Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

LA COORDINACIÓN DEL GRUPO DE PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE URBANO - PCIU DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA QUE

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, identificado con **NIT** No. **900084348**, cumplió a satisfacción técnica, administrativa, financiera y jurídicamente con el objeto y las obligaciones del contrato de **Interventoría No. 1900/2025**, en la forma y oportunidad pactadas.


En caso que se haya generado un pago anterior en virtud del contrato, CERTIFICO que el informe de ejecución correspondiente a dicho periodo se encuentra publicado en SECOP II.(1)

Por lo anterior, se genera registro de reevaluación al proveedor donde autoriza cancelar la suma de **$ 5.941.112,19 "CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO MIL CIENTO DOCE CON 19/100 PESOS M/Cte.";** correspondientes al **Tercer Pago** y tras previa verificación del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales.

Afecta los siguientes usos presupuestales:

No. COMPROMISO	RUBRO	USO	VALOR
1025325	C-3302-1603-16-20302B-3302051-02	A-02-02-02-008-003-09	$ 5.941.112,19
T O T A L			**$ 5.941.112,19**

Se expide en Bogotá, D.C. a los 28 días del mes de enero de 2026



YAMID ALEXANDER PATIÑO TORRES
COORDINADOR(A) (E) GRUPO DE PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE URBANO - PCIU
Supervisor

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.:
PERIODO DEL INFORME:
VIGENCIA DEL CONTRATO:
CONTRATISTA:
OBJETO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EL PERIODO EN MENCIÓN

Para el cumplimiento del objeto del contrato desarrolle las siguientes actividades acorde con el contrato en mención:

No.	Tipo	Obligación	Actividad	Porcentaje Avance	Soporte

Fecha de Entrega:

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES ADICIONALES

No.	Actividad

Cordial saludo,

En mi calidad de contratista me comprometo a publicar el presente informe y la certificación de cumplimiento en el SECOP II dentro de los 3 días hábiles siguientes a la aprobación del mismo.(1)

CONTRATISTA

Vo. Bo.:

Ministerio de Cultura
Supervisor

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

Fecha de Entrega:

CONTROL DE EVACION DE RECURSOS PARAFISCALES.
NIT 900.084.348 - 2
CERTIFICACIÓN JURAMENTADA PARA PERSONA JURIDICA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y lo señalado en la Ley 828 de 2003, el suscrito HERY ALBERTO CASTRO REINA. Identificado con CC. No 80.019.099 de Bogotá en calidad de representante legal de la firma CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA NIT 900.084.348-2 como persona jurídica hace constar el siguiente hecho:

Que hemos cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, cuando ello haya lugar, dentro de la ejecución del contrato No. 1900-2025. y a la fecha actual correspondientes a la nómina.

Que el Aportante no se encuentra en mora por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Por lo anterior, de manera expresa por este escrito ACREDITO el pago de aportes a que estoy obligado según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia.

Dada en Bogotá a los dieciséis (16) días del mes de enero de 2026.

ATT.

HENRY ALBERTO CASTRO REINA.
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900084348
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	piscilago
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-12-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-11
FECHA DE PAGO:	2025-12-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35638942
TOTAL COTIZANTES:	7
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35638942
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.000	$ 132.000
EPS005	800251440	SANITAS	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 712.000	$ 712.000
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172.000	$ 172.000
Subtotal Salud		3	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.016.000	$ 1.016.000
230201	800229739	PROTECCION	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.136.000	$ 1.136.000
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.728.000	$ 1.728.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200.000	$ 1.200.000
Subtotal Pensión		3	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.064.000	$ 4.064.000
14-23	860011153	POSITIVA	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.768.200	$ 1.768.200
Subtotal ARL		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.768.200	$ 1.768.200
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.016.000	$ 1.016.000
Subtotal CCF		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.016.000	$ 1.016.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.864.200	$ 7.864.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/01/2026

Culturas

ACTA DE PAGO PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**

Código: F-GIN-101
Versión: 4
Fecha: 10/Dic/2021

CONTRATO No:	**1900 DE 2025**	FECHA DE INICIACIÓN:	**27/10/2025**	ACTA No.	3
		PLAZO:	**65 DIAS**		
OBJETO:	Contratar la interventoría integral al contrato de obra resultante del proceso de selección abreviada cuyo objeto es: Realizar las obras para la protección de la Iglesia Inmaculada Concepción del municipio de Concepción - Antioquia, ubicada en el centro histórico declarado bien de interés cultural del ámbito nacional	PRORROGA:	**20 DIAS**	VALOR ACTA:	**$ 5.941.112,19**
				FECHA :	27/12/2025
		FECHA DE SUSPENSIÓN:	**NA**		
		FECHA DE REINICIACIÓN:	**NA**		
		FECHA TERMINACIÓN :	**20/01/2026**		
INTERVENTOR:	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA	VALOR Inicial (incluido IVA) :	**$ 49.167.825,0**	PERIODO PAGO MES:	28/12/2025
		VALOR ADICIÓN:	**$ 0,0**		AL
ACTA DE PAGO PARCIAL DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		VALOR TOTAL:	**$ 49.167.825,0**		16/01/2026

	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO		
FORMA DE PAGO (Acorde al contrato)	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**PORCENTAJE PAGADO**
Cargos fijos											
Un 40% del valor del contrato de Interventoría distribuido en el número de meses, correspondientes al plazo de ejecución total, pagadas mensualmente, contra informe de revisión de la ejecución del contrato de obra y de las actividades propias de la interventoría.	UNIDAD	$ 5.509.000,00	3,00	$ 16.527.000,00	0,70	$ 3.856.300,00	2	$ 11.018.000,00	2,70	$ 14.874.300,00	90%
Pagos por avance											
Un 55% del valor del contrato de Interventoría en pagos proporcionales al porcentaje de avance del contrato de obra, certificado mediante la correspondiente acta de corte de la ejecución, revisada y aprobada por la Interventoría y con la debida aprobación por parte de la Supervisión de la Entidad del correspondiente informe de ejecución, el cual deberá contener la información definida en el plan de calidad aprobado por las partes.	%	$ 41.317.500,00	55%	$ 22.724.625,00	5%	$ 1.136.231,25	95%	$ 21.588.393,75	100%	$ 22.724.625,00	100%
Pago contra liquidación											
Un 5% del valor del contrato de Interventoría a la terminación, recibo a satisfacción, liquidación y pago final de los trabajos del contrato de obra, la legalización y entrega de toda la documentación procedente, revisada, recibida a satisfacción y avalada por la Supervisión por parte de la Entidad y la acreditación del cumplimiento de las obligaciones contractuales de la interventoría, para dar paso a la liquidación del respectivo contrato.	UNIDAD	$ 2.065.875,00	1,00	$ 2.065.875,00		$ -			0%	$ -	0%
		SUBTOTAL		$ 41.317.500,00		$ 4.992.531,25		$ 32.606.393,75		$ 37.598.925,00	
		IVA 19%		$ 7.850.325,00		$ 948.580,94		$ 6.195.214,81		$ 7.143.795,75	
		VALOR TOTAL		$ 49.167.825,00		$ 5.941.112,19		$ 38.801.608,56		$ 44.742.720,75	91%


SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO DOCE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS

HENRY ALBERTO CASTRO REINA
Representante Legal Interventoria
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA

YAMID ALEXANDER PATIÑO TORRES
SUPERVISIÓN
GRUPO PCIU
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

CLAUDIA ZORAYA GUERRERO
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO PCIU
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES.

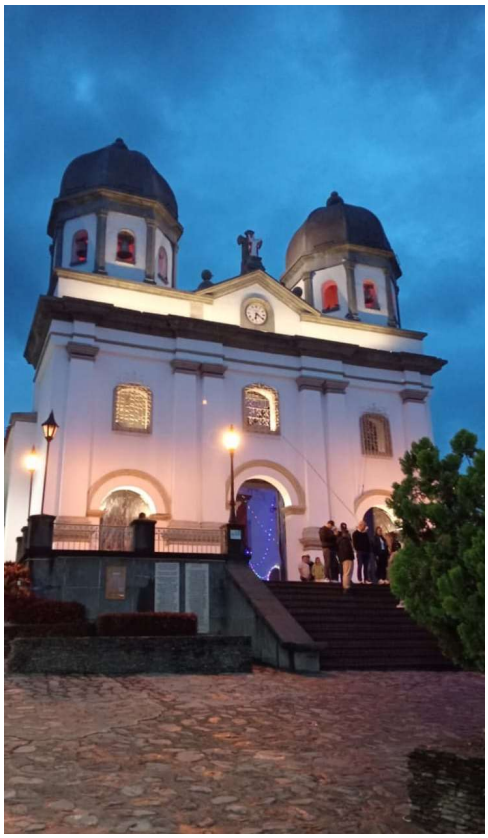

CONTRATO INTERVENTORIA No 1900-2025.

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS OBRAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN - ANTIOQUIA, UBICADA EN EL CENTRO HISTÓRICO DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL".

INFORME MENSUAL TECNICO 3 INTERVENTORIA.
27 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 16 DE ENERO DE 2026

Interventoría:
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.

SECTOR:
CONCEPCIÓN - ANTIOQUIA

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN..... 3

1. 1- INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4

1.2- INFORMACION CONTRATO DE OBRA.....4

1.3 – SUPERVISOR DEL CONTRATO. 4

2. MARCO DE REFERENCIA LEGAL. 5

3 DESARROLLO DEL PROYECTO..... 6

3. 1 - LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6

3. 2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 7

4. PRESUPUESTO ACTUAL IGLESIA CONCEPCIÓN. 7

4.1 AVANCE DE OBRA.....8

4.2 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES 1.....8

5. INFORMACION FINANCIERA Y AVANCE EN OBRA (CURVA S).....13

6. CUADRO GARANTIAS INTERVENTORIA (POLIZAS).....15

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 15

INFORME TECNICO 1 DE INTERVENTORÍA

1. INTRODUCCIÓN

Esta importante edificación situada al oriente de Antioquia fue construida en diferentes épocas; la primera data del año 1769 y luego fue reemplazada en 1859 por la actual edificación, diseñada por los arquitectos Simón Caballero y Luciano Jaramillo. El templo ha sido objeto de múltiples modificaciones a lo largo del tiempo, en especial sobre sus acabados del frontis y los techos. Presenta un estilo ecléctico e historicista, en el que puede destacarse el neo románico. Su fachada, construida en ladrillo, que posteriormente sería intervenida y revestida en granito lavado y pulido, tiene arcos de medio punto en los vanos de acceso y está rematada en un frontis con un reloj francés y dos torres octogonales con sendas cúpulas. El interior, construido con muros de tapia, tiene una planta basilical de tres naves; se destaca su piso, que fue construido inicialmente en tablón de arcilla cocida, al cual se le sobrepuso después la actual baldosa cerámica artesanal traída del Municipio de El Santuario, vecino de la localidad. Así mismo, se destaca el gran trabajo en carpintería de madera del retablo mayor, el baldaquino, cuatro altares laterales y el púlpito. La cubierta es la modificación más grande realizada en el Templo; inicialmente se componía de dos aguas que abarcaban la totalidad del espacio y se soportaba sobre pilares de madera; luego, fue reemplazada por la cubierta actual, donde la nave central, que se apoya sobre columnas de concreto que revistieron los antiguos pilares de madera, se levanta sobre las laterales generando unas ventanas en serie, colocadas en lo alto de la nave central, o claristorio, y da lugar a la aparición de un cimborio y un cupulino.

Bajo esta premisa, el centro histórico del municipio de Concepción – Antioquia, fue declarado bien de interés cultural ámbito Nacional mediante Resolución 1617 del 26 de noviembre de 1999; las intervenciones en el sector antiguo están reguladas por el PEMP aprobado mediante Resolución No 2175 del 5 de noviembre de 2020. La Iglesia Inmaculada Concepción, de acuerdo con el artículo 11 del PEMP, está clasificada en el nivel 1 – conservación integral; inmueble de excepcional significación cultural que por ser irremplazable deben ser preservados en su integralidad.

1. 1- INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El contrato de interventoría fue Adjudicado por **MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES** a **CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS** mediante **contrato No 1900-2025,** y cuyo objeto es: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS OBRAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN - ANTIOQUIA, UBICADA EN EL CENTRO HISTÓRICO DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL".

Valor Inicial (Incl. IVA):	**$ 49.167.825**
Fecha de inicio:	**27 de octubre de 2025.**
Fecha de terminación inicial:	**31 de diciembre de 2025**
Prorroga 1	**20 días**
Fecha terminación actual	**20 de enero de 2026**
Plazo Total inicial	**2 meses**
Plazo Total	**81 dias**

1. 2- INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra fue Adjudicado por **MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES** a **ID S.A.S** mediante **contrato No 1890 de 2025,** y cuyo objeto es: REALIZAR LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN - ANTIOQUIA, UBICADA EN EL CENTRO HISTÓRICO DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL.

Valor Inicial (Incl. IVA):	**$ 497.846.840**
Fecha de inicio:	**27 de octubre de 2025.**
Fecha de terminación inicial:	**31 de diciembre de 2025**
Prorroga 1	**20 días**
Fecha terminación actual	**20 de enero de 2026**
Plazo Total inicial	**2 meses**
Plazo Total	**81 dias**
Anticipo	**$ 99.569.368**

1.3 – SUPERVISOR DEL CONTRATO Y APOYO A LA SUPERVISIÓN.

YAMID ALEXANDER PATIÑO TORRES.
CLAUDIA ZORAYA GUERRERO SARTMIENTO

2. MARCO DE REFERENCIA LEGAL.

Hacen parte de la presente contratación, entre otros, los documentos que se relacionan a continuación y que para este proyecto se encuentran en aplicación: Norma Aportes que permiten el establecimiento de diálogos o esquemas de integración territorial para la gestión intermunicipal.

- Normas Técnicas Colombianas NTC 4595 y NTC 4596
- Resolución 0631 de 2015 reglamenta el artículo 28.
- Resolución 2175 del 5 de noviembre de 2020 por medio del cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección – PEMP del centro histórico del municipio de Concepción – Antioquia, bien de interés cultural del ámbito Nacional.
- La Ley 99 de 1993 (Ley Ambiental) y sus decretos reglamentarios.
- La Ley 789 de 2002. - Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo.
- La Ley 816 de 2003. - Por medio de la cual se apoya la Industria Nacional a través de la Contratación Pública.
- La Ley 828 de 2003. - Por la cual se expiden normas para el control de la evasión del Sistema de Seguridad Social.
- La Ley 850 de 2003. - Por la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.
- Normas RAS. 2017.
- Resolución 1617 del 26 de noviembre de 1999 por medio del cual se declara el centro histórico del municipio de Concepción – Antioquia como bien de interés cultural del ámbito Nacional.

3 DESARROLLO DEL PROYECTO

3. 1 - LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La Iglesia La Inmaculada Concepción es un lugar sagrado ubicado en Concepción, Antioquia, Colombia. Esta iglesia se distingue por su tradición y su especial sentido histórico, lo que la convierte en un destino imperdible para aquellos que buscan sumergirse en la cultura local. Además de la belleza de su arquitectura y su decoración sencilla pero encantadora, La Inmaculada Concepción alberga una historia cautivadora. En su predio, perteneciente en algún momento a las ánimas, se encuentra la historia del Beato Mártir Colombiano de la orden hospitalaria San Juan de Dios. A tan solo 40 km de la vía Medellín-Bogotá, este municipio acogedor y ordenado es un punto de interés turístico en el oriente antioqueño. Descubre la historia y la belleza de La Inmaculada Concepción, ¡una verdadera joya en Concepción, Antioquia



3. 2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

En la actualidad se desarrolla el proyecto de la referencia que consiste en la restauración puntual de la FACHADA de la iglesia la INMACULADA, en el municipio de CONCEPCION, Departamento de Antioquia, la iglesia presenta muros al descubierto, dado el retiro de fachada en granito. Así mismo presenta falta de mantenimiento en las cúpulas de fachada, y arreglos de mallan anti palomas

4 PRESUPUESTO ACTUAL IGLESIA CONCEPCIÓN.

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					3. MODIFICACIONES ANTERIORES			4. CONDICIONES ACTUALIZADAS		JUSTIFICACIÓN
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	+ / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	
1	Campamento 9 M2	un	3.049.459,00	1,00	3.049.459			-	1,00	3.049.459,00	VALOR FIJO
2	Cerramiento de protección tela polipropileno verde H= 2.00 MTS,incluye estructura en madera	ml	49.173,00	100,00	4.917.300			-	100,00	4.917.300,00	VALOR FIJO
3	Plataformas de trabajo COMPLETA con andamio certificado de 4.4 X 12 H=30m.	kg/día	4.796,00	30.000,00	143.880.000			-	30.000,00	143.880.000,00	VALOR FIJO
4	Desmonte de enchape en granito (incluye retiro de escombros)	m2	77.793,00	50,00	3.889.650	-	(50,00)	(3.889.650,00)	-	-	ACTIVIDAD SIN EJECUTAR (SE DEJA EL ENCHAPE QUE QUEDA COMO PROTECION EN LOS MUROS BAJOS)
5	Reparación y/o remplazo de molduras afectadas o faltantes	ml	565.420,00	30,00	16.962.600	+	35,80	20.242.036,00	65,80	37.204.636,00	Incluye lavado, limpieza , impermeabilizacion, y reposicion de piezas faltantes en cornizas de granito y otros materiales
6	Reparación arcos de medio punto en ladrillo	un	3.243.227,00	3,00	9.729.681			-	3,00	9.729.681,00	VALOR FIJO
7	Reparación y/o consolidación de fisuras y grietas en muros	ml	346.523,00	30,00	10.395.690	-	(2,00)	(693.046,00)	28,00	9.702.644,00	
8	Pañete 1:3 a base de cal y arena y fibra vegetal. No incluye pintura	m2	84.591,00	750,00	63.443.250	+	297,35	25.153.133,85	1.047,35	88.596.383,85	AJUSTE CON MEMORIAS
9	Pintura muro tres manos, con cal + mineral (blanco)	m2	31.860,00	750,00	23.895.000	+	297,35	9.473.571,00	1.047,35	33.368.571,00	AJUSTE CON MEMORIAS
10	Mantenimiento de carpintería en metalica (incluye remplazo de piezas faltantes, masilla, lijada, una mano de anticorrosivo y dos manos de esmalte de acabado final)	m2	587.657,00	20,00	11.753.140	-	(20,00)	(11.753.140,00)	-	-	AJUSTE CON MEMORIAS
11	Mantenimiento de carpintería en madera(incluye remplazo de piezas faltantes, masilla, lijada, una mano de inmunizante y dos manos de barniz de acabado final)	m2	787.142,00	50,00	39.357.100	-	(50,00)	(39.357.100,00)	-	-	ACTIVIDAD SIN EJECUTAR
12	Suministro e instalacion de proteccion vanos campanarios (rejas en marco metalico (con 1 mano de antocorrosivo y 2 manos de acabado en esmalte) y malla para control de aves (color transparente, material nylon, calibre 0,8mm rombo 4,4cm, resistencia 180K*m2, durabilidad de 4 a 6 años. Caracteristicas: proteccion uv y antihongos, no absorbe humedad, no conduce electricidad, no es escalable, no deshilacha, nudo reforzado)	m2	657.540,00	30,00	19.726.200	-	(9,98)	(6.562.249,20)	20,02	13.163.950,80	AJUSTE CON MEMORIAS
13	Lavado y protección con sello hidrofugo de cúpulas con acabado en granito	m2	166.132,00	50,00	8.306.600	+	44,45	7.384.567,40	94,45	15.691.167,40	AJUSTE CON MEMORIAS
14	Aseo general para entrega	m2	11.150,00	300,00	3.345.000			-	300,00	3.345.000,00	VALOR FIJO
A	**SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los item)**				**362.650.670,00**			**-1.876,95**		**362.648.793,05**	
B	ADMINISTRACION		28,33%		102.738.934,81			-531,74		102.738.403,07	
C	IMPREVISTOS		3,00%		10.879.520,10			-56,31		10.879.463,79	
D	UTILIDAD		5,00%		18.132.533,50			-93,85		18.132.439,65	
E	**SUBTOTALTOTALES (A+B+C+D)**				**494.401.658,41**			**-2.558,85**		**494.399.099,57**	
	IVA SOBRE UTILIDAD (19% sobre utilidad)		19,00%		**3.445.181,37**			**-17,83**		3.445.163,53	
	TOTAL				**497.846.839,78**			**-2.576,68**		**497.844.263,10**	

4.1 AVANCE DE OBRA.

El contrato de obra posee un avance real 100% vs 100% programado para el informe mensual 3 interventoría.

4.2 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES 2.

Durante el primer mes del contrato correspondiente al 27 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026, se realizaron las siguientes actividades en la iglesia de concepción Antioquia:

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realiza terminan actividades de pintura en la fachada y al interior de la iglesia.
- El contratista termina actividades al 100%.
- Se realiza actividades de desmonte de andamios internos y exteriores.
- Se terminan actividades de reparación de mallas en el campanario.
- Se inician actividades de limpieza de pisos al interior y al exterior de la iglesia.
- Se presentaron algunas observaciones finales las cuales el contratista atendió y completo al 100%.
- Se realiza retiro del campamento instalado por el contratista.
- Se realiza limpieza en las rejas de las ventanas de la iglesia.



FOTO 1. Terminación de actividades de pintura al interior de la iglesia.



FOTO 2. Terminación de actividades de pintura en la fachada



FOTO 3. Desmonte de andamios ubicados en la fachada y laterales de la iglesia al 100%.



FOTO 4. Limpieza piso de ladrillo adoquín parte exterior de la iglesia.



FOTO 5. Instalación rejillas campanario.


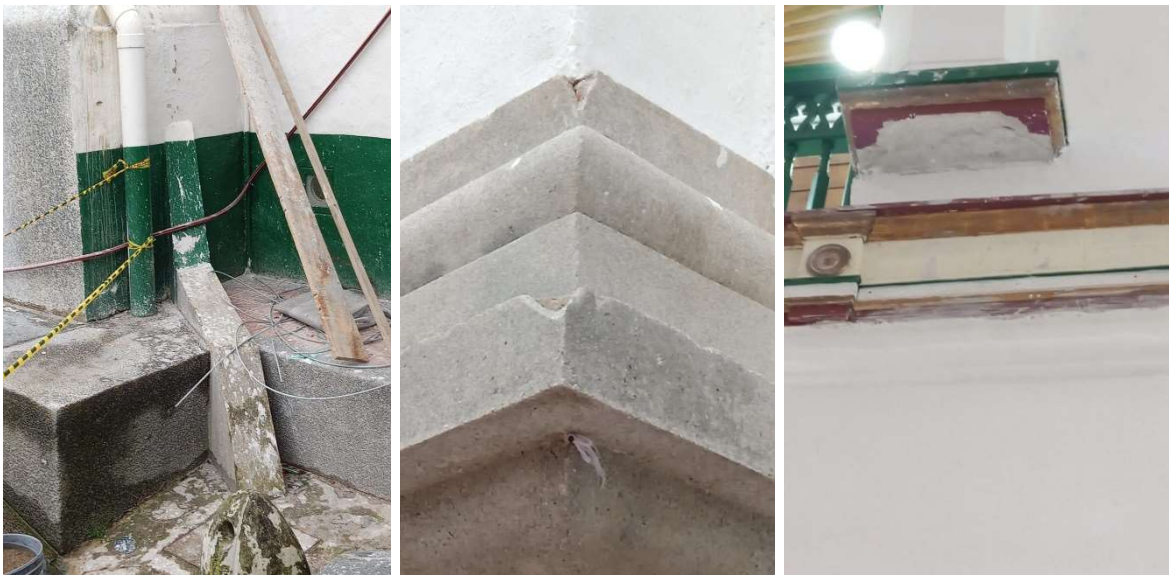


FOTO 6. Observaciones finales realizadas al contratista.


5. INFORMACION FINANCIERA Y AVANCE EN OBRA (CURVA S)

CANTIDADES SEMANA				
SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	$ 3.485.393,28	$ 3.485.393,28	$ 3.484.927,88	$ 3.484.927,88
2	$ 49.791.332,60	$ 53.276.725,88	$ 9.405.677,80	$ 12.890.605,68
3	$ 76.180.738,87	$ 129.457.464,75	$ 30.002.196,96	$ 42.892.802,64
4	$ 99.582.665,19	$ 229.040.129,94	$ 146.116.777,02	$ 189.009.579,66
5	$ 99.582.665,19	$ 328.622.795,13	$ 31.762.628,39	$ 220.772.208,05
6	$ 74.686.998,89	$ 403.309.794,03	$ 56.256.692,92	$ 277.028.900,97
7	$ 24.895.666,30	$ 428.205.460,33	$ 60.168.151,36	$ 337.197.052,33
8	$ 24.895.666,30	$ 453.101.126,62	$ 55.259.382,84	$ 389.082.694,00
9	$ 21.954.381,74	$ 470.913.325,00	$ 84.998.323,47	$ 474.081.017,47
10	$ 14.937.399,78	$ 485.850.724,78	$ 23.765.822,53	$ 497.846.840,00
11	$ 4.979.133,26	$ 490.829.858,04		
12	$ 4.979.133,26	$ 497.846.840,00		

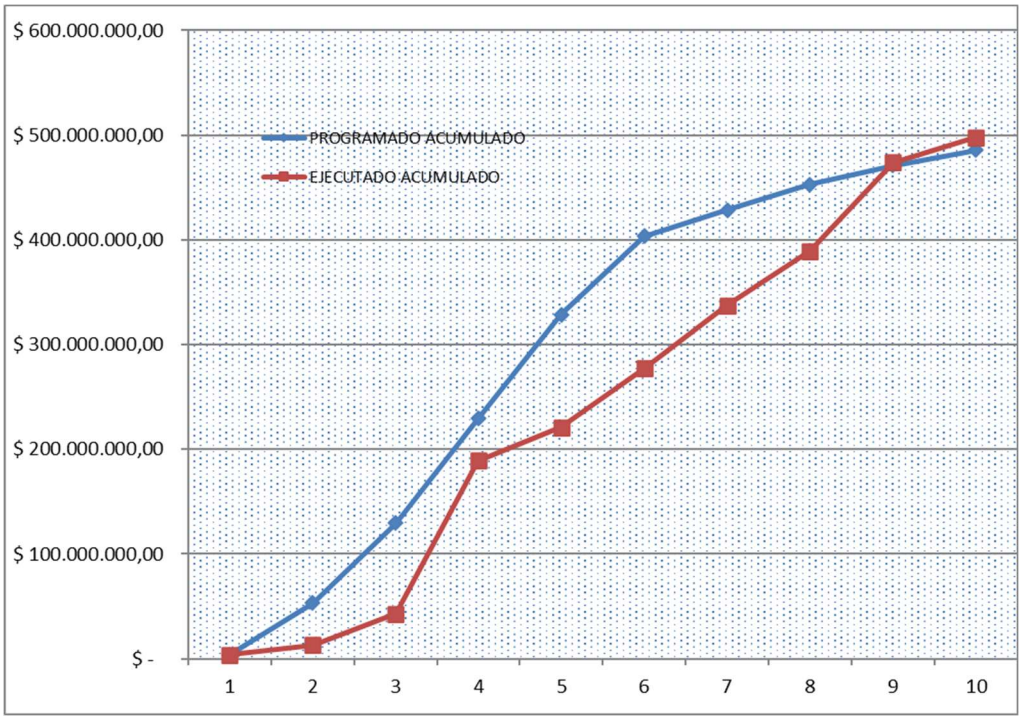

PORCENTAJES SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%
2	10,00%	10,70%	2,59%	3,29%
3	15,30%	26,00%	6,03%	9,32%
4	20,00%	46,00%	29,30%	38,62%
5	20,00%	66,00%	6,38%	45,00%
6	15,00%	81,00%	11,30%	56,30%
7	5,00%	86,00%	13,09%	69,39%
8	5,00%	91,00%	12,20%	81,59%
9	4,00%	95,00%	13,00%	94,59%
10	3,00%	98,00%	5,00%	99,59%
11	1,00%	99,00%	0,41%	100,00%
12	1,00%	100,00%		

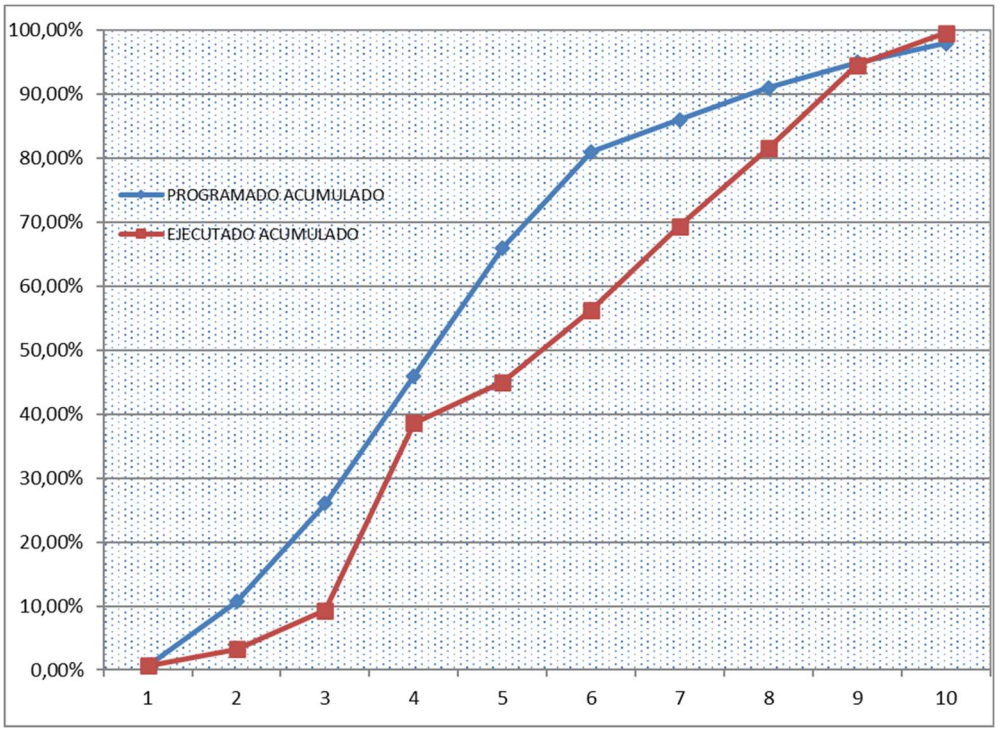

6. CUADRO GARANTIAS INTERVENTORIA (POLIZAS)

GARANTIAS ACTUALIZADAS A LA PRORROGA 1 INTERVENTORIA ANEXO 3:						
AMPAROS	**POLIZA N°**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**	**ASEGURADORA**	**%**
		DESDE	**DESDE**			
CUMPLIMIENTO	33-44-101268363	27-oct.-25	20-jul-26	$9,833,565.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A	20%
CALIDAD SERVICIO	33-44-101268363	27-oct.-25	20-ene-29	$2,458,391.25	SEGUROS DEL ESTADO S.A	20%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	33-44-101268363	27-oct.-25	20-ene-31	$9,833,565.00	SEGUROS DEL ESTADO S.A	5%

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Se realizan observaciones finales al contratista el cual se compromete a atenderlas para la fecha de terminación del 16 de enero de 2026.
- El contratista ejecuta al 100% la obra.
- Se debe hacer recorrido con la alcaldía y la curia para el día miércoles 14 de enero de 2026 con el fin de informar que se ejecutó al 100% la obra.
- Se realiza ACTA DE TERMINACION CONTRATOS OBRA E INTERVENTORIA
- Se suscribe ACTA DE INVENTARIO.
- Se solicitan pagos al contratista e interventoria, a la fecha no se ha surtito ninguno.

ATT.



HENRY ALBERTO CASTRO REINA.
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO:	**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS OBRAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN - ANTIOQUIA, UBICADA EN EL CENTRO HISTÓRICO DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL".**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CONCEPCION - ANTIOQUIA**
INTERVENTOR:	**CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1900-2025**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**27/12/2025 AL 16/01/2026**

FOTOGRAFÍA (1)



Terminación de actividades de pintura al interior de la iglesia.

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**CIC-06-2022**
		VERSIÓN:	**1**
		VIGENCIA:	**2023-10-07**

OBJETO DEL CONTRATO:	**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS OBRAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN - ANTIOQUIA, UBICADA EN EL CENTRO HISTÓRICO DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL".**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CONCEPCION - ANTIOQUIA**
INTERVENTOR:	**CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1900-2025**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**27/12/2025 AL 16/01/2026**

FOTOGRAFÍA (2)



Terminación de actividades de pintura en la fachada

OBJETO DEL CONTRATO:	**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS OBRAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN - ANTIOQUIA, UBICADA EN EL CENTRO HISTÓRICO DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL".**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CONCEPCION - ANTIOQUIA**
INTERVENTOR:	**CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1900-2025**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**27/12/2025 AL 16/01/2026**

FOTOGRAFÍA (3)



Desmonte de andamios ubicados en la fachada y laterales de la iglesia al 100%.

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**CIC-06-2022**
		VERSIÓN:	**1**
		VIGENCIA:	**2023-10-07**

OBJETO DEL CONTRATO:	**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS OBRAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN - ANTIOQUIA, UBICADA EN EL CENTRO HISTÓRICO DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL".**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CONCEPCION - ANTIOQUIA**
INTERVENTOR:	**CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1900-2025**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**27/12/2025 AL 16/01/2026**

FOTOGRAFÍA (4)



Limpieza piso de ladrillo adoquín parte exterior de la iglesia.

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**CIC-06-2022**
		VERSIÓN:	**1**
		VIGENCIA:	**2023-10-07**

OBJETO DEL CONTRATO:	**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS OBRAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN - ANTIOQUIA, UBICADA EN EL CENTRO HISTÓRICO DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL".**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CONCEPCION - ANTIOQUIA**
INTERVENTOR:	**CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1900-2025**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**27/12/2025 AL 16/01/2026**

FOTOGRAFÍA (5)



Instalación rejillas campanario.

Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO:	**CIC-06-2022**
		VERSIÓN:	**1**
		VIGENCIA:	**2023-10-07**

OBJETO DEL CONTRATO:	**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS OBRAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN - ANTIOQUIA, UBICADA EN EL CENTRO HISTÓRICO DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL".**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**CONCEPCION - ANTIOQUIA**
INTERVENTOR:	**CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**1900-2025**
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**27/12/2025 AL 16/01/2026**

FOTOGRAFÍA (6)





Observaciones finales realizadas al contratista.

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS	**FORMATO** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO COL-GRH-RH-FT-015 EMISIÓN 01/02/2010 VIGENCIA 14/04/2016 VERSIÓN 03 PÁGINA 1 de 5

Acta No	09	**Fecha**		
Lugar de la Reunión	VIRTUAL	**DD**	**MM**	**AA**
Temas:	AVANCE DE OBRA	30	12	2025
Hora de Inicio: 09:00 Am	**Hora de Finalización: 10:00 Am**			

ASISTENTES		
EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**
MINISTERIO DE CULTURA	**CLAUDIA ZORAYA GUERRERO SARTMIENTO**	**SUPERVISION MIN**
MINISTERIO DE CULTURA	**YAMID ALEXANDER PATIÑO TORRES.**	**SUPERVISION MIN**
CONSTRUCTODO	**HENRY ALBERTO CASTRO REINA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**
CONSTRUCTODO	**DAVID AMAYA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONSTRUCTODO	**SEBASTIAN MARTINEZ TORO**	**ADMINISTRATIVO INTERVENTORIA**
CONSTRUCTODO	**YECID HERNANDO CASTRO REINA**	**COORDINADOR**
ID S.A.S	**JOSE TOMAS**	**OBRA**
ID S.A.S	**LUIS FERNANDO SALGADO**	**COORDINADOR OBRA**
ID S.A.S	**AUGUSTO CABALLERO**	**OBRA**
ID S.A.S	**JOSE GUIOVANNI SASTOQUE MENDEZ**	**RESIDENTE OBRA**

PUNTOS PENDIENTES DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA
SUPERVISION MINISTERIO	APROBACION CUENTA 2 OBRA Y CUENTA 1 INTERVENTORIA	23/12/2025 CUMPLIO
SUPERVISION MINISTERIO	INFORMACION PRORROGA	30/12/2025
CONTRATISTA	CORTE 3 OBRA AL 95%	29/12/2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se presentan a esta reunión el contratista de obra, supervisión e interventoría con el fin de dar inicio al seguimiento del contrato, que inició en debida forma, el día 30 de diciembre de 2025. El COMITÉ 9, inicia con la lectura del orden del día por parte de la interventoría.

PUNTO 1. COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

APROBACION CUENTA 2 OBRA Y CUENTA 1 INTERVENTORIA, la interventoría menciona que se cumplió dicho compromiso y fue aprobada por parte del ministerio, luego de esto el contratista procedió a cargar la cuenta en la plataforma del secop II.

INFORMACION PRORROGA, la interventoría menciona que se dio aprobación a la documentación por parte del ministerio y por lo tanto se firmó en pagina la prorroga tanto para el contrato de obra e interventoría. Se espera la actualización de las pólizas conforme a la modificación del contrato y así mismo las pólizas deberá ser cargadas en el secop II.

CUENTA DE OBRA 3, la interventoría menciona que el contratista entrego la cuenta 3 con sus respectivas memorias de cálculo el día sábado 27 de diciembre de 2025, con el fin que fueran revisadas y aprobadas por parte de la interventoría, dicho esto la interventoría revisa la cuenta y la remite al ministerio para su respectiva aprobación. Se espera que la interventoría envíe la cuenta 2 para su revisión y aprobación por parte del ministerio.

PUNTO 2. ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA

La interventoría informa a supervisión el avance ejecutado en obra del 95,23% vs un avance programado del 100% y presenta un atraso del 4,77% conforme al plazo inicial del contrato, se menciona que ya nos encontramos en la parte final del contrato e informando que se encuentran en actividades de limpieza, instalación de mallas en el campanario, se deben realizar planos récord y manual de mantenimiento. Se espera terminar actividades el 15 de enero de 2026 quedando pendiente actividades de frisos de la parte baja de las columnas, detalles en la parte interna, aseo en la parte del coro y aseo general de la obra. Se informa que se están desmontando los andamios ya que se han terminado actividades de pañete al 100% en la fachada y parte interna.

PUNTO 4. IMPUESTOS

La interventoría menciona el tema de los impuestos que no ha llegado información por parte del ministerio, dando respuesta a dicho tema el ministerio menciona que hará lo posible para el próximo comité de tener información sobre dicho tema.

PUNTO 5. OTROS.

La interventoría menciona el tema o solicita a supervisión formatos de actas de entrega de las obras con el fin de ir diligenciando dichos formatos, dando respuesta el ministerio menciona que los enviara al correo los formatos junto a uno de inventario

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	**ACTIVIDAD**	**FECHA**
CONTRATISTA E INTERVENTORIA	POLIZAS PRORROGA	30/12/2025
CONTRATISTA	CORTE 3 OBRA AL 95%	30/12/2025
MINISTERIO DE CULTURA	INFORMACION IMPUESTOS	06/01/2026
MINISTERIO DE CULTURA	FORMATOS ENTREGA	30/12/2025

En señal de acuerdo, suscriben el acta,

NOMBRE	FIRMA
CLAUDIA GUERRERO SARMIENTO	
YAMID ALEXANDER PATIÑO TORRES	
JOSE TOMAS	
LUIS FERNANDO SALGADO	
AUGUSTO CABALLERO	
JOSE GUIOVANNI SASTOQUE MENDEZ	
HENRY ALBERTO CASTRO REINA	
YECID HERNANDO CASTRO REINA	Yecid Hernando Castro R.
DAVID AMAYA	
SEBASTIAN MARTINEZ TORO	Sebastián Martínez Toro

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS	**FORMATO** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO COL-GRH-RH-FT-015 EMISIÓN 01/02/2010 VIGENCIA 14/04/2016 VERSIÓN 03 PÁGINA 1 de 5

Acta No	10	**Fecha**		
Lugar de la Reunión	VIRTUAL	**DD**	**MM**	**AA**
Temas:	AVANCE DE OBRA	06	01	2026
Hora de Inicio: 09:00 Am	**Hora de Finalización: 10:00 Am**			

ASISTENTES		
EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**
MINISTERIO DE CULTURA	**CLAUDIA ZORAYA GUERRERO SARTMIENTO**	**SUPERVISION MIN**
MINISTERIO DE CULTURA	**YAMID ALEXANDER PATIÑO TORRES.**	**SUPERVISION MIN**
CONSTRUCTODO	**HENRY ALBERTO CASTRO REINA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**
CONSTRUCTODO	**DAVID AMAYA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONSTRUCTODO	**SEBASTIAN MARTINEZ TORO**	**ADMINISTRATIVO INTERVENTORIA**
CONSTRUCTODO	**YECID HERNANDO CASTRO REINA**	**COORDINADOR**
ID S.A.S	**JOSE TOMAS**	**OBRA**
ID S.A.S	**LUIS FERNANDO SALGADO**	**COORDINADOR OBRA**
ID S.A.S	**AUGUSTO CABALLERO**	**OBRA**
ID S.A.S	**JOSE GUIOVANNI SASTOQUE MENDEZ**	**RESIDENTE OBRA**

PUNTOS PENDIENTES DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA
CONTRATISTA E INTERVENTORIA	POLIZAS PRORROGA	30/12/2025
CONTRATISTA	CORTE 3 OBRA AL 95%	30/12/2025
MINISTERIO DE CULTURA	INFORMACION IMPUESTOS	06/01/2026
MINISTERIO DE CULTURA	FORMATOS ENTREGA	30/12/2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se presentan a esta reunión el contratista de obra, supervisión e interventoría con el fin de dar inicio al seguimiento del contrato, que inició en debida forma, el día 06 de enero de 2026. El COMITÉ 10, inicia con la lectura del orden del día por parte de la interventoría.

PUNTO 1. COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

APROBACION CUENTA 3 OBRA Y CUENTA INTERVENTORIA, la interventoría menciona que se cumplió dicho compromiso e informando que la del contratista fue cargada en la plataforma, conforme a la cuenta de interventoría se menciona que presento observaciones en la factura electrónica que debe actualizarse a fecha del enero de 2026. Supervisión solicita a interventoría realizar el cambio de la factura y nuevamente enviarla e informar con el fin de dar aprobación a la factura por parte de supervisión.

INFORMACION PRORROGA O ACTUALIZACION POLIZAS, la interventoría menciona que ya se actualizaron las pólizas del contrato de obra e interventoría, luego de esto ya fueron cargadas en la plataforma del secop II con su respectivo recibo de pago y por cada uno de los contratos.

PUNTO 2. ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA

La interventoría informa a supervisión el avance ejecutado en obra del 100% vs un avance programado del 100%. Se menciona que ya la obra se culmina e informando que el contratista se encuentra en labores de limpieza y terminando detalles en la iglesia, esta semana se espera pasar la última revisión por parte de interventoría y en compañía del contratista con el fin de identificar o realizar observaciones al contratista, luego de esto el ministerio propone realizar una reunión con la curia y el secretario de planeación con el fin de mostrarle finalmente lo realizado en la obra. El acta de recibo final de obra se deberá firmar por parte de la alcaldía y la curia. Se espera realizar la entrega de la obra a finales del mes de enero de 2026.

PUNTO 4. IMPUESTOS

La interventoría menciona el tema de los impuestos que no ha llegado información por parte del ministerio, dando respuesta a dicho tema el ministerio menciona que hará lo posible para el próximo comité de tener información sobre dicho tema, dicho comité será el 13 de enero de 2026.

PUNTO 5. OTROS.

La interventoría vuelve y recuerda al contratista realizar los planos récord y el manual de mantenimiento con el fin de ir adelantando actividades finales para la liquidación y entrega final

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	**ACTIVIDAD**	**FECHA**
INTERVENTORIA	NUEVA FACTURA CUENTA INTERVENTORIA	07/01/2026
CONTRATISTA E INTERVENTORIA	FORMATOS ENTREGA Y RECIBO FINAL DILIGENCIADOS	15/01/2026
MINISTERIO DE CULTURA	INFORMACION IMPUESTOS	13/01/2026
MINISTERIO CULTURA	FORMATO INVENTARIO	06/01/2026

En señal de acuerdo, suscriben el acta,

NOMBRE	FIRMA
CLAUDIA GUERRERO SARMIENTO	
YAMID ALEXANDER PATIÑO TORRES	
JOSE TOMAS	
LUIS FERNANDO SALGADO	
AUGUSTO CABALLERO	
JOSE GUIOVANNI SASTOQUE MENDEZ	
HENRY ALBERTO CASTRO REINA	
YECID HERNANDO CASTRO REINA	Yecid Hernando Castro R.
DAVID AMAYA	
SEBASTIAN MARTINEZ TORO	Sebastián Martínez Toro

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS	**FORMATO** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO COL-GRH-RH-FT-015 EMISIÓN 01/02/2010 VIGENCIA 14/04/2016 VERSIÓN 03 PÁGINA 1 de 5

Acta No	11	**Fecha**		
Lugar de la Reunión	VIRTUAL	**DD**	**MM**	**AA**
Temas:	AVANCE DE OBRA	13	01	2026
Hora de Inicio: 09:00 Am	**Hora de Finalización: 10:00 Am**			

ASISTENTES		
EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**
MINISTERIO DE CULTURA	**CLAUDIA ZORAYA GUERRERO SARTMIENTO**	**SUPERVISION MIN**
MINISTERIO DE CULTURA	**YAMID ALEXANDER PATIÑO TORRES.**	**SUPERVISION MIN**
CONSTRUCTODO	**HENRY ALBERTO CASTRO REINA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**
CONSTRUCTODO	**DAVID AMAYA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONSTRUCTODO	**SEBASTIAN MARTINEZ TORO**	**ADMINISTRATIVO INTERVENTORIA**
CONSTRUCTODO	**YECID HERNANDO CASTRO REINA**	**COORDINADOR**
ID S.A.S	**JOSE TOMAS**	**OBRA**
ID S.A.S	**LUIS FERNANDO SALGADO**	**COORDINADOR OBRA**
ID S.A.S	**AUGUSTO CABALLERO**	**OBRA**
ID S.A.S	**JOSE GUIOVANNI SASTOQUE MENDEZ**	**RESIDENTE OBRA**
CURIA	**VICTOR UBEIMAR GUTIERREZ**	**PARROCO**
ALCALDIA	**CAMILO SUAREZ**	**PLANEACION**

PUNTOS PENDIENTES DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
RESPONSABLE	**ACTIVIDAD**	**FECHA**
INTERVENTORIA	NUEVA FACTURA CUENTA INTERVENTORIA	07/01/2026
CONTRATISTA E INTERVENTORIA	FORMATOS ENTREGA Y RECIBO FINAL DILIGENCIADOS	15/01/2026
MINISTERIO DE CULTURA	INFORMACION IMPUESTOS	13/01/2026
MINISTERIO CULTURA	FORMATO INVENTARIO	06/01/2026

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se presentan a esta reunión el contratista de obra, alcaldía municipal, curia, supervisión e interventoría con el fin de dar inicio al seguimiento del contrato, que inició en debida forma, el día 13 de enero de 2026. El COMITÉ 11, inicia con la lectura del orden del día por parte de la interventoría.

PUNTO 1. COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

NUEVA FACTURA CUENTA 2 INTERVENTORIA, la interventoría menciona que se cumplió dicho compromiso e informando a supervisión que se generó una nueva factura y se envió nuevamente la cuenta 2 de interventoría el día 7 de enero de 2026. Esta cuenta se encuentra en trámite por parte del ministerio.

FORMATOS ENTREGA Y RECIBO FINAL DILIGENCIADOS, la interventoría presenta el formato de acta de terminación de contrato el cual ya se encuentra diligenciado, dicho esto la interventoría menciona que se presentaron 57 observaciones finales al contratista el cual ya se ha superado y atendido el 60% de dichas observaciones luego de esto se procederá a firmar el acta de terminación del contrato de obra en esta acta se debe plasmar la firma del párroco de la iglesia. Para el día de hoy 13 de enero de 2026 se realiza una visita o recorrido con la alcaldía y el párroco de la iglesia con el fin de que puedan generar alguna observación que tenga la alcaldía y la curia conforme al alcance del contrato. Respecto al acta de recibo final se debe diligenciar después del recibo de obra debido a que se deben anexar las pólizas finales las cuales se solicitan conforme al acta de terminación de obra, esta acta será diligenciada por el contratista de obra. La interventoría menciona que el contratista debe presentar una documentación final para la liquidación del contrato de obra, la interventoría hace referencia que en días anteriores se había enviado al contratista de obra mediante un correo electrónico la lista de chequeo de la liquidación del contrato de obra, dando respuesta el contratista de obra solicita a la interventoría un oficio donde este claro la documentación a enviar para la liquidación del contrato.

INFORMACION IMPUESTOS, la interventoría hace referencia el tema de los impuestos de los contratos, dando respuesta el ministerio informa que la semana pasada envió un correo donde menciona que el ministerio hace esa deducción a los contratos de obra e interventoría y luego de esto el ministerio desembolsa el impuesto al municipio.

FORMATO INVENTARIO, conforme a este formato la interventoría menciona que se diligenciara en los próximos días, después de la visita que se realizara con la alcaldía y el párroco el día de hoy 13 de enero de 2026.

PUNTO 2. AVANCE AL 100% Y ENTREGA

La interventoría informa a supervisión el avance se encuentra al 100% y el contratista cumple con las actividades del contrato, sin embargo, se encuentran en actividades de limpieza finales, desinstalación del campamento de la protección de las puestas de la iglesia y conforme a las observaciones se encuentran algunos remates en los filos de la edificación, la interventoría menciona que el contratista se encuentra realizando dichas observaciones y serán terminadas en los próximos días.

PUNTO 3. PAGOS

El contratista de obra solicita información sobre los pagos los cuales no se han realizado por parte del ministerio, dando respuesta supervisión menciona que el DNP empezó a girar recursos al ministerio con el fin del hacer al pago de las cuentas 1 y 2 del contratista de obra y la cuneta 1 de interventoría estos pagos se realizaran para el di a15 de enero de 2026, dicho esto el contratista enviara un oficio a la parte financiera del ministerio con el fin que den información de las fechas de pago de las cuentas.

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	**ACTIVIDAD**	**FECHA**
INTERVENTORIA, CONTRATISTA, ALCALDIA Y PARROCO	RECORRIDO FINAL EN LA OBRA	13/01/2026
CONTRATISTA	ACTA DE RECIBO FINAL	20/01/2026
INTERVENTORIA	SOLICITUD DOCUMENTOS LIQUIDACION OBRA	13/01/2026
CONTRATISTA	DOCUMENTACION FINAL PARA LIQUIDACION DE OBRA	20/01/2026
MINISTERIO DE CULTURA	PAGOS INTERVENTORIA Y OBRA	15/01/2026

En señal de acuerdo, suscriben el acta,

NOMBRE	FIRMA
CLAUDIA GUERRERO SARMIENTO	
YAMID ALEXANDER PATIÑO TORRES	
JOSE TOMAS	
LUIS FERNANDO SALGADO	
AUGUSTO CABALLERO	
JOSE GUIOVANNI SASTOQUE MENDEZ	
HENRY ALBERTO CASTRO REINA	
YECID HERNANDO CASTRO REINA	Yecid Hernando Castro R.
DAVID AMAYA	
SEBASTIAN MARTINEZ TORO	Sebastián Martínez Toro
VICTOR UBEIMAR	
CAMILO SUAREZ	

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS	**FORMATO** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO COL-GRH-RH-FT-015 EMISIÓN 01/02/2010 VIGENCIA 14/04/2016 VERSIÓN 03 PÁGINA 1 de 5

Acta No	09	**Fecha**		
Lugar de la Reunión	VIRTUAL	**DD**	**MM**	**AA**
Temas:	AVANCE DE OBRA	30	12	2025
Hora de Inicio: 09:00 Am	**Hora de Finalización: 10:00 Am**			

ASISTENTES		
EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**
MINISTERIO DE CULTURA	**CLAUDIA ZORAYA GUERRERO SARTMIENTO**	**SUPERVISION MIN**
MINISTERIO DE CULTURA	**YAMID ALEXANDER PATIÑO TORRES.**	**SUPERVISION MIN**
CONSTRUCTODO	**HENRY ALBERTO CASTRO REINA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**
CONSTRUCTODO	**DAVID AMAYA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONSTRUCTODO	**SEBASTIAN MARTINEZ TORO**	**ADMINISTRATIVO INTERVENTORIA**
CONSTRUCTODO	**YECID HERNANDO CASTRO REINA**	**COORDINADOR**
ID S.A.S	**JOSE TOMAS**	**OBRA**
ID S.A.S	**LUIS FERNANDO SALGADO**	**COORDINADOR OBRA**
ID S.A.S	**AUGUSTO CABALLERO**	**OBRA**
ID S.A.S	**JOSE GUIOVANNI SASTOQUE MENDEZ**	**RESIDENTE OBRA**

PUNTOS PENDIENTES DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA
SUPERVISION MINISTERIO	APROBACION CUENTA 2 OBRA Y CUENTA 1 INTERVENTORIA	23/12/2025 CUMPLIO
SUPERVISION MINISTERIO	INFORMACION PRORROGA	30/12/2025
CONTRATISTA	CORTE 3 OBRA AL 95%	29/12/2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se presentan a esta reunión el contratista de obra, supervisión e interventoría con el fin de dar inicio al seguimiento del contrato, que inició en debida forma, el día 30 de diciembre de 2025. El COMITÉ 9, inicia con la lectura del orden del día por parte de la interventoría.

PUNTO 1. COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

APROBACION CUENTA 2 OBRA Y CUENTA 1 INTERVENTORIA, la interventoría menciona que se cumplió dicho compromiso y fue aprobada por parte del ministerio, luego de esto el contratista procedió a cargar la cuenta en la plataforma del secop II.

INFORMACION PRORROGA, la interventoría menciona que se dio aprobación a la documentación por parte del ministerio y por lo tanto se firmó en pagina la prorroga tanto para el contrato de obra e interventoría. Se espera la actualización de las pólizas conforme a la modificación del contrato y así mismo las pólizas deberá ser cargadas en el secop II.

CUENTA DE OBRA 3, la interventoría menciona que el contratista entrego la cuenta 3 con sus respectivas memorias de cálculo el día sábado 27 de diciembre de 2025, con el fin que fueran revisadas y aprobadas por parte de la interventoría, dicho esto la interventoría revisa la cuenta y la remite al ministerio para su respectiva aprobación. Se espera que la interventoría envíe la cuenta 2 para su revisión y aprobación por parte del ministerio.

PUNTO 2. ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA

La interventoría informa a supervisión el avance ejecutado en obra del 95,23% vs un avance programado del 100% y presenta un atraso del 4,77% conforme al plazo inicial del contrato, se menciona que ya nos encontramos en la parte final del contrato e informando que se encuentran en actividades de limpieza, instalación de mallas en el campanario, se deben realizar planos récord y manual de mantenimiento. Se espera terminar actividades el 15 de enero de 2026 quedando pendiente actividades de frisos de la parte baja de las columnas, detalles en la parte interna, aseo en la parte del coro y aseo general de la obra. Se informa que se están desmontando los andamios ya que se han terminado actividades de pañete al 100% en la fachada y parte interna.

PUNTO 4. IMPUESTOS

La interventoría menciona el tema de los impuestos que no ha llegado información por parte del ministerio, dando respuesta a dicho tema el ministerio menciona que hará lo posible para el próximo comité de tener información sobre dicho tema.

PUNTO 5. OTROS.

La interventoría menciona el tema o solicita a supervisión formatos de actas de entrega de las obras con el fin de ir diligenciando dichos formatos, dando respuesta el ministerio menciona que los enviara al correo los formatos junto a uno de inventario

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	**ACTIVIDAD**	**FECHA**
CONTRATISTA E INTERVENTORIA	POLIZAS PRORROGA	30/12/2025
CONTRATISTA	CORTE 3 OBRA AL 95%	30/12/2025
MINISTERIO DE CULTURA	INFORMACION IMPUESTOS	06/01/2026
MINISTERIO DE CULTURA	FORMATOS ENTREGA	30/12/2025

En señal de acuerdo, suscriben el acta,

NOMBRE	FIRMA
CLAUDIA GUERRERO SARMIENTO	
YAMID ALEXANDER PATIÑO TORRES	
JOSE TOMAS	
LUIS FERNANDO SALGADO	
AUGUSTO CABALLERO	
JOSE GUIOVANNI SASTOQUE MENDEZ	
HENRY ALBERTO CASTRO REINA	
YECID HERNANDO CASTRO REINA	Yecid Hernando Castro R.
DAVID AMAYA	
SEBASTIAN MARTINEZ TORO	Sebastián Martínez Toro

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS	**FORMATO** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO COL-GRH-RH-FT-015 EMISIÓN 01/02/2010 VIGENCIA 14/04/2016 VERSIÓN 03 PÁGINA 1 de 5

Acta No	10	**Fecha**		
Lugar de la Reunión	VIRTUAL	**DD**	**MM**	**AA**
Temas:	AVANCE DE OBRA	06	01	2026
Hora de Inicio: 09:00 Am	**Hora de Finalización: 10:00 Am**			

ASISTENTES		
EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**
MINISTERIO DE CULTURA	**CLAUDIA ZORAYA GUERRERO SARTMIENTO**	**SUPERVISION MIN**
MINISTERIO DE CULTURA	**YAMID ALEXANDER PATIÑO TORRES.**	**SUPERVISION MIN**
CONSTRUCTODO	**HENRY ALBERTO CASTRO REINA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**
CONSTRUCTODO	**DAVID AMAYA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONSTRUCTODO	**SEBASTIAN MARTINEZ TORO**	**ADMINISTRATIVO INTERVENTORIA**
CONSTRUCTODO	**YECID HERNANDO CASTRO REINA**	**COORDINADOR**
ID S.A.S	**JOSE TOMAS**	**OBRA**
ID S.A.S	**LUIS FERNANDO SALGADO**	**COORDINADOR OBRA**
ID S.A.S	**AUGUSTO CABALLERO**	**OBRA**
ID S.A.S	**JOSE GUIOVANNI SASTOQUE MENDEZ**	**RESIDENTE OBRA**

PUNTOS PENDIENTES DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA
CONTRATISTA E INTERVENTORIA	POLIZAS PRORROGA	30/12/2025
CONTRATISTA	CORTE 3 OBRA AL 95%	30/12/2025
MINISTERIO DE CULTURA	INFORMACION IMPUESTOS	06/01/2026
MINISTERIO DE CULTURA	FORMATOS ENTREGA	30/12/2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se presentan a esta reunión el contratista de obra, supervisión e interventoría con el fin de dar inicio al seguimiento del contrato, que inició en debida forma, el día 06 de enero de 2026. El COMITÉ 10, inicia con la lectura del orden del día por parte de la interventoría.

PUNTO 1. COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

APROBACION CUENTA 3 OBRA Y CUENTA INTERVENTORIA, la interventoría menciona que se cumplió dicho compromiso e informando que la del contratista fue cargada en la plataforma, conforme a la cuenta de interventoría se menciona que presento observaciones en la factura electrónica que debe actualizarse a fecha del enero de 2026. Supervisión solicita a interventoría realizar el cambio de la factura y nuevamente enviarla e informar con el fin de dar aprobación a la factura por parte de supervisión.

INFORMACION PRORROGA O ACTUALIZACION POLIZAS, la interventoría menciona que ya se actualizaron las pólizas del contrato de obra e interventoría, luego de esto ya fueron cargadas en la plataforma del secop II con su respectivo recibo de pago y por cada uno de los contratos.

PUNTO 2. ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA

La interventoría informa a supervisión el avance ejecutado en obra del 100% vs un avance programado del 100%. Se menciona que ya la obra se culmina e informando que el contratista se encuentra en labores de limpieza y terminando detalles en la iglesia, esta semana se espera pasar la última revisión por parte de interventoría y en compañía del contratista con el fin de identificar o realizar observaciones al contratista, luego de esto el ministerio propone realizar una reunión con la curia y el secretario de planeación con el fin de mostrarle finalmente lo realizado en la obra. El acta de recibo final de obra se deberá firmar por parte de la alcaldía y la curia. Se espera realizar la entrega de la obra a finales del mes de enero de 2026.

PUNTO 4. IMPUESTOS

La interventoría menciona el tema de los impuestos que no ha llegado información por parte del ministerio, dando respuesta a dicho tema el ministerio menciona que hará lo posible para el próximo comité de tener información sobre dicho tema, dicho comité será el 13 de enero de 2026.

PUNTO 5. OTROS.

La interventoría vuelve y recuerda al contratista realizar los planos récord y el manual de mantenimiento con el fin de ir adelantando actividades finales para la liquidación y entrega final

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	**ACTIVIDAD**	**FECHA**
INTERVENTORIA	NUEVA FACTURA CUENTA INTERVENTORIA	07/01/2026
CONTRATISTA E INTERVENTORIA	FORMATOS ENTREGA Y RECIBO FINAL DILIGENCIADOS	15/01/2026
MINISTERIO DE CULTURA	INFORMACION IMPUESTOS	13/01/2026
MINISTERIO CULTURA	FORMATO INVENTARIO	06/01/2026

En señal de acuerdo, suscriben el acta,

NOMBRE	FIRMA
CLAUDIA GUERRERO SARMIENTO	
YAMID ALEXANDER PATIÑO TORRES	
JOSE TOMAS	
LUIS FERNANDO SALGADO	
AUGUSTO CABALLERO	
JOSE GUIOVANNI SASTOQUE MENDEZ	
HENRY ALBERTO CASTRO REINA	
YECID HERNANDO CASTRO REINA	Yecid Hernando Castro R.
DAVID AMAYA	
SEBASTIAN MARTINEZ TORO	Sebastián Martínez Toro

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS	**FORMATO** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO COL-GRH-RH-FT-015 EMISIÓN 01/02/2010 VIGENCIA 14/04/2016 VERSIÓN 03 PÁGINA 1 de 5

Acta No	11	**Fecha**		
Lugar de la Reunión	VIRTUAL	**DD**	**MM**	**AA**
Temas:	AVANCE DE OBRA	13	01	2026
Hora de Inicio: 09:00 Am	**Hora de Finalización: 10:00 Am**			

ASISTENTES		
EMPRESA	**NOMBRE**	**CARGO**
MINISTERIO DE CULTURA	**CLAUDIA ZORAYA GUERRERO SARTMIENTO**	**SUPERVISION MIN**
MINISTERIO DE CULTURA	**YAMID ALEXANDER PATIÑO TORRES.**	**SUPERVISION MIN**
CONSTRUCTODO	**HENRY ALBERTO CASTRO REINA**	**DIRECTOR INTERVENTORIA**
CONSTRUCTODO	**DAVID AMAYA**	**RESIDENTE INTERVENTORIA**
CONSTRUCTODO	**SEBASTIAN MARTINEZ TORO**	**ADMINISTRATIVO INTERVENTORIA**
CONSTRUCTODO	**YECID HERNANDO CASTRO REINA**	**COORDINADOR**
ID S.A.S	**JOSE TOMAS**	**OBRA**
ID S.A.S	**LUIS FERNANDO SALGADO**	**COORDINADOR OBRA**
ID S.A.S	**AUGUSTO CABALLERO**	**OBRA**
ID S.A.S	**JOSE GUIOVANNI SASTOQUE MENDEZ**	**RESIDENTE OBRA**
CURIA	**VICTOR UBEIMAR GUTIERREZ**	**PARROCO**
ALCALDIA	**CAMILO SUAREZ**	**PLANEACION**

PUNTOS PENDIENTES DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
RESPONSABLE	**ACTIVIDAD**	**FECHA**
INTERVENTORIA	NUEVA FACTURA CUENTA INTERVENTORIA	07/01/2026
CONTRATISTA E INTERVENTORIA	FORMATOS ENTREGA Y RECIBO FINAL DILIGENCIADOS	15/01/2026
MINISTERIO DE CULTURA	INFORMACION IMPUESTOS	13/01/2026
MINISTERIO CULTURA	FORMATO INVENTARIO	06/01/2026

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se presentan a esta reunión el contratista de obra, alcaldía municipal, curia, supervisión e interventoría con el fin de dar inicio al seguimiento del contrato, que inició en debida forma, el día 13 de enero de 2026. El COMITÉ 11, inicia con la lectura del orden del día por parte de la interventoría.

PUNTO 1. COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

NUEVA FACTURA CUENTA 2 INTERVENTORIA, la interventoría menciona que se cumplió dicho compromiso e informando a supervisión que se generó una nueva factura y se envió nuevamente la cuenta 2 de interventoría el día 7 de enero de 2026. Esta cuenta se encuentra en trámite por parte del ministerio.

FORMATOS ENTREGA Y RECIBO FINAL DILIGENCIADOS, la interventoría presenta el formato de acta de terminación de contrato el cual ya se encuentra diligenciado, dicho esto la interventoría menciona que se presentaron 57 observaciones finales al contratista el cual ya se ha superado y atendido el 60% de dichas observaciones luego de esto se procederá a firmar el acta de terminación del contrato de obra en esta acta se debe plasmar la firma del párroco de la iglesia. Para el día de hoy 13 de enero de 2026 se realiza una visita o recorrido con la alcaldía y el párroco de la iglesia con el fin de que puedan generar alguna observación que tenga la alcaldía y la curia conforme al alcance del contrato. Respecto al acta de recibo final se debe diligenciar después del recibo de obra debido a que se deben anexar las pólizas finales las cuales se solicitan conforme al acta de terminación de obra, esta acta será diligenciada por el contratista de obra. La interventoría menciona que el contratista debe presentar una documentación final para la liquidación del contrato de obra, la interventoría hace referencia que en días anteriores se había enviado al contratista de obra mediante un correo electrónico la lista de chequeo de la liquidación del contrato de obra, dando respuesta el contratista de obra solicita a la interventoría un oficio donde este claro la documentación a enviar para la liquidación del contrato.

INFORMACION IMPUESTOS, la interventoría hace referencia el tema de los impuestos de los contratos, dando respuesta el ministerio informa que la semana pasada envió un correo donde menciona que el ministerio hace esa deducción a los contratos de obra e interventoría y luego de esto el ministerio desembolsa el impuesto al municipio.

FORMATO INVENTARIO, conforme a este formato la interventoría menciona que se diligenciara en los próximos días, después de la visita que se realizara con la alcaldía y el párroco el día de hoy 13 de enero de 2026.

PUNTO 2. AVANCE AL 100% Y ENTREGA

La interventoría informa a supervisión el avance se encuentra al 100% y el contratista cumple con las actividades del contrato, sin embargo, se encuentran en actividades de limpieza finales, desinstalación del campamento de la protección de las puestas de la iglesia y conforme a las observaciones se encuentran algunos remates en los filos de la edificación, la interventoría menciona que el contratista se encuentra realizando dichas observaciones y serán terminadas en los próximos días.

PUNTO 3. PAGOS

El contratista de obra solicita información sobre los pagos los cuales no se han realizado por parte del ministerio, dando respuesta supervisión menciona que el DNP empezó a girar recursos al ministerio con el fin del hacer al pago de las cuentas 1 y 2 del contratista de obra y la cuneta 1 de interventoría estos pagos se realizaran para el di a15 de enero de 2026, dicho esto el contratista enviara un oficio a la parte financiera del ministerio con el fin que den información de las fechas de pago de las cuentas.

COMPROMISOS		
RESPONSABLE	**ACTIVIDAD**	**FECHA**
INTERVENTORIA, CONTRATISTA, ALCALDIA Y PARROCO	RECORRIDO FINAL EN LA OBRA	13/01/2026
CONTRATISTA	ACTA DE RECIBO FINAL	20/01/2026
INTERVENTORIA	SOLICITUD DOCUMENTOS LIQUIDACION OBRA	13/01/2026
CONTRATISTA	DOCUMENTACION FINAL PARA LIQUIDACION DE OBRA	20/01/2026
MINISTERIO DE CULTURA	PAGOS INTERVENTORIA Y OBRA	15/01/2026

En señal de acuerdo, suscriben el acta,


NOMBRE	FIRMA
CLAUDIA GUERRERO SARMIENTO	
YAMID ALEXANDER PATIÑO TORRES	
JOSE TOMAS	
LUIS FERNANDO SALGADO	
AUGUSTO CABALLERO	
JOSE GUIOVANNI SASTOQUE MENDEZ	
HENRY ALBERTO CASTRO REINA	
YECID HERNANDO CASTRO REINA	Yecid Hernando Castro R.
DAVID AMAYA	
SEBASTIAN MARTINEZ TORO	Sebastián Martínez Toro
VICTOR UBEIMAR	
CAMILO SUAREZ	

No. CONTRATO	1900-2025.	OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS OBRAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN - ANTIOQUIA, UBICADA EN EL CENTRO HISTÓRICO DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL".
NÚMERO DEL INFORME	3	PERIODO DEL INFORME	27/12 /2025 / - 16/01/2026

REGISTRO DE CHEQUEO

		CUMPLE			OBSERVACIONES	SOPORTE
		SI	NO	N.A.		
1.	**INFORME MENSUAL (formato GICN - 0028)**					
	Estado General del Contrato	X				INFORME MENSUAL 3
	Informe Técnico	X				INFORME MENSUAL 3
	Informe Administrativo	X				INFORME MENSUAL 3
	Informe Financiero	X				INFORME MENSUAL 3
	Programación actualizada firmada por el interventor y contratista.			X		
	Curva S (Estado avance presupuestal y cronograma del proyecto)	X				INFORME MENSUA3 2 E INFORMES SEMANALES
	Actividades proyectadas a ejecutarse	X				INFORME MENSUAL 3
	Flujo de Caja programado		X			
	Actas de comités (contrato)	X				INFORME MENSUAL 3
	Copia de resultado de estudios o laboratorios avalados por interventoría			X		
	Formato Plan de Calidad de Intervenroría	X				INFORME MENSUAL 3
	Correspondencia enviada y recibida del periodo	X				INFORME MENSUAL 3
	Recomedaciones y/o sugerencias	X				INFORME MENSUAL 3
2	**COPIA INFORMES SEMANALES DEL PERIODO**					
	Infome Semanal	X				INFORME MENSUAL 3
	Fotografías	X				INFORME MENSUAL 3
3	**ANEXOS**					
	Certificaciones y pruebas de calidad		X			
	Factura en original	X				
	Paz y Salvo de cumplimiento en pagos de parafiscales	X				
	Soportes pagos parafiscales del personal junto con planillas (revisar vs propuesta presentada)	X				
	Actualización de documentos legales del contrato (pólizas)	X				

INTERVENTORÍA	**APOYO A LA SUPERVISIÓN MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES**	**SUPERVISOR DEL CONTRATO MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES**

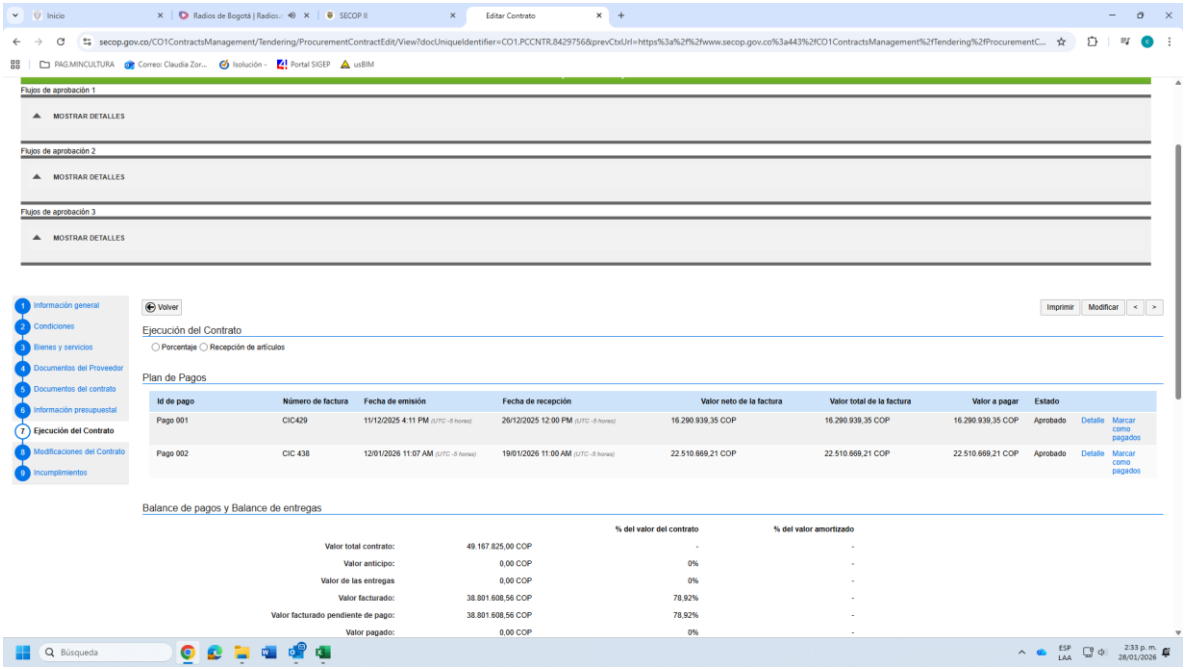

1. Información general
2. Condiciones
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. Ejecución del Contrato
8. Modificaciones del Contrato
9. Incumplimientos

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	CIC429	11/12/2025 4:11 PM (UTC -5 horas)	26/12/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	16.290.939,35 COP	16.290.939,35 COP	16.290.939,35 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados
Pago 002	CIC 438	12/01/2026 11:07 AM (UTC -5 horas)	19/01/2026 11:00 AM (UTC -5 horas)	22.510.669,21 COP	22.510.669,21 COP	22.510.669,21 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	49.167.825,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	38.801.608,56 COP	78,92%	-
Valor facturado pendiente de pago:	38.801.608,56 COP	78,92%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CALLE 100	33	33-44-101268363	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	12	2025	27	10	2025	00:00	20	01	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA	NIT: 900.084.348-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV CARACAS NRO. 34 - 86 408	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7589566

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES	NIT: 830.034.348-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 8 NRO. 8 - 55	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013424100

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CALIDAD DEL SERVICIO. DEL CONTRATO NO. 1900-2025. CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION ABREVIADA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS OBRAS PARA LA PROTECCION DE LA IGLESIA INMACULADA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION - ANTIOQUIA, UBICADA EN EL CENTRO HISTORICO DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL.

VIGENCIA CALIDAD DEL SERVICIO VIGENCIA EQUIVALENTE AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y CINCO (5) AÑOS MAS.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/10/2025	20/07/2026	$9,833,565.00	$9,833,565.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/10/2025	20/01/2029	$2,458,391.25	$2,458,391.25
CALIDAD DEL SERVICIO	27/10/2025	20/01/2031	$9,833,565.00	$9,833,565.00

ACLARACIONES

DE CONFORMIDAD CON EL OTROSI NO. 1, PRORROGAN 20 DIAS HASTA EL 20/01/2026. SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACION ALGUNA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******12,000.00	$ *******4,000.00	$ *******3,040.00	$ **********19,040.00	$ *******22,125,521.25	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASESORES EN SEGUROS DE LOS ANDES LT	18545	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

33-44-101268363

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CALLE 100**	**33**	**33-44-101268363**	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	**12**	**2025**	**27**	**10**	**2025**	**00:00**	**20**	**01**	**2031**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA	**NIT: 900.084.348-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
AV CARACAS NRO. 34 - 86 408	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7589566

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES	**NIT: 830.034.348-5**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 8 NRO. 8 - 55	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6013424100

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB · pse · MasterCard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · SuperINTER · éxito · MOVIIRED · Gana Gana · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******12,000.00	$ *******4,000.00	$ *******3,040.00	$ **********19,040.00	$ *******22,125,521.25	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ASESORES EN SEGUROS DE LOS ANDES LT	18545	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11006620626574(3900)000000019040(96)20261027

REFERENCIA PAGO:

1100662062657-4

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CALLE 100	33	33-44-101268363	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	12	2025	27	10	2025	00:00	20	01	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LIMITADA		**NIT: 900.084.348-2**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	AV CARACAS NRO. 34 - 86 408		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		7589566

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES		**NIT: 830.034.348-5**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 8 NRO. 8 - 55		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		6013424100

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

33-44-101268363

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101268363, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 30 días del mes de DICIEMBRE de 2025

33-44-101268363

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	**1900 de 2025**
OBJETO:	**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS OBRAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN - ANTIOQUIA, UBICADA EN EL CENTRO HISTÓRICO DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL.**
INTERVENTOR:	CONSTRUCTODO INGENIROS CONTRATISTAS LTDA
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	**2 MESES Y 21 DIAS (81 DIAS)**
FECHA DE INICIACIÓN	**27 DE OCTUBRE DE 2025**
FECHA DE AMPLIACIÓN:	ACTA 1 PRORROGA – 20 DIAS DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 20 DE ENERO DE 2026.
FECHA DE SUSPENSIÓN:	NO APLICA
FECHA DE REINICIO:	NO APLICA
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	**31 DE DICIEMBRE DE 2025**
FECHA DE TERMINACION FINAL:	**16 DE ENERO DE 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 49.167.825,00
VALOR TOTAL ADICIONES:	NO APLICA
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 47.201.112,00
VALOR PAGADO AL INTERVENTOR A LA FECHA:	$ 38.801.608,56
VALOR PARA PAGAR AL INTERVENTOR CONTRA LIQUIDACION:	$ 8.399.503,44

ASISTENTES

SUPERVISOR MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	CLAUDIA ESPERANZA DÍAZ BOJACÁ
APOYO SUPERVISOR MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	CLAUDIA ZORAYA GUERRERO SARMIENTO
POR PARTE DEL INTERVENTOR	HENRY ALBERTO CASTRO REINA

En Bogotá a los dieciséis (16) días del mes de enero del año 2026, se reunieron **CLAUDIA ESPERANZA DÍAZ BOJACÁ** como supervisora, **CLAUDIA ZORAYA GUERRERO SARMIENTO** como apoyo a la supervisión**, HENRY ALBERTO CASTRO REINA** representante legal de la firma interventora; con el fin de terminar el Contrato de Interventoría anteriormente citado.

Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los dieciséis (16) días del mes de enero de 2026.



SUPERVISIÓN
CLAUDIA ESPERANZA DÍAZ BOJACÁ
GRUPO DE PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE URBANO - PCIU
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES



APOYO A LA SUPERVISIÓN
CLAUDIA ZORAYA GUERRERO SARMIENTO
GRUPO DE PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE URBANO - PCIU
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES



INTERVENTORÍA
HENRY ALBERTO CASTRO REINA
REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA

Factura Electrónica de Venta

CIC439

Fecha de Emisión	21/01/2026 15:00:14	**Fecha de Vencimiento**	30/01/2026
Moneda	COP	**Fecha de Validación DIAN**	21/01/2026 15:06:16
Forma de Pago	Contado		
Medio de pago	Pago y depósito pre acordado (PPD)		

Datos del Emisor	**NIT 900084348 - 2**	**Razón Social**	**CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA**		
Tipo de Contribuyente	Persona Júridica	**Dirección**	TRANSVERSAL 120 n 78 B 87		
Correo Electrónico	constructodoltda@gmail.com	**Departamento**	Bogotá	**Ciudad**	Bogotá, D.c.
Responsabilidades Fiscales	No Aplica				

Datos del Adquiriente	**NIT 830034348 - 5**	**Razón Social**	**Ministerio de las culturas artes y saberes**
Tipo de Contribuyente	Persona Júridica	**Dirección**	CARRERA 8 N 8-55
Correo Electrónico	siifnacion.facturaelectronica@minhac	**Departamento**	Bogotá
Régimen Contable		**Ciudad**	Bogotá, D.c.

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INCBolsas	Valor Total
1	CUENTA PARCIAL 3 FINAL INTERVENTORIA, CONTRATO 1900 DE 2025,Contratar la interventoría integral al contrato de obra resultante del proceso de selección abreviada cuyo objeto es: Realizar las obras para la protección de la Iglesia Inmaculada Concepción del municipio de Concepción - Antioquia, ubicada en el centro histórico declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, PERIODO: 27-12-2025 AL 16-01-2026	CUENTA PARCIAL 3 FINAL INTERVENTORIA, CONTRATO 1900 DE 2025,Contratar la interventoría integral al contrato de obra resultante del proceso de selección abreviada cuyo objeto es: Realizar las obras para la protección de la Iglesia Inmaculada Concepción del municipio de Concepción - Antioquia, ubicada en el centro histórico declarado bien de interés cultural del ámbito nacional, PERIODO: 27-12-2025 AL 16-01-2026	Unidades	1.00	$ 4,992,531.25	$ 0.00	$ 948,580.94	$ 0.00	$ 0.00	$4,992,531.25

Recargo/Dto	Descripción	%	Monto	Tipo de Impuesto	%/Und.	Base Gravable	Valor Impuesto
				IVA	19.00	$4,992,531.25	$948,580.94

Orden de Compra	Aviso de Despacho	Aviso de Recibo	Otra de Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO DOCE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/TE;#$33-01-01;CONTRATO 1900-2025; YPATINO@MINCULTURA.GOV.CO#$

Datos Totales

CUFE b17a2a346d4d3cb65c59cee22f2c54624e684eb75cb28608ac233c1464f659be1eb66594409abe4e1feb244d601c0af1

TASA DE CAMBIO	$0.00
Subtotal base gravable (+)	$ 4,992,531.25
Subtotal de base no gravable (+)	$ 0.00
Total impuesto (+)	$ 948,580.94
Total mas impuesto (=)	$ 5,941,112.19
Anticipo (-)	$ 0.00
Descuento global (-)	$ 0.00
Recargo global (+)	$ 0.00
Valor total de la operación (=)	$ 5,941,112.19

Representación realizada por el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Soft: SaphetyDoc https://corporate.saphety.com/ - comercial.colombia@saphety.com (+57-1) 516 4518

Numero de Autorización: 18764091420548 Prefijo: CIC Rango Autorizado: Desde 382 hasta 1500 Vigencia: Desde 2025-04-02 hasta 2026-04-02

Factura Electrónica de Venta

CIC439

Fecha de Emisión	21/01/2026 15:00:14	**Fecha de Vencimiento**	30/01/2026
Moneda	COP	**Fecha de Validación DIAN**	21/01/2026 15:06:16
Forma de Pago	Contado		
Medio de pago	Pago y depósito pre acordado (PPD)		

Datos del Emisor	**NIT 900084348 - 2**	**Razón Social**	**CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA**		
Tipo de Contribuyente	Persona Júridica	**Dirección**	TRANSVERSAL 120 n 78 B 87		
Correo Electrónico	constructodoltda@gmail.com	**Departamento**	Bogotá	**Ciudad**	Bogotá, D.c.
Responsabilidades Fiscales	No Aplica				

Datos del Adquiriente	**NIT 830034348 - 5**	**Razón Social**	**Ministerio de las culturas artes y saberes**
Tipo de Contribuyente	Persona Júridica	**Dirección**	CARRERA 8 N 8-55
Correo Electrónico	siifnacion.facturaelectronica@minhac	**Departamento**	Bogotá
Régimen Contable		**Ciudad**	Bogotá, D.c.

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	INCBolsas	Valor Total
	12-2025 AL 16-01 -2026									

Recargo/Dto	Descripción	%	Monto	Tipo de Impuesto	%/Und.	Base Gravable	Valor Impuesto
				IVA	19.00	$4,992,531.25	$948,580.94

Orden de Compra	Aviso de Despacho	Aviso de Recibo	Otra de Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO DOCE PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/TE;#$33-01-01;CONTRATO 1900-2025; YPATINO@MINCULTURA.GOV.CO#$

Datos Totales

CUFE b17a2a346d4d3cb65c59cee22f2c54624e 684eb75cb28608ac233c1464f659be1eb66594409abe4e1feb244d601c0af1

TASA DE CAMBIO	$0.00
Subtotal base gravable (+)	$ 4,992,531.25
Subtotal de base no gravable (+)	$ 0.00
Total impuesto (+)	$ 948,580.94
Total mas impuesto (=)	$ 5,941,112.19
Anticipo (-)	$ 0.00
Descuento global (-)	$ 0.00
Recargo global (+)	$ 0.00
Valor total de la operación (=)	$ 5,941,112.19

Representación realizada por el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Soft: SaphetyDoc https://corporate.saphety.com/ - comercial.colombia@saphety.com (+57-1) 516 4518

Numero de Autorización: 18764091420548 Prefijo: CIC Rango Autorizado: Desde 382 hasta 1500 Vigencia: Desde 2025-04-02 hasta 2026-04-02

Gmail Buscar en el correo electrónico

Redactar

Recibidos 3
Importantes
Enviados
Borradores
Spam 30
Compras
Social
Notificaciones 1
Foros
Promociones
Más

Etiquetas

Junk
Personal
Trabajo
Viaje
Más

Actualizar

Hemos Recibido el Documento enviado por usted

Recibidos × Notificaciones ×

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co> 3:09 p.m. (ha
para mí

Imagen 2 Imagen 3

Bogotá D. C., 2026-01-21

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el Cl

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES - GESTION GENERAL

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su repr
