CONTRATO DE OBRA No 171 DE 2025

INFORME DE INTERVENTORÍA

FINAL [ ] [X] **PARCIAL**

PERIODO DEL INFORME: Del 1 al 31 de mayo de 2026.

Nombre del Contratista: CONENERGIA LTDA – CONCRETOS Y ENERGIA LTDA		**Contrato No: 171 DE 2025**	
Objeto: RESTITUCIÓN FASE III DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COMBINADO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA		**Valor inicial:** Mil seiscientos cuarenta y siete millones ochocientos nueve mil setecientos cincuenta y cuatro pesos **($1.647.809.754)** M/CTE. **Valor adicional:** Setecientos veinticinco millones ciento noventa y ocho mil ciento dos pesos **($725.198.102)** M/CTE. **Valor Total:** Dos mil trescientos setenta y tres millones siete mil ochocientos cincuenta y seis pesos **($2.373.007.856)** M/CTE. **Valor Anticipo:** Seiscientos cincuenta y nueve millones ciento veintitrés mil novecientos un peso con sesenta centavos **($659.123.901,60)** m/cte **Fecha Aprobación Póliza:** 11 de mayo de 2026 **Numero de Póliza:** - **CUMPLIMIENTO:** 11-44-101272185 - **RESPONSABILIDAD CIVIL:** 11-40-101086628 **FVPC:** 21 de febrero de 2027	
Duración inicial:	El plazo previsto para la ejecución del contrato es de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa legalización del contrato. El contrato mantendrá vigencia por el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.	**Municipio:**	PAICOL - HUILA
Adicional Otrosí 02:	Tres (3) meses.		
Duración Total:	Nueve (9) meses.		
Nombre del Supervisor: ING. DIEGO ARMANDO CARDOZO			
Nombre del Interventor:	INCIEM SAS – INGENIERÍA CIVIL, ELÉCTRICA Y MECÁNICA SAS	**Contrato No:** 172 DE 2025	


1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Información sobre estado y avance del proyecto

LOCALIZACIÓN

Paicol se encuentra localizado en la zona centro - occidental del departamento del Huila sobre la carretera troncal, que de Neiva conduce la Departamento del Cauca y a 108 km de Neiva y posee una extensión de 298 km2 aproximadamente. Está localizado entre la margen derecha del río Páez e izquierda del río Magdalena. Limita por el norte con los municipios de Nátaga, Tesalia y el departamento del Cauca; por el sur con los municipios de Agrado y Pital, por el occidente con el municipio de La Plata y por el oriente con el municipio de Gigante, siendo su posición geográfica 2°27’ de Latitud Norte y 75° 46’ de Longitud Oeste.

Figura 1. Localización General Paicol Huila

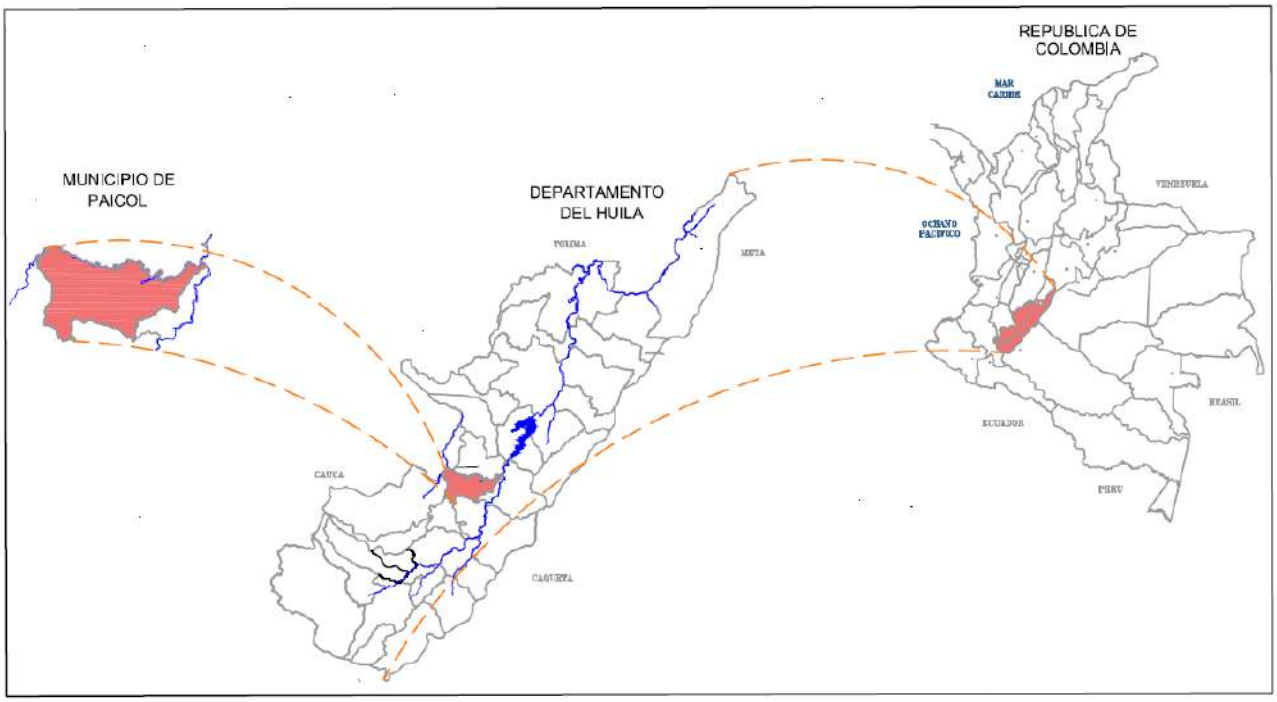

Fuente: *Alcaldía Municipal de Paicol. (2025, mayo).*

El Contrato de Obra inició el 21 de enero de 2026 y actualmente se encuentra vigente y en ejecución.

Así mismo, el 05 de diciembre de 2025 se llevó a cabo la socialización del proyecto denominado 'Restitución Fase III del Sistema de Acueducto y Alcantarillado Combinado y Mejoramiento de la Red Vial Urbana del Municipio de Paicol, Departamento del Huila', en el salón del exalcalde, ubicado en el segundo piso de la Alcaldía Municipal.

RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

POLIZAS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO

Tabla No 1. *Póliza de seguro de cumplimiento - ANEXO 0*

AMPARO	%	DESDE	HASTA	VR. ASEGUR	POLIZA	EXPEDICION
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30%	27/11/2025	27/09/2026	$494,342,926.20	11-44-101272185	09/12/2025
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	100%	27/11/2025	27/09/2026	$659,123,901.60	11-44-101272185	09/12/2025
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORES	20%	27/11/2025	27/05/2029	$329,561,950.80	11-44-101272185	09/12/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	27/05/2026	27/05/2031	$494,342,926.20	11-44-101272185	09/12/2025

Tabla No 2*. Póliza de responsabilidad civil extracontractual - ANEXO 0*

AMPARO	%	DESDE	HASTA	VR. ASEGUR	POLIZA	EXPEDICION
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	200 SMLMV	27/11/2025	27/05/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	09/12/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	200 SMLMV	27/11/2025	27/05/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	09/12/2025
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.	200 SMLMV	27/11/2025	27/05/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	09/12/2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	200 SMLMV	27/11/2025	27/05/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	09/12/2025
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	200 SMLMV	27/11/2025	27/05/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	09/12/2025
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	200 SMLMV	27/11/2025	27/05/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	09/12/2025

POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO

***Tabla No 3**. Póliza de seguro de cumplimiento - ANEXO 2*

AMPARO	%	DESDE	HASTA	VR. ASEGUR	POLIZA	EXPEDICION
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30%	21/01/2026	21/11/2026	$494,342,926.20	11-44-101272185	22/01/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	100%	21/01/2026	21/11/2026	$659,123,901.60	11-44-101272185	22/01/2026
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORES	20%	21/01/2026	21/07/2029	$329,561,950.80	11-44-101272185	22/01/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	21/07/2026	21/07/2031	$494,342,926.20	11-44-101272185	22/01/2026

***Tabla No 4**. Póliza de responsabilidad civil extracontractual - ANEXO 2*

AMPARO	%	DESDE	HASTA	VR. ASEGUR	POLIZA	EXPEDICION
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	200 SMLMV	21/01/2026	27/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	22/01/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	200 SMLMV	21/01/2026	27/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	22/01/2026
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.	200 SMLMV	21/01/2026	27/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	22/01/2026
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	200 SMLMV	21/01/2026	27/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	22/01/2026
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	200 SMLMV	21/01/2026	27/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	22/01/2026
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	200 SMLMV	21/01/2026	27/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	22/01/2026

POLIZAS SEGÚN OTROSÍ No. 1

***Tabla No 5**. Póliza de seguro de cumplimiento - ANEXO 3*

AMPARO	%	DESDE	HASTA	VR. ASEGUR	POLIZA	EXPEDICION
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30%	21/01/2026	21/11/2026	$494,342,926.20	11-44-101272185	06/03/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	100%	21/01/2026	21/11/2026	$659,123,901.60	11-44-101272185	06/03/2026
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORES	20%	21/01/2026	21/07/2029	$329,561,950.80	11-44-101272185	06/03/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	21/07/2026	21/07/2031	$494,342,926.20	11-44-101272185	06/03/2026

***Tabla No 6**. Póliza de responsabilidad civil extracontractual - ANEXO 3*

AMPARO	%	DESDE	HASTA	VR. ASEGUR	POLIZA	EXPEDICION
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	06/03/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	06/03/2026
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	06/03/2026
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	06/03/2026
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	06/03/2026
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	06/03/2026

POLIZAS SEGÚN OTROSÍ No. 2

***Tabla No 7**. Póliza de seguro de cumplimiento - ANEXO 4*

AMPARO	%	DESDE	HASTA	VR. ASEGUR	POLIZA	EXPEDICION
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30%	21/01/2026	21/11/2026	$494,342,926.20	11-44-101272185	11/05/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	100%	21/01/2026	21/11/2026	$659,123,901.60	11-44-101272185	11/05/2026
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORES	20%	21/01/2026	21/07/2029	$329,561,950.80	11-44-101272185	11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	21/07/2026	21/07/2031	$494,342,926.20	11-44-101272185	11/05/2026

***Tabla No 8**. Póliza de seguro de cumplimiento - ANEXO 5*

AMPARO	%	DESDE	HASTA	VR. ASEGUR	POLIZA	EXPEDICION
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30%	21/01/2026	21/02/2027	$711,902,356.80	11-44-101272185	11/05/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	100%	21/01/2026	21/12/2027	$949,203,142.40	11-44-101272185	11/05/2026
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORES	20%	21/01/2026	21/10/2029	$474,601,571.20	11-44-101272185	11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	21/07/2026	21/07/2031	$711,902,356.80	11-44-101272185	11/05/2026

***Tabla No 9**. Póliza de responsabilidad civil extracontractual - ANEXO 4*

AMPARO	%	DESDE	HASTA	VR. ASEGUR	POLIZA	EXPEDICION
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	200 SMLMV	21/01/2026	21/10/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	08/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	200 SMLMV	21/01/2026	21/10/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	08/05/2026
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.	200 SMLMV	21/01/2026	21/10/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	08/05/2026
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	200 SMLMV	21/01/2026	21/10/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	08/05/2026
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	200 SMLMV	21/01/2026	21/10/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	08/05/2026
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	200 SMLMV	21/01/2026	21/10/2026	$284,700,000.00	11-40-101086628	08/05/2026

RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

POLIZAS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO

***Tabla No 10**. Póliza de seguro de cumplimiento - ANEXO 0*

AMPARO	DESDE	HASTA	VR. ASEGUR	POLIZA	EXPEDICION
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/11/2025	27/09/2026	$50,965,752.30	11-44-101272130	09/12/2025
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	27/11/2025	27/09/2026	$67,954,336.40	11-44-101272130	09/12/2025
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORES	27/11/2025	27/05/2029	$33,977,168.20	11-44-101272130	09/12/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	27/05/2026	27/05/2031	$50,965,752.30	11-44-101272130	09/12/2025

***Tabla No 11**. Póliza de responsabilidad civil extracontractual - ANEXO 0*

AMPARO	DESDE	HASTA	VR. ASEGUR	POLIZA	EXPEDICION
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	27/11/2025	27/05/2026	$284,700,000.00	11-40-101086606	09/12/2025
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	27/11/2025	27/05/2026	$284,700,000.00	11-40-101086606	09/12/2025
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	27/11/2025	27/05/2026	$284,700,000.00	11-40-101086606	09/12/2025

POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO

***Tabla No 12**. Póliza de seguro de cumplimiento - ANEXO 2*

AMPARO	DESDE	HASTA	VR. ASEGUR	POLIZA	EXPEDICION
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/01/2026	21/07/2026	$50,965,752.30	11-44-101272130	26/01/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	21/01/2026	21/07/2026	$67,954,336.40	11-44-101272130	26/01/2026
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORES	21/01/2026	21/07/2029	$33,977,168.20	11-44-101272130	26/01/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	21/01/2026	21/07/2031	$50,965,752.30	11-44-101272130	26/01/2026

***Tabla No 13.** Póliza de responsabilidad civil extracontractual - ANEXO 2*

AMPARO	%	DESDE	HASTA	VR. ASEGUR	POLIZA	EXPEDICION
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086606	26/01/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086606	26/01/2026
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086606	26/01/2026
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086606	26/01/2026
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086606	26/01/2026
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086606	26/01/2026

POLIZAS OTROSI 1

***Tabla No 14**. Póliza de seguro de cumplimiento - ANEXO 3*

AMPARO	DESDE	HASTA	VR. ASEGUR	POLIZA	EXPEDICION
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/01/2026	21/11/2026	$50,965,752.30	11-44-101272130	06/03/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	21/01/2026	21/11/2026	$67,954,336.40	11-44-101272130	06/03/2026
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORES	21/01/2026	21/11/2029	$33,977,168.20	11-44-101272130	06/03/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	21/01/2026	21/07/2031	$50,965,752.30	11-44-101272130	06/03/2026

***Tabla No 15.** Póliza de responsabilidad civil extracontractual - ANEXO 3*

AMPARO	%	DESDE	HASTA	VR. ASEGUR	POLIZA	EXPEDICION
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086606	06/03/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086606	06/03/2026
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086606	06/03/2026
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086606	06/03/2026
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086606	06/03/2026
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	200 SMLMV	21/01/2026	21/07/2026	$284,700,000.00	11-40-101086606	06/03/2026

POLIZAS OTROSI 2

***Tabla No 16**. Póliza de seguro de cumplimiento - ANEXO 4*

AMPARO	DESDE	HASTA	VR. ASEGUR	POLIZA	EXPEDICION
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/01/2026	21/11/2026	$73,395,780.00	11-44-101272130	14/05/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	21/01/2026	21/11/2026	$97,861,040.00	11-44-101272130	14/05/2026
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORES	21/01/2026	21/07/2029	$48,930,520.00	11-44-101272130	14/05/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	21/07/2026	21/07/2031	$73,395,780.00	11-44-101272130	14/05/2026

***Tabla No 17**. Póliza de seguro de cumplimiento - ANEXO 5*

AMPARO	DESDE	HASTA	VR. ASEGUR	POLIZA	EXPEDICION
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/01/2026	21/02/2027	$73,395,780.00	11-44-101272130	14/05/2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	21/01/2026	21/02/2027	$97,861,040.00	11-44-101272130	14/05/2026
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORES	21/01/2026	21/10/2029	$48,930,520.00	11-44-101272130	14/05/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	21/07/2026	21/07/2031	$73,395,780.00	11-44-101272130	14/05/2026

Tabla No 18. *Póliza de responsabilidad civil extracontractual - ANEXO 4*


AMPARO	%	DESDE	HASTA	VR. ASEGUR	POLIZA	EXPEDICION
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	200 SMLMV	21/01/2026	21/10/2026	$284,700,000.00	11-40-101086606	14/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	200 SMLMV	21/01/2026	21/10/2026	$284,700,000.00	11-40-101086606	14/05/2026
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.	200 SMLMV	21/01/2026	21/10/2026	$284,700,000.00	11-40-101086606	14/05/2026
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	200 SMLMV	21/01/2026	21/10/2026	$284,700,000.00	11-40-101086606	14/05/2026
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	200 SMLMV	21/01/2026	21/10/2026	$284,700,000.00	11-40-101086606	14/05/2026
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	200 SMLMV	21/01/2026	21/10/2026	$284,700,000.00	11-40-101086606	14/05/2026

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

El presente informe de interventoría corresponde al seguimiento técnico, administrativo, financiero, y ambiental realizado al Contrato de Obra No. 171-2025, cuyo objeto es la **"RESTITUCIÓN FASE III DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COMBINADO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA".** Este documento consolida los resultados de las actividades de supervisión desarrolladas por la Interventoría durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2026, en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de interventoría y conforme a los lineamientos de supervisión y control establecidos por la entidad contratante.

En la *figura 2* se muestra el esquema de la red de alcantarillado y acueducto a reponer.

Figura 2. *Tramos a intervenir*

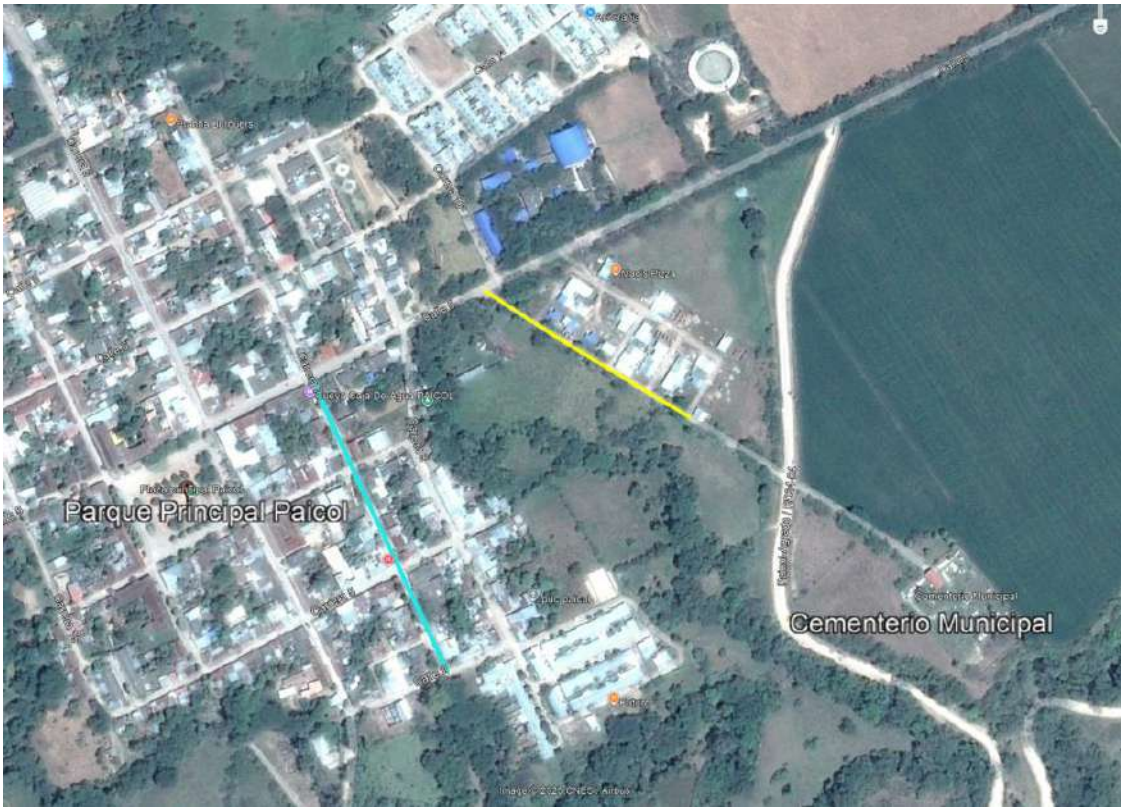

Fuente: *Google Earth*

Los tramos a intervenir en el presente proyecto se relacionan a continuación, incluyendo el diámetro de la tubería, longitud y barrio.

Tabla 19. *Tramos a intervenir*

BARRIO O SECTOR	TRAMO	Localización	Tubería	
			Long (ml)	Diámetro (")
LOS ALMENDROS (Acueducto)	T1	Carrera 7 entre calle 2 y 3	96.30	2
	T2	Carrera 7 entre calle 3 y 4	93.30	2
	T3	Carrera 7 entre calle 4 y 5	88.50	2
EL PRADO (Alcantarillado)	T4	Cra 10, Cementerio	108.51	16
	T5	Cra 10, Cementerio	115.40	16
	T6	Cra 10, Cementerio	76.85	16
	T7	Cra 10, Cementerio	11.41	16
EL JARDIN (Acueducto)	T8	Cra 6, Barrio el jardín	95.00	2
EL JARDIN (alcantarillado)				10

Capitulo 1: Restitución Acueducto

Durante el período reportado se dio continuidad a las actividades de restitución del sistema de acueducto en el barrio Los Almendros específicamente sobre la carrera 7, en los tramos T1 y T2 del proyecto. En el tramo T1, correspondiente a la carrera 7 entre calles 2 y 3, las actividades se concentraron en la reposición de aproximadamente 90 metros lineales de placa de rodadura en enrocado con concreto de 4.000 psi.

Por otra parte, en el tramo T2, ubicado sobre la carrera 7 entre calles 3 y 4, se realizó la demolición de la placa en enrocado, posteriormente, se llevaron a cabo actividades de excavación manual y mecánica para la conformación de zanjas y adecuación del terreno, permitiendo la instalación de aproximadamente 90 metros lineales de tubería de 2 pulgadas de diámetro, correspondiente a la red principal de acueducto. De manera complementaria, se realizo la conexión de 16 acometidas domiciliarias.

Tabla 20. *Acumulado de cantidades ejecutadas*

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROSÍ 1		PRESENTA ACTA		ACUMULADO TOTAL	
		UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	**CAPITULO 1: RESTITUCIÓN ACUEDUCTO**				**$ 63,940,701.00**		**$ 52,452,663.00**		**$ 26,686,048.00**		**$ 26,686,048.00**
1.1	**PRELIMINARES**				**$ 1,901,394.00**		**$ 1,954,298.00**		**$ 993,125.00**		**$ 993,125.00**
1.1.1	Localización y Replanteo de redes, incluye Equipo de Topografía, materiales y mano de obra.	ML	363.00	$ 5,238.00	$ 1,901,394.00	373.10	$ 1,954,298.00	189.60	$ 993,125.00	189.60	$ 993,125.00
1.2	**EXCAVACIONES INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS.**				**$ 14,282,103.00**		**$ 2,269,330.00**		**$ 1,151,600.00**		**$ 1,151,600.00**
1.2.1	Excavación a todo costo manual en conglomerado. Incluye: mano de obra, materiales y equipo.	M3	253.00	$ 56,451.00	$ 14,282,103.00	40.20	$ 2,269,330.00	20.40	$ 1,151,600.00	20.40	$ 1,151,600.00
N.P. 1.2.2	**ITEMS NO PREVISTOS**				**$ 0.00**		**$ 2,353,183.00**		**$ 1,227,072.00**		**$ 1,227,072.00**
N.P. 1.2.2.1	Excavación Mecánica a todo factor. Incluye: mano de obra, materiales y equipo.	M3	0.00	$ 21,573.00	$ 0.00	109.08	$ 2,353,183.00	56.88	$ 1,227,072.00	56.88	$ 1,227,072.00
1.3	**RELLENO APISONADO A TODO FACTOR CON MATERIAL SELECCIONADO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO.**				**$ 35,878,554.00**		**$ 26,913,992.00**		**$ 13,930,132.00**		**$ 13,930,132.00**
1.3.1	Relleno de brecha con material recebo granular compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 20cm. IP < 10%, según norma INVIAS 2012, Dm=95% según PM.	M3	158.00	$ 178,243.00	$ 28,162,394.00	106.04	$ 18,900,888.00	55.32	$ 9,860,403.00	55.32	$ 9,860,403.00
1.3.2	Relleno con Grava redondeada de 3/4 para cama de tubería, incluye: equipos, herramientas, transporte, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	M3	32.00	$ 188,588.00	$ 6,034,816.00	42.49	$ 8,013,104.00	21.58	$ 4,069,729.00	21.58	$ 4,069,729.00
1.3.3	Relleno de brecha con material seleccionado de la misma excavación, compactación mecánica tipo canguro, en capas máximo de 20 cms. IP< 13%, según Norma Invías 2012, Dm = según PM 95%.	M3	63.00	$ 26,688.00	$ 1,681,344.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROSÍ 1		PRESENTA ACTA		ACUMULADO TOTAL	
		UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.4	**RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN**				**$ 4,211,730.00**		**$ 3,309,090.00**		**$ 1,713,066.00**		**$ 1,713,066.00**
1.4.1	Cargue y retiro de material sobrante en volqueta hasta botadero autorizado, distancia entre 0- 5KM Incluye: factor de expansión, herramienta menor, transporte, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. Incluye factor de expansión.	M3	190.00	$ 22,167.00	$ 4,211,730.00	149.28	$ 3,309,090.00	77.28	$ 1,713,066.00	77.28	$ 1,713,066.00
1.5	**TUBERÍA Y ACCESORIOS EN PVC**				**$ 7,666,920.00**		**$ 11,415,192.00**		**$ 5,792,784.00**		**$ 5,792,784.00**
1.5.1	Suministro e instalación de domiciliarias en tubería PF + UAD de 1/2" RDE 9. Incluye: Tubería de 1/2", Collar de Derivación de 2" x 1/2", Válvula antifraude, Válvulas de bola de 1/2", y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	45.00	$ 170,376.00	$ 7,666,920.00	67.00	$ 11,415,192.00	34.00	$ 5,792,784.00	34.00	$ 5,792,784.00
N.P. 1.5.2	**ITEMS NO PREVISTOS**				**$ 0.00**		**$ 4,237,578.00**		**$ 1,878,269.00**		**$ 1,878,269.00**
N.P. 1.5.2.2	Instalación de tubería PVC-Unión Platino D=2" RDE 21.	ML	0.00	$ 5,957.00	$ 0.00	373.10	$ 2,222,557.00	180.00	$ 1,072,260.00	180.00	$ 1,072,260.00
N.P. 1.5.2.3	Enmalles en red de acueducto 2", incluye corte de tubería, instalación de unión de reparación, tee y accesorios necesarios	UND	0.00	$ 403,004.20	$ 0.00	5.00	$ 2,015,021.00	2.00	$ 806,009.00	2.00	$ 806,009.00
2	**CAPITULO 2: RESTITUCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO**				**$ 1,178,885,597.00**		**$ 1,739,766,137.00**		**$ 1,085,561,296.00**		**$ 1,085,561,296.00**
2.1	**PRELIMINARES**				**$ 2,446,146.00**		**$ 2,855,600.00**		**$ 1,635,146.00**		**$ 1,635,146.00**
2.1.1	Localización y Replanteo de redes, incluye Equipo de Topografía, materiales y mano de obra.	ML	467.00	$ 5,238.00	$ 2,446,146.00	545.17	$ 2,855,600.00	312.17	$ 1,635,146.00	312.17	$ 1,635,146.00
2.2	**POZOS DE INSPECCIÓN**				**$ 20,003,139.00**		**$ 27,405,686.00**		**$ 15,660,392.00**		**$ 15,660,392.00**

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROSÍ 1		PRESENTA ACTA		ACUMULADO TOTAL	
		UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
2.2.1	Construcción de pozo de inspección a todo costo, en concreto impermeabilizado de 4000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. Llevará cono de reducción, diámetro interno de 1,20 m. y espesor 0,20 m., suministro e instalación de aro base y tapa HD clase D400, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra; diametro total 1,60 m. incluye: Base y canuela. Pozo de Inspección de 0 a 3.00 metros de altura, desde la cota batea.	UND	4.00	$ 3,915,098.00	$ 15,660,392.00	7.00	$ 27,405,686.00	4.00	$ 15,660,392.00	4.00	$ 15,660,392.00
2.2.2	Construcción de pozo de inspección a todo costo, en concreto impermeabilizado de 4000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,40 m. Llevará cono de reducción, diámetro interno de 1,20 m. y espesor 0,20 m., suministro e instalación de aro base y tapa HD clase D400, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra; diametro total 1,60 m. incluye: Base y canuela. Pozo de Inspección de 0 a 4.00 metros de altura, desde la cota batea.	UND	1.00	$ 4,342,747.00	$ 4,342,747.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.3	**EXCAVACIONES INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS.**				**$ 29,909,985.00**		**$ 17,809,859.00**		**$ 11,234,406.00**		**$ 11,234,406.00**
2.3.1	Excavación Mecánica a todo factor. Incluye: mano de obra, materiales y equipo.	M3	659.00	$ 21,573.00	$ 14,216,607.00	548.24	$ 11,827,182.00	445.06	$ 9,601,279.00	445.06	$ 9,601,279.00
2.3.2	Excavación manual en material conglomerado Incluye: mano de obra, materiales y equipo.	M3	278.00	$ 56,451.00	$ 15,693,378.00	105.98	$ 5,982,677.00	28.93	$ 1,633,127.00	28.93	$ 1,633,127.00

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROSÍ 1		PRESENTA ACTA		ACUMULADO TOTAL	
		UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP 2.3.3	**ITEMS NO PREVISTOS**						**$ 3,282,782.00**		**$ 3,282,782.00**		**$ 3,282,782.00**
NP 2.3.3.1	Excavación a todo costo en roca (compresor y explosivos). Incluye: mano de obra, materiales y equipo, incluye retiro de material de la zanja a mano sin disposición final.	M3	0.00	$ 130,684.00	$ 0.00	25.12	$ 3,282,782.00	25.12	$ 3,282,782.00	25.12	$ 3,282,782.00
2.4	**RELLENO APISONADO A TODO FACTOR CON MATERIAL SELECCIONADO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO**				**$ 108,257,647.00**		**$ 112,931,228.00**		**$ 81,808,256.00**		**$ 81,808,256.00**
2.4.1	Relleno con Grava redondeada de 3/4 para cama de tubería, incluye: equipos, herramientas, transporte, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	M3	59.00	$ 188,588.00	$ 11,126,692.00	51.52	$ 9,716,054.00	33.26	$ 6,272,437.00	33.26	$ 6,272,437.00
2.4.2	Relleno de brecha con material recebo granular compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 20cm. IP < 10%, según norma INVIAS 2012, Dm=95% según PM.	M3	537.00	$ 178,243.00	$ 95,716,491.00	579.07	$ 103,215,174.00	423.78	$ 75,535,819.00	423.78	$ 75,535,819.00
2.4.3	Relleno de brecha con material seleccionado de la misma excavación, compactación mecánica tipo canguro, en capas máximo de 20 cms. IP< 13%, según Norma Invías 2012, Dm = según PM 95%.	M3	53.00	$ 26,688.00	$ 1,414,464.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
2.5	**RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN**				**$ 31,321,971.00**		**$ 15,056,048.00**		**$ 11,060,890.00**		**$ 11,060,890.00**
2.5.1	Cargue y retiro de material sobrante en volqueta hasta botadero autorizado, distancia entre 0- 5KM Incluye: factor de expansión, herramienta menor, transporte, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. Incluye factor de expansión.	M3	1413.00	$ 22,167.00	$ 31,321,971.00	679.21	$ 15,056,048.00	498.98	$ 11,060,890.00	498.98	$ 11,060,890.00
2.6	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ALCANTARILLADO HERMÉTICO**				**$ 45,638,820.00**		**$ 76,597,153.00**		**$ 76,597,153.00**		**$ 76,597,153.00**

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROSÍ 1		PRESENTA ACTA		ACUMULADO TOTAL	
		UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
2.6.2	Suministro e instalación de tubería de PVC. Incluye: Nivelación, arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de herramienta y mano de obra, lubricante, y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra, para tuberías de: PVC 16".	ML	186.00	$ 245,370.00	$ 45,638,820.00	312.17	$ 76,597,153.00	312.17	$ 76,597,153.00	312.17	$ 76,597,153.00
2.7	**CONEXIÓN DOMICILIARIA A CONECTOR PRINCIPAL**				**$ 30,369,075.00**		**$ 8,647,514.00**		**$ 5,487,231.00**		**$ 5,487,231.00**
2.7.3	Suministro e instalación de Silla Yee 400x160mm. Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético.	UND	4.00	$ 381,644.00	$ 1,526,576.00	7.00	$ 2,671,508.00	7.00	$ 2,671,508.00	7.00	$ 2,671,508.00
2.7.4	Construcción de Cajilla domiciliaria para alcantarillado a todo costo en concreto simple de 3000 PSI de dimensión de 0.6 X 0.6 m. libres, espesor de 0.10 m. Tapa en concreto reforzado en hierro de 3/8" separados cada 0.15 m. en ambos sentidos, base de 0.9 X 0.9 X 0.15 m. Superficie y cañuela esmaltadas en concreto puro y muros con pañete impermeabilizado. Incluye: producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra con pañete.	UND	35.00	$ 617,966.00	$ 21,628,810.00	3.00	$ 1,853,898.00	3.00	$ 1,853,898.00	3.00	$ 1,853,898.00
2.7.5	Demolicion de Anden lateral en concreto de e=10 cms.	M2	63.00	$ 19,090.00	$ 1,202,670.00	36.00	$ 687,240.00	8.40	$ 160,356.00	8.40	$ 160,356.00
2.7.6	Reparación de anden placa en concreto e=0,8m 2500 psi, acabado en concreto afinado. Incluye todo lo necesario para que su terminado sea igual o similar al existente.	M2	63.00	$ 95,413.00	$ 6,011,019.00	36.00	$ 3,434,868.00	8.40	$ 801,469.00	8.40	$ 801,469.00
NP 2.7.7	**ITEMS NO PREVISTOS**						**$ 16,568,025.00**		**$ 1,964,352.00**		**$ 1,964,352.00**
NP 2.7.7.1	Instalación de Tubería PVC diámetro 160mm, de pared estructural y sello hermético.	ML	0.00	$ 23,310.00	$ 0.00	180.00	$ 4,195,800.00	42.00	$ 979,020.00	42.00	$ 979,020.00
NP 2.7.7.2	Instalación de Tubería PVC diámetro 250mm, de pared estructural y sello hermético.	ML	0.00	$ 38,466.00	$ 0.00	95.00	$ 3,654,270.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROSÍ 1		PRESENTA ACTA		ACUMULADO TOTAL	
		UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP 2.7.7.3	Instalación de Silla Yee 250x160mm. Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético.	UND	0.00	$ 89,868.00		23.00	$ 2,066,964.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
NP. 2.7.7.4	Adecuación y/o Reparación cajilla existente de concreto: (incluye pañete, cañulela, empalme a tubo nuevo domiciliaria y tapa).	UND	0.00	$ 246,333.00		27.00	$ 6,650,991.00	4.00	$ 985,332.00	4.00	$ 985,332.00
2.8	**RESTITUCIÓN DE VÍA**				**$ 910,938,814.00**		**$ 1,203,392,026.00**		**$ 811,131,594.00**		**$ 811,131,594.00**
2.8.1	Rotura y demolición de concreto y/o Enrocado.	M2	2627.00	$ 64,449.00	$ 169,307,523.00	3036.44	$ 195,695,522.00	2549.69	$ 164,324,971.00	2549.69	$ 164,324,971.00
2.8.2	Excavación Mecánica a todo factor. Incluye: mano de obra, materiales y equipo.	M3	784.00	$ 21,573.00	$ 16,913,232.00	1439.46	$ 31,053,471.00	784.47	$ 16,923,371.00	784.47	$ 16,923,371.00
2.8.3	Relleno de brecha con material recebo granular compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 20cm. IP < 10%, según norma INVIAS 2012, Dm=95% según PM.	M3	256.00	$ 178,243.00	$ 45,630,208.00	854.48	$ 152,305,079.00	512.74	$ 91,392,316.00	512.74	$ 91,392,316.00
2.8.4	Suministro e instalación con Material Subbase granular IP menor 6%, según norma INVIAS 96, compactación mécanica tipo canguro, capa maxima de 20 cm Dm = 95% según PM.	M3	529.00	$ 201,019.00	$ 106,339,051.00	721.29	$ 144,992,995.00	408.05	$ 82,025,803.00	408.05	$ 82,025,803.00
2.8.5	Reposición Placa de Rodadura en Enrocado de 4,000 psi , 30% piedra plana TM 4"-5" y 70% concreto; Incluye: herramienta menor, materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra, E=0,20.	M3	512.00	$ 1,118,650.00	$ 572,748,800.00	607.29	$ 679,344,959.00	408.05	$ 456,465,133.00	408.05	$ 456,465,133.00
NP 2.8.6	**ITEMS NO PREVISTOS**						**$ 255,220,216.00**		**$ 65,699,094.00**		**$ 65,699,094.00**
NP 2.8.6.1	Localización y Replanteo de vía, incluye Equipo de Topografía, materiales y mano de obra.	M2	0.00	$ 5,238.00	$ 0.00	3509.44	$ 18,382,447.00	1943.22	$ 10,178,586.00	1943.22	$ 10,178,586.00
NP 2.8.6.2	Tala, tronzado y desenraice de árboles (incluye bote y disposición final de material vegetal)	UND	0.00	$ 262,465.00	$ 0.00	16.00	$ 4,199,440.00	16.00	$ 4,199,440.00	16.00	$ 4,199,440.00
NP 2.8.6.3	Construcción de bordillos (0.1 m. de ancho; 0.1 m. de alto)	ML	0.00	$ 26,512.37	$ 0.00	1287.21	$ 34,126,988.00	586.35	$ 15,545,528.00	586.35	$ 15,545,528.00

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS OTROSÍ 1		PRESENTA ACTA		ACUMULADO TOTAL	
		UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP 2.8.6.4	Construcción de Muro en concreto reforzado f'c=4000 psi (0.35X0.75X1.00)	ML	0.00	$ 580,726.00		18.00	$ 10,453,068.00	18.00	$ 10,453,068.00	18.00	$ 10,453,068.00
NP 2.8.6.5	Cargue y retiro de material sobrante en volqueta hasta botadero autorizado, distancia entre 0- 5KM Incluye: factor de expansión, herramienta menor, transporte, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. Incluye factor de expansión.	M3	0.00	$ 22,167.00		1968.08	$ 43,626,429.00	1142.35	$ 25,322,472.00	1142.35	$ 25,322,472.00
NP 2.8.6.6	Pavimento rígido MR-40, espesor 0,20mts , juntas de dilatación selladas, texturizado, pasadores transversales en hierro liso de diámetro 7/8", longitud 0,30 mts, espaciados cada 0,30 m y longitudinales en hierro corrugado de 1/2" de diámetro, longitud 0,85 mt separación según diseño, curado con Antisol.	M3	0.00	$ 1,266,946.00		114.00	$ 144,431,844.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
	CAPITULO 1: RESTITUCIÓN ACUEDUCTO				**$ 63,940,701.00**		**$ 52,452,663.00**		**$ 26,686,048.00**		**$ 26,686,048.00**
	CAPITULO 2: RESTITUCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO				**$ 1,178,885,597.00**		**$ 1,739,766,137.00**		**$ 1,085,561,296.00**		**$ 1,085,561,296.00**
	COSTO DIRECTO				**$ 1,242,826,298.00**		**$ 1,792,218,800.00**		**$ 1,112,247,344.00**		**$ 1,112,247,344.00**
	A		25%		$ 310,706,575.00		$ 448,054,700.00		$ 278,061,836.00		$ 278,061,836.00
	I		2%		$ 24,856,526.00		$ 35,844,376.00		$ 22,244,947.00		$ 22,244,947.00
	U		5%		$ 62,141,315.00		$ 89,610,940.00		$ 55,612,367.00		$ 55,612,367.00
	TOTAL AIU				**$ 397,704,416.00**		**$ 573,510,016.00**		**$ 355,919,150.00**		**$ 355,919,150.00**
	PLAN DE GESTIÓN DE OBRA (PGIO)		1.00		$ 7,279,040.00		$ 7,279,040.00		$ 7,279,040.00		$ 7,279,040.00
	TOTAL PRESUPUESTO				**$ 1,647,809,754.00**		**$ 2,373,007,856.00**		**$ 1,475,445,534.00**		**$ 1,475,445,534.00**

1.2 Estado y Avance Físico Del Proyecto

Historial Cronológico del Proyecto

ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
Acta de inicio de obra	21/01/2026			20/10/2026

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No	Fecha
Acta de inicio de obra	1	21 de enero de 2026
Otrosí No. 1	1	03 de marzo de 2026
Otrosí No. 2 (3 meses)	2	20 de abril de 2026

1.3. Estado y Avance Presupuestal del Proyecto (Describir)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO ……$ 1,647,809,754.00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO ……...$ 725,198,102.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO ……$ 2,373,007,856.00

VALOR DEL ANTICIPO…… $ 659,123,901.60
PORCENTAJE DE ANTICIPO…… 40.0 %

AVANCE FÍSICO REAL

Avance Físico Mensual…… 14.05 %
Avance Físico Acumulado…… 62.18 %

AVANCE FÍSICO PROYECTADO SEGÚN CRONOGRAMA

De acuerdo con la programación presentada, el avance físico a la fecha es del 55.56 %

PORCENTAJE DE AVANCE O RETRASO SEGÚN CRONOGRAMA

Según cronograma se presenta un avance superior al programado en un 6.62 %.

AVANCE EN TIEMPO

Tiempo Total Transcurrido ……..130 días
Avance Porcentual según plazo total …… 48.15%
Inversión contratada……... $ 2,373,007,856.00
Inversión Ejecutada en el Periodo……$ 333,348,863.00
Porcentaje Ejecutado en el Periodo……..14.05 %
Inversión Total Ejecutada…… $ 1,475,445,534.00
Porcentaje Total Ejecutado……62.18 %

La Tabla 21 muestra los valores programados y ejecutados mes a mes.

Tabla 21 – *Valores Programados y Ejecutados*

VALORES (%) \ MES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Programado	Mensual	6.06%	9.65%	17.74%	13.71%	8.40%	8.40%	7.87%	11.25%	10.62%	6.30%
	Acumulado	6.06%	15.71%	33.45%	47.16%	55.56%	63.96%	71.83%	83.08%	93.70%	100.00%
Ejecutado	Mensual	4.95%	15.29%	22.95%	4.95%	14.05%					
	Acumulado	4.95%	20.23%	43.18%	48.13%	62.18%					

FLUJO DE INVERSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El flujo de inversión financiero se puede apreciar en la tabla siguiente, mediante el seguimiento del avance programado financiero, con relación a la ejecución financiera ejecutada según el registro mensual de los valores programados versus los valores ejecutados y los acumulados para el periodo en referencia.

Tabla 22. *Valores y porcentajes programados y ejecutados*

MES	PROGRAMADO PERIODO		EJECUTADO PERIODO		PROGRAMADO ACUMULADO		EJECUTADO ACUMULADO	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	$ 143,795,401.00	6.06%	$ 117,375,927	4.95%	$ 143,795,401.00	6.06%	$ 117,375,927.00	4.95%
2	$ 228,985,047.00	9.65%	$ 362,723,991	15.29%	$ 372,780,448.00	15.71%	$ 480,099,918.00	20.23%
3	$ 420,930,018.00	17.74%	$ 544,651,022	22.95%	$ 793,710,466.00	33.45%	$ 1,024,750,940.00	43.18%
4	$ 325,424,837.00	13.71%	$ 117,345,731	4.95%	$ 1,119,135,303.00	47.16%	$ 1,142,096,671.00	48.13%
5	$ 199,286,457.00	8.40%	$ 333,348,863	14.05%	$ 1,318,421,760.00	55.56%	$ 1,475,445,534.00	62.18%
6	$ 199,286,457.00	8.40%			$ 1,517,708,217.00	63.96%		
7	$ 186,839,246.00	7.87%			$ 1,704,547,463.00	71.83%		
8	$ 267,025,232.00	11.25%			$ 1,971,572,695.00	83.08%		
9	$ 251,979,268.00	10.62%			$ 2,223,551,963.00	93.70%		
10	$ 149,455,893.00	6.30%			$ 2,373,007,856.00	100.00%		
TOTALES	$ 2,373,007,856.00	100.00%	$ 1,475,445,534	62.18%				

GRÁFICO DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS. EJECUTADO

Al establecer un comparativo entre las curvas de avance financiero del flujo de inversión programado versus la curva de inversión ejecutada en el período, se observa que el valor programado, curva en color celeste, está por debajo del valor ejecutado (curva de color naranja).

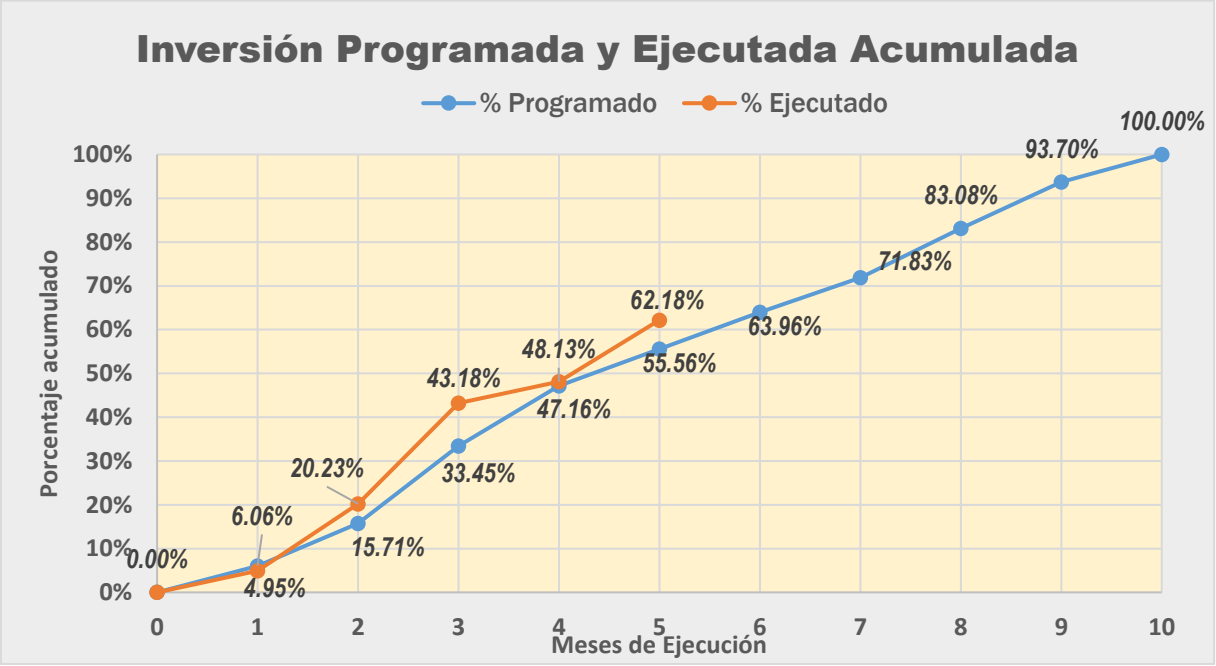


Figura 3. Valores de Inversión acumulada, programados y ejecutados.

1.4. Recomendaciones y Conclusiones

- La obra presenta un avance físico y financiero del 62.18%, coherente con las cantidades verificadas en campo y con los ajustes establecidos en el Otrosí No. 1, evidenciando una ejecución adecuada y conforme a las especificaciones técnicas.

2. INFORME BÁSICO

2.1 Estado Financiero del Contrato de obra

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Anticipo de obra	20/03/2026			N/A
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$1.647.809.754	$ 725.198.102	$ 2.373.007.856	N/A	N/A

2.3. Personal y Equipo Empleado por el Contratista

2.3.1. Personal empleado por CONENERGIA LTDA – CONCRETOS Y ENERGIA LTDA

- **Mes de mayo de 2026**

Tabla 23. *Personal Profesional empleado por el Contratista de Obra*

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	ID	CARGO
1	Nelson Gutiérrez Cuellar	19.486.513	Representante Legal
2	Diego Andrés Carrera Osorio	1075231417	Residente de obra
3	Stefanny Rivera Quevedo	1.081.415.763	Director de obra
4	Andrés Felipe Gonzales Collazos	1.075.309.384	Profesional HSEQ
5	Luis Javier Tovar Palomo	83.169.973	Topógrafo
6	Gerlinson Trujillo Londoño	4.920.457	Auxiliar HSEQ

Tabla 24. *Personal Técnico empleado por el Contratista de Obra*

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	C.C.	CARGO
1	Gustavo Losada Vásquez	12.136.195	Maestro De Obra
2	Yeison Camilo Andrade Trujillo	1.004.082.182	Ayudante de Obra
3	Jesús Armando García Bonilla	1.004.082.156	Ayudante de Obra
4	Jorge Luis Lara Ortiz	7.712.432	Oficial de Obra
5	Hernán Javier Ortiz Semanate	1.079.509.166	Ayudante de Obra
6	Alipio Puentes Cachaya	12.205.366	Oficial de Obra
7	Elías Ramos Cerquera	4.920.069	Inspector De Obra
8	Alberto Rojas Calderón	7.711.561	Ayudante de Obra
9	Eduard Fernando Olaya Guilombo	1.075.541.804	Personal Operativo
10	John Fredy Cervera Peña	1.081.155.462	Personal Operativo
11	Jhon Alexander Cadena Amado	1.023.895.200	Ayudante de Obra
12	Ciro Amaro Díaz	74.795.514	Ayudante de Obra
13	Elian Aldair Ochoa	1.004.082.060	Ayudante de Obra
14	Cristian Ricardo Velasco Tumbo	1. 004.473.374	Ayudante de Obra

15	Yorman Andres Mendez Cuellar	1.004.081.993	Ayudante de Obra
16	Jhon Edwin Penagos Zúñiga	1.079.508.188	Ayudante de Obra

2.3.2. Equipos y Herramientas Disponibles

- Una (1) estación total de topografía.
- Herramienta menor disponible para labores de apoyo en obra (picas, palas, carretillas, niveles manuales, entre otros).
- Retroexcavadora.
- Planta eléctrica.
- Rotomartillo.
- Volquetas.
- Minicargador.
- Camionetas.
- Canguro Compactador

Tabla 25. *Personal Profesional empleado por el Interventor*

	NOMBRE Y APELLIDOS	ID	CARGO
1	Sergio Ernesto Gómez Zambrano	79.940.691	Director de interventoría
2	Alexandra Marcela Arredondo Ramírez	1.035.436.676	Residente de interventoría
3	Luis Alberto Torres Cuellar	7.690.641	Asesor Hidráulico

3. ASPECTOS TÉCNICOS

3.1. Modificaciones Realizadas en Obra

Durante la ejecución de la obra fue necesario realizar ajustes al alcance inicial, como resultado de las condiciones reales identificadas en campo durante las actividades de localización y replanteo, las cuales fueron revisadas y aprobadas por la interventoría.

Entre los principales cambios, se evidenció que el tramo de la carrera 6 del barrio El Jardín presenta una longitud mayor a la contemplada en el diseño inicial, además de identificarse la necesidad de incluir 23 conexiones domiciliarias no previstas inicialmente. De igual manera, durante la verificación de la red de alcantarillado del barrio El Prado, se identificaron limitaciones técnicas en la conexión proyectada hacia el pozo No. 31, por lo que fue necesario extender la red hasta el pozo No. 33, garantizando así la adecuada conducción de las aguas residuales hacia la PTAR.

Estas modificaciones implicaron ajustes en las cantidades de obra asociadas a la instalación de tubería, excavaciones y rellenos, garantizando la funcionalidad y continuidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado en los barrios El Prado, Los Almendros y El Jardín del municipio de Paicol.

3.2. Problemas y Soluciones Adoptadas

Durante las actividades de excavación para la instalación de la red de acueducto sobre la Cra 7 con calle 2 y 3, se identificó la presencia de una tubería en gres correspondiente a una antigua red de alcantarillado sanitario, la cual aparentemente continúa en funcionamiento, evidenciado por la presencia de humedad,

material residual y posible circulación de aguas residuales en el punto intervenido. Asimismo, se evidenció infiltración y saturación del terreno en el área de excavación.

Se deja constancia de que, aunque la profundidad proyectada para la instalación de la tubería de acueducto corresponde a 0,60 m, fue necesario realizar excavaciones a profundidades superiores a 1,30 m, debido a la interferencia generada por la red de alcantarillado existente en gres. Lo anterior, considerando que durante la construcción de dicha infraestructura no fue inhabilitada la red antigua, la cual actualmente se encuentra totalmente colapsada, presentando material de relleno completamente saturado.

En consecuencia, se procedió con el retiro total del material afectado y saturado, con el fin de garantizar la estabilidad del terreno.

4. CONTROL DE CALIDAD

4.1. Cuadro Resumen de Pruebas de Laboratorio

Los resultados de densidades y resistencias del concreto se encuentran dentro de los rangos exigidos por las especificaciones técnicas, garantizando la calidad de los materiales y de las actividades ejecutadas en obra.

4.2. Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

Los resultados obtenidos evidencian el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto, garantizando la adecuada compactación de los materiales y la calidad del concreto utilizado en las estructuras ejecutadas.

4.3. Comentarios y Conclusiones

El contrato de obra se desarrolla con normalidad y, a la fecha, presenta un nivel de ejecución acorde con lo establecido en el nuevo cronograma aprobado por la interventoría.

4.4. Comité de Obra

Fecha de Realización	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
06/02/2026	Paicol Huila – Sitio de obra	Se llevó a cabo un comité de seguimiento con el objetivo de socializar los avances relacionados con la actividad de localización y replanteo topográfico en tramo de la Cra 10 - Sector Cementerio.
20/02/2026	Paicol Huila – Sitio de obra	Se realizó comité con la participación del equipo contratista y la interventoría, con el fin de socializar el estado de avance de la obra.
30/03/2026	Neiva – Aguas del Huila	Se llevó a cabo comité de obra con la participación de la interventoría, el contratista y la supervisión, en el cual se expuso que, para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, se hace necesario realizar un balance de mayores y menores cantidades de obra. Durante el comité se presentó el análisis correspondiente, evidenciando un mayor valor frente al inicialmente contratado. Como compromiso, el contratista de obra quedó encargado de remitir la respectiva justificación técnica, con el fin de que sea revisada y evaluada por la supervisión para su posterior aprobación, teniendo en cuenta que dicha solicitud ya cuenta con el visto bueno por parte de la interventoría.

15/04/2026	Virtual	Se llevó a cabo comité de obra entre el contratista y la interventoría, con el fin de socializar el acta de modificación correspondiente a mayores y menores cantidades de obra, creación de ítems nuevos, valor adicional y ampliación del plazo contractual del Contrato de Obra No. 171 de 2025.
22/05/2026	Virtual	Se llevó a cabo un comité de seguimiento con el objetivo de socializar los avances relacionados con el tramo de acueducto ubicado en la carrera 7 del barrio Los Almendros. Durante la reunión, el equipo contratista dejó en evidencia que el material proveniente de las excavaciones presenta un alto grado de contaminación.

5. INFORME AMBIENTAL

5.1 Identificación de situaciones Ambientales

En el primer informe de ejecución se presentó el Plan de Gestión Integral de la Obra (PGIO). Durante el periodo correspondiente al presente informe se realizó seguimiento al cumplimiento de las medidas allí establecidas, especialmente en lo relacionado con el manejo adecuado de los residuos generados en obra, con el fin de mantener condiciones adecuadas en el área de intervención y prevenir posibles impactos ambientales. *(Ver Anexo 1).*

5.2 Evaluación de Daños y Perjuicios a Terceros

Durante el periodo correspondiente al presente informe no se evidenciaron daños ni perjuicios a terceros derivados de las actividades ejecutadas en la obra. Las labores se desarrollaron bajo supervisión y cumpliendo las medidas necesarias para evitar afectaciones a predios, viviendas o infraestructura aledaña

6. PAGOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

6.1 Cumplimiento de las normas de seguridad industrial.

Durante el periodo correspondiente al presente informe, las actividades en obra se desarrollaron dando cumplimiento a las normas básicas de seguridad industrial, implementando medidas orientadas a prevenir riesgos para el personal que labora en el proyecto. Así mismo, se realizaron jornadas de orden y limpieza en los frentes de trabajo, con el fin de mantener condiciones adecuadas de seguridad y organización en el área intervenida. *(Ver Anexo 2).*

6.2 Pagos de la seguridad integral y otros.


Se anexa al presente informe el soporte de pago de la seguridad social correspondiente al equipo de trabajo propuesto, así como del personal de mano de obra no calificada vinculado al proyecto. (Ver Anexo 3)

6.3 Descripción de Actividades Desarrolladas en el Periodo

Ver imágenes adjuntas

6.4. Registro Fotográfico.

Imagen 1, 2, 3 y 4. *Demolición de enrocado en el tramo de la Cra 7 del barrio los Almendros*

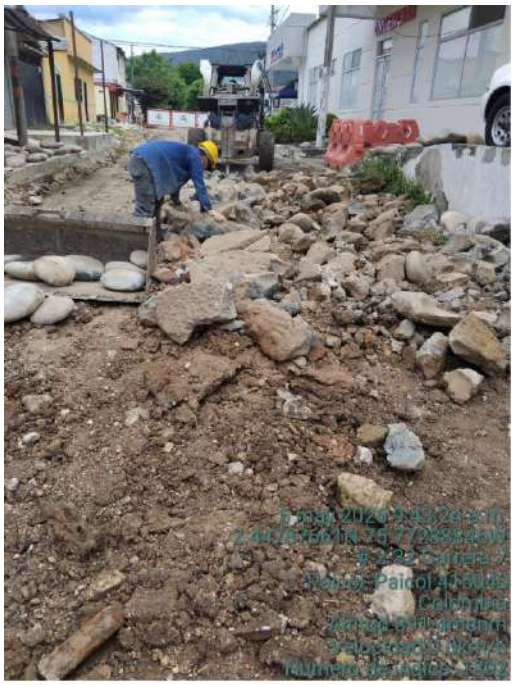







6.4. Registro Fotográfico.

Imagen 5, 6, 7 y 8. *Excavación mecánica Red de Acueducto barrio los Almendros*









6.4. Registro Fotográfico.

Imagen 9, 10, 11 y 12. *Instalación de tubería de Ø 2" para la red de acueducto en el barrio Los Almendros.*









6.4. Registro Fotográfico.

Imagen 13, 14, 15 y 16. *Relleno y compactación de la Red de Acueducto*









6.4. Registro Fotográfico.

Imagen 17, 18, 19 y 20. *Mejoramiento de la vía – Barrio Los Almendros*









6.4. Registro Fotográfico.

Imagen 21, 22, 23 y 24. *Reposición Placa de Rodadura en Enrocado de 4,000 psi – Los Almendros*









6.4. Registro Fotográfico.

7. ANEXOS

7.1 Anexos

A continuación, se relaciona el listado de anexos, los cuales hacen parte integral de este informe mensual de Interventoría No. 05, correspondiente al periodo comprendido del 1 y el 31 de mayo de 2026.

- *Anexo 1. Seguimiento Plan de gestión de obra (PGIO).pdf*
- *Anexo 2. Planilla Seguridad Social Mayo 2026.pdf*
- *Anexo 3. Bitácora periodo No 5. Del 1 al 31 de mayo de 2026.pdf*

INCIEM SAS – INGENIERÍA CIVIL, ELÉCTRICA Y MECÁNICA SAS
R.L. Alexandra Marcela Arredondo Ramírez
161037-0610884 TLM

Conenergía Ltda.
Concretos y Energía Ltda.

INFORME MENSUAL
HSE – MEDIO AMBIENTE
01 MAYO – 31 MAYO 2026
CONTRATO 171/2025.

Dirección: Calle 6 No. 7 – 28 Centro
Teléfono: (8) 8 71 64 78 - Celular: 317 666 69 99
Ciudad: Neiva – Huila

Conenergia Ltda. Concesión y Energía Ltda.	CONENERGIA LTDA	27/01/2023
	REPORTE MENSUAL CONTRATO DE OBRA No. 171 DE 2025	VERSIÓN: 001

OBJETO PROYECTO	FECHA	REPORTE No.
RESTITUCIÓN FASE III DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COMBINADO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA	01/05/2026 AL 31/05/2026	5

REALIZADO POR:

ANDRES FELIPE GONZALEZ COLLAZOS / INGENIERO AMBIENTAL ESPECIALISTA EN GENERENCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. ASPECTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

Horas Administrativas Trabajadas en el mes	X	Numero HHT Administrativos **CONENERGIA LTDA** en el mes	X
No. Trabajadores Administrativos **CONENERGIA LTDA.** en el mes	X	Numero HHT Operativos **CONENERGIA LTDA.** en el mes	220
No. Trabajadores Operativos **CONENERGIA LTDA.** en el mes	15	Acumulado HHT **CONENERGIA LTDA.** en el mes	X
		ACUMULADO TOTAL HHT CONENERGIA LTDA.	0

1.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL

DESCRIPCION	ANEXO	MES	ACUM	DESCRIPCION	ANEXO	MES	ACUM	DESCRIPCION	ANEXO	MES	ACUM
Permisos de Trabajo en zanjas y excavación	✓	4	4	Tarjetas por condición insegura		0	0	Accidentes de trabajo		0	0
Análisis de Trabajo Seguro	✓	4	4	Tarjetas por acto inseguro		0	0	Accidentes Fuera de Trabajo u Origen común		0	0
Inspección compactador, canguro	✓	2	2	Tarjeta por Impacto ambiental		0	0	Casi Accidentes o Incidentes		0	0
Inspección de mezcladora	✓	2	2	No. Total de Tarjetas de seguridad		0	0	Entrega de EPP y Dotación	✓	7	7

DESCRIPCION	ANEXO	MES	ACUM	DESCRIPCIÓN	ANEXO	MES	ACUM
Inspección de retroexcavadora	✓	0	0	Inspección de EPP	✓	1	1
Inspección de Herramientas de Mano	✓	4	4	Inspección de botiquín	✓	1	1
Inspección de Pulidora	✓	0	0	Inspección de Extintores		0	0
Inspección cortadora	✓	0	0	Inspección preoperacional generador eléctrico.		0	0

1.2. SALUD EN EL TRABAJO

TIPO	ANEXO	MES	ACUM	TIPO	ANEXO	MES	ACUM
Exámenes de Ingresos		0	0	Campañas de P Y P		0	0
Exámenes Periódicos		0	0	Días Ausentismo sin incapacidad		0	0
Exámenes egreso		0	0	Días Ausentismo con Incapacidad Medica		0	0

1.3. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

TIPO	TEMAS		ANEXO	No. PERSONAS	TIEMPO (hr)	HHC	TOTAL
Inducción	Cumplir con el plan de formación, capacitación entrenamiento, inducción, re-inducción de acuerdo con los criterios establecidos y las necesidades en cada proceso, en cuanto al SG-SST y respectivas actualizaciones de esta norma, de manera que tenga el nivel de competencia suficiente para las exigencias del cargo y lo exigido por el cliente Contractualmente en el Contrato de Obra No. 171 de 2025.		✓	0	0	0	0
Charlas	**TEMAS DE CHARLAS EN LA SEMANAS**		**ANEXO**	**No. PERSONAS**	**TIEMPO (hr)**	**HHC**	**TOTAL**
	SEMANA 1	DIA DEL TRABAJO, MANEJO DEL ESTRÉS	✓	15	1	10,0	10,00
	SEMANA 2	SEGURIDAD VIAL: LIMITES DE VELOCIDAD, DIA MUNDIAL DE LA HIGIENE DE MANOS, CAIDAS A DISTINTO NIVEL, RIESGO ERGONOOMICO, RIESGO MECANICO, MANEJO DE LA ANSIEDAD.	✓	14	1	14,0	14,00
	SEMANA 3	TRABAJO EN ALTURAS: INSPECCION DE EQUIPOS, ORDEN Y ASEO, PREVENCION DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, DESFORESTACION, RIESGO LOCATIVO, MANEJO DE RESIDUOS: CODIGO DE COLORES.	✓	17	1	17,0	17,00
	SEMANA 4	DIA MUNDIAL DEL RECICLEJE, USO Y MANTENIMIENTO DE EPP, CONTAMINACION DEL SUELO, DIA MUNDIAL DE LAS ABEJAS, ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, DIA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BOLOGICA, RIESGO PUBLICO:EXTORSION.	✓	15	1	15,0	15,00
	SEMANA 5	RIESGO ELECTRICO:CONEXIONES DE EQUIPOS, CABLES, CLAVIJAS, RIESGO CARDIO VASCULAR, USO Y AHORRO RACIONAL DE LA ENERGIA, ENFERMEDADES ENDEMICAS, REPORTE DE ACCIDENTES/CASIACCIDENTES, AUTO REPORTE DE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD.	✓	15	1	15,0	15,00
Capacitaciones							0,0
Lecciones Aprendidas	No se registran reportes de ACCIDENTES DE TRABAJO .			0	0	0	0,0
					TOTAL HHC	71	56

1.4. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

DESCRIPCIÓN	ANEXO	No. PERSONAS
Reporte de condiciones de Salud.		0
Bitácora de limpieza y desinfección.		0

1.5. ANEXOS

ANEXOS	SI	X	NO			No.Folios del informe.	0
OBSERVACIONES: Ninguna							

2. ASPECTOS AMBIENTALES

2.1. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

El Programa de Manejo de Residuos Sólidos se implementa para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, prevenir impactos negativos sobre el entorno y proteger la salud pública. Su aplicación permite organizar la separación, aprovechamiento y disposición adecuada de los residuos, optimizando recursos y fortaleciendo la participación comunitaria en la conservación ambiental. De esta manera, se asegura la sostenibilidad del proyecto y se promueve una gestión responsable y eficiente de los residuos. En el presente mes se realizó la recolección de los siguientes residuos: Residuos Sólidos: Aprovechables: 2,9 kg No aprovechables: 3,2 kg Organicos: 1,6 kg	**Residuos solidos:** **Aprovechables: 2,9 kg** **No aprovechables: 3,2 kg** **Organicos: 1,6 kg**
2.2 PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES Y RUIDO	
El uso de maquinaria como retroexcavadoras, mezcladoras y compactadores genera emisiones y niveles de ruido que pueden afectar la salud de los trabajadores y la comunidad, además de impactar el entorno. El programa se justifica porque permite controlar y monitorear estos equipos mediante mantenimiento preventivo, filtros y silenciadores, asegurando el cumplimiento normativo y la sostenibilidad del proyecto.	Se realizan 2 revisiones por semana a las herramientas y equipos para realizarle seguimiento al estado de los mismos para controlar y programar los mantenimientos preventivos.
2.3 PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL	
El Programa de Gestión Social se justifica por la necesidad de garantizar la participación activa de las comunidades en el desarrollo del proyecto, promoviendo la transparencia, el diálogo y la construcción de confianza. Su implementación permite atender inquietudes, prevenir conflictos y fortalecer la relación entre la organización y los actores sociales. Además, asegura el cumplimiento de compromisos institucionales, contribuye al bienestar colectivo y facilita la sostenibilidad de las acciones ejecutadas.	Se ejecuta una charla mensual con los habitantes de las areas intervenidas con el fin de actulizarlos en los avances realizados.
2.4 PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	
El Programa de Educación Ambiental se desarrolla con el fin de fortalecer la conciencia ciudadana sobre la protección de los recursos naturales y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Su implementación permite promover prácticas sostenibles, reducir impactos negativos en el entorno y fomentar la participación comunitaria en la gestión ambiental. De esta manera, se asegura la continuidad de los objetivos del proyecto, se mejora la calidad de vida de la población y se contribuye a la sostenibilidad de las acciones ejecutadas.	Se ejecutan 21 charlas y capacitacones al personal operativo del proyecto.
2.5 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
El Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo se justifica por la necesidad de proteger la integridad física y mental de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las actividades del proyecto. La implementación de medidas preventivas, el uso adecuado de equipos de protección personal y el mantenimiento seguro de herramientas y maquinaria permiten reducir accidentes, cumplir con la normativa laboral vigente y garantizar condiciones seguras de operación. De esta manera, el programa asegura la continuidad del proyecto, promueve el bienestar del personal y fortalece la responsabilidad social y ambiental de la organización.	Se realizan charlas diarias de 15 minutos previos al inicio de las actividades con el fin de orientar el personal.

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

 	 	 
FOTO 1: CHARLA PREOPERACIONAL 5 MIN	**FOTO 2 : ENTREGA DE DOTACION Y EPP AL PERSONAL**	**FOTO 3: INSPECCION PRE OPERACIONAL A VOLQUETA Y MINI CARGADOR**
Observación: Se realiza a diario la charla pre operacional de cinco minutos al personal para que inicie labores concentrado y enterado de las actividades que se realizaran durante el día los riesgos a los cuales están expuestos durante esta jornada.	**Observación:** Se entrega dotación y elementos de protección personal a colaboradores para el buen desarrollo de las actividades.	**Observación:** Para el funcionamiento del mini cargador y la volqueta se realiza inspección antes de ser utilizado esto con el objetivo de su correcto funcionamiento.
 	 	
FOTO 4: CAMPAÑA DE ORDEN Y ASEO	**FOTO 5: INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS**	**FOTO 6: PREPARACIÓN Y FUNDICIÓN DE PLACA CON PIEDRA Y CONCRETO**
Observación: Se realiza campaña de orden y aseo en la obra para evitar incidentes, clasificar correctamente los residuos generados y así poder dar una buena disposición final.	**Observación:** Antes de iniciar actividades se realiza inspección pre operacional a herramienta manual y equipos para garantizar la seguridad del personal.	**Observación:** Se realiza la preparación y posterior fundición de placa con piedra y concreto teniendo en cuenta las especificaciones del cliente y el buen uso de los elementos de protección personal.

4. FIRMA

INGENIERO AMBIENTAL ESPECIALISTA EN GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5. GRÁFICAS





GRAFICA 1. Para el mes de MAYO del 2025, se reportan 3792 de HHT, a nivel operativo que fueron 2820 de HHT y 972 HHT para los administrativos


GRAFICA 2. Para el mes de MAYO 2025 se realizó la apertura de 5 permisos de trabajo en zanjas y excavación , 9 analisis de trabajo seguro, 5 inspecciones de canguro y 3 inspecciones mezcladora.





GRAFICA 3. En el mes de MAYO No se realizó reportes de tarjetas de seguridad.

GRAFICA 4. En el mes de MAYO no se presentaron incidentes ni accidentes.

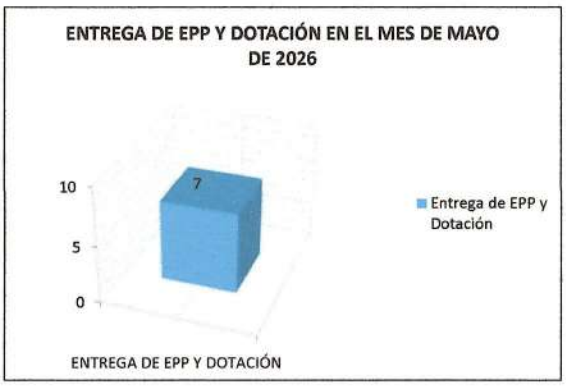




GRAFICA 5. En el mes de MAYO se realizaron 14 Entregas de EPP y dotación.





GRAFICA 6. Inspecciones realizadas durante el mes de MAYO



GRAFICA 7. Durante el mes de MAYO, no se realizaron exámenes de ingresos al personal del proyecto.


GRAFICA 8. No se presentaron casos de Ausentismo.

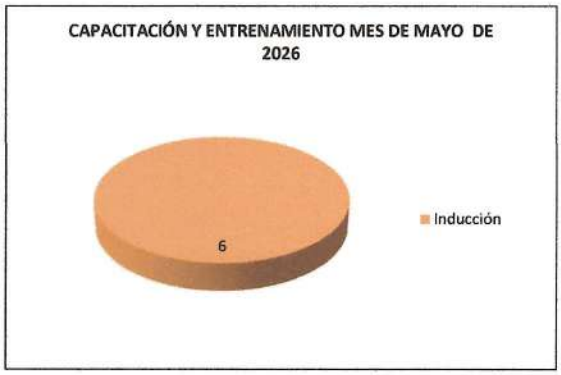



GRAFICA 9. Durante este mes de MAYO se realizó 1 inducción, y 29 Charlas de seguridad que equivale aproximadamente a 89 HHC.

GRAFICA 10. Durante el mes de MAYO, se registra 1 registro de Bitácora de limpieza y desinfección.





GRAFICA 11. En el mes de MAYO se registran 108 Anexos.

GRAFICA 12. Durante el mes de MAYO se generó Aprovechables: 2,9 kg; No aprovechables: 3,2 kg y Organicos: 1,6 kg

5. FIRMA

PROFESIONAL HSEQ

Conenergía Ltda.
Concretos y Energía Ltda.

ANEXO 1. PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES MES DE MAYO DE 2026.

Dirección: Calle 6 No. 7 – 28 Centro
Teléfono: (8) 8 71 64 78 - Celular: 317 666 69 99
Ciudad: Neiva – Huila

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-813000608
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2026-06-02
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-19486513
NOMBRE EMPLEADO	NELSON GUTIERREZ CUELLAR
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	37543258
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2026-05
PERÍODO SALUD	2026-06
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	1701001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.750.905	0,1600000	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.750.905	0,0400000	$ 70.100	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.750.905	0,0052200	$ 9.200	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.750.905	0,0400000	$ 70.100	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 280.200	$ 70.100	$ 9.200	$ 70.100	$ 429.600

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-813000606
SUCURSAL	49
FECHA PAGO	2026-06-02
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1075231417
NOMBRE EMPLEADO	DIEGO ANDRES CARRERA OSORIO
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO
AFP	COLFONDOS
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	37529082
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2026-05
PERÍODO SALUD	2026-06
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	1711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.750.905	0,1600000	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.750.905	0,0400000	$ 70.100	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.750.905	0,0052200	$ 9.200	1711001

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.750.905	0,0400000	$ 70.100	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 280.200	$ 70.100	$ 9.200	$ 70.100	$ 429.600

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-813000608
SUCURSAL	49
FECHA PAGO	2026-06-02
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1075309384
NOMBRE EMPLEADO	ANDRES FELIPE GONZALEZ COLLAZOS
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	37529082
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2026-05
PERÍODO SALUD	2026-06
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	1711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.040.000	0,1600000	$ 326.400	$ 0	$ 0	$ 326.400	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.040.000	0,0400000	$ 81.600	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.040.000	0,0052200	$ 10.700	1711001

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.040.000	0,0400000	$ 81.600	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 326.400	$ 81.600	$ 10.700	$ 81.600	$ 500.300

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	STEFANNY RIVERA QUEVEDO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1081415763
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-16
FECHA DE PAGO:	2026-06-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37449225
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37449225
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.100	$ 35.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 534.200	$ 534.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/07/2026

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-813000608
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2026-06-02
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1075541604
NOMBRE EMPLEADO	EDUARD FERNANDO OLAYA GUILOMBO
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PROTECCION (ING-PROTECCION)
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	37543258
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2026-05
PERÍODO SALUD	2026-06
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4492301
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.750.905	0,1600000	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.750.905	0.0400000	$ 70.100	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.750.905	0,0435000	$ 76.200	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.750.905	0,0400000	$ 70.100	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 280.200	$ 70.100	$ 76.200	$ 70.100	$ 496.600

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-813000608
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2026-06-02
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1081155462
NOMBRE EMPLEADO	JOHN FREDY CERVERA PEÑA
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	37543258
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2026-05
PERÍODO SALUD	2026-05
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4492301
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.750.905	0,1600000	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.750.905	0,0400000	$ 70.100	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.750.905	0,0435000	$ 76.200	3

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.750.905	0,0400000	$ 70.100	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 280.200	$ 70.100	$ 76.200	$ 70.100	$ 496.600

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-813000608
SUCURSAL	04
FECHA PAGO	2026-06-02
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-12136195
NOMBRE EMPLEADO	GUSTAVO LOSADA VASQUEZ
EPS	Sin EPS
AFP	Sin AFP
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	37312360
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	Y
PERÍODO PENSIÓN	2026-05
PERÍODO SALUD	2026-05
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
0	0	0,0000000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
0	0	0,0000000	$ 0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.750.905	0,0696000	$ 121.900	5

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 0	$ 0	$ 121.900	$ 0	$ 121.900

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37309246
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-06-03

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	GUSTAVO LOSADA VASQUEZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12136195	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 3 N 19 40	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4111	CORREO ELECTRÓNICO	CONENERGIA_LTDA@YAHOO.COM	TELÉFONO	8716478
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SINARP	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 05	Año: 2026	Mes: 05	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		37309246

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-12136195	03	No	No	No	41	1	0	Salario	LOSADA VASQUEZ GUSTAVO	$1.750.905

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 12136195																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 12136195	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 12136195	SANITAS	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	0	$0	0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-12136195	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$280.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$280.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$218.900	$0	0	$0	0	$0	$218.900	0	$0	$0	$218.900	$0	0	$0	$0	$218.900	$0	$0	$218.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SINARP	0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$218.900
PENSIONES	1	$280.200
RIESGOS PROFESIONALES	0	$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$499.100

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37527082
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-06-02

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONENERGIA LTDA CONCRETOS Y ENERGIA LTDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	813000608	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 6 NO 7 28	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	CONENERGIA_LTDA@YAHOO.COM	TELÉFONO	8716478
FAX	317666999	SUCURSAL	47	NOMBRE SUCURSAL	CTO 171 ACUE FASE III PAICOL
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	19486513	PRIMER APELLIDO	GUTIERREZ	SEGUNDO APELLIDO	CUELLAR
PRIMER NOMBRE	NELSON	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 05	Año: 2026	Mes: 06	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
15		$19.481.971		37527082

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-74795514	01	No	No	No	41	1	5422001	Fijo	AMARO DIAZ CIRO	$1.750.905
CC-1004082182	01	No	No	No	41	518	5422001	Fijo	ANDRADE TRUJILLO YEISON CAMILO	$1.750.905
CC-1023895200	01	No	No	No	41	518	5422001	Fijo	CADENA AMADO JHON ALEXANDER	$1.750.905
CC-1004082156	01	No	No	No	41	518	5422001	Fijo	GARCIA BONILLA JESUS ARMANDO	$1.750.905
CC-7712432	01	No	No	No	41	1	5422001	Fijo	LARA ORTIZ JORGE LUIS	$2.000.000
CC-1004081993	01	No	No	No	41	518	5422001	Fijo	MENDEZ CUELLAR YORMAN ANDRES	$1.750.905
CC-1004082060	01	No	No	No	41	1	5422001	Fijo	OCHOA ERAZO ELIAN ALDAIR	$1.750.905
CC-1079509166	01	No	No	No	41	1	5422001	Fijo	ORTIZ SEMANATE JAVIER HERNAN	$1.750.905
CC-12205366	01	5	No	No	41	1	5422001	Fijo	PUENTES CACHAYA ALIPIO	$2.000.000
CC-4920069	01	No	No	No	41	518	5422001	Fijo	RAMOS CERQUERA ELIAS	$1.750.905
CC-7711561	01	No	No	No	41	1	5422001	Fijo	ROJAS CALDERON ALBERTO	$2.000.000
CC-83169973	01	No	No	No	41	1	5422001	Fijo	TOVAR PALOMO LUIS JAVIER	$1.750.905
CC-4920457	01	No	No	No	41	518	5422001	Fijo	TRUJILLO LONDOÑO GERLINSON	$1.750.905
CC-1004473374	01	No	No	No	41	1	5422001	Fijo	VELASCO TUMBO CRISTIAN RICARDO	$1.750.905
CC-1079508188	01	No	No	No	41	518	5422001	Fijo	ZUÑIGA PENAGOS JHON EDWIN	$1.750.905

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 74795514	X	2026-05-20																											0		
CC - 1004082182																													0		
CC - 1023895200	X	2026-05-20																											0		
CC - 1004082156																													0		
CC - 7712432																													0		
CC - 1004081993	X	2026-05-20																											0		
CC - 1004082060	X	2026-05-20																											0		
CC - 1079509166																													0		
CC - 12205366																													0		
CC - 4920069																													0		
CC - 7711561																													0		
CC - 83169973																													0		
CC - 4920457																													0		
CC - 1004473374	X	2026-05-25																											0		

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1079508188	X	2026-05-26	X	2026-05-26																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 74795514	PROTECCION	11	$641.999	0.1600000	$102.800	$0	$0	$102.800	$0	$0	$0
CC - 1004082182	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1023895200	COLPENSIONES	11	$641.999	0.1600000	$102.800	$0	$0	$102.800	$0	$0	$0
CC - 1004082156	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 7712432	PROTECCION	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 1004081993	PROTECCION	11	$641.999	0.1600000	$102.800	$0	$0	$102.800	$0	$0	$0
CC - 1004082060	PROTECCION	11	$641.999	0.1600000	$102.800	$0	$0	$102.800	$0	$0	$0
CC - 1079509166	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 12205366	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 4920069	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 7711561	PORVENIR	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0
CC - 83169973	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 4920457	COLFONDOS	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1004473374	COLPENSIONES	6	$350.181	0.1600000	$56.100	$0	$0	$56.100	$0	$0	$0
CC - 1079508188	PORVENIR	1	$58.364	0.1600000	$9.400	$0	$0	$9.400	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 74795514	MIN002 - ADRES	11	$641.999	0.0400000	$25.700	$0	0	$0	0	$0	11	$641.999	5422001	0.0696000	$44.700
CC - 1004082182	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	5422001	0.0696000	$121.900

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1023895200	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	11	$641.999	0.0400000	$25.700	$0	0	$0	0	$0	11	$641.999	542200 1	0.0696000	$44.700
CC - 1004082156	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	542200 1	0.0696000	$121.900
CC - 7712432	SANITAS	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	542200 1	0.0696000	$139.200
CC - 1004081993	NUEVA E.P.S. S.A.	11	$641.999	0.0400000	$25.700	$0	0	$0	0	$0	11	$641.999	542200 1	0.0696000	$44.700
CC - 1004082060	NUEVA E.P.S. S.A.	11	$641.999	0.0400000	$25.700	$0	0	$0	0	$0	11	$641.999	542200 1	0.0696000	$44.700
CC - 1079509166	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	542200 1	0.0696000	$121.900
CC - 12205366	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	542200 1	0.0696000	$139.200
CC - 4920069	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	542200 1	0.0696000	$121.900
CC - 7711561	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	542200 1	0.0696000	$139.200
CC - 83169973	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	542200 1	0.0696000	$121.900

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 4920457	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	542200 1	0.0696000	$121.900
CC - 1004473374	SANITAS	6	$350.181	0.0400000	$14.100	$0	0	$0	0	$0	6	$350.181	542200 1	0.0696000	$24.400
CC - 1079508188	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$58.364	0.0400000	$2.400	$0	0	$0	0	$0	1	$58.364	542200 1	0.0696000	$4.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-74795514	COMFAMILIAR DEL HUILA	11	$641.999	0.0400000	$25.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004082182	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1023895200	COMFAMILIAR DEL HUILA	11	$641.999	0.0400000	$25.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004082156	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7712432	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004081993	COMFAMILIAR DEL HUILA	11	$641.999	0.0400000	$25.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004082060	COMFAMILIAR DEL HUILA	11	$641.999	0.0400000	$25.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079509166	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12205366	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4920069	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7711561	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-83169973	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4920457	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004473374	COMFAMILIAR DEL HUILA	6	$350.181	0.0400000	$14.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079508188	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$58.364	0.0400000	$2.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	6	$1.188.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.188.800
PORVENIR	5	$1.170.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.170.000
COLFONDOS	1	$280.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$280.200
COLPENSIONES	2	$158.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$158.900
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	7	$354.000	$0	0	$0	0	$0	$354.000	0	$0	$0	$354.000	$0	0	$0	$0	$354.000	$0	$0	$354.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$25.700	$0	0	$0	0	$0	$25.700	0	$0	$0	$25.700	$0	0	$0	$0	$25.700	$0	$0	$25.700
MIN002 - ADRES	1	$25.700	$0	0	$0	0	$0	$25.700	0	$0	$0	$25.700	$0	0	$0	$0	$25.700	$0	$0	$25.700
SANITAS	6	$374.500	$0	0	$0	0	$0	$374.500	0	$0	$0	$374.500	$0	0	$0	$0	$374.500	$0	$0	$374.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	15	$1.356.300	0	$0	$0	$1.356.300	0	$0	$1.356.300	0	$0	$0	$1.356.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	15	$779.900	0	$0	$779.900
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$779.900
PENSIONES	4	$2.797.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.356.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$779.900
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$5.714.000

Conenergía Ltda.
Concretos y Energía Ltda.

ANEXO 2. ANALISIS TRABAJO SEGURO.

Dirección: Calle 6 No. 7 – 28 Centro
Teléfono: (8) 8 71 64 78 - Celular: 317 666 69 99
Ciudad: Neiva – Huila

Conenergia Ltda.	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Proceso: SGSST Cod.SST FR-048 Vigencia:01-02-2025 Version:03

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO (DD/MM/AAAA):			04 05 2026
LUGAR DE TRABAJO:	Patio Calle 2-43 Carrera 7 B/ los almendros		
HORA DE INICIO (a.m / p.m)	0700 AM	HORA DE FINALIZACIÓN (a.m / p.m)	05:00 PM
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:	Demolicion de concreto con Minicargador y Martillo neumatico - Recoleccion de escombros con minicargador y Volqueta - Excavacion manual y mecanica para Cambio de tuberia - Preparacion y fundicion con Concreto		

CERTIFICADOS ASOCIADOS:	Alturas	Espacios Confinados y excavaciones	Electrico	Consignacion
	☐	☐	☐	☐

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS TRABAJADORES (EJECUTOR)	CÉDULA	FIRMA
Elian Aldair Ochoa Erazo	1004082060	Elian Aldair O.
Yeison Camilo Andrade	1004082102	Camilo Andrade
Yurman Andres Mendoza	1004081993	
Civo Amaro Diaz	74795514	
Jhon Alexander Cadena	1023895200	Jhon Cadena
Gilberto Rojas	7711361	Gilberto R.
Alipio Puentes	12805366	
Jorge Luis Lora	77121152	
Gustavo Losada	12136195	Gustavo Losada
Javier Hernan Ortiz	1079509163	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR	
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Indique cada una de las herramientas a utilizar
Manuales	Pala - barra - Palustre - llana - martillo - mareta - Coqueta
Eléctricas	Pulidora - taladro
Neumáticas	martillo
Hidráulicas	
Mecánicas	Motoniveladora - Mini cargador - Canguro - Volqueta
Otras	

ANÁLISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	
¿Cuáles son los elementos de protección personal requeridos?	
¿Cuantos trabajadores se requieren?	
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (Chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles requeridos
Demolicion con Minicargador	Minicargador	atropellamientos Proyeccion de particulas Ruido vibraciones	uso de EPP - Señalizacion area pausas activas.
Cargue de volqueta	minicargador - volqueta	atropellamiento daño a equipos	Señalizacion.
Excavacion Mecanica	Pala excavadora	golpes aplastamientos Fracturas	Señalizacion. evitar Puntos Ciegos
Excavacion Manual	Excavación	Caidas a diferente nivel caida de objetos	uso de casco, No transitar cerca a la excavación

Formaleteo	Formaletas	Machucones- Cortaduras- laceraciones	uso de EPP
	Carga Pesada	Hernias lumbagos Espasmos	no levantar mas de Peso
Preparacion de/ concreto	Mezcladora	Equipo en movimiento - atrapamiento. Ruido - dolor de cabeza.	uso de EPP
	Cemento	Quemaduras - irritacion de la piel y vias Respiratorias	uso de Proteccion Respiratoria
	Carga Pesada	lumbago Espasmos	- uso de ayudas - No levantar + del peso permitido 25kg
Fundicion	Quimico	Quemaduras- Irritacion de S. respiratorio- Piel	uso de EPP
	Bulcay	levantamiento de Carga Pesada Espasmos.	no sobre pasar el peso permitido -
	Terreno Irregular	caidas. Esguinces - Fracturas	Concentrado en la actividad
	Piedra	machucones Fracturas	uso de EPP.
Orden y aseo	Quimico	Contaminacion del Suelo - Virus hongos	Uso EPP.
		bacterias	

EVALUACIÓN EL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta

☐ No, continue con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☐ Si, proceda con la tarea

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

Conenergia Ltda.
Concretos & Energía Ltda.

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Proceso: SGSST
Cod.SST-FR-048
Vigencia:01-02-2025
Version:03

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO (DD/MM/AAAA):			11 05 2026
LUGAR DE TRABAJO:	Carrera 7 b| Escalandros Paicol - Huila		
HORA DE INICIO (a.m / p.m)	07:00 am	HORA DE FINALIZACIÓN (a.m / p.m)	05:00 pm
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:	Demolición de Empedrado existente, con Minicargador y maillo Manual. Recoleccion de Escombros con Min. Cargador y Volqueta.		

CERTIFICADOS ASOCIADOS:	Alturas	Espacios Confinados y excavaciones	Electrico	Consignacion
	☐	☐	☐	☐

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS TRABAJADORES (EJECUTOR)	CÉDULA	FIRMA
Gustavo Cano	12.327693	Gustavo Cano
Jorge Laia	7.712.432	
Alipio Puentes	12.205.366	
Yeiner Cortez	1075 527671	Yeiner Cortez
Edwar Fernandez	1075 541804	
Jhon Fredy Cavera	1081155462	Jhon Fredy Cavera
Elias Ramos	4920069	
Javier Hernan Ortiz	1079 529166	Javier Hernan Ortiz Jaramillo
Aldair Ochoa	1004 082 182	Aldair

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Indique cada una de las herramientas a utilizar
Manuales	Barra - Pala - maceta - martillo -
Electricas	
Neumáticas	
Hidraulicas	martillo del Mini cargador.
Mecanicas	
Otros	Mecanicos - Bobcat (Mini cargador) martillo - volqueta

ANALISIS DE LA TAREA

¿Que tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	A nivel del piso.
¿Cual es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	N/A
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	N/A
¿Cuales son los elementos de proteccion personal requeridos?	N/A
¿Cuantos trabajadores se requieren?	N/A
¿Que materiales y recursos van a utilizarse?	Herramienta manual. Bobcat. Volqueta
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	Si por los escombros demolidos
¿Que otros peligros hay en el lugar de trabajo? (Chispas, electricidad, quimicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	terreno irregular.

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles requeridos
Demolición mecanica	BobCat.	atropellamientos - aplastamientos - fracturas	Señalizacion del Area
Seleccion de piedra	Piedras.	machucones - laceraciones - elevadas	Uso de guantes
Cargue de volqueta con Bobcat	bobcat - Volqueta	atropellamientos - dano a equipos	Señalizacion del area.

Formaleteo	Formaletes	machucones Cortaduras laceraciones Fractura	Uso de EPP Concentrado en la actividad
	Carga pesada	Hernia discales lumbagos Espasmos	Uso de ayudas - mini cargador bugos
Preparado de Concreto	Mezcladoras	Equipos en movimiento atrapamientos Fractura	Personal con experiencia Concentrado
		Ruido dolor de Cabeza Perdida progresiva de la audicion	Uso de Protectores auditivos
	Cemento	Quemaduras irritación dela Piel ojos Vias respiratorias	Uso de EPP
		Contaminacion al Suelo	Proteccion con plastico
		levantamiento de Cargas - lumbagos Espasmos Hernias	Uso de ayudas bugys mini Cargador
Fundicion	Quimico Cemento	Quemaduras Irritacion de Piel, ojos Vias respiratorias	Uso de EPP
		Contaminacion al Suelo	Proteccion al suelo con plastico
		Contaminacion con las bolsas	Recoleccion de Residuos Contaminados
	Buggys	levantamiento de Cargas Espasmos - lumbagos	Uso de ayudas - pausas activas
	Terreno irregular	Caidas - Esguinces	Concentrado en la actividad
	Piedra	Carga Pesada - lumbagos Espasmos	Uso de ayudas - buggys mini - Volqueta
		movimientos repetitivos	Pausas activas
Orden y Aseo	Quimico	Hongos - Virus Bacterias	Uso de EPP

EVALUACIÓN EL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si: detengase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta

☑ No: continue con la tarea con precaucion, implemente los controles establecidos

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si: proceda con la tarea

☐ No: consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS TRABAJADORES (EJECUTOR)	CÉDULA	FIRMA
Javier Hernan Ortiz	1079361160	
Cro Amino Dian	74795574	
Hernan Dario Quinto Beltran	1080760711	
ELIAN Aldair ochoa	1004082060	
Arnaldo Esquivel Malambo	1105054144	
Sebastian Andrade	1079599434	
Yurman Andres Mendez C.	1004061993	
Daniel Eduardo castillo Blanco	1081409321	Daniel.
Yeison Camilo Andrade Tejillo	1004082282	Camilo A.
Hamurus Ortiz	4420722	
Edwin Fernando Ochoa	1075541804	Edwin Fernando O

Nombre del Emisor	Cédula	Firma

Comenergía Ltda.	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Proceso: SGSST Cod.SST.FR.046 Vigencia:01-02-2025 Version:03

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO (DD/MM/AAAA):			12 / 05 / 2026	
LUGAR DE TRABAJO:	Carrera 7 - entre calle 243 B/ los Almendros Pamplona			
HORA DE INICIO (a.m / p.m)	0700am	HORA DE FINALIZACIÓN (a.m / p.m)	05 pm.	
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:				
Demolicion con minicargador - y martillo Neumatico - Excavacion mecanica y manual Preparacion y fundicion de Placa de Cemento ordon y aseo				

CERTIFICADOS ASOCIADOS:	Alturas	Espacios Confinados y excavaciones	Electrico	Consignación
	☐	☐	☐	☐

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS TRABAJADORES (EJECUTOR)	CÉDULA	FIRMA
ELIAN Aldair Ochoa ERAZO	1004082060	ELIAN Aldair
Yeison Camilo Andrade Tovilla	1004082162	Camilo Andrade
Yormen Andres Mendez Cuellar	1004081993	
Ciro Amaro Diaz	74795514	
Jhon Alexander Cadena Amado	1023895200	Jhon C
Alberto Rojas L.	7711561	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR	
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Indique cada una de las herramientas a utilizar
Manuales	
Electricas	
Neumáticas	
Hidráulicas	
Mecánicas	
Otras	

ANÁLISIS DE LA TAREA	
¿Cual fue sitio se encuentra el lugar de trabajo?	
¿Cual es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	
¿Cuales son los sistemas de prevención y protección requeridos?	
¿Cuales son los elementos de protección personal requeridos?	
¿Cuantos trabajadores se requieren?	
¿Que materiales y recursos van a utilizarse?	
¿Hay peligro de restalar o tropezar alrededor del area de trabajo?	
¿Que otros peligros hay en el lugar de trabajo? (Chispas, electricidad, quimicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles requeridos

Formaleteo	Formaletas.	Machucones. Cortaduras laceraciones Fracturas	uso de EPP (orientado en la actividad)
	Carga Pesadas.	hernias discales. lumbagos. Espasmos	uso de ayudas (buggy. mini. Cargador.
Preparación de Concreto	Mezcladora.	Equipo en movimiento. atrapamientos. Fracturas	Personal con experiencia. Capacitado
		Ruido dolor de cabeza. perdida de la audicion	uso de protección auditiva.
	Cemento	Quemaduras. irritación de ojos. piel vias respiratorias.	uso de EPP
	Carga Pesadas	lumbago. Espasmos.	uso de ayuda, no levanta mas del peso
			Permitido para una persona 12kg
Fundición	Quimico (cemento)	Quemaduras. irritación de la piel ojos Vias Respiratorias.	uso de EPP.
	Buques	levantamiento de cargas pesados. Espasmos. lumbagos	Pausas activas
	Terreno irregular.	Caidas. Esguinces. Fracturas	concentrado en la actividad
	Piedra.	machucones. Fractura	no saltar pasar los pasos Preventivos
		movimientos repetitivos. lumbagos Espasmos	Pausas activas
Orden y aseo	Quimico	contaminación del suelo	uso de protección al suelo
		Virus Bacterias hongos	uso de EPP.

EVALUACIÓN EL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- [ ] Sí, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta
- [x] No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- [x] Sí, proceda con la tarea
- [ ] No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS TRABAJADORES (EJECUTOR)	CÉDULA	FIRMA
Hermes Ortiz	4920302	
Elias Ramos C.	4920069	
Javier Ramon Ortiz	1017507161	
Cito Amado Diaz	74745514	
Yeison Camilo Andrade Trujillo	2004082187	Yeison Camilo Andrade
Alian Aldair Pacha Chaparro	1004092060	Alian Aldair Pacha
Sebastian Andrade	0755096824	Sebastian Andrade
Yeiman Andres Montes C.	1044061973	
Edwin Fernando Olaya	1075541804	Edwin Fernando

Nombre del Emisor	Cédula	Firma

Conenergía Ltda.	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Proceso: SGSST Cod.SST-FR-048 Vigencia:01-02-2025 Version:03

FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO (DD/MM/AAAA):			25 05 2026
LUGAR DE TRABAJO:	Paicol Huila Carrera 7 B/ los almendros		
HORA DE INICIO (a.m / p.m)	0700 am	HORA DE FINALIZACIÓN (a.m / p.m)	0500 pm
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA A REALIZAR:			

Fundicion - Formaleteo - preparacion de concreto para construccion de bordillos - Relleno y Compactacion de terreno Orden y aseo

CERTIFICADOS ASOCIADOS:	Alturas	Espacios Confinados y excavaciones	Electrico	Consignación
	☐	☐	☐	☐

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS TRABAJADORES (EJECUTOR)	CÉDULA	FIRMA
Eliaj Ramos	4920643	Eliaj Ramos
Gustavo Losada	12 136 195	Gustavo Losada
Edwar fernando Olaya	1075 581 804	Edwar fernando Olaya
Jhon Fredy C	1084 151 402	Jhon Fredy C
Javier Hernan Ortiz	1079 509 766	Javier Hernan Ortiz
Jorge Luis Zarta	7 712 432	Jorge Luis Zarta
Alirio Puentes C.	12 205 366	Alirio Puentes

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR	
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Indique cada una de las herramientas a utilizar
Manuales	Pala · Cava · Hoyy - Palutte - Nava · Pulidor.
Eléctricos	
Neumáticos	
Hidráulicos	
Mecánicos	Mezcladora · Batear
Otros	

ANÁLISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	N.A.
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	N.A
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N.A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	N.A
¿Cuáles son los elementos de protección personal requeridos?	CASCO - Guantes
¿Cuántos trabajadores se requieren?	6
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	arena Cemento
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (Chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Químico - Cemento

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y potenciales	Consecuencias	Controles requeridos
Formaleteo	Formaleta	machocones - Fracturas -	Concentado Ayuda de Compañeros EPP
		Carga Pesadas - Esfuerzos lumbares	mantenta mas del peso Permitido
Preparación del Concreto	Químico (contacto)	Quemaduras irritación de la Piel y vias respiratorias	Uso de epp

Conenergía Ltda.
Concretos y Energía Ltda.

ANEXO 3. INSPECCIÓN VOLQUETA.

Dirección: Calle 6 No. 7 – 28 Centro
Teléfono: (8) 8 71 64 78 - Celular: 317 666 69 99
Ciudad: Neiva – Huila

Conenergia Ltda.	**INSPECCIÓN A VOLQUETA**	Proceso: SGSST Cod.SST-FR-029 Vigencia:01-02-2025 Versión: 03

FECHA: 02-05-2026 MARCA INTER MODELO 1976 SERIE NN PLACA MBI 398

OPERADOR Jhon Fredy C. PROYECTO

ITEM	CONCEPTO	BUENO	MALO
LUCES	Luces Frontales (altas, medias y bajas)	✓	
	Traseras de trabajo (reflector)	✓	
	Direccionales delanteras de parqueo y giro	✓	
	Direccionales traseras de parqueo y giro	✓	
	De stop y señal trasera	✓	
	De techo	✓	
CABINA	Espejos laterales	✓	
	Espejo retrovisor	✓	
	Alarma de retroceso	✓	
	Pito	✓	
	Freno de servicio	✓	
	Freno de emergencia	✓	
	Direccion / suspension (terminales)	✓	
	Cinturón de seguridad	✓	
	Vidrio frontal	✓	
	Limpia brisas	✓	
	Extintor de incendios	✓	
	Botiquin	✓	
	Herramientas (destornillador de pala, destornillador estrella, llave expansiva, gato, llaves fijas, alicate, cruceta, etc)	✓	
	Conos reflectivos	✓	
	Silleteria y tapiceria	✓	
	Indicadores (hidráulico, voltimetro, aceite motor, refrigerante, horometro, aire)	✓	
	Bateria y cables	✓	
	Documentos de conductor y del vehiculo	✓	
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos, huellas en buen estado	✓	
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓	
	Control fugas de aire	✓	
	Grapas y anclaje de chasis	✓	
	Cadena del cardam	✓	
	Acoples rapidos	✓	
	Mangueras para suministrar aire	✓	
	Estado general del volco	✓	
	Soporte del volco (gato hidráulico)	✓	
	Motor	✓	
	Sistema de carpado	✓	
	Guarda polvos	✓	
	Ganchos compuerta del volco	✓	
	Soportes o bujes del volco	✓	
	Tanque de combustible (abrasaderas, soporte)	✓	

HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA/ACCIÓN PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Jhon Fredy C
FIRMA OPERADOR

FIRMA INSPECTOR

Conenergía Ltda.
Concretos y Energía Ltda.

ANEXO 4. INSPECCIÓN MINICARGADOR.

Dirección: Calle 6 No. 7 – 28 Centro
Teléfono: (8) 8 71 64 78 - Celular: 317 666 69 99
Ciudad: Neiva – Huila

Conenergía Ltda.	**INSPECCIÓN MINICARGADOR**	Proceso: SGSST
		Cod.SST-FR-030
		Vigencia:01-02-2025
		Version:02

FECHA: 12-05-2026 MARCA Bobcat MODELO 2015 SERIE 460 SE

OPERADOR Eduar Fernando Olaya PROYECTO Carrera 7 B/los almendros Parcel

ITEM	CONCEPTO	BUENO	MALO
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	✓	
	De trabajo traseras	✓	
	Direccionales delanteras	✓	
	Direccionales traseras	✓	
	De frenado	✓	
	De stop y señal trasera	✓	
	Batería y cables	✓	
CABINA	Protección antivuelco	✓	
	Pito	✓	
	Cinturón de seguridad	✓	
	Frenos de servicio	✓	
	Freno de parqueo	✓	
	Extintor de incendio 10 Kg	✓	
	Silla del operador	✓	
	Vidrio panorámico	N/A	N/A
	Indicadores (hidráulico, refrigerante, corriente, aceite motor, horómetro)	✓	
	Tubo de escape (exhosto)	✓	
	Alarma de retroceso	N/A	✓
	Espejos laterales	N/A	N/A
	Espejo central	✓	
	Escalera y apoyos de acceso	✓	
	Palancas y pedales en buen estado	✓	
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos, huellas en buen estado	✓	
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓	
	Estado de pasadores	✓	
	Mecanismo de giro	✓	
	Mandos de avance	✓	
	Mandos de levante del brazo	✓	
	Guardas	✓	
	Estado del bastidor	N/A	N/A

HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA/ACCIÓN PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Eduar f olaya
FIRMA OPERADOR

FIRMA INSPECTOR

Conenergía Ltda.
Concretos y Energía Ltda.

ANEXO 5. INSPECCIÓN HERRAMIENTAS DE MANO.

Dirección: Calle 6 No. 7 – 28 Centro
Teléfono: (8) 8 71 64 78 - Celular: 317 666 69 99
Ciudad: Neiva – Huila

Comenergia Ltda.

INSPECCION HERRAMIENTAS DE MANO

Proceso:	SGSST
Cod.	SST-FR-010
Vigencia:	01-02-2025
Version:	03

LUGAR: Parcel Via Comunero
INSPECTOR: Coorlinson Trujillo
RESPONSABLE: Gustavo Losada

FECHA: 09 05 2026
HORA: 07 00 am

CANT	HERRAMIENTA	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
10	Palas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Palustres	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	macetas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	machetes	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	buguys.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	llaves metalicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	martillos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
NOTA:															

OBSERVACIONES

INSPECTOR

Gustavo Losada
RESPONSABLE DEL ÁREA

Conenergía Ltda.
Concretos y Energía Ltda.

ANEXO 6. INSPECCIÓN COMPACTADOR APISONADOR MANUAL - CANGURO.

Dirección: Calle 6 No. 7 – 28 Centro
Teléfono: (8) 8 71 64 78 - Celular: 317 666 69 99
Ciudad: Neiva – Huila

Conenergia Ltda.	**INSPECCIÓN COMPACTADOR APISONADOR MANUAL CANGURO**	Proceso: SGSST Cod.SST-FR-036 Vigencia:01-02-2025 Version:02

OPERADOR: Jebastian Andrade AÑO: 23-05-2026

DATOS GENERALES

NUMERO	N.A	TRABAJO EJECUTADO:	Compactación de vía	
N° DE SERIE	N.A			
CAPACIDAD	N.A	MODELO	N.A	
MARCA	HIKUA	AÑO DE FAB	N.A	
INSPECTOR	Genisson Trujillo			

INSTRUCCIONES DE USO	MARQUE CON LOS SIGUIENTES TÉRMINOS	B.E	BUEN ESTADO	E.A	ESTADO ACEPTABLE	M.E.	MAL ESTADO

NOTA: CUANDO UN ELEMENTO DE ENGUSTRIA EN BUEN ESTADO SIGNIFICA QUE ES NUEVO O BIEN PRESENTA POCO TIEMPO DE USO Y HA SIDO CUIDADO CON AMPLITUD

AL ENCONTRAR UN ELEMENTO EN ESTADO ACEPTABLE SE CONSIDERA QUE ES UN ELEMENTO CON ALGUN TIEMPO DE SERVICIO SIN EMBARGO CUMPLE CON LAS

CONDICIONES REQUERIDAS PARA SEGUIR USANDOSE. UN ELEMENTO EN MAL ESTADO YA NO REUNE ESTAS CARACTERISTICAS POR LO QUE DEBE SER RETIRADO

DEL AREA DE TRABAJO PARA EVITAR QUE SE CONTINUE USANDO

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
		X									

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	APOYO VISUAL
DESCRIPCIÓN								
TANQUE DE COMBUSTIBLE	BE	BE	BE	BE	BE	BE		
PALANCA DE ACELADOR	BE	BE	BE	BE	BE	BE		
FILTRO DE COMBUSTIBLE	BE	BE	BE	BE	BE	BE		
FILTRO DEL AIRE DEL MOTOR	BE	BE	BE	BE	BE	BE		
FILTRO DE ACEITE	BE	BE	BE	BE	BE	BE		
VARILLA DE NIVEL DE ACEITE	BE	BE	BE	BE	BE	BE		
NIVEL DE ACEITE	BE	BE	BE	BE	BE	BE		
VALVULA DE DRENAJE	BE	BE	BE	BE	BE	BE		
ZAPATA	BE	BE	BE	BE	BE	BE		
SILENCIADOR	BE	BE	BE	BE	BE	BE		
PALANCA DE DESCOMPRENSIÓN	BE	BE	BE	BE	BE	BE		
MANILLAR	BE	BE	BE	BE	BE	BE		
MANILLA DE ARRANQUE POR RETROCESO	BE	BE	BE	BE	BE	BE		
NIVEL DE COMBUSTIBLE	BE	BE	BE	BE	BE	BE		
PIOLA	BE	BE	BE	BE	BE	BE		
FUGAS	BE	BE	BE	BE	BE	BE		
MOTOR	BE	BE	BE	BE	BE	BE		



OBSERVACIONES:

EPP	CASCO CON BARBIQUEJO: ✓	LENTES: ✓	PROTECCIÓN AUDITIVA: ✓	ZAPATO DE SEGURIDAD: ✓	GUANTES DE BADUETA: ✓

Conenergía Ltda.
Concretos y Energía Ltda.

ANEXO 7. INSPECCIÓN MEZCLADORA.

Dirección: Calle 6 No. 7 – 28 Centro
Teléfono: (8) 8 71 64 78 - Celular: 317 666 69 99
Ciudad: Neiva – Huila

Conenergia Ltda. Concretos y Energía Ltda.	FORMATO DE INSPECCIÓN DE MEZCLADORA	Proceso SGSST
		Cod SST-FR-063
		Vigencia 01-02-2025
		Versión:01

SEDE O PROYECTO: Paicol - Vía Caucheros FECHA 20-05-2026

MARCA: DISEL MODELO: N/A SERIE N/A

OPERADOR: Yeison Camilo Andrade Trujillo

Marque en las casillas con la letra según corresponda. C= cumple NC= no cumple N/A= no aplica

1. LLANTAS		DÍAS							OBSERVACIONES
1.1	Estado de las llantas	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.2	Estado de los ejes (sin torceduras)	C	C	C	C	C	C		
2. TROMPO		**DIAS**							
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
2.1	Estructura de soporte	C	C	C	C	C	C		
2.2	Balineras y bujes de rotación	C	C	C	C	C	C		
2.3	Mecanismo de giro para vaciado	C	C	C	C	C	C		
2.4	Palanca de giro para vaciado	C	C	C	C	C	C		
2.5	Seguro	C	C	C	C	C	C		
2.6	Corona de rotación	C	C	C	C	C	C		
2.7	Caneca de Mezclado	C	C	C	C	C	C		
3. ESTADO MECÁNICO		**DÍAS**							**OBSERVACIONES**
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
3.1	Patas de anclaje	C	C	C	C	C	C		
3.2	Motor	C	C	C	C	C	C		
3.3	Tubo de escape	C	C	C	C	C	C		
3.4.	Estado de pasadores (bastidor)	C	C	C	C	C	C		
3.5	Resguardo de correas de motor	C	C	C	C	C	C		
3.6	Resguardos mecanismos de giro de trompo	C	C	C	C	C	C		
3.7	Tapa del motor con seguro	C	C	C	C	C	C		
3.8	Clutch de giro del trompo	C	C	C	C	C	C		
3.9	Corona de arranque del motor	C	C	C	C	C	C		
3.10	Control de fugas de combustible	C	C	C	C	C	C		
3.11	Control de fugas hidráulicas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
3.12	Yoyo de encendido del motor	C	C	C	C	C	C		
3.13	Control de fugas de aceite	C	C	C	C	C	C		
3.14	Estado general de la maquina	C	C	C	C	C	C		

4. HALLAZGOS

HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA ACCIÓN PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Yeison Camilo Andrade I
FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

Conenergía Ltda.
Concretos y Energía Ltda.

ANEXO 8. INSPECCIÓN BOTIQUÍN Y CAMILLA.

Dirección: Calle 6 No. 7 – 28 Centro
Teléfono: (8) 8 71 64 78 - Celular: 317 666 69 99
Ciudad: Neiva – Huila

Conenergia Ltda. Concretos y Energía Ltda.	**INSPECCIÓN A BOTIQUÍN Y CAMILLA**	Proceso: SGSST Cod.SST-FR-035 Vigencia:01-02-2025 Versión: 03

FECHA: 19-05-2026

UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN: Parcel - Via Cementerio - Acopio Material

UBICACIÓN DE LA CAMILLA: Parcel - Via Cementerio Acopio Material

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Geovanson Trujillo CARGO: SISO

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESTADO			CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)
		C	NC	N/A		
1	Sobre de suero fisiológico 500 ml	✓			1	Agosto - 2027
2	Sobre de sales para rehidratación oral	✓			1	mayo - 2027
3	Bajalenguas	✓			10	Enero - 2030
4	Aplicadores	✓			10	mayo - 2028
5	Venda elastica 4" X 5 yardas	✓			1	Diciembre - 2029
6	Venda triangular 90 cm X 90 cm	✓			1	N/A
7	Venda de algodón laminado 4" X 5 yardas	✓			1	12 - 2029
8	Termometro de mercurio					
9	Bolsa de algodon 25 gr	✓			1	07 - 2027
10	Frasco de alcohol 120 ml	✓			1	01 - 2028
11	Frasco de isodine espuma 60 ml	✓			1	06 - 2027
12	Frasco de isodine solución 60 ml	✓			1	09 - 2027
13	Tijera	✓			1	
14	Tapabocas desechables	✓			1	
15	Pares de guantes desechables de latex talla M	✓			1	04 - 2027
16	Sobres de gasa precortada antiadherente estéril 5 un. /sobre 7,5 cm X 7,5 cm	✓			1	04 - 2028
17	Curas	✓			5	
18	Apósitos oculares	✓			1	
19	Esparadrapo color piel MICROPORE	✓			1	12 - 2029
20	Esparadrapo tipo tela 1" X 5 yardas	✓			1	
21	Linterna	NO				
22	Toalla Higiénica	✓			1	
23	Bateria o pilas.	NO				
24	Lapicero	NO				
25	Libreta de notas	NO				
26	Manual de primeros auxilios	✓			1	
27	Inmovilizador de cuello.	NO				
28	Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior.	NO				

INSPECCIÓN DE CAMILLA					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	C	NC	N/A	OBSERVACIONES
1	Estado.	NO			
1	Instalación (sitio de ubicación).	NO			
2	Señalización.	NO			
3	Estado del soporte.	NO			
4	Arnés tipo araña para camilla.	NO			

Conenergía Ltda.
Concretos y Energía Ltda.

ANEXO 9. REGISTRO ASISTENCIA CHARLAS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE.

Dirección: Calle 6 No. 7 – 28 Centro
Teléfono: (8) 8 71 64 78 - Celular: 317 666 69 99
Ciudad: Neiva – Huila

Conenergía Ltda. Concretos y Energía Ltda.	**REGISTRO DE ASISTENCIA**	Proceso: SGSST Cod.SST-FR-005 Vigencia:01-02-2025 Version : 03

FECHA: 01 | 05 | 2026

TEMA: Dia del Trabajo

LUGAR: Parcel Carrera 7. HORA INICIO: 0700 am HORA FIN: 0730 am

INSTRUCTOR: Coordinador Trujillo EMPRESA: Conenergia Ltda

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Yo. San Camilo Arboleda T.	1004082182	Obrero	Camilo Arboleda
2	Javier Heiman Ortiz S.	1019509166	Obrero	
3	Elias Ramos C.	9720067	Inspector.	Elias Ramos
4	Jesus Garcia Bonilla	1004082156	Obrero	
5	Jhan Freddy C.	1094155462	Operador	Jhan Freddy
6	Jorge Luis Lava	7712437	OF	
7	Gustavo Losada	12136195	Maestro	Gustavo Losada
8	Alipio Puentes	PE205366	Oficial	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

OBSERVACIONES

Conenergia Ltda.	REGISTRO DE ASISTENCIA	Proceso: SGSST Cod.SST-FR-005 Vigencia:01-02-2025 Version : 03

FECHA: 04 | 05 | 2026

TEMA: Seguridad Vial: limites de velocidad

LUGAR: Patio Camera 7 — HORA INICIO: 0700 am — HORA FIN: 0730 am

INSTRUCTOR: Gerlinson Trujillo — EMPRESA: Conenergia Ltda

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	ELIAN Aldair Ochoa Ez	1004087060	obrero	Aldair Ochoa
2	Yeison Camilo Andrade Trujillo	1004082182	obrero	Camilo Andrade
3	Yorman Andres Mendez C.	1004081773	obrero	
4	Ciro Amaro Diaz	74795514	obrero	
5	Jhon Alexander Cadena A.	1023895200	Obrero	Jhon
6	Alberto Reyes C.	7711561	Oficial	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

OBSERVACIONES

Conenergia Ltda. Conectos y Energía Ltda	**REGISTRO DE ASISTENCIA**	Proceso: SGSST Cod.SST-FR-005 Vigencia:01-02-2025 Version : 03

FECHA: 05 | 05 | 2026

TEMA: Dia mundial de la higiene de manos

LUGAR: Patio Carrer 7- HORA INICIO: 0700 am HORA FIN: 0900 pm

INSTRUCTOR: Deivison Trujillo Ladino EMPRESA: Conenergia Ltda

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Javier Hernan Ortiz S	1074509161	Obrero	
2	Jorge Luis Jara	7712432	Of	
3	Edwar Fernando Ortiz	1015491804	Operador	
4	Mario Puentes	12203366	Of.	
5	Alberto Reyes	7211561	Oficial	Alberto Reyes
6	Jhon Fredy C	1031151462	conductor	Jhon Fredy C
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

OBSERVACIONES

Comenergia Ltda. Comercio y Energía Ltda.	**REGISTRO DE ASISTENCIA**	Proceso: SGSST Cod.SST-FR-005 Vigencia:01-02-2025 Version : 03

FECHA 06 | 05 | 2026

TEMA Caidas a distinto Nivel

LUGAR Calle Carrera 7 — HORA INICIO 07:00 am — HORA FIN 07:30 am

INSTRUCTOR Yeison Tryllo Cardeño — EMPRESA Comenergia Ltda

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Sebastian Andrade	1077[illegible]38	Auxiliar	Sebastian A.
2	Alirio Fuentes	V7205366	Oficial	
3	Jorge Luis Lara	7717432	oficial	
4	Ciro Amaro Diaz	74745514	Ayudante	
5	Edwin Fernando Olaya	1075541824	Operador	
6	Javier Mauricio Ortiz	1019507166	ayudante	
7	Yormar Andres Trujillo C.	1004081778	ayudante	
8	Yeison Camilo Andrade Trujillo	1004042983	ayudante	Yeison Camilo
9	Jhon Freddy C.	1082153466	operador	Jhon Freddy
10	Alberto Reyes C.	7211561	oficial	Alberto
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

OBSERVACIONES

Conenergia Ltda. Concretos y Energía Ltda.	**REGISTRO DE ASISTENCIA**	Proceso: SGSST Cod.SST-FR-005 Vigencia:01-02-2025 Version : 03

FECHA 07 | 05 | 2026

TEMA Riesgo ergonomico

LUGAR Rural Carrera 7 — HORA INICIO 08:00 am — HORA FIN 01:10 pm

INSTRUCTOR Gustavo Trujillo Barbosa — EMPRESA Conenergia Ltda

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Sebastian Andrade	1079507894	Aux. operativo	
2	ELIAN Aldair ochoa	1004082069	obrero	
3	Ciro Amaro Diaz	74795574	Ayudante	
4	Yeison Camilo Andrade T.	1004082382	Ayudante	
5	Yarman Andres Montes C.	1004086873	Ayudante	
6	Alipio Rentes	12 205 360	Oficial	
7	Edwin Fernando olaya	1075541804	Operador	
8	Jovic Hanan Ortiz Semanate	1079509162	Ayudante	
9	Jorge luis lora	7721 932	Oficial	
10	Jhon Fredy c	1091155462	operador	
11	Alberto R e	7721561	oficial	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

OBSERVACIONES

Comenergía Ltda. Comercios y Energía Ltda.	**REGISTRO DE ASISTENCIA**	Proceso: SGSST Cod.SST-FR-005 Vigencia:01-02-2025 Version : 03

FECHA 08/05/2026

TEMA Riesgo Mecanico

LUGAR Pared Carrera 7 HORA INICIO 0800 am HORA FIN 1100 pm

INSTRUCTOR Deiman Trujillo Londoño EMPRESA Comenergia Ltda

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Jhon Heiman Ortiz	1078361166	ayudante	
2	Hernan Dario Quiroga Beltran	1088026711	ayudant	
3	Yerman Andres Mendez C.	1088018773	Ayudante	
4	Giro Amaro Diaz	74795914	Ayudante	
5	Sebastian Avila de	1077507434	Ayudante	
6	Leonel Eduardo CB	1081409638	Ayudante	
7	Oculdo Esquivel Malambo	1105056144	Ayudante	
8	ELIAN ALDANA	1007097	AYUdante	
9	Hernan ortiz	4470702	oficial	
10	Yo Soy Camilo Andrade T.	1088028206	Ayudante	Camilo
11	Jorge Luis Lora	7712437	Oficial	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

OBSERVACIONES

Conenergia Ltda.
Concretos y Energía Ltda.

REGISTRO DE ASISTENCIA

Proceso:	SGSST
Cod.	SST-FR-005
Vigencia:	01-02-2025
Version :	03

FECHA: 09 | 05 | 2026

TEMA: Manejo de la ansiedad

LUGAR: Papel Carrera 7 — HORA INICIO: 0800 am — HORA FIN: 1700 pm

INSTRUCTOR: Cristian Angulo Tandoro — EMPRESA: Conenergia Ltda

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Javier Hernan Ortiz	1075281116	ayudante	
2	Hernan Dario Quiroga Beltran	1080266711	ayudant	
3	Yerman Andres Mantel C.	1006[illegible]773	Ayudante	
4	Giro Amaro Diaz	74795514	Ayudante	
5	Sebastian Avilade	1079[illegible]34	Ayudante	
6	Daniel Eduardo C[illegible]	1081[illegible]63	Ayudante	
7	Onaldo Esquivel Malambo	1105054144	Ayudante	
8	ELIAN ALDANA	1007097	AYUDANTE	
9	Hernan ortiz	4[illegible]7	oficial	
10	Yo San Camilo Arbaeti	1[illegible]	Ayudante	
11	Jorge luis Jara	7[illegible]7	Oficial	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

OBSERVACIONES

Conenergia Ltda.
Concretos y Energía Ltda.

REGISTRO DE ASISTENCIA

Proceso: SGSST
Cod.SST-FR-005
Vigencia:01-02-2025
Version : 03

FECHA: 09 | 05 | 2026
TEMA: Manejo de la ansiedad
LUGAR: Barrio Cañera 7
HORA INICIO: 0800 am
HORA FIN: 1100 pm
INSTRUCTOR: Deivison Ingrito Tombaro
EMPRESA: Conenergia Ltda

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Javier Hernan Ortiz	1079501166	ayudante	
2	Hernan Dario Quintero Beltran	1088026071	ayudant	
3	Yerman Andres Montes C.	1006[illegible]773	Ayudante	
4	Siro Amaro Ibañez	74745514	Ayudante	
5	Sebastian Andrade	1077[illegible]34	Ayudante	
6	Daniel Eduardo CB	1081409038	Ayudante	
7	Oualdo Esquivel Malambo	1105054144	Ayudante	
8	ELIAN ALZOLA	1006[illegible]97	AYUdante	
9	Hernan ortiz	4470702	oficial	
10	Yo San Camilo Andrade T.	1006[illegible]204	Ayudante	
11	Jorge luis Jaya	7722437	Oficial	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

OBSERVACIONES

Conenergia Ltda. Concretos y Energía Ltda.	**REGISTRO DE ASISTENCIA**	Proceso: SGSST Cod.SST-FR-005 Vigencia:01-02-2025 Version : 03

FECHA 17 05 2026

TEMA Trabajo en alturas: Inspección de Equipos.

LUGAR Parcel Carrera 7a — HORA INICIO 0700 — HORA FIN 0730 am

INSTRUCTOR Gerhinson Trujillo Londoño — EMPRESA Conenergia Ltda

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Javier Hernan Ortiz	1079509161	ayudante	
2	Ciro Amaro Dion	74795514	Ayudante	
3	Hernan Dario Segundo Beltran	1080260711	Ayudante	
4	ELIAN Aldair ochoa	1004028265	obrero	Aldair
5	Oraldo esquivel malambo	1105054144	Ayudante	
6	Sebastian Andrade	1079509835	Ayudante	
7	Yorman Andres Montes C.	1004081773	Ayudante	
8	Daniel eduardo castillo B	1081409034	Ayudante	Daniel Eduardo
9	Yason Camilo Andrade T.	1004082102	Ayudante	Camilo A.
10	Hernan ortiz	4970702	oficial	
11	Edwar Fernando Olaya	1075541864	Operador	Edwar F. O.
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

OBSERVACIONES

Conenergia Ltda. Concretos y Energía Ltda.	**REGISTRO DE ASISTENCIA**	Proceso: SGSST Cod.SST-FR-005 Vigencia:01-02-2025 Version : 03

FECHA 12 05 2026

TEMA Orden y Aseo

LUGAR Pared Camera 7 — HORA INICIO 0700 — HORA FIN 0730 am

INSTRUCTOR Gerhason Trujillo londoño — EMPRESA Conenergia Ltda

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Javier Hernan Ortiz	10795911[illegible]	ayudante	
2	Ciro Amaro Dias	74795514	Ayudante	
3	Hernan Dario Quiyindo Deltran	1082260711	Ayudante	
4	ELIAN Aldair ochoa	1090408265	obrero	Aldair
5	Oraldo esquivel malambo	1105054144	Ayudante	
6	Sebastian Arteaga	1079509835	Ayudante	
7	Yorman Andres Montiel C.	1004081793	Ayudante	
8	daniel eduardo castillo B	1081409034	Ayudante	daniel eduardo
9	Yeison Camilo Andrade T.	2004082102	Ayudante	Camilo A.
10	Hernan ortiz	4970702	oficial	
11	Edwar Fernando Olaya	1075541864	Operador	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

OBSERVACIONES

Comenergía Ltda. Concretos y Energía Ltda.	**REGISTRO DE ASISTENCIA**	Proceso: SGSST Cod.SST-FR-005 Vigencia:01-02-2025 Version : 03

FECHA 13 05 2026

TEMA Prevencion de Consumo de Sustancias Psicoactivas

LUGAR Patio Carrera 7 HORA INICIO 07:00 am HORA FIN 07:15 am

INSTRUCTOR Cristian Ingrid Londoño EMPRESA Comenergia Ltda

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1		4920302	oficial	
2	Gloria Ramos.	4920069	inspector	
3	Javier Leonardo Ortiz	1019509166	ayudante	
4	Ciro Amaro Diaz	74/795574	Ayudante	
5	Yeison Camilo Andrade Tarazillo	1004082182	Ayudante	Yeison Camilo
6	ELIAN Aldair Ochoa Ez	1004087060	obrero	Aldair
7	Sebastian Andrade.	1017599830	Ayudante	Sebastian
8	Yorman Andres Montes C.	1004081943	Ayudante	
9	Edwin Fernando O.	1075541804	operador	Edwin Fernando
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

OBSERVACIONES

Conenergia Ltda. Concretos y Energía Ltda.	**REGISTRO DE ASISTENCIA**	Proceso: SGSST Cod.SST-FR-005 Vigencia:01-02-2025 Version : 03

FECHA 14 01 2026

TEMA Deforestación

LUGAR Parcel Canera 7 HORA INICIO 07:00 am HORA FIN 07:15 am

INSTRUCTOR Cordinador Trujillo Lachara EMPRESA Conenergia Ltda

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1		4920302	oficial	
2	Gloria Ramos.	4920069	Inspector	
3	Javier Hernan Ortiz	1077509111	ayudante	
4	Ciro Amaro Diaz	74/75554	Ayudante	
5	Yeison Camilo Andrade Trujillo	1004082102	Ayudante	Yeison Camilo
6	ELIAN Aldair ochoa ez	1004087060	obrero	
7	Sebastian Andrade.	1077599830	Auxiliar ofa.	
8	Norman Andres Montes C.	1004081993	Ayudante	
9	Edwar Fernando O	1075541804	operador	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

OBSERVACIONES

Comenergia Ltda. Concretos y Energía Ltda.	**REGISTRO DE ASISTENCIA**	Proceso: SGSST Cod.SST-FR-005 Vigencia:01-02-2025 Version : 03

FECHA: 16 05 2026

TEMA: Manejo de Residuos y Codigo de colores

LUGAR: Planta Canera 7 — HORA INICIO: 0700 am — HORA FIN: 0730 am

INSTRUCTOR: Yerlinson Trujillo londoño — EMPRESA: Comenergia Ltda

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Sebastian Andrade	1079[illegible]38	Auxiliar	Sebastian A
2	Alirio Fuentes	77205366	Oficial	
3	Jorge Luis Lara	7717437	oficial	
4	Ciro Amaro Diaz	74795514	Ayudante	
5	Edwar Fernando Olaya	1075541804	Operador	
6	Javier Steven Oliva	1079507166	ayudante	
7	Yairman Andres Montes C.	1004081478	Ayudante	
8	Yesin Camilo Andrade Trujillo	1010402347	ayudante	Yesin Camilo
9	Jhon Freddy C	1081133466	operador	Jhon Freddy
10	Alberto Angel C.	7211561	Oficial	Alberto
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

OBSERVACIONES

Comenergia Ltda. Concretos y Energía Ltda.	**REGISTRO DE ASISTENCIA**	Proceso: SGSST Cod.SST-FR-005 Vigencia:01-02-2025 Version : 03

FECHA 13 05 2026

TEMA Dia mundial del Reciclaje

LUGAR Zona Cantera 7 — HORA INICIO 07:00 am — HORA FIN 07:30 am

INSTRUCTOR Jerlinson Tejillo londoño — EMPRESA Comenergia Ltda

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Sebastian Andrade	1079[illegible]	Auxiliar	
2	Alirio Fuentes	77205366	Oficial	
3	Jorge Luis Lara	7712432	oficial	
4	Ciro Amaro Diaz	74795514	Ayudante	
5	Edwar Fernando Olaya	1075541804	Operador	
6	Javier Mauricio Ortiz	1079507166	ayudante	
7	Yairman Andres Trujillo C.	1004081788	ayudante	
8	Yeison Camilo Andrade Tejillo	1004092387	ayudante	Yeison Camilo
9	Jhan Fredy C	1081135468	operador	Jhan Fredy
10	Alberto Rojas C.	7711561	Oficial	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

OBSERVACIONES

Conenergia Ltda. Concretos y Energía Ltda.	**REGISTRO DE ASISTENCIA**	Proceso: SGSST Cod.SST-FR-005 Vigencia:01-02-2025 Version : 03

FECHA: 19 | 05 | 2026

TEMA: Contaminación del Suelo

LUGAR: Real Carrera 7 — HORA INICIO: 0700 am — HORA FIN: 07:30 am

INSTRUCTOR: Dechinson Trujillo Londoño — EMPRESA: Conenergia Ltda

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Sebastian Andrade	1079[illegible]	Saber	Sebastian A.
2	Alirio Fuentes	77205360	Oficial	
3	Jorge Luis Lara	7717432	oficial	
4	Ciro Amaro Díaz	74745514	Ayudante	
5	Edwar Fernando Olaya	1075541804	Operador	
6	Javier Hernan Ortiz	1079507166	ayudante	
7	Yairman Andres Montes C.	1004081478	ayudante	
8	Yeison Camilo Andrade Trujillo	1010002387	ayudante	Yeison Camilo
9	Jhon Fredy C.	1081133461	operador	Jhon Fredy
10	Alberto Rojas C.	7211561	Oficial	Alberto
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

OBSERVACIONES

Conenergia Ltda.	REGISTRO DE ASISTENCIA	Proceso: SGSST Cod.SST-FR-005 Vigencia:01-02-2025 Version : 03

FECHA 20 05 2025

TEMA Dia Mundial de las Abejas.

LUGAR Pozo Carrera 7 HORA INICIO 09:00 am HORA FIN 01:10 pm

INSTRUCTOR Cristian Trujillo Londoño EMPRESA Conenergia Ltda

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Sebastian Andrade	1079507[illegible]	Aux. operativo	Sebastian
2	ELIAN Aldair Ochoa	1004087206	obrero	
3	Ciro Amaro Diaz	74795574	Ayudante	
4	Yeison Camilo Andrade T.	1004092782	Ayudante	Yeison Camilo A.
5	Yurman Andres Montes	1004088183	Ayudante	
6	Alipio Rentes	12 205 360	Oficial	
7	Edwin Fernando Olaya	1075541804	Operador	Edwin Fernando Olaya
8	Jovir Hernan Ortiz Semanate	1079509160	Ayudante	
9	Jorge luis lora	7721 932	Oficial	
10	Jhan Fredy C	1091155161	operador	Jhan Fredy
11	Filberto R e	7711561	oficial	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

OBSERVACIONES

Comenergia Ltda.	REGISTRO DE ASISTENCIA	Proceso: SGSST
		Cod.SST-FR-005
		Vigencia:01-02-2025
		Version : 03

FECHA 21 | 05 | 2026

TEMA Estilos de vida Saludable.

LUGAR Parcol Carrera 7 HORA INICIO 8:00 am HORA FIN 01 10 am

INSTRUCTOR Carlos Trujillo Londoño EMPRESA Comenergia Ltda

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Sebastian Andrade	1079507854	Aux. operacional	Sebastian
2	ELIAN Aldair Ochoa	1004032046	obrero	
3	Ciro Amaro Díaz	74795574	Ayudante	
4	YeSon Camilo Andrade T.	1004098282	Ayudante	YeSon Camilo A.
5	Yerman Andres Montes C	1004046783	Ayudante	
6	Alipio Rentes	12205360	Oficial	
7	Edwin Fernando Olaya	1075541804	Operador	Edwin Fernando Olaya
8	Jose Hernan Ortiz Seminario	1049509160	Ayudante	
9	Jorge luis lora	7721932	Oficial	
10	Jhan Freddy C	1091155161	operador	Jhan Freddy
11	Filberto R e	7211561	oficial	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

OBSERVACIONES

Conenergia Ltda. Concretos y Energía Ltda.	**REGISTRO DE ASISTENCIA**	Proceso: SGSST Cod.SST-FR-005 Vigencia:01-02-2025 Version : 03

FECHA 22 | 05 | 2026

TEMA Dia Mundial de la diversidad Biologico

LUGAR Caseta 7 Pad H. HORA INICIO 7:00 am HORA FIN 1900 PM

INSTRUCTOR Carlos Trujillo Bolaño EMPRESA Conenergia Ltda

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Yeison Camilo Andrade T.	1004081282	Empleado	Yeison Camilo
2	Jorge Luis Lara	7712432	OFICIAL	
3	Javier Henao Ortiz	1079507161	ayudante	
4	Alvaro Puentes	1122053600	Oficial	
5	Hernan ortiz	84202302	OFICIAL	
6	Ciro Amaro Diaz	74745514	Ayudante	
7	Edwar Fernandez olaya	1075541804	Operador	
8	Yovman Andres Montero C.	1004085973	Vigilante	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

OBSERVACIONES

Comenergia Ltda. Comercio y Energía Ltda.	**REGISTRO DE ASISTENCIA**	Proceso: SGSST Cod.SST-FR-005 Vigencia:01-02-2025 Version : 03

FECHA 23 | 05 | 2026

TEMA Riesgo Publico Extorsion

LUGAR Carrera 7 Paicol HORA INICIO 08:00 am HORA FIN 01:10 pm

INSTRUCTOR Cristian Trujillo Londoño EMPRESA Comenergia Ltda

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Sebastian Andrade	1079507895	Aux. operativo	Sebastian
2	ELIAN Aldair Ochoa	1004032046	obrero	
3	Ciro Amaro Diaz	7479574	Ayudante	
4	Yeison Camilo Andrade T.	1001092282	Ayudante	Yeison Camilo A.
5	Yerman Andres Montes C	1004088783	Ayudante	
6	Alipio Rentes	12205360	Oficial	
7	Edwin Fernando olaya	1075541804	Operador	Edwin Fernando Olaya
8	Jovic Hernan Ortiz Semanate	1079509160	Ayudante	
9	Jorge luis lora	7721932	Oficial	
10	Jhon Fredy C	1091551416	operador	Jhon Fredy
11	Alberto R e	7211561	oficial	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

OBSERVACIONES

Conenergía Ltda. Concretos y Energía Ltda.	**REGISTRO DE ASISTENCIA**	Proceso: SGSST Cod.SST-FR-005 Vigencia:01-02-2025 Version : 03

FECHA 25 / 05 / 2026

TEMA Riesgo Electrico: Conexiones de Equipos, Cables.

LUGAR Carrera 7 Patical — HORA INICIO 0700 am — HORA FIN 07:15 am

INSTRUCTOR Cristian Trujillo Lozano — EMPRESA Conenergia Ltda

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	[illegible]	4920302	oficial	[signature]
2	Gloria Ramos.	4920069	inspector	[signature]
3	Jairo Neiman Ortiz	1079509166	ayudante	[signature]
4	Ciro Amaro Díaz	74179559	Ayudante	[signature]
5	Yeison Camilo Andrade Trujillo	1004082182	Ayudante	Yeison Camilo
6	ELTAN Aldair ochoa ez	1004087060	obrero	ALdair
7	Sebastian Andrade.	1047599830	Aux. ofa.	[signature]
8	Norman Andres Montes C.	1004081993	Ayudante	[signature]
9	Edwar Fernando O	1075541804	Operador	[signature]
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

OBSERVACIONES

Conenergia Ltda.
Conectados y Energía Ltda

REGISTRO DE ASISTENCIA

Proceso: SGSST
Cod.SST-FR-005
Vigencia:01-02-2025
Version : 03

FECHA: 26 | 05 | 2026.
TEMA: Riesgo Cardiovascular
LUGAR: Carrera 7 Parcial
INSTRUCTOR: Gerhman Trujillo londoño
HORA INICIO: 0700
HORA FIN: 0730 am
EMPRESA: Conenergia Ltda

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Javier Hernan Ortiz	1079509111	ayudante	
2	Ciro Amaro Diaz	74795514	Ajudante	
3	Hernan Dario Quevado Beltran	1080260711	Ayudante	
4	ELIAN Aldair ochoa	1090408276	obrero	Aldair
5	Oraldo esquivel maicambo	1105054444	Ayudante	
6	Sebastian Andrade	1079509838	Aux.	Sebastian
7	Yorman Andres Montes C.	1004081773	Ayudante	
8	daniel eduardo castillo B	1081409034	Ayudante	daniel eduardo
9	Yeison Camilo Andrade T.	1000408102	Ayudante	Camilo A.
10	Hernan ortiz	4970302	oficial	
11	Edwar fernando olaya	1075541864	Operador	Edwar F. O.
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

OBSERVACIONES

Comenergia Ltda. Concretos y Energía Ltda.	**REGISTRO DE ASISTENCIA**	Proceso: SGSST Cod.SST-FR-005 Vigencia:01-02-2025 Version : 03

FECHA 27 | 05 | 2026

TEMA Uso y ahorro racional de la energia

LUGAR Patol. Carrera 7 HORA INICIO 0900 am HORA FIN 1700 pm

INSTRUCTOR Deivinson Trujillo Londoño EMPRESA Comenergia LTda

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Jaime Hernan Ortiz	1078[illegible]16	ayudante	
2	Hernan Dario Quintero Beltran	1088026071	ayudant	
3	Yerman Andres Mendez C.	1006[illegible]773	Ayudante	
4	Giro Amaro Diaz	74795514	Ayudante	
5	Sebastian Arcade	1077[illegible]834	Ayudante	
6	Daniel Eduardo Cm	1081409038	Ayudante	
7	Oualdo Esquivel Malambo	1105056144	Ayudante	
8	ELIAN ACOSTA	1006[illegible]92	AYUdante	
9	Hernan ortiz	4970202	oficial	
10	Yo Son Camilo Andrade T.	1006[illegible]206	Ayudante	
11	Jorge luis Jaraa	77124[illegible]87	Oficial	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

OBSERVACIONES

Conenergia Ltda.
Conectados a Energía Ltda.

REGISTRO DE ASISTENCIA

Proceso: SGSST
Cod.SST-FR-005
Vigencia:01-02-2025
Version : 03

FECHA: 28 | 05 | 2026
TEMA: Enfermedades endemicas.
LUGAR: Carrera 7° Parcela H. HORA INICIO: 8:00 am HORA FIN: 12:00 pm
INSTRUCTOR: Andrea Tejillo Barrero EMPRESA: Conenergia Ltda

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Yeison Camilo Andrade L.	1004082387	Empleado	Yeison Camilo
2	Jorge Luis Lara	7712432	oficial	
3	Jaime Herman Ortiz	1039507161	auxiliar	
4		1122053[illegible]		
5	Hernan ortiz	4420302	Oficial	
6	Ciro Amaro Diaz	74745514	Ayudante	
7	Edwar Fernando Olaya	1075511804	Operador	
8	Yerman Andres Montes C.	1004081773	Ayudante	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

OBSERVACIONES

Conenergia Ltda. Concretos y Energía Ltda.	**REGISTRO DE ASISTENCIA**	Proceso: SGSST Cod.SST-FR-005 Vigencia:01-02-2025 Version : 03

FECHA: 29 | 05 | 2026

TEMA: Reporte de Casi accidentes / accidentes

LUGAR: Tunal Carrera 7. HORA INICIO: 0700 am HORA FIN: 500 pm

INSTRUCTOR: Cristian Trujillo EMPRESA: Conenergia LTDA.

ITEM	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Alipio Bentes	14205340	Oficial	
2	Yeison Camilo Andrade Tarsillo	1004082322	Obrero	Camilo Andrade
3	Jesus Armando Garcia	1004082156	Obrero	
4	Elias Ramos e.	4920069	Inspector	
5	Jorge Luis Tavera	7712432	Of.	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

OBSERVACIONES

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37540932
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-06-09

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	INCIEM INGENIERIA CIVIL Y MECANICA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901044157	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 18 N 33A 63	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	INCIEMSAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3108697194
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1035436676	PRIMER APELLIDO	RENDONDO	SEGUNDO APELLIDO	RAMIREZ
PRIMER NOMBRE	ALEXANDRA	SEGUNDO NOMBRE	MARCELA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 05	Año: 2026	Mes: 06	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		$8,750,000		37540932

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1035436676	01	No	No	No	41	1	1701001	Fijo	ARREDONDO RAMIREZ ALEXANDRA MARCELA	$3,500,000
CC-79778045	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	GOMEZ ZAMBRANO SERGIO ERNESTO	$3,250,000
CC-7690641	01	No	No	No	41	1	1711001	Fijo	TORRES CUELLAR LUIS ALBERTO	$2,000,000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1035436676																													0		
CC - 79778045																													0		
CC - 7690641																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1035436676	COLPENSIONES	30	$3,500,000	0.1600000	$560,000	$0	$0	$560,000	$0	$0	$0
CC - 79778045	COLPENSIONES	30	$3,250,000	0.1600000	$520,000	$0	$0	$520,000	$0	$0	$0
CC - 7690641	PROTECCION	30	$2,000,000	0.1600000	$320,000	$0	$0	$320,000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1035436676	SANITAS	30	$3,500,000	0.0400000	$140,000	$0	0	$0	0	$0	30	$3,500,000	1	0.0052200	$18,300
CC - 79778045	SANITAS	30	$3,250,000	0.0400000	$130,000	$0	0	$0	0	$0	30	$3,250,000	1	0.0052200	$17,000
CC - 7690641	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2,000,000	0.0400000	$80,000	$0	0	$0	0	$0	30	$2,000,000	1	0.0052200	$10,500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1035436676	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$3,500,000	0.0400000	$140,000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-79778045	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$3,250,000	0.0400000	$130,000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7690641	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2,000,000	0.0400000	$80,000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	2	$1,080,000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1,080,000
PROTECCION	1	$320,000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$320,000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	2	$270,000	$0	0	$0	0	$0	$270,000	0	$0	$0	$270,000	$0	0	$0	$0	$270,000	$0	$0	$270,000
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$80,000	$0	0	$0	0	$0	$80,000	0	$0	$0	$80,000	$0	0	$0	$0	$80,000	$0	$0	$80,000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	3	$45,800	0	$0	$0	$45,800	0	$0	$45,800	0	$0	$0	$45,800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$350,000	0	$0	$350,000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$350,000
PENSIONES	2	$1,400,000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$45,800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$350,000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2,145,800

MIERCOLES 29-04-26 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SISO, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES. OPERATIVOS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

SE CONTINUA LA DEMOLICION DE LA PLACA (ENROCADO) EN EL MISMO TRAMO (CRA 7, IAIE 2 1 3), ALCANZANDO UNA LONGITUD INTERVENIDA DE 20 m).

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

JUEVES 30-04-26 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SISO, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES. OPERATIVOS. / RESIDENTE INTERVENTORIA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR

SE CONTINUA LA DEMOLICION MECANICA DE PLACA (ENROCADA) EN UNA LONGITUD DE 16 m). SE REALIZA LA RECOLECCION, CARGUE Y DISPOSICION FINAL DEL MATERIAL SOBRANTE EN SITIO AUTORIZADO

VIERNES 01-05-26 NO SE REALIZAN ACTIVIDADES POR DÍA FESTIVO.

SABADO 02-05-26 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SISO, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR

SE REALIZA NIVELACION DE LA VIA Y POSTERIORMENTE, SE COMPACTA EL TRAMO INTERVENIDO, CON EL FIN DE PREVENIR ENCHARCAMIENTO SE DEJA CONSTANCIA QUE EL MATERIAL DE SUBRASANTE PRESENTA ALTA PLASTICIDAD

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA.

04-05-26 LUNES

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA. PROFESIONAL SISO. MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES, OPERATIVOS.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: RETROEXCAVADORA, MINICARGADOR, COMPACTADOR TIPO CANGURO.

SE REALIZO EXCAVACIÓN MECANICA PARA CATEO DE LA VÍA EN 54 ML (5,50 M DE ANCHO Y 0,25 M DE ESPESOR) DEMOLICION DE ENCHAPADO EN 36 ML Y CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

05-05-26 MARTES

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA, PROFESIONAL SISO, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES, OPERATIVOS

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: RETROEXCAVADORA, MINICARGADOR, COMPACTADOR TIPO CANGURO

SE REALIZO DEMOLICIÓN DE ANDENES SOBRE LA CRA 7 ENTRE CALLES 1 Y 3. EN EL BARRIO LOS ALMENDROS.

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA.

06-05-26 MIERCOLES

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA, INSPECTOR DE OBRA PROFESIONAL SISO MAESTRO, OFICIAL AYUDANTES, OPERATIVOS

EQUIPO Y HERRAMIENTAS: RETROEXCAVADORA, COMPACTADOR TIPO CANGURO.

SE REALIZÓ UN ENMALLE SOBRE LA KRA 7 CON CALLE 2, Y DE CONTINUO CON EL CATEO DE LA VÍA. ASI MISMO, SE REALIZO EXCAVACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 2" DE LA RED DE ALCANTARILLADO, ADEMAS DE LA CONEXIÓN DE (5) ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTOR

JUEVES 07-05-25

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA, PROFESIONAL SISO, MAESTRO AYUDANTES, OPERATIVOS.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: RETROEXCAVADORA, COMPACTADOR TIPO CANGURO.

DURANTE LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO SOBRE LA CRA 7 CON CALLE 24 B, SE IDENTIFICÓ LA PRESENCIA DE UNA TUBERÍA EN BARRO CORRESPONDIENTE A UNA ANTIGUA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO. LA CUAL APARENTEMENTE CONTINUA EN FUNCIONAMIENTO EVIDENCIADO POR LA PRESENCIA DE HUMEDAD, MATERIAL RESIDUAL Y POSIBLE CIRCULACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL PUNTO INTERVENIDO. ASIMISMO, SE EVIDENCIO INFILTRACIÓN Y SATURACIÓN DEL TERRENO EN EL AREA DE EXCAVACIÓN. SE DEJA CONSTANCIA DE QUE, AUNQUE LA PROFUNDIDAD PROYECTADA PARA LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE ACUEDUCTO CORRESPONDE A 0,60 m, FUE NECESARIO REALIZAR EXCAVACIONES A PROFUNDIDADES SUPERIORES A 1,30 m. DEBIDO A LA INTERFERENCIA GENERADA POR LA RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE EN BARRO. LO ANTERIOR, CONSIDERANDO QUE DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE DICHA INFRAESTRUCTURA NO FUE INHABILITADA LA RED ANTIGUA, LA CUAL ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TOTALMENTE COLAPSADA, PRESENTANDO MATERIAL DE RELLENO COMPLETAMENTE SATURADO.

EN CONSECUENCIA, SE PROCEDIO CON EL RETIRO TOTAL DEL MATERIAL AFECTADO Y SATURADO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL TERRENO.

SE REALIZÓ MEJORAMIENTO DE LA VÍA EN 60 m² x 1.20 x 0,60 Y SE INSTALARON 13 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA.

VIERNES 08-05-26 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA, PROF. 3/10 MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES, OPERATIVOS, RESIDENTE INTERVENTORÍA.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: RETROEXCAVADORA, CANGURO, MINICARGADOR.
ACTIVIDADES: SE FINALIZÓ LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA CORRESPONDIENTE A LA RED DE ACUEDUCTO EN UNA LONGITUD DE 96 ML.
SE LLEVO A CABO RELLENO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA.

SABADO. ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA, PROF. HJE, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES, OPERATIVOS. RESIDENTE INTERVENTORÍA.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: RETROEXCAVADORA, CANGURO, MINI CARGADOR
ACTIVIDADES: SE REALIZO MEJORAMIENTO DE LA VIA MEDIANTE LA CONFORMACIÓN E INSTALACIÓN DE MATERIAL SUBBASE, CON UN ESPESOR DE 20 CM. EN UNA LONGITUD DE 32 ML.

RESIDENTE DE OBRA.

Interventoría

LUNES 11-05-26 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA, PROF. HJE. MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES, OPERATIVOS. RESIDENTE. INTERVENTORÍA
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: RETROEXCAVADORA, CANGURO.
ACTIVIDADES. MEJORAMIENTO DE LA VÍA MEDIANTE LA INSTALACIÓN Y COMPACTACION DE MATERIAL TIPO SUBBASE.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.

MARTES 12-05-26. PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE OBRA. PROF. HSE, MAESTRO, OFICIAL. OPERATIVOS, RESIDENTE INTERVENTORÍA.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: RETROEXCAVADORA, CANGRO.
ACTIVIDADES: SE CONTINUO CON EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA MEDIANTE LA INSTALACIÓN Y COMPACTACION DE MATERIAL TIPO SUBBASE

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

MIERCOLES 13-05-26 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE OBRA PROF. HSE, MAESTRO, OFICIAL. OPERATIVOS. RESIDENTE INTERVENTORÍA.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. RETROEXCAVADORA. CANGURO.
ACTIVIDADES: DURANTE LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN, SE EVIDENCIÓ QUE EL MATERIAL SE ENCONTRABA TOTALMENTE SATURADO, POR LO CUAL FUE NECESARIO SU RETIRO Y POSTERIOR RELLENO CON MATERIAL DE RECEBO. ASIMISMO, SE REALIZÓ EL CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

JUEVES 14-05-26 ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.
PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA, PROF. HS. MAESTRO. OFICIAL. AUXILIARES. OPERATIVOS. RESIDENTE INTERVENTORIA.
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: RETROEXCAVADORA, CANGURO.
ACTIVIDADES: SE INICIARON LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICION DE PLACA, ASÍ COMO EL CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL A SITIO AUTORIZADO

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA.

VIERNES 15-05-26

ESTADO DEL CLIMA: NUBLADO

PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA PROF. HSE, MAESTRO, OFICIAL, OPERATIVOS. RESIDENTE. INTERVENTORIA.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. RETROEXCAVADORA, MINICARGADOR

ACTIVIDADES: SE REALIZÓ MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOBRE LA CRA 7 ENTRE CALLES 2 Y 3. EN UN TRAMO DE 54 ml CON UN ANCHO DE 2, 30 m Y UNA PROFUNDIDAD DE 0,80 m. ASIMISMO. SE CONTINUO CON EL MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE MEDIANTE LA INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL TIPO SUBBASE.

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

SABADO 16-05-26

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA. PROF. HSE. MAESTRO. OFICIAL OPERATIVOS. RESIDENTE INTERVENTORÍA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDADES: SE REALIZARON ACTIVIDADES DE ORDEN Y ASEO EN EL SITIO DE OBRA.

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA.

LUNES 18.05-26

DÍA FESTIVO. - NO SE LABORÓ.

MARTES: 19-05-26

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO.

PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA. PROF. HSE. MAESTRO. OFICIAL. OPERATIVOS. RESIDENTE INTERVENTORIA.

HERRAMIENTAS Y EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR.

ACTIVIDADES: SE INSTALÓ FORMALETA A LO LARGO DE LA VÍA PARA LA POSTERIOR FUNDICIÓN DE LA PLACA EN ENTROLADO.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

MIERCOLES 20-05-26. ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA, PROFESIONAL HSE, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES, OPERATIVOS.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: MEZCLADORA.
ACTIVIDADES: SE CONTINUÓ CON LA INSTALACIÓN DE FORMALETA A LO LARGO DE LA VÍA PARA LA FUNDICIÓN DE LA PLACA. ADEMÁS, SE REALIZÓ LA FUNDICIÓN DE CUATRO PLACAS DE CONCRETO.

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

JUEVES 21-05-26 ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA. PROF. HSE. MAESTRO, OFICIAL AYUDANTES, OPERATIVOS.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: MEZCLADORA
ACTIVIDADES: SE REALIZÓ LA FUNDICIÓN DE SEIS PLACAS DE CONCRETO, CON DIMENSIONES DE 4.20 x 2.57 x 0.20 m.

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

VIERNES 22-05-26 ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA, PROF. HSE, MAESTRO, OFICIAL AYUDANTES, OPERATIVOS
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: MEZCLADORA.
ACTIVIDADES: SE REALIZÓ LA FUNDICIÓN DE (5) PLACAS DE CONCRETO CON DIMENSIONES 4.20 m x 2.57 x 0.20m

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

SABADO 23-05-26

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.

PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA, PROFESIONAL HSEQ, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES, OPERATIVOS

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. HERRAMIENTAS MENOR

ACTIVIDADES: SE REALIZARON ACTIVIDADES DE ASEO Y LIMPIEZA EN EL SITIO DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

LUNES 25-05-26

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA, PROFESIONAL HSEQ, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES. OPERATIVOS.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

ACTIVIDADES: SE REALIZÓ FUNDICIÓN DE CINCO (5) PLACAS DE CONCRETO DE 4.20 m x 2.57 x 0.20.

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

MARTES 26-05-26

ESTADO DEL CLIMA: SOLEADO

PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA, PROFESIONAL HSEQ. MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES. OPERATIVOS

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

ACTIVIDADES: SE INICIO LA DEMOLICIÓN MECANICA DEL SEGUNDO TRAMO, CON UNA LONGITUD DE 29 ml Y UN ANCHO DE 5.50 M. UBICADO SOBRE LA CRA 7 ENTRE CLLES 3 Y 4. ASIMISMO, SE REALIZÓ EL CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE. Y LA FUNDICION DE (11) PLACAS DE CONCRETO DE 4.20 m x 2.57 m x 0.20 m.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

MIERCOLES 27-05-26 ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA, PROFESIONAL HSE, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES, OPERATIVOS, RESIDENTE INTERVENTORIA
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: MEZCLADORA.
ACTIVIDADES: SE REALIZO LA FUNDICION DE CINCO (5) PLACAS DE CONCRETO DE 4.02 m x 2.57 m x 0.20 m.

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JUEVES 28-05-26 ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO.
PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA: PROFESIONAL HSE. MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES, OPERATIVOS, RESIDENTE INTERVENTORIA
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: MEZCLADORA.
ACTIVIDADES: SE REALIZO LA FUNDICION DE OCHO (8) PLACAS DE CONCRETO DE 4.02 x 2.57 x 0.20 EN LA UPA 3 DEL BARRIO LOS ALMENDROS.

RESIDENTE DE OBRA. RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

VIERNES 29-05-26 ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA; PROFESIONAL HSE, MAESTRO, OFICIAL, AYUDANTES, OPERATIVOS, RESIDENTE INTERVENTORIA.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: MEZCLADORA.
ACTIVIDADES: SE REALIZO FUNDICION DE 151 PLACAS DE CONCRETO DE 4.02 m x 2.57 m x 0.20 m.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
