1090-01105

Puerto Gaitán, 17 de junio de 2026

SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
Recibido por:
Fecha: 23 JUN 2026
Hora:

SEÑORES
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
SECRETARIA ALEJANDRA CASTILLO BLANDÓN

Puerto Gaitán – Meta

REF: CONTRATO DE OBRA N° 1683 DE 2025 CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META".

ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME MENSUAL N°5 DEL MES DE ABRIL DE 2026 DEL CONTRATO ESPECIAL 1683 DE 2025

Cordial saludo

En el presente adjunto informe mensual N°5 periodo del 1 al 30 del mes de abril de 2026 del contrato **1683 DE 2025** que tiene como objeto: **"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META".** Se adjunta sus respectivos soportes

Para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
Recibido por:
Fecha
Hora: 17 JUN 2026

CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES
Secretario de Infraestructura

Proyectó: Christian Camilo Franco García – Apoyo Cps
Revisó: Luz Adriana Hernández Cantor – Director técnico de seguimiento de proyectos de infraestructura

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META

PUERTO GAITAN – 25- 05- 2026

OFIC. 0034

Señor(a)
ING. CHRISTIAN JULIAN FERNÁNDEZ REYES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Alcaldía municipal – Puerto Gaitán, Meta

Ref.: Contrato de Obra No. 1683-2025, "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META".

Asunto: Remisión de informe de obra No. 5 revisado por Interventoría.

Por medio del presente y en calidad de representante legal del contrato en referencia, en cumplimiento de las obligaciones contractuales, me permito hacer remisión al Informe Mensual de obra No. 05 correspondiente al mes de abril de 2026, siendo revisado y avalado por interventoría.

Cordialmente,

R/L DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
86.088.145 DE VILLAVICENCIO
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
NIT: 902.014.419-5
Utinterpolicia2025@gmail.com

SI-0103
2:27 PM
02 JUN 2026

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-TC-DOC-001
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	CORRESPONDENCIA	

Puerto Gaitán, 05 de mayo de 2026

Cons. 2026-023-ADM

Señores
DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
Puerto Gaitán, Meta
Utinterpolicia2025@gmail.com

Recibido
2:30 pm

Referencia: **CONTRATO 1683 DE 2025.**
Objeto: **"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META".**

Asunto: Radicación Informe Mensual de Obra No. 05 – abril de 2026

Por medio del presente y en calidad de representante legal del contrato en referencia, en cumplimiento de las obligaciones contractuales, me permito hacer entrega formal del Informe Mensual No. 05, correspondiente al periodo comprendido del 01 al 30 de abril de 2026.

El informe se presenta para su revisión y aprobación, conforme a lo establecido contractualmente.

Cordialmente,

R/L INGRID MARYORI GARCIA FONSECA
1.121.837.768 de Villavicencio
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
NIT. 902.011.453-2
Email: utingepoliciagaitan@gmail.com

UNIÓN TEMPORAL
INGE
POLICIA
GAITÁN

INFORME DE OBRA

CALLE 2 No 27 – 116 Villavicencio – Meta
Tel. 310 888 54 20

CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025

"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 05

PERIODO:
1 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
NIT. 902.011.453-2

PUERTO GAITÁN-META

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

ESTADO DE REVISIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	RESIDENTE DE OBRA	
REVISÓ	GONZALO BECERRA MEJIA	DIRECTOR DE OBRA	
APROBÓ	INGRID MARYORI GARCIA FONSECA	R/L UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

INTERVENTORIA UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025

ESTADO DE REVISIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
REVISÓ	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
REVISÓ	ROBISON FERNANDO MARROQUIN PÉREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
APROBÓ	DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO	R/L UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025	

TABLA DE CONTENIDO

1. Información general del contrato de obra 5
1.1. Generalidades del contrato de obra 5
1.2. Localización del contrato de obra 5
1.3. Descripción del proyecto 7
1.4. Alcance del contrato de obra 7
1.5. Población beneficiada 9
2. Información del contrato de obra 9
3. Información legal del contrato de obra 10
3.1. Pólizas según Adjudicación de contrato de obra 10
3.2. Pólizas según Acta de Inicio 11
4. Información financiera del contrato 12
4.1. Plan de inversión del anticipo 12
4.2. Información de avance financiero del proyecto 13
4.3. Balance financiero del proyecto 13
4.4. Relación de certificados de disponibilidad presupuestal - CDP 14
4.5. Relación de registros presupuestales - RP 15
4.6. Órdenes de pago efectuadas 16
5. Información técnica del contrato 16
5.1. Descripción de las actividades ejecutadas 16
5.2. Reportes ejecución mensual contrato de obra 19
5.3. Cuadro de avance acumulado mes a mes 42
5.4. Gráfico de avance de obra 43
5.5. Control del estado del tiempo resumen 45
6. Información administrativa del contrato 46
6.1. Relación personal de obra (profesional, técnico, operativo) 46
6.2. Pagos de seguridad social y parafiscales 46
7. Cuadro resumen ensayos de laboratorio 47
8. Control de maquinaria y equipos 47
9. Información ambiental del contrato 47
9.1. Certificación del cumplimiento de los permisos, autorizaciones y licencias 47
9.2. Seguimiento a la disposición de materiales 48
10. Conclusiones 49
11. Valla informativa 50
12. Anexos 50

TABLAS

Tabla 1. Localización contrato de obra 5
Tabla 2. Resumen alcance del contrato 8
Tabla 3. Información del contrato de obra 10
Tabla 4. Póliza de cumplimiento según contrato de obra 10
Tabla 5. Póliza de responsabilidad civil según contrato de obra 10
Tabla 6. Póliza de cumplimiento según acta de inicio 11
Tabla 7. Póliza de responsabilidad civil según acta de inicio 11
Tabla 8. Plan de inversión del anticipo 13
Tabla 9. Información avance financiero 13
Tabla 10. Balance financiero 14
Tabla 11. CDP 2025 14
Tabla 12. CDP 2026 15
Tabla 13. RP 2025 15
Tabla 14. RP 2026 16
Tabla 15. Órdenes de pago efectuadas 16
Tabla 16. Ejecución mensual del proyecto 42
Tabla 17. Avance acumulado mes a mes 43
Tabla 18. % Programado VS %Ejecutado 43
Tabla 19. Control del tiempo 46
Tabla 20. Resumen control del tiempo 46
Tabla 21. Relación personal 47
Tabla 22. Relación maquinaria 48

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización general del municipio de Puerto Gaitán. 6
Ilustración 2. Localización del proyecto, imagen tomada de Google Earth. 6

TABLA DE GRÁFICAS

Grafica 1. Avance fisico 42
Grafica 2. Avance en dinero 43
Grafica 3. Avance en porcentaje 44

1. Información general del contrato de obra

1.1. Generalidades del contrato de obra

Considerando que el municipio de Puerto Gaitán – Meta, en su plan de desarrollo "JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE 2024-2027", ha viabilizado, priorizado y aprobado proyectos de inversión los cuales se encuentran incluido el programa 4501 "FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA". Con la finalidad de cumplir con la meta PDM0318 "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA MANTENER O MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO", fue adjudicado mediante la licitación pública LP-SI-010-2025, que tiene como objeto "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META", con código BPIN 202500000031783 Este proyecto se encuentra suscrito al contrato de obra pública 1683 del día tres (03) de diciembre de 2025, siendo perfeccionado con el acta de inicio de fecha el día dieciocho (18) de diciembre de 2025.

1.2. Localización del contrato de obra

El proyecto objeto del contrato 1683 de 2025 se encuentra localizada en el municipio de Puerto Gaitán-Meta. En la siguiente tabla un resumen de la ubicación del municipio.

Puerto Gaitán Meta	
País:	Colombia
Región:	Orinoquía
Departamento:	Meta
Ubicación:	Lat. N. 3° 05' y 4° 08' Log. O. 71° 05' y 72° 30'
Altitud:	149 msnm
Superficie:	17.536 km²
Temperatura media:	27 °C
Fundación:	1932
Población:	46.689 habitantes

Tabla 1. Localización contrato de obra

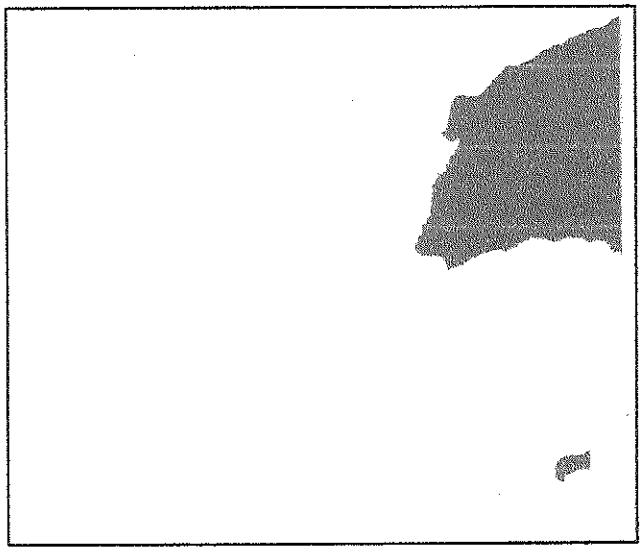


Ilustración 1. Localización general del municipio de Puerto Gaitán.

El proyecto se localiza en la zona urbana del municipio de Puerto Gaitán, específicamente en la Estación de Policía, ubicada en la Carrera 10 N.° 17-31, barrio Alto Manacacías. Este sector corresponde a un área estratégica del municipio, donde se concentra una parte significativa de la actividad administrativa, comercial y social del territorio.

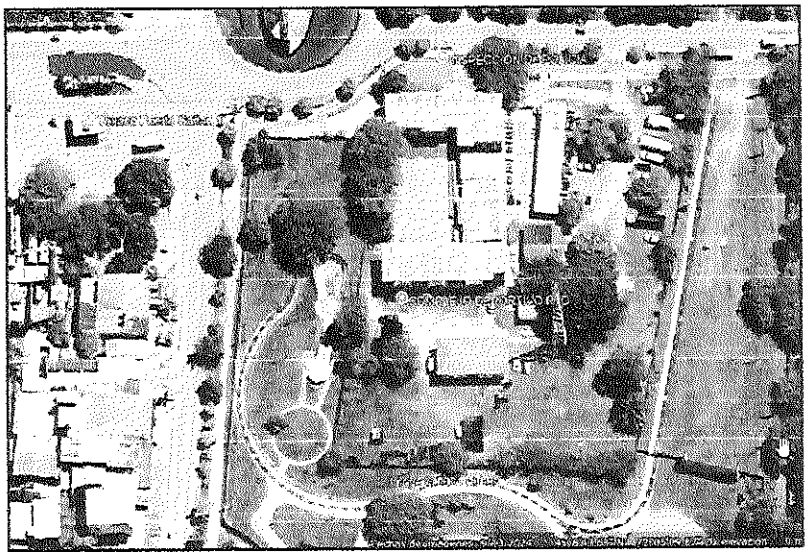


Ilustración 2. Localización del proyecto, imagen tomada de Google Earth.

1.3. Descripción del proyecto

El proyecto tiene como objetivo la construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura de la Estación de Policía del municipio de Puerto Gaitán – Meta, con el fin de superar las deficiencias físicas y funcionales que actualmente limitan el cumplimiento de las funciones misionales de la Policía Nacional. La intervención se fundamenta en un diagnóstico técnico que evidencia deterioro estructural, insuficiencia de espacios, fallas en los sistemas de instalaciones técnicas y condiciones inadecuadas para el alojamiento y operación del personal.

Puerto Gaitán es un municipio de alta relevancia estratégica debido a su crecimiento demográfico, desarrollo agroindustrial y ubicación cercana a corredores de movilidad interdepartamental, lo cual ha incrementado las exigencias en materia de seguridad y control territorial. En este contexto, el proyecto busca dotar a la institución de una infraestructura moderna, funcional y acorde con las dinámicas urbanas y sociales del territorio.

La propuesta contempla una intervención integral que incluye la construcción de nuevos alojamientos para el personal policial, la rehabilitación del edificio "Casa Blanca" destinado a vivienda familiar, la implementación de un sistema elevado de almacenamiento de agua potable y la construcción de un nuevo cerramiento perimetral de seguridad. Estas acciones permitirán mejorar las condiciones de habitabilidad, garantizar la continuidad de los servicios básicos, fortalecer la seguridad física de la estación y optimizar la capacidad operativa institucional.

El proyecto se desarrollará bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia institucional y responsabilidad fiscal, contribuyendo al fortalecimiento de la presencia policial y al mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Puerto Gaitán.

1.4. Alcance del contrato de obra

El Contrato de Obra No. 1683 de 2025 contempla la ejecución de actividades orientadas al fortalecimiento de la infraestructura de la Estación de Policía del municipio, mediante la construcción de una edificación de dos (2) niveles destinada a nuevos alojamientos con capacidad para albergar hasta ciento doce (112) personas, la rehabilitación integral del edificio denominado Casa Blanca, con capacidad para cuatro (4) grupos familiares, la implementación de un sistema elevado de almacenamiento de agua potable que

garantice la continuidad del servicio, y la demolición y posterior construcción de un nuevo cerramiento perimetral, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad y control del recinto policial.

A continuación, se muestra el alcance del contrato el cual consta de 23 capítulos enfocados a satisfacción del objeto contratado.

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	VALOR
	PRESUPUESTO ALOJAMIENTOS NUEVOS	
1	PRELIMINARES	$ 4.198.624,00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 80.230.348,00
3	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	$ 417.501.889,00
4	RED DE PRESION	$ 10.903.310,00
5	RED SANITARIA	$ 34.354.320,00
6	RED PLUVIAL	$ 11.900.456,00
7	RED CONTRA INCENDIOS	$ 1.014.054,00
8	RED ELECTRICA - BAJA TENSION	$ 141.083.078,00
9	RED ELECTRICA - APANTALLAMIENTO	$ 13.938.854,00
10	MAMPOSTERIA, PISOS Y ACABADOS ARQUITECTONICOS	$ 565.737.574,00
11	APARATOS SANITARIOS Y PRESION	$ 46.128.228,00
12	CARPINTERIA METALICA, MADERA Y DE ALUMINIO	$ 378.485.102,00
	PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES EXISTENTES	
13	DEMOLICION Y DESMONTE	$ 41.757.891,00
14	RED ELECTRICA - BAJA TENSION	$ 37.303.929,00
15	ACABADOS ARQUITECTONICOS	$ 223.371.272,00
16	CARPINTERIA METALICA, MADERA Y DE ALUMINIO	$ 144.145.763,00
17	APARATOS SANITARIOS Y PRESION	$ 8.154.912,00
	PRESUPUESTO TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMAMIENTO DE AGUA	
18	PRELIMINARES	$ 714.444,00
19	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACABADOS	$ 57.497.172,00
	PRESUPUESTO CERRAMIENTO	
20	PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	$ 34.412.024,00
21	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	$ 814.593.767,00
	OTROS	
22	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$ 75.936.264,00
23	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	$ 119.989.209,00
	VALOR TOTAL	**$ 4.306.277.668,00**

Tabla 2. Resumen alcance del contrato

1.5. Población beneficiada

El proyecto beneficia de manera directa al personal de la Policía Nacional que presta servicio en el municipio de Puerto Gaitán, al proporcionar una infraestructura moderna, funcional y segura que mejora las condiciones de alojamiento, operación y bienestar laboral. De manera indirecta, la iniciativa impacta positivamente a la comunidad del municipio, al fortalecer la capacidad institucional, la presencia policial y la atención oportuna a las necesidades de seguridad ciudadana, contribuyendo al orden público y al desarrollo social del territorio.

2. Información del contrato de obra

Número del proceso:	LP-SI-010-2025
Tipo de contrato:	Obra Publica
Número del contrato:	1683 del 2025
Fecha del contrato:	03 de diciembre de 2025
Objeto:	Construcción, adecuación y mejoramiento de la estación de policía del municipio de puerto Gaitán - meta
Contratista:	Union Temporal Inge Policía Gaitan
Nit:	902.011.453-2
Representante legal:	Ingrid Maryori García Fonseca C.C. No. 1.121.837.768 de Villavicencio – Meta
Correo electrónico:	utingepoliciagaitan@gmail.com
Contratante:	Municipio de Puerto Gaitán Alcalde municipal LUIS CÉSAR PÉREZ GAITÁN C.C. No. 1.122.120.037 de ACACIAS - META
Interventoría:	Unión Temporal Inter policía 2025
Nit:	902.014.419-5
Representante legal:	Diego Armando Cardoso Guerrero C.C. No. 86.088.145 de Villavicencio – Meta
Correo electrónico:	Utinterpolicia2025@gmail.com
Valor:	Cuatro mil trescientos seis millones doscientos setenta y siete mil seiscientos sesenta y ocho pesos m/cte ($4.306.277.668,00)

Plazo inicial del contrato:	Ocho (8) meses
Supervisor:	Christian Julián Fernández Reyes CC. 1.124.823.789 de Puerto Gaitan - Meta Secretario de infraestructura
Fecha del acta de inicio:	18 de diciembre de 2025
Fecha de terminación:	17 de agosto de 2026

Tabla 3. Información del contrato de obra

3. Información legal del contrato de obra

3.1. Pólizas según Adjudicación de contrato de obra

DATO	DESCRIPCIÓN
Póliza de cumplimiento No	30-44-101067871
Anexo No.	0
Fecha de expedición	09 de diciembre de 2025
Fecha de aprobación	23 de diciembre de 2025
Compañía de seguros	Seguros del estado S.A.

ACTUALIZACIÓN SEGÚN CONTRATO			
Amparos	**Vigencia**		**Valor asegurado**
	Desde	**Hasta**	
Cumplimiento	02/12/2025	02/12/2026	$ 430.627.766,80
Buen manejo del anticipo	02/12/2025	02/12/2026	$ 2.153.138.834,00
Salarios y prestaciones sociales	02/12/2025	02/08/2029	$ 215.313.883,40
Estabilidad y calidad	02/12/2025	02/12/2030	$ 430.627.766,80

Tabla 4. Póliza de cumplimiento según contrato de obra

DATO	DESCRIPCIÓN
Póliza de responsabilidad civil extracontractual No	30-40-101025675
Anexo No.	0
Fecha de expedición	09 de diciembre de 2025
Fecha de aprobación	23 de diciembre de 2025
Compañía de seguros	Seguros del estado S.A.

ACTUALIZACIÓN SEGÚN CONTRATO			
Amparos	**Vigencia**		**Valor asegurado**
	Desde	**Hasta**	
Predios labores y operaciones	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00

Daño emergente y lucro cesante	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00
Perjuicios extrapatrimoniales	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00
Contratistas y subcontratistas	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00
Responsabilidad civil patronal	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00
Vehículos propios y no propios	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00

Tabla 5. Póliza de responsabilidad civil según contrato de obra

3.2. Pólizas según Acta de Inicio

Póliza de cumplimiento No	30-44-101067871
Anexo No.	1 y 2
Fecha de expedición	23 de diciembre de 2025
Fecha de aprobación	23 de diciembre de 2025
Compañía de seguros	Seguros del estado S.A.
ACTUALIZACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO	

Amparos	Vigencia		Valor asegurado
	Desde	Hasta	
Cumplimiento	18/12/2025	18/12/2026	$ 430.627.766,80
Buen manejo del anticipo	18/12/2025	18/12/2026	$ 2.153.138.834,00
Salarios y prestaciones sociales	18/12/2025	18/08/2029	$ 215.313.883,40
Estabilidad y calidad	18/12/2025	18/12/2030	$ 430.627.766,80

Tabla 6. Póliza de cumplimiento según acta de inicio

Póliza de responsabilidad civil extracontractual No	30-40-101025675
Anexo No.	1 y 2
Fecha de expedición	23 de diciembre de 2025
Fecha de aprobación	23 de diciembre de 2025
Compañía de seguros	Seguros del estado S.A.
ACTUALIZACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO	

Amparos	Vigencia		Valor asegurado
	Desde	Hasta	
Predios labores y operaciones	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00
Daño emergente y lucro cesante	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00
Perjuicios extrapatrimoniales	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00
Contratistas y subcontratistas	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00
Responsabilidad civil patronal	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00
Vehículos propios y no propios	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00

Tabla 7. Póliza de responsabilidad civil según acta de inicio

4. Información financiera del contrato

4.1. Plan de inversión del anticipo

El Contrato de Obra No. 1683 de 2025 contempla un anticipo equivalente al 50% del valor total del contrato. En una primera etapa se gestionó la solicitud de desembolso correspondiente al 35% del valor total del contrato, equivalente a $1.507.197.183,80, con cargo al RP de la vigencia 2026. Por concepto de FONSET, la entidad aplica una retención del 5% sobre este valor, resultando un valor neto de anticipo de $1.431.837.324,61, trámite que fue debidamente radicado en el mes de enero.

Posteriormente, se realizó la solicitud No. 2 en el mes de febrero del anticipo correspondiente al 15% restante, equivalente a $645.941.650,20. Por concepto de FONSET, se aplica una retención del 5%, resultando un valor neto de $613.644.567,69. Esta solicitud fue tramitada con cargo a los Registros Presupuestales No. RES.2026004223 (vigencia 2025) y No. RES.2026000004 (vigencia 2026), completando así el 50% del anticipo contractual.

En cumplimiento con las condiciones contractuales, fue suscrito con la FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos P.A. ANTICIPO UNIÓN TEMPORAL INGE POLICÍA GAITÁN, con el objeto de administrar y girar los recursos del anticipo del contrato 1683 de 2025. Igualmente, fue registrada la cuenta de ahorros Banco Davivienda No. 482800059677, correspondiente al fideicomiso en el cual serán abonados los recursos objeto del contrato fiduciario.

A la fecha de corte del presente informe, el informe del plan de inversión del anticipo se encuentra en curso.

A continuación, se presenta la tabla del plan de inversión del anticipo No. 01 correspondiente al 35% y del anticipo No. 02 correspondiente al 15%, teniendo en cuenta que la totalidad del anticipo equivale al 50% del valor total del contrato, es decir, $2.153.138.834.

Por concepto de FONSET, la entidad aplica una retención del 5%, resultando un valor neto del anticipo total de $2.045.481.892,30.

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE	PLAZO DE EJECUCION (MESES Y/O DIAS)
1	MATERIALES	$ 1.268.198.773,23	62,00%	1 MES

2	MANO DE OBRA	$ 327.277.102,77	16,00%	1 MES
3	ALQUILER/COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 163.638.551,38	8,00%	1 MES
4	TRANSPORTE	$ 286.367.464,92	14,00%	1 MES
TOTAL		$ 2.045.481.892,30	100,00%	

Tabla 8. Plan de inversión del anticipo

4.2. Información de avance financiero del proyecto

PERIODO		VALOR PROGRAMADO		VALOR EJECUTADO	
		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
1	18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 28.037.949.00	$ 28.037.949.00	$22.553.339	$22.553.339
2	01 AL 31 DE ENERO DE 2026	$ 77.425.939.00	$ 105.463.888.00	$34.577.032	$57.130.370
3	01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	$ 191.735.345.00	$ 297.199.233.00	$121.980.573	$179.110.943
4	01 AL 31 DE MARZO DE 2026	$ 187.737.987.00	$ 484.937.220.00	$104.792.889	$283.903.832
5	01 AL 30 DE ABRIL DE 2026	$ 221.627.087.00	$ 706.564.307.00	$95.934.936	$379.838.768

Tabla 9. Información avance financiero

4.3. Balance financiero del proyecto

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL	$ 4.306.277.668,00
VALOR PROYECTO ACTUALIZADO	$ 4.306.277.668,00
VALOR ANTICIPO No. 01 – 35%	$1.507.197.183,80
VALOR ANTICIPO No. 02 – 15%	$645.941650,20
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO	$ 0,00
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ 0,00

Tabla 10. Balance financiero

4.4. Relación de certificados de disponibilidad presupuestal - CDP

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025	
CDP	DIS.2025002848 DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2025

RUBRO	FDS-1-4514501-2025000000031783-4501040
FUENTE	1041-1.3.3.4.01 – R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
DESCRIPCIÓN	INFRAESTRUCTURA PARA LA PROMOCIÓN A LA CULTURA DE LA LIGALIDAD Y A LA CONVIVENCIA CONSTRUIDA
CCPET	2.3.2.02.02.005 – CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
CPC DAN	53129 – OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
VALOR DEL CDP	SEISCIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L ($620.406.812,00)

Tabla 11. CDP 2025

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026	
CDP	DIS.2026000007 DEL 02 DE ENERO DE 2026
RUBRO	FDS-1-4514501-2025000000031783-4501040
FUENTE	1041-1.3.3.4.01 – R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
DESCRIPCIÓN	INFRAESTRUCTURA PARA LA PROMOCIÓN A LA CULTURA DE LA LIGALIDAD Y A LA CONVIVENCIA CONSTRUIDA
CCPET	2.3.2.02.02.005 – CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
CPC DAN	53129 – OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
VALOR PRESUPUESTO	TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L ($ 3.685.870.856,00)

Tabla 12. CDP 2026

4.5. Relación de registros presupuestales - RP

REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025	
NÚMERO	RES.2025004223
FECHA DEL REGISTRO	18/12/2025
BENEFICIARIO	902.011.453 – UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
DEPENDENCIA	FDS-1-ADMINISTRACION CENTRAL
CONCEPTO DEL RECURSO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMEINTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META
FUENTE O RECURSO	1041-1.3.3.4.01 – R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
VALOR TOTAL DEL REGISTRO	SEISCIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L ($ 620.406.812,00)

Tabla 13. RP 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026

NÚMERO	RES.2026000004
FECHA DEL REGISTRO	02/01/2026
BENEFICIARIO	902.011.453 – UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
DEPENDENCIA	FDS-1-ADMINISTRACION CENTRAL
CONCEPTO DEL RECURSO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMEINTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META
FUENTE O RECURSO	1041-1.3.3.4.01 – R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
VALOR TOTAL DEL REGISTRO	TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/L ($ 3.685.870.856,00)

Tabla 14. RP 2026

4.6. Órdenes de pago efectuadas

A la fecha de corte del presente informe, se cuenta con órdenes de pago efectuadas, las cuales se relacionan en el cuadro a continuación.

CONCEPTO	ORDEN DE PAGO No.	VALOR NETO	FECHA
ANTICIPO No. 01 CTO 1683/2025 – 35%	EGR.2026010031	$1.431.837.324,61	21/01/2026
ANTICIPO No. 02 CTO 1683/2025 – 15%	EGR.2026030507	$24.257.838,20	16/03/2026
	EGR.2026030508	$589.386.812,00	16/03/2026

Tabla 15. Ordenes de pago efectuadas

5. Información técnica del contrato

5.2. Descripción de las actividades ejecutadas

En el marco del proyecto "Construcción, adecuación y mejoramiento de la Estación de Policía del municipio de Puerto Gaitán – Meta", durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, se desarrollaron actividades constructivas, técnicas y de gestión, las cuales se describen a continuación:

Durante el mes se avanzó en la ejecución de la placa de contrapiso en concreto impermeabilizado de 20.7 MPa (3000 PSI), mezcla en obra, incluyendo su respectivo

suministro y construcción, permitiendo consolidar áreas previamente adecuadas para pisos. De manera simultánea, se desarrollaron actividades relacionadas con el acero de refuerzo fy=420 MPa (4200 kgf/cm², 60.000 PSI) para vigas aéreas, comprendiendo el suministro, figurado, armado, colocación y amarre, contribuyendo al avance de los elementos estructurales elevados del proyecto.

Adicionalmente, se ejecutaron actividades correspondientes al suministro e instalación de la red de presión para los baños del primer piso del área de alojamientos, avanzando en la implementación de los sistemas hidráulicos internos conforme a los diseños.

Paralelamente, se continuó con la elaboración del Acta Modificatoria No. 1, que contempla un adicional No. 1 y la solicitud de prórroga del contrato, como resultado de los recorridos técnicos realizados en las instalaciones de la estación de policía. Estas visitas, desarrolladas junto con profesionales especializados contratados por el contratista, han permitido profundizar en el análisis de los componentes hidráulicos y eléctricos, generando estudios e informes técnicos que evidencian la necesidad de ajustes al alcance inicial del proyecto.

En cuanto a las condiciones de ejecución, se han presentado inconvenientes para el inicio de la intervención correspondiente a la remodelación de la edificación denominada "Casa Blanca", debido a que actualmente se encuentra ocupada por seis (6) oficiales, lo cual ha impedido la disponibilidad del área. Frente a esta situación, se han llevado a cabo reuniones con el comandante de estación, con el fin de coordinar la desocupación del espacio y definir la fecha de inicio de las actividades.

Finalmente, es importante señalar que los ajustes técnicos derivados de los estudios en los componentes hidráulico y eléctrico, así como las limitaciones para la intervención de algunas áreas del proyecto, han generado retrasos en la ejecución de la obra. No obstante, estos aspectos están siendo gestionados mediante acciones técnicas y administrativas orientadas a garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

5.3. Reportes ejecución mensual contrato de obra

PRESUPUESTO OFICIAL CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META						PERIODO 5 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026			ACUMULADO			CANTIDAD POR EJECUTAR		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CAN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	%	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	%	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	%
	PRESUPUESTO ALOJAMIENTOS NUEVOS													
1	PRELIMINARES													
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	m2	358,00	$ 3.568,00	$ 1.277.344,00				358,00	$ 1.277.344,00	100%	0,00	$ 0,00	0%
1.2	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	m2	358,00	$ 8.160,00	$ 2.921.280,00				358,00	$ 2.921.280,00	100%	0,00	$ 0,00	0%
				Subtotal:	$ 4.198.624,00		$ -			$ 4.198.624,00			$ 0,00	
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS													
2.1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	m3	322,81	$ 36.161,00	$ 11.673.132,00				251,21	$ 9.084.005,00	78%	71,60	$ 2.589.128,00	22%
2.2	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	m3 - km	2098,27	$ 1.718,00	$ 3.604.826,00				1632,87	$ 2.805.271,00	78%	465,40	$ 799.557,00	22%
2.3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	m3	243,87	$ 69.801,00	$ 17.022.370,00				104,22	$ 7.274.660,00	43%	139,65	$ 9.747.710,00	57%

2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	m3 - km	27898,73	$ 1.718,00	$ 47.930.018,00				11922,77	$ 20.483.319,00	43%	15975,96	$ 27.446.699,00	57%
				Subtotal:	$ 80.230.348,00		$ -			$ 39.647.255,00			$ 40.583.094,00	
3	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO													
3.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	m3	3,81	$ 765.474,00	$ 2.916.456,00				3,81	$ 2.916.456,00	100%	0,00	$ 0,00	0%
3.2	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	9,06	$ 1.108.301,00	$ 10.041.207,00				9,05	$ 10.030.124,00	100%	0,01	$ 11.083,00	0%
3.3	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	15,18	$ 1.187.618,00	$ 18.028.041,00				12,38	$ 14.702.711,00	82%	2,80	$ 3.325.330,00	18%
3.4	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	11,06	$ 1.581.877,00	$ 17.495.560,00				7,90	$ 12.496.828,00	71%	3,16	$ 4.998.731,00	29%
3.5	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	39,72	$ 1.538.398,00	$ 61.105.169,00				0,00	$ 0,00	0%	39,72	$ 61.105.169,00	100%
3.6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	27,10	$ 1.034.931,00	$ 28.046.630,00	27,10	$ 28.046.630,00	100%	27,10	$ 28.046.630,00	100%	0,00	$ 0,00	0%
3.7	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	55,69	$ 1.383.418,00	$ 77.042.548,00				0,00	$ 0,00	0%	55,69	$ 77.042.548,00	100%

3.8	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	m3	3,79	$ 708.833,00	$ 2.686.477,00				0,00	$ 0,00	0%	3,79	$ 2.686.477,00	100%
3.9	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	kg	897,04	$ 10.015,00	$ 8.983.856,00				599,00	$ 5.998.985,00	67%	298,04	$ 2.984.871,00	33%
3.10	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	kg	10959,24	$ 9.265,00	$ 101.537.359,00	3151,45	$	29.198.184,00	29%	6717,10	$ 62.233.932,00	61%	4242,14	$ 39.303.427,00	39%
3.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 22 (NO INCLUYE CONCRETO)	m2	556,93	$ 103.015,00	$ 57.372.144,00				0,00	$ 0,00	0%	556,93	$ 57.372.144,00	100%
3.12	IMPERMEABILIZACION ACRILICA DE PLACA CUBIERTA CON PRODUCTO SIKAFILL-12 POWER O SIMILAR	m2	271,04	$ 118.973,00	$ 32.246.442,00				0,00	$ 0,00	0%	271,04	$ 32.246.442,00	100%
				Subtotal:	**$ 417.501.889,00**		**$**	**57.244.814,00**			**$ 136.425.666,00**			**$ 281.076.222,00**	
4	**RED DE PRESION**													
4.1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	40,09	$ 12.699,00	$ 509.103,00	24,00	$	304.776,00	60%	24,00	$ 304.776,00	60%	16,09	$ 204.327,00	40%
4.2	TUBERÍA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	77,59	$ 17.026,00	$ 1.321.047,00					0,00	$ 0,00	0%	77,59	$ 1.321.047,00	100%
4.3	TUBERÍA PVCP RDE 13,5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	25,99	$ 18.834,00	$ 489.496,00	6,00	$	113.004,00	23%	6,00	$ 113.004,00	23%	19,99	$ 376.492,00	77%

4.4	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	34,94	$ 26.867,00	$ 938.733,00				0,00	$ 0,00	0%	34,94	$ 938.733,00	100%
4.5	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	80,20	$ 29.502,00	$ 2.366.060,00				0,00	$ 0,00	0%	80,20	$ 2.366.060,00	100%
4.6	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	20,00	$ 3.296,00	$ 65.920,00	20,00	$ 65.920,00	100%	20,00	$ 65.920,00	100%	0,00	$ 0,00	0%
4.7	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	81,00	$ 3.772,00	$ 305.532,00				0,00	$ 0,00	0%	81,00	$ 305.532,00	100%
4.8	ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	9,00	$ 10.567,00	$ 95.103,00				0,00	$ 0,00	0%	9,00	$ 95.103,00	100%
4.9	ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	13,00	$ 11.474,00	$ 149.162,00	13,00	$ 149.162,00	100%	13,00	$ 149.162,00	100%	0,00	$ 0,00	0%
4.10	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	74,00	$ 56.864,00	$ 4.207.936,00				0,00	$ 0,00	0%	74,00	$ 4.207.936,00	100%
4.11	VALVULA DE BOLA 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2,00	$ 105.587,00	$ 211.174,00				0,00	$ 0,00	0%	2,00	$ 211.174,00	100%
4.12	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2,00	$ 49.274,00	$ 98.548,00				0,00	$ 0,00	0%	2,00	$ 98.548,00	100%
4.13	VALVULA DE BOLA 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2,00	$ 72.748,00	$ 145.496,00				0,00	$ 0,00	0%	2,00	$ 145.496,00	100%
				Subtotal:	**$ 10.903.310,00**		**$ 632.862,00**			**$ 632.862,00**			**$ 10.270.448,00**	
5	**RED SANITARIA**													
5.1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	87,30	$ 32.268,00	$ 2.816.996,00				48,00	$ 1.548.864,00	55%	39,30	$ 1.268.132,00	45%
5.2	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	10,71	$ 47.720,00	$ 511.081,00				10,71	$ 511.081,00	100%	0,00	$ 0,00	0%
5.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	162,45	$ 63.421,00	$ 10.302.741,00				60,00	$ 3.805.260,00	37%	102,45	$ 6.497.481,00	63%

5.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	u	3,00	$ 1.117.232,00	$ 3.351.696,00				0,00	$ 0,00	0%	3,00	$ 3.351.696,00	100%
5.5	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	30,00	$ 94.871,00	$ 2.846.130,00				28,00	$ 2.656.388,00	93%	2,00	$ 189.742,00	7%
5.6	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	18,00	$ 91.113,00	$ 1.640.034,00				16,00	$ 1.457.808,00	89%	2,00	$ 182.226,00	11%
5.7	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	u	4,00	$ 96.052,00	$ 384.208,00				4,00	$ 384.208,00	100%	0,00	$ 0,00	0%
5.8	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	18,00	$ 75.022,00	$ 1.350.396,00				16,00	$ 1.200.352,00	89%	2,00	$ 150.044,00	11%
5.9	LAVADERO PREFABRICADO 0.65 0.80 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2,00	$ 588.950,00	$ 1.177.900,00				0,00	$ 0,00	0%	2,00	$ 1.177.900,00	100%
5.10	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	215,00	$ 12.085,00	$ 2.598.275,00				136,00	$ 1.643.560,00	63%	79,00	$ 954.715,00	37%
5.11	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	38,00	$ 21.288,00	$ 808.944,00				38,00	$ 808.944,00	100%	0,00	$ 0,00	0%
5.12	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	86,00	$ 36.492,00	$ 3.138.312,00				86,00	$ 3.138.312,00	100%	0,00	$ 0,00	0%
5.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 3" X 2" UM	u	10,00	$ 226.831,00	$ 2.268.310,00				10,00	$ 2.268.310,00	100%	0,00	$ 0,00	0%

5.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 4" X 3" UM	u	8,00	$ 115.731,00	$ 925.848,00				8,00	$ 925.848,00	100%	0,00	$ 0,00	0%
5.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 4" X 2" UM	u	1,00	$ 233.449,00	$ 233.449,00				1,00	$ 233.449,00	100%	0,00	$ 0,00	0%
				Subtotal:	**$ 34.354.320,00**		$ -			**$ 20.582.384,00**			**$ 13.771.936,00**	
6	**RED PLUVIAL**													
6.1	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	71,50	$ 30.425,00	$ 2.175.388,00				0,00	$ 0,00	0%	71,50	$ 2.175.388,00	100%
6.2	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	5,00	$ 36.492,00	$ 182.460,00				0,00	$ 0,00	0%	5,00	$ 182.460,00	100%
6.3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	80,00	$ 63.421,00	$ 5.073.680,00				0,00	$ 0,00	0%	80,00	$ 5.073.680,00	100%
6.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	u	4,00	$ 1.117.232,00	$ 4.468.928,00				0,00	$ 0,00	0%	4,00	$ 4.468.928,00	100%
				Subtotal:	**$ 11.900.456,00**		$ -			**$ 0,00**			**$ 11.900.456,00**	
7	**RED CONTRA INCENDIOS**													
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR TIPO ABC. CAPACIDAD 10LB . INCLUYE ESTRUCTURA SOPORTE	u	6,00	$ 169.009,00	$ 1.014.054,00				0,00	$ 0,00	0%	6,00	$ 1.014.054,00	100%
				Subtotal:	**$ 1.014.054,00**		$ -			**$ 0,00**			**$ 1.014.054,00**	

8	RED ELECTRICA - BAJA TENSION													
8.1	PUESTA A TIERRA EN VARILLA GALVANIZADA 5/8" X 2.40 M PARA RED COMPACTA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	5,00	$ 309.456,00	$ 1.547.280,00				0,00	$ 0,00	0%	5,00	$ 1.547.280,00	100%
8.2	ALAMBRE CU AISLADO No 8	m	16,00	$ 11.342,00	$ 181.472,00				0,00	$ 0,00	0%	16,00	$ 181.472,00	100%
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA 2X18W	u	92,00	$ 181.525,00	$ 16.700.300,00				0,00	$ 0,00	0%	92,00	$ 16.700.300,00	100%
8.4	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	1,00	$ 1.152.705,00	$ 1.152.705,00				0,00	$ 0,00	0%	1,00	$ 1.152.705,00	100%
8.5	ACOMETIDA GENERAL BIFASICA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	1,00	$ 1.970.365,00	$ 1.970.365,00				0,00	$ 0,00	0%	1,00	$ 1.970.365,00	100%
8.6	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER RIEL MONOPOLAR 1 X 40A-10KA	u	1,00	$ 69.753,00	$ 69.753,00				0,00	$ 0,00	0%	1,00	$ 69.753,00	100%
8.7	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	64,00	$ 134.464,00	$ 8.605.696,00				32,00	$ 4.302.848,00	50%	32,00	$ 4.302.848,00	50%
8.8	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	8,00	$ 227.107,00	$ 1.816.856,00				4,00	$ 908.428,00	50%	4,00	$ 908.428,00	50%
8.9	SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	92,00	$ 271.828,00	$ 25.008.176,00				0,00	$ 0,00	0%	92,00	$ 25.008.176,00	100%

8.10	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	8,00	$ 199.056,00	$ 1.592.448,00				4,00	$ 796.224,00	50%	4,00	$ 796.224,00	50%
8.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	8,00	$ 5.566.253,00	$ 44.530.024,00				0,00	$ 0,00	0%	8,00	$ 44.530.024,00	100%
8.12	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	u	5,00	$ 1.251.752,00	$ 6.258.760,00				0,00	$ 0,00	0%	5,00	$ 6.258.760,00	100%
8.13	CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE	m	110,00	$ 29.626,00	$ 3.258.860,00				0,00	$ 0,00	0%	110,00	$ 3.258.860,00	100%
8.14	BAJANTE CON TUBO CONDUIT METALICO 1" L=6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	5,00	$ 99.185,00	$ 495.925,00				0,00	$ 0,00	0%	5,00	$ 495.925,00	100%
8.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC 3/4 "	m	380,00	$ 10.458,00	$ 3.974.040,00				150,00	$ 1.568.700,00	39%	230,00	$ 2.405.340,00	61%
8.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC 1 "	m	16,00	$ 12.235,00	$ 195.760,00				0,00	$ 0,00	0%	16,00	$ 195.760,00	100%
8.17	ALAMBRE CU AISLADO No12 DUCTO INSTALADO	m	900,00	$ 6.074,00	$ 5.466.600,00				0,00	$ 0,00	0%	900,00	$ 5.466.600,00	100%
8.18	SUMINISTRO E INSTALACION	u	86,00	$ 212.303,00	$ 18.258.058,00				0,00	$ 0,00	0%	86,00	$ 18.258.058,00	100%

	LUMINARIA DE EMERGENCIA 2X1,5W													
				Subtotal:	$ 141.083.078,00		$ -			$ 7.576.200,00			$ 133.506.878,00	
9	RED ELECTRICA - APANTALLAMIENTO													
9.1	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA TIERRA, CABLE 2/0,No 4, 3 CW	u	2,00	$ 3.457.978,00	$ 6.915.956,00				0,00	$ 0,00	0%	2,00	$ 6.915.956,00	100%
9.2	SUMINISTRO DE INSTALACION DE ANILLO PERIMETRAL EN ALUMINIO 8mm	m	113,00	$ 16.570,00	$ 1.872.410,00				0,00	$ 0,00	0%	113,00	$ 1.872.410,00	100%
9.3	SUMINISTRO DE INSTALACION PUNTA CAPTORA h=1,00m	u	10,00	$ 451.270,00	$ 4.512.700,00				0,00	$ 0,00	0%	10,00	$ 4.512.700,00	100%
9.4	SUMINISTRO DE INSTALACION CAJA DE EMPALME BIMETALICO	u	4,00	$ 159.447,00	$ 637.788,00				0,00	$ 0,00	0%	4,00	$ 637.788,00	100%
				Subtotal:	$ 13.938.854,00		$ -			$ 0,00			$ 13.938.854,00	
10	MAMPOSTERIA, PISOS Y ACABADOS ARQUITECTONICOS													
10.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	m2	570,32	$ 63.676,00	$ 36.315.696,00				0,00	$ 0,00	0%	570,32	$ 36.315.696,00	100%
10.2	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	m2	426,67	$ 41.730,00	$ 17.804.939,00				0,00	$ 0,00	0%	426,67	$ 17.804.939,00	100%
10.3	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	m2	977,12	$ 29.811,00	$ 29.128.924,00				0,00	$ 0,00	0%	977,12	$ 29.128.924,00	100%
10.4	ESTUCO PLASTICO	m2	788,98	$ 19.232,00	$ 15.173.663,00				0,00	$ 0,00	0%	788,98	$ 15.173.663,00	100%

10.5	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	m2	426,67	$ 16.021,00	$ 6.835.680,00				0,00	$ 0,00	0%	426,67	$ 6.835.680,00	100%
10.6	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	m2	788,98	$ 13.292,00	$ 10.487.122,00				0,00	$ 0,00	0%	788,98	$ 10.487.122,00	100%
10.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CANTERA DURO GRIS 51X51 CM	m2	515,93	$ 121.102,00	$ 62.480.155,00				0,00	$ 0,00	0%	515,93	$ 62.480.155,00	100%
10.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED CERAMICA BLANCA 20X30CM	m2	193,64	$ 88.221,00	$ 17.083.114,00				0,00	$ 0,00	0%	193,64	$ 17.083.114,00	100%
10.9	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m2	18,00	$ 178.658,00	$ 3.215.844,00				0,00	$ 0,00	0%	18,00	$ 3.215.844,00	100%
10.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA PVC BLANCO E=10MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y REMATES PERIMETRALES)	m2	532,84	$ 154.098,00	$ 82.109.578,00				0,00	$ 0,00	0%	532,84	$ 82.109.578,00	100%
10.11	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m	91,76	$ 158.791,00	$ 14.570.662,00				0,00	$ 0,00	0%	91,76	$ 14.570.662,00	100%
10.12	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ANDENES ESTAMPADOS EN CONCRETO, E=0,1M INCLUYE PLANTILLAS S/DISEÑO DE ANDEN, LOSETA TATIL DE PRECAUCION Y	m2	85,76	$ 313.176,00	$ 26.857.974,00				0,00	$ 0,00	0%	85,76	$ 26.857.974,00	100%

	LOSETA TACTIL DE GUIA													
10.13	POYOS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	1,39	$ 1.127.060,00	$ 1.566.613,00				0,00	$ 0,00	0%	1,39	$ 1.566.613,00	100%
10.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN CANTERA DURO GRIS	m	254,08	$ 13.036,00	$ 3.312.187,00				0,00	$ 0,00	0%	254,08	$ 3.312.187,00	100%
10.15	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	m2	507,85	$ 41.912,00	$ 21.285.009,00				0,00	$ 0,00	0%	507,85	$ 21.285.009,00	100%
10.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIONES DE BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE 304. S/DISEÑO.	m2	99,36	$ 1.543.414,00	$ 153.353.615,00				0,00	$ 0,00	0%	99,36	$ 153.353.615,00	100%
10.17	MESON EN CONCRETO 3000 PSI - 20.7 Mpa CON ACABADO EN GRANITO PULIDO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m3	17,62	$ 3.641.135,00	$ 64.156.799,00				0,00	$ 0,00	0%	17,62	$ 64.156.799,00	100%
				Subtotal:	**$ 565.737.574,00**		**$ -**			**$ 0,00**			**$ 565.737.574,00**	
11	**APARATOS SANITARIOS Y PRESION**													
11.1	SANITARIO INSTITUCIONAL VÁLVULA DE BOLA 1" INCLUYE ACCESORIOS	u	16,00	$ 295.145,00	$ 4.722.320,00				0,00	$ 0,00	0%	16,00	$ 4.722.320,00	100%
11.2	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA	u	4,00	$ 1.003.195,00	$ 4.012.780,00				0,00	$ 0,00	0%	4,00	$ 4.012.780,00	100%
11.3	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR	u	28,00	$ 614.996,00	$ 17.219.888,00				0,00	$ 0,00	0%	28,00	$ 17.219.888,00	100%

	INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS													
11.4	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	u	16,00	$ 175.382,00	$ 2.806.112,00				0,00	$ 0,00	0%	16,00	$ 2.806.112,00	100%
11.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON	u	8,00	$ 398.362,00	$ 3.186.896,00				0,00	$ 0,00	0%	8,00	$ 3.186.896,00	100%
11.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL	u	24,00	$ 590.843,00	$ 14.180.232,00				0,00	$ 0,00	0%	24,00	$ 14.180.232,00	100%
				Subtotal:	**$ 46.128.228,00**		**$ -**			**$ 0,00**			**$ 46.128.228,00**	
12	**CARPINTERIA METALICA, MADERA Y DE ALUMINIO**													
12.1	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE FACHADA CON VENTANAL (8,95M2) EN ALUMINIO BLANCO CON PUERTA EN MADERA. S/DISEÑO. INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	u	2,00	$ 17.408.145,00	$ 34.816.290,00				0,00	$ 0,00	0%	2,00	$ 34.816.290,00	100%
12.2	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CONJUNTO DE PUERTA CORREDIZA Y VENTANA EN ALUMINIO BLANCO. H=2.5m L=4.0m. INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE.	u	8,00	$ 4.195.195,00	$ 33.561.560,00				0,00	$ 0,00	0%	8,00	$ 33.561.560,00	100%
12.3	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CONJUNTO DE PUERTA CORREDIZA Y VENTANA EN	u	8,00	$ 3.293.404,00	$ 26.347.232,00				0,00	$ 0,00	0%	8,00	$ 26.347.232,00	100%

	ALUMINIO BLANCO. H=2.5m L=3.0m. INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE.													
12.4	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO BLANCO. TIPO S/DISEÑO. INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	m2	20,80	$ 933.400,00	$ 19.414.720,00				0,00	$ 0,00	0%	20,80	$ 19.414.720,00	100%
12.5	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION VENTANA PROYECTANTE EN ALUMINIO BLANCO. TIPO S/DISEÑO. INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	m2	6,64	$ 1.436.259,00	$ 9.536.760,00				0,00	$ 0,00	0%	6,64	$ 9.536.760,00	100%
12.6	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA TIPO PERSIANA EN ALUMINIO BLANCO. H=2.1m L=1.62m. TIPO S/DISEÑO. INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	u	8,00	$ 2.873.614,00	$ 22.988.912,00				0,00	$ 0,00	0%	8,00	$ 22.988.912,00	100%
12.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA MARCO MADERA CEDRO	m2	28,16	$ 473.145,00	$ 13.323.763,00				0,00	$ 0,00	0%	28,16	$ 13.323.763,00	100%

	TABLA TRIPEX 2.1 X 8 A 9														
12.8	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION BARANDA METALICA EN TUBERIA 2". PARA ESCALERA S/DISEÑO	m	31,94	$ 394.741,00	$ 12.608.028,00				0,00	$ 0,00	0%	31,94	$ 12.608.028,00	100%
12.9	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION BARANDA METALICA EN 5 TUBOS DE 2" PARA BALCON S/DISEÑO	m	72,80	$ 1.180.755,00	$ 85.958.964,00				0,00	$ 0,00	0%	72,80	$ 85.958.964,00	100%
12.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLOSET EN MADERA TIPO. S/DISEÑO	m2	94,94	$ 1.263.207,00	$ 119.928.873,00				0,00	$ 0,00	0%	94,94	$ 119.928.873,00	100%
				Subtotal:	**$ 378.485.102,00**		**$ -**			**$ 0,00**			**$ 378.485.102,00**	
	COSTOS DIRECTOS DEL ALOJAMIENTOS NUEVOS				**$ 1.705.475.837,00**		**$ 57.877.676,00**			**$ 209.062.991,00**			**$ 1.496.412.846,00**	
	PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES EXISTENTES													
13	**DEMOLICION Y DESMONTE**													
13.1	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	m2	239,40	$ 15.712,00	$ 3.761.453,00				0,00	$ 0,00	0%	239,40	$ 3.761.453,00	100%
13.2	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	u	20,00	$ 87.783,00	$ 1.755.660,00				0,00	$ 0,00	0%	20,00	$ 1.755.660,00	100%
13.3	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	m2	13,00	$ 19.175,00	$ 249.275,00				0,00	$ 0,00	0%	13,00	$ 249.275,00	100%

13.4	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	u	4,00	$ 40.819,00	$ 163.276,00				0,00	$ 0,00	0%	4,00	$ 163.276,00	100%
13.5	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	u	4,00	$ 32.654,00	$ 130.616,00				0,00	$ 0,00	0%	4,00	$ 130.616,00	100%
13.6	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	u	4,00	$ 16.325,00	$ 65.300,00				0,00	$ 0,00	0%	4,00	$ 65.300,00	100%
13.7	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	m2	159,61	$ 6.386,00	$ 1.019.269,00				0,00	$ 0,00	0%	159,61	$ 1.019.269,00	100%
13.8	DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	m2	311,12	$ 9.793,00	$ 3.046.798,00				0,00	$ 0,00	0%	311,12	$ 3.046.798,00	100%
13.9	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	m2	257,40	$ 20.886,00	$ 5.376.056,00				0,00	$ 0,00	0%	257,40	$ 5.376.056,00	100%
13.10	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	m3 - km	15244,58	$ 1.718,00	$ 26.190.188,00				0,00	$ 0,00	0%	15244,58	$ 26.190.188,00	100%
				Subtotal:	**$ 41.757.891,00**		$ -			**$ 0,00**			**$ 41.757.891,00**	

14	RED ELECTRICA - BAJA TENSION													
14.1	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	23,00	$ 158.551,00	$ 3.646.673,00				0,00	$ 0,00	0%	23,00	$ 3.646.673,00	100%
14.2	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	32,00	$ 134.464,00	$ 4.302.848,00				0,00	$ 0,00	0%	32,00	$ 4.302.848,00	100%
14.3	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	4,00	$ 227.107,00	$ 908.428,00				0,00	$ 0,00	0%	4,00	$ 908.428,00	100%
14.4	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	8,00	$ 199.056,00	$ 1.592.448,00				0,00	$ 0,00	0%	8,00	$ 1.592.448,00	100%
14.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	4,00	$ 5.566.253,00	$ 22.265.012,00				0,00	$ 0,00	0%	4,00	$ 22.265.012,00	100%
14.6	ALAMBRE CU AISLADO No12 DUCTO INSTALADO	m	100,00	$ 6.074,00	$ 607.400,00				0,00	$ 0,00	0%	100,00	$ 607.400,00	100%
14.7	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	20,00	$ 199.056,00	$ 3.981.120,00				0,00	$ 0,00	0%	20,00	$ 3.981.120,00	100%
				Subtotal:	$ 37.303.929,00		$ -			$ 0,00			$ 37.303.929,00	
15	ACABADOS ARQUITECTONICOS													
15.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30	m2	184,08	$ 63.676,00	$ 11.721.478,00				0,00	$ 0,00	0%	184,08	$ 11.721.478,00	100%

	M(MORTERO TIPO S 1:3)													
15.2	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	m2	20,40	$ 41.730,00	$ 851.292,00				0,00	$ 0,00	0%	20,40	$ 851.292,00	100%
15.3	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	m2	347,76	$ 29.811,00	$ 10.367.073,00				0,00	$ 0,00	0%	347,76	$ 10.367.073,00	100%
15.4	ESTUCO PLASTICO	m2	347,76	$ 19.232,00	$ 6.688.120,00				0,00	$ 0,00	0%	347,76	$ 6.688.120,00	100%
15.5	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	m2	20,40	$ 16.021,00	$ 326.828,00				0,00	$ 0,00	0%	20,40	$ 326.828,00	100%
15.6	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	m2	347,76	$ 13.292,00	$ 4.622.426,00				0,00	$ 0,00	0%	347,76	$ 4.622.426,00	100%
15.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CANTERA DURO GRIS 51X51 CM	m2	311,12	$ 121.102,00	$ 37.677.254,00				0,00	$ 0,00	0%	311,12	$ 37.677.254,00	100%
15.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED CERAMICA BLANCA 20X30CM	m2	71,88	$ 89.317,00	$ 6.420.106,00				0,00	$ 0,00	0%	71,88	$ 6.420.106,00	100%
15.9	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m2	2,16	$ 178.658,00	$ 385.901,00				0,00	$ 0,00	0%	2,16	$ 385.901,00	100%
15.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA PVC BLANCO E=10MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y REMATES PERIMETRALES)	m2	311,12	$ 154.098,00	$ 47.942.970,00				0,00	$ 0,00	0%	311,12	$ 47.942.970,00	100%

15.11	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m	68,06	$ 158.791,00	$ 10.807.315,00				0,00	$ 0,00	0%	68,06	$ 10.807.315,00	100%
15.12	ESCARIFICADO DE FACHADA Y PINTURA IMPERMEABILIZANTE COLOR INSTITUCIONAL	m2	310,41	$ 37.562,00	$ 11.659.620,00				0,00	$ 0,00	0%	310,41	$ 11.659.620,00	100%
15.13	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ANDENES ESTAMPADOS EN CONCRETO, E=0,1M INCLUYE PLANTILLAS S/DISEÑO DE ANDEN, LOSETA TATIL DE PRECAUCION Y LOSETA TACTIL DE GUIA	m2	183,18	$ 313.176,00	$ 57.367.580,00				0,00	$ 0,00	0%	183,18	$ 57.367.580,00	100%
15.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN CANTERA DURO GRIS	m	268,00	$ 13.036,00	$ 3.493.648,00				0,00	$ 0,00	0%	268,00	$ 3.493.648,00	100%
15.15	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	m2	311,12	$ 41.912,00	$ 13.039.661,00				0,00	$ 0,00	0%	311,12	$ 13.039.661,00	100%
				Subtotal:	**$ 223.371.272,00**		**$ -**			**$ 0,00**			**$ 223.371.272,00**	
16	**CARPINTERIA METALICA, MADERA Y DE ALUMINIO**													
16.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA MARCO MADERA CEDRO TABLA TRIPEX 2.1 X 8 A 9	u	16,00	$ 473.145,00	$ 7.570.320,00				0,00	$ 0,00	0%	16,00	$ 7.570.320,00	100%
16.2	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION	m2	18,72	$ 933.400,00	$ 17.473.248,00				0,00	$ 0,00	0%	18,72	$ 17.473.248,00	100%

	VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO BLANCO. TIPO S/DISEÑO. INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE													
16.3	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION VENTANA PROYECTANTE EN ALUMINIO BLANCO. TIPO S/DISEÑO. INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	m2	1,80	$ 1.436.259,00	$ 2.585.266,00				0,00	$ 0,00	0%	1,80	$ 2.585.266,00	100%
16.4	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION VENTANA FIJA ALUMINIO BLANCO. 2,70m x 3,05m. INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	u	1,00	$ 5.005.114,00	$ 5.005.114,00				0,00	$ 0,00	0%	1,00	$ 5.005.114,00	100%
16.5	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION VENTANA FIJA ALUMINIO BLANCO. 2,70m x 2,30m. INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	u	1,00	$ 3.548.706,00	$ 3.548.706,00				0,00	$ 0,00	0%	1,00	$ 3.548.706,00	100%
16.6	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION PUERTA ALUMINIO BLANCO. 1,80m x	u	2,00	$ 3.354.750,00	$ 6.709.500,00				0,00	$ 0,00	0%	2,00	$ 6.709.500,00	100%

	1,68m. INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE													
16.7	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION PUERTA ALUMINIO BLANCO. 1,50m x 1,68m. INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	u	4,00	$ 3.180.964,00	$ 12.723.856,00				0,00	$ 0,00	0%	4,00	$ 12.723.856,00	100%
16.8	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION PUERTA ALUMINIO BLANCO. 0,60m x 1,68m. INCLUYE VIDRIO DE 5mm CON PELICULA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	u	2,00	$ 2.405.338,00	$ 4.810.676,00				0,00	$ 0,00	0%	2,00	$ 4.810.676,00	100%
16.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CLOSET EN MADERATIPO. S/DISEÑO	m2	39,60	$ 1.263.207,00	$ 50.022.997,00				0,00	$ 0,00	0%	39,60	$ 50.022.997,00	100%
16.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINA INTEGRAL TIPO. S/DISEÑO. DE 3,3M DE LARGO X 0,6 DE ANCHO	u	4,00	$ 8.424.020,00	$ 33.696.080,00				0,00	$ 0,00	0%	4,00	$ 33.696.080,00	100%
				Subtotal:	**$ 144.145.763,00**		**$ -**			**$ 0,00**			**$ 144.145.763,00**	
17	**APARATOS SANITARIOS Y PRESION**													
17.1	SANITARIO INSTITUCIONAL VÁLVULA DE BOLA 1" INCLUYE ACCESORIOS	u	4,00	$ 295.145,00	$ 1.180.580,00				0,00	$ 0,00	0%	4,00	$ 1.180.580,00	100%

17.2	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	u	4,00	$ 614.996,00	$ 2.459.984,00				0,00	$ 0,00	0%	4,00	$ 2.459.984,00	100%
17.3	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	u	4,00	$ 175.382,00	$ 701.528,00				0,00	$ 0,00	0%	4,00	$ 701.528,00	100%
17.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE JABON	u	4,00	$ 398.362,00	$ 1.593.448,00				0,00	$ 0,00	0%	4,00	$ 1.593.448,00	100%
17.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL	u	4,00	$ 554.843,00	$ 2.219.372,00				0,00	$ 0,00	0%	4,00	$ 2.219.372,00	100%
				Subtotal:	**$ 8.154.912,00**		**$ -**			**$ 0,00**			**$ 8.154.912,00**	
	COSTOS DIRECTOS DEL MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES EXISTENTES				**$ 454.733.767,00**		**$ -**			**$ 0,00**			**$ 454.733.767,00**	
	PRESUPUESTO TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMAMIENTO DE AGUA													
18	**PRELIMINARES**													
18.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	m2	12,25	$ 3.568,00	$ 43.708,00				12,25	$ 43.708,00	100%	0,00	$ 0,00	0%
18.2	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	m2	12,25	$ 8.160,00	$ 99.960,00				0,00	$ 0,00	0%	12,25	$ 99.960,00	100%
18.3	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN INCLUYE CARGUE	m3	12,06	$ 36.161,00	$ 436.102,00				0,00	$ 0,00	0%	12,06	$ 436.102,00	100%
18.4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	m3 - km	78,39	$ 1.718,00	$ 134.674,00				0,00	$ 0,00	0%	78,39	$ 134.674,00	100%
				Subtotal:	**$ 714.444,00**		**$ -**			**$ 43.708,00**			**$ 670.736,00**	
19	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACABADOS**													

19.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	m3	0,46	$ 765.474,00	$ 352.118,00				0,00	$ 0,00	0%	0,46	$ 352.118,00	100%
19.2	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	1,72	$ 1.108.301,00	$ 1.906.278,00				0,00	$ 0,00	0%	1,72	$ 1.906.278,00	100%
19.3	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	0,60	$ 1.187.618,00	$ 712.571,00				0,00	$ 0,00	0%	0,60	$ 712.571,00	100%
19.4	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	3,53	$ 1.581.877,00	$ 5.584.026,00				0,00	$ 0,00	0%	3,53	$ 5.584.026,00	100%
19.5	VIGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	1,20	$ 1.538.398,00	$ 1.846.078,00				0,00	$ 0,00	0%	1,20	$ 1.846.078,00	100%
19.6	MUROS ARMADOS CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) EN ALTURAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	8,32	$ 1.413.921,00	$ 11.763.823,00				0,00	$ 0,00	0%	8,32	$ 11.763.823,00	100%
19.7	TAPA EN CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCIÓN 3000 PSI E=0.08 M. INCLUYE MARCO EN PLATINA 2 1/2" Y MALLA DE REFUERZO EN VARILLA 3/8"	m2	0,64	$ 231.807,00	$ 148.356,00				0,00	$ 0,00	0%	0,64	$ 148.356,00	100%
19.8	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION ESCALERA TIPO GATO EN TUBO 4" Y 2" S/DISEÑO	u	1,00	$ 9.294.934,00	$ 9.294.934,00				0,00	$ 0,00	0%	1,00	$ 9.294.934,00	100%

19.9	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	0,08	$ 1.054.377,00	$ 84.350,00				0,00	$ 0,00	0%	0,08	$ 84.350,00	100%
19.10	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	kg	1954,95	$ 9.265,00	$ 18.112.612,00				0,00	$ 0,00	0%	1954,95	$ 18.112.612,00	100%
19.11	PINTURA VINILO SOBRE CONCRETO AL INTERPERIE, ACABADO CON COLOR INSTITUCIONAL	m2	121,94	$ 38.735,00	$ 4.723.346,00				0,00	$ 0,00	0%	121,94	$ 4.723.346,00	100%
19.12	SUMINISTRO E INSTALACION SELLO DE JUNTAS CON CINTA SIKA WATERBAR O SIMILAR	m	26,40	$ 112.450,00	$ 2.968.680,00				0,00	$ 0,00	0%	26,40	$ 2.968.680,00	100%
				Subtotal:	**$ 57.497.172,00**		**$ -**			**$ 0,00**			**$ 57.497.172,00**	
				COSTOS DIRECTOS DEL TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMAMIENTON DE AGUA	**$ 58.211.616,00**		**$ -**			**$ 43.708,00**			**$ 58.167.908,00**	
	PRESUPUESTO CERRAMIENTO													
20	**PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES**													
20.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	m2	134,34	$ 3.568,00	$ 479.325,00				134,34	$ 479.325,00	100%	0,00	$ 0,00	0%
20.2	DEMOLICIO DEL CERRAMIENTO EXISTENTE. INCLUYE	m	335,85	$ 91.320,00	$ 30.669.822,00				0,00	$ 0,00	0%	335,85	$ 30.669.822,00	100%

	TRASIEGO Y CARGUE MANUAL													
20.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	m3 - km	1899,23	$ 1.718,00	$ 3.262.877,00				0,00	$ 0,00	0%	1899,23	$ 3.262.877,00	100%
				Subtotal:	**$ 34.412.024,00**		**$ -**			**$ 479.325,00**			**$ 33.932.699,00**	
21	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO**													
21.1	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	m3	39,52	$ 791.802,00	$ 31.292.015,00				0,00	$ 0,00	0%	39,52	$ 31.292.015,00	100%
21.2	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	41,17	$ 1.187.618,00	$ 48.894.233,00				0,00	$ 0,00	0%	41,17	$ 48.894.233,00	100%
21.3	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60,000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	kg	2547,00	$ 9.265,00	$ 23.597.955,00				0,00	$ 0,00	0%	2547,00	$ 23.597.955,00	100%
21.4	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO 2" (e=3.90MM), (H=2,5m), SEPARACION DE EJES A 150MM, (INCLUYE: TAPA PARA TUBERIA, YEE SOPORTE DE 0.5M, ANCLAJE, CONCERTINA)	m	329,33	$ 2.107.712,00	$ 694.132.793,00				0,00	$ 0,00	0%	329,33	$ 694.132.793,00	100%
21.5	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	m2	217,58	$ 16.021,00	$ 3.485.849,00				0,00	$ 0,00	0%	217,58	$ 3.485.849,00	100%

21.6	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	0,60	$ 1.108.301,00	$ 664.981,00				0,00	$ 0,00	0%	0,60	$ 664.981,00	100%
21.7	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	1,68	$ 1.581.877,00	$ 2.657.553,00				0,00	$ 0,00	0%	1,68	$ 2.657.553,00	100%
21.8	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACIÓN DE PORTON ABATIBLE A DOS HOJAS, H=2.5M X L=6M INCLUYE MARCO EN TUBO GALVANIZADO 2" (e=3.90MM), Y TUBERIA INTERNA VERTICAL EN TUBO GALVANIZADO 2" (e=1,90MM) SEPARACION DE EJES A 150MM. (INCLUYE: ANCLAJES A COLUMNAS DE SOPORTES, CERRADURA TIPO PASADOR)	u	1,00	$ 9.868.388,00	$ 9.868.388,00				0,00	$ 0,00	0%	1,00	$ 9.868.388,00	100%
				Subtotal:	**$ 814.593.767,00**		**$** -			**$ 0,00**			**$ 814.593.767,00**	
				COSTOS DIRECTOS DEL CERRAMIENTO	**$ 849.005.791,00**		**$** -			**$ 479.325,00**			**$ 848.526.466,00**	
				COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO	**$ 3.067.427.011,00**		**$ 57.877.676,00**			**$ 209.586.024,00**			**$ 2.857.840.987,00**	
	Administración	29,00%	$ 889.553.833,19			$ 16.784.526,04			$ 60.779.946,96			$ 828.773.886,23		
	Imprevistos	1,00%	$ 30.674.270,11			$ 578.776,76			$ 2.095.860,24			$ 28.578.409,87		
	Utilidad	4,00%	$ 122.697.080,44			$ 2.315.107,04			$ 8.383.440,96			$ 114.313.639,48		
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$ 1.042.925.184,00**		**$ 19.678.410,00**			**$ 71.259.248,00**			**$ 971.665.936,00**	
				VALOR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$ 75.936.264,00	8,00%	$ 6.074.901,12		47,33%	$ 35.943.164,96		52,67%	$ 39.993.099,04	
				VALOR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	$ 119.989.209,00	10,25%	$ 12.303.949,00		52,55%	$ 63.050.332,00		47,45%	$ 56.938.877,00	
				VALOR TOTAL DE OBRA	**$ 4.306.277.668,00**		$ 95.934.936,12	2,23%		$ 379.838.768,96	8,82%		$ 3.926.438.899,04	91,18%

Tabla 16. Ejecución mensual del proyecto


5.4. Cuadro de avance acumulado mes a mes

CONTRATO No. 1683 DE 2025 OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META" CUADRO DE COMPARACION DE COSTOS DELPROYECTO								
No. MES	VR. MENSUAL PROGRAMADO	VR PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAMADO MENSUAL	% PROGRAMADO ACUMULADO	VR. MENSUAL EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO MENSUAL	% EJECUTADO ACUMULADO
18/12/2025	$0	$0	0,00%	0,00%	$0	$0	0,00%	0,00%
31/12/2025	$28.037.949	$28.037.949	0,65%	0,65%	$22.553.338,67	$22.553.338,67	0,52%	0,52%
31/01/2026	$77.425.939	$105.463.888	1,80%	2,45%	$34.577.031,67	$57.130.370,33	0,80%	1,33%
28/02/2026	$191.735.345	$297.199.233	4,45%	6,90%	$121.980.572,67	$179.110.943,00	2,83%	4,16%
31/03/2026	$187.737.987	$484.937.220	4,36%	11,26%	$104.792.888,84	$283.903.831,84	2,43%	6,59%
30/04/2026	$221.627.087	$706.564.307	5,15%	16,41%	$95.934.936,12	$379.838.767,96	2,23%	8,82%
31/05/2026	$331.938.505	$1.038.502.812	7,71%	24,12%				
30/06/2026	$822.518.250	$1.861.021.062	19,10%	43,22%				
31/07/2026	$1.118.293.153	$2.979.314.215	25,97%	69,19%				
17/08/2026	$1.326.963.453	$4.306.277.668	30,81%	100,00%				

Tabla 17. Avance acumulado mes a mes


% PROGRAMADO	%EJECUTADO	ATRASO (-) O ADELANTO (+)
16,41%	8,82%	-7,59%

Tabla 18. % Programado VS %Ejecutado

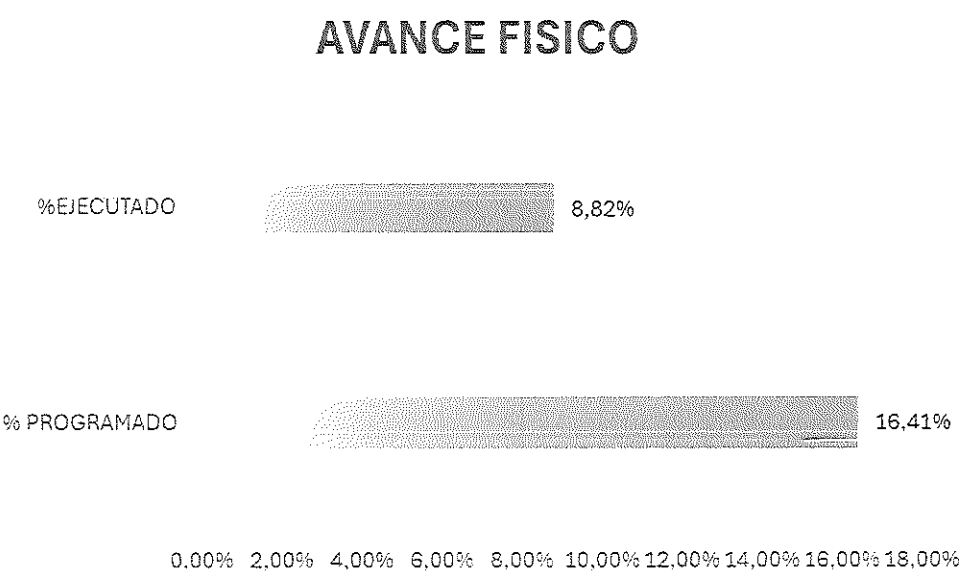


Grafica 1. Avance fisico

5.5. Gráficb de avance de obra

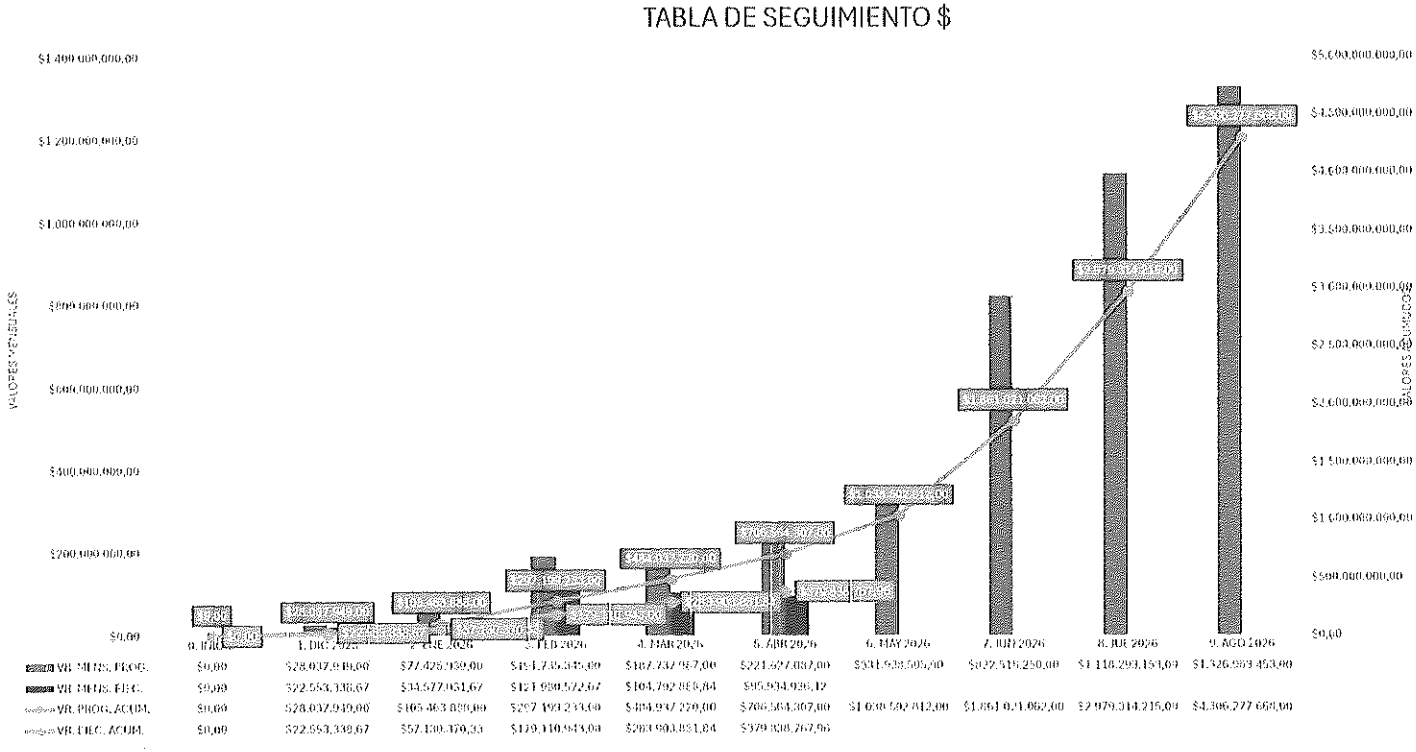

Grafica 2. Avance en dinero

TABLA DE SEGUIMIENTO %

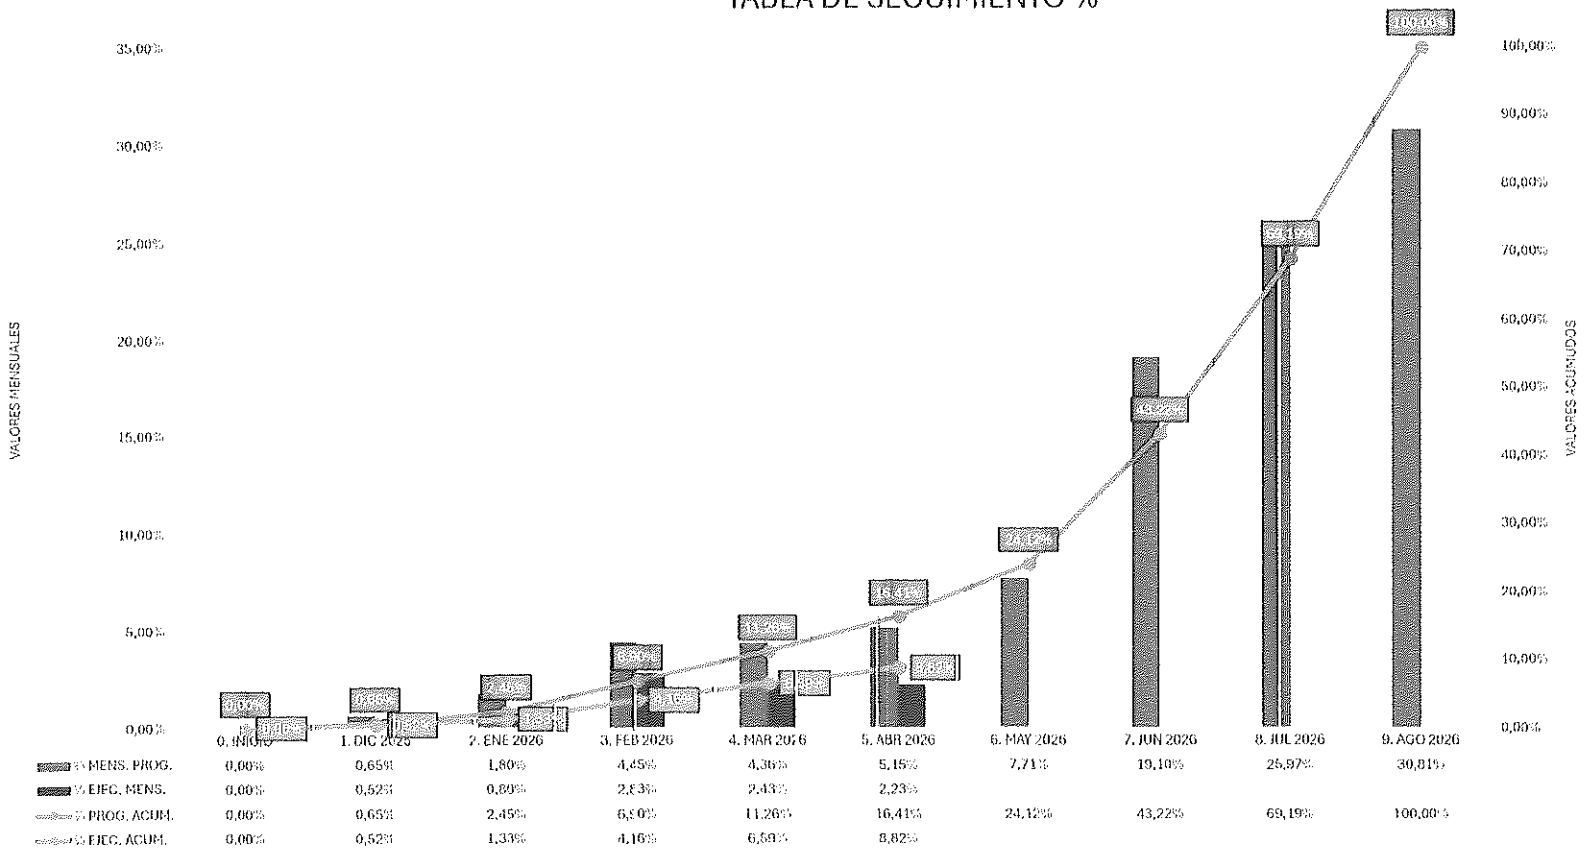

	0. INICIO	1. DIC 2025	2. ENE 2026	3. FEB 2026	4. MAR 2026	5. ABR 2026	6. MAY 2026	7. JUN 2026	8. JUL 2026	9. AGO 2026
% MENS. PROG.	0,00%	0,65%	1,80%	4,45%	4,36%	5,15%	7,71%	19,10%	25,97%	30,81%
% EJEC. MENS.	0,00%	0,52%	0,80%	2,83%	2,43%	2,23%				
% PROG. ACUM.	0,00%	0,65%	2,45%	6,90%	11,26%	16,41%	24,12%	43,22%	69,19%	100,00%
% EJEC. ACUM.	0,00%	0,52%	1,33%	4,16%	6,59%	8,82%				

Grafica 3. Avance en porcentaje

5.6. Control del estado del tiempo resumen

A continuación, se presenta una tabla con la información del clima durante el mes de ABRIL en Puerto Gaitan, Meta. Los datos cubren el periodo del 1 al 30 de abril de 2026, lo que resulta importante su seguimiento para la ejecución de las actividades en la obra.

Puerto Gaitán — CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO — UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN

CONTRATO No.	1933 DE 2025
OBJETO:	"CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
PERIODO:	01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026

MES / DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DICIEMBRE																			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ENERO	1	1	1	1	1	2	4	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FEBRERO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
MARZO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3
ABRIL	1	3	1	4	3	3	3	1	1	3	1	1	1	1	1	4	4	1	1	4	5	1	1	1	4	4	1	1	3	1	
MAYO																															
JUNIO																															
JUUO																															
AGOSTO																															

Tabla 19. Control del tiempo

CONTROL DEL TIEMPO	DESDE:	DD	MM	AA	HASTA:	DD	MM	AA
		1	4	2.026		30	4	2.026

CONCEPTO	TOTALES		CONVENCIONES	CV	No.	COLOR
TOTAL DE DÍAS SOLEADOS	17	56,67 %	DÍAS SOLEADOS	DS	1	
TOTAL DÍAS NUBLADOS	0	0,00 %	DÍAS NUBLADOS	DN	2	
TOTAL DÍAS LLUVIOSOS	6	20,00 %	LLUVIAS FUERTES	LLF	3	
	6	20,00 %	LLUVIAS MODERADAS	LLM	4	
	1	3,33 %	LLUVIAS AISLADAS	LLA	5	
TOTAL	30	100,00 %				

ESTADO DEL TIEMPO DURANTE EL PERIODO		
FECHA DE INICIO	FECHA ACTUAL	
1 DE ABRIL DE 2026	30 DE ABRIL DE 2026	
RESUMEN	DÍAS	%
TOTAL DÍAS SECOS	17	56,67 %
TOTAL DÍAS LLUVIOSO	13	43,33 %
TOTAL	30	100,00 %

ESTADO DEL TIEMPO ACUMULADO OBRA		
FECHA DE INICIO	FECHA ACTUAL	
18 DE DICIEMBRE DE 2025	30 DE ABRIL DE 2026	
RESUMEN	DÍAS	%
TOTAL DÍAS SECOS	109	81,34 %
TOTAL DÍAS LLUVIOSOS	25	18,66 %
TOTAL	134	100,00 %

Tabla 20. Resumen control del tiempo

6. Información administrativa del contrato

6.2. Relación personal de obra (profesional, técnico, operativo)

De acuerdo con las necesidades del proyecto y el personal propuesto, se contó con la disposición del personal descrito en la siguiente tabla:

PERIODO 01/04/26 – 30/04/26

PERSONAL						
CARGO	**NOMBRE Y APELLIDOS**	**C.C. T.P.**	**AFP**	**EPS**	**ARL**	**PLANILLA NO.**
Director de Obra	Gonzalo Becerra Mejia	17.310.424	N/A	EPS Sanitas	Sura	1081588727
Residente de Obra	Jennifer Andrea Becerra Morales	1.121.852.433	Colpensiones	EPS Sanitas	Sura	1081588727
Profesional en Salud Ocupacional	Mayra Alejandra Cardenas Lesmes	1.121.884.993	Porvenir	Nueva Eps	Sura	1081588727
Topografo	Marcos Didier Delgadillo Delgadillo	80.166.369	Porvenir	Capital Salud	Sura	1081588727
Ingeniera Ambiental	Jenny Paola Feria Triana	1.121.863.524	Protección	Sanitas	Sura	1081588727
Aux. Administrativo	Brayan Steven Rivera Martinez	1.193.092.733	Porvenir	EPS Sanitas	Sura	1081588727
Aux. Residente de Obra	Margie Daniela Herrera Paez	1.122.144.736	Proteccion	Famisanar	Sura	1081588727
Aux. Profesional SST	Yonli Yulieth Lozano Gonzalez	1.121.867.537	Colfondos	Famisanar	Sura	1081588727
Maestro Obra	Oscar Alexander Patiño Perez	86.055.645	Colfondos	Famisanar	Sura	1081588727
Oficial	Segundo Roa	93.372.770	Porvenir	Nueva eps	Sura	1081588727
Ayudante de Obra	Agustin Aguilar Gonzalez	86.008.125	Porvenir	Famisanar	Sura	1081588727
Ayudante de Obra	Dagoberto Cortes	74.857.071	Porvenir	Capital salud	Sura	1081588727
Ayudante de Obra	Elkin Fabian Zambrano Alvarez	1.121.922.788	Porvenir	Famisanar	Sura	1081588727
Ayudante de Obra	Jhoni Rodriguez Perez	1.124.999.733	Colfondos	EPS Pijaosalud	Sura	1081588727
Ayudante de Obra	Juan Martin Bolivar Gaitan	1.125.549.456	Porvenir	Nueva EPS	Sura	1081588727
Ayudante de Obra	Vicente Gaitan Gaitan	8.192.573	Protección	EPS Mallamas	Sura	1081588727
Ayudante de Obra	Yesid Galindo Gaitan	1.006.946.002	Porvenir	Nueva Eps	Sura	1081588727
Ayudante de Obra	Alexis David Beltran Yavinape	1.124.990.792	Colpensiones	Nueva Eps	Sura	1081588727

Tabla 21. Relación personal

6.3. Pagos de seguridad social y parafiscales

En Anexos se encuentran las planillas de pago de seguridad social correspondientes al periodo del informe de cada uno de los empleados tanto profesionales, como personal

operativos y técnicos junto con el certificado emitido por el contador público que avala dichos pagos.

7. Cuadro resumen ensayos de laboratorio

Durante el periodo analizado por el presente informe, no se realizaron tomas de muestras.

8. Control de maquinaria y equipos

Durante el periodo correspondiente al presente informe, no se registró movimiento, ingreso ni retiro de maquinaria y equipos en obra, debido a que las actividades ejecutadas durante el mes se desarrollaron con recursos manuales y equipos menores, sin requerir el uso de maquinaria pesada.

En consecuencia, no se presenta relación de equipos para el periodo evaluado.

No obstante, se continúa realizando el control y seguimiento permanente de los recursos disponibles en obra, garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas y administrativas establecidas en el contrato.

9. Información ambiental del contrato

9.2. Certificación del cumplimiento de los permisos, autorizaciones y licencias

En cumplimiento de los requerimientos ambientales y normativos aplicables al proyecto, se cuenta con la documentación legal necesaria que acredita la viabilidad de la intervención, incluyendo el Certificado de Tradición y Libertad del predio donde se localiza la Estación de Policía, el certificado predial y la licencia de construcción. Estos documentos respaldan el uso y la intervención del inmueble conforme a la normatividad urbanística y ambiental vigente.

Así mismo, se cuenta con la aprobación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) por parte de la Secretaría de Infraestructura competente, documento que establece las medidas de manejo, prevención, mitigación y control de los impactos ambientales asociados al desarrollo del proyecto.

Toda la documentación mencionada será incorporada como anexo al final del informe, para efectos de verificación y control por parte de la interventoría y las entidades competentes.

9.3. Seguimiento a la disposición de materiales

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, se realizó seguimiento permanente a la adecuada disposición, manejo y control de los materiales utilizados en el desarrollo del proyecto, en concordancia con las especificaciones técnicas, lineamientos ambientales y buenas prácticas constructivas.

Se verificó el correcto almacenamiento, organización y uso de los materiales dentro del área de obra, garantizando su protección frente a agentes externos y evitando interferencias con las actividades constructivas y la movilidad interna. Asimismo, se controló la disposición de residuos y sobrantes, promoviendo el orden y la adecuada gestión de los mismos.

De igual manera, se presentaron ajustes en el suministro y utilización de algunos materiales debido a las revisiones técnicas en los componentes del proyecto y a las limitaciones de acceso a ciertas áreas, los cuales fueron gestionados mediante la coordinación entre el contratista, la interventoría y el personal en obra.

En general, el manejo y disposición de los materiales durante el periodo evaluado se desarrolló de manera controlada, cumpliendo con los criterios técnicos establecidos y contribuyendo al desarrollo de la obra.

10. Conclusiones

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026 se evidenció avance en la ejecución de actividades constructivas del proyecto, especialmente en elementos de piso, estructura y redes hidráulicas, conforme a la programación establecida.

De manera paralela, el desarrollo de recorridos técnicos y la elaboración de estudios en los componentes hidráulico y eléctrico han permitido identificar la necesidad de ajustes al alcance contractual, encontrándose en proceso la elaboración del Acta Modificatoria No. 1 con su respectivo adicional y solicitud de prórroga.

No obstante, se presentaron limitaciones para la intervención de algunas áreas, particularmente en la edificación "Casa Blanca", debido a condiciones de ocupación, lo que ha incidido en el ritmo de ejecución de las actividades.

Aunque se han registrado avances en obra, los ajustes técnicos en estudio y las condiciones logísticas del proyecto han generado retrasos en la ejecución, los cuales se encuentran en proceso de gestión para minimizar su impacto en el cronograma.

11. Valla informativa

VALLA INFORMATIVA CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025



12. Anexos

1. Registro fotográfico.
2. Control clima.
3. Bitácoras de obra.
4. Informe de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).

5. Informe seguimiento PMA.
6. Informe seguimiento PMT.
7. Nómina del personal.
8. Planillas de pago de la seguridad social y certificación del contador.
9. Certificado de calidad
10. Certificados de interventoría

Los siguientes son los profesionales encargados de la elaboración del presente informe mensual de obra.

Director de Obra
Gonzalo Becerra Mejia
CC: 17.310.424 de Villavicencio
M.P: 25700-40739 CND

Residente de Obra
Jennifer Andrea Becerra Morales
CC: 1.121.852.433 de Villavicencio
M.P: A71052012 - 1121852433

Vo.Bo. interventoría

Director de Interventoría
Robison Fernando Marroquin Pérez
CC: 86.053.753 de Villavicencio
M.P: 25202-090337 CND

Residente de Interventoría
Johathan Andres Gaviria Contreras
CC: 1.121.844.182 de Villavicencio
M.P: 25202-193762 CND

UNIÓN TEMPORAL
INGE
POLICIA
GAITÁN

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CALLE 2 No 27 – 116 Villavicencio – Meta
Tel. 310 888 54 20

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN



Fotografia 1. Se realiza fundida para placa de contrapiso



Fotografia 2. Se realiza fundida para placa de contrapiso



Fotografia 3. Se realiza fundida para placa de contrapiso



Fotografia 4. Se realiza fundida para placa de contrapiso



Fotografia 5. Se realiza fundida para placa de contrapiso




Fotografia 6. Se realiza fundida para placa de contrapiso


ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE




Fotografia 7. Se realiza amarre de acero para vigas aéreas

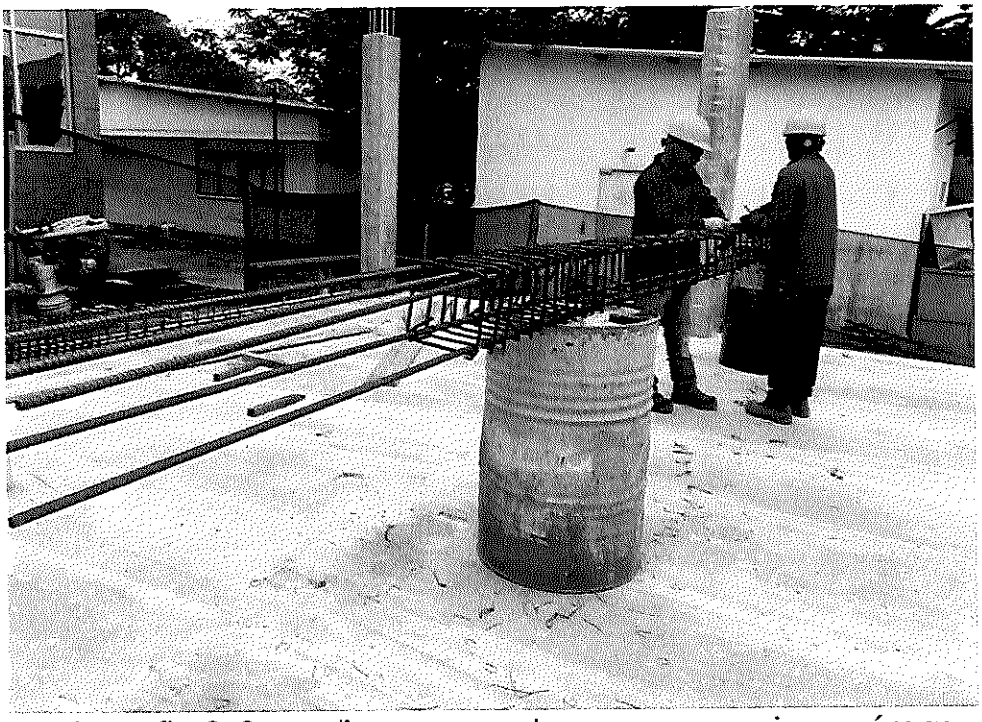

Fotografia 8. Se realiza amarre de acero para vigas aéreas

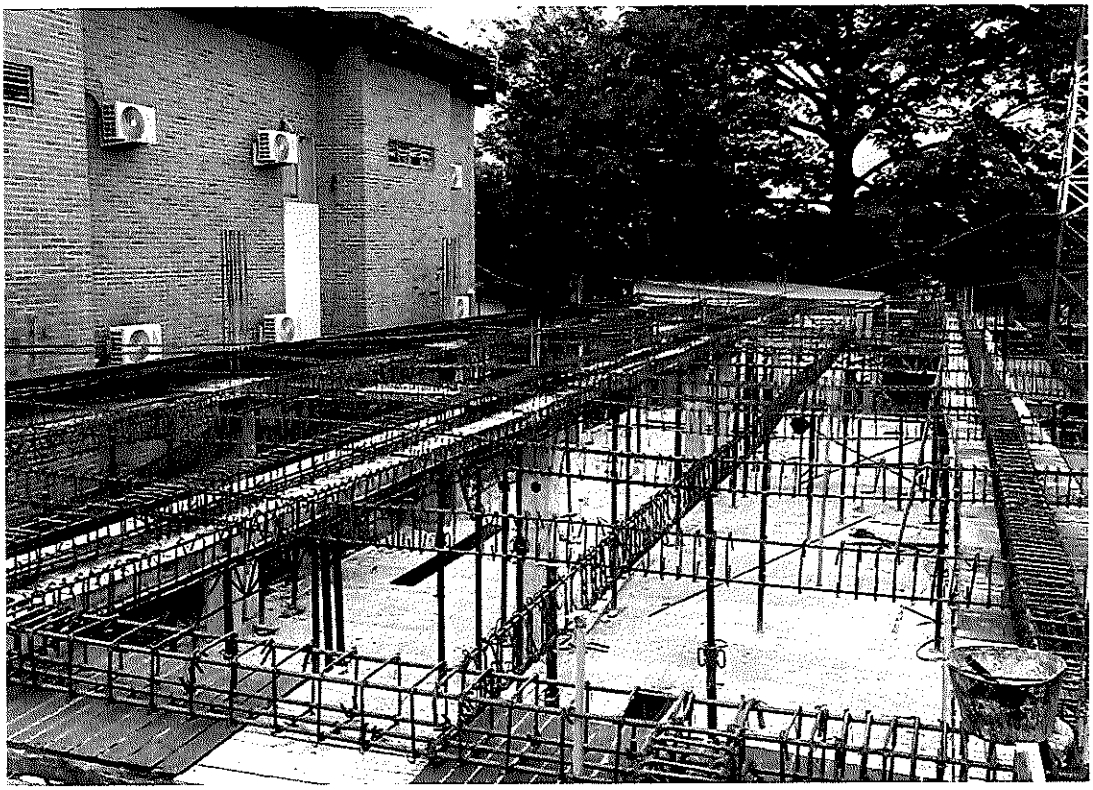


Fotografia 9. Se realiza amarre de acero para vigas aéreas

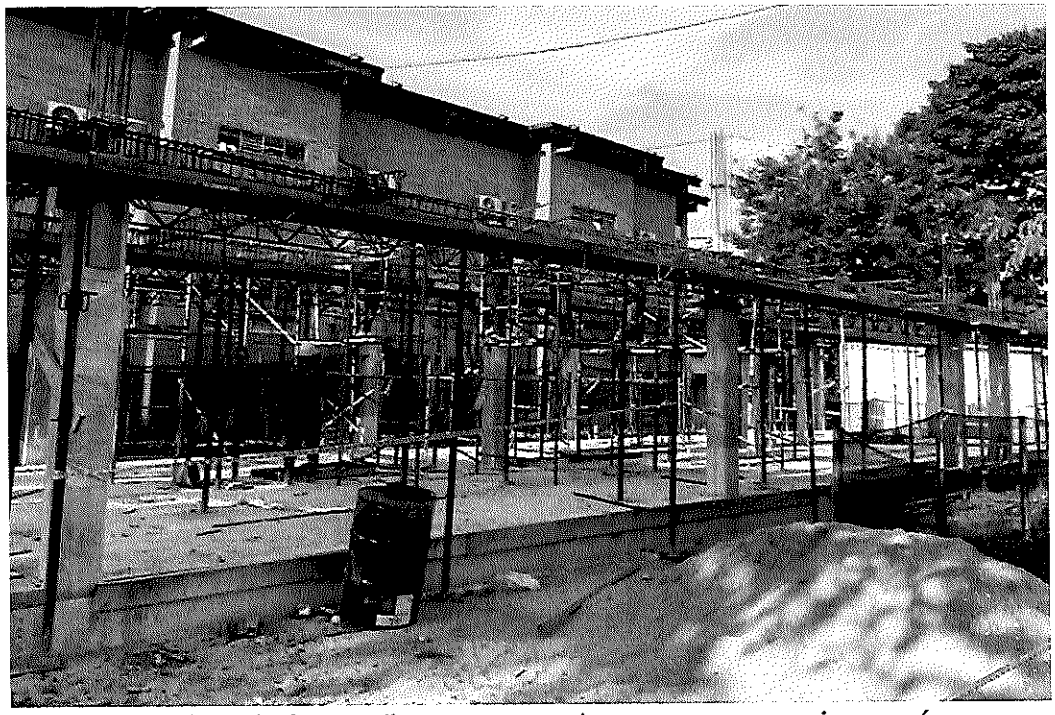


Fotografia 10. Se realiza amarre de acero para vigas aéreas

RED DE PRESIÓN

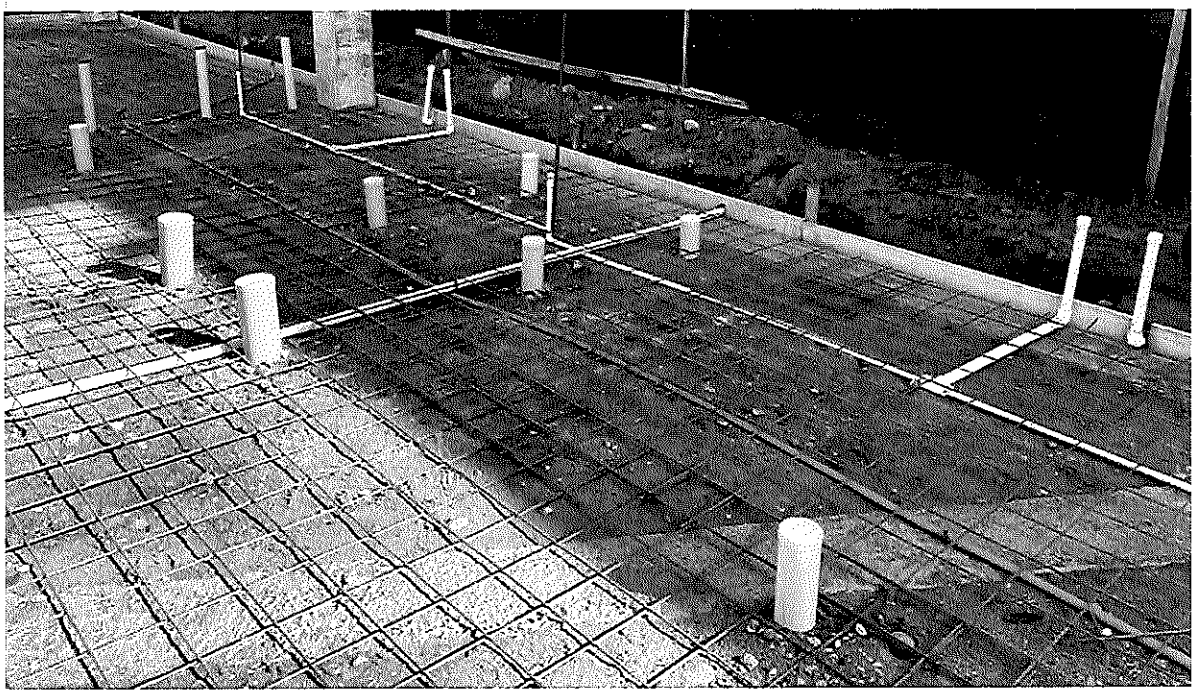


Fotografia 11. Se realiza instalacion de redes de presión para baños de primer piso

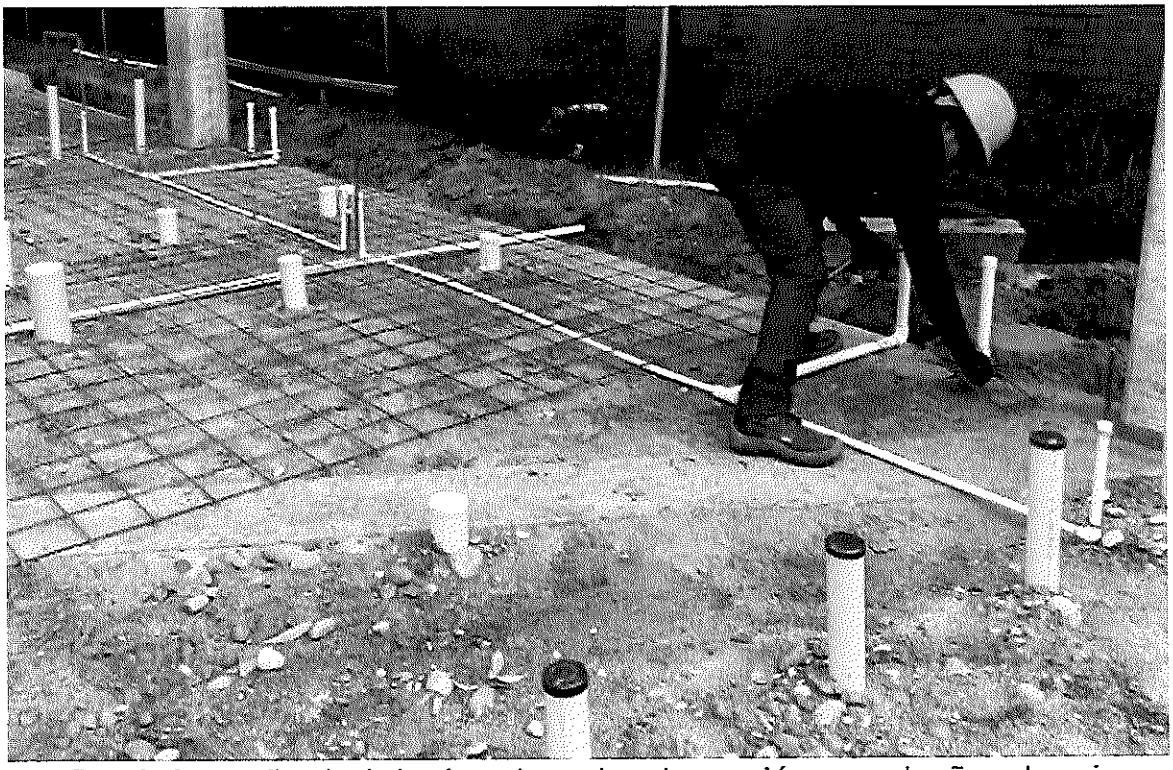

Fotografia 12. Se realiza instalacion de redes de presión para baños de primer piso


RECORRIDOS EN OBRA

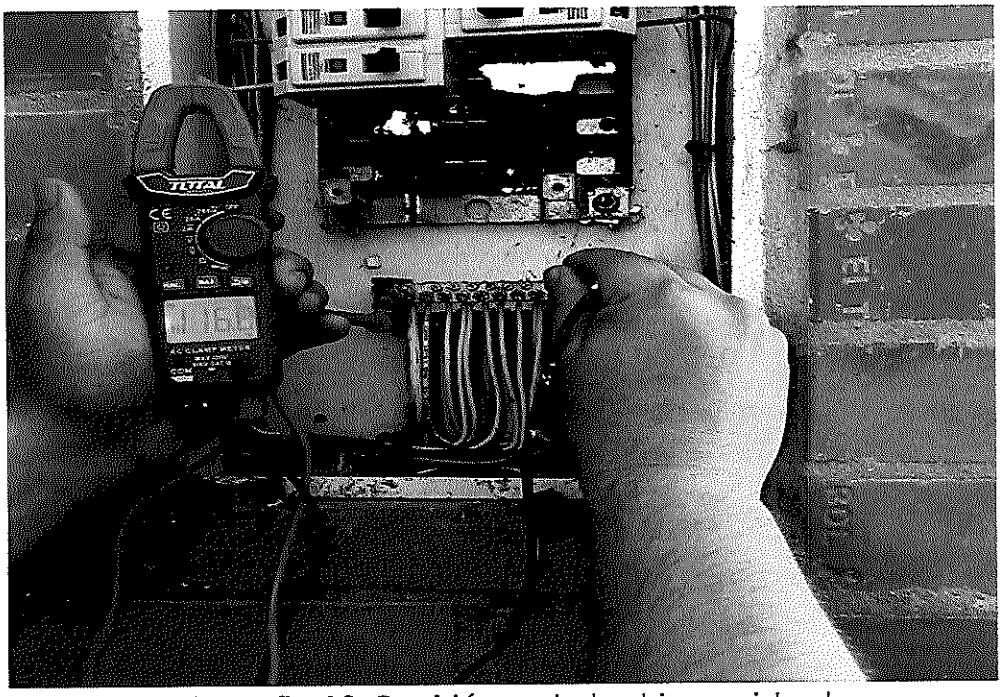


Fotografia 13. Revisión red electrica existente



Fotografia 14. Revisión suministro de agua actual

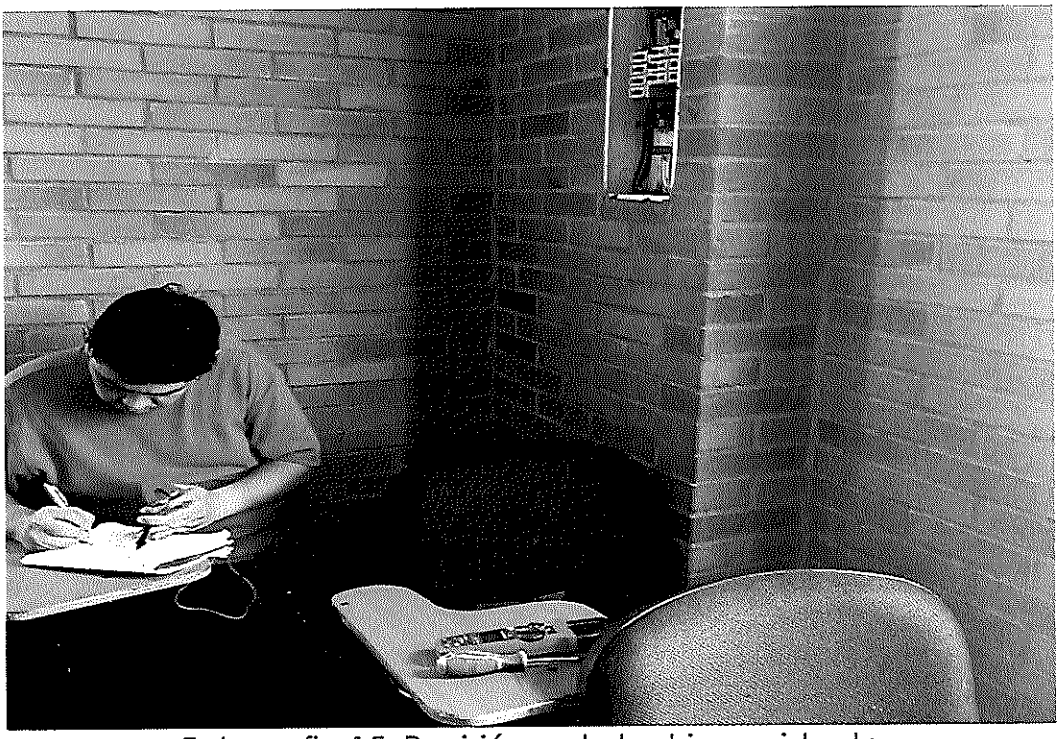


Fotografia 15. Revisión red electrica existente

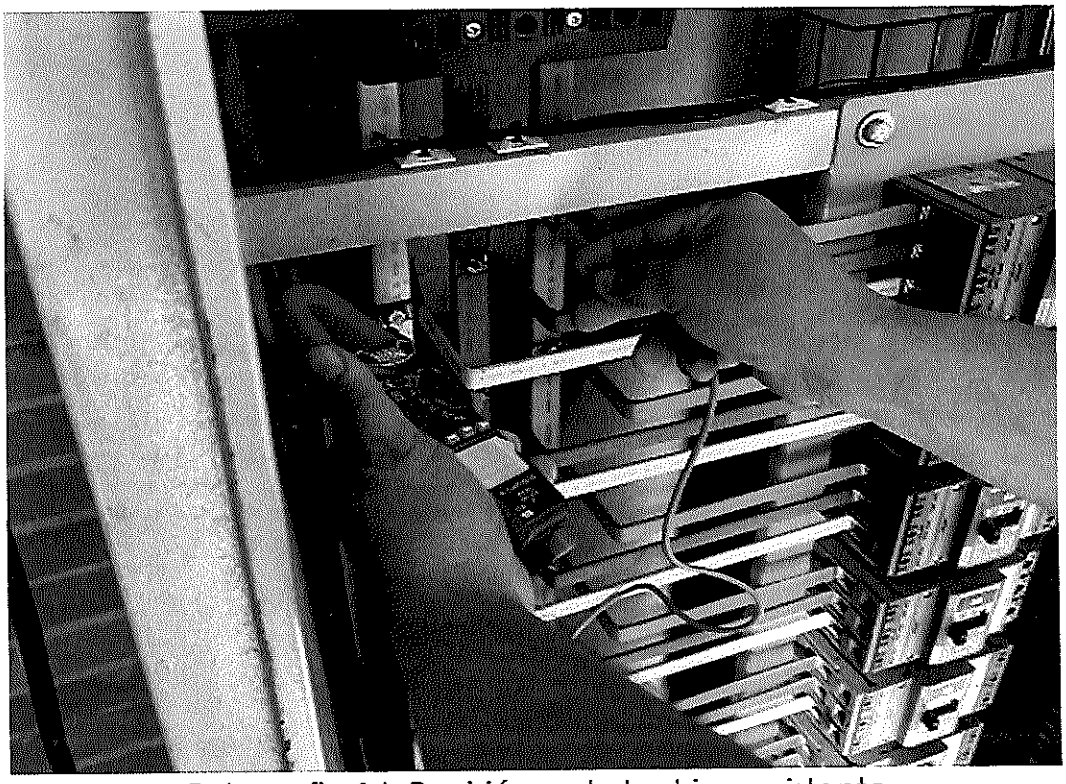

Fotografia 16. Revisión red electrica existente



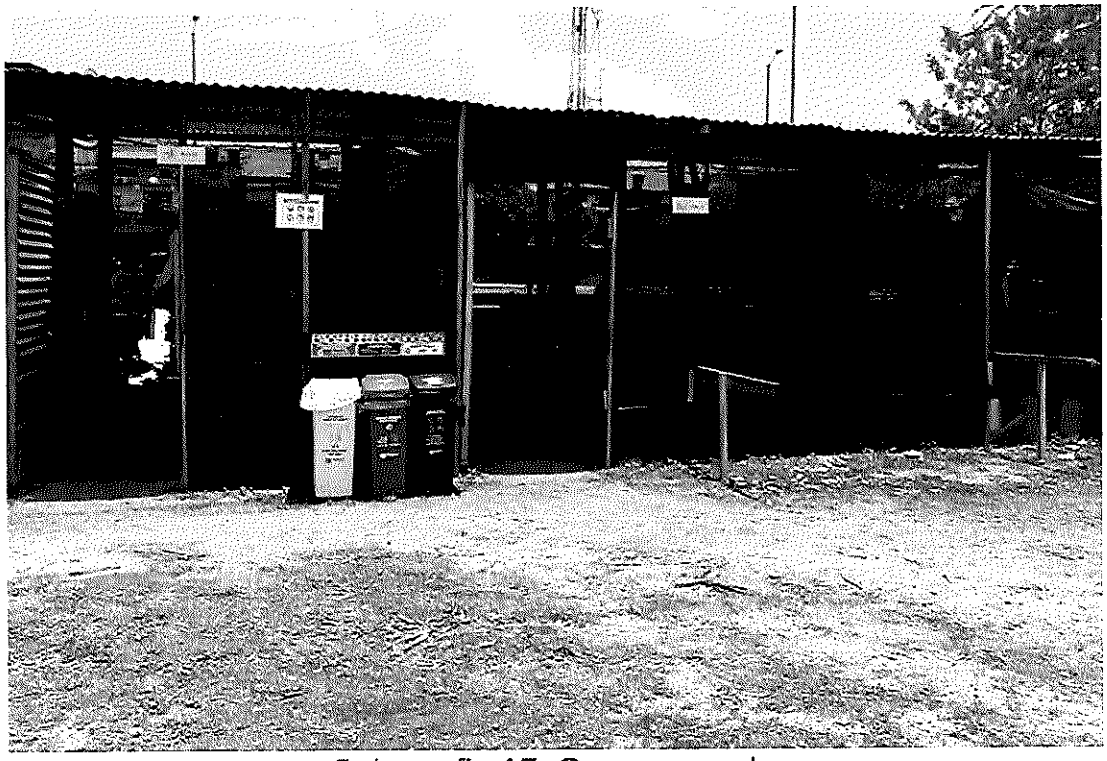


Fotografia 17. Campamento



Fotografia 18. Punto de hidratación



Fotografia 19. Entrega EPP a trabajadores

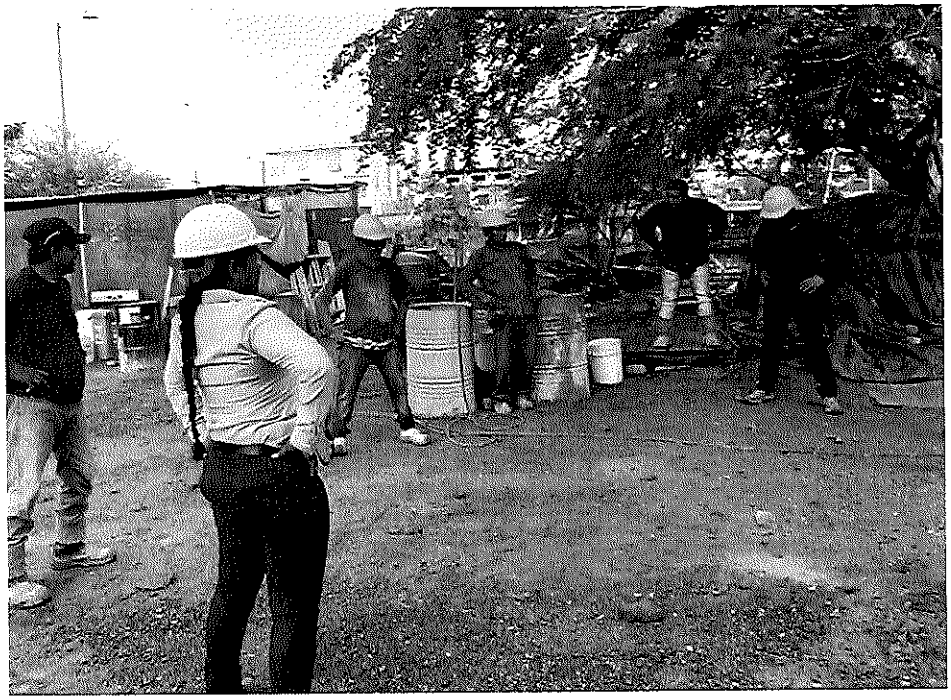

Fotografia 20. Charlas hseq

UNIÓN TEMPORAL
INGE
POLICIA
GAITÁN

CONTROL CLIMA

CALLE 2 No 27 – 116 Villavicencio – Meta
Tel. 310 888 54 20

Puerto Gaitán

CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

CONTRATO No.	**1983 DE 2025**
OBJETO:	"CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
PERIODO	01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026

MES / DÍAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DICIEMBRE																		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	3
ENERO	1	1	1	1	1	2	4	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FEBRERO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	4	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
MARZO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3
ABRIL	1	3	1	4	3	3	3	1	1	3	1	1	1	1	1	4	4	1	1	4	5	1	1	1	4	4	1	1	3	1	
MAYO																															
JUNIO																															
JULIO																															
AGOSTO																															


CONTROL DEL TIEMPO	DESDE :	DD	MM	AA	HASTA :	DD	MM	AA
		1	4	2.026		30	4	2.026

CONCEPTO	TOTALES		CONVENCIONES	CV	No.	COLOR
TOTAL DE DÍAS SOLEADOS	17	56,67 %	DÍAS SOLEADOS	DS	1	
TOTAL DÍAS NUBLADOS	0	0,00 %	DÍAS NUBLADOS	DN	2	
TOTAL DÍAS LLUVIOSOS	6	20,00 %	LLUVIAS FUERTES	LLF	3	
	6	20,00 %	LLUVIAS MODERADAS	LLM	4	
	1	3,33 %	LLUVIAS AISLADAS	LLA	5	
TOTAL	30	100,00 %				

ESTADO DEL TIEMPO DURANTE EL PERIODO		
FECHA DE INICIO	FECHA ACTUAL	
1 DE ABRIL DE 2026	30 DE ABRIL DE 2026	
RESUMEN	DÍAS	%
TOTAL DÍAS SECOS	17	56,67 %
TOTAL DÍAS LLUVIOSOS	13	43,33 %
TOTAL	30	100,00 %

ESTADO DEL TIEMPO ACUMULADO OBRA		
FECHA DE INICIO	FECHA ACTUAL	
18 DE DICIEMBRE DE 2025	30 DE ABRIL DE 2026	
RESUMEN	DÍAS	%
TOTAL DÍAS SECOS	109	81,34 %
TOTAL DÍAS LLUVIOSOS	25	18,66 %
TOTAL	134	100,00 %

OBSERVACIONES :

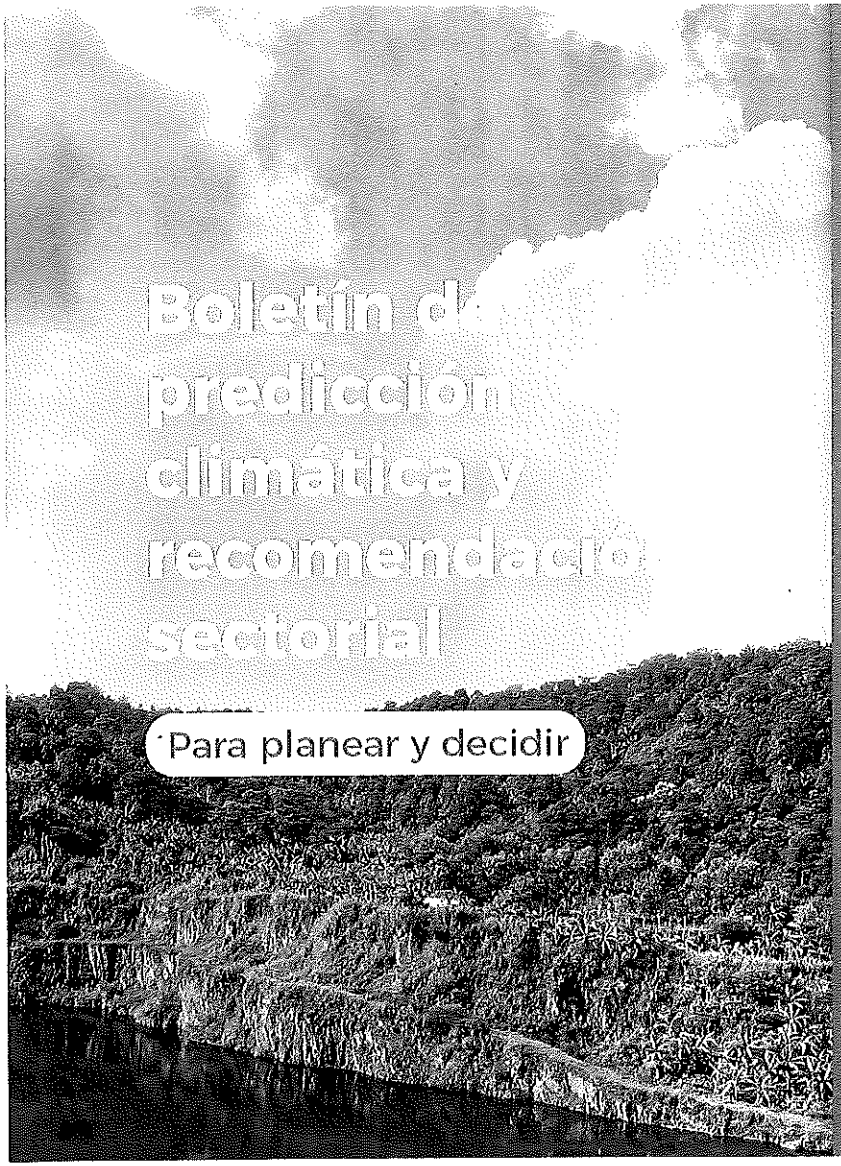

Boletín de predicción climática y recomendación sectorial

Para planear y decidir

CONTENIDO

MARZO 2026

- Seguimiento al sistema océano – atmósfera.

ABRIL - JUNIO | 2026


- Predicción climática de escala global.
- Predicción climática de la precipitación.
- Predicción climática de las temperaturas extremas.
- Predicción hidrológica, estado de los suelos y probabilidad de amenaza por deslizamientos e incendios de la cobertura vegetal.
- Recomendaciones.

La Predicción Climática generada por el IDEAM se basa en el análisis de modelos procedentes de los centros internacionales y de la discusión nacional del Comité de Predicción Climática.

Este producto es útil para tener una referencia de corto y mediano plazo en la escala climática, por lo que es necesario aclarar que no considera eventos extremos puntuales y de corta duración.

Publicación Nº 374
Abril de 2026

IDEAM

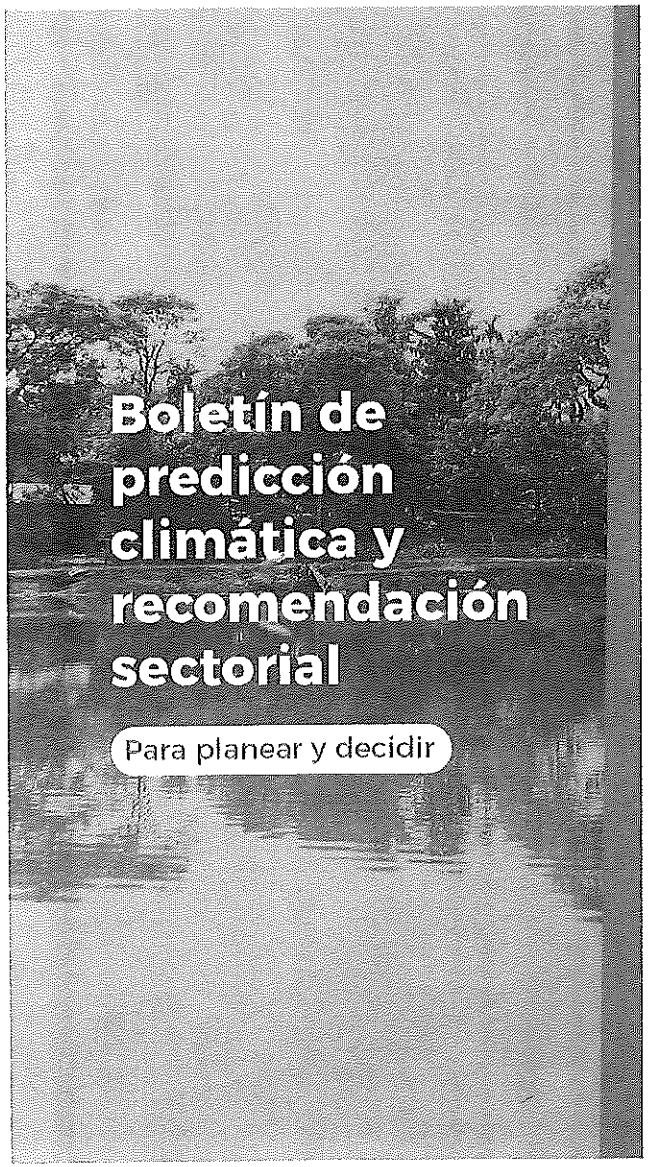

Boletín de predicción climática y recomendación sectorial

Para planear y decidir

Seguimiento – marzo de 2026

El Ideam informa que predominan las condiciones oceánicas y atmosféricas reflejaron condiciones neutrales respecto al Fenómeno ENOS.

La Temperatura Superficial del Mar (TSM) en la franja ecuatorial del océano Pacífico se registró dentro del *rango neutral* entre la cuenca centro-oriental y la occidental (EN 3, EN 3.4, EN 4), a la vez que, se registraron *valores sobre lo normal* en la cuenca oriental (EN 1+2). En la subsuperficie se fortalecieron las aguas cálidas en la cuenca ecuatorial, con mayor calentamiento cerca de los 165°W a 150 m de profundidad y en la costa de suramericana en superficie. En niveles bajos de la atmósfera (850 hPa) los alisios fluyeron de forma habitual sobre la cuenca central y, debilitados en la cuenca occidental y el flanco oriental; en altura (200 hPa) predominaron las anomalías del oeste. La convección se registró entre normal y suprimida alrededor de los 180°W.

En la mayor parte del océano Atlántico tropical se observaron temperaturas dentro de valores normales y con anomalías de hasta 1.5 °C.

Predicción Climática

Las variaciones climáticas del país serán moduladas por las oscilaciones intraestacionales, junto con las demás ondas ecuatoriales y la dinámica atmosférica típica de la época.

Las salidas más recientes de los modelos favorecen acumulados de lluvia con tendencia al déficit - *en diferentes zonas del país* - durante el bimestre abril-mayo. Para junio, se prevén volúmenes entre las diferentes categorías (por debajo, normal y encima).

Las temperaturas extremas se mantendrán entre los rangos habituales.

Nota ⚠


El Ideam advierte sobre la probable transición hacia anomalías positivas de la TSM en el Pacífico ecuatorial, alcanzando umbrales característicos de El Niño alrededor de mitad de año. De acuerdo con los análisis internacionales, esta condición se mantendría durante la segunda mitad del 2026 y, en el último trimestre, podría alcanzar una intensidad moderada o superior.

El Ideam hace un llamado a la comunidad para atender recomendaciones sectoriales derivadas de la predicción climática, de tal manera que puedan tomar decisiones climáticamente inteligentes.

* La declaratoria oficial de Los Fenómenos El Niño y La Niña se realiza con base en el ONI, tras el reporte de 5 trimestres móviles consecutivos – *como mínimo*. Cuando la alteración oceánica y atmosférica se reporta desde 1 y hasta por 4 trimestres seguidos se indican condiciones Tipo El Niño/ La Niña.

PRECIPITACIÓN

Mapa 1

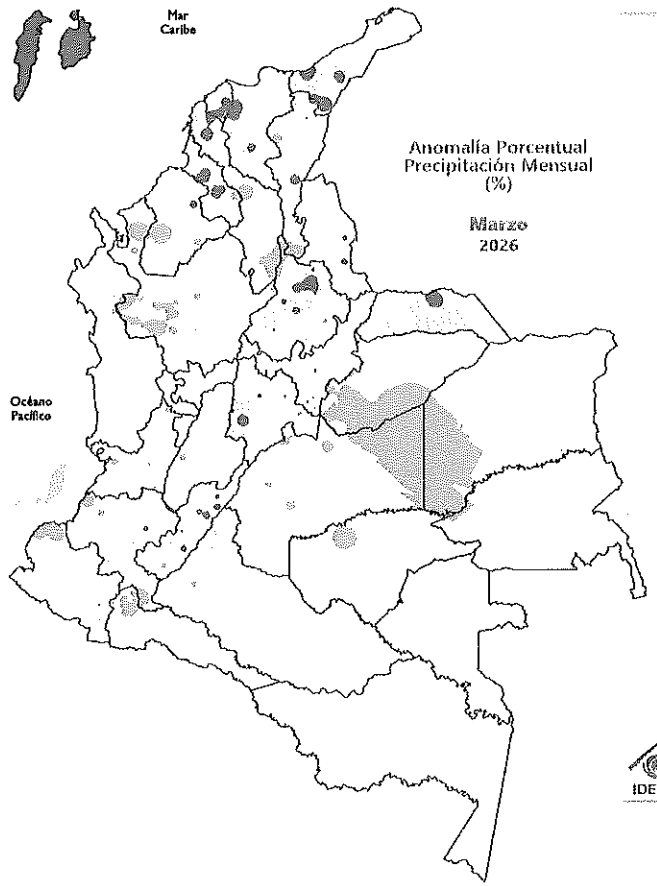


Las lluvias en las categorías muy por encima y por encima se registraron alrededor de un corredor oriental en la región Andina y en sectores del centro y norte de la región Caribe, además del área insular.

Las categorías muy por debajo y por debajo de lo normal se observaron en el oriente del país, región Pacífica y zonas del norte en los departamentos andinos y el sur de la región Caribe continental.

El comportamiento normal se destacó en el área insular Caribe.

TEMPERATURA

Mapa 2

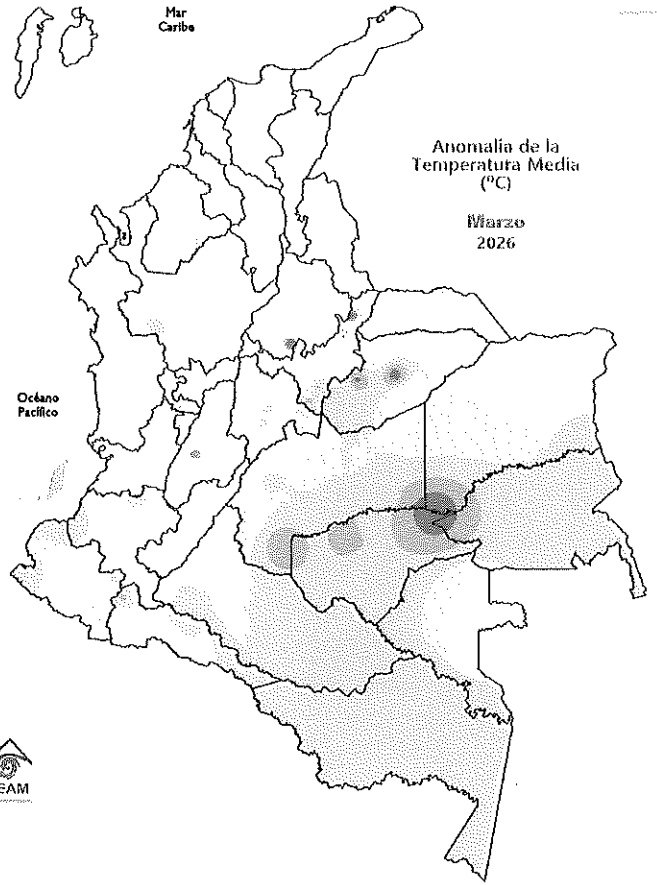

En el territorio nacional, las temperaturas se observaron generalmente sobre el rango normal.

Las anomalías positivas se registraron en la mayor parte del territorio nacional, salvo en sectores de las regiones Caribe y Andina. Las anomalías negativas se presentaron en zonas puntuales de Boyacá, Antioquia, Tolima y Casanare.

Los valores registrados dentro del rango normal se observaron en una amplia zona al sur del país.

Las variaciones climáticas del país serán moduladas por las oscilaciones intraestacionales y la dinámica atmosférica típica de la época.

Nota: El Ideam advierte sobre la probable transición hacia anomalías positivas de la TSM en el Pacífico ecuatorial, alcanzando umbrales característicos de El Niño alrededor de mitad de año. De acuerdo con los análisis internacionales, esta condición se mantendría durante la segunda mitad del 2026 y, en el último trimestre, podría alcanzar una intensidad moderada o superior.

OMM
Organización Meteorológica Mundial

NOAA
Administración Nacional de Océano y Atmósfera de los Estados Unidos

CPC
Centro de Predicción Climática de los Estados Unidos

NCEP
Centros Nacionales para la Predicción Ambiental de los Estados Unidos

BOM
Servicio Meteorológico de Australia

IRI
Instituto Internacional de Investigación del Clima y la Sociedad

JMA
Agencia Meteorológica del Japón

CIIFEN
Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno El Niño

ESCALA INTERANUAL

Durante *febrero* se destacó el siguiente comportamiento asociado a la variabilidad climática:

OCÉANO

La Temperatura Superficial del Mar (*TSM*) en la franja ecuatorial del océano Pacífico se registró dentro del rango neutral en su *lado frío* en la cuenca centro-oriental (EN 3.4 y EN 3) y en su *lado cálido* en la región occidental (EN 4), mientras que, se observó sobre el rango de neutralidad en la cuenca oriental (EN 1+2). Durante la última semana las Anomalías de la Temperatura Superficial del Mar (ATSM) en las regiones de seguimiento reportadas por la NOAA fueron:

| EN 4 0.3 °C | EN 3.4 -0.2 °C | EN 3 -0.3 °C | EN 1+2 0.6 °C |

Los indicadores de seguimiento al ciclo ENOS, reportaron:

- ONI (-0.2) promedio móvil del trimestre (enero-febrero-marzo). Indicativo de condiciones *Neutrales – en su lado frío.*
- RONI (-0.7) promedio móvil del trimestre (enero-febrero-marzo). Indicativo de condiciones La Niña (enfriamiento oceánico).
- MEIv2 (-0.9) promedio móvil del periodo (enero-febrero). Indicativo de una condición La Niña acoplada.

En la subsuperficie del océano Pacífico ecuatorial se fortalecieron las aguas cálidas en la cuenca ecuatorial, con mayor calentamiento cerca de los 165°W a 150 m de profundidad y en la costa de sudamericana en superficie.

En la mayor parte del océano Atlántico tropical se observaron temperaturas dentro de valores normales y con anomalías de hasta 1.5 °C – *las más cálidas sobre los 20°N.*

ATMÓSFERA

Región del Pacífico Ecuatorial

En niveles bajos de la atmósfera (850 hPa) los alisios fluyeron de forma habitual sobre la cuenca central y, debilitados en la cuenca occidental y el flanco oriental; en altura (200 hPa) predominaron las anomalías del oeste. La convección se registró entre normal y suprimida sobre los 180°W.

CICLO ENOS

Las condiciones oceánicas y atmosféricas se reportaron dentro del rango neutral.

Nota: En Ideam, la declaración oficial del fenómeno continuará generándose con base en el ONI. La posible transición al RONI se determinará con base en los resultados de análisis a nivel nacional.

ESCALA INTRAESTACIONAL

La oscilación Madden & Julian (MJO) transitó con las diferentes fases sobre el territorio nacional.

PREDICCIÓN

En la discusión oficial del CPC/IRI se informó que las condiciones de ENOS-neutral están presentes y se favorecen hasta abril-junio de 2026 (80% de probabilidad). En mayo-julio de 2026, es probable que surja El Niño (61% de probabilidad) y que persista hasta por lo menos finales del 2026.

El BOM indicó que el fenómeno de La Niña de 2025-2026 ha finalizado. En conjunto, los indicadores oceánicos y atmosféricos de la Oscilación del Sur de El Niño (ENSO) reflejan un estado neutro. Todos los modelos, incluido el de la Oficina de Meteorología, pronostican que el Pacífico tropical continuará calentándose en los próximos meses. Se espera que las condiciones neutrales persistan al menos hasta finales de otoño, y todos los modelos indican un calentamiento a niveles consistentes con El Niño para finales del invierno. De acuerdo con la JMA, las condiciones neutrales persistieron en marzo y es probable el desarrollo de El Niño durante el otoño (60% probabilidad). Por su parte, el CIIFEN destacó la transición a condiciones Neutras, aunque la atmósfera mantiene condiciones de Niña débil, sugiriendo una falta de acoplamiento a condiciones neutras.

La OMM, en su comunicado más reciente, señaló que desde mediados de febrero las condiciones observadas en el Pacífico tropical - *congruentes con un episodio débil de La Niña* - han perdido intensidad. De acuerdo con las predicciones de los modelos y las evaluaciones de expertos, existe un 60% de probabilidad de que se instauren condiciones neutras del ENOS entre marzo y mayo de 2026, un 30% de probabilidad de que se forme un evento La Niña y un 10% de que se presente El Niño. Para el periodo abril-junio, la probabilidad de neutralidad aumenta al 70%, mientras que la de El Niño se eleva al 40% entre mayo y julio.



La predicción climática mensual preparada por el **IDEAM** se presenta desde la página 6.

ANOMALÍA DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

La Temperatura Superficial del Mar (TSM) en la franja ecuatorial del océano Pacífico se registró dentro del rango neutral entre la cuenca centro-oriental y la occidental (EN 3, EN 3.4 y EN 4), a la vez que, se registraron sobre lo normal en la cuenca oriental (EN 1+2). Las temperaturas oscilaron con anomalías entre -0.06 °C y 0.82 °C.

En la región EN 3.4 se observó una anomalía de -0.06 °C.
Fuente ATSM: NOAA/OISSTv2/Weekly.
Rango de la normalidad (+/- 0.5°C)

Figura 1

Promedio de las Anomalías de la Temperatura Superficial del Mar (°C) entre el 08 de marzo y el 04 de abril de 2026. Fuente: NOAA


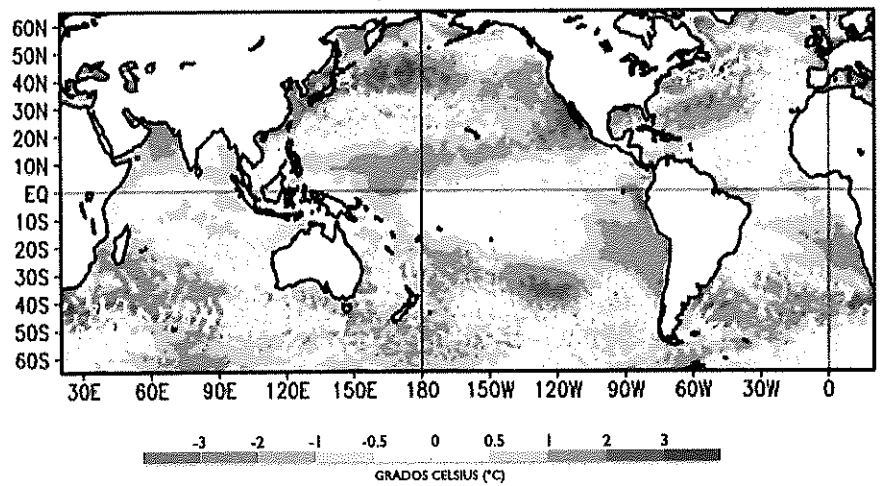


Figura 2

Anomalías de la Temperatura Subsuperficial del Mar (°C), pentada centrada en el 29 de marzo 2026. Fuente: NOAA

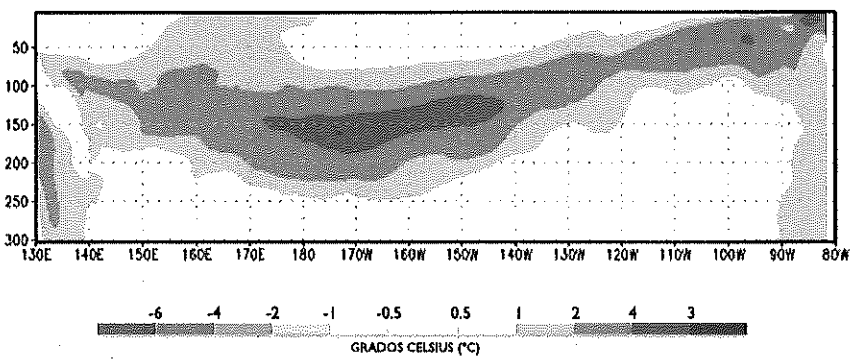


ANOMALÍA DE LA TEMPERATURA SUBSUPERFICIAL DEL MAR

Se fortalecieron las aguas cálidas en la cuenca ecuatorial, con mayor calentamiento cerca de los 165°W a 150 m de profundidad y en la costa de sudamericana en superficie.

Figura 3


Campo de viento en el nivel de 200 hPa, entre los 5°N y 5°S. Fuente: CPC/NCEP

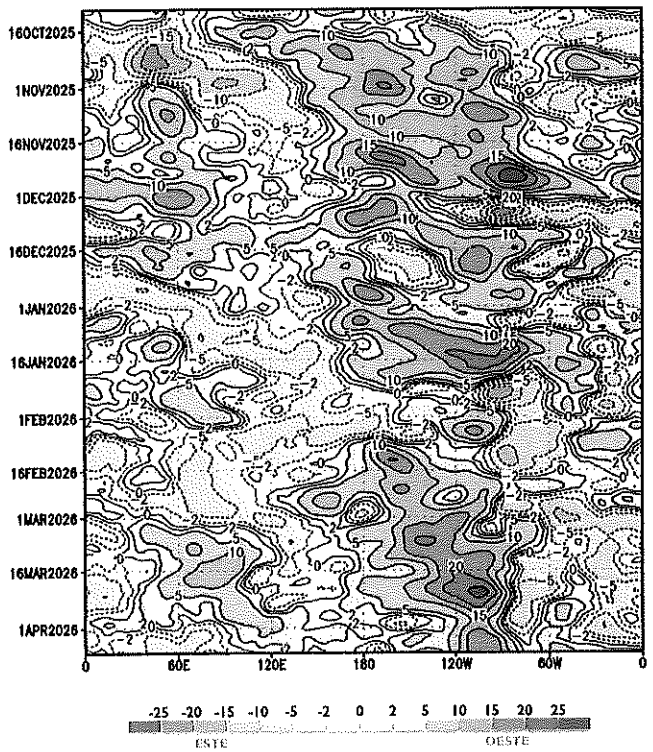

Predominaron las anomalías del oeste en la mayor parte de la cuenca ecuatorial.

Figura 4

Anomalía del campo de viento en el nivel de 850 hPa, entre los 5°N y 5°S. Fuente: CPC/NCEP

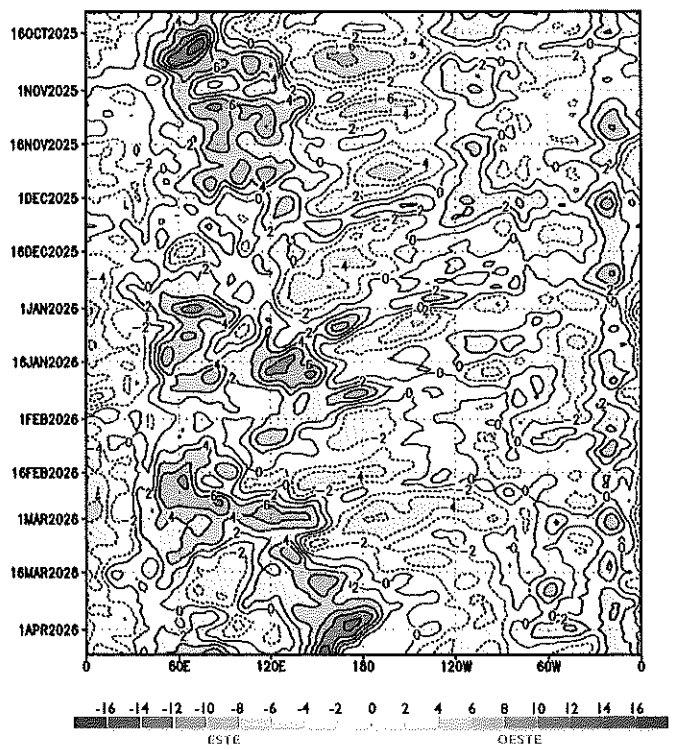


Los alisios fluyeron de forma habitual sobre la cuenca central y, debilitados en la cuenca occidental y el flanco oriental.

NOAA

Figura 5

Predicción probabilística oficial del ENOS del **CPC** basado en la TSM de la región EN 3.4. Fuente: NOAA.

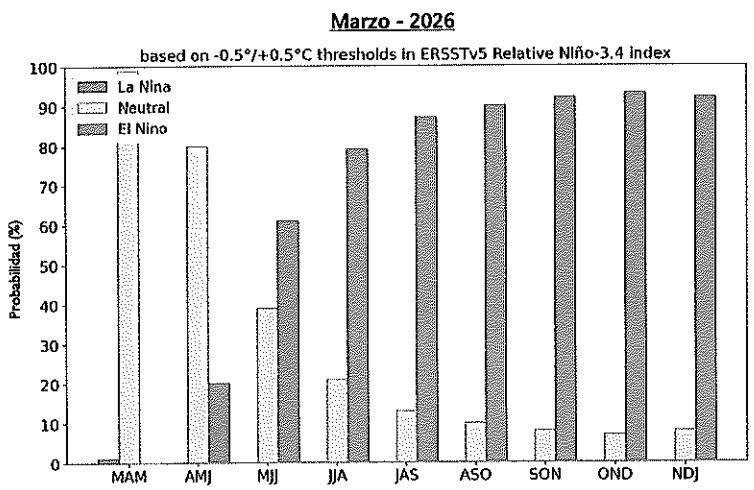

CPC
Centro de Predicción Climática de los Estados Unidos


IRI
Instituto Internacional de Investigación del Clima y la Sociedad

ECMWF
Centro Europeo de Predicción de Mediano Plazo

CENTRO EUROPEO

Figura 6


Predicción estacional del ECMWF
Anomalía de la Temperatura Superficial del Mar – Ensamble. Fuente: ECMWF

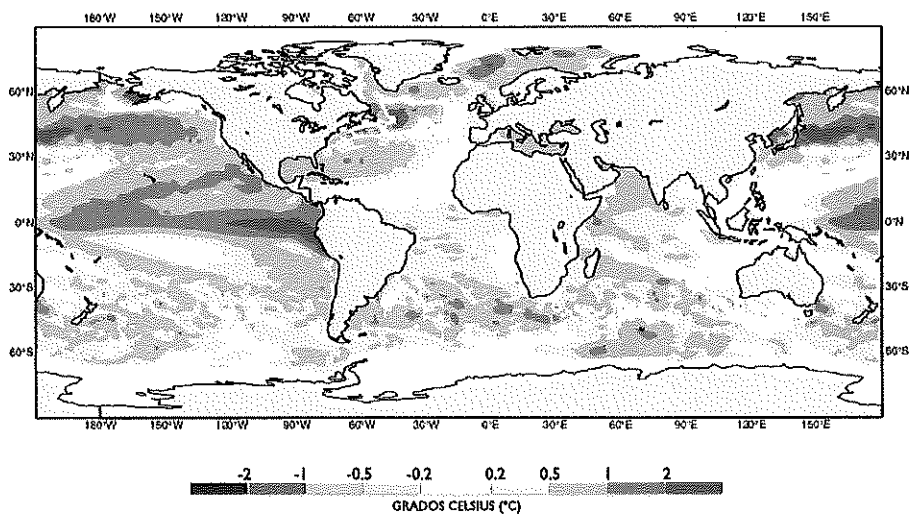

De acuerdo con la predicción del ECMWF:

Se proyectan temperaturas por encima de lo normal sobre la cuenca del Pacífico ecuatorial, con mayores intensidades hacia el flanco oriental.

Mapa 3

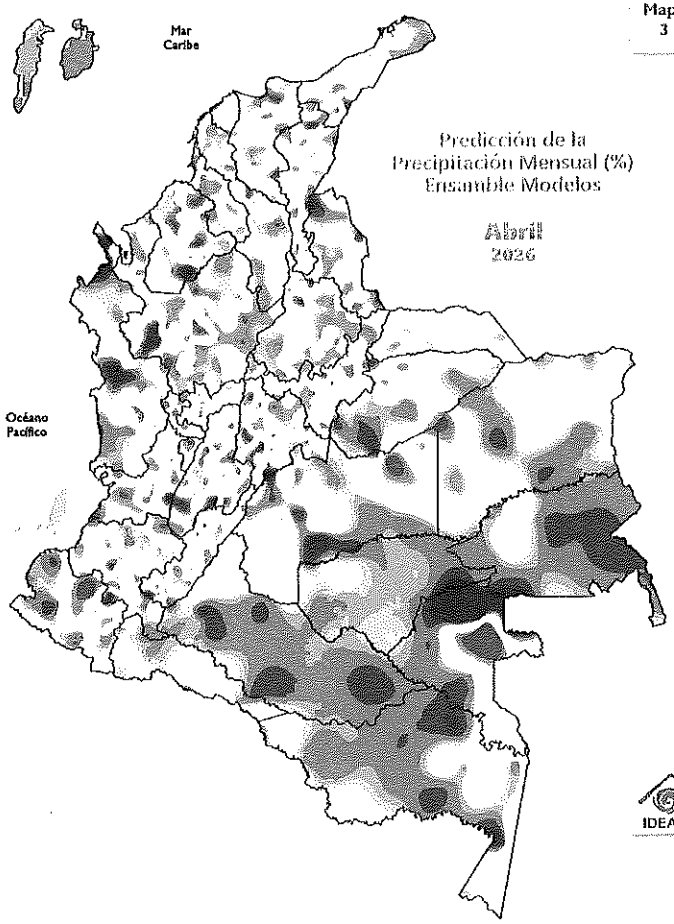

PREDICCIÓN

En el territorio nacional se esperan lluvias en las categorías POR DEBAJO de lo normal y NORMAL.

La categoría por debajo de lo normal se destacaría en el área insular Caribe, así como en sectores del oriente del país y, algunas áreas distribuidas en las regiones Pacífica y Caribe, con probabilidades que tienden a ubicarse entre el 45% y 70%.


La categoría por encima de lo normal se concentraría en zonas de menor extensión que se ubican principalmente en las regiones Andina y Caribe, con probabilidades entre el 50% y 70%.

En áreas restantes se proyectan valores normales.

CLIMATOLOGÍA


Abril hace parte de la primera temporada lluviosa del año, época en la cual la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) se ubica en el centro del territorio nacional, favoreciendo las precipitaciones en el centro de la región Andina y Pacífica. Al oriente del territorio nacional, las lluvias dependen más de las fluctuaciones asociadas a la Zona de Convergencia del Atlántico Sur (SACZ) y el ingreso de masas húmedas procedentes del sur del continente, las cuales favorecen las precipitaciones en la Amazonía y apoyan la transición de la época de menos lluvias a la temporada de más precipitaciones en la Orinoquía especialmente en el Piedemonte Llanero del Meta. En la región Caribe, es normal que aumenten los volúmenes de precipitación con respecto a marzo, principalmente al sur de Bolívar y Cesar, así como sobre la Sierra Nevada de Santa Marta.

Mapa 4

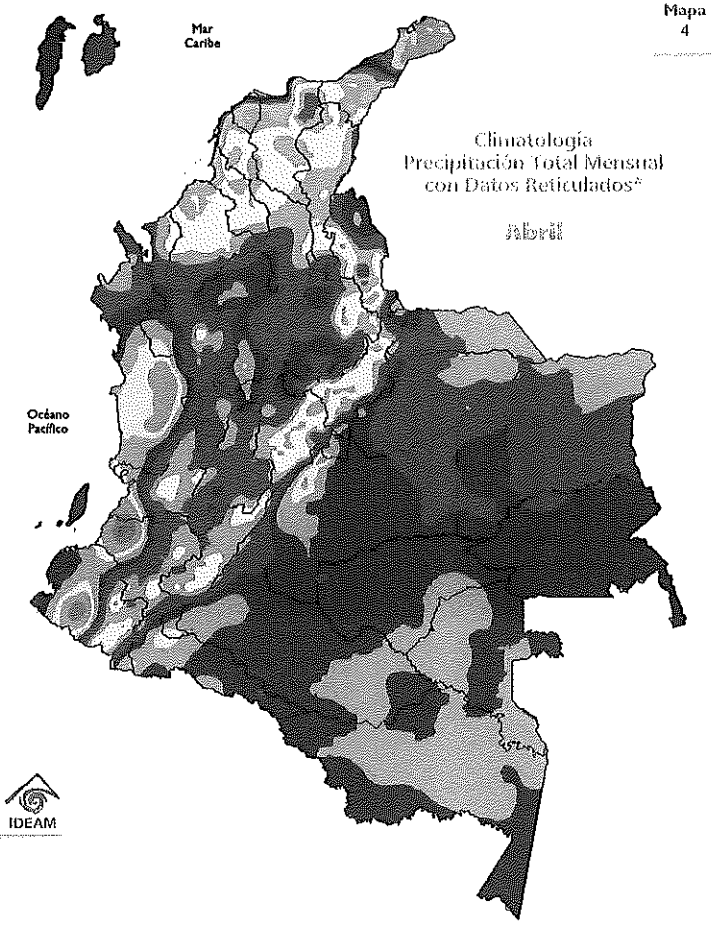

* Observaciones + CHIRPS + Cubo de Datos + ERA5

Mapa 5

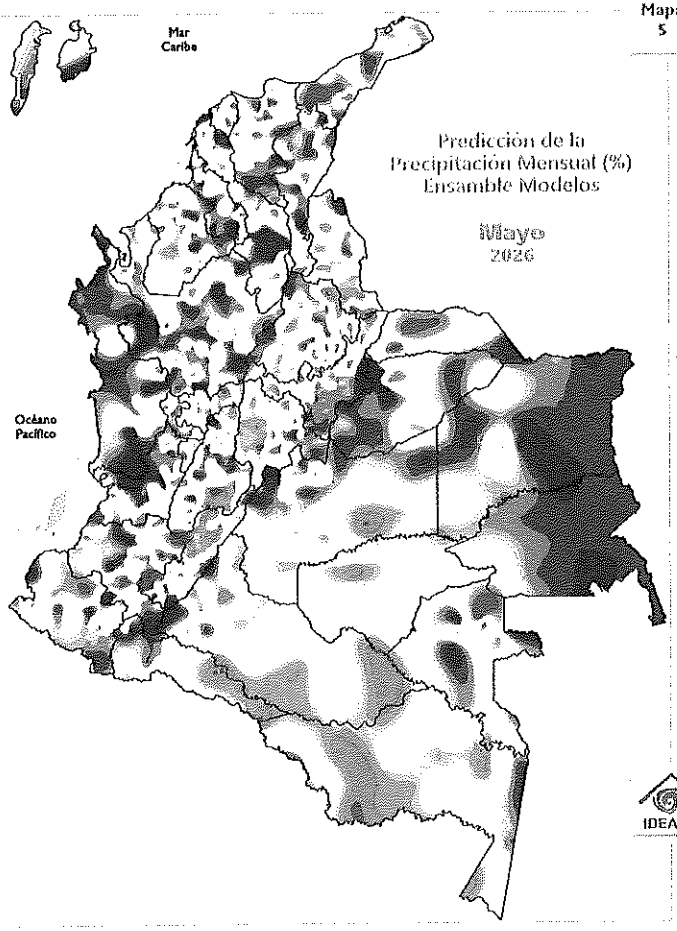

PREDICCIÓN

En el territorio nacional se esperan lluvias en las categorías POR DEBAJO de lo normal y NORMAL.

La categoría por debajo de lo normal se destacaría en el área insular Caribe y en el continente – en *sectores del centro y el norte del país* - con probabilidades que oscilan entre el 50% y 70%.


La categoría por encima de lo normal se estima en zonas de menor extensión que se distribuyen principalmente en las regiones Andina y Amazonía, con probabilidades entre el 50% y 70%.

En áreas restantes se proyectan valores normales.

CLIMATOLOGÍA


Mayo hace parte de la primera temporada lluviosa del año en la región Andina, época en la cual la ZCIT se ubica en el centro del territorio nacional. Al oriente del país, las precipitaciones dependen más de las fluctuaciones asociadas a la ZCAS y del ingreso de masas húmedas procedentes del sur de continente, lo cual marca el inicio de la temporada de lluvias a lo largo del Piedemonte Llanero de la Orinoquia. Sobre la región Caribe, es normal que aumenten significativamente los volúmenes de precipitación con respecto al mes anterior, producto del paso de ondas tropicales de este – temporada de mayo a noviembre. En la región Pacífica se incrementan las precipitaciones con respecto a abril y, paulatinamente sobre la Amazonía, empiezan a disminuir los volúmenes de precipitación con respecto al mes anterior sobre el trapecio Amazónico, pero continúan en ascenso hacia el piedemonte de esta región, para alcanzar sus máximos volúmenes hacia el mes de junio.

Mapa 6

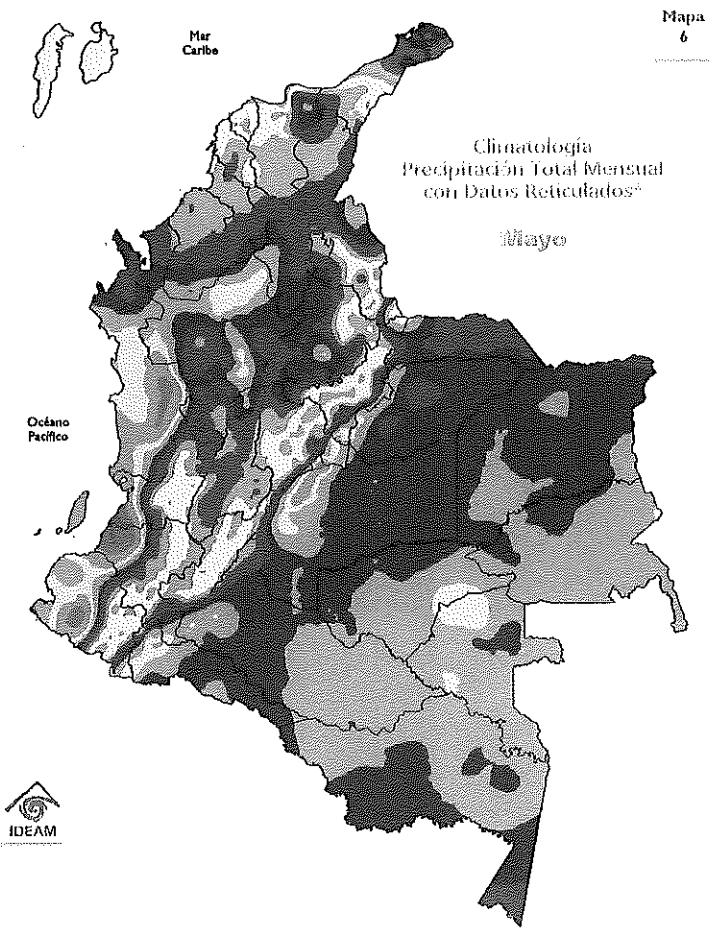

* Observaciones + CHIRPS +Cubo de Datos + ERA5

Mapa 7

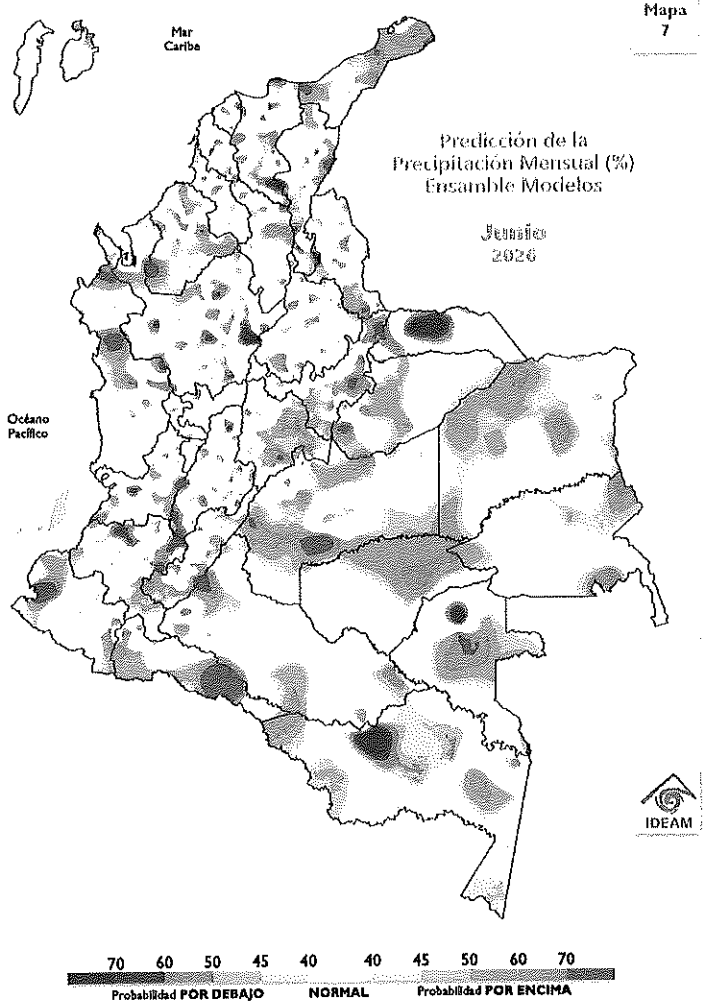

PREDICCIÓN

En el territorio nacional se esperan lluvias en la categoría POR ENCIMA de lo normal.

La categoría por debajo de lo normal se proyecta en zonas del Caribe, norte de la región Andina y centro-sur del Pacífico, así como zonas de Arauca y Amazonas, con probabilidades alrededor del 50%.


La categoría por encima de lo normal se estima en sectores de las regiones Orinoquía y Amazonía, así como en el flanco oriental de la región Andina y, sectores del norte y sur en las regiones Caribe y Pacífica, con probabilidades que fluctúan generalmente entre el 50% y 70%.

El comportamiento normal se proyecta en áreas restantes.

CLIMATOLOGÍA


En junio se presenta la transición entre la primera temporada de precipitaciones y la segunda temporada de menos lluvias del año, que se presenta en la mayor parte de la región Andina y en el oriente de la región Caribe. En sectores del norte del país es normal que las lluvias persistan, debido a la migración paulatina de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) desde el centro hacia el norte del país, junto con la actividad ciclónica del mar Caribe propia de la época del año. Al oriente del territorio nacional, las precipitaciones dependen más de las fluctuaciones asociadas a la migración de la Zona de Convergencia del Atlántico Sur (SACZ), la cual apoya la transición de la época de menos lluvias a la temporada de mayores precipitaciones, de mitad y parte del segundo semestre del año en la Orinoquía colombiana. En la Amazonía, se incrementan las lluvias al nororiente, mientras que descienden en amplios sectores, especialmente los que se ubican en el centro y sur de la región.

Mapa 8

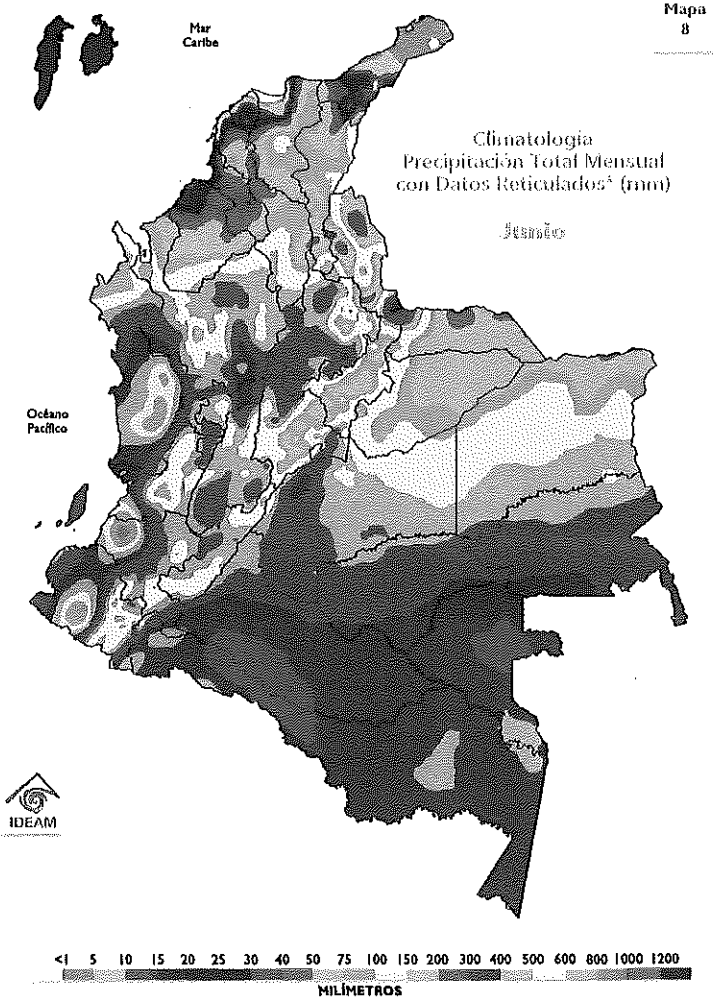

* Observaciones + CHIRPS + Cubo de Datos + ERA5


Mapa 9

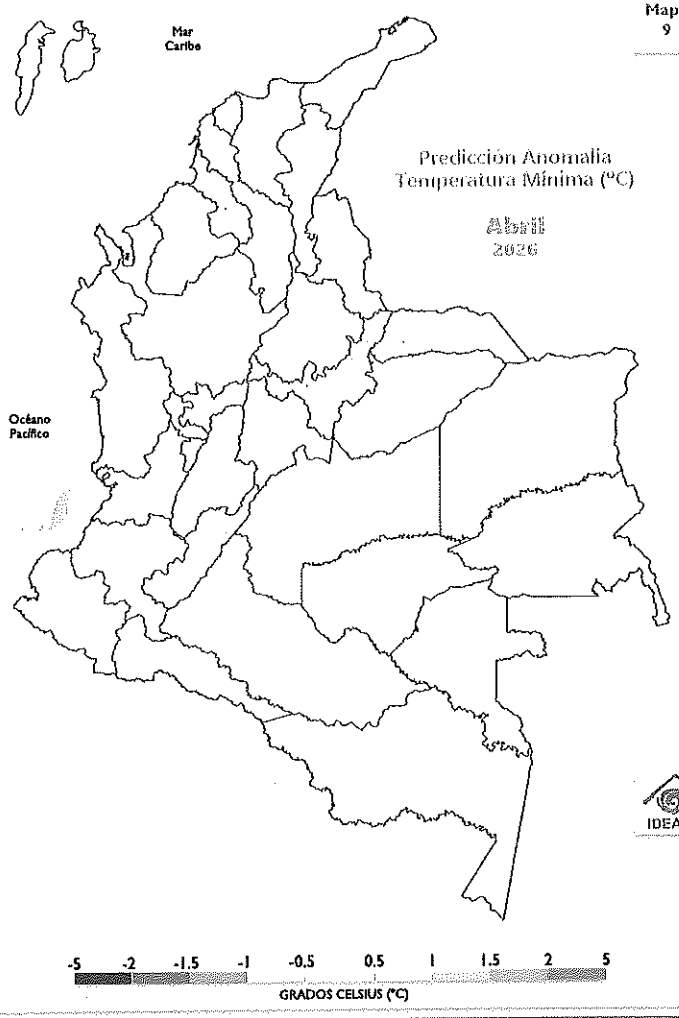


PREDICCIÓN ABRIL

Los valores normales se favorecen sobre la mayor parte del territorio nacional.

Mapas 10 - 11

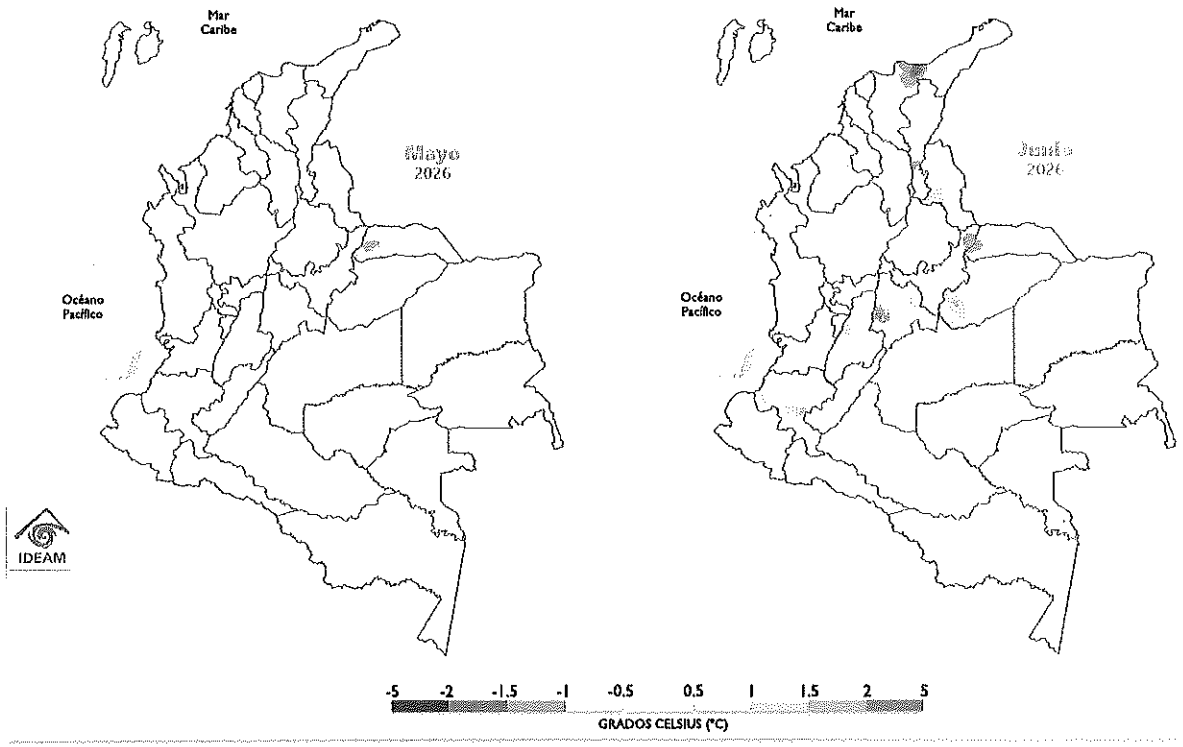


Mapa 12

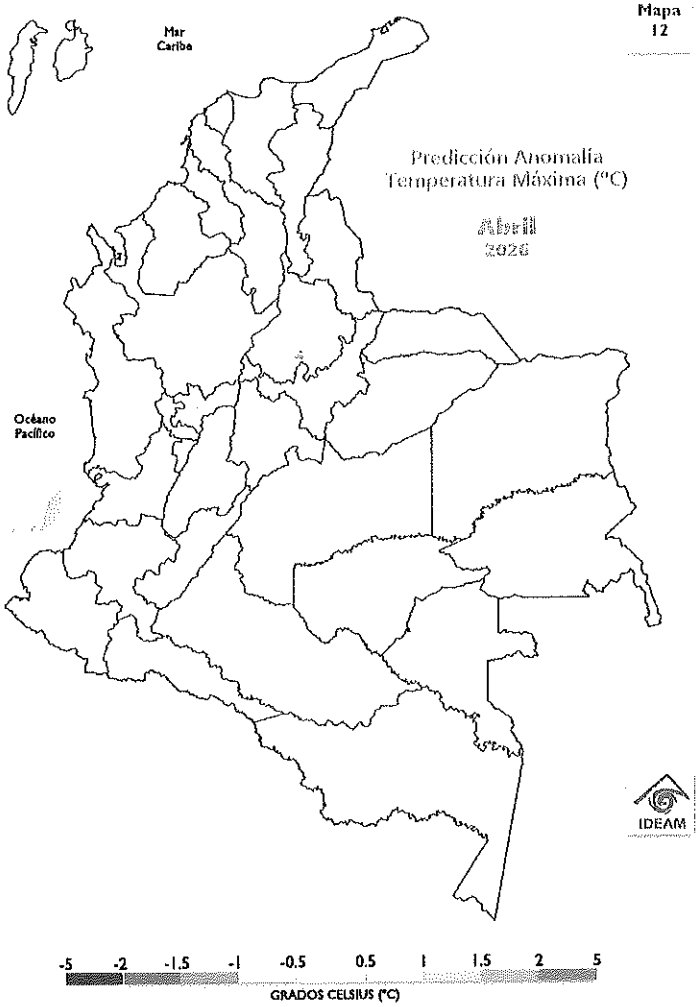


PREDICCIÓN ABRIL

En general, se estiman valores de temperatura máxima típicos de la época. Las anomalías negativas se proyectan en sectores de Norte de Santander, Santander, Caldas y Tolima.

Mapas 13 - 14

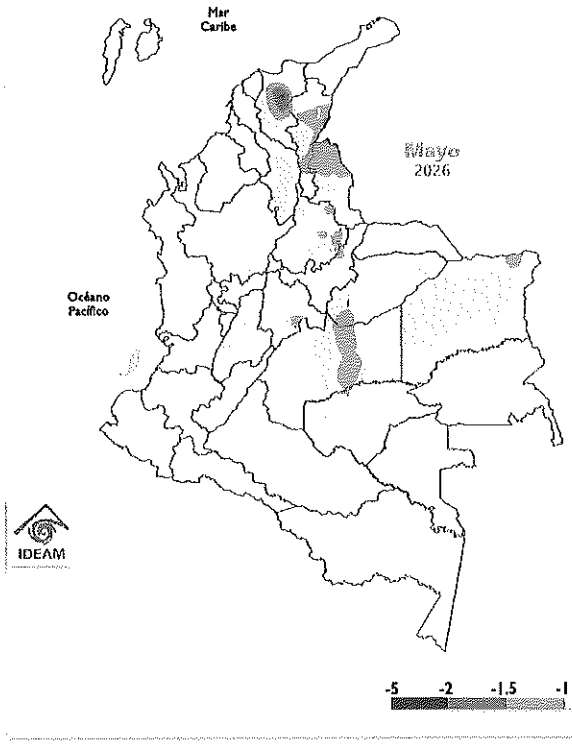

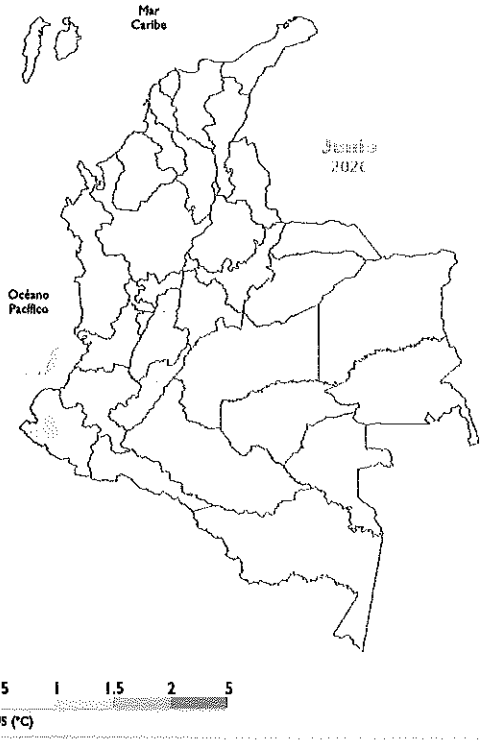

Cuenca de los ríos Magdalena y Cauca

El río Magdalena en su cuenca alta y media se mantendrá con niveles en el rango de valores altos y en la cuenca baja del río Magdalena persistirán niveles en el rango de niveles altos durante el mes de abril. El río Cauca a lo largo de la cuenca alta y media también se mantendrá con niveles en el rango de valores altos y, en la cuenca baja se esperan niveles *por encima de los promedios* del mes de abril.

Cuenca del río San Jorge

En el río San Jorge y el sistema de ciénagas asociado predominarán los niveles altos.

Cuenca del río Sinú

Para el río Sinú, con régimen influido por la operación del embalse de Urrá, se mantendrán niveles en el rango de valores altos.

Río Atrato

El río Atrato continuará presentando incrementos de nivel con una magnitud que se mantendrá en el rango de niveles altos.

Ríos Patía y Mira

Para el río Patía se esperan niveles en el rango de los valores altos, particularmente en las cuencas media y baja. Una condición similar se presentará en el río Mira.

Río Arauca

En algunos afluentes de la cuenca alta del río Arauca se espera una condición con incrementos súbitos de nivel. Para el río Arauca en la cuenca media los niveles se mantendrán en el rango de niveles medios.

Ríos Meta y Guaviare

En el río Meta persistirá la condición con niveles en el rango de valores medios. Para el río Guaviare también se esperan condiciones similares con niveles en el rango de los valores medios. En algunos afluentes de la zona del piedemonte se presentarán moderados incrementos súbitos de nivel.

Ríos Inírida y Vaupés

Predominio de niveles medios a altos en los ríos Inírida y Vaupés. Esta tendencia se mantendrá a lo largo del mes de abril.

Río Orinoco

Una condición de niveles estables predominará en amplios sectores del río Orinoco, con valores en el rango de niveles medios.


Ríos Caquetá y Putumayo

En los afluentes de la zona del piedemonte de los departamentos de Caquetá y Putumayo, persistirán algunos incrementos súbitos de nivel a lo largo del mes. En los ríos Caquetá y Putumayo, particularmente en la cuenca media y baja se mantendrán niveles en el rango de valores medios.

Río Amazonas

A la altura de Leticia, el río Amazonas se mantendrá con niveles medios para esta época del año.

Mapa 15

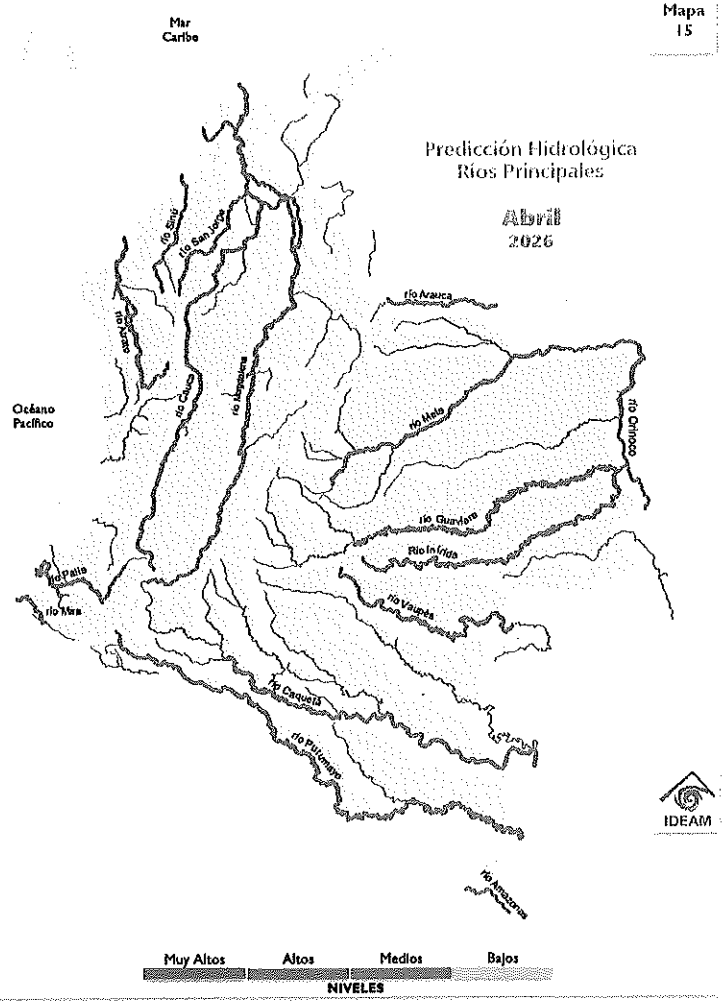

PARA TENER EN CUENTA

Para afluentes de la cuenca alta del río Magdalena, se mantendrán las condiciones favorables para la ocurrencia de incrementos súbitos de nivel por efecto de lluvias intensas en las cuencas de aporte de ríos y quebradas en sectores de los departamentos de Huila, Tolima y Cundinamarca, particularmente en las cuencas de los ríos Timaná, Yaguará, Bedón, Aipe, Chenche, Fatagán, Ortega, Cucuana, Coello y Totaré, entre otros. Con el incremento de niveles que se espera se evidencie en algunos afluentes de los departamentos de Antioquia y Santander, se mantendrá una condición de niveles en ascenso en la cuenca media de los ríos Cauca y Magdalena. Para la cuenca baja de los dos Cauca y Magdalena, con la interacción del complejo de ciénagas asociado a la planicie de inundación se mantendrá la tendencia al ascenso en los niveles con magnitudes superiores a los promedios históricos del mes de abril.

En la región pacífica, específicamente en algunos sectores de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño los afluentes hídricos mantendrán las condiciones de niveles altos por efecto de incrementos súbitos de nivel.

En la cuenca del río Atrato algunos afluentes continuarán con niveles altos, entre los que se destacan los ríos Murri y Sucio.

Para la región caribe se destacan los posibles incrementos de nivel en algunos afluentes de los departamentos de Córdoba, Magdalena y Cesar por efecto de lluvias ocurridas en las cuencas de aporte. En los afluentes en las estribaciones de la Sierra nevada de Santa Marta también se espera la ocurrencia de incrementos súbitos de nivel, particularmente en las cuencas de los ríos Guachaca, Mendihuaca, Buritaca, Don Diego y Ancho.

CONDICIONES MUY ALTAS
Se esperan niveles en el rango de valores muy altos respecto a los valores históricos del mes.


CONDICIONES ALTAS
Se esperan niveles en el rango de valores altos respecto a los valores históricos del mes.

CONDICIONES MEDIAS
Se esperan niveles con valores cercanos a los promedios respecto a los valores históricos del mes.

CONDICIONES BAJAS
Se esperan niveles con valores en el rango de los mínimos respecto a los valores históricos del mes.

Para conocer más acerca de los niveles en nuestros ríos, consulte el enlace:

fews.ideam.gov.co

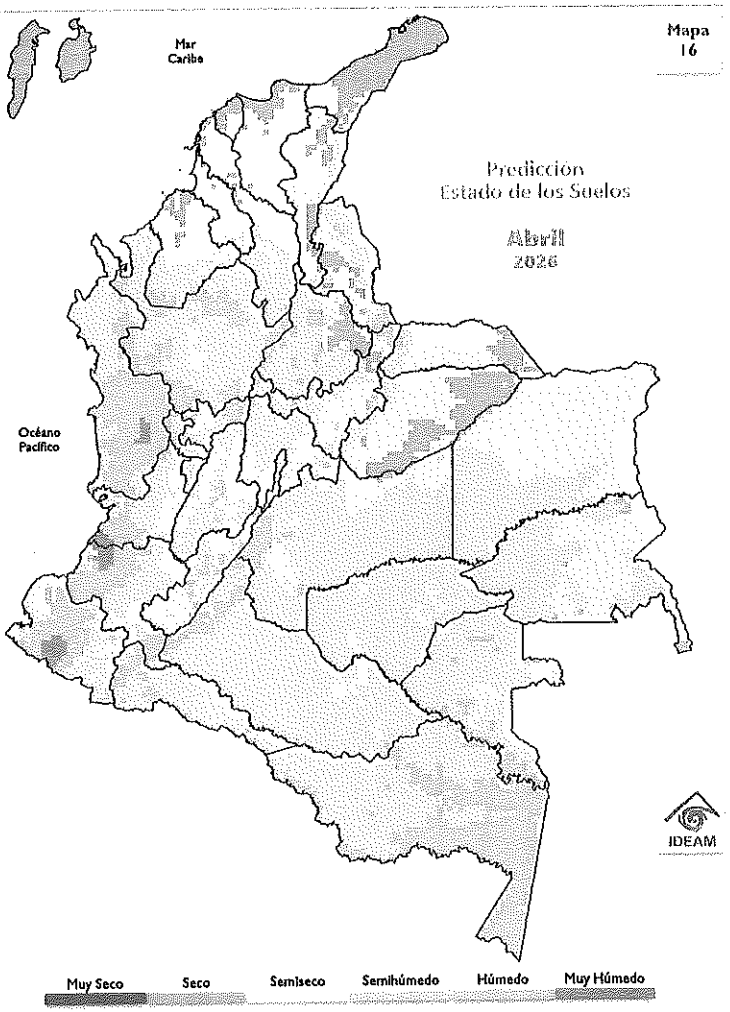

Región Caribe

Se prevén condiciones normales de humedad en los suelos para la época. Predomina el estado seco en La Guajira y en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, también se esperan condiciones secas en el norte de Magdalena, Atlántico y Córdoba, así como en algunas zonas dispersas en Bolívar, Sucre y Cesar. El estado muy seco de los suelos solo se espera en zonas muy particulares de La Guajira. De manera generalizada, se esperan condiciones semisecas en Magdalena y occidente de Cesar, mientras que, para Córdoba, Sucre y Bolívar, esta condición se presentaría hacia el norte y centro de estos departamentos. Asimismo, podrían encontrarse suelos semihúmedos en el sur de los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y nororiente de Cesar. Finalmente, se prevén suelos húmedos hacia el sur del departamento de Córdoba.

Región Andina

Se espera la predominancia de suelos semihúmedos en amplios sectores de los departamentos de Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Cundinamarca; en Tolima y Huila, se prevé esta condición de humedad hacia las zonas centrales de los departamentos, mientras que, para Boyacá y Norte de Santander, hacía el norte. Se prevén condiciones secas de los suelos solamente en el oriente de Santander y hacía el centro de Norte de Santander. Asimismo, se prevén suelos semisecos en el centro de Boyacá, sur de Huila y Cundinamarca y en algunos sectores puntuales en Norte de Santander, Antioquia, Caldas y Tolima. Finalmente, se prevén suelos húmedos hacia el sur de Norte de Santander y en zonas dispersas de Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Tolima y Huila.

Región Pacífica

En general, se prevén condiciones muy húmedas en el centro del departamento de Chocó, sur de Nariño, suroccidente de Valle del Cauca y noroccidente de Cauca. De igual manera, se esperan suelos húmedos en amplias zonas del departamento de Chocó, así como en el occidente del Valle del Cauca y Cauca, y en el centro de Nariño. El estado de humedad semihúmedo en general se prevé hacía el norte de Chocó, Valle del Cauca y oriente de los departamentos de Cauca y Nariño. Finalmente, los suelos semisecos se presentarían en zonas puntuales del oriente del Cauca y Valle de Cauca, así como hacía el occidente de Nariño y de manera dispersa en algunos sectores de los mismos departamentos.

Región Orinoquía

Se prevé suelos en estado seco en amplias zonas del departamento de Casanare, en algunos sectores del oriente de Arauca y zonas muy puntuales de Vichada. También se esperan suelos semisecos en amplias zonas de los departamentos de Casanare, Arauca y Vichada, mientras que, para Meta esta condición se prevé hacia el norte y algunos sectores de la Serranía de La Macarena. El estado semihúmedo se espera de manera generalizada en el departamento de Meta, como en el sur y occidente de Vichada. Finalmente, se prevén suelos húmedos en sectores específicos del occidente del departamento de Meta.

Región Amazonía

Se prevén condiciones generalizadas de suelos semihúmedos en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Guainía, así como hacía el occidente de Amazonas y occidente y oriente de Guainía. Se esperan suelos húmedos en el sur y oriente de Amazonas, occidente de Putumayo y Caquetá, además de zonas dispersas de Vaupés y Guainía. Finalmente, se prevén suelos semisecos en el centro de Guainía y en sectores puntuales de Guaviare, Caquetá, Vaupés y Amazonas.

MUY SECO
Suelo sin agua de suministro a organismos vivientes

SECO
Suelo con déficit continuo de agua a capacidad de campo para plantas sembradas

SEMISECO
Suelo con déficit de agua

SEMIHÚMEDO
Suelo con déficit momentáneo de agua

HÚMEDO
Suelo a capacidad de campo o de retención de agua

MUY HÚMEDO
Suelo saturado de agua

Región Caribe

En general, para la región Caribe, incluyendo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no se prevé amenaza. No obstante, se prevé amenaza baja en sectores La Sierra Nevada Santa Marta, Serranía del Perijá y Serranía de San Lucas en los departamentos de Magdalena, Cesar y Bolívar, respectivamente. Del mismo modo, se prevé amenaza baja en el suroccidente de Córdoba y en los Montes de María en los departamentos de Sucre y Bolívar. Por otro lado, se presenta amenaza moderada en el suroccidente de Bolívar y Córdoba, y amenaza alta en un sector puntual del suroccidente de Bolívar

Región Andina

Se prevé amenaza entre alta y moderada en sectores del norte y sur del departamento de Norte de Santander; en el centro, sur y occidente de Antioquia; en el oriente de Caldas; en el sur de Santander; en el norte y oriente de Cundinamarca; así como en el occidente y oriente de Boyacá. Asimismo, se presenta una amenaza muy alta en zonas puntuales de los departamentos de Tolima, Quindío y Caldas. Finalmente, para el resto de la región se prevé amenaza baja, principalmente en sectores de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander, Tolima, Huila, Eje Cafetero, Antioquia y Norte de Santander. Para el resto de la región, no se prevé amenaza.

Región Pacífica


Se prevé amenaza entre muy alta y alta en zonas del centro del departamento de Nariño, en los sectores occidental y oriental del Cauca, en el suroccidente del Valle del Cauca, así como en el oriente y occidente del departamento del Chocó. Por su parte, hacia el noroccidente y oriente de Chocó, en amplios sectores del Valle del Cauca, así como en el oriente de los departamentos de Cauca y Nariño se prevé una amenaza entre moderada y baja. En el resto de la región no se prevé este tipo de amenaza.

Región Orinoquía

Se prevé amenaza muy alta en sectores muy puntuales del departamento del Meta. Asimismo, se espera amenaza alta en el noroccidente del Meta y en la Serranía de la Macarena. Por otro lado, en sectores del occidente del Meta, así como en áreas de Casanare y Arauca, se prevé una amenaza entre moderada y baja. En el resto de la región no se prevé este tipo de amenaza.

Región Amazonía

Se prevé amenaza alta en zonas puntuales del occidente de los departamentos de Putumayo y Caquetá, en jurisdicción del piedemonte amazónico. Asimismo, amenaza moderada y baja en algunos sectores de estos mismos departamentos. En el resto de la región no se prevé este tipo de amenaza.

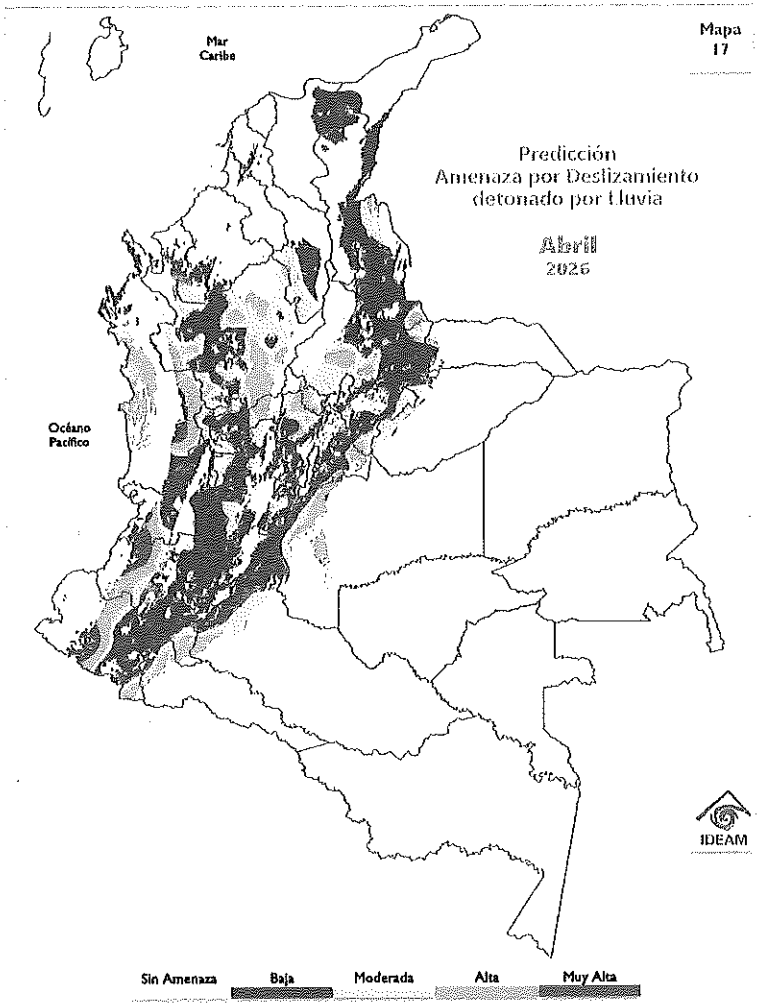

RECOMENDACIONES

Dadas las condiciones climáticas previstas para el territorio nacional en el mes de abril, se prevé alta probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en algunas zonas de ladera de las regiones Pacífica y Orinoquía, principalmente en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó y en zonas puntuales de Meta.

Se sugiere mantener vigilancia en áreas inestables del territorio, con especial atención en aquellas áreas donde se pueda iniciar o evidenciar cambios en la estabilidad del suelo, principalmente en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Meta.

Por tanto, se recomienda al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, mantener activos los planes de contingencia ante la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en áreas inestables y vulnerables que han presentado o presentan dinámicas actuales por condiciones de inestabilidad de laderas.

Dada la dinámica presentada actualmente, es preciso que los sectores de infraestructura vial, transporte, servicios públicos, recreación y demás, tengan en cuenta que se mantiene la amenaza por deslizamientos de tierra en áreas inestables de ladera en especial en los departamentos anteriormente indicados.

Importante: considerar la posible ocurrencia de avenidas torrenciales en las cuencas de alta pendiente ocasionadas por eventos extremos hidrometeorológicos locales. Se sugiere mantener la cobertura vegetal y la humedad en los suelos en zonas secas, para prevenir y mitigar los procesos de degradación de los suelos por erosión y salinización en aquellas zonas donde se puede presentar déficit hídrico.

Importante:

Considerar la posible ocurrencia de avenidas torrenciales en las cuencas de alta pendiente ocasionadas por eventos extremos hidrometeorológicos locales. Se sugiere mantener la cobertura vegetal y la humedad en los suelos en zonas secas, para prevenir y mitigar los procesos de degradación de los suelos por erosión y salinización en aquellas zonas donde se puede presentar déficit hídrico.

Región Caribe

Se prevé una condición muy alta en gran parte del departamento de La Guajira y zonas centro y norte de Magdalena y Cesar; para la condición alta se prevé mayoritariamente en el Atlántico, Sucre, Córdoba y San Andrés, Providencia y Santa Catalina, norte y centro de Bolívar. La condición moderada se espera en la parte baja de la Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena, La Guajira y Cesar), sur de Cesar, Bolívar y en menor proporción al sur de Córdoba. Se proyecta una condición baja en la zona media de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Región Andina

La condición alta se espera en áreas del norte de Santander y oriente, y zonas pequeñas del occidente de Norte de Santander y en zonas del Urabá antioqueño. Respecto a la condición moderada se espera en gran parte de Norte de Santander, noroccidente Santander, centro y norte de Boyacá, norte y occidente de Antioquia, centro-sur de Tolima y Huila, zonas puntuales del centro y occidente de Caldas. Se espera una condición baja en gran parte del departamento de Caldas, Risaralda y Quindío; al sur y zonas del occidente de Norte de Santander, oriente y sur de Santander, oriente y zonas del occidente de Boyacá, centro y oriente de Cundinamarca, centro y occidente de Antioquia, occidente y en zonas específicas del oriente de Tolima y sur del Huila. Se prevé una condición muy baja en zonas del sur de Santander, zonas pequeñas del oriente y occidente de Boyacá, y oriente de Cundinamarca, centro de Antioquia, oriente de Caldas y en menor proporción al sur de Risaralda y norte de Quindío.

Región Pacífica


Se prevé una condición alta al norte de Chocó, respecto a la condición moderada se espera en zonas del norte y zonas puntuales del sur oriente del Chocó, gran parte del oriente del Valle del Cauca y Cauca, zonas del oriente y en menor proporción del occidente de Nariño. Por otro lado, se anticipa una condición baja en centro y en zonas pequeñas del sur del departamento de Chocó, nororiente y occidente Valle del Cauca, centro de Cauca y occidente y zonas puntuales del oriente de Nariño. Finalmente, se proyecta una condición muy baja en el occidente y zonas de menor proporción del oriente del Chocó, áreas puntuales del sur occidente del Valle del Cauca, occidente del Cauca y en el departamento de Nariño en zonas puntuales del norte, occidente y sur oriente.

Región Orinoquía

Se prevé una condición muy alta al oriente de Arauca, para la condición alta se espera en gran parte del departamento de Casanare, Arauca y norte de Vichada de occidente a oriente, se espera condición moderada en gran proporción del departamento del Vichada, en zonas puntuales al occidente de Arauca, Casanare y al norte del Meta. Se prevé una condición baja en gran parte del Meta, el piedemonte Araucano, piedemonte de Casanare y sur occidente de Vichada. Para la condición muy baja se espera en zonas puntuales del occidente y suroriente del Meta.

Región Amazonía

Se prevé una condición muy alta en pequeñas zonas del nororiente de Guainía, en menor proporción en zonas del noroccidente de Caquetá, zonas puntuales del occidente de Putumayo y sur de Amazonas. Se espera una condición alta en gran parte del departamento de Guainía, Caquetá, norte de Guaviare, pequeñas áreas del norte de Vaupés, oriente y pequeñas zonas del occidente de Putumayo, y en menor proporción al sur del Amazonas. Finalmente, se proyecta una condición muy baja en gran parte del Amazonas, Vaupés, sur de Guaviare y Guainía, sur y pequeñas zonas del sur occidente del piedemonte caqueteño y occidente de Putumayo.

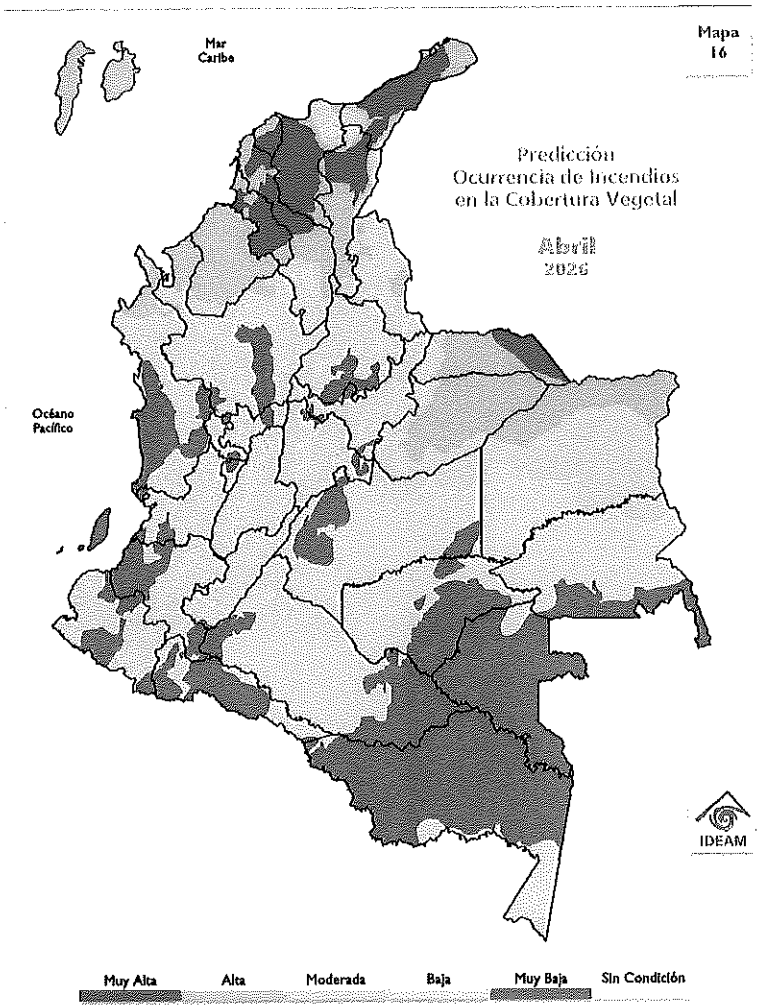

RECOMENDACIONES

A la comunidad en general, a los turistas y caminantes, apagar debidamente las fogatas y colillas encendidas no dejar residuos de materiales tipo vidrio u otros elementos que permitan concentrar la radiación, igualmente reportar a las autoridades en caso de ocurrencia de incendios.

A los Consejos de Gestión de Riesgo de Desastres Departamentales Distritales y Municipales (Art 45 de la Ley 1523) y a las autoridades ambientales regionales y locales, mantener activos los planes de prevención y atención de incendios con el fin de evitar la ocurrencia y propagación de estos, especialmente en áreas de reserva forestal y de Parques Nacionales Naturales.

A los sistemas regionales y locales de bomberos disponer de los elementos y la logística necesaria para la atención oportuna de eventos de incendio de la cobertura vegetal.

A las personas que realizan quemas abiertas controladas para actividades agrícolas y mineras, se les recuerda que, para permitir se realización, deben cumplir con los requisitos, términos y condiciones establecidos en la Resolución No. 532 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Para ampliar la información sobre la ocurrencia diaria de incendios de la cobertura vegetal visita el siguiente enlace:

http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/pronosticos-y-alertas/informe-diario-de-incendios

PROBABILIDAD MUY ALTA
La humedad disponible en la vegetación presente y las precipitaciones esperadas en el mes son muy escasas, la temperatura del aire, la radiación solar y el viento son muy altos, lo cual favorece la propagación del fuego.

PROBABILIDAD ALTA
La humedad disponible en la vegetación presente y las precipitaciones esperadas en el mes son escasas, la temperatura del aire, la radiación solar y el viento son altos, lo cual favorece la propagación del fuego.

PROBABILIDAD MODERADA
Hay disponibilidad de humedad para la vegetación presente, pero las precipitaciones esperadas en el mes son escasas, la temperatura del aire, la radiación solar y el viento son altos, lo cual favorece la propagación del fuego.

PROBABILIDAD BAJA
Hay disponibilidad de humedad para la vegetación presente y se esperan algunas precipitaciones en el mes, la temperatura del aire, la radiación solar y el viento son bajos, lo cual inhibe en alguna medida la propagación del fuego o viceversa.

PROBABILIDAD MUY BAJA
La humedad disponible para la vegetación presente es muy escasa, se esperan precipitaciones altas en el mes, la temperatura del aire, la radiación solar y el viento son muy bajos, lo cual no favorece la propagación del fuego.

SIN CONDICIÓN
Se esperan niveles con valores en el rango de los mínimos para que se desarrollen incendios en la vegetación respecto a los valores históricos del mes.

RECOMENDACIONES



Sistema Nacional de Riesgo de Desastres

De acuerdo con los resultados más recientes de la predicción climática, se recomienda activar los planes de prevención y atención ante una posible reducción de lluvias, durante esta época del año en la que normalmente se registran acumulados mensuales altos.

Asimismo, se sugiere mantener la atención ante la posible ocurrencia y propagación de incendios en la cobertura vegetal entre las categorías muy alta y alta en sectores de las regiones Caribe y Orinoquía.



Sector transporte

Dadas las condiciones climáticas previstas para el territorio nacional en el mes de abril, se prevé alta probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en algunas zonas de ladera de las regiones Pacífica y Orinoquia, principalmente en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó y en zonas puntuales de Meta.



Sector agropecuario y ganadero

Todas las recomendaciones necesarias con respecto a efectos y recomendaciones para el sector agropecuario por regiones y departamentos, las podrá encontrar en el enlace:

http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-agroclimatico



Sector salud


Evite la exposición directa al Sol entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Cerca del 80% de la radiación UV se recibe en este periodo. La exposición al Sol sin protección es nociva, ya que produce manchas en la piel, envejecimiento, problemas oculares y aumenta el riesgo de desarrollar cáncer en la piel. Las recomendaciones en relación con las enfermedades transmitidas por vectores, zoonosis y enfermedad diarreica aguda, las podrá encontrar en:

http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-clima-y-salud



Sector energético

Realizar una operación adecuada del recurso hídrico, puesto que en términos generales se estiman volúmenes de lluvia alrededor de los valores normales en la mayor parte de las cuencas de interés durante abril del 2026.

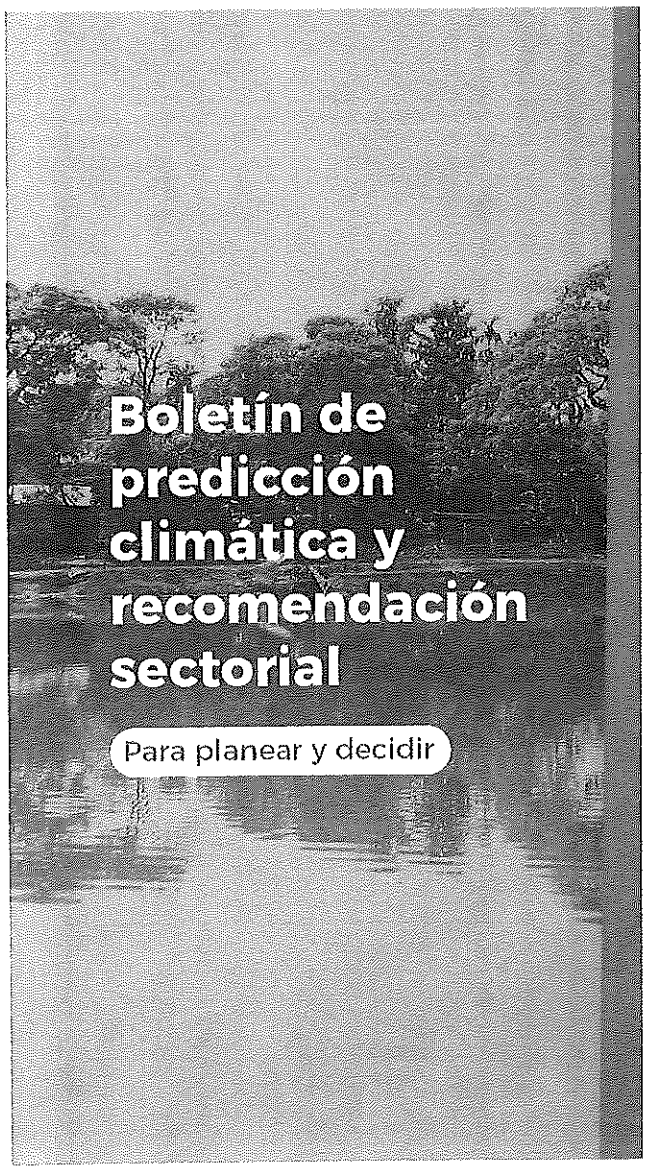

Boletín de predicción climática y recomendación sectorial

Para planear y decidir

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM

DIRECTIVOS
Ghisliane Echeverry Prieto
Directora General
TC. Diana Carolina Rueda Dimate
Subdirectora de Meteorología

AUTORES
Julieta Serna Cuenca
Coordinación del boletín
Grupo de Climatología y Agrometeorología
Subdirección de Meteorología


Grupo de Modelamiento de Tiempo y Clima
Predicción Climática Nacional
Subdirección de Meteorología

Nelsy Verdugo
Comportamiento hidrológico
Subdirección de Hidrología

Luis Mario Moreno
Lina Pinto
Incendios
Subdirección de Ecosistemas

Apoyo Técnico
Subdirección de Meteorología

Julieta Serna Cuenca
Edición y Diagramación
Subdirección de Meteorología



UNIÓN TEMPORAL
INGE
POLICIA
GAITÁN

BITÁCORA DE OBRA

CALLE 2 No 27 – 116 Villavicencio – Meta
Tel. 310 888 54 20

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 01 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 Meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	1	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO	1							
Electrico	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Verificación traslapos Malla electrosoldada		Alojamientos Nuevos	X	
Recorridos técnicos		Estación de Policía	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 01 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS? SI NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla inicial enfocada de la calistenia. Se realiza revisión de instalación de malla electrosoldada plana para de contrapiso, verificando traslapos, Nivelación y amarre Se ejecutan recorridos técnicos para verificación de redes hidraulicas y sanitarias en primer piso de alojamientos nuevos. No se presentan novedades.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 02 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 5

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Malla electrosoldada	Kg	Alojamientos	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 02 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 5

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla hseq seguido la calistenia se continua con la revisión de malla electrosoldada y adecuaciones menores. Se presentan lluvias fuertes durante la jornada lo que genera disminución en el rendimiento de actividades. Se realizan inspecciones de redes de presión No se presentan novedades

OBSERVACIONES:

C: Conforme	x	JENNIFER R FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 03 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 2

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	✓	
RESIDENTE	1	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	✓	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	✓	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	✓	
AYUDANTE	3	VOLQUETA	0			Botas	✓	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Malla electrosoldada	Kg	Alojamientos	✓	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 03 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 2

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla hsq y seguido la caliztenia. Se realizan revisiones de redes sanitarias en primer piso. Se presentan lluvias moderadas durante la jornada. NO se presentan novedades.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER R FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 04 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 3

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	3	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Revisiones técnicas		Alojamiento Nuevo	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 04 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 3

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla hseq y seguido la cotidiana. Se realizan revisiones de redes sanitarias en primer piso. Se presentan lluvias moderadas durante la jornada. No se presentan accidentes laborales

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 05 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 4

PLAZO ACTUAL		DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR		RETROEXCAVADORA				Cascos		
RESIDENTE		COMPACTADOR TIPO RANA				Gafas		
MAESTRO		MEZCLADORA DE CONCRETO				Tapabocas		
OFICIAL		VIBRADOR DE CONCRETO				Guantes		
AYUDANTE		VOLQUETA				Botas		
TOPOGRAFO								
INSPECTOR SISO								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 05 Abril 2026.	HORAS DE LLUVIA: 4

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

No se labora. por dia domingo.

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	x	JENNIFER FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 06 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 4

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Placa Contrapiso 3000 psi	M3	Alojamientos	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 06 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 4

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla hseq segun la caliskenia. Se inicia fundicion de Placa de Contrapiso en concreto impermeabilizado (3000 psi) mezclado en obra, verificando dosificación, extendido y nivelación. No se presentan novedades.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 07 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 5

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Placa de Contrapiso 3000 PSI	M3	Alojamientos	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÈCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 07 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 5

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla treq y seguido la calistenia. Se continúa la fundición de placa de contrapiso. Se presentan Fuertes lluvias pero se logra terminar la fundida sin novedades.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER R. FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 08 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	1	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Placa contrapiso	M3	Alojamiento	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 08 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla hseq y seguido las cabsternes. se ejecuta corrido de la placa de contrapiso y limpieza del área.
Se realizan recorridos técnicos e hidraulicos.
NO se presentan novedades

OBSERVACIONES:

C: Conforme	x	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 09 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	1	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Placa contrapiso	M3	Alojamiento	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 04 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla hseq. seguido la calistenia. Se continuan actividades de cerrado y verificación de redes de presión. No se presentan novedades.

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	x	JENNIFER FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 10 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 6

PLAZO ACTUAL	8 Meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR	0
RESIDENTE	1
MAESTRO	1
OFICIAL	1
AYUDANTE	7
TOPOGRAFO	0
INSPECTOR SISO	1

EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO	
		Operación	Mantenimiento
RETROEXCAVADORA	0		
COMPACTADOR TIPO RANA	0		
MEZCLADORA DE CONCRETO	0		
VIBRADOR DE CONCRETO	0		
VOLQUETA	0		

ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
Elemento	SI	NO
Cascos	X	
Gafas	X	
Tapabocas	X	
Guantes	X	
Botas	X	

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Verificación Área	GBL	Alojamientos	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	X SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	X NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 10 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 6

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS? SI [ ] NO [ ]

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla hseq, seguido la asistencia. Se continuan actividades de cunetas y verificación de redes. No se presentan novedades.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER R. FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 11 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	3	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Acero de refuerzo	KG	Vigas viernes	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 11 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se dan inicio a las actividades programadas con la charla hseq, seguido la calistenia. Se inicia figurado, armado y cargue de acero de refuerzo fy=420 MPa para vigas aéreas N+3.00, ademas de nastas y viguetas. No se presentan novedades

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 12 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR		RETROEXCAVADORA				Cascos		
RESIDENTE		COMPACTADOR TIPO RANA				Gafas		
MAESTRO		MEZCLADORA DE CONCRETO				Tapabocas		
OFICIAL		VIBRADOR DE CONCRETO				Guantes		
AYUDANTE		VOLQUETA				Botas		
TOPOGRAFO								
INSPECTOR SISO								
-								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 12 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Dia no laborado (Domingo)

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 13 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Acero de Refuerzo	Und	Vigas aéreas	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 13 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla hseq y seguido la cuadrilla. Se continua con el armado y amarre de acero de refuerzo en vigas aéreas. NO se presentan novedades

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER R FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 14 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0
PLAZO ACTUAL: 8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS:	DIAS PENDIENTES:

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	✓	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	x	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	x	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	x	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	x	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Aseo de Oficinas	Hoy	Vigul General	x	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 14 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla inicial y seguido la caminata. Se avanza en el armado de acero de refuerzo y verificación de diseño estructural. No se presentan novedades.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER R FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 15 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0
PLAZO ACTUAL: 8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS:	DIAS PENDIENTES:

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	✓	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	2	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Acero de refuerzo	Kg	Vigas aéreas	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 15 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0 .

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI	-	NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla hseq y seguido la cotidiana. Se continuan trabajos de amarre de acero de refuerzo en Viga de cerramiento. No se presentan novedades.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER R FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 16 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 3

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VISRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Acero de refuerzo	kg	Viga y aereo	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	X NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	X NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 16 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 3

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla inicial y seguido la caminata. Se presentan lluvias moderadas. Se realizan ajustes finales en acero de refuerzo previo a encofrado. No se presentan novedades.

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	X	JENNIFER FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 17 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 2

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	V	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	V	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	V	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Encofrado Vigas aereas		Alojamiento	✓	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 17 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 2

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la Charla diaria, seguido la continuidad. Se da inicio a las actividades de encofrado de Viga aérea N+3.00, incluyendo instalación de formaletas, alineación y nivelación. No se presentan novedades.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES FIRMA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS FIRMA
NC: No Conforme			

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 18 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0
PLAZO ACTUAL: 8 Meses	DIAS TRANSCURRIDOS:	DIAS PENDIENTES:

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0
TOPOGRAFO	0		
INSPECTOR SISO	1		

ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
		Cascos	X	
		Gafas	X	
		Tapabocas	X	
		Guantes	X	
		Botas	X	

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
Encofrado Vigas aéreas		Alojamiento Y	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 18 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla hse y seguido la calistenia. Se continua con el encofrado de viga aérea, realizando ajuste, alineamiento y revisión de estabilidad de formaletas. No se presentan novedades.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	✓	JENNIFER FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 19 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 Meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR		RETROEXCAVADORA				Cascos		
RESIDENTE		COMPACTADOR TIPO RANA				Gafas		
MAESTRO		MEZCLADORA DE CONCRETO				Tapabocas		
OFICIAL		VIBRADOR DE CONCRETO				Guantes		
AYUDANTE		VOLQUETA				Botas		
TOPOGRAFO								
INSPECTOR SISO								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 19 Abril 2026.	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

No se labora (Domingo)

OBSERVACIONES:			
C: Conforme		JENNIFER FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 20 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 3.

PLAZO ACTUAL	8 Meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Montaje Vigas aereas		Alojamientos nuevos	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÈCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 20 Abril 2026.	HORAS DE LLUVIA: 3

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla hseq, seguido la Calistenia. Se presentan lluvias moderadas se continua con el trabajo de encofrado de vigas aéreas N+3.00 y se realizan recorridos técnicos de revisión eléctrica e hidráulica bajo supervisión de interventoria. No se presentan novedades.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISION DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 21 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 1

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Montaje Vigas aéreas		Alojamientos	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 21 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 1

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla hseq y seguido la calistenia. Se continúa con las actividades de encofrado de vigas aéreas, verificando alineación, nivelación y aseguramiento de formaletas. No se presentan novedades.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	✓	JENNIFER FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 22 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 meses.	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	3	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Montaje Vigas aéreas		Alojamientos	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 22 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades laborales con la charla hseq y seguido la caminata. Se continúa con las actividades de formaleteado / encofrado de vigas aéreas, realizando ajuste y arriostramiento de la formaleta instalada. Se realiza revisión de niveles y alineación con equipo de Medición.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 23 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Encofrado Vigas aéreas		Alojamientos	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 23 de Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla HSEQ y seguido la caminata. Se avanza en el armado y colocación de formaleta en vigas aéreas restantes. Se verifica la correcta Fijación de elementos de soporte y se realiza control de nivelación

OBSERVACIONES:

C: Conforme	x	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 24 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0
PLAZO ACTUAL: 8 meses · DIAS TRANSCURRIDOS:	DIAS PENDIENTES:

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
Encofrado de Vigas aéreas		Alojamiento Nuevo	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO X	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 24 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla hseq y seguido la calistenia. Se ejecutan actividades de revisión general del sistema de formaleta instalado, corrigiendo desviaciones encontradas en niveles.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	Y	JENNIFER FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 25 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 4

PLAZO ACTUAL	8 meses.	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Encofrado Vigas aéreas		Alojamiento1	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 25 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 4

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas. Con la charla Aseg y seguido la Calistenia. Se continua el proceso de encofrado, sin embargo, se presentan condiciones climáticas de lluvia durante la jornada, lo cual genera disminución en el rendimiento de las actividades.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	✓	FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 26 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 4

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Encofrado Vigas aéreas		Alojamientos	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 26 April 2026.	HORAS DE LLUVIA: 4

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS? SI NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla diaria y seguido la calistenia. Se adelantan labores de perforación de muelas y alineación. Durante el dia se presentan lluvias intermitentes, afectando parcialmente el desarrollo normal de las actividades. Se corrigen inconsistencias de nivelación.

OBSERVACIONES:

C: Conforme	X	JENNIFER FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 27 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 Meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Encofrado Vigas aéreas		Alojamientos Nuevos	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 27 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla diaria, seguido la calistenia. Se continua con el aseguramiento de la formaleta. Se realiza revisión conjunta con equipo técnico para validación de elementos.

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	Y	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES FIRMA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS FIRMA
NC: No Conforme			

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 28 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 Meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Excavado Vigas aereas		Alojamientos		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 28 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0 .

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla
Hseq y seguido la utilizacion. Se realiza inspección detallada
de toda la formaleta instalada en vigas aéreas

OBSERVACIONES:

C: Conforme	V	JENNIFER FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 29 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 4

PLAZO ACTUAL	8 Meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	7	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Encofrado Vigas aereas.		Alojamientos	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 29 Abril 2026.	HORAS DE LLUVIA: 4

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se da inicio a las actividades programadas con la charla hse y seguido la asistencia. Se realizan Ajustes en la formaleta, no obstant, se presentan lluvias durante la jornada, lo que limita el avance continuo. Se realiza limpieza general en la obra.

OBSERVACIONES:			
C: Conforme		JENNIFER FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 30 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

PLAZO ACTUAL	8 Meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR	0	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
AYUDANTE	2	VOLQUETA	0			Botas	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Encofrado Viga aérea		Alojamiento	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
	X			X	
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
	X				X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO
		X			X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA	
	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 30 Abril 2026	HORAS DE LLUVIA: 0

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION ESPECIFICA ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se continúa con las actividades de Formaleteado de vigas aéreas, realizando ajuste, alineación y verificación de niveles. No se presentan novedades.

OBSERVACIONES:			
C: Conforme	✓	JENNIFER B FIRMA	FIRMA
NC: No Conforme		JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

UNIÓN TEMPORAL
INGE
POLICIA
GAITÁN

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

CALLE 2 No 27 – 116 Villavicencio – Meta
Tel. 310 888 54 20

INFORME MENSUAL SST No. 05
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"

PERIODO:
01 DE ABRIL DE 2026 A 30 DE ABRIL DE 2026

PUERTO GAITÁN-META

ELABORÓ	APROBÓ
MAIRA ALEJANDRA CARDENAS LESMES	**INGRID MARYORI GARCIA FONSECA**
PROF. EN SALUD OCUPACIONAL	R/L UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción....2
2. Descripción del proyecto....4
2.1. Localización del proyecto....4
2.2. Generalidades....5
2.3. Alcance del contrato de obra....6
2.4. Población beneficiada....7
3. Información del contrato de obra....7
4. Gestión SYSO / Seguridad y salud en el trabajo (SST)....8
4.1. Objetivos....9
4.1.1 Objetivo general....9
4.1.2 Objetivos específicos....9
4.2. Desarrollo de actividades en HSEQ....9
4.3. Control de maquinaria y equipos....28
4.4. Condiciones climáticas....30
4.5. Relación personal de obra (profesional, técnico, operativo)....30
5. Conclusiones....31
6. Anexos....31

TABLAS

Tabla 1. Localización del proyecto....4
Tabla 2. Alcance contrato de obra....6
Tabla 3. Información del contrato de obra....7
Tabla 5. Listado de maquinaria movilizada en la obra....28
Tabla 6. Relación personal de obra....30

1. Introducción

1. Introducción

El presente informe HSEQ corresponde al periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2026, para lo cual se requiere la verificación e identificación de las condiciones de riesgo con las que el trabajador se va a encontrar en el desarrollo de su labor, implementando las buenas prácticas, implementando conocimientos, y velando por la seguridad y salud de los trabajadores que se van a contratar para la ejecución del proyecto.

La Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como propósito fundamental la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de sus actividades laborales, promoviendo entornos de trabajo seguros y saludables. En la actualidad, este enfoque se extiende a todas las profesiones y oficios, buscando que el trabajo se adapte a las capacidades del trabajador y no que el trabajador se exponga a condiciones que afecten su integridad física o mental.

El presente informe se fundamenta en las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado, orientadas a la planeación, organización y estructuración del sistema HSEQ, así como a la identificación preliminar de las condiciones de riesgo que podrían presentarse durante la ejecución del proyecto. Lo anterior permite establecer las medidas preventivas necesarias, aplicar buenas prácticas y garantizar condiciones seguras para el personal que será vinculado en las etapas posteriores de la obra.

El principal objetivo del sistema HSEQ es la identificación y control de peligros que puedan afectar tanto a los trabajadores como a personal ajeno a la obra, fortaleciendo el compromiso con la seguridad, la salud y el cumplimiento normativo, y asegurando la correcta implementación del sistema de gestión durante el desarrollo del proyecto.

La Unión Temporal Inge Policía Gaitán mantiene un firme compromiso con la protección de la salud y la seguridad de su población trabajadora, mediante la evaluación continua y la mitigación de los riesgos presentes en las áreas de trabajo, con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Asimismo, reconoce que la participación y el compromiso de los trabajadores son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. Descripción del proyecto

2.1. Localización del proyecto

El proyecto objeto del contrato 1683 de 2025 se encuentra localizada en el municipio de Puerto Gaitán-Meta. En la siguiente tabla un resumen de la ubicación del municipio.

Tabla 1. Localización del proyecto

Puerto Gaitán Meta	
País:	Colombia
Región:	Orinoquía
Departamento:	Meta
Ubicación:	Lat. N. 3° 05' y 4° 08' Log. O. 71° 05' y 72° 30'
Altitud:	149 msnm
Superficie:	17.536 km²
Temperatura media:	27 °C
Fundación:	1932
Población:	46.689 habitantes

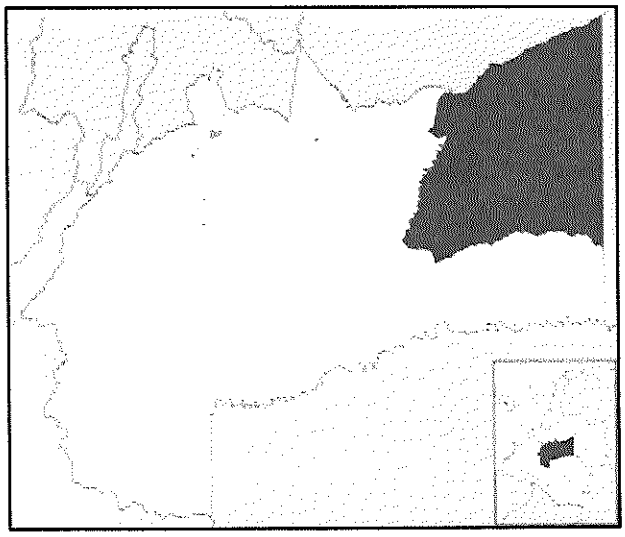


Ilustración 1. Localización general del municipio de Puerto Gaitán.

El proyecto se ubicará en la Estación de Policía del Municipio de Puerto Gaitán Meta (Zona Urbana). El trazado urbano es ordenado, con vías pavimentadas y accesos funcionales, aunque aún persisten sectores con déficit de servicios. En la cabecera se concentra la mayor parte de la población y la infraestructura estatal, incluyendo comandos de la Fuerza Pública. Estas condiciones justifican la necesidad de intervenir y fortalecer la Estación de Policía, garantizando capacidad operativa y cobertura adecuada ante el crecimiento poblacional y la complejidad del entorno.

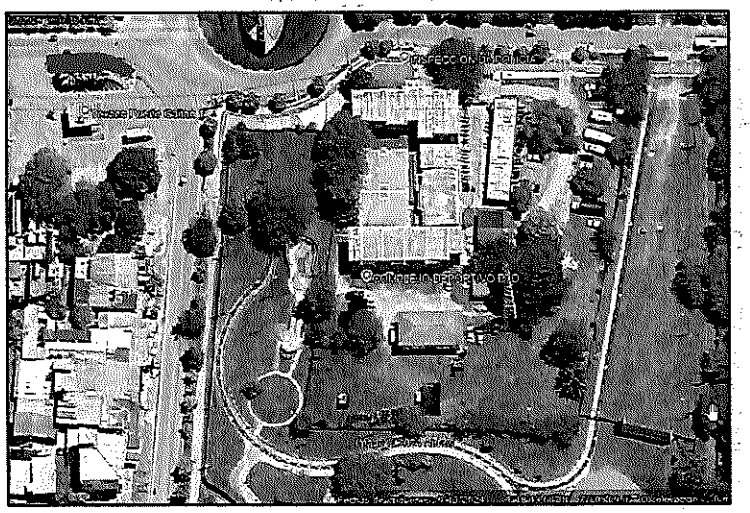


Ilustración 2. Localización del proyecto, imagen tomada de Google Earth.

2.2. Generalidades

El proyecto tiene como objetivo la construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura de la Estación de Policía del municipio de Puerto Gaitán – Meta, con el fin de superar las deficiencias físicas y funcionales que actualmente limitan el cumplimiento de las funciones misionales de la Policía Nacional. La intervención se fundamenta en un diagnóstico técnico que evidencia deterioro estructural, insuficiencia de espacios, fallas en los sistemas de instalaciones técnicas y condiciones inadecuadas para el alojamiento y operación del personal.

Puerto Gaitán es un municipio de alta relevancia estratégica debido a su crecimiento demográfico, desarrollo agroindustrial y ubicación cercana a corredores de movilidad interdepartamental, lo cual ha incrementado las exigencias en materia de seguridad y control territorial. En este contexto, el proyecto busca dotar a la institución de una infraestructura moderna, funcional y acorde con las dinámicas urbanas y sociales del territorio.

La propuesta contempla una intervención integral que incluye la construcción de nuevos alojamientos para el personal policial, la rehabilitación del edificio "Casa Blanca" destinado

a vivienda familiar, la implementación de un sistema elevado de almacenamiento de agua potable y la construcción de un nuevo cerramiento perimetral de seguridad. Estas acciones permitirán mejorar las condiciones de habitabilidad, garantizar la continuidad de los servicios básicos, fortalecer la seguridad física de la estación y optimizar la capacidad operativa institucional.

El proyecto se desarrollará bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia institucional y responsabilidad fiscal, contribuyendo al fortalecimiento de la presencia policial y al mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Puerto Gaitán.

2.3. Alcance del contrato de obra

El Contrato de Obra No. 1683 de 2025 contempla la ejecución de actividades orientadas al fortalecimiento de la infraestructura de la Estación de Policía del municipio, mediante la construcción de una edificación de dos (2) niveles destinada a nuevos alojamientos con capacidad para albergar hasta ciento doce (112) personas, la rehabilitación integral del edificio denominado Casa Blanca, con capacidad para cuatro (4) grupos familiares, la implementación de un sistema elevado de almacenamiento de agua potable que garantice la continuidad del servicio, y la demolición y posterior construcción de un nuevo cerramiento perimetral, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad y control del recinto policial.

A continuación, se muestra el alcance del contrato el cual consta de 23 capítulos enfocados a satisfacción del objeto contratado.

Tabla 2. Alcance contrato de obra

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	VALOR
	PRESUPUESTO ALOJAMIENTOS NUEVOS	
1	PRELIMINARES	$ 4.198.624,00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 80.230.348,00
3	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	$ 417.501.889,00
4	RED DE PRESION	$ 10.903.310,00
5	RED SANITARIA	$ 34.354.320,00
6	RED PLUVIAL	$ 11.900.456,00
7	RED CONTRA INCENDIOS	$ 1.014.054,00
8	RED ELECTRICA - BAJA TENSION	$ 141.083.078,00
9	RED ELECTRICA - APANTALLAMIENTO	$ 13.938.854,00
10	MAMPOSTERIA, PISOS Y ACABADOS ARQUITECTONICOS	$ 565.737.574,00

11	APARATOS SANITARIOS Y PRESION	$ 46.128.228,00
12	CARPINTERIA METALICA, MADERA Y DE ALUMINIO	$ 378.485.102,00
	PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES EXISTENTES	
13	DEMOLICION Y DESMONTE	$ 41.757.891,00
14	RED ELECTRICA - BAJA TENSION	$ 37.303.929,00
15	ACABADOS ARQUITECTONICOS	$ 223.371.272,00
16	CARPINTERIA METALICA, MADERA Y DE ALUMINIO	$ 144.145.763,00
17	APARATOS SANITARIOS Y PRESION	$ 8.154.912,00
	PRESUPUESTO TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMAMIENTO DE AGUA	
18	PRELIMINARES	$ 714.444,00
19	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACABADOS	$ 57.497.172,00
	PRESUPUESTO CERRAMIENTO	
20	PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	$ 34.412.024,00
21	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	$ 814.593.767,00
	OTROS	
22	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$ 75.936.264,00
23	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	$ 119.989.209,00
	VALOR TOTAL	**$ 4.306.277.668,00**

2.4. Población beneficiada

El proyecto beneficia de manera directa al personal de la Policía Nacional que presta servicio en el municipio de Puerto Gaitán, al proporcionar una infraestructura moderna, funcional y segura que mejora las condiciones de alojamiento, operación y bienestar laboral. De manera indirecta, la iniciativa impacta positivamente a la comunidad del municipio, al fortalecer la capacidad institucional, la presencia policial y la atención oportuna a las necesidades de seguridad ciudadana, contribuyendo al orden público y al desarrollo social del territorio.

3. Información del contrato de obra

Tabla 3. Información del contrato de obra

Número del proceso:	LP-SI-010-2025
Tipo de contrato:	Obra Publica
Número del contrato:	1683 del 2025
Fecha del contrato:	03 de diciembre de 2025

Objeto:	Construcción, adecuación y mejoramiento de la estación de policía del municipio de puerto Gaitán - meta
Contratista:	Union Temporal Inge Policía Gaitan
Nit:	902.011.453-2
Representante legal:	Ingrid Maryori García Fonseca C.C. No. 1.121.837.768 de Villavicencio – Meta
Correo electrónico:	utingepoliciagaitan@gmail.com
Contratante:	Municipio de Puerto Gaitán Alcalde municipal LUIS CÉSAR PÉREZ GAITÁN C.C. No. 1.122.120.037 de ACACIAS - META
Interventoría:	Unión Temporal Inter policía 2025
Nit:	902.014.419-5
Representante legal:	Diego Armando Cardoso Guerrero C.C. No. 86.088.145 de Villavicencio – Meta
Correo electrónico:	Utinterpolicia2025@gmail.com
Valor:	Cuatro mil trescientos seis millones doscientos setenta y siete mil seiscientos sesenta y ocho pesos m/cte ($4.306.277.668,00)
Plazo inicial del contrato:	Ocho (8) meses
Supervisor:	Christian Julián Fernández Reyes CC. 1.124.823.789 de Puerto Gaitan - Meta Secretario de infraestructura
Fecha del acta de inicio:	18 de diciembre de 2025
Fecha de terminación:	17 de agosto de 2026

4. Gestión SYSO / Seguridad y salud en el trabajo (SST)

Durante el periodo del presente informe, en el marco de la ejecución del proyecto, se desarrollaron actividades de localización y replanteo, relleno y excavación manual, estructura de concreto y aceros de refuerzo. En este contexto, la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SYSO / SST) estuvo orientada a la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales asociados a dichas actividades, en cumplimiento de los lineamientos HSEQ establecidos contractualmente y los requisitos definidos por la interventoría.

Las acciones implementadas durante el periodo incluyeron la planificación y seguimiento de las medidas preventivas, la elaboración y aplicación de la documentación HSEQ, así como la socialización de procedimientos seguros de trabajo para las actividades ejecutadas, con el

fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para el personal en obra y prevenir la ocurrencia de incidentes y accidentes laborales.

4.1. Objetivos

4.1.1 Objetivo general

Desarrollar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unión Temporal responsable del proyecto, alineado con los requisitos HSEQ establecidos por la interventoría y la normativa vigente, garantizando condiciones seguras y controladas para el personal que será vinculado durante la ejecución del contrato.

4.1.2 Objetivos específicos

- Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- Promover condiciones de trabajo que favorezcan el bienestar físico y mental de los trabajadores.
- Fomentar la concientización sobre la mitigación de impactos ambientales asociados a las actividades del proyecto.
- Garantizar el control de los impactos ambientales que puedan generarse durante la ejecución de la obra, conforme a los lineamientos del plan ambiental aplicable.

4.2. Desarrollo de actividades en HSEQ

Durante el periodo del presente informe, se desarrollaron actividades operativas en campo asociadas a la ejecución de placa de contrapiso en concreto, armado de acero de refuerzo para vigas aéreas y la instalación de redes hidráulicas, las cuales fueron ejecutadas bajo los lineamientos del Sistema de Gestión HSEQ, garantizando condiciones seguras de trabajo, control de los aspectos ambientales y cumplimiento de los criterios de calidad del proyecto.


De manera paralela a la ejecución de las actividades, se realizó la elaboración, organización y aplicación de los formatos HSEQ, así como la planeación y seguimiento de las medidas de control necesarias para la adecuada gestión de los riesgos asociados a cada una de las actividades desarrolladas en campo.

Entre las actividades HSEQ implementadas durante el periodo evaluado se destacan:

- Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos asociados a las actividades ejecutadas.
- Socialización de procedimientos seguros de trabajo y medidas preventivas con el personal en obra.
- Verificación del uso adecuado de elementos de protección personal (EPP).
- Control y seguimiento a las condiciones de seguridad durante la ejecución de las labores.

Los formatos y registros asociados a estas actividades se anexan a continuación (los siguientes registros se anexan al final de documento de manera clara):

TP-HSEQ-FOR-009 INDUCCION A PERSONAL

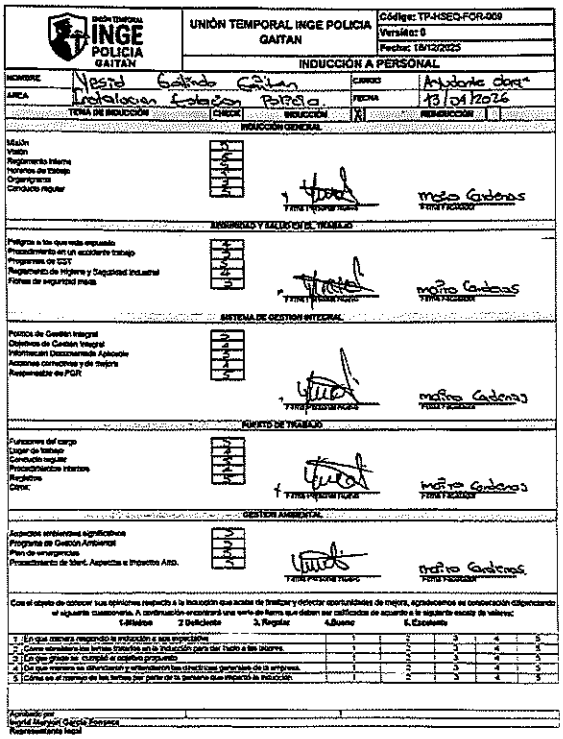

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Código: TP-HSEQ-FOR-009
Versión: 0
Fecha: 18/12/2025

INDUCCIÓN A PERSONAL

NOMBRE: Yesid Gaitán Gaitán — CARGO: Ayudante obra
AREA: Instalación Estación Patrulla — FECHA: 13/04/2026

TEMA DE INDUCCIÓN | CHECK | INDUCCIÓN: X | REINDUCCIÓN:

INDUCCIÓN GENERAL
Misión
Visión
Reglamento Interno
Horarios de Trabajo
Organigrama
Conducto regular

RIESGOS Y SALUD EN EL TRABAJO
Peligros a los que está expuesto
Procedimiento en un accidente trabajo
Programas de SST
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
Fichas de seguridad meds

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
Puntos de Gestión Integral
Objetivos de Gestión Integral
Información Documentada Aplicable
Acciones correctivas y de mejora
Responsable de PGI

ENTORNO DE TRABAJO
Funciones del cargo
Lugar de trabajo
Conducto regular
Procedimientos internos
Reglamento
Otros

GESTIÓN AMBIENTAL
Aspectos ambientales significativos
Programa de Gestión Ambiental
Plan de emergencias
Procedimiento de Ident. Aspectos e Impactos Amb.

Con el objeto de conocer sus opiniones respecto a la inducción que acaba de finalizar y detectar oportunidades de mejora, agradecemos su colaboración diligenciando el siguiente cuestionario. A continuación encontrará una serie de ítems que deben ser calificados de acuerdo a la siguiente escala de valores:

1-Mínimo 2 Deficiente 3. Regular 4.Bueno 5. Excelente

1	En qué manera respondió la inducción a sus expectativas	1	2	3	4	5
2	Como calificaría los temas tratados en la inducción para dar inicio a las labores	1	2	3	4	5
3	El tiempo ofrecido fue cumplido el objetivo propuesto	1	2	3	4	5
4	De qué manera se diferenciaron y entendieron las directrices generales de la empresa	1	2	3	4	5
5	Cómo es el manejo de las bromas por parte de la persona que dirigió la INDUCCIÓN	1	2	3	4	5

Aprobado por:
Yesid Mauricio García Fonseca
Representante legal

TP-HSEQ-FOR-010 ENTREGA DOTACION Y EPP

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN — UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN — Código: TP-HSEQ-FOR-010 — Versión: 0 — Fecha: 10/12/2025

ENTREGA DOTACIÓN Y EPP

DATOS PERSONALES

NOMBRES: Alexis David
APELLIDOS: Beltran Valencia
IDENTIFICACION: 1122990392
CARGO: Ayudante de obra

DESCRIPCION DOTACION	TALLA	CANTIDAD	FECHA
Casco Seguridad		1	20/04/2026
Tapabocas Dimacion		1	20/04/2026
Overol verde.		1	20/04/2026
Gafas oscuras.		1	20/04/2026
Botas de Seguridad	40.	1	23/4 hasta

OBSERVACIONES:

DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.P Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.P UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR, ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DISEÑADOS PARA MI PROTECCION Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO, EXIMIENDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN EN MI SALUD.

ENTREGADO — RECIBIDO

TP-HSEQ-FOR-012 REGISTRO ASISTENCIA DIARIA

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

REGISTRO ASISTENCIA DIARIA

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META" — FECHA: 1/04/2026.

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Jhon Rodriguez Rod	Ay.	7:00	Jhon RR	4:30	Jhon RR	—
2	Dario Lopez	Ay.	7:00		4:30		—
3	Agustin Aguilar	Ay	7:00		4:30		—
4	Jesus A Pulido F.	Maestro	7:00		4:30		—
5	Gustavo Rea	Ay	7:30		4:30		—
6	Johan Manuel	Ay	7:00		4:30		—
7	Yuli Lorena C	Aux sst	7:00		4:30		—
8	Mayra Herrera	Aux	7:00		4:30		—
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TP-HSEQ-FOR-013 REGISTRO ASISTENCIA CHARLAS DE SEGURIDAD

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN | UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN | Código: TP-HSEQ-FOR-013 | Versión: 0 | Fecha: 18/12/2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

TIPO DE CAPACITACION: Charla [ ] | Capacitación [X] | Inducción [ ] | Reinducción [ ] | Otro [ ] | ¿Cual?

LUGAR: Poblacion Colmena Policia | FECHA: 19-01-2026 | HORA: 7:00 am

TEMA: Manejo de Estres Laboral y Salud Mental.

NOMBRE DEL FACILITADOR: Yeli Lozano G

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Juan Martin Bolivar Gaitan	1125549456	
2	Jeny Rodriguez R.	1121999200	
3	Esperanza Rios	1122727726	
4	Agustina Jaramillo T.	1121	
5	[illegible]	1121	
6	Juan Alvarez	1121	
7	Vera Alfaro	56055665	
8	Yeli Lozano	1122	
9			
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES:

TP-HSEQ-FOR-015 MANTENIMIENTO Y EXISTENCIA EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

MANTENIMIENTO Y EXISTENCIA DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Nombre del que Inspecciona: Mayra Castellanos
Cargo: Profesional SST.
Fecha de Inspección: 28-04-2026
Ubicación del Botiquín: Campamento

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS*	ESTADO (B: Bien, M: Mal)	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)
CLORURO DE SODIO	Bien	1	oct /2029
CUELLO ORTOPEDICO	Bien	1	
ALCOHOL ANTISEPTICO	Bien	1	15/10/2026
MICROPORE	Bien	1	
ALGODON	Bien	1	
VENDA ELASTICA 2"X5M	Bien	1	oct /2029
SUERO ORAL	Bien	2	05/2026
TOALLAS HIGIENICAS	Bien	18	9/2027.
TAPABOCAS	Bien	9	
AGUA	Bien	0	
CONDONES	Bien	1	09/2028
GASA ESTERIL	Bien	3	22/07/28.
BAJA LENGUAS	Bien	20	
GUANTES	Bien	38	N/a
PITO	Bien	1	
BISTURI	Bien	1	N/a
LIBRO DE PRIMEROS AUXILIOS	Bien	1	N/a.
CAMILLA	Bien	1	N/a.

OBSERVACIONES:

TP-HSEQ-FOR-016 INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

Código: TP-HSEQ-FOR-016
Versión: 0
Fecha: 18/12/2025

ITEM	No. DE EXTINTOR	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA MES	FECHA DE RECARGA AÑO	UBICACIÓN	CONDICIONES DEL EXTINTOR: PRESIÓN	SELLO GARANTÍA	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	MANOMETRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN
							B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M
1	#1	Polvo seco	10L	X		Almacén	X	A	X	X	X	N/A	X	X
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

No.	RESUMEN ESTADO DE EXTINTORES Y/O GABINETES CONTRA INCENDIOS	ACCIONES A SEGUIR	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
1	Se encuentra en optimas condiciones para su uso.	/	Yenli Ivone	24/04/26	24/04/26
2	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/
4					

CONVENCIONES: B: BIEN M: MAL R:NO

TP-HSEQ-FOR-017 FORMATO INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN

UNIÓN TEMPORAL INGE FOUCIA GAITAN

Código: TP-HSEQ-FOR-017
Versión: 0
Fecha: 18/12/2025

INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ÁREA: Civil_Construcción Algamarta.
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Yenli Agudelo G.
FECHA: 24-04-2026
CEDULA: 86008175.
CARGO: Ayudante.

ITEM	ESTADO							OBSERVACIONES
			REGULAR					
	PROTECCIÓN DE CABEZA, VISTA Y OIDOS							
1	Tapabocas			X				
2	Casco seguridad	Bueno			X			
3	Tapa oídos	Bueno			X			
4	Gafas de Seguridad	Bueno.			X			
	PROTECCIÓN MANOS							
1	Guantes Caucho			X				
2	Guantes Carnaza			X				
3	Guantes Vaqueta	Bueno			X			
4	Guantes precisión			X				
	ROPA DE TRABAJO							
1	Capuchón	Bueno			X			
2	Camibuso	Bueno			X			
3	Pantalón Jean	Bueno			X			
4	Calzado	Bueno			X			

TP-HSEQ-FOR-018 INSPECCION DE CONDICIONES INSEGURAS

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-018
		Versión: 0
		Fecha: 16/12/2025
	INSPECCION DE CONDICIONES INSEGURAS	

FECHA: 6.01.2026 HORA: 9:20 am
ÁREA: obra construccion alojamientos

No	ASPECTOS A EVALUAR	S	N	NA	CALIFICA A	B	C	OBSERVACIONES
	RIESGO ELECTRICO							
1	Las terminales, cables , tomas ,interruptores, luces , cajas y accesorios se encuentran buen estado	✓						
2	Los tomacorrientes estan identificados segun voltaje.	✓						
3	Las cajas de conexiones electricas tienen tapa.	✓						
4	Las cajas de conexiones y tomacorrientes se encuentran despejadas y señalizadas.	✓						
5	Existe polo a tierra en maquinas y equipos.	✓						
6	Los equipos electricos o tomacorrientes están protegidos a proyecciones de agua.	✓						
7	Se realiza inspeccion y mantenimiento a los cables o instalaciones electricas.	✓						
8	Las cables se encuentran entubados o en canaleta.	✓						
	RIESGO LOCATIVO / INSTALACIONES LOCATIVAS							
1	Los pisos y pasillos están libres de materiales innecesarios, cables eléctricos y huecos, que puedan obstruir o dificultar el paso de personas, equipos o materiales.	✓						
2	Se encuentran en orden las herramientas	✓						
3	Se ha demarcado el area de deposito de residuos	✓						
4	Las áreas de circulación peatonal y vehicular se encuentran demarcadas y libres de obstáculos.	✓						
5	Se han recojido al finar del trabajo los residuos generados	✓						
6	Fueron depositados los residuos en bolsas o canecos	✓						
8	Las áreas de trabajo se encuentran demarcadas y señalizadas.	✓						
9	Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado	✓						
10	El tipo y numero de extintores existentes son los necesarios para la labor que se realiza.	✓						
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION:								
FIRMA DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION :								
CONVENCIONES: S:SI , N:NO A: Grado de Accion Inmediata B . Grado de Acción Pronta C. Grado de Acción Posterior								

TP-HSEQ-FOR-019 INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES, ELECTRICAS Y NEUMATICAS

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-019
		Versión: 0
		Fecha: 16/12/2025
	INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES, ELECTRICAS Y NEUMATICAS	

CONTRATISTA: M. Inc Ltda
ACTIVIDAD: Construccion Alojamiento
AREA A INSPECCIONAR: Obra.
FECHA: 6/01/26 HORA: 8:10 am

HERRAMIENTAS MANUALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO	N/A	OBSERVACIONES
1 Se usa adecuada el trabajo	✓			
2 Se encuentra en buen estado	✓			
3 Se guardan y portan adecuadamente	✓			
4 Los mangos de madera no presentan astillas, rajaduras y están firmemente adheridos.	✓			
5 Se usan prensas de banco para sujetarlos.			✓	
HERRAMIENTAS DE CORTE	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1 Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo.	✓			
2 Los cinceles se encuentran afilados.	✓			
3 Los limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias.	✓			
4 Los serruchos disponen de empuñaduras y sus dientes están completos.	✓			
5 Los cuchillos disponen de mangos y fundas.			✓	
HERRAMIENTAS DE GOLPE	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1 Se emplea el martillo adecuado según la labor.	✓			
2 Sus caras y bordes están en buen estado.	✓			
3 Su mango no está quemado, astillado ni flojo.	✓			
HERRAMIENTAS DE APRIETE	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1 Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas.			✓	
2 Se observan en la llave huellas y palancas.			✓	
3 Se dispone de llaves para golpear.			✓	
4 Las llaves no presentan sus mandibulas abiertas o deterioradas.			✓	
5 La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente.			✓	
6 La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado.			✓	
7 Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			✓	
HERRAMIENTAS ELECTRICAS	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1 Las herramienta seguin las adecuadas segun el riesgo (humedad, vapores).	✓			
2 Se emplean los EPP's de acuerdo con la herramienta empleada	✓			
3 Estan limpias y lubricadas.	✓			
4 Tiene sus guardas.	✓			
5 Posee aislamiento doble o conexion a tierra por exclusio de tres patas	✓			
6 El cable o enchufe no presentan daños.	✓			
7 En las uñadoras se observa el mandil con golpes.	✓			
8 Gruesa en filo o se ha reducido su diámetro para labores pesadas			✓	
9 Se almacenan las punteras y discos en areas donde puedan ser golpeados	✓			

HERRAMIENTAS NEUMATICAS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	N/A	OBSERVACIONES
1 Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado.			✓	
2 Se emplean EPP's de acuerdo con la herramienta empleada			✓	
3 Se trabaja a las presiones adecuadas.			✓	
4 La herramienta es descongada al terminar.			✓	
HERRAMIENTAS POR INYECCION	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1 El personal es autorizado.	✓			
2 Emplean los EPP's	✓			
3 La descargada y almacenada	✓			
4 Su externo de disparo es bajo presión	✓			
OTROS (CUALES)	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**

ACCIONES DE MEJORA :

FIRMA ALMACENISTA

FIRMA INSPECTOR HSEQ

TP-HSEQ-FOR-011 INSPECCION ENTREGA DE EPP

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Código: TP-HSEQ-FOR-011
Versión: 0
Fecha: 18/12/2025

ENTREGA DE EPP

EL PERSONAL RELACIONADO A CONTINUACIÓN SE COMPROMETE A:

"DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN ACERCA DEL USO Y CUIDADOS DE EPP Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS OTROS SI ES UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR. ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DE USO EXCLUSIVO PARA LA PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS ÚNICAMENTE EN CASO DE NO HABERLO, EXISTIRÁ UN LLAMADO DE ATENCIÓN POR ESCRITO. LA EMPRESA SE LOS HARÁ ENTREGA A LOS QUE NO RESPONDAN. LA EMPRESA SE LOS REEMPLAZARÁ CUANDO ESTOS SE DETERIOREN POR EL NORMAL DESGASTE EN EL TRABAJO Y NO POR MALTRATO O DESCUIDO. ESTOS ELEMENTOS SON ENTREGADOS GRATUITAMENTE PARA LAS LABORES PROPIAS A LOS QUE NOS DEDICAMOS

TP-HSEQ-FOR-023 I NSPECCION PREOPERACIONALES

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código TP-HSEQ-FOR-020
		Version 8
		Fecha 18/12/2025
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORA Y TALADRO	

AREA Construcción Alojamiento TRABAJO A REALIZAR Cubierta Nicho SERIE M-Tabl. 7945+3462 9 a/z



HERRAMIENTA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	OBSERVACIONES
	29/12/25	31/12/25	02/01/26	05/01/26	06/01/26	07/01/26	08/01/26	
NOMBRE PULIDORA								
Carcasa	V	V	V	V	V	V	V	
Interruptor de pistón	V	V	V	V	V	V	V	
Bloqueo del eje	V	V	V	V	V	V	V	
Mango Auxiliar	V	V	V	V	V	V	V	
Mango Principal	V	V	V	V	V	V	V	
Eje	V	V	V	V	V	V	V	
Guarda	V	V	V	V	V	V	V	
Estado general de alimentador	V	V	V	V	V	V	V	
Clavija de conexión a tierra	V	V	V	V	V	V	V	
Escobillas	V	V	V	V	V	V	V	
Rodamientos	V	V	V	V	V	V	V	
Extensión eléctrica	V	V	V	V	V	V	V	
Platos	V	V	V	V	V	V	V	
Clavija polarizada	V	V	V	V	V	V	V	
Disco	V	V	V	V	V	V	V	
Otros								
NOMBRE TALADRO								
Interruptor de pistón								
Clavija de conexión a tierra								
Clavija polarizada								
Cable y conexiones eléctricas								
Mandril								
Mango Auxiliar								
Mango Principal								
Broca								
Otros								


RESPONSABLE DE LA INSPECCION _____

REGISTRO DE ACOMPAÑAMIENTO SST EN ACTIVIDADES



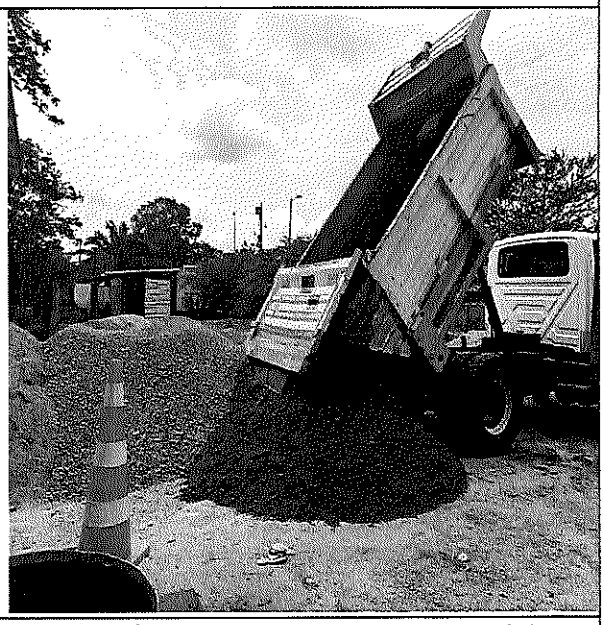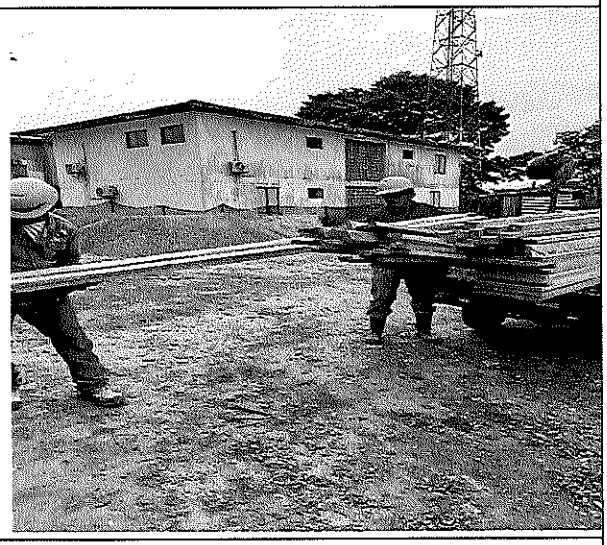

Fotografía 1. Supervisión relleno mixto	Fotografía 2. Supervisión amarre de acero
	
Fotografía 3. Supervisión acompañamiento de actividades	Fotografía 4. Llegada de relleno mixto a obra
	
Fotografía 5. Supervisión descarga de material	Fotografía 6. Supervisión descarga de madera al sitio.

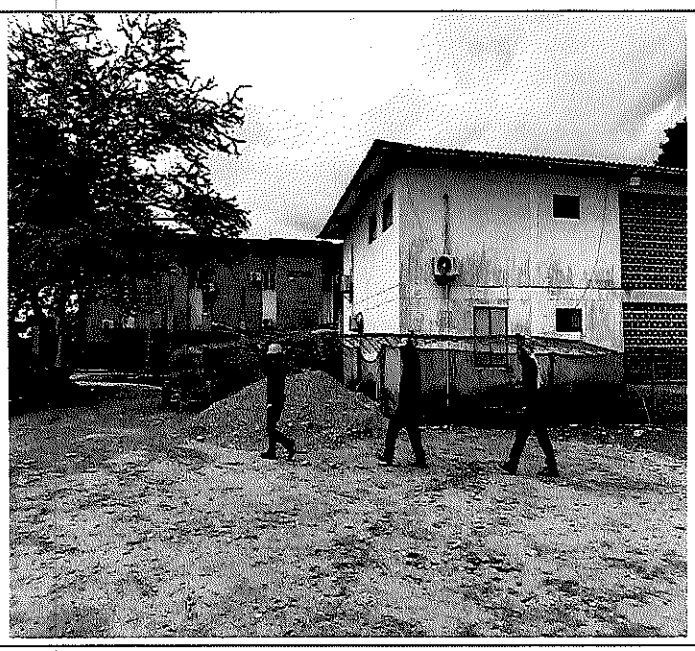


Fotografía 7. Traslado de material a obra




Fotografía 8. Toma medidas formaletas de madera en vigas aéreas



Fotografía 9. amarre en malla electro soldada en placa

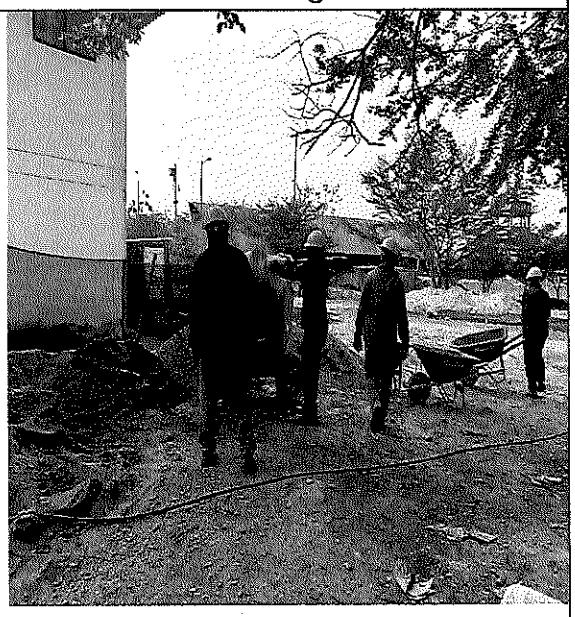


Fotografía 10. Mezcla para placa en concreto

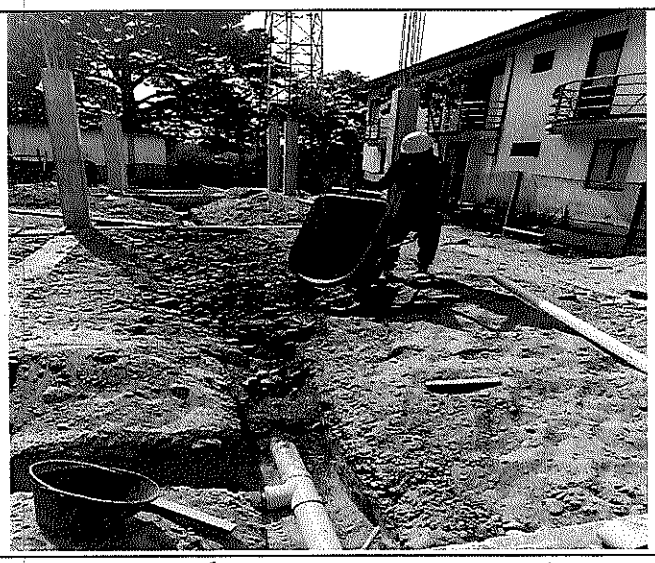


Fotografía 11. Relleno mixto de rio



Fotografía 12. Supervisión actividades en obra

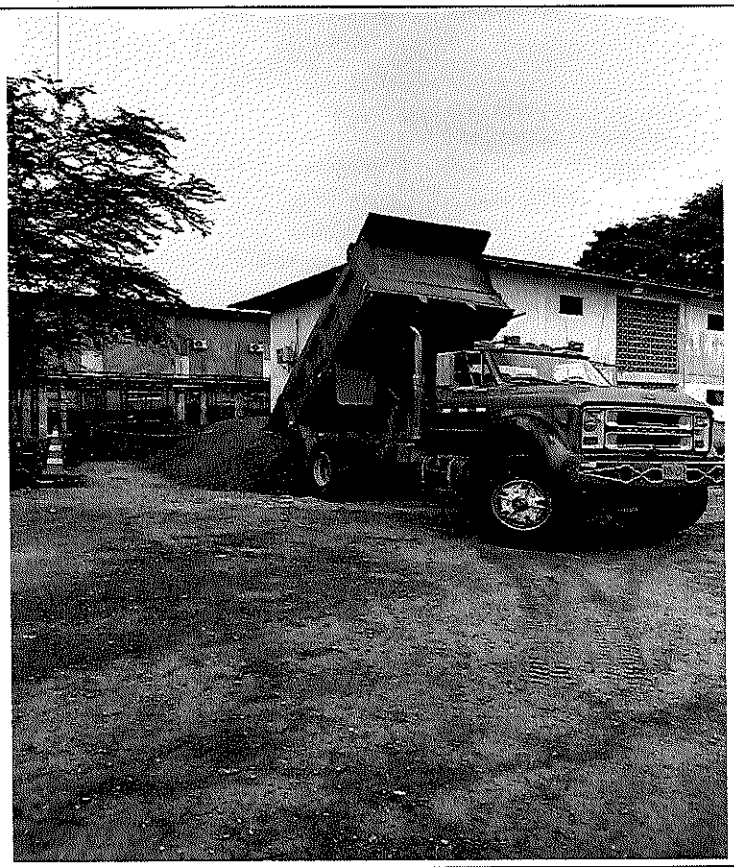

Fotografía 13. Llegada de material a obra

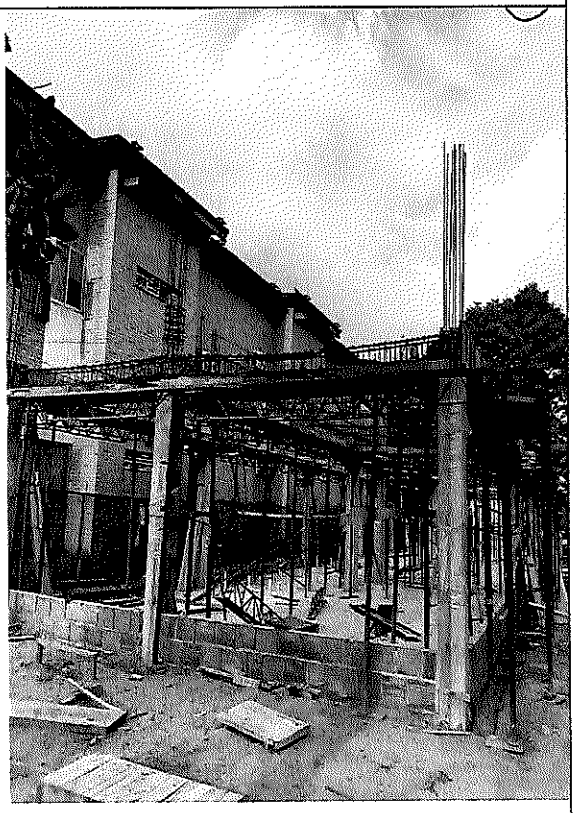

Fotografía 14. Supervisión actividades de encofrado de vigas áreas en obra


REGISTRO FOTOGRAFICO DE EQUIPOS DE EMERGENCIA



Fotografía 1. Camilla



Fotografía 2. Extintor

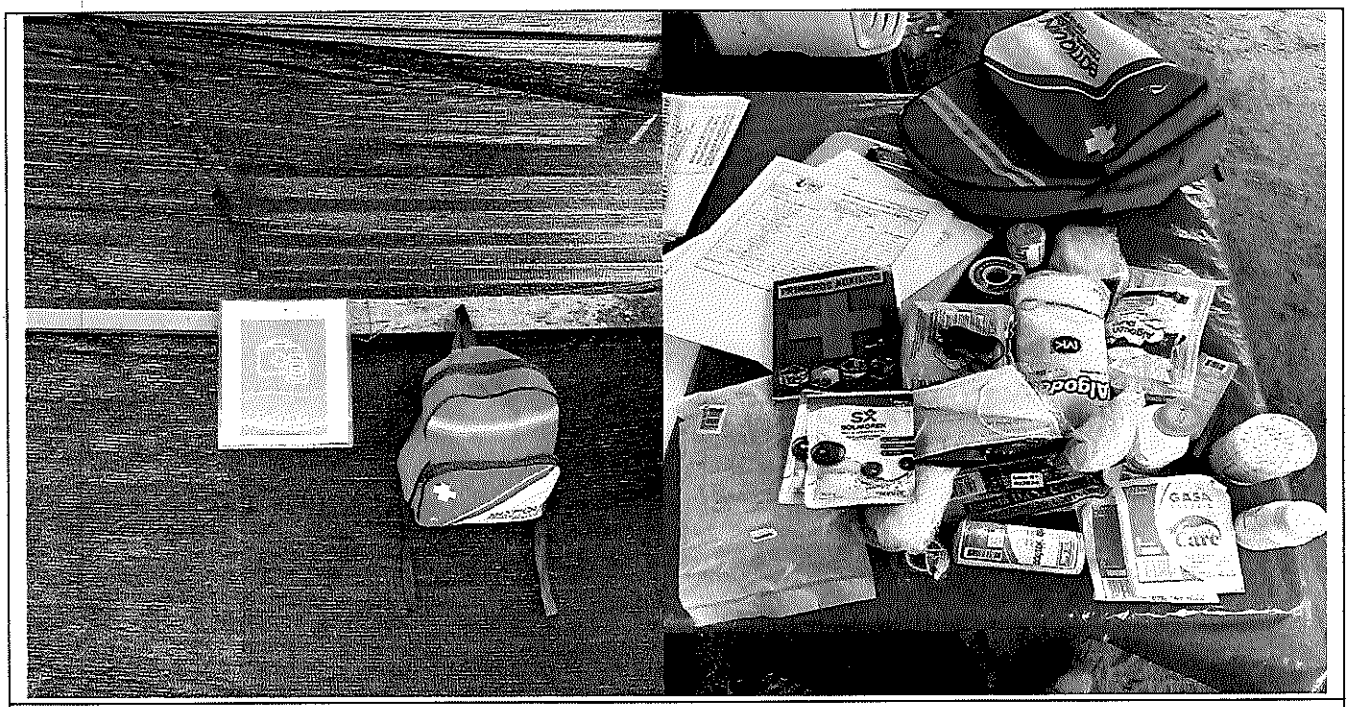


Fotografía 3. Botiquín

REGISTRO DE ENTREGA DE DOTACION Y EPP




Fotografía 1. Firma de Entrega EPP

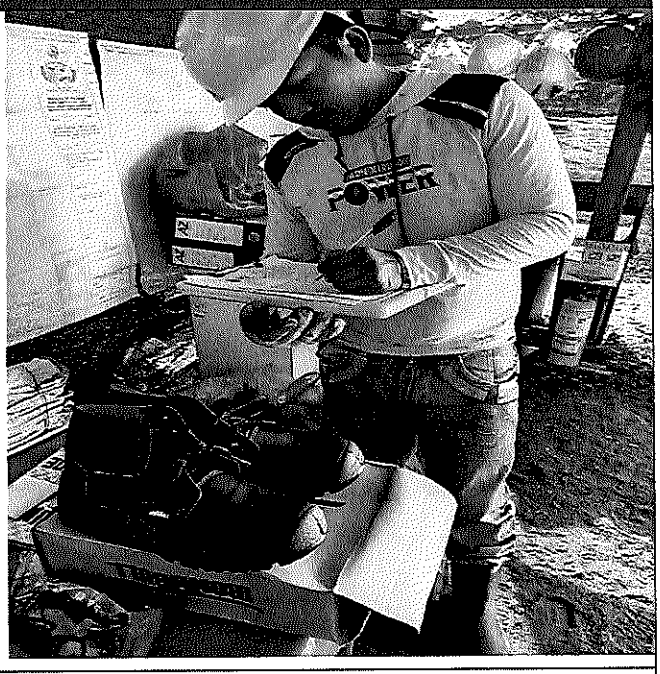


Fotografía 2. Firma de Entrega dotación




Fotografía 3. Registro de Dotación al personal

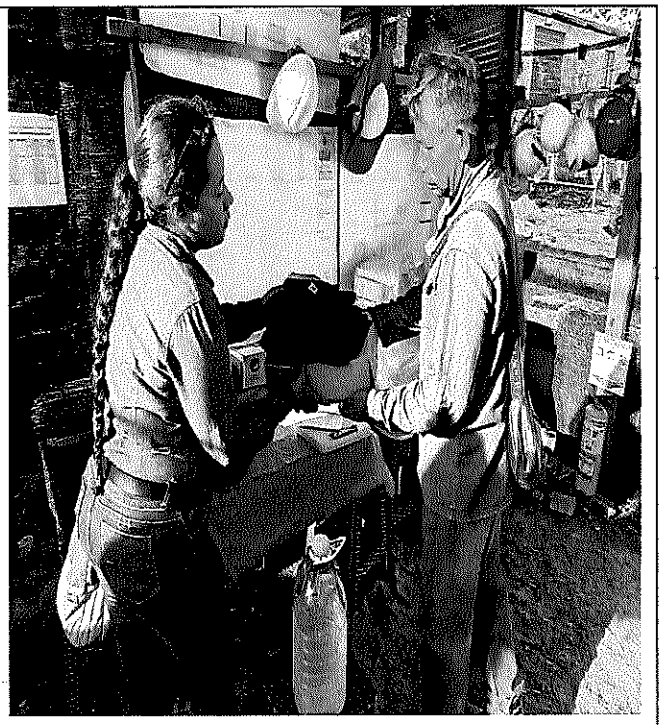

Fotografía 4. Entrega de dotación

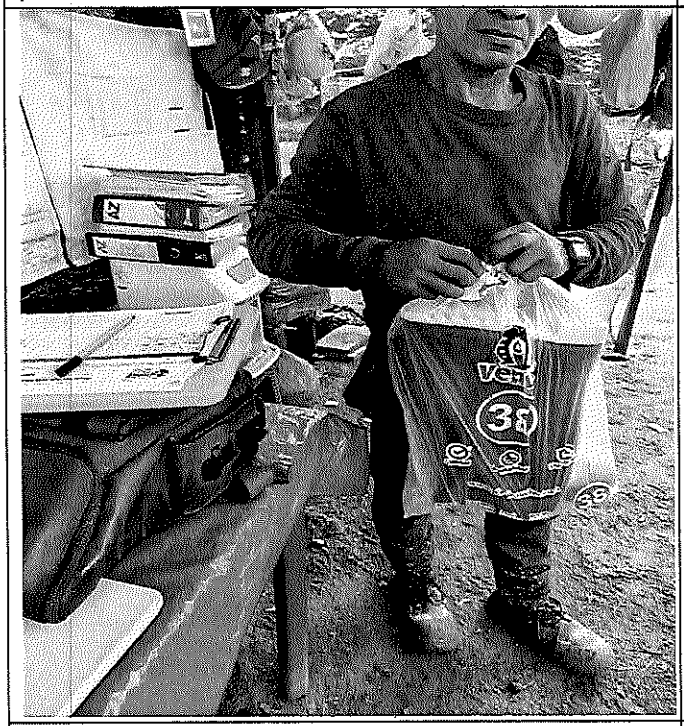


Fotografía 5. Entrega de dotación

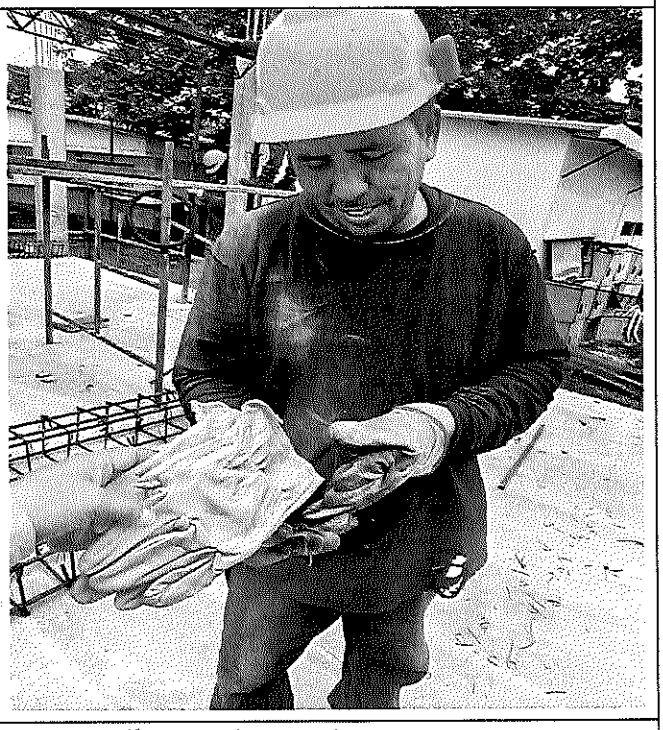

Fotografía 6. Entrega de epp

REGISTRO FOTOGRAFICO DE SEÑALIZACION

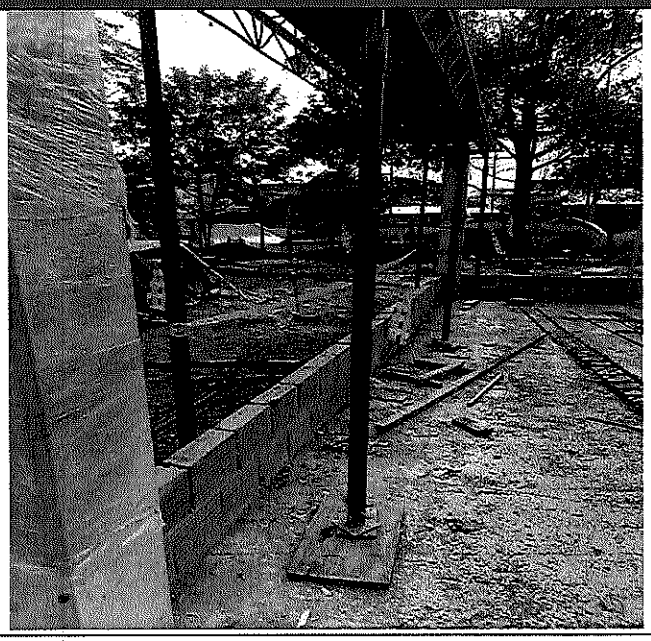

Fotografía 1. Señalización con cinta peligro áreas de intervención




Fotografía 2. Letreros de prevención e información




Fotografía 3. Punto ecológico




Fotografía 4. Acopio temporal de residuos

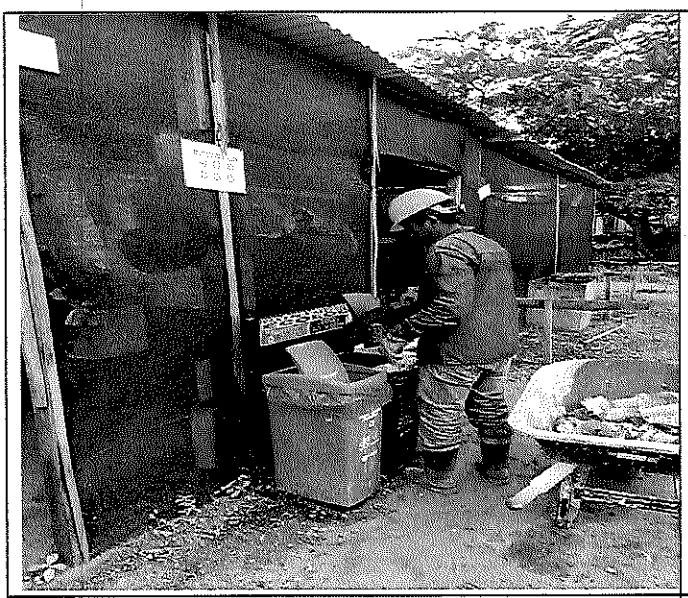


Fotografía 5. Separación de residuos

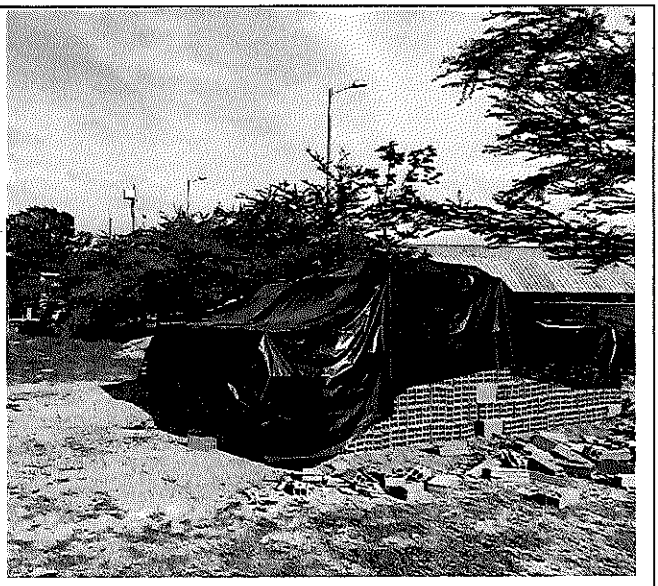


Fotografía 6. Protección de material con plástico

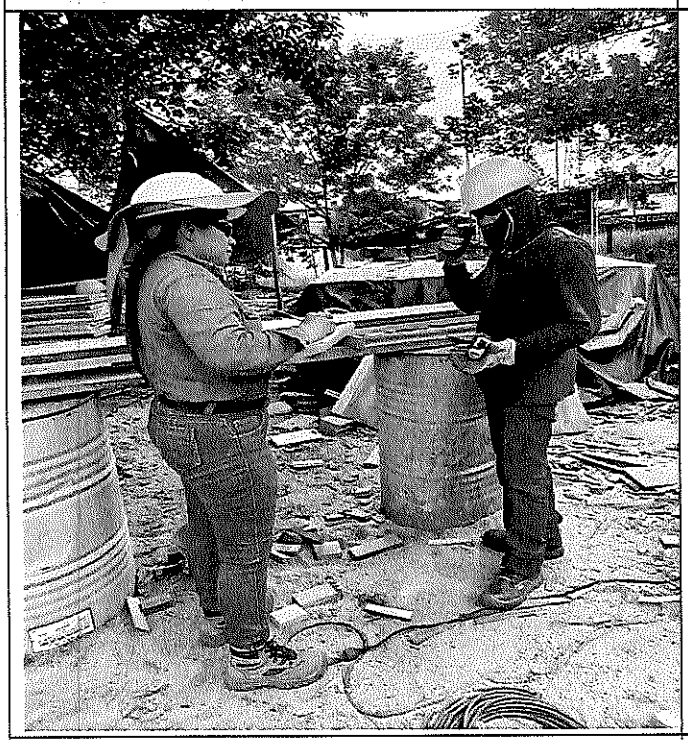


Fotografía 7. Inspección de epp

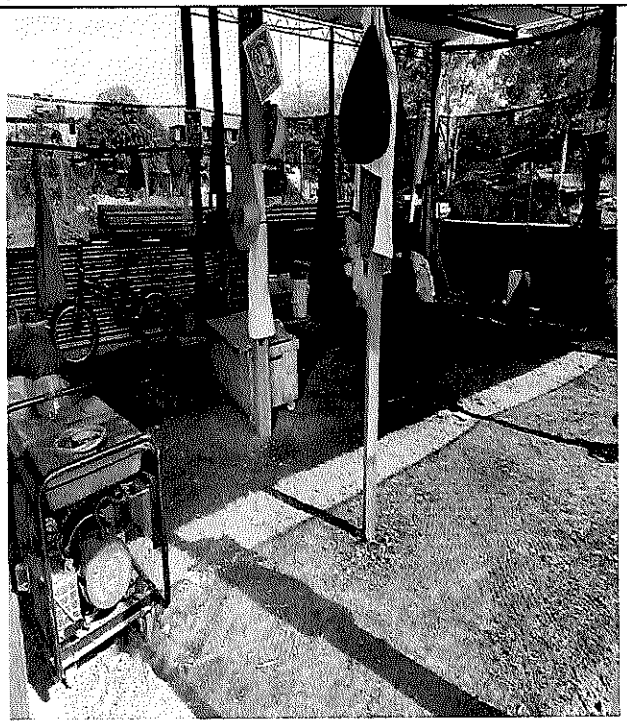

Fotografía 8. Organización bodega

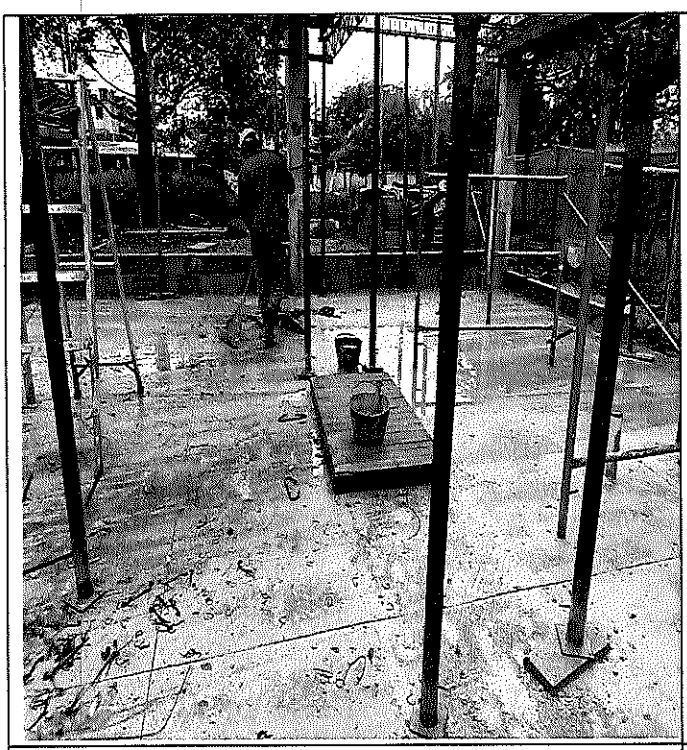


Fotografía 9. Orden y aseo lugar de trabajo

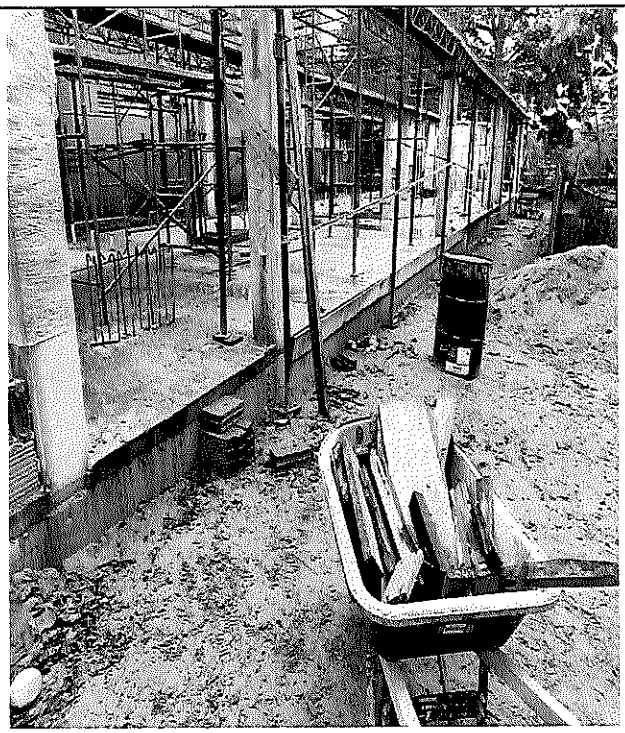

Fotografía 10. Organización de material en áreas de trabajo




Fotografía 11. Punto de hidratación

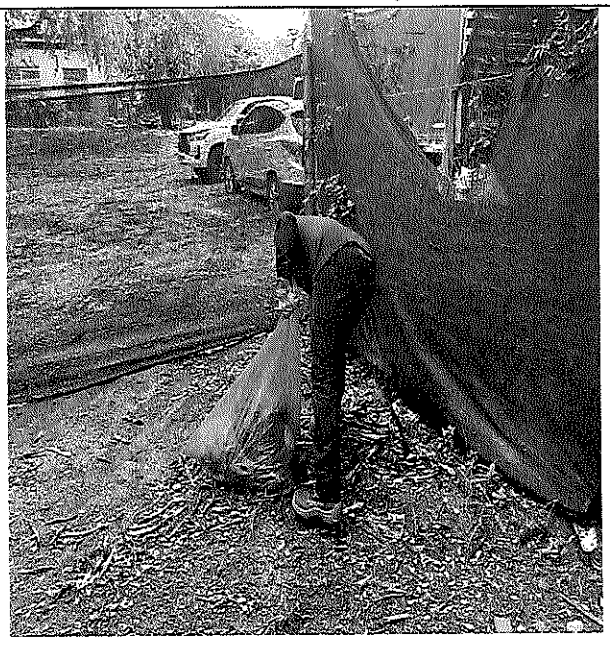


Fotografía 12. Jornada de orden y aseo áreas de intervención


REGISTRO FOTOGRAFICO DE CHARLA

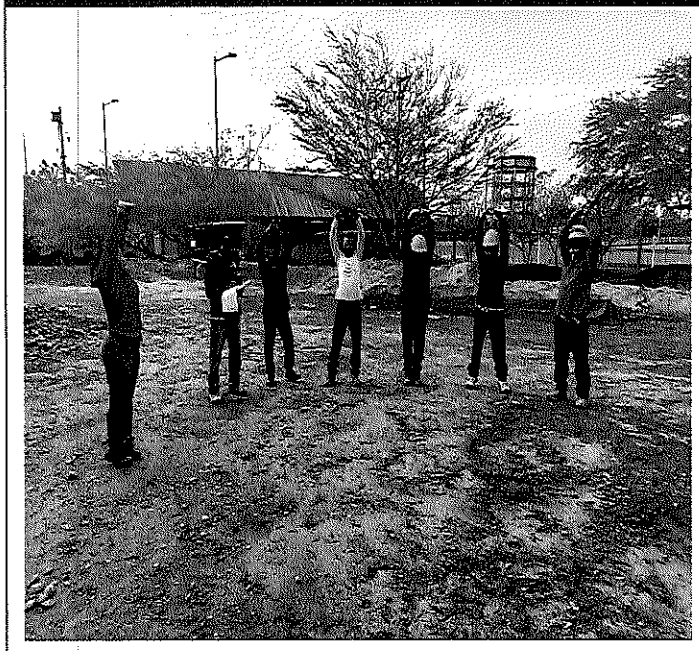


Fotografía 1. Charla -calistenia

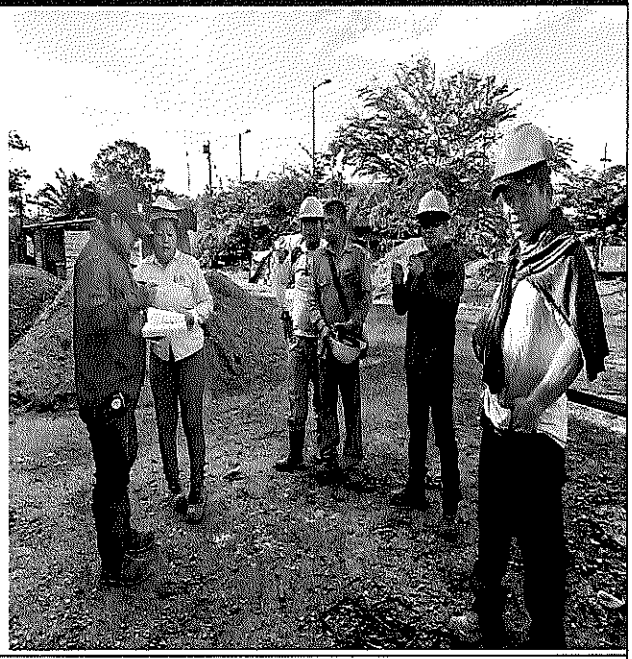


Fotografía 2. Asistencia Charla

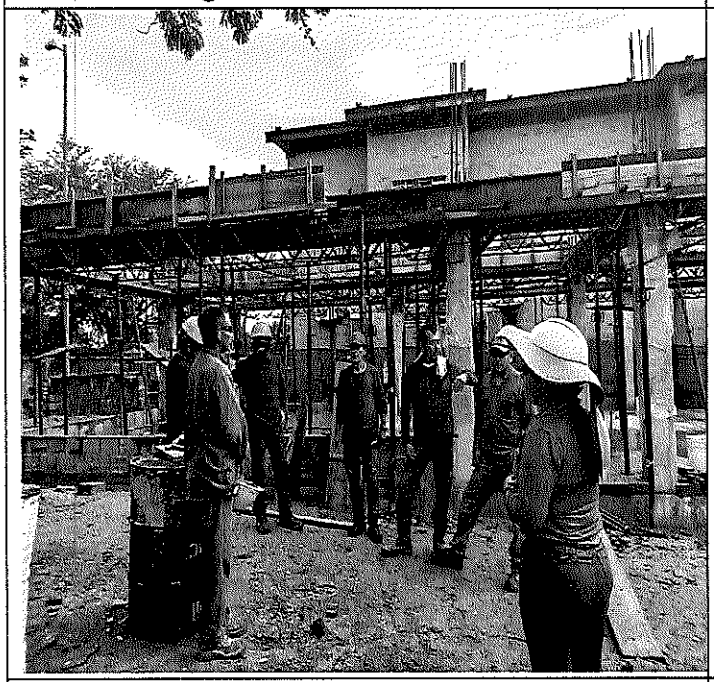


Fotografía 3. Asistencia Charla

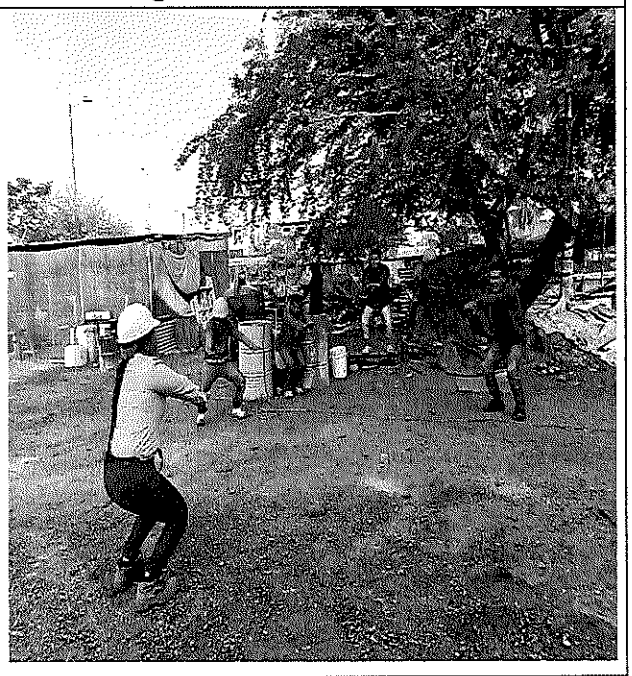


Fotografía 4. Charla- calistenia

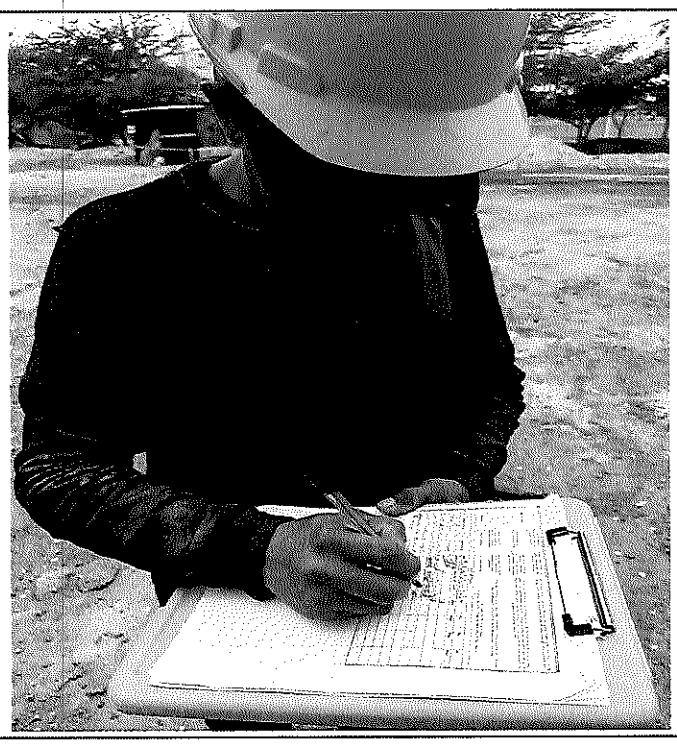


Fotografía 5. Permisos de trabajo

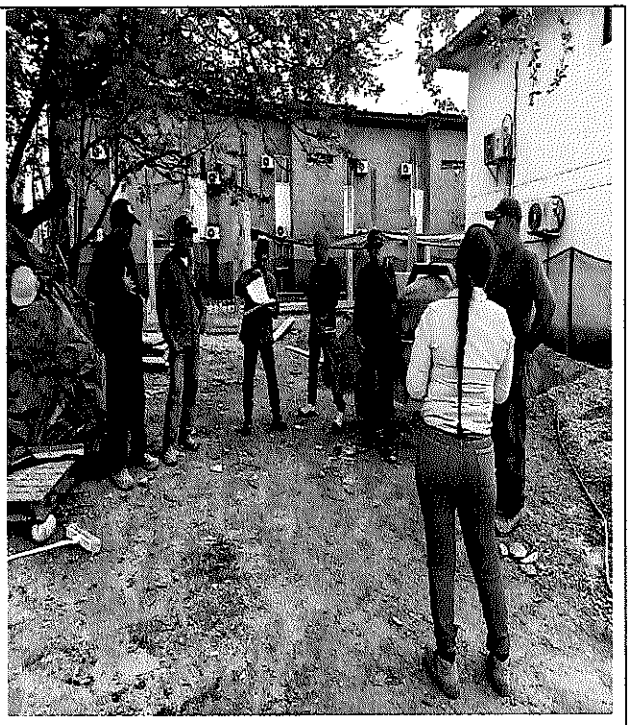

Fotografía 6. Asistencia a charla

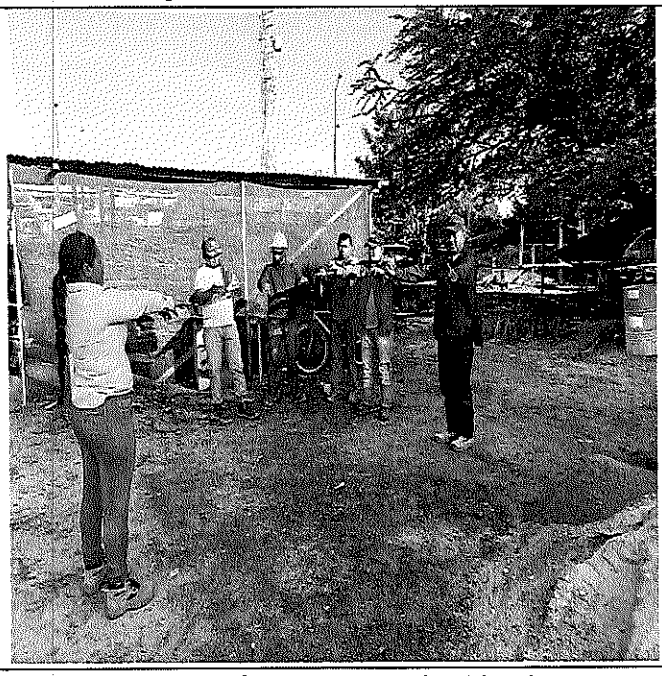

Fotografía 7. Asistencia Charla

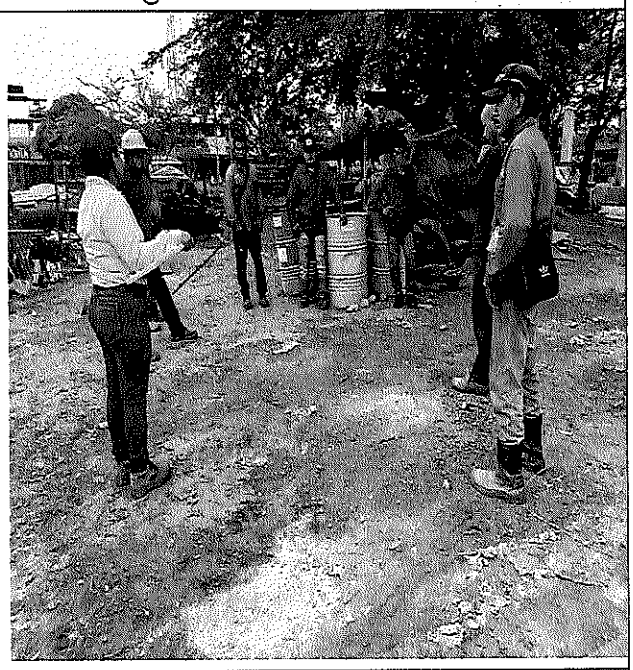

Fotografía 8. Asistencia Charla

4.3. Control de maquinaria y equipos

Durante el periodo del presente informe, se realizó seguimiento al estado y condiciones de operación de la maquinaria y equipos utilizados en obra, verificando su adecuado funcionamiento y cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos.

Se controló el uso correcto de equipos menores y herramientas empleadas en actividades de mezcla de concreto, manipulación de acero de refuerzo e instalación de redes hidráulicas, garantizando que se encontraran en condiciones óptimas antes de su utilización.


Así mismo, se verificó que los equipos contaran con mantenimiento preventivo al día y que su operación fuera realizada por personal autorizado, reduciendo riesgos asociados a fallas mecánicas y accidentes en obra.

Tabla 4. Listado de maquinaria movilizada en la obra.


ITEM	MAQUINARIA-VEHICULO-HTA-EQUIPOS	UND	CANT
1	PULIDORA 7"1/2 y 4 1/2	UND	2
2	MEZCLADORA	UND	1
3	PLANTA ELECTRICA	UND	1
4	VOLQUETA	UND	1

Todos y cada uno de los equipos empleados el desarrollo y ejecución de las actividades descritas en este informe, se sometían a la respectiva inspección pre-operacional con la periodicidad requerida.

REGISTRO FOTOGRAFICO

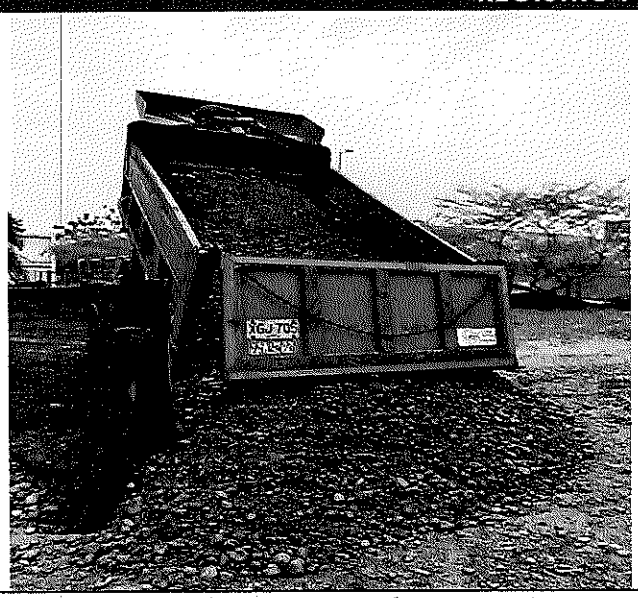

Fotografía 1 Inspección volqueta

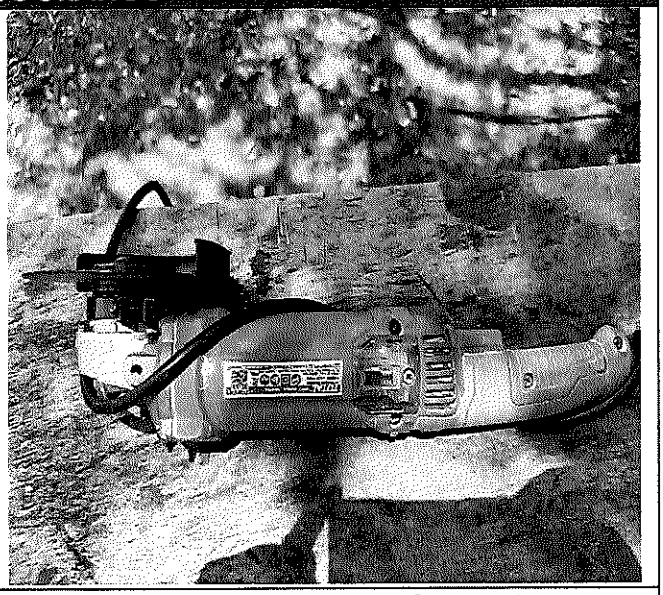

Fotografía 2. . Inspección pulidora



Fotografía 3. Inspección de Canguro



Fotografía 4. Inspección mezcladora

4.4. Condiciones climáticas

Durante el periodo evaluado no se presentaron condiciones climáticas que afectaran el desarrollo de actividades. El seguimiento climático quedó consignado en el formato de control de lluvias.

4.5. Relación personal de obra (profesional, técnico, operativo)

De acuerdo con las necesidades del proyecto y el personal propuesto, se contó con la disposición del personal descrito en la siguiente tabla:

PERIODO 01/04/26 –30/04/26

Tabla 5. Relación personal de obra

PERSONAL						
CARGO	**NOMBRE Y APELLIDOS**	**C.C. T.P.**	**AFP**	**EPS**	**ARL**	**PLANILLA NO.**
Director de Obra	Gonzalo Becerra Mejia	17.310.424	N/A	EPS Sanitas	Sura	1081588727
Residente de Obra	Jennifer Andrea Becerra Morales	1.121.852.433	Colpensiones	EPS Sanitas	Sura	1081588727
Profesional en Salud Ocupacional	Mayra Alejandra Cardenas Lesmes	1.121.884.993	Porvenir	Nueva Eps	Sura	1081588727
Topografo	Marcos Didier Delgadillo Delgadillo	80.166.369	Porvenir	Capital Salud	Sura	1081588727
Ingeniera Ambiental	Jenny Paola Feria Triana	1.121.863.524	Protección	Sanitas	Sura	1081588727
Aux. Administrativo	Brayan Steven Rivera Martinez	1.193.092.733	Porvenir	EPS Sanitas	Sura	1081588727
Aux. Residente de Obra	Margie Daniela Herrera Paez	1.122.144.736	Proteccion	Famisanar	Sura	1081588727
Aux. Profesional SST	Yonli Yulieth Lozano Gonzalez	1.121.867.537	Colfondos	Famisanar	Sura	1081588727
Maestro Obra	Oscar Alexander Patiño Perez	86.055.645	Colfondos	Famisanar	Sura	1081588727
Oficial	Segundo Roa	93.372.770	Porvenir	Nueva eps	Sura	1081588727
Ayudante de Obra	Agustin Aguilar Gonzalez	86.008.125	Porvenir	Famisanar	Sura	1081588727
Ayudante de Obra	Dagoberto Cortes	74.857.071	Porvenir	Capital salud	Sura	1081588727
Ayudante de Obra	Elkin Fabian Zambrano Alvarez	1.121.922.788	Porvenir	Famisanar	Sura	1081588727
Ayudante de Obra	Jhoni Rodriguez Perez	1.124.999.733	Colfondos	EPS Pijaosalud	Sura	1081588727
Ayudante de Obra	Juan Martin Bolivar Gaitan	1.125.549.456	Porvenir	Nueva EPS	Sura	1081588727
Ayudante de Obra	Vicente Gaitan Gaitan	8.192.573	Protección	EPS Mallamas	Sura	1081588727
Ayudante de Obra	Yesid Galindo Gaitan	1.006.946.002	Porvenir	Nueva Eps	Sura	1081588727
Ayudante de Obra	Alexis David Beltran Yavinape	1.124.990.792	Colpensiones	Nueva Eps	Sura	1081588727

5. Conclusiones

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, el proyecto presentó avances en la ejecución de actividades como la construcción de placa de contrapiso en concreto, el armado de acero de refuerzo para vigas aéreas y la instalación de redes hidráulicas, conforme a las condiciones operativas definidas para la obra.

Las actividades se desarrollaron garantizando condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo, mediante la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados, así como el seguimiento al estado de la maquinaria, equipos y herramientas, y la implementación de medidas preventivas orientadas a la prevención de incidentes y accidentes laborales.

En materia ambiental, se dio cumplimiento a las prácticas de manejo adecuado de residuos sólidos generados en obra, mediante su correcta segregación, almacenamiento temporal y disposición, contribuyendo a la minimización de impactos ambientales.

Finalmente, la gestión HSEQ durante el periodo evaluado se desarrolló de manera adecuada, en cumplimiento de los lineamientos establecidos, aunque se evidencian condiciones que han generado afectaciones en el cronograma, las cuales están siendo gestionadas mediante acciones técnicas y administrativas para garantizar la continuidad y adecuado desarrollo del proyecto.

6. Anexos

- Formatos HSEQ registrados en campo.

Mayra Cardenas

MAYRA ALEJANDRA CARDENAS LESMES
Resolución No. 3036 de 2015
Profesional SST
Union Temporal Inge Policía Gaitan
Nit. 902.011.453-2

UNIÓN TEMPORAL
INGE
POLICIA
GAITÁN

ANEXOS SST

CALLE 2 No 27 – 116 Villavicencio – Meta
Tel. 310 888 54 20

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-012
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO ASISTENCIA DIARIA	
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"	FECHA: 1/04/2026.

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Jhony Rodriguez Ruf	Ay.	7:00	JhonyRR	4:30	JhonyRR	—
2	Dagoberto	Ay.	7:00	Dagober	4:30	Dagober	—
3	Agustin Aguilar	Ay	7:00	Agustin	4:30	Agustin	—
4	Oscar A Pedraza R.	Maestro	7:00	Oscar A Pedraza	4:30	Oscar A Pedraza	—
5	Eugenio Roa	Of	7:00	Eugenio Roa	4:30	Eugenio Roa	—
6	Fabian Manuel	Ay	7:00	Fabian Manuel	4:30	Fabian Manuel	—
7	Yuli Lorano G	Aux SST	7:00	Yuli Lorano G	4:30	Yuli Lorano G	—
8	Marye Herrera	Aux	7.00	Marye Herrera	4:30	Marye Herrera	—
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-012
		Versión: 0
		Fecha: 19/12/2025
	REGISTRO ASISTENCIA DIARIA	

PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"	FECHA: 16-04-2026

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Elkin Fabian Zambrano	OB	7:00		4:30		
2	Juan Martin Bolivar	OB.	7:00		4:30		
3	Jhony Rodriguez Ramirez	AY	7:00	Jhony RR	4:30	JhonyRR	
4	Agustin Aguilar AX		7:00		4:30		
5	Segundo Rios	OF	7:00		4:30		
6	Jorge Roberto	AX	7:00		4:30		
7	Yonli Lozano G	AUX 557	7:00		4:00 pm		
8	Oscar H Molina J.	Maestro	7:00		4:30		
9	Marque Herrera	Aux. Pol	7:00		4:30		
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-012
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO ASISTENCIA DIARIA	

PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"	FECHA:	7-01-2026

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Juan Martin Bolivar	S.T.	7:00		4:00pm		—
2	Jhony Rodriguez Perez	AY	7:00	Jhony R Perez	4:00pm	Jhony R Perez	—
3	Duverberto C	AY	7:00		4:00pm		—
4	Segundo Tico	Of.	7:00		4:00pm		—
5	Holman Linares	Jb.	7:00		4:00pm		—
6	Agustin Aguilar	AX	7:00		4:00pm		—
7	Yeni Lorena G	Aux Sst	7:00		4:00pm		—
8	Oscar A Patiño R.	Maestro	7:00	Oscar A Patiño R.	4:00pm	Oscar A Patiño R.	—
9	Margie Herrera	Aux. Rev	7:00		4:00pm		—
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-012 Versión: 0 Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO ASISTENCIA DIARIA	

PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"	FECHA: 8-04-2026

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Agustin Agudelo	AX	7:00		4:30pm		—
2	Segundo Lopez	Aff	7:00		4:30pm		—
3	Edwar Nuñez	Ob.	7:00		4:30pm		—
4	Juan Manuel Bolivar	Ab.	7:00		4:30pm		—
5	[illegible]	Inv	7:00		4:30pm		—
6	Jhon Rodriguez P.	Ay.	7:00		4:30pm		—
7	Oscar Alberto P.	Maestro	7:00		4:30pm		—
8	Yoli Lozano C	Aux. Sst	7:00		4:00pm		—
9	Maryie Henao	Aux. Rq	7:00am		4:00pm		—
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-012
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO ASISTENCIA DIARIA	
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"	FECHA: 10-04-2026

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Juan Martin Bolivar	obrero	7:00am		4:30pm		—
2	Jhony Rodriguez Perez	Ay.	7:00am		4:30pm		—
3	Eduardo Roa.	ofa	7:00am		4:30pm		—
4	Agustin Agudelo	Ay	7:00am		4:30pm		—
5	[illegible]	Ay 1	7:00am		4:30pm		—
6	Robin Ahumada	Ay.	7:00am		4:30pm		—
7	Yonl. Lozano G	Aux. Sist	7:00am		4:30pm		—
8	Oscar A Pedraza P.	Maestro	7:00am		4:30pm		—
9	Maryie Herrera	Aux Resi	7:00am		4:30pm		
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-012
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO ASISTENCIA DIARIA	
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"	FECHA: 11 - 04 - 2026.

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Jhoan Rodriguez P	Ay.	7:00		3:00pm		—
2	Johan Alarcon	Ob	7:00		3:00pm		—
3	Juan Martin Bolivar	obrero	7:00		3:00pm		—
4	Duglberto	Ayu	7:00		3:00pm		—
5	Segundo Tos	ofi	7:00		3:00pm		—
6	Agatón Aguilar	AX	7:00		3:00 pm		—
7	Yonl. Lorena G	Aux ocu	7:00		3:00 pm		—
8	Oscar Alcalde Jr	Maestro	7:00		5.00pm		—
9	Marqui Herera	Ax Rep	7:00		3:00pm		—
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: IP-HSEQ-FOR-012 Versión: 0 Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO ASISTENCIA DIARIA	
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"	FECHA: 13/04/2026

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Fabian Alvarez	Ob.	7:00		2:00 p		—
2	Diego Cerón	Inv.	7:00		4:00pm		—
3	Juan Martin Bolivar	A.y.	7:00		4:00pm		—
4	Agustin Aguilar G	A.y	7:00		4:00pm		—
5	Eduardo Boa	Of	7:00		4:00pm		—
6	Yonl. Lorano G	Ax sst	7:00		4:00pm		—
7	YESID GARZON	Ay	700		4:00pm		—
8	Vicente Gaitan	Ay.	700		4:00pm		—
9	Oscar A Patiño P	maestro.	7:00		4:00pm		—
10	Marge Herrera	Ax. Rojo	7:00pm		4:00pm		—
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOP-012 Versión: 0 Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO ASISTENCIA DIARIA	
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"	FECHA: 15-04-2026

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Eduardo Roa	of.	7:00am	Eduardo R.	4:00pm	Eduardo	-
2	Roberto	Inf	7:00am	Roberto	4:00pm	Roberto	-
3	Vicente G	Obs.	7:00am	Vicente	4:00pm	Vicente	-
4	ALEXIS DAVID	OP	7:00am	Alexis	4:00pm	Alexis	-
5	YESID GALINDO	AY	7:00am	Yesid	4:00pm	Yesid	-
6	Juan Manuel Rubiano	Arbs	7:00am	Juan	4:00pm	Juan	-
7	Yeni Irene G	Auxsst	7:00am	Yeni	10:00am	Yeni	-
8	Maryie Elena	Aux RO	7:00am	Maryie	4:00pm	Maryie	-
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-012
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO ASISTENCIA DIARIA	
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"	FECHA: 16/04/2026.

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Yesid Galindo G	AY	7:00		4:00		—
2	Segundo Ros	of.	7:00		4:30		—
3	[illegible]	b.y.	7:00		4:30		—
4	Fabian Alvarez	do.	7:00		4:30		—
5	Juan Martin Bolivar G.	obr.	7:00		4:30		—
6	Vicente Goitón	Ayu.	900		4:30		—
7	Agustín Agudelo	MY	7:00		4:30		—
8	Oscar Alfredo R.	Maestro.	7:00		4:30		—
9	Yan. Lozano G	Ayx. SSI	7:00		4:00		—
10	Marque. Herrera	Ayu Res	7:00		4:00		—
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN							Código: TP-HSEQ-FOR-012 Versión: 0 Fecha: 18/12/2025
		REGISTRO ASISTENCIA DIARIA					
PROYECTO:		"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"				FECHA:	17/04/2026
	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Yon. Lozano G	Ayesst	7:00am		4:00pm		-
2	Segundo Rox	of.	7:00am		4:00pm		-
3	Bogadero C	Ay	7:00am		4:00pm		-
4	Adam Alvarez	Ay	7:00am		4:00		-
5	YESID GALINDO G	Ay.	7:00am		4:00pm		-
6	Juan Montes Bolivar	obrero.	7:00am		4:00 pm		-
7	Nicorte G.	Ay.	7:00am		4:00 pm		-
8	Oscar A Patiño P-	maestro	7:00am	Oscar A Patiño	4:00pm	Oscar A Patiño	-
9	Mayra Herrera	Ay Rano	7:00am		4:00pm		-
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-012
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO ASISTENCIA DIARIA	

PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"	FECHA:	18-01-2026

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Segundo Pico	of	7:00am		1:00pm		—
2	Agustín Aguilar	AY	7:00am		1:00pm		—
3	Vicente Gaitan	Ay.	7:00am		1:00pm		—
4	Segundo C.	AY	7:00am		1:00pm		—
5	Juan Martín Bolívar	A.Y.	7:00am		1:00pm		—
6	YESID GALINDO G.	AY.	7:00am		1:00pm		—
7	Johan Alcaraz	A	7:00am		1:00pm		—
8	Yoni Lozano G	Aux SST	7:00am		11:00am		—
9	Oscar Octavio O.	Maestro	7:00am		1:00pm		—
10	Maryie Herrera	Aux Rel	7:00am		1:00pm		—
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-012 Versión: 0 Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO ASISTENCIA DIARIA	

PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"	FECHA:	23-04-2026.

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	[illegible]	of.	7:00am	[illegible]	4:30 p.	[illegible]	—
2	[illegible]	A.N.	7:00 am	[illegible]	4:30 p.m.	[illegible]	—
3	[illegible]	[illegible]	7:00	[illegible]	4:00 p.m.	[illegible]	—
4	JESUS GALINDO	OY	7:00 AM	[illegible]	4:30 p.m.	[illegible]	—
5	Jean Martin Bolivar	Obrero	7:00am	[illegible]	4:30pm	[illegible]	—
6	Yicmte	Obr	7:00am	[illegible]	4:30p.m.	[illegible]	—
7	Oscar H Patiño	Oficial	7:00 pm	Oscar H Patiño	4:30pm	Oscar H Patiño	—
8	Yonfi Lozano G	AUX SST	7:00am	[illegible]	4:00pm	[illegible]	—
9	Makyre Herrera	Ayo Rsv	7:00am	[illegible]	4:00	[illegible]	—
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOP-012
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO ASISTENCIA DIARIA	
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"	FECHA: 24/04/2026.

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	ALEXIS DAVID	AYUDANTE	7:00AM		4:30PM		—
2	YONI LOZANO G	AYUDANTE	7:00 AM		4:00PM		—
3	MAIRYE HERRERA	AYUDANTE	7:00AM		4:00PM		—
4	YEISON CORTES	AYU	7:00		4:00PM		—
5	JESID GALINDO.	AYU	7:00AM		4:30PM		—
6	AGUSTIN OSPINA	AY	7:00AM		4:30PM		—
7	[illegible]	AY	7:00AM		4:30PM		—
8	[illegible]	AYU	7:00AM		4:30PM		—
9	[illegible]	AY	7:00AM		4:30PM		—
10	JUAN MARTIN BOLIVAR. G.	AY	7:00AM		4:30PM		—
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-012
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO ASISTENCIA DIARIA	
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"	FECHA: 23-04-2026

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Vicente G	OB	7:00am	VGA	1:00pm	VGA	—
2	ALEXIS DAVID	OB	7:00am		1:00pm		—
3	Segundo Roa	Of.	7:00am		1:00pm		—
4	Durobertos		7:00am		1:00pm		—
5	Fabian Naiva	Capitan	7:00am		1:00pm		—
6	Agustin Morales	AX	7:00am		1:00pm		—
7	Yeli Lozano	Aux Sst	7:00am		11:00am		—
8	Margie Herrera	Ax Res	7:00am		1:10pm		—
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-012
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO ASISTENCIA DIARIA	
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"	FECHA: 22-04-2026.

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Vicente Gaitan	M.	7:00 am		4:30 Pm		—
2	ALEXIS DAVID	AY	7:00 Am		4:30 Pm		—
3	YEID GALINDO	AY.	7:00 am		4:30 Pm		—
4	Segundo Rico.	Op	7:00 am		4:30 Pm		—
5	Yuffertis Bolivar G.	A.b.	7:00 am		4:30 Pm		—
6	Fabian Alvarez	ds.	11:00		4:00		—
7	Oscar A Patiño G.	Maestro	7:00 am		4:30 pm		—
8	Yonli Lozano G	Aux SST.	7:00 am		4:00 pm		—
9	Mayra Hernandez	Arq Rp	7:00 m		4:00 p		—
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN							Código: TP-HSEQ-FOP-012 Versión: 0 Fecha: 18/12/2025
		REGISTRO ASISTENCIA DIARIA					
PROYECTO:		"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"			FECHA:		28-04-2026
	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Vicente G.	Ay.	7:00am		4:30pm		-
2	YESID GALINDO G	AY	7:00am		4:30pm		-
3	ALEXIS DAVID	AN	7:00am		4:30pm		-
4	Juan Heredia Bolivar	A.Y.	7:00am		4:30pm		-
5	Agustín Aguilar	AX	7:00am		4:30pm		-
6	Oscar Alfonso		7:00am		4:30pm		-
7	Roberto C	AY	7:00 am		4:30pm		-
8	Fabian Alvarez.	padrino.	7:00am		4:00		-
9	[illegible]	of	7:00 am		4:30pm		-
10	Yonli Lorano G	Aux SSI	7:00am		4:00pm		-
11	Maye Herrera	Ax Rel	7:00am		4pm		-
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: IP-HSEQ-FOP-012
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO ASISTENCIA DIARIA	
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"	FECHA: 29-04-2026

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	YESID GALINDO G	AY.	7:00 am		5:00 pm		—
2	Vicente G.	AY	7:00 am		5:00 pm		—
3	ALEXIS DAVID	AN	7:00 am		5:00 pm		—
4	Eugenio Paz	Of.	7:00 am		5:00 pm		—
5	Sergio Herrera	A.V	7:00 am		5:00 pm		—
6	Juan Montoya Bolivar	A.Y.	7:00 am		5:00 pm		—
7	Agatio Aguil.	AY	7:00 am		5:00 pm		—
8	Adan Ruiz	ab	7:00 am		5:00 pm		—
9	Oscar A Patiño	Maestro	7:00 am		5:00 pm		—
10	Yonl. Lozano G	Aux. Soy	7:00 am		4:00 pm		—
11	Marye Hern	Aux Rg	7:00 am		4:00 pm		—
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-012
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO ASISTENCIA DIARIA	
PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"	FECHA: 30-04-2026

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Agustin Aguilar	AX	7:00		4:30		—
2	Vicente Cort.	Mpc	7:00		4:30		—
3	Edwin Alvarez	ES	7:00		4:30		—
4	ALEXIS DAZA	AN	7:00		4:30		—
5	Juan Martin Rodriguez	A.	7:00		4:30		—
6	Dagoberto	G	7:00		4:30		—
7	Ignacio Baez	Aff	7:00		4:30		—
8	Yonl. Lopez G	Est.	7:00		4:00pm		—
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-017
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	

ÁREA: Civil – Construccion Alcantarillado.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Agustín Aguilar G.

FECHA: 24-04-2026

CEDULA: 86008125.

CARGO: Ayudante.

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION		ESTADO				RECOMENDACIONES
				NO VA A BIEN	MAL	REGULAR		
A				PROTECCIÓN DE CABEZA, VISTA Y OÍDOS				
1	Tapabocas			X				
2	Casco seguridad	Buena			X			
3	Tapa oídos	Buena			X			
4	Gafas de Seguridad	Buena.			X			
B				PROTECCIÓN PARA MIEMBROS				
1	Guantes Caucho			X				
2	Guantes Carnaza			X				
3	Guantes Vaqueta	Buena			X			
4	Guantes precisión			X				
C				ROPA DE TRABAJO				
1	Capuchón	Buena			X			
2	Camibuso	Buena			X			
3	Pantalón Jean	Buena			X			
4	Calzado	Buena			X			

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-017
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	

ÁREA: Civil - construcción Alcantarillado.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Yesid Galindo Gaitan.

FECHA: 26-04-2026.

CEDULA: Cc. 1006946002. CARGO: Ayudante.

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	ESTADO					
			FALTA	BIEN	MAL	REGULAR		RECOMENDACIONES
A	PROTECCIÓN DE CABEZA VISTA Y OIDOS							
1	Tapabocas			X				
2	Casco seguridad	Buena			X			
3	Tapa oídos	Buena			X			
4	Gafas de Seguridad	Buena.			X			
B	PROTECCIÓN PARA MIEMBROS							
1	Guantes Caucho			X				
2	Guantes Carnaza			X				
3	Guantes Vaqueta			X				
4	Guantes precisión	Buena			X			
C	ROPA DE TRABAJO							
1	Capuchón	Buena			X			
2	Camibuso	Buena			X			
3	Pantalón Jean	Buena			X			
4	Calzado	Buena.			X			

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-017
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	

ÁREA: Civil - construcción Alejandría

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Elkin Fabian Ramirez Alvarez.

FECHA: 24-09-2025.

CEDULA: 1121922788.

CARGO: Ayudante.

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	F.V	N/A	ESTADO BIEN	MAL	REGULAR	RECOMENDACIONES
A.	PROTECCIÓN DE CABEZA, VISTA Y OÍDOS							
1	Tapabocas			X				
2	Casco seguridad	Buena			X			
3	Tapa oídos	Buena			X			
4	Gafas de Seguridad	Buena.			X			
B.	PROTECCIÓN PARA MIEMBROS							
1	Guantes Caucho			X				
2	Guantes Carnaza			X				
3	Guantes Vaqueta	Buena			X			
4	Guantes precisión			X				
C.	ROPA DE TRABAJO							
1	Capuchón	Buena			X			
2	Camibuso	Buena			X			
3	Pantalón Jean	Buena			X			
4	Calzado	Buena			X			

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-017
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	

ÁREA: Civil - construccion Alojamiento.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Segundo Ros.

FECHA 26-04-2025.

CEDULA: 93372770.

CARGO: Oficial.

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	ESTADO					
			FIRMA	BIEN	MAL	REGULAR		RECOMENDACIONES
A	PROTECCION DE CABEZA, VISTA Y OIDOS							
1	Tapabocas			X				
2	Casco seguridad	Buena			X			
3	Tapa oídos			X				
4	Gafas de Seguridad	Buena.			X			
B	PROTECCION PARA MIEMBROS							
1	Guantes Caucho	Buena						
2	Guantes Carnaza			X				
3	Guantes Vaqueta			X				
4	Guantes precisión			X				
C	ROPA DE TRABAJO							
1	Capuchón	Buena			X			
2	Camibuso	Buena			X			
3	Pantalón Jean	Buena			X			
4	Calzado	Bueno.			X			

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-017
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	

ÁREA: Civil - construccion Aeropuerto

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Juan Martin Bolivar Gaitan

FECHA: 24-09-2026

CEDULA: 1125549456.

CARGO: Ayudante.

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	ESTADO				RECOMENDACIONES
				BUENA	BIEN	MAL	REGULAR	
	PROTECCIÓN DE CABEZA, VISTA Y OÍDOS							
1	Tapabocas							
2	Casco seguridad	Buena.			X			
3	Tapa oídos	Buena			X			
4	Gafas de Seguridad	Buena			X			
	PROTECCION PARA MIEMBROS							
1	Guantes Caucho			X				
2	Guantes Carnaza			X				
3	Guantes Vaqueta	Buena.			X			
4	Guantes precisión			X				
	ROPA DE TRABAJO							
1	Capuchón	Buena.			X			
2	Camibuso	Buena			X			
3	Pantalón Jean	Buena			X			
4	Calzado	Buena			X			

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-017
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	

ÁREA: Civil - construcción Alojamiento.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Oscar Alexander Pedro Perez

FECHA: 26-09-2026

CEDULA: 86.055645.

CARGO: Maestro de obra.

			ESTADO					
	DESCRIPCION	PRESENTACION	N/A	BIEN	MAL	REGULAR		RECOMENDACIONES
			PROTECCION DE CABEZA, VISTA Y OIDOS					
1	Tapabocas	1		X				
2	Casco seguridad	Bien			X			
3	Tapa oídos							
4	Gafas de Seguridad	Bien			X			
			PROTECCION PARA MANOS					
1	Guantes Caucho			X				
2	Guantes Carnaza			X				
3	Guantes Vaqueta	Bien.			X			
4	Guantes precisión	Bien			X			
			ROPA DE TRABAJO					
1	Capuchón	Bien			X			
2	Camibuso	Bien			X			
3	Pantalón Jean	Bien			X			
4	Calzado	Bien.			X			

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOP-017
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	

ÁREA: Civil - construccion Alojamiento.

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Dagoberto Cortes.

FECHA: 28-04-2026

CEDULA: 74851071.

CARGO: Ayudante.

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	ESTADO					RECOMENDACIONES
			N/A	BIEN	MAL	REGULAR		
A	PROTECCIÓN DE CABEZA, VISTA Y OÍDOS							
1	Tapabocas	Bueno			X			
2	Casco seguridad	Bueno			X			
3	Tapa oídos	Bueno			X			
4	Gafas de Seguridad	Bueno.			X			
B	PROTECCIÓN PARA MIEMBROS							
1	Guantes Caucho			X				
2	Guantes Carnaza			X				
3	Guantes Vaqueta	Bueno.			X			
4	Guantes precisión			X				
C	ROPA DE TRABAJO							
1	Capuchón	Bueno			X			
2	Camibuso	Bueno			X			
3	Pantalón Jean	Bueno			X			
4	Calzado	Bueno.			X			

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-017
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	

ÁREA: _____ FECHA _____

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Vicente Gaitan Gaitan. FECHA 23-04-2026

CEDULA: CC. 81952573. CARGO: Ayudante.

	DESCRIPCION	PRESENTACION	ESTADO					
			NO TIENE	MALO	REGULAR	BUENO		RECOMENDACIONES
A	PROTECCIÓN DE CABEZA, VISTA Y OIDOS							
1	Tapabocas	Buena.			X			
2	Casco seguridad	Buena			X			
3	Tapa oídos				X			
4	Gafas de Seguridad	Buena			X			
B	PROTECCIÓN PARA MIEMBROS							
1	Guantes Caucho			X				
2	Guantes Carnaza	Buena			X			
3	Guantes Vaqueta	"		X				
4	Guantes precisión	Buena.			X			
C	ROPA DE TRABAJO							
1	Capuchón						X	
2	Camibuso	Bueno			X			
3	Pantalón Jean	Bueno			X			
4	Calzado	Bueno.			X			

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-020
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORA Y TALADRO	

AREA Construccion Alojamiento TRABAJO A REALIZAR Corte Hierro SERIE: M. Total 2945405167 8 4 1/2

HERRAMIENTA	FECHA 6/01/26 B	M	FECHA 8/01/26 B	M	FECHA 10/01/26 B	M	FECHA 13/01/26 B	M	FECHA 14/01/26 B	M	FECHA 23/01/26 B	M	FECHA 27/01/26 B	M	OBSERVACIONES
NOMBRE: PULIDORA															
Carcasa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Interruptor de gatillo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Bloqueo del eje	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Mango Auxiliar	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Mango Principal	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Eje	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Guarda	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Estado general de alimentador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Clavija de conexión a tierra	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Escobillas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Rodamientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Extension electrica	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Platos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Clavija polarizada	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Disco	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Otros:															
NOMBRE TALADRO															
Interruptor de gatillo															
Clavija de conexión a tierra															
Clavija polarizada															
Cable y conexiones eléctricas															
Mandril															
Mango Auxiliar															
Mango Principal															
Broca															
Otros:															

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: _____

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-
		Versión: 0
		Fecha: 08/03/2026
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADORA	

PROYECTO Alcantarilla Policía SEMANA DEL 9 AL 14 DE 04. 2026

MARCA: _____ SERIAL: #01

ITEM	CONCEPTO	FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
		9/04/26		10/04/26		11/04/26		12/04/26		13/04/26		14/04/26			
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	POLEAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	MEDIDOR DE ACEITE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	TAPA DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	BUJIA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	TUBO DE ESCAPE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	GUARDA DE LOS PIÑONES	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	CHOQUE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	YOYO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	ACELERADOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	VOLANTE DE OPERACIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	FILTRO DE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	TAPON DE ACEITE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	TORNILLOS EN GENERAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	GUARDA DE LOS PIÑONES	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	TAPA PROTECTORA MOTOR		✓		✓		✓		✓	✓		✓		✓	
	TAMBOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	ESTRIAS DE COMPACTACIÓN(INTERNO)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	LLANTAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	ENGRASE EN GENERAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	BALINERAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	FRENO DE SEGURIDAD(TAMBOR)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	PINTURA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	ASEO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMA	OPERADOR														
	SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-
	Versión: 0
	Fecha: 18/12/2025

INSPECCION PREOPERACIONAL PLANTA ELECTRICA

PROYECTO: Alojamiento Policía Pto. **SEMANA DEL** 6 **AL** _____ **DE** 04-2026.

MARCA: Komax **FREFERENCIA** #01

ITEM	CONCEPTO	FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
		6/04/26		9/04/26		14/04/26		17/04/26		20/04/26		23/04/26		26/04/26	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	Nivel agua, aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Funcionamiento del motor (Minimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL	Estado del sistema de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del sistema generador de carga	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del acumulador de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y funcionamiento de indicadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de swiches (conexiones)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y ubicación del sistema de escape	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general (tapas y estructura)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMA	OPERADOR (AYUDANTE TÉCNICO)														
	SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-26
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CANGURO

PROYECTO Instalacion Alumbrado Policia. SEMANA DEL 30 AL 8 DE 09-2026

MARCA: _____ SERIAL: 1

ITEM	CONCEPTO	FECHA 11/09/25		FECHA 6/09/25		FECHA 7/09/26		FECHA 13/09/26		FECHA 14/09/26		FECHA 15/09/26		FECHA 18/09/26	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Nivel aceite y combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Control de fugas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Funcionamiento del motor (Mínimo/aceleración)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del embrague	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado del resorte	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de la superficie del apisonador	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	El personal cuenta con los epp	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMA	OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)														
	SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-28
	Versión: 0
	Fecha: 18/12/2025
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRO CONCRETO	

MARCA: _____ SEMANA DEL 1/04/2026 AL 11/04/2026.

REFERENCIA: #01. SERIAL #01.

ITEM	CONCEPTO	LUNES 6/04/2026		MARTES 6/04/2026		MIERC. 7/04/2026		JUEVES 9/04/26		VIERNES 10/04/26		SABADO 11/04/26		DOMINGO 12/04/26	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable de ignición (tiraflector)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del interruptor de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la manguera	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la aguja vibrante (sin fisuras, grietas, costras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de sistema de bloqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del motor eléctrico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del botón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la piaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	OPERADOR (AYUDANTE TÉCNICO)														
	SUPERVISOR HSE														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código TP-HSEQ-FOR-
	Versión 0
	Fecha 18/12/2025

INSPECCION PREOPERACIONAL VOLQUETAS

PLACA XGJ 705 MODELO 2001 MARCA ford CONDUCTOR Guimar Lopez

PROYECTO: Construccion Alcantarillado Plato SEMANA DEL 06 AL 13 DE Abril 2026

ITEM	CONCEPTO	FECHA 16/09/26		FECHA 17/09/26		FECHA 18/09/26		FECHA 19/09/26		FECHA 21/09/26		FECHA 22/09/26		FECHA 23/09/26	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de servicio (altas y bajas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (Reflecto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales delanteras de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales traseras de parqueo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De stop y señal trasera	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	Espejos laterales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de emergencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección/suspensión (Terminales)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio frontal (en buen estado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Limpia brisas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios (10 lbs) POS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Silleteria y tapicería	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	refrigerante, horometro, aire)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores, suspensión	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Control fugas de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Grapas y anclaje de chasis	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cadena del cardam	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Acoples rapidos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general del volco	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Soporte del volco (gato hidráulico)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Sistema de carpado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ganchos compuerta volco	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Soportes y Bujes del Volco	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Documentos del conductor y del vehiculo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FIRMA	OPERADOR														
	SUPERVISOR SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Operativo - Campo Dst Policía	1/04/2026	7:00am.

TEMA
Uso adecuado de Herramientas Electricas.

NOMBRE DEL FACILITADOR
Maria Cardenas.

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Jorge Alberto C	7485707	
2	Fabian Suarez	1114922728	
3	Oscar A Patiño	88055605	
4	Eduardo Rios	93772	
5	Agustin Aguilar	86000612	
6	Yonli Lozano G	1143867537	
7	Jorge Herrera	1122144736	
8			
9			
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalación Estación Policía	7-04-2026	7:00am.

TEMA

Riesgo físicos Temperaturas Extremas.

NOMBRE DEL FACILITADOR

York Lozano G.

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Juan Martin Bolivar Gaitan	1125549456	
2	Jony Rodriguez Perez	1124999733	
3	Jogabarte e	26837071	
4	Segundo Roa.	93372720	
5	Adrian Suarez.	1122122	
6	Agustin Aguilar T	86008129	
7	Oscar A Patiño L.	86055605	
8	Maryuri Herrera	1122144136	
9			
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Operativo - Compo Int Policía	6-04-2026	7:00 am

TEMA
Estilos de Hábitos Saludables

NOMBRE DEL FACILITADOR
Moira Cardenas.

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Elkin fabian Tambano Alvarez.	1121922788	
2	Juan Martin Bolivar Gaitan	1122554456	
3	Jhon Rodriguez Pe-(-)	1124994-115	
4	Segundo Rap.	93372730	
5	Agustin Aguilar G	86022192	
6	Osgoberto e	74857071	
7	Yanli Lozano G.	1121867537	
8	Oscar H Patiño Y	86055605	
9	Makyie Herrera	1122447736	
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalación Estacion Policía.	8/04/2026	7:00 am

TEMA
Cod pes de Glev.

NOMBRE DEL FACILITADOR
Maira Cardenas

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Agustin Aguilar G	86.008.125	
2	[illegible]	93372170	
3	Fabian Alvarez	1118924765	
4	Juan Hustin Retiner Cacitan	1125549456	
5	Jacqueline C	1125730491	
6	Jhony Rodriguez Perez	1124999783	
7	Oscar A Polanco P.	86055605	
8	Yeison Lozano G.	1118663807	
9	Maryie Henao	1122144736	
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalacion Estacion Dgeblein	9-04-2026	7:00 am.

TEMA

Reglas de Oro de Seguridad.

NOMBRE DEL FACILITADOR

Maira Cardenas

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Jhary Rodriguez Ruiz	1124999733	
2	Fabian Alvarez.	1121922196	
3	Eduardo Ruiz	93372770	
4	Jaqueberto C	21857071	
5	Juan Manuel Bolivar Gaitán	1125549456	
6	Agustin Aguilar G	86.008.195	
7	Yonli Lorao G.	1121867537	
8	Margie Henao	1122114136	
9			
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalacion Estacion Policia	10-01-2026	7:00 am

TEMA

Manejo de Estres laboral y salud Mental.

NOMBRE DEL FACILITADOR

Yeli Lozano G

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Juan Martin Bolivar Gaitan	1125549456	
2	Jhon Rodriguez Rey	1121999777	
3	Eyner Roa	93372770	
4	Agustin Agudelo E	86.008.1	
5		74.537.1	
6	Fabian Alvarez	1121922488	
7	Oscar Alfonso	86056615	
8	Yaqui Henn	1127144436	
9			
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalación Policía Estación	12-04-2026	7:00 am

TEMA
Actos y Condiciones Inseguras.

NOMBRE DEL FACILITADOR
Yol. Lozano G.

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Jhon Rodriguez Perez	1124999733	Jhon R P.
2	Jean Hunting Bolivar Guzmán	1125549456	
3		1085720	
4		93372780	
5	Fabian Alvarez	1121922788	
6		86.009.165	
7		86055605	
8		1122144136	
9			
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Distrito Estación Patricia	13/04/2026	7:00 am

TEMA

Orden y Aseo.

NOMBRE DEL FACILITADOR

Maira Cardenas

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Edwin Alvarez	1121922148	
2	Dorgoodeth	1125526791	
3	Juan Martin Bolivar Gaitan	1125549456	
4	Agustin Aguilar G	86008165	
5	Sigifredo Pea	93377270	
6	Yonh Leon G	1121867537	
7	Oscar A Patiño L.	86085643	
8	Maycie Hern	1122144136	
9			
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Distracción Estación Policía	14-04-2026	7:00 am

TEMA
La Importancia del Dormir bien.

NOMBRE DEL FACILITADOR
María Cardenas

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Sigurin Rod	93372770	
2	Jhon Rodriguez pc-c1	1124997993	
3	[illegible]	[illegible]	
4	UESD GAITANDO GAITAN	1.006946oa	
5	Vicente Gaitan	8192173	
6	Juan Martín Bolívar Gaitán	1125549456	
7	Agustín Aguilar G	86.005165	
8	Oscar A Bohórquez V.	86055645	
9	York Lorao G	1111623534	
10	Maryle Herrera	1122144206	
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Estacion Policia Instalacion	15-04-2026	7:00 am.

TEMA

El respeto y la convivencia.

NOMBRE DEL FACILITADOR

Yan. Lozano G.

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Sergio Rey C	93372730	
2	Agustin Aguilar G	86008195	
3	Vicente Coiton	8192573	
4	[illegible]	70855071	
5	Juan Martin Bolivar Gaitan	1125549456	
6	UTSID GALINDO GAITAN	1069460002	
7	Edison Alvarez	1121927662	
8	Oscar A Patiño F	86055625	
9	Mayra Henao	1122144336	
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalaciones Estación Policía	16-04-2026	7:00am.

TEMA

El Cambio Climatico.

NOMBRE DEL FACILITADOR

Yoni Lozano G.

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Yesid Galindo Gaitan	1006946002	
2	Eduardo Ros	Eduardo R	
3	Edgodertp C	1065305	
4	Juan Martin Bolivar Gaitan	1125549456	
5	Vicente Gaitan	81912573	
6	Agatin Aguirre	86.008	
7	Oscar Arturo B.	86055613	
8	Wagner Henao	1127147136	
9			
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalacion Estacion Policia	17/04/2026	7:00 am

TEMA
Prevencion de Caidos al mismo nivel.

NOMBRE DEL FACILITADOR
Yeni Lorena S.

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Segundo Rou	93372770	
2	Jorge Luis Fonseca C.	7485707	
3	Fabian Alvarez.	1121927788	
4	UTSID GALINDO GAITÁN	1.069460	
5	Jose Martin Beltran G.	1125549456	
6	Vicente G.	8107573	
7	Oscar A Patiño V	86055645	
8	Mayra Hern	1122144776	
9			
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** IP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Estación Policía	18-04-2026	7:00 am

TEMA

Manejo Seguro de Herramientas Manuales.

NOMBRE DEL FACILITADOR

Yon. Lorano G.

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Segundo Ros G.	93372770	Segundo
2	Segoberto C	7485707	
3	Vicente G	8192573	
4	ALEXIS DAVID G	1124 99 778	
5	YESID GALINDO GAITAN	1000946002	
6	Juan Martin Bolivar Gaviria	1123549456	
7	Mayic Flenn	1172144136	
8			
9			
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalaciones Estación Policía	23-04-2026	7:00 am

TEMA

Prevención de Incendios en el trabajo.

NOMBRE DEL FACILITADOR

Maira Cardenas.

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	[illegible]	93372720	
2	[illegible]	7183720	
3	Esteban Alvarez.	1121077388	
4	YESID GALINDO GAITÁN	1006946002	
5	Juan Martin Bolivar Gaitán	1125549458	
6	Vicente Gaitan	8192573	
7	Oscar A Palomo P.	86075615	
8	Mayra Hoyos	1122144736	
9	Yoni Lozano G	1121867837	
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Institución Gaitan Policía	24/04/2026	7:00 am

TEMA
Trabajo en Equipo.

NOMBRE DEL FACILITADOR
Maira Cardenas

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	ALEXIS DAVID	1124990792	
2	Manuel Llerena	1122144335	
3	YESID GALINDO GAITAN	1065946002	
4	Vicente Cantillo Cantillo	8192573	
5	Gilberto Bog	93372772	
6	Agustin Aguilar C	86008125	
7	York Lozano G	1124662577	
8			
9			
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	4	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalaciones Policia Estación	25-04-2026	7:000m

TEMA
Prevención de Accidentes por Distracción.

NOMBRE DEL FACILITADOR
Yonis Lozano G.

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Vicente G.	8192573	
2	Eugenio Ros	9357470	
3	Dagoberto C	7485707	
4	Fabian Alvarez	1121922788	
5		1124990992	
6	Agt. Aguila	86098195	
7	Mayra Herra	1127144736	
8			
9			
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalacion Estacion Policia	29-04-2026.	7:00am

TEMA

Higiene Personal en el trabajo

NOMBRE DEL FACILITADOR

Yonh Lozano G.

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Vicente Gaitan	8192573	
2	ALEXIS DAVID	1124990992	
3	YESID GALINDO GAITAN	1.007946008	
4	Eugenio Roa	93372770	
5	Juan Martin Bolivar Gaitan	1125549456	
6	[illegible]	7185207	
7	Fabian Alvarez	1121922788	
8	Osca A Patarroyo Lores	86055649	Osca. A Patarroyo
9	Mayra Herrera	1122144236	
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalación Estación Policía	28-04-2026	7:00 am

TEMA
Cultura de Autocuidado y Prevención.

NOMBRE DEL FACILITADOR
Yali Lozano G.

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Vicente Gaitan	8192573	
2	YESID GALINDO GAITA	1006946002	
3	ALEXIS DAVID	1124990992	
4	Juan Martin Bolivar. G.	1125549456	
5	Agustin Aguilar G	86000[illegible]	
6	Oscar A Patiño I.	86055645	
7	Dagoberto C	24852071	
8	Fabian Alvarez	1121921588	
9	Eduardo Rios	93372770	
10	Mayra Flores	1121144336	
11	Mayu +		
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Estación Estación Policía	29-04-2026	7:00 am

TEMA

Consumo de Alcohol y Drogas: Riesgos laborales.

NOMBRE DEL FACILITADOR

Yanp Lozano G.

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	YESID GALINDO GAITAN	1006946002	
2	Vicente Gaitan Gaitan	8196573	
3	ALEXIS DAVID	1124990792	
4	Eugenio Roa C.	93392770	
5	Bagoberto C	2U95792	
6	Juan Martin Bolivar. Gaitán	1125549456	
7	Agustin Aguilar G	86022195	
8	Johan Alvarez	1121927488	
9	Oscar A Patiño P.	86035665	
10	Manye Hern	1122144136	
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla	X	Capacitación		Inducción	
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalacion Estacion Policia	30-04-2026	7:000m

TEMA

Prevencion de Caidos de Alturas.

NOMBRE DEL FACILITADOR

Yoli Lozano G.

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	Agustin Aguilar G	86008125	
2		8192573	
3		1118228148	
4	ALEXIS DAVID	1121990792	
5	Juan Manuel Bolivar Gaitan	1125549456	
6	Rogelberto C	74957071	
7	Segundo Roa	93372770	
8			
9			
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	**Código:** TP-HSEQ-FOR-013
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	REGISTRO DE ASISTENCIA	

TIPO DE CAPACITACION					
Charla		Capacitación		Inducción	X
Reinducción		Otro		¿Cuál?	

LUGAR	FECHA	HORA
Instalacion Estacion Policia	13/04/2026	7:15 am.

TEMA
Divulgacion de politicas de la Empresa.

NOMBRE DEL FACILITADOR
Moira Cardenas.

PARTICIPANTES

No	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	YESID GALINDO GAITAN	1006946002	
2	Vicente Gaitan	8692573	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN		Código: TP-HSEQ-FOR-025
	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) FUNDIDA DE ESTRUCTURA DE OBRA ARQUITECTONICA	

1. RIESGOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD 2. ALISTAMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD 3. EXCAVACION Y RELLENO MANUAL 4.EXTRUCTURA DE CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO 5. ORDEN Y ASEO	INICIA DESDE: 13-04-26 FINALIZA HASTA: 23-04-26
SEDE O PROYECTO:	PERMISO DE TRABAJO No.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: herramienta de mano, escalera , carretilla, r, volqueta, , andamios, mezcladora, planta electrica, canguro , pulidora grande, extenciones 110, vibrocompactador manual.

RIESGOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD	BIOMECANICO: Posturas bipedas y repetitivas por requerimiento de la actividad. Sobre esfuerzos	Espasmos Musculares, Hernias, Dolores lumbales, Fatiga	Realizar pausas activas antes, durante y despues de la terminacion de actividades. Manejo adecuado de cargas por persona, tener en cuenta el peso sugerido para levantar cargas manuales por persona (25 kg). Realizar buenas practicas de higiene postural, de ser necesario hacer uso de ayudas mecanicas. Orden y aseo en el area.
	FÍSICOS: Exposición a temperaturas extremas por calor	Deshidratación, insolación, golpe de calor.Disminucion de la vigilancia, la destreza manual y la rapidez	Disponibilidad de hidratacion, pausas activas durante la actividad, personal SST en el área de trabajo PERIÓDICAMENTE , uso de dotación y EPP.(camisa manga larga,pantalon Largo,casco de seguridad,gafas de seguridad)
	RIESGO BIOLÓGICO: Presencia de animales ponzoñosos y / o ofidicos y bacterias	Mareo, reacciones alérgicas, envenenamiento.	Inspeccionar el area antes de iniciar labores, para verificar la presencia de cualquier animal. Revisar las areas de almacenamiento antes de retirar elementos y equipo Hacer uso permanente de los EPP de acuerdo a la actividad. En caso de presentarse una eventualidad reportarla inmediatamente al jefe de area o supervisor HSE, prestar primeros auxilios.
	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Superficies de trabajo irregulares	Caidas a mismo y distinto nivel, golpes, fracturas, esguinses, raspones, moretones.	Usar adecuadamente los elementos de proteccion personal (Casco, gafas, tapa oidos, ropa de trabajo, botas), verificar las condiciones del area de trabajo antes de iniciar cada actividad.
	RIESGO ELECTRICO: Fuentes de energia electrica, equipos y cables energizados y pulidora	Electrocución, quemaduras e incendios.	Verificacion de equipos y herramientas energizados (pulidora) Verificar el estado de las extensiones, enchufes y toma corrientes a utilizar. Uso de EPP acordes a la actividad disponer de un extintor en caso de presentarse un conato de incendio. señalizar el area a intervenir. Verificar que los sistemas cuenten con las guardas de seguridad adecuadas
	RIESGO FÍSICO: Ruido.	Cefalea, dificultad para la comunicación oral, estrés, molestias o sensaciones desagradables , disminucion y perdida auditiva.	Entrega y uso de protección auditiva de inserción para el personal colaborador,verificacion del uso de epp
ALISTAMIENTO DE HERRAMIENTAS ,EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD	RIESGO BIOMECANICO: Posturas inadecuadas, prolongadas, Movimientos repetitivos, sobreesfuerzos	Lesiones del sistema músculo esquelético,cansancio, fatiga, dolores lumbales, adormecimiento de extremidades	Realizar pausas activas antes, durante y despues de la terminacion de actividades. Manejo adecuado de cargas por persona, tener en cuenta el peso sugerido para levantar cargas manuales por persona (25 kg). Realizar buenas practicas de higiene postural, de ser necesario hacer uso de ayudas mecanicas. Orden y aseo en el area.
	MECANICO: Uso de herramientas manuales	Cortadas, machucones, cortes.	Divulgar ATS de actividad a realizar y divulgacion de riesgos. Uso adecuado de EPP (casco, gafas de seguridad claras y/o oscuras, proteccion auditiva, guantes de vaqueta, botas de seguridad y ropa tipo industrial). No hacer uso de joyas ni prendas sueltas que puedan generar atrapamiento. En caso de presentarse una eventualidad informar inmediatamente al supeervisor HSE.

Powered by CamScanner

EXCAVACION Y RELLENO - Excavacion mecanica de cargue manual - transporte de material final escombro y sobrantes - relleno con material mixto (suministro, extendido, nivelacion,hundimiento, y compactacion manual. - Transporte de material granular	**MECANICO:** Herramientas electricas ,pulidora	Cortaduras, quemaduras, laseraciones, amputaciones.	Inspeccion preoperacional de equipos y herramientas Selección adecuada de herramientas para cada labor. Verificar que los equipos cuentan con el sistema de guardas de seguridad adecuadas delimitar area. Verificar el estado de las extensiones, enchufes y toma corrientes a utilizar. Uso adecuado de EPP(mangas, guantes y peto de camaza careta esmeriladora) No hacer uso de joyas ni prendas sueltas que puedan generar atrapamiento En caso de presentarse una eventualidad informar inmediatamente.
	Trabajo en Caliente Uso de Pulidora	Incendio, Amputaciones, muerte	Demarcar y mantener extintor en area de trabajo. - Verificar que no haya material combustible en el area. - Uso de peto, mangas, careta de esmeriar, guantes, ropa de trabajo, botas caña alta
	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Mecanico (Manipulación Inadecuada de herramienta menor, llaves fijas, de torción, alicates	Golpes, laseraciones, heridas, atrapamiento, punzones.	Uso adecuado de EPP (guantes, gafas, casco, botas punta de acero, ropa de trabajo). - Tener precaución al manipular estas herramientas. No usar anillos, pulseras, reloj, cadenas. Verificar estado de herramienta
	RIESGO BIOMECANICO: Posturas Inadecuadas, prolongadas, Movimientos repetitivos, sobreesfuerzos	Agotamiento osteomuscular, estrés, calambres.	Pausas activas, estiramiento o calistenia. Mantener posturas ergonómicas adecuadas
	MECANICO: Proyección de particulas	Heridas,rotura de cornea,perdida de vision,lesiones en miembros superiores	divulgacion ATS de los riesgos expuestos al personal y correcto uso de las herramientas a utilizar ,uso de proteccion ocular (careta,guantes de vaqueta,camisa manga larga y pantalon largo,botas de seguridad,inspeccion preoperacional pulidora
	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Superficies de trabajo irregulares	Caidas a mismo y distinto nivel, golpes, fracturas, esguinses, raspones, moretones.	Usar adecuadamente los elementos de proteccion personal (Casco, gafas, tapa oidos, ropa de trabajo, botas), verificar las condiciones del area de trabajo antes de iniciar cada actividad
	RIESGO MECANICO: contacto con Superficies cortantes, con oxido y corrosion	Lesiones en manos, cortaduras, laceracion, heridas, infecciones	Verificar la tuberia, identificar los puntos de peligro, filos , el personal que realice la actividad debe contar con esquema de vacunacion antitetanico y utilizar de forma continua guantes de vaqueta o camaza
	MECANICO: Uso de herramientas manuales	Cortadas, machucones, cortes.	Divulgar ATS de actividad a realizar y divulgacion de riesgos. Uso adecuado de EPP (casco, gafas de seguridad claras y/o oscuras, proteccion auditiva, guantes de vaqueta, botas de seguridad y ropa tipo industrial). No hacer uso de joyas ni prendas sueltas que puedan generar atrapamiento. En caso de presentarse una eventualidad informar inmediatamente al supeervisor HSE.
	MECANICO: Proyección de particulas	Heridas,rotura de cornea,perdida de vision,lesiones en miembros superiores	divulgacion ATS de los riesgos expuestos al personal y correcto uso de las herramientas a utilizar ,uso de proteccion ocular (careta,guantes de vaqueta,camisa manga larga y pantalon largo,botas de seguridad,inspeccion preoperacional pulidora
	QUÍMICOS: Humos metalicos	Asma profesional, cancer, Gripe, alergias, intoxicación, enrojecimiento, quemaduras en la piel, dermatitis	Informar los riesgo a los cuales estan expuestos, los daños que nos generan y las medidas preventivas a tomar, señalizar area contar con extintores en el area, en caso de presentarse una eventualidad informar inmediatamente al jefe de area encargado. uso de EPP (mascarilla con filtros para humos metalicos,botas de seguridad,gafas de seguridad,ropa corporativa,guantes de camaza,mangas de vaqueta,peto de camaza ,careta de soldar)
	RIESGO BIOMECANICO: Manipulacion manual de cargas y esfuerzo.	Espasmos, dolores lumbares, hernias, fatiga, machucones, atrapamiento.	Realizar pausas activas antes, durante y despues de la terminacion de actividades. Manejo adecuado de cargas por persona, tener en cuenta el peso sugerido para levantar cargas manuales por persona (25 kg). Realizar buenas practicas de higiene postural, de ser necesario hacer uso de ayudas mecanicas, orden y aseo en el area.
	RIESGO MECANICO: contacto con Superficies cortantes, con oxido y corrosion	Lesiones en manos, cortaduras, laceracion, heridas, infecciones	Verificar la tuberia, identificar los puntos de peligro, filos , el personal que realice la actividad debe contar con esquema de vacunacion antitetanico y utilizar de forma continua guantes de vaqueta o camaza
	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Superficies de trabajo irregulares	Caidas a mismo y distinto nivel, golpes, fracturas, esguinses, raspones, moretones.	Usar adecuadamente los elementos de proteccion personal (Casco, gafas, tapa oidos, ropa de trabajo, botas), verificar las condiciones del area de trabajo antes de iniciar cada actividad.
	MECANICO Herramientas electricas ,pulidora, equipo de soldadura	Cortaduras, quemaduras, laseraciones, amputaciones.	Inspeccion preoperacional de equipos y herramientas.Seleccion adecuada de herramientas para cada labor. Verificar que los equipos cuentan con el sistema de guardas de seguridad adecuadas.delimitar area. Verificar el estado de las extensiones, enchufes y toma corrientes a utilizar. Uso adecuado de EPP(mangas, guantes y peto de camaza,careta esmeriladora) No hacer uso de joyas ni prendas sueltas que puedan generar atrapamiento En caso de presentarse una eventualidad informar inmediatamente.
	MECANICO Uso de herramientas manuales	Cortadas, machucones, cortes.	Divulgar ATS de actividad a realizar y divulgacion de riesgos. Uso adecuado de EPP (casco, gafas de seguridad claras y/o oscuras, proteccion auditiva, guantes de vaqueta, botas de seguridad y ropa tipo industrial) No hacer uso de joyas ni prendas sueltas que puedan generar atrapamiento. En caso de presentarse una eventualidad informar inmediatamente al supervisor SST

Powered by CamScanner

EXTRUCTURA DE CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO - Solado, limpieza de concreto - fundida de zapatas, viuga, columnas en concreto - Fundida de placa de contrapeso en concreto impermeabilizacion. -Fundida de placa de entre piso impermeabilizacion -concreto en obra figurada -Malla electrosoldada(figurado, armado, colocacion y amarre) suministro y colocacion. -Acero de refuerzo(figurado, armado, colocacion y armarre . Suministro e instalacion de lamina Metaldeck. -Impermeabilizacion acrilica de placa cubierta sikafil 12-power o similar.	**MECANICO:** Proyección de particulas	Heridas,rotura de cornea,perdida de vision,lesiones en miembros superiores	divulgacion ATS de los riesgos expuestos al personal y correcto uso de las herramientas a utilizar ,uso de proteccion ocular (careta,guantes de vaqueta,camisa manga larga y cartalon largo,botas de seguridad,inspeccion preoperacional pulidora
	RIESGO BIOMECANICO: Manipulacion manual de cargas y esfuerzo.	Espasmos, dolores lumbares, hernias, fatiga, machucones, atrapamiento.	Realizar pausas activas antes, durante y despues de la terminacion de actividades. Manejo adecuado de cargas por persona, tener en cuenta el peso sugerido para levantar cargas manuales por persona (25 kg). Realizar buenas practicas de higiene postural, de ser necesario hacer uso de ayudas mecanicas, orden y aseo en el area.
	RIESGO MECANICO: contacto con Superficies cortantes, con oxido y corrosion	Lesiones en manos, cortaduras, laceracion, heridas, infecciones	Verificar la tuberia, identificar los puntos de peligro, filos , el personal que realice la actividad debe contar con esquema de vacunacion antitetanico y utilizar de forma continua guantes de vaqueta o carnaza
	BIOMECANICO Por posturas movimientos repetitivos	Lesiones osteomusculares, adquisicion de enfermedades profesionales, fatiga, cansancio	Realizar pausas activas, mantener y adoptar posturas ergonómicas adecuadas, trabajo en equipo
	QUÍMICOS: material particulado.	Asma profesional, cancer, Gripe, alergias, intoxicación, enrojecimiento, quemaduras en la piel, dermatitis	Uso de EPP (protección respiratoria y visual), en caso de caida de material particulado en ojos o piel lavar con abundante agua zona afectada.
	RIESGO BIOMECANICO (ERGONOMICO) Manipulacion manual de cargas y sobre esfuerzo	Espasmos Musculares, Hernias, Dolores lumbales, Fatiga	Concientizar al personal sobre manejo y manipulacion de cargas, adoptar posturas ergonomicas adecuadas, trabajo en equipo, realizar pausas activas, EL TRABAJO DEBE SER COORDINADO ENTRE DOS PERSONAS, para disminuir el esfuerzo y no sobrepasar el peso requerido por persona
	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Riesgo eléctrico, Uso de equipos y herramientas electricas (pulidora)	Electrocución, Incendios quemaduras,explociones, cortos circuitos.	Verificar el estado de las tomas y conexiones sobre las cuales se debe conectar la herramienta, el cableado debe estar en buenas condiciones, tener cerca al área un extintor multiproposito,uso de EPP, realizar inspeccion a la herramienta eléctrica.
	ELECTRICO: Cableado existente en estructuras o area	Electrocución, quemaduras, muerte, daños a equipos o redes, explocio, incendio.	Se recomienda al personal inspeccinar el area o estructura a intervenir, verificar estado de instalaciones o conexiones electricas existentes, informar y/o solicitar apoyo al area electrica o de Mto del núcleo, uso adecuado de EPP
	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Superficies de trabajo irregulares	Caidas a mismo y distinto nivel, golpes, fracturas, esguinses, raspones, moretones.	Usar adecuadamente los elementos de proteccion personal (Casco, gafas, tapa oidos, ropa de trabajo, botas), verificar las condiciones del area de trabajo antes de iniciar cada actividad.
	RIESGO BIOMECANICO: Manipulacion manual de cargas y esfuerzo.	Espasmos, dolores lumbares, hernias, fatiga, machucones, atrapamiento.	Realizar pausas activas antes, durante y despues de la terminacion de actividades. Manejo adecuado de cargas por persona, tener en cuenta el peso sugerido para levantar cargas manuales por persona (25 kg). Realizar buenas practicas de higiene postural, de ser necesario hacer uso de ayudas mecanicas, orden y aseo en el area.

Powered by CamScanner

ORDEN Y ASEO	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Superficies de trabajo irregulares	Caidas a mismo y distinto nivel, golpes, fracturas, esguinses, raspones, moretones.	Usar adecuadamente los elementos de proteccion personal (Casco, gafas, tapa oidos, ropa de trabajo, botas), verificar las condiciones del area de trabajo antes de iniciar cada actividad.
	RIESGO QUIMICOS: Polvos y material particulado	gripe, alergias, problemas respiratorios, intoxicacion, enrojecimiento, quemaduras en la piel, dermatitis, enfermedades pulmonares, muerte.	Informar a los trabajadores sobre el riesgo al cual van estar expuestos, los daños que nos generan y las medidas preventivas a tomar, entrega de proteccion respiratoria mascara con filtro según la labor humos, gases y vapores, cambio de la misma cada vez que sea necesario, uso de guantes de presicion, uso de EPP.
	RIESGO LOCATIVO: Presencia de materiales, herramientas y equipos en el area, residuos sin clasificar	Posibles caidas por areas de trabajo obstaculizadas, contaminación visual y ambiental.	Al terminar la actividad se debe dejar el area completamente limpia de materiales y equipos, retiro de señalización, recolección de escoria de soldadura , entre otros.
VERSIÓN: 01	FECHA: 18/12/2025	TP-HSEQ-FOR-025	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: FUNDIDA DE ESTRUCTURA DE OBRA ARQUICTECTONICA

EQUIPO DE TRABAJO :

No	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	DIA: 13 FIRMA	DIA: 14 FIRMA	DIA: FIRMA	DIA: FIRMA	DIA: FIRMA	DIA: FIRMA	DIA: FIRMA
1	Fabian Munoz	1121922128							
2	[illegible]	[illegible]							
3	Juan Martin Polivar	1125549456							
4	Agustin Avila	86.008.185							
5	[illegible]	93332270							
6	[illegible]	1124997153			—	—	—	—	—
7	Oscar Alberto P.	86055645							—
8	CESD Palmira	1069460002							
9	Vicente 6	8192573							

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-025 Versión: 0 Fecha: 18/12/2025
	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) FUNDIDA DE ESTRUCTURA DE OBRA ARQUITECTONICA	

1. RIESGOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD 2. ALISTAMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD 3. EXCAVACION Y RELLENO MANUAL 4.EXTRUCTURA DE CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO 5. ORDEN Y ASEO	INICIA DESDE: 1-09-26 FINALIZA HASTA: 11-09-26
SEDE O PROYECTO:	PERMISO DE TRABAJO No.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: herramienta de mano, escalera , carretilla, r, volqueta, , andamios, mezcladora, planta electrica, canguro , pulidora grande, extenciones 110, vibrocompactador manual.

RIESGOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD	BIOMECANICO. Posturas bipedas y repetitivas por requerimiento de la actividad. Sobre esfuerzos	Espasmos Musculares, Hernias, Dolores lumbales, Fatiga	Realizar pausas activas antes, durante y despues de la terminacion de actividades. Manejo adecuado de cargas por persona, tener en cuenta el peso sugerido para levantar cargas manuales por persona (25 kg). Realizar buenas practicas de higiene postural, de ser necesario hacer uso de ayudas mecanicas. Orden y aseo en el area.
	FÍSICOS: Exposición a temperaturas extremas por calor	Deshidratación, insolación, golpe de calor.Disminucion de la vigilancia, la destreza manual y la rapidez	Disponibilidad de hidratacion, pausas activas durante la actividad, personal SST en el área de trabajo PERIÓDICAMENTE , uso de dotación y EPP.(camisa manga larga,pantalon Largo,casco de seguridad,gafas de seguridad)
	RIESGO BIOLÓGICO: Presencia de animales ponzoñosos y / o ofidicos y bacterias	Mareo, reacciones alérgicas, envenenamiento.	Inspeccionar el area antes de iniciar labores, para verificar la presencia de cualquier animal. Revisar las areas de almacenamiento antes de retirar elementos y equipo Hacer uso permanente de los EPP de acuerdo a la actividad. En caso de presentarse una eventualidad reportarla inmediatamente al jefe de area o supervisor HSE, prestar primeros auxilios.
	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Superficies de trabajo irregulares	Caidas a mismo y distinto nivel, golpes, fracturas, esguinses, raspones, moretones.	Usar adecuadamente los elementos de proteccion personal (Casco, gafas, tapa oidos, ropa de trabajo, botas), verificar las condiciones del area de trabajo antes de iniciar cada actividad.
	RIESGO ELECTRICO: Fuentes de energia electrica, equipos y cables energizados y pulidora	Electrocución, quemaduras e incendios.	Verificacion de equipos y herramientas energizados (pulidora) Verificar el estado de las extensiones, enchufes y toma corrientes a utilizar. Uso de EPP acordes a la actividad disponer de un extintor en caso de presentarse un conato de incendio. señalizar el area a intervenir. Verificar que los sistemas cuenten con las guardas de seguridad adecuadas
	RIESGO FÍSICO: Ruido.	Cefalea, dificultad para la comunicación oral, estrés, molestias o sensaciones desagradables , disminucion y perdida auditiva.	Entrega y uso de protección auditiva de inserción para el personal colaborador,verificacion del uso de epp
ALISTAMIENTO DE HERRAMIENTAS ,EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD	RIESGO BIOMECANICO: Posturas inadecuadas, prolongadas, Movimientos repetitivos, sobreesfuerzos	Lesiones del sistema músculo esquelético,cansancio, fatiga, dolores lumbales, adormecimiento de extremidades	Realizar pausas activas antes, durante y despues de la terminacion de actividades. Manejo adecuado de cargas por persona, tener en cuenta el peso sugerido para levantar cargas manuales por persona (25 kg). Realizar buenas practicas de higiene postural, de ser necesario hacer uso de ayudas mecanicas. Orden y aseo en el area.
	MECANICO: Uso de herramientas manuales	Cortadas, machucones, cortes.	Divulgar ATS de actividad a realizar y divulgacion de riesgos. Uso adecuado de EPP (casco, gafas de seguridad claras y/o oscuras, proteccion auditiva, guantes de vaqueta, botas de seguridad y ropa tipo industrial). No hacer uso de joyas ni prendas sueltas que puedan generar atrapamiento. En caso de presentarse una eventualidad informar inmediatamente al supeervisor HSE.

Powered by CamScanner

EXCAVACION Y RELLENO - Excavcion mecanica de cargue manual - transporte de material final escombro y sobrantes - relleno con material mixto (suministro, extendido, nivelacion,hundimiento, y compactacion manual. - Transporte de material granular.	**MECANICO:** Herramientas electricas ,pulidora	Cortaduras, quemaduras, laseraciones, amputaciones.	Inspeccion preoperacional de equipos y herramientas.Selección adecuada de herramientas para cada labor. Verificar que los equipós cuenten con el sistema de guardas de seguridad adecuadas.delimitar area. Verificar el estado de las extensiones, enchufes y toma corrientes a utilizar. Uso adecuado de EPP(mangas, guantes y peto de camaza,careta esmeriladora) No hacer uso de joyas ni prendas sueltas que puedan generar atrapamiento.En caso de presentarse una eventualidad informar inmediatamente.
	Trabajo en Caliente Uso de Pulidora	Incendio, Amputaciones, muerte	Demarcar y mantener extintor en area de trabajo. - Verificar que no haya material combustible en el area. - Uso de peto, mangas, careta de esmerilar, guantes, ropa de trabajo, botas caña alta
	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Mecanico (Manipulación inadecuada de herramienta menor, llaves fijas, de torción, alicates	Golpes, laseraciones, heridas, atrapamiento, punzones.	Uso adecuado de EPP (guantes, gafas, casco, botas punta de acero, ropa de trabajo). - Tener precaución al manipular estas herramientas. No usar anillos, pulseras, reloj, cadenas. Verificar estado de herramienta
	RIESGO BIOMECANICO: Posturas inadecuadas, prolongadas, Movimientos repetitivos, sobreesfuerzos	Agotamiento osteomescular, estrès, calambres.	Pausas activas, estiramiento o calistenia. Mantener posturas ergonómicas adecuadas
	MECANICO: Proyección de particulas	Heridas,rotura de cornea,perdida de vision,lesiones en miembros superiores	divulgacion ATS de los riesgos expuestos al personal y correcto uso de las herramientas a utilizar ,uso de proteccion ocular (careta,guantes de vaqueta,camisa manga larga y cantalon largo,botas de seguridad,inspeccion preoperacional pulidora
	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Superficies de trabajo irregulares	Caidas a mismo y distinto nivel, golpes, fracturas, esguinsea, raspones, moretones.	Usar adecuadamente los elementos de proteccion personal (Casco, gafas, tapa oidos, ropa de trabajo, botas), verificar las condiciones del area de trabajo antes de iniciar cada actividad.
	RIESGO MECANICO: contacto con Superficies cortantes, con oxido y corrosion	Lesiones en manos, cortaduras, laceracion, heridas, infecciones	Verificar la tuberia, identificar los puntos de peligro, filos , el personal que realice la actividad debe contar con esquema de vacunacion antitetanico y utilizar de forma continua guantes de vaqueta o camaza
	MECANICO: Uso de herramientas manuales	Cortades, machucones, cortes.	Divulgar ATS de actividad a realizar y divulgacion de riesgos. Uso adecuado de EPP (casco, gafas de seguridad claras y/o oscuras, proteccion auditiva, guantes de vaqueta, botas de seguridad y ropa tipo industrial). No hacer uso de joyas ni prendas sueltas que puedan generar atrapamiento. En caso de presentarse una eventualidad informar inmediatamente al supeervisor HSE.
	MECANICO: Proyección de particulas	Heridas,rotura de cornea,perdida de vision,lesiones en miembros superiores	divulgacion ATS de los riesgos expuestos al personal y correcto uso de las herramientas a utilizar ,uso de proteccion ocular (careta,guantes de vaqueta,camisa manga larga y pantalon largo,botas de seguridad,inspeccion preoperacional pulidora
	QUÍMICOS: Humos metalicos	Asma profesional, cancer, Gripe, alergias, intoxicación, enrojecimiento, quemaduras en la piel, dermatitis	Informar los riesgo a los cuales estan expuestos, los daños que nos generan y las medidas preventivas a tomar, señalizar area contar con extintores en el area, en caso de presentarse una eventualidad Informar inmediatamente al jefe de area encargado. uso de EPP (mascarilla con filtros para humos metalicos,botas de seguridad,gafas de seguridad,ropa corporativa,guantes de camaza,mangas de vaquota,peto de camaza ,careta de soldar)
	RIESGO BIOMECANICO: Manipulacion manual de cargas y esfuerzo.	Espasmos, dolores lumbares, hernias, fatiga, machucones, atrapamiento.	Realizar pausas activas antes, durante y despues de la terminacion de actividades. Manejo adecuado de cargas por persona, tener en cuenta el peso sugerido para levantar cargas manuales por persona (25 kg). Realizar buenas practicas de higiene postural, de ser necesario hacer uso de ayudas mecanicas, orden y aseo en el area.
	RIESGO MECANICO: contacto con Superficies cortantes, con oxido y corrosion	Lesiones en manos, cortaduras, laceracion, heridas, infecciones	Verificar la tuberia, identificar los puntos de peligro, filos , el personal que realice la actividad debe contar con esquema de vacunacion antitetanico y utilizar de forma continua guantes de vaqueta o camaza
	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Superficies de trabajo irregulares	Caidas a mismo y distinto nivel, golpes, fracturas, esguinsos, raspones, moretones.	Usar adecuadamente los elementos de proteccion personal (Casco, gafas, tapa oidos, ropa de trabajo, botas), verificar las condiciones del area de trabajo antes de iniciar cada actividad.
	MECANICO: Herramientas electricas ,pulidora, equipo de soldadura.	Cortaduras, quemaduras, laseraciones, amputaciones.	Inspeccion preoperacional de equipos y herramientas.Selección adecuada de herramientas para cada labor. Verificar que los equipós cuenten con el sistema de guardas de seguridad adecuadas.delimitar area. Verificar el estado de las extensiones, enchufes y toma corrientes a utilizar. Uso adecuado de EPP(mangas, guantes y peto de camaza,careta esmeriladora) No hacer uso de joyas ni prendas sueltas que puedan generar atrapamiento.En caso de presentarse una eventualidad informar inmediatamente.
	MECANICO: Uso de herramientas manuales	Cortadas, machucones, cortes.	Divulgar ATS de actividad a realizar y divulgacion de riesgos. Uso adecuado de EPP (casco, gafas de seguridad claras y/o oscuras, proteccion auditiva, guantes de vaqueta, botas de seguridad y ropa tipo industrial). No hacer uso de joyas ni prendas sueltas que puedan generar atrapamiento. En caso de presentarse una eventualidad informar inmediatamente al supervisor SST.

Powered by CamScanner

EXTRUCTURA DE CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO - Solado, limpieza de concreto - fundida de zapatas, vuiga, columnas en concreto - Fundida de placa de contrapeso en concreto impermeabilizacion. -Fundida de placa de entre piso impermeabilizacion -concreto en obra figurada -Malla electrosoldada(figurado, armado, colocacion y amarre) suministro y colocacion. -Acero de refuerzo(figurado, armado, colocacion y amarre . Suministro e instalacion de lamina Metaldeck. -impermeabilizacion acrilica de placa cubierta sikafil 12-power o similar.	**MECANICO:** Proyección de particulas	Heridas,rotura de cornea,perdida de vision,lesiones en miembros superiores	divulgacion ATS de los riesgos expuestos al personal y correcto uso de las herramientas a utilizar ,uso de proteccion ocular (careta,guantes de vaqueta,camisa manga larga y pantalon largo,botas de seguridad,inspeccion preoperacional pulidora
	RIESGO BIOMECANICO: Manipulacion manual de cargas y esfuerzo.	Espasmos, dolores lumbares, hernias, fatiga, machucones, atrapamiento.	Realizar pausas activas antes, durante y despues de la terminacion de actividades. Manejo adecuado de cargas por persona, tener en cuenta el peso sugerido para levantar cargas manuales por persona (25 kg). Realizar buenas practicas de higiene postural, de ser necesario hacer uso de ayudas mecanicas, orden y aseo en el area.
	RIESGO MECANICO: contacto con Superficies cortantes, con oxido y corrosion	Lesiones en manos, cortaduras, lacerecion, heridas, infecciones	Verificar la tuberia, identificar los puntos de peligro, filos , el personal que realice la actividad debe contar con esquema de vacunacion antitetanico y utilizar de forma continua guantes de vaqueta o camaza
	BIOMECANICO Por posturas movimientos repetitivos	Lesiones osteomusculares, adquisicion de enfermedades profesionales, fatiga, cansancio	Realizar pausas activas, mantener y adoptar posturas ergonómicas adecuadas, trabajo en equipo
	QUÍMICOS: material particulado.	Asma profesional, cancer, Gripe, alergias, intoxicación, enrojecimiento, quemaduras en la piel, dermatitis	Uso de EPP (protección respiratoria y visual), en caso de caida de material particulado en ojos o piel lavar con abundante agua zona afectada.
	RIESGO BIOMECANICO (ERGONOMICO) Manipulacion manual de cargas y sobre esfuerzo	Espasmos Musculares, Hernias, Dolores lumbales, Fatiga	Concientizar al personal sobre manejo y manipulacion de cargas, adoptar posturas ergonomicas adecuadas, trabajo en equipo, realizar pausas activas. EL TRABAJO DEBE SER COORDINADO ENTRE DOS PERSONAS, para disminuir el esfuerzo y no sobrepasar el peso requerido por persona
	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Riesgo eléctrico, Uso de equipos y herramientas electricas (pulidora)	Electrocución, incendios quemaduras,explociones, cortos circuitos.	Verificar el estado de las tomas y conexiones sobre las cuales se debe conectar la herramienta, el cableado debe estar en buenas condiciones, tener cerca al área un extintor multiproposito,uso de EPP. realizar inspeccion a la herramienta eléctrica.
	ELECTRICO: Cableado existente en estructuras o area	Electrocución, quemaduras, muerte, daños a equipos o redes, explocié, incendio.	Se recomienda al personal inspeccinar el area o estructura a intervenir, verificar estado de instalaciones o conexiones electricas existentes, informar y/o solicitar apoyo al area electrica o de Mtto del núcleo, uso adecuado de EPP
	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Superficies de trabajo irregulares	Caidas a mismo y distinto nivel, golpes, fracturas, esguinses, raspones, moretones.	Usar adecuadamente los elementos de proteccion personal (Casco, gafas, tapa oidos, ropa de trabajo, botas), verificar las condiciones del area de trabajo antes de iniciar cada actividad.
	RIESGO BIOMECANICO: Manipulacion manual de cargas y esfuerzo.	Espasmos, dolores lumbares, hernias, fatiga, machucones, atrapamiento.	Realizar pausas activas antes, durante y despues de la terminacion de actividades. Manejo adecuado de cargas por persona, tener en cuenta el peso sugerido para levantar cargas manuales por persona (25 kg). Realizar buenas practicas de higiene postural, de ser necesario hacer uso de ayudas mecanicas, orden y aseo en el area.

Powered by CamScanner

ORDEN Y ASEO	CONDICIONES DE SEGURIDAD: Superficies de trabajo irregulares	Caidas a mismo y distinto nivel, golpes, fracturas, esguinses, raspones, moretones.	Usar adecuadamente los elementos de proteccion personal (Casco, gafas, tapa oidos, ropa de trabajo, botas), verificar las condiciones del area de trabajo antes de iniciar cada actividad
	RIESGO QUIMICOS: Polvos y material particulado	gripe, alergias, problemas respiratorios, intoxicacion, enrojecimiento, quemaduras en la piel, dermatitis, enfermedades pulmonares, muerte	Informar a los trabajadores sobre el riesgo al cual van estar expuestos, los daños que nos generan y las medidas preventivas a tomar, entrega de proteccion respiratoria mascara con filtro según la labor humos, gases y vapores, cambio de la misma cada vez que sea necesario, uso de guantes de presicion, uso de EPP.
	RIESGO LOCATIVO: Presencia de materiales, herramientas y equipos en el area, residuos sin clasificar	Posibles caidas por areas de trabajo obstaculizadas, contaminación visual y ambiental.	Al terminar la actividad se debe dejar el area completamente limpia de materiales y equipos, retiro de señalización, recolección de escoria de soldadura , entre otros.
VERSIÓN: 01	FECHA: 18/12/2025	TP-HSEQ-FOR-025	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: FUNDIDA DE ESTRUCTURA DE OBRA ARQUICTECTONICA

EQUIPO DE TRABAJO:

No	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACIÓN	DIA: / FIRMA:	DIA: / FIRMA:	DIA: / FIRMA:	DIA: / FIRMA:	DIA: / FIRMA:	DIA: / FIRMA:	DIA: / FIRMA:
1	Erik Fabian Cardenas	1124922388							
2	Juan Martin Bolivar	1125549456							
3	Jhony Rodriguez Rey	1124999733							
4	Siguenza Roa	93372770							
5	Agustin Ayala	86 00812							
6	Daggbrio	1085207100							
7	Oscar Patiño	86055643							
8	Jhony Rodriguez	1124999733							
9									

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-019
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES, ELECTRICAS Y NEUMATICAS	

CONTRATISTA: UT. Dyc Plaza — AREA A INSPECCIONAR: Obra.

ACTIVIDAD: Construcción Alojamiento. — FECHA: 6/09/25 HORA: 8:10 am

	HERRAMIENTAS MANUALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Se usa adecuada al trabajo	X			
2	Se encuentra en buen estado	X			
3	Se guardan y portan adecuadamente	X			
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	X			
5	Se usan prensas de banco para sujetarlas.			X	
	HERRAMIENTAS DE CORTE	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo.	X			
2	Los cinceles se encuentran afiliados.	X			
3	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias.	X			
4	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos.	X			
5	Los cuchillos disponen de mangos y fundas.			X	
	HERRAMIENTAS DE GOLPE	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor.	X			
2	Sus caras y bordes están en buen estado.	X			
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo.	X			
	HERRAMIENTAS DE TORSIÓN-LLAVES	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas.			X	
2	Se observan en la llave huellas y palancas.			X	
3	Se dispone de llaves para golpear.			X	
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas.			X	
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente.			X	
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado.			X	
7	Se dispone de herramientas que no producen chispas.			X	
	HERRAMIENTAS ELÉCTRICA	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Las herramientas según las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores).	X			
2	Se emplean los EPP's de acuerdo con la herramienta empleada	X			
3	Están limpias y lubricadas.	X			
4	Tiene sus guardas.	X			
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X			
6	El cable o enchufe no presentan daños.	X			
7	En los taladros se observa el mandil con golpes.	X			

Powered by CamScanner

8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños.			X	
9	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeadas.	X			
HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS		**CUMPLE**		**N/A**	**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**		
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado.			X	
2	Se emplean EPP's de acuerdo con la herramienta empleada.			X	
3	Se trabaja a las presiones indicadas.			X	
4	La herramienta es descargada al terminar.			X	
HERRAMIENTAS POR DOTACIÓN		**CUMPLE**		**N/A**	**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**		
1	El personal es autorizado.	X			
2	Emplean los EPP's	X			
3	Es descargada y almacenada	X			
4	Su sistema de disparo es bajo presión			X	
OTROS: ¿CUÁLES? _____		**CUMPLE**		**N/A**	**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**		
ACCIONES DE MEJORA :					

Edgardo Roa
FIRMA ALMACENISTA

Mario Cardenas
FIRMA INSPECTOR HSEQ

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-019
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES, ELECTRICAS Y NEUMATICAS	

CONTRATISTA: UT. Inge Policia — AREA A INSPECCIONAR: Almacen.

ACTIVIDAD: Construccion Alojamiento — FECHA: 13-01-25 HORA: 9:10 am

	HERRAMIENTAS MANUALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Se usa adecuada al trabajo	✓			
2	Se encuentra en buen estado	✓			
3	Se guardan y portan adecuadamente	✓			
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓			
5	Se usan prensas de banco para sujetarlas.		✓		
	HERRAMIENTAS DE CORTE	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo.	✓			
2	Los cinceles se encuentran afiliados.	✓			
3	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias.	✓			
4	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos.	✓			
5	Los cuchillos disponen de mangos y fundas.			✓	
	HERRAMIENTAS DE GOLPE	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor.	✓			
2	Sus caras y bordes están en buen estado.	✓			
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo.	✓			
	HERRAMIENTAS DE TORSIÓN-LLAVES	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas.			✓	
2	Se observan en la llave huellas y palancas.			✓	
3	Se dispone de llaves para golpear.			✓	
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas.			✓	
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente.			✓	
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado.			✓	
7	Se dispone de herramientas que no producen chispas.			✓	
	HERRAMIENTAS ELÉCTRICA	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Las herramientas según las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores).	✓			
2	Se emplean los EPP's de acuerdo con la herramienta empleada	✓			
3	Están limpias y lubricadas.	✓			
4	Tiene sus guardas.	✓			
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	✓			
6	El cable o enchufe no presentan daños.	✓			
7	En los taladros se observa el mandil con golpes.	✓			

Powered by CamScanner

8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños.			✓	
9	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeadas.	✓			
HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS		**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado.			✓	
2	Se emplean EPP's de acuerdo con la herramienta empleada.			✓	
3	Se trabaja a las presiones indicadas.			✓	
4	La herramienta es descargada al terminar.			✓	
HERRAMIENTAS POR DOTACIÓN		**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	El personal es autorizado.			✓	
2	Emplean los EPP's			✓	
3	Es descargada y almacenada			✓	
4	Su sistema de disparo es bajo presión			✓	
OTROS: ¿CUÁLES? _____		**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**

ACCIONES DE MEJORA :

FIRMA ALMACENISTA

Mdira Cardenas
FIRMA INSPECTOR HSEQ

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-019
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES, ELECTRICAS Y NEUMATICAS	

CONTRATISTA: UT. Inge Policía — AREA A INSPECCIONAR: Obra.

ACTIVIDAD: Construcción Alojamiento — FECHA 24/04/26 HORA: 8:00 a.m.

	HERRAMIENTAS MANUALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Se usa adecuada al trabajo	✓			
2	Se encuentra en buen estado	✓			
3	Se guardan y portan adecuadamente	✓			
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	✓			
5	Se usan prensas de banco para sujetarlas.	✓			
	HERRAMIENTAS DE CORTE	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo.	✓			
2	Los cinceles se encuentran afiliados.	✓			
3	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias.	✓			
4	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos.	✓			
5	Los cuchillos disponen de mangos y fundas.			✓	
	HERRAMIENTAS DE GOLPE	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor.	✓			
2	Sus caras y bordes están en buen estado.	✓			
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo.	✓			
	HERRAMIENTAS DE TORSIÓN-LLAVES	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas.		✓		
2	Se observan en la llave huellas y palancas.		✓		
3	Se dispone de llaves para golpear.			✓	
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas.			✓	
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado según el trabajo y son probadas frecuentemente.			✓	
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado.			✓	
7	Se dispone de herramientas que no producen chispas.			✓	
	HERRAMIENTAS ELÉCTRICA	**CUMPLE SI**	**CUMPLE NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
1	Las herramientas según las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores).	✓			
2	Se emplean los EPP's de acuerdo con la herramienta empleada	✓			
3	Están limpias y lubricadas.	✓			
4	Tiene sus guardas.	✓			
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	✓			
6	El cable o enchufe no presentan daños.	✓			
7	En los taladros se observa el mandil con golpes.			✓	

Powered by CamScanner

8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños.			✓	
9	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeadas.	✓			
HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS		**CUMPLE**		**N/A**	**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**		
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado.			✓	
2	Se emplean EPP's de acuerdo con la herramienta empleada.			✓	
3	Se trabaja a las presiones indicadas.			✓	
4	La herramienta es descargada al terminar.			✓	
HERRAMIENTAS POR DOTACIÓN		**CUMPLE**		**N/A**	**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**		
1	El personal es autorizado.			✓	
2	Emplean los EPP's			✓	
3	Es descargada y almacenada			✓	
4	Su sistema de disparo es bajo presión			✓	
OTROS: ¿CUÁLES?		**CUMPLE**		**N/A**	**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**		
ACCIONES DE MEJORA :					

FIRMA ALMACENISTA

FIRMA INSPECTOR HSEQ

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-016	
	Versión: 0	
	Fecha: 18/12/2025	

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

ORDEN	No. DE EXTINTOR	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA		UBICACIÓN	CONDICIONES DEL EXTINTOR															
				ACT.	PROX.		PRESION		SELLO/ GARANTÍA		MANOMETRO		RECIPIENTE		MANIJA		MANGUERA		PINTURA		SEÑALIZACION / DEMARCACIÓN	
							B	M	S	N	B	M	B	M	B	M	B	M	S	N	S	N
1	#1	Multiproposito	10L	X		Corredor	X		X		X		X		X		N/A.		X		X	
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						

No.	RESUMEN ESTADO DE EXTINTORES Y/O GABINETES CONTRA INCENDIOS	ACCIONES A SEGUIR	RESPONSABLE	FECHA	
				INICIO	FIN
1	Se encuentra en optimas condiciones para su uso.	/	Yenli Lozano	27/01/26	27/01/26
2	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/
4					

CONVENCIONES:

B: BIEN S: SI
M: MAL N:NO

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Código: TP-HSEQ-FOR-011
Versión: 0
Fecha: 18/12/2025

ENTREGA DE EPP

EL PERSONAL RELACIONADO A CONTINUACIÓN SE COMPROMETE A:

"DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.I Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.I UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR. ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS DISEÑADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO, EXHONERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA COMPAÑIA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD. LOS EPP ESTÁN BAJO MI RESPONSA CUIDADO Y SU USO SERÁ EXCLUSIVAMENTE PARA LAS LABORES PROPIAS A LOS QUE SON DESTINADOS. LA ENTREGA DE LOS MISMOS SE REALIZARÁ ACORDE CON M S FUNCIONES Y SOLAMENTE EN CASO DE SER NECESARIO. EN CASO DE PÉRDIDA O DETERIORO EQUIPOS YA NOMBRADOS, NOTIFICARÉ A LA EMPRESA O A LA PERSONA ENCARGADA DE LA ENTREGA DE DICHOS EQUIPOS".

RESPONSABLE Unon Tembal Inge **FECHA:** Abril 2026.

No.	NOMBRE TRABAJADOR	CÉDULA	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL										FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACIONES
				GAFAS	CASCO	GUANTES	BOTAS	TAPONES	TAPABOCA	LIMPIABARRO	ARNES	DOTACION	OTRO		
1	Oscar Alberto P	86055[illegible]	Maestro	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	Oscar Alberto P.	Vaqueta
2	Jhon Rodriguez	1124499783	Ay.	—	—	X	—	—	X	—	—	—	—	Jhon R.	Reasig.
3	Jeison Martin Bolivar	1125544[illegible]	Ay.	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	Reasig.
4	[illegible]	[illegible]	Oficial	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	Vaqueta.
5	Agustin Agudelo	86008[illegible]	Ay.	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	Vaqueta
6	Agustin Agudelo	86008[illegible]	Ay.	—	—	—	—	—	X	—	—	—	—	[illegible]	—
7	[illegible]	93572770	Oficial	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	Caucho.
8	[illegible]	93572770	Oficial	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	Botas caucho
9	Fabian Ibarra	1124[illegible]	Ay.	—	—	X	—	X	—	—	—	—	—	Fabian Ibarra	Reasig.
10	[illegible]	[illegible]	Ay.	X	—	—	—	—	X	—	—	—	—	[illegible]	—
11	Agustin Agudelo	86008[illegible]	Ay.	—	—	X	—	—	X	—	—	—	—	Agustin	Ext.
12	Oscar Alberto P.	86055[illegible]	Maestro	—	—	X	—	—	X	—	—	—	—	Oscar Alberto P.	Reasig.
13	Fabian Ibarra	1124[illegible]	Arquitecto	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	Fabian Ibarra	
14	Jeison Martin Bolivar	1125544[illegible]	Ay.	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	Vaqueta.
15	Yesid Gallindo	[illegible]	Ay	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	Vaqueta
16	Jeison Martin Bolivar	1125544[illegible]	Ay.	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	Vaqueta
17	Yicmar G	8101250	My.	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	Yicmar G.	Vaqueta

Maira Cardenas
FIRMA INSPECTORA HSEQ

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Código: TP-HSEQ-FOR-011
Versión: 0
Fecha: 18/12/2025

ENTREGA DE EPP

EL PERSONAL RELACIONADO A CONTINUACIÓN SE COMPROMETE A:

"DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.I Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.I UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR, ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS S DISEÑADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO, EXHONERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA COMPAÑÍA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD. LOS EPP ESTAN BAJO MI RESPONSABILI CUIDADO Y SU USO SERÁ EXCLUSIVAMENTE PARA LAS LABORES PROPIAS A LOS QUE SON DESTINADOS. LA ENTREGA DE LOS MISMOS SE REALIZARÁ ACORDE CON M S FUNCIONES Y SOLAMENTE EN CASO DE SER NECESARIO. EN CASO DE PERDIDA O DETERIORO D EQUIPOS YA NOMBRADOS, NOTIFICARÉ A LA EMPRESA O A LA PERSONA ENCARGADA DE LA ENTREGA DE DICHOS EQUIPOS".

RESPONSABLE Union Temporal Inge I **FECHA:** Abril 2026.

No.	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	ELEMENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL										FIRMA TRABAJADOR	OBSERVACI
				GAFAS	CASCO	GUANTES	BOTAS	TAP OIDOS	TAP BOCAS	IMPERMEABLE	ARNES	DOTACION	OTRO		
1	Alexis Beltran Y.	1124970792	AY	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—		Vaquet
2	HEIDI GALINDO	1006946	AY	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—		Vaquet
3	[illegible]	[illegible]	AY			X	—	—	—	—	—	—	—		[illegible]
4	Adrian Alvarez	1171972198	Ob	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—	Adrian Alvarez	
5	[illegible]	[illegible]	AY	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—		Vaquet
6	[illegible]	[illegible]	AY	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—		[illegible]
7	Alexis DAVILA	1124[illegible]	AY	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Vaquet
8	[illegible]	9537227[illegible]	Oficial	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—		Vaquet
9	Adrian Alvarez	1124227[illegible]	Ayudante	X	—	—	—	—	—	—	—	—	—		[illegible]
10	[illegible]		AY	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—		Vaquet
11	Adrian Alvarez		Ob	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—		Vaquet
12	Juan Martin Bolivar	1135[illegible]	Ob	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—		
13	[illegible]			—	—	X	—	—	—	—	—	—	—		Bojo
14	[illegible]	[illegible]	Ob	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—		Bojo
15	[illegible]	7[illegible]	AY	—	—	X	—	—	—	—	—	—	—		Bojo
16	[illegible]	1124[illegible]	AY	X	—	X	—	—	—	—	—	X	—		Bojo
17								—	—	—	—	—	—	—	Bojo

Maira Cardenas
FIRMA INSPECTORA HSEQ

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-018
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCION DE CONDICIONES INSEGURAS	

FECHA: 8-04-2026 HORA: 9:00 am
ÁREA: Obra construccion Algamietos

No	ASPECTOS A EVALUAR	S	N	NA	CALIFICA A	B	C	OBSERVACIONES
	RIESGO ELECTRICO							
1	Los terminales, cables , tomas ,interruptores, tacos , cajas y acometidas se encuentran buen estado	✓						
2	Los tomacorrientes están identificados según voltaje.	✓						
3	Las cajas de controles eléctricos tienen tapa.	✓						
4	Las cajas de controles y tomacorrientes se encuentran despejadas y señalizadas.	✓						
5	Existe polo a tierra en máquinas y equipos.	✓						
6	Los equipos eléctricos o tomacorrientes están protegidos a proyecciones de agua.	✓						
7	Se realiza inspección y mantenimiento a los cables e instalaciones eléctricas.	✓						
8	Los cables se encuentran entubados o en canaleta.	✓						
	RIESGO LOCATIVO / INSTALACIONES LOCATIVAS							
1	Los pisos y pasillos están libres de materiales innecesarios, cables eléctricos y huecos, que puedan obstruir o dificultar el paso de personas, equipos o materiales.	✓						
2	Se encuentran en orden las herramientas	✓						
3	Se ha demarcado el area de deposito de residuos	✓						
4	Las áreas de circulación peatonal y vehicular se encuentran demarcadas y libres de obstáculos.	✓						
5	Se han recojido al final del trabajo los residuos generados	✓						
6	Fueron dispuestos los residuos en bolsas o canecas	✓						
8	Las areas de trabajo se encuentran demarcadas y señalizadas	✓						
9	Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado	✓						
10	El tipo y numero de extintores existentes son los necesarios para la labor que se realiza.	✓						

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION: Yan Lozano G.

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION : Agudelo

CONVENCIONES: S:SI , N:NO A: Grado de Acción Inmediata
B : Grado de Acción Pronta
C: Grado de Acción Posterior

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-018
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INSPECCION DE CONDICIONES INSEGURAS	

FECHA: 23/04-2026 HORA: 10:00am
ÁREA: Obra construccion Alyamiento.

No	ASPECTOS A EVALUAR	S	N	NA	CALIFICA A	B	C	OBSERVACIONES
	RIESGO ELECTRICO							
1	Los terminales, cables , tomas ,interruptores, tacos , cajas y acometidas se encuentran buen estado	✓						
2	Los tomacorrientes están identificados según voltaje.	✓						
3	Las cajas de controles eléctricos tienen tapa.	✓						
4	Las cajas de controles y tomacorrientes se encuentran despejadas y señalizadas.	✓						
5	Existe polo a tierra en máquinas y equipos.	✓						
6	Los equipos eléctricos o tomacorrientes están protegidos a proyecciones de agua.	✓						
7	Se realiza inspección y mantenimiento a los cables e instalaciones eléctricas.	✓						
8	Los cables se encuentran entubados o en canaleta.	✓						
	RIESGO LOCATIVO / INSTALACIONES LOCATIVAS							
1	Los pisos y pasillos están libres de materiales innecesarios, cables eléctricos y huecos, que puedan obstruir o dificultar el paso de personas, equipos o materiales.	✓						
2	Se encuentran en orden las herramientas	✓						
3	Se ha demarcado el area de deposito de residuos	✓						
4	Las áreas de circulación peatonal y vehicular se encuentran demarcadas y libres de obstáculos.	✓						
5	Se han recojido al final del trabajo los residuos generados	✓						
6	Fueron dispuestos los residuos en bolsas o canecas	✓						
8	Las areas de trabajo se encuentran demarcadas y señalizadas	✓						
9	Las herramientas se mantienen y se guardan limpias y en buen estado	✓						
10	El tipo y numero de extintores existentes son los necesarios para la labor que se realiza.							

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCION : Nohora Cardenas.

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA INSPECCION :

CONVENCIONES: S:SI , N:NO A: Grado de Acción Inmediata
B : Grado de Acción Pronta
C: Grado de Acción Posterior

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-010
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	ENTREGA DOTACIÓN Y EPP	

DATOS PERSONALES

NOMBRES Alexis David

APELLIDOS Bolton Javenape.

IDENTIFICACION 1124990792

CARGO Ayudante de obra

DESCRIPCION DOTACION	TALLA	CANTIDAD	FECHA
Casco Seguridad.		1	20/04/2026
Tapabocas Diseción		1	20/04/2026
Gafas vaqueta.		1	20/04/2026
Gafas oscuros.		1	20/04/2026
Botas de Seguridad	#0.	1	27/04/2026

OBSERVACIONES:

DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.P Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.P UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR. ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DISEÑADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO, EXHONERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD.

ENTREGADO

RECIBIDO

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-010 Versión: 0 Fecha: 18/12/2025
	ENTREGA DOTACIÓN Y EPP	

DATOS PERSONALES

NOMBRES Vicente G.

APELLIDOS Gaitan Gaitan

IDENTIFICACION 8192573

CARGO Ayudante de obra.

DESCRIPCION DOTACION	TALLA	CANTIDAD	FECHA
Casco dielectrico		1	13/04/2026
Guantes Velqueta.		1	13/04/2026
Gafas Oscuras.		1	13/04/2026
Tapaoidos Diversion		1	13/04/2026
Tapabocas		1	13/04/2026
			13

OBSERVACIONES:

DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.P Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.P UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR. ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DISEÑADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO, EXHONERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD.

Mario Cardenas.
ENTREGADO

RECIBIDO

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-010
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	ENTREGA DOTACIÓN Y EPP	

DATOS PERSONALES

NOMBRES Yesid

APELLIDOS Galindo Gaitan

IDENTIFICACION 1006946002

CARGO Ayudante de obra.

DESCRIPCION DOTACION	TALLA	CANTIDAD	FECHA
Gafas oscuras		1	13/04/2026
Tapaoidos Inserción		1	13/04/2026
Guantes Vaqueta		1	13/04/2026
Guantes Precisión		1	13/04/2026
Tapabocas.		1	13/04/2026
Casco. dielectrico		1	13/04/2026

OBSERVACIONES:

DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.P Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.P UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR. ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DISEÑADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO, EXHONERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD.

Mayra Cardenas
ENTREGADO

RECIBIDO

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-010
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	ENTREGA DOTACIÓN Y EPP	

DATOS PERSONALES

NOMBRES Alexis David

APELLIDOS Beltran Yavinepe

IDENTIFICACION 1124990792

CARGO Ayudante de Seguridad.

DESCRIPCION DOTACION	TALLA	CANTIDAD	FECHA
Camibuso Manga larga	M	2	30-09-2026
Pantalón Jeans	32	1	30-09-2026

OBSERVACIONES:

DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.P Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.P UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR. ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DISEÑADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO, EXHONERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD.

ENTREGADO

RECIBIDO 1124990792

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-010
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	ENTREGA DOTACIÓN Y EPP	

DATOS PERSONALES

NOMBRES Vicente

APELLIDOS Gaitan Gaitan

IDENTIFICACION 8192573

CARGO Ayudante de obra.

DESCRIPCION DOTACION	TALLA	CANTIDAD	FECHA
Camiboso Manga larga	M	2	30-04-2026
Pantalon Jeans	32	1	30-04-2026
Bota de Seguridad	40	1.	30-04-2026

OBSERVACIONES:

DECLARO HABER RECIBIDO LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL USO Y CUIDADO DE E.P.P Y ME COMPROMETO CON LA EMPRESA A USAR LOS CITADOS E.P.P UNA VEZ INGRESE AL PUESTO DE TRABAJO A LABORAR. ENTENDIENDO QUE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS SON DISEÑADOS PARA MI PROTECCIÓN Y DEBO CUIDARLOS Y USARLOS DIARIAMENTE EN CASO DE NO USARLO, EXHONERO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA EMPRESA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENEREN EN MI SALUD.

ENTREGADO

RECIBIDO

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-009
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INDUCCIÓN A PERSONAL	

NOMBRE	Alexis David Beltran Yanimape	CARGO	Ayudante de Obra
AREA	Palacio Estacion Policia.	FECHA	20-04-2026.

TEMA DE INDUCCIÓN	CHECK	INDUCCIÓN	X	REINDUCCIÓN	

INDUCCIÓN GENERAL

Misión	5
Visión	5
Reglamento Interno	5
Horarios de trabajo	5
Organigrama	4
Conducto regular	4

Firma Personal Nuevo — Mayra Cardenas, Firma Facilitador

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Peligros a los que esta expuesto	5
Procedimiento en un accidente trabajo	4
Programas de SST	4
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	5
Fichas de seguridad msds	5

Firma Personal Nuevo — Mayra Cardenas, Firma Facilitador

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

Política de Gestión Integral	5
Objetivos de Gestión Integral	4
Información Documentada Aplicable	4
Acciones correctivas y de mejora	5
Responsable de PQR	5

Firma Personal Nuevo — Mayra Cardenas, Firma Facilitador

PUESTO DE TRABAJO

Funciones del cargo	4
Lugar de trabajo	5
Conducto regular	5
Procedimientos internos	5
Registros	5
Otros:	

Firma Personal Nuevo — Mayra Cardenas, Firma Facilitador

GESTION AMBIENTAL

Aspectos ambientales significativos	5
Programa de Gestión Ambiental	4
Plan de emergencias	5
Procedimiento de Ident. Aspectos e Impactos Amb.	5

Firma Personal Nuevo — Mayra Cardenas, Firma Facilitador

Con el objeto de conocer sus opiniones respecto a la inducción que acaba de finalizar y detectar oportunidades de mejora, agradecemos su colaboración diligenciando el siguiente cuestionario. A continuación encontrará una serie de ítems que deben ser calificados de acuerdo a la siguiente escala de valores:

1-Mínimo 2 Deficiente 3. Regular 4.Bueno 6. Excelente

1	En que manera respondió la inducción a sus expectativa	1	2	3	4	5
2	Cómo considera los temas tratados en la inducción para dar inicio a las labores.	1	2	3	4	5
3	En que grado se cumplió el objetivo propuesto	1	2	3	4	5
4	De que manera se difundieron y entendieron las directrices generales de la empresa	1	2	3	4	5
5	Cómo es el manejo de los temas por parte de la persona que impartió la inducción	1	2	3	4	5

Aprobado por
Ingrid Maryori Garcia Fonseca
Representante legal

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-009
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INDUCCIÓN A PERSONAL	

NOMBRE	Yesid Galindo Gaitan	CARGO	Ayudante obra
AREA	Instalacion Estacion Policia.	FECHA	13/01/2026

TEMA DE INDUCCIÓN	CHECK	INDUCCIÓN	X	REINDUCCIÓN	

INDUCCIÓN GENERAL

Misión	5
Visión	5
Reglamento Interno	5
Horarios de trabajo	5
Organigrama	5
Conducto regular	5

Firma Personal Nuevo — Firma Facilitador: maira Cardenas

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Peligros a los que esta expuesto	4
Procedimiento en un accidente trabajo	5
Programas de SST	5
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	4
Fichas de seguridad msds	5

Firma Personal Nuevo — Firma Facilitador: maira Cardenas

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

Política de Gestión Integral	5
Objetivos de Gestión Integral	4
Información Documentada Aplicable	5
Acciones correctivas y de mejora	4
Responsable de PQR	5

Firma Personal Nuevo — Firma Facilitador: maira Cardenas

PUESTO DE TRABAJO

Funciones del cargo	5
Lugar de trabajo	4
Conducto regular	5
Procedimientos internos	4
Registros	5
Otros:	

Firma Personal Nuevo — Firma Facilitador: maira Cardenas

GESTION AMBIENTAL

Aspectos ambientaes significativos	5
Programa de Gestión Ambiental	5
Plan de emergencias	5
Procedimiento de Ident. Aspectos e Impactos Amb.	5

Firma Personal Nuevo — Firma Facilitador: maira Cardenas

Con el objeto de conocer sus opiniones respecto a la inducción que acaba de finalizar y detectar oportunidades de mejora, agradecemos su colaboración diligenciando el siguiente cuestionario. A continuación encontrará una serie de items que deben ser calificados de acuerdo a la siguiente escala de valores:

1-Mínimo **2 Deficiente** **3. Regular** **4.Bueno** **5. Excelente**

1	En que manera respondió la inducción a sus expectativa	1	2	3	4	5
2	Cómo considera los temas tratados en la inducción para dar inicio a las labores.	1	2	3	4	5
3	En que grado se cumplió el objetivo propuesto	1	2	3	4	5
4	De que manera se difundieron y entendieron las directrices generales de la empresa.	1	2	3	4	5
5	Cómo es el manejo de los temas por parte de la persona que impartió la inducción	1	2	3	4	5

Aprobado por		
Ingrid Maryori Garcia Fonseca		
Representante legal		

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-009
		Versión: 0
		Fecha: 18/12/2025
	INDUCCIÓN A PERSONAL	

NOMBRE	Vicente Gaitan Gaitan	CARGO	Ayudante obra.
AREA	Instalacion Estacion de Policia.	FECHA	13/04/2026

TEMA DE INDUCCIÓN	CHECK	INDUCCIÓN	CHECK	REINDUCCIÓN
			X	

INDUCCIÓN GENERAL

Misión	5
Visión	5
Reglamento Interno	5
Horarios de trabajo	5
Organigrama	5
Conducto regular	5

Firma Personal Nuevo — Firma Facilitador: moira cadenas

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Peligros a los que esta expuesto	5
Procedimiento en un accidente trabajo	5
Programas de SST	5
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	5
Fichas de seguridad msds	5

Firma Personal Nuevo — Firma Facilitador: moira cadenas

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

Política de Gestión Integral	4
Objetivos de Gestión Integral	4
Información Documentada Aplicable	4
Acciones correctivas y de mejora	5
Responsable de PQR	4

Firma Personal Nuevo — Firma Facilitador: moira cadenas

PUESTO DE TRABAJO

Funciones del cargo	5
Lugar de trabajo	5
Conducto regular	5
Procedimientos internos	5
Registros	5
Otros:	

Firma Personal Nuevo — Firma Facilitador: moira cadenas

GESTION AMBIENTAL

Aspectos ambientaes significativos	4
Programa de Gestión Ambiental	5
Plan de emergencias	4
Procedimiento de Ident. Aspectos e Impactos Amb.	5

Firma Personal Nuevo — Firma Facilitador: moira cadenas

Con el objeto de conocer sus opiniones respecto a la inducción que acaba de finalizar y detectar oportunidades de mejora, agradecemos su colaboración diligenciando el siguiente cuestionario. A continuación encontrará una serie de ítems que deben ser calificados de acuerdo a la siguiente escala de valores:

1-Mínimo 2 Deficiente 3. Regular 4.Bueno 5. Excelente

1	En que manera respondió la inducción a sus expectativa	1	2	3	4	5
2	Cómo considera los temas tratados en la inducción para dar inicio a las labores.	1	2	3	4	5
3	En que grado se cumplió el objetivo propuesto	1	2	3	4	5
4	De que manera se difundieron y entendieron las directrices generales de la empresa.	1	2	3	4	5
5	Cómo es el manejo de los temas por parte de la persona que impartió la inducción	1	2	3	4	5

Aprobado por
Ingrid Maryori Garcia Fonseca
Representante legal

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Código: TP-HSEQ-FOR-015 Versión: 0 Fecha: 18/12/2025
	MANTENIMIENTO Y EXISTENCIA DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS	

Nombre del que Inspecciona	Mario Cardenas
Cargo	Profesional SST.
Fecha de Inspección	29-04-2026
Ubicación del Botiquín	Campamento.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS*	ESTADO B: Bien M: Mal	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)
CLORURO DE SODIO	Bien	1	oz /2027.
CUELLO ORTOPEDICO	Bien	1	
ALCOHOL ANTISEPTICO	Bien	1	15/10/2026.
MICROPORE	Bien	1	
ALGODÓN	Bien	1	
VENDA ELASTICA 2"X5M	Bien	1	oct /2029
SUERO ORAL	Bien	2	05 /2026
TOALLAS HIGIENICAS	Bien	1 P.	7/2027.
TAPABOCAS	Bien	9	
AGUA	Bien	0	
CONDONES	Bien	1	09/2028
GASA ESTERIL	Bien	3	27/12/01.
BAJA LENGUAS	Bien	20	.
GUANTES	Bien	3 P.	N/A
PITO	Bien	1	
BISTURI	Bien	1	N/A
LIBRO DE PRIMEROS AUXILIOS	Bien	1	N/A.
CAMILLA	Bien	1	N/A.

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner


UNIÓN TEMPORAL
INGE
POLICIA
GAITÁN

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

CALLE 2 No 27 – 116 Villavicencio – Meta
Tel. 310 888 54 20

MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
Alcaldía Municipal

CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"

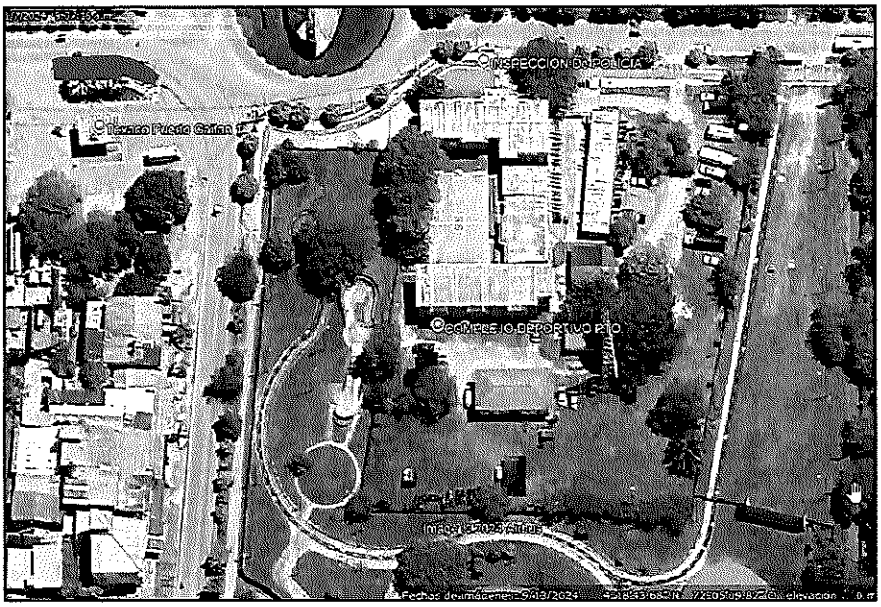

INFORME AMBIENTAL No. 5
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

FECHA DEL INFORME
ABRIL DE 2026

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN
INTERVENTORÍA: UNIÓN TEMPORAL INTER POLICIA 2025
SUPERVISIÓN: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÍBLICA

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 4

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5

4. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN 7

5. GESTIÓN DOCUMENTAL AMBIENTAL 7

6. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PMA 7

6.1 FICHA 1. PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 8

6.2 FICHA 2. PROGRAMA CONTROL DE RUIDO. 13

6.3 FICHA 3. PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DEL AGUA 13

6.4 FICHA 4. PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 14

6.5 FICHA 5. PROGRAMA zMANEJO DE MAQUINARÍA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 15

6.6 FICHA 6. PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE PAISAJE, FLORA Y FAUNA ... 16

6.7 FICHA 7. PROGRAMA MANEJO Y USO INTERNO DE INSUMOS Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 16

7 COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES ... 17

8 ANEXOS 18

1. INTRODUCCIÓN

El municipio de Puerto Gaitán mediante contrato de obra 1683 DE 2025, adjudica a UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA con Nit No. 902.011.453-2, representado legalmente por INGRID MARYORI GARCÍA FONSECA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.121.837.768, el contrato que tiene por objeto: "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META".

En el presente informe ambiental de obra No. 5 se describen las actividades desarrolladas por la UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA en el periodo comprendido entre el **01 AL 30 DE ABRIL DE 2026** de acuerdo con las obligaciones contractuales.

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

CONTRATISTA DE OBRA	UNION TEMPORAL INGE POLICÍA GAITAN
NIT No.	902.011.453-2
REPRESENTANTE LEGAL	INGRID MARYORI GARCÍA FONSECA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.121.837.768
NÚMERO DE CONTRATO	1683 del 2025
OBJETO	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META
VALOR	$4.306.277.668,00
PLAZO	OCHO (08) MESES

INTERVENTORÍA	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
NIT No.	902.014.419-5
REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
NÚMERO DE CONTRATO	1701 DE 2025
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META".
VALOR	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS ($296.313.094) M/CTE
PLAZO	OCHO (08) MESES


3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

3.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	PUERTO GAITÁN	**CÓDIGO DANE:**	50568
EXTENSIÓN TOTAL:	17.499 km^2	**ALTITUD:**	149 msnm
LIMITES:	**NORTE:** El río Meta y el departamento del Casanare. **ORIENTE:** Departamento del Vichada. **OCCIDENTE:** Río Manacacías y municipios de Puerto López y San Martín. **SUR:** Municipios de Mapiripan y San Martín.		

Puerto Gaitán es un municipio del departamento del Meta fundado el 11 de febrero de 1.932, cuando llegaron a la orilla del rio Manacacias los comerciantes Venezolanos: Pedro Capella, Ventura Alvarado y Concepción Izanoboco, allí se instalaron ante el anuncio de la dotación de un ferry o trasbordador del rio Manacacias para lograr el tránsito entre Puerto Carreño y Villavicencio. En este primer punto se encontraba el árbol "Majaguillo" de ahí surge el nombre Majaguillal, hasta el año 1.960 cuando se le dio entidad como Inspección de Policía del municipio de Puerto López y se llamó Manacacias. El 29 de noviembre de 1969 se acordó la ordenanza 039 en la Asamblea Departamental del Meta, por la cual se erigió el municipio con el nombre de Puerto Gaitán, en honor al caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán. Esta ordenanza indico que a partir del primero de 1 de enero de 1.970 funcionaria como municipio.

Imagen 1. Ubicación del municipio de Puerto Gaitán.

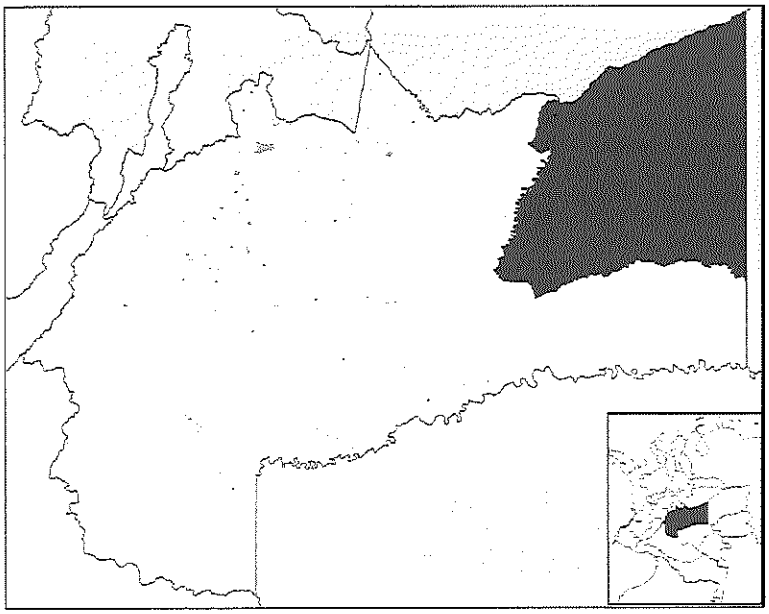

El contrato No. 1683 del 2025 con el objeto: "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META", se ejecutará por parte del contratista de obra UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN en las instalaciones de la Estación Policía del municipio.

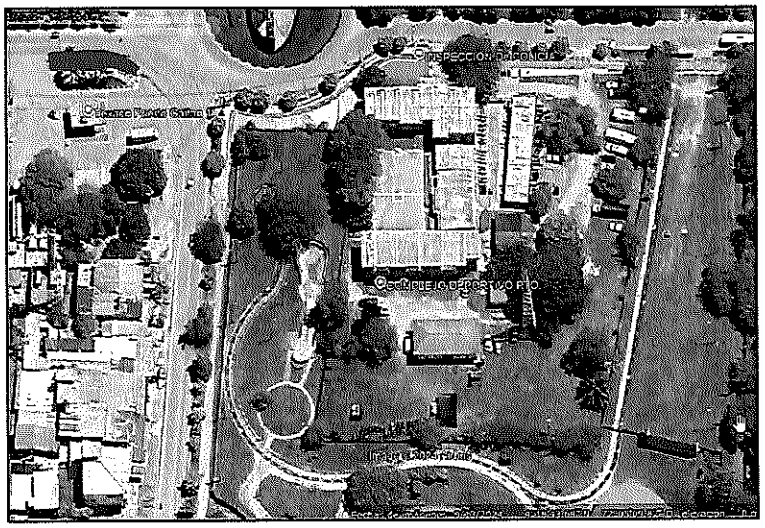


Imagen 2. Ubicación del proyecto.

4. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN

Las dificultades ambientales encontradas en el QUINTO MES correspondiente a ABRIL DE 2026 obedecen a:

Entrega oportuna de residuos no aprovechables en Perla del Manacacias.

MECANISMOS DE SOLUCIÓN

Validar con la empresa de servicios públicos Perla del Manacacias los horarios establecidos para la entrega de residuos sólidos no aprovechables en el municipio de Puerto Gaitán.

5. GESTIÓN DOCUMENTAL AMBIENTAL

No aplica para el presente mes.

6. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – PMA

PROGRAMAS DEL PMA
1. Programa Manejo Integral de Residuos Sólidos.
2. Programa Control de Ruido.
3. Programa Manejo Integral del Agua.
4. Programa Uso Eficiente de la Energía.
5. Programa Manejo de Maquinaria, Equipos y vehículos.
6. Programa Manejo Integral de Paisaje, Flora y Fauna.
7. Programa Manejo y Uso Interno de Insumos y Materiales de Construcción.

El proyecto contempla un grupo de gestión ambiental conformado por los siguientes profesionales:

NOMBRE	CARGO
Gonzalo Becerra Mejía	Director de Obra
Jennifer Andrea Becerra	Residente de Obra
Jenny Paola Feria Triana	Ingeniera Ambiental

Durante el período del 01 al 30 de abril de 2026, se contó con la presencia de los tres (03) integrantes del grupo de gestión ambiental, los cuales están siempre dispuestos para coordinar reuniones de seguimiento con interventoría, con el fin de validar el avance y cumplimiento de las actividades descritas en el PMA.

El contratista de obra para el período en mención, realizó las siguientes sensibilizaciones:

No.	TEMÁTICA	CUMPLE	FECHA	TOTAL ASISTENTES
1	Emisiones de CO_2	SI	08/04/2026	9
2	Día de la tierra	SI	22/04/2026	10

Los soportes documentales de las sensibilizaciones ambientales se encuentran en el anexo No. 1.

6.1 FICHA 1. PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Manejo de residuos sólidos convencionales

En el período del 01 al 30 de abril de 2026 se contó con UN (01) punto ecológico en el frente de obra y un sitio de almacenamiento temporal para el manejo integral de residuos sólidos generados en el proyecto, así:

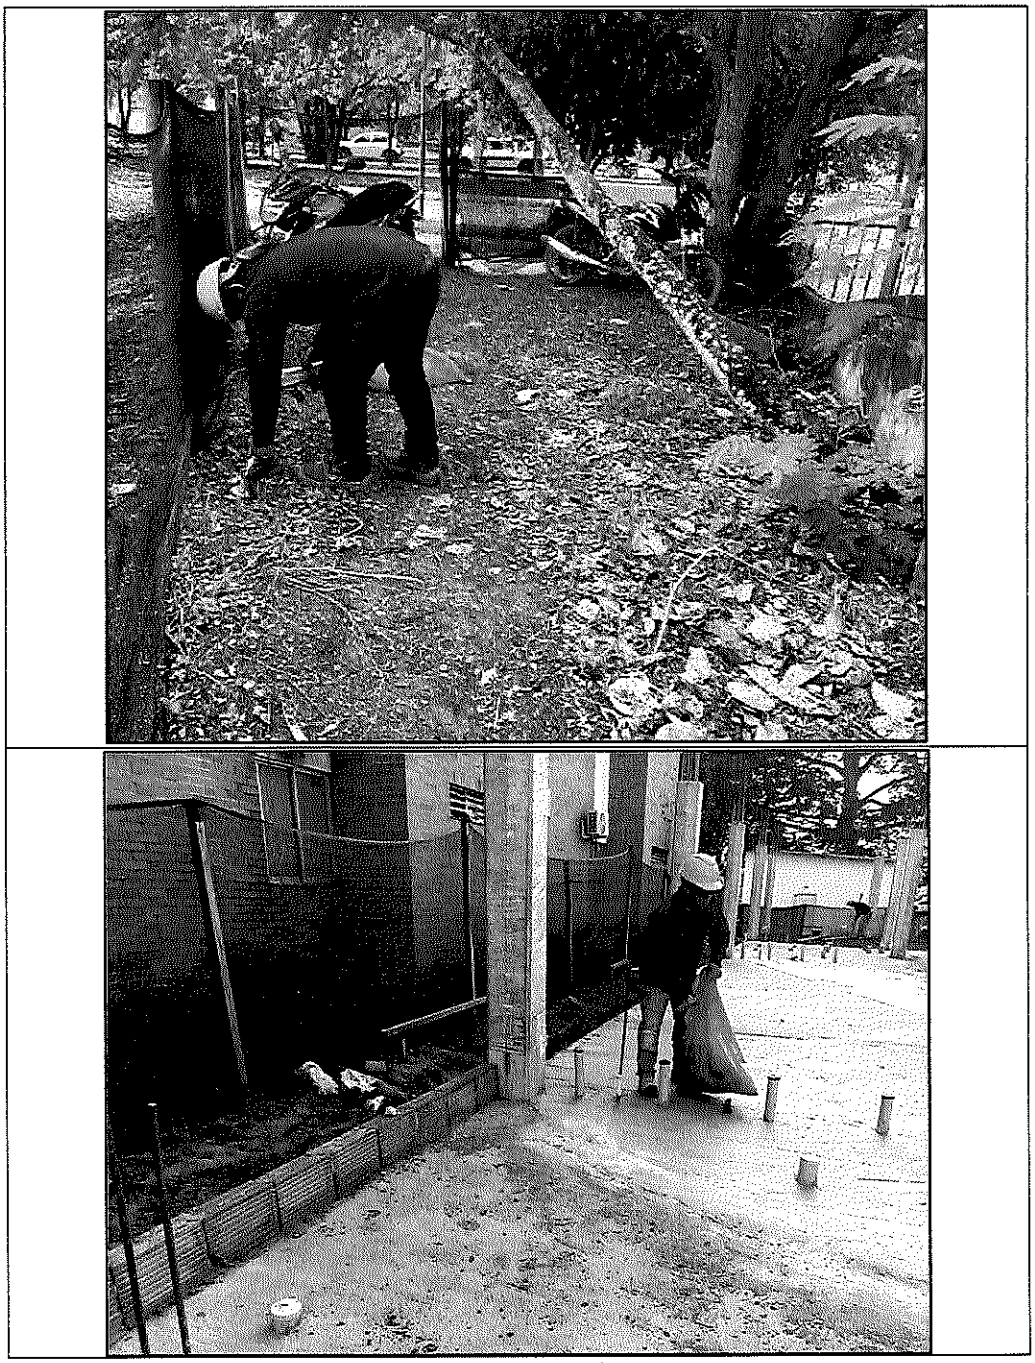


Foto 1. Evidencia de punto ecológico en obra.



Foto 2. Sitio de acopio temporal de residuos sólidos.

En el transcurso del período se realizaron jornadas de orden y aseo en los frentes de obra activos, así:



Fotos 3 y 4. Jornada de recolección de residuos en obra.

Durante el mes de abril de 2026 UT INGE POLICIA GAITÁN generó los residuos sólidos ordinarios relacionados a continuación:

MES	TIPO DE RESIDUOS	CANTIDAD
ABRIL/2026	NO APROVECHABLES	25 KG

A continuación, se relaciona el consolidado de residuos sólidos hasta la fecha:

MES	TIPO DE RESIDUOS	CANTIDAD
ENERO/2026	NO APROVECHABLES	3 KG
FEBRERO/2026	NO APROVECHABLES	3 KG
MARZO/2026	NO APROVECHABLES	4 KG
ABRIL/2026	NO APROVECHABLES	25 KG
TOTAL RESIDUOS INGE POLICIA GAITÁN		**35 KG**

Durante el mes de abril/2026 la empresa PERLA DEL MANACACIAS tuvo varios inconvenientes con los camiones de recolección. Por tal razón, los 25 kg generados por el contratista de obra durante el mes fueron almacenados en el sitio de acopio temporal de residuos no aprovechables.



Foto 5. Sitio de acopio temporal de residuos sólidos no aprovechables.

Manejo de residuos sólidos peligrosos

Durante el período del 01 al 30 de abril de 2026, las bolsas de cemento se continúan acopiando en el frente de obra y posteriormente son trasladas al sitio de acopio temporal en bolsas rojas. Se indica que se contactará con empresa del sector encargada de realizar la disposición final de RESPEL con todos los permisos ambientales vigentes ante la autoridad ambiental CORMACARENA.



Foto 6. Almacenamiento temporal de RESPEL en obra.

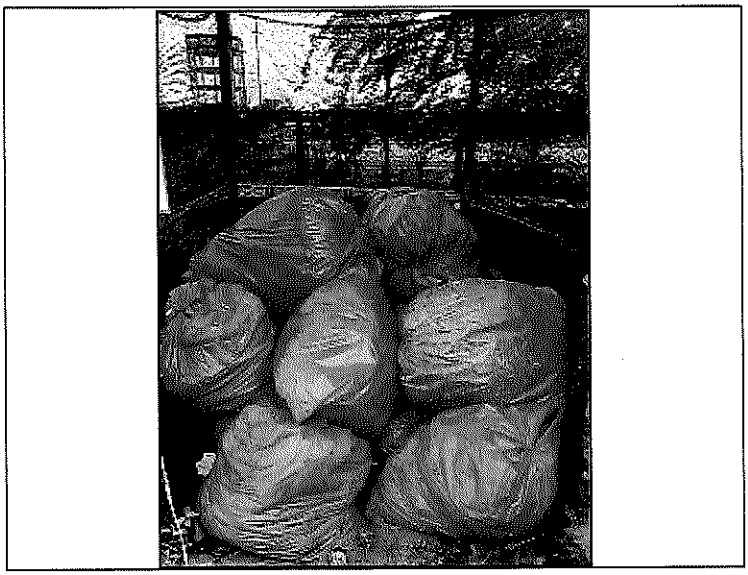


Foto 7. Almacenamiento en sitio de acopio temporal de residuos.

6.2 FICHA 2. PROGRAMA CONTROL DE RUIDO.

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2026 se contó con la siguiente maquinaría:

ITEM	MAQUINARIA-VEHICULO-HTA-EQUIPOS	CANT (UND)
1	PULIDORA 7"1/2 y 4 1/2	2
2	MEZCLADORA	1
3	PLANTA ELECTRICA	1
4	VOLQUETA	1

En el mes de abril de 2026 el área SST inspeccionó previamente la maquinaria empleada en el proyecto, verificando el estado mecánico, operatividad de los sistemas de seguridad y el cumplimiento de las recomendaciones técnicas del fabricante. Así mismo, se validó que los operadores contaran con la formación, experiencia y autorización correspondiente para la operación de los equipos.

Se indica que todos los equipos empleados en obra durante el período en mención diligenciaron sus preoperacionales con la periodicidad requerida por el área SST de obra e interventoría.

La volqueta solo funcionó en los horarios establecidos por obra y aprobados por interventoría, esto con el fin de mitigar los decibeles generados en la operación diaria.

6.3 FICHA 3. PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DEL AGUA

Uso del agua para obra

Durante el período del 01 al 30 de abril de 2026 UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN utilizó temporalmente el agua de la Estación de Policía para la siguiente actividad:

- Fundición de la placa de contrapiso en concreto impermeabilizado.

Agua Potable

En el mes de abril de 2026 la empresa NEBLINAS AGUA PURA continúa prestando el servicio de suministro de agua potable a los trabajadores en obra.

Unidad sanitaria

Durante el período en mención se contó con la siguiente unidad sanitaria en obra, así:

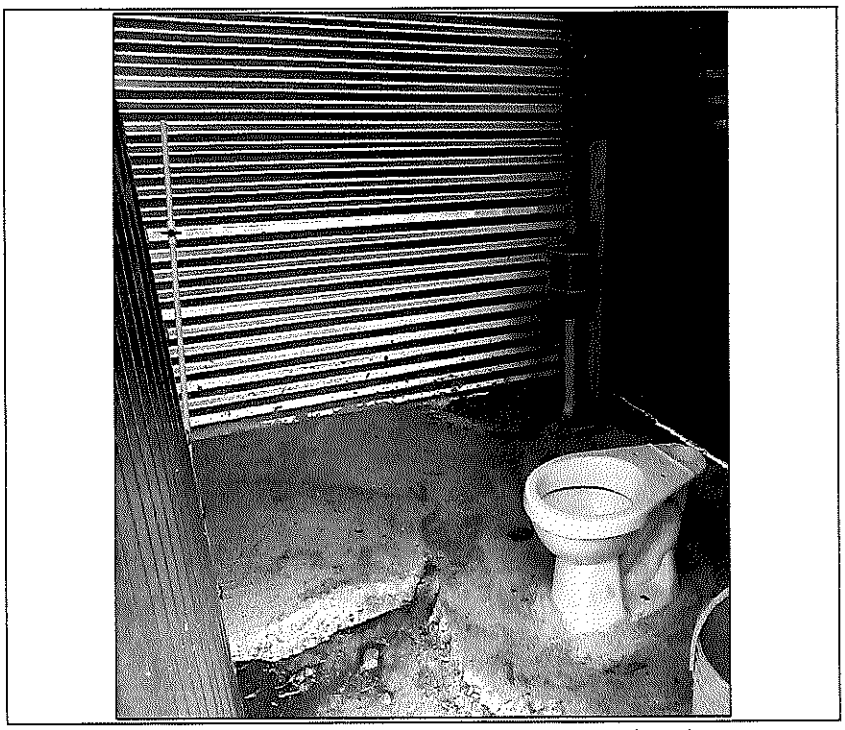


Foto 8. Unidad sanitaria en el frente de obra.

6.4 FICHA 4. PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Durante el mes de abril de 2026 se utilizó el suministro de energía de la Estación de Policía de Puerto Gaitán. Solo en casos de emergencia se utilizó la planta eléctrica en el frente de obra, la cual funciona con ACPM.



Foto 9. Planta eléctrica para emergencias.

Dicha planta fue inspeccionada por UT INGE POLICÍA GAITÁN y aprobaba por la interventoría.

6.5 FICHA 5. PROGRAMA MANEJO DE MAQUINARÍA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

En el período del 01 al 30 de abril de 2026 UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN contó con el siguiente equipo y maquinaría en obra:

ITEM	MAQUINARIA-VEHICULO-HTA-EQUIPOS	CANT (UND)
1	PULIDORA 7"1/2 y 4 1/2	2
2	MEZCLADORA	1
3	PLANTA ELECTRICA	1
4	VOLQUETA	1

TIPO DE EQUIPO	MARCA	MODELO	AÑO	USO EN OBRA
Volqueta	Dodge	D 600	1971	Transporte de material

La documentación se encuentra al día tanto de la maquinaría como de los operadores, lo cual se reporta en el informe SST de abril de 2026.

6.6 FICHA 6. PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE PAISAJE, FLORA Y FAUNA

En el mes de abril de 2026 no hubo intervención de individuos arbóreos en el frente de obra. Así mismo, no hubo avistamiento de fauna.

6.7 FICHA 7. PROGRAMA MANEJO Y USO INTERNO DE INSUMOS Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

Durante el período del 01 al 30 de abril de 2026 se contó con un campamento en obra, incluyendo una bodega, con el fin de garantizar el almacenamiento de materiales de construcción e insumos.



Foto 10. Evidencia de campamento en el frente de obra.

7 COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

En el período del 01 al 30 de abril de 2026 no hubo intervención de fauna y flora.

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN cumplió con los programas del Plan de Manejo Ambiental durante el mes de abril de 2026.

El contratista de obra realizó dos (02) capacitaciones ambientales con el personal de obra y la asistencia de nueve (09) y diez (10) personas entre profesionales y auxiliares de UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN.

Durante el mes de abril de 2026 se realizaron jornada de orden y aseo semanales en los frentes de obra activos y se contó con UN (01) punto ecológico en el frente de obra. Así mismo, se ejecutó con UN (01) sitio de acopio temporal de residuos sólidos.


El contratista de obra durante el período en mención generó 25 kg de residuos sólidos no aprovechables, los cuales fueron almacenados en el sitio de acopio temporal de obra.

Durante el período del 01 al 30 de abril de 2026 se contó con una unidad sanitaria en obra.

Jenny Feria

JENNY PAOLA FERIA TRIANA
Ingeniera Ambiental
Mat. Prof. 25238-229802 CND
UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN

JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
Residente de Obra
M.P: A71052012 – 1121852433
UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN



8 ANEXOS

- Anexo 1. Capacitaciones ambientales.

ANEXO 1. CAPACITACIONES AMBIENTALES ABRIL 2026

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	REGISTRO DE ASISTENCIA Y EVALUACION	FORMATO		
		VERSIÓN	CODIGO	PÁGINAS
	FECHA DE ELABORACIÓN: 1-DIC-2025	01	GA-	Página 1 de 2

Tema: Emisiones de CO_2	**Fecha**: 08/04/2026
Lugar: Instalaciones Estación de Policía de Puerto Gaitán	**Hora inicio**: 7:00 a.m.
Instructor: Jenny Feria – Residente Ambiental.	**Hora final**: 7:15 a.m.

Objetivo: Socializar con el personal de obra que el sector de la construcción es responsable del 38% al 40% aprox. de las emisiones mundiales de gas carbónico. Estas emisiones no solo ocurren durante la construcción como tal, sino que se dividen principalmente en dos categorías: el carbono incorporado (materiales y construcción) y el carbono operacional (uso de las instalaciones).

FUENTES PRINCIPALES DE EMISIONES EN OBRA

Las emisiones generadas directamente durante el proceso de construcción incluyen:

Fabricación de materiales: El cemento y el acero son los mayores emisores; la producción de una tonelada de cemento genera entre 800 y 900 kg de CO_2.

Maquinaria y equipos: El uso de equipos pesados para movimiento de tierras y vertido de concreto es una de las actividades con mayor impacto directo.

Transporte: El traslado de materias primas y residuos hacia y desde el sitio de obra.

ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN

Materiales biobasados: Uso de madera, paja o cáñamo que actúan como "sumideros" al secuestrar carbono en lugar de emitirlo.

Ejemplo: La capacidad de secuestro de la madera es de alrededor de 1,6 a 1,8 toneladas de CO_2 y se almacenan por cada metro cúbico m^3 de esta.
Impacto comparativo: Sustituir concreto por madera reduce las emisiones de la estructura en un 40%.
Innovación: El uso de madera contralaminada (CLT) permite construir rascacielos que funcionan como bosques verticales de almacenamiento masivo.

Concreto bajo en carbono: Productos como la línea Vertua de Cemex pueden reducir las emisiones de un proyecto hasta en un 40%.

Tipo de evento:

Charla [X] Inducción [ ] Capacitación [ ] Reunión [ ] Divulgación [ ] Otro: _____

ASISTENCIA

Ítem	Nombre	C.C	Cargo	Empresa	Firma
1	Eugenio Feria	93372770	Ing.	UT. Inge Policía	
2	Adrian Suarez	1121918888	Ayudante.	UT Inge Policía	
3	Dagoberto C	21857071	RV	UT. Inge Policía	
4	Agustín Aguilar	86008195	A X	UT. Inge Policía	
5	Juan Martin Bolivar	1125549456	A. Y.	UT. Inge Policía	
6	Yesid Bahamon Gaitan	1006946002	A Y.	UT. Inge Policía	
7	ALEXIS DAVID	1124990992	AN	UT. Inge Policía	

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	REGISTRO DE ASISTENCIA Y EVALUACION	FORMATO		
		VERSIÓN	CODIGO	PÁGINAS
	FECHA DE ELABORACIÓN: 1-DIC-2025	01	GA-	Página 2 de 2

8	Yarli Lozano G	1124867537	Aux. Prof SST	U.T. Inge Policía	
9	Maryie Herrera	1032144136	Aux Residente	Inge Poli	
10					
11					
12					

Se entregó el material de capacitación: SI ☐ **No** ☒ **Cual:**

Se realizo evaluación: SI ☐ **No** ☒

Observaciones:	**Firma del instructor:**
N.A	JENNY FERIA

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN	REGISTRO DE ASISTENCIA Y EVALUACION	FORMATO		
		VERSIÓN	CODIGO	PÁGINAS
	FECHA DE ELABORACIÓN: 1-DIC-2025	01	GA-	Página 1 de 2

Tema: Día de la Tierra	**Fecha**: 22/04/2026
Lugar: Instalaciones Estación de Policía de Puerto Gaitán	**Hora inicio**: 1:00 p.m.
Instructor: Jenny Feria – Residente Ambiental.	**Hora final**: 1:15 p.m.

Objetivo: Concientizar al personal en obra sobre la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra. Se socializó que en el 2009 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución en la cual formalizó el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra, popularmente llamado Día de la Tierra. En el año 2026 el tema principal del día es **"Nuestro poder, nuestro planeta"** y busca inspirar a millones de personas del mundo a unirse en torno a las energías renovables y a triplicar la generación global de electricidad limpia para 2030. Así mismo se informó las maneras de contribuir con las buenas prácticas ambientales, así:

EN TU HOGAR

- Elige productos sin empaque y evita los productos desechables que son de un solo uso.
- Utiliza la lavadora cuando esté completamente llena.
- Apaga la luz cuando no la necesites y utiliza focos ahorradores.
- Abre la puerta del refrigerador lo menos posible y cierra con rapidez. Evitará un gasto inútil de energía.
- No dejes luces encendidas y coloca focos ahorradores.

EN EL TRABAJO

- Utiliza el transporte público o institucional en lugar de tu vehículo privado. Si es privado, comparte con compañero (s) de trabajo.
- Ahorra agua en el proceso constructivo, utiliza estrictamente la necesaria.
- Utiliza el punto ecológico ubicado en los frentes de obra, realiza separación de residuos y recicla.
- Utiliza preferiblemente recipientes de vidrio para empacar tu almuerzo, no utilices icopor ni plásticos de un solo uso para tus alimentos diarios.

Tipo de evento:

Charla [X] Inducción [ ] Capacitación [ ] Reunión [ ] Divulgación [ ] Otro: _____

ASISTENCIA

Item	Nombre	C.C	Cargo	Empresa	Firma
1	Eduardo Roa	93372770	Inf.	UT Inge Policía	
2	Fabian Suarez	1124022268	Ayudante	UT Inge policía	
3	Roberto C	1118570	AY	UT. Inge Policía	Roberto C
4	Agustin Aguilar	86002127	AX	UT. Inge Policía	
5	Ricardo Cait	8192573	A.Y.	UT. Inge Policía	
6	Juan Martin Bolivar	1126547456	A.Y.	UT. Inge Policía	
7	Yesid Calderon Cano	1006916002	AY	UT. Inge Policía	
8	ALEX ISDAVID	1124990992	AN	UT. Inge Policía	
9	Yank Lozano G	1121667534	AX Prof 251	UT Inge Policía	
10	Marque Herrera	1121447336	Ay Residente	UT Inge Policía	
11					

Powered by CamScanner

12					

Se entregó el material de capacitación: Si ☐ **No** ☒ **Cual:**

Se realizo evaluación: Si ☐ **No** ☒

Observaciones:	**Firma del instructor:**
N.A	JENNY FERIA

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL
INGE
POLICIA
GAITÁN

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

CALLE 2 No 27 – 116 Villavicencio – Meta
Tel. 310 888 54 20

PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

INFORME DE SEGUIMIENTO

PERIODO:
01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026

CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"

CONTRATISTA
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
NIT. 902.011.453-2

PUERTO GAITÁN-META

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS 4
2.1. Objetivo general 4
2.2. Objetivos específicos 4
3. GENERALIDADES 5
3.1. Información del contrato de obra 5
3.2. Descripción general de la zona 6
3.3. Localización del proyecto 6
3.3.1. Localización general 6
3.3.2. Localización especifica 7
4. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 7
4.1. Descripción general del proyecto 7
4.2. Descripción de las actividades de obra 8
4.3. Maquinaria y equipos por utilizar 9
5. SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO 9
6. ANÁLISIS FINANCIERO 12
6.1. Presupuesto para el PMT 13
6.2. Actividades ejecutadas para el PMT 15
6.3. Resumen general de ejecución de PMT 18
7. CONCLUSIONES 18

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización general 7
Ilustración 2 Localización Especifica 7

TABLA DE TABLAS

Tabla 1. Información del contrato de obra 6
Tabla 2. Presupuesto para el PMT 14
Tabla 3. Ejecución actividades PMT 15

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como propósito realizar el seguimiento a la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) correspondiente al Contrato de Obra No. 1683 de 2025, cuyo objeto es la "Construcción, adecuación y mejoramiento de la Estación de Policía del municipio de Puerto Gaitán – Meta".

El PMT constituye un instrumento técnico fundamental orientado a prevenir, mitigar y controlar las afectaciones sobre la movilidad vehicular y peatonal que pueden generarse durante la ejecución de las actividades constructivas, especialmente aquellas relacionadas con el ingreso y salida de maquinaria, transporte de materiales y operación logística de la obra.

El periodo del presente informe comprende desde el 01 hasta el 31 de abril de 2026. Durante este intervalo se dio continuidad a la implementación del PMT, una vez aprobado por la Secretaría de Tránsito y Transporte, evidenciándose un mayor desarrollo de las actividades operativas, logísticas y de señalización contempladas en el plan.

En este contexto, el informe presenta el seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo, así como el avance en la implementación de las medidas de manejo de tránsito, orientadas a garantizar condiciones seguras para los usuarios de la vía, la comunidad y el personal vinculado al proyecto

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Realizar el seguimiento y evaluación a la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) del Contrato de Obra No. 1683 de 2025, con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas técnicas, operativas y de señalización establecidas, garantizando condiciones adecuadas de seguridad vial y mitigación de impactos sobre la movilidad vehicular y peatonal en el área de influencia del proyecto.

2.2. Objetivos específicos

- Verificar la correcta implementación de la señalización preventiva, reglamentaria e informativa conforme a lo establecido en el PMT aprobado.
- Evaluar el cumplimiento de las medidas de control de tránsito durante las actividades de obra, especialmente en el ingreso y salida de maquinaria, equipos y materiales.

- Analizar el manejo del tránsito peatonal en el área de influencia del proyecto, garantizando condiciones seguras para los usuarios.
- Identificar impactos, hallazgos y oportunidades de mejora en la implementación del PMT, así como la efectividad de las acciones correctivas adoptadas.

3. GENERALIDADES

3.1. Información del contrato de obra

Número del proceso:	LP-SI-010-2025
Tipo de contrato:	Obra Publica
Número del contrato:	1683 del 2025
Fecha del contrato:	03 de diciembre de 2025
Objeto:	Construcción, adecuación y mejoramiento de la estación de policía del municipio de puerto Gaitán - meta
Contratista:	Union Temporal Inge Policía Gaitan
Nit:	902.011.453-2
Representante legal:	Ingrid Maryori Garcia Fonseca C.C. No. 1.121.837.768 de Villavicencio – Meta
Correo electrónico:	utingepoliciagaitan@gmail.com
Contratante:	Municipio de Puerto Gaitán Alcalde municipal LUIS CÉSAR PÉREZ GAITÁN C.C. No. 1.122.120.037 de ACACIAS - META
interventoría:	Unión Temporal Inter policía 2025
Nit:	902.014.419-5
Representante legal:	Diego Armando Cardoso Guerrero C.C. No. 86.088.145 de Villavicencio – Meta
Correo electrónico:	Utinterpolicia2025@gmail.com
Valor:	Cuatro mil trescientos seis millones doscientos setenta y siete mil seiscientos sesenta y ocho pesos mcte ($4.306.277.668,00)
Plazo inicial del contrato:	Ocho (8) meses
Supervisor:	Christian Julian Fernandez Reyes CC. 1.124.823.789 de Puerto Gaitan - Meta Secretario de infraestructura pública

Fecha del acta de inicio:	18 de diciembre de 2025
Fecha de terminación:	17 de agosto de 2026

Tabla 1. Información del contrato de obra
Fuente: Elaboración propia.

3.2. Descripción general de la zona

Puerto Gaitán es un municipio ubicado en el departamento del Meta, en la región de la Orinoquía colombiana. Se destaca por su gran extensión territorial, riqueza en recursos naturales y ubicación estratégica a orillas del río Meta. Su economía se basa principalmente en la explotación de hidrocarburos, la ganadería, la agricultura y el ecoturismo. Cuenta con una población diversa, incluyendo comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Aunque posee un alto potencial productivo, enfrenta retos en materia de conectividad vial y acceso a servicios en sus zonas rurales, lo que hace prioritario el fortalecimiento de su infraestructura.

3.3. Localización del proyecto

3.3.1. Localización general

El municipio de Puerto Gaitán se encuentra ubicado en el oriente del departamento del Meta, en la región de la Orinoquía colombiana. Limita al norte con el departamento de Casanare, al oriente con Vichada, al sur con Mapiripán y al occidente con los municipios de Puerto López y Puerto Lleras. Su localización estratégica, a orillas del río Meta y en cercanía con importantes cuencas hidrográficas, le confiere un papel clave en la conectividad regional y en el desarrollo económico del oriente colombiano.

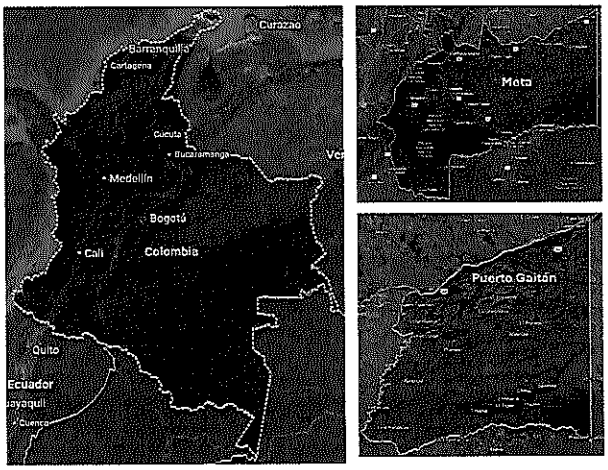


Ilustración 1 Localización general
Descripción: Corresponde a la ubicación del municipio
Fuente: Elaborado de las ilustraciones de los mapas generales

3.3.2. Localización especifica

El proyecto se localiza en la zona urbana del municipio de Puerto Gaitán, específicamente en la Estación de Policía, ubicada en la Carrera 10 N.° 17-31, barrio Alto Manacacías. Este sector corresponde a un área estratégica del municipio, donde se concentra una parte significativa de la actividad administrativa, comercial y social del territorio.



Ilustración 2 Localización Especifica
Descripción: Corresponde a la ubicación del proyecto
Fuente: Tomado de Google Earth

4. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

4.1. Descripción general del proyecto

El contrato tiene como objetivo la construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura de la Estación de Policía del municipio de Puerto Gaitán – Meta, con el fin de superar las deficiencias físicas y funcionales que actualmente limitan el cumplimiento de las funciones misionales de la Policía Nacional. La intervención se fundamenta en un diagnóstico técnico que evidencia deterioro estructural, insuficiencia

de espacios, fallas en los sistemas de instalaciones técnicas y condiciones inadecuadas para el alojamiento y operación del personal.

Puerto Gaitán es un municipio de alta relevancia estratégica debido a su crecimiento demográfico, desarrollo agroindustrial y ubicación cercana a corredores de movilidad interdepartamental, lo cual ha incrementado las exigencias en materia de seguridad y control territorial. En este contexto, el proyecto busca dotar a la institución de una infraestructura moderna, funcional y acorde con las dinámicas urbanas y sociales del territorio.

La propuesta contempla una intervención integral que incluye la construcción de nuevos alojamientos para el personal policial, la rehabilitación del edificio "Casa Blanca" destinado a vivienda familiar, la implementación de un sistema elevado de almacenamiento de agua potable y la construcción de un nuevo cerramiento perimetral de seguridad. Estas acciones permitirán mejorar las condiciones de habitabilidad, garantizar la continuidad de los servicios básicos, fortalecer la seguridad física de la estación y optimizar la capacidad operativa institucional.

El proyecto se desarrollará bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia institucional y responsabilidad fiscal, contribuyendo al fortalecimiento de la presencia policial y al mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Puerto Gaitán.

4.2. Descripción de las actividades de obra

Las actividades del proyecto están orientadas a la ejecución del Contrato de Obra No. 1683 de 2025, cuyo objeto es la "Construcción, adecuación y mejoramiento de la Estación de Policía del municipio de Puerto Gaitán – Meta". No obstante, el presente informe se estructura específicamente para establecer las medidas de manejo necesarias que permitan mitigar los impactos sobre la movilidad y la seguridad vial generados por las actividades propias de la obra, especialmente aquellas relacionadas con el ingreso y salida de volquetas, el descargue de materiales, la circulación de maquinaria amarilla y el tránsito de vehículos asociados al proyecto.

A su vez, se contemplan actividades como:

- Localización y replanteo.
- Excavaciones y movimientos de tierra.
- Estructuras en concreto.
- Mampostería, pañetes, acabados de muros.
- Acabados arquitectónicos.
- Baterías sanitas.

- Redes eléctricas.
- Redes hidráulicas.
- Red contra incendios.
- Transporte de materiales de construcción.
- Transporte de residuos y sobrantes.
- Vaciado de concreto.

4.3. Maquinaria y equipos por utilizar

Los equipos requeridos para realizar estos trabajos son considerados como herramienta menor (palas, picas, balde, carretillas, EPP, etc.)

También se debe contar con los siguientes equipos:

- Volquetas doble troque
- Volquetas sencillas
- Retro excavadora
- Minicargador
- Apisonadores tipo canguro
- Planchas vibratorias
- Vibradores para concreto
- Mezcladora de concreto

4.4. Horario laboral de obra

Se realizarán labores de obra en dos jornadas de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 pm a 4:00 pm; y el sábado de 7:00 am a 11:00 am, donde el programa de obra está dispuesto para realizarse en 8 meses, aunque se espera que el clima permita avanzar y finalizar la intervención lo antes posible, de ser requeridos trabajos extras, se deberá asegura la implementación del PMT en la programación de estas actividades con los respetivos tramites y permisos con la secretaria de Tránsito y Trasporte.

5. SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

El Plan de Manejo de Tránsito (PMT) tiene como objetivo identificar, prevenir y mitigar los impactos generados por la ejecución de obras, garantizando condiciones adecuadas de seguridad vial para todos los usuarios en el área de influencia del proyecto.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2026, se dio continuidad a la implementación del PMT, evidenciándose un mayor avance en la ejecución de las medidas contempladas en el plan aprobado.

En este periodo se desarrollaron actividades relacionadas con la instalación de señalización informativa en vías con obras (SIO), así como la implementación de dispositivos de canalización tales como conos, cinta de señalización y otros elementos destinados a la delimitación del área de intervención y control del tránsito interno.

Así mismo, se implementaron elementos para el manejo del ingreso y salida de vehículos asociados a la obra, incluyendo paletas PARE/SIGA y equipos de comunicación, fortaleciendo el control operativo en el área de influencia del proyecto.

Se mantuvo la presencia continua del personal operativo (inspectores viales), quienes realizaron labores de control y orientación durante las actividades de obra, contribuyendo a la seguridad vial en el sector.

De acuerdo con las visitas realizadas en campo, se evidenció que las actividades constructivas continúan desarrollándose al interior de las instalaciones de la Estación de Policía, sin generar afectaciones significativas a la movilidad vehicular externa.

5.1.1. Fotografías implementación PMT



Fotografía 1. Señal informativa (SIO)




Fotografía 2. Señal informativa (SIO)



Fotografía 3. Delimitación Cinta Peligro Ingreso



Fotografía 4. Inspectores viales

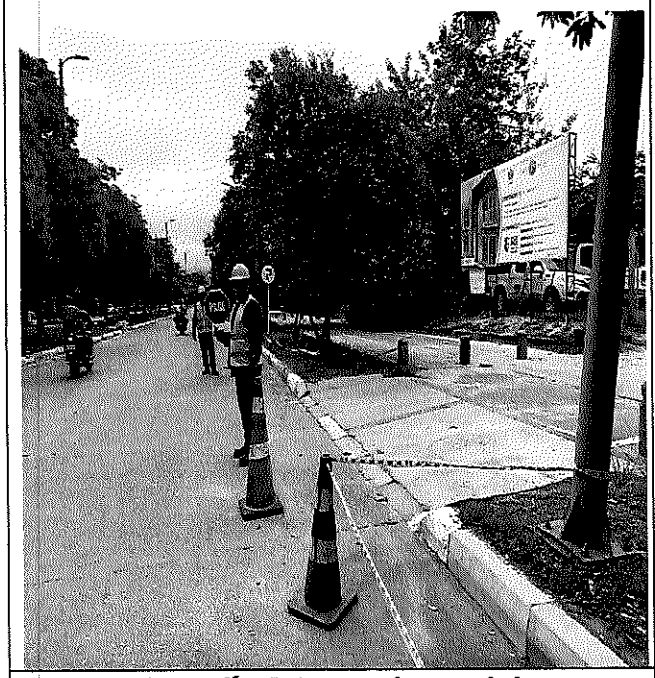

Fotografía 5. Inspectores viales



Fotografía 6. Inspectores viales

	
Fotografía 7. Delimitación Acopio de material	**Fotografía 8. Delimitación Acopio de material**

6. ANÁLISIS FINANCIERO

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2026, se evidenció un avance en la ejecución financiera del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), en concordancia con la implementación progresiva de sus componentes.

En este periodo se mantuvo la ejecución del componente de personal, mediante la continuidad de los dos (2) inspectores viales vinculados al proyecto.

Así mismo, se registró ejecución en los componentes de señalización y canalización, incluyendo la instalación de señales informativas en vías con obras (SIO), así como la implementación de dispositivos de canalización como conos, cinta de señalización y otros elementos utilizados para la delimitación del área de intervención y control del tránsito.

Adicionalmente, se evidenció la ejecución de recursos asociados al manejo de ingreso y salida de vehículos, mediante la utilización de paletas PARE/SIGA y equipos de comunicación tipo walkie talkie.

También se ejecutaron actividades correspondientes a la adecuación de zonas para la disposición de materiales dentro del área de obra, así como la dotación del personal con elementos de protección y seguridad requeridos para el desarrollo de sus funciones.

6.1. Presupuesto para el PMT

A continuación, se relacionan los costos de operación para el plan de manejo de tránsito.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MES	DEDICACION	FACTOR PRESTACIONAL O INCREMENTO	VALOR TOTAL
1	**PERSONAL**							
1,1	Inspector 1 (Técnico en tránsito, transporte y seguridad vial)	UN	1,00	$3.558.750,00	8,00	100%	162%	$46.121.400,00
1,2	Inspector 2 (Técnico en tránsito, transporte y seguridad vial)	UN	1,00	$3.131.700,00	8,00	100%	162%	$40.586.832,00
							Subtotal:	**$86.708.232,00**
2	**SEÑALIZACION, DEMARCACION Y EQUIPOS DE CANALIZACION**							
2,1	Señales reglamentarias en obra (SRO)	UN	4,00	$260.916,76	N/A	N/A	1,20	$2.296.067,00
2,2	Señales preventivas de obra (SPO)	UN	2,00	$260.916,76	N/A	N/A	1,20	$1.148.034,00
2,3	Señales informativas en vías con obras (SIO)	UN	6,00	$344.410,12	N/A	N/A	1,20	$4.546.214,00
2,4	Dispositivos de canalización (Conos)	UN	15,00	$74.900,00	N/A	N/A	1,20	$2.471.700,00
2,5	Dispositivos de canalización (Delineadores tubulares "Colombinas")	UN	30,00	$59.900,00	N/A	N/A	1,20	$3.953.400,00
2,6	Dispositivos de canalización (Maletin)	UN	4,00	$359.900,00	N/A	N/A	1,20	$3.167.120,00
2,7	Dispositivos de canalización (Rollos de cinta por 500mts)	UN	4,00	$70.900,00	N/A	N/A	1,20	$623.920,00
							Subtotal:	**$18.206.455,00**
3	**MANEJO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE CARGA Y PESADOS**							
3,1	Señales informativas en vías con obras (SIO)	UN	1,00	$344.410,12	N/A	N/A	1,20	$757.702,00
3,2	Dispositivos de canalización (Delineadores tubulares "Colombinas")	UN	10,00	$59.900,00	N/A	N/A	1,20	$1.317.800,00
3,3	Dispositivos de canalización (Maletin)	UN	10,00	$359.900,00	N/A	N/A	1,20	$7.917.800,00
3,4	Dispositivos de canalización (Rollos de cinta por 500mts)	UN	3,00	$70.900,00	N/A	N/A	1,20	$467.940,00
3,5	Paleta de Pare y Siga Octagonal Reflectiva	UN	2,00	$30.900,00	N/A	N/A	1,20	$135.960,00

3,6	Walkie Talkie Radio Bidireccional Largo Alcance Bf - 888s Baofeng	UN	2,00	$109.900,00	N/A	N/A	1,20	$483.560,00
							Subtotal:	**$11.080.762,00**
4	**ZONA PARA DISPOSICION DE MATERIALES**							
4,1	Dispositivos de canalización (Conos)	UN	5,00	$74.900,00	N/A	N/A	1,20	$823.900,00
4,2	Dispositivos de canalización (Delineadores tubulares "Colombinas")	UN	10,00	$59.900,00	N/A	N/A	1,20	$1.317.800,00
4,3	Dispositivos de canalización (Rollos de cinta por 500mts)	UN	3,00	$70.900,00	N/A	N/A	1,20	$467.940,00
							Subtotal:	**$2.609.640,00**
5	**EQUIPOS Y VARIOS**							
4,1	Chaleco Verde Con Reflectivo	UN	2,00	$29.900,00	N/A	N/A	1,20	$131.560,00
4,2	VOLANTES INFORMATIVOS	UN	400,00	$2.000,00	N/A	N/A	0,00	$800.000,00
4,3	Ploteo de planos del PMT	UN	4,00	$19.750,00	N/A	N/A	0,00	$79.000,00
4,4	Impermeable En Poliéster	UN	2,00	$84.900,00	N/A	N/A	1,20	$373.560,00
							Subtotal:	**$1.384.120,00**
							COSTOS DIRECTOS:	**$119.989.209,00**
							VALOR TOTAL DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO:	**$119.989.209,00**

Tabla 2. Presupuesto para el PMT
Fuente: Elaboración propia.

6.2. Actividades ejecutadas para el PMT

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas para el cumplimiento del PMT.

PRESUPUESTO OFICIAL PMT POLICIA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MES	DEDICACION	FACTOR PRESTACIONAL O INCREMENTO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA MES ABRIL (30/04/2026)		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		PORCENTAJE ACUMULADO EJECUTADO	CANTIDADES POR EJECUTAR		PORCENTAJE FALTANTE POR EJECUTAR
									CANT	VALOR	CANT	VALOR	%	CANT	VALOR	%
1	PERSONAL															
1,1	Inspector 1 (Tecnico en transito, transporte y seguridad vial)	UN	1,00	$3.558.750,00	8,00	100%	162%	$46.121.400,00	1,00	$ 5.765.175,00	5,00	$ 28.825.875,00	62,50%	3,00	$ 17.295.525,00	37,50%
1,2	Inspector 2 (Tecnico en transito, transporte y seguridad vial)	UN	1,00	$3.131.700,00	8,00	100%	162%	$40.586.832,00	1,00	$ 5.073.354,00	5,00	$ 25.366.770,00	62,50%	3,00	$ 15.220.062,00	37,50%
							Subtotal:	**$86.708.232,00**		**$ 10.838.529,00**		**$ 54.192.645,00**			**$ 32.515.587,00**	
2	SEÑALIZACION, DEMARCACION Y EQUIPOS DE CANALIZACION															
2,1	Señales reglamentarias en obra (SRO)	UN	4,00	$260.916,76	N/A	N/A	1,20	$2.296.067,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 2.296.067,00	100,00%
2,2	Señales preventivas de obra (SPO)	UN	2,00	$260.916,76	N/A	N/A	1,20	$1.148.034,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	2,00	$ 1.148.034,00	100,00%
2,3	Señales informativas en vias con obras (SIO)	UN	6,00	$344.410,12	N/A	N/A	1,20	$4.546.214,00		$ 0,00	2,00	$ 1.515.405,00	33,33%	4,00	$ 3.030.809,00	66,67%
2,4	Dispositivos de canalización (Conos)	UN	15,00	$74.900,00	N/A	N/A	1,20	$2.471.700,00	4,00	$ 659.120,00	8,00	$ 1.318.240,00	53,33%	7,00	$ 1.153.460,00	46,67%
2,5	Dispositivos de canalización (Delineadores tubulares "Colombinas")	UN	30,00	$59.900,00	N/A	N/A	1,20	$3.953.400,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	30,00	$ 3.953.400,00	100,00%
2,6	Dispositivos de canalización (Maletin)	UN	4,00	$359.900,00	N/A	N/A	1,20	$3.167.120,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	4,00	$ 3.167.120,00	100,00%

2,7	Dispositivos de canalización (Rollos de cinta por 500mts)	UN	4,00	$70.900,00	N/A	N/A	1,20	$623.920,00		$ 0,00	4,00	$ 623.920,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
							Subtotal:	**$18.206.455,00**		**$659.120,00**		**$3.457.565,00**			**$14.748.890,00**	
3	**MANEJO DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DE CARGA Y PESADOS**															
3,1	Señales informativas en vías con obras (SIO)	UN	1,00	$344.410,12	N/A	N/A	1,20	$757.702,00		$ 0,00	1,00	$ 757.702,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
3,2	Dispositivos de canalización (Delineadores tubulares "Colombinas")	UN	10,00	$59.900,00	N/A	N/A	1,20	$1.317.800,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 1.317.800,00	100,00%
3,3	Dispositivos de canalización (Maletin)	UN	10,00	$359.900,00	N/A	N/A	1,20	$7.917.800,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 7.917.800,00	100,00%
3,4	Dispositivos de canalización (Rollos de cinta por 500mts)	UN	3,00	$70.900,00	N/A	N/A	1,20	$467.940,00	2,00	$ 311.960,00	3,00	$ 467.940,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
3,5	Paleta de Pare y Siga Octagonal Reflectiva	UN	2,00	$30.900,00	N/A	N/A	1,20	$135.960,00		$ 0,00	2,00	$ 135.960,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
3,6	Walkie Talkie Radio Bidireccional Largo Alcance Bf - 888s Baofeng	UN	2,00	$109.900,00	N/A	N/A	1,20	$483.560,00		$ 0,00	2,00	$ 483.560,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
							Subtotal:	**$11.080.762,00**		**$311.960,00**		**$1.845.162,00**			**$9.235.600,00**	
4	**ZONA PARA DISPOSICION DE MATERIALES**															
4,1	Dispositivos de canalización (Conos)	UN	5,00	$74.900,00	N/A	N/A	1,20	$823.900,00	3,00	$ 494.340,00	5,00	$ 823.900,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
4,2	Dispositivos de canalización (Delineadores tubulares "Colombinas")	UN	10,00	$59.900,00	N/A	N/A	1,20	$1.317.800,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	10,00	$ 1.317.800,00	100,00%
4,3	Dispositivos de canalización (Rollos de cinta por 500mts)	UN	3,00	$70.900,00	N/A	N/A	1,20	$467.940,00		$ 0,00	3,00	$ 467.940,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
							Subtotal:	**$2.609.640,00**		**$494.340,00**		**$1.291.840,00**			**$1.317.800,00**	
5	**EQUIPOS Y VARIOS**															
4,1	Chaleco Verde Con Reflectivo	UN	2,00	$29.900,00	N/A	N/A	1,20	$131.560,00		$ 0,00	2,00	$ 131.560,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
4,2	VOLANTES INFORMATIVOS	UN	400,00	$2.000,00	N/A	N/A	0,00	$800.000,00		$ 0,00	400,00	$ 800.000,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%

4,3	Ploteo de planos del PMT	UN	4,00	$19.750,00	N/A	N/A	0,00	$79.000,00		$ 0,00	4,00	$ 79.000,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
4,4	Impermeable En Poliéster	UN	2,00	$84.900,00	N/A	N/A	1,20	$373.560,00		$ 0,00	2,00	$ 373.560,00	100,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
							Subtotal:	**$1.384.120,00**		**$0,00**		**$1.384.120,00**			**$0,00**	
							COSTOS DIRECTOS:	**$119.989.209,00**		**$12.303.949,00**		**$62.171.332,00**			**$57.817.877,00**	
							VALOR TOTAL DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO:	**$119.989.209,00**	**13,53%**	**$12.303.949,00**	**10,25%**	**$62.171.332,00**	**51,81%**		**$57.817.877,00**	**48,19%**

Tabla 3. Ejecución actividades PMT
Fuente: Elaboración propia.

6.3. Resumen general de ejecución de PMT

RESUMEN GENERAL DE EJECUCIÓN DEL PMT				
PROYECTO	**VALOR PMT**	**VALOR EJECUTADO ACUMULADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**PORCENTAJE POR EJECUTAR**
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META	$119.989.209,00	$62.171.332,00	51,81%	48,19%

7. CONCLUSIONES

Durante el periodo evaluado, correspondiente del 01 al 30 de abril de 2026, se evidenció un avance significativo en la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), consolidando la ejecución de varios de los componentes contemplados en el plan aprobado.

Se desarrollaron actividades relacionadas con señalización, dispositivos de canalización, control del tránsito y dotación del personal operativo, lo cual permitió fortalecer las condiciones de seguridad vial en el área de influencia del proyecto.

Así mismo, se mantuvo la operación continua de los inspectores viales, garantizando el control y orientación durante las actividades de obra.

No obstante, la implementación del PMT aún se encuentra en proceso, por lo cual es necesario continuar con la ejecución de los ítems restantes hasta lograr su cumplimiento total conforme a lo establecido en el plan.

En este sentido, las medidas implementadas han permitido mantener condiciones adecuadas de movilidad y seguridad, sin generar afectaciones significativas a la circulación vehicular y peatonal en el sector

Director de Obra
Gonzalo Becerra Mejia
CC: 17.310.424 de Villavicencio
M.P: 25700-40739 CND

UNIÓN TEMPORAL
INGE
POLICIA
GAITÁN

NÓMINA DEL PERSONAL

CALLE 2 No 27 – 116 Villavicencio – Meta
Tel. 310 888 54 20

UNIÓN TEMPORAL
INGE POLICIA GAITAN

NOMINA DE EMPLEADOS - UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

NIT 902,011,453-2

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-04-2026 AL 30-04-2026

Datos del Afiliado		Nove			DEVENGADO			DESCUENTOS				FIRMAS
Identificación	Apellidos y Nombres	I	R	DIAS	SALARIO	A. TRANS	DEVENGADO	PENSION	SALUD	DEDUCIBLE	TOTAL A PAGAR	
CC 8192573	GAITAN GAITAN VICENTE	X		19	1.108.907	157.760	1.266.667	44.356	44.356	88.713	1.177.954	
CC 1006946002	GALINDO GAITAN YESID	X		19	1.108.907	157.760	1.266.667	44.356	44.356	88.713	1.177.954	
CC 1121852433	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES			30	3.558.750	-	3.558.750	142.350	142.350	284.700	3.274.050	
CC 1121863524	JENNY PAOLA FERIA TRIANA			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 1121867537	YONLI YULIETH LOZANO GONZALEZ			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 1121884993	MAYRA ALEJANDRA CARDENAS LESMES			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 1121922788	ELKIN FABIAN ZAMBRANO ALVAREZ			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 1122144736	MARGIE DANIELA HERRERA PAEZ			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 1124999733	JHONI RODRIGUEZ PEREZ		X	1	58.364	8.303	66.667	2.335	2.335	4.669	61.998	
CC 1125549456	JUAN MARTIN BOLIVAR GAITAN			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 1124990792	BELTRAN YAVINAPE ALEXIS DAVID	X		14	817.089	116.244	933.333	32.684	32.684	65.367	867.966	
CC 17310424	GONZALO BECERRA MEJIA			30	1.750.905	249.095	2.000.000	-	70.036	70.036	1.929.964	
CC 74857071	DAGOBERTO CORTES			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 80166369	MARCOS DIDIER DELGADILLO DELGADILLO			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 86008125	AGUSTIN AGUILAR GONZALEZ			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 86056645	OSCAR ALEXANDER PATIÑO PEREZ			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
CC 1193092733	RIVERA MARTINEZ BRAYAN STEVEN	X		21	1.225.634	174.367	1.400.000	49.025	49.025	98.051	1.301.949	
CC 93372770	SEGUNDO ROA CRUZ			30	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
					28.888.509	3.603.574	32.492.083	1.085.504	1.155.540	2.241.045	30.251.039	

PROYECTO:

CONTADOR
CESAR OSWALDO SOTO HERNANDEZ
T.P 187.220-T

ELABORO

CONTADOR
CESAR OSWALDO SOTO HERNANDEZ
T.P 187.220-T

APROBO

INGRID MARYORY GARCIA FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL

UNIÓN TEMPORAL
INGE
POLICIA
GAITÁN

PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

CALLE 2 No 27 – 116 Villavicencio – Meta
Tel. 310 888 54 20

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-20, 04:35:10 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1081588727

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 15/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN		
Documento	NI902011453	**Dirección**	CL 2 #27 - 116
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3222671101
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal	GARCIA FONSECA INGRID MARYORY	**Identificación**	CC 1121837768
Total Afiliados	18	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradores	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradores	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradores	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1006946002	YESID GALINDO GAITAN	01	00	X																0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 1.108.907	$ 177.500	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.108.907	$ 44.400	6,960	$ 1.108.907	$ 77.200	(CCF34) COFREM	$ 1.108.907	$ 44.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.500
CC 1121852433	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.558.750	$ 569.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.558.750	$ 142.400	6,960	$ 3.558.750	$ 247.700	(CCF34) COFREM	$ 3.558.750	$ 142.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.101.900
CC 1121883524	JENNY PAOLA FERIA TRIANA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1121887537	YONLI YULIETH LOZANO GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1121884993	MAYRA ALEJANDRA CARDENAS LESMES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1121922788	ELIGN FABIAN ZAMBRANO ALVAREZ	01	00		X															0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 291.818	$ 46.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 291.818	$ 11.700	6,960	$ 291.818	$ 20.400	(CCF34) COFREM	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.500
CC 1122144736	MARGIE DANIELA HERRERA PAEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1124990792	ALEXIS DAVID BELTRAN YAVINAPE	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 58.364	$ 9.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF34) COFREM	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
CC 1124999733	JHONI RODRIGUEZ PEREZ	01	00		X															0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 58.364	$ 9.400	(EPSIC6) EPS PIJAOSALUD	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF34) COFREM	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
CC 1125549456	JUAN MARTIN BOLIVAR GAITAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1193092733	BRAYAN STEVEN RIVERA MARTINEZ	01	00	X																0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 1.225.634	$ 196.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.225.634	$ 49.100	6,960	$ 1.225.634	$ 85.400	(CCF34) COFREM	$ 1.225.634	$ 49.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.800
CC 17310424	GONZALO BECERRA MEJIA	01	03																	0	0	30	30	30	(NN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262.100
CC 74657071	DAGOBERTO CORTES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 80186369	MARCOS DIDIER DELGADILLO DELGADILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 8192573	VICENTE GAITAN GAITAN	01	00	X																0	19	19	19	19	(230201) PROTECCION	$ 1.108.907	$ 177.500	(EPSIC6) EPS MALLAMAS	$ 1.108.907	$ 44.400	6,960	$ 1.108.907	$ 77.200	(CCF34) COFREM	$ 1.108.907	$ 44.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.500
CC 86008125	AGUSTIN AGUILAR GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 86056646	OSCAR ALEXANDER PATIÑO PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 93372770	SEGUNDO ROA CRUZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 24.919.794	$ 26.670.699	$ 26.670.699	$ 26.670.699	$ 3.988.100	$ 1.067.900	$ 1.657.000	$ 1.067.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.980.900	$ 6.600	$ 7.987.500

Protección

Una empresa sura

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 900.379.921

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **GONZALO BECERRA MEJIA** identificado(a) con **CC** número **17.310.424**, es pensionado(a) por **VEJEZ** en nuestro FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN S.A., desde el día **21 de septiembre de 2022.**

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 20 de abril de 2026

Cordialmente,

Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **482 33 64** - Medellín **510 90 99** - Cali **386 00 80**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a **https://customer0001.wolkvox.com/proteccion/index.php**
o escríbenos a través de WhatsApp: **+57 310 220 55 75**
www.proteccion.com

2026042011160

UNIÓN TEMPORAL
INGE
POLICIA
GAITÁN

CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES

CALLE 2 No 27 – 116 Villavicencio – Meta
Tel. 310 888 54 20

UNIÓN TEMPORAL
INGE
POLICIA
GAITÁN

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

PERSONA JURIDICA

Los suscritos **INGRID MARYORY GARCIA FONSECA** identificado con la cedula de ciudadanía **1.121.837.768** de Villavicencio, en mi condición de Representante Legal de la **UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN** identificada con **Nit. 902.011.453-2**, y **CESAR OSWALDO SOTO HERNANDEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.071.198 y Tarjeta profesional 187.220-T en mi condición de **CONTADOR PUBLICO**, certificamos que se han realizado los pagos de seguridad social y parafiscales correspondientes al periodo comprendido del 01/04/2026 al 0/4/2026 en concordancia a la fecha de la firma de este certificado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Villavicencio, a los seis (6) días del mes de Mayo de 2026.

Atentamente,

R.L. INGRID MARYORY GARCIA FONSECA
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN


CESAR OSWALDO SOTO H.
CONTADOR PUBLICO
T.P 187.220-T.

Puerto Gaitán, Meta

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

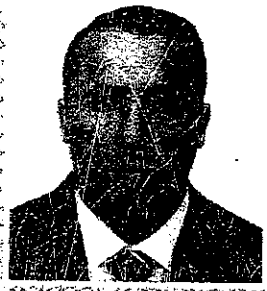

187220-T

CESAR OSWALDO
SOTO HERNANDEZ
C.C. 86071198

RESOLUCION INSCRIPCION 110 FECHA 26/02/2014
UNIVERSIDAD FUMD. UNIV. SAN MARTIN

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 199044

187784

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 644 44 50 o devolverla a la UAE. - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 86.071.198
SOTO HERNANDEZ
APELLIDOS
CESAR OSWALDO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 11-FEB-1982
MITU
(VAUPES)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 B+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
18-FEB-2000 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-5205000-00363556-M-0086071198-20120303 0029373069A 2 37367283

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 0 0 9 0 2 3 4 5 6 C A 2 8 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CESAR OSWALDO SOTO HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86071198 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 187220-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIÓN TEMPORAL
INGE
POLICIA
GAITÁN

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO ANTICIPO

CALLE 2 No 27 – 116 Villavicencio – Meta
Tel. 310 888 54 20

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO ANTICIPO			Puerto Gaitán Planeta Natural
	CONTRATACIÓN			
	Código: SCO-FR-100	Versión: 01	Vigencia: 01/08/2025	

INFORME Nº 4 DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

PROCESO N°:

CONTRATO/CONVENIO N°: CONTRATO DE OBRA 1683 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2025
(ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA
(PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OBRA, INTERVENTORIA, CONSULTORÍA, ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRA, OTRO)

OBJETO: CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META
(TAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)

VALOR DEL CONTRATO: 4.306.277.668,00
(VALOR EN NUMEROS)

VALOR DEL 2 ANTICIPO 15%: $ 645.941.650,20

DESCUENTO 5% CONTRIBUC. $ 32.297.082,51

ANTICIPO RECIBIDO $ 613.644.567,69
(VALOR EN NUMEROS)

CHEQUE/ COMPROBANTE N°	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
36452637120	7/04/2026	Arcoe S.A.S	3.265.726,00	1	compra de materiales
36452637120	7/04/2026	Arcoe S.A.S	33.044.209,00	1	compra de materiales
36465470083	8/04/2026	Gonzalez Diaz William Alexander	9.919.800,00	4	servicio de transporte
28939348206	8/04/2026	Montoya Yara Yulieth Katerine	1.748.640,00	3	servicio de transporte
84458766313	9/04/2026	Sikglass	2.028.373,00	1	compra de materiales
488471772647	14/04/2026	Artunduaga Barrera Jessica Liceth	47.295.000,00	3	alquiler de maquinaria y equipo
36465470083	24/04/2026	Gonzalez Diaz William Alexander	5.821.200,00	4	servicio de transporte
488441091417	24/04/2026	Becerra Morales Gonzalo Andres	70.169.000,00	4	servicio de transporte

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	MATERIALES	380.459.631,97	164.861.108,83	38.338.308,00	$ 203.199.416,83	$ 177.260.215,14
2	MANO DE OBRA	98.183.130,83	98.183.131,83	-	$ -	$ 98.183.131,83
3	ALQUILER/COMPRA DE MAQ. Y EQUIP	49.091.565,41	49.091.565,41	49.043.640,00	$ 49.043.640,00	$ 47.925,41
4	TRANSPORTE	85.910.239,48	-	85.910.000,00	$ 85.910.000,00	$ 239,48
				TOTAL	$ 338.153.056,83	$ 275.491.511,86

FIRMA

NOMBRE R/L: INGRID MARYORI GARCIA FONSECA
UNIÓN TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE R/L: DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
UNIÓN TEMPORAL INTER POLICIA 2025
INTERVENTOR / SUPERVISOR

ORIGINAL: ALCALDIA
COPIA N° 1: CONTRATISTA
COPIA N° 2: INTERVENTORIA

FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. NIT 800182281

REPORTE DE PAGOS SEGUNDO ANTICIPO - abril 2026

Fecha Causación	Fecha de Pago	Nombre Tercero Pago	Identificacion	Valor Bruto	Valor Neto	GMF	Anticipo
7/04/2026	7/04/2026	Arcoe S.A.S	900785321	3,265,726.00	3,265,726.00	13,062.90	N
7/04/2026	7/04/2026	Arcoe S.A.S	900785321	33,044,209.00	33,044,209.00	132,176.84	N
8/04/2026	8/04/2026	Gonzalez Diaz William Alexander	86080137	9,919,800.00	9,919,800.00	39,679.20	N
8/04/2026	8/04/2026	Montoya Yara Yulieth Katerine	1121980133	1,748,640.00	1,748,640.00	6,994.56	N
9/04/2026	9/04/2026	Sikglass	822001738	2,028,373.00	2,028,373.00	8,113.49	N
14/04/2026	14/04/2026	Artunduaga Barrera Jessica Liceth	40340547	47,295,000.00	47,295,000.00	189,180.00	N
24/04/2026	24/04/2026	Gonzalez Diaz William Alexander	86080137	5,821,200.00	5,821,200.00	23,284.80	N
24/04/2026	24/04/2026	Becerra Morales Gonzalo Andres	1121868023	70,169,000.00	70,169,000.00	280,676.00	N
			TOTAL	**173.291.948,00**	**173.291.948,00**	**693.167,79**	

WILLIAM ALEXANDER GONZALEZ DIAZ

CA 1 MZ 1 A BRR BATEAS

Puerto Gaitán,Meta, Colombia

NIT 86080137 - 5
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764085152804 del 11/12/2024 al 11/12/2026
Habilita numeración de:
FE-1 al FE-1000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

ACTIVIDADES COMERCIALES: CIIU
4923 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
4520 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
4530 COMERCIO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES

Cliente: UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
NIT 902011453 - 2
Dirección: CL 2 27 116
Codigo Cliente 1000
Teléfono: 3108885420
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Villavicencio
Departamento: Meta
País: Colombia

Factura Electronica de Venta No. FE80
Fecha de emisión: 27/03/2026 03:09:55 PM
Fecha de validación DIAN: 27/03/2026 03:12:37 PM
Fecha de vencimiento: 27/03/2026
Plazo (Días): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	1000	TRANSPORTE DE MATERIALES POR CARRETERA	1,00	unidad	COP 1,680,000.00	COP 0.00			COP 1,680,000.00

Retenca $. 100.200.
Paga $. 9'919.800=

Total de items: 1
Observaciones
TRANSPORTE DE 6 M3 DE ARENA DE PLANTA
Y 6 M3 DE GRAVILLA DE 1/2
DE PUERTO LOPEZ A PUERTO GAITAN

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Crédito Bancario

FAVOR CONSIGNAR EN BANCO COLOMBIA CUENTA DE AHORROS NUMERO 364-654700-83 A NOMBRE DE WILLIAM ALEXANDER GONZALEZ DIAZ

Subtotal:	COP 1,680,000.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 1,680,000.00
Neto a pagar	COP 1,680,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

Scanned with CamScanner

WILLIAM ALEXANDER GONZALEZ DIAZ

CA 1 MZ 1 A BRR BATEAS

Puerto Gaitán,Meta, Colombia

NIT 86080137 - 5
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764085152804 del 11/12/2024 al 11/12/2026
Habilita numeración de:
FE-1 al FE-1000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

ACTIVIDADES COMERCIALES: CIIU
4923 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
4520 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
4530 COMERCIO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES

Cliente: UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
NIT 902011453 - 2
Dirección: CL 2 27 116
Codigo Cliente 1000
Teléfono: 3108885420
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Villavicencio
Departamento: Meta
País: Colombia

Factura Electronica de Venta No. FE79
Fecha de emisión: 27/03/2026 02:30:52 PM
Fecha de validación DIAN: 27/03/2026 03:08:52 PM
Fecha de vencimiento: 27/03/2026
Plazo (Días): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	1000	TRANSPORTE DE MATERIALES POR CARRETERA	1,00	unidad	COP 4,140,000.00	COP 0.00			COP 4,140,000.00

Total de items: 1
Observaciones
TRANSPORTE DE 36 M3 DE CRUDO DE RIO
DE PUERTO LOPEZ A PUERTO GAITAN

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Crédito Bancario

FAVOR CONSIGNAR EN BANCO COLOMBIA CUENTA DE AHORROS NUMERO 364-654700-83 A NOMBRE DE WILLIAM ALEXANDER GONZALEZ DIAZ

Subtotal:	COP 4,140,000.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 4,140,000.00
Neto a pagar	COP 4,140,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

Scanned with CamScanner

WILLIAM ALEXANDER GONZALEZ DIAZ

CA 1 MZ 1 A BRR BATEAS

Puerto Gaitán,Meta, Colombia

NIT 86080137 - 5
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764085152804 del 11/12/2024 al 11/12/2026
Habilita numeración de:
FE-1 al FE-1000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

ACTIVIDADES COMERCIALES: CIIU
4923 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
4520 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
4530 COMERCIO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES

Cliente: UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
NIT 902011453 - 2
Dirección: CL 2 27 116
Codigo Cliente 1000
Teléfono: 3108885420
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Villavicencio
Departamento: Meta
País: Colombia

Factura Electronica de Venta No. FE78
Fecha de emisión: 20/03/2026 09:02:59 AM
Fecha de validación DIAN: 20/03/2026 09:06:47 AM
Fecha de vencimiento: 20/03/2026
Plazo (Dias): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	1000	TRANSPORTE DE MATERIALES POR CARRETERA	1,00	unidad	COP 4,200,000.00	COP 0.00			COP 4,200,000.00

Total de Items: 1
Observaciones
TRANSPORTE DE 18 M3 DE ARENA DE PLANTA
Y 12 M3 DE GRAVILLA DE 1/2
DE PUERTO LOPEZ A PUERTO GAITAN

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Crédito Bancario

FAVOR CONSIGNAR EN BANCO COLOMBIA CUENTA DE AHORROS NUMERO 364-654700-83 A NOMBRE DE WILLIAM ALEXANDER GONZALEZ DIAZ

Subtotal:	COP 4,200,000.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 4,200,000.00
Neto a pagar	COP 4,200,000.00

Este documento corresponde a la representacion gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

Scanned with CamScanner

Certificación Bancaria

Bancolombia

Lunes, 29 de enero de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **WILLIAM ALEXANDER GONZALEZ DIAZ** identificado(a) con cc. **86080137** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	364-654700-83	2011/01/04	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Santiago Valencia Calderon
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner
Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 141153652287

(415)7707212489984(8020) 000014116365228 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 8 0 1 3 7	5	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	86080137

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GONZALEZ	DIAZ	WILLIAM	ALEXANDER

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Puerto Gaitán 5 6 8

41. Dirección principal: CA 1 MZ 1 A BRR BATEAS

42. Correo electrónico: alexandergd.01@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 5 0 4 4 6 5 1 3 1	3 2 1 2 0 1 2 1 4 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 3	2 0 0 9 0 2 0 2	4 5 2 0	2 0 2 4 0 1 0 2	4 5 3 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 | 2 | 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

984. Nombre: GONZALEZ DIAZ WILLIAM ALEXANDER

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 08-01-2025 10:30:42AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Scanned with CamScanner

WILLIAM ALEXANDER GONZALEZ DIAZ

CA 1 MZ 1 A BRR BATEAS

Puerto Gaitán,Meta, Colombia

NIT 86080137 - 5
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764085152804 del 11/12/2024 al 11/12/2026
Habilita numeración de:
FE-1 al FE-1000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

ACTIVIDADES COMERCIALES: CIIU
4923 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
4520 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
4530 COMERCIO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES

Cliente: UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
NIT 902011453 - 2
Dirección: CL 2 27 116
Codigo Cliente 1000
Teléfono: 3108885420
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Villavicencio
Departamento: Meta
País: Colombia

Factura Electronica de Venta No. FE82
Fecha de emisión: 20/04/2026 10:53:25 AM
Fecha de validación DIAN: 20/04/2026 11:07:18 AM
Fecha de vencimiento: 20/04/2026
Plazo (Días): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	1000	TRANSPORTE DE MATERIALES POR CARRETERA	1,00	unidad	COP 5,880,000.00	COP 0.00			COP 5,880,000.00

Total de items: 1
Observaciones
TRANSPORTE 24 M3 ARENA DE PLANTA
Y 18 M3 DE GRAVILLA DE 1/2
DE PUERTO LOPEZ A PUERTO GAITAN

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Crédito Bancario

FAVOR CONSIGNAR EN BANCO COLOMBIA CUENTA DE AHORROS NUMERO 364-654700-83 A NOMBRE DE WILLIAM ALEXANDER GONZALEZ DIAZ

Subtotal:	COP 5,880,000.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 5,880,000.00
Neto a pagar	COP 5,880,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE a630624add176498083be1a1c217c3b46aa96dc4412fe97eb7629e6da891008d095dcc0d4d23aa7053baf33b5e9ea28b

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141153652287

(415)7707212489984(8020) 000014115365228 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 8 0 1 3 7	5	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	86080137

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GONZALEZ	DIAZ	WILLIAM	ALEXANDER

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Puerto Gaitán 5 6 8

41. Dirección principal: CA 1 MZ 1 A BRR BATEAS

42. Correo electrónico: alexandergd.01@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 5 0 4 4 6 5 1 3 1	3 2 1 2 0 1 2 1 4 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica / Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 3	2 0 0 9 0 2 0 2	4 5 2 0	2 0 2 4 0 1 0 2	4 5 3 0				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: GONZALEZ DIAZ WILLIAM ALEXANDER

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 08-01-2025 10:30:42AM

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **86.080.137**

GONZALEZ DIAZ

APELLIDOS

WILLIAM ALEXANDER

NOMBRES

FIRMA



Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-FEB-1984**

VISTA HERMOSA
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

18-FEB-2002 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-5205000-00818487-M-0086080137-20160425 **0049**90436A 1 46053622

Powered by CamScanner

Certificación Bancaria

Bancolombia

Lunes, 29 de enero de 2024

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **WILLIAM ALEXANDER GONZALEZ DIAZ** identificado(a) con cc. **86080137** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	364-654700-83	2011/01/04	Activa

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Santiago Valencia Calderon
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner
Escaneado con CamScanner

COTIZACION DE VENTAS

ARCOE S.A.S
N. I. T. : 900783521-1
Direccion: CALLE 31 No 26 31 VCIO
Telefono : 3173833547 Fax:

Numero : 001-CV-106402
Fecha : 2026-MAR-26

REIMPRESO

Cliente : UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN Nit: 902011453-2
Contacto :
Direccion: CL 2 27 116
Ciudad : VILLAVICENCIO
Telefono : 3108885420 Fax:

Vendedor : 40387869 ALBORNOZ APOLINAR SANDRA L
Forma de Pago: CONTADO
Moneda : PESOS
Valida Hasta : 2026/MAR/26

Referencia	Descripcion	Local. U.M	Cant_Cot	Precio_Unit.	IVA %	Descuentos	Valor Total
130155	M EL XX-159 5.5mm	001-01 UND	53.000	144,200.00	19.00		7,642,600.00
130165	M EL XX-221 6.5mm	001-01 UND	27.000	200,873.00	19.00		5,423,571.00
010401	ALAM NEGRO X KL	001-01 UND	100.000	4,650.00	19.00		465,000.00
050121	VAR COR 5/8#6mts	001-01 UND	424.000	33,578.00	19.00		14,237,072.00

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR IVA	IMPOCONSUMOS	T O T A L
27,768,243.00	0.00	0.00	27,768,243.00	5,275,966.00	0.00	33,044,209.00

Observacion: Sandra 3142790962

Scanned with CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141006983409

(415)7707212489984(8020) 000014100698340 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 3 5 2 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ARCOE S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
FERREMETALICAS COLOMBIA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CL 31 26 31 BRR PORVENIR

42. Correo electrónico fmcvillavicencio@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
5 0 0 0 0 1	3 1 7 3 8 3 3 5 4 7	6 8 4 9 8 7 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 1 6 0 4 0 1	4 7 5 2	2 0 1 4 1 0 1 5	4 9 2 3	4 6 6 4		8

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 4	1 5	1 8	2 6	4 2	4 8	5 2	5 5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 3																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PARRADO PARRADO DIOGENES
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

Página 2 de 7 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141006983409

(415)7707212489984(8020) 000014100698340 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 3 5 2 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 1 4 0 9 2 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 4 1 0 1 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 7 0 9 5 4	
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 4 0 9 2 0	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 0 1 0 2		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 7 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141006983409

(415)7707212489984(8020) 000014100698340 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 3 5 2 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 1 0 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 7 3 0 8 2 1 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PARRADO	PARRADO	DIOGENES	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 4 1 0 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 6 0 6 0 8 1 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PARRADO	TIUSO	DIEGO	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 7 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141006983409

(415)7707212489984(8020) 000014100698340 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 3 5 2 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 0 3 2 9 3 1 0	8	2 7 0 3 6 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GONZALEZ	SOTO	ANGELA	VIVIANA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 7 1 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 0 3 4 2 5 2 6		1 5 4 0 1 7 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
FORERO	MARTINEZ	MARTHA	CAROLINA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 7 1 2

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 1 2 3 2 6 6 8		1 4 5 0 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ESCOBAR	ARCINIEGAS	GLORIA	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 4 0 9 2 0

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141006983409

(415)7707212489984(8020) 000014100698340 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 3 5 2 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: ARCOE

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

165. Dirección: CR 34 33 39 55 57 BRR BARZAL

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 2 7 1 2 2 6	2 0 1 4 1 0 2 3
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 7 3 8 3 3 5 4 7	2 0 2 3 0 5 0 8

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: DISTRIBUCIONES J.N

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

165. Dirección: CL 36 27 60 BRR SAN ISIDRO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 8 8 3 7 8	2 0 1 6 0 1 1 8
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 6 8 7 6 7 1 7 8	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería 4 6 6 3

162. Nombre del establecimiento: FERREMETALICAS COLOMBIA VILLAVICENCIO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

165. Dirección: CL 31 26 31 BRR PORVENIR

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 8 8 3 8 0	2 0 1 6 0 1 1 8
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 7 3 8 3 3 5 4 7	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 6 de 7 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141006983409

(415)7707212489984(8020) 000014100698340 9

5. Número de identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 3 5 2 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 0 2
161. Actividad económica: Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3
162. Nombre del establecimiento: FERREMETALICAS COLOMBIA NEIVA
163. Departamento: Meta 5 0
164. Ciudad/Municipio: Villavicencio 0 0 1
165. Dirección: CL 3 6 48
166. Número de matrícula mercantil: 2 7 6 6 4 7
167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 1 6 0 1 2 9
168. Teléfono: 3 1 5 2 2 9 7 8 6 8
169. Fecha de cierre: 2 0 2 0 0 3 0 9

2

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 0 2
161. Actividad económica: Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3
162. Nombre del establecimiento: FERREMETALICAS COLOMBIA PLANTA DE MALLAS SOACHA
163. Departamento: Bogotá D.C. 1 1
164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección: CR 17 30 80 BRR CIUDAD DE QUITO
166. Número de matrícula mercantil: 2 7 8 2 9 7 4
167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 1 7 0 2 2 0
168. Teléfono: 3 1 7 4 0 1 7 6 6 6
169. Fecha de cierre:

3

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 0 2
161. Actividad económica: Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería 4 6 6 3
162. Nombre del establecimiento: FERREMETALICAS COLOMBIA MOSQUERA
163. Departamento: Cundinamarca 2 5
164. Ciudad/Municipio: Facatativá 2 6 9
165. Dirección: AV TRONCAL DE OCCIDENTE 18 76 BG 11 PAR SANTO DOMINGO
166. Número de matrícula mercantil: 1 0 7 4 1 0
167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 1 7 0 2 1 5
168. Teléfono: 3 1 8 2 0 9 9 3 3
169. Fecha de cierre:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 7 de 7 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141006983409

(415)7707212489984(8020) 000014100698340 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 3 5 2 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3	

162. Nombre del establecimiento: FERREMETALICAS COLOMBIA CEDIS VILLAVICENCIO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1	

165. Dirección: CR 48 19 122 BRR CATUMARE

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
3 1 3 2 2 7	2 0 1 7 0 4 2 7	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 7 3 8 3 3 5 4 7		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3	

162. Nombre del establecimiento: FERREMETALICAS COLOMBIA BOGOTA CALLE 12

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CL 12 15 42

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 6 6 4 7 8 9	2 0 1 6 0 3 1 0	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 6 8 7 6 8 1 0 7	2 0 2 1 1 2 0 2	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Jueves, 3 de abril de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ARCOE SAS identificado(a) con NIT 900783521, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	36452637120	2015/12/21	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

COTIZACION DE VENTAS

31668

ARCOE S.A.S
N. I. T. : 900783521-3
Direccion: CALLE 31 No 26 31 VCIO
Telefono : 3173833547 Fax:

Numero : 001-CV-106816
Fecha : 2026-ABR-07

Cliente : UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN	Nit: 902011453-2	Vendedor : 40387869	ALBORNOZ APOLINAR SANDRA L
Contacto :		Forma de Pago: CONTADO	
Direccion: CL 2 27 116		Moneda : PESOS	
Ciudad : VILLAVICENCIO		Valida Hasta : 2026/ABR/07	
Telefono : 3108885420 Fax:			

Referencia	Descripcion	Local. U.M	Cant_Cot	Precio_Unit.	IVA %	Descuentos	Valor Total
430105	HIERRO 3/8 Kilo	001-01 UND	958.000	3,750.00	19.00		3,592,500.00

22 6.10 (4071)

TOTAL BRUTO	DSCTO x LINEA	%DSCTO GLOBAL	0.00% SUB-TOTAL	VALOR IVA	IMPOCONSUMOS	T O T A L
3,592,500.00	0.00	0.00	3,592,500.00	682,575.00	0.00	4,275,075.00

Observacion: Sandra 3142990962

ELABORADO APROBADO RECIBIDO

Scanned with CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141006983409

(415)7707212489984(8020) 000014100698340 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 3 5 2 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ARCOE S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
FERREMETALICAS COLOMBIA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CL 31 26 31 BRR PORVENIR

42. Correo electrónico fmcvillavicencio@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
5 0 0 0 1	3 1 7 3 8 3 3 5 4 7	6 8 4 9 8 7 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 1 6 0 4 0 1	4 7 5 2	2 0 1 4 1 0 1 5	4 9 2 3	4 6 6 4		8

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 10 14 15 18 26 42 48 52 55

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código: 23

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PARRADO PARRADO DIOGENES

985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141006983409

(415)7707212489984(8020) 000014100698340 9

5. Número de identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 3 5 2 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 1 4 0 9 2 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 4 1 0 1 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 7 0 9 5 4	
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 4 0 9 2 0	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 0 1 0 2		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141006983409

(415)7707212489984(8020) 000014100698340 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 3 5 2 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 1 0 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 7 3 0 8 2 1 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PARRADO	PARRADO	DIOGENES	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 4 1 0 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 6 0 6 0 8 1 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PARRADO	TIUSO	DIEGO	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 7 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141006983409

(415)7707212489984(8020) 000014100698340 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 3 5 2 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 0 3 2 9 3 1 0	8	2 7 0 3 6 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GONZALEZ	SOTO	ANGELA	VIVIANA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 7 1 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 0 3 4 2 5 2 6		1 5 4 0 1 7 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
FORERO	MARTINEZ	MARTHA	CAROLINA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 7 1 2

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 1 2 3 2 6 6 8		1 4 5 0 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ESCOBAR	ARCINIEGAS	GLORIA	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 4 0 9 2 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 7 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141006983409

(415)7707212489984(8020) 000014100698340 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 3 5 2 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3	

162. Nombre del establecimiento: ARCOE

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1	

165. Dirección: CR 34 33 39 55 57 BRR BARZAL

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 2 7 1 2 2 6	2 0 1 4 1 0 2 3
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 7 3 8 3 3 5 4 7	2 0 2 3 0 5 0 8

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3	

162. Nombre del establecimiento: DISTRIBUCIONES J.N

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1	

165. Dirección: CL 36 27 60 BRR SAN ISIDRO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 8 8 3 7 8	2 0 1 6 0 1 1 8
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 6 8 7 6 7 1 7 8	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería 4 6 6 3	

162. Nombre del establecimiento: FERREMETALICAS COLOMBIA VILLAVICENCIO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1	

165. Dirección: CL 31 26 31 BRR PORVENIR

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 8 8 3 8 0	2 0 1 6 0 1 1 8
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 7 3 8 3 3 5 4 7	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 6 de 7 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141006983409

(415)7707212489984(8020) 000014100698340 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 3 5 2 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3	

162. Nombre del establecimiento: FERREMETALICAS COLOMBIA NEIVA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1	

165. Dirección: CL 3 6 48

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 7 6 6 4 7	2 0 1 6 0 1 2 9	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 5 2 2 9 7 8 6 8	2 0 2 0 0 3 0 9	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3	

162. Nombre del establecimiento: FERREMETALICAS COLOMBIA PLANTA DE MALLAS SOACHA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CR 17 30 80 BRR CIUDAD DE QUITO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 7 8 2 9 7 4	2 0 1 7 0 2 2 0	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 7 4 0 1 7 6 6 6		

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería 4 6 6 3	

162. Nombre del establecimiento: FERREMETALICAS COLOMBIA MOSQUERA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cundinamarca 2 5	Facatativá 2 6 9	

165. Dirección: AV TRONCAL DE OCCIDENTE 18 76 BG 11 PAR SANTO DOMINGO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 0 7 4 1 0	2 0 1 7 0 2 1 5	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 8 2 0 9 9 9 3 3		

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 7 de 7 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141006983409

(415)7707212489984(8020) 000014100698340 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 3 5 2 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3	

162. Nombre del establecimiento: FERREMETALICAS COLOMBIA CEDIS VILLAVICENCIO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1	

165. Dirección: CR 48 19 122 BRR CATUMARE

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
3 1 3 2 2 7	2 0 1 7 0 4 2 7	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 7 3 8 3 3 5 4 7		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 4 6 6 3	

162. Nombre del establecimiento: FERREMETALICAS COLOMBIA BOGOTA CALLE 12

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CL 12 15 42

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 6 6 4 7 8 9	2 0 1 6 0 3 1 0	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 6 8 7 6 8 1 0 7	2 0 2 1 1 2 0 2	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Jueves, 3 de abril de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ARCOE SAS identificado(a) con NIT 900783521, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	36452637120	2015/12/21	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Villavicencio, 23 de Abril del 2026

CUENTA DE COBRO No. 017

UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
NIT 902011453-2

DEBE A:

GONZALO ANDRES BECERRA MORALES

CC. 1.121.868.023 DE VILLAVICENCIO

La suma de: **SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($70.877.778) M/CTE, por concepto de SERVICIO DE TRANSPORTE de materiales e insumo para la obra que tiene como objeto CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META**

.

GONZALO ANDRES BECERRA MORALES
CC. 1.121.868.023 DE VILLAVICENCIO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14969358167

(415)7707212489984(8020) 000001496935816 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 2 1 8 6 8 0 2 3	5	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 1 8 6 8 0 2 3

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BECERRA	MORALES	GONZALO	ANDRES

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CR 40 5 A 41 SUR

42. Correo electrónico ing.gonzalobecerra19@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 8 7 5 6 1 4 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 1	2 0 1 4 0 7 0 1	4 3 9 0	2 0 1 4 1 2 0 3		4 1 1 2	4 6 6 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	2	2	4	9																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023-12-27 / 03:15:13PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BECERRA MORALES GONZALO ANDRES

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

PUERTO GAITAN, **23/04/2026**
META,
COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor GONZALO BECERRA MORALES** con **Cédula de Ciudadanía** número **1121868023**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488441091417**
Fecha de apertura	**02/09/2023**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141225381288

(415)7707212489984(8020) 000014122538128 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 0 3 4 0 5 4 7	0	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 0 3 4 0 5 4 7

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ARTUNDUAGA	BARRERA	JESSICA	LICETH

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: DG 6 SUR 39 144 TO 20 404 CONJ AMARILO PIEDEMONTE

42. Correo electrónico: jessicaartunduaga0925@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 8 5 7 6 6 3 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 4 9	2 0 2 4 0 3 0 6	4 7 7 1	2 0 2 4 0 8 2 2	4 6 5 1	3 1 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-12-15 / 12:23:31PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ARTUNDUAGA BARRERA JESSICA LICETH

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

SUMINISTROS FERRETEROS DEL LLANO

CR 26 4D 20

Villavicencio,Meta, Colombia

CC 40340547 -
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764107786479 del 30/03/2026 al 30/09/2026
Habilita numeración de:
FEJA-3 al FEJA-100
Régimen: No responsable de IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Factura Electronica de Venta No. FEJA3

Fecha de emisión: 30/03/2026 04:36:39 PM
Fecha de validación DIAN: 30/03/2026 04:41:36 PM
Fecha de vencimiento: 30/03/2026
Plazo (Días): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN
NIT 902011453 -2
Dirección: CL 2 27 116
Codigo Cliente 010
Teléfono: 3108885420
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Villavicencio
Departamento: Meta
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1		SUMINISTRO CIELO RASO EN LAMINA PVC BLANCO E=10MM, INCLUYE ESTRUCTURA. (OMEGAS, VIGUETA EN ALUMINIO, ANGULO, TORNILLOS, CINTA)	885,15	metro cuadrado por kilogramo	COP 117,000.00	COP 0.00			COP 103,562,550.00

Total de items: 1
Observaciones

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito

Subtotal:	COP 103,562,550.00

Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 103,562,550.00
Neto a pagar	COP 103,562,550.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 40eb175950d472df2da629d3b560fa224c7cc332707e40db66043724446c76a14d68f690eac1402a0a51553790bd1046

YULIETH KATERINE MONTOYA YARA
NIT 1.121.908.133-1
MZ 40 CS 15 BRR CORPOMECAVI
Tel: (608) 3172793262
Puerto Gaitán - Colombia
construequiposramosas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEKM 164

Señores	TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN		
NIT	902.011.453-2	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Puerto Gaitán - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	26/03/2026, 17:05
Expedición	26/03/2026, 17:05
Vencimiento	26/03/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION	1.00	1,821,500.00

Total Items: 1

Valor en Letras: Un millón ochocientos veintiun mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	1,821,500.00
Total a Pagar	1,821,500.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,821,500.00

Retara $ 72.860.
Rep $ 1.748.640.

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764104758585 aprobado en 20260119 prefijo FEKM desde el número 101 al 1000 Vigencia: 24 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. Tarifa 10*1000

CUFE: 40871b2069c142de22df7146f61166fd6b91fdacd99ccf2e075bdb501d15381be0a5e562101b148f0f114924311898ca

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vez en el XML

Scanned with CamScanner

CONSTRUEQUIPOS RAMOS

ALQUILER DE TODA CLASE DE EQUIPOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN

- MEZCLADORAS
- VIBRADORES
- TABLAS
- COMPRESORES
- ANDAMIOS
- CERCHAS
- CARRETILLAS
- PARALES
- FORMALETAS

NIT. 1.121.908.124-1 NO RESPONSABLE DE IVA

AFILIADO A LA CAMARA Y COMERCIO PTO. GAITAN

310 873 4398

FECHA		
DIA	MES	AÑO
26	03	2026

RECIBO Nº 0831 **B**

Señores: ING. POLICIA.

Cotización ☐ Remisión ☐

Dirección: NIT.:

Ciudad: Tel.

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
3	andamios 14.03 - 26.03 11 dias	2000	66000.
3	tablones 14.03 - 26.03 11 dias	1300	49500
30	FN Sardinel 14.03 - 24.03 11 dias	3000	990000
1	Canguro 16.03 - X 1 dia.	90000	90000
1	Vibro. 17.03 - 24.03 X 7 dias	50000	350000
1	FN 30x30 17.03 - 26.03 x 9	15000	135000
1	FN 30 x 30 24.03 - 26.03 x 3.	15000	45000
16	FN Sardinel 25.03 - 26.03 x 2.	3000	96000
ABONO $	SALDO $	TOTAL $	1821500

Esta factura cambia en dólares (US) efectivos a una tasa de cambio según el Art. 617 del Estatuto Tributario.

Firma Cliente

Firma Recibe

NIT. 79957755-7 331 248 58 11

Scanned with CamScanner

Certificado
Bancario

Viernes, 14 de julio de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que YULIETH KATERINE MONTOYA YARA identificado(a) con CC 1121908133, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	28939348206	2022/07/14	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

Scanned with CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: **141176641898**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 2 1 9 0 8 1 3 3	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 1 9 0 8 1 3 3

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MONTOYA	YARA	YULIETH	KATERINE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSTRUEQUIPOS RAMOS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Puerto Gaitán 5 6 8

41. Dirección principal: TV 9 N 11 25 BRR EL TRIUNFO

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
construequiposramos@gmail.com		3 1 7 2 7 9 3 2 6 2	3 1 0 8 7 3 4 3 9 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2		51. Código	52. Número establecimientos
7 7 3 0	2 0 1 7 0 1 1 6	7 7 1 0	2 0 1 7 0 1 1 6	4 1 1 1				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										
54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MONTOYA YARA YULIETH KATERINE

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 30-04-2025 03:53:32PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

Scanned with CamScanner

NIT: 822001738-3 REGIMEN COMUN
DIR: CR 33 N° 21 - 69 Barrio San Benito - CELS: 3138846703-3115210353

COTIZACION Nro: 0000002096

Nombre : UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN N.I.T. : 902011453

Razon Soc : UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

Fecha : 09/04/2026

Direccion : CL 2 27 116 Tel : Vend : SM

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNIT	DESC.	SUBTOTAL
100005	SIKA 1 X 20 KG	UNID	5.00	330,924	0.00	1,654,621
100191-1	SIKAFILL 12 POWER GRIS X 4.4. KG	UNID	1.00	86,470	0.00	86,470

SON: DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00 CENTAVO

CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

VALIDEZ DE LA COTIZACION:3 DIAS

OBSERVACIONES : SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA:

SUBTOTAL	1,741,092
DESCUENTO	0
IVA	330,808
NETO	2,071,900

Retención $ 43.527.

total a pagar $ 2.028.373.

Scanned with CamScanner

Certificado
Bancario

Miércoles, 9 de julio de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SIKGLASS LTDA identificado(a) con NIT 822001738, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	84458766313	2010/05/06	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14976142171

(415)7707212489984(8020) 000001497614217 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 2 0 0 1 7 3 8	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SIKGLASS LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CR 33 21 69

42. Correo electrónico			
sikglasselectronica@gmail.com			
43. Código postal 5 0	44. Teléfono 1 6 7 0 3 0 3 0	45. Teléfono 2 3 1 1 5 2 1 0 3 5 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	1 9 9 8 0 1 1 4	4 3 9 0	1 9 9 8 0 1 1 4				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 3 3 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HERNANDEZ GONZALEZ WILLIAM ORLANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 11-02-2025 09:54:43AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14976142171

(415)7707212489984(8020) 000001497614217 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 2 0 0 1 7 3 8	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 4
72. Número	0 3 8 0	4 9 8
73. Fecha	1 9 9 7 1 2 0 4	2 0 1 1 0 3 2 4
74. Número de notaría	4	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 8 0 1 1 3	2 0 1 1 0 4 1 2
77. No. Matrícula mercantil	6 1 0 2 6	0 0 0 3 7 0 1 6
78. Departamento	5 0	5 0
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4 0
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 8 0 1 1 3	
81. Hasta	2 0 2 7 1 2 0 4	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14976142171

(415)7707212489984(8020) 000001497614217 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 2 0 0 1 7 3 8	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 9 7 1 2 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 0 8 5 5 3 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HERNANDEZ	GONZALEZ	WILLIAM	ORLANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 2 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 9 5 8 1 0 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HERNANDEZ	HENAO	DAVID	JULIAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 11-02-2025 09:54:43AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14976142171

(415)7707212489984(8020) 000001497614217 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 2 2 0 0 1 7 3 8	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 0 8 5 5 3 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HERNANDEZ	GONZALEZ	WILLIAM	ORLANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
51,850,000	7 4 . 0 7	1 9 9 7 1 2 0 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Registro Civil de N 1 1	4 1 7 8 4 9 2 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HERNANDEZ	VANEGAS	FEDERICO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
800,000	1 . 1 5	1 9 9 7 1 2 0 4	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 9 5 8 1 0 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HERNANDEZ	HENAO	DAVID	JULIAN

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
2,500,000	3 . 5 7	1 9 9 7 1 2 0 4	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 2 1 9 4 0 2 5 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HERNANDEZ	RODRIGUEZ	SANTIAGO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
7,420,000	1 0 . 6	1 9 9 7 1 2 0 4	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 0 6 8 7 4 3 6 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HERNANDEZ	RODRIGUEZ	MARIA	CAMILA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
7,430,000	1 0 . 6 1	1 9 9 7 1 2 0 4	

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 6 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14976142171

(415)7707212489984(8020) 000001497614217 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 2 0 0 1 7 3 8	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 6 0 5 0 5 5 3		1 1 4 1 9 5

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
SUAREZ	FLORIDO	FERNANDO	ANTONIO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 1 2 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 6 de 6 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14976142171

(415)7707212489984(8020) 000001497614217 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 2 0 0 1 7 3 8	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de edificios residenciales 4 1 1 1	
162. Nombre del establecimiento: SIKGLASS LIMITADA		
163. Departamento: Meta 5 0	164. Ciudad/Municipio: Villavicencio 0 0 1	
165. Dirección: CR 33 21 69		
166. Número de matrícula mercantil: 6 1 0 2 6	167. Fecha de la matrícula mercantil: 1 9 9 8 0 1 1 3	
168. Teléfono: 6 7 0 3 0 3 0	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

UNIÓN TEMPORAL
INGE
POLICIA
GAITÁN

CERTIFICADOS DE CALIDAD

CALLE 2 No 27 – 116 Villavicencio – Meta
Tel. 310 888 54 20

INFORME DE ENSAYOS

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
22-LAB 041

Ternium
El acero que hace fuerte a Colombia

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S.
NIT: 901131909-1 **Página Web:** www.ternium.com.co
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Vía Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico,Colombia

INFORMACIÓN GENERAL

Cliente: GYJ FERRETERIAS SA VILLAVICENCIO
Dirección: CR 22 8 ESQ VILLAVICENCIO
Teléfono: 6713424

Fecha Impresión: 2026/05/17
Nro.Remisión: 187358497

Nro.Informe: 173528
Nro.Informe Ant:
Centro: Centro Planta Atlantico

DATOS GENERALES

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	COLADA/LOTE	PESO.PAQ (KG)	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS0018772	1468	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS0018774	1465	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS0018782	1465	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS0018784	1485	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS0018828	1404	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS0018829	1505	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS0018830	1478	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS001901F	1458	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS0019446	1475	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS0019447	1462	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS0019448	1455	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS0019451	1455	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS001952J	1448	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS001961K	1462	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS001961L	1465	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS001961P	1445	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS001964C	1438	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autorizó
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

DATOS GENERALES

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	COLADA/LOTE	PESO.PAQ (KG)	FORMA PRODUCTO	FABRICANTE
C8007443	BARRA CORR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BNS0019725	1448	NTC 2289 GR30	Ternium Atlántico

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decision aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autorizado
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES QUÍMICAS

MATERIAL	COLADA/LOTE	% C	% Mn	% Mo	% Si	% S	% P	% Cr	% Ni	% Cu	% V	% CE
C8007443	BNS001964C	0.26	0.99	0.014	0.23	0.019	0.022	0.210	0.070	0.20	0.003	0.46
C8007443	BNS0019725	0.27	0.92	0.012	0.25	0.024	0.025	0.230	0.070	0.16	0.004	0.46
C8007443	BNS001952J	0.27	0.92	0.014	0.25	0.026	0.032	0.230	0.070	0.25	0.003	0.45
C8007443	BNS001961K	0.26	0.99	0.014	0.23	0.019	0.022	0.210	0.070	0.20	0.003	0.46
C8007443	BNS001961L	0.26	0.99	0.014	0.23	0.019	0.022	0.210	0.070	0.20	0.003	0.46
C8007443	BNS001961P	0.26	0.99	0.014	0.23	0.019	0.022	0.210	0.070	0.20	0.003	0.46
C8007443	BNS0019446	0.27	0.96	0.013	0.23	0.022	0.022	0.210	0.070	0.20	0.003	0.46
C8007443	BNS0019447	0.27	0.96	0.013	0.23	0.022	0.022	0.210	0.070	0.21	0.004	0.46
C8007443	BNS0019448	0.27	0.96	0.013	0.23	0.022	0.022	0.210	0.070	0.21	0.004	0.46
C8007443	BNS0019451	0.27	0.96	0.013	0.23	0.022	0.022	0.210	0.070	0.21	0.004	0.46
C8007443	BNS001901F	0.28	0.91	0.014	0.22	0.027	0.027	0.220	0.070	0.20	0.004	0.46
C8007443	BNS0018828	0.26	0.98	0.015	0.21	0.025	0.028	0.230	0.060	0.20	0.003	0.45
C8007443	BNS0018829	0.26	0.98	0.015	0.21	0.025	0.028	0.230	0.060	0.20	0.003	0.45
C8007443	BNS0018830	0.26	0.98	0.015	0.21	0.025	0.028	0.230	0.060	0.20	0.003	0.45
C8007443	BNS0018772	0.28	0.90	0.015	0.22	0.032	0.030	0.250	0.080	0.21	0.004	0.46
C8007443	BNS0018774	0.28	0.90	0.015	0.22	0.032	0.030	0.250	0.080	0.21	0.004	0.46
C8007443	BNS0018782	0.28	0.90	0.015	0.22	0.032	0.030	0.250	0.080	0.21	0.004	0.46
C8007443	BNS0018784	0.28	0.90	0.015	0.22	0.032	0.030	0.250	0.080	0.21	0.004	0.46

sultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del
lo emisor.
sultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación
.
edades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de
cto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES FISICAS

ATERIAL M.	COI ADA/LC *E	Resiste cia Fluen ia MPa	Resisten la Fracció MPa	Ala gamien o %	D olado	Rel ción R RF	Fecha Ensayo
8007443	BNS0019640	476	622	18.56	SinGrieta	1.31	20260513
8007443	BNS0019725	480	631	16.40	SinGrieta	1.32	20260514
8007443	BNS0019521	500	660	15.29	SinGrieta	1.32	20260513
8007443	BNS0019618	476	622	18.56	SinGrieta	1.31	20260513
8007443	BNS0019619	476	622	18.56	SinGrieta	1.31	20260513
8007443	BNS0019620	476	622	18.56	SinGrieta	1.31	20260513
8007443	BNS0019446	489	647	15.82	SinGrieta	1.32	20260512
8007443	BNS0019447	489	647	15.82	SinGrieta	1.32	20260512
8007443	BNS0019448	489	647	15.82	SinGrieta	1.32	20260512
8007443	BNS0019449	489	647	15.82	SinGrieta	1.32	20260512
8007443	BNS0019019	505	674	16.45	SinGrieta	1.34	20260511
8007443	BNS0018828	481	641	15.96	SinGrieta	1.33	20260510
8007443	BNS0018829	481	641	15.96	SinGrieta	1.33	20260510
8007443	BNS0018830	481	641	15.96	SinGrieta	1.33	20260510
8007443	BNS0018772	490	649	15.25	SinGrieta	1.32	20260509
8007443	BNS0018774	490	649	15.25	SinGrieta	1.32	20260509
8007443	BNS0018782	490	649	15.25	SinGrieta	1.32	20260509
8007443	BNS0018784	490	649	15.25	SinGrieta	1.32	20260509

ultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados aquí descritos.
Este producir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del
Nos reservamos
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA_PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación
Las
Las Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de
pro

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES DIMENSIONALES

MATERIAL	COLADA/LOTE	Espaciamiento mm	Peso Metro (Masa) Kg/m	Altura Resalte mm	Separación Extremos mm	Angulo Resalte °
C8007443	BNS001964C	6.08	0.560	0.57	2.34	53
C8007443	BNS0019725	6.10	0.563	0.57	2.34	53
C8007443	BNS001952J	6.06	0.564	0.53	2.32	53
C8007443	BNS001961K	6.08	0.560	0.57	2.34	53
C8007443	BNS001961L	6.08	0.560	0.57	2.34	53
C8007443	BNS001961P	6.08	0.560	0.57	2.34	53
C8007443	BNS0019446	6.06	0.564	0.53	2.15	53
C8007443	BNS0019447	6.06	0.564	0.53	2.15	53
C8007443	BNS0019448	6.06	0.564	0.53	2.15	53
C8007443	BNS0019451	6.06	0.564	0.53	2.15	53
C8007443	BNS001901F	6.07	0.563	0.49	2.22	50
C8007443	BNS0018828	6.07	0.562	0.61	2.15	55
C8007443	BNS0018829	6.07	0.562	0.61	2.15	55
C8007443	BNS0018830	6.07	0.562	0.61	2.15	55
C8007443	BNS0018772	6.02	0.565	0.52	2.30	53
C8007443	BNS0018774	6.02	0.565	0.52	2.30	53
C8007443	BNS0018782	6.02	0.565	0.52	2.30	53
C8007443	BNS0018784	6.02	0.565	0.52	2.30	53

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

MÉTODOS DE ENSAYO Y DECLARACIÓN DE INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Tracción: NTC 2289:2020, Num. 9 y 15.2 NTC 3353:2024 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2:2024 Num. 5.1, 5.2.1,5.2.2, 6.6, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5,7.6, 7.7, 7.10, 7.11,7.13, 7.14, 8

* Doblado: NTC 2289:2020, Num. 10 NTC 3353: 2024 Num. 15 NTC 1:2024 Num. 4.6, 6.2, 8.1.1, 9.3, 9.7, 9.9, 10 y 11

* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8

* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

VARIABLE	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA(1)
Resistencia a la Fluencia	± 2.69 MPA
Resistencia a la Tracción	± 2.45 MPA
Alargamiento	± 0.60 %
Altura Resalte	± 2 %
Separación entre extremos	± 4 %
Espaciamiento	± 0.30 %
Angulo de Resalte	± 0.53 °
Peso metro (masa)	± 0.20 %

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianzade 95%.

Fin del Informe

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

艾贝思（天津）钢铁有限公司
IBC (TIANJIN) INDUSTRIAL CO.,LTD

产品质量证明书
QUALITY CERTIFICATE

RM 809,BUILDING C,HITECH INFORVATION PLAZA
HANKAI DISTRICT,TIANJIN,CHINA 300384 TEL: 022-65397226

CUSTOMER NAME/客户名称： ARCOE S.A.S

CERTIFICATE NO./质保证书号： IBC250320F25

COMMODITY/品名： ANNEALED WIRE

DATE OF ISSUE/日期： MAR.20,2025

SPEC/标准： SAE 1008

INVOICE NO./发票号: IUS-202502-005

SIZE 规格	BATCH NO. 批号	BAGS 袋数	NET Weight 重量 (TONS)	CHEMICAL ANALYSIS化学成分 %					MECHANICAL PROPERTIES/物理性能			
				C	Si	Mn	P	S	T.S (Mpa)	EL(%)	180° Cold Bending B.T	SURFACE
1.47MM	D25-031510	136	136	0.05	0.038	0.32	0.024	0.020	364	31.5	OK	GOOD
TOTAL		136	136									
SURVEYOR TO	NOTES T.S : Tensile Strength/抗拉强度 EL : Elongation/延伸率									Inspector 检验员		
	WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MANUFACTURED AND TESTED WITH SATISFACTORY RESULTS IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD TECHNIQUE. 兹证明本表所列产品，均按标准进行制造及试验，并且符合规范之要求											

Scanned with CamScanner

DECLARACIÓN

El alambre galvanizado suave fabricado y suministrado por la Productora de Alambres Colombianos - Proalco S.A.S., cumple con los siguientes requisitos técnicos:

CALIBRE (BWG)	DIAMETRO (mm)	TOLERANCIA DIAMETRO (mm)	MASA MÍNIMA DE RECUBRIMIENTO DE ZINC (g/m²)	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN MÁXIMA (kgf/mm²)
14	2,11	± 0,04	40	42
13,5	2,25	± 0,04	40	42
13	2,40	± 0,04	40	42
12,5	2,50	± 0,04	40	42
12	2,77	± 0,04	40	42
11	3,05	± 0,04	40	42
10,5	3,25	± 0,04	40	42
9	3,76	± 0,04	40	42
8	4,19	± 0,04	40	42
6	5.15	± 0.04	40	42

"Las copias impresas son sólo válidas garantizando su actualización con sello original del sistema documental"

ENVIADO DESDE EL SISTEMA DOCUMENTAL PARA EL CLIENTE ARCOE SAS VILLAVICENCIO

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according to ISO/IEC 17067) for

TUBERÍA DURAFORT ALCANTARILLADO

Fabricado por **CELTA S.A.S.** en la Carrera 24 No. 30-500, Soledad, Atlántico, COLOMBIA, identificada con número de NIT 800.164.590-1

Manufactured by **CELTA S.A.S.** in the Carrera 24 No. 30-500, Soledad, Atlántico, COLOMBIA, identificada con número de NIT 800.164.590-1

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 5055 (2018)

Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) (PVC) perfilados para uso en alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno

Poly(vinyl chloride) (PVC) profile gravity sewer pipe and fittings based on controlled inside diameter

SECTOR ICS 23.040.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC

Las ubicaciones autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral de presente certificado

The locations authorized to hold this certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC - CER395916
Certificate

Fecha de Aprobación:	2015-06-17	Fecha Última Modificación:	
Approval Date:		Last Modification Date:	
Fecha del Último Vencimiento:	2024-04-19	Fecha de Restauración:	2024-10-11
Last Due Date:		Restoration Date:	
Fecha del Próximo Vencimiento:	2025-04-18		
Next Due Date:			

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ANAB

icontec

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBERÍA A PRESIÓN

Fabricado por: **CELTA S.A.S.:** Carrera 24 No. 30 - 500, Soledad, Atlántico, Colombia; **Planta Maquila:** Autopista sur No. 71 - 75, Bogotá D.C., Colombia

Manufactured by: **CELTA S.A.S.:** Carrera 24 No. 30 - 500, Soledad, Atlántico, Colombia; **Planta Maquila:** Autopista sur No. 71 - 75, Bogotá D.C., Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 382 (2018)

Plásticos. Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) clasificados según la presión (serie RDE)

Plastics. Poly (vinyl chloride) (PVC) pressure rated pipes (SDR series)

SECTOR ICS: 23.040.20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC.

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las ubicaciones autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado.

The locations authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate.

Certificado: CSC-0003-1
Certificate

Fecha de Aprobación:	1975-12-05	Fecha Última Modificación:	
Approval Date		Last Modification Date	
Fecha de Renovación:	2023-08-01	Fecha de Vencimiento:	2029-08-31
Renewal Date		Expiration Date	

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

icontec

ANAB

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

El acero que hace fuerte a Colombia

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S.
NIT: 901131909-1 **Página Web:** www.ternium.com.co
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Vía Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico,Colombia

INFORMACIÓN GENERAL

Cliente: GYJ FERRETERIAS SA VILLAVICENCIO
Dirección: CR 22 8 ESQ VILLAVICENCIO
Teléfono: 6713424

Fecha Impresión: 2026/04/30
Nro.Remisión: 187349721

Nro.Informe: 170400
Nro.Informe Ant:
Centro: Centro Planta Atlantico

DATOS GENERALES

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	COLADA/LOTE	PESO.PAQ(KG)	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BNS001503C	1997	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BNS001503D	1997	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BNS001503E	1955	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BNS001513J	1979	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BNS001513K	1985	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BNS001513L	1961	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BNS001513M	1985	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BNS001513N	1973	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BNS001513P	1961	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BNS001513Q	2003	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BNS001513R	2003	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BNS001513S	1985	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BNS0015181	1955	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BNS0015195	1967	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BNS0015196	1961	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BNS0015197	1979	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Quimicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES QUÍMICAS

MATERIAL	COLADA/LOTE	% C	% Mn	% Mo	% Si	% S	% P	% Cr	% Ni	% Cu	% V	% CE
C8001348	BNS0015181	0.25	0.95	0.014	0.25	0.026	0.028	0.220	0.060	0.17	0.003	0.43
C8001348	BNS0015195	0.25	0.95	0.014	0.25	0.026	0.028	0.220	0.060	0.17	0.003	0.43
C8001348	BNS0015196	0.25	0.95	0.014	0.25	0.026	0.028	0.220	0.060	0.17	0.003	0.43
C8001348	BNS0015197	0.25	0.95	0.014	0.25	0.026	0.028	0.220	0.060	0.17	0.003	0.43
C8001348	BNS001513J	0.25	0.95	0.014	0.25	0.026	0.028	0.220	0.060	0.17	0.003	0.43
C8001348	BNS001513K	0.25	0.95	0.014	0.25	0.026	0.028	0.220	0.060	0.17	0.003	0.43
C8001348	BNS001513L	0.25	0.95	0.014	0.25	0.026	0.028	0.220	0.060	0.17	0.003	0.43
C8001348	BNS001513M	0.25	0.95	0.014	0.25	0.026	0.028	0.220	0.060	0.17	0.003	0.43
C8001348	BNS001513N	0.25	0.95	0.014	0.25	0.026	0.028	0.220	0.060	0.17	0.003	0.43
C8001348	BNS001513P	0.25	0.95	0.014	0.25	0.026	0.028	0.220	0.060	0.17	0.003	0.43
C8001348	BNS001513Q	0.25	0.95	0.014	0.25	0.026	0.028	0.220	0.060	0.17	0.003	0.43
C8001348	BNS001513R	0.25	0.95	0.014	0.25	0.026	0.028	0.220	0.060	0.17	0.003	0.43
C8001348	BNS001513S	0.25	0.95	0.014	0.25	0.026	0.028	0.220	0.060	0.17	0.003	0.43
C8001348	BNS001503C	0.28	0.87	0.016	0.25	0.025	0.027	0.230	0.080	0.19	0.003	0.46
C8001348	BNS001503D	0.28	0.87	0.016	0.25	0.025	0.027	0.230	0.080	0.19	0.003	0.46
C8001348	BNS001503E	0.28	0.87	0.016	0.25	0.025	0.027	0.230	0.080	0.19	0.003	0.46

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Quimicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES FÍSICAS

MATERIAL	COLADA/LOTE	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Fecha Ensayo
C8001348	BNS0015181	489	620	17.7	SinGrieta	1.27	20260429
C8001348	BNS0015195	489	620	17.7	SinGrieta	1.27	20260429
C8001348	BNS0015196	489	620	17.7	SinGrieta	1.27	20260429
C8001348	BNS0015197	489	620	17.7	SinGrieta	1.27	20260429
C8001348	BNS001513J	489	620	17.7	SinGrieta	1.27	20260429
C8001348	BNS001513K	489	620	17.7	SinGrieta	1.27	20260429
C8001348	BNS001513L	489	620	17.7	SinGrieta	1.27	20260429
C8001348	BNS001513M	489	620	17.7	SinGrieta	1.27	20260429
C8001348	BNS001513N	489	620	17.7	SinGrieta	1.27	20260429
C8001348	BNS001513P	489	620	17.7	SinGrieta	1.27	20260429
C8001348	BNS001513Q	489	620	17.7	SinGrieta	1.27	20260429
C8001348	BNS001513R	489	620	17.7	SinGrieta	1.27	20260429
C8001348	BNS001513S	489	620	17.7	SinGrieta	1.27	20260429
C8001348	BNS001503C	473	613	17.4	SinGrieta	1.29	20260429
C8001348	BNS001503D	473	613	17.4	SinGrieta	1.29	20260429
C8001348	BNS001503E	473	613	17.4	SinGrieta	1.29	20260429

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA,PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES DIMENSIONALES

MATERIAL	COLADA/LOTE	Espaciamiento mm	Peso Metro (Masa) Kg/m	Altura Resalte mm	Separación Extremos mm	Angulo Resalte °
C8001348	BNS0015181	7.95	0.954	0.80	2.35	50
C8001348	BNS0015195	7.95	0.954	0.80	2.35	50
C8001348	BNS0015196	7.95	0.954	0.80	2.35	50
C8001348	BNS0015197	7.95	0.954	0.80	2.35	50
C8001348	BNS001513J	7.95	0.954	0.80	2.35	50
C8001348	BNS001513K	7.95	0.954	0.80	2.35	50
C8001348	BNS001513L	7.95	0.954	0.80	2.35	50
C8001348	BNS001513M	7.95	0.954	0.80	2.35	50
C8001348	BNS001513N	7.95	0.954	0.80	2.35	50
C8001348	BNS001513P	7.95	0.954	0.80	2.35	50
C8001348	BNS001513Q	7.95	0.954	0.80	2.35	50
C8001348	BNS001513R	7.95	0.954	0.80	2.35	50
C8001348	BNS001513S	7.95	0.954	0.80	2.35	50
C8001348	BNS001503C	7.93	0.951	0.79	2.47	50
C8001348	BNS001503D	7.93	0.951	0.79	2.47	50
C8001348	BNS001503E	7.93	0.951	0.79	2.47	50

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

MÉTODOS DE ENSAYO Y DECLARACIÓN DE INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Tracción: NTC 2289:2020, Num. 9 y 15.2 NTC 3353:2024 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2:2024 Num. 5.1, 5.2.1,5.2.2, 6.6, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5,7.6, 7.7, 7.10, 7.11,7.13, 7.14, 8

* Doblado: NTC 2289:2020, Num. 10 NTC 3353: 2024 Num. 15 NTC 1:2024 Num. 4.6, 6.2, 8.1.1, 9.3, 9.7, 9.9, 10 y 11

* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8

* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

VARIABLE	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA(1)
Resistencia a la Fluencia	± 2.69 MPA
Resistencia a la Tracción	± 2.45 MPA
Alargamiento	± 0.60 %
Altura Resalte	± 2 %
Separación entre extremos	± 4 %
Espaciamiento	± 0.30 %
Angulo de Resalte	± 0.53 °
Peso metro (masa)	± 0.20 %

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianzade 95%.

Fin del Informe

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

AM FERRETERÍA
ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S.

NIT. 900.034.102
CLL 7 # 37 A 05

ICONTEC Sello de Calidad — NTC 5806: Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil

ICONTEC Sello con Reconocimiento Técnico — Resolucion 0277 de 2015: Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil

REPORTE DE CALIDAD
Informe de Ensayos Mecánicos de Malla Electrosoldada


FQ1201 | Fecha Rev:18-12-17 | Version: 1

Fecha de Emision : 30/03/2026
Cliente:

Descripcion de la muestra	
N° de Ensayo	3597-1
Referencia de Malla	XX-159
Diámetro de Grafil Long:	5,5
Diamentro de Grafil Transv:	5,5
Fecha de Producción de la Malla	30/03/2026
Fecha de recepcion de muestra	30/03/2026
Fecha de Ensayo	30/03/2026

ENSAYO DE RESISTENCIA AL CORTE EN LA SOLDADURA

N° ENSAYO	CARGA (N)	LUGAR DE FALLA	
1	14.261	Grafil	
2	12.990	Grafil	
3	14.077	Grafil	
4	11.436	Grafil	
5			
Promedio	13.191		
Requisito de Norma NTC 5806 N° 8.3	5.726		U (KN)
CUMPLE (SI/NO)	SI		6,66

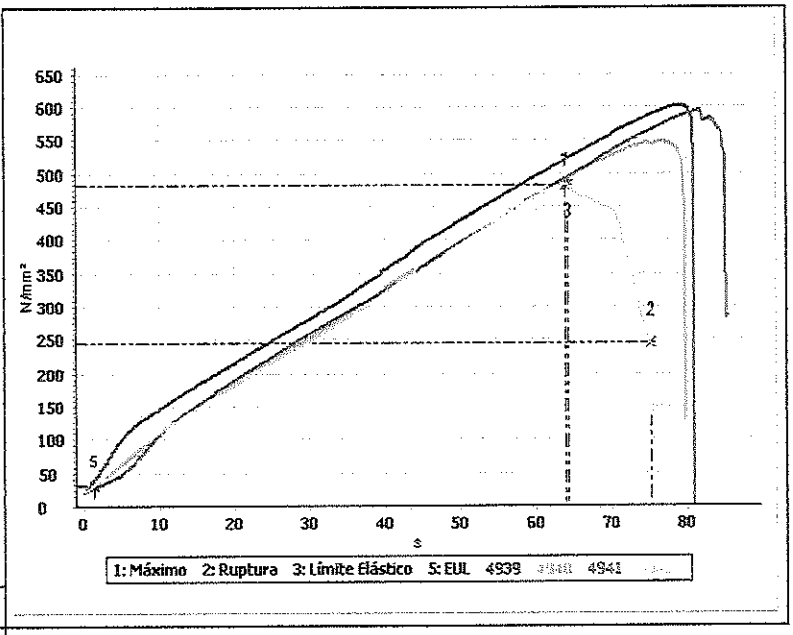

ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

N° DE BARRAS (Requisito Norma NTC 5806-2019 N°10.7)

TIPO	OBTENIDO	REQUISITO	CUMPLE (SI/NO)
Longitudinales	16	16	SI
Transversales	40	40	SI

LONGITUD TOTAL DEL GRAFIL (Requisito Norma NTC 5806-2019 N° 10)

TIPO	OBTENIDO (mm)	REQUISITO (±25mm)	CUMPLE (SI/NO)
Longitudinales	5.980	6.000	SI
Tranversales	2.340	2.350	SI

SEPARACION DE LOS GRAFILES (Requisito Norma NTC 5806-2019 N°11)

	OBTENIDO (mm)	REQUISITO (mm)	CUMPLE (SI/NO)
Longitudinales	151	150	SI
Transversales	150	150	SI

MEDICION DE PELOS (Requisito Norma NTC 5806-2019 N°10.3)

TIPO	PROMEDIO OBTENIDO (mm)	REQUISITO (mm)	CUMPLE (SI/NO)	METODO DE ENSAYO
Longitudinales	80	75	SI	(NTC 5806-2019 N° 10.3) (±13mm)
Tranversales	40	50	SI	(NTC 5806-2019 N° 10.3) (±13mm)

Condiciones Ambientales			
Temperatura promedio °C	22,7	Humedad Relativa promedio (%HR)	44,0

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas grafil y 7000 m2 para Malla.

AM FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S. NIT. 900 034 102 Aprobó:

Realizó
Juliana Cuervo Soler
LABORATORISTA
Juliana Cuervo Soler

Revisa:
CALIDAD
Ing. Sebastian Olave

JEFE DE CALIDAD
Ing. Sebastian Olave

AMFERRETERÍA
ANDRES MARTÍNEZ S. A. S.
UNA EMPRESA DE ÉXITO Y EXCELENCIA

NIT. 900,034,102
CLL 7 # 37A-05

REPORTE DE CALIDAD
Informe de Ensayos Mecánicos Grafil

NTC-5806 Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil.

Resolución 0277 de 2015 Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil.

FQ1201 | Fecha Rev: 18-12-17 | Version 1


Fecha Emisión Certificado 1/04/2026

Cliente:

Caracteristicas de la Muestra Ensayada

DESCRIPCION	MUESTRA GRAFIL
Informe N°	5239
Diametro de Grafil (mm)	5,5
Lote	2891
Fecha de Fabricación	26/02/2026
Fecha de recepcion de la muestra	26/02/2026
Fecha de Ensayo	26/02/2026
Longitud de la Muestra (mm)	400

GRAFICA DE ENSAYO DE TENSIÓN

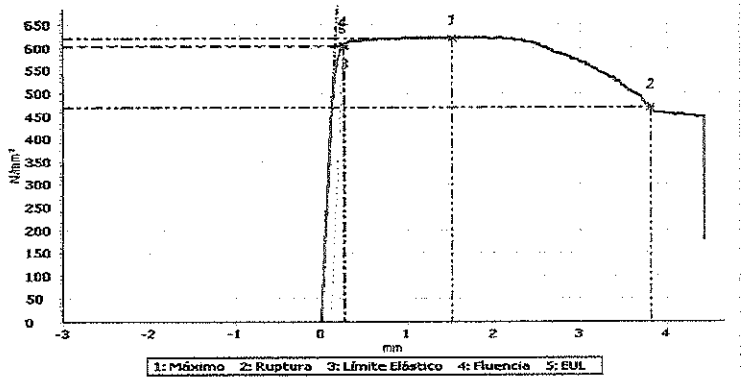

Condiciones ambientales de los ensayos

Temperatura promedio °C	20,1			Humedad relativa (HR%)		45,0	
DESCRIPCION	UNIDAD	UND	U	MUESTRA GRAFIL		REQUISITOS	
				Nominal	5,5	NTC 5806-2019	CUMPLE (SI/NO)
Diámetro	mm	U (mm)	0,0041	5,5	5,5	Tabla N° 6	SI
Peso	g/m	U (g)	0,0031	187	177,27	7.2.7.1	SI
Promedio altura resaltes	mm	U (g)	0,0031	0,25	0,34	7.2.4.4	SI
Espaciamiento entre resaltes	mm	U (mm).	0,0045	4,62 a 7,24	5,79	7.2.4.6	SI
Espaciamiento longitudinal por pulgada de resaltes	N/A	U (mm.).	0,058	3,5 a 5,5	4,00	7.2.4.3	SI
Ángulo resaltos	°	U (°)	0,00992	Min 45°	52	7.2.4.5	SI
Resaltes en direccion inversa	N/A	N/A	#N/D	N/A	N/A	7.2.4.5	SI
Area superficial grafilada	%	U (mm)	0,0045	Min 25%	26	7.2.4.1	SI
Lineas de resaltes	Unidad	U (mm)	0,0045	Min 2	3	7.2.4.2	SI

CALIDAD, ACABADO Y APARIENCIA		
Libre de imperfecciones perjudiciales y buen acabado superficial	7.4.1	SI
Libre de óxido.	7.4.2- 7.4.3	SI

PROPIEDADES MECANICAS DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DE LA PRUEBA		UNIDAD	UND	U	VALORES		REQUISITOS	
					Especificado	Obtenido	METODO DE ENSAYO	CUMPLE (SI/NO)
TRACCION	Esfuerzo Máximo de Tracción	Mpa	U (Mpa)	2,70	550	621	NTC 5806-Tabla 9 NTC 3353	SI
FLUENCIA	Resistencia a la Fluencia	Mpa	U (Mpa)	2,70	485	601	NTC 5806-Tabla 9 NTC 3353	SI
DOBLADO	Grados	°			90	90	NTC 3353	SI

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas.

AMFERRETERÍA ANDRES MARTINEZ S.A.S. NIT. 900.034.102-1

Realiza:

Juliana Cuervo Soler

LABORATORISTA
Juliana Cuervo Soler

Revisa:

CALIDAD
Ing. Sebastian Olave

Aprueba:

JEFE DE CALIDAD
Ing. Sebastian Olave

AMFERRETERÍA
ANDRES MARTINEZ S. A. S.
UNA EMPRESA DE ÉXITO Y EXCELENCIA

NIT. 900,034,102
CLL 7 # 37A-05

REPORTE DE CALIDAD

Informe de Ensayos Mecánicos Grafil

NTC-5806 Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil.

Resolución 0277 de 2015 Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil.

FQ1201 | Fecha Rev: 18-12-17 | Version 1


Fecha Emisión Certificado 1/04/2026

Cliente:

Caracteristicas de la Muestra Ensayada

DESCRIPCION	MUESTRA GRAFIL
Informe N°	5250
Diametro de Grafil (mm)	5,5
Lote	2885
Fecha de Fabricación	2/03/2026
Fecha de recepcion de la muestra	2/03/2026
Fecha de Ensayo	2/03/2026
Longitud de la Muestra (mm)	400

GRAFICA DE ENSAYO DE TENSIÓN

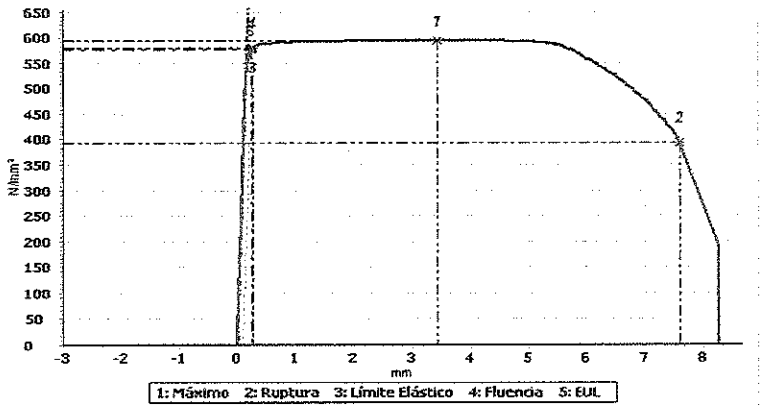

Condiciones ambientales de los ensayos

Temperatura promedio °C	20,1			Humedad relativa (HR%)		48,0	
DESCRIPCION	UNIDAD	UND	U	MUESTRA GRAFIL		REQUISITOS	
				Nominal	5,5	NTC 5806-2019	CUMPLE (SI/NO)
Diámetro	mm	U (mm)	0,0041	5,5	5,5	Tabla N° 6	SI
Peso	g/m	U (g)	0,0031	187	178,42	7.2.7.1	SI
Promedio altura resaltes	mm	U (g)	0,0031	0,25	0,32	7.2.4.4	SI
Espaciamiento entre resaltes	mm	U (mm)	0,0045	4,62 a 7,24	5,79	7.2.4.6	SI
Espaciamiento longitudinal por pulgada de resaltes	N/A	U (mm,)	0,058	3,5 a 5,5	4,00	7.2.4.3	SI
Angulo resaltes	°	U (°)	0,00092	Min 45°	50	7.2.4.5	SI
Resaltes en direccion inversa	N/A	N/A	#N/D	N/A	N/A	7.2.4.5	SI
Area superficial grafilada	%	U (mm)	0,0045	Min 25%	26	7.2.4.1	SI
Lineas de resaltes	Unicad	U (mm)	0,0045	Min 2	3	7.2.4.2	SI

CALIDAD, ACABADO Y APARIENCIA		
Libre de imperfecciones perjudiciales y buen acabado superficial	7.4.1	SI
Libre de óxido.	7.4.2- 7.4.3	SI

PROPIEDADES MECANICAS DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DE LA PRUEBA		UNIDAD	UND	U	VALORES		REQUISITOS	
					Especificado	Obtenido	METODO DE ENSAYO	CUMPLE (SI/NO)
TRACCION	Esfuerzo Máximo de Tracción	Mpa	U (Mpa)	2,70	550	594	NTC 5806-Tabla 9 NTC 3353	SI
FLUENCIA	Resistencia a la Fluencia	Mpa	U (Mpa)	2,70	485	576	NTC 5806-Tabla 9 NTC 3353	SI
DOBLADO	Grados	°			90	90	NTC 3353	SI

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas.

AM FERRETERÍA ANDRES MARTINEZ S.A.S. NIT. 900.034.102-1

Realiza:

Juliana Cuervo Soler

LABORATORISTA
Juliana Cuervo Soler

Revisa:

CALIDAD
Ing. Sebastian Olave

Aprueba:

JEFE DE CALIDAD
Ing. Sebastian Olave

Hierro 3/8

REPORTE DE CALIDAD

PazdelRio
ES COLOMBIA

FECHA: Belencito, 03.03.2026
HORA: 13:06:32
PÁGINA: 1 / 1

PRODUCTO: 6098499 - ROLLO CORR N.3 NTC 2289 G60 REPORTE: *14921
CLIENTE: ARCOE S.A.S. PLACA: GQW887 ORDEN DE ENTREGA: 8091291458

	COMPOSICIÓN QUIMICA (%)												PROPIEDADES MECÁNICAS					DIMENSIONES				
Especifca / Req.Norma:	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Cr	%Ni	%Mo	% V	%Ceq %	Re(MPa)	Fl (MPa)	R/F Pieza	AL(%)	DOBLADO	P/metro Kg	Esp.Res. mm	Alt. Res mm	Anc.Vena mm	Ang Grado
Mínimo:	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00								550,00	420	1,25	14,00		0,527		0,38		45,00
Máximo:	0,30	1,50	0,035	0,045	0,50							0,550		540					6,70		3,60	

Lote	Peso KG	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Cr	%Ni	%Mo	% V	%Ceq %	Re(MPa)	Fl (MPa)	R/F Pieza	AL(%)	DOBLADO	P/metro Kg	Esp.Res. mm	Alt. Res mm	Anc.Vena mm	Ang Grado
B67059-26	33.407,00	0,28	1,12	0,023	0,011	0,17	0,000	0,004	0,014	0,017	0,003	0,010	0,464	622,12	439,30	1,42	17,50	B	0,547	6,18	0,63	2,45	55,00

Características: Re(MPa) - RESISTENCIA Fl (MPa) - FLUENCIA R/F - RELACIÓN R/F AL(%) - ELONGACION (%) DOBLADO - B: BUENO

Método Determinación composición química: Espectrómetro de Emisión NTC 5192
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo y barra corrugada: Tracción NTC-3353,Doblado, Peso Masa NTC - 2289.
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo liso: Tracción NTC - 2, Doblado NTC - 1
Método Medición dimensional: Alambrón NTC - 330
Muestreo: Manual por Colada en Rollo y barra corrugada NTC 2289.
Muestreo: Manual por Colada en Alambrón.
Muestreo: Manual por Colada en Rollo Liso NTC 161.

Nota 1: Declaramos que los productos descritos, fueron inspeccionados y analizados conforme a lo especificado y los resultados cumplen con la norma citada. Los análisis aquí reportados corresponden a la muestra del lote Reportado.
Nota 2: Prohibida la reproducción parcial o total de éste documento, sin previa autorización de Acerías Paz del Río S.A.
Nota 3: Material libre de radiactividad,

Firma Autorizada: ING WILLIAN FERNANDO VIANCHA VALDERRAMA
Coordinador Calidad Productos, Química e Instrumental
Firma Autorizada vigente a partir de: 05.08.2025

Firma Autorizada: ING YENNY LILIANA MEDINA
Coordinador Seguridad Industrial
Firma Autorizada vigente a partir de: 04.05.2022

Sello de Calidad

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

TUBOS PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS CONDUIT

Fabricado por **CELTA S.A.S.:** Carrera 24 No. 30 - 500, Soledad, Atlántico, Colombia: **Planta Maquila:** Autopista sur No. 71 - 75, Bogotá D.C., Colombia

Manufactured by **CELTA S.A.S.:** Carrera 24 No. 30 - 500, Soledad, Atlántico, Colombia: **Planta Maquila:** Autopista sur No. 71 - 75, Bogotá D.C., Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 979 (2021)

Plásticos. Tubos y curvas de poli (cloruro de vinilo) rígido (PVC rígido) para alojar y proteger conductores eléctricos y cableado telefónico

Plastics. Unplasticized poly (vynil chloride) (PVC-U) pipes and bends for conduits housing and protecting

SECTOR ICS 29.120.10 - 83.080,20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the " R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC-0002-3
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	1977-03-30	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2023-09-01	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2029-08-31

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

Powered by CamScanner

CSA
INGENIERIA LTDA

IFICO22 05574

Nit. 900.301.388-9

CONSULTORIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO EN EL CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETOS, SUELOS Y ASFALTOS PARA PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL

LAB-026-0415

Villavicencio, 13 de febrero de 2026

Señor(es):
LADRILLERA DEL META SA
Ciudad

PROYECTO: Muestras para control de calidad
CONTENIDO: Ensayo de resistencia a la Compresión

Cordial saludo,

A continuación, adjuntamos los resultados de las pruebas de los bloques de arcilla enviados al laboratorio para realizarle el ensayo de resistencia a la compresión. Las muestras se determinaron como mampostería de perforación horizontal.

Anexamos formato de laboratorio, especificando el elemento, días de curado, fecha de ensayo, absorción, contenido de humedad, densidad, área neta y valor de resistencia del espécimen.

En cuanto a la absorción por unidad, la norma establece que no debe exceder el 16% por lo que las muestras cumplen.

Estos ensayos se han realizado con la Norma Técnica ICONTEC NTC 4017 - 4024 - 4026 – 4076 y corresponden exclusivamente a las muestras analizadas en Laboratorio.

En espera de sus comentarios y dispuestos en aclarar cualquier duda se suscribe de Uds.,

Atentamente,

GINA LILIANA CUERO RODRIGUEZ
DIRECTOR TÉCNICO

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

"Calidad, Asesoría y Tecnología"
Calle 65 N. 85-15 Barrio Montepinos, Villavicencio-Meta
Cel. 3138...

UNIDADES (BLOQUES Y LADRILLOS) DE CONCRETO Y ARCILLA, PARA MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL

Codigo PMIL-F79
Fecha 01.11.2015
Version 1

CLIENTE	LADRILLERA DEL METASAS
PROYECTO	MUESTRAS PARA CONTROL DE CALIDAD
UBICACION	MUNICIPIO DE MI LAMICENCIO, DEPARTAMENTO DEL VETA
OBSERVACIONES	RESISTENCIA A COMPRESIÓN
NORMA TECNICA	NTC 4017 - 4024 - 4026 - 4076

Descripcion	N° de Ladrillos	Fecha Fundida	Dias de Curado	Fecha de Rotura	Peso muestra Pegada (grs)	Peso Saturado (grs)	Peso Inmersion (grs)	Peso muestra seca (grs)	Absorcio As Kg/m3	Absorcio As %	Contde Hum %	Densidad Kg/m3	Altura promedio cms	Area neta cm2	Carga Aplicada	Resistencia Kg/cm2	Resistencia PSI	Resistencia Mpa
BLOQUE F5 STANDAR 12X20X30	1	31-ene	14	13-feb	4430	4905	2720	4410	226,54	11,2	4,0	2018,3	20,03	109,25	2870	26,3	375,3	2,6
	2	31-ene	14	13-feb	4350	4855	2685	4340	230,23	11,4	2,0	2018,6	20,20	106,44	2089	19,6	280,4	2,0
							PROMEDIO			11,3		2018,5				22,9	327,8	2,3
BLOQUE F4 LLANERITO 9X20X30	1	31-ene	13	13-feb	3550	3975	2170	3550	218,84	11,0	2,5	1993,4	20,00	93,25	3646	40,5	577,1	4,0
	2	31-ene	13	13-feb	3540	3960	2095	3533	166,97	9,3	3,0	2000,0	19,60	69,14	2318	32,7	467,6	3,3
							PROMEDIO			10,2		1994,7				36,6	522,4	3,7
BLOQUE F4B BOGOTA 9X22X31	1	2-feb	11	13-feb	3950	4410	2375	3950	226,04	11,6	0,0	1941,0	22,30	91,26	2317	25,4	362,7	2,5
	2	2-feb	11	13-feb	3970	4360	2340	3950	210,78	10,9	4,7	1936,3	22,00	92,73	1372	14,8	211,4	1,5
							PROMEDIO			11,3		1938,7				20,1	287,0	2,0

Laboratorista
Yoban Bermudez U.

Director Técnico
Gina Liliana Cuero Rodriguez

Powered by CamScanner

	UNIDADES (BLOQUES Y LADRILLOS) DE CONCRETO Y ARCILLA, PARA MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL	Código: LAB-026-01 Fecha: 01.11.2018 Versión: 1

CLIENTE	LADRILLERA DEL META SAS
PROYECTO	MUESTRAS PARA CONTROL DE CALIDAD
UBICACIÓN	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META
OBSERVACIONES	RESISTENCIA A COMPRESIÓN
NORMATIVIDAD	NTC 4017 - 4024 - 4026 - 4076

Descripción	N° de Lecturas	Fecha Fundida	Días de Curado	Fecha de Rotura	Peso muestra llegada (grs)	Peso Saturado (grs)	Peso Inmersión (grs)	Peso muestra seca (grs)	Absorción Aa Kg/m3	Absorción Aa %	Cont de Hum %	Densidad Kg/m3	Altura promedio cms	Area neta cm2	Carga Aplicada	Resistencia Kg/cm2	Resistencia PSI	Resistencia MPa
BLOQUE # 4 STANDAR 10X20X40	1	2-feb	11	13-feb	3960	4405	2355	3950	221,95	11,5	2,2	1926,8	20,00	102,50	2722	26,5	379,4	2,7
	2	2-feb	11	13-feb	3950	4340	2400	3940	206,19	10,2	2,5	2030,9	20,00	97,00	3093	31,9	455,5	3,2
							PROMEDIO			10,8		1978,9				29,2	417,4	2,9

Laboratorista
Yoban Bermudez U.

Director Técnico
Gina Liliana Cuero Rodriguez

Bekaert	INFORME DE ENSAYO DE PRODUCTO TERMINADO	CÓDIGO	FO-01-11
		VERSION	8

INFORME DE ENSAYO Nº
DCEM 036 2026

FECHA DE ELABORACION
11/02/2026

OC	CLIENTE	CIUDAD
NA	GYJ FERRETERIAS SAS	VILLAVICENCIO
PRODUCTO :	ALAMBRE RECOCIDO NEGRO Ø 1,50mm X 25Kg	

CODIGO DEL PRODUCTO:	270095	Nº FACTURA	FABQ-26776
		DESARROLLO:	NA
		FICHA TÉCNICA :	FT-PL-10

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS							
ESPECIFICACION	CALIBRE (BWG)	DIÁMETRO (mm)	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (kgf/mm²)	ELONGACION (%)	REDUCCIÓN DE ÁREA (%)	OVALIDAD	
	N/A	1,50 +/- 0,02	Max 42	NO APLICA	NO APLICA	MAX 0,02	

CARACTERÍSTICAS DEL DESPACHO		
NUMERO DE UNIDADES (UND)	PESO PROMEDIO (Kg)	PESO TOTAL (kg)
117	25	2925

OBSERVACIONES :

Material libre de Radiactividad.

Jesus herrera.

REALIZO : auxiliar de calidad proalco bekaert
CONTROL CALIDAD

"Se recomienda que la selección, separación y disposición de residuos de los Productos de Proalco SAS se realice de acuerdo a la Norma técnica Colombiana GTC 24"

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-003

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **GYJ FERRETERIAS SA VILLAVICENCIO**
Dirección: **CR 22 8 ESQ VILLAVICENCIO**
Teléfono: **6713424**

Fecha Impresión **25/11/08**
No. Remisión: **187266409**
Página: **1 de 6**

Informe N°: **134279**
Informe Ant N°:
Centro: **Centro Planta Manizales**

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESOPQ(KG)	NORMA.PROD	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P *	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu	% V *
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A012158416	1,992.34	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.89	0.16	0.019	0.012	0.45	0.167	0.053	0.130	0.004
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A012159509	1,992.34	NTC 2289 GR60	Ternium	0.28	0.92	0.15	0.012	0.012	0.46	0.183	0.051	0.128	0.004

DATOS GENERALES						PROPIEDADES QUIMICAS
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESOPQ(KG)	NORMA.PROD	FABRICANTE	% Mo *
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A012158416	1,992.34	NTC 2289 GR60	Ternium	0.041
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A012159509	1,992.34	NTC 2289 GR60	Ternium	0.019

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
Los resultados fuera de: V 0.004 % a 0.026 %, Ni 0.06% a 0.58% y Nb 0.0004% a 0.0998% no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de alargamiento fuera de 8,5 % a 25,78 % no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
No reproducir información parcial del informe, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-003

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **GYJ FERRETERIAS SA VILLAVICENCIO**
Dirección: **CR 22 8 ESQ VILLAVICENCIO**
Teléfono: **6713424**

Fecha Impresión **25/11/08**
No. Remisión: **187266409**
Página: **2 de 6**

Informe N°: **134279**
Informe Ant N°:
Centro: **Centro Planta Manizales**

DATOS GENERALES						PROPIEDADES FISICAS					
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESOPQ(KG)	NORMA.PROD	FABRICANTE	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Fecha Ensayo
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A012158416	1,992.34	NTC 2289 GR60	Ternium	476	628	16	SinGrieta	1.32	20251022
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A012159509	1,992.34	NTC 2289 GR60	Ternium	489	624	17	SinGrieta	1.28	20251021

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
Los resultados fuera de: V 0.004 % a 0.026 %, Ni 0.06% a 0.58% y Nb 0.0004% a 0.0998% no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de alargamiento fuera de 8,5 % a 25,78 % no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
No reproducir información parcial del informe, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-003

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **GYJ FERRETERIAS SA VILLAVICENCIO**
Dirección: **CR 22 8 ESQ VILLAVICENCIO**
Teléfono: **6713424**

Fecha Impresión **25/11/08**
No. Remisión: **187266409**
Página: **3 de 6**

Informe N°: **134279**
Informe Ant N°:
Centro: **Centro Planta Manizales**

DATOS GENERALES						PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESOPQ(KG)	NORMA.PROD	FABRICANTE	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte	Separación Extremos	Espaciamiento
						Kg/m	mm	mm	mm
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A012158418	1,992.34	NTC 2289 GR60	Ternium	1.561	1.15	3.9	10.4
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A012159509	1,992.34	NTC 2289 GR60	Ternium	1.530	0.92	3.6	10.4

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
Los resultados fuera de: V 0.004 % a 0.026 %, Ni 0.06% a 0.58% y Nb 0.0004% a 0.0998% no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de alargamiento fuera de 8,5 % a 25,78 % no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
No reproducir información parcial del informe, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-003

Razón Social:	**Ternium Colombia S.A.S.**	Página Web:	**www.ternium.com.co**
NIT:	**890932389-8**		
Teléfono:	**01 8000 423 724**		
Dirección:	**Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**		

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA VILLAVICENCIO**	Fecha Impresión	**25/11/08**	Informe N°:	**134279**
Dirección:	**CR 22 8 ESQ VILLAVICENCIO**	No. Remisión:	**187266409**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**6713424**	Página:	**4 de 6**	Centro:	**Centro Planta Manizales**

DATOS GENERALES | **PROPIEDADES DIMENSIONALES**

MATERIAL	DESCRIPCION	COLADA/LOTE	PESOPQ(KG)	NORMA.PROD	FABRICANTE	Angulo Resalte °
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A012158416	1,992.34	NTC 2289 GR60	Ternium	60
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	A012159509	1,992.34	NTC 2289 GR60	Ternium	60

Métodos de ensayo y declaración de incertidumbre de la medición

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Composición Química: NTC 5192: 2024 Num. 9.1.2 (ASTM E415) NTC 5231: 2024
* Tracción: NTC 2289: 2020 Num. 9 y 15.2 NTC 3353: 2024 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2: 2024
* Doblado: NTC 2289:2020 Num. 10, NTC 3353: 2024, Num. 15, NTC 1:2024
* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8
* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
Los resultados fuera de: V 0.004 % a 0.026 %, Ni 0.06% a 0.58% y Nb 0.0004% a 0.0998% no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de alargamiento fuera de 8,5 % a 25,78 % no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
No reproducir información parcial del informe, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-003

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **GYJ FERRETERIAS SA VILLAVICENCIO**
Dirección: **CR 22 8 ESQ VILLAVICENCIO**
Teléfono: **6713424**

Fecha Impresión **25/11/08**
No. Remisión: **187266409**
Página: **5 de 6**

Informe N°: **134279**
Informe Ant N°:
Centro: **Centro Planta Manizales**

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
% C	± 0.009935 %
% Mn	± 0.0125 %
% Si	± 0.0200 %
% S	± 0.0021 %
% P	± 0.0013 %
% Cr	± 0.0145 %
% Ni	± 0.0071 %
% Cu	± 0.0098 %
% V	± 0.0009 %
% Nb	± 0.0005 %
% Mo	± 0.0035%
Resistencia a la Fluencia	± 7.46 MPA
Resistencia a la Tracción	± 6.32 MPA
Alargamiento	± 0.42 %
Altura Resalte	± 2 %
Separación entre extremos	± 2 %
Espaciamiento	± 1 %

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianzade 95%.

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
Los resultados fuera de: V 0.004 % a 0.026 %, Ni 0.06% a 0.58% y Nb 0.0004% a 0.0998% no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de alargamiento fuera de 8,5 % a 25,78 % no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
No reproducir información parcial del informe, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
21-LAB-003

Razón Social: **Ternium Colombia S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **890932389-8**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Km 2 Vía Termales la Enea. Manizales**

INFORMACION GENERAL

Cliente:	**GYJ FERRETERIAS SA VILLAVICENCIO**	Fecha Impresión	**25/11/08**	Informe N°:	**134279**
Dirección:	**CR 22 8 ESQ VILLAVICENCIO**	No. Remisión:	**187266409**	Informe Ant N°:	
Teléfono:	**6713424**	Página:	**6 de 6**	Centro:	**Centro Planta Manizales**

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
Angulo de Resalte	± 0.16 °
Peso metro (masa)	± 0.72%

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianzade 95%.

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aqui descritos.
Los resultados fuera de: V 0.004 % a 0.026 %, Nl 0.06% a 0.58% y Nb 0.0004% a 0.0998% no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de alargamiento fuera de 8,5 % a 25,78 % no están dentro del alcance de acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
No reproducir información parcial del informe, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

INFORME DE ENSAYOS

ISO/IEC 17025:2017
22-LAB-041

El acero que hace fuerte a Colombia

Razón Social: Ternium del Atlantico S.A.S.
NIT: 901131909-1 **Página Web:** www.ternium.com.co
Teléfono: 01 8000 423 724
Dirección: Vía Barranquilla Ponedera km 48 + 600 m, Palmar de Varela, Atlántico,Colombia

INFORMACIÓN GENERAL

Cliente: ARCOE SOACHA COP
Dirección: CR 17 30 80 SUR FRENTE A INDUM SOACHA
Teléfono: 7216638

Fecha Impresión: 2026/03/25
Nro.Remisión: 187322977

Nro.Informe: 163144
Nro.Informe Ant:
Centro: Centro Planta Atlantico

DATOS GENERALES

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	COLADA/LOTE	PESO.PAQ(KG)	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO0030087	1564	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico
C8001349	BARRA COR 5/8"(No.5) 6m NTC2289/G60	BFO003083U	2067	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántico

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Quimicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES QUÍMICAS

MATERIAL	COLADA/LOTE	% C	% Mn	% Mo	% Si	% S	% P	% Cr	% Ni	% Cu	% V	% CE
C8001349	BFO0030087	0.29	1.20	0.000	0.22	0.011	0.014	0.01	0.01	0.01	0.001	0.49
C8001349	BFO003083U	0.29	1.19	0.000	0.22	0.008	0.022	0.01	0.01	0.01	0.001	0.49

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES FÍSICAS

MATERIAL	COLADA/LOTE	Resistencia Fluencia MPa	Resistencia Tracción MPa	Alargamiento %	Doblado	Relación RT/RF	Fecha Ensayo
C8001349	BFO0030087	472	626	17.68	SinGrieta	1.33	20260305
C8001349	BFO0003083U	477	622	17.73	SinGrieta	1.30	20260307

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

PROPIEDADES DIMENSIONALES

MATERIAL	COLADA/LOTE	Espaciamiento mm	Peso Metro (Masa) Kg/m	Altura Resalte mm	Separación Extremos mm	Angulo Resalte °
C8001349	BFO0030087	10.10	1.510	0.80	3.82	50
C8001349	BFO003083U	10.10	1.547	0.82	4.17	50

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

MÉTODOS DE ENSAYO Y DECLARACIÓN DE INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Tracción: NTC 2289:2020, Num. 9 y 15.2 NTC 3353:2024 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2:2024 Num. 5.1, 5.2.1,5.2.2, 6.6, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5,7.6, 7.7, 7.10, 7.11,7.13, 7.14, 8

* Doblado: NTC 2289:2020, Num. 10 NTC 3353: 2024 Num. 15 NTC 1:2024 Num. 4.6, 6.2, 8.1.1, 9.3, 9.7, 9.9, 10 y 11

* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8

* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

VARIABLE	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA(1)
Resistencia a la Fluencia	± 2.69 MPA
Resistencia a la Tracción	± 2.45 MPA
Alargamiento	± 0.60 %
Altura Resalte	± 2 %
Separación entre extremos	± 4 %
Espaciamiento	± 0.30 %
Angulo de Resalte	± 0.53 °
Peso metro (masa)	± 0.20 %

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianzade 95%.

Fin del Informe

Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.
Los resultados de los ensayos cumplen con la norma indicada en la columna "NORMA.PROD", la regla de decisión aplicada es aceptación simple.
Propiedades Químicas no se encuentran dentro del alcance de la acreditación del laboratorio, sin embargo, cumplen con la norma de producto.

Autoriza
Sebastian Carmona Restrepo
Plant Quality & Laboratory Manager

AM FERRETERÍA
ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S.

NIT. 900,034,102

CLL 7 # 37 A 05

Sello de Calidad

NTC 5806
Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil

Sello con Reglamento Técnico

Resolucion 0277 de 2016
Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil

REPORTE DE CALIDAD

Informe de Ensayos Mecánicos de Malla Electrosoldada

FQ1201 Fecha Rev:18-12-17 Version: 1


Fecha de Emision : 27/03/2026

Cliente:

Descripcion de la muestra	
N° de Ensayo	3594-1
Referencia de Malla	XX-188
Diámetro de Grafil Long:	6,0
Diamentro de Grafil Transv:	6,0
Fecha de Producción de la Malla	27/03/2026
Fecha de recepcion de muestra	27/03/2026
Fecha de Ensayo	27/03/2026

ENSAYO DE RESISTENCIA AL CORTE EN LA SOLDADURA

N° ENSAYO	CARGA (N)	LUGAR DE FALLA
1	15.744	Soldadura
2	18.188	Grafil
3	17.883	Grafil
4	16.803	Grafil
5		
Promedio	17.155	
Requisito de Norma NTC 5806 N°8.3	6.814	U (KN)
CUMPLE (SI/NO)	SI	6,66

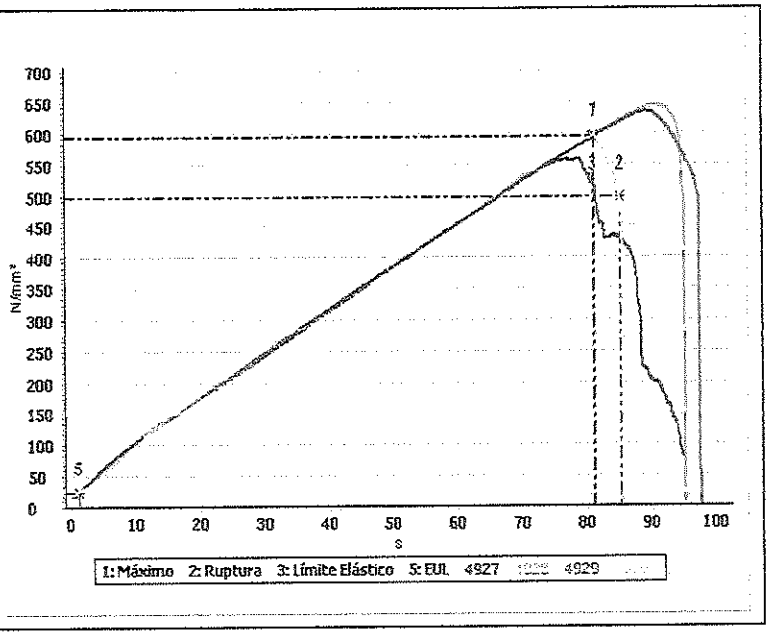

ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

N° DE BARRAS (Requisito Norma NTC 5806-2019 N°10.7)

TIPO	OBTENIDO	REQUISITO	CUMPLE (SI/NO)
Longitudinales	16	16	SI
Transversales	40	40	SI

LONGITUD TOTAL DEL GRAFIL (Requisito Norma NTC 5806-2019 N° 10)

TIPO	OBTENIDO (mm)	REQUISITO (±25mm)	CUMPLE (SI/NO)
Longitudinales	5.980	6.000	SI
Tranversales	2.340	2.350	SI

SEPARACION DE LOS GRAFILES (Requisito Norma NTC 5806-2019 N°11)

	OBTENIDO (mm)	REQUISITO (mm)	CUMPLE (SI/NO)
Longitudinales	150	150	SI
Transversales	150	150	SI

MEDICION DE PELOS (Requisito Norma NTC 5806-2019 N°10.3)

TIPO	PROMEDIO OBTENIDO (mm)	REQUISITO (mm)	CUMPLE (SI/NO)	METODO DE ENSAYO
Longitudinales	80	75	SI	(NTC 5806-2019 N° 10.3) (±13mm)
Tranversales	40	50	SI	(NTC 5806-2019 N° 10.3) (±13mm)

Condiciones Ambientales

Temperatura promedio °C	22,0	Humedad Relativa promedio (%HR)	41,0

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas grafil y 7000 m2 para Malla.

AM FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S. NIT. 900 034 102 Aprobado

Realizó

LABORATORISTA
Juliana Cuervo Soler

Revisa:

CALIDAD
Ing. Sebastian Olave

JEFE DE CALIDAD
Ing. Sebastian Olave

AMFERRETERÍA
ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S.
UNA EMPRESA DE ESTILO Y EXCELENCIA

NIT. 900.034.102
CLL 7 # 37A-05

REPORTE DE CALIDAD

Informe de Ensayos Mecánicos Grafil

NTC-5806 Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil.

Resolución 0277 de 2016 Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil.

FQ1201 | Fecha Rev: 18-12-17 | Versión 1


Fecha Emisión Certificado 31/03/2026

Cliente:

Características de la Muestra Ensayada

DESCRIPCION	MUESTRA GRAFIL
Informe N°	5321
Diametro de Grafil (mm)	8.0
Lote	2916
Fecha de Fabricación	25/03/2026
Fecha de recepcion de la muestra	25/03/2026
Fecha de Ensayo	25/03/2026
Longitud de la Muestra (mm)	400

GRAFICA DE ENSAYO DE TENSIÓN

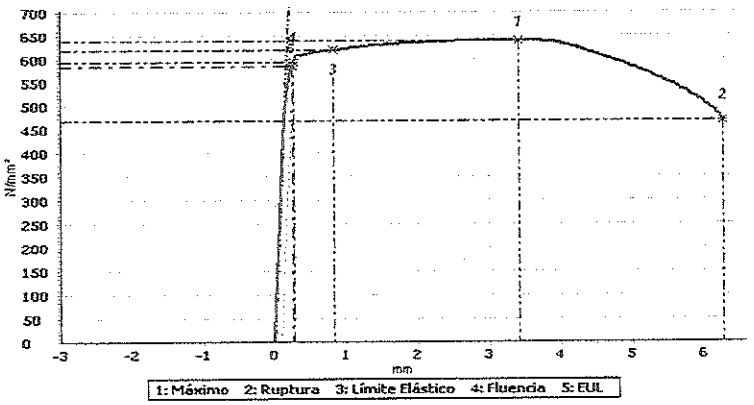

1: Máximo 2: Ruptura 3: Límite Elástico 4: Fluencia 5: EUL

Condiciones ambientales de los ensayos

Temperatura promedio °C	22,1			Humedad relativa (HR%)		47,0	
DESCRIPCION	UNIDAD	UND	U	MUESTRA GRAFIL		REQUISITOS	
				Nominal	8	NTC 5806-2019	CUMPLE (SI/NO)
Diámetro	mm	U (mm)	0,0041	8,0	8,0	Tabla N° 6	SI
Peso	g/m	U (g)	0,0031	395	375,75	7.2.7.1	SI
Promedio altura resaltes	mm	U (g)	0,0031	0,36	0,40	7.2.4.4	SI
Espaciamiento entre resaltes	mm	U (mm)	0,0045	4,62 a 7,24	6,34	7.2.4.6	SI
Espaciamiento longitudinal por pulgada de resaltes	N/A	U (mm.)	0,058	3,5 a 5,5	4,00	7.2.4.3	SI
Angulo resaltes	°	U (°)	0,00092	Min 45°	55	7.2.4.5	SI
Resaltes en direccion inversa	N/A	N/A	#N/D	N/A	N/A	7.2.4.5	SI
Area superficial grafilada	%	U (mm)	0,0045	Min 25%	33	7.2.4.1	SI
Lineas de resaltes	Unidad	U (mm)	0.0045	Min 2	3	7.2.4.2	SI

CALIDAD, ACABADO Y APARIENCIA		
Libre de imperfecciones perjudiciales y buen acabado superficial	7.4.1	SI
Libre de óxido.	7.4.2- 7.4.3	SI

PROPIEDADES MECANICAS DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DE LA PRUEBA		UNIDAD	UND	U	VALORES		REQUISITOS	
					Especificado	Obtenido	METODO DE ENSAYO	CUMPLE (SI/NO)
TRACCION	Esfuerzo Máximo de Tracción	Mpa	U (Mpa)	2,70	550	639	NTC 5806-Tabla 9 NTC 3353	SI
FLUENCIA	Resistencia a la Fluencia	Mpa	U (Mpa)	2,70	485	583	NTC 5806-Tabla 9 NTC 3353	SI
DOBLADO	Grados	°			90	90	NTC 3353	SI

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas.

AM FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ S.A.S. NIT. 900.034.102-1

Realiza:

LABORATORISTA
Juliana Cuervo Soler

Revisa:

CALIDAD
Ing. Sebastian Olave

Aprueba:

JEFE DE CALIDAD
Ing. Sebastian Olave

AM FERRETERÍA ANDRES MARTINEZ S. A. S.

NIT. 900,034,102
CLL 7 # 37A-05

REPORTE DE CALIDAD

Informe de Ensayos Mecánicos Grafil

Sello de Calidad — NTC-5806 Alambre de acero grafitado y mallas electrosoldadas con grafil.

Sello con Reglamento Tecnico — Resolución 0277 de 2015 Alambre de acero grafitado y mallas electrosoldadas con grafil.

FQ1201 | Fecha Rev: 18-12-17 | Version 1


Fecha Emisión Certificado 31/03/2026

Cliente:

Caracteristicas de la Muestra Ensayada

DESCRIPCION	MUESTRA GRAFIL
Informe N°	5324
Diametro de Grafil (mm)	6,0
Lote	2917
Fecha de Fabricación	26/03/2026
Fecha de recepcion de la muestra	26/03/2026
Fecha de Ensayo	26/03/2026
Longitud de la Muestra (mm)	400

GRAFICA DE ENSAYO DE TENSIÓN

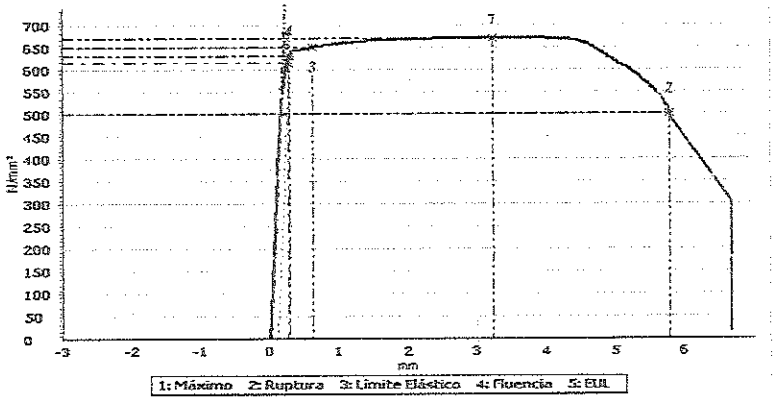

Condiciones ambientales de los ensayos

Temperatura promedio °C	20,1			Humedad relativa (HR%)		43,0	
DESCRIPCION	UNIDAD	UND	U	MUESTRA GRAFIL		REQUISITOS	
				Nominal	6	NTC 5806-2019	CUMPLE (SI/NO)
Diámetro	mm	U (mm)	0,0041	6,0	6,0	Tabla N° 6	SI
Peso	g/m	U (g)	0,0031	222	210,62	7.2.7.1	SI
Promedio altura resaltes	mm	U (g)	0,0031	0,27	0,37	7.2.4.4	SI
Espaciamiento entre resaltes	mm	U (mm),	0,0045	4,62 a 7,24	6,15	7.2.4.6	SI
Espaciamiento longitudinal por pulgada de resaltes	N/A	U (mm),	0,058	3,5 a 5,5	4,00	7.2.4.3	SI
Ángulo resaltes	°	U (°)	0,00092	Min 45°	50	7.2.4.5	SI
Resaltes en direccion inversa	N/A	N/A	#N/D	N/A	N/A	7.2.4.5	SI
Area superficial grafilada	%	U (mm)	0,0045	Min 25%	26	7.2.4.1	SI
Lineas de resaltes	Unidad	U (mm)	0,0045	Min 2	3	7.2.4.2	SI

CALIDAD, ACABADO Y APARIENCIA		
Libre de imperfecciones perjudiciales y buen acabado superficial	7.4.1	SI
Libre de óxido.	7.4.2- 7.4.3	SI

PROPIEDADES MECANICAS DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DE LA PRUEBA		UNIDAD	UND	U	VALORES		REQUISITOS	
					Especificado	Obtenido	METODO DE ENSAYO	CUMPLE (SI/NO)
TRACCION	Esfuerzo Máximo de Tracción	Mpa	U (Mpa)	2,70	550	671	NTC 5806-Tabla 9 NTC 3353	SI
FLUENCIA	Resistencia a la Fluencia	Mpa	U (Mpa)	2,70	485	615	NTC 5806-Tabla 9 NTC 3353	SI
DOBLADO	Grados	°			90	90	NTC 3353	SI

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas.

AM FERRETERÍA ANDRES MARTINEZ S.A.S. NIT. 900.034.102-1

Realiza: Juliana Cuervo Soler
LABORATORISTA
Juliana Cuervo Soler

Revisa:
CALIDAD
Ing. Sebastian Olave

Aprueba:
JEFE DE CALIDAD
Ing. Sebastian Olave

UNIÓN TEMPORAL
INGE
POLICIA
GAITÁN

CERTIFICADOS DE INTERVENTORIA

CALLE 2 No 27 – 116 Villavicencio – Meta
Tel. 310 888 54 20

CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Con base en las obligaciones la **UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025** derivadas de la ejecución del **Contrato de Obra No. 1683 de 2025** cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"**, en mi calidad de Interventor del Contrato de Obra me permito CERTIFICAR que:

Durante el periodo comprendido desde el 01 de abril al 30 de abril de 2026, la Interventoría realizó seguimiento a las actividades relacionadas con la gestión de residuos sólidos en los diferentes frentes de obra del proyecto.

Como resultado de las verificaciones, se evidenció que el contratista viene adelantó acciones orientadas a la separación en la fuente y al acopio temporal de los residuos generados según sus características, en condiciones que permiten su manejo controlado, considerando la ejecución de múltiples frentes de trabajo en zonas rurales del municipio de Puerto Gaitán.

A la fecha de corte del presente certificado, el contratista de obra prevé su entrega a gestores o empresas autorizadas una vez se consoliden volúmenes representativos o se finalicen las actividades en cada frente de trabajo. En este sentido, la Interventoría continuará realizando seguimiento a la gestión integral de los residuos, incluyendo la verificación de los respectivos soportes de disposición final.

El presente certificado se expide a los treinta (30) días del mes de abril del año 2026, para los fines pertinentes.

Cordialmente:

ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Ingeniero Civil. M.P. No. 25202090337 CND
Director Interventoría
UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025

CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES

Con base en las obligaciones la **UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025** derivadas de la ejecución del **Contrato de Obra No. 1683 de 2025** cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"**, en mi calidad de Interventor del Contrato de Obra me permito CERTIFICAR que:

Durante el periodo comprendido desde el 01 de abril al 30 de abril de 2026, la Interventoría realizó seguimiento a las actividades relacionadas con el manejo de los materiales de excavación generados en los diferentes frentes de obra del proyecto, para los cuales el contratista adelantó acciones orientadas al manejo adecuado de los materiales provenientes de excavaciones y descapote, priorizando su reutilización en sitio para actividades de relleno, reconformación y nivelación de las áreas intervenidas.

En aquellos casos donde no es posible su aprovechamiento inmediato, se ha observado su acopio temporal en condiciones controladas y autorizadas por la comunidad. Así mismo, la disposición final de estos materiales se realiza en sitios definidos dentro del área de intervención, asegurando que no se generen afectaciones a drenajes naturales, fuentes hídricas o zonas ambientalmente sensibles.

A la fecha del presente certificado, estas actividades se desarrollan en el marco de las condiciones propias del proyecto, caracterizado por la ejecución en múltiples frentes de trabajo en zonas rurales dispersas. En este sentido, la Interventoría continuará realizando seguimiento al manejo y disposición de los materiales de excavación, con el fin de garantizar la adecuada reconformación de las áreas intervenidas y la prevención de

El presente certificado se expide a los treinta (30) días del mes de abril del año 2026, para los fines pertinentes.

Cordialmente:

ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Ingeniero Civil. M.P. No. 25202090337 CND
Director Interventoría
UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025

UT INTERPOLICIA
2025

CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE INTERVENTORIA AVALANDO EQUIPOS Y MAQUINARIA PROPUESTOS EN EL CONTRATO DE OBRA

Durante el mes de abril de 2026, una vez analizada y verificada en campo la información y la documentación presentada por el contratista la **UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN** frente a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y el anexo técnico del proceso de licitación pública No. LP-CI-010-2025, la **UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025**, identificado con NIT. 902.014.419-5 representado legalmente por **DIEGO ARMANDO CARDOZO GUERRERO** identificado con cedula de ciudadanía No. 86.088.145 de Villavicencio, certificamos que no se realizó movimiento de maquinaria ni manipulación de equipos, debido al que proyecto se encontraba en fase de aislamiento administrativo y técnico durante el mes de abril del 2026.

El presente certificado se expide a los treinta (30) días del mes de abril del año 2026, para los fines pertinentes.

Cordialmente:

ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Ingeniero Civil. M.P. No. 25202090337 CND
Director Interventoría
UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025

CERTIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRA

El suscrito, certifica el actual estado de la obra que a continuación se especifica:

CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN
INTERVENTORÍA: UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
FECHA DE CORTE: 30 de abril del 2026
PERIODO EVALUADO: Del 01 al 30 de abril

En cumplimiento de las funciones de seguimiento, control y vigilancia de la ejecución contractual, la interventoría certifica el avance financiero del contrato, con base en la programación aprobada y la inversión física ejecutada durante el periodo evaluado.

AVANCE CON RESPECTO A VALOR DEL CONTRATO	SEGUN PROGRAMACION	SEGUN AVANCE FISICO
INVERSION AL 30/04/2026	$221.627.087,00	$95.934.936,12
INVERSION ACUMULADA	$706.564.307,00	$283.903.831,84

Para la fecha de corte del presente informe, se evidencia un avance de obra física ejecutada por un valor de $95.934.936,12, frente a un avance programado de $221.627.087,00. Este resultado refleja un adelanto financiero del 2,23%, equivalente a $95.934.936,12.

El presente certificado se expide a los treinta (30) días del mes de abril del año 2026, para los fines pertinentes.

Cordialmente:

ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Ingeniero Civil. M.P. No. 25202090337 CND
Director Interventoría
UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

En cumplimiento de las funciones de vigilancia, seguimiento y control de la ejecución contractual asignadas a la interventoría, y en mi calidad de **INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 1683 de 2025.**

CERTIFICO QUE:

La **UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025**, en el marco de la ejecución del contrato cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"**, durante el periodo comprendido entre el 01 de abril y el 30 de abril del 2026, fue objeto de seguimiento integral por parte de la Interventoría en los componentes técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y jurídico, respecto de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de obra del proyecto.

Con base en las verificaciones realizadas, se evidenció que el contratista ha venido ejecutando las actividades conforme a lo establecido en el contrato, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, condiciones contractuales y lineamientos requeridos para la adecuada ejecución del proyecto, considerando su desarrollo en zonas rurales del municipio de Puerto Gaitán.

De igual manera, se constató el avance de las actividades constructivas, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada gestión en los diferentes componentes objeto de interventoría, necesarios para la correcta ejecución del contrato. En este sentido, la Interventoría continuará realizando el seguimiento integral, con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones pactadas hasta la finalización del proyecto.

El presente certificado se expide a los treinta (30) días de abril del año 2026, para los fines pertinentes.

Cordialmente:

ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Ingeniero Civil. M.P. No. 25202090337 CND
Director Interventoría
UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025
