Findeter Financiera del Desarrollo	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO Comité Nº 17	Código: CM-FO-18 Versión: 4 Fecha de Aprobación: 15/05/15

Fecha y lugar de la reunión: 24 - Julio - 2020 - CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA CAMPO VERDE - LOCALIDAD DE BOSA

Hora inicio: 11:00 am

Objetivo de la reunión: COMITE SEMANAL DE OBRA N° 17

PARTICIPANTES:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
Liliana Rojas R.	Consorcio Deidad	Residente de Obra
Sonia Johanna Nieto Plazas	Consorcio Deidad	Residente de Obra
Edwin Ricardo Camargo C.	Consorcio Deidad	Residente de Obra
Lida Patricia Mesa Ladino	Consorcio Deidad	Residente SST
Yerly Hurtado Ortiz	consorcio Deidad	Aux Res SST
GERMAN ACUÑA PARRA.	CONSORCIO JCI-BOGOTA	ENCARGADO RESIDENTE INTERVENTORIA
Yecaldin Linares Ruiz	Consorcio JCI Bogotá	Insp. Interventoria
Luz Mery Delgadillo P.	Consorcio JCI Bogotá	Residente Social.
Tatiana Morales [illegible]	Deidad	Residente Obra
Tatiana Parra Chavarria	Consorcio JCI Bogotá	[illegible]
Hector Henry Cuadrado	Interventoria	[illegible]
Ivan Dario Mantilla	Findeter	Supervisor
RENE [illegible] R.	SCJ-DB	Supervisor Contrato
Lina Maria Cadena	Consorcio Deidad	Aux. Residente Obra.

Findeter Financiera del Desarrollo	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO Comité N° 17	**Código:** CM-FO-18 **Versión:** 4 **Fecha de Aprobación:** 15/05/15

INVITADOS:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO

ORDEN DEL DÍA

1. Recorrido Por la Obra
2. Componente Ambiental
3. Componente SST
4. Componente Tecnico
5. Componente Social.

DESARROLLO

-.Lectura acta de Comite N°16 del 13 de Julio de 2020.

COMPONENTE AMBIENTAL.

- Se realizo recolección de residuos (madera, acero), ademas de Tanques desocupados de ACPM
- Interventoria solicita al contratista hacer disposicion de madera y chatarra
- Se ha evidenciado que se hace uso del lavado de llantas
- Se ha realizado limpieza de la via de acceso a la obra todos los dias
- Falta por cargar en el Aplicativo todos los documentos (certificaciones de disposicion) del mes de Junio
- El contratista informa que se ha cumplido con el Punto de acopio en obra y que una vez se tiene la cantidad necesaria se realiza el retiro de este material y se realiza la disposicion de este, entregando asi la certificación correspondiente.
- Se solicita al contratista el certificado de la empresa que suministra la madera, ademas del certificado de disposicion de la madera y chatarra.

- Se ha realizado buen manejo y disposicion de los residuos quimicos
- Se solicita al contratista realizar cambio de Señalizacion del Punto de acopio, se aconseja que esta Señalización sea laminada.
- Se esta realizando capacitaciones al Personal que va ingresando a la Obra sobre temas de disposición de Residuos, etc.
- Se Solicita que los equipos que van a entrar a obra y los que ya se encuentran se les realice mantenimiento y se entregue toda la documentación correspondiente.
- Se Solicita realizar mantenimiento a la bomba de la Pilote adora o realizar cambio de esta maquinaria.
- Se Solicita no dejar acumular Residuos Organicos, para evitar roedores

COMPONENTE SST

- Se realizo adecuación del tanque para el lavado de llantas
- El contratista indica que actualmente hay 19 personas del area administrativa y 45 del area operativa, ademas señala que al personal que ha ingresado a la obra se les ha capacitado con el tema de bioseguridad
- El contratista informa que se le pago a una empresa para que realizara desinfeccion a toda la obra, ademas indica que existe un personal el cual realiza desinfección dos (2) veces al dia en la mañana antes que ingrese el personal y en la tarde en los Campamentos.
- Se realiza limpieza (Lavado) de los baños dia por medio y desinfeccion diaria en la mañana y tarde
- El contratista indica que ya se realizo requerimiento para dos (2) baterias Sanitarias debido al incremento del personal
- Se ha incrementado el tema de bioseguridad al ingreso de la obra
- El contratista informa que el personal nuevo que ha ingresado a la obra ha Presentado Pruebas Covid, ademas indica que los documentos que deben entregar como requerimiento son afiliaciones, examenes medicos y Prueba del covid.

- La Secretaria de Seguridad y Findeter reiteran el tema del personal de mano de obra no calificada de acuerdo a los requerimientos de los terminos de referencia donde se indica que es el 70% del personal de obra. Sean de la localidad de Bosa.
- El contratista informa que realiza recorrido por la obra para verificar que se este cumpliendo con los protocolos de bioseguridad (distanciamiento, lavado de manos, uso de tapabocas, etc)
- El contratista indica que se esta programando un acompañamiento para que la ARL realice algunas capacitaciones al personal.
- Nadie puede ingresar a la obra, sin primero verificar de que entidad son. y para el ingreso debe tener el aval de Findeter y secretaria de Seguridad.

COMPONENTE TECNICO

- El contratista menciona que la parte estructural a traves de las mesas de trabajo con el consultor se ha visto un avance, ya que en obra se ve reflejado en la intervencion del CAI y el Exteeroe 6.
- Ademas el contratista indica que esta programado la entrada de otra piloteadora.
- Se tiene programado la intervencion de los bloques de la casa de Justicia 1, URI 2, URI 3, se va a tenee 2 contratistas de mano de obra.
- Al dia de hoy se han ejecutado 827 pilotes, se han liberado 221 pilotes despues de las reuniones virtuales y en observacion 91 pilotes que faltan por definir por parte del consultor y el contratista.
- Se realizaron unas mesas tecnicas virtuales por solicitud de Consorcio Oeidad con el acompañamiento de la Consultoria, la Interventoria y Findeter los dias 16 y 21 de Julio. Se tiene programado otra reunion para el 28 de Julio.
- El contratista realizo entrega de hojas de vida de maestros de obra para realizar cambio de las que estan aprobadas, se esta a la espera de la aprobacion. Interventoria menciona que el dia de hoy se da respuesta a esa solicitud.
- El contratista ha realizado la entrega de resultados de Pruebas de cilindros de concreto, y Pruebas de integridad (PIT)

- El Resultado de las Pruebas de cilindro han salido por encima de 130%, por lo que ha la fecha han estado bien al igual que las Pruebas PIT
- El contratista indica que ya se definio y establecio que la prueba de carga es dinamica y se esta a la espera de la contratación del laboratorio para ejecutar esta Prueba. Se realizara el ensayo de carga a dos Pilotes los cuales se someteran a la carga de diseño.
- El contratista informa que en obra ya hay acero para la cimentación del CAI, exterior 6, URI 2, casa de Justicia 1.
- El contratista realizo la revisión de las memorias de consultoria y evidencio diferencia en las cantidades entre el presupuesto contractual y los planos, Por lo cual el contratista realizara la entrega del balance con las memorias de las cantidades mayores o menores que encontraron respecto a los planos quedando pendiente los capitulos de estructura, debido a que se estan realizando mesas de trabajo entre el consultor y el contratista. Adicionalmente el contratista indica que el balance que se entrego tambien queda pendiente los capitulos de redes hidrosanitaria y electricas. ya que se encuentran en Revisión, Por lo cual puede cambiar el valor del balance.
- El contratista indica que a mas tardar el martes se hace entrega del balance
- Se anexa documento Acta realizada con constructora Bolivar.
- El contratista indica que no ha realizado el cambio de constructor en la curaduria Urbana N° 1. La Secretaria de Seguridad reitera que se debe hacer esa solicitud.

COMPONENTE SOCIAL

- Interventoria indica que se debe hacer un ajuste al Plan de Gestion Social y al cronograma de actividades debido al tema de la Pandemia se cambian algunas actividades ya que se deben hacer reuniones con la comunidad de forma Virtual

Findeter	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO Comité N° 17	Código: CM-FO-18 Versión: 4 Fecha de Aprobación: 15/05/15

COMPROMISOS

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA EJECUCION	OBSERVACIONES
1	Certificado de la empresa que suministra la madera y certificado de disposicion	Consorcio Deidad.		
2	Realizar cambio de señalizacion Punto de acopio	Consorcio Deidad.		
3	Respuesta a Oficio Solicitud Aprobacion maestro	Consorcio JCI	24/07/20	
4	Entrega de balance	Consorcio Deidad	28/07/20	
5	Realizar acta Via acceso Vehicular	Consorcio Deidad		
6	Carta Dirigida a la Secretaria de educacion	Consorcio JCI Consorcio Deidad		

Convocatoria próximo comité:

Firmas

Nombre: Liliana Rojas L.

Nombre: Sonia Johanna Niño P.

Nombre: Ricardo Camargo.

Nombre: Lida Patricia Hoya Latino

Nombre:

Nombre: CELIAN ANDRES PARRA RINCON

Nombre: Luz Mery Delgadillo P.

Nombre: Cristian Israel Olaciregui

Nombre: Tatiana Parra Chavarria

Nombre: Alcides Henry Contardo G.

Nombre: Juan Danio Montilla R

Nombre: RENE CARZOLA R.


Nombre: Luci Mauricio Cadena Mariu

Nombre: Yeraldin Linares R.

COMPONENTE SOCIAL

- De acuerdo a la revision que se realizo a los terminos de referencia, se evidencio que debe haber dos (2) vallas informativas del proyecto, por lo cual Consorcio Deidad debe enviar un correo electronico a Interventoria y a Findeter describiendo la justificación de la instalacion de la valla para que interventoria de la apeobación de la ubicacion de esta nueva valla.
- Aun esta pendiente la valla del Punto de atencion a la comunidad (PAC) y el Buzon externo para dar atención a la comunidad.
- Consorcio Deidad esta elaborando 30 kits para entregar a los participantes del Comite de Sostenibilidad.
- Se esta trabajando en la presentación para la Siguiente mesa de sostenibilidad que se llevara a cabo el 04 de Agosto.
- Se recibio la atencion ciudadana N°4 por la afectacion de las vias debido a los residuos de obra que dejan los vehiculos al salir de la obra; Se esta a la espera de la evidencia fotografica para verificar dicha afectación.
- Se solicita hacer acta de la via por donde los vehiculos entran.
- Se realizo Seguimiento N° 3 de la atención ciudadana N° 1, Se espera respuesta por parte del area tecnica del Colegio Campo Verde 2 para realizar cierre.

- Realizar una carta entre direccion de interventoria y direccion de obra dirigida a Findeter reiterando la comunicacion a Secretaria de educación sobre el tema del muro de contencion y todo lo relacionado con este tema. A su vez Findeter realizara el traslado de esa carta a la secretaria de educación. para que defina que se va hacer.

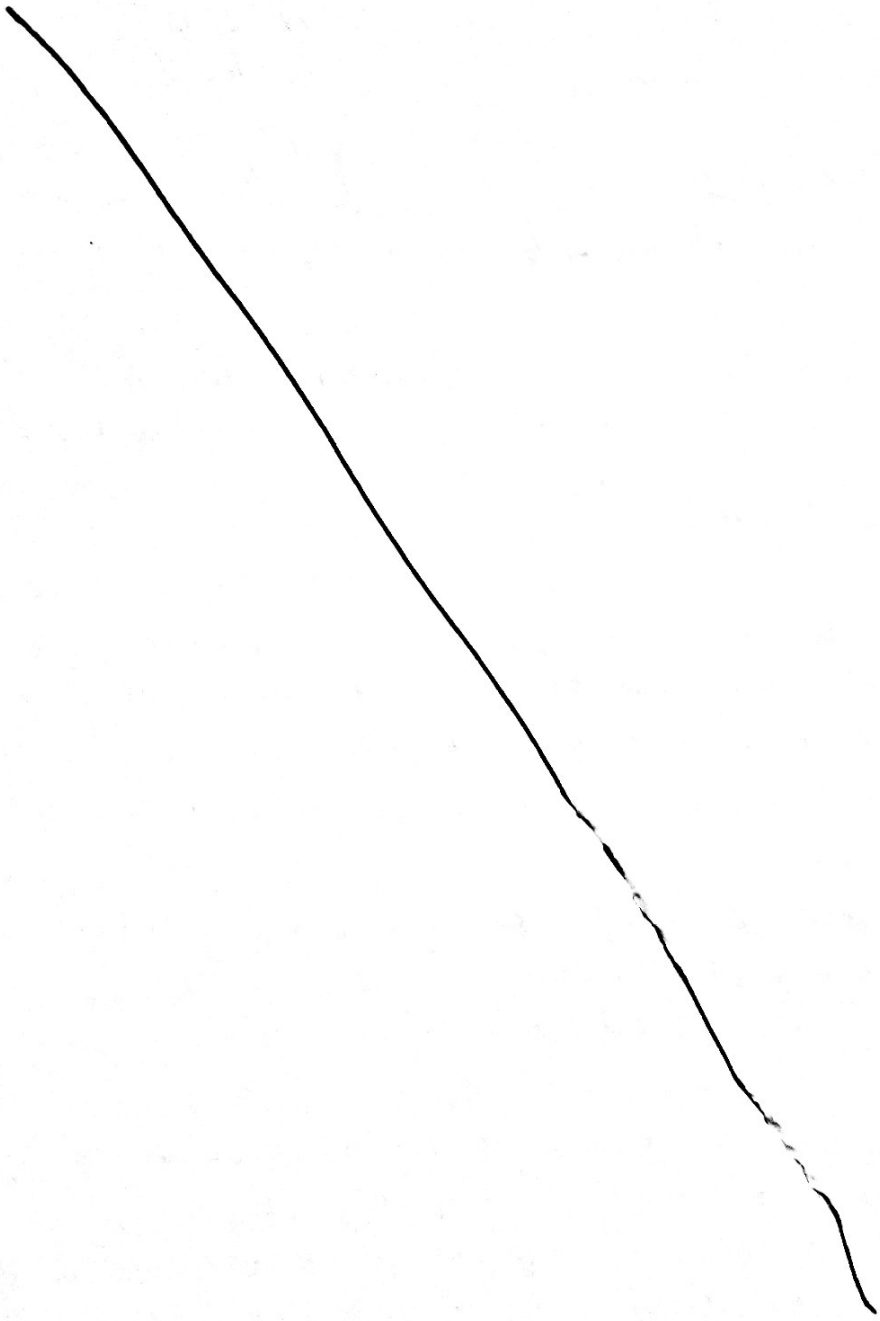

Findeter Financiera del Desarrollo	**PLANILLA DE ASISTENCIA**	**Código:** GH-FO-062 **Versión:** 1 **Fecha de aprobación:** 26-Mar-19

MODALIDAD: CAPACITACIÓN ☐ REUNIÓN ☒ EVENTO ☐ CAMPAÑA ☐

FECHA: (dd/mm/aa) 24 - Julio - 2020

LUGAR: CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA - BOSA

LINEA DE CAPACITACIÓN : (para ser diligenciado por la Jefatura de Talento Humano)

REINDUCCIÓN : ——— **CORPORTIVA:** ——— **ESPECÍFICA** ———

COMPLEMENTARIA: ——— **MANEJO DE COMPETENCIAS:** ———

HORA INICIO: 11:00 am

HORA FINALIZACION: 1:05 pm

TEMA: COMITE DE OBRA N° 17

ÁREA QUE ORGANIZA:

INSTRUCTOR:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS (Completos)	CÉDULA	DEPENDENCIA	CARGO	TEL/EXT
1	Ivan Dario Mantilla R	13723181	Findeter	Supervisor	3005705751
2	Rave Gonzalez M.	79531398	SCJ - DB	[illegible]	3102623525
3	HERMAN PARRA	93374478	CONSORCIO JCI BOGOTA	INTERVENTOR	3132931257
4	Hector Henry Rodriguez	79306753	Laboratorio	Director	3125643798
5	Ricardo Camargo C.	7186505	Consorcio Deidad	Residente	3143735174
6	Ing Hayde Cifuentes	1.116.266.123	Consorcio Deidad	Aux. Residente	3144047226
7	Yerly Hurtado Ortiz	1.074.131.015	Consorcio Deidad	Aux. Residente SST	3138396648
8	Lida Patricia Mosquera	46382193	Consorcio Deidad	Residente SST	3132106614
9	Sonia Johanna Niño Rojas	1.049.605.679	Consorcio Deidad	Residente Obra	3138600009
10	Liliana Rojas L	52156973	Consorcio Deidad	Residente Obra	3118440109
11	Tatiana Parra	1019093502	consorcio JCI	Ambiental	3104[illegible]
12	Yeraldin Linares Ruiz	1018449285	Consorcio JCI Bogota	Inge. Interventor	3176[illegible]
13	Luz Mery Delgadillo P	52435150	Consorcio JCI Bogota	Res Social	3176482613
14	Gladys T Nariño	52935320	Consorcio Deidad	Ff Obra	3214422946
15	Liliana Rojas Rojas	52156973	Consorcio Deidad	Residente Obra	3118440109
16					
17					
18					

Findeter Financiera del Desarrollo	ACTA DE REUNION CONSTRUCTORA BOLIVAR	**Código:** CM-FO-18 **Versión:** 1 **Fecha de Aprobación:**

Fecha y lugar de la reunión: 14 de Julio de 2020, Obra Centro Integral de Justicia

Hora inicio: 8:00 am

Objetivo de la reunión: Revisión vía y andenes calle 7ª

PARTICIPANTES:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
Ing. Alexander Moreno Ceballos.	C. Deidad	
Ing. Liliana Rojas R.	C. Deidad	Residente
Arq. Hollman Salamanca	JIC Interventoría	
Tatiana Morales	C. Deidad	
Luz Mary Delgadillo	JIC Interventoría	Mary
Ing. Leonardo Barrelo	Constructora Bolivar	

Nota: Asistencia de la comunidad se reporta en listado de asistencia adjunto.

INVITADOS:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión vía y andenes calle 7ª (recorrido)
2. Establecimiento de compromisos en obra
3.

DESARROLLO

Scanned with CamScanner

CONSORCIO DEIDAD	**REUNIÓN ACTIVIDAD SOCIAL** la *"CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA Y CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA - CAMPO VERDE"* contrato N° 68573-028-2019 (PAF-SDSCJ-O-034-2019)	Findeter Financiera del Desarrollo CONSORCIO JCI BOGOTÁ NIT. 901.334.793-4

ORDEN DEL DÍA / AGENDA:

1.
2.
3.

DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Reparación vía y confinamiento anden perimetrales, El Consorcio Deidad contactará al Ing. Alfonso Uribe para solicitar una visita técnica con el fin de revisar una solución técnica a los inconvenientes actualmente presentados, lo anterior como compromiso generado el dia 17 de Junio/20 en reunión con el IDU.

2. El Ing. Leonardo Barreto enviará las especificaciones de la via calle 7ª el dia 14 de Julio de 2020 a los siguientes correos
Illiana rojas. construir 21 @gmail.com
cijinterventoria@gmail.com

3, La vía debe ser entregada en buenas condiciones el 30 de agosto de 2020. para ello se requiere previamente el envío a la Constructora Bolivar de un cronograma y el concepto del Ing. Alfonso Uribe y los ensayos de los materiales empleados durante el proceso.

4. Retirar la cubierta provisional del anden (via calle 7ª) a mas tardar el dia sabado 18 de julio de 2020 y se embo-quillará el adoquin afectado. (El dia martes 21 de julio/20 el Ingl Leonardo recibirá dichas actividades)

+ Illiana 20[illegible]

Scanned with CamScanner

CONSORCIO DEIORO	**REUNIÓN ACTIVIDAD SOCIAL** la *"CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA Y CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA - CAMPO VERDE"* contrato N° 68573-028-2019 (PAF-SDSCJ-O-034-2019)	Findeter Financiera del Desarrollo **CONSORCIO JCI BOGOTÁ** NIT. 901.334.793-4

INTERVENCIÓN DE LA COMUNIDAD:

5. Rampa de acceso

El Ing. Leonardo Barreto ratifica dos alternativas para el recibo de la rampa de acceso a la obra.

A. Rampa definitiva cumpliendo las especificaciones del IDU.

B. Construir nuevamente el anden como estaba inicialmente y como protección del mismo instalar una rampa metálica de acuerdo con las características enviadas al correo de la constructora. "Consorcio Deidad" por el Ing. Leonardo Bancto.

Scanned with CamScanner
