
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2330 DE 2025, MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ– DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

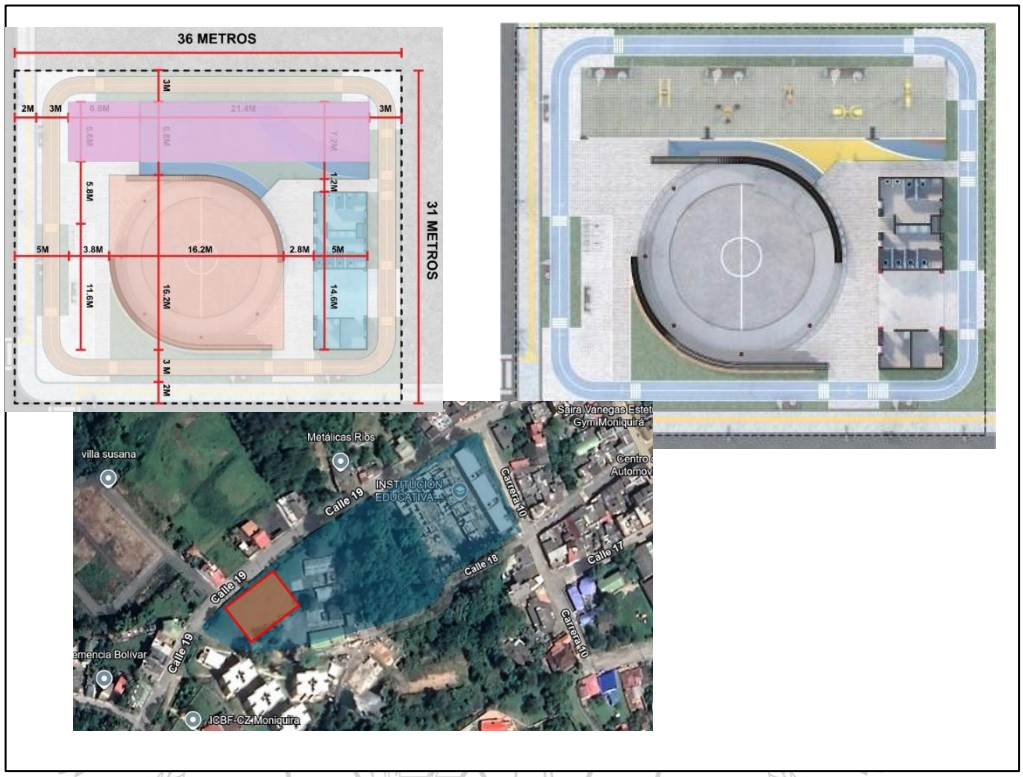

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ- BOYACÁ	
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Lote 2 "La Quinta" Calle 19 N° 10 -27 Barrio Joaquín Motta, zona urbana del municipio de Moniquirá, departamento de Boyacá.	
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MINISTERIO INTERIOR-FONSECON**	$ 2.450.000.000,00
	APORTES MUNICIPIO	$ 0,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO	$ 2.450.000.000,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	06/11/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/07/2026	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	14/11/2025	

INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO	PRIMERA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO	SUSPENSIÓN 01	FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN	FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO	FECHA: DD/MM/AAAA
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE($ 149.827.981,00)	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE($ 84.123.457,00)	
VALOR DE OBRA	MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE($1.846.883.749,00)	
VALOR INTERVENTORÍA	TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($369.164.814,00)	
SUPERVISOR DEL CONVENIO POR EL MUNICIPIO	HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES Secretaría de Planeación y Desempeño Institucional	
PERIODO DE INFORME	01 de diciembre del 2025 al 31 de diciembre del 2025	

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DESARROLLO DEL CONVENIO

Se avanza en la estructuración de los estudios previos y estudios del sector para el proceso de contratación de la obra que incluye estudios y diseños y la contratación de la interventoría.

En el proceso de estructuración se encuentra una posible irregularidad entre lo establecido en el ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 2330 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, BOYACÁ, concretamente en la CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRACTUALES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ENTE TERRITORIAL, en lo correspondiente PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, numeral 20 “Suministrar a los contratistas de obra e interventoría, el estudio de suelos del predio en el que se va a ejecutar la obra, realizado, aportado y presentado por el ENTE TERRITORIAL en el proceso de viabilidad para la asignación de recursos de FONSECON, garantizando su correspondencia con las normas técnicas, y que haya sido ejecutado por personal idóneo, y subsanar y/o aclarar cualquier inconsistencia que se detecte en la fase de diseños.”

El proyecto presentado viabilizado y aprobado como parte del convenio, incluye estudio de suelos del predio, por un valor de $ 11.523.245,00. Por lo tanto, desde la secretaría de compras del municipio se recomienda esperar a aclarar con el ministerio esta situación.

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO

RELACIÓN CUENTAS DE COBRO	DÉBITO	CRÉDITO
VALOR CONTRATO	$ 2.450.000.000,00	$ 0,00
VALOR CUENTA COBRO No. 1		$ 857.500.000,00
VALOR POR COBRAR		$ 1.592.500.000,00
SUMAS IGUALES	**$ 2.450.000.000,00**	**$ 2.450.000.000,00**

1. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO

ACTIVIDADES	30/11/2025	31/12/2025
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO	100%	
EXPEDICIÓN DE PÓLIZA Y ENVÍO PARA APROBACIÓN	100%	
ACTA DE INICIO	100%	
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	100%	
INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA	5%	15%
INCORPORACIÓN DE RECURSOS (Cuenta Cobro No. 1)		100%
ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS - PUBLICACIÓN - PROCESO Y ADJUDICACIÓN (INTERVENTORÍA Y OBRA (INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS)		40%
OBRA (INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS)		40%
INTERVENTORÍA		40%
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		0%

Teniendo en cuneta la vigencia fiscal, se planea la ejecución de los recursos para el año 2026.

HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES
Secretaría de Planeación y Desempeño Institucional
SUPERVISOR

Vto Bno. FREDY IOVANNY PARDO PIZÓN
Alcalde municipio de Moniquirá

	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	Vivian Andrea Ulloa Mayorga	Harvi Hiuston Antony Barrera Torres	Fredy Iovanny Pardo Pinzón
Firma			
TRD	Código	Dependencia	Secretaría de Planeación y Desempeño Institucional
