
INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2330 DE 2025, MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ– DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

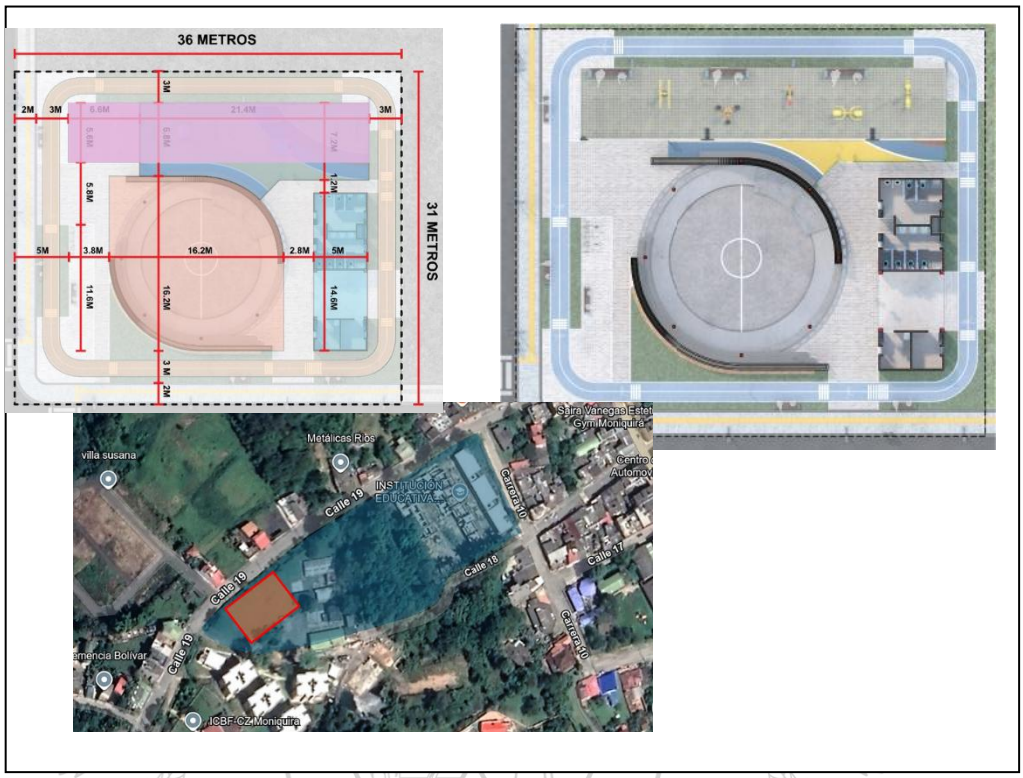

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ- BOYACÁ	
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Lote 2 "La Quinta" Calle 19 N° 10 -27 Barrio Joaquín Motta, zona urbana del municipio de Moniquirá, departamento de Boyacá.	
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MINISTERIO INTERIOR-FONSECON**	$ 2.450.000.000,00
	APORTES MUNICIPIO	$ 0,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO	$ 2.450.000.000,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	06/11/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/07/2026	

INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	14/11/2025	
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO	PRIMERA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO	SUSPENSIÓN 01	FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN	FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO	FECHA: DD/MM/AAAA
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE($ 149.827.981,00)	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE($ 84.123.457,00)	
VALOR DE OBRA	MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE($1.846.883.749,00)	
VALOR INTERVENTORÍA	TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($369.164.814,00)	
SUPERVISOR DEL CONVENIO POR EL MUNICIPIO	HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES Secretaría de Planeación y Desempeño Institucional	
PERIODO DE INFORME	01 de marzo del 2026 al 31 de marzo del 2026	

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DESARROLLO DEL CONVENIO

Durante el mes de marzo, se reitera la solicitud a la EBSA para cambio de trazado de red sobre predio propiedad municipio de Moniquirá, la EBSA mediante comunicación telefónica informa que la red actualmente entrega energía a los salones de la zona y que en el momento de las obras realizará el traslado, pues de allí también se podrá entregar el fluido eléctrico al Centro de Convivencia Ciudadana “Paz a lo Bien” Moniquirá.



Gmail planeacion moniquira-boyaca.gov.co <planeacion@moniquira-boyaca.gov.co>

Solicitud cambio de trazado red sobre predio propiedad municipio de Moniquirá

planeacion moniquira-boyaca.gov.co <planeacion@moniquira-boyaca.gov.co> 2 de marzo de 2026 a las 2:11 p.m.
Para: "nperez@ebsa.com.co" <nperez@ebsa.com.co>

Estimado Ingeniero Perez,

Esperamos que usted y su equipo de trabajo se encuentren muy bien,

Desde el municipio de Moniquirá y con el apoyo del ministerio del Interior venimos desarrollando el proyecto de "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ – BOYACÁ" en el predio localizado en la Calle 19 N°. 10-27 Lote N°2 "La Quinta" en el Barrio Joaquín Motta en el área urbana del municipio, coordenadas 5°52'26.3"N 73°34'37.4"W.
Predio sobre el que se encuentra una red de energía eléctrica, por lo que solicitamos su valiosa gestión y apoyo para cambiar el trazado de la mencionada red, que puede verse en las imágenes adjuntas. El proyecto se encuentra avanzando y requerimos iniciar obras de nivelación del terreno cuanto antes.

Hemos registrado la solicitud en la página web de la EBSA, con el radicado Nº. ENT-TUN-0009788-2026, para gestión y seguimiento,

Reiteramos nuestro agradecimiento por su valioso apoyo en el desarrollo sostenible de nuestro municipio,
Un cordial saludo,

ING.HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES
Secretario de Planeación y Desempeño Institucional
Municipio de Moniquirá



Adicionalmente se verifica la correcta instalación de la valla





Se avanza en el proceso de contratación para:

Número del proceso	Descripción	Precio estimado total
M-CM-001-2026	INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	453.288.271 COP
M-LP-001-2026	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ - BOYACÁ	1.996.711.729 COP

Según lo presentado en la plataforma secop 2, los procesos se detallan a continuación (Anexos al final del documento para cada proceso), teniendo en cuenta los documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2026, para el Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte):

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO

RELACIÓN CUENTAS DE COBRO	DÉBITO	CRÉDITO
VALOR CONTRATO	$ 2.450.000.000,00	$ 0,00
VALOR CUENTA COBRO No. 1		$ 857.500.000,00
VALOR POR COBRAR		$ 1.592.500.000,00
SUMAS IGUALES	**$ 2.450.000.000,00**	**$ 2.450.000.000,00**

4. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO

ACTIVIDADES	30/11/2025	31/12/2025	31/01/2026	28/02/2026	31/03/2026
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO	100%				
EXPEDICIÓN DE PÓLIZA Y ENVÍO PARA APROBACIÓN	100%				
ACTA DE INICIO	100%				
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	100%				
INCORPORACIÓN DE RECURSOS (Cuenta Cobro No. 1)		100%			
INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA	5%	15%	50%	90%	100%
ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, ESTUDIOS DEL SECTOR Y DEMAS DOCUMENTOS - INTERVENTORÍA Y OBRA (INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS)		5%	80%	100%	100%
OBRA (INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS)		40%	90%	100%	100%
INTERVENTORÍA		40%	70%	100%	100%
PUBLICACIÓN - PROCESO Y ADJUDICACIÓN -INTERVENTORÍA Y OBRA (INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS)				70%	90%
OBRA (INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS)				70%	90%
INTERVENTORÍA				70%	90%
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		0%	0%	0%	0%

Sin otro particular,

HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES
Secretaría de Planeación y Desempeño Institucional
SUPERVISOR

Vto Bno. FREDY IOVANNY PARDO PIZÓN
Alcalde municipio de Moniquirá

	Proyectó		Revisó	Aprobó
Nombre	Vivian Andrea Ulloa Mayorga		Harvi Hiuston Antony Barrera Torres	Harvi Hiuston Antony Barrera Torres
Firma				
TRD	Código		Dependencia	
