
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 6
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2330 DE 2025, MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ– DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

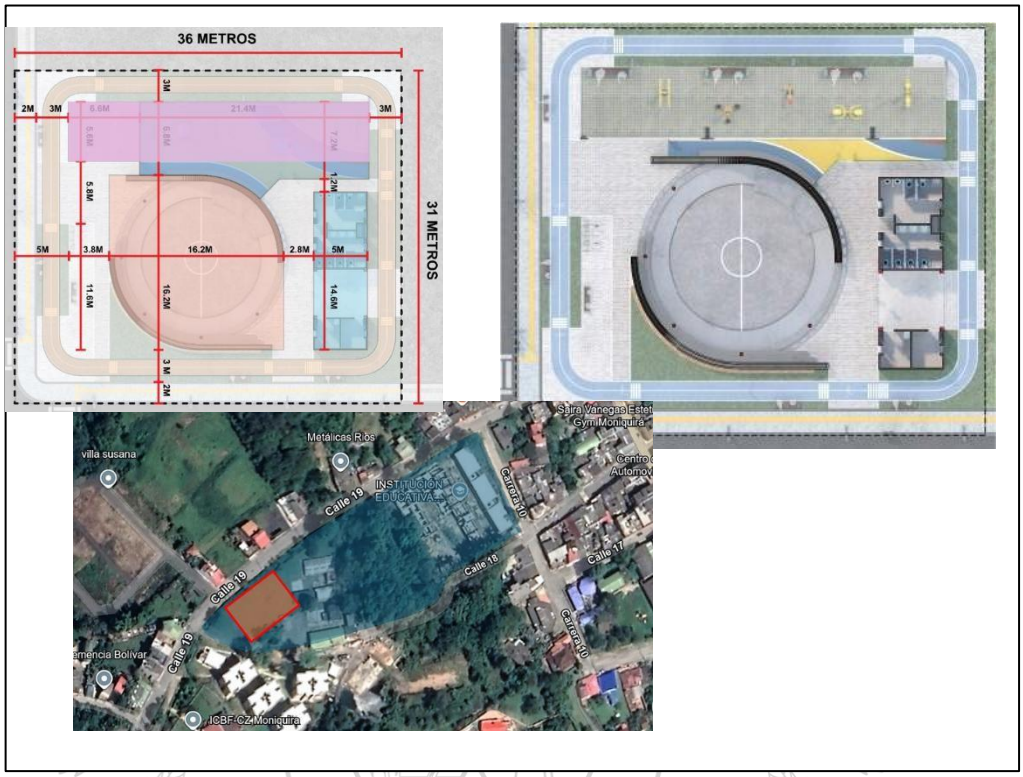

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ- BOYACÁ	
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Lote 2 "La Quinta" Calle 19 N° 10 -27 Barrio Joaquín Motta, zona urbana del municipio de Moniquirá, departamento de Boyacá.	
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MINISTERIO INTERIOR-FONSECON**	$ 2.450.000.000,00
	APORTES MUNICIPIO	$ 0,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO	$ 2.450.000.000,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	06/11/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/07/2026	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	14/11/2025	

INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO	PRIMERA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO	SUSPENSIÓN 01	FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN	FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO	FECHA: DD/MM/AAAA
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE($ 149.827.981,00)	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE($ 84.123.457,00)	
VALOR DE OBRA	MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE($1.846.883.749,00)	
VALOR INTERVENTORÍA	TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($369.164.814,00)	
SUPERVISOR DEL CONVENIO POR EL MUNICIPIO	HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES Secretaría de Planeación y Desempeño Institucional	
PERIODO DE INFORME	01 de abril del 2026 al 30 de abril del 2026	

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DESARROLLO DEL CONVENIO

Se avanza en el proceso de contratación para:

Número del proceso	Descripción	Precio estimado total
M-CM-001-2026	INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	453.288.271 COP
M-LP-001-2026	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ - BOYACÁ	1.996.711.729 COP

Según lo presentado en la plataforma secop 2, los procesos se detallan a continuación (Anexos al final del documento para cada proceso), teniendo en cuenta los documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2026, para el Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte):

INFORME DE SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE MONIQUIRA+

Precio estimado total: 453.288.271 COP

Número del proceso M-CM-001-2026 (Presentación de oferta)

Título: INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICI

Fase: Presentación de oferta

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Fase previa Presentación de observaciones

Descripción: INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Tipo de proceso Concurso de méritos abierto

Publicación del informe de evaluación de las Ofertas 6/04/2026 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Presentación de observaciones al informe evaluación de las ofertas 9/04/2026 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Expedición del acto de adjudicación o de declaratoria desierta 13/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Firma del Contrato 13/04/2026 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Entrega de las garantías de ejecución del contrato 14/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del contrato 15/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe de selección	CO1.AWD.2555596	Informe de selección CO1.AWD.2555596	20/04/2026 3:00 PM *(UTC -5 horas)*
Observación a informe	CO1.MSG.9243270	[Respondido] RE:SUBSANACIÓN PROPONENTE INTEROBRAS SC S.A.S., INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR	10/04/2026 11:08 AM *(UTC -5 horas)*
Informe de evaluación	CO1.AWD.2555596	Informe de evaluación 2 CO1.AWD.2555596	10/04/2026 11:07 AM *(UTC -5 horas)*
Observación a informe	CO1.MSG.9243270	SUBSANACIÓN PROPONENTE INTEROBRAS SC S.A.S., INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR	7/04/2026 7:22 PM *(UTC -5 horas)*
Informe de evaluación	CO1.AWD.2555596	Informe de evaluación 1 CO1.AWD.2555596	6/04/2026 5:02 PM *(UTC -5 horas)*

MUNICIPIO DE MONIQUIRA+

Precio estimado total: 1.996.711.729 COP

Número del proceso M-LP-001-2026 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))

Título: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ - BOYACÁ (Fase de Selección (Presentación de ofertas))

Fase: Fase de Selección (Presentación de ofertas)

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Fase previa Presentación de observaciones

Descripción: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ - BOYACÁ

Tipo de proceso Licitación pública (Obra pública)

Presentación de Ofertas 9/04/2026 8:30:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Apertura del sobre 1 9/04/2026 8:40:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Informe de presentación de Ofertas 10/04/2026 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Publicación del informe de verificación o evaluación 20/04/2026 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

ALCALDÍA MUNICIPAL MONIQUIRÁ		FM - 049	Versión: 2.0
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			Fecha: 01/09/2024
			Página 1 de 3

ADENDA

ADENDA MODIFICATORIA N° 03

LICITACIÓN DE OBRA PUBLICA
No. M-LP-001-2026

OBJETO:

OBJETO: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ - BOYACÁ"

CONSIDERANDO QUE:

Que el Municipio de Moniquirá con base en el Plan Anual de Adquisiciones, determinó la necesidad de realizar el proceso de contratación cuyo objeto es **"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ - BOYACÁ"** Para lo cual se permitió publicar el 13 de febrero de 2026 en la plataforma del SECOP: 2.) Estudios previos, estudio del sector, pliego de condiciones, avisos y demás anexos.

Que, dentro del proceso se presentó cinco 5 ofertas así:

LISTA DE OFERTAS

Abrir Panel | Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
Moniquira 1	CONSORCIO MQ	Evaluación	9/04/2026 8:18 AM	0 COP
UNIÓN TEMPORAL CENTRO MONIQUIRÁ	UT CENTRO MONIQUIRÁ	Evaluación	9/04/2026 8:15 AM	0 COP
CONSORCIO MONIQUIRÁ	CONSORCIO MONIQUIRÁ	Evaluación	9/04/2026 7:26 AM	0 COP
M-LP-001-2026 - UNION TEMPORAL C&G VIWAM INGENIERIA INTEGRAL	UNION TEMPORAL C&G VIWAM INGENIERIA INTEGRAL	Evaluación	9/04/2026 7:20 AM	0 COP
OFERTA M-LP-001-2026. CONSORCIO SOCIAL INSAF	CONSORCIO SOCIAL INSAF	Evaluación	8/04/2026 9:43 PM	0 COP

Fecha de cierre	AGOTADO	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Informe de presentación de ofertas Audiencia de apertura de Sobre 1	09/04/2026 a las 8:40 am	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	20/04/2026 a las 03:00 pm	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas	28/04/2026 a las 08:00 am	SECOP II	L. 1882/18 art. 1
(plazo máximo para presentación de subsanaciones)			
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre 1	29/04/2026 a las 08:00 am	SECOP II	L. 1882/18 art. 1
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	30/04/2026 a las 09:00 am	[ciudad], en la [dirección de la Entidad]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	30/04/2026 a las 06:00 pm	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.

ARTÍCULO CUARTO: Para efectos legales a los que haya lugar, este documento será publicado en el SECOP II www.contratos.gov.co

En constancia firman quienes intervienen en ella, a los **quince (15)** días del mes de **abril** del año **2026.**

FREDY IOVANNY PARDO PINZÓN
Alcalde municipal de Moniquirá

	Proyectó	Revisó / Aprobó	Revisó / Aprobó
Nombre	Ing. Héctor Andrés Rodríguez Arias – Apoyo profesional – Secretaría de Compras Públicas y Abastecimiento Estratégico	Dra. Ling Yinedt Ortiz Fajardo - Secretaria De Compras y Abastecimiento Estratégico	Ing. Harvi Huston Ardany Barrera Torres – Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional
Firma			
TRD	Código / Dependencia	SECRETARÍA DE COMPRAS PÚBLICAS Y ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO	

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO

RELACIÓN CUENTAS DE COBRO	DÉBITO	CRÉDITO
VALOR CONTRATO	$ 2.450.000.000,00	$ 0,00
VALOR CUENTA COBRO No. 1		$ 857.500.000,00
VALOR POR COBRAR		$ 1.592.500.000,00
SUMAS IGUALES	**$ 2.450.000.000,00**	**$ 2.450.000.000,00**

4. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO

ACTIVIDADES	30/11/2025	31/12/2025	31/01/2026	28/02/2026	31/03/2026	30/04/2026
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO	100%					
EXPEDICIÓN DE PÓLIZA Y ENVÍO PARA APROBACIÓN	100%					
ACTA DE INICIO	100%					
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	100%					
INCORPORACIÓN DE RECURSOS (Cuenta Cobro No. 1)		100%				
INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA	5%	15%	50%	90%	100%	
ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, ESTUDIOS DEL SECTOR Y DEMAS DOCUMENTOS - INTERVENTORÍA Y OBRA (INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS)		5%	80%	100%	100%	
OBRA (INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS)		40%	90%	100%	100%	
INTERVENTORÍA		40%	70%	100%	100%	
PUBLICACIÓN - PROCESO Y ADJUDICACIÓN - INTERVENTORÍA Y OBRA (INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS)				70%	90%	95%
OBRA (INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS)				70%	90%	90%
INTERVENTORÍA				70%	90%	100%
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		0%	0%	0%	0%	0%

Sin otro particular,

HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES
Secretaría de Planeación y Desempeño Institucional
SUPERVISOR

Vto Bno. FREDY JOVANNY PARDO PIZÓN
Alcalde municipio de Moniquirá

	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	Vivian Andrea Ulloa Mayorga	Harvi Hiuston Antony Barrera Torres	Harvi Hiuston Antony Barrera Torres
Firma			
TRD	Código	Dependencia	
