INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

FECHA	lunes, 12 de febrero de 2024	PERIODO No.	58	DEL	5/02/2024	AL	11/02/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL PARQUES BELLO Y PARQUE LA JOYITA Calle 30B SUR-KR1A / CALLE 31 SUR- KR 1E**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				**CONTRATO DE OBRA.**			
CONTRATO No.:	1260 DE 2022			**CONTRATO No.:**	1270 DE 2022		
PLAZO INICIAL:	10 MESES			**PLAZO INICIAL:**	9 MESES		
PRORROGA No. 1	2 MES 15 DIAS			**PRORROGA No. 1**	2 MES 15 DIAS		
PRORROGA No. 2	1 MES 15 DIAS			**PRORROGA No. 2**	1 MES 15 DIAS		
PRORROGA No. 3				**PRORROGA No. 3**	1 MES 2 DIAS		
FECHA DE INICIACIÓN:	28/12/2022			**FECHA DE INICIACIÓN:**	28/12/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/10/2023			**FECHA DE TERMINACIÓN:**	28/09/2023		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	27/03/2024			**FECHA DE TERMINACION**	26/01/2024		
				FECHA DE TERMINACION	27/02/2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	455			**PLAZO ACTUALIZADO:**	426		
PLAZO TRANSCURRIDO:	410	EQUIVALE AL	90%	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	410	EQUIVALE AL	96%
VALOR INICIAL :	$1.555.859.401			**VALOR INICIAL :**	$8.491.054.570		
VALOR ADICIÓN 1:	$76.000.000			**VALOR ADICIÓN(ES):**	$0		
VALOR ADICIÓN	$0			**ANTICIPO**	$2.547.316.371		
VALOR ACTUALIZADO:	$1.631.859.401			**VALOR ACTUALIZADO:**	$0		
VALOR PAGADO:	$639.885.658			**VALOR PAGADO:**	$3.712.231.792		
VALOR POR PAGAR:	$991.973.743			**VALOR POR PAGAR:**	$2.231.506.407		
SUPERVISOR:	**CAMILO ANDRES PEÑUELA CANO**			**INTERVENTOR:**	**ELSA TORRES ARENALES**		

2. CONTROL DE HITOS.


No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	28/12/2022	28/12/2022	0
2	VISITA DE CAMPO CON CADA CONTRATISTA	26/01/2023	11/01/2023	-15
3	REUNIÓN CON CONTRATISTA OBRA ALCALDÍA LOCAL- JOYITA20	9/01/2023	12/01/2023	3
4	APROPIACIÓN DE DISEÑOS - FASE PRELIMINAR	28/12/2022	6/02/2023	40
5	REUNIÓN CON CONTRATISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CON SOLICITUDES Y/O INQUIETUDES DEL CONTRATISTA DE OBRA	28/01/2023	31/03/2023	62
6	INICIO DE OBRA	28/01/2023	31/01/2023	3
7	CUMPLIMIENTO A TODO LO SOLICITADO EN LA FASE PRELIMINAR / APROPIACIÓN DE DISEÑOS	28/01/2023	30/04/2023	92
	FASE PRELIMINAR			
7	REMITIR HOJAS DE VIDA	2/01/2023	30/01/2023	25
8	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	18/01/2023	6/02/2023	19
9	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA	18/01/2023	1/02/2023	13
10	REVISAR, APROBAR Y VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ENTREGADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA	11/01/2023	8/02/2023	28
11	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA	18/01/2023	25/01/2023	6
12	REVISAR Y APROBAR LOS DOCUMENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA5	18/01/2023	11/03/2023	52
13	PLAN DE COMPRAS - REVISIÓN Y APROBACIÓN PLAN DE COMPRAS	26/01/2023	11/03/2023	44
14	PMT- APROBACIÓN PMT	19/01/2023	25/01/2023	5
15	PROGRAMACIÓN APUS- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE APUS	27/01/2023	15/02/2023	19
16	APROBACIÓN DE LABORATORIOS Y MATERIALES ESENCIALES FASE	27/01/2023	11/03/2023	43
	30			

AVANCE DE ACTIVIDADES PRELIMINARES / APROPIACIÓN DE DISEÑOS

PROGRAMACIÓN

SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA (%)	EJECUTAD0 SEMANA (%)
1,2,3, y 4	100,00%	60,00%
5	100,00%	80,00%
6	100,00%	80,00%
7	100,00%	84,00%
8	100,00%	84,00%
9	100,00%	84,00%
10	100,00%	98,00%
11	100,00%	98,00%
12	100,00%	99,50%
13	100,00%	99,50%
14	100,00%	99,50%
15	100,00%	100,00%

DIFERENCIA
0,00%

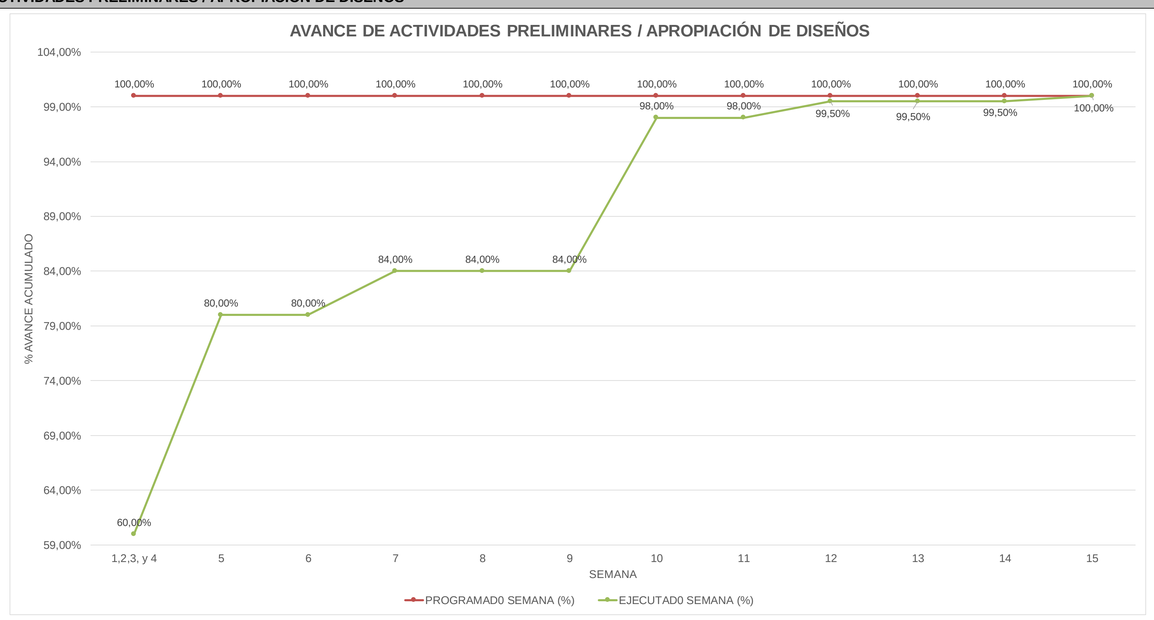

ÍTEM	2.1. FASE EJECUCIÓN DE OBRAS BELLO HORIZONTE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	%EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
1.1.1.	Replanteo general	31/01/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.1.2.	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	14/02/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.1.3.	Descapote mecánico y retiro,Incl. MdeO.**	3/12/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.1.4.	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	2/05/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.1.5.	Campamento 40 M2	2/05/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.1.6.	Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos)	2/02/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.2.2.	Demolición. Muro 0.20x 0,25	17/03/23	**Finalizada**	100,0%	
1.2.3.	Demolición muros de concreto	26/03/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.2.4.	Demolición Cimiento en Concreto	26/03/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.2.5.	Demolición placa de contrapiso	30/03/2023	**Finalizada**	100,00%	
1,2,7,	Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	20/07/2023	**Finalizada**	100,00%	
1.2.8.	Demolición Escalera Concreto	17/04/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.2.9.	Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	20/07/2023	**Finalizada**	100,0%	
	Demolición de Estructura con Equipo+ retiro	16/09/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.3.1	Desmonte y retiro de red eléctrica A.P.**	11/08/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.3.2.	Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	5/09/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.3.3.	Desmonte Equipos Biosaludables (Demolc+Retiro)	18/05/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.3.4.	Desmonte juegos infantiles	27/05/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.3.6.	Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m	05/0/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.3.7.	Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico	11/08/2023	**Finalizada**	100,0%	
2.1.1.	Excavación Manual Taludes	31/10/2023	**Finalizada**	100,0%	
2.1.2.	Excavación manual con retiro en roca Caisson**	8/04/2023	**Finalizada**	100,00%	
2.1.3.	Excavación Mecánica Y Retiro	31/05/2023	**Finalizada**	100,0%	
2.1.4.	Entibado de Excavación	31/05/2023	**Finalizada**	100,0%	
2.1.5.	Excavación con equipo en roca Caisson	27/06/2023	**Finalizada**	100,00%	
2.2.3	Nivelación y Compactación de subrasante (MdeO+Cilin)	31/10/2023	**Finalizada**	100,0%	
2.2.4	Nivelacion y Conformacion taludes (m2) e=0.05**	31/10/2023	**Finalizada**	100,0%	
2.4.2.	Relleno Recebo afirmado	31/10/2023	**Finalizada**	100,00%	
2.4.4.	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	31/10/2023	**Finalizada**	100,00%	
3,1,1,	Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C Sin	31/10/2023	**En ejecución**	90,00%	
3,1,2,	Viga 0.3*0.4 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	27/10/2023	**Finalizada**	100,00%	
3.1.3.	Concreto de Limpieza (solado) 2500psi	31/10/2023	**Finalizada**	100,00%	
3,1,5,	Pilote +Concret210 D=0.40 M Exc. Máxima 35 M Roca	11/07/2023	**Finalizada**	100,00%	
3.2.3	Gradería Sitio	29/05/2023	**Finalizada**	100,00%	
	Placa contrapiso 0,12 m 3000 PSI	31/10/2023	**Finalizada**	100,00%	
3.4.2.	Muro contención concreto premezclado 4000	2/09/2023	**Finalizada**	100,0%	
	Muro de Contención en Gavion(Inc.Formaleta). **	31/10/2023	**Finalizada**	100,0%	
	Junta de Dilatación sikarod 32mm + sikaflex **	31/10/2023	**Finalizada**	100,0%	
	Acero de refuerzo 60000	31/10/2023	**Finalizada**	100,0%	
3.7.1	Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35	31/10/2023	**Finalizada**	100,0%	
3.7.2	Tuberia Novafort d=250mm Exca y relleno zona dura **	25/09/2023	**Finalizada**	100,0%	
	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	28/06/2023	**Finalizada**	100,0%	
4.1.5.	Caja eléctrica de inspección AP 274 Codensa **	28/06/2023	**Finalizada**	100,0%	
4,1,1	Canaliz ducto eléctrica PVC- D2X3" Zona Verde	31/10/2023	**Finalizada**	100,0%	
7.1.2	Bordillo en sitio - contenedor de raíces (0.15x0.6m)	31/10/2023	**Finalizada**	100,0%	
7.2.6	Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo **	30/05/2023	**Finalizada**	100,0%	
	Empalme en Derivación (91B1)	31/10/2023	**Finalizada**	100,0%	
	Caja electrica de inspección AP 274 Codensa **	31/10/2023	**Finalizada**	100,0%	
	Canaliz ducto electric PVC- D2X3 Zona Verde	31/10/2023	**Finalizada**	200,0%	

	Acometida 3#4	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	Cable 3 N° 12 Sum e Instal**	31/10/2023	En ejecucion	95,0%		
	Brazo Sencillo Luminaria	30/05/2023	Finalizada	100,0%		
	Luminaria FLEXIA FG MIDI / 20 LEDS / 4000K / 32W / 220V	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	Luminaria AVENTO 1 / 144 LEDS / 233mA / 4000K / 5195 OPTIC / 106W / 220V	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	Fotocelda - Suministro e instalacion	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	Sistema de Puesta a Tierra	31/10/2023	En ejecucion	90,0%		
	Soldadura Exotermica	31/05/2023	Finalizada	100,0%		
	Empradizacion grama con semiilla ray-grass **	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	Traslado de arbol pequeño	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	Arbol Acacia Negra(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	Arbol CarboneroRojo(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	Arbol Caucho Tequendama (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	Arbol Guayacán (Siemb+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	31/05/2023	Finalizada	100,0%		
	Arbol Nogal 1.5 - 2.0m(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	Arbol Yarumo/Cecropia (Siemb+Caja+Tier.Ab+Tutor)	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	Jardinería Densidad 12 Plantas por M2 -CDRC	31/10/2023	En ejecucion	95,0%		
	Adoquin prefabricado de arcilla. 60x260 e=60mm.	31/10/2023	En ejecución	95,0%		
	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 sin viga	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 sin viga	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	Servicio de Time Lapse con Fotos	15/11/2023	Finalizada	100,00%		
	Dotación Giro Cadera Adultos/Mayores	15/11/2023	Finalizada	100,00%		
	Barras Adultos/Mayores-Diseñ-Idrd(Suminist)	15/11/2023	Finalizada	100,00%		
	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	15/11/2023	Finalizada	100,00%		
	Bicicletero Espiral Acero Inox(10 Puestos)Sum+Inst	15/11/2023	Finalizada	100,00%		
8.1.8.	**SEÑALIZACION**					
	Valla Normas Gral. 2 Caras (1.00x3.00m)	15/11/2023	En ejecución	95,00%		
	Señal Para Biosaludable (0.80x1.20m) dos caras	15/11/2023	En ejecución	95,00%		
	Señal en lámina galv (90X140CM) CAL.18-HG+Vi (DESM	15/11/2023	En ejecución	95,00%		
	Señal Plano Ubic Parque (0.90x1.20m) 1 cara (PGLH)	15/11/2023	En ejecución	95,00%		
	Señal Punto de Encuentro 1 Cara	15/11/2023	En ejecución	95,00%		
	Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	15/11/2023	En ejecución	95,00%		
8.1.8.	**REEMBOLSABLES**					
	Espaldón Igol Imprimante + Denso	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	Valla informativa de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	LICENCIAS AMBIENTALES, PERMISOS ETC.	31/10/2023	En ejecución	50,0%		
	Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1800+tubo100mm	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	Filtro Chimenea Excav+geoNT-1600+tubo100mm **	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 2500 psi **	31/10/2023	Finalizada	1000,0%		
	Geotextil NT-1600** - Suministro e instalación	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	Piso caucho Recicl 3cm	31/10/2023	En ejecución	95,0%		
	Suministro e instalación Balancín	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	Suministro e instalación de muelle resorte cap. 1 niño	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	Corte Concreto Dilatac.cortadora (e=6-10)	31/10/2023	Finalizada	100,0%		
	Poste Metal H=9M a 10M Tipo Ap + Base Concreto (Sum + Tran + Hin)	31/10/2023	Finalizada	100,0%		

AVANCE DE OBRA BELLO HORIZONTE

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA (%)	EJECUTAD0 SEMANA (%)
1,2,3, y 4	0,00%	0,00%
5	0,99%	0,70%
6	1,53%	2,84%
7	2,08%	3,34%
8	2,62%	4,22%
9	3,17%	4,79%
10	3,72%	5,19%
11	4,81%	5,53%
12	6,11%	6,31%
13	7,47%	6,76%
14	8,83%	7,28%
15	10,20%	8,11%
16	11,56%	9,66%
17	12,92%	10,05%
18	14,40%	10,97%
19	10,34%	11,42%
20	11,62%	12,40%
21	13,10%	12,71%
22	14,83%	13,94%
23	16,59%	14,78%
24	18,39%	17,46%
25	20,24%	19,54%
26	22,21%	21,32%
27	26,95%	23,51%
28	29,97%	26,17%
29	35,09%	27,58%
30	41,34%	29,08%
31	48,25%	30,39%
32	55,63%	31,72%
33	62,90%	31,99%
34	69,73%	33,41%
35	76,17%	34,75%
36	82,33%	36,54%
37	87,92%	38,31%
38	93,30%	39,79%
39	39,24%	51,10%
40	44,18%	56,12%
41	54,01%	56,49%
42	64,28%	61,02%
43	84,40%	75,10%
44	92,92%	81,04%
45	98,65%	82,61%
46	100,00%	84,12%
47	100,00%	86,32%
48	100,00%	92,32%
49	100,00%	92,98%
50	97,27%	94,41%
51	98,89%	95,61%
52	99,61%	95,85%
53	100,00%	96,82%
54	100,00%	96,87%
55	100,00%	96,90%
56	100,00%	97,16%
57	100,00%	97,40%
58	100,00%	97,50%

DIFERENCIA

-2,50%


El presente informe se realiza con la programación aprobada con la prorroga 2 del día 12 de diciembre de 2023


PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA ($)	EJECUTAD0 SEMANA ($)
1, 2, 3 y 4	$ 0	$ 0
5	$ 20.129.455	$ 16.199.764
6	$ 22.668.999	$ 40.071.346
7	$ 29.769.785	$ 50.592.994
8	$ 38.222.999	$ 64.351.670
9	$ 46.506.890	$ 71.524.701
10	$ 55.703.564	$ 78.038.988
11	$ 100.183.953	$ 88.183.813
12	$ 132.143.369	$ 104.707.930
13	$ 147.397.949	$ 117.334.895
14	$ 166.253.660	$ 128.145.631
15	$ 254.995.560	$ 140.453.237
16	$ 321.017.283	$ 161.402.143
17	$ 384.536.959	$ 165.442.247
18	$ 451.644.240	$ 176.319.028
19	$ 512.633.595	$ 182.332.807
20	$ 588.533.349	$ 248.865.838
21	$ 661.947.160	$ 256.245.532
22	$ 733.418.103	$ 300.610.636
23	$ 819.655.199	$ 313.742.405
24	$ 910.317.778	$ 333.924.948
25	$ 990.726.068	$ 484.931.571
26	$ 1.078.838.074	$ 511.090.371
27	$ 1.163.483.740	$ 513.433.240
28	$ 1.245.131.415	$ 597.988.525
29	$ 1.330.630.780	$ 625.082.082
30	$ 1.418.516.933	$ 670.682.649
31	$ 1.502.351.961	$ 701.098.376
32	$ 1.585.598.010	$ 718.057.893
33	$ 1.700.313.770	$ 738.958.426
34	$ 1.869.874.057	$ 789.310.712
35	$ 2.045.512.866	$ 819.788.388
36	$ 2.217.150.724	$ 952.242.832
37	$ 2.445.669.579	$ 964.954.878
38	$ 2.691.979.565	$ 983.770.236
39	$ 567.967.822	$ 822.265.822
40	$ 684.372.871	$ 956.001.651
41	$ 979.833.253	$ 973.298.051
42	$ 1.401.141.159	$ 1.060.510.928
43	$ 1.876.834.703	$ 1.317.002.338
44	$ 2.061.683.342	$ 1.490.731.850
45	$ 2.126.746.957	$ 1.579.766.424
46	$ 2.147.883.259	$ 1.631.395.220
47	$ 2.147.883.259	$ 1.684.329.620
48	$ 2.147.883.259	$ 1.849.508.166
49	$ 2.147.883.259	$ 1.880.503.078
50	$ 2.048.801.135	$ 1.922.752.280
51	$ 2.105.403.969	$ 1.964.007.077
52	$ 2.105.403.969	$ 1.922.752.280
53	$ 2.147.883.260	$ 2.000.408.685
54	$ 2.147.883.260	$ 2.001.482.627
55	$ 2.147.883.260	$ 2.002.126.992
56	$ 2.147.883.260	$ 2.018.322.970
57	$ 2.147.883.260	$ 2.029.557.545
58	$ 2.147.883.260	$ 2.052.071.236

DIFERENCIA

$ 95.812.024

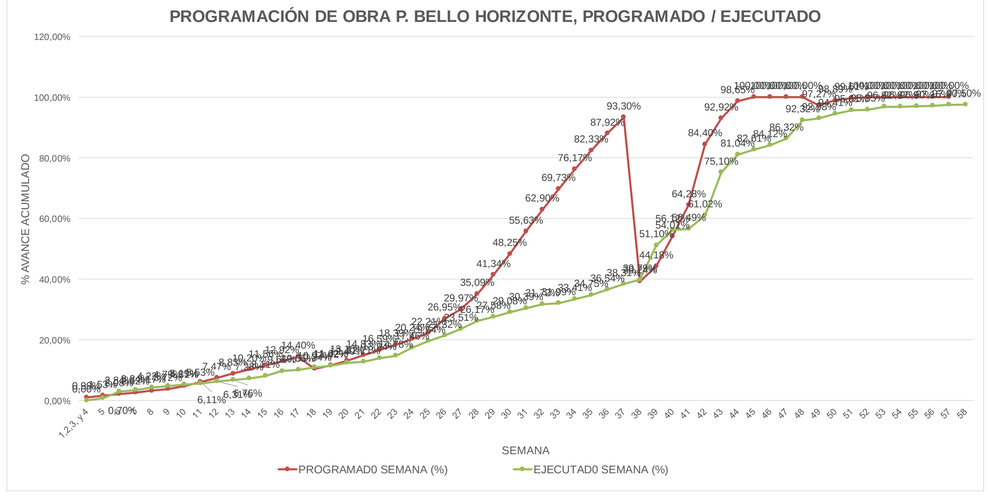

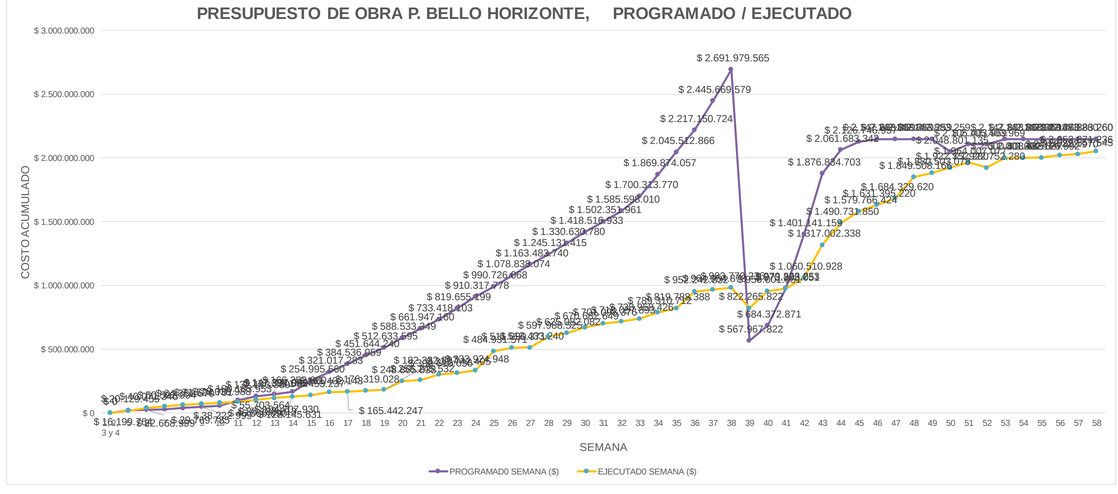

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

FECHA	lunes, 12 de febrero de 2024	PERIODO No.	58	DEL	5/02/2024	AL	11/02/2024

***** Se adjunta Imágenes de la programación de obra aprobada en Project con corte al 11 febrero del 2024.**

ÍTEM	2.2. FASE EJECUCIÓN DE OBRAS LA JOYITA	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENT	%EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
1.1.1.	Replanteo general	31/01/2023	31/01/2023	100,0%	
1.1.2.	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	14/02/2023	20/02/2023	100,0%	
1.1.3.	Descapote mecánico y retiro,Incl. MdeO.**	12/03/2023	30/03/2023	100,0%	
1.1.4.	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	5/02/2023	29/03/2023	100,0%	
1.1.5.	Campamento 40 M2	5/02/2023	6/02/2023	100,0%	
1.1.6.	Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos)	2/02/2023	2/02/2023	100,0%	
1.2.1.	Demolición cimiento en concreto	28/07/2023	**En ejecución**	100,0%	
1.2.2.	Demolición placa de contrapiso	21/03/2023	12/04/2023	100,0%	
1.2.4	Demolición Cuneta Manual Incluye cargue y retiro	30/03/2023	20/04/2023	100,0%	
1.2.5.	Demolición Escalera Concreto	3/04/2023	28/03/2023	100,0%	
1.3.1.	Desmonte aparatos	19/03/2023	30/03/2023	100,0%	
1.3.2,	Desmonte carpintería metálica	27/03/2023	**En ejecución**	100,0%	
1.3.3,	Desmonte y retiro de red eléctrica A.P.**	27/03/2023	**En ejecución**	50,0%	
1.3.4.	Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	10/04/2023	**En ejecución**	100,0%	
1.3.5.	Desmonte y retiro de llantas**	17/04/2023	21/03/2023	100,0%	
1.3.7.	Desmonte Y Reinst.De Pasamanos	1/05/2023	28/03/2023	100,0%	
1.3.8.	Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m**	1/05/2023	**En ejecución**	100,0%	
1.3.9.	Desmonte y retiro de luminaria Álbum Publico	8/05/2023	**En ejecución**	67,0%	
2.1.1.	Excavación Manual Taludes	30/03/2023	**En ejecución**	100,0%	
2.1.2.	Excavación manual con retiro en roca Caisson**	10/07/2023	**En ejecución**	100,0%	
2.1.3.	Excavación Mecánica Y Retiro	10/07/2023	**En ejecución**	100,0%	
2.1.4.	Entibado de Excavación **	10/07/2023	**En ejecución**	100,0%	
2.1.5.	Excavacion con equipo en roca Caisson**	18/07/2023	**En ejecución**	100,0%	
	Nivelación y Compactación de subrasante (MdeO+Cilin)	6/10/2023	**En ejecución**	90,0%	
	Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	10/11/2023	**En ejecución**	95,0%	
2.4.2.	Relleno recebo afirmado	6/06/2023	**En ejecución**	95,0%	
2.4.4.	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	30/06/2023	**En ejecución**	95,0%	
	Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle	10/11/2023	**En ejecución**	90,0%	
3.1.2.	Concreto de Limpieza (solado) 2500psi	14/05/2023	**En ejecución**	100,0%	
3.1.5.	Columna Circ Conc 4000PSI Ø1,20 M. - PILA	30/06/2023	**En ejecución**	100,0%	
	Pedestal En Concreto 4000psi	9/11/2023	**En ejecución**	100,0%	
	Vigas Aereas En Concreto 4000psi**	21/11/2023	7/12/2023	100,0%	
	Graderia Sitio	12/10/2023	**En ejecución**	80,0%	
	Placa contrapiso 0.12 m 3000 psi	12/10/2023	**En ejecución**	100,0%	
3.4.1.	Muro contención concreto premezclado 4000	30/05/2023	**En ejecución**	100,0%	
3.4.2.	Muro de Contención en Gavión(Inc. Formaleta). **	27/07/2023	**En ejecución**	95,0%	
	Entrepiso Steel Deck E=.13	22/12/2023	**En ejecución**	75,0%	
	Estructura metalica obra	31/10/2023	**En ejecución**	70,0%	
3.7.1.	Acero de refuerzo 60000 **	19/08/2023	**En ejecución**	100,0%	
3.7.2.	Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35	19/07/2023	**En ejecución**	90,0%	
	Tuberia Novafort d=250mm	3/11/2023	**En ejecución**	80,0%	
	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	3/11/2023	**En ejecución**	80,0%	
4.1.7.	Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1800+tubo100mm **	1/09/2023	**En ejecución**	100,0%	
	Caja electrica de inspección AP 274 Codensa **	3/11/2023	**En ejecución**	90,0%	
	Canaliz ducto electric PVC- D2X3 Zona Verde	3/11/2023	**En ejecución**	90,0%	
8.1.2.	Tala de arboles h= 2.1 a 5 m incly. Transp	24/05/2023	2/08/2023	100,0%	
8.1.3.	Traslado con equipo y bloqueo arboles de 5 m a 10m	24/05/2023	**En ejecución**	100,0%	
	Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo **	3/11/2023	**En ejecución**	90,0%	
9.2.1.	Servicio de Time Lapse con Fotos	27/09/2023	**En ejecución**	96,1%	
	LOSA DE PISO ALIGERADA F'C 21 MPAh=.50 Caset. GUADUA	22/11/2023	7/12/2023	100,0%	
NP	Concreto ciclópeo concreto de 3000 psi. MezclObra 0.6Mx0.4P **	30/05/2023	30/06/2023	100,0%	
	Geotextil NT-1600** - Suministro e instalacion	16/11/2023	**En ejecución**	85,0%	
	Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 2500 psi **	20/09/2023	**En ejecución**	100,0%	
	CANASTILLA PASAJUNTAS (4 BARRAS LISAS 1"*35 CM CADA 30 CM)	8/11/2023	**En ejecución**	80,0%	
	Corte Concreto Dilatac.cortadora (e=6-10)	14/11/2023	**En ejecución**	60,0%	
	Mampostería en Bloque de cocreto 15x20x40	16/01/2024	**En ejecución**	100,0%	
	GROUTING - MORTERO F´CR 16.5 MPA MAMPOSTERIA CDRC	16/01/2024	**En ejecución**	100,0%	
	Piso en concreto MR 41 (280 Kg/cm2) acelerado a 7 dias estampado	14/11/2023	**En ejecución**	80,0%	
	Suministro e instalación de bordillo A80	8/11/2023	**En ejecución**	80,0%	
	Sunistro e instalación de cárcamo de .43x.40x1.00	8/11/2023	**En ejecución**	75,0%	
	Sunistro e instalación de cárcamo prefabricado 0.63x0.60x1.00	30/11/2023	**En ejecución**	85,0%	
	REEMBOLSABLES				
	Valla informativa de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M			100,0%	
	LICENCIAS AMBIENTALES, PERMISOS ETC.			8,4%	

AVANCE DE OBRA JOYITA

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA (%)	EJECUTAD0 SEMANA (%)
1,2,3, y 4	0,00%	0,00%
5	0,94%	0,56%
6	1,00%	0,83%
7	2,30%	2,85%
8	2,43%	2,88%
9	2,84%	3,19%
10	3,31%	3,57%
11	4,20%	4,17%
12	5,29%	5,56%
13	6,50%	6,86%
14	8,88%	7,94%
15	10,75%	8,48%
16	12,62%	8,83%
17	14,49%	9,93%
18	9,72%	10,70%
19	11,46%	12,04%
20	11,65%	12,24%
21	12,65%	12,44%
22	14,04%	14,48%
23	15,67%	14,69%
24	17,57%	14,97%
25	20,12%	16,07%
26	23,63%	18,81%
27	27,43%	19,65%
28	31,44%	21,53%
29	36,53%	21,66%
30	41,89%	22,20%
31	48,39%	23,28%
32	56,29%	23,93%
33	64,16%	24,88%
34	71,70%	25,29%
35	79,05%	26,21%
36	86,24%	31,61%
37	93,12%	33,05%
38	99,32%	35,69%
39	30,84%	49,24%
40	32,97%	50,34%
41	36,11%	51,54%
42	40,08%	53,06%
43	44,21%	53,93%
44	49,24%	55,40%
45	57,70%	56,84%
46	68,30%	63,22%
47	81,30%	68,28%
48	90,95%	70,79%
49	99,15%	72,53%
50	73,47%	72,53%
51	77,98%	74,24%
52	82,10%	76,31%
53	86,20%	77,99%
54	91,13%	80,15%
55	96,32%	81,53%

DIFERENCIA
-3,68%

El presente informe se realiza con la programación aprobada con la prorroga 3 del día 25 de enero 2024

PRESUPUESTO DE OBRA


SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA ($)	EJECUTAD0 SEMANA ($)
1, 2, 3 y 4	$ 0	$ 0
5	$ 20.608.909	$ 11.723.869
6	$ 38.953.542	$ 44.919.042
7	$ 58.156.673	$ 92.745.322
8	$ 93.638.136	$ 113.517.172
9	$ 102.174.262	$ 118.886.077
10	$ 119.920.521	$ 125.904.888
11	$ 222.180.989	$ 131.942.265
12	$ 260.188.615	$ 160.148.255
13	$ 292.531.508	$ 195.040.036
14	$ 324.957.535	$ 237.973.744
15	$ 353.972.194	$ 253.235.904
16	$ 385.015.574	$ 257.344.467
17	$ 416.924.020	$ 307.539.672
18	$ 458.271.715	$ 338.358.368
19	$ 492.840.161	$ 389.179.758
20	$ 524.540.463	$ 390.406.540
21	$ 555.997.749	$ 401.941.434
22	$ 724.478.633	$ 451.596.426
23	$ 958.016.838	$ 470.823.280
24	$ 1.205.837.113	$ 491.934.026
25	$ 1.297.204.061	$ 518.740.964
26	$ 1.400.626.453	$ 545.402.626
27	$ 1.615.540.606	$ 638.054.836
28	$ 1.998.413.055	$ 724.063.360
29	$ 2.363.195.356	$ 733.873.197
30	$ 2.673.832.222	$ 759.338.573
31	$ 2.936.589.522	$ 821.634.587
32	$ 3.191.769.741	$ 876.416.003
33	$ 3.688.679.196	$ 892.490.636
34	$ 4.082.993.488	$ 956.267.828
35	$ 4.409.443.094	$ 1.121.592.127
36	$ 4.717.985.517	$ 1.821.263.451
37	$ 4.936.813.550	$ 1.968.377.336
38	$ 5.217.140.753	$ 2.193.652.955
39	$ 724.121.553	$ 2.443.345.239
40	$ 969.438.022	$ 2.694.187.115
41	$ 1.260.506.788	$ 2.769.466.384
42	$ 1.610.945.317	$ 2.941.690.198
43	$ 2.098.757.589	$ 3.099.604.108
44	$ 2.702.189.538	$ 3.201.695.539
45	$ 3.475.211.764	$ 3.408.765.750
46	$ 4.130.900.904	$ 3.639.193.637
47	$ 4.934.225.691	$ 3.731.771.828
48	$ 5.704.589.939	$ 3.781.259.809
49	$ 6.297.723.282	$ 3.905.687.250
50	$ 4.058.453.662	$ 4.026.419.636
51	$ 4.360.473.613	$ 4.151.118.150
52	$ 4.667.894.037	$ 4.245.571.536
53	$ 4.995.933.331	$ 4.294.849.850
54	$ 5.361.910.360	$ 5.081.489.422
55	$ 5.915.029.955	$ 5.194.717.673


DIFERENCIA
$ 88.697.857

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA										
	SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES										
FECHA	lunes, 12 de febrero de 2024			**PERIODO No.**	58	DEL	**5/02/2024**	AL	**11/02/2024**		

56	100,00%	82,47%
57	84,92%	84,10%
58	89,47%	85,79%

56	$ 6.343.171.312	$ 5.202.777.980
57	$ 4.929.194.744	$ 5.297.563.338
58	$ 5.258.201.075	$ 5.346.898.932

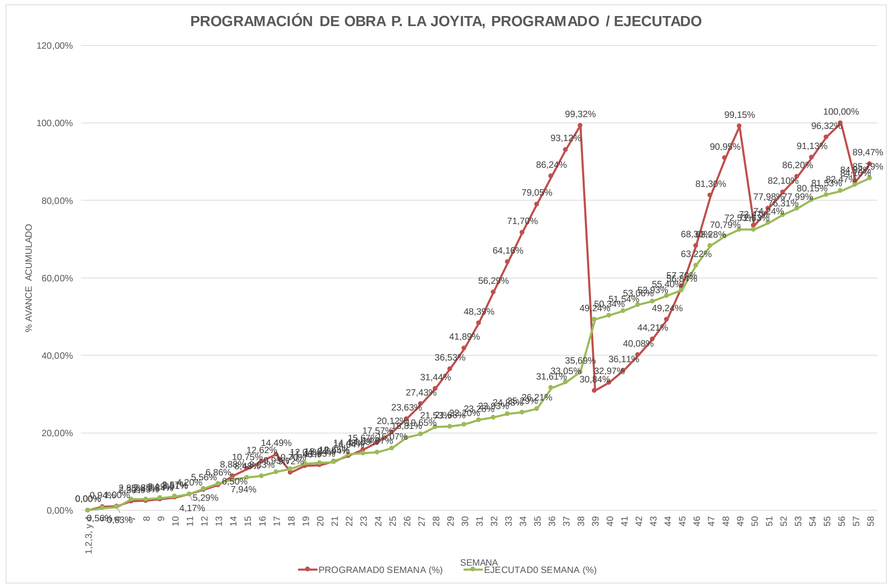

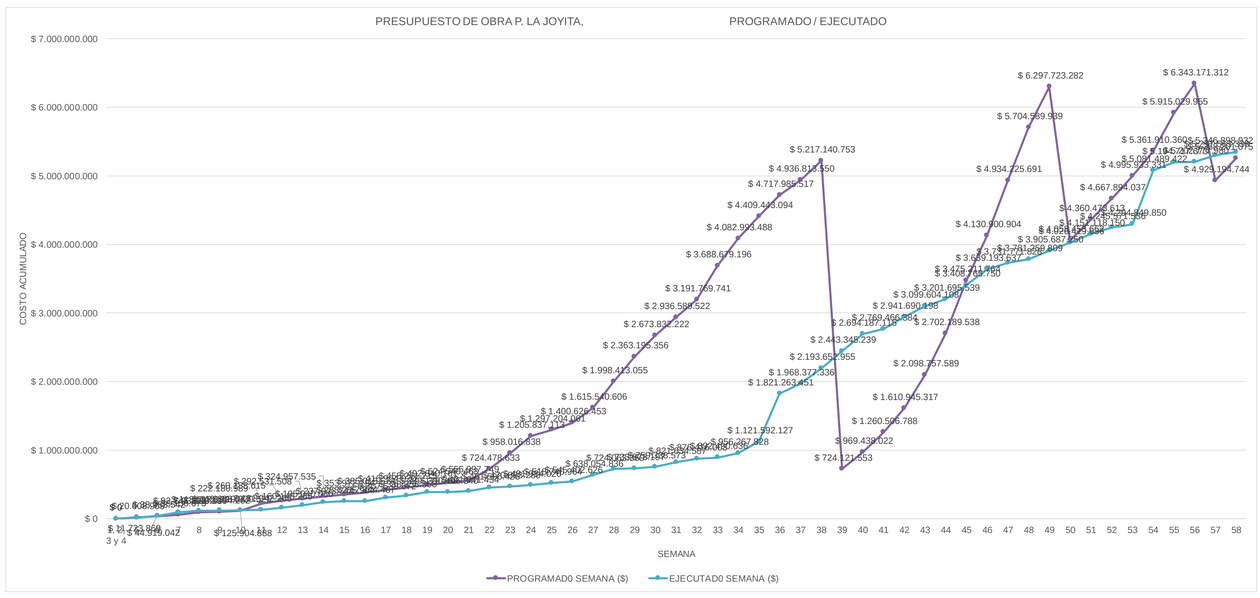

***** Se adjunta Imágenes de la programación de obra aprobada en Project con corte al 11 de febrero del 2024.**

AVANCE TERRITORIO 1 - 11/02/2024						
PIP	**VALOR**	**% PROGRAMADO**	**VR. PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**	**VR. EJECUTADO**	**DESVIACIÓN**
JOYITA	**$ 6.343.171.312,00**	**89,47%**	**$ 5.675.235.372,85**	**85,79%**	**$ 5.441.806.668,56**	**-3,68%**
BELLO HORIZONTE	**$ 2.147.883.259**	**100,00%**	**$ 2.147.883.258,71**	**97,50%**	**$ 2.094.186.177,24**	**-2,50%**
TOTAL	**$ 8.491.054.571**	**92,13%**	**$ 7.823.118.631,56**	**88,75%**	**$ 7.535.992.845,81**	**-3,38%**

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA (OBRA)

PARQUE BELLO HORIZONTE:

1.Se realizó instalación de piedra laja en jardineras del sector 1, 2 y 3

2.Se continua con la instalación de acero para acometer muro de contención del sector 3.

3.Se realiza instalación de piezas de fachaleta en escaleras centrales tramo superior

4.Se ejecuta aplicación de pintura de tráfico tipo 1

5.Aseo y Limpieza: Prosiguen los trabajos de limpieza y aseo fino en todas las áreas del parque.

6. Se realiza reparación de gaviones del sector 2 con piedra rajón

PARQUE LA JOYITA:

1. Instalación de sardinel A15

2. Instalación de adoquín en plazoletas y senderos

3. Instalación de enchape en sección de escalera del salón comunal

4. Armada de muro gavión arquitectónico.

5. Encofrado para tanque de almacenamiento de agua.

6. Vaciado de concreto en tanque de almacenamiento de agua.

7. Izaje de la estructura metálica de la pasarela.

8. Conformación de anden en parte superior de tanque

9. Izaje de postes para luminarias

10. Excavación para individuos arbóreos

11. Instalación de barandas M81 y M83.

12. Conformación de cajas eléctricas.

13. Enchape en piedra laja en muro de contención DET-CT003 y muro de mampostería en concreto en la bahía de parqueadero.

4. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PARQUE BELLO HORIZONTE:

1. Continuar con remates de bordillos, piezas faltantes, resanes e instalación de piedra laja, entre otros

2. se continuará con aseo y limpieza en todas las áreas del parque

3. Se debe instalar cargadores de celulares

4. Se continuará con la construcción del muro del sector 3

5. Se deben completar instalación de señalética

6. Se continuará pintura de tráfico reflectivo

7. Suministro e instalación de señal preventiva de 60x60 según invias

PARQUE LA JOYITA:

1. Instalación de grama kikuyo.

2. Armado de muro gavión arquitectónico

3. Instalación de adoquín cuarterón en senderos.

4. Pintura de estructura metálica

5. Instalación de piedra laja amarilla en muro en mampostería en concreto en bahía de parqueadero

6. Vaciado de concreto MR 41 en placas de parqueadero

7. Instalación de enchape fachaleta en sección de escaleras del salón comunal

8. Instalación de barandas M81 y M83

9. Instalación de redes eléctricas.

10. Vaciado de concreto Mr41 color ginger en pasarela.

5. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PARQUE LA JOYITA :

Se requiere que el contratista aumente personal operativo (mano de obra no calificada) para ejecutar las diferentes actividades en los diversos frentes del parque.
Se le solicita al contratista tener en obra los insumos y materiales necesarios para la ejecución de las actividades
Se le solicita al contratista realizar control de asentamiento a la vía transversal 1 Bis este, parte superior del parque la Joyita.
Se le reitera al contratista la terminación o acabado de las actividades debe de ser de buena calidad.

PARQUE BELLO HORIZONTE:

Se requirió al contratista garantizar la calidad y estabilidad de las obras, toda vez que, existen actividades que a la fecha presentan fallas en su ejecución o inestabilidad por la no culminación de las mismas.
Se recuerda al contratista el aunar esfuerzos en la consecución de las actividades y el aumento del personal, toda vez, que existe una desviación del porcentaje entre lo ejecutado y lo programado.
Se le solicita al contratista realizar el muro de contención del sector 3, entrega de información forestal y emitir respuesta de señalización en conjunto con sus especialistas.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
PRESENTACIÓN DE INFORME DE PLAN DE COMPRAS DE LOS PIP LA JOYITA Y BELLO HORIZONTE, Y ENTREGA DE PAQUETE No. 03 DE ÍTEM NO PREVISTOS	CONSORCIO TINGUA 2023	INMEDIATA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría.

A la fecha del presente informe se encuentra el paquete No. 03 de ítems no previstos aprobado por la Secretaria de Hábitat.

b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APUS por parte de la interventoría y del contratista.

A la fecha del presente informe se encuentra el paquete No. 03 de ítems no previstos aprobado por la Secretaria de Hábitat.

7. Aspectos técnicos:

La Joyita:

1. Se requiere al contratista de obra, que el personal operativo sea independiente para cada parque.
2. Se requiere que el contratista inicie con la empradización de zonas verdes.
3. Se requiere que el contratista avance con la instalación del enchape en la escalera y gradería.
4. Se requiere que el contratista garantice la estabilidad y calidad de la obra en la ejecución y terminados de todas las actividades.
5. Se requiere que el contratista realice las compras de los insumos necesarios para avanzar con la ejecución del contrato.
6, Se requiere que el contratista avance con la instalación de la estructura metálica de la pasarela.
7. Se requiere que el contratista avance con la instalación de redes eléctricas

Bello Horizonte :

1. Se informo al contratista acerca de los constantes retrasos presentados en obra y sobre el posible incumplimiento de las obligaciones contractuales, por ello, se requirió al contratista tomar cartas en el asunto.

2. Se recomendó y recordó al contratista la administración y solicitud e materiales en obra, en razón al tiempo de finalización del contrato y su relación con las actividades pendientes por ejecutar.

8. Aspectos administrativos:

Se realiza Comité de Obra No. 57 el día 08/02/2024, participantes: SDH, Interventoría ETA, Consorcio Tingua 2023.

Se remite al contratista de obra los compromisos pactados en el comité de obra No. 57 para su respectiva revisión.

Se le solicita al contratista entregar orden de compra de los apliques solares y del mobiliario (bancas).

Se realiza reitera solicitud al contratista de entrega ítems no previstos y Balance de obra.

BOGOTÁ	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES**	ETA

FECHA	lunes, 12 de febrero de 2024	**PERIODO No.**	58	DEL	**5/02/2024**	AL	**11/02/2024**

9. Resumen del Comité de Obra

Recorrido Bello Horizonte
El ingeniero Wilson Ramírez apoyo técnico a la supervisión de la SDHT solicita a la interventoría la entrega del arte de la señalética para revisión del arquitecto Alex Correa apoyo a la subdirección de estudios y diseños de la SDHT.
La arquitecta Gabriela Mejía Vallejo residente de interventoría manifiesta que la información será entregada a más tardar el 09 de febrero.
El ingeniero Wilson Ramírez apoyo técnico a la supervisión de la SDHT solicita al contratista mejorar el acabado de los gaviones del sector 2, para que el cemento quede a la vista sino se remate con piedra rajón.
El Ing. Mauricio Illera de apoyo técnico a la supervisión de la entidad SDHT, manifiesta al contratista y a la interventoría que se realice aseo y se baje una de las rejillas porque no permite la correcta filtración de agua por acumulación de basura y el nivel alto del concreto.
El Ing. Mauricio Illera de apoyo técnico a la supervisión de la entidad SDHT, manifiesta al contratista y a la interventoría que se remate las esquinas de las jardineras con un corte a 45 grados, memorando así el acabado
Recorrido Parque La Joyita

No se realiza recorrido de obra por el PIP La Joyita.

COMPROMISOS PACTADOS EN COMITÉ DE OBRA No. 57 – 08/02/2024

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA/ REALIZACIÓN
El contratista realizará el retiro de los postes del P.I.P La Joyita.	Consorcio Tingua 2023	SEGUIMIENTO
Reunión con Fondo de Desarrollo para la definición o concertación de la unión entre el P.I.P La Joyita y las obras contiguas realizadas por la entidad ya mencionada.	Consorcio Tingua 2023 / ETA Interventoría / SHDT	SEGUIMIENTO
El contratista entregará la subsanación del informe o reporte forestal, acerca de los cambios en el tipo de individuo arbóreo a instalar en el P.I.P Bello Horizonte y P.I.P La Joyita, y fichas de los individuos arbóreos.	Consorcio Tingua 2023	08/02/24
Entrega de respuesta del especialista de transito señalización de Bello Horizonte	Consorcio Tingua 2023	09/02/24
El contratista realizara la siembra del individuo arbóreo en el P.I.P La Joyita y poda o corte de la raíz de individuo arbóreo en la parte superior del parque.	Consorcio Tingua 2023	10/02/2024
El contratista realizará ensayos de laboratorio – Prueba de tintas penetrantes en soldadura de la estructura, toma de núcleos del concreto de vía Transversal 1 Bis Este.	Consorcio Tingua 2023	10/02/2024
La interventoría entregará a la entidad el paquete de ítems no previstos de Territorio 1.	Consorcio Tingua 2023	09/02/2024
El contratista entregará a la interventoría programación de actividades a ejecutar, donde se evidencia, tiempo, personal operativo e insumos que se requieran.	Consorcio Tingua 2023	08/02/2024

10. Aspectos componente SISTEMA:

Actividades de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (SSTMA) interventoría ETA semana del 05 al 11 de febrero del 2024
Se informa a la entidad que durante la semana del 05 al 11 de febrero no se presentaron accidentes de trabajo (AT). A la fecha de este reporte de los tres (3) AT que se han presentado en el transcurso del 2024, uno (1) está cerrado y dos (2) continúan abiertos, el cierre definitivo de cada uno de los eventos presentados se dará con el pronunciamiento de la respectiva ARL.

Referente a los controles de seguridad en campo se informa a la entidad que se solicitó al contratista CT garantizar el óptimo desarrollo de la actividad de instalación de postes metálicos en el PIP Joyita, ya que la actividad se está llevando a cabo sin los controles de seguridad adecuados para la tarea.
Se solicita al área SST del contratista CT 2023 gestionar corredores de tránsito fuera y dentro de la obra, fuera ya que en el costado oriental del PIP Joyita, se presentó caída de uno de los residentes de la hilera de viviendas que limita con el proyecto al ingresar su motocicleta a su vivienda debido a la diferencia de nivel en el andén donde se realizan trabajos de excavación para la instalación de bordillo.
En el interior de la obra se evidencia desorden el costado oriental donde se descargo bordillo y material de relleno el cual obstaculiza el corredor de tránsito peatonal en ambos sentidos hacia la pasarela metálica, evidenciándose personal que se resbalara debido a las condiciones del terreno (plano inclinado y húmedo por las recientes precipitaciones) causal del accidente de trabajo del 12/01/2024.
Adicionalmente se informa que también se solicita en el ámbito ambiental y de seguridad gestionar la madera apilada en el costado occidental del PIP Joyita ya que es un volumen relevante el cual representa un riesgo para el corredor de tránsito peatonal adyacente a este ya que cuando se presenta una precipitación este colapsa cayendo sobre el corredor de paso.
Po r ultimo se solicita al área SST del contratista inspeccionar el estado de la dotación del personal, puntualmente el que trabaja en el tanque de agua, ya que se le manifestó a esta interventoría por parte del personal operativo que el agua producto del nivel freático o acumulación aguas lluvias en la parte inferior de la excavación del tanque se introduce por las botas en mal estado del personal que trabaja en esta actividad.
Observaciones generales en SSTMA
Por último se informa a la entidad que respecto a las observaciones realizadas por la líder SSTMA de la SDH Ing. Eliana Moscoso Vargas el 27/01/2024 se desarrolló por el contratista CT 2023 el respectivo plan de acción para dar cierre a las observaciones en seguridad, ambiente y forestal identificadas en campo.
1. Puntos ecológicos revisar condiciones, reforzar con charla de capacitación clasificación de residuos
2. Puntos de acopio: Se solicita unificar, demarcar, señalizar por tipo de material (madera, RCD, residuos plásticos, etc.). , protección suelo/cobertura
3. Puntos e acopio: dispersos en diferentes puntos, unificar
4. Revisar la Res. 6004 del 2022 "Manual de control y seguimiento ambiental y SST" del IDU v 3,0.
5, Revisar y remitir el plan de gestión integral de residuos (Ordinarios "Aprovechables R.O, No aprovechables ", RESPEL, RCD, Otros.)
6. Programar charla de trabajo en redes seca y húmedas
7. Diferenciar personal BOAL de auxiliares de transito

Personal interventoría semana del 05 al 11 febrero del 2024

Administrativos interventoría ETA

1. Residente Interventoría (Parque La Joyita) ING. ÁLVARO APONTE
2. Residente Interventoría (Parque Bello Horizonte) ARQ. GABRIELA MEJIA
3. Residente SSTMA Interventoría ING. SERGIO LUNA
4. Trabajador social Interventoría ALEJANDRA RAMÍREZ
5. Inspector Técnico Interventoría JESSICA CAROLINA ALVAREZ
6. Directora Interventoría DIANA AVENDAÑO
7. Pasante SENA topografía ANTONY PONTON

Personal Operativo y Administrativo contratista CT 2023

Nº	NOMBRE COMPLETO	CARGO	EMPRESA
1	LUZ MARINA SARMIENTO ADARMEN	PROFESIONAL DE CALIDAD	SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL- SIMA
2	DIDIER LEONARDO MUÑOZ MORENO	RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO TINGUA
3	LORENA ANDREA GOMEZ RAMIREZ	RESIDENTE AMBIENTAL	CONSORCIO TINGUA - INDEPENDIENTE
4	CLEMENCIA ALBAN LAGUNA	PROFESIONAL SOCIAL	CONSORCIO TINGUA
5	ANGIE DANIELA SILVA MESA	BOAL	CONSORCIO TINGUA
6	AURELIO DE JESUS MONROY NIÑO	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO TINGUA
7	JULIAN FELIPE VARGAS SALAMANCA	CADENERO	CONSORCIO TINGUA
8	OLGA REGINA SANDOVAL VEGA	BOAL	CONSORCIO TINGUA
9	DANIEL CANTE FANDIÑO	MAESTRO	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
10	HECTOR EUSTORGIO LOPEZ CUADRADO	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
11	YONN FREDY AMAYA MELO	VIGILANCIA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
12	JOSE ANTONIO CHAPARRO	VIGILANCIA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
13	KARLA VANESA RODRIGUEZ BARROS	INSPECTORA SST	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
14	OSCAR MAURICIO BLANCO	OFICIAL	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
15	PABLO ANTONIO AMAYA	MAESTRO	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
16	ARNOLDO MELO	MAESTRO	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
17	LUIS ALFONSO CONTRERAS	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
18	LUIS ALBERTO ACUÑA LEGUIZAMON	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
19	JORGE SARMIENTO PATIÑO	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
20	EDUARDO LUIS MUÑOZ MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
21	OSBAIRO DE JESUS HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
22	JAIRO LOPEZ BLANCO	INSPECTOR DE OBRA	CONSORCIO TINGUA
23	JUAN CARLOS MARTINEZ	OFICIAL DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
24	LAURA ISABEL TRIANA RAMIREZ	TOPOGRAFIA	CONSORCIO TINGUA
25	LUIS GUILLERMO SANDOVAL	VIGILANCIA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
26	JHONATHAN HENAO CASTRO	RESIDENTE TECNICO BH	CONSORCIO TINGUA
27	NARCISO EFRAIN OROZCO	AYUDANTE DE OBRA COSTOS Y PRESUPUESTOS	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL- SIMA
28	GILMA STELLA RAMOS		
29	DEYSON EDUARDO MUÑOZ MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
30	NELSON ROJAS CASILIMAS	RESIDENTE SST BH	CONSORCIO TINGUA
31	HENRY ALBERTO ROMERO COMBA	OFICIAL DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL- SIMA
32	OMAR YESID QUINTERO ROJAS	CONDUCTOR	CONSORCIO TINGUA
33	JOSE ULISES ALTURO RAMIREZ	ELECTRICISTA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
34	JUAN DIAZ ESALA	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
35	MARILUZ RODRIGUEZ NAVARRO	AUXILIAR DE TRANSITO	CONSORCIO TINGUA
36	LINA DANIELA RUIZ ALDANA	AUXILIAR DE TRANSITO	CONSORCIO TINGUA
37	EDGAR ANDRES PUENTES ARANGO	OFICIAL	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
38	JERSON EDITH CONDE GUALACO	AUXILIAR DE TRANSITO	CONSORCIO TINGUA
39	JULIAN ENRRIQUE PADILLA	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
40	LEONARDO FABIO BARRETO	OFICIAL	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
41	TAYLOR VALENCIA VELASCO	OFICIAL	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
42	ALFONSO ENRIQUE FERNANDEZ	OFICIAL	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
43	FERNANDO ENRIQUE ROQUE	OFICIAL	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
44	RUFINO RODOLFO RODRIGUEZ	OFICIAL	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL- SIMA
45	EMILIO JOSE KHLIEFAT RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
46	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ LOBO	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
47	VICTOR JULIO SONZA	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
48	OSCAR ESTEBAN SUAREZ LOMELI	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
49	ARIEL DANILO ASCANIO ASCANIO	EMPREADZACION	BIOFORES INGENIERIA S.A.S
50	YEISON GOMEZ HOYOS	EMPREADZACION	BIOFORES INGENIERIA S.A.S
51	JOSE JOAQUIN TINJACA OSPINA	EMPREADZACION	BIOFORES INGENIERIA S.A.S
52	JOSE MILTON TOVAR MEJIA	EMPREADZACION	BIOFORES INGENIERIA S.A.S
53	EDWIN STIVEN TORRES SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
54	JORGE ELIECER MARTINEZ TINJACA	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
55	JOHN CARLOS MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
56	ELMER QUIÑONES BRAVO	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
57	FELIX ALBERTO CASALLAS VILLA	OFICIAL DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
58	HEYDER GERARDO RUIZ CUADROS	AYUDANTE SOLDADOR	ESTRUCTURAS METALICAS CYF S.A.S
59	LEIDY PAOLA BERNAL DAZA	PROFESIONAL SOCIAL	CONSORCIO TINGUA
60	MARISOL GONZALEZ URIANA	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
61	HAIVER FABIAN SUAREZ BENAVIDES	OFICIAL DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
62	CARLOS JAVIER TAMARA PAEZ	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
63	HECTOR JULIO GONZALEZ JIMENEZ	OFICIAL DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
64	ARMANDO MENDIVELSO	OFICIAL DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
65	EINER FRANCISCO ROMERO	SOLDADOR	ESTRUCTURAS METALICAS CYF S.A.S
66	HORLENTON JOSE TABORDA	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
67	GEOVANIS RODRIGUEZ PUERTA	MAESTRO	GR PAVICONS INGENIERIA S.A.S
68	EDUER ENRIQUE GONZALEZ PEÑA	AYUDANTE DE OBRA	MAQUINAS Y EQUIPOS JW S.A.S.
69	LUIS BELTRAN CAMACARO OCHOA	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
70	VICTOR MANUEL MENDOZA	SOLDADOR	ESTRUCTURAS METALICAS CYF S.A.S
71	LUIS ALBERTO NIEVES UTRERA	SOLDADOR	ESTRUCTURAS METALICAS CYF S.A.S
72	JAIVER ASDRUBAL CONDE	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
73	WILLIAM ARTURO OSORIO PINZON	SOLDADOR	ESTRUCTURAS METALICAS CYF S.A.S
74	WILSON JOSE ORELLANO ACOSTA	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS

11. Aspectos componente social:

COMPONENTE SOCIAL – 05 AL 10 DE FEBRERO/2024
•El día 07/02/2024 se llevó a cabo comité de seguimiento social, entre Entidad SDHT, Interventoría y Contratista.
•Informe semanal No. 54 (actividades del 29 de enero al 03 de febrero/2024): El día 05/02/2024 el contratista remitió los informes semanales de ambos PIP. Por parte de Interventoría se remitieron observaciones al Informe del PIP La Joyita el día 07/02/2024 y se recibió subsanado el mismo día; por lo cual, los informes de ambos PIP fueron revisados, complementados y remitidos a la Entidad, recibiendo su aval del día 08/02/2024. Se remite versión aprobada al contratista mediante oficio INT-PARQUES-1495 y a su vez se radica ante la Entidad mediante oficio INT-PARQUES-1496.
•Informe semanal No. 55 (actividades del 05 al 10 de febrero/2024): El día 10/02/2024 se recibe informe del PIP Bello Horizonte.
•Informe mensual No. 13 PIP Bello Horizonte: El día 05/02/2024 se recibe informe en su versión No. 1. El día 07/02/2024 se remiten observaciones por parte de Interventoría y se recibe ajustado en su versión No. 2 el día 08/02/2024. El día 09/02/2023 se realiza revisión de Informe, evidenciando que se atendieron las observaciones remitidas por Interventoría.
•Informe mensual No. 13 PIP La Joyita: El día 06/02/2024 se remiten observaciones por parte de Interventoría al Informe mensual y se recibe subsanado el mismo día en su versión No. 2. El día 09/02/2023 se realiza revisión de Informe, evidenciando que se atendieron las observaciones remitidas por Interventoría.
•Informe mensual No. 13 Interventoría: El día 09/02/2023 se remitió informe en su versión No. 1 a la Entidad para su revisión y concepto, junto con los informes del contratista No. 13.
•PQRS No. 15 PIP Bello Horizonte: El día 06/02/2024 se reciben observaciones por parte de la Entidad a la proyección de respuesta de la PQRS. Esto fue atendido por el contratista el día 09/02/2024, por lo que, se remitió a la Entidad y se recibió su aval para entrega a peticionario.
•Se realiza acompañamiento en actividad cierre actas de vecindad en Bello Horizonte.
•El día 07/02/2024 por parte del contratista se reciben ajustados (conforme lo solicitado por la Entidad) los dos oficios que se proyecta sean remitidos a los propietarios de los predios ubicados en la Cra 1ra N° 30C 34 Sur y Cra 30 B Sur N° 1 -23 del PIP Bello Horizonte, ya que no se logró efectuar el cierre de actas de vecindad. Una vez revisados por Interventoría, el día 09/02/2024 se remitieron a la Entidad y se recibió su aval para continuar con su entrega.
•Se realizó verificación de los PAC de Bello Horizonte y La Joyita, evidenciando su atención por las Profesionales Sociales en los horarios establecidos. Sin embargo, en el PAC del PIP La Joyita no se contó con impresora, por lo que desde Interventoría se remitió correo el día 05/02/2024 solicitando la adecuación completa del Punto conforme lo establece el Anexo Social.
•Se verifica actualización de vallas informativas de los PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita, conforme lo establecido en el Acuerdo 787 de 2020.

REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE BELLO HORIZONTE



Imagen 1 y 2. Panorámica General del proyecto







Imagen 3 y 4. Zona de Biosaludables



Imagen 5 y 6. Panorámica General del proyecto



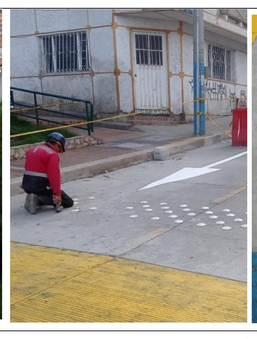


Imagen 7 y 8 . Reparación de reductores de velocidad





Imagen 9. Instalación de piedra laja en jardinera sector 1.



Imagen 10 y 11. instalación de acero de refuerzo en muro de contención sector 3



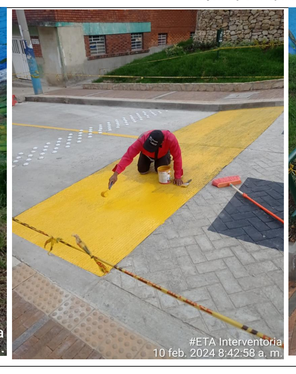


Imagen 12. Pintura de trafico

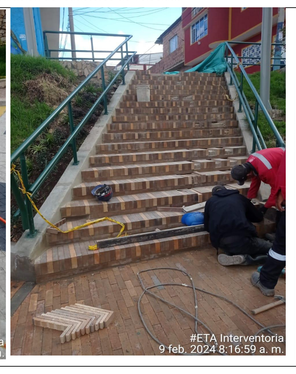


Imagen 13. Reposición de piezas fachaleta en escalera central



Imagen 14. Recorrido comité de obra

BOGOTÁ	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	ETA

FECHA	lunes, 12 de febrero de 2024	PERIODO No.	58	DEL	5/02/2024	AL	11/02/2024

REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE LA JOYITA











Imagen 1 - 3. Instalación de enchape fachaleta, piedra laja amarilla, conformación de anden costado nororiental del parque, instalación de adoquín cuarterón, conformación de cajas eléctricas

Imagen 4-5. Instalación de conectores stug, biotex e instalación de baranda M83











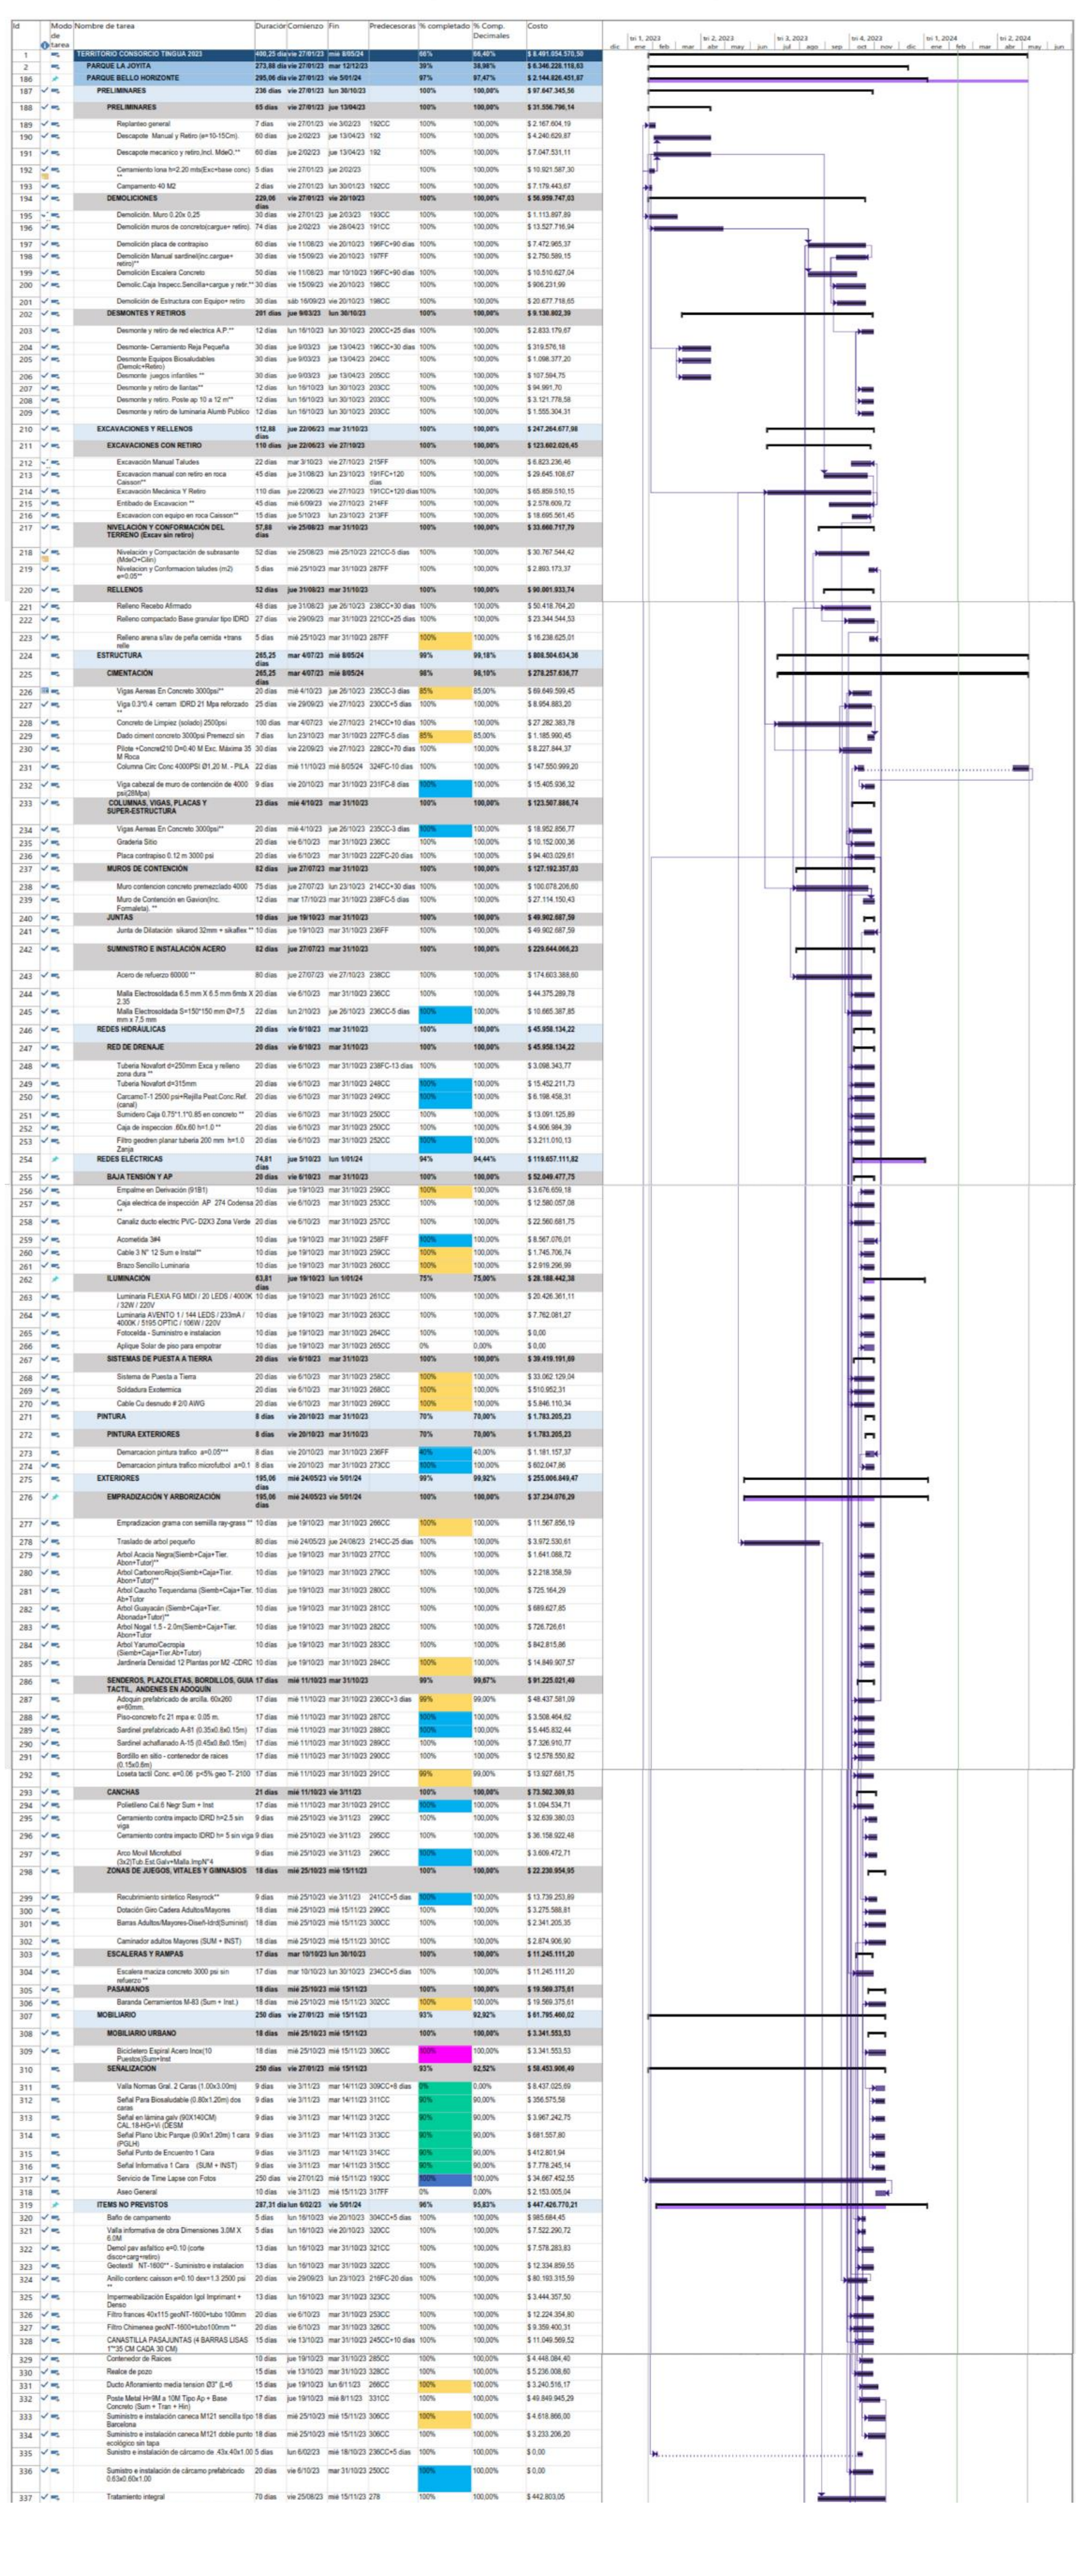


Imagen 6-9. Pintura de estructura metálica de la pasarela, instalación de baranda M81, vaciado de concreto en tanque de almacenamiento de agua

Imagen 10-11. Comité de obra.


ANEXOS

Actividades ejecutadas en Parque Bello Horizonte, a fecha del presente informe 11/02/2024



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado	% Comp. Decimales	Costo
1	TERRITORIO CONSORCIO TINGUA 2023	400,25 días	vie 27/01/23	mié 8/05/24		88%	88,40%	$ 8.491.054.570,50
2	PARQUE LA JOYITA	273,88 días	vie 27/01/23	mar 12/12/23		39%	38,98%	$ 6.346.228.118,63
186	PARQUE BELLO HORIZONTE	295,06 días	vie 27/01/23	vie 5/01/24		97%	97,47%	$ 2.144.826.451,67
187	PRELIMINARES	236 días	vie 27/01/23	lun 30/10/23		100%	100,00%	$ 97.647.345,56
188	PRELIMINARES	65 días	vie 27/01/23	jue 13/04/23		100%	100,00%	$ 31.556.796,14
189	Replanteo general	7 días	vie 27/01/23	vie 3/02/23	192CC	100%	100,00%	$ 2.167.604,19
190	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	60 días	jue 2/02/23	jue 13/04/23	192	100%	100,00%	$ 4.240.829,87
191	Descapote mecanico y retiro,Incl. MdeO.**	60 días	jue 2/02/23	jue 13/04/23	192	100%	100,00%	$ 7.047.531,11
192	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	5 días	vie 27/01/23	jue 2/02/23		100%	100,00%	$ 10.921.587,30
193	Campamento 40 M2	2 días	vie 27/01/23	lun 30/01/23	192CC	100%	100,00%	$ 7.179.443,67
194	DEMOLICIONES	229,06 días	vie 27/01/23	vie 20/10/23		100%	100,00%	$ 56.959.747,03
195	Demolición. Muro 0.20x 0.25	30 días	vie 27/01/23	jue 2/03/23	193CC	100%	100,00%	$ 1.113.897,89
196	Demolición muros de concreto(cargue+ retiro).	74 días	jue 2/02/23	vie 28/04/23	191CC	100%	100,00%	$ 13.527.716,94
197	Demolición placa de contrapiso	60 días	vie 11/08/23	vie 20/10/23	196FC+90 días	100%	100,00%	$ 7.472.965,37
198	Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	30 días	vie 15/09/23	vie 20/10/23	197FF	100%	100,00%	$ 2.750.589,15
199	Demolición Escalera Concreto	50 días	vie 11/08/23	mar 10/10/23	196FC+90 días	100%	100,00%	$ 10.510.627,04
200	Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	30 días	vie 15/09/23	vie 20/10/23	198CC	100%	100,00%	$ 906.231,99
201	Demolición de Estructura con Equipo+ retiro	30 días	sáb 16/09/23	vie 20/10/23	198CC	100%	100,00%	$ 20.677.718,65
202	DESMONTES Y RETIROS	201 días	jue 9/03/23	lun 30/10/23		100%	100,00%	$ 9.130.802,39
203	Desmonte y retiro de red electrica A.P.**	12 días	lun 16/10/23	lun 30/10/23	200CC+25 días	100%	100,00%	$ 2.833.179,67
204	Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	30 días	jue 9/03/23	jue 13/04/23	196CC+30 días	100%	100,00%	$ 319.576,18
205	Desmonte Equipos Biosaludables (Demolic+Retiro)	30 días	jue 9/03/23	jue 13/04/23	204CC	100%	100,00%	$ 1.098.377,20
206	Desmonte juegos infantiles **	30 días	jue 9/03/23	jue 13/04/23	205CC	100%	100,00%	$ 107.594,75
207	Desmonte y retiro de llantas**	12 días	lun 16/10/23	lun 30/10/23	203CC	100%	100,00%	$ 94.991,70
208	Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m**	12 días	lun 16/10/23	lun 30/10/23	203CC	100%	100,00%	$ 3.121.778,58
209	Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico	12 días	lun 16/10/23	lun 30/10/23	203CC	100%	100,00%	$ 1.555.304,31
210	EXCAVACIONES Y RELLENOS	112,88 días	jue 22/06/23	mar 31/10/23		100%	100,00%	$ 247.264.677,98
211	EXCAVACIONES CON RETIRO	110 días	jue 22/06/23	vie 27/10/23		100%	100,00%	$ 123.602.026,45
212	Excavación Manual Taludes	22 días	mar 3/10/23	vie 27/10/23	215FF	100%	100,00%	$ 6.823.236,46
213	Excavacion manual con retiro en roca Caisson**	45 días	jue 31/08/23	lun 23/10/23	191FC+120 días	100%	100,00%	$ 29.645.108,67
214	Excavación Mecánica Y Retiro	110 días	jue 22/06/23	vie 27/10/23	191CC+120 días	100%	100,00%	$ 65.859.510,15
215	Entibado de Excavacion **	45 días	mié 6/09/23	vie 27/10/23	214FF	100%	100,00%	$ 2.578.609,72
216	Excavacion con equipo en roca Caisson**	15 días	jue 5/10/23	lun 23/10/23	213FF	100%	100,00%	$ 18.695.561,45
217	NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO (Excav sin retiro)	57,88 días	vie 25/08/23	mar 31/10/23		100%	100,00%	$ 33.660.717,79
218	Nivelación y Compactación de subrasante (MdeO+Cilin)	52 días	vie 25/08/23	mié 25/10/23	221CC-5 días	100%	100,00%	$ 30.767.544,42
219	Nivelacion y Conformacion taludes (m2) e=0.05**	5 días	mié 25/10/23	mar 31/10/23	287FF	100%	100,00%	$ 2.893.173,37
220	RELLENOS	52 días	jue 31/08/23	mar 31/10/23		100%	100,00%	$ 90.001.933,74
221	Relleno Recebo Afirmado	48 días	jue 31/08/23	jue 26/10/23	238CC+30 días	100%	100,00%	$ 50.418.764,20
222	Relleno compactado Base granular tipo IDRD	27 días	vie 29/09/23	mar 31/10/23	221CC+25 días	100%	100,00%	$ 23.344.544,53
223	Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle	5 días	mié 25/10/23	mar 31/10/23	287FF	100%	100,00%	$ 16.238.625,01
224	ESTRUCTURA	265,25 días	mar 4/07/23	mié 8/05/24		99%	99,18%	$ 808.504.634,36
225	CIMENTACIÓN	265,25 días	mar 4/07/23	mié 8/05/24		98%	98,10%	$ 278.257.636,77
226	Vigas Aereas En Concreto 3000psi**	20 días	mié 4/10/23	jue 26/10/23	235CC-3 días	85%	85,00%	$ 69.649.599,45
227	Viga 0.3*0.4 cemen IDRD 21 Mpa reforzado **	25 días	vie 29/09/23	vie 27/10/23	230CC+5 días	100%	100,00%	$ 8.954.883,20
228	Concreto de Limpiez (solado) 2500psi	100 días	mar 4/07/23	vie 27/10/23	214CC+10 días	100%	100,00%	$ 27.282.383,78
229	Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin	7 días	lun 23/10/23	mar 31/10/23	227FC-5 días	85%	85,00%	$ 1.185.990,45
230	Pilote +Concrel210 D=0.40 M Exc. Máxima 35 M Roca	30 días	vie 22/09/23	vie 27/10/23	228CC+70 días	100%	100,00%	$ 8.227.844,37
231	Columna Circ Conc 4000PSI Ø1,20 M. - PILA	22 días	mié 11/10/23	mié 8/05/24	324FC-10 días	100%	100,00%	$ 147.550.999,20
232	Viga cabezal de muro de contención de 4000 psi(28Mpa)	9 días	vie 20/10/23	mar 31/10/23	231FC-8 días	100%	100,00%	$ 15.405.936,32
233	COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA	23 días	mié 4/10/23	mar 31/10/23		100%	100,00%	$ 123.507.886,74
234	Vigas Aereas En Concreto 3000psi**	20 días	mié 4/10/23	jue 26/10/23	235CC-3 días	100%	100,00%	$ 18.952.856,77
235	Graderia Sitio	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	236CC	100%	100,00%	$ 10.152.000,36
236	Placa contrapiso 0.12 m 3000 psi	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	222FC-20 días	100%	100,00%	$ 94.403.029,61
237	MUROS DE CONTENCIÓN	82 días	jue 27/07/23	mar 31/10/23		100%	100,00%	$ 127.192.357,03
238	Muro contencion concreto premezclado 4000	75 días	jue 27/07/23	lun 23/10/23	214CC+30 días	100%	100,00%	$ 100.078.206,60
239	Muro de Contención en Gavion(Inc. Formaleta). **	12 días	mar 17/10/23	mar 31/10/23	238FC-5 días	100%	100,00%	$ 27.114.150,43
240	JUNTAS	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23		100%	100,00%	$ 49.902.687,59
241	Junta de Dilatación sikarod 32mm + sikaflex **	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	236FF	100%	100,00%	$ 49.902.687,59
242	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO	82 días	jue 27/07/23	mar 31/10/23		100%	100,00%	$ 229.644.066,23
243	Acero de refuerzo 60000 **	80 días	jue 27/07/23	vie 27/10/23	238CC	100%	100,00%	$ 174.603.388,60
244	Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	236CC	100%	100,00%	$ 44.375.289,78
245	Malla Electrosoldada S=150*150 mm Ø=7.5 mm x 7.5 mm	22 días	lun 2/10/23	jue 26/10/23	236CC-5 días	100%	100,00%	$ 10.665.387,85
246	REDES HIDRÁULICAS	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23		100%	100,00%	$ 45.958.134,22
247	RED DE DRENAJE	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23		100%	100,00%	$ 45.958.134,22
248	Tuberia Novafort d=250mm Exca y relleno zona dura **	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	238FC-13 días	100%	100,00%	$ 3.098.343,77
249	Tuberia Novafort d=315mm	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	248CC	100%	100,00%	$ 15.452.211,73
250	Carcamo T-1 2500 psi+Rejilla Peat.Conc.Ref. (canal)	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	249CC	100%	100,00%	$ 6.198.458,31
251	Sumidero Caja 0.75*1.1*0.85 en concreto **	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	250CC	100%	100,00%	$ 13.091.125,89
252	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	250CC	100%	100,00%	$ 4.906.984,39
253	Filtro geodren planar tuberia 200 mm h=1.0 Zanja	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	252CC	100%	100,00%	$ 3.211.010,13
254	REDES ELÉCTRICAS	74,81 días	jue 5/10/23	lun 1/01/24		94%	94,44%	$ 119.657.111,82
255	BAJA TENSIÓN Y AP	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23		100%	100,00%	$ 52.049.477,75
256	Empalme en Derivación (91B1)	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	259CC	100%	100,00%	$ 3.676.659,18
257	Caja electrica de inspección AP 274 Codensa **	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	253CC	100%	100,00%	$ 12.580.057,08
258	Canaliz ducto electric PVC- D2X3 Zona Verde	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	257CC	100%	100,00%	$ 22.560.681,75
259	Acometida 3#4	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	258FF	100%	100,00%	$ 8.567.076,01
260	Cable 3 N° 12 Sum e Instal**	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	259CC	100%	100,00%	$ 1.745.706,74
261	Brazo Sencillo Luminaria	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	260CC	100%	100,00%	$ 2.919.296,99
262	ILUMINACIÓN	63,81 días	jue 19/10/23	lun 1/01/24		75%	75,00%	$ 28.188.442,38
263	Luminaria FLEXIA FG MIDI / 20 LEDS / 4000K / 32W / 220V	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	261CC	100%	100,00%	$ 20.426.361,11
264	Luminaria AVENTO 1 / 144 LEDS / 233mA / 4000K / 5195 OPTIC / 106W / 220V	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	263CC	100%	100,00%	$ 7.762.081,27
265	Fotocelda - Suministro e instalacion	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	264CC	100%	100,00%	$ 0,00
266	Aplique Solar de piso para empotrar	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	265CC	0%	0,00%	$ 0,00
267	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23		100%	100,00%	$ 39.419.191,69
268	Sistema de Puesta a Tierra	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	258CC	100%	100,00%	$ 33.062.129,04
269	Soldadura Exotermica	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	268CC	100%	100,00%	$ 510.952,31
270	Cable Cu desnudo # 2/0 AWG	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	269CC	100%	100,00%	$ 5.846.110,34
271	PINTURA	8 días	vie 20/10/23	mar 31/10/23		70%	70,00%	$ 1.783.205,23
272	PINTURA EXTERIORES	8 días	vie 20/10/23	mar 31/10/23		70%	70,00%	$ 1.783.205,23
273	Demarcacion pintura trafico a=0.05***	8 días	vie 20/10/23	mar 31/10/23	236FF	40%	40,00%	$ 1.181.157,37
274	Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.1	8 días	vie 20/10/23	mar 31/10/23	273CC	100%	100,00%	$ 602.047,86
275	EXTERIORES	195,06 días	mié 24/05/23	vie 5/01/24		99%	99,92%	$ 255.006.849,47
276	EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN	195,06 días	mié 24/05/23	vie 5/01/24		100%	100,00%	$ 37.234.076,29
277	Empradizacion grama con semilla ray-grass **	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	266CC	100%	100,00%	$ 11.567.856,19
278	Traslado de arbol pequeño	80 días	mié 24/05/23	jue 24/08/23	214CC-25 días	100%	100,00%	$ 3.972.530,61
279	Arbol Acacia Negra(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	277CC	100%	100,00%	$ 1.641.088,72
280	Arbol CarboneroRojo(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	279CC	100%	100,00%	$ 2.218.358,59
281	Arbol Caucho Tequendama (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	280CC	100%	100,00%	$ 725.164,29
282	Arbol Guayacán (Siemb+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	281CC	100%	100,00%	$ 689.627,85
283	Arbol Nogal 1.5 - 2.0m(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	282CC	100%	100,00%	$ 726.726,61
284	Arbol Yarumo/Cecropia (Siemb+Caja+Tier.Ab+Tutor)	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	283CC	100%	100,00%	$ 842.815,86
285	Jardinería Densidad 12 Plantas por M2 -CDRC	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	284CC	100%	100,00%	$ 14.849.907,57
286	SENDEROS, PLAZOLETAS, BORDILLOS, GUIA TACTIL, ANDENES EN ADOQUÍN	17 días	mié 11/10/23	mar 31/10/23		99%	99,67%	$ 91.225.021,49
287	Adoquin prefabricado de arcilla. 60x260 e=60mm.	17 días	mié 11/10/23	mar 31/10/23	236CC+3 días	99%	99,00%	$ 48.437.581,09
288	Piso-concreto f'c 21 mpa e: 0.05 m.	17 días	mié 11/10/23	mar 31/10/23	287CC	100%	100,00%	$ 3.508.464,62
289	Sardinel prefabricado A-81 (0.35x0.8x0.15m)	17 días	mié 11/10/23	mar 31/10/23	288CC	100%	100,00%	$ 5.445.832,44
290	Sardinel achaflanado A-15 (0.45x0.8x0.15m)	17 días	mié 11/10/23	mar 31/10/23	289CC	100%	100,00%	$ 7.326.910,77
291	Bordillo en sitio - contenedor de raices (0.15x0.6m)	17 días	mié 11/10/23	mar 31/10/23	290CC	100%	100,00%	$ 12.578.550,82
292	Loseta tactil Conc. e=0.06 p<5% geo T- 2100	17 días	mié 11/10/23	mar 31/10/23	291CC	99%	99,00%	$ 13.927.681,75
293	CANCHAS	21 días	mié 11/10/23	vie 3/11/23		100%	100,00%	$ 73.502.309,93
294	Polietileno Cal.6 Negr Sum + Inst	17 días	mié 11/10/23	mar 31/10/23	291CC	100%	100,00%	$ 1.094.534,71
295	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 sin viga	9 días	mié 25/10/23	vie 3/11/23	299CC	100%	100,00%	$ 32.639.380,03
296	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 sin viga	9 días	mié 25/10/23	vie 3/11/23	295CC	100%	100,00%	$ 36.159.922,48
297	Arco Movil Microfutbol (3x2)Tub.Est.Galv+Malla.ImpN°4	9 días	mié 25/10/23	vie 3/11/23	296CC	100%	100,00%	$ 3.608.472,71
298	ZONAS DE JUEGOS, VITALES Y GIMNASIOS	18 días	mié 25/10/23	mié 15/11/23		100%	100,00%	$ 22.230.954,95
299	Recubrimiento sintetico Resyrock**	9 días	mié 25/10/23	vie 3/11/23	241CC+5 días	100%	100,00%	$ 13.739.253,69
300	Dotación Giro Cadera Adultos/Mayores	18 días	mié 25/10/23	mié 15/11/23	299CC	100%	100,00%	$ 3.275.588,81
301	Barras Adultos/Mayores-Diseñ-Idrd(Suminist)	18 días	mié 25/10/23	mié 15/11/23	300CC	100%	100,00%	$ 2.341.205,35
302	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	18 días	mié 25/10/23	mié 15/11/23	301CC	100%	100,00%	$ 2.874.906,90
303	ESCALERAS Y RAMPAS	17 días	mar 10/10/23	lun 30/10/23		100%	100,00%	$ 11.245.111,20
304	Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo **	17 días	mar 10/10/23	lun 30/10/23	234CC+5 días	100%	100,00%	$ 11.245.111,20
305	PASAMANOS	18 días	mié 25/10/23	mié 15/11/23		100%	100,00%	$ 19.569.375,61
306	Baranda Cerramientos M-83 (Sum + Inst.)	18 días	mié 25/10/23	mié 15/11/23	302CC	100%	100,00%	$ 19.569.375,61
307	MOBILIARIO	250 días	vie 27/01/23	mié 15/11/23		93%	92,92%	$ 61.795.460,02
308	MOBILIARIO URBANO	18 días	mié 25/10/23	mié 15/11/23		100%	100,00%	$ 3.341.553,53
309	Bicicletero Espiral Acero Inox(10 Puestos)Sum+Inst	18 días	mié 25/10/23	mié 15/11/23	306CC	100%	100,00%	$ 3.341.553,53
310	SEÑALIZACIÓN	250 días	vie 27/01/23	mié 15/11/23		93%	92,52%	$ 58.453.906,49
311	Valla Normas Gral. 2 Caras (1.00x3.00m)	9 días	vie 3/11/23	mar 14/11/23	309CC+8 días	0%	0,00%	$ 8.437.025,69
312	Señal Para Biosaludable (0.80x1.20m) dos caras	9 días	vie 3/11/23	mar 14/11/23	311CC	90%	90,00%	$ 356.575,58
313	Señal en lámina galv (90X140CM) CAL.18-HG+Vi (DESM	9 días	vie 3/11/23	mar 14/11/23	312CC	90%	90,00%	$ 3.967.242,75
314	Señal Plano Ubic Parque (0.90x1.20m) 1 cara (PGLH)	9 días	vie 3/11/23	mar 14/11/23	313CC	90%	90,00%	$ 681.557,80
315	Señal Punto de Encuentro 1 Cara	9 días	vie 3/11/23	mar 14/11/23	314CC	90%	90,00%	$ 412.801,94
316	Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	9 días	vie 3/11/23	mar 14/11/23	315CC	90%	90,00%	$ 7.778.245,14
317	Servicio de Time Lapse con Fotos	250 días	vie 27/01/23	mié 15/11/23	193CC	100%	100,00%	$ 34.667.452,55
318	Aseo General	10 días	vie 3/11/23	mié 15/11/23	317FF	0%	0,00%	$ 2.153.005,04
319	ITEMS NO PREVISTOS	287,31 días	lun 6/02/23	vie 5/01/24		96%	95,83%	$ 447.426.770,21
320	Baño de campamento	5 días	lun 16/10/23	vie 20/10/23	304CC+5 días	100%	100,00%	$ 985.684,45
321	Valla informativa de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M	5 días	lun 16/10/23	vie 20/10/23	320CC	100%	100,00%	$ 7.522.290,72
322	Demol pav asfaltico e=0.10 (corte disco+carg+retiro)	13 días	lun 16/10/23	mar 31/10/23	321CC	100%	100,00%	$ 7.578.283,83
323	Geotextil NT-1600** - Suministro e instalacion	13 días	lun 16/10/23	mar 31/10/23	322CC	100%	100,00%	$ 12.334.859,55
324	Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 2500 psi **	20 días	vie 29/09/23	lun 23/10/23	216FC-20 días	100%	100,00%	$ 80.193.315,59
325	Impermeabilización Espaldon Igol Imprimant + Denso	13 días	lun 16/10/23	mar 31/10/23	323CC	100%	100,00%	$ 3.444.357,50
326	Filtro frances 40x115 geoNT-1600+tubo 100mm	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	253CC	100%	100,00%	$ 12.224.354,80
327	Filtro Chimenea geoNT-1600+tubo100mm **	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	326CC	100%	100,00%	$ 9.359.400,31
328	CANASTILLA PASAJUNTAS (4 BARRAS LISAS 1"*35 CM CADA 30 CM)	15 días	vie 13/10/23	mar 31/10/23	245CC+10 días	100%	100,00%	$ 11.049.569,52
329	Contenedor de Raices	10 días	jue 19/10/23	mar 31/10/23	285CC	100%	100,00%	$ 4.448.084,40
330	Realce de pozo	15 días	vie 13/10/23	mar 31/10/23	328CC	100%	100,00%	$ 5.236.008,60
331	Ducto Afloramiento media tension Ø3" (L=6	15 días	jue 19/10/23	lun 6/11/23	266CC	100%	100,00%	$ 3.240.516,17
332	Poste Metal H=9M a 10M Tipo Ap + Base Concreto (Sum + Tran + Hin)	17 días	jue 19/10/23	mié 8/11/23	331CC	100%	100,00%	$ 49.849.945,29
333	Suministro e instalación caneca M121 sencilla tipo Barcelona	18 días	mié 25/10/23	mié 15/11/23	306CC	100%	100,00%	$ 4.618.866,00
334	Suministro e instalación caneca M121 doble punto ecológico sin tapa	18 días	mié 25/10/23	mié 15/11/23	306CC	100%	100,00%	$ 3.233.206,20
335	Sumistro e instalación de cárcamo de .43x.40x1.00	5 días	lun 6/02/23	mié 18/10/23	236CC+5 días	100%	100,00%	$ 0,00
336	Sumistro e instalación de cárcamo prefabricado 0.63x0.60x1.00	20 días	vie 6/10/23	mar 31/10/23	250CC	100%	100,00%	$ 0,00
337	Tratamiento integral	70 días	vie 25/08/23	mié 15/11/23	278	100%	100,00%	$ 442.803,05

Actividades ejecutadas en Parque La Joyita, a fecha del presente informe 11/02/2024

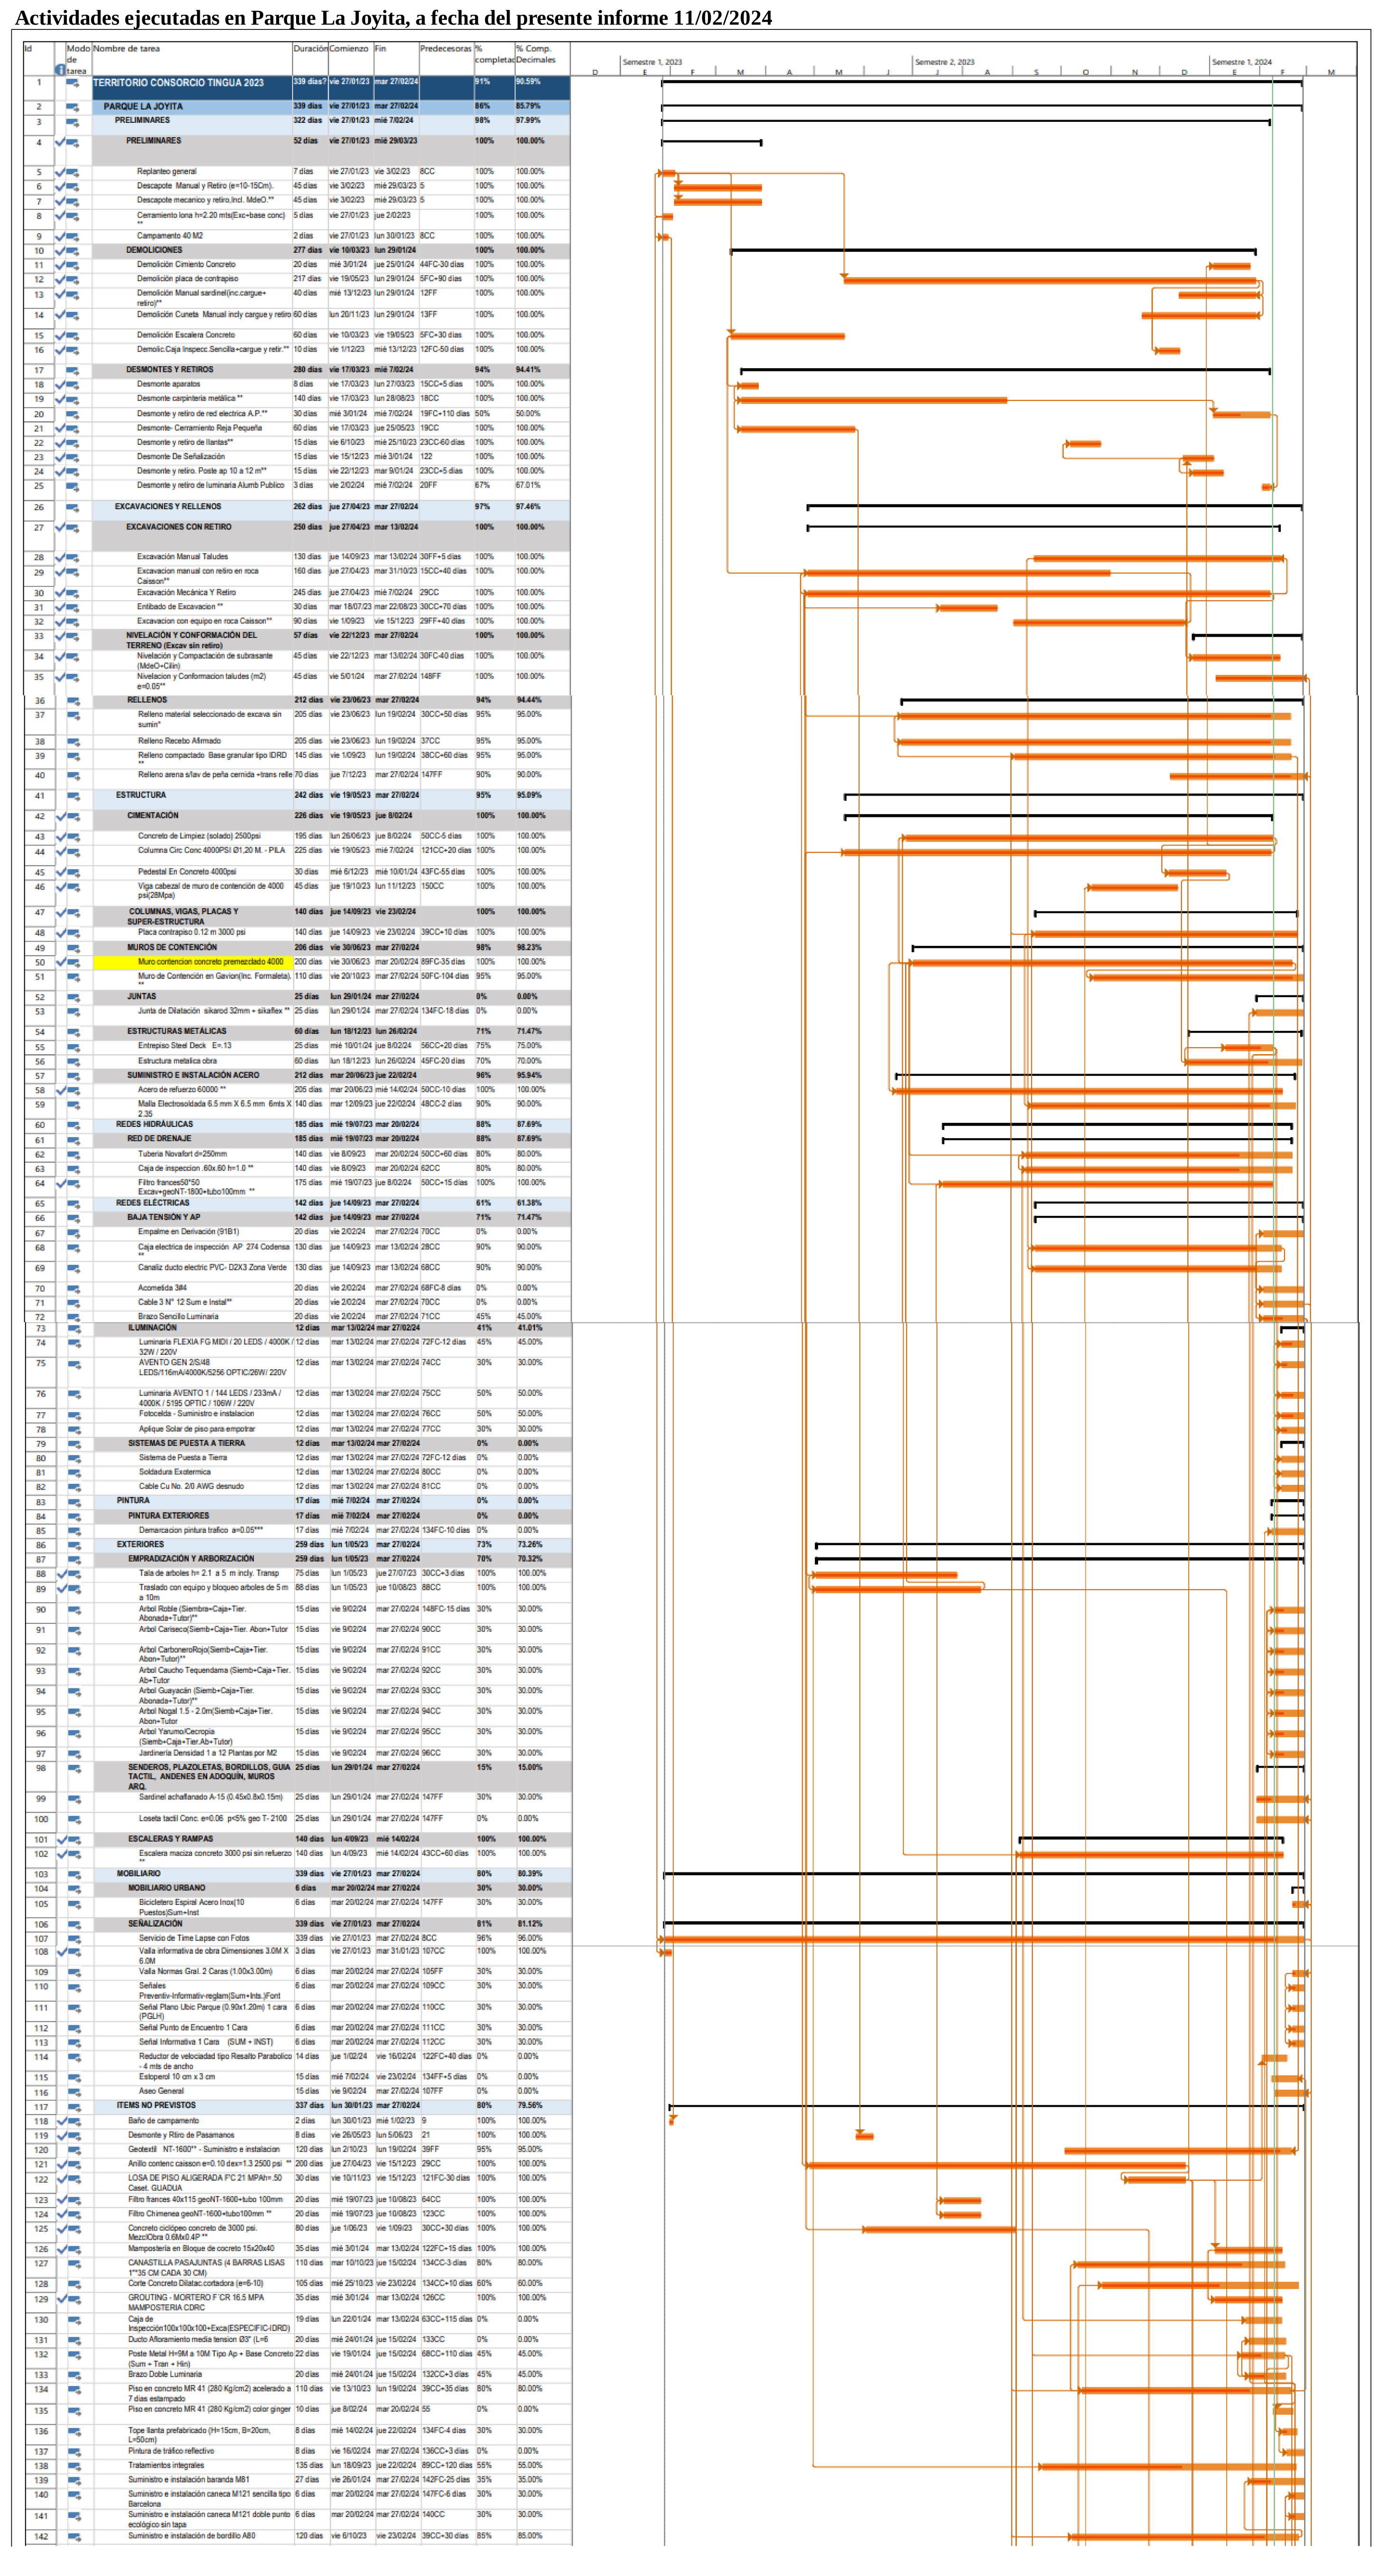


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completado	% Comp. Decimales
1	TERRITORIO CONSORCIO TINGUA 2023	339 días?	vie 27/01/23	mar 27/02/24		91%	90.59%
2	PARQUE LA JOYITA	339 días	vie 27/01/23	mar 27/02/24		86%	85.79%
3	PRELIMINARES	322 días	vie 27/01/23	mié 7/02/24		98%	97.99%
4	PRELIMINARES	52 días	vie 27/01/23	mié 29/03/23		100%	100.00%
5	Replanteo general	7 días	vie 27/01/23	vie 3/02/23	8CC	100%	100.00%
6	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	45 días	vie 3/02/23	mié 29/03/23	5	100%	100.00%
7	Descapote mecanico y retiro,Incl. MdeO.**	45 días	vie 3/02/23	mié 29/03/23	5	100%	100.00%
8	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	5 días	vie 27/01/23	jue 2/02/23		100%	100.00%
9	Campamento 40 M2	2 días	vie 27/01/23	lun 30/01/23	8CC	100%	100.00%
10	DEMOLICIONES	277 días	vie 10/03/23	lun 29/01/24		100%	100.00%
11	Demolición Cimiento Concreto	20 días	mié 3/01/24	jue 25/01/24	44FC-30 días	100%	100.00%
12	Demolición placa de contrapiso	217 días	vie 19/05/23	lun 29/01/24	5FC+90 días	100%	100.00%
13	Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	40 días	mié 13/12/23	lun 29/01/24	12FF	100%	100.00%
14	Demolición Cuneta Manual incly cargue y retiro	60 días	lun 20/11/23	lun 29/01/24	13FF	100%	100.00%
15	Demolición Escalera Concreto	60 días	vie 10/03/23	vie 19/05/23	5FC+30 días	100%	100.00%
16	Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	10 días	vie 1/12/23	mié 13/12/23	12FC-50 días	100%	100.00%
17	DESMONTES Y RETIROS	280 días	vie 17/03/23	mié 7/02/24		94%	94.41%
18	Desmonte aparatos	8 días	vie 17/03/23	lun 27/03/23	15CC+5 días	100%	100.00%
19	Desmonte carpintería metálica **	140 días	vie 17/03/23	lun 28/08/23	18CC	100%	100.00%
20	Desmonte y retiro de red electrica A.P.**	30 días	mié 3/01/24	mié 7/02/24	19FC+110 días	50%	50.00%
21	Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	60 días	vie 17/03/23	jue 25/05/23	19CC	100%	100.00%
22	Desmonte y retiro de llantas**	15 días	vie 6/10/23	mié 25/10/23	23CC-60 días	100%	100.00%
23	Desmonte De Señalización	15 días	vie 15/12/23	mié 3/01/24	122	100%	100.00%
24	Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m**	15 días	vie 22/12/23	mar 9/01/24	23CC+5 días	100%	100.00%
25	Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico	3 días	vie 2/02/24	mié 7/02/24	20FF	67%	67.01%
26	EXCAVACIONES Y RELLENOS	262 días	jue 27/04/23	mar 27/02/24		97%	97.46%
27	EXCAVACIONES CON RETIRO	250 días	jue 27/04/23	mar 13/02/24		100%	100.00%
28	Excavación Manual Taludes	130 días	jue 14/09/23	mar 13/02/24	30FF+5 días	100%	100.00%
29	Excavacion manual con retiro en roca Caisson**	160 días	jue 27/04/23	mar 31/10/23	15CC+40 días	100%	100.00%
30	Excavación Mecánica Y Retiro	245 días	jue 27/04/23	mié 7/02/24	29CC	100%	100.00%
31	Entibado de Excavacion **	30 días	mar 18/07/23	mar 22/08/23	30CC+70 días	100%	100.00%
32	Excavacion con equipo en roca Caisson**	90 días	vie 1/09/23	vie 15/12/23	29FF+40 días	100%	100.00%
33	NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO (Excav sin retiro)	57 días	vie 22/12/23	mar 27/02/24		100%	100.00%
34	Nivelación y Compactación de subrasante (MdeO+Cilin)	45 días	vie 22/12/23	mar 13/02/24	30FC-40 días	100%	100.00%
35	Nivelacion y Conformacion taludes (m2) e=0.05**	45 días	vie 5/01/24	mar 27/02/24	148FF	100%	100.00%
36	RELLENOS	212 días	vie 23/06/23	mar 27/02/24		94%	94.44%
37	Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	205 días	vie 23/06/23	lun 19/02/24	30CC+50 días	95%	95.00%
38	Relleno Recebo Afirmado	205 días	vie 23/06/23	lun 19/02/24	37CC	95%	95.00%
39	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	145 días	vie 1/09/23	lun 19/02/24	38CC+60 días	95%	95.00%
40	Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle	70 días	jue 7/12/23	mar 27/02/24	147FF	90%	90.00%
41	ESTRUCTURA	242 días	vie 19/05/23	mar 27/02/24		95%	95.09%
42	CIMENTACIÓN	226 días	vie 19/05/23	jue 8/02/24		100%	100.00%
43	Concreto de Limpiez (solado) 2500psi	195 días	lun 26/06/23	jue 8/02/24	50CC-5 días	100%	100.00%
44	Columna Circ Conc 4000PSI Ø1,20 M. - PILA	225 días	vie 19/05/23	mié 7/02/24	121CC+20 días	100%	100.00%
45	Pedestal En Concreto 4000psi	30 días	mié 6/12/23	mié 10/01/24	43FC-55 días	100%	100.00%
46	Viga cabezal de muro de contención de 4000 psi(28Mpa)	45 días	jue 19/10/23	lun 11/12/23	150CC	100%	100.00%
47	COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA	140 días	jue 14/09/23	vie 23/02/24		100%	100.00%
48	Placa contrapiso 0.12 m 3000 psi	140 días	jue 14/09/23	vie 23/02/24	39CC+10 días	100%	100.00%
49	MUROS DE CONTENCIÓN	206 días	vie 30/06/23	mar 27/02/24		98%	98.23%
50	Muro contencion concreto premezclado 4000	200 días	vie 30/06/23	mar 20/02/24	89FC-35 días	100%	100.00%
51	Muro de Contención en Gavion(Inc. Formaleta). **	110 días	vie 20/10/23	mar 27/02/24	50FC-104 días	95%	95.00%
52	JUNTAS	25 días	lun 29/01/24	mar 27/02/24		0%	0.00%
53	Junta de Dilatación sikarod 32mm + sikaflex **	25 días	lun 29/01/24	mar 27/02/24	134FC-18 días	0%	0.00%
54	ESTRUCTURAS METÁLICAS	60 días	lun 18/12/23	lun 26/02/24		71%	71.47%
55	Entrepiso Steel Deck E=.13	25 días	mié 10/01/24	jue 8/02/24	56CC+20 días	75%	75.00%
56	Estructura metalica obra	60 días	lun 18/12/23	lun 26/02/24	45FC-20 días	70%	70.00%
57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO	212 días	mar 20/06/23	jue 22/02/24		96%	95.94%
58	Acero de refuerzo 60000 **	205 días	mar 20/06/23	mié 14/02/24	50CC-10 días	100%	100.00%
59	Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35	140 días	mar 12/09/23	jue 22/02/24	48CC-2 días	90%	90.00%
60	REDES HIDRÁULICAS	185 días	mié 19/07/23	mar 20/02/24		88%	87.69%
61	RED DE DRENAJE	185 días	mié 19/07/23	mar 20/02/24		88%	87.69%
62	Tuberia Novafort d=250mm	140 días	vie 8/09/23	mar 20/02/24	50CC+60 días	80%	80.00%
63	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	140 días	vie 8/09/23	mar 20/02/24	62CC	80%	80.00%
64	Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1800+tubo100mm **	175 días	mié 19/07/23	jue 8/02/24	50CC+15 días	100%	100.00%
65	REDES ELÉCTRICAS	142 días	jue 14/09/23	mar 27/02/24		61%	61.38%
66	BAJA TENSIÓN Y AP	142 días	jue 14/09/23	mar 27/02/24		71%	71.47%
67	Empalme en Derivación (91B1)	20 días	vie 2/02/24	mar 27/02/24	70CC	0%	0.00%
68	Caja electrica de inspección AP 274 Codensa **	130 días	jue 14/09/23	mar 13/02/24	28CC	90%	90.00%
69	Canaliz ducto electric PVC- D2X3 Zona Verde	130 días	jue 14/09/23	mar 13/02/24	68CC	90%	90.00%
70	Acometida 3#4	20 días	vie 2/02/24	mar 27/02/24	68FC-8 días	0%	0.00%
71	Cable 3 N° 12 Sum e Instal**	20 días	vie 2/02/24	mar 27/02/24	70CC	0%	0.00%
72	Brazo Sencillo Luminaria	20 días	vie 2/02/24	mar 27/02/24	71CC	45%	45.00%
73	ILUMINACIÓN	12 días	mar 13/02/24	mar 27/02/24		41%	41.01%
74	Luminaria FLEXIA FG MIDI / 20 LEDS / 4000K / 32W / 220V	12 días	mar 13/02/24	mar 27/02/24	72FC-12 días	45%	45.00%
75	AVENTO GEN 2/S/48 LEDS/116mA/4000K/5256 OPTIC/26W/ 220V	12 días	mar 13/02/24	mar 27/02/24	74CC	30%	30.00%
76	Luminaria AVENTO 1 / 144 LEDS / 233mA / 4000K / 5195 OPTIC / 106W / 220V	12 días	mar 13/02/24	mar 27/02/24	75CC	50%	50.00%
77	Fotocelda - Suministro e instalacion	12 días	mar 13/02/24	mar 27/02/24	76CC	50%	50.00%
78	Aplique Solar de piso para empotrar	12 días	mar 13/02/24	mar 27/02/24	77CC	30%	30.00%
79	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA	12 días	mar 13/02/24	mar 27/02/24		0%	0.00%
80	Sistema de Puesta a Tierra	12 días	mar 13/02/24	mar 27/02/24	72FC-12 días	0%	0.00%
81	Soldadura Exotermica	12 días	mar 13/02/24	mar 27/02/24	80CC	0%	0.00%
82	Cable Cu No. 2/0 AWG desnudo	12 días	mar 13/02/24	mar 27/02/24	81CC	0%	0.00%
83	PINTURA	17 días	mié 7/02/24	mar 27/02/24		0%	0.00%
84	PINTURA EXTERIORES	17 días	mié 7/02/24	mar 27/02/24		0%	0.00%
85	Demarcacion pintura trafico a=0.05***	17 días	mié 7/02/24	mar 27/02/24	134FC-10 días	0%	0.00%
86	EXTERIORES	259 días	lun 1/05/23	mar 27/02/24		73%	73.26%
87	EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN	259 días	lun 1/05/23	mar 27/02/24		70%	70.32%
88	Tala de arboles h= 2.1 a 5 m incly. Transp	75 días	lun 1/05/23	jue 27/07/23	30CC+3 días	100%	100.00%
89	Traslado con equipo y bloqueo arboles de 5 m a 10m	88 días	lun 1/05/23	jue 10/08/23	88CC	100%	100.00%
90	Arbol Roble (Siembra+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	15 días	vie 9/02/24	mar 27/02/24	148FC-15 días	30%	30.00%
91	Arbol Cariseco(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor	15 días	vie 9/02/24	mar 27/02/24	90CC	30%	30.00%
92	Arbol CarboneroRojo(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	15 días	vie 9/02/24	mar 27/02/24	91CC	30%	30.00%
93	Arbol Caucho Tequendama (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor	15 días	vie 9/02/24	mar 27/02/24	92CC	30%	30.00%
94	Arbol Guayacán (Siemb+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	15 días	vie 9/02/24	mar 27/02/24	93CC	30%	30.00%
95	Arbol Nogal 1.5 - 2.0m(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor	15 días	vie 9/02/24	mar 27/02/24	94CC	30%	30.00%
96	Arbol Yarumo/Cecropia (Siemb+Caja+Tier.Ab+Tutor)	15 días	vie 9/02/24	mar 27/02/24	95CC	30%	30.00%
97	Jardinería Densidad 1 a 12 Plantas por M2	15 días	vie 9/02/24	mar 27/02/24	96CC	30%	30.00%
98	SENDEROS, PLAZOLETAS, BORDILLOS, GUIA TACTIL, ANDENES EN ADOQUÍN, MUROS ARQ.	25 días	lun 29/01/24	mar 27/02/24		15%	15.00%
99	Sardinel achaflanado A-15 (0.45x0.8x0.15m)	25 días	lun 29/01/24	mar 27/02/24	147FF	30%	30.00%
100	Loseta tactil Conc. e=0.06 p<5% geo T- 2100	25 días	lun 29/01/24	mar 27/02/24	147FF	0%	0.00%
101	ESCALERAS Y RAMPAS	140 días	lun 4/09/23	mié 14/02/24		100%	100.00%
102	Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo **	140 días	lun 4/09/23	mié 14/02/24	43CC+60 días	100%	100.00%
103	MOBILIARIO	339 días	vie 27/01/23	mar 27/02/24		80%	80.39%
104	MOBILIARIO URBANO	6 días	mar 20/02/24	mar 27/02/24		30%	30.00%
105	Bicicletero Espiral Acero Inox(10 Puestos)Sum+Inst	6 días	mar 20/02/24	mar 27/02/24	147FF	30%	30.00%
106	SEÑALIZACIÓN	339 días	vie 27/01/23	mar 27/02/24		81%	81.12%
107	Servicio de Time Lapse con Fotos	339 días	vie 27/01/23	mar 27/02/24	8CC	96%	96.00%
108	Valla informativa de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M	3 días	vie 27/01/23	mar 31/01/23	107CC	100%	100.00%
109	Valla Normas Gral. 2 Caras (1.00x3.00m)	6 días	mar 20/02/24	mar 27/02/24	105FF	30%	30.00%
110	Señales Preventiv-Informativ-reglam(Sum+Ints.)Font	6 días	mar 20/02/24	mar 27/02/24	109CC	30%	30.00%
111	Señal Plano Ubic Parque (0.90x1.20m) 1 cara (PGLH)	6 días	mar 20/02/24	mar 27/02/24	110CC	30%	30.00%
112	Señal Punto de Encuentro 1 Cara	6 días	mar 20/02/24	mar 27/02/24	111CC	30%	30.00%
113	Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	6 días	mar 20/02/24	mar 27/02/24	112CC	30%	30.00%
114	Reductor de velocidad tipo Resalto Parabolico - 4 mts de ancho	14 días	jue 1/02/24	vie 16/02/24	122FC+40 días	0%	0.00%
115	Estoperol 10 cm x 3 cm	15 días	mié 7/02/24	vie 23/02/24	134FF+5 días	0%	0.00%
116	Aseo General	15 días	vie 9/02/24	mar 27/02/24	107FF	0%	0.00%
117	ITEMS NO PREVISTOS	337 días	lun 30/01/23	mar 27/02/24		80%	79.56%
118	Baño de campamento	2 días	lun 30/01/23	mié 1/02/23	9	100%	100.00%
119	Desmonte y Rtiro de Pasamanos	8 días	vie 26/05/23	lun 5/06/23	21	100%	100.00%
120	Geotextil NT-1600** - Suministro e instalacion	120 días	lun 2/10/23	lun 19/02/24	39FF	95%	95.00%
121	Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 2500 psi **	200 días	jue 27/04/23	vie 15/12/23	29CC	100%	100.00%
122	LOSA DE PISO ALIGERADA F'C 21 MPAh=.50 Caset. GUADUA	30 días	vie 10/11/23	vie 15/12/23	121FC-30 días	100%	100.00%
123	Filtro frances 40x115 geoNT-1600+tubo 100mm	20 días	mié 19/07/23	jue 10/08/23	64CC	100%	100.00%
124	Filtro Chimenea geoNT-1600+tubo100mm **	20 días	mié 19/07/23	jue 10/08/23	123CC	100%	100.00%
125	Concreto ciclópeo concreto de 3000 psi. MezclObra 0.6Mx0.4P **	80 días	jue 1/06/23	vie 1/09/23	30CC+30 días	100%	100.00%
126	Mampostería en Bloque de cocreto 15x20x40	35 días	mié 3/01/24	mar 13/02/24	122FC+15 días	100%	100.00%
127	CANASTILLA PASAJUNTAS (4 BARRAS LISAS 1"*35 CM CADA 30 CM)	110 días	mar 10/10/23	jue 15/02/24	134CC-3 días	80%	80.00%
128	Corte Concreto Dilatac.cortadora (e=6-10)	105 días	mié 25/10/23	vie 23/02/24	134CC+10 días	60%	60.00%
129	GROUTING - MORTERO F´CR 16.5 MPA MAMPOSTERIA CDRC	35 días	mié 3/01/24	mar 13/02/24	126CC	100%	100.00%
130	Caja de Inspección100x100x100+Exca(ESPECIFIC-IDRD)	19 días	lun 22/01/24	mar 13/02/24	63CC+115 días	0%	0.00%
131	Ducto Afloramiento media tension Ø3" (L=6	20 días	mié 24/01/24	jue 15/02/24	133CC	0%	0.00%
132	Poste Metal H=9M a 10M Tipo Ap + Base Concreto (Sum + Tran + Hin)	22 días	vie 19/01/24	jue 15/02/24	68CC+110 días	45%	45.00%
133	Brazo Doble Luminaria	20 días	mié 24/01/24	jue 15/02/24	132CC+3 días	45%	45.00%
134	Piso en concreto MR 41 (280 Kg/cm2) acelerado a 7 días estampado	110 días	vie 13/10/23	lun 19/02/24	39CC+35 días	80%	80.00%
135	Piso en concreto MR 41 (280 Kg/cm2) color ginger	10 días	jue 8/02/24	mar 20/02/24	55	0%	0.00%
136	Tope llanta prefabricado (H=15cm, B=20cm, L=50cm)	8 días	mié 14/02/24	jue 22/02/24	134FC-4 días	30%	30.00%
137	Pintura de tráfico reflectivo	8 días	vie 16/02/24	mar 27/02/24	136CC+3 días	0%	0.00%
138	Tratamientos integrales	135 días	lun 18/09/23	jue 22/02/24	89CC+120 días	55%	55.00%
139	Suministro e instalación baranda M81	27 días	vie 26/01/24	mar 27/02/24	142FC-25 días	35%	35.00%
140	Suministro e instalación caneca M121 sencilla tipo Barcelona	6 días	mar 20/02/24	mar 27/02/24	147FC-6 días	30%	30.00%
141	Suministro e instalación caneca M121 doble punto ecológico sin tapa	6 días	mar 20/02/24	mar 27/02/24	140CC	30%	30.00%
142	Suministro e instalación de bordillo A80	120 días	vie 6/10/23	vie 23/02/24	39CC+30 días	85%	85.00%


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA


SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

FECHA	lunes, 12 de febrero de 2024	PERIODO No.	58	DEL	5/02/2024	AL	11/02/2024

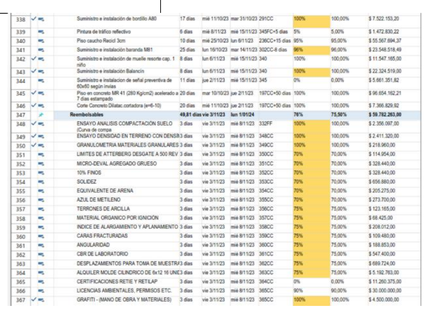


138		Suministro e instalación de bordillo A80	17 días	mié 11/10/23	mar 31/10/23	291CC	100%	100.00%	$ 7.522.153,20	
139		Pintura de tráfico reflectivo	6 días	mié 8/11/23	mié 15/11/23	345FC+5 días	5%	5.00%	$ 1.472.830,22	
140		Piso caucho Reciol 3cm	10 días	mié 25/10/23	lun 6/11/23	236CC+15 días	95%	95.00%	$ 55.567.894,37	
141		Suministro e instalación baranda MB1	25 días	lun 16/10/23	mar 14/11/23	302CC-6 días	95%	95.00%	$ 23.546.518,49	
142		Suministro e instalación de muelle resorte cap. 1 niño	8 días	lun 6/11/23	mié 15/11/23	340	100%	100.00%	$ 11.547.185,00	
143		Suministro e instalación Balancín	8 días	lun 6/11/23	mié 15/11/23	340	100%	100.00%	$ 22.324.519,00	
144		Suministro e instalación de señal preventiva de 60x60 según invias	11 días	jue 2/11/23	mié 15/11/23	345	0%	0.00%	$ 5.661.351,82	
145		Piso en concreto MR 41 (350 Kg/cm2) acelerado a 7 días estampado	20 días	mar 10/10/23	jue 2/11/23	197CC+50 días	100%	100.00%	$ 96.654.162,21	
146		Corte Concreto Diatac.cortadora (e=6-10)	20 días	mié 11/10/23	jue 2/11/23	197CC+50 días	100%	100.00%	$ 7.366.829,92	
147		**Reembolsables**	**49,61 días**	**vie 3/11/23**	**lun 1/01/24**		**70%**	**75,58%**	**$ 59.782.263,00**	
148		ENSAYO ANALISIS COMPACTACION SUELO (Curva de compa	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	332FF	100%	100.00%	$ 2.286.597,00	
149		ENSAYO DENSIDAD EN TERRENO CON DENSIM	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	348CC	100%	100.00%	$ 2.411.320,00	
150		GRANULOMETRIA MATERIALES GRANULARES	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	349CC	100%	100.00%	$ 218.960,00	
151		LIMITES DE ATTERBERG DESGATE A 500 REV	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	350CC	70%	70.00%	$ 114.954,00	
152		MCIRO-DEVAL AGREGADO GRUESO	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	351CC	70%	70.00%	$ 328.440,00	
153		10% FINOS	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	352CC	70%	70.00%	$ 328.440,00	
154		SOLIDEZ	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	353CC	70%	70.00%	$ 656.880,00	
155		EQUIVALENTE DE ARENA	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	354CC	70%	70.00%	$ 205.275,00	
156		AZUL DE METILENO	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	355CC	70%	70.00%	$ 273.700,00	
157		TERRONES DE ARCILLA	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	356CC	75%	75.00%	$ 123.165,00	
158		MATERIAL ORGANICO POR IGNICION	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	357CC	75%	75.00%	$ 68.425,00	
159		INDICE DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	358CC	75%	75.00%	$ 208.012,00	
160		CARAS FRACTURADAS	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	359CC	75%	75.00%	$ 109.460,00	
161		ANGULARIDAD	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	360CC	75%	75.00%	$ 188.853,00	
162		CBR DE LABORATORIO	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	361CC	75%	75.00%	$ 547.400,00	
163		DESPLAZAMIENTOS PARA TOMA DE MUESTRAS	1 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	362CC	75%	75.00%	$ 669.724,00	
164		ALQUILER MOLDE CILINDRICO DE 6x12 16 UNID	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	363CC	75%	75.00%	$ 5.162.763,00	
165		CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	364CC	0%	0.00%	$ 11.260.375,00	
166		LICENCIAS AMBIENTALES, PERMISOS ETC.	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	365CC	90%	90.00%	$ 30.000.000,00	
167		GRAFITI - (MANO DE OBRA Y MATERIALES)	3 días	vie 3/11/23	mié 8/11/23	366CC	100%	100.00%	$ 4.500.000,00	



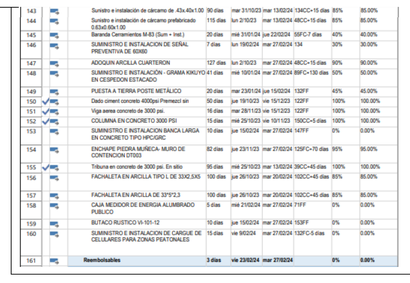

143		Suministro e instalación de cárcamo de .43x.40x1.00	90 días	mar 31/10/23	mar 13/02/24	134CC+15 días	85%	85.00%		
144		Suministro e instalación de cárcamo prefabricado 0.62x0.60x1.00	115 días	lun 2/10/23	mar 13/02/24	48CC+15 días	85%	85.00%		
145		Baranda Cerramientos M-83 (Sum + Inst.)	20 días	mié 31/01/24	jue 22/02/24	59FC-7 días	40%	40.00%		
146		SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA DE 60X60	7 días	lun 19/02/24	mar 27/02/24	134	30%	30.00%		
147		ADOQUIN ARCILLA CUARTERON	127 días	lun 2/10/23	mar 27/02/24	48CC+15 días	90%	90.00%		
148		SUMINISTRO E INSTALACION - GRAMA KIKUYO EN CESPEDON ESTACADO	41 días	mié 10/01/24	mar 27/02/24	89FC+130 días	50%	50.00%		
149		PUESTA A TIERRA POSTE METÁLICO	20 días	mar 23/01/24	jue 15/02/24	133FF	45%	45.00%		
150		Dado ciment concreto 4000psi Premezcl sin	50 días	jue 19/10/23	vie 15/12/23	122FF	100%	100.00%		
151		Viga aerea concreto de 3000 psi.	16 días	mar 28/11/23	vie 15/12/23	122FF	100%	100.00%		
152		COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI	15 días	mié 25/10/23	vie 10/11/23	150CC+5 días	100%	100.00%		
153		SUMINISTRO E INSTALACION BANCA LARGA EN CONCRETO TIPO HPC/GRC	10 días	jue 15/02/24	mar 27/02/24	147FF	0%	0.00%		
154		ENCHAPE PIEDRA MUÑECA- MURO DE CONTENCION DTD03	82 días	jue 23/11/23	mar 27/02/24	125FC+70 días	95%	95.00%		
155		Tribuna en concreto de 3000 psi. En sitio	95 días	mié 25/10/23	mar 13/02/24	39CC+45 días	100%	100.00%		
156		FACHALETA EN ARCILLA TIPO L DE 33X2.5X5	100 días	jue 26/10/23	mar 20/02/24	102CC+45 días	85%	85.00%		
157		FACHALETA EN ARCILLA DE 33*5*2,3	100 días	jue 26/10/23	mar 20/02/24	102CC+45 días	85%	85.00%		
158		CAJA MEDIDOR DE ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO	5 días	mié 21/02/24	mar 27/02/24	71FF	0%	0.00%		
159		BUTACO RUSTICO VI-101-12	10 días	jue 15/02/24	mar 27/02/24	153FF	0%	0.00%		
160		SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGUE DE CELULARES PARA ZONAS PEATONALES	15 días	vie 9/02/24	mar 27/02/24	132FC-5 días	0%	0.00%		
161		**Reembolsables**	**3 días**	**vie 23/02/24**	**mar 27/02/24**		**0%**	**0.00%**		

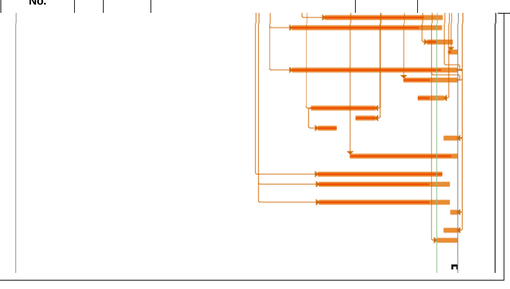

Pintura de tráfico, reparación de reductores de velocidad, armado de acero de muro de contención sector 3, aseo y Limpieza, enchape con piedra laja en jardinera de los sectores 1, 2 y 3.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ARQ. DIANA M. AVENDAÑO B.

Armado de muro gavión arquitectónico, instalación de enchape, montaje de estructura metálica para mirador pasarela, instalación de adoquín cuarterón, instalación de tubería eléctrica, armado de acero para tanque de almacenamiento de agua, instalación de grama kikuyo, excavación para individuos arbóreos, instalación de barandas.

SUPERVISOR DE APOYO DEL CONTRATO
ING WILSON RAMÍREZ
