INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

FECHA	lunes, 19 de febrero de 2024	**PERIODO No.**	59	DEL	**12/02/2024**	AL	**18/02/2024**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL".**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL PARQUES BELLO Y PARQUE LA JOYITA Calle 30B SUR-KR1A / CALLE 31 SUR- KR 1E**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				**CONTRATO DE OBRA.**			
CONTRATO No.:	1260 DE 2022			**CONTRATO No.:**	1270 DE 2022		
PLAZO INICIAL:	10 MESES			**PLAZO INICIAL:**	9 MESES		
PRORROGA No. 1	2 MES 15 DIAS			**PRORROGA No. 1**	2 MES 15 DIAS		
PRORROGA No. 2	1 MES 15 DIAS			**PRORROGA No. 2**	1 MES 15 DIAS		
PRORROGA No. 3				**PRORROGA No. 3**	1 MES 2 DIAS		
FECHA DE INICIACIÓN:	28/12/2022			**FECHA DE INICIACIÓN:**	28/12/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/10/2023			**FECHA DE TERMINACIÓN:**	28/09/2023		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	27/03/2024			**FECHA DE TERMINACION**	26/01/2024		
				FECHA DE TERMINACION	27/02/2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	455			**PLAZO ACTUALIZADO:**	426		
PLAZO TRANSCURRIDO:	417	EQUIVALE AL	92%	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	417	EQUIVALE AL	98%
VALOR INICIAL :	$1.555.859.401			**VALOR INICIAL :**	$8.491.054.570		
VALOR ADICIÓN 1:	$76.000.000			**VALOR ADICIÓN(ES):**	$0		
VALOR ADICIÓN	$0			**ANTICIPO**	$2.547.316.371		
VALOR ACTUALIZADO:	$1.631.859.401			**VALOR ACTUALIZADO:**	$0		
VALOR PAGADO:	$639.885.658			**VALOR PAGADO:**	$3.712.231.792		
VALOR POR PAGAR:	$991.973.743			**VALOR POR PAGAR:**	$2.231.506.407		
SUPERVISOR:	**CAMILO ANDRES PEÑUELA CANO**			**INTERVENTOR:**	**ELSA TORRES ARENALES**		

2. CONTROL DE HITOS.


No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	28/12/2022	28/12/2022	0
2	VISITA DE CAMPO CON CADA CONTRATISTA	26/01/2023	11/01/2023	-15
3	REUNIÓN CON CONTRATISTA OBRA ALCALDÍA LOCAL- JOYITA20	9/01/2023	12/01/2023	3
4	APROPIACIÓN DE DISEÑOS - FASE PRELIMINAR	28/12/2022	6/02/2023	40
5	REUNIÓN CON CONTRATISTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CON SOLICITUDES Y/O INQUIETUDES DEL CONTRATISTA DE OBRA	28/01/2023	31/03/2023	62
6	INICIO DE OBRA	28/01/2023	31/01/2023	3
7	CUMPLIMIENTO A TODO LO SOLICITADO EN LA FASE PRELIMINAR / APROPIACIÓN DE DISEÑOS	28/01/2023	30/04/2023	92
FASE PRELIMINAR				
7	REMITIR HOJAS DE VIDA	2/01/2023	30/01/2023	25
8	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	18/01/2023	6/02/2023	19
9	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA REALIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA	18/01/2023	1/02/2023	13
10	REVISAR, APROBAR Y VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ENTREGADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA	11/01/2023	8/02/2023	28
11	REVISAR Y APROBAR EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DE EJECUCIÓN DE OBRA	18/01/2023	25/01/2023	6
12	REVISAR Y APROBAR LOS DOCUMENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRA5	18/01/2023	11/03/2023	52
13	PLAN DE COMPRAS - REVISIÓN Y APROBACIÓN PLAN DE COMPRAS	26/01/2023	11/03/2023	44
14	PMT- APROBACIÓN PMT	19/01/2023	25/01/2023	5
15	PROGRAMACIÓN APUS- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE APUS	27/01/2023	15/02/2023	19
16	APROBACIÓN DE LABORATORIOS Y MATERIALES ESENCIALES FASE	27/01/2023	11/03/2023	43
	30			

AVANCE DE ACTIVIDADES PRELIMINARES / APROPIACIÓN DE DISEÑOS

PROGRAMACIÓN

SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA (%)	EJECUTAD0 SEMANA (%)
1,2,3, y 4	100,00%	60,00%
5	100,00%	80,00%
6	100,00%	80,00%
7	100,00%	84,00%
8	100,00%	84,00%
9	100,00%	84,00%
10	100,00%	98,00%
11	100,00%	98,00%
12	100,00%	99,50%
13	100,00%	99,50%
14	100,00%	99,50%
15	100,00%	100,00%

DIFERENCIA
0,00%

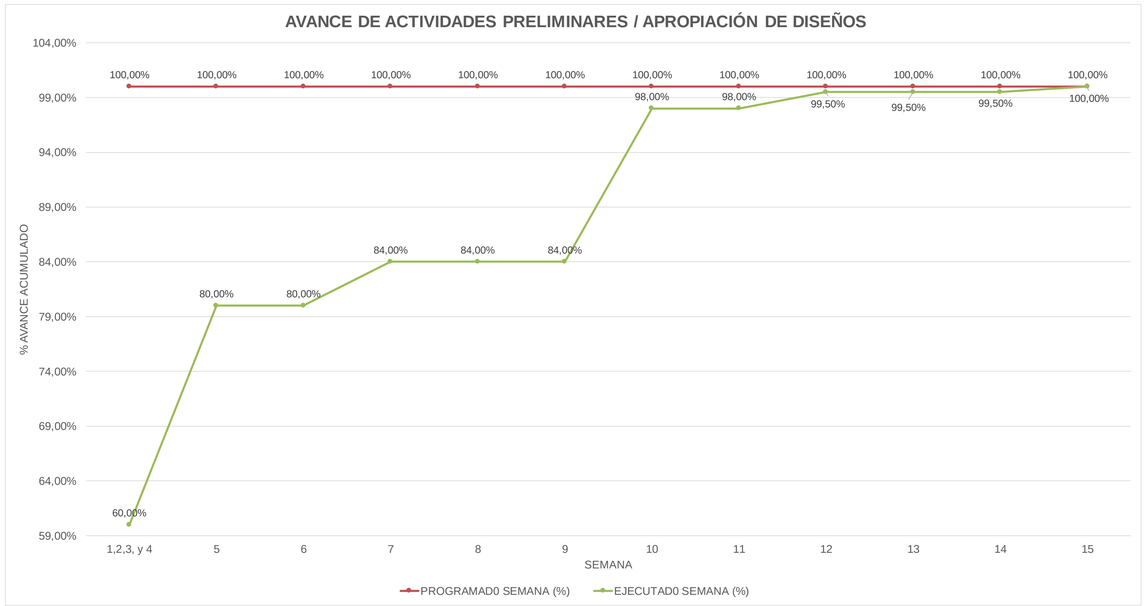

ÍTEM	2.1. FASE EJECUCIÓN DE OBRAS BELLO HORIZONTE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	%EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
1.1.1.	Replanteo general	31/01/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.1.2.	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	14/02/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.1.3.	Descapote mecánico y retiro,Incl. MdeO.**	3/12/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.1.4.	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	2/05/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.1.5.	Campamento 40 M2	2/05/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.1.6.	Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos)	2/02/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.2.2.	Demolición. Muro 0.20x 0,25	17/03/23	**Finalizada**	100,0%	
1.2.3.	Demolición muros de concreto	26/03/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.2.4.	Demolición Cimiento en Concreto	26/03/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.2.5.	Demolición placa de contrapiso	30/03/2023	**Finalizada**	100,00%	
1,2,7,	Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	20/07/2023	**Finalizada**	100,00%	
1.2.8.	Demolición Escalera Concreto	17/04/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.2.9.	Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	20/07/2023	**Finalizada**	100,0%	
	Demolición de Estructura con Equipo+ retiro	16/09/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.3.1	Desmonte y retiro de red eléctrica A.P.**	11/08/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.3.2.	Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	5/09/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.3.3.	Desmonte Equipos Biosaludables (Demolc+Retiro)	18/05/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.3.4.	Desmonte juegos infantiles	27/05/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.3.6.	Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m	05/0/2023	**Finalizada**	100,0%	
1.3.7.	Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico	11/08/2023	**Finalizada**	100,0%	
2.1.1.	Excavación Manual Taludes	31/10/2023	**Finalizada**	100,0%	
2.1.2.	Excavación manual con retiro en roca Caisson**	8/04/2023	**Finalizada**	100,00%	
2.1.3.	Excavación Mecánica Y Retiro	31/05/2023	**Finalizada**	100,0%	
2.1.4.	Entibado de Excavación	31/05/2023	**Finalizada**	100,0%	
2.1.5.	Excavación con equipo en roca Caisson	27/06/2023	**Finalizada**	100,00%	
2.2.3	Nivelación y Compactación de subrasante (MdeO+Cilin)	31/10/2023	**Finalizada**	100,0%	
2.2.4	Nivelacion y Conformacion taludes (m2) e=0.05**	31/10/2023	**Finalizada**	100,0%	
2.4.2.	Relleno Recebo afirmado	31/10/2023	**Finalizada**	100,00%	
2.4.4.	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	31/10/2023	**Finalizada**	100,00%	
3,1,1,	Viga Cimiento Concreto 3000 Psi G.C Sin	31/10/2023	**En ejecución**	90,00%	
3,1,2,	Viga 0.3*0.4 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	27/10/2023	**Finalizada**	100,00%	
3.1.3.	Concreto de Limpieza (solado) 2500psi	31/10/2023	**Finalizada**	100,00%	
3,1,5,	Pilote +Concret210 D=0.40 M Exc. Máxima 35 M Roca	11/07/2023	**Finalizada**	100,00%	
3.2.3	Gradería Sitio	29/05/2023	**Finalizada**	100,00%	
	Placa contrapiso 0,12 m 3000 PSI	31/10/2023	**Finalizada**	100,00%	
3.4.2.	Muro contención concreto premezclado 4000	2/09/2023	**Finalizada**	100,0%	
	Muro de Contención en Gavion(Inc.Formaleta). **	31/10/2023	**Finalizada**	100,0%	
	Junta de Dilatación sikarod 32mm + sikaflex **	31/10/2023	**Finalizada**	100,0%	
	Acero de refuerzo 60000	31/10/2023	**Finalizada**	100,0%	
3.7.1	Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35	31/10/2023	**Finalizada**	100,0%	
3.7.2	Tuberia Novafort d=250mm Exca y relleno zona dura **	25/09/2023	**Finalizada**	100,0%	

FECHA	lunes, 19 de febrero de 2024	PERIODO No.	59	DEL	12/02/2024	AL	18/02/2024

	Caja de inspección .60x.60 h=1.0 **	28/06/2023	Finalizada	100,0%	
4.1.5.	Caja eléctrica de inspección AP 274 Codensa **	28/06/2023	Finalizada	100,0%	
4,1,1	Canaliz ducto eléctrica PVC- D2X3" Zona Verde	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
7.1.2	Bordillo en sitio - contenedor de raíces (0.15x0.6m)	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
7.2.6	Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo **	30/05/2023	Finalizada	100,0%	
	Empalme en Derivación (91B1)	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Caja electrica de inspección AP 274 Codensa **	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Canaliz ducto electric PVC- D2X3 Zona Verde	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Acometida 3#4	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Cable 3 N° 12 Sum e Instal**	31/10/2023	En ejecucion	95,0%	
	Brazo Sencillo Luminaria	30/05/2023	En ejecucion	100,0%	
	Luminaria FLEXIA FG MIDI / 20 LEDS / 4000K / 32W / 220V	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Luminaria AVENTO 1 / 144 LEDS / 233mA / 4000K / 5195 OPTIC / 106W / 220V	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Fotocelda - Suministro e instalacion	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Sistema de Puesta a Tierra	31/10/2023	En ejecucion	90,0%	
	Soldadura Exotermica	31/05/2023	En ejecucion	100,0%	
	Empradizacion grama con semiilla ray-grass **	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Traslado de arbol pequeño	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Arbol Acacia Negra(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Arbol CarboneroRojo(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor)**	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Arbol Caucho Tequendama (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Arbol Guayacán (Siemb+Caja+Tier. Abonada+Tutor)**	31/05/2023	Finalizada	100,0%	
	Arbol Nogal 1.5 - 2.0m(Siemb+Caja+Tier. Abon+Tutor	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Arbol Yarumo/Cecropia (Siemb+Caja+Tier.Ab+Tutor)	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Jardinería Densidad 12 Plantas por M2 -CDRC	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	
	Adoquin prefabricado de arcilla. 60x260 e=60mm.	31/10/2023	En ejecución	98,0%	
	Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5 sin viga	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 sin viga	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Servicio de Time Lapse con Fotos	15/11/2023	Finalizada	100,00%	
	Dotación Giro Cadera Adultos/Mayores	15/11/2023	Finalizada	100,00%	
	Barras Adultos/Mayores-Diseñ-Idrd(Suminist)	15/11/2023	Finalizada	100,00%	
	Caminador adultos Mayores (SUM + INST)	15/11/2023	Finalizada	100,00%	
	Bicicletero Espiral Acero Inox(10 Puestos)Sum+Inst	15/11/2023	Finalizada	100,00%	
8.1.8.	**SEÑALIZACION**				
	Valla Normas Gral. 2 Caras (1.00x3.00m)	15/11/2023	En ejecución	95,00%	
	Señal Para Biosaludable (0.80x1.20m) dos caras	15/11/2023	En ejecución	95,00%	
	Señal en lámina galv (90X140CM) CAL.18-HG+Vi (DESM	15/11/2023	En ejecución	95,00%	
	Señal Plano Ubic Parque (0.90x1.20m) 1 cara (PGLH)	15/11/2023	En ejecución	95,00%	
	Señal Punto de Encuentro 1 Cara	15/11/2023	En ejecución	95,00%	
	Señal Informativa 1 Cara (SUM + INST)	15/11/2023	En ejecución	95,00%	
8.1.8.	**REEMBOLSABLES**				
	Espaldón Igol Imprimante + Denso	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Valla informativa de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	LICENCIAS AMBIENTALES, PERMISOS ETC.	31/10/2023	En ejecución	90,0%	
	Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1800+tubo100mm	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Filtro Chimenea Excav+geoNT-1600+tubo100mm **	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 2500 psi **	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Geotextil NT-1600** - Suministro e instalación	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Piso caucho Recicl 3cm	31/10/2023	Finalizada	98,0%	
	Suministro e instalación Balancín	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Suministro e instalación de muelle resorte cap. 1 niño	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Corte Concreto Dilatac.cortadora (e=6-10)	31/10/2023	Finalizada	100,0%	
	Poste Metal H=9M a 10M Tipo Ap + Base Concreto (Sum + Tran + Hin)	31/10/2023	En ejecucion	100,0%	

AVANCE DE OBRA BELLO HORIZONTE

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA (%)	EJECUTAD0 SEMANA (%)
1,2,3, y 4	0,00%	0,00%
5	0,99%	0,70%
6	1,53%	2,84%
7	2,08%	3,34%
8	2,62%	4,22%
9	3,17%	4,79%
10	3,72%	5,19%
11	4,81%	5,53%
12	6,11%	6,31%
13	7,47%	6,76%
14	8,83%	7,28%
15	10,20%	8,11%
16	11,56%	9,66%
17	12,92%	10,05%
18	14,40%	10,97%
19	10,34%	11,42%
20	11,62%	12,40%
21	13,10%	12,71%
22	14,83%	13,94%
23	16,59%	14,78%
24	18,39%	17,46%
25	20,24%	19,54%
26	22,21%	21,32%
27	26,95%	23,51%
28	29,97%	26,17%
29	35,09%	27,58%
30	41,34%	29,08%
31	48,25%	30,39%
32	55,63%	31,72%
33	62,90%	31,99%
34	69,73%	33,41%
35	76,17%	34,75%
36	82,33%	36,54%
37	87,92%	38,31%
38	93,30%	39,79%
39	39,24%	51,10%
40	44,18%	56,12%
41	54,01%	56,49%
42	64,28%	61,02%
43	84,40%	75,10%
44	92,92%	81,04%
45	98,65%	82,61%
46	100,00%	84,12%
47	100,00%	86,32%
48	100,00%	92,32%
49	100,00%	92,98%
50	97,27%	94,41%
51	98,89%	95,61%
52	99,61%	95,85%
53	100,00%	96,82%
54	100,00%	96,87%
55	100,00%	96,90%
56	100,00%	97,16%
57	100,00%	97,40%
58	100,00%	97,50%
59	100,00%	97,54%

DIFERENCIA
-2,46%

El presente informe se realiza con la programación aprobada con la prorroga 2 del día 12 de diciembre de 2023

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA ($)	EJECUTAD0 SEMANA ($)
1, 2, 3 y 4	$ 0	$ 0
5	$ 20.129.455	$ 16.199.764
6	$ 22.668.999	$ 40.071.346
7	$ 29.769.785	$ 50.592.994
8	$ 38.222.999	$ 64.351.670
9	$ 46.506.890	$ 71.524.701
10	$ 55.703.564	$ 78.038.988
11	$ 100.183.953	$ 88.183.813
12	$ 132.143.369	$ 104.707.930
13	$ 147.397.949	$ 117.334.895
14	$ 166.253.660	$ 128.145.631
15	$ 254.995.560	$ 140.453.237
16	$ 321.017.283	$ 161.402.143
17	$ 384.536.959	$ 165.442.247
18	$ 451.644.240	$ 176.319.028
19	$ 512.633.595	$ 182.332.807
20	$ 588.533.349	$ 248.865.838
21	$ 661.947.160	$ 256.245.532
22	$ 733.418.103	$ 300.610.636
23	$ 819.655.199	$ 313.742.405
24	$ 910.317.778	$ 333.924.948
25	$ 990.726.068	$ 484.931.571
26	$ 1.078.838.074	$ 511.090.371
27	$ 1.163.483.740	$ 513.433.240
28	$ 1.245.131.415	$ 597.988.525
29	$ 1.330.630.780	$ 625.082.082
30	$ 1.418.516.933	$ 670.682.649
31	$ 1.502.351.961	$ 701.098.376
32	$ 1.585.598.010	$ 718.057.893
33	$ 1.700.313.770	$ 738.958.426
34	$ 1.869.874.057	$ 789.310.712
35	$ 2.045.512.866	$ 819.788.388
36	$ 2.217.150.724	$ 952.242.832
37	$ 2.445.669.579	$ 964.954.878
38	$ 2.691.979.565	$ 983.770.236
39	$ 567.967.822	$ 822.265.822
40	$ 684.372.871	$ 956.001.651
41	$ 979.833.253	$ 973.298.051
42	$ 1.401.141.159	$ 1.060.510.928
43	$ 1.876.834.703	$ 1.317.002.338
44	$ 2.061.683.342	$ 1.490.731.850
45	$ 2.126.746.957	$ 1.579.766.424
46	$ 2.147.883.259	$ 1.631.395.220
47	$ 2.147.883.259	$ 1.684.329.620
48	$ 2.147.883.259	$ 1.849.508.166
49	$ 2.147.883.259	$ 1.880.503.078
50	$ 2.048.801.135	$ 1.922.752.280
51	$ 2.105.403.969	$ 1.964.007.077
52	$ 2.105.403.969	$ 1.922.752.280
53	$ 2.147.883.260	$ 2.000.408.685
54	$ 2.147.883.260	$ 2.001.482.627
55	$ 2.147.883.260	$ 2.002.126.992
56	$ 2.147.883.260	$ 2.018.322.970
57	$ 2.147.883.260	$ 2.029.557.545
58	$ 2.147.883.260	$ 2.052.071.236
59	$ 2.147.883.260	$ 2.070.193.039


DIFERENCIA
$ 77.690.221


SWW><

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

FECHA	lunes, 19 de febrero de 2024	PERIODO No.	59	DEL	12/02/2024	AL	18/02/2024

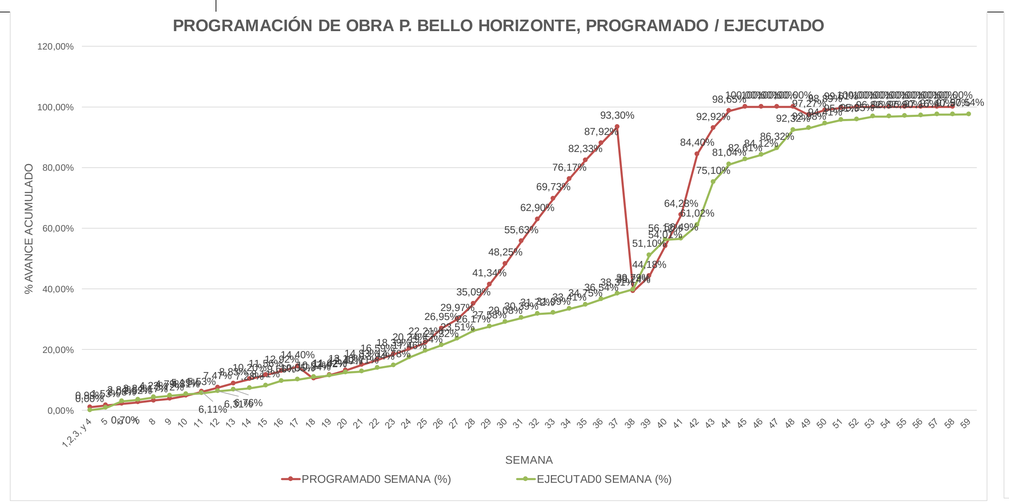

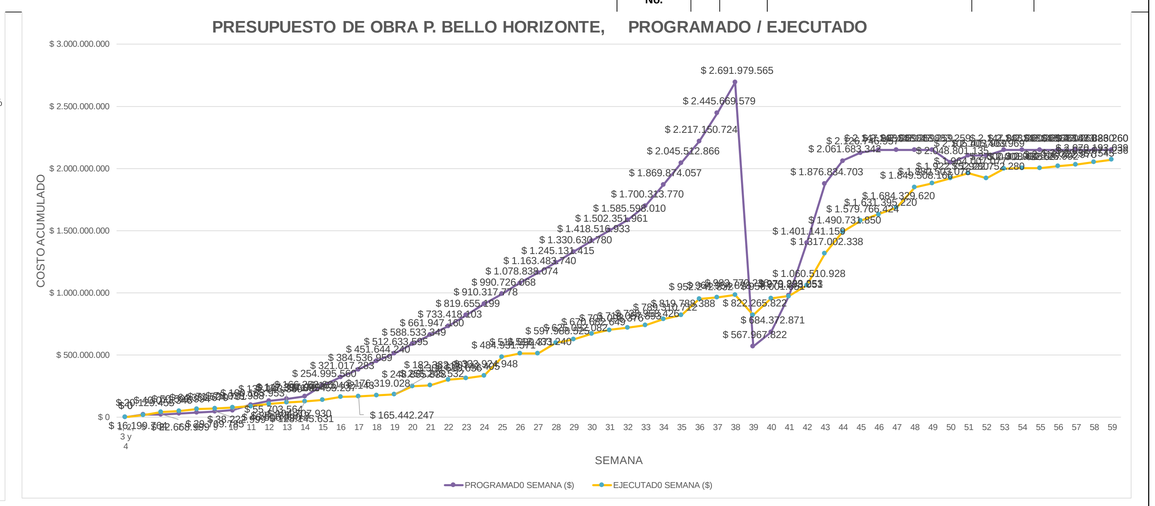

***** Se adjunta Imágenes de la programación de obra aprobada en Project con corte al 18 febrero del 2024.**

ÍTEM	2.2. FASE EJECUCIÓN DE OBRAS LA JOYITA	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENT	%EJECUCIÓN	DÍAS DE ATRASO
1.1.1.	Replanteo general	31/01/2023	31/01/2023	100,0%	
1.1.2.	Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	14/02/2023	20/02/2023	100,0%	
1.1.3.	Descapote mecánico y retiro,Incl. MdeO.**	12/03/2023	30/03/2023	100,0%	
1.1.4.	Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc+base conc) **	5/02/2023	29/03/2023	100,0%	
1.1.5.	Campamento 40 M2	5/02/2023	6/02/2023	100,0%	
1.1.6.	Baño Portátil Alquiler (Inc.Transp+8aseos)	2/02/2023	2/02/2023	100,0%	
1.2.1.	Demolición cimiento en concreto	28/07/2023	**En ejecución**	100,0%	
1.2.2.	Demolición placa de contrapiso	21/03/2023	12/04/2023	100,0%	
1.2.4	Demolición Cuneta Manual Incluye cargue y retiro	30/03/2023	20/04/2023	100,0%	
1.2.5.	Demolición Escalera Concreto	3/04/2023	28/03/2023	100,0%	
1.3.1.	Desmonte aparatos	19/03/2023	30/03/2023	100,0%	
1.3.2,	Desmonte carpintería metálica	27/03/2023	**En ejecución**	100,0%	
1.3.3,	Desmonte y retiro de red eléctrica A.P.**	27/03/2023	**En ejecución**	50,0%	
1.3.4.	Desmonte- Cerramiento Reja Pequeña	10/04/2023	**En ejecución**	100,0%	
1.3.5.	Desmonte y retiro de llantas**	17/04/2023	21/03/2023	100,0%	
1.3.7.	Desmonte Y Reinst.De Pasamanos	1/05/2023	28/03/2023	100,0%	
1.3.8.	Desmonte y retiro. Poste ap 10 a 12 m**	1/05/2023	**En ejecución**	100,0%	
1.3.9.	Desmonte y retiro de luminaria Álbum Publico	8/05/2023	**En ejecución**	67,0%	
2.1.1.	Excavación Manual Taludes	30/03/2023	**En ejecución**	100,0%	
2.1.2.	Excavación manual con retiro en roca Caisson**	10/07/2023	**En ejecución**	100,0%	
2.1.3.	Excavación Mecánica Y Retiro	10/07/2023	**En ejecución**	100,0%	
2.1.4.	Entibado de Excavación **	10/07/2023	**En ejecución**	100,0%	
2.1.5.	Excavacion con equipo en roca Caisson**	18/07/2023	**En ejecución**	100,0%	
	Nivelación y Compactación de subrasante (MdeO+Cilin)	6/10/2023	**En ejecución**	90,0%	
	Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	10/11/2023	**En ejecución**	95,0%	
2.4.2.	Relleno recebo afirmado	6/06/2023	**En ejecución**	95,0%	
2.4.4.	Relleno compactado Base granular tipo IDRD **	30/06/2023	**En ejecución**	95,0%	
	Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle	10/11/2023	**En ejecución**	90,0%	
3.1.2.	Concreto de Limpieza (solado) 2500psi	14/05/2023	**En ejecución**	100,0%	
3.1.5.	Columna Circ Conc 4000PSI Ø1,20 M. - PILA	30/06/2023	**En ejecución**	100,0%	
	Pedestal En Concreto 4000psi	9/11/2023	**En ejecución**	100,0%	
	Vigas Aereas En Concreto 4000psi**	21/11/2023	7/12/2023	100,0%	
	Graderia Sitio	12/10/2023	**En ejecución**	80,0%	
	Placa contrapiso 0.12 m 3000 psi	12/10/2023	**En ejecución**	100,0%	
3.4.1.	Muro contención concreto premezclado 4000	30/05/2023	**En ejecución**	100,0%	
3.4.2.	Muro de Contención en Gavión(Inc. Formaleta). **	27/07/2023	**En ejecución**	95,0%	
	Entrepiso Steel Deck E=.13	22/12/2023	**En ejecución**	100,0%	
	Estructura metalica obra	31/10/2023	**En ejecución**	85,0%	
3.7.1.	Acero de refuerzo 60000 **	19/08/2023	**En ejecución**	100,0%	
3.7.2.	Malla Electrosoldada 6.5 mm X 6.5 mm 6mts X 2.35	19/07/2023	**En ejecución**	100,0%	
	Tuberia Novafort d=250mm	3/11/2023	**En ejecución**	80,0%	
	Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	3/11/2023	**En ejecución**	80,0%	
4.1.7.	Filtro frances50*50 Excav+geoNT-1800+tubo100mm **	1/09/2023	**En ejecución**	100,0%	
	Caja electrica de inspección AP 274 Codensa **	3/11/2023	**En ejecución**	90,0%	
	Canaliz ducto electric PVC- D2X3 Zona Verde	3/11/2023	**En ejecución**	90,0%	
8.1.2.	Tala de arboles h= 2.1 a 5 m incly. Transp	24/05/2023	2/08/2023	100,0%	
8.1.3.	Traslado con equipo y bloqueo arboles de 5 m a 10m	24/05/2023	**En ejecución**	100,0%	
	Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo **	3/11/2023	**En ejecución**	90,0%	
9.2.1.	Servicio de Time Lapse con Fotos	27/09/2023	**En ejecución**	97,9%	
	LOSA DE PISO ALIGERADA F'C 21 MPAh=.50 Caset. GUADUA	22/11/2023	7/12/2023	100,0%	
NP	Concreto ciclópeo concreto de 3000 psi. MezclObra 0.6Mx0.4P **	30/05/2023	30/06/2023	100,0%	
	Geotextil NT-1600** - Suministro e instalacion	16/11/2023	**En ejecución**	85,0%	
	Anillo contenc caisson e=0.10 dex=1.3 2500 psi **	20/09/2023	**En ejecución**	100,0%	
	CANASTILLA PASAJUNTAS (4 BARRAS LISAS 1"*35 CM CADA 30 CM)	8/11/2023	**En ejecución**	80,0%	
	Corte Concreto Dilatac.cortadora (e=6-10)	14/11/2023	**En ejecución**	65,0%	
	Mampostería en Bloque de cocreto 15x20x40	16/01/2024	**En ejecución**	100,0%	
	GROUTING - MORTERO F´CR 16.5 MPA MAMPOSTERIA CDRC	16/01/2024	**En ejecución**	100,0%	
	Piso en concreto MR 41 (280 Kg/cm2) acelerado a 7 dias estampado	14/11/2023	**En ejecución**	80,0%	
	Suministro e instalación de bordillo A80	8/11/2023	**En ejecución**	80,0%	
	Sunistro e instalación de cárcamo de .43x.40x1.00	8/11/2023	**En ejecución**	75,0%	
	Sunistro e instalación de cárcamo prefabricado 0.63x0.60x1.00	30/11/2023	**En ejecución**	85,0%	
	REEMBOLSABLES				
	Valla informativa de obra Dimensiones 3.0M X 6.0M			100,0%	
	LICENCIAS AMBIENTALES, PERMISOS ETC.			8,4%	

AVANCE DE OBRA JOYITA

PROGRAMACIÓN DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA (%)	EJECUTAD0 SEMANA (%)
1,2,3, y 4	0,00%	0,00%
5	0,94%	0,56%
6	1,00%	0,83%
7	2,30%	2,85%
8	2,43%	2,88%
9	2,84%	3,19%
10	3,31%	3,57%
11	4,20%	4,17%
12	5,29%	5,56%
13	6,50%	6,86%
14	8,88%	7,94%
15	10,75%	8,48%
16	12,62%	8,83%
17	14,49%	9,93%
18	9,72%	10,70%
19	11,46%	12,04%
20	11,65%	12,24%
21	12,65%	12,44%
22	14,04%	14,48%
23	15,67%	14,69%
24	17,57%	14,97%
25	20,12%	16,07%
26	23,63%	18,81%
27	27,43%	19,65%
28	31,44%	21,53%
29	36,53%	21,66%
30	41,89%	22,20%
31	48,39%	23,28%
32	56,29%	23,93%
33	64,16%	24,88%
34	71,70%	25,29%

DIFERENCIA
-7,24%

El presente informe se realiza con la programación aprobada con la prorroga 3 del día 25 de enero 2024

PRESUPUESTO DE OBRA

SEMANA No.	PROGRAMAD0 SEMANA ($)	EJECUTAD0 SEMANA ($)
1, 2, 3 y 4	$ 0	$ 0
5	$ 20.608.909	$ 11.723.869
6	$ 38.953.542	$ 44.919.042
7	$ 58.156.673	$ 92.745.322
8	$ 93.638.136	$ 113.517.172
9	$ 102.174.262	$ 118.886.077
10	$ 119.920.521	$ 125.904.888
11	$ 222.180.989	$ 131.942.265
12	$ 260.188.615	$ 160.148.255
13	$ 292.531.508	$ 195.040.036
14	$ 324.957.535	$ 237.973.744
15	$ 353.972.194	$ 253.235.904
16	$ 385.015.574	$ 257.344.467
17	$ 416.924.020	$ 307.539.672
18	$ 458.271.715	$ 338.358.368
19	$ 492.840.161	$ 389.179.758
20	$ 524.540.463	$ 390.406.540
21	$ 555.997.749	$ 401.941.434
22	$ 724.478.633	$ 451.596.426
23	$ 958.016.838	$ 470.823.280
24	$ 1.205.837.113	$ 491.934.026
25	$ 1.297.204.061	$ 518.740.964
26	$ 1.400.626.453	$ 545.402.626
27	$ 1.615.540.606	$ 638.054.836
28	$ 1.998.413.055	$ 724.063.360
29	$ 2.363.195.356	$ 733.873.197
30	$ 2.673.832.222	$ 759.338.573
31	$ 2.936.589.522	$ 821.634.587
32	$ 3.191.769.741	$ 876.416.003
33	$ 3.688.679.196	$ 892.490.636
34	$ 4.082.993.488	$ 956.267.828


DIFERENCIA
$ 208.013.134


	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	
BOGOTÁ	SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	ETA

FECHA	lunes, 19 de febrero de 2024	PERIODO No.	59	DEL	12/02/2024	AL	18/02/2024

35	79,05%	26,21%
36	86,24%	31,61%
37	93,12%	33,05%
38	99,32%	35,69%
39	30,84%	49,24%
40	32,97%	50,34%
41	36,11%	51,54%
42	40,08%	53,06%
43	44,21%	53,93%
44	49,24%	55,40%
45	57,70%	56,84%
46	68,30%	63,22%
47	81,30%	68,28%
48	90,95%	70,79%
49	99,15%	72,53%
50	73,47%	72,53%
51	77,98%	74,24%
52	82,10%	76,31%
53	86,20%	77,99%
54	91,13%	80,15%
55	96,32%	81,53%
56	100,00%	82,47%
57	84,92%	84,10%
58	89,47%	85,79%
59	94,16%	86,92%

35	$ 4.409.443.094	$ 1.121.592.127
36	$ 4.717.985.517	$ 1.821.263.451
37	$ 4.936.813.550	$ 1.968.377.336
38	$ 5.217.140.753	$ 2.193.652.955
39	$ 724.121.553	$ 2.443.345.239
40	$ 969.438.022	$ 2.694.187.115
41	$ 1.260.506.788	$ 2.769.466.384
42	$ 1.610.945.317	$ 2.941.690.198
43	$ 2.098.757.589	$ 3.099.604.108
44	$ 2.702.189.538	$ 3.201.695.539
45	$ 3.475.211.764	$ 3.408.765.750
46	$ 4.130.900.904	$ 3.639.193.637
47	$ 4.934.225.691	$ 3.731.771.828
48	$ 5.704.589.939	$ 3.781.259.809
49	$ 6.297.723.282	$ 3.905.687.250
50	$ 4.058.453.662	$ 4.026.419.636
51	$ 4.360.473.613	$ 4.151.118.150
52	$ 4.667.894.037	$ 4.245.571.536
53	$ 4.995.933.331	$ 4.294.849.850
54	$ 5.361.910.360	$ 5.081.489.422
55	$ 5.915.029.955	$ 5.194.717.673
56	$ 6.343.171.312	$ 5.202.777.980
57	$ 4.929.194.744	$ 5.297.563.338
58	$ 5.258.201.075	$ 5.346.898.932
59	$ 5.668.749.171	$ 5.460.736.037

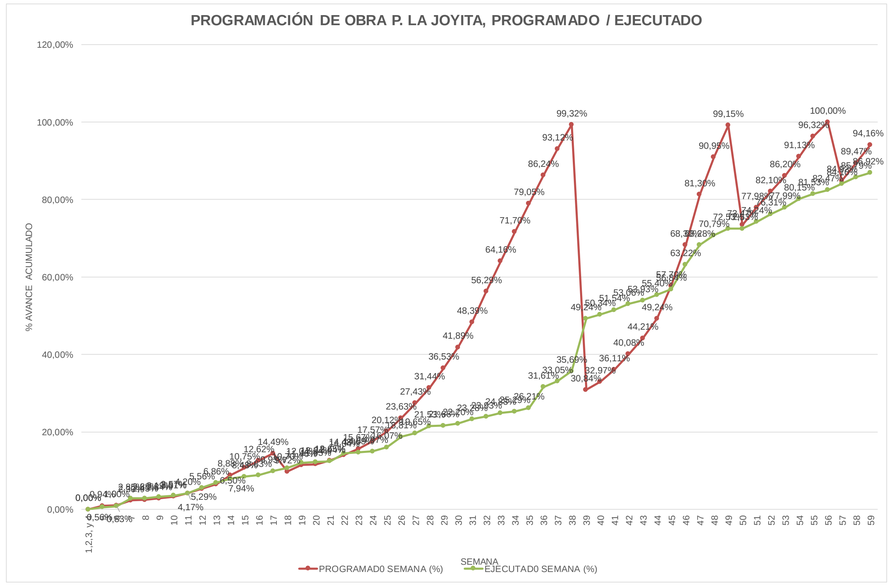

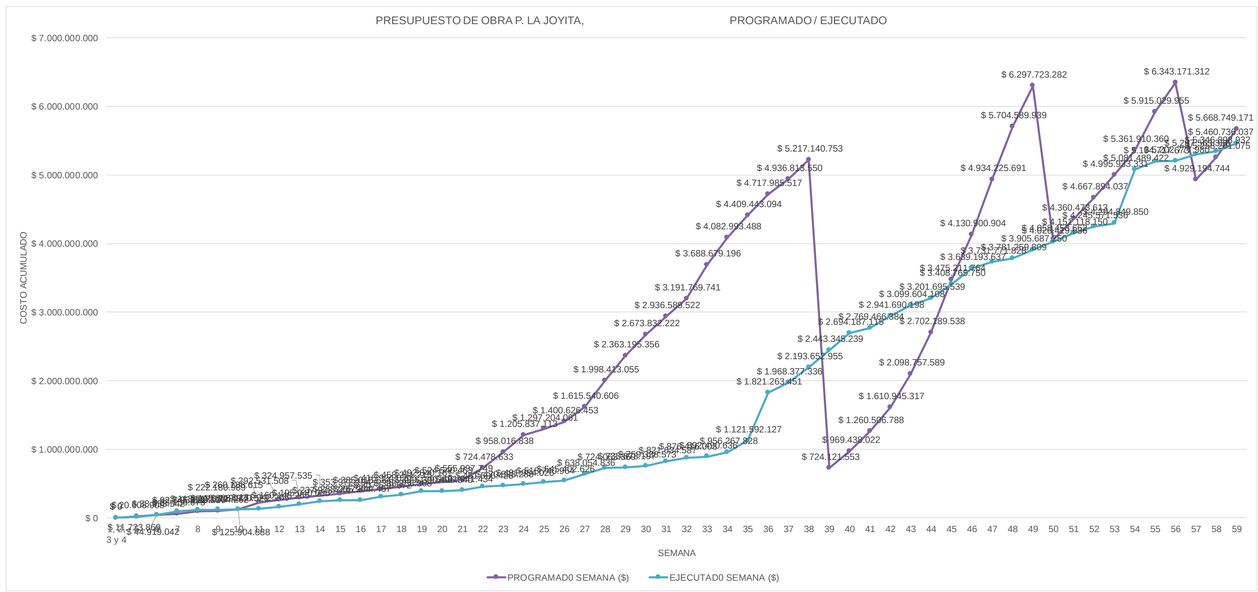

***** Se adjunta Imágenes de la programación de obra aprobada en Project con corte al 18 de febrero del 2024.**

AVANCE TERRITORIO 1 - 18/02/2024						
PIP	VALOR	% PROGRAMADO	VR. PROGRAMADO	% EJECUTADO	VR. EJECUTADO	DESVIACIÓN
JOYITA	$ 6.343.171.312,00	94,16%	$ 5.972.730.107,38	86,92%	$ 5.513.484.504,39	-7,24%
BELLO HORIZONTE	$ 2.147.883.259	100,00%	$ 2.147.883.258,71	97,54%	$ 2.095.045.330,55	-2,46%
TOTAL	$ 8.491.054.571	95,64%	$ 8.120.613.366,09	89,61%	$ 7.608.529.834,94	-6,03%

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA (OBRA)

PARQUE BELLO HORIZONTE:

1.Se realizó instalación de piedra laja en jardineras del sector 1 y 2

2.Se continua con la instalación de formaleta e icopor para acometer muro de contención del sector 3.

3.Se realiza instalación de piezas de fachaleta en escaleras centrales tramo superior

4.Se ejecuta aplicación de pintura de tráfico tipo 1

5.Aseo y Limpieza: Prosiguen los trabajos de limpieza y aseo fino en todas las áreas del parque.

6. Se realiza reparación de gaviones del sector 2 con piedra rajón

PARQUE LA JOYITA:

1. Instalación de sardinel A15

2. Instalación de adoquín en plazoletas y senderos

3. Instalación de enchape en seccion de escalera del salon comunal

4. Armada de muro gavión arquitectónico.

5. Vaciado de concreto MR41 en pasarela

6. Instalación de grama kikuyo

7. Compactacion de base granular en zona de parqueadero.

8. Conformacion de anden en parte superior de tanque

9. Izage de postes para luminarias

10. Excavación para individuos arboreos

11. Instalación de barandas M81 y M83.

12. Conformacion de cajas eléctricas.

13. Enchape en piedra laja en muro de contencion DET-CT003 y muro de mamposteria en concreto en la bahía de parqueadero.

4. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PARQUE BELLO HORIZONTE:

1. Continuar con remates de bordillos, piezas faltantes, resanes e instalación de piedra laja, entre otros

2. se continuará con aseo y limpieza en todas las áreas del parque

4. Fundición del muro del sector 3

5. Se deben completar instalación de señaletica

6. Se continuará pintura de tráfico reflectivo

7. Suministro e instalacion de señal preventiva de 60x60 según invias

PARQUE LA JOYITA:

1. Instalacion de grama kikuyo.

2. Armado de muro gavion arquitectonico

3. Instalacion de adoquin cuarteron en senderos.

4. Pintura de estructura metalica

5. Instalacion de piedra laja amarilla en muro en mamsporteria en concreto en bahía de parqueadero

6. Vaciado de concreto MR 41 en placas de parqueadero

7. Instalacion de enchape fachaleta en seccion de escaleras del salon comunal

8. Instalacion de barandas M81 y M83

9. Instalación de redes eléctricas.

10. Instalacion de sardinel A15.

5. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PARQUE LA JOYITA :

Se requiere que el contratista aumente personal operativo (mano de obra no calificada) para ejecutar las diferentes actividades en los diversos frentes del parque.
Se le solicita al contratista tener en obra los insumos y materiales necesarios para la ejecución de las actividades
Se le solicita al contratista realizar control de asentamiento de la bahía de parqueadero y pasarela.
Se le reitera al contratista la terminacion o acabado de las actividades debe de ser de buena calidad.

PARQUE BELLO HORIZONTE:

Se requirió al contratista garantizar la calidad y estabilidad de las obras, toda vez que, existen actividades que a la fecha presentan fallas en su ejecución o inestabilidad por la no culminación de las mismas.
Se recuerda al contratista el aunar esfuerzos en la consecución de las actividades y el aumento del personal, toda vez, que existe una desviación del porcentaje entre lo ejecutado y lo programado.
Se le solicita al contratista realizar el muro de contención del sector 3, entrega de informacion forestal y emitir respuesta de señalización en conjunto con sus especialistas.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
PRESENTACIÓN DE INFORME DE PLAN DE COMPRAS DE LOS PIP LA JOYITA Y BELLO HORIZONTE, Y ENTREGA DE PAQUETE No. 03 DE ÍTEM NO PREVISTOS	CONSORCIO TINGUA 2023	INMEDIATA

BOGOTA	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES**	ETA

FECHA	lunes, 19 de febrero de 2024	**PERIODO No.**	59	DEL	**12/02/2024**	AL	**18/02/2024**

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría.

A la fecha del presente informe se radica a la entidad paquete No.04 de items no previstos bajo oficio No. INT-PARQUES-1516 - VIABILIZACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS Y BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA 1270 DE 2022 - TERRITORIO 1, para su revision y aprobacion.

b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APUS por parte de la interventoría y del contratista.

A la fecha del presente informe se radica a la entidad paquete No.04 de items no previstos bajo oficio No. INT-PARQUES-1516 - VIABILIZACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS Y BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA 1270 DE 2022 - TERRITORIO 1, para su revision y aprobacion.

7. Aspectos técnicos:

La Joyita:

1. Se requiere al contratista de obra, que el personal operativo sea independiente para cada parque.
2. Se requiere que el contratista inicie con la empradización de zonas verdes.
3. Se requiere que el contratista avance con la instalacion del enchape en la escalera y graderia.
4. Se requiere que el contratista garantice la estabilidad y calidad de la obra en la ejecucion y terminados de todas las actividades.
5. Se requiere que el contratista realice las compras de los insumos necesarios para avanzar con la ejecución del contrato.
6, Se requiere que el contratista avance con la instalacion de barandas de cerramiento M81 y M83,
7. Se requiere que el contratista avance con la instalacion de redes electricas

Bello Horizonte :

1. Se informo al contratista acerca de los constantes retrasos presentados en obra y sobre el posible incumplimiento de las obligaciones contractuales, por ello, se requirió al contratista tomar cartas en el asunto.

2. Se recomendó y recordó al contratista la administracion y solicitud e materiales en obra, en razón al tiempo de finalización del contrato y su relación con las actividades pendientes por ejecutar.

8. Aspectos administrativos:

Se realiza Comité de Obra No. 58 el día 15/02/2024, participantes: SDH, Interventoría ETA, Consorcio Tingua 2023.

Se remite al contratista de obra los compromisos pactados en el comité de obra No. 58 para su respectiva revisión.

Se realiza reitera solicitud al contratista de entrega items no previstos y Balance de obra.

9. Resumen del Comité de Obra

Recorrido Parque La Joyita

El Ing. Mauricio Illera de apoyo tecnico a la supervision de la SDHT, manifiesta al contratista de obra y a la interventoría, donde se va a ubicar la bomba del tanque de almacenamiento de agua, y si esta llevaria su respectiva proteccion.
El Ing. Aurelio Monroy director de obra del consorcio Tingua 2023, manifiesta a la entidad SDHT, que la bomba va ubicada en el costado occidental del tanque, y lelva su respectivo nicho metalico para brindar proteccion a ella, de igual forma indica que se va a realizar un muro en mamposteria, prolongando el existente del salon comunal, dando confinamiento a la rampa escalera de este sector.
El Ing. Wilson Ramirez de apoyo tecnico a la supervision de la SDHT, manifiesta a la interventoria y al contratista de obra, si se esta ejecutando la actividad de grama kikuyo.
El Ing. Alvaro Aponte residente de interventoría, indica que el día lunes llego a la obra 262 M2 de grama kikuyo y se esta realizando su respectiva instalacion en conjunto con la malla Biotex, y estacas donde la pendiente sea pronunciada y se requiera de las mismas.
El Ing. Alvaro Aponte residente de interventoría manifiesta a la entidad que ya llegaron la estructura de los tótems a la obra, y cada uno se encuentra en el sitio donde se realizara su respectiva instalacion.
El Ing. Wilson Ramirez de apoyo tecnico a la supervision de la SDHT, manifiesta a la interventoria y al contratista de obra, si ya se tiene el aval para realizar el vaciado de concreto en la pasarela y que día se va a realizar.
El Ing. Alvaro Aponte residente de interventoría manifiesta a la entidad que ya se dío el aval para ejecutar esta actividad, y el día de hoy se espera la llegada de las mixer con el concreto.

Recorrido Bello Horizonte

La arq. Diana Avendaño directora de interventoria, solicita al contratista cumplir con las especificaciones tecnicas contractuales en la instalación de la bala solar contractual para su instalación de Territorio 1.
El Ing. Mauricio Illera de apoyo tecnico a la supervision de la SDHT, manifiesta al contratista de obra que existen distintas clases de bala solar y que se debe instalar la que cumple con sistema antibandalica y ademas la que cumple con todas las especificaciones contractuales.
El Ing. Wilson Ramirez de apoyo técnico a la supervision de la SDHT, manifiesta a la interventoría y al contratista de obra que no se tienen observacioes al arte de la señaletica remitido por la interventoría, siempre que se cumplan las especificaciones que establece el manual deseñaletica del IDRD.
El Ing. Wilson Ramirez de apoyo técnico a la supervision de la SDHT, pregunta al contratista de obra cuando se realizará el arreglo del piso caucho de juegos infantiles.
El arq. Jonathan Henao residente de obra, informa que en seis semanas por agendamiento. La arq. Gabriela Mejia residente de interventoria solicita el diseño de la reparación de piso de caucho para dar visto bueno.
La arq. Diana Avendaño directora de interventoria, solicita al contratista cumplir las especificaciones en la aplicacion de la pintura de bolardos y protección de los elementos hasta la entrega final de la obra.
El Ing. Mauricio Illera de apoyo tecnico a la supervision de la SDHT, manifiesta al contratista de obra que debe resolver el bajante de agua en el salon de la junta de accion comunal. La arq. Gabriela Mejia, residente de interventoria, propone que se instale canaleta y bajante con tuberia externa que conecte el agua a la rejilla de drenaje, interviniendo únicamente una sección de anden.
La profesional social Laura Zuñiga funcionaria de la SDHT solicita al contratista la elaboración del manual de funcionamiento con manejo de juegos infantiles, maquinas biosaludables, cancha y demas.
El Ing. Wilson Ramirez de apoyo técnico a la supervision de la SDHT, manifiesta a la interventoría y al contratista de obra que el contratista debe entregar certificaciones de aprobación de obras por parte de las empresas de servicios publicos y entidades: ENEL CODESA, Secretaria de Movilidad, EAAB, Jardin Botanico, Secretaria de Ambiente, UAESP, entre otras.

10. Aspectos componente SISTEMA:

Actividades de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (SSTMA) interventoría ETA semana del 12 al 18 de febrero del 2024
Se informa a la entidad que durante la semana del 12 al 18 de febrero no se presentaron accidentes de trabajo (AT).

Se informa a la entidad que el contratista CT presenta el informe con la subsanación a las observaciones en materia de SST&MA identificadas en visita del 27/01/2024 (Oficio CT2023/052-2024 del 15/02/2024) levantadas por la Ing. Eliana Moscoso Vargas.

Durante el desarrollo de la semana del 12 al 18 de febrero se realizan las respectivas observaciones al contratista CT 2023 para que garantice se cumpla con el procedimiento para ingreso de personal, ya que durante el desarrollo de la semana se presentaron cuatro (4) casos de personal nuevo el cual ingresa a obra sin que previamente la interventoría avale dicha documentación.

A la fecha de este reporte de los tres (3) AT que se han presentado en el transcurso del 2024, dos (2) están cerrados por el contratista, solo uno (1) continúa abierto, Caso Sr FELIX ALBERTO CASALLAS VILLA con CC 80.235.440 de la subcontratista MyE CONTRUCCIONES Y EQUIPOS SAS quien ha la fecha presenta 56 días de incapacidad con proyección a que se la extiendan debido al tipo de lesión.

Se informa a la entidad respecto a los controles de seguridad en campo que se solicita al contratista CT garantizar el óptimo desarrollo de la actividad de instalación de postes metálicos en el PIP Joyita, ya que la actividad se está llevando a cabo en horarios en los cuales no hay presencia del área SST por parte del contratista y de la interventoría. Como medida de control se solicito mediante oficio y en reunión de comité garantizar la supervisión de dicha actividad por parte del área SST del contratista CT.
Se solicita al contratista gestionar jornada de orden y aseo ya que se evidencia en el costado sur del parque por uno de los corredores principales adyacentes al tanque de excavación bordillos mal apilados, sin señalización y demarcación.
En materia ambiental se informa a la entidad que aún no se toman medidas preventivas para el retiro de la madera apilada en el costado occidental del PIP Joyita ya que es un volumen relevante de material el cual representa riesgo de colapso sobre un corredor de tránsito en obra.
Por último, se solicita al área SST del contratista inspeccionar el estado de la dotación y EPP el personal operativo ya que ha sido reiterativo en los recorridos de obra que se le haga la observación a la interventoría sobre la falta o el mal estado de los EPP.
Observaciones generales en SST&MA: El contratista gestiona el 17/02/2024 capacitación en riesgo Psicosocial por intermedio de la ARL BOLIVAR para personal administrativo y parcialmente operativo.

Personal interventoría semana del 12 al 18 febrero del 2024

Administrativos interventoría ETA

1. Residente Interventoría (Parque La Joyita) ING. ÁLVARO APONTE
2. Residente Interventoría (Parque Bello Horizonte) ARQ. GABRIELA MEJIA
3. Residente SSTMA Interventoría ING. SERGIO LUNA
4. Trabajador social Interventoría ALEJANDRA RAMÍREZ
5. Inspector Técnico Interventoría JESSICA CAROLINA ALVAREZ
6. Directora Interventoría DIANA AVENDAÑO
7. Pasante SENA topografía ANTONY PONTON

Ingresos Personal Operativo Subcontratista MyE Construcciones (Actividad puntual estampado pasarela peatonal)

1. CARLOS ANDRES ARIZA QUIÑONES 1002495232
2. PEDRO JOSE CAVA SAMBRANO 1129497580
3. AMILCAR ENRIQUE GONZALEZ TEHERAN 6323652
4. FREDDY ORLANO RAMIREZ FLOREZ 1014186700

Nº	NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO	CARGO	EMPRESA
1	DANIEL CANTE FANDIÑO	19284851	MAESTRO	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
2	HECTOR EUSTORGIO LOPEZ CUADRADO	79383445	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
3	LISANDRO VELASQUEZ MORENO	73021023	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
4	JOSE ANTONIO CHAPARRO	79351045	VIGILANCIA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
5	KARLA VANESA RODRIGUEZ BARROS	1122412508	INSPECTORA SST	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
6	OSCAR MAURICIO BLANCO BLANCO	1031160920	OFICIAL	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
7	PABLO ANTONIO AMAYA HERNANDEZ	19236297	MAESTRO	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
8	ARNOLDO MELO	3080157	MAESTRO	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
9	LUIS ALFONSO CONTRERAS PACHECO	1091535202	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
10	LUIS ALBERTO ACUÑA LEGUIZAMON	1023913840	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
11	JORGE SARMIENTO PATIÑO	79804648	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
12	EDUARDO LUIS MUÑOZ MUÑOZ	1.043.850.09 1	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
13	OSSAIRO DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ	15.681.887	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
14	JUAN CARLOS MARTINEZ	84.452.385	OFICIAL DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
15	LUIS GUILLERMO SANDOVAL PUENTES	80932778	VIGILANCIA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
16	NARCISO EFRAIN OROZCO ABDALA	73507362	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
17	DEYSON EDUARDO MUÑOZ MUÑOZ	1043850450	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
18	JOHN JAIRO ROMERO COVEA	77777381	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
19	FREDY ALEXANDER VELASQUEZ BARAONDA	1039302977	SOLDADOR	ESTRUCTURAS METALICAS OYF S.A.S
20	KENEY ALBERTO ROMERO COMBA	80117309	OFICIAL DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
21	JOSE LUIS ALTUZO RAMIREZ	93083473	ELECTRICISTA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
22	ANDRES EDUARDO GARCIA AMENDRALES	1082246458	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
23	JUAN DIAZ RUALA	9041413	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
24	EDGAR ANDRES PUENTES ARANGO	1012404634	OFICIAL	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
25	JUAN ENRIQUE FADELA RODRIGUEZ	1003553090	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
26	ARCHEO ENRIQUE FERNANDEZ POLANCO	7138947	OFICIAL	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
27	JAVIER ELISIO ARIAS EVA	1015415434	SOLDADOR	ESTRUCTURAS METALICAS OYF S.A.S
28	FERNANDO ENRIQUE BOQUE FIRDEO	8146873	OFICIAL	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
29	JESUS EDGOLFO RODRIGUEZ DE LA CRUZ	1045043805	OFICIAL	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
30	CRISTIAN CAMILO MARTINEZ LORA	1013294418	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
31	VICTOR JULIO SOTELA PITRANGOREA	77117430	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
32	OSCAR ESTEBAN SUAREZ LOMELI	1192215524	OBRA	BIOFORES INGENIERIA S.A.S
33	ABEL DANILO ARCANO ARCANO	1010554468	EMPRENDIZACION	BIOFORES INGENIERIA S.A.S
34	YIBSON GOMEZ NOYOL	1077335771	EMPRENDIZACION	BIOFORES INGENIERIA S.A.S
35	JOSE JOAQUIN TINJACA CERINA	79073297	EMPRENDIZACION	BIOFORES INGENIERIA S.A.S
36	JOSE MILTON TOVAS MEJIA	1193184248	EMPRENDIZACION	BIOFORES INGENIERIA S.A.S
37	JOHN CARLOS MUÑOZ MOSQUERA	8540567	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
38	DAISA ROSA CROCCO MANJARRES	45756000	OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
39	FELIX ALBERTO CASALLAS VILLA	80235440	OFICIAL DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
40	RAIVES FABIAN SUAREZ BENAVIDES	1013292573	OFICIAL DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
41	CARLOS JAVIER TAMARA PAEZ	1007127773	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
42	HECTOR JULIO GONZALEZ JIMENEZ	80726904	OFICIAL DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
43	ALBEIRO ARMANDO MENDIVELSO ROBERTON JOSE FABRICIA	80083853	OFICIAL DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
44	CARRILLO	1082903390	AYUDANTE DE OBRA	M&E CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
45	GIOVANNI RODRIGUEZ PUESTA	8047472	MAESTRO	OS FAVOCIVILINGENIERIA S.A.S
46	EDVIS ENRIQUE GONZALEZ PIÑA	19155574	AYUDANTE DE OBRA	MAQUINAS Y EQUIPOS JVS S.A.S
47	VICTOR MANUEL MENDOZA CALADOS	73055533	SOLDADOR	ESTRUCTURAS METALICAS OYF S.A.S
48	LUIS ALBERTO NIEVES UTRERA	8744650	SOLDADOR	ESTRUCTURAS METALICAS OYF S.A.S
49	WILLIAM ARTURO CISNEROS PINZON	79822033	SOLDADOR	ESTRUCTURAS METALICAS OYF S.A.S


11. Aspectos componente social:

COMPONENTE SOCIAL – 12 AL 17 DE FEBRERO/2024
•El día 14/02/2024 se llevó a cabo comité de seguimiento social, entre Entidad SDHT, Interventoría y Contratista.
•Informe semanal No. 55 (actividades del 05 al 10 de febrero/2024): El día 10/02/2024 se recibe informe del PIP Bello Horizonte y el día 12/02/2024 se recibe el del PIP La Joyita. Por parte de Interventoría fueron revisados, complementados y remitidos a la Entidad el día 13/02/2024 recibiendo su aval. Se remite versión aprobada al contratista mediante oficio INT-PARQUES-1517 y a su vez se radica ante la Entidad mediante oficio INT-PARQUES-1518 el día 14/02/2024.
•Informe semanal No. 56 (actividades del 12 al 17 de febrero/2024): El día 17/02/2024 se recibe informe del PIP Bello Horizonte.
•Informe mensual No. 13 Contratista e Interventoría: El día 12/02/2024 se recibe aprobación por parte de SDHT a Informe mensual No.13 V1 de Interventoría y a informes mensuales No 13 V2 de los PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita. Por lo cual, el día 13/02/2024 se remite aprobación al Contratista mediante oficio INT-PARQUES-1513. A su vez, se radican ante la Entidad junto con el Informe mensual de Interventoría, mediante oficio INT-PARQUES-1514.
•PQRS No. 7 PIP La Joyita: El día 12/02/2024 se reciben soportes de acta de compromiso con ciudadana de la PQRS.
•PQRS No. 15 PIP Bello Horizonte: El día 14/02/2024 se efectúa cierre de PQRS mediante entrega de oficio CT2023/051-2024, siendo firmada a satisfacción de ambas partes. El mismo día se reciben los soportes.
•El día 16/02/2024 se realiza socialización en predio ubicado en la Cra 1 No. 32C – 14 sur del PIP La Joyita, en el que se comunicó que no es viable realizar rampa de acceso vehicular ya que el predio no cuenta con garaje. Como soporte se cuenta con acta y registro fotográfico.
•El día 16/02/2024 se realizó acompañamiento en actividad comunicativa de la Entidad con nota periodística de Citytv, convocando a dos integrantes del comité veedor para su participación en la entrevista.
•Se realiza acompañamiento en actividad cierre actas de vecindad en Bello Horizonte.
•Se realizó verificación de los PAC de Bello Horizonte y La Joyita, evidenciando su atención por las Profesionales Sociales en los horarios establecidos.
•Se verifica actualización de vallas informativas de los PIP Bello Horizonte y PIP La Joyita, conforme lo establecido en el Acuerdo 787 de 2020.

REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE BELLO HORIZONTE





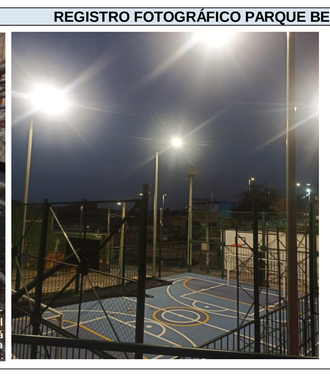

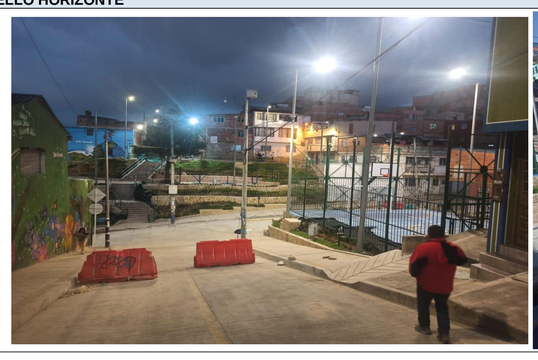




Imagen 1 y 2. Encofrado de muro sector 3

Imagen 3 y 4. Iluminación y conexión de red electrica

Imagen 5. Panoramica General














Imagen 6 y 7. Pintura de trafico

Imagen 8, 9 y 10 . Reparación de gaviones y piedra laja

Imagen 11. Recorrido Comite de obra No. 58

BOGOTÁ	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES							ETA
FECHA	lunes, 19 de febrero de 2024	PERIODO No.	59	DEL	12/02/2024	AL	18/02/2024	

REGISTRO FOTOGRÁFICO PARQUE LA JOYITA







Imagen 1 - 3. Instalación de enchape fachaleta, piedra laja amarilla, instalacion de grama kikuyo.







Imagen 4-6. Instalacion de canecas M121, llegada de tótems y vaciado de concreto MR41 en pasarela.







Imagen 6-9. Toma de prueba de asentamiento de concreto, viguetas para fallo a flexion del concreto MR41, estampado de la pasarela.



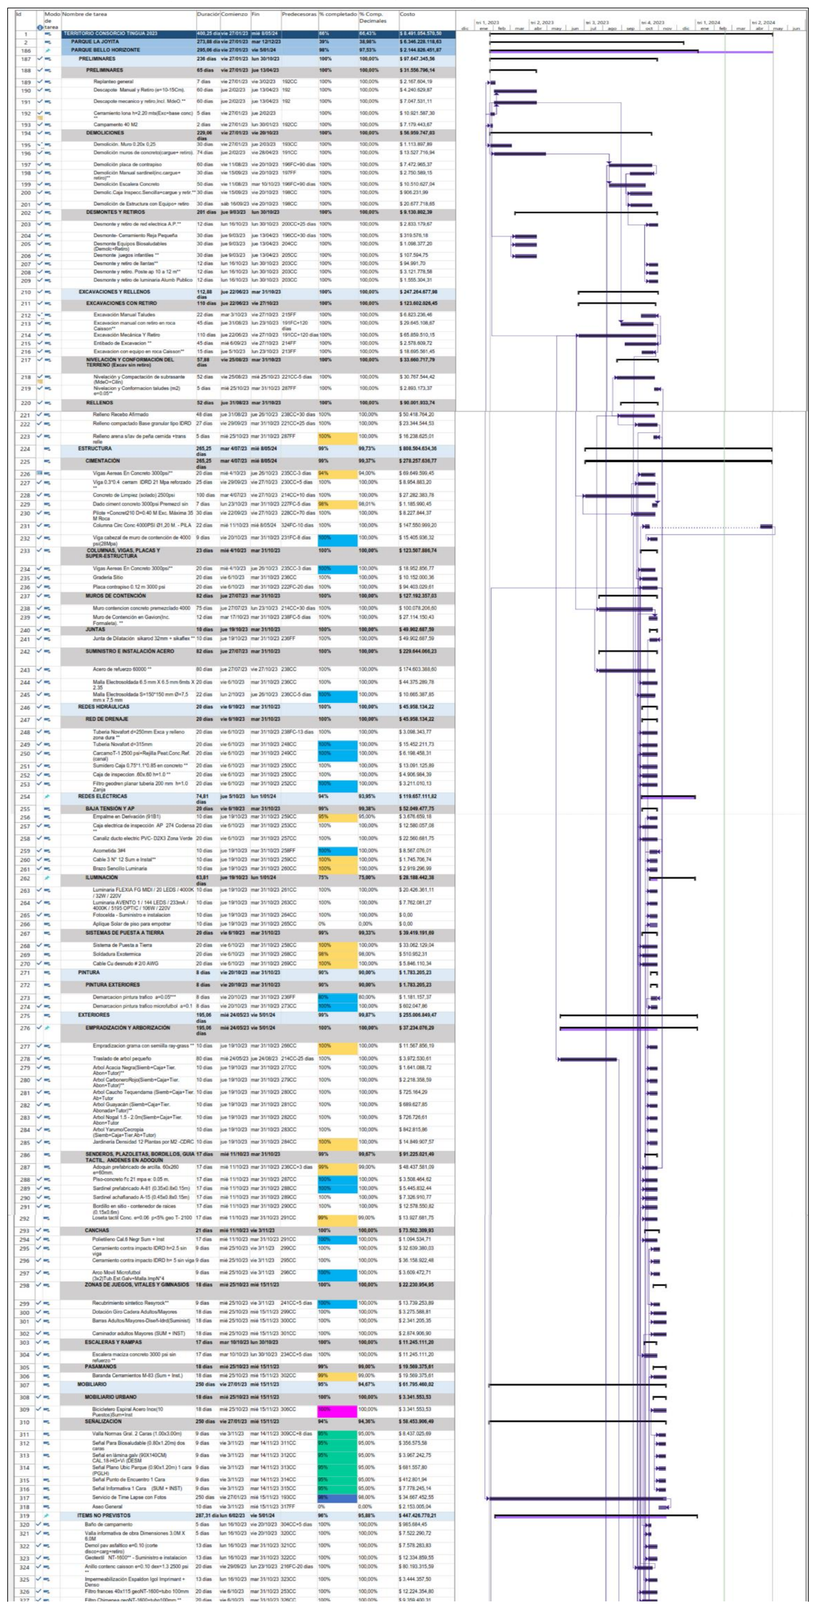





Imagen 11-12. Comité de obra.

ANEXOS

Actividades ejecutadas en Parque Bello Horizonte, a fecha del presente informe 17/02/2024




Actividades ejecutadas en Parque La Joyita, a fecha del presente informe 17/02/2024

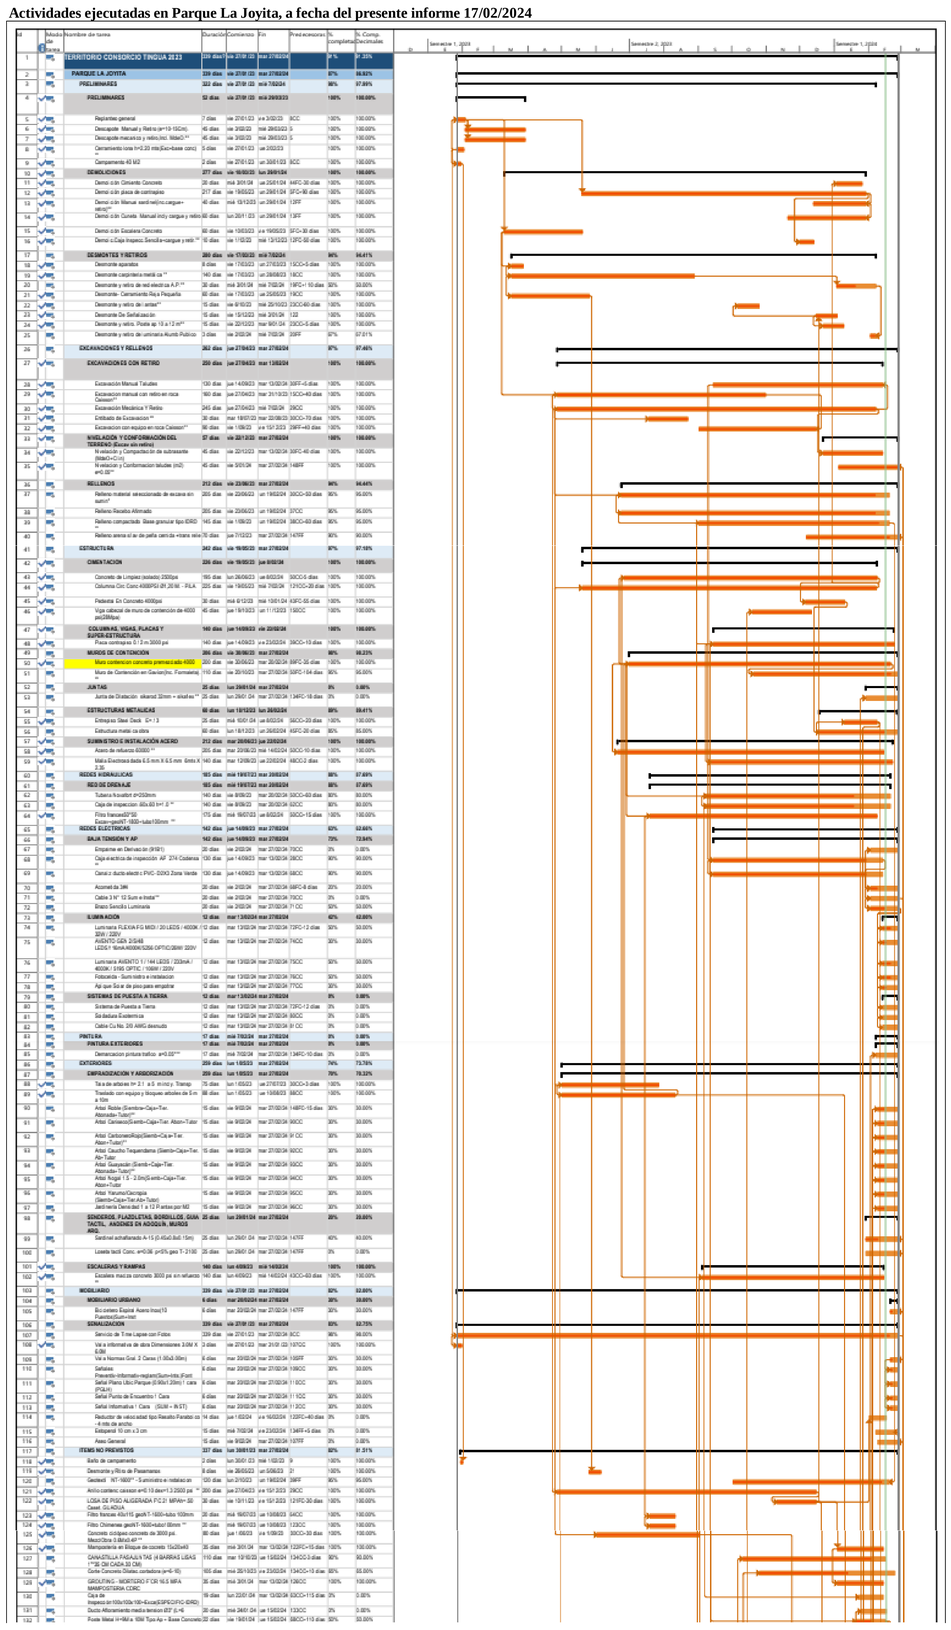



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

FECHA	lunes, 19 de febrero de 2024	PERIODO No.	59	DEL	12/02/2024	AL	18/02/2024

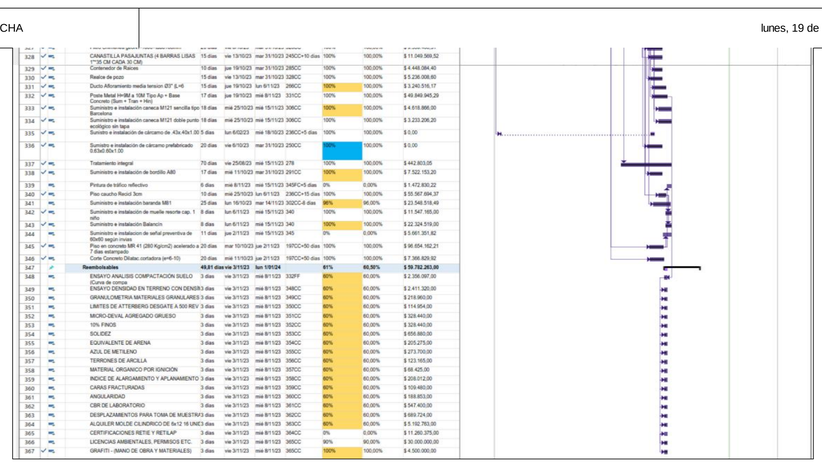

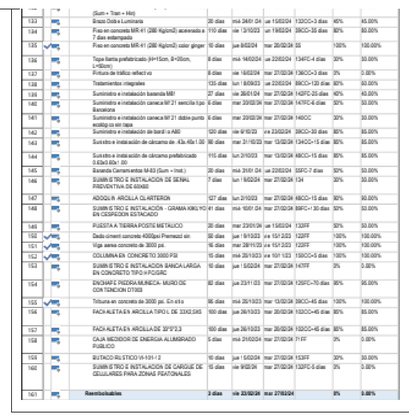

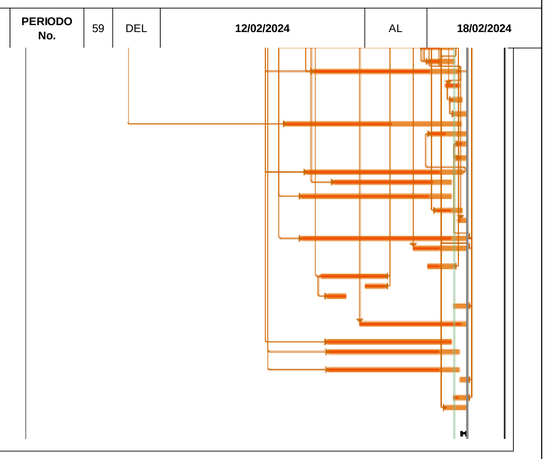

Relleno arena s/lav de peña cernida +trans relle, lijado y pintura verde en baranda M81 y cerramiento de cancha. Aseo y Limpieza, instalación de redes electricas, enchape con piedra laja en jardinera de los sectores 1, 2 y 3.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ARQ. DIANA M. AVENDAÑO B.

Armado de muro gavion arquitectonico, instalacion de enchape, vaciado de concreto en mirador pasarela, instalacion de adoquin cuarteron, instalacion de tuberia electrica, instalacion de barandas M81 y M83, instalacion de grama kikuyo, excavacion pára individuos arboreos.

SUPERVISOR DE APOYO DEL CONTRATO
ING WILSON RAMÍREZ
