1492

CS INFRA - CR

ACTA PARCIAL

INFORME ACTA PARCIAL No. 01

CONTRATO N°	358 de 2025

12. FILIACIÓN PERSONAL OBRA

NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE CEDULA	CARGO	IBC COTIZACION	RAZON SOCIAL	EPS	ARL	PENSION
JEFFERSON SMIT RIVERA VELASQUEZ	1090398681	DIRECTOR DE OBRA	1 SMMLV	CONSORCIO INFRA-CR	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR
JULIAN DAVID LERMA L	1121879078	RESIDENTE DE OBRA	1 SMMLV	CONSORCIO INFRA-CR	CAJA COOPI	SURA	PORVENIR
KELLY YOANA BARRERO	112080979	HSE	1 SMMLV	CONSORCIO INFRA-CR	SANITAS	SURA	COLPENSIONES
FAIBER SIERRA CASTRO	80775221	MAESTRO	1 SMMLV	CONSORCIO INFRA-CR	CONPESAR	SURA	COLPENSIONES
ANDREY SMITH SANABRIA REYES	1006797343	AYUDANTE	1 SMMLV	CONSORCIO INFRA-CR	FAMISAAR	SURA	PORVENIR
ALCIDES TOLOZA HOGUIN	7331263	AYUDANTE	1 SMMLV	CONSORCIO INFRA-CR	NUEVA EPS	SURA	PROTECCIO
JEAN CARLOS QUILLEN OSPINA	1080540101	AYUDANTE	1 SMMLV	CONSORCIO INFRA-CR	CAPITAL SALUD	SURA	PORVENIR
ARMANDO ROSALIO MACHACON CAMPOS	1043613351	AYUDANTE	1 SMMLV	CONSORCIO INFRA-CR	CAPITAL SALUD	SURA	PORVENIR
ADRIAN ALEXANDER VILLA BUZON	1003379713	AYUDANTE	1 SMMLV	CONSORCIO INFRA-CR	CAPITAL SALUD	SURA	PORVENIR

CS INFRA - CR

ACTA PARCIAL

INFORME ACTA PARCIAL No. 01

CONTRATO N°	358 de 2025

12.1 GESTION SOCIAL

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	17
Empleos directos generados:	14
Empleos indirectos generados:	3

12.2 CLASIFICACIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS EMPLEOS GENERADOS

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	20 a 59 años	-
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	-
Grupos étnicos	Población Indígena	-
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	-
Género	Masculino	13
Género	Femenino	2
Población Vulnerable	Desplazados	1
Población Vulnerable	Discapacitados	1
Población Vulnerable	Victimas	-
Total		16

13 ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DÍAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

CS INFRA - CR

NIT 902 006 911-4

ACTA N°1

INFORME ACTA PARCIAL No. 01

CONTRATO N°	358 de 2025

	SUB TOTAL						**$ 31.110.252,31**
5,1	DESMONTE DE UNA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA, TUBERIAS ELECTRICAS, CAJAS Y CABLEADO DETERIORADO A UNA AL TURA DE 8 MTS	M2	453,70	$ 60.005,00	$27,677,968,50	453,70	$27,677,968,50
	SUB TOTAL						**$ 27,677,968,50**
6,1	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	355,30	$25,547,00	$9,076,849,10	310,11	$7.922.380,17
6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 250C CAL. 26 PREPINTADA. INCLUYE ICOPOR O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	355,30	$274,523,00	$97.538.021,90	310,11	$85.132.327,53
6,3	LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET INCLUYE RETIRO DE MANTO AFECTADO	M2	185,00	$ 12.709,00	$ 2.351.165,00	125,00	$ 1.588.625,00
6,4	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE (REPINTAR, RESOLDAR, ACONDICIONAR ELEMENTOS EXISTENTES)	M2	355,30	$172,408,00	$61.256.562,40	310,11	$53.465.444,88
6,5	DEMOLICION MANUAL MORTERO PISO 0.05 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	60	$5.011,00	300.660,00	50	$250.550,00

CS INFRA - CR

ACTA PARCIAL

INFORME ACTA PARCIAL No. 01

CONTRATO N°	358 de 2025

14 ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA

CONDICIONES INICIALES						PRESENTE ACTA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR/UNITARIO	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
	PRELIMINARES						
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	660,3	$ 4.229,00	$ 2.792.408,70	660,3	$ 2.792.408,70
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2,10M ESTRUCTURA MADERA COMUN BASES EN CONCRETO 2000PSI	ML	10.85	$ 80,905.00	$ 877,819.25	10.85	$ 877,819.25
	SUB TOTAL PRELIMINARES						**$ 3.670.227,95**
2.1	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL ALTURA MAYOR A 3M. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE	m2	116.976	$ 16,091.00	$ 1,882,260.82	70.27	$ 1,130.714,57

CS INFRA - CR

NIT 902 006 611-4

ACTA PARCIAL

INFORME ACTA PARCIAL No. 01

CONTRATO N°	358 de 2025

2.2	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	m2	28.94	$ 29,063.00	$ 841,083.22	20	$ 581,160.00
2.3	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	20	$ 43,092.00	$ 861,840.00	20.00	$ 861,840.00
2.4	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O ALMACENAMIENTO.	UND	7	$ 40,086.00	$ 280,602.00	7.00	$ 280,602.00
2.5	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O ALMACENAMIENTO. CARGUE MANUAL	Und	8	$ 50,107.00	$ 400,856.00	7.00	$ 350,749.00
2.6	DEMOLICION MUROS SOPORTE LAVAMANOS	UND	4	$ 133,937.00	$ 535,748.00	4.00	$ 535,748.00
2.7	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	19.20	$ 19,211.00	$ 368,851.20	19.20	$ 368,851.20

CS INFRA - CR

NIT 902.006.911-4

ACTA PARCIAL

INFORME ACTA PARCIAL No. 01

CONTRATO N°	358 de 2025

2.8	DESMONTE DE LUMINARIAS DE CIELO RASO. INCLUYE TRASLADO HASTA PUNTO DE ACOPIO ALTURA MAYOR 3,00M HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	UND	25	$ 14,124.00	$ 353,100.00	25	$ 353,100.00
2.9	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND	9	$ 107,750.00	$ 969,750.00	5	$ 538.750.00
2.18	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	7,16	$ 69,660	$ 498,417.30	3,98	$ 277.246,80
2.19	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	14,31	$ 33.372,00	$ 477.553,32	10	$ 333.120,00
2.20	ESTUCO PLASTICO	M2	14,31	$ 21.624,00	$ 309.439,44	10	$ 216.240,00

CS INFRA - CR

ACTA PARCIAL

INFORME ACTA PARCIAL No. 01

CONTRATO N°	358 de 2025

	SUB TOTAL						**$ 5.828.821,57**
3.1	DESMONTE DE LUMINARIAS DE CIELO RASO EN AUDITORIO Y REJILLAS DE VENTILACION. INCLUYE TRASLADO HASTA PUNTO DE ACOPIO ALTURA MAYOR A 3M	Und	30.00	$ 14,124.00	$ 423,720.00	30	$ 423,720.00
3.2	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL, ALTURA MAYOR A 4M CON APOYO EN SUPERFICIE ESCALONADA - INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	338.20	$ 30,414.00	$ 10,286,014.80	194,61	$ 5.918.866,54
3.3	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL, AILTURA HASTA 3M CON APOYO EN SUPERFICIE ESCALONADA - INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	115.50	$ 10,514.00	$ 1,214,367.00	115.50	$ 1,214,367.00
3.4	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y PARED EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	16.43	$ 18,051.00	$ 296,650.13	11,27	$ 203.434.77
3.16	DESMONTE Y RETIRO DE SILLAS EXISTENTES	UND	466.00	$ 50,107.00	$ 23,349,862.00	466	$ 23,349,862.00

CS INFRA - CR

ACTA N°1

INFORME ACTA PARCIAL No. 01

CONTRATO N°	358 de 2025

6,12	PERFIL RECTAN 120X60X2.5 MM ASTM A-500	M2	128,59	$118,304,00	$15.212.119,84	120	$ 14.195.480,00
8.1	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	88	$281.657,00	$24.785.816,00	40	$11.266.280,00
	SUB TOTAL						

VALOR COSTO DIRECTO DEL CONTRATO	$1,765,022,954.19		$ 184,816,303,75
ADMINISTRACION (26%)	$ 458,905,968.09		$ 48,052,238,97
IMPREVISTOS (1%)	$ 17,650,229.54		$ 1,848,163,04
UTILIDADES (4%)	$ 70,600,918.17		$7,392,652,15
TOTAL AIU	$ 547,157,115.80		$ 57,293,054,16
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,312,180,070.00		$ 242,109,357.91
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 30%	$ 693,654,021.00		

1480

CS INFRA - CR
NIT 902 006 911-4

ACTA PARCIAL

INFORME ACTA PARCIAL No. 01

CONTRATO N°	358 de 2025

15 PROGRAMACION SEMANALPERIODO DEL 13 FEBRERO AL 12 DE MAYO

PROGRAMACION SEMANAL DE OBRA			
SEMANA: 16 AL 21 DE MARZO DE 2026			
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TEATRO MAYOR JOSITA HOYOS DE MEJIA DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO			
CONTRATISTA: CS INFRA-CR			
Dia	Ítem	Actividad Programada	Descripción Técnica
Lunes 16	3.2	Desmonte de cielo raso en sistema liviano	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL, ALTURA MAYOR A 4M CON APOYO EN SUPERFICIE ESCALONADA - INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
Martes 17	3.2	Desmonte de cielo raso en sistema liviano	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL, ALTURA MAYOR A 4M CON APOYO EN SUPERFICIE ESCALONADA - INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
Miércoles 18	3.2	Retiro de frescasa	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL, ALTURA MAYOR A 4M CON APOYO EN SUPERFICIE ESCALONADA - INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
Jueves 19	3.2	Retiro de frescasa y limpieza	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL, ALTURA MAYOR A 4M CON APOYO EN SUPERFICIE ESCALONADA - INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
Viernes 20	3.3	Desmonte de cielo raso en sistema liviano, área Tarima principal	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL, ALTURA HASTA 3M CON APOYO EN SUPERFICIE ESCALONADA - INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
Sábado 21	3.3	Desmonte de cielo raso en sistema liviano, área Tarima principal	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL, ALTURA HASTA 3M CON APOYO EN SUPERFICIE ESCALONADA - INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO

OBSERVACIONES TECNICAS
• Las actividades programadas corresponden a trabajos preliminares y adecuaciones en el área del teatro. • El material desmontado será retirado y dispuesto conforme a las normas vigentes. • La programación podrá ajustarse según condiciones propias de la obra. • El personal será asignado de acuerdo con los rendimientos de obra.

220

CS INFRA - CR
NIT 902 006 611 - 8

ACTA PARCIAL

INFORME ACTA PARCIAL No. 01

CONTRATO N°	358 de 2025

PROGRAMACION SEMANAL DE OBRA			
SEMANA: 23 AL 28 DE MARZO DE 2026			
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TEATRO MAYOR ROSITA HOYOS DE MEJIA DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO			
CONTRATISTA: CS INFRA-CR			
Dia	Item	Actividad Programada	Descripción Técnica
Lunes 23			FESTIVO
Martes 24	3.3	Desmonte de cielo raso en sistema liviano, área Tarima principal	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL, ALTURA HASTA 3M CON APOYO EN SUPERFICIE ESCALONADA - INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
Miércoles 25	3.2	Retiro de Perfileria en aluminio y lámparas cuadradas	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL, ALTURA MAYOR A 4M CON APOYO EN SUPERFICIE ESCALONADA - INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
Jueves 26	3.2	Retiro de Perfileria en aluminio y lámparas cuadradas	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL, ALTURA MAYOR A 4M CON APOYO EN SUPERFICIE ESCALONADA - INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
Viernes 27	3.2	Retiro de Perfileria en aluminio y lámparas cuadradas	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL, ALTURA MAYOR A 4M CON APOYO EN SUPERFICIE ESCALONADA - INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
Sábado 28	3.2	Retiro de Perfileria en aluminio y lámparas cuadradas	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL, ALTURA MAYOR A 4M CON APOYO EN SUPERFICIE ESCALONADA - INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO

OBSERVACIOES TECNICAS
• Las actividades programadas corresponden a trabajos preliminares y adecuaciones en el área del teatro. ➢ El material desmontado será retirado y dispuesto conforme a las normas vigentes. ➢ La programación podrá ajustarse segun condiciones propias de la obra. ➢ El personal será asignado de acuerdo con los rendimientos de obra.

PROGRAMACION SEMANAL DE OBRA			
SEMANA: 30 MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2026			
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TEATRO MAYOR ROSITA HOYOS DE MEJIA DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO			
CONTRATISTA: CS INFRA-CR			
Dia	Item	Actividad Programada	Descripción Técnica
Lunes 30	2.7	Demolicion muro soporte área proyección cuarto cine	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
Martes 31	3.3	Desmonte de cielo raso en sistema liviano, área Tarima principal	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL, ALTURA HASTA 3M CON APOYO EN SUPERFICIE ESCALONADA - INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
Miércoles 1		Limpieza y aseo general	Limpieza y aseo general
Jueves 2	—	—	festivo
Viernes 3	—	—	festivo
Sábado 4	—	—	No se laboro

OBSERVACIOES TECNICAS
• Las actividades programadas corresponden a trabajos preliminares y adecuaciones en el área del teatro. ➢ El material desmontado será retirado y dispuesto conforme a las normas vigentes. ➢ La programación podrá ajustarse segun condiciones propias de la obra. ➢ El personal será asignado de acuerdo con los rendimientos de obra.

CS INFRA - CR

ACTA PARCIAL

INFORME ACTA PARCIAL No. 01

CONTRATO N°	358 de 2025

PROGRAMACION SEMANAL DE OBRA			
SEMANA: 06 ABRIL AL 11 DE ABRIL DE 2026			
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TEATRO MAIPORE ROSITA HOYOS DE MEJIA DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO			
CONTRATISTA: CS INFRA-CR			
Dia	Item	Actividad Programada	Descripción Técnica
Lunes 6	6.1	Retiro de material	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES
Martes 7	6.1	Retiro de material	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES
Miércoles 8	6.1	Retiro de material	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES
Jueves 9	6.1	Retiro de material	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES
Viernes 10	6.1	Inicio de desmonte de la cubierta	DESMONTE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
Sábado 11	6.1	Inicio de desmonte de la cubierta	DESMONTE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO

OBSERVACIONES TÉCNICAS
• Las actividades programadas corresponden a trabajos preliminares y adecuaciones en el área del teatro. • El material desmontado será retirado y dispuesto conforme a las normas vigentes. • La programación podrá ajustarse según condiciones propias de la obra. • El personal será asignado de acuerdo con los rendimientos de obra.

PROGRAMACION SEMANAL DE OBRA			
SEMANA: 13 ABRIL AL 18 DE ABRIL DE 2026			
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TEATRO MAIPORE ROSITA HOYOS DE MEJIA DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO			
CONTRATISTA: CS INFRA-CR			
Dia	Item	Actividad Programada	Descripción Técnica
Lunes 13		-	NO DE LABORO
Martes 14		-	NO DE LABORO
Miércoles 15	6.1	-	NO DE LABORO
Jueves 16	6.1	Retiro de material	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES
Viernes 17	6.1	Retiro de material	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES
Sabado 18	6.1	Retiro de material	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES

OBSERVACIONES TÉCNICAS
• Las actividades programadas corresponden a trabajos preliminares y adecuaciones en el área del teatro. • El material desmontado será retirado y dispuesto conforme a las normas vigentes. • La programación podrá ajustarse según condiciones propias de la obra. • El personal será asignado de acuerdo con los rendimientos de obra.

CS INFRA - CR

NIT 902 006 911-4

ACTA PARCIAL

INFORME ACTA PARCIAL No. 01

CONTRATO N°	358 de 2025

PROGRAMACION SEMANAL DE OBRA			
SEMANA: 20 ABRIL AL 25 DE ABRIL DE 2026			
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TEATRO MAYOR ROSITA HOYOS DE MEJIA DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO			
CONTRATISTA: CS INFRA-CR			
Dia	Item	Actividad Programada	Descripción Técnica
Lunes 20	6.1	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
Martes 21	6.1	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
Miercoles 22	6.1	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
Jueves 23	6.1	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
Viernes 24	6.1	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
Sábado 25	6.1	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO

OBSERVACIONES TECNICAS
• Las actividades programadas corresponden a trabajos preliminares y adecuaciones en el área del teatro. • El material desmontado será retirado y dispuesto conforme a las normas vigentes. • La programación podrá ajustarse según condiciones propias de la obra. • El personal será asignado de acuerdo con los rendimientos de obra.

PROGRAMACION SEMANAL DE OBRA			
SEMANA: 27 ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2026			
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TEATRO MAYOR ROSITA HOYOS DE MEJIA DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO			
CONTRATISTA: CS INFRA-CR			
Dia	Item	Actividad Programada	Descripción Técnica
Lunes 27	6.4	MANTENIMIENTO GENERAL ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LA CUBIERTA	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE (REPINTAR, RESOLDAR, ACONDICIONAR ELEMENTOS EXISTENTES)
Martes 28	6.4	MANTENIMIENTO GENERAL ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LA CUBIERTA	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE (REPINTAR, RESOLDAR, ACONDICIONAR ELEMENTOS EXISTENTES)
Miercoles 29	6.4	MANTENIMIENTO GENERAL ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LA CUBIERTA	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE (REPINTAR, RESOLDAR, ACONDICIONAR ELEMENTOS EXISTENTES)
Jueves 30	6.4	MANTENIMIENTO GENERAL ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LA CUBIERTA	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE (REPINTAR, RESOLDAR, ACONDICIONAR ELEMENTOS EXISTENTES)
Viernes 1	6.4	MANTENIMIENTO GENERAL ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LA CUBIERTA	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE (REPINTAR, RESOLDAR, ACONDICIONAR ELEMENTOS EXISTENTES)
Sábado 2	6.4	MANTENIMIENTO GENERAL ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LA CUBIERTA	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE (REPINTAR, RESOLDAR, ACONDICIONAR ELEMENTOS EXISTENTES)

OBSERVACIONES TECNICAS
• Las actividades programadas corresponden a trabajos preliminares y adecuaciones en el área del teatro. • El material desmontado será retirado y dispuesto conforme a las normas vigentes. • La programación podrá ajustarse según condiciones propias de la obra. • El personal será asignado de acuerdo con los rendimientos de obra.

1184

CS INFRA - CR
NIT 902 006 911 4

ACTA PARCIAL

INFORME ACTA PARCIAL No. 01

CONTRATO N°	358 de 2025

PROGRAMACION SEMANAL DE OBRA			
SEMANA: 04 MAYO AL 09 DE MAYO DE 2026			
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TEATRO MAYORE ROSITA HOYOS DE MEJIA DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO			
CONTRATISTA: CS INFRA-CR			
Día	Ítem	Actividad Programada	Descripción Técnica
Lunes 04	6.4	MANTENIMIENTO GENERAL ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LA CUBIERTA	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE (REPINTAR, RESOLDAR, ACONDICIONAR ELEMENTOS EXISTENTES)
Martes 05	6.4	MANTENIMIENTO GENERAL ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LA CUBIERTA	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE (REPINTAR, RESOLDAR, ACONDICIONAR ELEMENTOS EXISTENTES)
Miércoles 06	6.2	INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 250C CAL	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TIPO SANDWICH 250C CAL 26 PREPINTADA. INCLUYE ICOPOR O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA
Jueves 07	6.4	MANTENIMIENTO GENERAL ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LA CUBIERTA	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE (REPINTAR, RESOLDAR, ACONDICIONAR ELEMENTOS EXISTENTES)
Viernes 08	6.4	MANTENIMIENTO GENERAL ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LA CUBIERTA	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE (REPINTAR, RESOLDAR, ACONDICIONAR ELEMENTOS EXISTENTES)
Sábado 09	6.2	INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 250C CAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 250C CAL 26 PREPINTADA. INCLUYE ICOPOR O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA

OBSERVACIONES TÉCNICAS
• Las actividades programadas corresponden a trabajos preliminares y adecuaciones en el área del teatro. • El material desmontado será retirado y dispuesto conforme a las normas vigentes. • La programación podrá ajustarse según condiciones propias de la obra. • El personal será asignado de acuerdo con los rendimientos de obra.

CS INFRA - CR

ACTA PARCIAL

INFORME ACTA PARCIAL No. 01

CONTRATO N°	358 de 2025

16 CONTROL DE POLIZAS OBRA

PÓLIZA DE CONFORMIDAD SEGÚN FIRMA DE CONTRATO DE OBRA			
Póliza de Cumplimiento N°	**400070374**		
Expedida por:	NACIONAL DE SEGUROS		
Fecha de expedición:	18 Febrero 2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**$ ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento Del Contrato	13/02/2026	12/12/2026	$ 490.359.811,40
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales	13/02/2026	12/08/2029	$ 122.589.952,85
Buen Manejo Y Correcta Inversion Del Anticipo	13/02/2026	12/12/2026	$735.539.717,10
Estabilidad De La Obra	12/08/2026	12/08/2031	$ 490.359.811,40

PÓLIZA DE CONFORMIDAD SEGÚN FIRMA DE CONTRATO DE OBRA			
Póliza de Cumplimiento	**400070375**		
Expedida por:	NACIONAL DE SEGUROS		
Fecha de expedición:	18 Febrero 2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**$ ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Predios, Labores Y Operaciones-Plo	13/02/2026	12/08/2026	525.285.000
Contratistas Y Subcontratistas	13/02/2026	12/08/2026	525.285.000
Perjuicios Extrapatrimoniales	13/02/2026	12/08/2026	525.285.000
Responsabilidad civil patronal	13/02/2026	12/08/2026	525.285.000
Responsabilidad Civil Cruzada	13/02/2026	12/08/2026	525.285.000
Vehiculos propios y no propios	13/02/2026	12/08/2026	525.285.000

CS INFRA - CR

NIT 902 006 911-4

ACTA PARCIAL

INFORME ACTA PARCIAL No. 01

CONTRATO N°	358 de 2025

17 REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO COMITÉ N 8





REGISTRO FOTOGRAFICO COMITÉ N 9



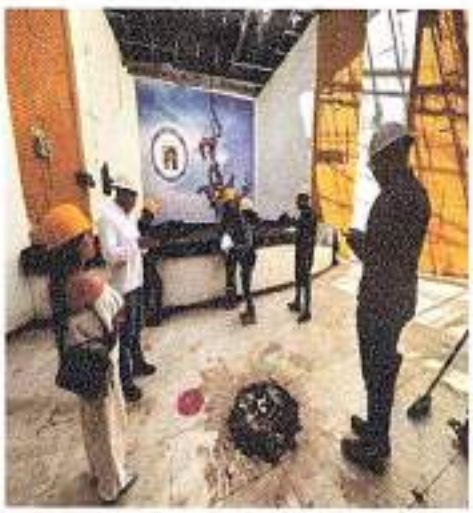

CS INFRA - CR

NIT 902 006 911-4

ACTA PARCIAL

INFORME ACTA PARCIAL No. 01

CONTRATO N°	358 de 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO COMITE N 10





REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRA





CS INFRA - CR

NIT 902 006 511-4

ACTA PARCIAL

INFORME ACTA PARCIAL No. 01

CONTRATO N°	358 de 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRA





REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRA





CS INFRA - CR

NIT 902 006 011-4

ACTA PARCIAL

INFORME ACTA PARCIAL No. 01

CONTRATO N°	358 de 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRA





RESGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRA





CS INFRA - CR
NIT 902 006 911-4

ACTA N°1

INFORME ACTA PARCIAL No. 01

CONTRATO N°	358 de 2025

18 INFORME FINANCIERO

Durante el periodo comprendido entre el 13 de ABRIL y el 31 de MAYO , se adelantaron actividades administrativas orientadas a la revisión, ajuste y radicación de los formatos requeridos para la gestión de desembolsos ante la fiducia.

Estas gestiones se realizaron con el fin de asegurar la disponibilidad de recursos necesarios para la ejecución de las actividades programadas.

	VALOR PROYECTO	$ 2,312,180,070.00 M/CTE

FECHA	% EJECUTADO DEL 13 ABRIL AL 12 MAYO	VALOR EJECUTADO DEL PERIDO	AMORTIZACIÓN	NETO	ACUMULADO EJECUTADO	
					$	%
13 ABRIL al 12 de MAYO	10,47 %	$ 242.109.357,91	$72.632.807,37	$ 169,476,550,54	$ 242,109.357,91	10,47%

CS INFRA - CR
NIT 902 006 811 4

ACTA PARCIAL

INFORME ACTA PARCIAL No. 01

CONTRATO N°	358 de 2025

19 RELACION DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD (RP)

En el presente informe mensual se informa que se cuenta con dos (2) registros presupuestales vigentes, los cuales respaldan la disponibilidad de recursos para la ejecución de las actividades del periodo. Estos documentos se anexan como soporte del presente informe.

Usuario: MSUAREZ

CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

REGISTRO PRESUPUESTAL No.1128
30 de Diciembre de 2025

Sec: [illegible]

Concepto:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TEATRO MAIPORE - RONDA HOYOS DE MEJIA DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO SEGUN CONTRATO NRO 358 DE 2025 RESULTADO DEL PROCESO DE INVITACION PUBLICA SMVLP-001-2025
VALOR CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2025 $ 3.500.000.000
VALOR CORRESPONDIENTE VIGENCIA 2026 $ 951.799.857
ADJUDICACION SEGUN ACTA [illegible]
Tercero Contratista: [illegible]

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	Valor
2 3 2 02 02 005 2 33 3501 1601 2024000000233 124305	SEPULBRE INVERSION - PY ADECUACION E INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL ARTISTICA Y PATRIMONIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	$0.000.000.00
3 3 3 02 02 005 3 33 3501 1601 2024000000033 133320	R.B. ESTAMPILLA PROCULTURA - PY ADECUACION E INTERVENCION DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL ARTISTICA Y PATRIMONIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	$1,499,000,000.00

Son:
UN MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS

Total: $1,500,000,000.00

JUAN GUILLERMO ARCINIEGAS GALINDO
TESORERO

1492

CS INFRA - CR

NIT 902 006 911 - 4

ACTA PARCIAL

INFORME ACTA PARCIAL No. 01

CONTRATO N°	358 de 2025

Usuario : MSUAREZ

CORCUMVI **CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO**

REGISTRO PRESUPUESTAL No.2

2 de Enero de 2026

Nit: 822001245

Concepto:
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TEATRO MAIPORÉ - ROSITA HOYOS DE MEJIA DE LA CIUDAD DE V-ILLAVICENCIO SEGUN CONTRAO NRO 358 DE 2025.

Tercero\Contratista: **902006911 CONSORCIO INFRA - CR**

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	Valor
2.3.2.02.02.006.2.33.3301.1603.20240506001033I.124303	SGP LIBRE INVERSIÓN - PY ADECUACIÓN E INTERVENCIÓN D E LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL ARTISTICA Y PATRIMON-IAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	$812,180,070.00

Son: **Total:** **$812,180,070.00**

OCHOCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETENTA PESOS

JUAN GUILLERMO ARCINIEGAS GALINDO
TESORERO

732

CS INFRA - CR

ACTA PARCIAL

INFORME ACTA PARCIAL No. 01

CONTRATO N°	**358 de 2025**

20 CONCLUSIONES

Durante el periodo evaluado se ejecutaron las actividades correspondientes a la primera fase de adecuación y mejoramiento del Teatro Rosita Hoyos, cumpliendo con los procedimientos técnicos, de calidad y seguridad establecidos contractualmente.

La ejecución de obra durante los cuatro meses reportados presentó los siguientes avances porcentuales:

- Mes 1: 1,38%
- Mes 2: 0,34%
- Mes 3: 8,15%
- Mes 4: 0,60%

Lo anterior representa un avance acumulado del 10,47% del total contractual, correspondiente principalmente a actividades preliminares, desmontes, adecuaciones locativas, mantenimiento de elementos arquitectónicos existentes y preparación de áreas para las etapas posteriores del proyecto.

El mayor porcentaje de ejecución se registró durante el tercer mes, periodo en el cual se concentró la mayor cantidad de actividades constructivas y de adecuación programadas. Los demás períodos correspondieron principalmente a labores de organización, desmontes especializados, suministro de materiales y actividades complementarias necesarias para garantizar la correcta continuidad de las obras.

Las actividades ejecutadas fueron verificadas en campo y cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, permitiendo evidenciar un avance satisfactorio dentro de la programación prevista para esta etapa del proyecto. Asimismo, se cuenta con las condiciones técnicas y operativas necesarias para continuar con la ejecución de las actividades programadas en las siguientes fases, orientadas al mejoramiento integral de la infraestructura del Teatro Rosita Hoyos.

Firma

Nombre: JEFFERSON RIVERA VELASQUEZ

DIRECTOR DE OBRA

N° Matrícula Profesional: 54202-318756 CND

Firma

Nombre: JULIAN DAVID LERMA LEYTON

RESIDENTE DE OBRA

N° Matricula Profesional: 091037-0532539 CND

1494

CS INFRA - CR

Kelly B

INFORME N °1 SISO ACTA PARCIAL

Cra 10 # 20-19 piso 10, Bogotá D.C – Colombia
Cel. .324 626 95 76
email: cs.infracr@gmail.com

234

1495

CS INFRA - CR	CONSORCIO CS INFRA – CR	
	INFORME SEGURIDAD	Y SALUD EN EL TRABAJO
	CODIGO: SG-SST-IN-001	VERSION 01

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El consorcio infra -cr , dentro de su marco de Actividades se dedica a la edificación de obras civiles. El presente informe se realiza con el fin de dar a conocer, la gestión realizada durante el periodo correspondiente en materia de seguridad y salud en el trabajo, las cuales son registradas, en función al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, permitiendo optimizar las acciones preventivas durante la jornada laboral.

Observamos que se hicieron charlas de sst,ubicación de señalización en el teatro ,extintor y elementos de brigada de emergencia ,cada viernes se inicia el comité con la parte de interventoría ,acompañamiento de seguridad y salud en el trabajo da a conocer la importancia de las charlas diarias realizadas a nuestro personal ,la importancia del uso de epps durante la obra .

ELABORO:	REVISO:	APROBO :
YOANA RODRIGUEZ	CONSORCIO CS INFRA	REPRESENTANTE

235

CS INFRA - CR	CONSORCIO CS INFRA – CR	
	INFORME SEGURIDAD	Y SALUD EN EL TRABAJO
	CODIGO: SG-SST-IN-001	VERSION 01

En cumplimiento del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizaron diferentes actividades orientadas a promover la prevención de riesgos laborales, fortalecer la cultura de seguridad y garantizar el bienestar de los trabajadores.

Actividades Realizadas

Durante el periodo correspondiente se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- **Charlas de Seguridad:**
  Se realizaron charlas de sensibilización dirigidas a los trabajadores sobre temas relacionados con la prevención de accidentes laborales, uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y buenas prácticas en el lugar de trabajo.
- **Capacitación al Personal:**
  Se brindó orientación al personal sobre la importancia de mantener condiciones seguras en sus áreas de trabajo y reportar actos o condiciones inseguras.
- **Actividades de Prevención:**
  Se desarrollaron actividades enfocadas en la promoción de hábitos seguros, la identificación de riesgos y la importancia del autocuidado en el entorno laboral.
- **Participación** Las actividades contaron con la participación activa de los trabajadores, quienes demostraron interés en los temas tratados y en la aplicación de las medidas de seguridad en sus labores diarias.

CS INFRA - CR	CONSORCIO CS INFRA – CR	
	INFORME SEGURIDAD	Y SALUD EN EL TRABAJO
	CODIGO: SG-SST-IN-001	VERSION 01

Conclusión

Las charlas y actividades realizadas contribuyen al fortalecimiento de la cultura de prevención dentro de la empresa, promoviendo ambientes de trabajo más seguros y saludables para todos los colaboradores.

Podemos decir que en nuestra empresa Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es fundamental para garantizar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores dentro de la organización. Su objetivo principal es prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales y promover ambientes laborales seguros y saludables.

La implementación de actividades de SST permite identificar, evaluar y controlar los riesgos presentes en los lugares de trabajo, reduciendo la probabilidad de incidentes que puedan afectar la integridad de los trabajadores y el normal desarrollo de las actividades laborales.

Asimismo, la Seguridad y Salud en el Trabajo fomenta una cultura de prevención y autocuidado entre los colaboradores, fortaleciendo la responsabilidad individual y colectiva frente a los riesgos laborales.

La aplicación adecuada de las normas y medidas de SST también contribuye a mejorar la productividad, disminuir el ausentismo laboral y fortalecer el compromiso de los trabajadores con la organización.

En conclusión, la Seguridad y Salud en el Trabajo es un pilar esencial para el funcionamiento eficiente de cualquier empresa, ya que protege la vida y la salud de los trabajadores, al mismo tiempo que promueve un entorno laboral seguro, responsable y sostenible

Charlas sst

En nuestro inicio de obra damos charlas las cualesDurante la charla se explicó a los trabajadores:

- Importancia de los EPP en obra.
- Tipos de EPP utilizados en el proyecto (casco, guantes, botas de seguridad, gafas, arnés, etc.).
- Forma correcta de uso y mantenimiento.
- Riesgos de no utilizar los elementos de protección.
- Recomendaciones generales de seguridad.

La actividad se realizó mediante explicación verbal y demostración práctica del uso adecuado de los equipos.

Orden y Aseo en el Lugar de Trabajo

Objetivo:
Prevenir accidentes por caídas, golpes o tropiezos en la obra.

Temas tratados:

- Mantener pasillos y zonas de trabajo despejadas.
- Guardar herramientas después de usarlas.
- Retirar escombros y materiales sobrantes.
- Depositar residuos en los lugares asignados.

Observaciones
Un lugar limpio y ordenado reduce los accidentes.

CS INFRA - CR	CONSORCIO CS INFRA – CR	
	INFORME SEGURIDAD	Y SALUD EN EL TRABAJO
	CODIGO: SG-SST-IN-001	VERSION 01

Charla SST como Trabajo en Alturas

Objetivo:
Prevenir caidas durante actividades en altura.

Temas tratados:

- Uso obligatorio del arnés de seguridad.
- Verificación de líneas de vida y puntos de anclaje.
- No trabajar en alturas sin autorización.
- Revisar el estado de andamios y escaleras.

Observaciones :
Antes de subir, revisa tu equipo y asegura tu punto de anclaje.

Charla Uso Seguro de Herramientas
Evitar accidentes durante el uso de herramientas manuales y eléctricas.

Temas tratados:

- Revisar herramientas antes de utilizarlas.
- No usar herramientas dañadas.
- Utilizar el EPP adecuado.
- Guardar correctamente después del uso.

OBSERVACIONES:

Una herramienta en mal estado puede causar accidentes graves.

ELABORO:	REVISO:	APROBO :
YOANA RODRIGUEZ	CONSORCIO CS INFRA	REPRESENTANTE

Charla Prevención de Accidentes

Objetivo:
Promover la cultura de seguridad entre los trabajadores.

Temas tratados:

- Identificación de riesgos en la obra.
- Importancia de reportar actos y condiciones inseguras.
- Seguir los procedimientos de trabajo.
- Mantener comunicación con el supervisor.

Importancia de las charlas SST

Las charlas de seguridad son importantes porque:

- Ayudan a **prevenir accidentes laborales.**
- Promueven el **uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).**
- Informan sobre **riesgos específicos de cada actividad.**
- Fomentan una **cultura de seguridad en la empresa.**
- Permiten recordar **normas y procedimientos de trabajo seguro.**

Temas comunes en las charlas SST

Algunos temas que se tratan frecuentemente en estas charlas son:

- Uso correcto de los **elementos de protección personal (EPP).**
- Orden y aseo en el lugar de trabajo.
- Trabajo seguro en alturas.
- Uso adecuado de herramientas y maquinaria.
- Prevención de accidentes y reporte de condiciones inseguras.
- Manejo manual de cargas.

- Prevención de caídas, golpes o cortaduras.

En obra contamos con las siguientes herramientas de emergencia las cuales tenemos :

1. Extintores
Se utilizan para controlar o apagar incendios en su etapa inicial.

2. Botiquín de primeros auxilios
Contiene materiales básicos para atender lesiones leves como cortaduras, golpes o quemaduras.

3. Camillas o equipos de traslado
Se utilizan para movilizar de forma segura a una persona lesionada.

4. Señalización de emergencia
Indica rutas de evacuación, salidas de emergencia y ubicación de equipos de seguridad.

Nuestro equipo de trabajo conoce el equipo de emergencia que es una parte fundamental de la seguridad en el trabajo, **su ubicación y uso correcto** ya que en una situación de emergencia una respuesta rápida puede **salvar vidas y evitar consecuencias mayores**.

Tenemos cascos adicionales para nuestras visitas hacia el teatro protegiendo a nuestros visitantes de cualquier riesgo,

¿Por qué es importante usar casco en la obra?

El uso del casco es fundamental porque **la cabeza es una de las partes más vulnerables del cuerpo**. En una obra pueden ocurrir situaciones como caída de herramientas, materiales desde alturas o golpes contra estructuras, lo que puede causar lesiones graves si no se cuenta con la protección adecuada.

El uso de no utilizar el casco en obras no da los riesgos son:

Riesgos que previene el casco

El casco ayuda a prevenir:

- **Golpes en la cabeza** por objetos que caen.
- **Lesiones por choques** contra vigas, andamios o estructuras.
- **Accidentes durante trabajos en alturas.**
- **Posibles descargas eléctricas** en algunos tipos de cascos especiales.

Recomendaciones para el uso del casco

Para que el casco cumpla correctamente su función, se deben seguir algunas recomendaciones:

- Usarlo **siempre dentro de la obra**.
- Ajustarlo correctamente a la cabeza.
- Mantenerlo **limpio y en buen estado**.
- No perforarlo ni modificarlo.
- Reemplazarlo si presenta **grietas o daños**.

También contamos con un punto de hidratación en nuestra obra

Punto de hidratación en el lugar de trabajo

El **punto de hidratación** es un espacio destinado a que los trabajadores puedan **consumir agua potable durante la jornada laboral**, con el fin de mantener una adecuada hidratación y prevenir problemas de salud relacionados con el calor y el esfuerzo físico.

Importancia del punto de hidratación

En actividades como la construcción, donde los trabajadores realizan esfuerzo físico y muchas veces están expuestos al sol, es fundamental contar con puntos de hidratación porque:

- Ayudan a **prevenir la deshidratación**.
- Evitan **fatiga, mareos o golpes de calor**.
- Permiten mantener **el rendimiento y la concentración en el trabajo**.

Importancia de la señalización en el lugar de trabajo

La **señalización** en una obra o lugar de trabajo es un conjunto de señales, avisos y símbolos que se utilizan para **informar, advertir y orientar a los trabajadores sobre los riesgos presentes y las normas de seguridad que deben seguir**.

Importancia de la señalización

La señalización es muy importante porque:

- **Previene accidentes laborales**.
- Advierte sobre **peligros o riesgos en determinadas áreas**.
- Indica **rutas de evacuación y salidas de emergencia**.
- Señala la **ubicación de equipos de emergencia**, como extintores o botiquines.
- Ayuda a mantener **orden y seguridad dentro de la obra**.

- **Tipos de señalización**

- En los lugares de trabajo existen diferentes tipos de señales de seguridad:

- **Señales de advertencia**
  Alertan sobre posibles peligros, como riesgo eléctrico, caída de objetos o maquinaria en movimiento.

- **Señales de obligación**
  Indican acciones que se deben cumplir, por ejemplo: uso obligatorio de casco, guantes o gafas de seguridad.

- **Señales de prohibición**
  Indican acciones que no están permitidas, como no fumar o no pasar.

- **Señales de emergencia**
  Indican rutas de evacuación, salidas de emergencia y ubicación de equipos de primeros auxilios.

Tambien contamos con arnés es un equipo que se coloca alrededor del **cuerpo, hombros y piernas del trabajador**, y se conecta a una **línea de vida o punto de anclaje**. De esta manera, si ocurre una caída, el arnés ayuda a detener al trabajador y reducir el impacto.

Importancia del uso del arnés

El uso del arnés es fundamental porque:

- **Previene caídas desde alturas**.
- Protege la **vida y la integridad del trabajador**.
- Permite realizar trabajos en lugares elevados con mayor seguridad.
- Es obligatorio en muchas actividades de construcción cuando se trabaja a más de cierta altura.

Los arneses son importantes porque ayudan a **sostener y proteger al trabajador en caso de una caída**. Cuando el arnés está correctamente colocado y conectado a una **línea de vida o punto de anclaje**, permite detener la caída y reducir el impacto, de acuerdo a nuestras charlas es muy importante utilizar arnés cuando iniciamos trabajo en alturas.

El uso del arnés es fundamental para la seguridad en trabajos en altura. Utilizarlo correctamente puede **evitar accidentes y salvar vidas**, por lo que todos los trabajadores deben usarlo siempre que la actividad lo requiera.

Importancia del uso de EPP en obra

Los **EPP (Elementos de Protección Personal)** son equipos o dispositivos diseñados para **proteger al trabajador de riesgos laborales que puedan causar lesiones o enfermedades**. En una obra de construcción, donde hay maquinaria, alturas, herramientas y materiales peligrosos, el uso de EPP es **fundamental para la seguridad y la salud de los trabajadores**.

¿Por qué es importante usar EPP?

El uso adecuado de los EPP ayuda a:

- **Prevenir accidentes y lesiones** (golpes, cortes, caídas, quemaduras, descargas eléctricas).
- **Proteger la salud del trabajador** frente a riesgos físicos, químicos o biológicos.
- **Reducir la gravedad de los accidentes** si estos ocurren.
- **Cumplir con la normativa de seguridad y salud en el trabajo**, evitando sanciones.

Supervisamos que nuestro personal tenga los EPPS adecuados para cada actividad realizada para uso de protección de cada uno.

Disposición final de residuos

Contamos con disposición final de RCD y residuos sólidos ordinarios ,en el desarrollo de la obra se llevó a cabo la adecuada gestión y disposición final de los residuos sólidos generados, así como de los residuos de construcción y demolición (RCD), cumpliendo con la normativa ambiental vigente.

Los residuos sólidos ordinarios fueron clasificados en la fuente correspondiente en este caso BIOAGRICOLA , para posteriormente ser entregados al servicio autorizado de recolección.

Por su parte, los residuos de construcción y demolición (RCD), tales como escombros, restos de concreto, fueron acopiados de manera organizada dentro del área de la obra. Posteriormente, estos residuos fueron transportados por un gestor autorizado hacia sitios de disposición, Con estas acciones se asegura una correcta gestión ambiental de los residuos generados durante la ejecución del proyecto, minimizando impactos negativos al entorno.

1509

CS INFRA - CR	Sistema de Gestión de la Seguridad & Salud en el Trabajo NIVEL 7: FORMATOS N°:01 FT-SST-081 (✓) SG-SST	
FORMATO BRIGADA DE AVISO Y CONTROL		Fecha: FEBRERO 2025 Versión: 1
Aprobado por: SST	Autorizado por: Gerente General	Página 1 de 2

BRIGADA DE AVISO Y CONTROL





OBJETIVO

Difundir la activación de la alarma de acuerdo a la emergencia presentada, dirigir a todo el personal presente en el campo base hacia el punto de reunión al momento de la activación de la alarma, controlar y verificar que todo el personal sea informado del evento.

GENERALIDADES

La operatividad de los planes de contingencia para los diferentes eventos, debe ser conocida por todo el personal, soportada por la Brigada de aviso y control, quienes tendrán a su cargo la divulgación del evento que generó la emergencia.

FUNCIONES

CS INFRA - CR	CONSORCIO CS INFRA – CR	
	INFORME SEGURIDAD	Y SALUD EN EL TRABAJO
	CODIGO: SG-SST-IN-001	VERSION 01

Información de seguridad y salud en el trabajo en nuestra obra

Se hace una cartelera informativa para dar a conocer a nuestro personal la importancia de seguridad y salud en el trabajo Durante la ejecución de la obra, se dispuso una cartelera informativa de Seguridad y Salud en el Trabajo en un punto estratégico de alta visibilidad para todo el personal, como el área de ingreso o zona de circulación principal.

La cartelera fue diseñada con el propósito de divulgar información relevante en materia de prevención, promoviendo conductas seguras entre los trabajadores.

*Identificación de riesgos presentes en la obra

* Uso obligatorio de elementos de protección personal (EPP)

*Recomendaciones y campañas de prevención

La información fue organizada de manera clara, visual y de fácil comprensión, utilizando avisos, gráficos y señalización adecuada.
Se estableció la actualización periódica del contenido para garantizar su vigencia y utilidad, La cartelera informativa de Seguridad y Salud en el Trabajo constituye una herramienta efectiva para fortalecer la gestión preventiva en la obra, contribuyendo a la reducción de incidentes y al bienestar de los trabajadores.

ELABORO: YOANA RODRIGUEZ	REVISO: CONSORCIO CS INFRA	APROBO : REPRESENTANTE

CS INFRA - CR	Sistema de Gestión de la Seguridad & Salud en el Trabajo NIVEL 7: FORMATOS N°:01 FT-SST-081 ☑ SG-SST	
FORMATO BRIGADA DE AVISO Y CONTROL		Fecha: FEBRERO 2026 Versión: 1
Aprobado por: SST	Autorizado por: Gerente General	Página 2 de 2

El personal integrante de la Brigada de Aviso y Control, en cabezada por el encargado de la empresa, se encargara de corroborar que todo el personal conozca los diferentes sonidos y significados de la alarma y realizar el inventario de personal una vez estén en el punto de encuentro:

Los integrantes de la brigada se pondrán a disposición del responsable en SST para continuar con el soporte del inventario y evaluación de la emergencia hasta que se dé la orden de desactivación de la alarma y terminación del evento.

PERSONAL DE AVISO Y CONTROL

Todo el personal del grupo, tanto administrativos u operativos recibirán información del instructivo en los diferentes sonidos de la alarma y vías de evacuación; Se les instruirá sobre cómo se realiza el inventario de personal en este tipo de emergencia.

Todo el personal integrante de la brigada de aviso y control, recibirá instrucción básica previa sobre sus roles y responsabilidades para actuar de forma eficiente y eficaz.

Integrantes:

1	Faiber Sierra Castro	
2	Andrey Smith Sandrio R	
3		

1510

CS INFRA - CR	Sistema de Gestión de la Seguridad & Salud en el Trabajo NIVEL 7: FORMATOS N°:01 FT-SST-079 [✓] SG-SST	
FORMATO DE BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS		Fecha: FEBRERO 2025 Versión: 1
Aprobado por: SST	Autorizado por: Gerente General	Página 1 de 2 2

FORMATO DE BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS





OBJETIVO

Contar con un grupo de personas capacitadas para afrontar de manera adecuada cualquier emergencia médica, buscando salvaguardar la vida de los implicados.

GENERALIDADES

La operatividad del Plan MEDEVAC, debe ser conocida por todo el personal, soportado por la brigada de primeros auxilios, quienes tendrán a su cargo la prestación y soporte primario en primeros auxilios al lesionado o paciente.

FUNCIONES

Todo el personal integrante de la brigada de primeros auxilios junto a las demás personas, se reunirán en los sitios preestablecidos Punto de Reunión ubicado así:

Los integrantes de la brigada o cuadrilla de primeros auxilios se colocarán a disposición del Coordinador de SST, para recibir órdenes especificas y atender a los lesionados.

PERSONAL DE PRIMEROS AUXILIOS

250

CS INFRA - CR	Sistema de Gestión de la Seguridad & Salud en el Trabajo NIVEL 7: FORMATOS N°:01 FT-SST-079 SG-SST	
FORMATO DE BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS		Fecha: FEBRERO 2024 Versión: 1
Aprobado por: SST	Autorizado por: Gerente General	Página 2 de 2

Todo el personal del grupo, recibirán orientación sobre los principales aspectos en la prestación de los primeros auxilios.

Todo el personal integrante de la brigada de Primeros Auxilios recibirá instrucciones específicas previas para enfrentar de manera adecuada la emergencia médica.

INTEGRANTES:

1	Fáber Sierra Cosme	
2	Andrey Smith Sanabria R	
3		

CS INFRA - CR	Sistema de Gestión de la Seguridad & Salud en el Trabajo NIVEL 7: FORMATOS N°.01 FT-SST-080 [✓] SG-SST
FORMATO BRIGADA CONTRA INCENDIOS	Fecha: FT-SST-080 2020 Versión: 1
Aprobado por: SST	Autorizado por: Gerente General Página 1 de 2

FORMATO BRIGADA CONTRA INCENDIOS



OBJETIVO

Establecer procedimientos específicos para afrontar cualquier conato de incendio, buscando salvaguardar la vida de los trabajadores, los bienes de la empresa y proteger el Medio Ambiente.

GENERALIDADES

La operatividad del plan de contingencia para conatos de incendios, debe ser conocida por todo el personal, especialmente por el grupo contra incendios, quienes tendrán a su cargo la lucha primaria contra incendio. En caso que se presente un conato de incendio se activará la alarma de acuerdo al instructivo.

FUNCIONES

Todo el personal integrante de la brigada de Contra Incendios junto a las demás personas, se reunirán en los sitios preestablecidos Punto de Reunión ubicado así:

Los integrantes de la brigada o cuadrilla contra incendios realizarán la lucha primaria o avance para combatir el fuego. La brigada controlara la propagación si es posible, sin poner en peligro la vida de ninguna persona. En caso contrario se dará aviso a las autoridades y organismos competentes.

PERSONAL DE CONTRA INCENDIOS

CS INFRA - CR	Sistema de Gestión de la Seguridad & Salud en el Trabajo NIVEL 7: FORMATOS N°:01 FT-SST-000 ☑ SG-SST	
FORMATO BRIGADA CONTRA INCENDIOS		Fecha: FEBRERO 2025 Versión: 1
Aprobado por: SST	Autorizado por: Gerente General	Página 2 de 2

Todo el personal recibirá orientación sobre los principales aspectos en la lucha contra incendio.

Todo el personal integrante de la cuadrilla contra incendio será capacitado previamente para actuar de la manera más adecuada ante dicho evento.

Integrantes:

1	Fabio Sierra Castro	[signature]
2	Anket Smith Sanabria	[signature]
3		

1514

CS INFRA - CR

HOJA DE VIDA BRIGADISTA

CÓDIGO	FO-SST-PO-04
VERSIÓN	1
FECHA	27/02/25
PÁGINA	1 DE 1

Fecha de Solicitud de Ingreso	DD	2	MM	3	AAAA	2026

1. Datos laborales del Candidato a Brigadista

Apellidos y Nombres	ANDREY SMITH SANABRIA REYES
Dependencia	CONTRATISTA
Cargo desempeñado	AUXILIAR DE CONSTRUCCION
Antigüedad en la empresa	1 AÑO
Nombre del Jefe Inmediato	FABER SIERRA
Teléfono oficina y extensión	0887450



2. Datos Personales del Brigadista

No. De Cedula	1006797343		Edad	20	No. Celular	3012338256		GR. Sang y RH	O+
Estatura (mts)	1,68		Peso (Kg)	70	Estado Civil		SOLTERO		
Fecha de Nacimiento	DD	7	MM	4	AAAA	2003	Lugar de Nacimiento		VILLAVICENCIO
Dirección de domicilio brigadista				CARRERA 49 N. 74-60			Teléfonos		3012338256
En caso de emergencia avisar a				- LAURA VALENTINA MORALES			Parentesco		- MUJER - madre
Telefonos fijos del acudiente				NP			Celular acud		- 302 410 4129

3. Experiencia previa en Brigadas o Grupos de Socorro

Nombre del grupo o Brigada	Empresa	Cargo en el Grupo	Tiempo
BRIGADA	Seguridad Privada	BRIGADISTA	1 AÑO

4. Capacitaciones recibidas en brigadas o temas relacionados

Nombre del Curso	Tiempo	Institución
brigada de emergencia	6 meses	positiva

5. Acondicionamiento físico

Deporte Practicado	Intensidad semana (días)	Tiempo practica (horas)
futbol	3 dias en la semana	1 hora

6. Estado de Salud

¿Hay razones médicas que limiten su desempeño en la brigada? (Si su respuesta es Si, especifique cuáles)

NO

Firma del Candidato a Brigadista

754

1515

CS INFRA - CR

HOJA DE VIDA BRIGADISTA

CÓDIGO	FS-SIG-RG-64
VERSIÓN	1
FECHA	2/2/2026
PÁGINA	1 DE 1

Firma del Médico

B. Concepto de Seguridad Salud en el Trabajo

¿Se acepta al candidato en la Brigada? [X] Si [ ] No

Justificación del concepto

Cuenta con certificado en Brigadas

Fecha del Concepto DD 02 MM 03 AAAA 2026

GRUPO ASIGNADO EN LA BRIGADA Incendios [X] Evacuación [ ] Primeros Auxilios [ ]

OBSERVACIONES

Firma del Coordinador de Seguridad Y Salud en el Trabajo

CONTROL DE CAMBIOS				
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	REVISÓ	APROBÓ
0	2/2/2026	Creación del formato	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

715

1516

CS INFRA - CR

HOJA DE VIDA BRIGADISTA

CODIGO	ES-SIG-RG-64
VERSION	1
FECHA	2/02/2020
PAGINA	1 DE 1

Fecha de Solicitud de Ingreso	DD	2	MM	3	AAAA	2020

1. Datos laborales del Candidato a Brigadista

Apellidos y Nombres	FAIBER SIERRA CASTRO
Dependencia	CONTRATISTA
Cargo desempeñado	EJECUTOR DE ACTIVIDADES DE OBRA
Antiguedad en la empresa	5 AÑOS
Nombre del Jefe Inmediato	RENE TOLOZA
Teléfono oficina y extensión	6848700



2. Datos Personales del Brigadista

No. De Cedula	80,775,221	Edad	40	No. Celular	323362302	GR. Sang y RH	A+
Estatura (mts)	1,73	Peso (Kg)	75	Estado Civil	UNION LIBRE		
Fecha de Nacimiento	DD 5	MM 12	AAAA 1985	Lugar de Nacimiento	BARANOA		
Dirección de domicilio brigadista	CL 49 SUR N . 09 A 94			Teléfonos			
En caso de emergencia avisar a	Yohel Barga			Parentesco	Cortega		
Telefonos fijos del acudiente	—			Celular acud	3241892043		

3. Experiencia previa en Brigadas o Grupos de Socorro

Nombre del grupo o Brigada	Empresa	Cargo en el Grupo	Tiempo
Brigada	SD Ingeniería	Brigadista	1 AÑO

4. Capacitaciones recibidas en brigadas o temas relacionados

Nombre del Curso	Tiempo	Institución
brigada de emergencia	6 meses	positiva

5. Acondicionamiento físico

Deporte Practicado	Intensidad semana (días)	Tiempo practica (horas)
CICLISMO	3 días en la semana	1 hora

6. Estado de Salud

¿Hay razones médicas que limiten su desempeño en la brigada? (Si su respuesta es SI, especifique cuáles)

NO

Firma del Candidato a Brigadista

256

1517

CS INTRA - CR	HOJA DE VIDA BRIGADISTA	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	1
		[illegible]	[illegible]
		PAGINA	[illegible]

Firma del Médico

8. Concepto de Seguridad Salud en el Trabajo

¿Se acepta al candidato en la Brigada? (X) Si ( ) No

Justificación del concepto:

Esperando en Brigada

Fecha del Concepto DD 02 MM 03 AAAA 2016

GRUPO ASIGNADO EN LA BRIGADA Incendios [ ] Evacuación [ ] Primeros Auxilios [ ]

OBSERVACIONES

Firma del Coordinador de Seguridad Y Salud en el Trabajo

CONTROL DE CAMBIOS				
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	REVISÓ	APROBÓ
0	2/2/2016	Creación del formato	COORDINADOR DE SST	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

257

1518

POSITIVA

SALUTIS

educa

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

NIT 860.011.153-6

Certifica que

FAIBER SIERRA CASTRO

Identificado con **C.C.** 80.775.221

NIT 902,006,911 – **Razón Social**: CS INFRA -CR

Participó

En el proceso de formación dirigido a la **Brigada Integral de Emergencias** con una intensidad de 8 horas

En la ciudad de Villavicencio, dirigido por ARL POSITIVA y nuestro aliado estratégico asegurarte y Azur solutions, el dia 19 de FEBRERO de 2026.

Carlos Ivan Heredia Ferreira

Positiva Prevención

Hacienda

258

1519

POSITIVA

SALUTIS

educo

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

NIT 860.011.153-6

Certifica que

ANDREY SMITH SANABRIA REYEZ

Identificado con **C.C.** 1.006.797.343

NIT 902 .006,911– **Razón Social**: CS INFRA - CR

Participó

En el proceso de formación dirigido a la **Brigada Integral de Emergencias** con una intensidad de 8 horas

En la ciudad de Villavicencio, dirigido por ARL POSITIVA y nuestro aliado estratégico asegurarte y Azur solutions, el dia 19 de FEBRERO de 2026.

Carlos Ivan Heredia Ferreira

Positiva Prevención

Hacienda

259


CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO - CORCUMV


USO OBLIGATORIO DE GAFAS
USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA
USO OBLIGATORIO DE GUANTES
USO OBLIGATORIO DE CALZADO DE SEGURIDAD
















Primeros Auxilios
Botiquin
BOTIQUIN
FIRST AID KIT















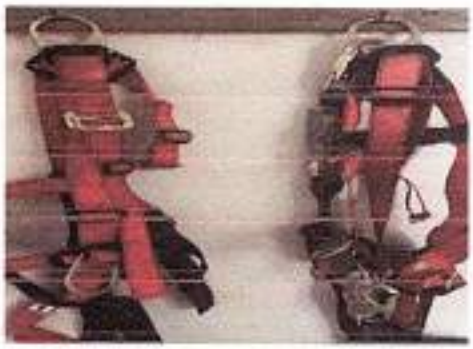





1524

CS INFRA - CR

	FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	
	CSINFRA-CR	

AREA O PROYECTO	Teatro Mayor
TEMA	Uso correcto de EPPS.
CAPACITADOR	Kelly Yoana Herrera
FECHA	02-03-2016

Nro	Si	Si	Si

OBJETIVO: Dar a conocer la importancia de la charla SST

No.	NOMBRE	CC	CARGO	FIRMA
1	Fabian Sicilia Castro	80735221	Contratista	
2	Julian Lerma	1121879076	ING Residente	
3	Andrey Smith Sanabria R	1006797313	1006797313	
4	Dilsides Toloza	7331263	Contratista	Dilsides Toloza
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

764

1525

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	CODIGO: [illegible]
CS INFRA - CR	VERSION: 01
	[illegible]

AREA O PROYECTO	teatro maipore		
TEMA	orden y Aseo en el lugar de trabajo		
CAPACITADOR	Kelly Yoana Barrera		
FECHA	03-03-2026		
[illegible]	Si	Si	Si
OBJETIVO	/	/	/

No.	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Fribar Sierra Castro	80775221	Contratista	[signature]
2	Julian Lerma	1121879076	Ing Resnd	[signature]
3	Andrey Smith Sambrook	1206797343	Ayudante	[signature]
4	Alsides Tuloza.	7331263.	Contratista	Alsides,
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

265

1576

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA CR

AREA O PROYECTO	teatro mayor
TEMA	identificacion de peligros y riesgos
CAPACITADOR	Kolt Leona Bonilla
FECHA	04-03-2016

	SI	SI	Si
OBJETIVO			

No.	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Fiber Sierra Castro	50715241	contratista	[signature]
2	Julian Lerma	1121879078	ING Residente	[signature]
3	Andrey Smith Sanabria	1006797343	Ayudante	[signature]
4	Alsides Toloza	7331263	Contratista	Alsides Toloza
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

266

1527

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA - CR

ARTE O PROYECTO	teatro mayor
TEMA	Reporte de Accidentes e Incidentes
CAPACITADOR	Kelly Joana Barrera
FECHA	05-03-2026

No	Si	Si	Si

OBJETIVO

No.	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Fainer Sierra Castro	80775221	contratista	[signature]
2	Julian Lerma	1121879078	Residente	[signature]
3	Andrey Smith Sanabria R	1006797343	Ayudante	[signature]
4	Alsides Toloza	733/263	Contratista	Alsides Toloza
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

267

1518

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA - CR

AREA O PROYECTO	teatro mayor
TEMA	prevencion de caidas
CAPACITADOR	Kelly Yoana Barrio
FECHA	06-03-2026

CAPACITADOR			
	Si	Si	Si

OBJETIVO

No.	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Fabian Sierra Castro	80775221	Contratista	[signature]
2	Julian Lerma	1121879078	ING Residente	[signature]
3	Andrey Smith Sanabria R	1006797343	Ayudante	[signature]
4	Alsides Toloza	7331263	Contratista	Alsides Toloza
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

268

1579

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA - CR

AREA O PROYECTO	teatro maipue
TEMA	manejo seguro de Movimiento
CAPACITADOR	Kelly Quana Bore
FECHA	07-03-2026

NA	SI	SI	SI
OBJETIVO	//	—	//

No.	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Fabio Sierra Castro	80775221	contratista	[firma]
2	Julian Lerma	1121879078	MO Bord	[firma]
3	andrey smith sandrich	1006797343	ayudante	[firma]
4	Als. des. toloza	7331963.	contratista	Alsidesitoloz.
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

269

1550

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA CR

AREA O PROYECTO	teatro mayor
TEMA	Seguro manejo de trabajo en Alturas
CAPACITADOR	Edy Yoana Barrera
FECHA	09-03-2026

Na	Si	Si	Si

OBJETIVO

No.	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Fabier Sierra Castro	50775771	Contratista	[signature]
2	Julian Lema L.	1121879076	Ing Residente	[signature]
3	Andrey Smith Sanabria R	1006797343	Ayudante	[signature]
4	Alsides Toloza	7331263	Contratista	Alsides Toloza
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

270

1531

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA CR

PROYECTO	teatro maipo
TEMA	Seguridad en el uso de maquinaria
CAPACITADOR	Leila Yoana Barrio
FECHA	10-03-2026

Nº	Si	Si	Si
—	//	—	

Nº	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Fabier Sierra Castro	80775271	Contratista	[signature]
2	Julian Lerma L.	1121879036	Ing Residente	[signature]
3	Andrey Smith Sanabria R	1006797343	Ayudante	[signature]
4	Alsides Toloza	7331263.	Contratista	Alsides Toloza.
5	Alsides Toloz.			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

271

1532

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA - CR

AREA O PROYECTO	Teatro Maipo
TEMA	Primer(s) Auxilio Basico(s)
CAPACITADOR	Kelly Rocha Barrio
FECHA	12-03-2026

Nº	SI	SI	SI
OBJETIVO	—	—	—

Nº	NOMBRE	CC	CARGO	FIRMA
1	Faiber Jaime Castro	[illegible]	contratista	[signature]
2	Julian Lerma	1121879078	ING Des	[signature]
3	Andrey Smith Sanabria R	1026797343	Ayudante	[signature]
4	Alsides Toloza	7331263	Contratista	Alsides Toloza
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

272

1533

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

CONTRA CR

[illegible]	Jeatro [illegible]		
[illegible]	que hacer en caso de incendio		
[illegible]	Kelly Barrio		
[illegible]	13-03-2026		
— // —	SI	SI	SI
—	//	—	/ —

No.	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Frizo Sierra Castro	50715221	contratista	[signature]
2	Julian Lerma	1121874078	ING Res	[signature]
3	Andrey smith sanabria R	1006797343	Ayudante	[signature]
4	Alsides toloza	7331263	Contratista	Alsides toloza
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

1534

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA - CR

AREA O PROYECTO	teatro maipo
TEMA	Socialización de Riesgo eléctrico
CAPACITADOR	Kelly Rocha Barra
FECHA	14-03-2016

Nº	Si	5	Si

OBJETIVO

	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Faiber Sierra Castro	80775221	Contratista	[signature]
2	Julian Lerma L.	1121879078	ING RESP!	[signature]
3	Andrey Smith Sanabria R	1026797343	Ayudante	[signature]
4	Alsides Toloza	1331963	Contratista	Alsides Toloza
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

274

1535

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA - CR

AREA O PROYECTO	teatro maipo
TEMA	socialización de manipulación a cargas
CAPACITADOR	Kelly Yoana Izarra
FECHA	16-03-2026

— // —	Si	Si	S

— // — /

Paiba Sierra Castro	80775221	[illegible]	[signature]
Julian Lerma L.	1121879078	ING ROAL	[signature]
Andrey Smith Sanabria R	1006797343	Ayudante	[signature]
Alsides Toloza	7331263	contratista	Alsides, Toloza

775

1536

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA - CR

AREA O PROYECTO	teatro mayor
TEMA	socialización de manejo de sustancia química
CAPACITADOR	teatro Kelly Bara
FECHA	17-03-2016

No	Si	Si	Si

OBJETIVO

No.	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Faiber Sierra casilla	80775271	Contratista	[signature]
2	Julia Lerma	1121879078	ING Residente	[signature]
3	Andrey Smith Sanabria	1006797343	Ayudante	[signature]
4	Alsides toloza	7331263	contratista	Alsides toloza
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

276

1537

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA - CR

AREA O PROYECTO	Teatro Mayor
TEMA	Socialización de Bioseguridad
CAPACITADOR	Edith Moore Bern
FECHA	18-03-2026

NO	SI	SI	SI

	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Fabian Sierra Castro	80175221	Contratista	[firma]
2	Julian Lerma L.	1121879078	ING Residente	[firma]
3	Andrey Smith Sanabria R	1006797343	Ayudante	[firma]
4	Alsides Toloza	7331263	Contratista	Alsides Toloza
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

277

1538

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	CODIGO: [illegible]
CS INFRA - CR	VERSION: 03

AREA O PROYECTO	teatro maipo
TEMA	Importancia del casco y guantes en obra
CAPACITADOR	Kelly Rojano Barrio
FECHA	19-03-2026

CAPACITACION	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Na	Si	Si	Si

OBJETIVO

No.	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Faiber Sierra castro	80:775221	contratista	[signature]
2	Julian lerma	1121879078	Ing Residente	[signature]
3	Andrey smith sanabria R	1006797343	Ayudante	[signature]
4	Alsides toloza	7331263	contratista	alsides toloz
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

278

1539

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA - CR

AREA O PROYECTO	teatro mayor
TEMA	Socialización de Actos y condiciones inseguras
CAPACITADOR	Kelly Roana Barrio
FECHA	26-03-2015

NA	SI	SI	SI

OBJETIVO

No.	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Pascual Sierra Castro	80775221	contratista	[signature]
2	Julian Lerma	1121879078	ING Rebelde	[signature]
3	Andrey Smith Sanabria R	1206777343	Ayudante	[signature]
4	Alsides Toloza	7331263	contratista	Alsides toloza
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

279

1540

NFRA - CR	FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO		
	CS INFRA -CR		
AREA O PROYECTO	teatro maipou		
TEMA	socialitacion de Riesgo del Area		
CAPACITADOR	Kelly Rocha Barrera		
FECHA	23-03-2020		
Ra	SI	SI	SI

NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
Sierra. Castro	80-775.221	contratista	[signature]
n Lerma C.	1121879078	contratista	[signature]
smith sanabria	1006777343	Ayudante	[signature]
es Toloza	7 331 263	Contratista	Alsides Toloza

280

1541

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA CR

AREA O PROYECTO	Teatro Maipou
TEMA	Socialización del Riesgo Psicosocial
CAPACITADOR	Kelly Yoana Barrio
FECHA	24-03-2016

— / SI —	SI	SI	SI

OBJETIVO: — / — —

No.	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Fribes Sierra Castro	80775221	contratista	[signature]
2	Julian Lerma L.	1121879076	ING Residente	[signature]
3	Andrey Smith Sanabria R	1206797343	Ayudante	[signature]
4	Alsides Toloza	7331263	Contratista	Alsides Toloza
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

281

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA - CR

AREA O PROYECTO	teatro mayor
TEMA	socialización de Riesgo físico
CAPACITADOR	Kelly Quiroga Romero
FECHA	30-03-2026

CAPACITACION	HORA		
NO	5	51	51

OBJETIVO

No.	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Fraiber Sierra Castro	80775221	contratista	[signature]
2	Julian Lerma	1121879076	ING Residente	[signature]
3	Andrey Smith Sanabria R	1006777343	Ayudante	[signature]
4	Alsides Toloza	7331263	contratista	Alsides Toloza
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

282

1542

CS INFRA - CR

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cra 10 # 20-19 piso 10, Bogotá D.C – Colombia
Cel. 324 626 95 76
email: cs.infracr@gmail.com

293

1543

CS INFRA - CR	CONSORCIO CS INFRA – CR	
	INFORME SEGURIDAD	Y SALUD EN EL TRABAJO
	CODIGO: SG-SST-IN-001	VERSION 01

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MES DE ABRIL 2026

TEATRO ROSITA HOYOS

ELABORADO YOANA RODRIGUEZ

ELABORO:	REVISO:	APROBO :
YOANA RODRIGUEZ	CONSORCIO CS INFRA	REPRESENTANTE

784

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MES DE ABRIL 2026

TEATRO ROSITA HOYOS

ELABORADO YOANA RODRIGUEZ

CS INFRA - CR	CONSORCIO CS INFRA – CR	
	INFORME SEGURIDAD	Y SALUD EN EL TRABAJO
	CODIGO: SG-SST-IN-001	VERSION 01

OBJETIVO

El consorcio infra -cr , dentro de su marco de Actividades se dedica a la edificación de obras civiles. El presente informe se realiza con el fin de dar a conocer, la gestión realizada durante el periodo c

orrespondiente en materia de seguridad y salud en el trabajo, las cuales son registradas, en función al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, permitiendo optimizar las acciones preventivas durante la jornada laboral.

Observamos que se hicieron charlas de sst,ubicación de señalización en el teatro ,extintor y elementos de brigada de emergencia ,cada viernes se inicia el comité con la parte de interventoría ,acompañamiento de seguridad y salud en el trabajo da a conocer la importancia de las charlas diarias realizadas a nuestro personal ,la importancia del uso de epps durante la obra .

En cumplimiento del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizaron diferentes actividades orientadas a promover la prevención de riesgos laborales, fortalecer la cultura de seguridad y garantizar el bienestar de los trabajadores.

Actividades Realizadas

Durante el periodo correspondiente se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- **Charlas de Seguridad:**
  Se realizaron charlas de sensibilización dirigidas a los trabajadores sobre temas relacionados con la prevención de accidentes laborales, uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y buenas prácticas en el lugar de trabajo.
- **Capacitación al Personal:**
  Se brindó orientación al personal sobre la importancia de mantener condiciones seguras en sus áreas de trabajo y reportar actos o condiciones inseguras.
- **Actividades de Prevención:**
  Se desarrollaron actividades enfocadas en la promoción de hábitos seguros, la identificación de riesgos y la importancia del autocuidado en el entorno laboral.
- **Participación** Las actividades contaron con la participación activa de los trabajadores, quienes demostraron interés en los temas tratados y en la aplicación de las medidas de seguridad en sus labores diarias.

Conclusión

Las charlas y actividades realizadas contribuyen al fortalecimiento de la cultura de prevención dentro de la empresa, promoviendo ambientes de trabajo más seguros y saludables para todos los colaboradores.

Podemos decir que en nuestra empresa Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es fundamental para garantizar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores dentro de la organización. Su objetivo principal es prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales y promover ambientes laborales seguros y saludables.

La implementación de actividades de SST permite identificar, evaluar y controlar los riesgos presentes en los lugares de trabajo, reduciendo la probabilidad de incidentes que puedan afectar la integridad de los trabajadores y el normal desarrollo de las actividades laborales.

Asimismo, la Seguridad y Salud en el Trabajo fomenta una cultura de prevención y autocuidado entre los colaboradores, fortaleciendo la responsabilidad individual y colectiva frente a los riesgos laborales.

La aplicación adecuada de las normas y medidas de SST también contribuye a mejorar la productividad, disminuir el ausentismo laboral y fortalecer el compromiso de los trabajadores con la organización.

En conclusión, la Seguridad y Salud en el Trabajo es un pilar esencial para el funcionamiento eficiente de cualquier empresa, ya que protege la vida y la salud de los trabajadores, al mismo tiempo que promueve un entorno laboral seguro, responsable y sostenible

Charlas sst

En nuestro inicio de obra damos charlas las cualesDurante la charla se explicó a los trabajadores:

- Importancia de los EPP en obra.
- Tipos de EPP utilizados en el proyecto (casco, guantes, botas de seguridad, gafas, arnés, etc.).
- Forma correcta de uso y mantenimiento.
- Riesgos de no utilizar los elementos de protección.
- Recomendaciones generales de seguridad.

La actividad se realizó mediante explicación verbal y demostración práctica del uso adecuado de los equipos.

Orden y Aseo en el Lugar de Trabajo

Objetivo:
Prevenir accidentes por caídas, golpes o tropiezos en la obra.

Temas tratados:

- Mantener pasillos y zonas de trabajo despejadas.
- Guardar herramientas después de usarlas.
- Retirar escombros y materiales sobrantes.
- Depositar residuos en los lugares asignados.

Observaciones
Un lugar limpio y ordenado reduce los accidentes.

CS INFRA - CR	CONSORCIO CS INFRA – CR	
	INFORME SEGURIDAD	Y SALUD EN EL TRABAJO
	CODIGO: SG-SST-IN-001	VERSION 01

Charla SST como Trabajo en Alturas

Objetivo:
Prevenir caídas durante actividades en altura.

Temas tratados:

- Uso obligatorio del arnés de seguridad.
- Verificación de líneas de vida y puntos de anclaje.
- No trabajar en alturas sin autorización.
- Revisar el estado de andamios y escaleras.

Observaciones :
Antes de subir, revisa tu equipo y asegura tu punto de anclaje.

Charla Uso Seguro de Herramientas
Evitar accidentes durante el uso de herramientas manuales y eléctricas.

Temas tratados:

- Revisar herramientas antes de utilizarlas.
- No usar herramientas dañadas.
- Utilizar el EPP adecuado.
- Guardar correctamente después del uso.

OBSERVACIONES:

Una herramienta en mal estado puede causar accidentes graves.

Charla Prevención de Accidentes

Objetivo:
Promover la cultura de seguridad entre los trabajadores.

Temas tratados:

- Identificación de riesgos en la obra.
- Importancia de reportar actos y condiciones inseguras.
- Seguir los procedimientos de trabajo.
- Mantener comunicación con el supervisor.

Importancia de las charlas SST

Las charlas de seguridad son importantes porque:

- Ayudan a **prevenir accidentes laborales**.
- Promueven el **uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP)**.
- Informan sobre **riesgos específicos de cada actividad**.
- Fomentan una **cultura de seguridad en la empresa**.
- Permiten recordar **normas y procedimientos de trabajo seguro**.

Temas comunes en las charlas SST

Algunos temas que se tratan frecuentemente en estas charlas son:

- Uso correcto de los **elementos de protección personal (EPP)**.
- Orden y aseo en el lugar de trabajo.
- Trabajo seguro en alturas.
- Uso adecuado de herramientas y maquinaria.
- Prevención de accidentes y reporte de condiciones inseguras.
- Manejo manual de cargas.

- Prevención de caídas, golpes o cortaduras.

En obra contamos con las siguientes herramientas de emergencia las cuales tenemos :

1. Extintores
Se utilizan para controlar o apagar incendios en su etapa inicial.

2. Botiquín de primeros auxilios
Contiene materiales básicos para atender lesiones leves como cortaduras, golpes o quemaduras.

3. Camillas o equipos de traslado
Se utilizan para movilizar de forma segura a una persona lesionada.

4. Señalización de emergencia
Indica rutas de evacuación, salidas de emergencia y ubicación de equipos de seguridad.

Nuestro equipo de trabajo conoce el equipo de emergencia que es una parte fundamental de la seguridad en el trabajo, **su ubicación y uso correcto** ya que en una situación de emergencia una respuesta rápida puede **salvar vidas y evitar consecuencias mayores.**

Tenemos cascos adicionales para nuestras visitas hacia el teatro protegiendo a nuestros visitantes de cualquier riesgo,

¿Por qué es importante usar casco en la obra?

El uso del casco es fundamental porque **la cabeza es una de las partes más vulnerables del cuerpo**. En una obra pueden ocurrir situaciones como caída de herramientas, materiales desde alturas o golpes contra estructuras, lo que puede causar lesiones graves si no se cuenta con la protección adecuada.

El uso de no utilizar el casco en obras no da los riesgos son:

Riesgos que previene el casco

El casco ayuda a prevenir:

- **Golpes en la cabeza** por objetos que caen.
- **Lesiones por choques** contra vigas, andamios o estructuras.
- **Accidentes durante trabajos en alturas.**
- **Posibles descargas eléctricas** en algunos tipos de cascos especiales.

Recomendaciones para el uso del casco

Para que el casco cumpla correctamente su función, se deben seguir algunas recomendaciones:

- Usarlo **siempre dentro de la obra.**
- Ajustarlo correctamente a la cabeza.
- Mantenerlo **limpio y en buen estado.**
- No perforarlo ni modificarlo.
- Reemplazarlo si presenta **grietas o daños.**

También contamos con un punto de hidratación en nuestra obra

Punto de hidratación en el lugar de trabajo

El **punto de hidratación** es un espacio destinado a que los trabajadores puedan **consumir agua potable durante la jornada laboral**, con el fin de mantener una adecuada hidratación y prevenir problemas de salud relacionados con el calor y el esfuerzo físico.

Importancia del punto de hidratación

En actividades como la construcción, donde los trabajadores realizan esfuerzo físico y muchas veces están expuestos al sol, es fundamental contar con puntos de hidratación porque:

- Ayudan a **prevenir la deshidratación**.
- Evitan **fatiga, mareos o golpes de calor**.
- Permiten mantener **el rendimiento y la concentración en el trabajo**.

Importancia de la señalización en el lugar de trabajo

La **señalización** en una obra o lugar de trabajo es un conjunto de señales, avisos y símbolos que se utilizan para **informar, advertir y orientar a los trabajadores sobre los riesgos presentes y las normas de seguridad que deben seguir**.

Importancia de la señalización

La señalización es muy importante porque:

- **Previene accidentes laborales**.
- Advierte sobre **peligros o riesgos en determinadas áreas**.
- Indica **rutas de evacuación y salidas de emergencia**.
- Señala la **ubicación de equipos de emergencia**, como extintores o botiquines.
- Ayuda a mantener **orden y seguridad dentro de la obra**.

- **Tipos de señalización**

- En los lugares de trabajo existen diferentes tipos de señales de seguridad:

- **Señales de advertencia**
  Alertan sobre posibles peligros, como riesgo eléctrico, caída de objetos o maquinaria en movimiento.

- **Señales de obligación**
  Indican acciones que se deben cumplir, por ejemplo: uso obligatorio de casco, guantes o gafas de seguridad.

- **Señales de prohibición**
  Indican acciones que no están permitidas, como no fumar o no pasar.

- **Señales de emergencia**
  Indican rutas de evacuación, salidas de emergencia y ubicación de equipos de primeros auxilios.

Tambien contamos con arnés es un equipo que se coloca alrededor del **cuerpo, hombros y piernas del trabajador,** y se conecta a una **línea de vida o punto de anclaje**. De esta manera, si ocurre una caída, el arnés ayuda a detener al trabajador y reducir el impacto.

Importancia del uso del arnés

El uso del arnés es fundamental porque:

- **Previene caídas desde alturas**.
- Protege la **vida y la integridad del trabajador**.
- Permite realizar trabajos en lugares elevados con mayor seguridad.
- Es obligatorio en muchas actividades de construcción cuando se trabaja a más de cierta altura.

Los arneses son importantes porque ayudan a **sostener y proteger al trabajador en caso de una caída**. Cuando el arnés está correctamente colocado y conectado a una **línea de vida o punto de anclaje**, permite detener la caída y reducir el impacto, de acuerdo a nuestras charlas es muy importante utilizar arnés cuando iniciamos trabajo en alturas.

El uso del arnés es fundamental para la seguridad en trabajos en altura. Utilizarlo correctamente puede **evitar accidentes y salvar vidas**, por lo que todos los trabajadores deben usarlo siempre que la actividad lo requiera.

Importancia del uso de EPP en obra

Los **EPP (Elementos de Protección Personal)** son equipos o dispositivos diseñados para **proteger al trabajador de riesgos laborales que puedan causar lesiones o enfermedades.** En una obra de construcción, donde hay maquinaria, alturas, herramientas y materiales peligrosos, el uso de EPP es **fundamental para la seguridad y la salud de los trabajadores.**

¿Por qué es importante usar EPP?

El uso adecuado de los EPP ayuda a:

- **Prevenir accidentes y lesiones** (golpes, cortes, caídas, quemaduras, descargas eléctricas).
- **Proteger la salud del trabajador** frente a riesgos físicos, químicos o biológicos.
- **Reducir la gravedad de los accidentes** si estos ocurren.
- **Cumplir con la normativa de seguridad y salud en el trabajo**, evitando sanciones.

Supervisamos que nuestro personal tenga los EPPS adecuados para cada actividad realizada para uso de protección de cada uno.

Entrega de epps:

Son dispositivos o accesorios diseñados para proteger al trabajador frente a riesgos laborales, entregamos :

- Cascos
- Guantes
- Gafas de seguridad
- Botas de protección
- Mascarillas o respiradores
- Protectores auditivos

Contamos con suministro de agua para nuestro personal En el trabajo, especialmente en ambientes calurosos o de esfuerzo físico, el acceso al agua ayuda a mantener el rendimiento y previene la fatiga o golpes de calor.

Desarrollo social y económico

El acceso al agua impulsa actividades como la agricultura, la industria y los servicios, siendo fundamental para el crecimiento de una comunidad.

Cumplimiento normativo

En muchos paises, incluido Colombia, el suministro de agua potable en lugares de trabajo es una obligación legal dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual lo suministramos a nuestros trabajadores.

La señalización en la obra

corresponde al conjunto de elementos visuales implementados con el fin de prevenir accidentes, informar sobre riesgos y orientar a los trabajadores y visitantes dentro del área de trabajo.

Durante la inspección, se verificó la presencia de diferentes tipos de señalización, tales como señales de advertencia, obligación, prohibición e información, ubicadas en puntos estratégicos según los riesgos identificados. Estas señales permiten alertar sobre peligros como caídas, manejo de maquinaria, riesgo eléctrico y tránsito de vehículos.

Asimismo, la señalización cumple un papel fundamental en la organización de la obra, facilitando la circulación segura y la identificación de zonas restringidas, rutas de evacuación y puntos de encuentro en caso de emergencia.

CS INFRA - CR	CONSORCIO CS INFRA – CR	
	INFORME SEGURIDAD	Y SALUD EN EL TRABAJO
	CODIGO: SG-SST-IN-001	VERSION 01

Contamos con un botiquín

El botiquín contiene insumos básicos como vendas, gasas, antisépticos y otros elementos necesarios para atender lesiones leves como cortaduras, golpes o quemaduras, evitando que estas se agraven mientras se recibe atención médica especializada si es necesario.

Contamos con el botiquín en nuestra obra para prevenir o poder actuar durante una emergencia ocasionada en obra.

EN CASO EN ACCIDENTE :

"En caso de accidente, se deberá informar de manera inmediata al responsable o supervisor, garantizando la atención oportuna del afectado y la aplicación de los protocolos de seguridad establecidos.

CS INFRA - CR	CONSORCIO CS INFRA – CR	
	INFORME SEGURIDAD	Y SALUD EN EL TRABAJO
	CODIGO: SG-SST-IN-001	VERSION 01













1560

CS INFRA - CR	CONSORCIO CS INFRA – CR	
	INFORME SEGURIDAD	Y SALUD EN EL TRABAJO
	CODIGO: SG-SST-IN-001	VERSION 01













CS INFRA - CR	CONSORCIO CS INFRA – CR	
	INFORME SEGURIDAD	Y SALUD EN EL TRABAJO
	CODIGO: SG-SST-IN-001	VERSION 01









1562

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA -CR

AREA O PROYECTO	teatro maipore
TEMA	Primeros Auxilios.
CAPACITADOR	Kelly Barrios
FECHA	01-04-2026

	X	X	

OBJETIVO

Importancia de saber Primeros Auxilios

NOMBRE	C.C	CARGO	FIRMA
ABMANdomACHACON	1047613751	Oficial	ABMANdo
Andrey smith sanabria R	1006797343	Ayudante	[signature]
Fiber Sierra castro	80775221	Encargado	[signature]
alsides toloza	7331963.	Contratista	alsides toloza
Julian lerma	1121879078	INGResidente	[signature]

303

1563

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA-CR

AREA O PROYECTO	teatro maipore
TEMA	inspeccion de seguridad
CAPACITADOR	Kelly Barrera
FECHA	04-04-2020

CAPACITACION: | CHARLA: X | CAPACITACION: X | ENTRENAMIENTO:

OBJETIVO: Dar a conocer que debemos inspeccionar

No.	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	ARMANDO MACHACON	1041361337	OFICIAL	ARMANDO
2	Andrey Smith Senabria R	1006797343	Ayudante	[firma]
3	Faiber Sierra Castro	80775221	contratista	[firma]
4	Alsides Toloza	7331263	Contratista	Alsides Toloza
5	Julian Lerma	1121679078	Inb Rdvd	[firma]
6				
7				

304

1564

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	CODIGO: [illegible]
CS INFRA - CR	VERSION: [illegible]
	FECHA DE APROB.: [illegible]

AREA O PROYECTO	teatro macpan
TEMA	Uso de extintores
CAPACITADOR	KAH Banelo
FECHA	06 - 04 - 2026

CAPACITACION	CHARLA	ENTREGA DE DOCUMENTO	RETROALIMENTACION
	X	X	

OBJETIVO: uso Adecuado de extintores

No.	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	ARMANDO MACHACON	1043613351	OFICIAL	ARMANDO
2	Andrey smith sanabria R	1006797313	Ayudante	[signature]
3	Fainer Sierra castro	80775221	contratista	[signature]
4	Alsides toloza	7331263	Contratista	Alsides toloza
5	Julian lerma	1121879076	Ing Rejun	[signature]
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

305

1565

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	CODIGO [illegible]
CS INFRA - CR	VERSION 01

AREA O PROYECTO	teatro maipori
TEMA	manipulacion manual repetitiva
CAPACITADOR	Kelly Barrio
FECHA	07-04-2026

CAPACITACION	TIPO	[illegible]	[illegible]
	∞	∞	

OBJETIVO: movimiento repetitivo realiza pausa

No.	NOMBRE	C.C	CARGO	FIRMA
1	ARMANDOMANDO	1021361331	OFICIAL	ARMANDO
2	Andrey smith sanabria R	1006797943	Ayudante	[signature]
3	Fabes sierra castro	80315221	Contratista	[signature]
4	Alcides toloz	7331263	Contratista	Alcides toloz
5	Julian lerma	1121879078	Ing Res. [illegible]	[signature]
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

306

1566

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA - CR

AREA O PROYECTO	teatro mayor
TEMA	iluminacion adecuada
CAPACITADOR	Kelly Barrero
FECHA	08-04-2026

CAPACITACION	TIPO	FORMULACION DE	PERSONAL PRESENTACION
	✓	✓	

OBJETIVO: trabajar con luz en nuestra zona de trabajo

No.	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	ARMANDO MACHACON	1043613351	OFICIAL	ARMANDO
2	Andrey smith sanabria K	1006797343	Ayudante	[signature]
3	Faiber Sierra castro	80775221	contratista	[signature]
4	Alsides toloza	1331263	Contratista	Alsides toloza
5	Julian levina	1121879078	Inb Residente	[signature]
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

307

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA - CR

AREA O PROYECTO	teatro maipon
TEMA	Ruido ocupacional
CAPACITADOR	Kelly Barrero
FECHA	09-04-2026

CAPACITACION	VALOR	ACCIONES	PROGRAMACION
	X	X	

OBJETIVO: uso de protectores auditivo

No.	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	ABMANDOMACHACON	1043613351	OFICIAL	ABMANDO
2	Andrey smith sanabria R	1006797343	Ayudante	[signature]
3	Andrey smith sanabria R	1006797343	Ayudante	[signature]
4	Faiber sierra castro	80775221	contratista	[signature]
5	Alsides tolosa	7331263	Contratista	Alsides tolosa
6	Julian lema	1121677078	Ing. Residente	[signature]
7				
8				
9				
10				
11				
12				

308

1562

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CSINFRA-CR

AREA O PROYECTO	teatro maipal
TEMA	Protección visual
CAPACITADOR	Kelly Barrero
FECHA	10-04-2026

CAPACITACION	VALIDA	ENTRENAMIENTO	DESTRUCCION
	X	X	

OBJETIVO

Uso de Protección visual.

No.	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	ABMANDOMACHACON	1043613351	OFICIAL	ABMANDO
2	Andrey smith sanabria R	1006797343	Ayudante	[firma]
3	Faiber sierra castro	8077524	Contratista	[firma]
4	Alsides toloza	7331263	Contratista	Alsides toloza
5	Julian lerma	1121879078	Ing Residente	[firma]
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

309

1568

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	CODIGO: [illegible]
CS INFRA-CR	VERSION: [illegible]
	[illegible]

AREA O PROYECTO	teatro maipo
TEMA	reporte de incidentes
CAPACITADOR	Kelly Woana Barrera
FECHA	11-04-2020

CAPACITACION	CHARLA	CAPACITACION	ACTIVIDAD
		X	O

OBJETIVO: Dar a conocer la importancia de reportar un incidente

No.	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	ABIMANDO MACHACON	1043613351	OFICIAL	ABIMANDO
2	Andrey smith sanabria R	1006797343	Ayudante	[signature]
3	Faiber sierra castro	8077522	contratista	[signature]
4	Algidesi tuloz	1331263	contratista	algidesi tuloz
5	Julian lerma	1121879078	Inb Residente	[signature]
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

310

1569

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA-CR

AREA O PROYECTO	teatro mayor
TEMA	Prevencion de incendio
CAPACITADOR	Kelly Joana Barrio
FECHA	13-04-2026

CAPACITACION	CARGA	[illegible]	[illegible]
	0	0	

OBJETIVO

Dar a conocer la prevencion

No.	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	ABMANDOMACHACON	1043613351	Oficial	ABMANDO
2	Andrey smith sanabriah	1006797343	Ayudante	[signature]
3	Faiber Serra Castro	80775221	Contratista	[signature]
4	Alsides toloza	7331263	contratista	Alsides toloza
5	Julian lerma	1121878078	ING Civil	[signature]
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

311

1570

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA -CR

AREA O PROYECTO	TEATRO PORTA NOVIA
TEMA	Fatiga laboral
CAPACITADOR	KELLY YOANA BARRERO
FECHA	14-04-2026

	✓	✓	✓

OBJETIVO: Descansar para realizar nuestra jornada laboral

NO.	NOMBRE	C.C	CARGO	FIRMA
1	Andrey smith sanabria R	1006797343	AY. volante	[signature]
2	Alsides toloza	7331963.	contratista	Alsides. toloza
3	Julian lerma	1121879078	ING Residente	[signature]
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

312

1571

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA -CR

AREA O PROYECTO	TEATRO PORTA MOYOR
TEMA	Importancia de la señalizacion
CAPACITADOR	NELLY JOANA BARRERO
FECHA	15 -09 -2026

	X	X	

OBJETIVO: respectar el uso de la señalizacion

NO.	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Andrey smith sanabria R	1006797343	1006797343	[signature]
2	Alsides. Toloza	7331263.	Contratista	Alsides Toloza.
3	Julian lerma	1121879078	Ing Residente	[signature]
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

313

1572

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA -CR

AREA O PROYECTO	TRATADO DE ROBLE HOYOS
TEMA	manejo de sustancias Quimica
CAPACITADOR	KELLY YOANA BARRERO
FECHA	16-09-2026

	X	X	

OBJETIVO: Identificar al momento de utilizar sustancia Quimica.

No.	NOMBRE	C.C	CARGO	FIRMA
1	Andrey smith sanabria	1006797343	Ayudante	[signature]
2	Alsides toloza	1331263	contratista	alsides toloza
3	Julian lerma	1121679070	ING Residual	[signature]
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

314

1573

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA-CR

AREA O PROYECTO	TEATRO PORTA MAYOR
TEMA	uso de herramientas adecuadas
CAPACITADOR	KELLY YOANA BARRETO
FECHA	17-04-2026

CAPACITACION	TIMBRE		
	x	x	

OBJETIVO: conservar sus herramientas con sus objetos lo cual los trae.

No.	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Andrey smith Senabria R	1006797343	Ayudante	[signature]
2	Alsides toloza	7331263	contratista	Alsides toloza
3	Julian Ierma	1121879076	ING Rsnt	[signature]
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

315

1304

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	CODIGO [illegible]
CS INFRA -CR	VERSION [illegible]

AREA O PROYECTO	TEATRO PORTA HOYOS
TEMA	Prevencion de caida
CAPACITADOR	KELLY YOANA BARRERO
FECHA	18-04-2026

CAPACITACION	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	X	X	

OBJETIVO

Verificacion y Supervision.

No.	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Andrey smith sanabria R	1006797343	Ayudante	[signature]
2	Andrey smith sanabria R	1006797343	Ayudante	[signature]
3	Alsides toloza	1331263	contratista	Alsides toloza
4	Julian levma	1121879078	Inb Residente	[signature]
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

316

1575

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA CR

AREA O PROYECTO	TEATRO BORDA MOVIL
TEMA	Levantamiento de cargas
CAPACITADOR	KELLY YOANA BARRERO
FECHA	20-04-2016
	X X

OBJETIVO: Manipulacion de levantamiento de carga.

No.	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Andrey smith Sanabria R	1006797343	Ayudante	[signature]
2	Alcides toloz.	7331263.	contratista	Alcides toloza
3	Julian lerma	1121879078	Ayud Residente	[signature]
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

317

1576

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA -CR

AREA O PROYECTO	TEATRO PORTA HOYOS
TEMA	Riesgo electrico
CAPACITADOR	KELLY YOANA BARRERO
FECHA	21-04-2026

	x	x	

OBJETIVO

usar Protección adecuada.

No.	NOMBRE	C.C	CARGO	FIRMA
1	Andrey smith sanabria R	1006797343	Ayudante	[signature]
2	Alsides toloza	7381263	contratista	alsides toloza
3	Julian lerma	1121879078	ING Residente	[signature]
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

318

1527

CS INFRA - CR

	FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
	CS INFRA CR
AREA O PROYECTO	
TEMA	Orden y Limpieza en Obra
CAPACITADOR	
FECHA	22-09-2026
	X X X
OBJETIVO	el puesto de trabajo debe estar ordenado

No.	NOMBRE	CC	CARGO	FIRMA
1	Andrey smith sanabria R	1006797343	Ayudante	
2	Alejandra loaiza	7331263	contratista	Alejandra loaiza
3	Julian lerma	1121879078	ING Residente	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

319

1578

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA - CR

AREA O PROYECTO	TRABAJO DE ALTA MAYOR
TEMA	Importancia de los epp en Obra
CAPACITADOR	KELLY YOSHA BARRERO
FECHA	23-04-2026

CAPACITACION	TOTAL	[illegible]	[illegible]
	x	x	

OBJETIVO: Dar a conocer la importancia de la seguridad y salud en Obra

No.	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	faiber sierra castro	80775221	contratista	[signature]
2	Andrey smith sanabria R	1006797343	Ayudante	[signature]
3	Alsides tolosa	7331263	contratista	Alsides tolosa
4	Julian lerma	1121879078	ING Residente	[signature]
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

320

1579

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA -CR

AREA O PROYECTO	TEATRO PORTA MOYOR
TEMA	reforzar normas de seguridad
CAPACITADOR	KELLY YOANA BARRERO
FECHA	24-04-2026

CAPACITADOR	TIMBRE	CALIFICACION	OBSERVACIONES
	X	X	

OBJETIVO: los reglas de oro Durante la obra

No.	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Fraiber sierra castro	80775221	contratista	[firma]
2	Andreysmith sanabria R	1006797343	Ayudante	[firma]
3	Alsides. Soloza	7331263.	contratista	Alsides. Soloza
4	Adrian villa	1003379773	Ayudante	Adrian villa
5	Julian lerma	1121879078	ING Residente	[firma]
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

321

1580

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA CR

AREA O PROYECTO	TRATADO POR LA HONOR
TEMA	sensibilizar sobre riesgos especificos.
CAPACITADOR	KELLY YOANA BARRERO
FECHA	25-04-2026

	x	x	

OBJETIVO: Dar a conocer la importancia de cada charla.

NO.	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Faider sierra castro	80775221	contratista	[signature]
2	Andrey smith sanabria R	1006797343	Ayudante	[signature]
3	Alsides toloza	1331263.	Contratista	alsidesitoloza
4	Adrian villa	1003379773	Ayudante	Adrian villa
5	Julian lerma	1121879078	ING Residente	[signature]
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

322

1581

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA - CR

AREA O PROYECTO	TEATRO PORTA NOVIA
TEMA	prevenir accidentes laborales
CAPACITADOR	KELLY YOANA BARRERO
FECHA	29 - 04 - 2026

	x	x	

OBJETIVO: Dar a conocer la importancia de las charlas.

No.	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	Andrey Smith Sanabria R	1006797343	Ayudante	[signature]
2	Alsides Toloza	7331963	Contratista	Alsides Toloza
3	Adrian Villa	1003379773	Ayudante	Adrian Villa
4	Julian Lerma	1121879078	Ing Residente	[signature]
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

323

CS INFRA - CR	CONSORCIO CS INFRA – CR	
	INFORME SEGURIDAD	Y SALUD EN EL TRABAJO
	CODIGO: SG-SST-IN-001	VERSION 01

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MES DE MAYO 2026

TEATRO ROSITA HOYOS

ELABORADO YOANA RODRIGUEZ

CS INFRA - CR	CONSORCIO CS INFRA – CR	
	INFORME SEGURIDAD	Y SALUD EN EL TRABAJO
	CODIGO: SG-SST-IN-001	VERSION 01

OBJETIVO

El consorcio infra -cr , dentro de su marco de Actividades se dedica a la edificación de obras civiles. El presente informe se realiza con el fin de dar a conocer, la gestión realizada durante el periodo c

orrespondiente en materia de seguridad y salud en el trabajo, las cuales son registradas, en función al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, permitiendo optimizar las acciones preventivas durante la jornada laboral.

Observamos que se hicieron charlas de sst,ubicación de señalización en el teatro ,extintor y elementos de brigada de emergencia ,cada viernes se inicia el comité con la parte de interventoria ,acompañamiento de seguridad y salud en el trabajo da a conocer la importancia de las charlas diarias realizadas a nuestro personal ,la importancia del uso de epps durante la obra .

En cumplimiento del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizaron diferentes actividades orientadas a promover la prevención de riesgos laborales, fortalecer la cultura de seguridad y garantizar el bienestar de los trabajadores.

1584

CS INFRA - CR	CONSORCIO CS INFRA – CR	
	INFORME SEGURIDAD	Y SALUD EN EL TRABAJO
	CODIGO: SG-SST-IN-001	VERSION 01

Actividades Realizadas

Durante el periodo correspondiente se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- **Charlas de Seguridad:**
  Se realizaron charlas de sensibilización dirigidas a los trabajadores sobre temas relacionados con la prevención de accidentes laborales, uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y buenas prácticas en el lugar de trabajo.
- **Capacitación al Personal:**
  Se brindó orientación al personal sobre la importancia de mantener condiciones seguras en sus áreas de trabajo y reportar actos o condiciones inseguras.
- **Actividades de Prevención:**
  Se desarrollaron actividades enfocadas en la promoción de hábitos seguros, la identificación de riesgos y la importancia del autocuidado en el entorno laboral.
- **Participación** Las actividades contaron con la participación activa de los trabajadores, quienes demostraron interés en los temas tratados y en la aplicación de las medidas de seguridad en sus labores diarias.

CS INFRA - CR	CONSORCIO CS INFRA – CR	
	INFORME SEGURIDAD	Y SALUD EN EL TRABAJO
	CODIGO: SG-SST-IN-001	VERSION 01

Conclusión

Las charlas y actividades realizadas contribuyen al fortalecimiento de la cultura de prevención dentro de la empresa, promoviendo ambientes de trabajo más seguros y saludables para todos los colaboradores.

Podemos decir que en nuestra empresa Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es fundamental para garantizar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores dentro de la organización. Su objetivo principal es prevenir accidentes de trabajo, enfermedades laborales y promover ambientes laborales seguros y saludables.

La implementación de actividades de SST permite identificar, evaluar y controlar los riesgos presentes en los lugares de trabajo, reduciendo la probabilidad de incidentes que puedan afectar la integridad de los trabajadores y el normal desarrollo de las actividades laborales.

Asimismo, la Seguridad y Salud en el Trabajo fomenta una cultura de prevención y autocuidado entre los colaboradores, fortaleciendo la responsabilidad individual y colectiva frente a los riesgos laborales.

La aplicación adecuada de las normas y medidas de SST también contribuye a mejorar la productividad, disminuir el ausentismo laboral y fortalecer el compromiso de los trabajadores con la organización.

En conclusión, la Seguridad y Salud en el Trabajo es un pilar esencial para el funcionamiento eficiente de cualquier empresa, ya que protege la vida y la salud de los trabajadores, al mismo tiempo que promueve un entorno laboral seguro, responsable y sostenible

Charlas sst

En nuestro inicio de obra damos charlas las cuales Durante la charla se explicó a los trabajadores:

- Importancia de los EPP en obra.
- Tipos de EPP utilizados en el proyecto (casco, guantes, botas de seguridad, gafas, arnés, etc.).
- Forma correcta de uso y mantenimiento.
- Riesgos de no utilizar los elementos de protección.
- Recomendaciones generales de seguridad.

La actividad se realizó mediante explicación verbal y demostración práctica del uso adecuado de los equipos.

Orden y Aseo en el Lugar de Trabajo

Objetivo:
Prevenir accidentes por caídas, golpes o tropiezos en la obra.

Temas tratados:

- Mantener pasillos y zonas de trabajo despejadas.
- Guardar herramientas después de usarlas.
- Retirar escombros y materiales sobrantes.
- Depositar residuos en los lugares asignados.

Observaciones
Un lugar limpio y ordenado reduce los accidentes.

Charla SST como Trabajo en Alturas

Objetivo:
Prevenir caídas durante actividades en altura.

Temas tratados:

- Uso obligatorio del arnés de seguridad.
- Verificación de líneas de vida y puntos de anclaje.
- No trabajar en alturas sin autorización.
- Revisar el estado de andamios y escaleras.

Observaciones:
Antes de subir, revisa tu equipo y asegura tu punto de anclaje.

Charla Uso Seguro de Herramientas
Evitar accidentes durante el uso de herramientas manuales y eléctricas.

Temas tratados:

- Revisar herramientas antes de utilizarlas.
- No usar herramientas dañadas.
- Utilizar el EPP adecuado.
- Guardar correctamente después del uso.

OBSERVACIONES:

Una herramienta en mal estado puede causar accidentes graves.

1588

CS INFRA - CR	CONSORCIO CS INFRA – CR	
	INFORME SEGURIDAD	Y SALUD EN EL TRABAJO
	CODIGO: SG-SST-IN-001	VERSION 01

Charla Prevención de Accidentes

Objetivo:
Promover la cultura de seguridad entre los trabajadores.

Temas tratados:

- Identificación de riesgos en la obra.
- Importancia de reportar actos y condiciones inseguras.
- Seguir los procedimientos de trabajo.
- Mantener comunicación con el supervisor.

Importancia de las charlas SST

Las charlas de seguridad son importantes porque:

- Ayudan a **prevenir accidentes laborales**.
- Promueven el **uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP)**.
- Informan sobre **riesgos específicos de cada actividad**.
- Fomentan una **cultura de seguridad en la empresa**.
- Permiten recordar **normas y procedimientos de trabajo seguro**.

Temas comunes en las charlas SST

Algunos temas que se tratan frecuentemente en estas charlas son:

- Uso correcto de los **elementos de protección personal (EPP)**.
- Orden y aseo en el lugar de trabajo.
- Trabajo seguro en alturas.
- Uso adecuado de herramientas y maquinaria.
- Prevención de accidentes y reporte de condiciones inseguras.
- Manejo manual de cargas.

- Prevención de caídas, golpes o cortaduras.

En obra contamos con las siguientes herramientas de emergencia las cuales tenemos:

1. Extintores
Se utilizan para controlar o apagar incendios en su etapa inicial.

2. Botiquín de primeros auxilios
Contiene materiales básicos para atender lesiones leves como cortaduras, golpes o quemaduras.

3. Camillas o equipos de traslado
Se utilizan para movilizar de forma segura a una persona lesionada,

4. Señalización de emergencia
Indica rutas de evacuación, salidas de emergencia y ubicación de equipos de seguridad.

Nuestro equipo de trabajo conoce el equipo de emergencia que es una parte fundamental de la seguridad en el trabajo, **su ubicación y uso correcto** ya que en una situación de emergencia una respuesta rápida puede **salvar vidas y evitar consecuencias mayores**.

Tenemos cascos adicionales para nuestras visitas hacia el teatro protegiendo a nuestros visitantes de cualquier riesgo,

¿Por qué es importante usar casco en la obra?

El uso del casco es fundamental porque **la cabeza es una de las partes más vulnerables del cuerpo.** En una obra pueden ocurrir situaciones como caída de herramientas, materiales desde alturas o golpes contra estructuras, lo que puede causar lesiones graves si no se cuenta con la protección adecuada.

El uso de no utilizar el casco en obras no da los riesgos son:

Riesgos que previene el casco

El casco ayuda a prevenir:

- **Golpes en la cabeza** por objetos que caen.
- **Lesiones por choques** contra vigas, andamios o estructuras.
- **Accidentes durante trabajos en alturas.**
- **Posibles descargas eléctricas** en algunos tipos de cascos especiales.

Recomendaciones para el uso del casco

Para que el casco cumpla correctamente su función, se deben seguir algunas recomendaciones:

- Usarlo **siempre dentro de la obra.**
- Ajustarlo correctamente a la cabeza.
- Mantenerlo **limpio y en buen estado.**
- No perforarlo ni modificarlo.
- Reemplazarlo si presenta **grietas o daños.**

También contamos con un punto de hidratación en nuestra obra

Punto de hidratación en el lugar de trabajo

El **punto de hidratación** es un espacio destinado a que los trabajadores puedan **consumir agua potable durante la jornada laboral**, con el fin de mantener una adecuada hidratación y prevenir problemas de salud relacionados con el calor y el esfuerzo físico.

Importancia del punto de hidratación

En actividades como la construcción, donde los trabajadores realizan esfuerzo físico y muchas veces están expuestos al sol, es fundamental contar con puntos de hidratación porque:

- Ayudan a **prevenir la deshidratación**.
- Evitan **fatiga, mareos o golpes de calor**.
- Permiten mantener **el rendimiento y la concentración en el trabajo**.

Importancia de la señalización en el lugar de trabajo

La **señalización** en una obra o lugar de trabajo es un conjunto de señales, avisos y símbolos que se utilizan para **informar, advertir y orientar a los trabajadores sobre los riesgos presentes y las normas de seguridad que deben seguir**.

Importancia de la señalización

La señalización es muy importante porque:

- **Previene accidentes laborales.**
- Advierte sobre **peligros o riesgos en determinadas áreas**.
- Indica **rutas de evacuación y salidas de emergencia**.
- Señala la **ubicación de equipos de emergencia**, como extintores o botiquines.
- Ayuda a mantener **orden y seguridad dentro de la obra**.

- **Tipos de señalización**
- En los lugares de trabajo existen diferentes tipos de señales de seguridad:
- **Señales de advertencia**
  Alertan sobre posibles peligros, como riesgo eléctrico, caída de objetos o maquinaria en movimiento.
- **Señales de obligación**
  Indican acciones que se deben cumplir, por ejemplo: uso obligatorio de casco, guantes o gafas de seguridad.
- **Señales de prohibición**
  Indican acciones que no están permitidas, como no fumar o no pasar.
- **Señales de emergencia**
  Indican rutas de evacuación, salidas de emergencia y ubicación de equipos de primeros auxilios.

También contamos con arnés es un equipo que se coloca alrededor del **cuerpo, hombros y piernas del trabajador**, y se conecta a una **línea de vida o punto de anclaje**. De esta manera, si ocurre una caída, el arnés ayuda a detener al trabajador y reducir el impacto.

Importancia del uso del arnés

El uso del arnés es fundamental porque:

- **Previene caídas desde alturas.**
- Protege la **vida y la integridad del trabajador**.
- Permite realizar trabajos en lugares elevados con mayor seguridad.
- Es obligatorio en muchas actividades de construcción cuando se trabaja a más de cierta altura.

Los arneses son importantes porque ayudan a **sostener y proteger al trabajador en caso de una caída.** Cuando el arnés está correctamente colocado y conectado a una **línea de vida o punto de anclaje**, permite detener la caída y reducir el impacto, de acuerdo a nuestras charlas es muy importante utilizar arnés cuando iniciamos trabajo en alturas.

El uso del arnés es fundamental para la seguridad en trabajos en altura. Utilizarlo correctamente puede **evitar accidentes y salvar vidas**, por lo que todos los trabajadores deben usarlo siempre que la actividad lo requiera.

Importancia del uso de EPP en obra

Los **EPP (Elementos de Protección Personal)** son equipos o dispositivos diseñados para **proteger al trabajador de riesgos laborales que puedan causar lesiones o enfermedades**. En una obra de construcción, donde hay maquinaria, alturas, herramientas y materiales peligrosos, el uso de EPP es **fundamental para la seguridad y la salud de los trabajadores**.

¿Por qué es importante usar EPP?

El uso adecuado de los EPP ayuda a:

- **Prevenir accidentes y lesiones** (golpes, cortes, caídas, quemaduras, descargas eléctricas).
- **Proteger la salud del trabajador** frente a riesgos físicos, químicos o biológicos.
- **Reducir la gravedad de los accidentes** si estos ocurren.
- **Cumplir con la normativa de seguridad y salud en el trabajo**, evitando sanciones.

Supervisamos que nuestro personal tenga los EPPS adecuados para cada actividad realizada para uso de protección de cada uno.

Entrega de epps:

Son dispositivos o accesorios diseñados para proteger al trabajador frente a riesgos laborales, entregamos:

- Cascos
- Guantes
- Gafas de seguridad
- Botas de protección
- Mascarillas o respiradores
- Protectores auditivos

Contamos con suministro de agua para nuestro personal En el trabajo, especialmente en ambientes calurosos o de esfuerzo físico, el acceso al agua ayuda a mantener el rendimiento y previene la fatiga o golpes de calor.

Desarrollo social y económico

El acceso al agua impulsa actividades como la agricultura, la industria y los servicios, siendo fundamental para el crecimiento de una comunidad.

Cumplimiento normativo

En muchos países, incluido Colombia, el suministro de agua potable en lugares de trabajo es una obligación legal dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo el cual lo suministramos a nuestros trabajadores.

La señalización en la obra

corresponde al conjunto de elementos visuales implementados con el fin de prevenir accidentes, informar sobre riesgos y orientar a los trabajadores y visitantes dentro del área de trabajo.

Durante la inspección, se verificó la presencia de diferentes tipos de señalización, tales como señales de advertencia, obligación, prohibición e información, ubicadas en puntos estratégicos según los riesgos identificados. Estas señales permiten alertar sobre peligros como caídas, manejo de maquinaria, riesgo eléctrico y tránsito de vehículos.

Asimismo, la señalización cumple un papel fundamental en la organización de la obra, facilitando la circulación segura y la identificación de zonas restringidas, rutas de evacuación y puntos de encuentro en caso de emergencia.

Contamos con un botiquín

El botiquin contiene insumos básicos como vendas, gasas, antisépticos y otros elementos necesarios para atender lesiones leves como cortaduras, golpes o quemaduras, evitando que estas se agraven mientras se recibe atención médica especializada si es necesario.

Contamos con el botiquín en nuestra obra para prevenir o poder actuar durante una emergencia ocasionada en obra.

CAMILLA

El área dispone de camilla para atención de emergencias y traslado en caso de accidente, La obra cuenta con camilla disponible para la atención y traslado de personal en caso de emergencia o accidente laboral.

EXTINTOR

La obra cuenta con extintor disponible y ubicado en un punto accesible, con el fin de atender de manera inmediata cualquier conato de incendio que pueda presentarse durante el desarrollo de las actividades laborales, este equipo permite controlar y mitigar emergencias relacionadas con fuego, protegiendo la integridad de los trabajadores, las instalaciones, los materiales y las herramientas presentes en la obra, además de contribuir al cumplimiento de las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

CASCOS EN OBRA

En obra contamos con casco de visita para el personal externo que quiera ingresar teniendo adecuada su vestimenta formal para el ingreso a la obra tenemos un puesto para nuestro casco de visitantes.

EN CASO EN ACCIDENTE:

"En caso de accidente, se deberá informar de manera inmediata al responsable o supervisor, garantizando la atención oportuna del afectado y la aplicación de los protocolos de seguridad establecidos.

ACCIDENTE DE TRABAJON

se presentó un accidente de trabajo durante la jornada laboral, ante el cual se realizó de manera inmediata el respectivo proceso de atención, reporte y seguimiento, cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidos en la obra.

Posteriormente, se llevó a cabo el reporte del accidente y el seguimiento del caso conforme a los procedimientos establecidos en materia de seguridad y salud en el trabajo, garantizando la atención oportuna y el cumplimiento de las medidas preventivas correspondientes.

Se socializa el accidente al personal que paso el día 12 de mayo del 2026 en las instalaciones de la obra el cual se hace la investigación de accidente de trabajo se hace el debido paso a paso durante un accidente de trabajo se adjunta evidencias, incapacidad de acuerdo a el accidente de trabajo.









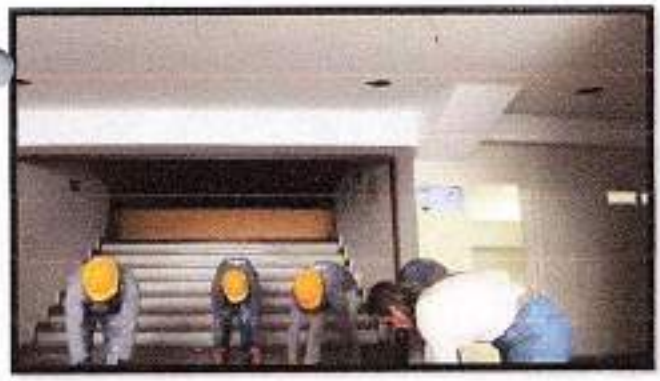

















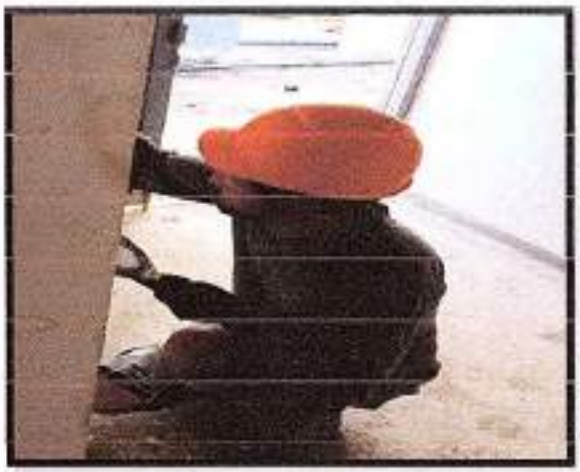

1602

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA - CR

AREA O PROYECTO	TEATRO CORTA PUERTO
TEMA	Prevencion de accidentes laborales
CAPACITADOR	KELLY YOANA BARRERO
FECHA	01-05-2026

CAPACITACION	CHARLA	SOCIALIZACION EX	RETROALIMENTACION
	X		

OBJETIVO: Dar a conocer la importancia de prevenir accidente en obra.

Andrex Smith Sanabria	1006797343	obrero	[signature]
Nicolas Toloza	7331263	contratista	[signature]
Faber Sama	8071541	oficial	[signature]

343

1603

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

EVIDENCIA

APELLIDO PROYECTO	TEMA DE CAPACITACION
TEMA	uso correcto de elementos de Protección Personal
CAPACITADOR	KELLY YOANA RAPPERO
FECHA	02-05-2026

CAPACITACION	CHARLA	SOLICITACION	INFORMACION
	X		

OBJETIVO socializa al personal de uso epps.

Andrey Smith Sanabria	1006797343	obrero	[signature]
Alsidas Tolaza	7771263	contratista	Alsidas Tolaza
Faiber Sena	80775221	oficial	[signature]

344

1609

CS INFRA - CR

SUMARIO DE CAPACITACIONES
ENTRENAMIENTO

APRENDIZAJE	TEMA DE CAPACITACIÓN
TEMA	orden y Aseo
CAPACITANTE	RELLY VIANA BARRIOS
FECHA	04-03-2026

CAPACITACIÓN	COMPRA	SOCIALIZACIÓN	
		5	

OBJETIVO: orden y Aseo en las areas de trabajo

Andrey smith samabria	1006797343	obrero	[signature]
Alsi desitoloza	7331263	contratista	alsidesitoloza
Faiber sierra	85775211	oficial	[signature]

346

CSINFRA.CO

TEMA	Riesgo de caida al mismo Nivel
CAPACITADOR	1
FECHA	05-05-2026
DURACION	6

OBJETIVO: Dar a conocer el Riesgo de caida al mismo Nivel.

	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	wilber Quintero	1010241045	oficial	
2	Andrey smith sanabria	1006297343	obrero	
3	Adrian moreno	1121 946 654	obrero	
4	Adrian moreno	1121 946 654	obrero	
5	Hector Zapata	1017104 2	Oficial	
6	Alsides tolaza	7331 263	contratista	Alsides tolaza
7				
8				
9				
10				
11				
12				

1606

CS INFRA - CR

TEMA	trabajo en altura
FECHA	06-05-2018

Dar a conocer la importancia de trabajo en Altura

Wilber Quintero	1010241045	Oficial	[signature]
Andrey Smith Sanabria	1006797343	obrero	[signature]
Adrian Moreno	1121 946 694	obrero	Adrian Moreno
Hector Zapata	10171042	Oficial	[signature]
Alsides toloza	7331263	contratista	Alsides toloza

348

CEMENTERA			
	manipulacion de cargas		
	01-05-2026		
	✓	✓	

socializacion de manipulacion de carga

wilber Quintero	1010241045	Oficial	[signature]
Andrey smith sanabria	1006797343	obrero	[signature]
Adrian Moreno	1121 946 659	obrero	Adrian moreno
Hector Zapata	1017 1042	Oficial	[signature]
Alsicka toloza	7331263	contratista	Alsicka toloza

160A

Prevencion de Riesgo [illegible]

08-05-2016

Dar a conocer la prevencion de Riesgo [illegible]

wilber Quintero	1010241045	oficial	[illegible]
Andrey Smith Sanabria	1006797343	obrero	[illegible]
Adrian Moreno	1121 946 659	obrero	Adrian Moreno
Alector Zapata	10171042	oficial	[illegible]
Alsides Toloza	7331263	contratista	Alsides Toloza

350

CSIMERA CR

	mango seguro de [illegible]
	09-05-2026

Dar a conocer el uso Adecuado de Herramienta manual

Wilber Quintero	1010241045	oficial	[signature]
Andrey Smith Sanabria	1206797343	obrero	[signature]
Alan Moreno	1121 416 659	obrero	Alan Moreno
Hector Zapata	10171042	oficial	[signature]
Alsides Tabaza	7331263	contratista	Alsides Tabaza

CSINERA CR

	prevención de incendios
	11/05/2016

Prevenir un incendio en dicho.

Wilber Quintero	1010241045	Oficial	[signature]
Andrey Smith Sanabria	1006997343	obrero	[signature]
[illegible]	1121 946 659	obrero	[signature]
Hector Zapata	10171042	oficial	[signature]
Alsides Toloza	7331263	Contratista	Alsides Toloza

plan de emergencia

11-05-2016

Socialización de plan de emergencia

wilber Quintero	1010241045	Oficial	[signature]
Andrey smith sanabria	1001797343	obrero	[signature]
Alvaro Moreno	1121 946 659	obrero	Alvaro Moreno
Hector Zapata	10171042	Oficial	[signature]
Alcides. toloza	7331 263.	contratista.	Alcides. toloza

CS INFRA CR

	Señalización de seguridad		
	13-05-2016		

Interpretación de señales preventivas, obligatorias

Wilber Quintero	1010241045	Oficial	[signature]
Andrey Smith Sanabria	1006797343	Obrero	[signature]
[signature] Moreno	1121 946 654	obrero	[signature] Moreno
Hector Zapata	10171042	Oficial	[signature]
Alcides Toloza	I331263	Contratista	Alcides Toloza

1613

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA CR

AREA O PROYECTO	
TEMA	Riesgo quimico
CAPACITADOR	KELLY YOANA BARRERO
FECHA	14-05-2026

CAPACITACION	CHARLA	SOCIALIZACION	RESPONSABILIZACION
		X	

OBJETIVO: Socialización de manipulación segura de sustancias quimicas

No.	NOMBRE	CC	CARGO	FIRMA
1	wilber Quintero	1010241045	Oficial	[signature]
2	Andrey Smith Sanabria	1006797343	obrero	[signature]
3	Alvin Moreno	1121 946 659	obrero	Alvin Moreno
4	Hector Zapata	10171042	oficial	[signature]
5	Alsides Toloza	7331 263	contratista	Alisides Toloza
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

355

1614

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA - CR

AREA O PROYECTO	TEATRO PRINCIPAL
TEMA	Primeros auxilios basicos
CAPACITADOR	KELLY YOANA BARRERO
FECHA	15-05-2026

CAPACITACION	CHARLA	SOCIALIZACION	RECONOCIMIENTO
	X		

OBJETIVO: que hacer mientras llega ayuda profesional

NO.	NOMBRE	CC	CARGO	FIRMA
1	wilber Quintero	1010241045	Oficial	[signature]
2	Andrey smith sanabria	1006797343	obrero	[signature]
3	Adrian moreno	1121 946 699	obrero	Adrian moreno
4	Hector zapata	10171042	oficial	[signature]
5	Alsides toloza	7331263	contratista	Alsides toloza
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

356

1615

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA CR

APEGO PROYECTO	TEXTO DOCUMENTADO
TEMA	Bioseguridad e higiene personal
CAPACITADOR	KELLY YOANA DAPIDEZ
FECHA	16-05-2026

CAPACITACION	CHATEA	SUPERVISION	OBSERVACIONES
		X	

OBJETIVO: Lavado de manos y control de enfermedades

No.	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	wilber Quintero	1010241045	oficial	[signature]
2	Andrey Smith Sanabria	1006797343	obrero	[signature]
3	Adrián moreno	1121 946 609	obrero	Adrián moreno
4	Héctor Zapata	10171042	oficial	[signature]
5	Alsides. toloza	7331 263.	contratista	Alsides. toloza
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

357

1616

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA - CR

AREA DE PROYECTO	TEATRO PROGRAMADOR
TEMA	prohibicion de consumo alcohol y sustancia psicoactiva
CAPACITADOR	KELLY YOANA RAPIDO
FECHA	18-05-2026

CAPACITACION	CHARLA	SOCIALIZACION	RETROALIMENTACION
		X	

OBJETIVO

Forma Part del impacto en la seguridad y producción

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
wilber Quintero	1010241045	Oficial	[signature]
Andrey smith sanabria	1006797343	obrero	[signature]
Julian Moreno	1121946699	obrero	Julian moreno
Hector Zapata	10171042	oficial	[signature]
Alsides Tolozo	7331263	contratista	Alsides Tolozo

358

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

TEMA	Riesgo psicosocial
FECHA	19-05-2026
CAPACITACION	
CHARLA	
SOCIALIZACION	X

Factores emocionales y organizacionales

wilber Quintero	1010241045	oficial	[signature]
Andrey Smith Sanabria	1006797343	obrero	[signature]
Adrian Moreno	1121946659	obrero	Adrian Moreno
Hector Zapata	10771042	oficial	[signature]
Alcides Toloza	7331263	contratista	Alcides Toloza

1618

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA - CR

AREA O PROYECTO	
TEMA	cultura de seguridad en el trabajo
CAPACITADOR	
FECHA	20-05-2016

CAPACITACION	CHARLA		

OBJETIVO: socializacion de cultura de seguridad en el trabajo.

No.	NOMBRE	C.C.	CARGO	FIRMA
1	wilber Quintero	1010241045	oficial	[signature]
2	Andrey smith sanabria	1006797343	obrero	[signature]
3	Adrian moreno	1121 916 659	obrero	Adrian moreno
4	Hector Zapata	10171042	Oficial	[signature]
5	Alsi Vesi toloza	7 331 263	Contratista	Alsi Ves. toloza
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

360

1619

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACIONES
ENTRENAMIENTO

TEMA	Riesgo Biomecanico
FECHA	21-05-2016
CAPACITACION	X

Socialización movimiento repetitivo

wilber Quintero	1010241045	oficial	[signature]
Andrey smith sanabria	1006797343	obrero	[signature]
Adrian moreno	1121 916 689	obrero	Adrian moreno
Hector zapata	10121042	oficial	[signature]
Nsides toloza	7331263	Contratista	Nsides toloza

361

CS INFRA - CR

FORMATO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CS INFRA - CR

PROGRAMA	TEATRO INTERNACIONAL
TEMA	Seguridad en espacio confinado
CAPACITADOR	KELLY YOANA BARRERO
FECHA	22-05-2016

CAPACITACION	CORREO	SOCIALIZACION	RETROALIMENTACION

DESCRIPCION: Socializacion en peligros, permisos y monitoreos

NO.	NOMBRE	CC	CARGO	FIRMA
	Willer Quintero	1010241045	oficial	[signature]
	Adrian Moreno	1121 946 659	dorero	Adrian Moreno
	Andrey smith sanabria	1206 797343	obrero	[signature]
	Hector Zapata	10171042	oficial	[signature]
	Alsides toloza	7331263	contratista	Alsides toloza

1627

CS INFRA - CR

TOMATO DE CAPACITACIONES
ENTRENAMIENTO

FECHA

TEMA	Riesgo locativo
FECHA	23-05-2016

CAPACITACION | CHARLA X | INFORMACIONES

DIRIGIDO: identificacion de piso defectuoso cable y obber.

Andrey smith sanabria	1006777343	obrero	[signature]
Hector Zapata	10171042	oficial	[signature]
Alsides toloza	7331263	contratista	Alsides toloza
Faber Sena	86.775 224	oficial	[signature]

363

CS INFRA - CR

TOMATA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

TEMA	Importancia de las inspecciones de seguridad
FECHA	25-05-2016

CAPACITACIÓN	CHARLA	ACCIONAMIENTO	
		X	

OBJETIVO: como detecta riesgo antes de que ocurra accidente

Andrey smith sanabria	1006797343	obrero	[signature]
wilber Quintero	1010241045	oficial	[signature]
Alvin moreno	1121 946 694	obrero	Alvin moreno
Héctor zapata	10171042	oficial	[signature]
Alcides toloza	7331263.	Contratista	Alcides toloza
Alcides toloza			

CONTRATISTA	
TEMA	Hidratacion en el trabajo.
FECHA	21-05-2016

Importancia del consumo de agua y practica

1	Wilber Quintero	1010241045	Oficial
2	Adam ramirez	1121 996 651	obrero
3	Andrey smith sanabria	1006397343	obrero
4	Hector Zapata.	1017042	Oficial
5	Alexis toloza	1331263	contratista
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

CS INFRA - CR

TEMA	Manejo de residuos
FECHA	28-05-2016
CAPACITACIÓN	
PRÓXIMA	
PRESENTACIÓN	X

PRÓXIMO: clasificacion y disposición adecuado de residuos

wilber Quinteso	1010241045	Oficial	[signature]
Andrey smith Sanabria	1006797343	obrero	[signature]
Hector Zapata	10171042	Oficial	[signature]
Alsides Toloza	7331263.	contratista	Alsides Toloza

1625

CSINERA CD

Nombre	Presentación de [illegible]
Fecha	29-05-2016

Socializador de Almacenamiento y Asegurar el

Wilber Quintero	1010241045.	Oficial	[signature]
Andrey Smith Sanabria	1006797343	obrero	[signature]
Hector Zapata	10171042	Oficial	[signature]
Alsides. Toloza	7331263.	Contratista	Alsides. Toloza
Falber Siana	80775241	Oficial	[signature]

367

CS INFRA - CB

	uso de [illegible]
	30-05-2016

Socialización de tipos de fuego y [illegible]

wilber Quintero	1010241045	Oficial	[signature]
Andrey smith sanabria	1006797343	Obrero	[signature]
Hector Zapata	1011042	oficial	[signature]
Faiber Sierra	80775221	Oficial	[signature]
Alsides toloz	7331263	Contratista	Alsides toloz

1672

	INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO	SG-SST V1.12.2020 PÁG 1 DE 3

INVESTIGACIÓN DE:	☒ ACCIDENTE DE TRABAJO ☐ LEVE ☐ GRAVE / MORTAL		☐ INCIDENTE

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR - CONTRATANTE

RAZÓN SOCIAL:	CONSTRUCCIONES Y ACOPIADOS JR SAS	**TIPO ID:**	☐ NIT ☒ CC ☐ CE ☐ NIU ☐ PA	**NÚMERO ID:**	80140733-0				
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	CONSTRUCCIONES DE OBRA INGENIERIA CIVIL	**CÓDIGO:**	410001	**DEPARTAMENTO:**	BOGOTA				
MUNICIPIO:	BOGOTA	**DIRECCIÓN:**	CLL 48 G SUR 5 C 59	**TELÉFONO:**	NA	**ZONA:**	● Urbana ○ Rural		
LA INFORMACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO DONDE LABORA EL TRABAJADOR ¿ES LA MISMA QUE APARECE EN IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE?		☐ SI	☐ NO	SÍ SU RESPUESTA ES NEGATIVA DILIGENCIAR LAS SIGUIENTES CASILLAS:					
NOMBRE DEL PROYECTO:	TEATRO MAYOR DE ROSITA OYOS								
DIRECCIÓN:	CALLE 40 N. 33-68			**TELÉFONO:**	NA				
DEPARTAMENTO:	VILLAVICENCIO	**MUNICIPIO:**	META	**ZONA:**	☐ Urbana ☐ Rural				

II. INFORMACIÓN DE LA PERSONA INVOLUCRADA EN EL EVENTO

TIPO DE VINCULACIÓN:	☐ Patrono ☐ Afiliado ☐ Cooperado ☐ Estudiante/ Aprendiz ☐ Contratista ☐ Subcontratista ☐ Independiente ☐ Otro _____												
NOMBRES Y APELLIDOS:	ADRIAN ALEXANDER VILLA BUZON												
TIPO ID:	☐ CC ☐ CE ☐ NIT ☐ TI ☐ PA	**NÚMERO ID:**	1.003.273.713	**FECHA DE NACIMIENTO**	D 12	M 12	A 2002	**GENERO**	☐ M ☐ F				
DIRECCIÓN:	CENTRO CALLE 40 N.					**TELÉFONO**							
DEPARTAMENTO:	Meta	**MUNICIPIO:**	VILLAVICENCIO	**ZONA:**	☐ Urbana ☐ Rural								
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA			**TIEMPO DE OCUPACIÓN HABITUAL AL MOMENTO DEL ACCIDENTE:**	Años _____ Meses _____ Días _____								
FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA:	D 4 M 9 A 2019	**Bolsa**	1.750.905	**JORNADA HABITUAL DE TRABAJO:**	☐ Diurna ☐ Nocturna ☐ Mixta ☐ Turnos								
RECIBIÓ INDUCCIÓN EN SST	☒ SI ☐ NO	**RECIBIÓ ENTRENAMIENTO EN EL CARGO**	☐ SI ☐ NO	**EL TRABAJADOR USABA EPP AL MOMENTO DEL EVENTO**	☒ SI ☐ NO	**CUALES?** Botas punta de acero, ropa dotacional y la arnesa							
EPS A LA QUE ESTÁ AFILIADO:	EPS FAMILIAR	**AFP A LA QUE ESTÁ AFILIADO:**	PORVENIR	**ARL A LA QUE ESTÁ AFILIADO:**	SURA								

III. INFORMACIÓN SOBRE EL EVENTO

FECHA DEL EVENTO:	D 12	M 3	A 2020	**HORA** 10:43 hs	11:20 a.m.	**DÍA DEL EVENTO:**	☐ Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo								
JORNADA EN QUE SUCEDE EL EVENTO:	☐ Normal ☐ Extra	**ESTABA REALIZANDO SU LABOR HABITUAL**	☒ SI ☐ NO	¿CUÁL? (Solo en caso negativo) _____											
TIEMPO LABORADO PREVIO AL EVENTO:	Horas 3	Minutos 20	**TIPO DE EVENTO:**	☐ Violencia ☐ Tránsito ☐ Deportivo ☐ Recreacional o Cultural ☐ Propio del trabajo											
CAUSÓ LA MUERTE:	☐ SI ☒ NO	**FECHA DE LA MUERTE:**	D	M	A	**DEPARTAMENTO:**		**CIUDAD:**		**ZONA**	☐ Urbana ☐ Rural				
LUGAR DONDE OCURRIÓ EL EVENTO	☐ DENTRO DE LA EMPRESA			☐ FUERA DE LA EMPRESA											

INDIQUE CUÁL SITIO	
1	ALMACENES O DEPÓSITOS
2	ÁREAS DE PRODUCCIÓN
3	ÁREAS RECREATIVAS O PRODUCTIVAS
4	CORREDORES O PASILLOS
5	ESCALERAS
6	PARQUEADEROS O ÁREAS DE CIRCULACIÓN
7	OFICINAS
8	OTRAS ÁREAS COMUNES
9	OTRO. (Especifique)

INDIQUE TIPO DE LESIÓN			
1	FRACTURA	7	QUEMADURA
2	LUXACIÓN	8	ENVENENAMIENTO O INTOXICACIÓN AGUDA O ALERGIA
3	TORCEDURA, ESGUINCE, DESGARRO MUSCULAR, HERNIA O LACERACIÓN DE MÚSCULO O TENDÓN SIN HERIDA	9	EFECTO DEL TIEMPO, CLIMA U OTRO RELACIONADO CON EL AMBIENTE
4	CONMOCIÓN O TRAUMA INTERNO	10	ASFIXIA
5	AMPUTACIÓN (Incluya dedo o pérdida del ojo)	11	EFECTO DE LA ELECTRICIDAD
6	HERIDA	12	EFECTO NOCIVO DE LA RADIACIÓN
13	TRAUMA SUPERFICIAL (Incluye magulla, punción o cortadura y lesión en ojo por cuerpo extraño)	14	HERIDA
15	GOLPE, CONTUSIÓN O APLASTAMIENTO	16	FRACTURA DE DEDO MUÑEQUE

PARTE DEL CUERPO APARENTEMENTE AFECTADO:	
1	CABEZA
2	OJO
3	CUELLO
4	TRONCO (Incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pelvis)
5	HÚMERO
6	ABDOMEN
7	MIEMBROS SUPERIORES
8	MANOS
9	MIEMBROS INFERIORES
10	PIES
11	UBICACIONES MÚLTIPLES
12	LESIONES GENERALES U OTRAS

AGENTE DEL ACCIDENTE: (CON QUÉ SE LESIONÓ EL TRABAJADOR)	
1	MAQUINAS Y/O EQUIPOS
2	MEDIOS DE TRANSPORTE
3	APARATOS
4	HERRAMIENTAS, IMPLEMENTOS O UTENSILIOS
5	MATERIALES O SUSTANCIAS
6	RADIACIONES
7	AMBIENTE DE TRABAJO (Incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, lugares, en el exterior, interior o subterráneos)
8	OTROS AGENTES NO CLASIFICADOS
9	ANIMALES (Vivos o productos animales)
10	AGENTES NO CLASIFICADOS POR FALTA DE DATOS

MECANISMO O FORMA DEL EVENTO	
11	CAIDA DE PERSONAS
12	CAIDA DE OBJETOS
13	PISADAS, CHOQUES O GOLPES
14	ATRAPAMIENTOS
15	SOBREESFUERZO, ESFUERZO EXCESIVO O FALSO MOVIMIENTO
16	EXPOSICIÓN O CONTACTO CON TEMPERATURA EXTREMA
17	EXPOSICIÓN O CONTACTO CON ELECTRICIDAD
18	EXPOSICIÓN O CONTACTO CON SUSTANCIAS NOCIVAS, RADIACIONES O SALPICADURAS
19	OTRO. (Especifique)

369

	INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO	SG-SST
		V1.12.2026
		PAG 1 DE 3

IV. PARA ACCIDENTES O INCIDENTES DE TRANSITO INDIQUE:

MEDIO DE TRANSPORTE EN QUE OCURRIO EL EVENTO	☐ CARRO ☐ MOTO	TIPO O MARCA:		MODELO:		PLACA:		VELOCIDAD A LA QUE CIRCULABA	
DIRECCION DEL EVENTO:		¿LA PERSONA INVOLUCRADA EN EL EVENTO CONDUCIA?	☐ SI ☐ NO	N° DE LA LICENCIA Y CATEGORIA:		FECHA DE VENCIMIENTO	D	M	A
¿ HUBO PROCEDIMIENTO JUDICIAL ?	☐ SI ☐ NO	INSPECCIÓN EN LA QUE SE DEJO CONSTANCIA:		FECHA:		FOLIO:			
MEDIDAS ADOPTADAS INMEDIATAMENTE:									

V. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	PERSONAS QUE PRESENCIARON EL EVENTO
DESCRIBA DETALLADAMENTE EL EVENTO QUE LO ORIGINO O CAUSO (Responda a las preguntas qué pasó, cuándo, dónde, cómo y por qué)	¿ HUBO PERSONAS QUE PRESENCIARON EL EVENTO ? ☐ SI ☐ NO
El Señor ADRIAN ALEXANDER VILLA BUZON Identificado con numero de cedula 1,003,379,713 de valledupar realizada su tarea habitual donde utilizaba sus elementos de proteccion al momento de su jornada el señor Adrian alexander villa buzon se encontraba en piso pasando una teja se le deslizo ocasionandole una leccion abierta en la mano izquierda de los cuales estaba el colaborador utilizando los elementos de proteccion cuyo guantes tambien fueron cortado al momento de deslizarse la teja .	EN CASO AFIRMATIVO, DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
	DOCUMENTO DE ID: ☐ CC ☐ CE ☐ NU ☐ TI ☐ PA — Numero ID: 60775201
	NOMBRES Y APELLIDOS: FABER SIERRA CASTRO
	CARGO: OFICIAL
	DECLARACIÓN: el compañero Adrian Alexander villa Buzon aproximadamente a las 11 y 30 de la mañana estaba pasando una teja se le deslizo ocasionandole una leccion abierta en la mano izquierda de los cuales estaba utilizando los elementos de proteccion cuyo guantes tambien fueron cortados aclarando que fue inclinando la teja hacia arriba donde fui testigo de lo ocurrido. — Firma: [firma]
	DOCUMENTO DE ID: ☐ CC ☐ CE ☐ NU ☐ TI ☐ PA — Numero ID: 70038[illegible]
	NOMBRES Y APELLIDOS: ARMANDO ROBALIO MACHACON OCAMPO
	CARGO: OFICIAL
	DECLARACIÓN: El compañero Adrian Alexander villa Buzon aproximadamente a las 11 y 30 de la mañana estaba pasando una teja se le deslizo ocasionandole una leccion abierta en la mano izquierda de los cuales estaba utilizando los elementos de proteccion cuyo guantes tambien fueron cortados aclarando que fue inclinando la teja hacia arriba donde fui testigo de lo ocurrido. — Firma: [firma]
ANEXOS O EVIDENCIAS: ☐ SI ☐ NO — TIPO DE EVIDENCIA: ☐ Fotografías ☐ Dibujos ☐ Esquemas ☐ Croquis de Accidente de tránsito ☐ Otro, Cual?	

VI. DISEÑO ESQUEMATICO DE CAUSAS (Espina de pescado, Arbol Causal, Diagrama de Afinidad, los 5 Por qué, entre otros.)

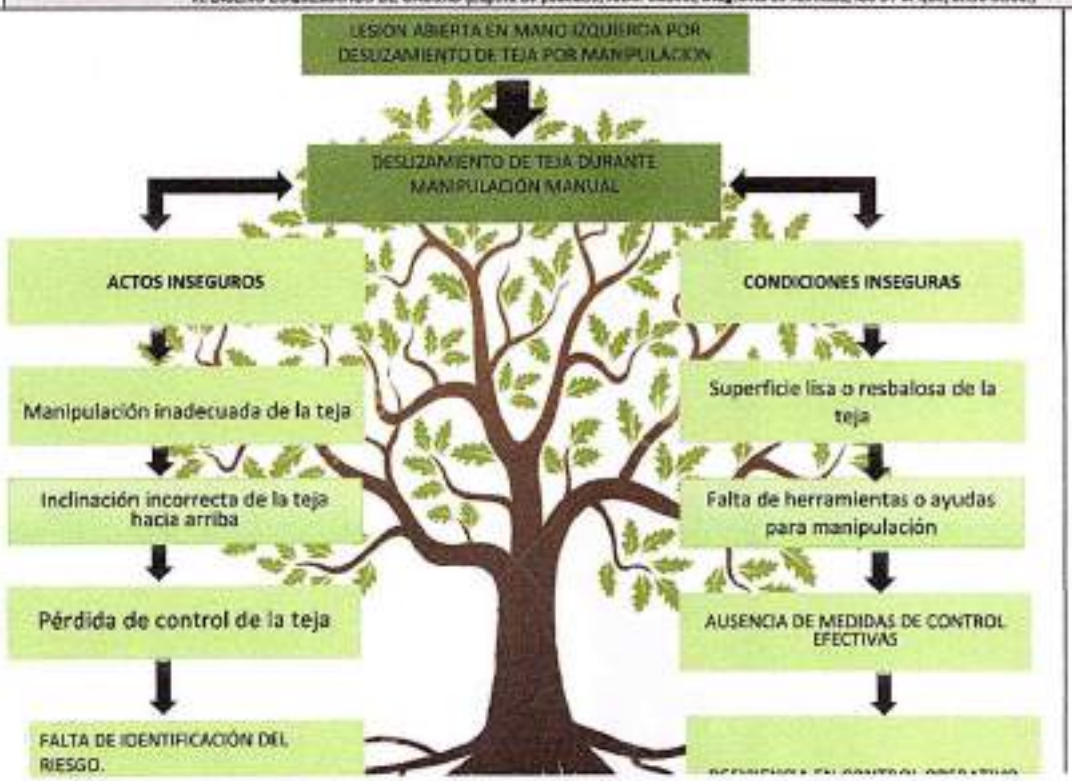

TÉCNICA INADECUADA DE MANIPULACIÓN

DEFICIENCIA EN CONTROL OPERATIVO



CAUSAS INMEDIATAS - DIRECTAS	
CÓDIGO	CONDICIONES AMBIENTALES INSEGURAS
4030	OBJETOS RESBALOSOS
4110	CARENCIA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL NECESARIOS
4250	INSUFICIENTE ESPACIO DE TRABAJO
4350	UBICACIÓN DEL PERSONAL INAPROPIADA (SIN TENER EN CUENTA LAS LIMITACIONES FISICAS , HABILIDADES)
4400	RIESGO DE COLOCACION O EMPLAZAMIENTO (MATERIALES, EQUIPOS EXEPTUANDO LAS PERSONAS)
CÓDIGO	ACTOS INSEGUROS
3350	USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO
3352	AGARRAR LOS OBJETOS INSEGURAMENTE
3012	ADOPTAR UNA POSICION INADECUADA PARA REALIZAR LA TAREA

CAUSAS BASICAS	
CÓDIGO	FACTORES PERSONALES
1001	LIMITACIONES DE ESTATURA , PESO , TAMAÑO, FUERZA Y ALCANCE
1002	LIMITACIONES EN EL LIBRE MOVIMIENTO DEL CUERPO
1107	FALLAS DE COORDINACION
1209	MOVIMIENTO RESTRINGIDO
1304	RUTINA , MONOTONIA,LABOR SIN NOVEDAD DESGANO/EXCESO DE CONFIANZA
CÓDIGO	FACTORES DEL TRABAJO
2103	CONSIDERACIONES INADECUADAS DE LOS FACTORES ERGONOMICOS
2207	MANEJO INCORRECTO DE LOS MATERIALES
2208	ALMACENAMIENTO INCORRECTO DE LOS MATERIALES
2402	CONSIDERACIONES INADECUADAS DE LOS FACTORES HUMANOS YERGONOMICOS

163C

[illegible]	INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO	SG-SST
		V1.12.2020
		PAG 1 DE 3

VII. OBSERVACIONES DE LA EMPRESA (EQUIPO INVESTIGADOR, DR SST, JEFE INMEDIATO Y COPASST)

1. EJECUTAR PLANES DE ACCION PROPUESTOS PARA LA MITIGACION DE NUEVOS EVENTOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO

2. ESTABLECER ACCIONES CORRECTIVAS Y REALIZAR SEGUIMIENTO EN FUNCIONES OPERATIVAS

3. HABILITAR EL ESPACIO DE TRABAJO SUFICIENTE QUE HAYA INNECESARIA LA REALIZACION DE GIROS DEL CUERPO NECESARIOS PARA MOVIMIENTO O TRASLADO DE MATERIALES

IX. MEDIDAS DE INTERVENCION

ACCIONES	TIPO DE MEDIDA P	M	I	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION	FECHA EJECUCION	FECHA SEGUIMIENTO	REGISTRO	FUE EFECTIVA
CAPACITACION DE AUTOCUIDADO				Kelly Barrero			capacitacion	si
SOCIALIZACION DEL PROCEDIMIENTO DE LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS				Kelly Barrero			chuza	si
Tecnicas correctas de agarre y traslado				Kelly Barrero			charla	si
Posiciones seguras de los nuevos				Kelly Barrero			charla	si

X. PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN

NOMBRE	C.C.	CARGO - AREA	FIRMA
KELLY YOANA BARRERO RODRIGUEZ	1.1120.380.579	SST	Kelly barrero

XI. DATOS DE LA INVESTIGACIÓN

FECHA DE LA INVESTIGACION	D	15	M	1	A	2020	LUGAR DE LA INVESTIGACION	TRABAJO MAYORCA [illegible]

372

1631

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO

NIT: 892000501-5
REPS: 5000100529
DIR: CALLE 37 A No. 28 53
TELEFONO: 6817901

INCAPACIDAD MÉDICA
Nº133256

INFORMACIÓN GENERAL

Entidad: 903790 SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
Lugar y Fecha de Expedición: Villavicencio 13/05/2026 2:50:05 p. m.
Nombre Paciente: ADRIAN ALEXANDER VILLA BUZON
Tipo Documento: Cédula_Ciudadanía **Número:** 1003379713
Tipo Paciente: Otro **Sexo:** Masculino
Edad: 23 Años / 5 Meses / 2 Días **F. Nacimiento:** 10 de diciembre de 2002
Médico: 19406885 CARLOS ALBERTO ARDILA QUINTANA

DETALLE DE LA INCAPACIDAD: Accidente_de_trabajo **Causa Externa:** Accidente_de_trabajo

Modalidad de la Prestación del Servicio: Intramural
Grupo de Servicios: ConsultaExterna **Incapacidad Retroactiva:** Ninguna
Presunto Origen: Comun
Causa Que Motiva la Atención:
Prórroga: No
Dias de Incapacidad: 30 **Fecha Inicial:** 13 de mayo de 2026 **Fecha Final:** 11 de junio de 2026

INCAPACIDAD POR 30 DIAS

Diagnóstico: S661 TRAUMATISMO DEL TENDON Y MUSCULO FLEXOR DE OTRO DEDO A NIVEL DE LA MUÑECA Y DE LA MANO
S661 TRAUMATISMO DEL TENDON Y MUSCULO FLEXOR DE OTRO DEDO A NIVEL DE LA MUÑECA Y DE LA MANO

Profesional: 19406885 - ARDILA QUINTANA CARLOS ALBERTO
Tipo Documento: CédulaCiudadanía
Registro Profesional: 13379
Especialidad: CIRUGIA DE LA MANO

323

1632

INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

ARL | sura

EPS a la que está afiliado	Código EPS	ARL a la que está afiliado	Código ARL
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	ARL SURA	46

AFP a la que está afiliado: PORVENIR — Código AFP: 230301

Identificación general de la empresa

Tipo de vinculador laboral: (•) Empleador ( ) Contratante ( ) Cooperativa de trabajo asociado

Nombre de la actividad económica

Construcción de otras obras de ingeniería civil. Incluye la construcción, conservación y reparación de instalaciones industriales (excepto edificios) como refinerías, fábricas de productos químicos, vías de navegación, obras portuarias y fluviales, puertas deportivas, instalaciones deportivas a de esparcimiento, esclusas, represas y diques, subdivisión de terrenos con mejora

Nombre o razón social: CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS JR SAS

Tipo de identificación: (•) NI ( ) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA — Número: 901407273

Dirección	Teléfono	Fax
CL 48Q SUR # 5C - 59	3103020413	

Correo electrónico	Departamento	Municipio	Zona
	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	(•) U ( ) R

Centro de trabajo donde labora el trabajador

Son los datos del centro de trabajo son los mismos de la sede principal? (•) Si ( ) No

Nombre de la actividad económica del centro de trabajo — Código de la actividad económica del centro de trabajo: 4111101

Construcción de edificios residenciales. Incluye la construcción de todo tipo de edificios residenciales: casas y edificios, montaje de cubiertas metálicas, puertas, ventanas, construcciones prefabricadas, reforma o renovación de estructuras

Dirección	Teléfono	Fax
CL 48 O SUR # 5 C - 49	5675975	

Departamento	Municipio	Zona
BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	(•) U ( ) R

Identificación de la persona que se accidentó

Tipo de vinculación: (•) Planta ( ) Misión ( ) Cooperado ( ) Estudiante o aprendiz ( ) Independiente — Código:

Primer apellido	Segundo apellido	Nombres
VILLA	BUZON	ADRIAN ALEXANDER

Tipo de identificación	Número	Fecha de nacimiento	Sexo
( ) NI (•) CC ( ) CE ( ) NU ( ) PA	1003378713	10/12/2002	(•) M ( ) F

Dirección	Teléfono	Fax
TV 94 # 22 I - 20 OFIC 203	3209201828	

Departamento	Municipio	Zona	Cargo
BOGOTA	BOGOTÁ, D.C.	(•) U ( ) R	AYUDANTE DE OBRA

Ocupación habitual	Tiempo de ocupación habitual al momento del accidente
OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES, NO CLASIFICADOS BAJO OTROS	0 meses 8 días

Fecha de ingreso a la empresa	Salario u honorarios (mensual)	Jornada de trabajo habitual
04/05/2026	1750905	(•) Diurno ( ) Nocturna ( ) Mixto ( ) Turnos

Información sobre el accidente

Fecha del accidente	Estaba dentro de la empresa?	Día de la semana en el que ocurrió el accidente
12/05/2026 11:20:00	S	martes

Jornada en que sucede	¿Estaba realizando su labor habitual?	¿Cuál?
(•) Normal ( ) Extra	(•) Si ( ) No	

¿Causó la muerte al trabajador?	Departamento del accidente	Municipio del accidente	Zona donde ocurrió el accidente
( ) Si (•) No	META	VILLAVICENCIO	(•) U ( ) R

Total tiempo laborado previo al accidente	Tipo de accidente
4:20	( ) Violencia ( ) Tránsito ( ) Deportivo ( ) Recreativo o cultural (•) Propios del trabajo

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

324

1633

Lugar donde ocurrió el accidente: (•) Dentro de la empresa ( ) Fuera de la empresa

Indique cuál sitio
- (•) Almacenes o depósitos
- ( ) Áreas de producción
- ( ) Áreas recreativas o deportivas
- ( ) Corredores o pasillos
- ( ) Escaleras
- ( ) Parqueaderos o áreas de circulación vehicular
- ( ) Oficinas
- ( ) Otras áreas comunes
- ( ) Otro

Parte del cuerpo aparentemente afectado
- ( ) Cabeza
- ( ) Ojo
- ( ) Cuello
- ( ) Tronco (incluye espalda, columna vertebral, médula espinal, pélvis)
- ( ) Tórax
- ( ) Abdomen
- ( ) Miembros superiores
- (•) Manos
- ( ) Miembros inferiores
- ( ) Pies
- ( ) Ubicaciones múltiples
- ( ) Lesiones generales o otras

Tipo de Lesión
- ( ) Fractura
- ( ) Luxación
- ( ) Torcedura o esguince, desgarro muscular, hernia o laceración de tendón sin herida
- ( ) Conmoción o trauma interno
- ( ) Amputación o enucleación
- (•) Herida
- ( ) Trauma superficial
- ( ) Golpe contusión o aplastamiento
- ( ) Quemadura
- ( ) Envenenamiento o intoxicación aguda o alergia
- ( ) Efecto del tiempo, del clima u otro relacionado con el ambiente
- ( ) Asfixia
- ( ) Efecto de la electricidad
- ( ) Efecto nocivo de la radiación
- ( ) Lesiones múltiples
- ( ) Otro

Agente del accidente (con que se lesionó el trabajador)
- ( ) Máquinas y/o equipos
- ( ) Medios de transporte
- ( ) Aparatos
- ( ) Herramientas, implementos o utensilios
- ( ) Materiales o sustancias
- ( ) Radiaciones
- ( ) Ambiente de trabajo (incluye superficies de tránsito y de trabajo, muebles, lejados, en el exterior, interior o subterráneos)
- (•) Otros agentes no clasificados
- ( ) Animales (vivos o productos animales)
- ( ) Agentes no clasificados por falta de datos

Mecanismos o formas del accidente
- ( ) Caída de personas
- (•) Caída de objetos
- ( ) Pisadas, choques o golpes
- ( ) Atrapamientos
- ( ) Sobreesfuerzo, esfuerzo excesivo o falso movimiento
- ( ) Exposición o contacto con temperatura extrema
- ( ) Exposición o contacto con la electricidad
- ( ) Exposición o contacto con sustancias nocivas o radiaciones o explosiones
- ( ) Golpes por o contra objetos
- ( ) Otro

Descripción del accidente

el trabajador Adrian Alexander villa Buzon aproximadamente alas 11 y 20 de la mañana estaba pasando una teja se le desliso ocasionandole una leccion abierta en la mano izquierda de los cuales estaba utilizando los elementos de proteccion cuyo guantes tambien fueron cortados aclarando que fue inclinando la teja hacia arriba

Personas que presenciaron el accidente

Hubo personas que presenciaron el accidente? (•) SI ( ) No

		Documento de identidad	No.
Apellidos y nombres	FABER SIERRA CASTRO	(•) CC ( ) TI ( ) CE ( ) NU ( ) PA	80775221
Cargo	OFICIAL		
Apellidos y nombres	ARMANDO ROSALIO MACHACON CAMPO	(•) CC ( ) TI ( ) CE ( ) NU ( ) PA	1043613351
Cargo	oficial		

Persona responsable del informe (Representante o delegado)

		Documento de identidad	No.
Apellidos y nombres	TOLOZA TOLOZA HAMINSSON RENE	(•) CC ( ) TI ( ) CE ( ) NU ( ) PA	1048846237
Cargo	director de obra		

ARL SURA
12/05/2026 12:50:31
12/05/2026 13:04:05
RECIBIDO

Fecha de diligenciamiento del informe del accidente

Fecha de recibido en ARL SURA

Fecha Impresión 12-05-2026

325

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1634

ARL | sura

Medellin, 12 de May de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS JR SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000010 OPERARIOS OBRAS		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1010241045	QUINTERO LOPEZ WILBER ALBERTO	13/05/2026		7JO240S3	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 12/05/2026 19:32:38 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.84.21.107, 192.230.104.13, 172.16.42.57

379

1683

ARL | sura

Medellin, 22 de April de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS JR SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000010 OPERARIOS OBRAS		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1043613351	MACHACON CAMPO ARMANDO ROSALIO	23/04/2026		15120715	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/04/2026 20:50:19 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.84.20.168, 192.230.104.17, 172.16.42.57

380

1636

ARL | sura

Medellín, 21 de April de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS JR SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000010 OPERARIOS OBRAS		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1080540101	GUILLEN OSPINO JEAN CARLOS	22/04/2026		154b2141	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/04/2026 22:49:23 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.84.20.168, 192.230.104.17, 172.16.42.57

381

1639

ARL | sura

Medellín, 01 de February de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS JR SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000010 OPERARIOS OBRAS		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1006904241	MONROY HERNANDEZ BREINER MAURICIO	02/02/2026		39284421	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 01/02/2026 22:05:29 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.84.20.168, 192.230.104.14, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

382

1638

ARL | sura

Medellín, 01 de February de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS JR SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000010 OPERARIOS OBRAS		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1006797343	SANABRIA REYES ANDREY SMITH	02/02/2026		63I46160	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 01/02/2026 22:07:49 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.84.20.168, 192.230.104.14, 172.16.42.57

383

1639

ARL | sura

Medellín, 26 de January de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS JR SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL BOGOTA DC		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C7331263	TOLOZA HOLGUIN ALCIDES	27/01/2026		20612921	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/01/2026 13:41:36 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.84.20.168, 192.230.104.14, 172.16.42.57

384

1640

ARL | sura

Medellín, 14 de May de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS JR SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000010 OPERARIOS OBRAS		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1121946659	MORENO GUATAPI ADRIAN EDUARDO	15/05/2026		c222T246	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 14/05/2026 17:18:26 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 45.238.183.151, 198.143.37.61, 172.16.42.57

385

1641

ARL | sura

Medellín, 03 de May de 2026

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS JR SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000010 OPERARIOS OBRAS		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1003379713	VILLA BUZON ADRIAN ALEXANDER	04/05/2026		a59205w1	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 03/05/2026 20:23:42 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.84.20.168, 192.230.104.17, 172.16.42.57

386

ARL | sura

Medellín, 24 de abril de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que KELLY YOANA BARRERO RODRIGUEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía 1120380979 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:
Fecha inicio cobertura: 25/02/2026 **Fecha fin cobertura.**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE
CONSORCIO INFRA - CR N902006911
ACTIVIDAD ECONÓMICA: 5411201 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS **CLASE DE RIESGO:** 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96% **CENTRO DE TRABAJO:** 0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC **CLASE:** 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO: 5411201 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA: 5411201 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS **CODIGO DE ACTIVIDAD:** 5411201 **CLASE DE RIESGO:** 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo 5 (6.96 %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11. Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. *La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.*
2. *El propio de la actividad ejecutada por el contratista.*

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:
C10238974602611454283

VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos al: 24/04/2026 3:04 PM

387

1643

Medellín, 01 de junio de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que LAURA DANIELA ALFEREZ TRUJILLO identificado(a) con cédula de ciudadanía 1121940652 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 02/06/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE
CONSORCIO INFRA - CR N902006911
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411201 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS
CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%
CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - PRINCIPAL BOGOTA DC
CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5411201 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5411201 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS
CODIGO DE ACTIVIDAD: 5411201
CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. *La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.*
2. *El propio de la actividad ejecutada por el contratista.*

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación importante. La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 01/06/2026 10:46 AM

1644

079

NIT. 902020368-2

INFORME DE INTERVENTORÍA APROBANDO LA PARCIAL

DIRECCION: CALLE 37A#19-27 BARRIO FLORENCIA
TELEFONO: 3124820191
CORREO: Consorcioccp2026@gmail.com
VILLAVICENCIO - META

389

1645

NIT. 902020368-2

INFORME DE INTERVENTORÍA PARA ACTA PARCIAL UNO DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TEATRO MAIPORE ROSITA HOYOS DE MEJIA DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO

CONSORCIO CC&P
VILLAVICENCIO META
2026

NIT. 902020368-2

REVISIÓN Y APROBACIÓN:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
LUIS ALFREDO MATEUS PARDO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	MARTHA I. ALVARADO JIMENEZ DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	LUCILA GOMEZ TORRES Directora CONCUMVI SUPERVISORA

ÍNDICE DE MODIFICACIONES:

VERSIÓN	FECHA	OBSERVACIONES

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 5
2.1 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 6
2.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 6
2.3 INFORMACIÓN CONTRATO APOYO A LA SUPERVISIÓN 7
2.4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 8
2.5 ALCANCE DEL PROYECTO 9
3. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE FISICO DE OBRA. 9
4. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN PROPUESTOS 10
6. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES 10
7 .MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD 11
8. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 11
9. GESTIÓN SOCIAL 15
10. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS 16
11. GARANTIAS 16
12. INFORME FINANCIERO 17
13 PERSONAL EN OBRA 17
14 MANEJO DE ESCOMBROS 18
15. ACTIVIDADES REALIZADAS AL CORTE ..... ¡Error! Marcador no definido.
17. ITEMS EJECUTADOS 26
18. PROYECCION PARA ACTA PERIODO ACTUAL 40
19. SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA 40
20.1 CONTROL DE AVANCE DE OBRA 43
21. REGISTRO FOTOGRÁFICO 45
22 CONCLUSIONES. 53

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a la información para el Acta de pago parcial de obra correspondiente al periodo 13 de febrero de 2026 y el 30 de mayo de 2026, en el marco del Contrato de Interventoria No. 356 de 2025, suscrito con la entidad Corporación Cultural Municipal de Villavicencio – CORCUMVI, cuyo objeto es realizar la supervisión integral del contrato de obra para el mejoramiento de la infraestructura fisica del Teatro Maiporé Rosita Hoyos de Mejia, ubicado en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta.

Este informe tiene como finalidad presentar de manera detallada el estado de avance del proyecto, las actividades ejecutadas durante el periodo evaluado, así como las acciones de seguimiento, control y verificación desarrolladas por la interventoria, en cumplimiento de las funciones establecidas dentro del contrato y de las disposiciones técnicas aplicables al proyecto.

El proyecto de mejoramiento del Teatro Maiporé Rosita Hoyos de Mejía constituye una intervención orientada al fortalecimiento de la infraestructura cultural del municipio de Villavicencio, mediante la adecuación, modernización y optimización de los espacios destinados a actividades artísticas, culturales y comunitarias. Estas intervenciones buscan mejorar las condiciones funcionales, técnicas y estéticas del escenario, garantizando espacios adecuados para el desarrollo de eventos culturales y el fortalecimiento de la oferta cultural de la ciudad.

Durante el periodo reportado se dio inicio formal a las actividades del contrato de obra, desarrollándose principalmente labores preliminares relacionadas con la instalación inicial del proyecto, adecuación del área de trabajo y desmonte de los elementos existentes en diferentes áreas del teatro, actividades necesarias para permitir la ejecución de las etapas constructivas posteriores contempladas dentro del alcance del proyecto.

En desarrollo de sus funciones, la interventoria ha realizado seguimiento permanente al desarrollo de las actividades ejecutadas por el contratista de obra CONSORCIO INFRA CR, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los procedimientos constructivos, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como el avance fisico del proyecto en relación con la programación establecida.

Adicionalmente, se han llevado a cabo comités de obra de carácter semanal, en los cuales participan representantes del contratista, la interventoria y la entidad contratante CORCUMVI, con el propósito de realizar recorridos técnicos en obra, revisar el estado de avance del proyecto, identificar posibles novedades y coordinar las actividades a ejecutar en los siguientes periodos de trabajo.

De esta manera, el presente informe consolida la información correspondiente al estado actual del proyecto durante el periodo reportado, permitiendo a la entidad contratante contar con un registro claro y actualizado del desarrollo de las actividades ejecutadas y del seguimiento realizado por la interventoría al contrato de obra.

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Con el fin de establecer el marco administrativo y contractual dentro del cual se desarrolla el proyecto, a continuación, se presenta la información correspondiente a los contratos de obra e interventoria asociados al mejoramiento de la infraestructura fisica del Teatro Maiporé Rosita Hoyos de Mejia, proyecto ejecutado bajo la supervisión de la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio – CORCUMVI.

El proyecto contempla la ejecución de actividades orientadas al mejoramiento y adecuación de la infraestructura existente del teatro, mediante intervenciones que permitirán optimizar las condiciones funcionales y operativas del escenario cultural.

En este sentido, la entidad contratante ha suscrito el correspondiente contrato de obra para la ejecución de las actividades constructivas, asi como el contrato de interventoría encargado de realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero y de control al desarrollo del proyecto.

2.1 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.	358-2025
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TEATRO MAIPORE ROSITA HOYOS DE MEJIA DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRA-CR
NIT.	902.006.911–4
CORREO ELECTRONICO	cs.infracr@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL S.	CARMEN JULIA RINCON CARRUYO
OBJETO INTERVENTORIA:	INTERVENTORIA INTEGRAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL TEATRO MAIPORE - ROSITA HOYOS DE MEJIA DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCI
INTERVENTORIA:	CONSORCIO CC&P
CORREO ELECTRONICO	consorcioccp26@gmail.com
LOCALIZACIÓN	VILLAVICENCIO META
VALOR INICIAL	$ 2'312.180.070 M/CTE
FECHA ACTA DE INICIO	13 DE FEBRERO DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	12 DE AGOSTO DEL 2026
ANTICIPO 30%	$ 693.654.021
SUSPENSION	N/A
%EJECUCIÓN ECONÓMICA A LA FECHA	10,47%
.ÑVALOR TOTAL EJECUCIÓN	$ 242.109.357.91

2.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ITEM	INFORMACIÓN
NÚMERO DE CONTRATO	356 de 2025
ENTIDAD CONTRATANTE	Corporación Cultural Municipal de Villavicencio – CORCUMVI
INTERVENTORÍA	CONSORCIO CC&P
OBJETO	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y de control al contrato de obra para el mejoramiento de la infraestructura física del Teatro Maiporé Rosita Hoyos de Mejía
FECHA DE INICIO	13 de febrero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	12 de agosto de 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 meses

VALOR DEL CONTRATO	$245.108.596.00
ESTADO DEL CONTRATO	En ejecución
CORREO ELECTRONICO	Consorcioccp26@gmail.com

2.3 INFORMACIÓN CONTRATO APOYO A LA SUPERVISIÓN

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE SUPERVISOR	LUCILA GÓMEZ TORRES
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN	JULIO ALBERTO ORTIZ GARCÍA

2.4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO









El proyecto se desarrolla en las instalaciones del **Teatro Maiporé Rosita Hoyos de Mejía**, escenario cultural ubicado en la ciudad de **Villavicencio, departamento del Meta**, el cual constituye uno de los principales espacios destinados al desarrollo de actividades culturales, artísticas y comunitarias del municipio. El teatro se encuentra en una zona urbana consolidada, con acceso a vías principales, lo cual facilita el ingreso de personal, materiales y equipos necesarios para la ejecución del proyecto.

La intervención contempla el mejoramiento de diferentes áreas del teatro, con el propósito de optimizar las condiciones de funcionamiento del escenario y garantizar espacios adecuados para el desarrollo de eventos culturales.

2.5 ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto de mejoramiento de la infraestructura del Teatro Maiporé Rosita Hoyos de Mejía contempla la ejecución de diversas actividades orientadas a la adecuación, renovación y optimización de los espacios existentes dentro del teatro.

Entre las principales intervenciones contempladas dentro del proyecto se incluyen actividades relacionadas con:

- Demoliciones y desmontes de elementos existentes.
- Adecuaciones arquitectónicas de espacios interiores.
- Mejoramiento y adecuación del escenario.
- Mejoramiento de condiciones funcionales y operativas del teatro.
- Instalación y adecuación de elementos constructivos requeridos para el correcto funcionamiento del escenario cultural.

Estas actividades se desarrollarán de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos y documentos contractuales establecidos para el proyecto.

3. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE FISICO DE OBRA.

MENSUAL	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
MES UNO FEBRERO	12,00%	$ 277.461.608,4	12,00%	$ 277.461.608,4	1,29%	$ 29.827.122,9	1,29%	$ 29.827.122,9
MES DOS MARZO	16,00%	$ 369.948.811,2	28,00%	$ 647.410.419,6	0,63%	$ 14.566.734,4	1,92%	$ 44.393.857,3
MES TRES ABRIL- 14 MAYO 2026	7,33%	$ 169.482.799,1	7,33%	$ 169.482.799,1	8,55%	$ 197.691.396,0	10,47%	$ 242,109,357,91
MES SEIS MAYO	20,67%	$ 477.927.620,5	28,00%	$ 647.410.419,6				
MES SIETE JUNIO	42,33%	$ 978.745.823,6	70,33%	$ 1.626.156.243,2				
MES OCHO JULIO	29,67%	$ 686.023.826,8	100,00%	$ 2.312.180.070,0				



4. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN PROPUESTOS

Durante el periodo comprendido entre el 13 de febrero de 2026 y el 30 de mayo de 2026, no se presentaron situaciones de tipo técnico que comprometieran la calidad de las actividades ejecutadas en el proyecto, ni se recibieron quejas formales relacionadas con el desarrollo de la obra.

No obstante, continuó evidenciándose afectación en el avance programado de las actividades constructivas, derivada de retrasos acumulados en la ejecución de la obra, situación que impactó el cumplimiento de la programación inicialmente establecida. En atención a lo anterior, y como resultado de los requerimientos realizados por la interventoría en el periodo anterior, el contratista presentó formalmente un plan de contingencia, una reprogramación de obra y la respectiva ruta crítica actualizada, con el propósito de mitigar el atraso existente y garantizar la recuperación progresiva del cronograma contractual.

Dentro de las medidas correctivas y mecanismos de solución propuestos por el contratista, se contempló la ampliación de las jornadas laborales, estableciendo horarios de trabajo de lunes a viernes entre las 7:00 a.m. y las 9:00 p.m., así como jornadas los fines de semana entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m., con el fin de incrementar el rendimiento operativo y optimizar los tiempos de ejecución.

Adicionalmente, se propuso el fortalecimiento del recurso humano mediante la vinculación de mayor personal administrativo y operativo, así como el aumento de cuadrillas de trabajo especializadas, permitiendo desarrollar actividades de manera simultánea en diferentes frentes de obra y mejorar la capacidad de respuesta frente a las actividades pendientes.

6. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

NORMA	APLICACIÓN	RESULTADO
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente- NSR-10.	**N/A**	N/A
Invias. < Norma colombiana de diseño de puentes, Manual de señalización vial, etc....>	N/A	N/A
Reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico - RAS.	N/A	N/A
Norma técnica colombiana < Instalaciones y Ambientes Escolares,		

Servicios de Salud, Infraestructura deportiva y recreativa, Adoquines y losetas, gas domiciliario, sistemas contra incendio, etc....>	N/A	N/A
Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE- RETILAP	N/A	N/A
Decreto único Reglamentario del sector Ambiental y desarrollo sostenible.	N/A	N/A
Decreto del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.	N/A	N/A
Otras.	N/A	N/A

7 .MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	NORMA
Densidad en terreno Ensayo a compresión en cilindros de concreto C.B.R Muestra inalterada Flexión de Vigas de Concreto Rodadura Asfáltica Límite de Consistencia Desgaste Proctor Gradación Abrasión de Agregados en la Máquina de los ángeles Granulometría Equivalente de Arena otros (Especificar)	N/A

8. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA	ACTIVIDAD SGSST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
13/04/2026	Señalización de áreas de riesgo	Se instalan señales preventivas y restrictivas en zonas de peligro.
20/04/2026	Charlas de seguridad y salud en el trabajo	Se sensibiliza al personal sobre riesgos específicos del área y medidas preventivas
27/04/2026	Verificación de uso de EPP	Se evidencia cumplimiento parcial; se refuerzan medidas disciplinarias y

		capacitación.
30/04/2026	Orden y aseo en áreas de trabajo	Se realiza jornada de limpieza; se mejora la organización y reducción de riesgos locativos.
05/05/2026	Pausas activas laborales	Se promueve la realización de ejercicios de estiramiento para prevenir lesiones osteomusculares.

Durante el periodo comprendido entre el 13 de febrero de 2026 y el 30 de mayo de 2026, la interventoría realizó seguimiento permanente a la implementación y cumplimiento de las medidas establecidas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), verificando las condiciones de seguridad presentes durante la ejecución de las actividades relacionadas con el montaje de la estructura metálica y la instalación de las tejas tipo sándwich de la cubierta del teatro.

Teniendo en cuenta que las actividades desarrolladas durante el periodo involucraron trabajos en alturas, manipulación de estructuras metálicas y uso de herramientas y equipos especializados, se efectuó control y supervisión continua de las condiciones de seguridad industrial y prevención de riesgos laborales, con el fin de garantizar la integridad física del personal operativo y técnico presente en obra.

Durante las visitas e inspecciones realizadas, se evidenció:

- Uso adecuado y permanente de Elementos de Protección Personal (EPP) por parte del personal, incluyendo casco, botas de seguridad, guantes, gafas de protección, arnés y líneas de vida para trabajos en altura.
- Supervisión y control de actividades de trabajo seguro en alturas, verificando el correcto uso de sistemas de protección contra caídas, puntos de anclaje y condiciones seguras de acceso y desplazamiento sobre la cubierta.
- Implementación y mantenimiento de señalización preventiva y delimitación de áreas de trabajo, especialmente en zonas de riesgo asociadas al montaje de estructura metálica y manipulación de materiales.
- Disponibilidad y verificación de equipos de atención de emergencias, tales como extintores, botiquines y camilla de emergencia.
- Seguimiento a las condiciones de orden y aseo en obra, minimizando riesgos asociados a caídas, tropiezos y acumulación de materiales o residuos.
- Control en el almacenamiento y manipulación de materiales metálicos y herramientas de trabajo, garantizando condiciones seguras para el personal operativo.
- Verificación de puntos de hidratación y condiciones básicas de bienestar para el personal presente en obra.

Asimismo, el componente SST desarrolló actividades de capacitación y sensibilización dirigidas al personal operativo, mediante charlas periódicas enfocadas en:

- Prevención de accidentes laborales.
- Uso adecuado de Elementos de Protección Personal (EPP).
- Trabajo seguro en alturas.
- Manipulación segura de herramientas y materiales.
- Orden y aseo en el área de trabajo.
- Identificación y reporte de condiciones inseguras.

Se evidenció participación activa del personal en las jornadas de capacitación y cumplimiento general de las medidas preventivas establecidas para el desarrollo de las actividades ejecutadas durante el periodo.

De igual manera, se realizó seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas dentro del SG-SST por parte del contratista, verificando la implementación de controles preventivos y correctivos orientados a reducir la probabilidad de incidentes y fortalecer la cultura de seguridad y autocuidado en obra.

Finalmente, las medidas implementadas durante el periodo contribuyeron a mantener condiciones adecuadas de seguridad para el desarrollo de las actividades constructivas, garantizando el bienestar del personal y promoviendo el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.







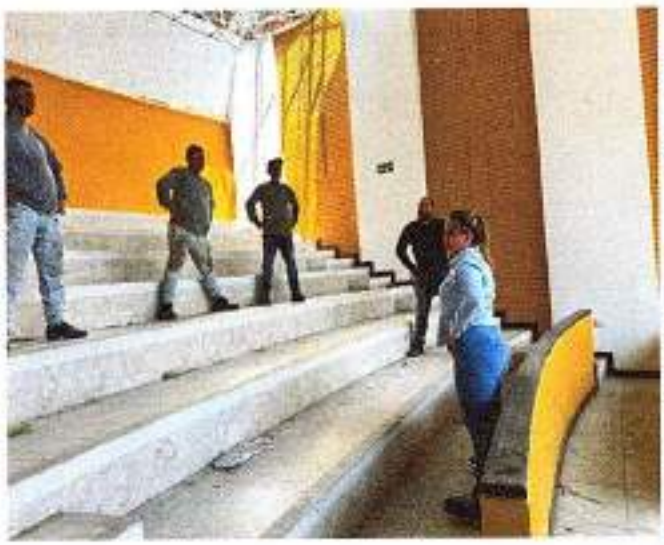







9. GESTIÓN SOCIAL

EMPLEO	CANTIDAD
Total empleos generados:	16
Empleos directos generados:	13
Empleos indirectos generados:	3

EMPLEO	CANTIDAD
Población Urbana y/o Rural	N/A
Agrícola	N/A
Ganadero	N/A
Escolar	N/A
Comercial	N/A
Hoteles	N/A

10. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

11. GARANTIAS

PÓLIZA DE CONFORMIDAD SEGÚN FIRMA DE CONTRATO DE OBRA			
Póliza de Cumplimiento N°	**400070374**		
Expedida por:	NACIONAL DE SEGUROS		
Fecha de expedición:	18 Febrero 2026		
AMPARO	VIGENCIA		$ ASEGURADO
	Fecha Inicial	Fecha Final	
Cumplimiento Del Contrato	13/02/2026	12/12/2026	$ 490.359.811,40
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales	13/02/2026	12/08/2029	$ 122.589.952,85
Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo	13/02/2026	12/12/2026	$735.539.717,10
Estabilidad De La Obra	12/08/2026	12/08/2031	$ 490.359.811,40

PÓLIZA DE CONFORMIDAD SEGÚN FIRMA DE CONTRATO DE OBRA	
Póliza de Cumplimiento	**400070375**
Expedida por:	NACIONAL DE SEGUROS
Fecha de expedición:	18 Febrero 2026

AMPARO	VIGENCIA		$ ASEGURADO
	Fecha Inicial	Fecha Final	
Predios, Labores Y Operaciones-Plo	13/02/2026	12/08/2026	525.285.000
Contratistas Y Subcontratistas	13/02/2026	12/08/2026	525.285.000
Perjuicios Extrapatrimoniales	13/02/2026	12/08/2026	525.285.000
Responsabilidad civil patronal	13/02/2026	12/08/2026	525.285.000
Responsabilidad Civil Cruzada	13/02/2026	12/08/2026	525.285.000

12. INFORME FINANCIERO

Pagos realizados

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
TOTALES			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

13 PERSONAL EN OBRA

NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE CEDULA	CARGO
JEFFERSON SMIT RIVERA VELASQUEZ	1090396681	DIRECTOR DE OBRA
JULIAN DAVID LERMA L	1121879078	RESIDENTE DE OBRA
KELLY YOANA BARRERO	112080979	HSE
FAIBER SIERRA CASTRO	80775221	MAESTRO
ANDREY SMITH SANABRIA REYES	1006797343	AYUDANTE
ALCIDES TOLOZA HOGUIN	7331263	AYUDANTE

EDWIN FABIAN BALLESTEROS CRUZ	1123434696	AYUDANTE
JEAN CARLOS GUILLEN OSPINOTA	1.080.540.101	AYUDANTE
ARMANDO ROSALIO MACHACON CAMPO	1.043.613.351	AYUDANTE
ADRIAN ALEXANDER VILLA BUZON	1.003.379.713	AYUDANTE

Durante el periodo evaluado, el contratista dispuso del personal mencionado para la ejecución de las actividades. El señor Edwin Fabian Ballesteros Cruz, trabajó en obra hasta el día 15 de abril, el señor Jean Carlos Guillen Ospinota ingresó a trabajar en la obra el día 24 de abril y se retiró el día 03 de mayo, el señor Armando Rosalio Machacon Campo ingresó el día 24 de abril y sigue laborando hasta la fecha de corte del presente informe, el señor Adrián Alexander Villa Buzón ingresó a trabajar el día 05 de mayo y sigue laborando hasta la fecha de corte del presente informe.

La interventoría verificó la presencia del personal en obra, afiliaciones y el cumplimiento de las actividades asignadas, evidenciando una adecuada organización del recurso humano para el desarrollo de las labores preliminares.

14 MANEJO DE ESCOMBROS

Durante el periodo comprendido entre el 13 de abril de 2026 y el 12 de mayo de 2026, se realizó el retiro de los residuos producto de las actividades de desmonte y demolición ejecutadas en el área del teatro, dando continuidad a las medidas de manejo y disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) establecidas para el proyecto.

Las actividades de evacuación de escombros se llevaron a cabo los días 16, 17 y 18 de abril de 2026, mediante tres (3) viajes en vehículo tipo bolqueta, efectuándose un viaje por cada jornada de trabajo. Durante dichas actividades se realizó el cargue, transporte y retiro del material acopiado temporalmente dentro del área de intervención, incluyendo escombros y residuos derivados de las actividades previas de desmonte.

La interventoría realizó seguimiento a las labores ejecutadas, verificando que el manejo, cargue y retiro de los residuos se desarrollara bajo condiciones adecuadas de orden, seguridad y limpieza, evitando afectaciones al entorno inmediato y permitiendo mantener condiciones apropiadas para la continuidad de las actividades constructivas en el proyecto.

Asimismo, se evidenció organización y control en las áreas intervenidas posterior al retiro del material, contribuyendo a mejorar las condiciones de circulación, seguridad y operatividad dentro del frente de obra.



1659

NIT. 902020368-2

13 ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA

CONDICIONES INICIALES						PRESENTE ACT	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR/UNITARIO	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL
	PRELIMINARES						
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	660,3	$ 4.229,00	$ 2.792.408,70	660,3	$ 2.792.408,
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2,10M ESTRUCTURA MADERA COMUN BASES EN CONCRETO 2000PSI	ML	10.85	$ 80,905.00	$ 877,819.25	10.85	$ 877,81
	SUB TOTAL PRELIMINARES						**$ 3.670.227,9**
2.1	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL ALTURA MAYOR A 3M. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE	m2	116.976	$ 16,091.00	$ 1,882,260.82	70,27	$ 1,130.7
2.2	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	m2	28.94	$ 29,063.00	$ 841,083.22	20	$ 581.16

2.3	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	20	$ 43,092.00	$ 861,840.00	20.00	$ 861,8
2.4	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O ALMACENAMIENTO.	UND	7	$ 40,086.00	$ 280,602.00	7.00	$ 280,6
2.5	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O ALMACENAMIENTO. CARGUE MANUAL	Und	8	$ 50,107.00	$ 400,856.00	7.00	$ 350,7
2.6	DEMOLICION MUROS SOPORTE LAVAMANOS	UND	4	$ 133,937.00	$ 535,748.00	4.00	$ 535,7
2.7	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	19.20	$ 19,211.00	$ 368,851.20	19.20	$ 368,8
2.8	DESMONTE DE LUMINARIAS DE CIELO RASO. INCLUYE TRASLADO HASTA PUNTO DE ACOPIO ALTURA MAYOR 3,00M HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	UND	25	$ 14,124.00	$ 353,100.00	25	$ 353,1

2.9	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND	9	$ 107,750.00	$ 969,750.00	5	$ 538.75
2.18	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	7,16	$ 69,660	$ 498,417.30	3,98	$ 277.246,8
2.19	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	14,31	$ 33.372,00	$ 477.553,32	10	$ 333.120
2.20	ESTUCO PLASTICO	M2	14,31	$ 21.624,00	$ 309.439,44	10	$ 216.240,
	SUB TOTAL						**$ 5.828.821,57**
3.1	DESMONTE DE LUMINARIAS DE CIELO RASO EN AUDITORIO Y REJILLAS DE VENTILACION. INCLUYE TRASLADO HASTA PUNTO DE ACOPIO ALTURA MAYOR A 3M	Und	30.00	$ 14,124.00	$ 423,720.00	30	$ 423,72

1669

NIT. 902020368-2

3.2	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL, ALTURA MAYOR A 4M CON APOYO EN SUPERFICIE ESCALONADA - INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	338.20	$ 30,414.00	$ 10,286,014.80	194,61	$ 5.918.86
3.3	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL, AILTURA HASTA 3M CON APOYO EN SUPERFICIE ESCALONADA - INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	115.50	$ 10,514.00	$ 1,214,367.00	115.50	$ 1,214,3
3.4	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y PARED EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	16.43	$ 18,051.00	$ 296,650.13	11,27	$ 203.4
3.16	DESMONTE Y RETIRO DE SILLAS EXISTENTES	UND	466.00	$ 50,107.00	$ 23,349,862.00	466	$ 23,349,8
	SUB TOTAL						**$ 31.110.252**
5,1	DESMONTE DE UNA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA, TUBERIAS ELECTRICAS, CAJAS Y CABLEADO DETERIORADO A UNA AL TURA DE 8 MTS	M2	453,70	$ 60,005,00	$27,677,968,50	453,70	$27,677,968,5
	SUB TOTAL						**$ 27,677,968**
6,1	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE	M2	355,30	$25,547,00	$9,076,849,10	310,11	$7.922.380,17

1668

NIT. 902020368-2

	ALMACENAMIENTO						
6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 250C CAL. 26 PREPINTADA. INCLUYE ICOPOR O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	355,30	$274,523,00	$97,538,021,90	310,11	$85,132.327,53
6.3	LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET INCLUYE RETIRO DE MANTO AFECTADO	M2	185,00	$ 12.709,00	$ 2.351.165,00	125,00	$ 1.588.625
6,4	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE (REPINTAR, RESOLDAR, ACONDICIONAR ELEMENTOS EXISTENTES)	M2	355,30	$172,408,00	$61,256,562,40	310,11	$53.465.444,88
6.5	DEMOLICION MANUAL MORTERO PISO 0.05 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	60	$5.011,00	300.660,00	50	$250.550,00
6,12	PERFIL RECTAN 120X60X2.5 MM ASTM A-500	M2	128,59	$118,304,00	$15,212,119,84	120	$ 14.196.480,0
8.1	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	88	$281.657,00	$24.785.816,00	40	$11.266.280,0
	SUB TOTAL						
VALOR COSTO DIRECTO DEL CONTRATO				**$1,765,022,954.19**		**$ 184,816,303,75**	

1669

NIT. 902020368-2

ADMINISTRACION (26%)	$ 458,905,968.09		$ 48,052,238,97
IMPREVISTOS (1%)	$ 17,650,229.54		$ 1,848,163,04
UTILIDADES (4%)	$ 70,600,918.17		$7,392,652,15
TOTAL AIU	$ 547,157,115.80		$ 57,293,054,16
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2,312,180,070.00		$ 242,109,357.91
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 30%	$ 693,654,021.00		

NIT. 902020368-2

14. ITEMS EJECUTADOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD INCIAL	UNIDAD	ACTA PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	660.30	ML	660.30	660.30

ESQUEMA





PLANTA PRIMER NIVEL



OBSERVACIÓN:

Se realiza levantamiento topográfico del teatro rosita hoyos para verificar las dimensiones y tener claridad de las áreas donde se va intervenir

NIT. 902020368-2

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD INCIAL	UNIDAD	ACTA PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2,10M ESTRUCTURA MADERA COMUN BASES EN CONCRETO 2000PSI	10.85	ML	10.85	10.85

ESQUEMA





OBSERVACIÓN:

El cerramiento provisional inicialmente contemplado en tela verde fue modificado, ejecutándose con láminas de tipo Etherboard, con el fin de mejorar la presentación y la delimitación visual del área de obra."

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD INCIAL	UNIDAD	ACTA PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA
2.1	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL ALTURA MAYOR A 3M. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE	116.98	M2	70.27	70.27

ESQUEMA





OBSERVACIÓN:

"La actividad se ejecutó conforme a lo previsto, realizando el desmonte del cielo raso existente y el traslado del material retirado hasta el punto de acopio o sitio de carga para su posterior disposición."

NIT. 902020368-2

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD INCIAL	UNIDAD	ACTA PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA
2.2	DEMOLICION MANUAL BALDOSAPISOE=0.07M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	20.00	M2	20.00	20.00

ESQUEMA




OBSERVACIÓN:

"Durante la ejecución de la actividad se realizó el desmonte de siete (7) sanitarios existentes, incluyendo su respectivo traslado al sitio de carga o almacenamiento. Se deja constancia de que en sitio únicamente se encontraron siete (7) unidades instaladas, aunque en la cantidad inicial del ítem se contemplaban ocho (8)."

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD INCIAL	UNIDAD	ACTA PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA
2.3	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	20	M2	20	20

ESQUEMA


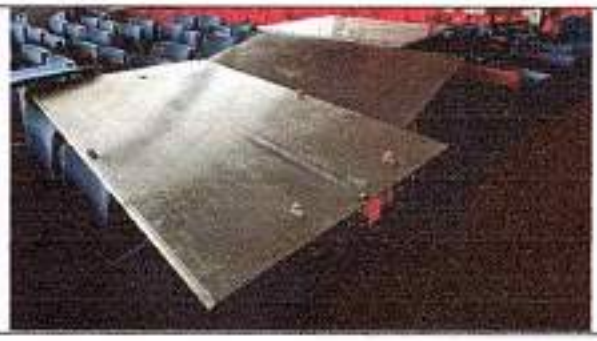

OBSERVACIÓN:

"La actividad se ejecutó realizando el desmonte de las divisiones modulares metálicas existentes en los baños y su respectivo traslado y almacenamiento en el almacén dispuesto en la ciudad de Villavicencio."

NIT. 902020368-2

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD INCIAL	UNIDAD	ACTA PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA
2.4	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O ALMACENAMIENTO.	7	UND	7	7

ESQUEMA





OBSERVACIÓN:

"La actividad se ejecutó mediante el desmonte de siete (7) lavamanos existentes, realizando el retiro cuidadoso de los elementos y accesorios, e incluyendo su traslado hasta el sitio de carga o descarga dispuesto en obra."

16.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD INCIAL	UNIDAD	ACTA PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA
2.5	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O ALMACENAMIENTO.	8	UD	7	7

ESQUEMA





OBSERVACIÓN:

"Durante la ejecución de la actividad se realizó el desmonte de siete (7) sanitarios existentes, incluyendo su respectivo traslado al sitio de carga o almacenamiento. Se deja constancia de que en sitio únicamente se encontraron siete (7) unidades instaladas, aunque en la cantidad inicial del ítem se contemplaban ocho (8)."

NIT. 902020368-2

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD INCIAL	UNIDAD	ACTA PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA
2.6	DEMOLICION MUROS SOPORTE LAVAMANOS	4	UND	4	4

ESQUEMA




OBSERVACIÓN:

"Se realizó la demolición de cuatro (4) muros soporte de lavamanos en material tipo cuarzón, retirando los elementos existentes donde se encontraban empotrados los lavamanos, e incluyendo el manejo y retiro del material producto de la demolición hacia el sitio de acopio dispuesto en obra."

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD INCIAL	UNIDAD	ACTA PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA
2.7	DEMOLICIÓN MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	19.20	UND	19.20	19.20

ESQUEMA




OBSERVACIÓN:

"sé realizo la demolición de muros para ampliación de los baños de los hombres tanto de las mujeres del primer piso también se realizó la demolición para hacer la puerta de acceso para la bodega del cuarto piso en zona de proyección

NIT. 902020368-2

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD INCIAL	UNIDAD	ACTA PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA
2.8	DESMONTE DE LUMINARIAS DE CIELO RASO. INCLUYE TRASLADO HASTA PUNTO DE ACOPIO ALTURA MAYOR 3.00M	25	UND	25	25

ESQUEMA





OBSERVACIÓN:

"Se realizó el desmonte de veinticinco (25) luminarias redondas instaladas en el cielo raso, efectuando su retiro cuidadoso y el respectivo traslado hasta el punto de acopio dispuesto en obra."

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD INCIAL	UNIDAD	ACTA PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA
2.9	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	9	UND	5	5

ESQUEMA





OBSERVACIÓN:

"Se realizó el desmonte de veinticinco (25) luminarias redondas instaladas en el cielo raso, efectuando su retiro cuidadoso y el respectivo traslado hasta el punto de acopio dispuesto en obra."

NIT. 902020368-2

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD INCIAL	UNIDAD	ACTA PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA
2.18	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	7.16	M2	3.98	3.98

ESQUEMA




OBSERVACIÓN:

se realiza la actividad de levantar el muro de división de los baños de los hombres en el primer piso para dejar su aplicación de acuerdo a las medidas de los planos de diseño

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD INCIAL	UNIDAD	ACTA PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA
2.19	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	14.31	M2	10.00	10.00

ESQUEMA




OBSERVACIÓN:

se realiza la actividad de levantar el muro de división de los baños de los hombres en el primer piso para dejar su aplicación de acuerdo a las medidas de los planos de diseño

NIT. 902020368-2

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD INCIAL	UNIDAD	ACTA PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA
			M2	10.00	
2.20	ESTUCO PLASTICO	14.31			10.00

ESQUEMA





OBSERVACIÓN:

Se realiza la actividad de estucar los muros que se levantaron nuevos como son el del baño de los hombres, también se estuca algunas paredes de las bodegas de zona de proyección

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD INCIAL	UNIDAD	ACTA PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA
			UD	30	
3.1	DESMONTE DE LUMINARIAS DE CIELO RASO EN AUDITORIO Y REJILLAS DE VENTILACION. INCLUYE TRASLADO HASTA PUNTO DE ACOPIO ALTURA MAYOR A 3M	30			30

ESQUEMA

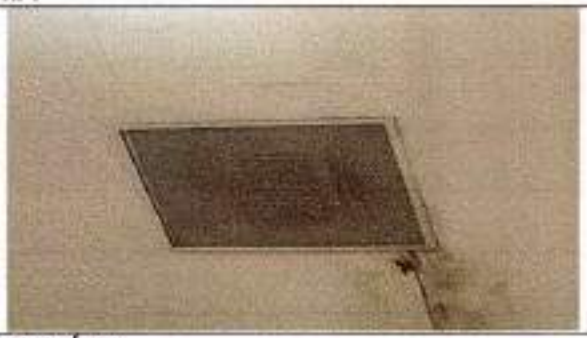



OBSERVACIÓN:

SE DESMONTAN LAS LUMINARIAS DEL CIELO RAZO EN AUDITORIO CON LAS REJILLAS DE VENTILACION SE DESMONTARON APROXIMADAMENTE 30 UNIDADES Y SE LLEVARON AL PUNTO DE ACOPIO

NIT. 902020368-2

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD INCIAL	UNIDAD	ACTA PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA
3.2	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL, ALTURA MAYOR A 4M CON APOYO EN SUPERFICIE ESCALONADA - INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	338.20	M2	194.61	194.61

ESQUEMA




OBSERVACIÓN:

DESMONTE DE CIELO RAZO A UNA ALTURA MAYOR A 4 METROS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD INCIAL	UNIDAD	ACTA PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA
3.3	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL, AILTURA HASTA 3M CON APOYO EN SUPERFICIE ESCALONADA - INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	115.50	M2	115.50	115.50

ESQUEMA




OBSERVACIÓN:

DESMONTE DE CIELO RAZO A UNA ALTURA HASTA 3 METROS

NIT. 902020368-2

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD INCIAL	UNIDAD	ACTA PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA
3.4	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y PARED EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	16.43	UND	11.27	11.27

ESQUEMA




OBSERVACIÓN:

"Se realizó el desmonte de la estructura y pared en drywall existente, incluyendo la demolición de los elementos instalados, recolección del material resultante y su respectivo cargue y traslado al sitio dispuesto para la disposición de escombros."

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD INCIAL	UNIDAD	ACTA PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA
3.16	DESMONTE Y RETIRO DE SILLAS EXISTENTES	466	UND	466	466

ESQUEMA




OBSERVACIÓN:

"Se realizó el desmonte y retiro de cuatrocientas sesenta y seis (466) sillas existentes, efectuando su traslado y entrega en el almacén dispuesto por la Alcaldía para su respectivo almacenamiento.

NIT. 902020368-2

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD INCIAL	UNIDAD	ACTA PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA
5.1	DESMONTE DE UNA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA, TUBERIAS ELECTRICAS, CAJAS Y CABLEADO DETERIORADO A UNA AL TURA DE 8 MTS	453.70	UND	453.70	453.70

ESQUEMA





OBSERVACIÓN:

"incluye desmontaje y retiro de tuberías eléctricas, cajas, soportes, accesorios y cableado deteriorado; desconexión segura de los circuitos existentes

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD INCIAL	UNIDAD	ACTA PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA
6,1	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	355,30	M2	310.11	310.11

ESQUEMA





OBSERVACIÓN:

incluye retiro manual y controlado de las tejas existentes, cumpliendo protocolos de seguridad y manejo de material con contenido de fibrocemento; desmontaje de fijaciones y accesorios asociados; descenso y manipulación cuidadosa del material para evitar fracturas

NIT. 902020368-2

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD INCIAL	UNIDAD	ACTA PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA
6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 250C CAL. 26 PREPINTADA. INCLUYE ICOPOR O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	355,30	M2	310.11	310.11

ESQUEMA




OBSERVACIÓN:

incluye suministro, transporte, izaje e instalación de panel metálico termoacústico tipo sándwich calibre 26 prepintado, con núcleo aislante en icopor (EPS) o material similar; fijaciones, traslapos, sellos y remates necesarios para su correcta instalación y funcionamiento

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD INCIAL	UNIDAD	ACTA PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA
6,3	LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET INCLUYE RETIRO DE MANTO AFECTADO	185.00	M2	125.00	125.00

ESQUEMA




OBSERVACIÓN:

Se realizo lavado con la hidro lavadora de alta presión quitando los residuos

NIT. 902020368-2

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD INCIAL	UNIDAD	ACTA PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA
6,4	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE (REPINTAR, RESOLDAR, ACONDICIONAR ELEMENTOS EXISTENTES)	355,30	M2	310.11	310.11

ESQUEMA




OBSERVACIÓN:

incluye limpieza y preparación de superficies metálicas, retiro de óxido y pintura deteriorada, aplicación de pintura anticorrosiva y acabado; resoldado y refuerzo de uniones o elementos estructurales existentes

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD INCIAL	UNIDAD	ACTA PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA
6,5	DEMOLICION MANUAL MORTERO PISO 0.05 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	60.00	M2	50.00	50.00

ESQUEMA




OBSERVACIÓN:

Se realiza la demolición de piso azotea

NIT. 902020368-2

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD INCIAL	UNIDAD	ACTA PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA
6,12	PERFIL RECTAN 120X60X2.5 MM ASTM A 500	128.59	M2	120.00	120.00

ESQUEMA





OBSERVACIÓN:

se instala el perfil rectangular para la cubierta con el fin de poderla atornillar con la estructura

17. PROYECCION PARA ACTA PERIODO ACTUAL

	VALOR PROYECTO	$ 2,312,180,070.00 M/CTE

FECHA	% EJECUTADO DEL 13 ABRIL AL 12 MAYO	VALOR EJECUTADO DEL PERIDO	AMORTIZACIÓN	NETO	ACUMULADO EJECUTADO	
					$	%
13 ABRIL al 12 de MAYO	10,47 %	$ 242.109.357,91	$72.632.807,37	$ 169,476,550,54	$ 242,109.357,91	10,47%

18. SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA

Durante el periodo comprendido entre el 12 de abril de 2026 y el 30 de mayo de 2026, la interventoria realizó seguimiento técnico, administrativo y de control al desarrollo de las actividades ejecutadas por el contratista CONSORCIO INFRA CR, en el marco del contrato de obra para el mejoramiento de la infraestructura fisica del Teatro Maiporé Rosita Hoyos de Mejia.

El seguimiento efectuado durante el periodo tuvo como finalidad verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las condiciones contractuales y los procedimientos constructivos asociados a las actividades desarrolladas en obra, así como realizar control permanente sobre el avance fisico del proyecto, el recurso humano implementado y las condiciones generales de seguridad y operatividad del frente de trabajo.

Durante el periodo evaluado, la interventoria realizó visitas técnicas periódicas mediante recorridos de inspección en campo, en los cuales se efectuó revisión detallada de las actividades relacionadas con desmontes, adecuaciones preliminares, intervención de cubierta y ejecución de trabajos asociados a la estructura metálica del teatro.

A diferencia del periodo anterior, durante el presente corte se evidenció reactivación y mayor continuidad en la ejecución de actividades constructivas, principalmente asociadas a la intervención de la cubierta del teatro y a la ejecución de actividades complementarias necesarias para el desarrollo de las siguientes etapas del proyecto.

Entre las principales actividades verificadas por la interventoría durante el periodo evaluado se encuentran:

a. Desmonte de infraestructura eléctrica, tuberías, cajas y cableado deteriorado en alturas aproximadas de 8 metros.

b. Desmonte manual y controlado de teja de asbesto cemento existente, incluyendo retiro y traslado del material desmontado.

c. Suministro e instalación de cubierta tipo sándwich calibre 26 prepintada, incluyendo núcleo termoacústico y elementos de fijación requeridos.

d. Mantenimiento general de la estructura metálica existente de cubierta, incluyendo actividades de limpieza, resoldado, acondicionamiento y aplicación de pintura anticorrosiva.

e. Suministro e instalación de perfiles estructurales rectangulares para adecuaciones y refuerzos metálicos requeridos dentro del sistema de cubierta.

La interventoría realizó seguimiento permanente a la correcta ejecución de dichas actividades, verificando en sitio la calidad de los materiales instalados, los procedimientos constructivos implementados y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los documentos contractuales.

Asimismo, se efectuó control permanente a las actividades desarrolladas en altura, verificando el cumplimiento de los protocolos de seguridad industrial y las medidas establecidas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta que las labores ejecutadas durante el periodo involucraron trabajos sobre cubierta, manipulación de elementos metálicos y uso de equipos especializados.

Durante las inspecciones realizadas se verificó el uso adecuado de elementos de protección personal por parte del personal operativo, el correcto uso de líneas de vida, arneses y puntos de anclaje, así como la delimitación y señalización de áreas de riesgo dentro del frente de obra.

De igual manera, la interventoría realizó seguimiento al manejo y retiro de residuos producto de las actividades de demolición y desmonte ejecutadas previamente, verificando la evacuación controlada de escombros mediante vehículo tipo volqueta y la adecuada organización de las áreas intervenidas posterior al retiro del material.

En desarrollo de las labores de control y coordinación del proyecto, continuaron realizándose comités de obra semanales con participación de la interventoría, el contratista

y representantes de CORCUMVI, en los cuales se efectuó revisión del estado actual del proyecto, análisis del avance físico ejecutado, seguimiento al cumplimiento de compromisos y verificación de las medidas planteadas dentro del plan de contingencia y la reprogramación presentada por el contratista.

Durante dichos comités, la interventoría reiteró la necesidad de mantener y fortalecer las medidas implementadas para la recuperación del atraso evidenciado en el cronograma del proyecto, haciendo énfasis en el cumplimiento de la programación ajustada, el aumento de cuadrillas de trabajo y la continuidad de jornadas extendidas de ejecución.

En términos generales, durante el presente periodo se evidenció un incremento significativo en la ejecución de actividades respecto al periodo anterior, especialmente en los frentes relacionados con cubierta y estructura metálica, permitiendo avanzar en actividades críticas para el desarrollo del proyecto y generando mejores condiciones para la continuidad de las etapas constructivas posteriores.

20.1 CONTROL DE AVANCE DE OBRA

Durante el periodo comprendido entre el 13 de febrero de 2026 y el 30 de mayo de 2026, la interventoria realizó seguimiento y control permanente al avance fisico del proyecto, verificando las actividades ejecutadas por el contratista CONSORCIO INFRA CR y contrastando la información reportada con las condiciones evidenciadas en campo.

Como parte del proceso de control, la interventoria efectuó revisión de cantidades de obra ejecutadas, validación de avances reportados y verificación fisica de los items desarrollados durante el periodo, con el propósito de garantizar la correspondencia entre las actividades ejecutadas y la información presentada dentro del acta parcial de obra.

Durante las visitas técnicas realizadas se evidenció un mayor ritmo de ejecución respecto al periodo anterior, principalmente asociado a las actividades relacionadas con el desmontaje de cubierta existente, adecuaciones de estructura metálica e instalación de la nueva cubierta termoacústica del teatro.

Entre los principales items objeto de seguimiento y verificación por parte de la interventoria durante el periodo evaluado se encuentran:

a. Desmonte de infraestructura eléctrica, tuberías eléctricas, cajas y cableado deteriorado a alturas aproximadas de 8 metros.

b. Desmonte de teja de asbesto cemento existente, incluyendo traslado hasta sitio de cargue y almacenamiento.

c. Suministro e instalación de cubierta tipo sándwich prepintada con aislamiento termoacústico.

d. Mantenimiento general de la estructura metálica existente de cubierta, incluyendo limpieza, acondicionamiento, resoldado y aplicación de pintura anticorrosiva.

e. Suministro e instalación de perfiles estructurales rectangulares requeridos para refuerzo y adecuación de la cubierta.

La interventoria verificó que las actividades ejecutadas durante el periodo corresponden a labores prioritarias dentro de la ruta critica del proyecto, especialmente aquellas relacionadas con la recuperación funcional de la cubierta del teatro y el acondicionamiento estructural requerido para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y operatividad.

Con base en la información reportada por el contratista y verificada por la interventoría, durante el presente periodo se ejecutó un valor correspondiente a $ 242.109.357.91 alcanzando un valor acumulado ejecutado de $ 242.109.357.91 equivalente aproximadamente al 10,47% del valor total del contrato.

No obstante, pese al incremento en el ritmo de ejecución evidenciado durante el periodo, la interventoría continúa identificando atraso frente a la programación contractual inicialmente establecida, razón por la cual se mantiene seguimiento permanente al cumplimiento de la reprogramación y del plan de contingencia implementado por el contratista.

La interventoría verificó que el contratista dio inicio a la implementación de medidas orientadas a la recuperación del cronograma, incluyendo ampliación de jornadas laborales, incremento de personal operativo y ejecución simultánea de actividades en diferentes frentes de trabajo.

Asimismo, durante los comités de obra realizados en el periodo, la interventoría efectuó seguimiento al cumplimiento de la ruta crítica actualizada presentada por el contratista, reiterando la necesidad de mantener continuidad operativa y fortalecer el rendimiento de ejecución con el fin de mitigar el atraso acumulado y garantizar el cumplimiento del plazo contractual establecido.

Adicionalmente, la interventoría realizó control sobre la calidad de los trabajos ejecutados, verificando la correcta instalación de la cubierta, el adecuado acondicionamiento de la estructura metálica y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para los materiales instalados durante el periodo.

En términos generales, durante el presente corte se evidenció una mejora en el comportamiento operativo del proyecto y un avance significativo respecto al periodo inmediatamente anterior; sin embargo, la interventoría continuará realizando seguimiento permanente al cumplimiento de la programación ajustada y a la implementación efectiva de las medidas correctivas necesarias para garantizar el adecuado desarrollo del contrato.

21. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMITÉ DE OBRA






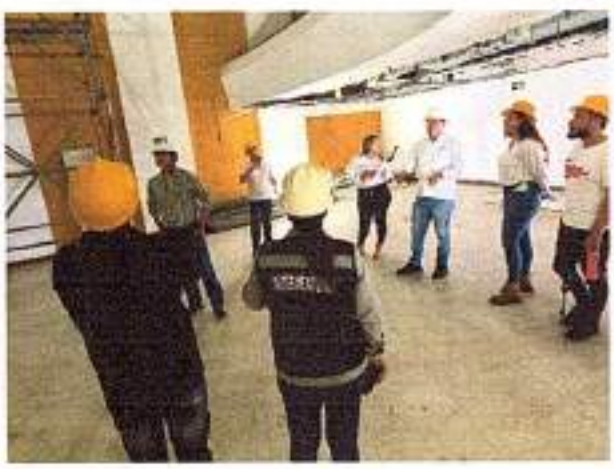

1770

REGISTRO FOTOGRAFICO COMITÉ DE OBRA.













NIT.

902020368-2

1977

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMITÉ DE OBRA.













NIT.

902020368-2

1722

REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA













NIT.

902020368-2

REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA













NIT.

902020368-2

REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA 27 ABRIL-3 MAYO













NIT.

902020368-2

REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA.-













1776

22 CONCLUSIONES.

a. Se realiza la verificación por parte de la de Consorcio CC&P de los pagos de seguridad del personal de obra que labora para este periodo del 13 de febrero de 2026 al 30 de mayo de 2026.

b. Se realizo la verificación de los documentos requeridas para el pago de acta parcial correspondiente al periodo del 13 de febrero de 2026 al 30 de mayo de 2026.

c. La factura está revisada en avance y valor; 10,47% y $ 242.109.357,91.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta parcial de obra a los 19 del mes de Junio de 2026.

Gloria Cardona

GLORIA ELSY CARDONA RODRIGUEZ
Representante Legal.
CONSORCIO CC&P
DIRECCION: CRA 40 #32-13 BARRIO BARZAL ALTO
TELEFONO: 3213149430
CORREO: Consorcioccp26@gmail.com

CORCUMVI	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FL038
		Versión: 005
		Fecha: 1 de febrero de 2026

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. 358-2025 DEL TRECE (13) DE FEBRERO DE 2026
PERIODO N°. 01
DEL 13 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2026

1. DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME:	23/06/2026
PERIODO DEL INFORME:	Desde: 13/02/2026 Hasta: 30/03/2026

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO	Contrato No. 358-2025 del TRECE (13) DE FEBRERO DE 2026
N° DEL PROCESO EN SECOP:	LP-001-2025.
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRA-CR
No. DE IDENTIFICACIÓN	902.006.911-4
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TEATRO MAIPORE ROSITA HOYOS DE MEJIA DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	LUCILA GOMEZ TORRES C.C. 40.399.561 DE VILLAVICENCIO
NOMBRE DEL APOYO AL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	JULIO ALBERTO ORTIZ GARICA C.C. 86.087.133 DE VILLAVICENCIO M.P. 25202-180261 CND
FECHA DESIGNACIÓN DEL APOYO AL SUPERVISOR:	CUATRO (04) DE FEBRERO DE 2026

Carrera 45a No. 8-16/50. La esperanza Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

CORCUMVI	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FL038
		Versión: 005
		Fecha: 1 de febrero de 2026

CONDICIONES INICIALES			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (EN LETRAS Y NÚMERO)	DOS MIL TRESCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.312.180.070).		
VALOR MENSUAL DEL CONTRATO (EN LETRAS Y NÚMERO)	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($242.109.357,91).		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES		
FECHA DE INICIO:	TRECE (13) DE FEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN:	DOCE (12) DE AGOSTO DE 2026		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N/A	FECHA:	N/A
ADICIÓN DEL CONTRATO:	N/A	FECHA	N/A
VALOR DE LA (S) ADICIÓN(ES):	N/A	FECHA:	N/A
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	N/A		
PRÓRROGAS:	N/A	FECHA:	N/A
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)			
SUSPENSIONES:	N/A		
REINICIOS:	N/A		
OTRAS MODIFICACIONES:	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	N/A		

Carrera 45a No. 8-16/50. La esperanza Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

CORCUMVI	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FL038
		Versión: 005
		Fecha: 1 de febrero de 2026

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CUMPLE (SI/NO)	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1. Ejecutar en forma idónea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto contractual	SI	El contratista para la presente Acta Parcial cumplió con la ejecución de las actividades correspondientes al objeto contractual, evidenciándose avances en los diferentes frentes de obra de conformidad con las especificaciones técnicas, cronograma aprobado y condiciones establecidas en el contrato.
2. Cumplir con el objeto del contrato conforme a la propuesta presentada y condiciones de adjudicación.	SI	El contratista para la presente Acta Parcial cumplió con la ejecución del objeto contractual conforme a los estudios previos, propuesta presentada y documentos que hacen parte integral del proceso contractual.
3. Presentar los documentos y requisitos necesarios para la ejecución contractual.	SI	El contratista para la presente Acta Parcial cumplió con la presentación y actualización de la documentación técnica, administrativa y legal requerida para la correcta ejecución y seguimiento del contrato.
4. Cumplir con las obligaciones relacionadas con el manejo de recursos y requisitos financieros del contrato.	SI	El contratista para la presente Acta Parcial cumplió con las obligaciones administrativas y financieras establecidas contractualmente, presentando los soportes requeridos para el control y seguimiento de los recursos ejecutados.
5. Presentar y cumplir el cronograma de actividades	SI	El contratista para la presente Acta Parcial cumplió con el desarrollo de las actividades programadas, realizando seguimiento permanente al cronograma y adoptando las medidas necesarias para garantizar el avance de la obra.

Carrera 45a No. 8-16/50. La esperanza Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

CORCUMVI	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FL038
		Versión: 005
		Fecha: 1 de febrero de 2026

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CUMPLE (SI/NO)	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
6. Implementar medidas ambientales durante la ejecución del proyecto.	Si	El contratista para la presente Acta Parcial cumplió con la implementación de medidas de manejo ambiental, garantizando el adecuado manejo de residuos, orden y aseo en las áreas intervenidas y el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable.
7. Vincular el personal requerido para la ejecución de las actividades.	SI	El contratista para la presente Acta Parcial cumplió con la disponibilidad del personal técnico, administrativo y operativo requerido para el desarrollo de las actividades ejecutadas durante el periodo evaluado.
8. Garantizar la afiliación del personal al Sistema General de Seguridad Social Integral.	SI	El contratista para la presente Acta Parcial cumplió con la afiliación y permanencia activa del personal vinculado al proyecto en salud, pensión y riesgos laborales, aportando los soportes correspondientes.
9. Presentar informes periódicos de ejecución.	SI	El contratista para la presente Acta Parcial cumplió con la presentación de informes técnicos, administrativos y financieros requeridos para el seguimiento y control de la ejecución contractual.
10. Acatar las observaciones y requerimientos de la interventoría y la Entidad.	SI	El contratista para la presente Acta Parcial cumplió con la atención oportuna de las observaciones, recomendaciones y requerimientos formulados por la interventoría y la Entidad Contratante.
11. Actuar con lealtad y buena fe contractual.	SI	El contratista para la presente Acta Parcial cumplió con sus obligaciones actuando bajo los principios de responsabilidad, transparencia, buena fe y colaboración institucional.

Carrera 45a No. 8-16/50. La esperanza Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

CORCUMVI	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FL038
		Versión: 005
		Fecha: 1 de febrero de 2026

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CUMPLE (SI/NO)	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
12. Cumplir la normatividad legal aplicable durante la ejecución del contrato.	SI	El contratista para la presente Acta Parcial desarrolló las actividades contractuales conforme a la normatividad vigente y las condiciones establecidas en el contrato.
13. Mantener la reserva y custodia de la información contractual.	SI	El contratista para la presente Acta Parcial cumplió con el adecuado manejo, custodia y conservación de la información técnica, administrativa y contractual relacionada con el proyecto.
14. Presentar cuentas de cobro y soportes para pago.	SI	El contratista para la presente Acta Parcial cumplió con la presentación de las cuentas de cobro y soportes requeridos para el trámite de pago, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Entidad.
15. Solicitar oportunamente prórrogas o modificaciones cuando sea necesario.	SI	El contratista para la presente Acta Parcial realizó seguimiento permanente al cronograma contractual e informó oportunamente las situaciones que pudieran afectar el plazo de ejecución del proyecto.
16. Suscribir el acta de liquidación del contrato.	N/A	La presente obligación no aplica para el período evaluado, toda vez que el contrato se encuentra en etapa de ejecución y aún no ha iniciado el proceso de liquidación contractual.
17. Mantener vigentes las garantías y pólizas contractuales.	SI	El contratista para la presente Acta Parcial cumplió con el mantenimiento y actualización de las pólizas y garantías exigidas contractualmente, verificándose su vigencia durante el período evaluado.
18. Cumplir con el pago de aportes a Seguridad Social y Parafiscales.	SI	El contratista para la presente Acta Parcial cumplió con el pago oportuno de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y parafiscales, aportando las planillas y soportes correspondientes.

Carrera 45a No. 8-16/50. La esperanza Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

CORCUMVI	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FL038
		Versión: 005
		Fecha: 1 de febrero de 2026

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CUMPLE (SI/NO)	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
19. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado.	SI	El contratista para la presente Acta Parcial cumplió con las obligaciones laborales derivadas de la vinculación del personal, incluyendo salarios, prestaciones sociales, dotación y demás obligaciones legales aplicables.
20. Cumplir las demás obligaciones establecidas en el contrato y la ley.	SI	El contratista para la presente Acta Parcial cumplió con las demás obligaciones contractuales, técnicas, administrativas y legales necesarias para el adecuado desarrollo del proyecto.
21. Informar oportunamente irregularidades o novedades durante la ejecución.	SI	El contratista para la presente Acta Parcial cumplió con informar oportunamente a la interventoría las novedades técnicas, administrativas y operativas presentadas durante la ejecución de la obra.
22. Tomar todas las medidas conducentes para evitar la contaminación ambiental durante la ejecución del contrato.	SI	El contratista para la presente Acta Parcial cumplió con la implementación de medidas de manejo ambiental orientadas a prevenir impactos negativos derivados de las actividades constructivas, evidenciándose la adecuada disposición de residuos de construcción y demolición (RCD), control de material particulado, orden y aseo permanente en las áreas intervenidas y cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable.
23. Llevar en la obra una bitácora donde se registren diariamente los avances, personal, equipos y demás novedades.	SI	El contratista para la presente Acta Parcial cumplió con el diligenciamiento y actualización permanente de la bitácora de obra, registrando las actividades ejecutadas, personal vinculado, equipos utilizados, novedades presentadas e instrucciones impartidas por la interventoría para el adecuado seguimiento del proyecto.

Carrera 45a No. 8-16/50. La esperanza Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

CORCUMVI	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FL038 Versión: 005 Fecha: 1 de febrero de 2026

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CUMPLE (SI/NO)	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
24. Cumplir con todos los reglamentos de seguridad para los trabajadores y personal involucrado durante la ejecución de la obra.	SI	El contratista para la presente Acta Parcial cumplió con la implementación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), garantizando el uso de elementos de protección personal, la señalización preventiva de las áreas de trabajo, la identificación de riesgos y la ejecución de actividades orientadas a la prevención de accidentes laborales.
25. Garantizar la conservación de las garantías de los elementos intervenidos durante la ejecución de la obra.	SI	El contratista para la presente Acta Parcial cumplió con la verificación, control y conservación de las condiciones de garantía de los equipos y elementos intervenidos, aportando los soportes técnicos, certificados y documentación requerida para su validación.
26. Mantener una oficina operativa durante todo el plazo de ejecución del contrato.	SI	El contratista para la presente Acta Parcial cumplió con la disponibilidad de una oficina operativa destinada al desarrollo de actividades administrativas y técnicas del proyecto, facilitando la coordinación con la interventoría y la Entidad Contratante.
27. Someter a aprobación de la interventoría los materiales y equipos que se emplearán en la obra.	SI	El contratista para la presente Acta Parcial cumplió con la presentación de fichas técnicas, especificaciones y documentación de los materiales y equipos utilizados en la ejecución de las actividades, permitiendo la revisión y aprobación por parte de la interventoría antes de su instalación.
28. Verificar planos, diseños y cantidades de obra antes de iniciar cada actividad.	SI	El contratista para la presente Acta Parcial cumplió con la revisión y validación de planos, diseños y cantidades de obra requeridas para la ejecución de las actividades programadas, realizando las consultas y aclaraciones técnicas correspondientes cuando fue necesario.

Carrera 45a No. 8-16/50. La esperanza Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

CORCUMVI	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FL038
		Versión: 005
		Fecha: 1 de febrero de 2026

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CUMPLE (SI/NO)	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
29. Elaborar y presentar la documentación contractual en los formatos establecidos por la Entidad.	SI	El contratista para la presente Acta Parcial cumplió con la elaboración y presentación de informes, actas, soportes técnicos, cronogramas y demás documentos requeridos para el adecuado seguimiento y control de la ejecución contractual.
30. Acreditar y mantener disponibles los equipos necesarios para la ejecución del contrato.	SI	El contratista para la presente Acta Parcial cumplió con la disponibilidad de equipos, herramientas y recursos operativos necesarios para el desarrollo de las actividades programadas, garantizando la continuidad de los diferentes frentes de trabajo.
31. Realizar la socialización de la obra con la comunidad antes del inicio de los trabajos.	SI	El contratista para la presente Acta Parcial cumplió con la realización de las actividades de socialización del proyecto, informando a la comunidad sobre el alcance de la obra, cronograma de ejecución y demás aspectos relacionados con el desarrollo del contrato.
32. Instalar la valla informativa y señalización preventiva de la obra.	SI	El contratista para la presente Acta Parcial cumplió con el mantenimiento de la valla informativa y la señalización preventiva requerida en las áreas intervenidas, contribuyendo a la seguridad de trabajadores, usuarios y comunidad en general.
33. Ejecutar los trabajos de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y normas de construcción vigentes.	SI	El contratista para la presente Acta Parcial cumplió con la ejecución de las actividades de obra conforme a los planos, diseños, especificaciones técnicas y normas aplicables, utilizando materiales que cumplen con las condiciones de calidad exigidas contractualmente.

Carrera 45a No. 8-16/50. La esperanza Villavicencio - Meta -Colombia
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

CORCUMVI	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	Código: FL038
		Versión: 005
		Fecha: 1 de febrero de 2026

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CUMPLE (SI/NO)	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
34. Implementar jornadas extendidas cuando aplique para garantizar el cumplimiento del cronograma contractual.	SI	El contratista para la presente Acta Parcial cumplió con la implementación de acciones orientadas a la recuperación y fortalecimiento del cronograma de obra, incluyendo reprogramación de actividades y jornadas extendidas cuando las condiciones de ejecución así lo requirieron.
35. Mantener durante la ejecución del contrato las condiciones ofertadas respecto a la vinculación de personal con discapacidad, conforme al Decreto 392 de 2018.	SI	El contratista para la presente Acta Parcial cumplió con la presentación de los soportes y certificaciones requeridas para acreditar el mantenimiento de las condiciones ofertadas relacionadas con la vinculación de personal con discapacidad, de conformidad con la normatividad vigente y las condiciones establecidas en el proceso contractual.

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verificamos el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente a los períodos, así:

Valor del contrato: $ 2.312.180.070

IBC del contrato: $ 924.872.028

MES COTIZADO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA
FEBRERO	09/03/2026	65708862-6016332763-76372603-86399627-86399112

Carrera 45a No. 8-16/50. La esperanza Villavicencio - Meta -Colombia
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

CORCUMVI	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FL038
		Versión: 005
		Fecha: 1 de febrero de 2026

MES COTIZADO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA
MARZO	30/03/2026	71952367-6016661597-76452556-9503474211-86349659-86349146
ABRIL	29/04/2026	79368569-6016665096-78676460-9504492844-86349185-86349708
MAYO	29/05/2026	87080129-6017401531-86419974-9506043893-86349759-86349294

*Se verifica que el valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios de salud, pensión y Fondos de Seguridad Pensional están calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales.

Nota. Si el contratista no está obligado a aportar a pensión hacer la observación, si es pensionado indicar el número de resolución correspondiente y anexar copia del documento.

Carrera 45a No. 8-16/50. La esperanza Villavicencio - Meta -Colombia
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

CORCUMVI	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FL038
		Versión: 005
		Fecha: 1 de febrero de 2026

5. AVANCE FINANCIERO INICIAL

CONCEPTO	VALOR	FECHA	PORCENTAJE
ANTICIPO	N/A	----------	0 %
PRIMER MES	$ 242.109.357,91	13/02/2026 AL 30/05/2026	10.47 %
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 2.070.070.712,09	----------	89.53 %
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.312.180.070,00	----------	100%

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO: 10.47 %

5.1. AVANCE FINANCIERO ADICIÓN (APLICA __ NO APLICA X)

CONCEPTO	VALOR	FECHA	PORCENTAJE
ANTICIPO	N/A	DD/MM/AAAA	0 %
VALOR DE LA ADICIÓN	N/A	DD/MM/AAAA AL DD/MM/AAAA	0 %
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE PERIODO	N/A	DD/MM/AAAA AL DD/MM/AAAA	0 %
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	N/A	DD/MM/AAAA AL DD/MM/AAAA	0 %
VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN	N/A	DD/MM/AAAA AL DD/MM/AAAA	0 %

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ADICIÓN: 0%

Carrera 45a No. 8-16/50. La esperanza Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

CORCUMVI	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FL038
		Versión: 005
		Fecha: 1 de febrero de 2026

6. CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN APLICABLE

Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos en los diferentes sistemas de gestión de la siguiente manera:

SISTEMA DE GESTIÓN	REQUISITO	CUMPLE (SI/NO)
Calidad	Usó la documentación vigente establecida aplicable para el desarrollo de las obligaciones contractuales.	SI
Seguridad y Salud el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	SI
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivistica y política de gestión documental de la entidad.	SI

Nota: Se puede modificar esta información acorde a los requerimientos de cada contrato sin necesidad de actualización del formato, también puede ampliar el detalle de la evaluación.

7. EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

Tenga en cuenta los siguientes rangos de calificación:

- **Excelente:** El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
- **Buena:** El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
- **Regular:** El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
- **No Cumple:** El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

Carrera 45a No. 8-16/50. La esperanza Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

CORCUMVI	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FL038
		Versión: 005
		Fecha: 1 de febrero de 2026

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	**BUENA**
CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	**BUENA**
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	**BUENA**
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	**BUENA**

8. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del Contrato de Obra No. **358-2025 del TRECE (13) DE FEBRERO DE 2026.** certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe que corresponde al Periodo del **13 de febrero del 2026 al 30 de mayo del 2026. Informe Parcial No. 01, equivalente al 10.47% de ejecución**, así mismo, las relativas al pago de seguridad social integral y a los principios de transparencia propios de la gestión administrativa y contractual, confirmó que fue verificada la publicación en SECOP del presente informe y demás documentos aprobados.

9. OBSERVACIONES GENERALES DEL CONTRATO

Una vez revisado el Informe Parcial No. 1 presentado por el CONSORCIO CS-INFRA-CR , correspondiente al periodo comprendido entre el 13 de febrero y el 30 de mayo de 2026, así como los documentos soporte, registros fotográficos, actas, informes técnicos, administrativos, financieros, ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo, se evidenció que el contratista de obra dio cumplimiento satisfactorio a las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de obra No. 358 de 2025, conforme a las condiciones establecidas en los documentos del proceso y a las disposiciones técnicas y administrativas aplicables.

De igual manera, se verificó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la participación del personal profesional ofertado, la presentación de informes, el control documental, la realización de visitas y comités de seguimiento, la revisión de las actividades ejecutadas, el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, así como las acciones de seguimiento en materia ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, sin evidenciar incumplimientos que afecten el normal desarrollo del contrato.

Carrera 45a No. 8-16/50. La esperanza Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co

CORCUMVI	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: FL038
		Versión: 005
		Fecha: 1 de febrero de 2026

De acuerdo con la información financiera y técnica presentada por la obra y una vez efectuada la revisión por parte de la supervisión, se constató un avance físico ejecutado del (10.47 %), correspondiente al Acta Parcial No. 1. En consecuencia, se considera que las actividades ejecutadas durante el período evaluado fueron desarrolladas de conformidad con las obligaciones contractuales y los soportes aportados, razón por la cual esta supervisión considera procedente autorizar el trámite de pago del Acta Parcial No. 1 por valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($242.109.357,91 M/CTE), correspondiente a las actividades ejecutadas y debidamente soportadas durante el período comprendido entre el 13 de febrero y el 30 de mayo de 2026.

LUCILA GOMEZ TORRES
C.C. 40.399.561 DE VILLAVICENCIO
SUPERVISOR

JULIO ALBERTO ORTIZ GARCIA
C.C. 86.087.133 DE VILLAVICENCIO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
M.P. 25202-180261 CND

	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMAS
ELABORÓ.	JULIO ALBERTO ORTIZ GARCIA	APOYO A LA SUPERVISIÓN	
REVISÓ.	LUCILA GOMEZ TORRES	SUPERVISOR	

Carrera 45a No. 8-16/50. La esperanza Villavicencio - Meta -Colombia.
Página web: www.corcumvi.gov.co
E-Mail: direccion@corcumvi.gov.co
