

CRONOGRAMA DE OBRA
CONTRATO DG-070-2026

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Indice cumplimiento grafico	% completado	% ASIGNADO O PROYECTADO (25/4/2026)
0	**DG-070-2026 CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES PARA COMUNIDADES RURALES Y DISPERSAS DE LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.**	**141,95 días**	**vie 30/01/26**	**vie 31/07/26**		**15%**	**20 %**
1	**INICIO**	**78,84 días**	**vie 30/01/26**	**mar 19/05/26**		**76%**	
2	**FASE DE PREPARACIÓN Y GESTIÓN**	**78,84 días**	**vie 30/01/26**	**mar 19/05/26**		**76%**	
3	Gestión polizas, plan de inversión, plan de trabajo, etc.	41 días	vie 30/01/26	vie 27/03/26		100%	100%
4	Firma de Acta de Inicio	1 día	vie 27/03/26	vie 27/03/26		100%	100%
5	Trámites administrativos, actualización de polizas, obtención de permisos y aprobación de planos	6 días	vie 27/03/26	jue 9/04/26		100%	100%
6	Implementación SG-SST y plan ambiental	12 días	vie 27/03/26	lun 13/04/26		80%	100%
7	Revisión de información base, replanteo técnico en campo y ajuste de cronograma	34 días	vie 27/03/26	jue 14/05/26		47%	47%
8	Socialización inicial con las comunidades	1 día	mié 8/04/26	mié 8/04/26		100%	100%
9	Envío de infornación replanteo a interventoria	3 días	vie 15/05/26	mar 19/05/26		0%	0%
10	**FASE DE APROVISIONAMIENTO, INGENIERÍA DE DETALLE Y LOGÍSTICA**	**70,37 días**	**vie 27/03/26**	**dom 28/06/26**		9%	
11	Validación de fichas técnicas de paneles, inversores, controladores, baterías, gabinetes, materiales civiles, materiales eléctricos, entre otros.	12 días	vie 27/03/26	lun 13/04/26		85%	100%
12	Gestión de cotizaciones, selección de proveedores, y aprobación de órdenes de compra para equipos y materiales, tanto nacionales como importados.	5 días	mié 8/04/26	mar 14/04/26		85%	100%
13	Transporte y nacionalización de equipos importados	45 días	mar 21/04/26	vie 19/06/26		0%	9%
14	Fabricación de herramientas y materiales civiles	45 días	mar 21/04/26	vie 19/06/26		0%	9%
15	Transporte y Nacionalización de Paneles Solares	45 días	mar 21/04/26	vie 19/06/26		0%	9%
16	Transporte y Nacionalización de Inversores	45 días	mar 21/04/26	vie 19/06/26		0%	9%
17	Transporte y Nacionalización de Baterías	45 días	mar 21/04/26	vie 19/06/26		0%	9%
18	Transporte y Nacionalización de Controlador	45 días	mar 21/04/26	vie 19/06/26		0%	9%
19	Fabricación de Gabinetes Metálicos	7 días	vie 19/06/26	vie 26/06/26		0%	9%
20	Transporte y Nacionalización de Medidores de Energía	45 días	mar 21/04/26	vie 19/06/26		0%	9%
21	Fabricación de materiales eléctricos	45 días	mar 21/04/26	vie 19/06/26		0%	9%
22	Fabricación de Mastiles y Estructura	45 días	mar 21/04/26	vie 19/06/26		0%	9%
23	Transporte de equipos y materiales a Bodega de almacenamiento	2 días	vie 26/06/26	dom 28/06/26		0%	9%
24	Planeación logística de transporte y almacenamiento temporal	27 días	mié 8/04/26	jue 14/05/26		85%	100%
25	Planificación logística por rutas y frentes de entrega de material y herramientas	8 días	vie 10/04/26	mar 21/04/26		85%	75%
26	**FASE DE MOVILIZACIÓN Y OBRAS CIVILES**	**23,21 días**	vie 26/06/26	**mar 21/07/26**		**0%**	**0%**
27	Obras civil: adecuación del terreno para infraestructura (limpieza y desmonte, nivelación y relleno, construcción de cimentaciones y canalizaciones subterráneas) Altamira- San Carlos	10 días	vie 26/06/26	mar 7/07/26		0%	0%
28	Obras civil: adecuación del terreno para infraestructura (limpieza y desmonte, nivelación y relleno, construcción de cimentaciones y canalizaciones subterráneas) Los Caños- San Carlos	4 días	mié 8/07/26	dom 12/07/26		0%	0%
29	Obras civil: adecuación del terreno para infraestructura (limpieza y desmonte, nivelación y relleno, construcción de cimentaciones y canalizaciones subterráneas) Calle de agua- San Carlos	5 días	lun 13/07/26	vie 17/07/26		0%	0%
30	Obras civil: adecuación del terreno para infraestructura (limpieza y desmonte, nivelación y relleno, construcción de cimentaciones y canalizaciones subterráneas) Las Pachacas- San Carlos	3 días	sáb 18/07/26	mar 21/07/26		0%	0%
31	Capacitación 1: Comunidades Energéticas	1 día	mié 8/07/26	mié 8/07/26		0%	0%
32	Socialización de avances del proyecto	1 día	mié 8/07/26	mié 8/07/26		0%	0%
33	**FASE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMA FV**	**25,84 días**	**vie 26/06/26**	**jue 23/07/26**		**0%**	**0%**
34	Instalación del SFV e instalaciones internas Altamira- San Carlos	10 días	vie 26/06/26	mar 7/07/26		0%	0%
35	Instalación del SFV e instalaciones internas Los Caños- San Carlos	4 días	mié 8/07/26	dom 12/07/26		0%	0%
36	Instalación del SFV e instalaciones internas Calle de agua- San Carlos	5 días	lun 13/07/26	vie 17/07/26		0%	0%
37	Instalación del SFV e instalaciones internas Las Pachacas- San Carlos	3 días	sáb 18/07/26	mar 21/07/26		0%	0%
38	Instalación de gabinetes eléctricos, inversores, transformadores, banco de baterias, controladores y protecciones	23 días	vie 26/06/26	mar 21/07/26		0%	0%
39	Cableado DC	23 días	vie 26/06/26	mar 21/07/26		0%	0%
40	Cableado AC	23 días	vie 26/06/26	mar 21/07/26		0%	0%
41	Instalación de acometidas para viviendas	23 días	vie 26/06/26	mar 21/07/26		0%	0%
42	Instalación de puesta a tierra para vivienda	23 días	vie 26/06/26	mar 21/07/26		0%	0%

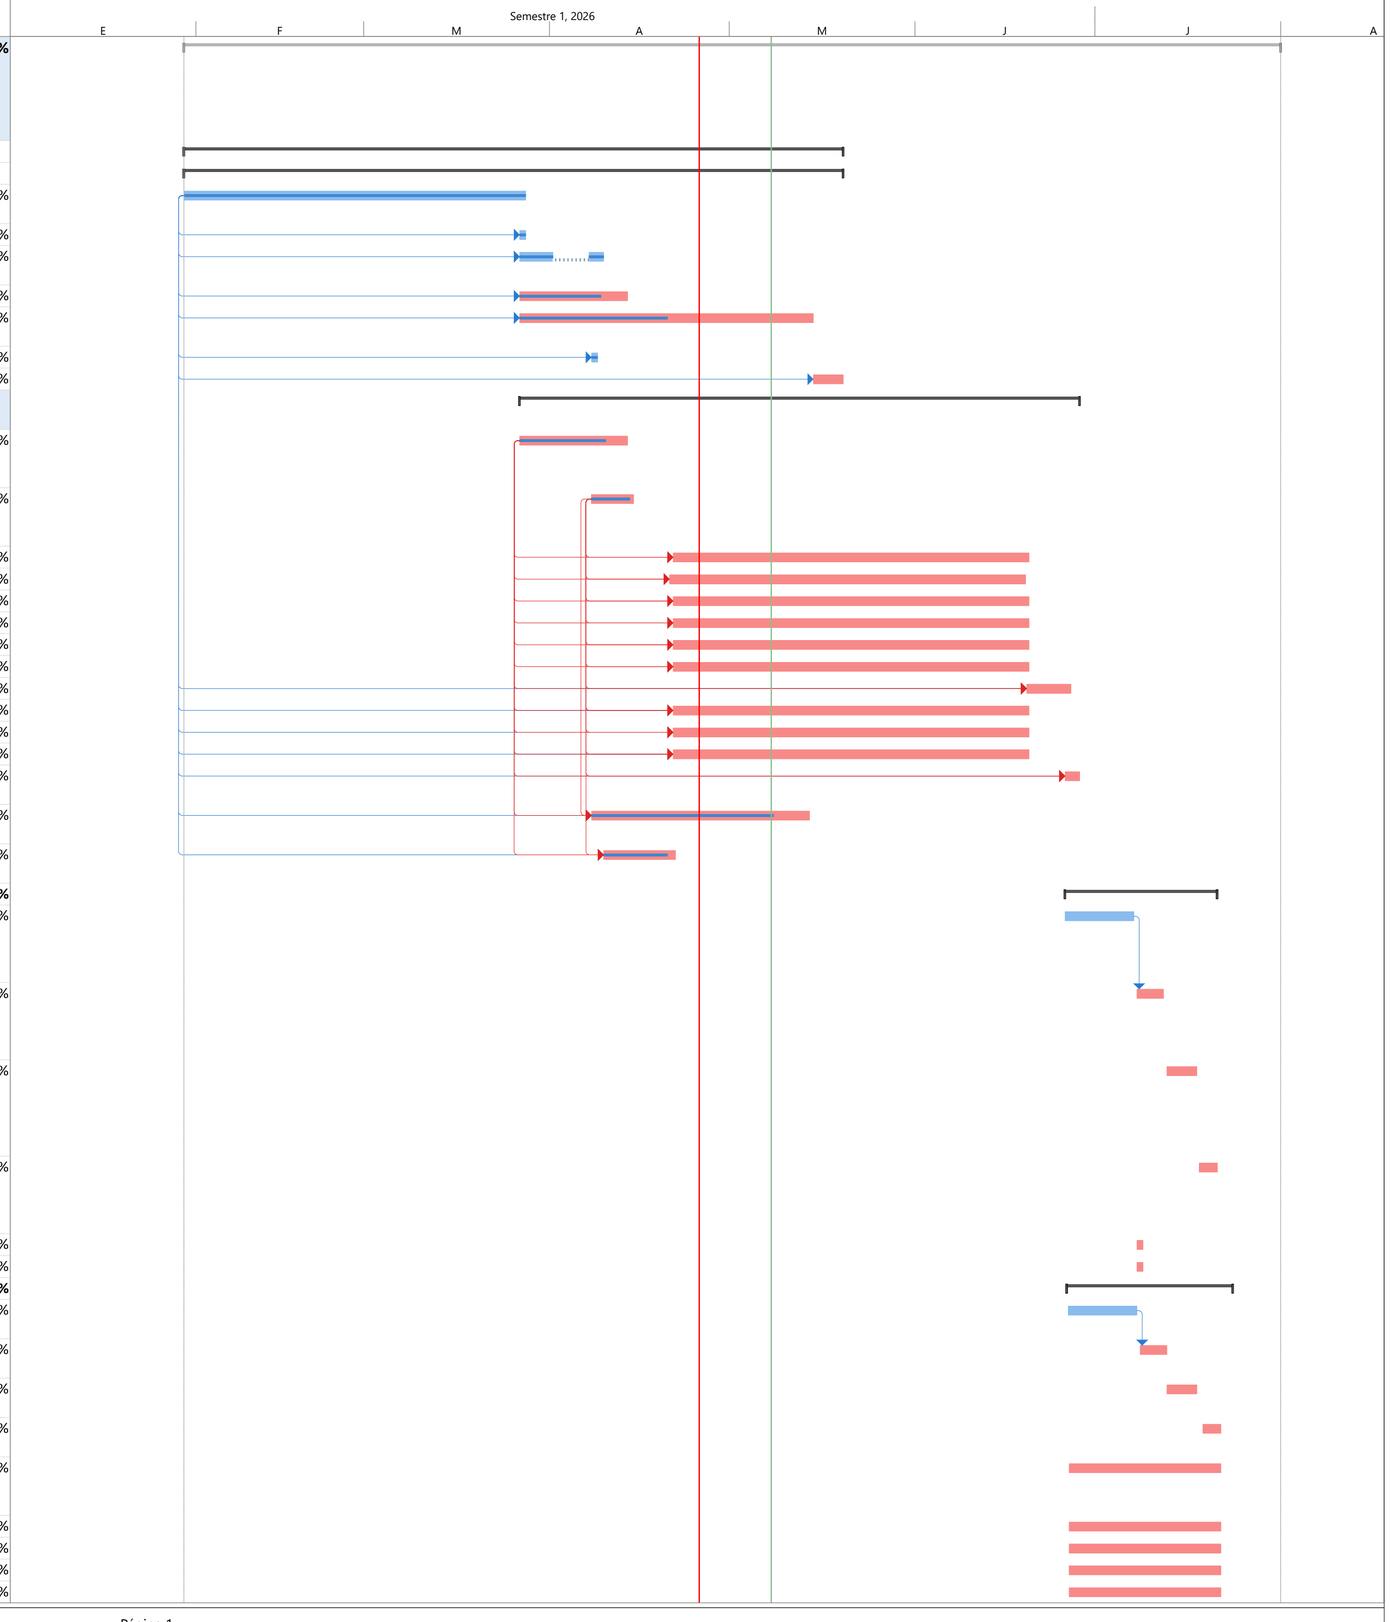

CRONOGRAMA DE OBRA
CONTRATO DG-070-2026

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Indice cumplimiento grafico	% completado	% ASIGNADO O PROYECTADO (25/4/2026)
43	Instalación de redes internas para vivienda	23 días	vie 26/06/26	mar 21/07/26		0%	0%
44	Pruebas de continuidad, aislamiento y funcionamiento	23 días	vie 26/06/26	mar 21/07/26		0%	0%
45	Capacitación 2: Comunidades Energéticas	3 días	mar 21/07/26	jue 23/07/26		0%	0%
46	**FASE FINAL**	**26 días**	**vie 3/07/26**	**vie 31/07/26**		**0%**	**0%**
47	Entrega de planos "As built"	20 días	vie 3/07/26	sáb 25/07/26		0%	0%
48	Certificación RETIE	8,68 días	jue 16/07/26	sáb 25/07/26		0%	0%
49	Entrega a DISPAC e Interventoría	5 días	lun 27/07/26	vie 31/07/26		0%	0%
50	**FASE DE SOCIALIZACIÓN FINAL**	**11 días**	**lun 20/07/26**	**vie 31/07/26**		**0%**	**0%**
51	Socialización final	1 día	jue 23/07/26	jue 23/07/26		0%	0%
52	Entrega de informes finales y actas	7 días	lun 20/07/26	lun 27/07/26		0%	0%
53	Cierre	1 día	vie 31/07/26	vie 31/07/26		0%	0%
54	FIN	1 día	vie 31/07/26	vie 31/07/26		0%	0%

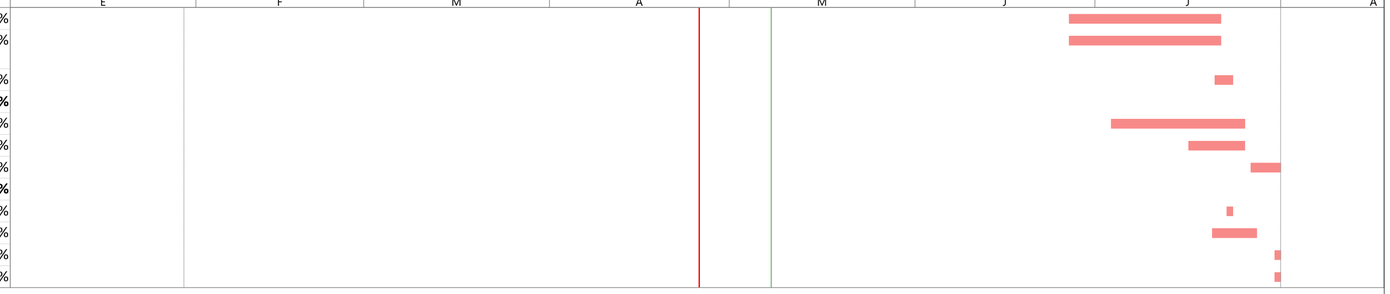

CONTRATO DG-068-2025

RIOSUCIO - CHOCO

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual
