Interior

Al contestar cite Radicado 2026-3-003122-018653 Id: 794962
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Fecha: 26-06-2026 07:41:22
Folios: 1
Anexos: 1 Soporte de almacenamiento de datos/magnéticos

MEMORANDO

Bogotá, D.C. 26 de junio de 2026

PARA: Subdirección de Gestión Contractual

DE: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

ASUNTO: Remisión de informe técnico mensual de supervisión del convenio No. 2330 - 2025 Municipio de Moniquirá - Boyacá (Para Archivo y Publicación en SECOP II)

Cordial saludo,

En mi calidad de Supervisor del convenio en mención, me permito hacer entrega del informe técnico mensual de supervisión, correspondiente al mes de mayo de 2026, en cumplimiento del convenio interadministrativo No. 2330 de 2025 Municipio de Moniquirá - Boyacá, para archivo y Publicación en SECOP II, la información se relaciona a continuación:

CONVENIO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	INFORME	FOLIOS
2330-25	Moniquirá	Boyacá	Mayo 2026	28

Atentamente

EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
Profesional Universitario
Grupo de Control y Seguimiento de Proyectos
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Supervisor del convenio

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO No. 2330 DE 2025, MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE MAYO DE 2026

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ-BOYACÁ.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Lote 2 "La Quinta" Calle 19 N° 10 -27 Barrio Joaquín Motta, zona urbana del municipio de Moniquirá, departamento de Boyacá.		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 2.450.000.000,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$ 2.450.000.000,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/11/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/07/2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	TITO LORENZO LOVO CARRETERO	06/11/2025	12/11/2025
	JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA	13/11/2025	05/04/2026
	TITO LORENZO LOVO CARRETERO	06/04/2026	21/04/2026
	EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS	22/04/2026	Actual
APOYO A LA SUPERVISIÓN	JAISON ALFREDO DUARTE GALLO	14/11/2025	31/12/2025
	JAISON ALFREDO DUARTE GALLO	24/01/2026	ACTUAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 36825	05/11/2025	31/12/2025
	No. 8326	10/01/2026	31/12/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 58325	07/11/2025	31/12/2025
	No. 8326	10/01/2026	31/12/2026
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	2-2025-009332	14/02/2025	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	N.A	N.A	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	600- 47- 994000077994	14/11/2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	14/11/2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN	FECHA: DD/MM/AAAA		

(Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA FECHA: DD/MM/AAAA
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 149.827.981
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 84.123.457
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	
VALOR DE OBRA	$ 1.846.883.748
VALOR INTERVENTORÍA	$ 369.164.814
VALOR ADICIONAL DE OBRA	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($857.500.000), contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza de Garantía. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	24/12/2025	$857.500.000
SEGUNDO DESEMBOLSO	2. UN SEGUNDO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (735.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP. B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Informe del supervisor del ENTE TERRITORIAL con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$735.000.000
TERCER DESEMBOLSO	3. UN TERCER DESEMBOLSO, equivalente a la suma de SEISCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($612.500.000) contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite la aprobación de estudios y diseños. B. Estudio de suelos. C. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el Municipio que acredite como mínimo un avance del 50% de	50%	DD/MM/AAAA	$612.500.000

	ejecución de la obra. D. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de la obra por capítulos, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. E. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. F. Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. G. Entrega de primer video donde se evidencie que el avance de obra es de mínimo el 50%. F. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio			
ULTIMO DESEMBOLSO	4. UN ÚLTIMO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($245.000.000) contra entrega de los de los siguientes productos: A. La certificación del Interventor y del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final de interventoría con registro fotográfico del proyecto del antes, durante y después de la ejecución de las actividades por capítulos. 2) Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto. 3) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. 4) Evidencia de la desinstalación de la valla. B. Entrega de la certificación RETIE y RETILAP, certificación de conexión eléctrica definitiva C. Entrega de planos récord al Ministerio suscritos por el constructor y avalados por la interventoría y el Municipio D. Entrega al Ministerio del Interior de "Acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), E. Entrega del segundo video F. Paz y salvo ambiental (Disposición de RCD) G. Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.	100%	DD/MM/AAAA	$245.000.000
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$857.500.000
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$0,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
600- 47- 994000077994	Cumplimiento	490.000.000,00	07/11/2025	31/07/2027

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

	SI	NO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: MAYO 2026	**X**	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		N/A
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		X
OTROS		X

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**84,21%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0%**

Componente Administrativo: Se continúo con el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones específicas y el cronograma aprobado.

- El 7 de mayo de 2026, la supervisión del Ministerio del Interior remitió correo electrónico de asunto: *"Cumplimiento a las obligaciones contractuales convenio No. 2330 de 2025 Municipio de Moniquirá – Boyacá",* a la supervisión del municipio.

- El 19 de mayo de 2026, la supervisión del Ministerio del Interior remitió correo electrónico de asunto: *"Cumplimiento a las obligaciones contractuales convenio No. 2330 de 2025 Municipio de Moniquirá – Boyacá",* a la supervisión del municipio.

- El 29 de mayo de 2026, se reitera la solicitud de aclaración con respecto al numero de la resolución del acto administrativo a la subdirección de Gestión Contractual, teniendo en cuenta que el municipio requiere del documento para realizar la incorporación de recursos y expedir los cdp y rp necesarios para el proceso de contratación.

La supervisión del Ministerio informó al ente territorial los requisitos para el segundo desembolso, de acuerdo con lo establecido en la CLAÚSULA SEXTA: FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS: EL MINISTERIO **–** FONSECON:

> *CLAÚSULA SEXTA: FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS: EL MINISTERIO – FONSECON desembolsará los recursos al ENTE TERRITORIAL previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y la presentación de cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) por parte del representante legal de la siguiente forma: (…) 2. UN SEGUNDO DESEMBOLSO, equivalente a la suma de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (735.000.000), contra entrega de los siguientes productos:* ***A. Contar con los pliegos definitivos que soportan el proceso de contratación de los Estudios, Diseños y Ejecución de obra, así como el de interventoría debidamente publicados a través de la plataforma SECOP.*** *B. Evidencias de instalación de valla informativa del proyecto. C. Informe del supervisor del ENTE TERRITORIAL con registro fotográfico donde se evidencie que el lote ya se encuentra listo para iniciar la obra y cuenta con los puntos de agua, luz y alcantarillado. D. Acta de socialización del proyecto con la comunidad. E. Remisión de Informe y/o balance financiero expedido por el ENTE TERRITORIAL, donde conste la ejecución de los recursos aportados por el MINISTERIO al corte del mes inmediatamente anterior a la solitud de desembolso, para lo cual deberá diligenciar el Anexo suministrado por el MINISTERIO, y se deberán adjuntar copias de: facturas, cuentas de cobro, actas, órdenes de pago, comprobantes de egreso y copia de los extractos de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos del convenio.*

A. Pliegos definitivos: Se encuentra publicados los procesos a espera de adjudicación, suscripción y actas de inicio.

B. Instalación de valla informativa: El municipio expresó que se cuenta con la valla instalada en el predio sin embargo no ha remitido el registro fotográfico para verificación.

C. Informe de adecuación del predio: el municipio expresa que no se han realizado las actividades de descapote, nivelación y adecuación del predio.


D. Acta de socialización del proyecto a la comunidad: no se cuenta con el acta de socialización.

E. Informes financieros: El municipio remitió los documentos soporte a la supervisión del Ministerio.

De acuerdo a lo anterior, el municipio no ha dado cumplimiento a los requisitos que permitan ejecutar el segundo desembolso del convenio.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: En el mes de marzo de 2026, la supervisión del Ministerio del Interior solicito a la Subdirección de Gestión Contractual el inicio de trámite por presunto incumplimiento a las obligaciones por parte del Municipio, teniendo en cuenta el atraso con respecto al cronograma, adecuación del predio y entrega de documentación para el segundo desembolso.

De esta manera de acuerdo al cronograma se evidencia lo siguiente:

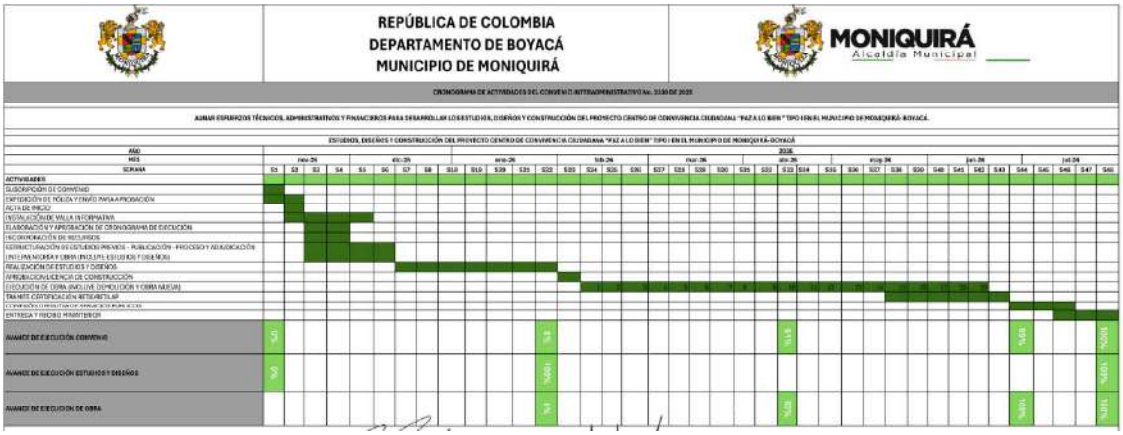

De acuerdo al cronograma suscrito entre las partes, se evidencia un atraso considerable teniendo en cuenta que para la última semana del mes de mayo de 2026 se debía avanzar en la dieciseisava semana de ejecución de obra, por lo cual se debería avanzar en el 84,21% de avance de obra, sin embargo, a la fecha no se cuenta adjudicación de los contratos de estudios, diseños y obra e interventoría de los mismos, faltando adicionalmente la ejecución de los estudios y diseños.

En el presente mes, la supervisión del ministerio del Interior remitió comunicados solicitando el estado actual de los procesos de contratación de los derivados, así mismo, el plan de choque en el cual se indique las actividades pendientes y los tiempos necesarios para la ejecución del proyecto dentro del plazo contractual.

Se indica que el municipio no remitió comunicación alguna con respecto a lo solicitado por esta supervisión.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

12/02/2026	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

JAISON ALFREDO DUARTE GALLO Apoyo a la supervisión del Convenio No. 2330 de 2025 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio	**EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS** Supervisor Convenio No. 2330 de 2025 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio

Outlook

Cumplimiento a las obligaciones contractuales convenio No. 2330 de 2025 Municipio de Moniquirá - Boyacá

Desde Jaison Alfredo Duarte Gallo <jaison.duarte@mininterior.gov.co>
Fecha Jue 7/05/2026 3:56 PM
Para planeacion moniquira-boyaca.gov.co <planeacion@moniquira-boyaca.gov.co>; alcaldia@moniquira-boyaca.gov.co <alcaldia@moniquira-boyaca.gov.co>
CC Edgar Jhoan Lopez Riveros <edgar.lopez@mininterior.gov.co>; Cristian Camilo Bohorquez Molano <cristianc.bohorquez@mininterior.gov.co>

Señores:

FREDY IOVANNY PARDO PINZON
Alcalde Municipal
Municipio de Moniquirá - Boyacá


HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA
Secretario de planeación
Municipio de Moniquirá - Boyacá

Asunto: Cumplimiento a las obligaciones contractuales convenio No. 2330 de 2025 Municipio de Moniquirá - Boyacá

Cordial saludo,

En atención al convenio No. 2330 de 2025 suscrito entre el municipio de Moniquirá - Boyacá y el Ministerio del Interior FONSECON cuyo objeto es: *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ-BOYACÁ.",* me permito solicitar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Anexo de condiciones específicamente en *"CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRACTUALES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ENTE TERRITORIAL*" de acuerdo a lo siguiente:

"(...) 4. El cronograma y sus modificaciones deberán ser aprobadas por el supervisor del convenio designado por el MINISTERIO y serán de obligatorio y estricto cumplimiento, atendiendo a las normas técnicas necesarias para su correcta ejecución. Los eventuales ajustes al cronograma se sustentarán técnica, económica y jurídicamente. (...)"

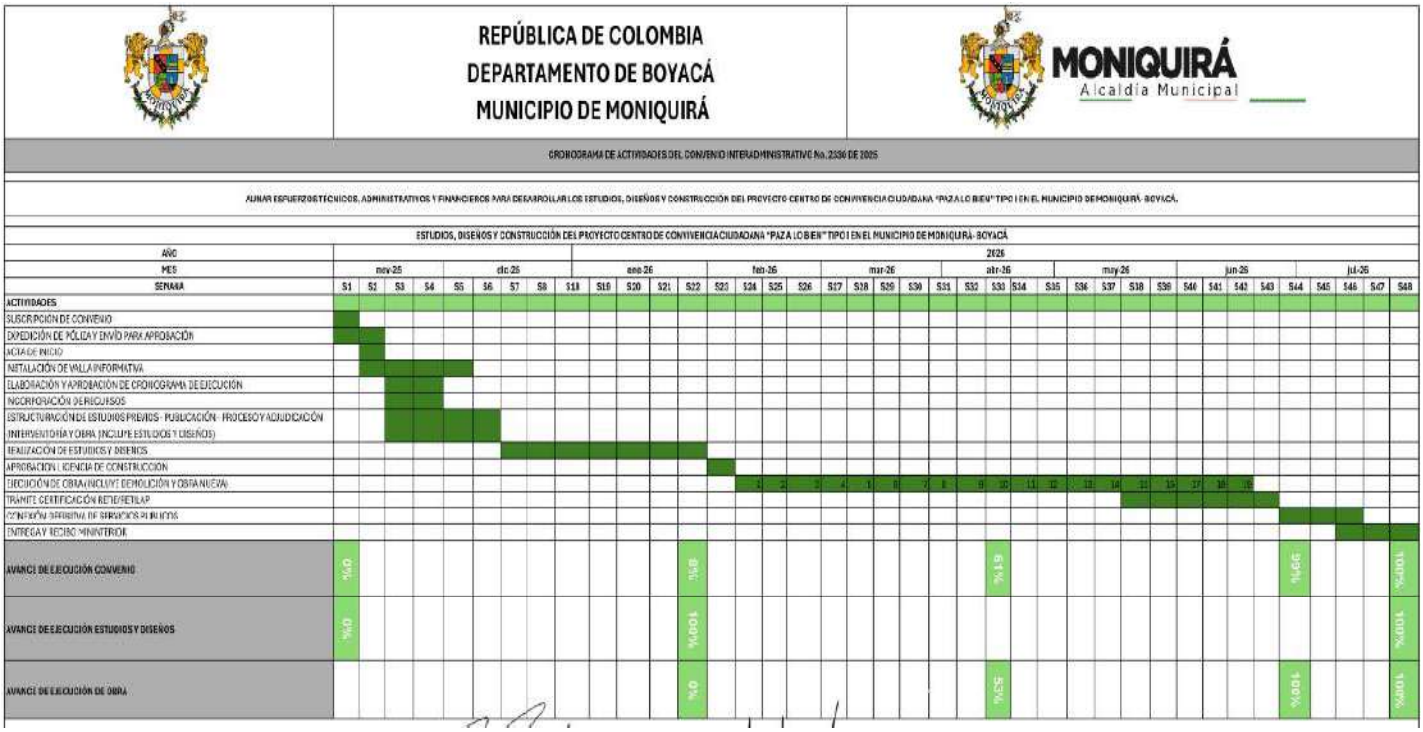

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ

MONIQUIRÁ
Alcaldía Municipal

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2336 DE 2025

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ- BOYACÁ.

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ- BOYACÁ

AÑO																																								
MES	nov-25				dic-25					ene-26					feb-26				mar-26					abr-26					may-26					jun-26					jul-26				
SEMANA	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48
ACTIVIDADES																																														
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO																																														
EXPEDICIÓN DE PÓLIZA Y ENVÍO PARA APROBACIÓN																																													
ACTA DE INICIO																																													
INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA																																													
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN																																													
INCORPORACIÓN DE RECURSOS																																													
ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS - PUBLICACIÓN - PROCESO Y ADJUDICACIÓN																																													
INTERVENTORÍA Y OBRA (INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS)																																													
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS																																													
APROBACIÓN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN																																													
EJECUCIÓN DE OBRA (INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA NUEVA)																																													
TRÁMITE CERTIFICACIÓN RETIE/RETILAP																																													
CONEXIÓN (ARRIBA DE SERVICIOS PÚBLICOS)																																													
ENTREGA Y RECIBO MINISTERIO																																													
AVANCE DE EJECUCIÓN CONVENIO	%0											%68																				%19										%96				%100
AVANCE DE EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	%0											%100																														%100				%100
AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA												%0																				%35										%100				%100

De esta manera, se indica que le municipio se encuentra en presunto incumplimiento al cronograma evidenciando que al a fecha no se cuenta con actas de inicio de los contratos derivados, faltando también la ejecución de los estudios y diseños.

Ahora bien, en el cronograma suscrito entre las partes se evidencia que, para la primera semana del mes de mayo de 2026, se debería estar avanzando en actividades de obra aproximándose a un 68,42%.

Así las cosas, se solicita al ente territorial remitir los cronogramas de cada proceso de selección y expresar las fechas tentativas para realizara actas de inicio, entrega de estudios y diseños.

Atentamente,

Interior

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Jaison Alfredo Duarte Gallo
jaison.duarte@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 ext. 2800
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

Cumplimiento a las obligaciones contractuales convenio No. 2330 de 2025 Municipio de Moniquirá - Boyacá

Desde Jaison Alfredo Duarte Gallo <jaison.duarte@mininterior.gov.co>
Fecha Mar 19/05/2026 10:08 AM
Para planeacion moniquira-boyaca.gov.co <planeacion@moniquira-boyaca.gov.co>; alcaldia@moniquira-boyaca.gov.co <alcaldia@moniquira-boyaca.gov.co>
CC Edgar Jhoan Lopez Riveros <edgar.lopez@mininterior.gov.co>

Señores:

FREDY IOVANNY PARDO PINZON
Alcalde Municipal
Municipio de Moniquirá - Boyacá

HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA
Secretario de planeación
Municipio de Moniquirá - Boyacá

Asunto: Cumplimiento a las obligaciones contractuales convenio No. 2330 de 2025 Municipio de Moniquirá - Boyacá

Cordial saludo,

En atención al convenio No. 2330 de 2025 suscrito entre el municipio de Moniquirá - Boyacá y el Ministerio del Interior FONSECON cuyo objeto es: *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ-BOYACÁ.",* me permito solicitar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Anexo de condiciones específicamente en *"CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES CONTRACTUALES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ENTE TERRITORIAL*" de acuerdo a lo siguiente:

"(...) 4. El cronograma y sus modificaciones deberán ser aprobadas por el supervisor del convenio designado por el MINISTERIO y serán de obligatorio y estricto cumplimiento, atendiendo a las normas técnicas necesarias para su correcta ejecución. Los eventuales ajustes al cronograma se sustentarán técnica, económica y jurídicamente. (...)"

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ

MONIQUIRÁ
Alcaldía Municipal

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2336 DE 2025

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ- BOYACÁ.

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ- BOYACÁ

AÑO																																								
																															2026											
MES	nov-25				dic-25					ene-26					feb-26				mar-26					abr-26					may-26					jun-26					jul-26			
SEMANA	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48
ACTIVIDADES																																													
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO																																														
EXPEDICIÓN DE PÓLIZA Y ENVÍO PARA APROBACIÓN																																													
ACTA DE INICIO																																													
INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA																																													
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN																																													
INCORPORACIÓN DE RECURSOS																																													
ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS - PUBLICACIÓN - PROCESO Y ADJUDICACIÓN INTERVENTORÍA Y OBRA (INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS)																																													
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS																																													
APROBACIÓN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN																																													
EJECUCIÓN DE OBRA (INCLUYE DEMOLICIÓN Y OBRA NUEVA)																																													
TRAMITE CERTIFICACIÓN RETIE/RETILAP																																													
CONEXIÓN (ARRIBA DE SERVICIOS PUBLICOS)																																													
ENTREGA Y RECIBO MINISTERIO																																													
AVANCE DE EJECUCIÓN CONVENIO	%0											%68																				%19										%96				%100
AVANCE DE EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS	%0											%100																														%100				%100
AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA												%0																				%15										%100				%100

De esta manera, se indica que le municipio se encuentra en presunto incumplimiento al cronograma evidenciando que al a fecha no se cuenta con actas de inicio de los contratos derivados, faltando también la ejecución de los estudios y diseños.

Ahora bien, en el cronograma suscrito entre las partes se evidencia que, para la tercera semana del mes de mayo de 2026, se debería estar avanzando en actividades de obra aproximándose a un 78,94%.

Así las cosas, se solicita al ente territorial remitir los cronogramas de cada proceso de selección y expresar las fechas tentativas para realizara actas de inicio, entrega de estudios y diseños.

Atentamente,

Interior

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Jaison Alfredo Duarte Gallo
jaison.duarte@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 ext. 2800
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Interior

Al contestar cite Radicado 2026-3-003122-016666 Id: 775809
Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Fecha: 29-05-2026 10:33:47
Folios: 1
Anexos: 0

MEMORANDO

Bogotá, D.C. 29 de mayo de 2026

PARA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL

DE: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.

ASUNTO: Solicitud de aclaración con respecto al numero de Resolución del Acto Administrativo emitido para el convenio No. 2330 de 2025 Municipio de Moniquirá - Boyacá.

Cordial saludo,

En atención al convenio No. 2330 de 2025, suscrito entre el Municipio de Moniquirá - Boyacá y el Ministerio del Interior - FONSECON, me permito solicitar a su despacho la aclaración pertinente con respecto al No. de resolución del Acto Administrativo expedido para este convenio, teniendo en cuenta lo siguiente:

- El 23 de febrero de 2025, el ente territorial solicitó aclaración con respecto a la resolución expedida como acto administrativo del convenio en mención basados que en la primera pagina de la resolución se evidencia el No. 1849 del 06 de noviembre de 2025, sin embargo en las siguientes paginas del documento se evidencia el No. 1449 del 06 de noviembre de 2025.


Así las cosas, se solicita de manera prioritaria la aclaración y subsanación del documento, en el entendido que se hace necesario el número de la resolución para la elaboración de los contratos de estudios, diseños y obra e interventora de los mismos.

Atentamente,

EDGAR JHOAN LOPEZ RIVEROS
Profesional Universitario
Grupo de Control y Seguimiento de Proyectos
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Elaboró:Jaison Duarte/ Profesional de apoyo a la supervisión

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2330 DE 2025, MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ– DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

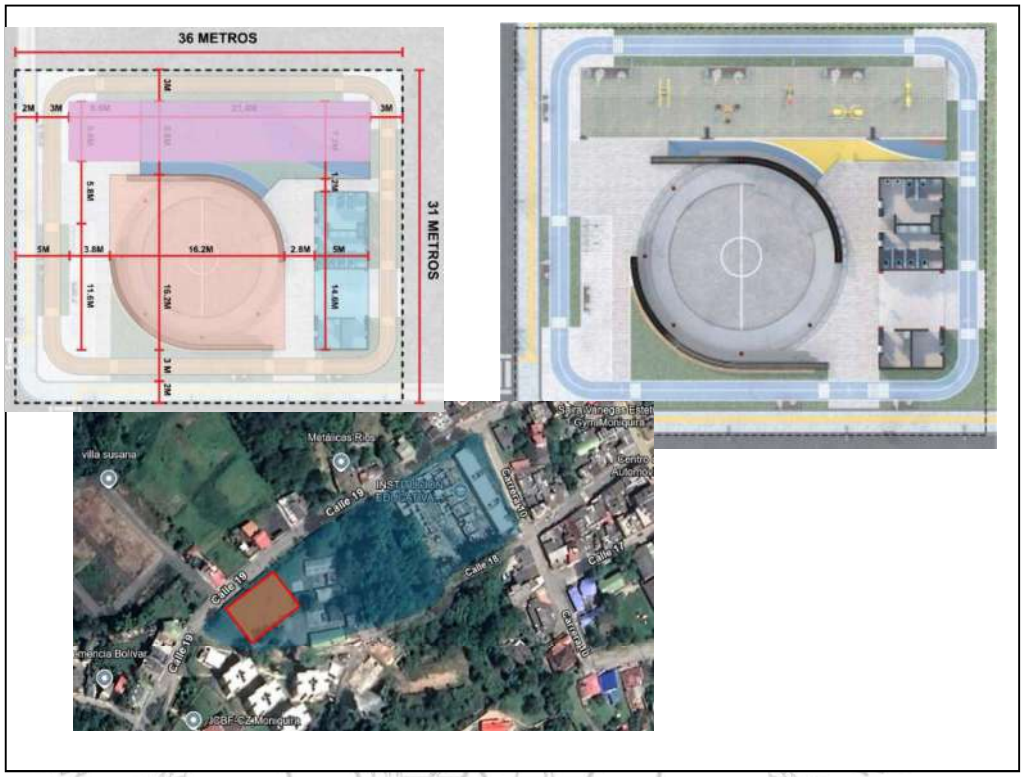

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ- BOYACÁ	
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Lote 2 "La Quinta" Calle 19 N° 10 -27 Barrio Joaquín Motta, zona urbana del municipio de Moniquirá, departamento de Boyacá.	
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MINISTERIO INTERIOR-FONSECON**	$ 2.450.000.000,00
	APORTES MUNICIPIO	$ 0,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO	$ 2.450.000.000,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	06/11/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/07/2026	

INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	14/11/2025	
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO	PRIMERA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO	SUSPENSIÓN 01	FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN	FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO	FECHA: DD/MM/AAAA
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE($ 149.827.981,00)	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE($ 84.123.457,00)	
VALOR DE OBRA	MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE($1.846.883.749,00)	
VALOR INTERVENTORÍA	TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($369.164.814,00)	
SUPERVISOR DEL CONVENIO POR EL MUNICIPIO	HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES Secretaría de Planeación y Desempeño Institucional	
PERIODO DE INFORME	01 de marzo del 2026 al 31 de marzo del 2026	

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DESARROLLO DEL CONVENIO

Durante el mes de marzo, se reitera la solicitud a la EBSA para cambio de trazado de red sobre predio propiedad municipio de Moniquirá, la EBSA mediante comunicación telefónica informa que la red actualmente entrega energía a los salones de la zona y que en el momento de las obras realizará el traslado, pues de allí también se podrá entregar el fluido eléctrico al Centro de Convivencia Ciudadana “Paz a lo Bien” Moniquirá.



Gmail planeacion moniquira-boyaca.gov.co <planeacion@moniquira-boyaca.gov.co>

Solicitud cambio de trazado red sobre predio propiedad municipio de Moniquirá

planeacion moniquira-boyaca.gov.co <planeacion@moniquira-boyaca.gov.co> 2 de marzo de 2026 a las 2:11 p.m.
Para: "nperez@ebsa.com.co" <nperez@ebsa.com.co>

Estimado Ingeniero Perez,

Esperamos que usted y su equipo de trabajo se encuentren muy bien.

Desde el municipio de Moniquirá y con el apoyo del ministerio del interior venimos desarrollando el proyecto de "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ – BOYACÁ" en el predio localizado en la Calle 19 N°. 10-27 Lote N°2 "La Quinta" en el Barrio Joaquín Motta en el área urbana del municipio, coordenadas 5°52'26.3"N 73°34'37.4"W.
Predio sobre el que se encuentra una red de energía eléctrica, por lo que solicitamos su valiosa gestión y apoyo para cambiar el trazado de la mencionada red, que puede verse en las imágenes adjuntas. El proyecto se encuentra avanzando y requerimos iniciar obras de nivelación del terreno cuanto antes.

Hemos registrado la solicitud en la página web de la EBSA, con el radicado N°. ENT-TUN-0009788-2025, para gestión y seguimiento.

Reiteramos nuestro agradecimiento por su valioso apoyo en el desarrollo sostenible de nuestro municipio.
Un cordial saludo,

ING.HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES
Secretario de Planeación y Desempeño Institucional
Municipio de Moniquirá



Adicionalmente se verifica la correcta instalación de la valla





Se avanza en el proceso de contratación para:

Número del proceso	Descripción	Precio estimado total
M-CM-001-2026	INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	453.288.271 COP
M-LP-001-2026	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ - BOYACÁ	1.996.711.729 COP

Según lo presentado en la plataforma secop 2, los procesos se detallan a continuación (Anexos al final del documento para cada proceso), teniendo en cuenta los documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2026, para el Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte):

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO

RELACIÓN CUENTAS DE COBRO	DÉBITO	CRÉDITO
VALOR CONTRATO	$ 2.450.000.000,00	$ 0,00
VALOR CUENTA COBRO No. 1		$ 857.500.000,00
VALOR POR COBRAR		$ 1.592.500.000,00
SUMAS IGUALES	**$ 2.450.000.000,00**	**$ 2.450.000.000,00**

4. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO

ACTIVIDADES	30/11/2025	31/12/2025	31/01/2026	28/02/2026	31/03/2026
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO	100%				
EXPEDICIÓN DE PÓLIZA Y ENVÍO PARA APROBACIÓN	100%				
ACTA DE INICIO	100%				
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	100%				
INCORPORACIÓN DE RECURSOS (Cuenta Cobro No. 1)		100%			
INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA	5%	15%	50%	90%	100%
ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, ESTUDIOS DEL SECTOR Y DEMAS DOCUMENTOS - INTERVENTORÍA Y OBRA (INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS)		5%	80%	100%	100%
OBRA (INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS)		40%	90%	100%	100%
INTERVENTORÍA		40%	70%	100%	100%
PUBLICACIÓN - PROCESO Y ADJUDICACIÓN -INTERVENTORÍA Y OBRA (INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS)				70%	90%
OBRA (INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS)				70%	90%
INTERVENTORÍA				70%	90%
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		0%	0%	0%	0%


Sin otro particular,

HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES
Secretaría de Planeación y Desempeño Institucional
SUPERVISOR

Vto Bno. FREDY IOVANNY PARDO PIZÓN
Alcalde municipio de Moniquirá

	Proyectó		Revisó		Aprobó
Nombre	Vivian Andrea Ulloa Mayorga		Harvi Hiuston Antony Barrera Torres		Harvi Hiuston Antony Barrera Torres
Firma					
TRD	Código		Dependencia		

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 6
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2330 DE 2025, MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ– DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

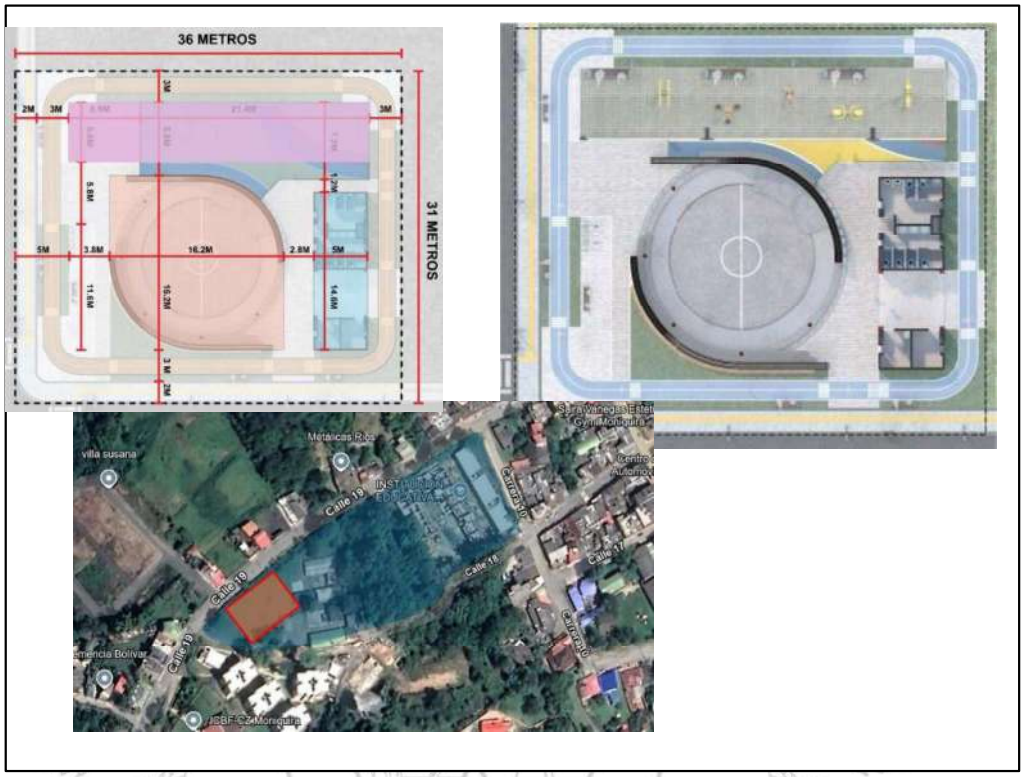

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ- BOYACÁ	
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Lote 2 "La Quinta" Calle 19 N° 10 -27 Barrio Joaquín Motta, zona urbana del municipio de Moniquirá, departamento de Boyacá.	
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MINISTERIO INTERIOR-FONSECON**	$ 2.450.000.000,00
	APORTES MUNICIPIO	$ 0,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO	$ 2.450.000.000,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	06/11/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/07/2026	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	14/11/2025	

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO	PRIMERA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO	SUSPENSIÓN 01	FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN	FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO	FECHA: DD/MM/AAAA
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE($ 149.827.981,00)	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE($ 84.123.457,00)	
VALOR DE OBRA	MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE($1.846.883.749,00)	
VALOR INTERVENTORÍA	TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($369.164.814,00)	
SUPERVISOR DEL CONVENIO POR EL MUNICIPIO	HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES Secretaría de Planeación y Desempeño Institucional	
PERIODO DE INFORME	01 de abril del 2026 al 30 de abril del 2026	

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DESARROLLO DEL CONVENIO

Se avanza en el proceso de contratación para:

Número del proceso	Descripción	Precio estimado total
M-CM-001-2026	INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	453.288.271 COP
M-LP-001-2026	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ - BOYACÁ	1.996.711.729 COP

Según lo presentado en la plataforma secop 2, los procesos se detallan a continuación (Anexos al final del documento para cada proceso), teniendo en cuenta los documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2026, para el Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte):

INFORME DE SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE MONIQUIRA+

Precio estimado total: 453.288.271 COP

Número del proceso M-CM-001-2026 (Presentación de oferta)

Título: INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICI

Fase: Presentación de oferta

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Fase previa Presentación de observaciones

Descripción: INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Tipo de proceso Concurso de méritos abierto

Publicación del informe de evaluación de las Ofertas 6/04/2026 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Presentación de observaciones al informe evaluación de las ofertas 9/04/2026 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Expedición del acto de adjudicación o de declaratoria desierta 13/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Firma del Contrato 13/04/2026 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Entrega de las garantías de ejecución del contrato 14/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del contrato 15/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe de selección	CO1.AWD.2555596	Informe de selección CO1.AWD.2555596	20/04/2026 3:00 PM *(UTC -5 horas)*
Observación a informe	CO1.MSG.9243270	[Respondido] RE:SUBSANACIÓN PROPONENTE INTEROBRAS SC S.A.S., INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR	10/04/2026 11:08 AM *(UTC -5 horas)*
Informe de evaluación	CO1.AWD.2555596	Informe de evaluación 2 CO1.AWD.2555596	10/04/2026 11:07 AM *(UTC -5 horas)*
Observación a informe	CO1.MSG.9243270	SUBSANACIÓN PROPONENTE INTEROBRAS SC S.A.S., INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR	7/04/2026 7:22 PM *(UTC -5 horas)*
Informe de evaluación	CO1.AWD.2555596	Informe de evaluación 1 CO1.AWD.2555596	6/04/2026 5:02 PM *(UTC -5 horas)*

MUNICIPIO DE MONIQUIRA+

Precio estimado total: 1.996.711.729 COP

Número del proceso M-LP-001-2026 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))

Título: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ - BOYACÁ (Fase de Selección (Presentación de ofertas))

Fase: Fase de Selección (Presentación de ofertas)

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Fase previa Presentación de observaciones

Descripción: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ - BOYACÁ

Tipo de proceso Licitación pública (Obra pública)

Presentación de Ofertas 9/04/2026 8:30:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Apertura del sobre 1 9/04/2026 8:40:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Informe de presentación de Ofertas 10/04/2026 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Publicación del informe de verificación o evaluación 20/04/2026 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*



ALCALDÍA MUNICIPAL MONIQUIRÁ	FM - 049	Versión: 2.0 Fecha: 01/09/2024 Página 1 de 3
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		

ADENDA

ADENDA MODIFICATORIA N° 03

LICITACIÓN DE OBRA PUBLICA
No. M-LP-001-2026

OBJETO:

OBJETO: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ - BOYACÁ"

CONSIDERANDO QUE:

Que el Municipio de Moniquirá con base en el Plan Anual de Adquisiciones, determinó la necesidad de realizar el proceso de contratación cuyo objeto es **"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ - BOYACÁ"** Para lo cual se permitió publicar el 13 de febrero de 2026 en la plataforma del SECOP: 2.) Estudios previos, estudio del sector, pliego de condiciones, avisos y demás anexos.

Que, dentro del proceso se presentó cinco 5 ofertas así:

LISTA DE OFERTAS

Abrir Panel | Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
Moniquira 1	CONSORCIO MQ	Evaluación	9/04/2026 8:18 AM	0 COP
UNIÓN TEMPORAL CENTRO MONIQUIRÁ	UT CENTRO MONIQUIRÁ	Evaluación	9/04/2026 8:15 AM	0 COP
CONSORCIO MONIQUIRÁ	CONSORCIO MONIQUIRÁ	Evaluación	9/04/2026 7:26 AM	0 COP
M-LP-001-2026 - UNION TEMPORAL C&G VIWA M INGENIERIA INTEGRAL	UNION TEMPORAL C&G VIWAM IN GENIERIA INTEGRAL	Evaluación	9/04/2026 7:20 AM	0 COP
OFERTA M-LP-001-2026. CONSORCIO SOCIAL INSAF	CONSORCIO SOCIAL INSAF	Evaluación	8/04/2026 9:43 PM	0 COP

Fecha de cierre	AGOTADO	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Informe de presentación de ofertas Audiencia de apertura de Sobre 1	09/04/2026 a las 8:40 am	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	20/04/2026 a las 03:00 pm	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas	28/04/2026 a las 08:00 am	SECOP II	L. 1882/18 art. 1
(plazo máximo para presentación de subsanaciones)			
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre 1	29/04/2026 a las 08:00 am	SECOP II	L. 1882/18 art. 1
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	30/04/2026 a las 09:00 am	[ciudad], en la [dirección de la Entidad]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	30/04/2026 a las 06:00 pm	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.

ARTÍCULO CUARTO: Para efectos legales a los que haya lugar, este documento será publicado en el SECOP II www.contratos.gov.co

En constancia firman quienes intervienen en ella, a los **quince (15)** días del mes de **abril** del año **2026.**

FREDY IOVANNY PARDO PINZÓN
Alcalde municipal de Moniquirá

	Proyectó	Revisó / Aprobó	Revisó / Aprobó
Nombre	Ing. Héctor Andrés Rodríguez Arias – Apoyo profesional – Secretaría de Compras Públicas y Abastecimiento Estratégico	Dra. Leyi Yineth Ortiz Fajardo - Secretaria De Compras y Abastecimiento Estratégico	Ing. Harvi Hustin Arjony Barrera Torres – Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional
Firma			
TRD	Código Dependencia	SECRETARÍA DE COMPRAS PÚBLICAS Y ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO	

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO

RELACIÓN CUENTAS DE COBRO	DÉBITO	CRÉDITO
VALOR CONTRATO	$ 2.450.000.000,00	$ 0,00
VALOR CUENTA COBRO No. 1		$ 857.500.000,00
VALOR POR COBRAR		$ 1.592.500.000,00
SUMAS IGUALES	**$ 2.450.000.000,00**	**$ 2.450.000.000,00**

4. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO

ACTIVIDADES	30/11/2025	31/12/2025	31/01/2026	28/02/2026	31/03/2026	30/04/2026
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO	100%					
EXPEDICIÓN DE PÓLIZA Y ENVÍO PARA APROBACIÓN	100%					
ACTA DE INICIO	100%					
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	100%					
INCORPORACIÓN DE RECURSOS (Cuenta Cobro No. 1)		100%				
INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA	5%	15%	50%	90%	100%	
ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, ESTUDIOS DEL SECTOR Y DEMAS DOCUMENTOS - INTERVENTORÍA Y OBRA (INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS)		5%	80%	100%	100%	
OBRA (INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS)		40%	90%	100%	100%	
INTERVENTORÍA		40%	70%	100%	100%	
PUBLICACIÓN - PROCESO Y ADJUDICACIÓN - INTERVENTORÍA Y OBRA (INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS)				70%	90%	95%
OBRA (INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS)				70%	90%	90%
INTERVENTORÍA				70%	90%	100%
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		0%	0%	0%	0%	0%


Sin otro particular,

HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES
Secretaría de Planeación y Desempeño Institucional
SUPERVISOR

Vto Bno. FREDY JOVANNY PARDO PIZÓN
Alcalde municipio de Moniquirá

	Proyectó		Revisó	Aprobó
Nombre	Vivian Andrea Julloa Mayorga		Harvi Hiuston Antony Barrera Torres	Harvi Hiuston Antony Barrera Torres
Firma				
TRD	Código		Dependencia	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 7
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2330 DE 2025, MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ– DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

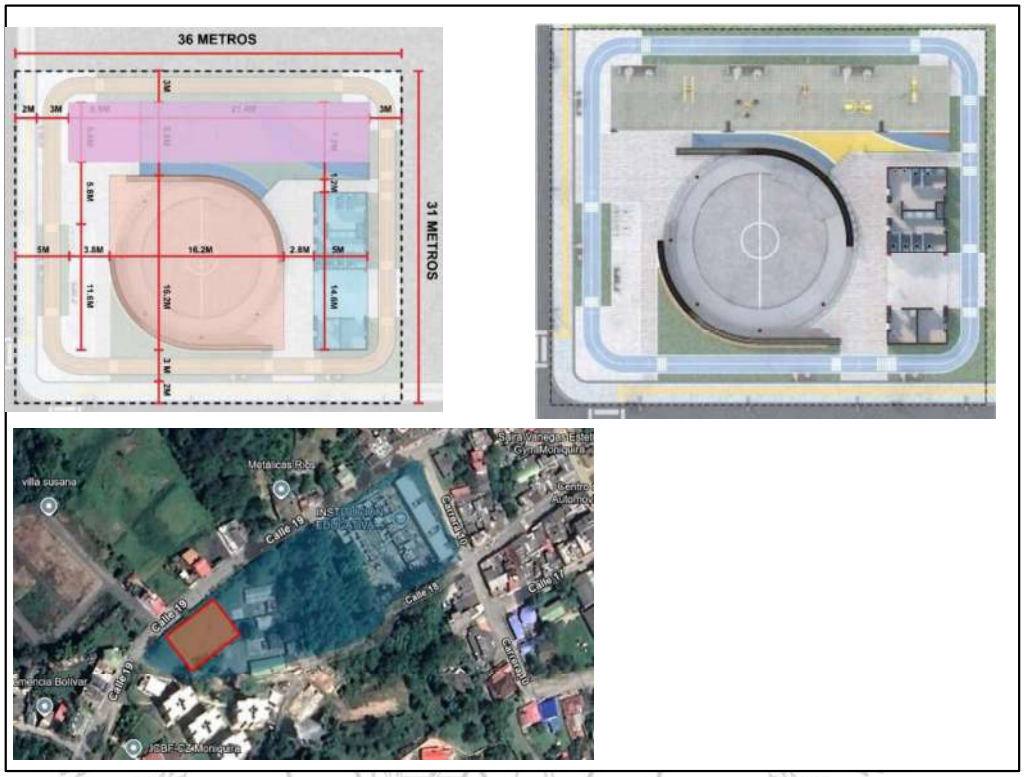

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ- BOYACÁ	
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Lote 2 "La Quinta" Calle 19 N° 10 -27 Barrio Joaquín Motta, zona urbana del municipio de Moniquirá, departamento de Boyacá.	
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MINISTERIO INTERIOR-FONSECON**	$ 2.450.000.000,00
	APORTES MUNICIPIO	$ 0,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO	$ 2.450.000.000,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	06/11/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/07/2026	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	14/11/2025	

INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO	PRIMERA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO	SUSPENSIÓN 01	FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN	FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO	FECHA: DD/MM/AAAA
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 149.827.981,00)	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 84.123.457,00)	
VALOR DE OBRA	MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.846.883.749,00).	
VALOR INTERVENTORÍA	TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($369.164.814,00)	
SUPERVISOR DEL CONVENIO POR EL MUNICIPIO	HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES Secretaría de Planeación y Desempeño Institucional	
PERIODO DE INFORME	01 de mayo del 2026 al 31 de mayo del 2026	

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DESARROLLO DEL CONVENIO

Se avanza en el proceso de contratación para:

Número del proceso	Descripción	Precio estimado total
M-CM-001-2026	INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	453.288.271 COP
M-LP-001-2026	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ - BOYACÁ	1.996.711.729 COP

Según la plataforma secop 2, sobre el proceso de contratación M-LP-001-2026 “ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ – BOYACÁ” durante el mes de mayo se adelantó la audiencia de adjudicación y estamos atentos a la firma del contrato y el acta de inicio.

Como se presentó en el informe del mes de abril, el proceso de interventoría fue finalizado y se encuentra a la espera de acta de inicio, lo cual depende del proceso de obra

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ıformación

MUNICIPIO DE MONIQUIRA+

Precio estimado total:	1.996.711.729 COP
Número del proceso	M-LP-001-2026 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))
Título:	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ - BOYACÁ (Fase de Selección (Presentación de ofertas))
Fase:	Fase de Selección (Presentación de ofertas)
Estado:	Proceso adjudicado y celebrado
Fase previa	Presentación de observaciones
Descripción:	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ - BOYACÁ
Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	15 días de tiempo transcurrido *(20/05/2026 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Audiencia de Adjudicación y apertura sobre económico	10 días de tiempo transcurrido *(26/05/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	9 días de tiempo transcurrido *(26/05/2026 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Firma del Contrato	8 días de tiempo transcurrido *(27/05/2026 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	7 días de tiempo transcurrido *(28/05/2026 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Se realizó la adenda modificatoria No. 5 con fecha de 12 de mayo de 2026, donde se actualizaron las fechas de las distintas actividades de contratación.

ADENDA

ADENDA MODIFICATORIA N° 05

LICITACIÓN DE OBRA PUBLICA
No. M-LP-001-2026

OBJETO:

OBJETO: "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ - BOYACÁ"

CONSIDERANDO QUE:

Que el Municipio de Moniquirá con base en el Plan Anual de Adquisiciones, determinó la necesidad de realizar el proceso de contratación cuyo objeto es **"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ - BOYACÁ"** Para lo cual se permitió publicar el 13 de febrero de 2026 en la plataforma del SECOP: 2.) Estudios previos, estudio del sector, pliego de condiciones, avisos y demás anexos.

Que, dentro del proceso se presentó cinco 5 ofertas así:

LISTA DE OFERTAS

Abrir Panel | Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
Moniquira 1	CONSORCIO MQ	Evaluación	9/04/2026 8:18 AM	0 COP
UNIÓN TEMPORAL CENTRO MONIQUIRÁ	UT CENTRO MONIQUIRÁ	Evaluación	9/04/2026 8:15 AM	0 COP
CONSORCIO MONIQUIRÁ	CONSORCIO MONIQUIRÁ	Evaluación	9/04/2026 7:26 AM	0 COP
M-LP-001-2026 - UNION TEMPORAL C&G VIWA M INGENIERIA INTEGRAL	UNION TEMPORAL C&G VIWAM IN GENIERIA INTEGRAL	Evaluación	9/04/2026 7:20 AM	0 COP
OFERTA M-LP-001-2026, CONSORCIO SOCIAL INSAF	CONSORCIO SOCIAL INSAF	Evaluación	8/04/2026 9:43 PM	0 COP

ADENDA

Informe de presentación de ofertas Audiencia de apertura de Sobre 1	AGOTADO	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	AGOTADO	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	AGOTADO	SECOP II	L. 1882/18 art. 1
Publicación del informe preliminar de evaluación 03 de Sobre 1	12/05/2026 a las 12:00 m.	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	20/05/2026 a las 03:00 pm.	SECOP II	L. 1882/18 art. 1
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre 1	22/05/2026 a las 06:00 p.m.	SECOP II	L. 1882/18 art. 1
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	26/05/2026 a las 08:00 am	[ciudad], en la [dirección de la Entidad]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	26/05/2026 a las 06:00 pm	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.
Firma del Contrato	27/05/2026 a las 04:00 pm	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Entrega de la Garantía única de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	28/05/2026 a las 04:00 pm	[ciudad], en la [dirección de la Entidad]	Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de Garantías	29/05/2026 a las 04:00 pm	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.

[La Entidad deberá incluir en el cronograma la fecha establecida para el examen del sitio de la obra, teniendo presente que en ningún caso no asistir al sitio de la obra tendrá como consecuencia el rechazo de la oferta]

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO

RELACIÓN CUENTAS DE COBRO	DÉBITO	CRÉDITO
VALOR CONTRATO	$ 2.450.000.000,00	$ 0,00
VALOR CUENTA COBRO No. 1		$ 857.500.000,00
VALOR POR COBRAR		$ 1.592.500.000,00
SUMAS IGUALES	**$ 2.450.000.000,00**	**$ 2.450.000.000,00**

4. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO

ACTIVIDADES	30/11/2025	31/12/2025	31/01/2026	28/02/2026	31/03/2026	30/04/2026	31/05/2026
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO	100%						
EXPEDICIÓN DE PÓLIZA Y ENVÍO PARA APROBACIÓN	100%						
ACTA DE INICIO	100%						
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	100%						
INCORPORACIÓN DE RECURSOS (Cuenta Cobro No. 1)		100%					
INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA	5%	15%	50%	90%	100%		
ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, ESTUDIOS DEL SECTOR Y DEMAS DOCUMENTOS - INTERVENTORÍA Y OBRA (INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS)		5%	80%	100%	100%		
OBRA (INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS)		40%	90%	100%	100%		
INTERVENTORÍA		40%	70%	100%	100%		
PUBLICACIÓN - PROCESO Y ADJUDICACIÓN - INTERVENTORÍA Y OBRA (INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS)				70%	90%	95%	100%
OBRA (INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS)				70%	90%	90%	100%
INTERVENTORÍA				70%	90%	100%	100%
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		0%	0%	0%	0%	0%	0%

Sin otro particular,

HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES
Secretaría de Planeación y Desempeño Institucional
SUPERVISOR

Vto Bno. FREDY IOVANNY PARDO PIZÓN
Alcalde municipio de Moniquirá

	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	Vivian Andrea Ulloa Mayorga	Harvi Hiuston Antony Barrera Torres	Harvi Hiuston Antony Barrera Torres
Firma			
TRD	Código	Dependencia	

INFORME FINANCIERO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026
MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CUENTA (AHORROS) No. 4-155-10-69275-4 **DEL BANCO:** **BANCO AGRARIO DE COLOMBIA**

VALOR CONVENIO $ 2,450,000,000.00

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR $ 2,450,000,000.00
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 0.00

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	24/12/2025	GIRO 1	$ 857,500,000.00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 2	$
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 3	$
		GIRO 4	$
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR		$ 857,500,000.00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) $ 857,500,000.00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
	TOTAL CONTRATADO			$ 0.00	$ 0.00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
		VALOR TOTAL PAGADO (2)			$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/03/2026	$ 2,735,339.00
TOTAL (3)	$ 2,735,339.00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. _____

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	$ 0.00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) $ 857,500,000.00
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) $ 0.00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 2,735,339.00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0.00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) $ 2,735,339.00

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) $ 860,235,339.00

OBSERVACIONES Los rendimientos financieros, se reflejan de manera trimestral.

FIRMA

OLGA MARINA CAITON PINILLA
Secretaria de Hacienda

* EL PRESENTE FORMATO DEBE SER DILIGENCIADO EN SU TOTALIDAD, CADA CASILLA DEBE SER DILIGENCIADA DE MANERA CLARA Y PRECISA, SIN ENMENDADURAS Y CON LA INFORMACIÓN DE LOS MESES ANTERIORES

#¡VALOR!	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	1
	FORMATO	ANEXO	PÁGINA	1 DE 1
		INFORME FINANCIERO	FECHA DE VIGENCIA	07/11/2025

INFORME FINANCIERO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026
MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CUENTA (AHORROS) No. 3-155-10-09275-4 DEL BANCO: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR CONVENIO $ 2,450,000,000.00

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR $ 2,450,000,000.00
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 0.00

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR	24/12/2025	GIRO 1	$ 857,500,000.00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR		GIRO 2	$
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR.		GIRO 3	$
		GIRO 4	$
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR		$ 857,500,000.00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) $ 857,500,000.00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
TOTAL CONTRATADO				$ 0.00	$ 0.00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
VALOR TOTAL PAGADO (2)					$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/03/2026	$ 2,735,339.00
TOTAL (3)	$ 2,735,339.00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	$ 0.00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	$ 857,500,000.00
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	$ 0.00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 2,735,339.00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0.00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3 -4)=[5]	$ 2,735,339.00
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	$ 860,235,339.00

OBSERVACIONES: Los rendimientos financieros, se reflejan de manera trimestral.

FIRMA

OLGA MARINA LANTON CHILLA
Secretaria de Hacienda

*EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 3.5 DEL ANEXO TECNICO DEL CONTRATO DE ENDEUDAMIENTO FINANCIERO Y CONDICIONES DE LOS RECURSOS SOCIALES

	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	1
#¡VALOR!	FORMATO	ANEXO	PÁGINA	1 DE 1
		INFORME FINANCIERO	FECHA DE VIGENCIA	07/11/2025

INFORME FINANCIERO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026
MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CUENTA (AHORROS) No. 4-165-10-09276-4 DEL BANCO: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR CONVENIO $ 2,450,000,000.00

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR $ 2,450,000,000.00
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 0.00

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	24/12/2025	GIRO 1	$ 857,500,000.00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 2	$
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 3	$
		GIRO 4	$
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	$ 857,500,000.00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) $ 857,500,000.00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
TOTAL CONTRATADO				$ 0.00	$ 0.00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
VALOR TOTAL PAGADO (2)					$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/05/2026	$ 2,735,339.00
TOTAL (3)	$ 2,735,339.00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	$ 0.00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	$ 857,500,000.00
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	$ 0.00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 2,735,339.00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0.00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	$ 2,735,339.00
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	$ 860,235,339.00

OBSERVACIONES: Los rendimientos financieros, se reflejan de manera bimestral.

FIRMA

OLGA MARINA CANTOR PINILLA
Secretaria de Hacienda

SE FOLIA UNICAMENTE EL FORMATO BANCARIO CON EL COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES
