ALQUILER DE RETROEXCAVADORA DE ORUGA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MATERIAL DE ARRASTRE QUE TIENEN COMO PROPÓSITO LA PREVENCIÓN, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

INFORME DE SUPERVISION No. 02 FINAL

MARIA SONIA TORRES MORA

SUPERVISOR

MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE GOBIERNO

TAURAMENA 2026

18 DE JUNIO 2026

INFORME DE SUPERVISION No. 02 FINAL

CONTRATO No.	576 del 24 de diciembre de 2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SERVICIOS
OBJETO	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA DE ORUGA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MATERIAL DE ARRASTRE QUE TIENEN COMO PROPÓSITO LA PREVENCIÓN, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS - COOPSERVICES NIT: 844001177-1
R/LEGAL	ERWIN PLATA HERNANDEZ C.C.: 74.856.752 de Tauramena.
SUPERVISOR	MARIA SONIA TORRES MORA
APOYO SUPERVISIÓN	Marly Yurany Martínez Aldana Contrato No. 93 de 2026
VALOR CONTRATO	$ 349.886.415,00
FECHA INICIACIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN	28 DE ABRIL DE 2026
PERIODO DE EJECUCIÓN	N/A
% AVANCE FINANCIERO	100,00%
% AVANCE FISICO	100,00%
FECHA PRESENTE INFORME	18 DE JUNIO DE 2026

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto Municipal 029 de 2004 y demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la Cláusula Séptima del Contrato en mención; me permito rendir en el presente informe el seguimiento sobre el cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. EJECUCIÓN FÍSICIA (CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES)

ACTIVIDAD DESARROLLADA		RESULTADOS OBTENIDOS
INTERVENCIÓN DE HORAS MÁQUINA DE RETROEXCAVADORA DE ORUGA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MATERIAL DE ARRASTRE QUE TIENEN COMO PROPÓSITO LA PREVENCIÓN, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.		9,78%
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO EN CAMABAJA.		90,22%
VISITAS O INSPECCIONES REALIZADAS	Supervisión Permanente.	**100,00%**

2. GARANTÍAS

El contratista presentó las siguientes:	SI	NO	N.A	FECHA APROBACIÓN
Cumplimiento	X			29/12/2025
Responsabilidad civil extracontractual	X			29/12/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	X			29/12/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	X			29/12/2025

PÓLIZA N°	COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		MODIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FIN	
CHU-100065639	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Cumplimiento	$ 34.988.641,50	24/12/2025	30/08/2026	XX
		Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 105.000.000,00	24/12/2025	30/08/2026	XX
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 17.494.320,75	24/12/2025	30/04/2029	XX
CHU-100012546		Responsabilidad Civil Extracontractual.	$ 284.700.000,00	24/12/2025	24/04/2026	XX

3. EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
		ANTICIPADO		
Valor contratado	$ 349.886.415,00			
Valor Anticipo (100 % VIGENCIA 2025)		$ 105.000.000,00		$ 105.000.000,00
Valor Adicional No. XXX				
Valor Acta Parcial No.01		-$ 105.000.000,00	$ 269.274.394,00	$ 164.274.394,00
Valor presente Acta de Recibo Final			$ 80.612.021,00	$ 80.612.021,00
Saldo por ejecutar			$ -	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	**$ 349.886.415,00**		**$ 349.886.415,00**	**$ 349.886.415,00**

4. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

Se materializó alguno de los riesgos establecidos en el proceso inicialmente?

Para el periodo de la ejecución del presente contrato no se materializó ningún riesgo.

5. DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN	
DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
ACTA DE INICIO	29/12/2025
INFORME DE EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No. 1	27/03/2026
ACTA PARCIAL No. 1	15/04/2026
INFORME DE SUPERVISIÓN No.1	15/04/2026
INFORME DE EJECUCIÓN No.2 FINAL	5/06/2026
ACTA DE RECIBO FINAL	18/06/2026
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2	18/06/2026

Se deja constancia, que el Contratista hizo entrega de: Informe No 2 Final) con sus respectivos soportes como: (seguridad social, planillas, registro fotográfico, entre otros), los cuales se remiten a la oficina Asesora de Jurídica del Municipio, para que reposen en el expediente del contrato.

REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	EXCELENTE	PUNTAJE:	100	

6. ANEXOS

1. Anexo 1. INFORME DE ACTIVIDADES No 2 Final

MARIA SONIA TORRES MORA
SUPERVISOR

MARLY YURANY MARTÍNEZ ALDANA
Apoyo a la supervisón

ANEXO 1
INFORME DE SUPERVISION No. 02 FINAL

OBJETO	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA DE ORUGA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MATERIAL DE ARRASTRE QUE TIENEN COMO PROPÓSITO LA PREVENCIÓN, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS - COOPSERVICES NIT: 844001177-1
SUPERVISOR	MARIA SONIA TORRES MORA

DESCRIPCION DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1 *MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO EN CAMABAJA DISTANCIA PROMEDIO 30 KMM (INCLUYE ESCOLTA).*

Durante la ejecución total del proyecto se llevaron a cabo dieciocho (18) intervenciones, las cuales permitieron atender de manera oportuna situaciones de emergencia asociadas a fenómenos hidrológicos y climáticos. Estas acciones contribuyeron a la reducción de riesgos por inundación, erosión y socavación, así como a la protección de viviendas, vías de comunicación y predios productivos.

Asimismo, las intervenciones ejecutadas mejoraron las condiciones de movilidad en las zonas rurales y garantizaron la disponibilidad de agua para el desarrollo de actividades pecuarias y agrícolas. De igual manera, favorecieron la recuperación y estabilización de cauces naturales, fortaleciendo la capacidad de respuesta institucional frente a eventos que pueden afectar la seguridad, los medios de vida y el bienestar de las comunidades rurales del municipio.

2 *RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS*

Se ejecutaron un total de 1.119 horas de maquinaria amarilla en diferentes sectores rurales del municipio, orientadas a la atención de emergencias, mitigación de riesgos, protección de infraestructura vial y productiva, recuperación de cauces, control de procesos erosivos y fortalecimiento de las actividades agropecuarias. Las intervenciones se distribuyeron de la siguiente manera:

169 horas de intervención en el río Cusiana, vereda Villa Rosa, sector La Vega (predios Buenos Aires y Bethel), para labores de adecuación y mitigación de afectaciones ocasionadas por procesos erosivos.

100 horas de intervención en el río Cusiana, vereda Cuernavaca (predio Altamira II), orientadas a la recuperación y protección del área afectada.

167 horas de trabajo en el río Chitamena, vereda Cuernavaca (predio La Porfía), mediante acciones de mantenimiento y mitigación del riesgo asociado a la dinámica hídrica del afluente.

120 horas de intervención en caño Güira, vereda El Güira (predios Llano Lindo y Barzal), para labores de descolmatación y mejoramiento de la capacidad hidráulica del cauce.

13 horas de trabajo en los canales de Iquía, vereda Iquía (predios Flor Amarillo y Palma Real), destinadas al mantenimiento y adecuación de canales de drenaje.

55 horas de intervención en la quebrada Gotereña, vereda Visinaca (predio La Gotereña), con el fin de reducir riesgos asociados a procesos de sedimentación y desbordamiento.

87 horas para la atención de emergencias por deslizamiento y ampliación de la vía que comunica las veredas Raizal y Delicias. De igual manera, se atendió la emergencia derivada de la escasez de agua mediante la construcción de un abrevadero para garantizar el suministro hídrico al ganado en la vereda Raizal predio La Posa La Patilla.

42 horas de intervención en la vereda Yaguaros, en caño Santa Rita (predio Bitania), ejecutando acciones de mitigación del riesgo por colmatación del cauce, con el propósito de prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias.
10 horas destinadas a la atención de la emergencia ocasionada por la temporada seca y la escasez de agua en la vereda La Lucha (predio Las Palmitas), mediante la construcción de un reservorio para almacenamiento y abastecimiento hídrico.
120 horas de intervención en la vereda Jagüito, para la descolmatación de afluentes que desembocan en el río Caja y la posterior construcción de un jarillón de protección para el predio Murillana y sectores aledaños. Asimismo, se atendió la emergencia generada por la socavación del río sobre la vía utilizada por varios predios, entre ellos La Envidia y El Manantial, atendiendo la solicitud presentada por la comunidad del sector.**40** horas de intervención en la quebrada Aguablanca, vereda Aguablanca (predio El Maná), debido a la migración del lecho principal de la quebrada y la apertura de un nuevo cauce que ha generado afectaciones sobre un ecosistema de bosque protector de alta sensibilidad ambiental y amenaza la estabilidad de la vivienda existente en el predio. La intervención estuvo orientada a recuperar el cauce histórico que mantenía la quebrada hasta el año 2023.
35 horas de trabajo en el río Surimena, vereda Aguablanca (predio Los Milagros), mediante acciones de reencauzamiento para restaurar el lecho principal del río y reducir la bifurcación actual del flujo. Las labores incluyeron dragado, descolmatación y conformación de material sobre la margen izquierda, con el fin de proteger el talud expuesto y estabilizar la dinámica hidráulica del sector.
72 horas de intervención en el río Tacuya, vereda La Lucha (predio Curimagua), para atender procesos de socavación y migración del cauce principal. La intervención consistió en la recuperación del lecho central del río, el cual se había dividido en dos brazos, generando una isla por acumulación de material sedimentario en la zona media.
32 horas de canalización en la vereda Piñalito, destinadas al descole y drenaje de aguas represadas en el predio La Siega, cuya acumulación estaba generando afectaciones sobre la franja de medianía y la vía de acceso.
36 horas de intervención en el río Cusiana, vereda Visinaca (predio La Sofía), para la construcción y conformación de una canalización y jarillón de protección orientados a disminuir el riesgo de erosión y pérdida de terreno.
21 horas de trabajo en caño Monteloro y el río Surimena, sector San Joaquín de Surimena, vereda Palmar (predios La Porfía y La Primavera), mediante labores de mantenimiento y adecuación de cauces para mejorar las condiciones hidráulicas y reducir riesgos de afectación a los predios colindantes.

MARIA SONIA TORRES MORA
SUPERVISOR

MARLY YURANY MARTÍNEZ ALDANA
Apoyo a la supervisón

ANEXO 2

INFORME DE SUPERVISION No. 02 FINAL

OBJETO	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA DE ORUGA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MATERIAL DE ARRASTRE QUE TIENEN COMO PROPÓSITO LA PREVENCIÓN, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS - COOPSERVICES NIT: 844001177-1
SUPERVISOR	MARIA SONIA TORRES MORA

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO
1	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO EN CAMABAJA DISTANCIA PROMEDIO 30KM (INCLUYE ESCOLTA)	VIAJE	18,00	18,00	9,78%	9,78%	0,0	$ 1.622.376,00	$ 29.202.768,00	$ 29.202.768,00
2	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS.	HORA	1.119,00	1.119,00	90,22%	90,22%	0,0	$ 240.824,00	$ 269.482.056,00	$ 269.482.056,00
								SUBTOTAL EXCLUIDOS	**$ 29.202.768**	**$ 29.202.768**
								SUBTOTAL GRAVADOS IVA 19%	**$ 269.482.056**	**$ 269.482.056**
								IVA 19%	**$ 51.201.591**	**$ 51.201.591**
								TOTAL	**$ 349.886.415**	**$ 349.886.415**
								SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ -

SONIA TORRES MORA
SUPERVISOR


MARLY YURANY MARTINEZ ALDANA
Apoyo a la supervisón

ANEXO 3

INFORME DE SUPERVISION No. 02 FINAL

OBJETO	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA DE ORUGA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MATERIAL DE ARRASTRE QUE TIENEN COMO PROPÓSITO LA PREVENCIÓN, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS - COOPSERVICES NIT: 844001177-1
SUPERVISOR	MARIA SONIA TORRES MORA

GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)

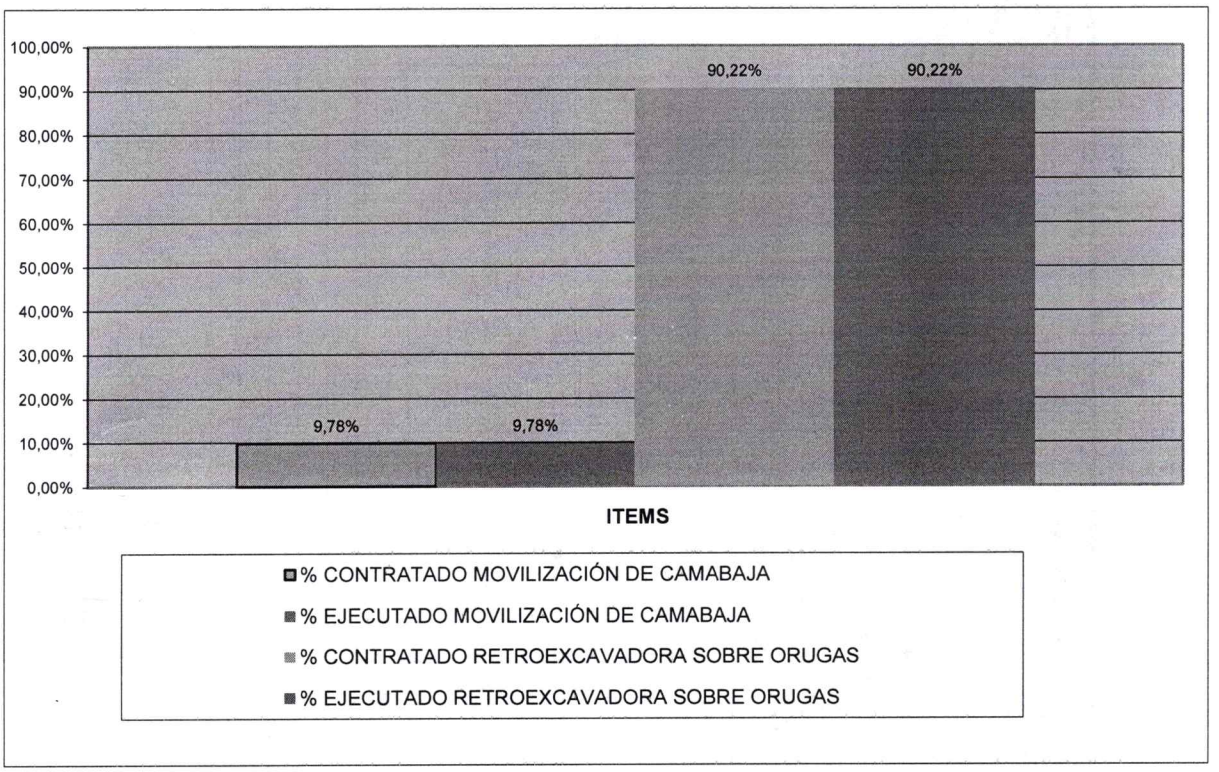

SONIA TORRES MORA
SUPERVISOR

MARLY YURANY MARTÍNEZ
Apoyo a la supervisón

ANEXO 5

INFORME DE SUPERVISION No. 02 FINAL

OBJETO	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA DE ORUGA PARA ADELANTAR ACTIVIDADES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MATERIAL DE ARRASTRE QUE TIENEN COMO PROPÓSITO LA PREVENCIÓN, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS - COOPSERVICES NIT: 844001177-1
INTERVENTOR	MARIA SONIA TORRES MORA

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE DOCUMENTOS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE SUPERVISIÓN
DICIEMBRE 2025	1					
	2					
	3					
	4	Revision de Documentos		Acta de Inicio	Seguimiento	Revision Plan de Inversión del Anticipo
ENERO 2026	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	
FEBRERO 2026	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	
MARZO 2026	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4			Acta parcial 1	Seguimiento	Informe de Supervisión No 1
ABRIL 2026	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	
JUNIO 2026	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3			Acta de recibo final y acta final de ejecucion	Seguimiento	Informe de Supervisión No.2 Final
	4			Acta de Liquidación		

SONIA TORRES MORA
SUPERVISOR

MARLY YURANY MARTÍNEZ ALDANA
Apoyo a la supervisón
