INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MNE-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** No. 9
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Cretrio respectivo)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021
OBJETO:
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA N: 964 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA N: 1111 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 8 de fecha 15/08/2025		2021												2022											
											ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACTA 5		ACTA 6		ACTA 7		ACTA 8		ACTA 9		ACTA 10		ACTA 11		ACTA 12	
											JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																																
		VIATICOS																																
38	1	Viaticos Director y/o Especialistas 2021	Dia	200.000	1.189,00	237.800.000			240,89	$ 48.178.000,00	20	$ 4.000.000	1.500	$ 300.000	10.000	$ 2.000.000	10.500	$ 2.100.000	13.000	$ 2.600.000	31.000	$ 6.200.000	20.500	$ 4.100.000	44.575	$ 8.914.000	34.320	$ 6.864.000	36.000	$ 7.200.000	5.00	$ 1.000.000	#####	$ 2.900.000
38A	1	Viaticos Director y/o Especialistas 2022					$ 226.000,00		171,00	$ 38.646.000,00																								
38B	1	Viaticos Director y/o Especialistas 2023					$ 254.000,00		94,00	$ 23.876.000,00																								
38C	1	Viaticos Director y/o Especialistas 2024					$ 272.000,00		29,00	$ 7.888.000,00																								
38D	1	Viaticos Director y/o Especialistas 2025					$ 284.000,00		308,50	$ 87.614.000,00																								
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																																
39	1	Camioneta o campero de mas de 2.000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y combustible) El modelo del vehículo ofrecido debe corresponder a modelos 2.015 o superior 2021	Mes	4.500.000	218,00	981.000.000			28,28	$ 127.273.999,95	0,523	$ 2.354.000	0,425	$ 1.912.500	1,752	$ 7.884.000	1,141	$ 5.134.500	2,791	$ 12.559.500	3,000	$ 13.500.000	3,000	$ 13.500.000	3,000	$ 13.500.000	3,398	$ 15.111.000	3,133	$ 14.098.500	3,00	$ 13.500.000	3,00	$ 13.770.000
39A	1	Camioneta o campero de mas de 2.000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y combustible) El modelo del vehículo ofrecido debe corresponder a modelos 2.015 o superior 2022					$ 5.130.000,00		41,41	$ 212.433.300,00																								
39B	1	Camioneta o campero de mas de 2.000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y combustible) El modelo del vehículo ofrecido debe corresponder a modelos 2.015 o superior 2023					$ 5.715.000,00		48,07	$ 274.720.050,00																								
39C	1	Camioneta o campero de mas de 2.000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y combustible) El modelo del vehículo ofrecido debe corresponder a modelos 2.015 o superior 2024					$ 6.120.000,00		24,97	$ 152.816.400,00																								
39D	1	Camioneta o campero de mas de 2.000 c.c. (1): 4x4 (Incluye peajes y combustible) El modelo del vehículo ofrecido debe corresponder a modelos 2.015 o superior 2025					$ 6.390.000,00		189,20	$ 1.208.988.000,00																								
40	2	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y combustible) El modelo del vehículo ofrecido debe corresponder a modelos 2.015 o superior 2021	Mes	5.000.000	103,00	515.000.000			0,00	$ -	0	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,00	$ -	$	$ -
40A	2	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y combustible) El modelo del vehículo ofrecido debe corresponder a modelos 2.015 o superior 2022					$ 5.700.000,00		0,00	$ -																								
40B	2	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y combustible) El modelo del vehículo ofrecido debe corresponder a modelos 2.015 o superior 2023					$ 6.350.000,00		0,00	$ -																								
40C	2	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y combustible) El modelo del vehículo ofrecido debe corresponder a modelos 2.015 o superior 2024					$ 6.800.000,00		0,00	$ -																								
40D	2	Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes y combustible) El modelo del vehículo ofrecido debe corresponder a modelos 2.015 o superior 2025					$ 7.100.000,00		0,00	$ -																								
41	1	Esuaco completo de Topografia 2021	Segun comprobante	2.000.000	436,00	872.000.000			15,07	$ 30.142.000,00	0	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,666	$ 1.932.000	2,000	$ 4.000.000	2,000	$ 4.000.000	2,000	$ 4.000.000	2,000	$ 4.000.000	2,035	$ 4.070.000	2,00	$ 4.000.000	2,00	$ 4.000.000
41A	1	Equipo completo de Topografia 2022					$ 2.280.000,00		31,53	$ 71.888.400,00																								
41B	1	Equipo completo de Topografia 2023					$ 2.540.000,00		32,97	$ 83.743.800,00																								
41C	1	Esuaco completo de Topografia 2024					$ 2.720.000,00		20,03	$ 54.481.600,00																								
41D	1	Equipo completo de Topografia 2025					$ 2.840.000,00		156,70	$ 445.028.000,00																								
42	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos 2021	Segun comprobante	2.500.000	220,00	550.000.000			5,05	$ 12.635.000,00	0	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,392	$ 980.000	0,660	$ 1.650.000	0,400	$ 1.000.000	1,082	$ 2.705.000	2,52	$ 6.300.000	-	$ -
42A	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos 2022					$ 2.850.000,00		20,73	$ 59.080.500,00																								
42B	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos 2023					$ 3.175.000,00		16,07	$ 51.022.250,00																								
42C	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos 2024					$ 3.400.000,00		14,00	$ 47.600.000,00																								
42D	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos 2025					$ 3.550.000,00		120,13	$ 426.461.500,00																								
43	1	Oficina /Campamento (Incluye dotación y servicios públicos) 2021	Segun comprobante mes	2.000.000	224,00	448.000.000			26,56	$ 53.128.000,00	0	$ -	0,000	$ -	2,547	$ 5.094.000	3,595	$ 7.190.000	4,650	$ 9.300.000	2,888	$ 5.776.000	2,814	$ 5.628.000	2,000	$ 4.000.000	2,000	$ 4.000.000	2,000	$ 4.000.000	2,00	$ 4.000.000	2,00	$ 4.000.000
43A	1	Oficina /Campamento (Incluye dotación y servicios públicos) 2022					$ 2.280.000,00		24,00	$ 54.720.000,00																								
43B	1	Oficina /Campamento (Incluye dotación y servicios públicos) 2023					$ 2.540.000,00		24,00	$ 60.960.000,00																								
43C	1	Oficina /Campamento (Incluye dotación y servicios públicos) 2024					$ 2.720.000,00		23,00	$ 62.560.000,00																								
43D	1	Oficina /Campamento (Incluye dotación y servicios públicos) 2025					$ 2.840.000,00		123,93	$ 351.961.200,00																								
		OTROS COSTOS																																
44	1	Transportes aéreos y/o terrestres (Incluye peajes y combustible) 2021	Segun comprobante mes	1.500.000	99,00	148.500.000			21,19	$ 31.782.000,00	3,42	$ 5.130.000	0,775	$ 1.162.500	1,337	$ 2.005.500	0,905	$ 1.357.500	1,075	$ 1.614.000	1,807	$ 2.710.500	0,861	$ 1.291.500	1,440	$ 2.160.000	4,390	$ 6.585.000	3,507	$ 5.260.500	0,31	$ 465.000	1,36	$ 2.040.000
44A	1	Transportes aéreos y/o terrestres (Incluye peajes y combustible) 2022					$ 1.710.000,00		20,67	$ 35.345.700,00																								
44B	1	Transportes aéreos y/o terrestres (Incluye peajes y combustible) 2023					$ 1.905.000,00		11,90	$ 22.669.500,00																								
44C	1	Transportes aéreos y/o terrestres (Incluye peajes y combustible) 2024					$ 2.040.000,00		5,02	$ 10.240.800,00																								
44D	1	Transportes aéreos y/o terrestres (Incluye peajes y combustible) 2025					$ 2.130.000,00		62,00	$ 132.060.000,00																								

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SUBDIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MNL-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 9
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021 — PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA EQUIDAD Y LA REACTIVACION, VISION 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.**

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE: 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 47.999.892.900 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 2.400.000.000

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 50.399.892.900

CONTRATO DE OBRA N. 964 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA N. 1111 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 8 de fecha 15/08/2025		2021												2022											
											ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA 4		ACTA 5		ACTA 6		ACTA 7		ACTA 8		ACTA 9		ACTA 10		ACTA 11		ACTA 12	
											JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
45	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. 2021	Según comprobante mes	847.000	114,00	96.558.000			6,55	$ 5.545.309,00	0,555	$ 470.085	0,000	$ -	1,170	$ 990.990	1,011	$ 856.317	0,109	$ 92.323	0,052	$ 44.044	0,193	$ 163.471	1,657	$ 1.403.479	0,214	$ 181.258	0,216	$ 182.952	1,230	$ 1.041.810	0,14	$ 118.580
45A	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. 2022					$ 966.000,00		4,03	$ 3.892.980,00																								
45B	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. 2023					$ 1.076.000,00		2,41	$ 2.593.160,00																								
45C	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. 2024					$ 1.152.000,00		0,64	$ 737.280,00																								
45D	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc. 2025					$ 1.203.000,00		34,90	$ 41.984.700,00																								
46	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) 2021	Según comprobante mes	600.000	222,00	133.200.000			9,98	$ 5.985.000,00		$ -	0,000	$ -	0,389	$ 233.400	0,889	$ 533.400	0,696	$ 417.600	0,696	$ 417.600	1,021	$ 612.600	1,021	$ 612.600	1,297	$ 778.200	1,296	$ 777.600	1,29	$ 774.000	1,38	$ 828.000
46A	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) 2022					$ 684.000,00		13,86	$ 9.480.240,00																								
46B	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) 2023					$ 762.000,00		7,15	$ 5.448.300,00																								
46C	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) 2024					$ 816.000,00		7,82	$ 6.381.120,00																								
46D	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) 2025					$ 852.000,00		66,00	$ 56.232.000,00																								
47	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID - 19 2021	Según comprobante mes	1.350.000	22,00	29.700.000			0,59	$ 800.820,00		$ -	0,000	$ -	0,064	$ 86.400	0,086	$ 116.100	0,000	$ -	0,000	$ -	-0,035	$ -6.480	0,151	$ 203.850	0,208	$ 280.800	0,039	$ 52.650	0,05	$ 67.500	-	$ -
47A	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID - 19 2022					$ 1.539.000,00		0,00	$ -																								
47B	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID - 19 2023					$ 1.715.000,00		0,00	$ -																								
47C	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID - 19 2024					$ 1.836.000,00		0,00	$ -																								
47D	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID - 19 2025					$ 1.917.000,00		0,00	$ -																								
48	1	Veeduría Técnica Comunitaria 2021	Según comprobante mes	200.000	216,00	43.200.000			13,12	$ 2.624.000,00		$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,000	$ -	0,450	$ 90.000	11,44	$ 2.288.000	1,23	$ 246.000
48A	1	Veeduría Técnica Comunitaria 2022					$ 228.000,00		8,60	$ 1.960.800,00																								
48B	1	Veeduría Técnica Comunitaria 2023					$ 254.000,00		33,29	$ 8.455.660,00																								
48C	1	Veeduría Técnica Comunitaria 2024					$ 272.000,00		5,91	$ 1.607.520,00																								
48D	1	Veeduría Técnica Comunitaria 2025					$ 284.000,00		124,00	$ 35.216.000,00																								
		Ajuste por Acta de modificación							0,00	$ 22.349,74																								
	*	**SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)**				4.054.958.000				4.469.253,139		$ 11.954.085		$ 3.375.000		$ 18.264.290		$ 17.287.817		$ 28.515.423		$ 32.648.144		$ 30.269.091		$ 36.443.929		$ 38.800.259		$ 38.437.203		$ 33.436.316		$ 27.902.580
	*	**VALOR TOTAL BÁSICO** (C) = (A) + (B)				**37.646.282.300**				**42.352.853.177**		$ 55.775.509		$ 113.391.256		$ 171.904.690		$ 168.729.017		$ 201.685.143		$ 252.459.734		$ 251.589.891		$ 289.965.929		$ 311.365.258		$ 321.936.802		$ 301.558.710		$ 304.824.980
	*	*Provisión para ajustes y/o frente adicional (D)*				2.689.782.134																												
	*	**SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS** (E) = (C) + (D)				**40.336.044.454**				**42.352.853.177**		$ 55.775.509		$ 113.391.256		$ 171.904.690		$ 168.729.017		$ 201.685.143		$ 252.459.734		$ 251.589.891		$ 289.965.929		$ 311.365.258		$ 321.936.802		$ 301.558.710		$ 304.824.900
	*	AIU (F) = (E) *. 2% IVA)				7.663.848.446				8.047.041.724		$ 10.597.347		$ 21.544.339		$ 32.662.271		$ 32.058.513		$ 38.320.177		$ 47.967.349		$ 55.063.717		$ 59.162.246		$ 61.048.284		$ 57.286.655		$ 57.316.731
	*	**COSTO TOTAL** = (E) + (F)				**47.999.892.900**				**50.399.892.900**		$ 66.372.856		$ 132.935.595		$ 204.566.961		$ 200.787.530		$ 240.005.320		$ 300.427.072		$ 306.653.608		$ 349.128.175		$ 372.413.542		$ 379.223.457		$ 358.795.385		$ 362.141.631
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																																

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la croquesta económica aprobada.

CAUSAL
n.n

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

1). La presente Acta se elabora con el objeto de actualizar los sueldos de los cargos que con corte a 1 de enero de 2026 presentan valor inferior a $1'750.905; teniendo en cuenta los Decretos 1469 y 1470 del 29 de diciembre de 205 mediante cuales el Gobierno Nacional establecio el Salario Minimo Mensual Legal Vigente SMMLV para el año 2026 y que para el Contrato 977 de 2021 aplica a los siguientes cargos:
- **Auxiliar de Laboratorio.**
- **Secretaria.**
- **Conductor.**
- **Campamentera.**
- **Auxiliar Administrativa.**

Los recursos son tomados de los saldos de los items que no han sido utilizados generandose incrementos en la dedicacion mensual de Especialista Ambiental, Especialista en Geotecnia, Especialista en Pavimentos, Especialista en Estructuras, Especialista en Hidraulica, Especialista en Diseño Geometrico, Especialista en sostenibilidad, Profesional Tecnico Predial, Profesional de Aseguramiento de la Calidad, Abogado, Inspector, Topografo Inspector, Auxiliar de Laboratorio 2026, Secretaria 2026, Conductor 2026, Campamentera 2026, Viaticos, Alquiler camioneta de mas de 2000 4X4, Alquiler equipo de Topografia, Transportes Aereos y Terrestres; disminucion en la dedicacion mensual de Director de Interventoria, Ingeniero Residente de Interventoria, Ingeniero Auxiliar de Interventoria, Especialista en Tuneles, Lider de Integracion, Profesional Social, Profesional Ambiental, Auditor de Calidad, Laboratoriasta Inspector, Inspector SST, Cadenero, Auxiliar de laboratorio, Secretaria, Conductor, Campamentera, Especialista en Transito, Especialista Social, Profesional SIG, Auxiliar Administrativa, Alquiler Equipo de Laboratorio, Edicion de Informes y Comunicaciones y no se generan recursos adicionales para el Contrato 977 de 2021.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma:
Nombre: **EDUARDO ENRIQUE RAMOS ARNEDO**
CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
Matrícula Profesional No.: **13202 - 03661 BLV**

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

Firma:
Nombre: **JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **52202 - 46096 NRÑ**

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

SUBPROCESO DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 9
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 877 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERV.: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No. 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

CONTRATO DE OBRA No. 1133 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 47.999.992.900 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 50.399.992.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 2.400.000.000

2022								2023																2023											
ACTA 13		ACTA 14		ACTA 15		ACTA 16		ACTA 17		ACTA 18		ACTA 19		ACTA 20		ACTA 21		ACTA 22		ACTA 23		ACTA 24		ACTA 25		ACTA 26		ACTA 27		ACTA 28		ACTA 29		ACTA 30	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
0,03	$ 285.000																															0,00		0,00	
0,97	$ 10.505.100	1,00	$ 10.830.000	1,00	$ 10.830.000	1,00	$ 10.830.000	1,00	$ 10.830.000	1,00	$ 10.830.000	1,00	$ 10.830.000	1,00	$ 10.830.000	1,00	$ 10.830.000	1,00	$ 10.830.000	1,00	$ 10.830.000	1,00	$ 10.830.000		$ -							0,00		0,00	
																								0,25	$ 3.016.250	0,30	$ 3.619.500	0,30	$ 3.619.500	0,30	$ 3.619.500	1,00	$ 12.065.000	1,00	$ 12.065.000
0,10	$ 598.000	0,00		0,00																												0,00			
2,90	$ 19.769.300	3,00	$ 20.451.000	3,00	$ 20.451.000	3,00	$ 20.451.000	3,00	$ 20.451.000	2,73	$ 18.610.410	2,70	$ 18.405.900	3,00	$ 20.451.000	3,00	$ 20.451.000	3,00	$ 20.451.000	3,00	$ 20.451.000	3,00	$ 20.451.000		$ -							0,00		0,00	
																								0,25	$ 1.898.750	0,30	$ 2.278.500	0,30	$ 2.278.500	0,30	$ 2.278.500	3,00	$ 22.785.000	1,00	$ 7.595.000
0,07	$ 280.000	0,00		0,00																												0,00		0,00	
1,93	$ 8.800.800	2,00	$ 9.120.000	2,00	$ 9.120.000	2,00	$ 9.120.000	2,00	$ 9.120.000	2,00	$ 9.120.000	2,00	$ 9.120.000	2,00	$ 9.120.000	1,73	$ 7.888.800	2,00	$ 9.120.000	2,00	$ 9.120.000	2,00	$ 9.120.000		$ -							0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 10.160.000	1,00	$ 5.080.000
0,00		0,00		0,00																												0,00		0,00	
0,81	$ 7.387.200	0,95	$ 8.664.000	0,90	$ 8.208.000	0,86	$ 7.843.200	0,85	$ 7.752.000	0,87	$ 7.934.400	0,87	$ 7.934.400	0,64	$ 5.836.800	0,77	$ 7.022.400	0,81	$ 7.387.200	0,70	$ 6.384.000	0,76	$ 6.931.200									0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,73	$ 7.416.800	0,00	$ -
0,03	$ 240.000	0,00		0,00																												0,00		0,00	
0,97	$ 8.846.400	1,00	$ 9.120.000	1,00	$ 9.120.000	1,00	$ 9.120.000	1,00	$ 9.120.000	1,00	$ 9.120.000	1,00	$ 9.120.000	1,00	$ 9.120.000	0,90	$ 8.208.000	0,90	$ 8.208.000	1,00	$ 9.120.000	1,00	$ 9.120.000		$ -							0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 20.320.000	0,00	$ -
0,00		0,00		0,00																												0,00		0,00	
0,04	$ 364.800	0,26	$ 2.371.200	0,22	$ 2.006.400	0,14	$ 1.276.800	0,14	$ 1.276.800	0,14	$ 1.276.800	0,24	$ 2.188.800	0,17	$ 1.550.400	0,15	$ 1.368.000	0,15	$ 1.368.000	0,06	$ 547.200	0,04	$ 364.800									0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,00		0,00		0,00																												0,00		0,00	
0,30	$ 2.736.000	0,30	$ 2.736.000	0,30	$ 2.736.000	0,42	$ 3.830.400	0,59	$ 5.380.800	0,60	$ 5.472.000	0,72	$ 6.566.400	0,60	$ 5.472.000	0,50	$ 4.560.000	0,50	$ 4.560.000	0,60	$ 5.472.000	0,90	$ 8.208.000		$ -							0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 20.320.000	0,00	$ -
0,00		0,00		0,00																												0,00		0,00	
0,25	$ 2.280.000	0,10	$ 912.000	0,15	$ 1.368.000	0,00	$ -	0,34	$ 3.100.800	0,32	$ 2.918.400	0,30	$ 2.736.000	0,15	$ 1.368.000	0,15	$ 1.368.000	0,15	$ 1.368.000	0,15	$ 1.368.000	0,07	$ 638.400									0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,20	$ 2.032.000	0,00	$ -
0,00		0,00		0,00																												0,00		0,00	
0,20	$ 1.824.000	0,45	$ 4.104.000	0,39	$ 3.556.800	0,55	$ 5.016.000	0,84	$ 7.660.800	0,84	$ 7.660.800	0,45	$ 4.104.000	0,15	$ 1.368.000	0,10	$ 912.000	0,25	$ 2.280.000	0,24	$ 2.188.800	0,23	$ 2.097.600									0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,10	$ 1.016.000	0,00	$ -
0,00		0,00		0,00																												0,00		0,00	
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -									0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,00		0,00		0,00																												0,00		0,00	
0,37	$ 2.741.700	0,42	$ 3.112.200	0,41	$ 3.038.100	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,37	$ 2.741.700	0,20	$ 1.482.000	0,31	$ 2.297.100	0,31	$ 2.297.100									0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,31	$ 2.559.050	0,00	$ -
0,03	$ 195.000	0,00		0,00																												0,00		0,00	
0,97	$ 7.740.600	1,00	$ 7.980.000	1,00	$ 7.980.000	1,00	$ 7.980.000	1,00	$ 7.980.000	0,70	$ 5.586.000	0,70	$ 5.586.000	1,00	$ 7.980.000	2,00	$ 15.960.000	2,00	$ 15.960.000	2,00	$ 15.960.000	2,00	$ 15.960.000		$ -							0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 17.780.000	2,00	$ 17.780.000
0,07	$ 259.000	0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
1,93	$ 8.140.740	2,00	$ 8.436.000	2,00	$ 8.436.000	2,00	$ 8.436.000	2,00	$ 8.436.000	1,73	$ 7.297.140	1,70	$ 7.170.600	2,00	$ 8.436.000	2,00	$ 8.436.000	1,90	$ 8.014.200	1,83	$ 7.718.940	2,00	$ 8.436.000		$ -							0,00		0,00	
																								0,25	$ 1.174.750	0,30	$ 1.409.700	0,30	$ 1.409.700	0,30	$ 1.409.700	2,00	$ 9.398.000	2,00	$ 9.398.000
0,07	$ 280.000	0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
1,93	$ 8.800.800	2,00	$ 9.120.000	2,00	$ 9.120.000	2,00	$ 9.120.000	2,00	$ 9.120.000	1,70	$ 7.752.000	1,13	$ 5.152.800	2,00	$ 9.120.000	2,00	$ 9.120.000	2,00	$ 9.120.000	2,00	$ 9.120.000	2,00	$ 9.120.000		$ -							0,00		0,00	
																								0,25	$ 1.270.000	0,30	$ 1.524.000	0,30	$ 1.524.000	0,30	$ 1.524.000	2,00	$ 10.160.000	2,00	$ 10.160.000
0,03	$ 132.000	0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
0,97	$ 4.865.520	1,00	$ 5.016.000	1,00	$ 5.016.000	1,00	$ 5.016.000	1,00	$ 5.016.000	1,00	$ 5.016.000	1,00	$ 5.016.000	1,00	$ 5.016.000	1,00	$ 5.016.000	0,13	$ 652.080	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.016.000		$ -							0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 5.588.000	0,00	$ -
0,00		0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
0,22	$ 1.003.200	0,31	$ 1.413.600	0,30	$ 1.368.000	0,31	$ 1.413.600	0,29	$ 1.322.400	0,29	$ 1.322.400	0,26	$ 1.185.600	0,27	$ 1.231.200	0,27	$ 1.231.200	0,27	$ 1.231.200	0,30	$ 1.368.000	0,30	$ 1.368.000									0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,35	$ 1.778.000	0,00	$ -
0,00		0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00	$ -			0,00		0,00		0,00	$ -	0,00		0,00										0,00		0,00	
																											$ -					0,00		0,00	$ -
0,00		0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
0,15	$ 855.000	0,16	$ 912.000	0,15	$ 855.000	0,16	$ 912.000	0,63	$ 3.591.000	0,63	$ 3.591.000	0,36	$ 2.052.000	0,34	$ 1.938.000	0,35	$ 1.995.000	0,39	$ 2.223.000	0,41	$ 2.337.000	0,44	$ 2.508.000									0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,42	$ 2.667.000	0,00	$ -
0,07	$ 175.000			0,00																												0,00		0,00	
1,93	$ 5.500.500	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,40	$ 6.840.000	3,00	$ 8.550.000	3,00	$ 8.550.000	2,87	$ 8.179.500	3,00	$ 8.550.000	3,00	$ 8.550.000		$ -							0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -	0,30	$ 952.500	4,00	$ 12.700.000	4,00	$ 12.700.000
0,07	$ 175.000	0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
1,93	$ 5.500.500	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,50	$ 7.125.000	2,73	$ 7.780.500	2,70	$ 7.695.000	3,00	$ 8.550.000	3,00	$ 8.550.000	3,00	$ 8.550.000	3,00	$ 8.550.000	3,00	$ 8.550.000		$ -							0,00		0,00	
																								0,90	$ 2.857.500	0,60	$ 1.905.000	0,60	$ 1.905.000	0,60	$ 1.905.000	3,00	$ 9.525.000	3,00	$ 9.525.000
0,03	$ 75.000	0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
0,97	$ 2.764.500	1,00	$ 2.850.000	1,80	$ 5.130.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	1,73	$ 4.930.500	1,70	$ 4.845.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000		$ -							0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000
0,07	$ 175.000	0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
1,93	$ 5.500.500	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	1,73	$ 4.930.500	1,70	$ 4.845.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000		$ -							0,00		0,00	
																								0,30	$ 952.500	0,30	$ 952.500	0,30	$ 952.500	0,30	$ 952.500	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FORMATO DE INFORMACIÓN PARA EL PAGO

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSION	1
PAGINA	
FECHA	30/01/2026 (Dia / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 9
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 877 DE 2021

OBJETO:
INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No.1 111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indicar día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indicar la suspensión mas inmediata con el inicio del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses segun las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indicar día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indicar día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

2022												2023												2023											
ACTA 13		ACTA 14		ACTA 15		ACTA 16		ACTA 17		ACTA 18		ACTA 19		ACTA 20		ACTA 21		ACTA 22		ACTA 23		ACTA 24		ACTA 25		ACTA 26		ACTA 27		ACTA 28		ACTA 29		ACTA 30	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
0,13	$ 169.000	0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
3,87	$ 5.735.340	4,00	$ 5.928.000	4,00	$ 5.928.000	4,00	$ 5.928.000	5,00	$ 7.410.000	4,73	$ 7.009.860	4,56	$ 6.757.920	5,80	$ 8.595.600	6,00	$ 8.892.000	6,00	$ 8.892.000	6,00	$ 8.892.000	6,00	$ 8.892.000		$ -							0,00		0,00	
																								1,80	$ 2.971.800	1,20	$ 1.981.200	1,20	$ 1.981.200	1,20	$ 1.981.200	6,00	$ 9.906.000	6,00	$ 9.906.000
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,30	$ 410.400	1,00	$ 1.368.000	0,77	$ 1.053.360	0,93	$ 1.272.240	1,00	$ 1.368.000	1,67	$ 2.284.560	2,00	$ 2.736.000	2,00	$ 2.736.000		$ -							0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 3.048.000	2,00	$ 3.048.000
0,07	$ 77.000																															0,00		0,00	
1,93	$ 2.420.220	1,67	$ 2.094.180	2,00	$ 2.508.000	2,00	$ 2.508.000	2,00	$ 2.508.000	1,73	$ 2.169.420	1,70	$ 2.131.800	2,00	$ 2.508.000	2,00	$ 2.508.000	2,00	$ 2.508.000	2,00	$ 2.508.000	2,00	$ 2.508.000		$ -							0,00		0,00	
																								0,30	$ 419.100	0,30	$ 419.100	0,60	$ 838.200	0,60	$ 838.200	2,00	$ 2.794.000	2,00	$ 2.794.000
0,10	$ 110.000	0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
2,90	$ 3.636.600	3,00	$ 3.762.000	3,00	$ 3.762.000	3,00	$ 3.762.000	3,00	$ 3.762.000	3,00	$ 3.762.000	3,37	$ 4.225.980	4,00	$ 5.016.000	4,00	$ 5.016.000	4,00	$ 5.016.000	3,77	$ 4.727.580	4,00	$ 5.016.000		$ -							0,00		0,00	
																								0,60	$ 838.200	0,60	$ 838.200	0,60	$ 838.200	0,60	$ 838.200	4,80	$ 6.705.600	4,80	$ 6.705.600
0,07	$ 73.598	0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
1,93	$ 2.310.210	2,00	$ 2.394.000	2,00	$ 2.394.000	2,00	$ 2.394.000	2,00	$ 2.394.000	1,73	$ 2.070.810	1,70	$ 2.034.900	2,00	$ 2.394.000	1,00	$ 1.197.000	1,47	$ 1.759.590	2,00	$ 2.394.000	2,00	$ 2.394.000		$ -							0,00		0,00	
																								0,30	$ 400.200	0,30	$ 400.200	0,30	$ 400.200	0,30	$ 400.200	2,00	$ 2.668.000	2,00	$ 2.668.000
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,05	$ 456.000	0,04	$ 364.800	0,00	$ -										0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,95	$ 7.039.500	0,95	$ 7.039.500	0,95	$ 7.039.500	0,95	$ 7.039.500	0,95	$ 7.039.500										0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,95	$ 7.942.250	0,00	$ -
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,20	$ 1.363.400	1,00	$ 6.817.000		$ -								0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 7.595.000	0,00	$ -
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,70	$ 5.187.000	0,70	$ 5.187.000	0,70	$ 5.187.000	0,79	$ 5.853.900	0,75	$ 5.557.500										0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,70	$ 5.778.500	0,00	$ -
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -										0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,37	$ 1.855.920	1,00	$ 5.016.000	1,00	$ 5.016.000	1,00	$ 5.016.000	1,00	$ 5.016.000		$ -								0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -										0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,50	$ 1.425.000	0,73	$ 2.080.500	0,70	$ 1.995.000	1,00	$ 2.850.000	1,00	$ 2.850.000	1,00	$ 2.850.000	1,00	$ 2.850.000	1,00	$ 2.850.000		$ -								0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	3,00	$ 9.525.000	3,00	$ 9.525.000
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,93	$ 1.166.220	1,00	$ 1.254.000	1,00	$ 1.254.000	1,00	$ 1.254.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -								0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,00	$ -	0,33	$ 660.000	1,05	$ 2.100.000	0,31	$ 620.000	0,34	$ 680.000	0,00	$ -	0,77	$ 1.540.000	0,49	$ 980.000	0,51	$ 1.020.000	0,35	$ 700.000	0,43	$ 860.000	1,37	$ 2.740.000										0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,60	$ 1.524.000	0,00	$ -
	133.328.030		139.086.180		142.131.300		138.377.000		154.138.220		146.563.440		142.386.460		166.289.660		171.337.680		173.440.750		177.387.220		192.532.100		15.799.050		15.327.900		15.747.000		16.699.500		243.944.200		137.237.600
	2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
	314.654.151		328.243.385		335.429.868		326.569.720		363.766.199		345.889.718		336.032.046		392.443.596		404.356.925		409.320.170		418.633.839		454.375.756		37.285.758		36.173.844		37.162.920		39.410.820		575.706.312		323.880.736

2022												2023												2023											
ACTA 13		ACTA 14		ACTA 15		ACTA 16		ACTA 17		ACTA 18		ACTA 19		ACTA 20		ACTA 21		ACTA 22		ACTA 23		ACTA 24		ACTA 25		ACTA 26		ACTA 27		ACTA 28		ACTA 29		ACTA 30	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MEPI-MN1-IN-SI-FR-2
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 9 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No. 964 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

CONTRATO DE OBRA No.1111 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses segun las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

2022												2023												2023											
ACTA 13		ACTA 14		ACTA 15		ACTA 16		ACTA 17		ACTA 18		ACTA 19		ACTA 20		ACTA 21		ACTA 22		ACTA 23		ACTA 24		ACTA 25		ACTA 26		ACTA 27		ACTA 28		ACTA 29		ACTA 30	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
0,00																																0,00		0,00	
9,50	$ 2.166.000	12,00	$ 2.736.000	12,00	$ 2.736.000	22,00	$ 5.016.000	9,50	$ 2.166.000	11,00	$ 2.508.000	13,00	$ 2.964.000	32,00	$ 7.296.000	4,00	$ 912.000	25,00	$ 5.700.000	11,00	$ 2.508.000	10,00	$ 2.280.000									0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	19,00	$ 4.826.000	0,00	$ -
0,10	$ 450.000	0,00				0,00																										0,00		0,00	
2,90	$ 14.877.000	3,05	$ 15.646.500	3,00	$ 15.390.000	3,00	$ 15.390.000	3,00	$ 15.390.000	3,00	$ 15.390.000	3,40	$ 17.442.000	4,00	$ 20.520.000	4,00	$ 20.520.000	4,00	$ 20.520.000	4,00	$ 20.520.000	4,00	$ 20.520.000	0,06	$ 307.800							0,00		0,00	
																								1,94	$ 11.087.100	2,00	$ 11.430.000	2,00	$ 11.430.000	2,00	$ 11.430.000	5,00	$ 28.575.000	5,00	$ 28.575.000
0,00		0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -									0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,07	$ 140.000	0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
1,93	$ 4.400.400	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	2,50	$ 5.700.000	3,00	$ 6.840.000	3,00	$ 6.840.000	3,00	$ 6.840.000	3,00	$ 6.840.000	3,00	$ 6.840.000	3,00	$ 6.840.000	3,00	$ 6.840.000	0,10	$ 228.000							0,00		0,00	
																								2,90	$ 7.366.000	2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000	3,00	$ 7.620.000	3,00	$ 7.620.000
0,00		0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
0,98	$ 2.793.000	1,15	$ 3.277.500	1,78	$ 5.073.000	0,82	$ 2.337.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000	2,00	$ 5.700.000		$ -							0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000
0,07	$ 140.000	0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
1,93	$ 4.400.400	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	2,00	$ 4.560.000	0,07	$ 159.600							0,00		0,00	
																								1,93	$ 4.902.200	2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000
0,00		0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
1,03	$ 1.761.300	0,97	$ 1.658.700	1,11	$ 1.898.100	3,18	$ 5.437.800	1,40	$ 2.394.000	0,33	$ 564.300	1,88	$ 3.214.800	5,46	$ 9.336.600	0,59	$ 1.008.900	3,36	$ 5.745.600	0,38	$ 649.800	0,98	$ 1.675.800									0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	2,03	$ 3.867.150	0,00	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 9 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021
OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACÍFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA**
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE.: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No. 964 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No. 1111 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión (use consecutivo con el periodo del acta))
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 2.400.000.000

2022												2023												2023											
ACTA 13		ACTA 14		ACTA 15		ACTA 16		ACTA 17		ACTA 18		ACTA 19		ACTA 20		ACTA 21		ACTA 22		ACTA 23		ACTA 24		ACTA 25		ACTA 26		ACTA 27		ACTA 28		ACTA 29		ACTA 30	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
0,00	$ -	0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
0,62	$ 598.920	0,58	$ 560.280	0,10	$ 96.600	0,11	$ 106.260	0,07	$ 67.620	0,33	$ 318.780	0,40	$ 386.400	0,49	$ 473.340	0,45	$ 434.700	0,24	$ 231.840	0,28	$ 270.480	0,36	$ 347.760											0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,49	$ 527.240	0,00	$ -
0,00		0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
1,20	$ 820.800	1,14	$ 779.760	1,14	$ 779.760	1,14	$ 779.760	1,18	$ 807.120	1,18	$ 807.120	1,16	$ 793.440	1,16	$ 793.440	1,14	$ 779.760	1,14	$ 779.760	1,14	$ 779.760	1,14	$ 779.760											0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	1,09	$ 830.580	0,00	$ -
0,00		0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
																																0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
0,00	$ -	0,00	$ -	1,97	$ 449.160	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,57	$ 1.269.960	0,00	$ -	0,00	$ -	1,06	$ 241.680	0,00	$ -										0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	$ 32.547.820		$ 33.778.740		$ 35.542.620		$ 38.186.820		$ 36.784.740		$ 36.688.200		$ 41.900.640		$ 56.789.340		$ 40.755.360		$ 50.077.200		$ 42.069.720		$ 42.703.320		$ 24.050.700		$ 21.590.000		$ 21.590.000		$ 21.590.000		$ 57.675.970		$ 47.625.000
	$ 347.201.971		$ 362.022.125		$ 370.972.488		$ 364.756.540		$ 400.550.939		$ 382.577.918		$ 377.932.686		$ 449.232.938		$ 445.112.285		$ 459.397.370		$ 460.703.559		$ 497.079.076		$ 61.336.458		$ 57.763.844		$ 58.752.920		$ 61.000.820		$ 633.384.282		$ 371.505.736
	$ 347.201.971		$ 362.022.125		$ 370.972.488		$ 364.756.540		$ 400.550.939		$ 382.577.918		$ 377.932.686		$ 449.232.938		$ 445.112.285		$ 459.397.370		$ 460.703.559		$ 497.079.076		$ 61.336.458		$ 57.763.844		$ 58.752.920		$ 61.000.820		$ 633.384.282		$ 371.505.736
	$ 65.968.374		$ 68.784.204		$ 70.484.773		$ 69.303.743		$ 76.104.678		$ 72.689.804		$ 71.807.210		$ 85.354.258		$ 84.571.334		$ 87.285.500		$ 87.533.676		$ 94.445.024		$ 11.653.927		$ 10.975.130		$ 11.163.065		$ 11.590.155		$ 120.343.014		$ 70.586.060
	$ 413.170.345		$ 430.806.329		$ 441.457.261		$ 434.060.283		$ 476.655.618		$ 455.267.723		$ 449.739.896		$ 534.587.196		$ 529.683.619		$ 546.682.870		$ 548.237.235		$ 591.524.100		$ 72.990.385		$ 68.738.974		$ 69.915.975		$ 72.590.976		$ 753.727.296		$ 442.091.826

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FORMATO DE INTERVENTORÍA PARA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MEPI-MN1-IN-S-FR-2
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	30/03/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 9 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEN.: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 1624 DE: 22/06/2023 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S A

CONTRATO DE OBRA No.: 1133 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses segun contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indicar día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indicar la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 116 MESES (En meses segun las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indicar día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

2024												2024												2025											
ACTA 31 ENERO		ACTA 32 FEBRERO		ACTA 33 MARZO		ACTA 34 ABRIL		ACTA 35 MAYO		ACTA 36 JUNIO		ACTA 37 JULIO		ACTA 38 AGOSTO		ACTA 39 SEPTIEMBRE		ACTA 40 OCTUBRE		ACTA 41 NOVIEMBRE		ACTA 42 DICIEMBRE		ACTA 43 ENERO		ACTA 44 FEBRERO		ACTA 45 MARZO		ACTA 46 ABRIL		ACTA 47 MAYO		ACTA 48 JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
1,00	$ 12.065.000	1,00	$ 12.065.000	1,00	$ 12.065.000	1,00	$ 12.065.000	1,00	$ 12.065.000	0,60	$ 7.239.000	0,03	$ 361.950																						
												0,97	$ 12.532.400	1,00	$ 12.920.000	0,20	$ 2.584.000	0,20	$ 2.584.000	0,50	$ 6.460.000	0,19	$ 2.454.800	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000
3,00	$ 22.785.000	3,00	$ 22.785.000	3,00	$ 22.785.000	3,00	$ 22.785.000	3,00	$ 22.785.000	2,10	$ 15.949.500	0,07	$ 531.650	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												1,23	$ 10.003.590	1,00	$ 8.133.000	1,00	$ 8.133.000	1,00	$ 8.133.000	1,00	$ 8.133.000	1,00	$ 8.133.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000
2,00	$ 10.160.000	2,00	$ 10.160.000	2,00	$ 10.160.000	2,00	$ 10.160.000	2,00	$ 10.160.000	1,10	$ 5.588.000	0,07	$ 355.600	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												1,93	$ 10.499.200	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,50	$ 2.720.000	1,00	$ 5.440.000	1,00	$ 5.440.000	1,00	$ 5.440.000	1,00	$ 5.440.000	1,00	$ 5.440.000
1,00	$ 10.160.000	0,86	$ 8.737.600	0,96	$ 9.753.600	0,79	$ 8.026.400	0,85	$ 8.636.000	0,78	$ 7.924.800	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,67	$ 7.289.600	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 10.880.000	1,00	$ 10.880.000	0,80	$ 8.704.000	0,90	$ 9.792.000	0,90	$ 9.792.000	0,90	$ 9.792.000
2,00	$ 20.320.000	1,18	$ 11.988.800	1,51	$ 15.341.600	1,16	$ 11.785.600	1,13	$ 11.480.800	0,79	$ 8.026.400	0,03	$ 304.800	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,97	$ 10.553.600	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 21.760.000	2,00	$ 21.760.000	2,00	$ 21.760.000	2,00	$ 21.760.000	2,00	$ 21.760.000	2,00	$ 21.760.000
0,90	$ 9.144.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 10.880.000		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,00	$ 20.320.000	1,00	$ 10.160.000	1,00	$ 10.160.000	1,00	$ 10.160.000	1,00	$ 10.160.000	1,00	$ 10.160.000	0,03	$ 304.800	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,97	$ 10.553.600	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 10.880.000	1,00	$ 10.880.000	1,00	$ 10.880.000	1,00	$ 10.880.000	1,00	$ 10.880.000	1,00	$ 10.880.000
0,90	$ 9.144.000	0,00	$ -	0,24	$ 2.438.400	0,05	$ 508.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,10	$ 1.088.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 10.880.000	0,60	$ 6.528.000	0,80	$ 8.704.000	0,90	$ 9.792.000	0,90	$ 9.792.000	0,80	$ 8.704.000
0,90	$ 9.144.000	0,26	$ 2.641.600	0,12	$ 1.219.200	0,10	$ 1.016.000	0,07	$ 711.200	0,08	$ 812.800	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,20	$ 2.176.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 10.880.000	0,60	$ 6.528.000	0,80	$ 8.704.000	0,90	$ 9.792.000	0,90	$ 9.792.000	0,80	$ 8.704.000
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,90	$ 7.429.500	0,34	$ 2.806.700	0,37	$ 3.054.350	0,36	$ 2.971.800	0,38	$ 3.136.900	0,39	$ 3.219.450	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,38	$ 3.359.200	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,30	$ 2.652.000	0,30	$ 2.652.000	0,55	$ 4.862.000	0,30	$ 2.652.000	0,40	$ 3.536.000	0,50	$ 4.420.000
2,00	$ 17.780.000	2,00	$ 17.780.000	2,00	$ 17.780.000	2,00	$ 17.780.000	1,83	$ 16.268.700	1,10	$ 9.779.000	0,03	$ 266.700	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												1,74	$ 16.564.800	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,50	$ 4.760.000	1,00	$ 9.520.000	1,00	$ 9.520.000	1,00	$ 9.520.000	1,00	$ 9.520.000	1,00	$ 9.520.000
2,00	$ 9.398.000	1,00	$ 4.699.000	1,00	$ 4.699.000	1,00	$ 4.699.000	1,97	$ 9.257.030	1,33	$ 6.249.670	0,07	$ 328.930	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												1,46	$ 7.348.720	1,00	$ 5.032.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.032.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000
2,00	$ 10.160.000	2,00	$ 10.160.000	2,00	$ 10.160.000	2,00	$ 10.160.000	2,00	$ 10.160.000	1,43	$ 7.264.400	0,07	$ 355.600	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												1,23	$ 6.691.200	1,00	$ 5.440.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,50	$ 8.160.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000
1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000	0,03	$ 167.640	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,97	$ 5.804.480	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000
0,90	$ 4.572.000	0,36	$ 1.828.800	0,36	$ 1.828.800	0,36	$ 1.828.800	0,36	$ 1.828.800	0,36	$ 1.828.800	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,36	$ 1.958.400	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.440.000	0,40	$ 2.176.000	0,70	$ 3.808.000	0,45	$ 2.448.000	0,40	$ 2.176.000	0,40	$ 2.176.000
0,90	$ 5.715.000	0,66	$ 4.191.000	0,71	$ 4.508.500	0,64	$ 4.064.000	0,66	$ 4.191.000	0,45	$ 2.857.500	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,40	$ 2.720.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 6.800.000	0,40	$ 2.720.000	0,70	$ 4.760.000	0,50	$ 3.400.000	0,40	$ 2.720.000	0,40	$ 2.720.000
6,00	$ 19.050.000	4,00	$ 12.700.000	4,00	$ 12.700.000	3,00	$ 9.525.000	3,00	$ 9.525.000	1,63	$ 5.175.250	0,07	$ 222.250	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												2,23	$ 7.582.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 10.200.000	2,00	$ 6.800.000	3,00	$ 10.200.000	3,00	$ 10.200.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000
5,00	$ 15.875.000	3,00	$ 9.525.000	3,00	$ 9.525.000	3,00	$ 9.525.000	2,00	$ 6.350.000	1,14	$ 3.619.500	0,07	$ 222.250	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												1,93	$ 6.582.000	1,00	$ 3.400.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 10.200.000	2,00	$ 6.800.000	3,00	$ 10.200.000	3,00	$ 10.200.000	3,00	$ 10.200.000	3,00	$ 10.200.000
2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	1,33	$ 4.222.750	0,07	$ 222.250	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												1,06	$ 3.604.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000
2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	0,66	$ 2.095.500	0,07	$ 222.250	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												1,93	$ 6.562.000	1,00	$ 3.400.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,50	$ 8.500.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FORMATO INFORMES PARA AVALAR

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN3-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 9

(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEN: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 1624 DE: 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/7/2021 (Indicar día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indicar la suspensión mas reciente que conste en el acta) (Indicar día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indicar día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indicar día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 2.400.000.000

2024												2024												2025											
ACTA 31		ACTA 32		ACTA 33		ACTA 34		ACTA 35		ACTA 36		ACTA 37		ACTA 38		ACTA 39		ACTA 40		ACTA 41		ACTA 42		ACTA 43		ACTA 44		ACTA 45		ACTA 46		ACTA 47		ACTA 48	
ENERO		FEBERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
10,00	$ 16.510.000	6,00	$ 9.906.000	6,00	$ 9.906.000	6,00	$ 9.906.000	5,00	$ 8.255.000	3,66	$ 6.042.660	0,17	$ 280.670	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												2,93	$ 5.180.240	1,00	$ 1.768.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 10.608.000	4,00	$ 7.072.000	6,00	$ 10.608.000	6,00	$ 10.608.000	6,00	$ 10.608.000	6,00	$ 10.608.000
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
1,00	$ 1.524.000	1,63	$ 2.484.120	2,00	$ 3.048.000	2,00	$ 3.048.000	2,00	$ 3.048.000	1,00	$ 1.524.000	0,03	$ 45.720	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,97	$ 1.583.040	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
2,00	$ 2.794.000	2,00	$ 2.794.000	2,00	$ 2.794.000	1,50	$ 2.095.500	2,00	$ 2.794.000	1,57	$ 2.193.290	0,07	$ 97.790	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												1,93	$ 2.887.280	1,00	$ 1.496.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
7,00	$ 9.779.000	5,00	$ 6.985.000	5,00	$ 6.985.000	5,00	$ 6.985.000	4,00	$ 5.588.000	2,67	$ 3.729.990	0,13	$ 181.610	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												2,24	$ 3.351.040	1,00	$ 1.496.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 7.480.000	2,00	$ 2.992.000	3,00	$ 4.488.000	4,00	$ 5.984.000	3,00	$ 4.488.000	3,00	$ 4.488.000
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
2,00	$ 2.668.000	2,00	$ 2.668.000	2,00	$ 2.668.000	2,00	$ 2.668.000	1,73	$ 2.307.820	1,33	$ 1.774.220	0,07	$ 93.380	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												1,93	$ 2.756.040	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
0,00	$ -	0,14	$ 1.422.400	0,13	$ 1.320.800	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,90	$ 9.792.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
0,95	$ 7.842.250	0,95	$ 7.842.250	0,95	$ 7.842.250	0,95	$ 7.842.250	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
1,00	$ 7.595.000	0,07	$ 531.650	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -													
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
1,00	$ 8.255.000	0,74	$ 6.108.700	0,83	$ 6.851.650	0,77	$ 6.356.350	0,71	$ 5.861.050	0,76	$ 6.273.800	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,75	$ 6.630.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,90	$ 7.956.000	0,56	$ 4.950.400	0,50	$ 4.420.000	0,60	$ 5.304.000	0,50	$ 4.420.000	0,60	$ 5.304.000
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
3,00	$ 9.525.000	3,00	$ 9.525.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	0,90	$ 2.857.500	0,07	$ 222.250	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												1,93	$ 6.562.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 10.200.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
0,25	$ 635.000	0,63	$ 1.600.200	0,63	$ 1.600.200	0,42	$ 1.066.800	0,68	$ 1.727.200	0,67	$ 1.701.800	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,16	$ 435.200	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	304.224.750		217.971.820		221.420.350		207.253.500		190.934.500		133.697.580		167.623.720		43.085.000		10.717.000		10.717.000		14.593.000		10.587.800		237.742.000		193.324.400		212.684.000		213.398.000		207.550.000		207.142.000
	2,38		2,36		2,36		2,36		2,36		2,38		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,38
	717.970.410		514.413.495		522.552.026		489.118.260		450.605.420		315.526.289		395.591.979		101.680.600		25.292.120		25.292.120		34.439.480		24.987.208		561.071.120		456.245.584		501.934.240		503.619.280		489.818.000		488.855.120

2024												2024												2025											
ACTA 31		ACTA 32		ACTA 33		ACTA 34		ACTA 35		ACTA 36		ACTA 37		ACTA 38		ACTA 39		ACTA 40		ACTA 41		ACTA 42		ACTA 43		ACTA 44		ACTA 45		ACTA 46		ACTA 47		ACTA 48	
ENERO		FEBERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MEPI-MNE-IN-9.FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 9
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021
OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEB: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE: 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión con correspondencia con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

2024												2024												2025											
ACTA 31		ACTA 32		ACTA 33		ACTA 34		ACTA 35		ACTA 36		ACTA 37		ACTA 38		ACTA 39		ACTA 40		ACTA 41		ACTA 42		ACTA 43		ACTA 44		ACTA 45		ACTA 46		ACTA 47		ACTA 48	
ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
10,00	$ 2.540.000	14,00	$ 3.556.000	31,00	$ 7.874.000	15,00	$ 3.810.000	4,00	$ 1.016.000	1,00	$ 254.000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												2,00	$ 544.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 1.632.000	8,00	$ 2.176.000	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 1.632.000	7,00	$ 1.904.000
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
7,00	$ 40.005.000	5,00	$ 28.575.000	5,00	$ 28.575.000	5,00	$ 28.575.000	4,00	$ 22.860.000	4,00	$ 22.860.000	0,13	$ 742.950	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												3,87	$ 23.684.400	1,00	$ 6.120.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 30.600.000	2,00	$ 12.240.000	3,00	$ 18.360.000	4,00	$ 24.480.000	3,00	$ 18.360.000	3,00	$ 18.360.000
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
5,00	$ 12.700.000	3,00	$ 7.620.000	3,00	$ 7.620.000	3,00	$ 7.620.000	2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000	0,07	$ 177.800	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												1,93	$ 5.249.600	1,00	$ 2.720.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 8.160.000	2,00	$ 5.440.000	3,00	$ 8.160.000	3,00	$ 8.160.000	3,00	$ 8.160.000	3,00	$ 8.160.000
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	0,07	$ 222.250	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												1,93	$ 6.562.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000	0,07	$ 177.800	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												1,93	$ 5.249.600	1,00	$ 2.720.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
0,84	$ 1.600.200	1,49	$ 2.838.450	3,35	$ 6.381.750	2,18	$ 4.152.900	1,33	$ 2.533.650	0,68	$ 1.295.400	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,76	$ 1.550.400	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,84	$ 1.713.600	1,29	$ 2.631.600	0,10	$ 204.000	0,19	$ 387.600	1,12	$ 2.284.800	0,72	$ 1.468.800

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
FORMATO DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

PLAN DE CARGAS INICIAL — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** No. 9 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA - VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA**

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEN.: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE: 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/7/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión con concordancia con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

2024												2024												2025											
ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA	
31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48	
ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
0,69	$ 742.440	0,29	$ 312.040	0,02	$ 21.520	0,36	$ 387.360	0,50	$ 538.000	0,06	$ 64.560	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,14	$ 161.280	0,00	$ -	0,13	$ 149.760	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,15	$ 172.800	0,04	$ 46.080	0,00	$ -	0,16	$ 184.320	0,00	$ -	0,02	$ 23.040
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
1,12	$ 853.440	1,12	$ 853.440	1,11	$ 845.820	1,11	$ 845.820	0,80	$ 609.600	0,80	$ 609.600	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,74	$ 603.840	0,00	$ -	0,74	$ 603.840	0,74	$ 603.840	0,74	$ 603.840	0,74	$ 603.840	0,68	$ 554.880	0,68	$ 554.880	0,69	$ 563.040	0,69	$ 563.040	0,69	$ 563.040	0,69	$ 563.040
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
0,00	$ -	0,00	$ -	10,19	$ 2.588.260	8,50	$ 2.159.000	5,31	$ 1.348.740	9,29	$ 2.359.660	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3,31	$ 900.320	1,60	$ 435.200	1,00	$ 272.000
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -						
	$ 69.871.080		$ 55.184.930		$ 65.136.350		$ 58.980.080		$ 45.415.990		$ 43.953.220		$ 44.925.920		$ 11.560.000		$ 6.193.600		$ 6.043.840		$ 6.043.840		$ 6.043.840		$ 55.073.280		$ 35.326.560		$ 39.527.040		$ 46.915.280		$ 43.675.040		$ 42.990.880	
	$ 787.841.490		$ 569.598.425		$ 587.888.376		$ 548.098.340		$ 496.021.410		$ 359.479.509		$ 440.517.899		$ 113.240.600		$ 31.485.720		$ 31.335.960		$ 40.483.320		$ 31.031.048		$ 616.144.400		$ 491.574.144		$ 541.461.280		$ 550.534.560		$ 533.493.040		$ 531.846.000	
	$ 787.841.490		$ 569.598.425		$ 587.888.376		$ 549.098.340		$ 496.021.410		$ 359.479.509		$ 440.517.899		$ 113.240.600		$ 31.485.720		$ 31.335.960		$ 40.483.320		$ 31.031.048		$ 616.144.400		$ 491.574.144		$ 541.461.280		$ 550.534.560		$ 533.493.040		$ 531.846.000	
	$ 149.689.883		$ 108.223.701		$ 111.698.791		$ 104.138.685		$ 94.244.068		$ 68.301.107		$ 83.698.401		$ 21.515.714		$ 5.982.287		$ 5.953.832		$ 7.691.831		$ 5.895.899		$ 117.067.436		$ 93.399.087		$ 102.877.643		$ 104.601.566		$ 101.363.678		$ 101.050.740	
	$ 937.531.373		$ 677.822.126		$ 699.587.167		$ 652.237.025		$ 590.265.478		$ 427.780.615		$ 524.216.300		$ 134.756.314		$ 37.468.007		$ 37.289.792		$ 48.175.151		$ 36.926.947		$ 733.211.836		$ 584.973.231		$ 644.338.923		$ 655.136.126		$ 634.856.718		$ 632.896.740	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
FORMATO DE INTERVENTORÍA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	29/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 9
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021
OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: ING. JOSE RICARDO RUBIANO RASCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/05/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S A
CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indicar día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indicar la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 47.999.992.900 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 50.399.992.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indicar día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 2.400.000.000

2025												2026												2026											
ACTA 49		ACTA 50		ACTA 51		ACTA 52		ACTA 53		ACTA 54		ACTA 55		ACTA 56		ACTA 57		ACTA 58		ACTA 59		ACTA 60		ACTA 61		ACTA 62		ACTA 63		ACTA 64		ACTA 65		ACTA 66	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
0,03	$ 387.600																																		
0,97	$ 13.085.300	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	0,70	$ 9.443.000	0,63	$ 8.498.700	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	0,50	$ 6.745.000	0,50	$ 6.745.000	0,50	$ 6.745.000
0,07	$ 569.310																																		
1,93	$ 16.389.560	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	1,40	$ 11.888.800	1,26	$ 10.699.920	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	1,00	$ 8.492.000
0,07	$ 380.800																																		
1,93	$ 10.962.400	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	1,40	$ 7.952.000	1,26	$ 7.156.800	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	0,50	$ 2.840.000
0,90	$ 10.224.000	0,90	$ 10.224.000	0,90	$ 10.224.000	0,90	$ 10.224.000	0,90	$ 10.224.000	0,63	$ 7.156.800	0,60	$ 6.816.000	0,70	$ 7.952.000	0,70	$ 7.952.000	0,70	$ 7.952.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000		$ -		$ -		$ -		$ -
0,07	$ 761.600																																		
1,93	$ 21.924.800	2,00	$ 22.720.000	2,00	$ 22.720.000	2,00	$ 22.720.000	2,00	$ 22.720.000	1,49	$ 16.926.400	2,00	$ 22.720.000	2,00	$ 22.720.000	2,00	$ 22.720.000	2,00	$ 22.720.000	2,00	$ 22.720.000	2,00	$ 22.720.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000		$ -		$ -		$ -		$ -
	$ -	0,00	$ -	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,21	$ 2.385.600	0,25	$ 2.840.000	0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
0,03	$ 326.400																																		
0,97	$ 11.019.200	1,00	$ 11.360.000	1,00	$ 11.360.000	1,00	$ 11.360.000	1,00	$ 11.360.000	1,00	$ 11.360.000	1,00	$ 11.360.000	1,00	$ 11.360.000	1,00	$ 11.360.000	1,00	$ 11.360.000	1,00	$ 11.360.000	1,00	$ 11.360.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000		$ -		$ -		$ -		$ -
0,60	$ 6.816.000	0,80	$ 9.088.000	0,60	$ 6.816.000	0,60	$ 6.816.000	0,60	$ 6.816.000	0,42	$ 4.771.200	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000		$ -		$ -		$ -		$ -
0,60	$ 6.816.000	0,70	$ 7.952.000	0,60	$ 6.816.000	0,60	$ 6.816.000	0,60	$ 6.816.000	0,42	$ 4.771.200	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,25	$ 2.840.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000		$ -		$ -		$ -		$ -
	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
0,50	$ 4.615.000	0,60	$ 5.538.000	0,30	$ 2.769.000	0,61	$ 5.630.300	0,70	$ 6.461.000	0,49	$ 4.522.700	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000
0,03	$ 285.600																																		
0,97	$ 9.641.800	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	0,70	$ 6.958.000	0,63	$ 6.262.200	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
0,07	$ 352.240																																		
1,93	$ 10.140.220	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	1,40	$ 7.355.600	1,26	$ 6.620.040	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	0,50	$ 2.627.000
0,07	$ 380.800																																		
1,93	$ 10.962.400	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	1,40	$ 7.952.000	1,26	$ 7.156.800	3,00	$ 17.040.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	0,50	$ 2.840.000
0,03	$ 179.520																																		
0,97	$ 6.060.560	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	0,70	$ 4.373.600	0,63	$ 3.936.240	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	0,50	$ 3.124.000	0,50	$ 3.124.000	0,50	$ 3.124.000	0,50	$ 3.124.000		$ -		$ -
0,40	$ 2.272.000	0,60	$ 3.408.000	0,40	$ 2.272.000	0,40	$ 2.272.000	0,40	$ 2.272.000	0,35	$ 1.988.000	0,30	$ 1.704.000	0,30	$ 1.704.000	0,30	$ 1.704.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000		$ -		$ -
	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00			$ -	0,00		0,10	$ 568.000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,20	$ 1.136.000	0,00		0,00	
0,50	$ 3.550.000	0,70	$ 4.970.000	0,69	$ 4.260.000	0,75	$ 5.325.000	0,70	$ 4.970.000	0,49	$ 3.479.000	0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000		$ -		$ -
0,07	$ 238.000																																		
1,93	$ 6.851.500	6,00	$ 21.300.000	6,00	$ 21.300.000	6,00	$ 21.300.000	6,00	$ 21.300.000	4,20	$ 14.910.000	3,15	$ 11.182.500	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000		$ -		$ -
0,10	$ 340.000																																		
2,90	$ 10.295.000	6,00	$ 21.300.000	6,00	$ 21.300.000	6,00	$ 21.300.000	6,00	$ 21.300.000	4,20	$ 14.910.000	3,15	$ 11.182.500	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000		$ -		$ -
0,07	$ 238.000																																		
1,93	$ 6.851.500	2,00	$ 7.100.000	2,09	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,40	$ 4.970.000	1,26	$ 4.473.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000		$ -		$ -
0,07	$ 238.000																																		
1,93	$ 6.851.500	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,40	$ 4.970.000	1,26	$ 4.473.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000		$ -		$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FORMATO SEGUIMIENTO OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	30/01/2026 (Dia / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 9
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 1624 DE: 22/06/2021 (Indicar dia/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión más recientemente con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique dia/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

2025												2026												2026											
ACTA 49		ACTA 50		ACTA 51		ACTA 52		ACTA 53		ACTA 54		ACTA 55		ACTA 56		ACTA 57		ACTA 58		ACTA 59		ACTA 60		ACTA 61		ACTA 62		ACTA 63		ACTA 64		ACTA 65		ACTA 66	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
0,20	$ 353.600																																		
5,80	$ 10.706.800	12,00	$ 22.152.000	12,00	$ 22.152.000	12,00	$ 22.152.000	12,00	$ 22.152.000	8,40	$ 15.506.400	6,30	$ 11.629.800	8,00	$ 14.768.000	8,00	$ 14.768.000	8,00	$ 14.768.000	8,00	$ 14.768.000	8,00	$ 14.768.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000		$ -		$ -
0,07	$ 114.240																																		
1,93	$ 3.288.720	2,00	$ 3.408.000	2,00	$ 3.408.000	2,00	$ 3.408.000	2,00	$ 3.408.000	1,40	$ 2.385.600																								
												1,26	$ 2.206.140	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
0,07	$ 104.720																																		
1,93	$ 3.014.660	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	1,40	$ 2.186.800																								
												1,26	$ 2.206.140	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	1,00	$ 1.750.905	0,50	$ 875.453
0,10	$ 140.800																																		
2,90	$ 4.529.800	7,00	$ 10.934.000	7,00	$ 10.934.000	7,00	$ 10.934.000	7,00	$ 10.934.000	4,90	$ 7.653.800																								
												3,15	$ 5.515.351	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810		$ -		$ -
0,07	$ 99.960																																		
1,93	$ 2.877.690	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	1,40	$ 2.087.400																								
												1,26	$ 2.206.140	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	0,50	$ 875.453		$ -
	$ -																																		
	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -																		
	$ -																																		
	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -																						
	$ -																																		
	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000		$ -		$ -
	$ -																																		
	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -																						
0,70	$ 6.461.000	0,90	$ 8.307.000	0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	0,60	$ 5.538.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000		$ -		$ -
	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -																								
	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -																								
	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -																						
0,07	$ 238.000																																		
1,93	$ 6.851.500	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,40	$ 4.970.000	1,26	$ 4.473.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000		$ -		$ -
	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -																						
	$ -	0,00	$ -	0,08	$ 227.200	0,03	$ 85.200	0,04	$ 113.600	0,03	$ 85.200	0,10	$ 284.000	0,10	$ 284.000	0,10	$ 284.000	0,10	$ 284.000	0,10	$ 284.000	0,10	$ 284.000	0,10	$ 284.000	0,10	$ 284.000	0,10	$ 284.000	0,10	$ 284.000	0,00	$ -		$ -
	218.796.840		269.957.000		263.723.200		267.507.500		268.011.600		193.457.100		177.186.272		237.056.050		229.104.050		226.264.050		221.152.050		221.152.050		134.202.430		124.262.430		112.902.430		107.293.430		45.738.358		27.188.453
	2,36		2,36		2,36		2,38		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,38		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
	516.360.542		637.098.520		622.386.752		631.317.700		632.507.376		456.558.756		418.159.601		559.452.278		540.685.558		533.983.158		521.918.838		521.918.838		316.717.735		293.259.335		266.449.735		253.212.495		107.942.524		64.164.748

2025												2026												2026											
ACTA 49		ACTA 50		ACTA 51		ACTA 52		ACTA 53		ACTA 54		ACTA 55		ACTA 56		ACTA 57		ACTA 58		ACTA 59		ACTA 60		ACTA 61		ACTA 62		ACTA 63		ACTA 64		ACTA 65		ACTA 66	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MNS-IN-9.FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 9
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021
OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVIAL: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE: 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No.:1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

2025												2026												2026											
ACTA 49		ACTA 50		ACTA 51		ACTA 52		ACTA 53		ACTA 54		ACTA 55		ACTA 56		ACTA 57		ACTA 58		ACTA 59		ACTA 60		ACTA 61		ACTA 62		ACTA 63		ACTA 64		ACTA 65		ACTA 66	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
5,00	$ 1.420.000	8,00	$ 2.272.000	11,00	$ 3.124.000	8,00	$ 2.272.000	16,00	$ 4.544.000	5,00	$ 1.420.000	4,00	$ 1.136.000	8,00	$ 2.272.000	8,00	$ 2.272.000	8,00	$ 2.272.000	8,00	$ 2.272.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	1,00	$ 284.000		$ -
0,10	$ 612.000																																		
2,90	$ 18.531.000	7,00	$ 44.730.000	7,00	$ 44.730.000	7,00	$ 44.730.000	7,00	$ 44.730.000	5,50	$ 35.145.000	5,00	$ 31.950.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	0,00	$ -	0,00	$ -
0,10	$ 272.000																																		
2,90	$ 8.236.000	6,00	$ 17.040.000	6,00	$ 17.040.000	6,00	$ 17.040.000	6,00	$ 17.040.000	4,80	$ 13.632.000	5,00	$ 14.200.000	4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	0,00	$ -	0,00	$ -
0,07	$ 238.000																																		
1,93	$ 6.851.500	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	0,00	$ -	0,00	$ -
0,07	$ 190.400																																		
1,93	$ 5.481.200	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000
0,88	$ 1.874.400	0,67	$ 1.427.100	1,43	$ 3.045.900	1,42	$ 3.024.600	2,87	$ 6.113.100	0,80	$ 1.704.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000		$ -		$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
FORMATO DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MNG-IN-5-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 9
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021
OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACÍFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA ...
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEI: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indicar día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indicar la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

2025												2026												2026											
ACTA 49		ACTA 50		ACTA 51		ACTA 52		ACTA 53		ACTA 54		ACTA 55		ACTA 56		ACTA 57		ACTA 58		ACTA 59		ACTA 60		ACTA 61		ACTA 62		ACTA 63		ACTA 64		ACTA 65		ACTA 66	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
0,08	$ 96.240	0,00	$ -	0,00	$ -	0,08	$ 96.240	0,06	$ 72.180	0,06	$ 72.180	0,30	$ 360.900	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500		$ -		$ -
0,66	$ 562.320	0,66	$ 562.320	0,75	$ 639.000	0,75	$ 639.000	0,75	$ 639.000	0,75	$ 639.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000
0,95	$ 269.800	2,04	$ 579.360	1,07	$ 303.880	0,00	$ -	1,07	$ 303.880	1,07	$ 303.880	1,00	$ 284.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000
	$ 44.634.860		$ 79.390.780		$ 81.662.780		$ 80.581.840		$ 86.222.160		$ 65.696.060		$ 63.692.900		$ 56.123.500		$ 56.123.500		$ 56.123.500		$ 56.123.500		$ 54.987.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 7.384.000		$ 7.100.000
	$ 560.995.402		$ 716.489.300		$ 704.049.532		$ 711.899.540		$ 718.729.536		$ 522.254.816		$ 481.852.501		$ 615.575.778		$ 596.809.058		$ 560.106.658		$ 579.042.338		$ 576.906.338		$ 353.245.235		$ 329.786.835		$ 302.977.235		$ 289.739.995		$ 115.326.524		$ 71.264.748
	$ 560.995.402		$ 716.489.300		$ 704.049.532		$ 711.899.540		$ 718.729.536		$ 522.254.816		$ 481.852.501		$ 615.575.778		$ 596.809.058		$ 590.106.658		$ 579.042.338		$ 576.906.338		$ 353.245.235		$ 329.786.835		$ 302.977.235		$ 289.739.995		$ 115.326.524		$ 71.264.748
	$ 106.589.126		$ 136.132.967		$ 133.769.411		$ 135.260.913		$ 136.558.612		$ 99.228.415		$ 91.551.975		$ 116.959.398		$ 113.393.721		$ 112.120.265		$ 109.828.044		$ 109.612.204		$ 67.116.595		$ 62.659.499		$ 57.565.675		$ 55.050.599		$ 21.912.040		$ 13.540.302
	$ 667.584.529		$ 852.622.267		$ 837.818.943		$ 847.160.453		$ 855.288.148		$ 621.483.231		$ 573.404.476		$ 732.535.176		$ 710.202.779		$ 702.226.923		$ 687.870.382		$ 686.518.542		$ 420.361.829		$ 392.446.333		$ 360.542.909		$ 344.790.594		$ 137.238.563		$ 84.805.050

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

SUBPROCESO INTERVENTORÍA DEBIDO PROCESO

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 9

(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACÍFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indicar día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indicar la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.992.900 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.992.900

PLAZO ACUMULADO: 119 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indicar día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

2027												2027												2028											
ACTA 67		ACTA 68		ACTA 69		ACTA 70		ACTA 71		ACTA 72		ACTA 73		ACTA 74		ACTA 75		ACTA 76		ACTA 77		ACTA 78		ACTA 79		ACTA 80		ACTA 81		ACTA 82		ACTA 83		ACTA 84	
ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	0,80	$ 10.792.000	0,80	$ 10.792.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000
2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	1,60	$ 13.587.200	1,60	$ 13.587.200	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000
2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	1,60	$ 9.088.000	1,60	$ 9.088.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000
0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000
0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,08	$ 908.800	0,08	$ 908.800	0,08	$ 908.800	0,08	$ 908.800	0,08	$ 908.800	0,08	$ 908.800	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000
0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800
0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,08	$ 908.800	0,08	$ 908.800	0,08	$ 908.800	0,08	$ 908.800	0,08	$ 908.800	0,08	$ 908.800	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000
0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800
0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800
0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000
0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000
1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	0,80	$ 7.952.000	0,80	$ 7.952.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000
2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	1,60	$ 8.406.400	1,60	$ 8.406.400	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000
2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	1,60	$ 9.088.000	1,60	$ 9.088.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000
1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	0,50	$ 3.124.000	0,80	$ 4.998.400	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000
0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000
0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,80	$ 6.390.000	1,80	$ 6.390.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FORMATO DE INFORMACIÓN TÉCNICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 9
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD"**

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEI: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE: 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 954 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indicar día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indicar la suspensión más representativa, esto es el mayor/a del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indicar día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indicar día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

2027												2027												2028											
ACTA 67		ACTA 68		ACTA 69		ACTA 70		ACTA 71		ACTA 72		ACTA 73		ACTA 74		ACTA 75		ACTA 76		ACTA 77		ACTA 78		ACTA 79		ACTA 80		ACTA 81		ACTA 82		ACTA 83		ACTA 84	
ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	1,60	$ 2.953.600	3,20	$ 5.907.200	2,00	$ 3.692.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000
2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	1,60	$ 2.801.448	1,60	$ 2.801.448	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810
2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	1,60	$ 2.801.448	1,60	$ 2.801.448	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810
4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	3,60	$ 6.303.258	3,60	$ 6.303.258	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810
2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	1,60	$ 2.801.448	1,60	$ 2.801.448	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810
0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MEPI-MN1-19-3-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 9 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD**

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEN: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 1624 DE: 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 47.999.892.900 (Segun contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 2.400.000.000

2027												2027												2028											
ACTA 67		ACTA 68		ACTA 69		ACTA 70		ACTA 71		ACTA 72		ACTA 73		ACTA 74		ACTA 75		ACTA 76		ACTA 77		ACTA 78		ACTA 79		ACTA 80		ACTA 81		ACTA 82		ACTA 83		ACTA 84	
ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000
4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	3,60	$ 23.004.000	3,60	$ 23.004.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000
2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	1,60	$ 4.544.000	1,60	$ 4.544.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000
2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000
1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
GERENCIA DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 9
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACÍFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD**

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEN: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/7/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique si suspensión fue comenzada con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indicar día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

2027												2027												2028											
ACTA 67		ACTA 68		ACTA 69		ACTA 70		ACTA 71		ACTA 72		ACTA 73		ACTA 74		ACTA 75		ACTA 76		ACTA 77		ACTA 78		ACTA 79		ACTA 80		ACTA 81		ACTA 82		ACTA 83		ACTA 84	
ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500
1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000
2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000
	$ 49.023.500		$ 49.023.500		$ 49.023.500		$ 49.023.500		$ 49.023.500		$ 49.023.500		$ 49.307.500		$ 49.307.500		$ 49.307.500		$ 49.307.500		$ 49.307.500		$ 44.195.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500	
	$ 421.713.402		$ 421.713.402		$ 421.713.402		$ 421.713.402		$ 421.713.402		$ 421.713.402		$ 420.925.018		$ 420.925.018		$ 420.925.018		$ 420.925.018		$ 420.925.018		$ 353.598.113		$ 360.032.417		$ 398.272.170		$ 406.985.290		$ 406.985.290		$ 406.985.290	
	$ 421.713.402		$ 421.713.402		$ 421.713.402		$ 421.713.402		$ 421.713.402		$ 421.713.402		$ 420.925.018		$ 420.925.018		$ 420.925.018		$ 420.925.018		$ 420.925.018		$ 353.598.113		$ 360.032.417		$ 398.272.170		$ 406.985.290		$ 406.985.290		$ 406.985.290	
	$ 80.125.546		$ 80.125.546		$ 80.125.546		$ 80.125.546		$ 80.125.546		$ 80.125.546		$ 79.975.753		$ 79.975.753		$ 79.975.753		$ 79.975.753		$ 79.975.753		$ 67.183.641		$ 68.406.159		$ 75.671.712		$ 77.327.205		$ 77.327.205		$ 77.327.205	
	$ 501.838.948		$ 501.838.948		$ 501.838.948		$ 501.838.948		$ 501.838.948		$ 501.838.948		$ 500.900.771		$ 500.900.771		$ 500.900.771		$ 500.900.771		$ 500.900.771		$ 420.781.754		$ 428.438.576		$ 473.943.883		$ 484.312.496		$ 484.312.496		$ 484.312.496	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
FORMATO DE SEGUIMIENTO OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MNE-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 9 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021
OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACÍFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el iniciado del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.992.900 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.992.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

2028												2029												2029											
ACTA 85 JULIO		ACTA 86 AGOSTO		ACTA 87 SEPTIEMBRE		ACTA 88 OCTUBRE		ACTA 89 NOVIEMBRE		ACTA 90 DICIEMBRE		ACTA 91 ENERO		ACTA 92 FEBRERO		ACTA 93 MARZO		ACTA 94 ABRIL		ACTA 95 MAYO		ACTA 96 JUNIO		ACTA 97 JULIO		ACTA 98 AGOSTO		ACTA 99 SEPTIEMBRE		ACTA 100 OCTUBRE		ACTA 101 NOVIEMBRE		ACTA 102 DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	0,80	$ 10.792.000	0,80	$ 10.792.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	0,50	$ 6.745.000
2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	1,60	$ 13.587.200	1,60	$ 13.587.200	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	1,00	$ 8.492.000
2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	1,60	$ 9.088.000	0,80	$ 4.544.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	0,50	$ 2.840.000
0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000
0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800																								
0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800																								
0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000
1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	0,80	$ 7.952.000		$		$ -		$ -		$ -		$ -														
2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	1,60	$ 8.406.400	0,80	$ 4.203.200	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	0,50	$ 2.627.000
2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	1,60	$ 9.088.000	0,80	$ 4.544.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	0,50	$ 2.840.000
1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	0,80	$ 4.998.400	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000
0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,00	$ 3.550.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,00	$ 3.550.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,00	$ 3.550.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,00	$ 3.550.000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FORMATO DE INFORMACIÓN TÉCNICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MEPI-MNE-IN-S-FR-2
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 9

(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 977 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 1624 DE: 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indicar día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indicar día, mes y año de cada suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indicar día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indicar día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 2.400.000.000

2028												2029												2029											
ACTA 85		ACTA 86		ACTA 87		ACTA 88		ACTA 89		ACTA 90		ACTA 91		ACTA 92		ACTA 93		ACTA 94		ACTA 95		ACTA 96		ACTA 97		ACTA 98		ACTA 99		ACTA 100		ACTA 101		ACTA 102	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
4,00	$ 7.384.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	1,60	$ 2.953.600	1,60	$ 2.953.600	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	1,00	$ 1.846.000
2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	1,60	$ 2.801.448	1,60	$ 2.801.448	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	1,00	$ 1.750.905		$ -		$ -
2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	1,60	$ 2.801.448	1,60	$ 2.801.448	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	1,00	$ 1.750.905
2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	1,80	$ 3.151.629	1,80	$ 3.151.629	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	1,50	$ 2.626.358
2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	1,60	$ 2.801.448	1,60	$ 2.801.448	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	1,00	$ 1.750.905
0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,00	$ 3.550.000
0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000
	156.292.040		152.600.040		152.600.040		152.600.040		152.600.040		126.332.373		96.767.973		116.475.240		116.475.240		116.475.240		116.475.240		116.475.240		116.475.240		116.475.240		116.475.240		114.724.335		112.973.430		65.456.168
	2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
	368.849.214		360.136.094		360.136.094		360.136.094		360.136.094		298.144.400		228.372.416		274.881.566		274.881.566		274.881.566		274.881.566		274.881.566		274.881.566		274.881.566		274.881.566		270.749.431		266.617.295		154.476.555

2028												2029												2029											
ACTA 85		ACTA 86		ACTA 87		ACTA 88		ACTA 89		ACTA 90		ACTA 91		ACTA 92		ACTA 93		ACTA 94		ACTA 95		ACTA 96		ACTA 97		ACTA 98		ACTA 99		ACTA 100		ACTA 101		ACTA 102	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MEPT-MINE-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 9 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA**

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 1624 DE: 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/7/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el cerrado del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 37.999.892.900 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 12.400.000.000

2028												2029												2029											
ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA	
85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000
2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	1,80	$ 11.502.000	1,80	$ 11.502.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	1,50	$ 9.585.000
2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	1,60	$ 4.544.000	1,60	$ 4.544.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	1,00	$ 2.840.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,00	$ 3.550.000
2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000
1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
FORMA DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MNE-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 9
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA PAZ"**

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/7/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

2028												2029												2029											
ACTA 85		ACTA 86		ACTA 87		ACTA 88		ACTA 89		ACTA 90		ACTA 91		ACTA 92		ACTA 93		ACTA 94		ACTA 95		ACTA 96		ACTA 97		ACTA 98		ACTA 99		ACTA 100		ACTA 101		ACTA 102	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500
1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000
2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000
	$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 32.693.500		$ 32.409.500		$ 36.243.500		$ 36.243.500		$ 36.243.500		$ 36.243.500		$ 36.243.500		$ 36.243.500		$ 35.959.500		$ 35.959.500		$ 35.959.500		$ 35.959.500		$ 26.374.500	
	$ 405.376.714		$ 396.663.594		$ 396.663.594		$ 396.663.594		$ 396.663.594		$ 330.837.900		$ 260.781.916		$ 311.125.066		$ 311.125.066		$ 311.125.066		$ 311.125.066		$ 311.125.066		$ 311.125.066		$ 311.125.066		$ 310.841.066		$ 306.708.931		$ 302.576.795		$ 180.851.055	
	$ 405.376.714		$ 396.663.594		$ 396.663.594		$ 396.663.594		$ 396.663.594		$ 330.837.900		$ 260.781.916		$ 311.125.066		$ 311.125.066		$ 311.125.066		$ 311.125.066		$ 311.125.066		$ 311.125.066		$ 311.125.066		$ 310.841.066		$ 306.708.931		$ 302.576.795		$ 180.851.055	
	$ 77.021.576		$ 75.366.083		$ 75.366.083		$ 75.366.083		$ 75.366.083		$ 62.859.201		$ 49.548.584		$ 59.113.763		$ 59.113.763		$ 59.113.763		$ 59.113.763		$ 59.113.763		$ 59.113.763		$ 59.059.803		$ 58.274.697		$ 57.489.591		$ 34.361.701	
	$ 482.398.290		$ 472.029.677		$ 472.029.677		$ 472.029.677		$ 472.029.677		$ 393.697.101		$ 310.330.500		$ 370.238.829		$ 370.238.829		$ 370.238.829		$ 370.238.829		$ 370.238.829		$ 370.238.829		$ 370.238.829		$ 369.900.869		$ 364.983.627		$ 360.066.386		$ 215.212.756	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-7
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — No. 9

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 877 DE 2021
OBJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEN.: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses segun contrato principal) — 119 MESES (En meses segun las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año) — 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 47.999.892.900 (Según contrato principal) — $ 2.400.000.000
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 50.399.892.900

2030																TOTAL	
ACTA 103 ENERO		ACTA 104 FEBRERO		ACTA 105 MARZO		ACTA 106 ABRIL		ACTA 107 MAYO		ACTA 108 JUNIO		ACTA 109 JULIO		ACTA 110 AGOSTO			
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
																11,86	112.670.000,00
																11,97	129.635.100,00
																9,78	105.930.700,00
																9,09	117.442.800,00
1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	58,50	789.165.000,00
																12,80	186.144.000,00
																35,33	240.844.610,00
																22,32	169.520.400,00
2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	3,00	$ 25.476.000	3,00	$ 25.476.000	3,00	$ 25.476.000	3,00	$ 25.476.000	3,00	$ 25.476.000	3,00	$ 25.476.000	18,30	148.833.900,00
																124,98	1.061.410.080,00
																12,14	48.560.000,00
																23,66	107.889.600,00
																14,17	71.983.600,00
																7,56	40.800.000,00
2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	102,19	580.439.200,00
																8,34	45.390.000,00
																9,79	89.284.800,00
																5,97	60.605.200,00
0,70	$ 7.952.000	0,70	$ 7.952.000	0,70	$ 7.952.000	0,70	$ 7.952.000	0,70	$ 7.952.000	0,70	$ 7.952.000	0,70	$ 7.952.000	0,90	$ 10.224.000	9,17	67.129.600,00
																39,23	377.492.800,00
																5,90	47.200.000,00
																11,77	107.342.400,00
																9,86	99.568.000,00
																13,04	141.875.200,00
																25,53	260.588.800,00
																1,22	9.760.000,00
																1,75	15.960.000,00
																0,90	9.144.000,00
																1,56	10.880.000,00
0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	2,98	33.852.800,00
																4,90	39.200.000,00
																6,33	57.729.600,00
																9,03	91.744.800,00
0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	7,06	76.160.000,00
																18,11	205.956.800,00
																1,34	10.720.000,00
																2,13	19.425.600,00
																1,39	14.122.400,00
0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	5,35	55.488.000,00
																8,24	93.606.400,00
																2,70	21.600.000,00
																4,69	42.772.800,00
																1,63	16.560.800,00
																5,20	56.576.000,00
0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,30	$ 3.408.000	7,89	89.630.400,00
																-	-
																-	-
																-	-
0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	3,48	39.532.800,00
																3,19	20.735.000,00
																2,39	17.709.900,00
																3,05	25.177.750,00
0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	2,73	24.132.200,00
																20,00	184.600.000,00
																6,88	44.590.000,00
																15,37	122.652.600,00
																14,96	132.994.400,00
1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	7,27	69.210.400,00
																43,70	434.378.000,00
																21,33	78.921.000,00
																23,09	97.393.620,00
																13,52	63.530.480,00
																13,53	68.092.960,00
2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	102,19	536.906.260,00
																20,81	83.240.000,00
																22,76	103.785.600,00
																16,65	84.562.000,00
2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	13,80	75.072.000,00
																103,19	585.119.200,00
																3,83	16.852.000,00
																9,10	45.645.600,00
																7,03	39.283.640,00
1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	7,06	41.888.000,00
																44,40	277.411.200,00
																3,02	12.080.000,00
																3,39	15.458.400,00
																3,06	15.494.000,00
0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	3,71	20.182.400,00
																13,65	77.532.000,00
																-	-
																-	-
																-	-
																0,30	1.704.000,00
																2,30	11.500.000,00
																4,17	23.769.000,00
																4,44	28.194.000,00
0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	3,80	25.840.000,00
																19,74	149.154.000,00
																12,44	31.600.000,00
																29,26	83.220.000,00
																30,06	95.250.000,00
																17,30	58.820.000,00
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	147,98	522.134.000,00
																15,04	37.600.000,00
																30,86	87.951.000,00
																25,91	82.264.250,00
																20,03	68.102.000,00
4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	163,65	580.957.500,00
																7,03	17.575.000,00
																21,20	80.620.000,00
																15,40	48.895.000,00
																13,13	44.642.000,00
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	115,99	411.764.500,00
																12,64	31.600.000,00
																23,36	86.576.000,00
																15,93	59.577.750,00
																15,50	52.700.000,00
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	115,99	411.764.500,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SUBSECTOR TIPO INTERVENTORÍA PARA VÍAS 4ª G
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **No.** 9

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 877 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEN.: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) — 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indicar día/mes/año) — 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indicar día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indicar la suspensión mas reciente, con el periodo del acta) (Indicar día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal) — $ 2.400.000.000
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

2030																TOTAL	
ACTA 103 ENERO		ACTA 104 FEBRERO		ACTA 105 MARZO		ACTA 106 ABRIL		ACTA 107 MAYO		ACTA 108 JUNIO		ACTA 109 JULIO		ACTA 110 AGOSTO			
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
																29,57	38.441.000,00
																59,96	89.660.720,00
																54,73	85.533.730,00
																36,13	67.413.840,00
4,00	$ 7.384.006	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	229,50	423.657.000,00
																-	-
																9,87	13.238.560,00
																13,66	20.817.840,00
																13,04	21.281.280,00
																11,33	19.306.320,00
2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	92,66	162.238.857,39
																-	-
																17,57	19.327.000,00
																23,03	26.879.620,00
																16,94	23.685.180,00
																15,06	22.440.000,00
																11,33	17.697.460,00
2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	106,16	185.876.074,80
																21,07	23.177.000,00
																41,04	51.464.160,00
																40,80	56.997.600,00
																22,34	34.916.640,00
																36,86	55.919.800,00
4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	159,45	279.181.802,25
																11,94	12.537.000,00
																21,83	26.130.510,00
																16,33	21.784.220,00
																14,00	19.992.000,00
																11,33	16.893.030,00
2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	105,16	184.125.169,80
																-	-
																0,09	820.800,00
																0,27	2.743.200,00
																0,90	9.792.000,00
0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	1,60	18.176.000,00
																4,75	35.197.500,00
																4,75	39.211.250,00
																-	-
																2,79	24.921.000,00
																1,20	8.180.400,00
																2,07	15.721.650,00
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	-
																3,64	25.972.400,00
																5,51	45.485.050,00
																4,41	38.984.400,00
0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	32,90	301.667.000,00
																-	-
																-	-
																4,37	21.919.920,00
																6,00	33.528.000,00
																-	-
																-	-
																-	-
																-	-
																6,93	19.750.920,00
																18,97	60.229.750,00
																15,00	51.000.000,00
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	118,39	413.194.500,00
																3,33	4.928.220,00
																-	-
																-	-
																5,95	11.900.000,00
																3,98	9.950.200,00
																0,16	435.200,00
0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	5,56	16.000.000,00
	183.877.050		183.877.050		192.369.050		192.369.050		192.369.050		192.369.050		192.369.050		195.777.050		16.020.060.454,15
	2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
	433.949.838		433.949.838		453.990.958		453.990.958		453.990.958		453.990.958		453.990.958		462.033.838		37.807.342.671,79

2030																TOTAL	
ACTA 103 ENERO		ACTA 104 FEBRERO		ACTA 105 MARZO		ACTA 106 ABRIL		ACTA 107 MAYO		ACTA 108 JUNIO		ACTA 109 JULIO		ACTA 110 AGOSTO			
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPT-MN1-IN-01-FR-21
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — No. 9

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEN.: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE: 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) — 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año) — 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 47.999.892.900 (Según contrato principal) — $ 2.400.000.000

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 50.399.892.900

2030																		TOTAL	
ACTA 103		ACTA 104		ACTA 105		ACTA 106		ACTA 107		ACTA 108		ACTA 109		ACTA 110					
ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO					
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR		
																		240,89	48.178.000,00
																		171,00	38.988.000,00
																		94,00	23.876.000,00
																		29,00	7.888.000,00
17,00	$ 4.828.000	16,00	$ 4.544.000	17,00	$ 4.828.000	17,00	$ 4.828.000	16,00	$ 4.544.000	12,00	$ 3.408.000	12,00	$ 3.408.000	15,00	$ 4.260.000	354,00	100.536.000,00		
																		28,28	127.273.999,95
																		41,41	212.433.300,00
																		48,07	274.720.050,00
																		24,97	152.816.400,00
4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	197,79	1.263.303.000,00		
																		-	-
																		-	-
																		-	-
																		-	-
																		15,07	30.142.000,00
																		31,53	71.888.400,00
																		32,97	83.743.800,00
																		20,03	54.481.600,00
4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	166,10	471.724.000,00		
																		5,05	12.635.000,00
																		20,73	59.080.500,00
																		16,07	51.022.250,00
																		14,00	47.600.000,00
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	117,33	416.521.500,00		
																		26,56	53.128.000,00
																		24,00	54.720.000,00
																		24,00	60.960.000,00
																		23,00	62.560.000,00
2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	173,93	361.961.350,00		
																		21,19	31.782.000,00
																		20,67	35.345.700,00
																		11,90	22.669.500,00
																		5,02	10.240.800,00
1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	43,07	132.209.100,00		

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MEDICIÓN DE INTERVENTORÍA PARA EVITAR ATRASOS
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MEPI-MN1-IN-9.FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — No. 9

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEN.: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses segun contrato principal) — 114 MESES (En meses segun las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año) — 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal) — $ 2.400.000.000
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

2030																TOTAL	
ACTA 103 ENERO		ACTA 104 FEBRERO		ACTA 105 MARZO		ACTA 106 ABRIL		ACTA 107 MAYO		ACTA 108 JUNIO		ACTA 109 JULIO		ACTA 110 AGOSTO			
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
																6,5470	5.545.309,09
																4,09	3.892.980,00
																2,41	2.593.160,00
																0,64	737.280,00
1,00	$ 1.203.000	1,00	$ 1.203.000	1,00	$ 1.203.000	1,00	$ 1.203.000	1,00	$ 1.203.000	1,00	$ 1.203.000	1,00	$ 1.203.000	1,00	$ 1.203.000	31,06	37.389.240,00
																9,98	5.985.000,00
																13,96	9.480.240,00
																7,15	5.448.300,00
																7,82	6.381.120,00
1,50	$ 1.278.000	1,50	$ 1.278.000	1,50	$ 1.278.000	1,50	$ 1.278.000	1,50	$ 1.278.000	1,50	$ 1.278.000	1,50	$ 1.278.000	1,50	$ 1.278.000	64,32	54.800.640,00
																0,59	800.820,00
																-	-
																-	-
																-	-
																13,12	2.624.000,00
																8,60	1.960.800,00
																33,29	8.495.660,00
																5,91	1.607.520,00
2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	117,20	33.284.800,00
																-	$ 93.535,78
	$ 59.707.000		$ 59.423.000		$ 59.707.000		$ 59.707.000		$ 59.423.000		$ 58.287.000		$ 58.287.000		$ 59.139.000	-	$ 4.545.508.504,71
	$ 493.656.838		$ 493.372.838		$ 513.697.958		$ 513.697.958		$ 513.413.958		$ 512.277.958		$ 512.277.958		$ 521.172.838	-	$ 42.352.851.176,50
	$ 493.656.838		$ 493.372.838		$ 513.697.958		$ 513.697.958		$ 513.413.958		$ 512.277.958		$ 512.277.958		$ 521.172.838	-	$ 42.352.851.177,00
	$ 93.794.799		$ 93.740.839		$ 97.602.612		$ 97.602.612		$ 97.548.652		$ 97.332.812		$ 97.332.812		$ 99.022.839	-	$ 8.047.041.723,00
	$ 587.451.637		$ 587.113.677		$ 611.300.570		$ 611.300.570		$ 610.962.610		$ 609.610.770		$ 609.610.770		$ 620.195.677	-	$ 50.399.892.900,00

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Área técnica:

El Consorcio San Francisco tiene los siguientes frentes de trabajo por sector:

Sector 1:

- Pavimento sector 1: Respecto a las actividades realizadas en el tramo comprendido entre el K0+770 y el K6+620 de este frente de trabajo. Se ha completado al 100% la pavimentación en concreto tipo MR-45 de los carriles izquierdo y derecho. En cuanto a la construcción de cunetas, se han finalizado un total de 5.311 metros en el carril derecho y 5.160 metros en el carril izquierdo. De igual forma se culminó la construcción de las losas laterales de acceso a los puentes existentes, habiéndose culminado las correspondientes a los puentes No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

- Puente 6 - K5+761 - K5+828: Este puente se encuentra terminado en su estructura física; actualmente se encuentra en servicio al tránsito de vehículos del proyecto.

- Talud del K6+800 margen derecha: El contratista avanza con las actividades de estabilización del talud. Se realiza instalación de guayas longitudinales y tensionamiento de anclajes.

- Alcantarilla del K6+320: Esta obra se encuentra terminada al 100%

- Alcantarilla del K6+406: Esta obra se encuentra terminada al 100%

- Muro No.0 - K6+869 - K 6+887: Esta estructura de contención se culminó a un 100%.

- Puente 9 - K6+959 al K7+004: Este puente se encuentra terminado en su estructura física desde el mes de octubre de 2024, actualmente se encuentra en servicio al tránsito de vehículos del proyecto.

Sector 2:

- Talud No. 0 Cero (K7+003 al K7+123) M.D: El Contratista culminó las actividades de estabilización del talud, mediante la instalación de anclajes, geomanto y malla de alta resistencia.

- Puente No. 9A (K7+130 al K7+190): Se ha finalizado la construcción de toda la estructura incluyendo barreras de protección lateral tipo New Jersey. Durante este mes, se ha realizado construcción del muro de aproximación a la margen izquierda del acceso del puente, se realizan actividades de excavación, instalación de acero y hormigonado de zarpas y vástagos. El puente se encuentra al servicio del tránsito de equipos de obra.

- Talud No. 1 (K7+200 - K 7+300): Esta obra se encuentra terminada en su totalidad.

- Muro No.1 (K7+293 al K7+330) M.I: Esta estructura de contención se culminó a un 100%.

- Talud No. 2 (K7+315 - K 7+392): Esta estructura de contención se culminó a un 100%.
- Muro No.2 (K7+360 al K7+395) M.I: Esta estructura de contención se culminó a un 100%.

- Puente No. 10 (K7+398 al K7+431): Este puente se encuentra construido en un 100%, actualmente se encuentra en servicio al tránsito de vehículos del proyecto.

- Muro No 3 (K 7+435 al K 7+488) M.I: Se han construido los caisson números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Se culminó la construcción de la zarpa de los módulos 1, 2, 3, 4 y 5, así como los vástagos de los módulos 1 y 2 del muro. Se culminaron también las actividades de perforación e inyección de los anclajes de los módulos 3, 4 y 5. Se avanza con la estabilización del talud 3, lo cual causa una obstrucción temporal de la vía de acceso provisional hacia mayores. Se presenta el siguiente avance en la construcción del muro:

- Talud No. 3 (K7+440 - K7+520) M.D: A la fecha se tienen terminadas las terrazas 6, 5 y 4. Durante este mes se realiza instalación anclajes, platinas y guayas longitudinales. Se realizan actividades de explanación y desalojo de material. Se continúa con instalación de geo manto y malla de alta resistencia. Se realiza inyección de lechada a anclajes y tensionamiento de estos.

- Puente No. 11 (K7+491 - K7+579): En la actualidad, se han completado los caissons números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La construcción del babero del eje No. 1, así como de las pilas No. 3 y 4, ha sido finalizada. Además, se ha llevado a cabo el hormigonado de las vigas cabezal No.1, 2 y 3. Se realiza instalación de acero de refuerzo y hormigonado para muro espaldar y aletas sobre el eje 2. Se inicia con trabajos de soldadura para unificar la estructura metálica y se inicia con izaje de vigas metálicas desde el eje 2 hacía el eje 1.

- Talud No. 4 (K7+575 - K 7+635) M.D: Esta obra se encuentra terminada en su totalidad.

- Puente No.12: A la fecha se tiene a nivel de viga cabezal los ejes 1, 2, 3 y 4. Se continúa con actividades de adecuación de piso para bases de obra falsa entre los ejes 1 y 2. Se realiza hormigonado de las vigas 7, 8 y 9 entre los ejes 3 y 4. Se realiza tensionamiento de las vigas 7, 8 y 9. Se realiza instalación de acero de refuerzo para la viga 1 y se da inicio a instalación de acero de refuerzo para la viga 2 entre ejes 1 y 2.

- Talud No. 5 (K7+728 - K 7+762) M.D: Este talud se encuentra culminado en un 100%.

- Muro No. 6 (K7+730 - K7+736) M.I: A la fecha se tiene fundidos los caisson de cimentación, zarpa y armado en su totalidad el acero de refuerzo del vástago. Pendiente el hormigonado de la barrera tipo new jersey.

- Muro No. 7 (K7+763.20 - K7+786.42) M.I: Los caisson No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ya han sido hormigonados, se ha construido la totalidad de caisson de esta estructura. Pendiente por iniciar las actividades constructivas de la zarpa y vástagos.

- Puente No. 12A (K7+785 al K7+866): Se realiza izaje de secciones de vigas en estructura metálica, terminando todas las secciones entre los ejes 1 y 3. Se realizan trabajos de soldadura sobre la estructura metálica.

- Talud No. 6 (K7+865- K 7+950) M.D: Este talud se encuentra culminado en un 100%. Se realiza instalación de anclajes adicionales en el sector ubicado frente al eje 1 del puente 12B, con el fin de proteger esta estructura.

- Puente No 12B (K7+952 al K8+042): Se culmina con actividades de instalación de lámina auto portante para base de losa e instalación de acero de refuerzo para losa. Se realiza instalación de formaleta perimetral para losa. Por el momento se está a la espera de recibir por parte del contratista los ajustes correspondientes a los diseños estructurales de la losa y ajustes en rasante para ser revisados y aprobados por interventoría y poder así continuar con las actividades correspondientes a la construcción de esta losa.

- Muro No. 8 (K7+897.03 al K7+949.58) M.I: Se culminó el hormigonado de la totalidad de los vástagos, terminando todos los módulos del muro. Se realiza instalación de acero de refuerzo para barreras de protección tipo New Jersey.

- Talud No. 7 (K8+043 y el K8+140) M.D: Este talud se encuentra culminado en un 100%.

- Muro No. 9 (K8+125 al K8+227) M.I: El Contratista culminó el hormigonado de las zarpas en los módulos No. 1 al 14 y se tiene hormigonado los vástagos 1, 2 y 3. Se realizan actividades de armado de acero de refuerzo y hormigonado para vástagos. Se inicia con instalación de relleno estructural.

- Talud No. 8 (K8+160 – K8+300 M.D): Terminado. No presenta actividades.

- Puente No 13 (K8+298 al K8+362): A la fecha se ha realizado la excavación de los 4 caisson. Se ha realizado instalación de acero y hormigonado de los caisson ejes 1 y 2.

- Puente No 13A (K8+393 al K8+415): A la fecha se ha realizado la excavación de los 4 caisson. Se ha realizado instalación de acero y hormigonado de los caisson ejes 1 y 2.

- Talud No. 9 (K8+365-K8+510) M.D: Terminado. No presenta actividades.

- Puente No 14 (K8+512 al K8+575): A la fecha se tienen excavados e instalado acero de refuerzo los 4 caisson. Se realiza hormigonado del caisson 2 del eje 1.

- Talud No. 10 (K8+575-K8+655) M.D: Terminado. No presenta actividades.

- Puente No 14A (K8+660 al K8+700): A la fecha se tienen excavados los 4 caisson. En el presente mes, no se registran actividades.

- Talud No. 11 (K8+703-K8+765) M.D: Terminado. No presenta actividades.

- Talud No. 12 (K8+817-K8+868) M.D: A la fecha se tiene terminados los trabajos de instalación de anclajes, geo manto y malla de alta resistencia. En el presente mes se realiza actividades de construcción de zanjas de coronación.

- Talud No. 13 (K9+053-K9+165) M.D: Se llega con explanación hasta el talud 13 y se inicia con instalación de anclajes y construcción de zanjas de coronación.

Sitio de depósito de material sobrante Tamabioy:

- A la fecha se tienen terminadas las actividades de instalación de material sobrante de excavación en este sector por parte del Contratista. Se culminaron también las actividades de conformación y perfilado del material para entrega de este predio. Así como las actividades de revegetalización y siembra de plántulas al perímetro del mismo.

Área social:

- El profesional social ha realizado la atención a las solicitudes presentadas por la comunidad, brindando respuestas oportunas que han permitido mantener un adecuado canal de comunicación e información sobre el desarrollo del proyecto.
- Las reuniones de seguimiento con las veedurías ciudadanas se han llevado a cabo conforme a los cronogramas establecidos, garantizando además la atención a los requerimientos e inquietudes de los participantes.
- En el componente arqueológico, se ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Resolución 1001, particularmente en lo relacionado con la ejecución de actividades del Plan de Arqueología Pública. Estas acciones han permitido socializar con grupos focales de la comunidad educativa los avances del proyecto, así como la importancia de la protección y prevención del patrimonio arqueológico.

Área ambiental:

- En este periodo se realiza seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en las fichas del PMA en el frente de obra de los Sector 1 y Sector 2 tramo K7+100 hasta K9+300 y Zona Industrial San Carlos.

- En este periodo se revisa, ajusta y aprueba los informes mensuales del contratista del cumplimiento de las medidas y gestiones ambientales establecidas en la licencia ambiental, P.M.A.
- En este periodo se remiten a la SS INVIAS los 10 reportes parciales de contingencias ambientales presentados en el frente San Francisco para que se radiquen en la página VITAL de la ANLA y ante la DBBSE del MADVS.
- Durante este periodo se remiten a los ajustes de la VPI 2 del ICA No. 27 y el ICA 28 a la SS INVIAS la cual procede su radicación a la ANLA dentro de los plazos establecidos por la autoridad ambiental.
- Durante este periodo se realizan las mesas de trabajo con el contratista y SS INVIAS para atender los pendientes ambientales del proyecto y revisión del informe mensual ambiental.
- Se recomienda al Contratista verificar que todas las obras a ejecutar se construyan con las especificaciones y ubicación del diseño autorizado en la Resolución 2170 de 2008.
- Se recomienda al Contratista que previo al inicio de las obras se informe de su ejecución al área ambiental de la Interventoría, con el fin de garantizar que la ejecución de estas actividades se desarrollen dentro del marco de la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008.
- Se recomienda al Contratista priorizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 2170 de 2008, sus modificaciones, Autos de seguimiento y control derivados y PMA, con el propósito de evitar el inicio de posibles procesos sancionatorios por parte de las Autoridades Ambientales competentes.
- Se recomienda al Contratista dar respuesta de manera oportuna a los comunicados y apremios emitidos por parte de la Interventoría, con el fin de evitar el inicio de posibles procesos sancionatorios por el incumplimiento a las obligaciones contractuales.
- Se recomienda al contratista que mes a mes realice la actualización de la revisión de los pendientes ambientales del proyecto y proponer alternativas de solución en el marco de sus obligaciones contractuales.

Área seguridad y salud en el trabajo:

- Se recomienda al contratista mantener humectada la vía de acceso en sector 2 y vías internas de Zona industrial teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la zona, con de objetivo de disminuir la emisión de material particulado (polvo), protegiendo la salud respiratoria de trabajadores.

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR

8.1.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
7949	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-1671-119899 con recibido interno 04-5439-24 del 7-11-2024, con asunto “Entrega informe de Diseño Talud No. 24-25, K11+400.00–K11+475, K11+475-K11+736.20”. No Aprobación Diseño de estabilización Taludes No.24 y No.25.
7950	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-1813-121095 con recibido interno 04-5843-25 del 1-04-2025, con asunto “Respuesta a observaciones comunicado Putumayo 04-6236-25 con recibido interno No. 204277 del 21-02-2025, con asunto Entrega informe de diseño Talud No.23, K11+238.75-K11+400.00, Obras Sector 2, subsector K10+100-K12+100”. Aprobación Diseño de estabilización Talud No.23.
7951	Jose Ignacio Cadena López	Nelson Yovany Jiménez González	INVIAS	Envío Acta de obra No.55. Contrato 1111 de 2021. Variante San Francisco - Mocoa
7952	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 11 Contingencia Ambiental No. 10 Talud K0+900 hasta K1+240 Sector 1 Frente San Francisco, contrato 1111 de 2021.
7953	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 33 Contingencia Ambiental Talud K7+750 a K7+850 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
7954	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2134-123477 con recibido interno 04-6830-25 del 19-11-2025, con asunto “Respuesta a oficio Putumayo 04-6652-25 con número de radicado 210411, con asunto: “Atención a observaciones Talud 22, Sector 2, K10+541.84 K10+697.85”. No Aprobación Diseño de estabilización Talud No.22.

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
7955	Jose Ignacio Cadena López	Walter Leandro Chindoy Jacanamejoy		Respuesta a la solicitud de información con radicado interno 04-7105-26 del 13 de Febrero 2026.
7956	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2249-124390 con recibo 04-7097-26M1 del 12/02/2026 con asunto; Radicación de los cinco (5) predios seleccionados por Corpoamazonia en visita técnica y ambiental de campo realizada los días 01, 02 y 03 de diciembre de 2025, en el marco de la Línea 2 del Plan de Inversión Forzosa no inferior al 1%.
7958	Jose Ignacio Cadena López	Jose Ricardo Burbano Barcenas	INVIAS	Solicitud de instrucción formal para atención de emergencia y trámite de ocupación de cauce – Puente Río San Pedro (PR62+300, Vía 1003).
7966	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Traslado solicitud de información por parte de URT del proyecto Variante San Francisco Mocoa
7970	Jose Ignacio Cadena López	Jose Ricardo Burbano Barcenas	INVIAS	Remisión Acta de Obra No. 56 – Contrato 1111 de 2021 (Variante San Francisco - Mocoa)
7976	Jose Ignacio Cadena López	Jose Ricardo Burbano Barcenas	INVIAS	Reenvió comunicado Putumayo04-7412-25 radicado 2025E-VUVRAZ-125570 del 05/11/2025 por el cual se dio Traslado Oficio 2025S-VBOG-074973 con asunto; Respuesta a radicado 2025E-VUVRAZ-099853 (Putumayo04-7096-25) del 8 de septiembre de 2025. Divergencia. Remite las justificaciones de la solicitud de reconocimiento económico de la actualización del Inventario Forestal, en el marco de la Cláusula Vigésima Novena “Divergencias y Solución de Controversias” Contrato No. 1111 de 2021.
7977	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 53 Contingencia Ambiental Talud K6+920 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
7978	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a los comunicados CSF-2157-123678 con radicado interno 04-6905-25 CSF-2176-123767 con radicado interno 04-6956-25 y el comunicado CSF-2248-124389 con radicado interno 04-7096-26 Anexo solicitud de determinación de procedencia consulta previa.
7979	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Traslado Oficio 2026S-VPUT-010712 con recibo 04-7185-26 del 04/03/2026 con asunto; Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-019807 (Putumayo04-7958-26) con asunto: Respuesta a solicitud de intervención de emergencia y autorización de trámites ante Corpoamazonia Puente Río San Pedro (PR62+300, Vía 1003).
7980	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Respuesta a su oficio 2026S-VBOG-009610 con recibo 04-7168-26 del 27/02/2026 con asunto; Remisión oficio ANLA Radicación 20254501035441 Contrato de Obra No. 1111 de 2021 Contrato de Interventoría No. 977 de 2021 Proyecto Variante San Francisco Mocoa (Tramo 2).
7981	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Respuesta a su oficio 2026S-VBOG-010767 con recibo 04-7186-26 del 04/03/2026 con asunto; Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-005720 (Putumayo04-7783-26) con asunto: Solicitud de reliquidación vigencia 2026, cesión parcial de licencia ambiental. Expediente LAM 1358.
7982	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2279-124611 con recibo 04-7173-26M1 del 02/03/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7936-26, con asunto: Traslado oficio ANLA 20262300183431 del 23/02/2026 con asunto: Respuesta al oficio con radicado ANLA No. 20266200167182 del 09 de febrero de 2026 - Reliquidación VARIANTE DE MOCOA - SAN FRANCISCO.

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
7983	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2291-124647 con recibo 04-7192-26M1 del 04/03/2026 con asunto; Entrega de informe de actividades ambientales correspondientes al mes de febrero 2026.
7984	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta al comunicado CSF-2262-124467 con radicado interno 04-7125-26 Metodología y logística para el desarrollo de Taller N 1 – I. E Almirante Padilla.
7990	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2275-124592 con recibo 04-7167-26M1 del 27/02/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7872-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2246-124369 con recibo 04-7094-26M1 del 11/02/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7803-26, con asunto: Solicitud ICA No. 28.
7991	Jose Ignacio Cadena López	Jose Ricardo Burbano Barcenas	INVIAS	Remisión de Actas de Ajuste Definitivas No. 51 a 53 y Acta de Ajuste Provisional No.55 – Contrato 1111 de 2021 - Contrato 1111 de 2021.
7994	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta comunicado con consecutivo CSF-2182-123778 con radicado interno No. 04-6962-25M1, con asunto: “Conclusiones y recomendaciones desde el área de Geología y Geotecnia, visita realizada entre los días 26 y 28 de noviembre de 2025 al tramo 2 de la variante San Francisco - Mocoa por el Frente San Francisco: “Atención a compromiso No. 4 Sección critica talud aferente puente 12B, ampliación de vía industrial. K7+968 a K8+000”.
7996	Jose Ignacio Cadena López	Nelson Yovany Jiménez González	INVIAS	Remisión de Actas de Ajuste Definitivas No. 51 a 53 y Acta de Ajuste Provisional No.55 – Contrato 1111 de 2021 - Contrato 1111 de 2021.
7997	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta al comunicado: CSF-2265-124473 con radicado interno 04-7128-26 Preacta Social 56 correspondiente al periodo de febrero de 2026

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
7998	Jose Ignacio Cadena López	Nelson Yovany Jiménez González	INVIAS	Envío Acta de obra No.56. Contrato 1111 de 2021. Variante San Francisco - Mocoa
7999	Jose Ignacio Cadena López	Jose Ricardo Burbano Barcenas	INVIAS	Traslado con concepto de aprobación a la solicitud de acta de fijación de precios No Previstos No.10 al Contrato de Obra No. 1111 de 2021. Recibida mediante comunicado CSF-1739-120476 con asunto “Remisión del Acta de Fijación de Precios No Previstos No. 10”. Recibido interventoría 04-7193-26M1.
8000	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 14 Contingencia Ambiental Talud K7+860 hasta K8+160 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
8001	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 14 Contingencia Ambiental Talud K8+170 hasta K8+300 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
8002	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 49 Contingencia Ambiental Talud K7+100 hasta K7+250 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
8003	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta al comunicado: CSF-2293-124664 con radicado interno 04-7202-26 Informe de seguimiento a la Gestión Social vigencia febrero 2026.
8004	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Solicitud de atención de visita guiada al Km 6+700 por parte del equipo de WWF – Colombia
8005	Jose Ignacio Cadena López	CRISTIAN FELIPE ARAUJO MULCUE	Director Territorial Putumayo Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas UAEGRTD	Respuesta al comunicado 2026S-VPUT-007444 con asunto: Traslado solicitud de información variante Mocoa - San francisco por parte de la URT del 202622600112591 remitido a la Dirección territorial INVIAS

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
8007	Jose Ignacio Cadena López	Veeduría Ciudadana	Veeduría Ciudadana	Remisión informe mensual de interventoría - Febrero de 2026. Contrato 1111 de 2021
8008	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Informe Final de cierre Contingencia Ambiental Talud K7+400 a K7+430 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco
8013	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2177-123768 con recibido interno 04-6957-25 del 18-12-2025, con asunto “Respuesta a oficio Putumayo 04-6367-25 con número de radicado 206055, con asunto: “Atención a observaciones fundaciones Muro 25, Sector 2 K9+501.24 K9+514.19”. No Aprobación al diseño de Fundación Muro 25.
8015	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2230-124276 con recibido interno 04-7055-26 del 2-02-2026, con asunto “Respuesta a oficio Putumayo04-7621-25 con número de radicado 223681 con asunto: “Atención a observaciones informe de diseño fundaciones Puente 14, Sector 2 K8+511.45 K8+575.71”. No Aprobación al diseño de Fundación Puente 14.
8016	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2258-124449 con recibido interno 04-7118-26 del 18-02-2026, con asunto “Entrega de procedimiento de montaje estructura metálica Puente 12 A”. Aprobación procedimiento de montaje estructura metálica Puente 12 A.
8018	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2281-124622 con recibido interno 04-7178-26 del 3-03-2026, con asunto “Respuesta a oficio Putumayo04-7925-26 con número de radicado 227817 con asunto: Reiteración comunicado Putumayo04-7641-25 de fecha 19-12-2025 con asunto “Solicitud ajuste a coordenadas de empalme con el Sector No.3 al DG Aprobado mediante comunicado Putumayo04-5152-24, que comprende del K12+100 hacia mayores del Sector No.2”.

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
8020	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2284-124637 con recibido interno 04-7187-26 del 4-03-2026, con asunto “Entrega informe de Diseño estructural muros de contención de altura 3.0 m y 4.0 m sin micropilotes, Sector 2 K8+100 - K12+100”. Aprobación Diseño Estructural Muros Tipo H de 3m a 4m.
8021	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Remisión del ajuste al Plan de inversión social del contrato 1111/2021
8023	Jose Ignacio Cadena López	Jose Ricardo Burbano Barcenas	INVIAS	Remisión Acta de Ajuste Definitiva No. 54 – Contrato 1111 de 2021 - Contrato 1111 de 2021.
8024	Jose Ignacio Cadena López	Jose Ricardo Burbano Barcenas	INVIAS	Remisión Acta de Ajuste Definitiva No. 55 – Contrato 1111 de 2021 - Contrato 1111 de 2021.
8025	Jose Ignacio Cadena López	Jose Ricardo Burbano Barcenas	INVIAS	Remisión Acta de Ajuste Provisional No. 56 – Contrato 1111 de 2021 - Contrato 1111 de 2021.
8036	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Alcance Putumayo04-7491-25 radicado 222275 del 24/11/2025 con asunto; Respuesta a su comunicado CSF-2109-123347 con recibo 04-6751-25M1 del 04/11/2025 con asunto; Respuesta a la comunicación Putumayo04-7283-25 “Remisión oficio 2025S-VBOG-074973 con asunto; Respuesta a radicado 2025EVUVRAZ-099853 (Putumayo04-7096-25) del 8 de septiembre de 2025 Divergencia”.
8037	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 23 Contingencia Ambiental Talud K6+800 hasta K6+900 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
8038	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Observación Técnica – Incumplimiento de diseños estructurales en cimentación de Muro 9A (Módulo 1). (K7+119 – K7+130).

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
8039	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 23 Contingencia Ambiental Talud K7+431 hasta K7+500 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
8040	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 50 Contingencia Ambiental Talud K7+500 hasta K7+600 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
8041	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Solicitud certificado firmado por contador público o revisor fiscal, base de liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1%.
8042	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Traslado oficio 2026S-VBOG-013755 del 12/03/2026. Solicitud de información cartográfica Inversión del 1%, así como las compensaciones ambientales adelantadas.
8043	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Apremio – Incumplimiento PROGRAMA 2: PROGRAMA MANEJO Y PROTECCIÓN DEL SUELO Ficha: MS – 2 MANEJO Y RECUPERACIÓN DE TALUDES DE CORTE Y TERRAPLÉN.
8044	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Solicitud estado Permiso Ocupación de cauces fuentes identificadas del K7+100 a K12+000.
8045	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta al comunicado CSF-2295-124693 con radicado interno 04-7208-26 Plan de Manejo Arqueológico correspondiente a las áreas adicionales del Programa de Arqueología Preventiva en el marco de la modificación de la Licencia Ambiental 2170 de 2008.
8048	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta comunicado con consecutivo CSF-2310-124780 con radicado interno No. 04-7256-26M1, con asunto: “Balance de cantidades, Acta de Modificación No 17 y reprogramación al programa de inversiones No 17”. Devolución por inconsistencias
8049	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Remisión de respuesta de INVIAS y DCCAE sobre excavación por perforación y voladura (Radicado 2026S-VPUT-015281).

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
8050	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Solicitud % programado vs % ejecutado con corte a cada lunes para cronograma vigente de Estudios Y Diseños.
8054	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Remisión de pre-acta predial No.1 correspondiente al mes de marzo de 2026, aprobada por interventoría para su validación
8055	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2306-124738 con recibo 04-7236-26M1 del 12/03/2026 con asunto; Respuesta al comunicado Putumayo04-7983-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2291-124647 con recibo 04-7192-26M1 del 04/03/2026 con asunto; Entrega de informe de actividades ambientales correspondientes al mes de febrero 2026.
8056	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2316-124793 con recibo 04-7263-26M1 del 17/03/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7921-26 del 25 de febrero de 2026, con Asunto: Traslado 2026SVBOG-006373 con recibo 04-7120-26 del 18/02/2026 con asunto: Respuesta a entrada INVIAS 2026EVUVRAZ-001792 (Putumayo04-7701-26) de 19 de enero de 2026, Plan de Inversión Ambiental Versión 3.
8057	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2323-124814 con recibo 04-7272-26M1 del 18/03/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7843-26, con asunto: Liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1% año 2025.
8062	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Respuesta oficio 20264700191891 del 24/02/2026 con asunto; Resultado de la Segunda Verificación Preliminar del ICA No 27 – Frente San Francisco (VPI). Radicado ANLA: 20256201551242 del 11 de diciembre de 2025. Proyecto: Variante de Mocoa – San Francisco. Expediente: LAM1358.

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
8065	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Remisión de respuesta de DANCP a la solicitud de Determinación de Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa.
8066	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 34 Contingencia Ambiental Talud K7+750 a K7+850 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
8067	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 12 Contingencia Ambiental No. 10 Talud K0+900 hasta K1+240 Sector 1 Frente San Francisco, contrato 1111 de 2021.
8068	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a sus comunicados CSF-2303-124720 con recibo 04-7232-26M1 del 12/03/2026 con asunto; Entrega por parte del Consorcio San Francisco del cambio menor de Puente 14B, para su revisión y aprobación y CSF-2311-124781 con recibo 04-7254-26M1 del 16/03/2026 con asunto; Entrega por parte del Consorcio San Francisco del cambio menor de Puente 14C, para su revisión y aprobación.
8071	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Remisión ICA N° 28 proyecto “Construcción Variante San Francisco Mocoa”, expediente LAM 1358. Contrato 1111 de 2021 Frente San Francisco.
8073	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2319-124802 con recibo 04-7266-26M1 del 17/03/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7990-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2275-124592 con recibo 04-7167-26M1 del 27/02/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7872-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2246-124369 con recibo 04-7094-26M1 del 11/02/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7803-26, con asunto: Solicitud ICA No. 28.

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
8074	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2317-124795 con recibo 04-7264-26M1 del 17/03/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7956-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2249-124390 con recibo 04-7097-26M1 del 12/02/2026 con asunto; Radicación de los cinco (5) predios seleccionados por Corpoamazonia en visita técnica y ambiental de campo realizada los días 01, 02 y 03 de diciembre de 2025, en el marco de la Línea 2 del Plan de Inversión Forzosa no inferior al 1%.
8075	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2304-124721 con recibo 04-7235-26M1 del 12/03/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7935-26, con asunto: Traslado oficio ANLA 20264700191891 del 24/02/2026 con asunto: Resultado de la Segunda Verificación Preliminar del ICA No 27 – Frente San Francisco (VPI). Radicado ANLA: 20256201551242 del 11 de diciembre de 2025. Proyecto: Variante de Mocoa – San Francisco. Expediente: LAM1358.
8076	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2297-124701 con recibo 04-7215-26M1 del 10/03/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7828-26, Con Asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2224-124233 con recibo 04-7047-26M1 del 29/01/2026 con asunto; Respuesta al comunicado Putumayo04-7688-25, con asunto: Remisión oficio INVIAS-SS-OS-R25-0252, respuesta MADS solicitud de unificación del polígono de sustracción de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa.
8077	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2296-124699 con recibo 04-7211-26M1 del 09/03/2026 con asunto; INFORME FINAL DE LA CONTINGENCIA AMBIENTAL POR PROCESOS EROSIVOS, MOVIMIENTOS EN MASA Y DESLIZAMIENTO PRESENTADO ENTRE EL K7+400 AL K7+430– REPORTADA COMO CONTINGENCIA Nº3.

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
8078	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2286-124639 con recibo 04-7273-26M1 del 18/03/2026 con asunto; Respuesta a su comunicación Putumayo04-7486-25 "Reembolso Visitas ANLA"
8079	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Requerimientos técnicos para la entrega de Estudios y Diseños – Tramo K12+100 al K21+899.
8080	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2324-124833 con recibido interno 04-7283-26 del 24-03-2026, con asunto “Entrega de información correspondiente al desarrollo de exploraciones geotécnicas del Sector K12+033 a K12+830 de la Variante San Francisco – Mocoa, Frente San Francisco”.
8081	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Solicitud de reconocimiento económico monitoreos físico químicos e hidrobiológicos paso fuente hídrica Puente 12 B, Frente San Francisco, Contrato 1111 de 2021.
8083	Jose Ignacio Cadena López	Nelson Yovany Jiménez González	INVIAS	Remisión Acta de Ajuste Definitiva No. 54 – Contrato 1111 de 2021 - Contrato 1111 de 2021.
8084	Jose Ignacio Cadena López	Nelson Yovany Jiménez González	INVIAS	Remisión Acta de Ajuste Definitiva No. 55 – Contrato 1111 de 2021 - Contrato 1111 de 2021.
8085	Jose Ignacio Cadena López	Nelson Yovany Jiménez González	INVIAS	Remisión Acta de Ajuste Provisional No. 56 – Contrato 1111 de 2021 - Contrato 1111 de 2021.
8096	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Relación equipo y personal disponible para atención de emergencias durante el receso de Semana Santa 2026 – Contrato de Obra No. 1111 de 2021.

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
8097	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2236-124291 con recibido interno 04-7075-26 del 5-02-2026, con asunto “Respuesta a oficio Putumayo 04-6793-25 con número de radicado 212412 con asunto: “Atención a observaciones informe de diseño fundaciones Puente 14E, Sector 2 K9+284.36 - K9+304.96”. No Aprobación al diseño de Fundación Puente 14E.
8098	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2237-124292 con recibido interno 04-7062-26 del 4-02-2026, con asunto “Respuesta a oficio Putumayo 04-6718-25 con número de radicado 211298 con asunto: “Atención a observaciones informe de diseño fundaciones Puente 15, Sector 2 K9+451.36 - K9+497.46”. No Aprobación al diseño de Fundación Puente 15.
8099	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2318-124796 con recibido interno 04-7265-26 del 17-03-2026, con asunto “Respuesta a observaciones “Informe de Nivelación rasante losa Steel Deck Puente 12B y Rediseño estructural losa Steel Deck Puente 12B, Sector 2 K7+953.43 K8+041.49”. Aval nivelación losa puente 12B”.
8104	Jose Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Remisión de los documentos soportes al comunicado de 2026-2-002410-008737 Id: 722995 de DANCP a la solicitud de Determinación de Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa proyecto Variante San Francisco Mocoa.
8105	Jose Ignacio Cadena López	Jesús Andrés Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2318-124796 con recibido interno 04-7265-26 del 17-03-2026, con asunto “Respuesta a observaciones “Informe de Nivelación rasante losa Steel Deck Puente 12B y Rediseño estructural losa Steel Deck Puente 12B, Sector 2 K7+953.43 K8+041.49”. Aprobación al rediseño estructural losa Steel Deck Puente 12B.

8.1.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
7170	CSF-2276-124600	2-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a comunicado Putumayo04-7880-26, con asunto: Traslado Derecho de Petición de información realizada por Walter Chindoy.
7171	CSF-2277-124609	2-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a oficio Putumayo 04-6366-25 con número de radicado 206053 con asunto: “Atención a observaciones Informe de diseño fundación Muro 28, Sector 2 K9+680.58 – K9+686.58”.
7172	CSF-2278-124610	2-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Entrega de Informe SST – Vigencia febrero de 2026.
7173	CSF-2279-124611	2-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a su comunicado Putumayo04-7936-26, con asunto: Traslado oficio ANLA 20262300183431 del 23/02/2026 con asunto: Respuesta al oficio con radicado ANLA No. 20266200167182 del 09 de febrero de 2026 - Reliquidación VARIANTE DE MOCOA - SAN FRANCISCO.
7174	CSF-2280-124617	2-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta al comunicado Putumayo04-7866-26 y alcance al comunicado CSF-2275-124589.
7175	2026S-VPUT-010300	2-mar-26	INVIAS	Jose Ricardo Burbano Barcenas	Jose Ignacio Cadena López	Remisión Acta de Recibo Parcial de Obra No. 55 – Contrato 1111 de 2021

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
7177	SIN CONSECUTIVO	3-mar-26	Asociación Sembrando Arte y Tejido Social	Luz Nelly Muchavisoy Chindoy	Jose Ignacio Cadena López	Propuesta económica material vegetal con destino gestión social.
7178	CSF-2281-124622	3-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a oficio Putumayo04-7925-26 con número de radicado 227817 con asunto: Reiteración comunicado Putumayo04-7641-25 de fecha 19-12-2025 con asunto "Solicitud ajuste a coordenadas de empalme con el Sector No.3 al DG Aprobado mediante comunicado Putumayo04-5152-24, que comprende del K12+100 hacia mayores del Sector No.2.
7179	CSF-2282-124624	3-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a los comunicados Putumayo04-7466-26 y Putumayo04-7914-26 Remisión de notificaciones y oficios de inscripción de oferta formal de compra.
7180	CSF-2283-124625	3-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a los comunicados Putumayo04-7466-25 del 19 de noviembre de 2025 y Putumayo04-7924-26 del 25 de febrero de 2026 – Propuestas de compra de mejoras, notificaciones, aceptaciones y minutas CONTRATO COMPRA DE MEJORAS firmadas para tramite INVIAS.
7185	2026S-VPUT-010712	4-mar-26	INVIAS	Jose Ricardo Burbano Barcenas	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-019807 (Putumayo04-7958-26) con asunto: Respuesta a solicitud de intervención de emergencia y autorización de trámites ante Corpoamazonia Puente Río San Pedro (PR62+300, Vía 1003).
7186	2026S-VBOG-010767	4-mar-26	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-005720 (Putumayo04-7783-26) con asunto: Solicitud de reliquidación vigencia 2026, cesión parcial de licencia ambiental. Expediente LAM 1358

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
7187	CSF-2284-124637	4-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Entrega informe de Diseño estructural muros de contención de altura 3.0 m y 4.0 m sin micropilotes, Sector 2 K8+100 - K12+100.
7188	CSF-2287-124641	4-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Entrega de Registros de Tensionamiento de Anclajes Activos.
7189	CSF-2288-124642	4-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a oficio Putumayo 04-7022-25 con número de radicado 215649, con asunto “Remisión planos taller puentes 11, 12A y 12B, Sector No.2 del k7+100 al k8+100”.
7190	CSF-2289-124644	4-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a oficio Putumayo 04-7874-26 con número de radicado 227291, con asunto: “Respuesta su comunicado CSF-1768-120723 con recibido interno 04-5729-25 del 27-02-2025, con asunto Remisión “Respuesta Comunicado Putumayo 04-6181-25: Solicitud reactivación Link´s de su comunicado CSF-1240-117405 con recibido interno 04-4171-24 del 21-02-2024, asunto “Respuestas al oficio Putumayo04-4675-24, solicitud de firmas volúmenes aprobados sector 1 y 2. Variante san francisco – Mocoa” Entrega volumen V: Estabilización y estabilidad de taludes, sector 1, K0+000-K7+100.
7191	CSF-2290-124645	4-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Informe No. 42 de Calidad - febrero 2026
7192	CSF-2291-124647	4-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Entrega de informe de actividades ambientales correspondientes al mes de febrero 2026.

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
7193	CSF-2285-124638	3-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Remisión de Acta de Fijación de Precios No Previstos No. 10
7199	CSF-2292-124660	5-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL VERSIÓN 7.
7200	SIN CONSECUTIVO	5-mar-26		Walter Leandro Chindoy Jacanamejoy	Jose Ignacio Cadena López	Petición Solicitud información.
7202	CSF-2293-124664	6-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Entrega de informe de seguimiento a la Gestión Social vigencia febrero 2026.
7203	CSF-2294-124673	6-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a oficio Putumayo04-7903-26 con número de radicado 227626 con asunto: Respuesta comunicado con consecutivo CSF-2126-123434 con radicado interno No. 04-6805-25M1, con asunto: “Respuesta a comunicación Putumayo04-7339-25. Solicitud de reparación inmediata por deficiencias en pavimento asfáltico – Contrato de Obra No. 1111 del 2021. Visita de Inspección de Obra del 17 de septiembre de 2025.”.
7208	CSF-2295-124693	9-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Solicitud de revisión y aprobación del Plan de Manejo Arqueológico correspondiente a las áreas adicionales del Programa de Arqueología Preventiva (Resolución 1001 de 2022), en el marco de la modificación de la Licencia Ambiental 2170 de 2008.

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
7211	CSF-2296-124699	9-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	INFORME FINAL DE LA CONTINGENCIA AMBIENTAL POR PROCESOS EROSIVOS, MOVIMIENTOS EN MASA Y DESLIZAMIENTO PRESENTADO ENTRE EL K7+400 AL K7+430– REPORTADA COMO CONTINGENCIA Nº3
7214	SIN CONSECUTIVO	10-mar-26	WWF Colombia	Sandra Valenzuela de Narváez	Jose Ignacio Cadena López	Solicitud autorización Visita al KM 6+700 Visita Guiada Frente de Obra San Francisco Mocoa con el Consorcio San Francisco
7215	CSF-2297-124701	10-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a su comunicado Putumayo04-7828-26, Con Asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2224-124233 con recibo 04-7047-26M1 del 29/01/2026 con asunto; Respuesta al comunicado Putumayo04-7688-25, con asunto: Remisión oficio INVIAS-SS-OS-R25-0252, respuesta MADS solicitud de unificación del polígono de sustracción de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa.
7216	CSF-2298-124707	10-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a oficio Putumayo 04-6508-25 con número de radicado 208587 con asunto: “Atención a observaciones Informe de diseño fundación Muro 30, Sector 2 K9+894.00 - K9+912.00”.
7219	CSF-2299-124711	10-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Remisión del Análisis de Precios Unitarios No Previstos OE-090 “Suministro e Instalación de Pernos Autoperforantes R-51 660 (Incluye Perforación, Instalación del Perno, Inyección, Platina de 200×200×35 mm y Tensionamiento)”
7220	CSF-2300-124712	10-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a oficio Putumayo 04-6272-25 con número de radicado 204773 con asunto: “Atención a observaciones Informe de diseño fundación Muro 42, Sector 2 K11+556.56 – K11+574.56”.

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
7221	CSF-2301-124713	10-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Entrega informe de Diseño de cimentaciones Muro 27 K9+632.00 – K9+656.00.
7225	CSF-2302-124715	10-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Remisión Informe Sostenibilidad No. 56, correspondiente al mes de febrero de 2026.
7232	CSF-2303-124720	12-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Entrega por parte del Consorcio San Francisco del cambio menor de Puente 14B, para su revisión y aprobación.
7233	2026S-VPUT-013129	12-mar-26	INVIAS	Jose Ricardo Burbano Barcenas	Jose Ignacio Cadena López	Pronunciamiento Dirección Territorial Putumayo Reconocimiento de APUs Forestales Contrato de Obra No. 1111 de 2021
7234	CSF-2305-124736	12-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a oficio Putumayo 04-6489-25 con número de radicado 208209 con asunto: “Atención a observaciones Informe de diseño fundación Muro 26, Sector 2 K9+553.00 - K9+601.00”.
7235	CSF-2304-124721	12-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a su comunicado Putumayo04-7935-26, con asunto: Traslado oficio ANLA 20264700191891 del 24/02/2026 con asunto: Resultado de la Segunda Verificación Preliminar del ICA No 27 – Frente San Francisco (VPI). Radicado ANLA: 20256201551242 del 11 de diciembre de 2025. Proyecto: Variante de Mocoa – San Francisco. Expediente: LAM1358.
7236	CSF-2306-124738	12-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta al comunicado Putumayo04-7983-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2291-124647 con recibo 04-7192-26M1 del 04/03/2026 con asunto; Entrega de informe de actividades ambientales correspondientes al mes de febrero 2026.

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
7237	CSF-2307-124741	12-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Alcance comunicado con registro: CSF-2269-124570 con asunto: Respuesta Putumayo04-7797-26. Con asunto: Respuesta su comunicado CSF-2170-123718 con recibido interno 04-6927-25 del 12-12-2025, con asunto "Respuesta Putumayo04-7289-25. Con asunto: "Reiteración en respuesta a oficio 04-6463-25, (04-6919-25. Con asunto: "En respuesta a CSF-1947-122203 con radicado interno (04-6216-25) con asunto: Remisión pre-acta predial No.1".
7238	CSF-2308-124742	12-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Diseño mezclas concreto 21, 28, 42 Mpa Toxement – Sika; Agregados acopio Ftumanjay
7240	2026S-VBOG-013755	12-mar-26	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Solicitud de información cartográfica Inversión del 1%, así como las compensaciones ambientales adelantadas. CI 977 - 2021 (CO 964 -2021, CO 1111-2021)
7241	2026S-VPUT-013765	12-mar-26	INVIAS	Jose Ricardo Burbano Barcenas	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta al comunicado Putumayo04-7991-26 con asunto: Remisíon Actas de Ajustes 51D, 52D, 53D, 55P Cto. 1111 de 2021
7243	2026S-VPUT-013786	12-mar-26	INVIAS	Jose Ricardo Burbano Barcenas	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta al comunicado Putumayo04-7970-26 con asunto: Acta de Recibo Parcial de Obra No. 56 Febrero de 2026
7250	2026S-VBOG-012995	13-mar-26	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-017714 (Putumayo04-7933-26) con asunto: Concepto de No Objeción a la Pre Acta Social No 56 del contrato de obra No 1111 de 2021 (Frente San Francisco)

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
7253	CSF-2309-124779	16-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Metodología para el desarrollo del taller con la Institución Educativa Champagnat del municipio de Sibundoy Putumayo. En atención al comunicado Putumayo 04-7984-24 – Metodología y logística para el desarrollo de los talleres.
7254	CSF-2311-124781	16-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Entrega por parte del Consorcio San Francisco del cambio menor de Puente 14C, para su revisión y aprobación.
7255	CSF-2312-124782	16-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a comunicado Putumayo04-7984-24- Remisión previa de metodología y logística para el desarrollo de los talleres dirigidos a Juntas de Acción Comunal y comités de veeduría ciudadana, en el marco de la Ficha GS-1 “Sistema de Información, Atención y Educación Ambiental a la Comunidad” del Plan de Manejo Ambiental (PMA).
7256	CSF-2310-124780	16-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Balance de cantidades, Acta de Modificación No 17 y reprogramación al programa de inversiones No 17
7258	CSF-2313-124784	16-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Programación actividades de obra semana santa.
7259	CSF-2314-124785	16-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Reiteración de suscripción de Acta de entrega y recibo definitivo de las obras en el sector de Mallama, Piedra Ancha y Ricaurte. Alcance a nuestras comunicaciones CSF-1458 118565 del 25 de junio del 2024 y CSF-1834 121212 del 14 de abril del 2025.
7260	CSF-2315-124786	16-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Inspección visual al estado de obras ejecutadas en el sector Mallama – Nariño, primer año del periodo de garantía de 5 años.

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
7261	2026S-VBOG-014599	16-mar-26	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-005728 - (Putumayo04-7784-26) con asunto: Reporte Parcial No.51 Contingencia Ambiental Talud K6+900 a K6+920. CI 977 de 2021. CO 1111 de 2021
7263	CSF-2316-124793	17-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a su comunicado Putumayo04-7921-26 del 25 de febrero de 2026, con Asunto: Traslado 2026S-VBOG-006373 con recibo 04-7120-26 del 18/02/2026 con asunto: Respuesta a entrada INVIAS 2026EVUVRAZ-001792 (Putumayo04-7701-26) de 19 de enero de 2026, Plan de Inversión Ambiental Versión 3.
7264	CSF-2317-124795	17-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a su comunicado Putumayo04-7956-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2249-124390 con recibo 04-7097-26M1 del 12/02/2026 con asunto; Radicación de los cinco (5) predios seleccionados por Corpoamazonia en visita técnica y ambiental de campo realizada los días 01, 02 y 03 de diciembre de 2025, en el marco de la Línea 2 del Plan de Inversión Forzosa no inferior al 1%.
7265	CSF-2318-124796	17-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a observaciones “Informe de Nivelación rasante losa Steel Deck Puente 12B y Rediseño estructural losa Steel Deck Puente 12B, Sector 2 K7+953.43 K8+041.49”.
7266	CSF-2319-124802	17-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a su comunicado Putumayo04-7990-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2275-124592 con recibo 04-7167-26M1 del 27/02/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7872-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2246-124369 con recibo 04-7094-26M1 del 11/02/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7803-26, con asunto: Solicitud ICA No. 28.

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
7267	2026S-VPUT-015281	18-mar-26	INVIAS	Jose Ricardo Burbano Barcenas	Jose Ignacio Cadena López	RESPUESTA OFICIO 2026S-VPUT-006042 Excavación por medio de perforación y voladura Contrato 1111 de 2021
7270	CSF-2320-124803	18-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta al comunicado Putumayo04-8004-26 con asunto: Solicitud de atención de visita guiada al Km 6+700 por parte del equipo de WWF – Colombia
7271	CSF-2322-124809	18-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Remisión propuesta compra de mejoras 008ID-T2-CMMVSFM.
7272	CSF-2323-124814	18-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a su comunicado Putumayo04-7843-26, con asunto: Liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1% año 2025.
7273	CSF-2286-124639	18-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a su comunicación Putumayo04-7486-25 "Reembolso Visitas ANLA"
7274	CSF-2321-124808	18-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a su comunicación PUTUMAYO04-7073-25 Actividades de ingeniería ejecutadas en el tramo comprendido entre el K7+100 AL K8+100 – Frente San Francisco pendientes de reconocimiento.
7275	2026S-VBOG-015939	19-mar-26	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-017733 - (Putumayo04-7934-26) con asunto: Remisión Informe Trimestral Sostenibilidad No 18 V0 (Octubre 03 de 2025 – Enero 02 de 2026), Contrato de Obra 1111-2021 Frente de Obra San Francisco.

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
7277	2026S-VBOG-016125	19-mar-26	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-019656 - (Putumayo04-7952-26). Reporte Parcial No. 11 Contingencia Ambiental No. 10 Talud K0+900 hasta K1+240 Sector 1 Frente San Francisco. CO 1111-2021, CI 977-2021.
7278	2026S-VBOG-016127	19-mar-26	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-019661 (Putumayo04-7953-26). Reporte parcial número 33, contingencia ocurrida entre el K7+750 al K7+850 tramo Frente San Francisco. CO 1111-2021, CI 977-2021.
7280	2026S-VBOG-016783	24-mar-26	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	SABANA DE AVALUOS Y CRONOGRAMA CTO 1111 - 2021
7281	2026S-VBOG-016806	24-mar-26	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-021981 (Putumayo04-7981-26) y 2026E-VUVRAZ-017919 (Putumayo04-7939-26). cesión parcial de licencia ambiental. Expediente LAM 1358. CO 1111 -2021, CI 977-2021.
7283	CSF-2324-124833	24-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Entrega de información correspondiente al desarrollo de exploraciones geotécnicas del Sector K12+033 a K12+830 de la Variante San Francisco – Mocoa, Frente San Francisco.
7285	CSF-2325-124834	24-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Notificación de atrasos en la ejecución y cumplimiento al cronograma del proceso de Consulta Previa, Sustracción de Reserva Forestal y Modificación de Licencia Ambiental
7290	2026S-VBOG-016974	24-mar-26	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Credenciales aplicativo Sukubun

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
7291	CSF-2326-124837	24-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Diseño de mezclas lechada 21 Mpa
7296	CSF-2327-124844	25-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a su oficio Putumayo04-7903-26 con número de radicado 227626 con asunto: “Respuesta comunicado con consecutivo CSF-2126-123434 con radicado interno No. 04-6805-25M1, con asunto: “Respuesta a comunicación Putumayo04-7339-25. Solicitud de reparación inmediata por deficiencias en pavimento asfáltico – Contrato de Obra No. 1111 del 2021. Visita de Inspección de Obra del 17 de septiembre de 2025.”.
7297	2026S-VPUT-017349	25-mar-26	INVIAS	Jose Ricardo Burbano Barcenas	Jose Ignacio Cadena López	Remisión de acta ajustes 54D - Dic 2025 - Cto 1111
7298	2026S-VPUT-017355	25-mar-26	INVIAS	Jose Ricardo Burbano Barcenas	Jose Ignacio Cadena López	Remisión de acta ajuste 56P - Feb 2026 - Cto 1111
7299	2026S-VPUT-017353	25-mar-26	INVIAS	Jose Ricardo Burbano Barcenas	Jose Ignacio Cadena López	Remisión de acta ajuste 55D - Enero 2026 - Cto 1111
7300	2026S-VPUT-017358	25-mar-26	INVIAS	Jose Ricardo Burbano Barcenas	Jose Ignacio Cadena López	Remisión de observaciones Acta - de Fijación de Ítems No Previstos No. 10
7301	CSF-2328-124848	25-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Entrega de formatos de liberación de actividades ambientales de obra – periodo septiembre de 2025 a febrero de 2026

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
7302	CSF-2329-124851	25-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Entrega de informe predial – Vigencia febrero de 2026.
7303	CSF-2330-124857	25-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Solicitud de implementación de la figura de reprogramación de contratos mediante la “anticipación de vigencia”, por parte del Instituto.
7314	CSF-2331-124871	27-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Remisión de informe de trazabilidad – Línea 2 Plan de Inversión Forzosa de no menos del 1%
7315	CSF-2332-124872	27-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta oficio con radicado Putumayo04-7966-26 con asunto: Traslado solicitud de información por parte de URT del proyecto Variante San Francisco Mocoa.
7316	CSF-2333-124891	27-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a su comunicación Putumayo04-7865-26, Remisión de Análisis de Precios Unitarios No Previstos correspondientes a Aisladores Sísmicos Puentes 12A y 12B
7317	CSF-2334-124893	27-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Solicitud de reconocimiento económico de reingeniería por variación en empalme geométrico entre Sector 2 (San Francisco) y Sector 3 (Mocoa).
7318	CSF-2335-124895	27-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Procedimiento de soldadura en tuberías estructurales para micropilotes
7320	CSF-2337-124911	30-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Entrega de informe de seguimiento a la Gestión Social vigencia marzo 2026.

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
7322	CSF-2338-124912	30-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Entrega de Informe SST – Vigencia marzo de 2026.
7323	CSF-2339-124913	30-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a comunicado Putumayo04-8045-26 – Radicación ante ICANH correspondiente al Plan de Manejo Arqueológico asociado al polígono específico R1001A220001, en el marco de la modificación de la Licencia Ambiental 2170 de 2008.
7324	CSF-2340-124915	30-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a la comunicación Putumayo04-8036-26, divergencia sobre aprobación de ítems de inventario forestal.
7325	CSF-2336-124910	30-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta a comunicado Putumayo04-8048-26 de asunto “Respuesta comunicado con consecutivo CSF-2310-124780 con radicado interno No. 04-7256-26M1, con asunto: “Balance de cantidades, Acta de Modificación No 17 y reprogramación al programa de inversiones No 17”. Devolución por inconsistencias.”
7326	CSF-2341-124917	30-mar-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andrés Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta al comunicado Putumayo04-8065-26 – Atención a requerimiento de información adicional solicitada por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa -DANCP- Radicado 2026-2-002410-008737.
7331	2026S-VBOG-019363	31-mar-26	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena López	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-027136 (Putumayo04-8054-26).Remisión de pre-acta predial No.1 correspondiente al mes de marzo de 2026, aprobada por interventoría para su validación

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE LAS OBRAS

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud del K6+800 MD: Instalación de guayaS.VSFM-S1



Talud del K6+800 MD: Instalación de guayaS.VSFM-S1



Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Excavación para construcción muro de aproximación. VSFM-S2



Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Excavación para construcción muro de aproximación. VSFM-S2



Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Sin actividades. VSFM-S2



Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Sin actividades. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Instalación de anclajes, geo manto y malla. VSFM-S2



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Retiro de material de explanación. VSFM-S2



Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Instalación acero muro estribo 2. VSFM-S2



Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Instalación acero muro estribo 2. VSFM-S2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Instalación obra falsa entre ejes 1 y 2. VSFM S-2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Tensionamiento de vigas 7, 8 y 9 entre ejes 3 y 4. VSFM S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Trabajos de soldadura sobre estructura metálica izada. VSFM S-2



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Adecuación de área para posicionamiento de grúa en estribo 1. VSFM S-2



MURO 8 (K 7+897 -K 7+949MI): Muro terminado, pendiente realizar hormigonado de barreras New Jersey. VSFM S-2



MURO 8 (K 7+897 -K 7+949MI): Muro terminado, pendiente realizar hormigonado de barreras New Jersey. VSFM S-2



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Sin actividades. VSFM-S-2



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Sin actividades. VSFM-S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227MI): Instalación de acero para vástagos. VSFM-S-2



MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227MI): Instalación de formaleta para vástagos. VSFM-S-2



Talud 8 (K 8+160 - K 8+300 MD): Sin actividades. VSFM-S-2



Talud 8 (K 8+160 - K 8+300 MD): Sin actividades. VSFM-S-2



Puente No.13 (K 8+298 - K 8+362): Excavación de caisson 2 eje 1. VSFM-S-2



Puente No.13 (K 8+298 - K 8+362): Excavación caisson 4 eje 2. VSFM-S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Puente No.13A (K 8+393 - K 8+415): Actividades de excavación para caisson. VSFM-S-2



Puente No.13A (K 8+393 - K 8+415): Actividades de excavación para caisson. VSFM-S-2



Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Instalación de anclajes. VSFM-S2



Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Instalación de anclajes. VSFM-S2



Puente No. 14 (K8+512-K8+575 M.D): Instalación acero de refuerzo para caisson. VSFM-S2



Puente No. 14 (K8+512-K8+575 M.D): Instalación acero de refuerzo para caisson. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud 10 (K8+575-K8+655 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 10 (K8+575-K8+655 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Puente 14A (K8+660-K8+700 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Puente 14A (K8+660-K8+700 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 11 (K8+703-K8+765 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 11 (K8+703-K8+765 M.D): Sin actividades. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud 12 (K8+817-K8+868 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 12 (K8+817-K8+868 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 13 (K8+868-K9+053 M.D): Construcción zanja de coronación. VSFM-S2



Talud 13 (K8+868-K9+053 M.D): Explanación y desalojo de material. VSFM-S2



Explanación (K8+868-K9+053 M.D): Explanación de avance entre taludes 12 y 13. VSFM-S2



Explanación (K8+868-K9+053 M.D): Explanación de avance entre taludes 12 y 13. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO




Talud del K6+800 MD: Tensionamiento de anclajes.VSFM-S1



Talud del K6+800 MD: Instalación de guayas.VSFM-S1



Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Conformación de plataforma módulo 1 muro 9A. VSFM-S2

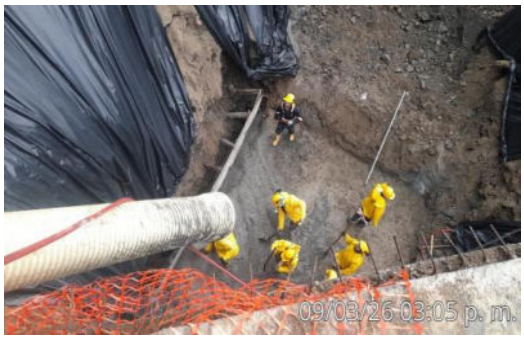

Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Hormigonado de solado módulo 2 muro 9A. VSFM-S2



Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Sin actividades. VSFM-S2



Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Sin actividades. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Explanación de talud. VSFM-S2



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Retiro de material de explanación. VSFM-S2



Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Instalación formaleta segunda sección muro estribo 2. VSFM-S2



Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Instalación formaleta segunda sección muro estribo 2. VSFM-S2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Instalación obra falsa entre ejes 1 y 2. VSFM S-2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Desmonte de obra falsa vigas entre ejes 3 y 4. VSFM S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Izaje de vigas metálicas. VSFM S-2



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Trabajos de soldadura en estructura metálica izada. VSFM S-2



MURO 8 (K 7+897 -K 7+949MI): Muro terminado, pendiente realizar hormigonado de barreras New Jersey. VSFM S-2



MURO 8 (K 7+897 -K 7+949MI): Muro terminado, pendiente realizar hormigonado de barreras New Jersey. VSFM S-2




PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Sin actividades. VSFM-S-2



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Sin actividades. VSFM-S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

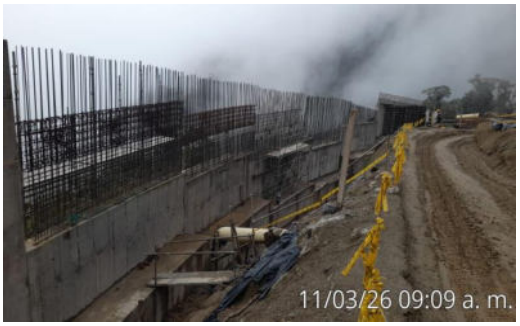

MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227MI): Instalación de acero para vástagos. VSFM-S-2



MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227MI): Instalación de formaleta para vástagos. VSFM-S-2



Talud 8 (K 8+160 - K 8+300 MD): Sin actividades. VSFM-S-2



Talud 8 (K 8+160 - K 8+300 MD): Sin actividades. VSFM-S-2



Puente No.13 (K 8+298 - K 8+362): Excavación de caisson 2 eje 1. VSFM-S-2



Puente No.13 (K 8+298 - K 8+362): Excavación de caisson 2 eje 1. VSFM-S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Puente No.13A (K 8+393 - K 8+415): Actividades de excavación para caisson. VSFM-S-2



Puente No.13A (K 8+393 - K 8+415): Actividades de excavación para caisson. VSFM-S-2



Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Puente No. 14 (K8+512-K8+575 M.D): Instalación acero de refuerzo para caisson. VSFM-S2



Puente No. 14 (K8+512-K8+575 M.D): Instalación acero de refuerzo para caisson. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud 10 (K8+575-K8+655 M.D): Sin actividades. VSFM-S2




Talud 10 (K8+575-K8+655 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Puente 14A (K8+660-K8+700 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Puente 14A (K8+660-K8+700 M.D): Sin actividades. VSFM-S2

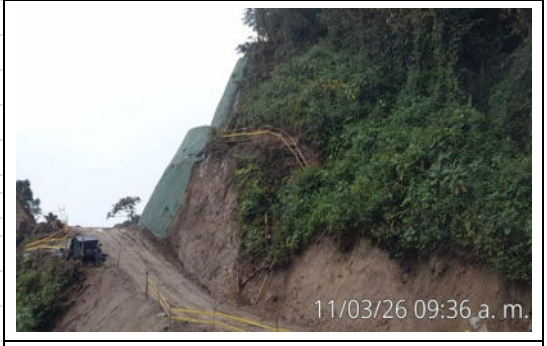

Talud 11 (K8+703-K8+765 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 11 (K8+703-K8+765 M.D): Sin actividades. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud 12 (K8+817-K8+868 M.D): Construcción zanjas de coronación. VSFM-S2



Talud 12 (K8+817-K8+868 M.D): Construcción zanjas de coronación. VSFM-S2



Talud 12 (K8+817-K8+868 M.D): Construcción zanjas de coronación. VSFM-S2



Talud 12 (K8+817-K8+868 M.D): Construcción zanjas de coronación. VSFM-S2



Explanación (K8+868-K9+053 M.D): Explanación de avance entre taludes 12 y 13. VSFM-S2



Talud 13 (K8+868-K9+053 M.D): Construcción zanjas de coronación entre taludes 12 y 13. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud del K6+800 MD: Tensionamiento de anclajes.VSFM-S1



Talud del K6+800 MD: Instalación de guayas.VSFM-S1



Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Hormigonado vástago módulo 2 muro 9A. VSFM-S2



Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Hormigonado zarpa módulo 1 muro 9A. VSFM-S2



Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Sin actividades. VSFM-S2



Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Sin actividades. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Instalación de anclajes. VSFM-S2



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Retiro de material de explanación. VSFM-S2



Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Trabajos de soldadura en estructura metálica. VSFM-S2



Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Trabajos de soldadura en estructura metálica. VSFM-S2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Instalación de acero de refuerzo viga 1 entre ejes 1 y 2. VSFM S-2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Instalación de acero de refuerzo viga 1 entre ejes 1 y 2. VSFM S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Trabajos de soldadura en estructura metálica izada. VSFM S-2



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Pruebas de ultra sonido a soldadura. VSFM S-2




MURO 8 (K 7+897 -K 7+949MI): Muro terminado, pendiente realizar hormigonado de barreras New Jersey. VSFM S-2



MURO 8 (K 7+897 -K 7+949MI): Muro terminado, pendiente realizar hormigonado de barreras New Jersey. VSFM S-2



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Sin actividades. VSFM-S-2

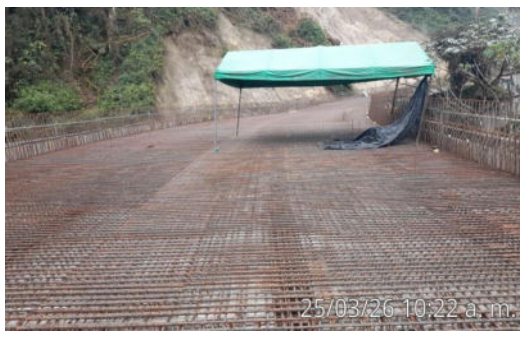

PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Sin actividades. VSFM-S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227MI): Ensayos para determinar porcentaje de compactación en relleno estructural. VSFM-S-2



MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227MI): Hormigonado de vástagos. VSFM-S-2



Talud 8 (K 8+160 - K 8+300 MD): Sin actividades. VSFM-S-2



Talud 8 (K 8+160 - K 8+300 MD): Sin actividades. VSFM-S-2



Puente No.13 (K 8+298 - K 8+362): Instalación de acero de refuerzo para caisson. VSFM-S-2



Puente No.13 (K 8+298 - K 8+362): Instalación de acero de refuerzo para caisson. VSFM-S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Puente No.13A (K 8+393 - K 8+415): Verificación de asentamiento de mezcla. VSFM-S-2



Puente No.13A (K 8+393 - K 8+415): Hormigonado de caisson. VSFM-S-2



Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Puente No. 14 (K8+512-K8+575 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Puente No. 14 (K8+512-K8+575 M.D): Sin actividades. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud 10 (K8+575-K8+655 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 10 (K8+575-K8+655 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Puente 14A (K8+660-K8+700 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Puente 14A (K8+660-K8+700 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 11 (K8+703-K8+765 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 11 (K8+703-K8+765 M.D): Sin actividades. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Puente 14B (K8+758-K8+868): Inicio de excavaciones para caisson. VSFM-S2



Puente 14B (K8+758-K8+868): Inicio de excavaciones para caisson. VSFM-S2



Explanación (K8+868-K9+053 M.D): Explanación de avance entre taludes 12 y 13. VSFM-S2



Talud 13 (K8+868-K9+053 M.D): Construcción zanjas de coronación entre taludes 12 y 13. VSFM-S2



Talud 13 (K9+053-K9+164 M.D): Instalación de anclajes. VSFM-S2



Talud 13 (K9+053-K9+164 M.D): Explanación y desalojo de material. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud del K6+800 MD: Tensionamiento de anclajes.VSFM-S1



Talud del K6+800 MD: Instalación de guayas.VSFM-S1




Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Instalación acero vástago módulo 1 muro 9A. VSFM-S2



Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Instalación formaleta vástago módulo 1 muro 9A. VSFM-S2



Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Sin actividades. VSFM-S2

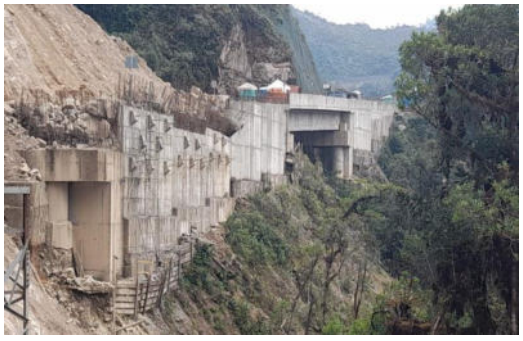

Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Sin actividades. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488 MI): Explanación de talud. VSFM-S2



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488 MI): Explanación de talud. VSFM-S2



Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Izaje de estructura metálica. VSFM-S2



Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Izaje de estructura metálica. VSFM-S2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Instalación formaleta base para vigas 2 y 3 entre ejes 1 y 2. VSFM S-2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Instalación de acero de refuerzo viga 1 entre ejes 1 y 2. VSFM S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Pruebas de ultra sonido a soldadura. VSFM S-2



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Pruebas de ultra sonido a soldadura. VSFM S-2




MURO 8 (K 7+897 -K 7+949MI): Muro terminado, pendiente realizar hormigonado de barreras New Jersey. VSFM S-2



MURO 8 (K 7+897 -K 7+949MI): Muro terminado, pendiente realizar hormigonado de barreras New Jersey. VSFM S-2



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Sin actividades. VSFM-S-2

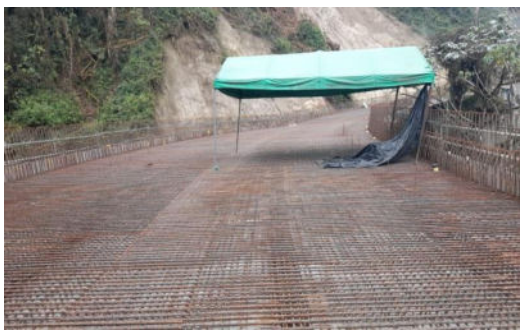

PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Sin actividades. VSFM-S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227 MI): Instalación de formaleta para vástagos. VSFM-S-2



MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227 MI): Instalación de acero de refuerzo para vástagos. VSFM-S-2



Talud 8 (K 8+160 - K 8+300 MD): Sin actividades. VSFM-S-2



Talud 8 (K 8+160 - K 8+300 MD): Sin actividades. VSFM-S-2



Puente No.13 (K 8+298 - K 8+362): Hormigonado para bases de obra falsa para viga cabezal. VSFM-S-2



Puente No.13 (K 8+298 - K 8+362): Conformación de piso para plataforma obra falsa viga cabezal. VSFM-S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Puente No.13A (K 8+393 - K 8+415): Sin actividades. VSFM-S-2




Puente No.13A (K 8+393 - K 8+415): Sin actividades. VSFM-S-2



Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 9 (K8+365-K8+510 M.D): Sin actividades. VSFM-S2

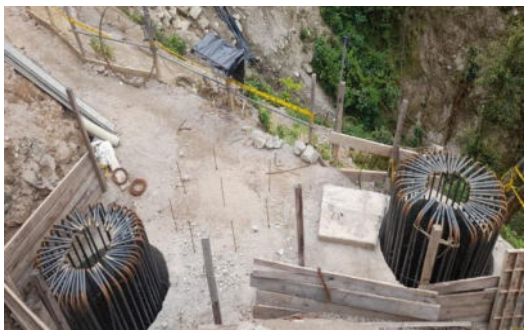

Puente No. 14 (K8+512-K8+575 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Puente No. 14 (K8+512-K8+575 M.D): Sin actividades. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud 10 (K8+575-K8+655 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 10 (K8+575-K8+655 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Puente 14A (K8+660-K8+700 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Puente 14A (K8+660-K8+700 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 11 (K8+703-K8+765 M.D): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 11 (K8+703-K8+765 M.D): Sin actividades. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Puente 14B (K8+758-K8+868): Excavaciones para caisson. VSFM-S2



Puente 14B (K8+758-K8+868): Excavaciones para caisson. VSFM-S2



Talud 12 (K8+817-K8+868 MD): Instalación de anclajes de sujeción. VSFM-S2



Talud 12 (K8+817-K8+868 MD): Instalación de anclajes de sujeción. VSFM-S2



Talud 13 (K9+053-K9+164 MD): Explanación de avance. VSFM-S2



Talud 13 (K9+053-K9+164 MD): Instalación de geo manto. VSFM-S2

8.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO ÁREA AMBIENTAL, SST, SOCIAL.

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



El día 27 de febrero del 2026 se realizo seguimiento a capacitación mensual por parte del contratista tema Contextualización de la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008



El día 28 de febrero de 2026 se realizo seguimiento a instalación de saco suelo en el puente 14A K8+659



El día 02 de Marzo de 2026 se realizo seguimiento a aseo y mantenimiento de baños portátiles en todo el frente de obra.



El día 02 de marzo de 2026 se realizo seguimiento a rescate de plántulas en el K9+780



El día 02 de marzo de 2026 se realizo seguimiento a reubicación y etiquetado de plántulas rescatadas en Zona 9 K9+680



El día 02 de Marzo de 2026 se realizo seguimiento a instalación de trinchos de madera en el K8+720

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Capacitación de Reinduccion al personal de obra en tema socio ambietnales del PMA



Capacitación de Reinduccion al personal de obra en tema socio ambietnales del PMA



26 de febrero de 2026. Charlas de seguridad.



27 de febrero de 2026. Señalización de equipos pesados en áreas de trabajo.



03 de marzo de 2026. Verificación de humectación de la vía en sector 2..



04 de marzo de 2026. Recorrido en Zona Industrial San Carlos.

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



El día 05 de marzo del 2026 se realizo seguimiento a captación de agua en la Quebrada autorizada Solterayaco



El día 05 de febrero de 2026 se realizo seguimiento a humectación de vía en todo el frente de obra



El día 06 de Marzo de 2026 se realizo seguimiento a los trabajos de mantenimiento de los disipadores en todo el frente de obra



El día 09 de marzo de 2026 se realizo seguimiento a tala por parte del contratista en el K9+780



El día 09 de marzo de 2026 se realizo seguimiento a reubicación y etiquetado de plántulas rescatadas en Zona 9 K9+680



El día 10 de Marzo de 2026 se realizo seguimiento a instalación de trinchos de madera y delimitación de vía con lona verde en el K8+900

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



06 de marzo de 2026. Pruebas de alcoholimetría..



06 de marzo de 2026. Capacitación en primeros auxilios para personal de oficina del Consorcio San Francisco.



07 de marzo de 2026. Capacitación en estilos de vida saludable para el personal del Consorcio San Francisco



09 de marzo de 2026. Recorrido en Sector 2.



Reunión de seguimientos avance del proyecto a veedurias ciudadanas- Administración Municipal



Reunión de seguimientos avance del proyecto a veedurias ciudadanas- Administración Municipal

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



El día 14 de marzo del 2026 se realizo seguimiento a instalación de saco suelo en el K8+930



El día 16 de febrero de 2026 se realizo seguimiento a rescate de Helechos en el K9+680



El día 17 de Marzo de 2026 se realizo seguimiento zona industrial San Carlos



El día 17 de marzo de 2026 se realizo seguimiento a mantenimiento de punto de captación Quebrada Solterayaco



El día 17 de marzo de 2026 se realizo seguimiento a socialización con veedurías ciudadanas sobre el avance de gestión ambiental del proyecto.



El día 17 de Marzo de 2026 se realizo seguimiento a humectación de vía en Zona Industrial

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



13 de marzo de 2026. Seguimiento a condiciones de seguridad en sector de puente 12.



14 de marzo de 2026. Capacitación en estilos de vida saludabe



18 de marzo de 2026. Seguimiento a uso de equipos de alturas durante perforacion de anclajes en talud 6.



18 de marzo de 2026. Seguimiento a armnado de andamios en sector de puente 9A.



Taller con JAC Veredas de AID- Resolucion de Conflictos- Seguridad Vial y Rescate de Flora



Taller con estudiantes grado 5 Institución Educativa Champagnat - Arqueologia preventiva en el proyecto.

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



El día 20 de marzo del 2026 se realizo seguimiento a taller ambiental con juntas de acción comunal por parte de contratista.



El día 21 de marzo de 2026 se realizo seguimiento a instalación de saco suelo en el K9+053



El día 24 de Marzo de 2026 se realizo seguimiento a aseo y mantenimiento de baños portátiles en todo el frente de obra



El día 24 de marzo de 2026 se realizo seguimiento a humectación de vías en todo el frente de obra.



El día 24 de marzo de 2026 se realizo inspección de puntos ecológicos en todo el frente de obra.



El día 24 de Marzo de 2026 se realizo seguimiento a monitoreo de plántulas en zona cinco K8+100

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



21 de marzo de 2026. Capacitación en estilos de vida saludable.



21 de marzo de 2026. Pruebas de alcoholimetría



21 de marzo de 2026. Pausas activas



24 de marzo de 2026 Seguimiento a condiciones de seguridad de accesos.



Capacitación Personal de Obra Tema Arqueologia



Capacitación Personal de Obra Tema Ambiental Manejo de escombros

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



El día 27 de marzo del 2026 se realizo seguimiento a capacitación con todo el personal de obra sobre medidas de manejo de materiales de construcción y concreto por parte del contratista



El día 27 de marzo de 2026 se realizo seguimiento a mantenimiento de disipadores en todo el frente de obra



El día 28 de Marzo de 2026 se realizo seguimiento a aseo y mantenimiento de baños portátiles en todo el frente de obra



El día 28 de marzo de 2026 se realizo seguimiento a instalación de saco suelo en puente 14 d K9+028.



El día 30 de marzo de 2026 se realizo seguimiento a humectación de vías en todo el frente de obra



El día 31 de Marzo de 2026 se realizo seguimiento instalación de trinchos en el K9+100
