INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 9 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021
OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACÍFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA**
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE.: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No. 964 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No. 1111 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión (use consecutivo con el periodo del acta))
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 2.400.000.000

2022												2023												2023											
ACTA 13		ACTA 14		ACTA 15		ACTA 16		ACTA 17		ACTA 18		ACTA 19		ACTA 20		ACTA 21		ACTA 22		ACTA 23		ACTA 24		ACTA 25		ACTA 26		ACTA 27		ACTA 28		ACTA 29		ACTA 30	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
0,00	$ -	0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
0,62	$ 598.920	0,58	$ 560.280	0,10	$ 96.600	0,11	$ 106.260	0,07	$ 67.620	0,33	$ 318.780	0,40	$ 386.400	0,49	$ 473.340	0,45	$ 434.700	0,24	$ 231.840	0,28	$ 270.480	0,36	$ 347.760											0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,49	$ 527.240	0,00	$ -
0,00		0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
1,20	$ 820.800	1,14	$ 779.760	1,14	$ 779.760	1,14	$ 779.760	1,18	$ 807.120	1,18	$ 807.120	1,16	$ 793.440	1,16	$ 793.440	1,14	$ 779.760	1,14	$ 779.760	1,14	$ 779.760	1,14	$ 779.760											0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	1,09	$ 830.580	0,00	$ -
0,00		0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
																																0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00																										0,00		0,00	
0,00	$ -	0,00	$ -	1,97	$ 449.160	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,57	$ 1.269.960	0,00	$ -	0,00	$ -	1,06	$ 241.680	0,00	$ -										0,00		0,00	
																									$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	$ 32.547.820		$ 33.778.740		$ 35.542.620		$ 38.186.820		$ 36.784.740		$ 36.688.200		$ 41.900.640		$ 56.789.340		$ 40.755.360		$ 50.077.200		$ 42.069.720		$ 42.703.320		$ 24.050.700		$ 21.590.000		$ 21.590.000		$ 21.590.000		$ 57.675.970		$ 47.625.000
	$ 347.201.971		$ 362.022.125		$ 370.972.488		$ 364.756.540		$ 400.550.939		$ 382.577.918		$ 377.932.686		$ 449.232.938		$ 445.112.285		$ 459.397.370		$ 460.703.559		$ 497.079.076		$ 61.336.458		$ 57.763.844		$ 58.752.920		$ 61.000.820		$ 633.384.282		$ 371.505.736
	$ 347.201.971		$ 362.022.125		$ 370.972.488		$ 364.756.540		$ 400.550.939		$ 382.577.918		$ 377.932.686		$ 449.232.938		$ 445.112.285		$ 459.397.370		$ 460.703.559		$ 497.079.076		$ 61.336.458		$ 57.763.844		$ 58.752.920		$ 61.000.820		$ 633.384.282		$ 371.505.736
	$ 65.968.374		$ 68.784.204		$ 70.484.773		$ 69.303.743		$ 76.104.678		$ 72.689.804		$ 71.807.210		$ 85.354.258		$ 84.571.334		$ 87.285.500		$ 87.533.676		$ 94.445.024		$ 11.653.927		$ 10.975.130		$ 11.163.065		$ 11.590.155		$ 120.343.014		$ 70.586.060
	$ 413.170.345		$ 430.806.329		$ 441.457.261		$ 434.060.283		$ 476.655.618		$ 455.267.723		$ 449.739.896		$ 534.587.196		$ 529.683.619		$ 546.682.870		$ 548.237.235		$ 591.524.100		$ 72.990.385		$ 68.738.974		$ 69.915.975		$ 72.590.976		$ 753.727.296		$ 442.091.826

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FORMATO DE INTERVENTORÍA PARA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MEPI-MN1-IN-S-FR-2
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	30/03/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 9 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEN.: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 1624 DE: 22/06/2023 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S A

CONTRATO DE OBRA No.: 1133 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses segun contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indicar día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indicar la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 116 MESES (En meses segun las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indicar día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

2024												2024												2025											
ACTA 31 ENERO		ACTA 32 FEBRERO		ACTA 33 MARZO		ACTA 34 ABRIL		ACTA 35 MAYO		ACTA 36 JUNIO		ACTA 37 JULIO		ACTA 38 AGOSTO		ACTA 39 SEPTIEMBRE		ACTA 40 OCTUBRE		ACTA 41 NOVIEMBRE		ACTA 42 DICIEMBRE		ACTA 43 ENERO		ACTA 44 FEBRERO		ACTA 45 MARZO		ACTA 46 ABRIL		ACTA 47 MAYO		ACTA 48 JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
1,00	$ 12.065.000	1,00	$ 12.065.000	1,00	$ 12.065.000	1,00	$ 12.065.000	1,00	$ 12.065.000	0,60	$ 7.239.000	0,03	$ 361.950																						
												0,97	$ 12.532.400	1,00	$ 12.920.000	0,20	$ 2.584.000	0,20	$ 2.584.000	0,50	$ 6.460.000	0,19	$ 2.454.800	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000	1,00	$ 12.920.000
3,00	$ 22.785.000	3,00	$ 22.785.000	3,00	$ 22.785.000	3,00	$ 22.785.000	3,00	$ 22.785.000	2,10	$ 15.949.500	0,07	$ 531.650	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												1,23	$ 10.003.590	1,00	$ 8.133.000	1,00	$ 8.133.000	1,00	$ 8.133.000	1,00	$ 8.133.000	1,00	$ 8.133.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000	2,00	$ 16.266.000
2,00	$ 10.160.000	2,00	$ 10.160.000	2,00	$ 10.160.000	2,00	$ 10.160.000	2,00	$ 10.160.000	1,10	$ 5.588.000	0,07	$ 355.600	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												1,93	$ 10.499.200	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,50	$ 2.720.000	1,00	$ 5.440.000	1,00	$ 5.440.000	1,00	$ 5.440.000	1,00	$ 5.440.000	1,00	$ 5.440.000
1,00	$ 10.160.000	0,86	$ 8.737.600	0,96	$ 9.753.600	0,79	$ 8.026.400	0,85	$ 8.636.000	0,78	$ 7.924.800	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,67	$ 7.289.600	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 10.880.000	1,00	$ 10.880.000	0,80	$ 8.704.000	0,90	$ 9.792.000	0,90	$ 9.792.000	0,90	$ 9.792.000
2,00	$ 20.320.000	1,18	$ 11.988.800	1,51	$ 15.341.600	1,16	$ 11.785.600	1,13	$ 11.480.800	0,79	$ 8.026.400	0,03	$ 304.800	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,97	$ 10.553.600	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 21.760.000	2,00	$ 21.760.000	2,00	$ 21.760.000	2,00	$ 21.760.000	2,00	$ 21.760.000	2,00	$ 21.760.000
0,90	$ 9.144.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 10.880.000		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,00	$ 20.320.000	1,00	$ 10.160.000	1,00	$ 10.160.000	1,00	$ 10.160.000	1,00	$ 10.160.000	1,00	$ 10.160.000	0,03	$ 304.800	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,97	$ 10.553.600	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 10.880.000	1,00	$ 10.880.000	1,00	$ 10.880.000	1,00	$ 10.880.000	1,00	$ 10.880.000	1,00	$ 10.880.000
0,90	$ 9.144.000	0,00	$ -	0,24	$ 2.438.400	0,05	$ 508.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,10	$ 1.088.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 10.880.000	0,60	$ 6.528.000	0,80	$ 8.704.000	0,90	$ 9.792.000	0,90	$ 9.792.000	0,80	$ 8.704.000
0,90	$ 9.144.000	0,26	$ 2.641.600	0,12	$ 1.219.200	0,10	$ 1.016.000	0,07	$ 711.200	0,08	$ 812.800	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,20	$ 2.176.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 10.880.000	0,60	$ 6.528.000	0,80	$ 8.704.000	0,90	$ 9.792.000	0,90	$ 9.792.000	0,80	$ 8.704.000
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,90	$ 7.429.500	0,34	$ 2.806.700	0,37	$ 3.054.350	0,36	$ 2.971.800	0,38	$ 3.136.900	0,39	$ 3.219.450	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,38	$ 3.359.200	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,30	$ 2.652.000	0,30	$ 2.652.000	0,55	$ 4.862.000	0,30	$ 2.652.000	0,40	$ 3.536.000	0,50	$ 4.420.000
2,00	$ 17.780.000	2,00	$ 17.780.000	2,00	$ 17.780.000	2,00	$ 17.780.000	1,83	$ 16.268.700	1,10	$ 9.779.000	0,03	$ 266.700	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												1,74	$ 16.564.800	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,50	$ 4.760.000	1,00	$ 9.520.000	1,00	$ 9.520.000	1,00	$ 9.520.000	1,00	$ 9.520.000	1,00	$ 9.520.000
2,00	$ 9.398.000	1,00	$ 4.699.000	1,00	$ 4.699.000	1,00	$ 4.699.000	1,97	$ 9.257.030	1,33	$ 6.249.670	0,07	$ 328.930	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												1,46	$ 7.348.720	1,00	$ 5.032.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.032.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000	2,00	$ 10.064.000
2,00	$ 10.160.000	2,00	$ 10.160.000	2,00	$ 10.160.000	2,00	$ 10.160.000	2,00	$ 10.160.000	1,43	$ 7.264.400	0,07	$ 355.600	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												1,23	$ 6.691.200	1,00	$ 5.440.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,50	$ 8.160.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000	2,00	$ 10.880.000
1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000	0,03	$ 167.640	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,97	$ 5.804.480	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000	1,00	$ 5.984.000
0,90	$ 4.572.000	0,36	$ 1.828.800	0,36	$ 1.828.800	0,36	$ 1.828.800	0,36	$ 1.828.800	0,36	$ 1.828.800	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,36	$ 1.958.400	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.440.000	0,40	$ 2.176.000	0,70	$ 3.808.000	0,45	$ 2.448.000	0,40	$ 2.176.000	0,40	$ 2.176.000
0,90	$ 5.715.000	0,66	$ 4.191.000	0,71	$ 4.508.500	0,64	$ 4.064.000	0,66	$ 4.191.000	0,45	$ 2.857.500	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,40	$ 2.720.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 6.800.000	0,40	$ 2.720.000	0,70	$ 4.760.000	0,50	$ 3.400.000	0,40	$ 2.720.000	0,40	$ 2.720.000
6,00	$ 19.050.000	4,00	$ 12.700.000	4,00	$ 12.700.000	3,00	$ 9.525.000	3,00	$ 9.525.000	1,63	$ 5.175.250	0,07	$ 222.250	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												2,23	$ 7.582.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 10.200.000	2,00	$ 6.800.000	3,00	$ 10.200.000	3,00	$ 10.200.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000
5,00	$ 15.875.000	3,00	$ 9.525.000	3,00	$ 9.525.000	3,00	$ 9.525.000	2,00	$ 6.350.000	1,14	$ 3.619.500	0,07	$ 222.250	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												1,93	$ 6.582.000	1,00	$ 3.400.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 10.200.000	2,00	$ 6.800.000	3,00	$ 10.200.000	3,00	$ 10.200.000	3,00	$ 10.200.000	3,00	$ 10.200.000
2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	1,33	$ 4.222.750	0,07	$ 222.250	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												1,06	$ 3.604.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000
2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	0,66	$ 2.095.500	0,07	$ 222.250	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												1,93	$ 6.562.000	1,00	$ 3.400.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,50	$ 8.500.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FORMATO INFORMES PARA AVALA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN3-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 9

(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEN: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 1624 DE: 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/7/2021 (Indicar día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indicar la suspensión mas reciente que conste en el acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indicar día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indicar día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 2.400.000.000

2024												2024												2025											
ACTA 31		ACTA 32		ACTA 33		ACTA 34		ACTA 35		ACTA 36		ACTA 37		ACTA 38		ACTA 39		ACTA 40		ACTA 41		ACTA 42		ACTA 43		ACTA 44		ACTA 45		ACTA 46		ACTA 47		ACTA 48	
ENERO		FEBERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
10,00	$ 16.510.000	6,00	$ 9.906.000	6,00	$ 9.906.000	6,00	$ 9.906.000	5,00	$ 8.255.000	3,66	$ 6.042.660	0,17	$ 280.670	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6,00	$ 10.608.000	4,00	$ 7.072.000	6,00	$ 10.608.000	6,00	$ 10.608.000	6,00	$ 10.608.000	6,00	$ 10.608.000
												2,93	$ 5.180.240	1,00	$ 1.768.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -												
1,00	$ 1.524.000	1,63	$ 2.484.120	2,00	$ 3.048.000	2,00	$ 3.048.000	2,00	$ 3.048.000	1,00	$ 1.524.000	0,03	$ 45.720	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000	2,00	$ 3.264.000
												0,97	$ 1.583.040	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -												
2,00	$ 2.794.000	2,00	$ 2.794.000	2,00	$ 2.794.000	1,50	$ 2.095.500	2,00	$ 2.794.000	1,57	$ 2.193.290	0,07	$ 97.790	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000	2,00	$ 2.992.000
												1,93	$ 2.887.280	1,00	$ 1.496.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -												
7,00	$ 9.779.000	5,00	$ 6.985.000	5,00	$ 6.985.000	5,00	$ 6.985.000	4,00	$ 5.588.000	2,67	$ 3.729.990	0,13	$ 181.610	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00	$ 7.480.000	2,00	$ 2.992.000	3,00	$ 4.488.000	4,00	$ 5.984.000	3,00	$ 4.488.000	3,00	$ 4.488.000
												2,24	$ 3.351.040	1,00	$ 1.496.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -												
2,00	$ 2.668.000	2,00	$ 2.668.000	2,00	$ 2.668.000	2,00	$ 2.668.000	1,73	$ 2.307.820	1,33	$ 1.774.220	0,07	$ 93.380	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000	2,00	$ 2.856.000
												1,93	$ 2.756.040	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -												
0,00	$ -	0,14	$ 1.422.400	0,13	$ 1.320.800	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,90	$ 9.792.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -												
0,95	$ 7.842.250	0,95	$ 7.842.250	0,95	$ 7.842.250	0,95	$ 7.842.250	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -												
1,00	$ 7.595.000	0,07	$ 531.650	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -												
1,00	$ 8.255.000	0,74	$ 6.108.700	0,83	$ 6.851.650	0,77	$ 6.356.350	0,71	$ 5.861.050	0,76	$ 6.273.800	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,90	$ 7.956.000	0,56	$ 4.950.400	0,50	$ 4.420.000	0,60	$ 5.304.000	0,50	$ 4.420.000	0,60	$ 5.304.000
												0,75	$ 6.630.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -												
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -												
1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000	1,00	$ 5.588.000	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -												
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -												
3,00	$ 9.525.000	3,00	$ 9.525.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	0,90	$ 2.857.500	0,07	$ 222.250	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3,00	$ 10.200.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000
												1,93	$ 6.562.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -												
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -												
0,25	$ 635.000	0,63	$ 1.600.200	0,63	$ 1.600.200	0,42	$ 1.066.800	0,68	$ 1.727.200	0,67	$ 1.701.800	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,16	$ 435.200	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	304.224.750		217.971.820		221.420.350		207.253.500		190.934.500		133.697.580		167.623.720		43.085.000		10.717.000		10.717.000		14.593.000		10.587.800		237.742.000		193.324.400		212.684.000		213.398.000		207.550.000		207.142.000
	2,38		2,36		2,36		2,36		2,36		2,38		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,38		2,36		2,36		2,38		2,36		2,36		2,38
	717.970.410		514.413.495		522.552.026		489.118.260		450.605.420		315.526.289		395.591.979		101.680.600		25.292.120		25.292.120		34.439.480		24.987.208		561.071.120		456.245.584		501.934.240		503.619.280		489.818.000		488.855.120

2024												2024												2025											
ACTA 31		ACTA 32		ACTA 33		ACTA 34		ACTA 35		ACTA 36		ACTA 37		ACTA 38		ACTA 39		ACTA 40		ACTA 41		ACTA 42		ACTA 43		ACTA 44		ACTA 45		ACTA 46		ACTA 47		ACTA 48	
ENERO		FEBERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MEPI-MNE-IN-9.FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 9
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021
OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEB: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE: 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión con correspondencia con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

2024												2024												2025											
ACTA 31		ACTA 32		ACTA 33		ACTA 34		ACTA 35		ACTA 36		ACTA 37		ACTA 38		ACTA 39		ACTA 40		ACTA 41		ACTA 42		ACTA 43		ACTA 44		ACTA 45		ACTA 46		ACTA 47		ACTA 48	
ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
10,00	$ 2.540.000	14,00	$ 3.556.000	31,00	$ 7.874.000	15,00	$ 3.810.000	4,00	$ 1.016.000	1,00	$ 254.000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												2,00	$ 544.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 1.632.000	8,00	$ 2.176.000	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 1.632.000	7,00	$ 1.904.000
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
7,00	$ 40.005.000	5,00	$ 28.575.000	5,00	$ 28.575.000	5,00	$ 28.575.000	4,00	$ 22.860.000	4,00	$ 22.860.000	0,13	$ 742.950	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												3,87	$ 23.684.400	1,00	$ 6.120.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 30.600.000	2,00	$ 12.240.000	3,00	$ 18.360.000	4,00	$ 24.480.000	3,00	$ 18.360.000	3,00	$ 18.360.000
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
5,00	$ 12.700.000	3,00	$ 7.620.000	3,00	$ 7.620.000	3,00	$ 7.620.000	2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000	0,07	$ 177.800	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												1,93	$ 5.249.600	1,00	$ 2.720.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 8.160.000	2,00	$ 5.440.000	3,00	$ 8.160.000	3,00	$ 8.160.000	3,00	$ 8.160.000	3,00	$ 8.160.000
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	2,00	$ 6.350.000	0,07	$ 222.250	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												1,93	$ 6.562.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000	2,00	$ 6.800.000
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000	2,00	$ 5.080.000	0,07	$ 177.800	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												1,93	$ 5.249.600	1,00	$ 2.720.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000	2,00	$ 5.440.000
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00													
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
0,84	$ 1.600.200	1,49	$ 2.838.450	3,35	$ 6.381.750	2,18	$ 4.152.900	1,33	$ 2.533.650	0,68	$ 1.295.400	0,00	$ -	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,76	$ 1.550.400	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,84	$ 1.713.600	1,29	$ 2.631.600	0,10	$ 204.000	0,19	$ 387.600	1,12	$ 2.284.800	0,72	$ 1.468.800

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
FORMATO DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

PLAN DE CARGAS INICIAL — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS** No. 9 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA - VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA**

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEN.: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE: 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/7/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión con concordancia con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

2024												2024												2025											
ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA	
31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48	
ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
0,69	$ 742.440	0,29	$ 312.040	0,02	$ 21.520	0,36	$ 387.360	0,50	$ 538.000	0,06	$ 64.560	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,14	$ 161.280	0,00	$ -	0,13	$ 149.760	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,15	$ 172.800	0,04	$ 46.080	0,00	$ -	0,16	$ 184.320	0,00	$ -	0,02	$ 23.040
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
1,12	$ 853.440	1,12	$ 853.440	1,11	$ 845.820	1,11	$ 845.820	0,80	$ 609.600	0,80	$ 609.600	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,74	$ 603.840	0,00	$ -	0,74	$ 603.840	0,74	$ 603.840	0,74	$ 603.840	0,74	$ 603.840	0,68	$ 554.880	0,68	$ 554.880	0,69	$ 563.040	0,69	$ 563.040	0,69	$ 563.040	0,69	$ 563.040
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
0,00	$ -	0,00	$ -	10,19	$ 2.588.260	8,50	$ 2.159.000	5,31	$ 1.348.740	9,29	$ 2.359.660	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3,31	$ 900.320	1,60	$ 435.200	1,00	$ 272.000
												0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -						
	$ 69.871.080		$ 55.184.930		$ 65.136.350		$ 58.980.080		$ 45.415.990		$ 43.953.220		$ 44.925.920		$ 11.560.000		$ 6.193.600		$ 6.043.840		$ 6.043.840		$ 6.043.840		$ 55.073.280		$ 35.326.560		$ 39.527.040		$ 46.915.280		$ 43.675.040		$ 42.990.880	
	$ 787.841.490		$ 569.598.425		$ 587.888.376		$ 548.098.340		$ 496.021.410		$ 359.479.509		$ 440.517.899		$ 113.240.600		$ 31.485.720		$ 31.335.960		$ 40.483.320		$ 31.031.048		$ 616.144.400		$ 491.574.144		$ 541.461.280		$ 550.534.560		$ 533.493.040		$ 531.846.000	
	$ 787.841.490		$ 569.598.425		$ 587.888.376		$ 549.098.340		$ 496.021.410		$ 359.479.509		$ 440.517.899		$ 113.240.600		$ 31.485.720		$ 31.335.960		$ 40.483.320		$ 31.031.048		$ 616.144.400		$ 491.574.144		$ 541.461.280		$ 550.534.560		$ 533.493.040		$ 531.846.000	
	$ 149.689.883		$ 108.223.701		$ 111.698.791		$ 104.138.685		$ 94.244.068		$ 68.301.107		$ 83.698.401		$ 21.515.714		$ 5.982.287		$ 5.953.832		$ 7.691.831		$ 5.895.899		$ 117.067.436		$ 93.399.087		$ 102.877.643		$ 104.601.566		$ 101.363.678		$ 101.050.740	
	$ 937.531.373		$ 677.822.126		$ 699.587.167		$ 652.237.025		$ 590.265.478		$ 427.780.615		$ 524.216.300		$ 134.756.314		$ 37.468.007		$ 37.289.792		$ 48.175.151		$ 36.926.947		$ 733.211.836		$ 584.973.231		$ 644.338.923		$ 655.136.126		$ 634.856.718		$ 632.896.740	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
FORMATO DE INTERVENTORÍA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	29/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 9
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021
OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: ING. JOSE RICARDO RUBIANO RASCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/05/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S A
CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indicar día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indicar la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 47.999.992.900 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 50.399.992.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indicar día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 2.400.000.000

2025												2026												2026											
ACTA 49		ACTA 50		ACTA 51		ACTA 52		ACTA 53		ACTA 54		ACTA 55		ACTA 56		ACTA 57		ACTA 58		ACTA 59		ACTA 60		ACTA 61		ACTA 62		ACTA 63		ACTA 64		ACTA 65		ACTA 66	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
0,03	$ 387.600																																		
0,97	$ 13.085.300	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	0,70	$ 9.443.000	0,63	$ 8.498.700	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	0,50	$ 6.745.000	0,50	$ 6.745.000	0,50	$ 6.745.000
0,07	$ 569.310																																		
1,93	$ 16.389.560	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	1,40	$ 11.888.800	1,26	$ 10.699.920	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	1,00	$ 8.492.000
0,07	$ 380.800																																		
1,93	$ 10.962.400	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	1,40	$ 7.952.000	1,26	$ 7.156.800	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	0,50	$ 2.840.000
0,90	$ 10.224.000	0,90	$ 10.224.000	0,90	$ 10.224.000	0,90	$ 10.224.000	0,90	$ 10.224.000	0,63	$ 7.156.800	0,60	$ 6.816.000	0,70	$ 7.952.000	0,70	$ 7.952.000	0,70	$ 7.952.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000		$ -		$ -		$ -		$ -
0,07	$ 761.600																																		
1,93	$ 21.924.800	2,00	$ 22.720.000	2,00	$ 22.720.000	2,00	$ 22.720.000	2,00	$ 22.720.000	1,49	$ 16.926.400	2,00	$ 22.720.000	2,00	$ 22.720.000	2,00	$ 22.720.000	2,00	$ 22.720.000	2,00	$ 22.720.000	2,00	$ 22.720.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000		$ -		$ -		$ -		$ -
	$ -	0,00	$ -	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,21	$ 2.385.600	0,25	$ 2.840.000	0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
0,03	$ 326.400																																		
0,97	$ 11.019.200	1,00	$ 11.360.000	1,00	$ 11.360.000	1,00	$ 11.360.000	1,00	$ 11.360.000	1,00	$ 11.360.000	1,00	$ 11.360.000	1,00	$ 11.360.000	1,00	$ 11.360.000	1,00	$ 11.360.000	1,00	$ 11.360.000	1,00	$ 11.360.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000		$ -		$ -		$ -		$ -
0,60	$ 6.816.000	0,80	$ 9.088.000	0,60	$ 6.816.000	0,60	$ 6.816.000	0,60	$ 6.816.000	0,42	$ 4.771.200	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000		$ -		$ -		$ -		$ -
0,60	$ 6.816.000	0,70	$ 7.952.000	0,60	$ 6.816.000	0,60	$ 6.816.000	0,60	$ 6.816.000	0,42	$ 4.771.200	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,25	$ 2.840.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000		$ -		$ -		$ -		$ -
	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
0,50	$ 4.615.000	0,60	$ 5.538.000	0,30	$ 2.769.000	0,61	$ 5.630.300	0,70	$ 6.461.000	0,49	$ 4.522.700	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000
0,03	$ 285.600																																		
0,97	$ 9.641.800	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	0,70	$ 6.958.000	0,63	$ 6.262.200	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
0,07	$ 352.240																																		
1,93	$ 10.140.220	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	1,40	$ 7.355.600	1,26	$ 6.620.040	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	0,50	$ 2.627.000
0,07	$ 380.800																																		
1,93	$ 10.962.400	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	1,40	$ 7.952.000	1,26	$ 7.156.800	3,00	$ 17.040.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	0,50	$ 2.840.000
0,03	$ 179.520																																		
0,97	$ 6.060.560	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	0,70	$ 4.373.600	0,63	$ 3.936.240	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	0,50	$ 3.124.000	0,50	$ 3.124.000	0,50	$ 3.124.000	0,50	$ 3.124.000		$ -		$ -
0,40	$ 2.272.000	0,60	$ 3.408.000	0,40	$ 2.272.000	0,40	$ 2.272.000	0,40	$ 2.272.000	0,35	$ 1.988.000	0,30	$ 1.704.000	0,30	$ 1.704.000	0,30	$ 1.704.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000		$ -		$ -
	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00			$ -	0,00		0,10	$ 568.000	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,20	$ 1.136.000	0,00		0,00	
0,50	$ 3.550.000	0,70	$ 4.970.000	0,69	$ 4.260.000	0,75	$ 5.325.000	0,70	$ 4.970.000	0,49	$ 3.479.000	0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000		$ -		$ -
0,07	$ 238.000																																		
1,93	$ 6.851.500	6,00	$ 21.300.000	6,00	$ 21.300.000	6,00	$ 21.300.000	6,00	$ 21.300.000	4,20	$ 14.910.000	3,15	$ 11.182.500	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000		$ -		$ -
0,10	$ 340.000																																		
2,90	$ 10.295.000	6,00	$ 21.300.000	6,00	$ 21.300.000	6,00	$ 21.300.000	6,00	$ 21.300.000	4,20	$ 14.910.000	3,15	$ 11.182.500	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000		$ -		$ -
0,07	$ 238.000																																		
1,93	$ 6.851.500	2,00	$ 7.100.000	2,09	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,40	$ 4.970.000	1,26	$ 4.473.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000		$ -		$ -
0,07	$ 238.000																																		
1,93	$ 6.851.500	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,40	$ 4.970.000	1,26	$ 4.473.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000		$ -		$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FORMATO SEGUIMIENTO OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	30/01/2026 (Dia / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 9
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 1624 DE: 22/06/2021 (Indicar dia/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión más recientemente con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique dia/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

2025												2026												2026											
ACTA 49		ACTA 50		ACTA 51		ACTA 52		ACTA 53		ACTA 54		ACTA 55		ACTA 56		ACTA 57		ACTA 58		ACTA 59		ACTA 60		ACTA 61		ACTA 62		ACTA 63		ACTA 64		ACTA 65		ACTA 66	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
0,20	$ 353.600																																		
5,80	$ 10.706.800	12,00	$ 22.152.000	12,00	$ 22.152.000	12,00	$ 22.152.000	12,00	$ 22.152.000	8,40	$ 15.506.400	6,30	$ 11.629.800	8,00	$ 14.768.000	8,00	$ 14.768.000	8,00	$ 14.768.000	8,00	$ 14.768.000	8,00	$ 14.768.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000		$ -		$ -
0,07	$ 114.240																																		
1,93	$ 3.288.720	2,00	$ 3.408.000	2,00	$ 3.408.000	2,00	$ 3.408.000	2,00	$ 3.408.000	1,40	$ 2.385.600																								
												1,26	$ 2.206.140	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
0,07	$ 104.720																																		
1,93	$ 3.014.660	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	2,00	$ 3.124.000	1,40	$ 2.186.800																								
												1,26	$ 2.206.140	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	1,00	$ 1.750.905	0,50	$ 875.453
0,10	$ 140.800																																		
2,90	$ 4.529.800	7,00	$ 10.934.000	7,00	$ 10.934.000	7,00	$ 10.934.000	7,00	$ 10.934.000	4,90	$ 7.653.800																								
												3,15	$ 5.515.351	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810		$ -		$ -
0,07	$ 99.960																																		
1,93	$ 2.877.690	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	2,00	$ 2.982.000	1,40	$ 2.087.400																								
												1,26	$ 2.206.140	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	0,50	$ 875.453		$ -
	$ -																																		
	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -																		
	$ -																																		
	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -																						
	$ -																																		
	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000		$ -		$ -
	$ -																																		
	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -																						
0,70	$ 6.461.000	0,90	$ 8.307.000	0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	0,60	$ 5.538.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000		$ -		$ -
	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -																								
	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -																								
	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -																						
0,07	$ 238.000																																		
1,93	$ 6.851.500	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,40	$ 4.970.000	1,26	$ 4.473.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000		$ -		$ -
	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -																						
	$ -	0,00	$ -	0,08	$ 227.200	0,03	$ 85.200	0,04	$ 113.600	0,03	$ 85.200	0,10	$ 284.000	0,10	$ 284.000	0,10	$ 284.000	0,10	$ 284.000	0,10	$ 284.000	0,10	$ 284.000	0,10	$ 284.000	0,10	$ 284.000	0,10	$ 284.000	0,10	$ 284.000	0,00	$ -		$ -
	218.796.840		269.957.000		263.723.200		267.507.500		268.011.600		193.457.100		177.186.272		237.056.050		229.104.050		226.264.050		221.152.050		221.152.050		134.202.430		124.262.430		112.902.430		107.293.430		45.738.358		27.188.453
	2,36		2,36		2,36		2,38		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,38		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
	516.360.542		637.098.520		622.386.752		631.317.700		632.507.376		456.558.756		418.159.601		559.452.278		540.685.558		533.983.158		521.918.838		521.918.838		316.717.735		293.259.335		266.449.735		253.212.495		107.942.524		64.164.748

2025												2026												2026											
ACTA 49		ACTA 50		ACTA 51		ACTA 52		ACTA 53		ACTA 54		ACTA 55		ACTA 56		ACTA 57		ACTA 58		ACTA 59		ACTA 60		ACTA 61		ACTA 62		ACTA 63		ACTA 64		ACTA 65		ACTA 66	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MNS-IN-9.FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 9
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021
OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVIAL: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE: 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No.:1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

2025												2026												2026											
ACTA 49		ACTA 50		ACTA 51		ACTA 52		ACTA 53		ACTA 54		ACTA 55		ACTA 56		ACTA 57		ACTA 58		ACTA 59		ACTA 60		ACTA 61		ACTA 62		ACTA 63		ACTA 64		ACTA 65		ACTA 66	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
5,00	$ 1.420.000	8,00	$ 2.272.000	11,00	$ 3.124.000	8,00	$ 2.272.000	16,00	$ 4.544.000	5,00	$ 1.420.000	4,00	$ 1.136.000	8,00	$ 2.272.000	8,00	$ 2.272.000	8,00	$ 2.272.000	8,00	$ 2.272.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	1,00	$ 284.000		$ -
0,10	$ 612.000																																		
2,90	$ 18.531.000	7,00	$ 44.730.000	7,00	$ 44.730.000	7,00	$ 44.730.000	7,00	$ 44.730.000	5,50	$ 35.145.000	5,00	$ 31.950.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	0,00	$ -	0,00	$ -
0,10	$ 272.000																																		
2,90	$ 8.236.000	6,00	$ 17.040.000	6,00	$ 17.040.000	6,00	$ 17.040.000	6,00	$ 17.040.000	4,80	$ 13.632.000	5,00	$ 14.200.000	4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	0,00	$ -	0,00	$ -
0,07	$ 238.000																																		
1,93	$ 6.851.500	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	0,00	$ -	0,00	$ -
0,07	$ 190.400																																		
1,93	$ 5.481.200	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000
0,88	$ 1.874.400	0,67	$ 1.427.100	1,43	$ 3.045.900	1,42	$ 3.024.600	2,87	$ 6.113.100	0,80	$ 1.704.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000		$ -		$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
FORMATO DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MNG-IN-5-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 9
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021
OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACÍFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA ...
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEI: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indicar día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indicar la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

2025												2026												2026											
ACTA 49		ACTA 50		ACTA 51		ACTA 52		ACTA 53		ACTA 54		ACTA 55		ACTA 56		ACTA 57		ACTA 58		ACTA 59		ACTA 60		ACTA 61		ACTA 62		ACTA 63		ACTA 64		ACTA 65		ACTA 66	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
0,08	$ 96.240	0,00	$ -	0,00	$ -	0,08	$ 96.240	0,06	$ 72.180	0,06	$ 72.180	0,30	$ 360.900	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500		$ -		$ -
0,66	$ 562.320	0,66	$ 562.320	0,75	$ 639.000	0,75	$ 639.000	0,75	$ 639.000	0,75	$ 639.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000
0,95	$ 269.800	2,04	$ 579.360	1,07	$ 303.880	0,00	$ -	1,07	$ 303.880	1,07	$ 303.880	1,00	$ 284.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000
	$ 44.634.860		$ 79.390.780		$ 81.662.780		$ 80.581.840		$ 86.222.160		$ 65.696.060		$ 63.692.900		$ 56.123.500		$ 56.123.500		$ 56.123.500		$ 56.123.500		$ 54.987.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 7.384.000		$ 7.100.000
	$ 560.995.402		$ 716.489.300		$ 704.049.532		$ 711.899.540		$ 718.729.536		$ 522.254.816		$ 481.852.501		$ 615.575.778		$ 596.809.058		$ 560.106.658		$ 579.042.338		$ 576.906.338		$ 353.245.235		$ 329.786.835		$ 302.977.235		$ 289.739.995		$ 115.326.524		$ 71.264.748
	$ 560.995.402		$ 716.489.300		$ 704.049.532		$ 711.899.540		$ 718.729.536		$ 522.254.816		$ 481.852.501		$ 615.575.778		$ 596.809.058		$ 590.106.658		$ 579.042.338		$ 576.906.338		$ 353.245.235		$ 329.786.835		$ 302.977.235		$ 289.739.995		$ 115.326.524		$ 71.264.748
	$ 106.589.126		$ 136.132.967		$ 133.769.411		$ 135.260.913		$ 136.558.612		$ 99.228.415		$ 91.551.975		$ 116.959.398		$ 113.393.721		$ 112.120.265		$ 109.828.044		$ 109.612.204		$ 67.116.595		$ 62.659.499		$ 57.565.675		$ 55.050.599		$ 21.912.040		$ 13.540.302
	$ 667.584.529		$ 852.622.267		$ 837.818.943		$ 847.160.453		$ 855.288.148		$ 621.483.231		$ 573.404.476		$ 732.535.176		$ 710.202.779		$ 702.226.923		$ 687.870.382		$ 686.518.542		$ 420.361.829		$ 392.446.333		$ 360.542.909		$ 344.790.594		$ 137.238.563		$ 84.805.050

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

SUBPROCESO INTERVENTORÍA DEBIDO PROCESO

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 9

(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACÍFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indicar día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indicar la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.992.900 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.992.900

PLAZO ACUMULADO: 119 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indicar día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

2027												2027												2028											
ACTA 67		ACTA 68		ACTA 69		ACTA 70		ACTA 71		ACTA 72		ACTA 73		ACTA 74		ACTA 75		ACTA 76		ACTA 77		ACTA 78		ACTA 79		ACTA 80		ACTA 81		ACTA 82		ACTA 83		ACTA 84	
ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	0,80	$ 10.792.000	0,80	$ 10.792.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000
2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	1,60	$ 13.587.200	1,60	$ 13.587.200	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000
2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	1,60	$ 9.088.000	1,60	$ 9.088.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000
0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000
0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,08	$ 908.800	0,08	$ 908.800	0,08	$ 908.800	0,08	$ 908.800	0,08	$ 908.800	0,08	$ 908.800	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000
0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800
0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,10	$ 1.136.000	0,08	$ 908.800	0,08	$ 908.800	0,08	$ 908.800	0,08	$ 908.800	0,08	$ 908.800	0,08	$ 908.800	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000
0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800
0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800
0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000
0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000
1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	0,80	$ 7.952.000	0,80	$ 7.952.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000
2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	1,60	$ 8.406.400	1,60	$ 8.406.400	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000
2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	1,60	$ 9.088.000	1,60	$ 9.088.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000
1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	0,50	$ 3.124.000	0,80	$ 4.998.400	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000
0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000
0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,80	$ 6.390.000	1,80	$ 6.390.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FORMATO DE INFORMACIÓN TÉCNICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 9
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD"**

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEI: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE: 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 954 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indicar día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indicar la suspensión más representativa, esto es el mayor/a del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indicar día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indicar día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

2027												2027												2028											
ACTA 67		ACTA 68		ACTA 69		ACTA 70		ACTA 71		ACTA 72		ACTA 73		ACTA 74		ACTA 75		ACTA 76		ACTA 77		ACTA 78		ACTA 79		ACTA 80		ACTA 81		ACTA 82		ACTA 83		ACTA 84	
ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	1,60	$ 2.953.600	3,20	$ 5.907.200	2,00	$ 3.692.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000
2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	1,60	$ 2.801.448	1,60	$ 2.801.448	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810
2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	1,60	$ 2.801.448	1,60	$ 2.801.448	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810
4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	3,60	$ 6.303.258	3,60	$ 6.303.258	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810
2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	1,60	$ 2.801.448	1,60	$ 2.801.448	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810
0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MEPI-MN1-19-3-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 9 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD**

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEN.: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 1624 DE: 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 47.999.892.900 (Segun contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 2.400.000.000

2027												2027												2028											
ACTA 67		ACTA 68		ACTA 69		ACTA 70		ACTA 71		ACTA 72		ACTA 73		ACTA 74		ACTA 75		ACTA 76		ACTA 77		ACTA 78		ACTA 79		ACTA 80		ACTA 81		ACTA 82		ACTA 83		ACTA 84	
ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000
4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	3,60	$ 23.004.000	3,60	$ 23.004.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000
2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	1,60	$ 4.544.000	1,60	$ 4.544.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000
2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000
1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
GERENCIA DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 9
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACÍFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD**

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEN: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/7/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique si suspensión fue comenzada con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indicar día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

2027												2027												2028											
ACTA 67		ACTA 68		ACTA 69		ACTA 70		ACTA 71		ACTA 72		ACTA 73		ACTA 74		ACTA 75		ACTA 76		ACTA 77		ACTA 78		ACTA 79		ACTA 80		ACTA 81		ACTA 82		ACTA 83		ACTA 84	
ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500
1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000
2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000
	$ 49.023.500		$ 49.023.500		$ 49.023.500		$ 49.023.500		$ 49.023.500		$ 49.023.500		$ 49.307.500		$ 49.307.500		$ 49.307.500		$ 49.307.500		$ 49.307.500		$ 44.195.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500	
	$ 421.713.402		$ 421.713.402		$ 421.713.402		$ 421.713.402		$ 421.713.402		$ 421.713.402		$ 420.925.018		$ 420.925.018		$ 420.925.018		$ 420.925.018		$ 420.925.018		$ 353.598.113		$ 360.032.417		$ 398.272.170		$ 406.985.290		$ 406.985.290		$ 406.985.290	
	$ 421.713.402		$ 421.713.402		$ 421.713.402		$ 421.713.402		$ 421.713.402		$ 421.713.402		$ 420.925.018		$ 420.925.018		$ 420.925.018		$ 420.925.018		$ 420.925.018		$ 353.598.113		$ 360.032.417		$ 398.272.170		$ 406.985.290		$ 406.985.290		$ 406.985.290	
	$ 80.125.546		$ 80.125.546		$ 80.125.546		$ 80.125.546		$ 80.125.546		$ 80.125.546		$ 79.975.753		$ 79.975.753		$ 79.975.753		$ 79.975.753		$ 79.975.753		$ 67.183.641		$ 68.406.159		$ 75.671.712		$ 77.327.205		$ 77.327.205		$ 77.327.205	
	$ 501.838.948		$ 501.838.948		$ 501.838.948		$ 501.838.948		$ 501.838.948		$ 501.838.948		$ 500.900.771		$ 500.900.771		$ 500.900.771		$ 500.900.771		$ 500.900.771		$ 420.781.754		$ 428.438.576		$ 473.943.883		$ 484.312.496		$ 484.312.496		$ 484.312.496	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
FORMATO DE SEGUIMIENTO OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MNE-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 9 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021
OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACÍFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el iniciado del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.992.900 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.992.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

2028												2029												2029											
ACTA 85 JULIO		ACTA 86 AGOSTO		ACTA 87 SEPTIEMBRE		ACTA 88 OCTUBRE		ACTA 89 NOVIEMBRE		ACTA 90 DICIEMBRE		ACTA 91 ENERO		ACTA 92 FEBRERO		ACTA 93 MARZO		ACTA 94 ABRIL		ACTA 95 MAYO		ACTA 96 JUNIO		ACTA 97 JULIO		ACTA 98 AGOSTO		ACTA 99 SEPTIEMBRE		ACTA 100 OCTUBRE		ACTA 101 NOVIEMBRE		ACTA 102 DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	0,80	$ 10.792.000	0,80	$ 10.792.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	0,50	$ 6.745.000
2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	1,60	$ 13.587.200	1,60	$ 13.587.200	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	1,00	$ 8.492.000
2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	1,60	$ 9.088.000	0,80	$ 4.544.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	0,50	$ 2.840.000
0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000
0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800																								
0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800																								
0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,03	$ 340.800	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000
1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	0,80	$ 7.952.000		$		$ -		$ -		$ -		$ -														
2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	1,60	$ 8.406.400	0,80	$ 4.203.200	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	1,00	$ 5.254.000	0,50	$ 2.627.000
2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	1,60	$ 9.088.000	0,80	$ 4.544.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	1,00	$ 5.680.000	0,50	$ 2.840.000
1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	0,80	$ 4.998.400	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000
0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,30	$ 2.130.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000	0,20	$ 1.420.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,00	$ 3.550.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,00	$ 3.550.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,00	$ 3.550.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,00	$ 3.550.000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FORMATO DE INFORMACIÓN TÉCNICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MEPI-MNE-IN-S-FR-2
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 9

(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 977 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 1624 DE: 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indicar día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indicar día, mes y año de cada suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indicar día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indicar día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 2.400.000.000

2028												2029												2029											
ACTA 85		ACTA 86		ACTA 87		ACTA 88		ACTA 89		ACTA 90		ACTA 91		ACTA 92		ACTA 93		ACTA 94		ACTA 95		ACTA 96		ACTA 97		ACTA 98		ACTA 99		ACTA 100		ACTA 101		ACTA 102	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
4,00	$ 7.384.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	1,60	$ 2.953.600	1,60	$ 2.953.600	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	2,00	$ 3.692.000	1,00	$ 1.846.000
2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	1,60	$ 2.801.448	1,60	$ 2.801.448	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	1,00	$ 1.750.905		$ -		$ -
2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	1,60	$ 2.801.448	1,60	$ 2.801.448	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	1,00	$ 1.750.905
2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	1,80	$ 3.151.629	1,80	$ 3.151.629	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	1,50	$ 2.626.358
2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	1,60	$ 2.801.448	1,60	$ 2.801.448	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	1,00	$ 1.750.905
0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000	0,50	$ 4.615.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,00	$ 3.550.000
0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000
	156.292.040		152.600.040		152.600.040		152.600.040		152.600.040		126.332.373		96.767.973		116.475.240		116.475.240		116.475.240		116.475.240		116.475.240		116.475.240		116.475.240		116.475.240		114.724.335		112.973.430		65.456.168
	2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
	368.849.214		360.136.094		360.136.094		360.136.094		360.136.094		298.144.400		228.372.416		274.881.566		274.881.566		274.881.566		274.881.566		274.881.566		274.881.566		274.881.566		274.881.566		270.749.431		266.617.295		154.476.555

2028												2029												2029											
ACTA 85		ACTA 86		ACTA 87		ACTA 88		ACTA 89		ACTA 90		ACTA 91		ACTA 92		ACTA 93		ACTA 94		ACTA 95		ACTA 96		ACTA 97		ACTA 98		ACTA 99		ACTA 100		ACTA 101		ACTA 102	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MEPT-MINE-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 9 (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA**

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

RESOLUCIÓN No.: 1624 DE: 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/7/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el cerrado del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 37.999.892.900 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 12.400.000.000

2028												2029												2029											
ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA		ACTA	
85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	4,00	$ 1.136.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	3,00	$ 852.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000
2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	1,80	$ 11.502.000	1,80	$ 11.502.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	2,00	$ 12.780.000	1,50	$ 9.585.000
2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	1,60	$ 4.544.000	1,60	$ 4.544.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	1,00	$ 2.840.000
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,60	$ 5.680.000	1,60	$ 5.680.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	1,00	$ 3.550.000
2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000
1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
FORMA DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MNE-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No.** 9
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA PAZ"**

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVE: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/7/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 2.400.000.000

2028												2029												2029											
ACTA 85		ACTA 86		ACTA 87		ACTA 88		ACTA 89		ACTA 90		ACTA 91		ACTA 92		ACTA 93		ACTA 94		ACTA 95		ACTA 96		ACTA 97		ACTA 98		ACTA 99		ACTA 100		ACTA 101		ACTA 102	
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500	0,50	$ 601.500
1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000	1,00	$ 852.000
2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000
	$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 36.527.500		$ 32.693.500		$ 32.409.500		$ 36.243.500		$ 36.243.500		$ 36.243.500		$ 36.243.500		$ 36.243.500		$ 36.243.500		$ 35.959.500		$ 35.959.500		$ 35.959.500		$ 35.959.500		$ 26.374.500	
	$ 405.376.714		$ 396.663.594		$ 396.663.594		$ 396.663.594		$ 396.663.594		$ 330.837.900		$ 260.781.916		$ 311.125.066		$ 311.125.066		$ 311.125.066		$ 311.125.066		$ 311.125.066		$ 311.125.066		$ 311.125.066		$ 310.841.066		$ 306.708.931		$ 302.576.795		$ 180.851.055	
	$ 405.376.714		$ 396.663.594		$ 396.663.594		$ 396.663.594		$ 396.663.594		$ 330.837.900		$ 260.781.916		$ 311.125.066		$ 311.125.066		$ 311.125.066		$ 311.125.066		$ 311.125.066		$ 311.125.066		$ 311.125.066		$ 310.841.066		$ 306.708.931		$ 302.576.795		$ 180.851.055	
	$ 77.021.576		$ 75.366.083		$ 75.366.083		$ 75.366.083		$ 75.366.083		$ 62.859.201		$ 49.548.584		$ 59.113.763		$ 59.113.763		$ 59.113.763		$ 59.113.763		$ 59.113.763		$ 59.113.763		$ 59.059.803		$ 58.274.697		$ 57.489.591		$ 34.361.701	
	$ 482.398.290		$ 472.029.677		$ 472.029.677		$ 472.029.677		$ 472.029.677		$ 393.697.101		$ 310.330.500		$ 370.238.829		$ 370.238.829		$ 370.238.829		$ 370.238.829		$ 370.238.829		$ 370.238.829		$ 370.238.829		$ 369.900.869		$ 364.983.627		$ 360.066.386		$ 215.212.756	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-7
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — No. 9

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 877 DE 2021
OBJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEN.: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses segun contrato principal) — 119 MESES (En meses segun las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año) — 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 47.999.892.900 (Según contrato principal) — $ 2.400.000.000
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 50.399.892.900

2030																TOTAL	
ACTA 103 ENERO		ACTA 104 FEBRERO		ACTA 105 MARZO		ACTA 106 ABRIL		ACTA 107 MAYO		ACTA 108 JUNIO		ACTA 109 JULIO		ACTA 110 AGOSTO			
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
																11,86	112.670.000,00
																11,97	129.635.100,00
																9,78	105.930.700,00
																9,09	117.442.800,00
1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	1,00	$ 13.490.000	58,50	789.165.000,00
																12,80	186.144.000,00
																35,33	240.844.610,00
																22,32	169.520.400,00
2,00	$ 16.984.000	2,00	$ 16.984.000	3,00	$ 25.476.000	3,00	$ 25.476.000	3,00	$ 25.476.000	3,00	$ 25.476.000	3,00	$ 25.476.000	3,00	$ 25.476.000	18,30	148.833.900,00
																124,98	1.061.410.080,00
																12,14	48.560.000,00
																23,66	107.889.600,00
																14,17	71.983.600,00
																7,56	40.800.000,00
2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	102,19	580.439.200,00
																8,34	45.390.000,00
																9,79	89.284.800,00
																5,97	60.605.200,00
0,70	$ 7.952.000	0,70	$ 7.952.000	0,70	$ 7.952.000	0,70	$ 7.952.000	0,70	$ 7.952.000	0,70	$ 7.952.000	0,70	$ 7.952.000	0,90	$ 10.224.000	9,17	67.129.600,00
																39,23	377.492.800,00
																5,90	47.200.000,00
																11,77	107.342.400,00
																9,86	99.568.000,00
																13,04	141.875.200,00
																25,53	260.588.800,00
																1,22	9.760.000,00
																1,75	15.960.000,00
																0,90	9.144.000,00
																1,56	10.880.000,00
0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	2,98	33.852.800,00
																4,90	39.200.000,00
																6,33	57.729.600,00
																9,03	91.744.800,00
0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	0,50	$ 5.680.000	7,06	76.160.000,00
																18,11	205.956.800,00
																1,34	10.720.000,00
																2,13	19.425.600,00
																1,39	14.122.400,00
0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	5,35	55.488.000,00
																8,24	93.606.400,00
																2,70	21.600.000,00
																4,69	42.772.800,00
																1,63	16.560.800,00
																5,20	56.576.000,00
0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,20	$ 2.272.000	0,30	$ 3.408.000	7,89	89.630.400,00
																-	-
																-	-
																-	-
0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	0,30	$ 3.408.000	3,48	39.532.800,00
																3,19	20.735.000,00
																2,39	17.709.900,00
																3,05	25.177.750,00
0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	0,30	$ 2.769.000	2,73	24.132.200,00
																20,00	184.600.000,00
																6,88	44.590.000,00
																15,37	122.652.600,00
																14,96	132.994.400,00
1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	1,00	$ 9.940.000	7,27	69.210.400,00
																43,70	434.378.000,00
																21,33	78.921.000,00
																23,09	97.393.620,00
																13,52	63.530.480,00
																13,53	68.092.960,00
2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	2,00	$ 10.508.000	102,19	536.906.260,00
																20,81	83.240.000,00
																22,76	103.785.600,00
																16,65	84.562.000,00
2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	2,00	$ 11.360.000	13,80	75.072.000,00
																103,19	585.119.200,00
																3,83	16.852.000,00
																9,10	45.645.600,00
																7,03	39.283.640,00
1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	1,00	$ 6.248.000	7,06	41.888.000,00
																44,40	277.411.200,00
																3,02	12.080.000,00
																3,39	15.458.400,00
																3,06	15.494.000,00
0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	0,20	$ 1.136.000	3,71	20.182.400,00
																13,65	77.532.000,00
																-	-
																-	-
																-	-
																0,30	1.704.000,00
																2,30	11.500.000,00
																4,17	23.769.000,00
																4,44	28.194.000,00
0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	0,40	$ 2.840.000	3,80	25.840.000,00
																19,74	149.154.000,00
																12,44	31.600.000,00
																29,26	83.220.000,00
																30,06	95.250.000,00
																17,30	58.820.000,00
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	147,98	522.134.000,00
																15,04	37.600.000,00
																30,86	87.951.000,00
																25,91	82.264.250,00
																20,03	68.102.000,00
4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	4,00	$ 14.200.000	163,65	580.957.500,00
																7,03	17.575.000,00
																21,20	80.620.000,00
																15,40	48.895.000,00
																13,13	44.642.000,00
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	115,99	411.764.500,00
																12,64	31.600.000,00
																23,36	86.576.000,00
																15,93	59.577.750,00
																15,50	52.700.000,00
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	115,99	411.764.500,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SUBSECTOR TIPO INTERVENTORÍA PARA VÍAS 4ª G
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO — **No.** 9

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 877 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEN.: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) — 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indicar día/mes/año) — 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indicar día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indicar la suspensión mas reciente, con el periodo del acta) (Indicar día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal) — $ 2.400.000.000
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

2030																TOTAL	
ACTA 103 ENERO		ACTA 104 FEBRERO		ACTA 105 MARZO		ACTA 106 ABRIL		ACTA 107 MAYO		ACTA 108 JUNIO		ACTA 109 JULIO		ACTA 110 AGOSTO			
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
																29,57	38.441.000,00
																59,96	89.660.720,00
																54,73	85.533.730,00
																36,13	67.413.840,00
4,00	$ 7.384.006	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	4,00	$ 7.384.000	229,50	423.657.000,00
																-	-
																9,87	13.238.560,00
																13,66	20.817.840,00
																13,04	21.281.280,00
																11,33	19.306.320,00
2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	92,66	162.238.857,39
																-	-
																17,57	19.327.000,00
																23,03	26.879.620,00
																16,94	23.685.180,00
																15,06	22.440.000,00
																11,33	17.697.460,00
2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	106,16	185.876.074,80
																21,07	23.177.000,00
																41,04	51.464.160,00
																40,80	56.997.600,00
																22,34	34.916.640,00
																36,86	55.919.800,00
4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	4,00	$ 7.003.620	159,45	279.181.802,25
																11,94	12.537.000,00
																21,83	26.130.510,00
																16,33	21.784.220,00
																14,00	19.992.000,00
																11,33	16.893.030,00
2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	2,00	$ 3.501.810	105,16	184.125.169,80
																-	-
																0,09	820.800,00
																0,27	2.743.200,00
																0,90	9.792.000,00
0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	0,05	$ 568.000	1,60	18.176.000,00
																4,75	35.197.500,00
																4,75	39.211.250,00
																-	-
																2,79	24.921.000,00
																1,20	8.180.400,00
																2,07	15.721.650,00
0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	-
																3,64	25.972.400,00
																5,51	45.485.050,00
																4,41	38.984.400,00
0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	0,70	$ 6.461.000	32,90	301.667.000,00
																-	-
																-	-
																4,37	21.919.920,00
																6,00	33.528.000,00
																-	-
																-	-
																-	-
																-	-
																6,93	19.750.920,00
																18,97	60.229.750,00
																15,00	51.000.000,00
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	118,39	413.194.500,00
																3,33	4.928.220,00
																-	-
																-	-
																5,95	11.900.000,00
																3,98	9.950.200,00
																0,16	435.200,00
0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	0,20	$ 568.000	5,56	16.000.000,00
	183.877.050		183.877.050		192.369.050		192.369.050		192.369.050		192.369.050		192.369.050		195.777.050		16.020.060.454,15
	2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36
	433.949.838		433.949.838		453.990.958		453.990.958		453.990.958		453.990.958		453.990.958		462.033.838		37.807.342.671,79

2030																TOTAL	
ACTA 103 ENERO		ACTA 104 FEBRERO		ACTA 105 MARZO		ACTA 106 ABRIL		ACTA 107 MAYO		ACTA 108 JUNIO		ACTA 109 JULIO		ACTA 110 AGOSTO			
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPT-MN1-IN-01-FR-21
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — No. 9

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEN.: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE: 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) — 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año) — 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 47.999.892.900 (Según contrato principal) — $ 2.400.000.000

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 50.399.892.900

2030																		TOTAL	
ACTA 103		ACTA 104		ACTA 105		ACTA 106		ACTA 107		ACTA 108		ACTA 109		ACTA 110					
ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO					
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR		
																		240,89	48.178.000,00
																		171,00	38.988.000,00
																		94,00	23.876.000,00
																		29,00	7.888.000,00
17,00	$ 4.828.000	16,00	$ 4.544.000	17,00	$ 4.828.000	17,00	$ 4.828.000	16,00	$ 4.544.000	12,00	$ 3.408.000	12,00	$ 3.408.000	15,00	$ 4.260.000	354,00	100.536.000,00		
																		28,28	127.273.999,95
																		41,41	212.433.300,00
																		48,07	274.720.050,00
																		24,97	152.816.400,00
4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	4,00	$ 25.560.000	197,79	1.263.303.000,00		
																		-	-
																		-	-
																		-	-
																		-	-
																		15,07	30.142.000,00
																		31,53	71.888.400,00
																		32,97	83.743.800,00
																		20,03	54.481.600,00
4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	4,00	$ 11.360.000	166,10	471.724.000,00		
																		5,05	12.635.000,00
																		20,73	59.080.500,00
																		16,07	51.022.250,00
																		14,00	47.600.000,00
2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	2,00	$ 7.100.000	117,33	416.521.500,00		
																		26,56	53.128.000,00
																		24,00	54.720.000,00
																		24,00	60.960.000,00
																		23,00	62.560.000,00
2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	2,00	$ 5.680.000	173,93	361.961.350,00		
																		21,19	31.782.000,00
																		20,67	35.345.700,00
																		11,90	22.669.500,00
																		5,02	10.240.800,00
1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	1,00	$ 2.130.000	43,07	132.209.100,00		

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MEDICIÓN DE INTERVENTORÍA PARA EVITAR ATRASOS
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CODIGO	MEPI-MN1-IN-9.FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/01/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — No. 9

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVEN.: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
RESOLUCIÓN No.: 1624 DE 22/06/2021 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CONTRATO DE OBRA No.: 1111 DE 2021 — CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses segun contrato principal) — 114 MESES (En meses segun las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año) — 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 47.999.892.900 (Según contrato principal) — $ 2.400.000.000
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 50.399.892.900

2030																TOTAL	
ACTA 103 ENERO		ACTA 104 FEBRERO		ACTA 105 MARZO		ACTA 106 ABRIL		ACTA 107 MAYO		ACTA 108 JUNIO		ACTA 109 JULIO		ACTA 110 AGOSTO			
H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
																6,5470	5.545.309,09
																4,09	3.892.980,00
																2,41	2.593.160,00
																0,64	737.280,00
1,00	$ 1.203.000	1,00	$ 1.203.000	1,00	$ 1.203.000	1,00	$ 1.203.000	1,00	$ 1.203.000	1,00	$ 1.203.000	1,00	$ 1.203.000	1,00	$ 1.203.000	31,06	37.389.240,00
																9,98	5.985.000,00
																13,96	9.480.240,00
																7,15	5.448.300,00
																7,82	6.381.120,00
1,50	$ 1.278.000	1,50	$ 1.278.000	1,50	$ 1.278.000	1,50	$ 1.278.000	1,50	$ 1.278.000	1,50	$ 1.278.000	1,50	$ 1.278.000	1,50	$ 1.278.000	64,32	54.800.640,00
																0,59	800.820,00
																-	-
																-	-
																-	-
																13,12	2.624.000,00
																8,60	1.960.800,00
																33,29	8.495.660,00
																5,91	1.607.520,00
2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	2,00	$ 568.000	117,20	33.284.800,00
																-	$ 93.535,78
	$ 59.707.000		$ 59.423.000		$ 59.707.000		$ 59.707.000		$ 59.423.000		$ 58.287.000		$ 58.287.000		$ 59.139.000	-	$ 4.545.508.504,71
	$ 493.656.838		$ 493.372.838		$ 513.697.958		$ 513.697.958		$ 513.413.958		$ 512.277.958		$ 512.277.958		$ 521.172.838	-	$ 42.352.851.176,50
	$ 493.656.838		$ 493.372.838		$ 513.697.958		$ 513.697.958		$ 513.413.958		$ 512.277.958		$ 512.277.958		$ 521.172.838	-	$ 42.352.851.177,00
	$ 93.794.799		$ 93.740.839		$ 97.602.612		$ 97.602.612		$ 97.548.652		$ 97.332.812		$ 97.332.812		$ 99.022.839	-	$ 8.047.041.723,00
	$ 587.451.637		$ 587.113.677		$ 611.300.570		$ 611.300.570		$ 610.962.610		$ 609.610.770		$ 609.610.770		$ 620.195.677	-	$ 50.399.892.900,00

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Área técnica:

El Consorcio San Francisco tiene los siguientes frentes de trabajo por sector:

Sector 1:

- **Pavimento sector 1:** Respecto a las actividades realizadas en el tramo comprendido entre el K0+770 y el K6+620 de este frente de trabajo. Se ha completado al 100% la pavimentación en concreto tipo MR-45 de los carriles izquierdo y derecho. En cuanto a la construcción de cunetas, se han finalizado un total de 5.311 metros en el carril derecho y 5.160 metros en el carril izquierdo. De igual forma se culminó la construcción de las losas laterales de acceso a los puentes existentes, habiéndose culminado las correspondientes a los puentes No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

- **Puente 6 (K5+761 - K5+828):** Este puente se encuentra terminado en su estructura física; actualmente se encuentra en servicio al tránsito de vehículos del proyecto.

- **Talud del K6+800 margen derecha:** El contratista avanza con las actividades de estabilización del talud. Se realiza instalación de guayas longitudinales y tensionamiento de anclajes.

- **Alcantarilla del K6+320:** Esta obra se encuentra terminada al 100%

- **Alcantarilla del K6+406:** Esta obra se encuentra terminada al 100%

- **Muro No.0 (K6+869 - K 6+887):** Esta estructura de contención se culminó a un 100%.

- **Puente No. 9 (K6+959 al K7+004):** Este puente se encuentra terminado en su estructura física desde el mes de octubre de 2024, actualmente se encuentra en servicio al tránsito de vehículos del proyecto.

Sector 2:

- **Talud No. 0 Cero (K7+003 - K7+123) M.D:** Talud terminado mediante actividades de estabilización del talud, mediante la instalación de anclajes, geomanto y malla de alta resistencia.

- **Puente No. 9A (K7+130 - K7+190):** Se ha finalizado la construcción de toda la estructura incluyendo barreras de protección lateral tipo New Jersey. Durante este mes, se ha realizado construcción del muro de aproximación a la margen izquierda del acceso del puente, Se realiza instalación de relleno estructural para el muro 9A.

- **Talud No. 1 (K7+200 - K 7+300):** Esta obra se encuentra terminada en su totalidad.

- **Muro No.1 (K7+293 - K7+330) M.I:** Esta estructura de contención se culminó a un 100%.

- **Talud No. 2 (K7+315 - K 7+392):** Esta estructura de contención se culminó a un 100%.
- **Muro No.2 (K7+360 - K7+395) M.I:** Esta estructura de contención se culminó a un 100%.

- **Puente No. 10 (K7+398 - K7+431):** Este puente se encuentra construido en un 100%, actualmente se encuentra en servicio al tránsito de vehículos del proyecto.

- **Muro No 3 (K 7+435 - K 7+488) M.I:** Se han construido los caisson números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Se culminó la construcción de la zarpa de los módulos 1, 2, 3, 4 y 5, así como los vástagos de los módulos 1 y 2 del muro. Se culminaron también las actividades de perforación e inyección de los anclajes de los módulos 3, 4 y 5. Se avanza con la estabilización del talud 3, lo cual causa una obstrucción temporal de la vía de acceso provisional hacia mayores.

- **Talud No. 3 (K7+440 - K7+520) M.D:** A la fecha se tienen terminadas las terrazas 6, 5, 4 y 3. Durante este mes se realiza instalación anclajes, platinas y guayas longitudinales. Se realizan actividades de explanación y desalojo de material. Se continúa con instalación de geo manto y malla de alta resistencia. Se realiza inyección de lechada a anclajes y tensionamiento de estos.

- **Puente No. 11 (K7+491 - K7+579):** En la actualidad, se han completado los caissons números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La construcción del babero del eje No. 1, así como de las pilas No. 3 y 4, ha sido finalizada, hormigonado de las vigas cabezal No.1, 2 y 3, instalación de acero de refuerzo y hormigonado para muro espaldar y aletas sobre el eje 2. Se continúa con trabajos de soldadura para unificar la estructura metálica e izaje de vigas metálicas.

- **Talud No. 4 (K7+573 - K 7+654) M.D:** Esta obra se encuentra terminada en su totalidad.

- **Puente No.12 (K7+633 – K7+727):** A la fecha se tiene a nivel de viga cabezal los ejes 1, 2, 3 y 4. Se tiene hormigonado de las vigas 7, 8 y 9 entre los ejes 3 y 4. Se tiene tensionadas las vigas 7, 8 y 9. Se realiza instalación de formaleta para la viga 1 y se realiza instalación de acero de refuerzo para las vigas 2 y 3 entre ejes 1 y 2.

- **Talud No. 5 (K7+728 - K 7+762) M.D:** Este talud se encuentra culminado en un 100%.

- **Muro No. 6 (K7+730 - K7+736) M.I:** A la fecha se tiene fundidos los caisson de cimentación, zarpa y armado en su totalidad el acero de refuerzo del vástago. Pendiente el hormigonado de la barrera tipo new jersey.

- **Muro No. 7 (K7+763 - K7+786) M.I:** Los caisson No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ya han sido hormigonados, se ha construido la totalidad de caisson de esta estructura. Pendiente por iniciar las actividades constructivas de la zarpa y vástagos.

- **Puente No. 12A (K7+785 - K7+866):** Se tiene terminado todas las secciones de estructura metálica entre los ejes 1 y 3. Sin actividades durante este mes.

- **Talud No. 6 (K7+865 - K 7+950) M.D:** Este talud se encuentra culminado en un 100%.

- **Puente No 12B (K7+952 - K8+042):** Se culmina con actividades de hormigonado de losa. Se continúa con instalación de acero y formaleta para barreras tipo New Jersey margen derecha e izquierda.

- **Talud Aferente P12B (K7+920 - K 7+980) M.D:** Se continúa con actividades de perforación, instalación e inyección de anclajes.

- **Muro No. 8 (K7+897 - K7+949) M.I:** Se culminó el hormigonado de la totalidad de los vástagos, terminando todos los módulos del muro. Se realiza instalación de acero de refuerzo para barreras de protección tipo New Jersey.

- **Talud No. 7 (K8+043 y el K8+140) M.D:** Este talud se encuentra culminado en un 100%.

- **Muro No. 9 (K8+125 - K8+227) M.I:** Se tiene hormigonado las zarpas en los módulos No. 1 al 14 y se termina con hormigonado de los vástagos 1 al 14. Se inicia con actividades de instalación de anclajes. Se continúa con instalación de relleno estructural.

- **Talud No. 8 (K8+160 – K8+300 M.D):** Terminado. No presenta actividades.

- **Muro No. 10 (K8+287 - K8+295) M.I:** Se realiza perforación e instalación de micropilotes.

- **Puente No 13 (K8+298 - K8+362):** Se tiene a la fecha hormigonados los caisson de los ejes 1 y 2. Se realiza instalación de acero de refuerzo y formaleta para la viga cabezal del eje 2. Se inicia con instalación de acero de refuerzo para la viga cabezal del eje 1.

- **Talud No. 9 (K8+365 - K8+510) M.D:** Terminado. No presenta actividades.

- **Puente No 13A (K8+393 - K8+415):** A la fecha se ha realizado la excavación de los 4 caisson. Se ha realizado instalación de acero y hormigonado de los caisson ejes 1 y 2. Se realiza instalación de acero y hormigonado de pilas.

- **Muro No. 12 (K8+444 - K8+476) M.I:** Se realiza perforación e instalación de micropilotes.
- **Puente No 14 (K8+512 - K8+575):** A la fecha se tienen excavados e instalado acero de refuerzo los 4 caisson. Se realiza hormigonado de caisson.

- **Talud No. 10 (K8+575 - K8+655) M.D:** Terminado. No presenta actividades.

- **Puente No 14A (K8+660 - K8+700):** A la fecha se tienen excavados los 4 caisson. En el presente mes, no se registran actividades.

- **Talud No. 11 (K8+703 - K8+765) M.D:** Terminado. No presenta actividades.

- **Puente No 14B (K8+758 - K8+868):** Se realiza excavación de caisson.

- **Talud No. 12 (K8+817 - K8+868) M.D:** A la fecha se tiene terminados los trabajos de instalación de anclajes, geo manto y malla de alta resistencia. En el presente mes No se presentan actividades.

- **Talud No. 13 (K9+053 - K9+165) M.D:** Se realiza instalación de anclajes, geomanto, malla de alta resistencia y platinas. Se realiza explanación y desalojo de material.

- **Talud No. 14 (K9+166 - K9+284) M.D:** Se inicia con perforación e instalación de anclajes. Se realiza explanación y desalojo de material.

Sitio de depósito de material sobrante Tamabioy:

- A la fecha se tienen terminadas las actividades de instalación de material sobrante de excavación en este sector por parte del Contratista. Se culminaron también las actividades de conformación y perfilado del material para entrega de este predio. Así como las actividades de revegetalización y siembra de plántulas al perímetro del mismo.

Área social:

- Se ha realizado la atención oportuna a las solicitudes presentadas por la comunidad y por las instituciones del área de influencia, lo cual ha permitido alcanzar un cumplimiento del 100% en los indicadores establecidos.
- Así mismo, se ha dado cumplimiento al cronograma de capacitación dirigido a la comunidad, desarrollando talleres en los diferentes componentes social, ambiental y de arqueología.
- En cuanto al seguimiento del proyecto por parte de las veedurías ciudadanas, se ha dado cumplimiento a los cronogramas concertados, atendiendo de manera oportuna las inquietudes y sugerencias presentadas. Adicionalmente, no solo se han realizado espacios de socialización en los distintos componentes, sino también recorridos en los frentes de obra, fortaleciendo los procesos de participación, transparencia y seguimiento comunitario.

Área ambiental:

- En este periodo se realiza seguimiento a la implementación de las medidas ambientales establecidas en las fichas del PMA en el frente de obra de los Sector 1 y Sector 2 tramo K7+100 hasta K9+300 y Zona Industrial San Carlos.
- En este periodo se revisa, ajusta y aprueba los informes mensuales del contratista del cumplimiento de las medidas y gestiones ambientales establecidas en la licencia ambiental, P.M.A.
- En este periodo se remiten a la SS INVIAS los reportes parciales de 9 contingencias ambientales y el cierre de la contingencia No. 3 presentados en el frente San Francisco para que se radiquen en la página VITAL de la ANLA y ante la DBBSE del MADVS.
- Durante este periodo se realiza la radicación de los ajustes de la VPI 2 del ICA No. 27 y el ICA 28 a la ANLA dentro de los plazos establecidos por la autoridad ambiental.
- Durante este periodo se realizan las mesas de trabajo con el contratista y SS INVIAS para atender los pendientes ambientales del proyecto y revisión del informe mensual ambiental.
- Se recomienda al Contratista verificar que todas las obras a ejecutar se construyan con las especificaciones y ubicación del diseño autorizado en la Resolución 2170 de 2008.
- Se recomienda al Contratista que previo al inicio de las obras se informe de su ejecución al área ambiental de la Interventoría, con el fin de garantizar que la ejecución de estas actividades se desarrollen dentro del marco de la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008.
- Se recomienda al Contratista priorizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 2170 de 2008, sus modificaciones, Autos de seguimiento y control derivados y PMA, con el propósito de evitar el inicio de posibles procesos sancionatorios por parte de las Autoridades Ambientales competentes.
- Se recomienda al Contratista dar respuesta de manera oportuna a los comunicados y apremios emitidos por parte de la Interventoría, con el fin de evitar el inicio de posibles procesos sancionatorios por el incumplimiento a las obligaciones contractuales.

- Se recomienda al contratista que mes a mes realice la actualización de la revisión de los pendientes ambientales del proyecto y proponer alternativas de solución en el marco de sus obligaciones contractuales.

Área seguridad y salud en el trabajo:

- Se recomienda al contratista mantener los accesos en buen estado con escalones y barandas de seguridad para evitar accidentes laborales por riesgo locativo en los diferentes frentes de trabajo.

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR

8.1.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
8007	José Ignacio Cadena López	Veeduría Ciudadana	Veeduría Ciudadana	Remisión informe mensual de interventoría - Febrero de 2026. Contrato 1111 de 2021
8008	José Ignacio Cadena López	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Informe Final de cierre Contingencia Ambiental Talud K7+400 a K7+430 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco
8013	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2177-123768 con recibido interno 04-6957-25 del 18-12-2025, con asunto “Respuesta a oficio Putumayo 04-6367-25 con número de radicado 206055, con asunto: “Atención a observaciones fundaciones Muro 25, Sector 2 K9+501.24 K9+514.19”. No Aprobación al diseño de Fundación Muro 25.
8015	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2230-124276 con recibido interno 04-7055-26 del 2-02-2026, con asunto “Respuesta a oficio Putumayo04-7621-25 con número de radicado 223681 con asunto: “Atención a observaciones informe de diseño fundaciones Puente 14, Sector 2 K8+511.45 K8+575.71”. No Aprobación al diseño de Fundación Puente 14.
8016	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2258-124449 con recibido interno 04-7118-26 del 18-02-2026, con asunto “Entrega de procedimiento de montaje estructura metálica Puente 12 A”. Aprobación procedimiento de montaje estructura metálica Puente 12 A.
8018	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2281-124622 con recibido interno 04-7178-26 del 3-03-2026, con asunto “Respuesta a oficio Putumayo04-7925-26 con número de radicado 227817 con asunto: Reiteración comunicado Putumayo04-7641-25 de fecha 19-12-2025 con asunto “Solicitud ajuste a coordenadas de empalme con el Sector No.3 al DG Aprobado mediante comunicado Putumayo04-5152-24, que comprende del K12+100 hacia mayores del Sector No.2”.
8020	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2284-124637 con recibido interno 04-7187-26 del 4-03-2026, con asunto “Entrega informe de Diseño estructural muros de contención de altura 3.0 m y 4.0 m sin micropilotes, Sector 2 K8+100 - K12+100”. Aprobación Diseño Estructural Muros Tipo H de 3m

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
				a 4m.
8021	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Remisión del ajuste al Plan de inversión social del contrato 1111/2021
8023	Jose Ignacio Cadena Lopez	José Ricardo Burbano Bárcenas	INVIAS	Remisión Acta de Ajuste Definitiva No. 54 – Contrato 1111 de 2021 - Contrato 1111 de 2021.
8024	Jose Ignacio Cadena Lopez	José Ricardo Burbano Bárcenas	INVIAS	Remisión Acta de Ajuste Definitiva No. 55 – Contrato 1111 de 2021 - Contrato 1111 de 2021.
8025	Jose Ignacio Cadena Lopez	José Ricardo Burbano Bárcenas	INVIAS	Remisión Acta de Ajuste Provisional No. 56 – Contrato 1111 de 2021 - Contrato 1111 de 2021.
8036	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Alcance Putumayo04-7491-25 radicado 222275 del 24/11/2025 con asunto; Respuesta a su comunicado CSF-2109-123347 con recibo 04-6751-25M1 del 04/11/2025 con asunto; Respuesta a la comunicación Putumayo04-7283-25 “Remisión oficio 2025S-VBOG-074973 con asunto; Respuesta a radicado 2025EVUVRAZ-099853 (Putumayo04-7096-25) del 8 de septiembre de 2025 Divergencia”.
8037	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 23 Contingencia Ambiental Talud K6+800 hasta K6+900 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
8038	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Observación Técnica – Incumplimiento de diseños estructurales en cimentación de Muro 9A (Módulo 1). (K7+119 – K7+130).
8039	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 23 Contingencia Ambiental Talud K7+431 hasta K7+500 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
8040	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 50 Contingencia Ambiental Talud K7+500 hasta K7+600 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
8041	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Solicitud certificado firmado por contador público o revisor fiscal, base de liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1%.
8042	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Traslado oficio 2026S-VBOG-013755 del 12/03/2026. Solicitud de información cartográfica Inversión del 1%, así como las compensaciones ambientales adelantadas.

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
8043	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Apremio – Incumplimiento PROGRAMA 2: PROGRAMA MANEJO Y PROTECCIÓN DEL SUELO Ficha: MS – 2 MANEJO Y RECUPERACIÓN DE TALUDES DE CORTE Y TERRAPLÉN.
8044	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Solicitud estado Permiso Ocupación de cauces fuentes identificadas del K7+100 a K12+000.
8045	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta al comunicado CSF-2295-124693 con radicado interno 04-7208-26 Plan de Manejo Arqueológico correspondiente a las áreas adicionales del Programa de Arqueología Preventiva en el marco de la modificación de la Licencia Ambiental 2170 de 2008.
8048	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta comunicado con consecutivo CSF-2310-124780 con radicado interno No. 04-7256-26M1, con asunto: “Balance de cantidades, Acta de Modificación No 17 y reprogramación al programa de inversiones No 17”. Devolución por inconsistencias
8049	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Remisión de respuesta de INVIAS y DCCAE sobre excavación por perforación y voladura (Radicado 2026S-VPUT-015281).
8050	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Solicitud % programado vs % ejecutado con corte a cada lunes para cronograma vigente de Estudios Y Diseños.
8054	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Remisión de pre-acta predial No.1 correspondiente al mes de marzo de 2026, aprobada por interventoría para su validación
8055	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2306-124738 con recibo 04-7236-26M1 del 12/03/2026 con asunto; Respuesta al comunicado Putumayo04-7983-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2291-124647 con recibo 04-7192-26M1 del 04/03/2026 con asunto; Entrega de informe de actividades ambientales correspondientes al mes de febrero 2026.
8056	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2316-124793 con recibo 04-7263-26M1 del 17/03/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7921-26 del 25 de febrero de 2026, con Asunto: Traslado 2026SVBOG-006373 con recibo 04-7120-26 del 18/02/2026 con asunto: Respuesta a entrada INVIAS 2026EVUVRAZ-001792 (Putumayo04-7701-26) de 19 de enero de 2026, Plan de Inversión Ambiental Versión 3.
8057	Jose Ignacio	Jesus	Consorcio San	Respuesta a su comunicado CSF-2323-124814 con

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
	Cadena Lopez	Andres Castro Zapata	Francisco	recibo 04-7272-26M1 del 18/03/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7843-26, con asunto: Liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1% año 2025.
8062	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Respuesta oficio 20264700191891 del 24/02/2026 con asunto; Resultado de la Segunda Verificación Preliminar del ICA No 27 – Frente San Francisco (VPI). Radicado ANLA: 20256201551242 del 11 de diciembre de 2025. Proyecto: Variante de Mocoa – San Francisco. Expediente: LAM1358.
8065	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Remisión de respuesta de DANCP a la solicitud de Determinación de Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa.
8066	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 34 Contingencia Ambiental Talud K7+750 a K7+850 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
8067	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 12 Contingencia Ambiental No. 10 Talud K0+900 hasta K1+240 Sector 1 Frente San Francisco, contrato 1111 de 2021.
8068	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a sus comunicados CSF-2303-124720 con recibo 04-7232-26M1 del 12/03/2026 con asunto; Entrega por parte del Consorcio San Francisco del cambio menor de Puente 14B, para su revisión y aprobación y CSF-2311-124781 con recibo 04-7254-26M1 del 16/03/2026 con asunto; Entrega por parte del Consorcio San Francisco del cambio menor de Puente 14C, para su revisión y aprobación.
8071	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Remisión ICA N° 28 proyecto “Construcción Variante San Francisco Mocoa”, expediente LAM 1358. Contrato 1111 de 2021 Frente San Francisco.
8073	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2319-124802 con recibo 04-7266-26M1 del 17/03/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7990-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2275-124592 con recibo 04-7167-26M1 del 27/02/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7872-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2246-124369 con recibo 04-7094-26M1 del 11/02/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7803-26, con asunto: Solicitud ICA No. 28.
8074	Jose Ignacio Cadena	Jesus Andres	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2317-124795 con recibo 04-7264-26M1 del 17/03/2026 con asunto;

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
	Lopez	Castro Zapata		Respuesta a su comunicado Putumayo04-7956-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2249-124390 con recibo 04-7097-26M1 del 12/02/2026 con asunto; Radicación de los cinco (5) predios seleccionados por Corpoamazonia en visita técnica y ambiental de campo realizada los días 01, 02 y 03 de diciembre de 2025, en el marco de la Línea 2 del Plan de Inversión Forzosa no inferior al 1%.
8075	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2304-124721 con recibo 04-7235-26M1 del 12/03/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7935-26, con asunto: Traslado oficio ANLA 20264700191891 del 24/02/2026 con asunto: Resultado de la Segunda Verificación Preliminar del ICA No 27 – Frente San Francisco (VPI). Radicado ANLA: 20256201551242 del 11 de diciembre de 2025. Proyecto: Variante de Mocoa – San Francisco. Expediente: LAM1358.
8076	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2297-124701 con recibo 04-7215-26M1 del 10/03/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7828-26, Con Asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2224-124233 con recibo 04-7047-26M1 del 29/01/2026 con asunto; Respuesta al comunicado Putumayo04-7688-25, con asunto: Remisión oficio INVIAS-SS-OS-R25-0252, respuesta MADS solicitud de unificación del polígono de sustracción de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa.
8077	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2296-124699 con recibo 04-7211-26M1 del 09/03/2026 con asunto; INFORME FINAL DE LA CONTINGENCIA AMBIENTAL POR PROCESOS EROSIVOS, MOVIMIENTOS EN MASA Y DESLIZAMIENTO PRESENTADO ENTRE EL K7+400 AL K7+430– REPORTADA COMO CONTINGENCIA Nº3.
8078	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2286-124639 con recibo 04-7273-26M1 del 18/03/2026 con asunto; Respuesta a su comunicación Putumayo04-7486-25 "Reembolso Visitas ANLA"
8079	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Requerimientos técnicos para la entrega de Estudios y Diseños – Tramo K12+100 al K21+899.
8080	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2324-124833 con recibido interno 04-7283-26 del 24-03-2026, con asunto “Entrega de información correspondiente al desarrollo de exploraciones geotécnicas del Sector K12+033 a K12+830 de la Variante San Francisco – Mocoa, Frente San Francisco”.

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
8081	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Solicitud de reconocimiento económico monitoreos físico químicos e hidrobiológicos paso fuente hídrica Puente 12 B, Frente San Francisco, Contrato 1111 de 2021.
8083	Jose Ignacio Cadena Lopez	Nelson Yovany Jiménez González	INVIAS	Remisión Acta de Ajuste Definitiva No. 54 – Contrato 1111 de 2021 - Contrato 1111 de 2021.
8084	Jose Ignacio Cadena Lopez	Nelson Yovany Jiménez González	INVIAS	Remisión Acta de Ajuste Definitiva No. 55 – Contrato 1111 de 2021 - Contrato 1111 de 2021.
8085	Jose Ignacio Cadena Lopez	Nelson Yovany Jiménez González	INVIAS	Remisión Acta de Ajuste Provisional No. 56 – Contrato 1111 de 2021 - Contrato 1111 de 2021.
8096	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Relación equipo y personal disponible para atención de emergencias durante el receso de Semana Santa 2026 – Contrato de Obra No. 1111 de 2021.
8097	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2236-124291 con recibido interno 04-7075-26 del 5-02-2026, con asunto “Respuesta a oficio Putumayo 04-6793-25 con número de radicado 212412 con asunto: “Atención a observaciones informe de diseño fundaciones Puente 14E, Sector 2 K9+284.36 - K9+304.96”. No Aprobación al diseño de Fundación Puente 14E.
8098	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2237-124292 con recibido interno 04-7062-26 del 4-02-2026, con asunto “Respuesta a oficio Putumayo 04-6718-25 con número de radicado 211298 con asunto: “Atención a observaciones informe de diseño fundaciones Puente 15, Sector 2 K9+451.36 - K9+497.46”. No Aprobación al diseño de Fundación Puente 15.
8099	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2318-124796 con recibido interno 04-7265-26 del 17-03-2026, con asunto “Respuesta a observaciones “Informe de Nivelación rasante losa Steel Deck Puente 12B y Rediseño estructural losa Steel Deck Puente 12B, Sector 2 K7+953.43 K8+041.49”. Aval nivelación losa puente 12B”.
8104	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Remisión de los documentos soportes al comunicado de 2026-2-002410-008737 Id: 722995 de DANCP a la solicitud de Determinación de Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa proyecto Variante San Francisco Mocoa.
8105	Jose Ignacio	Jesus	Consorcio San	Respuesta su comunicado CSF-2318-124796 con

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
	Cadena Lopez	Andres Castro Zapata	Francisco	recibido interno 04-7265-26 del 17-03-2026, con asunto “Respuesta a observaciones “Informe de Nivelación rasante losa Steel Deck Puente 12B y Rediseño estructural losa Steel Deck Puente 12B, Sector 2 K7+953.43 K8+041.49”. Aprobación al rediseño estructural losa Steel Deck Puente 12B.
8107	Jose Ignacio Cadena Lopez	Veeduría Ciudadana	Veeduría Ciudadana San Francisco	Entrega del informe de trazabilidad – Línea 2 Plan de Inversión Forzosa de no menos del 1%
8108	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 15 Contingencia Ambiental Talud K8+170 hasta K8+300 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
8109	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 15 Contingencia Ambiental Talud K7+860 hasta K8+160 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco
8110	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 50 Contingencia Ambiental Talud K7+100 hasta K7+250 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
8111	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 54 Contingencia Ambiental Talud K6+920 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
8112	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Traslado Oficio 20264500310531 del 26/03/2026 con asunto; Respuesta al oficio ANLA 20266200273132 del 2 de marzo de 2026, solicitud cesión de licencia otorgada mediante la Resolución 2170 del diciembre 05 de 2008, para el proyecto vial "Variante Mocoa - San Francisco". Expediente: LAM1358
8113	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a comunicado CSF-2275-124589 radicado interno 04-7163-26 con asunto: Respuesta al comunicado Putumayo04-7708-26 con asunto Cumplimiento a la Resolución 0312 de 2019, por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST; y a comunicado CSF-2280-124617 con asunto: Respuesta al comunicado Putumayo04-7866-26 y alcance al comunicado CSF-2275-124589.
8115	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2216-124194 con recibido interno 04-7036-26 del 27-01-2026, con asunto “Respuesta a oficio Putumayo 04-6683-25 con número de radicado 210953, con asunto: “Atención a observaciones Volumen de Estudio de Diseño de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Sector 2 K8+103 - K10+103”. No Aprobación al diseño de Fundación Puente 14D.

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
8116	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2264-124472 con recibido interno 04-7127-26 del 19-01-2026, con asunto “Respuesta a oficio Putumayo 04-7604-25 con número de radicado 223620 con asunto: “Atención a observaciones Informe diseño de fundación Puente 14B, Sector 2 K8+762.18 – K8+818.68”. No Aprobación al diseño de Fundación Puente 14B.
8118	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 24 Contingencia Ambiental Talud K7+431 hasta K7+500 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
8119	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 24 Contingencia Ambiental Talud K6+800 hasta K6+900 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
8120	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 51 Contingencia Ambiental Talud K7+500 hasta K7+600 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
8121	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta al comunicado CSF-2337-124911 con radicado interno 04-7320-26 Informe de seguimiento a la Gestión Social vigencia marzo 2026.
8122	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Remisión Radicados Ajustes Segunda VPI ICA 27, ICA No. 28 y reporte final Contingencia Ambiental No. 3 Talud K7+400 a K7+430.
8128	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Requerimiento de carácter URGENTE para la radicación del Acta de Recibo Parcial de Obra No. 57 (Mes de marzo de 2026).
8129	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Aprobación del Informe de seguimiento a la Gestión Social vigencia marzo 2026.
8131	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Remisión copia de concepto especializado en pavimentos, sobre estado de intervención en corredor Vial Mallama-Ricaurte, Nariño.
8132	Jose Ignacio Cadena Lopez	José Ricardo Burbano Bárcenas	INVIAS	Remisión Acta de Ajuste Definitiva No. 56 – Contrato 1111 de 2021 - Contrato 1111 de 2021.
8133	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Remisión del Informe Trimestral Ambiental de Interventoría N° 19 para el Contrato de obra 1111 de 2021 en el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026 Frente San Francisco.
8134	Jose Ignacio	Martha	INVIAS	Remisión del Informe Trimestral Social N° 19 para el

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
	Cadena Lopez	Elena Romero Moreno		Contrato de obra No.1111 de 2021- Frente San Francisco, en el periodo comprendido entre el 01 enero 2026 al 31 de marzo 2026.
8140	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Requerimiento de información y subsanación de observaciones - Acta de Fijación de Ítems No Previstos No. 10. Observaciones Dirección Territorial Putumayo radicado 2026S-VPUT-017358.
8141	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 13 Contingencia Ambiental No. 10 Talud K0+900 hasta K1+240 Sector 1 Frente San Francisco, contrato 1111 de 2021.
8142	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 35 Contingencia Ambiental Talud K7+750 a K7+850 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
8143	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta comunicado con consecutivo CSF-2345-124955 con radicado interno No. 04-7340-26M1, con asunto: “Respuesta a su comunicación Putumayo04-7805-26, Rediseño estructural sistema de losas puentes 11, 12A y 12B”. Requerimiento de información técnica y económica complementaria sobre el rediseño de losa del Puente 12B.
8146	Eduardo Enrique Ramos Arnedo	Julio Cesar Villota Cabrera	Consorcio San Francisco	Traslado de la solicitud de documentos para proceder con modificación contractual del contrato 1111 de 2021
8152	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF_2349-124964 con recibido interno 04-7344-26 del 7-04-2026, con asunto “Procedimiento constructivo para instalación de micropilotes para los muros de contención” Aval al procedimiento constructivo para instalación de micropilotes para los muros de contención.
8155	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Remisión comunicado Invias 2026S-VPUT-019610 del 1 de abril de 2026, concepto favorable y viabilizan la elaboración de los estudios y diseños para la estabilización del punto crítico K1+270, por un valor estimado de CIENTO DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($118.370.038), IVA incluido, y un plazo estimado de cuarenta y cinco (45) días.
8161	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2342-124919 con recibo 04-7337-26M1 del 06/04/2026 con asunto: Entrega de informe de actividades ambientales correspondientes al mes de marzo -2026.
8165	Jose Ignacio Cadena	Martha Elena	INVIAS	Remisión Cambio Menor Puente 14 B y Puente 14 C, Proyecto Variante Mocoa – San Francisco

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
	Lopez	Romero Moreno		Expediente LAM1358 Frente San Francisco. Contrato 1111 de 2021.
8168	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta comunicado con consecutivo CSF-2336-124910 con radicado interno No. 04-7325-26M1, con asunto: “Respuesta a comunicado de asunto “Respuesta comunicado con consecutivo CSF-2310-124780 con radicado interno No. 04-7256-26M1, con asunto: “Balance de cantidades, Acta de Modificación No 17 y reprogramación al programa de inversiones No 17”. Devolución por inconsistencias.””.
8171	Jose Ignacio Cadena Lopez	José Ricardo Burbano Bárcenas	INVIAS	Remisión Acta de Obra No. 57 – Contrato 1111 de 2021 (Variante San Francisco - Mocoa)
8174	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2328-124848 con recibo 04-7301-26M1 del 25/03/2026 con asunto: Entrega de formatos de liberación de actividades ambientales de obra – periodo septiembre de 2025 a febrero de 2026.
8175	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reiteración de solicitud de directriz sobre el trámite de Cesión Parcial de la Licencia Ambiental, frente San Francisco.
8176	Jose Ignacio Cadena Lopez	José Ricardo Burbano Bárcenas	INVIAS	Presentación de la Divergencia de Acta de Recibo Definitivo y Reconocimiento de actividades en el sector Mallama.
8179	Jose Ignacio Cadena Lopez	Veeduría San Francisco	Veeduría Ciudadana	Remisión informe mensual de interventoría - marzo de 2026. Contrato 1111 de 2021.
8180	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2281-124622 con recibido interno 04-7178-26 del 3-03-2026, con asunto “Respuesta a oficio Putumayo04-7925-26 con número de radicado 227817 con asunto: Reiteración comunicado Putumayo04-7641-25 de fecha 19-12-2025 con asunto “Solicitud ajuste a coordenadas de empalme con el Sector No.3 al DG Aprobado mediante comunicado Putumayo04-5152-24, que comprende del K12+100 hacia mayores del Sector No.2”. Visto Bueno a señalización y seguridad del k20+300 al k21+900 por corrección de cota y coordenada de empalme del sector No.2 con el Sector No.3.
8182	Jose Ignacio Cadena Lopez	Nelson Yovany Jiménez González	INVIAS	Traslado Solicitud Activación Cláusula Vigésima Novena “Divergencias y Solución de Controversias” Contrato No. 1111 de 2021. Radicado CSF-2340-124915 con asunto; Respuesta a la comunicación Putumayo04- 8036-26, divergencia sobre aprobación

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
				de ítems de inventario forestal. CO 1111-2021. "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.
8183	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 55 Contingencia Ambiental Talud K6+920 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
8184	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a comunicado CSF-2333-124891, con radicado interno 04-7316-26M1 del 27/03/2026, con asunto: "Respuesta a su comunicación Putumayo04-7865-26, Remisión de Análisis de Precios Unitarios No Previstos correspondientes a Aisladores Sísmicos Puentes 12A y 12B."
8187	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2348-124963 con recibido interno 04-7343-26 del 7-04-2026, con asunto "Respuesta a oficio Putumayo 04-8015-26 con número de radicado 228930, con asunto "Atención a observaciones Informe de diseño de fundación Puente 14, Sector 2 K8+511.45 K8+575.71". Aprobación al diseño de Fundación Puente 14.
8189	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Remite Pre acta Social N° 58 Contrato 1111/2021 del Frente San Francisco
8190	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a los comunicados CSF-2341-124917 con radicado interno 04-7326-26 Entrega del radicado de información adicional solicitada por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa - DANCP- Radicado 2026-2-002410-008737
8192	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2353-124969 con recibo 04-7348-26-M1 del 07/04/2026 con asunto: Respuesta a su comunicado Putumayo04-8068-26, con asunto: Respuesta a sus comunicados CSF-2303-124720 con recibo 04-723226M1 del 12/03/2026 con asunto; Entrega por parte del Consorcio San Francisco del cambio menor del Puente 14B, para su revisión y aprobación y CSF-2311-124781 con recibo 04-7254-26M1 del 16/03/2026 con asunto; Entrega por parte del Consorcio San Francisco del cambio menor de

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
				Puente 14C, para su revisión y aprobación..
8196	Jose Ignacio Cadena Lopez	José Ricardo Burbano Bárcenas	INVIAS	Respuesta a comunicado 2026S-VPUT-023830, con radicado interno 04-7385-26, con asunto: "Traslado Solicitud de intervención técnica urgente afectaciones vía San Francisco Mocoa (km 75) y red vial vereda Chorlaví."
8199	Jose Ignacio Cadena Lopez	Nelson Yovany Jiménez González	INVIAS	Remisión Impresa y magnética de Estudios y Diseños Sector No1 del k0+000 al k7+100 y Sector No.2 primer Kilómetro, comprendido entre el K7+100 y el K8+100.
8200	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2347-124957 con recibo 04-7342-26M1 del 06/04/2026 con asunto: Respuesta a su comunicado Putumayo04-8043-26 del 18 de marzo de 2026, con Asunto: Apremio – Incumplimiento PROGRAMA 2: PROGRAMA MANEJO Y PROTECCIÓN DEL SUELO Ficha: MS – 2 MANEJO Y RECUPERACIÓN DE TALUDES DE CORTE Y TERRAPLÉN
8201	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 51 Contingencia Ambiental Talud K7+100 hasta K7+250 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
8202	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 16 Contingencia Ambiental Talud K7+860 hasta K8+160 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
8203	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-1640-119632 con recibido interno 04-5327-24 del 8-1-2024, con asunto "Entrega informe de Diseño Talud No. 19 CI-19CD". No Aprobación Diseño de estabilización No.19.
8204	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Remisión de información de predios seleccionados para el cumplimiento de la línea de inversión "Adquisición de predios y/o mejoras en zonas de páramo, bosques de niebla y áreas de influencia de nacimiento y recarga de acuíferos, estrellas fluviales y rondas hídricas" Artículo Primero Resolución 1056 del 11 de junio de 2020.
8206	Jose Ignacio Cadena Lopez	José Ricardo Burbano Bárcenas	INVIAS	Traslado con concepto de aprobación a la solicitud de modificación de cantidades de obra No.17 y reprogramación del programa de inversión No.17 al Contrato de Obra No. 1111 de 2021. Recibida mediante comunicado CSF-2363-125064 con asunto "Respuesta a comunicado Putumayo04-8168-26 "Respuesta comunicado con consecutivo CSF-2336-124910 con radicado interno No. 04-7325-26M1, con asunto: "Respuesta a comunicado de asunto "Respuesta comunicado con consecutivo CSF-2310-124780 con radicado interno No. 04-7256-

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
				26M1, con asunto: “Balance de cantidades, Acta de Modificación No 17 y reprogramación al programa de inversiones No 17”. Devolución por inconsistencias.””””. Recibido Interventoría 04-7386-26-M1.
8207	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Solicitud de atención a observaciones – Requerimiento URT
8208	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2353-124969 con recibo 04-7348-26-M1 del 07/04/2026 con asunto: Respuesta a su comunicado Putumayo04-8068-26, con asunto: Respuesta a sus comunicados CSF-2303-124720 con recibo 04-723226M1 del 12/03/2026 con asunto; Entrega por parte del Consorcio San Francisco del cambio menor del Puente 14B, para su revisión y aprobación y CSF-2311-124781 con recibo 04-7254-26M1 del 16/03/2026 con asunto; Entrega por parte del Consorcio San Francisco del cambio menor de Puente 14C, para su revisión y aprobación.
8209	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2340-124915 con recibo 04-7324-26M1 del 30/03/2026 con asunto: Respuesta a la comunicación Putumayo04-8036-26, divergencia sobre aprobación de ítems de inventario forestal.
8210	Jose Ignacio Cadena Lopez	Nelson Yovany Jiménez González	INVIAS	Envío Acta de obra No.57. Contrato 1111 de 2021. Variante San Francisco - Mocoa
8211	Jose Ignacio Cadena Lopez	Nelson Yovany Jiménez González	INVIAS	Remisión Acta de Ajuste Definitiva No. 56 – Contrato 1111 de 2021 - Contrato 1111 de 2021.
8212	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2173-123754 con recibido interno 04-6942-25 del 16-12-2025, con asunto “Respuesta a oficio Putumayo 04-7213-25 con número de radicado 218742, con asunto: “Atención a observaciones fundaciones Muro 14, Sector 2, K8+579.27 K8+590.77”. Aprobación al diseño de Fundación superficial tipo zapata para el Muro 14.
8213	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Solicitud detalles constructivos por cada unidad de contención para los muros tipo del K8+200 al K11+750.
8214	Jose Ignacio Cadena Lopez	Néstor Augusto Correal	Consorcio San Francisco	Remisión de concepto favorable y viabilizarían para la elaboración de estudios y diseños – Talud K1+270.

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
8215	Jose Ignacio Cadena Lopez	José Ricardo Burbano Bárcenas	INVIAS	Remisión Acta de Ajuste Provisional No. 57 – Contrato 1111 de 2021 - Contrato 1111 de 2021.
8216	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Remisión de pre-acta predial del mes abril del contrato 1111/2021 Frente San Francisco
8219	Jose Ignacio Cadena Lopez	Oscar Escobar	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO	Respuesta al comunicado con recibido interno 04-7388-26 referente a la solicitud donación de pintura para el mantenimiento del parque los fundadores en el marco de la celebración del día del niño.
8220	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2362-125062 con recibo 04-7383-26-M1 del 16/04/2026 con asunto: Respuesta a su comunicado Putumayo04-8112-26, con asunto: Traslado Oficio 20264500310531 del 26/03/2026 con asunto; Respuesta al oficio ANLA 20266200273132 del 2 de marzo de 2026, solicitud cesión de licencia otorgada mediante la Resolución 2170 del diciembre 05 de 2008, para el proyecto vial "Variante Mocoa - San Francisco". Expediente: LAM1358
8221	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2263-124470 con recibo 04-7126-26M1 del 19/02/2026 con asunto: Respuesta a su comunicado Putumayo04-7720-26, con asunto: Traslado Oficio INVIAS-SS-OS-R25-0274 con recibo 04-7006-26 del 19/01/2026 con asunto; Respuesta RE25-1946 - Remisión comunicación Min Ambiente, Radicado No. 21022025E2045836 19 de diciembre de 2025 Contingencias Frente San Francisco (Variante Mocoa–San Francisco).
8222	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2253-124402 con recibo 04-7104-26M1 del 13/02/2026 con asunto: Respuesta a su comunicado Putumayo04-7766-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2202-124095 con recibo 04-7002-26M1 del 15/01/2026 con asunto; Solicitud de pronunciamiento sobre inclusión del Puente 12B en el plan de monitoreos de calidad de agua – Auto 006425 del 12 de agosto de 2024
8223	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Respuesta a su comunicado 2026S-VBOG-006373 con recibo 04-7120-26 del 18/02/2026 con asunto; Respuesta a entrada INVIAS 2026E-VUVRAZ-001792 de 19 de enero de 2026, Plan de Inversión Ambiental Versión 3
8224	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero	INVIAS	Reporte Parcial No. 52 Contingencia Ambiental Talud K7+500 hasta K7+600 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
		Moreno		
8227	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta al comunicado CSF-2325-124834 con radicado interno 04-7285-26 Notificación de atrasos en la ejecución – Consulta Previa, Sustracción de Reserva Forestal y Modificación de Licencia Ambiental.
8229	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta comunicado con consecutivo CSF-2334-124893 con radicado interno No. 04-7317-26M1, con asunto: "Solicitud de reconocimiento económico de reingeniería por variación en empalme geométrico entre Sector 2 (San Francisco) y Sector 3 (Mocoa)".
8230	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2366-125080 con recibido interno 04-7391-26 del 21-04-2026, con asunto "Respuesta a oficio Putumayo 04-8018-26 con número de radicado 228935, con asunto "Respuesta su comunicado CSF-2281-124622 con recibido interno 04-7178 26 del 3-03-2026, con asunto "Respuesta a oficio Putumayo04-7925-26 con número de radicado 227817 con asunto: Reiteración comunicado Putumayo04-7641-25 de fecha 19-12-2025 con asunto "Solicitud ajuste a coordenadas de empalme con el Sector No.3 al DG Aprobado mediante comunicado Putumayo04-5152-24, que comprende del K12+100 hacia mayores del Sector No.2".
8233	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta a su comunicado CSF-2367-125090 con recibo 04-7392-26M1 del 21/04/2026 con asunto: Respuesta al comunicado Putumayo04-8161-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2342-124919 con recibo 04-7337-26M1 del 06/04/2026 con asunto: Entrega de informe de actividades ambientales correspondientes al mes de marzo – 2026
8234	Jose Ignacio Cadena Lopez	José Ricardo Burbano Bárcenas	INVIAS	Respuesta al comunicado remitido por INVIAS con radicado 2026S-VPUT-007444 recibido interno 04-7135-26 Información proyecto Variante San Francisco Mocoa por parte de URT-Contrato 1111/2021.
8235	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 25 Contingencia Ambiental Talud K7+431 hasta K7+500 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
8236	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 25 Contingencia Ambiental Talud K6+800 hasta K6+900 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
8237	Eduardo Enrique	José Ricardo	INVIAS	Respuesta al comunicado 2026S-VPUT-021674 con recibido interno 04-7361-26 con asunto: "Solicitud de

NUMERO DE CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADA POR	DIRIGIDO A:		ASUNTO
		NOMBRE	ENTIDAD	
	Ramos Arnedo	Burbano Bárcenas		documentos para proceder con modificación contractual (Otrosí) para los Contratos de Obra 964 y 1111 de 2021 Definición de alcances finales.". Traslado comunicado CSF-2376-125166 con concepto Técnico-Jurídico frente a las pretensiones económicas y modificaciones de alcance del Consorcio San Francisco. Contrato 1111 de 2021. R.I. 04-7416-26 M1.
8239	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Cumplimiento de personal profesional mínimo - Grupo de especialistas. Contrato 1111 de 2021.
8240	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2369-125117 con recibido interno 04-7405-26 del 22-04-2026, con asunto "Respuesta a oficio Putumayo 04-7863-26 con número de radicado 227012, con asunto "Atención a observaciones Informe de diseño de fundación Puente 14A, Sector 2 K8+658.91 K8+700.91". No Aprobación al diseño de Fundación Puente 14A.
8244	Jose Ignacio Cadena Lopez	Nelson Yovany Jiménez González	INVIAS	Remisión Acta de Ajuste Provisional No. 57 – Contrato 1111 de 2021 - Contrato 1111 de 2021.
8246	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 36 Contingencia Ambiental Talud K7+750 a K7+850 contrato 1111 de 2021 Sector 2 Frente San Francisco.
8247	Jose Ignacio Cadena Lopez	Martha Elena Romero Moreno	INVIAS	Reporte Parcial No. 14 Contingencia Ambiental No. 10 Talud K0+900 hasta K1+240 Sector 1 Frente San Francisco, contrato 1111 de 2021.
8248	Jose Ignacio Cadena Lopez	Jesus Andres Castro Zapata	Consorcio San Francisco	Respuesta su comunicado CSF-2369-125117 con recibido interno 04-7036-26 del 27-01-2026, con asunto "Respuesta a oficio Putumayo 04-6683-25 con número de radicado 210953, con asunto: "Atención a observaciones Volumen de Estudio de Diseño de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Sector 2 K8+103 - K10+103". Observaciones Volumen de Estudio de Diseño de Hidrología, Hidráulica y Socavación, Sector 2 K8+103 - K10+103.

8.1.2 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
7335	2026S-VPUT-019610	6-Apr-26	INVIAS	José Ricardo Burbano Bárcenas	Jose Ignacio Cadena Lopez	Respuesta a comunicación Putumayo04-7204-25 Viabilizarían de estudios y diseños para estabilización del talud en el sector crítico K1+270.
7337	CSF-2342-124919	6-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Entrega de informe de actividades ambientales correspondientes al mes de marzo -2026
7338	CSF-2343-124947	6-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Alcance a la comunicación CSF-2285-124638 “Acta de Fijación de Precios No Previstos No. 10”
7339	CSF-2344-124952	6-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Informe de reunión – Trámite permiso de ocupación de cauce puente sobre el río San Pedro.
7340	CSF-2345-124955	6-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Respuesta a su comunicación Putumayo04-7805-26, Rediseño estructural sistema de losas puentes 11, 12A y 12B
7341	CSF-2346-124956	6-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Informe No. 43 de Calidad - marzo 2026
7342	CSF-2347-124957	6-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Respuesta a su comunicado Putumayo04-8043-26 del 18 de marzo de 2026, con Asunto: Apremio – Incumplimiento PROGRAMA 2: PROGRAMA MANEJO Y PROTECCIÓN DEL SUELO Ficha: MS – 2 MANEJO Y RECUPERACIÓN DE TALUDES DE CORTE Y TERRAPLÉN.
7343	CSF-2348-124963	7-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Respuesta a oficio Putumayo 04-8015-26 con número de radicado 228930, con asunto “Atención a observaciones Informe de diseño de fundación Puente 14, Sector 2 K8+511.45 K8+575.71”
7344	CSF_2349-124964	7-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Procedimiento constructivo para instalación de micropilotes para los muros de contención
7345	CSF-2350-	7-Apr-26	Consorcio	Jesus	Jose	Respuesta a su comunicado

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
	124966		San Francisco	Andres Castro Zapata	Ignacio Cadena Lopez	Putumayo04-8074-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2317-124795 con recibo 04-7264-26M1 del 17/03/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7956-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2249-124390 con recibo 04-7097-26M1 del 12/02/2026 con asunto; Radicación de los cinco (5) predios seleccionados por Corpoamazonia en visita técnica y ambiental de campo realizada los días 01, 02 y 03 de diciembre de 2025, en el marco de la Línea 2 del Plan de Inversión Forzosa no inferior al 1%.
7346	CSF-2351-124967	7-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Entrega de Registros de Tensionamiento de Anclajes Activos.
7347	CSF-2352-124968	7-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Respuesta al comunicado No Putumayo04-8056-26 del 20 de marzo de 2026, con Asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2316-124793 con recibo 04-7263-26M1 del 17/03/2026 con asunto; Respuesta a su comunicado Putumayo04-7921-26 del 25 de febrero de 2026, con Asunto: Traslado 2026SVBOG-006373 con recibo 04-7120- 26 del 18/02/2026 con asunto: Respuesta a entrada INVIAS 2026EVUVRAZ-001792 (Putumayo04-7701-26) de 19 de enero de 2026, Plan de Inversión Ambiental Versión 3.
7348	CSF-2353-124969	7-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Respuesta a su comunicado Putumayo04-8068-26, con asunto: Respuesta a sus comunicados CSF-2303-124720 con recibo 04-723226M1 del 12/03/2026 con asunto; Entrega por parte del Consorcio San Francisco del cambio menor del Puente 14B, para su revisión y aprobación y CSF-2311-124781

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
						con recibo 04-7254-26M1 del 16/03/2026 con asunto; Entrega por parte del Consorcio San Francisco del cambio menor de Puente 14C, para su revisión y aprobación.
7349	CSF-2354-124970	7-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Respuesta a su comunicación PUTUMAYO04-7467-25, Seguimiento a la solicitud de reconocimiento por incrementos salariales.
7350	CSF-2355-124972	7-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Respuesta a su comunicación Putumayo04-7434-25, Seguimiento a la solicitud de reconocimiento por efectos de la Ley 2101 de 2021
7356	CSF-2356-124996	9-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Respuesta a su comunicado Putumayo04-8076-26, con asunto: Respuesta al MADS, sobre solicitud de unificación del polígono de sustracción de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa.
7357	2026S-VBOG-021422	9-Apr-26	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena Lopez	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-028272 (Putumayo04-8062-26). Ajustes del resultado de la segunda verificación preliminar del ICA No. 27 frente San Francisco. CI 977-2021, CO 1111-2021.
7358	2026S-VBOG-021425	9-Apr-26	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena Lopez	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-028890 (Putumayo04-8071-26). Remisión ICA N° 28 proyecto “Construcción Variante San Francisco Mocoa”, expediente LAM 1358. Contrato 1111 de 2021 Frente San Francisco.
7359	2026S-VBOG-021450	9-Apr-26	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena Lopez	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-026043 (Putumayo04-8041-26). Certificado firmado por contador público o revisor fiscal, base de liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1% y radicado ante la ANLA. CI 977 - 2021, CO 1111-2021.
7371	CSF-2357-125053	15-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro	Jose Ignacio Cadena	Remisión de estudio de suelos para fundaciones del Muro 47, K11+970 a K12+015, Sector 2,

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
				Zapata	Lopez	Subsector K10+100 a K12+100, Variante San Francisco-Mocoa, Frente San Francisco.
7372	CSF-2358-125054	15-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Remisión de estudio de suelos para fundaciones del Muro 46, K11+873 a K11+915, Sector 2, Subsector K10+100 a K12+100, Variante San Francisco-Mocoa, Frente San Francisco.
7373	CSF-2359-125055	15-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Respuesta al comunicado PUTUMAYO04-8128-26 con asunto “Requerimiento de carácter URGENTE para la radicación del Acta de Recibo Parcial de Obra No. 57 (Mes de marzo de 2026).”
7374	CSF-2360-125056	15-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Remisión de estudio de suelos para fundaciones del Muro 45, K11+835 a K11+860, Sector 2, Subsector K10+100 a K12+100, Variante San Francisco-Mocoa, Frente San Francisco.
7375	CSF-2361-125057	15-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Remisión Informe Sostenibilidad No. 57, correspondiente al mes de marzo de 2026.
7383	CSF-2362-125062	16-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Respuesta a su comunicado Putumayo04-8112-26, con asunto: Traslado Oficio 20264500310531 del 26/03/2026 con asunto; Respuesta al oficio ANLA 20266200273132 del 2 de marzo de 2026, solicitud cesión de licencia otorgada mediante la Resolución 2170 del diciembre 05 de 2008, para el proyecto vial "Variante Mocoa - San Francisco". Expediente: LAM1358
7384	CSF-2364-125065	16-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Metodología para el desarrollo del taller con Coordinadores Culturales de los municipios de Santiago, Colon, Sibundoy y San Francisco (Putumayo). En atención al comunicado Putumayo 04-7984-24 – Metodología y logística para el desarrollo de los talleres.
7385	2026S-VPUT-023830	17-Apr-26	INVIAS	José Ricardo	Jose Ignacio	Traslado Solicitud de intervención técnica urgente

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
				Burbano Bárcenas	Cadena Lopez	afectaciones vía San Francisco Mocoa (km 75) y red vial vereda Chorlaví
7386	CSF-2363-125064	17-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Respuesta a comunicado Putumayo04-8168-26 "Respuesta comunicado con consecutivo CSF-2336-124910 con radicado interno No. 04-7325-26M1, con asunto: "Respuesta a comunicado de asunto "Respuesta comunicado con consecutivo CSF2310-124780 con radicado interno No. 04-7256-26M1, con asunto: "Balance de cantidades, Acta de Modificación No 17 y reprogramación al programa de inversiones No 17". Devolución por inconsistencias.
7387	CSF-2365-125077	20-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Remisión de Fichas Prediales.
7388	S/N	17-Apr-26	Administración Municipal	Johana Elizabeth Córdoba Montenegro	Jose Ignacio Cadena Lopez	Solicitud e vinculación al consorcio de San Francisco con la donación de pintura para el mantenimiento del parque los fundadores en el marco de la celebración del día del niño.
7391	CSF-2366-125080	21-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Respuesta a oficio Putumayo 04-8018-26 con número de radicado 228935, con asunto "Respuesta su comunicado CSF-2281-124622 con recibido interno 04-7178 26 del 3-03-2026, con asunto "Respuesta a oficio Putumayo04-7925-26 con número de radicado 227817 con asunto: Reiteración comunicado Putumayo04-7641-25 de fecha 19-12-2025 con asunto "Solicitud ajuste a coordenadas de empalme con el Sector No.3 al DG Aprobado mediante comunicado Putumayo04-5152-24, que comprende del K12+100 hacia mayores del Sector No.2".
7392	CSF-2367-125090	21-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro	Jose Ignacio Cadena	Respuesta al comunicado Putumayo04-8161-26, con asunto: Respuesta a su

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
				Zapata	Lopez	comunicado CSF-2342-124919 con recibo 04-7337-26M1 del 06/04/2026 con asunto: Entrega de informe de actividades ambientales correspondientes al mes de marzo – 2026
7393	CSF-2368-125091	21-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Respuesta a su comunicado Putumayo04-8044-26, con asunto: Solicitud estado Permiso Ocupación de cauces fuentes identificadas del K7+100 a K12+000
7405	CSF-2369-125117	22/04/2026	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Respuesta a oficio Putumayo 04-7863-26 con número de radicado 227012, con asunto “Atención a observaciones Informe de diseño de fundación Puente 14A, Sector 2 K8+658.91 K8+700.91”.
7406	CSF-2370-125118	22-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Solicitud revisión y remisión pre acta predial del mes de abril de 2026.
7407	CSF-2371-125126	22-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Respuesta a oficio Putumayo 04-8116-26 con número de radicado 230210, con asunto “Atención a observaciones Informe de diseño de fundación Puente 14B, Sector 2 K8+762.18 - K8+816.68”.
7408	CSF-2372-125128	22-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Respuesta a oficio Putumayo 04-7262-25 con número de radicado 219521, con asunto “Informe de diseño de fundación Muro 43, Sector 2 K11+682.00 – K11+699.97”.
7409	2026S-VPUT-024765	21-Apr-26	INVIAS	José Ricardo Burbano Bárcenas	Jose Ignacio Cadena Lopez	Remisión Acta de Obra No. 57 - Marzo 2026 - Cto 1111
7410	2026S-VPUT-024763	21-Apr-26	INVIAS	Jose Ricardo Burbano Bárcenas	Jose Ignacio Cadena Lopez	Remisión Acta de Ajuste Definitiva No 56D - Febrero 2026 - Cto 1111
7412	CSF-2373-125148	23-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Estado de estudios y diseños e identificación de alcance y reconocimiento económico – Tramo hasta y posterior al Km 14+000
7413	CSF-2374-125151	24-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro	Jose Ignacio Cadena	Respuesta a los comunicados Putumayo04-7966-26 y Putuamyo04-8207-26

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
				Zapata	Lopez	Requerimiento URT
7414	2026S-VBOG-025588	24-Apr-26	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena Lopez	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-036323. (Putumayo04-8165-26) Cambio menor, construcción Puente 14 B y 14 C, Variante San Francisco - Mocoa. CO 1111-2022, CI 977-2021.
7415	CSF-2375-125164	24-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Respuesta a comunicado Putumayo04-8155-26 “Remisión comunicado Invias 2026S-VPUT-019610 del 1 de abril de 2026, concepto favorable y viabilizan la elaboración de los estudios y diseños para la estabilización del punto crítico K1+270, por un valor estimado de CIENTO DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($118.370.038), IVA incluido, y un plazo estimado de cuarenta y cinco (45) días.”
7416	CSF-2376-125166	24-Apr-26	Consorcio San Francisco	Julio Cesar Villota Cabrera	Jose Ignacio Cadena Lopez	Pronunciamiento frente a su comunicación Putumayo04-8146-26 “Traslado de la solicitud de documentos para proceder con modificación contractual del contrato 1111 de 2021”- Modificación contractual del contrato 1111 de 2021, desafectación del Contrato de tramo vial entre el K14+000 y K20+825.
7418	2026S-VBOG-026068	27-Apr-26	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena Lopez	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-034494(Putumayo04-8138-26).Remisión de insumos prediales, con comunicados de obra con radicados 312-001-20260224000341, 312-001-20260224000342, CSF-2322-124809, CSF 2282-124624, y CSF-2283-124625.
7420	CSF-2377-125176	27-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Respuesta a la comunicación Putumayo04-8174-26, con asunto: Respuesta a su comunicado CSF-2328-124848 con recibo 04-7301-26M1 del 25/03/2026 con asunto: Entrega

CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
						de formatos de liberación de actividades ambientales de obra – periodo septiembre de 2025 a febrero de 2026
7421	CSF-2378-125180	27-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesús Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Entrega de perfiles y carteras de rasante Puente 12 B
7422	CSF-2379-125183	27-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena López	Remisión de estudio y diseño de estabilización y estabilidad del Talud 27, K11+770 a K11+880, Sector 2, Subsector K10+100 a K12+100, Variante San Francisco-Mocoa, Frente San Francisco.
7423	CSF-2380-125184	27-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Respuesta a oficio Putumayo 04-6479-25 con número de radicado 208106, con asunto “Atención a observaciones Informe de diseño de fundación Muro 37, Sector 2, K11+090.46 – K11+169.95”.
7424	CSF-2381-125188	28-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Remisión de estudio y diseño de estabilización y estabilidad del Talud 28, K11+910 a K11+980, Sector 2, Subsector K10+100 a K12+100, Variante San Francisco-Mocoa, Frente San Francisco.
7425	CSF-2382-125196	28-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Entrega de informe predial – Vigencia marzo de 2026.
7433	CSF-2383-125201	29-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Respuesta al comunicado Putumayo04-7767-26 – Cumplimiento con entrega de materiales a la Alcaldía de San Francisco.
7435	2026S-VBOG-027032	29-Apr-26	INVIAS	Martha Helena Romero Moreno	Jose Ignacio Cadena Lopez	Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-039470. Remisión de información de predios seleccionados para el cumplimiento de la línea de inversión “Adquisición de predios y/o mejoras en zonas de páramo, bosques de niebla y áreas de influencia de nacimiento y recarga de acuíferos, estrellas fluviales y rondas hídricas” Artículo Primero Resolución 1056 del 11 de junio de 2020.


CONSECUTIVO INTERNO DE RECIBIDO	CONSECUTIVO DE LA ENTIDAD QUE REMITE	FECHA DE RECIBIDO	ENTIDAD	ENVIADO POR	DIRIGIDA A	ASUNTO
7436	CSF-2384-125208	29-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Respuesta a su comunicación Putumayo04-7434-25, Seguimiento a la solicitud de reconocimiento por efectos de la Ley 2101 de 2021
7438	CSF-2385-125209	29-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Respuesta a su comunicación PUTUMAYO04-7467-25, Seguimiento a la solicitud de reconocimiento por incrementos salariales
7439	2026S-VPUT-027230	29-Apr-26	INVIAS	Jose Ricardo Burbano Bárcenas	Jose Ignacio Cadena Lopez	Remisión Acta de Ajuste Provisional 57P - Marzo 2026 - Cto 1111
7442	CSF-2387-125217	30-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Entrega de perfiles y carteras de rasante Puente 12A
7443	CSF-2386-125213	30-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Remisión de estudio y diseño de estabilización y estabilidad del Talud 29, K11+980 a K12+040, Sector 2, Subsector K10+100 a K12+100, Variante San Francisco-Mocoa, Frente San Francisco.
7444	CSF-2388-125220	30-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Entrega de informe de actividades ambientales correspondientes al mes de abril -2026
7445	CSF-2389-125221	30-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Entrega de Informe SST – Vigencia abril de 2026.
7446	CSF-2390-125222	30-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Entrega de informe de seguimiento a la Gestión Social vigencia abril 2026.
7448	CSF-2391-125226	30-Apr-26	Consorcio San Francisco	Jesus Andres Castro Zapata	Jose Ignacio Cadena Lopez	Presentación Hoja de Vida para el Cargo de Especialista en Geotecnia

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE LAS OBRAS

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud del K6+800 MD: Tensionamiento de anclajes.VSFM-S1

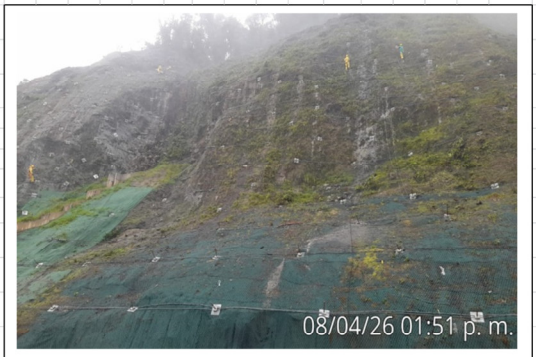

Talud del K6+800 MD: Instalación de guayas.VSFM-S1



Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Desencofrado vástago módulo 1 muro 9A. VSFM-S2



Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Muro terminado. VSFM-S2



Muro No. 3 (K7+435 - K7+488 MI): Retiro de material de explanación talud 3. VSFM-S2



Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Sin actividades. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488 MI): Perforación e instalación de anclajes. VSFM-S2




Talud No. 3 (K7+435 - K7+488 MI): Explanación de talud y desalojo de material. VSFM-S2



Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Trabajos de soldadura en estructura metálica para izaje. VSFM-S2



Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Trabajos de soldadura en estructura metálica para izaje. VSFM-S2

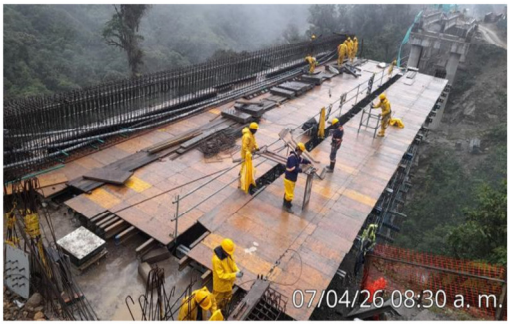

Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Instalación formaleta base para vigas 2 y 3 entre ejes 1 y 2. VSFM S-2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Instalación de formaleta para viga 1 entre ejes 1 y 2. VSFM S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Sin actividades. VSFM S-2



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Sin actividades. VSFM S-2



MURO 8 (K 7+897 -K 7+949MI): Muro terminado, pendiente realizar hormigonado de barreras New Jersey. VSFM S-2



MURO 8 (K 7+897 -K 7+949MI): Muro terminado, pendiente realizar hormigonado de barreras New Jersey. VSFM S-2



TALUD 6 (K 7+859 -K 7+950 MD): Perforación e instalación de anclajes adicionales. VSFM S-2



TALUD 6 (K 7+859 -K 7+950 MD): Perforación e instalación de anclajes adicionales. VSFM S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Sin actividades. VSFM-S-2



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Sin actividades. VSFM-S-2



MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227 MI): Hormigonado de vástagos. VSFM-S-2



MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227 MI): Instalación de formaleta para vástagos. VSFM-S-2



Talud 8 (K 8+160 - K 8+300 MD): Sin actividades. VSFM-S-2



Talud 8 (K 8+160 - K 8+300 MD): Sin actividades. VSFM-S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Muro 10 (K 8+287 - K 8+295 MI): Perforación para instalación de micro pilotes. VSFM-S-2



Muro 10 (K 8+287 - K 8+295 MI): Perforación para instalación de micro pilotes. VSFM-S-2



Puente No.13 (K 8+298 - K 8+362): Sin actividades. VSFM-S-2



Puente No.13 (K 8+298 - K 8+362): Sin actividades. VSFM-S-2



Puente No.13A (K 8+393 - K 8+415): Instalación de acero para caisson. VSFM-S-2



Puente No.13A (K 8+393 - K 8+415): Instalación de acero para caisson. VSFM-S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud 9 (K8+365-K8+510 MD): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 9 (K8+365-K8+510 MD): Sin actividades. VSFM-S2



Puente No. 14 (K8+512-K8+575): Sin actividades. VSFM-S2



Puente No. 14 (K8+512-K8+575): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 10 (K8+575-K8+655 MD): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 10 (K8+575-K8+655 MD): Sin actividades. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO




Puente 14A (K8+660-K8+700): Sin actividades. VSFM-S2



Puente 14A (K8+660-K8+700): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 11 (K8+703-K8+765 MD): Sin actividades. VSFM-S2

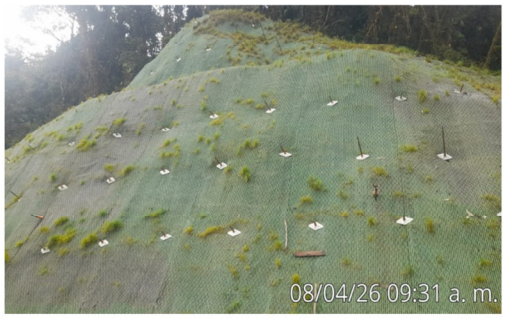

Talud 11 (K8+703-K8+765 MD): Sin actividades. VSFM-S2



Puente 14B (K8+758-K8+868): Excavaciones para caisson. VSFM-S2



Puente 14B (K8+758-K8+868): Excavaciones para caisson. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud 12 (K8+817-K8+868 MD): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 12 (K8+817-K8+868 MD): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 13 (K9+053-K9+164 MD): Tensionamiento de anclajes. VSFM-S2



Talud 13 (K9+053-K9+164 MD): Explanación de talud. VSFM-S2



Talud 13 (K9+053-K9+164 MD): Perforación e instalación de anclajes. VSFM-S2



Talud 13 (K9+053-K9+164 MD): Explanación de talud. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud del K6+800 MD: Tensionamiento de anclajes.VSFM-S1



Talud del K6+800 MD: Instalación de guayas.VSFM-S1



Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Sin actividades. VSFM-S2



Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Sin actividades. VSFM-S2



Muro No. 3 (K7+435 - K7+488 MI): Retiro de material de explanación talud 3. VSFM-S2



Muro No. 3 (K7+435 - K7+488MI): Sin actividades. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488 MI): Perforación e instalación de anclajes. VSFM-S2



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488 MI): Explanación de talud y desalojo de material. VSFM-S2



Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Trabajos de soldadura en estructura metálica para izaje. VSFM-S2



Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Trabajos de soldadura en estructura metálica para izaje. VSFM-S2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Instalación formaleta base para vigas 2 y 3 entre ejes 1 y 2. VSFM S-2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Instalación de acero viga 2 entre ejes 1 y 2. VSFM S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Sin actividades. VSFM S-2



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Sin actividades. VSFM S-2



MURO 8 (K 7+897 -K 7+949MI): Muro terminado, pendiente realizar hormigonado de barreras New Jersey. VSFM S-2



MURO 8 (K 7+897 -K 7+949MI): Muro terminado, pendiente realizar hormigonado de barreras New Jersey. VSFM S-2



TALUD 6 (K 7+859 -K 7+950 MD): Perforación e instalación de anclajes adicionales. VSFM S-2



TALUD 6 (K 7+859 -K 7+950 MD): Perforación e instalación de anclajes adicionales. VSFM S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Hormigonado de losa. VSFM-S-2



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Losa hormigonada. VSFM-S-2



MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227 MI): Hormigonado de vástagos. VSFM-S-2



MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227 MI): Hormigonado de vástagos. VSFM-S-2



Talud 8 (K 8+160 - K 8+300 MD): Sin actividades. VSFM-S-2



Talud 8 (K 8+160 - K 8+300 MD): Sin actividades. VSFM-S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Muro 10 (K 8+287 - K 8+295 MI): Hormigonado de micro pilotes. VSFM-S-2



Muro 10 (K 8+287 - K 8+295 MI): Perforación para instalación de micro pilotes. VSFM-S-2



Puente No.13 (K 8+298 - K 8+362): Adecuación a viga cabezal. VSFM-S-2



Puente No.13 (K 8+298 - K 8+362): Adecuación a viga cabezal. VSFM-S-2



Puente No.13A (K 8+393 - K 8+415): Instalación de acero para pila. VSFM-S-2



Puente No.13A (K 8+393 - K 8+415): Instalación de acero para pila. VSFM-S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud 9 (K8+365-K8+510 MD): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 9 (K8+365-K8+510 MD): Sin actividades. VSFM-S2



Puente No. 14 (K8+512-K8+575): Hormigonado de caisson. VSFM-S2



Puente No. 14 (K8+512-K8+575): Hormigonado de caisson. VSFM-S2



Talud 10 (K8+575-K8+655 MD): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 10 (K8+575-K8+655 MD): Sin actividades. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO




Puente 14A (K8+660-K8+700): Sin actividades. VSFM-S2



Puente 14A (K8+660-K8+700): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 11 (K8+703-K8+765 MD): Sin actividades. VSFM-S2

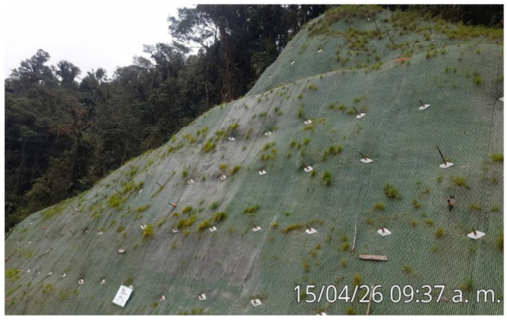

Talud 11 (K8+703-K8+765 MD): Sin actividades. VSFM-S2




Puente 14B (K8+758-K8+868): Excavaciones para caisson. VSFM-S2



Puente 14B (K8+758-K8+868): Excavaciones para caisson. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

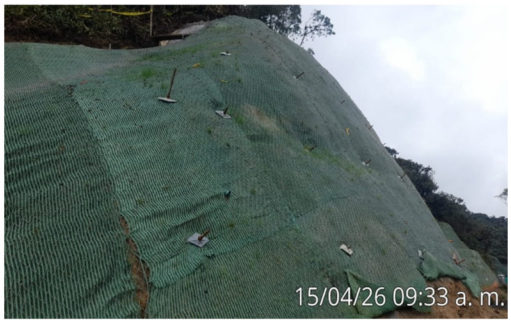

Talud 12 (K8+817-K8+868 MD): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 12 (K8+817-K8+868 MD): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 12 (K8+817-K8+868 MD): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 12 (K8+817-K8+868 MD): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 13 (K9+053-K9+164 MD): Perforación e instalación de anclajes. VSFM-S2



Talud 13 (K9+053-K9+164 MD): Explanación de talud. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud del K6+800 MD: Tensionamiento de anclajes.VSFM-S1



Talud del K6+800 MD: Instalación de guayas.VSFM-S1



Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Sin actividades. VSFM-S2



Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Sin actividades. VSFM-S2



Muro No. 3 (K7+435 - K7+488 MI): Retiro de material de explanación talud 3. VSFM-S2



Muro No. 3 (K7+435 - K7+488 MI): Retiro de material de explanación talud 3. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488 MI): Perforación e instalación de anclajes. VSFM-S2



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488 MI): Explanación de talud y desalojo de material. VSFM-S2



Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Trabajos de soldadura en estructura metálica para izaje. VSFM-S2



Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Trabajos de soldadura en estructura metálica para izaje. VSFM-S2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Instalación de formaleta viga 1 entre ejes 1 y 2. VSFM S-2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Instalación de acero vigas 2 y 3 entre ejes 1 y 2. VSFM S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Sin actividades. VSFM S-2



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Sin actividades. VSFM S-2



MURO 8 (K 7+897 -K 7+949MI): Muro terminado, pendiente realizar hormigonado de barreras New Jersey. VSFM S-2



MURO 8 (K 7+897 -K 7+949MI): Muro terminado, pendiente realizar hormigonado de barreras New Jersey. VSFM S-2



TALUD 6 (K 7+859 -K 7+950 MD): Perforación e instalación de anclajes adicionales. VSFM S-2



TALUD 6 (K 7+859 -K 7+950 MD): Perforación e instalación de anclajes adicionales. VSFM S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Instalación de acero para New Jersey. VSFM-S-2



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Instalación de formaleta para New Jersey. VSFM-S-2



MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227 MI): Hormigonado de vástagos. VSFM-S-2



MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227 MI): Instalación de relleno estructural. VSFM-S-2



Talud 8 (K 8+160 - K 8+300 MD): Sin actividades. VSFM-S-2



Talud 8 (K 8+160 - K 8+300 MD): Sin actividades. VSFM-S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Muro 10 (K 8+287 - K 8+295 MI): Perforación para instalación de micropilotes. VSFM-S-2



Muro 10 (K 8+287 - K 8+295 MI): Perforación para instalación de micropilotes. VSFM-S-2



Puente No.13 (K 8+298 - K 8+362): Adecuación a viga cabezal. VSFM-S-2



Puente No.13 (K 8+298 - K 8+362): Instalación acero viga cabezal. VSFM-S-2



Puente No.13A (K 8+393 - K 8+415): Hormigonado de pila. VSFM-S-2



Puente No.13A (K 8+393 - K 8+415): Pila hormigonada. VSFM-S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud 9 (K8+365-K8+510 MD): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 9 (K8+365-K8+510 MD): Sin actividades. VSFM-S2



Puente No. 14 (K8+512-K8+575): Hormigonado de caisson. VSFM-S2



Puente No. 14 (K8+512-K8+575): Hormigonado de caisson. VSFM-S2



Talud 10 (K8+575-K8+655 MD): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 10 (K8+575-K8+655 MD): Sin actividades. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Puente 14A (K8+660-K8+700): Sin actividades. VSFM-S2



Puente 14A (K8+660-K8+700): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 11 (K8+703-K8+765 MD): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 11 (K8+703-K8+765 MD): Sin actividades. VSFM-S2



Puente 14B (K8+758-K8+868): Excavaciones para caisson. VSFM-S2



Puente 14B (K8+758-K8+868): Excavaciones para caisson. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud del K6+800 MD: Instalación de guayas.VSFM-S1



Talud del K6+800 MD: Instalación de guayas.VSFM-S1



Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Sin actividades. VSFM-S2



Puente No. 9A (K7+130 - K7+190): Sin actividades. VSFM-S2



Muro No. 3 (K7+435 - K7+488 MI): Retiro de material de explanación talud 3. VSFM-S2



Muro No. 3 (K7+435 - K7+488 MI): Retiro de material de explanación talud 3. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488 MI): Perforación e instalación de anclajes. VSFM-S2



Talud No. 3 (K7+435 - K7+488 MI): Explanación de talud y desalojo de material. VSFM-S2



Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Trabajos de soldadura en estructura metálica para izaje. VSFM-S2



Puente No.11 (K7+491 - K7+579): Trabajos de soldadura en estructura metálica para izaje. VSFM-S2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Instalación de torones viga 2 entre ejes 1 y 2. VSFM S-2



Puente No. 12 (K7+633 - K7+727): Instalación de acero viga 3 entre ejes 1 y 2. VSFM S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Sin actividades. VSFM S-2



Puente 12A (K7+785 - K7+866): Sin actividades. VSFM S-2



MURO 8 (K 7+897 -K 7+949MI): Muro terminado, pendiente realizar hormigonado de barreras New Jersey. VSFM S-2



MURO 8 (K 7+897 -K 7+949MI): Muro terminado, pendiente realizar hormigonado de barreras New Jersey. VSFM S-2



TALUD 6 (K 7+859 -K 7+950 MD): Perforación e instalación de anclajes adicionales. VSFM S-2



TALUD 6 (K 7+859 -K 7+950 MD): Perforación e instalación de anclajes adicionales. VSFM S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Sin actividades. VSFM-S-2




PUENTE 12 B (K 7+952 - K 8+042): Sin actividades. VSFM-S-2



MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227 MI): Hormigonado de vástagos. VSFM-S-2



MURO No.9 (K 8+125 - K 8+227 MI): Instalación de relleno estructural. VSFM-S-2

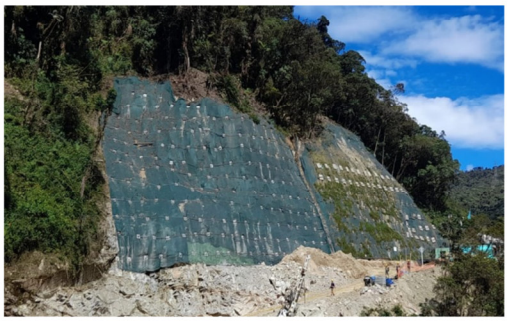

Talud 8 (K 8+160 - K 8+300 MD): Sin actividades. VSFM-S-2



Talud 8 (K 8+160 - K 8+300 MD): Sin actividades. VSFM-S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Muro 10 (K 8+287 - K 8+295 MI): Perforación para instalación de micropilotes. VSFM-S-2



Muro 10 (K 8+287 - K 8+295 MI): Perforación para instalación de micropilotes. VSFM-S-2



Puente No.13 (K 8+298 - K 8+362): Adecuación a viga cabezal. VSFM-S-2



Puente No.13 (K 8+298 - K 8+362): Instalación acero viga cabezal. VSFM-S-2




Puente No.13A (K 8+393 - K 8+415): Sin actividades. VSFM-S-2



Puente No.13A (K 8+393 - K 8+415): Sin actividades. VSFM-S-2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

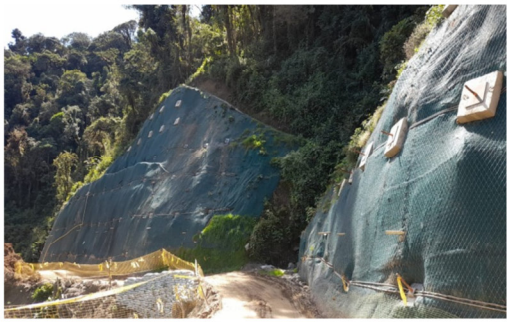

Talud 9 (K8+365-K8+510 MD): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 9 (K8+365-K8+510 MD): Sin actividades. VSFM-S2



Muro 12 (K8+444-K8+476 MI): Inicio de perforación e instalación de micropilotes. VSFM-S2



Muro 12 (K8+444-K8+476 MI): Inicio de perforación e instalación de micropilotes. VSFM-S2




Puente No. 14 (K8+512-K8+575): Sin actividades. VSFM-S2



Puente No. 14 (K8+512-K8+575): Sin actividades. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

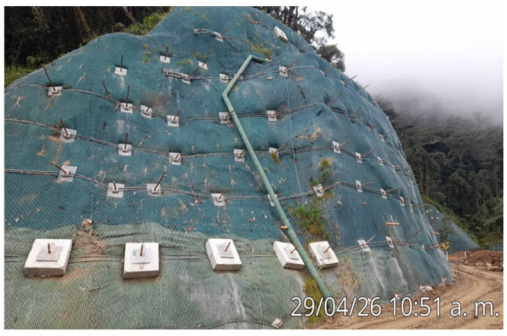

Talud 10 (K8+575-K8+655 MD): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 10 (K8+575-K8+655 MD): Sin actividades. VSFM-S2



Puente 14A (K8+660-K8+700): Sin actividades. VSFM-S2



Puente 14A (K8+660-K8+700): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 11 (K8+703-K8+765 MD): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 11 (K8+703-K8+765 MD): Sin actividades. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Puente 14B (K8+758-K8+868): Excavaciones para caisson. VSFM-S2



Puente 14B (K8+758-K8+868): Excavaciones para caisson. VSFM-S2



Talud 12 (K8+817-K8+868 MD): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 12 (K8+817-K8+868 MD): Sin actividades. VSFM-S2



Talud 13 (K9+053-K9+164 MD): Perforación e instalación de anclajes. VSFM-S2



Talud 13 (K9+053-K9+164 MD): Explanación de talud. VSFM-S2

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Talud 14 (K9+166-K9+284 MD): Explanación y desalojo de material. VSFM-S2



Talud 14 (K9+166-K9+284 MD): Perforación e instalación de anclajes. VSFM-S2

8.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO ÁREA AMBIENTAL, SST, SOCIAL.

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



El día 06 de abril del 2026 se realizo seguimiento a las actividades de tala en el K9+810



El día 07 de abril de 2026 se realizo seguimiento a rescate, etiquetado y reubicación de plántulas en el K9+680



El día 07 de abril de 2026 se realizo seguimiento a instalación de equipos para monitoreo de calidad de aire en Zona Industrial San Carlos.



El día 07 de abril de 2026 se realizo seguimiento a instalación de equipos para monitoreo de calidad de aire en el frente de obra.



El día 08 de abril de 2026 se realizo seguimiento a instalación de saco suelo en puente 12 D K9+028



El día 08 de abril de 2026 se realizo inspección a puntos ecológicos en todo el frente de obra.

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



06 de abril de 2026. Pruebas de alcoholimetría.



07 de abril de 2026. Pausas activas.



08 de abril de 2026. Seguimiento a uso de epp durante manipulación de acero.



08 de abril de 2026. Seguimiento a condiciones de seguridad durante mantenimiento a instalaciones de Zona Industrial San Carlos.



El día 13 de abril de 2026 se realizo seguimiento a etiquetado y reubicación de epifitas en zona 9 K9+680



El día 13 de abril de 2026 se realizo seguimiento a mantenimiento de piscina en la planta de concreto.

CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO

INFORME MENSUAL No. 58

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



El día 09 de abril del 2026 se realizo seguimiento a las actividades de tala en el K9+850



El día 09 de abril de 2026 se realizo seguimiento a medidas ambientales para fundición de puente 12B K7+952



El día 11 de abril de 2026 se realizo seguimiento a instalación de saco suelo en el K8+900



El día 13 de abril de 2026 se realizo seguimiento a rescate de epifitas en el K9+850



Recorrido al frente de obra con las veedurias ciudadana



Recorrido al frente de obra con las veedurias ciudadana

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



10 de abril de 2026. Seguimiento a condiciones de seguridad durante fundición de placa de puente 12B.



14 de abril de 2026. Jornada de orden y aseo en sector 2.



14 de abril de 2026. Charla de seguridad Intervetoría



15 de abril de 2026. Charla de seguridad Consorcio San Francisco.



El día 20 de abril de 2026 se realizo seguimiento a monitoreo de epifitas vascularesn en zona 3 K 7+500



El día 20 de abril de 2026 se realizo seguimiento a corte, cargue de material y carpado de volquetas en el K9+100 por parte del contratista.

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



El día 15 de abril del 2026 se realizo seguimiento a aseo y mantenimiento de baños portatiles en todo el frente de obra.



El día 16 de abril de 2026 se realizo seguimiento a rescate y reubicacion de epifitas en zona 9 K9+850



El día 71 de abril de 2026 se realizo seguimiento a monitoreo de helechos en zona 3 K7+500



El dia 18 de abril de 2026 se realizo seguimiento a instalacion de saco suelo en el K8+920



Socializacion de temas ambientales y constructivos



Socializacion de temas ambientales y constructivos

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Contextualizacion y Generalidades del proyecto



Contextualizacion y Generalidades del proyecto




18 de abril de 2026. Capacitación en riesgo biomecánico con el personal del Consorcio San Francisco.



20 de abril de 2026. Capacitación en estilos de vida saludable con el personal de interventoría.



20 de abril de 2026. Jornada de actividades lúdicas con el personal Interventoría

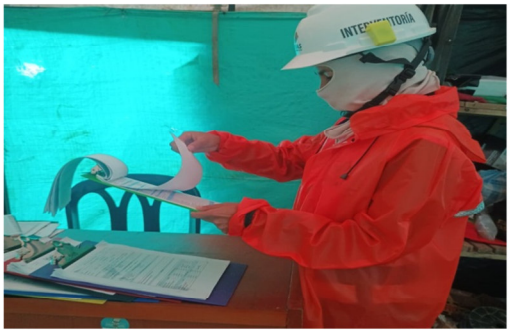

21 de abril de 2026. Recorrido Sector 2, revisión de permisos de trabajo.

CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO

INFORME MENSUAL No. 58

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



El día 23 de abril del 2026 se realizo seguimiento a instalacion de trinchos en madera en el K9+070 MI



El día 24 de abril de 2026 se realizo seguimiento a capacitacion mensual a todo el personal de obra por parte del contratista tema proteccion y manejo de la fauna silvestre



El día 25 de abril de 2026 se realizo seguimiento a humectacion de vias en Zona Industrial San Carlos



El dia 25 de abril de 2026 se realizo seguimiento a monitoreo de epifitas vasculares en el zona 7 K8+780



El día 27 de abril de 2026 se realizo seguimiento a mantenimiento de cunetas en todo el frente de obra.



El día 28 de abril de 2026 se realizo seguimiento a corte, cargue de material y carpado de volquetas en el K9+100 por parte del contratista.

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



Capacitación al Personal de Obra



Capacitación al Personal de Obra



Taller Gestores Culturales en Arqueología Preventiva



Taller Gestores Culturales en Arqueología Preventiva



24 de abril de 2026. Reunión Copasst Consorcio San Francisco.



28 de abril de 2026. Recorrido Sector 2.

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN FRANCISCO	**INTERVENTORÍA**: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO



23 de abril de 2026. Adecuación de accesos seguros.



24 de abril de 2026. Capacitación en análisis de vulnerabilidad Consorcio San Francisco

8.4. COPIA DE LA BITÁCORA CONTRATO DE OBRA No.1111 DE 2021

de reporte diario; Talud K6+800 MD. Se continúa instalación de gaviones. Se realiza tensionamiento de anclajes, Puente 9A (K7+130 – K7+190). Se realiza hormigonado vástago módulo 1 muro 9A. Talud 3 (K7+440 – K7+540) MD. Se continúa instalación de anclajes, geo manto y malla de alta resistencia. Se continúa con excavación y desalojo de material. Puente 12 (K7+633 – K7+730). Se continúa instalación de obra falsa para viga 3 entre ejes 1 y 2. Talud 6 (K7+859 – K7+950) MD. Se continúa instalación de anclajes. Muro 9 (K8+125 – K8+227) MI. Se realiza hormigonado de vástagos módulos 11 y 13. Se realiza instalación de relleno estructural en módulos 4 y 5. Muro 10 (K8+287 – K8+295) MI. Se realiza construcción de trinchos para contención de material. Puente 13 (K8+298 – K8+362). Se realiza hormigonado de caissón 2 eje 1. Puente 12D (K8+758 – K8+817). Se continúa con excavación de caissón. Talud 13 (K9+053 – K9+161) MD. Se continúa con instalación de anclajes, geo manto, malla de alta resistencia y platinas. Las demás obras no presentan actividades.

En función de las condiciones topográficas y geomorfológicas observadas en campo para el T13, las cuales difieren de las condiciones consideradas en la elaboración de planos de referencia, se establece la necesidad de incorporar anclajes activos y extender el tratamiento inicial previsto, esta intervención contempla la colocación de anclajes en las filas A, B, C, D de la primera terraza, con el fin de garantizar la adecuada transferencia de cargas, y el control de deformaciones y desprendimientos en la zona perimetral del T13, asegurando la estabilidad global del T13, esta intervención se realiza manteniendo los criterios de espaciamiento tanto vertical y horizontal definidos y aprobados en los diseños. Esta información debería ser evaluada por especialistas de interventoría y constructor. Of.

01 de Abril de 2016. Estado del tiempo: seco desde las 0:00 hasta las 24:00 horas; Personal y equipos según formato de reporte diario; Talud K6+800 MD. Se continúa

Instalación de guayas y tensionamiento de anclajes. Puente 9A (K7+130 - K7+190): Se realiza desencofrado de vástago módulo 1 muro 9A. Talud 3 (K7+440 - K7+520) MD: se continúa instalación de anclajes, geo manto y malla de alta resistencia. se continúa desalojo de material de explanación. Puente 12 (K7+633 - K7+730): se continúa instalación de obra falsa para viga 3 entre ejes 1 y 2. Se realiza instalación de cables para vigas 1 entre ejes 1 y 2. Muro 9 (K8+125 - K8+227) MI: se realizó desencofrado segunda sección vástagos módulos 11 y 13. se continúa instalación de formaletas vástago módulo 9. Muro 10 (K8+287 - K8+295) MI: se continúa construcción de trinchos para contención de material perforaciones micro pilotes. Puente 13 (K8+298 - K8+362): se continúa ampliación para acceso eje 2. Puente 12B (K8+758 - K8+817): se continúa excavación cabezal ejes 1 y 2. Talud 13 (K9+053 - K9+160) MD: se continúa instalación de anclajes y guayas. Las demás obras no presentan actividades.

Del 02 al 05 de abril de 2026 se tiene receso de actividades por semana santa.

06 de abril de 2026. Estado del tiempo: Seco desde las 0:00 hasta las 24:00 horas. Personal y equipos según formato de reporte diario. Talud K6+800 MD: se continúa instalación de guaya. Talud 3 (K7+440 - K7+520) MD: se continúa instalación de anclajes, geo manto y malla de alta resistencia. Puente 12 (K7+633 - K7+730): Continúa instalación de obra falsa viga 3. Talud 6 (K7+859 - K7+950) MD: se continúa instalación de anclajes. Muro 9 (K8+125 - K8+227) MI: se realizó desencofrado vástago módulo 13. Se continúa instalación de relleno estructural módulos 4 y 5. Muro 10 (K8+287 - K8+295) MI: se da inicio a perforación de micro pilotes. Puente 13 (K8+298 - K8+362): se continúa con ampliación de acceso industrial eje 2. Puente 12B (K8+758 - K8+817):
