	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-27
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión: V1
		Fecha: 29/04/2025
	FORMATO INFORME DE SUPERVISOR	Página 1 de 58

Villavicencio, 04/06/2026

Doctor(a):
ALBA AURORA COLINA
Secretario(a) de Contratación
Alcaldía Municipal de Villavicencio

Ref.: CONTRATO N°. 2131 DE 2026, N°. DEL PROCESO EN SECOP CD-2131-2026 PERIODO No. 1 del 27 de marzo de 2026 al 31 de mayo de 2026.

OBJETIVO DEL INFORME: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en SECOP)	CTO No. 2131-2026 DEL 29/04/2026, ORDEN DE SERVICIO N°03 DE 2026 DEL 27 DE MARZO DE 2026 No. DE PROCESO. CD-2131-2026
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I _____ Ó SECOP II __X_____
CLASE DE CONTRATO:	OBRA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	M&O CONSTRUCTORES E INGENIEROS SAS
No. DE IDENTIFICACIÓN	901903144-6
OBJETO:	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y PROTECCION EN LOS SECTORES DE BARRIO RESERVAS DE GUATAPE, BARRIO PACANDE CAMINO GANADERO, PUENTE PEATONAL BARRIO SAN CARLOS PINILLA SOBRE EL CAÑO MAIZARO, PUENTE VEHICULAR ROSAL LA PRADERA SOBRE CAÑO PARRADO Y CONTRUCCION DE JARILLONES DE PROTECCION EN DIFERENTES PUNTOS CRITICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ C.C. 17.326.435 de Villavicencio
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN	05/05/2026
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($650.962.520)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	60 DIAS
FECHA DE INICIO ORDEN DE SERVICIO:	27/03/2026
FECHA DE ACTA DE INICIO CONTRATO:	11/05/2026
FECHA DE TERMINACIÓN ORDEN DE SERVICIO:	26/05/2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL SEGÚN ACTA DE INICIO:	10/07/2026

MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	N.A.
VALOR DE ADICIÓN:	N/A	FECHA:	N/A
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	N/A		
PRORROGAS	N/A	FECHA:	N/A
	N/A	FECHA:	N/A
	N/A	FECHA:	N/A
TOTAL, PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	N/A		
SUSPENSIONES	FECHA: N/A		
REINICIOS:	N/A	FECHA:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	N/A		

2. **DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 05/05/2026, notificado personalmente con fecha 05/05/2026 y en plataforma SECOP II del 05/05/2026 se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al **PERIODO N° 1 del 27/03/2026 al 31/05/2026** de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

   El día 27 de marzo de 2026 en el Municipio de Villavicencio – Meta, se expedición de la ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO No. 003 de 2026 adjudicado a la empresa M&O CONSTRUCTORES E INGENIEROS SAS. identificado con NIT. 901903144-6 y representado legalmente por YESSICA PAOLA COLLAZOS RUBIO identificado con cédula de ciudadanía No. 1018450089 y cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y PROTECCION EN LOS SECTORES DE BARRIO RESERVAS DE GUATAPE, BARRIO PACANDE CAMINO GANADERO, PUENTE PEATONAL BARRIO SAN CARLOS PINILLA SOBRE EL CAÑO MAIZARO, PUENTE VEHICULAR ROSAL LA PRADERA SOBRE CAÑO PARRADO Y CONTRUCCION DE JARILLONES DE PROTECCION EN DIFERENTES PUNTOS CRITICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".

   El día 29 de abril de 2026, se suscribe el contrato de obra No. 2131 de 2026 a través del SECOP II entre JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ designado como supervisor, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.326.435 en su carácter de jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo y YESSICA PAOLA COLLAZOS RUBIO identificada con Cedula de ciudadanía No. 1018450089 en calidad de representante legal de M&O CONSTRUCTORES E INGENIEROS SAS. con NIT. 901903144-6 en su condición de contratista.

   Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado total del 76,12%:

MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	N.A.
VALOR DE ADICIÓN:	N/A	FECHA:	N/A
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	N/A		
PRORROGAS	No. 01, Por 15 días	FECHA:	27/05/26
	N/A	FECHA:	N/A
	N/A	FECHA:	N/A
TOTAL, PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	SETENTA Y CINCO (75) DIAS		
SUSPENSIONES	FECHA: N/A		
REINICIOS:	N/A	FECHA:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO:	10/06/26		

2. **DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 05/05/2026, notificado personalmente con fecha 05/05/2026 y en plataforma SECOP II del 05/05/2026 se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al **PERIODO N° 1 del 27/03/2026 al 31/05/2026** de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.


   El día 27 de marzo de 2026 en el Municipio de Villavicencio – Meta, se expedición de la ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO No. 003 de 2026 adjudicado a la empresa M&O CONSTRUCTORES E INGENIEROS SAS. identificado con NIT. 901903144-6 y representado legalmente por YESSICA PAOLA COLLAZOS RUBIO identificado con cédula de ciudadanía No. 1018450089 y cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y PROTECCION EN LOS SECTORES DE BARRIO RESERVAS DE GUATAPE, BARRIO PACANDE CAMINO GANADERO, PUENTE PEATONAL BARRIO SAN CARLOS PINILLA SOBRE EL CAÑO MAIZARO, PUENTE VEHICULAR ROSAL LA PRADERA SOBRE CAÑO PARRADO Y CONTRUCCION DE JARILLONES DE PROTECCION EN DIFERENTES PUNTOS CRITICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".

   El día 29 de abril de 2026, se suscribe el contrato de obra No. 2131 de 2026 a través del SECOP II entre JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ designado como supervisor, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.326.435 en su carácter de jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo y YESSICA PAOLA COLLAZOS RUBIO identificada con Cedula de ciudadanía No. 1018450089 en calidad de representante legal de M&O CONSTRUCTORES E INGENIEROS SAS. con NIT. 901903144-6 en su condición de contratista.

   Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado total del 76,12%:

PUNTO CRITICO No 1
SECTOR RESERVAS DE GUATAPE Y VILLAS DEL PROGRESO

LOCALIZACION DE ACTIVIDADES

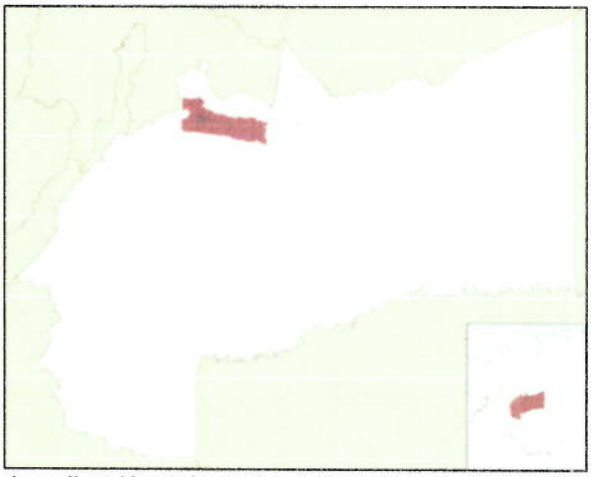

Localización del municipio de Villavicencio – Meta



Imagen satelital Google Earth del sector Reservas de guatape.

PUNTO DE REFERENCIA	LATITUD X	LONGITUD Y
Sector Reservas de guatape	4° 5'57.65"N	73°38'35.52"O

45

ACTIVIDAD No. 1, ÍTEM 1.1.

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE


Descripción del avance:

Durante la jornada de seguimiento y control, la supervisión verificó la ejecución de excavaciones correspondientes a un volumen estimado de **57,12 m³** de material, distribuidas en una sección de intervención. Esta excavación fue destinada a la implantación de los niveles de cimentación de la estructura de gaviones, de acuerdo con lo establecido en los diseños del proyecto.

El sector intervenido presenta las siguientes dimensiones aproximadas:

- Sección excavada: 10,2 m de longitud × 2,80 m de ancho, con una profundidad de excavación de 2,00m.

La supervisión evidenció que las actividades fueron ejecutadas con el apoyo de maquinaria tipo retroexcavadora sobre orugas, verificándose en campo el cumplimiento de las dimensiones, cotas y alineamientos definidos en los planos y especificaciones técnicas del proyecto, cabe resaltar la existencia de unos sobre anchos de excavación que el contratista asumirá.

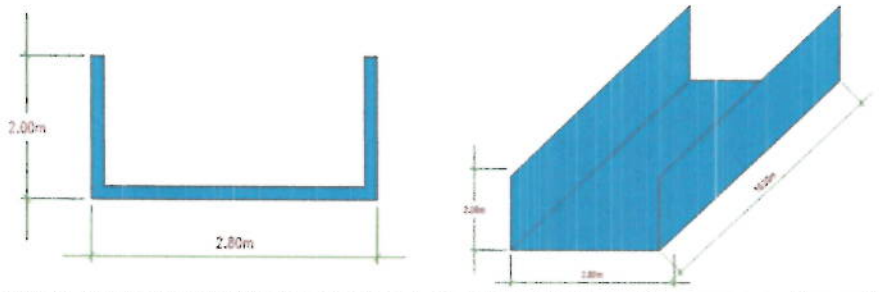

Sección No1 de excavación mecánica en conglomerado sector reservas de guatape

Anexos y Evidencias:









Excavación Mecánica Sector Reservas de guatape.

ACTIVIDAD No. 2, ÍTEM 1.2.

MANEJO DE AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL

Descripción del avance:

En el desarrollo de las actividades constructivas, la supervisión verificó la necesidad de disponer de una (1) motobomba en el área de intervención, la cual operó durante un tiempo acumulado de cinco (5) días de servicio, con el fin de realizar el control y evacuación de aguas en la zona de excavación. Lo anterior se debe a que las labores se ejecutan a una profundidad aproximada de 2,00 m respecto al lecho del caño grande, el cual presenta un caudal permanente significativo. A pesar de la canalización provisional implementada por el contratista para desviar parcialmente el flujo, durante las visitas de seguimiento se evidenció un ascenso rápido del nivel freático, generado por la diferencia de cotas entre el lecho del río y la zona de trabajo, situación que ocasiona ingreso continuo de agua por presión freática hacia el área excavada.

La supervisión registró el uso de la motobomba en las siguientes fechas:

- 1/05/2026
- 2/05/2026
- 3/05/2026
- 4/05/2026
- 5/05/2026

La utilización de este equipo permitió mantener condiciones adecuadas de trabajo en el frente de excavación y garantizar la continuidad de las actividades constructivas programadas.

Anexos y Evidencias:





Manejo de agua con motobomba 6" auto cebaste Diesel, Sector de Reservas de guatape.

ACTIVIDAD No. 3, ÍTEM 1.3.

CANALIZACIÓN RÍO (TIPO EXACAVADORA ORUGADA)

Descripción del avance:

Durante las actividades de seguimiento en campo, la supervisión verificó la ejecución de la canalización provisional mediante el uso de maquinaria tipo retroexcavadora sobre orugas, empleada para la conformación y adecuación del cauce en el área de intervención.

De acuerdo con los registros de obra y la verificación realizada en sitio, se dio cumplimiento a las horas de operación previstas en el presupuesto del proyecto, correspondientes a treinta (80) horas de trabajo de maquinaria, conforme a lo establecido en la programación de actividades y en las especificaciones técnicas definidas para la ejecución de esta actividad

Anexos y Evidencias:







Canalización río (tipo excavadora orugada),

ACTIVIDAD No. 4, ÍTEM 1.5.


CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES RECUBRIMIENTO PVC TRIPLE TORSION GALVANIZADO MINIMO 245 GRAMOS TIPO DE APERTURA 8X10 DIAMETRO ALAMBRE 3MM CALIBRE 12 Y DIAMETRO DE ARISTA 3,8 MEDIDAS: 2X1X1

Descripción del avance:

49

Durante las actividades de seguimiento en obra, la supervisión verificó la ejecución de la estructura de gaviones con un total de 110 metros cúbicos ejecutados.

De acuerdo con la revisión en campo, la disposición de los módulos de gavión se desarrolla se dé la siguiente manera:

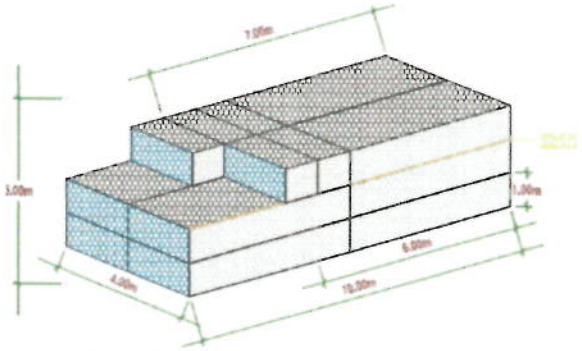

- Niveles 1 y 2: se encuentran dispuestos con un ancho de 4 m x 10 m de longitud. Los niveles 1 y 2 se encuentran enterrados, cumpliendo la función de cimentación de la estructura de contención.
- El nivel 3 se encuentra dispuesto con un ancho de 4 m x 7.5 m de longitud y un gavión adicional.

Con esta distribución se cumplen con las condiciones iniciales del contrato, esto debido a que se realizo un cambio de diseño por parte de la OGRD, se evidencia la necesidad terminar el diseño propuesto para un óptimo funcionamiento de la estructura.

Anexos y Evidencias:





50





Construcción de gaviones recubrimiento pvc triple torsion galvanizado mínimo 245 gramos tipo de apertura 8x10 diámetro alambre 3mm calibre 12 y diámetro de arista 3,8 medidas: 2x1x1, Sector de Reservas de Guatape.

ACTIVIDAD No. 5, ÍTEM 1.6.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOBOLSA POLIPROPILENO DE ALTO MODULO TIPO TR 4000 DIMENSIONES: 4,5MX2,1MX1,5M


Descripción del avance:

Durante las actividades de seguimiento y supervisión en obra, se verificó la ejecución de la instalación de geobolsas en polipropileno de alto módulo tipo TR 4000 para la conformación de una estructura de protección hidráulica orientada al control de procesos erosivos, la reducción de la socavación y riesgos de inundación en el sector intervenido.

De acuerdo con los registros de obra y la verificación realizada en campo, se constató la instalación de veinte (20) geobolsas, conforme a las especificaciones técnicas y los diseños. La supervisión evidenció el adecuado posicionamiento de los elementos instalados y el cumplimiento de los objetivos previstos para la intervención.

Anexos y Evidencias

51

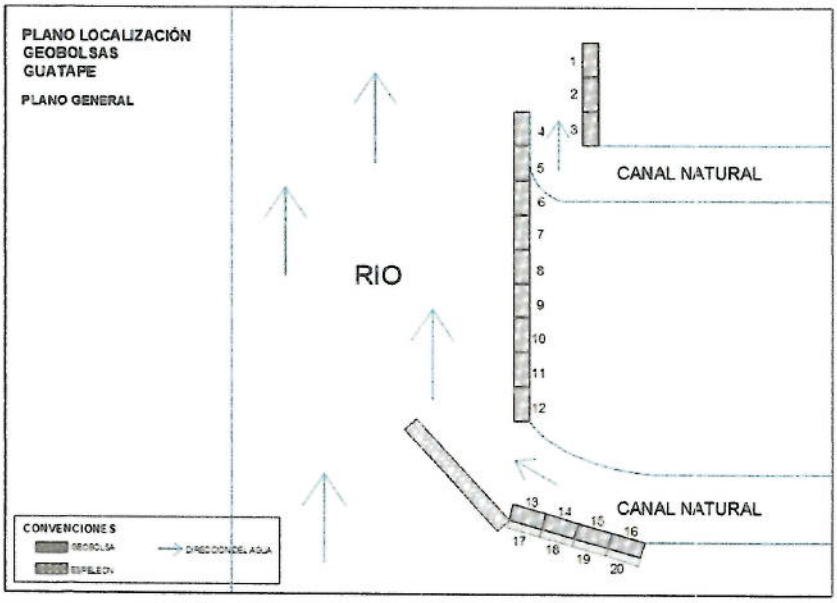

PLANO LOCALIZACIÓN
GEOBOLSAS
GUATAPE
PLANO GENERAL
RIO
CANAL NATURAL
CANAL NATURAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CONVENCIONES
GEOBOLSA
DIRECCIÓN DEL AGUA









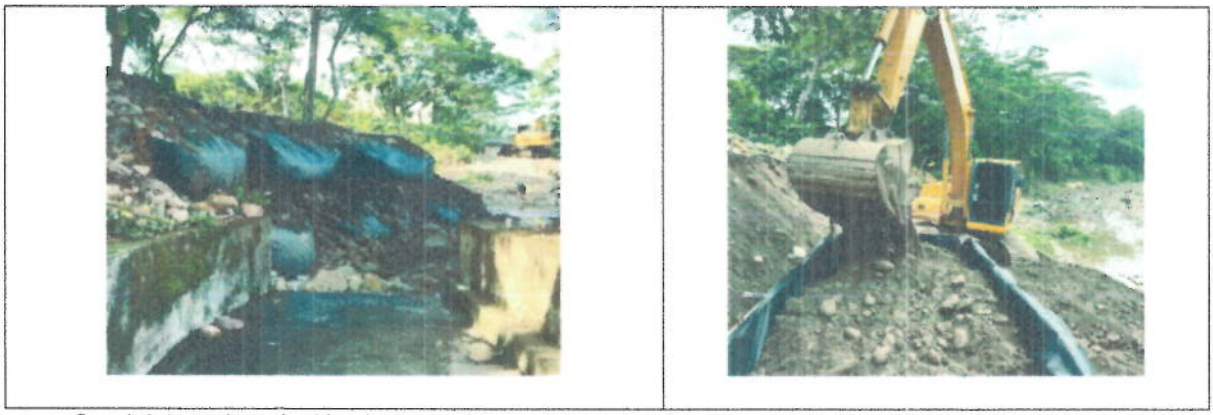


Suministro e instalación de geobolsa polipropileno de alto modulo tipo TR 4000 dimensiones: 4,5Mx2,1MX1,5M

ACTIVIDAD No. 8 ÍTEM 1.7.

REVESTIMIENTO PARA GAVIONES EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

Descripción del avance: Durante las actividades de seguimiento en obra, la supervisión verificó la ejecución del revestimiento en concreto de 3.000 psi, conforme a los diseños entregados por la Oficina, se constató el vaciado de concreto de catorce punto tres (14,3) m3 manteniendo un espesor de 10 cm, así mismo, se corrobora en campo la utilización de formaleta metálica y su correcta fijación para el adecuado desarrollo de la actividad.

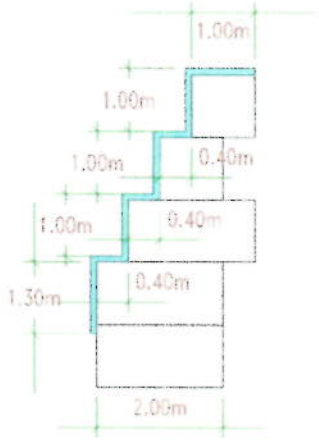

- Sección de revestimiento ejecutado: 22,00 m de longitud × 6,50 m de altura y con un espesor de 0,10 m.

Anexos y Evidencias:



Revestimiento para gaviones en concreto 20.7 Mpa (3000 psi) suministro y construcción Sector reservas de guatape

PUNTO CRITICO No 2
SECTOR PUENTE PEATONAL SAN CARLOS ENTRE BARRIO PINILLA - EL MILAGRO

LOCALIZACION DE ACTIVIDADES



Imagen satelital Google Earth del Sector puente peatonal San Carlos entre barrio pinilla - el milagro.

PUNTO DE REFERENCIA	LATITUD X	LONGITUD Y
Sector puente peatonal San Carlos entre barrio pinilla - el milagro	4° 8'11.61"N	73°35'8.41"O

ACTIVIDAD No. 1, ÍTEM 3.1.

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE

Descripción del avance:


Durante la jornada de seguimiento y control, la supervisión verificó la ejecución de excavación correspondiente a un volumen estimado de **44,88 m³** de material, distribuido en una sección de intervención. Esta excavación fue destinada a la implantación de los niveles de cimentación de la estructura de gaviones, de acuerdo con lo establecido en los diseños del proyecto.

El sector intervenido presenta las siguientes dimensiones aproximadas:

55

- Sección: 10,2 m de longitud × 2,20 m de ancho, con una profundidad de excavación de 2,00m.

La supervisión evidenció que las actividades fueron ejecutadas con el apoyo de maquinaria tipo retroexcavadora sobre orugas, verificándose en campo el cumplimiento de las dimensiones, cotas y alineamientos definidos en los planos y especificaciones técnicas del proyecto, cabe resaltar la existencia de unos sobre anchos de excavación que el contratista asumirá.

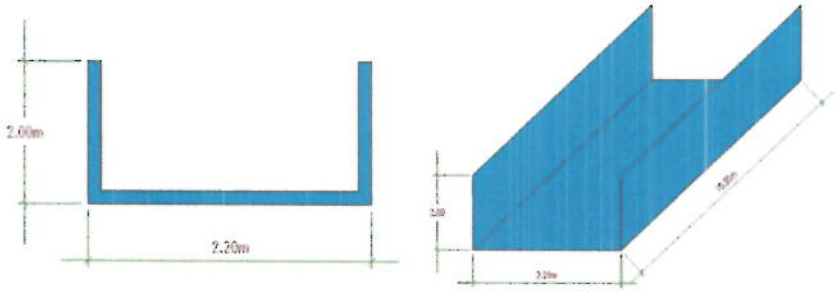

Sección No1 de excavación mecánica en conglomerado sector puente peatonal San Carlos entre barrio pinilla - el milagro

Anexos y Evidencias:



Excavación Mecánica Sector puente peatonal San Carlos entre barrio pinilla - el milagro.

ACTIVIDAD No. 2, ÍTEM 3.2.

MANEJO DE AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL

Descripción del avance:

En el desarrollo de las actividades constructivas, la supervisión verificó la necesidad de disponer de una (1) motobomba en el área de intervención, la cual operó durante un tiempo acumulado de cinco (5) días de servicio, con el fin de realizar el control y evacuación de aguas en la zona de excavación. Lo anterior se debe a que las labores se ejecutan a una profundidad aproximada de 2,00 m respecto al lecho del caño Maizaro, el cual presenta un caudal permanente significativo. A pesar de la canalización provisional implementada por el contratista para desviar parcialmente el flujo, durante las visitas de seguimiento se evidenció un ascenso rápido del nivel freático, generado por la diferencia de cotas entre el lecho del río y la zona de trabajo, situación que ocasiona ingreso continuo de agua por presión freática hacia el área excavada.

La supervisión registró el uso de la motobomba en las siguientes fechas:

- 20/05/2026
- 21/05/2026
- 22/05/2026
- 23/05/2026
- 24/05/2026

La utilización de este equipo permitió mantener condiciones adecuadas de trabajo en el frente de excavación y garantizar la continuidad de las actividades constructivas programadas.

Anexos y Evidencias:









Manejo de agua con motobomba 6" auto cebaste Diesel, Sector de puente peatonal San Carlos entre barrio pinilla - el milagro.

ACTIVIDAD No. 3, ÍTEM 3.3.

CANALIZACIÓN RÍO (TIPO EXACAVADORA ORUGADA)

Descripción del avance:

Durante las actividades de seguimiento en campo, la supervisión verificó la ejecución de la canalización provisional mediante el uso de maquinaria tipo retroexcavadora sobre orugas, empleada para la conformación y adecuación del cauce en el área de intervención.

De acuerdo con los registros de obra y la verificación realizada en sitio, se dio cumplimiento a las horas de operación previstas en el presupuesto del proyecto, correspondientes a treinta (50) horas de trabajo de maquinaria, conforme a lo establecido en la programación de actividades y en las especificaciones técnicas definidas para la ejecución de esta actividad

Anexos y Evidencias:





58



Canalización río (tipo excavadora orugada), Sector puente peatonal San Carlos entre barrio pinilla - el milagro


ACTIVIDAD No. 4, ÍTEM 3.5.

CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES RECUBRIMIENTO PVC TRIPLE TORSION GALVANIZADO MINIMO 245 GRAMOS TIPO DE APERTURA 8X10 DIAMETRO ALAMBRE 3MM CALIBRE 12 Y DIAMETRO DE ARISTA 3,8 MEDIDAS: 2X1X1

Descripción del avance:

Durante las actividades de seguimiento en obra, la supervisión verificó la ejecución de la estructura de gaviones con un total de 80 metros cúbicos ejecutados conforme a las condiciones iniciales establecidas.

De acuerdo con la revisión en campo, la disposición de los módulos de gavión se desarrolla se dé la siguiente manera:

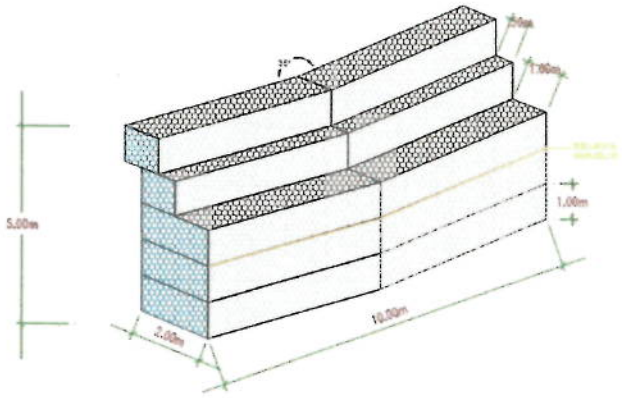

- Niveles 1,2 y 3: se encuentran dispuestos en configuración tizón con un ancho de 2 m x 10 m de longitud. Los niveles 1 y 2 se encuentran enterrados, cumpliendo la función de cimentación de la estructura de contención.
- Los niveles 4 y 5 se encuentra dispuestos en configuración soga con un ancho de 1 m x 10 m de longitud.

Anexos y Evidencias:



Construcción de gaviones recubrimiento pvc triple torsión galvanizado mínimo 245 gramos tipo de apertura 8x10 diámetro alambre 3mm calibre 12 y diámetro de arista 3,8 medidas: 2x1x1, Sector puente peatonal San Carlos entre barrio pinilla - el milagro.

PUNTO CRITICO No 3
SECTOR PUENTE VEHICULAR ROSAL - LA PRADERA

LOCALIZACION DE ACTIVIDADES



Imagen satelital Google Earth del Sector puente vehicular rosal – la pradera.

PUNTO DE REFERENCIA	LATITUD X	LONGITUD Y
Sector puente vehicular rosal – la pradera.	4° 9'23.20"N	73°38'56.97"O

ACTIVIDAD No. 1, ÍTEM 4.1.

CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES RECUBRIMIENTO PVC TRIPLE TORSION GALVANIZADO MINIMO 245 GRAMOS TIPO DE APERTURA 8X10 DIAMETRO ALAMBRE 3MM CALIBRE 12 Y DIAMETRO DE ARISTA 3,8 MEDIDAS: 2X1X1


Descripción del avance:

Durante las actividades de seguimiento en obra, la supervisión verificó la ejecución de la estructura de gaviones con un total de 20 metros cúbicos ejecutados conforme a las condiciones iniciales establecidas.

De acuerdo con la revisión en campo, la disposición de los módulos de gavión se desarrolla se dé la siguiente manera:

- Niveles 1 y 2: se encuentran dispuestos en configuración tizón con un ancho de 2 m x 5 m de longitud.

Anexos y Evidencias:

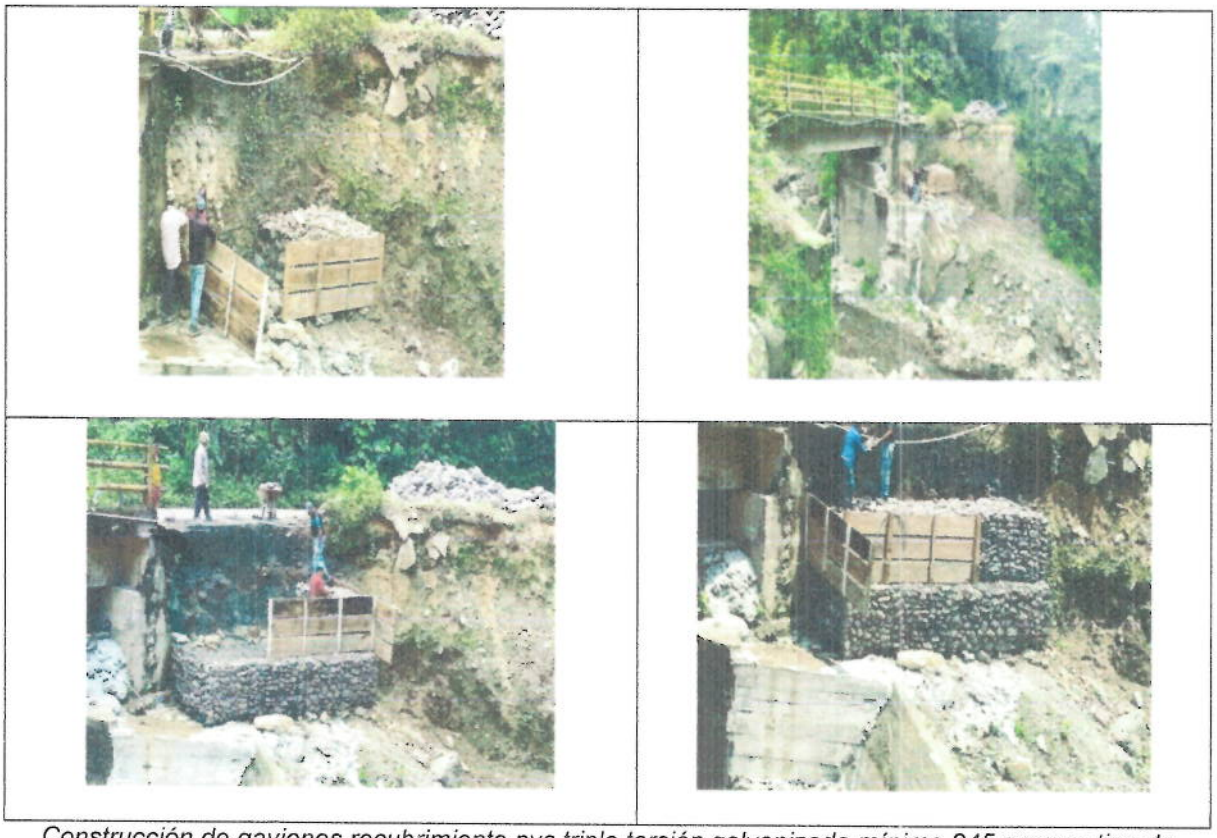

Construcción de gaviones recubrimiento pvc triple torsión galvanizado mínimo 245 gramos tipo de apertura 8x10 diámetro alambre 3mm calibre 12 y diámetro de arista 3,8 medidas: 2x1x1, Sector puente vehicular rosal – la pradera.

PUNTO No 4
CONSTRUCCION DE JARILLONES E INTERVENCION EN PUNTOS CRITICOS

ACTIVIDAD No. 1, ÍTEM 5.1.

CANALIZACIÓN RÍO (TIPO EXACAVADORA ORUGADA)

Durante el periodo objeto de supervisión se verificaron las actividades desarrolladas por el contratista mediante el uso de retroexcavadora sobre oruga en distintos frentes de trabajo, enfocadas en la excavación, perfilado y redistribución de material. Estas acciones tuvieron como propósito reencauzar el flujo hídrico, fortalecer las márgenes a través de la conformación de jarillones y mitigar los riesgos de socavación y desbordamiento en puntos críticos. De manera complementaria, se constataron las labores de descolmatación ejecutadas en los cauces de río Guatiquía y el caño buque, donde se llevó a cabo la remoción de sedimentos y obstrucciones naturales, permitiendo restablecer la capacidad hidráulica y disminuir la probabilidad de nuevos desbordamientos.

A continuación, se adjunta un registro fotográfico que evidencia las actividades realizadas en los diferentes sectores intervenidos.

DESCRIPCION	SECTOR INTERVENIDO	CANTIDAD EJECUTADA	OBSERVACIONES
CANALIZACION RÍO (TIPO EXCAVADORA ORUGADA)	ANILLO VIAL CAÑO BUQUE	160,5	Se ejecutaron actividades de canalización del rio para redireccionamiento de cause y construcción de Jarillón
CANALIZACION RÍO (TIPO EXCAVADORA ORUGADA)	CUNAVICHE RIO GUATIQUIA	99,2	Se ejecutaron actividades de canalización del rio para redireccionamiento de cause y construcción de Jarillón
CANALIZACION RÍO (TIPO EXCAVADORA ORUGADA)	PARCELAS DEL PROGRESO RIO GUATIQUIA	40,3	Se ejecutaron actividades de canalización del rio para redireccionamiento de cause y construcción de Jarillón
TOTAL	**DIAS**	**300**	

Anexos y Evidencias:

- **ANILLO VIAL CAÑO BUQUE**

LOCALIZACION DE ACTIVIDADES



Imagen satelital Google Earth del Sector anillo vial caño buque.

PUNTO DE REFERENCIA	LATITUD X	LONGITUD Y
Sector anillo vial caño buque.	4° 7'8.50"N	73°37'14.08"O






DEERE









Canalización río (tipo excavadora orugada), Sector anillo vial caño buque

- **CUNAVICHE RIO GUATIQUIA**

LOCALIZACION DE ACTIVIDADES

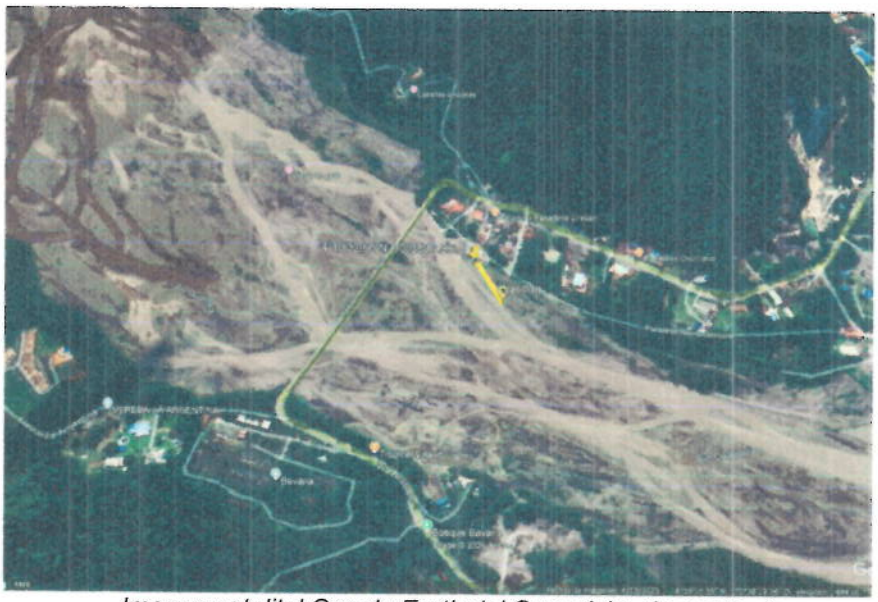


Imagen satelital Google Earth del Cunaviche rio guatiquia.

PUNTO DE REFERENCIA	LATITUD X	LONGITUD Y
Sector parcelas del progreso rio guatiquia	4°10'34.67"N	73°38'17.36"O

















Canalización río (tipo excavadora orugada), Sector cunaviche rio guatiquia

- **PARCELAS DEL PROGRESO RIO GUATIQUIA**

LOCALIZACION DE ACTIVIDADES

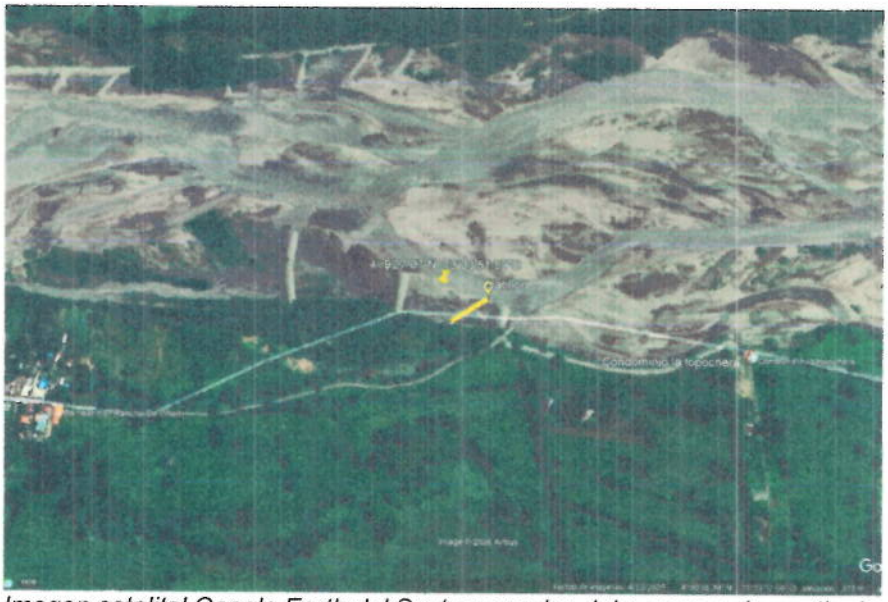


Imagen satelital Google Earth del Sector parcelas del progreso rio guatiquia.

PUNTO DE REFERENCIA	LATITUD X	LONGITUD Y
Sector parcelas del progreso rio guatiquia	4° 9'27.07"N	73°33'51.59"O


DEERE




DEERE




DEERE


DEERE



Canalización río (tipo excavadora orugada), Sector cunaviche rio guatiquia

ACTIVIDAD No. 2, ÍTEM 5.2.

TRANSPORTE DE MATERIAL DENTRO DEL AFLUENTE PARA CONSTRUCION DE JARILLONES

Durante el periodo objeto de supervisión se verificaron las actividades desarrolladas por el contratista relacionadas con el transporte y disposición de material de excavación. Este proceso incluyó el cargue del material en los puntos de acopio previamente establecidos, así como su traslado y descarga en los sectores críticos priorizados para la intervención.

El material transportado fue utilizado en la conformación de un Jarillón de protección, con el fin de reforzar las márgenes del cauce y mitigar los riesgos asociados a posibles crecientes súbitas.

En el desarrollo de estas labores se constató una adecuada articulación entre la operación de la maquinaria y el suministro del material, garantizando la continuidad, eficiencia y cumplimiento de los lineamientos técnicos definidos para la ejecución de las obras. La supervisión permitió evidenciar que la conformación del Jarillón incrementó la capacidad de contención del cauce y constituyó una medida preventiva frente a procesos de erosión y socavación que podrían afectar la seguridad de la comunidad y la infraestructura aledaña. Asimismo, se dejó constancia de que las actividades ejecutadas respondieron a la necesidad de intervenir puntos vulnerables y reducir la exposición al riesgo en los sectores priorizados. A continuación, se adjunta el registro fotográfico que evidencia las actividades realizadas en los diferentes frentes intervenidos.


DESCRIPCION	SECTOR INTERVENIDO	CANTIDAD EJECUTADA	OBSERVACIONES
TRANSPORTE MATERIAL VOLQUETA DOBLE TROQUE	EL BRILLANTE RIO OCOA	14	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno para construcción de jarillones de protección
TRANSPORTE MATERIAL VOLQUETA DOBLE TROQUE	ARAGUANEY	6	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno para construcción de jarillones de protección
TRANSPORTE MATERIAL VOLQUETA DOBLE TROQUE	7 DE AGOSTO CAÑO MAIZARO	4	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno para construcción de jarillones de protección
TRANSPORTE MATERIAL VOLQUETA DOBLE TROQUE	CUNAVICHE RIO GUATIQUIA	10	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno para construcción de jarillones de protección
TRANSPORTE MATERIAL VOLQUETA DOBLE TROQUE	QUINTAS DEL LLANO	6	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno para construcción de jarillones de protección
TRANSPORTE MATERIAL VOLQUETA DOBLE TROQUE	JUAN PABLO SEGUNDO RIO OCOA	10	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno para construcción de jarillones de protección
TOTAL	**DIAS**	**50**	

Anexos y Evidencias:

- **EL BRILLANTE RIO OCOA**





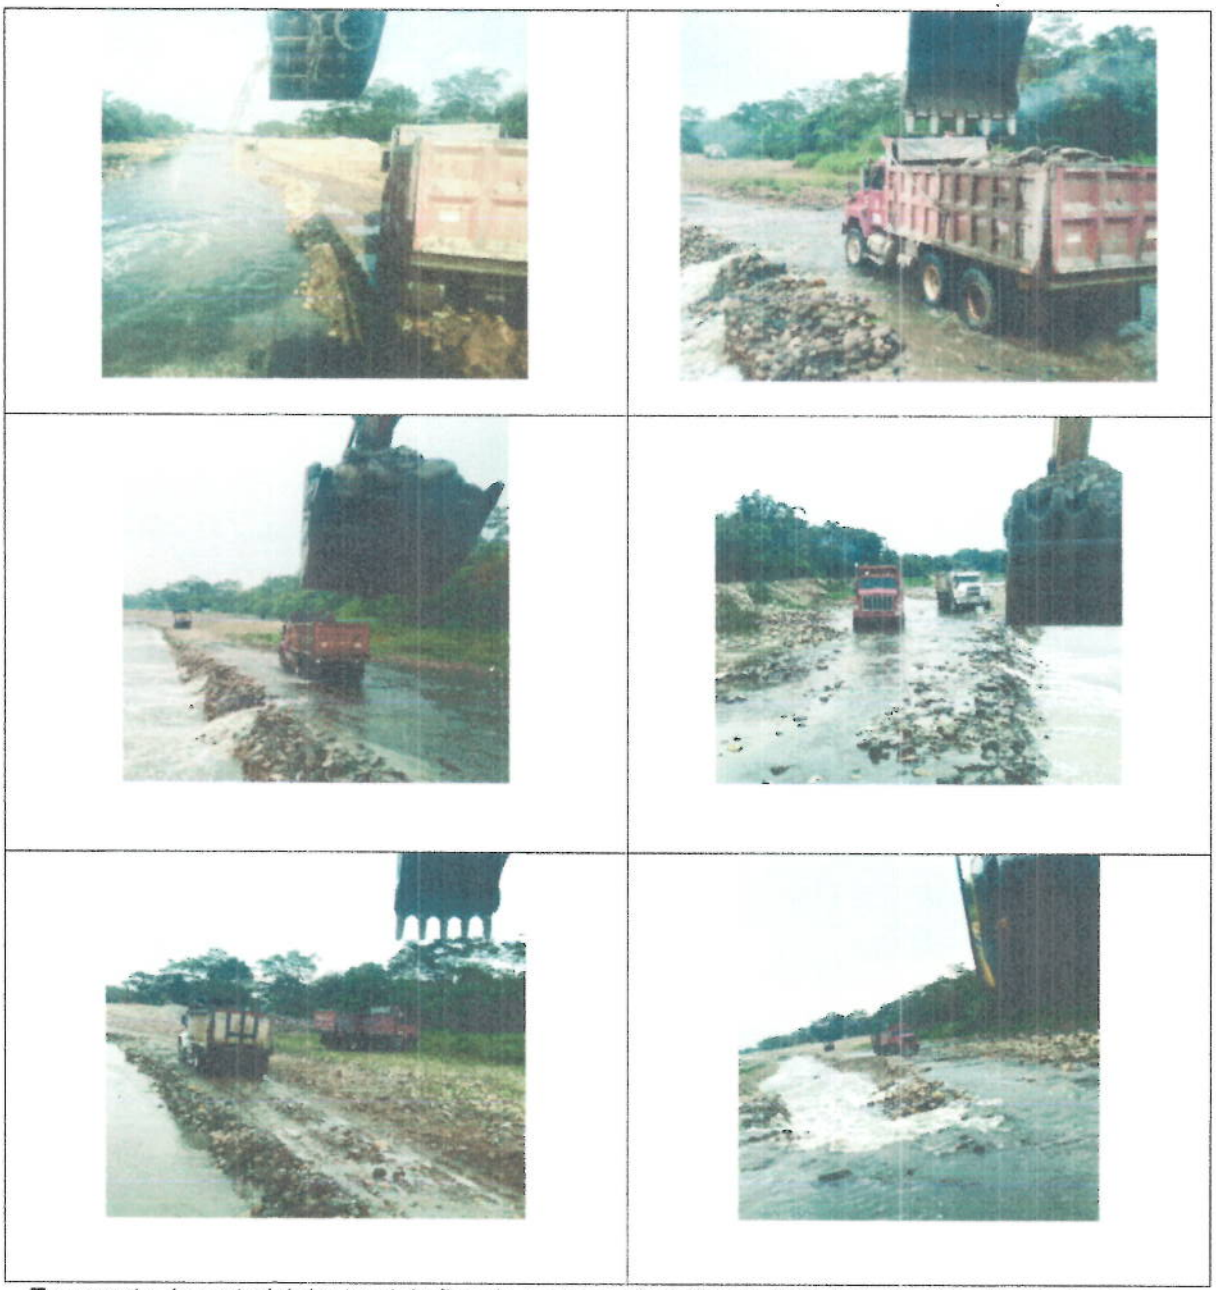

Transporte de material dentro del afluente para construcción de jarillones, Sector el brillante rio ocoa

- **ARAGUANEY**



Transporte de material dentro del afluente para construcción de jarillones, Sector Araguaney

- **7 DE AGOSTO CAÑO MAIZARO**



Transporte de material dentro del afluente para construcción de jarillones, Sector 7 de agosto caño Maizaro

- **CUNAVICHE RIO GUATIQUIA**















Transporte de material dentro del afluente para construcción de jarillones, Sector cunaviche rio guatiquia

- **QUINTAS DEL LLANO**



Transporte de material dentro del afluente para construcción de jarillones, Sector quintas del llano

- **JUAN PABLO SEGUNDO RIO OCOA**










Transporte de material dentro del afluente para construcción de jarillones, Sector juan pablo segundo

AVANCE TECNICO EJECUTADO EN EL PRESENTE PERIODO: ACTA PARCIAL No 1

		CONDICIONES ACTUALIZADAS				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIO N/A		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS		PENDIENTES POR EJECUTAR	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V.UNIT	V. TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL	CANT.	V.TOTAL
GUATAPE, RESERVAS DE GUATAPE Y VILLAS DEL PROGRESO															
1,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	57,12	$ 40.200,00	$ 2.301.936,00		$ -		$ -	57,12	$ 2.301.936,00	57,1	$ 2.301.936,00	0,00	$ -
1,2	MANEJO DE AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL	DIA	5,00	$ 286.700,00	$ 1.433.500,00		$ -		$ -	5,00	$ 1.433.500,00	5,00	$ 1.433.500,00	0,00	$ -
1,3	CANALIZACION RIO (TIPO EXCAVADORA ORUGA DA)	HR	80,00	$ 368.900,00	$ 29.512.000,00		$ -		$ -	80,00	$ 29.512.000,00	80,00	$ 29.512.000,00	0,00	$ -
1,4	GEOTEXTIL NT 2000 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	100,00	$ 14.200,00	$ 1.420.000,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	100,00	$ 1.420.000,00
1,5	CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES RECUBRIMIENTO PVC TRIPLE TORSION GALVANIZADO MINIMO 245 GRAMOS TIPO DE APERTURA 8X10 DIAMETRO ALAMBRE 3MM CALIBRE 12 Y DIAMETRO DE ARISTA 3,8 MEDIDAS 2X1X1	M3	110,00	$ 362.500,00	$ 39.875.000,00		$ -		$ -	110,00	$ 39.875.000,00	110,00	$ 39.875.000,00	0,00	$ -
1,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOBOLSA POLIPROPILENO DE ALTO MODULO TIPO TR 4000 DIMENSIONES 4,5MX2,5MX0,5M	UND	20,00	$ 1.545.000,00	$ 30.900.000,00		$ -		$ -	20,00	$ 30.900.000,00	20,00	$ 30.900.000,00	0,00	$ -
1,7	REVESTIMIENTO PARA GAVIONES EN CONCRETO 28,7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	14,20	$ 949.000,00	$ 13.556.400,00					14,20	$ 13.556.400,00	14,20	$ 13.556.400,00	0,00	$ -
BARRIO PACANDE CAMINO GANADERO															
2,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	127,68	$ 40.300,00	$ 5.145.504,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	127,68	$ 5.145.504,00
2,2	MANEJO DE AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL	DIA	8,00	$ 286.700,00	$ 2.293.600,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	8,00	$ 2.293.600,00
2,3	CANALIZACION RIO (TIPO EXCAVADORA ORUGA DA)	HR	50,00	$ 368.900,00	$ 18.445.000,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	50,00	$ 18.445.000,00
2,4	GEOTEXTIL NT 2000 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	110,00	$ 14.300,00	$ 1.573.000,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	110,00	$ 1.573.000,00
2,5	CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES RECUBRIMIENTO PVC TRIPLE TORSION GALVANIZADO MINIMO 245 GRAMOS TIPO DE APERTURA 8X10 DIAMETRO ALAMBRE 3MM CALIBRE 12 Y DIAMETRO DE ARISTA 3,8 MEDIDAS 2X1X1	M3	240,00	$ 362.500,00	$ 87.000.000,00				$ -		$ -	0,00	$ -	240,00	$ 87.000.000,00
PUENTE PEATORAL SAN CARLOS ENTRE BARRIO PINILLA - EL MILAGRO															
3,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	44,00	$ 40.300,00	$ 1.809.664,00		$ -		$ -	44,00	$ 1.809.664,00	44,00	$ 1.809.664,00	0,00	$ -
3,2	MANEJO DE AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL	DIA	5,00	$ 286.700,00	$ 1.433.500,00		$ -		$ -	5,00	$ 1.433.500,00	5,00	$ 1.433.500,00	0,00	$ -
3,3	CANALIZACION RIO (TIPO EXCAVADORA ORUGA DA)	HR	50,00	$ 368.900,00	$ 18.445.000,00		$ -		$ -	50,00	$ 18.445.000,00	50,00	$ 18.445.000,00	0,00	$ -
3,4	GEOTEXTIL NT 2000 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	68,00	$ 14.300,00	$ 972.400,00		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	68,00	$ 972.400,00
3,5	CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES RECUBRIMIENTO PVC TRIPLE TORSION GALVANIZADO MINIMO 245 GRAMOS TIPO DE APERTURA 8X10 DIAMETRO ALAMBRE 3MM CALIBRE 12 Y DIAMETRO DE ARISTA 3,8 MEDIDAS 2X1X1	M3	80,00	$ 362.500,00	$ 29.000.000,00		$ -		$ -	80,00	$ 29.000.000,00	80,00	$ 29.000.000,00	0,00	$ -
PUENTE VEHICULAR ROSAL - LA PRADERA															
4,1	CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES RECUBRIMIENTO PVC TRIPLE TORSION GALVANIZADO MINIMO 245 GRAMOS TIPO DE APERTURA 8X10 DIAMETRO ALAMBRE 3MM CALIBRE 12 Y DIAMETRO DE ARISTA 3,8 MEDIDAS 2X1X1	M3	20,00	$ 362.500,00	$ 7.250.000,00		$ -		$ -	20,00	$ 7.250.000,00	20,00	$ 7.250.000,00	0,00	$ -
CONSTRUCION DE JARILLONES															
5,1	CANALIZACION RIO (TIPO EXCAVADORA ORUGA DA)	HR	300,00	$ 368.900,00	$ 110.670.000,00		$ -		$ -	300,00	$ 110.670.000,00	300,00	$ 110.670.000,00	0,00	$ -
5,2	TRANSPORTE DE MATERIAL DEL DENTRO AFLUENTE PARA CONSTRUCION DE JARILLONES	DIA	50,00	$ 1.728.000,00	$ 86.400.000,00		$ -		$ -	50,00	$ 86.400.000,00	50,00	$ 86.400.000,00	0,00	$ -
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO				$ 489.445.504,00		$ -		$ -		$ 372.586.000,00		$ 372.586.000,00		$ 116.859.504,00
	VALOR TOTAL AIU (33%)				$ 161.517.016,00		$ -		$ -		$ 122.953.380,00		$ 122.953.380,00		$ 38.563.636,00
	VALOR TOTAL CONTRATO				$ 650.962.520,00		$ -		$ -		$ 495.539.380,00		$ 495.539.380,00		$ 155.423.140,00

3. EVALUACION Y REEVALAUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	EXCELENTE
CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	BUENO
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	EXCELENTE
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	EXCELENTE

4. **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:** Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así: (Si aplica, reportar los dos meses que componen el periodo. Los valores se reportan sin intereses de mora). Si el contratista es pensionado indicar el número de resolución correspondiente y anexar copia del documento.

Nombre del Afiliado	PACHECO CORDOBA BIUNNY	
No. de Identificación	1006796333	
Mes de Cotizado	MARZO	ABRIL
Fecha de Pago	24/04/2026	8/05/2026
Número de Planilla	4651417471	4653185622
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.750.905	$ 1.750.905
Valor pagado en PENSIÓN	$ 280.200	$ 280.200
Valor pagado en SALUD	$ 218.900	$ 218.900
Valor pagado en ARL	$ 121.900	$ 121.900

Nombre del Afiliado	LUIS EDUARDO PEINADO CUELLAR	
No. de Identificación	1090478273	
Mes de Cotizado	MARZO	ABRIL
Fecha de Pago	22/04/2026	19/05/2026
Número de Planilla	9502310424	9503950062
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.750.905	$ 1.750.905
Valor pagado en PENSIÓN	$ 280.200	$ 280.200
Valor pagado en SALUD	$ 218.900	$ 218.900
Valor pagado en ARL	$ 121.900	$ 121.900

Nombre del Afiliado	YARA LANDAHETA JOSE DAVID	
No. de Identificación	86085701	
Mes de Cotizado	MARZO	ABRIL
Fecha de Pago	22/04/2026	19/05/2026
Número de Planilla	9501560353	9503209358
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.750.905	$ 1.750.905
Valor pagado en PENSIÓN	$ 280.200	$ 280.200
Valor pagado en SALUD	$ 218.900	$ 218.900
Valor pagado en ARL	$ 121.900	$ 121.900

Nombre del Afiliado	MAHECHA VIRGUEZ EDWIN ANIBAL	
No. de Identificación	11524037	
Mes de Cotizado	MARZO	ABRIL
Fecha de Pago	22/04/2026	19/05/2026
Número de Planilla	9501918241	9503600064
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.750.905	$ 1.750.905
Valor pagado en PENSIÓN	$ 280.200	$ 280.200
Valor pagado en SALUD	$ 218.900	$ 218.900
Valor pagado en ARL	$ 121.900	$ 121.900

Nombre del Afiliado	URREGO MATEUS DIEGO FERNANDO	
No. de Identificación	1003519785	
Mes de Cotizado	MARZO	ABRIL
Fecha de Pago	10/04/2026	19/05/2026
Número de Planilla	9500866853	9504079547
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.750.905	$ 1.750.905
Valor pagado en PENSIÓN	$ 280.200	$ 280.200
Valor pagado en SALUD	$ 218.900	$ 218.900
Valor pagado en ARL	$ 9.200	$ 9.200

Nombre del Afiliado	GARZON JIMENEZ RICARDO
No. de Identificación	18370316
Mes de Cotizado	ABRIL
Fecha de Pago	11/05/2026
Número de Planilla	37343268
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.750.905
Valor pagado en PENSIÓN	$ 280.200
Valor pagado en SALUD	$ 70.100
Valor pagado en ARL	$ 76.200

Nombre del Afiliado	ESPINOSA REYES MARIA PATRICIA
No. de Identificación	32832049
Mes de Cotizado	ABRIL
Fecha de Pago	11/05/2026
Número de Planilla	37343268
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.750.905
Valor pagado en PENSIÓN	$ 280.200
Valor pagado en SALUD	$ 70.100
Valor pagado en ARL	$ 9.200

Nombre del Afiliado	SERRANO AVILA JAIRO
No. de Identificación	79778859
Mes de Cotizado	ABRIL
Fecha de Pago	11/05/2026
Número de Planilla	37343268
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.750.905
Valor pagado en PENSIÓN	$ 280.200
Valor pagado en SALUD	$ 70.100
Valor pagado en ARL	$ 76.200

Nombre del Afiliado	SERRANO AVILA MIGUEL ANTONIO
No. de Identificación	79784712
Mes de Cotizado	ABRIL
Fecha de Pago	11/05/2026
Número de Planilla	37343268
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.750.905
Valor pagado en PENSIÓN	$ 280.200
Valor pagado en SALUD	$ 70.100
Valor pagado en ARL	$ 76.200

Nombre del Afiliado	LADINO ALDANA HEIDER ANDRES
No. de Identificación	1121855352
Mes de Cotizado	ABRIL
Fecha de Pago	11/05/2026
Número de Planilla	37343268
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.750.905
Valor pagado en PENSIÓN	$ 280.200
Valor pagado en SALUD	$ 70.100
Valor pagado en ARL	$ 76.200

Nombre del Afiliado	RODRIGUEZ OSORIO JAVIER HERNANDO
No. de Identificación	1121914273
Mes de Cotizado	ABRIL
Fecha de Pago	11/05/2026
Número de Planilla	37343268
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.750.905
Valor pagado en PENSIÓN	$ 280.200
Valor pagado en SALUD	$ 70.100
Valor pagado en ARL	$ 28.000

5. **CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA**: Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución (la información completa de la ejecución debe reposar en el expediente contractual, si aplica, anexar CD con la información).

6. **CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:**

Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

Sistema de Gestión aplicable	Requisito	Cumplió / No Cumplió
Calidad	Usó la documentación vigente establecida aplicable el desarrollo de las obligaciones contractuales.	Cumplió
Seguridad y Salud en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	Cumplió
	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal o protocolos de bioseguridad.	Cumplió
	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios.	Cumplió
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad.	Cumplió
Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejó reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones.	Cumplió
	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	Cumplió
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.	Cumplió

7. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	FECHA	%
ANTICIPO	$0 COP	N/A	N/A	N/A
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 495.539.380,00	N/A	27/03/2026 al 31/05/2026	76,12%
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 155.423.140,00	N/A	01/06/2026 al 10/07/2026	23,88%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 650,962,520,00	N/A	27/03/2025 al 10/07/2026	100%

8. **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:**

Con base en todo lo expuesto, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO N°.1** comprendido entre el **27 de marzo de 2026 al 31 de mayo de 2026,** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral y en consecuencia, autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTAMCTE ($ 495.539.380.00).** El presente informe se encuentra cargado en la plataforma SECOP II.

ANEXOS:
Soportes de pago de la planilla seguridad social
Planillas Horómetros

NOMBRE DEL SUPERVISOR:
JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ
CARGO DEL SUPERVISOR: JEFE OFICINA GESTION DEL RIESGO
TELÉFONO DEL SUPERVISOR: 3217371942

ANEXOS

SOPORTE PAGO DE SEGUIRIDAD SOCIAL MARZO 2026

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094947573		RONALDO CUEVAS LUIS EDUARDO	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias mora	Valor	
2026-03	2026-03	244078199	[illegible]	[illegible]	2026-04-10	2026-04-10	BANCOLOMBIA			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No	EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificacion	Nombre			Cotiz	Dias	IBC	Aporte	Cotiz	Dias	IBC	Aporte	Cotiz	Dias	IBC	Aporte	Cotiz	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC [illegible]	[illegible]			[illegible]	30	$ 1.750.905	$280.200	[illegible]	30	$ 1.750.905	$210.900					[illegible]	30	$ 1.750.905	$14.200				No	$621.300
Total	Afiliados(1)						$ 1.750.905	$280.200			$ 1.750.905	$210.900							$ 1.750.905	$14.200					$621.300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC [illegible]		[illegible]	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias mora	Valor	
2026-03	2026-03	244078199	[illegible]	[illegible]	2026-04-10	2026-04-10	BANCOLOMBIA			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No	EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificacion	Nombre			Cotiz	Dias	IBC	Aporte	Cotiz	Dias	IBC	Aporte	Cotiz	Dias	IBC	Aporte	Cotiz	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC [illegible]	[illegible]			[illegible]	30	$ 1.750.905	$280.200	[illegible]	30	$ 1.750.905	$210.900					[illegible]	30	$ 1.750.905	$14.200				No	$621.300
Total	Afiliados(1)						$ 1.750.905	$280.200			$ 1.750.905	$210.900							$ 1.750.905	$14.200					$621.300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC [illegible]		[illegible]	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias mora	Valor	
2026-03	2026-03	244078199	[illegible]	[illegible]	2026-04-10	2026-04-10	BANCOLOMBIA			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No	EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificacion	Nombre			Cotiz	Dias	IBC	Aporte	Cotiz	Dias	IBC	Aporte	Cotiz	Dias	IBC	Aporte	Cotiz	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC [illegible]	[illegible]			[illegible]	30	$ 1.750.905	$280.200	[illegible]	30	$ 1.750.905	$210.900					[illegible]	30	$ 1.750.905	$14.200				No	$621.300
Total	Afiliados(1)						$ 1.750.905	$280.200			$ 1.750.905	$210.900							$ 1.750.905	$14.200					$621.300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC [illegible]		[illegible]	DEPENDIENTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias mora	Valor	
2026-02	2026-02	240098102	[illegible]	[illegible]	2026-04-22	2026-04-[illegible]	[illegible]		$626.500	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES


No	EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificacion	Nombre			Cotiz	Dias	IBC	Aporte	Cotiz	Dias	IBC	Aporte	Cotiz	Dias	IBC	Aporte	Cotiz	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)							$ 1.750.905	$280.200			$ 1.750.905	$210.900				$0			$ 1.750.905	$14.200			$0		$500.300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$ 1.750.905	$280.200			$ 1.750.905	$210.900				$0			$ 1.750.905	$14.200			$0		$500.300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.C. (1 Afiliados)							$ 1.750.905	$280.200			$ 1.750.905	$210.900				$0			$ 1.750.905	$14.200			$0		$500.300
1	CC [illegible]	[illegible]			[illegible]	30	$ 1.750.905	$280.200	[illegible]	30	$ 1.750.905	$210.900				$0	[illegible]	30	$ 1.750.905	$14.200			$0	No	$500.300
Total	Afiliados(1)						$ 1.750.905	$280.200			$ 1.750.905	$210.900				$0			$ 1.750.905	$14.200			$0		$500.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



TOTAL PAGADO: $ 623.200

SOPORTE PAGO DE SEGUIRIDAD SOCIAL ABRIL 2026



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1124437		RAMIREZ VIRGUEZ EDWIN ANIBAL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 18B 0 13	BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.	3177501	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	100032014	9000400044		2026-05-19	2026-05-19	BANCOLOMBIA	1	$ 624.200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No	EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificacion		Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1124437	RAMIREZ VIRGUEZ EDWIN ANIBAL		230201	30	$ 1.750.905	$ 280.200	230201	30	$ 1.750.905	$ 210.900		0	0	0	14	30	$ 1.750.905	$ 121.900	0	0	0	No	$ 611.000
Total	Afiliados(1)						$ 1.750.905	$ 280.200			$ 1.750.905	$ 210.900							$ 1.750.905	$ 121.900					$ 611.000



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE


Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1030677277		VARA LANDAETA JOSE DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 14 CRA 10 E 1 Ap 201	TABIO - CUNDINAMARCA	3138774207	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	100032077	9000399550		2026-05-19	2026-05-19	BANCOLOMBIA	1	$ 621.400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No	EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificacion		Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1030677277	VARA LANDAETA JOSE DAVID		230201	30	$ 1.750.905	$ 280.200	230201	30	$ 1.750.905	$ 210.900		0	0	0	14	30	$ 1.750.905	$ 121.900	0	0	0	No	$ 611.000
Total	Afiliados(1)						$ 1.750.905	$ 280.200			$ 1.750.905	$ 210.900							$ 1.750.905	$ 121.900					$ 611.000



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094870273		PEINADO CUELLAR LUIS EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	K 48 # 8 B 29 Piso/Int: none	CUCUTA NORTE DE SANTANDER	3214781	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	100010401	9000400062		2026-05-19	2026-05-19	BANCOLOMBIA	0	$ 621.200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No	EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificacion		Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1094870273	PEINADO CUELLAR LUIS EDUARDO		230201	30	$ 1.750.905	$ 280.200	230201	30	$ 1.750.905	$ 210.900		0	0	0	14	30	$ 1.750.905	$ 121.900	0	0	0	No	$ 611.000
Total	Afiliados(1)						$ 1.750.905	$ 280.200			$ 1.750.905	$ 210.900							$ 1.750.905	$ 121.900					$ 611.000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065571755		JARRO MATEUS DIEGO FERNANDO	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 24 # 41 A 40	BOGOTA BOGOTA D.E	3134018343	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-04	2026-04	2000971006	1004279947		2026-05-12	2026-05-07	NOAH	1	$500.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No	Identificación	Nombre		Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1.750.905	$280.200			$1.750.905	$210.900			$0	$0			$1.750.905		$34.200		$0	$0		$500.300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1.750.905	$280.200			$1.750.905	$210.900			$0	$0			$1.750.905		$34.200		$0	$0		$500.300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1.750.905	$280.200			$1.750.905	$210.900			$0	$0			$1.750.905		$34.200		$0	$0		$500.300
1	CC	1065571755	JARRO DIEGO	1004	30	$1.750.905	$280.200	1004	30	$1.750.905	$210.900	1004	30	$0	$0	1004	30	$1.750.905	0.522%	$34.200	30	$0	$0	NO	$500.300
Total	Afiliados: 1)					$1.750.905	$280.200			$1.750.905	$210.900			$0	$0			$1.750.905		$34.200		$0	$0		$500.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIbank



TOTAL PAGADO: $ 621.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

TOTALES IBC

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ATP Administradora									
COMPENSAR									
PORVENIR									
PLA Administradora									
SANITAS EPS S.A.									

PLANILLAS HOROMETROS RESERVAS DE GUATAPE

REGISTRO HORAS TRABAJADAS

PROYECTO: CONTRATO 2131 DE 2026
EQUIPO: LOVOL 200 PC
OPERARIO:

Tipo de lluvia
Leve
Moderadas
Fuertes

Fecha	Horometro inicial	Horometro final	Fracción horas	Foto Horometros		Sectos Intervenid	Actividades realizada	Registro fotografico	
20/03/2026	1491,3	1495,7	4,4			RESERVAS DE GUATAPE	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION AMBAS MARGENES		
20/03/2026	1495,7	1500,1	4,4			RESERVAS DE GUATAPE	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION AMBAS MARGENES		
31/03/2026	1509,1	1512,4	12,3			RESERVAS DE GUATAPE	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION AMBAS MARGENES		
1/04/2026	1512,4	1518,5	6,1			RESERVAS DE GUATAPE	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION AMBAS MARGENES		
4/04/2026	1518,5	1524,0	5,5			RESERVAS DE GUATAPE	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION AMBAS MARGENES		
6/04/2026	1524,0	1529,1	5,1			RESERVAS DE GUATAPE	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION AMBAS MARGENES		
7/04/2026	1529,1	1533,1	4,0			RESERVAS DE GUATAPE	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION AMBAS MARGENES		
8/04/2026	1533,1	1539,9	6,8			RESERVAS DE GUATAPE	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION AMBAS MARGENES		
9/04/2026	1539,9	1544,7	4,8			RESERVAS DE GUATAPE	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION AMBAS MARGENES		
10/04/2026	1544,7	1552,0	7,3			RESERVAS DE GUATAPE	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION AMBAS MARGENES		

REGISTRO HORAS TRABAJADAS

PROYECTO: CONTRATO 2131 DE 2026
EQUIPO: LOVOL 280 PC
OPERARIO:

Tipo de lluvia
Leve
Moderadas
Fuertes

Fecha	Horometro inicial	Horometro final	Fracción de horas	Foto Horometros		Sector Intervenido	Actividades realizada	Registro fotografico
13/04/2026	1552.0	1557.4	5.4			RESERVAS DE GUATAPE	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION AMBAS MARGENES	
13/04/2026	1557.4	1561.4	4.0			RESERVAS DE GUATAPE	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION AMBAS MARGENES	
14/04/2026	1561.4	1567.5	6.1			RESERVAS DE GUATAPE	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION AMBAS MARGENES	
15/04/2026	1567.5	1571.0	3.5			RESERVAS DE GUATAPE	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION AMBAS MARGENES	
	TOTAL HORAS:		99.00					

PLANILLAS HOROMETROS PUENTE PEATONAL SANCARLOS – EL MILAGRO

REGISTRO HORAS TRABAJADAS

PROYECTO: CONTRATO 2131 DE 2026
EQUIPO:
OPERARIO:

Tipo de lluvia
Leve
Moderadas
Fuertes

Fecha	Horometro inicial	Horometro final	Fracción de horas	Foto Horometros		Sector Intervenido	Actividades realizadas	Registro fotografico
19/05/2026	3531.1	3532.8	1.7			PUENTE PEATONAL SANCARLOS - EL MILAGRO	CANALIZACION DE RIO Y DESCOLMATACION DEL AFLUENTE	
14/05/2026	3532.8	3543.1	10.3			PUENTE PEATONAL SANCARLOS - EL MILAGRO	CANALIZACION DE RIO Y DESCOLMATACION DEL AFLUENTE	
13/05/2026	3543.1	3553.1	10.0			PUENTE PEATONAL SANCARLOS - EL MILAGRO	CANALIZACION DE RIO Y DESCOLMATACION DEL AFLUENTE	
11/05/2026	3553.1	3559.8	6.7			PUENTE PEATONAL SANCARLOS - EL MILAGRO	CANALIZACION DE RIO Y DESCOLMATACION DEL AFLUENTE	

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-27
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión: V1
		Fecha: 29/04/2025
	FORMATO INFORME DE SUPERVISOR	Página 49 de 58

REGISTRO HORAS TRABAJADAS

PROYECTO: CONTRATO 2131 DE 2026
EQUIPO:
OPERARIO:

Tipo de lluvia
Leve
Moderadas
Fuertes




Fecha	Horometro inicial	Horometro final	Fracción de horas	Foto Horometros	Sector Intervenido	Actividades realizadas	Registro fotografico
15/05/2026	3558,8	3561,6	2,8		PUENTE PEATONAL SANCARLOS - EL MILAGRO	CANALIZACION DE RIO Y DESCOLMATACION DEL AFLUENTE	
16/05/2026	3561,6	3570,8	9,2		PUENTE PEATONAL SANCARLOS - EL MILAGRO	CANALIZACION DE RIO Y DESCOLMATACION DEL AFLUENTE	
19/05/2026	3570,8	3581,1	10,3		PUENTE PEATONAL SANCARLOS - EL MILAGRO	CANALIZACION DE RIO Y DESCOLMATACION DEL AFLUENTE	
TOTAL HORAS			50,09				

PLANILLAS HOROMETROS ANILLO VIAL CAÑO BUQUE

REGISTRO HORAS TRABAJADAS

PROYECTO: CONTRATO 2131 DE 2026
EQUIPO: JOHN DEERE 200 LC
OPERARIO:

Tipo de lluvia
Leve
Moderadas
Fuertes








Fecha	Hor ete	Hore tec	Fracción de horas	Foto Horometros	Sector Intervenid	Actividades realizadas	Registro fotografico
6/04/2026	20116,5	20121,2	4,9		ANILLO VIAL CAÑO BUQUE	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION MARGEN IZQUIERDA	
7/04/2026	20121,2	20136,0	15,0		ANILLO VIAL CAÑO BUQUE	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION MARGEN IZQUIERDA	
8/04/2026	20136,0	20148,0	10,0		ANILLO VIAL CAÑO BUQUE	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION MARGEN IZQUIERDA	
9/04/2026	20148,0	20158,3	10,3		ANILLO VIAL CAÑO BUQUE	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION MARGEN IZQUIERDA	
10/04/2026	20158,3	20163,1	10,0		ANILLO VIAL CAÑO BUQUE	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION MARGEN IZQUIERDA	
11/04/2026	20163,1	20174,7	5,6		ANILLO VIAL CAÑO BUQUE	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION MARGEN IZQUIERDA	

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-27
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión: V1
		Fecha: 29/04/2025
	FORMATO INFORME DE SUPERVISOR	Página 50 de 58

REGISTRO HORAS TRABAJADAS

PROYECTO: CONTRATO 2131 DE 2026
EQUIPO: JOHN DEERE 200 LC
OPERARIO:

Tipo de lluvia
Leve
Moderadas
Fuertes

Fecha	Horómetro	Horómetro	Fracción de horas	Foto Horometros		Sector Intervenido	Actividades realizadas	Registro fotografico
13/04/2026	20174,7	20180,8	6,1			ANILLO VIAL CAÑO BUQUE	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION MARGEN IZQUIERDA	
14/04/2026	20180,8	20187,0	6,2			ANILLO VIAL CAÑO BUQUE	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION MARGEN IZQUIERDA	
15/04/2026	20187,0	20194,3	7,3			ANILLO VIAL CAÑO BUQUE	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION MARGEN IZQUIERDA	
16/04/2026	20194,3	20200,8	6,5			ANILLO VIAL CAÑO BUQUE	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION MARGEN IZQUIERDA	
17/04/2026	20200,8	20205,9	5,1			ANILLO VIAL CAÑO BUQUE	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION MARGEN IZQUIERDA	
18/04/2026	20205,9	20216,4	10,5			ANILLO VIAL CAÑO BUQUE	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION MARGEN IZQUIERDA	
20/04/2026	20216,4	20224,3	7,9			ANILLO VIAL CAÑO BUQUE	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION MARGEN IZQUIERDA	
21/04/2026	20224,3	20223,6	5,3			ANILLO VIAL CAÑO BUQUE	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION MARGEN IZQUIERDA	
22/04/2026	20223,6	20237,2	7,6			ANILLO VIAL CAÑO BUQUE	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION MARGEN IZQUIERDA	
23/04/2026	20237,2	20245,2	8,0			ANILLO VIAL CAÑO BUQUE	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION MARGEN IZQUIERDA	
24/04/2026	20245,2	20248,6	3,4			ANILLO VIAL CAÑO BUQUE	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION MARGEN IZQUIERDA	
	TOTAL HORAS		132,30					

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-27
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión: V1
		Fecha: 29/04/2025
	FORMATO INFORME DE SUPERVISOR	Página 51 de 58

REGISTRO HORAS TRABAJADAS

PROYECTO: CONTRATO 2131 DE 2026
EQUIPO: ZOOMLION 215E
OPERARIO:

Tipo de lluvia
Leve
Moderadas
Fuertes


Fecha	Horometro ini	Horometro fin	Fracción de horas	Foto Horometros	Sector Intervenido	Actividades realizadas	Registro fotografico
6/04/2026	5279.0	5288.2	9.2		ANILLO VIAL CAÑO BUQUE	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION MARGEN IZQUIERDA	
7/04/2026	5288.2	5295.1	6.9		ANILLO VIAL CAÑO BUQUE	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION MARGEN IZQUIERDA	
8/04/2026	5295.1	5307.2	12.1		ANILLO VIAL CAÑO BUQUE	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION MARGEN IZQUIERDA	
	TOTAL HORAS		28,20				

PLANILLAS HOROMETROS CUNAVICHE RIO GUATIQUIA

REGISTRO HORAS TRABAJADAS

PROYECTO: CONTRATO 2131 DE 2026
EQUIPO: RETROEXCAVADORA HITACHI
OPERARIO:

Tipo de lluvia
Leve
Moderadas
Fuertes

Fecha	Horometro ini	Horometro fin	Fracción de horas	Foto Horometros	Sector Intervenido	Actividades realizada	Registro fotografico
27/04/2026	6734,2	6740,2	6,0		CUNAVICHE RIO GUATIQUIA	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION	
28/04/2026	6740,2	6747,7	7,5		CUNAVICHE RIO GUATIQUIA	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION	
29/04/2026	6747,7	6756,2	8,5		CUNAVICHE RIO GUATIQUIA	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION	
30/04/2026	6756,2	6766,5	10,3		CUNAVICHE RIO GUATIQUIA	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION	
2/05/2026	6766,5	6775,0	8,5		CUNAVICHE RIO GUATIQUIA	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION	
4/05/2026	6775,0	6781,6	6,6		CUNAVICHE RIO GUATIQUIA	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION	

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-27
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión: V1
		Fecha: 29/04/2025
	FORMATO INFORME DE SUPERVISOR	Página 52 de 58

REGISTRO HORAS TRABAJADAS

PROYECTO: CONTRATO 2131 DE 2026
EQUIPO: RETROEXCAVADORA HITACHI
OPERARIO:

Tipo de Horas
Leve
Moderadas
Fuertes

Fecha	Hora ini	Hora fin	Fracción de horas	Foto Horometros		Sector Intervenid	Actividades realizada	Registro fotografico
5/05/2026	6781,6	6793,2	11,6			CUNAVICHE RIO GUATIQUIA	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION	
6/05/2026	6793,2	6802,3	9,1			CUNAVICHE RIO GUATIQUIA	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION	
7/05/2026	6802,3	6811,2	8,9			CUNAVICHE RIO GUATIQUIA	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION	
8/05/2026	6811,2	6820,6	9,4			CUNAVICHE RIO GUATIQUIA	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION	
9/05/2026	6820,6	6833,4	12,8			CUNAVICHE RIO GUATIQUIA	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION	
	TOTAL HORAS		55,20					

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-27
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión: V1
		Fecha: 29/04/2025
	FORMATO INFORME DE SUPERVISOR	Página 53 de 58

REGISTRO HORAS TRABAJADAS

PROYECTO: CONTRATO 2131 DE 2026
EQUIPO: JOHN DEERE 200 LC
OPERARIO:

Tipo de Horas
Leve
Moderadas
Fuertes

Fecha	Hor cio	Hora tre	Fracción de horas	Foto Horometros		Sectos Intervenid	Actividades realizada	Registro fotografico
11/05/2026	20346,3	20347,4	1,1			PARCELAS DEL PROGRESO RIO GUATIQUIA	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION	
12/05/2026	20347,4	20350,7	3,3			PARCELAS DEL PROGRESO RIO GUATIQUIA	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION	
13/05/2026	20350,7	20353,6	2,9			PARCELAS DEL PROGRESO RIO GUATIQUIA	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION	
14/05/2026	20353,6	20356,6	3,0			PARCELAS DEL PROGRESO RIO GUATIQUIA	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION	
15/05/2026	20356,6	20377,6	3,0			PARCELAS DEL PROGRESO RIO GUATIQUIA	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION	
16/05/2026	20377,6	20382,6	5,0			PARCELAS DEL PROGRESO RIO GUATIQUIA	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION	
19/05/2026	20382,6	20386,6	4,0			PARCELAS DEL PROGRESO RIO GUATIQUIA	CANALIZACION DE RIO Y CONSTRUCION DE JARILLON DE PROTECCION	
	TOTAL HORAS		40,30					

PLANILLA REGISTRO DE VOLQUETAS

REGISTRO DIAS VOLQUETA

PROYECTO: CONTRATO 2131 DE 2026
EQUIPO:
OPERARIO:

Tipo de lluvia	
	Leve
	Moderadas
	Fuertes

Fecha	Dias volqueta	Sector Intervenid	Actividades realizadas	Registro fotografico
4-abr-26	2,00	EL BRILLANTE RIO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la afluente y su posterior descarga en el punto crítico	
6-abr-26	2,00	EL BRILLANTE RIO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la afluente y su posterior descarga en el punto crítico	
7-abr-26	2,00	EL BRILLANTE RIO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la afluente y su posterior descarga en el punto crítico	
8-abr-26	2,00	EL BRILLANTE RIO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la afluente y su posterior descarga en el punto crítico	
9-abr-26	2,00	EL BRILLANTE RIO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la afluente y su posterior descarga en el punto crítico	

Fecha	Dias volqueta	Sector Intervenid	Actividades realizadas	Registro fotografico
10-abr-26	2,00	EL BRILLANTE RIO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la afluente y su posterior descarga en el punto crítico	 
11-abr-26	2,00	EL BRILLANTE RIO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la afluente y su posterior descarga en el punto crítico	 
21-abr-26	2,00	ARAGUANEY	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la afluente y su posterior descarga en el punto crítico	 
22-abr-26	2,00	ARAGUANEY	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la afluente y su posterior descarga en el punto crítico	 
23-abr-26	2,00	ARAGUANEY	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la afluente y su posterior descarga en el punto crítico	 

Fecha	Dias volqueta	Sector intervenid	Actividades realizadas	Registro fotografico
27-abr-26	2,00	7 DE AGOSTO CAÑO MAIZARO	Se apoyo con el trasnporte de material para la elaboracion de geobolsas tr 4000	
28-abr-26	2,00	7 DE AGOSTO CAÑO MAIZARO	Se apoyo con el trasnporte de material para la elaboracion de geobolsas tr 4000	
5-may-26	2,00	CUNAVICHE RIO GUATIQUIA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la afluente y su posterior descarga en el punto critico	
6-may-26	2,00	CUNAVICHE RIO GUATIQUIA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la afluente y su posterior descarga en el punto critico	
7-may-26	2,00	CUNAVICHE RIO GUATIQUIA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la afluente y su posterior descarga en el punto critico	

Página

Fecha	Dias volqueta	Sector Intervenid	Actividades realizadas	Registro fotografico
8-may-26	2,00	CUNAVICHE RIO GUATIQUIA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la afluente y su posterior descarga en el punto critico.	 
9-may-26	2,00	CUNAVICHE RIO GUATIQUIA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la afluente y su posterior descarga en el punto critico.	 
11-may-26	2,00	QUINTAS DEL LLANO	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la afluente y su posterior descarga en el punto critico.	 
12-may-26	2,00	QUINTAS DEL LLANO	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la afluente y su posterior descarga en el punto critico.	 
13-may-26	2,00	QUINTAS DEL LLANO	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la afluente y su posterior descarga en el punto critico.	 

Fecha	Dias volqueta	Sector intervenid	Actividades realizadas	Registro fotografico
19-may-26	2,00	JUAN PABLO SEGUNDO RIO OCOA	Apoyo en el transporte y disposicion de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la alluente y su posterior descarga en el punto critico	 
20-may-26	2,00	JUAN PABLO SEGUNDO RIO OCOA	Apoyo en el transporte y disposicion de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la alluente y su posterior descarga en el punto critico	 
21-may-26	2,00	JUAN PABLO SEGUNDO RIO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la alluente y su posterior descarga en el punto critico	 
22-may-26	2,00	JUAN PABLO SEGUNDO RIO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la alluente y su posterior descarga en el punto critico	 
23-may-26	2,00	JUAN PABLO SEGUNDO RIO OCOA	Apoyo en el transporte y disposición de material de relleno, realizando el cargue en un punto de acopio dentro de la alluente y su posterior descarga en el punto critico	 
	50,00	TOTAL DIAS		

SUPERVISOR DESIGNADO
JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ
JEFE DE OFICINA DE GESTION DE RIESGOS
