Villavicencio, junio 22 de 2026

Señores
Oficina Gesón del Riesgo

Ref.: Contrato -2130-2026 **–** Orden de servicio N°002 de 2026

Objeto: '' CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS SECTORES: BARRIO DIVINO NIÑO, PUENTE PEATONAL DIVINO NIÑO SOBRE CAÑO GRANDE, BARRIO CATUMARE Y CONSTRUCCIÓN DE JARILLONES DE PROTECCIÓN EN DIFERENTES PUNTOS CRÍTICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META".

Asunto: Solicitud de prórroga por treinta dias (30) calendario a la orden de servicio N° 02 de 2026


En desarrollo de la orden de servicio N° 02 de 2026, suscrita el 26 de marzo del 2026, y teniendo en cuenta las condiciones técnicas, climáticas e hidrológicas presentadas durante la ejecución de las acvidades contratadas, nos permitimos solicitar una prórroga por un término de 30 días calendario, con el fin de garantizar la adecuada culminación de las obras objeto de la presente orden de servicio.

A la fecha, el proyecto presenta un avance fisico del 80.07 %, correspondiente principalmente a la ejecución de actividades de Excavación mecánica en conglomerado incluye cargue, canalización rio (por excavadora orugada) 20TL , suministro e instalación de geo bolsas en polipropileno del Divino niño, Canalización rio (por excavadora orugada) 20t, transporte de material del dentro afluente para construcción de jarillones en Construcción de Jarillones para la protección de margen y demás acvidades requeridas para garantizar la estabilidad de los sectores intervenidos.

Las acvidades de construcción de gaviones requieren condiciones hidráulicas controladas y estabilidad temporal del cauce para garantizar la excavación, conformación de fundaciones, colocación de estructuras y seguridad del personal y equipos. No obstante, las crecientes registradas durante la ejecución han impedido mantener condiciones adecuadas de trabajo dentro del cauce, afectando directamente los rendimientos previstos y la secuencia constructiva inicialmente programada.

Como evidencia de las condiciones presentadas durante la ejecución contractual, se registraron crecientes significados ocurridos durante el periodo de ejecución, los cuales generaron incrementos considerables en el nivel y afectaron las acvidades programadas.

REGISTRO FOTOGRAFICO

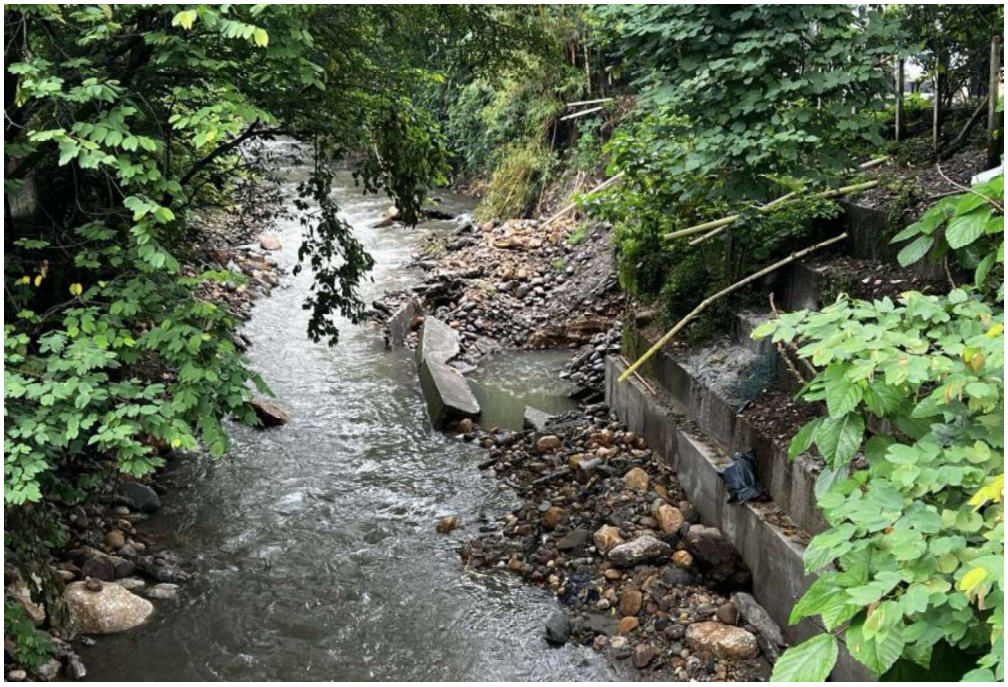







Con el fin de sustentar técnicamente la incidencia de la temporada de lluvias sobre la ejecución contractual, se realizó el análisis de los registros pluviométricos obtenidos del IDEAM, SENA, Vanguardia, correspondientes al mes comprendido entre el 16 de abril al 10 de junio.

TIEMPO	RANGO
Tiempo seco	< 0.10 mm
Lluvia ligera	0.10 a 10.00 mm
Lluvia ligera a moderada	10.10 a 20.00 mm
Lluvia moderada a fuerte	20.10 a 40.00 mm
Lluvia fuerte a torrencial	40.10 a 60.00 mm
Lluvia torrencial	> 60.10 mm

FECHA	IDEAM	SENA	VANGUARDIA	PROMEDIO
16/04/2026	19	57	6,6	27,53
17/04/2026	21,3	29,9	27,9	26,37
18/04/2026	0	0	0,3	0,1
19/04/2026	6,5	5	0,4	3,97
20/04/2026	10,8	10,4	21,7	14,3
21/04/2026	11	10	14,6	11,87
22/04/2026	17	13,5	6,3	12,27
23/04/2026	0	0	0	0
24/04/2026	12,9	6,5	5,4	8,27
25/04/2026	12,6	18,2	21,4	17,4
26/04/2026	37	11,2	12,6	20,27
27/04/2026	34	0	11,4	15,13
28/04/2026	86	86,7	76,8	83,17
29/04/2026	6,3	1,3	4,8	4,13

FECHA	IDEAM	SENA	VANGUARDIA	PROMEDIO
30/04/2026	0,5	2,6	1,1	1,4
1/05/2026	7,3	2,2	5,3	4,93
2/05/2026	114	99,7	112,3	108,67
3/05/2026	30	36,6	34,7	33,77
4/05/2026	4,7	0	0,8	1,83
5/05/2026	57,5	19,5	46,2	41,07
6/05/2026	36,1	28,8	34,6	33,17
7/05/2026	0,5		0,5	0,5
8/05/2026	0		0	0
9/05/2026	0	0,2	1	0,4
10/05/2026	11	8,6	8,3	9,3
11/05/2026	7,1	4,6	10,8	7,5
12/05/2026	26,1	21,2	55,2	34,17
13/05/2026	24,4	24,8	12,2	20,47
14/05/2026	1,2	2,3	12,7	5,4
15/05/2026	37,3	42,8	45,1	41,73
16/05/2026	13,6	11,1	11,3	12
17/05/2026	3,7	0,1	1,2	1,67
18/05/2026	39,7	31,1	25,6	32,13
19/05/2026	0,1	1,6	0	0,57
20/05/2026	0,3	52,9	0	17,73
21/05/2026	55,3	11,4	60,7	42,47
22/05/2026	27,2	1,7	29	19,3
23/05/2026	1	17,3	2,1	6,8
24/05/2026	26,7	45,8	34,6	35,7
25/05/2026	121,3	17	114,6	84,3
26/05/2026	59,3	12,5	61,7	44,5
27/05/2026	26,1	25,3	27,6	26,33
28/05/2026	39,6	0	68,2	35,93
29/05/2026	10,2	5,4	9,8	8,47

FECHA	IDEAM	SENA	VANGUARDIA	PROMEDIO
30/05/2026	33,80	11,40	32,00	25,73
31/05/2026	19,80		19,80	19,80
01/06/2026	6,00		8,70	7,35
02/06/2026	1,70		2,90	2,30
03/06/2026	20,80		2,30	11,55
04/06/2026	63,70		48,10	55,90
05/06/2026	13,30		18,40	15,85
06/06/2026	1,00		2,10	1,55
07/06/2026	96,00		88,20	92,10
08/06/2026	13,80		16,10	14,95
09/06/2026	12,60		9,60	11,10
10/06/2026	0,20			0,20

Estas precipitaciones generaron incrementos significativos en los niveles y caudales del divino niño provocando crecientes súbitos que afectaron la estabilidad de las obras provisionales construidas para el direccionamiento hidráulico y limitaron el desarrollo de las acvidades previstas dentro del cauce. Como consecuencia de ello, fue necesario desnar una parte importante de los recursos disponibles a la recuperación de accesos, reconstrucción de jarillones temporales y restablecimiento de las condiciones mínimas de operación para continuar con la ejecución de las obras.

Por las razones anteriormente expuestas, solicitamos respetuosamente la aprobación de una prórroga por treinta (30) días calendario a la Orden de Servicio No. 002 de 2026, contados a partir del 22 de junio al 22 de julio de 2026, plazo que permirá culminar adecuadamente las acvidades contratadas, para garantizar la correcta ejecución de las obras de protección proyectadas y preservar la estabilidad, funcionalidad y durabilidad de la intervención

Cordialmente,



R.Legal Maria Angelica Beltran
CC. 1121966714
AB CONSTRUYENDO SAS
