CONSORCIO MAYORCA CONECTA

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
901999695-4
CR 35A 15B 35 OFICINA 410 ED PRISMA
MEDELLÍN
TEL- 4440568
FAX-4440568 Opc 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE9
Documento Ref.:
Código CIIU / Actividad Económica: 4210
Correo: proveedores@estyma.com

Señor(es):	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	**Fecha Documento :**	18 - Jun - 2026
NIT:	901387801-2	**Hora Documento:**	15:05:08-05:00
Dirección:	CL 35 SUR 40 35 - Envigado - Antioquia	**Fecha Vencimiento:**	18 - Jul - 2026
Teléfono:	6044801300	**Condición Pago:**	Crédito
		Lugar de Pago:	MEDELLIN

Código	Descripción	Cantidad	Valor_Unidad	Valor_Total	%IVA
SER-ANOGRAVADA	ACTA DE OBRA NO GRAVADA	1	76,245,166.00	76,245,166.00	

DESur

Al Contestar cite Radicado 2026-1300-011772-R Id 111180
Fecha: 2026-06-24 15:47
Destinatario: DIRECCIÓN DE EJECUCION
Remitente: CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Tipologia Documental: COMUNICACION RECIBIDA
Folios: 1

DESur
CONTIENE ANEXOS

ACTA NCONTRATO DESur-IA-168-2025 "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN NDEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24"

\fs17

Sub Total:	76,245,166.00
Descuento:	
IVA:	
Retención:	0.00
Retención AMB:	0.00
Retención: ICA	
Valor Total:	76,245,166.00

Firma Digital : b221f7ba18a2785e310d3d0a7c2fcd9a662fd7c1fba9bf069abe4dfea291c8adcd3306dfaf9c272fa5691330aa962148
Cufe : 86d58bc2829dca214c4560974f2645db74f0402bbf13dba2f5647b3a06a7ea2a20ad0f6ee152d3121c4cf8991c4cab75

SON : SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO UN PESOS Y SEIS CENTAVOS M/L

Somos Grandes Contribuyentes Resolución No. 041 de Enero 30 de 2014

Documento Ref.: -
Esta Factura electrónica de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 del Codigo de Comercio
Resolución No. 18764100452377 Fecha:22-Oct-2025 Factura FE 1 hasta FE 1000

ELABORADO POR	APROBADO	FECHA RECIBIDO:

FECHA DE VALIDACIÓN: 2026-06-18 HORA DE VALIDACIÓN 15:06:17-05:00 Elaborado por: lcuartas

Este comprobante ha sido emitido por TITANIO el Software de Facturación Electrónica de Delcop Colombia S.A.S. NIT 860.028.581

CONTRATO DE OBRA No.	DESur-M-163-2025
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENVI-001-1418-24.	

CONTRATISTA:	
CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
INTERVENTOR:	
CONSORCIO METROPOLITANO RA 2025	

Valor Inicial:	$ 53.051.910.303,00	ACTA DE OBRA No.4	
Plazo Inicial:	22 meses		
Valor Adicional:	$ -	Valor Final	$ 53.051.910.303,00
Plazo Adicional:	0 meses	Plazo Final	22 meses

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MODIFICACIONES					OBRA EJECUTADA		ACUMULADA		SALDO OBRA POR EJECUTAR	
						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 4			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No.4					
											4					
Item	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario ($)	Valor Total ($)	Cant	+/-	Valor ($)	Cant	Valor ($)	Cant	Valor ($)	Cant	Valor ($)	Cant	Valor Total ($)
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 676,250,772			$ -		$ 655,695,376		$ 16,922,876		$ 616,626,714		$ 341,368,585
1.1	Localizacion trazado y replanteo (Comisión de topografía , Incluye Topógrafo, cadenieros y equipos de precisión)	dia	540	$ 756,815	$ 408,734,100			$ -	540.00	$ 408,734,100.0	22.00	$ 16,922,876.00	89.00	$ 67,368,433.00	451.00	$ 341,368,565
1.2	Construccion de campamentos provisionales. Incluye mortero de pega, paredes en tableras, techo en lamina de zinc, red electrica interna en general, puertas y ventanas.	m2	336	$ 499,502	$ 167,496,672			$ -	897.01	$ 447,161,279.0		$ -	897.01	$ 447,161,279.00	0.00	$ -
2	INSTALACIONES PROVISIONALES Y DEMOLICIONES				$ 2,138,539,390			$ 5,455,538	$ -	$ 779,077,370		$ 84,459,672	$ -	$ 93,417,417		$ 685,659,953
2.1	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, anaqueles y latrunación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación. Incluye: suministro, transporte, instalación, excavación, concreto de fundación preparado en Obra de 17,5 Mpa - 2500 psi, diámetro aproximado 0,30 m y profundidad aproximada 0,60 m, cable o alambre tensas parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación, cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales.	m	1500	$ 35,196	$ 52,794,000			$ -	1,500.00	$ 52,794,000.0	91.11	$ 3,206,708.00	91.11	$ 3,206,708.00	1408.89	$ 49,587,292
2.2	Instalación de CERRAMIENTO EN SUPERBOARD calibre 8, con una altura de 2.20 m. Incluye suministro, transporte e instalación de la placa de superboar, estructura metálica cada 1.00m, larguero horizontal en la parte intermedia y superior, concreto de 17.5 Mpa para fijación de estructura , vlardos en madera cada 3m, excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de material, incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m	100	$ 125,474	$ 12,547,400	191.78	+	$ 24,063,404.00	408.14	$ 51,210,958.0	91.78	$ 11,516,004.00	308.14	$ 38,663,558.00	100.00	$ 12,547,400
2.3	DESMONTE Y LIMPIEZA a máquina, e=0,15m. Incluye cargue, transporte y botada de escombros material vegetal en botaderos oficiales o donde indique la interventoria. Su medida será en sitio.	m2	1000	$ 10,650	$ 10,650,000	1,641.14	+	$ 17,494,552.00	2,777.34	$ 29,606,444.0	770.51	$ 8,303,181.00	1777.34	$ 18,946,444.00	1000.00	$ 10,650,000
2.4	Demolición de andenes o pisos en concreto, baldosa o cualquier acabado, e = 8 - 25 cm, Incluye retiro de entresuelo, retiro y reinstalación de tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de teléfonos, según recibiendo de diseño. Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o cargue, transporte y botada de los escombros.	m2	1466	$ 43,842	$ 64,272,372			$ -	1,466.00	$ 64,272,372.0	502.29	$ 22,021,398.00	502.29	$ 22,021,398.00	963.71	$ 42,250,974
2.5	Desmonte y retiro de cordones en concreto o bordillos existentes 0,15x0,10 m, Manual o mecánico. Incluye cargue, transporte, botada y disposición de los escombros a sitios definidos por la interventoría.	m	1505	$ 19,302	$ 30,999,012			$ -	1,606.00	$ 30,999,012.0	28.80	$ 601,852.00	30.80	$ 594,502.00	1575.20	$ 30,404,510
2.6	Corte y demolición de pavimento asfáltico, Incluye corte con máquina de disco según trazado, compresor neumático con martillo, acopio, cargue, transporte interno, transporte externo y botada en botadero autorizado.	m3	1466	$ 169,991	$ 249,206,806			$ -	1,466.00	$ 249,206,806.0	0.00	$ -	0.00	$ -	1466.00	$ 249,206,806
2.7	Demolición de cimientos de cualquier tipo y material existentes. Incluye: Cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	un	20	$ 176,438	$ 3,528,760			$ -	20.00	$ 3,528,760.0		$ -	0.00	$ -	20.00	$ 3,528,760
2.8	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m3	8160	$ 167,994	$ 1,615,631,040	-182.34	-	-$ 36,102,418.00	1,003.66	$ 198,759,018.0	45.16	$ 8,939,429.00	50.43	$ 9,984,837.00	953.43	$ 188,774,181
2.9	Retiro de puerta peatonal en estructural metalica en el costado sur del proyecto. Incluye todo lo necesario para su retiro y disposicion final	un	1	$ 98,700,000	$ 98,700,000			$ -	1.00	$ 98,700,000.0		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 98,700,000
3	EXCAVACIONES				$ 1,842,151,955			-$ 18,322,000	$ -	$ 1,461,939,607		$ 83,250,813	$ -	$ 208,221,115		$ 1,253,718,474
3.1	Excavación manual en tierra de 0 a 2m bajo cualquier grado de humedad. Incluye acarreo interno, cargue, transporte y disposición final del material sobrante en botaderos oficiales. Medido en sitio.	m3	3384	$ 94,381	$ 319,385,304			$ -	3,384.00	$ 319,385,304.0		$ -	17.65	$ 1,665,825.00	3366.35	$ 317,719,479
3.2	Excavación manual en tierra de 2 a 4m bajo cualquier grado de humedad, Incluye acarreo interno, cargue, transporte y disposición final del material sobrante en botaderos oficiales. Medido en sitio.	m3	912	$ 98,346	$ 89,691,552			$ -	912.00	$ 89,691,552.0	0.00	$ -	0.29	$ 28,520.00	911.71	$ 89,663,032
3.3	Excavación manual para caissons, Incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo baja cualquier grado de humedad, Incluye roca descompuesta, bolas de roca de diametro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No Incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (0-2.5 m)	m3	150	$ 358,176	$ 53,726,400			$ -	47.54	$ 17,027,687.0	0.00	$ -	43.50	$ 15,580,558.00	4.04	$ 1,447,031
3.4	Excavación manual para caissons, Incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo baja cualquier grado de humedad, Incluye roca descompuesta, bolas de roca de diametro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No Incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (2,5-5 m)	m3	150	$ 447,704	$ 67,155,600			$ -	31.51	$ 14,107,163.0	4.42	$ 1,978,652.00	23.58	$ 10,601,631.00	7.93	$ 3,505,522
3.5	Excavación manual para caissons, Incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo baja cualquier grado de humedad, Incluye roca descompuesta, bolas de roca de diametro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No Incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (5-7,5 m)	m3	150	$ 485,376	$ 72,806,400			$ -	31.51	$ 15,294,193.0	8.84	$ 4,290,724.00	22.09	$ 10,721,956.00	9.42	$ 4,572,242

| | | |

| | | |

	CONTRATO DE OBRA No.	DESuNA-153-2025
	OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 59 SUR, DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENVI-0434-1418-24	

DESur

ACTA 1 | ACTA 2 | ACTA 3

CONTRATISTA:	
CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
INTERVENTOR:	
CONSORCIO METROPOLITANO ELA 2025	

Valor Inicial:	$ 53,051,810,203.00	ACTA DE OBRA No.4	
Plazo Inicial:	22 meses		
Valor Adicional:	$ -	Valor Final	$ 53,051,810,203.00
Plazo Adicional:	0 meses	Plazo Final	22 meses

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					MODIFICACIONES					OBRA EJECUTADA ACTA No. 4		ACUMULADA		SALDO OBRA POR EJECUTAR	
					ACTA DE MODIFICACIÓN No. 4			CONDICIONES ACTUALIZADAS							
Item	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario ($)	Valor Total ($)	Cant	+/-	Valor ($)	Cant	Valor ($)	Cant	Valor ($)	Cant	Valor ($)	Cant	Valor Total ($)
7.17	Suministro, transporte e instalación de semáforos para bicicusuarios, con contador. Incluye: soporte y placa de contraste de acuerdo a las normas de la Secretaría de Movilidad.	un	14	$ 1,292,697	$ 18,097,758			$ -	14.00	$ 18,097,758.0		$ -	0.00	$ -	14.00	$ 18,097,758
7.18	Suministro, transporte e instalación de discos direccionales para postes de semáforos, incluye todos los elementos necesarios para su correcta ejecución.	un	28	$ 264,113	$ 7,396,938			$ -	28.00	$ 7,396,938.0		$ -	0.00	$ -	28.00	$ 7,396,938
7.19	Construcción de Caja de distribución de 60 x 80cm.	un	1	$ 1,621,673	$ 1,621,673			$ -	1.00	$ 1,621,673.0		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,621,673
7.20	Suministro, transporte e instalación, programación y puesta en servicio de equipos de control de tráfico vial, con capacidad de dieciseis (16) grupos vehiculares y/o peatonales.	un	4	$ 65,288,788	$ 261,155,152			$ -	4.00	$ 261,155,152.0		$ -	0.00	$ -	4.00	$ 261,155,152
7.21	Suministro, transporte e instalación de equipo ininterrumpible de energía spa de 1 hora, potencia de 3kva.	un	4	$ 3,915,100	$ 15,660,400			$ -	4.00	$ 15,660,400.0		$ -	0.00	$ -	4.00	$ 15,660,400
7.22	Compra e instalación de software de programación con accesorios instalado en portátil. Incluye computador portátil y otros) y capacitación para personal técnico.	un	1	$ 17,201,509	$ 17,201,509			$ -	1.00	$ 17,201,509.0		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 17,201,509
8	URBANISMO				$ 1,230,918,281			$ -	$ -	$ 1,230,918,281		$ -	$ -	$ -		$ 1,230,918,281
8.1	Suministro, transporte e instalación de bordillo prefabricado en concreto 0m: largo 0.60 x ancho 0.15 x alto 0.30 m, incluye excavación y conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega.	m	2140	$ 120,202	$ 257,232,280			$ -	2,140.00	$ 257,232,280.0		$ -	0.00	$ -	2140.00	$ 257,232,280
8.2	Suministro, transporte e instalación de bordillo de confinamiento fc = 210 kg/cm2 (curvo para andenes zona de amoblamiento) Queda oculto bajo la superficie, ancho 10cm y altura 25cm, incluye excavación y conformación del terreno.	m	1110	$ 81,632	$ 90,611,520			$ -	1,110.00	$ 90,611,520.0		$ -	0.00	$ -	1110.00	$ 90,611,520
8.3	Suministro, transporte e instalación de adoquín peatonal en concreto20x10x6 color bahichara y lunar, distribución según diseño, incluye suministro y transporte de los materiales, cortes a máquina, arena gruesa y limpia para cama de asiento con espesor de 4cm compactados, arena para sello libre de materia organica.	m2	1467	$ 160,033	$ 234,768,411			$ -	1,467.00	$ 234,768,411.0		$ -	0.00	$ -	1467.00	$ 234,768,411
8.4	Suministro, transporte e instalación de adoquín vehicular en concreto20x10x8, color bahichara y lunar, distribución según diseño, incluye suministro y transporte de los materiales, cortes a máquina, arena gruesa y limpia para cama de asiento con espesor de 4cm compactados, arena para sello libre de materia organica.	m2	255	$ 177,231	$ 45,193,905			$ -	255.00	$ 45,193,905.0		$ -	0.00	$ -	255.00	$ 45,193,905
8.5	Suministro, transporte e instalación de tableta prefabricada tipo tapeol o alerta de 6x20x20 cm, tráfico peatonal, textura 5sa cerrada bicapa, con bisel arista de 10pt., incluye suministro y transporte de los materiales, cortes a máquina, arena gruesa y limpia para cama de asiento con espesor de 4cm compactados, arena para sello libre de materia organica	m2	87	$ 96,634	$ 8,407,158			$ -	87.00	$ 8,407,158.0		$ -	0.00	$ -	87.00	$ 8,407,158
8.6	Suministro, transporte e instalación de tableta prefabricada tipo táctil guía de 6x20x20 cm, tráfico peatonal, textura 5sa cerrada bicapa, con bisel arista de 10pt., incluye suministro y transporte de los materiales, cortes a máquina, arena gruesa y limpia para cama de asiento con espesor de 4cm compactados, arena para sello libre de materia organica	m2	120	$ 79,102	$ 9,492,240			$ -	120.00	$ 9,492,240.0		$ -	0.00	$ -	120.00	$ 9,492,240
8.7	Construcción de andén en losa de concreto 21 Mpa, E=8cm No incluye refuerzo, según diseño. Incluye suministro y transporte de los materiales. No incluye enlistonado ni excavaciones.	m2	250	$ 131,107	$ 32,776,750			$ -	250.00	$ 32,776,750.0		$ -	0.00	$ -	250.00	$ 32,776,750
8.8	Concreto permeable para ciclo ruta, color por definir, no incluye excavación ni mejoramiento de la subrasante	m2	972	$ 174,912	$ 170,014,464			$ -	972.00	$ 170,014,464.0		$ -	0.00	$ -	972.00	$ 170,014,464
8.9	Suministro, transporte e instalación de piedraquin Dim: 0.20 x 0.15	m2	193	$ 142,847	$ 27,611,671			$ -	193.00	$ 27,511,671.0		$ -	0.00	$ -	193.00	$ 27,511,671
8.10	Pasarela en malla metálica, Tubería estructural rectangular de 6cms x 20cms, Angulo de 2cms x 2.5cms, Viga metálica en U, Fundación dado de concreto, Platina de 3/8" x 2". Pintura anticorrosiva.	m2	111	$ 888,452	$ 98,618,172			$ -	111.00	$ 98,618,172.0		$ -	0.00	$ -	111.00	$ 98,618,172
8.11	Pasamanos metálico, compuesto por platina superior horizontal de 3/8" x 2", con nailz para ocultar cinta led, mas vainillas verticales fijas de 3/8" y ángulo de 2cms x 2.5cms inferior, pintura anticorrosiva,Tubo en acero inoxidable de 1"	m	207	$ 1,225,700	$ 253,719,900			$ -	207.00	$ 253,719,900.0		$ -	0.00	$ -	207.00	$ 253,719,900
8.12	Cinta led de iluminación en pasamanos metálicos. según diseño.	m	85	$ 100,846	$ 8,571,910			$ -	85.00	$ 8,571,910.0		$ -	0.00	$ -	85.00	$ 8,571,910
9	PAISAJISMO				$ 666,278,225			$ -	$ -	$ 666,278,225		$ 21,159,644	$ -	$ 21,159,644		$ 666,118,581
9.1	Suministro e instalación de alcorque en concreto de 21 Mpa, incluye muro de bloque cataflin estándar 0.14x0.20 x 0.40 m, grouting en concreto de 14 Mpa (en los bloques huecos de por medio), acero de refuerzo, Lamina e=1/4", Perno acero Inoxi 1/4"x1/2" + tuerca, Incluye viga de fundación en concreto de 17,5 Mpa según especificaciones.	un	5	$ 3,879,923	$ 19,399,615			$ -	5.00	$ 19,399,615.0		$ -	0.00	$ -	5.00	$ 19,399,615
9.2	Resane de muros a la vista por demolición de estructuras existentes, con mortero 1:4. Incluye ranuras, filetes y dilataciones en muros. Incluye todo lo necesario para su correcta colocación y funcionamiento.	m2	1250	$ 64,629	$ 80,786,250			$ -	1,250.00	$ 80,786,250.0		$ -	0.00	$ -	1250.00	$ 80,786,250
9.3	Suministro, transporte e instalación y construcción de muros verdes, malla tipo palmeira y plantas tipo enredaderas	m2	669	$ 66,954	$ 44,279,026			$ -	669.00	$ 44,279,026.0		$ -	0.00	$ -	669.00	$ 44,279,026
9.4	Suministro, transporte y siembra de especies maqueo, incluye tierra abonada, (altura mínima 1 m)	un	259	$ 157,080	$ 40,683,720			$ -	259.00	$ 40,683,720.0		$ -	0.00	$ -	259.00	$ 40,683,720
9.5	Suministro, transporte y siembra de grama tipo san agustin , pasto japones, wedelia y otras especies menores, incluya tierra abonada. Ver densidad de especies menores. Según diseño.	m2	5453	$ 68,385	$ 316,373,405			$ -	5,453.00	$ 316,373,405.0		$ -	0.00	$ -	5453.00	$ 316,373,405
9.6	Talas de árboles de 0 a 5m	un	19	$ 229,551	$ 4,361,469			$ -	19.00	$ 4,361,469.0		$ -	0.00	$ -	19.00	$ 4,361,469
9.7	Talas de árboles de 5 a 10m	un	27	$ 503,394	$ 13,591,638			$ -	27.00	$ 13,591,638.0	1.00	$ 503,394.00	1.00	$ 503,394.00	26.00	$ 13,088,244
9.8	Talas de árboles de 10 a 15m	un	1	$ 779,079	$ 779,079			$ -	1.00	$ 779,079.0		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 779,079
9.9	Transplante de árboles de 0 a 5m	un	9	$ 3,559,375	$ 32,034,375			$ -	9.00	$ 32,034,375.0	2.00	$ 7,118,750.00	2.00	$ 7,118,750.00	7.00	$ 24,915,625
9.10	Transplante de árboles de 5 a 10m	un	9	$ 4,512,500	$ 40,612,500			$ -	9.00	$ 40,612,500.0	3.00	$ 13,537,500.00	3.00	$ 13,537,500.00	6.00	$ 27,075,000
9.11	Murales tipo grafiti en pinturas tipo Vinilex y Pinturas en aerosol tipo Montana 94, altura máxima 6 metros. Número de manos de acuerdo a necesidad del artista.	m2	1076	$ 84,923	$ 91,377,148			$ -	1,076.00	$ 91,377,148.0		$ -	0.00	$ -	1076.00	$ 91,377,148
10	MOBILIARIO URBANO				$ 306,628,154			$ -	$ -	$ 306,628,154		$ -	$ -	$ -		$ 306,628,154
10.1	Suministro, transporte e instalación de basurera tipo 4 (manual de espacio público - MEP). Incluye caneca en lámina CR calibre 14 de 50x24cm, vertical en platina de 3/8" de 85cm longitud, anclajes y pernos de 3/8" y dado 30x30x40cm en concreto reforzado de 3000PSI.	un	5	$ 1,281,407	$ 6,407,035			$ -	5.00	$ 6,407,035.0		$ -	0.00	$ -	5.00	$ 6,407,035
10.2	Suministro, transporte e instalación de bicicletero tipo u (manual de espacio público - MEP). En perfiltubular metálico de altura máxima de 75cm y 70cm de ancho, con pintura electrostática negra semi mate. Anclajes en platinas metálicas, con pintura electrostática negra semi mate y dado en concreto de 15x20x20cm. Según diseño.	un	4	$ 559,818	$ 2,239,272			$ -	4.00	$ 2,239,272.0		$ -	0.00	$ -	4.00	$ 2,239,272

CONTRATO DE OBRA Nro.	DES-VIA-168-2025	CONTRATISTA:	CONSORCIO MAYORCA CONECTA
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO EIVA-GGM-1418-24		INTERVENTOR:	CONSORCIO METROPOLITANO ILA 2025

Valor Inicial:	$ 53,081,910,303.00	ACTA DE OBRA Nro.4
Plazo Inicial:	22 meses	
Valor Adicional:	$ -	Valor Final: $ 53,081,910,303.00
Plazo Adicional:	0 meses	Plazo Final: 22 meses

ACTA 1 | ACTA 2 | ACTA 3

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MODIFICACIONES					OBRA EJECUTADA		ACUMULADA		SALDO OBRA POR EJECUTAR	
						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 4			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA Nro.4					
											4					
Item	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario ($)	Valor Total ($)	Cant	+/-	Valor ($)	Cant	Valor ($)	Cant	Valor ($)	Cant	Valor ($)	Cant	Valor Total ($)
10.3	Suministro, transporte e instalación de señal vertical indicativa de 2,46m de altura y ancho 74cm con platina metálica con pintura electrostática negra semi mate. Según diseño.	un	7	$ 591,047	$ 4,137,329			$ -	7.00	$ 4,137,329.0		$ -	0.00	$ -	7.00	$ 4,137,329
10.4	Suministro, transporte y construcción de muro de la memoria más banca tipo 1 (6.00m de longitud x 0.40m de altura y 0,50m de ancho) en concreto y madera. Incluye construcción de muro en malla electrosoldada de 0.05m separación entre varillas, de 6.00m de longitud y altura de 1.60m + 0.40m de altura de la banca. Lleno en teja de barro reciclada hasta 2.00m de altura y 50cm de ancho. Bono en piedra de canto rodado de 60x40cm y longitud 5.00m, banca en concreto simple de 21MPa de 1.50mx0.45m de ancho, según diseño estructural. Bono de 60x40x100cm en brozos de pino, hojas secas y palos secos. Según diseño.	un	2	$ 5,995,117	$ 11,990,234			$ -	2.00	$ 11,990,234.0		$ -	0.00	$ -	2.00	$ 11,990,234
10.5	Suministro, transporte y construcción de banca tipo 2 en concreto y madera. (4.01m de longitud x 0.40m de altura y 0.50m de ancho) en concreto y madera. Incluye construcción de muro en malla electrosoldada de 0.05m separación entre varillas, de 1.00m de longitud y altura de 1.60m + 0.40m de alta de la banca. Lleno en teja de barro reciclada hasta 2.00m de altura y 50cm de ancho. Bono en piedra de canto rodado de 50x40cm y longitud 4.01m, banca en concreto simple de 21MPa de 1.50mx0.45m de ancho, según diseño estructural. Bono de 50x40x100cm en brozos de pino, hojas secas y palos secos. Según diseño.	un	2	$ 4,733,787	$ 9,467,574			$ -	2.00	$ 9,467,574.0		$ -	0.00	$ -	2.00	$ 9,467,574
10.6	Suministro, transporte y construcción de banca tipo 3 en concreto, según diseño. Incluye banca en concreto de 0.45m de ancho x 1.50m de largo y espesor hasta de 0.14m. Estructura en malla electrosoldada de 0.05m separación entre varillas, lleno en ladrillos de 0.20x0.10m, varilla lisa de 6mm, según diseño.	un	1	$ 3,567,540	$ 3,567,540			$ -	1.00	$ 3,567,540.0		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 3,567,540
10.7	Suministro, transporte y construcción de hotel de insectos de 1.60m de altura x 2.00m de longitud y espesor según diseño. Incluye estructura en malla electrosoldada de 0.05m separación entre varillas, Bonos en capas de 0.40m; Bono de 0.40m en brozos de pino, hojas secas y palos secos, Bono de 0.40m en troncos de madera tamaño variable, Bono de 0.40m en teja de teja de barro reciclada, Bono de 0.40m en piedra de canto rodado y varilla lisa de 6mm, según diseño.	un	1	$ 3,504,545	$ 3,504,545			$ -	1.00	$ 3,504,545.0		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 3,504,545
10.8	Suministro, transporte y construcción de banca corrida 1 curva (ver detalle planos de espacio público). Banca con estructura en concreto, con dimensiones 0.60m de ancho x 3.5m de longitud y 0,45m de altura, con correa para fijación de listones en madera teca de 0.05x0.10m con Inoprancl, listones en madera teca de 1.50x0.05x0.02m y 0.45x0.05x0.02m, platina metálica 3/8" y listón en madera teca de 0.15x0.05x0.02m. Según diseño.	un	3	$ 3,714,377	$ 11,143,131			$ -	3.00	$ 11,143,131.0		$ -	0.00	$ -	3.00	$ 11,143,131
10.9	Suministro, transporte y construcción de banca corrida 2 curva (ver detalle planos de espacio público). Incluye banca tipo 2 con dimensiones de 3.50x0.60m, con espaldar, con estructura en concreto, con correa para fijación de listones en madera teca de 0.05x0.15m con Inoprancl, listones en madera teca de 1.50x0.05x0.02m y 0.45x0.05x0.02m, espaldar conformado por soporte metálico de 6mm acabado en pintura electrostática mate negro, perno de expansión 1/2 x 2" y listón horizontal en madera teca 0.22x0.05x0.02m. Según diseño.	un	4	$ 4,384,736	$ 17,538,944			$ -	4.00	$ 17,538,944.0		$ -	0.00	$ -	4.00	$ 17,538,944
10.10	Suministro, transporte y construcción de banca corrida 3 curva (ver detalle planos de espacio público).	un	5	$ 2,033,720	$ 10,168,600			$ -	5.00	$ 10,168,600.0		$ -	0.00	$ -	5.00	$ 10,168,600
10.11	Suministro, transporte y construcción de banca corrida 3 curva ver detalle planos de espacio público).Banca en concreto simple de 21Mpa según diseño estructural. De 0.50m de espesor y 0.45m de altura, Incluye suministro y transporte de los materiales, formaleta, refuerzo y demás requeridos para su correcta ejecución.	m	25	$ 1,006,969	$ 25,174,225			$ -	25.00	$ 25,174,225.0		$ -	0.00	$ -	25.00	$ 25,174,225
10.12	Suministro, transporte e instalación de bolardo metálico tipo luminaria (ver detalle planos de espacio público).	un	12	$ 1,469,169	$ 17,630,028			$ -	12.00	$ 17,630,028.0		$ -	0.00	$ -	12.00	$ 17,630,028
10.13	Suministro, transporte e instalación de parque infantil y gimnasio. Según diseño.	un	1	$ 71,123,077	$ 71,123,077			$ -	1.00	$ 71,123,077.0		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 71,123,077
10.14	Construcción de módulo de ventas tipo 5, según diseño.Dimensiones de 1.60m ancho x 1.93m de largo y 2.45m de altura. Modulo de ventas en lámina metálica + pintura o lámina alucobond, marco exterior en lamina metálica con pintura electrostática color rojo o alucobond con acabado color negro, estructura en acero inoxidable en tubería de sección circular de 2" calibre 18, puertas plegables y corredero en lámina metálica o alucobond y cuerpo fijo en malla galvanizada ondulada calibre 10 con ojo de 3.5cm enmarcada en perfil de aluminio de 1 x 1/8", entrepaños en lámina metálica, paño inferior de marco metálico en concreto reforzado + enchape en lámina metálica color roja y dilatación entre piso y marco color rojo en concreto reforzado.	un	2	$ 30,940,000	$ 61,880,000			$ -	2.00	$ 61,880,000.0		$ -	0.00	$ -	2.00	$ 61,880,000
10.15	Suministro, transporte e instalación de luminaria tipo 2 de 4.12m de alto, Incluye perfil tubular metálico con pintura electrostática negra semi mate y anclajes para su correcta instalación.	un	20	$ 2,532,831	$ 50,656,620			$ -	20.00	$ 50,656,620.0		$ -	0.00	$ -	20.00	$ 50,656,620
11	REDES HUMEDAS (ACUEDUCTO Y GAS)				$ 265,111,972			$ -		$ 265,111,972		$ -	$ -	$ -		$ 265,111,972
11.1	Corte, retiro y botada de material sobrante de acometidas que salen de servicio. Incluye cala medidor y accesorios	un	24	$ 184,976	$ 4,439,424			$ -	24.00	$ 4,439,424.0		$ -	0.00	$ -	24.00	$ 4,439,424
11.2	Excavación material común húmedo<2m mecanica, Incluya el cargue, transporte interno y externo y botada.	m3	604	$ 78,855	$ 47,628,420			$ -	604.00	$ 47,628,420.0		$ -	0.00	$ -	604.00	$ 47,628,420
11.3	Llena final de alcantarillas y aplonado zanjas y apiques en recebo, segun norma INVIAS, Art. 610, (CBR>10%). Incluye suministro, transporte interno y compactación con densidad seca igual o mayor al 95% de la densidad seca máxima obtenida mediante el ensayo Proctor Modificado.	m3	533	$ 109,417	$ 58,319,261			$ -	533.00	$ 58,319,261.0		$ -	0.00	$ -	533.00	$ 58,319,261
11.4	Suministro, transporte y colocación de tubería 90mm PEAD, PE 100, PN 16. Incluye termofusión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m	6	$ 117,529	$ 705,174			$ -	6.00	$ 705,174.0		$ -	0.00	$ -	6.00	$ 705,174
11.5	Suministro, transporte y colocación de tubería 125mm PEAD, PE 100, PN 16. Incluye termofusión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m	188	$ 135,351	$ 25,445,988			$ -	188.00	$ 25,445,988.0		$ -	0.00	$ -	188.00	$ 25,445,988
11.6	Suministro, transporte y colocación de válvula de 90mm. Incluye Brida, Porta Brida y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	2	$ 1,545,251	$ 3,090,502			$ -	2.00	$ 3,090,502.0		$ -	0.00	$ -	2.00	$ 3,090,502
11.7	Suministro, transporte y colocación de válvula de 125mm. Incluye Brida, Porta Brida y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	1	$ 2,906,312	$ 2,906,312			$ -	1.00	$ 2,906,312.0		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 2,906,312
11.8	Suministro, transporte y colocación de codo 45° -125mm PEAD. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación	un	2	$ 411,249	$ 822,498			$ -	2.00	$ 822,498.0		$ -	0.00	$ -	2.00	$ 822,498

| | | |

| | | |

CONTRATO DE OBRA No.	OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°8 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-08-09-1418-24	OBRA No.	OS-SUA-183-2025

DESur

ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3

CONTRATISTA:	
CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
INTERVENTOR:	
CONSORCIO METROPOLITANO EA 2025	

Valor Inicial:	$ 93,061,810,303.00	ACTA DE OBRA Nro.4	
Plazo Inicial:	22 meses		
Valor Adicional:	$ -	Valor Final	$ 93,061,810,303.00
Plazo Adicional:	0 meses	Plazo Final	22 meses

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MODIFICACIONES					OBRA EJECUTADA				ACUMULADA		SALDO OBRA POR EJECUTAR	
						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 4			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA Nro.4							
											4							
Nem	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario ($)	Valor Total ($)	Cant	+/-	Valor ($)	Cant	Valor ($)	Cant	Valor ($)			Cant	Valor ($)	Cant	Valor Total ($)
14.16	Suministro, transporte y montaje de vestida primaria según norma RA2-003 de EPM	un	8	$ 2,027,274	$ 16,218,192			$ -	8.00	$ 16,218,192.00	2.00	$ 4,054,548.00			2.00	$ 4,054,548.00	6.00	$ 12,163,644
14.17	Suministro, transporte y montaje de vestida primaria según norma RA2-004 de EPM	un	3	$ 3,428,219	$ 10,284,657			$ -	3.00	$ 10,284,657.00		$ -			0.00	$ -	3.00	$ 10,284,657
14.18	Suministro, transporte y montaje de vestida primaria según norma RA2-019 de EPM	un	5	$ 8,885,924	$ 44,429,620			$ -	5.00	$ 44,429,620.00		$ -			0.00	$ -	5.00	$ 44,429,620
14.19	Suministro, transporte y montaje de vestida primaria según norma RA2-007 de EPM	un	2	$ 2,978,855	$ 5,957,710			$ -	2.00	$ 5,957,710.00		$ -			0.00	$ -	2.00	$ 5,957,710
14.20	Suministro, transporte y montaje de vestida primaria según norma RA3-026 de EPM	un	6	$ 1,689,735	$ 10,138,410			$ -	6.00	$ 10,138,410.00		$ -			0.00	$ -	6.00	$ 10,138,410
14.21	Suministro, transporte y montaje de vestida primaria según norma RA2-004 de EPM	un	2	$ 3,428,219	$ 6,856,438	3.00	+	$ 10,284,657.00	5.00	$ 17,141,095.00	3.00	$ 10,284,657.00			3.00	$ 10,284,657.00	2.00	$ 6,856,438
14.22	Suministro, transporte y montaje de vestida primaria según norma RA6-010 de EPM	un	8	$ 485,617	$ 3,885,536			$ -	8.00	$ 3,885,536.00	7.00	$ 3,400,719.00			7.00	$ 3,400,719.00	1.00	$ 485,617
14.23	Suministro, transporte y montaje de vestida primaria-Viento convencional según norma RA6-001 para 44KV de EPM.	un	3	$ 1,015,051	$ 3,045,153			$ -	3.00	$ 3,045,153.00		$ -			0.00	$ -	3.00	$ 3,045,153
14.24	Viento convencional según norma RA6-001 para 13.2KV	un	6	$ 718,265	$ 4,309,590	6.00	+	$ 4,309,590.00	12.00	$ 8,619,060.00	9.00	$ 6,464,295.00			9.00	$ 6,464,295.00	3.00	$ 2,154,765
14.25	Viento Farol según norma RA6-002 para 13.2KV de EPM	un	5	$ 848,018	$ 5,088,108			$ -	6.00	$ 5,088,108.00	3.00	$ 2,544,054.00			3.00	$ 2,544,054.00	3.00	$ 2,544,054
14.26	Suministro, transporte y montaje riendа super GX en promedio 30m.	ml	3	$ 391,765	$ 1,175,394			$ -	3.00	$ 1,175,394.00		$ -			0.00	$ -	3.00	$ 1,175,394
14.27	Suministro y montaje de estribos según norma RA6-009 de EPM	un	9	$ 132,943	$ 1,196,487			$ -	9.00	$ 1,196,487.00		$ -			0.00	$ -	9.00	$ 1,196,487
14.28	Traslado salida de cto según norma RA1-019 de EPM, incluye puesta tierra, tomillería, cinta bandit y demás elementos para su correcto funcionamiento.	un	2	$ 3,171,904	$ 6,343,808			$ -	2.00	$ 6,343,808.00		$ -			0.00	$ -	2.00	$ 6,343,808
14.29	Traslado salida de cto según norma RA2-010 de EPM, incluye puesta tierra, tomillería, cinta bandit y demás elementos para su correcto funcionamiento.	un	2	$ 1,924,187	$ 3,848,374			$ -	2.00	$ 3,848,374.00		$ -			0.00	$ -	2.00	$ 3,848,374
14.30	Adecuación salida de circuito según norma RA2-019 de EPM	un	1	$ 5,636,805	$ 5,636,805			$ -	1.00	$ 5,636,805.00		$ -			0.00	$ -	1.00	$ 5,636,805
14.31	Suministro, transporte y montaje linea primaria trifásica 3x350MCM XLPE 133% de aisl. Cable Aluminio.	ml	600	$ 356,104	$ 213,662,400			$ -	600.00	$ 213,662,400.00		$ -			0.00	$ -	600.00	$ 213,662,400
14.32	Suministro, transporte y montaje acometida primaria trifasica 3x1/0 Cu XLPE 133% de aisl. + 1No.2 Cu desnudo	ml	30	$ 389,914	$ 11,697,420			$ -	30.00	$ 11,697,420.00		$ -			0.00	$ -	30.00	$ 11,697,420
14.33	Suministro y montaje derivación en T, de 600A, operación bajo carga 15 KV, incluye borna, cintas, demás accesorios para su correcto funcionamiento.	un	12	$ 1,503,866	$ 18,046,392			$ -	12.00	$ 18,046,392.00		$ -			0.00	$ -	12.00	$ 18,046,392
14.34	Suministro, transporte y montaje premoldeado para cable 1/0 XLPE 133% de aislamiento 15 KV por fase tipo exterior, incluye borna y demás elementos para su correcto funcionamiento	un	3	$ 414,945	$ 1,244,835			$ -	3.00	$ 1,244,835.00		$ -			0.00	$ -	3.00	$ 1,244,835
14.35	Suministro, transporte y montaje premoldeado para cable 350MCM XLPE 133% de aislamiento 15KV por fase tipo exterior, incluye borna y demás elementos para su correcto funcionamiento	un	15	$ 743,216	$ 11,148,240			$ -	15.00	$ 11,148,240.00		$ -			0.00	$ -	15.00	$ 11,148,240
14.36	Suministro, transporte y montaje linea primaria aerea trifasica 3No.4/0+1No.1/0 ACSR	ml	60	$ 85,929	$ 5,155,740			$ -	60.00	$ 5,155,740.00		$ -			0.00	$ -	60.00	$ 5,155,740
14.37	Suministro, transporte y montaje linea primaria aerea trifasica 3No.266.8 ecokaliptol 1/0 AWAC 6 4/0 ACSR	ml	60	$ 230,896	$ 13,853,760	340.00	+	$ 78,538,640.00	400.00	$ 92,392,400.00	200.00	$ 46,199,200.00			200.00	$ 46,199,200.00	200.00	$ 46,193,200
14.38	Suministro, transporte y montaje linea primaria aerea trifasica 3No.1/0 Ecokaliptol +1/0 AWAC	ml	170	$ 139,358	$ 23,692,560			$ -	170.00	$ 23,692,560.00		$ -			0.00	$ -	170.00	$ 23,692,560
14.39	Suministro, transporte y montaje cuadrilla linea viva en dia festivo y/o no festivo	h	40	$ 1,816,519	$ 72,660,760			$ -	40.00	$ 72,660,760.00		$ -			0.00	$ -	40.00	$ 72,660,760
14.40	Suministro, transporte y montaje cable 6No2/0+2No1/0 Cu-THHN-2	ml	50	$ 551,622	$ 27,581,100			$ -	50.00	$ 27,581,100.00		$ -			0.00	$ -	50.00	$ 27,581,100
14.41	Suministro, transporte y montaje cable 3No2/0+1No1/0 Cu-THHN-2.	ml	50	$ 294,343	$ 14,717,150			$ -	50.00	$ 14,717,150.00		$ -			0.00	$ -	50.00	$ 14,717,150
14.42	Suministro, transporte y montaje cable 3No.4/0+1No2/0 Cu-THHN-2	ml	50	$ 303,763	$ 15,188,150			$ -	50.00	$ 15,188,150.00		$ -			0.00	$ -	50.00	$ 15,188,150
14.43	Suministro, transporte y montaje bajanta de 3"x6 según norma RA7 004, incluye los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.	un	6	$ 1,204,431	$ 7,226,586			$ -	6.00	$ 7,226,586.00		$ -			0.00	$ -	6.00	$ 7,226,586
14.44	Suministro, transporte y montaje caja RS3-005 sellada.	un	4	$ 1,814,242	$ 7,256,968			$ -	4.00	$ 7,256,968.00		$ -			0.00	$ -	4.00	$ 7,256,968
14.45	Retiro (incluye reintegro) linea primaria Al. 350MCM XLPE 15 KV al 100%	ml	35	$ 24,400	$ 854,000			$ -	35.00	$ 854,000.00		$ -			0.00	$ -	35.00	$ 854,000
14.46	Retiro (incluye reintegro) linea primaria 4 hilos para 13.2 y/o 44Kv	ml	1160	$ 13,800	$ 16,048,000			$ -	1,160.00	$ 16,048,000.00	30.00	$ 408,000.00			30.00	$ 408,000.00	1160.00	$ 15,640,000
14.47	Retiro (incluye reintegro) vestidas primarias trifasicas 13.2 y/o 44Kv	ml	25	$ 54,402	$ 1,360,050			$ -	25.00	$ 1,360,050.00	5.00	$ 272,010.00			5.00	$ 272,010.00	20.00	$ 1,088,040
14.48	Retiro (incluye reintegro) de vientos primarios	un	20	$ 27,201	$ 544,020			$ -	20.00	$ 544,020.00	8.00	$ 217,608.00			8.00	$ 217,608.00	12.00	$ 326,412
14.49	Traslado vestidas primarias trifasicas 13.2 y/o 44KV	ml	4	$ 272,005	$ 1,088,020			$ -	4.00	$ 1,088,020.00	2.00	$ 544,010.00			2.00	$ 544,010.00	2.00	$ 544,010
14.50	Traslado linea primaria 4 hilos para 13.2 y/o 44Kv	ml	70	$ 54,402	$ 3,808,140	428.00	+	$ 23,284,056.00	498.00	$ 27,092,196.00	398.00	$ 21,651,996.00			398.00	$ 21,651,996.00	100.00	$ 5,440,200
14.51	Traslado desconectadores RA2-010 para 13.2 y/o 44KV, incluye conectores, mangueras y demás elementos para su correcto funcionamiento	un	4	$ 378,726	$ 1,514,904			$ -	4.00	$ 1,514,904.00		$ -			0.00	$ -	4.00	$ 1,514,904
14.52	Traslado espaciadores para 13.2 y/o 44KV	un	7	$ 27,201	$ 190,407			$ -	7.00	$ 190,407.00		$ -			0.00	$ -	7.00	$ 190,407
14.53	Traslado Transformador trifásico según norma RA2-026 desde 30 hasta 75 KVA, incluye suministro de mangueras para el barraje primario y puesta a tierra nuevas.	un	2	$ 2,601,284	$ 5,202,568			$ -	2.00	$ 5,202,568.00		$ -			0.00	$ -	2.00	$ 5,202,568
14.54	Traslado Transformadores monofasicos según norma RA3-026 desde 10 hasta 75 KVA, incluye el suministro de mangueras para el barraje primario y puesta a tierra nuevas	un	3	$ 1,819,655	$ 5,458,965			$ -	3.00	$ 5,458,965.00		$ -			0.00	$ -	3.00	$ 5,458,965
14.55	Traslado de integrador, transformadores de corriente, bajante de 1" y cableado, incluye cinta bandit y demás elementos para su correcto funcionamiento	un	5	$ 176,832	$ 883,160			$ -	5.00	$ 883,160.00		$ -			0.00	$ -	5.00	$ 883,160
14.56	Traslado bajanta en tubería metálica galvanizada de 3", incluye cinta bandi, curva PVC y demás elementos para su correcto funcionamiento	un	1	$ 210,866	$ 210,866			$ -	1.00	$ 210,866.00		$ -			0.00	$ -	1.00	$ 210,866
14.57	Retiro (incluye reintegro) postes de concreto de 12m y/o 14m	un	25	$ 289,985	$ 7,249,625			$ -	25.00	$ 7,249,625.00	3.00	$ 869,955.00			3.00	$ 869,955.00	22.00	$ 6,379,670
14.58	Retiro (incluye reintegro) postes de concreto de 8m	un	5	$ 256,435	$ 1,282,175			$ -	5.00	$ 1,282,175.00		$ -			0.00	$ -	5.00	$ 1,282,175
14.59	Retiro (incluye reintegro) adecuaciones secundarias	un	20	$ 32,639	$ 652,780			$ -	20.00	$ 652,780.00		$ -			0.00	$ -	20.00	$ 652,780
14.60	Montaje TAF monofasico de 10 a 25 KVA, incluye suministro	un	1	$ 14,060,808	$ 14,060,808			$ -	1.00	$ 14,060,808.00		$ -			0.00	$ -	1.00	$ 14,060,808
14.61	Suministro, transporte y montaje cable antifraude 2No.8+1No.8	ml	200	$ 61,629	$ 12,325,800			$ -	200.00	$ 12,325,800.00		$ -			0.00	$ -	200.00	$ 12,325,800
14.62	Suministro, transporte y montaje pecha de 1puesto con abatedor carrela	un	6	$ 54,398	$ 326,388			$ -	6.00	$ 326,388.00		$ -			0.00	$ -	6.00	$ 326,388
14.63	Certificado RETIE de las redes secas	un	1	$ 6,713,950	$ 6,713,950			$ -	1.00	$ 6,713,950.00		$ -			0.00	$ -	1.00	$ 6,713,950
14.64	Trámites y Legalización	un	1	$ 692,523	$ 692,523			$ -	1.00	$ 692,523.00		$ -			0.00	$ -	1.00	$ 692,523
14.65	Suministro, transporte y montaje poste concreto de 12m, 510 kgf, redondo según norma EPM, incluye grua, hincada y demás elementos para su correcto funcionamiento	un	57	$ 2,082,769	$ 118,717,833			$ -	57.00	$ 118,717,833.00		$ -			0.00	$ -	57.00	$ 118,717,833

CONTRATO DE OBRA No.	DESur-44-168-2025	ACTA 1	CONTRATISTA: CONSORCIO MAYORCA CONEXTA
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 30 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENVI-0055-1418-24.		ACTA 2	INTERVENTOR: CONSORCIO METROPOLITANO ILA 2025
		ACTA 3	OBRA EJECUTADA ACTA No.4

Valor Inicial:	$ 53,091,910,303.00	ACTA DE OBRA No.4	
Plazo Inicial:	22 meses		
Valor Adicional:	$ -	Valor Final	$ 53,091,910,303.00
Plazo Adicional:	0 meses	Plazo Final	22 meses

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MODIFICACIONES					ACUMULADA		SALDO OBRA POR EJECUTAR	
						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 4			CONDICIONES ACTUALIZADAS					
Ítem	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario ($)	Valor Total ($)	Cant	+/-	Valor ($)	Cant	Valor ($)	Cant	Valor ($)	Cant	Valor Total ($)
14.66	Suministro, transporte y montaje poste en fibra de vidrio de 10m, 510 kgf, según norma alumbrado público de EPM, incluye grua, hincada y demás elementos para su correcto funcionamiento	un	28	$ 2,173,704	$ 60,816,304			$ -	28.00	$ 60,816,304.0		$ -	0.00	$ -	28.00	$ 60,816,304
14.67	Suministro y montaje transformador de 25 KVA 7620/480-240V, según norma RA3-028.	un	1	$ 14,160,444	$ 14,160,444			$ -	1.00	$ 14,160,444.0		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 14,160,444
14.68	Suministro y montaje de norma de EPM, RA3-028, para transformador monofasico.	un	1	$ 1,197,682	$ 1,197,682			$ -	1.00	$ 1,197,682.0		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,197,682
14.69	Suministro y montaje de norma de EPM, RA6-010, puesta a tierra de transformador monofasico.	un	1	$ 364,174	$ 364,174			$ -	1.00	$ 364,174.0		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 364,174
14.70	Suministro e instalación de tablero de energía normal, alumbrado público, tipo ML para instalación en pedestal, tipo intemperie, 2 fases, neutro y tierra. Con espacio para totalizador, 1 equipo de medida de 480 V, incluye bisagras tipo industrial (totalizador). Ver cuadro de cargas y todos los elementos necesarios para su correcto instalación y funcionamiento.	un	1	$ 5,125,645	$ 5,125,645			$ -	1.00	$ 5,125,645.0		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 5,125,645
14.71	Suministro e instalación de conectores submersibles para empalmes en caja de piso.	un	234	$ 70,528	$ 16,503,552			$ -	234.00	$ 16,503,552.0		$ -	0.00	$ -	234.00	$ 16,503,552
14.72	Suministro e instalación de malla de puesta a tierra, ALUMBRADO PUBLICO, un electrodo, incluyecable de cobre, varilla de Coopeweld de 5/8" y 2,4m de longitud, grapa, borna terminal de compresión estañada y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	23	$ 170,005	$ 3,910,115			$ -	23.00	$ 3,910,115.0		$ -	0.00	$ -	23.00	$ 3,910,115
14.73	Suministro, transporte y montaje cable 2/No.8+1No.8 Cu THHN-2	ml	630	$ 47,082	$ 29,661,660			$ -	630.00	$ 29,661,660.0		$ -	0.00	$ -	630.00	$ 29,661,660
14.74	Suministro, transporte y montaje cable 2/No.4+1No.6 Cu THHN-2	ml	1150	$ 70,102	$ 80,617,300			$ -	1,150.00	$ 80,617,300.0		$ -	0.00	$ -	1150.00	$ 80,617,300
14.75	Suministro, transporta y montaje cable 2/No.2+1No.4 Cu THHN-2	ml	270	$ 104,524	$ 28,221,480			$ -	270.00	$ 28,221,480.0		$ -	0.00	$ -	270.00	$ 28,221,480
14.76	Suministro, transporte y montaje canalización en tubería PVC de 2", incluye curvas, soldadura PVC y demás elementos para su correcto funcionamiento.	ml	1270	$ 16,677	$ 21,179,790			$ -	1,270.00	$ 21,179,790.0		$ -	0.00	$ -	1270.00	$ 21,179,790
14.77	Suministro, transporta y montaje canalización en tubería RIC de 2", incluye curvas, fijación a pared y demás elementos para su correcto funcionamiento	ml	670	$ 113,326	$ 75,928,420			$ -	670.00	$ 75,928,420.0		$ -	0.00	$ -	670.00	$ 75,928,420
14.78	Suministro, transporta y montaje canalización en tubería PVC de 2x2" para cruces de vias, incluye soldadura PVC y demás elementos para su correcto funcionamiento.	ml	190	$ 33,355	$ 6,337,450			$ -	190.00	$ 6,337,450.0		$ -	0.00	$ -	190.00	$ 6,337,450
14.79	Suministro, transporta y montaje de canalización en tubería PVC de 3/4" para conexión entre caja y poste, incluye soldadura PVC y demás elementos para su correcto funcionamiento.	ml	60	$ 8,403	$ 504,180			$ -	60.00	$ 504,180.0		$ -	0.00	$ -	60.00	$ 504,180
14.80	Suministro, transporta y montaje de canalización en coraza metalica de 1" para conexión entre caja intemperie y poste fibra, incluye soldadura PVC y demás elementos para su correcto funcionamiento.	ml	38	$ 53,406	$ 2,029,428			$ -	38.00	$ 2,029,428.0		$ -	0.00	$ -	38.00	$ 2,029,428
14.81	Suministro, transporte y montaje bajante en tubería galvanizada de 2"X 6m, incluye curva, boquilla, cinta bandit y demás elementos para su correcto funcionamiento.	un	2	$ 490,273	$ 980,546			$ -	2.00	$ 980,546.0		$ -	0.00	$ -	2.00	$ 980,546
14.82	Suministro, transporte y montaje de Luminaria Electrocontrol 100 W ref T33B-N1-100; IP:66; IK:08; peso: 6,5kg; flujo (lumenes): SEGUN DISEÑO; eficacia luminica mayor de 155 lm/w; temperatura de color:4,000K; IRC mayor 70%; corriente menor o igual a 160mA; protección sobretemperatura:SI; protección sobrecarga, sobrecorriente y sobretensión: SI con DPS; clase eléctrica I; DRIVER IP66 clase electrica II.	un	28	$ 1,470,102	$ 38,222,652			$ -	28.00	$ 38,222,652.0		$ -	0.00	$ -	28.00	$ 38,222,652
14.83	Suministro, transporte y montaje de Luminaria Electrocontrol 120 W ref: T33C-N2-120, IP:66; IK:08; flujo (lumenes): SEGUN DISEÑO; eficacia luminica: hasta 155 lm/w; temperatura de color:4,000K; IRC mayor 70%; corriente menor o igual a 160mA; protección sobretemperatura:SI; protección sobrecarga, sobrecorriente y sobretensión: SI con DPS; clase eléctrica I; DRIVER IP66 clase electrica II.	un	59	$ 1,912,125	$ 112,815,375			$ -	59.00	$ 112,815,375.0		$ -	0.00	$ -	59.00	$ 112,815,375
14.84	Suministro, transporte y montaje de Luminaria Electrocontrol 30 W ref T33B-N1-30; IP:66; IK:08;flujo (lumenes): SEGUN DISEÑO; eficacia luminica mayor de 155 lm/w; temperatura de color:4,000K; IRC mayor 70%; corriente menor o igual a 160mA; protección sobretemperatura:SI; protección sobrecarga, sobrecorriente y sobretensión: SI con DPS; clase eléctrica I; DRIVER IP66 clase electrica II.	un	48	$ 1,414,448	$ 67,893,504			$ -	48.00	$ 67,893,504.0		$ -	0.00	$ -	48.00	$ 67,893,504
14.85	Suministro, transporte y montaje de Luminaria Roy Alpha faro led 40 W ref RAD78R; IP:66; IK:08;flujo (lumenes): SEGUN DISEÑO; eficacia luminica mayor de 155 lm/w; temperatura de color:4,000K; IRC mayor 70%; corriente menor o igual a 160mA; protección sobretemperatura:SI; protección sobrecarga, sobrecorriente y sobretensión: SI con DPS; clase eléctrica I; DRIVER IP66 clase electrica II.	un	28	$ 1,787,489	$ 50,049,692			$ -	28.00	$ 50,049,692.0		$ -	0.00	$ -	28.00	$ 50,049,692
14.86	Suministro, transporte y montaje de Luminaria tipo proyector de 70W; IP:66; IK:08; flujo (lumenes): SEGUN DISEÑO; eficacia luminica: hasta 155 lm/w; temperatura de color:4,000K; IRC mayor 70%; corriente menor o igual a 160mA; protección sobretemperatura:SI; protección sobrecarga, sobrecorriente y sobretensión: SI con DPS; clase eléctrica I; DRIVER IP66 clase electrica II.	un	5	$ 1,217,852	$ 6,088,260			$ -	5.00	$ 6,088,260.0		$ -	0.00	$ -	5.00	$ 6,088,260
14.87	Suministro, transporte y montaje de brazo metálico para alumbrado público de 1 1/2" - 62/0" incluye brazo, instalación, transporte, elementos de anclaje y fijación y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	un	135	$ 193,036	$ 26,059,860			$ -	135.00	$ 26,059,860.0		$ -	0.00	$ -	135.00	$ 26,059,860
14.88	Suministro, transporte y montaje de alimentador eléctrico, en cable encauchetado 3 x 14 AWG. Incluye: cable encauchetado y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. No incluye: tubería y/o canalizaciones.	ml	1830	$ 14,655	$ 26,818,650			$ -	1,830.00	$ 26,818,650.0		$ -	0.00	$ -	1830.00	$ 26,818,650
14.89	Suministro, transporte y montaje caja de piso según norma RS3-001 antihurto.	un	106	$ 599,649	$ 63,562,794			$ -	106.00	$ 63,562,794.0		$ -	0.00	$ -	106.00	$ 63,562,794
14.90	Suministro, transporte y montaje caja 20x20x10 galvanizada en caliente y pintura electrostatica tipo intemperie, para instalación en puente. Fabricación especial	un	29	$ 106,834	$ 3,098,186			$ -	29.00	$ 3,098,186.0		$ -	0.00	$ -	29.00	$ 3,098,186
14.91	Retiro (incluye reintegro) de triplex No.4 hasta 1/0 XLPE	ml	400	$ 10,880	$ 4,352,000			$ -	400.00	$ 4,352,000.0		$ -	0.00	$ -	400.00	$ 4,352,000
14.92	Retiro (incluye reintegro) de adecuaciones secundarias RA4-001, o RA4-002,RA4-003, y/o RA4-004, incluye reintegro	un	4	$ 27,201	$ 108,804			$ -	4.00	$ 108,804.0		$ -	0.00	$ -	4.00	$ 108,804
14.93	Retiro (incluye reintegro) postes metálicos, y reintegro	un	16	$ 141,375	$ 2,261,200			$ -	16.00	$ 2,261,200.0		$ -	0.00	$ -	16.00	$ 2,261,200
14.94	Retiro de luminarias 70, o 150, o 250 y/o 400W, incluye retiro de brazo y reintegro	un	45	$ 40,800	$ 1,836,000			$ -	45.00	$ 1,836,000.0		$ -	0.00	$ -	45.00	$ 1,836,000
14.95	Certificado RETIE del ALP	un	1	$ 9,391,694	$ 9,391,694			$ -	1.00	$ 9,391,694.0		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 9,391,694
14.96	Certificado RETILAP del ALP	un	1	$ 10,106,722	$ 10,106,722			$ -	1.00	$ 10,106,722.0		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 10,106,722

CONTRATO DE OBRA No.	DESur-MA-168-2025		
OBJETO	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENVIGADO-1418-24.		

DESur

ACTA 1 | ACTA 2 | ACTA 3

CONTRATISTA:	CONSORCIO MAYORCA CONECTA
INTERVENTOR:	CONSORCIO ESTROPICIENTO ILA 2025
OBRA EJECUTADA	ACTA No.4

Valor Inicial:	$ 53,051,610,303.00	ACTA DE OBRA No.4
Plazo Inicial:	22 meses	
Valor Adicional:	$ -	Valor Final: $ 53,051,610,303.00
Plazo Adicional:	0 meses	Plazo Final: 22 meses

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MODIFICACIONES								ACUMULADA		SALDO OBRA POR EJECUTAR	
						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 4			CONDICIONES ACTUALIZADAS								
Item	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario ($)	Valor Total ($)	Cant	+/-	Valor ($)	Cant	Valor ($)		Cant	Valor ($)	Cant	Valor ($)	Cant	Valor Total ($)
14.97	Suministro, transporte y montaje canalización en tubería PVC de 4", para telecomunicaciones TDP o DB, incluye adaptadores campana, y demás elementos para su correcto funcionamiento.	ml	2100	$ 35,308	$ 74,146,800			$ -	2,100.00	$ 74,146,800.0			$ -	0.00	$ -	2100.00	$ 74,146,800
14.98	Suministro, transporte y montaje canalización en tubería PVC de 3", para telecomunicaciones TDP o DB, incluye adaptadores campana, y demás elementos para su correcto funcionamiento.	ml	1510	$ 28,729	$ 43,380,790			$ -	1,510.00	$ 43,380,790.0			$ -	0.00	$ -	1510.00	$ 43,380,790
14.99	Suministro, transporte y montaje canalización en tubería PVC de 2", para telecomunicaciones TDP o DB, incluye adaptadores campana, y demás elementos para su correcto funcionamiento.	ml	40	$ 16,677	$ 667,080			$ -	40.00	$ 667,080.0			$ -	0.00	$ -	40.00	$ 667,080
14.100	Bajante en tubería galvanizada de 3"x4.5m, incluye curva PVC, boquilla y fijaciones a muro	un	11	$ 803,908	$ 8,842,988			$ -	11.00	$ 8,842,988.0			$ -	0.00	$ -	11.00	$ 8,842,988
14.101	Caja telefónica 60x60 cm con tapa 1T según norma de UNE Telecomunicaciones.	un	10	$ 895,946	$ 8,959,460			$ -	10.00	$ 8,959,460.0			$ -	0.00	$ -	10.00	$ 8,959,460
14.102	Caja telefónica doble 120x60 cm con tapa 2T según norma de UNE Telecomunicaciones.	un	11	$ 1,344,149	$ 14,765,639			$ -	11.00	$ 14,765,639.0			$ -	0.00	$ -	11.00	$ 14,765,639
14.103	Cámara telefónica tipo P#1 según normas de UNE Telecomunicaciones. Sólo incluye aro metálico.	un	1	$ 4,801,052	$ 4,801,052			$ -	1.00	$ 4,801,052.0			$ -	0.00	$ -	1.00	$ 4,801,052
14.104	Cámara telefónica tipo P#4 según normas de UNE Telecomunicaciones. Sólo incluye aro metálico.	un	1	$ 5,650,416	$ 5,650,416			$ -	1.00	$ 5,650,416.0			$ -	0.00	$ -	1.00	$ 5,650,416
14.105	Cámara telefónica tipo P#5 según normas de UNE Telecomunicaciones. Sólo incluye aro metálico.	un	1	$ 6,616,405	$ 6,616,405			$ -	1.00	$ 6,616,405.0			$ -	0.00	$ -	1.00	$ 6,616,405
14.106	Suministro, transporte e instalación de provisionales (tableros móviles) eléctricas de obra, incluye dos extensiones encauchetadas de 20 metros cada una, dos salidas de 220v, polo a tierra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	8	$ 3,360,000	$ 26,880,000			$ -	8.00	$ 26,880,000.0			$ -	0.00	$ -	8.00	$ 26,880,000
14.107	Retiro de instalaciones provisionales al finalizar la obra y entrega de materiales al Municipio (propietario de los materiales), donde incluyan: incluye supervisión, interventoría y todo lo necesario para su ejecución.	un	1	$ 3,648,750	$ 3,648,750			$ -	1.00	$ 3,648,750.0			$ -	0.00	$ -	1.00	$ 3,648,750
14.108	Suministro e instalación de provisional eléctrica, incluye montaje de transformador Tri fasico, gabinetes de medida y protección, acometidas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, incluye supervisión, interventoría y todo lo necesario para su ejecución.	un	1	$ 53,788,658	$ 53,788,658			$ -	1.00	$ 53,788,658.0			$ -	0.00	$ -	1.00	$ 53,788,658
15	CONCRETOS ESTRUCTURALES				$ 8,557,032,745			$ -	$ -	$ 8,310,104,618			$ 247,261,445	$ -	$ 299,859,572		$ 8,019,434,976
15.1	Colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, de e=0.05m, incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno.	m2	1691	$ 31,165	$ 52,733,835			$ -	1,691.00	$ 52,733,835.0		121.13	$ 3,777,439.00	123.39	$ 3,847,917.00	1567.61	$ 48,885,918
15.2	Colocación de concreto de 4000 PSI para pilas de fundación. Incluye suministro y el transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para pilas de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños.	m3	612	$ 808,353	$ 494,712,036			$ -	612.00	$ 494,712,036.0		301.21	$ 243,484,007.00	315.91	$ 255,368,766.00	296.09	$ 239,345,240
15.3	CONSTRUCCION DE ANILLOS DE REVESTIMIENTO para excavaciones de pilas, incluye colocación de concreto 3000 psi (incluye suministro, transporte, formaleta, colocación del concreto, molineta, motobomba, acarreo interno de materiales y todo lo necesario para su correcta construcción)	m3	337	$ 905,641	$ 305,268,417			$ -	74.34	$ 67,340,220.0		0.00	$ -	44.66	$ 40,454,659.00	29.68	$ 26,885,561
15.4	Construcción de DADOS en concreto de 4000 psi. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m3	580	$ 948,447	$ 548,939,260			$ -	580.00	$ 548,939,260.0			$ -	0.00	$ -	580.00	$ 548,939,260
15.5	Construcción de ESTRIBOS en concreto de 4000 psi. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m3	180	$ 1,062,886	$ 191,319,480			$ -	180.00	$ 191,319,480.0			$ -	0.00	$ -	180.00	$ 191,319,480
15.6	Construcción de COLUMNAS en concreto de 4000 psi. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m3	192	$ 1,670,070	$ 320,653,440			$ -	192.00	$ 320,653,440.0			$ -	0.00	$ -	192.00	$ 320,653,440
15.7	Construcción de VIGAS TIPO CAJÓN en concreto de 5000 psi. Incluye la colocación de concreto para vigas tipo cajón (incluye tablique interior, tablique exterior, losa inferior y losa superior). Incluye todos los elementos necesarios para su correcta construcción. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, mano de obra, formaleta, vibrado, protección, curado y obra falsa para puente en cruce de vías principales, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo . Acabado a la vista, bordes biselados.	m3	1469	$ 2,992,305	$ 4,395,699,045			$ -	1,469.00	$ 4,395,695,045.0			$ -	0.00	$ -	1469.00	$ 4,395,695,045
15.8	Construcción de MUROS DE APROXIMACIÓN en concreto de 3000 psi. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m3	908	$ 1,752,346	$ 1,591,129,280			$ -	908.00	$ 1,591,129,280.0			$ -	0.00	$ -	908.00	$ 1,591,129,280
15.9	Colocación de concreto 4000 psi para tope sísmico de 0.35m x 0.80m x 1.00m (incluye suministro, transporte, formaleta, colocación del concreto y curado)	m3	9	$ 2,015,481	$ 12,092,886			$ -	6.00	$ 12,092,886.0			$ -	0.00	$ -	6.00	$ 12,092,886
15.10	Construcción de BARRERAS en concreto de 3000 psi. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m3	245	$ 1,385,437	$ 339,432,065			$ -	245.00	$ 339,432,065.0			$ -	0.00	$ -	245.00	$ 339,432,065
15.11	Construcción de DIAFRAGMAS en concreto de 5000 psi. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m3	146	$ 1,473,444	$ 215,122,824			$ -	146.00	$ 215,122,824.0			$ -	0.00	$ -	146.00	$ 215,122,824
15.12	Construcción de LOSA DE APROXIMACIÓN en concreto de 3000 psi. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m3	42	$ 1,428,164	$ 59,982,888			$ -	42.00	$ 59,982,888.0			$ -	0.00	$ -	42.00	$ 59,982,888
15.13	Construcción de ANDÉN en concreto de 21 Mpa., sobre losa de concreto según diseño. Incluye suministro y transporte de los materiales, adecuación de la superficie, acabado según diseño, malla electrosoldada D-84, formaleta en sópst T para acabado a la vista, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m3	31	$ 969,139	$ 29,950,309			$ -	31.00	$ 29,950,309.0			$ -	0.00	$ -	31.00	$ 29,950,309
16	ACERO DE REFUERZO				$ 6,713,691,220			$ -	$ -	$ 6,713,691,220			$ 204,450,048	$ -	$ 472,200,648		$ 5,241,760,872

| | CONTRATO DE OBRA Nro. | DESur-IA-168-2025 | | |

CONTRATO DE OBRA No.	DESun-AI-165-2025
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 53 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N° 6 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-0900-1418-24.	

DESur

ACTA 1 | ACTA 2 | ACTA 3

CONTRATISTA:	
CONSORCIO MAYORCA CONECTA	
INTERVENTOR:	
CONSORCIO METROPOLITANO ILA 2025	

		ACTA DE OBRA No.4	
Valor Inicial	$ 51.041.913.393,00	Valor Final	$ 53.041.913.393,00
Plazo Inicial	22 meses	Plazo Final	22 meses
Valor Adicional:	$ -		
Plazo Adicional:	0 meses		

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

Item	Actividad	Unidad	Cant	Precio Unitario ($)	Valor Total ($)
COSTO DIRECTO					$ 39.761.516.712,00
PORCENTAJE DE AU					21,61%
COSTOS INDIRECTOS					$ 8.335.647.178,00
COSTO TOTAL					$ 47.097.163.890,00
GASTOS REEMBOLSABLES					$ 1.571.188.048,00
GR1	Ensayos de laboratorio (Ver anexo "Gtos. reb. + pólizas")				$ 130.474.320,00
GR2	Implementación Social (Ver anexo "Sostenibilidad AU")				$ 127.633.000,00
GR3	Implementación Plan de Manejo Ambiental (Ver anexo PMA)				$ 190.816.800,00
GR4	Implementación Plan de Manejo de Tráfico (Ver anexo PMT)				$ 764.869.440,00
GR5	Implementación SST (Ver anexo "Sostenibilidad AU")				$ 163.184.520,00
GR6	Polizas (Ver anexo "Gtos. reb. + pólizas")				$ 194.414.968,00
TOTAL BASE GRAVABLE PARA IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES					$ 40.968.661.960,00
REEMBOLSABLES IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES				Base gravable	$ 6.113.359.354,00
Contribución especial ley 1106			5,00%	$ 42.968.661.960	$ 2.448.427.597,00
Impuesto predial			0,59%	$ 42.968.661.960	$ 344.643.760,00
Impuesto pro deporte y recreación			0,10%	$ 42.968.661.960	$ 118.305.654,00
Estampilla universidad de Envigado			0,41%	$ 42.968.661.960	$ 168.874.571,00
Estampilla Adulto mayor			2,00%	$ 42.968.661.960	$ 873.371.656,00
Impuesto del 20% (GF's)			0,20%	$ 42.968.661.960	$ 87.937.124,00
				TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 53.041.913.393,00
				ANTICIPO	$ 15.924.573.701,00
				REAJUSTES	$ 2.067.807.983,11

MODIFICACIONES

ACTA DE MODIFICACIÓN No. 4			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
Cant	+/-	Valor ($)	Cant	Valor ($)
		$ -		$ 39.761.516.712,00
	21,61%			21,61%
		$ -		$ 8.335.647.178,00
		$ -		$ 47.097.163.890,00

OBRA EJECUTADA

ACTA No.4

4

Cant	Valor ($)
COSTO DIRECTO	$ 1.931.640.850,00
AU	21,61%
COSTO INDIRECTO	$ 415.408.420,00
COSTO TOTAL	$ 2.347.049.270,00
GASTOS REEMBOLSABLES	$ 35.612.866,00
1,28%	$ 1.684.728,00
0,08%	$ 105.600,00
0,26%	$ 512.820,00
4,08%	$ 32.001.240,00
0,72%	$ 1.329.090,00
	$ -
TOTAL BASE GRAVABLE PARA IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	$ 2.382.661.656,00
REEMBOLSABLES IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	$ 205.149.562,00
5,00%	$ 119.133.083,00
0,59%	$ 14.061.337,00
0,30%	$ 7.147.849,00
0,41%	$ 9.765.216,00
2,00%	47.653.329,00
0,20%	$ 4.765.329,00
SUBTOTAL CONTRATO DE OBRA	$ 2.587.809.218,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 774.641.505,00
TOTAL CONTRATO DE OBRA	$ 1.897.965.613,00
REAJUSTE	

ACUMULADA

Cant	Valor ($)
COSTO DIRECTO	$ 2.463.953.518,00
AU	21,61%
COSTO INDIRECTO	$ 532.453.927,00
COSTO TOTAL	$ 2.997.449.495,00
ACUMULADO GASTOS REEMBOLSABLES	$ 501.999.091,00
	$ 3.030.580,00
	$ 8.995.600,00
	$ 17.760.260,00
	$ 59.030.150,00
	$ 7.110.000,00
	$ 378.054.901,00
ACUMULADO TOTAL BASE GRAVABLE PARA IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	$ 4.109.492.568,00
ACUMULADO REEMBOLSABLES IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	$ 345.192.537,00
5,00%	$ 205.471.679,00
0,59%	$ 20.847.162,00
0,30%	$ 12.328.298,00
0,41%	$ 16.437.731,00
2,00%	82.153.652,00
0,20%	$ 8.218.665,00
ACUMULADO CONTRATO DE OBRA	$ 4.454.684.933,00
ACUMULADO AMORTIZACIÓN	$ 1.556.557.478,00
ACUMULADO REAJUSTE	$ -

BALDO OBRA POR EJECUTAR

Cant	Valor Total ($)
COSTO DIRECTO	$ 35.797.562.193,00
AU	21,61%
COSTO INDIRECTO	$ 7.803.194.199,00
COSTO TOTAL	$ 43.600.756.392,00
SALDO GASTOS REEMBOLSABLES	$ 1.069.294.955,00
	$ 127.447.743
	$ 117.668.400
	$ 181.056.480
	$ 808.639.080
	$ 176.054.000
	$ 68.332.300
SALDO TOTAL BASE GRAVABLE PARA IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	$ 48.958.118.352,00
SALDO REEMBOLSABLES IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	$ 5.768.166.823,00
	$ 2.243.143.583,00
	$ 324.235.538,00
	$ 156.677.325,00
	$ 170.426.472,00
	$ 497.103.337,00
	$ 89.718.333,00
SALDO CONTRATO DE OBRA	$ 48.827.285.979,00
PENDIENTE POR AMORTIZAR	$ 14.568.165.615,00
SALDO REAJUSTE	$ 2.067.807.983,11

$$Pr = Po\left(\frac{0{,}27Cor}{Cou} + \frac{0{,}27Mir}{Mio} + \frac{0{,}18MOOPr}{MOOPo} + \frac{0{,}18Par}{Pao} + \frac{0{,}06INSr}{INSo} + \frac{0{,}01ESTr}{ESTo} + \frac{0{,}01AFr}{AFo}\right)$$

El pago de reajustes no está incluido en el presupuesto oficial del contrato, por lo que cualquier valor final deberá ser revisado y aprobado por la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Envigado y el DESUN. A medida que se generen los mismos se le notificará, se reflejará formalmente en la contratación y la ejecución presupuestal por parte de ambas entidades para proceder con el mismo trámite.

NOTA: Se incluyen memorias con cantidades generales de cada ítem. Para ver las cantidades específicas por intervención y la carpeta del archivo digital "MEMORIA DE CALCULO DE OBRA", en las cuales se encuentran las memorias: 20260510 Item 1.1, 20260510 Item 2.1, 20260510 Item 2.2, 20260510 Item 2.3, 20260510 Item 2.4, 20260510 Item 3.5, 20260510 Item 3.6, 20260510 Item 3.4, 20260510 Item 3.5, 20260510 Item 3.6, 20260510 Item 3.12, 20260510 Item 9.7, 20260510 Item 9.9, 20260510 Item 9.10, 20260510 Item 12.2, 20260510 Item 12.3, 20260510 Item 12.4, 20260510 Item 12.6, 20260510 Item 12.7, 20260510 Item 14.1, 20260510 Item 14.2, 20260510 Item 14.11, 20260510 Item 14.13, 20260510 Item 14.14, 20260510 Item 14.15, 20260510 Item 14.21, 20260510 Item 14.22, 20260510 Item 14.24, 20260510 Item 14.25, 20260510 Item 14.37, 20260510 Item 14.46, 20260510 Item 14.47, 20260510 Item 14.48, 20260510 Item 14.49, 20260510 Item 14.50, 20260510 Item 14.57, 20260510 Item 15.1, 20260510 Item 15.2, 20260510 Item 16.1, 20260510 OE2, 20260510 OE3, 20260510 OE4, 20260510 OE5, 20260510 OE9

RESUMEN		
COSTO DIRECTO		$ 1.931.640.850
COSTOS INDIRECTO AU 21,61%	21,61%	$ 415.408.420
COSTO TOTAL CD + CI		$ 2.347.049.270
GASTOS REEMBOLSABLES		$ 35.612.866
REEMBOLSABLES IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		$ 205.149.562
TOTAL EJECUTADO ACTA DE OBRA N° 4		$ 2.587.809.218
PORCENTAJE EJECUTADO		4,87%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 49.627.285.390

Jesus Enrique Acevedo
Representante Legal
CONSORCIO MAYORCA CONECTA

Alvaro Hernando Vera
Representante Legal
CONSORCIO METROPOLITANO ILA 2025

Esteban Salazar
Gerente
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESur

	CONTROL CANTIDADES DE OBRA	DESur / CONSORCIO MAYORCA CONECTA
	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.		DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN												Cant. Contractual	540.00
1.1													Cant. Adicional	0.00
Unidad	Localizacion trazado y replanteo (Comisión de topografía , incluye Topógrafo, cadeneros y equipos de precisión)												Cant. Total	540.00
dia													Saldo por Ejecutar	451.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12		Cant. Ejecutada Acum	89.00
10/02/2026	10/03/2026	10/04/2026	10/05/2026											
23.00	20.00	21.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24		Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Largo	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Localizacion, trazado y replanteo.	Levantamiento general del proyecto	25.00				25.00

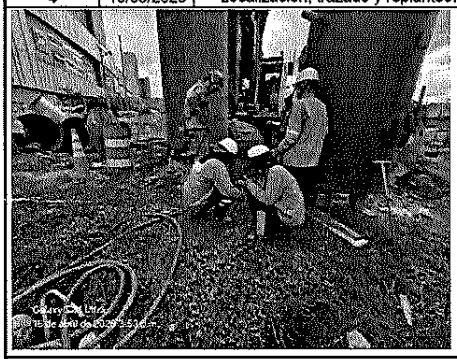

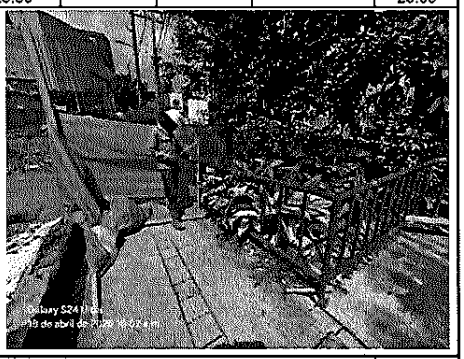

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 4	25.00

OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

	CONTROL CANTIDADES DE OBRA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	DESur CONSORCIO MAYORCA CONECTA
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.		DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	1,500.00
2.1	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación, incluye: suministro, transporte, instalación, excavación, concreto de fundación preparado en Obra de 17.5 Mpa - 2500 psi, diámetro aproximado 0,30 m y profundidad aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación, cargue transporte y	Cant. Adicional	0.00
Unidad m		Cant. Total	1,500.00
		Saldo por Ejecutar	1,408.89

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	91.11
			10/05/2026										
0.00	0.00	0.00	91.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Largo	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Cerramiento	Anden peatonal - Eje 3 vial	1.00	48.52			48.52
4	10/05/2026	Cerramiento	Anden peatonal - Eje 3 vial	1.00	42.59			42.59

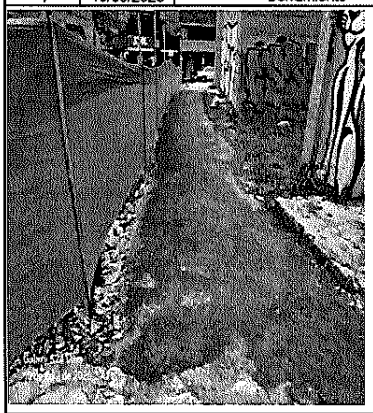

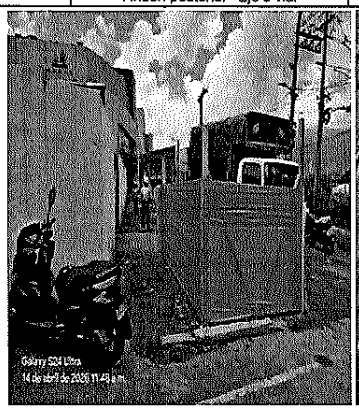

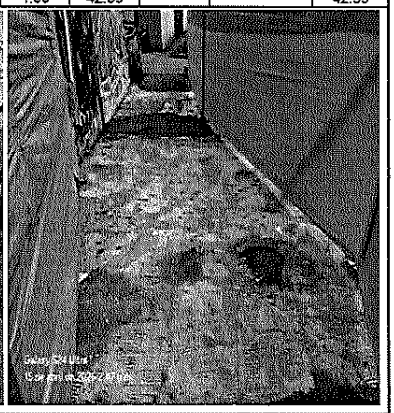

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 4	91.11

OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

DESur — CONSORCIO MAYORCA CONECTA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	100.00
2.2	Instalación de CERRAMIENTO EN SUPERBOARD calibre 8, con una altura de 2.20 m. Incluye suministro, transporte e instalación de la placa de superboar, estructura metálica cada 1.00m, larguero horizontal en la parte intermedia y superior, concreto de 17.5 Mpa para fijación de estructura , vientos en madera cada 3m, excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de material, incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	Cant. Adicional	208.14
Unidad		Cant. Total	308.14
m		Saldo por Ejecutar	0.00

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	308.14
10/02/2026			10/05/2026										
216.36		0.00	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro. 19**	**Cant. Acta Nro. 20**	**Cant. Acta Nro. 21**	**Cant. Acta Nro. 22**	**Cant. Acta Nro. 23**	**Cant. Acta Nro. 24**	**Cant. Ejecutada Acum**	**0.00**
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Largo	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Cerramiento	Eje 1 - costado occidental (norte sur)	1.00	7.32			7.32
4	10/05/2026	Cerramiento	Eje 1 - costado oriental (sur norte)	1.00	13.70			13.70
4	10/05/2026	Cerramiento	Eje 1 - costado occidental (norte sur)	1.00	20.74			20.74
4	10/05/2026	Cerramiento	Eje 1 - costado (sur norte)	1.00	9.76			9.76
4	10/05/2026	Cerramiento	Eje 2 - costado oriental (sur norte)	1.00	23.18			23.18
4	10/05/2026	Cerramiento	Eje 2 - costado oriental (Norte sur)	1.00	10.98			10.98
4	10/05/2026	Cerramiento	Eje 1 - costado oriental mayorca (Norte sur)	1.00	6.10			6.10

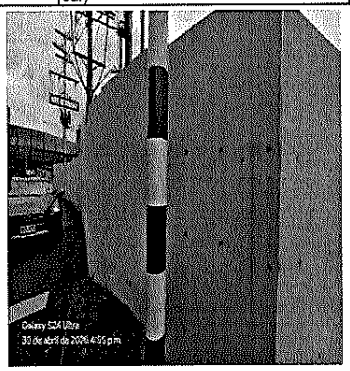

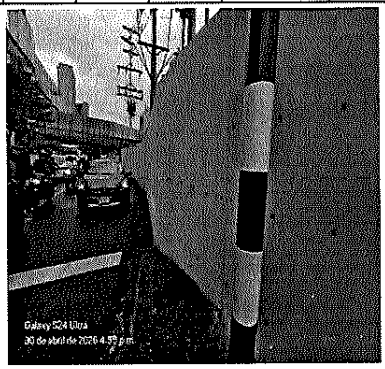

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 4 | **91.78**

OBSERVACIONES:

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

DESur

CONSORCIO MAYORCA CONECTA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	1,000.00
2.3	DESMONTE Y LIMPIEZA a máquina, e=0.15m. Incluye cargue, transporte y botada de escombros material vegetal en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. Su medida será en sitio.	Cant. Adicional	777.33
Unidad		Cant. Total	1,777.33
m2		Saldo por Ejecutar	0.00

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	1777.33
	10/03/2026	10/04/2026	10/05/2026										
0.00	759.72	238.71	778.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant.	Largo	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Desmonte	Eje 3 vial	311.41				311.41
4	10/05/2026	Desmonte	Eje 3 vial	467.50				467.50

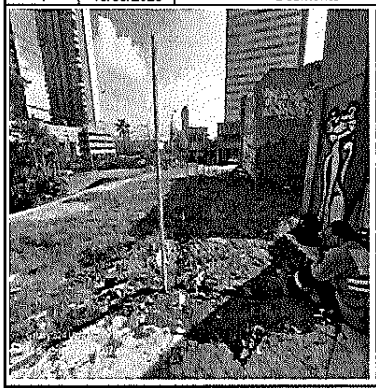

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 4	778.91

OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Sulez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

	CONTROL CANTIDADES DE OBRA	DESur CONSORCIO MAYORCA CONECTA
	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.		DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	1,466.00
2.4	Demolición de andenes o pisos en concreto, baldosa o cualquier acabado, e = 8 - 25 cm. Incluye retiro de entresuelo, retiro y reinstalación de tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía, tapas cajas de teléfonos, según reubicación de diseño. Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o cargue, transporte y botada de los escombros.	Cant. Adicional	0.00
Unidad		Cant. Total	1,466.00
m2		Saldo por Ejecutar	963.71

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	502.29
			10/05/2026										
0.00	0.00	0.00	502.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant.	Largo	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Anden 1	Eje 3 vial	64.65			0.10	64.65
4	10/05/2026	Anden 2	Eje 3 vial	79.21			0.10	79.21
4	10/05/2026	Pisos duros - tramo 2	Eje 3 vial	358.43			0.12	358.43

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 4	502.29

OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

	CONTROL CANTIDADES DE OBRA	DESur / CONSORCIO MAYORCA CONECTA
	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.		DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	1,606.00
2.5	Desmonte y retiro de cordones en concreto o bordillos existentes 0.15x0.10 m. Manual o mecánico. incluye cargue, transporte, botada y disposición de los escombros a sitios definidos por la interventoría.	Cant. Adicional	0.00
Unidad m		Cant. Total	1,606.00
		Saldo por Ejecutar	1,575.20

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	30.80
		10/04/2026	10/05/2026										
0.00	0.00	4.80	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Largo	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Reitro de cordoneria	Eje 1	15.00	0.80			12.00
4	10/05/2026	Reitro de cordoneria	Eje 1	8.00	0.80			6.40
4	10/05/2026	Reitro de cordoneria	Eje 1	1.00	0.10			0.10
4	10/05/2026	Reitro de cordoneria	Eje 2	9.00	0.80			7.20
4	10/05/2026	Reitro de cordoneria	Eje 2	1.00	0.30			0.30

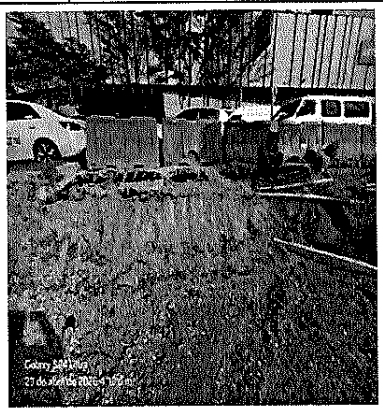

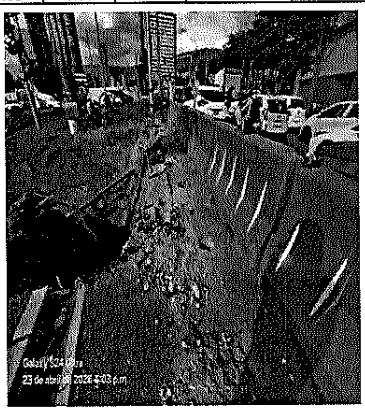

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 4	26.00

OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

DESur

CONSORCIO MAYORCA CONECTA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	8,160.00
2.8	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	Cant. Adicional	0.00
Unidad		Cant. Total	8,160.00
m3		Saldo por Ejecutar	8,106.97

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	53.03
	10/03/2026	10/04/2026	10/05/2026										
0.00	2.60	5.28	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro. 19**	**Cant. Acta Nro. 20**	**Cant. Acta Nro. 21**	**Cant. Acta Nro. 22**	**Cant. Acta Nro. 23**	**Cant. Acta Nro. 24**	**Cant. Ejecutada Acum**	**0.00**
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Largo	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Demolicion de concreto	Eje 3 vial - Eje 4 - Eje 1	45.15				45.15

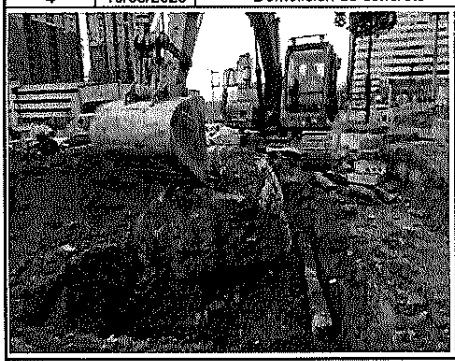

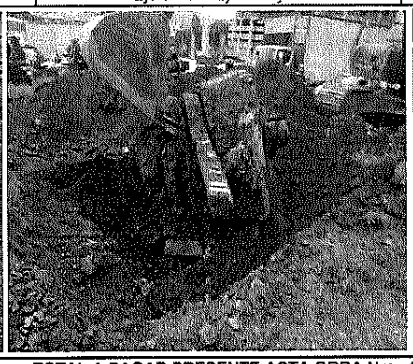

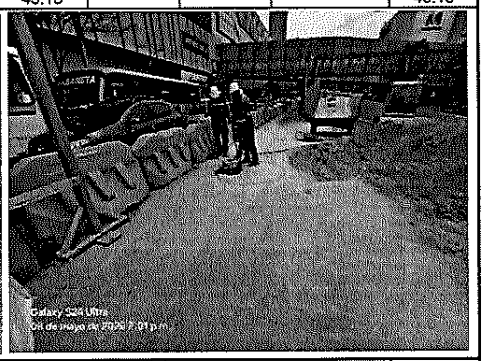

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 4	45.15

OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

DESur — CONSORCIO MAYORCA CONECTA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	150.00
3.4	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, Incluye roca descompuesta, bolas de roca de diametro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (2,5-5 m)	Cant. Adicional	0.00
Unidad		Cant. Total	150.00
m3		Saldo por Ejecutar	126.32

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	23.68
	10/03/2026	10/04/2026	10/05/2026										
	16.72	2.54	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Excavacion de caisson	Eje 3	4.42				4.42
			TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 4					4.42

OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

	CONTROL CANTIDADES DE OBRA	DESur CONSORCIO MAYORCA CONECTA
	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.		DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	150.00
3.5	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, incluye roca descompuesta, bolas de roca de diametro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (5-7,5 m)	Cant. Adicional	0.00
Unidad		Cant. Total	150.00
m3		Saldo por Ejecutar	127.91

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	22.09
	10/03/2026		10/05/2026										
	13.25	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Excavacion de caisson	Eje 3	8.84				8.84
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 4								8.84

OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Sulez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

DESur — CONSORCIO MAYORCA CONECTA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	150.00
3.6	Excavación manual para caissons, incluye equipo y herramienta. En material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad, Incluye roca descompuesta, bolas de roca de diámetro inferior a 0.3m, molinete, motobomba, extracción del material, acarreo interno de materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría, factor de expansión (30%). No incluye anillos de revestimiento. Profundidad de (7,5-10 m)	Cant. Adicional	0.00
Unidad m3		Cant. Total	150.00
		Saldo por Ejecutar	130.30

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	19.70
	10/03/2026	10/04/2026	10/05/2026										
	4.42	8.80	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant.	Diametro	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Excavacion de caisson	Eje 3	6.48				6.48
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 4								**6.48**

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

DESur

CONSORCIO MAYORCA CONECTA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	10,878.00
3.12	Excavación mecánica hasta 4,00m de profundidad, incluye el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones	Cant. Adicional	0.00
Unidad m3		Cant. Total	10,878.00
		Saldo por Ejecutar	9,109.16

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	1768.84
	10/03/2026	10/04/2026	10/05/2026										
0.00	195.03	645.28	928.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Longitud	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Excavacion	Eje 3 vial	409.27				409.27
4	10/05/2026	Excavacion	Eje 3 - Zapata	263.60				263.60
4	10/05/2026	Excavacion	Eje 4 - Zapata	255.66				255.66

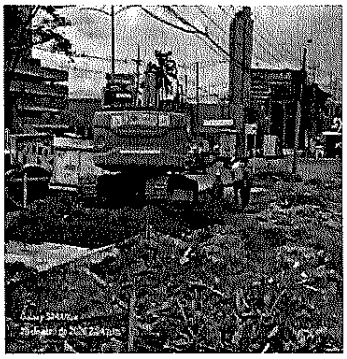

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 4	928.53

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

	CONTROL CANTIDADES DE OBRA **EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO**	DESur / CONSORCIO MAYORCA CONECTA
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.		**DESur-IA-168-2025**

Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	27.00
9.7												Cant. Adicional	0.00
Unidad	Talas de árboles de 5 a 10m											Cant. Total	27.00
un												Saldo por Ejecutar	26.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	1.00
			10/05/2026										
0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Tala		1.00				1.00

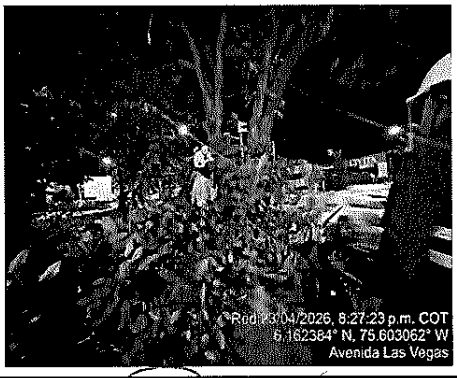

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.	**4**	**1.00**

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

	CONTROL CANTIDADES DE OBRA	DESur / CONSORCIO MAYORCA CONECTA
	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.		DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	9.00
9.9		Cant. Adicional	0.00
Unidad	Transplante de árboles de 0 a 5m	Cant. Total	9.00
un		Saldo por Ejecutar	7.00

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	2.00
			10/05/2026										
0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Transplante	Guanabano adulto - Eje 3 vial	1.00			4.50	1.00
4	10/05/2026	Transplante	Mango juvenil - Eje 1	1.00			2.50	1.00

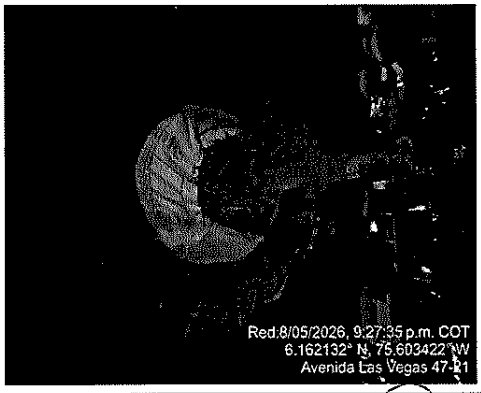

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 4	2.00

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

	CONTROL CANTIDADES DE OBRA	DESur / CONSORCIO MAYORCA CONECTA
	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.		DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	9.00
9.10												Cant. Adicional	0.00
Unidad	Transplante de árboles de 5 a 10m											Cant. Total	9.00
un												Saldo por Ejecutar	6.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	3.00
			10/05/2026										
0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Transplante	Palma corozo - Piscina	1.00			6.00	1.00
4	10/05/2026	Transplante	Palma corozo - Piscina	1.00			6.50	1.00
4	10/05/2026	Transplante	Palma corozo - Piscina	1.00			7.50	1.00

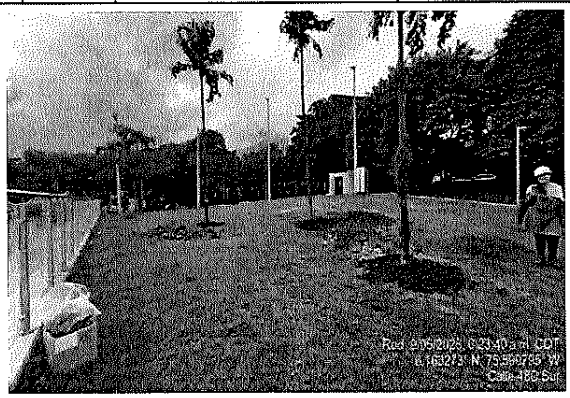

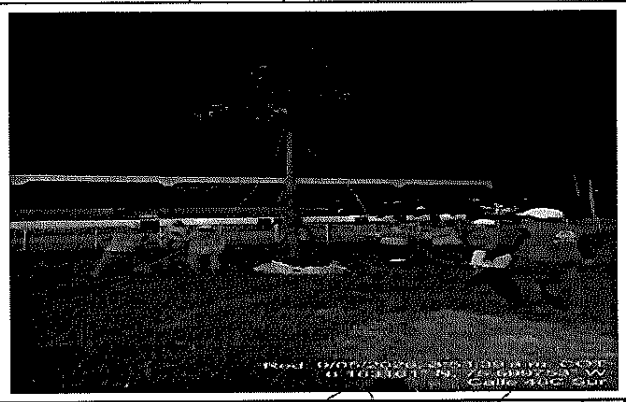

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.	4	3.00

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

	CONTROL CANTIDADES DE OBRA	DESur / CONSORCIO MAYORCA CONECTA
	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.		DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	890.74
12.2		Cant. Adicional	0.00
Unidad	Excavación material común húmedo<2m mecanica. Retiro, cargue y botada de material	Cant. Total	890.74
m3		Saldo por Ejecutar	813.82

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	76.92
			10/05/2026										
0.00	0.00	0.00	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Largo	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Excavacion		23.64	6.00	1.97	2.00	23.64
4	10/05/2026	Excavacion		30.60	6.00	2.55	2.00	30.60
4	10/05/2026	Excavacion		22.68	6.00	1.89	2.00	22.68

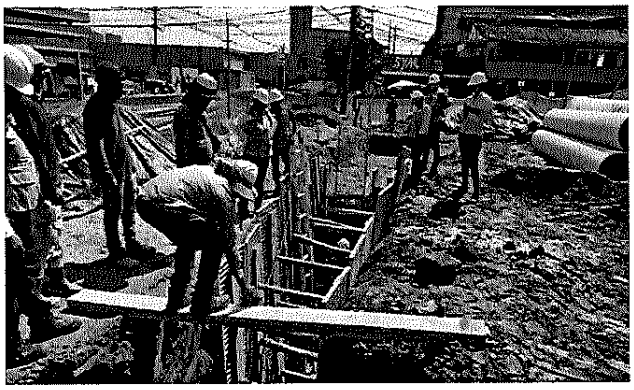

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.	4	76.92

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

	CONTROL CANTIDADES DE OBRA	DESur / CONSORCIO MAYORCA CONECTA
	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.		DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	333.40
12.3	Excavación mecánica material común húmedo 2 - 4 m. Retiro, cargue y botada de material	Cant. Adicional	0.00
Unidad		Cant. Total	333.40
m3		Saldo por Ejecutar	310.26

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	23.14
			10/05/2026										
0.00	0.00	0.00	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Largo	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Excavacion		5.91	6.00	1.97	0.50	5.91
4	10/05/2026	Excavacion		9.18	6.00	2.55	0.60	9.18
4	10/05/2026	Excavacion		8.05	6.00	1.89	0.71	8.05

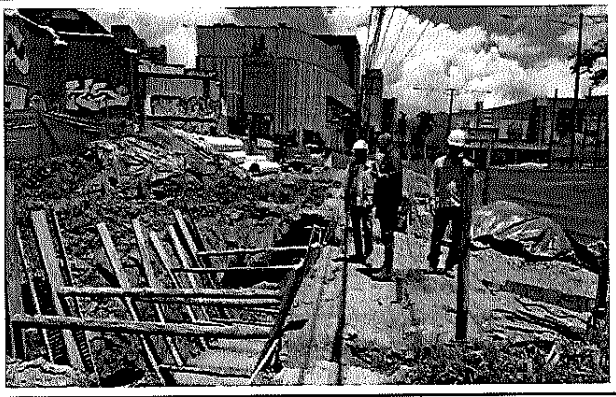

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 4/	23.14

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

DESur

CONSORCIO MAYORCA CONECTA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	2,521.00
12.4												Cant. Adicional	0.00
Unidad	Entibados o trinchos en madera temporal											Cant. Total	2,521.00
m2												Saldo por Ejecutar	2,427.28
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	93.72
			10/05/2026										
0.00	0.00	0.00	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Largo	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Entibados		15.00	6.00		2.50	30.00
4	10/05/2026	Entibados		15.60	6.00		2.60	31.20
4	10/05/2026	Entibados		16.26	6.00		2.71	32.52

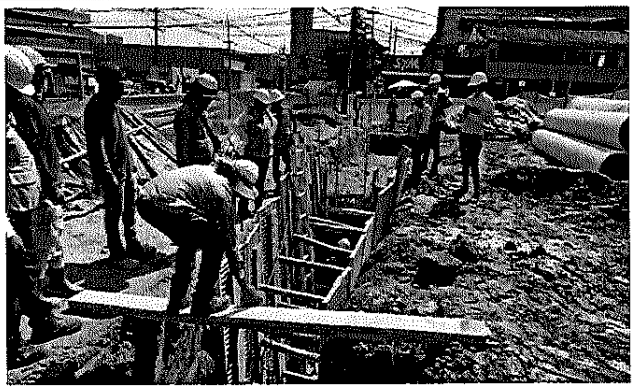

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.	4	93.72

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

	CONTROL CANTIDADES DE OBRA	DESur
	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	CONSORCIO MAYORCA CONECTA
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.		DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	95.70
12.7	Suministro, transporte y colocación de tubería PVC Novafort S8 315mm 12" Incluye limpiador, pegante, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación.	Cant. Adicional	0.00
Unidad m		Cant. Total	95.70
		Saldo por Ejecutar	77.70

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	18.00
			10/05/2026										
0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Largo	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Instalacion de tuberia		1.00	6.00			6.00
4	10/05/2026	Instalacion de tuberia		1.00	6.00			6.00
4	10/05/2026	Instalacion de tuberia		1.00	6.00			6.00

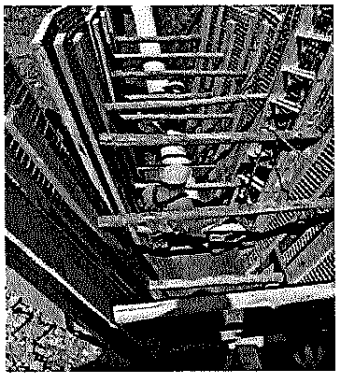

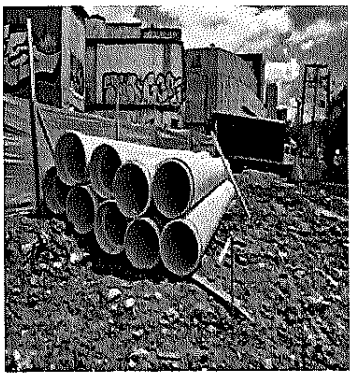

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.	4	18.00

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

	CONTROL CANTIDADES DE OBRA	DESur / CONSORCIO MAYORCA CONECTA
	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.		DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	51.00
14.1		Cant. Adicional	0.00
Unidad	Retiro y reintegro de luminarias propiedad de EPM	Cant. Total	51.00
un		Saldo por Ejecutar	47.00

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	4.00
			10/05/2026										
0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant.	Diametro	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Desmonte	Retiro luminarias	4.00				4.00

			TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 4					4.00

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

DESur

CONSORCIO MAYORCA CONECTA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN

DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	35.00
14.2												Cant. Adicional	0.00
Unidad	Retiro y reintegro de postes propiedad de EPM, no incluye retiro de vestidas											Cant. Total	35.00
un												Saldo por Ejecutar	31.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	4.00
			10/05/2026										
0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Retiro y reintegro de postes propiedad de EPM, no incluye retiro de vestidas	Retiro de poste	4.00				4.00

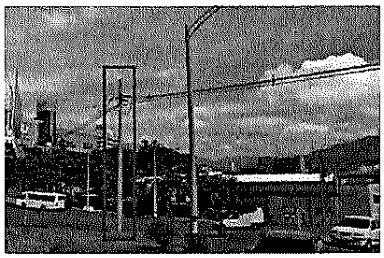

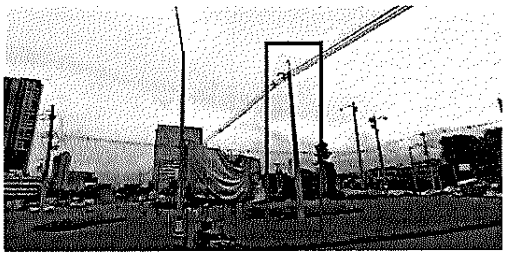

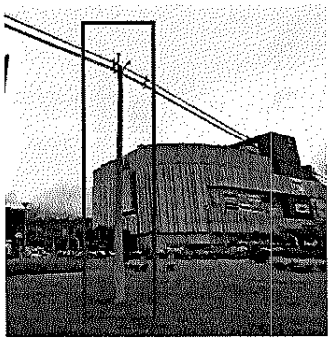

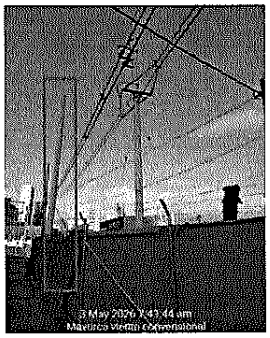

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 4 — 4.00

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

DESur

CONSORCIO MAYORCA CONECTA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	8.00
14.11		Cant. Adicional	0.00
Unidad	Suministro, transporte y montaje poste de concreto de 12m , 750 kg-f, según norma RA7-035, incluye hincada y demás elementos para su correcto funcionamiento	Cant. Total	8.00
un		Saldo por Ejecutar	5.00

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	3.00
		10/04/2026	10/05/2026										
0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	instalacion	Poste	1.00				1.00

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 4	1.00

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

DESur

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	6.00
14.14		Cant. Adicional	0.00
Unidad	Suministro, transporte y montaje de vestida primaria según norma RA1-301 de EPM	Cant. Total	6.00
un		Saldo por Ejecutar	1.00

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	5.00
			10/05/2026										
0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Instalacion	Vestida RA1-301	5.00				5.00

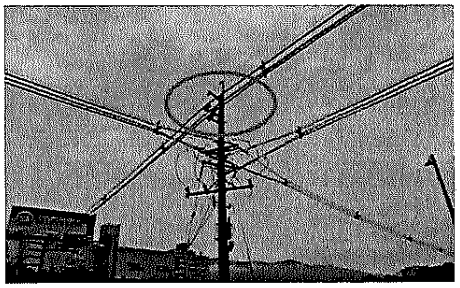

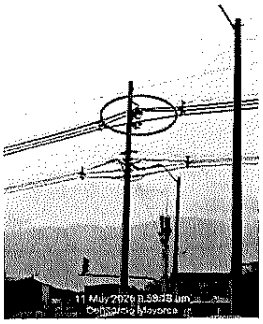

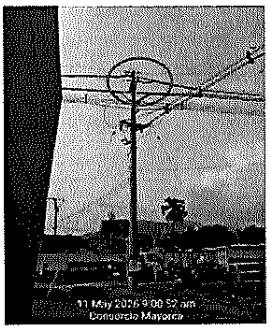

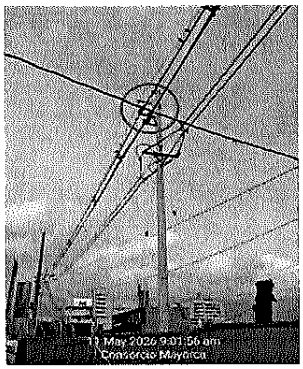

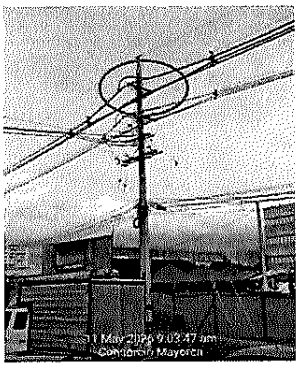

								TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 4	5.00

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

DESur

CONSORCIO MAYORCA CONECTA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN

DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	8.00
14.16												Cant. Adicional	0.00
Unidad	Suministro, transporte y montaje de vestida primaria según norma RA2-003 de EPM											Cant. Total	8.00
un												Saldo por Ejecutar	6.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	2.00
			10/05/2026										
0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	instalacion	suministro de vestida RA2-003	2.00				2.00

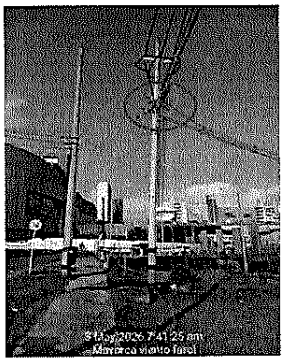

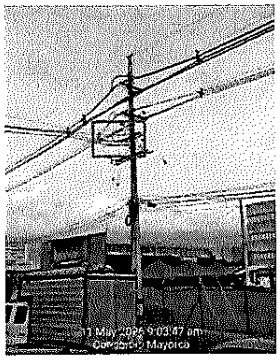

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 4	2.00

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

DESur

CONSORCIO MAYORCA CONECTA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	2.00
14.21		Cant. Adicional	1.00
Unidad	Suministro, transporte y montaje de vestida primaria según norma RA2-304 de EPM	Cant. Total	3.00
un		Saldo por Ejecutar	0.00

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	3.00
			10/05/2026										
0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant.	Diametro	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Instalacion	Vestida Poste RA2-304	3.00				3.00







TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 4	3.00

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

DESur

CONSORCIO MAYORCA CONECTA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN | DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	8.00
14.22												Cant. Adicional	0.00
Unidad	Suministro, transporte y montaje de vestida primaria según norma RA6-010 de EPM											Cant. Total	8.00
un												Saldo por Ejecutar	1.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	7.00
			10/05/2026										
0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Instalacion	Vestida primaria RA6-010	7.00				7.00

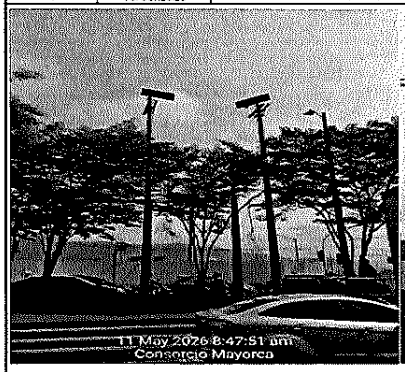

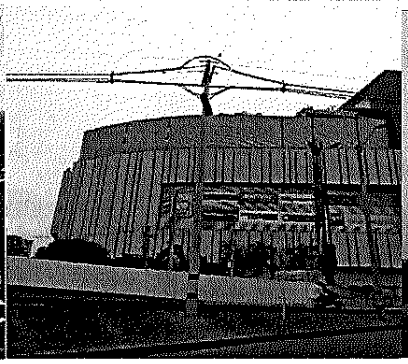

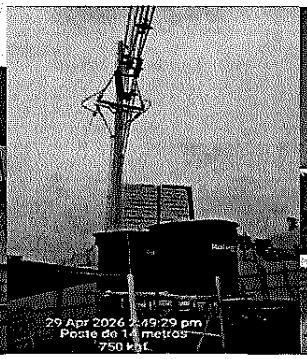

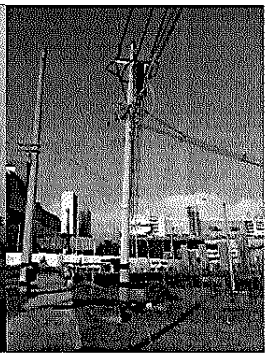

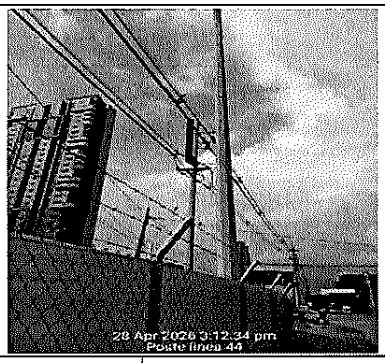

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 4 | 7.00

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

	CONTROL CANTIDADES DE OBRA	
	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	DESur
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN		DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	6.00
14.24		Cant. Adicional	3.00
Unidad	Viento convencional según norma RA6-001 para 13.2KV	Cant. Total	9.00
un		Saldo por Ejecutar	0.00

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	9.00
			10/05/2026										
0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	instalacion	viento convencional + viento auxiliar sin poste	9.00				9.00

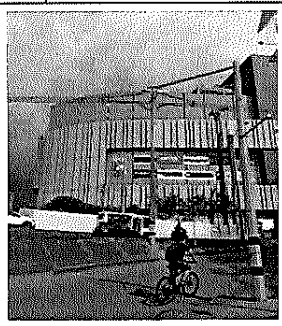

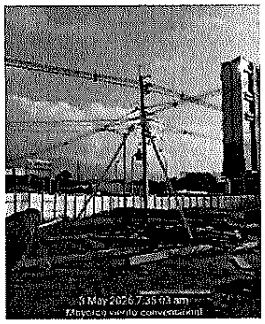

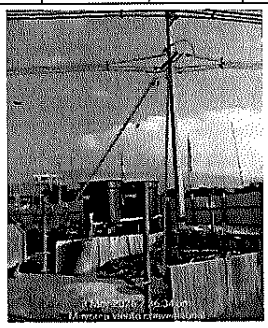

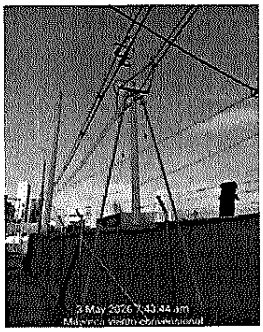

			TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 4					9.00

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

DESur

CONSORCIO MAYORCA CONECTA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN

DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	6.00
14.25		Cant. Adicional	0.00
Unidad	Viento Farol según norma RA6-002 para 13.2KV de EPM	Cant. Total	6.00
un		Saldo por Ejecutar	3.00

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	3.00
			10/05/2026										
0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Instalacion	Viento Farol	3.00				3.00

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 4	3.00

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

DESur

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	60,00
14.37		Cant. Adicional	140,00
Unidad	Suministro, transporte y montaje linea primaria aerea trifásica 3No.266.8 ecologico+1/0 AWAC ó 4/0 ACSR	Cant. Total	200,00
ml		Saldo por Ejecutar	0,00

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	200,00
			10/05/2026										
0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Instalacion	Suministro de cable compacto	200,00				200,00

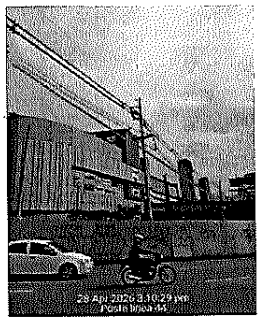

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 4	200,00

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

DESur

CONSORCIO MAYORCA CONECTA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN

DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	1,180.00
14.46		Cant. Adicional	0.00
Unidad	Retiro (incluye reintegro) linea primaria 4 hilos para 13.2 y/o 44Kv	Cant. Total	1,180.00
mi		Saldo por Ejecutar	1,150.00

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	30.00
			10/05/2026										
0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Retiro de Red de 13.2 Kvv	Retiro de Red de 13.2 kv	30.00				30.00

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 4 — 30.00

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

DESur

CONSORCIO MAYORCA CONECTA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN

DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	25.00
14.47		Cant. Adicional	0.00
Unidad	Retiro (incluye reintegro) vestidas primarias trifasicas 13.2 y/o 44Kv	Cant. Total	25.00
ml		Saldo por Ejecutar	20.00

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	5.00
			10/05/2026										
0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Retiro de vestida	Retiro de vestida	5.00				5.00



			TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 4					5.00

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

DESur

CONSORCIO MAYORCA CONECTA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN

DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	20.00
14.48												Cant. Adicional	0.00
Unidad	Retiro (incluye reintegro) de vientos primarios											Cant. Total	20.00
un												Saldo por Ejecutar	12.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	8.00
			10-may-26										
0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Retiro de vientos primarios	Retiro de vientos primarios	8.00				8.00

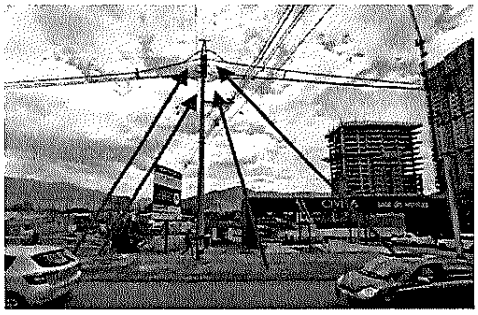

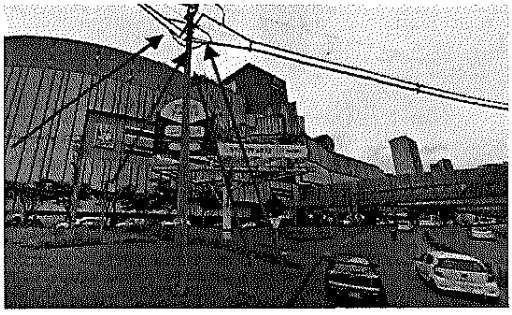

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 4 — 8.00

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

DESur

CONSORCIO MAYORCA CONECTA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN | **DESur-IA-168-2025**

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	4.00
14.49		Cant. Adicional	0.00
Unidad	Traslado vestidas primarias trifasicas 13.2 y/o 44KV	Cant. Total	4.00
ml		Saldo por Ejecutar	2.00

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	2.00
			10/05/2026										
0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Traslado de vestida	Traslado de vestida	2.00				2.00

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 4 | **2.00**

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

DESur

CONSORCIO MAYORCA CONECTA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	70.00
14.50	Traslado linea primaria 4 hilos para 13.2 y/o 44Kv											Cant. Adicional	328.00
Unidad												Cant. Total	398.00
ml												Saldo por Ejecutar	0.00
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	398.00
			10/05/2026										
0.00	0.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Traslado	Traslado Red de 13.2kv	136.00				136.00
4	10/05/2026	Traslado	Traslado Red de 44kv	262.00				262.00

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 4	398.00

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

DESur

CONSORCIO MAYORCA CONECTA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN

DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	25.00
14.57		Cant. Adicional	0.00
Unidad	Retiro (incluye reintegro) postes de concreto de 12m y/o 14m	Cant. Total	25.00
un		Saldo por Ejecutar	22.00

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	3.00
			10/05/2026										
0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Retiro de postes	Retiro de postes	3.00				3.00

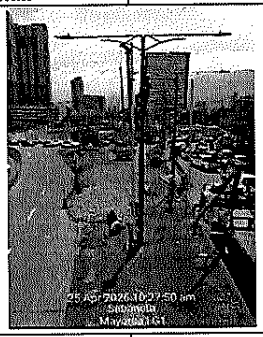

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 4 | 3.00

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

	CONTROL CANTIDADES DE OBRA	DESur CONSORCIO MAYORCA CONECTA
	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.		DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	1,691.00
15.1	Colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, de e=0,05m, Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno.	Cant. Adicional	0.00
Unidad		Cant. Total	1,691.00
m2		Saldo por Ejecutar	1,567.61

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	123.39
		10/04/2026	10/05/2026										
0.00	0.00	2.26	121.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Solado	Pila 15 - eje 3	1.13	1.20		0.05	1.13
4	10/05/2026	Solado	Eje 4 - Zapata	60.00		6.00	10.00	60.00
4	10/05/2026	Solado	Eje 3 - Zapata	60.00		6.00	10.00	60.00

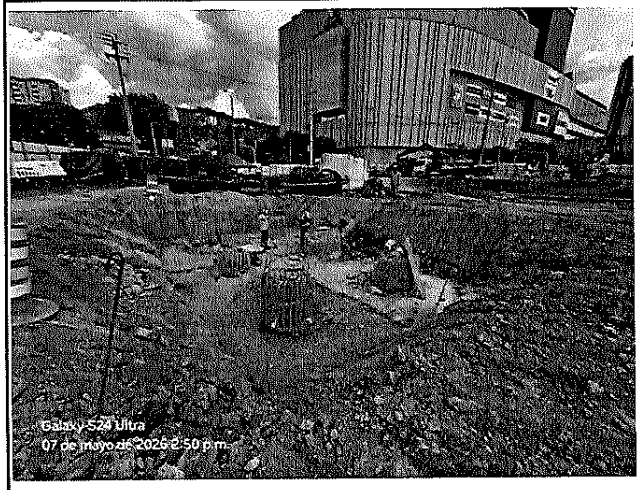

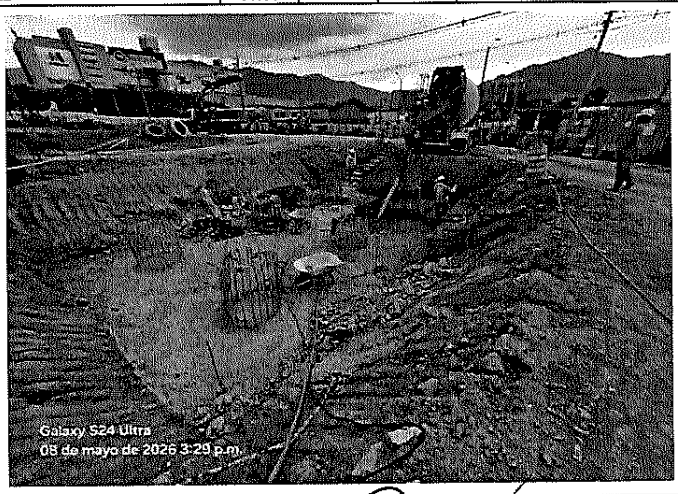

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 4	121.13

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

	CONTROL CANTIDADES DE OBRA	DESur / CONSORCIO MAYORCA CONECTA
	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.		DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	612.00
15.2	Colocación de concreto de 4000 PSI para pilas de fundación. Incluye suministro y el transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para pilas de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños.	Cant. Adicional	0.00
Unidad m3		Cant. Total	612.00
		Saldo por Ejecutar	296.09

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	315.91
		10/04/2026	10/05/2026										
0.00	0.00	14.70	301.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Concreto	Pila 12 - Eje 3	14.70	1.20		13.00	14.70
4	10/05/2026	Concreto	Pila 14 - Eje 3	14.70	1.20		13.00	14.70
4	10/05/2026	Concreto	Pila 15 - Eje 3	14.70	1.20		13.00	14.70
4	10/05/2026	Concreto	Pila 16 - Eje 3	14.70	1.20		13.00	14.70
4	10/05/2026	Concreto	Pila 17 - Eje 3	14.70	1.20		13.00	14.70
4	10/05/2026	Concreto	Pila 18 - Eje 4	11.31	1.20		10.00	11.31
4	10/05/2026	Concreto	Pila 19 - Eje 4	11.31	1.20		10.00	11.31
4	10/05/2026	Concreto	Pila 20 - Eje 4	11.31	1.20		10.00	11.31
4	10/05/2026	Concreto	Pila 21 - Eje 4	11.31	1.20		10.00	11.31
4	10/05/2026	Concreto	Pila 22 - Eje 4	11.31	1.20		10.00	11.31
4	10/05/2026	Concreto	Pila 23 - Eje 4	11.31	1.20		10.00	11.31
4	10/05/2026	Concreto	Pila 6 - Eje 2	16.46	1.20		14.55	16.46
4	10/05/2026	Concreto	Pila 7 - Eje 2	14.84	1.20		13.12	14.84
4	10/05/2026	Concreto	Pila 9 - Eje 2	22.62	1.20		20.00	22.62
4	10/05/2026	Concreto	Pila 10 - Eje 2	14.33	1.20		12.67	14.33
4	10/05/2026	Concreto	Pila 11 - Eje 2	13.23	1.20		11.70	13.23
4	10/05/2026	Concreto	Pila 1 - Eje 1	19.24	1.20		17.01	19.24
4	10/05/2026	Concreto	Pila 2 - Eje 1	19.26	1.20		17.03	19.26
4	10/05/2026	Concreto	Pila 3 - Eje 1	20.55	1.20		18.17	20.55
4	10/05/2026	Concreto	Pila 4 - Eje 1	19.32	1.20		17.08	19.32

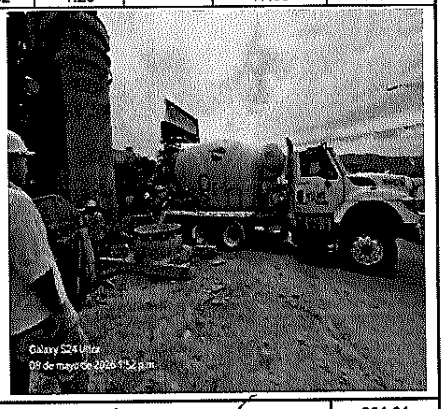

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 4	301.21

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

	CONTROL CANTIDADES DE OBRA	DESur CONSORCIO MAYORCA CONECTA
	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.		DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	861,540.00
16.1	Acero de refuerzo de fy=60.000 psi. Suministro, transporte e instalación. Acero según especificaciones particulares y de acuerdo a lo estipulado por la NSR-10, norma ASTM A-706, ICONTEC 2289 para el acero pdr-60. Incluye todos los costos de suministro de materiales (refuerzo (G60) figurado, corrugado, incluye el alambre de amarre), equipos (herramienta menor), transportes, manejo, almacenamiento, desperdicios y mano de obra. Incluye separadores que garanticen el recubrimiento mínimo especificado.	Cant. Adicional	0.00
Unidad		Cant. Total	861,540.00
kg		Saldo por Ejecutar	800,947.09

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	60592.91
	10/03/2026	10/04/2026	10/05/2026										
0.00	6680.72	17410.19	36502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant.	Diametro	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Acero de refuerzo	Eje 1 - 2 - 5- 6	36502.00				36502.00
			TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 4					36502.00

OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

DESur

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	0.00
OE2	Excavación con cuña manual. Incluye manejo de aguas.	Cant. Adicional	11,303.00
Unidad		Cant. Total	11,303.00
Pulg		Saldo por Ejecutar	0.00

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	11303.00
		10/04/2026	10/05/2026										
0.00	0.00	8643.00	2660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Perforaciones en roca	Eje 3	2660.00				2660.00
			TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.	4				2660.00

OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

	CONTROL CANTIDADES DE OBRA **EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO**	DESur / CONSORCIO MAYORCA CONECTA
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.		**DESur-IA-168-2025**

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	0.00
OE3	Traslado de cámara PTZ: desmonte, traslado y reinstalación de poste, gabinete y cámara; adecuación de puesta a tierra; canalización y vaciado de caja; traslado/adecuación de fibra óptica ADSS y realización de fusiones	Cant. Adicional	1.00
Unidad		Cant. Total	1.00
Global		Saldo por Ejecutar	0.00

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	1.00
			10/05/2026										
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro. 19**	**Cant. Acta Nro. 20**	**Cant. Acta Nro. 21**	**Cant. Acta Nro. 22**	**Cant. Acta Nro. 23**	**Cant. Acta Nro. 24**	**Cant. Ejecutada Acum**	**0.00**
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Traslado de camara	Glorieta	1.00				1.00

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 4	1.00

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Sulez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

	CONTROL CANTIDADES DE OBRA **EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO**	DESur / CONSORCIO MAYORCA CONECTA
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.		**DESur-IA-168-2025**

Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	0.00
OE4	Desmonte de valla informativa tipo tubo de 12 × 4 m, incluye señalización temporal, cierre parcial de vía, uso de grúa, trabajo nocturno para desmonte de estructura principal, desmonte diurno de torres, láminas y lonas, cargue, transporte y disposición final de material desmontado.											Cant. Adicional	2.00
Unidad												Cant. Total	2.00
Und												Saldo por Ejecutar	0.00
Cant. Acta Nro. 1	**Cant. Acta Nro. 2**	**Cant. Acta Nro. 3**	**Cant. Acta Nro. 4**	**Cant. Acta Nro. 5**	**Cant. Acta Nro. 6**	**Cant. Acta Nro. 7**	**Cant. Acta Nro. 8**	**Cant. Acta Nro. 9**	**Cant. Acta Nro. 10**	**Cant. Acta Nro. 11**	**Cant. Acta Nro. 12**	**Cant. Ejecutada Acum**	**2.00**
			10/05/2026										
0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	**Cant. Acta Nro. 14**	**Cant. Acta Nro. 15**	**Cant. Acta Nro. 16**	**Cant. Acta Nro. 17**	**Cant. Acta Nro. 18**	**Cant. Acta Nro. 19**	**Cant. Acta Nro. 20**	**Cant. Acta Nro. 21**	**Cant. Acta Nro. 22**	**Cant. Acta Nro. 23**	**Cant. Acta Nro. 24**	**Cant. Ejecutada Acum**	**0.00**
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Desmonte de valla	Sabaneta	1.00				1.00
4	10/05/2026	Desmonte de valla	Envigado	1.00				1.00

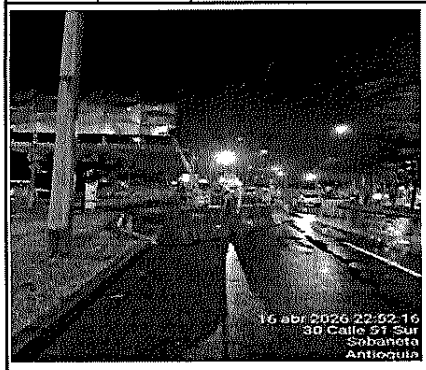

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro. 4	2.00

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

DESur — CONSORCIO MAYORCA CONECTA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	0.00
OE6	Excavación de pilote de cimentación profunda de 1.20 m de diámetro mediante perforación mecánica con piloteadora, uso de camisa metálica recuperable. Incluye personal especializado, equipos mayores y menores, herramientas, maniobras de izaje, transporte de equipos, plataforma y/o terraplenes para el posicionamiento de equipos y tanques para manejo polímeros o lodos bentoníticos.	Cant. Adicional	249.63
Unidad m		Cant. Total	249.63
		Saldo por Ejecutar	0.00

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	249.63
			10/05/2026										
0.00	0.00	0.00	249.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Excavacion con piloteadora	Pila 18 - Eje 4	10.80			10.80	10.80
4	10/05/2026	Excavacion con piloteadora	Pila 19 - Eje 4	9.51			9.51	9.51
4	10/05/2026	Excavacion con piloteadora	Pila 20 - Eje 4	10.90			10.90	10.90
4	10/05/2026	Excavacion con piloteadora	Pila 21 - Eje 4	10.60			10.60	10.60
4	10/05/2026	Excavacion con piloteadora	Pila 22 - Eje 4	9.40			9.40	9.40
4	10/05/2026	Excavacion con piloteadora	Pila 23 - Eje 4	10.90			10.90	10.90
4	10/05/2026	Excavacion con piloteadora	Pila 12 - Eje 3	11.63			11.63	11.63
4	10/05/2026	Excavacion con piloteadora	Pila 14 - Eje 3	5.91			5.91	5.91
4	10/05/2026	Excavacion con piloteadora	Pila 16 - Eje 3	5.92			5.92	5.92
4	10/05/2026	Excavacion con piloteadora	Pila 6 - Eje 2	16.75			16.75	16.75
4	10/05/2026	Excavacion con piloteadora	Pila 7 - Eje 2	15.42			15.42	15.42
4	10/05/2026	Excavacion con piloteadora	Pila 9 - Eje 2	22.26			22.26	22.26
4	10/05/2026	Excavacion con piloteadora	Pila 10 - Eje 2	15.17			15.17	15.17
4	10/05/2026	Excavacion con piloteadora	Pila 11 - Eje 2	14.30			14.30	14.30
4	10/05/2026	Excavacion con piloteadora	Pila 2 - Eje 1	19.20			19.20	19.20
4	10/05/2026	Excavacion con piloteadora	Pila 3 - Eje 1	21.08			21.08	21.08
4	10/05/2026	Excavacion con piloteadora	Pila 4 - Eje 1	21.02			21.02	21.02
4	10/05/2026	Excavacion con piloteadora	Pila 1 - Eje 1	18.86			18.86	18.86
			TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.	**4**				**249.63**

OBSERVACIONES: Revisar Anexo memorias detalladas

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

	CONTROL CANTIDADES DE OBRA	DESur / CONSORCIO MAYORCA CONECTA
	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.		DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	1.00
GR1		Cant. Adicional	0.00
Unidad	Ensayos de laboratorio (Ver anexo "Ens. Lab. + póliza")	Cant. Total	1.00
GL		Saldo por Ejecutar	0.98

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	0.02
		10/04/2026	10/05/2026										
0.00	0.00	0.010	0.0128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Laboratorio	Actividades de Abril	0.0128				0.0128
			TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.	4				0.01

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

DESur — CONSORCIO MAYORCA CONECTA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN											Cant. Contractual	1.00
GR2												Cant. Adicional	0.00
Unidad	Implementación Social (Ver anexo "Subanálisis AU")											Cant. Total	1.00
GL												Saldo por Ejecutar	0.92
Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	0.08
		10/04/2026	10/05/2026										
0.00	0.00	0.0774	0.0008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Implementación actividades social	Actividades de Abril	0.0008				0.0008
			TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.	4				0.0774

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

DESur

CONSORCIO MAYORCA CONECTA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	1.00
GR3		Cant. Adicional	0.00
Unidad	Implementación Plan de Manejo Ambiental (Ver anexo PMA)	Cant. Total	1.00
GL		Saldo por Ejecutar	0.91

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	0.09
		10/04/2026	10/05/2026										
0.00	0.00	0.0867	0.0026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total
3	10/04/2026	Implementación Plan manejo ambiental	Actividades de Enero - Marzo	0.0867				0.0867
4	10/04/2026	Implementación Plan manejo ambiental	Actividades de Abril	0.0026				0.0026
			TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.					0.0026

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Sulez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

	CONTROL CANTIDADES DE OBRA	DESur / CONSORCIO MAYORCA CONECTA
	EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO	
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.		DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	1.00
GR4		Cant. Adicional	0.00
Unidad	Implementación Plan de Manejo de Tránsito (Ver anexo PMT)	Cant. Total	1.00
GL		Saldo por Ejecutar	0.89

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	0.11
		10/04/2026	10/05/2026										
0.00	0.00	0.0689	0.0408	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Implementación Plan manejo de tránsito	Actividades de Abril	0.0408				0.0408
			TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.	4				0.0689

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Sulez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

DESur

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

DESur-IA-168-2025

Item No	DESCRIPCIÓN	Cant. Contractual	1.00
GR5		Cant. Adicional	0.00
Unidad	Implementación SST (Ver anexo "Subanálisis AU")	Cant. Total	1.00
GL		Saldo por Ejecutar	0.96

Cant. Acta Nro. 1	Cant. Acta Nro. 2	Cant. Acta Nro. 3	Cant. Acta Nro. 4	Cant. Acta Nro. 5	Cant. Acta Nro. 6	Cant. Acta Nro. 7	Cant. Acta Nro. 8	Cant. Acta Nro. 9	Cant. Acta Nro. 10	Cant. Acta Nro. 11	Cant. Acta Nro. 12	Cant. Ejecutada Acum	0.04
		10/04/2026	10/05/2026										
0.00	0.00	0.0316	0.0072	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cant. Acta Nro. 13	Cant. Acta Nro. 14	Cant. Acta Nro. 15	Cant. Acta Nro. 16	Cant. Acta Nro. 17	Cant. Acta Nro. 18	Cant. Acta Nro. 19	Cant. Acta Nro. 20	Cant. Acta Nro. 21	Cant. Acta Nro. 22	Cant. Acta Nro. 23	Cant. Acta Nro. 24	Cant. Ejecutada Acum	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Registro Fotográfico /Plano / Esquema

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Diametro	Ancho	Alto	Total
4	10/05/2026	Implementación SST	Actividades de Abril	0.007				0.0072
			TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA OBRA Nro.	4				0.0072

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Ing. Jorge Restrepo Suiez
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Ing. Alvaro Hernando Vera
INTERVENTORIA

Ensayos de laboratorio

ENSAYOS DE LABORATORIO				ACTA 4		ACUMULADO		SALDO	
Actividad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cant	Valor Total	Cant	Valor Total	Cant	Valor Total
Granulometria	30	$ 92.964	$ 2.788.920		-	-	-	30,00	2.788.920,00
Diseño Grouting (Incluye ensayos)	1	$ 757.478	$ 757.478		-	-	-	1,00	757.478,00
Ultrasonido (3 lecturas por elemento)	20	$ 198.442	$ 3.968.840		-	-	-	20,00	3.968.840,00
Resistencia a la compresión cilindros 4" (Ensayo Acreditado)	250	$ 10.674	$ 2.668.500	139,00	1.483.686,00	250,00	2.668.500,00	-	-
Resistencia a la compresión cilindros de 3 -Grouting	100	$ 11.142	$ 1.114.200		-	-	-	100,00	1.114.200,00
Densidad de campo (cono y arena) materiales finos	300	$ 81.320	$ 24.396.000		-	-	-	300,00	24.396.000,00
Proctor Estándar	75	$ 221.870	$ 16.640.250		-	-	-	75,00	16.640.250,00
Proctor Modificado	75	$ 247.972	$ 18.597.900		-	-	-	75,00	18.597.900,00
Diseño suelo cemento (Incluye todos los ensayos)	1	$ 1.204.719	$ 1.204.719		-	-	-	1,00	1.204.719,00
CBR suelos granulares (3 puntos)	10	$ 567.224	$ 5.672.240		-	-	-	10,00	5.672.240,00
CBR suelos finos (9 puntos)	10	$ 974.819	$ 9.748.190		-	-	-	10,00	9.748.190,00
Espesor base o sub-base granular	45	$ 101.397	$ 4.562.865		-	-	-	45,00	4.562.865,00
Transporte (recolección de cilindros)	357	$ 36.208	$ 12.926.256	5,00	181.040,00	10,00	362.080,00	347,00	12.564.176,00
Extracción de nucleo de asfalto	50	$ 70.274	$ 3.513.700		-	-	-	50,00	3.513.700,00
Transporte (personal, equipo ensayo densidad campo)	0	$ 362.061	$ -		-	-	-	-	-
Resistencia a la flexión bordillos/cordones/sardineles	0	$ 156.949	$ -		-	-	-	-	-
diseño de mezcla	5	$ 1.250.000	$ 6.250.000		-	-	-	5,00	6.250.000,00
Transporte	0	$ 63.248	$ -		-	-	-	-	-
Tensión, desde 1/4" hasta 1" (Ensayo Acreditado)	0	$ 254.629	$ -		-	-	-	-	-
Tensión, mayor a 1" (Ensayo Acreditado)	0	$ 636.642	$ -		-	-	-	-	-
Doblamiento, desde 1/4" hasta 1" (Ensayo Acreditado)	30	$ 325.190	$ 9.755.700		-	-	-	30,00	9.755.700,00
Doblamiento, mayor a 1" (Ensayo Acreditado)	15	$ 394.171	$ 5.912.565		-	-	-	15,00	5.912.565,00
Costo total			**$ 130.478.323**		**$ 1.664.726**		**$ 3.030.580**		**$ 127.447.743**

J. SEBASTIAN CAÑIZALES A.

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
CONTRATISTA

JUAN CAMILO PÉREZ GONZÁLEZ

INTERVENTORIA

MEMORIA CÁLCULO

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

ACTIVIDADES

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Total
4	10/05/2026	Resistencia a la compresión cilindros 4" (Ensayo Acreditado)□	Resistencia a la compresión cilindros 4" □	139	139

Registro Fotográfico /Soporte

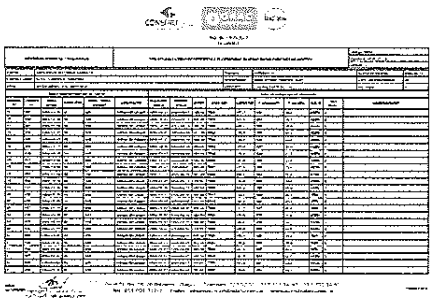

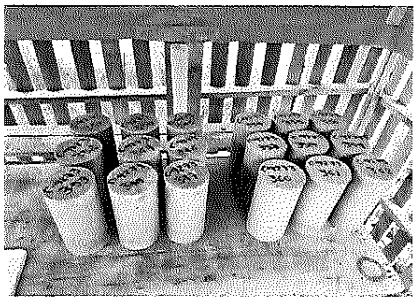

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Total
4	10/05/2026	Transporte (recolección de cilindros)	Transporte y recolección de cilindros para ensayo	5	5

Registro Fotográfico /Soporte

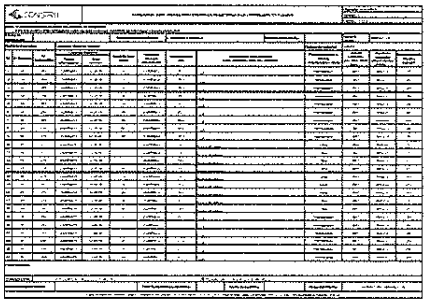

OBSERVACIONES:

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
J. SEBASTIAN CAÑIZALES A.
CONTRATISTA

Camilo P

JUAN CAMILO PÉREZ GONZÁLEZ
INTERVENTORIA

Implementación Social (Anexo Social)

FECHA 30/04/2026

COMPONENTE SOCIAL							ACTA 4		ACUMULADO		SALDO	
Accion Social	Programa al cual pertenece en el PASAO	Detalle	Cant	Und	Valor Unitario	Valor Total	Cant	Valor Total	Cant	Valor Total	Cant	Valor Total
SOCIALIZACION						$ 16,500,000		$ -		$ 1,000,000		$ 15,500,000
SOCIALIZACION	Programa de participación ciudadana	Reuniones con comunidad inicio,avance y finde obra. Incluye refrigerio,sitio de reunión,sillateria y medio audiovisual requerido. (100 Personas)	11,00	reunión	$ 500,000	$ 5,500,000		$ -	1,00	$ 500,000	$ 10	$ 5,000,000
		Reuniones y capacitaciones comité ciudadano de obra. Esto incluye refrigerio, sitio de reunión, sillateria y medio audiovisual requerido.	22,00	reunión	$ 500,000	$ 11,000,000		$ -	1,00	$ 500,000	$ 21	$ 10,500,000
INFORMACION Y DIVULGACION						$ 43,155,600		$ 106,600		$ 1,756,600		$ 40,398,400
INFORMACION Y DIVULGACION	Programa de información y comunicación a la comunidad	Volantes de obra: papel propalcote mate de 90 gramos, impreso por ambas caras a cuatro tintas, refilados, en tamaño media carta	20,000,00	un	$ 520	$ 10,400,000	205	$ 106,600	205,00	$ 106,600	$ 19,795	$ 10,293,400
		Buzón PQRS	6,00	un	$ 50,000	$ 300,000		$ -	2,00	$ 100,000	$ 4	$ 200,000
		Carteleras informativas: madera o corcho de 1 metro x 90 cms.	8,00	un	$ 140,000	$ 1,120,000		$ -	1,00	$ 140,000	$ 7	$ 980,000
		Pendones institucionales para volquetas. (De 2 x 1 metro)	24,00	un	$ 90,000	$ 2,160,000		$ -	16,00	$ 1,440,000	$ 8	$ 720,000
		Publicaciones impresas en periódicos en pagina par, en tamaño cuarto de pagina a blanco y negro con el visto bueno del Área de Comunicaciones.	5,00	un	$ 5,635,000	$ 28,175,000		$ -	0,00	$ -	$ 5	$ 28,175,000
ACTAS DE VECINDAD Y DE ENTORNO						$ 60,000,000		$ -		$ 7,200,000		$ 52,800,000
ACTAS DE VECINDAD Y DE ENTORNO	Programa restitución de bienes afectados	Actas de vecindad y cierre (Area de influencia directa y cuando se requiera realizar en el área de influencia indirecta). Incluye registro fotográfico, video, físico y digital.	200,00	un	$ 300,000	$ 60,000,000		$ -	24,00	$ 7,200,000	$ 176	$ 52,800,000
EVENTO DE ENTREGA DE OBRA						$ 9,000,000		$ -		$ -		$ 9,000,000
EVENTO DE ENTREGA DE OBRA	Social	Tarima 4x3 con cubierta, mesa central y sillas (6 personas), micrófonos, alimentación, atril con micrófono, sonido hidratación (500 personas), cinta y tijeras para dar apertura simbólica en la vía entre otros. Incluye placa conmemorativa y pedestal para la placa conmemorativa	2,00	Un	$ 4,500,000	$ 9,000,000		$ -	0,00	$ -	$ 2	$ 9,000,000
TOTAL COMPONENTE SOCIAL						$ 127,655,600,00		$ 106,600,00		$ 9,956,600,00		$ 117,698,400,00

CONSORCIO MAYORCA CONECTA

CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA

INTERVENTORIA

MEMORIA CÁLCULO

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

ACTIVIDADES

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Total
4	30/04/2026	**Volantes de obra: papel propalcote mate de 90 gramos, impreso por ambas caras a cuatro tintas, refilados, en tamaño media carta**	* 16 impresiones de la notificacion 1 de las actas de vecindad iniciales (las que hicimos en enero) * 6 impresiones de la notificacion 2 de las actas de vecindad iniciales (las que hicimos en enero) * 31 impresiones de la circular del cierre parcial de la calle 49 b sur * 18 impresiones de notificación 1 de actas de vecindad (las que estamos haciendo en el momento) * 8 impresiones de notificacion 2 de actas de vecindad (las que entregué ayer) * 67 impresiones para el volante de suspensión de energia del 26 de abril * 17 impresiones para la circular de invitación al CCO * 42 Impresiones para circular de tratamientos forestales	205,00	205,00

Registro Fotográfico /Soporte







OBSERVACIONES:

CONSORCIO MAYORCA CONECTA

CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA 2025

INTERVENTORIA

Implementación Plan de Manejo Ambiental (Anexo PMA)

FECHA 10/04/2026

PMA					ACTA 4		ACUMULADO		SALDO	
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	Cant	Valor Total	Cant	Valor Total	Cant	Valor Total
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES, MANEJO DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN				**$ 3 800 000,00**		**$ 184 720,00**		**$ 350 400,00**		**$ 3 449 600,00**
Cubrimiento de escombros con plástico calibre 4. Se paga 1 sola vez	m2	12 000,00	$ 220,00	2 640 000	356,00	$ 78 320,00	1 200,00	$ 264 000,00	10 800,00	$ 2 376 000,00
Demarcación de zona de acopio temporal de escombros con 3 líneas de cinta de señalización	m	2 000,00	$ 180,00	360 000	480,00	$ 86 400,00	480,00	$ 86 400,00	1 520,00	$ 273 600,00
Permisos de salvoconducto para el transporte del material resultante de las labores	un	4,00	$ 200 000,00	800 000		$ -	-	$ -	4,00	$ 800 000,00
MANEJO DE CAMPAMENTO E INSTALACIONES TEMPORALES				**$ 10 039 200,00**		**$ -**		**$ 9 365 306,00**		**$ 673 900,00**
Campamento	un	2,00	$ 3 500 000,00	7 000 000		$ -	2,00	$ 7 000 000,00	-	$ -
Canecas metálicas de 55 galones	un	24,00	$ 35 000,00	840 000		$ -	3,00	$ 105 000,00	21,00	$ 735 000,00
Bolsas plásticas paquete por 50	paquete	100,00	$ 15 500,00	1 550 000		$ -	51,00	$ 790 500,00	49,00	$ 759 500,00
Costal de fibra	un	500,00	$ 300,00	150 000		$ -	150,00	$ 45 000,00	350,00	$ 105 000,00
Extintor tipo Solkaflam de 9 Kilos	un	4,00	$ 324 800,00	1 299 200		$ -	1,00	$ 324 800,00	3,00	$ 974 400,00
									-	
MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE				**$ 450 000,00**		**$ -**		**$ 450 000,00**		**$ -**
Kit para atención de derrames (entre 25 a 35 galones)	un	1,00	$ 450 000,00	450 000		$ -	1,00	$ 450 000,00	-	$ -
MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS				**$ 13.761.860,00**		**$ -**		**$ 2.700.000,00**		**$ 11.061.860,00**
Construcción pozones de sedimentación	un	1,00	$ 2 500 000,00	2 500 000		$ -	1,00	$ 2 500 000,00	-	$ -
Construcción trampa de grasas de 55 litros	un	2,00	$ 530 930,00	1 061 860		$ -	-	$ -	2,00	$ 1 061 860,00
Adecuación zona de acopio de combustibles	gl	1,00	$ 200 000,00	200 000		$ -	1,00	$ 200 000,00	-	$ -
Manejo de residuos peligrosos en la obra	gl	1,00	$ 10 000 000,00	10 000 000		$ -	-	$ -	1,00	$ 10 000 000,00
MANEJO DE ESTRUCTURAS Y ASEO DE LA OBRA				**$ 39 880 820,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 39 880 820,00**
Brigada de aseo (compuesta por 3 personas). Incluye implementación	mes brigada	6,00	$ 6 646 770,00	39 880 820		$ -	-	$ -	6,00	$ 39 880 820,00
MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES				**$ 3.145 000,00**		**$ 365 200,00**		**$ 994 560,00**		**$ 2.150 440,00**
Protección de sumideros - instalación de malla de protección tipo polisombra (incluye sumideros del corredor y bocacalles)	m2	1 500,00	$ 1 850,00	2 775 000	192,00	$ 355 200,00	537,60	$ 994 560,00	962,40	$ 1 780 440,00
Cerramiento de las zonas cercanas a las quebradas y señalización	m	200,00	$ 1 850,00	370 000		$ -	-	$ -	200,00	$ 370 000,00
CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO				**$ 111 400 000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 111 400 000,00**
Humectacion vias, incluye carrotanque y conductor durante todo el tiempo de ejecucion de la obra y las horas que la interventoria lo consideren necesario	mes	18,00	$ 5 000 000,00	90 000 000		$ -	-	$ -	18,00	$ 90 000 000,00
Monitoreo de Calidad del aire, parametro PM10 proyecto en operación	un	2,00	$ 3 700 000,00	7 400 000		$ -	-	$ -	2,00	$ 7 400 000,00
Monitoreo de la calidad del aire, parametros ruido ambiental	un	2,00	$ 2 400 000,00	4 800 000		$ -	-	$ -	2,00	$ 4 800 000,00
Monitoreo de la calidad del aire, parametros ruido ocupacional	un	2,00	$ 2 400 000,00	4 800 000		$ -	-	$ -	2,00	$ 4 800 000,00
Monitoreo de la calidad del agua	un	2,00	$ 2 200 000,00	4 400 000		$ -	-	$ -	2,00	$ 4 400 000,00
MANEJO DE FAUNA (Ahuyentamiento, Rescate y Reubicacion)				**$ 5 900 000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 5 900 000,00**
Equipos ahuyentamiento	Global	1	$ 700 000,00	700 000		$ -	0	$ -	1,00	$ 700 000,00
Materiales de campo	Global	1	$ 500 000,00	500 000		$ -	0	$ -	1,00	$ 500 000,00
Veterinario	Mes	1	$ 2 700 000,00	2 700 000		$ -	0	$ -	1,00	$ 2 700 000,00
Atencion fauna	Global	1	$ 2 000 000,00	2 000 000		$ -	0	$ -	1,00	$ 2 000 000,00
SISTEMA DEL ARBOL URBANO SAU				**$ 5.000.000,00**		**$ -**		**$ 5.000.000,00**		**$ -**
Elaboracion del inventario forestal al aplicativo del Sistema del Árbol urbano - SAU, de acuerdo con las exigencias del Municipio de Medellin.	gl	1,00	$ 5 000 000,00	5 000 000		$ -	1,00	$ 5 000 000,00	-	$ -
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN				**$ 4 640 000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 4 640 000,00**
La empresa acogerá una o varias de las propuestas de divulgación relacionadas en el PMA, y dispondrá de sus recursos técnicos y logísticos para tal fin. El equipo de arqueología realizará el acompañamiento científico y la socialización requerida (Se valora recurso humano)	mes	1	$ 4 640 000,00	4 640 000		$ -	0	$ -	1,00	$ 4 640 000,00
TOTAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				**$ 198.819.980,00**		**$ 819.920,00**		**$ 17.760.260,00**		**$ 181.058.420,00**

CONSORCIO MAYORCA CONECTA

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

MEMORIA CÁLCULO

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°8 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Unidad de Medida	Cant	Total
4	30/04/2026	Cubrimiento de escombros con plástico calibre 4. Se paga 1 sola vez	Se implementa plastico para casi todos los programas del plan de manejo ambiental	m2	356,00	356,00

Registro Fotográfico /Soporte

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Unidad de Medida	Cant	Total
4	30/04/2026	Protección de sumideros - instalación de malla de protección tipo polisombra (Incluye sumideros del corredor y bocacalles)		m2	192,00	192,00

Registro Fotográfico /Soporte

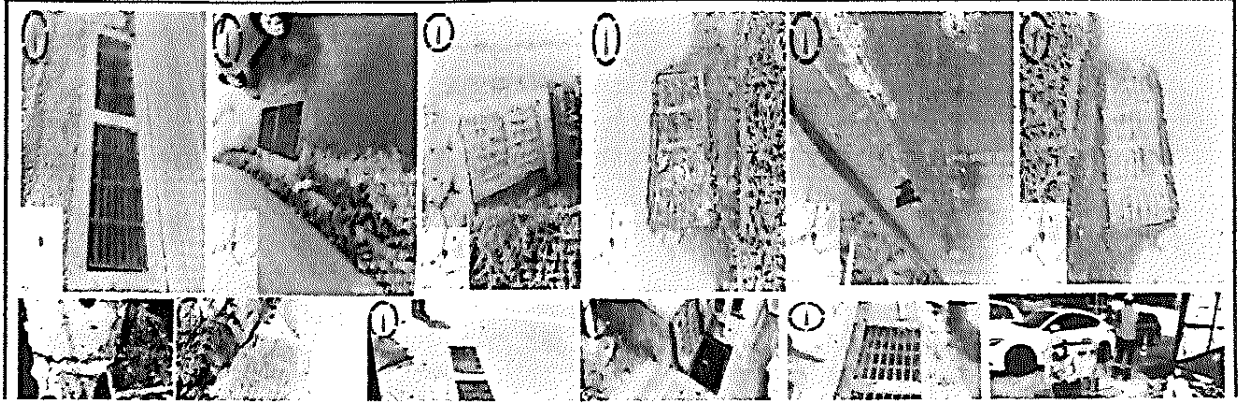

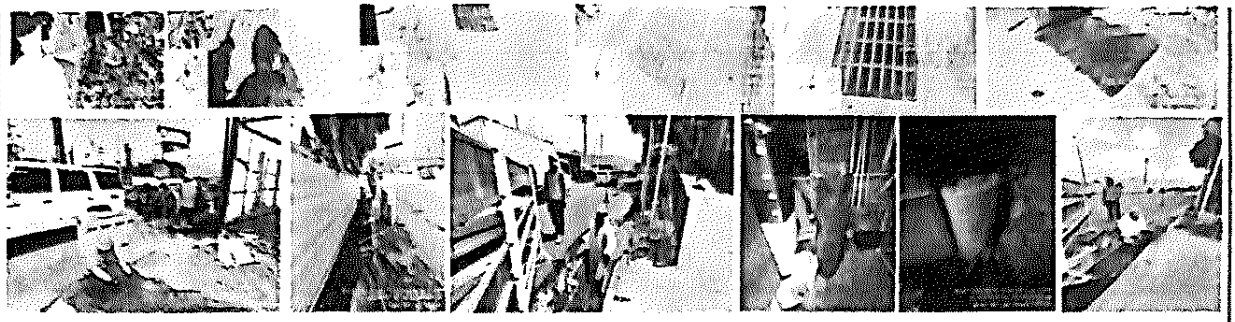

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Unidad de Medida	Cant	Total
4	30/04/2026	Demarcación de zona de acopio temporal de escombros con 3 líneas de cinta de señalización	Se implementa Cinta de Demarcacion Amb para casi todos los programas del plan de manejo ambiental.	m2	480,00	480,00

Registro Fotográfico /Soporte

OBSERVACIONES: Facturas

CONSORCIO MAYORCA CONECTA

CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA 2025

INTERVENTORIA

Implementación Plan de Manejo de Tránsito (Anexo PMT)

FECHA 8-04-2024

DESCRIPCIÓN	PMT				ACTA 4		ACUMULADO		BASICO	
	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL	Cant	Valor Total	Cant	Valor Total	Cant	Valor Total
Dispositivos y Planes de divulgación a la Comunidad				$ 587.913.840,00		$ 22.293.540,00		$ 69.111.854,00		$ 414.709.260,00
Brigadistas de PMT y banderero						-		-		-
Ingeniero	un	22,00	$ 8.000.000,00	$ 132.000.000,00	1,00	8.000.000,00	4,00	24.000.000,00	16,00	96.000.000,00
Inspector	un	27,00	$ 3.000.000,00	$ 66.000.000,00	1,00	3.000.000,00	4,00	12.000.000,00	18,00	54.000.000,00
Ayudantes banderero (turno 8hr)	un	132,00	$ 2.218.590,00	$ 292.457.880,00	8,00	15.293.340,00	15,00	33.233.010,00	117,00	259.224.330,00
Brigada de señalización	un	44,00	$ 2.218.590,00	$ 97.485.960,00		-	-	-	44,00	97.485.960,00
Señalización vial y canalización del tránsito			$ -	$ 189.428.000,00		$ 9.357.700,00	-	$ 19.766.900,00	-	$ 174.874.100,00
Suministro, transporte, instalación y desinstalación de señales reglamentaria informativas o preventivas según PMT, estructura de soporte tubular y pedestal	und	80,00	$ 368.800,00	$ 29.504.000,00		-	12,00	4.425.600,00	68,00	25.078.400,00
Barricadas con señal	und	12,00	$ 420.000,00	$ 5.040.000,00		-	-	-	12,00	5.040.000,00
Maletines (2.05x1x 0.5 m)	und	300,00	$ 299.900,00	$ 89.970.000,00	29,00	8.697.100,00	33,00	9.896.700,00	267,00	80.073.300,00
Cinta de demarcación (rollo de 500 m)	und	100,00	$ 36.900,00	$ 3.690.000,00	2,00	73.800,00	2,00	73.800,00	98,00	3.616.200,00
Señalizadores luminares (Balizas)	und	700,00	$ 48.900,00	$ 34.230.000,00	12,00	586.800,00	22,00	1.075.800,00	678,00	33.154.200,00
Paleta de pare y siga*	und	20,00	$ 55.000,00	$ 1.100.000,00	-	-	5,00	275.000,00	15,00	825.000,00
Aplicación pintura acrílica con base agua o base solvente en la construcción de líneas de 0,40 m continua en Cebras, zona peatonal, Líneas de Pare, Líneas de semáforo, Líneas antibloqueo, líneas logarítmicas, crucero, Agujas y otros. Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	300,00	$ 14.280,00	$ 4.284.000,00		-	-	-	300,00	4.284.000,00
Aplicación de pintura acrílica con base agua o base solvente en la construcción de líneas de 0,12 m para líneas centrales, líneas de carril, líneas de borde de pavimento, entre otras. Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación	m	300,00	$ 6.920,00	$ 2.076.000,00		-	-	-	300,00	2.076.000,00
Aplicación de pintura acrílica con base agua o base solvente en la construcción de marcas viales para flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos ceda el paso, diamantes ceda el paso, entre otros. Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	300,00	$ 22.360,00	$ 6.708.000,00		-	-	-	300,00	6.708.000,00
Suministro y colocacion de Hitos para desvios de transito	un	100,00	$ 58.240,00	$ 5.824.000,00		-	-	-	100,00	5.824.000,00
Retiro y traslado de mobiliario semafórico, donde lo indique la interventoria	cruce	4,00	$ 2.000.000,00	$ 8.000.000,00		-	-	-	4,00	8.000.000,00
Permisos de cierre de vías.			$ -	$ 6.300.000,00		$ 350.000,00	-	$ 1.050.000,00	-	$ 5.250.000,00
Permiso para el cierre de vías en los momentos en que se requiera, ante la autoridad competente en los Municipios de Medellín, Envigado e Itagüí	un	18,00	$ 350.000,00	$ 6.300.000,00	1,00	350.000,00	3,00	1.050.000,00	15,00	5.250.000,00
TOTAL PLAN DE MANEJO DEL TRÁNSITO				$ 784.669.840,00		$ 32.001.240,00	0	$ 88.030.750,00	0	$ 698.639.090,00

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Germán Alonso Ramírez Restrepo
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Amparo Yaneth Ramírez
INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

MEMORIA CÁLCULO

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

ACTIVIDADES

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Total
4	30/04/2026	Ayudantes bandereros	control TRANSITO DE OBRA PMT	6,00	6,00

Registro Fotográfico /Soporte

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Total
4	30/04/2026	Maletines (2,05x1x 0,5 m)	Cierre parciales de vias por proceso contructivo	29,00	29,00

Registro Fotográfico /Soporte



Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Total
4	30/04/2026	Cinta de demarcación (rollo de 500 m)		2,00	2,00

Registro Fotográfico /Soporte



Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Total
4	30/04/2026	Señalizadores tubulares (Balizas)		12,00	12,00

Registro Fotográfico /Soporte

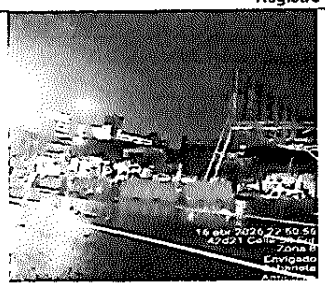

Powered by CamScanner

MEMORIA CÁLCULO

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

DESur

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Total
4	10/04/2026	Ingeniero PMT	Se anexa seguridad social	1,00	1,00



Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Total
4	10/04/2026	Inspector PMT	Se anexa seguridad social	1,00	1,00

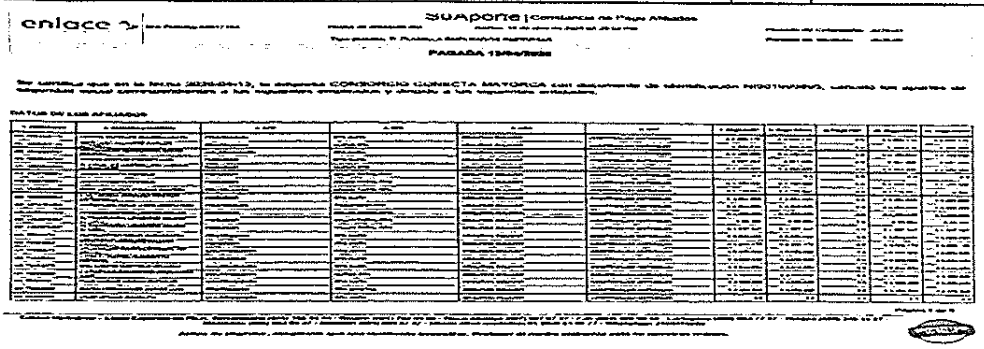

OBSERVACIONES:

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Germán Alonso Ramírez Restrepo
CONTRATISTA

CONSORCIO METROPOLITANO ILA
Carolina Perez Pineda
INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

Implementación SST

FECHA 8/05/2026

Programa, si cual pertenece en el PASAD	Detalle	COMPONENTE SST CANTIDAD	UNIDAD	Valor Unitario	Valor Total	ACTA 5 Cant	ACTA 5 Valor Total	ACTA 6 Cant	ACTA 6 Valor Total	ACTA 6 Cant	ACTA 6 Valor Total	ACTA 7 Cant	ACTA 7 Valor Total	ACTA 8 Cant	ACTA 8 Valor Total	ACTA 9 Cant	ACTA 9 Valor Total	ACTA 10 Cant	ACTA 10 Valor Total	ACUMULADO Cant	ACUMULADO Valor Total	SALDO Cant	SALDO Valor Total
Salud Ocupacional					$ 99.224.000		$ 110.000		$ 40.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 900.000		$ 98.874.000
	Overol antifluidos desechable con capucha	72	un	$ 20.000	$ 1.440.000	3.00	$ 60.000	2	$ 40.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	5.00	$ 100.000	67.00	$ 1.340.000
	Arnes multipropósito 4 argollas	48	un	$ 130.000	$ 6.780.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	48.00	$ 6.780.000
	Eslinga doble en Y	48	un	$ 178.000	$ 8.544.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	48.00	$ 8.544.000
	Chaquetas para personal administrativo	72	un	$ 45.000	$ 3.240.000	10.00	$ 450.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	10.00	$ 450.000	62.00	$ 2.790.000
	Capacitaciones a personal	72	hr	$ 45.000	$ 3.240.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	72.00	$ 3.240.000
	Cuerda Linea de vida cernertel 13mm	8000	ml	$ 5.500	$ 44.000.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	8000.00	$ 44.000.000
Adecuacion de Campamento					$ 118.848.000		$ 510.000		$ 1.230.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	8.00	$ 550.000		$ 118.188.000
Adecuacion de Campamento	Botiquin Primeros Auxilios	18	un	$ 180.000	$ 3.240.000	3.00	$ 540.000	1	$ 180.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 720.000	14.00	$ 2.520.000
	Camilla de Emergencia Portatil Metalica	8	un	$ 210.000	$ 1.680.000	2.00	$ 420.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2.00	$ 420.000	4.00	$ 840.000
	Extintor 30lb con manguera	12	un	$ 100.000	$ 1.200.000	8.00	$ 800.000	2	$ 200.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	11.00	$ 1.100.000	1.00	$ 100.000
	Unidades sanitarias portátiles	220	un	$ 450.000	$ 99.000.000	2.00	$ 900.000	2	$ 900.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4.00	$ 1.800.000	218.00	$ 97.200.000
	Elementos de aseo	144	un	$ 50.000	$ 7.200.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0.00	$ -	144.00	$ 7.200.000
	Radios y Equipos de Telecomunicación (par)	12	un	$ 420.000	$ 5.040.000	6.00	$ 2.520.000		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	6.00	$ 2.520.000	6.00	$ 2.520.000
	TOTAL COMPONENTE SST				$ 333.164.000,00		$ 5.790.000,00		$ 5.370.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 2.110.000,00		$ 176.654.000,00

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Germán Alonso Ramírez Restrepo
CONTRATISTA

Arquero Tenelo Restrepo
INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

MEMORIA CÁLCULO

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

DESur

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

ACTIVIDADES

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Total
4	25/04/2026	USO OVEROL TIPO TIBEEK		2,00	2,00

Registro Fotográfico /Soporte

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Total
4	25/04/2026	10/032026	BOTIQUIN PRIMERO AUXILIOS	1,00	1,00

Registro Fotográfico /Soporte

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Total
4	25/04/2026	EXTINTORES 30 LBS CON MANGUERA		2,00	2,00

Registro Fotográfico /Soporte

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Total

Powered by CamScanner

MEMORIA CÁLCULO

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

DESur

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

4	10/04/2026	UNIDADES SANITARIAS PORTATILES		2,00	2,00

Registro Fotográfico /Soporte

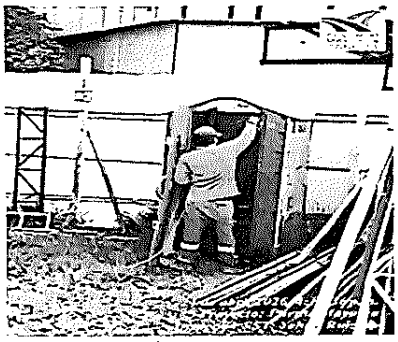

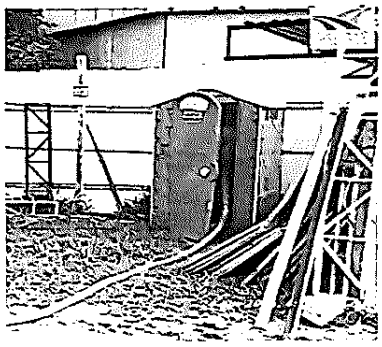

Acta Nro.	Fecha Corte	Actividad	Detalle	Cant	Total
4					0,00

Registro Fotográfico /Soporte

OBSERVACIONES:

CONSORCIO MAYORCA CONECTA
German Alonso Ramírez Restrpo
CONTRATISTA

Amparo Yaneth Rammos
INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

CONTRATO N° DESur-IA-168-2025

OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

ACTA DE CAMBIO DE OBRA No 4

En el Municipio de Envigado a los 25 días del mes de ABRIL de 2026, se han reunido el Ingeniero ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ, Gerente de la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado, la ingeniera LAURA QUINTERO GRAVIRIA, supervisora del contrato, el señor JESUS ENRIQUE ACEVEDO , representante legal del CONSORCIO MAYORCA CONECTA, el señor ALVARO HERNANDO VERA, representante legal del CONSORCIO METROPOLITANO ILA 2025, con el fin de suscribir la presente Acta, cuyo objeto es dejar constancia de las obras adicionales o extras que deben ejecutarse durante el periodo correspondiente al mes de ABRIL de 2026:

JUSTIFICACION

ITEM 2.8. DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura:
La menor cantidad ejecutada obedece a ajustes en obra derivados de las condiciones reales encontradas, que permitieron conservar algunos elementos estructurales inicialmente contemplados para demolición, disminuyendo así el volumen total sin afectar el desarrollo del proyecto.

ITEM 3.1 Cargue mecánico, transporte y botada de escombros
La disminución de este ítem se debe a que las actividades de excavación y demolición ejecutadas dentro del proyecto ya contemplaban en su alcance el cargue, transporte y disposición final del material sobrante y escombros. Por tal motivo, no fue necesario ejecutar de manera independiente la totalidad de las cantidades inicialmente previstas para este ítem, evitando duplicidad de actividades y optimizando los recursos de obra.

ITEM 14.4 – Excavación de material común húmedo < 2 m manual
La disminución de este ítem se presenta debido a que las excavaciones requeridas para la instalación de los postes de las redes secas fueron consideradas por la interventoría como parte integral del alcance de las actividades de suministro e hincada de postes. En consecuencia, dichas excavaciones no fueron reconocidas de manera independiente dentro de este ítem, generando una menor cantidad ejecutada respecto a la inicialmente presupuestada.

ITEM 2.2 – Instalación de cerramiento en superboard
La ejecución de esta actividad adicional fue necesaria para garantizar el aislamiento, seguridad y cerramiento adecuado de las áreas intervenidas durante la ejecución del proyecto. En obra se evidenció la necesidad de ampliar las zonas de confinamiento inicialmente previstas, con el fin de cumplir condiciones operativas, de seguridad industrial y requerimientos de la interventoría. Por tal motivo, fue indispensable instalar una mayor longitud de cerramiento en superboard.

ITEM 2.3 – Desmonte y limpieza
El aumento de esta actividad se originó debido a que, durante la ejecución del proyecto, se encontraron mayores áreas con presencia de material vegetal, residuos y elementos no contemplados inicialmente en los estudios preliminares. Para garantizar las condiciones adecuadas de intervención y seguridad del área de trabajo, fue necesario ampliar las labores de limpieza y retiro de material sobrante.

ITEM 14.21 – Suministro, transporte y montaje de vestida primaria según norma RA2-304 de EPM
La ejecución de esta actividad adicional se requirió como resultado de ajustes técnicos realizados durante el desarrollo del proyecto y de las exigencias establecidas por el operador de red EPM para garantizar el cumplimiento normativo y la correcta operación del sistema eléctrico. La instalación de vestidas primarias adicionales permitió asegurar las condiciones técnicas de conexión y confiabilidad requeridas.

ITEM 14.24 – Viento convencional según norma RA6-001 para 13.2 kV
La mayor cantidad ejecutada corresponde a requerimientos técnicos derivados de las condiciones reales identificadas en sitio. Fue necesario incorporar vientos adicionales para garantizar la estabilidad mecánica de la red eléctrica aérea y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad exigidas por EPM.

ITEM 14.37 – Suministro, transporte y montaje de línea primaria aérea trifásica 3 No. 266.8 ecológico +1/0 AWG ó 4/0 ACSR

La actividad adicional se justificó por la necesidad de ampliar el tendido de red primaria conforme a las condiciones de conexión definidas durante la ejecución del proyecto. La longitud inicialmente proyectada resultó insuficiente para garantizar la continuidad y correcta configuración del sistema eléctrico requerido en obra.

ITEM 14.50 – Traslado línea primaria 4 hilos para 13.2 y/o 44 kV
La ejecución de esta actividad fue necesaria debido a interferencias identificadas en campo entre la infraestructura eléctrica existente y las obras proyectadas. Para garantizar la seguridad operacional, la continuidad del servicio y permitir la ejecución de las actividades constructivas, fue indispensable realizar el traslado de la línea primaria existente conforme a los requerimientos técnicos y aprobaciones del operador de red.

OE2. Excavación con cuña manual. Incluye manejo de aguas:
Durante la excavación de los caissons se encontraron más estratos rocosos que no podían ser removidos mediante los métodos convencionales previstos. Debido a las condiciones físicas y mecánicas del material, caracterizado por su alta resistencia y grado de compactación, fue necesario implementar excavación con cuña manual para su fragmentación y retiro controlado. Adicionalmente, se requirió el manejo de aguas durante el proceso constructivo para garantizar condiciones adecuadas de trabajo y estabilidad en la excavación.

OBRA QUE NO SE EJECUTA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2.8	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m3	-182.34	$ 197,994.00	-$ 36,102,418.00
3.1	CARGUE MECANICO, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS, incluye, el cargue con máquina, repaleo, transporte interno y externo y botada de material tipo escombro en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio.	m3	-400.00	$ 45,805.00	-$ 18,322,000.00
14.4	Excavación de material común húmedo<2m manual. Retiro, cargue y botada de material	m3	-1200.00	$ 107,467.00	-$ 128,960,400.00
TOTAL OBRA QUE NO SE EJECUTA					-$ 183,384,818.00

DESur

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

Alcaldía de Envigado

CONTRATO N° DESur-IA-168-2025

OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA AVENIDA LAS VEGAS CON CALLE 50 SUR, DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°5 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-1418-24.

ACTA DE CAMBIO DE OBRA No 4

OBRA ADICIONAL QUE SE EJECUTA:

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2.2	Instalación de CERRAMIENTO EN SUPERBOARD calibre 8, con una altura de 2.20 m. Incluye suministro, transporte e instalación de la placa de superboar, estructura metálica cada 1.00m, larguero horizontal en la parte intermedia y superior, concreto de 17.5 Mpa para fijación de estructura , vientos en madera cada 3m, excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de material, incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m	191.78	$ 125,474.00	$ 24,063,404.00
2.3	DESMONTE Y LIMPIEZA a máquina, e=0.15m. Incluye cargue, transporte y botada de escombros material vegetal en botaderos oficiales o donde indique la interventoria. Su medida será en sitio.	m2	1641.14	$ 10,660.00	$ 17,494,552.00
14.21	Suministro, transporte y montaje de vestida primaria según norma RA2-304 de EPM	un	3.00	$ 3,428,219.00	$ 10,284,657.00
14.24	Viento convencional según norma RA6-001 para 13.2KV	un	6.00	$ 718,255.00	$ 4,309,530.00
14.37	Suministro, transporte y montaje linea primaria aerea trifásica 3No.266.8 ecologico+1/0 AWAC ó 4/0 ACSR	ml	340.00	$ 230,996.00	$ 78,538,640.00
14.50	Traslado linea primaria 4 hilos para 13.2 y/o 44Kv	ml	428.00	$ 54,402.00	$ 23,284,056.00
TOTAL OBRA ADICIONAL QUE SE EJECUTA					**$ 157,974,839**

OBRA EXTRA QUE SE EJECUTA:

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
OE2	Excavación con cuña manual. Incluye manejo de aguas.	Pulg	3303.00	$ 7,693.00	$ 25,409,979.00
TOTAL OBRA EXTRA QUE SE EJECUTA					**$ 25,409,979.00**

TOTAL OBRA ADICIONAL Y EXTRA QUE SE EJECUTA	**$**	**183,384,818.00**
DIFERENCIA OBRA QUE NO SE EJECUTA - OBRA QUE SE EJECUTA	**$**	**-**

Las partes dejan constancia de lo siguiente:

1. Que dicho cambio de obra fue aprobado por los Representantes de la Empesa DESur.
2. Se ha mantenido el objeto del Contrato No. DESur-IA-168-2025
3. Se han respetado y mantenido las ventajas económicas otorgadas al Contratista, y se han guardado tanto para el Municipio como para el contratista el equilibrio financiero del contrato.

Para constancia firman:

ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ
Gerente
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO DESur

LAURA QUINTERO GRAVIRIA
Supervisora del Contrato
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE
ENVIGADO DESur

JESÚS ENRIQUE ACEVEDO
Representante Legal Contratista
CONSORCIO MAYORCA CONECTA

ALVARO HERNANDO VERA
Representante Legal Interventoria
CONSORCIO METROPOLITANO ILA 2025

INDECO
Constructora

CONSTRUIMOS
POSIBILIDADES

FORMATO
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo MARIA GLADYS OCHOA GIRALDO identificada con C.C. 42.961.311 de Medellín y con Tarjeta Profesional No 9622-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INTERVENTORIA DISEÑOS Y CONTRATOS S.A.S. identificada con Nit 811006928-9, debidamente inscrita en la cámara de comercio de ABURRÁ SUR, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dado en el Municipio de Envigado a los tres (03) días del mes junio del año 2026.

Atentamente,

NOMBRE: MARIA GLADYS OCHOA GIRALDO
CARGO: REVISOR FISCAL de INTERVENTORIA DISEÑOS Y CONTRATOS S.A.S. en nombre de FM CONASESORES S.A.S
C.C. 42.961.311 de Medellín
Tarjeta Profesional No 9622-T

CONSORCIO
MAYORCA
CONECTA

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El suscritor representante legal del **Consorcio Mayorca Conecta** identificado con nit 901.999.695 - 4, **CAMILO ANGEL MACHADO** identificado con cédula de ciudadanía **8.161.089,** y el suscrito contador público, **CARLOS MARIO ALVAREZ CANO** identificado con cédula de ciudadanía **1.152.185.206**, certifican que el consorcio en mención se encuentra al día a la fecha con sus obligaciones provenientes del Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Dada en la ciudad de Medellín a los (3) tres días del mes de junio de 2026.

Cordialmente,

Camilo Angel Machado.
Representante legal.
Consorcio Mayorca Conecta

Carlos Mario Alvarez Cano.
Contador Público.
T.P 207249 – T

Estyma
INGENIERÍA CON TALENTO HUMANO

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En mi calidad de Revisor Fiscal de la ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A identificada con NIT 800.014.246-8, declaro bajo la gravedad de juramento, que la sociedad ha cumplido en los últimos meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dado en Medellín Antioquia, a los tres (03) día de junio de 2026.

Cordialmente,

Raúl A. Menco V.
Revisor fiscal designado por Auren Consultores Medellín
Tarjeta Profesional No. 66200-T
C.C. 19.872.348 de Magangué Bolívar

Medellín, 02 de junio de 2026.

CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCAL.

Como Revisor Fiscal de Pavimentar S.A., con NIT 800.040.014-6. certifico que, durante los últimos 6 meses anteriores a la expedición de la presente certificación, esta empresa se encuentra al día con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales (Cajas de Compensación familiar, SENA, I.C.B.F.), en los términos que establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas reglamentarias.

Nota: Mediante auto del 19 de agosto de 2021 (Exp. 26855), se admitió a Pavimentar S.A. en proceso de reorganización, situación que está registrada en la Cámara de Comercio en el Libro XIX.

La información financiera, contable y tributaria es responsabilidad de la Administración de la Compañía. No estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Esta comunicación se emite a solicitud de la Administración de la Compañía y no debe, ni puede ser utilizada para ningún otro propósito, ni distribuida a terceras personas.

Atentamente,

Daniel Flórez Osorio
Revisor fiscal
T.P. 237007-T
Designado por OCH ASSURANCE & AUDIT S.A

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

El suscrito revisor fiscal de **ION INNOVACION ORIENTADA A LOS NEGOCIOS SAS**, Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que **ION INNOVACION ORIENTADA A LOS NEGOCIOS SAS**, identificada con **NIT 900.240.169-1**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio del Aburra Sur, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, en lo correspondiente al personal vinculado y contratado por Servicios Profesionales, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la firma de dicha certificación, y a la fecha de este certificado se encuentra al día en sus pagos y respectivos aportes.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Dada en Envigado, a los 3 días del mes de junio del 2026.

JOHN JAIRO ZAPATA RODRIGUEZ
C.C 98.578.337
T.P 106587-T

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-19, 09:13:39 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 86181309

Periodo Cotización: mayo de 2026 Periodo Servicio: junio de 2026

PAGADO 18/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CONECTA MAYORCA		
Documento	NI901999695	**Dirección**	CR 35A #15 B - 35 ED PRISMA OF410
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6044440568
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	ANGEL MACHADO CAMILO	**Identificación**	CC 8161089
Total Afiliados	50	**ARP**	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001233778	EDUARD SMITH OCHOA MORALES	01	00												X					0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58,364	$ 9,400	(EPS010) EPS SURA	$ 58,364	$ 2,400	0,000	$ 58,364	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11,800
CC 1001233778	EDUARD SMITH OCHOA MORALES	01	00										X							0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 3,078,382	$ 492,600	(EPS010) EPS SURA	$ 3,078,382	$ 123,200	6,960	$ 3,078,382	$ 214,300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3,078,382	$ 123,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 953,300
CC 1001635758	CAMILO ANDRES ALVAREZ PUELLO	01	00	X						X										0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 583,635	$ 93,400	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 583,635	$ 23,400	6,960	$ 583,635	$ 40,700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 583,635	$ 23,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180,900
CC 1003244440	JHONATHAN ALVAREZ ANGULO	01	00													L				0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 78,021	$ 12,500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 78,021	$ 3,200	0,000	$ 78,021	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 78,021	$ 3,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18,900
CC 1003244440	JHONATHAN ALVAREZ ANGULO	01	00	X						X		X								0	26	26	26	26	(231001) COLFONDOS	$ 2,188,143	$ 350,300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2,188,143	$ 87,600	6,960	$ 2,188,143	$ 152,300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2,188,143	$ 87,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 677,700
CC 1003360455	YOINER RAFAEL MENDEZ PEREZ	01	00	X						X		X								0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1,518,778	$ 243,100	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 1,518,778	$ 60,800	6,960	$ 1,518,778	$ 105,800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1,518,778	$ 60,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470,500
CC 1015072510	EMANUEL OCHOA CARRILLO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2,517,324	$ 402,800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2,517,324	$ 100,700	6,960	$ 2,517,324	$ 175,300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2,517,324	$ 100,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 779,500
CC 1019039747	DIEGO ANDRES HERNANDEZ QUINCHARA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8,200,000	$ 1,394,000	(EPS010) EPS SURA	$ 8,200,000	$ 328,000	6,960	$ 8,200,000	$ 570,800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8,200,000	$ 328,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,620,800
CC 1026142489	JUAN CARLOS TORRES MARTINEZ	01	00	X	X					X										0	14	14	14	14	(25-14) COLPENSIONES	$ 817,089	$ 130,800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 817,089	$ 32,700	6,960	$ 817,089	$ 56,900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 651,132	$ 34,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 254,500
CC 1035129480	YEFERSON ARLEY MAZO MONTOYA	01	00	X							X									0	6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 624,171	$ 99,900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 624,171	$ 25,000	6,960	$ 624,171	$ 43,500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 624,171	$ 25,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 193,400
CC 1035129480	YEFERSON ARLEY MAZO MONTOYA	01	00										X							0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 156,043	$ 25,000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 156,043	$ 0	0,000	$ 156,043	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 156,043	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25,000
CC 1036607393	SERGIO ANTONIO SARAVIA LAINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4,500,000	$ 720,000	(EPS010) EPS SURA	$ 4,500,000	$ 180,000	6,960	$ 4,500,000	$ 313,200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4,500,000	$ 180,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,393,200
CC 1037266817	EDWAR ALEXIS LOPERA ORTIZ	01	00		X								X							0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION	$ 1,250,822	$ 200,200	(EPS010) EPS SURA	$ 1,250,822	$ 50,100	6,960	$ 1,250,822	$ 87,100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1,338,703	$ 53,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 391,000
CC 1037777445	JUAN CAMILO MUNERA ZAPATA	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 116,727	$ 18,700	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 116,727	$ 4,700	0,000	$ 116,727	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23,400
CC 1037777445	JUAN CAMILO MUNERA ZAPATA	01	00	X									X							0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 1,224,839	$ 196,000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1,224,839	$ 49,000	6,960	$ 1,224,839	$ 85,300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1,307,490	$ 52,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 382,600
CC 1039286649	JHONNY ALEXANDER RODRIGUEZ CASTRILLON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3,635,968	$ 581,800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3,635,968	$ 145,500	6,960	$ 3,635,968	$ 253,100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3,635,968	$ 145,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,125,900
CC 1040376567	FREYDY ADALBERTO VELASQUEZ SUAREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2,226,635	$ 356,300	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2,226,635	$ 89,100	6,960	$ 2,226,635	$ 155,000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2,226,635	$ 89,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 689,500
CC 1047762949	JORGE MARIO AGUDELO PEREZ	01	00	X						X		X								0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 2,056,039	$ 329,000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2,056,039	$ 82,300	6,960	$ 2,056,039	$ 143,200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2,056,039	$ 82,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 636,800
CC 1047762949	JORGE MARIO AGUDELO PEREZ	01	00										X							0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 234,064	$ 37,500	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 234,064	$ 0	0,000	$ 234,064	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 234,064	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37,500

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 18/06/2026 | Empresa NI901999695 CONSORCIO CONECTA MAYORCA | Planilla Nro: 86181309 | Periodo Cotización: mayo de 2026 | Periodo Servicio: junio de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	
CC 1044909014	ERICK ANTONIO SERRANO ALVAREZ	01	00	X							X		X							0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.554.923	$ 248.800	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.554.923	$ 62.200	6,960	$ 1.554.923	$ 108.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.554.923	$ 62.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 481.500
CC 1044909014	ERICK ANTONIO SERRANO ALVAREZ	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 58.364	$ 0	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400
CC 1045424150	JORGE DAVID MARTINEZ VALENCIA	01	00	X							X		X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 2.319.360	$ 371.100	(EPS016) S.O.S EPS	$ 2.319.360	$ 92.800	6,960	$ 2.319.360	$ 161.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.319.360	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 718.200
CC 1052738581	LUIS ANTONIO BELEÑO BARRETO	01	00	X							X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.528.726	$ 244.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.528.726	$ 61.200	6,960	$ 1.528.726	$ 106.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.528.726	$ 61.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 473.400
CC 1054541209	ANDERSON JHOVANY MOLINA RAMIREZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.479.448	$ 556.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.479.448	$ 139.200	6,960	$ 3.479.448	$ 242.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.479.448	$ 139.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.077.400
CC 1056820423	HECTOR HERNANDO CASTAÑEDA GIRALDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.261.000	$ 521.800	(EPS010) EPS SURA	$ 3.261.000	$ 130.500	6,960	$ 3.261.000	$ 227.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.261.000	$ 130.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.009.800
CC 1067900160	JUAN DANIEL PACHECO	01	00	X							X		X							0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.636.831	$ 261.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.636.831	$ 65.500	6,960	$ 1.636.831	$ 114.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.636.831	$ 65.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 506.900
CC 1067900160	JUAN DANIEL PACHECO	01	00											X						0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 58.364	$ 9.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 58.364	$ 0	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400
CC 1068560506	YORMAN GREY FLOREZ PADILLA	01	00	X							X		X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.583.442	$ 253.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.583.442	$ 63.400	6,960	$ 1.583.442	$ 110.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.583.442	$ 63.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
CC 1071435065	KEINER LUIS FLOREZ PADILLA	01	00	X	X						X		X							0	18	18	18	18	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.130.130	$ 180.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.130.130	$ 45.300	6,960	$ 1.130.130	$ 78.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.177.219	$ 47.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.000
CC 1072751399	JHON SEBASTIAN CAÑIZALES AVILA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.204.000	$ 672.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 4.204.000	$ 168.200	6,960	$ 4.204.000	$ 292.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.204.000	$ 168.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.301.700
CC 1096188182	JUAN DAVID OCHOA CARRILLO	01	00											X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.397.746	$ 383.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.397.746	$ 96.000	6,960	$ 2.397.746	$ 166.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.397.746	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 742.600
CC 1104258291	JUAN CAMILO RIVAS AVILA	01	00	X							X		X							0	23	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.421.948	$ 227.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.421.948	$ 56.900	6,960	$ 1.421.948	$ 99.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.421.948	$ 56.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.400
CC 1104258291	JUAN CAMILO RIVAS AVILA	01	00											X						0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 58.364	$ 9.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 58.364	$ 0	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400
CC 1104258291	JUAN CAMILO RIVAS AVILA	01	00											X						0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 58.364	$ 9.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 58.364	$ 0	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400
CC 1127655755	CESAR OMAR MONTES PARRA	01	00											X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.743.648	$ 439.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.743.648	$ 109.800	6,960	$ 2.743.648	$ 191.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.743.648	$ 109.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 849.600
CC 1128429470	JORGE EMILIO ARANGO ESPINAL	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.948.456	$ 471.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.948.456	$ 118.000	6,960	$ 2.948.456	$ 205.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.948.456	$ 118.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 913.100
CC 1192752941	YORLY BEIKER FLOREZ PADILLA	01	00	X							X		X							0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.732.998	$ 277.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.732.998	$ 69.400	6,960	$ 1.732.998	$ 120.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.732.998	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 536.500
CC 1193076337	JULIAN STIVEN ALTAMIRANDA LONDOÑO	01	00		X								X							0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 459.612	$ 73.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 459.612	$ 18.400	6,960	$ 459.612	$ 32.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 676.041	$ 27.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151.100
CC 1193416514	JOHN DENIS MONTES HIGUITA	01	00	X							X		X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 2.069.869	$ 331.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.069.869	$ 82.800	6,960	$ 2.069.869	$ 144.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.069.869	$ 82.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.900
CC 1214715997	ELVER SANTIAGO URBINA ARISTIZABAL	01	00	X							X									0	10	10	10	10	(231001) COLFONDOS	$ 780.213	$ 124.900	(EPS010) EPS SURA	$ 780.213	$ 31.300	6,960	$ 780.213	$ 54.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 780.213	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.900
CC 1249660l	JAHER ENRIQUE PEREZ NEGRETE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.576.173	$ 572.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.576.173	$ 143.100	6,960	$ 3.576.173	$ 249.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.576.173	$ 143.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.107.400
CC 32090399	BEATRIZ EUGENIA SANCHEZ MARTINEZ	01	00	X							X		X							0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.883.816	$ 301.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.883.816	$ 75.400	6,960	$ 1.883.816	$ 131.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.883.816	$ 75.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 583.500
CC 70329174	ALEJANDRO ECHAVARRIA MEJIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 5.500.000	$ 880.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.500.000	$ 220.000	6,960	$ 5.500.000	$ 382.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5.500.000	$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.702.800
CC 70421223	WILMAR FERNANDO MONTOYA VASQUEZ	01	00												X					0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.634.178	$ 261.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.634.178	$ 65.400	0,000	$ 1.634.178	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 326.900
CC 70421223	WILMAR FERNANDO MONTOYA VASQUEZ	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 182.641	$ 29.300	(EPS010) EPS SURA	$ 182.641	$ 7.400	6,960	$ 182.641	$ 12.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 182.641	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.900
CC 70952073	OTONIEL DE JESUS VELASQUEZ RIVERA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.000.000	$ 960.000	(EPS010) EPS SURA	$ 6.000.000	$ 240.000	6,960	$ 6.000.000	$ 417.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 6.000.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.857.600
CC 71215420	HUMBERTO HERNAN YEPEZ CASTRO	01	00											X						0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.123.421	$ 499.800	(EPS010) EPS SURA	$ 3.123.421	$ 125.000	6,960	$ 3.123.421	$ 217.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.123.421	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 967.200
CC 71252116	ANTONIO MARIA DAVID BEDOYA	01	00	X							X		X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.116.770	$ 338.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.116.770	$ 84.700	6,960	$ 2.116.770	$ 147.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.116.770	$ 84.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 655.500
CC 71411787	JUAN DIEGO JARAMILLO MAZO	01	00	X	X						X		X							0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 555.117	$ 88.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 555.117	$ 22.300	6,960	$ 555.117	$ 38.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 577.003	$ 23.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.000
CC 71411787	JUAN DIEGO JARAMILLO MAZO	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 58.364	$ 0	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.400
CC 71754033	CESAR AUGUSTO BOLIVAR RUIZ	01	00	X							X		X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.796.071	$ 287.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.796.071	$ 71.900	6,960	$ 1.796.071	$ 125.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.796.071	$ 71.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.300
CC 72153375	WILLIAM DEL CAMPO MARTELO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.378.182	$ 540.600	(EPS010) EPS SURA	$ 3.378.182	$ 135.200	6,960	$ 3.378.182	$ 235.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.378.182	$ 135.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.046.200
CC 74180999	GEOVANNY YAIR CARDENAS CHAPARRO	01	00											X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.313.433	$ 1.010.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 6.313.433	$ 252.600	6,960	$ 6.313.433	$ 439.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 6.313.433	$ 252.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.954.900
CC 7600666	YOHAN ENRIQUE RUIZ MUÑOZ	01	00											X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.208.271	$ 673.400	(EPS010) EPS SURA	$ 4.208.271	$ 168.400	6,960	$ 4.208.271	$ 292.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.208.271	$ 168.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.303.100
CC 78115923	JOSE ALEJANDRO MUÑOZ ROJAS	01	00	X							X		X							0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 2.266.164	$ 362.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.266.164	$ 90.700	6,960	$ 2.266.164	$ 157.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.266.164	$ 90.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 701.800
CC 78303655	JORGE LUIS BORJA HERNANDEZ	01	00																	1	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 84.558	$ 13.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 84.558	$ 3.400	0,000	$ 84.558	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.000

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 18/06/2026 | Empresa NI901999695 CONSORCIO CONECTA MAYORCA | Planilla Nro: 86181309 | Periodo Cotización: mayo de 2026 | Periodo Servicio: junio de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 78303055	JORGE LUIS DORIA HERNANDEZ	01	00																	10	10	10	10	10	(230201) PROTECCION	$ 845.577	$ 135.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 845.577	$ 33.900	0,000	$ 845.577	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 169.200
CC 78303055	JORGE LUIS DORIA HERNANDEZ	01	00													L				0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 84.558	$ 13.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 84.558	$ 3.400	0,000	$ 84.558	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 84.000	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.400
CC 78303055	JORGE LUIS DORIA HERNANDEZ	01	00										X							0	18	18	18	18	(230201) PROTECCION	$ 2.162.671	$ 346.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.162.671	$ 86.600	6,960	$ 2.162.671	$ 150.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.162.671	$ 86.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 669.900
CC 96478799	JESUS MARIA OCHOA TORRES	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.819.671	$ 451.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.819.671	$ 112.800	6,960	$ 2.819.671	$ 196.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.819.671	$ 112.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 873.100
CC 96557939	LUIS EDUARDO ORTIZ ECHAVARRIA	01	00	X							X		X							0	27	27	27	27	(230204) PORVENIR	$ 1.923.808	$ 307.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.923.808	$ 77.000	6,960	$ 1.923.808	$ 133.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.923.808	$ 77.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 595.800
CC 96610281	FRANCISCO FIDEL FIGUEROA BERMUDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.261.997	$ 522.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.261.997	$ 130.500	6,960	$ 3.261.997	$ 227.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.261.997	$ 130.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.010.100
PT 6481664	ANGEL DIONICIO MONTES PORTILLO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.549.755	$ 408.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.549.755	$ 102.000	6,960	$ 2.549.755	$ 177.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.549.755	$ 102.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 789.500
PT 7152492	ALEXANDER JOSE RENGEL	01	00	X							X		X							0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.715.092	$ 274.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.715.092	$ 68.700	6,960	$ 1.715.092	$ 119.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.715.092	$ 68.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 531.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 128.591.039	$ 128.591.039	$ 128.591.039	$ 126.341.135	$ 20.659.600	$ 5.119.000	$ 8.703.100	$ 5.028.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.510.400	$ 0	$ 39.510.400

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protager el medio ambiente está en nuestras manos.

Certificación
Bancaria

Señores
CONSORCIO MAYORCA CONECTA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **CONSORCIO MAYORCA CONECTA**, identificada con Nit. No **901999695** a la fecha 09/05/2026, presenta la siguiente información:

Nombre producto	CONSORCIO MAYORCA CONECTA
Tipo producto	AHORROS
No. producto	02900006773
Fecha apertura	23/01/2026
Estado	ACTIVA
Código sucursal	29 - OVIEDO

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciador, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

JUAN CARLOS BALLESTEROS SARMIENTO
GERENCIA DE SERVICIOS DE INTERACCIÓN COMERCIAL

Elaboró: Leidy Estefania Niño Piza

Bancolombia
