INFORME DE SUPERVISION

ACTA FINAL

MV–MC-OBRA-001 DE 2026

SUPERVISOR : SANDRA MARCELA ORTIZ COBO.

FECHA: FEBRERO 27 DE 2025

Documento propiedad de la Administración Municipal de Vijes. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

GESTION JURIDICOADMINISTRATIVA CONTRATACION	MODELO GERENCIAL **INFORME CONTRATACION**	**MAJA02.02**	
		VERSIÓN	2
		FECHA APROBACION	12/01/10

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

1.1 DATOS BASICOS DEL CONTRATO					
Contrato No.	**MV–MC-OBRA-001 DE 2026**	Fecha de suscripción	D 26	M 01	A 2026
Objeto:	"ILUMINACION DE VIAS RURALES MEDIANTE LUMINARIAS SOLARES SOBRE EL SECTOR CRUCERO LA YE CORREGIMIENTO DE CARBONERO MUNICIPIO DE VIJES VALLE DEL CAUCA				
Valor del contrato incluye novedades:	$ 59.046.243				
Contratista:	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGENICO SAS				
Fecha de iniciación	ENERO 27 DE 2026				
Plazo:	1 MES (30) DIAS				
Fecha de terminación incluye novedades	FEBRERO 27 DE 2026				

2. DOCUMENTOS SUSCRITOS AL CONTRATO

ACTA	SI	NO	OBSERVACIONES
Reunión visita previa al sitio de las obra	X		SE REALIZA RECORRIDO DE OBRA PARA IDENTIFICAR ZONAS AFECTADAS
Inicio de obra	X		27 DE ENERO DE 2026
Reunión en obra	X		SE EALIZA COMITA DE OBRA EN EL SITIO DE INTERVENCION
Acta de pago Final	X		27 DE FEBRERO DE 2026

3. AVANCE DEL CONTRATO

3.1 AVANCE FISICO DE LAS OBRAS

Documento propiedad de la Administración Municipal de Vijes. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

Las obras se encuentran	Al día	Atrasadas	Adelantadas
	X		
Porcentaje (%) de Ejecución de las obras	Programado	Ejecutado	Diferencia (+ó-).
	100%	100%	0%
Observaciones	El avance en el acta comprende Todo lo contratado		

3.2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

3.2.1 BALANCE FINACIERO DEL CONTRATO

Valor contrato	$ 59.046.243	
Valor anticipo 40% (no suma)	$ 15.839.063	
Valor Acta Final		$ 59.046.243
Saldo pendiente por ejecutar.		$ 0.00
SUMAS IGUALES	$ 59.046.243	$ 59.046.243

4. CONTROL POLIZAS

Conforme Decreto 1082 de 2015. No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en el Título III, de las Disposiciones Especiales del Presente Decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documento previos. Teniendo en cuenta lo anterior, el Municipio de Vijes Valle NO exigirá al contratista la constitución de la Garantía dada su forma de pago, por considerarse que NO existe riesgo

5. COMENTARIOS AL DESARROLLO DEL CONTRATO

Documento propiedad de la Administración Municipal de Vijes. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

Se destacan las siguientes observaciones durante la ejecución de las obras y/o el desarrollo del contrato:

5.1 ASPECTOS TÉCNICOS

A la fecha y luego de realizar las respectivas revisiones se procede a realizar el pago final de las labores de suministro e instalación de luminarias solares sobre el sector crucero la YE corregimiento de carbonero, en el Municipio de Vijes.

Se realizan las siguientes precisiones de tipo técnico con el fin de dar claridad a las memorias de cantidades presentadas para el pago del contrato.

Documento propiedad de la Administración Municipal de Vijes. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

GESTION JURIDICOADMINISTRATIVA CONTRATACION	MODELO GERENCIAL **INFORME CONTRATACION**	**MAJA02.02**	
		VERSIÓN	2
		FECHA APROBACION	12/01/10

MUNICIPIO DE VIJES - VALLE DEL CAUCA

CONTRATO No. MV MC-0BRA-001 DE 2026

ACTA DE RECIBO FINAL

MUNICIPIO DE VIJES VALLE DEL CAUCA

OBJETO: "ILUMINACION DE VIAS RURALES MEDIANTE LUMINARIAS SOLARES EN EL SECTOR CRUCERO LA YE CORREGIMIENTO DE CARBONERO MUNICIPIO DE VIJES VALLE DEL CAUCA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VIJES VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA: INGENICO SAS

$ 19.448.585

OBRA EJECUTADA FINAL

CONTRATO No. MV MC-0BRA-001 DE 2026

SUPERVISOR: SANDRA MARCELA ORTIZ COBO

INICIACION: 27 DE ENERO DE 2026

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 26 DE ENERO DE 2025

CONTRATO No. MV MC-0BRA-001 DE 2026						OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
1	LUMINARIAS SOLARES								
1.1	POSTE CONCRETO 8 X 510 KG	UND	11	1.200.000,00	13.200.000	11,00	13.200.000	11,00	13.200.000
1.2	SOPORTE PARA LUMINARIA	UND	11	177.024,00	1.947.264	11,00	1.947.264	11,00	1.947.264
1.3	LUMINARIA SE 60 W	UND	11	2.319.546,00	25.515.006	11,00	25.515.006	11,00	25.515.006
1.4	EXCAVACION DE 1 80 X 50 X 50 (HUECOS POSTE)	UND	11	85.000,00	935.000	11,00	935.000	11,00	935.000
1.5	TRANSPORTE GRLA	GL	1	2.500.000,00	2.500.000	1,00	2.500.000	1,00	2.500.000
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 44.097.269		$ 44.097.269		$ 44.097.269
	TOTAL COSTO INDIRECTO				$ 14.948.974		$ 14.948.974		$ 14.948.974
	ADMINISTRACION	24,90%			$ 10.980.220		$ 10.980.220		$ 10.980.220
	IMPREVISTOS	1%			$ 440.973		$ 440.973		$ 440.973
	UTILIDAD	8%			$ 3.527.781		$ 3.527.781		$ 3.527.781
	COSTO TOTAL (DIRECTO +INDIRECTO)				$ 59.046.243		$ 59.046.243		$ 59.046.243

Documento propiedad de la Administración Municipal de Vijes. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

SON: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE.

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATADO INICIAL	$ 39.597.658	
VALOR ADICIONAL	$ 19.448.585	
VALOR CONTRATADO	$ 59.046.243	
VALOR LIQUIDADO ACTAS ANTERIORES		$ -
VALOR PRESENTE ACTA		$ 59.046.243
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIOR		
VALOR AMORTIZAR PRESENTE		$ 15.839.063
VALOR A PAGAR EN PRESENTE ACTA		$ 43.207.180
SALDO SIN EJECUTAR		$ 0
SUMAS IGUALES	**$ 59.046.243**	**$ 59.046.243**

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los 26 dias de febrero de 2026

SANDRA MARCELA ORTIZ COBO
SUPERVISOR MUNICIPIO DE VIJES

NIERIA Y CONSULTORIA INGENICC
P LEGAL. XIMENA BECHARA RAMIF
CONTRATISTA


Documento propiedad de la Administración Municipal de Vijes. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

	MEMORIA DE CÁLCULO	CORTE DE OBRA No:	FINAL	INGÉNICO
	CONTRATO MV-MC-OBRA 001-2026 "ILUMINACION DE VIAS RURALES MEDIANTE LUMINARIAS SOLARES EN EL SECTOR CRUCERO LA YE CORREGIMIENTO DE CARBONERO MUNICIPIO DE VIJES VALLE DEL CAUCA	FECHA	25/02/2026	
		HOJA	1 DE 1	

CAPITULO: 1 LUMINARIAS SOLARES

ITEM: 1,5 TRANSPORTE GRUA UND UND CANT 1,00

DESCRIPCION	UND		GLB
GRUA	1		1,00
TOTAL			1,00

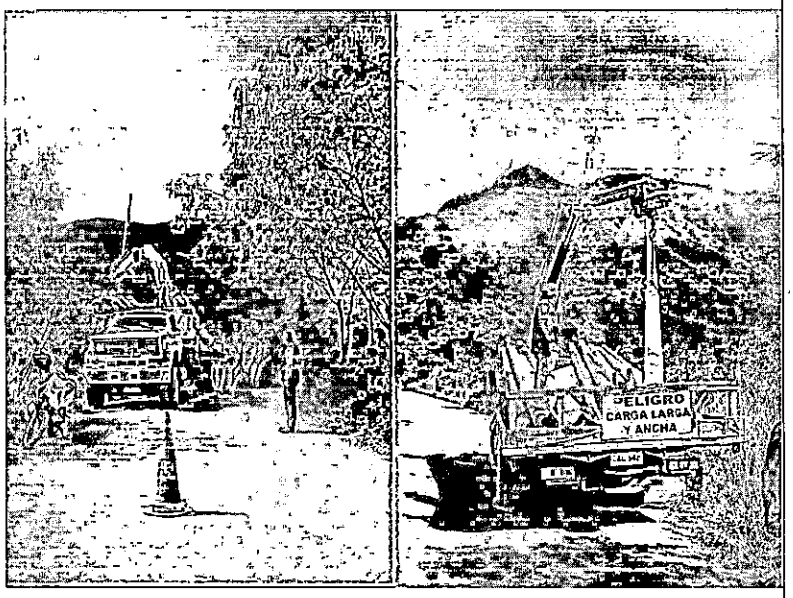

	OBSERVACIONES
ELASORO INGENICO SAS CONTRATISTA	
APROBO SANDRA MARCELA ORTIZ COBO SUPERVISOR	

Las diferentes áreas de intervención se encuentran en un 100 % terminadas

5.2 ASPECTOS FINANCIEROS

Adicional al otro si adelantado no se presenta ningún inconveniente de tipo financiero para llevar a cabo la correcta ejecución del contrato.

Documento propiedad de la Administración Municipal de Vijes. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

MV–MC-OBRA-001 DE 2026

5.3 CONTROVERSIAS Y SOLUCIONES

No se han suscitados diferencias, en su desarrollo y ejecución

Para constancia se firma en el despacho de la Alcaldía de Vijes Valle, a los 27 días del mes de febrero de 2025

Atentamente,

SANDRA MARCELA ORTIZ COBO.
Secretaria de Planeación (Supervisor del Contrato).

Anexos y Fotografías.

Documento propiedad de la Administración Municipal de Vijes. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.
