Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**Contratar el mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) del Centro Internacional de Producción Limpia Lope SENA Regional Nariño. Contrato No. CO1.PCCNTR.8660687 de 2025.**	**22,25 días?**	**jue 4/12/25**	**dom 28/12/25**
2	INICIO PROYECTO	0 días	jue 4/12/25	jue 4/12/25
3	Mantenimiento de paredes internas del tanque floculador con medidas de (1m ancho x 4.20m largo) y filos internos de 6 cámaras fabricadas en fibra de vidrio, incluye sellado interno total de 57 metros lineales con materiales especializados.	22,25 días	jue 4/12/25	lun 29/12/25
4	Suministro e instalación de una puerta reja de protección, fabricada en tubo galvanizado calibre 1 ½ marco en ángulo metálico y malla eslabonada calibre 12. Medidas: Alto: 2,02 m x Ancho: 2,90 m	15 días	jue 4/12/25	lun 22/12/25
5	Cambio e instalación de puerta metálica de protección, calibre 18, marco metálico, con sistema de seguridad y pintura anticorrosiva y herrajes. Medidas: Alto: 2,23 x Ancho: 1,09 metros.	15 días	jue 4/12/25	lun 22/12/25
6	Caja de inspección en mampostería de 80x80x80 cm, útiles, con su respectiva tapa en lámina alfajor calibre 11, con marco metálico y ganchos de sujeción para seguridad y mantenimiento de redes hidráulicas.	15 días	jue 4/12/25	lun 22/12/25
7	Suministro e instalación de membrana PVC, lámina de policloruro de vinilo flexible (PVC-P) reforzada con malla de fibra de poliéster en área interna del tanque de contacto N°2 y tanque Nº 3 y 4 para abastecimiento de agua potable.	22,25 días	jue 4/12/25	lun 29/12/25
8	Suministro y aplicación de Pintura acrílica de alta calidad para áreas exteriores con resistencia a la humedad, al moho y al sol, en estructuras de concreto; bocatoma, tanque desarenador y tanques de contacto 1, 2, 3 y 4 de almacenamiento de agua potable.	8 días	lun 22/12/25	mar 30/12/25
9	Lavado, limpieza y desinfección de 3 tanques cónicos de con capacidad de 500 litros para almacenamiento de agua potable, fabricados en polietileno (pvc), ubicados en Unidad avícola (1) y unidad de porcinos (2) del sector Agroindustrial. Se debe incluir pr	3 días	lun 22/12/25	jue 25/12/25
10	Lavado, limpieza y desinfección de 12 tanques cónicos con capacidad de 1000 litros para almacenamiento de agua potable fabricados en polietileno, color azul. Localizados en área administrativa (4), área comercial (4), área agroindustrial-cafetería (1), ba	12 días	jue 4/12/25	jue 18/12/25
11	Lavado, limpieza y desinfección de 2 tanques cónicos con capacidad de 2000 litros para almacenamiento de agua potable, fabricados en polietileno, color negro. Localizados en Unidad de caprinos (2). Se debe incluir prueba de cloro y pH posterior a la activ	2 días	jue 18/12/25	sáb 20/12/25
12	Lavado, limpieza y desinfección de 2 tanques cónicos de capacidad de 1000 litros, para almacenamiento de agua potable, fabricados en polietileno, color negro. Localizados en la sede del municipio de la Unión (N). Se debe incluir prueba de cloro y pH poste	2 días	lun 22/12/25	mar 23/12/25
13	Lavado, limpieza y desinfección de todos los componentes del tanque principal de abastecimiento de agua potable, con capacidad de 604 m3. Se encuentra semienterrado y construido en concreto, dividido en 2 compartimientos iguales. Incluye escaleras, válvul	1 día	mié 24/12/25	jue 25/12/25
14	Lavado, limpieza y desinfección del tanque de almacenamiento de agua potable con capacidad de 4.2m3, construido en concreto y enterrado. Se ubica en el complejo agroindustrial contiguo al comercializador sector agroindustrial. Se debe incluir prueba de cl	1 día	jue 25/12/25	vie 26/12/25
15	Lavado, limpieza y desinfección del tanque de bombeo, con capacidad de 78 m3 construido en concreto y semienterrado. Ubicado en la vía entre el sector administrativo y el agroindustrial (sendero). Se debe realizar prueba de cloro y pH al finalizar.	1 día	vie 26/12/25	sáb 27/12/25
16	Suministro e instalación de (1) tapa de inspección (con doble ingreso), en lámina de alfajor de calibre 11 doble tapa con marco y gancho para sujetar, ubicada en área administrativo. Dimensiones: doble Tapa 1y2: 87cm x 87 cm	15 días	jue 4/12/25	lun 22/12/25
17	Suministro e instalación de una (1) tapa de inspección en lámina de alfajor de calibre 11, marco y con gancho para sujetar, ubicada frente del área de atención al ciudadano. (vía) Dimensiones: 86 cm x 65 cm	15 días	jue 4/12/25	lun 22/12/25
18	Suministro e instalación de una (1) tapa de inspección en lámina de alfajor de calibre 11, marco y con gancho para sujetar, ubicada en esquina de gastronomía, área comercial. Dimensiones: 1.14 m x 0.91 m.	15 días	jue 4/12/25	lun 22/12/25
19	Suministro e instalación de una 1 tapa de inspección en lámina de alfajor de calibre 11, marco y con gancho para sujetar, ubicada al respaldo de gastronomía y lindero área comercial. Dimensiones: 1.73 m x 0.98 m.	15 días	jue 4/12/25	lun 22/12/25
20	Suministro e instalación de llaves de paso tipo compuerta en acero inoxidable de 1" para acometidas hidráulicas de agua potable. Incluye: todos los accesorios para conexión a la red, unión universal a cada lado de la instalación y mantenimiento de zona.	15 días	jue 4/12/25	lun 22/12/25
21	Suministro e instalación de tapa en concreto de 40 × 40 cm, con refuerzo estructural y gancho metálico para sujeción. Diseñada para cubrir cajas de inspección o válvulas en zonas técnicas del Centro Lope.	22,25 días	jue 4/12/25	lun 29/12/25
22	Suministro e Instalación de filtro en hierro dúctil en YEE, tipo AQT BR3 CON válvula purga para 3" pulgadas. Incluye accesorios para su completa instalación. Ubicaciones: - Cajilla de inspección en puente administrativo. - Área finca Lope (posible punto:	1 día	lun 15/12/25	mar 16/12/25
23	FINAL PROYECTO	0 días	dom 28/12/25	dom 28/12/25

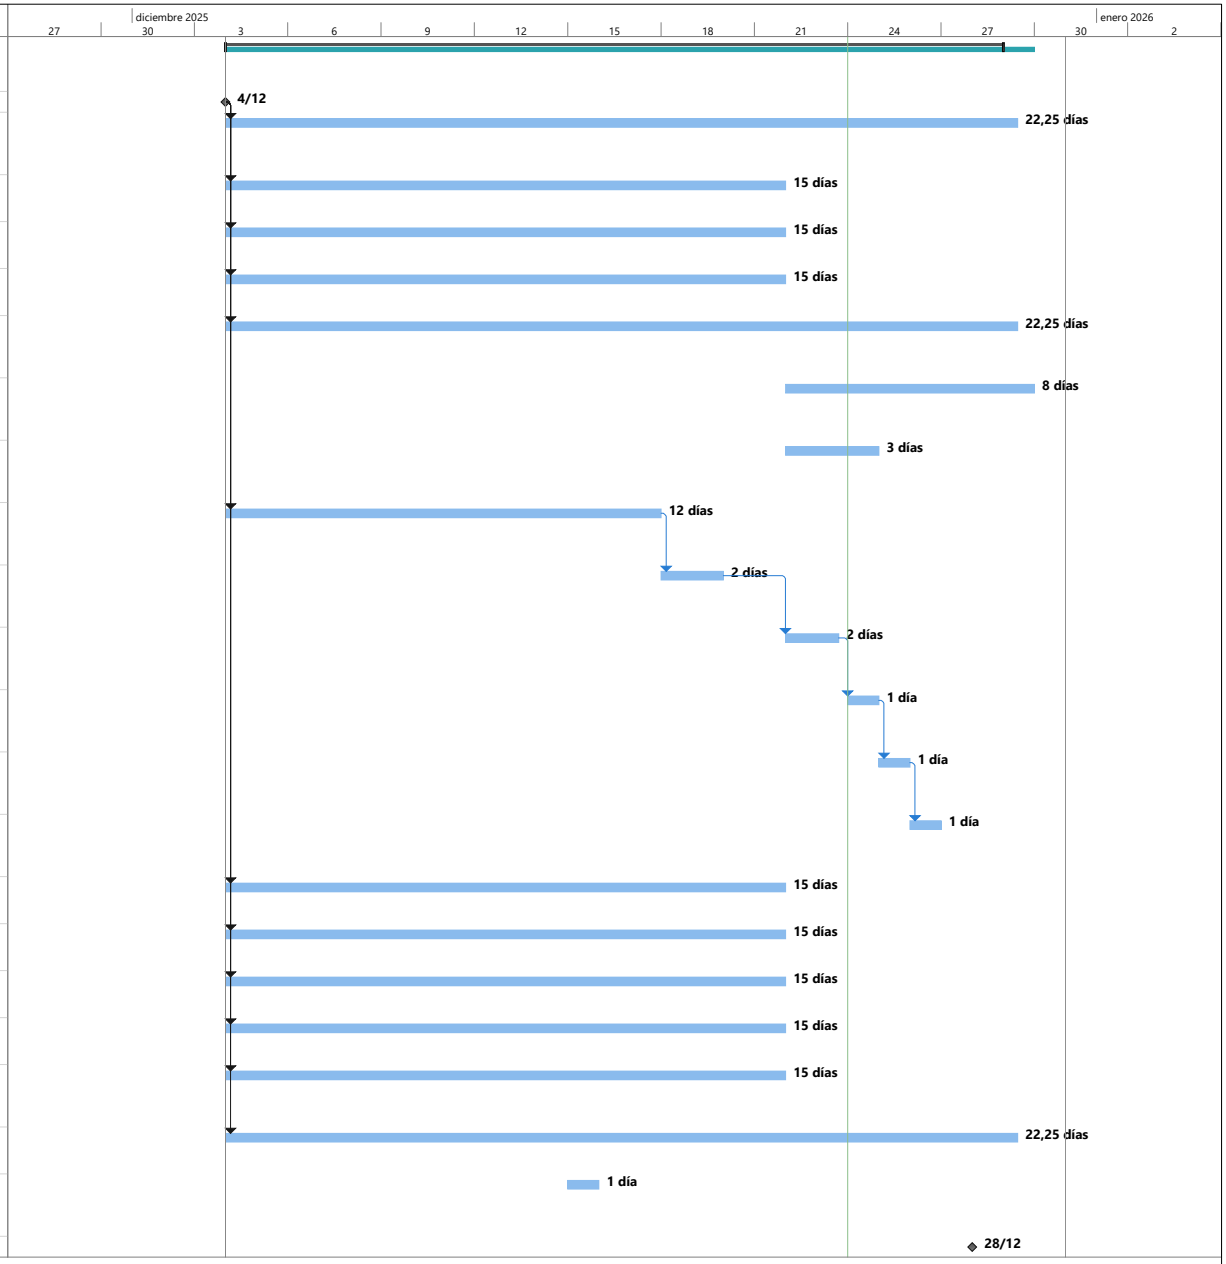

Proyecto: Diagrama GANTT
Fecha: 05/12/25

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso
