CONSORCIO ALUMBRADO 2025

INFORME DE OBRA“MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL SECTOR URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR”. CONTRATO DE OBRA N°. 01-197-2025.



INFORME ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA
SANTA ROSA DEL SUR.
JUNIO DEL 2026.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4

2.1. LOCALIZACIÓN 4
2.2. UBICACIÓN 4
2.3. SECTOR RURAL. 5
2.4. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 6

3. CONTRATO DE OBRA. 7

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 7
3.2. PÓLIZAS DE SEGURIDAD Y RELACION DEL PERSONAL CONTRATISTA 8
3.3. SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL EN LA OBRA. 9
3.4. RELACION DEL PERSONAL POR EL CONTRATISTA. 11
3.5. OBRAS PROGRAMADAS Y CONTRATADAS DEL PROYECTO INICIAL. 11
3.5.1. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS-ACTA DE FINAL DE OBRA 15
3.6. PROGRAMACIÓN DE OBRA. 41
3.7. RELACIÓN DE ACTAS DE OBRA 42
3.8. AVANCE FINAL FINANCIERO DE OBRA 42

1. INTRODUCCIÓN

El Municipio de Santa Rosa del sur con la visión de proveer los servicios básicos a toda la comunidad perteneciente al sector Urbano y Rural ha puesto en marcha el proyecto que beneficiará a las comunidades de diferentes barrios del municipio con alumbrado público con el fin de contribuir a la iluminación y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

Actualmente en el municipio tanto lo Urbano como lo Rural no se cuenta con cobertura total de este servicio público de alumbrado, es por esto que, para la materialización del proyecto de **MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL SECTOR URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR**. Celebrado entre el Alcalde Municipal y CONSORCIO ALUMBRADO 2025. Para la el mantenimiento del municipio y de los diferentes Corregimiento en el Sector Rural.

A la fecha se encuentra ejecutando el proyecto en un 100% siendo instaladas las lámparas en Sector Rural y el sector Urbano.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

SECTOR URBANO.

El presente contrato de obra tiene como lugar de ejecución el Municipio de Santa Rosa del Sur en los siguientes barrios Barrio Miraflores, El Carmen, La Ferias, El Bosque, El Prado, Las Villas, vía al aeropuerto, Betania, El Centro, Idema, Los Comuneros, San Martin, Los Pinos, Asomind, Ciudadela de Paz, Ciudad Bolívar, San Isidro, La Floresta, Las Acacias, La cabaña, Las Mercedes, El Recreo, 20 julio, Villa del sur, Villa olímpica, Villa esperanza, Villa maría, Villa paula, Adesan,villas del Rosario, barrio juan bautista.

2.2. UBICACIÓN





2.3. SECTOR RURAL.

El presente contrato de obra tiene como lugar de ejecución el Municipio de Santa Rosa del Sur en los Corregimientos de Canelos, San Lucas, San Isidro, Buenavista, san jose, Fatima, arrayanes ,San francsico Y San Benito..







2.4. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

El proyecto de **MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL SECTOR URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR**. Tiene como objetivo mejorar las condiciones actuales del servicio de alumbrado público en el municipio y zona Rural, donde en algunos sectores presenta mucha oscuridad en las noches.

3. CONTRATO DE OBRA.

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBR

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
NIT	800.049.017-9
CONTRATISTA	CONSORCIO ALUMBRADO 2025
C.C O NIT	9 0 1 9 8 6 4 2 2 - 4
REPRESENTANTE LEGAL	RODOLFO SIERRA GARCIA
C.C NO.	13.718.896 de Bucaramanga.
INTERVENTOR	JMRC ENGIEENERING S.A.S.
CC. O NIT.	NIT: 901.552.368-1
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS HUMBERTO RÙA BELTRAN
C.C NO.	C.C. 91.321.166 de Puerto Wilches.
OBJETO	"MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL SECTOR URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR".
VALOR INICIAL	QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO QUINCE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($ 546.916.115,86).
VALOR TOTAL	QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO QUINCE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($ 546.916.115,86).
PLAZO	DOS (02) MESES.
FECHA ACTA INICIO	12 NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	11 ENERO DE 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Inicial- número 25-0000364 del 13 de mayo de 2025.
RUBRO PRESUPUESTAL	RP Inicial: N°.25-000780
ACTA DE AVANCE N°1	2 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE SUSPENSIÓN N°001	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE SUSPENSIÓN N°001	TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS
ACTA DE REINICIO N°001	31 DE ENERO DEL 2026
NUEVA DE FECHA DE TERMINACION	11 FEBRERO DE 2026
ACTA DE SUSPENSION N° 002	10 DE FEBRERO DEL 2026
PLAZO DE SUSPENSION N°002	TRAINTA (30) DIAS CALENDARIO

ACTA DE AMPLIACION 001 A LA SUSPENSIÓN N°002	12 DE MARZO DE 2026
PLAZO DE AMPLIACION 001 A LA SUSPENSIÓN N°002	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
ACTA DE AMPLIACION 002 A LA SUSPENSIÓN N°002	26 DE MARZO DE 2026
PLAZO DE AMPLACION 002 A LA SUSPENSIÓN N°002	TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS.
ACTA DE REINICIO N°002	13 DE ABRIL DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACION	14 DE ABRIL DE 2026
ACTA MODIFICATORIA N°001	14 DE ABRIL DE 2026
PRORROGA	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
NUEVA DE FECHA DE TERMINACION.	29 DE ABRIL DE 2026
ADICION	SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 51/100 M/CTE ($ 71.958.873,51)
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 37/100 M/CTE ($ 618.874.989,37)
ACTA DE MAYORES Y MENORES N°002	23 DE ABRIL DE 2026
ACTA DE RECIBO DE OBRA.	3 DE JUNIO DE 2026
REGRSITO PRESUPUESTAL	25-000780 del 15 de Octubre de 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA- UBERNEL MARIN MARIN
REGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DE IVA

3.2. PÓLIZAS DE SEGURIDAD Y RELACION DEL PERSONAL CONTRATISTA

Las Pólizas iniciales de Garantía del contrato de obra a la fecha del presente Informe se encuentran actualizadas.

POLIZAS					
COBERTURA	ASEGURADORA	N° POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	CESCE	173528-4120006598	12/11/2025	12/07/2026	109,383,223.17
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	CESCE	173528-4120006598	29/09/2025	29/11/2028	54,691,611.58
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	CESCE	173528-4120006598	29/11/2025	29/11/2027	109,383,223.17
Calidad del bien o servicio	CESCE	173528-4120006598	29/09/2025	29/05/2026	54,691,611.58
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	CESCE	173528-4120006598	12/11/2025	29/09/2025	54,691,611.58

Las Pólizas Finales de Garantía del contrato de obra a la fecha del presente Informe se encuentran actualizadas.

POLIZAS					
COBERTURA	ASEGURADORA	N° POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	CESCE	173528-4120006598	12/11/2025	29/10/2026	123.774.997,87
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	CESCE	173528-4120006598	12/11/2025	29/04/2029	61.887.498,93
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	CESCE	173528-4120006598	05/06/2026	05/06/2028	123.774.997,93
Calidad del bien o servicio	CESCE	173528-4120006598	12/11/2025	29/10/2026	61.887.498,93
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	CESCE	173528-4120006598	12/11/2025	29/10/2026	61.887.498,93

3.3. SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL EN LA OBRA.

Fecha de pago:	2025-03-02
Periodo cotizado:	DICIEMBRE
Planilla No:	36455135
IBC:	1,423,500
Valor Total pago:	$3,122,300

Fecha de pago:	2026-06-10
Periodo cotizado:	DICIEMBRE
Planilla No:	37688116
IBC:	1.692.54 2
Valor Total pago:	$577.800

Fecha de pago:	2025/12/26
Periodo cotizado:	DICIEMBRE
Planilla No:	9496876331
IBC:	$1,682,604
Valor Total pago:	$488,500

CONSORCIO ALUMBRADO 2025

Fecha de pago:	2026-06-10
Periodo cotizado:	ENERO
Planilla No:	37687642
IBC:	58.364
Valor Total pago:	99.700

Fecha de pago:	2026/02/06
Periodo cotizado:	ENERO
Planilla No:	9499334142
IBC:	$2,228,748
Valor Total pago:	$646,900

Fecha de pago:	2026-06-10
Periodo cotizado:	FEBRERO
Planilla No:	37687692
IBC:	$583.635
Valor Total pago:	$ 964.400

Fecha de pago:	2026/03/03
Periodo cotizado:	FEBRERO
Planilla No:	9500841968
IBC:	$2,228,748
Valor Total pago:	$646,900

Fecha de pago:	2026-06-10
Periodo cotizado:	ABRIL
Planilla No:	37687877
IBC:	$ 992.180
Valor Total pago:	$ 1.573.400

Fecha de pago:	2026-06-10
Periodo cotizado:	ABRIL
Planilla No:	37687877
IBC:	$ 992.180
Valor Total pago:	$ 1.573.400

Fecha de pago:	2026/05/25
Periodo cotizado:	ABRIL
Planilla No:	9504219185
IBC:	$2,228,748
Valor Total pago:	$646,900

3.4. RELACION DEL PERSONAL POR EL CONTRATISTA.

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO
ANAYA ALMEIDA ANGEL ANTONIO	CC 13716850	DIRECTOR DE OBRA
JESUS ERNESTO QUIÑONEZ RUIZ	CC 79757137	RESIDENTE DE OBRA
WILSON FABIAN HURTADO	CC 1049027537	OBRERO 2
FLOREZ AVILA EDINSON FERNEY	CC 1049028664	TECNICO AUXILIAR
RODOLFO SIERRA GARCIA	CC 13.718.896	REPRESENTANTE LEGAL
JEFFERSON ALEXIS MONTAÑEZ LOPEZ	CC 1.010.078.194	SISO

3.5. RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA.

En el periodo comprendido del mes de JUNIO del 2025 se utilizó la herramienta y equipo expuesto a continuación.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Herramienta menor	Und	1
2	Escalera 14 metros	Und	1
3	Soldador eléctrico	Und	1
4	Taladro eléctrico	Und	1
5	Pulidora	Und	1
6	Motosierra a gasolina	Und	1
7	Pertiga	Und	1
8	Zunchadora manual	Und	1

3.5. OBRAS PROGRAMADAS Y CONTRATADAS DEL PROYECTO INICIAL.

El valor de las actividades que conforman el contrato INICIALMENTE asciende a la suma **QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO QUINCE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($ 546.916.115,86).** Como lo muestran en el cuadro siguiente:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	**ALUMBRADO PÚBLICO - SECTOR URBANO**				
1.1	Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 60W - 9000lm Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	35,00	$ 1.160.348,33	40.612.191,55
1.2	Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico,brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	150,00	$ 969.748,33	145.462.249,50
1.3	Suministro e instalación Fotocontrol electronico, para cambio a luminarias.	UND	90,00	$ 66.739,38	6.006.544,20
1.4	Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	185,00	$ 58.888,33	10.894.341,05
2	**ALUMBRADO PÚBLICO - SECTOR RURAL**				
2.1	**SAN LUCAS** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20,00	$ 996.843,75	19.936.875,00
2.2	**SAN LUCAS** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20,00	$ 71.414,46	1.428.289,20
2.3	**CANELOS** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	30,00	$ 1.000.227,08	30.006.812,40
2.4	**CANELOS** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	30,00	$ 69.587,50	2.087.625,00
2.5	**SAN ISIDRO** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20,00	$ 988.510,42	19.770.208,40
2.6	**SAN ISIDRO** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20,00	$ 68.610,29	1.372.205,80
2.7	**BUENAVISTA** - Suministro, transporte e instalacion Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20,00	$ 1.010.643,75	20.212.875,00
2.8	**BUENAVISTA** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20,00	$ 76.405,00	1.528.100,00
2.9	**SAN JOSE** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	15,00	$ 991.865,97	14.877.989,55
2.10	**SAN JOSE** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	15,00	$ 75.160,12	1.127.401,80
2.11	**VILLAFLOR** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20,00	$ 992.677,08	19.853.541,60
2.12	**VILLAFOR** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20,00	$ 72.238,33	1.444.766,60
2.13	**FÁTIMA** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20,00	$ 992.677,08	19.853.541,60
2.14	**FÁTIMA** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20,00	$ 72.238,33	1.444.766,60
2.15	**LOS ARRAYANES** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	15,00	$ 1.015.108,04	15.226.620,60
2.16	**LOS ARRAYANES** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	15,00	$ 86.482,92	1.297.243,80
2.17	**SAN FRANCISCO** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	15,00	$ 988.510,42	14.827.656,30
2.18	**SAN FRANCISCO** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	15,00	$ 70.635,77	1.059.536,55
2.19	**SAN BENITO** - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20,00	$ 985.732,64	19.714.652,80
2.20	**SAN BENITO** - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20,00	$ 58.454,49	1.169.089,80
	SUBTOTAL ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL				**411.215.124,70**

A	COSTO DIRECTO			**411.215.124,70**
B	**Administración**	27,00%		111.028.083,67
C	**Imprevistos**	1,00%		4.112.151,25
D	**Utilidad**	5,00%		20.560.756,24
				135.700.991,16
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO [A + B + C + D]			**546.916.115,86**

3.6. OBRAS PROGRAMADAS Y CONTRATADAS DEL OTRO SI N°001.

El valor de las actividades que conforman el **OTRO SI N°001** asciende a la suma **SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 51/100 M/CTE ($ 71.958.873,51)** Como lo muestran en el cuadro siguiente:

CONDICIONES ORIGINALES						OTRO SI N°1	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
ALUMBRADO PÚBLICO - SECTOR URBANO							
1.1	Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 60W - 9000lm Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	35,00	$ 1.160.348,33	$ 40.612.191,55		
1.2	Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico,brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	150,00	$ 969.748,33	$ 145.462.249,50	24,00	$ 23.273.959,92
1.3	Suministro e instalación Fotocontrol electronico, para cambio a luminarias.	UND	90,00	$ 66.739,38	$ 6.006.544,20	10,00	$ 667.393,80
1.4	Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	185,00	$ 58.888,33	$ 10.894.341,05		
	VALOR TOTAL						$ 23.941.353,72
2	ALUMBRADO PÚBLICO - SECTOR RURAL						
2.1	SAN LUCAS - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20,00	$ 996.843,75	$ 19.936.875,00		
2.2	SAN LUCAS - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20,00	$ 71.414,46	$ 1.428.289,20		
2.3	CANELOS - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	30,00	$ 1.000.227,08	$ 30.006.812,40	15,00	$ 15.003.406,20
2.4	CANELOS - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	30,00	$ 69.587,50	$ 2.087.625,00		
2.5	SAN ISIDRO - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20,00	$ 988.510,42	$ 19.770.208,40		
2.6	SAN ISIDRO - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20,00	$ 68.610,29	$ 1.372.205,80		
2.7	BUENAVISTA - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20,00	$ 1.010.643,75	$ 20.212.875,00	15,00	$ 15.159.656,25
2.8	BUENAVISTA - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20,00	$ 76.405,00	$ 1.528.100,00		
2.9	SAN JOSE - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	15,00	$ 991.865,97	$ 14.877.989,55		
2.10	SAN JOSE - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	15,00	$ 75.160,12	$ 1.127.401,80		
2.11	VILLAFLOR - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20,00	$ 992.677,08	$ 19.853.541,60		
2.12	VILLAFOR - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20,00	$ 72.238,33	$ 1.444.766,60		
2.13	FÁTIMA - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20,00	$ 992.677,08	$ 19.853.541,60		
2.14	FÁTIMA - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20,00	$ 72.238,33	$ 1.444.766,60		
2.15	LOS ARRAYANES - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	15,00	$ 1.015.108,04	$ 15.226.620,60		
2.16	LOS ARRAYANES - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	15,00	$ 86.482,92	$ 1.297.243,80		
2.17	SAN FRANCISCO - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	15,00	$ 988.510,42	$ 14.827.656,30		
2.18	SAN FRANCISCO - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	15,00	$ 70.635,77	$ 1.059.536,55		
2.19	SAN BENITO - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20,00	$ 985.732,64	$ 19.714.652,80		
2.20	SAN BENITO - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20,00	$ 58.454,49	$ 1.169.089,80		
	VALOR TOTAL						$ 30.163.062,45
A	COSTO DIRECTO				$ 411.215.124,70		$ 54.104.416,17
B	ADMINISTRACIÓN	27%			$ 111.028.083,67		$ 14.608.192,37
C	IMPREVISTOS	1%			$ 4.112.151,25		$ 541.044,16
D	UTILIDAD	5%			$ 20.560.756,24		$ 2.705.220,81
VALOR TOTAL DEL CONTRATO [A + B + C + D]					$ 546.916.115,86		$ 71.958.873,51

3.7. NUEVO VALOR DEL CONTRATO DE OBRA Y ACTIVIDADES DE LAS CONDICIONES INICIALES MAS EL OTRO SI N°001.

El Valor Nuevo del Contrato de Oba a la suma **SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 37/100 M/CTE ($ 618.874.989,37)** Como lo muestran en el cuadro siguiente:

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA PARCIAL AVANCE 1		OTRO SI N°1		BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES N°1					ACTA DE LIQUIDACION		TOTAL CANTIDAD EJECUTADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+-)	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD TOTAL	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	ALUMBRADO PUBLICO - SECTOR URBANO																	
1.1	Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 60W - 8000lm Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	35,00	$ 1.160.348,33	$ 40.612.191,55	35,00	$ 40.612.191,55			+	-	$ 1.160.348,33	35,00	$ 40.612.191,55	-	-	35,00	$ 40.612.191,55
1.2	Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico,brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	150,00	$ 969.748,33	$ 145.462.249,50	150,00	$ 145.462.249,50	24,00	$ 23.273.959,92	+	-	$ 969.748,33	174,00	$ 168.736.209,42	24,00	$ 23.273.959,92	174,00	$ 168.736.209,42
1.3	Suministro e instalación Fotocontrol electronico, para cambio a luminarias.	UND	90,00	$ 66.738,38	$ 6.006.544,20	90,00	$ 6.006.544,20	10,00	$ 667.393,80	+	-	$ 66.738,38	100,00	$ 6.673.938,00	10,00	$ 667.393,80	100,00	$ 6.673.938,00
1.4	Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento	UND	185,00	$ 58.688,23	$ 10.894.341,05	185,00	$ 10.894.341,05			+	-	$ 58.888,33	185,00	$ 10.894.341,05	-	-	185,00	$ 10.894.341,05
	VALOR TOTAL						$ 202.975.326,30		$ 23.941.353,72					$ 226.916.680,02		$ 23.941.353,72		$ 226.916.680,02
2	ALUMBRADO PUBLICO - SECTOR RURAL																	
2.1	SAN LUCAS - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20,00	$ 998.843,75	$ 19.936.875,00	10,00	$ 9.968.437,50			+	-	$ 998.843,75	20,00	$ 19.936.875,00	10,00	$ 9.968.437,50	20,00	$ 19.936.875,00
2.2	SAN LUCAS - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20,00	$ 71.414,46	$ 1.428.289,20					+	-	$ 71.414,46	20,00	$ 1.428.289,20	20,00	$ 1.428.289,20	20,00	$ 1.428.289,20
2.3	CANELOS - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	30,00	$ 1.000.227,06	$ 30.006.812,40			15,00	$ 15.003.409,20	+	-	$ 1.000.227,06	45,00	$ 45.010.218,60	45,00	$ 45.010.218,60	45,00	$ 45.010.218,60
2.4	CANELOS - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	30,00	$ 69.587,50	$ 2.087.625,00					+	-	$ 69.587,50	30,00	$ 2.087.625,00	30,00	$ 2.087.625,00	30,00	$ 2.087.625,00
2.5	SAN ISIDRO - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20,00	$ 988.510,42	$ 19.770.208,40					+	-	$ 988.510,42	20,00	$ 19.770.208,40	20,00	$ 19.770.208,40	20,00	$ 19.770.208,40
2.6	SAN ISIDRO - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20,00	$ 68.610,29	$ 1.372.205,80					+	-	$ 68.610,29	20,00	$ 1.372.205,80	20,00	$ 1.372.205,80	20,00	$ 1.372.205,80
2.7	BUENAVISTA - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20,00	$ 1.010.643,75	$ 20.212.875,00	15,00	$ 15.158.058,25			+	-	$ 1.010.643,75	35,00	$ 35.372.931,25	35,00	$ 35.372.931,25	35,00	$ 35.372.931,25
2.8	BUENAVISTA - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20,00	$ 76.405,00	$ 1.528.100,00					+	-	$ 76.405,00	20,00	$ 1.528.100,00	20,00	$ 1.528.100,00	20,00	$ 1.528.100,00
2.9	SAN JOSE - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	15,00	$ 991.865,97	$ 14.877.989,55					+	-	$ 991.865,97	15,00	$ 14.877.989,55	15,00	$ 14.877.989,55	15,00	$ 14.877.989,55
2.10	SAN JOSE - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	15,00	$ 75.160,12	$ 1.127.401,80					+	-	$ 75.160,12	15,00	$ 1.127.401,80	15,00	$ 1.127.401,80	15,00	$ 1.127.401,80
2.11	VILLAFLOR - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20,00	$ 992.677,08	$ 19.853.541,60					+	-	$ 992.677,08	20,00	$ 19.853.541,60	20,00	$ 19.853.541,60	20,00	$ 19.853.541,60
2.12	VILLAFOR - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20,00	$ 72.238,33	$ 1.444.766,60					+	-	$ 72.238,33	20,00	$ 1.444.766,60	20,00	$ 1.444.766,60	20,00	$ 1.444.766,60
2.13	FÁTIMA - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20,00	$ 992.677,08	$ 19.853.541,60					+	-	$ 992.677,08	20,00	$ 19.853.541,60	20,00	$ 19.853.541,60	20,00	$ 19.853.541,60
2.14	FÁTIMA - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20,00	$ 72.238,33	$ 1.444.766,60					+	-	$ 72.238,33	20,00	$ 1.444.766,60	20,00	$ 1.444.766,60	20,00	$ 1.444.766,60
2.15	LOS ARRAYANES - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	15,00	$ 1.015.188,04	$ 15.226.620,60					+	-	$ 1.015.188,04	15,00	$ 15.226.620,60	15,00	$ 15.226.620,60	15,00	$ 15.226.620,60
2.16	LOS ARRAYANES - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	15,00	$ 86.482,92	$ 1.297.243,80					+	-	$ 86.482,92	15,00	$ 1.297.243,80	15,00	$ 1.297.243,80	15,00	$ 1.297.243,80
2.17	SAN FRANCISCO - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	15,00	$ 988.510,42	$ 14.827.656,30					+	-	$ 988.510,42	15,00	$ 14.827.656,30	15,00	$ 14.827.656,30	15,00	$ 14.827.656,30
2.18	SAN FRANCISCO - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	15,00	$ 70.636,77	$ 1.059.536,55					+	-	$ 70.636,77	15,00	$ 1.059.536,55	15,00	$ 1.059.536,55	15,00	$ 1.059.536,55
2.19	SAN BENITO - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20,00	$ 985.732,84	$ 19.714.652,80					+	-	$ 985.732,84	20,00	$ 19.714.652,80	20,00	$ 19.714.652,80	20,00	$ 19.714.652,80
2.20	SAN BENITO - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20,00	$ 58.454,49	$ 1.169.089,80					+	-	$ 58.454,49	20,00	$ 1.169.089,80	20,00	$ 1.169.089,80	20,00	$ 1.169.089,80
	VALOR TOTAL						$ 9.968.437,50		$ 30.163.062,45					$ 238.402.860,85		$ 228.434.423,35		$ 238.402.860,85
A	COSTO DIRECTO				$ 411.215.124,76		$ 212.943.763,80		$ 54.494.416,47					$ 465.319.540,87		$ 252.375.777,07		$ 465.319.540,87
B	ADMINISTRACIÓN	27%			$ 111.028.083,67		$ 57.494.816,23		$ 14.608.182,37					$ 125.636.276,03		$ 68.141.459,81		$ 125.636.276,03
C	IMPREVISTOS	1%			$ 4.112.151,25		$ 2.129.437,64		$ 541.044,16					$ 4.653.195,41		$ 2.523.757,77		$ 4.653.195,41
D	UTILIDAD	5%			$ 20.560.756,24		$ 10.647.188,19		$ 2.705.220,81					$ 23.265.977,04		$ 12.618.788,65		$ 23.265.977,04
VALOR TOTAL DEL CONTRATO [A + B + C + D]					$ 546.916.115,86		$ 283.215.205,86		$ 71.958.873,51					$ 618.874.989,37		$ 335.659.783,49		$ 618.874.989,37

3.7.1. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS-ACTA DE AVANCE DE OBRA N°001.

El valor de las actividades que conforman el **Avance de Obra N°001** asciende a la suma **DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON 86/100 CENTAVOS ($ 283.215.205,86),** Como lo muestran en el cuadro siguiente:

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR DE BOLÍVAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01

CONTRATO DE OBRA:	**No. 01-197-2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	**MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.**

		CONDICIONES ORIGINALES				ACTA PARCIAL AVANCE 1	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	ALUMBRADO PÚBLICO - SECTOR URBANO						
1.1	Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 60W - 8000lm Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	35,00	$ 1.160.348,33	$ 40.612.191,55	$ 35,00	$ 40.612.191,55
1.2	Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm- Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico,brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	150,00	$ 969.748,33	$ 145.462.249,50	$ 150,00	$ 145.462.249,50
1.3	Suministro e instalación Fotocontrol electronico, para cambio a luminarias	UND	90,00	$ 66.738,38	$ 6.006.544,20	$ 90,00	$ 6.006.544,20
1.4	Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento	UND	185,00	$ 58.888,33	$ 10.894.341,05	$ 185,00	$ 10.894.341,05
	VALOR TOTAL						$ 202.975.326,30
2	ALUMBRADO PÚBLICO - SECTOR RURAL						
2.1	SAN LUCAS - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20,00	$ 996.843,75	$ 19.936.875,00	$ 10,00	$ 9.968.437,50
2.2	SAN LUCAS - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20,00	$ 71.414,46	$ 1.428.289,20		
2.3	CANELOS - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	30,00	$ 1.000.227,08	$ 30.006.812,40		
2.4	CANELOS - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	30,00	$ 69.587,50	$ 2.087.625,00		
2.5	SAN ISIDRO - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20,00	$ 988.510,42	$ 19.770.208,40		
2.6	SAN ISIDRO - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20,00	$ 68.610,29	$ 1.372.205,80		
2.7	BUENAVISTA - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol	UND	20,00	$ 1.010.643,75	$ 20.212.875,00		
2.8	BUENAVISTA - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20,00	$ 76.405,00	$ 1.528.100,00		
2.9	SAN JOSE - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	15,00	$ 991.865,97	$ 14.877.989,55		
2.10	SAN JOSE - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	15,00	$ 75.160,12	$ 1.127.401,80		
2.11	VILLAFLOR - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20,00	$ 992.677,08	$ 19.853.541,60		
2.12	VILLAFOR - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20,00	$ 72.238,33	$ 1.444.766,60		
2.13	FÁTIMA - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20,00	$ 992.677,08	$ 19.853.541,60		
2.14	FÁTIMA - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20,00	$ 72.238,33	$ 1.444.766,60		
2.15	LOS ARRAYANES - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	15,00	$ 1.015.108,04	$ 15.226.620,60		
2.16	LOS ARRAYANES - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	15,00	$ 86.482,92	$ 1.297.243,80		
2.17	SAN FRANCISCO - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	15,00	$ 988.510,42	$ 14.827.656,30		
2.18	SAN FRANCISCO - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	15,00	$ 70.635,77	$ 1.059.536,55		
2.19	SAN BENITO - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20,00	$ 985.732,64	$ 19.714.652,80		
2.20	SAN BENITO - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20,00	$ 58.454,49	$ 1.169.089,80		
	VALOR TOTAL						$ 9.968.437,50
A	COSTO DIRECTO				$ 411.215.124,70		$ 212.943.763,80
B	ADMINISTRACIÓN	27%			$ 111.028.083,67		$ 57.494.816,23
C	IMPREVISTOS	1%			$ 4.112.151,25		$ 2.129.437,64
D	UTILIDAD	5%			$ 20.560.756,24		$ 10.647.188,19
VALOR TOTAL DEL CONTRATO [A + B + C + D]					$ 546.916.115,86		$ 283.215.205,86

3.7.2. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS-ACTA DE AVANCE DE N°1.

A continuación, se presentan las cantidades de obra ejecutadas acumuladas hasta la fecha del presente informe de supervisión

FORMULARIO 8. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

DESCRIPCION:	"MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR"		
CAPITULO:	**ALUMBRADO PUBLICO**		**UNIDAD**
ITEM: 1.1	Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 60W - 9000lm Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.		***UND***

1. EQUIPOS

No. ART.	DESCRIPCION	CANT	TAR/DIA	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
7	Equipo de Seguridad	1	DIA	4,00	$ 60.000,0	$ 15.000,00
	Escalera Aislada de 12 mts	1	DIA	4,00	$ 20.000,0	$ 5.000,00
	Herramienta menor					$ 1.700,00
					SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 21.700,00
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	**$ 21.700,00**

2. MATERIALES EN OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
77	Luminaria Led Alumbrado Público potencia 60W - 4000K, flujo luminoso 9000 lm, vida util 100.000 horas	UND	1,00	$ 790.000	$ 790.000,00
25	Alambre de Cobre # 14	ML	5,00	$ 5.200	$ 26.000,00
87	Brazo para luminaria horizontal metálico galvanizado 1-1/2"x1,5 m	UND	1,00	$ 84.000	$ 84.000,00
36	Cinta bandit 3/4"	ML	4,00	$ 7.000	$ 28.000,00
37	Hebilla de 3/4"	UND	4,00	$ 2.300	$ 9.200,00
86	Conector de perforacion calibres 2-8 AWG.	UND	2,00	$ 11.800	$ 23.600,00
18	Fotocontrol electrónico.	UND	1,00	$ 34.300	$ 34.300,00
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	**$ 995.100,00**

3. MANO DE OBRA

No.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%.	P.UNIT	VR. PARCIAL
	H.C. Tecnico electricista - Prestaciones	1,00	1	0,50		$ 46.258	$ 92.515,00
	Hora ayudante - Prestaciones	1,00	1	0,50		$ 15.100	$ 30.200,00
	SUBTOTAL MANO DE OBRA						$ 122.715,000
						VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	**$ 122.715,00**

4. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO	PRECIO	VR. PARCIAL
49	CAMIONETA PICK-UP EQUIPADA (TRANSPORTE DE ARNES, TECNICOS Y SUMINISTROS)	1	UNID.	12	$ 250.000	$ 20.833
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$ 20.833,33
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTE	**$ 20.833,33**
	TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 1.160.348,33**



FORMULARIO 8. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

DESCRIPCION:	"MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR"

CAPITULO:		**ALUMBRADO PUBLICO**	**UNIDAD**
ITEM:	**1.2**	Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico,brazo metálico y accesorios de instalación.	***UND***

1. EQUIPOS

No. ART.	DESCRIPCION	CANT	TAR/DIA	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
7	Equipo de Seguridad	1	DIA	4,00	$ 60.000,0	$ 15.000,00
	Escalera Aislada de 12 mts	1	DIA	4,00	$ 20.000,0	$ 5.000,00
	Herramienta menor					$ 1.700,00
					SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 21.700,00
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	**$ 21.700,00**

2. MATERIALES EN OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
76	Luminaria Led Alumbrado Público potencia 40W - 4000K, flujo luminoso 5400 lm, vida util 100.000 horas	UND	1,00	$ 615.000	$ 615.000,00
25	Alambre de Cobre # 14	ML	2,00	$ 5.200	$ 10.400,00
87	Brazo para luminaria horizontal metálico galvanizado 1-1/2"x1,5 m	UND	1,00	$ 84.000	$ 84.000,00
36	Cinta bandit 3/4"	ML	4,00	$ 7.000	$ 28.000,00
37	Hebilla de 3/4"	UND	4,00	$ 2.300	$ 9.200,00
86	Conector de perforacion calibres 2-8 AWG.	UND	2,00	$ 11.800	$ 23.600,00
18	Fotocontrol electrónico.	UND	1,00	$ 34.300	$ 34.300,00
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	**$ 804.500,00**

3. MANO DE OBRA

No.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%.	P.UNIT	VR. PARCIAL
	H.C. Tecnico electricista - Prestaciones	1,00	1	0,50		$ 46.258	$ 92.515,00
	Hora ayudante - Prestaciones	1,00	1	0,50		$ 15.100	$ 30.200,00
	SUBTOTAL MANO DE OBRA						$ 122.715,000
						VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	**$ 122.715,00**

4. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO	PRECIO	VR. PARCIAL
49	CAMIONETA PICK-UP EQUIPADA (TRANSPORTE DE ARNES, TECNICOS Y SUMINISTROS)	1	UNID.	12	$ 250.000	$ 20.833
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$ 20.833,33
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTE	**$ 20.833,33**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 969.748,33**



FORMULARIO 8. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

DESCRIPCION:	"MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR"

CAPITULO:		**ALUMBRADO PUBLICO**	**UNIDAD**
ITEM:	**1.3**	Suministro e instalación Fotocontrol electronico, para cambio a luminarias	***UND***

1. EQUIPOS

No. ART.	DESCRIPCION	CANT	TAR/DIA	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
7	Equipo de Seguridad	1	DIA	8,00	$ 60.000,0	$ 7.500,00
	Escalera Aislada de 12 mts	1	DIA	8,00	$ 20.000,0	$ 2.500,00
	Herramienta menor					$ 1.500,00
					SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 11.500,00
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	**$ 11.500,00**

2. MATERIALES EN OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
18	Fotocontrol electrónico.	UND	1,00	$ 33.000	$ 33.000,00
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	**$ 33.000,00**

3. MANO DE OBRA

No.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%	P.UNIT	VR. PARCIAL
	H.C. Tecnico electricista - Prestaciones	1,00	1	4,00		$ 46.258	$ 11.564,38
	Hora ayudante - Prestaciones	1,00	1	2,00		$ 15.100	$ 7.550,00
	SUBTOTAL MANO DE OBRA						$ 19.114,375
						VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	**$ 19.114,38**

4. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO	PRECIO	VR. PARCIAL
49	CAMIONETA PICK-UP EQUIPADA (TRANSPORTE DE ARNES, TECNICOS Y SUMINISTROS)	1	UNID.	80	$ 250.000	$ 3.125
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$ 3.125,00
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTE	**$ 3.125,00**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 66.739,38**

FORMULARIO 8. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

DESCRIPCION:	"MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR"

CAPITULO:		**ALUMBRADO PUBLICO**	**UNIDAD**
ITEM:	1.4	Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	***UND***

1. EQUIPOS

No. ART.	DESCRIPCION	CANT	TAR/DIA	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
7	Equipo de Seguridad	1	DIA	10,00	$ 70.000,0	$ 7.000,00
	Escalera Aislada de 12 mts	1	DIA	10,00	$ 20.000,0	$ 2.000,00
	Herramienta menor					$ 1.500,00
					SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 10.500,00
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	**$ 10.500,00**

2. MATERIALES EN OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	**$ 0,00**

3. MANO DE OBRA

No.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%.	P.UNIT	VR. PARCIAL
	H.C. Tecnico electricista - Prestaciones	1,00	1	1,50		$ 46.258	$ 30.838,33
	Hora ayudante - Prestaciones	1,00	1	2,00		$ 15.100	$ 7.550,00
	SUBTOTAL MANO DE OBRA						$ 38.388,333
						VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	**$ 38.388,33**

4. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO	PRECIO	VR. PARCIAL
	CAMIONETA PICK-UP EQUIPADA (TRANSPORTE DE ARNES,	1,00	1	25	$ 250.000	$ 10.000
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$ 10.000,00
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTE	**$ 10.000,00**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 58.888,33**

CONSORCIO ALUMBRADO 2025

FORMULARIO 8. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

DESCRIPCION:	"MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR"

CAPITULO:		**ALUMBRADO PUBLICO**	**UNIDAD**
ITEM:	**2.1**	SAN LUCAS - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	***UND***

1. EQUIPOS

No. ART.	DESCRIPCION	CANT	TAR/DIA	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
7	Equipo de Seguridad	1	DIA	4,00	$ 60.000,0	$ 15.000,00
	Escalera Aislada de 12 mts	1	DIA	2,50	$ 20.000,0	$ 5.000,00
	Herramienta menor					$ 1.500,00
					SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 21.500,00
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	**$ 21.500,00**

2. MATERIALES EN OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
76	Luminaria Led Alumbrado Público potencia 40W - 4000K, flujo luminoso 5400 lm, vida util 100.000 horas	UND	1,00	$ 615.000	$ 615.000,00
25	Alambre de Cobre # 14	ML	2,00	$ 5.200	$ 10.400,00
87	Brazo para luminaria horizontal metálico galvanizado 1-1/2"x1,5 m	UND	1,00	$ 84.000	$ 84.000,00
36	Cinta bandit 3/4"	ML	4,00	$ 7.000	$ 28.000,00
37	Hebilla de 3/4"	UND	4,00	$ 2.300	$ 9.200,00
86	Conector de perforacion calibres 2-8 AWG.	UND	2,00	$ 11.800	$ 23.600,00
18	Fotocontrol electrónico.	UND	1,00	$ 34.300	$ 34.300,00
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	**$ 804.500,00**

3. MANO DE OBRA

No.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%.	P.UNIT	VR. PARCIAL
	H.C. Tecnico electricista - Prestaciones	1,00	1	0,40		$ 46.258	$ 115.643,75
	Hora ayudante - Prestaciones	1,00	1	0,50		$ 15.100	$ 30.200,00
	SUBTOTAL MANO DE OBRA						$ 145.843,750
						VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	**$ 145.843,75**

4. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO	PRECIO	VR. PARCIAL
49	CAMIONETA PICK-UP EQUIPADA (TRANSPORTE DE ARNES, TECNICOS Y SUMINISTROS)	1	UNID.	10	$ 250.000	$ 25.000
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$ 25.000,00
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTE	**$ 25.000,00**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 996.843,75**

3.7.3. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS-ACTA DE LIQUIDACION.

El valor de las actividades que conforman el Avance Final de Obra asciende a la suma **ACTA LIQUIDACION: TRECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 49/100 M/CTE. ($ 335.659.783,49). VALOR IVA INCLUIDO.,** Como lo muestran en el cuadro siguiente:

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR DE BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA: No. 01-197-2025

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.

ACTA DE LIQUIDACION

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA PARCIAL AVANCE N°1		OTROSI N°1		BALANCE DE ADICIONES Y MENOS CANTIDADES N°1					ACTA DE LIQUIDACION		TOTAL CANTIDAD EJECUTADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	(+-)	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD TOTAL	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	ALUMBRADO PÚBLICO - SECTOR URBANO																	
1.1	Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 80W - 8000lm Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electrónico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	35,00	$ 1.160.348,33	$ 40.612.191,55	35,00	$ 40.612.191,55			+	-	$ 1.160.348,33	35,00	$ 40.612.191,55	-	-	35,00	$ 40.612.191,55
1.2	Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electrónico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	150,00	$ 968.748,39	$ 145.462.248,53	150,00	$ 145.462.248,53	24,00	$ 23.273.599,92	+	-	$ 968.748,39	174,00	$ 168.736.208,42	24,00	$ 25.275.958,92	174,00	$ 168.736.208,42
1.3	Suministro e instalación Fotocontrol electrónico, para cambio de luminaria.	UND	90,00	$ 66.726,38	$ 6.006.344,20	90,00	$ 6.006.344,20	10,00	$ 667.359,80	+	-	$ 66.726,38	100,00	$ 6.673.958,00	10,00	$ 667.359,80	100,00	$ 6.673.958,00
1.4	Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento	UND	165,00	$ 66.856,33	$ 10.894.341,05	165,00	$ 10.894.341,05			+	-	$ 66.856,33	165,00	$ 10.894.341,05	-	-	165,00	$ 10.894.341,05
	VALOR TOTAL						$ 202.975.326,30		$ 23.941.353,72					$ 226.916.680,02		$ 25.941.353,72		$ 226.916.680,02
2	ALUMBRADO PÚBLICO - SECTOR RURAL																	
2.1	SAN LUCAS - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electrónico, brazo metálico y accesorios de instalación	UND	20,00	$ 996.843,75	$ 19.936.875,00	10,00	$ 9.968.437,50			+	-	$ 996.843,75	20,00	$ 19.936.875,00	10,00	$ 9.968.437,50	20,00	$ 19.936.875,00
2.2	SAN LUCAS - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento	UND	20,00	$ 71.414,48	$ 1.428.289,20					+	-	$ 71.414,48	20,00	$ 1.428.289,20	20,00	$ 1.428.289,20	20,00	$ 1.428.289,20
2.3	CANELOS - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electrónico, brazo metálico y accesorios de instalación	UND	30,00	$ 1.000.227,08	$ 30.006.812,40			15,00	$ 15.003.406,20	+	-	$ 1.000.227,08	45,00	$ 45.010.218,60	45,00	$ 45.010.218,60	45,00	$ 45.010.218,60
2.4	CANELOS - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento	UND	30,00	$ 69.987,50	$ 2.099.625,00					+	-	$ 69.987,50	30,00	$ 2.099.625,00	30,00	$ 2.099.625,00	30,00	$ 2.099.625,00
2.5	SAN ISIDRO - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electrónico, brazo metálico y accesorios de instalación	UND	20,00	$ 938.510,42	$ 18.770.208,40					+	-	$ 938.510,42	20,00	$ 18.770.208,40	20,00	$ 18.770.208,40	20,00	$ 18.770.208,40
2.6	SAN ISIDRO - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento	UND	20,00	$ 68.610,28	$ 1.372.205,60					+	-	$ 68.610,28	20,00	$ 1.372.205,60	20,00	$ 1.372.205,60	20,00	$ 1.372.205,60
2.7	BUENAVISTA - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electrónico, brazo metálico y accesorios de instalación	UND	20,00	$ 1.010.543,75	$ 20.210.875,00			15,00	$ 15.158.068,25	+	-	$ 1.010.543,75	35,00	$ 35.372.931,25	35,00	$ 35.372.931,25	35,00	$ 35.372.931,25
2.8	BUENAVISTA - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento	UND	20,00	$ 76.405,65	$ 1.528.130,00					+	-	$ 76.405,65	20,00	$ 1.528.130,00	20,00	$ 1.528.130,00	20,00	$ 1.528.130,00
2.9	SAN JOSE - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electrónico, brazo metálico y accesorios de instalación	UND	15,00	$ 991.905,97	$ 14.877.889,55					+	-	$ 991.905,97	15,00	$ 14.877.889,55	15,00	$ 14.877.889,55	15,00	$ 14.877.889,55
2.10	SAN JOSE - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	15,00	$ 75.169,12	$ 1.127.431,80					+	-	$ 75.169,12	15,00	$ 1.127.431,80	15,00	$ 1.127.431,80	15,00	$ 1.127.431,80
2.11	VILLAFOR - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electrónico, brazo metálico y accesorios de instalación	UND	20,00	$ 992.677,38	$ 19.853.541,60					+	-	$ 992.677,38	20,00	$ 19.853.541,60	20,00	$ 19.853.541,60	20,00	$ 19.853.541,60
2.12	VILLAFOR - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento	UND	20,00	$ 72.238,33	$ 1.444.766,60					+	-	$ 72.238,33	20,00	$ 1.444.766,60	20,00	$ 1.444.766,60	20,00	$ 1.444.766,60
2.13	FATIMA - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electrónico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	20,00	$ 992.677,38	$ 19.853.541,60					+	-	$ 992.677,38	20,00	$ 19.853.541,60	20,00	$ 19.853.541,60	20,00	$ 19.853.541,60
2.14	FATIMA - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento	UND	20,00	$ 72.238,33	$ 1.444.766,60					+	-	$ 72.238,33	20,00	$ 1.444.766,60	20,00	$ 1.444.766,60	20,00	$ 1.444.766,60
2.15	LOS ARRAYANES - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electrónico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	15,00	$ 1.015.109,04	$ 15.226.620,60					+	-	$ 1.015.109,04	15,00	$ 15.226.620,60	15,00	$ 15.226.620,60	15,00	$ 15.226.620,60
2.16	LOS ARRAYANES - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	15,00	$ 86.482,92	$ 1.297.243,80					+	-	$ 86.482,92	15,00	$ 1.297.243,80	15,00	$ 1.297.243,80	15,00	$ 1.297.243,80
2.17	SAN FRANCISCO - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electrónico, brazo metálico y accesorios de instalación.	UND	15,00	$ 988.510,42	$ 14.827.656,30					+	-	$ 988.510,42	15,00	$ 14.827.656,30	15,00	$ 14.827.656,30	15,00	$ 14.827.656,30
2.18	SAN FRANCISCO - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento	UND	15,00	$ 70.035,77	$ 1.050.536,55					+	-	$ 70.035,77	15,00	$ 1.050.536,55	15,00	$ 1.050.536,55	15,00	$ 1.050.536,55
2.19	SAN BENITO - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electrónico, brazo metálico y accesorios de instalación	UND	20,00	$ 988.732,64	$ 19.714.652,80					+	-	$ 988.732,64	20,00	$ 19.714.652,80	20,00	$ 19.714.652,80	20,00	$ 19.714.652,80
2.20	SAN BENITO - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	UND	20,00	$ 58.454,49	$ 1.169.089,80					+	-	$ 58.454,49	20,00	$ 1.169.089,80	20,00	$ 1.169.089,80	20,00	$ 1.169.089,80
	VALOR TOTAL						$ 9.968.437,50		$ 30.169.053,45					$ 238.402.860,95		$ 239.434.423,95		$ 238.402.860,95
A	COSTO DIRECTO				$ 411.215.124,76		$ 212.943.763,80		$ 54.304.414,17					$ 485.319.540,97		$ 252.375.777,07		$ 485.319.540,97
B	ADMINISTRACIÓN	27%			$ 111.028.083,67		$ 57.494.816,23		$ 14.662.192,27					$ 125.636.276,03		$ 68.141.459,81		$ 125.636.276,03
C	IMPREVISTOS	1%			$ 4.112.151,25		$ 2.129.437,64		$ 543.044,35					$ 4.653.195,41		$ 7.923.757,77		$ 4.653.195,41
D	UTILIDAD	5%			$ 20.560.756,24		$ 10.647.188,19		$ 2.715.220,91					$ 23.275.977,04		$ 12.619.788,85		$ 23.275.977,04
VALOR TOTAL DEL CONTRATO [A + B+ C + D]					$ 546.916.116,66		$ 283.215.205,86		$ 71.556.873,51					$ 638.874.989,37		$ 335.659.783,49		$ 638.874.989,37

FORMULARIO 8. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

DESCRIPCION:	"MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR"

CAPITULO:	**ALUMBRADO PUBLICO**		**UNIDAD**
ITEM:	**2.2**	SAN LUCAS - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	***UND***

1. EQUIPOS

No. ART.	DESCRIPCION	CANT	TAR/DIA	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
7	Equipo de Seguridad	1	DIA	10,00	$ 70.000,0	$ 7.000,00
	Escalera Aislada de 12 mts	1	DIA	5,00	$ 20.000,0	$ 4.000,00
	Herramienta menor					$ 1.500,00
					SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 12.500,00
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	**$ 12.500,00**

2. MATERIALES EN OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	**$ 0,00**

3. MANO DE OBRA

No.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%	P.UNIT	VR. PARCIAL
	H.C. Tecnico electricista - Prestaciones	1,00	1	2,00		$ 46.258	$ 23.128,75
	Hora ayudante - Prestaciones	1,00	1	1,40		$ 15.100	$ 10.785,71
	SUBTOTAL MANO DE OBRA						$ 33.914,464
						VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	**$ 33.914,46**

4. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO	PRECIO	VR. PARCIAL
	CAMIONETA PICK-UP EQUIPADA (TRANSPORTE DE ARNES,	1,00	1	10	$ 250.000	$ 25.000
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$ 25.000,00
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTE	**$ 25.000,00**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 71.414,46**

CONSORCIO ALUMBRADO 2025

FORMULARIO 8. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

DESCRIPCION:	"MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR"		
CAPITULO:	**ALUMBRADO PUBLICO**		**UNIDAD**
ITEM: 2.3	CANELOS - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.		***UND***

1. EQUIPOS

No. ART.	DESCRIPCION	CANT	TAR/DIA	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
7	Equipo de Seguridad	1	DIA	4,00	$ 60.000,0	$ 15.000,00
	Escalera Aislada de 12 mts	1	DIA	2,50	$ 20.000,0	$ 5.000,00
	Herramienta menor					$ 1.500,00
					SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 21.500,00
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	**$ 21.500,00**

2. MATERIALES EN OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
76	Luminaria Led Alumbrado Público potencia 40W - 4000K, flujo luminoso 5400 lm, vida util 100.000 horas	UND	1,00	$ 615.000	$ 615.000,00
25	Alambre de Cobre # 14	ML	2,00	$ 5.200	$ 10.400,00
87	Brazo para luminaria horizontal metálico galvanizado 1-1/2"x1,5 m	UND	1,00	$ 84.000	$ 84.000,00
36	Cinta bandit 3/4"	ML	4,00	$ 7.000	$ 28.000,00
37	Hebilla de 3/4"	UND	4,00	$ 2.300	$ 9.200,00
86	Conector de perforacion calibres 2-8 AWG.	UND	2,00	$ 11.800	$ 23.600,00
18	Fotocontrol electrónico.	UND	1,00	$ 34.300	$ 34.300,00
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	**$ 804.500,00**

3. MANO DE OBRA

No.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%.	P.UNIT	VR. PARCIAL
	H.C. Tecnico electricista - Prestaciones	1,00	1	0,40		$ 46.258	$ 115.643,75
	Hora ayudante - Prestaciones	1,00	1	0,40		$ 15.100	$ 37.750,00
	SUBTOTAL MANO DE OBRA						$ 153.393,750
						VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	**$ 153.393,75**

4. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO	PRECIO	VR. PARCIAL
49	CAMIONETA PICK-UP EQUIPADA (TRANSPORTE DE ARNES, TECNICOS Y SUMINISTROS)	1	UNID.	12	$ 250.000	$ 20.833
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$ 20.833,33
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTE	**$ 20.833,33**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 1.000.227,08**

CONSORCIO ALUMBRADO 2025

FORMULARIO 8. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

DESCRIPCION:	"MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR"		
CAPITULO:	**ALUMBRADO PUBLICO**		**UNIDAD**
ITEM: 2.4	CANELOS - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.		***UND***

1. EQUIPOS

No. ART.	DESCRIPCION	CANT	TAR/DIA	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
7	Equipo de Seguridad	1	DIA	10,00	$ 70.000,0	$ 7.000,00
	Escalera Aislada de 12 mts	1	DIA	10,00	$ 20.000,0	$ 2.000,00
	Herramienta menor					$ 1.500,00
					SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 10.500,00
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	**$ 10.500,00**

2. MATERIALES EN OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	**$ 0,00**

3. MANO DE OBRA

No.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%.	P.UNIT	VR. PARCIAL
	H.C. Tecnico electricista - Prestaciones	1,00	1	1,80		$ 46.258	$ 25.698,61
	Hora ayudante - Prestaciones	1,00	1	1,80		$ 15.100	$ 8.388,89
	SUBTOTAL MANO DE OBRA						$ 34.087,500
						VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	**$ 34.087,50**

4. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO	PRECIO	VR. PARCIAL
	CAMIONETA PICK-UP EQUIPADA (TRANSPORTE DE ARNES,	1,00	1	10	$ 250.000	$ 25.000
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$ 25.000,00
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTE	**$ 25.000,00**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 69.587,50**

CONSORCIO ALUMBRADO 2025

FORMULARIO 8. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

DESCRIPCION:	"MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR"		
CAPITULO:	**ALUMBRADO PUBLICO**		**UNIDAD**
ITEM: 2.5	SAN ISIDRO - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.		***UND***

1. EQUIPOS

No. ART.	DESCRIPCION	CANT	TAR/DIA	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
7	Equipo de Seguridad	1	DIA	4,00	$ 60.000,0	$ 15.000,00
	Escalera Aislada de 12 mts	1	DIA	2,50	$ 20.000,0	$ 5.000,00
	Herramienta menor					$ 1.500,00
					SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 21.500,00
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	**$ 21.500,00**

2. MATERIALES EN OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
76	Luminaria Led Alumbrado Público potencia 40W - 4000K, flujo luminoso 5400 lm, vida util 100.000 horas	UND	1,00	$ 615.000	$ 615.000,00
25	Alambre de Cobre # 14	ML	2,00	$ 5.200	$ 10.400,00
87	Brazo para luminaria horizontal metálico galvanizado 1-1/2"x1,5 m	UND	1,00	$ 84.000	$ 84.000,00
36	Cinta bandit 3/4"	ML	4,00	$ 7.000	$ 28.000,00
37	Hebilla de 3/4"	UND	4,00	$ 2.300	$ 9.200,00
86	Conector de perforacion calibres 2-8 AWG.	UND	2,00	$ 11.800	$ 23.600,00
18	Fotocontrol electrónico.	UND	1,00	$ 34.300	$ 34.300,00
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	**$ 804.500,00**

3. MANO DE OBRA

No.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%.	P.UNIT	VR. PARCIAL
	H.C. Tecnico electricista - Prestaciones	1,00	1	0,40		$ 46.258	$ 115.643,75
	Hora ayudante - Prestaciones	1,00	1	0,50		$ 15.100	$ 30.200,00
	SUBTOTAL MANO DE OBRA						$ 145.843,750
						VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	**$ 145.843,75**

4. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO	PRECIO	VR. PARCIAL
49	CAMIONETA PICK-UP EQUIPADA (TRANSPORTE DE ARNES, TECNICOS Y SUMINISTROS)	1	UNID.	15	$ 250.000	$ 16.667
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$ 16.666,67
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTE	**$ 16.666,67**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 988.510,42**

CONSORCIO ALUMBRADO 2025

FORMULARIO 8. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

DESCRIPCION:	"MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR"

CAPITULO:		**ALUMBRADO PUBLICO**	**UNIDAD**
ITEM:	**2.6**	SAN ISIDRO - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	***UND***

1. EQUIPOS

No. ART.	DESCRIPCION	CANT	TAR/DIA	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
7	Equipo de Seguridad	1	DIA	10,00	$ 70.000,0	$ 7.000,00
	Escalera Aislada de 12 mts	1	DIA	10,00	$ 20.000,0	$ 2.000,00
	Herramienta menor					$ 1.500,00
					SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 10.500,00
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	**$ 10.500,00**

2. MATERIALES EN OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	**$ 0,00**

3. MANO DE OBRA

No.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%.	P.UNIT	VR. PARCIAL
	H.C. Tecnico electricista - Prestaciones	1,00	1	1,70		$ 46.258	$ 27.210,29
	Hora ayudante - Prestaciones	1,00	1	1,50		$ 15.100	$ 10.066,67
	SUBTOTAL MANO DE OBRA						$ 37.276,961
						VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	**$ 37.276,96**

4. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO	PRECIO	VR. PARCIAL
	CAMIONETA PICK-UP EQUIPADA (TRANSPORTE DE ARNES,	1,00	1	12	$ 250.000	$ 20.833
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$ 20.833,33
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTE	**$ 20.833,33**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 68.610,29**

CONSORCIO ALUMBRADO 2025



FORMULARIO 8. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

DESCRIPCION:	"MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR"

CAPITULO:		**ALUMBRADO PUBLICO**	**UNIDAD**
ITEM:	**2.7**	BUENAVISTA - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	***UND***

1. EQUIPOS

No. ART.	DESCRIPCION	CANT	TAR/DIA	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
7	Equipo de Seguridad	1	DIA	4,00	$ 60.000,0	$ 15.000,00
	Escalera Aislada de 12 mts	1	DIA	2,50	$ 20.000,0	$ 5.000,00
	Herramienta menor					$ 1.500,00
					SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 21.500,00
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	**$ 21.500,00**

2. MATERIALES EN OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
76	Luminaria Led Alumbrado Público potencia 40W - 4000K, flujo luminoso 5400 lm, vida util 100.000 horas	UND	1,00	$ 615.000	$ 615.000,00
25	Alambre de Cobre # 14	ML	2,00	$ 5.200	$ 10.400,00
87	Brazo para luminaria horizontal metálico galvanizado 1-1/2"x1,5 m	UND	1,00	$ 84.000	$ 84.000,00
36	Cinta bandit 3/4"	ML	4,00	$ 7.000	$ 28.000,00
37	Hebilla de 3/4"	UND	4,00	$ 2.300	$ 9.200,00
86	Conector de perforacion calibres 2-8 AWG.	UND	2,00	$ 11.800	$ 23.600,00
18	Fotocontrol electrónico.	UND	1,00	$ 34.300	$ 34.300,00
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	**$ 804.500,00**

3. MANO DE OBRA

No.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%.	P.UNIT	VR. PARCIAL
	H.C. Tecnico electricista - Prestaciones	1,00	1	0,40		$ 46.258	$ 115.643,75
	Hora ayudante - Prestaciones	1,00	1	0,40		$ 15.100	$ 37.750,00
	SUBTOTAL MANO DE OBRA						$ 153.393,750
						VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	**$ 153.393,75**

4. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO	PRECIO	VR. PARCIAL
49	CAMIONETA PICK-UP EQUIPADA (TRANSPORTE DE ARNES, TECNICOS Y SUMINISTROS)	1	UNID.	8	$ 250.000	$ 31.250
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$ 31.250,00
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTE	**$ 31.250,00**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 1.010.643,75**

CONSORCIO ALUMBRADO 2025

FORMULARIO 8. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

DESCRIPCION:	"MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR"

CAPITULO:		**ALUMBRADO PUBLICO**	**UNIDAD**
ITEM:	**2.8**	BUENAVISTA - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	***UND***

1. EQUIPOS

No. ART.	DESCRIPCION	CANT	TAR/DIA	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
7	Equipo de Seguridad	1	DIA	10,00	$ 70.000,0	$ 7.000,00
	Escalera Aislada de 12 mts	1	DIA	10,00	$ 20.000,0	$ 2.000,00
	Herramienta menor					$ 1.500,00
					SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 10.500,00
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	**$ 10.500,00**

2. MATERIALES EN OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	**$ 0,00**

3. MANO DE OBRA

No.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%.	P.UNIT	VR. PARCIAL
	H.C. Tecnico electricista - Prestaciones	1,00	1	1,50		$ 46.258	$ 30.838,33
	Hora ayudante - Prestaciones	1,00	1	1,50		$ 15.100	$ 10.066,67
	SUBTOTAL MANO DE OBRA						$ 40.905,000
						VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	**$ 40.905,00**

4. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO	PRECIO	VR. PARCIAL
	CAMIONETA PICK-UP EQUIPADA (TRANSPORTE DE ARNES,	1,00	1	10	$ 250.000	$ 25.000
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$ 25.000,00
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTE	**$ 25.000,00**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 76.405,00**

CONSORCIO ALUMBRADO 2025



FORMULARIO 8. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

DESCRIPCION:	"MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR"		
CAPITULO:	**ALUMBRADO PUBLICO**		**UNIDAD**
ITEM: 2.9	SAN JOSE - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.		***UND***

1. EQUIPOS

No. ART.	DESCRIPCION	CANT	TAR/DIA	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
7	Equipo de Seguridad	1	DIA	4,00	$ 60.000,0	$ 15.000,00
	Escalera Aislada de 12 mts	1	DIA	2,50	$ 20.000,0	$ 5.000,00
	Herramienta menor					$ 1.500,00
					SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 21.500,00
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	**$ 21.500,00**

2. MATERIALES EN OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
76	Luminaria Led Alumbrado Público potencia 40W - 4000K, flujo luminoso 5400 lm, vida util 100.000 horas	UND	1,00	$ 615.000	$ 615.000,00
25	Alambre de Cobre # 14	ML	2,00	$ 5.200	$ 10.400,00
87	Brazo para luminaria horizontal metálico galvanizado 1-1/2"x1,5 m	UND	1,00	$ 84.000	$ 84.000,00
36	Cinta bandit 3/4"	ML	4,00	$ 7.000	$ 28.000,00
37	Hebilla de 3/4"	UND	4,00	$ 2.300	$ 9.200,00
86	Conector de perforacion calibres 2-8 AWG.	UND	2,00	$ 11.800	$ 23.600,00
18	Fotocontrol electrónico.	UND	1,00	$ 34.300	$ 34.300,00
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	**$ 804.500,00**

3. MANO DE OBRA

No.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%.	P.UNIT	VR. PARCIAL
	H.C. Tecnico electricista - Prestaciones	1,00	1	0,40		$ 46.258	$ 115.643,75
	Hora ayudante - Prestaciones	1,00	1	0,45		$ 15.100	$ 33.555,56
	SUBTOTAL MANO DE OBRA						$ 149.199,306
						VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	**$ 149.199,31**

4. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO	PRECIO	VR. PARCIAL
49	CAMIONETA PICK-UP EQUIPADA (TRANSPORTE DE ARNES, TECNICOS Y SUMINISTROS)	1	UNID.	15	$ 250.000	$ 16.667
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$ 16.666,67
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTE	**$ 16.666,67**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 991.865,97**

CONSORCIO ALUMBRADO 2025

FORMULARIO 8. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

DESCRIPCION:	"MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR"
CAPITULO:	**ALUMBRADO PUBLICO** — **UNIDAD**
ITEM: 2.10	SAN JOSE - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento. — ***UND***

1. EQUIPOS

No. ART.	DESCRIPCION	CANT	TAR/DIA	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
7	Equipo de Seguridad	1	DIA	10,00	$ 70.000,0	$ 7.000,00
	Escalera Aislada de 12 mts	1	DIA	10,00	$ 20.000,0	$ 2.000,00
	Herramienta menor					$ 1.500,00
					SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 10.500,00
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	**$ 10.500,00**

2. MATERIALES EN OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	**$ 0,00**

3. MANO DE OBRA

No.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%.	P.UNIT	VR. PARCIAL
	H.C. Tecnico electricista - Prestaciones	1,00	1	1,40		$ 46.258	$ 33.041,07
	Hora ayudante - Prestaciones	1,00	1	1,40		$ 15.100	$ 10.785,71
	SUBTOTAL MANO DE OBRA						$ 43.826,786
						VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	**$ 43.826,79**

4. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO	PRECIO	VR. PARCIAL
	CAMIONETA PICK-UP EQUIPADA (TRANSPORTE DE ARNES,	1,00	1	12	$ 250.000	$ 20.833
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$ 20.833,33
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTE	**$ 20.833,33**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 75.160,12**

CONSORCIO ALUMBRADO 2025

FORMULARIO 8. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

DESCRIPCION:	"MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR"
CAPITULO:	**ALUMBRADO PUBLICO** — **UNIDAD**
ITEM: 2.11	VILLAFLOR - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación. — ***UND***

1. EQUIPOS

No. ART.	DESCRIPCION	CANT	TAR/DIA	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
7	Equipo de Seguridad	1	DIA	4,00	$ 60.000,0	$ 15.000,00
	Escalera Aislada de 12 mts	1	DIA	2,50	$ 20.000,0	$ 5.000,00
	Herramienta menor					$ 1.500,00
					SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 21.500,00
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	**$ 21.500,00**

2. MATERIALES EN OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
76	Luminaria Led Alumbrado Público potencia 40W - 4000K, flujo luminoso 5400 lm, vida util 100.000 horas	UND	1,00	$ 615.000	$ 615.000,00
25	Alambre de Cobre # 14	ML	2,00	$ 5.200	$ 10.400,00
87	Brazo para luminaria horizontal metálico galvanizado 1-1/2"x1,5 m	UND	1,00	$ 84.000	$ 84.000,00
36	Cinta bandit 3/4"	ML	4,00	$ 7.000	$ 28.000,00
37	Hebilla de 3/4"	UND	4,00	$ 2.300	$ 9.200,00
86	Conector de perforacion calibres 2-8 AWG.	UND	2,00	$ 11.800	$ 23.600,00
18	Fotocontrol electrónico.	UND	1,00	$ 34.300	$ 34.300,00
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	**$ 804.500,00**

3. MANO DE OBRA

No.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%.	P.UNIT	VR. PARCIAL
	H.C. Tecnico electricista - Prestaciones	1,00	1	0,40		$ 46.258	$ 115.643,75
	Hora ayudante - Prestaciones	1,00	1	0,50		$ 15.100	$ 30.200,00
	SUBTOTAL MANO DE OBRA						$ 145.843,750
						VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	**$ 145.843,75**

4. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO	PRECIO	VR. PARCIAL
49	CAMIONETA PICK-UP EQUIPADA (TRANSPORTE DE ARNES, TECNICOS Y SUMINISTROS)	1	UNID.	12	$ 250.000	$ 20.833
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$ 20.833,33
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTE	**$ 20.833,33**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 992.677,08**

CONSORCIO ALUMBRADO 2025

FORMULARIO 8. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

DESCRIPCION:	"MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR"

CAPITULO:		**ALUMBRADO PUBLICO**	**UNIDAD**
ITEM:	**2.12**	VILLAFOR - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	***UND***

1. EQUIPOS

No. ART.	DESCRIPCION	CANT	TAR/DIA	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
7	Equipo de Seguridad	1	DIA	10,00	$ 70.000,0	$ 7.000,00
	Escalera Aislada de 12 mts	1	DIA	10,00	$ 20.000,0	$ 2.000,00
	Herramienta menor					$ 1.500,00
					SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 10.500,00
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	**$ 10.500,00**

2. MATERIALES EN OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	**$ 0,00**

3. MANO DE OBRA

No.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%.	P.UNIT	VR. PARCIAL
	H.C. Tecnico electricista - Prestaciones	1,00	1	1,50		$ 46.258	$ 30.838,33
	Hora ayudante - Prestaciones	1,00	1	1,50		$ 15.100	$ 10.066,67
	SUBTOTAL MANO DE OBRA						$ 40.905,000
						VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	**$ 40.905,00**

4. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO	PRECIO	VR. PARCIAL
	CAMIONETA PICK-UP EQUIPADA (TRANSPORTE DE ARNES,	1,00	1	12	$ 250.000	$ 20.833
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$ 20.833,33
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTE	**$ 20.833,33**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 72.238,33**

CONSORCIO ALUMBRADO 2025



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

DESCRIPCION:	"MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR"	
CAPITULO:	**ALUMBRADO PUBLICO**	**UNIDAD**
ITEM: 2.13	FÁTIMA - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	***UND***

1. EQUIPOS

No. ART.	DESCRIPCION	CANT	TAR/DIA	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
7	Equipo de Seguridad	1	DIA	4,00	$ 60.000,0	$ 15.000,00
	Escalera Aislada de 12 mts	1	DIA	2,50	$ 20.000,0	$ 5.000,00
	Herramienta menor					$ 1.500,00
					SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 21.500,00
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	**$ 21.500,00**

2. MATERIALES EN OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
76	Luminaria Led Alumbrado Público potencia 40W - 4000K, flujo luminoso 5400 lm, vida util 100.000 horas	UND	1,00	$ 615.000	$ 615.000,00
25	Alambre de Cobre # 14	ML	2,00	$ 5.200	$ 10.400,00
87	Brazo para luminaria horizontal metálico galvanizado 1-1/2"x1,5 m	UND	1,00	$ 84.000	$ 84.000,00
36	Cinta bandit 3/4"	ML	4,00	$ 7.000	$ 28.000,00
37	Hebilla de 3/4"	UND	4,00	$ 2.300	$ 9.200,00
86	Conector de perforacion calibres 2-8 AWG.	UND	2,00	$ 11.800	$ 23.600,00
18	Fotocontrol electrónico.	UND	1,00	$ 34.300	$ 34.300,00
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	**$ 804.500,00**


3. MANO DE OBRA

No.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%	P.UNIT	VR. PARCIAL
	H.C. Tecnico electricista - Prestaciones	1,00	1	0,40		$ 46.258	$ 115.643,75
	Hora ayudante - Prestaciones	1,00	1	0,50		$ 15.100	$ 30.200,00
	SUBTOTAL MANO DE OBRA						$ 145.843,750
						VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	**$ 145.843,75**

4. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO	PRECIO	VR. PARCIAL
49	CAMIONETA PICK-UP EQUIPADA (TRANSPORTE DE ARNES, TECNICOS Y SUMINISTROS)	1	UNID.	12	$ 250.000	$ 20.833
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$ 20.833,33
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTE	**$ 20.833,33**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 992.677,08**



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)			
DESCRIPCION:	"MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR"		
CAPITULO:	**ALUMBRADO PUBLICO**		**UNIDAD**
ITEM: 2.14	FÁTIMA - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.		***UND***

1. EQUIPOS

No. ART.	DESCRIPCION	CANT	TAR/DIA	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
7	Equipo de Seguridad	1	DIA	10,00	$ 70.000,0	$ 7.000,00
	Escalera Aislada de 12 mts	1	DIA	10,00	$ 20.000,0	$ 2.000,00
	Herramienta menor					$ 1.500,00
					SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 10.500,00
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	**$ 10.500,00**

2. MATERIALES EN OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	**$ 0,00**

3. MANO DE OBRA

No.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%	P.UNIT	VR. PARCIAL
	H.C. Tecnico electricista - Prestaciones	1,00	1	1,50		$ 46.258	$ 30.838,33
	Hora ayudante - Prestaciones	1,00	1	1,50		$ 15.100	$ 10.066,67
	SUBTOTAL MANO DE OBRA						$ 40.905,000
						VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	**$ 40.905,00**

4. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO	PRECIO	VR. PARCIAL
	CAMIONETA PICK-UP EQUIPADA (TRANSPORTE DE ARNES,	1,00	1	12	$ 250.000	$ 20.833
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$ 20.833,33
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTE	**$ 20.833,33**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 72.238,33**



FORMULARIO 8. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

DESCRIPCION:	"MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR"	
CAPITULO:	**ALUMBRADO PUBLICO**	**UNIDAD**
ITEM: 2.15	LOS ARRAYANES - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	***UND***

1. EQUIPOS

No. ART.	DESCRIPCION	CANT	TAR/DIA	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
7	Equipo de Seguridad	1	DIA	4,00	$ 60.000,0	$ 15.000,00
	Escalera Aislada de 12 mts	1	DIA	2,50	$ 20.000,0	$ 5.000,00
	Herramienta menor					$ 1.500,00
					SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 21.500,00
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	**$ 21.500,00**

2. MATERIALES EN OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
76	Luminaria Led Alumbrado Público potencia 40W - 4000K, flujo luminoso 5400 lm, vida util 100.000 horas	UND	1,00	$ 615.000	$ 615.000,00
25	Alambre de Cobre # 14	ML	2,00	$ 5.200	$ 10.400,00
87	Brazo para luminaria horizontal metálico galvanizado 1-1/2"x1,5 m	UND	1,00	$ 84.000	$ 84.000,00
36	Cinta bandit 3/4"	ML	4,00	$ 7.000	$ 28.000,00
37	Hebilla de 3/4"	UND	4,00	$ 2.300	$ 9.200,00
86	Conector de perforacion calibres 2-8 AWG.	UND	2,00	$ 11.800	$ 23.600,00
18	Fotocontrol electrónico.	UND	1,00	$ 34.300	$ 34.300,00
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	**$ 804.500,00**

3. MANO DE OBRA

No.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%.	P.UNIT	VR. PARCIAL
	H.C. Tecnico electricista - Prestaciones	1,00	1	0,40		$ 46.258	$ 115.643,75
	Hora ayudante - Prestaciones	1,00	1	0,40		$ 15.100	$ 37.750,00
	SUBTOTAL MANO DE OBRA						$ 153.393,750
						VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	**$ 153.393,75**

4. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO	PRECIO	VR. PARCIAL
49	CAMIONETA PICK-UP EQUIPADA (TRANSPORTE DE ARNES, TECNICOS Y SUMINISTROS)	1	UNID.	7	$ 250.000	$ 35.714
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$ 35.714,29
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTE	**$ 35.714,29**

	TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 1.015.108,04**

CONSORCIO ALUMBRADO 2025

FORMULARIO 8. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

DESCRIPCION:	"MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR"		
CAPITULO:	**ALUMBRADO PUBLICO**		**UNIDAD**
ITEM: 2.16	LOS ARRAYANES - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.		***UND***

1. EQUIPOS

No. ART.	DESCRIPCION	CANT	TAR/DIA	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
7	Equipo de Seguridad	1	DIA	11,00	$ 70.000,0	$ 6.363,64
	Escalera Aislada de 12 mts	1	DIA	10,00	$ 20.000,0	$ 2.000,00
	Herramienta menor					$ 1.500,00
					SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 9.863,64
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	**$ 9.863,64**

2. MATERIALES EN OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	**$ 0,00**

3. MANO DE OBRA

No.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%.	P.UNIT	VR. PARCIAL
	H.C. Tecnico electricista - Prestaciones	1,00	1	1,50		$ 46.258	$ 30.838,33
	Hora ayudante - Prestaciones	1,00	1	1,50		$ 15.100	$ 10.066,67
	SUBTOTAL MANO DE OBRA						$ 40.905,000
						VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	**$ 40.905,00**

4. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO	PRECIO	VR. PARCIAL
	CAMIONETA PICK-UP EQUIPADA (TRANSPORTE DE ARNES,	1,00	1	7	$ 250.000	$ 35.714
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$ 35.714,29
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTE	**$ 35.714,29**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 86.482,92**



FORMULARIO 8. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

DESCRIPCION:	"MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR"

CAPITULO:		**ALUMBRADO PUBLICO**	**UNIDAD**
ITEM:	**2.17**	SAN FRANCISCO - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	***UND***

1. EQUIPOS

No. ART.	DESCRIPCION	CANT	TAR/DIA	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
7	Equipo de Seguridad	1	DIA	4,00	$ 60.000,0	$ 15.000,00
	Escalera Aislada de 12 mts	1	DIA	2,50	$ 20.000,0	$ 5.000,00
	Herramienta menor					$ 1.500,00
					SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 21.500,00
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	**$ 21.500,00**

2. MATERIALES EN OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
76	Luminaria Led Alumbrado Público potencia 40W - 4000K, flujo luminoso 5400 lm, vida util 100.000 horas	UND	1,00	$ 615.000	$ 615.000,00
25	Alambre de Cobre # 14	ML	2,00	$ 5.200	$ 10.400,00
87	Brazo para luminaria horizontal metálico galvanizado 1-1/2"x1,5 m	UND	1,00	$ 84.000	$ 84.000,00
36	Cinta bandit 3/4"	ML	4,00	$ 7.000	$ 28.000,00
37	Hebilla de 3/4"	UND	4,00	$ 2.300	$ 9.200,00
86	Conector de perforacion calibres 2-8 AWG.	UND	2,00	$ 11.800	$ 23.600,00
18	Fotocontrol electrónico.	UND	1,00	$ 34.300	$ 34.300,00
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	**$ 804.500,00**

3. MANO DE OBRA

No.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%.	P.UNIT	VR. PARCIAL
	H.C. Tecnico electricista - Prestaciones	1,00	1	0,40		$ 46.258	$ 115.643,75
	Hora ayudante - Prestaciones	1,00	1	0,50		$ 15.100	$ 30.200,00
	SUBTOTAL MANO DE OBRA						$ 145.843,750
						VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	**$ 145.843,75**

4. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO	PRECIO	VR. PARCIAL
49	CAMIONETA PICK-UP EQUIPADA (TRANSPORTE DE ARNES, TECNICOS Y SUMINISTROS)	1	UNID.	15	$ 250.000	$ 16.667
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$ 16.666,67
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTE	**$ 16.666,67**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 988.510,42**

CONSORCIO ALUMBRADO 2025

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

DESCRIPCION:	"MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR"	
CAPITULO:	**ALUMBRADO PUBLICO**	**UNIDAD**
ITEM: 2.18	SAN FRANCISCO - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	***UND***

1. EQUIPOS

No. ART.	DESCRIPCION	CANT	TAR/DIA	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
7	Equipo de Seguridad	1	DIA	10,00	$ 70.000,0	$ 7.000,00
	Escalera Aislada de 12 mts	1	DIA	10,00	$ 20.000,0	$ 2.000,00
	Herramienta menor					$ 1.500,00
					SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 10.500,00
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	**$ 10.500,00**

2. MATERIALES EN OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	**$ 0,00**

3. MANO DE OBRA

No.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%	P.UNIT	VR. PARCIAL
	H.C. Tecnico electricista - Prestaciones	1,00	1	1,50		$ 46.258	$ 30.838,33
	Hora ayudante - Prestaciones	1,00	1	1,50		$ 15.100	$ 10.066,67
	SUBTOTAL MANO DE OBRA						$ 40.905,000
						VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	**$ 40.905,00**

4. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO	PRECIO	VR. PARCIAL
	CAMIONETA PICK-UP EQUIPADA (TRANSPORTE DE ARNES,	1,00	1	13	$ 250.000	$ 19.231
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$ 19.230,77
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTE	**$ 19.230,77**

	TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 70.635,77**

CONSORCIO ALUMBRADO 2025

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

DESCRIPCION:	"MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR"

CAPITULO:		**ALUMBRADO PUBLICO**	**UNIDAD**
ITEM:	**2.19**	SAN BENITO - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	***UND***

1. EQUIPOS

No. ART.	DESCRIPCION	CANT	TAR/DIA	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
7	Equipo de Seguridad	1	DIA	4,00	$ 60.000,0	$ 15.000,00
	Escalera Aislada de 12 mts	1	DIA	2,50	$ 20.000,0	$ 5.000,00
	Herramienta menor					$ 1.500,00
					SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 21.500,00
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	**$ 21.500,00**

2. MATERIALES EN OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
76	Luminaria Led Alumbrado Público potencia 40W - 4000K, flujo luminoso 5400 lm, vida util 100.000 horas	UND	1,00	$ 615.000	$ 615.000,00
25	Alambre de Cobre # 14	ML	2,00	$ 5.200	$ 10.400,00
87	Brazo para luminaria horizontal metálico galvanizado 1-1/2"x1,5 m	UND	1,00	$ 84.000	$ 84.000,00
36	Cinta bandit 3/4"	ML	4,00	$ 7.000	$ 28.000,00
37	Hebilla de 3/4"	UND	4,00	$ 2.300	$ 9.200,00
86	Conector de perforacion calibres 2-8 AWG.	UND	2,00	$ 11.800	$ 23.600,00
18	Fotocontrol electrónico.	UND	1,00	$ 34.300	$ 34.300,00
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	**$ 804.500,00**

3. MANO DE OBRA

No.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%.	P.UNIT	VR. PARCIAL
	H.C. Tecnico electricista - Prestaciones	1,00	1	0,40		$ 46.258	$ 115.643,75
	Hora ayudante - Prestaciones	1,00	1	0,50		$ 15.100	$ 30.200,00
	SUBTOTAL MANO DE OBRA						$ 145.843,750
						VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	**$ 145.843,75**

4. TRANSPORTE

No. ART.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO	PRECIO	VR. PARCIAL
49	CAMIONETA PICK-UP EQUIPADA (TRANSPORTE DE ARNES, TECNICOS Y SUMINISTROS)	1	UNID.	18	$ 250.000	$ 13.889
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$ 13.888,89
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTE	**$ 13.888,89**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 985.732,64**

CONSORCIO ALUMBRADO 2025

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)

DESCRIPCION:	"MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR"	
CAPITULO:	**ALUMBRADO PUBLICO**	**UNIDAD**
ITEM: 2.20	SAN BENITO - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	***UND***

1. EQUIPOS

No. ART.	DESCRIPCION	CANT	TAR/DIA	REND.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
7	Equipo de Seguridad	1	DIA	10,00	$ 70.000,0	$ 7.000,00
	Escalera Aislada de 12 mts	1	DIA	10,00	$ 20.000,0	$ 2.000,00
	Herramienta menor					$ 1.500,00
					SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS	$ 10.500,00
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE EQUIPOS/HERRAMIENTAS	**$ 10.500,00**

2. MATERIALES EN OBRA

No. ART.	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
				VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MATERIALES E INSUMOS	**$ 0,00**

3. MANO DE OBRA

No.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO.	%.	P.UNIT	VR. PARCIAL
	H.C. Tecnico electricista - Prestaciones	1,00	1	1,80		$ 46.258	$ 25.698,61
	Hora ayudante - Prestaciones	1,00	1	2,00		$ 15.100	$ 7.550,00
	SUBTOTAL MANO DE OBRA						$ 33.248,611
						VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE MANO DE OBRA	**$ 33.248,61**

4. TRANSPORTE


No. ART.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	RDTO	PRECIO	VR. PARCIAL
	CAMIONETA PICK-UP EQUIPADA (TRANSPORTE DE ARNES,	1,00	1	17	$ 250.000	$ 14.706
	SUBTOTAL MANO DE OBRA					$ 14.705,88
					VALOR REDONDEADO SUBTOTAL DE TRANSPORTE	**$ 14.705,88**


	TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 58.454,49**

3.8. PROGRAMACIÓN DE OBRA.

A la fecha del presente informe el día **2 DE DICIEMBRE DEL 2025 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, 31 DE ENERO DEL 2026 A 10 DE FEBRERO DE 2026 Y 13 DE ABRIL DE 2026 HASTA EL 29 DE ABRIL DEL 2026** la ejecución presupuestal asciende a la suma de **TRECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 49/100 M/CTE. ($ 335.659.783,49).** El Acta de Liquidacion Final llevando a la fecha una de la ejecución del contrato en un **100 %.**

BALANCE FINANCIERO		
Valor del contrato inicial	$ 546.916.115,86	
Valor Acta de Avance N°1		$ 283.215.205,86
% Ejecutado a la Fecha	46 %	
Otro Si N°001	$ 71.958.873,51	
Nuevo Valor de Contrato	$ 618.874.989,37	
Acta de Liquidacion Final	$ 335.659.783,49	
Saldo por Liquidar	54%	$ 335.659.783,49
SUMAS IGUALES	$ 618.874.989,37	$ 618.874.989,37

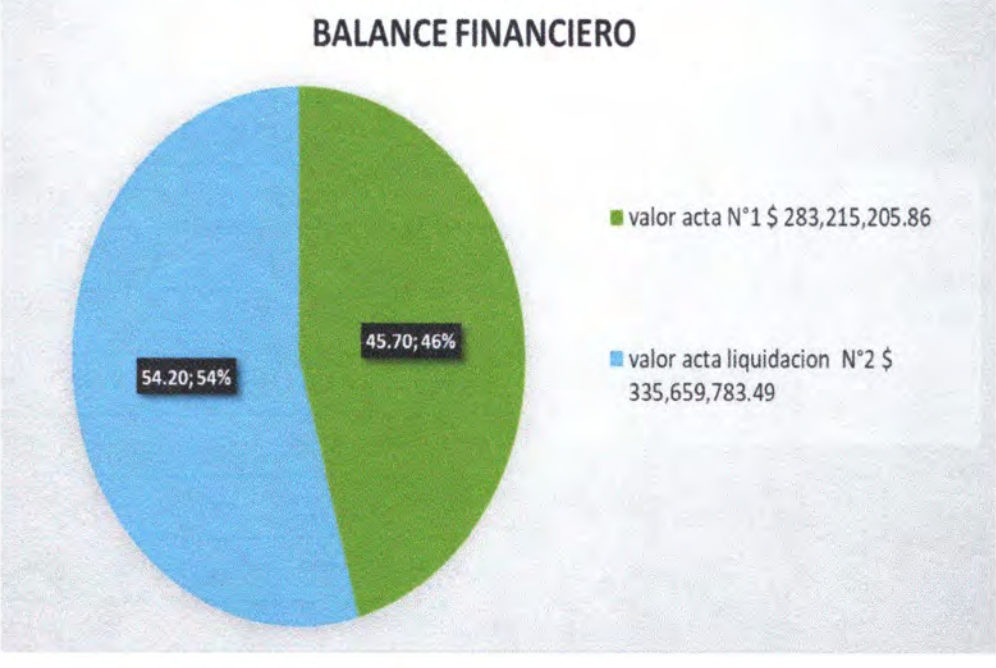

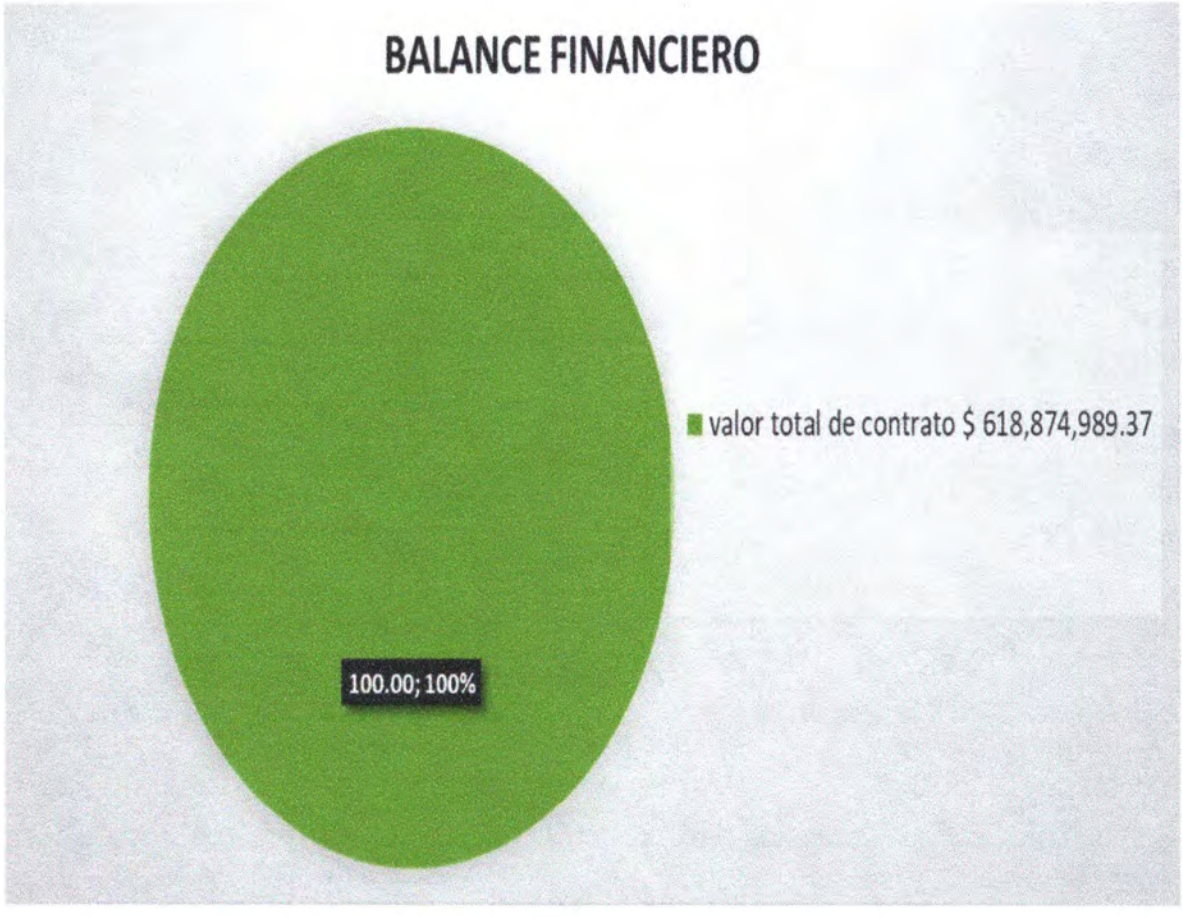

3.9. RELACIÓN DE ACTAS DE OBRA

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
ACTA DE AVANCE N°1	1/Diciembre /2025	Avance N°1 de obra del Contrato mejoramiento y optimización del sistema de alumbrado público del sector urbano y rural en el municipio de santa rosa del sur".
ACTA	**FECHA**	**OBSERVACIÓN**
ACTA DE LIQUIDACION FINAL	5/JUNIO/2026	Avance de Liquidacion Final de obra del Contrato mejoramiento y optimización del sistema de alumbrado público del sector urbano y rural en el municipio de santa rosa del sur".

3.10. AVANCE FINANCIERO DE OBRA


A la fecha del presente informe el contratista de obra ha tramitado las siguientes actas de cobro de Liquidacion Final.

ÍTEM	VALOR	PORCENTAJE	ESTADO
Valor del contrato	$ 546.916.115,85	100%	
Acta 1 - Valor a pagar	$ 283.215.205,86	52%	Pagado
Valor pagado	$ 263.700.909,99	48%	Ejecutado
Otro Si N°001	$ 71.958.873,51	8.6%	
Nuevo Valor del Contrato	$ 618.874.989,37	100%	
Acta de Liquidacion Final	$ 335.659.783,49	54%	Sin Pagar
Valor por Pagar	$ 335.659.783,49	54%	Ejecutado

RODOLFO SIERRA GARCIA
R/l Consorcio Alumbrado Público
Contratista


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES EN OBRA




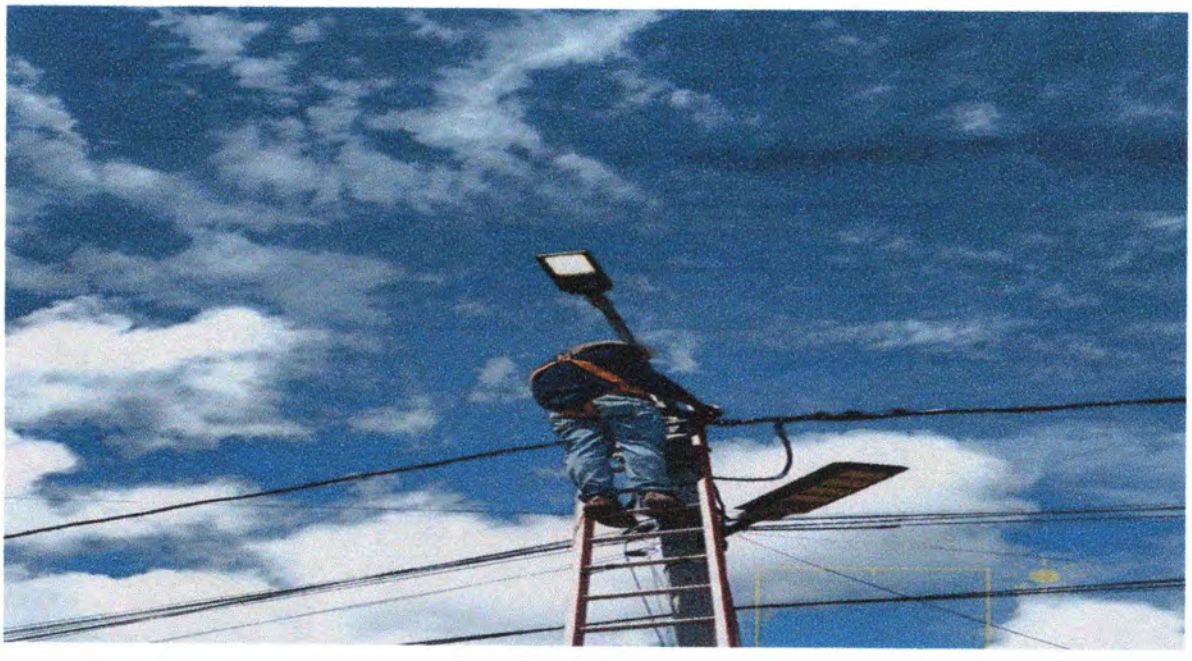





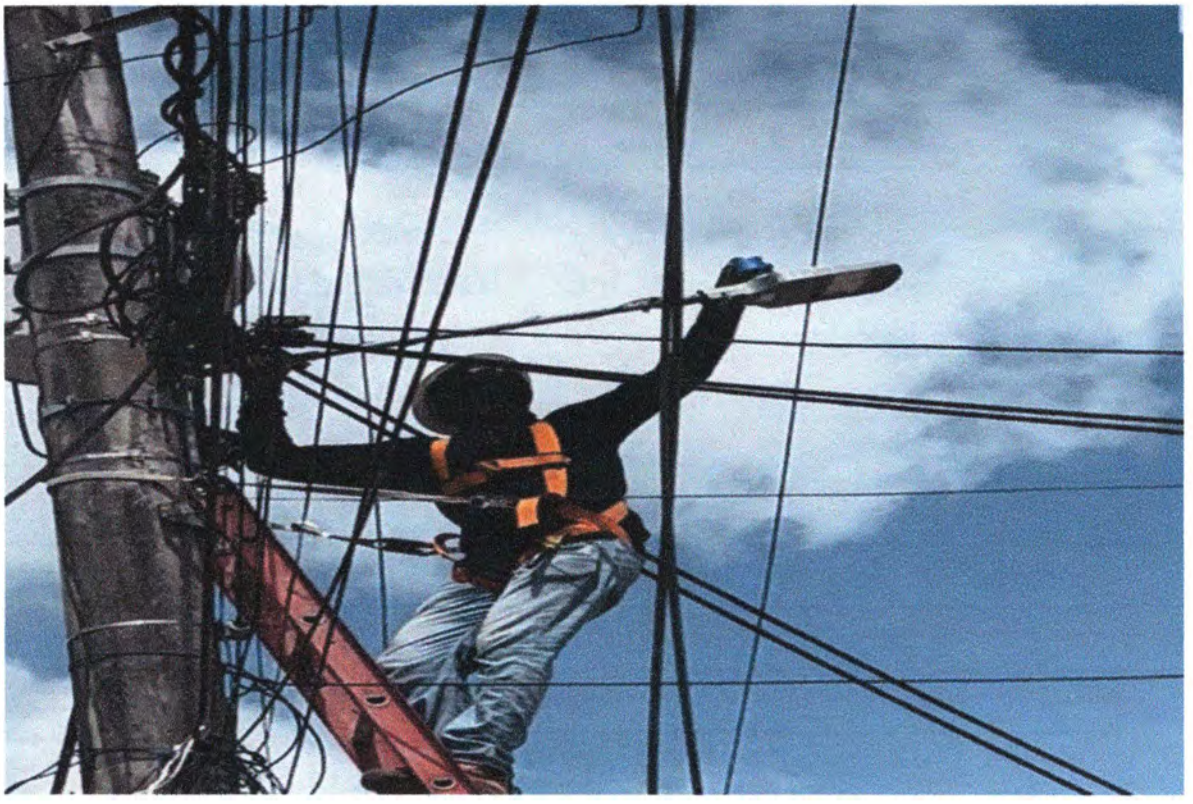

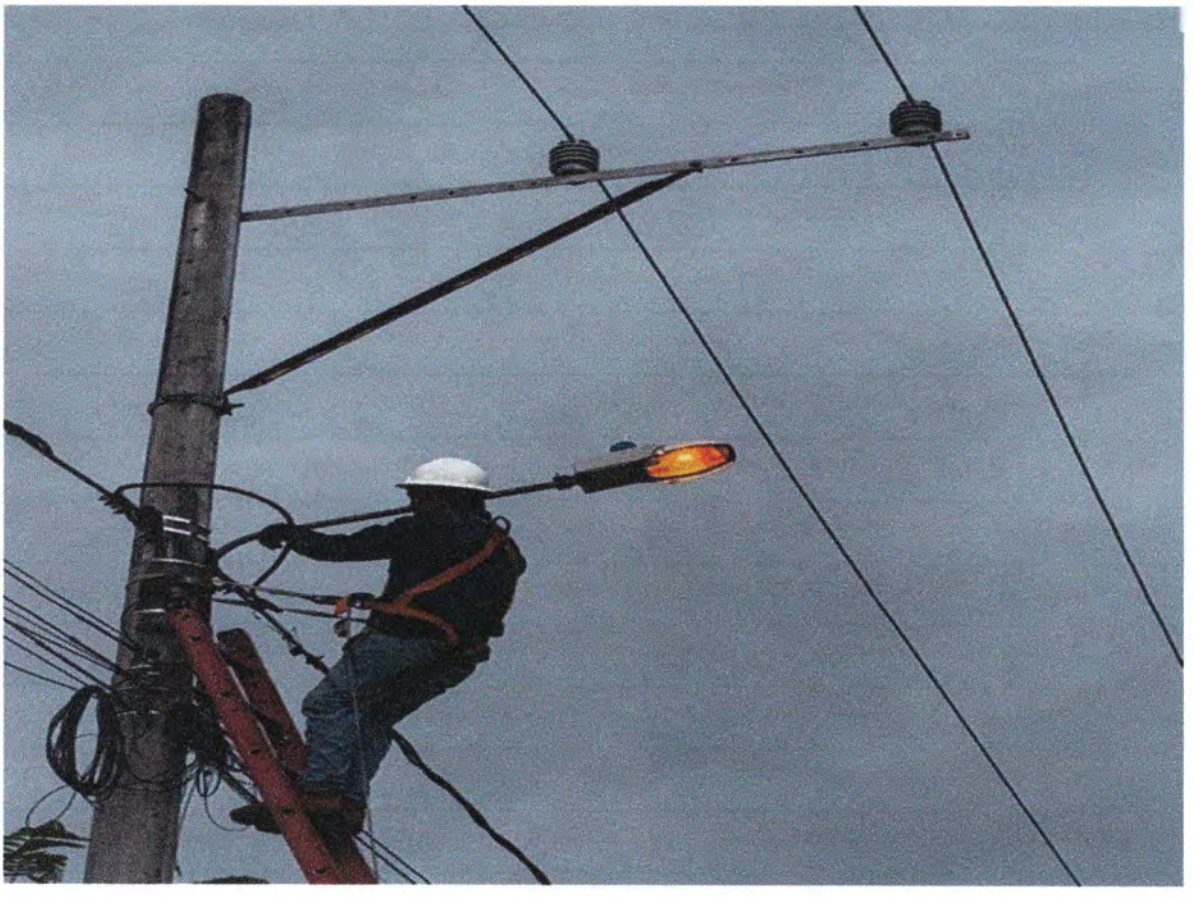








LAVADERO
MOTOAUTOS





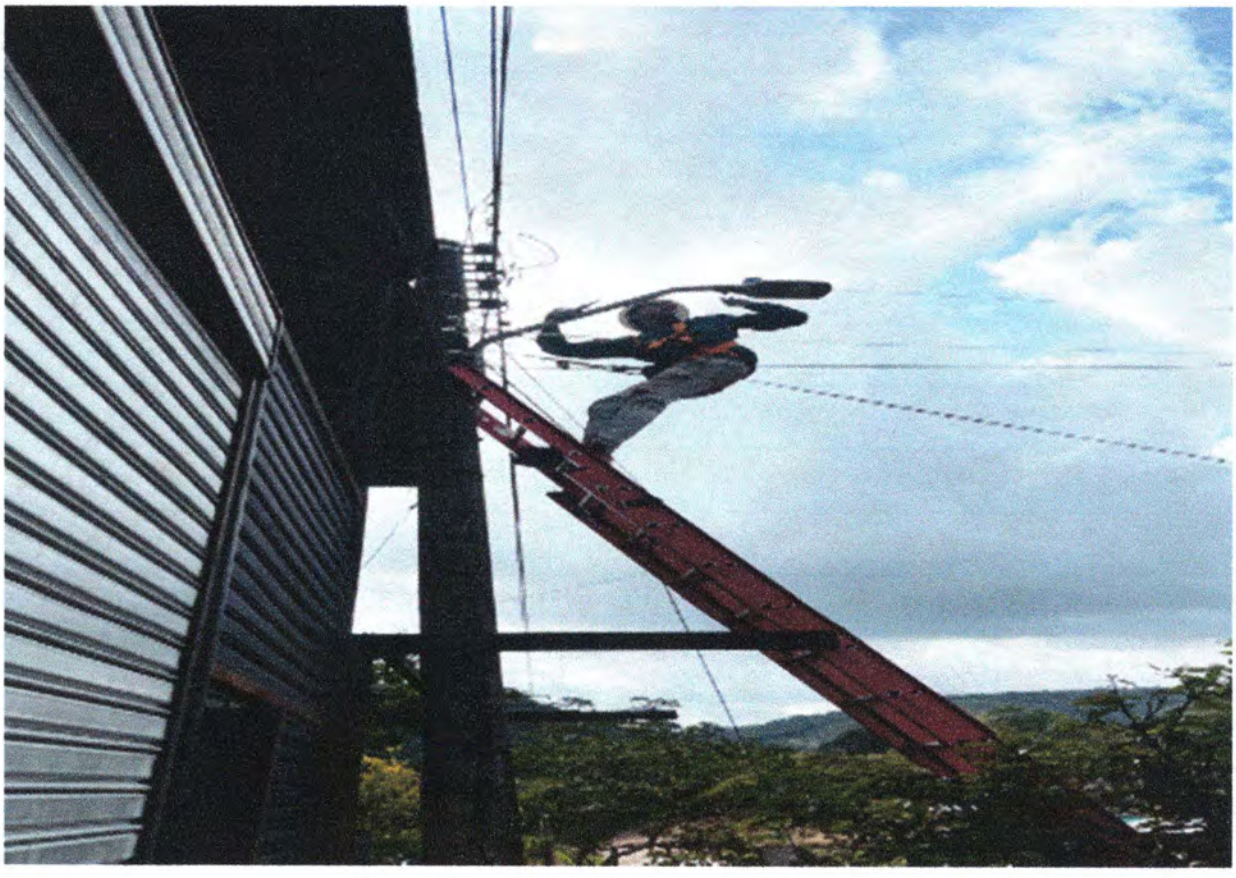

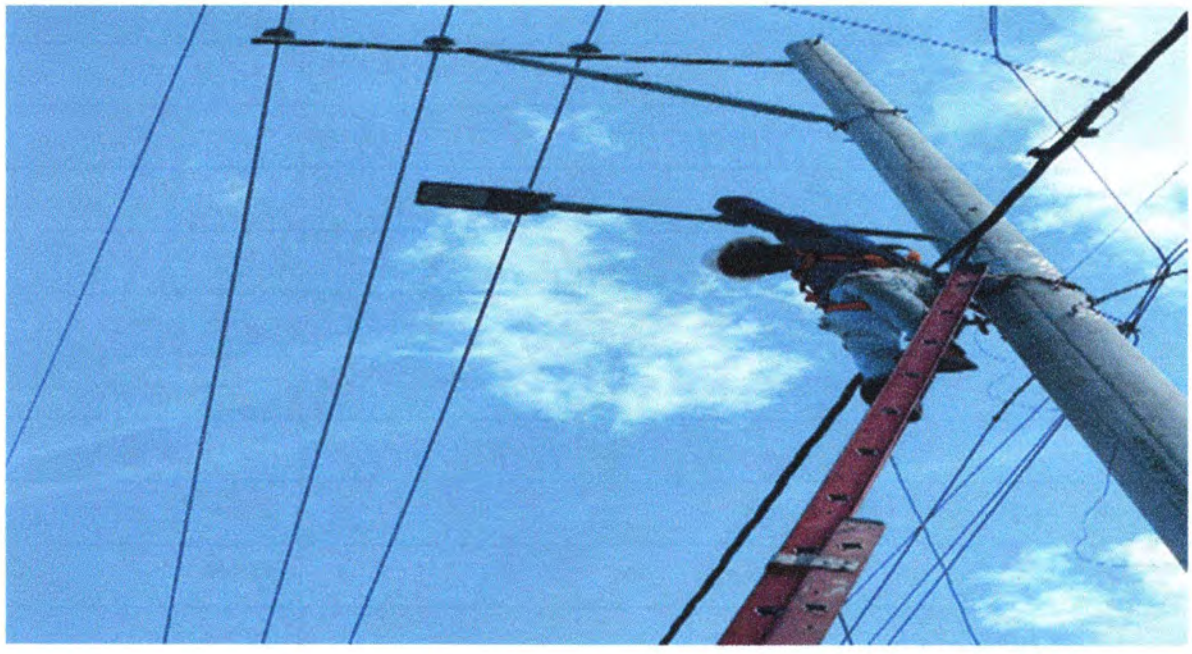



















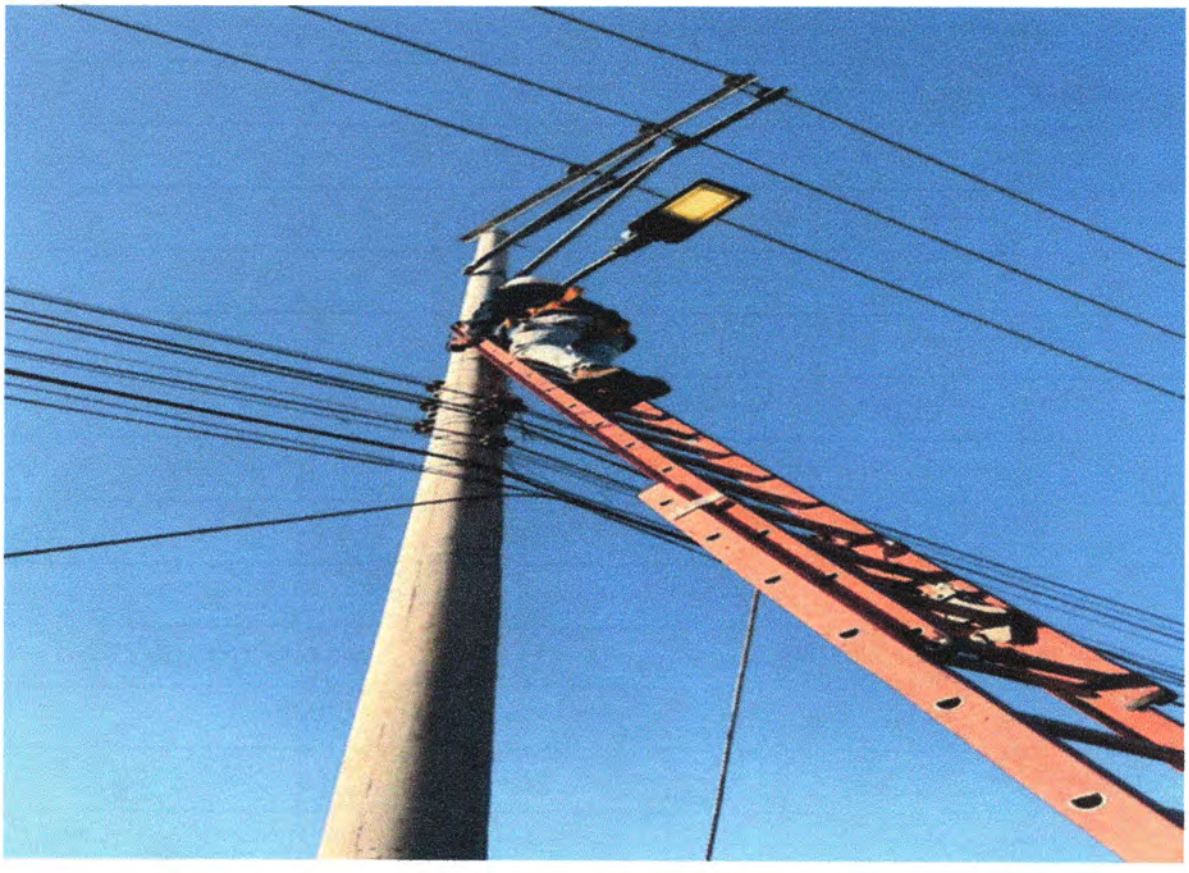



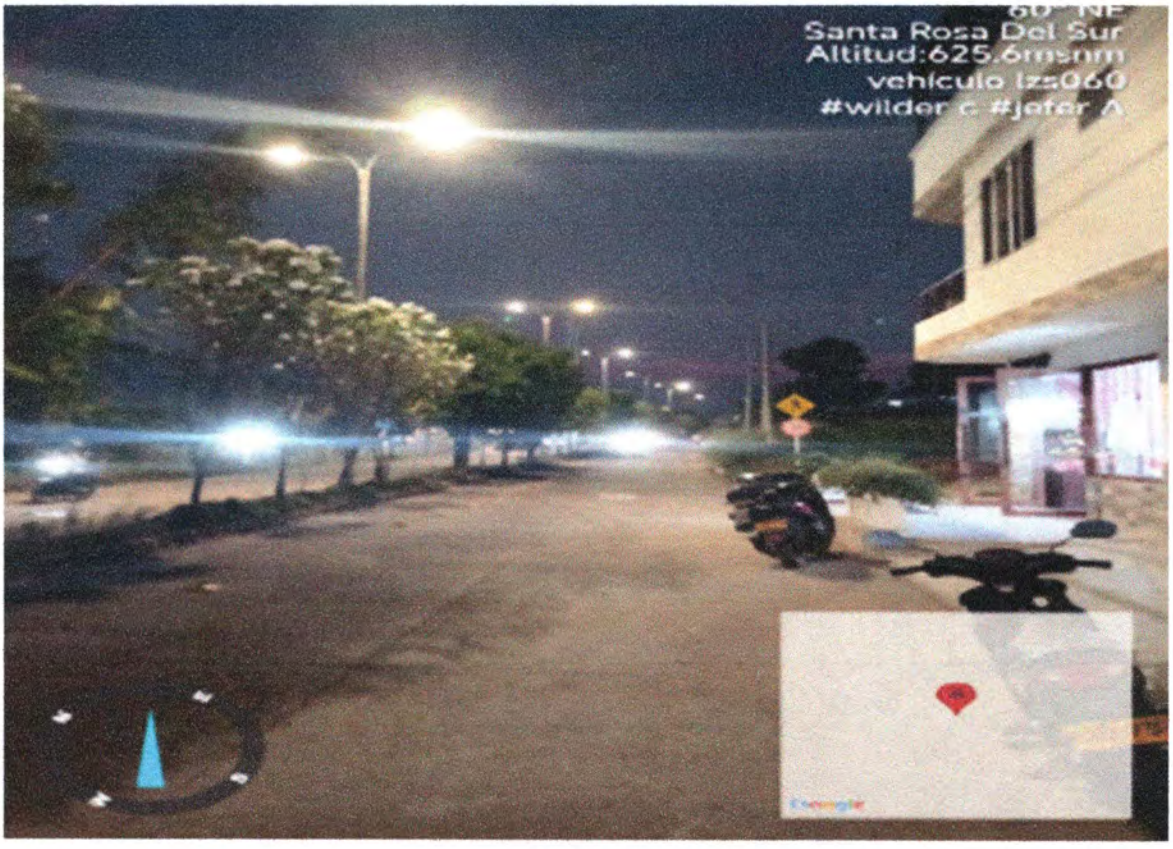


Santa Roza Del Sur
Altitud:625.6msnm
vehículo lzs060







588

Banco Caja Social
Su banco amigo.

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CONSORCIO ALUMBRADO 2025 Identificado con NI 9019864224

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina CARRERA 33, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24150874405
Fecha de apertura:	25 de Noviembre de 2025
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN PUEDA INTERESAR:, realizada en la Oficina 0529 CARRERA 33 de la ciudad de BUCARAMANGA, el día Martes, 25 de Noviembre de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social

CONSORCIO ALUMBRADO 2025

Santa Rosa del sur (Bolívar), JUNIO 17 de 2026.

Señor:
DIOSIMAR VARGAS FLORES.
SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANCIAS PUBLICAS.

Ref.: Solicitud de la Autorización de descuentos **del OTRO SI N° 001** para el **CONTRATO DE OBRA NÚMERO 01-197-2025**

Objeto: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL SECTOR URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.

Yo, RODOLFO SIERRA GARCIA, Identificado con cedula de ciudadanía 13.718.896 de Bucaramanga., representante legal de **CONSORCIO ALUMBRADO 2025.** mediante el presente oficio me dirijo a ustedes Secretaria de Hacienda y Financias Publicas para que al Momento de realizarme el pago de la **LIQUIDACION FINAL** con la **FACTURA DE VENTA FECA 2** del Contrato de Obra **N° 01-197-2025 .,** cuyo objeto es: **MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL SECTOR URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.,** cuando se efectué el Pago se haga descuento del **OTRO SI N°001** por concepto del impuesto de Industria y Comercio, conforme a las normas legales vigente y las tarifas establecidas por el municipio de Santa Rosa Del Sur, Bolívar.

Atentamente,

RODOLFO SIERRA GARCIA
R/l Consorcio Alumbrado Público
NIT; 9 0 1 9 8 6 4 2 2 - 4
Contratista

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36455135
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-03-02

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO ALUMBRADO 2025	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901986422	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 12 8 40	DEPARTAMENTO	BOLIVAR	MUNICIPIO	SANTA ROSA DEL SUR
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	CONSORCIOS.SANTAROSADELSUR@GMAIL.COM	TELÉFONO	3026092005
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1002277957	PRIMER APELLIDO	MANCIPE	SEGUNDO APELLIDO	UMAÑA
PRIMER NOMBRE	GERALDINE	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 12	Año: 2026	Mes: 01	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		$9,964,500		36455135

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-13716850	01	No	No	No	13	688	4432101	Fijo	ANAYA ALMEIDA ANGEL ANTONIO	$1,423,500
CC-1049022844	01	No	No	No	13	688	4432101	Fijo	AREVALO MARTINEZ JOSE MIGUEL	$1,423,500
CC-1049027537	01	No	No	No	13	688	4432101	Fijo	FABIAN HURTADO WILSON	$1,423,500
CC-1049028664	01	No	No	No	13	688	4432101	Fijo	FLORES AVILA EDINSON FERNEY	$1,423,500
CC-1049029784	01	No	No	No	13	688	4432101	Fijo	LOPEZ AVENDAÑO JOEL ANDRES	$1,423,500
CC-1002277957	01	No	No	No	13	688	2821101	Fijo	MANCIPE UMAÑA GERALDINE	$1,423,500
CC-79757137	01	No	No	No	13	688	4432101	Fijo	QUIÑONES RUIZ JESUS ERNESTO	$1,423,500

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 13716850			X	2025-12-31																									0		
CC - 1049022844			X	2025-12-31																									0		
CC - 1049027537			X	2025-12-31																									0		
CC - 1049028664			X	2025-12-31																									0		
CC - 1049029784			X	2025-12-31																									0		
CC - 1002277957			X	2025-12-31																									0		
CC - 79757137			X	2025-12-31																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 13716850	COLPENSIONES	30	$1,423,500	0.1600000	$227,800	$0	$0	$227,800	$0	$0	$0
CC - 1049022844	PORVENIR	30	$1,423,500	0.1600000	$227,800	$0	$0	$227,800	$0	$0	$0
CC - 1049027537	PORVENIR	30	$1,423,500	0.1600000	$227,800	$0	$0	$227,800	$0	$0	$0
CC - 1049028664	PORVENIR	30	$1,423,500	0.1600000	$227,800	$0	$0	$227,800	$0	$0	$0
CC - 1049029784	PORVENIR	30	$1,423,500	0.1600000	$227,800	$0	$0	$227,800	$0	$0	$0
CC - 1002277957	COLPENSIONES	30	$1,423,500	0.1600000	$227,800	$0	$0	$227,800	$0	$0	$0
CC - 79757137	COLPENSIONES	30	$1,423,500	0.1600000	$227,800	$0	$0	$227,800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 13716850	EPS SURA	30	$1,423,500	0.0400000	$57,000	$0	0	$0	0	$0	30	$1,423,500	1	0.0696000	$99,100
CC - 1049022844	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1,423,500	0.0400000	$57,000	$0	0	$0	0	$0	30	$1,423,500	1	0.0696000	$99,100
CC - 1049027537	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1,423,500	0.0400000	$57,000	$0	0	$0	0	$0	30	$1,423,500	1	0.0696000	$99,100
CC - 1049028664	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1,423,500	0.0400000	$57,000	$0	0	$0	0	$0	30	$1,423,500	1	0.0696000	$99,100
CC - 1049029784	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1,423,500	0.0400000	$57,000	$0	0	$0	0	$0	30	$1,423,500	1	0.0696000	$99,100
CC - 1002277957	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1,423,500	0.0400000	$57,000	$0	0	$0	0	$0	30	$1,423,500	2	0.0243600	$34,700
CC - 79757137	SANITAS	30	$1,423,500	0.0400000	$57,000	$0	0	$0	0	$0	30	$1,423,500	1	0.0696000	$99,100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-13716850	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1,423,500	0.0400000	$57,000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049022844	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1,423,500	0.0400000	$57,000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049027537	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1,423,500	0.0400000	$57,000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049028664	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1,423,500	0.0400000	$57,000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049029784	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1,423,500	0.0400000	$57,000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1002277957	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1,423,500	0.0400000	$57,000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-79757137	COMFENALCO CARTAGENA	30	$1,423,500	0.0400000	$57,000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	3	$683,400	$0	$0	$0	$0	53	$22,700	$0	$0	$706,100
PORVENIR	4	$911,200	$0	$0	$0	$0	53	$30,200	$0	$0	$941,400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	$57,000	$0	0	$0	0	$0	$57,000	53	$1,900	$0	$58,900	$0	0	$0	$0	$58,900	$0	$0	$58,900
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$114,000	$0	0	$0	0	$0	$114,000	53	$3,800	$0	$117,800	$0	0	$0	$0	$117,800	$0	$0	$117,800
SANITAS	1	$57,000	$0	0	$0	0	$0	$57,000	53	$1,900	$0	$58,900	$0	0	$0	$0	$58,900	$0	$0	$58,900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	$171,000	$0	0	$0	0	$0	$171,000	53	$5,700	$0	$176,700	$0	0	$0	$0	$176,700	$0	$0	$176,700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	7	$629,300	0	$0	$0	$629,300	53	$20,900	$650,200	0	$0	$6,502	$650,200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCO CARTAGENA	7	$399,000	53	$13,300	$412,300
SENA	0	$0	53	$0	$0
ICBF	0	$0	53	$0	$0
ESAP	0	$0	53	$0	$0
MinEdu	0	$0	53	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$412,300
PENSIONES	2	$1,647,500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$650,200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$412,300
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$3,122,300

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37688116
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-06-10

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO ALUMBRADO 2025	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901986422	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 12 8 40	DEPARTAMENTO	BOLIVAR	MUNICIPIO	SANTA ROSA DEL SUR
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	CONSORCIOS.SANTAROSADELSUR@GMAIL.COM	TELÉFONO	3026092005
FAX	0	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	Representante Legal
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	13718896	PRIMER APELLIDO	MANCIPE	SEGUNDO APELLIDO	UMAÑA
PRIMER NOMBRE	GERALDINE	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 12	Año: 2026	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.692.542		37688116

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-13718896	01	No	No	No	13	688	4432101	Fijo	SIERRA GARCIA RODOLFO	$1.750.905

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 13718896	X	2025-12-02	X	2025-12-31																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 13718896	COLPENSIONES	29	$1.692.542	0.1600000	$270.900	$0	$0	$270.900	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 13718896	EPS SURA	29	$1.692.542	0.0400000	$67.800	$0	0	$0	0	$0	29	$1.692.542	1	0.0696000	$117.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-13718896	COMFENALCO CARTAGENA	29	$1.692.542	0.0400000	$67.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$270.900	$0	$0	$0	$0	153	$27.600	$0	$0	$298.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	$67.800	$0	0	$0	0	$0	$67.800	153	$6.900	$0	$74.700	$0	0	$0	$0	$74.700	$0	$0	$74.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$117.900	0	$0	$0	$117.900	153	$12.000	$129.900	0	$0	$0	$129.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCO CARTAGENA	1	$67.800	153	$6.900	$74.700
SENA	0	$0	153	$0	$0
ICBF	0	$0	153	$0	$0
ESAP	0	$0	153	$0	$0
MinEdu	0	$0	153	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$74.700
PENSIONES	1	$298.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	$129.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$74.700
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$577.800

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37687642
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-06-10

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO ALUMBRADO 2025	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901986422	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 12 8 40	DEPARTAMENTO	BOLIVAR	MUNICIPIO	SANTA ROSA DEL SUR
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	CONSORCIOS.SANTAROSADELSUR@GMAIL.COM	TELÉFONO	3026092005
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1002277957	PRIMER APELLIDO	MANCIPE	SEGUNDO APELLIDO	UMAÑA
PRIMER NOMBRE	GERALDINE	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 01	Año: 2026	Mes: 02	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
5		$291.820		37687642

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-13716850	01	No	No	No	13	688	4432101	Fijo	ANAYA ALMEIDA ANGEL ANTONIO	$1.750.905
CC-1049027537	01	No	No	No	13	688	4432101	Fijo	FABIAN HURTADO WILSON	$1.750.905
CC-1049028664	01	No	No	No	13	688	4432101	Fijo	FLORES AVILA EDINSON FERNEY	$1.750.905
CC-79757137	01	No	No	No	13	688	4432101	Fijo	QUIÑONES RUIZ JESUS ERNESTO	$1.750.905
CC-13718896	01	No	No	No	13	688	4432101	Fijo	SIERRA GARCIA RODOLFO	$1.750.905

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 13716850	X	2026-01-30																											0		
CC - 1049027537	X	2026-01-30																											0		
CC - 1049028664	X	2026-01-30																											0		
CC - 79757137	X	2026-01-30																											0		
CC - 13718896	X	2026-01-30																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 13716850	COLPENSIONES	1	$58.364	0.1600000	$9.400	$0	$0	$9.400	$0	$0	$0
CC - 1049027537	PORVENIR	1	$58.364	0.1600000	$9.400	$0	$0	$9.400	$0	$0	$0
CC - 1049028664	PORVENIR	1	$58.364	0.1600000	$9.400	$0	$0	$9.400	$0	$0	$0
CC - 79757137	COLPENSIONES	1	$58.364	0.1600000	$9.400	$0	$0	$9.400	$0	$0	$0
CC - 13718896	COLPENSIONES	1	$58.364	0.1600000	$9.400	$0	$0	$9.400	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 13716850	EPS SURA	1	$58.364	0.0400000	$2.400	$0	0	$0	0	$0	1	$58.364	1	0.0696000	$4.100
CC - 1049027537	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$58.364	0.0400000	$2.400	$0	0	$0	0	$0	1	$58.364	1	0.0696000	$4.100

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1049028664	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$58.364	0.0400000	$2.400	$0	0	$0	0	$0	1	$58.364	1	0.0696000	$4.100
CC - 79757137	SANITAS	1	$58.364	0.0400000	$2.400	$0	0	$0	0	$0	1	$58.364	1	0.0696000	$4.100
CC - 13718896	EPS SURA	1	$58.364	0.0400000	$2.400	$0	0	$0	0	$0	1	$58.364	1	0.0696000	$4.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-13716850	COMFENALCO CARTAGENA	1	$58.364	0.0400000	$2.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049027537	COMFENALCO CARTAGENA	1	$58.364	0.0400000	$2.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049028664	COMFENALCO CARTAGENA	1	$58.364	0.0400000	$2.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-79757137	COMFENALCO CARTAGENA	1	$58.364	0.0400000	$2.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13718896	COMFENALCO CARTAGENA	1	$58.364	0.0400000	$2.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 01

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	2	$18.800	$0	$0	$0	$0	124	$1.600	$0	$0	$20.400
COLPENSIONES	3	$28.200	$0	$0	$0	$0	124	$2.400	$0	$0	$30.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	2	$4.800	$0	0	$0	0	$0	$4.800	124	$500	$0	$5.300	$0	0	$0	$0	$5.300	$0	$0	$5.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$2.400	$0	0	$0	0	$0	$2.400	124	$300	$0	$2.700	$0	0	$0	$0	$2.700	$0	$0	$2.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$4.800	$0	0	$0	0	$0	$4.800	124	$500	$0	$5.300	$0	0	$0	$0	$5.300	$0	$0	$5.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	5	$20.500	0	$0	$0	$20.500	124	$1.800	$22.300	0	$0	$0	$22.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCO CARTAGENA	5	$12.000	124	$1.100	$13.100
SENA	0	$0	124	$0	$0
ICBF	0	$0	124	$0	$0
ESAP	0	$0	124	$0	$0
MinEdu	0	$0	124	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$13.300
PENSIONES	2	$51.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$22.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$13.100
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$99.700

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37687692
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-06-10

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO ALUMBRADO 2025	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901986422	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 12 8 40	DEPARTAMENTO	BOLIVAR	MUNICIPIO	SANTA ROSA DEL SUR
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	CONSORCIOS.SANTAROSADELSUR@GMAIL.COM	TELÉFONO	3026092005
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1002277957	PRIMER APELLIDO	MANCIPE	SEGUNDO APELLIDO	UMAÑA
PRIMER NOMBRE	GERALDINE	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 02	Año: 2026	Mes: 03	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
5		$2.918.175		37687692

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-13716850	01	No	No	No	13	688	4432101	Fijo	ANAYA ALMEIDA ANGEL ANTONIO	$1.750.905
CC-1049027537	01	No	No	No	13	688	4432101	Fijo	FABIAN HURTADO WILSON	$1.750.905
CC-1049028664	01	No	No	No	13	688	4432101	Fijo	FLORES AVILA EDINSON FERNEY	$1.750.905
CC-79757137	01	No	No	No	13	688	4432101	Fijo	QUIÑONES RUIZ JESUS ERNESTO	$1.750.905
CC-13718896	01	No	No	No	13	688	4432101	Fijo	SIERRA GARCIA RODOLFO	$1.750.905

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 13716850			X	2026-02-10																									0		
CC - 1049027537			X	2026-02-10																									0		
CC - 1049028664			X	2026-02-10																									0		
CC - 79757137			X	2026-02-10																									0		
CC - 13718896			X	2026-02-10																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 13716850	COLPENSIONES	10	$583.635	0.1600000	$93.400	$0	$0	$93.400	$0	$0	$0
CC - 1049027537	PORVENIR	10	$583.635	0.1600000	$93.400	$0	$0	$93.400	$0	$0	$0
CC - 1049028664	PORVENIR	10	$583.635	0.1600000	$93.400	$0	$0	$93.400	$0	$0	$0
CC - 79757137	COLPENSIONES	10	$583.635	0.1600000	$93.400	$0	$0	$93.400	$0	$0	$0
CC - 13718896	COLPENSIONES	10	$583.635	0.1600000	$93.400	$0	$0	$93.400	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 13716850	EPS SURA	10	$583.635	0.0400000	$23.400	$0	0	$0	0	$0	10	$583.635	1	0.0696000	$40.700
CC - 1049027537	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	10	$583.635	0.0400000	$23.400	$0	0	$0	0	$0	10	$583.635	1	0.0696000	$40.700

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1049028664	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	10	$583.635	0.0400000	$23.400	$0	0	$0	0	$0	10	$583.635	1	0.0696000	$40.700
CC - 79757137	SANITAS	10	$583.635	0.0400000	$23.400	$0	0	$0	0	$0	10	$583.635	1	0.0696000	$40.700
CC - 13718896	EPS SURA	10	$583.635	0.0400000	$23.400	$0	0	$0	0	$0	10	$583.635	1	0.0696000	$40.700

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-13716850	COMFENALCO CARTAGENA	10	$583.635	0.0400000	$23.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049027537	COMFENALCO CARTAGENA	10	$583.635	0.0400000	$23.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049028664	COMFENALCO CARTAGENA	10	$583.635	0.0400000	$23.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-79757137	COMFENALCO CARTAGENA	10	$583.635	0.0400000	$23.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13718896	COMFENALCO CARTAGENA	10	$583.635	0.0400000	$23.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 02											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	3	$280.200	$0	$0	$0	$0	96	$18.500	$0	$0	$298.700
PORVENIR	2	$186.800	$0	$0	$0	$0	96	$12.400	$0	$0	$199.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$46.800	$0	0	$0	0	$0	$46.800	96	$3.100	$0	$49.900	$0	0	$0	$0	$49.900	$0	$0	$49.900
EPS SURA	2	$46.800	$0	0	$0	0	$0	$46.800	96	$3.100	$0	$49.900	$0	0	$0	$0	$49.900	$0	$0	$49.900
SANITAS	1	$23.400	$0	0	$0	0	$0	$23.400	96	$1.600	$0	$25.000	$0	0	$0	$0	$25.000	$0	$0	$25.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	5	$203.500	0	$0	$0	$203.500	96	$13.400	$216.900	0	$0	$0	$216.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCO CARTAGENA	5	$117.000	96	$7.800	$124.800
SENA	0	$0	96	$0	$0
ICBF	0	$0	96	$0	$0
ESAP	0	$0	96	$0	$0
MinEdu	0	$0	96	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$124.800
PENSIONES	2	$497.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$216.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$124.800
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$964.400

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37687877
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-06-10

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO ALUMBRADO 2025	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901986422	D.V.	4	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 12 8 40	DEPARTAMENTO	BOLIVAR	MUNICIPIO	SANTA ROSA DEL SUR
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	CONSORCIOS.SANTAROSADELSUR@GMAIL.COM	TELÉFONO	3026092005
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1002277957	PRIMER APELLIDO	MANCIPE	SEGUNDO APELLIDO	UMAÑA
PRIMER NOMBRE	GERALDINE	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 04	Año: 2026	Mes: 05	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
5		$4.960.900		37687877

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-13716850	01	No	No	No	13	688	4432101	Fijo	ANAYA ALMEIDA ANGEL ANTONIO	$1.750.905
CC-1049027537	01	No	No	No	13	688	4432101	Fijo	FABIAN HURTADO WILSON	$1.750.905
CC-1049028664	01	No	No	No	13	688	4432101	Fijo	FLORES AVILA EDINSON FERNEY	$1.750.905
CC-79757137	01	No	No	No	13	688	4432101	Fijo	QUIÑONES RUIZ JESUS ERNESTO	$1.750.905
CC-13718896	01	No	No	No	13	688	4432101	Fijo	SIERRA GARCIA RODOLFO	$1.750.905

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 13716850	X	2026-04-13	X	2026-04-29																									0		
CC - 1049027537	X	2026-04-13	X	2026-04-29																									0		
CC - 1049028664	X	2026-04-13	X	2026-04-29																									0		
CC - 79757137	X	2026-04-13	X	2026-04-29																									0		
CC - 13718896	X	2026-04-13	X	2026-04-29																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 13716850	COLPENSIONES	17	$992.180	0.1600000	$158.800	$0	$0	$158.800	$0	$0	$0
CC - 1049027537	PORVENIR	17	$992.180	0.1600000	$158.800	$0	$0	$158.800	$0	$0	$0
CC - 1049028664	PORVENIR	17	$992.180	0.1600000	$158.800	$0	$0	$158.800	$0	$0	$0
CC - 79757137	COLPENSIONES	17	$992.180	0.1600000	$158.800	$0	$0	$158.800	$0	$0	$0
CC - 13718896	COLPENSIONES	17	$992.180	0.1600000	$158.800	$0	$0	$158.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 13716850	EPS SURA	17	$992.180	0.0400000	$39.700	$0	0	$0	0	$0	17	$992.180	1	0.0696000	$69.100
CC - 1049027537	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	17	$992.180	0.0400000	$39.700	$0	0	$0	0	$0	17	$992.180	1	0.0696000	$69.100

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1049028664	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	17	$992.180	0.0400000	$39.700	$0	0	$0	0	$0	17	$992.180	1	0.0696000	$69.100
CC - 79757137	SANITAS	17	$992.180	0.0400000	$39.700	$0	0	$0	0	$0	17	$992.180	1	0.0696000	$69.100
CC - 13718896	EPS SURA	17	$992.180	0.0400000	$39.700	$0	0	$0	0	$0	17	$992.180	1	0.0696000	$69.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-13716850	COMFENALCO CARTAGENA	17	$992.180	0.0400000	$39.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049027537	COMFENALCO CARTAGENA	17	$992.180	0.0400000	$39.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049028664	COMFENALCO CARTAGENA	17	$992.180	0.0400000	$39.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-79757137	COMFENALCO CARTAGENA	17	$992.180	0.0400000	$39.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13718896	COMFENALCO CARTAGENA	17	$992.180	0.0400000	$39.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 04											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	2	$317.600	$0	$0	$0	$0	33	$7.600	$0	$0	$325.200
COLPENSIONES	3	$476.400	$0	$0	$0	$0	33	$11.400	$0	$0	$487.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	2	$79.400	$0	0	$0	0	$0	$79.400	33	$1.900	$0	$81.300	$0	0	$0	$0	$81.300	$0	$0	$81.300
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$79.400	$0	0	$0	0	$0	$79.400	33	$1.900	$0	$81.300	$0	0	$0	$0	$81.300	$0	$0	$81.300
SANITAS	1	$39.700	$0	0	$0	0	$0	$39.700	33	$1.000	$0	$40.700	$0	0	$0	$0	$40.700	$0	$0	$40.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	5	$345.500	0	$0	$0	$345.500	33	$8.300	$353.800	0	$0	$0	$353.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCO CARTAGENA	5	$198.500	33	$4.800	$203.300
SENA	0	$0	33	$0	$0
ICBF	0	$0	33	$0	$0
ESAP	0	$0	33	$0	$0
MinEdu	0	$0	33	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$203.300
PENSIONES	2	$813.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$353.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$203.300
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.573.400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010078194		MONTAÑEZ LOPEZ JEFFERSON ALEXIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 59 No 11 26 APT 201	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3147598954	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2038212707	9496876331	I	2026/01/26	2025/12/26	BANCOLOMBIA	0	$488,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,682,604	$269,300			$1,682,604	$210,400			$0	$0			$1,682,604	$8,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$1,682,604**	**$269,300**			**$1,682,604**	**$210,400**			**$0**	**$0**			**$1,682,604**	**$8,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						**$1,682,604**	**$269,300**			**$1,682,604**	**$210,400**			**$0**	**$0**			**$1,682,604**	**$8,800**		**$0**	**$0**
1	CC	1010078194	MONTAÑEZ JEFFERSON	25-14	30	$1,682,604	$269,300	EPS005	30	$1,682,604	$210,400		0	$0	$0	14-23	30	$1,682,604	$8,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,682,604**	**$269,300**			**$1,682,604**	**$210,400**			**$0**	**$0**			**$1,682,604**	**$8,800**		**$0**	**$0**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010078194		MONTAÑEZ LOPEZ JEFFERSON ALEXIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 59 No 11 26 APT 201	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3147598954	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2038212707	9496876331	I	2026/01/26	2025/12/26	BANCOLOMBIA	0	$488,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$269,300	$0	$0	$269,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$269,300	$0	$0	$269,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,800	$0	$0	$8,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,800	$0	$0	$8,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$210,400	$0	$0	$210,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$210,400	$0	$0	$210,400
TOTAL				1	$488,500	$0	$0	$488,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010078194		MONTAÑEZ LOPEZ JEFFERSON ALEXIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 59 No 11 26 APT 201	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3147598954	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	42035333	9499334142	I	2026/02/23	2026/02/06	BANCOLOMBIA	0	$646,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,228,748	$356,600			$2,228,748	$278,600			$0	$0			$2,228,748	$11,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$2,228,748**	**$356,600**			**$2,228,748**	**$278,600**			**$0**	**$0**			**$2,228,748**	**$11,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					**$2,228,748**	**$356,600**			**$2,228,748**	**$278,600**			**$0**	**$0**			**$2,228,748**	**$11,700**		**$0**	**$0**
1	CC 1010078194	MONTAÑEZ JEFFERSON	25-14	30	$2,228,748	$356,600	EPS005	30	$2,228,748	$278,600		0	$0	$0	14-23	30	$2,228,748	$11,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					**$2,228,748**	**$356,600**			**$2,228,748**	**$278,600**			**$0**	**$0**			**$2,228,748**	**$11,700**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010078194		MONTAÑEZ LOPEZ JEFFERSON ALEXIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 59 No 11 26 APT 201	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3147598954	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	42035333	9499334142	I	2026/02/23	2026/02/06	BANCOLOMBIA	0	$646,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$356,600	$0	$0	$356,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$356,600	$0	$0	$356,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,700	$0	$0	$11,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,700	$0	$0	$11,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$278,600	$0	$0	$278,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$278,600	$0	$0	$278,600
TOTAL				1	$646,900	$0	$0	$646,900

2026/02/06 12:05 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010078194		MONTAÑEZ LOPEZ JEFFERSON ALEXIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 59 No 11 26 APT 201	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3147598954	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-02	2026-02	107163120	9500841968	I	2026/03/24	2026/03/03	BANCOLOMBIA	0	$646,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,228,748	$356,600			$2,228,748	$278,600			$0	$0			$2,228,748	$11,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$2,228,748**	**$356,600**			**$2,228,748**	**$278,600**			**$0**	**$0**			**$2,228,748**	**$11,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					**$2,228,748**	**$356,600**			**$2,228,748**	**$278,600**			**$0**	**$0**			**$2,228,748**	**$11,700**		**$0**	**$0**
1	CC	1010078194	MONTAÑEZ JEFFERSON	25-14	30	$2,228,748	$356,600	EPS005	30	$2,228,748	$278,600		0	$0	$0	14-23	30	$2,228,748	$11,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$2,228,748**	**$356,600**			**$2,228,748**	**$278,600**			**$0**	**$0**			**$2,228,748**	**$11,700**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010078194		MONTAÑEZ LOPEZ JEFFERSON ALEXIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 59 No 11 26 APT 201	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3147598954	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	107163120	9500841968	I	2026/03/24	2026/03/03	BANCOLOMBIA	0	$646,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$356,600	$0	$0	$356,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$356,600	$0	$0	$356,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,700	$0	$0	$11,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,700	$0	$0	$11,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$278,600	$0	$0	$278,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$278,600	$0	$0	$278,600
TOTAL				1	$646,900	$0	$0	$646,900

2026/03/02 09:27 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010078194		MONTAÑEZ LOPEZ JEFFERSON ALEXIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 59 No 11 26 APT 201	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3147598954	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	335549935	9504219185	I	2026/05/26	2026/05/25	BANCO DE BOGOTA	0	$646,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$2,228,748	$356,600			$2,228,748	$278,600			$0	$0			$2,228,748		$11,700		$0	$0		$646,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$2,228,748**	**$356,600**			**$2,228,748**	**$278,600**			**$0**	**$0**			**$2,228,748**		**$11,700**		**$0**	**$0**		**$646,900**
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																					**$2,228,748**	**$356,600**			**$2,228,748**	**$278,600**			**$0**	**$0**			**$2,228,748**		**$11,700**		**$0**	**$0**		**$646,900**
1	CC	1010078194	MONTAÑEZ JEFFERSON																	25-14	30	$2,228,748	$356,600	EPS005	30	$2,228,748	$278,600		0	$0	$0	14-23	30	$2,228,748	0.522%	$11,700	0	$0	$0	No	$646,900
Total	**Afiliados(1)**																					$2,228,748	$356,600			$2,228,748	$278,600			$0	$0			$2,228,748		$11,700		$0	$0		$646,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$356,600	$0	$0	$356,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$356,600	$0	$0	$356,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,700	$0	$0	$11,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,700	$0	$0	$11,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$278,600	$0	$0	$278,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$278,600	$0	$0	$278,600
TOTAL				1	$646,900	$0	$0	$646,900

MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO DE OBRA	Nº01-197-2025

MEJORAMIENTO Y OPTIMIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.

	CONTRATANTE	SUPERVISOR	CONTRATISTA	INTERVENTOR
	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR	SEC INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO ALUMBRADO 2025	JMRC ENGIEENERING S.A.S
FECHA	05/06/2026	ING UBERNEL MARIN MARIN	RODOLFO SIERRA GARCIA	CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN

ALUMBRADO PUBLICO SECTOR URBANO	UND	UND	UBICACIÓN	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR

		ITEM	1,2	Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico,brazo metálico y accesorios de instalación.	CANTIDAD



LOCALIZACION	NUMERO DE LUMINARIAS
BARRIO CORGEVU	6,00
BARRIO VILLA MARIA	5,00
BARRIO LAS VEGAS	5,00
BARRIO PINOS Y MINEROS	8,00

OBSERVACIONES:

TOTAL	24,00
CANTIDAD PPTO	24,00
DIFERENCIA	-

CONTRATO DE OBRA	Nº01-197-2025

MEJORAMINENTO Y OPTIMIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL

	CONTRATANTE	SUPERVISOR	CONTRATISTA	INTERVENTOR
	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR	SEC INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO ALUMBRADO 2025	JMRC ENGIEENERING S.A.S
FECHA	05/06/2026	ING UBERNEL MARIN MARIN	RODOLFO SIERRA GARCIA	CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN

Suministro e instalación Fotocontrol electronico, para cambio a luminarias.				UND	UND	UBICACIÓN	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
		ITEM	1,3	Suministro e instalación Fotocontrol electronico, para cambio a luminarias.	CANTIDAD		



LOCALIZACION	NUMERO DE FOTOCONTROL ELECTRONICO
BARRIO CORGEVU	3,00
BARRIO VILLA MARIA	3,00
BARRIO LAS VEGAS	2,00
BARRIO PINOS Y MINEROS	2,00

OBSERVACIONES:

TOTAL	10,00
CANTIDAD PPTO	10,00
DIFERENCIA	-

CONTRATO DE OBRA	Nº01-197-2025

MEJORAMIENTO Y OPTIMIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL

	CONTRATANTE	SUPERVISOR	CONTRATISTA	INTERVENTOR
	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR	SEC INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO ALUMBRADO 2025	JMRC ENGIEENERING S.A.S
FECHA	05/06/2026	ING UBERNEL MARIN MARIN	RODOLFO SIERRA GARCIA	CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN

ALUMBRADO PUBLICO SECTOR RURAL					UND	UND	UBICACIÓN	CGTO DE SAN LUCAS
		ITEM	2,1	SAN LUCAS - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	CANTIDAD			



LOCALIZACION	NUMERO DE LUMINARIAS
CGTO DE SAN LUCAS	10,00

OBSERVACIONES:

TOTAL	10,00
CANTIDAD PPTO	10,00
DIFERENCIA	0,00

CONTRATO DE OBRA	Nº01-197-2025

MEJORAMINENTO Y OPTIMIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL

	CONTRATANTE	SUPERVISOR	CONTRATISTA	INTERVENTOR
	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR	SEC INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO ALUMBRADO 2025	JMRC ENGIEENERING S.A.S
FECHA	05/06/2026	ING UBERNEL MARIN MARIN	RODOLFO SIERRA GARCIA	CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN

ALUMBRADO PUBLICO SECTOR RURAL				UND	UND	UBICACIÓN	CGTO DE SAN LUCAS
		ITEM	2,2	SAN LUCAS - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	CANTIDAD		



LOCALIZACION	NUMERO DE LUMINARIAS
CALLE PRINCIPAL CGTO DE SAN LUCAS	20,00


OBSERVACIONES:	TOTAL	20,00
	CANTIDAD PPTO	20,00
	DIFERENCIA	-

CONTRATO DE OBRA	Nº01-197-2025

MEJORAMIENTO Y OPTIMIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR.

	CONTRATANTE	*SUPERVISOR*	*CONTRATISTA*	*INTERVENTOR*
	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR	SEC INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO ALUMBRADO 2025	JMRC ENGIEENERING S.A.S
FECHA	05/06/2026	ING UBERNEL MARIN MARIN	RODOLFO SIERRA GARCIA	CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN

ALUMBRADO PUBLICO SECTOR RURAL					UND	UND	UBICACIÓN	CGTO DE CANELOS
		ITEM	2,3	CANELOS - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	CANTIDAD			

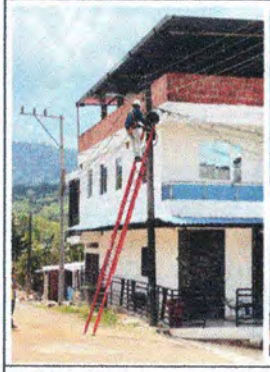



LOCALIZACION	NUMERO DE LUMINARIAS
CALLE PRINCIPAL CGTO DE CANELOS	30,00
CALLE PRINCIPAL CGTO DE CANELOS	15,00

OBSERVACIONES:

TOTAL	45,00
CANTIDAD PPTO	45,00
DIFERENCIA	-

MEJORAMIENTO Y OPTIMIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL

	CONTRATANTE	SUPERVISOR	CONTRATISTA	INTERVENTOR
	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR	SEC INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO ALUMBRADO 2025	JMRC ENGIEENERING S.A.S
FECHA	05/06/2026	ING UBERNEL MARIN MARIN	RODOLFO SIERRA GARCIA	CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN

ALUMBRADO PUBLICO SECTOR RURAL				UND	UND	UBICACIÓN	CGTO DE CANELOS
		ITEM	2,4	CANELOS - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	CANTIDAD		



LOCALIZACION	NUMERO DE LUMINARIAS
CALLE PRINCIPAL CGTO DE CANELOS	30,00

OBS

TOTAL	30,00
CANTIDAD PPTO	30,00
DIFERENCIA	-

MEJORAMIENTO Y OPTIMIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL

	CONTRATANTE	SUPERVISOR		CONTRATISTA		INTERVENTOR
	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR	SEC INFRAESTRUCTURA		CONSORCIO ALUMBRADO 2025		JMRC ENGIEENERING S.A.S
FECHA	05/06/2026	ING UBERNEL MARIN MARIN		RODOLFO SIERRA GARCIA		CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN

ALUMBRADO PUBLICO SECTOR RURAL					UND	UND	UBICACIÓN	CGTO DE SAN ISIDRO
		ITEM	2,5	SAN ISIDRO - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación	CANTIDAD			





LOCALIZACION	NUMERO DE LUMINARIAS
CALLE PRINCIPAL CGTO DE SAN ISIDRO	20,00

OBSERVACIONES:

TOTAL	20,00
CANTIDAD PPTO	20,00
DIFERENCIA	-

MEJORAMIENTO Y OPTIMIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL

	CONTRATANTE	SUPERVISOR	CONTRATISTA	INTERVENTOR
	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR	SEC INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO ALUMBRADO 2025	JMRC ENGIEENERING S.A.S
FECHA	05/06/2026	ING UBERNEL MARIN MARIN	RODOLFO SIERRA GARCIA	CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN

ALUMBRADO PUBLICO SECTOR RURAL				UND	UND	UBICACIÓN	CGTO DE SAN ISIDRO
		ITEM	2,6	SAN ISIDRO - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	CANTIDAD		



LOCALIZACION	NUMERO DE LUMINARIAS
CALLE PRINCIPAL CGTO DE SAN ISIDRO	20,00

OBSERVACIONES:

TOTAL	20,00
CANTIDAD PPTO	20,00
DIFERENCIA	-

MEJORAMIENTO Y OPTIMIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL

	CONTRATANTE	SUPERVISOR		CONTRATISTA		INTERVENTOR
	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR	SEC INFRAESTRUCTURA		CONSORCIO ALUMBRADO 2025		JMRC ENGIEENERING S.A.S
FECHA	05/06/2026	ING UBERNEL MARIN MARIN		RODOLFO SIERRA GARCIA		CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN

ALUMBRADO PUBLICO SECTOR RURAL	UND	UND	UBICACIÓN	CGTO DE BUENAVISTA

		ITEM	2,7	BUENAVISTA - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	CANTIDAD





LOCALIZACION	NUMERO DE LUMINARIAS
CALLE PRINCIPAL CGTO DE BUENAVISTA	20,00

OBSERVACIONES:

TOTAL	20,00
CANTIDAD PPTO	20,00
DIFERENCIA	-

MEJORAMIENTO Y OPTIMIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL

	CONTRATANTE	SUPERVISOR	CONTRATISTA	INTERVENTOR
	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR	SEC INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO ALUMBRADO 2025	JMRC ENGIEENERING S.A.S
FECHA	05/06/2026	ING UBERNEL MARIN MARIN	RODOLFO SIERRA GARCIA	CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN

ALUMBRADO PUBLICO SECTOR RURAL					UND	UND	UBICACIÓN	CGTO DE BUENAVISTA
		ITEM	28	BUENAVISTA - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	CANTIDAD			



LOCALIZACION	NUMERO DE LUMINARIAS
CALLE PRINCIPAL CGTO DE BUENAVISTA	20,00

OBSERVACIONES:

TOTAL	20,00
CANTIDAD PPTO	20,00
DIFERENCIA	-

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL

	CONTRATANTE	SUPERVISOR		CONTRATISTA		INTERVENTOR
	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR	SEC INFRAESTRUCTURA		CONSORCIO ALUMBRADO 2025		JMRC ENGIEENERING S.A.S
FECHA	05/06/2026	ING UBERNEL MARIN MARIN		RODOLFO SIERRA GARCIA		CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN

ALUMBRADO PUBLICO SECTOR RURAL			UND	UND	UBICACIÓN	CGTO DE JOSE
	ITEM	2,9	SAN JOSE - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	CANTIDAD		



LOCALIZACION	NUMERO DE LUMINARIAS
CALLE PRINCIPAL CGTO DE SAN JOSE	15,00

OBSERVACIONES:		
	TOTAL	15,00
	CANTIDAD PPTO	15,00
	DIFERENCIA	-

MEJORAMIENTO Y OPTIMIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL

	CONTRATANTE	SUPERVISOR	CONTRATISTA	INTERVENTOR
	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR	SEC INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO ALUMBRADO 2025	JMRC ENGIEENERING S.A.S
FECHA	05/06/2026	ING UBERNEL MARIN MARIN	RODOLFO SIERRA GARCIA	CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN

ALUMBRADO PUBLICO SECTOR RURAL	UND	UND	UBICACIÓN	CGTO DE JOSE

		ITEM	2,10	SAN JOSE - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	CANTIDAD



LOCALIZACION	NUMERO DE LUMINARIAS
CALLE PRINCIPAL CGTO DE SAN JOSE	15,00

OBSERVACIONES:

TOTAL	15,00
CANTIDAD PPTO	15,00
DIFERENCIA	-

MEJORAMINENTO Y OPTIMIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL

	CONTRATANTE	SUPERVISOR	CONTRATISTA	INTERVENTOR
	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR	SEC INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO ALUMBRADO 2025	JMRC ENGIEENERING S.A.S
FECHA	05/06/2026	ING UBERNEL MARIN MARIN	RODOLFO SIERRA GARCIA	CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN

ALUMBRADO PUBLICO SECTOR RURAL					UND	UND	UBICACIÓN	CGTO DE VILLFLOR
		ITEM	2.11	VILLAFLOR - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	CANTIDAD			



LOCALIZACION	NUMERO DE LUMINARIAS
CALLE PRINCIPAL CGTO DE VILLAFLOR	20,00

OBSERVACIONES:

TOTAL	20,00
CANTIDAD PPTO	20,00
DIFERENCIA	-

MEJORAMIENTO Y OPTIMIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL

	CONTRATANTE	SUPERVISOR	CONTRATISTA	INTERVENTOR
	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR	SEC INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO ALUMBRADO 2025	JMRC ENGIEENERING S.A.S
FECHA	05/06/2026	ING UBERNEL MARIN MARIN	RODOLFO SIERRA GARCIA	CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN

ALUMBRADO PUBLICO SECTOR RURAL	UND	UND	UBICACIÓN	CGTO DE VILLFLOR

		ITEM	2.12	FÁTIMA - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación	CANTIDAD



LOCALIZACION	NUMERO DE LUMINARIAS
CALLE PRINCIPAL CGTO DE VILLA FLOR	20,00

OBSERVACIONES:


TOTAL	20,00
CANTIDAD PPTO	20,00
DIFERENCIA	-

MEJORAMIENTO Y OPTIMIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL

	CONTRATANTE	SUPERVISOR	CONTRATISTA	INTERVENTOR
	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR	SEC INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO ALUMBRADO 2025	JMRC ENGIEENERING S.A.S
FECHA	05/06/2026	ING UBERNEL MARIN MARIN	RODOLFO SIERRA GARCIA	CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN

ALUMBRADO PUBLICO SECTOR RURAL	UND	UND	UBICACIÓN	CGTO DE VILLFLOR

		ITEM	2.12	FÁTIMA - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación	CANTIDAD

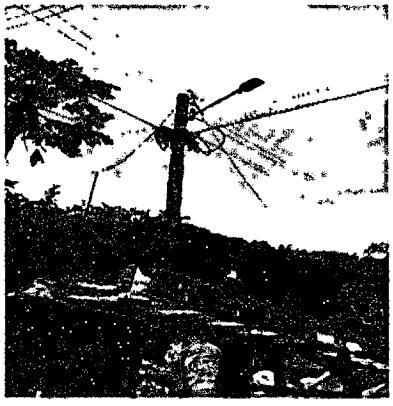

LOCALIZACION	NUMERO DE LUMINARIAS
CALLE PRINCIPAL CGTO DE VILLA FLOR	20,00

OBSERVACIONES:	TOTAL	20,00
	CANTIDAD PPTO	20,00
	DIFERENCIA	-

MEJORAMIENTO Y OPTIMIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL

	CONTRATANTE	SUPERVISOR	CONTRATISTA	INTERVENTOR
	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR	SEC INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO ALUMBRADO 2025	JMRC ENGIEENERING S.A.S
FECHA	05/06/2026	ING UBERNEL MARIN MARIN	RODOLFO SIERRA GARCIA	CARLOS HUMBERTO BOA BELTRAN

ALUMBRADO PUBLICO SECTOR RURAL					UND	UND	UBICACIÓN	CGTO DE FATIMA
		ITEM	2.13	FÁTIMA - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	CANTIDAD			




LOCALIZACION	NUMERO DE LUMINARIAS
CALLE PRINCIPAL CGTO DE FATIMA	20,00

OBSERVACIONES:		
	TOTAL	20,00
	CANTIDAD PPTO	20,00
	DIFERENCIA	-

MEJORAMIENTO Y OPTIMIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL

	CONTRATANTE	SUPERVISOR	CONTRATISTA	INTERVENTOR
	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR	SEC INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO ALUMBRADO 2025	JMRC ENGIEENERING S.A.S
FECHA	05/06/2026	ING UBERNEL MARIN MARIN	RODOLFO SIERRA GARCIA	CARLOS HUMBERTO BOA BELTRAN

ALUMBRADO PUBLICO SECTOR RURAL					UND	UND	UBICACIÓN	CGTO DE FATIMA
		ITEM	2.13	FÁTIMA - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	CANTIDAD			

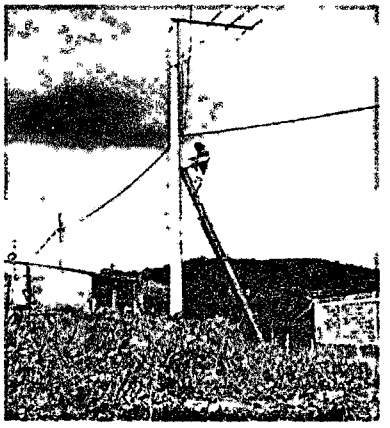

LOCALIZACION	NUMERO DE LUMINARIAS
CALLE PRINCIPAL CGTO DE FATIMA	20,00

OBSERVACIONES:

TOTAL	20,00
CANTIDAD PPTO	20,00
DIFERENCIA	-

MEJORAMIENTO Y OPTIMIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL

	CONTRATANTE	SUPERVISOR	CONTRATISTA	INTERVENTOR
	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR	SEC INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO ALUMBRADO 2025	JMRC ENGIEENERING S.A.S
FECHA	05/06/2026	ING UBERNEL MARIN MARIN	RODOLFO SIERRA GARCIA	CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN

ALUMBRADO PUBLICO SECTOR RURAL				UND	UND	UBICACIÓN	CGTO DE FATIMA
		ITEM	2.14	FÁTIMA - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	CANTIDAD		



LOCALIZACION	NUMERO DE LUMINARIAS
CALLE PRINCIPAL CGTO DE FATIMA	20,00

OBSERVACIONES:

TOTAL	20,00
CANTIDAD PPTO	20,00
DIFERENCIA	-

MEJORAMIENTO Y OPTIMIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL

	CONTRATANTE	SUPERVISOR	CONTRATISTA	INTERVENTOR
	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR	SEC INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO ALUMBRADO 2025	JMRC ENGIEENERING S.A.S
FECHA	05/06/2026	ING UBERNEL MARIN MARIN	RODOLFO SIERRA GARCIA	CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN

ALUMBRADO PUBLICO SECTOR RURAL					UND	UND	UBICACIÓN	CGTO DE ARRAYANES
		ITEM	2.15	LOS ARRAYANES - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	CANTIDAD			



LOCALIZACION	NUMERO DE LUMINARIAS
CALLE PRINCIPAL CGTO DE ARRAYANES	15,00

OBSERVACIONES:		
	TOTAL	15,00
	CANTIDAD PPTO	15,00
	DIFERENCIA	-

MEJORAMIENTO Y OPTIMIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL

	CONTRATANTE	SUPERVISOR	CONTRATISTA	INTERVENTOR
	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR	SEC INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO ALUMBRADO 2025	JMRC ENGIEENERING S.A.S
FECHA	05/06/2026	ING UBERNEL MARIN MARIN	RODOLFO SIERRA GARCIA	CARLOS HUMBERTO BUA BELTRAN

ALUMBRADO PUBLICO SECTOR RURAL					UND	UND	UBICACIÓN	CGTO DE ARRAYANES
		ITEM	2.16	LOS ARRAYANES - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento	CANTIDAD			



LOCALIZACION	NUMERO DE LUMINARIAS
CALLE PRINCIPAL CGTO DE ARRAYANES	15,00

OBSERVACIONES:		
	TOTAL	15,00
	CANTIDAD PPTO	15,00
	DIFERENCIA	-

MEJORAMIENTO Y OPTIMIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL

	CONTRATANTE	SUPERVISOR	CONTRATISTA	INTERVENTOR
	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR	SEC INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO ALÚMBRADO 2025	JMRC ENGIEENERING S.A.S
FECHA	05/06/2026	ING UBERNEL MARIN MARIN	RODOLFO SIERRA GARCIA	CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN

ALUMBRADO PUBLICO SECTOR RURAL					UND	UND	UBICACIÓN	CGTO DE SAN FRANCISCO
		ITEM	2.17	SAN FRANCISCO - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	CANTIDAD			
				LOCALIZACION	NUMERO DE LUMINARIAS			
				CALLE PRINCIPAL CGTO DE SAN FRANCISCO	15,00			

OBSERVACIONES:		
	TOTAL	15,00
	CANTIDAD PPTO	15,00
	DIFERENCIA	-

MEJORAMIENTO Y OPTIMIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL

	CONTRATANTE	SUPERVISOR	CONTRATISTA	INTERVENTOR
	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR	SEC INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO ALUMBRADO 2025	JMRC ENGIEENERING S.A.S
FECHA	05/06/2026	ING UBERNEL MARIN MARIN	RODOLFO SIERRA GARCIA	CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN

ALUMBRADO PUBLICO SECTOR RURAL	UND	UND	UBICACIÓN	CGTO DE SAN FRANCISCO

		ITEM	2.18	SAN FRANCISCO - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	CANTIDAD



LOCALIZACION	NUMERO DE LUMINARIAS
CALLE PRINCIPAL CGTO DE SAN FRANCISCO	15,00

OBSERVACIONES:	TOTAL	15,00
	CANTIDAD PPTO	15,00
	DIFERENCIA	-

MEJORAMINENTO Y OPTIMIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL

	CONTRATANTE	SUPERVISOR		CONTRATISTA		INTERVENTOR
	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR	SEC INFRAESTRUCTURA		CONSORCIO ALUMBRADO 2025		JMRC ENGIEENERING S.A.S
FECHA	05/06/2026	ING UBERNEL MARIN MARIN		RODOLFO SIERRA GARCIA		CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN

ALUMBRADO PUBLICO SECTOR RURAL	UND	UND	UBICACIÓN	CGTO DE SAN BENITO

		ITEM	2.19	SAN BENITO - Suministro, transporte e instalación Luminaria Led potencia 40W 8000lm - Alumbrado Público. Vida útil 100.000 horas. Incluye fotocontrol electronico, brazo metálico y accesorios de instalación.	CANTIDAD





LOCALIZACION	NUMERO DE LUMINARIAS
CALLE PRINCIPAL CGTO DE SAN BENITO	20,00

OBSERVACIONES:

TOTAL	20,00
CANTIDAD PPTO	20,00
DIFERENCIA	-

MEJORAMIENTO Y OPTIMIMIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL

	CONTRATANTE	SUPERVISOR	CONTRATISTA	INTERVENTOR
	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLÍVAR	SEC INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO ALUMBRADO 2025	JMRC ENGIEENERING S.A.S
FECHA	05/06/2026	ING UBERNEL MARIN MARIN	RODOLFO SIERRA GARCIA	CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN

ALUMBRADO PUBLICO SECTOR RURAL	UND	UND	UBICACIÓN	CGTO DE SAN BENITO

		ITEM	2,20	SAN BENITO - Desmonte luminaria existente y transporte a sitio de almacenamiento.	CANTIDAD



LOCALIZACION	NUMERO DE LUMINARIAS
CALLE PRINCIPAL CGTO DE SAN BENITO	20,00

OBSERVACIONES:

TOTAL	20,00
CANTIDAD PPTO	20,00
DIFERENCIA	-

641

Materiales en el vehiculo, y se instalan 10 lamparas en la calle principal de San lucas. Se instalan 10 fotoceldas en lamparas. Se laboró hasta las 5:00 pm.

Jesus E. Quiñonez

Martes, 2 de diciembre de 2025
Condiciones Climáticas: Soleado y seco.
Personal de trabajo: Jesus quiñonez: Residente de obra; Nayitha Posada: Residente de interventoria; SISO: Jefferson montañez; obrero: wilson Hurtado; Conductor: Joel lopez; tecnico: ferney florez.
Maquinaria y herramienta: Escalera 14a, portigo, escalera, Zunchadora, Pulidora lazos, llave Bristol, Camioneta transporte.
Actividades realizadas en obra: Se inician actividades a las 7:00 am, luego el SISO se encargó de las actividades y charlas de Seguridad. Posteriormente se cargan los materiales a la camioneta y se terminan de instalar las otras 10 lamparas pendiente de instalar en el corregimiento de carebos; se terminan actividades a las 5:00 pm.

Jesus E Quiñonez.

*Miercoles 3 diciembre de 2025
Condiciones Climaticas: lluvia, intensa
personal: Jesus quiñonez; obra, nayitha posada: interventoria, SISO: Jefferson montañez obrero: wilson hurtado, Joel lopez, ferney florez.
lluvia intensa todo el dia, las actividades fueron Suspendidas la lluvia estuvo hasta las 4 pm no se trabajo en todo el dia.

Jesus E. Quiñonez.

Jueves 4 diciembre de 2025.
Condiciones Climaticas: lluvia intensa y rayos
personal: Jesus quiñones: obra, nayitk posada: interventoria
SISO: Jefferson montañez, obrero: wilson hurtado, ferney flores el tecnico.
por condiciones Climaticas adversas se suspendieron las actividades programadas para ejecta y evitar accidentes, se deja. Constancia de que actualmente está llueve mucho en el sector.

Jesus E Quiñonez

Viernes 5 diciembre 2025
Condiciones Climaticas: nublado y frio
personal: Jesus quiñones, nayitk posada; intercentoria
SISO: jefferson montañez, obrero wilson hurtado, ferney flores tecnico,
se iniciaron labores a las 7:00 am pero la lluvia llegó a las 9:00 am, por recomendacion del SISO se suspendieron labores de instalacion.

Jesus E. Quiñonez

Sabado 6 de diciembre de 2025
Condiciones Climaticas: nublado y frio
personal: Jesus quiñones: nayitk posada de intercentoria,
SISO: Jefferson montañez, obrero wilson hurtado, ferney flores el tecnico.
Se inicaron labores a las 7:00 am realizando instalacion de luminarias, luego en Serco a las 10:50 am Hizo suspender las actividades.

Jesus E. Quiñonez

10

Domingo 6 de diciembre 2025

No se labora.

JESUS E. QUIÑONEZ

Lunes 7 de diciembre 2025

Condiciones climaticas: Soleado y seco.

Personal de tabajo: Jesus Quiñones, Residente de obra, Neyitha posada, Residente interventoria. ferney florez: tecnico electrico. Jefferson montañez: SISO.

Actividades realizadas en obra: Se inician actividades 7:00 am, el Siso realiza la charla y la importancia de la seguridad y la Salud en el tabajo.

Se inician las intalaciones de las luminarias a las 8:00 am, Siendo las 9:00 am comenzó a llover y se suspendieron las actividades de tabajo.

JESUS E. QUIÑONEZ

Martes 8 de diciembre 2025

Condiciones Climatricas: Soleado y seco.

Se continuó por dia festivo no laboral

JESUS E QUIÑONEZ

Miercoles 9 de diciembre de 2025

Condicions climatricas: nublado y lluvioso

personal de tabajo: Jesus Quiñones: Residente obra, Neyitha posada, Residente interventoria, ferney florez: tecnico electrico, Jefferson montañez. Si So.

Por recomendación del Siso no se realizan actividades de tabajo ya que ha estado lloviendo durante la mañana.

JESUS E QUIÑONEZ

Jueves 10 diciembre de 2025
Condiciones Climaticas: Soleado y seco.
Personal de trabajo: Jesus Quiñonez: Residente obra; Nayitha Posada. Residente interventoria. Ferney Florez tecnico electrico. Jeferson montañez SISA
Actividades realizadas: Se inician actividades a las 7:00am y se inicia la charla de Seguridad donde se indica la importancia de las normas y acatar la Seguridad, Se inician a instalar lamparas pero alrededor de las 9:00 am comenzo a llover y se suspenden actividades.

Jesus E. Quiñonez

Viernes 11 diciembre de 2025
Condiciones Climaticas: lluvioso y frio
personal de trabajo: Jesus quiñonez; Residente obra; nayitha posada Residente interventoria., ferney florez, tecnico electrico, jefferson montañez, siso.
Actividades realizadas: se inicia la charla por parte del siso, en donde se explican las importancia de acatar normas de seguridad, no se realizan instalaciones debido a la lluvia presentada

Jesus E. Quiñonez

Sabado 12 diciembre de 2025
Condiciones Climaticas: lluvioso y frio
Personal de trabajo: Jesus quiñonez; Residente obra, nayitha posada, Residente interventoria, ferney florez; tecnico electrico, jefferson montañez-siso
Actividades realizadas: Charla por parte del siso donde explica la importancia de las normas de seguridad, debido a las lluvias no se realizan actividades de trabajo.

Jesus E. Quiñonez

12

Domingo 13 diciembre 2025

No se labora este día

JESUS E. QUIÑONEZ

Lunes 14 diciembre 2025
Condiciones Climáticas: Soleado y seco
personal de trabajo: Jesus Quiñonez; Residente obra, nayitha posada, Residente interventoría; ferney florez; tecnico electrico, jefferson montañez. SISO
Actividades realizadas: se inicia con la charla diaria de seguridad por parte del siso, se coordinan los materiales para instalar y el tecnico se dispone a instalar se realizan instalacion de 4 lamparas Barrio ciudad bolivar.

JESUS E QUIÑONEZ

Martes 15 diciembre 2025
Condiciones Climáticas: lluvioso y frio, Humedo
personal de trabajo: Jesus Quiñonez, residente de obra, nayitha posada Residente interventoria, ferney florez, tecnico electrico. Jefferson montañez, SISO.
Actividades realizadas, se inicia la charla del SISO, se inician actividades de instalacion a las 9:00 am debido a la lluvia se trabajó hasta el medio dia es dia festivo.

JESUS E. QUIÑONEZ

Jueves 16 diciembre de 2025.
Condiciones Climáticas: Seco y Soleado
personal de trabajo: Jesus Quiñonez. residente obra, nayitha posada Residente interventoria, ferney florez, tecnico electrico, jefferson montañez, SISO.
Actividades realizadas: se inician las charlas por parte del siso capacitando la importancia de las zonas de seguridad, se inician las

instalaciones de alumbrado Publico, en el dia se instalaron 5 lamparas todas las Condiciones de instalación.

JESUS E. QUIÑONEZ

Miercoles 17 diciembre de 2025
Condiciones Climaticas: Soleado y seco.
Personal de trabajo: Jesus quiñonez, residente obra, nayith posada residente de interventoria. ferney florez, tecnico electrico, jefferson montañez, SISO.
Actividades realizadas: Se inicia 7:00 am la charla por parte del SISO. donde explica la importancia de las normas de seguridad Se inician actividades de instalación en el sector rural, donde se realiza la instalacion en San francisco.

JESUS E. QUIÑONEZ

Jueves 18 diciembre de 2025.
Condiciones Climaticas: Soleado y seco.
personal de trabajo: Jesus quiñonez, residente obra, nayith posada residente interventoria, ferney florez tecnico electrico, jefferson montañez. SISO
Actividades realizadas: Se inician la charla por parte del SISO donde explica la importancia de las normas de seguridad, acto seguido se inician actividades de instalación, donde se instalaron lamparas de alumbrado en el sector de San francisco.

JESUS E. QUIÑONEZ

Viernes 19 de diciembre de 2025
Condiciones Climaticas: Soleado y seco.
Personal de trabajo: Jesus Quiñonez, Residente de obra, nayith posada, residente interventoria, ferney florez tecnico electrico, Jefferson montañez, SISO

Actividades realizadas: Se inicia con la Charla por parte del SISO donde explica la importancia de las normas de seguridad. Se procedió a seguir la instalacion de luminarias en el Corregimiento de San Francisco.

JESUS E. QUIÑONEZ

Sabado 20 de diciembre de 2025

Condiciones Climaticas: Soleado y Seco

personal de trabajo: Jesus Quiñonez, Residente obra, Nayith Posada, Residente interventoria, Ferney Florez, tecnico electrico. Jefferson montañez, SISO.

Actividades realizadas, Se inicia la charla por parte del SISO, luego se organizan las herramientas y material de trabajo. para iniciar instalaciones, se procede a terminar las luminarias correspondientes en el sector de San Ramiro.

JESUS E. QUIÑONEZ

Domingo 21 de diciembre de 2025.

No se labora.

JESUS E. QUIÑONEZ

Lunes 22 de diciembre de 2025

Condiciones Climaticas: Soleado y seco

personal de trabajo: Jesus Quiñonez Residente de obra, nayith posada, residente interventoria. Ferney Florez. tecnico electrico, Jefferson montañez, SISO.

Actividades realizadas, Se inicia la Charla del SISO donde explica importancia de las normas de seguridad. y se inicia las labores de instalacion en el sector de la corregimiento de San isidro.

JESUS E. QUIÑONEZ

Martes 23 de diciembre de 2025.
Condiciones Climaticas: Soleado y Seco.
personal de trabajo: Jesus Quiñonez, Residente obra, Nayitha Pineda, Residente interventoria, Ferney Florez. tecnico electrico, Jefferson montañez. SiSo.
Actividades realizadas: Se realiza la charla por parte del SiSo donde resalta las normas de seguridad, luego se inician actividades de instalacion en el sector de San Isidro.

JESUS E. QUIÑONEZ

miercoles 24 de diciembre 2025
Condiciones Climaticas: Soleado y seco
personal de trabajo: Jesus Quiñonez, Residente de obra, Nayitha Pineda, residente de interventoria, Ferney Florez, tecnico electrico, Jefferson montañez, SiSo.
Actividades Realizadas: se inician labores de trabajo 7:00 am charla por parte del SiSo. se acuerdan trabajos hasta el medio dia por el tema de festividades.

JESUS E. QUIÑONEZ

Jueves 25 de diciembre de 2025

No se labora. dia festivo.

JESUS E. QUIÑONEZ

Viernes 26 de diciembre de 2025
Condiciones climaticas: Soleado y seco.
personal de trabajo: Jesus Quiñonez, Residente obra, Nayitha Pineda, Residente interventoria, Ferney Florez, tecnico electrico, Jefferson montañez SiSo.
Actividades a realizar: se inician labores a las 7:00am se

16

dió la charla por parte del SISO y se continuaron las instalaciones de las lamparas de alumbrado publico en el corregimiento de San Isidro.

JESUS E. QUIÑONEZ

Sabado 27 de diciembre de 2025
Condiciones Climaticas: Soleado y seco.
Personal de trabajo: Jesus Quiñonez, Residente obra, nayeth posada Residente Interventoria, Fermer Florez, teenco electrico, Jefferson montañez SISO.
Actividades realizadas: Se inician las labors de trabajo a las 7:00 am y se dió la charla por parte del SISO, luego se inician las instalaciones de luminarias en el sector del Corregimiento de San Isidro.

JESUS E. QUIÑONEZ

Domingo 28 de diciembre de 2025

No se labora.

JESUS E. QUIÑONEZ

Lunes 29 de diciembre de 2025
Condiciones Climaticas: Soleado y seco
Personal de trabajo: Jesus Quiñonez, Residente obra, nayeth posada, residente de interventoria, Fermer Florez, teenco electrico, Jefferson montañez, SISO
Actividades realizadas, se inicia Actividades a las 7:00 am, luego el SISO dá la charla y la importancia de las normas de seguridad, Se inician Labores de instalacion de alumbrado publico en el Sector de Buenavista.

JESUS E. QUIÑONEZ

Martes 30 de diciembre de 2025
Condiciones Climaticas: Soleado y seco
Personal de trabajo: Jesus Quiñonez, Residente obra, nayeth Posada, residente interventoria, ferney florez, tecnico electrico, jeffersson montañez, SISO.
Actividades realizadas: Se inician labores a las 7:00 am, luego el SISO da la charla de seguridad y el tecnico sigue realizando la instalacion de Alumbrado publico en el corregimiento de Buenavista.

JESUS E. QUIÑONEZ

Miercles 31 de diciembre de 2025.
Condiciones Climaticas: Soleado y seco.
Actividades realizadas: Se realiza comité de obra donde el contratista por el tema de trasladado y otras consideraciones Solicita SSPender el contato por un término de 30 dias Calendarios.

JESUS E QUIÑONEZ

Sabado 31 de Enero de 2026
Condiciones Climaticas: Soleado y seco
Actividades realizadas: Se actualizan polizas del Contato por parte del contratista así Como tambien Ajusta la seguridad de los trabajadores.

JESUS E. QUIÑONEZ

Domingo 1 febrero 2026

No se trabaja.

JESUS E. QUIÑONEZ

Lunes 2 febrero de 2026
Condiciones Climaticas: Soleado y Seco.
personal de trabajo: Jesus Quiñones: Residente obra, martha posada, Residente interventoria, Ferney florez, tecnico electrico. Jefferson montañez, Siso.
Actividades realizadas: Se inician labores de trabajo 7:00 am luego el Siso realiza Su charla dela importancia de las normas de Salud y Seguridad en el trabajo. posterior a esto, Se siguen las actividades de instalacion en la conegrimiento de Buenavista.

JESUS E QUIÑONEZ

Martes 3 febrero de 2026
Condiciones Climaticas: Soleado y seco
personal de trabajo: Jesus Quiñonez, residente de obra, martha posada, residente de interventoria, Ferney florez tecnico electrico Jefferson montañez, Siso.
Actividades a realizar: Se inician labores a las 7:00 am Se dicta la Charla por parte del Siso donde se expresa la importancia de las normas de seguridad y Se Continua la instalacion en el Conegrimiento de Buenavista

JESUS E. QUIÑONEZ

Miercoles 4 febrero de 2026.
Condiciones Climaticas: Soleado y Seco.
personal de trabajo: Jesus quiñones: Residente obra, martha posada, Residente interventoria, Ferney florez tecnico electrico, Jefferson montañez, Siso.
Actividades realizadas: Se dicta la Charla por parte del Siso, luego el tecnico finaliza la instalacion en el Conegrimiento de Buenavista.

JESUS E. QUIÑONEZ.

Jueves 5 de febrero de 2026.
Condiciones Climaticas: Soleado y Seco.
Personal de trabajo: Jesus Quiñones, Residente de obra, Nayth posada Residente interventoria, Ferney Florez, tecnico electrico, Jefferson montañez, SISO.
Actividades realizadas: Se inician labores a las 7:00 am, se dicta la charla por parte del SISO y se inician labores de instalacion de alumbrado Publico en el corregimiento de villaflor.

JESUS E. QUIÑONEZ

Viernes 6 de febrero de 2026
Condiciones Climaticas: Soleado y Seco.
personal de trabajo: Jesus Quiñones. Residente de obra, Nayth Posada Residente de interventoria, Ferney Florez, tecnico electrico, Jefferson montañez, SISO.
Actividades realizadas: Se inician labores 7:00 am, se dicta la charla de Seguridad y se Continuan instalando lamparas de alumbrado publico en el corregimiento de villaflor.

JESUS E. QUIÑONEZ

Sabado 7 febrero de 2026
Condiciones Climaticas: Soleado y Seco
personal de trabajo, Jesus quiñonez, Residente de obra, nayth posada, residente de interventoria, Ferney florez, tecnico electrico, Jefferson Montañez, SISO.
Actividades realizadas: se inician labores 7:00 am se dicta la charla de seguridad y se inicion trabajos en el corregimiento de Patima donde se realiza la instalacion de luminarias de alumbrado publico en este Sector.

JESUS E. QUIÑONEZ

Domingo 8 febrero de 2026

No se trabaja.

JESUS E. QUIÑONEZ

Lunes 9 febrero de 2026
Condiciones Climaticas: Soleado y Seco.
personal de trabajo: Jesus Quiñonez, Residente de obra, Nayeli Posada Residente de interventoria, Yeiner Florez, Yeiner electrico, Jefferson montañez, Siso.
Actividades realizadas: Se inician labores a las 7:00pm luego el Siso realiza la Charla de Seguridad, posteriormente se continuan instalando luminarias en el coreginiento de Fatima.

JESUS E. QUIÑONEZ

Martes 10 febrero de 2026
Condiciones Climaticas: Soleado y Seco
personal de trabajo: Jesus Quiñonez, Residente obra, Nayeli Posada, residente interventoria, Yeiner Florez, Yeiner electrico, Jefferson montañez, Siso.
Actividades realizadas: Se inicia instalacion en el Coreginiento de San Jose, en donde se nota presencia grupos Armados ilegales

JESUS E. QUIÑONEZ

Miercoles 11 febrero de 2025
Condiciones: Soleado y Seco
Actividades: se realiza Cierre de obra donde el Contratista Solicita Suspender el Contrato por un mes Calendario mientras se Solucionan problemas de orden Publico y del mismo Contratista. Se aprueba la Suspension x por 30 dias Calendario.

JESUS E. QUIÑONEZ

Jueves 12 Marzo de 2026
Actividades realizadas: Se realiza Comite de obra y una vez reunidos el contratista manifiesta que solicita ampliacion o a la suspension 02 debido las condiciones aun no estan garantizadas para continuar la ejecucion, la interventoria y la supervision estan de acuerdo con esta ampliacion a la suspension 2. Se aprueba esta ampliacion a la suspension por un termino de 15 dias calendario.

JESUS E. QUIÑONEZ.

Jueves 26 marzo de 2026
Actividades realizadas: Se realiza Comite de obra Solicitado por el contratista, una vez reunidos el Contratista Solicito ampliacion 2 a la suspension 2 esta vez por 30 dias Calendarios, esto con el fin de mitigar los inconvenientes que dieron origen a la suspension La interventoria y la supervision estan de acuerdo con la ampliacion por 30 dias Calendario y Se aprueba.

JESUS E QUIÑONEZ

Lunes 13 de abril de 2026
Actividades realizadas: Se da el reinicio numero dos (2) del contrato en curso, se actualizan polizas y seguridad social del personal.

JESUS E. QUIÑONEZ.

Martes 14 abril de 2026
Actividades realizadas: Se realiza por solicitud del contratista y bajo justificacion tecnica una adicion en tiempo por 15 quince dias calendario y un adicional en recursos para instalacion de nuevas luminarias en los barrios nuevos del corregimiento de Conejo y el Corregimiento de Buenavista, asi como en

22

el casco urbano del municipio, con nueva fecha de afirmacion 29 de abril de 2026.

Jesus E. Quiñonez

Miercoles 15 abril de 2026
Condiciones Climaticas: Soleado y Seco
personal de trabajo: Jesus quiñonez: residente obra, nayeth posada, residente interventoria, ferney florez. tecnico electrico jeferson montañez, SISO.
Actividades realizadas: se continua realizando instalaciones en el sector rural Sector de San benito y se instala el alumbrado publico en este Centro poblado.

Jesus E. Quiñonez

Jueves 16 abril de 2026.
Condiciones Climaticas: Soleado y seco
personal de trabajo: Jesus quiñonez residente obra, nayeth posada residente interventoria, ferney florez tecnico electrico, jeferson montañez, SISO.
Actividades realizadas: se dicta la charla por parte del SISO, se inicia la instalacion en el corregimiento de Sanchez donde se realiza la instalacion del alumbrado publico.

Jesus E. Quiñonez

Viernes 17 abril 2026
Condiciones Climaticas: Soleado y seco
personal de trabajo: Jesus quiñonez, Residente de obra, nayeth posada, residente de interventoria, ferney florez. Jefferson montañez SISO,
Actividades realizadas, se inician labores 7:00 am, el SISO realiza la charla y se continua la instalacion de alumbrado publico en

el Corregimiento de Canelos, en el nuevo Barrio donde no se habian instalado luminarias.

Jesus E. Quintanez.

Sabado 18 de abril de 2026.
Condiciones Climaticas: Soleado y seco:
Personal de trabajo: Jesus Quintanez, Nayita Posada residente interventoria, Forney Florez, Tecnico electrico, Jeffersan montañez Siso.
Actividades realizadas: Se inician actividades 7:00 am, Se Continuan instalando lamparas barrio la playita de Canelos y se culminan actividades en este Sitio.

Jesus E. Quintanez.

Domingo 19 abril 2026

no Se Labora.

Jesus E. Quintanez

Lunes 20 abril 2026
Condiciones Climaticas: Soleado y Seco
Personal de trabajo: Jesus Quintanez, residente de obra, Nayita Posada, residente interventoria, Forney Florez tecnico electrico, Jeffersan montañez, Siso.
Actividades realizadas: Se inician actividades de trabajo en el Corregimiento de arrayanes, Se instalan las luminarias de alumbrado publico en este corregimiento.

Jesus E. Quintanez

24

Martes 21 de abril de 2026
Condiciones Climaticas: Soleado y Seco.
Personal de trabajo: Jesus Quiñones, residente obra, nayeth posada, residente Interventoria, ferney florez, tecnico electrico, jefferson montañez, Soso
Actividades realizadas, Se inician labores a las 7:00 am, luego Se inician instalacion de luminaras de alumbrado publico en el sector barrio el jardin de Buenavista donde no se habian instalado Alumbrado publico.

Jesus Quiñonez.

miercoles 22 abril 2026
Condiciones Climaticas: Soleado y Seco
personal de trabajo: Jesus quiñones, residente de obra, nayeth posada, residente de interventoria, ferney florez, tecnico electrico, jefferson montañez, Soso.
Actividades realizadas: Se continua con los trabajos de instalacion en el barrio el jardin de buenavista, a las 10:00 am Comienza a llover y por consiguiente Se suspenden las actividades de trabajo.

Jesus E. Quiñonez

Jueves 23 abril 2026
Condiciones Climaticas: Soleado y Seco
Personal de trabajo: Jesus Quiñones, residente de obra, nayeth posada, residente interventoria, ferney florez, tecnico electrico, jefferson montañez Siso.
Actividades realizadas: Se inician labores a las 7:00 am Se continuan las actividades de instalación de Alumbrado publico, Se trabajo hasta las 2:30 pm yaque una fuerte lluvia atrasó la instalacion.

Jesus E. Quiñonez

Viernes 24 abril de 2026
Condiciones Climáticas: Lluvioso y Frio
personal de trabajo: Jesus Quiñones. residente obra, Nayith Posada residente interventoria. Ferney Florez tecnico electrico. Jefferson montañez. SISO
Actividades realizadas: se inician labores 7:00 am. luego el siso dicta la Charla correspondiente, se inicia la instalación de las lamparas a las 9:00 am por la lluvia, esta continuó a las 3pm y se suspendieron los trabajos por el resto del dia.

Jesus E. Quiñonez

Sabado 25 abril de 2026
Condiciones Climaticas: Soleado y seco.
Personal de trabajo: Jesus Quiñones, residente obra, Nayith Posada residente interventoria, Ferney florez. tecnico electrico., Jefferson montañez, SISO.
Actividades realizadas: Se inician labores de trabajo 7:00 am. luego el siso dicta la Charla de Seguridad y se inicia la instalacion de lamparas hasta el jardin de Bucaristra donde se concluye con la totalidad de las lamparas programadas en ese sector.

Jesus E. Quiñonez.

Domingo 26 de abril de 2026

no se labora

Jesus E. Quiñonez

Lunes 27 abril de 2026
Condiciones Climaticas: Soleado y Seco.
Personal de trabajo: Jesus Quiñones, residente obra, Nayith Posada, residente interventoria. Ferney Flores tecnico electrico, Jefferson montañez, SISO

Actividades realizadas: Se inician trabajos 7:000m, luego el S.S= dicto la Charla de Seguridad, se inicia instalacion en Puntos criticos del municipio de Santa Rosa casco urbano.

Jesus E. Quiñonez.

Martes 28 de abril de 2026
Condiciones Climaticas: Soleado y Seco.
Personal de trabajo: Jesus Quiñones. residente obra, nayda posada, residente interventoria, Farey Florez. tecnico electrico, Jefferson montañez, S.S.o
Actividades realizadas: Se continua Con la instalacion en el municipio de Santa Rosa del Sur, casco urbano, en puntos criticos. del municipio.

Jesus E. Quiñonez

Miercoles 29 abril de 2026
Condiciones Climaticas: Soleado y Seco
personal de trabajo: Jesus Quiñones. residente obra, nayda posada, residente interventoria, Farey Florez. tecnico electrico, Jefferson montañez, S.S.o
Actividades realizadas: Se finaliza la instalacion de las luminarias de alumbrado Publico en el casco urbano y rural dando. total Cumplimiento al proyecto.

Jesus E. Quiñonez.
