EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE

Nit: 901.494.307

RESERVA PRESUPUESTAL PAGADA

Numero: 00287 **Fecha: 23/06/2026**

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00034	19/06/2026

NIT o Cèdula:	901.411.511
Beneficiario:	GRUPO BAW SAS

Concepto de este Egreso

951E33BFE5FB9B85966250887867EEA1

INFORME DE ACTIVIDADES N-3 CONTRATO DE OBRA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO, COMETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGA CON LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MISMO. COP-079-2025.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
03-2.3.2.01.01.001.02.03	**EDIFICIOS COMERCIALES**		**328.954.194,00**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	328.954.194,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	0000000000000	No aplica	328.954.194,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	328.954.194,00
CCPET04 - TERCEROS	1	NO APLICA	328.954.194,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	328.954.194,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	328.954.194,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	00000000	No Aplica	328.954.194,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
328.954.194	**59.869.664**	**269.084.530**

Valor en letras:

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
161-227903-59	AH_CUENTA DE AHORROS EMEGA	00000CE287	269.084.530,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - Versión AriesNet

Impreso por: MELISSA HERRERA MARIN

EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE

Nit: 901.494.307

RESERVA PRESUPUESTAL PAGADA

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA HOSPITAL	1,00	3.289.542,00
ESTAMPILLA PROANCIANO	4,00	13.158.168,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	6.579.084,00
PRODEPORTES 2.5 %	2,50	8.223.855,00
RETE ICA 0.7%	0,70	2.302.679,00
CONSTRIBUCION ESPECIAL 5%	5,00	16.447.710,00
RET TIMBRE 1%	1,00	3.289.542,00
OBRA PUBLICA 2%	2,00	6.579.084,00

Certifico que: Recibi a satisfaccion el valor de esta cuenta.

UBALDO DE JESUS CASTRILLON
Gerente General

JULIAN MAURICIO MONTOYA
Director Administrativo y Financiero

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - Versión AriesNet

Impreso por: MELISSA HERRERA MARIN

EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE

Nit: 901.494.307

OBLIGACIÓN CONTRAIDA POR RESERVA PRESUPUESTAL

Numero: 00034 **Fecha: 19/06/2026**

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00251	01/01/2026

NIT o Cèdula:	901.411.511
Beneficiario:	GRUPO BAW SAS

Por Concepto de:

43FD97211A44F4FC77BE9EDBD2A594C3

INFORME DE ACTIVIDADES N-3 CONTRATO DE OBRA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO, COMETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGA CON LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MISMO. COP-079-2025.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
03-2.3.2.01.01.001.02.03	**EDIFICIOS COMERCIALES**		**328.954.194,00**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	328.954.194,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	0000000000000	No aplica	328.954.194,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	328.954.194,00
CCPET04 - TERCEROS	1	NO APLICA	328.954.194,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	328.954.194,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	328.954.194,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	00000000	No Aplica	328.954.194,00

Valor en letras:

TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA HOSPITAL	1,00	3.289.542,00
ESTAMPILLA PROANCIANO	4,00	13.158.168,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	6.579.084,00
PRODEPORTES 2.5 %	2,50	8.223.855,00
RETE ICA 0.7%	0,70	2.302.679,00
CONSTRIBUCION ESPECIAL 5%	5,00	16.447.710,00
RET TIMBRE 1%	1,00	3.289.542,00
OBRA PUBLICA 2%	2,00	6.579.084,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
328.954.194,00	**59.869.664,00**	**269.084.530,00**

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - Versión AriesNet

Impreso por: MELISSA HERRERA MARIN

EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD
DE GUARNE

Nit: 901.494.307

OBLIGACIÓN CONTRAIDA POR RESERVA PRESUPUESTAL

UBALDO DE JESUS CASTRILLON	**JULIAN MAURICIO MONTOYA**
Gerente General	**Director Administrativo y Financiero**

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - Versión AriesNet
Impreso por: MELISSA HERRERA MARIN

INFORME DE ACTIVIDADES No.03
CONTRATO COP-079-2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	COP-079-2025
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE "EMEGA".
CONTRATISTA	GRUPO BAW S.A.S.
NIT	901.411.511-4
NOMBRE	ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS
CEDULA	1.220.469.730
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE -EMEGA-
VALOR INICIAL	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($1.250.296.755) INCLUIDO TODOS LOS COSTOS, GASTOS Y TRIBUTOS A QUE HAYA LUGAR.
PLAZO	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	16 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	16 DE MARZO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN	20 DE FEBRERO 2026
FECHA DE REANUDACIÓN	21 DE MARZO 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE ABRIL DE 2026
OTROSÍ N° 01-PRORROGA.	
OBJETO DEL OTROSÍ:	OBJETO DEL OTROSÍ: MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA QUINTA. PLAZO.
PLAZO A PRORROGAR MEDIANTE EL PRESENTE OTROSÍ:	PLAZO A PRORROGAR MEDIANTE EL PRESENTE OTROSÍ: CINCUENTA Y DOS (52) DÍAS CALENDARIO.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 05 DE JUNIO DE 2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($1.250.296.755) INCLUIDO TODOS LOS COSTOS, GASTOS Y TRIBUTOS A QUE HAYA LUGAR.
VALOR POR CONCEPTO DE 20% INICIAL SEGÚN LO DEFINIDIO EN EL	TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE PESOS M/L ($ 375.089.027)

OTROSI N°1 VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO	
VALOR EJECUTDO DEL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 30 DE ABRIL DEL 2026.	SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 795.988.198)
SALDO A PAGAR DEL PERIODO 16 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 30 DE ABRIL DEL 2026. (RESTANDO EL PAGO ANTICIPADO)	CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UN MIL PESOS ($ 420.899.171)
VALOR EJECUTDO DEL PERIODO DEL 01 DE MAYO DEL 2026 AL 31 DE MAYO DEL 2026.	TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 328.954.194)
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	CIENTO VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/L ($ 125.354.363)
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	89.97 %
PORCENTAJE POR EJECUTAR	10.03 %
ESTADO DE LA GARANTÍA	N/A

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE MAYO DEL 2025 AL 31 DE MAYO DEL 2026.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con las obligaciones específicas pactadas se desagregan en la siguiente tabla, donde se relacionan las cantidades contractuales y cantidades ejecutadas en acta de avance N°2; y se anexa carta de aprobación por parte de la interventoría, firmada el 30 DE MAYO DEL 2026 por parte del director de la interventoría, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida.

INTEGRAR CONSTRUCCIONES

CERTIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRA

El suscrito representante legal de INTEGRARCONSTRUCCIONES S.A.S., en calidad de interventor del Contrato N.° COP-079 DE 2025, cuyo objeto corresponde a la "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE – EMEGA", se permite:

HACER CONSTAR:

Que el contrato suscrito entre la EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE "EMEGA" y CONSTRUCCIONES S.A.S., cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE – EMEGA", registra un avance físico de obra correspondiente al 89,97%, con corte al 30 de mayo de 2026.

Así mismo, se certifica que las actividades ejecutadas cumplen con las especificaciones técnicas contractuales y se desarrollan conforme al cronograma aprobado y a las obligaciones contractuales vigentes.

La presente certificación se expide como soporte para el trámite de pago del ACTA DE OBRA PARCIAL N.° 02, por valor de TRECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L ($328.954.194).

Se expide en el municipio de Sabaneta, Antioquia, a los treinta (30) días del mes de mayo de 2026.

LILIANA MARCELA GUARIN CARDONA
Representante legal
INTEGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.
Interventor

Adicional por parte de EMEGA el arquitecto Juan David Londoño quien acompaña la supervisión del contrato, realizo la validación de la suficiencia y alcance de la información entregada en el acta, enviado correo de validación como se muestra en la siguiente imagen:

Re: ACTA_02_SEDE

CASA ARQUITECTONICA <casa.arquitectonica@
Para Juan Gabriel Mancera Trejos

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

lunes 22/06/2026 8:49 a. m.

Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

Buenos días,

Luego de revisada la información adjunta, se deja constancia de que la misma se ajusta a las cantidades y evidencias presentadas, tanto en acta, memorias e informe de avance del contratista.

El jue, 18 jun 2026 a las 9:09, Juan Gabriel Mancera Trejos (<infraestructura@emega.gov.co>) escribió:

https://we.tl/t-yFUo9aJC3GYW3KFH

Es importante resaltar y hacer claridad que desde EMEGA y la supervisión del contrato, ***realizamos la administración delegada de los recursos***, el alcance contractual, descripción de los ítems, valores de los ítems, suficiencia y satisfacción de estos, son decisión de la supervisión por parte del municipio, y corresponden a la formulación, necesidad y priorización definida para cada contrato, los cuales son competencia específica de cada secretaria.

Cordial saludo,

Juan Gabriel Mancera Trejos
Director técnico e infraestructura

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA DE OBRA N°2		ACUMULADO TOTAL		VALORES DISPONIBLES	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL
1	PRELIMINARES										
1,1	Localización, trazado y replanteo de edificaciones. Medido como área construida. Incluye hiladeros y señalización necesaria.	m2	301,00	$4.149,00	$1.248.849		$0,00	293,00	$ 1.215.657	0,00	$0
1,2	Cerramiento Provisional en tela de cerramiento verde h: 2.10 incluye estructura de madera común, anclajes de parales al piso y tela verde	ml	60,00	$28.575,00	$1.714.500		$0,00	100,00	$ 2.857.500	0,00	$0
1,3	Campamento provisional en teleras y teja de zinc. Incluye puerta de acceso, bisagras, cerradura de seguridad, conexiones eléctricas y de iluminación.	m2	25,00	$131.838,00	$3.295.950		$0,00	25,00	$ 3.295.950	0,00	$0
1,5	Suministro e instalación de redes Eléctricas provisionales.	glb	1,00	$4.653.464,00	$4.653.464		$0,00	1,00	$ 4.653.464	0,00	$0

1,6	Suministro e instalación de redes Hidráulicas provisionales.	glb	1,00	$1.737.996,00	$1.737.996		$0,00	1,00	$ 1.737.996	0,00	$0
2	**CONCRETOS Y ACEROS**										
2.1	CONCRETO PARA ESCALERAS DE 3000 PSI: realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 12,5 mm	m2	28,50	$350.488,00	$9.988.908		$0,00	0,00	$ 0	25,30	$8.867.346
2.2	CONCRETO PARA COLUMNAS DE 3000 PSI: Columna de sección cuadrada de concreto armado, realizado con concreto f'c=280 kg/cm² (28 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 19 mm	m3	9,94	$1.369.523,00	$13.607.581		$0,00	13,99	$ 19.159.627	0,00	$0
2.3	CONCRETO PARA VIGAS AÉREAS: Viga de concreto armado, realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa), máximo del agregado 19 mm,a, en planta de hasta 3.5 m de altura libre	m3	36,92	$1.454.823,00	$53.709.156		$0,00	17,07	$ 24.833.829	0,00	$0

2.4	Viga de amarre de 0.15m x 0.20m en concreto de 21 mpa. El acero de refuerzo se pagará por su respectivo ítem	ml	98,00	$79.375,00	$7.778.750		$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0	
2.5	Construcción de LOSA en concreto premezclado según diseño armada con casetón de Poron Recuperable. Incluye suministro, transporte, bombeo con Auto bomba o bomba estacionaria y colocación del concreto a una altura de entre 3.0 y 4.0m, formaleta en súper T de 19 mm. o equivalente para acabado a la vista en la parte inferior y paredes laterales y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. Incluye suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para el correcto vaciado según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m2	228,00	$369.714,00	$84.294.792		$0,00	202,00	$ 74.682.228	0,00	$0	
2.6	Construcción de junta de dilatación entre muros y elementos estructurales para pañetes en exterior.	ml	485,00	$8.008,00	$3.883.880		$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0	

2.8	Suministro, transporte e instalación de Acero de Refuerzo Figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	14.650,00	$8.196,00	$120.071.400		$0,00	16.097,50	$ 131.935.110	0,00	$0
2.9	Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D-84Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	kg	559,56	$9.393,00	$5.255.947		$0,00	526,50	$ 4.945.415	0,00	$0
2.10	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL según diseño. Incluye PHR PTS PLATINAS Y RIOSTRAS	kg	4.792,24	$23.000,00	$110.221.539		$0,00	4.317,33	$ 99.298.590	0,00	$0
2.11	Colocación de GROUTING en concreto de 17.5 Mpa., para relleno de muro no estructural (bloque, tolete o catalán). Incluye mano de obra, vibrado, protección, curado y todos demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo.	ml	468,00	$24.803,00	$11.607.804		$0,00	226,77	$ 5.624.576	0,00	$0

2.12	Suministro, transporte e instalación de lagrimal en concreto.	ml	395,00	$51.999,00	$20.539.605	60,00	$3.119.940,00	60,00	$ 3.119.940	0,00	$0
2.13	Construcción de dinteles según diseño de elementos no estructurales. Incluye suministro, transporte y colocación de concreto, espesor indicado en planos. Incluye mano de obra, vibrado, formaleta, mano de obra, El acero se paga en su respectivo ITEM.	ml	67,30	$41.223,00	$2.774.308		$0,00	6,00	$ 247.338	0,00	$0
2.14	Suministro e instalación de Anclajes epoxicos para diámetros de 3/8" y 1/2"; incluye perforación, limpieza, colocación acero de refuerzo y anclaje epoxico según normas NSR-10	und	389,00	$40.400,00	$15.715.600		$0,00	520,00	$ 21.008.000	0,00	$0
2.15	Construcción de JUNTA DE DILATACIÓN ENTRE MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES (una sola cara), ancho de 2 cm., instalación de varilla de espuma de polietileno tipo sellalón, sikarod ó equivalente de Ø= 1", aplicación de masilla elástica sellante y adhesiva con base en poliuretano tipo Sikaflex-1a ó equivalente, junta máxima de ancho= 20 mm. prof.= 5 mm., color similar al muro ó a definir por la interventoría. Incluye suministro y	ml	487,00	$36.293,00	$17.674.691		$0,00	178,88	$ 6.492.092	0,00	$0

	transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Se deben seguir todas las especificaciones y recomendaciones de los fabricantes de los materiales.										
2.16	Mortero para pendientes (e=5cm) con impermeabilizante integral.	m2	417,00	$62.949,00	$26.249.733	202,00	$12.715.698,00	495,00	$ 31.159.755	0,00	$0
3	**REVOQUES Y PINTURAS**										
3.1	Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	456,00	$41.741,00	$19.033.896		$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0
3.2	Suministro, transporte e instalación de estuco sobre muros. Dos manos o las que sean necesarias hasta lograr una superficie homogénea. Incluye la preparación de la superficie	M2	612,60	$26.804,00	$16.420.130	10,20	$273.400,80	218,71	$ 5.862.303	0,00	$0

3.3	Suministro y aplicación de estuco sobre filos de muros, mochetas, columnas, vigas y vanos de puertas y ventanas. Incluye la preparación de la superficie, el perfilado y aplomado de las aristas para garantizar un acabado recto y uniforme, listo para recibir la pintura final.	ml	180,00	$16.329,00	$2.939.220		$0,00	176,22	$ 2.877.496	0,00	$0	
3.4	suministro y aplicación de REVOQUE en mortero 1:4 impermeabilizado, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	m2	152,00	$46.743,00	$7.104.936	10,20	$476.778,60	218,71	$ 10.223.162	0,00	$0	
3.5	Fajas de revoque impermeabilizado con Sika 1.	ml	180,00	$28.045,80	$5.048.244		$0,00	417,37	$ 11.705.476	0,00	$0	
3.6	Aplicación de PINTURA DE PRIMERA CALIDAD. Para interiores y exteriores, sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales	m2	704,49	$22.862,00	$16.106.050	369,75	$8.453.224,50	369,75	$ 8.453.225	0,00	$0	
4	**ENCHAPES Y CERRAMIENTOS**											
4.1	Construcción de Muro portante de mampostería reforzada según diseño, de bloque de concreto 15 cm x 20 cm x 40 cm	m2	228,00	$104.039,00	$23.720.892		$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0	

4.2	Construcción de Muro el ladrillo catalán a la vista (según construcción existente). Incluye todo lo necesario para su construcción	m2	171,27	$181.655,00	$31.111.280		$0,00	249,37	$ 45.299.307	0,00	$0
4.4	Suministro, transporte y colocación de ventana en aluminio negro anodizado y vidrio incoloro templado de 6 mm. Incluye cerradura de seguridad y todos los elementos necesarios según diseño para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	79,50	$623.929,00	$49.602.356	58,28	$36.362.582,12	58,28	$ 36.362.582	0,00	$0
4.5	Suministro, transporte y colocación de puerta en aluminio anodizado y vidrio incoloro templado de 8 mm. Incluye cerradura de seguridad y todos los elementos necesarios según diseño para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	6,21	$664.970,00	$4.129.464	16,80	$11.171.496,00	16,80	$ 11.171.496	0,00	$0
4.6	suministro, transporte e instalación de Teja termoacústicas UPVC 2.5 mm cresta alta blanca, así como todos los componentes y accesorios necesarios para su montaje conforme a las especificaciones técnicas y normativas pertinentes.	m2	103,00	$96.801,00	$9.970.503	118,00	$11.422.518,00	118,00	$ 11.422.518	0,00	$0

4.8	Suministro, transporte e instalación de pasamanos metálico fabricado de la siguiente manera, pletina de anclaje de forma circular a muro, mas L en varilla de 1/2" lisa ,incluye la tornillería de ensamble .1 un tubo superior de 2" calibre 16,incluye pintura anticorrosiva y acabados según requerimiento.	m	22,74	$324.009,00	$7.367.965	11,26	$3.648.341,34	11,26	$ 3.648.341	0,00	$0
4.9	Suministro e instalación cerramiento para divisiones de oficinas en vidrio templado incoloro 10mm bordes pulidos y brillados con perfilería en aluminio negro, conformado por módulos fijos laterales y montantes superiores, tubular horizontal inferior de 3"x1"1/2, + tubulares verticales y horizontal superior de 10 x 4,5 cm con remarco en sistema 3831 pisa vidrio a presión con empaque, incluye 4 puertas batientes con zócalo inferior de 9cm con empaque y con base, bisagra hidráulica speedy trabajo pesado, chapeta esquinera superior con pivote platina aéreo, doble manija en acero inoxidable de 1"x40, cerradura Yale 170 1/4 con porta cerradura y recibidor cuadrado, cerrojos y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	59,92	$928.379,00	$55.628.470	30,34	$28.167.018,86	30,34	$ 28.167.019	0,00	$0

4.10	Suministro e instalación de cuerpo fijo de 2 módulos en persiana de ventilación 315, perfilería color negro.	m2	9,00	$585.548,00	$5.269.932		$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0
4.11	suministro, transporte e instalación de canal en lamina galvanizada cal. 18, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	55,00	$206.331,00	$11.348.205	33,50	$6.912.088,50	33,50	$ 6.912.089	0,00	$0
4.12	suministro, transporte e instalación de ruana para cubierta en lamina galvanizada cal. 26, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	38,00	$100.689,00	$3.826.182	35,80	$3.604.666,20	35,80	$ 3.604.666	0,00	$0
4.13	suministro, transporte e instalación de zócalo de baldosa Alpes grafito Gris formato 8,5 cm x 90 cm incluye todo lo necesario para su correcta instalación	ml	214,00	$35.846,00	$7.671.044	160,83	$5.765.112,18	160,83	$ 5.765.112	0,00	$0
4.15	Enchape De Pared Tipo Artica De Corona O Similar Colo Blanco Formato 30 X 60.Istalacion En Sentido Horizontal En Sistema Apilado.	m2	92,68	$88.027,00	$8.158.342		$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0
5	**APARATOS SANITARIOS**										
5.1	Suministro, transporte e instalación de Orinal mediano con válvula antivandálica Tipo push color blanco o equivalente	und	1,00	$704.803,00	$704.803	1,00	$704.803,00	1,00	$ 704.803	0,00	$0

5.3	Suministro, transporte e instalación de Espejo Cristal De 6 Mm Con Bordes Pulidos Pegado A Cerámica	m2	9,00	$123.000,00	$1.107.000		$0,00	0,00	$ 0	3,12	$383.760	
5.4	suministro, transporte e instalacion de Lavamanos Acuajet Institucional, incluye brazos de instalacion a muro, griferia Institucional para lavamanos Push mesa max y todos sus accesorios para su correcta instalacion	und	2,00	$1.370.500,00	$2.741.000	4,00	$5.482.000,00	4,00	$ 5.482.000	0,00	$0	
5.5	Suministro, transporte e instalacion de kit Taza Báltica plus entrada superior con válvula push de empotrar, incluye todos los accesorios para su correcta instalación.	und	2,00	$1.860.383,00	$3.720.766	4,00	$7.441.532,00	4,00	$ 7.441.532	0,00	$0	
6	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**											
	TABLEROS DE CIRCUITOS PARCIALES 3 PISO											
6.8	Suministro e instalación de tablero mb de 36 ctos trifásico con puerta	und	1,00	$3.714.200,00	$3.714.200		$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0	
6.9	Suministro e instalación de tablero mb de 24 ctos trifásico con puerta	und	1,00	$2.610.400,00	$2.610.400		$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0	
6.10	Suministro e instalación breakers enchufables monopolares de 1x20 amp	und	60,00	$19.600,00	$1.176.000	32,00	$627.200,00	32,00	$ 627.200	0,00	$0	

	SALIDAS DE TOMAS Y LUCES 3 PISO											
6.11	Salidas para tomas con p.t. 120v. normal. cable 3xno12 lshf, emt = 1/2" cajas y accesorio	und	36,00	$235.800,00	$8.488.800	6,00	$1.414.800,00	31,00	$ 7.309.800	0,00	$0	
6.12	salidas para tomas con p.t. 120v. Gfci	und	16,00	$235.800,00	$3.772.800	5,00	$1.179.000,00	5,00	$ 1.179.000	0,00	$0	
6.13	Salidas para tomas regulados con p.t. 120v. color naranja,cable 3xno12 lshf, imc = 1/2" cajas y accesorio metalico	und	16,00	$235.800,00	$3.772.800	3,00	$707.400,00	11,00	$ 2.593.800	0,00	$0	
6.14	salidas para luces 120v. Normales	und	60,00	$235.800,00	$14.148.000	17,00	$4.008.600,00	57,00	$ 13.440.600	0,00	$0	
6.15	salidas para luces de emergencia	und	5,00	$235.800,00	$1.179.000	4,00	$943.200,00	4,00	$ 943.200	0,00	$0	
6.16	salidas para television	und	2,00	$235.800,00	$471.600	2,00	$471.600,00	2,00	$ 471.600	0,00	$0	
6.17	suministro, instalacion y montaje de luminarias de emergencia	und	8,00	$163.100,00	$1.304.800	4,00	$652.400,00	4,00	$ 652.400	0,00	$0	
6.18	suministro e instalacion de tomas con p.t. 120v. normal	und	36,00	$113.500,00	$4.086.000	31,00	$3.518.500,00	31,00	$ 3.518.500	0,00	$0	
6.19	suministro e instalacion de tomas con p.t. 120v. Gfci	und	8,00	$113.500,00	$908.000	5,00	$567.500,00	5,00	$ 567.500	0,00	$0	
6.20	suministro e instalacion de tomas regulados con p.t. 120v.	und	8,00	$113.500,00	$908.000	11,00	$1.248.500,00	11,00	$ 1.248.500	0,00	$0	
6.21	suministro, instalacion y montaje de luminaria led 36 w	und	45,00	$222.560,00	$10.015.200	57,00	$12.685.920,00	57,00	$ 12.685.920	0,00	$0	

6.22	suministro e instalacion de interruptor sencillo o sensor de movimiento	und	16,00	$113.500,00	$1.816.000	2,00	$227.000,00	2,00	$ 227.000	0,00	$0
6.23	suministro e instalacion de tuberia metalica emt 3/4" y accesorios	ml	816,00	$6.490,00	$5.295.840		$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0
6.24	salidas para señal de evacuacio(salida),120 v, cable 3xno12 awg,emt de 1/2"cajas 2x4 metalicas, etc	und	5,00	$235.800,00	$1.179.000	2,00	$471.600,00	2,00	$ 471.600	0,00	$0
6.25	suministro e instalacion de señal de salida	und	5,00	$183.500,00	$917.500	2,00	$367.000,00	2,00	$ 367.000	0,00	$0
6.26	suministro e instalacion de salidas para video beam	und	2,00	$482.000,00	$964.000	2,00	$964.000,00	2,00	$ 964.000	0,00	$0
	VOZ Y DATOS										
6.27	salida para voz y datos, en cable utp cat 6a lshf, tuberia sch 40 de 3/4"	und	25,00	$450.000,00	$11.250.000	16,00	$7.200.000,00	16,00	$ 7.200.000	0,00	$0
6.28	suministro en instalacion de rack , suiche administrable, ap para salida de wifi	und	1,00	$18.525.000,00	$18.525.000	0,00	$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0
6.29	suministro transporte instalacion de camaras wifi	und	4,00	$1.581.250,00	$6.325.000	0,00	$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0
	SISTEMA DE PROTECCION DE UPS										
6.30	suministro de ups 15 kva, , on line	und	1,00	$8.000.000,00	$8.000.000	0,00	$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0

	REGISTROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION										
6.31	registros electricos de baja tension sb 325	und	1,00	$360.000,00	$360.000	0,00	$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0
7	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**										
7.1	Suministro, transporte e instalación de tubería 1/2" PVC RDE 13,5. incluye todo lo necesario para su correcta instalación	ml	35,00	$21.219,00	$742.665		$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0
7.2	Suministro, transporte e instalación de de tubería 3/4" PVC RDE 13,5. incluye todo lo necesario para su correcta instalación	ml	15,00	$23.514,00	$352.710		$0,00	10,90	$ 256.303	0,00	$0
7.3	Suministro, transporte e instalación de de tubería 1" PVC RDE 21. incluye todo lo necesario para su correcta instalación	ml	30,00	$29.837,00	$895.110		$0,00	7,00	$ 208.859	0,00	$0
7.4	Suministro, transporte e instalación de de tubería 1-1/4" PVC RDE 21. incluye todo lo necesario para su correcta instalación	ml	40,95	$30.787,00	$1.260.617		$0,00	33,70	$ 1.037.522	0,00	$0
7.5	Suministro, transporte e instalación de tubería 1-1/2" PVC. incluye todo lo necesario para su correcta instalación	ml	2,69	$31.856,00	$85.782		$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0

7.6	Suministro, transporte e instalación de tubería 2" PVC. incluye todo lo necesario para su correcta instalación	ml	60,19	$45.312,00	$2.727.420	9,75	$441.792,00	9,75	$ 441.792	0,00	$0
7.7	Suministro e instalación de Anclaje para tubería colgante al techo de 3/8". incluye todo lo necesario para su correcta instalación	und	35,00	$66.284,00	$2.319.940	5,00	$331.420,00	5,00	$ 331.420	0,00	$0
7.8	Suministro e instalación de Punto hidráulico. incluye todo lo necesario para su correcta instalación	und	12,00	$101.740,00	$1.220.880	9,00	$915.660,00	9,00	$ 915.660	0,00	$0
7.9	Suministro, transporte e instalación de válvula de compuerta de 1/2". incluye todo lo necesario para su correcta instalación	und	1,00	$62.236,00	$62.236		$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0
7.10	Suministro, transporte e instalación de válvula de compuerta de 3/4". incluye todo lo necesario para su correcta instalación	und	1,00	$73.236,00	$73.236		$0,00	2,00	$ 146.472	0,00	$0
7.11	Suministro, transporte e instalación de válvula de compuerta de 1 1/4". incluye todo lo necesario para su correcta instalación	und	3,00	$118.442,00	$355.326		$0,00	2,00	$ 236.884	0,00	$0
7.12	Suministro, transporte e instalación de Puntos sanitarios y accesorios de 2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	3,00	$170.302,00	$510.906	9,00	$1.532.718,00	9,00	$ 1.532.718	0,00	$0
7.13	Suministro, transporte e instalación Puntos sanitarios y accesorios de 3". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación	und	3,00	$182.152,00	$546.456	16,50	$3.005.508,00	16,50	$ 3.005.508	0,00	$0

7.14	Suministro, transporte e instalación de Puntos sanitarios y accesorios de 4". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	4,00	$201.343,00	$805.372	4,00	$805.372,00	4,00	$ 805.372	0,00	$0
8	**IMPERMEABILIZACIÓN**										
7.14	Suministro, transporte e instalación de materiales para impermeabilizacion de losa de tercer piso con broncoelastico. Incluye todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	218,00	$87.867,00	$19.155.006		$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0
9	**CERTIFICACIONES**										
9.1	certificacion RETIE IVA INCLUIDO	und	1,00	$5.355.000,00	$5.355.000		$0,00	0,00	$ 0	1,00	$5.355.000
9.2	certificacio RETILAP IVA INCLUIDO	und	1,00	$5.355.000,00	$5.355.000		$0,00	0,00	$ 0	1,00	$5.355.000
NP	**NO PREVISTOS**										
NP-01	Fijaciones epoxicas en perforaciones de 1 1/4" con epoxico hintic re500	Und		$550.000,00			$0,00	20,00	$ 11.000.000	0,00	$0
NP-02	Limpieza de acero de refuerzo existente	Kg		$1.000,00			$0,00	1.814,02	$ 1.814.020	0,00	$0
NP-03	Demolicion y escarificacion de columnas existentes (todas las del perimetro)	Und		$120.000,00			$0,00	16,00	$ 1.920.000	0,00	$0

NP-04	Tramite de legalizacion ante epm incluido aprobacion de diseños y estudios respectivos	Glb		$6.800.000,00			$0,00	0,00	$ 0	2,00	$13.600.000	
NP-05	Retiro de manto impermeabilizante en losa	m2		$5.500,00			$0,00	293,00	$ 1.611.500	0,00	$0	
NP-06	Demolicion de muro en fachadas; incluye botada de escombros	m2		$95.000,00			$0,00	122,13	$ 11.602.350	0,00	$0	
NP-07	Mamposteria en ladrillo sencillo de 15x20x40 para divisiones de muros interiores	m2		$94.000,00			$0,00	100,96	$ 9.490.240	0,00	$0	
NP-08	Pisos en ceramica 60x60	m2		$123.000,00			$0,00	98,88	$ 12.162.240	214,12	$26.336.760	
NP-09	Lavada e hidrofugo de muros en ladrillo a la vista	m2		$35.000,00		235,52	$8.243.200,00	424,09	$ 14.843.150	0,00	$0	
NP-10	Cocina integrar de 1.80m; incluye lavaplatos y griferia	Und		$2.251.195,00			$0,00	0,00	$ 0	1,00	$2.251.195	
NP-11	Perforaciones de 21/2" para pases de tuberia sanitaria 2"	Und		$60.000,00			$0,00	6,00	$ 360.000	0,00	$0	
NP-12	Perforaciones de 41/2" para pases de tuberia sanitaria y de aguas lluvias de 4"	Und		$95.000,00			$0,00	4,00	$ 380.000	0,00	$0	
NP-13	Tuberia pvc aguas lluvias de 4" para bajantes	Ml		$55.000,00		11,00	$605.000,00	11,00	$ 605.000	0,00	$0	
NP-14	Suministro e instalacion de gabinete by-pass para proteccion T-R1	und		$4.445.820,00		1,00	$4.445.820,00	1,00	$ 4.445.820	0,00	$0	
NP-15	Suministro e instalacion de acometida desde transferencia automatica	ml		$195.445,00		7,00	$1.368.115,00	7,00	$ 1.368.115	0,00	$0	

	no.1 hasta tablero general en cable 4 x 8 awg lshf										
NP-16	Suministro e instalacion de acometida desde transferencia hasta tablero de tomas y luces reguladas en cable 4 x 8awg lshf	ml		$195.445,00		8,00	$1.563.560,00	8,00	$ 1.563.560	0,00	$0
NP-17	Suministro e instalacion de llave by-pass 40 amp	und		$634.980,00		1,00	$634.980,00	1,00	$ 634.980	0,00	$0
NP-18	Suministro en instalacion de acometida desde gabinete general de instalaciones existentes hasta tablero de distribucion de toma y luces normales en cable 5 x 4 AWG LSHF	ml		$250.000,00		60,00	$15.000.000,00	60,00	$ 15.000.000	0,00	$0
NP-19	Suministro e instalacion de interruptor sencillo	und		$60.564,00		11,00	$666.204,00	11,00	$ 666.204	0,00	$0
NP-20	Suministro e instalacion de interruptor doble en muro	und		$69.174,00		1,00	$69.174,00	1,00	$ 69.174	0,00	$0
NP-21	Suministro de NVR para sistema de videovigilancia	und		$203.210,00		0,00	$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0

NP-22	Suministro y aplicación de pintura tipo Koraza color gris basalto o equivalente sobre superficie de losa en concreto, incluyendo aplicación uniforme de dos manos de pintura, mano de obra especializada, herramientas menores, equipos, transporte interno y limpieza final del área intervenida, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto.	m2		$26.500,00		26,08	$691.091,50	399,44	$ 10.585.132	0,00	$0	
NP-23	Resane y preparación superficial de losa de concreto mediante remoción mecánica de rebabas, filos y sobrantes de concreto, lijado y desbaste con pulidora, corrección de hormigueros, reparación de porosidades superficiales, aplicación de mortero de resane donde sea requerido, limpieza de la superficie, retiro de material sobrante, mano de obra especializada, equipos, herramientas menores, consumibles y limpieza final del área intervenida, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto.	m2		$36.695,00			$0,00	373,36	$ 13.700.445	41,08	$1.507.431	
NP-24	Suministro en alquiler de equipo tipo pluma o malacate mecánico para el transporte vertical de materiales, herramientas y equipos menores durante la ejecución de	día		$330.000,00			$0,00	24,00	$ 7.920.000	0,00	$0	

	actividades constructivas, incluyendo instalación, operación básica, energía o combustible menor, anclajes temporales, mantenimiento básico, transporte interno y desmontaje del equipo, de acuerdo con las condiciones de obra y especificaciones técnicas del proyecto.										
NP-25	Suministro e instalación de canalización eléctrica en tubería EMT de 3/4", incluye apertura y resane de superficies, perforaciones, anclajes, soportes, accesorios, fijaciones, adecuaciones civiles, retiro de sobrantes y demás actividades necesarias para su correcta ejecución.	ml		$14.101,00		147,00	$2.072.847,00	462,00	$ 6.514.662	0,00	$0
NP-26	Suministro, transporte e instalación de un sistema de impermeabilización bicapa sobre losa de concreto, mediante la preparación y limpieza de la superficie, aplicación de imprimante o emulsión asfáltica, instalación termofundida de primera capa de manto asfáltico tipo sufridor en poliéster de 3 mm y segunda capa de acabado en manto asfáltico en poliéster de 3 mm, incluyendo traslapos longitudinales y transversales, sellado de juntas, tratamiento de puntos críticos, remates, aplicación de dos manos de pintura aluminizada	m2		$122.260,00			$0,00	0,00	$ 0	202,00	$24.696.520

	tipo Paraguas Corona o equivalente, mano de obra especializada, equipos, herramientas, consumibles, transporte interno y limpieza final del área intervenida, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto.											
NP-27	Suministro, transporte e instalación de muro liviano en sistema drywall conformado por estructura metálica galvanizada en perfiles tipo parales y canales, revestido por ambas caras con lámina de yeso drywall de 1/2", incluyendo tornillería, cintas, masillado de juntas, refuerzos, fijaciones, cortes, desperdicios, mano de obra especializada, herramientas menores, transporte interno y limpieza final del área intervenida, de acuerdo con planos y especificaciones técnicas del proyecto.	m2		$131.378,00		16,26	$2.136.206,28	16,26	$ 2.136.206	0,00	$0	
NP-28	Suministro, transporte e instalación de muro liviano en sistema fibrocemento tipo Superboard de 8 mm, conformado por estructura metálica galvanizada en perfiles tipo parales y canales, revestido por ambas caras (2F) con lámina Superboard de 8 mm, incluyendo perfilería metálica, tornillería, tratamiento de juntas, sellos, refuerzos,	m2		$153.186,00		3,17	$485.599,62	3,17	$ 485.600	0,00	$0	

	fijaciones, cortes, desperdicios, mano de obra especializada, herramientas menores, transporte interno y limpieza final del área intervenida, de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos del proyecto.										
NP-29	Suministro, transporte e instalación de tablero eléctrico trifásico de distribución para 30 circuitos con totalizador principal de 100 amperios, gabinete metálico, barraje, accesorios de conexión, fijaciones, montaje, nivelación, conexionado, marquillado, pruebas básicas de funcionamiento, mano de obra calificada, herramientas menores y limpieza final, conforme RETIE y especificaciones del proyecto.	Und		$3.429.890,00			$0,00	1,00	$ 3.429.890	0,00	$0
NP-30	Suministro, transporte e instalación de tablero eléctrico de distribución para 12 circuitos, con gabinete metálico, barraje, espacio para interruptores termomagnéticos, accesorios de conexión, fijaciones, montaje, nivelación, conexionado, marquillado, pruebas básicas de funcionamiento, mano de obra calificada, herramientas menores, transporte interno y	Und		$1.223.691,00			$0,00	1,00	$ 1.223.691	0,00	$0

	limpieza final, conforme RETIE y especificaciones del proyecto.										
NP-31	Suministro e instalación de UPS On-Line Trifásica 10 kVA FP 1.0, con tecnología de doble conversión, banco de baterías, configuración, pruebas y puesta en funcionamiento.	und		$23.000.000,00		1,00	$23.000.000,00	1,00	$ 23.000.000	0,00	$0
NP-32	Perforación en losa de concreto e instalación de sistema de fijación mediante chazo y tornillo de 3/8" para soporte de lámparas colgantes, incluyendo suministro de materiales, perforación, limpieza del alojamiento, colocación y ajuste de la fijación, verificación de firmeza y todos los elementos, equipos y mano de obra necesarios para su correcta ejecución.	und		$18.000,00		114,00	$2.052.000,00	114,00	$ 2.052.000	0,00	$0
NP-33	Suministro de materiales, preparación, elaboración y acabado de media caña en mortero cemento-arena dosificación 1:3, en encuentros entre piso-muro o muro-muro, incluyendo humedecimiento de superficie, conformación, afinado, curado inicial, herramientas, equipos menores, mano de obra y limpieza final.	ml		$23.000,00			$0,00		$ 0	67,54	$1.553.420

NP-34	Suministro e instalación de tubería EMT galvanizada de 1 1/2" para acometidas eléctricas, incluyendo accesorios de unión, conectores, curvas, abrazaderas, elementos de fijación, corte, conformado, instalación, alineación, soportación, mano de obra especializada	ml		$32.000,00			$0,00		$ 0	60,00	$1.920.000
NP-35	Suministro e instalación de puerta tipo persiana para baño, fabricada en aluminio anodizado o lámina metálica con ventilación tipo persiana, marco, hojas, bisagras, cerradura tipo baño, topes, anclajes y accesorios de fijación. Incluye transporte, montaje, nivelación, aplome, ajuste, sellos, limpieza y mano de obra necesaria para su correcta instalación.	und		$800.000,00			$0,00		$ 0	3,00	$2.400.000
NP-36	Fabricación, suministro e instalación de reja de seguridad de 8.82m2 en varilla lisa de 1/2", con marco en ángulo metálico, soldada, anclada a muro o estructura existente, con aplicación de anticorrosivo y pintura esmalte. Incluye transporte, materiales, mano de obra, equipos, anclajes y limpieza final.	und		$2.200.000,00			$0,00		$ 0	1,00	$2.200.000

COSTOS DIRECTOS OBRA ORDINARIA Y OBRA NO PREVISTA					$961.766.735		$253.041.688		$865.340.301		$96.426.432	
COSTOS INDIRECTOS OBRA ORDINARIA Y OBRA NO PREVISTA					$288.530.021		$75.912.506		$259.602.090		$28.927.930	
	ADMINISTRACIÓN		25,00%		$240.441.684		$63.260.422		$216.335.075		$24.106.608	
	UTILIDAD		5%		$48.088.337		$12.652.084		$43.267.015		$4.821.322	
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS OBRA ORDINARIA Y NO PREVISTA				########## #		$328.954.194		$1.124.942.391		$125.354.362	
COSTO TOTAL					$1.250.296.756		$328.954.194		$1.124.942.391		$125.354.362	

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No COP-79-2025, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de avance del 89.97%.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Dirección Financiera y Administrativa

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2028 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planillas o certificación de pagos correspondientes al periodo de MAYO-JUNIO 2026, planilla del pago de la seguridad social No 85582400.Desde la dirección técnica e infraestructura se realiza el primer filtro correspondiente al pago de la seguridad social, el alcance, particularidades de normativas o decretos según la figura del contrato y montos de pagos de seguridad social se deberá verificar por parte de la dirección financiera, específicamente la manera y montos con los que se debe realizar la cotización de seguridad social. Se adjunto carta de certificado de parafiscales firmada el 17 de junio del 2026 por la contadora de la empresa MARIA MILENA RIVERA RESTREPO

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos.

El presente informe se firma en Guarne, a los diecinueve (19) días del mes de JUNIO del 2026.

Atentamente,

JUAN GABRIEL MANCERA TREJOS
Director Técnico y de Infraestructura
Supervisor del Contrato

BAW

GRUPO BAW SAS

Guarne 17 de junio de 2026

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores: EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCCION DE GUARNE – EMEGA
La Ciudad

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002,

Certifico que Grupo BAW SAS NIT 901.411.511-4 Ha cumplido en forma completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido el caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, dichos pagos se efectuaron para las obligaciones correspondientes a los meses de enero a mayo de 2026.

Maira Milena Rivera Restrepo
CC 1.017.150.327
Contador Público TP:239397-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.017.150.327

RIVERA RESTREPO
APELLIDOS

MAIRA MILENA
NOMBRES

Maira Milena Rivera
FIRMA

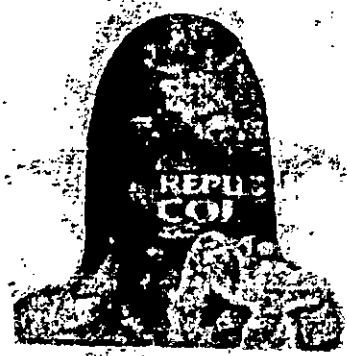



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-JUN-1987
PUERTO BERRIO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

07-JUL-2005 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0100100-14159516-F-1017150327-20070913 0611907256M 02 231552031

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



239397-T

MAIRA MILENA
RIVERA RESTREPO
C.C. 1017150327
RES. INSCRIPCION 237 DEL 23/03/2016
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

246756 263838

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 85 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

Firma

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MAIRA MILENA RIVERA RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1017150327 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 239397-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

GRUPO BAW S.A.S
NIT: 901.411.511-1
3169466411 – INFO@BAW.COM.CO
GUARNE ANT

BAW

Guarne, 18 de junio de 2026

OFI-BAW-SE-10-2026

Gerente
JUAN GABRIEL MANCERA TREJOS
DIRECTRO DE INFRAESTRUCTURA
EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE "EMEGA"

REF: Contrato de obra COP 079 de 2025 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMISNITRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL MUNICIPIO DE GUARNE - EMEGA".

ASUNTO: ACTA DE AVANCE N°2

Cordial saludo

Adjunto acta de avance N°2 del proyecto en referencia, anexo la siguiente información:

1. Factura
2. RUT
3. Certificación Bancaria
4. Acta de obra y memorias de calculo
5. Seguridad Social
6. Informe de Actividades
7. Informe de SST con sus anexos.

EMEG
Empresa de desarrollo competitividad y prod.
Nit: 90149430
19062026-217
10:57 a.m.

Atentamente,

Anderson S. Barrera

ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS
C.C 1.220.469.730
REPRESENTANTE LEGAL

GRUPO BAW S.A.S
NIT: 901.411.511-1
3169466411 – INFO@BAW.COM.CO
GUARNE ANT

Guarne, 16 de junio de 2026

OFI-BAW-SE-11-2026

Gerente
UBALDO CASTRILLON TEJADA
GRUPO BAW
EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE "EMEGA"

REF: Contrato de obra COP 079 de 2025 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMISNITRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL MUNICIPIO DE GUARNE - EMEGA".

ASUNTO: Solicitud de pago a terceros

Por medio de la presente, en mi calidad de Representante Legal, yo ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS, identificado con cedula de ciudadanía N°1.220.469.730 y en calidad de representante legal de la empresa GRUPO BAW identificado con NIT 901411511, solicito de la manera más atenta que el valor de acta de avance N°2 sean pagados directamente a la empresa ELIM INVESTMENTS S.A.S, identificados con NIT 901839301.

Anexo RUT y Certificación Bancaria.

Atentamente,

Anderson S. Barrera

ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS
C.C 1.220.469.730
REPRESENTANTE LEGAL

NOTARIA 21 DEL CÍRCULO DE MEDELLÍN
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO
Verificación Biométrica Decreto Ley 019 de 2012

Ante el Notario Vecinal del Círculo de Medellín compareció

BARRERA ARIAS ANDERSON STEVE

quien exhibió la C.C. 1220489730

Y declaró: Que el contenido del anterior documento es cierto y que a la firma que lo autoriza fue puesta por él. El compareciente solicitó y autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad ciudadana con huellas digitales y datos biométricos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingresar a www.notariaonline.com para cotejar este documento.

Medellín, 2025-06-18 14:18:48

Cod. 13em4z

El Compareciente

5070-55eb6ce7

GUSTAVO ANIBAL SALAZAR MARIN
NOTARIO 21 DEL CÍRCULO DE MEDELLÍN

NOTARIA 21
Gustavo Salazar Marín
NOTARIO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141228179155

(415)7707212489984(8020) 000014122817915 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 9 3 0 1	2	Impuestos de Medellín	1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ELIM INVESTMENTS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CR 96 NO. 49 BB 69

42. Correo electrónico ALEJANDROGF2018@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 5 0 4 5 0 7 0	3 0 2 3 5 3 9 1 3 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 2 4 0 6 0 6							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GIRALDO FRANCO ALEJANDRO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 13-02-2026 05:47:56PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141228179155

(415)7707212489984(8020) 000014122817915 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 9 3 0 1	2	Impuestos de Medellín	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 5 3 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 6 0 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 7 8 8 2 3 0 1 2	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 5 3 1	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

8. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 4 0 6 0 6		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141228179155

(415)7707212489984(8020) 000014122817915 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 9 3 0 1	2	Impuestos de Medellín	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 6 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 3 7 6 7 2 0 6 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GIRALDO	FRANCO	ALEJANDRO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141228179155

(415)7707212489984(8020) 000014122817915 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 9 3 0 1		Impuestos de Medellín	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 8 2 1 3 5 8 1		3 1 6 5 0 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MARIN	SUAREZ	FERNEY	ARLEY

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 5 3 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Miércoles, 19 de noviembre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ELIM INVESTMENTS SAS identificado(a) con NIT 901839301, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	23600005862	2024/06/25	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. (Establecimiento Bancario)

INTEGRAR
CONSTRUCCIONES

CERTIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRA

El suscrito representante legal de INTEGRARCONSTRUCCIONES S.A.S., en calidad de interventor del Contrato N.° COP-079 DE 2025, cuyo objeto corresponde a la "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE – EMEGA", se permite:

HACER CONSTAR:

Que el contrato suscrito entre la EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE "EMEGA" y GRUPO BAW S.A.S., cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE – EMEGA", registra un avance físico de obra correspondiente al 89,97%, con corte al 30 de mayo de 2026.

Así mismo, se certifica que las actividades ejecutadas cumplen con las especificaciones técnicas contractuales y se desarrollan conforme al cronograma aprobado y a las obligaciones contractuales vigentes.

La presente certificación se expide como soporte para el trámite de pago del ACTA DE OBRA PARCIAL N.° 02, por valor de TRECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L ($328.954.194).

Se expide en el municipio de Sabaneta, Antioquia, a los treinta (30) días del mes de mayo de 2026.

LILIANA MARCELA GUARIN CARDONA
Representante legal
INTEGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.
Interventor

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE GUARNE

EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE "EMEGA"

ACTA DE OBRA PARCIAL N° 02

PERIODO DE EJECUCION DEL ACTA: DEL 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2026

SUPERVISOR:	ING. JUAN GABRIEL MANCERA- EMEGA	INTERVENTORÍA:	INTEGRARCONSTRUCCIONES S.A.S
FECHA:	30 de mayo de 2026	APROBADO POR:	
CONTRATANTE:	EMEGA	CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S
OBJETO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.		

CONTRATO N°:	COP-079 DE 2025	PLAZO INICIAL (MESES):	3	PRORROGA N°1 (DIAS):	52 DIAS		
FECHA INICIO:	18 de diciembre de 2025	FECHA FIN INICIAL:	18 de marzo de 2026	NUEVA FECHA FIN:	5 de junio de 2026		
VALOR INICIAL:	$ 1.250.296.756	SUSPENSION No 1:	20 de febrero de 2026				
VALOR ADICIÓN:	$ 0	FECHA REINICIO:	21 de marzo de 2026				
VALOR TOTAL:	$ 1.250.296.756	NUEVA FECHA FIN:	14 de abril de 2026				

CONTRATANTE	EMEGA	INTERVENTORIA	INTEGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	CONTRATISTA	GRUPO BAW S.A.S

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES No 01		ACTA DE OBRA N°1		ACUMULADO DE ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA N°2		ACUMULADO TOTAL		VALORES DISPONIBLES	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL
						OBRA CONTRACTUAL											
1	PRELIMINARES																
1,1	Localización, trazado y replanteo de edificaciones. Medido como área construida. Incluye hiladeros y señalización necesaria.	m2	301,00	$4.149,00	$1.248.849	293,00	$1.215.657	293,00	$1.215.657,00	293,00	$1.215.657,00		$0,00	293,00	$ 1.215.657	0,00	$0
1,2	Cerramiento Provisional en tela de cerramiento verde h: 2,10 incluye estructura de madera común, anclajes de parales al piso y tela verde	ml	60,00	$28.575,00	$1.714.500	100,00	$2.857.500	100,00	$2.857.500,00	100,00	$2.857.500,00		$0,00	100,00	$ 2.857.500	0,00	$0
1,3	Campamento provisional en teleras y teja de zinc. Incluye puerta de acceso, bisagras, cerradura de seguridad, conexiones eléctricas y de iluminación.	m2	25,00	$131.838,00	$3.295.950	25,00	$3.295.950	25,00	$3.295.950,00	25,00	$3.295.950,00		$0,00	25,00	$ 3.295.950	0,00	$0
1,5	Suministro e instalación de redes Eléctricas provisionales.	glb	1,00	$4.653.484,00	$4.653.484	1,00	$4.653.484	1,00	$4.653.484,00	1,00	$4.653.484,00		$0,00	1,00	$ 4.653.484	0,00	$0
1,6	Suministro e instalación de redes Hidráulicas provisionales.	glb	1,00	$1.737.996,00	$1.737.996	1,00	$1.737.996	1,00	$1.737.996,00	1,00	$1.737.996,00		$0,00	1,00	$ 1.737.996	0,00	$0
2	CONCRETOS Y ACEROS																
2,1	CONCRETO PARA ESCALERAS DE 3000 PSI: realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 12,5 mm	m2	28,50	$350.488,00	$9.988.908	25,30	$8.867.346	0,00	$0,00	0,00	$0,00		$0,00	0,00	$ 0	25,30	$8.867.346
2,2	CONCRETO PARA COLUMNAS DE 3000 PSI: Columna de sección cuadrada de concreto armado, realizado con concreto f'c=280 kg/cm² (28 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 19 mm	m3	9,94	$1.369.523,00	$13.607.581	13,99	$19.159.627	13,99	$19.159.626,77	13,99	$19.159.626,77		$0,00	13,99	$ 19.159.627	0,00	$0
2,3	CONCRETO PARA VIGAS AÉREAS: Viga de concreto armado, realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa), máximo del agregado 19 mm,e, en planta de hasta 3.5 m de altura libre	m3	36,92	$1.454.823,00	$53.709.156	17,07	$24.833.829	17,07	$24.833.828,61	17,07	$24.833.828,61		$0,00	17,07	$ 24.833.829	0,00	$0
2,4	Viga de amarre de 0.15m x 0.20m en concreto de 21 mpa. El acero de refuerzo se pagará por su respectivo item	ml	98,00	$79.375,00	$7.778.750	0,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00		$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES No 01		ACTA DE OBRA N°1		ACUMULADO DE ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA N°2		ACUMULADO TOTAL		VALORES DISPONIBLES	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL
2.5	Construcción de LOSA en concreto premezclado según diseño armada con casetón de Poron Recuperable. Incluye suministro, transporte, bombeo con Auto bomba o bomba estacionaria y colocación del concreto a una altura de entre 3.0 y 4.0m, formaleta en súper T de 19 mm. o equivalente para acabado a la vista en la parte inferior y paredes laterales y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. Incluye suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para el correcto vaciado según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m2	228,00	$369.714,00	$84.294.792	202,00	$74.682.228	202,00	$74.682.228,00	202,00	$74.682.228,00		$0,00	202,00	$ 74.682.228	0,00	$0
2.6	Construcción de junta de dilatación entre muros y elementos estructurales para peñetes en exterior.	ml	485,00	$8.008,00	$3.883.880	0,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00		$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0
2.8	Suministro, transporte e instalación de Acero de Refuerzo Figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarge, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones	kg	14.650,00	$8.196,00	$120.071.400	16097,50	$131.935.110	16097,50	##########	16097,50	$131.935.110,00		$0,00	16.097,50	$ 131.935.110	0,00	$0
2.9	Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D-84Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	kg	559,56	$9.393,00	$5.255.947	526,50	$4.945.415	526,50	$4.945.414,50	526,50	$4.945.414,50		$0,00	526,50	$ 4.945.415	0,00	$0
2.10	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL según diseño. Incluye PHR PTS PLATINAS Y RIOSTRAS	kg	4.792,24	$23.000,00	$110.221.539	4317,33	$99.298.590	4317,33	$99.298.590,00	4317,33	$99.298.590,00		$0,00	4.317,33	$ 99.298.590	0,00	$0
2.11	Colocación de GROUTING en concreto de 17.5 Mpa., para relleno de muro no estructural (bloque, tolete o estatán). Incluye mano de obra, vibrado, protección, curado y todos demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo.	ml	468,00	$24.803,00	$11.607.804	226,77	$5.624.576	226,77	$5.624.576,31	226,77	$5.624.576,31		$0,00	226,77	$ 5.624.576	0,00	$0
2.12	Suministro, transporte e instalación de lagrimal en concreto.	ml	395,00	$51.999,00	$20.539.605	60,00	$3.119.940	0,00	$0,00	0,00	$0,00	60,00	$3.119.940,00	60,00	$ 3.119.940	0,00	$0
2.13	Construcción de dinteles según diseño de elementos no estructurales. Incluye suministro, transporte y colocación de concreto, espesor indicado en planos. Incluye mano de obra, vibrado, formaleta, mano de obra, El acero se	ml	67,30	$41.223,00	$2.774.306	6,00	$247.338	6,00	$247.338,00	6,00	$247.338,00		$0,00	6,00	$ 247.338	0,00	$0
2.14	Suministro e instalación de Anclajes epoxicos para diámetros de 3/8" y 1/2"; Incluye perforación, limpieza, colocación acero de refuerzo y anclaje epoxico según normas NSR-10	und	389,00	$40.400,00	$15.715.600	520,00	$21.008.000	520,00	$21.008.000,00	520,00	$21.008.000,00		$0,00	520,00	$ 21.008.000	0,00	$0
2.15	CONSTRUCCION DE JUNTA DE DILATACION ENTRE MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES (una sola cara), ancho de 2 cm., instalación de varilla de espuma de polietileno tipo soltalón, sikarod ó equivalente de Ø= 1", aplicación de masilla elástica saltante y adhesiva con base en poliuretano tipo Sikaflex-1a ó equivalente, junta máxima de ancho= 20 mm, prof.= 5 mm, color similar al muro ó a definir por	ml	487,00	$38.293,00	$17.674.691	178,88	$6.492.092	178,88	$6.492.091,84	178,88	$6.492.091,84		$0,00	178,88	$ 6.492.092	0,00	$0
2.16	Mortero para pendientes (e=5cm) con impermeabilizante integral.	m2	417,00	$62.949,00	$26.249.733	495,00	$31.159.755	293,00	$18.444.057,00	293,00	$18.444.057,00	202,00	$12.715.698,00	495,00	$ 31.159.755	0,00	$0
3	REVOQUES Y PINTURAS																
3.1	Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	456,00	$41.741,00	$19.033.896	0,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00		$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0
3.2	Suministro, transporte e instalación de estuco sobre muros. Dos manos o las que sean necesarias hasta lograr una superficie homogénea. Incluye la preparación de la superficie	M2	612,60	$26.804,00	$16.420.130	218,71	$5.862.303	208,51	$5.588.902,04	208,51	$5.588.902,04	10,20	$273.400,80	218,71	$ 5.862.303	0,00	$0

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES (NUEVO)		ACTA DE OBRA N°1		ACUMULADO DE ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA N°2		ACUMULADO TOTAL		VALORES DISPONIBLES	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL
3.3	Suministro y aplicación de estuco sobre lados de muros, mochetas, columnas, vigas y vanos de puertas y ventanas. Incluye la preparación de la superficie, el perfilado y aplomado de las aristas para garantizar un acabado recto y uniforme, listo para recibir la pintura final.	ml	180,00	$16.329,00	$2.939.220	176,22	$2.877.498	176,22	$2.877.498,38	176,22	$2.877.498,38		$0,00	176,22	$ 2.877.498	0,00	$0
3.4	suministro y aplicación de REVOQUE en mortero 1:4 impermeabilizado, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	m2	152,00	$46.743,00	$7.104.936	218,71	$10.223.162	208,51	$9.748.382,93	208,51	$9.748.382,93	10,20	$476.778,60	218,71	$ 10.223.162	0,00	$0
3.5	Fajas de revoque impermeabilizado con Sika 1.	ml	180,00	$28.045,80	$5.048.244	417,37	$11.705.476	417,37	$11.705.475,55	417,37	$11.705.475,55		$0,00	417,37	$ 11.705.476	0,00	$0
3.6	Aplicación de PINTURA DE PRIMERA CALIDAD. Para interiores y exteriores, sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las	m2	704,49	$22.882,00	$16.106.050	369,75	$8.453.225	0,00	$0,00	0,00	$0,00	369,75	$8.453.224,50	369,75	$ 8.453.225	0,00	$0
4	ENCHAPES Y CERRAMIENTOS																
4.1	Construcción de muro portante de mampostería reforzada según diseño, de bloque de concreto 15 cm x 20 cm x 40 cm.	m2	228,00	$104.039,00	$23.720.892	0,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00		$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0
4.2	Construcción de muro en ladrillo calavan a la vista (según construcción existente). Incluye todo lo necesario para su construcción.	m2	171,27	$181.655,00	$31.111.280	249,37	$45.299.307	249,37	$45.299.307,35	249,37	$45.299.307,35		$0,00	249,37	$ 45.299.307	0,00	$0
4.4	Suministro, transporte y colocación de ventana en aluminio negro anodizado y vidrio incoloro templado de 6 mm. Incluye cerradura de	m2	79,50	$623.929,00	$49.602.356	58,28	$36.362.582	0,00	$0,00	0,00	$0,00	58,28	$36.362.582,12	58,28	$ 36.362.582	0,00	$0
4.5	Suministro, transporte y colocación de puerta en aluminio anodizado y vidrio incoloro templado de 8 mm. Incluye cerradura de seguridad y todos los elementos necesarios según diseño para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	6,21	$664.970,00	$4.129.464	16,80	$11.171.496	0,00	$0,00	0,00	$0,00	16,80	$11.171.496,00	16,80	$ 11.171.496	0,00	$0
4.6	suministro, transporte e instalación de Teja termoacústicas UPVC 2.5 mm cresta alta blanca, así como todos los componentes y accesorios necesarios para su montaje conforme a las especificaciones técnicas y normativas pertinentes.	m2	103,00	$96.801,00	$9.970.503	118,00	$11.422.518	0,00	$0,00	0,00	$0,00	118,00	$11.422.518,00	118,00	$ 11.422.518	0,00	$0
4.8	Suministro, transporte e instalación de pasamanos metálico fabricado de la siguiente manera, platina de anclaje de forma circular a muro, mas L en varilla de 1/2" lisa ,incluye la tornillería de ensamble .1 un tubo superior de 2" calibre 16,incluye pintura anticorrosiva y acabados según requerimiento.	m	22,74	$324.009,00	$7.367.965	11,26	$3.648.341	0,00	$0,00	0,00	$0,00	11,26	$3.648.341,34	11,26	$ 3.648.341	0,00	$0
4.9	Suministro e instalación cerramiento para divisiones de oficinas en vidrio templado incoloro 10mm bordes pulidos y brillados con perfilería en aluminio negro, conformado por módulos fijos laterales y montantes superiores tubular	m2	59,92	$928.379,00	$55.628.470	30,34	$28.167.019	0,00	$0,00	0,00	$0,00	30,34	$28.167.018,86	30,34	$ 28.167.019	0,00	$0
4.10	Suministro e instalación de cuerpo fijo de 2 módulos en persiana de ventilación 315, perfilería color negro.	m2	9,00	$585.548,00	$5.269.932	0,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00		$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0
4.11	suministro, transporte e instalación de canal en lamina galvanizada cal. 18, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	55,00	$206.331,00	$11.348.205	33,50	$6.912.089	0,00	$0,00	0,00	$0,00	33,50	$6.912.088,50	33,50	$ 6.912.089	0,00	$0
4.12	suministro, transporte e instalación de ruana para cubierta en lamina galvanizada cal. 26, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	38,00	$100.689,00	$3.826.182	35,80	$3.604.666	0,00	$0,00	0,00	$0,00	35,80	$3.604.666,20	35,80	$ 3.604.666	0,00	$0
4.13	suministro, transporte e instalación de zócalo de baldosa Alpes grafito Gris formato 8,5 cm x 90 cm incluye todo lo necesario para su correcta instalación	ml	214,00	$35.846,00	$7.671.044	160,83	$5.765.112	0,00	$0,00	0,00	$0,00	160,83	$5.765.112,18	160,83	$ 5.765.112	0,00	$0
4.15	Enchape De Pared Tipo Artica De Corona O Similar Color Blanco Formato 30 X 60.Istalacion En Sentido Horizontal En Sistema Apilado.	m2	92,68	$88.027,00	$8.158.342	0,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00		$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0
5	APARATOS SANITARIOS																
5.1	Suministro, transporte e instalación de Orinal mediano con válvula antivandálica Tipo push color blanco o equivalente	und	1,00	$704.803,00	$704.803	1,00	$704.803	0,00	$0,00	0,00	$0,00	1,00	$704.803,00	1,00	$ 704.803	0,00	$0
5.3	Suministro, transporte e instalación de Espejo Cristal De 6 Mm Con Bordes Pulidos Pegado A Cerámica	m2	9,00	$123.000,00	$1.107.000	3,12	$383.760	0,00	$0,00	0,00	$0,00		$0,00	0,00	$ 0	3,12	$383.760

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES No 01		ACTA DE OBRA N°1		ACUMULADO DE ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA N°2		ACUMULADO TOTAL		VALORES DISPONIBLES	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL
5.4	suministro, transporte y instalacion de lavamanos Acuajet institucional, incluye brazos de instalacion a muro, griferia institucional para tavamanos Push mesa max y todos sus accesorios para su correcta instalacion.	und	2,00	$1.370.500,00	$2.741.000	4,00	$5.482.000	0,00	$0,00	0,00	$0,00	4,00	$5.482.000,00	4,00	$ 5.482.000	0,00	$0
5.5	Suministro, transporte e instalacion de kit Taza Sátilca plus entrada superior con válvula push de empotrar, incluye todos los accesorios para su correcta instalación.	und	2,00	$1.860.383,00	$3.720.766	4,00	$7.441.532	0,00	$0,00	0,00	$0,00	4,00	$7.441.532,00	4,00	$ 7.441.532	0,00	$0
6	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS																
	TABLEROS DE CIRCUITOS PARCIALES 3 PISO																
6.8	Suministro e instalación de tablero mb de 36 ctos trifásico con puerta	und	1,00	$3.714.200,00	$3.714.200	0,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00		$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0
6.9	Suministro e instalación de tablero mb de 24 ctos trifásico con puerta	und	1,00	$2.610.400,00	$2.610.400	0,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00		$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0
6.10	Suministro e instalación breakers enchufables monopotares de 1x20 amp	und	60,00	$19.600,00	$1.176.000	32,00	$627.200	0,00	$0,00	0,00	$0,00	32,00	$627.200,00	32,00	$ 627.200	0,00	$0
	SALIDAS DE TOMAS Y LUCES 3 PISO																
6.11	Salidas para tomas con p.t. 120v. normal. cable 3xno12 tshf, emt = 1/2" cajas y accesorio	und	38,00	$235.800,00	$8.488.800	31,00	$7.309.800	25,00	$5.895.000,00	25,00	$5.895.000,00	6,00	$1.414.800,00	31,00	$ 7.309.800	0,00	$0
6.12	salidas para tomas con p.t. 120v. Gfci	und	16,00	$235.800,00	$3.772.800	5,00	$1.179.000	0,00	$0,00	0,00	$0,00	5,00	$1.179.000,00	5,00	$ 1.179.000	0,00	$0
6.13	Salidas para tomas regulados con p.t. 120v. color naranja,cable 3xno12 tshf, imc = 1/2" cajas y accesorio metalico	und	16,00	$235.800,00	$3.772.800	11,00	$2.593.800	8,00	$1.886.400,00	8,00	$1.886.400,00	3,00	$707.400,00	11,00	$ 2.593.800	0,00	$0
6.14	salidas para luces 120v. Normales	und	60,00	$235.800,00	$14.148.000	57,00	$13.440.600	40,00	$9.432.000,00	40,00	$9.432.000,00	17,00	$4.008.600,00	57,00	$ 13.440.600	0,00	$0
6.15	salidas para luces de emergencia	und	5,00	$235.800,00	$1.179.000	4,00	$943.200	0,00	$0,00	0,00	$0,00	4,00	$943.200,00	4,00	$ 943.200	0,00	$0
6.16	salidas para television	und	2,00	$235.800,00	$471.600	2,00	$471.600	0,00	$0,00	0,00	$0,00	2,00	$471.600,00	2,00	$ 471.600	0,00	$0
6.17	suministro, instalacion y montaje de luminarias de emergencia	und	6,00	$163.100,00	$1.304.800	4,00	$652.400	0,00	$0,00	0,00	$0,00	4,00	$652.400,00	4,00	$ 652.400	0,00	$0
6.18	suministro e instalacion de tomas con p.t. 120v. normal	und	38,00	$113.500,00	$4.066.000	31,00	$3.518.500	0,00	$0,00	0,00	$0,00	31,00	$3.518.500,00	31,00	$ 3.518.500	0,00	$0
6.19	suministro e instalacion de tomas con p.t. 120v. Gfci	und	8,00	$113.500,00	$908.000	5,00	$567.500	0,00	$0,00	0,00	$0,00	5,00	$567.500,00	5,00	$ 567.500	0,00	$0
6.20	suministro e instalacion de tomas regulados con p.t. 120v.	und	8,00	$113.500,00	$908.000	11,00	$1.248.500	0,00	$0,00	0,00	$0,00	11,00	$1.248.500,00	11,00	$ 1.248.500	0,00	$0
6.21	suministro, instalacion y montaje de luminaria led 36 w	und	45,00	$222.560,00	$10.015.200	57,00	$12.685.920	0,00	$0,00	0,00	$0,00	57,00	$12.685.920,00	57,00	$ 12.685.920	0,00	$0
6.22	suministro e instalacion de interruptor sencillo o sensor de movimiento	und	16,00	$113.500,00	$1.816.000	2,00	$227.000	0,00	$0,00	0,00	$0,00	2,00	$227.000,00	2,00	$ 227.000	0,00	$0
6.23	suministro e instalacion de tuberia metalica emt 3/4" y accesorios	ml	816,00	$6.490,00	$5.295.840	0,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00		$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0
6.24	salidas para sensor de ovacuacion(salidas),120 v. cable 3xno12 awg,emt de 1/2"cajas 2x4 metalicas etc	und	5,00	$235.800,00	$1.179.000	2,00	$471.600	0,00	$0,00	0,00	$0,00	2,00	$471.600,00	2,00	$ 471.600	0,00	$0
6.25	suministro e instalacion de señal de salida	und	5,00	$183.500,00	$917.500	2,00	$367.000	0,00	$0,00	0,00	$0,00	2,00	$367.000,00	2,00	$ 367.000	0,00	$0
6.26	suministro e instalacion de salidas para video beam	und	2,00	$482.000,00	$964.000	2,00	$964.000	0,00	$0,00	0,00	$0,00	2,00	$964.000,00	2,00	$ 964.000	0,00	$0
	VOZ Y DATOS																
6.27	salida para voz y datos, en cable utp cat 6a tshf, tuberia sch 40 de 3/4"	und	25,00	$450.000,00	$11.250.000	16,00	$7.200.000	0,00	$0,00	0,00	$0,00	16,00	$7.200.000,00	16,00	$ 7.200.000	0,00	$0
6.28	suministro en instalacion de rack , suiche administrable, ap para salida de wifi	und	1,00	$18.525.000,00	$18.525.000	0,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0
6.29	suministro transporte instalacion de camaras wifi	und	4,00	$1.581.250,00	$6.325.000	0,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0
	SISTEMA DE PROTECCION DE UPS																
6.30	suministro de ups 15 kva. , on line	und	1,00	$8.000.000,00	$8.000.000	0,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0
	REGISTROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION																
6.31	registros electricos de baja tension sb 325	und	1,00	$360.000,00	$360.000	0,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS																

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES No 01		ACTA DE OBRA N°1		ACUMULADO DE ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA N°2		ACUMULADO TOTAL		VALORES DISPONIBLES	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL
7.1	Suministro, transporte e instalación de tubería 1/2" PVC RDE 13,5. incluye todo lo necesario para su correcta instalación	ml	35,00	$21.219,00	$742.665	0,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00		$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0
7.2	Suministro, transporte e instalación de de tubería 3/4" PVC RDE 13,5. incluye todo lo necesario para su correcta instalación	ml	15,00	$23.514,00	$352.710	10,90	$256.303	10,90	$256.302,60	10,90	$256.302,60		$0,00	10,90	$ 256.303	0,00	$0
7.3	Suministro, transporte e instalación de de tubería 1" PVC RDE 21. incluye todo lo necesario para su correcta instalación	ml	30,00	$29.837,00	$895.110	7,00	$208.859	7,00	$208.859,00	7,00	$208.859,00		$0,00	7,00	$ 208.859	0,00	$0
7.4	Suministro, transporte e instalación de de tubería 1-1/4" PVC RDE 21. incluye todo lo necesario para su correcta instalación	ml	40,95	$30.787,00	$1.260.617	33,70	$1.037.522	33,70	$1.037.521,90	33,70	$1.037.521,90		$0,00	33,70	$ 1.037.522	0,00	$0
7.5	Suministro, transporte e instalación de tubería 1-1/2" PVC. incluye todo lo necesario para su correcta instalación	ml	2,69	$31.656,00	$85.782	0,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00		$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0
7.6	Suministro, transporte e instalación de tubería 2" PVC. incluye todo lo necesario para su correcta instalación	ml	60,19	$45.312,00	$2.727.420	9,75	$441.792	0,00	$0,00	0,00	$0,00	9,75	$441.792,00	9,75	$ 441.792	0,00	$0
7.7	Suministro e instalación de Anclaje para tubería colgante al techo de 3/8". incluye todo lo necesario para su correcta instalación	und	35,00	$66.284,00	$2.319.940	5,00	$331.420	0,00	$0,00	0,00	$0,00	5,00	$331.420,00	5,00	$ 331.420	0,00	$0
7.8	Suministro e instalación de Punto hidráulico, incluye todo lo necesario para su correcta instalación	und	12,00	$101.740,00	$1.220.880	9,00	$915.660	0,00	$0,00	0,00	$0,00	9,00	$915.660,00	9,00	$ 915.660	0,00	$0
7.9	Suministro, transporte e instalación de Valvula de compuerta de 1/2". incluye todo lo necesario para su correcta instalación	und	1,00	$62.236,00	$62.236	0,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00		$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0
7.10	Suministro, transporte e instalación de Valvula de compuerta de 3/4". incluye todo lo necesario para su correcta instalación	und	1,00	$73.236,00	$73.236	2,00	$146.472	2,00	$146.472,00	2,00	$146.472,00		$0,00	2,00	$ 146.472	0,00	$0
7.11	Suministro, transporte e instalación de Valvula de compuerta de 1 1/4". incluye todo lo necesario para su correcta instalación	und	3,00	$118.442,00	$355.326	2,00	$236.884	2,00	$236.884,00	2,00	$236.884,00		$0,00	2,00	$ 236.884	0,00	$0
7.12	Suministro, transporte e instalación de Puntos sanitarios y accesorios de 2". incluye todo lo necesario para su correcta instalación	und	3,00	$170.302,00	$510.906	9,00	$1.532.718	0,00	$0,00	0,00	$0,00	9,00	$1.532.718,00	9,00	$ 1.532.718	0,00	$0
7.13	Suministro, transporte e instalación de Puntos sanitarios y accesorios de 3". incluye todo lo necesario para su correcta instalación	und	3,00	$182.152,00	$546.456	16,50	$3.005.508	0,00	$0,00	0,00	$0,00	16,50	$3.005.508,00	16,50	$ 3.005.508	0,00	$0
7.14	Suministro, transporte e instalación de Puntos sanitarios y accesorios de 4". incluye todo lo necesario para su correcta instalación	und	4,00	$201.343,00	$805.372	4,00	$805.372	0,00	$0,00	0,00	$0,00	4,00	$805.372,00	4,00	$ 805.372	0,00	$0
8	IMPERMEABILIZACIÓN																
7.14	Suministro, transporte e instalación de materiales para impermeabilizacion de losa de tercer piso con bituplastico. incluye todos los elementos para	m2	218,00	$87.867,00	$19.155.006	0,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00		$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0
9	CERTIFICACIONES																
9.1	certificacion RETIE IVA INCLUIDO	und	1,00	$5.355.000,00	$5.355.000	1,00	$5.355.000	0,00	$0,00	0,00	$0,00		$0,00	0,00	$ 0	1,00	$5.355.000
9.2	certificacio RETILAP IVA INCLUIDO	und	1,00	$5.355.000,00	$5.355.000	1,00	$5.355.000	0,00	$0,00	0,00	$0,00		$0,00	0,00	$ 0	1,00	$5.355.000
NP	NO PREVISTOS																
NP-01	Fijaciones epoxicas en perforaciones de 1 1/4" con epoxico hinlc re500	Und		$550.000,00		20,00	$11.000.000	20,00	$11.000.000,00	20,00	$11.000.000,00		$0,00	20,00	$ 11.000.000	0,00	$0
NP-02	Limpieza de acero de refuerzo existente	Kg		$1.000,00		1.814,02	$1.814.020	1814,02	$1.814.020,00	1814,02	$1.814.020,00		$0,00	1.814,02	$ 1.814.020	0,00	$0
NP-03	Demolicion y escarificacion de columnas existentes (todas las del perimetro)	Und		$120.000,00		16,00	$1.920.000	16,00	$1.920.000,00	16,00	$1.920.000,00		$0,00	16,00	$ 1.920.000	0,00	$0
NP-04	Tramite de legalizacion ante epm incluido aprobacion de diseños y estudios respectivos	Glb		$6.800.000,00		2,00	$13.600.000	0,00	$0,00	0,00	$0,00		$0,00	0,00	$ 0	2,00	$13.600.000
NP-05	Retiro de manto impermeabilizante en losa	m2		$5.500,00		293,00	$1.611.500	293,00	$1.611.500,00	293,00	$1.611.500,00		$0,00	293,00	$ 1.611.500	0,00	$0
NP-06	Demolicion de muro en fachadas; incluye botada de escombros	m2		$95.000,00		122,13	$11.602.350	122,13	$11.602.350,00	122,13	$11.602.350,00		$0,00	122,13	$ 11.602.350	0,00	$0
NP-07	Mamposteria en ladrillo sencillo de 15x20x40 para divisiones de muros interiores	m2		$94.000,00		100,96	$9.490.240	100,96	$9.490.240,00	100,96	$9.490.240,00		$0,00	100,96	$ 9.490.240	0,00	$0
NP-08	Pisos en ceramica 60x60	m2		$123.000,00		313,00	$38.499.000	98,88	$12.162.240,00	98,88	$12.162.240,00		$0,00	98,88	$ 12.162.240	214,12	$26.336.760
NP-09	Lavada o hidrofugo de muros en ladrillo a ta vista	m2		$35.000,00		424,09	$14.843.150	188,57	$6.599.950,00	188,57	$6.599.950,00	235,52	$8.243.200,00	424,09	$ 14.843.150	0,00	$0
NP-10	Cocina integrar de 1.80m; incluye lavaplatos y griferia	Und		$2.251.195,00		1,00	$2.251.195	0,00	$0,00	0,00	$0,00		$0,00	0,00	$ 0	1,00	$2.251.195
NP-11	Perforaciones de 21/2" para pases de tuberia sanitaria 2"	Und		$60.000,00		6,00	$360.000	6,00	$360.000,00	6,00	$360.000,00		$0,00	6,00	$ 360.000	0,00	$0
NP-12	Perforaciones de 41/2" para pases de tuberia sanitaria y de aguas lluvias de 4"	Und		$95.000,00		4,00	$380.000	4,00	$380.000,00	4,00	$380.000,00		$0,00	4,00	$ 380.000	0,00	$0

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 01		ACTA DE OBRA N°1		ACUMULADO DE ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA N°2		ACUMULADO TOTAL		VALORES DISPONIBLES	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL
NP-13	Tuberia pvc aguas lluvias de 4" para bajantes	Ml		$55.000,00		11,00	$605.000	0,00	$0,00	0,00	$0,00	11,00	$605.000,00	11,00	$ 605.000	0,00	$0
NP-14	Suministro e instalacion de gabinete by-pass para proteccion T-R1	und		$4.445.820,00		1,00	$4.445.820	0,00	$0,00	0,00	$0,00	1,00	$4.445.820,00	1,00	$ 4.445.820	0,00	$0
NP-15	Suministro e instalacion de acometida desde transferencia automatica no.1 hasta tablero general en cable 4 x 8 awg lshf	ml		$195.445,00		7,00	$1.368.115	0,00	$0,00	0,00	$0,00	7,00	$1.368.115,00	7,00	$ 1.368.115	0,00	$0
NP-16	Suministro e instalacion de acometida desde transferencia hasta tablero de tomas y luces reguladas en cable 4 x 8awg lshf	ml		$195.445,00		8,00	$1.563.560	0,00	$0,00	0,00	$0,00	8,00	$1.563.560,00	8,00	$ 1.563.560	0,00	$0
NP-17	Suministro e instalacion de llave by-pass 40 amp	und		$634.980,00		1,00	$634.980	0,00	$0,00	0,00	$0,00	1,00	$634.980,00	1,00	$ 634.980	0,00	$0
NP-18	Suministro en instalacion de acometida desde gabinete general de instataciones existentes hasta tablero de distribucion de toma y luces normales en cable 5 x 4 AWG LSHF	ml		$250.000,00		60,00	$15.000.000	0,00	$0,00	0,00	$0,00	60,00	$15.000.000,00	60,00	$ 15.000.000	0,00	$0
NP-19	Suministro e instalacion de interruptor sencillo	und		$60.564,00		11,00	$666.204	0,00	$0,00	0,00	$0,00	11,00	$666.204,00	11,00	$ 666.204	0,00	$0
NP-20	Suministro e instalacion de interruptor doble en muro	und		$69.174,00		1,00	$69.174	0,00	$0,00	0,00	$0,00	1,00	$69.174,00	1,00	$ 69.174	0,00	$0
NP-21	Suministro de NVR para sistema de videovigilancia	und		$203.210,00		0,00	$0	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$ 0	0,00	$0
NP-22	Suministro y aplicacion de pintura tipo Koraza color gris basalto o equivalente sobre superficie de losa en concreto, incluyendo aplicación uniforme de dos manos de pintura, mano de obra especializada, herramientas menores, equipos	m2		$26.500,00		399,44	$10.585.132	373,36	$9.894.040,00	373,36	$9.894.040,00	26,08	$691.091,50	399,44	$ 10.585.132	0,00	$0
NP-23	Resane y preparación superficial de losa de concreto mediante remoción mecánica de rebabas, filos y sobrantes de concreto, lijado y desbaste con pulidora, corrección de hormigueros, reparación de oquedades superficiales	m2		$36.695,00		414,44	$15.207.876	373,36	$13.700.445,20	373,36	$13.700.445,20		$0,00	373,36	$ 13.700.445	41,08	$1.507.431
NP-24	Suministro en alquiler de equipo tipo pluma o malacate mecánico para el transporte vertical de materiales, herramientas y equipos menores durante la ejecución de actividades constructivas, incluyendo instalación, operación básica, energía	día		$330.000,00		24,00	$7.920.000	24,00	$7.920.000,00	24,00	$7.920.000,00		$0,00	24,00	$ 7.920.000	0,00	$0
NP-25	Suministro e instalación de canalización eléctrica en tubería EMT de 3/4", incluye apertura y resane de superficies, perforaciones, anclajes, soportes, accesorios, fijaciones, adecuaciones civiles, retiro de sobrantes y demás actividades necesarias para	ml		$14.101,00		462,00	$6.514.662	315,00	$4.441.815,00	315,00	$4.441.815,00	147,00	$2.072.847,00	462,00	$ 6.514.682	0,00	$0
NP-26	Suministro, transporte e instalación de un sistema de impermeabilización bicapa sobre losa de concreto, mediante la preparación y limpieza de la superficie, aplicación de imprimante o emulsión asfáltica, instalación termofundida de primera	m2		$122.260,00		202,00	$24.696.520	0,00	$0,00	0,00	$0,00		$0,00	0,00	$ 0	202,00	$24.696.520
NP-27	Suministro, transporte e instalación de muro liviano en sistema drywall conformado por estructura metálica galvanizada en perfiles tipo parales y canales, revestido por ambas caras con lámina de yeso drywall de 1/2" incluyendo	m2		$131.378,00		16,26	$2.136.206	0,00	$0,00	0,00	$0,00	16,26	$2.136.206,28	16,26	$ 2.136.206	0,00	$0
NP-28	Suministro, transporte e instalación de muro liviano en sistema fibrocemento tipo Superboard de 8 mm, conformado por estructura metálica galvanizada en perfiles tipo parales y canales, revestido por ambas caras (2E) con lámina	m2		$153.186,00		3,17	$485.600	0,00	$0,00	0,00	$0,00	3,17	$485.599,62	3,17	$ 485.600	0,00	$0
NP-29	Suministro, transporte e instalación de tablero eléctrico trifásico de distribución para 30 circuitos con totalizador principal de 100 amperios, gabinete metálico, barraje, accesorios de conexión, fijaciones, montaje, nivelación	Und		$3.429.890,00		1,00	$3.429.890	1,00	$3.429.890,00	1,00	$3.429.890,00		$0,00	1,00	$ 3.429.890	0,00	$0
NP-30	Suministro, transporte e instalación de tablero eléctrico de distribución para 12 circuitos, con gabinete metálico, barraje, espacio para interruptores termomagnéticos, accesorios de conexión, fijaciones, montaje, nivelación	Und		$1.223.691,00		1,00	$1.223.691	1,00	$1.223.691,00	1,00	$1.223.691,00		$0,00	1,00	$ 1.223.691	0,00	$0
NP-31	Suministro e instalación de UPS On-Line Trifásica 10 kVA FP 1.0, con tecnología de doble conversión, banco de baterías, configuración, pruebas y puesta en funcionamiento.	und		$23.000.000,00		1,00	$23.000.000		$0,00			1,00	$23.000.000,00	1,00	$ 23.000.000	0,00	$0
NP-32	Perforación en losa de concreto e instalación de sistema de fijación mediante chazo y tornillo de 3/8" para soporte de lámparas colgantes, incluyendo suministro de materiales, perforación, limpieza del alojamiento, colocación y ajuste de la	und		$18.000,00		114,00	$2.052.000		$0,00			114,00	$2.052.000,00	114,00	$ 2.052.000	0,00	$0

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES No 01		ACTA DE OBRA N°1		ACUMULADO DE ACTAS ANTERIORES		ACTA DE OBRA N°2		ACUMULADO TOTAL		VALORES DISPONIBLES	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL
NP-33	Suministro de materiales, preparación, elaboración y acabado de media caña en mortero cemento-arena dosificación 1:3, en encuentros entre piso-muro o muro-muro, incluyendo humedecimiento de superficie, conformación, afinado, curado inicial, herramientas, equipos menores, mano de obra y limpieza final.	ml		$23.000,00		67,54	$1.553.420		$0,00				$0,00		$ 0	67,54	$1.553.420
NP-34	Suministro e instalación de tubería EMT galvanizada de 1 1/2" para acometidas eléctricas, incluyendo accesorios de unión, conectores, curvas, abrazaderas, elementos de fijación, corte, conformado, instalación, alineación, soportación, mano de obra especializada	ml		$32.000,00		60,00	$1.920.000		$0,00				$0,00		$ 0	60,00	$1.920.000
NP-35	Suministro e instalación de puerta tipo persiana para baño, fabricada en aluminio anodizado o lámina metálica con ventilación tipo persiana, marco, hojas, bisagras, cerradura tipo baño, topes, anclajes y accesorios de fijación. Incluye transporte, montaje, nivelación, aplome, ajuste, sellos, limpieza y mano de obra necesaria para su correcta instalación.	und		$800.000,00		3,00	$2.400.000		$0,00				$0,00		$ 0	3,00	$2.400.000
NP-36	Fabricación, suministro e instalación de reja de seguridad de 5.62m2 en varilla lisa de 1/2", con marco en ángulo metálico, soldada, anclada a muro o estructura existente, con aplicación de anticorrosivo y pintura esmalte. Incluye transporte, materiales, mano de obra, equipos, anclajes y limpieza final.	und		$2.200.000,00		1,00	$2.200.000		$0,00				$0,00		$ 0	1,00	$2.200.000
COSTOS DIRECTOS OBRA ORDINARIA Y OBRA NO PREVISTA					$961.768.735		$961.768.733		$812.298.613		$812.298.613		$253.041.688		$865.340.301		$96.428.432
COSTOS INDIRECTOS OBRA ORDINARIA Y OBRA NO PREVISTA					$288.530.021		$288.530.020		$183.689.584		$183.689.584		$75.912.506		$259.602.090		$28.927.930
	ADMINISTRACIÓN		25,00%		$240.441.684		$240.441.683		$153.074.653		$153.074.653		$63.260.422		$216.335.075		$24.106.608
	UTILIDAD		5%		$48.088.337		$48.088.337		$30.614.931		$30.614.931		$12.652.084		$43.267.015		$4.821.322
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS OBRA ORDINARIA Y NO PREVISTA				$1.250.296.756		$1.250.296.753		$795.988.197		$795.988.197		$328.954.194		$1.124.942.391		$125.354.362
	COSTO TOTAL				$1.250.296.756		$1.250.296.753		$795.988.197		$795.988.197		$328.954.194		$1.124.942.391		$125.354.362
	PAGO ANTICIPADO		30,00%		$375.089.027												
	AMORTIZACION ANTICIPO																
	VALOR A PAGAR												$328.954.194,00				

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACTA	VALOR OBRA TOTAL	AMORTIZACION PAGO ANTICIPADO			SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta de Obra Parcial N° 1	30 de abril de 2026	$795.988.197	$375.089.026,65			$0,00	$420.899.170	$454.308.556	63,66%
2	Acta de Obra Parcial N° 2	30 de Mayo de 2026	$328.954.194	$0,00			$0,00	$328.954.194	$125.354.362	16,08%

POR EL CONTRATANTE	POR EL CONTRATISTA		POR INTERVENTORIA	POR EL SUPERVISOR
FIRMA:	FIRMA: Anderson S. Barrera		FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: UBALDO DE JESUS CASTRILLON TEJADA EMEGA REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS GRUPO BAW S.A.S. REPRESENTATE LEGAL		NOMBRE: LILIANA MARCELA GUARIN CARDONA INTEGRARCONSTRUCCIONES S.A.S REPRESENTATE LEGAL	NOMBRE: JUAN GABRIEL MANCERA TREJOS EMEGA SUPERVISOR

EMEGA	RELACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS No 02	INTEGRAR CONSTRUCCIONES

RELACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS No 02

Proyecto	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	Localización	MUNICIPIO DE GUARNE - ANTIOQUIA
Contrato Nº:	COP-079 DE 2025	Contratista:	GRUPO BAW SAS
Período:	30 DE MAYO DE 2026	Interventoria:	INTEGRARCONSTRUCCION S.A.S.
Director de obra:	ING. LUZ MARINA VALENCIA BETANCUR	Director Interventoria:	ING. CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO

ITEM	DESCRIPCIÓN SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS - ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES 01			CANTIDADES		VALORES		CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
			Cantidad contrato	Valor Unitario	Valor Total	Mayores (+)	Menores (-)	Mayores (+)	Menores (-)		
1	**PRELIMINARES**										
1,1	Localización, trazado y replanteo de edificaciones. Medido como área construida. Incluye hiladeros y señalización necesaria.	m2	293,00	$4.149	$1.215.657	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**293,00**	$1.215.657
1,2	Cerramiento Provisional en tela de cerramiento verde h: 2.10 incluye estructura de madera común, anclajes de parales al piso y tela verde	ml	100,00	$28.575	$2.857.500	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**100,00**	$2.857.500
1,3	Campamento provisional en teleras y teja de zinc. Incluye puerta de acceso, bisagras, cerradura de seguridad, conexiones eléctricas y de iluminación.	m2	25,00	$131.838	$3.295.950	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**25,00**	$3.295.950
1,5	Suministro e instalación de redes Eléctricas provisionales.	glb	1,00	$4.653.464	$4.653.464	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**1,00**	$4.653.464
1,6	Suministro e instalación de redes Hidráulicas provisionales.	glb	1,00	$1.737.996	$1.737.996	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**1,00**	$1.737.996
2	**CONCRETOS Y ACEROS**										
2.1	CONCRETO PARA ESCALERAS DE 3000 PSI: realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 12,5 mm	m2	25,30	$350.488	$8.867.346	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**25,30**	$8.867.346
2.2	CONCRETO PARA COLUMNAS DE 3000 PSI: Columna de sección cuadrada de concreto armado, realizado con concreto f'c=280 kg/cm² (28 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 19 mm	m3	13,99	$1.369.523	$19.159.627	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**13,99**	$19.159.627
2.3	CONCRETO PARA VIGAS AÉREAS: Viga de concreto armado, realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa), máximo del agregado 19 mm,a, en planta de hasta 3.5 m de altura libre	m3	17,07	$1.454.823	$24.833.829	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**17,07**	$24.833.829
2.4	Viga de amarre de 0.15m x 0.20m en concreto de 21 mpa. El acero de refuerzo se pagará por su respectivo ítem	ml	0,00	$79.375	$0	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**0,00**	$0

EMEGA	RELACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS No 02	INTEGRAR CONSTRUCCIONES

2.5	Construcción de LOSA en concreto premezclado según diseño armada con casetón de Poron Recuperable. Incluye suministro, transporte, bombeo con Auto bomba o bomba estacionaria y colocación del concreto a una altura de entre 3.0 y 4.0m, formaleta en súper T de 19 mm. o equivalente para acabado a la vista en la parte inferior y paredes laterales y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. Incluye suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para el correcto vaciado según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m2	202,00	$369.714	$74.682.228	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**202,00**	$74.682.228
2.6	Construcción de junta de dilatación entre muros y elementos estructurales para pañetes en exterior.	ml	0,00	$8.008	$0	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**0,00**	$0
2.8	Suministro, transporte e instalación de Acero de Refuerzo Figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	16097,50	$8.196	$131.935.110	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**16.097,50**	$131.935.110
2.9	Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D-84Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	kg	526,50	$9.393	$4.945.415	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**526,50**	$4.945.415
2.10	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL según diseño. Incluye PHR PTS PLATINAS Y RIOSTRAS	kg	4600,34	$23.000	$105.807.837	0,00	283,01	$ 0,00	$ 6.509.247,00	**4.317,33**	$99.298.590
2.11	Colocación de GROUTING en concreto de 17.5 Mpa., para relleno de muro no estructural (bloque, tolete o catalán). Incluye mano de obra, vibrado, protección, curado y todos demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo.	ml	226,77	$24.803	$5.624.576	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**226,77**	$5.624.576
2.12	Suministro, transporte e instalación de lagrimal en concreto.	ml	60,00	$51.999	$3.119.940	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**60,00**	$3.119.940
2.13	Construcción de dinteles según diseño de elementos no estructurales. Incluye suministro, transporte y colocación de concreto, espesor indicado en planos. Incluye mano de obra, vibrado, formaleta, mano de obra, El acero se paga en su respectivo ITEM.	ml	6,00	$41.223	$247.338	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**6,00**	$247.338
2.14	Suministro e instalación de Anclajes epoxicos para diámetros de 3/8" y 1/2"; incluye perforación, limpieza, colocación acero de refuerzo y anclaje epoxico según normas NSR-10	und	520,00	$40.400	$21.008.000	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**520,00**	$21.008.000
2.15	Construcción de JUNTA DE DILATACIÓN ENTRE MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES (una sola cara), ancho de 2 cm., instalación de varilla de espuma de polietileno tipo sellalón, sikarod ó equivalente de Ø= 1", aplicación de masilla elástica sellante y adhesiva con base en poliuretano tipo Sikaflex-1a ó equivalente, junta máxima de ancho= 20 mm. prof.= 5 mm., color similar al muro ó a definir por la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Se deben seguir todas las especificaciones y recomendaciones de los fabricantes de los materiales.	ml	178,88	$36.293	$6.492.092	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**178,88**	$6.492.092

EMEGA	RELACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS No 02	INTEGRAR CONSTRUCCIONES

2.16	Mortero para pendientes (e=5cm) con impermeabilizante integral.	m2	495,00	$62.949	$31.159.755	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**495,00**	$31.159.755
3	**REVOQUES Y PINTURAS**										
3.1	Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	0,00	$41.741	$0	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**0,00**	$0
3.2	Suministro, transporte e instalación de estuco sobre muros. Dos manos o las que sean necesarias hasta lograr una superficie homogénea. Incluye la preparación de la superficie	M2	208,51	$26.804	$5.588.902	10,20	0,00	$ 273.401,00	$ 0,00	**218,71**	$5.862.303
3.3	Suministro y aplicación de estuco sobre filos de muros, mochetas, columnas, vigas y vanos de puertas y ventanas. Incluye la preparación de la superficie, el perfilado y aplomado de las aristas para garantizar un acabado recto y uniforme, listo para recibir la pintura final.	ml	176,22	$16.329	$2.877.496	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**176,22**	$2.877.496
3.4	suministro y aplicación de REVOQUE en mortero 1:4 impermeabilizado, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	m2	208,51	$46.743	$9.746.383	10,20	0,00	$ 476.779,00	$ 0,00	**218,71**	$10.223.162
3.5	Fajas de revoque impermeabilizado con Sika 1.	ml	417,37	$28.046	$11.705.476	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**417,37**	$11.705.476
3.6	Aplicación de PINTURA DE PRIMERA CALIDAD. Para interiores y exteriores, sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales	m2	259,51	$22.862	$5.932.918	110,24	0,00	$ 2.520.307,00	$ 0,00	**369,75**	$8.453.225
4	**ENCHAPES Y CERRAMIENTOS**										
4.1	Construcción de Muro portante de mampostería reforzada según diseño, de bloque de concreto 15 cm x 20 cm x 40 cm	m2	0,00	$104.039	$0	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**0,00**	$0
4.2	Construcción de Muro el ladrillo catalán a la vista (según construcción existente). Incluye todo lo necesario para su construcción	m2	249,37	$181.655	$45.299.307	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**249,37**	$45.299.307
4.4	Suministro, transporte y colocación de ventana en aluminio negro anodizado y vidrio incoloro templado de 6 mm. Incluye cerradura de seguridad y todos los elementos necesarios según diseño para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	62,00	$623.929	$38.683.598	0,00	3,72	$ 0,00	$ 2.321.016,00	**58,28**	$36.362.582
4.5	Suministro, transporte y colocación de puerta en aluminio anodizado y vidrio incoloro templado de 8 mm. Incluye cerradura de seguridad y todos los elementos necesarios según diseño para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	22,60	$664.970	$15.028.322	0,00	5,80	$ 0,00	$ 3.856.826,00	**16,80**	$11.171.496
4.6	suministro, transporte e instalación de Teja termoacústicas UPVC 2.5 mm cresta alta blanca, así como todos los componentes y accesorios necesarios para su montaje conforme a las especificaciones técnicas y normativas pertinentes.	m2	91,00	$96.801	$8.808.891	27,00	0,00	$ 2.613.627,00	$ 0,00	**118,00**	$11.422.518

EMEGA	RELACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS No 02	INTEGRAR CONSTRUCCIONES

4.8	Suministro, transporte e instalación de pasamanos metálico fabricado de la siguiente manera, pletina de anclaje de forma circular a muro, mas L en varilla de 1/2" lisa ,incluye la tornillería de ensamble .1 un tubo superior de 2" calibre 16,incluye pintura anticorrosiva y acabados según requerimiento.	m	7,00	$324.009	$2.268.063	4,26	0,00	$ 1.380.278,00	$ 0,00	**11,26**	$3.648.341
4.9	Suministro e instalación cerramiento para divisiones de oficinas en vidrio templado incoloro 10mm bordes pulidos y brillados con perfilería en aluminio negro, conformado por módulos fijos laterales y montantes superiores, tubular horizontal inferior de 3"x1"1/2, + tubulares verticales y horizontal superior de 10 x 4,5 cm con remarco en sistema 3831 pisa vidrio a presión con empaque, incluye 4 puertas batientes con zócalo inferior de 9cm con empaque y con base, bisagra hidráulica speedy trabajo pesado, chapeta esquinera superior con pivote platina aéreo, doble manija en acero inoxidable de 1"x40, cerradura Yale 170 1/4 con porta cerradura y recibidor cuadrado, cerrojos y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	28,00	$928.379	$25.994.612	2,34	0,00	$ 2.172.407,00	$ 0,00	**30,34**	$28.167.019
4.10	Suministro e instalación de cuerpo fijo de 2 módulos en persiana de ventilación 315, perfilería color negro.	m2	0,00	$585.548	$0	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**0,00**	$0
4.11	suministro, transporte e instalación de canal en lamina galvanizada cal. 18, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	37,00	$206.331	$7.634.247	0,00	3,50	$ 0,00	$ 722.159,00	**33,50**	$6.912.089
4.12	suministro, transporte e instalación de ruana para cubierta en lamina galvanizada cal. 26, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	32,00	$100.689	$3.222.048	3,80	0,00	$ 382.618,00	$ 0,00	**35,80**	$3.604.666
4.13	suministro, transporte e instalación de zócalo de baldosa Alpes grafito Gris formato 8,5 cm x 90 cm incluye todo lo necesario para su correcta instalación	ml	185,00	$35.846	$6.631.510	0,00	24,17	$ 0,00	$ 866.398,00	**160,83**	$5.765.112
4.15	Enchape De Pared Tipo Artica De Corona O Similar Colo Blanco Formato 30 X 60.Istalacion En Sentido Horizontal En Sistema Apilado.	m2	0,00	$88.027	$0	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**0,00**	$0
5	**APARATOS SANITARIOS**										
5.1	Suministro, transporte e instalación de Orinal mediano con válvula antivandálica Tipo push color blanco o equivalente	und	1,00	$704.803	$704.803	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**1,00**	$704.803
5.3	Suministro, transporte e instalación de Espejo Cristal De 6 Mm Con Bordes Pulidos Pegado A Cerámica	m2	9,00	$123.000	$1.107.000	0,00	5,88	$ 0,00	$ 723.240,00	**3,12**	$383.760
5.4	suministro, transporte e instalacion de Lavamanos Acuajet Institucional, incluye brazos de instalacion a muro, griferia Institucional para lavamanos Push mesa max y todos sus accesorios para su correcta instalacion	und	4,00	$1.370.500	$5.482.000	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**4,00**	$5.482.000
5.5	Suministro, transporte e instalacion de kit Taza Báltica plus entrada superior con válvula push de empotrar, incluye todos los accesorios para su correcta instalación.	und	4,00	$1.860.383	$7.441.532	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**4,00**	$7.441.532
6	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**										
	TABLEROS DE CIRCUITOS PARCIALES 3 PISO										

EMEGA

RELACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS No 02

INTEGRAR CONSTRUCCIONES

6.8	Suministro e instalación de tablero mb de 36 ctos trifásico con puerta	und	0,00	$3.714.200	$0	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$0
6.9	Suministro e instalación de tablero mb de 24 ctos trifásico con puerta	und	0,00	$2.610.400	$0	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$0
6.10	Suministro e instalación breakers enchufables monopolares de 1x20 amp	und	42,00	$19.600	$823.200	0,00	10,00	$ 0,00	$ 196.000,00	32,00	$627.200
	SALIDAS DE TOMAS Y LUCES 3 PISO										
6.11	Salidas para tomas con p.t. 120v. normal. cable 3xno12 lshf, emt = 1/2" cajas y accesorio	und	45,00	$235.800	$10.611.000	0,00	14,00	$ 0,00	$ 3.301.200,00	31,00	$7.309.800
6.12	salidas para tomas con p.t. 120v. Gfci	und	5,00	$235.800	$1.179.000	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	5,00	$1.179.000
6.13	Salidas para tomas regulados con p.t. 120v. color naranja,cable 3xno12 lshf, imc = 1/2" cajas y accesorio metalico	und	16,00	$235.800	$3.772.800	0,00	5,00	$ 0,00	$ 1.179.000,00	11,00	$2.593.800
6.14	salidas para luces 120v. Normales	und	66,00	$235.800	$15.562.800	0,00	9,00	$ 0,00	$ 2.122.200,00	57,00	$13.440.600
6.15	salidas para luces de emergencia	und	4,00	$235.800	$943.200	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	4,00	$943.200
6.16	salidas para television	und	4,00	$235.800	$943.200	0,00	2,00	$ 0,00	$ 471.600,00	2,00	$471.600
6.17	suministro, instalacion y montaje de luminarias de emergencia	und	4,00	$163.100	$652.400	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	4,00	$652.400
6.18	suministro e instalacion de tomas con p.t. 120v. normal	und	45,00	$113.500	$5.107.500	0,00	14,00	$ 0,00	$ 1.589.000,00	31,00	$3.518.500
6.19	suministro e instalacion de tomas con p.t. 120v. Gfci	und	5,00	$113.500	$567.500	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	5,00	$567.500
6.20	suministro e instalacion de tomas regulados con p.t. 120v.	und	16,00	$113.500	$1.816.000	0,00	5,00	$ 0,00	$ 567.500,00	11,00	$1.248.500
6.21	suministro, instalacion y montaje de luminaria led 36 w	und	66,00	$222.560	$14.688.960	0,00	9,00	$ 0,00	$ 2.003.040,00	57,00	$12.685.920
6.22	suministro e instalacion de interruptor sencillo o sensor de movimiento	und	3,00	$113.500	$340.500	0,00	1,00	$ 0,00	$ 113.500,00	2,00	$227.000
6.23	suministro e instalacion de tuberia metalica emt 3/4" y accesorios	ml	0,00	$6.490	$0	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$0
6.24	salidas para señal de evacuacio(salida),120 v, cable 3xno12 awg,emt de 1/2"cajas 2x4 metalicas, etc	und	2,00	$235.800	$471.600	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	2,00	$471.600
6.25	suministro e instalacion de señal de salida	und	2,00	$183.500	$367.000	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	2,00	$367.000
6.26	suministro e instalacion de salidas para video beam	und	2,00	$482.000	$964.000	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	2,00	$964.000
	VOZ Y DATOS										
6.27	salida para voz y datos, en cable utp cat 6a lshf, tuberia sch 40 de 3/4"	und	16,00	$450.000	$7.200.000	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	16,00	$7.200.000
6.28	suministro en instalacion de rack , suiche administrable, ap para salida de wifi	und	1,00	$18.525.000	$18.525.000	0,00	1,00	$ 0,00	$ 18.525.000,00	0,00	$0
6.29	suministro transporte instalacion de camaras wifi	und	4,00	$1.581.250	$6.325.000	0,00	4,00	$ 0,00	$ 6.325.000,00	0,00	$0
	SISTEMA DE PROTECCION DE UPS										
6.30	suministro de ups 15 kva, , on line	und	0,00	$8.000.000	$0	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$0
	REGISTROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION										
6.31	registros electricos de baja tension sb 325	und	1,00	$360.000	$360.000	0,00	1,00	$ 0,00	$ 360.000,00	0,00	$0
7	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**										
7.1	Suministro, transporte e instalación de tubería 1/2" PVC RDE 13,5. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación	ml	0,00	$21.219	$0	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$0

EMEGA	RELACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS No 02	INTEGRAR CONSTRUCCIONES

7.2	Suministro, transporte e instalación de de tubería 3/4" PVC RDE 13,5. incluye todo lo necesario para su correcta instalación	ml	10,90	$23.514	$256.303	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**10,90**	$256.303
7.3	Suministro, transporte e instalación de de tubería 1" PVC RDE 21. incluye todo lo necesario para su correcta instalación	ml	7,00	$29.837	$208.859	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**7,00**	$208.859
7.4	Suministro, transporte e instalación de de tubería 1-1/4" PVC RDE 21. incluye todo lo necesario para su correcta instalación	ml	33,70	$30.787	$1.037.522	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**33,70**	$1.037.522
7.5	Suministro, transporte e instalación de tubería 1-1/2" PVC. incluye todo lo necesario para su correcta instalación	ml	0,00	$31.856	$0	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**0,00**	$0
7.6	Suministro, transporte e instalación de tubería 2" PVC. incluye todo lo necesario para su correcta instalación	ml	25,00	$45.312	$1.132.800	0,00	15,25	$ 0,00	$ 691.008,00	**9,75**	$441.792
7.7	Suministro e instalación de Andaje para tubería colgante al techo de 3/8". incluye todo lo necesario para su correcta instalación	und	0,00	$66.284	$0	5,00	0,00	$ 331.420,00	$ 0,00	**5,00**	$331.420
7.8	Suministro e instalación de Punto hidráulico. incluye todo lo necesario para su correcta instalación	und	10,00	$101.740	$1.017.400	0,00	1,00	$ 0,00	$ 101.740,00	**9,00**	$915.660
7.9	Suministro, transporte e instalación de válvula de compuerta de 1/2". incluye todo lo necesario para su correcta instalación	und	0,00	$62.236	$0	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**0,00**	$0
7.10	Suministro, transporte e instalación de válvula de compuerta de 3/4". incluye todo lo necesario para su correcta instalación	und	2,00	$73.236	$146.472	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**2,00**	$146.472
7.11	Suministro, transporte e instalación de válvula de compuerta de 1 1/4". incluye todo lo necesario para su correcta instalación	und	2,00	$118.442	$236.884	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**2,00**	$236.884
7.12	Suministro, transporte e instalación de Puntos sanitarios y accesorios de 2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	8,00	$170.302	$1.362.416	1,00	0,00	$ 170.302,00	$ 0,00	**9,00**	$1.532.718
7.13	Suministro, transporte e instalación Puntos sanitarios y accesorios de 3". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación	und	0,00	$182.152	$0	16,50	0,00	$ 3.005.508,00	$ 0,00	**16,50**	$3.005.508
7.14	Suministro, transporte e instalación de Puntos sanitarios y accesorios de 4". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	4,00	$201.343	$805.372	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**4,00**	$805.372
8	**IMPERMEABILIZACIÓN**										
7.14	Suministro, transporte e instalación de materiales para impermeabilizacion de losa de tercer piso con broncoelastico. Incluye todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	0,00	$87.867	$0	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**0,00**	$0
9	**CERTIFICACIONES**										
9.1	certificacion RETIE IVA INCLUIDO	und	1,00	$5.355.000	$5.355.000	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**1,00**	$5.355.000
9.2	certificacio RETILAP IVA INCLUIDO	und	1,00	$5.355.000	$5.355.000	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**1,00**	$5.355.000
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**										
NP-01	Fijaciones epoxicas en perforadones de 1 1/4" con epoxico hintic re500	Und	20,00	$550.000	$11.000.000	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**20,00**	$11.000.000
NP-02	Limpieza de acero de refuerzo existente	Kg	1814,02	$1.000	$1.814.020	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**1.814,02**	$1.814.020
NP-03	Demolicion y escarificacion de columnas existentes (todas las del perimetro)	Und	16,00	$120.000	$1.920.000	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**16,00**	$1.920.000

EMEGA

RELACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS No 02

INTEGRAR CONSTRUCCIONES

NP-04	Tramite de legalizacion ante epm incluido aprobacion de diseños y estudios respectivos	Glb	2,00	$6.800.000	$13.600.000	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**2,00**	$13.600.000
NP-05	Retiiro de manto impermeabilizante en losa	m2	293,00	$5.500	$1.611.500	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**293,00**	$1.611.500
NP-06	Demolicion de muro en fachadas; incluye botada de escombros	m2	122,13	$95.000	$11.602.350	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**122,13**	$11.602.350
NP-07	Mamposteria en ladrillo sencillo de 15x20x40 para divisiones de muros interiores	m2	100,96	$94.000	$9.490.240	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**100,96**	$9.490.240
NP-08	Pisos en ceramica 60x60	m2	293,00	$123.000	$36.039.000	20,00	0,00	$ 2.460.000,00	$ 0,00	**313,00**	$38.499.000
NP-09	Lavada e hidrofugo de muros en ladrillo a la vista	m2	418,00	$35.000	$14.630.000	6,09	0,00	$ 213.150,00	$ 0,00	**424,09**	$14.843.150
NP-10	Cocina integrar de 1.80m; incluye lavaplatos y griferia	Und	1,00	$2.251.195	$2.251.195	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**1,00**	$2.251.195
NP-11	Perforaciones de 21/2" para pases de tuberia sanitaria 2"	Und	6,00	$60.000	$360.000	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**6,00**	$360.000
NP-12	Perforaciones de 41/2" para pases de tuberia sanitaria y de aguas lluvias de 4"	Und	4,00	$95.000	$380.000	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**4,00**	$380.000
NP-13	Tuberia pvc aguas lluvias de 4" para bajantes	Ml	20,00	$55.000	$1.100.000	0,00	9,00	$ 0,00	$ 495.000,00	**11,00**	$605.000
NP-14	Suministro e instalacion de gabinete by-pass para proteccion t-r1	und	1,00	$4.445.820	$4.445.820	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**1,00**	$4.445.820
NP-15	Suministro e instalacion de acometida desde transferencia automatica no.1 hasta tablero general en cable 4 x 8 awg lshf	ml	7,00	$195.445	$1.368.115	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**7,00**	$1.368.115
NP-16	Suministro e instalacion de acometida desde transferencia hasta tablero de tomas y luces reguladas en cable 4 x 8awg lshf	ml	8,00	$195.445	$1.563.560	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**8,00**	$1.563.560
NP-17	Suministro e instalacion de llave by-pass 40 amp	und	1,00	$634.980	$634.980	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**1,00**	$634.980
NP-18	Suministro en instalacion de acometida desde gabinete general de instalaciones existentes hasta tablero de distribucion de toma y luces normales en cable 5 x 4 AWG LSHF	ml	60,00	$250.000	$15.000.000	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**60,00**	$15.000.000
NP-19	Suministro e instalacion de interruptor sencillo	und	13,00	$60.564	$787.332	0,00	2,00	$ 0,00	$ 121.128,00	**11,00**	$666.204
NP-20	Suministro e instalacion de interruptor doble en muro	und	1,00	$69.174	$69.174	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**1,00**	$69.174
NP-21	Suministro de NVR para sistema de video vigilancia	und	1,00	$203.210	$203.210	0,00	1,00	$ 0,00	$ 203.210,00	**0,00**	$0
NP-22	Suministro y aplicación de pintura tipo Koraza color gris basalto o equivalente sobre superficie de losa en concreto, incluyendo aplicación uniforme de dos manos de pintura, mano de obra especializada, herramientas menores, equipos, transporte interno y limpieza final del área intervenida, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto.	m2	373,36	$26.500	$9.894.040	26,08	0,00	$ 691.092,00	$ 0,00	**399,44**	$10.585.132
NP-23	Resane y preparación superficial de losa de concreto mediante remoción mecánica de rebabas, filos y sobrantes de concreto, lijado y desbaste con pulidora, corrección de hormigueros, reparación de porosidades superficiales, aplicación de mortero de resane donde sea requerido, limpieza de la superficie, retiro de material sobrante, mano de obra especializada, equipos, herramientas menores, consumibles y limpieza final del área intervenida, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto.	m2	373,36	$36.695	$13.700.445	41,08	0,00	$ 1.507.431,00	$ 0,00	**414,44**	$15.207.876

EMEGA	RELACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS No 02	INTEGRAR CONSTRUCCIONES

NP-24	Suministro en alquiler de equipo tipo pluma o malacate mecánico para el transporte vertical de materiales, herramientas y equipos menores durante la ejecución de actividades constructivas, incluyendo instalación, operación básica, energía o combustible menor, anclajes temporales, mantenimiento básico, transporte interno y desmontaje del equipo, de acuerdo con las condiciones de obra y especificaciones técnicas del proyecto.	dia	24,00	$330.000	$7.920.000	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**24,00**	$7.920.000
NP-25	Suministro e instalación de canalización eléctrica en tubería EMT de 3/4", incluye apertura y resane de superficies, perforaciones, anclajes, soportes, accesorios, fijaciones, adecuaciones civiles, retiro de sobrantes y demás actividades necesarias para su correcta ejecución.	ml	400,00	$14.101	$5.640.400	62,00	0,00	$ 874.262,00	$ 0,00	**462,00**	$6.514.662
NP-26	Suministro, transporte e instalación de un sistema de impermeabilización bicapa sobre losa de concreto, mediante la preparación y limpieza de la superficie, aplicación de imprimante o emulsión asfáltica, instalación termofundida de primera capa de manto asfáltico tipo sufridor en poliéster de 3 mm y segunda capa de acabado en manto asfáltico en poliéster de 3 mm, incluyendo traslapos longitudinales y transversales, sellado de juntas, tratamiento de puntos críticos, remates, aplicación de dos manos de pintura aluminizada tipo Paraguas Corona o equivalente, mano de obra especializada, equipos, herramientas, consumibles, transporte interno y limpieza final del área intervenida, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto.	m2	202,00	$122.260	$24.696.520	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	**202,00**	$24.696.520
NP-27	Suministro, transporte e instalación de muro liviano en sistema drywall conformado por estructura metálica galvanizada en perfiles tipo parales y canales, revestido por ambas caras con lámina de yeso drywall de 1/2", incluyendo tornillería, cintas, masillado de juntas, refuerzos, fijaciones, cortes, desperdicios, mano de obra especializada, herramientas menores, transporte interno y limpieza final del área intervenida, de acuerdo con planos y especificaciones técnicas del proyecto.	m2	7,00	$131.378	$919.646	9,26	0,00	$ 1.216.560,00	$ 0,00	**16,26**	$2.136.206
NP-28	Suministro, transporte e instalación de muro liviano en sistema fibrocemento tipo Superboard de 8 mm, conformado por estructura metálica galvanizada en perfiles tipo parales y canales, revestido por ambas caras (2F) con lámina Superboard de 8 mm, incluyendo perfilería metálica, tornillería, tratamiento de juntas, sellos, refuerzos, fijaciones, cortes, desperdicios, mano de obra especializada, herramientas menores, transporte interno y limpieza final del área intervenida, de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos del proyecto.	m2	3,50	$153.186	$536.151	0,00	0,33	$ 0,00	$ 50.551,00	**3,17**	$485.600

EMEGA	RELACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS No 02	INTEGRAR CONSTRUCCIONES

NP-29	Suministro, transporte e instalación de tablero eléctrico trifásico de distribución para 30 circuitos con totalizador principal de 100 amperios, gabinete metálico, barraje, accesorios de conexión, fijaciones, montaje, nivelación, conexionado, marquillado, pruebas básicas de funcionamiento, mano de obra calificada, herramientas menores y limpieza final, conforme RETIE y especificaciones del proyecto.	Und	1,00	$3.429.890	$3.429.890	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	1,00	$3.429.890
NP-30	Suministro, transporte e instalación de tablero eléctrico de distribución para 12 circuitos, con gabinete metálico, barraje, espacio para interruptores termomagnéticos, accesorios de conexión, fijaciones, montaje, nivelación, conexionado, marquillado, pruebas básicas de funcionamiento, mano de obra calificada, herramientas menores, transporte interno y limpieza final, conforme RETIE y especificaciones del proyecto.	Und	1,00	$1.223.691	$1.223.691	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	1,00	$1.223.691
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$961.766.735,00**			**$20.289.142,00**	**$53.414.563,00**		**$928.641.315,00**
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$288.530.021,00**			**$6.086.743,00**	**$16.024.369,00**		**$278.592.395,00**
	Administración	25,00%			$240.441.684,00			$5.072.286,00	$13.353.641,00		$232.160.329,00
	Utilidad	5,00%			$48.088.336,75			$1.014.457,10	$2.670.728,15		$46.432.065,75
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				**$1.250.296.756,00**			**$26.375.885,00**	**$69.438.932,00**		**$1.207.233.710,00**
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				**$1.250.296.756,00**			**$26.375.885,00**	**$69.438.932,00**		**$1.207.233.710,00**

ÍTEMS NO PREVISTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	JUSTIFICACIÓN	CONCEPTO DIRECTOR INTERVENTORÍA	CONCEPTO SUPERVISOR ENTIDAD
NP-31	Suministro e instalación de UPS On-Line Trifásica 10 kVA FP 1.0, con tecnología de doble conversión, banco de baterías, configuración, pruebas y puesta en funcionamiento.	Und	1,00	$23.000.000	$23.000.000	Durante el proceso de definición y puesta en funcionamiento de la infraestructura tecnológica y eléctrica de la sede administrativa fue necesaria la instalación de una UPS para garantizar el respaldo y la continuidad del suministro eléctrico de los equipos críticos de la sede administrativa, asegurando su correcta operación ante fallas o interrupciones del servicio de energía.	FAVORABLE	
NP-32	Perforación en losa de concreto e instalación de sistema de fijación mediante chazo y tornillo de 3/8" para soporte de lámparas colgantes, incluyendo suministro de materiales, perforación, limpieza del alojamiento, colocación y ajuste de la fijación, verificación de firmeza y todos los elementos, equipos y mano de obra necesarios para su correcta ejecución.	Und	114,00	$18.000	$2.052.000	Durante la instalación de los elementos de iluminación arquitectónica fue necesario ejecutar perforaciones e instalar sistemas de fijación en la losa para garantizar el soporte seguro y la correcta instalación de las lámparas colgantes definidas para los espacios de la sede administrativa.	FAVORABLE	

EMEGA

RELACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS No 02

INTEGRAR CONSTRUCCIONES

NP-33	Suministro de materiales, preparación, elaboración y acabado de media caña en mortero cemento-arena dosificación 1:3, en encuentros entre piso-muro o muro-muro, incluyendo humedecimiento de superficie, conformación, afinado, curado inicial, herramientas, equipos menores, mano de obra y limpieza final.	ml	67,54	$23.000	$1.553.420	Durante la ejecución de las actividades de impermeabilización de la losa expuesta del cuarto piso, se evidenció la necesidad de conformar medias cañas en los encuentros entre la losa y los elementos verticales, con el fin de garantizar la correcta adherencia y continuidad del sistema impermeabilizante, evitando puntos críticos de filtración y asegurando la durabilidad de la cubierta. Esta actividad no se encontraba contemplada en las cantidades iniciales del contrato y fue requerida como condición técnica indispensable para la adecuada protección de la estructura frente a la acción del agua y la intemperie.	FAVORABLE	
NP-34	Suministro e instalación de tubería EMT galvanizada de 1 1/2" para acometidas eléctricas, incluyendo accesorios de unión, conectores, curvas, abrazaderas, elementos de fijación, corte, conformado, instalación, alineación, soportación, mano de obra especializada	ml	60,00	$32.000	$1.920.000	Durante la ejecución de las instalaciones eléctricas fue necesario incorporar tubería EMT adicional para garantizar la correcta canalización y protección de las acometidas eléctricas, conforme a los requerimientos técnicos y a las condiciones reales encontradas en obra, actividad no contemplada inicialmente en el proyecto.	FAVORABLE	
NP-35	Suministro e instalación de puerta tipo persiana para baño, fabricada en aluminio anodizado o lámina metálica con ventilación tipo persiana, marco, hojas, bisagras, cerradura tipo baño, topes, anclajes y accesorios de fijación. Incluye transporte, montaje, nivelación, aplome, ajuste, sellos, limpieza y mano de obra necesaria para su correcta instalación.	Und	3,00	$800.000	$2.400.000	Fue necesaria la instalación de puertas tipo persiana para el cierre de los cubículos sanitarios de los baños, garantizando la privacidad de los usuarios y la adecuada funcionalidad de las áreas sanitarias, actividad no contemplada inicialmente en el proyecto.	FAVORABLE	
NP-36	Fabricación, suministro e instalación de reja de seguridad en varilla lisa de 1/2", con marco en ángulo metálico, soldada, anclada a muro o estructura existente, con aplicación de anticorrosivo y pintura esmalte. Incluye transporte, materiales, mano de obra, equipos, anclajes y limpieza final.	Und	1,00	$2.200.000	$2.200.000	Durante la ejecución de la obra se identificó la necesidad de instalar una reja de seguridad en el acceso al cuarto piso, debido a que esta zona quedó expuesta y representaba un riesgo para la seguridad de los usuarios y del personal de mantenimiento. La instalación de este elemento fue necesaria para controlar el acceso, prevenir caídas y garantizar condiciones seguras de operación de la edificación.	FAVORABLE	
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$33.125.420,00**	**OBSERVACIONES:**		
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$9.937.626,00**			
	Administracion	25,00%			$8.281.355,00			
	Utilidad	5,00%			$1.656.271,00			
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				**$43.063.046,00**			

CIERRE BALANCE FINANCIERO: VALOR CONTRACTUAL VS ITEM NO PREVISTOS + SALDO FINAL

* ESTE DOCUMENTO DEBE ESTAR ACOMPAÑADO DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EL CONTRATISTA:	**EL SUPERVISOR DE OBRA:**	**EL INTERVENTOR:**	
Firma:	Firma:	Firma:	
NOMBRE: LILIANA MARCELA GUARIN CARDONA INTEGRARCONSTRUCCIONES S.A.S. REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA	NOMBRE: JUAN GABRIEL MANCERA TREJOS EMEGA SUPERVISOR DE OBRA	NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS GRUPO BAW SAS REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Elaborado: Total de Páginas: **10**

EMEGA BAW

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

INTEGRAR CONSTRUCCIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	2.12
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	ml
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	Suministro, transporte e instalación de lagrimal en concreto.
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO					CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	
Muro atico cuarto nivel	7,25					7,25
	7,25					7,25
	9,85					9,85
	7,60					7,60
	11,90					11,90
	7,85					7,85
	8,30					8,30
CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA						60,00
ACUMULADO ANTERIOR						
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS						60,00

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA



Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO

OBSERVACIONES:

EMEGA BAW

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

INTEGRAR CONSTRUCCIONES

				ACTA No.
PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	2.16	
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	m2	
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	Mortero para pendientes (e=5cm) con impermeabilizante integral.	02
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026	

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO					CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	
Losa de cuarto piso				202,00		202,00
CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA						202,00
ACUMULADO ANTERIOR						
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS						202,00

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA

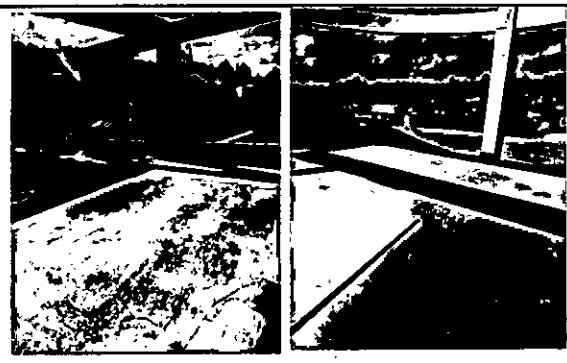

Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO

OBSERVACIONES:

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	3.2
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	m2
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	Suministro, transporte e instalación de estuco sobre muros. Dos manos o las que sean necesarias hasta lograr una superficie homogénea. Incluye la preparación de la superficie
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Alto (m)	Largo (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Muro escalas	3,00	3,40		10,20		1,00	10,20
CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA							10,20
ACUMULADO ANTERIOR							
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS							10,20

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA



Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO

OBSERVACIONES:

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	3.4
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	m2
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	suministro y aplicación de REVOQUE en mortero 1:4 impermeabilizado, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Alto (m)	Largo (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Muro escalas	3,00	3,40		10,20		1,00	10,20
CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA							10,20
ACUMULADO ANTERIOR							
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS							10,20

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA



Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO

OBSERVACIONES:

EMEGA | BAW

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

INTEGRAR CONSTRUCCIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	FRENTE DE OBRA:	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	ITEM:	3.2
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	UNIDAD:	m2
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	DESCRIPCIÓN:	Aplicación de PINTURA DE PRIMERA CALIDAD. Para interiores y exteriores, sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Alto (m)	Largo (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Pasillo Baños	2,65	2,35		6,23		2,00	12,46
División Baños	2,65	1,50		3,98		2,00	7,95
to electrico	2,90	3,55		10,30		2,00	20,59
ión Baños Dama	2,95	1,50		4,43		2,00	8,85
Direccion Financiera	2,90	7,30		21,17		2,00	42,34
	2,65	1,80		4,77		2,00	9,54
	2,65	1,00		2,65		2,00	5,30
Gerencia	2,65	3,60		9,54		2,00	19,08
	2,65	3,54		9,38		2,00	18,76
	2,65	2,26		5,99		2,00	11,98
Direccion de Insfraestructura	2,65	4,20		11,13		2,00	22,26
Direccion de Insfraestructura	2,90	1,50		4,35		2,00	8,70
Cocineta	2,65	3,70		9,81		2,00	19,61
Muro escalas	3,00	3,40		10,20		10,20	104,04
Area ventanas	2,00	0,50		1,00	-2,00	-2,00	-2,00
Cocineta	1,50	0,50		0,75	-1,00	-0,75	-0,56
Muro fachada						51,34	51,34
Columnas Fachada	2,38	0,25		0,60		16,00	9,52
						CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA	369,75
						ACUMULADO ANTERIOR	
						CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS	369,75

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA

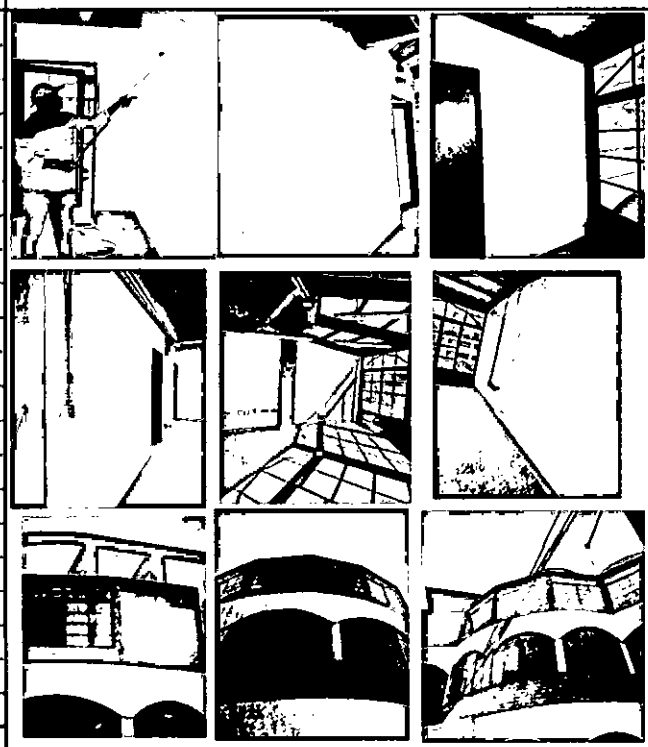

Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO

OBSERVACIONES:

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	4.4
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	m2
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	Suministro, transporte y colocación de ventana en aluminio negro anodizado y vidrio incoloro templado de 6 mm. Incluye cerradura de seguridad y todos los elementos necesarios según diseño para su correcta instalación y funcionamiento.
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Alto (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Ventanas Fachada	19,03	1,97		37,49		1,00	37,49
Baño Gerencia	1,87	0,50		0,94		1,00	0,94
Ventanas Archivo	9,92	0,50		4,96		1,00	4,96
lio Cocineta	2,07	0,87		1,80		1,00	1,80
Cocineta	1,48	0,85		1,26		1,00	1,26
Baños Hombres	2,00	0,50		1,00		1,00	1,00
Baño Mujeres	2,00	0,50		1,00		1,00	1,00
Oficina Direccion Financiera	3,00	1,72		5,16		1,00	5,16
Escalas Tercer y cuarto nivel	3,90	0,60		2,34		2,00	4,68
						CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA	58,28
						ACUMULADO ANTERIOR	
						CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS	58,28

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA



Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO

OBSERVACIONES:

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	4.5
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	m2
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	Suministro, transporte y colocación de puerta en aluminio anodizado y vidrio incoloro templado de 8 mm. Incluye cerradura de seguridad y todos los elementos necesarios según diseño para su correcta instalación y funcionamiento.
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Alto (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Cocineta	2,10	1,00		2,10		1,00	2,10
Baños	2,10	1,00		2,10		2,00	4,20
Oficia Financiera	2,10	1,00		2,10		1,00	2,10
ina Juridica	2,10	1,00		2,10		1,00	2,10
Gerencia	2,10	1,00		2,10		2,00	4,20
Direccion de Insfraestructura	2,10	1,00		2,10		1,00	2,10
CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA							16,80
ACUMULADO ANTERIOR							
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS							16,80

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA



Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO

OBSERVACIONES:

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	4.6
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	m2
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	suministro, transporte e instalación de Teja termoacústicas UPVC 2.5 mm cresta alta blanca, así como todos los componentes y accesorios necesarios para su montaje conforme a las especificaciones técnicas y normativas pertinentes.
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Cubierta tercer piso				91,00		1,00	91,00
Cubierta Escalas	6,00	4,50		27,00		1,00	27,00
CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA							118,00
ACUMULADO ANTERIOR							
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS							118,00

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA






Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO

OBSERVACIONES:

EMEGA | BAW

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

INTEGRAR CONSTRUCCIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	4.8
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	m
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	Suministro, transporte e instalación de pasamanos metálico fabricado de la siguiente manera, pletina de anclaje de forma circular a muro, mas L en varilla de 1/2" lisa ,incluye la tornillería de ensamble .1 un tubo superior de 2" calibre 16,incluye pintura anticorrosiva y acabados según requerimiento.
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Escalas tercer a 4 piso	11,26					1,00	11,26
CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA							11,26
ACUMULADO ANTERIOR							
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS							11,26

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA





Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO

OBSERVACIONES:

EMEGA | BAW

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

INTEGRAR CONSTRUCCIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	4.9
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	m2
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	Suministro e instalación cerramiento para divisiones de oficinas en vidrio templado incoloro 10mm bordes pulidos y brillados con perfilería en aluminio negro, conformado por módulos fijos laterales y montantes superiores, tubular horizontal inferior de 3"x1"1/2, + tubulares verticales y horizontal superior de 10 x 4,5 cm con remarco en sistema 3831 pisa vidrio a presión con empaque, incluye 4 puertas batientes con zócalo inferior de 9cm con empaque y con base, bisagra hidráulica speedy trabajo pesado, chapeta esquinera superior con pivote platina aéreo, doble manija en acero inoxidable de 1"x40, cerradura Yale 170 1/4 con porta cerradura y recibidor cuadrado, cerrojos y todo lo necesario para su correcta instalación.
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Alto (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Direccion financiera	2,83	2,55		7,22		1,00	7,22
Oficina Juridica	2,77	2,55		7,06		1,00	7,06
Zona Abierta Financiera	1,50	2,55		3,83		1,00	3,83
	1,80	2,55		4,59		1,00	4,59
	2,40	2,55		6,12		1,00	6,12
Acceso Principal	2,60	2,20		5,72		1,00	5,72
Area Puertas	2,10	1,00		2,10		-2,00	-4,20
						CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA	30,34
						ACUMULADO ANTERIOR	
						CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS	30,34

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA

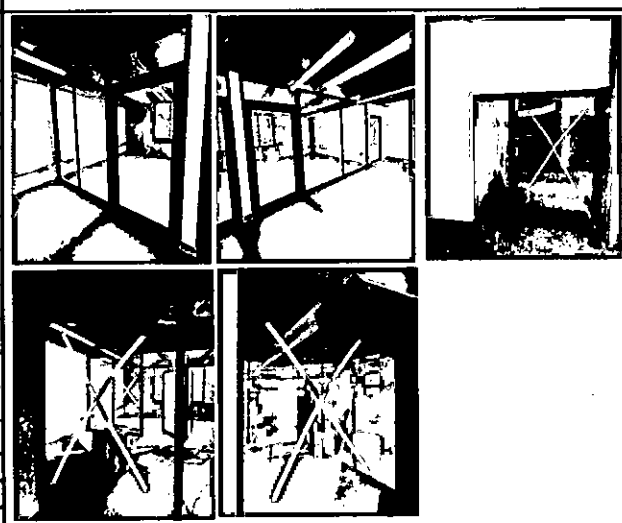

Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO

OBSERVACIONES:

EMEGA | BAW

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

INTEGRAR CONSTRUCCIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	4.11
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	ml
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	Suministro, transporte e instalación de canal en lamina galvanizada cal. 18, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Canoa	33,50					1,00	33,50
CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA							33,50
ACUMULADO ANTERIOR							
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS							33,50

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA

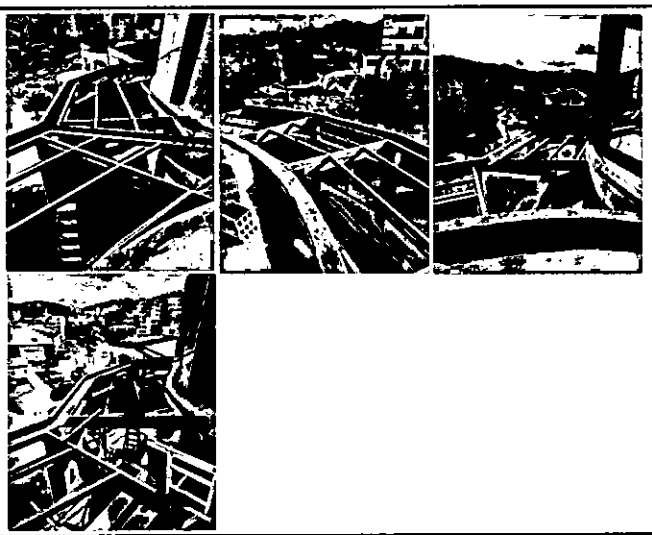

Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO

OBSERVACIONES:

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	4.12
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	ml
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	suministro, transporte e instalación de ruana para cubierta en lamina galvanizada cal. 26, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. **02**

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Ruana Metalica	35,80					1,00	35,80
CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA							35,80
ACUMULADO ANTERIOR							
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS							35,80

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA



Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO

OBSERVACIONES:

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	4.13
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	ml
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	suministro, transporte e instalación de zócalo de baldosa Alpes grafito Gris formato 8,5 cm x 90 cm Incluye todo lo necesario para su correcta instalación
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Pasillo Baños	2,35					2,00	4,70
División Baños	1,50					2,00	3,00
to electrico	3,55					2,00	7,10
sión Baños Demo	1,50					2,00	3,00
Direccion Financiera	7,30					2,00	14,60
	1,80					2,00	3,60
	1,00					2,00	2,00
Gerencia	3,60					2,00	7,20
	3,54					2,00	7,08
	2,30					2,00	4,60
Direccion de Insfraestructura	4,20					2,00	8,40
Direccion de Insfraestructura	1,50					2,00	3,00
Cocineta	3,70					2,00	7,40
Muro escalas	3,00					1,00	3,00
Cocineta	7,20					1,00	7,20
	2,10					1,00	2,10
Oficina Auxiliar Administrativa	7,00					1,00	7,00
Baños Hombres y Mujeres	12,50					1,00	12,50
Baño mujeres	1,75					1,00	1,75
Fachada Frontal (archivo)	10,10					1,00	10,10
	10,50					1,00	10,50
	2,20					1,00	2,20
Baño Gerencia	1,85					1,00	1,85
	2,60					1,00	2,60
Escalas tercer nivel	6,00					1,00	6,00
	6,55					1,00	6,55
Columnas	1,40					5,00	7,00
	0,30					4,00	1,20
	0,40					9,00	3,60
						CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA	160,83
						ACUMULADO ANTERIOR	
						CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS	160,83

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA

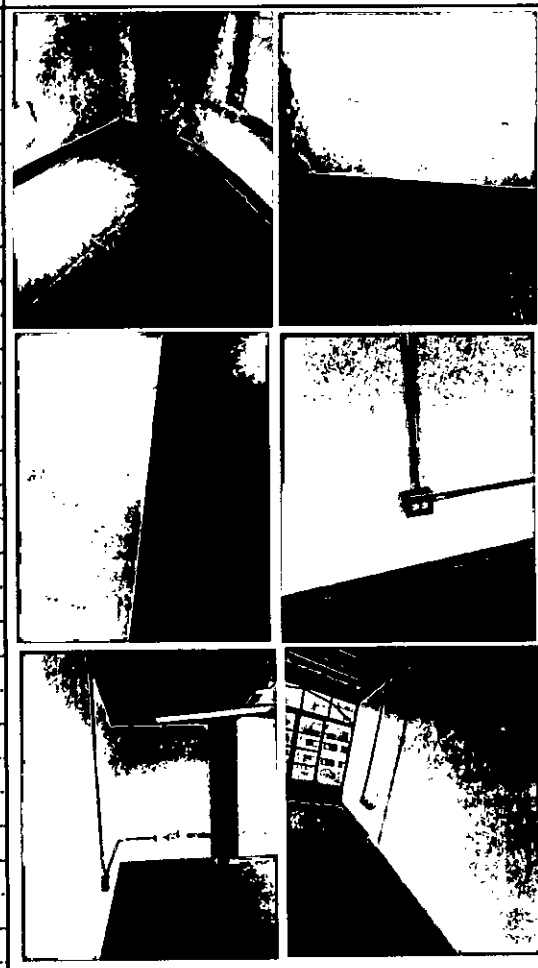

Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO

OBSERVACIONES:

EMEGA BAW

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

INTEGRAR CONSTRUCCIONES

				ACTA No.
PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	5.1	
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	und	
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	Suministro, transporte e instalación de Orinal mediano con válvula antivandálica Tipo push color blanco o equivalente	02
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026	

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Baño Hombres						1,00	1,00

EMEGA | BAW

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

INTEGRAR CONSTRUCCIONES

				ACTA No.
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	5.4	
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	und	
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	suministro, transporte e instalacion de Lavamanos Acrajet Institucional, incluye brazos de instalacion a muro, grifería Institucional para lavamanos Push mesa max y todos sus accesorios para su correcta instalacion	02
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026	

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Baño Hombres						1,00	1,00
Baño Damas						2,00	2,00
Baño Gerencia						1,00	1,00
CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA							4,00
ACUMULADO ANTERIOR							
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS							4,00

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA

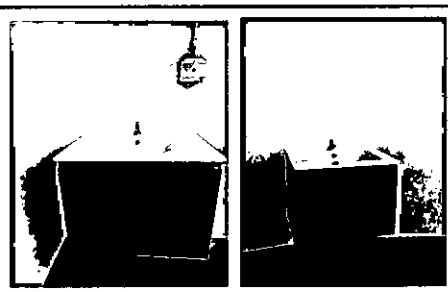



Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO

OBSERVACIONES:

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	5.5
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	und
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	Suministro, transporte e instalacion de kit Taza Bética plus entrada superior con válvula push de empotrar, incluye todos los accesorios para su correcta instalación.
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Baño Hombres						1,00	1,00
Baño damas						2,00	2,00
Baño Gerencia						1,00	1,00
CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA							4,00
ACUMULADO ANTERIOR							
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS							4,00

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA

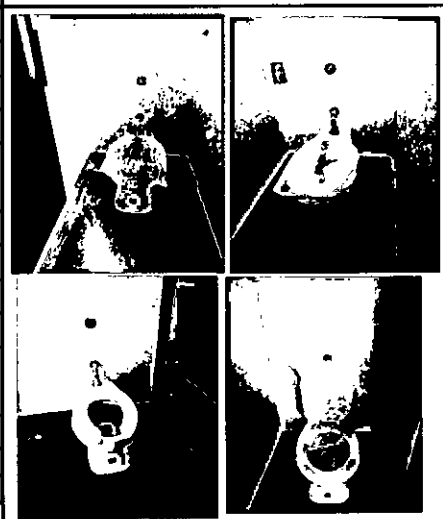

Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO

OBSERVACIONES:

EMEGA BAW

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

INTEGRAR CONSTRUCCIONES

				ACTA No.
PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	6.10	
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	und	
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	Suministro e instalación breakers enchufables monopolares de 1x20 amp	02
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026	

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Cuarto electrico						32,00	32,00

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	6.11
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	und
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	Salidas para tomas con p.t. 120v. normal. cable 3xno12 tshf, emt = 1/2" cajas y accesorio
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Cocina						1,00	1,00
Cuarto de electrico						2,00	2,00
Archivo						3,00	3,00

EMEGA | BAW

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

INTEGRAR CONSTRUCCIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	FRENTE DE OBRA:	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	ITEM:	6.12
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	UNIDAD:	und
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	DESCRIPCIÓN:	salidas para tomas con p.t. 120v. Gfci
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Cocina						2,00	2,00
Baños						2,00	2,00
Baño Gerencia						1,00	1,00

EMEGA | BAW

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

INTEGRAR CONSTRUCCIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	6.13
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	und
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	Salidas para tomas regulados con p.t. 120v. color naranja,cable 3xno12 tshf, tmc = 1/2" cajas y accesorio metalico
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Archivo						1,00	1,00
Direccion Infraestructura						1,00	1,00
Gerencia y pasillo						1,00	1,00
CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA							3,00
ACUMULADO ANTERIOR							
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS							3,00

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA

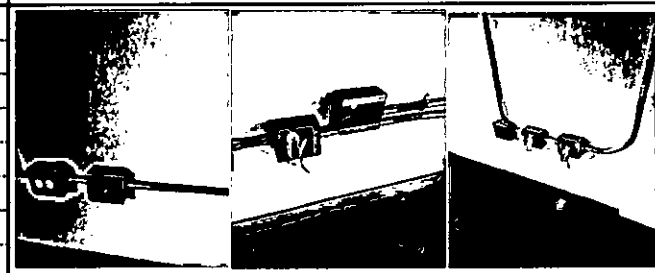

Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OSANDO

OBSERVACIONES:

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	6.14
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	und
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	salidas para luces 120v. Normales
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Cocina						2,00	2,00
Archivo						5,00	5,00
Direccion Infraestructura						4,00	4,00
Baños						6,00	6,00

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	6.15
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	und
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	salidas para luces de emergencia
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Direccion de Infraestructura						1,00	1,00
Salon Principal						2,00	2,00
Escalas						1,00	1,00

EMEGA BAW

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

INTEGRAR CONSTRUCCIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	FRENTE DE OBRA:	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	ITEM:	6.16
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	UNIDAD:	und
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	DESCRIPCIÓN:	salidas para television
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Gerencia						1,00	1,00
Salon Principal						1,00	1,00
CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA							2,00
ACUMULADO ANTERIOR							
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS							2,00

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA

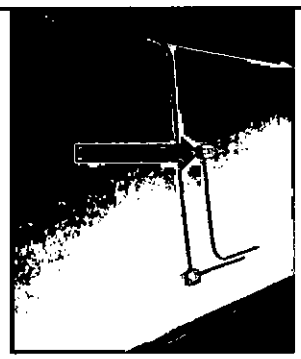



Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO

OBSERVACIONES:

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	6.17
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	und
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	suministro, instalacion y montaje de luminarias de emergencia
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Direccion de Infraestructura						1,00	1,00
Salon Principal						2,00	2,00
Escalas						1,00	1,00

EMEGA | BAW

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

INTEGRAR CONSTRUCCIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	6.18
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	und
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	suministro e instalacion de tomas con p.t. 120v. Normal
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Cocina						1,00	1,00
Salon Principal						7,00	7,00
Archivo						3,00	3,00
Direccion Infraestructura						2,00	2,00
ncia y pasillo						4,00	4,00
Dirección Financiera, Juridica y Acceso						12,00	12,00
Cuarto de electrico						2,00	2,00

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	6.19
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	und
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	suministro e instalacion de tomas con p.t. 120v. Gfci
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Cocina						2,00	2,00
Baños						2,00	2,00
Baño Gerencia						1,00	1,00
CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA							5,00
ACUMULADO ANTERIOR							
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS							5,00

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA

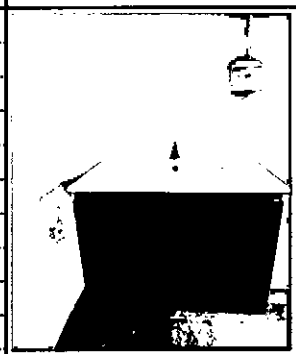

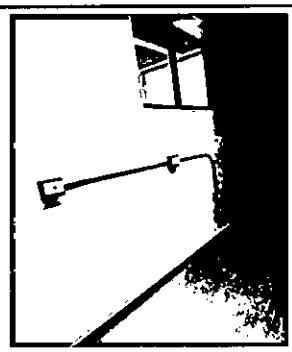

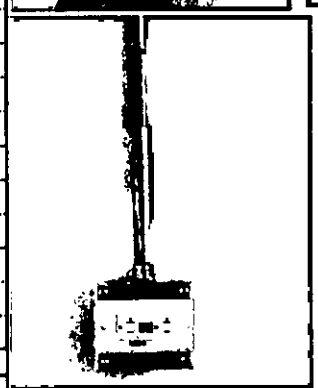

Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO

OBSERVACIONES:

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	6.20
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	und
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	suministro e instalacion de tomas regulados con p.t. 120v.
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Salon Principal						4,00	4,00
Archivo						1,00	1,00
Direccion Infraestructura						1,00	1,00
Gerencia y pasillo						1,00	1,00
:ción Financiera, Juridica y Accseo						3,00	3,00
Cuarto electrico						1,00	1,00
						CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA	11,00
						ACUMULADO ANTERIOR	
						CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS	11,00

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA

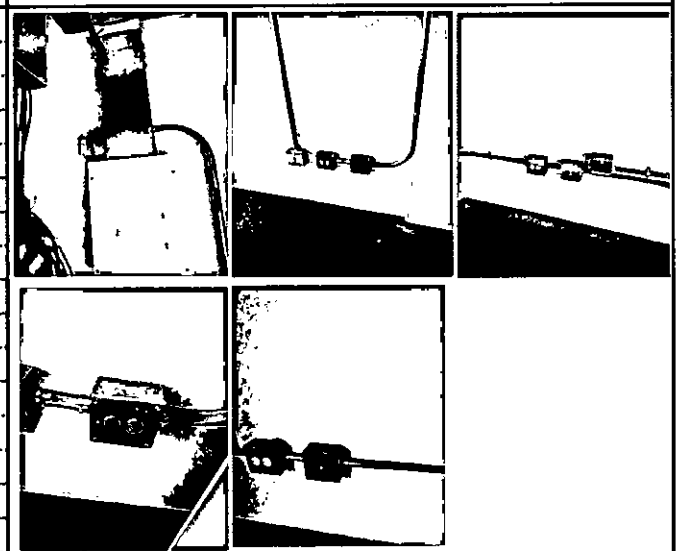

Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO

OBSERVACIONES:

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	6.21
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	und
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	suministro, instalacion y montaje de luminaria led 36 w
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Area Baños						6,00	6,00
Area direccion Financiera y Direccion Juridica						10,00	10,00
Salon Principal						20,00	20,00
Gerencia y pasillo						7,00	7,00
tivo						5,00	5,00
Cocina						2,00	2,00
escalas						3,00	3,00
Direccion Infraestructura						4,00	4,00
						CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA	57,00
						ACUMULADO ANTERIOR	
						CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS	57,00

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA



Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO

OBSERVACIONES:

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	6.22
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	und
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	suministro e instalacion de interruptor sencillo o sensor de movimiento
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Escalas y pasillo						2,00	2,00
CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA							2,00
ACUMULADO ANTERIOR							
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS							2,00

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA



Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO

OBSERVACIONES:

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	6.24
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	und
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	salidas para señal de evacuacio(salida),120 v, cable 3xno12 awg,emt de 1/2"calas 2x4 metalicas, etc
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Escalas y Pasillo						2,00	2,00

EMEGA | BAW

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

INTEGRAR CONSTRUCCIONES

				ACTA No.
PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	6.25	
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	und	
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	suministro e instalacion de señal de salida	02
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026	

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Escalas y Pasillo						2,00	2,00
CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA							2,00
ACUMULADO ANTERIOR							
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS							2,00

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA



Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	OBSERVACIONES:
NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS	NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO	

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	6.26
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	und
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	suministro e instalacion de salidas para video beam
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Gerencia						1,00	1,00
Salon Principal						1,00	1,00

EMEGA | BAW

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

INTEGRAR CONSTRUCCIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	FRENTE DE OBRA:	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	ITEM:	6.27
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	UNIDAD:	und
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	DESCRIPCIÓN:	salida para voz y datos, en cable utp cat 6a bhf, tuberia pvc 40 de 3/4"
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Salon Principal						6,00	6,00
Direccion Infraestructura						1,00	1,00
Gerencia y pasillo						3,00	3,00
Dirección Financiera, Juridica y Acceso						4,00	4,00
las Camaras						2,00	2,00
CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA							16,00
ACUMULADO ANTERIOR							
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS							16,00

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA

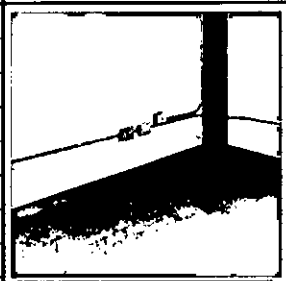

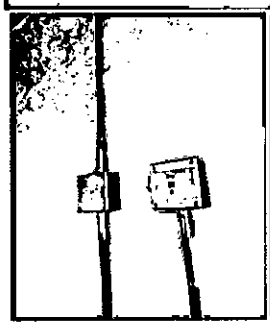
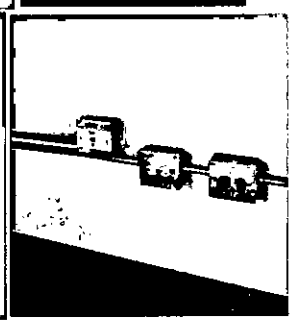

Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO

OBSERVACIONES:

EMEGA | BAW

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

INTEGRAR CONSTRUCCIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	7.6
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	ml
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	Suministro, transporte e instalación de tubería 2" PVC. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Area Baños	9,75					1,00	9,75

EMEGA BAW

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

INTEGRAR CONSTRUCCIONES

PROYECTO: CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.

ENTIDAD CONTRATANTE: EMEGA

CONTRATISTA: GRUPO BAW S.A.S.

INTERVENTOR: INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.

FRENTE DE OBRA: SEDE EMEGA

ITEM: 7.7

UNIDAD: und

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de Anclaje para tubería colgante al techo de 3/8". incluye todo lo necesario para su correcta instalación

PERIODO: DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Area Baños						5,00	5,00
CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA							5,00
ACUMULADO ANTERIOR							
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS							5,00

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA

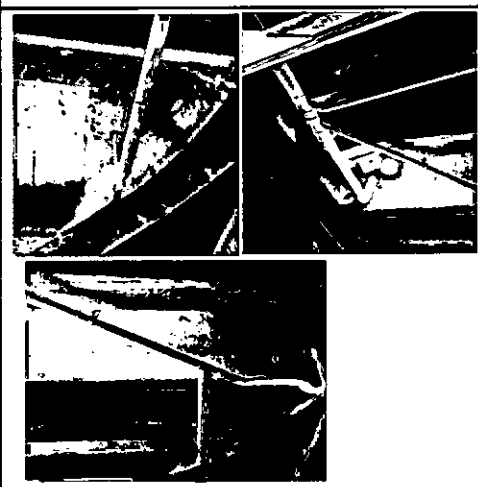

Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO

OBSERVACIONES:

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	7.8
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	und
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	Suministro e instalación de Punto hidráulico. incluye todo lo necesario para su correcta instalación
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Orinal	1,00					1,00	1,00
Lavamanos Baño Hombres	1,00					1,00	1,00
Sanitario Baños Hombres	1,00					1,00	1,00
manos Baño Damas	2,00					1,00	1,00
tario Baños Damas	2,00					1,00	1,00
Lavamanos Baño Gerencia	1,00					1,00	1,00
Sanitario Baños Gerencia	1,00					1,00	1,00
Cocina	1,00					1,00	1,00
Punto Principal	1,00					1,00	1,00
CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA							9,00
ACUMULADO ANTERIOR							
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS							9,00

PLANO DESCRIPTIVO YO ESQUEMA



Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO

OBSERVACIONES:

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	7.12
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	und
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	Suministro, transporte e instalación de Puntos sanitarios y accesorios de 2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No **02**

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Orinal						1,00	1,00
Lavamanos Baño Hombres						1,00	1,00
Lavamanos Baño Damas						2,00	2,00
manos Baño Gerencia						1,00	1,00
...na						1,00	1,00
Desague de Piso (Carcamos Baños)						3,00	3,00
CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA							9,00
ACUMULADO ANTERIOR							
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS							9,00

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA

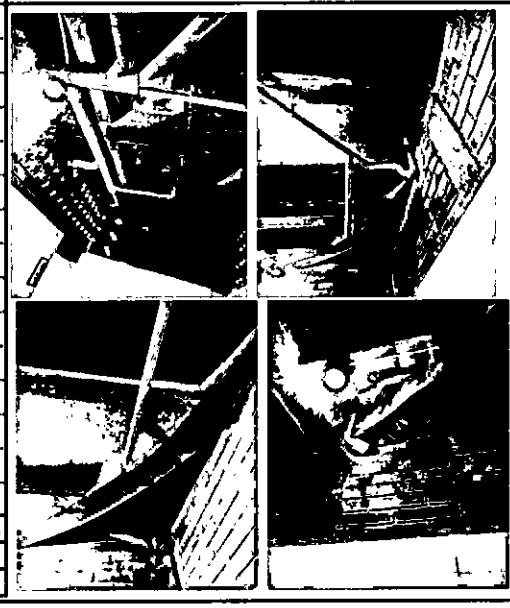

Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OSANDO

OBSERVACIONES:

EMEGA | BAW

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

INTEGRAR CONSTRUCCIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	7.13
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	ml
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	Suministro, transporte e instalación Puntos sanitarios y accesorios de 3". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Desague Losa cuarto nivel						9,00	9,00
Bajantes						7,50	7,50

EMEGA | BAW

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

INTEGRAR CONSTRUCCIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	7.14
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	und
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	Suministro, transporte e instalación de Puntos sanitarios y accesorios de 4". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO						CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	Cantidad (und)	
Baños Hombres						1,00	1,00
Baños Damas						2,00	2,00
Baño Gerencia						1,00	1,00
CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA							4,00
ACUMULADO ANTERIOR							
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS							4,00

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA





Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO

OBSERVACIONES:

EMEGA | BAW

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

INTEGRAR CONSTRUCCIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	NP-09 .
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	m2
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	Lavada e hidrofugo de muros en ladrillo a la vista
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO					CANTIDADES PARCIALES
	Ancho (m)	Largo (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Cantidad (und)	
Pasillo cocina	2,08	1,78		3,70	2,00	7,40
Fachada Frontal (archivo)	10,06	2,00		20,12	2,00	40,24
Fachada Muro bajo	16,70	0,50		8,35	2,00	16,70
	2,43	2,65		6,44	2,00	12,88
fio Gerencia	1,95	2,00		3,90	2,00	7,80
	2,60	2,00		5,20	2,00	10,40
Muro Fachada 3 Piso	65,43	0,50		32,72	2,00	65,43
Escalas	2,20	0,90		1,98	2,00	3,96
	13,34	2,65		35,35	2,00	70,70
				CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA		235,52
				ACUMULADO ANTERIOR		
				CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS		235,52

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA

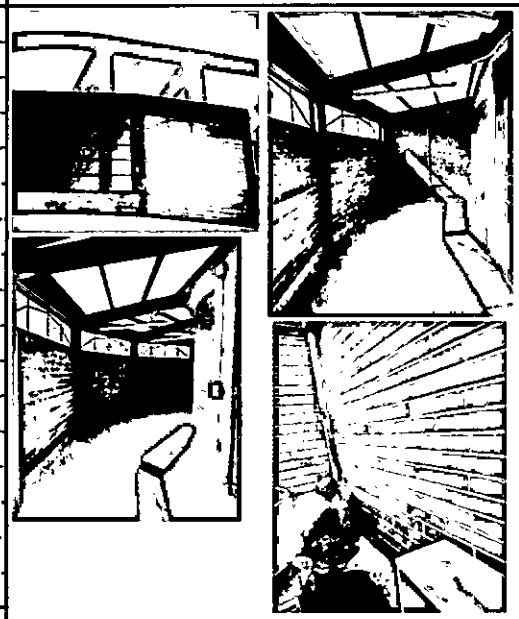

Interson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS	NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO

OBSERVACIONES:

EMEGA | BAW

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

INTEGRAR CONSTRUCCIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	NP-13
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	ml
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	Tuberia pvc aguas lluvias de 4" para bajantes
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO					CANTIDADES PARCIALES
	Ancho (m)	Largo (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Cantidad (und)	
Tuberia Baños		11,00			1,00	11,00
CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA						11,00
ACUMULADO ANTERIOR						
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS						11,00

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA

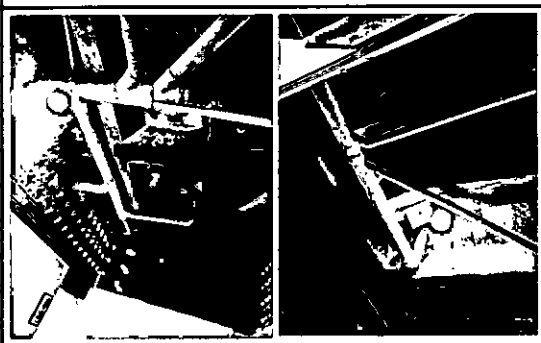

Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS	NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO

OBSERVACIONES:

EMEGA BAW

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

INTEGRAR CONSTRUCCIONES

				ACTA No.
PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	NP-14	
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	und	
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	Suministro e instalacion de gabinete by-pass para proteccion T-R1	02
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026	

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO					CANTIDADES PARCIALES
	Ancho (m)	Largo (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Cantidad (und)	
Gabinete By-pass					1,00	1,00
CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA						1,00
ACUMULADO ANTERIOR						
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS						1,00

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA

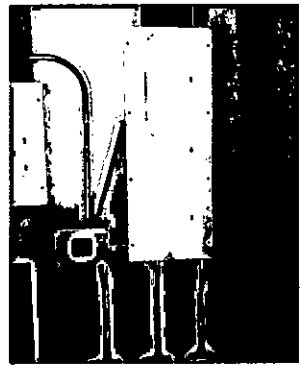

Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO

OBSERVACIONES:

EMEGA BAW

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

INTEGRAR CONSTRUCCIONES

PROYECTO: CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.

ENTIDAD CONTRATANTE: EMEGA

CONTRATISTA: GRUPO BAW S.A.S.

INTERVENTOR: INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.

FRENTE DE OBRA: SEDE EMEGA

ITEM: NP-15

UNIDAD: ml

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalacion de acometida desde transferencia automatica no.1 hasta tablero general en cable 4 x 8 awg lshf

PERIODO: DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO					CANTIDADES PARCIALES
	Ancho (m)	Largo (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Cantidad (und)	
Acometida de tablero electricohasta UPS		7,00			1,00	7,00
CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA						7,00
ACUMULADO ANTERIOR						
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS						7,00

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA

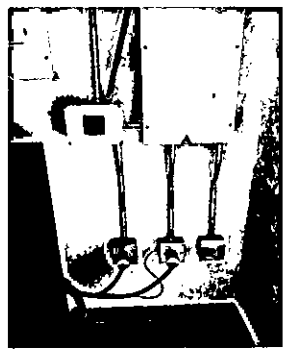

Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO

OBSERVACIONES:

EMEGA BAW

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

INTEGRAR CONSTRUCCIONES

				ACTA No.
PROYECTO:	CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	NP-16	
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	ml	
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	Suministro e instalacion de acometida desde transferencia hasta tablero de tomas y luces reguladas en cable 4 x 8awg tshf	02
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026	

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO					CANTIDADES PARCIALES
	Ancho (m)	Largo (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Cantidad (und)	
Acometida de tablero electricohasta UPS		8,00			1,00	8,00

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	NP-17
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	und
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	Suministro e instalacion de llave by-pass 40 amp
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO Ancho (m)	Largo (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Cantidad (und)	CANTIDADES PARCIALES
Llave Bypas					1,00	1,00
CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA						1,00
ACUMULADO ANTERIOR						
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS						1,00

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA

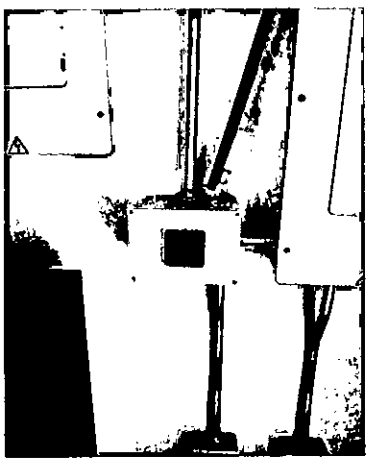

Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO

OBSERVACIONES:

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA	**ACTA No.**
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	NP-18	
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	ml	
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	Suministro en instalacion de acometida desde gabinete general de instalaciones existentes hasta tablero de distribucion de toma y luces normales en cable 5 x 4 AWG LSHF	**02**
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026	

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO					CANTIDADES PARCIALES
	Ancho (m)	Largo (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Cantidad (und)	
Acometida Principal		60,00			1,00	60,00

EMEGA | BAW

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

INTEGRAR CONSTRUCCIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	NP-19
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	und
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	Suministro e instalacion de interruptor sencillo
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO					CANTIDADES PARCIALES
	Ancho (m)	Largo (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Cantidad (und)	
Cocina					1,00	1,00
Pasillo					1,00	1,00
Duireccion Infraestructura					1,00	1,00
rencia y pasillo					3,00	3,00
iccion Financiera					3,00	3,00
Baños					2,00	2,00
CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA						11,00
ACUMULADO ANTERIOR						
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS						11,00

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA

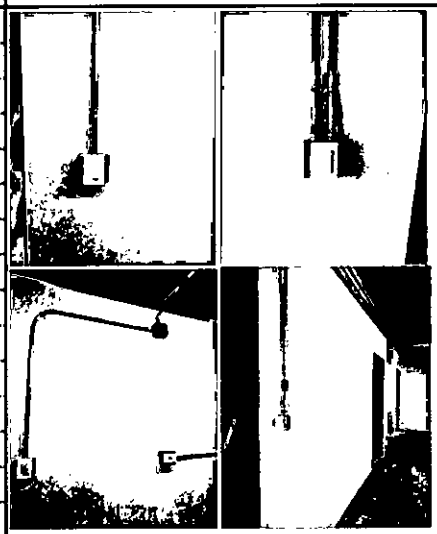

Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO

OBSERVACIONES:

EMEGA BAW

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

INTEGRAR CONSTRUCCIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA	**ACTA No.**
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	NP-20	
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	und	
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	Suministro e instalacion de interruptor doble en muro	**02**
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026	

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO					CANTIDADES PARCIALES
	Ancho (m)	Largo (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Cantidad (und)	
Pasillo acceso cocina					1,00	1,00
CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA						1,00
ACUMULADO ANTERIOR						[illegible]
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS						[illegible]1,00

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA

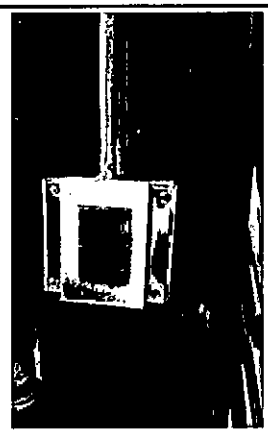

Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO

OBSERVACIONES:

EMEGA BAW

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

INTEGRAR CONSTRUCCIONES

PROYECTO: CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.

FRENTE DE OBRA: SEDE EMEGA

ENTIDAD CONTRATANTE: EMEGA

ITEM: NP-22

CONTRATISTA: GRUPO BAW S.A.S.

UNIDAD: m2

INTERVENTOR: INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.

DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación de pintura tipo Koraza color gris basalto o equivalente sobre superficie de losa en concreto, incluyendo aplicación uniforme de dos manos de pintura, mano de obra especializada, herramientas menores, equipos, transporte interno y limpieza final del área intervenida, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto.

PERIODO: DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO					CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	
calas del tercer al cuarto piso Tramo 2	3,23	2,50		8,07		8,07
calas del tercer al cuarto piso Tramo 1	3,23	2,50		8,07		8,07
Descanso				9,92		9,92
CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA						26,08
ACUMULADO ANTERIOR						
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS						26,08

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA





Interson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: CESAR AUGUSTO OSORIO OBANDO

OBSERVACIONES:

EMEGA BAW

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

INTEGRAR CONSTRUCCIONES

PROYECTO: CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.

ENTIDAD CONTRATANTE: EMEGA

CONTRATISTA: GRUPO BAW S.A.S.

INTERVENTOR: INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.

FRENTE DE OBRA: SEDE EMEGA

ITEM: NP-25

UNIDAD: ML

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de canalización eléctrica en tubería EMT de 3/4", incluye apertura y resane de superficies, perforaciones, anclajes, soportes, accesorios, fijaciones, adecuaciones civiles, retiro de sobrantes y demás actividades necesarias para su correcta ejecución.

PERIODO: DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO					CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Volumen (m3)	
Tuberia en MT de 3/4 para iluminación y datos	147,00					147,00
CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA						147,00
ACUMULADO ANTERIOR						
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS						147,00

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA

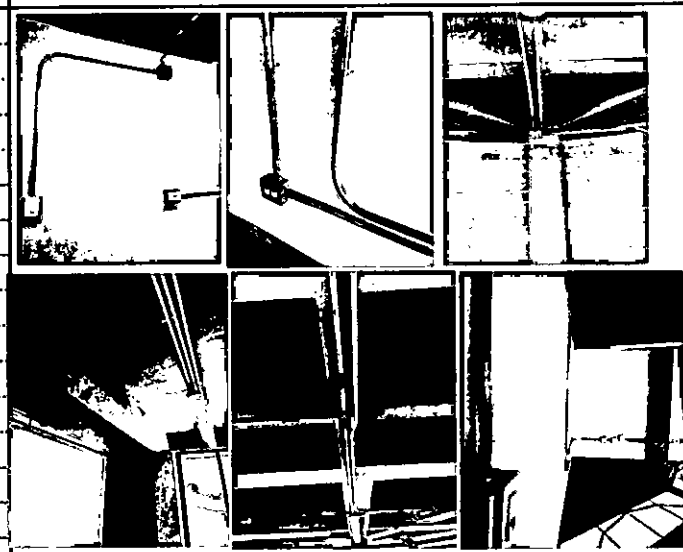

Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	NP-27
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	m2
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	Suministro, transporte e instalación de muro liviano en sistema drywall conformado por estructura metálica galvanizada en perfiles tipo parales y canales, revestido por ambas caras con lámina de yeso drywall de 1/2", incluyendo tornillería, cintas, masillado de juntas, refuerzos, fijaciones, cortes, desperdicios, mano de obra especializada, herramientas menores, transporte interno y limpieza final del área intervenida, de acuerdo con planos y especificaciones técnicas del proyecto.
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO					CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Alto (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Cantidad (und)	
eccion Financiera	3,68	2,55		9,38	1,00	9,38
Baños Hombes	0,68	1,51		1,03	1,00	1,03
	1,25	1,81		2,26	1,00	2,26
Baño Mujeres	1,40	1,81		2,53	1,00	2,53
	0,58	1,81		1,05	1,00	1,05
CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA						16,26
ACUMULADO ANTERIOR						
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS						16,26

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA



Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	NP-28
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	m2
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	Suministro, transporte e instalación de muro liviano en sistema fibrocemento tipo Superboard de 8 mm, conformado por estructura metálica galvanizada en perfiles tipo parales y canales, revestido por ambas caras (2F) con lámina Superboard de 8 mm, incluyendo perfilería metálica, tornillería, tratamiento de juntas, sellos, refuerzos, fijaciones, cortes, desperdicios, mano de obra especializada, herramientas menores, transporte interno y limpieza final del área intervenida, de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos del proyecto.
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO					CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Alto (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Cantidad (und)	
Entrada Principal	2,17	3,30		7,16	1,00	7,16
Rampa escalas acceso	3,20	0,50		1,60	1,00	
	2,10	1,90		3,99	-1,00	-3,99
CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA						3,17
ACUMULADO ANTERIOR						
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS						3,17

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA

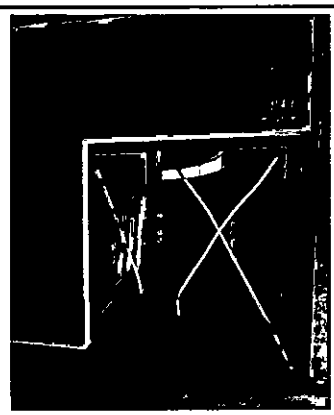

Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

EMEGA BAW

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

INTEGRAR CONSTRUCCIONES

				ACTA No.
PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	FRENTE DE OBRA:	SEDE EMEGA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	ITEM:	NP-31	
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	UNIDAD:	und	
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	DESCRIPCIÓN:	Suministro, transporte e instalación de UPS Trifásica On-Line 10kVA Alta Frecuencia FP 1.0 - G5	02
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026	

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO					CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Alto (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Cantidad (und)	
UPS					1,00	1,00
CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA						1,00
ACUMULADO ANTERIOR						[illegible]
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS						41,00

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA



Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

EMEGA BAW

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS

MEMORIAS DE CÁLCULO DIMENSIONES

INTEGRAR CONSTRUCCIONES

PROYECTO:	CONSTRUCCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PROUDCTIVIDAD DE GUARNE EMEGA.	**FRENTE DE OBRA:**	SEDE EMEGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMEGA	**ITEM:**	NP-32
CONTRATISTA:	GRUPO BAW S.A.S.	**UNIDAD:**	und
INTERVENTOR:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S.	**DESCRIPCIÓN:**	Perforación en losa de concreto e instalación de sistema de fijación mediante chazo y tornillo de 3/8" para soporte de lámparas colgantes, incluyendo suministro de materiales, perforación, limpieza del alojamiento, colocación y ajuste de la fijación, verificación de firmeza y todos los elementos, equipos y mano de obra necesarios para su correcta ejecución.
		PERIODO:	DEL 1-may.-2026 AL 30-may.-2026

ACTA No. 02

LOCALIZACIÓN	MEMORIA DE CÁLCULO					CANTIDADES PARCIALES
	Largo (m)	Alto (m)	Espesor (m)	Area (m2)	Cantidad (und)	
rea Baños					12,00	12,00
ea direccion Financiera y Direccion Juridica					20,00	20,00
Salon Principal					40,00	40,00
Gerencia y pasillo					14,00	14,00
Archivo					10,00	10,00
Cocina					4,00	4,00
escalas					6,00	6,00
Direccion Infraestructura					8,00	8,00
CANTIDADES TOTALES ESTA ACTA						114,00
ACUMULADO ANTERIOR						
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS						114,00

PLANO DESCRIPTIVO Y/O ESQUEMA

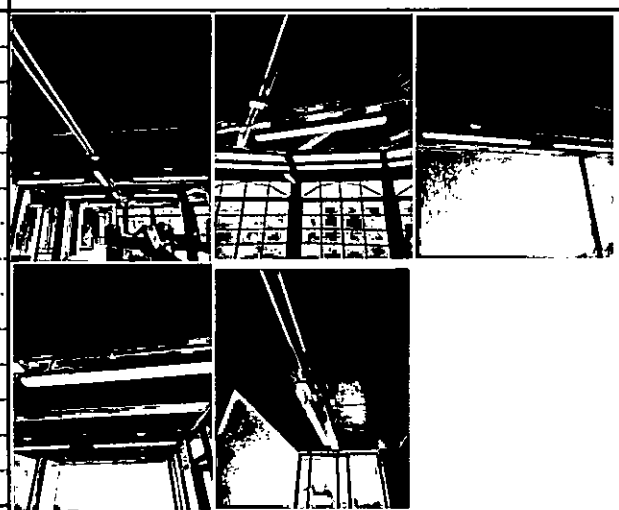

Anderson S. Barrera

RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE: ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

EMEGA
Empresa de desarrollo, competitividad y productividad

"CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMISNITRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL MUNICIPIO DE GUARNE - EMEGA".

INFORME MENSUAL

PERIODO DE INFORME

DESDE EL 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2026

BAW

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 1
1.1 Descripcion y Alcance del proyecto 1
1.2 Localización del Proyecto 1
2. OBJETIVOS 2
2.1 OBJETIVO GENERAL 2
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2
3. RESUMEN EJECUTIVO 3
3.1 Información General deL CONTRATO. 3
3.2 Estado Actual de las Pólizas 3
3.3 ACTIVIDADES CONTRACTUALES 4
4. AVANCE FISICO 14
5. CANTIDADES EJECUTADAS 16
6. PERSONAL, EQUIPO E INSTALACIONES 33
7. Resumen financiero 33
8. PORCENTAJE DE AVANCE: 34

BAW

1. INTRODUCCIÓN

1.1 DESCRIPCION Y ALCANCE DEL PROYECTO

La consolidación del Municipio de Guarne como un referente de crecimiento en el Oriente Antioqueño demanda una institucionalidad técnica, ágil y con capacidad de ejecución directa. En respuesta a este reto, la **Empresa de Desarrollo, Competitividad y Productividad de Guarne - EMEGA**, constituida como una entidad descentralizada del nivel municipal se rige como el instrumento estratégico para materializar la visión, misión y el progreso del territorio.

Su naturaleza descentralizada no es un detalle administrativo menor; representa la voluntad de la Alcaldía Municipal de contar con una organización dotada de autonomía administrativa, financiera y personería jurídica propia, capaz de interactuar con el mercado y la sociedad civil de manera dinámica. Sin embargo, para que esta autonomía sea plenamente efectiva y cumpla con su misión constitucional, es imperativo que la entidad cuente con una infraestructura física a la altura de sus responsabilidades.

La construcción de la sede propia de EMEGA se justifica como el paso necesario para consolidar esta descentralización. Actualmente, la operación en espacios ajenos o transitorios limita la capacidad de la empresa para proyectar la solidez institucional que se requiere. Una sede propia no solo optimiza el patrimonio público al eliminar gastos recurrentes de arrendamiento, sino que se convierte en el centro operativo del desarrollo local, donde la agilidad empresarial de **EMEGA** se combina con el mandato superior de servicio a la comunidad.

En este sentido, el proyecto trasciende la edificación de oficinas: es la creación de un punto de convergencia donde la alcaldía Municipal, a través de su entidad descentralizada, garantiza que la productividad sea el vehículo para la equidad social.

Con esta sede, EMEGA reafirma su compromiso de ser una entidad de puertas abiertas, técnica y eficiente, dedicada a transformar el potencial de Guarne en una realidad de bienestar y competitividad para todos sus habitantes.

1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en la zona urbana del Municipio de Guarne, departamento de Antioquia, específicamente en el Centro Integrado de comercialización y Transporte.

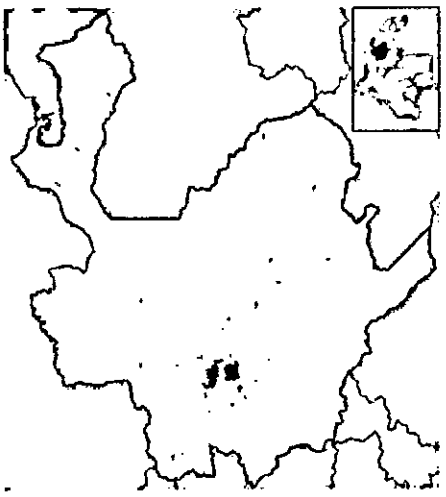

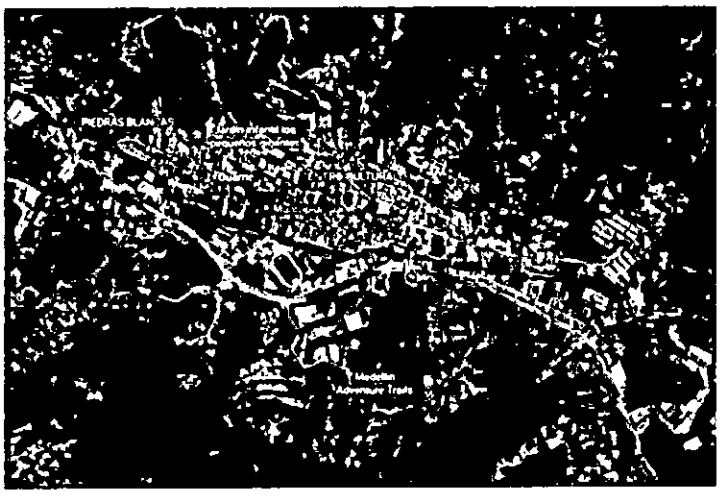

Tabla 1. LOCALIZACIÓN

COORDENADAS	
NORTE	**OESTE**
6°27'61.52"N	75°43'94.25"W

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Garantizar el cumplimiento de las condiciones contractuales en el desarrollo del contrato de Obras del Contrato COP-079-DE-2025

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Ejecutar con calidad las obras necesarias para el cumplimento del contrato.

- Mantener informado al supervisor del contrato y por medio de él a la entidad contratante de la ejecución de los trabajos de acuerdo con el alcance y conforme a los términos de referencia y al contrato de obra civil.

- Garantizar que los compromisos adquiridos con Empresa de desarrollo, competitiva y productividad de Guarne EMEGA, se cumplan a cabalidad dentro de los términos de tiempo establecidos.

3. RESUMEN EJECUTIVO

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

CONDICIONES GENERALES	
CONTRATO NUMERO:	COP-079-DE 2025
CONTRATANTE:	GRUPO BAW S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMISNITRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL MUNICIPIO DE GUARNE - EMEGA.
VALOR DEL CONTRATO:	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($1.250.296.755), EL CUAL INCLUYE TODOS LOS COSTOS, GASTOS Y TRIBUTOS A QUE HAYA LUGAR, TANTO MUNICIPALES COMO NACIONALES
INTERVENTORÍA:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DEL CONTRATO:	03 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	16 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE MARZO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN	20 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE REINICIO	21 DE MARZO DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE ABRIL DE 2026
PRORROGA	CINCUENTA Y DOS DÍAS (52)
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE JUNIO DE 2026

3.2 ESTADO ACTUAL DE LAS PÓLIZAS

GRUPO BAW S.A.S					
GARANTÍA	**ASEGURADORA**	**NUMERO PÓLIZA**	**FECHA INICIO**	**FECHA TERMINACIÓN**	**VALOR ASEGURADO ($)**
Cumplimiento del contrato	Aseguradora Solidaria	496-47-994000023219	16-12-25	16-09-26	250.059.351
Buen Manejo del Anticipo	Aseguradora Solidaria	496-47-994000023219	16-12-25	16-09-26	375.089.026,50
Prestaciones Sociales	Aseguradora Solidaria	496-47-994000023219	16-12-25	16-03-26	187.544.513



Estabilidad y calidad de obra	Aseguradora Solidaria	496-47-994000023219			250.059.351
Responsabilidad Civil y Extracontractual	Aseguradora Solidaria	496-47-994000009805			284.700.000,00

3.3 ACTIVIDADES CONTRACTUALES

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	V/UNIT.	VALOR
1	PRELIMINARES				$ 12.650.759
1,1	Localización, trazado y replanteo de edificaciones. Medido como área construida. Incluye hiladeros y señalización necesaria.	m2	301,00	$ 4.149	$ 1.248.849
1,2	Cerramiento Provisional en tela de cerramiento verde h: 2.10 incluye estructura de madera común, anclajes de parales al piso y tela verde	ml	60,00	$ 28.575	$ 1.714.500
1,3	Campamento provisional en teleras y teja de zinc. Incluye puerta de acceso, bisagras, cerradura de seguridad, conexiones eléctricas y de iluminación.	m2	25,00	$ 131.838	$ 3.295.950
1,5	Suministro e instalación de redes Eléctricas provisionales.	glb	1,00	$ 4.653.464	$ 4.653.464
1,6	Suministro e instalación de redes Hidráulicas provisionales.	glb	1,00	$ 1.737.996	$ 1.737.996
2	CONCRETOS Y ACEROS				$ 503.373.694
2.1	CONCRETO PARA ESCALERAS DE 3000 PSI: realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 12,5 mm	m2	28,50	$ 350.488	$ 9.988.908
2.2	CONCRETO PARA COLUMNAS DE 3000 PSI: Columna de sección cuadrada de concreto	m3	9,94	$ 1.369.523	$ 13.607.581

BAW

	armado, realizado con concreto f'c=280 kg/cm² (28 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 19 mm				
2.3	CONCRETO PARA VIGAS AÉREAS: Viga de concreto armado, realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa), máximo del agregado 19 mm, en planta de hasta 3.5 m de altura libre.	m3	36,92	$ 1.454.823	$ 53.709.156
2.4	Viga de amarre de 0.15m x 0.20m en concreto de 21 mpa. El acero de refuerzo se pagará por su respectivo ítem.	ml	98,00	$ 79.375	$ 7.778.750
2.5	Construcción de LOSA en concreto premezclado según diseño armada con casetón de Poron Recuperable. Incluye suministro, transporte, bombeo con Auto bomba o bomba estacionaria y colocación del concreto a una altura de entre 3.0 y 4.0m, formaleta en súper T de 19 mm. o equivalente para acabado a la vista en la parte inferior y paredes laterales y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. Incluye suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para el correcto vaciado según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m2	228,00	$ 369.714	$ 84.294.792
2.6	Construcción de junta de dilatación entre muros y elementos estructurales para pañetes en exterior.	ml	485,00	$ 8.008	$ 3.883.880
2.8	Suministro, transporte e instalación de Acero de Refuerzo Figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de	kg	14.650,00	$ 8.196	$ 120.071.400

	amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.				
2.9	Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D-84Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	kg	559,56	$ 9.393	$ 5.255.947
2.10	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL según diseño. Incluye PHR PTS PLATINAS Y RIOSTRAS	kg	4.792,24	$ 23.000	$ 110.221.539
2.11	Colocación de GROUTING en concreto de 17.5 Mpa., para relleno de muro no estructural (bloque, tolete o catalán). Incluye mano de obra, vibrado, protección, curado y todos demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo.	ml	468,00	$ 24.803	$ 11.607.804
2.12	Suministro, transporte e instalación de lagrimal en concreto.	ml	395,00	$ 51.999	$ 20.539.605
2.13	Construcción de dinteles según diseño de elementos no estructurales. Incluye suministro, transporte y colocación de concreto, espesor indicado en planos. Incluye mano de obra, vibrado, formaleta, mano de obra, El acero se paga en su respectivo ITEM.	ml	67,30	$ 41.223	$ 2.774.308
2.14	Suministro e instalación de Anclajes epoxicos para diámetros de 3/8" y 1/2"; incluye perforación, limpieza, colocación acero de refuerzo y anclaje epoxico según normas NSR-10	und	389,00	$ 40.400	$ 15.715.600

2.15	Construcción de JUNTA DE DILATACIÓN ENTRE MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES (una sola cara), ancho de 2 cm., instalación de varilla de espuma de polietileno tipo sellalón, sikarod ó equivalente de Ø= 1", aplicación de masilla elástica sellante y adhesiva con base en poliuretano tipo Sikaflex-1a ó equivalente, junta máxima de ancho= 20 mm. prof.= 5 mm., color similar al muro ó a definir por la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. Se deben seguir todas las especificaciones y recomendaciones de los fabricantes de los materiales.	ml	487,00	$ 36.293	$ 17.674.691
2.16	Mortero para pendientes (e=5cm) con impermeabilizante integral.	m2	417,00	$ 62.949	$ 26.249.733
3	REVOQUES Y PINTURAS				$ 66.652.476
3.1	Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	456,00	$ 41.741	$ 19.033.896
3.2	Suministro, transporte e instalación de estuco sobre muros. Dos manos o las que sean necesarias hasta lograr una superficie homogénea. Incluye la preparación de la superficie	M2	612,60	$ 26.804	$ 16.420.130

BAW

3.3	Suministro y aplicación de estuco sobre filos de muros, mochetas, columnas, vigas y vanos de puertas y ventanas. Incluye la preparación de la superficie, el perfilado y aplomado de las aristas para garantizar un acabado recto y uniforme, listo para recibir la pintura final.	ml	180,00	$ 16.329	$ 2.939.220
3.4	suministro y aplicación de REVOQUE en mortero 1:4 impermeabilizado, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	m2	152,00	$ 46.743	$ 7.104.936
3.5	Fajas de revoque impermeabilizado con Sika 1.	ml	180,00	$ 28.046	$ 5.048.244
3.6	Aplicación de PINTURA DE PRIMERA CALIDAD. Para interiores y exteriores, sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales	m2	704,49	$ 22.862	$ 16.106.050
4	ENCHAPES Y CERRAMIENTOS				$ 217.804.635
4.1	Construcción de Muro portante de mampostería reforzada según diseño, de bloque de concreto 15 cm x 20 cm x 40 cm	m2	228,00	$ 104.039	$ 23.720.892
4.2	Construcción de Muro el ladrillo catalán a la vista (según construcción existente). Incluye todo lo necesario para su construcción	m2	171,27	$ 181.655	$ 31.111.280
4.4	Suministro, transporte y colocación de ventana en aluminio negro anodizado y vidrio incoloro templado de 6 mm. Incluye cerradura de seguridad y todos los elementos necesarios según diseño para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	79,50	$ 623.929	$ 49.602.356

BAW

4.5	Suministro, transporte y colocación de puerta en aluminio anodizado y vidrio incoloro templado de 8 mm. Incluye cerradura de seguridad y todos los elementos necesarios según diseño para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	6,21	$ 664.970	$ 4.129.464
4.6	suministro, transporte e instalación de Teja termoacústicas UPVC 2.5 mm cresta alta blanca, así como todos los componentes y accesorios necesarios para su montaje conforme a las especificaciones técnicas y normativas pertinentes.	m2	103,00	$ 96.801	$ 9.970.503
4.8	Suministro, transporte e instalación de pasamanos metálico fabricado de la siguiente manera, pletina de anclaje de forma circular a muro, mas L en varilla de 1/2" lisa ,incluye la tornillería de ensamble .1 un tubo superior de 2" calibre 16,incluye pintura anticorrosiva y acabados según requerimiento.	m	22,74	$ 324.009	$ 7.367.965
4.9	Suministro e instalación cerramiento para divisiones de oficinas en vidrio templado incoloro 10mm bordes pulidos y brillados con perfilería en aluminio negro, conformado por módulos fijos laterales y montantes superiores, tubular horizontal inferior de 3"x1"1/2, + tubulares verticales y horizontal superior de 10 x 4,5 cm con remarco en sistema 3831 pisa vidrio a presión con empaque, incluye 4 puertas batientes con zócalo inferior de 9cm con empaque y con base, bisagra hidráulica speedy trabajo pesado, chapeta esquinera	m2	59,92	$ 928.379	$ 55.628.470

	superior con pivote platina aéreo, doble manija en acero inoxidable de 1"x40, cerradura Yale 170 1/4 con porta cerradura y recibidor cuadrado, cerrojos y todo lo necesario para su correcta instalación.				
4.10	Suministro e instalación de cuerpo fijo de 2 módulos en persiana de ventilación 315, perfilería color negro.	m2	9,00	$ 585.548	$ 5.269.932
4.11	suministro, transporte e instalación de canal en lámina galvanizada cal. 18, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	55,00	$ 206.331	$ 11.348.205
4.12	suministro, transporte e instalación de ruana para cubierta en lámina galvanizada cal. 26, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	38,00	$ 100.689	$ 3.826.182
4.13	suministro, transporte e instalación de zócalo de baldosa Alpes grafito Gris formato 8,5 cm x 90 cm incluye todo lo necesario para su correcta instalación	ml	214,00	$ 35.846	$ 7.671.044
4.15	Enchape De Pared Tipo Artica De Corona O Similar Color Blanco Formato 30 X 60.Istalacion En Sentido Horizontal En Sistema Apilado.	m2	92,68	$ 88.027	$ 8.158.342
5	APARATOS SANITARIOS				$ 8.273.569
5.1	Suministro, transporte e instalación de Orinal mediano con válvula antivandálica Tipo push color blanco o equivalente	und	1,00	$ 704.803	$ 704.803
5.3	Suministro, transporte e instalación de Espejo Cristal De 6 Mm Con Bordes Pulidos Pegado A Cerámica	m2	9,00	$ 123.000	$ 1.107.000
5.4	suministro, transporte e instalación de Lavamanos Acuajet Institucional, incluye brazos de instalación a muro, grifería Institucional para	und	2,00	$ 1.370.500	$ 2.741.000

	lavamanos Push mesa max y todos sus accesorios para su correcta instalación				
5.5	Suministro, transporte e instalación de kit Taza Báltica plus entrada superior con válvula push de empotrar, incluye todos los accesorios para su correcta instalación.	und	2,00	$ 1.860.383	$ 3.720.766
6	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS				$ 111.187.940
	TABLEROS DE CIRCUITOS PARCIALES 3 PISO				
6.8	suministro e instalación de tablero mb de 36 ctos trifásico con puerta	und	1,00	$ 3.714.200	$ 3.714.200
6.9	suministro e instalación de tablero mb de 24 ctos trifásico con puerta	und	1,00	$ 2.610.400	$ 2.610.400
6.10	suministro e instalación breakers enchufables monopolares de 1x20 amp	und	60,00	$ 19.600	$ 1.176.000
	SALIDAS DE TOMAS Y LUCES 3 PISO				
6.11	salidas para tomas con p.t. 120v. normal. cable 3xno12 lshf, emt = 1/2" cajas y accesorio	und	36,00	$ 235.800	$ 8.488.800
6.12	salidas para tomas con p.t. 120v. Gfci	und	16,00	$ 235.800	$ 3.772.800
6.13	salidas para tomas regulados con p.t. 120v. color naranja, cable 3xno12 lshf, imc = 1/2" cajas y accesorio metálico	und	16,00	$ 235.800	$ 3.772.800
6.14	salidas para luces 120v. Normales	und	60,00	$ 235.800	$ 14.148.000
6.15	salidas para luces de emergencia	und	5,00	$ 235.800	$ 1.179.000
6.16	salidas para televisión	und	2,00	$ 235.800	$ 471.600
6.17	suministro, instalación y montaje de luminarias de emergencia	und	8,00	$ 163.100	$ 1.304.800
6.18	suministro e instalación de tomas con p.t. 120v. normal	und	36,00	$ 113.500	$ 4.086.000
6.19	suministro e instalación de tomas con p.t. 120v. Gfci	und	8,00	$ 113.500	$ 908.000

6.20	suministro e instalación de tomas regulados con p.t. 120v.	und	8,00	$ 113.500	$ 908.000
6.21	suministro, instalación y montaje de luminaria led 36 w	und	45,00	$ 222.560	$ 10.015.200
6.22	suministro e instalación de interruptor sencillo o sensor de movimiento	und	16,00	$ 113.500	$ 1.816.000
6.23	suministro e instalación de tubería metálica emt 3/4" y accesorios	ml	816,00	$ 6.490	$ 5.295.840
6.24	salidas para señal de evacuación(salida),120 v, cable 3xno12 awg, emt de 1/2"cajas 2x4 metálicas, etc	und	5,00	$ 235.800	$ 1.179.000
6.25	suministro e instalación de señal de salida	und	5,00	$ 183.500	$ 917.500
6.26	suministro e instalación de salidas para video beam	und	2,00	$ 482.000	$ 964.000
	VOZ Y DATOS				
6.27	salida para voz y datos, en cable utp cat 6a lshf, tubería sch 40 de 3/4"	und	25,00	$ 450.000	$ 11.250.000
6.28	suministro en instalación de rack , suiche administrable, ap para salida de wifi	und	1,00	$ 18.525.000	$ 18.525.000
6.29	suministro transporte instalación de cámaras wifi	und	4,00	$ 1.581.250	$ 6.325.000
	SISTEMA DE PROTECCION DE UPS				
6.30	suministro de ups 15 kva, on line	und	1,00	$ 8.000.000	$ 8.000.000
	REGISTROS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION				
6.31	registros eléctricos de baja tensión sb 325	und	1,00	$ 360.000	$ 360.000
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				$ 11.958.656
7.1	Suministro, transporte e instalación de tubería 1/2" PVC RDE 13,5. incluye todo lo necesario para su correcta instalación	ml	35,0	$ 21.219	$ 742.665
7.2	Suministro, transporte e instalación de de tubería 3/4" PVC RDE 13,5. incluye todo lo	ml	15,0	$ 23.514	$ 352.710

BAW

	necesario para su correcta instalación				
7.3	Suministro, transporte e instalación de de tubería 1" PVC RDE 21. incluye todo lo necesario para su correcta instalación	ml	30,0	$ 29.837	$ 895.110
7.4	Suministro, transporte e instalación de de tubería 1-1/4" PVC RDE 21. incluye todo lo necesario para su correcta instalación	ml	40,9	$ 30.787	$ 1.260.617
7.5	Suministro, transporte e instalación de tubería 1-1/2" PVC. incluye todo lo necesario para su correcta instalación	ml	2,7	$ 31.856	$ 85.782
7.6	Suministro, transporte e instalación de tubería 2" PVC. incluye todo lo necesario para su correcta instalación	ml	60,2	$ 45.312	$ 2.727.420
7.7	Suministro e instalación de Anclaje para tubería colgante al techo de 3/8". incluye todo lo necesario para su correcta instalación	und	35,0	$ 66.284	$ 2.319.940
7.8	Suministro e instalación de Punto hidráulico. incluye todo lo necesario para su correcta instalación	und	12,0	$ 101.740	$ 1.220.880
7.9	Suministro, transporte e instalación de válvula de compuerta de 1/2". incluye todo lo necesario para su correcta instalación	und	1,0	$ 62.236	$ 62.236
7.10	Suministro, transporte e instalación de válvula de compuerta de 3/4". incluye todo lo necesario para su correcta instalación	und	1,0	$ 73.236	$ 73.236
7.11	Suministro, transporte e instalación de válvula de compuerta de 1 1/4". incluye todo lo necesario para su correcta instalación	und	3,0	$ 118.442	$ 355.326
7.12	Suministro, transporte e instalación de Puntos sanitarios	und	3,0	$ 170.302	$ 510.906

	y accesorios de 2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.				
7.13	Suministro, transporte e instalación Puntos sanitarios y accesorios de 3". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación	und	3,0	$ 182.152	$ 546.456
7.14	Suministro, transporte e instalación de Puntos sanitarios y accesorios de 4". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	4,0	$ 201.343	$ 805.372
8	IMPERMEABILIZACIÓN				$ 19.155.006
7.14	Suministro, transporte e instalación de materiales para impermeabilización de losa de tercer piso con bronco elástico. Incluye todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	218,0	$ 87.867	$ 19.155.006
9	CERTIFICACIONES				$ 10.710.000
9.1	certificación RETIE IVA INCLUIDO	und	1,00	$ 5.355.000	$ 5.355.000
9.2	certificación RETILAP IVA INCLUIDO	und	1,00	$ 5.355.000	$ 5.355.000

COSTO DIRECTO		**$ 961.766.734**
ADMINISTRACIÓN	25%	$ 240.441.684
UTILIDAD	5%	$ 48.088.337
TOTAL CONTRATO DE OBRA		**$ 1.250.296.755**

4. AVANCE FISICO

A continuación se realiza una breve descripción de las actividades ejecutadas durante el periodo del informe las cuales son:



CONCRETOS Y ACEROS

Durante el presente periodo se ejecutaron actividades relacionadas con detalles de acabados e instalación de elementos necesarios para evitar que los muros del cuarto nivel permanezcan húmedos.

Se realizo la instalación del lagrimal de concreto en todo el perímetro de los muros exteriores y así evitar que el agua lluvia permanezca en los mismos, de esta manera se protege la fachada y se garantiza la correcta evacuación de las aguas hacia el exterior.

REVOQUES Y PINTURAS

Se realizo la actividad de pintura en los diferentes muros, esta actividad se ejecuta con el fin de proteger las superficies, se da el acabados y presentación de los diferentes espacios.

Se realizó el resane y la aplicación de pintura en la fachada intervenida, debido al deterioro ocasionado durante la ejecución de las actividades de obra. Esta intervención fue necesaria para recuperar las condiciones estéticas y funcionales de la superficie, garantizando un acabado uniforme y acorde con las condiciones existentes de la edificación.

ENCHAPES Y CERRAMIENTOS

Se realizaron las actividades de suministro, transporte e instalación de divisiones en vidrio, ventanas y puertas, de acuerdo con los especificado en los planos arquitectónicos y las especificaciones técnicas del proyecto.

La anterior actividad se hace necesaria con el fin de conformar y delimitar los espacios proyectados dentro del diseño arquitectónico.

Se realizó la instalación de la cubierta en el área correspondiente al techo del tercer nivel, incluyendo el montaje de la canoa y la ruana metálica para la adecuada conducción y evacuación de aguas lluvias.

Durante la ejecución de los trabajos fue necesario fabricar e instalar un caballete en obra, debido a la geometría particular de la losa, la cual presenta una curvatura tipo media luna. Esta solución constructiva permitió garantizar la correcta unión entre los elementos de cubierta, evitando posibles filtraciones y el ingreso de agua a través de las juntas de la teja, asegurando así la hermeticidad y el adecuado funcionamiento del sistema de cubierta.

APARATOS SANITARIOS

Como parte de las actividades de acabados, se realizó el suministro e instalación de los aparatos sanitarios correspondientes a cada unidad sanitaria (baños hombres, damas y Gerencia), incluyendo sanitarios, orinales y lavamanos. Los trabajos contemplaron la fijación de los elementos, conexión a las redes hidrosanitarias, verificación de su correcto funcionamiento y los ajustes necesarios para garantizar su adecuada operación y cumplimiento de las especificaciones del proyecto.

INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS

Se ejecutó las instalaciones eléctricas y de datos requeridas para el adecuado funcionamiento de las oficinas de la sede de EMEGA. Estas actividades incluyen la instalación de salidas de iluminación, tomacorrientes, interruptores, puntos de datos, luces de emergencia, acometida principal, así como el suministro, montaje y conexión de los diferentes aparatos eléctricos y de comunicaciones, incluyendo el tendido y organización del cableado correspondiente.

Adicionalmente, se dispuso una salida de piso para energía y una salida de piso para datos, con el fin de atender los requerimientos operativos y de conectividad de los puestos de trabajo, garantizando la funcionalidad y flexibilidad de los espacios de oficina.

INSTALACIÓNES HIDROSANITARIAS

Se realizaron las conexiones hidrosanitarias de las unidades sanitarias, incluyendo lavamanos, sanitarios, orinales y área de cocina. Las actividades comprendieron la conexión a las redes de suministro y desagüe, la instalación de accesorios complementarios, las pruebas de funcionamiento y los ajustes necesarios para garantizar la correcta operación de los equipos, evitando fugas y asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto, fue necesario realizar anclajes a la losa del tercer nivel.

NO PREVISTOS

Durante la ejecución del contrato fue necesario desarrollar actividades complementarias no contempladas inicialmente, derivadas de las condiciones reales encontradas en obra y de los ajustes requeridos para garantizar la adecuada funcionalidad, seguridad y calidad del proyecto.

Estas actividades incluyeron el lavado e hidrofugado de muros exteriores para mejorar su protección frente a la humedad y los agentes ambientales; la instalación de tubería sanitaria de 4 pulgadas para las unidades sanitarias; la instalación de interruptores de energía y tubería eléctrica complementaria para atender los requerimientos de las redes eléctricas; y la aplicación de pintura en la losa de las escaleras para mejorar su acabado y protección.

BAW

Adicionalmente, se ejecutó la construcción de un muro divisorio en sistema liviano tipo drywall para la conformación de la oficina de Dirección Financiera y Jurídica, así como la construcción de un muro en panel tipo Superboard en el acceso principal, de acuerdo con las necesidades funcionales y arquitectónicas definidas durante el desarrollo del proyecto.

La ejecución de estas actividades permitió complementar las intervenciones inicialmente previstas, garantizando el correcto funcionamiento de los espacios y el cumplimiento de los requerimientos operativos de la entidad.

Es importante mencionar que, a la fecha, el proyecto se encuentra en su etapa final, adelantando actividades de detalles de acabados, ajustes menores y limpieza general de obra, con el fin de garantizar la entrega de los espacios en óptimas condiciones de funcionamiento y presentación.

Así mismo, se precisa que las actividades ejecutadas se encuentran prácticamente finalizadas, quedando pendiente por facturar únicamente el valor correspondiente al diez por ciento (10%) del contrato, porcentaje que la entidad ha determinado retener para el proceso de liquidación y cierre definitivo del proyecto.

5. CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. TOTAL
2	**CONCRETOS Y ACEROS**			
2.12	Suministro, transporte e instalación de lagrimal en concreto.	ml	60,00	$3.119.940,00
3	**REVOQUES Y PINTURAS**			
3.2	Suministro, transporte e instalación de estuco sobre muros. Dos manos o las que sean necesarias hasta lograr una superficie homogénea. Incluye la preparación de la superficie	M2	10,20	$273.400,80
3.4	suministro y aplicación de REVOQUE en mortero 1:4 impermeabilizado, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	m2	10,20	$476.778,60

3.6	Aplicación de PINTURA DE PRIMERA CALIDAD. Para interiores y exteriores, sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales	m2	369,75	$8.453.224,50
4	**ENCHAPES Y CERRAMIENTOS**			
4.4	Suministro, transporte y colocación de ventana en aluminio negro anodizado y vidrio incoloro templado de 6 mm. Incluye cerradura de seguridad y todos los elementos necesarios según diseño para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	58,28	$36.362.582,12
4.5	Suministro, transporte y colocación de puerta en aluminio anodizado y vidrio incoloro templado de 8 mm. Incluye cerradura de seguridad y todos los elementos necesarios según diseño para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	16,80	$11.171.496,00
4.6	suministro, transporte e instalación de Teja termoacústicas UPVC 2.5 mm cresta alta blanca, así como todos los componentes y accesorios necesarios para su montaje conforme a las especificaciones técnicas y normativas pertinentes.	m2	118,00	$11.422.518,00
4.8	Suministro, transporte e instalación de pasamanos metálico fabricado de la siguiente manera, pletina de anclaje de forma circular a muro, mas L en varilla de 1/2" lisa ,incluye la tornillería de ensamble .1 un tubo superior de 2" calibre 16,incluye pintura anticorrosiva y acabados según requerimiento.	m	11,26	$3.648.341,34

4.9	Suministro e instalación cerramiento para divisiones de oficinas en vidrio templado incoloro 10mm bordes pulidos y brillados con perfilería en aluminio negro, conformado por módulos fijos laterales y montantes superiores, tubular horizontal inferior de 3"x1"1/2, + tubulares verticales y horizontal superior de 10 x 4,5 cm con remarco en sistema 3831 pisa vidrio a presión con empaque, incluye 4 puertas batientes con zócalo inferior de 9cm con empaque y con base, bisagra hidráulica speedy trabajo pesado, chapeta esquinera superior con pivote platina aéreo, doble manija en acero inoxidable de 1"x40, cerradura Yale 170 1/4 con porta cerradura y recibidor cuadrado, cerrojos y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	30,34	$28.167.018,86
4.11	suministro, transporte e instalación de canal en lamina galvanizada cal. 18, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	33,50	$6.912.088,50
4.12	suministro, transporte e instalación de ruana para cubierta en lamina galvanizada cal. 26, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	35,80	$3.604.666,20
4.13	suministro, transporte e instalación de zócalo de baldosa Alpes grafito Gris formato 8,5 cm x 90 cm incluye todo lo necesario para su correcta instalación	ml	160,83	$5.765.112,18
5	**APARATOS SANITARIOS**			
5.1	Suministro, transporte e instalación de Orinal mediano con válvula antivandálica Tipo push color blanco o equivalente	und	1,00	$704.803,00
5.4	suministro, transporte e instalación de Lavamanos Acuajet Institucional, incluye brazos de instalación a muro, griferia Institucional para lavamanos Push mesa max y todos sus accesorios para su correcta instalación	und	4,00	$5.482.000,00

BAW

5.5	Suministro, transporte e instalación de kit Taza Báltica plus entrada superior con válvula push de empotrar, incluye todos los accesorios para su correcta instalación.	und	4,00	$7.441.532,00
6	**INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS**			
	TABLEROS DE CIRCUITOS PARCIALES 3 PISO			
6.10	Suministro e instalación breakers enchufables monopolares de 1x20 amp	und	32,00	$627.200,00
	SALIDAS DE TOMAS Y LUCES 3 PISO			
6.11	Salidas para tomas con p.t. 120v. normal. cable 3xno12 lshf, emt = 1/2" cajas y accesorio	und	6,00	$1.414.800,00
6.12	salidas para tomas con p.t. 120v. Gfci	und	5,00	$1.179.000,00
6.13	Salidas para tomas regulados con p.t. 120v. color naranja, cable 3xno12 lshf, imc = 1/2" cajas y accesorio metálico	und	3,00	$707.400,00
6.14	salidas para luces 120v. Normales	und	17,00	$4.008.600,00
6.15	salidas para luces de emergencia	und	4,00	$943.200,00
6.16	salidas para televisión	und	2,00	$471.600,00
6.17	suministro, instalación y montaje de luminarias de emergencia	und	4,00	$652.400,00
6.18	suministro e instalación de tomas con p.t. 120v. normal	und	31,00	$3.518.500,00
6.19	suministro e instalación de tomas con p.t. 120v. Gfci	und	5,00	$567.500,00
6.20	suministro e instalación de tomas regulados con p.t. 120v.	und	11,00	$1.248.500,00
6.21	suministro, instalación y montaje de luminaria led 36 w	und	57,00	$12.685.920,00
6.22	suministro e instalación de interruptor sencillo o sensor de movimiento	und	2,00	$227.000,00

6.24	salidas para señal de evacuacio(salida),120 v, cable 3xno12 awg,emt de 1/2"cajas 2x4 metalicas, etc	und	2,00	$471.600,00
6.25	suministro e instalacion de señal de salida	und	2,00	$367.000,00
6.26	suministro e instalacion de salidas para video beam	und	2,00	$964.000,00
	VOZ Y DATOS			
6.27	salida para voz y datos, en cable utp cat 6a lshf, tuberia sch 40 de 3/4"	und	16,00	$7.200.000,00
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			
7.6	Suministro, transporte e instalación de tubería 2" PVC. incluye todo lo necesario para su correcta instalación	ml	9,75	$441.792,00
7.7	Suministro e instalación de Anclaje para tubería colgante al techo de 3/8". incluye todo lo necesario para su correcta instalación	und	5,00	$331.420,00
7.8	Suministro e instalación de Punto hidráulico. incluye todo lo necesario para su correcta instalación	und	9,00	$915.660,00
7.12	Suministro, transporte e instalación de Puntos sanitarios y accesorios de 2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	9,00	$1.532.718,00
7.13	Suministro, transporte e instalación Puntos sanitarios y accesorios de 3". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación	und	16,50	$3.005.508,00
7.14	Suministro, transporte e instalación de Puntos sanitarios y accesorios de 4". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	4,00	$805.372,00
	NO PREVISTOS			
NP-09	Lavada e hidrofugo de muros en ladrillo a la vista	m2	235,52	$8.243.200,00
NP-13	Tuberia pvc aguas lluvias de 4" para bajantes	Ml	11,00	$605.000,00

NP-14	Suministro e instalacion de gabinete by-pass para proteccion T-R1	und	1,00	$4.445.820,00
NP-15	Suministro e instalacion de acometida desde transferencia automatica no.1 hasta tablero general en cable 4 x 8 awg lshf	ml	7,00	$1.368.115,00
NP-16	Suministro e instalacion de acometida desde transferencia hasta tablero de tomas y luces reguladas en cable 4 x 8awg lshf	ml	8,00	$1.563.560,00
NP-17	Suministro e instalacion de llave by-pass 40 amp	und	1,00	$634.980,00
NP-18	Suministro en instalación de acometida desde gabinete general de instalaciones existentes hasta tablero de distribución de toma y luces normales en cable 5 x 4 AWG LSHF	ml	60,00	$15.000.000,00
NP-19	Suministro e instalacion de interruptor sencillo	und	11,00	$666.204,00
NP-20	Suministro e instalacion de interruptor doble en muro	und	1,00	$69.174,00
NP-21	Suministro de NVR para sistema de videovigilancia	und	0,00	$0,00
NP-22	Suministro y aplicación de pintura tipo Koraza color gris basalto o equivalente sobre superficie de losa en concreto, incluyendo aplicación uniforme de dos manos de pintura, mano de obra especializada, herramientas menores, equipos, transporte interno y limpieza final del área intervenida, de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto.	m2	26,08	$691.091,50

BAW

NP-25	Suministro e instalación de canalización eléctrica en tubería EMT de 3/4", incluye apertura y resane de superficies, perforaciones, anclajes, soportes, accesorios, fijaciones, adecuaciones civiles, retiro de sobrantes y demás actividades necesarias para su correcta ejecución.	ml	147,00	$2.072.847,00
NP-27	Suministro, transporte e instalación de muro liviano en sistema drywall conformado por estructura metálica galvanizada en perfiles tipo parales y canales, revestido por ambas caras con lámina de yeso drywall de 1/2", incluyendo tornillería, cintas, masillado de juntas, refuerzos, fijaciones, cortes, desperdicios, mano de obra especializada, herramientas menores, transporte interno y limpieza final del área intervenida, de acuerdo con planos y especificaciones técnicas del proyecto.	m2	16,26	$2.136.206,28
NP-28	Suministro, transporte e instalación de muro liviano en sistema fibrocemento tipo Superboard de 8 mm, conformado por estructura metálica galvanizada en perfiles tipo parales y canales, revestido por ambas caras (2F) con lámina Superboard de 8 mm, incluyendo perfilería metálica, tornillería, tratamiento de juntas, sellos, refuerzos, fijaciones, cortes, desperdicios, mano de obra especializada, herramientas menores, transporte interno y limpieza final del área intervenida, de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos del proyecto.	m2	3,17	$485.599,62
NP-31	Suministro e instalación de UPS On-Line Trifásica 10 kVA FP 1.0, con tecnología de doble conversión, banco de baterías, configuración, pruebas y puesta en funcionamiento.	und	1,00	$23.000.000,00

NP-32	Perforación en losa de concreto e instalación de sistema de fijación mediante chazo y tornillo de 3/8" para soporte de lámparas colgantes, incluyendo suministro de materiales, perforación, limpieza del alojamiento, colocación y ajuste de la fijación, verificación de firmeza y todos los elementos, equipos y mano de obra necesarios para su correcta ejecución.	und	114,00	$2.052.000,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



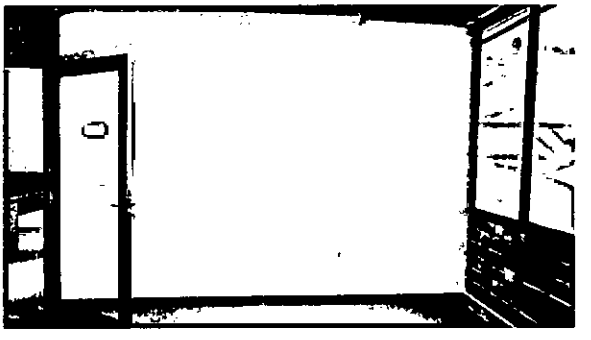







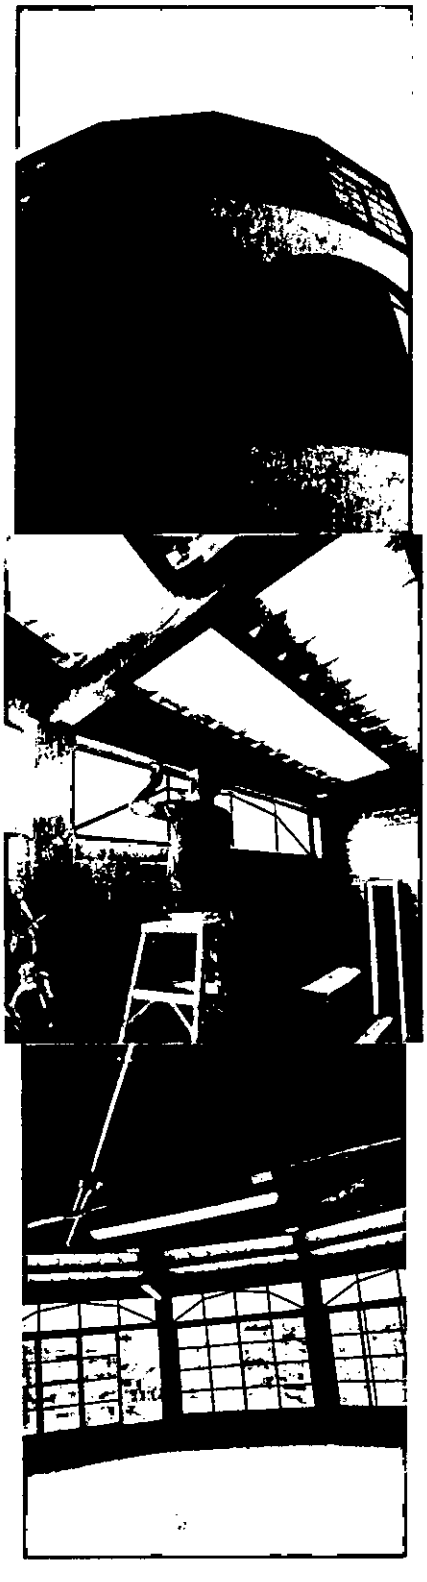

BAW







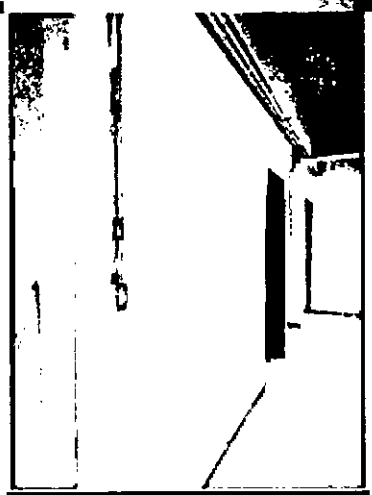

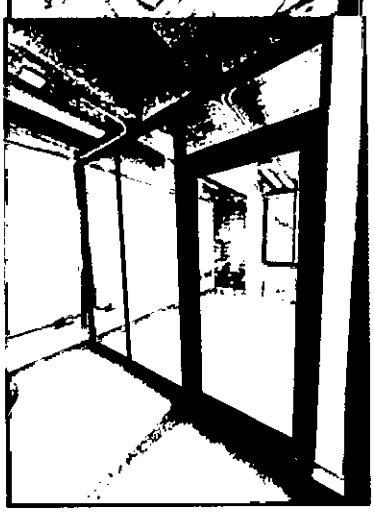



BAW

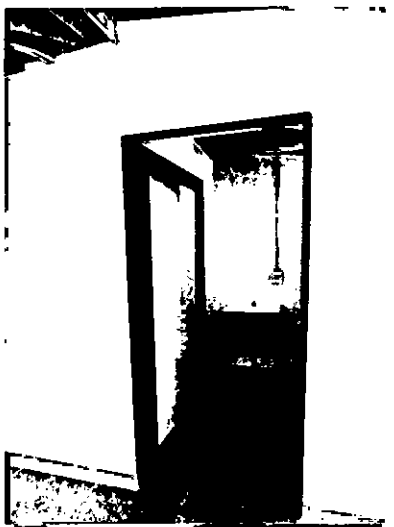





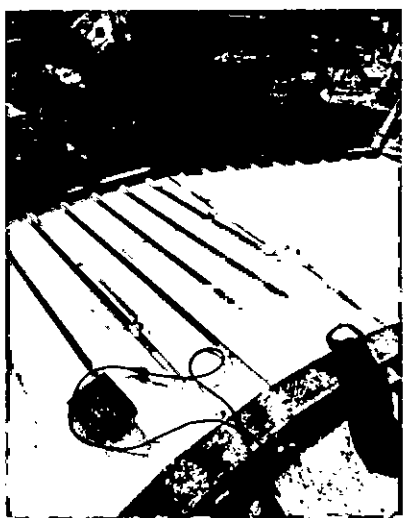





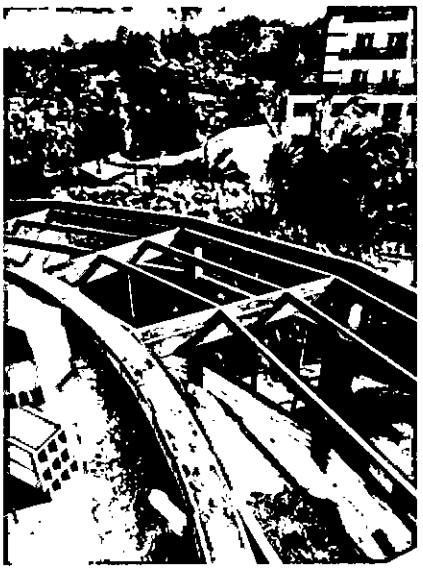



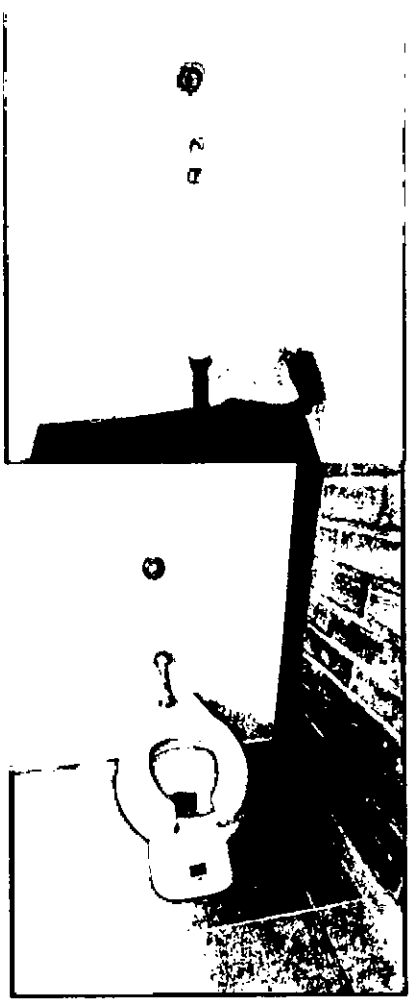

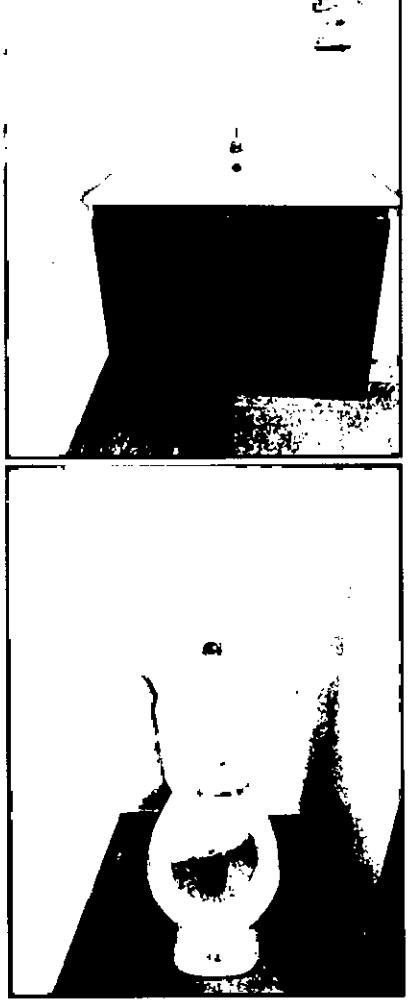

BAW

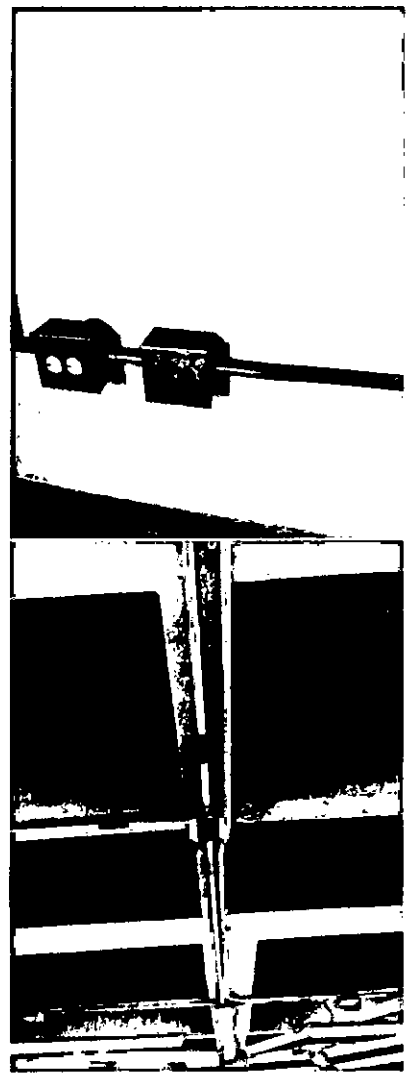

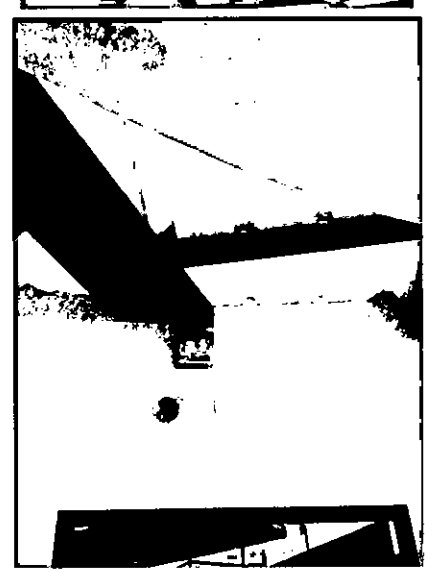

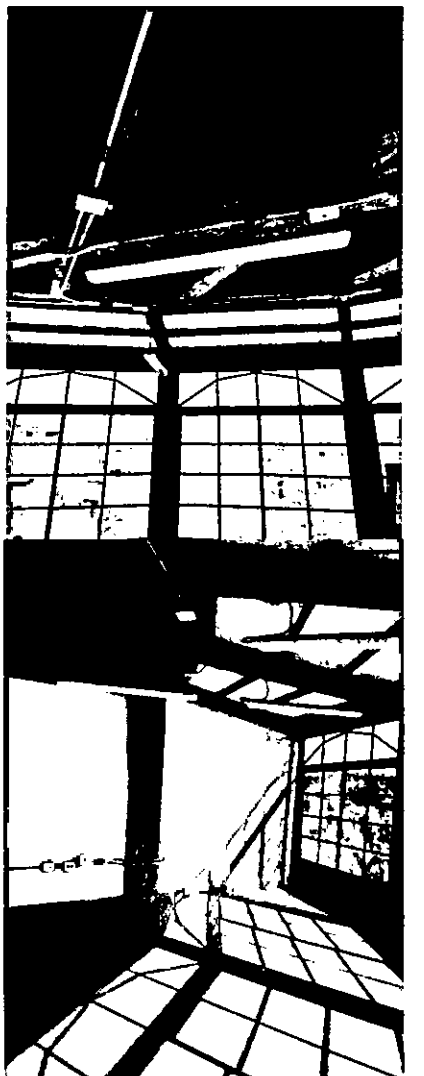

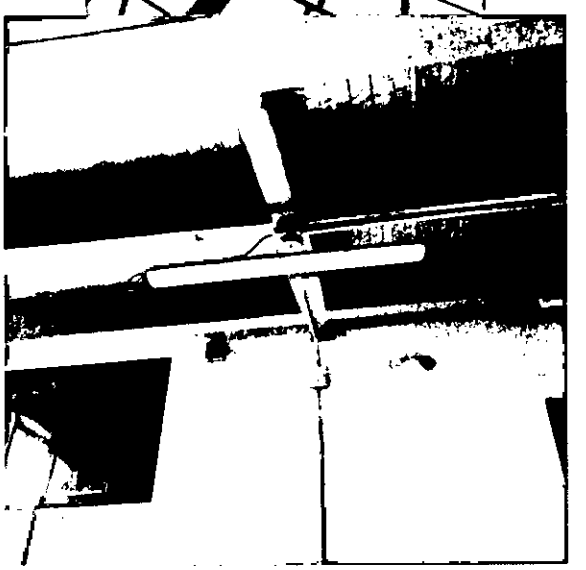

BAW

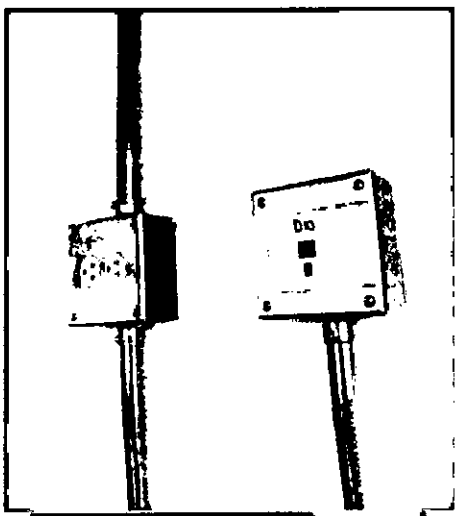

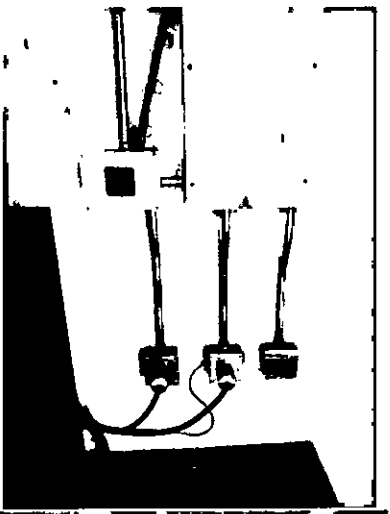



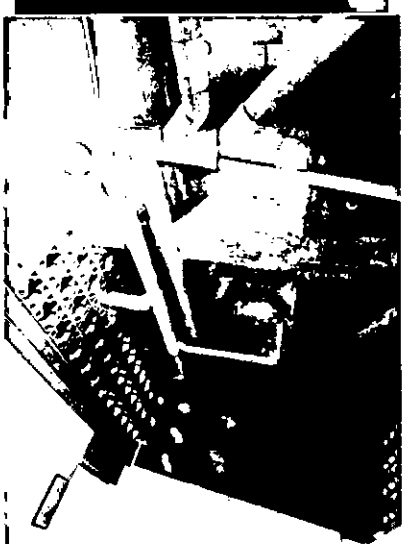

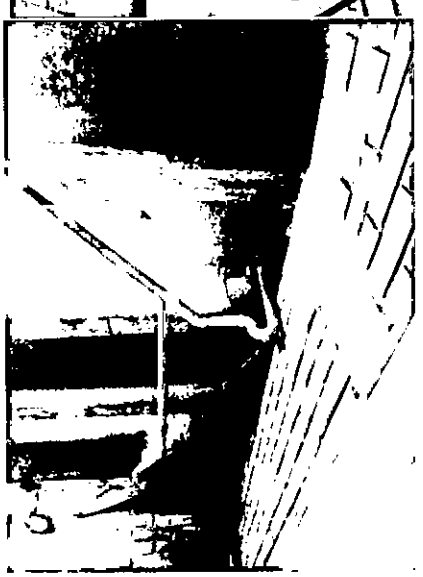



BAW



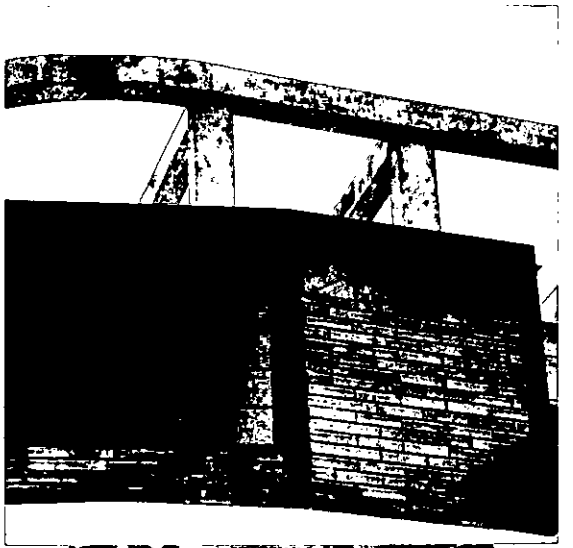

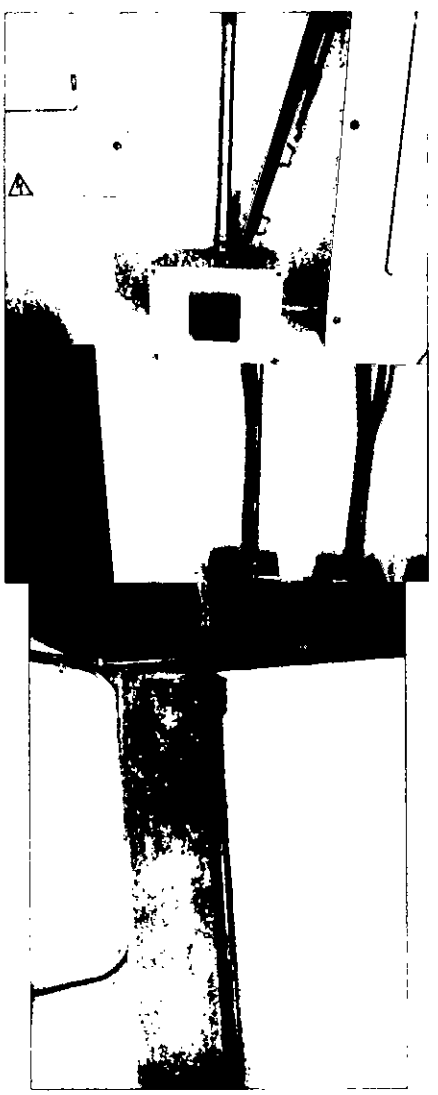



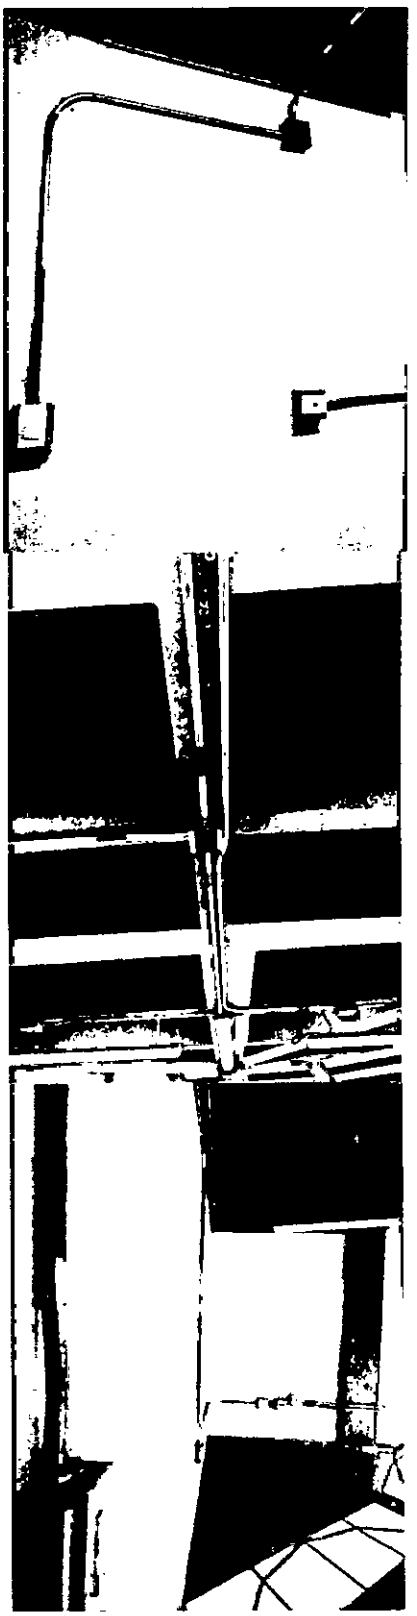

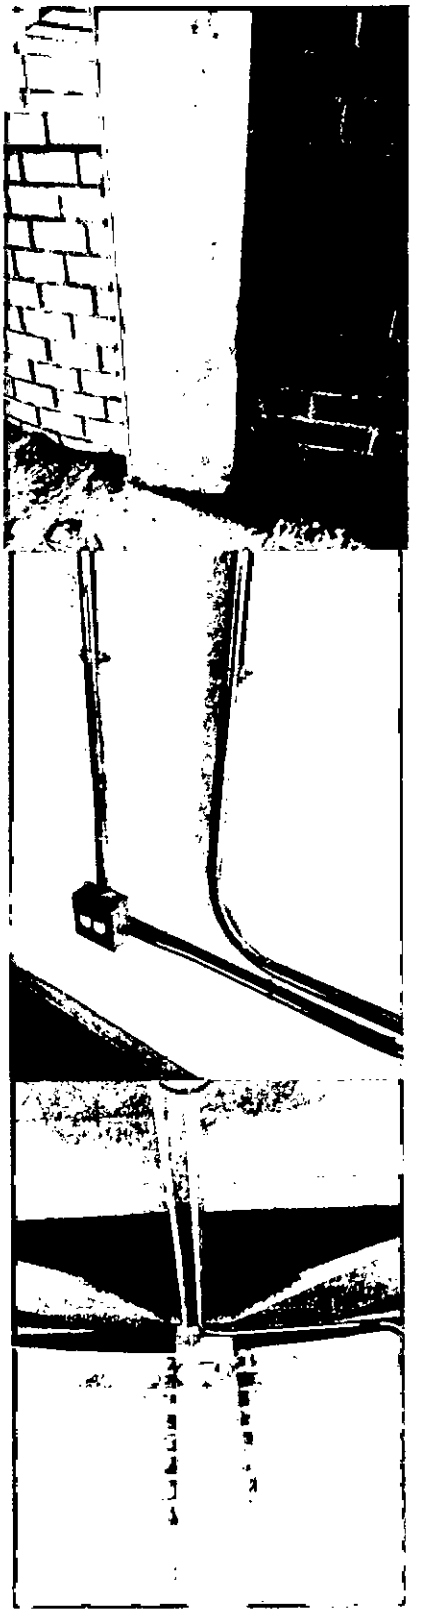

BAW

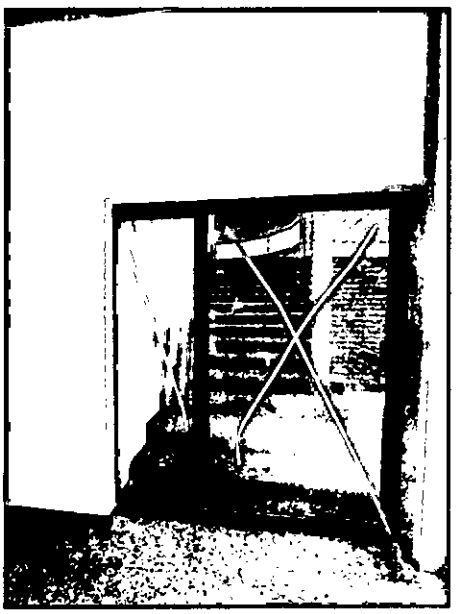

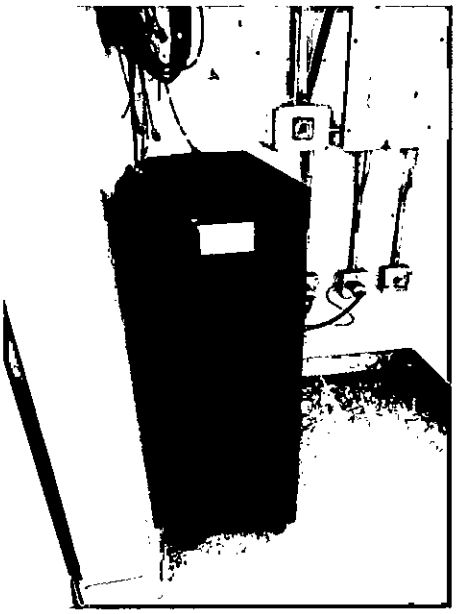

6. PERSONAL, EQUIPO E INSTALACIONES

El contratista de obra cuenta con el personal presentado en la propuesta, lo que corresponde al Director de Obra, Residente de Obra y SST, adicional al personal operativo de obra, contratista eléctrico, de estructura metálica e instalador de puertas y ventanas.

En el informe de Seguridad y salud en el trabajo se relaciona el personal administrativo y operativo que se encuentran en obra.

7. RESUMEN FINANCIERO

GRUPO BAW S.A.S	
Contrato	COP-079-DE 2025
Valor Contrato	$1.250.296.755
Valor Anticipado	$ 375.089.027
Acta de Avance 1	$795,988,198
Acta de Avance 2	$328.954.194

COSTO DIRECTO		**$ 961.766.734**
ADMINISTRACIÓN	25%	$ 240.441.684
UTILIDAD	5%	$ 48.088.337
TOTAL CONTRATO DE OBRA		**$ 1.250.296.755**

8. PORCENTAJE DE AVANCE:

A la fecha se presenta un avance del 89,75% del total de la obra.

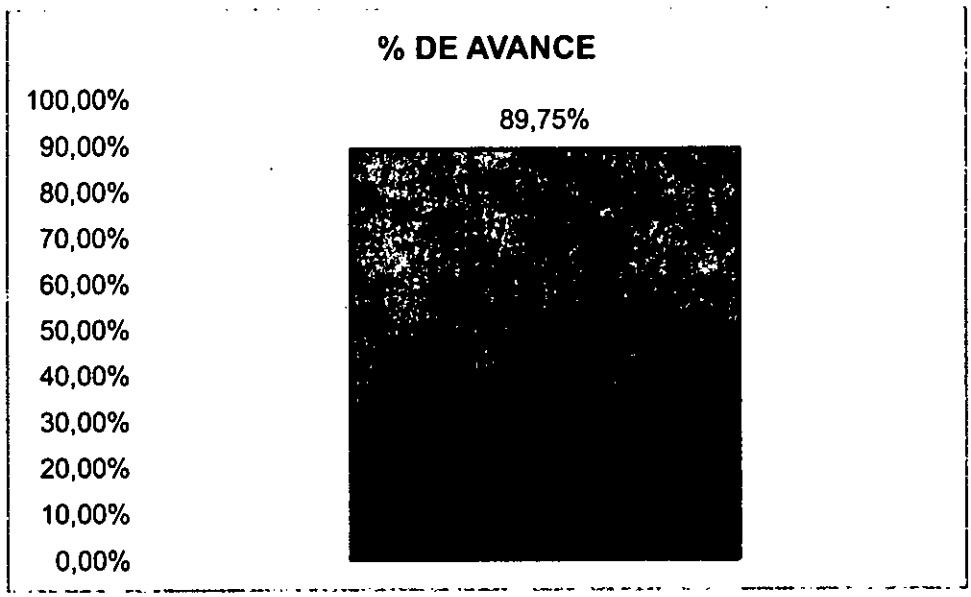

Anderson S. Barrera

ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO BAW S.A.S

Anexos:
Componente SST, Acta de Obra.

BAW

INFORME DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N°2

CONDICIONES GENERALES	
CONTRATO NUMERO:	COP-079-DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMISNITRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL MUNICIPIO DE GUARNE - EMEGA
VALOR DEL CONTRATO:	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PEOSOS ($1.250.296.755), EL CUAL INCLUYE TODOS LOS COSTOS, GASTOS Y TRIBUTOS A QUE HAYA LUGAR, TANTO MUNICIPALES COMO NACIONALES
INTERVENTORÍA:	INTERGRARCONSTRUCCIONES S.A.S
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DEL CONTRATO:	03 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	16 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	16 DE MARZO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN	20 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE REINICIO	21 DE MARZO DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE ABRIL DE 2026
PERIODO	1 – 30 DE MAYO DE 2026

BAW

EMEGA

Contenido

Contenido 2

GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3

1. REPORTE DE PERSONAL 3
2. SEGURIDAD SOCIAL 3
3. ENFERMEDAD GENERAL, ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO, RELACIÓN DE INCAPACIDADES Y FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS. 4
4. ACTIVIDADES SG-SST 4
5. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) 5
6. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 5
7. CAPACITACIÓN AL PERSONAL 5
8. CONTROL APLICACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA 5
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO 6
10. ACCIDENTES DE OBRA 11

ANEXO 1 – SEGURIDAD SOCIAL 13

ANEXO 2 – BITACORA SST 14

ANEXO 3 – GRUPOS DE APOYO 15

ANEXO 4 – CAPACITACIONES 16

ANEXO 5 – PERMISOS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURA Y PREOPERACIONALES 17

GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. REPORTE DE PERSONAL

Con el propósito de llevar un control organizado y actualizado del personal que hace parte del proyecto, independientemente de su modalidad de vinculación, se presenta el siguiente reporte de trabajadores. En este documento se relaciona el personal que ha participado en la ejecución de la obra durante el periodo evaluado. El informe incluye tanto el personal activo como aquellos trabajadores que han finalizado su labor, permitiendo así contar con una trazabilidad clara de los movimientos de personal y del recurso humano dispuesto para el desarrollo de las actividades.

EMPLEOS GENERADOS (Cantidad)							
Administrativo	Oficiales	Ayudante	Directos	Mujer	PROCEDENCIA Empleo de la zona		Indirectos
					N°	%	
5	3	4	2	1	12	100	10

2. SEGURIDAD SOCIAL

A continuación, se muestra el listado del personal que activo a la fecha de corte. **Ver anexo 1 – Personal en obra**, para ver detalladamente la documentación del personal.

	NOMBRE	CARGO	ESTADO	EMPRESA
1	Luis Emilio Vanegas Taborda	Oficial	Activo	Cadbim S.A.S
2	Edgar Antonio González González	Oficial	Activo	Cadbim S.A.S
3	Steven Manuel Suarez Martínez	Ayudante	Activo	Cadbim S.A.S
4	Juan David Ortega Talaigua	Ayudante	Activo	Cadbim S.A.S
5	José Gabriel Rodríguez Rodríguez	Oficial	Activo	Cadbim S.A.S
6	Jesús Andrés Macias Ortega	Ayudante	Activo	Cadbim S.A.S
7	Roger Andrés Pinto Oyola	Ayudante	Activo	Cadbim S.A.S
8	Deysi Jhazindra Herrera Alcaraz	Residente SST	Activo	Grupo Baw S.A.S
9	Anderson Steve Barrera Arias	Residente Civil	Activo	Grupo Baw S.A.S
10	Davidnson Arley Leal Mendoza	Ing. Civil	Activo	Grupo Baw S.A.S
11	Yony Marín Henao	Auxiliar residente	Activo	Grupo Baw S.A.S
12	Cristian Herrera	Ing. Civil	Activo	Grupo Baw S.A.S

3. ENFERMEDAD GENERAL, ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO, RELACIÓN DE INCAPACIDADES Y FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS.

Este ítem contempla el seguimiento y control de los eventos relacionados con enfermedad general, accidentes e incidentes de trabajo, así como la relación de incapacidades médicas presentadas por el personal durante el periodo evaluado. De igual manera, incluye la identificación y análisis de los factores de riesgo asociados a las actividades desarrolladas en la obra, con el fin de fortalecer las medidas de prevención y control.

Para el periodo evaluado, No se presentaron casos de enfermedad laboral e incidentes, sin embargo, se presentó un accidente de trabajo con un total de 7 días de incapacidad médica asociadas a la ejecución de las actividades del proyecto. La persona afectada es externa a la empresa, pero s ele brindó apoyo y se realizó la gestión para la atención médica, además de notificar a su empleador con el fin de realizar las actividades correspondientes posteriores.

Nombre	N/A
Enfermedad Laboral	0
Accidente Laboral	1
Enfermedad común	0
Accidente común	0
Incapacidad laboral	1
Incapacidad general	0

4. ACTIVIDADES SG-SST

Para ver un resumen detallado de las actividades que se realizan diario en la obra se puede dirigir al Anexo 2 – bitácora SST.

Dentro de estas se contemplan:

- Inducción de Seguridad y Salud en el trabajo.
- Inspecciones de seguridad.
- Pausas Activas.
- Supervisión de uso de EPP.
- Demarcación de áreas.
- Preoperacionales.

5. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST)

Se realizaron las reuniones mensuales correspondientes a mayo frente al COCOLA y COPASST, no se adjunta acta porque aún no se han recolectado las firmas de los integrantes por completo, sin embargo, se adjunta evidencia de participación,

FECHA DE REUNIÓN	TEMAS TRATADOS	LECCIONES APRENDIDAS/ACCIONES DE MEJORA
05 / 06 / 2026	Verificación de AT. Implementos de emergencia. Inspecciones.	Mitigación de AT en obra.
Compromisos	Seguimiento a plan de acción, dotar y hacer seguimiento a los botiquines, documentar la participación de los trabajadores en el proceso IVPR.	

6. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

FECHA DE REUNIÓN	RECOMENDACIONES/MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PARA UN SANO AMBIENTE LABORAL
05 / 06 / 2026	Se hace recordatorio acerca de los canales disponibles en la empresa para el reporte de situaciones.

Ver en anexo 3 – Grupos de apoyo

7. CAPACITACIÓN AL PERSONAL

De acuerdo al Plan de capacitaciones y su cumplimiento aplicable durante el periodo, se dictaron las siguientes capacitaciones:

TEMA	PÚBLICO	No. PERSONAS	EXPOSITOR	No. HORAS
Inducción SST	Ingresos	4	Deysi Jhazindra Herrera Alcaraz	1 x persona
TOTAL	N° PERSONAS CAPACITADAS			N° HORAS
	4			4

Para ver los registros ver Anexo 4 – Capacitación.

8. CONTROL APLICACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA

Durante el período reportado, se ha mantenido comunicación constante con los usuarios de los locales ubicados en el perímetro del área donde se ejecuta la obra civil, con el fin de

atender y dar solución a los posibles perjuicios generados por el desarrollo de las actividades. Entre las situaciones evidenciadas se encuentran: ruido por el uso de herramientas eléctricas y caída de material particulado al interior de los locales y en los pasillos.

Frente a lo anterior, se implementaron medidas correctivas de manera inmediata, tales como la entrega de tapa oídos a las personas que lo requirieron y la limpieza de las zonas afectadas.

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Imagen 1. Uso adecuado de EPP	**Imagen 2.** Uso adecuado de EPP



Imagen 3. Uso adecuado de EPP

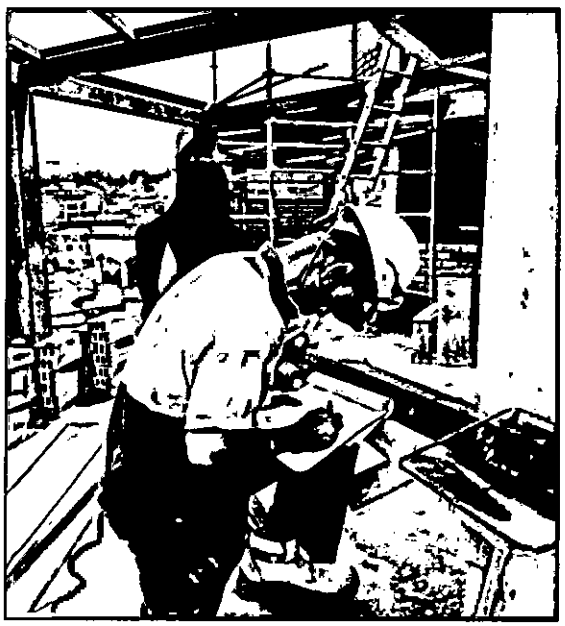

Imagen 4. Entrega de EPP

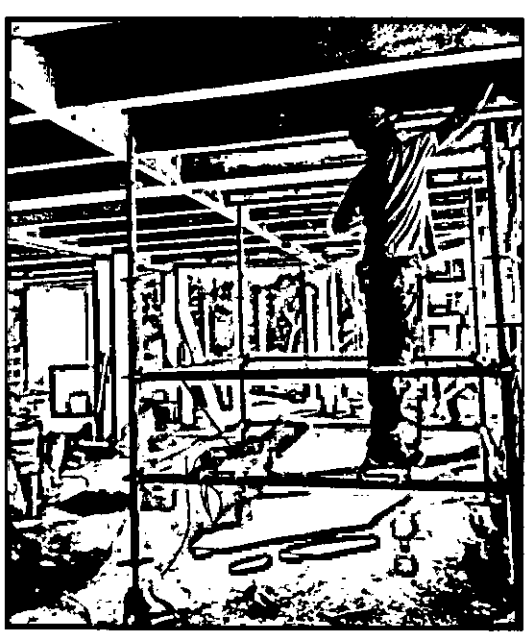

Imagen 5. Uso adecuado de EPP



Imagen 6. Gestión del orden y aseo.



Imagen 7. Gestión del orden y aseo.

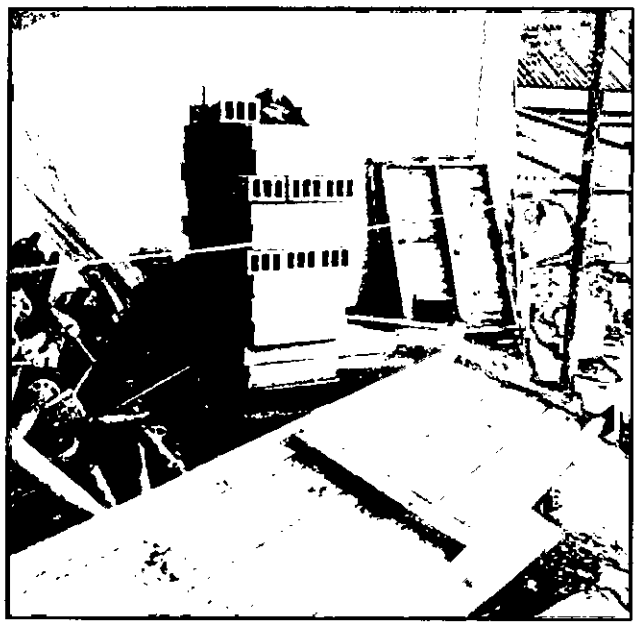

Imagen 8. Instalación de guayas en bordes de losa.



Imagen 9. Instalación de guayas en bordes de losa.

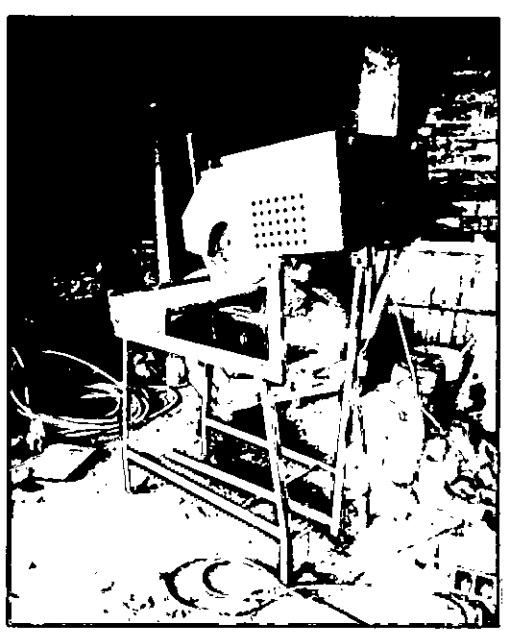

Imagen 10. Realización de preoperacionales.

Se implementaron diferentes mecanismos de barrera para prevenir caída de objetos, delimitar zonas con riesgos por excavaciones, desniveles y áreas de trabajo.

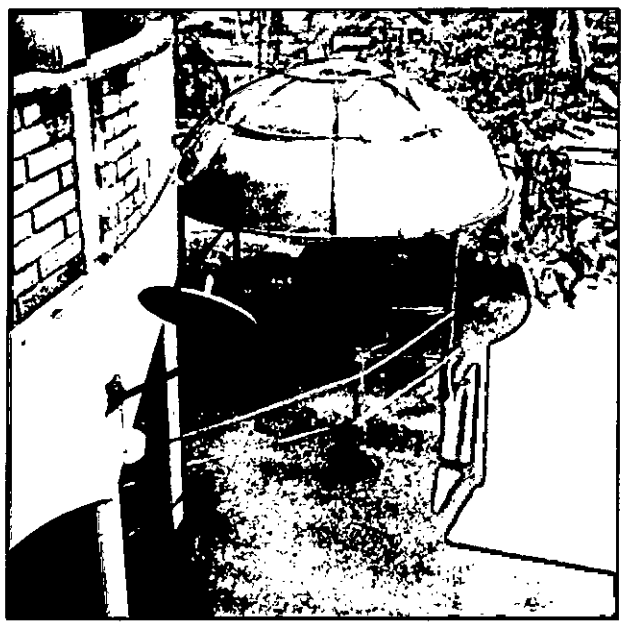

Imagen 11. Cerramiento peatonal.



Imagen 12. Realización de pre operacionales.



Imagen 13. Cerramiento de protección



Imagen 14. Preoperacionales

contra proyección de partículas.

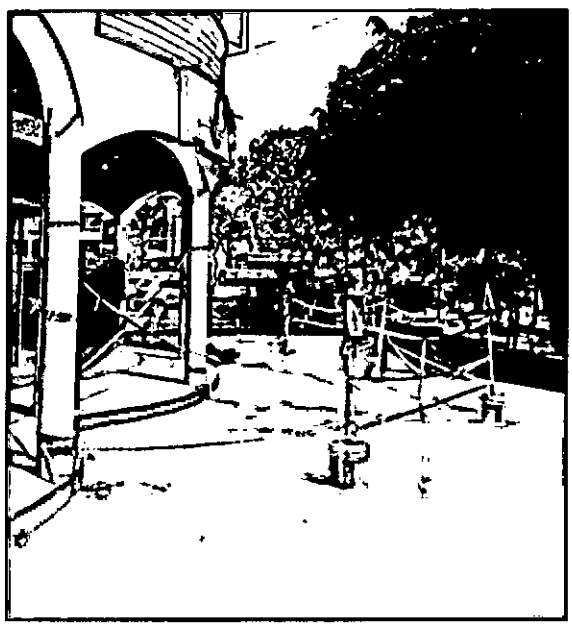

Imagen 15. Cerramiento de protección peatonal contra caída de objetos.



Imagen 16. Pausas activas.

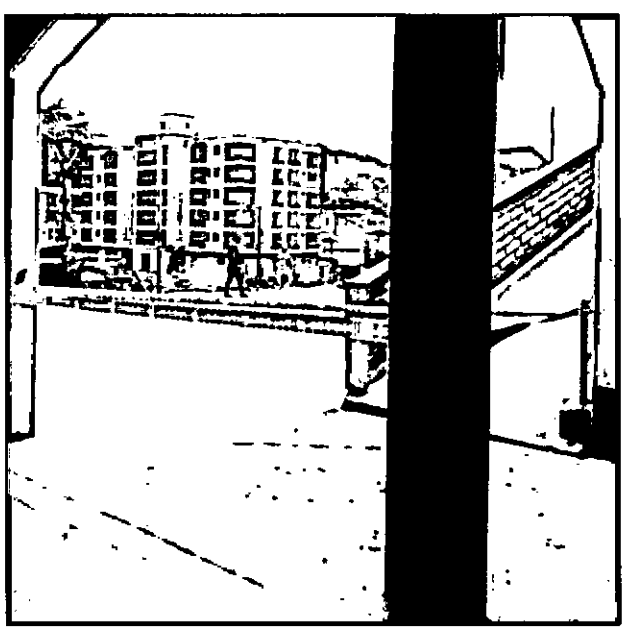

Imagen 17. Cerramiento de protección contra partículas de soldadura.



Imagen 18. Delimitación de áreas.



Imagen 19. Inspección de botiquín.

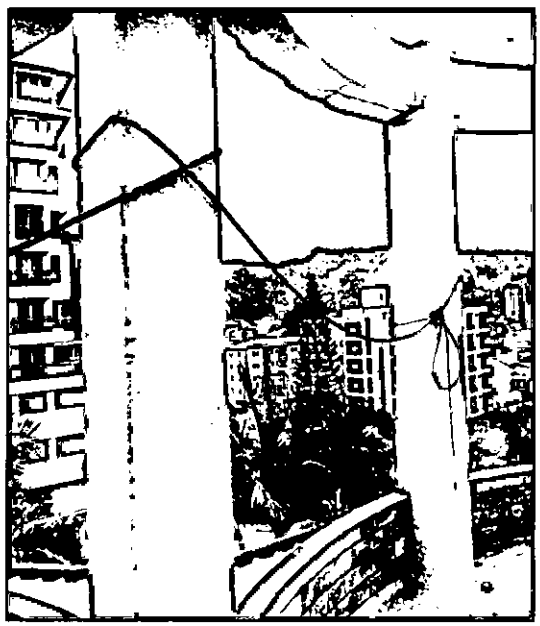

Imagen 20. Instalación de líneas de vida.

10. ACCIDENTES DE OBRA

Durante el desarrollo de las actividades ejecutadas en el periodo evaluado no se presentaron novedades respecto a accidentes, incidentes o enfermedades de origen laboral.

Deysi Jhazindra Herrera Alcaraz Auxiliar
SST
Grupo BAW S.A.S.

ANEXO 1 – SEGURIDAD SOCIAL

Se verificaron las planillas de seguridad social del personal contratista, y para el personal de ingreso se valida como requisito indispensable el certificado de afiliación a la ARL con clasificación de riesgo 5 para autorizar su ingreso e inicio de labores en la obra.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-16, 03:16:13 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 86168696

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 16/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO BAW SAS	**Nombre Sucursal**	GRUPO BAW SAS	**Código Sucursal**	01
Documento	NI901411511	**Dirección**	CR 52 #49 - 44 LOCAL 202		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5311493		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	GUARNE	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BARRERA ARIAS ANDERSON STEVE	**Identificación**	CC 1220469730		
Total Afiliados	9	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	LMA	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	SLN	IGE	LMA	VAC	SLN	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Aportes Pensiones	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Pago	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mindeporte	Total
CC 1035820885	DEYSI JHAZINDRA HERRERA ALCARAZ	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1038815073	KARINA MARIA MARQUEZ [illegible]	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	0,522	$ 2.500.000	$ 13.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 613.100
CC 1065008984	ALDAIR BRU GARCIA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.000.000	$ 800.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.000.000	$ 200.000	6,960	$ 5.000.000	$ 348.000	(CCF04) COMFAMA	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.548.000
CC 1087840454	[illegible]	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.586.000	$ 186.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.586.000	$ 180.000	6,553	$ 2.586.000	$ 171.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.586.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 771.000
CC 1090467332	CAMILO ESTEBAN LEAL VERA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF04) COMFAMA	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400
CC 1001314388	DAYDSON ARLEY LEAL MENDOZA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 6325539	ERLEY HERNANDEZ DOMINGUEZ	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
[illegible]	MARIANO DE JESUS [illegible]	01	00																		0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.200.000	$ 88.000	6,522	$ 2.200.000	$ 11.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 539.500
PT 5048012	LEONARDO CISNEROS PEÑA	01	00	X																	0	1	1	1	(230801) PROTECCION	$ 58.364	$ 9.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF04) COMFAMA	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 22.760.174	$ 22.760.174	$ 22.760.174	$ 22.760.174	$ 3.641.800	$ 910.600	$ 1.261.700	$ 910.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.744.700	$ 64.500	$ 6.809.200

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-16, 03:16:16 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 85582400

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 16/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO BAW SAS	**Nombre Sucursal**	GRUPO BAW SAS	**Código Sucursal**	01
Documento	NI901411511	**Dirección**	CR 52 #49 - 44 LOCAL 202		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5311493		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	GUARNE	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BARRERA ARIAS ANDERSON STEVE	**Identificación**	CC 1220469730		
Total Afiliados	65	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días ARP	Días EPS	Días APO	Días CCF														
CC 1000105325	OVIDIO ALEJANDRO COSSIO URREGO	01	00		X														0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 58.364	$ 2.400	0,980	$ 58.364	$ 4.100	(CCF04) COMFAMA	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
CC 1000439680	ERICA TATIANA PARRA DAZAVID	01	00											X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 116.727	$ 18.700	(EPS032) SALUD TOTAL EPS	$ 116.727	$ 4.700	0,000	$ 116.727	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 116.727	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.400
CC 1000439680	ERICA TATIANA PARRA CADAVID	01	00																0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.634.178	$ 261.800	(EPS022) SALUD TOTAL EPS	$ 1.634.178	$ 65.400	0,980	$ 1.634.178	$ 113.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.634.178	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 506.100
CC 1001158861	JUAN CARLOS QUINTAN FZ ZUÑIGA	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.753.843	$ 280.600	(EPS041) NUEVA EPS	$ 1.753.843	$ 70.100	0,980	$ 1.753.843	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.753.843	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1001415862	BRAYAN ZULETA RUIZ	01	00											X					0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 175.091	$ 28.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 175.091	$ 7.100	0,000	$ 175.091	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 175.091	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200
CC 1001415862	BRAYAN ZULETA RUIZ	01	00											X					0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 175.091	$ 28.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 175.091	$ 7.100	0,000	$ 175.091	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 175.091	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200
CC 1001415862	BRAYAN ZULETA RUIZ	01	00	X															0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 1.050.543	$ 168.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.050.543	$ 42.100	0,980	$ 1.050.543	$ 73.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.050.543	$ 42.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.500
CC 1001980883	JOHN ALEXANDER MONTOYA CAYE	01	00	X															0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION	$ 1.342.361	$ 214.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.342.361	$ 53.700	0,980	$ 1.342.361	$ 93.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.342.361	$ 53.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 415.700
CC 1007104082	ANDRES VIRGILIO VALENZUELA CASTAÑEDA	01	00									X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.854.778	$ 296.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.854.778	$ 74.200	0,980	$ 1.854.778	$ 129.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.854.778	$ 74.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 574.300
CC 1007342218	JHONATAN STIVEN JARAMILLO CEBALLOS	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	0,980	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 1007390806	DANIEL CARDONA ARIAS	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	0,522	$ 2.500.000	$ 13.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 613.100
CC 1007515823	JANIO MANUEL DE LA ROSA POLO	01	00																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S A [illegible]	$ 1.750.905	$ 70.100	0,980	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1011580113	YEISON STIVEN UBUGA BECERRA	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	$ 1.750.905	$ 70.100	0,980	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1011581002	ANDRES UBUGA PULGARIN	01	00										X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.938.907	$ 310.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MAYORIDAD	$ 1.938.907	$ 77.600	0,980	$ 1.938.907	$ 135.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.938.907	$ 77.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.700
CC 1018227838	DANILO LOPERA GIRON	01	00										X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.980.105	$ 316.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.980.105	$ 79.300	0,980	$ 1.980.105	$ 137.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.980.105	$ 79.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 613.400
CC 1020468570	YOVANY ALBERTO GALLO GOMEZ	01	00	X															0	19	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.383.334	$ 223.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.383.334	$ 55.800	0,980	$ 1.383.334	$ 97.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.383.334	$ 55.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 431.600
CC 1022092157	JUAN ALONSO CALVO GODOY	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.780.305	$ 284.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.780.305	$ 71.300	0,980	$ 1.780.305	$ 124.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.780.305	$ 71.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.500
CC 1022092367	JOSE MANUEL ANGULO OSPEDOSB	01	00										X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.076.505	$ 332.300	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MAYORIDAD	$ 2.076.505	$ 83.100	0,980	$ 2.076.505	$ 144.600	(CCF04) COMFAMA	$ 2.076.505	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 643.100
CC 1022096767	JEISON AGUINAGA VELASQUEZ	01	00		X								X						0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION	$ 1.738.545	$ 278.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.738.545	$ 69.600	0,980	$ 1.738.545	$ 121.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.738.545	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 538.500

Enlace Operativo – Líneas Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 16/06/2026 | **Empresa NI901411511 GRUPO BAW SAS** | **Planilla Nro: 85582400** | **Periodo Cotización: mayo de 2026** | **Periodo Servicio: junio de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APR	Días APR	Días APR	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1022097520	EVER MAURICIO SEPULVEDA BARRERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.008.505	$ 321.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 2.008.505	$ 80.400	6,960	$ 2.008.505	$ 139.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.008.505	$ 80.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 622.300
CC 1022097767	MARIA CAMILA MEJIA SARRAZOLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230801) PROTECCION	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1022099581	YIMI ALEJANDRO GARCES BENITEZ	01	00											X						0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.342.361	$ 214.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.342.361	$ 53.700	0,000	$ 1.342.361	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 1.342.361	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.500
CC 1022099581	YIMI ALEJANDRO GARCES BENITEZ	01	00										X							0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 604.545	$ 96.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 604.545	$ 24.200	6,960	$ 604.545	$ 42.100	(CCF04) COMFAMA	$ 604.545	$ 24.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.300
CC 1022100357	MARLON ALEJANDRO FLOREZ SERNA	01	00																	0	30	30	30	30	(230801) PROTECCION	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.300.000	$ 92.000	6,960	$ 2.300.000	$ 160.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 712.100
CC 1030863613	VICTOR ANGELO VELASQUEZ PALOMINO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.962.568	$ 314.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.962.568	$ 78.500	6,960	$ 1.962.568	$ 136.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.962.568	$ 78.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 607.900
CC 1038917868	LUIS EDUARDO BERRIO CARVAJAL	01	00											X						0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 175.091	$ 28.100	(EPS010) EPS SURA	$ 175.091	$ 7.100	0,000	$ 175.091	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 175.091	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200
CC 1038917868	LUIS EDUARDO BERRIO CARVAJAL	01	00																	0	27	27	27	27	(230801) PROTECCION	$ 1.575.815	$ 252.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.575.815	$ 63.100	6,960	$ 1.575.815	$ 109.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.356.000	$ 54.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 479.000
CC 1039919865	MARIA ISABELLA CERTUCHE CARAY	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.500.000	$ 140.000	6,522	$ 3.500.000	$ 18.300	(CCF04) COMFAMA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 858.300
CC 1039919916	DANILO SANCHEZ RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS040) SANITAS SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1039921083	SEBASTIAN TABA MARIN	01	00									X								0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	0,522	$ 3.000.000	$ 15.700	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 735.700
CC 1039921884	CRISTIAN HERRERA OCHOA	01	00																	0	30	30	30	30	(230801) PROTECCION	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 1039338899	LUIS MIGUEL ALVIRA MEDINA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 1039854838	YONY DE JESUS MARIN HENAO	01	00									X								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.000.000	$ 160.000	0,522	$ 4.000.000	$ 20.900	(CCF04) COMFAMA	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 980.900
CC 1039862988	JUAN DAVID LOAIZA SERNA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1037863458	ANDRES FELIPE CALDERON MEJIA[illegible]	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	0,522	$ 3.000.000	$ 15.700	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 735.700
CC 1037862780	DANIELA MEJIA LUCAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.800.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF04) COMFAMA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.063.600
CC 1039862762	JHONATAN STIBENS CARDONA MARIN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.200.905	$ 352.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.200.905	$ 88.100	6,960	$ 2.200.905	$ 153.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.200.905	$ 88.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.800
CC 1041149058	JONNY ALEJANDRO TORO CARMONA	01	00		X															0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 58.364	$ 9.400	(EPS010) EPS SURA	$ 58.364	$ 2.400	6,960	$ 58.364	$ 4.100	(CCF04) COMFAMA	$ 51.667	$ 2.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.000
CC 1041149058	JONNY ALEJANDRO TORO CARMONA	01	00	X																0	18	18	18	18	(231001) COLFONDOS	$ 583.636	$ 93.400	(EPS010) EPS SURA	$ 583.636	$ 23.400	6,960	$ 583.636	$ 40.700	(CCF04) COMFAMA	$ 516.667	$ 20.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.200
CC 1042086838	ELIAN ARBEY CANO SANCHEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.155.905	$ 345.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.155.905	$ 86.300	6,960	$ 2.155.905	$ 150.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.155.905	$ 86.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 667.700
CC 1040800467	OTONIEL FERNANDO MORENO GUTIERREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1063988819	MARIA LAURA OCHOA CATAÑO	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 80.000	$ 12.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 80.000	$ 3.200	6,960	$ 80.000	$ 5.600	(CCF04) COMFAMA	$ 80.000	$ 3.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.800
CC 1078367384	VICTOR ALFONSO VARGAS ROMERO #2	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.200.905	$ 352.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 1088617284	GERSON ANDRES MORENO NOVA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.800.000	$ 112.000	6,960	$ 2.800.000	$ 194.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 868.900
CC 1111452152	OSCAR FABIAN REPIZO LOZANO	01	00													X				0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS010) EPS SURA	$ 58.364	$ 2.400	0,000	$ 58.364	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 58.364	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.800
CC 1111452152	OSCAR FABIAN REPIZO LOZANO	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.682.542	$ 270.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.682.542	$ 67.300	6,960	$ 1.682.542	$ 117.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.682.542	$ 67.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 524.400
CC 1128417344	DIEGO JULIAN ARIAS HENAO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
CC 1130884808	ANGELICA MARIA REPIZO MORENO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
CC 1152446849	CATALINA PEREZ OCHOA	01	00																	0	30	30	30	30	(230801) PROTECCION	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.000.000	$ 160.000	6,522	$ 4.000.000	$ 26.000	(CCF04) COMFAMA	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 980.900
CC 1230468730	ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.000.000	$ 960.000	(EPS010) EPS SURA	$ 6.000.000	$ 240.000	6,960	$ 6.000.000	$ 417.600	(CCF04) COMFAMA	$ 6.000.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.857.600
CC 1234882386	SANTIAGO JOSE PINEDA PACHECO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 15402486	VICTOR MANUEL ESPINOSA TEJANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.573.514	$ 571.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.573.514	$ 143.000	6,960	$ 3.573.514	$ 248.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.573.514	$ 143.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.108.800
CC 15404136	JORGE IVAN VARELA LOPEZ	01	00														X			0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 641.999	$ 102.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 641.999	$ 25.700	6,000	$ 641.999	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 641.999	$ 25.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.200
CC 15404135	JORGE IVAN VARELA LOPEZ	01	00										X							0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 1.208.380	$ 193.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.208.380	$ 48.400	6,960	$ 1.208.380	$ 84.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.208.380	$ 48.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 374.400
CC 15404379	FERNANDO ANTONIO QUIRANGO CIRAI DO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230801) PROTECCION	$ 2.308.205	$ 369.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.308.205	$ 92.400	6,960	$ 2.308.205	$ 160.800	(CCF04) COMFAMA	$ 2.301.705	$ 92.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 715.100
CC 15408626	JOSE ANGEL HERNANDEZ QUISAO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.375	$ 288.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.800.375	$ 72.100	6,960	$ 1.800.375	$ 125.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.800.375	$ 72.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.700
CC 15407044	FRANK JOHANY AGUINAGA DURANGO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.687.958	$ 430.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 2.687.958	$ 107.600	6,960	$ 2.687.958	$ 187.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.687.958	$ 107.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 832.400

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 16/06/2026 | **Empresa NI901411511 GRUPO BAW SAS** | **Planilla Nro: 85582400** | **Periodo Cotización: mayo de 2026** | **Periodo Servicio: junio de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotiz.	Subtipo Cotiz.	IRO	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 15432800	HECTOR EMILIO ARIAS MARIN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF04) COMFAMA	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400
CC 15458419	IVAN DARIO PELAEZ ARREGUIRAU	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.800.000	$ 112.000	6,960	$ 2.800.000	$ 194.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 866.900
CC 15458851	RAFAEL ANTONIO PELAEZ ARREDONDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 70751512	FELIX ANTONIO CARDENAS LEMAO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 70751918	JAIRO DE JESUS FLOREZ RIVERA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 70755616	CARLOS ARTURO CARVAJAL MATEU	01	00		X															0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 833.816	$ 149.500	(EPS010) EPS SURA	$ 833.816	$ 37.400	0,522	$ 833.816	$ 4.800	(CCF04) COMFAMA	$ 833.816	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 229.800
CC 71421012	JOHN JAIRO HERRERA HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(CSSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 73240448	JOSE GREGORIO AGUAS SUAREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.516.526	$ 402.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.516.526	$ 100.700	6,960	$ 2.516.526	$ 175.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.516.526	$ 100.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 779.300
CC 80721118	GERMAN ANDRES ARIAS HENAO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.000.000	$ 120.000	0,522	$ 3.000.000	$ 15.700	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 735.700
CC 8174384	EMILIO GABRIEL GONZALEZ HERNANDEZ	01	06																	0	0	30	30	30	(INH-AFI) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.400
CC 85474189	LEONARDO JESUS VASQUEZ VIDALES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 91225688	EDUARDO CARON CHERRERO	01	04		X															0	0	30	30	30	(INH-AFI) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF04) COMFAMA	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 598.400
CC 98818882	WALDEMIRO ANTONIO HERNANDEZ LUNA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.053.488	$ 329.900	(CPO045) COOSALUD CONTRIBUTIVO	$ 2.053.488	$ 82.300	6,960	$ 2.053.488	$ 143.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.053.488	$ 82.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 636.800
PT 5383775	BENITO JOSE MATERAN MARIN	01	00		X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 56.364	$ 9.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 56.364	$ 2.400	6,960	$ 56.364	$ 4.100	(CCF04) COMFAMA	$ 56.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
PT 6407684	RICARDO ANTONIO LAGUNA MENDEZ	01	00	X																0	24	24	24	24	(230201) PROTECCION	$ 1.400.724	$ 224.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.400.724	$ 56.100	6,960	$ 1.400.724	$ 97.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.400.724	$ 56.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.800
PT 6585323	SERGIO JOSE BOLIVAR ROMERO	01	00															M		0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 56.364	$ 9.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 56.364	$ 2.400	0,522	$ 56.364	$ 300	(CCF04) COMFAMA	$ 56.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.200
PT 6585323	SERGIO JOSE BOLIVAR ROMERO	01	00																	0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 1.682.542	$ 270.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.682.542	$ 67.800	6,960	$ 1.682.542	$ 117.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.682.542	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 524.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 136.261.737	$ 142.012.642	$ 142.012.642	$ 141.713.162	$ 21.804.600	$ 5.683.500	$ 7.784.900	$ 5.589.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.862.300	$ 389.500	$ 41.251.800

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-21, 11:28:48 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 85543173

Periodo Cotización: abril de 2026 Periodo Servicio: mayo de 2026

PAGADO 11/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO BAW SAS	**Nombre Sucursal**	GRUPO BAW SAS	**Código Sucursal**	01
Documento	NI901411511	**Dirección**	CR 52 #49 - 44 LOCAL 202		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5311493		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	GUARNE	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BARRERA ARIAS ANDERSON STEVE	**Identificación**	CC 1220469730		
Total Afiliados	54	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	CDI	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ADC	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	LMAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000105325	OVIDIO ALEJANDRO COSSIO URREGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	0,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1000430689	ERICA TATIANA PARRA CADAVID	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1001158681	JUAN CARLOS GONZALEZ [illegible]	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1007104082	ANDRES VIRGILIO VALENZUELA CASTAÑEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1007242219	JHONATAN STIVEN JARAMILLO OLAYA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	0,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 1007293808	DANIEL CARDONA ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	0,522	$ 2.500.000	$ 113.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 613.100
CC 1007515623	JAIRO MANUEL DE LA ROSA POLO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 70.100	0,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1011580113	YEIBON STIVEN UBUGIA BECERRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	$ 1.750.905	$ 70.100	0,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1011581002	ANDRES USUGIA PULGARIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 70.100	0,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1018227938	DANILO LOPERA GIRON	01	00																	0	30	30	30	30	(23-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	0,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1022082157	JULIAN ALONSO CALVO (YODDY	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1022092367	JOSE MANUEL ANDULO CESPEDES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 70.100	0,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1022096787	JEISON AGUINAGA VELASQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	0,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1022097520	EVER MAURICIO SEPULVEDA BARRERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 70.100	0,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1022097707	MARIA CAMILA MEJIA BARRAZOLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	0,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1022100357	MARLON ALEJANDRO FLOREZ SERNA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.300.000	$ 92.000	0,960	$ 2.300.000	$ 160.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 712.100
CC 1030683613	VICTOR ANGELO VELASQUEZ PALOMINO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1035817668	LUIS EDUARDO OLIVO CARVAJAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	0,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1035818865	MARIA ISABELLA CERTUCHE CARAY	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.500.000	$ 140.000	0,522	$ 3.500.000	$ 158.300	(CCF04) COMFAMA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 858.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 11/05/2026 | **Empresa NI901411511 GRUPO BAW SAS** | **Planilla Nro: 85543173** | **Periodo Cotización: abril de 2026** | **Periodo Servicio: mayo de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET.P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	
CC 1035821083	SEBASTIAN TABA MARIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
CC 1035821884	CRISTIAN HERRERA OCHOA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 1036339888	LUIS MIGUEL ALVIRA MEDINA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PORVENIR	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 1036854826	YONY DE JESUS MARIN HENAO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	0,522	$ 3.000.000	$ 15.700	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 735.700
CC 1038862868	JUAN DAVID LOAIZA SERNA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1039[illegible]456	ANDRES FELIPE CALDERON MULANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	0,522	$ 3.000.000	$ 15.700	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 735.700
CC 1039682782	JHONATAN STIBENS CARDONA MARIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1041149058	JONNY ALEJANDRO TORO CARMONA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1042068839	ELIAN ARBEY CANO SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1048020467	OTONIEL FERNANDO MORENO QUINTANA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1085866510	MARIA LAURA OCHOA CATAÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.400.000	$ 384.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.400.000	$ 96.000	6,960	$ 2.400.000	$ 167.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 743.100
CC 1088817294	GERSON ANDRES MORENO HOYOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.800.000	$ 112.000	6,960	$ 2.800.000	$ 194.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 868.900
CC 1128417244	DIEGO JULIAN ARIAS HENAO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
CC 1136684586	ANGELICA MARIA REPATO MORENO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.555.555	$ 408.888	(EPS010) EPS SURA	$ 2.555.555	$ 102.222	0,522	$ 2.555.555	$ 13.400	(CCF04) COMFAMA	$ 2.555.555	$ 102.222	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 626.700
CC 1152448848	CATALINA PEREZ OCHOA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.000.000	$ 160.000	0,522	$ 4.000.000	$ 20.900	(CCF04) COMFAMA	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 980.900
CC 1220489730	ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.000.000	$ 960.000	(EPS010) EPS SURA	$ 6.000.000	$ 240.000	6,960	$ 6.000.000	$ 417.600	(CCF04) COMFAMA	$ 6.000.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.857.600
CC 1234882383	SANTIAGO JOSE PINEDA PACHECO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 13402496	VICTOR MANUEL ESPINOSA TELVIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 15404135	JORGE IVAN VARELA LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(ES39C24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 15404378	FERNANDO ANTONIO DURANGO DURANGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 15408626	JOSE ANGEL HERNANDEZ OUSSAD	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 15407811	FRANK JOHANY AGUINAGA DURANGO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(ES39C24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 15458412	IVAN DARIO PELAEZ ARREDONDO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.800.000	$ 112.000	6,960	$ 2.800.000	$ 194.900	(CCF04) COMFAMA	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 868.900
CC 15458851	RAFAEL ANTONIO PELAEZ ARREDONDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 70751512	FELIX ANTONIO CARDONA HENAO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 70751910	JAIRO DE JESUS FLOREZ RIVERA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 70755618	CARLOS ARTURO CARVAJAL MARIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.800
CC 71431913	JOHN JAIRO HERRERA HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(ES39C24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 73240448	JOSE GREGORIO ACUAS SUAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 80721118	GERMAN ANDRES ARIAS HENAO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.000.000	$ 120.000	0,522	$ 3.000.000	$ 15.700	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 735.700
CC 8174584	EMILIO GABRIEL GONZALEZ HERNANDEZ	01	04																	0	0	30	30	30	(NN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.400
CC 85474199	LEONARDO JESUS VASQUEZ VIDALES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 98618882	WALDEMIRO ANTONIO HERNANDEZ LUNA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
PT 5383775	BENITO JOSE MATERAN MADIM	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
PT 8585323	SERGIO JOSE BOLIVAR ROMERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Enlace Operativo – Líneas Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 114.526.960	$ 116.279.865	$ 116.279.865	$ 116.279.865	$ 18.326.400	$ 4.653.300	$ 8.260.100	$ 4.653.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.893.100	$ 121.900	$ 34.015.000

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-21, 11:25:18 AM | Tipo Planilla: K: PLANILLA ESTUDIANTES DECRETO 055 DE 2015 | Numéro Planilla: 85550094

Periodo Cotización: abril de 2026 | Periodo Servicio: mayo de 2026 | Referencia pago (PIN): 8909980437

PAGADO 11/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO BAW SAS	**Nombre Sucursal**	GRUPO BAW SAS	**Código Sucursal**	01
Documento	NI901411511	**Dirección**	CR 52 #49 - 44 LOCAL 202		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5311493		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	GUARNE	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BARRERA ARIAS ANDERSON STEVE	**Identificación**	CC 1220469730		
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1007493142	SARA ESCUDERO GALLEGO	23	00																0	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900	$ 500	$ 122.400

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-21, 11:30:24 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 85087941

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 06/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO BAW SAS	**Nombre Sucursal**	GRUPO BAW SAS	**Código Sucursal**	01
Documento	NI901411511	**Dirección**	CR 52 #49 - 44 LOCAL 202		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5311493		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	GUARNE	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BARRERA ARIAS ANDERSON STEVE	**Identificación**	CC 1220469730		
Total Afiliados	9	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRD	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días A.RP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1039820985	DEYSI JHAZMORA HERRERA ALCARAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1036855023	KARINA MARIA MARQUEZ OSPINA	01	00														X			0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 166.667	$ 26.700	(EPS010) EPS SURA	$ 166.667	$ 6.700	0,000	$ 166.667	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.100
CC 1036855023	KARINA MARIA MARQUEZ OSPINA	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 2.333.334	$ 373.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.333.334	$ 93.400	0,522	$ 2.333.334	$ 12.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.333.334	$ 93.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 572.400
CC 1085008984	ALDAIR BRU GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.000.000	$ 800.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.000.000	$ 200.000	6,960	$ 5.000.000	$ 348.000	(CCF04) COMFAMA	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.548.000
CC 1067840454	HUMBERTO JAIME PEINADO GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1090467332	CAMILO ESTEBAN LEAL VERA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF04) COMFAMA	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400
CC 1094245386	DAVIDSON ARLEY LEAL MENDOZA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 6325639	ERLEY HERNANDEZ DOMINGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 78018653	MARIANO ENRIQUE JESUS REVUELTAS AROUMEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.200.000	$ 88.000	0,522	$ 2.200.000	$ 11.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 539.500
PT 5048012	LEONARDO CISNEROS PEÑA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 24.452.716	$ 24.452.716	$ 24.452.716	$ 24.452.716	$ 3.912.700	$ 978.400	$ 1.398.600	$ 978.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	/ $ 0	$ 7.268.100	$ 0	$ 7.268.100

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-21, 11:27:58 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 85419995

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8900597116

PAGADO 11/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO BAW SAS	**Nombre Sucursal**	GRUPO BAW SAS	**Código Sucursal**	01
Documento	NI901411511	**Dirección**	CR 52 #49 - 44 LOCAL 202		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5311493		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	GUARNE	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BARRERA ARIAS ANDERSON STEVE	**Identificación**	CC 1220469730		
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1023000541	YIMI ALEJANDRO GARCES BENITEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 70.100	$ 121.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300	$ 2.200	$ 544.500

Enlace Operativo – Líneas Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (608) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

aportes en línea

Planill[illegible]esumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901850935	6	ELECTRICOS Y ASOCIADOS DEL ORIENTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	VEREDA SAN JOSE	GUARNE-ANTIOQUIA	2728628	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	300128244	9504591990	E	2026/05/11	2026/05/11	BANCOLOMBIA	0	$2,995,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	71224505	ARISMENDY FREDY																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
2	CC	1040872391	CARDONA ALEX																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
3	CC	1001415551	IRAL WILFER																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
4	CC	1035916096	IRAL YEIFER																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
5	CC	1193093480	MEJIA JUAN																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
6	CC	70696859	OCAMPO LUIS																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
7	CC	1001416042	ZAPATA DAVID		X																230301	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF04	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$58,364	$2,600	1	$0	$0	SI	$16,300
Total	Afiliados(7)																						$10,563,794	$1,690,600			$10,563,794	$423,000			$10,552,880	$422,500			$10,563,794	$459,800		$0	$0		$2,995,900

aportes en línea

Planill[illegible]esumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901850935	6	ELECTRICOS Y ASOCIADOS DEL ORIENTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	VEREDA SAN JOSE	GUARNE-ANTIOQUIA	2728628	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	300128244	9504591990	E	2026/05/11	2026/05/11	BANCOLOMBIA	0	$2,995,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,690,600	$0	$0	$1,690,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$560,400	$0	$0	$560,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$569,800	$0	$0	$569,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,400	$0	$0	$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$459,800	$0	$0	$459,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$459,800	$0	$0	$459,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$422,500	$0	$0	$422,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	7	$422,500	$0	$0	$422,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$423,000	$0	$0	$423,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$282,800	$0	$0	$282,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	$140,200	$0	$0	$140,200
TOTAL				7	$2,995,900	$0	$0	$2,995,900

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-21, 03:56:56 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 85467942

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 21/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CADBIM SAS	**Nombre Sucursal**	CADBIM SAS	**Código Sucursal**	01
Documento	NI901958780	**Dirección**	CR 52 #49 - 44		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5514211		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	GUARNE	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	BRU GARCIA ALDAIR	**Identificación**	CC 1065008994		
Total Afiliados	20	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRD	RET	INT P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CDN	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1004007998	LEONARDO ANDRES DELGADO GARCIA	01	00	A															0	0	0	0	0	(230301) PORVENIR	$ 525.272	$ 84.100	(EPS010) EPS SURA	$ 525.272	$ 21.100	0,980	$ 525.272	$ 36.600	(CCF04) COMFAMA	$ 525.272	$ 21.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.900
CC 1003405835	LUIS ANGEL SALGADO HERNANDEZ	01	00	X															0	0	0	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 525.272	$ 84.100	(ESSC67) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 525.272	$ 21.100	0,980	$ 525.272	$ 36.600	(CCF04) COMFAMA	$ 525.272	$ 21.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.900
CC 1002737603	LUIS MIGUEL RUBIANO AMAYA	01	00	A															0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 933.816	$ 149.500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 933.816	$ 37.400	0,980	$ 933.816	$ 65.000	(CCF04) COMFAMA	$ 933.816	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.300
CC 1035914370	ANDERSON DANILO SALDARRIAGA OROZ	01	00		X														0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS010) EPS SURA	$ 58.364	$ 2.400	0,980	$ 58.364	$ 4.100	(CCF04) COMFAMA	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
CC 1063361174	ERNESTO LEON PEÑA FLOREZ	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,980	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1067091979	JOSE LUIS MESTRA PEREIRA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,980	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1067883414	LUIS MIGUEL ALVAREZ DIN	01	00	X															0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 1.225.634	$ 196.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.225.634	$ 49.100	0,980	$ 1.225.634	$ 85.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.225.634	$ 49.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 379.800
CC 1067885867	PEDRO LUIS DOMINGUEZ ROMERO	01	00	X															0	21	21	21	21	(231001) COLFONDOS	$ 1.225.634	$ 196.200	(ESSC67) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.225.634	$ 49.100	0,980	$ 1.225.634	$ 85.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.225.634	$ 49.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 379.800
CC 1067903513	GUSTAVO ADOLFO MEJIA PEÑA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS046) EPS MUTUAL SER	$ 1.750.905	$ 70.100	0,980	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1076367264	VICTOR ALFONSO VARGAS RODRIGUEZ	01	00		X														0	17	17	17	17	(25-14) COLPENSIONES	$ 992.181	$ 158.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 992.181	$ 39.700	0,980	$ 992.181	$ 69.100	(CCF04) COMFAMA	$ 992.181	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 307.300
[illegible]	STEVEN MANUEL [illegible] MARTINEZ	01	00	A															0	14	14	14	14	(25-14) COLPENSIONES	$ 817.089	$ 130.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 817.089	$ 32.700	0,980	$ 817.089	$ 56.900	(CCF04) COMFAMA	$ 817.089	$ 32.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.100
CC 1140837804	JANCARLO ANDRES GOMEZ MENDOZA	01	00	X	X														0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.364	$ 9.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 58.364	$ 2.400	0,980	$ 58.364	$ 4.100	(CCF04) COMFAMA	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
CC 1143446329	CAI FR MENES HERNANDEZ BERRIO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58.364	$ 9.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 58.364	$ 2.400	0,980	$ 58.364	$ 4.100	(CCF04) COMFAMA	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
CC 1237444299	EDGAR ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS046) SAVIA SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	0,980	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 7191[illegible]	[illegible] ROBERTO JARAMILLO MIRA	01	03	X															0	0	24	24	24	(MIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.400.724	$ 56.100	0,980	$ 1.400.724	$ 97.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.400.724	$ 56.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 209.700
CC 79825041	CARLOS JULIO GALLEGO SANCHEZ	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,980	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 8132[illegible]	[illegible] FABIAN VANEGAS TABORDA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,980	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
PT 6372903	HENYERBERT JESUS SILVA SILVA	01	00	X	X														0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 58.364	$ 9.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 58.364	$ 2.400	0,980	$ 58.364	$ 4.100	(CCF04) COMFAMA	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
PT 7201[illegible]	JONATHAN SANTIAGO VILLALOBOS GONZALEZ	01	00		X														0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 350.181	$ 56.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 350.181	$ 14.100	0,980	$ 350.181	$ 24.400	(CCF04) COMFAMA	$ 350.181	$ 14.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.700

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 21/05/2026 | Empresa NI901958780 CADBIM SAS | Planilla Nro: 85467942 | Periodo Cotización: abril de 2026 | Periodo Servicio: mayo de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	IRET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
PT 825526	ROBINSON JESUS SALAS AULAR	01	00	X																	0	24	24	24	(230201) PROTECCION	$ 1.400.724	$ 224.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.400.724	$ 56.100	6,960	$ 1.400.724	$ 97.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.400.724	$ 56.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.900

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 18.734.690	$ 20.135.414	$ 20.135.414	$ 20.135.414	$ 2.998.800	$ 806.700	$ 1.402.200	$ 806.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.014.400	$ 0	$ 6.014.400

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-19, 11:45:58 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 1082140470

Periodo Cotización: abril de 2026 Periodo Servicio: mayo de 2026

PAGADO 19/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EMPRESAS GRUPO APOLO SAS	**Nombre Sucursal**	COMERCIALES	**Código Sucursal**	002
Documento	NI901791669	**Dirección**	CL 65 SUR #42 B - 14 INT 909		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6045112345		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	SABANETA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SIERRA ARGUELLES ASTRID MILENA	**Identificación**	CC 43454790		
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	IGE	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRT	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1007316085	PEDRO ALUNSO MARIN RUEDA	01	00	X																	0	7	7	7	(23I001) COLFONDOS	$ 408.545	$ 63.400	(ESSC34) EPS-S COOSALUD	$ 408.545	$ 16.400	6,960	$ 408.545	$ 28.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 408.545	$ 16.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.700
CC 1036668184	JOHN FREDY ZAPATA GOMEZ	01	00	X																	0	7	7	7	(23O301) PORVENIR	$ 408.545	$ 63.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 408.545	$ 16.400	6,960	$ 408.545	$ 28.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 408.545	$ 16.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.700
CC 71256250	JOHN EDISON VILLADA TOBON	01	00	X																	0	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 408.545	$ 63.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 408.545	$ 16.400	6,960	$ 408.545	$ 28.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 408.545	$ 16.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.700
PT 2935886	JESUS DAVID ARTEAGA GOMEZ	01	00	X																	0	0	10	10	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 583.636	$ 23.400	6,960	$ 583.636	$ 40.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 583.636	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.500
PT 6850501	JOSE LUIS HERRERA VARGAS	01	00	X																	0	16	16	16	(23O201) PROTECCION	$ 933.818	$ 149.500	(EPS040) ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	$ 933.818	$ 37.400	6,960	$ 933.818	$ 65.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 933.818	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.300
PT 7186363	FRANCISCO JAVIER MONTILLA CORTEZ	01	00	X																	0	0	16	16	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS008) SALUD TOTAL EPS	$ 933.818	$ 37.400	6,960	$ 933.818	$ 66.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 933.818	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.159.451	$ 3.676.902	$ 3.676.902	$ 3.676.902	$ 345.700	$ 147.400	$ 256.200	$ 147.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 896.700	$ 0	$ 896.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO 2 – BITACORA SST

En este se consignan parte de las actividades realizadas durante el periodo.

	BAW	Versión: 01 Código: XXXXXX

Formato Bitácora seguimiento

CONTRATO N°	**COP-079-DE 2025**		
OBRA	**CONSTRUCCION SEDE EMEGA**		
Nombre de la empresa	**NIT**	**BITACORA N°**	**Período**
GRUPO BAW S.A.S	901.411.511	08	

Nombre del jefe inmediato/ Coordinador SST	**Teléfono de contacto**	**Correo electrónico**
Angelica Repizo Moreno	318 657 4349	info@baw.com.co
Gerson Andres Moreno Nova	318 368 2619	sst@baw.com.co

Seleccione con una "X" el tipo de modalidad

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO		**PASANTÍA**		**VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL**	**X**

Nombre del colaborador	**Documento Id.**	**Teléfono de contacto**	**Correo electrónico institucional**
Deysi Jhazindra Herrera Alcaraz	1035920695	3145396230	sst@baw.com.co

PROFESIÓN	**CARGO**
TECNOLOGA EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL	AUXILIAR SST

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD *(Ingrese cuantas filas sean necesarias)*	**FECHA INICIO**	**FECHA FIN**	**EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES, INASISTENCIAS**
Realizacion de pausas activas(Calistenia y Estiramiento)	4/05/2026	8/05/2026		Actividad realizada sin novedad
Entrega de Elementos de Proteccion Personal	4/05/2026	8/05/2026	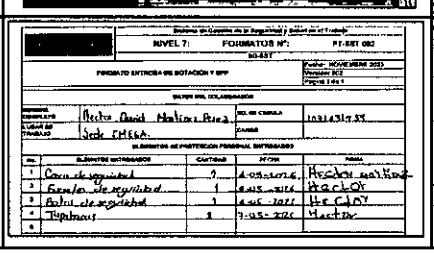	Actividad realizada sin novedad

se realiza inspeccion y preoperacionales verificando que las herramientas se encuentre en optimas condiciones para su manipulacion.	4/05/2026	8/05/2026		Actividad realizada sin novedad
Se realiza recorrido por obra identificando condiciones de seguridad que puedan generar accidentes y verificando el uso adecuado de los Elementos de Proteccion Personal	4/05/2026	8/05/2026	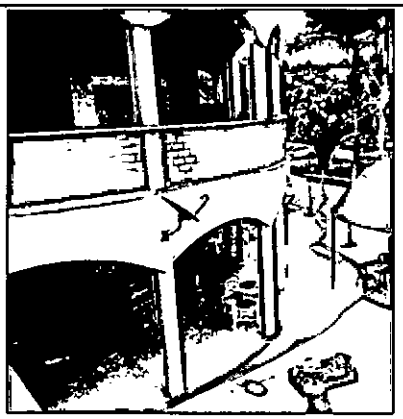	se desarrollan actividades de excavacion para caja. Actividad desarrollada sin novedad
se realiza induccion a los colaboradores que ingresan.	4/05/2026	8/05/2026	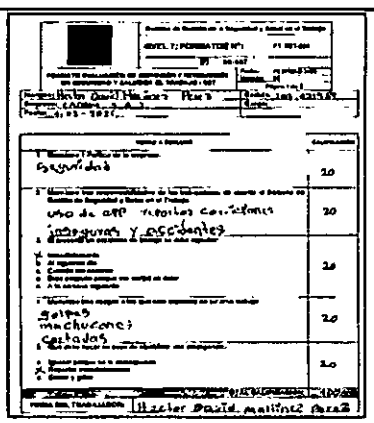	Actividad desarrollada sin novedad
Demarcación de zonas y cerramiento de zonas de trabao.	4/05/2026	8/05/2026		Actividad desarrollada sin novedad

BAW		Versión: 01
		Código: XXXXXX

Formato Bitácora seguimiento

CONTRATO N°	**N.A.**
OBRA	**CONSTRUCCION SEDE EMEGA**

Nombre de la empresa	**NIT**	**BITACORA N°**	**Período**
GRUPO BAW S.A.S	901.411.511	08	

Nombre del Jefe Inmediato/ Coordinador SST	**Teléfono de contacto**	**Correo electrónico**
Angelica Repizo Moreno	318 657 4349	info@baw.com.co
Gerson Andres Moreno Nova	318 368 2619	sst@baw.com.co

Seleccione con una "X" el tipo de modalidad

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO		**PASANTÍA**		**VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL**	**X**

Nombre del contratista	**Documento Id.**	**Teléfono de contacto**	**Correo electrónico institucional**
Deysi Jhazindra Herrera Alcaraz	1035920695	3145396230	sst@baw.com.co

PROFESIÓN	**CARGO**
TECNOLOGA EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL	AUXILIAR SST

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD *(Ingrese cuantas filas sean necesarias)*	**FECHA INICIO**	**FECHA FIN**	**EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES, INASISTENCIAS**
Realizacion de pausas activas(Calistenia y Estiramiento)	11/05/2026	15/05/2026	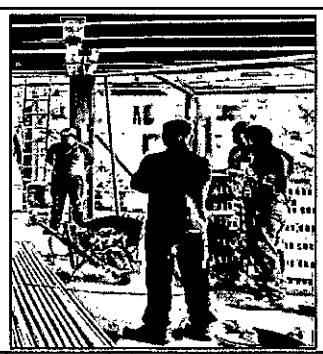	Actividad realizada sin novedad

Verificacion de aseo en obra	11/05/2026	15/05/2026		Actividad realizada sin novedad
se realiza inspeccion y preoperacionales verificando que las herramientas se encuentre en optimas condiciones para su manipulacion.	11/05/2026	15/05/2026	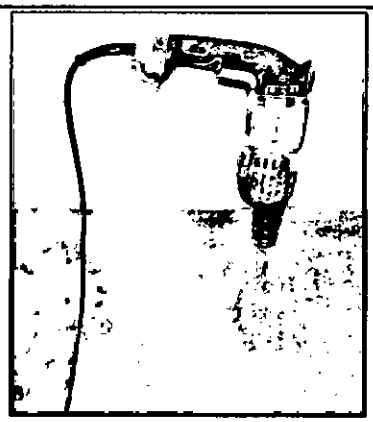	Actividad realizada sin novedad
Se realiza recorrido por obra identificando condiciones de seguridad que puedan generar accidentes y verificando el uso adecuado de los Elementos de Proteccion Personal	11/05/2026	15/05/2026		se desarrollan actividades de excavacion para caja. Actividad desarrollada sin novedad
Cerramiento de zonas de trabajo para garantizar la seguridad de personas externas por caida de objetos.	11/05/2026	15/05/2026		Actividad desarrollada sin novedad

BAW		Versión: 01
		Código: XXXXXX

Formato Bitácora seguimiento

CONTRATO N°	**N.A.**
OBRA	**CONSTRUCCION SEDE EMEGA**

Nombre de la empresa	**NIT**	**BITACORA N°**	**Período**
GRUPO BAW S.A.S	901.411.511	08	

Nombre del jefe inmediato/ Coordinador SST	**Teléfono de contacto**	**Correo electrónico**
Angelica Repizo Moreno	318 657 4349	info@baw.com.co
Gerson Andres Moreno Nova	318 368 2619	sst@baw.com.co

Seleccione con una "X" el tipo de modalidad

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO		**PASANTÍA**		**VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL**	**X**

Nombre del contratista	**Documento Id.**	**Teléfono de contacto**	**Correo electrónico institucional**
Deysi Jhazindra Herrera Alcaraz	1035920695	3145396230	sst@baw.com.co

PROFESIÓN	**CARGO**
TECNOLOGA EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL	AUXILIAR SST

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD *(Ingrese cuantas filas sean necesarias)*	**FECHA INICIO**	**FECHA FIN**	**EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES, INASISTENCIAS**
Realizacion de pausas activas(Calistenia y Estiramiento)	20/05/2026	22/05/2026	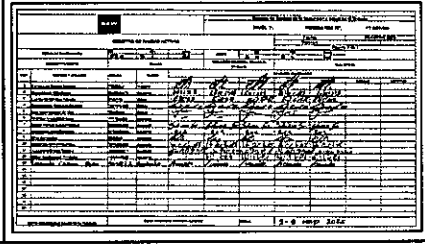	Actividad realizada sin novedad

Inspección de bptiquin	20/05/2026	20/05/2026		Actividad realizada sin novedad
Verificacion de aseo en obra	20/05/2026	22/05/2026		Actividad realizada sin novedad
se realiza inspeccion y preoperacionales verificando que las herramientas se encuentre en optimas condiciones para su manipulacion.	20/05/2026	22/05/2026		Actividad realizada sin novedad

	BAW	Versión: 01
		Código: XXXXXX

Formato Bitácora seguimiento

CONTRATO N°	**N.A.**
OBRA	**CONSTRUCCION SEDE EMEGA**

Nombre de la empresa	**NIT**	**BITACORA N°**	**Período**
GRUPO BAW S.A.S	901.411.511	08	

Nombre del jefe inmediato/ Coordinador SST	**Teléfono de contacto**	**Correo electrónico**
Angelica Repizo Moreno	318 657 4349	info@baw.com.co
Gerson Andres Moreno Nova	318 368 2619	sst@baw.com.co

Seleccione con una "X" el tipo de modalidad

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO		**PASANTÍA**		**VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL**	**X**

Nombre del contratista	**Documento Id.**	**Teléfono de contacto**	**Correo electrónico institucional**
Deysi Jhazindra Herrera Alcaraz	1035920695	3145396230	sst@baw.com.co

PROFESIÓN	**CARGO**
TECNOLOGA EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL	AUXILIAR SST

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD *(Ingrese cuantas filas sean necesarias)*	**FECHA INICIO**	**FECHA FIN**	**EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES, INASISTENCIAS**
Realizacion de pausas activas(Calistenia y Estiramiento)	25/29/2026	29/05/2026		Actividad realizada sin novedad

Verificacion de aseo en obra	25/29/2026	29/05/2026		Actividad realizada sin novedad
se realiza inspeccion y preoperacionales verificando que las herramientas se encuentre en optimas condiciones para su manipulacion.	25/29/2026	29/05/2026		Actividad realizada sin novedad
Se realiza recorrido por obra identificando condiciones de seguridad que puedan generar accidentes y verificando el uso adecuado de los Elementos de Proteccion Personal	25/29/2026	29/05/2026		Actividad realizada sin novedad
	25/29/2026	29/05/2026		Actividad desarrollada sin novedad

ANEXO 3 – GRUPOS DE APOYO

Muestra las actas de reunión del COPASST y el Comité de Convivencia Laboral del periodo.

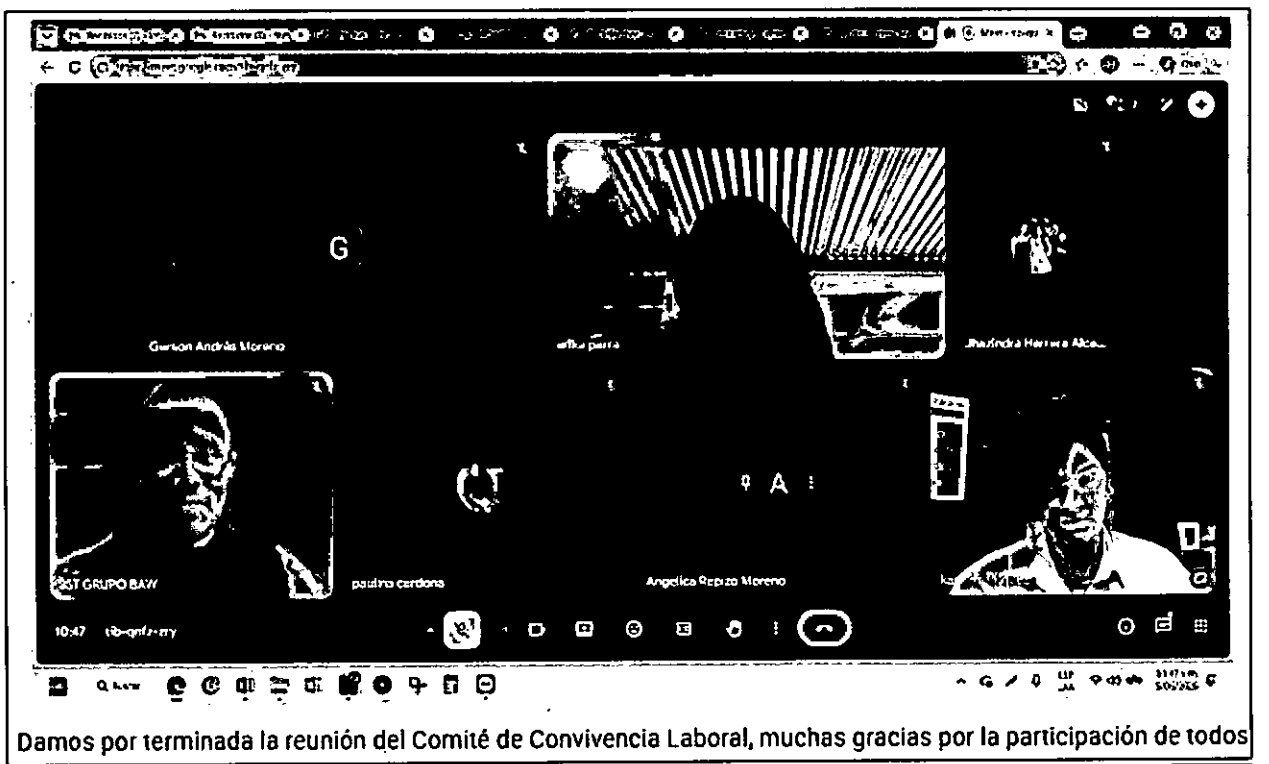

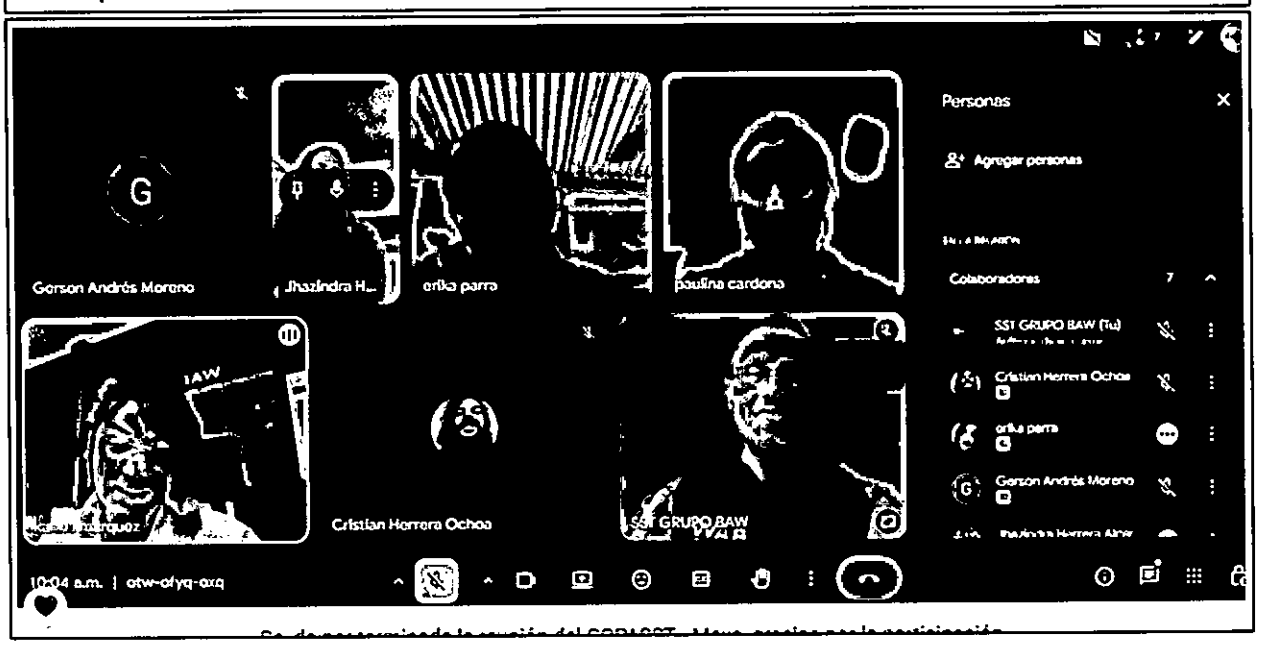

ANEXO 4 – CAPACITACIONES

Se muestra una de las charlas brindadas en materia de SST, así mismo, se muestran las inducciones realizas al personal que ingresa al proyecto.

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027	
	SG-SST	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha:	Febrero 2025
	Versión:	001
		Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Guame	EMEGA	8	5	26.

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción	X	Dar a conocer aspectos SST.
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Documento	Cargo	Firma
1	Jaime Alberto Castro G.	79214976	Ayudante E	[signature]
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Deysi Jhazindra Herrera A.	[signature]

[redacted]	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°: FT-SST-026	
	☑ SG-SST	
FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	Fecha: FEBRERO 2025 Versión: 01 Página 1 de 1	

Nombre: Elvis Padilla.	**Cedula:** 1067970518
Empresa: CADAM S.A.S.	**Cargo:** Oficial.
Fecha:	

TEMAS A EVALUAR	CALIFICACIÓN
1. Mencione 1 Política de la empresa: Alcol y drogas	20
2. Mencione tres responsabilidades de los trabajadores en cuanto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Reportar emergencias	20
3. Si presenta un accidente de trabajo se debe reportar: X a. Inmediatamente b. Al siguiente día c. Cuando me acuerde d. Días después porque me surgió un dolor e. A la semana siguiente	20
4. Mencione tres riesgos a los que está expuesto en su área trabajo: caída de objetos, cortes y machucones	20
5. Qué debe hacer en caso de identificar una emergencia: a. Ignorar porque no le corresponde X b. Reportar inmediatamente c. Correr y gritar	20
TOTAL CALIFICACIÓN:	100
FIRMA DEL TRABAJADOR: Elvis	

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
	NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Febrero 2025
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Guarne	Sede EMEGA	5	5	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción	X	Dar a conocer los aspectos generales SST al personal
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Documento	Cargo	Firma
1	Wilter Yair Gonzales F.	1066568089	Operad.	Wilter
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Deysi Jhanneth Herrera	

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
[redacted]	NIVEL 7: FORMATOS N°: FT-SST-026	
	☑ SG-SST	
FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	Fecha: FEBRERO 2025	
	Versión: 01	
	Página 1 de 1	

Nombre: Hector David Martinez Perez	Cedula: 1071431959
Empresa: CADBIM S.A.S.	Cargo:
Fecha: 4-05-2026.	

TEMAS A EVALUAR	CALIFICACIÓN
1. Mencione 1 Política de la empresa: Seguridad	20
2. Mencione tres responsabilidades de los trabajadores en cuanto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Uso de app reportar condiciones inseguras y accidentes	20
3. Si presenta un accidente de trabajo se debe reportar: X a. Inmediatamente b. Al siguiente día c. Cuando me acuerde d. Días después porque me surgió un dolor e. A la semana siguiente	20
4. Mencione tres riesgos a los que está expuesto en su área trabajo: golpes machucones cortadas	20
5. Qué debe hacer en caso de identificar una emergencia: a. Ignorar porque no le corresponde X b. Reportar inmediatamente c. Correr y gritar	20
TOTAL CALIFICACIÓN	100
FIRMA DEL TRABAJADOR:	Hector David martinez perez

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°: FT-SST-026	
	☑ SG-SST	
FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	Fecha: FEBRERO 2025 Versión: 01 Página 1 de 1	

Nombre: Jaime Alberto Castro Gallego	Cedula: 79214976.
Empresa: CAODIM S.A.S.	Cargo: Ayudante E.
Fecha: 8-05-2026.	

TEMAS A EVALUAR	CALIFICACIÓN
1. Mencione 1 Política de la empresa: Seguridad y Salud en el Trabajo	20
2. Mencione tres responsabilidades de los trabajadores en cuanto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Reportar condiciones de Salud, Riesgos Accidentes	20
3. Si presenta un accidente de trabajo se debe reportar: X a. Inmediatamente b. Al siguiente día c. Cuando me acuerde d. Días después porque me surgió un dolor e. A la semana siguiente	20 2
4. Mencione tres riesgos a los que está expuesto en su área trabajo: Tropiezos cortes Electricidad	20
5. Qué debe hacer en caso de identificar una emergencia: a. Ignorar porque no le corresponde X b. Reportar inmediatamente c. Correr y gritar	20
TOTAL CALIFICACIÓN:	100.
FIRMA DEL TRABAJADOR: Jaime Castro G.	

BAW	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°: FT-SST-026	
	☑ SG-SST	
FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	Fecha: FEBRERO 2025	
	Versión: 01	
	Página 1 de 2	

Nombre: Wilter Yair Conales Fernandez	**Cedula:** 1066568089.
Empresa: CADBIM S.A.S	**Cargo:**
Fecha: 5-05-2026.	

TEMAS A EVALUAR	CALIFICACIÓN
1. Mencione 1 Política de la empresa: Seguridad y Salud en el trabajo	20
2. Mencione tres responsabilidades de los trabajadores en cuanto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Reporte de riesgos Usar EPP Reporte de accidentes	20
3. Si presenta un accidente de trabajo se debe reportar: X a. Inmediatamente b. Al siguiente día c. Cuando me acuerde d. Días después porque me surgió un dolor e. A la semana siguiente	20
4. Mencione tres riesgos a los que está expuesto en su área trabajo: Corte superficial Machucones golpes	20
5. Qué debe hacer en caso de identificar una emergencia: a. Ignorar porque no le corresponde X b. Reportar inmediatamente c. Correr y gritar	20
TOTAL CALIFICACIÓN:	100.
FIRMA DEL TRABAJADOR:	Wilter Conales

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
[redacted]	NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Febrero 2025
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Cesar	Emega			

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción	X	Dar a conocer los aspectos SST.
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Documento	Cargo	Firma
1	Elvis Padilla.	07	Opical.	Elvis
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre Daysi Jhanindra Herrera Mendoza	Firma

	Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo
[redacted]	NIVEL 7: FORMATOS: FT-SST-027
	SG-SST
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Febrero 2025
	Versión: 001
	Pagina 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Guarne	Sede EMEGA	4	05	2026

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción	X	Dar a conocer los aspectos generales en materia SST a los colaboradores y contratistas.
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No.	Nombre del Trabajador	Documento	Cargo	Firma
1	Hector David Martinez	1031143857	Ayudante	Hector
2	Juan David OrtegaT	1068666417	Ayudante	Juan David
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad	
Nombre: Oksi Jhazinda Herrera Alcaraz	Firma

ANEXO 5 – PERMISOS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURA Y PREOPERACIONALES

Se muestran los permisos emitidos el subcontratista CADBIM, quién actualmente es el único con colaboradores que realizan actividades en alturas.

CADBIM S.A.S	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TIPO: F FECHA: 30/12/2024 VERSIÓN: 2
	NIVEL 7: FORMATOS N°: FT-SST-000	

PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS R 4272/2021

FECHA DE EXPEDICIÓN	DÍA: 4	MES: 05	AÑO: 2026	HORA: 7:00 am
VALIDO HASTA	DÍA: 4	MES: 05	AÑO: 2026	HORA: 4:30 pm
CIUDAD	Guarne - Antioquia			

N°	NOMBRE DE LOS TRABAJADORES
1	Carlos Julio Gallego Sanchez
2	Ernesto Leon Peña Florez
3	
4	
5	
6	
7	

NOMBRE DE LA EMPRESA

CADBIM S.A.S

ESPECIFICACIÓN DEL TRABAJO

SITIO DONDE SE REALIZARÁ EL TRABAJO: Sede EMEGA

EL TRABAJO A REALIZAR ES RUTINARIO? SI [X] NO [ ]

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO A REALIZAR: Izaje de materiales con pluma y adecuaciones de mampostería a borde de losa.

ALTURA APROXIMADA A REALIZAR EL TRABAJO: 15 m.

REALIZACIÓN DEL TRABAJO

ENTRENAMIENTO Y ESTADO DE SALUD	TRABAJADOR 1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO
Las personas que realizan el trabajo cuentan con la seguridad social vigente?	X		X		-	-	-	-
Las personas que realizaran el trabajo se encuentra en condiciones aptas de salud para realizar el trabajo.	X	X	X	X	-	-	-	-
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		X		X	-	-	-	-
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		X		X	-	-	-	-
Sufre de miedo a las alturas (acrofobia)?		X		X	-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo están capacitadas (certificadas) para la realización de trabajo en alturas?	X		X		-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo saben como realizar la actividad asignada?	X		X		-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo saben que hacer en caso de accidente o incidente?	X		X		-	-	-	-

INSPECCION DEL AREA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	TRABAJADOR 1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO
Dispone de todas las herramientas y equipos necesarias para la realización del trabajo,	X		X		-	-	-	-
Se están utilizando todos los elementos de protección personal certificados?	X		X		-	-	-	-
Se inspeccionaron todos los elementos de protección personal antes de ser usados?	X		X		-	-	-	-
Las condiciones atmosféricas (lluvia, tormenta eléctrica, vientos fuertes) permiten realizar este trabajo?	X		X		-	-	-	-
Se tiene definido ,los posibles puntos de anclaje o líneas de vida para asegurarse, que cumplan 5000lb por cada trabajador?	X		X		-	-	-	-
Se demarco el área de trabajo (mínimo 1.5 alrededor) con cintas, avisos, conos u otros elementos para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas?		X		X	-	-	-	-
Se tiene una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados?	X		X		-	-	-	-

Se requiere de permisos adicionales?			
	Trabajo en espacios confinados	SI [ ]	NO [X]
	Trabajo en caliente	SI [ ]	NO [X]
	Trabajos eléctricos	SI [ ]	NO [X]

HERRAMIENTAS A UTILIZAR	
Varias.	

SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDAS
(marque con una X que sistemas de prevención utilizará y describa el tipo y sus características)

X	Dispositivo de anclaje (Punto de anclaje, tie off, etc. Por trabajador):	
X	Línea de vida:	
X	Eslinga:	
	Arnés multipropósito:	
X	Casco de seguridad con barbuquejo	
X	Señalización	
	Otro:	
	Otro:	

EQUIPOS - SISTEMA DE ACCESO A UTILIZAR (marque con una X y describa el equipo)

X	Escalera	X	Andamio		Elevador		Cuerda

DESCRIPCIÓN: Escalera metálica y Andamios certificados.

SISTEMA DE RESTRICCIÓN CONTRA CAÍDAS
(marque con una X que el tipo de eslinga que utilizará)

X	Eslinga en Y con absorbedor	X	Eslinga en Y sin absorbedor
X	Eslinga sencilla con absorbedor	X	Eslinga sencilla sin absorbedor

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO CONTRA CAÍDAS
(marque con una X que el tipo de eslinga que utilizará)

	Eslinga de posicionamiento	X	No requiere

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INDIVIDUAL (Marque con una X los EPI a usar)

X	Botas de seguridad con puntera	X	Guantes de caucho		Mascarilla desechable	OTROS:	
		X	Guantes de vaqueta		Protector auditivo desechable	X	
X	Gafas de seguridad transparentes	X	Guantes de hilaza recubiertos en látex			X	
					Pava para el sol		
X	Gafas de seguridad oscuras		Guantes de hilaza recubiertos en poliuretano		Protector auditivo tipo copa		

OBSERVACIONES:

PERSONAS AUTORIZADAS PARA TRABAJAR EN ALTURAS

N°	NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	FIRMA
1	Carlos Julio Gallego Sanchez	C.C	79825041	
2	Ernesto Leon Peña Florez	C.C	1063361174	
3				
4				
5				
6				
7				

PERSONA QUE AUTORIZA EL TRABAJO EN ALTURAS

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:
Cristian Herrera	1035921884	Residente Civil	

PERSONA RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:
Ernesto Leon Peña Florez	1063361174	Oficial	

COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:
Carlos Julio Gallego Sanchez	79825041	Maestro	

AYUDANTE DE SEGURIDAD (SI APLICA)

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:

CADBIM S.A.S	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TIPO: F FECHA: 30/12/2024 VERSIÓN: 2
	NIVEL 7: FORMATOS N°: FT-SST-000	

PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS R 4272/2021

FECHA DE EXPEDICIÓN	DÍA: 5	MES: 05	AÑO: 2026	HORA: 7:00 am
VÁLIDO HASTA	DÍA: 5	MES: 05	AÑO: 2026	HORA: 4:30 pm
CIUDAD	Guarne - Antioquia			

N°	NOMBRE DE LOS TRABAJADORES
1	Carlos Julio Gallego Sanchez
2	Ernesto Leon Peña Florez
3	
4	
5	
6	
7	

NOMBRE DE LA EMPRESA

CADBIM S.A.S

ESPECIFICACIÓN DEL TRABAJO

SITIO DONDE SE REALIZARÁ EL TRABAJO: Sede EMEGA

EL TRABAJO A REALIZAR ES RUTINARIO? SI [ ] NO [ ]

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO A REALIZAR: Izaje de materiales con pluma y adecuaciones de mampostería a borde de losa.

ALTURA APROXIMADA A REALIZAR EL TRABAJO: 15 m.

REALIZACIÓN DEL TRABAJO

ENTRENAMIENTO Y ESTADO DE SALUD	TRABAJADOR 1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO
Las personas que realizan el trabajo cuentan con la seguridad social vigente?	X		X		-	-	-	-
Las personas que realizaran el trabajo se encuentra en condiciones aptas de salud para realizar el trabajo.	X		X		-	-	-	-
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		X		X	-	-	-	-
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		X		X	-	-	-	-
Sufre de miedo a las alturas (acrofobia)?		X		X	-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo están capacitadas (certificadas) para la realización de trabajo en alturas?	X		X		-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo saben como realizar la actividad asignada?	X		X		-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo saben que hacer en caso de accidente o incidente?	X		X		-	-	-	-

INSPECCION DEL AREA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	TRABAJADOR 1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO
Dispone de todas las herramientas y equipos necesarias para la realización del trabajo.	X		X		-	-	-	-
Se están utilizando todos los elementos de protección personal certificados?	X		X		-	-	-	-
Se inspeccionaron todos los elementos de protección personal antes de ser usados?	X		X		-	-	-	-
Las condiciones atmosféricas (lluvia, tormenta eléctrica, vientos fuertes) permiten realizar este trabajo?	X		X		-	-	-	-
Se tiene definido ,los posibles puntos de anclaje o líneas de vida para asegurarse, que cumplan 5000lb por cada trabajador?	X		X		-	-	-	-
Se demarco el área de trabajo (mínimo 1.5 alrededor) con cintas, avisos, conos u otros elementos para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas?		X		X	-	-	-	-
Se tiene una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados?	X		X		-	-	-	-

Se requiere de permisos adicionales?					
	Trabajo en espacios confinados	SI [ ]	NO [X]
	Trabajo en caliente	SI [ ]	NO [X]
	Trabajos eléctricos	SI [ ]	NO [X]

HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Varias.

SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDAS

(marque con una X que sistemas de prevención utilizará y describa el tipo y sus características)

X	Dispositivo de anclaje (Punto de anclaje, tie off, etc. Por trabajador):
X	Línea de vida:
X	Eslinga:
X	Arnés multipropósito:
X	Casco de seguridad con barbuquejo
X	Señalización
	Otro:
	Otro:

EQUIPOS - SISTEMA DE ACCESO A UTILIZAR (marque con una X y describa el equipo)

X	Escalera	X	Andamio		Elevador		Cuerda

DESCRIPCIÓN: Escalera metálica y Andamios certificados.

SISTEMA DE RESTRICCIÓN CONTRA CAÍDAS

(marque con una X que el tipo de eslinga que utilizará)

X	Eslinga en Y con absorbedor	X	Eslinga en Y sin absorbedor
X	Eslinga sencilla con absorbedor	X	Eslinga sencilla sin absorbedor

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO CONTRA CAIDAS

(marque con una X que el tipo de eslinga que utilizará)

	Eslinga de posicionamiento		No requiere

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INDIVIDUAL (Marque con una X los EPI a usar)

X	Botas de seguridad con puntera	X	Guantes de caucho	X	Mascarilla desechable	OTROS:	
		X	Guantes de vaqueta				
X	Gafas de seguridad transparentes	X	Guantes de hilaza recubiertos en látex	X	Protector auditivo desechable		
					Pava para el sol		
X	Gafas de seguridad oscuras		Guantes de hilaza recubiertos en poliuretano		Protector auditivo tipo copa		

OBSERVACIONES:

PERSONAS AUTORIZADAS PARA TRABAJAR EN ALTURAS

N°	NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	FIRMA
1	Carlos Julio Gallego Sanchez	C.C	79825041	
2	Ernesto Leon Peña Florez	C.C	1063361174	
3				
4				
5				
6				
7				

PERSONA QUE AUTORIZA EL TRABAJO EN ALTURAS

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:
Cristian Herrera	1035921884	Residente Civil	

PERSONA RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:
Ernesto Leon Peña Florez	1063361174	Oficial	

COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:
Carlos Julio Gallego Sanchez	79825041	Maestro	

AYUDANTE DE SEGURIDAD (SI APLICA)

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:

CADBIM S.A.S	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TIPO: F FECHA: 30/12/2024 VERSIÓN: 2
	NIVEL 7: FORMATOS N°: FT-SST-000	

PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS R 4272/2021

FECHA DE EXPEDICIÓN	DÍA: 6	MES: 05	AÑO: 2026	HORA: 7:00 am
VALIDO HASTA	DÍA: 6	MES: 05	AÑO: 2026	HORA: 4:30 pm
CIUDAD	Guarne - Antioquia			

N°	NOMBRE DE LOS TRABAJADORES
1	Carlos Julio Gallego Sanchez
2	Ernesto Leon Peña Florez
3	
4	
5	
6	
7	

NOMBRE DE LA EMPRESA

CADBIM S.A.S

ESPECIFICACIÓN DEL TRABAJO

SITIO DONDE SE REALIZARÁ EL TRABAJO: Sede EMEGA

EL TRABAJO A REALIZAR ES RUTINARIO? SI [ ] NO [ ]

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO A REALIZAR: Izaje de materiales con pluma y adecuaciones de mampostería a borde de losa.

ALTURA APROXIMADA A REALIZAR EL TRABAJO: 15 m.

REALIZACIÓN DEL TRABAJO

ENTRENAMIENTO Y ESTADO DE SALUD	TRABAJADOR 1		2		3		4	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Las personas que realizan el trabajo cuentan con la seguridad social vigente?	X		X		-	-	-	-
Las personas que realizaran el trabajo se encuentra en condiciones aptas de salud para realizar el trabajo.	X		X		-	-	-	-
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		X		X	-	-	-	-
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		X		X	-	-	-	-
Sufre de miedo a las alturas (acrofobia)?		X		X	-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo están capacitadas (certificadas) para la realización de trabajo en alturas?	X		X		-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo saben como realizar la actividad asignada?	X		X		-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo saben que hacer en caso de accidente o incidente?	X		X		-	-	-	-

INSPECCION DEL AREA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	TRABAJADOR 1		2		3		4	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Dispone de todas las herramientas y equipos necesarias para la realización del trabajo.	X		X		-	-	-	-
Se están utilizando todos los elementos de protección personal certificados?	X		X		-	-	-	-
Se inspeccionaron todos los elementos de protección personal antes de ser usados?	X		X		-	-	-	-
Las condiciones atmosféricas (lluvia, tormenta eléctrica, vientos fuertes) permiten realizar este trabajo?	X		X		-	-	-	-
Se tiene definido ,los posibles puntos de anclaje o lineas de vida para asegurarse, que cumplan 5000lb por cada trabajador?	X		X		-	-	-	-
Se demarco el área de trabajo (mínimo 1.5 alrededor) con cintas, avisos, conos u otros elementos para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas?		X		X	-	-	-	-
Se tiene una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados?	X		X		-	-	-	-

Se requiere de permisos adicionales?			
	Trabajo en espacios confinados	SI [ ]	NO [X]
	Trabajo en caliente	SI [ ]	NO [X]
	Trabajos eléctricos	SI [ ]	NO [X]

HERRAMIENTAS A UTILIZAR
Varias.

	SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDAS (marque con una X que sistemas de prevención utilizará y describa el tipo y sus características)
X	Dispositivo de anclaje (Punto de anclaje, tie off, etc. Por trabajador):
X	Línea de vida:
X	Eslinga:
X	Arnés multipropósito:
X	Casco de seguridad con barbuquejo
X	Señalización
	Otro:
	Otro:

EQUIPOS - SISTEMA DE ACCESO A UTILIZAR (marque con una X y describa el equipo)							
X	Escalera	X	Andamio		Elevador		Cuerda
DESCRIPCIÓN: Escalera metálica y Andamios certificados.							

SISTEMA DE RESTRICCIÓN CONTRA CAÍDAS (marque con una X que el tipo de eslinga que utilizará)			
X	Eslinga en Y con absorbedor	X	Eslinga en Y sin absorbedor
X	Eslinga sencilla con absorbedor	X	Eslinga sencilla sin absorbedor

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO CONTRA CAIDAS (marque con una X que el tipo de eslinga que utilizará)			
	Eslinga de posicionamiento		No requiere

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INDIVIDUAL (Marque con una X los EPI a usar)							
X	Botas de seguridad con puntera	X	Guantes de caucho	X	Mascarilla desechable		OTROS:
		X	Guantes de vaqueta	X	Protector auditivo desechable		
X	Gafas de seguridad transparentes	X	Guantes de hilaza recubiertos en látex		Pava para el sol		
X	Gafas de seguridad oscuras	X	Guantes de hilaza recubiertos en poliuretano		Protector auditivo tipo copa		
OBSERVACIONES:							

PERSONAS AUTORIZADAS PARA TRABAJAR EN ALTURAS

N°	NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	FIRMA
1	Carlos Julio Gallego Sanchez	C.C	79825041	
2	Ernesto Leon Peña Florez	C.C	1063361174	Ernesto
3				
4				
5				
6				
7				

PERSONA QUE AUTORIZA EL TRABAJO EN ALTURAS

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:
Cristian Herrera	1035921884	Residente Civil	

PERSONA RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:
Ernesto Leon Peña Florez	1063361174	Oficial	Ernesto

COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:
Carlos Julio Gallego Sanchez	79825041	Maestro	

AYUDANTE DE SEGURIDAD (SI APLICA)

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:

CADBIM S.A.S	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TIPO: F FECHA: 30/12/2024 VERSIÓN: 2
	NIVEL 7: FORMATOS N°: FT-SST-000	

PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS R 4272/2021

FECHA DE EXPEDICIÓN	DÍA: 7	MES: 05	AÑO: 2026	HORA: 7:00 am
VALIDO HASTA	DÍA: 7	MES: 05	AÑO: 2026	HORA: 4:30 pm
CIUDAD	Guarne - Antioquia			

N°	NOMBRE DE LOS TRABAJADORES
1	Carlos Julio Gallego Sanchez
2	Ernesto Leon Peña Florez
3	
4	
5	
6	
7	

NOMBRE DE LA EMPRESA

CADBIM S.A.S

ESPECIFICACIÓN DEL TRABAJO

SITIO DONDE SE REALIZARÁ EL TRABAJO: Sede EMEGA

EL TRABAJO A REALIZAR ES RUTINARIO? SI [ ] NO [ ]

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO A REALIZAR: Izaje de materiales con pluma y adecuaciones de mampostería a borde de losa.

ALTURA APROXIMADA A REALIZAR EL TRABAJO: 15 m.

REALIZACIÓN DEL TRABAJO

ENTRENAMIENTO Y ESTADO DE SALUD	TRABAJADOR 1		2		3		4	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Las personas que realizan el trabajo cuentan con la seguridad social vigente?	X		X		-	-	-	-
Las personas que realizaran el trabajo se encuentra en condiciones aptas de salud para realizar el trabajo.	X		X		-	-	-	-
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		X		X	-	-	-	-
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		X		X	-	-	-	-
Sufre de miedo a las alturas (acrofobia)?		X		X	-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo están capacitadas (certificadas) para la realización de trabajo en alturas?	X		X		-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo saben como realizar la actividad asignada?	X		X		-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo saben que hacer en caso de accidente o incidente?	X		X		-	-	-	-

INSPECCION DEL AREA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	TRABAJADOR 1		2		3		4	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Dispone de todas las herramientas y equipos necesarias para la realización del trabajo.	X		X		-	-	-	-
Se están utilizando todos los elementos de protección personal certificados?	X		X		-	-	-	-
Se inspeccionaron todos los elementos de protección personal antes de ser usados?	X		X		-	-	-	-
Las condiciones atmosféricas (lluvia, tormenta eléctrica, vientos fuertes) permiten realizar este trabajo?	X		X		-	-	-	-
Se tiene definido ,los posibles puntos de anclaje o líneas de vida para asegurarse, que cumplan 5000lb por cada trabajador?	X		X		-	-	-	-
Se demarco el área de trabajo (mínimo 1.5 alrededor) con cintas, avisos, conos u otros elementos para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas?		X		X	-	-	-	-
Se tiene una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados?	X		X		-	-	-	-

Se requiere de permisos adicionales?			
	Trabajo en espacios confinados	SI [ ]	NO [X]
	Trabajo en caliente	SI [ ]	NO [X]
	Trabajos eléctricos	SI [ ]	NO [X]

HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Varias.

SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDAS
(marque con una X que sistemas de prevención utilizará y describa el tipo y sus características)

X	Dispositivo de anclaje (Punto de anclaje, tie off, etc. Por trabajador):
X	Línea de vida:
X	Eslinga:
X	Arnés multipropósito:
X	Casco de seguridad con barbuquejo
X	Señalización
	Otro:
	Otro:

EQUIPOS - SISTEMA DE ACCESO A UTILIZAR (marque con una X y describa el equipo)

X	Escalera	X	Andamio		Elevador		Cuerda

DESCRIPCIÓN: Escalera metálica y Andamios certificados.

SISTEMA DE RESTRICCIÓN CONTRA CAÍDAS
(marque con una X que el tipo de eslinga que utilizará)

X	Eslinga en Y con absorbedor	X	Eslinga en Y sin absorbedor
X	Eslinga sencilla con absorbedor		Eslinga sencilla sin absorbedor

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO CONTRA CAIDAS
(marque con una X que el tipo de eslinga que utilizará)

	Eslinga de posicionamiento		No requiere

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INDIVIDUAL (Marque con una X los EPI a usar)

X	Botas de seguridad con puntera	X	Guantes de caucho	X	Mascarilla desechable	OTROS:	
		X	Guantes de vaqueta				
X	Gafas de seguridad transparentes	X	Guantes de hilaza recubiertos en látex	X	Protector auditivo desechable		
					Pava para el sol		
X	Gafas de seguridad oscuras		Guantes de hilaza recubiertos en poliuretano		Protector auditivo tipo copa		

OBSERVACIONES:

PERSONAS AUTORIZADAS PARA TRABAJAR EN ALTURAS

N°	NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	FIRMA
1	Carlos Julio Gallego Sanchez	C.C	79825041	
2	Ernesto Leon Peña Florez	C.C	1063361174	
3				
4				
5				
6				
7				

PERSONA QUE AUTORIZA EL TRABAJO EN ALTURAS

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:
Cristian Herrera	1035921884	Residente Civil	

PERSONA RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:
Ernesto Leon Peña Florez	1063361174	Oficial	

COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:
Carlos Julio Gallego Sanchez	79825041	Maestro	

AYUDANTE DE SEGURIDAD (SI APLICA)

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:

CADBIM S.A.S

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TIPO: F
FECHA: 30/12/2024
VERSIÓN: 2

NIVEL 7: **FORMATOS N°:** **FT-SST-000**

PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS R 4272/2021

FECHA DE EXPEDICIÓN	DÍA: 8	MES: 05	AÑO: 2026	HORA: 7:00 am
VALIDO HASTA	DÍA: 8	MES: 05	AÑO: 2026	HORA: 4:30 pm
CIUDAD	Guarne - Antioquia			

N°	NOMBRE DE LOS TRABAJADORES
1	Carlos Julio Gallego Sanchez
2	Ernesto Leon Peña Florez
3	
4	
5	
6	
7	

NOMBRE DE LA EMPRESA

CADBIM S.A.S

ESPECIFICACIÓN DEL TRABAJO

SITIO DONDE SE REALIZARÁ EL TRABAJO: Sede EMEGA

EL TRABAJO A REALIZAR ES RUTINARIO? SI [ ] NO [ ]

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO A REALIZAR: Izaje de materiales con pluma y adecuaciones de mamposteria a borde de losa.

ALTURA APROXIMADA A REALIZAR EL TRABAJO: 15 m.

REALIZACIÓN DEL TRABAJO

ENTRENAMIENTO Y ESTADO DE SALUD	TRABAJADOR 1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO
Las personas que realizan el trabajo cuentan con la seguridad social vigente?	X		X		-	-	-	-
Las personas que realizaran el trabajo se encuentra en condiciones aptas de salud para realizar el trabajo.	X		X		-	-	-	-
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		X		X	-	-	-	-
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		X		X	-	-	-	-
Sufre de miedo a las alturas (acrofobia)?		X		X	-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo están capacitadas (certificadas) para la realización de trabajo en alturas?	X		X		-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo saben como realizar la actividad asignada?	X		X		-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo saben que hacer en caso de accidente o incidente?	X		X		-	-	-	-

INSPECCION DEL AREA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	TRABAJADOR 1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO
Dispone de todas las herramientas y equipos necesarias para la realización del trabajo.	X		X		-	-	-	-
Se están utilizando todos los elementos de protección personal certificados?	X		X		-	-	-	-
Se inspeccionaron todos los elementos de protección personal antes de ser usados?	X		X		-	-	-	-
Las condiciones atmosféricas (lluvia, tormenta eléctrica, vientos fuertes) permiten realizar este trabajo?	X		X		-	-	-	-
Se tiene definido ,los posibles puntos de anclaje o lineas de vida para asegurarse, que cumplan 5000lb por cada trabajador?	X		X		-	-	-	-
Se demarco el área de trabajo (mínimo 1.5 alrededor) con cintas, avisos, conos u otros elementos para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas?		X		X	-	-	-	-
Se tiene una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados?	X		X		-	-	-	-

Se requiere de permisos adicionales?	Trabajo en espacios confinados	SI [ ]	NO [X]	
	Trabajo en caliente	SI [ ]	NO [X]	
	Trabajos eléctricos	SI [ ]	NO [X]	

HERRAMIENTAS A UTILIZAR
Varias.

	SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDAS (marque con una X que sistemas de prevención utilizará y describa el tipo y sus características)
X	Dispositivo de anclaje (Punto de anclaje, tie off, etc. Por trabajador):
X	Línea de vida:
X	Eslinga:
X	Arnés multipropósito:
X	Casco de seguridad con barbuquejo
X	Señalización
	Otro:
	Otro:

EQUIPOS - SISTEMA DE ACCESO A UTILIZAR (marque con una X y describa el equipo)							
X	Escalera	X	Andamio		Elevador		Cuerda
DESCRIPCIÓN: Escalera metálica y Andamios certificados.							

	SISTEMA DE RESTRICCIÓN CONTRA CAÍDAS (marque con una X que el tipo de eslinga que utilizará)		
X	Eslinga en Y con absorbedor	X	Eslinga en Y sin absorbedor
X	Eslinga sencilla con absorbedor	X	Eslinga sencilla sin absorbedor

	SISTEMA DE POSICIONAMIENTO CONTRA CAIDAS (marque con una X que el tipo de eslinga que utilizará)		
	Eslinga de posicionamiento		No requiere

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INDIVIDUAL (Marque con una X los EPI a usar)							
X	Botas de seguridad con puntera	X	Guantes de caucho		Mascarilla desechable		OTROS:
		X	Guantes de vaqueta		Protector auditivo desechable	X	
X	Gafas de seguridad transparentes	X	Guantes de hilaza recubiertos en látex			X	
					Pava para el sol		
X	Gafas de seguridad oscuras		Guantes de hilaza recubiertos en polluretano		Protector auditivo tipo copa		
OBSERVACIONES:							

PERSONAS AUTORIZADAS PARA TRABAJAR EN ALTURAS				
N°	NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	FIRMA
1	Carlos Julio Gallego Sanchez	C.C	79825041	
2	Ernesto Leon Peña Florez	C.C	1063361174	
3				
4				
5				
6				
7				

PERSONA QUE AUTORIZA EL TRABAJO EN ALTURAS			
NOMBRE: Cristian Herrera	CC 1035921884	CARGO: Residente Civil	FIRMA:
PERSONA RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS			
NOMBRE: Ernesto Leon Peña Florez	CC 1063361174	CARGO: Oficial	FIRMA:
COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS			
NOMBRE: Carlos Julio Gallego Sanchez	CC 79825041	CARGO: Maestro	FIRMA:
AYUDANTE DE SEGURIDAD (SI APLICA)			
NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:

CADBIM S.A.S	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TIPO: F FECHA: 30/12/2024 VERSIÓN: 2
	NIVEL 7: FORMATOS N°: FT-SST-000	

PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS R 4272/2021

FECHA DE EXPEDICIÓN	DÍA: 11	MES: 05	AÑO: 2026	HORA: 7:00 am
VALIDO HASTA	DÍA: 11	MES: 05	AÑO: 2026	HORA: 4:30 pm
CIUDAD	Guarne - Antioquia			

N°	NOMBRE DE LOS TRABAJADORES
1	Carlos Julio Gallego Sanchez
2	Ernesto Leon Peña Florez
3	
4	
5	
6	
7	

NOMBRE DE LA EMPRESA

CADBIM S.A.S

ESPECIFICACIÓN DEL TRABAJO

SITIO DONDE SE REALIZARÁ EL TRABAJO: Sede EMEGA

EL TRABAJO A REALIZAR ES RUTINARIO? SI [X] NO [ ]

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO A REALIZAR: Izaje de materiales con pluma y adecuaciones de mamposteria a borde de losa.

ALTURA APROXIMADA A REALIZAR EL TRABAJO: 15 m.

REALIZACIÓN DEL TRABAJO

ENTRENAMIENTO Y ESTADO DE SALUD	TRABAJADOR 1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO
Las personas que realizan el trabajo cuentan con la seguridad social vigente?	X		X		-	-	-	-
Las personas que realizaran el trabajo se encuentra en condiciones aptas de salud para realizar el trabajo.	X		X		-	-	-	-
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		X		X	-	-	-	-
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		X		X	-	-	-	-
Sufre de miedo a las alturas (acrofobia)?		X		X	-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo están capacitadas (certificadas) para la realización de trabajo en alturas?	X		X		-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo saben como realizar la actividad asignada?	X		X		-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo saben que hacer en caso de accidente o incidente?	X		X		-	-	-	-

INSPECCION DEL AREA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	TRABAJADOR 1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO
Dispone de todas las herramientas y equipos necesarias para la realización del trabajo.	X		X		-	-	-	-
Se están utilizando todos los elementos de protección personal certificados?	X		X		-	-	-	-
Se inspeccionaron todos los elementos de protección personal antes de ser usados?	X		X		-	-	-	-
Las condiciones atmosféricas (lluvia, tormenta eléctrica, vientos fuertes) permiten realizar este trabajo?	X		X		-	-	-	-
Se tiene definido ,los posibles puntos de anclaje o líneas de vida para asegurarse, que cumplan 5000lb por cada trabajador?	X		X		-	-	-	-
Se demarco el área de trabajo (mínimo 1.5 alrededor) con cintas, avisos, conos u otros elementos para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas?	X		X		-	-	-	-
Se tiene una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados?	X		X		-	-	-	-

Se requiere de permisos adicionales?	Trabajo en espacios confinados	SI [ ]	NO [X]
	Trabajo en caliente	SI [ ]	NO [X]
	Trabajos eléctricos	SI [ ]	NO [X]

HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Varias.

SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDAS
(marque con una X que sistemas de prevención utilizará y describa el tipo y sus características)

X	Dispositivo de anclaje (Punto de anclaje, tie off, etc. Por trabajador):
X	Línea de vida:
X	Eslinga:
X	Arnés multipropósito:
X	Casco de seguridad con barbuquejo
X	Señalización
	Otro:
	Otro:

EQUIPOS - SISTEMA DE ACCESO A UTILIZAR (marque con una X y describa el equipo)

X	Escalera	X	Andamio		Elevador		Cuerda

DESCRIPCIÓN: Escalera metálica y Andamios certificados.

SISTEMA DE RESTRICCIÓN CONTRA CAÍDAS
(marque con una X que el tipo de eslinga que utilizará)

X	Eslinga en Y con absorbedor		Eslinga en Y sin absorbedor
X	Eslinga sencilla con absorbedor		Eslinga sencilla sin absorbedor

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO CONTRA CAÍDAS
(marque con una X que el tipo de eslinga que utilizará)

	Eslinga de posicionamiento	X	No requiere

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INDIVIDUAL (Marque con una X los EPI a usar)

X	Botas de seguridad con puntera	X	Guantes de caucho	X	Mascarilla desechable	OTROS:	
		X	Guantes de vaqueta				
X	Gafas de seguridad transparentes	X	Guantes de hilaza recubiertos en látex	X	Protector auditivo desechable		
					Pava para el sol		
X	Gafas de seguridad oscuras		Guantes de hilaza recubiertos en poliuretano		Protector auditivo tipo copa		

OBSERVACIONES:

PERSONAS AUTORIZADAS PARA TRABAJAR EN ALTURAS

N°	NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	FIRMA
1	Carlos Julio Gallego Sanchez	C.C	79825041	
2	Ernesto Leon Peña Florez	C.C	1063361174	
3				
4				
5				
6				
7				

PERSONA QUE AUTORIZA EL TRABAJO EN ALTURAS

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:
Cristian Herrera	1035921684	Residente Civil	

PERSONA RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:
Ernesto Leon Peña Florez	1063361174	Oficial	

COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:
Carlos Julio Gallego Sanchez	79825041	Maestro	

AYUDANTE DE SEGURIDAD (SI APLICA)

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:

CADBIM S.A.S	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TIPO: F FECHA: 30/12/2024 VERSIÓN: 2
	NIVEL 7: FORMATOS N°: FT-SST-000	

PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS R 4272/2021

FECHA DE EXPEDICIÓN	DIA: 12	MES: 05	AÑO: 2026	HORA: 7:00 am
VALIDO HASTA	DIA: 12	MES: 05	AÑO: 2026	HORA: 4:30 pm
CIUDAD	Guarne - Antioquia			

N°.	NOMBRE DE LOS TRABAJADORES
1	Carlos Julio Gallego Sanchez
2	Ernesto Leon Peña Florez
3	
4	
5	
6	
7	

NOMBRE DE LA EMPRESA

CADBIM S.A.S

ESPECIFICACIÓN DEL TRABAJO

SITIO DONDE SE REALIZARÁ EL TRABAJO: Sede EMEGA

EL TRABAJO A REALIZAR ES RUTINARIO? SI [X] NO [ ]

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO A REALIZAR: Izaje de materiales con pluma y adecuaciones de mampostería a borde de losa.

ALTURA APROXIMADA A REALIZAR EL TRABAJO: 15 m.

REALIZACIÓN DEL TRABAJO

ENTRENAMIENTO Y ESTADO DE SALUD	TRABAJADOR 1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO
Las personas que realizan el trabajo cuentan con la seguridad social vigente?	X		X		-	-	-	-
Las personas que realizaran el trabajo se encuentra en condiciones aptas de salud para realizar el trabajo.	X		X		-	-	-	-
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		X		X	-	-	-	-
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		X		X	-	-	-	-
Sufre de miedo a las alturas (acrofobia)?		X		X	-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo están capacitadas (certificadas) para la realización de trabajo en alturas?	X		X		-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo saben como realizar la actividad asignada?	X		X		-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo saben que hacer en caso de accidente o incidente?	X		X		-	-	-	-

INSPECCION DEL AREA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	TRABAJADOR 1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO
Dispone de todas las herramientas y equipos necesarias para la realización del trabajo.	X		X		-	-	-	-
Se están utilizando todos los elementos de protección personal certificados?	X		X		-	-	-	-
Se inspeccionaron todos los elementos de protección personal antes de ser usados?	X		X		-	-	-	-
Las condiciones atmosféricas (lluvia, tormenta eléctrica, vientos fuertes) permiten realizar este trabajo?	X		X		-	-	-	-
Se tiene definido ,los posibles puntos de anclaje o lineas de vida para asegurarse, que cumplan 5000lb por cada trabajador?	X		X		-	-	-	-
Se demarco el área de trabajo (mínimo 1.5 alrededor) con cintas, avisos, conos u otros elementos para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas?	X		X		-	-	-	-
Se tiene una distancia segura entre el trabajo y lineas o equipos eléctricos energizados?	X		X		-	-	-	-

Se requiere de permisos adicionales?	Trabajo en espacios confinados	SI [ ]	NO [X]
	Trabajo en caliente	SI [ ]	NO [X]
	Trabajos eléctricos	SI [ ]	NO [X]

HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Varias.

SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDAS
(marque con una X que sistemas de prevención utilizará y describa el tipo y sus características)

X	Dispositivo de anclaje (Punto de anclaje, tie off, etc. Por trabajador):
X	Línea de vida:
X	Eslinga:
X	Arnés multipropósito:
X	Casco de seguridad con barbuquejo
X	Señalización
	Otro:
	Otro:

EQUIPOS - SISTEMA DE ACCESO A UTILIZAR (marque con una X y describa el equipo)

X	Escalera	X	Andamio		Elevador		Cuerda

DESCRIPCIÓN: Escalera metálica y Andamios certificados.

SISTEMA DE RESTRICCIÓN CONTRA CAÍDAS
(marque con una X que el tipo de eslinga que utilizará)

X	Eslinga en Y con absorbedor		Eslinga en Y sin absorbedor
X	Eslinga sencilla con absorbedor		Eslinga sencilla sin absorbedor

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO CONTRA CAÍDAS
(marque con una X que el tipo de eslinga que utilizará)

	Eslinga de posicionamiento	X	No requiere

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INDIVIDUAL (Marque con una X los EPI a usar)

X	Botas de seguridad con puntera	X	Guantes de caucho	X	Mascarilla desechable	OTROS:	
		X	Guantes de vaqueta	X	Protector auditivo desechable		
X	Gafas de seguridad transparentes	X	Guantes de hilaza recubiertos en látex		Pava para el sol		
X	Gafas de seguridad oscuras		Guantes de hilaza recubiertos en poliuretano		Protector auditivo tipo copa		

OBSERVACIONES:

PERSONAS AUTORIZADAS PARA TRABAJAR EN ALTURAS

N°	NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	FIRMA
1	Carlos Julio Gallego Sanchez	C.C	79825041	
2	Ernesto Leon Peña Florez	C.C	1063361174	
3				
4				
5				
6				
7				

PERSONA QUE AUTORIZA EL TRABAJO EN ALTURAS

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:
Cristian Herrera	1035921884	Residente Civil	

PERSONA RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:
Ernesto Leon Peña Florez	1063361174	Oficial	

COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:
Carlos Julio Gallego Sanchez	79825041	Maestro	

AYUDANTE DE SEGURIDAD (SI APLICA)

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:

[redacted]	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	NIVEL 7: FORMATOS N°: FT-SST-026	
	☑ SG-SST	
FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	Fecha: FEBRERO 2025 Versión: 01 Página 1 de 1	

Nombre: Juan David Ortega Talbiyva	**Cedula:** 1068666417
Empresa: CADBIM S.A.S.	**Cargo:**
Fecha: 4-05-2026.	

TEMAS A EVALUAR	CALIFICACIÓN
1. Mencione 1 Política de la empresa: Sobios y seguridad - en trabajo	20
2. Mencione tres responsabilidades de los trabajadores en cuanto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: reportar accidente en el trabajo reportar en cifras estar epps	20
3. Si presenta un accidente de trabajo se debe reportar: X a. Inmediatamente b. Al siguiente día c. Cuando me acuerde d. Días después porque me surgió un dolor e. A la semana siguiente	20
4. Mencione tres riesgos a los que está expuesto en su área trabajo: caídas y golpes	20
5. Qué debe hacer en caso de identificar una emergencia: a. Ignorar porque no le corresponde X b. Reportar inmediatamente c. Correr y gritar	20
TOTAL CALIFICACIÓN	100
FIRMA DEL TRABAJADOR:	Juan David

CADBIM S.A.S	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TIPO: F FECHA: 30/12/2024 VERSIÓN: 2
	NIVEL 7: FORMATOS N°: FT-SST-000	

PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS R 4272/2021

FECHA DE EXPEDICIÓN	DÍA: 13	MES: 05	AÑO: 2026	HORA: 7:00 am
VALIDO HASTA	DÍA: 13	MES: 05	AÑO: 2026	HORA: 4:30 pm
CIUDAD	Guarne - Antioquia			

N°	NOMBRE DE LOS TRABAJADORES
1	Carlos Julio Gallego Sanchez
2	Ernesto Leon Peña Florez
3	
4	
5	
6	
7	

NOMBRE DE LA EMPRESA

CADBIM S.A.S

ESPECIFICACIÓN DEL TRABAJO

SITIO DONDE SE REALIZARÁ EL TRABAJO: Sede EMEGA

EL TRABAJO A REALIZAR ES RUTINARIO? SI [X] NO [ ]

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO A REALIZAR: Izaje de materiales con pluma y adecuaciones de mamposteria a borde de losa.

ALTURA APROXIMADA A REALIZAR EL TRABAJO: 15 m.

REALIZACIÓN DEL TRABAJO

ENTRENAMIENTO Y ESTADO DE SALUD	TRABAJADOR 1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO
Las personas que realizan el trabajo cuentan con la seguridad social vigente?	X		X		-	-	-	-
Las personas que realizaran el trabajo se encuentra en condiciones aptas de salud para realizar el trabajo.	X		X		-	-	-	-
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		X		X	-	-	-	-
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		X		X	-	-	-	-
Sufre de miedo a las alturas (acrofobia)?		X		X	-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo están capacitadas (certificadas) para la realización de trabajo en alturas?	X		X		-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo saben como realizar la actividad asignada?	X		X		-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo saben que hacer en caso de accidente o incidente?	X		X		-	-	-	-

INSPECCION DEL AREA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	TRABAJADOR 1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO
Dispone de todas las herramientas y equipos necesarias para la realización del trabajo.	X		X		-	-	-	-
Se están utilizando todos los elementos de protección personal certificados?	X		X		-	-	-	-
Se inspeccionaron todos los elementos de protección personal antes de ser usados?	X		X		-	-	-	-
Las condiciones atmosféricas (lluvia, tormenta eléctrica, vientos fuertes) permiten realizar este trabajo?	X		X		-	-	-	-
Se tiene definido los posibles puntos de anclaje o líneas de vida para asegurarse, que cumplan 5000lb por cada trabajador?	X		X		-	-	-	-
Se demarco el área de trabajo (mínimo 1.5 alrededor) con cintas, avisos, conos u otros elementos para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas?	X		X		-	-	-	-
Se tiene una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados?	X		X		-	-	-	-

Se requiere de permisos adicionales?			
	Trabajo en espacios confinados	SI [ ]	NO [X]
	Trabajo en caliente	SI [ ]	NO [X]
	Trabajos eléctricos	SI [ ]	NO [X]

HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Varias.

SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDAS
(marque con una X que sistemas de prevención utilizará y describa el tipo y sus características)

X	Dispositivo de anclaje (Punto de anclaje, tie off, etc. Por trabajador):
X	Línea de vida:
X	Eslinga:
X	Arnés multipropósito:
X	Casco de seguridad con barbuquejo
X	Señalización
	Otro:
	Otro:

EQUIPOS - SISTEMA DE ACCESO A UTILIZAR (marque con una X y describa el equipo)

X	Escalera	X	Andamio		Elevador		Cuerda

DESCRIPCIÓN: Escalera metálica y Andamios certificados.

SISTEMA DE RESTRICCIÓN CONTRA CAÍDAS
(marque con una X que el tipo de eslinga que utilizará)

X	Eslinga en Y con absorbedor		Eslinga en Y sin absorbedor
X	Eslinga sencilla con absorbedor		Eslinga sencilla sin absorbedor

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO CONTRA CAÍDAS
(marque con una X que el tipo de eslinga que utilizará)

	Eslinga de posicionamiento	X	No requiere

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INDIVIDUAL (Marque con una X los EPI a usar)

X	Botas de seguridad con puntera	X	Guantes de caucho	X	Mascarilla desechable	OTROS:	
		X	Guantes de vaqueta	X	Protector auditivo desechable		
X	Gafas de seguridad transparentes	X	Guantes de hilaza recubiertos en látex		Pava para el sol		
X	Gafas de seguridad oscuras		Guantes de hilaza recubiertos en poliuretano		Protector auditivo tipo copa		

OBSERVACIONES:

PERSONAS AUTORIZADAS PARA TRABAJAR EN ALTURAS

N°	NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	FIRMA
1	Carlos Julio Gallego Sanchez	C.C	79825041	
2	Ernesto Leon Peña Florez	C.C	1063361174	Ernesto
3				
4				
5				
6				
7				

PERSONA QUE AUTORIZA EL TRABAJO EN ALTURAS

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:
Cristian Herrera	1035921884	Residente Civil	

PERSONA RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:
Ernesto Leon Peña Florez	1063361174	Oficial	ERNESTO

COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:
Carlos Julio Gallego Sanchez	79825041	Maestro	

AYUDANTE DE SEGURIDAD (SI APLICA)

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:

CADBIM S.A.S	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TIPO: F FECHA: 30/12/2024 VERSIÓN: 2
	NIVEL 7: FORMATOS N°: FT-SST-000	

PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS R 4272/2021

FECHA DE EXPEDICIÓN	DÍA: 14	MES: 05	AÑO: 2026	HORA: 7:00 am
VÁLIDO HASTA	DÍA: 14	MES: 05	AÑO: 2026	HORA: 4:30 pm
CIUDAD	Guarne - Antioquia			

N°	NOMBRE DE LOS TRABAJADORES
1	Carlos Julio Gallego Sanchez
2	Ernesto Leon Peña Florez
3	
4	
5	
6	
7	

NOMBRE DE LA EMPRESA

CADBIM S.A.S

ESPECIFICACIÓN DEL TRABAJO

SITIO DONDE SE REALIZARÁ EL TRABAJO: Sede EMEGA

EL TRABAJO A REALIZAR ES RUTINARIO? SI [X] NO [ ]

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO A REALIZAR: izaje de materiales con pluma y adecuaciones de mamposteria a borde de losa.

ALTURA APROXIMADA A REALIZAR EL TRABAJO: 15 m.

REALIZACIÓN DEL TRABAJO

ENTRENAMIENTO Y ESTADO DE SALUD	TRABAJADOR 1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO
Las personas que realizan el trabajo cuentan con la seguridad social vigente?	X		X		-	-	-	-
Las personas que realizaran el trabajo se encuentra en condiciones aptas de salud para realizar el trabajo.	X		X		-	-	-	-
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		X		X	-	-	-	-
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		X		X	-	-	-	-
Sufre de miedo a las alturas (acrofobia)?		X		X	-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo están capacitadas (certificadas) para la realización de trabajo en alturas?	X		X		-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo saben como realizar la actividad asignada?	X		X		-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo saben que hacer en caso de accidente o incidente?	X		X		-	-	-	-

INSPECCION DEL AREA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	TRABAJADOR 1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO
Dispone de todas las herramientas y equipos necesarias para la realización del trabajo.	X		X		-	-	-	-
Se están utilizando todos los elementos de protección personal certificados?	X		X		-	-	-	-
Se inspeccionaron todos los elementos de protección personal antes de ser usados?	X		X		-	-	-	-
Las condiciones atmosféricas (lluvia, tormenta eléctrica, vientos fuertes) permiten realizar este trabajo?	X		X		-	-	-	-
Se tiene definido ,los posibles puntos de enclaje o líneas de vida para asegurarse, que cumplan 5000lb por cada trabajador?	X		X		-	-	-	-
Se demarco el área de trabajo (mínimo 1.5 alrededor) con cintas, avisos, conos u otros elementos para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas?	X		X		-	-	-	-
Se tiene una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados?	X		X		-	-	-	-

Se requiere de permisos adicionales?	Trabajo en espacios confinados	SI [ ]	NO [X]
	Trabajo en caliente	SI [ ]	NO [X]
	Trabajos eléctricos	SI [ ]	NO [X]

HERRAMIENTAS A UTILIZAR
Varias.

	SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDAS (marque con una X que sistemas de prevención utilizará y describa el tipo y sus caracteristicas)
X	Dispositivo de anclaje (Punto de anclaje, tie off, etc. Por trabajador):
X	Línea de vida:
X	Eslinga:
X	Arnés multipropósito:
X	Casco de seguridad con barbuquejo
X	Señalización
	Otro:
	Otro:

EQUIPOS - SISTEMA DE ACCESO A UTILIZAR (marque con una X y describa el equipo)							
X	Escalera	X	Andamio		Elevador		Cuerda
DESCRIPCIÓN: Escalera metálica y Andamios certificados.							

	SISTEMA DE RESTRICCIÓN CONTRA CAÍDAS (marque con una X que el tipo de eslinga que utilizará)		
	Eslinga en Y con absorbedor		Eslinga en Y sin absorbedor
	Eslinga sencilla con absorbedor		Eslinga sencilla sin absorbedor

	SISTEMA DE POSICIONAMIENTO CONTRA CAÍDAS (marque con una X que el tipo de eslinga que utilizará)		
	Eslinga de posicionamiento	X	No requiere

	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INDIVIDUAL (Marque con una X los EPI a usar)							
X	Botas de seguridad con puntera	X	Guantes de caucho	X	Mascarilla desechable		OTROS:	
		X	Guantes de vaqueta	X	Protector auditivo desechable			
X	Gafas de seguridad transparentes	X	Guantes de hilaza recubiertos en látex		Pava para el sol			
X	Gafas de seguridad oscuras		Guantes de hilaza recubiertos en poliuretano		Protector auditivo tipo copa			
OBSERVACIONES:								

PERSONAS AUTORIZADAS PARA TRABAJAR EN ALTURAS				
N°	NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	FIRMA
1	Carlos Julio Gallego Sanchez	C.C	79825041	
2	Ernesto Leon Peña Florez	C.C	1063361174	Ernesto
3				
4				
5				
6				
7				

PERSONA QUE AUTORIZA EL TRABAJO EN ALTURAS			
NOMBRE: Cristian Herrera	CC 1035921884	CARGO: Residente Civil	FIRMA:

PERSONA RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS			
NOMBRE: Ernesto Leon Peña Florez	CC 1063361174	CARGO: Oficial	FIRMA: Ernesto

COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS			
NOMBRE: Carlos Julio Gallego Sanchez	CC 79825041	CARGO: Maestro	FIRMA:

AYUDANTE DE SEGURIDAD (SI APLICA)			
NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:

CADBIM S.A.S	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TIPO: F FECHA: 30/12/2024 VERSIÓN: 2
	NIVEL 7: FORMATOS N°: FT-SST-000	

PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS R 4272/2021

FECHA DE EXPEDICIÓN	DÍA: 15	MES: 05	AÑO: 2026	HORA: 7:00 am
VALIDO HASTA	DÍA: 15	MES: 05	AÑO: 2026	HORA: 4:30 pm
CIUDAD	Guarne - Antioquia			

Nº	NOMBRE DE LOS TRABAJADORES
1	Carlos Julio Gallego Sanchez
2	Ernesto Leon Peña Florez
3	
4	
5	
6	
7	

NOMBRE DE LA EMPRESA

CADBIM S.A.S

ESPECIFICACIÓN DEL TRABAJO

SITIO DONDE SE REALIZARÁ EL TRABAJO: Sede EMEGA

EL TRABAJO A REALIZAR ES RUTINARIO? SI [X] NO [ ]

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO A REALIZAR: Izaje de materiales con pluma y adecuaciones de mamposteria a borde de losa.

ALTURA APROXIMADA A REALIZAR EL TRABAJO: 15 m.

REALIZACIÓN DEL TRABAJO

ENTRENAMIENTO Y ESTADO DE SALUD	TRABAJADOR 1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO
Las personas que realizan el trabajo cuentan con la seguridad social vigente?	X		X		-	-	-	-
Las personas que realizaran el trabajo se encuentra en condiciones aptas de salud para realizar el trabajo.	X		X		-	-	-	-
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		X		X	-	-	-	-
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		X		X	-	-	-	-
Sufre de miedo a las alturas (acrofobia)?		X		X	-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo están capacitadas (certificadas) para la realización de trabajo en alturas?	X		X		-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo saben como realizar la actividad asignada?	X		X		-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo saben que hacer en caso de accidente o incidente?	X		X		-	-	-	-

INSPECCION DEL AREA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	TRABAJADOR 1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO
Dispone de todas las herramientas y equipos necesarios para la realización del trabajo.	X		X		-	-	-	-
Se están utilizando todos los elementos de protección personal certificados?	X		X		-	-	-	-
Se inspeccionaron todos los elementos de protección personal antes de ser usados?	X		X		-	-	-	-
Las condiciones atmosféricas (lluvia, tormenta eléctrica, vientos fuertes) permiten realizar este trabajo?	X		X		-	-	-	-
Se tiene definido ,los posibles puntos de anclaje o líneas de vida para asegurarse, que cumplan 5000lb por cada trabajador?	X		X		-	-	-	-
Se demarco el área de trabajo (mínimo 1.5 alrededor) con cintas, avisos, conos u otros elementos para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas?	X		X		-	-	-	-
Se tiene una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados?	X		X		-	-	-	-

Se requiere de permisos adicionales?	Trabajo en espacios confinados	SI [ ]	NO [X]
	Trabajo en caliente	SI [ ]	NO [X]
	Trabajos eléctricos	SI [ ]	NO [X]

HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Varias.

SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDAS
(marque con una X que sistemas de prevención utilizará y describa el tipo y sus características)

X	Dispositivo de anclaje (Punto de anclaje, tie off, etc. Por trabajador):
X	Línea de vida:
X	Eslinga:
X	Arnés multipropósito:
X	Casco de seguridad con barbuquejo
X	Señalización
	Otro:
	Otro:

EQUIPOS - SISTEMA DE ACCESO A UTILIZAR (marque con una X y describa el equipo)

X	Escalera	X	Andamio		Elevador		Cuerda

DESCRIPCIÓN: Escalera metálica y Andamios certificados.

SISTEMA DE RESTRICCIÓN CONTRA CAÍDAS
(marque con una X que el tipo de eslinga que utilizará)

X	Eslinga en Y con absorbedor		Eslinga en Y sin absorbedor
X	Eslinga sencilla con absorbedor		Eslinga sencilla sin absorbedor

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO CONTRA CAÍDAS
(marque con una X que el tipo de eslinga que utilizará)

	Eslinga de posicionamiento	X	No requiere

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INDIVIDUAL (Marque con una X los EPI a usar)

X	Botas de seguridad con puntera	X	Guantes de caucho	X	Mascarilla desechable	OTROS:	
		X	Guantes de vaqueta	X	Protector auditivo desechable		
X	Gafas de seguridad transparentes	X	Guantes de hilaza recubiertos en látex		Pava para el sol		
X	Gafas de seguridad oscuras		Guantes de hilaza recubiertos en poliuretano		Protector auditivo tipo copa		

OBSERVACIONES:

PERSONAS AUTORIZADAS PARA TRABAJAR EN ALTURAS

N°	NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	FIRMA
1	Carlos Julio Gallego Sanchez	C.C	79825041	
2	Ernesto Leon Peña Florez	C.C	1063361174	ERNESTO
3				
4				
5				
6				
7				

PERSONA QUE AUTORIZA EL TRABAJO EN ALTURAS

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:
Cristian Herrera	1035921884	Residente Civil	

PERSONA RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:
Ernesto Leon Peña Florez	1063361174	Oficial	ERNESTO

COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:
Carlos Julio Gallego Sanchez	79825041	Maestro	

AYUDANTE DE SEGURIDAD (SI APLICA)

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:

CADBIM S.A.S

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TIPO: F
FECHA: 30/12/2024
VERSIÓN: 2

NIVEL 7: **FORMATOS N°:** **FT-SST-000**

PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS R 4272/2021

FECHA DE EXPEDICIÓN	DÍA: 19	MES: 05	AÑO: 2026	HORA: 7:00 am
VALIDO HASTA	DÍA: 22	MES: 05	AÑO: 2026	HORA: 5:00 pm
CIUDAD	Guarne - Antioquia			

N°	NOMBRE DE LOS TRABAJADORES
1	Carlos Julio Gallego Sanchez
2	~~Ernesto Leon Peña Florez~~ R.t
3	
4	
5	
6	
7	

NOMBRE DE LA EMPRESA

CADBIM S.A.S

ESPECIFICACIÓN DEL TRABAJO

SITIO DONDE SE REALIZARÁ EL TRABAJO: Sede EMEGA

EL TRABAJO A REALIZAR ES RUTINARIO? SI [X] NO [ ]

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO A REALIZAR: Izaje de materiales con pluma y adecuaciones de mampostería a borde de losa.

ALTURA APROXIMADA A REALIZAR EL TRABAJO: 15 m para la pluma y 2 m para la losa nivel 3.

REALIZACIÓN DEL TRABAJO

ENTRENAMIENTO Y ESTADO DE SALUD	TRABAJADOR 1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO
Las personas que realizan el trabajo cuentan con la seguridad social vigente?	X		X		-	-	-	-
Las personas que realizaran el trabajo se encuentra en condiciones aptas de salud para realizar el trabajo.	X		X		-	-	-	-
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		X		X	-	-	-	-
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		X		X	-	-	-	-
Sufre de miedo a las alturas (acrofobia)?		X		X	-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo están capacitadas (certificadas) para la realización de trabajo en alturas?	X			X	-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo saben como realizar la actividad asignada?	X			X	-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo saben que hacer en caso de accidente o incidente?	X			X	-	-	-	-

INSPECCION DEL AREA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	TRABAJADOR 1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO
Dispone de todas las herramientas y equipos necesarias para la realización del trabajo.	X		X		-	-	-	-
Se están utilizando todos los elementos de protección personal certificados?	X		X		-	-	-	-
Se inspeccionaron todos los elementos de protección personal antes de ser usados?	X		X		-	-	-	-
Las condiciones atmosféricas (lluvia, tormenta eléctrica, vientos fuertes) permiten realizar este trabajo?	X		X		-	-	-	-
Se tiene definido ,los posibles puntos de anclaje o líneas de vida para asegurarse, que cumplan 5000lb por cada trabajador?	X		X		-	-	-	-
Se demarco el área de trabajo (mínimo 1.5 alrededor) con cintas, avisos, conos u otros elementos para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas?		X		X	-	-	-	-
Se tiene una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados?	X		X		-	-	-	-

Se requiere de permisos adicionales?	Trabajo en espacios confinados	SI [ ]	NO [X]	
	Trabajo en caliente	SI [ ]	NO [X]	
	Trabajos eléctricos	SI [ ]	NO [X]	

HERRAMIENTAS A UTILIZAR	
Varias, tales como: martillos, palustres, etc.	
SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDAS (marque con una X que sistemas de prevención utilizará y describa el tipo y sus características)	
✖	Dispositivo de anclaje (Punto de anclaje, tie off, etc. Por trabajador):
✖	Línea de vida:
✖	Eslinga:
✖	Arnés multipropósito:
✖	Casco de seguridad con barbuquejo
	Señalización
	Otro:
	Otro:

EQUIPOS - SISTEMA DE ACCESO A UTILIZAR (marque con una X y describa el equipo)							
✖	Escalera		Andamio		Elevador		Cuerda
DESCRIPCIÓN: Escalera metálica y Andamios certificados.							

SISTEMA DE RESTRICCIÓN CONTRA CAÍDAS (marque con una X que el tipo de eslinga que utilizará)			
✖	Eslinga en Y con absorbedor		Eslinga en Y sin absorbedor
✖	Eslinga sencilla con absorbedor		Eslinga sencilla sin absorbedor

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO CONTRA CAÍDAS (marque con una X que el tipo de eslinga que utilizará)			
	Eslinga de posicionamiento	✖	No requiere

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INDIVIDUAL (Marque con una X los EPI a usar)							
✖	Botas de seguridad con puntera	✖	Guantes de caucho	✖	Mascarilla desechable	OTROS:	
		✖	Guantes de vaqueta	✖	Protector auditivo desechable		
✖	Gafas de seguridad transparentes	✖	Guantes de hilaza recubiertos en látex		Pava para el sol		
✖	Gafas de seguridad oscuras		Guantes de hilaza recubiertos en polluretano		Protector auditivo tipo copa		
OBSERVACIONES:							

PERSONAS AUTORIZADAS PARA TRABAJAR EN ALTURAS

N°	NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	FIRMA
1	Carlos Julio Gallego Sanchez	C.C	79825041	
2	~~Ernesto Leon Peña Florez~~	C.C	~~1063361174~~	
3				
4				
5				
6				
7				

PERSONA QUE AUTORIZA EL TRABAJO EN ALTURAS

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:
Cristian Herrera	1035921884	Residente Civil	

PERSONA RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:
Ernesto Leon Peña Florez	1063361174	Oficial	

COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:
Carlos Julio Gallego Sanchez	79825041	Maestro	

AYUDANTE DE SEGURIDAD (SI APLICA)

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:

CADBIM S.A.S	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	TIPO: F FECHA: 30/12/2024 VERSIÓN: 2
	NIVEL 7: FORMATOS N°: FT-SST-000	

PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS R 4272/2021

FECHA DE EXPEDICIÓN	DÍA: 27	MES: 05	AÑO: 2026	HORA: 7:00 am
VALIDO HASTA	DÍA: 29	MES: 05	AÑO: 2026	HORA: 5:00 pm
CIUDAD	Guarne - Antioquia			

N°	NOMBRE DE LOS TRABAJADORES
1	Carlos Julio Gallego Sanchez
2	
3	
4	
5	
6	
7	

NOMBRE DE LA EMPRESA

CADBIM S.A.S

ESPECIFICACIÓN DEL TRABAJO

SITIO DONDE SE REALIZARÁ EL TRABAJO: Sede EMEGA

EL TRABAJO A REALIZAR ES RUTINARIO? SI [X] NO [ ]

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO A REALIZAR: Izaje de materiales con pluma y adecuaciones de mampostería a borde de losa.

ALTURA APROXIMADA A REALIZAR EL TRABAJO: 15 m.

REALIZACIÓN DEL TRABAJO

ENTRENAMIENTO Y ESTADO DE SALUD	TRABAJADOR 1		2		3		4	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Las personas que realizan el trabajo cuentan con la seguridad social vigente?	X		-	-	-	-	-	-
Las personas que realizaran el trabajo se encuentra en condiciones aptas de salud para realizar el trabajo.	X		-	-	-	-	-	-
Actualmente toma medicamentos que causen sueño, ejemplo: antigripales?		X	-	-	-	-	-	-
Sufre de epilepsia, mareos o vértigo?		X	-	-	-	-	-	-
Sufre de miedo a las alturas (acrofobia)?		X	-	-	-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo están capacitadas (certificadas) para la realización de trabajo en alturas?	X		-	-	-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo saben como realizar la actividad asignada?	X		-	-	-	-	-	-
Las personas que van a realizar el trabajo saben que hacer en caso de accidente o incidente?	X		-	-	-	-	-	-

INSPECCION DEL AREA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	TRABAJADOR 1		2		3		4	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Dispone de todas las herramientas y equipos necesarias para la realización del trabajo.	X		-	-	-	-	-	-
Se están utilizando todos los elementos de protección personal certificados?	X		-	-	-	-	-	-
Se inspeccionaron todos los elementos de protección personal antes de ser usados?	X		-	-	-	-	-	-
Las condiciones atmosféricas (lluvia, tormenta eléctrica, vientos fuertes) permiten realizar este trabajo?	X		-	-	-	-	-	-
Se tiene definido ,los posibles puntos de anclaje o líneas de vida para asegurarse, que cumplan 5000lb por cada trabajador?	X		-	-	-	-	-	-
Se demarco el área de trabajo (mínimo 1.5 alrededor) con cintas, avisos, conos u otros elementos para aislar la zona y no permitir el paso de vehículos o personas?		X	-	-	-	-	-	-
Se tiene una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados?	X		-	-	-	-	-	-

Se requiere de permisos adicionales?	Trabajo en espacios confinados	SI [ ]	NO [X]
	Trabajo en caliente	SI [ ]	NO [X]
	Trabajos eléctricos	SI [ ]	NO [X]

HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Varias.

SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDAS
(marque con una X que sistemas de prevención utilizará y describa el tipo y sus características)

X	Dispositivo de anclaje (Punto de anclaje, tie off, etc. Por trabajador):
X	Línea de vida:
X	Eslinga:
X	Amés multipropósito:
X	Casco de seguridad con barbuquejo
X	Señalización
	Otro:
	Otro:

EQUIPOS - SISTEMA DE ACCESO A UTILIZAR (marque con una X y describa el equipo)

X	Escalera	X	Andamio		Elevador		Cuerda

DESCRIPCIÓN: Escalera metálica y Andamios certificados.

SISTEMA DE RESTRICCIÓN CONTRA CAÍDAS
(marque con una X que el tipo de eslinga que utilizará)

X	Eslinga en Y con absorbedor		Eslinga en Y sin absorbedor
X	Eslinga sencilla con absorbedor		Eslinga sencilla sin absorbedor

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO CONTRA CAIDAS
(marque con una X que el tipo de eslinga que utilizará)

	Eslinga de posicionamiento	X	No requiere

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INDIVIDUAL (Marque con una X los EPI a usar)

X	Botas de seguridad con puntera	X	Guantes de caucho	X	Mascarilla desechable	OTROS:	
		X	Guantes de vaqueta	X	Protector auditivo desechable		
X	Gafas de seguridad transparentes		Guantes de hilaza recubiertos en látex		Pava para el sol		
X	Gafas de seguridad oscuras		Guantes de hilaza recubiertos en poliuretano		Protector auditivo tipo copa		

OBSERVACIONES:

PERSONAS AUTORIZADAS PARA TRABAJAR EN ALTURAS

N°	NOMBRE	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO	FIRMA
1	Carlos Julio Gallego Sanchez	C.C	79825041	
2				
3				
4				
5				
6				
7				

PERSONA QUE AUTORIZA EL TRABAJO EN ALTURAS

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:
Cristian Herrera	1035921884	Residente Civil	

PERSONA RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:
Cristian Herrera	1035921884	Residente Civil	

COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:
Carlos Julio Gallego Sanchez	79825041	Maestro	

AYUDANTE DE SEGURIDAD (SI APLICA)

NOMBRE:	CC	CARGO:	FIRMA:

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	NIVEL 7:	FORMATOS N°:	FT-SST-059
	SG-SST		

FORMATO INSPECCIÓN Y CONTROL DE BOTIQUINES Y ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS	Fecha:	JULIO 2022
	Versión:	1
	Página 1 de 2	

Lugar: EMEGA Responsable: BAW Fecha: 20-05-26













No.	IMAGEN	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESTADO DEL ELEMENTO B	M	NT	VENCIMIENTO FECHA	VENCIDO SI	NO	N/A	REQUIERE REPOSICIÓN SI	NO	OBSERVACIONES
1		Agua esteril para lavado	Bolsa											NT
2		Alcohol	Botella	1	X			01-2028					X	Nuevo
3		Venda Algodón 6" x 5yds 3" x 5	Bolsa	2 2	X			15-12-2030					X	Nuevos.
5		Apósito ocular adulto	Bolsa indivudual X 1 unidad											NT
6		Bajalenguas	Paquete X 20 unidades	2	X						X		X	Nuevo
7		Curitas	Caja X 100 unidades	1x100	X			12 09 2029					X	Nuevo.
8		Esparadrapo en tela 6959 no tejida	Rollo 2" X 5 Yds	1	X						X		X	Nuevo
9		Gasa esteril	Paquete sellado X 6 unidades	12x50	X						X		X	No tejida
10		Guantes de látex		1 caja	X						X		X	Nuevo.
11		Inmobilizador Cervical		2	X						X		X	Nuevo
12		Inmobilizadores	5 unidades	1	X						X		X	Nuevo
13		Jeringa + aguja												NT
		Toallas higienicas		1x100	X						X		X	Nuevo
		Aplicadores Aseptikos		2	X						X		X	Nuevo
		Condones		1x3	X			2030-01					X	Nuevo
		tensiometro		1	X						X		X	Nuevo













No.	IMAGEN	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESTADO DEL ELEMENTO			VENCIMIENTO				REQUIERE REPOSICIÓN		OBSERVACIONES
								FECHA	VENCIDO					
					B	M	NT		SI	NO	N/A	SI	NO	
14		Linterna	Con dinamo											NT
15		Manual de primeros auxilios												NT
16		Mascarilla para RCP	Para un solo uso	2	X						X		X	Nuevo
17		Microporo	Rollo											NT
18		Silbato												NT
19		Jabón limpieza de heridas	Recipiente 120 cc	1	X			01-2029					X	Nuevo
20		Suero oral	Bolsita rinde 1 litro	4 5	X			Jun 27						Suero fisiologico.
21		Tapabocas desechable	Bolsa individual											NT
22		Termómetro digital		1	X						X		X	Nuevo
23		Tijeras		1	X						X		X	Nuevo
24		Vasos desechables	Paquete X 50	1x25	X						X	X		Faltan 50 U.
25		Venda elástica	Rollo 3 X 5 Yds 5" x 5	1 2	X X			01-2031 01-2031					X X	Nuevo Nuevo
26		Venda elástica	Rollos" X 5 Yds	2	X			01 2031						2" x 5
27		Yodo para heridas	Frasco X 60 ml											NT

B	Bueno	NT	No tiene
M	Malo	NA	No aplica

	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL DE PLUMA		
	Código: FO-MEJ-68	Versión: 01	Fecha: Noviembre 2023

PLUMA No. 1 MARCA

OBRA Sede EMEGA SEMANA DEL 4-05 AL 8-05-2026.

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	PLUMA														
ESTADO GENERAL	Anclaje	X		X		X		X		X					
	A la placa	X		X		X		X		X					
	Con pasos de anclaje en forma de U	X		X		X		X		X					
	CABLE														
	Buen estado	X		X		X		X		X					
	Diámetro adecuado	X		X		X		X		X					
	Capacidad requerida	X		X		X		X		X					
	Tres grilletes en el anclaje	X		X		X		X		X					
	REVISION														
	Motor	X		X		X		X		X					
	Instalaciones eléctricas	X		X		X		X		X					
	Los guardas están en su sitio	X		X		X		X		X					
	El amarre de la carga es seguro	X		X		X		X		X					
	Los cajones están completos	X		X		X		X		X					
	OPERADOR														
	Buena visibilidad	X		X		X		X		X					
	Usa código de señales con sus compañeros	X		X		X		X		X					
	Velocidad de manejo es la adecuada	X		X		X		X		X					
FIRMAS	¿QUIEN LO OPERA?	FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR	
		Ernesto		Ernesto		Ernesto		Ernesto		Ernesto					
	NOMBRE DEL SISO	Orysi Jhazindra Herrera Alcaraz.													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SIG Versión: 01 Fecha de Emisión: 2025

PROYECTO	Secle EMEGA.		
MARCA		MODELO	
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del (dd/mm/aa) 4-05-2026	al (dd/mm/aa)	8-05-2026.
TIPO DE CORTADORA	Aserradora ___ Cortarora X Cortador de concreto ___ Otro _____		

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. MECÁNICO	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,0	Control de fugas de aceite	NA	NA	NA	NA	NA			
2,0	Control de fugas de combustible	NA	NA	NA	NA	NA			
3,0	Ajuste de tuercas y tornillos	C	C	C	C	C			
4,0	Limpieza de la máquina	C	C	C	C	C			
5,0	Nivel de aceite de motor	NA	NA	NA	NA	NA			
6,0	Nivel de combustible	NA	NA	NA	NA	NA			
7,0	Limpieza del filtro de aire del motor (realizar)	NA	NA	NA	NA	NA			
8,0	Yoyo de encendido	C	C	C	C	C			

	2. ESTADO GENERAL	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
9,0	Lubricación de la máquina (realizar)	C	C	C	C	C			
9.1	Control de fugas de agua	NA	NA	NA	NA	NA			
9.2	Poleas y correas	NA	NA	NA	NA	NA			
9.3	Guardas y cubiertas	C	C	C	C	C			
9.4	Disco de corte	C	C	C	C	C			
9.5	Paro de motor	NA	C	C	C	C			
9.6	Verificar fugas de agua	NA	NA	NA	NA	NA			
9.7	Sistema de encendido	C	C	C	C	C			

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evafuara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
9.8	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	C		
9.9	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	C		
10,0	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	C		

NOMBRE DEL OPERADOR	FIRMA	JEFE INMEDIATO / SST	FIRMA
Shiven	Shiven S.	Degsi Jhacindra Herrera Alcoriz	

[redacted]	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MARTILLO DEMOLEDOR	Código: SIG-F-77 Versión: 1 Fecha de Emisión: Noviembre 2023

PROYECTO	Sede EMEGA.		
MARCA	Makita.	MODELO	HM 1306 CB
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del (dd/mm/aaaa) 4-5-2026	al (dd/mm/aaaa) 8-05-2026	

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE), N/A (NO APLICA)

1. ESTADO MECANICO		DÍAS							OBSERVACIONES
		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	
1.1	Conexión neumática sellada	NA	NA	NA	NA	NA			
1.2	Pin para acople ajustado	C	C	C	C	C			
1.3	Manguera sin abolladuras ni ruptura	NA	NA	NA	NA	NA			
1.4	Unidad de lubricación instalada correctamente	C	C	C	C	C			
1.5	Punta rompedora bien instalada	C	C	C	C	C			
1.6	Manijas de agarre en buen estado	C	C	C	C	C			
1.7	Manijas bien sujetas al equipo	C	C	C	C	C			
1.8	Salida de gases sin obstrucción	NA	NA	NA	NA	NA			
1.9	Estado de la plaqueta de identificación	C	C	C	C	C			
1.10	Estado general del martillo	C	C	C	C	C			

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo (Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

2. FACTORES HUMANOS		CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	✓		
2.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo			
2.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	✓		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe Inmediato / SST
FIRMA	[signature]	[signature]
NOMBRE	Witer Canales.	Deysi Herrera,
C.C	1066568089	1035920695.

[redacted]	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA: NOVIEMBRE
	INSPECCION PRE-USO RADIAL	VERSION: 01

SEMANA DEL: 4 AL 8 MES: 5 AÑO: 2026

PROYECTO: Sede energy — SERIE: Stalef - No se ve.

UBICACIÓN: Guarne - Antioquia. — N° EQUIPO: 1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Corte de madera

OPERADOR: Willer Corrales — CC: 1066568089.

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo N/A: No aplica

ITEM	PARAMETRO A REVISAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
EQUIPO	Guarda de proteccion de disco	✓			✓			✓			✓			✓								
	Disco apropiado rpm	✓			✓			✓			✓			✓								
	Suiche de encendido y apagado	✓			✓			✓			✓			✓								
	Instalaciones electricas	✓			✓			✓			✓			✓								
	Hoja de la sierra en buen estado (sin dientes sallados, quebrados, sin sabia de resina pegada)	✓			✓			✓			✓			✓								
	Cuerpo del equipo (fisuras, rupturas)	✓			✓			✓			✓			✓								
	Empuñadura libre de grasa y limpia	✓			✓			✓			✓			✓								
	Sentido de rotancion del disco	✓			✓			✓			✓			✓								
CONDICIONES DE SEGURIDAD	Verifique que el operario este libre de, accesorios, ropa suelta y otros elementos que puedan ser atrapados por las partes moviles, area libre de obstalucutos	✓			✓			✓			✓			✓								
	Verifique que la actividad se realiza sobre superficie estable y nivelada, l longitud del cable alcance el area de corte	✓			✓			✓			✓			✓								
	El operatio observa el sentido de giro y la velocidad del disco, cumple con las especificaciones del fabricante	✓			✓			✓			✓			✓								
	El operario opera la herramienta sin ralizar movimientos oscilantes	✓			✓			✓			✓			✓								
	El operario delimita, abla o demarca el area de trabajo para que ningunapersona este cerca a la operación que se esta realizando	✓			✓			✓			✓			✓								
EPP	El operario utiliza la proteccion auditiva, visual y mascarilla para particulas de polvo, guantes de seguridad, careta para particulas	✓			✓			✓			✓			✓								

UBICACIÓN:		
SERIE:		
FIRMAS	FIRMA DEL OPERADOR	Willer Corrales ·
	FIRMA ENCARGADO DEL AREA (Maestro, supervisor e Ing. Residente)	Carlos Julio Sanchez ·
	FIRMA DE QUIEN AUTORIZA	Cristian Herrera. ·

OBSERVACIONES

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO:

EL EQUIPO FUE:	SI:	NO:	RESPONSABLE:	FECHA:
SEPARADO Y ALMACENADO POR EL OPERADOR:				
REVISADO POR EL MECANICO EN EL CAMPO:				
SEPARADO Y REMITIDO AL ALMACEN:				
OTRO:				

FIRMA DEL OPERARIO QUE REPORTA LA FALLA	FIRMA DE QUIEN AUTORIZA

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
[redacted]	NIVEL 7:	FORMATOS N°:	FT-SST-056
PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE		Fecha:	Noviembre 2025
		Versión:	1
		Página 1 de 1	

DESDE EL DÍA: 4 Mes: 5 Año: 26 Hora: 2pm		HASTA EL DÍA: 8 Mes: 5 Año: 26 Hora: 5 pm.	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Canine.	ÁREA DONDE SE VA A REALIZAR EL TRABAJO:	Sede EMBERA.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:		EQUIPO O MAQUINARIA:	Pulidora - radial - cortadora.

TRABAJO A REALIZAR

Marque con una (x) según corresponda

Soldadura		Oxicorte		Pulidora	X	Otro, ¿Cuál?	cortadora - Radial.

LISTA DE CHEQUEO

Marque con una (x) según corresponda: C: cumple NC: no cumple NA: no aplica

Verificación condiciones de riesgo	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
Se cuenta con procedimiento específico y claro para la labor a desarrollar.	X			X			X			X			X								
Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para trabajar?	X			X			X			X			X								
El personal esta calificado para desarrollar trabajos?	X			X			X			X			X								
Se ha hecho una reunión y el ATS con todos los trabajadores en la tarea?	X			X			X			X			X								
El area de ejecucion de la labor se encuentra limpia, pegada, aislada y es optima para la ejecucion de la tarea.	X			X			X			X			X								
Se señaliza y delimita el area de trabajo, teniendo en cuenta la zona de influencia de potenciales peligros?			X			X			X			X			X						
Se han instalado mamparas y/o se han aislado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o resplandor			X			X			X			X			X						
Se ha hecho la conexión a tierra de los equipos de soldadura u otros requeridos.			X			X			X			X			X						
Se dispone de extintores con capacidad suficiente para uso en caso de incendio	X			X			X			X			X								
Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos en forma correcta con materiales resistentes al fuego			X			X			X			X			X						
El sitio en donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias químicas y de materiales combustibles o inflamables o estan aislados completamente	X			X			X			X			X								
Los equipos a utilizar tienen los cables, conectores, reguladores, mangueras, sopletes en buenas condiciones.	X			X			X			X			X								
Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, están con sus soportes y asegurados correctamente.			X			X			X			X			X						
Los ejecutores conocen el procedimiento de apagar un potencial fuego generado en este trabajo?	X				X		X			X			X								
El equipo y las tuberías están aislados con flanche ciego, drenados y desconectados?			X			X			X			X			X						
Fueron tomadas precauciones para la liberación accidental de vapor/gases inflamables en el area?			X			X			X			X			X						
Fueron realizadas mediciones de gases inflamables/tóxicos en tanques, manholes, líneas, cajas y canaletas			X			X			X			X			X						
La válvula corta-llamas y la línea de la manguera próximas han sido marcadas en las salidas de los cilindros?			X			X			X			X			X						
Los cables eléctricos temporales están en buen estado, sobre zonas secas, son aéreos en zonas de circulación y están encauchetados.	X			X			X			X			X								

PULIDORAS

	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
El personal que realizará el trabajo está entrenado para ejecutar trabajos de pulido	X			X			X			X			X								
La pulidora está en buen estado	X			X			X			X			X								
El disco es el adecuado para la actividad a realizar	X			X			X			X			X								
El disco de corte o pulido se encuentra en buenas condiciones para el uso	X			X			X			X			X								
El cable de conexión eléctrica se encuentra en buenas condiciones	X			X			X			X			X								
La pulidora cuenta con la guarda de seguridad		X			X			X			X			X							
La pulidora cuenta con mango auxiliar			X			X			X			X			X						

AL TERMINAR LA LABOR																					
Se ha dejado el área de trabajo en orden y aseo?	X			X			X			X											
Se ha entregado la máquina/equipo a quien corresponda, verificando las actividades realizadas?	X			X			X			X											
Se retiraron todos los bloqueos, etiquetas y tarjetas?			X			X			X			X									
Se volvieron a colocar las guardas y todos los controles de seguridad de la máquina, incluyendo señales luminosas, sonoras, avisos y pictogramas?			X			X			X			X									
PLAN DE RESCATE																					
Se conoce el plan de respuesta a emergencia del area y hay equipos suficientes?																					
Los trabajadores tienen pleno conocimiento e identificado los brigadistas en caso de emergencia?																					

Marque con una (x) según corresponda: C: cumple NC: no cumple NA: no aplica

Ítem	C	NC	NA	Ítem	C	NC	NA	Ítem	C	NC	NA
Casco de seguridad	X			Visera o Careta			X	Área de trabajo delimitada			
Gafas de seguridad	X			Traje de Soldador			X	Reunión pre operacional			
Guantes (según la actividad a realizar)	X			Polainas para soldador			X	Inspección pre operacional de equipos	X		
Botas de seguridad	X			Mascara para soldar			X	Permiso de Trabajo en Alturas			X
Respirador para polvos o humos	X			Protección auditiva	X		X	Charla de Seguridad			
Respirador para vapores ácidos	X			Otros, ¿Cuál?				Aptitud Física	X		

TRABAJADORES AUTORIZADOS

He verificado con el emisor del permiso, que se cuenta con todas las medidas de seguridad posibles para realizar el trabajo de manera adecuada y segura.

Declaro que me encuentro en óptimas condiciones de salud y considero seguro proceder con la ejecución de este trabajo.

FIRMA DE LOS TRABAJADORES

NOMBRES Y APELLIDOS	NO. IDENTIFICACIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Stiven Manuel Suarez Martinez	1133795220	Stiven S.	Stiven S.	Stiven S.	Stiven S.	Stiven S.		
Wilter Corales	1066568089	Wilter	Wilter	Wilter	Wilter	Wilter		
Luis Eva. L.D Vanegas	8152182	Luis Eva L.D	Luis Eva L.D	Luis Eva L.D	Luis Eva L.D	Luis Eva L.D		

FIRMA	NO. IDENTIFICACIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
JEFE INMEDIATO Cristian Herrera	1035921894	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]			
ENCARGADO DE SST Deysi Herrera	1035920697	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]			
FECHA 4-8-May-2026.								

[redacted]	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FORMATO [illegible]-SST
	SG-SST	FECHA: 10-03-2025
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	VERSIÓN: 1

PROYECTO: Sede EMEGA CIUDAD: GUARNE PULIDORA N°: 1
MARCA: _____ FECHA INICIO DE ACTIVIDAD: 4-05-2026 - 8-05-26 CONTRATISTA: CADBIM
NOMBRE TRABAJADOR: Luis Emilio CÉDULA: 8152182

PUNTOS DE INSPECCIÓN	LUN	MAR	MIER	JUEV	VIER	SAB	DOM
CONDICIONES:							
1. ¿Se realizó una inspección del lugar donde se ejecutará el trabajo antes de realizar actividades?	B	B	B	B	B		
2. ¿Se cuenta con todos los elementos de protección personal para realizar la labor?	B	B	B	B	B		
3. ¿El sitio donde se ejecuta el trabajo está bien ventilado?	B	B	B	B	B		
4. ¿El sitio de trabajo está libre de material combustible o inflamable?	B	B	B	B	B		
5. ¿Los trabajadores están debidamente entrenados, capacitados y autorizados para realizar su labor?	B	B	B	B	B		
6. ¿Se han dispuesto extintores adecuados para la actividad, debidamente recargados y en buenas condiciones?	B	B	B	B	B		
7. ¿Las instalaciones subterráneas de servicio público (electricidad, teléfono, gas, agua y otros han sido identificadas)?	NA	NA	NA	NA	NA		
8. ¿Se han identificado las vías de evacuación?	B	B	B	B	B		
9. ¿Los trabajadores realizan el trabajo con las normas de seguridad necesarias para la actividad?	B	B	B	B	B		
10. ¿Se mantienen las vías de acceso sin obstáculos?	B	B	B	B	B		
11. ¿Al terminar la actividad se deja el área de trabajo ordenada y aseada?	B	B	B	B	B		
EQUIPO:							
1. ¿Conexiones eléctricas (cables, extensiones, tomas) del equipo en buenas condiciones?	B	B	B	B	B		
2. ¿Disco completo, sin defectos?	B	B	B	B	B		
3. ¿Estado de interruptor de encendido y su seguro en buen estado?	B	B	B	B	B		
4. ¿Accesorios de portadiscos en buen estado?	B	B	B	B	B		
5. ¿El tipo de disco es acorde al material a pulir?	B	B	B	B	B		
6. ¿Guarda de seguridad en buen estado?	NA	NA	NA	NA	NA		
7. ¿Llaves para desmonte de disco en buen estado?	B	B	B	B	B		
8. ¿Mango de agarre y cuerpo en buen estado?	B	B	B	B	B		
9. ¿no cuenta con anomalías en general? (fisuras, rupturas, etc.)	B	B	B	B	B		
10. ¿Cuenta con buenas condiciones de aseo?	B.	B	B	B	B		
CONDICIONES DE SALUD:							
1. ¿Los trabajadores declaran no haber consumido sustancias psicoactivas (alcohol, drogas)?	OK	OK	OK	OK	OK		
2. ¿Esta en condiciones óptimas de salud para realizar el trabajo?	OK	OK	OK	OK	OK		
3. ¿Sufre de trastorno de equilibrio, mareo, vértigo?	OK	OK	OK	OK	OK		
4. ¿Sufre de enfermedad diarreica, infecciosa o febril aguda y/o vómito?	OK	OK	OK	OK	OK		
5. ¿Consume actualmente un tipo de medicamento? Cual:	NO	NO	NO	NO	NO		
VISTO BUENO DEL TRABAJADOR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
VISTO BUENO DE PROFESIONAL QUE REALIZÓ INSPECCIÓN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

Nota: califique el estado actual de las condiciones y el equipo de acuerdo a los criterios de la tabla 1.

Tabla 1: Criterios de calificación

CRITERIO DE CALIFICACIÓN	
Bueno	SI
Malo	NO
No Aplica	N/A

Tabla 2: Observaciones

OBSERVACIONES			
FECHA			COMENTARIOS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	

NOMBRE DEL INSPECTOR: Luis Emilio T.
CARGO: Oficial
FIRMA: [illegible]

[redacted]	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	NIVEL 7:	FORMATOS N°:	FT-SST-056
PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE		Fecha:	Noviembre 2025
		Versión:	1
		Página 1 de 1	

DESDE EL DÍA: 22 Mes: 5 Año: 26 Hora: 7 am		HASTA EL DÍA: 15 Mes: 5 Año: 26 Hora: 4:30 pm	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Cajamarca	ÁREA DONDE SE VA A REALIZAR EL TRABAJO:	Centro - losa Catadora.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:	corte ladrillo cocido	EQUIPO O MAQUINARIA:	

TRABAJO A REALIZAR

Marque con una (x) según corresponda

Soldadura		Oxicorte		Pulidora	X	Otro. ¿Cuál?

LISTA DE CHEQUEO

Marque con una (x) según corresponda: C: cumple NC: no cumple NA: no aplica

Verificación condiciones de riesgo	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
Se cuenta con procedimiento específico y claro para la labor a desarrollar.	X			X			X			X			X								
Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para trabajar?	X			X			X			X			X								
El personal esta calificado para desarrollar trabajos?	X			X			X			X			X								
Se ha hecho una reunión y el ATS con todos los implicados en la tarea?	X			X			X			X			X								
El area de ejecucion de la labor se encuentra limpia, purgada, aislada y es optima para la ejecucion de la tarea.	X			X			X			X			X								
Se señaliza y delimito el area de trabajo, teniendo en cuenta la zona de influencia de potenciales peligros?			X			X			X			X			X						
Se han instalado mamparas y/o se han aislado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o resplandor			X			X			X			X			X						
Se ha hecho la conexión a tierra de los equipos de soldadura u otros requeridos.			X			X			X			X			X						
Se dispone de extintores con capacidad suficiente para uso en caso de incendio	X			X			X			X			X								
Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos en forma correcta con materiales resistentes al fuego			X			X			X			X			X						
El sitio en donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias químicas y de materiales combustibles e inflamables o estan aislados completamente	X			X			X			X			X								
Los equipos a utilizar tienen los cables, conectores, reguladores, mangueras, sopletes en buenas condiciones.	X			X			X			X			X								
Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, están con sus soportes y asegurados correctamente.			X			X			X			X			X						
Los ejecutores conocen el procedimiento de apagar un potencial fuego generado en este trabajo?	X			X			X			X			X								
El equipo y las tuberías están aislados con flancho ciego, drenados y desconectados?			X			X			X			X			X						
Fueron tomadas precauciones para la liberación accidental de vapor/gases inflamables en el area?			X			X			X			X			X						
Fueron realizadas mediciones de gases inflamables/tóxicos en tanques, manholes, tinas, cajas y canaletas			X			X			X			X			X						
La válvula corta-llamas y la línea de la manguera próximas a han sido marcadas en las salidas de los cilindro?			X			X			X			X			X						
Los cables eléctricos temporales están en buen estado, sobre zonas secas, son aéreos en zonas de circulación y están encauchetados.	X			X			X			X			X								

PULIDORAS

	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
El personal que realizará el trabajo está autorizado para ejecutar trabajos de pulido	X			X			X			X			X								
La pulidora está en buen estado	X			X			X			X			X								
El disco es el adecuado para la actividad a realizar	X			X			X			X			X								
El disco de corte o pulido se encuentra en buenas condiciones para el uso	X			X			X			X			X								
El cable de conexión eléctrica se encuentra en buenas condiciones	X			X			X			X			X								
La pulidora cuenta con la guarda de seguridad	X			X			X			X			X								
La pulidora cuenta con mango móvil			X			X			X			X			X						

AL TERMINAR LA LABOR																								
Se ha dejado el área de trabajo en orden y aseo?	X			X			X			X														
Se ha verificado la máquina, equipo o aquí en corresponda, verificando las actividades realizadas?	X			X			X			X														
Se retiraron todos los candados, etiquetas y tarjetas?			X			X			X			X												
Se volvieron a colocar las guardas y todos los controles de seguridad de la máquina, incluyendo señales luminosas, sonoras, avisos y pictogramas?			X			X			X			X												

PLAN DE RESCATE																								
Se conoce el plan de respuesta a emergencia del area y hay equipos suficientes?	X			X			X			X														
Los trabajadores tienen pleno conocimiento e identificado los brigadistas en caso de emergencia?	X			X			X			X														

Marque con una (X) según corresponda: C: cumple NC: no cumple NA: no aplica

Item	C	NC	NA	Item	C	NC	NA	Item	C	NC	NA
Casco de seguridad	X			Visera o Careta			X	Área de trabajo delimitada			
Gafas de seguridad	X			Traje de Soldador			X	Reunión pre operacional			
Guantes (según la actividad a realizar)	X			Polainas para soldador			X	Inspección pre operacional de equipos	X		
Botas de seguridad	X			Mascara para soldar			X	Permiso de Trabajo en Alturas			X
Respirador para polvos o humos	X			Protección auditiva	X			Charla de Seguridad			
Respirador para vapores ácidos	X			Otros, ¿Cuál?				Aptitud Física	X		

TRABAJADORES AUTORIZADOS

He verificado con el emisor del permiso, que se cuenta con todas las medidas de seguridad posibles para realizar el trabajo de manera adecuada y segura.

Declaro que me encuentro en óptimas condiciones de salud y considero seguro proceder con la ejecución de este trabajo.

FIRMA DE LOS TRABAJADORES

NOMBRES Y APELLIDOS	NO. IDENTIFICACIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Luis Emilio Vanegas Tabarda	8152182							
FIRMA	NO. IDENTIFICACIÓN	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
JEFE INMEDIATO Cristian Herrera	1035921884							
ENCARGADO DE SST Dayci Martinez Herrera	1035470692							
FECHA								

[redacted]	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA: NOVIEMBRE
	INSPECCION PRE-USO RADIAL	VERSION: 01

SEMANA DEL: 11 AL 15 MES: 03 AÑO: 2026

PROYECTO: EMEGA — SERIE: Stanley - Stanley

UBICACIÓN: GUAINE — N° EQUIPO: 1

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: corte de madera

OPERADOR: Wisemilio Venegas Taborda. — CC: 8152182

CALIFIQUE: B: Bueno M: Malo N/A: No aplica

ITEM	PARAMETRO A REVISAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
EQUIPO	Guarda de proteccion de disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Disco apropiado rpm	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Suiche de encendido y apagado	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Instalaciones electricas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Hoja de la sierra en buen estado (sin dientes saliados, quebrados, sin sabia de resina pegada)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cuerpo del equipo (fisuras, rupturas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Empuñadura libre de grasa y limpia	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Sentido de rotancion del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CONDICIONES DE SEGURIDAD	Verifique que el operario este libre de, accesorios, ropa suelta y otros elementos que puedan ser atrapados por las partes moviles, area libre de obstaluculos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Verifique que la actividad se realiza sobre superficie establey nivelada, l longitud del cable alcance el area de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El operatio observa el sentido de giro y la velocidad del disco, cumple con las especificaciones del fabricante	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El operario opera la herramienta sin rallzar movimientos oscilantes	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	El operario delimita, aisla o demarca el area de trabajo para que ningunapersona este cerca a la operación que se esta realizando	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
EPP	El operario utiliza la proteccion auditiva, visual y mascarilla para particulas de polvo, guantes de seguridad, careta para particulas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

UBICACIÓN:		EMEGA.
SERIE:		UTS9243552.
FIRMAS	FIRMA DEL OPERADOR	
	FIRMA ENCARGADO DEL AREA (Maestro, supervisor e Ing. Residente)	
	FIRMA DE QUIEN AUTORIZA	

OBSERVACIONES

EN CASO DE FALLA DEL EQUIPO:

EL EQUIPO FUE:	SI:	NO:	RESPONSABLE:	FECHA:
SEPARADO Y ALMACENADO POR EL OPERADOR:				
REVISADO POR EL MECANICO EN EL CAMPO:				
SEPARADO Y REMITIDO AL ALMACEN:				
OTRO:				

FIRMA DEL OPERARIO QUE REPORTA LA FALLA	FIRMA DE QUIEN AUTORIZA

[redacted]	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CORTADORA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SIG Versión: 01 Fecha de Emisión: 2025

PROYECTO	ENEGA		
MARCA		MODELO	
FECHA INSPECCIÓN (Semana)	del (dd/mmm/aa) 11-05	al (dd/mmm/aa) 15-05-2026.	
TIPO DE CORTADORA	Aserradora ___ Cortarora X Cortador de concreto ___ Otro _____		

Marque en las casillas con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. MECÁNICO	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1,0	Control de fugas de aceite	NA	NA	NA	NA	NA			
2,0	Control de fugas de combustible	NA	NA	NA	NA	NA			
3,0	Ajuste de tuercas y tornillos	C	C	C	C	C			
4,0	Limpieza de la máquina	C	C	C	C	C			
5,0	Nivel de aceite de motor	NA	NA	NA	NA	NA			
6,0	Nivel de combustible	NA	NA	NA	NA	NA			
7,0	Limpieza del filtro de aire del motor (realizar)	NA	NA	NA	NA	NA			
8,0	Yoyo de encendido	C	C	C	C	C			

	2. ESTADO GENERAL	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
9,0	Lubricación de la máquina (realizar)	C	C	C	C	C			
9.1	Control de fugas de agua	NA	NA	NA	NA	NA			
9.2	Poleas y correas	NA	NA	NA	NA	NA			
9.3	Guardas y cubiertas	C	C	C	C	C			
9.4	Disco de corte	C	C	C	C	C			
9.5	Paro de motor	C	C	C	C	C			
9.6	Verificar fugas de agua	NA	NA	NA	NA	NA			
9.7	Sistema de encendido	C	C	C	C	C			

El siguiente ítem se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponde)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
9.8	Cumple con las instrucciones de Operatividad del equipo?	C		
9.9	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo	C		
10,0	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras	C		

NOMBRE DEL OPERADOR	FIRMA	JEFE INMEDIATO / SST	FIRMA
Edgar Antonio Fonseca	[signature]	Deysi Hernandez Herrera	[signature]

INSPECCION PREOPERACIONAL PARA ROTOMARTILLO

	CODIGO:SIN-INF-FO-24	FECHA: FEBRERO 2024	VERSION: 001	PAGINA: 1 DE 1

FECHA DE LA INSPECCION 11 mayo 2026.

PERIODO: DEL 11 05 AL 15 05 DEL 2026.

ROTOMARTILLO N°

MARCA: Makita.

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
EL CABLE DE ALIMENTACION ESTA COMPLETO Y EN BUEN ESTADO	X		X		X		X		X					
LA CARCAZA ESTA COMPLETA, AJUSTADA Y SIN GOLPES	X		X		X		X		X					
ESTADO DE ACCESORIOS PORTA BROCAS-MADRIL	X		X		X		X		X					
EL INTERRUPTOR DE VELOCIDAD VARIABLE ESTA EN BUEN ESTADO	X		X		X		X		X					
EL BOTON DE CONTROL DE AVANCE Y REVERSA ESTA EN BUEN ESTADO Y ES FUNCIONAL	NA		NA		NA		NA		NA					
EL BOTON DE BLOQUEO ESTA EN BUEN ESTADO Y ES FUNCIONAL	X		X		X		X		X					
EL SECTOR DE MODOS ESTA EN BUEN ESTADO - FUNCIONAL	NA		NA		NA		NA		NA					
TIENE EL MANGO LATERAL MULTIPOSICION EN BUEN ESTADO	X		X		X		X		X					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	X		X		X		X		X					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	NA		NA		NA		NA		NA					
ESTAN COMPLETOS LOS ACCESORIOS DEL EQUIPO: TOPE DE PROFUNDIDAD Y CAJA PLASTICA	X		X		X		X		X					
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR														
FIRMA SST														

FUERA DE SERVICIO SI NO

FIRMA RECIBIDO TALLER	

OBSERVACIONES:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo.

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
	NIVEL 7:	FORMATOS N°:	FT-SST-056

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

Fecha:	Noviembre 2
Versión:	1
	Pagina 1 de 1

DESDE EL DÍA: 19 Mes: 5 Año: 26 Hora: 7 am

HASTA EL DÍA: 22 Mes: 5 Año: 26 Hora: 5 pm

CIUDAD/MUNICIPIO:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

ÁREA DONDE SE VA A REALIZAR EL TRABAJO:

EQUIPO O MAQUINARIA:

TRABAJO A REALIZAR

Soldadura

Marque con una (x) según corresponda

Oxicorte | Pulidora | Otro, ¿Cuál?

LISTA DE CHEQUEO

Marque con una (x) según corresponda: C: cumple NC: no cumple NA: no aplica

Verificación condiciones de riesgo	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
Se cuenta con procedimiento específico y claro para la labor a desarrollar.	X			X			X			X			X								
Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para trabajar?	X			X			X			X			X								
El personal esta calificado para desarrollar trabajos?	X			X			X			X			X								
Se ha hecho una reunión y el ATS con todos los implicados en la tarea?	X			X			X			X			X								
El area de ejecucción de la labor se encuentra limpia, purgada, aislada y es optima para la ejecucción de la tarea.	X			X			X			X			X								
Se señalizo y delimito el area de trabajo, teniendo en cuenta la zona de influencia de potenciales peligros?	X			X			X			X			X								
Se han instalado mamparas y/o se han aislado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o resplandor			X			X			X			X									
Se ha hecho la conexión a tierra de los equipos de soldadura u otros requeridos.	X			X			X			X			X								
Se dispone de extintores con capacidad suficiente para uso en caso de incendio	X			X			X			X			X								
Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos en forma correcta con materiales resistentes al fuego	X			X			X			X			X								
El sitio en donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias químicas y de materiales combustibles o inflamables o estan aislados completamente	X			X			X			X			X								
Los equipos a utilizar tienen las caibas, conectoras, reguladores, mangueras, sopletes en buenas condiciones.			X			X			X			X			X						
Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, están con sus soportes y asegurados correctamente.	X			X			X			X			X								
Los ejecutores conocen el procedimiento de apagar un potencial fuego generado en este trabajo?	X		X	X		X	X		X	X		X	X		X						
El equipo y las tuberías están aislados con flancha ciega, drenados y desconectados?			X			X			X			X			X						
Fueron tomadas precauciones para la liberación accidental de vapor/gases inflamables en el area?			X			X			X			X			X						
Fueron realizadas mediciones de gases inflamables/tóxicos en tanques, manholes, líneas, cajas y canaletas			X			X			X			X			X						
La válvula corta-llamas y la línea de la manguera próximas han sido marcadas en las salidas de los cilindro?			X			X			X			X			X						
Los cables eléctricos temporales están en buen estado, sobre zonas secas, son aéreos en zonas de circulación y están encauchetados.	X			X			X														

PULIDORAS

	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
El personal que realizará el trabajo está autorizado para ejecutar trabajos de pulido	X			X			X			X			X								
La pulidora está en buen estado	X			X			X			X			X								
El disco es el adecuado para la actividad a realizar	X			X			X			X			X								
El disco de corte o pulido se encuentra en buenas condiciones para el uso	X			X			X			X			X								
El cable de conexión eléctrica se encuentra en buenas condiciones	X			X			X			X			X								
La pulidora cuenta con la guarda de seguridad	X			X			X			X			X								
La pulidora cuenta con mango móvil	X			X			X			X			X								

| AL TERMINAR LA LABOR | | |

	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL DE PLUMA		
	Código: FO-MEJ-68	Versión: 01	Fecha: Noviembre 2023

PLUMA No. 1 MARCA

OBRA EMEGA SEMANA DEL 11 AL 15 mayo 2026

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
	PLUMA														
ESTADO GENERAL	Anclaje	X		X		X		X		X					
	A la placa	X		X		X		X		X					
	Con pasos de anclaje en forma de U	X		X		X		X		X					
	CABLE														
	Buen estado	X		X		X		X		X					
	Diametro adecuado	X		X		X		X		X					
	Capacidad requerido	X		X		X		X		X					
	Tres grilletes en el anclajo	X		X		X		X		X					
	REVISION														
	Motor	X		X		X		X		X					
	Instalaciones eléctricas	X		X		X		X		X					
	Las guardas están en su sitio	X		X		X		X		X					
	El amarre de la carga es seguro	X		X		X		X		X					
	Los cajones estan completos	X		X		X		X		X					
	OPERADOR														
	Buena visibilidad	X		X		X		X		X					
	Usa código de señales con sus compañeros	X		X		X		X		X					
	Velocidad de manejo es la adecuada	X		X		X		X		X					
FIRMAS	¿QUIEN LO OPERA?	FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR	
		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]					
	NOMBRE DEL SISO	Dayci Jhanndra Herrera Alcaraz.													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

BAW

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

NIVEL 7: **FORMATOS N°:** FT-SST-046

REGISTRO DE PAUSAS ACTIVAS

Fecha:	Noviembre 2025
Versión:	1
Pagina 1 de 1	

FECHA DE ELABORACIÓN	DD	MM	AAAA	HASTA	DD	MM	AAAA
	05	5	2026		8	5	2026

CIUDAD/ MUNICIPIO	Guarne	UBICACIÓN DONDE SE REALIZA EL TRABAJO:	Sede EMEGA

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	FIRMA DEL TRABAJADOR						
				LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
1	Carlos Julio Gallego Sanchez	79825041	Maestro	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
2	Ernesto Leon Peña Florez	1063361174	Ayudante	ERNESTO	ERNESTO	ERNESTO	ERNESTO	ERNESTO		
3	Luis Emilio Vanegas Taborda	8152182	Oficial	EDGAR	EDGAR	EDGAR	EDGAR	EDGAR		
4	Edgar Antonio Gonzalez Gonzalez	1237444299	Oficial	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
5	Jose Roberto Jaramillo Mira	71639928	Oficial	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
6	Robinson Jesus Salas Aular	PPT 925526	Ayudante	—	—					
7	Steven Manuel Suarez Martinez	1133795220	Ayudante	Stiven S	Stiven S	Stiven S.	Stiven S.	Stiven S.		
8	Henyerbert Jesus Silva Silva	PPT 6372903	Ayudante	Ret	Ret	Ret	Ret	Ret		
9	Erley Hernandez	6325239	Ayudante	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
10	Hector David Martinez Perez	1071431959	Ayudante	Hector	Hector	Hector	Hector	Hector		
11	Juan David Ortega Talaigua	1068666417	Ayudante	Juan David	Juan David	Juan David	Juan David	Juan David		
12	Wilter Yair Corrales Fernandez	1066568089	Ayudante		Wilter	Wilter	Wilter	Wilter		
13	Leonardo Cisneros Peña	5048012	Ayudante.	Leonardo	Leonardo	Leonardo	Leonardo	Leonardo		
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

FIRMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DEYSI JHAZINDRA HERRERA ALCARAZ	FECHA	5-8 Mayo 2026

[redacted]	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL DE PLUMA		
	Código: FO-MEJ-68	Versión: 01	Fecha: Noviembre 2023

PLUMA No. 1 MARCA

OBRA Sede EMEGA SEMANA DEL 4-05 AL 8-05-2026.

ITEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERC. B	MIERC. M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ESTADO GENERAL	PLUMA														
	Anclaje	X		X		X		X		X					
	A la placa	X		X		X		X		X					
	Con pasos de anclaje en forma de U	X		X		X		X		X					
	CABLE														
	Buen estado	X		X		X		X		X					
	Diámetro adecuado	X		X		X		X		X					
	Capacidad requerida	X		X		X		X		X					
	Tres grilletes en el anclaje	X		X		X		X		X					
	REVISION														
	Motor	X		X		X		X		X					
	Instalaciones eléctricas	X		X		X		X		X					
	Las guardas están en su sitio	X		X		X		X		X					
	El amarre de la carga es seguro	X		X		X		X		X					
	Los cajones estan completos	X		X		X		X		X					
	OPERADOR														
	Buena visibilidad	X		X		X		X		X					
	Usa código de señales con sus compañeros	X		X		X		X		X					
	Velocidad de manejo es la adecuada	X		X		X		X		X					
FIRMAS	¿QUIEN LO OPERA?	FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR	
		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]					
	NOMBRE DEL SISO	Deysi Jhazindra Herrera Alcaraz.													

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

BAW

Factura Electrónica De Venta No

GB No. 138

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764101952323 que habilita desde GB 51 hasta GB 1000. Vence 2026-11-24

GRUPO BAW S.A.S.

Nit 901411511 **- 4**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0 0.00 X 1000

CLIENTE	EMPRESA DE DESARROLLO,COMPETITIVIDAD Y PRODU		
NIT	901494307 3		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
GUARNE 26	Guarne		

POR CONCEPTO DE

CONTRATO COP-079 DE 2025 CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE GUARNE

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**
18/06/2026	18/06/2026	ANDERSON STEVE BARRERA ARIAS

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41309501	Contrato Obra Civil	1	Und.	253.041.688	0%	0	253.041.688
2	41309502	Administración	1	Und.	63.260.422	0%	0	63.260.422
3	41309504	Utilidad	1	Und.	12.652.084	0%	0	12.652.084

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**328.954.194**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**328.954.194**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**328.954.194**

Valor en Letras

TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/06/2026 11:05:30

VDA SAN JOSE CONDOMINIO TERRASANTA CA 6 Teléfono 3218303768 Guarne

Correo Electrónico facturacion@baw.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 01bdfd6317f03e2f16ec5986e0380c9b5889c0ffff74ba0c9f8902e6f20207a9b7d2e483f932367495bb20b4f4c84c59 --Fecha y Hora de Expedición : 18/06/2026 3:42:36 p. m.

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Emega - Nit: 901494307
Martes, 23 de junio de 2026, 12:49:29 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
23 Jun 2026

Nombre del destinatario
Elim Investments S

Identificación destinatario
901839301

Producto destino
236 - 000058 - 62

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 269.084.530,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.249.179.108
