"INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO"

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
FRENTE MOCOA



EXPLANACIÓN TERRAZA 4 TALUD 13 K11+590 – K11+680 M.I. – VISTA CORONA TALUD 13N

ABRIL DE 2026

Rev.	Fecha	Descripción	Elaborado por	Reviso	Aprobó
✓	✓	✓	✓		Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO
00	**30/04/2026**	**INFORME MENSUAL**	**Consorcio Reactivación Putumayo**	**Ing. José Ignacio Cadena López**	**Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas.**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

Contrato de Obra No. 964 de 2021 **Contratista:** CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

Contrato de Interventoría No. 977 de 2021 **Interventoría:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

Objeto Contrato de Obra:
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

INFORME MENSUAL No. 58 **MES O PERIODO:** ABRIL DE 2026

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		3
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		4
2.1	Localización		4
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		6
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		7
2.4	Características técnicas del proyecto		7
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA No 964 de 2021**		9
3.1	Información general del contrato		9
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		10
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		14
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		16
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA No 964 DE 2021**		17
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	18
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	38
4.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	40
4.4	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	43
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	108
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	110
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	539
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	540
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	618
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	623
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	632
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 977 DE 2021**		642
5.1	Información general del contrato		642
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		643
5.3	Informe Especialistas y Profesionales		728
5.4	Informe del Programa Anual de Caja PAC		729
6	**Conclusiones y recomendaciones**		731
7	**Anexos**		732
7.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		733
7.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		744
7.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		761
7.4	Copia de la Bitácora Contrato 964 de 2021		775

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firmado digitalmente por BURBANO BARCENAS JOSE RICARDO

Firma:

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 1624 de fecha 22/06/2021

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **PERIODO MES:** ABRIL DE 2026

CONTRATO DE OBRA No.: 964 DE 2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR

PLAZO INICIAL:	114 MESES
FECHA DE INICIO:	2 DE JULIO DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 DE AGOSTO DE 2030
PLAZO ACUMULADO:	N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 541.389.953.817,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 541.389.953.817,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ 8.030.482.547,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 2.999.363.684,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 977 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	
Pavimentación	Construcción a cielo abierto Sector 3	km	7,77	* sector 3
	Mejoramiento	km		
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles	km	1,35	* sector 3
	Puentes	UND	31,00	* sector 3
	Pontones			
Mantenimiento	Vía Existente Sector 4	km	8,03	
Terminación	Pavimento MR	km	1,40	
Otros				

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción a cielo abierto	Km		1,00
	Mejoramiento	Km	-	8,13
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles	m	-	-
	Puentes	UND	-	1,00
	Pontones			
Mantenimiento	Vía Existente Sector 4	km	-	8,03
Terminación	Pavimento MR	km		0,63
Otros				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 343.727.160.196	$ 2.511.852.325	$ 346.239.012.520
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 158.751.273.447	$ 1.160.105.460	$ 159.911.378.907
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 1.100.000.000	$ 8.038.462	$ 1.108.038.462
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 8.481.753.347	$ 1.611.533.136	$ 10.093.286.483
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 17.000.979.054	$ 3.230.186.020	$ 20.231.165.074
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 272.268.908	$ 51.731.093	$ 324.000.001
MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 2.926.951.572	$ 556.120.799	$ 3.483.072.371
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 532.260.386.524**	**$ 8.573.446.495**	**$ 541.389.953.817**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	**$ 2.632.102.462,00**	**$ 19.234.595**	**$ 2.651.337.057,00**	**$ 148.681.959.035,00**
AJUSTES			**$ -**	**$ 28.898.198.445,00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			**$ -**	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			**$ -**	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			**$ -**	**$ 2.681.126.287,00**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	**$ 62.253.150,00**	**$ 454.928,00**	**$ 62.708.078,00**	**$ 884.434.641,00**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	**$ 22.351.294,00**	**$ 103.579,00**	**$ 22.454.873,00**	**$ 1.365.391.962,00**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	**$ 36.157.717,00**	**$ 944.706,00**	**$ 37.102.423,00**	**$ 324.390.205,00**
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			**$ -**	**$ -**
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19			**$ -**	**$ 49.515.320,00**
MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	**$ 1.230.746.130,00**	**$ 233.841.765,00**	**$ 1.464.587.895,00**	**$ 1.464.587.895,00**
VALOR EJECUTADO	**$ 3.983.610.753,00**	**$ 254.579.573,00**	**$ 4.238.190.326,00**	**$ 184.349.603.790,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 152.728.859.105	Acumulado antes de IVA
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 147.603.319.394	Acumulado antes de IVA
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	96,64%	

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	266
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	181
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	204
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	447

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Mantenimiento vía existente El Pepino - San Francisco - conformación de calzada



Muro 7 (K11+428/459) MD: adecuación para construcción de los 3 móduios del muro caisson 5 ϕ=1.50 m



panorámica estabilización de talud 13 y 13N



Panorámica avance construcción de anillos para caissons del Muro Y2 K11+790/835 M.D



Talud 13 N K11+720/804 M.I: estabilización con pernos autoperforantes en terrazas 1 y 2

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

PENDIENTE AMBIENTAL	COMUNICADO	RADICADO INVIAS	ESTADO
1. No informar a la Interventoría en un término no mayor de 3 días hábiles posterior a la notificación, todos los actos administrativos y/o requerimientos realizados por las autoridades ambientales. 2. No presentar a la Interventoría en los plazos solicitados por ésta, los documentos elaborados para las Autoridades Ambientales. 3. No reportar a la Autoridad Ambiental el valor correcto de la liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1% y en el plazo establecido por ésta.	Putumayo04-5625-24	2024E-VUVRAZ-076341 del 14/08/2024	En revisión de INVIAS
1. Realizar aprovechamiento forestal entre las abscisas K10+518 al K11+640 por fuera del polígono sustraído. 2. Realizar aprovechamiento forestal entre las abscisas K10+518 al K11+640 por fuera del polígono licenciado. 3. Ejecutar obras entre las abscisas K10+518 al K11+640 por fuera del polígono sustraído. 4. Ejecutar obras entre las abscisas K10+518 al K11+640 por fuera del polígono licenciado. 5. No informar dentro del término legalmente establecido de veinticuatro (24) horas a la Autoridad Ambiental sobre la ocurrencia de las contingencias del K10+518 al K11+280 y no reportar los avances parciales en la atención de las contingencias dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a su ocurrencia. 6. No presentar los documentos requeridos para radicar la solicitud de la cesión parcial de la sustracción de Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa para el frente Mocoa, ante el MADS.	Putumayo04-7223-25	2025E-VUVRAZ-110675 del 02/10/2025	En revisión de INVIAS

Firma
Nombre: JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-31528 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

Con base en lo establecido en los términos de referencia del Contrato de Interventoría No. 977 de 2021, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el Consorcio Reactivación Putumayo, y en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Interventoría del 2022, en el presente Informe se sintetizan las actividades realizadas por la Interventoría durante el periodo evaluado. Las actividades que se mencionan en este documento están relacionadas con actividades y gestiones asociadas a temas propios de los componentes administrativo, operativo y técnico, dentro de las cuales se resaltan los asociados a aspectos geométricos, geotécnicos, estructurales, ambientales, sociales y prediales que se desarrollaron durante el periodo mencionado.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Localización del proyecto

… ( ) "La variante San Francisco – Mocoa, con una longitud estimada de 44,07 km se desarrolla en la parte noroccidental del departamento del Putumayo, República de Colombia, en jurisdicción de los municipios de Mocoa y de San Francisco. Estos municipios actualmente están interconectados por una carretera de 76,3 km en terreno escarpado, de bajas especificaciones técnicas. La construcción de la Variante tiene como objetivo unir por la margen derecha del Río Mocoa, a las poblaciones de Mocoa y San Francisco, para sustituir la vía actual, pasando a formar parte de la carretera Pasto-Mocoa y a su vez convertirse en corredor alterno que servirá de conexión a la zona sur con el centro del país.

De acuerdo con lo anterior, mediante resolución No. 2170 de 2008, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, concedió la Licencia Ambiental para la Construcción de la Variante San Francisco-Mocoa con base en los diseños adelantados por el consorcio DIN-SEDIC (2006). El diseño del año 2006 (DIN-SEDIC), optó por trazar la vía sobre la margen derecha del Río Mocoa mediante un trazado sinuoso atravesando la reserva forestal protectora de la cuenca alta del Río Mocoa (RFPCARM) afectando un área del orden de 90 hectáreas de manera definitiva y de 5 hectáreas de manera temporal (incluye un derecho de vía de 30 metros, 15 m a cada lado del eje vial).

El diseño estaba planteado con la implantación del proyecto a cielo abierto, observando cortes a media ladera, sobre suelos residuales, donde se presentan los mayores índices de vulnerabilidad y riesgo causados por los procesos potenciales de inestabilidad de las laderas naturales; lo cual, sumado a los altos volúmenes de explanación y la disposición final de los mismos, así como la pérdida de cobertura vegetal, generaban un incremento en los impactos ambientales. Así mismo, el proyecto cuenta con una limitante de carácter ambiental, la cual obliga a que el ancho del corredor no supere los 15 metros a cada lado del eje de la vía, contando con sólo 30 metros de ancho para su construcción, incluidos cortes y rellenos, lo que generaba inclinaciones muy fuertes requiriéndose la construcción de obras de estabilización y contención de gran envergadura. Por las razones expuestas anteriormente, se adelantó las actividades de ajustes y/o modificación de los diseños para el área del proyecto incluida dentro de la Reserva Forestal correspondiente a los Sectores 2 y 3 cuya longitud aproximada es de 26,38 km, que definiera un trazado que se adaptará mejor a la categoría de la vía y cuyos impactos ambientales fueran disminuidos.

Del trazado original, mediante Contrato 407 de 2010, se actualizaron 26,38 km sectores 2 y 3 entre las abscisas K7+103 y la K33+480, la actualización de los estudios y diseños

cambió sustancialmente la filosofía del trazado inicial, evitando al máximo los cortes y las zonas inestables y por ello, el diseño actual se materializa a través de la construcción de una vía compuesta por 61 puentes que representan un 58 % del corredor, cuya longitud total sumada asciende a 15.242 metros, 11 túneles que a su vez constituyen un 11% del corredor cuya longitud total corresponde a 2.809 metros y una condición a cielo abierto de tan solo un 31% del total del corredor con longitud de 8.326 metros, cuya longitud total es de 26,38 km." ( )… [Extracto anexo técnico contrato 1111 y 964 de 2021, pág. 4 y 5]. Condiciones iniciales del Contrato 1111 y 964 de 2021, las cuales se irán ajustando de acuerdo al rediseño del proyecto.

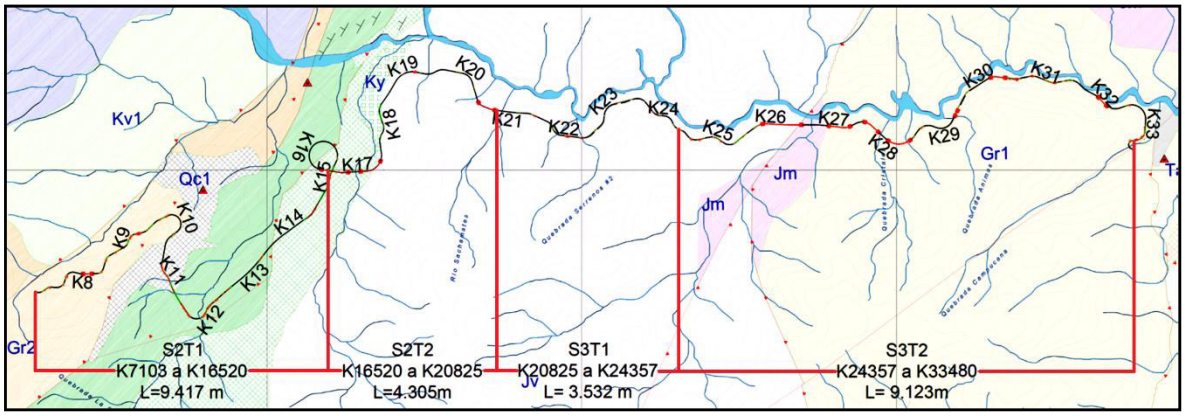


Fig. No. 01 – Variante San Francisco Mocoa – Vía proyectada

Sectorización del Proyecto.

En la siguiente imagen se registra la localización del corredor objeto de intervención con la ejecución del presente proyecto.

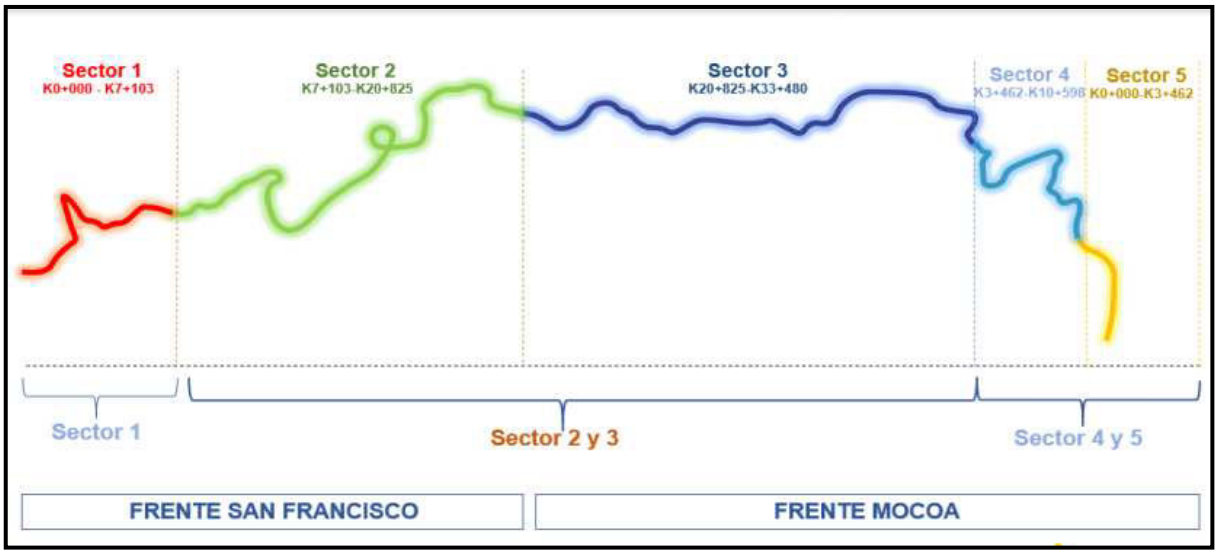


Fig. No. 03 Sectorización del Proyecto VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA

2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

La zona de influencia está enmarcada en los Departamentos de Nariño y Putumayo principalmente, se ejecuta en los Municipios de San Francisco y Mocoa (Putumayo), como principales áreas de influencia del proyecto.

La variante San Francisco – Mocoa es un proyecto que busca brindar una conectividad adecuada entre la zona del bajo Putumayo con la costa del océano Pacífico, al formar parte del corredor transversal Tumaco – Pasto – Mocoa, para lograr una intercomunicación vial con otros países del área como son: Ecuador, Perú, Brasil e incluso los países del cono sur de América latina – IIRSA. Así mismo, el mejoramiento de la competitividad del país, en busca el desarrollo de zonas de producción, con el fin de fortalecerlo, ante la suscripción de Tratados de Libre Comercio – TLC.

2.3. Inventario y Estado Actual de la Vía

• Contrato 1111 de 2021 Construcción del Tramo 02 (Frente San Francisco): Comprende aproximadamente 13.0 kilómetros que como punto de inicio el K7+103 hasta la conexión con el Tramo 3 (Frente Mocoa), localización según estudios y diseños del Consorcio Vial del Sur de fecha 04 de marzo y 26 de mayo de 2016, mediante Contrato 407 de 2010.

• Contrato 964 de 2021 Construcción del Tramo 03 (Frente Mocoa): Comprende aproximadamente 12.5 kilómetros que como punto de inicio tiene el K33+480 hasta la conexión con el Tramo 2 (Frente San Francisco), localización según estudios y diseños del Consorcio Vial del Sur de fecha 04 de marzo y 26 de mayo de 2016 mediante Contrato 407 de 2010. Este tramo se encuentra intervenido entre el K10+600 y el K11+560 básicamente mediante estabilización de taludes.

2.4. Características técnicas del proyecto

El proyecto inicial comprende la continuación de la construcción de la nueva vía entre las cabeceras Municipales de San Francisco y Mocoa, en el Departamento de Putumayo, la cual estará constituida por una calzada con dos carriles (bidireccional) de una longitud aproximada de 44.07 Km, incluyendo puentes, estructuras de contención, obras de arte, obras del Plan de Manejo Ambiental (PMA), entre otros, según necesidades y disponibilidad presupuestal para el contrato de obra. Para el proyecto se tiene concebida la construcción de 64 puentes (con una longitud aproximada total de 4.581 metros), de los cuales 31 estarán ubicados en el sector correspondiente a Mocoa y 33 en el sector correspondiente a San Francisco, cuya infraestructura varía en tipo, longitud y profundidad. Contempla también la construcción de 3 túneles con una longitud total aproximada de 0,735 km.

Alternativa Optimización de Diseño Geométrico

Tomando en cuenta consideraciones de tipo geométrico, geotécnico y ambiental, buscando disminuir las intervenciones a cielo abierto e incrementar la construcción de estructuras tipo viaductos y túneles, previa concertación con la Entidad Contratante, se avaló la presentación por parte del Contratista de la alternativa de optimización de diseños, para el caso del sector 3 frente Mocoa a partir del K14+400 hasta el K23+571, mientras que el sub tramo K10+600 – K14+400 se mantiene de acuerdo con la fase II avalada a la fecha, a fin de garantizar pista de trabajo hasta tanto se lleven los diseños de la alternativa de optimización a fase III y se surtan las gestiones de índole ambiental, social, predial y demás ante las Entidades Competentes.

Mediante comunicado de fecha 18/11/24 radicado al CRP con el consecutivo 04-5482-24 el Contratista radicó a Interventoría el diseño geométrico propuesto a fase II como optimización del alineamiento del sub tramo K11+600 – K23+571, que incluye también el sector en ejecución K10+600 - K11+600. La propuesta definitiva aprobada por Interventoría indica que el alineamiento se desarrolla entre el K10+600 al K22+708 con una longitud total de 12110 m que contempla 7568 m de intervención a cielo abierto; 31 puentes de longitud sumada 3199 m y 3 túneles de longitud sumada 1343 m.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No 964 de 2021

3.1. Información General del Contrato

"CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

A continuación, se enuncia la información general del Contrato de Obra:

Licitación:	LP-DT-062-2020.
Contratista:	CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR. Nit. 890.922.447-4
Integrantes:	Constructores El Cóndor S.A. 100% Nit. 890.922.447-4
Contrato de Obra Nº:	964 de 2021.
Objeto:	CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.
Valor Inicial:	$ 541.389.953.817 Incluido IVA.
Valor Total:	$ 541.389.953.817 Incluido IVA.
Plazo:	Ciento Catorce (114) meses.
Etapa de construcción Plazo Máximo:	114 meses comenzando a partir de la finalización de la Etapa de Pre-construcción.
Fecha de Inicio:	02 de Julio de 2021.
Fecha de Terminación:	31 de Agosto de 2030.

Cesión de Contrato de Obra

Con fecha 29 de abril de 2022, mediante comunicación SMC-GGPT-23701, la Entidad Contratante, notificó a Interventoría acerca de la cesión de los contratos No. 964 y 1111 de 2021, mediante la aprobación de los contratos de cesión a fecha 27 y 28 de abril por los delegados formalmente en representación del contratista e INVIAS como Entidad Contratante.

En ese orden de ideas se establece que el Consorcio CM Putumayo cede los contratos de obra como sigue:

El Contrato 1111 de 2021 se cede al CONSORCIO SAN FRANCISCO, Integrado por ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S.A, con NIT. 800.014.246-8 con un porcentaje de participación del 50%, UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS SAS - UNICA S.A.S., con NIT. 900.655.891-1 con un porcentaje de participación del 35%, TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS con NIT. 890.903.035-2 con un porcentaje de participación del 7,5% y HB STRUCTURAS METALICAS SAS con NIT. 860.006.282-8 con un porcentaje de participación del 7,5%.

El Contrato 964 de 2021 se cede a CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A., con NIT. 890.922.447-4.

El contrato de cesión 1111-21, cuenta con aprobación de Garantías mediante Acta en plataforma SECOP II desde el día 03 de Agosto de 2022. Así mismo, el contrato de cesión 964-21, cuenta con aprobación de Garantías mediante Acta en plataforma SECOP II desde el día 22 de Julio de 2022.

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Para el contrato 964 de 2021, durante el periodo abril de 2026 se avanzó en las siguientes actividades:

Sector 4 (K3+462 a K10+600)

Actividad de pavimento tipo MR terminada con cunetas entre K3+092 a K3+848

K9+930 - K10+030 MI: Terminada construcción de canal en concreto reforzado base talud M.I. L=100 m

Muro de Cierre K10+520 MD: Finalizada actividad con losa de aproximación a Puente Campucana. Amarre aceros, encofre y vaceado barrera tipo New Jersey. Conformación material a nivel de rasante mejorada.

Sector 3 (K10+600 a K22+811)

Muro 1 K10+792.36 - K10+835.03 M.D: Muro terminado con barrera de protección.

Muro 2 K10+855,44 - K10+884,61 M.D: Muro terminado con barrera de protección.

Muro 3 K10+956,29 - K10+98978 M.D: Muro terminado con barrera de protección.

Muro 4 K10+999,64 - K11+049.45 M.D: Muro terminado con barrera de protección.

Muro 6 K11+240,15 - K11+281,22 M.D: Se realiza la fundición de los 4 módulos L= 43,10 m

Muro 7 K11+430.62 - K11+460.01 M.D: Conformación de terreno para la construcción de módulos 1 - 2 de muro (demolición de anillos falsos y excavaciones).

Muro 8 K11+535,09 - K11+587,22 M.D: Excavación manual de caissons diámetro 1,50 m. C1=12,50 m - C2=10,50 m - C3=6.0 excavación - C6=fundido caisson - C7=18,70 Inicia instalación de acero de caisson - C8 = 17.50 m - C9=13,70 m - C10=12,80 m

Muro Y2 K11+790.70 a K11+835.03 M.D: Actividades de excavaciones para la construcción de caisson diametro 1,50 m - caisson #1 = 2 m - caisson #5 = 2,0 m - caisson #6 = 3,0 m - caisson #7 = 3,0 m - caisson #8 = 3,0 m

Talud 9 K11+445 – K11+580 MI: Terreno natural retoma actividades de perforación.

Talud 9A K 11+445- K 11+515 MI Terraza 5 se realiza demolición de rocas para continuar con la explanación

Talud 9 K11+560 – K11+580 MD: Se avanza con la perforación e instalación de torón en terreno natural bajo nivel de calzada

Talud 13 K11+590 – K11+680 MI: Terraza 3 (L=25 m): Inyección anclajes activos línea D#1-2-3 / línea E#3-11-12-13-14-15. Tensionamiento anclajes activos 40 ton, línea D#10-11-12-13-14-15-16-17-18. Terraza 4 (L=25 m): perforación anclajes activos, línea A#11-10-9

Talud Contingencia adjunto a Talud 13 K11+680 MI: Terminado

Talud 13N K11+720 - K11+804 MI: Avanza Explanación en terraza 2, Perforación e instalación de barras auto perforantes líneas A, B, C. L= 12 m. Terraza 1: Línea A 1-2 / Línea B: 1 al 5 / Línea C: 1 al 9 / Línea D: 1 al 11 / Línea E: 1 al 13.

ODT1 K10+665: Terminada

ODT 2 K10+798: Terminada

ODT 3 K10+870: Excavación para la construcción de complemento alcantarilla media calzada, colocación concreto 210 kg/cm2 hormigonado solado para tubería 36"- longitud 6,0 x 1,40 x 0,10 = 0.90 m3

ODT 4 K10+975: terminada media calzada margen derecha

ODT 5 K11+020: Excavación para la instalación de tubería en concreto reforzado de 36 ". Instalación de solado en concreto 3000 PSI

ODT 7 K11+250: Terminada

Puente Y4 K11+682 - K11+727: caisson #1: excavación manual anillo 13 - caisson #2 excavación manual anillos falsos

Explanación y demolición de rocas con excavadora y martillo hidráulico en terraza 4 de talud 13, repaleo de materiales hasta acopio abscisa: K11+580.

Explanación terraza 5 talud 9, cargue y transporte a ZODME Guaduales.

Explanación para terraza 2 talud 13N abscisas: K11+720 a K11+735, desalojo materiales hasta acopio abscisa: K11+580 con mini cargador.

Replanteo puntos de paramento y marcación de nivel para estructura de encole O.D.T. 4 abscisa: K10+975.

Control topográfico para excavación O.D.T. 5 media calzada margen derecha, nivelación para marcación de cota solado de limpieza abscisa: K11+020.

Replanteo de O.D.T. 6 abscisa: K11+145 y 8 abscisa: K11+360.

Localización de puntos para perforación e instalación de anclajes activos fila A (1 a 5) terraza 4 talud 13.

Vía existente entre Mocoa – San Francisco (trampolín de la biodiversidad):

Conformación y compactación Ruta 1003 Trampolín se trabajó entre PR108+300 y PR109+400 con motoniveladora MN 38 y el compactador CV841.

Maquinaria disponible: Cargador CA 62, retro cargador CAT 327

Volqueta sencilla VO 15, VO 020 disponibles

3.2.1 Control valores discriminados para la ejecución del contrato 964-2021

Tabla N° 3. Control de Valor Ejecutado Mes Contrato de Obra N° 964 de 2021

CONTRATO 964 DE 2021 - FRENTE MOCOA						
	PERIODO			ABRIL DE 2026		
DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO			VALOR EJECUTADO MES		
	BÁSICO	IVA	TOTAL	BÁSICO	IVA	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 8.481.753.347	$ 1.611.533.136	$ 10.093.286.483			$ -
OBRA BÁSICA	$ 343.727.160.196	$ 2.511.852.325	$ 346.239.012.520	$ 2.632.102.462	$ 19.234.595	$ 2.651.337.057,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	$ 158.751.273.447	$ 1.160.105.460	$ 159.911.378.907			$ -
PROVISIÓN PARA JORNADAS 24/7	$ 1.100.000.000	$ 8.038.462	$ 1.108.038.462			$ -
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE	$ 17.000.979.054	$ 3.230.186.020	$ 20.231.165.074	$ 120.762.161	$ 1.503.213	$ 122.265.374,00
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 272.268.908	$ 51.731.092	$ 324.000.000			$ -
MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 2.926.951.572	$ 556.120.799	$ 3.483.072.371	$ 1.230.746.130	$ 233.841.765,00	$ 1.464.587.895,00
TOTAL	**$ 532.260.386.524**	**$ 9.129.567.294**	**$ 541.389.953.817**	**$ 3.983.610.753**	**$ 254.579.573**	**$ 4.238.190.326**

Tabla N° 4. Control de Valor Ejecutado Acumulado Contrato de Obra N° 964 de 2021.

CONTRATO 964 DE 2021 - FRENTE MOCOA						
	PERIODO			ABRIL DE 2026		
DESCRIPCIÓN	VALOR EJECUTADO ACUMULADO			SALDO		
	BÁSICO	IVA	TOTAL	BÁSICO	IVA	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 2.253.047.299	$ 428.078.988	$ 2.681.126.287	$ 6.228.706.048	$ 1.183.454.148	$ 7.412.160.196
OBRA BÁSICA	$ 147.603.319.394	$ 1.078.639.642	$ 148.681.959.036	$ 196.123.840.802	$ 1.433.212.683	$ 197.557.053.484
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	$ 28.688.551.337	$ 209.647.108	$ 28.898.198.445	$ 130.062.722.110	$ 950.458.352	$ 131.013.180.462
PROVISIÓN PARA JORNADAS 24/7	$ -	$ -	$ -	$ 1.100.000.000	$ 8.038.462	$ 1.108.038.462
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE	$ 2.514.962.271	$ 59.254.537	$ 2.574.216.808	$ 14.486.016.783	$ 3.170.931.483	$ 17.656.948.266
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 49.286.917	$ 228.403	$ 49.515.320	$ 222.981.991	$ 51.502.689	$ 274.484.680
MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	$ 1.230.746.130	$ 233.841.765	$ 1.464.587.895	$ 1.696.205.442	$ 322.279.034	$ 2.018.484.476
TOTAL	**$ 182.339.913.348**	**$ 2.009.690.443**	**$ 184.349.603.790**	**$ 349.920.473.176**	**$ 7.119.876.851**	**$ 357.040.350.026**

3.3. Seguimiento Ítems no previstos

Contratista e Interventoría atendió las observaciones planteadas por la dirección territorial INVIAS Putumayo y remitió los documentos ajustados, a fin de obtener el aval para el trámite respectivo, de la siguiente relación de ítems no previstos, aplicables en su gran mayoría al desarrollo de las actividades de mantenimiento y atención de emergencias sobre la vía existente San Francisco – El Pepino ruta 1003:

ORDEN	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
149	INP-18	Fabricación de Estructura metálica en acero A-709	kg	431.528,00	$ 17.878,00
150	INP-19	Suministro en instalación de Espejo cóncavo	Un	50,00	$ 6.154.075,00
151	621.1.9P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto clase FC=28 MPA de diámetro 1,2 M (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	ml	150,00	$ 2.705.331,00

152	621.9.5	Anillos falsos en concreto F'C = 14 MPA para pilotes de 1.2 M (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	ml	70,00	$ 1.467.570,00
153	INP-20	Hora Camión mezclador de concreto atención emergencias ruta 1003	hr	150,00	$ 139.961,00
154	INP-21	Hora Compresor con Martillo atención emergencias ruta 1003	hr	1.500,00	$ 125.840,00
155	INP-22	Hora Oficial atención emergencias ruta 1003	hr	33.600,00	$ 16.033,00
156	INP-23	Hora Grúa Brazo articulado (Macho) atención emergencias ruta 1003	hr	3.600,00	$ 190.679,00
157	INP-24	Hora Grúa Planchón atención emergencias ruta 1003	hr	3.600,00	$ 133.475,00
158	INP-25	Hora Compresor de Aire atención emergencias ruta 1003	hr	1.500,00	$ 92.239,00
159	INP-26	Hora Bomba de concreto de remolque atención emergencias ruta 1003	hr	1.500,00	$ 104.000,00
160	INP-27	Hora Vibro compactador atención emergencias ruta 1003	hr	18.000,00	$ 137.816,00
161	INP-28	Hora Motoniveladora atención emergencias ruta 1003	hr	18.000,00	$ 216.094,00
162	INP-29	Hora Carro tanque atención emergencias ruta 1003	hr	1.500,00	$ 117.000,00
163	INP-30	Hora Ayudante General o controlador de tráfico atención emergencias ruta 1003	hr	172.800,00	$ 9.120,00
164	INP-31	Hora Cargador Frontal atención emergencias ruta 1003	hr	18.000,00	$ 228.105,00

165	INP-32	Hora Retro cargador atención emergencias ruta 1003	hr	18.000,00	$ 227.500,00
166	INP-33	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado) atención emergencias ruta 1003	m3	3.000,00	$ 618.162,00
167	INP-34	Concreto clase 14 MPA Ciclópeo atención emergencias ruta 1003	m3	2.000,00	$ 877.197,00
168	INP-35	Concreto clase 21 MPA para diversas estructuras atención emergencias ruta 1003	m3	1.500,00	$ 1.417.534,00
169	INP-36	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa para diversas estructuras atención emergencias ruta 1003	kg	50.000,00	$ 9.263,00

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Seguimiento a la continuación de actividades sobre los siguientes frentes de obra:

Sector 3 (K10+600 a K22+811)

• Muro 3A (K10+640/706) MD: Construcción muro de cierre K10+706 a mayores.

• Muro 2 K10+855 - K10+884 M.D: Construcción muros de cierre a ambos extremos.

• Muro 7 K11+430.62 - K11+460.01 M.D: Adecuación entable e inicio construcción zarpas.

• Muro 8 K11+535,09 - K11+587,22 M.D: Terminación Amarre aceros y vaciado pilotes pendientes. Inicio construcción zarpas.

• Talud 9 K11+445 – K11+580 MI: Terminación explanación y estabilización terraza 5.

• Talud 9B K 11+535- K 11+580 MI: terminación tensionamiento anclajes activos en terreno natural.

• Talud 9 K11+460 – K11+550 MD Terminación estabilización en terreno natural bajo nivel de calzada (anclajes L=30 m).

• Talud 13 K11+590 – K11+680 MI (anclajes L = 25m): Continuación explanación y estabilización terrazas 3 y 4.

• Talud 13 N M.I.: Continuación explanación y estabilización terrazas superiores.

• Puente Y4. Continuación excavación cimentación profunda

• Muro Y2 K11791 –K11+835. Continuación excavación cimentación profunda (caissons).

• Obra de Drenaje Transversal ODT 3 K10+870: Terminación.

• Obra de Drenaje Transversal ODT 4 K10+975: Terminación.

• Obra de Drenaje Transversal ODT 6 K11+145: Construcción.

Vía existente entre Mocoa – San Francisco (trampolín de la biodiversidad):

• Seguimiento permanente a actividades mantenimiento y atención de emergencias

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA No 964 de 2021

A continuación, se adjuntan los formatos de seguimiento al Contrato de Obra 964 de 2021, según el siguiente listado:

4.1 Informe Semanal MEPI-MN1-IN-15-FR-3
4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-4
4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-6
4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-8
4.5 Estado General del Tiempo MEPI-MN1-IN-15-FR-10
4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio MEPI-MN1-IN-15-FR-11
4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra MEPI-MN1-IN-15-FR-12
4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra MEPI-MN-1IN-15-FR-14
4.9 Otros documentos seguimiento mensual
Seguimiento a la inversión del Anticipo MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2
Seguimiento Programa de Obra
Seguimiento Programa de Inversiones MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2
Informe de Inversión y buen manejo del Anticipo de Obra MEPI-MN1-IN-2FR-2
Actas de Comité de Obra MEPI-MN-IN-14-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4
		FECHA:	8/4/2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO | SEMANA No.: 249 del 2/4/2026 al 8/4/2026 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Angel Guacales

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 12,97 Km de vía nueva que contemplan 31 puentes con una longitud total de 2,39 Km y 2 túneles en una longitud total de 0,33 Km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Intervención para terminación de la construcción de una vía, de la cual se tienen construidos hasta el momento 10,5 Km entre la abscisa K0+000 al K10+518 incluyendo 3 puentes correspondiente al Sector 4. Durante el presente contrato se ejecutó la terminación de explanación y estabilización de talud K10+518 - K10+600 del sector 4 (Talud Campucana). Pendientes por construir el tramo comprendido entre el K10+600 al K23+571,17 que corresponden al sector 3, con el fin de comunicar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa.

Mediante comunicado de fecha 18/11/24 radicado al CRP con el consecutivo 04-5482-24 el Contratista radicó a Interventoría el diseño geométrico propuesto a fase II como optimización del alineamiento del sub tramo K11+600 – K23+571, que incluye también el sector en ejecución K10+600 -K11+600. la propuesta indica que el alineamiento se desarrolla entre el K10+600 al K22+811 con una longitud total de 12.211,20 m que contempla 7.770,50 m de intervención a cielo abierto; 24 puentes de longitud sumada 3.180,50 m y 3 túneles de longitud sumada 1.260, 00 m.

Una vez desarrollada la propuesta radicada y previa revisión de Interventoría se ajusta el alineamiento al tramo K10+598 - K22+708 con una longitud total de 12.11 m que contempla 7.770 m de intervención a cielo abierto; 31 puentes de longitud sumada 2.998,5 m y 3 túneles de longitud sumada 1.342,00 m.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A			INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO		
INTEGRANTES:	CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A – 100%			INTEGRANTES:	HMV INGENIEROS LTDA 40% CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.– 30% GRUPO INTEROISEÑOS S.A.S.– 30%		
CONTRATO No.	564 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 641.399.993.917,00	CONTRATO No.	977 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 47.999.892.900,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ 2.400.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 641.399.993.917,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 50.399.892.900,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 20.000.482.547,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 1.129.388.470,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 2.782.928.997,00			VALOR AMORTIZADO:	$ 1.129.388.470,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 19.247.553.550,00			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 27.049.209.066	$ 18.020.744.751	$ 27.072.000.000	$ 63.144.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 27.049.209.066	$ 18.020.744.751	$ 27.072.000.000	$ 63.144.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ -	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	2027	2028
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 63.168.000.000	$ 63.192.000.000	$ 67.680.000.000	$ 63.168.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 55.346.680.053			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 7.821.309.947			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 8.000.000.000	$ 5.400.000.000	$ 6.000.000.000	$ 5.600.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 7.567.067.088			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 432.932.911,97			

CONTRATO	VIGENCIA	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 54.144.000.000	$ 94.752.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.200.000.000	$ 4.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (INICIAL) (A)	$	**483.413.463.218,00**
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIF No. 5:	$	347.184.964.001,00
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIF No.6:	$	343.727.160.196,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 151.000.617.362,19	31,24%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 145.434.477.974,88	30,08%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (5.566.139.387,31)	-1,16%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños)	$ 34.412.974.439,00	59,36%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 188.137.768.917,10	38,78%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 179.847.452.413,88	33,22%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (13.004.514.218,00)	-3,16%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 576.080.581	0,17%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 999.158.313	0,15%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Febrero 2026
VALOR FACTURA: $ 3.407.321.775,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado de trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo04-8093-26 de 27/03/2026, Interventoría remite a la DT INVIAS Putumayo Acta de Obra No. 57 periodo marzo 2026, la cual dió entrada con número de radicado No.2026E-VUVRAZ-033526 de fecha 08 de abril de 2026

Mediante comunicado Putumayo04-8094-26 de 27/03/2026, Interventoría remite a la DT INVIAS Putumayo Acta de Ajustes definitivo No. 56 periodo febrero 2026, la cual dió entrada con número de radicado No.2026E-VUVRAZ-0029821 de fecha 27 de marzo de 2026

NOTA: El valor reportado como saldo de vigencia 2025 por $11.231.680.296 contempla el monto del anticipo No.2 por valor de 14.000 millones de pesos cuyo trámite a la fecha, se encuentra en cuentas por pagar según lo reportado por la SMCN.

Inversión total programada desde la fecha de inicio del contrato hasta	abril 08 de 2026	$	196.942.267.028,94	36,38%
Inversión total ejecutada desde la fecha de inicio del contrato hasta	abril 08 de 2026	$	179.847.452.413,88	33,22%
Inversión de obra programada desde la fecha de inicio del contrato hasta	abril 08 de 2026	$	151.000.617.362,19	31,24%
Inversión en obra ejecutada desde la fecha de inicio del contrato hasta	abril 08 de 2026	$	145.434.477.974,88	30,08%

Detalle información financiera:

Valor facturado acumulado a enero de 2026	$ 171.385.090.321,00	31,66%	Valor programado acumulado a	Enero de 2026	$ 188.137.768.917,10	34,75%

NOTA: El valor facturado acumulado corresponde al valor acumulado hasta acta de Obra No.55 enero 2026 más las actas de ajustes def No.53 y No.54

ANTICIPOS	
Otorgado $	22.030.482.547,00
Amortizado $	2.782.928.997,00
Saldo $	19.247.553.550,00

INDICADOR IC	
En el mes:	**0,17**
Acumulado:	**0,15**

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 26.158.659.150	54,50%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 26.157.908.617	54,50%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 175.556.731	0,37%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 175.556.731	0,37%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Enero 2026
VALOR FACTURA: $ 572.653.943

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado de trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo04-8114-25 de 06/04/26 Interventoría radica a la DT Invias Putumayo, Acta de Costos de Interventoría No.56 febrero 2026. la cual dió entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-032289 de fecha 06 de abril de 2026

Mediante comunicado Putumayo04-7989-25 de 11/03/26 Interventoría radica a la SMCN, Acta de Costos de Interventoría No.55 enero 2026. la cual dió entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-023234 de fecha 11 de marzo de 2026

Mediante comunicado Putumayo04-7986-25 de 11/03/26 Interventoría radica a la SMCN, Acta de Modificación de Costos de Interventoría No 6 Contrato 977 de 2021 y Reprogramación al Plan de Cargas No 9. la cual dió entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-022991 de fecha 11 de marzo de 2026

Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta	abril 08 de 2026	$ 26.158.659.149,93	54,50%
Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta	abril 08 de 2026	$ 26.157.908.616,63	54,50%

Detalle información financiera:

Valor programado acumulado a	Diciembre de 2025	$ 24.399.352.105	50,83%
Valor facturado acumulado	Diciembre de 2025	$ 23.966.959.988	49,93%

Nota 1: El valor programado acumulado se toma de acuerdo al Plan de Cargas No 9 radicado ante la entidad con comunicado Putumayo04-7819-26 con fecha 05 de febrero de 2026, Radicado 2026E-VUVRAZ-008992

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.129.388.470,00
Amortizado $	$ 1.129.388.470,00
Saldo $	$ 0,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 31,24% (Inversión programada en obra básica) Avance o Atraso Físico % -1,15%
Meta Física Ejecutada % 30,08% (Inversión ejecutada en obra básica)

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia hasta 2025	Vigencia 2026	Avance Físico	Tramo 3	Tramo 4	Corredor	Total	%
EXPLANACIONES	km	12,19	1,16	-	Prog	12,11	0,08		12,19	
					Ejec	1,08	0,08		1,16	9,53%
BASES SUBBASES Y AFIRMADOS	km	20,34	1,16	-	Prog	12,211	8,13		20,34	
					Ejec	0	1,39		1,39	6,81%
PAVIMENTOS ASFALTICOS (pavimento hidráulico)	km	20,24	1,16	-	Prog	12,11	8,13		20,24	
					Ejec		1,32		1,32	6,50%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	km	12,11			Prog	12,11			12,11	
					Ejec				0,00	0,00%
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	km	20,24			Prog	12,11	8,13		20,24	
					Ejec				0,00	0,00%
OBRAS VARIAS	km	20,24			Prog	12,11	8,13		20,24	
					Ejec				0,00	0,00%
TRANSPORTES	km	12,19	1,160	-	Prog	12,11	0,08		12,19	
					Ejec	1,08	0,08		1,16	9,53%
PUENTES	km	3,21	0,030	-	Prog	3,18	0,03		3,21	
					Ejec		0,03		0,03	0,84%
TÚNELES	km	1,26			Prog	1,26	0,00		1,26	
					Ejec		0,00		0,00	0,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 4: K9+462 - K10+600
TRAMO Y/O SECTOR 3: K10+600 hacia mayores

Nota: La longitud total a intervenir de acuerdo con diseños a fase II en el sector 3 es de 12.11 Km. (meta física programada). A la fecha se ha intervenido de manera parcial 1,080 Km, lo que equivale a una meta física ejecutada del 8,91 %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Planta de concreto	1	1
Planta de asfalto	1	-
Perforador jumbo (3 brazos)	2	
Formaleta para revestimiento túneles	3	
Anclajes para instalación impermicas.	3	
Carro de avance	2	
Perforador jumbo (2 brazos)	3	
Bomba inyección lechada	4	4
Robot de lanzado	4	
Trituradora 90 Ton	1	
Excavadora de orugas	2	4
Compactador neumático	2	
Terminadora de Asfalto	1	
Motoniveladora	2	1
Vibrocompactador	2	2
Volquetas	10	6
Cargador		1
Retrocargador		2
Camioneta		4
Camiones		1
Carro taller		1
Camión combustible		1
Carrotanque de agua		1
Bomba para concreto		1
Bulldozer		
Minicargadores		2
Compresor		9
Generador Eléctrico		4
Planta de generación de energía		6
Equipo para tensionamiento (anclajes)		1
Compactador manual (Canguro)		2
Vibrador manual para Concreto		2
Perforadoras T46 (oruga)		2
Perforadoras T19 (Colgantes)		4
Perforadoras Everdigm		1
Autobomba		
Perforadoras petty (sondeos)		5
Equipo de topografía		2
Unidad perforadora con canasta		4
Mixer		2
TOTAL		**76**

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MOCOA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:
Se cuenta con Autorización Temporal de materiales de construcción No. 502328 sobre el Río Mocoa, autorizada mediante Resoluci ón 210-4291 del 20 de octubre de 2021 emitida por la Agencia Nacional de Minería y con Licencia Ambiental otorgada a través de la Resolución 0746 del 26 de mayo de 2023 emitida por CORPOAMAZONIA. Actualmente, se encuentra en proceso el trámite de cesión de la Autorización Temporal por parte del Consorcio CM Putumayo a Construcciones El Cóndor S.A.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	X	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:
La Licencia Ambiental concedida mediante Resolución 2170 del 01 de diciembre de 2008 otorga los permisos de sustracción de reserva forestal, levantamiento de veda, zonas industrial, campamentos, concesión de aguas superficiales, vertimientos, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, ocupación de cauce y zonas de disposición fina l de material sobrante (ZODME).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N.A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**451**	**20**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	247	15
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	204	5
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	213	11

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 471

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Av.Colombia Cra 9 N. 21 - 108.

OBSERVACIONES:
GS-1 SISTEMA DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL A LA COMUNIDAD.
En este periodo semanal objeto de reporte, nose desarrolló escenario de capacitacion a comunidad.

GS - 3 CAPACITACION AMBIENTAL Y EN SEGURIDAD INDUSTRIAL AL PERSONAL DE OBRA.
En este periodo semanal objeto de reporte no se desarrolló escenario de capacitacion a personal de obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 22
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A.
AVALÚOS APROBADOS: N.A.
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A.

OBSERVACIONES:
Las gestiones identificadas preliminarmente, corresponden a lo identificado para los dos primeros kilómetros. El contratista está en proceso de elaboración y entrega del diagnóstico predial para el contrato.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Elaboración y envío de informe de sostenibilidad de marzo de 2026 de la interventoría.

AREA TÉCNICA

COMUNICACIONES

Mediante comunicado Putumayo04-8100-26 de 31/03/2026 Se emite respuesta a comunicado 312-168-20260309002293 con recibido interno 04-7224-26 del 10-03-2026, con asunto "Vol. II – Trazado S5 – Entrega de diseño geométrico de la segunda calzada, en el tramo K0+600 – K2+000 del Sector 5 del proyecto". Viabilidad para continuar Diseño Geométrico Doble Calzada sector No.5.

Mediante comunicado Putumayo04-8106-26 de 01/04/2026 Se radicó a la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales el informe semanal No.248 correspondiente al periodo 26 de marzo al 01 de abril 2026.

Mediante comunicado Putumayo04-8093-26 del 06/04/2026, se remite a la DT INVIAS Putumayo Acta de Costos de Interventoría No 56 febrero de 2026

Mediante comunicado Putumayo04-8125-26 del 08/04/2026, se remite a la DT INVIAS Putumayo Acta de obra No 57 marzo de 2026 Cto 964 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa

REUNIONES Y RECORRIDOS:

Interventoría desarrolla recorridos permanentes al sitio de las obras a fin de verificar el estado de la obra en los diferentes frentes activos.

FRENTES DE OBRA ACTIVOS

Vía existente entre Mocoa – San Francisco (trampolín de la biodiversidad):

- Conformación y compactación Ruta 1003 Trampolín se trabajó entre PR94+000 y PR99+800 con motoniveladora MN 38 y el compactador CV841.
- Maquinaria disponible: Cargador CA 82, retrocargador CAT 327
- Volqueta sencilla VO 15, VO 020 disponibles

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO RÍGIDO TIPO MR

• Actividad de pavimento tipo MR terminada con cunetas entre K3+092 a K3+848

Sector 4 (K3+462 a K10+600)

• **K9+930 - K10+030 MI:** Avanza construcción de canal, se realizó fundición de tramo entre K9+970 a K9+980 y se instala acero de refuerzo desde K9+960 a K9+970, se fundió solado de limpieza desde K9+938 a K9+960

• **Muro de Cierre K10+520 MD:** fundición en concreto de 28 Mpa de losa de aproximación Puente Campucana en el carril izquierdo

Sector 3 (K10+600 a K22+811)

• **Muro 1 K10+792,36 - K10+835,03 M.D:** Terminada barrera de protección tipo new jersey

• **Muro 2 K10+855,44 - K10+884,61 M.D:** Fundición de módulo 2 y módulo 3 new jersey

• **Muro 3 K10+956,29 - K10+98978 M.D:** Terminado el lleno de muro, se realiza la figuración, colocación y amarre de acero para new jersey y fundición módulo 1

• **Muro 4 K10+999,64 - K11+049,45 M.D:** se realiza la figuración, colocación y amarre de acero para new jersey

• **Muro 7 K11+430.62 - K11+460.01 M.D:** caisson #5: se termina excavación con profundidad final de 11 m, cambio de altura de acuerdo a memorando técnico IDMC 022 2026 firmado por especialista en Geología y Geotecnia del C.R.P. se aprueba solicitud del Contratista para cambiar nivel de excavación cota 993.28 a 995.28, nivel de excavación cumple modificación.

• **Muro 8 K11+535,09 - K11+587,22 M.D:** Excavación manual de caissons diámetro 1,50m. Resumen de avance: C1=12,20m - C2=10,20m - C3=2.70 excavación - C6=fundido caisson - C7=18,30 - C8 = 16.65 m - C9=13,10 m - C10=12,60m

• **Muro Y2 K11+790.70 a K11+835.03 M.D:** se arma formaleta para caisson #1 y #7 primer anillo y plataformas de caissons #6 y #8

• **Talud 9 K11+445 – K11+580 MI:** Fundición y desencofrado de dados en terreno natural sector K11+540

• **Talud 9A K 11+445- K 11+515 MI Terraza 4 (anclajes activos 40 ton L=30 m):** Sin actividad

• **Talud 9 K11+560 – K11+580 MD:** Se avanza con la perforación e instalación de torón en terreno natural bajo nivel de calzada

• **Talud 13 K11+590 – K11+680 MI: Terraza 3:** Explanación y perfilado para avance de terraza, perforación para anclajes activos en la línea D y llenado e inyección de anclajes. Se instala refuerzo para dados en sitio línea C. Concreto lanzado K11+632 al K11+664

• **Talud Contingencia adjunto a Talud 13 K11+680 MI:** Concreto lanzado de protección K11+670

• **Talud 13N K11+720 - K11+804 MI:** Explanación terraza 1, se localizaron pernos autoperforantes de 12 m en talud adjunto a menores.

• **ODT1 K10+665:** Terminada

• **ODT 2 K10+798:** se realiza la fundición de la placa de piso de la caja de encole, se esta realizando la instalación de acero de la caja

• **ODT 3 K10+870:** atraque de tubería en concreto de 36", se realiza lleno con material tipo sub base, media calzada margen derecha

• **ODT 4 K10+975:** atraque y relleno estructural en media calzada margen derecha

• **ODT 7 K11+250:** solado, armado de acero de refuerzo, fundición de losa piso de encole, encofrado y fundición de caja

• **Puente Y4 K11+682 - K11+727:** Sin actividad

• Se realiza la instalación de concreto lanzado de protección en abscisa K11+700 aprox a mayores y la instalación de pernos autoperforantes L=3 m, tres filas.

• Nivelación para marcar cotas de terminado barrera de protección tipo New Jersey modulo 1 y modulo 2 en muro de contención M3 abscisas: K10+956.29 a K10+989.78 margen derecha.

• Repaleo material de explanación terraza 3 en talud 13 con excavadora hasta acopio abscisa: K11+580, cargue y transporte a ZODME Guaduales.

• Explanación parcial terraza 1 en talud 13N transporte de materiales hasta acopio temporal abscisa: K11+580 utilizando mini cargador.

• Replanteo eje de caissons localizados en muro Y2 números: 1, 6, 7 y 8 abscisas: K11+790.10 a K11+835.03 margen derecha.

• Explanación y perfilado en roca utilizando excavadora y martillo hidráulico para terraza 3 en talud 13 abscisas: K11+620 a K11+630, se efectuó control topográfico de esta actividad.

• Alineamiento formaleta para barrera de protección (New Jersey) en muro 2 modulo 3 margen derecha abscisas: K10+855,44 a K10+884,61.

• Alineamiento formaleta para barrera de protección (New Jersey) en muro 3 modulo 1 margen derecha abscisas: K10+956,29 aK10+989,78.

AREA TOPOGRAFÍA

Supervisión actividades desarrolladas por el Contratista.

06/04/2026: Verificación alineamiento formaleta para barrera de protección (New Jersey) en muro M2 modulo 2 abscisas: K10+855.44 a K10+884.61 margen derecha.

06/04/2026: Verificación niveles y geometría para losa de aproximación puente Campucana media calzada margen izquierda abscisa: K10+520.

06/04/2026: Verificación alineamiento tubería instalada media calzada margen derecha para O.D.T. 4 abscisa: K10+975.

07/04/2026: Verificación altura de excavación caisson 5 localizado en M7 abscisas: K11+428.56 a K11+460.01 margen derecha, nivel de excavación no cumple aun cota de diseño.

07/04/2026: Chequeo nivel para solado de limpieza canal longitudinal abscisas: K9+950 a K9+960.

07/04/2026: En oficina se efectuó revisión información referente a muro Y2 abscisas: K11+790.70 a K11+835.03

08/04/2026: Verificación altura de excavación caisson 5 localizado en M7 abscisas: K11+428.56 a K11+460.01 margen derecha, de acuerdo a memorando técnico IDMC 022 2026 firmado por especialista en Geología y Geotecnia del C.R.P. se aprueba solicitud del Contratista para cambiar nivel de excavación cota 993.28 a 995.28, nivel de excavación cumple modificación.

08/04/2026: Verificación alineamiento de formaleta para barreras de protección (New Jersey) en muros de contención: 2 (modulo 3) y 3 (modulo 1).

08/04/2026: Chequeo eje para caissons 1, 7 y 8 (primera formaleta) localizados en muro de contención Y2 abscisas: K11+790.70 a K11+835.03 margen derecha.

08/04/2026: Nivelación para chequeo acabado estructura de encole O.D.T. 2.

TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO

06/04/2026: Se realiza ensayo de granulometría, a la arena clasificada del rio Mocoa.

06/04/2026: Se realiza ensayo de granulometría, a la arena triturada del rio Mocoa.

06/04/2026: Se realiza ensayo de compresión de cilindros a 33 días, del concreto tremie de 28Mpa, para caisson 6, muro 8, margen derecha.

07/04/2026: Se realiza ensayo de granulometría, a la arena mixta del rio Mocoa.

07/04/2026: Se realiza ensayo de granulometría, a la arena mixta del rio Mocoa.

07/04/2026: Se realiza ensayo de compresión de cilindros a 28 días, del concreto convencional de 21Mpa, para cunetas k03+700 a la k03+760, margen izquierda. "intermedias"

08/04/2026: Se realiza toma de asentamiento, temperatura y cilindros al concreto convencional de 28Mpa, concreto para muros canal MI K9+950/970MI.

08/04/2026: Se realiza ensayo de compresión de núcleos a 7 días, concreto lanzado, talud 13N, terraza 1, fila 1, k11+740/747.

ÁREA AMBIENTAL

COMUNICACIONES:

Mediante comunicación Putumayo04-8123-26 del 08 de abril del 2026, la Interventoría radicó al Contratista con ASUNTO: Apremio 1 Solicitud entrega del informe de gestión ambiental de febrero de 2026. Como es de su conocimiento, mediante comunicado Putumayo04-8092-26 del 27 de marzo de 2026, se remitió al Contratista las observaciones al informe de gestión ambiental de febrero de 2026, otorgando un plazo de dos (2) días calendario para su ajuste. No obstante, vencido dicho término, esta Interventoría aún no ha recibido el documento solicitado. Por lo anterior, se emite el primer apremio y se otorga un plazo máximo de un (1) día calendario para la entrega definitiva del documento.

Mediante comunicación Putumayo04-8124-26 del 08 de abril del 2026, la Interventoría radicó al Contratista con ASUNTO: Apremio 1 Solicitud entrega del informe de gestión ambiental de marzo de 2026. Como es de su conocimiento, el Apéndice D (Gestión Ambiental), establece que el contratista debe entregar a la Interventoría el informe y anexos del avance de la gestión ambiental a los cinco (5) días calendario del vencimiento del período respectivo. Sin embargo, a la fecha esta Interventoría no ha recibido el informe correspondiente a marzo de 2026. En consecuencia, se emite el primer apremio y se otorga un plazo máximo de un (1) día calendario para la entrega definitiva del documento.

REUNIONES Y/O RECORRIDOS:

En el período reportado no se efectuaron reuniones sobre la gestión ambiental.

ACTIVIDADES DE ÁREA AMBIENTAL:

• La Interventoría emitió un primer apremio al Contratista debido a que no presentó en el plazo solicitado (29/03/2026), el ajuste al informe de la gestión ambiental de febrero de 2026.
• La Interventoría emitió un primer apremio al Contratista debido a que no remitió el informe de la gestión ambiental de marzo de 2026 dentro del plazo establecido en el Apéndice D (05/04/2026).
• El 8 de abril de 2026, el Contratista radicó en VITAL, el reporte de avance parcial N°13 de la Contingencia 9 (Camino Sachamates) localizada del K11+315 al K11+330.

Medidas de manejo ambiental implementadas en obra:

MC-3 Manejo ambiental de materiales y equipos de construcción
• Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo en los diques destinados a equipos menores. Estas actividades incluyeron la revisión de su integridad, limpieza de sedimentos y reparación de posibles filtraciones.
• Se realizó mantenimiento general en los diques asociados a los equipos principales de la obra. Este proceso contempló la evaluación de condiciones físicas, refuerzo de estructuras y limpieza de residuos acumulados.

MC-4 Manejo ambiental de residuos sólidos domésticos e industriales
• Se realizó la recolección de residuos sólidos en el tramo comprendido entre el K9+900 y el K11+800, incluyendo la limpieza y vaciado de los contenedores de los puntos ecológicos.
• Se realizó la recolección de materiales en desuso tales como mangueras deterioradas, chatarra metálica y restos de madera a lo largo del corredor vial del frente de obra entre el K10+000 y el K11+800.

MC-5 Manejo de vertimientos
• Se realizó la recolección de aguas residuales domésticas, lavado y aseo de las unidades sanitarias portátiles dos veces por semana.

MS-1 Manejo ambiental de las zonas de disposición de materiales sobrantes de excavación – ZODMES
• Se verificó que el material se cargue directamente en el volcó del vehículo que lo transporta y que no exceda el límite permitido para evitar derrames del material sobre la vía.
• Se inspecciona que las volquetas que transportan el material realicen el carpado previo a su desplazamiento a la ZODME, para evitar la dispersión de partículas en la vía.
• Se realizó instalación de postes de madera para delimitación de la ZODME.

MH-1 Manejo de escorrentía superficial
• Se realizó la limpieza y descolmatación de cunetas y estructuras hidráulicas existentes en el tramo comprendido entre el K9+800 y el K10+500.

CA-1 Manejo ambiental de emisiones atmosféricas y ruido
• Se realizó humectación de la vía para evitar la dispersión de material particulado entre el K3+000 y el K11+400.

AREA SOCIAL

COMUNICACIONES

Mediante comunicado Putumayo04-8117-26 del 08/04/2026 Se remite a Construcciones el Cóndor; Asunto: Respuesta al comunicado 312-168-20260331002331 (04-7332-26) Asunto: Envió informe mensual social 1 de Marzo de 2026 al 31 de Marzo de 2026.

Mediante comunicado Putumayo04-8126-26 del 08/04/2026 Se remite a Subdirección de Sostenibilidad; Asunto: Remisión información adicional- Anexo1 Solicitud de determinación de procedencia y oportunidad de consulta previa.

REUNIONES Y RECORRIDOS:

Se asistió a capacitación liderada por el área SST bajo modalidad virtual,tema de la sesión formativa: Prácticas seguras generales.

ACTIVIDADES DEL AREA SOCIAL:

Se elaboró informe sectorial de gestión social,el cual da cuenta de acciones adelantadas en cumplimiento del PGS con periodo de reporte semanal

Profesional social de obra realizó inducción socioambiental en el marco de la Licencia Ambiental al personal qué ingreso a la empresa brindando información sobre la Resolución 2170 de 2008, Plan de Manejo Ambiental. Se entregó volante del SAU y se hace énfasis en las fichas del PMA y las medidas preventivas para su implementación, importancia de la Reserva Forestal y cuidado ambiental

Se revisó informe y anexos del informe de gestión social correspondiente al mes de marzo entregados por el contratista y se generó comunicado con concepto respectivo.

Se realizó revisión de reportes semanales de profesionales de obra social y arqueología, en los cuales presentan acciones adelantadas en el periodo objeto de reporte y coordinan posible ejecución de actividades en cumplimiento a planes de manejo respectivamente.

Elaboración de reporte semanal en formato MEPI-MNI-IN-15-210, el cual permite el reporte de actividades semanales desde el componente social y sus alcances.

En proceso de elaboración del informe trimestral N° 19 paar presentación de la gestión social, el cual contiene procesos adelantados en cumplimiento al PGS y PMA.

En proceso de revisión insumos presentados por el contratista en atención a solicitud de información adicional por parte de la DANCP, con el fin de avanzar en el trámite ante la Autoridad Nacional para obtención de certificado de procedencia y oportunidad de consulta previa.

Capacitación a personal de obra,en tema: Fases del programa de Arqueología preventiva,desarrollado por profesional líder de campo.

AREA PREDIAL

COMUNICACIONES

Mediante comunicado Putumayo04-8063-26 del 24/03/2026 Se remite a la SMCN FICHA PREDIAL 005- D- T3-CMMVSFM a INVIAS.

ACTIVIDADES DEL AREA PREDIAL:

• Informes de Gestión Predial de la Interventoría

• En los tramos de intervención de obra nueva, se cuentan en el proyecto con 12 permisos de intervención voluntaria.

El estado de gestión de predios de pasivos prediales:

260-ID- T4-CMMVSFM	Minuta de escritura pública en notaria a la espera de Paz y salvo Predial por parte del propietario para culminar el trámite Notarial
264-SPI	Se envió el 02/Agosto/2025 Formato de solicitud de Mutación Catastral y documentación soporte de adquisición a la territorial INVIAS Putumayo (Ing. Miguel Angel Cuacalas Díaz) en cons idaración a lo solicitado por el IGAC en el comunicado 2015 C TN-2025-000461 5 del 25/05/2025.
264A-SPI	Se remitió EJECUTORIA 264 A, 03-09-2025, se remitió por parte del INVIAS los avales a la constancias de ejecutoria.
264B-SPI	Ya se pagó el 100% de la obligación. A la espera de Capacitación con Gestión documental Del INVIAS para entrega Final del Expediente.
285- SPI	Se envió el 02/Agosto/2025 Formato de solicitud de Mutación Catastral y documentación soporte de adquisición a la territorial INVIAS Putumayo (Ing. Miguel Angel Cuacalas Díaz) en cons idaración a lo solicitado por el IGAC en el comunicado 2015 C TN-2025-000461 5 del 25/05/2025.
286-SPID	Oferta formal de compra notificada y aceptada con inscripción en la ORIP, minuta de escritura en revisión de la interventoría radicado 312-001- 2025071 6000270.
288-SPI	Predio adquirido a favor del INVIAS mediante escritura pública de compraventa no 1154 de 2024. Ya se pagó el 100%. Se radicó ante el IGAC solicitud de asignación de cedula catastral.
314 -D-T4-CMMVSFM	Se remitió por parte del INVIAS los avales a la constancias de ejecutoria.
338 D	Minuta de escritura pública, se remitió de paz y salvo de impuesto predial para continuar el proceso de escrituración.
356D	Oficio 04-8554-25-ME, ALCANCE A LA OFERTA FORMAL DE COMPRA SMA 64447 aclarada mediante SMA 5128, predio 356D con folio de matrícula inmobiliaria 440- 17396.

Para el contrato N.° 964 del 2021. - Sector 3, Resumen del estado de gestión:

GESTION PREDIAL

	No	EJECUTADOS	%	FALTANTES POR EJECUTAR				%	OBSERVACIONES
				EN MANOS DE	SUB TOTAL	%	TOTAL		
No Predios o Carpetas	22	14	64%	CONTRATISTA	12	0%	12	55%	
				INVIAS	2	17%			
Fichas	22	14	64%	CONTRATISTA	12	86%	14	64%	
				INTERVENTORIA	0	0%			
				INVIAS	0	0%			
Estudios de Títulos	22	14	64%	CONTRATISTA	14	100%	14	64%	
				INTERVENTORIA	0	0%			
				INVIAS	0	0%			
Avalúos	22	14	64%	CONTRATISTA	11	138%	8	36%	
				INTERVENTORIA		0%			
				INTERVENTORIA	0	0%			
Escrituras	22	9	41%	ALCALDIA	0	0%	13	59%	
				PROPIETARIOS	0	0%			
				NOTARIA	0	0%			
				OFICINA DE REGISTRO E INSTRUMENTOS PUBLICOS	0	0%			
Pendientes	Se reiteraron al INVIAS los pendientes de gestión, toda vez que no se le han dado respuesta.								

Se requiere la gestión de saneamiento, como son la formación catastral (debido a que no existe referencia catastral en la zona), la actualización de cabida y linderos (al no coincidir las áreas de las bases catastrales con las jurídicas), o cualquier otra, que genere algún riesgo de retraso en su gestión situaciones.

Se reitera que, de demorarse más los tiempos en la definición de las actividades requeridas, con lo anterior el riesgo latente es el impacto del cronograma por los tiempos requeridos para su saneamiento, a su vez insta que en caso de requerirse la elaboración de topografías de la totalidad de las áreas de alguno de los predios (o de los cinco predios), es necesario garantizar que no se perderá la actividad ejecutada, sino que se garantice que se continúe hasta al fin de su adquisición.

ÁREA SST

COMUNICACIONES

Durante periodo reportado no se generan comunicaciones

REUNIONES Y/O RECORRIDOS:

Durante la semana del 06 de abril al 08 de abril de 2026, se realizaron diversas actividades de supervisión, inspección y verificación en los diferentes frentes de trabajo, con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo establecidas en la normativa vigente y en los procedimientos internos del proyecto.

ACTIVIDADES DEL AREA SST:

El día 6 de abril, se revisó la documentación de ingreso del personal de mantenimiento del proveedor Geclosa, verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos para su ingreso y permanencia en obra. Adicionalmente, se realizó la inspección del equipo tipo telehandler, verificando sus condiciones operativas y de seguridad para el desarrollo de actividades. Finalmente, se dio inicio a la revisión del informe mensual de SST remitido por la contratista El Cóndor, con el fin de validar el cumplimiento de los requisitos y la información reportada.

El día 07 de abril, se participó en capacitación realizada por la ARL, dirigida al personal de la interventoría, sobre prácticas seguras.

El día 07 de abril. se evidenció la presencia de pomas sin etiquetar, frente a lo cual la Auxiliar SST manifestó que se encuentran implementando alternativas para mejorar la adherencia de las etiquetas.

El día 07 de abril, se supervisó el preoperacional del equipo telehandler realizado en sitio, verificando su correcta ejecución.

El día 07 de abril, durante el recorrido en el sector del Talud 9, se evidenció la presencia de vehículos estacionados en zona de trabajo, por lo cual se realizó la observación correspondiente para su reubicación.

El día 07 de abril, durante el recorrido en el sector del Talud 9, se evidenció la presencia de vehículos estacionados en zona de trabajo, por lo cual se realizó la observación correspondiente para su reubicación.

El día 07 de abril, se realizaron observaciones generales relacionadas con el uso adecuado de EPP, así como condiciones de orden y aseo en los diferentes frentes de trabajo.

El día 08 de abril, se revisó la documentación de ingreso al proyecto del personal de la contratista El Cóndor, correspondiente a un operador de minicargador y un operador de compresor, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Por otra parte, la contratista El Cóndor continúa con la implementación de actividades del SG-SST, tales como pausas activas, inducción al personal de ingreso y acompañamiento a tareas de alto riesgo como lanzado de concreto y trabajos en alturas; así mismo, realiza recorridos diarios en obra para la identificación de hallazgos y la ejecución de las respectivas acciones correctivas.

ESTUDIOS Y DISEÑOS

COMUNICACIONES

Enviados

- Mediante comunicado Putumayo04-8052-26 del 19-03-2026 Interventoría solicita que semanalmente cada lunes construcciones el Cóndor presente corte del Project donde se evidencie o haga énfasis en porcentaje (%) programado vs porcentaje (%) ejecutado, respecto al cronograma Vigente de Estudios & Diseños y exploración geotécnica. Lo antes descrito para facilitar el Seguimiento y Control semanal, tratado en comités de obra y requerimiento hecho por el Invias.
- Mediante comunicado Putumayo04-8059-26 del 20-03-2026 presenta. Aprobación diseño estructural de Muro Y16

REUNIONES Y RECORRIDOS:

*Mesas de trabajo entre pares Obra e Interventoría en Seguimiento y Control a E&D.

*Mesas de trabajo para culminar la impresión de Volumenes de Diseño.

ACTIVIDADES ESTUDIOS Y DISEÑOS

INTERVENTORIA

• Interventoría emite, Aprobación diseño estructural del Muro Y16

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 de 4
		FECHA	8/4/2026 (Día / Mes / Año)

COMPONENTE	K10+600 K11+600	K11+600 K13+600	K13+600 K15+600	K15+600 K17+600	K17+600 K19+600	K19+600 K21+600	K21+600 K23+971
ESTUDIO DE TRANSITO Y NIVELES DE SERVICIO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA	100%	100%	80%				
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION	100%	60%	51%				
ESTUDIO DE ESTABILIZACION Y ESTABILIDAD DE TALUDES	100%	94%	69%				
ESTUDIO GEOTECNICO Y DISEÑO DE PAVIMENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION	100%	80%	80%	40%	40%	40%	40%
ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	100%	97%	65%				
COMPONENTE AMBIENTAL	100%	20%	0%	MODIFICACIÓN DE LICENCIA			
ESTUDIO PREDIAL Y SOCIO - PREDIAL	100%	100%	20%	CONSULTA PREVIA			
ESTIMACION DE CANTIDADES DE OBRA	100%	0%	0%				
RESUMEN EJECUTIVO	100%	0%	0%				
EXPLORACION GEOTECNICA	100%	100%	100%	100%	80%		20%

CONVENCIONES

APROBADO | EN EJECUCION | SIN PRESENTAR

ESTADO CAMPAÑA EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA

Continúa la ejecución de sondeos de acuerdo a programación

Mediante comunicado Putumayo04-8091-26 de 27/03/2026 Se emite respuesta a comunicado de Cóndor No. 312-168-20260223002254 con recibido interno 04-7141-26 del 23-02-2026, asunto "Entrega parcial registros de exploración K15+600 - K17+600 / K19+600-K21+600".

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TÉCNICA
* Continuar atención de emergencias de la vía existente Mocoa – San Francisco Trampolín de la biodiversidad.
* Estabilización de taludes (perfilado, concreto lanzado, perforación, llenado, inyección y tensionamiento anclajes activos) en sector 3 desde K11+445 a K11+804 en margen izquierda
* Muros 1, 2, 4, 6: Construcción de new jersey y ODT
* Muro 3 K10+956,29 - K10+98978 M.D: construcción de new jersey.
* Muro 7 K11+430,62 - K11+460,01 M.D: Continuación anillado. Amarre aceros y vaciado pilotes.
* Muro 8 K11+535,09 - K11+587,22 M.D: Continuación anillado. Amarre aceros y vaciado
* Puente Y4 K11+682 - K11+727
* Exploración Geotécnica

ESTUDIOS Y DISEÑOS:
*Revisiones varias de productos de Diseño presentados por obra.
*Atención a observaciones de interventoría a productos de Diseño regresados. Esto por parte de Obra.
*Enfasis Obra e Interventoria, en tener producto Talud 15 Aprobados para inicio de obra.


SOCIAL:
* Revisión documental
* Seguimiento a actividades ordinarias o extraordinarias a ejecutar por parte de profesional social de obra

SST:
• Realizar recorridos de campo.
• Verificar condiciones de seguridad en las diferentes áreas de trabajo.
• Asistencia a comité semanal de obra.
* Seguimiento a condiciones de seguridad durante actividades de alto riesgo como lo es trabajo en alturas y espacios confinados.

AMBIENTAL:
• Seguimiento a las actividades programadas por el Contratista.
• Seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en los frentes de obra.
• Revisión y respuesta de correspondencia radicada por el INVIAS y el Contratista.
• La Interventoría revisará el informe de la gestión ambiental del Contratista del mes de marzo de 2026.
• El Contratista radicará en VITAL, el reporte de avance parcial N°14 de la Contingencia 7 (Riesgo inminente) localizada del K11+600 al K11+685.
• El Contratista radicará en VITAL, el reporte de avance parcial N°14 de la Contingencia 8 localizada del K8+300 al K8+330.
• El Contratista radicará en VITAL, el reporte de avance parcial N°14 de la Contingencia 9 (Camino Sachamates) localizada del K11+315 al K11+330.
• El Contratista radicará en VITAL, el reporte de avance parcial N°13 de la Contingencia 11 (Riesgo inminente) localizada del K10+950 al K11+000.
• El Contratista radicará en VITAL, el reporte de avance parcial N°11 de la Contingencia 12 (Riesgo inminente) localizada del K11+720 al K11+900.

PREDIAL:
*Revisión de la sábana predial actual.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

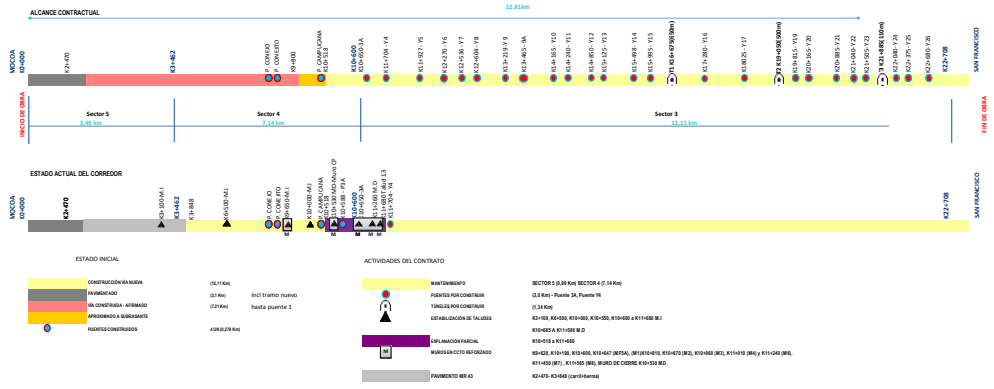

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNI-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Mantenimiento vía existente El Pepino - San Francisco - conformación de calzada existente



Muro 3 K10+956/989 MD: instalación de acero de refuerzo para barrera de protección (new jersey)



Muro 4 K10+999-K11+049 MD: instalación de acero de refuerzo para barrera de protección (new jersey)



Panorámica estabilización de taludes 9, 13 , contingencia



Talud 13 N (K11+720/804) M.I: Explanación terraza 1



Fundición de tramo de canal entre K9+970 - K9+980 M.I - Sector 4

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se realizan requerimientos permanentes al Contratista al respecto del avance de las actividades contractuales.

Se emiten comunicaciones permanentes al contratista encaminadas a reiterar las obligaciones contractuales y se hace seguimiento a lo pertinente.

Se programa y coordina los comités de seguimiento semanal con el Contratista y se generan compromisos cuyo cumplimiento se evalúa en la semana siguiente.

Seguimiento y control de la calidad de los materiales utilizados en las actividades realizadas en obra de acuerdo con las Normas establecidas por INVIAS

Seguimiento y supervisión permanente a las actividades de obra desde las áreas técnica, ambiental, social, predial y SST

Seguimiento, medición y control de calidad permanente en campo de las actividades en ejecución.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ**

Matrícula Profesional No.: **25202-31528 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 6
		FECHA:	15/4/2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO | SEMANA No.: 250 del 9/4/2026 al 15/4/2026 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Angel Guacales

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 12,97 Km de vía nueva que contemplan 31 puentes con una longitud total de 2,39 Km y 2 túneles en una longitud total de 0,33 Km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Intervención para terminación de la construcción de una vía, de la cual se tienen construidos hasta el momento 10,5 Km entre la abscisa K0+000 al K10+518 incluyendo 3 puentes correspondiente al Sector 4. Durante el presente contrato se ejecutó la terminación de explanación y estabilización de talud K10+518 - K10+600 del sector 4 (Talud Campucana). Pendientes por construir el tramo comprendido entre el K10+600 al K23+571,17 que corresponden al sector 3, con el fin de comunicar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa.

Mediante comunicado de fecha 18/11/24 radicado al CRP con el consecutivo 04-5482-24 el Contratista radicó a Interventoría el diseño geométrico propuesto a fase II como optimización del alineamiento del sub tramo K11+600 – K23+571, que incluye también el sector en ejecución K10+600 -K11+600. la propuesta indica que el alineamiento se desarrolla entre el K10+600 al K22+811 con una longitud total de 12.211,20 m que contempla 7.770,50 m de intervención a cielo abierto; 24 puentes de longitud sumada 3.180,50 m y 3 túneles de longitud sumada 1.260, 00 m.

Una vez desarrollada la propuesta radicada y previa revisión de Interventoría se ajusta el alineamiento al tramo K10+598 - K22+708 con una longitud total de 12.11 m que contempla 7.567 m de intervención a cielo abierto; 31 puentes de longitud sumada 3.199 m y 3 túneles de longitud sumada 1.342,00 m.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.			INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO		
INTEGRANTES:	CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A – 100%			INTEGRANTES:	HMV INGENIEROS LTDA 40% CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.– 30% GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.– 30%		
CONTRATO No.	964 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 541.389.993.817,00	CONTRATO No.	977 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 47.999.892.900,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ 2.400.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 541.389.993.817,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 50.399.892.900,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 22.030.482.547,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 1.129.388.470,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 2.866.933.204,00			VALOR AMORTIZADO:	$ 1.129.388.470,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 19.163.549.343,00			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 27.049.209.068	$ 18.020.744.751	$ 27.072.000.000	$ 63.144.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 27.049.209.068	$ 18.020.744.751	$ 27.072.000.001	$ 63.144.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.600.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ -	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	2027	2028
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 63.168.000.000	$ 63.192.000.000	$ 67.680.000.000	$ 63.168.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 59.525.322.938			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3.642.677.062			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 8.000.000.000	$ 5.400.000.000	$ 6.000.000.000	$ 5.600.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 7.567.067.068			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 432.932.911,97			

CONTRATO	VIGENCIA	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 54.144.000.000	$ 94.752.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.200.000.000	$ 4.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (INICIAL) (A)	**$ 483.413.463.218,00**	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIF No.5:	$ 347.184.964.001,00	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIF No.6:	$ 343.727.160.196,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 151.576.697.943,19	31,36%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 145.904.287.625,00	30,18%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (5.672.410.318,19)	-1,17%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños)	$ 33.613.374.438,00	6,95%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 198.098.731.728,09	36,59%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 180.517.262.064,00	33,34%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (17.581.469.664,09)	-3,25%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 576.080.581	0,17%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 469.809.650	0,14%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Fe No.22513 de 15/04/2026: Acta de Obra No. 56 febrero 2026 Fe No.22436 de 11/03/2026: Acta Ajustes Def No. 55

PERIODO FACTURADO: Febrero 2026
VALOR FACTURA: $ 3.407.321.775,00
$ 856.516.417,00 Acta de ajustes Def No.55 enero 2026

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado de trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo04-8093-26 de 27/03/2026, Interventoría remite a la DT INVIAS Putumayo Acta de Obra No. 57 periodo marzo 2026, la cual dió entrada con número de radicado No.2026E-VUVRAZ-033526 de fecha 08 de abril de 2026

Mediante comunicado Putumayo04-8094-26 de 27/03/2026, Interventoría remite a la DT INVIAS Putumayo Acta de Ajustes definitivo No. 56 periodo febrero 2026, la cual dió entrada con número de radicado No.2026E-VUVRAZ-0029821 de fecha 27 de marzo de 2026

NOTA: El valor reportado como saldo de vigencia 2025 por $11.231.680.296 contempla el monto del anticipo No.2 por valor de 14.000 millones de pesos cuyo trámite a la fecha, se encuentra en cuentas por pagar según lo reportado por la SMCN.

Inversión total programada desde la fecha de inicio del contrato hasta	abril 15 de 2026	$	198.098.731.728,09	36,59%
Inversión total ejecutada desde la fecha de inicio del contrato hasta	abril 15 de 2026	$	180.517.262.064,00	33,34%
Inversión de obra programada desde la fecha de inicio del contrato hasta	abril 15 de 2026	$	151.576.697.943,19	31,36%
Inversión en obra ejecutada desde la fecha de inicio del contrato hasta	abril 15 de 2026	$	145.904.287.625,00	30,18%

Detalle información financiera:

Valor facturado acumulado a febrero de 2026	$ 175.647.727.413,00	32,44%	Valor programado acumulado a	febrero de 2026	$	191.908.862.951,19	35,45%

NOTA: El valor facturado acumulado corresponde al valor acumulado hasta acta de Obra No.56 febrero 2026 más las actas de ajustes def No.55

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 26.334.215.881		54,86%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 26.333.465.347		54,86%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 175.556.731		0,37%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 175.556.731		0,37%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Enero 2026
VALOR FACTURA: $ 572.653.943

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado de trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo04-8114-25 de 06/04/26 Interventoría radica a la DT Invias Putumayo, Acta de Costos de Interventoría No.56 febrero 2026. la cual dió entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-032289 de fecha 06 de abril de 2026

Mediante comunicado Putumayo04-7989-25 de 11/03/26 Interventoría radica a la SMCN, Acta de Costos de Interventoría No.55 enero 2026. la cual dió entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-023234 de fecha 11 de marzo de 2026

Mediante comunicado Putumayo04-7986-25 de 11/03/26 Interventoría radica a la SMCN, Acta de Modificación de Costos de Interventoría No 6 Contrato 977 de 2021 y Reprogramación al Plan de Cargas No 9. la cual dió entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-022991 de fecha 11 de marzo de 2026

Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta	abril 15 de 2026	$ 26.334.215.880,68	54,86%
Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta	abril 15 de 2026	$ 26.333.465.347,39	54,86%

Detalle información financiera:

Valor programado acumulado a	Diciembre de 2025	$ 24.399.352.105	50,83%
Valor facturado acumulado	Diciembre de 2025	$ 23.966.959.988	49,93%

Nota 1: El valor programado acumulado se toma de acuerdo al Plan de Cargas No 9 radicado ante la entidad con comunicado Putumayo04-7819-26 con fecha 05 de febrero de 2026, Radicado 2026E-VUVRAZ-008992

ANTICIPOS	
Otorgado $	22.030.482.547,00
Amortizado $	2.866.933.204,00
Saldo $	19.163.549.343,00

INDICADOR IC	
En el mes:	**0,17**
Acumulado:	**0,15**

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.129.388.470,00
Amortizado $	$ 1.129.388.470,00
Saldo $	$ 0,00

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 31,36% (Inversión programada en obra básica) Avance o Atraso Físico % -1,17%
Meta Física Ejecutada % 30,18% (Inversión ejecutada en obra básica)

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia hasta 2025	Vigencia 2026	Avance Físico	Tramo 3	Tramo 4	Corredor	Total	%
EXPLANACIONES	km	12,19	1,16	-	Prog	12,11	0,08		12,19	
					Ejec	1,08	0,08		1,16	9,53%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	km	20,34	1,16	-	Prog	12,211	8,13		20,34	
					Ejec	0	1,39		1,39	6,81%
PAVIMENTOS ASFALTICOS (pavimento hidráulico)	km	20,24	1,16	-	Prog	12,11	8,13		20,24	
					Ejec		1,32		1,32	6,50%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	km	12,11			Prog	12,11			12,11	
					Ejec				0,00	0,00%
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	km	20,24			Prog	12,11	8,13		20,24	
					Ejec				0,00	0,00%
OBRAS VARIAS	km	20,24			Prog	12,11	8,13		20,24	
					Ejec				0,00	0,00%
TRANSPORTES	km	12,19	1,160	-	Prog	12,11	0,08		12,19	
					Ejec	1,08	0,08		1,16	9,53%
PUENTES	km	3,21	0,030	-	Prog	3,18	0,03		3,21	
					Ejec	-	0,03		0,03	0,84%
TÚNELES	km	1,26			Prog	1,26	0,00		1,26	
					Ejec		0,00		0,00	0,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 4: K3+462 - K10+600
TRAMO Y/O SECTOR 3: K10+600 hacia mayores

Nota: La longitud total a intervenir de acuerdo con diseños a fase II en el sector 3 es de 12.11 Km. (meta física programada). A la fecha se ha intervenido de manera parcial 1,080 Km, lo que equivale a una meta física ejecutada del 8.91 %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Planta de concreto	1	1
Planta de asfalto	1	
Perforador jumbo (3 brazos)	2	
Formaleta para revestimiento túneles	3	
Andamios para instalacion impermeas	3	
Carro de avance	2	
Perforador jumbo (2 brazos)	3	
Bomba inyección lechada	4	4
Robot de lanzado	4	
Trituradora 50 Ton	1	
Excavadora de orugas	2	4
Compactador neumático	2	
Terminadora de Asfalto	1	
Motoniveladora	4	1
Vibrocompactador	2	2
Volquetas	10	6
Cargador		1
Retrocargador		2
Camioneta		4
Camiones		1
Carro taller		1
Camión combustible		1
Carrotanque de agua		1
Bomba para concreto		1
Bulldozer		
Minicargadores		2
Compresor		9
Generador Eléctrico		4
Planta de generación de energía		6
Equipo para tensionamiento (anclajes)		1
Compactador manual (Canguro)		2
Vibrador manual para Concreto		2
Perforadoras T46 (oruga)		3
Perforadoras T19 (Colgantes)		4
Perforadoras Everdigm		1
Telehandler		1
Perforadoras petty (sondeos)		5
Equipo de topografía		2
Unidad perforadora con canasta		4
Mixer		2
TOTAL		**78**

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MOCOA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:
Se cuenta con Autorización Temporal de materiales de construcción No. 502328 sobre el Rio Mocoa, autorizada mediante Resoluci ón 210-4291 del 20 de octubre de 2021 emitida por la Agencia Nacional de Mineria y con Licencia Ambiental otorgada a través de la Resolución 0746 del 26 de mayo de 2023 emitida por CORPOAMAZONIA. Actualmente, se encuentra en proceso el trámite de cesión de la Autorización Temporal por parte del Consorcio CM Putumayo a Construcciones El Cóndor S.A.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	X	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:
La Licencia Ambiental concedida mediante Resolución 2170 del 01 de diciembre de 2008 otorga los permisos de sustracción de reserva forestal, levantamiento de veda, zonas industrial, campamentos, concesión de aguas superficiales, vertimientos, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, ocupación de cauce y zonas de disposición fina l de material sobrante (ZODME).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N.A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**449**	**20**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	245	15
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	204	5
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	208	11

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 469

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Av.Colombia Cra 9 N. 21 - 108.

OBSERVACIONES:
GS-1 SISTEMA DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL A LA COMUNIDAD.
En este periodo semanal objeto de reporte, nose desarrolló escenario de capacitacion a comunidad.

GS - 3 CAPACITACION AMBIENTAL Y EN SEGURIDAD INDUSTRIAL AL PERSONAL DE OBRA.
En este periodo semanal objeto de reporte no se desarrolló escenario de capacitacion a personal de obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	22
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N.A.
AVALÚOS APROBADOS:	N.A.
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N.A.

OBSERVACIONES:
Las gestiones identificadas preliminarmente, corresponden a lo identificado para los dos primeros kilómetros. El contratista está en proceso de elaboración y entrega del diagnóstico predial para el contrato.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Envío por parte del contratista del informe de sostenibilidad correspondiente al mes de marzo de 2026.

2. En proceso de elaboración informe trimestral 19.

AREA TÉCNICA

COMUNICACIONES

Mediante comunicado Putumayo04-8130-26 de 09/04/2026 se remite a la SMCN Acta de ajustes definitivos No 56 febrero de 2026 Cto 964 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa

Mediante comunicado Putumayo04-8135-26 de 09/04/2026 Se radicó a la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales el informe semanal No.249 correspondiente al periodo 02 al 08 de abril 2026.

Mediante comunicado Putumayo04-8136-26 del 10/04/2026, se remite a la DT INVIAS Putumayo Acta de ajustes definitivos No.57 marzo 2026 Cto 964 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa

Mediante comunicado Putumayo04-8137-26 del 10/04/2026, se radica a la SMCN SEGUNDA REITERACIÓN: Solicitud urgente de habilitación de semanas en plataforma CIFRA para los contratos de obra No. 964 y 1111 de 2021.

Mediante comunicado Putumayo04-8145-26 del 13/04/2026, se traslada a Construcciones el Cóndor de la solicitud de documentos para proceder con modificación contractual del contrato 964 de 2021

Mediante comunicado Putumayo04-8148-26 del 13/04/2026, se emite respuesta a Contratista a comunicado 312-168-20260324002318 con recibido interno 04-7293-26 del 25-03-2026, con asunto "Vol. IV – Suelos S3 – Remisión de concepto técnico acerca de la profundidad del caisson #5 del muro 7, ubicado en el tramo K11+429 – K11+460 del Sector 3 del Proyecto". Aprobación a modificación profundidad caisson 5 del muro 7.

Mediante comunicado Putumayo04-8163-26 del 14/04/2026, se remite a la DT INVIAS Putumayo Alcance Acta de Obra No.57 marzo 2026 Cto 964 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa

Mediante comunicado Putumayo04-8164-26 del 14/04/2026, se remite a la DT INVIAS Putumayo Alcance Acta de ajustes definitivos No.57 marzo 2026 Cto 964 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa

Mediante comunicado Putumayo04-8167-26 del 15/04/2026, se remite a la DT INVIAS Putumayo Informe mensual de Interventoría No. 57 Marzo de 2026 Variante San Francisco - Mocoa

Mediante comunicado Putumayo04-8169-26 del 15/04/2026, se remite a la DT INVIAS Putumayo Rta 2026S-VPUT-016298 Remisión de observaciones Acta de Fijación de Ítems No Previstos No. 6. R.I. 04-7279-26-M2

REUNIONES Y RECORRIDOS:

Interventoría desarrolla recorridos permanentes al sitio de las obras a fin de verificar el estado de la obra en los diferentes frentes activos.

El día 10 de abril de 2026 se llevó a cabo el comité de seguimiento de obra No. 174 con participación de Gestor del proyecto, Contratista Construcciones el Cóndor S.A, Interventoría Consorcio Reactivación Putumayo.

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Dia /Mes / Año)	RESPONSABLES	CUMPLIMIENTO
1. Seguimiento al avance en la gestión de anticipo No 2 solicitado por el Contratista	PRÓXIMO COMITÉ	Interventoría - Entidad	EN ESTE COMITÉ
2. Remisión documentos ajustados grupo 6 de Ítems No Previstos	PRÓXIMO COMITÉ	Interventoría	EN ESTE COMITÉ
3. Concepto de Interventoría a propuesta técnica ajuste profundidad de desplante pilote No 5 Muro 7	PRÓXIMO COMITÉ	Interventoría	CUMPLIDO
4. Mesa de Trabajo Revisión revisión ajuste a Cronograma Estudios y Diseños sector 3 según instrucción de INVIAS	PRÓXIMO COMITÉ	Contratista - Interventoría	EN ESTE COMITÉ
5. Mesa de trabajo revisión alcance técnico propuesta sustracción de reserva: zodmes, vías industriales, accesos, campamentos y demás.	30/03/2026	Contratista - Interventoría	CUMPLIDO
6. Mesa de Trabajo unificación polígonos ANLA y DANCP con Sostenibilidad	PRÓXIMO COMITÉ	Contratista - Interventoría - INVIAS - SS	EN ESTE COMITÉ
7. Mesa de trabajo con Gobernación de Putumayo para revisión pasivo predial 407 Escuela Guaduales	16/04/2026	Contratista - Interventoría - INVIAS	DENTRO DEL PLAZO

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Verificación Cumplimiento de compromisos

2. Avance de las obras

3. VARIOS

DESARROLLO DEL COMITÉ

Presentación de los profesionales que participan en el comité por parte de Contratista, Interventoría e INVIAS.

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

1. Seguimiento al avance en la gestión de anticipo No 2 solicitado por el Contratista

El Contratista indica que a la fecha no se ha hecho efectivo el desembolso del anticipo en cuestión. Gestor de Proyecto indica que aún no se dispone de PAC. De otra parte el Contratista solicita que se avale la facturación del acta parcial de obra No 56 correspondiente al mes de febrero de 2026, la cual depende de la aprobación del acta de modificación No 13 por parte de la SMCN. Se hará seguimiento a ambos trámites durante el próximo comité semanal.

2. Remisión documentos ajustados grupo 6 de Ítems No Previstos

Contratista e Interventoría indican que se han efectuado los ajustes solicitados pero solicitan a la DTPUT que se acepten las cotizaciones allegadas para los insumos Grúa, Espejo y Acero A709, ya que con estas se conciliaron los correspondientes APUs. La DTPUT considera viable la solicitud. Se remitirán los documentos ajustados a mediados de la próxima semana.

3. Concepto de Interventoría a propuesta técnica ajuste profundidad de desplante pilote No 5 Muro 7

El Memorando de aval ya fue emitido por el especialista de Interventoría. Se radicará durante la presente jornada.

4. Mesa de Trabajo Revisión revisión ajuste a Cronograma Estudios y Diseños sector 3 según instrucción de INVIAS

Cumplido. El Contratista socializó a Interventoría el cronograma ajustado, al cual se solicitó reducir los tiempos de ejecución. El Contratista radicará el cronograma ajustado según requerimiento de Interventoría el próximo 14/04/26.

5. Mesa de trabajo revisión alcance técnico propuesta sustracción de reserva: zodmes, vías industriales, accesos, campamentos y demás.

Cumplido. Mediante la mesa de trabajo con participación de especialistas de obra e Interventoría se ha socializado de manera preliminar los posibles trazados de vías industriales para transitar entre ponteaderos de puentes y viaductos, buscando acometer frentes simultáneos de obra, a fin de estimar las áreas necesarias para incluir en los documentos de modificación de licencia y sustracción de reserva. El ejercicio indica que algunas estructuras requieren adecuación de pasos de longitud considerable, por lo cual se está analizando la posibilidad de reducir al máximo el desarrollo de estos carreteables, tomando en cuenta las evidentes limitaciones que ofrece la topografía del sector.

6. Mesa de Trabajo unificación polígonos ANLA y DANCP con Sostenibilidad

Al respecto el Gestor de Proyecto indica que el Consorcio San Francisco ya radicó el documento a la DANCP. Enviará copia a Construcciones El Cóndor S.A.

7. Mesa de trabajo con Gobernación de Putumayo para revisión pasivo predial 407 Escuela Guaduales

De acuerdo conel documento de respuesta a la Gobernación de Putumayo, se mantiene la fecha propuesta para la mesa de trabajo el próximo 16/04/26.

PRESENTACIÓN DE AVANCE DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. ÁREA TÉCNICA

Puente Campucana, Km10+500

- Construcción de losas de aproximación, eje 4, cairil derecho

Talud 9, Km 11+445 - Km 11+580

Estabilización de talud, terraza 5:

- Perforación e inyección de pernos autoperforantes R-38, línea C.
- Perforación de anclajes activos 40 ton, terreno natural, margen derecha.
- Vaciado de dados en sitio, terreno natural.
- Explanación en roca, terraza 5, línea D.

Talud 13, Km 11+590 - Km 11+680

- Perforación de anclajes activos, terraza 3, línea D
- Explanación terraza 3, línea E.
- Instalación de concreto lanzado con fibra sintetica línea D.
- Vaciado de dados en sitio, terraza 3, línea B.

Talud 13N, Km 11+720 - Km 11+804

- Explanación y acceso a terraza 1, línea A.

Muro 1, Km 10+810, margén derecha:

Sistema de contención :

- Finaliza construcción New Jersey, módulo 1,2 y 3

Muro 2, Km 10+870, margén derecha:

Sistema de contención :

- Finaliza construcción New Jersey, módulo 1,2 y 3

Muro 3, Km 10+970, margén derecha:

Sistema de contención :

- Instalación de acero New Jersey, módulo 1,2 y 3.
- Instalación de tubería de refuerzo clase III, ODT004

Muro 4, Km 11+030, margén derecha:

Sistema de contención :

- Instalación de acero New Jersey, módulo 1 y 2

Muro 7, K11+428.56 - K11+459.99

- Instalación de acero de refuerzo nucleo caisson No.5

Muro 8, K11+535.09 -K11+587.22

Sistema de contención, bloque 1 y 2, margen derecha :

- Construcción cimentación profunda, avance en Caisson 1,2,3,7,8,9,10.

Muro Y2, K11+819.71 -K11+834.33

Sistema de contención, margen derecha :

- Inicio excavación de cimentació profunda.

Puente Y4, K11+682 -K11+727

Cimentación profunda, Eje 1, margen derecha :

- Construcción cimentación profunda, avance en Caisson 1
- Avance construcción de acceso a eje 2

Trampolin de la Biodiversidad

Conformación de la vía PR97+800 al PR99+800

Conformación de la vía PR96+300 al PR97+800

Resumen avance financiero 2026

Obra	Fecha de Inicio	Fecha de terminacion	Valor programado a la fecha	Valor ejecutado a la fecha	Porcentaje programado	porcentaje ejecutado	% ATRASO/ HOLGURA
Talud k11+445- k11+580 Talud 9	13/01/2026	22/06/2026	$ 2,140,833,809.06	$ 3,448,940,696.57	62%	101%	38%
Km 11+580 - Km 11+680 Talud 13	14/01/2026	20/08/2026	$ 2,628,314,422.56	$ 3,472,094,704.56	47%	62%	15%
Km 11+730 - Km 11+804 Talud 13N	31/01/2026	29/06/2026	$ 1,386,805,388.99	$ 183,789,808.00	44%	6%	-38%
Km 11+804 - Km 11+895 Talud 14	05/05/2026	18/11/2026	$ -	$ -	0%	0%	0%
Km 11+950 - Km 12+100 Talud 15	02/07/2026	07/10/2026	$ -	$ -	0%	0%	0%
Km 12+100 - Km 12+180 Talud 15-1	25/07/2026	26/ 12/2026	$ -	$ -	0%	0%	0%
Km 12+180 - Km 12+260 Talud 16	06/08/2026	10/11/2026	$ -	$ -	0%	0%	0%
Km 12+260 - Km 12+355 Talud 17	16/09/2026	30/12/2026	$ -	$ -	0%	0%	0%
Km 12+355- Km 12+415 Talud 18	21/10/2026	30/ 12/2026	$ -	$ -	0%	0%	0%
Puente Y4	11/02/2026	02/11/2026	$ 256,136,221.22	$ 24,107,559.15	16%	1.5%	-15%
Puente Y6	30/03/2026	30/11/2026	$ -	$ -	0%	0%	0%
Muro 7 K11+428.56 - K11+459.99	13/01/2026	20/05/2026	$ 523,261,838.01	$ 547,970,928.30	59%	62%	3%
Muro 8 K11+535.09 -K11+587.22	13/01/2026	29/09/2026	$ 869,580,693.53	$ 294,936,905.10	64%	22%	-42%
Muro Y2 K11+819.71 - K11+834.33	24/02/2026	04/07/2026	$ 145,340,286.81	$ 13,149,378.00	18%	1.6%	-16%
Muro Y5 K11+972.99 - K12+037	17/04/2026	11/12/2026	$ -	$ -	0%	0%	0%
Muro Y6 K12+037 - K12+128.21	16/05/2026	29/12/2026	$ -	$ -	0%	0%	0%
Muro Y7 K12+187.58 - K12+199.73	02/07/2026	21/09/2026	$ -	$ -	0%	0%	0%
Obras varias trampolin	13/01/2026	28/12/2026	$ 1,741,814,087.35	$ 1,793,005,638.53	24%	25%	1%
Actividades exploraciones	13/01/2026	14/12/2026	$ 532,193,078.73	$ 508,286,045.65	24%	23%	-1%
Total			**$ 10,613,735,346.26**	**$ 11,750,905,082.50**	**20.2%**	**22.3%**	2.16%

2. ÁREA ESTUDIOS Y DISEÑOS

El Contratista indica que a la fecha está en proceso de suspensión de actividades de exploración geotécnica, las cuales avanzan hasta el K16+900, en razón de la instrucción de adelantar estudios y diseños a fase III únicamente hasta la abscisa ejecutable con los recursos disponibles, estimada de manera preliminar en el K15+500.

Gestor de Proyecto indaga acerca de diseños pendientes de aprobación de obras incluidas en el programa de obra 2026. Interventoría indica que los taludes están aprobados hasta talud 15. Pendiente aval de taludes 16 al 18, los cuales hacen parte de las prioridades de revisión.

Gestor de proyecto enviará para seguimiento semanal el modelo de proyección de facturación para el año 2026 y seguimiento a aprobación de diseños.

3. ÁREA AMBIENTAL

IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EN OBRA

Programa 1. MC-4 MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES

PROGRAMA 4. CA-1 MANEJO AMBIENTAL DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO (MAQUINARIA, EQUIPOS, VEHÍCULOS Y PATIOS DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES) A

4. ÁREA SOCIAL

GS1 SISTEMA DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL A LA COMUNDAD.

Atención a la comunidad:

PQRS:

106 PQRS

106 PQRS Cerradas

PQRS 106: Sr. Justo Martinez: verificación de estado del camino veredal por posible afectación por material de arrastre. (Se encuentra en trámite de respuesta dentro de los términos establecidos por Ley).

6 y 7 de abril y se realizó inducción socio ambiental en el marco de la Licencia Ambiental al personal qué ingreso a la empresa brindando información sobre la Resolución 2170 de 2008, Plan de Manejo Ambiental. Se entregó volante del SAU y se hace énfasis en las fichas del PMA y las medidas preventivas para su implementación, importancia de la Reserva Forestal y cuidado ambiental, implementación de las medidas.

Comité con veeduría ciudadana registrada bajo Resolución 014 del 13/04/2021 programado para el día martes 14/04/2026,ha desarrollarse en instalaciones del Dirección Territorial.

GS - 5 GESTIÓN PREDIAL EN LA ÁREAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

Avance gestión predial: Se solicita información a personal que lidera procesos de gestión predial, sobre el estado del avance del trámite para reconocimiento a la mejorataria Sra Marina Castro-Apoderado Sr. Carlos Córdoba, en atención a sugerencias emitidas por el profesional social de la ANLA, durante comité de seguimiento el apoyo técnico a la labor predial informa se recepcionó por parte de superintendencia de Notariado y registro los dos 2 certificados de carencias registrales que hacían falta , entre ellos el del Sr. Carlos Córdoba y se le informó que con esto ya se puede avanzar en el ajuste de los insumos jurídicos de la mejora.

CONSULTA PREVIA:

El pronunciamiento de la DANCP con fecha de expedicion13/03/2026 el cual fue remitido por parte de Interventoría al contratista, es a la fecha de realización de comité de seguimiento semanal N° 174 objeto de alcance total por parte del contratista, con respectiva entrega por parte de Interventoría el 09/04/2026 a la Subdirección de Sostenibilidad, para surtir trámite respectivo que lidera la Entidad ante la DANCP, el gestor social del proyecto reportó que el día lunes 13/04/2026 desarrollará mesa de trabajo con jurídica de la Entidad y procederá de conformidad.

Se continua a la espera del pronunciamiento por parte del Resguardo indígena Kamentsá Inga del Municipio de San Francisco, relacionado a definir valor de ruta metodológica, teniendo en cuenta que al interior del gabinete se presenta novedades relacionados a recursos invertidos, se continua a la espera de pronunciamiento como resultado de asamblea realizada el día jueves 09/04/2026.

OTROS:

* Aprobación pre acta social N° 57 por interventoría

* Concepto de No Objeción pre acta social N° 57 por la SS

* Informe de gestión social correspondiente al mes de Marzo, revisado y aprobado por Interventoría.

5.ÁREA PREDIAL

Dando cumplimiento a las directrices impartidas por El Instituto Nacional de Vías – INVIAS y la interventoría CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO, para el cierre del proceso de adquisición de los 10 pasivos prediales derivados del Contrato No 407 del 2010.

N°	FICHA PREDIAL	MAT. INMOBILIARIA	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ÁREA DE TERRENO ESTIMADA REQ.	Estado	% Avance Anterior	% Avance Actual
1	260-ID-T4-CMMVSFM	440-16413	K10+021.90 I	K10+035.70 I	0 Ha+ 500,67 m²	Predio a favor del INVIAS se adquirió mediante Escritura Pública de Compraventa No. 1185 del 1/09/2025, mediante oficio 20265-VPUT-010154 dirigido al IGAC la Territorial de INVIAS Putumayo solicito la Mutación Catastral, se recepcionó documentos contables para el pago	98%	98%
2	264-SP-ID	440-14323	K9+315,65 I	K9+715,82 I	0 Ha + 5802.01 m²	Predio a favor del INVIAS se adquirió mediante Escritura Pública de Compraventa No. 1127 del 02-09-2024, tiene Resolución IGAC de Mutación Catastral, se remitió información Digital al SS INVIAS	100%	100%
3	264A-ID-T4-CMMVSFM	440-66117	K9+286.83 I	K9+315.65 I	0 Ha + 0536.20 m²	Demanda de expropiación rechazada por El Juzgado Civil del Circuito de Mocoa - Putumayo mediante auto del 20 de noviembre de 2025, (Radicado del proceso 2025-00194-00), El contratista mediante radicado 312-001-20260224000342 remite a interventoría la perdida de fuerza ejecutoria para la resolución de expropiación 1712 de fecha 20 de mayo de 2024. Insumo aprobado y en revisión de la SS INVIAS	77%	77%
4	264B-T4-CMMVSFM	N.A	K9+315.65	K9+407.93	N.A	Mejoras adquiridas a favor de INVIAS,y pagado el 100%	100%	100%
5	285-SP-I	440-49052	K 7+133,33 I	7+484,40 I	0 Ha + 4186.27 m²	Predio a favor de INVIAS se adquirió mediante Escritura Pública de Compraventa No. 1125 del 02-09-2024 tiene Resolución IGAC de Mutación Catastral, se remitió información Digital al SS INVIAS	100%	100%
6	286-SP-ID	440-52636	K 6+539,63 D	K 7+066,67 I	1Ha +2661.23 m²	Predio a favor de INVIAS se adquirió mediante Escritura Pública de compraventa No. 1774 del 1/12/2025, se recepcionó documentos contables para el pago.	88%	92%
7	288-SP-ID	440-3969	K 6+300,53 I	K 6+538,84 I	0 Ha +2002.92 m²	Predio a favor de INVIAS mediante Escritura Pública De Compraventa No. 1154 del 06-09-2024 tiene Resolución IGAC de Mutación Catastral, se remitió información Digital al SS INVIAS	100%	100%
8	314-ID-T4-CMMVSFM	440-35518	K3+116,83 D	K3+129,28 D	0 Ha +0255.77 m²	Demanda de expropiación Admitida por EL Juzgado Civil del Circuito de Mocoa - Putumayo, radicado del proceso numero .025-00195-00, se realizo el deposito judicial el 24/02/2026, para la entrega anticipada.	85%	85%
9	338-D	440- 8790	K2+339.71 D	K2+378.48 D	0 Ha +0631.63 m²	Predio a favor del INVIAS se adquirió mediante Escritura pública de compraventa No. 1166 del 29/08/2025, y pagado el 100%, mediante oficio 20265-VPUT-010155 dirigido al IGAC, la Territorial de INVIAS Putumayo solicito la Mutación Catastral	100%	100%
10	355D	440-17395	k2+117.09	k2+167.68	0 Ha +00356.68 m²	Resolución de Expropiación enviada por INVIAS y en tramite de notificación (12-12-2025)	69%	69%

PREDIOS REQUERIDOS CONTRATO N°. 964 DEL 2021

N°	FICHA PREDIAL	MAT. INMOBILIARIA	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ÁREA DE TERRENO ESTIMADA REQ.	Estado
1	313-I-T4-CMMVSFM	440-78570	K3+126.33 I	K3+133,50 I	0.003142	Minuta de Escritura Pública aprobada por interventoría y con vistos buenos de las S del INVIAS, área jurídica de la entidad y de la Territorial de INVIAS Putumayo, en espera de Paz y Salvo impuesto predial para continuar con protocolización ante la Notaria única de Mocoa.
2	315-I-T4-CMMVSFM	440-78569	K3+102.56 I	K3+126,33 I	0.026867	Minuta de Escritura Pública aprobada por interventoría y con vistos buenos de las S del INVIAS, área jurídica de la entidad y de la Territorial de INVIAS Putumayo, en espera de Paz y Salvo Impuesto predial para continuar con protocolización ante la Notaria única de Mocoa.
3	001-ID-T3-CMMVSFM	N.A	K 10+504.48 ID	K 10+751.99 ID	1.999545	El 26/05/2025 la SS de INVIAS mediante el comunicado No. 20255-VBOG-034357 emite los vistos buenos de conformidad para los insumos técnicos, el 03-07-2025 Interventoría remite observaciones a los insumos jurídicos (Diagnostico Jurídico)
4	002-ID-T3-CMMVSFM	N.A	K 10+753.63 ID	K 11+101.14 ID	1.986527	El 26/05/2025 la SS de INVIAS mediante el comunicado Nº 20255-VBOG-034357 emite los vistos buenos de conformidad para los Insumos técnicos, el 24/02/2026 el mediante radicado Nro 312-001-20260224000341 se remite para revisión de interventoría el Diagnostico Jurídico aprobado por interventoría en revisión de la SS de INVIAS
5	005-ID-T3-CMMVSFM	N.A	K 11+314.67 D	K 11+436.04 D	1.986527	El 10/03/2026 mediante oficio Putumayo04-7985-26 con radicado No. 311-168-20260310002185, Interventoría comunica de los Vistos Buenos de conformidad por parte de la SS de INVIAS para los Insumos Técnico Prediales.

6. ÁREA SST

ACTIVIDADES GESTION SG-SST

- Inducción al personal que ingresa en temas SST
- Supervisión de Activas de Alto Riesgo
- Pausas Activas personal operativo Campucana

VARIOS

VISITA DIRECTIVAS SMCN AL PROYECTO VARIANTE

Gestor de Proyecto confirma la visita del director operativo y sub director de Modernización de Carreteras Nacionales al proyecto entre el 15 y el 18 de abril de 2026. Se requiere apoyo logístico y acompañamiento de profesionales para acceso hasta los frentes activos de obra. Se confirmará itinerario.

SOLICITUD MODIFICACIÓN ALCANCE EN CONTRATOS DE OBRA

Gestor de Proyecto reitera la solicitud al Contratista para radicar documentación relacionada con la solicitud de modificación al alcance en los contratos de obra, asociada a las actsicsas ejecutables con los ecursos disponibles, a fin de facilitar la liberación del siguiente sub tramo, el cual será objeto de un nuevo proceso licitatorio.

En tal sentido la DTPUT remitió a Interventoría el oficio 20265-VPUT-021674 con asunto Solicitud de documentos para proceder con modificación contractual (Otrosi) para los Contratos de Obra 964 y 1111 de 2021 Definición de alcances finales. Director de Interventoría indica que el mismo fue remitido a los consorciados en espera de directrices para proyectar los comunicados solicitados.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
1. Seguimiento al avance en la gestión de anticipo No 2 solicitado por el Contratista	PRÓXIMO COMITÉ	Interventoría - Entidad
2. Seguimiento a aval para facturación acta parcial No 56 (febrero) radicada a la SMCN	PRÓXIMO COMITÉ	Interventoría - Entidad
3. Remisión documentos ajustados grupo 6 de Items No Previstos	15/04/2026	Interventoría
4. Remisión Cronograma Estudios y Diseños sector 3 ajustado según instrucción de INVIAS	14/04/2026	Contratista - Interventoría
5. Seguimiento al procedimiento de trámite de cesión de derechos del contrato 964	PRÓXIMO COMITÉ	Entidad
6. Atención requerimiento de la DTPUT solicitud modificación alcance contratos de obra	PRÓXIMO COMITÉ	Contratista - Interventoría
7. Mesa de trabajo con Gobernación de Putumayo para revisión pasivo predial 407 Escuela Guaduales	16/04/2026	Contratista - Interventoría - INVIAS

FRENTES DE OBRA ACTIVOS

Vía existente entre Mocoa – San Francisco (trampolín de la biodiversidad):

* Conformación y compactación Ruta 1003 Trampolín se trabajo entre PR96+300 y PR103+700 con motoniveladora MN 38 y el compactador CV841.
* Mejoramiento en sector PR81 para bacheos con adición de material tipo sub base.
* Maquinaria disponible: Cargador CA 82, retrocargador CAT 327
* Volqueta sencilla VO 15, VO 020 disponibles
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO RÍGIDO TIPO MR
• Actividad de pavimento tipo MR terminada con cunetas entre K3+092 a K3+848
Sector 4 (K3+462 a K10+600)
• K9+930 - K10+030 MI: Avanza construcción de canal, se realizó fundición de tramo entre K9+955 a K9+970. Se realiza la instalación de acero
• Muro de Cierre K10+520 MD: Finalizada actividad con losa de aproximación a Puente Campucana.
Sector 3 (K10+600 a K22+811)
• Muro 1 K10+792.36 - K10+835.03 M.D: Terminada barrera de protección tipo new jersey, se realiza la fundición de la caja de encole de la ODT2
• Muro 2 K10+855,44 - K10+884,61 M.D: Terminado New jersey
• Muro 3 K10+956,29 - K10+98978 M.D: Fundición de módulo #1 del new jersey y se avanza con la figuración, colocación y amarre de acero para módulos 2 y 3
• Muro 4 K10+999,64 - K11+049.45 M.D: Fundición de módulos 1 y 2 y se avanza con la figuración, colocación y amarre de acero de los siguientes módulos
• Muro 7 K11+430.62 - K11+460.01 M.D: Fundición de caisson #5. Diam =1.5 m, Altura Final = 11 m
• Muro 8 K11+535,09 - K11+587,22 M.D: Excavación manual de caissons diámetro 1,50m. Resumen de avance: C1=12,20m - C2=10,20m - C3=2.70 excavación - C6=fundido caisson - C7=18,10 - C8 = 17.40 m - C9=13,10 m - C10=12,80m
• Muro Y2 K11+790.70 a K11+835.03 M.D: se realizó la fundición del primer anillos de los caisson 1 (ø=1.20 m), 6 (ø=1.20 m)
• Talud 9 K11+445 – K11+580 MI: desencofrado de dados en sitio sector K11+540
• Talud 9A K 11+445- K 11+515 MI Terraza 4 (anclajes activos 40 ton L=30 m): Inyección de barras autoperforantes e instalación de platinas línea A (faltantes)
• Talud 9 K11+560 – K11+580 MD: Se avanza con la perforación e instalación de torón en terreno natural bajo nivel de calzada
• Talud 13 K11+590 – K11+680 MI: Terraza 3: Instalación de canastas de acero y encofrado para dados en sitio líneas B, C y D. Se avanza con la perforación e instalación de anclajes faltantes en la línea D. Fundición de dados en la línea C: 1-2-3 y del 6 al 27
• Talud Contingencia adjunto a Talud 13 K11+680 MI: Terminado
• Talud 13N K11+720 - K11+804 MI: Avanza Explanación en terraza 2, Perforación e instalación de barras autoperforantes líneas A, B, C. L= 12 m
• ODT1 K10+665: Terminada
• ODT 2 K10+798: se realiza la fundición de la caja de encole
• ODT 3 K10+870: terminada media calzada margen derecha
• ODT 4 K10+975: terminada media calzada margen derecha
• ODT 7 K11+250: llenado de area de caja de encole
• Puente Y4 K11+682 - K11+727: eje #1, caisson #2 se adelantan trabajos de acondicionsmiento terreno para realizar excavacion de caisson, Caisson #1 continúa excavación manual
• Explanación, perfilado y demolición de rocas con excavadora y martillo hidráulico para terraza 3 en talud 13, repaleo de materiales hasta acopio abscisa: K11+580, cargue y transporte a ZODME Guaduales, actividad ejecutada solo en jornada nocturna.
• Inicio explanación terraza 2 en talud 13N abscisas: K11+720 a K11+760, desalojo de materiales con mini cargador hasta acopio del K11+580.
• Continua a apertura vía de acceso a sector 3 abscisa de avance K11+775.
• Alineamiento formaleta para barrera de protección (New Jersey) módulos 2 y 3 en muro 4 abscisas: K10+999.64 a K10+049.45 margen derecha.
• Localización de referencias sobre primera formaleta de caissons 7 y 8 localizados en muro Y2 para control de verticalidad abscisas: K11+790,70 a K11+835,03 margen derecha.
• Localización eje para caisson 5 en muro Y2 abscisas: K11+790,70 a K11+835,03 margen derecha.
• Control topográfico para perfilado y céreo de berma en terraza 3 talud 13 abscisas: K11+627 a K11+640.
• Demolición rocas en vía de acceso a sector 3 abscisa de avance K11+775, se utiliza cuña hidráulica.
• Nivelación para marcar cotas de terminado barrera de protección lateral (New Jersey) módulos 4 y 5 de muro M4 abscisas: K10+999.64 a K10+049.45 margen derecha.
AREA TOPOGRAFÍA
09/04/2026: Nivelación para chequeo soladо de limpieza canal longitudinal margen izquierda, abscisas: K9+940 a K9+950.
09/04/2026: Las lluvias presentadas durante la jornada afectaron el desarrollo de actividades.
10/04/2026: Verificación geometría formaleta inicial para caisson 1, 6, 7 y 8 localizados en muro Y2 abscisa: K11+790.70 a K11+835.03 margen derecha.
10/04/2026: Chequeo nivel e excavación caissons 7 y 8 localizados en muro M8 abscisas: K11+535.09-K11 a 587.22 margen derecha, los niveles aun no cumplen cota de diseño.
11/04/2026: Chequeo alineamiento de formaleta para New Jersey en muro 4 modulo1 abscisas: K10+999.64 a K11+049.45 margen derecha.
13/04/2026: Nivelación para chequeo cota refuerzo castillo caisson 5 localizado en muro 7 abscisas: K11+428.56 a K11+460.01 margen derecha, nivel cumple diseño.
14/04/2026: Se verificó nivel de terminado caissons modulo 1 en muro Y2, los niveles de acabado están arriba del terreno natural afectando la cimentación de la viga cabezal de este modulo, se informó al Contratista esta novedad.
14/04/2026: Se efectuó chequeo de equipo de topografía utilizado por interventoría
14/04/2026: Verificación excavación caisson 7 en muro 8 abscisas: K11+535.09 a K11+587.22 margen derecha, pendiente aun 1.65 metros de excavación.
15/04/2026: Chequeo localización eje para caisson 5 en muro Y2 abscisas: K11+790,70 a K11+835,03 margen derecha.
15/04/2026: Nivelación para verificar formaleta de barrera de protección (New Jersey) módulos 2 y 3 de muro M4 abscisas: K10+999.64 a K10+049.45 margen derecha, también se efectuó chequeo de alineamiento formaleta.
TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO
09/04/2026: Se realiza ensayo de compresión de núcleos a 28 días, del concreto lanzado, Talud 13, terraza 3, fila C, k11+636/657, margen izquierda.
09/04/2026: Se realiza ensayo de granulometría al material granular para sub base granular, utilizado en los rellenos estructurales.
10/04/2026: Se realiza toma de asentamiento 7.5", temperatura 30° y cilindros al concreto convencional de 35Mpa para dados en sitio, Talud 9 TN, D 66 y E 70 al 76, k11+500, margen izquierda.
10/04/2026: Se realiza ensayo de compresión de núcleos a 28 días, del concreto lanzado, Talud 9, terraza 5, fila B, k11+485/502, margen izquierda.
10/04/2026: Se realiza ensayo de compresión de núcleos a 28 días, de la lechada de inyección, talud 9, terraza 4, anclajes fila D 31 al 35, fila E 30 al 35, margen izquierda.
13/04/2026: Se hace seguimiento a la toma de densidades en el relleno estructural del muro 3, k10+920, lado derecho.
13/04/2026: Se realiza ensayo de granulometría y terrones de arcilla, a la arena clasificada del río Mocoa.
13/04/2026: Se realiza ensayo de granulometría y terrones de arcilla, a la arena triturada del río Mocoa.
14/04/2026: Se realiza ensayo de granulometría y terrones de arcilla, a la arena mixta del río Mocoa.
14/04/2026: Se realizas ensayos de granulometría y terrones de arcilla, al triturado de ¾ del río Mocoa.
14/04/2026: Se realiza toma de asentamiento 9", temperatura 30° y cilindros al concreto tremie para caisson 5, modulo 2, muro 7, k11+450, lado derecho.
15/04/2026: Se realiza toma de asentamiento 8 1/2", temperatura 30° y cilindros al concreto de 35Mpa para dados en sitio, Talud 13, fila C del 8 al 27, k11+600.
15/04/2026: Se hace seguimiento a la toma de densidades en el relleno estructural del muro 3, k10+920, lado derecho.
ÁREA AMBIENTAL
COMUNICACIONES:
Mediante comunicación Putumayo04-8127-26 del 09 de abril del 2026, la Interventoría radicó al Contratista con ASUNTO: Cumplimiento al Acta de oralidad N°429 de 2025. Por medio de la presente, se solicita remitir a esta Interventoría la respuesta consolidada a los requerimientos N°2 al N° 26 del Acta de oralidad N°429 del 4 de julio de 2025. Para tal fin, se otorga un plazo máximo de un (1) día calendario para la entrega del documento, el cual debe incluir los soportes de cumplimiento y el respectivo número de radicación ante la ANLA. Cabe recordar que, si bien Construcciones El Cóndor funge como titular de la licencia ambiental para el frente Mocoa, el proyecto se desarrolla en el marco del Contrato de obra 964 del 2021, por lo tanto, todos los documentos dirigidos a la Autoridad Ambiental deben ser presentados previamente a esta Interventoría para su revisión y aval, antes de proceder con la radicación formal.
Mediante comunicación Putumayo04-8144-26 del 10 de abril del 2026, la Interventoría radicó al INVIAS con ASUNTO: Remisión del Informe Trimestral Ambiental de Interventoría N°19 para el Contrato de obra 964 de 2021. Por medio de la presente, nos permitimos remitir el Informe Trimestral Ambiental de Interventoría N°19, el cual consolida la gestión ambiental desarrollada para el Contrato de obra 964 de 2021 durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2026. Es importante precisar que el presente informe se estructuró con base en el reporte ambiental de enero de 2026, aprobado por esta Interventoría mediante comunicado Putumayo04-8089-26 del 27 de marzo de 2026. Respecto a los meses de febrero y marzo, informamos el estado actual de su trazabilidad: Informe de febrero de 2026: Tras remitir observaciones mediante el comunicado Putumayo04-8092-26 del 27 de marzo de 2026 y al cumplirse el plazo otorgado sin recibir los ajustes correspondientes, la Interventoría emitió el primer apremio mediante el comunicado Putumayo04-8123-26 del 08 de abril de 2026, requiriendo la entrega definitiva del documento. Informe de marzo de 2026: Debido a la falta de entrega oportuna, se procedió a emitir el primer apremio mediante el comunicado Putumayo04-8124-26 del 08 de abril de 2026. Una vez el Contratista allegue los documentos pendientes y estos cuenten con el aval de la Interventoría, se procederá a su incorporación en el informe trimestral para la revisión final por parte de la Entidad.
Mediante comunicación Putumayo04-8162-26 del 14 de abril del 2026, la Interventoría radicó al Contratista con ASUNTO: Cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental. En ejercicio de las funciones de seguimiento y control de esta Interventoría, se informa que durante la inspección rutinaria realizada a los frentes de obra, se evidenció la necesidad de implementar de manera estricta las medidas de manejo ambiental establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto, con el fin de prevenir impactos negativos sobre el entorno. Como resultado de la inspección, se formulan las siguientes observaciones: 1. Protección de taludes durante el lanzado de concreto Se debe instalar de manera obligatoria lona u otro material de protección en la zona de los cortes del talud durante la ejecución del lanzado de concreto, con el propósito de evitar la dispersión de material y la afectación de las áreas circundantes, especialmente las zonas con cobertura vegetal. 2. Manejo del material producto de construcción de pilotes El material resultante de las actividades de excavación para la construcción de pilotes no debe ser dispuesto ni se debe permitir su caída hacia la ladera y zonas verdes aledañas, con el fin de prevenir impactos ambientales tales como la degradación del suelo y la afectación de la vegetación existente. 3. Restricciones en zona de ronda hídrica – Quebrada La Vieja De acuerdo con la normatividad ambiental vigente y lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), no está permitido el emplazamiento de compresores, baños portátiles, almacenamiento de ACPM, materiales, ni ningún otro equipo o sustancia que represente riesgo de contaminación en la zona de ronda hídrica de la quebrada La Vieja (K11+700). Así mismo, dicha área deberá encontrarse debidamente delimitada y señalizada, garantizando la protección del cuerpo de agua. 4. Restablecimiento y manejo de mamparas y material de control Se debe restablecer de manera inmediata las mamparas de contención cada vez que se produzca colapso o afectación a las mismas, garantizando en todo momento el control del arrastre de sedimentos y material suelto hacia las áreas aledañas. Así mismo, se deberá recoger y disponer adecuadamente los tubos, mamparas y demás elementos utilizados para el control del material, evitando su abandono en el área intervenida, conforme a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental (PMA). 5. Retiro de lona verde en la ZODME Guaduales Se debe realizar el retiro de la lona verde que se encuentra caída en el perímetro del canal, con el fin de mantener el área limpia y en condiciones adecuadas. De acuerdo con lo expuesto en este comunicado, se requiere a CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A proceder de forma inmediata con la implementación de las medidas correctivas necesarias. Lo anterior deberá ser informado y soportado a esta Interventoría, sin perjuicio del cumplimiento las obligaciones establecidas en el PMA y en la Licencia Ambiental, las cuales son de entera responsabilidad del Contratista.
Mediante comunicación Putumayo04-8172-26 del 15 de abril del 2026, la Interventoría radicó al Contratista con ASUNTO: Actividades no autorizadas y solicitud de soportes ambientales – ZODME Guaduales. En ejercicio de las funciones de seguimiento y control de esta Interventoría, se informa que durante la inspección rutinaria realizada en campo, se constató la instalación y operación de una planta clasificadora de materiales pétreos dentro del área de la ZODME Guaduales. Se evidenció, además, que el material procesado está siendo destinado a proyectos externos ajenos al Contrato de obra 964 – 2021. Esta situación contraviene lo establecido en la Resolución 2170 del 05 de diciembre de 2008, la cual destina dicha zona de manera exclusiva para la disposición de materiales sobrantes de explanación y/o demolición generados con ocasión de la ejecución de la construcción de la Variante San Francisco – Mocoa. En virtud de lo anterior, esta Interventoría requiere al Contratista la remisión de una justificación técnica y jurídica detallada respecto a la irregularidad detectada. Así como proceder de manera inmediata al retiro de la planta clasificadora y la evacuación del material pétreo acopiado en la ZODME. Lo anterior deberá ser informado y soportado a esta Interventoría en un plazo perentorio de un (1) día calendario al recibo del presente comunicado, advirtiendo que el incumplimiento de lo solicitado podrá dar lugar a la aplicación de las medidas contractuales y ambientales a que haya lugar.
REUNIONES Y/O RECORRIDOS:
En el período reportado no se efectuaron reuniones sobre la gestión ambiental.
ACTIVIDADES DE ÁREA AMBIENTAL:
• La Interventoría revisó la pre-acta de inversión ambiental del mes de abril de 2026 con sus respectivos anexos, para lo cual se generaron unas observaciones que fueron transmitidas al Contratista. • La Interventoría solicitó al Contratista remitir la respuesta consolidada a los requerimientos N°2 al N° 26 del Acta de oralidad N°429 del 4 de julio de 2025, para la revisión correspondiente. • La Interventoría elaboró y remitió a la Subdirección de Sostenibilidad el Informe Trimestral Ambiental N°19, el cual consolida la gestión ambiental desarrollada para el Contrato de obra 964 de 2021 durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2026. • El 14 de abril de 2026, el Contratista radicó en VITAL, el reporte de avance parcial N°14 de la Contingencia 7 (Riesgo inminente) localizada del K11+600 al K11+685. • El 14 de abril de 2026, el Contratista radicó en VITAL, el reporte de avance parcial N°14 de la Contingencia 8 localizada del K8+300 al K8+330. • El 14 de abril de 2026, el Contratista radicó en VITAL, el reporte de cierre de la Contingencia 11 (Riesgo inminente) localizada del K10+950 al K11+000.
Medidas de manejo ambiental implementadas en obra: MC-3 Manejo ambiental de materiales y equipos de construcción • Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo en los diques destinados a equipos menores. Estas actividades incluyeron la revisión de su integridad, limpieza de sedimentos y reparación de posibles filtraciones. • Se realizó mantenimiento general en los diques asociados a los equipos principales de la obra. Este proceso contempló la evaluación de condiciones físicas, refuerzo de estructuras y limpieza de residuos acumulados. MC-4 Manejo ambiental de residuos sólidos domésticos e industriales • Se realizó la recolección de residuos sólidos en el tramo comprendido entre el K9+900 y el K11+800, incluyendo la limpieza y vaciado de los contenedores de los puntos ecológicos. • Se realizó la recolección de materiales en desuso tales como mangueras deterioradas, chatarra metálica y restos de madera a lo largo del corredor vial del frente de obra entre el K10+000 y el K11+800. MC-5 Manejo de vertimientos • Se realizó la recolección de aguas residuales domésticas, lavado y aseo de las unidades sanitarias portátiles dos veces por semana. MS-1 Manejo ambiental de las zonas de disposición de materiales sobrantes de excavación – ZODMES • Se verificó que el material se cargue directamente en el volco del vehículo que lo transporta y que no exceda el límite permitido para evitar derrames del material sobre la vía. • Se inspecciona que las volquetas que transportan el material realicen el cargado previo a su desplazamiento a la ZODME, para evitar la dispersión de partículas en la vía. • Se continuó con la instalación de postes de madera para delimitación de la ZODME Guaduales. MH-1 Manejo de escorrentía superficial • Se realizó la limpieza y descolmatación de cunetas y estructuras hidráulicas existentes en el tramo comprendido entre el K9+800 y el K10+500. CA-1 Manejo ambiental de emisiones atmosféricas y ruido • Se realizó humectación de la vía para evitar la dispersión de material particulado entre el K3+000 y el K11+400.
AREA SOCIAL
COMUNICACIONES
Mediante comunicado Putumayo04-8139-26 del 10/04/2026 Se remite a Construcciones el Cóndor; Asunto: Rta al comunicado 312-168-2026040600233 (04-7353-26), Asunto: Remisión de Informe mensual del Programa de Arqueología Preventiva– periodo 01 a 31 de marzo 2026.

Mediante comunicado Putumayo04-8149-26 del 13/04/2026 Se remite a Dirección Territorial Putumayo; Asunto: Respuesta 2026S-VPUT-007444 (RI 04-7135-2026) Asunto: TRASALDO SOLICITUD DE INFORMACION VARIANTE MOCOA – SAN FRANCISCO POR PARTE DE LA URT.

Mediante comunicado Putumayo04-8158-26 del 14/04/2026 Se remite a Contraloría General de la República; Asunto: Remisión informes veedurías ciudadana vigencia 2026-Contrato N° 964/2021 Módulo 2-Sector 3-Frente Mocoa.

Mediante comunicado Putumayo04-8159-26 del 14/04/2026 Se remite a Veeduria ciudadana-Edgar Torres ; Asunto:Remisión informe mensual de interventoría N°57 periodo Marzo de 2026

Mediante comunicado Putumayo04-8160-26 del 14/04/2026 Se remite a Veeduria ciudadana-Jesús Checa; Asunto: Remisión informe mensual de interventoría N°57 periodo Marzo de 2026

Mediante comunicado Putumayo04-8166-26 del 14/04/2026 Se remite a Contraloría General de la República; Asunto: Actualización direcciones de correos electrónicos para notificaciones de información.

Mediante comunicado Putumayo04-8170-26 del 15/04/2026 Se remite a Subdirección de Sostenibilidad; Asunto: Remisión del Informe Trimestral Estado Social de Proyectos Nro.19 Contrato de obra N° 964 del periodo Enero-Marzo de 2026.

REUNIONES Y RECORRIDOS:

Se asistió y participó en modalidad presencial al comité de obra semanal de seguimiento N° 174 Contrato 964 de 2021, espacio en el cual profesionales de interventoría y contratista, presentan al gestor técnico del Proyecto, acciones adelantadas en el periodo objeto de reporte, cumplimiento parcial o total a compromisos adquiridos en sesión anterior y coordinan ejecución de actividades.

Se asistió y participó en el comité operativo de interventoría N° 048 contrato N°977 de 2021, espacio en el cual profesionales y especialistas de interventoría presentan acciones adelantadas en el periodo objeto de reporte y coordinan ejecución de actividades.

Se asistió y participó en el comité programado con la veeduría ciudadana conformado bajo resolución No. 014 de 13/04/2021.

ACTIVIDADES DEL AREA SOCIAL:

Se elaboró informe sectorial de gestión social,el cual da cuenta de acciones adelantadas en cumplimiento del PGS con periodo de reporte semanal

Profesional social de obra realizó inducción socioambiental en el marco de la Licencia Ambiental al personal qué ingreso a la empresa brindando información sobre la Resolución 2170 de 2008, Plan de Manejo Ambiental. Se entregó volante del SAU y se hace énfasis en las fichas del PMA y las medidas preventivas para su implementación, importancia de la Reserva Forestal y cuidado ambiental

Procesos de induccion sobre arqueología preventiva, legislación, patrimonio arqueológico y que hacer en caso de encontrar materiral cultural durante las excavaciones en la obra.

En cumplimiento a las directrices emitidas en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG); se envió insumos informe trimestral - participación ciudadana, en atención y cumplimiento a la ficha GS4 Programa 10: Programa de Gestión Social // Participación ciudadana, reportando la gestión social adelantada en el primer trimestre del año 2026 en el marco del Contrato de Obra No.964 del 2021.

Se realizó revisión de reportes semanales de profesionales de obra social y arqueología, en los cuales presentan acciones adelantadas en el periodo objeto de reporte y coordinan posible ejecución de actividades en cumplimiento a planes de manejo respectivamente.

Elaboración de reporte semanal en formato MEPI-MN1-IN-15-210, el cual permite el reporte de actividades semanales desde el componente social y sus alcances.

Se elaboró informe trimestral N° 19 paar presentación de la gestión social, el cual contiene procesos adelantados en cumplimiento al PGS y PMA.

Se revisó y aprobó informe mensual de actividades del Programa de Arqueologia Prebventiva,correspondiente al mes de marzo.

Se realizó seguimiento a consolidación de respuesta en proceso de elaboración por parte del contratista para dar alcance a PQRS radicada por la Unidad de Restitución de Tierras, proceso que avanza con fecha de entrega el 13/04/2026 a la Interventoría para respectiva revisión, validación y remisión a la Dirección Territorial.

Se coordinó visita de verificación técnica, para dar alcance a Derecho de Petición radicado a la Dirección Territorial con datos de solicitante Sr. Carlos Alberto Moncayo Guerrero.

Se revisó, ajusto y aprobó presentación proyectada a socializarse en el comité con la veeduría ciudadana, escenario de control social programado a desarrollarse el 14/04/2026.

Se elaboró informe de avance No.57 para las veedurías ciudadanas, a través del cual se reporta avances de las áreas transversales del proyecto Variante Mocoa-San Francisco, Módulo 2-Sector 3 Frente Mocoa.

Se asistió y participó en el comité programado con la veeduría ciudadana conformado bajo resolución No. 014 de 13/04/2021.

Se consolidó informes de avance No.55,56 y 57 del año 2026 para el Grupo de Participación Ciudadana -Colegiada Putumayo-Contraloría General de la República, a través del cual se reporta avances de las áreas transversales del proyecto Variante Mocoa-San Francisco, Módulo 2-Sector 3 Frente Mocoa.

Se dio cumplimiento a Circular informativa No.2026/VBOG-019707 de la Direccion General-Lineamientos para el reporte de empleos generados en epoyectros de insfraestructura.-Diligenciamiento de matriz

AREA PREDIAL

COMUNICACIONES

Mediante comunicado Putumayo04-8138-26 del 10/04/2026 Se remite a la Subdirección de Sostenibilidad insumos prediales, con comunicados de obra con radicados 312-001-20260224000341, 312-001-20260224000342, CSF-2322-124809, CSF 2282-124624, y CSF-2283-124625

ACTIVIDADES DEL AREA PREDIAL:

• Informes de Gestión Predial de la Interventoría

• En los tramos de intervención de obra nueva, se cuentan en el proyecto con 12 permisos de intervención voluntaria.

El estado de gestión de predios de pasivos prediales:

260-ID- T4-CMMVSFM	Minuta de escritura pública en notaria a la espera de Paz y salvo Predial por parte del propietario para culminar el trámite Notarial
264-SPI	Se envió el 02/Agosto/2025 Formato de solicitud de Mutación Catastral y documentación soporte de adquisición a la territorial INVIAS Putumayo (Ing. Miguel Angel Guacales Díaz) en consideración a lo solicitado por el IGAC en el comunicado 2015 DTN-2025-0004615 del 25/06/2025.
264A-SPI	Se remitió EJECUTORIA 264 A, 03-09-2025, se remitió por parte del INVIAS los avales a la constancias de ejecutoria.
264B-SPI	Ya se pagó el 100% de la obligación. A la espera de Capacitación con Gestión documental Del INVIAS para entrega Final del Expediente.
285- SPI	Se envió el 02/Agosto/2025 Formato de solicitud de Mutación Catastral y documentación soporte de adquisición a la territorial INVIAS Putumayo (Ing. Miguel Angel Guacales Díaz) en consideración a lo solicitado por el IGAC en el comunicado 2015 DTN-2025-0004615 del 25/06/2025.
285-SPID	Oferta formal de compra notificada y aceptada con inscripción en la ORIP, minuta de escritura en revisión de la interventoría radicado 312-001- 2025071 6000270.
288-SPI	Predio adquirido a favor del INVIAS mediante escritura pública de compraventa no 1154 de 2024. Ya se pagó el 100%. Se radicó ante el IGAC solicitud de asignación de cedula catastral.
314 -D-T4-CMMVSFM	Se remitió por parte del INVIAS los avales a la constancias de ejecutoria.
338 D	Minuta de escritura pública, se remitió de paz y salvo de impuesto predial para continuar el proceso de escrituración.
356D	Oficio 04-8554-25-IVE, ALCANCE A LA OFERTA FORMAL DE COMPRA SMA 64447 adarada mediante SMA 6128, predio 356D con folio de matrícula inmobiliaria 440-17396.

Para el contrato N.° 964 del 2021. - Sector 3, Resumen del estado de gestión:

GESTION PREDIAL

	No	EJECUTADOS	%	FALTANTES POR EJECUTAR				%	OBSERVACIONES
				EN MANOS DE	SUB TOTAL	%	TOTAL		
No Predios o Carpetas	22	14	64%	CONTRATISTA	12	0%	12	55%	
				INVIAS	2	17%			
Fichas	22	14	64%	CONTRATISTA	12	86%	14	64%	
				INTERVENTORIA	0	0%			
				INVIAS	0	0%			
Estudios de Títulos	22	14	64%	CONTRATISTA	14	100%	14	64%	
				INTERVENTORIA	0	0%			
Avalúos	22	14	64%	INVIAS	0	0%	8	36%	
				CONTRATISTA	11	138%			
				INTERVENTORIA		0%			
Escrituras	22	9	41%	INTERVENTORIA	0	0%	13	59%	
				AVALUOS	0	0%			
				PROPIETARIOS	0	0%			
				NOTARIA	0	0%			
				OFICINA DE REGISTRO E INSTRUMENTOS PUBLICOS	0	0%			
Pendientes	Se refieren al INVIAS los pendientes de gestión, toda vez que no se le han dado respuesta.								

Se requiere la gestión de saneamiento, como son la formación catastral (debido a que no existe referencia catastral en la zona), la actualización de cabida y linderos (al no coincidir las áreas de las bases catastrales con las jurídicas), o cualquier otra, que genere algún riesgo de retraso en su gestión situaciones.

Se reitera que, de demorarse más los tiempos en la definición de las actividades requeridas, con lo anterior el riesgo latente es el impacto del cronograma por los tiempos requeridos para su saneamiento, a su vez insta que en caso de requerirse la elaboración de topografías de la totalidad de las áreas de alguno de los predios (o de los cinco predios), es necesario garantizar que no se perderá la actividad ejecutada, sino que se garantice que se continúe hasta al fin de su adquisición.

ÁREA SST

COMUNICACIONES

Durante período reportado no se generan comunicaciones

REUNIONES Y/O RECORRIDOS:

Durante la semana del 09 de abril al 15 de abril de 2026, se realizaron diversas actividades de supervisión, inspección y verificación en los diferentes frentes de trabajo, con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo establecidas en la normativa vigente y en los procedimientos internos del proyecto.

ACTIVIDADES DEL AREA SST:

El dia 13 de abril, durante recorrido en obra se evidenció el ingreso de un equipo Berreta T46 sin notificación previa a la interventoría, por lo cual se solicitó al Residente SST el envío de la documentación correspondiente.

El dia 14 de abril, se realizó inspección de botiquines de la contratista El Cóndor, evidenciando faltantes de algunos insumos, frente a lo cual se realizó la observación a la Auxiliar SST para la implementación de acciones correctivas.

El dia 14 de abril, durante recorrido en obra se verificó un equipo de inyección con fuga de aceite hidráulico, por lo cual se recomendó a la Auxiliar SST revisar el preoperacional del equipo y hacer seguimiento a las acciones correctivas.

El dia 15 de abril, se revisó la documentación de ingreso del personal de la contratista El Cóndor, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos.

El dia 15 de abril, se realizó verificación de la actividad de fragmentación en el Talud 13, constatando condiciones de señalización en el área.

El dia 15 de abril, se realizó observación a la Auxiliar SST para la adecuación o retiro de caseta en mal estado utilizada por el proveedor Villalobos.

El dia 15 de abril, se solicitó a la Auxiliar SST la instalación de un punto de emergencia para el personal que labora en los pilotes del Muro Y2 y el Talud 13N.

El dia 15 de abril, se verificaron trabajos en alturas en el Talud 13N, constatando que los perforistas contaran con preoperacionales firmados y tambien se realizaron recomendaciones generales relacionadas con la delimitación de frentes de trabajo activos.

Por otra parte, la contratista El Cóndor continúa realizando recorridos diarios en los diferentes frentes de obra, identificando hallazgos y ejecutando las respectivas acciones correctivas. Así mismo realiza inspección de equipos de protección contra caídas (EPCC), pausas activas, charlas de seguridad y capacitaciones, incluyendo formación en puntos de anclaje dirigida al personal operativo.

ESTUDIOS Y DISEÑOS

COMUNICACIONES

Enviados

- Mediante comunicado Putumayo04-8147-26 del 13-04-2026 Interventoría emite respuesta a comunicado 312-168-20260330002329 con recibido interno 04-7328-26 del 20-03-2026, con asunto "Vol. IV – Fundaciones S3 – Diseño de Fundación muro Y5". Aprobación diseño de Fundación muro Y5.

- Mediante comunicado Putumayo04-8157-26 del 14-04-2026 Interventoría emite respuesta a comunicado 312-168-20260319002310 con recibido interno 04-7287-26 del 24-03-2026, con asunto "Entrega Planos Ajustados Talud 9". Aprobación incorporación en la estabilización del talud 9 terraza 5, la instalación de 3 lineas de barras auto perforantes separadas verticalmente (SV= 4m) separación horizontal (SH = 2M) y Planos Ajustados Talud 9.

REUNIONES Y RECORRIDOS:

*Mesas de trabajo entre pares Obra e Interventoria en Seguimiento y Control a E&D.

*Mesas de trabajo para culminar la impresión de Volumenes de Diseño.

ACTIVIDADES ESTUDIOS Y DISEÑOS

INTERVENTORIA

• Interventoría emite, Aprobación diseño de fundación del Muro Y5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	6 de 6
		FECHA	15/4/2026 (Día / Mes / Año)

COMPONENTE	K10+600 K11+600	K11+600 K13+600	K13+600 K15+600	K15+600 K17+600	K17+600 K19+600	K19+600 21+600	K21+600 K23+971
ESTUDIO DE TRANSITO Y NIVELES DE SERVICIO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA	100%	100%	80%				
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION	100%	60%	51%				
ESTUDIO DE ESTABILIZACION Y ESTABILIDAD DE TALUDES	100%	94%	69%				
ESTUDIO GEOTECNICO Y DISEÑO DE PAVIMENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION	100%	60%	80%	40%	40%	40%	40%
ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	100%	97%	65%				
COMPONENTE AMBIENTAL	100%	20%	0%	MODIFICACIÓN DE LICENCIA			
ESTUDIO PREDIAL Y SOCIO - PREDIAL	100%	100%	20%	CONSULTA PREVIA			
ESTIMACION DE CANTIDADES DE OBRA	100%	0%	0%				
RESUMEN EJECUTIVO	100%	0%	0%				
EXPLORACION GEOTECNICA	100%	100%	100%	100%	80%		20%

CONVENCIONES

APROBADO | EN EJECUCION | SIN PRESENTAR

ESTADO CAMPAÑA EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA

Continúa la ejecución de sondeos de acuerdo a programación

Mediante comunicado Putumayo04-8150-26 de 13/04/2026 Se emite respuesta a comunicado de Cóndor No. 312-168-20260324002315 con recibido interno 04-7295-265 del 26-03-2026, asunto "Entrega parcial registros de exploración geotécnica K15+600 - K17+600".

Mediante comunicado Putumayo04-8151-26 de 13/04/2026 Se emite respuesta a comunicado de Cóndor No. 312-165-20260324000002 con recibido interno 04-7292-265 del 24-03-2026, asunto "Entrega parcial del informe de exploración indirecta mediante lineas de refracción sísmica para los tramos: K13+600 – K14+400; K14+400 – K15+600; y K15+600 – K17+600".

Mediante comunicado Putumayo04-8153-26 de 13/04/2026 Se emite respuesta a comunicado de Cóndor No. 312-168-20260324002317 con recibido interno 04-7294-26 del 25-03-2026, asunto "Entrega parcial resultados ensayos de laboratorio de los Tramos: K15+600 y K17+600; K19+600 y 21+600".

Mediante comunicado Putumayo04-8154-26 de 13/04/2026 Se emite respuesta a comunicado de Cóndor No. 312-168-20260225002263 con recibido interno 04-7157-26 del 26-02-2026, asunto "Entrega parcial resultados ensayos de laboratorio de los Tramos: K14+400 y K15+600; K15+600 y K17+600; y K19+600 y K21+600".

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TÉCNICA
* Continuar atención de emergencias de la vía existente Mocoa – San Francisco Trampolín de la biodiversidad.
* Estabilización de taludes (perfilado, concreto lanzado, perforación, llenado, inyección y tensionamiento anclajes activos) en sector 3 desde K11+445 a K11+804 en margen izquierda
* Muros 1, 2, 4, 6: Construcción de new jersey y CDT
* Muro 3 K10+956,29 - K10+98978 M.D: construcción de new jersey.
* Muro 7 K11+430,62 - K11+460,01 M.D
* Muro 8 K11+535,09 - K11+587,22 M.D: Continuación anillado. Amarre aceros y vaciado
* Muro Y2 K11+535,09 - K11+587,22 M.D: Continuación anillado. Amarre aceros y vaciado
* Puente Y4 K11+682 - K11+727
* Exploración Geotécnica

ESTUDIOS Y DISEÑOS:
*Revisiones varias de productos de Diseño presentados por obra.
*Atención a observaciones de interventoría a productos de Diseño regresados. Esto por parte de Obra.
*Enfasis Obra e Interventoría, en tener producto Talud 15 Aprobados para inicio de obra.


SOCIAL:
* Revisión documental
* Seguimiento a actividades ordinarias o extraordinarias a ejecutar por parte de profesional social de obra

SST:
• Realizar recorridos de campo.
• Verificar condiciones de seguridad en las diferentes áreas de trabajo.
• Asistencia a comité semanal de obra.
• Seguimiento a condiciones de seguridad durante actividades de alto riesgo como lo es trabajo en alturas y espacios confinados.

AMBIENTAL:
• Seguimiento a las actividades programadas por el Contratista.
• Seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en los frentes de obra.
• Revisión y respuesta de correspondencia radicada por el INVIAS y el Contratista.
• La Interventoría revisará el ajuste al informe de la gestión ambiental del Contratista correspondiente a febrero de 2026.
• La Interventoría revisará el informe de la gestión ambiental del Contratista del mes de marzo de 2026.
• La Interventoría revisará los ajustes de la pre-acta de inversión ambiental de abril de 2026 y sus respectivos anexos.
- El Contratista radicará en VITAL, el reporte de avance parcial N°14 de la Contingencia 9 (Camino Sachamates) localizada del K11+315 al K11+330.
- El Contratista radicará en VITAL, el reporte de avance parcial N°11 de la Contingencia 12 (Riesgo inminente) localizada del K11+720 al K11+900.

PREDIAL:
*Revisión de la sábana predial actual.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

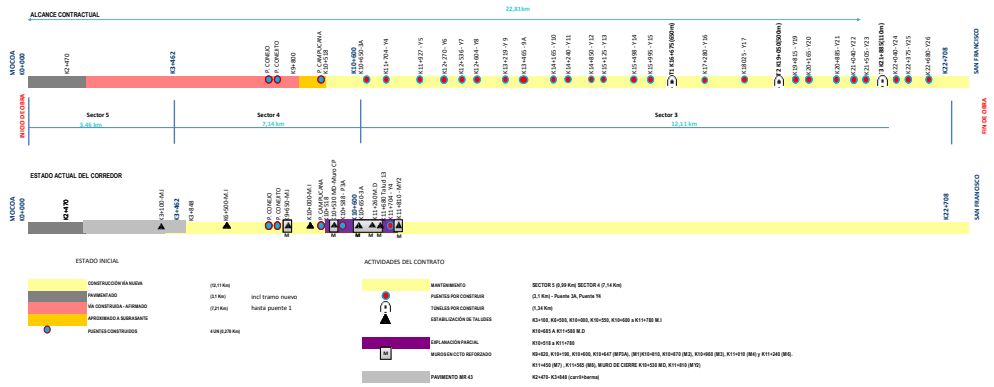

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Mantenimiento vía existente El Pepino - San Francisco - conformación de calzada existente


Muro 7 (K11+428/459) MD: chequeo nivel de acero de refuerzo para caisson 5 ϕ=1.50 m


Puente Y4- eje 1 - excavación caisson #1-2


Talud 13 (K11+590/680) M.I: estabilización con anclajes activos en terraza 3 linea D


Talud 13 N (K11+720/804) M.I: Esplanación terraza 1


Fundición de tramo de canal entre K9+970 - K9+980 M.I - Sector 4

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA
Se realizan requerimientos permanentes al Contratista al respecto del avance de las actividades contractuales.
Se emiten comunicaciones permanentes al contratista encaminadas a reiterar las obligaciones contractuales y se hace seguimiento a lo pertinente.
Se programa y coordina los comités de seguimiento semanal con el Contratista y se generan compromisos cuyo cumplimiento se evatúa en la semana siguiente.
Seguimiento y control de la calidad de los materiales utilizados en las actividades realizadas en obra de acuerdo con las Normas establecidas por INVIAS
Seguimiento y supervisión permanente a las actividades de obra desde las áreas técnica, ambiental, social, predial y SST
Seguimiento, medición y control de calidad permanente en campo de las actividades en ejecución.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ**

Matrícula Profesional No.: **25202-31528 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO | SEMANA No.: 251 del 16/4/2026 al 22/4/2026 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Angel Guacales

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 12,97 Km de vía nueva que contemplan 31 puentes con una longitud total de 2,39 Km y 2 túneles en una longitud total de 0,33 Km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Intervención para terminación de la construcción de una vía, de la cual se tienen construidos hasta el momento 10,5 Km entre la abscisa K0+000 al K10+518 incluyendo 3 puentes correspondiente al Sector 4. Durante el presente contrato se ejecutó la terminación de explanación y estabilización de talud K10+518 - K10+600 del sector 4 (Talud Campucana). Pendientes por construir el tramo comprendido entre el K10+600 al K23+571,17 que corresponden al sector 3, con el fin de comunicar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa.

Mediante comunicado de fecha 18/11/24 radicado al CRP con el consecutivo 04-5482-24 el Contratista radicó a Interventoría el diseño geométrico propuesto a fase II como optimización del alineamiento del sub tramo K11+600 – K23+571, que incluye también el sector en ejecución K10+600 -K11+600. la propuesta indica que el alineamiento se desarrolla entre el K10+600 al K22+811 con una longitud total de 12.211,20 m que contempla 7.770,50 m de intervención a cielo abierto; 24 puentes de longitud sumada 3.180,50 m y 3 túneles de longitud sumada 1.260, 00 m.

Una vez desarrollada la propuesta radicada y previa revisión de Interventoría se ajusta el alineamiento al tramo K10+598 - K22+708 con una longitud total de 12.11 m que contempla 7.567 m de intervención a cielo abierto; 31 puentes de longitud sumada 3.199 m y 3 túneles de longitud sumada 1.342,00 m.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

INTEGRANTES: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A – 100%

CONTRATO No.	964 DE 2021	VALOR INICIAL:	$	547.389.993.617,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$	547.389.993.617,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$	22.030.482.547,00
		VALOR AMORTIZADO:	$	2.866.933.204,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$	19.163.549.343,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

INTEGRANTES: HMV INGENIEROS LTDA 40%; CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S. – 30%; GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S. – 30%

CONTRATO No.	977 DE 2021	VALOR INICIAL:	$	47.999.892.900,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$	2.400.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$	50.399.892.900,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$	1.129.388.470,00
		VALOR AMORTIZADO:	$	1.129.388.470,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$	-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 27.049.209.066	$ 18.020.744.751	$ 27.072.000.000	$ 63.144.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 27.049.209.066	$ 18.020.744.751	$ 27.072.000.001	$ 63.144.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.800.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ -	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	2027	2028
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 63.168.000.000	$ 63.192.000.000	$ 67.680.000.000	$ 63.168.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 60.465.003.179			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.702.996.821			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 8.000.000.000	$ 5.400.000.000	$ 6.000.000.000	$ 5.600.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 7.567.067.088			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 432.932.911,97			

CONTRATO	VIGENCIA	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 54.144.000.000	$ 94.752.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.200.000.000	$ 4.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (INICIAL) (A)	$	483.413.463.218,00
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIF No.5:	$	347.184.964.001,00
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIF No.6:	$	343.727.160.196,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	152.152.778.524,19 31,47%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	146.497.183.486,00 30,30%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(5.655.595.038,19) -1,17%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños)	$	34.612.974.439,00 59,70%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	199.255.196.427,20 36,80%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	181.110.157.925,00 33,45%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(18.145.038.502,20) -3,35%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	576.080.581 0,17%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA	$	662.695.661 0,19%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Fe No 22515 de 16/04/2026 Acta Ajustes Def No. 56

PERIODO FACTURADO: Febrero 2026
VALOR FACTURA: $ 939.680.241,00 Acta de ajustes Def No.56 febrero 2026

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado de trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo04-8194-26 de 20/04/2026, Interventoría remite a la SMCN Acta de Obra No. 57 periodo marzo 2026, la cual dió entrada con número de radicado No.2026E-VUVRAZ-038611 de fecha 20 de abril de 2026

Mediante comunicado Putumayo04-8195-26 de 27/03/2026, Interventoría remite a la SMCN Acta de Ajustes definitivo No. 57 periodo marzo 2026, la cual dió entrada con número de radicado No.2026E-VUVRAZ-038622 de fecha 20 de abril de 2026

NOTA: El valor reportado como saldo de vigencia 2025 por $11.231.680.296 contempla el monto del anticipo No.2 por valor de 14.000 millones de pesos cuyo trámite a la fecha, se encuentra en cuentas por pagar según lo reportado por la SMCN.

Inversión total programada desde la fecha de inicio del contrato hasta	abril 22 de 2026	$	199.255.196.427,23	36,80%
Inversión total ejecutada desde la fecha de inicio del contrato hasta	abril 22 de 2026	$	181.110.157.925,00	33,45%
Inversión de obra programada desde la fecha de inicio del contrato hasta	abril 22 de 2026	$	152.152.778.524,19	31,47%
Inversión en obra ejecutada desde la fecha de inicio del contrato hasta	abril 22 de 2026	$	146.497.183.486,00	30,30%

Detalle información financiera:

Valor facturado acumulado a febrero de 2026: $ 176.587.407.654,00 32,62%
Valor programado acumulado a febrero de 2026: $ 191.908.862.951,19 35,45%

NOTA: El valor facturado acumulado corresponde al valor acumulado hasta acta de Obra No.56 febrero 2026 más las actas de ajustes def No.56

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	26.509.772.611	55,23%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	26.509.022.078	55,23%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	175.556.731	0,37%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	175.556.731	0,37%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Enero 2026
VALOR FACTURA: $ 572.653.943

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado de trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo04-8114-25 de 06/04/26 Interventoría radica a la DT Invias Putumayo, Acta de Costos de Interventoría No.56 febrero 2026. la cual dió entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-032289 de fecha 06 de abril de 2026

Mediante comunicado Putumayo04-7989-25 de 11/03/26 Interventoría radica a la SMCN, Acta de Costos de Interventoría No.55 enero 2026. la cual dió entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-023234 de fecha 11 de marzo de 2026

Mediante comunicado Putumayo04-7986-25 de 11/03/26 Interventoría radica a la SMCN, Acta de Modificación de Costos de Interventoría No 6 Contrato 977 de 2021 y Reprogramación al Plan de Cargas No 9. la cual dió entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-022991 de fecha 11 de marzo de 2026

Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta	abril 22 de 2026	$ 26.509.772.611,44	55,23%
Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta	abril 22 de 2026	$ 26.509.022.078,14	55,23%

Detalle información financiera:

Valor programado acumulado a	Diciembre de 2025	$ 24.399.352.105	50,83%
Valor facturado acumulado	Diciembre de 2025	$ 23.966.959.988	49,93%

Nota 1: El valor programado acumulado se toma de acuerdo al Plan de Cargas No 9 radicado ante la entidad con comunicado Putumayo04-7819-26 con fecha 05 de febrero de 2026, Radicado 2026E-VUVRAZ-008992

ANTICIPOS	
Otorgado $	22.030.482.547,00
Amortizado $	2.866.933.204,00
Saldo $	19.163.549.343,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,01
Acumulado:	0,15

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.129.388.470,00
Amortizado $	$ 1.129.388.470,00
Saldo $	$ 0,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 31,47% (Inversión programada en obra básica)
Meta Física Ejecutada %: 30,30% (Inversión ejecutada en obra básica)
Avance o Atraso Físico %: -1,17%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia hasta 2025	Vigencia 2026	Avance Físico	Tramo 3	Tramo 4	Corredor	Total	%
EXPLANACIONES	km	12,19	1,16	-	Prog	12,11	0,08		12,19	
					Ejec	1,08	0,08		1,16	9,53%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	km	20,34	1,16	-	Prog	12,211	8,13		20,34	
					Ejec	0	1,39		1,39	6,81%
PAVIMENTOS ASFALTICOS (pavimento hidráulico)	km	20,24	1,16	-	Prog	12,11	8,13		20,24	
					Ejec		1,32		1,32	6,50%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	km	12,11			Prog	12,11			12,11	
					Ejec				0,00	0,00%
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	km	20,24			Prog	12,11	8,13		20,24	
					Ejec				0,00	0,00%
OBRAS VARIAS	km	20,24			Prog	12,11	8,13		20,24	
					Ejec				0,00	0,00%
TRANSPORTES	km	12,19	1,160	-	Prog	12,11	0,08		12,19	
					Ejec	1,08	0,08		1,16	9,53%
PUENTES	km	3,21	0,030	-	Prog	3,18	0,03		3,21	
					Ejec		0,03		0,03	0,84%
TÚNELES	km	1,26			Prog	1,26	0,00		1,26	
					Ejec		0,00		0,00	0,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 4: K3+462 - K10+600
TRAMO Y/O SECTOR 3: K10+600 hacia mayores

Nota: La longitud total a intervenir de acuerdo con diseños a fase II en el sector 3 es de 12.11 Km. (meta física programada). A la fecha se ha intervenido de manera parcial 1,080 Km, lo que equivale a una meta física ejecutada del 8.91 %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Planta de concreto	1	1
Planta de asfalto	1	
Perforador jumbo (3 brazos)	2	
Formaleta para revestimiento tuneles	3	
Andamios para instalación impermeab.	3	
Carro de avance	2	
Perforador jumbo (2 brazos)	3	
Bomba inyección lechada	4	4
Robot de lanzado	4	
Trituradora 60 Ton	1	
Excavadora de orugas	2	4
Compactador neumático	2	
Terminadora de Asfalto	1	
Motoniveladora	2	1
Vibrocompactador	2	2
Volquetas:	10	6
Cargador		1
Retrocargador		2
Camioneta		4
Camiones		1
Carro taller		1
Camión combustible		1
Carrotanque de agua		1
Bomba para concreto		1
Buldozer		
Minicargadores		2
Compresor		9
Generador Eléctrico		4
Planta de generación de energía		6
Equipo para tensionamiento (anclajes)		1
Compactador manual (Canguro)		2
Vibrador manual para Concreto		2
Perforadoras T46 (oruga)		3
Perforadoras T19 (Colgantes)		4
Perforadoras Everdigm		1
Telehandler		1
Perforadoras petty (sondeos)		5
Equipo de topografía		2
Utilidad perforadora con canasta		4
Mixer		2
TOTAL		78

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	MOCOA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:
Se cuenta con Autorización Temporal de materiales de construcción No. 502328 sobre el Rio Mocoa, autorizada mediante Resolución 210-4291 del 20 de octubre de 2021 emitida por la Agencia Nacional de Minería y con Licencia Ambiental otorgada a través de la Resolución 0746 del 26 de mayo de 2023 emitida por CORPOAMAZONIA. Actualmente, se encuentra en proceso el trámite de cesión de la Autorización Temporal por parte del Consorcio CM Putumayo a Construcciones El Cóndor S.A.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	X	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:
La Licencia Ambiental concadida mediante Resolución 2170 del 05 de diciembre de 2008 otorga los permisos de sustracción de reserva forestal, levantamiento de veda, zonas industrial, campamentos, concesión de aguas superficiales, vertimientos, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, ocupación de cauce y zonas de disposición final de material sobrante (ZODME).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N.A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	460	20
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	249	15
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	211	5
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	212	11

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 480

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Av Colombia Cra 9 N. 21 - 108

OBSERVACIONES:
GS-1 SISTEMA DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL A LA COMUNIDAD.
En este periodo semanal objeto de reporte, nose desarrolló escenario de capacitacion a comunidad.

GS - 3 CAPACITACION AMBIENTAL Y EN SEGURIDAD INDUSTRIAL AL PERSONAL DE OBRA.
En este periodo semanal objeto de reporte no se desarrolló escenario de capacitacion a personal de obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: 22
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A.
AVALÚOS APROBADOS: N.A.
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A.

OBSERVACIONES:
Las gestiones identificadas preliminarmente, corresponden a lo identificado para los dos primeros kilómetros. El contratista está en proceso de elaboración y entrega del diagnóstico predial para el contrato.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Envío por parte del contratista del informe de sostenibilidad correspondiente al mes de marzo de 2026.

2. En proceso de elaboración informe trimestral 19.

AREA TÉCNICA

COMUNICACIONES

Mediante comunicado Putumayo04-8177-26 de 16/04/2026 Se radicó a la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales el informe semanal No.250 correspondiente al periodo 09 al 15 de abril 2026.

Mediante comunicado Putumayo04-8178-26 del 17/04/2026, se radica a la SMCN TERCERA REITERACIÓN: Solicitud urgente de habilitación de semanas en plataforma CIFRA para los contratos de obra No. 964 y 1111 de 2021.

Mediante comunicado Putumayo04-8181-26 de 17/04/2026 se remite a la SMCN Informe mensual de Interventoría No.57 correspondiente al seguimiento de actividades realizadas en el mes de marzo 2026

Mediante comunicado Putumayo04-8194-26 de 20/04/2026 se remite a la SMCN Acta de obra No 57 marzo de 2026 Cto 964 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa

Mediante comunicado Putumayo04-8195-26 del 20/04/2026, se remite a la SMCN Acta de ajustes definitiva No 57 marzo de 2026 Cto 964 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa

Mediante comunicado Putumayo04-8197-26 del 21/04/2026, Interventoría emite respuesta a comunicado 312-168-20260305002288 con recibido interno 04-7205-26 del 9-03-2026, con asunto "Propuesta de Diseño Cierres Muro 2 -K10+870".

Mediante comunicado Putumayo04-8205-26 del 22/04/2026, Interventoría emite respuesta a comunicado 312-168-20260330002330. Remisión de Plan de Puntos de Inspección (PPI) – Versión actualizada marzo. R.I. 04-7327-26 M2. Una vez revisada la información por parte del equipo de laboratorio de Interventoría, se avala los ajustes propuestos al Plan de Puntos de Inspección para su efectiva implementación en campo

REUNIONES Y RECORRIDOS:

Interventoría desarrolla recorridos permanentes al sitio de las obras a fin de verificar el estado de la obra en los diferentes frentes activos.

22/04/2026: En las instalaciones de la Cámara de Comercio del Putumayo se realizó la reunión de apertura de la visita de seguimiento y control ambiental de la ANLA, con participación funcionarios de la ANLA, INVIAS, Contratista de Obra e Interventoría, dondes se realizó la exposición de los avances de las áreas técnica, ambiental, predial y social. Posteriormente un recorrido al proyecto desde el K0+000 al K11+680

FRENTES DE OBRA ACTIVOS

Vía existente entre Mocoa – San Francisco (trampolin de la biodiversidad):

" Conformación y compactación Ruta 1003 Trampolin se trabajo entre PR101+800 y PR109+300 con motoniveladora MN 38 y el compactador CV841.

" Maquinaria disponible: Cargador CA 62, retrocargador CAT 327

" Volqueta sencilla VO 15, VO 020 disponibles

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO RÍGIDO TIPO MR

• Actividad de pavimento tipo MR terminada con cunetas entre K3+092 a K3+848

Sector 4 (K3+462 a K10+600)

• **K9+930 - K10+030 MI:** Se termina construcción de canal L=100 m con inicio en cuneta.

• **Muro de Cierre K10+520 MD:** Finalizada actividad con losa de aproximación a Puente Campucana. Se realiza la figuración e instalación de acero de refuerzo para la barrera de protección tipo New Jersey en los 3 módulos.

Sector 3 (K10+600 a K22+811)

• **Muro 1 K10+792.36 - K10+835.03 M.D:** Muro terminado con barrera de protección.

• **Muro 2 K10+855,44 - K10+884,61 M.D:** Muro terminado con barrera de protección.

• **Muro 3 K10+956,29 - K10+98978 M.D:** Fundición de barrera de protección en el módulo 2 L=12.15 m. Colocación, ajuste y alineación formaleta metálica para la construcción de barrera en concreto en el módulo 3 L=12.15 m

• **Muro 4 K10+999,64 - K11+049.45 M.D:** Muro terminado con barrera de protección.

• **Muro 6 K11+240,15 - K11+281,22 M.D:** Avanza instalación de acero de refuerzo para barrera de protección tipo new jersey

• **Muro 7 K11+430.62 - K11+460.01 M.D:** Fundición de caisson #5. Diam =1.5 m, Altura Final = 11 m. Conformación de terreno para la construcción de módulos 1-2 de muro (demolición de anillos falsos y excavaciones)

• **Muro 8 K11+535,09 - K11+587,22 M.D:** Excavación manual de caissons diámetro 1,50m. Resumen de avance: C1=12,50m - C2=10,20m - C3=5,30 excavación - C6=fundido caisson - C7=18,70 - C8 = 17.50 m - C9=13,10 m - C10=12,80m

• **Muro Y2 K11+790.70 a K11+835.03 M.D:** avanza excavación manual en los caissons 1-5-6-7-8.

• **Talud 9 K11+445 – K11+580 MI:** Terreno natural: sin actividad

• **Talud 9A K 11+445- K 11+515 MI Terraza 4 (anclajes activos 40 ton L=30 m):** tensionamiento de anclajes activos de 40 ton L=30m - linea C#23-24 - linea D#22-23-24 - linea E#24-25-27-29-30-31. Nota: al anclaje Línea E #24 se le realiza prueba de carga se lleva a 52,4 ton de carga - dando una elongación de 8,03 cm

• **Talud 9 K11+560 – K11+580 MD:** Se avanza con la perforación e instalación de torón en terreno natural bajo nivel de calzada

• **Talud 13 K11+590 – K11+680 MI: Terraza 3:** Instalación de canastas de acero y encofrado para dados en sitio línea D. Se realiza fundición de dados en la línea C. Avanza la perforación e instalación de anclejes L=25 m en la línea E

• **Talud Contingencia adjunto a Talud 13 K11+680 MI:** Terminado

• **Talud 13N K11+720 - K11+804 MI:** Avanza Explanación en terraza 2, Perforación e instalación de barras autoperforantes lineas A, B, C. L= 12 m

• **ODT 1 K10+665:** Terminada

• **ODT 2 K10+798:** Terminada

• **ODT 3 K10+870:** terminada media calzada margen derecha

• **ODT 4 K10+975:** terminada media calzada margen derecha

• **ODT 7 K11+250:** Terminada

• **Puente Y4 K11+682 - K11+727:** caisson #1: excavación manual (desabombe de fragmentación) anillos 10 y anillo 11 - caisson #2 fundición de anillo falso #1 en concreto 210 kg/cm2 mezclado en sitio.

• Explanación, perfilado y demolición de rocas con excavadora y martillo hidráulico para terraza 3 y 4 en talud 13, repaleo de materiales hasta acopio abscisa: K11+580, cargue y transporte a ZODME Guaduales en jornada nocturna.

• Control topográfico para perfilado y céreo de berma en terraza 3 talud 13 abscisas: K11+603 a K11+618.

• Explanación vía de acceso a sector 3 terraza 2 talud 13N, abscisa de avance K11+783, se efectuó control topográfico de esta actividad.

• Localización de puntos para perforación e instalación parcial de anclajes pasivos (pernos) en talud 13N terraza 2, abscisas: K11+762 a K11+746

• Perforaciones de rocas para demolición utilizando cuña hidráulica en terraza 4 talud 9 y terraza 2 talud 13N.

• Localización de puntos para perforación e instalación de anclajes activos fila E en terraza 3 talud 13.

• Explanación terraza 2 talud 13N abscisas: K11+720 a K11+785, traslado de materiales hasta acopio abscisa: K11+580 utilizando mini cargador.

AREA TOPOGRAFÍA

16/04/2026: Chequeo nivel de excavación caisson 1 localizado en eje 1 de puente Y4, avance excavación 11,40 metros, pendiente 4,80 metros para cumplir diseño, abscisa: K11+682,86.

17/04/2026: Chequeo nivel de excavación caissons: 1 (11.73 metros), 2 (10.16 metros), 3 (4.44 metros), 7 (18.27 metros), 8 (17.22 metros), 9 (12.94 metros) y 10 (12.83) localizados en muro 8 abscisas: K11+535.09 a K11+587.22 margen derecha.

17/04/2026: Chequeo alineamiento y nivel de formaleta para barrera de protección (New Jersey) módulos 4 y 5 en muro 4 abscisas: K11+240.15 a K11+281.22 margen derecha

20/04/2026: Verificación alineamiento de formaleta y niveles de formaleta barrera de protección (New Jersey) módulo 3 muro 3 abscisas: K10+956.29 a K10+989.78 margen derecha.

20/04/2026: Acompañamiento a profesionales del área social del C.R.P. y Contratista recorrido de obra abscisas: K10+520 a K11+800.

20/04/2026: Verificación localización de puntos para perforación e instalación de anclajes activos terraza 2 talud 13N fila A 8 y fila B 4, abscisas: K11+762 a K11+746.

21/04/2026: Medición excavación de caissons 7 y 8 en muro M8, excavación caisson 7 18.18 metros con formaleta falsa, profundidad real 15,40 metros de 17.00 metros que muestra diseño, excavación caisson 8 17.20 metros con formaleta falsa, profundidad real 14.44 metros de 17.00 metros que muestra diseño.

21/04/2026: Recorrido con ingenieros residente del C.R.P. y director del Contratista para evaluar modificación terraza 2 del talud 13N abscisas: K11+785 a K11+800.

22/04/2026: Verificación alineamiento y nivel para formaleta barrera de protección (New Jersey) en muro de aproximación puente Campucana abscisa: K10+530 margen derecha.

22/04/2026: Acompañamiento recorrido de obra visita ANLA con ingenieros y especialistas del C.R.P. y Contratista.

FECHA: 22/4/2026 (Día / Mes / Año)

TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO

16/04/2026: Se realiza toma de asentamiento 8 3/4", temperatura 29° y cilindros al concreto de 35Mpa para dados en sitio, Talud 13, terraza 3, fila B, k11+600.

16/04/2026: Se hace seguimiento a la toma de densidades en el relleno estructural del muro 3, k10+920, lado derecho

16/04/2026: Se realiza ensayo de compresión de núcleos a 31 días, de la lechada de inyección, talud 9, terreno natural, anclajes, fila B 68, 73, 92, fila C 67, 71, fila D 62, 63, 64, fila E 71, 72, 73, k11+500/520.

16/04/2026: Se realiza ensayo de compresión de núcleos a 29 días, de la lechada de inyección, talud 9, terraza 5, anclajes, fila B 76, 77, fila C 19, 74, 75, fila D 66, fila E 73, 74, talud 13, fila C 20, 21, 23, k11+500/550

17/04/2026: Se realiza ensayo de granulometría y proctor al material granular para sub base granular, utilizado en los rellenos estructurales.

17/04/2026: Se realiza ensayo de compresión de cilindros a 28 días, del concreto convencional de 35Mpa, para dados en sitio, talud 9, terraza 4, lineas E, D y C, k11+500, costado izquierdo.

17/04/2026: Se realiza ensayo de compresión de núcleos a 7 días, de la lechada de inyección, talud 13, terraza 3, anclajes, fila C 18 al 27, fila D 10 al 28, k11+590/600.

17/04/2026: Se realiza ensayo de compresión de núcleos a 7 días, del concreto lanzado, Talud 13 N, terraza 1, k11+740/760, margen izquierda.

18/04/2026: Se realiza toma de asentamiento 7", temperatura 31° y cilindros al concreto convencional de 35Mpa, para, dados en sitio, Talud 13 terraza 3 Fila D # (10 und), k11+600

18/04/2026: Se realiza ensayo de compresión de núcleos a 7 días, del concreto lanzado, Talud 13, terraza 3, fila D, k11+600/620, margen izquierda.

20/04/2026: Se realiza ensayo de clasificación, equivalente de arena, materia orgánica y absorción, a la arena clasificada del río Mocoa.

20/04/2026: Se realiza ensayo de compresión de núcleos a 7 días, de la lechada de inyección, talud 13, terraza 3, anclajes, fila D 4 al 9 y 22 al 28, k11+600/650

20/04/2026: Revisión al PPI "PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN" del Cóndor

21/04/2026: Se realiza ensayo de clasificación, equivalente de arena, materia orgánica y absorción, a la arena triturada del río Mocoa.

21/04/2026: Se realiza ensayo de compresión de cilindros a 7 días, del concreto de 28Mpa tremie para caisson 5, modulo 2, muro 7, k11+450, lado derecho.

21/04/2026: Se realiza ensayo de compresión de núcleos a 28 días, del concreto lanzado, Talud 13, acceso vía industrial, k11+728/740, margen izquierda.

21/04/2026: Se realiza ensayo de compresión de núcleos a 7 días, del concreto lanzado, Talud 13, terraza 3, fila E, k11+640/660, margen izquierda.

21/04/2026: Se realiza ensayo de contenido de fibra en el concreto lanzado.

22/04/2026: Se realiza ensayo de clasificación, equivalente de arena, materia orgánica y absorción, a la arena mixta del río Mocoa.

22/04/2026: Se realiza ensayo de compresión de cilindros a 7 días, del concreto de 35Mpa para dados en sitio, Talud 13, fila C del 8 al 27, k11+600.

22/04/2026: Se realiza ensayo de granulometría y desgaste en máquina de los ángeles al triturado de ½" para concreto.

ÁREA AMBIENTAL

COMUNICACIONES:

Mediante comunicación Putumayo04-8188-26 del 20 de abril del 2026, la Interventoría radicó al Contratista con ASUNTO: Incumplimiento de la ficha MH-2: Manejo de cruce de fuentes superficiales – Quebrada La Vieja (K11+700). En ejercicio de las funciones de seguimiento y control de esta Interventoría, se informa que durante la inspección rutinaria realizada en el sector K11+700 (Quebrada La Vieja), se identificaron deficiencias en el manejo del recurso hídrico. De acuerdo con lo observado, el cauce de la quebrada discurría originalmente por la parte superior del camino Sachamates. Posteriormente, el Contratista instaló una tubería con el fin de conducir el flujo de agua hacia la margen opuesta del camino. Esta intervención ha generado una pérdida de la continuidad hidráulica de la fuente hídrica; adicionalmente, en el punto de descarga, el flujo impacta directamente sobre la superficie del talud derecho, lo que puede ocasionar procesos de infiltración y arrastre de sedimentos. Lo anterior, constituye un incumplimiento a lo establecido en la ficha MH-2, MANEJO CRUCE DE FUENTES SUPERFICIALES, la cual estipula lo siguiente: " 9.1. Accesos Temporales (…) Construir ataguías en el caso de requerirse la desviación del flujo de agua para la construcción del paso temporal, con bolsas de lona a manera de pilas, aguas arriba y abajo del cauce y tuberías para el permitir el paso continuo de dichas fuentes. Una vez instalada la estructura de paso en la mitad del cauce, se permitirá el paso del agua por esta estructura y se reubicaran las ataguías para poder secar la otra mitad y terminar el paso temporal. Al finalizar la construcción del paso provisional se deben retirar las ataguías y los materiales utilizados para tal fin se deben levar a los ZODMES para su disposición final." En consecuencia, se requiere al Contratista realizar las acciones necesarias para restablecer la continuidad hidráulica de la Quebrada La Vieja, garantizando la adecuada conducción del flujo mediante la conformación de un cauce definido, canalización o estructura que permita la evacuación eficiente del agua en lo posible a través de su cauce original, evitando estancamientos y posibles afectaciones al entorno.

Mediante comunicación Putumayo04-8193-26 del 20 de abril del 2026, la Interventoría radicó al Contratista con ASUNTO: Respuesta comunicado 312-168-20260408002338 del 13/04/2026 (04-7366-26-M2). Entrega informe mensual actividades componente ambiental periodo marzo de 2026, frente Mocoa. En respuesta al comunicado del asunto, mediante el cual presenta el informe de gestión ambiental de marzo del 2026, informamos que, tras la revisión de la información se han generado las observaciones adjuntas al presente comunicado. Por lo anterior, se solicita al Contratista atender dichas observaciones en un plazo no mayor a dos (2) días calendario y remitir el documento ajustado para la correspondiente aprobación de esta Interventoría.

Mediante comunicación Putumayo04-8198-26 del 20 de abril del 2026, la Interventoría radicó al INVIAS con ASUNTO: Remisión de la Pre-acta de Inversión Ambiental correspondiente a abril de 2026. Por medio de la presente, nos permitimos remitir para su revisión y respectivo concepto de no objeción el formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3 Pre-acta de Inversión Ambiental del mes de abril del 2026 del Contrato de obra No. 964 de 2021, junto con sus anexos. Es importante destacar que este documento cuenta con la aprobación previa de la Interventoría, tras verificar que las actividades ejecutadas y los valores registrados guardan correspondencia con la Versión 4 del Plan de Inversión Ambiental.

REUNIONES Y/O RECORRIDOS:

El 22 de abril de 2026, se efectuó la reunión de apertura de la visita de seguimiento y control ambiental de la ANLA, con participación de funcionarios de la ANLA, INVIAS, Contratista e Interventoría. En dicha reunión el Contratista presentó los avances del proyecto del área técnica, ambiental, social y predial. Posteriormente, se realizó un recorrido general al proyecto desde el K0+000 al K11+680.

ACTIVIDADES DE ÁREA AMBIENTAL:

- La Interventoría revisó el ajuste de la pre-acta de inversión ambiental del mes de abril de 2026 con sus respectivos anexos, para lo cual se generaron unas observaciones que fueron transmitidas al Contratista.
- La Interventoría revisó el informe de la gestión ambiental del Contratista correspondiente a marzo de 2026, para el cual se generaron unas observaciones que fueron transmitidas al Contratista.
- La Interventoría remitió a la Subdirección de Sostenibilidad la pre-acta de inversión ambiental de abril de 2026 para el concepto de no objeción respectivo.
- El 17 de abril de 2026, el Contratista radicó en VITAL, el reporte de avance parcial N°11 de la Contingencia 12 (Riesgo inminente) localizada del K11+720 al K11+900.

Medidas de manejo ambiental implementadas en obra:

MC-3 Manejo ambiental de materiales y equipos de construcción
- Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo en los diques destinados a equipos menores. Estas actividades incluyeron la revisión de su integridad, limpieza de sedimentos y reparación de posibles filtraciones.
- Se realizó mantenimiento general en los diques asociados a los equipos principales de la obra. Este proceso contempló la evaluación de condiciones físicas, refuerzo de estructuras y limpieza de residuos acumulados.

MC-4 Manejo ambiental de residuos sólidos domésticos e industriales
- Se realizó la recolección de residuos sólidos en el tramo comprendido entre el K9+900 y el K11+800, incluyendo la limpieza y vaciado de los contenedores de los puntos ecológicos.
- Se realizó la recolección de materiales en desuso tales como mangueras deterioradas, chatarra metálica y restos de madera a lo largo del corredor vial del frente de obra entre el K10+000 y el K11+800.

MC-5. Manejo de vertimientos
- Se realizó la recolección de aguas residuales domésticas, lavado y aseo de las unidades sanitarias portátiles dos veces por semana.

MS-1 Manejo ambiental de las zonas de disposición de materiales sobrantes de excavación – ZODMES
- Se verificó que el material se cargue directamente en el volcó del vehículo que lo transporta y que no exceda el límite permitido para evitar derrames del material sobre la vía.
- Se inspeccionó que las volquetas que transportan el material realicen el carpado previo a su desplazamiento a la ZODME, para evitar la dispersión de partículas en la vía.
- Se continuó con la instalación de postes de madera para delimitación de la ZODME Guaduales.

MH-1 Manejo de escorrentía superficial
- Se realizó la limpieza y descolmatación de cunetas y estructuras hidráulicas existentes en el tramo comprendido entre el K9+800 y el K10+500.

CA-1 Manejo ambiental de emisiones atmosféricas y ruido
- Se realizó humectación de la vía para evitar la dispersión de material particulado entre el K3+000 y el K11+400.

AREA SOCIAL

COMUNICACIONES

Mediante comunicado Putumayo04-8173-26 del 16/04/2026 Se remite a Dirección Territorial; Asunto: Rta 2026S-VPUT-021208 TRASLADO PETICION EXP. 2026E-VUVR-031845. R.I. 04-7355-26-M2

Mediante comunicado Putumayo04-8185-26 del 20/04/2026 Se remite a Subdirección de Sostenibilidad; Asunto: Remisión Pre-acta mensual de inversión social N° 58 correspondiente al mes de marzo del 2026 del Contrato N° 964 del 2021-Frente Mocoa

Mediante comunicado Putumayo04-8186-26 del 20/04/2026 Se remite a Construcciones el Cóndor; Asunto: Rta comunicado: 312-168-20260415002357 (04-7381-26) Asunto: Envío pre acta social No 58.

REUNIONES Y RECORRIDOS:

Se asistió y participó en el comité operativo de interventoría N° 049 contrato N°977 de 2021, espacio en el cual profesionales y especialistas de interventoría presentan acciones adelantadas en el periodo objeto de reporte y coordinan ejecución de actividades.

Se asistió y participó bajo modalidad virtual en el comité de gestión social liderado por el gestor social del proyecto,con el fin de revisar estado de cumplimiento de requerimientos hechos por la ANLA,teniendo en cuenta la nueva visita programada del 22 al 24 de abril.

Se asistió y participó bajo modalidad presencial en el desarrollo de capacitación, del área de SST con tema central: trabajo seguro en altura-énfasis en prácticas seguras

Se realizó recorrido en obra con el fin de revisar estado y cumplimiento de medidas de manejo para asegurar el tránsito de los usuarios del camino Sachamates.

ACTIVIDADES DEL AREA SOCIAL:

Se elaboró informe sectorial de gestión social,el cual da cuenta de acciones adelantadas en cumplimiento del PGS con periodo de reporte semanal

Profesional social de obra realizó inducción socioambiental en el marco de la Licencia Ambiental al personal qué ingreso a la empresa brindando información sobre la Resolución 2170 de 2008, Plan de Manejo Ambiental. Se entregó volante del SAU y se hace énfasis en las fichas del PMA y las medidas preventivas para su implementación, importancia de la Reserva Forestal y cuidado ambiental

Procesos de induccion sobre arqueologia preventiva, legislación, patrimonio arqueológico y que hacer en caso de encontrar material cultural durante las excavaciones en la obra.

En proceso de actualización de Matriz de obligaciones contractuales PS-F-010.

Se realizó revisión de reportes semanales de profesionales de obra social y arqueología, en los cuales presentan acciones adelantadas en el periodo objeto de reporte y coordinan posible ejecución de actividades en cumplimiento a planes de manejo respectivamente.

Elaboración de reporte semanal en formato MEPI-MN1-IN-15-210, el cual permite el reporte de actividades semanales desde el componente social y sus alcances.

Se revisó y ajustó documento tipo acta del comité con la veeduría ciudadana desarrollado el 14/04/2026, elaborado por el contratista, en espera de atención de observaciones para trámite de envió a coordinador de veeduría.

Se revisó, validó y conceptuó Pre acta de inversión social N° 58, generando aprobación al contratista y remisión a la Subdirección de Sostenibilidad para tramite respectivo de concepto de No Objeción.

Se revisó, ajusto y aprobó presentación proyectada a socializarse en la sesion de participación ciudadana conbicada por la Contraloría: Diálogo participativo de seguimiento al proyecto vriante Mocoa-San Francisco.

AREA PREDIAL

COMUNICACIONES

Mediante comunicado Putumayo04-8138-26 del 10/04/2026 Se remite a la Subdirección de Sostenibilidad insumos prediales, con comunicados de obra con radicados 312-001-20260224000341, 312-001-20260224000342, CSF-2322-124809, CSF 2282-124624, y CSF-2283-124625

ACTIVIDADES DEL AREA PREDIAL:

- Informes de Gestión Predial de la Interventoría
- En los tramos de intervención de obra nueva, se cuentan en el proyecto con 12 permisos de intervención voluntaria.

El estado de gestión de predios de pasivos prediales:

260-ID-T4-CMMVSFM	Minuta de escritura pública en notaria a la espera de Paz y salvo Predial por parte del propietario para culminar el trámite Notarial
264-SPI	Se envió el 02/Agosto/2025 Formato de solicitud de Mutación Catastral y documentación soporte de adquisición a la territorial INVIAS Putumayo (Ing. Miguel Angel Guacales Díaz) en consideración a lo solicitado por el IGAC en el comunicado 2615 DTN-2025-0004615 del 26/06/2025
264A-SPI	Se remitió EJECUTORIA 264 A, 03-09-2025, se remitió por parte del INVIAS los avales a la constancias de ejecutoria.
264B-SPI	Ya se pagó el 100% de la obligación. A la espera de Capacitación con Gestión documental Del INVIAS para entrega Final del Expediente.
285- SPI	Se envió el 02/Agosto/2025 Formato de solicitud de Mutación Catastral y documentación soporte de adquisición a la territorial INVIAS Putumayo (Ing. Miguel Angel Guacales Díaz) en consideración a lo solicitado por el IGAC en el comunicado 2615 DTN-2025-0004615 del 26/06/2025
285-SPID	Oferta formal de compra notificada y aceptada con inscripción en la ORIP, minuta de escritura en revisión de la interventoría radicado 312-001-202507 16000270
288-SPI	Predio adquirido a favor del INVIAS mediante escritura pública de compraventa no 1154 de 2024. Ya se pagó el 100%. Se radicó ante el IGAC solicitud de asignación de cedula catastral.
314 -D-T4-CMMVSFM	Se remitió por parte del INVIAS los avales a la constancias de ejecutoria.
338 D	Minuta de escritura pública, se remitió de paz y salvo de impuesto predial para continuar el proceso de escrituración.
356D	Oficio 04-8564-25-M2, ALCANCE A LA OFERTA FORMAL DE COMPRA SMA 64447 aclarada mediante SMA 5128, predio 356D con folio de matricula inmobiliaria 440-17396.

Para el contrato N.° 964 del 2021. - Sector 3, Resumen del estado de gestión:

GESTION PREDIAL

	No	EJECUTADOS	%	FALTANTES POR EJECUTAR					OBSERVACIONES
				EN MANOS DE	SUB TOTAL	%	TOTAL	%	
No Predios o Carpetas	22	14	64%	CONTRATISTA	12	0%	12	55%	
Fichas	22	14	64%	INVIAS	2	17%	14	64%	
				CONTRATISTA	12	86%			
				INTERVENTORIA	0	0%			
Estudios de Títulos	22	14	64%	INVIAS	0	0%	14	64%	
				CONTRATISTA	14	100%			
				INTERVENTORIA	0	0%			
Avalúos	22	14	64%	INVIAS	0	0%	8	36%	
				CONTRATISTA	11	138%			
				INTERVENTORIA		0%			
Escrituras	22	9	41%	INTERVENTORIA	0	0%	13	59%	
				ALCALDIA	0	0%			
				PROPIETARIOS	0	0%			
				NOTARIA	0	0%			
				OFICINA DE REGISTRO E INSTRUMENTOS PUBLICOS	0	0%			
Pendientes	Se reiteraron al INVIAS los pendientes de gestión, hasta voz que no se le han dado respuesta.								

Se requiere la gestión de saneamiento, como son la formación catastral (debido a que no existe referencia catastral en la zona), la actualización de cabida y linderos (al no coincidir las áreas de las bases catastrales con las jurídicas), o cualquier otra, que genere algún riesgo de retraso en su gestión situaciones.

Se reitera que, de demorarse más los tiempos en la definición de las actividades requeridas, con lo anterior el riesgo latente es el impacto del cronograma por los tiempos requeridos para su saneamiento, a su vez insta que en caso de requerirse la elaboración de topografías de la totalidad de las áreas de alguno de los predios (o de los cinco predios), es necesario garantizar que no se perderá la actividad ejecutada, sino que se garantice que se continúe hasta al fin de su adquisición.

ÁREA SST

COMUNICACIONES

Durante periodo reportado no se generan comunicaciones

REUNIONES Y/O RECORRIDOS:

Durante la semana del 16 de abril al 22 de abril de 2026, se realizaron diversas actividades de supervisión, inspección y verificación en los diferentes frentes de trabajo, con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo establecidas en la normativa vigente y en los procedimientos internos del proyecto.

ACTIVIDADES DEL AREA SST:

El día 20 de abril, se revisó la documentación de ingreso de un operario de motosierra de la contratista El Cóndor, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en materia de SST.

El día 20 de abril, se realizó revisión de la documentación de ingreso del personal del proveedor Concarb, evidenciando que la Auxiliar SST no contaba con examen médico ocupacional (EMO), situación que fue informada al Residente SST para su respectiva gestión y control.

El día 21 de abril, durante recorrido en obra se observó tubería de la bomba de lanzado con fugas de agua, por lo cual se realizó la observación a la Auxiliar SST para gestionar la revisión de empaques y ejecutar las acciones correctivas correspondientes.

El día 21 de abril, se realizó la actualización de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles del área SST de la interventoría, conforme a las condiciones actuales del proyecto.

El día 21 de abril, se actualizó el modelo de valoración de riesgos de la interventoría, el cual fue remitido a quien solicitó la información para su respectiva revisión.

El día 21 de abril,se efectuó recorrido en obra, evidenciando adecuada delimitación de los frentes de trabajo y condiciones aceptables de orden y aseo en las diferentes áreas intervenidas.

El día 22 de abril, se recomendó al encargado de obra adecuar las mamparas ubicadas sobre el piso en el frente del Talud 9, así como mantener condiciones adecuadas de hidratación para el personal que labora en este sector.

El día 22 de abril, se realizó recorrido general por la obra, verificando condiciones de seguridad y emitiendo recomendaciones generales a la Auxiliar SST para la atención de la visita de la ANLA.

Por otra parte, la contratista El Cóndor continúa realizando inspección de botiquines, supervisión de actividades en campo, mantenimiento de la señalización y recorridos diarios, con el fin de identificar hallazgos y dar cumplimiento a las acciones correctivas requeridas.

ESTUDIOS Y DISEÑOS

COMUNICACIONES

Mediante comunicado Putumayo04-8191-26 del 20/04/2026, Interventoría emite respuesta a Respuesta su comunicado 312-168-20250829001946 con recibido interno 6452-25 del 01-09-2025, con asunto "Vol. IV – Fundaciones S3 – volumen IV fundaciones del Muro Y7 K12+187.58 – K12+199.73". No Aprobación Diseño de fundación Muro Y7.

REUNIONES Y RECORRIDOS:

*Mesas de trabajo entre pares Obra e Interventoria en Seguimiento y Control a E&D.

*Mesas de trabajo para culminar la impresión de Volumenes de Diseño.

ACTIVIDADES ESTUDIOS Y DISEÑOS

• Interventoría emite, NO Aprobación diseño de fundación del Muro Y7

COMPONENTE	K10+400 K11+400	K11+400 K13+400	K13+400 K15+400	K15+400 K17+400	K17+400 K19+400	K19+400 K21+600	K21+600 K23+071
ESTUDIO DE TRANSITO Y NIVELES DE SERVICIO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA	100%	100%	80%				
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION	100%	86%	35%				
ESTUDIO DE ESTABILIZACION Y ESTABILIDAD DE TALUDES	100%	84%	60%				
ESTUDIO GEOTECNICO Y DISEÑO DE PAVIMENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION	100%	80%	80%	40%	40%	40%	40%
ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	100%	99%	42%				
COMPONENTE AMBIENTAL	100%	20%	0%	MODIFICACIÓN DE LICENCIA			
ESTUDIO PREDIAL Y SOCIO - PREDIAL	100%	100%	20%	CONSULTA PREVIA			
ESTIMACION DE CANTIDADES DE OBRA	100%	0%	0%				
RESUMEN EJECUTIVO	100%	0%	0%				
EXPLORACION GEOTECNICA	100%	100%	100%	100%	80%		20%

CONVENCIONES

APROBADO | EN EJECUCIÓN | SIN PRESENTAR

ESTADO CAMPAÑA EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA

Mediante comunicado Putumayo04-8150-26 de 13/04/2026 Se emite respuesta a comunicado de Cóndor No. 312-168-20260324002315 con recibido interno 04-7295-265 del 26-03-2026, asunto "Entrega parcial registros de exploración geotécnica K15+600 - K17+600".

Mediante comunicado Putumayo04-8151-26 de 13/04/2026 Se emite respuesta a comunicado de Cóndor No. 312-165-20260324000002 con recibido interno 04-7292-265 del 24-03-2026, asunto "Entrega parcial del informe de exploración indirecta mediante líneas de refracción sísmica para los tramos: K13+600 – K14+400; K14+400 – K15+600; y K15+600 – K17+600".

Mediante comunicado Putumayo04-8153-26 de 13/04/2026 Se emite respuesta a comunicado de Cóndor No. 312-168-20260324002317 con recibido interno 04-7294-26 del 25-03-2026, asunto "Entrega parcial resultados ensayos de laboratorio de los Tramos: K15+600 y K17+600; K19+600 y 21+600".

Mediante comunicado Putumayo04-8154-26 de 13/04/2026 Se emite respuesta a comunicado de Cóndor No. 312-168-20260225002263 con recibido interno 04-7157-26 del 26-02-2026, asunto "Entrega parcial resultados ensayos de laboratorio de los Tramos: K14+400 y K15+600; K15+600 y K17+600; y K19+600 y K21+600".

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TÉCNICA
* Continuar atención de emergencias de la vía existente Mocoa – San Francisco Trampolín de la biodiversidad.
* Estabilización de taludes (perfilado, concreto lanzado, perforación, llenado, inyección y tensionamiento anclajes activos) en sector 3 desde K11+445 a K11+804 en margen izquierda
* Muros 3, 4: Construcción de new jersey y ODT
* Muro 7 K11+430.62 - K11+460.01 M.D
* Muro 8 K11+535.09 - K11+587.22 M.D: Continuación anillado. Amarre aceros y vaciado
* Muro Y2 K11+535.09 - K11+587.22 M.D: Continuación anillado. Amarre aceros y vaciado
* Puente Y4 K11+682 - K11+727
* Exploración Geotécnica

ESTUDIOS Y DISEÑOS:
*Revisiones varias de productos de Diseño presentados por obra.
*Atención a observaciones de interventoria a productos de Diseño regresados. Esto por parte de Obra.
*Enfasis Obra e Interventoria, en tener producto Talud 15 Aprobados para inicio de obra.


SOCIAL:
* Revisión documental
* Seguimiento a actividades ordinarias o extraordinarias a ejecutar por parte de profesional social de obra

SST:
• Realizar recorridos de campo.
• Verificar condiciones de seguridad en las diferentes áreas de trabajo.
• Asistencia a comité semanal de obra.
• Seguimiento a condiciones de seguridad durante actividades de alto riesgo como lo es trabajo en alturas y espacios confinados.

AMBIENTAL:
• Seguimiento a las actividades programadas por el Contratista.
• Seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en los frentes de obra.
• Revisión y respuesta de correspondencia radicada por el INVIAS y el Contratista.
• La Interventoría revisará el ajuste al informe de la gestión ambiental del Contratista correspondiente a febrero de 2026.
• El Contratista radicará en VITAL, el reporte de avance parcial N°15 de la Contingencia 7 (Riesgo inminente) localizada del K11+600 al K11+685.
• El Contratista radicará en VITAL, el reporte de avance parcial N°15 de la Contingencia 8 localizada del K8+300 al K8+330.
• El Contratista radicará en VITAL, el reporte de avance parcial N°14 de la Contingencia 9 (Camino Sachamates) localizada del K11+315 al K11+330.
• El Contratista radicará en VITAL, el reporte de avance parcial N°12 de la Contingencia 12 (Riesgo inminente) localizada del K11+720 al K11+900.
• La Interventoría realizará el acompañamiento a la visita de seguimiento y control ambiental de la ANLA.

PREDIAL:
*Revisión de la sábana predial actual.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

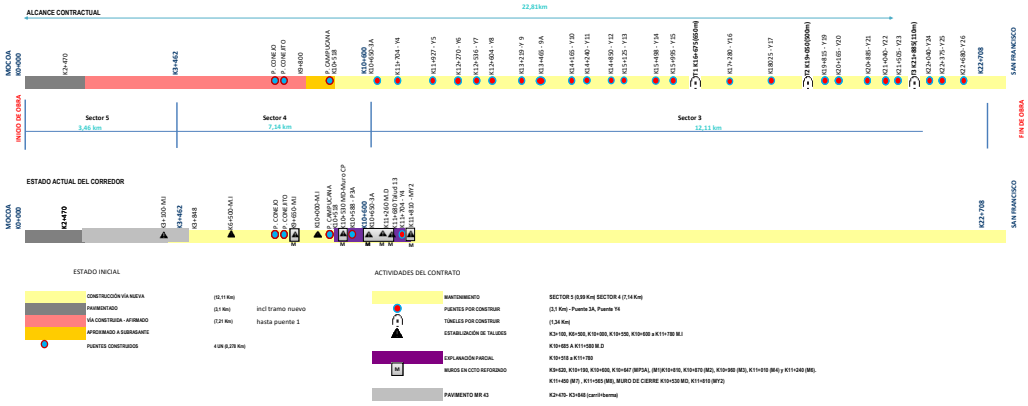

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Mantenimiento vía existente El Pepino - San Francisco - conformación de calzada existente



Muro 7 (K11+428/459) MD: adecuación para construcción de los 3 módulos del muro caisson 5 ϕ=1.50 m



panorámica estabilización de talud 13 y 13N



Panorámica avance construcción de anillos para caissons del Muro Y2 K11+790/835 M.D



Talud 13 N (K11+720/804) M.I: estabilización con pernos autoperforantes en terrazas 1, instalación concreto lanzado para corte 1 terraza 2



Finalizada construcción de canal en concreto entre K9+930 - K10+030 M.I - Sector 4

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se realizan requerimientos permanentes al Contratista al respecto del avance de las actividades contractuales.
Se emiten comunicaciones permanentes al contratista encaminadas a reiterar las obligaciones contractuales y se hace seguimiento a lo pertinente.
Se programa y coordina los comités de seguimiento semanal con el Contratista y se generan compromisos cuyo cumplimiento se evalúa en la semana siguiente.
Seguimiento y control de la calidad de los materiales utilizados en las actividades realizadas en obra de acuerdo con las Normas establecidas por INVIAS
Seguimiento y supervisión permanente a las actividades de obra desde las áreas técnica, ambiental, social, predial y SST
Seguimiento, medición y control de calidad permanente en campo de las actividades en ejecución.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ

Matrícula Profesional No.: 25202-31528 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO | SEMANA No.: 252 del 23/4/2026 al 29/4/2026 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Miguel Angel Guacales

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 12,97 Km de vía nueva que contemplan 31 puentes con una longitud total de 2,39 Km y 2 túneles en una longitud total de 0,33 Km.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Intervención para terminación de la construcción de una vía, de la cual se tienen construidos hasta el momento 10,5 Km entre la abscisa K0+000 al K10+518 incluyendo 3 puentes correspondiente al Sector 4. Durante el presente contrato se ejecutó la terminación de explanación y estabilización de talud K10+518 - K10+600 del sector 4 (Talud Campucana). Pendientes por construir el tramo comprendido entre el K10+600 al K23+571,17 que corresponden al sector 3, con el fin de comunicar las cabeceras municipales de San Francisco y Mocoa.

Mediante comunicado de fecha 18/11/24 radicado al CRP con el consecutivo 04-5482-24 el Contratista radicó a Interventoría el diseño geométrico propuesto a fase II como optimización del alineamiento del sub tramo K11+600 – K23+571, que incluye también el sector en ejecución K10+600 -K11+600. la propuesta indica que el alineamiento se desarrolla entre el K10+600 al K22+811 con una longitud total de 12.211,20 m que contempla 7.770,50 m de intervención a cielo abierto; 24 puentes de longitud sumada 3.180,50 m y 3 túneles de longitud sumada 1.260, 00 m.

Una vez desarrollada la propuesta radicada y previa revisión de Interventoría se ajusta el alineamiento al tramo K10+598 - K22+708 con una longitud total de 12.11 m que contempla 7.567 m de intervención a cielo abierto; 31 puentes de longitud sumada 3.199 m y 3 túneles de longitud sumada 1.342,00 m.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

INTEGRANTES: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A – 100%

CONTRATO No.	964 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 541.389.993.917,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 541.389.993.917,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 22.030.482.547,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 2.933.561.122,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 19.096.921.425,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

INTEGRANTES: HMV INGENIEROS LTDA 40%; CONSULTORÍA EN INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.– 30%; GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.– 30%.

CONTRATO No.	977 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 47.999.892.900,00
FECHA DE INICIO:	2/7/2021	VALOR ADICIONES:	$ 2.400.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 50.399.892.900,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/8/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 1.129.388.470,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.129.388.470,00
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 27.049.209.066	$ 18.020.744.751	$ 27.072.000.000	$ 63.144.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 27.049.209.066	$ 18.020.744.751	$ 27.072.000.001	$ 63.144.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ 4.800.000.000	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2.399.892.900	$ -	$ 3.600.000.000	$ 5.800.000.000
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRATO	VIGENCIA	2025	2026	2027	2028
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 63.168.000.000	$ 63.192.000.000	$ 67.680.000.000	$ 63.168.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 63.168.000.000	$ 754.381.071		
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 62.437.618.929		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 8.000.000.000	$ 5.400.000.000	$ 6.000.000.000	$ 5.600.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 7.567.067.088			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 432.932.911,97			

CONTRATO	VIGENCIA	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 54.144.000.000	$ 94.752.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.200.000.000	$ 4.800.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		
	SALDO DE VIGENCIA		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (INICIAL) (A)	$ 483.413.463.218,00	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIF No.5:	$ 347.184.964.001,00	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA MODIF No.6:	$ 343.727.160.196,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 152.728.859.105,19	31,59%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 147.797.183.486,00	30,57%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (4.931.675.619,19)	-1,02%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños)	$ 35.002.974.439,00	60,37%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 200.411.661.126,38	37,02%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 182.800.157.925,00	33,76%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (17.611.503.201,38)	-3,25%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 576.080.581	0,17%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.900.000.000	0,37%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: Fe No.22554 de 28/04/2026 Acta de Obra No. 57; Fe No.22555 de 28/04/2026 Acta Ajustes Def No. 57

PERIODO FACTURADO: Marzo 2026

VALOR FACTURA: $ 2.851.305.260,00 Acta de Obra No.57 marzo 2026; $ 728.263.131,00 Acta de ajustes Def No.57 marzo 2026

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado de trámite)

Observaciones:

Acta de Obra No. 58 periodo abril 2026 se encuentra en conciliación de cantidades con contratista

Mediante comunicado Putumayo04-8195-26 de 27/03/2026, Interventoría remite a la SMCN Acta de Ajustes definitivo No. 57 periodo marzo 2026, la cual dió entrada con número de radicado No.2026E-VUVRAZ-038622 de fecha 20 de abril de 2026

NOTA: El valor reportado como saldo de vigencia 2025 por $11.231.680.296 contempla el monto del anticipo No.2 por valor de 14.000 millones de pesos cuyo trámite a la fecha, se encuentra en cuentas por pagar según lo reportado por la SMCN.

Inversión total programada desde la fecha de inicio del contrato hasta	abril 30 de 2026	$ 200.411.661.126,38	37,02%
Inversión total ejecutada desde la fecha de inicio del contrato hasta	abril 30 de 2026	$ 182.800.157.925,00	33,76%
Inversión de obra programada desde la fecha de inicio del contrato hasta	abril 30 de 2026	$ 152.728.859.105,19	31,59%
Inversión en obra ejecutada desde la fecha de inicio del contrato hasta	abril 30 de 2026	$ 147.797.183.486,00	30,57%

Detalle información financiera:

Valor facturado acumulado a marzo de 2026 $ 180.111.413.464,00 33,27% | Valor programado acumulado a marzo de 2026 $ 195.785.802.329,79 36,16%

NOTA: El valor facturado acumulado corresponde al valor acumulado hasta acta de Obra No.56 febrero 2026 más las actas de ajustes def No.56

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	26.685.329.342	55,59%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	26.684.578.809	55,59%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	175.556.731	0,37%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	175.556.731	0,37%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: Enero 2026

VALOR FACTURA: $ 572.653.943

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado de trámite)

Observaciones:

Mediante comunicado Putumayo04-8114-25 de 06/04/26 Interventoría radica a la DT Invias Putumayo, Acta de Costos de Interventoría No.56 febrero 2026. la cual dió entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-032289 de fecha 06 de abril de 2026

Mediante comunicado Putumayo04-7989-25 de 11/03/26 Interventoría radica a la SMCN, Acta de Costos de Interventoría No.55 enero 2026. la cual dió entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-023234 de fecha 11 de marzo de 2026

Mediante comunicado Putumayo04-7986-25 de 11/03/26 Interventoría radica a la SMCN, Acta de Modificación de Costos de Interventoría No 6 Contrato 977 de 2021 y Reprogramación al Plan de Cargas No 9. la cual dió entrada con número de radicado 2026E-VUVRAZ-022991 de fecha 11 de marzo de 2026

Inversión programada desde fecha de inicio del contrato hasta	abril 30 de 2026	$ 26.685.329.342,19	55,59%
Inversión ejecutada desde fecha de inicio del contrato hasta	abril 30 de 2026	$ 26.684.578.808,90	55,59%

Detalle información financiera:

Valor programado acumulado a	Diciembre de 2025	$ 24.399.352.105	50,83%
Valor facturado acumulado	Diciembre de 2025	$ 23.966.959.988	49,93%

Nota 1: El valor programado acumulado se toma de acuerdo al Plan de Cargas No 9 radicado ante la entidad con comunicado Putumayo04-7819-26 con fecha 05 de febrero de 2026, Radicado 2026E-VUVRAZ-008992

ANTICIPOS	
Otorgado $	22.030.482.547,00
Amortizado $	2.933.561.122,00
Saldo $	19.096.921.425,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,20
Acumulado:	0,15

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.129.388.470,00
Amortizado $	$ 1.129.388.470,00
Saldo $	$ 0,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 31,59% (Inversión programada en obra básica)
Meta Física Ejecutada % 30,57% (Inversión ejecutada en obra básica)
Avance o Atraso Físico % -1,02%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia hasta 2025	Vigencia 2026	Avance Físico	Tramo 3	Tramo 4	Corredor	Total	%
EXPLANACIONES	km	12,19	1,16	-	Prog	12,11	0,08		12,19	
					Ejec	1,08	0,08		1,16	9,53%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	km	20,34	1,16	-	Prog	12,211	8,13		20,34	
					Ejec	0	1,39		1,39	6,81%
PAVIMENTOS ASFALTICOS (pavimento hidráulico)	km	20,24	1,16	-	Prog	12,11	8,13		20,24	
					Ejec		1,32		1,32	6,50%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	km	12,11			Prog	12,11			12,11	
					Ejec				0,00	0,00%
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	km	20,24			Prog	12,11	8,13		20,24	
					Ejec				0,00	0,00%
OBRAS VARIAS	km	20,24			Prog	12,11	8,13		20,24	
					Ejec				0,00	0,00%
TRANSPORTES	km	12,19	1,160	-	Prog	12,11	0,08		12,19	
					Ejec	1,08	0,08		1,16	9,53%
PUENTES	km	3,21	0,030	-	Prog	3,18	0,03		3,21	
					Ejec		0,03		0,03	0,84%
TÚNELES	km	1,26			Prog	1,26	0,00		1,26	
					Ejec		0,00		0,00	0,00%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 4: K3+462 - K10+600
TRAMO Y/O SECTOR 3: K10+600 hacia mayores

Nota: La longitud total a intervenir de acuerdo con diseños a fase II en el sector 3 es de 12.11 Km. (meta física programada). A la fecha se ha intervenido de manera parcial 1,080 Km, lo que equivale a una meta física ejecutada del 8.91 %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Planta de concreto	1	1
Planta de asfalto	1	
Perforador jumbo (3 brazos)	2	
Formaleta para revestimiento tuneles	3	
Andamios para instalación impermeab.	3	
Carro de avance	2	
Perforador jumbo (2 brazos)	3	
Bomba inyección lechada	4	4
Robot de lanzado	4	
Trituradora 60 Ton	1	
Excavadora de orugas	2	4
Compactador neumático	2	
Terminadora de Asfalto	1	
Motoniveladora	2	1
Vibrocompactador	2	2
Volquetas:	10	6
Cargador		1
Retrocargador		2
Camioneta		4
Camiones		1
Carro taller		1
Camión combustible		1
Carrotanque de agua		1
Bomba para concreto		1
Buldozer		
Minicargadores		2
Compresor		9
Generador Eléctrico		4
Planta de generación de energía		6
Equipo para tensionamiento (anclajes)		1
Compactador manual (Canguro)		2
Vibrador manual para Concreto		2
Perforadoras T46 (oruga)		3
Perforadoras T19 (Colgantes)		4
Perforadoras Everdigm		1
Telehandler		1
Perforadoras petty (sondeos)		5
Equipo de topografía		2
Utilidad perforadora con canasta		4
Mixer		2
TOTAL		78

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MOCOA	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:
Se cuenta con la Autorización Temporal No. 502328 para explotación de materiales sobre el Rio Mocoa, autorizada mediante Resolución 210-4291 del 20 de octubre de 2021 emitida por la Agencia Nacional de Minería y con Licencia Ambiental Resolución 0746 del 26 de mayo de 2023 otorgada por CORPOAMAZONIA. Mediante Resolución VSC - 1220 del 01 de abril de 2026 se autorizó el cambio de titular de la AT. Actualmente, se encuentra en proceso el trámite de cesión de la licencia ambiental del Consorcio CM Putumayo a favor de Construcciones El Cóndor S.A.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	X	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI	X	NO		N/A
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:
La Licencia Ambiental concadida mediante Resolución 2170 del 05 de diciembre de 2008 otorga los permisos de sustracción de reserva forestal, levantamiento de veda, zonas industrial, campamentos, concesión de aguas superficiales, vertimientos, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, ocupación de cauce y zonas de disposición final de material sobrante (ZODME).

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N.A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**447**	**20**
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	243	15
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	204	5
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	202	11

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 467

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
Av Colombia Cra 9 N. 21 - 108

OBSERVACIONES:
GS-1 SISTEMA DE INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL A LA COMUNIDAD.
En este periodo semanal objeto de reporte, nose desarrolló escenario de capacitacion a comunidad.

GS - 3 CAPACITACION AMBIENTAL Y EN SEGURIDAD INDUSTRIAL AL PERSONAL DE OBRA.
En este periodo semanal objeto de reporte no se desarrolló escenario de capacitacion a personal de obra.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	22
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N.A.
AVALÚOS APROBADOS:	N.A.
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N.A.

OBSERVACIONES:
Las gestiones identificadas preliminarmente, corresponden a lo identificado para los dos primeros kilómetros. El contratista está en proceso de elaboración y entrega del diagnóstico predial para el contrato.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

1. Envío por parte del contratista del informe de sostenibilidad correspondiente al mes de marzo de 2026.

2. En proceso de elaboración informe trimestral 19.

AREA TÉCNICA

COMUNICACIONES

Mediante comunicado Putumayo04-8218-26 de 23/04/2026 Se radicó a la Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales el informe semanal No.251 correspondiente al periodo 16 al 22 de abril 2026.

Mediante comunicado Putumayo04-8225-26 del 24/04/2026, se radica a la SMCN CUARTA REITERACIÓN: Solicitud urgente de habilitación de semanas en plataforma CIFRA para los contratos de obra No. 964 y 1111 de 2021.

Mediante comunicado Putumayo04-8228-26 de 27/04/2026 Interventoría emite a Construcciones el Cóndor Recordatorio de plazo máximo para la radicación de Actas de Recibo Parcial de Obra

Mediante comunicado Putumayo04-8238-26 de 29/04/2026 Interventoría realiza Solicitud Adición para la vigencia de 2026, Acta de Modificación de Costos de Interventoría y Modificación Plan de Cargas Contrato 977 de 2021.

REUNIONES Y RECORRIDOS:

Interventoría desarrolla recorridos permanentes al sitio de las obras a fin de verificar el estado de la obra en los diferentes frentes activos.

FRENTES DE OBRA ACTIVOS

Vía existente entre Mocoa – San Francisco (trampolín de la biodiversidad):

" Conformación y compactacion Ruta 1003 Trampolin se trabajó entre PR106+300 y PR109+400 con motoniveladora MN 38 y el compactador CV841.

" Maquinaria disponible: Cargador CA 62, retrocargador CAT 327

" Volqueta sencilla VO 15, VO 020 disponibles

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO RÍGIDO TIPO MR

• Actividad de pavimento tipo MR terminada con cunetas entre K3+092 a K3+848

Sector 4 (K3+462 a K10+600)

• **K9+930 - K10+030 MI:** Terminada construcción de canal L=100 m con inicio en cuneta.

• **Muro de Cierre K10+520 MD:** Finalizada actividad con losa de aproximación a Puente Campucana. Se realiza la figuración e instalación de acero de refuerzo para la barrera de protección tipo New Jersey en los 3 módulos.

Sector 3 (K10+600 a K22+811)

• **Muro 1 K10+792.36 - K10+835.03 M.D:** Muro terminado con barrera de protección.

• **Muro 2 K10+855,44 - K10+884,61 M.D:** Muro terminado con barrera de protección.

• **Muro 3 K10+956,29 - K10+98978 M.D:** Muro terminado con barrera de protección.

• **Muro 4 K10+999,64 - K11+049.45 M.D:** Muro terminado con barrera de protección.

• **Muro 6 K11+240,15 - K11+281,22 M.D:** Se realiza la fundición de los 4 módulos L= 43,10 m

• **Muro 7 K11+430.62 - K11+460.01 M.D:** Conformación de terreno para la construcción de módulos 1-2 de muro (demolición de anillos falsos y excavaciones). Inactivo

• **Muro 8 K11+535,09 - K11+587,22 M.D:** Excavación manual de caissons diámetro 1,50m. Resumen de avance: C1=12,50m - C2=10,50m - C3=6,0 excavación - C6=fundido caisson - C7=18,70 Inicia instalación de acero de caisson - C8 = 17.50 m - C9=13,70 m - C10=12,80m

• **Muro Y2 K11+790.70 a K11+835.03 M.D:** Actividades de excavaciones para la construcción de caisson diametro 1,50m - caisson #1 = 2 m - caisson #5 = 2,0m - caisson #6 = 3,0m - caisson #7 = 3,0m - caisson #8 = 3,0 m

• **Talud 9 K11+445 – K11+580 MI:** Terreno natural: sin actividad

• **Talud 9A K 11+445- K 11+515 MI Terraza 5** se realiza demolición de rocas para continuar con la explanación

• **Talud 9 K11+560 – K11+580 MD:** Se avanza con la perforación e instalación de torón en terreno natural bajo nivel de calzada

• **Talud 13 K11+590 – K11+680 MI: Terraza 3 (L=25 m):** Inyección anclajes activos linea D#1-2-3 / linea E#3-11-12-13-14-15. Tensionamiento anclajes activos 40 ton, linea D#10-11-12-13-14-15-16-17-18. **Terraza 4 (L=25 m):** perforación anclajes activos, linea A#11-10-9

• **Talud Contingencia adjunto a Talud 13 K11+680 MI:** Terminado

• **Talud 13N K11+720 - K11+804 MI:** Avanza Explanación en terraza 2, Perforación e instalación de barras autoperforantes líneas A, B, C. L= 12 m. Terraza 1: Línea A 1-2 / Línea B: 1 al 5 / Línea C: 1 al 9 / Línea D: 1 al 11 / Línea E: 1 al 13.

• **ODT 1 K10+665:** Terminada

• **ODT 2 K10+798:** Terminada

• **ODT 3 K10+870: E**xcavaciones para la construcion de complemento alcantarilla media calzada, colocación concreto 210 kg/cm2 hormigonado solado para tuberia 36"- longitud 6,0 x 1,40 x 0,10 = 0.90 m3

• **ODT 4 K10+975:** terminada media calzada margen derecha

• **ODT 5 K11+020: E**xcavación para la instalación de tuberia en concreto reforzado de 36 " - Instalación de solado en concreto 210 kg/cm2 para tuberia - longitud 6,0x1,40c0,10=0.90 m3C

• **ODT 7 K11+250:** Terminada

• **Puente Y4 K11+682 - K11+727:** caisson #1: excavación manual anillo 13 - caisson #2 excavación manual anillos falsos

• Explanación y demolición de rocas con excavadora y martillo hidráulico en terraza 4 de talud 13, repateo de materiales hasta acopio abscisa: K11+580.

• Explanación terraza 5 talud 9, cargue y transporte a ZODME Guaduales.

• Explanación para terraza 2 talud 13N abscisas: K11+720 a K11+735, desalojo materiales hasta acopio abscisa: K11+580 con mini cargador.

• Replanteo puntos de paramento y marcación de nivel para estructura de encole O.D.T. 4 abscisa: K10+975.

• Control topográfico para excavación O.D.T. 5 media calzada margen derecha, nivelación para marcación de cota solado de limpieza abscisa: K11+020.

• Replanteo de O.D.T. 6 abscisa: K11+145 y 8 abscisa: K11+360.

• Localización de puntos para perforación e instalación de anclajes activos fila A (1 a 5) terraza 4 talud 13.

AREA TOPOGRAFÍA

23/04/2026: Chequeo nivel de excavación para caisson 7 localizado en muro 8 abscisas: K11+535.09 a K11+587.22 margen derecha, la cota cumple de acuerdo a modificación planteada por el Contratista, núcleo de caisson 15.50 metros, diseño original 17.00 metros.

23/04/2026: Verificación alineamiento y nivel de formaleta para New Jersey de muro 6 modulo 1.

23/04/2026: Acompañamiento recorrido de obra visita ANLA con ingenieros y especialistas del C.R.P. y Contratista.

24/04/2026: se revisó y concertó cantidades para pre acta correspondientes a mes de abril de 2026 con contratista de obra

24/04/2026: Se efectuó acompañamiento a ingeniero residente y a ingeniero líder de integración del C.R.P. a reunión interinstitucional convocada por Contraloría Departamental en la que participaron representantes de: Terminal de transportes de Mocoa, Alcaldía de Mocoa, Concejales, veedurías ciudadanas e INVIAS, tema tratado diseño doble calzada y propuestas para ajustarse al nuevo terminal de transportes localizado en sector 5 abscisas: K1+800 a K2+100.

27/04/2026: Se asistió a reunión técnica con Contratista para tratar temas referentes a vias de acceso terminal de transporte de Mocoa localizado en el sector 5 abscisa: K1+900/K2+100.

27/04/2026: Se digitó información referente a georreferenciación diseño terminal con respecto al proyecto de la Variante San Francisco Mocoa.

28/04/2026: Chequeo paramentos y nivel para acabado estructuras de encole O.D.T. 3 y 4 localizadas en abscisas: K10+870 y K10+975 respectivamente.

28/04/2026: Chequeo de nivel para solado de limpieza O.D.T. 5 media calzada margen derecha abscisa: K11+020.

29/04/2026: En oficina se efectuó revisión de secciones cada 5 metros para cálculo de volumen explanación talud 13N pre acta mes de abril de 2026 de acuerdo a instrucción de ingeniero residente del C.R.P.

TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO

23/04/2026: Se realiza ensayo de compresión de cilindros a 7 días, del concreto de 35Mpa para dados en sitio, Talud 13, terraza 3, fila B, k11+600.

23/04/2026: Se realiza ensayo de compresión de núcleos a 8 días, de la lechada de inyección, talud 13, vía Sachamote, contingencia, pernos, fila A 1, 4, 5, fila B 4 Y 5, fila C 1 al 7, fila D 3 al 8, k11+710/740.

24/04/2026: Se realiza ensayo de clasificación al material granular para sub base granular, utilizado en los rellenos estructurales.

24/04/2026: Se realiza ensayo de compresión de núcleos a 7 días, del concreto lanzado, Talud 13, terraza 3, fila E, k11+623/640

24/04/2026: Se realiza ensayo de compresión de cilindros a 7 días, del concreto de 35Mpa concreto convencional de 35Mpa, para, dados en sitio, Talud 13 terraza 3 Fila D # (10 und), k11+600.

27/04/2026: Se realiza ensayo de clasificación, a la arena clasificada del río Mocoa.

27/04/2026: Se realiza ensayo de clasificación, a la arena triturada del río Mocoa.

28/04/2026: Se realiza ensayo de clasificación, al triturado de 3/4", del río Mocoa.

28/04/2026: Se realiza ensayo de compresión de núcleos a 28 días, del concreto lanzado, talud 13N, terraza 1, fila 1, k11+740/747.

28/04/2026: Se realiza ensayo de compresión de núcleos a 7 días, del concreto lanzado, talud 13, terraza 2, fila A y B, K11+725/740.

29/04/2026: Se realiza ensayo de clasificación, a la arena mixta del río Mocoa.

ÁREA AMBIENTAL

COMUNICACIONES:

Mediante comunicación Putumayo04-8217-26 del 24 de abril del 2026, la Interventoría radicó al Contratista con ASUNTO: Respuesta comunicado 312-168-20260408002339 del 13/04/2026 (04-7365-26-M2). Respuesta a comunicado Putumayo04-8123-26 con radicado Cóndor 311-168-20260408002219 y asunto: Apremio 1 Solicitud entrega del informe de gestión ambiental de febrero de 2026. En ejercicio de las funciones de esta Interventoría, se emite concepto de aprobación al informe de gestión ambiental N°56 del periodo febrero de 2026. Lo anterior, tras verificar que se atendieron las observaciones del comunicado Putumayo04-8092-26 del 27 de marzo de 2026 y que el documento cumple con los lineamientos del Manual de Interventoría.

Mediante comunicación Putumayo04-8232-26 del 27 de abril del 2026, la Interventoría radicó al Contratista con ASUNTO: Respuesta comunicado 312-168-20260421002367 del 21/04/2026 (04-7403-26-M2). Remisión Pre - acta de Inversión Ambiental N° 58. En respuesta al comunicado del asunto, mediante el cual remite la Pre-acta de Inversión Ambiental de abril del 2026 con sus respectivos anexos, informamos que tras revisar el formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3, se verificó que este se encuentra debidamente diligenciado y con las respectivas firmas, de igual manera los anexos presentados están acordes con las actividades ejecutadas. Por lo tanto, esta Interventoría mediante comunicado Putumayo04-8198-26 del 21 de abril de 2026, remitió esta información a la Subdirección de Sostenibilidad para el concepto de no objeción correspondiente. Una vez se reciba el pronunciamiento de la Entidad, se notificará al Contratista para los fines pertinentes.

REUNIONES Y/O RECORRIDOS:

El 23 de abril de 2026, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA en el marco de la visita de seguimiento y control ambiental al frente Mocoa, realizó un recorrido al proyecto del K11+900 al K8+000 y a la ZODME Guaduales.

El 24 de abril de 2026, se realizó una reunión presencial entre la ANLA, CORPOAMAZONIA, Contratista e Interventoría, en la cual los funcionarios de la ANLA consultaron a la Corporación si existen quejas sobre el proyecto. Finalmente, se realizó la reunión de cierre, en la cual los funcionarios de la ANLA socializaron las conclusiones de la visita.

ACTIVIDADES DE ÁREA AMBIENTAL:

- La Interventoría realizó el acompañamiento a la visita de seguimiento y control ambiental efectuada por la ANLA.
- La Interventoría revisó el ajuste al informe de la gestión ambiental del Contratista correspondiente a febrero de 2026, para el cual se emitió el concepto de aprobación correspondiente.
- El 29 de abril de 2026, el Contratista radicó en VITAL, el reporte de avance parcial N°14 de la Contingencia 9 (Camino Sachamates) localizada del K11+315 al K11+330.
- El 29 de abril de 2026, el Contratista radicó en VITAL, el reporte de avance parcial N°12 de la Contingencia 12 (Riesgo inminente) localizada del K11+720 al K11+900.

Medidas de manejo ambiental implementadas en obra:

MC-3 Manejo ambiental de materiales y equipos de construcción
- Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo en los diques destinados a equipos menores. Estas actividades incluyeron la revisión de su integridad, limpieza de sedimentos y reparación de posibles filtraciones.
- Se realizó mantenimiento general en los diques asociados a los equipos principales de la obra. Este proceso contempló la evaluación de condiciones físicas, refuerzo de estructuras y limpieza de residuos acumulados.

MC-4 Manejo ambiental de residuos sólidos domésticos e industriales
- Se realizó la recolección de residuos sólidos en el tramo comprendido entre el K9+900 y el K11+800, incluyendo la limpieza y vaciado de los contenedores de los puntos ecológicos.
- Se realizó la recolección de materiales en desuso tales como mangueras deterioradas, chatarra metálica y restos de madera a lo largo del corredor vial del frente de obra entre el K10+000 y el K11+800.

MC-5 Manejo de vertimientos
- Se realizó la recolección de aguas residuales domésticas, lavado y aseo de las unidades sanitarias portátiles dos veces por semana.

MH-1 Manejo de escorrentía superficial
- Se realizó la limpieza y descolmatación de cunetas y estructuras hidráulicas existentes en el tramo comprendido entre el K9+800 y el K10+500.

MH-2 Manejo cruce de fuentes superficiales
- Se realizó mantenimiento al paso provisional de la quebrada La Vieja en el K11+700.

CA-1 Manejo ambiental de emisiones atmosféricas y ruido
- Se realizó humectación de la vía para evitar la dispersión de material particulado entre el K3+000 y el K11+400.

B-2 Rescate de epífitas vasculares
- Se realizó el mantenimiento y monitoreo de epífitas vasculares en el PR12+450.

B-10 Ahuyentamiento y rescate de fauna
- Se realizó ahuyentamiento de fauna con trampas de olor y con vuvuzela en el K12+450.

AREA SOCIAL

COMUNICACIONES

En proceso de elaboración comunicados para tramite de radicación al contratista.

REUNIONES Y RECORRIDOS:

En proceso de elaboración comunicados para tramite de radicación al contratista.

Se asistió y participó bajo modalidad presencial en el desarrollo de capacitación, del área de SST con tema central: Reinducción reglamento interno

Se asistió a reunión de apertura de la visita de seguimiento ambiental de la ANLA-Expediente LAV0016-00-2023 al Proyecto variante Mocoa-San Francisco.

Se asistió al recorrido en el frente de obra junto al contratista y comisión de la ANLA (profesionales, biótico, físico y social), actividad con el objeto de realizar un tamizaje general del frente de obra objeto de visita de seguimiento.

Se dio cumplimiento a la agenda programada por el componente social, cumpliéndose con los encuentros formales con: Veedurías ciudadana, secretaria de planeación municipal y Personería, encuentros que permitieron al profesional social de ANLA fortalecer vínculos entre la institucionalidad y el proyecto, además de verificar procesos de captación, atención y cierres de PQRS.

ACTIVIDADES DEL AREA SOCIAL:

Se elaboró informe sectorial de gestión social,el cual da cuenta de acciones adelantadas en cumplimiento del PGS con periodo de reporte semanal

Profesional social de obra realizó inducción socioambiental en el marco de la Licencia Ambiental al personal qué ingreso a la empresa brindando información sobre la Resolución 2170 de 2008, Plan de Manejo Ambiental. Se entregó volante del SAU y se hace énfasis en las fichas del PMA y las medidas preventivas para su implementación, importancia de la Reserva Forestal y cuidado ambiental

Procesos de induccion sobre arqueologia preventiva, legislación, patrimonio arqueológico y que hacer en caso de encontrar materrial cultural durante las excavaciones en la obra.

En cumplimiento a PMA se desarrolló escenario de capacitacion a personal de obra,desarollando tema:Puericultura,en el frente obra-Vereda Campucana.

Se realizó revisión de reportes semanales de profesionales de obra social y arqueología, en los cuales presentan acciones adelantadas en el periodo objeto de reporte y coordinan posible ejecución de actividades en cumplimiento a planes de manejo respectivamente.

Elaboración de reporte semanal en formato MEPI-MN1-IN-15-210, el cual permite el reporte de actividades semanales desde el componente social y sus alcances.

Se revisó y ajustó documento tipo acta del comité con la veeduría ciudadana desarrollado el 14/04/2026 V2, elaborado por el contratista, en espera de revisión por parte del coordinador de veeduría para su version final.

A través de vía telefónica, el resguardo indígena Kamentsá Inga del Municipio de San Francisco, confirmó que la proyección presupuestal aprobada en el 2025 para la implementación de la Ruta Metodológica en el año 2026 se conserva y como comunidad certificada están a la espera del pronunciamiento de la DANCP a través del certificado de procedencia y oportunidad de consulta previa para iniciar formalmente proceso consultivo, el cual estiman materializarlo en 6 meses y proceder a la protocolización de acuerdos.

En cumplimiento a PMA se desarrolló escenario de capacitacion a personal de obra,desarollando tema:Puericultura,en el frente obra-Vereda Campucana.

En proceso de elaboración informe mensual de gestión social No.58 - Mes abril

AREA PREDIAL

COMUNICACIONES

Mediante comunicado Putumayo04-8138-26 del 10/04/2026 Se remite a la Subdirección de Sostenibilidad insumos prediales, con comunicados de obra con radicados 312-001-20260224000341, 312-001-20260224000342, CSF-2322-124809, CSF 2282-124624, y CSF-2283-124625

ACTIVIDADES DEL AREA PREDIAL:

- Informes de Gestión Predial de la Interventoría

- En los tramos de intervención de obra nueva, se cuentan en el proyecto con 12 permisos de intervención voluntaria.

El estado de gestión de predios de pasivos prediales:

N°	FICHA PREDIAL	MAT. INMOBILIARIA	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ÁREA DE TERRENO ESTIMADA REQ.	Estado	% Avance Anterior	% Avance Actual
1	260-ID-T4-CMMVSFM	440-16413	K10+021.90 I	K10+035.70 I	0 Ha+ 500,67 m²	Predio a favor del INVIAS se adquirió mediante Escritura Pública de Compraventa No. 1185 del 2/09/2025, y pagado el 100%, mediante oficio 20265-VPUT-010154 dirigido al IGAC la Territorial de INVIAS Putumayo solicito la Mutación Catastral.	96%	100%
2	264-SP-ID	440-14323	K9+315,65 I	K9+715,82 I	0 Ha + 5802.01 m²	Predio a favor del INVIAS se adquirió mediante Escritura Pública de Compraventa No. 1122 del 02-09-2024, tiene Resolución IGAC de Mutación Catastral, se remitió información Digital al SI.INVIAS	100%	100%
3	264A-ID-T4-CMMVSFM	440-66137	K9+286.83 I	K9+315.65 I	0 Ha + 0536.20 m²	Demanda de expropiación rechazada por el Juzgado Civil del Circuito de Mocoa – Putumayo, mediante auto del 20 de noviembre de 2025, dentro del proceso identificado con radicado No. 2025 00194 00, el contratista, mediante radicado No. 312 001 20260224000342, radico a interventoria la pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolución de Expropiación No. 1712 del 20 de mayo de 2024. Dicho insumo se encuentra agrobado y en etapa de revisión por la SS del INVIAS.	77%	77%
4	264B-T4-CMMVSFM	N.A	K9+315.65	K9+607.33	N.A	Mejoras adquiridas a favor de INVIAS y pagado el 100%	100%	100%
5	285-SP-I	440-49052	K 7+133,33 I	7+484,40 I	0 Ha + 4186.27 m²	Predio a favor de INVIAS se adquirió mediante Escritura Pública de Compraventa No. 1125 del 02-09-2024 tiene Resolución IGAC de Mutación Catastral, se remitió información Digital al SI.INVIAS	100%	100%
6	286-SP-ID	440-52636	K 6+539,63 D	K 7+066,67 I	1Ha +2661.23 m²	Predio a favor de INVIAS se adquirió mediante Escritura Pública de compraventa No. 1774 del 1/12/2025, se recepciono documentos contables para el pago.	92%	92%
7	288-SP-ID	440-3969	K 6+300,51 I	K 6+538,84 I	0 Ha +2002.92 m²	Predio a favor de INVIAS mediante Escritura Pública De Compraventa No. 1154 del 06-09-2024 tiene Resolución IGAC de Mutación Catastral, se remitió información Digital al SI INVIAS	100%	100%
8	314-ID-T4-CMMVSFM	440-35538	K3+116,83 D	K3+129,28 D	0 Ha +0235.77 m²	Demanda de expropiación Admitida por El Juzgado Civil del Circuito de Mocoa - Putumayo, radicado del proceso numero. 025-00195-00, se realizo el deposito judicial el 24/02/2026, para la entrega anticipada.	85%	85%
9	338-D	440- 8790	K2+339.71 D	K2+378.48 D	0 Ha +0431.63 m²	Predio a favor del INVIAS se adquirió mediante Escritura pública de compraventa No. 1166 del 29/08/2025, y pagado el 100%, mediante oficio 20265-VPUT-010155 dirigido al IGAC, la Territorial de INVIAS Putumayo solicito la Mutación Catastral.	100%	100%
10	355D	440-17395	k2+117.09	k2+167.64	0 Ha +00356.66 m²	Resolución de Expropiación enviada por INVIAS y en tramite de notificación (12-12-2025)	69%	69%

Para el contrato N.° 964 del 2021. - Sector 3, Resumen del estado de gestión:

GESTION PREDIAL

	No	EJECUTADOS	%	FALTANTES POR EJECUTAR			%	OBSERVACIONES
				EN MANOS DE	SUB TOTAL	%	TOTAL	
No Predios o Carpetas	22	14	64%	CONTRATISTA	12	0%	12	55%	
				INVIAS	2	17%			
Fichas	22	14	64%	CONTRATISTA	12	86%	14	64%	
				INTERVENTORIA	0	0%			
				INVIAS	0	0%			
Estudios de Títulos	22	14	64%	CONTRATISTA	14	100%	14	64%	
				INTERVENTORIA	0	0%			
				INVIAS	0	0%			
Avalúos	22	14	64%	CONTRATISTA	11	136%	8	36%	
				INTERVENTORIA		0%			
				INTERVENTORIA	0	0%			
				ALCALDIA	0	0%			
Escrituras	22	9	41%	PROPIETARIOS	0	0%	13	59%	
				NOTARIA	0	0%			
				OFICINA DE REGISTRO E INSTRUMENTOS PUBLICOS	0	0%			
Pendientes	Se reiteraron al INVIAS los prendientes de gestión, toda vez que no se le han dado respuesta.							

Se requiere la gestión de saneamiento, como son la formación catastral (debido a que no existe referencia catastral en la zona), la actualización de cabida y linderos (al no coincidir las áreas de las bases catastrales con las jurídicas), o cualquier otra, que genere algún riesgo de retraso en su gestión situaciones.

FECHA	29/4/2026 (Día / Mes / Año)

Se reitera que, de demorarse más los tiempos en la definición de las actividades requeridas, con lo anterior el riesgo latente es el impacto del cronograma por los tiempos requeridos para su saneamiento, a su vez insta que en caso de requerirse la elaboración de topografías de la totalidad de las áreas de alguno de los predios (o de los cinco predios), es necesario garantizar que no se perderá la actividad ejecutada, sino que se garantice que se continúe hasta al fin de su adquisición.

ÁREA SST

COMUNICACIONES

Durante periodo reportado no se generan comunicaciones

REUNIONES Y/O RECORRIDOS:

Durante la semana del 23 de abril al 29 de abril de 2026, se realizaron diversas actividades de supervisión, inspección y verificación en los diferentes frentes de trabajo, con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo establecidas en la normativa vigente y en los procedimientos internos del proyecto.

ACTIVIDADES DEL AREA SST:

El día 24 de abril, se realizó revisión de formatos MEPI y seguridad social de los proveedores ORIAG, Sur Especial, Villalobos, Bioplus, SERMAR, Construcivil, Joyco, Prointure, Rylsa y Geoexcavación, evidenciando cumplimiento general; adicionalmente al proveedor JHP se le solicitó la seguridad social correspondiente al mes de marzo, dado que presentaba información del mes de febrero.

El día 27 de abril, se realizó la socialización del reglamento interno de la empresa al personal de la interventoría, abordando los principales lineamientos y disposiciones a tener en cuenta para su cumplimiento.

El día 27 de abril, se revisó el formato MEPI y la seguridad social de la contratista El Cóndor, dando continuidad al proceso de elaboración del informe mensual del área SST.

El día 28 de abril, se verificó la señalización preventiva en los senderos peatonales, con el fin de garantizar condiciones seguras para el tránsito del personal.

El día 28 de abril, se recomendó a la Auxiliar SST instalar un punto de emergencia en el frente Y2, la profesional manifestó que se encuentran gestionando los insumos necesarios para su implementación.

El día 28 de abril, durante recorrido en obra se evidenció personal realizando actividades de tanqueo de agua sin el uso adecuado de la dotación requerida, por lo cual se realizó la observación al Residente SST para la implementación de las acciones correctivas correspondientes.

El día 28 de abril, en recorrido por obra se realizaron observaciones generales relacionadas con orden y aseo en los diferentes frentes de trabajo, así como la necesidad de mantener los senderos peatonales libres de obstáculos.

El 29 de abril, se finalizó el informe mensual del área SST de la interventoría, el cual fue remitido al Residente de Obra para su revisión.

El día 29 de abril, se evidenció canastilla utilizada para actividades de lanzado en condiciones no aptas, debido a deformaciones y varillas torcidas, se recomendó realizar revisión por personal competente antes de su uso.

Por otra parte, la contratista El Cóndor continúa realizando inducciones del SG-SST al personal de ingreso, instalación de señalización para entrada y salida de volquetas, ejecución de capacitaciones programadas al personal de brigada y recorridos continuos en obra, con el fin de identificar hallazgos y dar cumplimiento a las acciones correctivas correspondientes.

ESTUDIOS Y DISEÑOS

COMUNICACIONES

Mediante comunicado Putumayo04-8231-26 del 27/04/2026, Interventoría emite respuesta a comunicados 312-168-20260413002349 con recibido 04-7367-26 del 14-04-2026 y 312-168-20260415002355 con recibido interno 04-7379-26 del 16-04-2026, con asunto "Alcance a oficio 312-168-20260413002349 (Putumayo04-7367-26-M2) Remisión reprogramación cronograma estudios y diseños del contrato No 964 de 2021, enmarcado en los problemas de acceso a los puntos de perforación y toma de muestras de laboratorio".

Mediante comunicado Putumayo04-8241-26 del 29/04/2026, Interventoría emite respuesta a comunicado 312-168-20250220001709 con recibido interno 04-5745-25 del 25-02-2025, con asunto "MURO Y5 V2 – VOL VIII. Respuesta comunicado Putumayo04-6164-25 referente a las observaciones realizadas al volumen VIII del Muro Y5 (K+963.82 A K12+036.99), con radicado 311-168-20250210001577". No Aprobación Diseño de estructuras Muro Y5.

REUNIONES Y RECORRIDOS:

*Mesas de trabajo entre pares Obra e Interventoria en Seguimiento y Control a E&D.

*Mesas de trabajo para culminar la impresión de Volumenes de Diseño.

ACTIVIDADES ESTUDIOS Y DISEÑOS

• Interventoría emite, No Aprobación Diseño de estructuras Muro Y5.

COMPONENTE	K10+600 K11+600	K11+600 K13+600	K13+600 K15+600	K15+600 K17+600	K17+600 K19+600	K19+600 K21+600	K21+600 K23+571
ESTUDIO DE TRANSITO Y NIVELES DE SERVICIO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO, SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ESTUDIO DE GEOLOGIA PARA INGENIERIA	100%	100%	80%				
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCION	100%	86%	35%				
ESTUDIO DE ESTABILIZACION Y ESTABILIDAD DE TALUDES	100%	84%	60%				
ESTUDIO GEOTECNICO Y DISEÑO DE PAVIMENTO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION	100%	80%	80%	40%	40%	40%	40%
ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	100%	99%	42%				
COMPONENTE AMBIENTAL	100%	20%	0%	MODIFICACIÓN DE LICENCIA			
ESTUDIO PREDIAL Y SOCIO - PREDIAL	100%	100%	20%	CONSULTA PREVIA			
ESTIMACION DE CANTIDADES DE OBRA	100%	0%	0%				
RESUMEN EJECUTIVO	100%	0%	0%				
EXPLORACION GEOTECNICA	100%	100%	100%	100%	80%		20%

CONVENCIONES

APROBADO | EN EJECUCION | SIN PRESENTAR

ESTADO CAMPAÑA EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA

Mediante comunicado Putumayo04-8150-26 de 13/04/2026 Se emite respuesta a comunicado de Cóndor No. 312-168-20260324002315 con recibido interno 04-7295-265 del 26-03-2026, asunto "Entrega parcial registros de exploración geotécnica K15+600 - K17+600".

Mediante comunicado Putumayo04-8151-26 de 13/04/2026 Se emite respuesta a comunicado de Cóndor No. 312-165-20260324000002 con recibido interno 04-7292-265 del 24-03-2026, asunto "Entrega parcial del informe de exploración indirecta mediante lineas de refracción sísmica para los tramos: K13+600 – K14+400; K14+400 – K15+600; y K15+600 – K17+600".

Mediante comunicado Putumayo04-8153-26 de 13/04/2026 Se emite respuesta a comunicado de Cóndor No. 312-168-20260324002317 con recibido interno 04-7294-26 del 25-03-2026, asunto "Entrega parcial resultados ensayos de laboratorio de los Tramos: K15+600 y K17+600; K19+600 y 21+600".

Mediante comunicado Putumayo04-8154-26 de 13/04/2026 Se emite respuesta a comunicado de Cóndor No. 312-168-20260225002263 con recibido interno 04-7157-26 del 26-02-2026, asunto "Entrega parcial resultados ensayos de laboratorio de los Tramos: K14+400 y K15+600; K15+600 y K17+600; y K19+600 y K21+600".

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TÉCNICA
* Continuar atención de emergencias de la vía existente Mocoa – San Francisco Trampolín de la biodiversidad.
* Estabilización de taludes (perfilado, concreto lanzado, perforación, llenado, inyección y tensionamiento anclajes activos) en sector 3 desde K11+445 a K11+804 en margen izquierda
* Muros 2, 3, 4, 6: Construcción de new jersey y ODT
* Muro 7 K11+430.62 - K11+460.01 M.D
* Muro 8 K11+535.09 - K11+587,22 M.D
* Muro Y2 K11+535,09 - K11+587,22 M.D
* Puente Y4 K11+682 - K11+727
* Exploración Geotécnica

ESTUDIOS Y DISEÑOS:
*Revisiones varias de productos de Diseño presentados por obra.
*Atención a observaciones de interventoria a productos de Diseño regresados. Esto por parte de Obra.


SOCIAL:
* Revisión documental
* Seguimiento a actividades ordinarias o extraordinarias a ejecutar por parte de profesional social de obra

SST:
• Realizar recorridos de campo.
• Verificar condiciones de seguridad en las diferentes áreas de trabajo.
• Asistencia a comité semanal de obra.
• Seguimiento a condiciones de seguridad durante actividades de alto riesgo como lo es trabajo en alturas y espacios confinados.

AMBIENTAL:
• Seguimiento a las actividades programadas por el Contratista.
• Seguimiento a la implementación de las medidas de manejo ambiental en los frentes de obra.
• Revisión y respuesta de correspondencia radicada por el INVIAS y el Contratista.
• La Interventoría revisará el ajuste al informe de la gestión ambiental del Contratista correspondiente a marzo de 2026.
• El Contratista radicará en VITAL, el reporte de avance parcial N°15 de la Contingencia 7 (Riesgo inminente) localizada del K11+600 al K11+685.
• El Contratista radicará en VITAL, el reporte de avance parcial N°15 de la Contingencia 8 localizada del K8+300 al K8+330.
• El Contratista radicará en VITAL, el reporte de avance parcial N° 15 de la Contingencia 9 (Camino Sachamates) localizada del K11+315 al K11+330.

PREDIAL:
*Revisión de la sábana predial actual.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

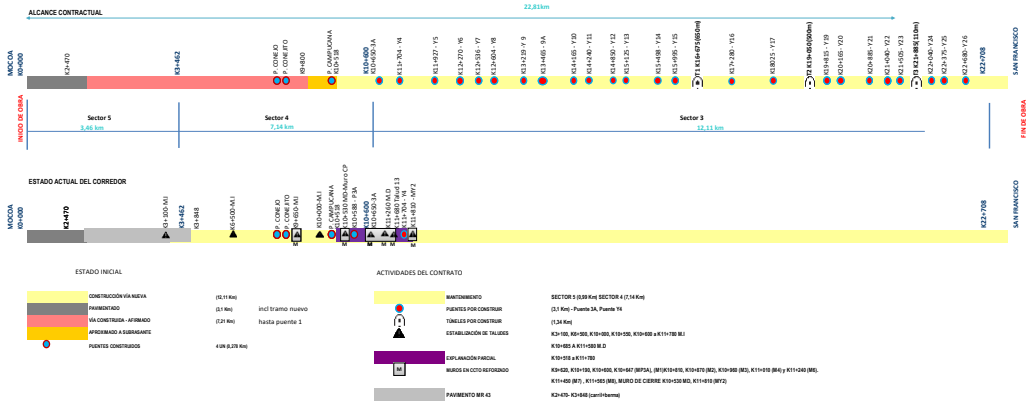

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Mantenimiento vía existente El Pepino - San Francisco - conformación de calzada existente



Muro 6 (K11+240/281) MD: Terminada Construcción de barrera de protección tipo new jersey



Muro 8 (K11+535/587) MD: Instalado acero de refuerzo paracaisson #7 ϕ=1.50 m



Talud 13 (K11+590/680) MI: terrazas 3 y 4 anclajes activos, avanza explanación corte 2



Talud 13 N (K11+720/804) M.I: estabilización con pernos autoperforantes en terrazas 2, explanación corte 3



Muro Y2 (K11+790/835) M.D: Se avanza con la excavación manual y construcción de anillos para caissons de los módulos 1 y 2

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se realizan requerimientos permanentes al Contratista al respecto del avance de las actividades contractuales.

Se emiten comunicaciones permanentes al contratista encaminadas a reiterar las obligaciones contractuales y se hace seguimiento a lo pertinente.

Se programa y coordina los comités de seguimiento semanal con el Contratista y se generan compromisos cuyo cumplimiento se evalúa en la semana siguiente.

Seguimiento y control de la calidad de los materiales utilizados en las actividades realizadas en obra de acuerdo con las Normas establecidas por INVIAS

Seguimiento y supervisión permanente a las actividades de obra desde las áreas técnica, ambiental, social, predial y SST

Seguimiento, medición y control de calidad permanente en campo de las actividades en ejecución.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ**

Matrícula Profesional No.: **25202-31528 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ABRIL **PROYECTO:** VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3

CONTRATO No. 964-2021 **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 977 DE 2021 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES DE ABRIL 2026																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CAMIONETA 4X4 ADM	NISSAN	VL 179	MOCOA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAMIONETA 4X4 ADM	CHEVROLET		MOCOA	A	I	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
CAMIONETA 4X4 RES	NISSAN		MOCOA	A	I	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
CAMIONETA 4X4 RES	NISSAN		MOCOA	A	I	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
CAMION	FOTON	5 TON	MOCOA	A	I	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
RETRO CARGADOR	JCB	MC731775	MOCOA	A	I	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
EXCAVADORA	KOMATSU	PC200	MOCOA	I	I	I	I	I	A	A	R	R	A	A	I	I	I	R	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
EXCAVADORA	CATERPILLAR	320GX	MOCOA	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A
EXCAVADORA	JONHN DEERE	130GLC	MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
EXCAVADORA	JONHN DEERE	130GLC	MOCOA	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
EXCAVADORA	CATERPILLAR	313GC	MOCOA	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
EXCAVADORA	CATERPILLAR	313GC	MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
BUS			MOCOA	A	I	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
MINICARGADOR	JHONN DEERE	320G	MOCOA	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
MINICARGADOR	BOBCAT	MC085021	MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MINICARGADOR	CATERPILLAR		MOCOA	I	I	I	I	I	R	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
MINICARGADOR	HYUNDAI		MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MINICARGADOR	BOBCAT S330		MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MINICARGADOR	CASE 220B		MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MINICARGADOR	CASE 220B		MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MIXER	KENWORTH		MOCOA	A	I	I	A	I	A	I	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A
MIXER	INTERNATIONAL		MOCOA	A	I	I	A	I	A	I	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A
MIXER	INTERNATIONAL		MOCOA	A	I	I	A	I	A	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	WHP-190	MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I
VIBROCOMPACTADOR			MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA	INTERNATIONAL		MOCOA	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
VOLQUETA	INTERNATIONAL		MOCOA	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
VOLQUETA	INTERNATIONAL		MOCOA	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
VOLQUETA	KENWORK		MOCOA	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
VOLQUETA	INTERNATIONAL		MOCOA	I	I	I	I	I	A	A	A	I	I	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	I	A
VOLQUETA	INTERNATIONAL		MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I
VOLQUETA	INTERNATIONAL		MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA	INTERNATIONAL		MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA	INTERNATIONAL		MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PERFORADORA T46	BERETTA		MOCOA	A	I	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A
PERFORADORA T46	BERETTA		MOCOA	A	I	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A
PERFORADORA T19	BERETTA		MOCOA	A	I	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	I
PERFORADORA T19	BERETTA		MOCOA	A	I	I	A	I	A	A	A	I	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
PERFORADORA T19	BERETTA		MOCOA	A	I	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	I
PERFORADORA T19	BERETTA		MOCOA	A	I	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	I
AUTOBOMBA	SANY	40 M	MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
BOMBA DE INYECCIÓN	STA 2022		MOCOA	A	I	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
BOMBA DE INYECCIÓN	STA 2022		MOCOA	A	I	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
BOMBA DE INYECCIÓN	STA 2022		MOCOA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
COMPRESOR	KAESER		MOCOA	A	I	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
COMPRESOR	KAESER		MOCOA	A	I	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	A	A	A	A
COMPRESOR	KAESER		MOCOA	A	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A
CARROTANQUE DE AGUA	HINO		MOCOA	I	I	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
CAMIÓN LUBRICADOR	CHEVROLET NPR		MOCOA	I	I	I	A	I	A	A	I	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I
CARRO COMBUSTIBLE	HINO 2016		MOCOA	I	I	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	A	I	I	A	I	I	I	A	A	I	I

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/04/2026 (Día / Mes / Año)

| | | |

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS - SMCN

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 964 - 2021

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA

MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2026

PROYECTO: VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 -2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	57121	C-2401-0600-123	54	Nacion	Principal 964 de 2021	$ 27.049.209.066,00	
2022	98222	C-2401-0600-123	11	Nacion	Principal 964 de 2021	$ 18.020.744.751,00	
2023	105923	C-2401-0600-123	11	Nacion	Principal 964 de 2021	$ 27.072.000.000,00	
2024	194824	C-2401-0600-123-51102D-2401023-02	16	Nacion	Principal 964 de 2021	$ 63.144.000.000,00	$ -
2025	108025	C-2401-0600-123-51102D-2401008-02	11	Nacion	Principal 964 de 2021	$ 13.285.650.297,00	$ -
2025	108025	C-2401-0600-123-51102D-2401015-02	11	Nacion	Principal 964 de 2021	$ 13.483.176.759,00	$ -
2025	108025	C-2401-0600-123-51102D-2401017-02	16	Nacion	Principal 964 de 2021	$ 36.188.612.944,00	$ 14.000.000.000,00
2025	108025	C-2401-0600-123-51102D-2401023-02	16	Nacion	Principal 964 de 2021	$ 210.560.000,00	$ -
2026	306926	C-2401-0600-123-51102D-2401008-02	11	Nacion	Principal 964 de 2021	$ 15.183.600.340,00	$ 14.429.219.269,00
2026	306926	C-2401-0600-123-51102D-2401023-02	11	Nacion	Principal 964 de 2021	$ 240.640.000,00	$ 240.640.000,00
2026	306926	C-2401-0600-123-51102D-2401015-02	11	Nacion	Principal 964 de 2021	$ 26.409.344.866,00	$ 26.409.344.866,00
2026	306926	C-2401-0600-123-51102D-2401017-02	11	Nacion	Principal 964 de 2021	$ 21.358.414.794,00	$ 21.358.414.794,00
				TOTAL		**$ 261.645.953.817,00**	**$ 76.437.618.928,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 541.389.953.817,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1		JULIO 2021		-	-	$ -	$ -	$ -	416021	$ 27.049.209.066	$ 541.389.953.817	N/A			
2	EYD	AGOSTO 2021	$ 139.260.000,00	$ 26.459.400,00	$ 165.719.400,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 26.883.489.666	$ 541.224.234.417	105030-08/11/2021			
3	EYD	SEPTIEMBRE 2021	$ 69.630.000,00	$ 13.229.700,00	$ 82.859.700,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 26.800.629.966	$ 541.141.374.717	107910-16/11/2021			
4	EYD	OCTUBRE 2021	$ 69.630.000,00	$ 13.229.700,00	$ 82.859.700,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 26.717.770.266	$ 541.058.515.017	107916-16/11/2021			
5	EYD	NOVIEMBRE 2021	$ 69.630.000,00	$ 13.229.700,00	$ 82.859.700,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 26.634.910.566	$ 540.975.655.317	123300-21/12/2021			
6	EYD	DICIEMBRE 2021	$ 139.260.000,00	$ 26.459.400,00	$ 165.719.400,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 26.469.191.166	$ 540.809.935.917	123307-20/12/2021			
6	OBRA	DICIEMBRE 2021	$ 55.859.945,00	$ 408.207,00	$ 56.268.152,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 26.412.923.014	$ 540.753.667.765	123291-20/12/2021			
6	AJUSTE PROV	DICIEMBRE 2021	$ 462.683,00	$ 3.381,00	$ 466.064,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 26.412.456.950	$ 540.753.201.701	39820-21/04/2022			
7	OBRA	ENERO 2022	$ 75.092.930,00	$ 548.756,00	$ 75.641.686,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 44.357.560.015	$ 540.677.560.015	16414-22/02/2022			
8	OBRA	FEBRERO 2022	$ 73.339.891,00	$ 535.945,00	$ 73.875.836,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 44.283.684.179	$ 540.603.684.179	39867-21/04/2022			
6	AJUSTE DEF	DICIEMBRE 2021	$ 365.400,00	$ 2.670,00	$ 368.070,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 44.283.316.109	$ 540.603.316.109	39820-21/04/2022			
7	AJUSTE DEF	ENERO 2022	$ 1.348.382,00	$ 9.854,00	$ 1.358.236,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 44.281.957.873	$ 540.601.957.873	39817-21/04/2022			
8	AJUSTE DEF	FEBRERO 2022	$ 1.395.866,00	$ 10.201,00	$ 1.406.067,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 44.280.551.806	$ 540.600.551.806	39812-21/04/2022			
9	OBRA	MARZO 2022	$ 225.834.892,00	$ 1.650.332,00	$ 227.485.224,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 44.053.066.582	$ 540.373.066.582	39862-21/04/2022			
9	AJUSTE DEF	MARZO 2022	$ 3.042.588,00	$ 22.234,00	$ 3.064.822,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 44.050.001.760	$ 540.370.001.760	39808-21/04/2022			
10	OBRA	ABRIL 2022	$ 285.079.790,00	$ 2.083.275,00	$ 287.163.065,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 43.762.838.695	$ 540.082.838.695	52444-20/05/2022			
10	AJUSTE DEF	ABRIL 2022	$ 4.402.488,00	$ 32.172,00	$ 4.434.660,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 43.758.404.035	$ 540.078.404.035	52334-20/05/2022			
11	OBRA	MAYO 2022	$ 308.192.392,00	$ 2.252.175,00	$ 310.444.567,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 43.447.959.468	$ 539.767.959.468	80790-01/08/2022			
11	COVID	MAYO 2022	$ 4.624.997,00	$ 21.433,00	$ 4.646.430,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 43.443.313.038	$ 539.763.313.038				
11	AJUSTE DEF	MAYO 2022	$ 5.475.323,00	$ 40.012,00	$ 5.515.335,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 43.437.797.703	$ 539.757.797.703	88274-19/08/2022			
12	OBRA	JUNIO 2022	$ 684.521.446,00	$ 5.002.272,00	$ 689.523.718,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 42.748.273.985	$ 539.068.273.985	80702-01/08/2022			
12	AJUSTE DEF	JUNIO 2022	$ 18.263.826,00	$ 133.466,00	$ 18.397.292,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 42.729.876.693	$ 539.049.876.693	88267-19/08/2022			
13	OBRA	JULIO 2022	$ 703.410.625,00	$ 5.140.308,00	$ 708.550.933,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 42.021.325.760	$ 538.341.325.760	89779-23/08/2022			
13	COVID	JULIO 2022	$ 44.661.920,00	$ 206.970,00	$ 44.868.890,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 41.976.456.870	$ 538.296.456.870				
13	AJUSTE DEF	JULIO 2022	$ 24.344.468,00	$ 177.902,00	$ 24.522.370,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 41.951.934.500	$ 538.271.934.500	90129-24/08/2022			
14	OBRA	AGOSTO 2022	$ 1.718.250.335,00	$ 12.556.445,00	$ 1.730.806.780,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 40.221.127.720	$ 536.541.127.720				
15	OBRA	SEPTIEMBRE 2022	$ 4.052.110.391,00	$ 29.611.576,00	$ 4.081.721.967,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 36.139.405.753	$ 532.459.405.753				
16	OBRA	OCTUBRE 2022	$ 5.615.470.858,00	$ 41.036.133,00	$ 5.656.506.991,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 30.482.898.762	$ 526.802.898.762				
14	AJUSTE DEF	AGOSTO 2022	$ 78.496.491,00	$ 573.628,00	$ 79.070.119,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 30.403.828.643	$ 526.723.828.643				
15	AJUSTE DEF	SEPTIEMBRE 2022	$ 265.831.878,00	$ 1.942.618,00	$ 267.774.496,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 30.136.054.147	$ 526.456.054.147				
16	AJUSTE DEF	OCTUBRE 2023	$ 474.489.337,00	$ 3.467.422,00	$ 477.956.759,00	$ -	$ -	$ -	416021	$ 29.658.097.388	$ 525.978.097.388				
17	OBRA	NOVIEMBRE 2022	$ 3.965.485.350,00	$ 28.978.547,00	$ 3.994.463.897,00	$ -	$ -	$ 8.030.482.547,00	416021	$ 17.633.150.944	$ 521.983.633.491				
	AJUSTE DEF	NOVIEMBRE 2022	$ 371.195.806,00	$ 2.712.585,00	$ 373.908.391,00	$ -	$ -	$ -	98222	$ 17.259.242.553	$ 521.609.725.100				
18	OBRA	DICIEMBRE 2022	$ 2.022.462.312,00	$ 14.779.532,00	$ 2.037.241.844,00	$ -	$ -	$ -	98222	$ 15.222.000.709	$ 519.572.483.256				
18	AJUSTE DEF	DICIEMBRE 2022	$ 219.429.208,00	$ 1.603.521,00	$ 221.032.729,00	$ -	$ -	$ -	98222	$ 15.000.967.980	$ 519.351.450.527				
19	OBRA	ENERO 2023	$ 2.741.733.650,00	$ 20.035.746,00	$ 2.761.769.396,00	$ 47.486.827,00	$ 2.714.282.569,00	$ 7.982.995.720,00	98222	$ 39.358.685.411	$ 516.589.681.131				
19	AJUSTE DEF	ENERO 2023	$ 305.821.563,00	$ 2.234.850,00	$ 308.056.413,00	$ -	$ -	$ 7.982.995.720,00	98222	$ 39.050.628.998	$ 516.281.624.718				
20	OBRA	FEBRERO 2023	$ 3.060.514.380,00	$ 22.365.297,00	$ 3.082.879.677,00	$ 53.008.109,00	$ 3.029.871.568,00	$ 7.929.987.611,00	98222	$ 36.020.757.430	$ 513.198.745.041				
21	OBRA	MARZO 2023.	$ 1.795.007.105,00	$ 13.117.360,00	$ 1.808.124.465,00	$ 31.091.250,00	$ 1.777.033.215,00	$ 7.898.896.361,00	98222	$ 34.243.724.215	$ 511.390.620.576				
22	OBRA	ABRIL 2023.	$ 2.140.453.154,00	$ 15.641.773,00	$ 2.156.094.927,00	$ 37.074.703,00	$ 2.119.020.224,00	$ 7.861.821.658,00	98222	$ 32.124.703.991	$ 509.234.525.649				
23	OBRA	MAYO 2023.	$ 2.001.851.600,00	$ 14.628.916,00	$ 2.016.480.516,00	$ 34.672.070,00	$ 1.981.808.446,00	$ 7.827.149.588,00	98222	$ 30.142.895.545	$ 507.218.045.133				
24	OBRA	JUNIO 2023.	$ 959.719.607,00	$ 7.013.336,00	$ 966.732.943,00	$ 16.660.732,00	$ 950.072.211,00	$ 7.810.488.856,00	98222	$ 29.192.823.334	$ 506.251.312.190				
24	AMBIENTAL	JUNIO 2023.	$ 137.141.805,00	$ 85.805,00	$ 137.227.610,00	$ -	$ 137.227.610,00	$ 7.810.488.856,00	98222	$ 29.055.595.724	$ 506.114.084.580				
25	OBRA	JULIO 2023.	$ 10.833.834.337,00	$ 79.170.328,00	$ 10.913.004.665,00	$ 187.642.011,00	$ 10.725.362.654,00	$ 7.622.846.845,00	98222	$ 18.330.233.070	$ 495.201.079.915				
26	OBRA	AGOSTO 2023.	$ 1.555.433.375,00	$ 11.366.629,00	$ 1.566.800.004,00	$ 37.330.401,00	$ 1.529.469.603,00	$ 7.585.516.444,00	105923	$ 16.800.763.467	$ 493.634.279.911				
26	EYD	AGOSTO 2023.	$ 462.184.874,00	$ 87.815.126,00	$ 550.000.000,00	$ -	$ 550.000.000,00	$ 7.585.516.444,00	105923	$ 16.250.763.467	$ 493.084.279.911				
27	OBRA	SEPTIEMBRE 2023.	$ 2.653.144.449,00	$ 19.388.363,00	$ 2.672.532.812,00	$ 63.675.467,00	$ 2.608.857.345,00	$ 7.521.840.977,00	105923	$ 13.641.906.122	$ 490.411.747.099				
27	SOCIAL	SEPTIEMBRE 2023.	$ 167.548.195,00	$ 776.443,00	$ 168.324.638,00	$ -	$ 168.324.638,00	$ 7.521.840.977,00	105923	$ 13.473.581.484	$ 490.243.422.461				
20	AJUSTES DEF	FEBRERO 2023	$ 357.822.597,00	$ 2.614.857,00	$ 360.437.454,00	$ -	$ 360.437.454,00	$ 7.521.840.977,00	105923	$ 13.113.144.030	$ 489.882.985.007				
21	AJUSTES DEF	MARZO 2023.	$ 221.603.238,00	$ 1.619.408,00	$ 223.222.646,00	$ -	$ 223.222.646,00	$ 7.521.840.977,00	105923	$ 12.889.921.384	$ 489.659.762.361				
22	AJUSTES DEF	ABRIL 2023.	$ 241.746.853,00	$ 1.766.612,00	$ 243.513.465,00	$ -	$ 243.513.465,00	$ 7.521.840.977,00	105923	$ 12.646.407.919	$ 489.416.248.896				

23	AJUSTES DEF	MAYO 2023.	$ 205.704.595,00	$ 1.503.226,00	$ 207.207.821,00	$ -	$ 207.207.821,00	$ 7.521.840.977,00	105923	$ 12.439.200.098	$ 489.209.041.075				
24	AJUSTES DEF	JUNIO 2023.	$ 103.348.079,00	$ 755.236,00	$ 104.103.315,00	$ -	$ 104.103.315,00	$ 7.521.840.977,00	105923	$ 12.335.096.783	$ 489.104.937.760				
25	AJUSTES DEF	JULIO 2023.	$ 1.626.525.089,00	$ 11.886.145,00	$ 1.638.411.234,00	$ -	$ 1.638.411.234,00	$ 7.521.840.977,00	105923	$ 10.696.685.549	$ 487.466.526.526				
28	OBRA	OCTUBRE 2023	$ 2.465.104.732,00	$ 18.014.227,00	$ 2.483.118.959,00	$ 59.162.514,00	$ 2.423.956.445,00	$ 7.462.678.463,00	105923	$ 8.272.729.104	$ 484.983.407.567				
28	SOCIAL	OCTUBRE 2023	$ 212.789.054,00	$ 986.095,00	$ 213.775.149,00	$ -	$ 213.775.149,00	$ 7.462.678.463,00	105923	$ 8.058.953.955	$ 484.769.632.418				
28	EYD	OCTUBRE 2023	$ 83.812.645,00	$ 15.924.403,00	$ 99.737.048,00	$ -	$ 99.737.048,00	$ 7.462.678.463,00	105923	$ 7.959.216.907	$ 484.669.895.370				
26	AJUSTES DEF	AGOSTO 2023	$ 293.691.475,00	$ 2.146.207,00	$ 295.837.682,00	$ -	$ 295.837.682,00	$ 7.462.678.463,00	105923	$ 7.663.379.225	$ 484.374.057.688				
27	AJUSTES PROV	SEPTIEMBRE 2023	$ 511.288.189,00	$ 3.736.337,00	$ 515.024.526,00		$ 515.024.526,00	$ 7.462.678.463,00	105923	$ 7.148.354.699	$ 483.859.033.162				
27	AJUSTES DEF	SEPTIEMBRE 2023	$ 85.719,00	$ 626,00	$ 86.345,00		$ 86.345,00	$ 7.462.678.463,00	105923	$ 7.148.268.354	$ 483.858.946.817				
29	OBRA	NOVIEMBRE 2023	$ 2.623.299.514,00	$ 19.170.266,00	$ 2.642.469.780,00	$ 62.959.188,00	$ 2.579.510.592,00	$ 7.399.719.275,00	105923	$ 4.568.757.762	$ 481.216.477.037				
29	EYD	NOVIEMBRE 2023	$ 57.734.250,00	$ 10.969.508,00	$ 68.703.758,00		$ 68.703.758,00	$ 7.399.719.275,00	105923	$ 4.500.054.004	$ 481.147.773.279				
29	SOCIAL	NOVIEMBRE 2023	$ 32.257.712,00	$ 149.487,00	$ 32.407.199,00		$ 32.407.199,00	$ 7.399.719.275,00	105923	$ 4.467.646.805	$ 481.115.366.080				
30	OBRA	DICIEMBRE 2023	$ 2.905.511.612,00	$ 21.232.585,00	$ 2.926.744.197,00	$ 69.732.279,00	$ 2.857.011.918,00	$ 7.329.986.996,00	105923	$ 1.610.634.887	$ 478.188.621.883				
28	AJUSTES DEF	OCTUBRE 2023	$ 468.040.332,00	$ 3.420.295,00	$ 471.460.627,00		$ 471.460.627,00	$ 7.329.986.996,00	105923	$ 1.139.174.260	$ 477.717.161.256				
29	AJUSTES PROV	NOVIEMBRE 2023	$ 483.142.394,00	$ 3.530.656,00	$ 486.673.050,00		$ 486.673.050,00	$ 7.329.986.996,00	105923	$ 652.501.210	$ 477.230.488.206				
30	AJUSTES PROV	DICIEMBRE 2023	$ 550.024.083,00	$ 4.019.407,00	$ 554.043.490,00		$ 554.043.490,00	$ 7.329.986.996,00	105923	$ 98.457.720	$ 476.676.444.716				
31	OBRA	ENERO 2024	$ 3.196.887.790,00	$ 23.361.872,00	$ 3.220.249.662,00	$ 76.725.307,00	$ 3.143.524.355,00	$ 7.253.261.689,00	105923	$ 51.098.933.365	$ 473.456.195.054				
31	SOCIAL	ENERO 2024	$ 102.523.146,00	$ 475.107,00	$ 102.998.253,00		$ 102.998.253,00	$ 7.253.261.689,00	105923	$ 50.995.935.112	$ 473.353.196.801				
32	OBRA	FEBRERO 2024	$ 3.048.150.378,00	$ 22.274.945,00	$ 3.070.425.323,00	$ 76.203.759,00	$ 2.994.221.564,00	$ 7.177.057.930,00	194824	$ 48.001.713.548	$ 470.282.771.478				
32	SOCIAL	FEBRERO 2024	$ 21.738.920,00	$ 100.741,00	$ 21.839.661,00		$ 21.839.661,00	$ 7.177.057.930,00	194824	$ 47.979.873.887	$ 470.260.931.817				
33	OBRA	MARZO 2024	$ 2.331.734.130,00	$ 17.039.596,00	$ 2.348.773.726,00	$ 58.293.353,00	$ 2.290.480.373,00	$ 7.118.764.577,00	194824	$ 45.689.393.514	$ 467.912.158.091				
33	SOCIAL	MARZO 2024	$ 89.190.951,00	$ 413.324,00	$ 89.604.275,00		$ 89.604.275,00	$ 7.118.764.577,00	194824	$ 45.599.789.239	$ 467.822.553.816				
30	AJUSTES DEF	DICIEMBRE 2023	$ 932.075,00	$ 6.811,00	$ 938.886,00		$ 938.886,00	$ 7.118.764.577,00	194824	$ 45.598.850.353	$ 467.821.614.930				
31	AJUSTES DEF	ENERO 2024	$ 602.576.233,00	$ 4.403.442,00	$ 606.979.675,00		$ 606.979.675,00	$ 7.118.764.577,00	194824	$ 44.991.870.678	$ 467.214.635.255				
32	AJUSTES PROV	FEBRERO 2024	$ 604.230.610,00	$ 4.415.531,00	$ 608.646.141,00		$ 608.646.141,00	$ 7.118.764.577,00	194824	$ 44.383.224.537	$ 466.605.989.114				
32	AJUSTES DEF	FEBRERO 2024	$ 2.489.384,00	$ 18.192,00	$ 2.507.576,00		$ 2.507.576,00	$ 7.118.764.577,00	194824	$ 44.380.716.961	$ 466.603.481.538				
33	AJUSTES PROV	MARZO 2024	$ 532.064.850,00	$ 3.888.166,00	$ 535.953.016,00		$ 535.953.016,00	$ 7.118.764.577,00	194824	$ 43.844.763.945	$ 466.067.528.522				
34	OBRA	ABRIL 2024	$ 3.402.329.906,00	$ 24.863.180,00	$ 3.427.193.086,00	$ 85.058.248,00	$ 3.342.134.838,00	$ 7.033.706.329,00	194824	$ 40.502.629.107	$ 462.640.335.436				
34	EYD	ABRIL 2024	$ 253.204.150,00	$ 48.108.789,00	$ 301.312.939,00		$ 301.312.939,00	$ 7.033.706.329,00	194824	$ 40.201.316.168	$ 462.339.022.497				
34	SOCIAL	ABRIL 2024	$ 22.615.252,00	$ 104.802,00	$ 22.720.054,00		$ 22.720.054,00	$ 7.033.706.329,00	194824	$ 40.178.596.114	$ 462.316.302.443				
33	AJUSTE DEF	MARZO 2024	$ 217.405,00	$ 1.589,00	$ 218.994,00		$ 218.994,00	$ 7.033.706.329,00	194824	$ 40.178.377.120	$ 462.316.083.449				
34	AJUSTES PROV	ABRIL 2024	$ 789.047.932,00	$ 5.766.120,00	$ 794.814.052,00		$ 794.814.052,00	$ 7.033.706.329,00	194824	$ 39.383.563.068	$ 461.521.269.397				
35	OBRA	MAYO 2024	$ 6.520.666.125,00	$ 47.651.022,00	$ 6.568.317.147,00	$ 163.016.653,00	$ 6.405.300.494,00	$ 6.870.689.676,00	194824	$ 32.978.262.574	$ 454.952.952.250				
35	SOCIAL	MAYO 2024	$ 21.615.229,00	$ 100.168,00	$ 21.715.397,00		$ 21.715.397,00	$ 6.870.689.676,00	194824	$ 32.956.547.177	$ 454.931.236.853				
35	AJUSTES PROV	MAYO 2024	$ 1.471.693.766,00	$ 10.754.685,00	$ 1.482.448.451,00		$ 1.482.448.451,00	$ 6.870.689.676,00	194824	$ 31.474.098.726	$ 453.448.788.402				
36	OBRA	JUNIO 2024	$ 5.542.838.046,00	$ 40.505.355,00	$ 5.583.343.401,00	$ 138.570.951,00	$ 5.444.772.450,00	$ 6.732.118.725,00	194824	$ 26.029.326.276	$ 447.865.445.001				
36	AJUSTES PROV	JUNIO 2024	$ 1.244.283.613,00	$ 9.092.842,00	$ 1.253.376.455,00		$ 1.253.376.455,00	$ 6.732.118.725,00	194824	$ 24.775.949.821	$ 446.612.068.546				
37	OBRA	JULIO 2024	$ 4.607.308.161,00	$ 33.668.790,00	$ 4.640.976.951,00	$ 115.182.704,00	$ 4.525.794.247,00	$ 6.616.936.021,00	194824	$ 20.250.155.574	$ 441.971.091.595				
37	SOCIAL	JULIO 2024	$ 44.191.912,00	$ 204.792,00	$ 44.396.704,00		$ 44.396.704,00	$ 6.616.936.021,00	194824	$ 20.205.758.870	$ 441.926.694.891				
38	OBRA	AGOSTO 2024	$ 4.774.121.564,00	$ 34.887.811,00	$ 4.809.009.375,00	$ 119.353.039,00	$ 4.689.656.336,00	$ 6.497.582.982,00	194824	$ 15.516.102.534	$ 437.117.685.516				
38	SOCIAL	AGOSTO 2024	$ 23.143.108,00	$ 107.249,00	$ 23.250.357,00		$ 23.250.357,00	$ 6.497.582.982,00	194824	$ 15.492.852.177	$ 437.094.435.159				
38	EYD	AGOSTO 2024	$ 102.033.464,00	$ 19.386.358,00	$ 121.419.822,00		$ 121.419.822,00	$ 6.497.582.982,00	194824	$ 15.371.432.355	$ 436.973.015.337				
37	AJUSTES PROV	JULIO 2024	$ 1.009.245.934,00	$ 7.375.259,00	$ 1.016.621.193,00		$ 1.016.621.193,00	$ 6.497.582.982,00	194824	$ 14.354.811.162	$ 435.956.394.144				
39	OBRA	SEPTIEMBRE 2024	$ 7.693.070.181,00	$ 56.218.590,00	$ 7.749.288.771,00	$ 192.326.755,00	$ 7.556.962.016,00	$ 6.305.256.227,00	194824	$ 6.797.849.146	$ 428.207.105.373				
39	SOCIAL	SEPTIEMBRE 2024	$ 21.612.619,00	$ 100.156,00	$ 21.712.775,00		$ 21.712.775,00	$ 6.305.256.227,00	194824	$ 6.776.136.371	$ 428.185.392.598				
38	AJUSTES DEF	AGOSTO 2024	$ 1.047.458.004,00	$ 7.654.501,00	$ 1.055.112.505,00		$ 1.055.112.505,00	$ 6.305.256.227,00	194824	$ 5.721.023.866	$ 427.130.280.093				
40	OBRA	OCTUBRE 2024	$ 3.074.634.977,00	$ 22.468.486,00	$ 3.097.103.463,00	$ 76.865.874,00	$ 3.020.237.589,00	$ 6.228.390.353,00	194824	$ 2.700.786.277	$ 424.033.176.630				
41	OBRA	NOVIEMBRE 2024	$ 76.788.734,00	$ 561.148,00	$ 77.349.882,00	$ 1.919.718,00	$ 75.430.164,00	$ 6.226.470.635,00	194824	$ 2.625.356.113	$ 423.955.826.748				
39	AJUSTES DEF	SEPTIEMBRE 2024	$ 1.721.881.255,00	$ 12.582.978,00	$ 1.734.464.233,00		$ 1.734.464.233,00	$ 6.226.470.635,00	194824	$ 890.891.880	$ 422.221.362.515				
42	OBRA	DICIEMBRE 2024	$ 145.839.144,00	$ 1.065.748,00	$ 146.904.892,00	$ 3.645.979,00	$ 143.258.913,00	$ 6.222.824.656,00	194824	$ 9.747.632.967	$ 422.074.457.623				
40	AJUSTES DEF	OCTUBRE 2024	$ 684.369.106,00	$ 5.001.159,00	$ 689.370.265,00		$ 689.370.265,00	$ 6.222.824.656,00	194824	$ 9.058.262.702	$ 421.385.087.358				
41	AJUSTES PROV	NOVIEMBRE 2024	$ 17.756.094,00	$ 129.756,00	$ 17.885.850,00		$ 17.885.850,00	$ 6.222.824.656,00	194824	$ 9.040.376.852	$ 421.367.201.508				
42	AJUSTES PROV	DICIEMBRE 2024	$ 33.722.833,00	$ 246.436,00	$ 33.969.269,00		$ 33.969.269,00	$ 6.222.824.656,00	194824	$ 9.006.407.583	$ 421.333.232.239				
43	OBRA	ENERO 2025	$ 3.356.318.232,00	$ 24.526.941,00	$ 3.380.845.173,00	$ 83.907.956,00	$ 3.296.937.217,00	$ 6.138.916.700,00	108025	$ 68.877.470.366	$ 417.952.387.066				
43	EYD	ENERO 2025	$ 98.548.618,00	$ 18.724.237,00	$ 117.272.855,00		$ 117.272.855,00	$ 6.138.916.700,00	108025	$ 68.760.197.511	$ 417.835.114.211				
43	SOCIAL	ENERO 2025	$ 68.433.671,00	$ 317.132,00	$ 68.750.803,00		$ 68.750.803,00	$ 6.138.916.700,00	108025	$ 68.691.446.708	$ 417.766.363.408				
43	AMBIENTAL	ENERO 2025	$ 353.737.713,00	$ 15.170.477,00	$ 368.908.190,00		$ 368.908.190,00	$ 6.138.916.700,00	108025	$ 68.322.538.518	$ 417.397.455.218				
43	PREDIAL	ENERO 2025	$ 118.923.000,00	$ 22.595.370,00	$ 141.518.370,00		$ 141.518.370,00	$ 6.138.916.700,00	108025	$ 68.181.020.148	$ 417.255.936.848				
41	AJUSTES DEF	NOVIEMBRE 2024			$ -		$ -	$ 6.138.916.700,00	194824	$ 68.181.020.148	$ 417.255.936.848				
42	AJUSTES DEF	DICIEMBRE 2024	$ 37.981,00	$ 278,00	$ 38.259,00		$ 38.259,00	$ 6.138.916.700,00	194824	$ 68.180.981.889	$ 417.255.898.589				
44	OBRA	FEBRERO 2025	$ 250.461.260,00	$ 1.830.294,00	$ 252.291.554,00	$ 6.261.532,00	$ 246.030.022,00	$ 6.132.655.168,00	194824	$ 67.934.951.867	$ 417.003.607.035				
44	EYD	FEBRERO 2025	$ 172.650.588,00	$ 32.803.612,00	$ 205.454.200,00		$ 205.454.200,00	$ 6.132.655.168,00	194824	$ 67.729.497.667	$ 416.798.152.835				
43	AJUSTES DEF	ENERO 2025	$ 858.334.871,00	$ 6.272.447,00	$ 864.607.318,00		$ 864.607.318,00	$ 6.132.655.168,00	194824	$ 66.864.890.349	$ 415.933.545.517				
44	AJUSTES DEF	FEBRERO 2025	$ 69.269.197,00	$ 506.198,00	$ 69.775.395,00		$ 69.775.395,00	$ 6.132.655.168,00	194824	$ 66.795.114.954	$ 415.863.770.122				
45	OBRA	MARZO 2025	$ 698.848.636,00	$ 5.106.971,00	$ 703.955.607,00	$ 17.471.216,00	$ 686.484.391,00	$ 6.115.183.952,00	194824	$ 66.108.630.563	$ 415.159.814.515				
46	OBRA	ABRIL 2025	$ 1.130.835.705,00	$ 8.263.799,00	$ 1.139.099.504,00	$ 28.270.893,00	$ 1.110.828.611,00	$ 6.086.913.059,00	194824	$ 64.997.801.952	$ 414.020.715.011				
45	AJUSTES DEF	MARZO 2025	$ 180.461.789,00	$ 1.318.759,00	$ 181.780.548,00		$ 181.780.548,00	$ 6.086.913.059,00	194824	$ 64.816.021.404	$ 413.838.934.463				

47	OBRA	MAYO 2025	$ 1.986.225.421,00	$ 14.514.724,00	$ 2.000.740.145,00	$ 49.655.636,00	$ 1.951.084.509,00	$ 6.037.257.423,00	194824	$ 62.864.936.895	$ 411.838.194.318				
47	EYD	MAYO 2025	$ 193.164.314,00	$ 36.701.221,00	$ 229.865.535,00		$ 229.865.535,00	$ 6.037.257.423,00	194824	$ 62.635.071.360	$ 411.608.328.783				
46	AJUSTES DEF	ABRIL 2025	$ 275.854.708,00	$ 2.015.861,00	$ 277.870.569,00		$ 277.870.569,00	$ 6.037.257.423,00	194824	$ 62.357.200.791	$ 411.330.458.214				
48	OBRA	JUNIO 2025	$ 2.993.368.864,00	$ 21.874.619,00	$ 3.015.243.483,00	$ 74.834.222,00	$ 2.940.409.261,00	$ 5.962.423.201,00	194824	$ 59.416.791.530	$ 408.315.214.731				
48	SOCIAL	JUNIO 2025	$ 4.877.278,00	$ 22.602,00	$ 4.899.880,00		$ 4.899.880,00	$ 5.962.423.201,00	194824	$ 59.411.891.650	$ 408.310.314.851				
47	AJUSTES DEF	MAYO 2025	$ 235.557.703,00	$ 1.721.383,00	$ 237.279.086,00		$ 237.279.086,00	$ 5.962.423.201,00	194824	$ 59.174.612.564	$ 408.073.035.765				
47	AJUSTES DEF	MAYO 2025	$ 293.934.745,00	$ 2.147.985,00	$ 296.082.730,00		$ 296.082.730,00	$ 5.962.423.201,00	108025	$ 58.878.529.834	$ 407.776.953.035				
49	OBRA	JULIO 2025	$ 3.210.908.462,00	$ 23.464.331,00	$ 3.234.372.793,00	$ 80.272.712,00	$ 3.154.100.081,00	$ 5.882.150.489,00	108025	$ 55.724.429.753	$ 404.542.580.242				
49	SOCIAL	JULIO 2025	$ 136.195.316,00	$ 631.149,00	$ 136.826.465,00		$ 136.826.465,00	$ 5.882.150.489,00	108025	$ 55.587.603.288	$ 404.405.753.777				
48	AJUSTES DEF	JUNIO 2025	$ 781.577.076,00	$ 5.711.525,00	$ 787.288.601,00		$ 787.288.601,00	$ 5.882.150.489,00	108025	$ 54.800.314.687	$ 403.618.465.176				
49	AJUSTES PROV	JULIO 2025	$ 836.741.844,00	$ 6.114.652,00	$ 842.856.496,00		$ 842.856.496,00	$ 5.882.150.489,00	108025	$ 53.957.458.191	$ 402.775.608.680				
49	AJUSTES DEF	JULIO 2025	$ 11.555.990,00	$ 84.448,00	$ 11.640.438,00		$ 11.640.438,00	$ 5.882.150.489,00	108025	$ 53.945.817.753	$ 402.763.968.242				
50	OBRA	AGOSTO 2025	$ 4.324.462.226,00	$ 31.601.839,00	$ 4.356.064.065,00	$ 108.111.556,00	$ 4.247.952.509,00	$ 5.774.038.933,00	108025	$ 49.697.865.244	$ 398.407.904.177				
50	SOCIAL	AGOSTO 2025	$ 44.617.774,00	$ 206.765,00	$ 44.824.539,00		$ 44.824.539,00	$ 5.774.038.933,00	108025	$ 49.653.040.705	$ 398.363.079.638				
50	PREDIAL	AGOSTO 2025	$ 142.773.928,00	$ 2.995.484,00	$ 145.769.412,00		$ 145.769.412,00	$ 5.774.038.933,00	108025	$ 49.507.271.293	$ 398.217.310.226				
50	AMBIENTAL	AGOSTO 2025	$ 226.790.551,00	$ 10.138.865,00	$ 236.929.416,00		$ 236.929.416,00	$ 5.774.038.933,00	108025	$ 49.270.341.877	$ 397.980.380.810				
50	AJUSTES DEF	AGOSTO 2025	$ 1.143.440.535,00	$ 8.355.912,00	$ 1.151.796.447,00		$ 1.151.796.447,00	$ 5.774.038.933,00	108025	$ 48.118.545.430	$ 396.828.584.363				
51	OBRA	SEPTIEMBRE 2025	$ 4.335.435.733,00	$ 31.682.030,00	$ 4.367.117.763,00	$ 108.385.893,00	$ 4.258.731.870,00	$ 5.665.653.040,00	108025	$ 43.859.813.560	$ 392.461.466.600				
51	EYD	SEPTIEMBRE 2025	$ 184.419.919,00	$ 35.039.785,00	$ 219.459.704,00		$ 219.459.704,00	$ 5.665.653.040,00	108025	$ 43.640.353.856	$ 392.242.006.896				
51	AJUSTED PROV	SEPTIEMBRE 2025	$ 1.144.870.372,00	$ 8.366.360,00	$ 1.153.236.732,00		$ 1.153.236.732,00	$ 5.665.653.040,00	108025	$ 42.487.117.124	$ 391.088.770.164				
52	OBRA	OCTUBRE 2025	$ 3.515.131.073,00	$ 25.687.496,00	$ 3.540.818.569,00	$ 87.878.277,00	$ 3.452.940.292,00	$ 5.577.774.763,00	108025	$ 39.034.176.832	$ 387.547.951.595				
52	SOCIAL	OCTUBRE 2025	$ 124.194.190,00	$ 575.534,00	$ 124.769.724,00		$ 124.769.724,00	$ 5.577.774.763,00	108025	$ 38.909.407.108	$ 387.423.181.871				
52	AJUSTED PROV	OCTUBRE 2025	$ 904.543.003,00	$ 6.610.122,00	$ 911.153.125,00		$ 911.153.125,00	$ 5.577.774.763,00	108025	$ 37.998.253.983	$ 386.512.028.746				
53	OBRA	NOVIEMBRE 2025	$ 5.102.122.819,00	$ 37.284.744,00	$ 5.139.407.563,00	$ 127.553.070,00	$ 5.011.854.493,00	$ 5.450.221.693,00	108025	$ 32.986.399.490	$ 381.372.621.183				
53	AJUSTED PROV	NOVIEMBRE 2025	$ 1.391.941.663,00	$ 10.171.881,00	$ 1.402.113.544,00		$ 1.402.113.544,00	$ 5.450.221.693,00	108025	$ 31.584.285.946	$ 379.970.507.639				
54	OBRA	DICIEMBRE 2025	$ 4.993.851.522,00	$ 36.493.530,00	$ 5.030.345.052,00	$ 124.846.288,00	$ 4.905.498.764,00	$ 5.325.375.405,00	108025	$ 26.678.787.182	$ 374.940.162.587				
54	AJUSTED PROV	DICIEMBRE 2025	$ 1.436.608.593,00	$ 10.498.294,00	$ 1.447.106.887,00		$ 1.447.106.887,00	$ 5.325.375.405,00	108025	$ 25.231.680.295	$ 373.493.055.700				
55	OBRA	ENERO 2026	$ 3.112.874.192,00	$ 22.747.927,00	$ 3.135.622.119,00	$ 77.821.855,00	$ 3.057.800.264,00	$ 5.247.553.550,00	108025	$ 22.173.880.031	$ 370.357.433.581				
55	EYD	ENERO 2026	$ 84.558.617,00	$ 16.066.136,00	$ 100.624.753,00		$ 100.624.753,00	$ 5.247.553.550,00	108025	$ 22.073.255.278	$ 370.256.808.828				
55	SOCIAL	ENERO 2026	$ 152.922.179,00	$ 708.664,00	$ 153.630.843,00		$ 153.630.843,00	$ 5.247.553.550,00	108025	$ 21.919.624.435	$ 370.103.177.985				
55	AMBIENTAL	ENERO 2026	$ 78.090.683,00	$ 570.664,00	$ 78.661.347,00		$ 78.661.347,00	$ 5.247.553.550,00	108025	$ 21.840.963.088	$ 370.024.516.638				
53	AJUSTED DEF	NOVIEMBRE 2025	$ 3.212.334,00	$ 23.475,00	$ 3.235.809,00		$ 3.235.809,00	$ 5.247.553.550,00	108025	$ 21.837.727.279	$ 370.021.280.829				
54	AJUSTED DEF	DICIEMBRE 2025	$ 16.298.231,00	$ 119.102,00	$ 16.417.333,00		$ 16.417.333,00	$ 5.247.553.550,00	108025	$ 21.821.309.946	$ 370.004.863.496				
55	AJUSTED DEF	ENERO 2026	$ 849.110.280,00	$ 6.205.037,00	$ 855.315.317,00		$ 855.315.317,00	$ 5.247.553.550,00	108025	$ 20.965.994.629	$ 369.149.548.179				
56	OBRA	FEBRERO 2026	$ 3.360.168.268,00	$ 24.555.076,00	$ 3.384.723.344,00	$ 84.004.207,00	$ 3.300.719.137,00	$ 5.163.549.343,00	108025	$ 17.665.275.492	$ 365.764.824.835				
56	SOCIAL	FEBRERO 2026	$ 22.494.190,00	$ 104.241,00	$ 22.598.431,00		$ 22.598.431,00	$ 5.163.549.343,00	108025	$ 17.642.677.061	$ 365.742.226.404				
56	AJUSTED DEF	FEBRERO 2026	$ 932.863.164,00	$ 6.817.077,00	$ 939.680.241,00		$ 939.680.241,00	$ 5.163.549.343,00	108025	$ 16.702.996.820	$ 364.802.546.163				
	VIGENCIA 2026							$ 5.163.549.343,00	306926	$ 63.192.000.000	$ 364.802.546.163				
57	OBRA	MARZO 2026	$ 2.665.116.711,00	$ 19.475.853,00	$ 2.684.592.564,00	$ 66.627.918,00	$ 2.617.964.646,00	$ 5.096.921.425,00	108025	$ 77.277.032.174	$ 362.117.953.599				
57	SOCIAL	MARZO 2026	$ 23.781.734,00	$ 110.208,00	$ 23.891.942,00		$ 23.891.942,00	$ 5.096.921.425,00	108025	$ 77.253.140.232	$ 362.094.061.657				
57	EYD	MARZO 2026	$ 73.325.860,00	$ 13.931.913,00	$ 87.257.773,00		$ 87.257.773,00	$ 5.096.921.425,00	108025	$ 77.165.882.459	$ 362.006.803.884				
57	AJUSTED DEF	MARZO 2026	$ 722.980.214,00	$ 5.283.317,00	$ 728.263.531,00		$ 728.263.531,00	$ 5.096.921.425,00	306926	$ 76.437.618.928	$ 361.278.540.353				
58	OBRA	ABRIL. 2026	$ 2.632.102.462,00	$ 19.234.595,00	$ 2.651.337.057,00	$ 65.802.562,00	$ 2.585.534.495,00	$ 5.031.118.863,00	306926	$ 73.852.084.433	$ 358.627.203.296				
58	SOCIAL	ABRIL. 2026	$ 22.351.294,00	$ 103.579,00	$ 22.454.873,00		$ 22.454.873,00	$ 5.031.118.863,00	306926	$ 73.829.629.560	$ 358.604.748.423				
58	AMBIENTAL	ABRIL. 2026	$ 62.253.150,00	$ 454.928,00	$ 62.708.078,00		$ 62.708.078,00	$ 5.031.118.863,00	306926	$ 73.766.921.482	$ 358.542.040.345				
58	MOD. LICENCIA	ABRIL. 2026	$ 1.230.746.130,00	$ 233.841.765,00	$ 1.464.587.895,00		$ 1.464.587.895,00	$ 5.031.118.863,00	306926	$ 72.302.333.587	$ 357.077.452.450				
58	PREDIAL	ABRIL. 2026	$ 36.157.717,00	$ 944.706,00	$ 37.102.423,00		$ 37.102.423,00	$ 5.031.118.863,00	306926	$ 72.265.231.164	$ 357.040.350.027				
TOTALES			**182.339.913.348,00**	**2.009.690.442,00**	**184.349.603.790,00**	**2.999.363.684,00**		**$ 5.031.118.863,00**		**$ 72.265.231.164**	**$ 357.040.350.027**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 147.603.319.394,00	$ 1.078.639.641,00	$ 148.681.959.035,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
AJUSTES	$ 28.688.551.337,00	$ 209.647.108,0	$ 28.898.198.445,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 2.253.047.299,00	$ 428.078.988,00	$ 2.681.126.287,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 297.854.645,00	$ 26.535.560,00	$ 324.390.205,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 1.359.093.724,00	$ 6.298.238,00	$ 1.365.391.962,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 858.013.902,00	$ 26.420.739,00	$ 884.434.641,00
MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA (PREACTA)	$ 1.230.746.130,00	$ 233.841.765,00	$ 1.464.587.895,00
PROTOCOLO COVID (PREACTA)	$ 49.286.917,00	$ 228.403,00	$ 49.515.320,00
VALOR TOTAL	**$ 182.339.913.348,00**	**$ 2.009.690.442,00**	**$ 184.349.603.790,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: ANA MARÍA JAILLIER CORREA
REPRESENTANTE LEGAL
Matrícula No.: 05202-46129 ANT

Firma
Nombre: JOSÉ IGNACIO CADENA LÓPEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Matrícula No.: 25202-31528 CND

VoBo.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-6 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 25/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 964 de 2021 — **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2026 — **PROYECTO:** VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 de 2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR PUTUMAYO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

G	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					ELIMINAR F.I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CARLOS AUGUSTO GIL HENAO	16.077.882	COORDINADOR BIÓTICO	$ 2.850.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		BIOPLUS INGENIERIA	$ 2.970.000	$ 186.100	V	Nueva EPS	9502696470	$ 107.000	Protección	9502696470	$ 463.400	$ 107.000	N/A	N/A	Licencia no remunerada
2	MORENO ORTEGA JOHANN CAMILO	1.086.135.836	COORDINADOR SST	$ 2.000.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		BIOPLUS INGENIERIA	$ 2.150.000	$ 149.700	V	Sanitas	9502696470	$ 86.000	Colpensiones	9502696470	$ 344.000	$ 86.000	N/A	N/A	
3	CRISTIAN DUVAN TOQUICA JANAMEJOY	1.010.081.886	AUXILIAR DE CAMPO	$ 1.423.500		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		BIOPLUS INGENIERIA	$ 2.042.000	$ 142.200	V	Nueva EPS	9502696470	$ 81.700	Porvenir	9502696470	$ 326.800	$ 81.700	N/A	N/A	
4	JOSE LUIS VERGARA MORAN	80.793.605	COORDINADOR FORESTAL	$ 2.850.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		BIOPLUS INGENIERIA	$ 2.970.000	$ 206.800	V	Sanitas	9502696470	$ 118.800	Colpensiones	9502696470	$ 475.200	$ 118.800	N/A	N/A	
5	MARCO TULIO BENAVIDES PIPICANO	1.124.864.674	OPERADOR FORESTAL	$ 1.423.500		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		BIOPLUS INGENIERIA	$ 1.806.785	$ 125.800	V	Nueva EPS	9502696470	$ 72.300	Porvenir	9502696470	$ 289.100	$ 72.300	N/A	N/A	
6	LUIS FERNEY CARVAJAL CAMPOS	1.118.470.103	OPERADOR FORESTAL PLUS	$ 1.900.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		BIOPLUS INGENIERIA	$ 2.043.510	$ 142.300	V	Nueva EPS	9502696470	$ 81.800	Porvenir	9502696470	$ 327.000	$ 81.800	N/A	N/A	
7	FRANKLIN LUNA HUACA	76.324.134	AUXILIAR DE CAMPO	$ 1.423.500		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		BIOPLUS INGENIERIA	$ 1.883.154	$ 131.100	V	Emssanar	9502696470	$ 75.400	Porvenir	9502696470	$ 301.400	$ 75.400	N/A	N/A	
8	JAMES ADRIAN QUIROZ SUAREZ	1.120.217.458	AUXILIAR DE CAMPO	$ 1.423.500		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		BIOPLUS INGENIERIA	$ 1.750.905	$ 121.900	V	Nueva EPS	9502696470	$ 70.100	Protección	9502696470	$ 280.200	$ 70.100	N/A	N/A	
9	JEFREY GRIJALBA ORDOÑEZ	1.006.948.946	AUXILIAR DE CAMPO	$ 1.423.500		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		BIOPLUS INGENIERIA	$ 1.806.785	$ 125.800	V	Nueva EPS	9502696470	$ 72.300	Porvenir	9502696470	$ 289.100	$ 72.300	N/A	N/A	
10	MELO DELGADO OMAR CLEMENTE	15.555.186	CONDUCTOR	$ 1.423.500		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		BIOPLUS INGENIERIA	$ 2.276.549	$ 158.500	V	Mallamas	9502696470	$ 91.100	Porvenir	9502696470	$ 364.300	$ 91.100	N/A	N/A	
11	JHON JENNER CORTES QUIÑONES	1006665639	OBRERO DE LA CONSTRUCCION	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	x	x		EMSSANAR	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EMSSANAR	9503125842	$ 70.100	PORVENIR	9503125842	$ 91.200	$ 70.100	N/A	N/A	
12	ALVARO MARLON MORENO MENDOZA	1022425373	ING SST	$ 2.400.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	x	x		CONSTRUCIVIL ARL SAS	$ 2.400.000	$ 167.100	V	SURA	9503125842	$ 96.000	COLFONDOS	9503125842	$ 320.000	$ 96.000	N/A	N/A	
13	ESTEVAN CAMILO MUTUMBAJOY MAVISOY	1006663456	OBRERO DE LA CONSTRUCCION	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	x	x		CONSTRUCIVIL ARL SAS	$ 1.750.905	$ 121.900	V	MALLAMAS	9503125842	$ 70.100	PORVENIR	9503125842	$ 76.000	$ 70.100	N/A	N/A	
14	RUIZ LEON ABRAHAN	79002415	REPRESENTANTE LEGAL	$ 5.500.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	x	x		CONSTRUCIVIL ARL SAS	$ 5.000.000	$ 348.000	V	FAMISARNAR COLSUBSIDIO	9503040776	$ 200.000	COLPENSIONES	9503040776	$ 880.000	$ 200.000	N/A	N/A	
15	JAIRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	6646599	OBRERO DE LA CONSTRUCCION PLENO	$ 1.750.905		X																													CONSTRUCIVIL ARL SAS	$ 1.750.905	$ 121.900	V	NUEVA EPS	9503125842	$ 70.100	PORVENIR	9503125842	$ 227.800	$ 70.100	N/A	N/A	
16	WILLIAN VILLALOBOS ORDOÑEZ	1.072.748.512	OBRERO DE LA CONSTRUCCION	1750905		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	x	x		CONSTRUCIVIL ARL SAS	$ 1.750.905	$ 121.900	V	NUEVA EPS	9503070217	$ 70.100	PORVENIR	9503070217	$ 280.200	$ 70.100	N/A	N/A	
17	OSCAR EDUARDO JIMENEZ RODRIGUEZ	1076220363	OBRERO DE LA CONSTRUCCION	$ 1.750.905		X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		CONSTRUCIVIL ARL SAS	$ 1.750.905	$ 121.900	V	NUEVA EPS	9503181448	$ 70.100	PORVENIR	9503181448	$ 280.200	$ 70.100	N/A	N/A	
18	AREIZA GIRALDO JOSE YANEIRO	15297068	PERFORADOR	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	x	x		JHF PERFORACIONES S.A.S.	$ 1.750.905	$ 121.900	V	COOSALUD	9502758981	$ 70.100	PORVENIR	9502758981	$ 280.200	$ 70.100	N/A	N/A	
19	ARISTIZABAL GIRALDO WALTHER DE JESUS	70696448	PERFORADOR	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	x	x		JHF PERFORACIONES S.A.S.	$ 1.750.905	$ 121.900	V	SURA	9502758981	$ 70.100	COLPENSIONES	9502758981	$ 280.200	$ 70.100	N/A	N/A	
20	ASCUNTAR ERAZO HECTOR EMMANUEL	1120218512	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	x	x		JHF PERFORACIONES S.A.S.	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EMSANAR	9502758981	$ 70.100	PORVENIR	9502758981	$ 280.200	$ 70.100	N/A	N/A	
21	ASCUNTAR ASCUNTAR JIMMY ANDERSON	1006679714	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	x	x		JHF PERFORACIONES S.A.S.	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EMSANAR	9502758981	$ 70.100	PORVENIR	9502758981	$ 280.200	$ 70.100	N/A	N/A	
22	ASCUNTAR BURGOS WILSON YAMITH	1120217106	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	x	x		JHF PERFORACIONES S.A.S.	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EMSANAR	9502758981	$ 70.100	PORVENIR	9502758981	$ 280.200	$ 70.100	N/A	N/A	
23	BOTINA DELGADO YIMI ARLEY	1120216661	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	x	x		JHF PERFORACIONES S.A.S.	$ 1.750.905	$ 121.900	V	NUEVA EPS	9502758981	$ 70.100	COLPENSIONES	9502758981	$ 280.200	$ 70.100	N/A	N/A	
24	CALDERON PIANDA JEINER CAMILO	1010081854	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	x	x		JHF PERFORACIONES S.A.S.	$ 1.750.905	$ 121.900	V	NUEVA EPS	9502758981	$ 70.100	PORVENIR	9502758981	$ 280.200	$ 70.100	N/A	N/A	
25	FLOREZ MANRIQUE MANUEL FERNANDO	1106785742	PERFORADOR	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	x	x		JHF PERFORACIONES S.A.S.	$ 1.750.905	$ 121.900	V	NUEVA EPS	9502758981	$ 70.100	PORVENIR	9502758981	$ 280.200	$ 70.100	N/A	N/A	
26	GOMEZ CHAVES ARCESIO HEINES	18124122	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	x	x		JHF PERFORACIONES S.A.S.	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EMSANAR	9502758981	$ 70.100	PORVENIR	9502758981	$ 280.200	$ 70.100	N/A	N/A	
27	HUELGAS MARTINEZ LUIS CARLOS	18128204	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	x	x		JHF PERFORACIONES S.A.S.	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EMSANAR	9502758981	$ 70.100	PORVENIR	9502758981	$ 280.200	$ 70.100	N/A	N/A	
28	LASCANO CALCETA LUIS ALFONSO	1072746330	PERFORADOR	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	x	x		JHF PERFORACIONES S.A.S.	$ 1.750.905	$ 121.900	V	FAMISANAR	9502758981	$ 70.100	PORVENIR	9502758981	$ 280.200	$ 70.100	N/A	N/A	
29	LASCANO VELASQUEZ VICTOR ALFONSO	1083461674	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	x	x		JHF PERFORACIONES S.A.S.	$ 1.750.905	$ 121.900	V	SALUDTOTAL	9502758981	$ 70.100	PORVENIR	9502758981	$ 280.200	$ 70.100	N/A	N/A	
30	LUNA VALLES KEVIN ANDRES	1120218401	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	x	x		JHF PERFORACIONES S.A.S.	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EMSANAR	9502758981	$ 70.100	PORVENIR	9502758981	$ 280.200	$ 70.100	N/A	N/A	
31	MARTINEZ CORDOBA JOSE MOISES	98354692	PERFORADOR	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	x	x		JHF PERFORACIONES S.A.S.	$ 1.750.905	$ 121.900	V	SANITAS	9502758981	$ 70.100	COLPENSIONES	9502758981	$ 280.200	$ 70.100	N/A	N/A	
32	SALAS PORTILLO YONNY FERNEY	1007254199	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	x	x		JHF PERFORACIONES S.A.S.	$ 1.750.905	$ 121.900	V	NUEVA EPS	9502758981	$ 70.100	PORVENIR	9502758981	$ 280.200	$ 70.100	N/A	N/A	
33	TAPIA CHANA HENRY FABIO	97481106	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	x	x		JHF PERFORACIONES S.A.S.	$ 1.750.905	$ 121.900	V	EMSANAR	9502758981	$ 70.100	PORVENIR	9502758981	$ 280.200	$ 70.100	N/A	N/A	
34	BASTIDAS SOLARTE EMERSON FABIAN	1006946897	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	x	x		JHF PERFORACIONES S.A.S.	$ 1.750.905	$ 16.300	V	EMSANAR	9502758981	$ 9.400	COLPENSIONES	9502758981	$ 37.400	$ 9.400	N/A	N/A	
35	VALLES RAMIREZ ADRIANA	69028379	COCINERA	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x	x	x	x	x		JHF PERFORACIONES S.A.S.	$ 1.750.905	$ 49.100	V	EMSANAR	9502758981	$ 49.100	PORVENIR	9502276593	$ 196.200	$ 49.100	N/A	N/A	
36	CESAR AUGUSTO GOMEZ ROJAS	91252330	PROFESIONAL EN GEOLOGIA	$ 6.000.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			JOYCO CONSULTORES S.A.S.	$ 6.000.000	$ 417.600	V	EPS SURA	9502915516	$ 240.000	PORVENIR	9502915516	$ 960.000	$ 240.000	N/A	N/A	Retiro de obra
37	MARIO ALEJANDRO BEDOYA MUÑOZ	18130466	RESIDENTE SST	$ 2.500.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			JOYCO CONSULTORES S.A.S.	$ 2.500.000	$ 174.000	V	NUEVA E.P.S.	9502915516	$ 100.000	COLPENSIONES	9502915516	$ 400.000	$ 100.000	N/A	N/A	Retiro de obra
38	CARLOS ANDRES CHAVES BRAVO	1193385655	Ingeniero en entrenamiento	$ 3.500.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ORIAG SAS	933.334	$ 65.000	V	MALLAMAS	84038855	$ 37.400	COLPENSIONES	84038855	$ 560.000	$ 140.000	N/A	N/A	
39	MARIA ALEJANDRA CAICEDO JOSSA	1124860490	Residente SST	$ 3.000.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ORIAG SAS	800.000	$ 55.700	V	EMSANAR	84038855	$ 32.000	PORVENIR	84038855	$ 480.000	$ 120.000	N/A	N/A	
40	DIEGO ALEXANDER GUAPACHA HERNANDEZ	1592738	Auxiliar Tecnico	$ 2.700.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ORIAG SAS	2.700.000	$ 188.000	V	NUEVA EPS	84038855	$ 108.000	PROTECCION	84038855	$ 432.000	$ 108.000	N/A	N/A	
41	ALVARO FERNANDO DIAZ VILLOTA	1087960094	Auxiliar de servicios generales	$ 2.200.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ORIAG SAS	586.667	$ 40.900	V	MALLAMAS	84038855	$ 23.500	PORVENIR	84038855	$ 352.000	$ 88.000	N/A	N/A	
42	OSCAR ALEJANDRO QUIGUA PISSO	1083904609	CONDUCTOR	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		PROINTURES SAS BIC	$ 1.910.083	$ 133.000	V	NUEVA EPS	9503151273	$ 76.500	PORVENIR	9503151273	$ 305.700	$ 76.500	N/A	N/A	
43	JHOAN EMILIO BOHORQUEZ RANGEL	1018453872	ING RESIDENTE	$ 5.500.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		SERMAR INGENIEROS SAS	$ 5.500.000	$ 382.800	V	EPS SANITAS	73384667	$ 220.000	PORVENIR	73384667	$ 880.000	$ 220.000	N/A	N/A	
44	LUIS ENRIQUE SANCHEZ RODRIGUEZ	14013436	MAESTRO DE OBRA	$ 2.800.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		SERMAR INGENIEROS SAS	$ 2.800.000	$ 194.880	V	NUEVA EPS	73308961	$ 112.000	PORVENIR	73308961	$ 448.000	$ 112.000	N/A	N/A	
45	ALEXANDER ALBERTO LOPEZ VILLARREAL	1032375337	PILERO DE OBRA	$ 1.950.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		SERMAR INGENIEROS SAS	$ 1.950.000	$ 135.720	V	FAMISANAR	73308961	$ 78.000	COLFONDOS	73308961	$ 312.000	$ 78.000	N/A	N/A	
46	MANUEL ANTONIO HINESTROZA MOSQUERA	11794102	PILERO DE OBRA	$ 1.950.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		SERMAR INGENIEROS SAS	$ 1.950.000	$ 135.720	V	NUEVA EPS	73308961	$ 78.000	PORVENIR	73308961	$ 312.000	$ 78.000	N/A	N/A	
47	JORGE ALBERTO CASTILLO	PPT. 5957957	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		SERMAR INGENIEROS SAS	$ 1.750.905	$ 121.863	V	NUEVA EPS	73308961	$ 70.036	PORVENIR	73308961	$ 280.145	$ 70.036	N/A	N/A	
48	VICTOR ADIAM ORDÓÑEZ MURILLO	11936555	PILERO DE OBRA	$ 1.950.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		SERMAR INGENIEROS SAS	$ 1.950.000	$ 135.720	V	SALUD TOTAL	73308961	$ 78.000	COLPENSIONES	73308961	$ 312.000	$ 78.000	N/A	N/A	
49	ALEJANDRO FONSECA GOMEZ	1133679921	PILERO DE OBRA	$ 1.950.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		SERMAR INGENIEROS SAS	$ 1.950.000	$ 135.720	V	NUEVA EPS	73308961	$ 78.000	PORVENIR	73308961	$ 312.000	$ 78.000	N/A	N/A	
50	LEONARDO FAVIO MOSQUERA	82060092	PILERO DE OBRA	$ 1.950.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		SERMAR INGENIEROS SAS	$ 1.950.000	$ 135.720	V	NUEVA EPS	73308961	$ 78.000	COLPENSIONES	73308961	$ 312.000	$ 78.000	N/A	N/A	
51	NERVIN JESUS URIANA	1134192112	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		SERMAR INGENIEROS SAS	$ 1.750.905	$ 121.863	V	NUEVA EPS	73308961	$ 70.036	PORVENIR	73308961	$ 280.145	$ 70.036	N/A	N/A	
52	ELIANA MARIA GRISALES LASSO	1072748704	INSPECTOR SST	$ 2.400.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		SERMAR INGENIEROS SAS	$ 2.400.000	$ 167.040	V	NUEVA EPS	73730304	$ 96.000	PORVENIR	73730304	$ 384.000	$ 96.000	N/A	N/A	
53	FRANCY LINDAY MELO LINARES	1111200339	INSPECTOR SST	$ 3.000.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		SERMAR INGENIEROS SAS	$ 3.000.000	$ 208.800	V	NUEVA EPS	73384667	$ 120.000	PORVENIR	73384667	$ 480.000	$ 120.000	N/A	N/A	
54	FERNANDES VALENCIA MOSQUERA	1077600602	PILERO DE OBRA	$ 1.950.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		SERMAR INGENIEROS SAS	$ 1.950.000	$ 135.720	V	NUEVA EPS	73308961	$ 78.000	PORVENIR	73308961	$ 312.000	$ 78.000	N/A	N/A	
55	ADOLFO RAFAEL ZAMBRANO LARA	1001829892	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		SERMAR INGENIEROS SAS	$ 1.750.905	$ 121.863	V	MUTUAL SER	73308961	$ 70.036	COLPENSIONES	73308961	$ 280.145	$ 70.036	N/A	N/A	
56	JESUS ORLANDO ROSAS BARRETO	14013566	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		SERMAR INGENIEROS SAS	$ 1.750.905	$ 121.863	V	SALUD TOTAL	73308961	$ 70.036	PROTECCION	73308961	$ 280.145	$ 70.036	N/A	N/A	
57	JUNIOR PALACIOS BEJARANO	1076018563	PILERO DE OBRA	$ 1.950.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		SERMAR INGENIEROS SAS	$ 1.950.000	$ 135.720	V	SALUD TOTAL	73308961	$ 78.000	PROTECCION	73308961	$ 312.000	$ 78.000	N/A	N/A	
58	IBAN ANDRES AJON TASCCON	1124869146	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		SERMAR INGENIEROS SAS	$ 1.750.905	$ 121.863	V	NUEVA EPS	73730304	$ 70.036	PORVENIR	73730304	$ 280.145	$ 70.036	N/A	N/A	
59	JESUS LEONEL TRUJILLO LOPEZ	18124394	CONDUCTOR	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		SERMAR INGENIEROS SAS	$ 1.750.905	$ 121.863	V	NUEVA EPS	73308961	$ 70.036	COLPENSIONES	73308961	$ 280.145	$ 70.036	N/A	N/A	
60	MARIA FERNANDA BUITRAGO CORTES	1080185172	INSPECTOR SST	$ 2.200.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		SERMAR INGENIEROS SAS	$ 2.200.000	$ 153.120	V	NUEVA EPS	73308961	$ 88.000	PORVENIR	73308961	$ 352.000	$ 88.000	N/A	N/A	
61	EDWIN ADDAY BARRERA RENZA	1010046672	CONDUCTOR	$ 1.850.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		SERMAR INGENIEROS SAS	$ 1.850.000	$ 128.760	V	NUEVA EPS	73308961	$ 74.000	PORVENIR	73308961	$ 296.000	$ 74.000	N/A	N/A	
62	JHEFFERSON DUVAN CHAVEZ CHAVEZ	1018343307	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		SERMAR INGENIEROS SAS	$ 1.750.905	$ 121.863	V	EMSSANAR	73308961	$ 70.036	PORVENIR	73308961	$ 280.145	$ 70.036	N/A	N/A	
63	JUAN ANDRES AVILA GARCIA	79789707	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		SERMAR INGENIEROS SAS	$ 1.750.905	$ 121.863	V	NUEVA EPS	73308961	$ 70.036	COLFONDOS	73308961	$ 280.145	$ 70.036	N/A	N/A	INCAPACIDAD TEMPORAL POR ENFERMEDAD GENERAL
64	JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ URIANA	1148185329	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		SERMAR INGENIEROS SAS	$ 1.108.907	$ 77.180	V	NUEVA EPS	73308961	$ 44.356	PORVENIR	73308961	$ 177.425	$ 44.356	N/A	N/A	
65	EDUARDO BONTINA HERNANDEZ	17704855	Conductor	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Surespecial S.A	$ 1.750.905,00	$ 76.200	IV	LA NUEVA EPS	9503006259	$ 70.100	COLPENSIONES	9503006259	$ 280.200	$ 70.100	N/A	N/A	
66	DARWIN FABIAN LOPEZ MONTILLA	1274794	Conductor	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Surespecial S.A	$ 1.750.905,00	$ 76.200	IV	MALLAMAS	9503006259	$ 70.100	PROTECCION	9503006259	$ 280.200	$ 70.100	N/A	N/A	
67	WILMER LAURIDO CEDEÑO	1123331879	AYUDANTE PRACTICO	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Villalobos SAS	$ 2.110.238	$ 146.900	V	NUEVA E.P.S.	9502804247	$ 84.500	PORVENIR	9502804247	$ 337.700	$ 84.500	N/A	N/A	
68	EDUIM JAIR ROSERO ERAZO	1006947784	AYUDANTE PRACTICO	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Villalobos SAS	$ 2.323.928	$ 161.800	V	EMSSANAR	9502804247	$ 93.000	PORVENIR	9502804247	$ 371.900	$ 93.000	N/A	N/A	
69	ROYMAN JHONATAN PANTOJA CADENA	1123328794	AYUDANTE PRACTICO	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Villalobos SAS	$ 1.999.613	$ 139.200	V	EMSSANAR	9502804247	$ 80.000	PORVENIR	9502804247	$ 320.000	$ 80.000	N/A	N/A	
70	WILMER CEBALLOS JACANAMEJOY	1006946442	AYUDANTE DEOBRA	$ 1.750.905		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

| | | |

| | | |

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2026-03-02 **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 84038855 **Referencia pago:** N/A

Periodo Cotización: 202603 **Periodo Servicio:** 202604

PAGADA 2026-04-06

Se certifica que en la fecha **2026-04-06**, la empresa **ORIAG SAS**, con documento de identificación **NI 901599436**, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado **MARIA ALEJANDRA CAICEDO JOSSA**, con **CC 1124860490**, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
AFP	N800224808	230301	PORVENIR
EPS	N901021565	ESSC18	EMSSANAR EPS
CCF	N891200337	CCF63	COMFAMILIAR PUTUMAYO

Tarifa ARL	Clase Riesgo
.0696%	5

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2026-03-02 **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 84038855 **Referencia pago:** N/A

Periodo Cotización: 202603 **Periodo Servicio:** 202604

PAGADA 2026-04-06

Se certifica que en la fecha **2026-04-06**, la empresa **ORIAG SAS**, con documento de identificación **NI 901599436**, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado **ALVARO FERNANDO DIAZ VILLOTA**, con **CC 1087960094**, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
AFP	N800224808	230301	PORVENIR
EPS	N837000084	EPSIC5	EPS MALLAMAS
CCF	N891200337	CCF63	COMFAMILIAR PUTUMAYO

Tarifa ARL	Clase Riesgo
.0696%	5

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2026-03-02 **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 84038855 **Referencia pago:** N/A

Periodo Cotización: 202603 **Periodo Servicio:** 202604

PAGADA 2026-04-06

Se certifica que en la fecha **2026-04-06**, la empresa **ORIAG SAS**, con documento de identificación **NI 901599436**, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado **CARLOS ANDRES CHAVES BRAVO**, con **CC 1193385655**, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
AFP	N900336004	25-14	COLPENSIONES
EPS	N837000084	EPSIC5	EPS MALLAMAS
CCF	N891200337	CCF63	COMFAMILIAR PUTUMAYO

Tarifa ARL	Clase Riesgo
.0696%	5

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2026-03-02 **Tipo Planilla:** E **Número Planilla:** 84038855 **Referencia pago:** N/A

Periodo Cotización: 202603 **Periodo Servicio:** 202604

PAGADA 2026-04-06

Se certifica que en la fecha **2026-04-06**, la empresa **ORIAG SAS**, con documento de identificación **NI 901599436**, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado **DIEGO ALEXANDER GUAPACHA HERNANDEZ**, con **CC 15921738**, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
AFP	N800229739	230201	PROTECCION
EPS	N900156264	EPS037	NUEVA EPS
CCF	N890900841	CCF04	COMFAMA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
.0696%	5

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901582825	4	BIOPLUS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PUTUMAYO	PORTAL SAN ANDRES CALLE 16	MOCOA-PUTUMAYO	3207235640	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	210375686	9502696470	E	2026/04/09	2026/04/09	BANCOLOMBIA	0	$10,753,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PUTUMAYO (13 Afiliados)																								**$26,506,589**	**$4,229,900**			**$26,506,589**	**$1,049,000**			**$26,506,589**	**$1,049,000**			**$26,506,589**		**$1,735,500**		**$0**	**$0**		**$8,063,400**
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (13 Afiliados)																								**$26,506,589**	**$4,229,900**			**$26,506,589**	**$1,049,000**			**$26,506,589**	**$1,049,000**			**$26,506,589**		**$1,735,500**		**$0**	**$0**		**$8,063,400**
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (13 Afiliados)																								**$26,506,589**	**$4,229,900**			**$26,506,589**	**$1,049,000**			**$26,506,589**	**$1,049,000**			**$26,506,589**		**$1,735,500**		**$0**	**$0**		**$8,063,400**
1	CC	1124864674	BENAVIDES MARCO									X										230301	30	$1,806,785	$289,100	EPS037	30	$1,806,785	$72,300	CCF63	30	$1,806,785	$72,300	14-11	30	$1,806,785	6.960%	$125,800	30	$0	$0	Si	$559,500
2	CC	1118470103	CARVAJAL LUIS									X										230301	30	$2,043,510	$327,000	EPS037	30	$2,043,510	$81,800	CCF63	30	$2,043,510	$81,800	14-11	30	$2,043,510	6.960%	$142,300	30	$0	$0	Si	$632,900
3	CC	1087646060	GARCES JOSE									X										230301	30	$1,797,472	$287,600	EPS037	30	$1,797,472	$71,900	CCF63	30	$1,797,472	$71,900	14-11	30	$1,797,472	6.960%	$125,200	30	$0	$0	Si	$556,600
4	CC	16077882	GIL CARLOS																			230201	27	$2,673,000	$427,700	EPS037	27	$2,673,000	$107,000	CCF63	27	$2,673,000	$107,000	14-11	27	$2,673,000	6.960%	$186,100	27	$0	$0	Si	$827,800
5	CC	16077882	GIL CARLOS										X									230201	3	$297,000	$35,700	EPS037	3	$297,000	$0	CCF63	3	$297,000	$0	14-11	3	$297,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$35,700
6	CC	1006948946	GRIJALBA JEFREY									X										230301	30	$1,806,785	$289,100	EPS037	30	$1,806,785	$72,300	CCF63	30	$1,806,785	$72,300	14-11	30	$1,806,785	6.960%	$125,800	30	$0	$0	Si	$559,500
7	CC	18146615	GUEVARA RAMON									X										25-14	30	$1,979,081	$316,700	EPS037	30	$1,979,081	$79,200	CCF63	30	$1,979,081	$79,200	14-11	30	$1,979,081	6.960%	$137,800	30	$0	$0	Si	$612,900
8	CC	1124856924	LOPEZ MARIBEL		X																	230201	30	$2,620,000	$419,200	EPS037	30	$2,620,000	$104,800	CCF63	30	$2,620,000	$104,800	14-11	30	$2,620,000	6.960%	$182,400	30	$0	$0	Si	$811,200
9	CC	76324134	LUNA FRANKLIN									X										230301	30	$1,883,154	$301,400	ESSC18	30	$1,883,154	$75,400	CCF63	30	$1,883,154	$75,400	14-11	30	$1,883,154	6.960%	$131,100	30	$0	$0	Si	$583,300
10	CC	15555186	MELO OMAR									X										230301	30	$2,276,549	$364,300	EPSIC5	30	$2,276,549	$91,100	CCF63	30	$2,276,549	$91,100	14-11	30	$2,276,549	6.960%	$158,500	30	$0	$0	Si	$705,000
11	CC	1130144074	NARVAEZ JHON									X										230301	30	$1,778,845	$284,700	ESSC18	30	$1,778,845	$71,200	CCF63	30	$1,778,845	$71,200	14-11	30	$1,778,845	6.960%	$123,900	30	$0	$0	Si	$551,000
12	CC	1124862871	PATIÑO DAVID																			230301	8	$466,908	$74,800	EPS037	8	$466,908	$18,700	CCF63	8	$466,908	$18,700	14-11	8	$466,908	6.960%	$32,500	8	$0	$0	Si	$144,700
13	CC	1124862871	PATIÑO DAVID													L						230301	22	$1,283,997	$205,500	EPS037	22	$1,283,997	$51,400	CCF63	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	0.000%	$0	22	$0	$0	Si	$308,300
14	CC	1120217458	QUIROZ JAMES																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF63	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
15	CC	1010081886	TOQUICA CRISTIAN									X										230301	30	$2,042,598	$326,900	EPS037	30	$2,042,598	$81,800	CCF63	30	$2,042,598	$81,800	14-11	30	$2,042,598	6.960%	$142,200	30	$0	$0	Si	$632,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAJA NARIÑO (4 Afiliados)																								**$8,761,999**	**$1,402,000**			**$8,761,999**	**$350,500**			**$8,184,499**	**$327,400**			**$8,761,999**		**$610,000**		**$0**	**$0**		**$2,689,900**
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)																								**$8,761,999**	**$1,402,000**			**$8,761,999**	**$350,500**			**$8,184,499**	**$327,400**			**$8,761,999**		**$610,000**		**$0**	**$0**		**$2,689,900**
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (4 Afiliados)																								**$8,761,999**	**$1,402,000**			**$8,761,999**	**$350,500**			**$8,184,499**	**$327,400**			**$8,761,999**		**$610,000**		**$0**	**$0**		**$2,689,900**
16	CC	87550802	ACOSTA PABLO		X																	230301	11	$641,999	$102,800	ESSC18	11	$641,999	$25,700	CCF35	11	$64,499	$2,600	14-11	11	$641,999	6.960%	$44,700	11	$0	$0	Si	$175,800
17	CC	1061703240	LIZCANO ROBINSON																			25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF35	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
18	CC	1086135836	MORENO JOHANN																			25-14	30	$2,150,000	$344,000	EPS005	30	$2,150,000	$86,000	CCF35	30	$2,150,000	$86,000	14-11	30	$2,150,000	6.960%	$149,700	30	$0	$0	Si	$665,700
19	CC	80793605	VERGARA JOSE																			25-14	30	$2,970,000	$475,200	EPS005	30	$2,970,000	$118,800	CCF35	30	$2,970,000	$118,800	14-11	30	$2,970,000	6.960%	$206,800	30	$0	$0	Si	$919,600
Total			**Afiliados(17)**																					$35,268,588	$5,631,900			$35,268,588	$1,399,500			$34,691,088	$1,376,400			$35,268,588		$2,345,500		$0	$0		$10,753,300

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$5,631,900	$0	$0	$5,631,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,615,900	$0	$0	$1,615,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,853,200	$0	$0	$2,853,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,162,800	$0	$0	$1,162,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$2,345,500	$0	$0	$2,345,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$2,345,500	$0	$0	$2,345,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				17	$1,376,400	$0	$0	$1,376,400
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	4	$327,400	$0	$0	$327,400
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	13	$1,049,000	$0	$0	$1,049,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$1,399,500	$0	$0	$1,399,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$172,300	$0	$0	$172,300
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$91,100	$0	$0	$91,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$811,300	$0	$0	$811,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$324,800	$0	$0	$324,800
TOTAL				**17**	**$10,753,300**	**$0**	**$0**	**$10,753,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900775402	8	JHF PERFORACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 1 A SUR 8 A 19	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3042341	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	200829701	9502758981	E	2026/04/06	2026/04/07	BANCO DAVIVIENDA	1	$14,463,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (30 Afiliados)						$45,581,896	$7,294,700			$48,441,708	$1,923,100			$48,441,708	$1,911,400			$48,441,708	$3,323,900		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO R V (5 Afiliados)						$7,003,620	$1,120,800			$8,754,525	$350,500			$8,754,525	$350,500			$8,754,525	$609,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$7,003,620	$1,120,800			$8,754,525	$350,500			$8,754,525	$350,500			$8,754,525	$609,500		$0	$0
1	CC	1018492834	FLOREZ DIEGO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
2	CC	80904877	FLOREZ EDSON	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
3	CC	19344922	FLOREZ JAIME		0	$0	$0	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
4	CC	1013687222	FLOREZ LAURA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
5	CC	46374546	NIÑO YANNY	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO BASE Y/O BODEGA (1 Afiliados)						$1,750,906	$280,200			$1,750,906	$53,700			$1,750,906	$53,700			$1,750,906	$93,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,750,906	$280,200			$1,750,906	$53,700			$1,750,906	$53,700			$1,750,906	$93,500		$0	$0
6	CC	87431139	ANGULO JOSE	25-14	7	$408,545	$65,400	EPS005	7	$408,545	$0	CCF21	7	$408,545	$0	14-25	7	$408,545	$0	7	$0	$0
7	CC	87431139	ANGULO JOSE	25-14	23	$1,342,361	$214,800	EPS005	23	$1,342,361	$53,700	CCF21	23	$1,342,361	$53,700	14-25	23	$1,342,361	$93,500	23	$0	$0
Centro de Trabajo: PROYECTO CENTRALIZADO 001 (19 Afiliados)						$31,399,564	$5,025,000			$31,399,564	$1,257,200			$31,399,564	$1,245,500			$31,399,564	$2,165,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (19 Afiliados)						$31,399,564	$5,025,000			$31,399,564	$1,257,200			$31,399,564	$1,245,500			$31,399,564	$2,165,800		$0	$0
8	CC	15297068	AREIZA JOSE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
9	CC	70696448	ARISTIZABAL WALTHER	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
10	CC	1120218512	ASCUNTAR HECTOR	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC18	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
11	CC	1006679714	ASCUNTAR JIMMY	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC18	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
12	CC	1120217106	ASCUNTAR WILSON	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC18	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
13	CC	1006946897	BASTIDAS EMERSON	25-14	16	$933,816	$149,500	ESSC18	16	$933,816	$37,400	CCF21	16	$933,816	$37,400	14-25	16	$933,816	$65,000	16	$0	$0
14	CC	1120216661	BOTINA YIMI	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
15	CC	1010081854	CALDERON JEINER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
16	CC	1106785742	FLOREZ MANUEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
17	CC	18124124	GOMEZ ARCESIO	230301	25	$1,459,088	$233,500	ESSC18	25	$1,459,088	$58,400	CCF21	25	$1,459,088	$58,400	14-25	25	$1,459,088	$101,600	25	$0	$0
18	CC	18124124	GOMEZ ARCESIO	230301	5	$291,818	$46,700	ESSC18	5	$291,818	$11,700	CCF21	5	$291,818	$0	14-25	5	$291,818	$0	5	$0	$0
19	CC	18128204	HUELGAS LUIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC18	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
20	CC	1072746330	LASCANO LUIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
21	CC	1083461674	LASCANO VICTOR	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
22	CC	1120218401	LUNA KEVIN	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC18	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
23	CC	98354692	MARTINEZ JOSE	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
24	CC	1002874570	PAZ ANDERSON	230301	12	$700,362	$112,100	EPS008	12	$700,362	$28,100	CCF21	12	$700,362	$28,100	14-25	12	$700,362	$48,800	12	$0	$0
25	CC	1007254199	SALAS YONNY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
26	CC	97481106	TAPIA HENRY	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC18	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
27	CC	69028379	VALLES ADRIANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC18	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PROYECTOS DESCENTRALIZADOS (5 Afiliados)						$5,427,806	$868,700			$6,536,713	$261,700			$6,536,713	$261,700			$6,536,713	$455,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$5,427,806	$868,700			$6,536,713	$261,700			$6,536,713	$261,700			$6,536,713	$455,100		$0	$0
28	CC	19431233	MARTINEZ JUAN		0	$0	$0	EPS001	19	$1,108,907	$44,400	CCF21	19	$1,108,907	$44,400	14-25	19	$1,108,907	$77,200	19	$0	$0
29	CC	87947125	MESA DADIER	230201	24	$1,400,724	$224,200	EPS037	24	$1,400,724	$56,100	CCF21	24	$1,400,724	$56,100	14-25	24	$1,400,724	$97,500	24	$0	$0
30	CC	1023947825	MORALES OSCAR	230301	22	$1,283,997	$205,500	EPS037	22	$1,283,997	$51,400	CCF21	22	$1,283,997	$51,400	14-25	22	$1,283,997	$89,400	22	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
31	CC	18129102	MUÑOZ FREDI	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC18	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
32	CC	93404517	PACHECO ITALO	230301	17	$992,180	$158,800	EPS005	17	$992,180	$39,700	CCF21	17	$992,180	$39,700	14-25	17	$992,180	$69,100	17	$0	$0
Total			**Afiliados(30)**			**$45,581,896**	**$7,294,700**			**$48,441,708**	**$1,923,100**			**$48,441,708**	**$1,911,400**			**$48,441,708**	**$3,323,900**		**$0**	**$0**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900775402	8	JHF PERFORACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 1 A SUR 8 A 19	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3042341	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	200829701	9502758981	E	2026/04/06	2026/04/07	BANCO DAVIVIENDA	1	$14,463,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				28	$7,294,700	$5,100	$0	$7,299,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,550,500	$1,100	$0	$1,551,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	$5,520,000	$3,800	$0	$5,523,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$224,200	$200	$0	$224,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$3,323,900	$2,300	$0	$3,326,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	30	$3,323,900	$2,300	$0	$3,326,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$1,911,400	$1,300	$0	$1,912,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	30	$1,911,400	$1,300	$0	$1,912,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				30	$1,923,100	$1,700	$0	$1,924,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$44,400	$100	$0	$44,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$28,100	$100	$0	$28,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	10	$668,300	$500	$0	$668,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$350,500	$300	$0	$350,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$387,900	$300	$0	$388,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$100	$0	$70,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$140,200	$100	$0	$140,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$233,600	$200	$0	$233,800
TOTAL				**30**	**$14,453,100**	**$10,400**	**$0**	**$14,463,500**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PROINTURES SAS identificado(a) con NI 900409163 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para OSCAR ALEJANDRO QUIGUA PISSO identificado(a) con CC 1083904609

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9503151273	230074993	E	2026-04-17	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									$1,910,083	4%	$76,500
9503151273	230074993	E	2026-04-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$1,910,083	16%	$305,700
9503151273	230074993	E	2026-04-17	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-03	30									X									$1,910,083		$0
9503151273	230074993	E	2026-04-17	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-03	30									X									$1,910,083		$0
9503151273	230074993	E	2026-04-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-03	30									X									$0	0%	$0
9503151273	230074993	E	2026-04-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-03	30									X									$0	0%	$0
9503151273	230074993	E	2026-04-17	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$1,910,083	6.96%	$133,000
9503151273	230074993	E	2026-04-17	CCF	CCF63	COMFAMILIAR PUTUMAYO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									$1,910,083	4%	$76,500

Este certificado se expide el día 2026-04-17 a las 03:24.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que RODRIGUEZ Y LONDONO S.A. identificado(a) con NI 890923691 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JAVIER ANTONIO CASTRO FIGUEROA identificado(a) con CC 72286213

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9502726402	249655161	E	2026-04-24	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30									X									4%	$168,000
9502726402	249655161	E	2026-04-24	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									16%	$671,700
9502726402	249655161	E	2026-04-24	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-03	30									X										$0
9502726402	249655161	E	2026-04-24	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-03	30									X										$0
9502726402	249655161	E	2026-04-24	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-03	30									X									0%	$0
9502726402	249655161	E	2026-04-24	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-03	30									X									0%	$0
9502726402	249655161	E	2026-04-24	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									6.96%	$292,200
9502726402	249655161	E	2026-04-24	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30									X									4%	$165,900

Este certificado se expide el día 2026-04-24 a las 09:18.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900363514	6	SOCIEDAD UNIDA DE RUTAS ESPECIALES SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MOCOA	AV SAN FRANCISCO	MOCOA-PUTUMAYO	4200604	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	218820777	9503006259	E	2026/04/07	2026/04/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	6	$14,355,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MOCOA (27 Afiliados)																						$51,405,364	$8,226,200			$53,156,269	$2,127,800			$53,156,269	$2,027,000			$53,156,269		$1,916,200		$0	$0		$14,297,200
Centro de Trabajo: ADMINIS 4.35 (2 Afiliados)																						$4,758,000	$761,300			$4,758,000	$190,400			$4,758,000	$190,400			$4,758,000		$207,100		$0	$0		$1,349,200
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)																						$4,758,000	$761,300			$4,758,000	$190,400			$4,758,000	$190,400			$4,758,000		$207,100		$0	$0		$1,349,200
1	CC	91286448	DIAZ ORLANDO																	230301	30	$2,858,000	$457,300	EPS037	30	$2,858,000	$114,400	CCF63	30	$2,858,000	$114,400	14-23	30	$2,858,000	4.350%	$124,400	30	$0	$0	Si	$810,500
2	CC	16015402	QUICENO DARWIN																	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS037	30	$1,900,000	$76,000	CCF63	30	$1,900,000	$76,000	14-23	30	$1,900,000	4.350%	$82,700	30	$0	$0	Si	$538,700
Centro de Trabajo: ADMON RIESGO 1 (4 Afiliados)																						$8,350,906	$1,336,300			$8,350,906	$334,200			$8,350,906	$303,500			$8,350,906		$39,900		$0	$0		$2,013,900
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (4 Afiliados)																						$8,350,906	$1,336,300			$8,350,906	$334,200			$8,350,906	$303,500			$8,350,906		$39,900		$0	$0		$2,013,900
3	CC	1152465700	ARANZAZU JAVIER																	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF63	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
4	CC	1032472381	ESTUPIÑAN DANIELA																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF63	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
5	CC	27361825	MAYA DEICY																	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPSIC5	30	$2,300,000	$92,000	CCF63	30	$2,300,000	$92,000	14-23	30	$2,300,000	0.522%	$12,100	30	$0	$0	Si	$564,100
6	CC	1127073493	MELO LUZ																	230301	20	$1,533,334	$245,400	EPS037	20	$1,533,334	$61,400	CCF63	20	$1,533,334	$61,400	14-23	20	$1,533,334	0.522%	$8,100	20	$0	$0	Si	$376,300
7	CC	1127073493	MELO LUZ													X				230301	10	$766,667	$122,700	EPS037	10	$766,667	$30,700	CCF63	10	$766,667	$0	14-23	10	$766,667	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$153,400

Planilla Resumen

| | | |

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				26	$8,226,200	$33,500	$0	$8,259,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,943,800	$7,900	$0	$1,951,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$5,329,700	$21,700	$0	$5,351,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$952,700	$3,900	$0	$956,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$1,916,200	$7,800	$0	$1,924,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	27	$1,916,200	$7,800	$0	$1,924,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$2,027,000	$8,300	$0	$2,035,300
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	27	$2,027,000	$8,300	$0	$2,035,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				27	$2,127,800	$8,900	$0	$2,136,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	5	$382,800	$1,600	$0	$384,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$80,000	$400	$0	$80,400
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	3	$232,200	$1,000	$0	$233,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	$1,292,600	$5,300	$0	$1,297,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$140,200	$600	$0	$140,800
TOTAL				**27**	**$14,297,200**	**$58,500**	**$0**	**$14,355,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901571698	8	VILLALOBOS PERFORACIONES E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VILLAGARZON	CRR 33 2 73 BARRIO PRIMAVERA	VILLAGARZON-PUTUMAYO	3007391152	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	225197317	9502804247	E	2026/04/24	2026/04/15	BANCOLOMBIA	0	$21,649,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VILLAGARZON (28 Afiliados)																							$63,905,200	$10,226,100			$63,905,200	$2,557,200			$64,123,458	$2,565,900			$63,905,200		$4,311,200		$0	$0		$19,660,400
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																							$2,143,864	$343,100			$2,143,864	$85,800			$2,143,864	$85,800			$2,143,864		$11,200		$0	$0		$525,900
Ciudad: VILLAGARZON Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																							$2,143,864	$343,100			$2,143,864	$85,800			$2,143,864	$85,800			$2,143,864		$11,200		$0	$0		$525,900
1	CC	1124864634	CASTILLO ORTEGA KAREN LICETD									X									25-14	30	$2,143,864	$343,100	ESSC18	30	$2,143,864	$85,800	CCF63	30	$2,143,864	$85,800	14-11	30	$2,143,864	0.522%	$11,200	30	$0	$0	Si	$525,900

Planilla Resumen

| | | |

| | | |

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				31	$11,253,800	$0	$0	$11,253,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,678,800	$0	$0	$1,678,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	27	$9,575,000	$0	$0	$9,575,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$4,758,400	$0	$0	$4,758,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	31	$4,758,400	$0	$0	$4,758,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				31	$2,822,900	$0	$0	$2,822,900
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	3	$257,000	$0	$0	$257,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	28	$2,565,900	$0	$0	$2,565,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				31	$2,814,200	$0	$0	$2,814,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	9	$725,600	$0	$0	$725,600
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$81,600	$0	$0	$81,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	3	$283,700	$0	$0	$283,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$1,182,600	$0	$0	$1,182,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$96,000	$0	$0	$96,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$444,700	$0	$0	$444,700
TOTAL				**31**	**$21,649,300**	**$0**	**$0**	**$21,649,300**

SuAporte | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: sábado, 25 de abril de 2026 10:43:08 AM

Período del informe: 202603

Pagada 07/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EXCAVACIONES CONSTRUCCION SAS		
Documento	NI901393708	**Dirección**	CR 35 #15 B - 143 VIA LA PALMAS
Tipo de Empresa		**Teléfono**	4884587
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	ALVAREZ EVERTH	**Identificación**	CC14679743

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 77103393	MIELES GONZALEZ JOSE MARTIN	84850758	07/04/2026	202603	202604										X								30	30	30	30	230301	EPS002	14-4	CCF04	$4.174.473	$4.174.473	$4.174.473	$4.174.473	$668.000	$167.000	$290.600	$167.000	$0	$0	$0	$0	$1.292.600

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ANGELICA MARIA TORRES OROZCO identificado(a) con CC 1053800188 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A NI 890922447

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	222752773	9502936343	E	2026-04-14													L				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	27	16%	$4,959,900	$793,600
AFP	COLPENSIONES	3	16%	$551,100	$88,200
ARL	COLPATRIA ARP	27	6.96%	$4,959,900	$345,300
ARL	COLPATRIA ARP	3	0%	$551,100	$0
CCF	COMFAMA	27	4%	$4,959,900	$198,400
CCF	COMFAMA	3	4%	$551,100	$22,100
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	27	4%	$4,959,900	$198,400
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	3	4%	$551,100	$22,100

Este certificado se expide el día 2026-04-22 a las 02:18.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JUAN CAMILO CRUZ MESA identificado(a) con CC 8015832 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A NI 890922447

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	222752773	9502936343	E	2026-04-14													L				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	3	16%	$950,500	$152,100
AFP	PORVENIR	27	16%	$8,554,500	$1,368,800
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	3		$950,500	$4,800
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	27		$8,554,500	$42,800
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	3		$950,500	$4,800
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	27		$8,554,500	$42,800
ARL	COLPATRIA ARP	3	0%	$950,500	$0
ARL	COLPATRIA ARP	27	6.96%	$8,554,500	$595,400
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	3	4%	$950,500	$38,100
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	27	4%	$8,554,500	$342,200
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	3	4%	$950,500	$38,100
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	27	4%	$8,554,500	$342,200

Este certificado se expide el día 2026-04-22 a las 02:17.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890922447	4	CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 25 N 3 45 MALL DEL ESTE PISO 2	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4480029	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	212036484	9502936208	E	2026/04/14	2026/04/10	BANCOLOMBIA	0	$191,063,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (238 Afiliados)						$636,978,019	$102,318,900			$643,221,583	$25,565,400			$626,284,692	$25,064,800			$643,221,583	$38,113,900		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 168 (238 Afiliados)						$636,978,019	$102,318,900			$643,221,583	$25,565,400			$626,284,692	$25,064,800			$643,221,583	$38,113,900		$0	$0
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (238 Afiliados)						$636,978,019	$102,318,900			$643,221,583	$25,565,400			$626,284,692	$25,064,800			$643,221,583	$38,113,900		$0	$0
1	CC	15341053	ACEVEDO MENDEZ DAIRO	25-14	30	$5,937,000	$950,000	EPS002	30	$5,937,000	$237,500	CCF63	30	$5,937,000	$237,500	14-4	30	$5,937,000	$258,300	30	$0	$0
2	CC	1124863234	ACOSTA ROBLES HARYNSON FABRICIO	25-14	30	$2,451,931	$392,400	ESSC18	30	$2,451,931	$98,100	CCF63	30	$2,451,931	$98,100	14-4	30	$2,451,931	$170,700	30	$0	$0
3	CC	1124866634	ACOSTA BENITEZ MAYCOL JONATAN	230301	18	$1,442,509	$230,900	ESSC18	18	$1,442,509	$57,800	CCF63	18	$1,502,614	$60,200	14-4	18	$1,442,509	$100,400	18	$0	$0
4	CC	1124859753	ALAPE CABRERA EGIDIO	230301	30	$2,651,892	$424,400	EPS037	30	$2,651,892	$106,100	CCF63	30	$2,651,892	$106,100	14-4	30	$2,651,892	$184,600	30	$0	$0
5	CC	1123326458	ALVEAR FIGUEROA DIANA FERNANDA	230301	30	$6,657,000	$1,065,200	EPS037	30	$6,657,000	$266,300	CCF63	30	$6,657,000	$266,300	14-4	30	$6,657,000	$34,800	30	$0	$0
6	CC	1041262153	ANAYA VERGARA ALBEIRO ANTONIO	25-14	4	$443,866	$71,100	EPS037	4	$443,866	$17,800	CCF63	4	$443,866	$17,800	14-4	4	$443,866	$0	4	$0	$0
7	CC	1041262153	ANAYA VERGARA ALBEIRO ANTONIO	25-14	26	$3,989,504	$638,400	EPS037	26	$3,989,504	$159,600	CCF63	26	$3,989,504	$159,600	14-4	26	$3,989,504	$277,700	26	$0	$0
8	CC	1030080456	ANDRADE SAMBONI BALLARDO FABIAN	25-14	30	$2,735,258	$437,700	ESSC18	30	$2,735,258	$109,500	CCF63	30	$2,735,258	$109,500	14-4	30	$2,735,258	$190,400	30	$0	$0
9	CC	1062774165	ANDRADE CAMAYO DIVAR JAIR	230201	6	$573,000	$91,700	EPS037	6	$573,000	$23,000	CCF63	6	$525,000	$21,000	14-4	6	$573,000	$39,900	6	$0	$0
10	CC	1124864379	ANDRADE RODRIGUEZ FAYBER GEOVANY	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF63	1	$58,363	$2,400	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
11	CC	1124864379	ANDRADE RODRIGUEZ FAYBER GEOVANY	230301	7	$410,979	$65,800	EPS037	7	$410,979	$16,500	CCF63	7	$410,978	$16,500	14-4	7	$410,979	$0	7	$0	$0
12	CC	1124864379	ANDRADE RODRIGUEZ FAYBER GEOVANY	230301	22	$1,832,017	$293,200	EPS037	22	$1,832,017	$73,300	CCF63	22	$1,832,017	$73,300	14-4	22	$1,832,017	$79,700	22	$0	$0
13	CC	1124857522	ANDRADE LOPEZ JESUS ALBERTO	230301	29	$2,567,662	$410,900	EPS037	29	$2,567,662	$102,800	CCF63	29	$2,567,662	$102,800	14-4	29	$2,567,662	$178,800	29	$0	$0
14	CC	1124857522	ANDRADE LOPEZ JESUS ALBERTO	230301	1	$72,791	$11,700	EPS037	1	$72,791	$0	CCF63	1	$0	$0	14-4	1	$72,791	$0	1	$0	$0
15	CC	98346604	ANDRADE UYAQUE LUIS FELIPE	230301	5	$455,500	$72,900	EPS037	5	$455,500	$18,300	CCF63	5	$455,500	$18,300	14-4	5	$455,500	$0	5	$0	$0
16	CC	98346604	ANDRADE UYAQUE LUIS FELIPE	230301	25	$3,361,175	$537,800	EPS037	25	$3,361,175	$134,500	CCF63	25	$3,361,175	$134,500	14-4	25	$3,361,175	$234,000	25	$0	$0
17	CC	1125179431	ANGULO ORTIZ LUIS HERNEY	230301	30	$2,242,020	$358,800	EPS037	30	$2,242,020	$89,700	CCF63	30	$2,242,020	$89,700	14-4	30	$2,242,020	$156,100	30	$0	$0
18	CC	1115918298	ANTURI DURAN ROBERT ALBERTO	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF63	1	$0	$0	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
19	CC	1115918298	ANTURI DURAN ROBERT ALBERTO	230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$0	$0	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
20	CC	1115918298	ANTURI DURAN ROBERT ALBERTO	230301	27	$2,184,321	$349,500	EPS037	27	$2,184,321	$87,400	CCF63	27	$2,184,321	$87,400	14-4	27	$2,184,321	$152,100	27	$0	$0
21	CC	1006827194	APOLINAR SILVA HERNANDO	230301	30	$3,410,830	$545,800	EPS037	30	$3,410,830	$136,500	CCF63	30	$3,410,830	$136,500	14-4	30	$3,410,830	$237,400	30	$0	$0
22	CC	1006795395	APOLINAR SILVA JHON FREDY	230301	5	$430,166	$68,900	EPS005	5	$430,166	$17,300	CCF63	5	$430,166	$17,300	14-4	5	$430,166	$0	5	$0	$0
23	CC	1006795395	APOLINAR SILVA JHON FREDY	230301	25	$2,937,842	$470,100	EPS005	25	$2,937,842	$117,600	CCF63	25	$2,937,842	$117,600	14-4	25	$2,937,842	$204,500	25	$0	$0
24	CC	1018342286	ARANGO BUILES ALEJANDRA	230201	30	$1,980,611	$316,900	EPS037	30	$1,980,611	$79,300	CCF63	30	$1,980,611	$79,300	14-4	30	$1,980,611	$10,400	30	$0	$0
25	CC	1006789626	ARTEAGA BENAVIDEZ JAES ANDRES	230301	30	$2,274,849	$364,000	ESSC18	30	$2,274,849	$91,000	CCF63	30	$2,274,849	$91,000	14-4	30	$2,274,849	$158,400	30	$0	$0
26	CC	1120218181	ASCUNTAR BURGOS BRAYAN ALEXANDER	25-14	30	$2,998,293	$479,800	ESSC18	30	$2,998,293	$120,000	CCF63	30	$2,998,293	$120,000	14-4	30	$2,998,293	$208,700	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
27	CC	7604239	BARRETO CARRERO ROBERT ERNESTO	230301	2	$261,489	$41,900	EPS037	2	$261,489	$10,500	CCF63	2	$0	$0	14-4	2	$261,489	$0	2	$0	$0
28	CC	7604239	BARRETO CARRERO ROBERT ERNESTO	230301	28	$3,791,596	$606,700	EPS037	28	$3,791,596	$151,700	CCF63	28	$0	$0	14-4	28	$3,791,596	$0	28	$0	$0
29	CC	98394028	BASANTE ORTEGA JOHAN ARTURO	25-14	3	$284,200	$45,500	EPS005	3	$284,200	$11,400	CCF63	3	$284,200	$11,400	14-4	3	$284,200	$0	3	$0	$0
30	CC	98394028	BASANTE ORTEGA JOHAN ARTURO	25-14	27	$3,831,963	$613,200	EPS005	27	$3,831,963	$153,300	CCF63	27	$3,831,963	$153,300	14-4	27	$3,831,963	$266,800	27	$0	$0
31	CC	1124862511	BASTIDAS DOMELIN DIEGO FERNANDO	25-14	6	$408,544	$65,400	ESSC18	6	$408,544	$16,400	CCF63	6	$408,544	$16,400	14-4	6	$408,544	$28,500	6	$0	$0
32	CC	87067924	BASTIDAS PORTILLO HENRY ALEXANDER	230301	5	$374,500	$60,000	EPS037	5	$374,500	$15,000	CCF63	5	$374,500	$15,000	14-4	5	$374,500	$0	5	$0	$0
33	CC	87067924	BASTIDAS PORTILLO HENRY ALEXANDER	230301	19	$2,264,448	$362,400	EPS037	19	$2,264,448	$90,600	CCF63	19	$2,925,723	$117,100	14-4	19	$2,264,448	$157,700	19	$0	$0
34	CC	1124848122	BASTIDAS LASSO JAIDER EMERSON	230301	29	$2,478,327	$396,600	ESSC18	29	$2,478,327	$99,200	CCF63	29	$2,478,327	$99,200	14-4	29	$2,478,327	$172,500	29	$0	$0
35	CC	1124848122	BASTIDAS LASSO JAIDER EMERSON	230301	1	$74,847	$12,000	ESSC18	1	$74,847	$0	CCF63	1	$0	$0	14-4	1	$74,847	$0	1	$0	$0
36	CC	1124858775	BASTIDAS CHAVEZ LIONICIO RAMIRO	230301	14	$875,452	$140,100	CCFC33	14	$875,452	$35,100	CCF63	14	$875,452	$35,100	14-4	14	$875,452	$61,000	14	$0	$0
37	CC	5938034	BASTIDAS TIMANA WILSON EDUARDO	25-14	30	$2,826,198	$452,200	EPS005	30	$2,826,198	$113,100	CCF63	30	$2,826,198	$113,100	14-4	30	$2,826,198	$196,800	30	$0	$0
38	CC	1124867088	BAUTISTA ZULETA ROGER	230301	21	$1,343,687	$215,000	ESSC18	21	$1,343,687	$53,800	CCF63	21	$1,343,687	$53,800	14-4	21	$1,343,687	$93,600	21	$0	$0
39	CC	1086329069	BENAVIDES DIAZ JHON FAVIAN	230301	30	$2,763,113	$442,100	EPS037	30	$2,763,113	$110,600	CCF63	30	$2,763,113	$110,600	14-4	30	$2,763,113	$120,200	30	$0	$0
40	CC	1006948631	BENAVIDES PEREZ JULIAN DAVID	230301	28	$1,929,312	$308,700	ESSC18	28	$1,929,312	$77,200	CCF63	28	$1,929,312	$77,200	14-4	28	$1,929,312	$134,300	28	$0	$0
41	CC	1124856281	BENAVIDES MACUACE WILMER ANTONIO	230301	30	$2,263,707	$362,200	EPS037	30	$2,263,707	$90,600	CCF63	30	$2,263,707	$90,600	14-4	30	$2,263,707	$157,600	30	$0	$0
42	CC	32353235	BERMUDEZ HERRERA BLANCA FARIDE	231001	30	$1,868,958	$299,100	EPS037	30	$1,868,958	$74,800	CCF63	30	$1,868,958	$74,800	14-4	30	$1,868,958	$130,100	30	$0	$0
43	CC	10783493	BERRIO OLEA ALEX ALBERTO	230301	30	$2,407,069	$385,200	EPS037	30	$2,407,069	$96,300	CCF63	30	$2,407,069	$96,300	14-4	30	$2,407,069	$167,600	30	$0	$0
44	CC	1010083712	BUESAQUILLO LUNA ANDERSON CAMILO	230301	27	$2,098,432	$335,800	ESSC18	27	$2,098,432	$84,000	CCF63	27	$2,098,432	$84,000	14-4	27	$2,098,432	$146,100	27	$0	$0
45	CC	1010083712	BUESAQUILLO LUNA ANDERSON CAMILO	230301	1	$66,510	$10,700	ESSC18	1	$66,510	$0	CCF63	1	$0	$0	14-4	1	$66,510	$0	1	$0	$0
46	CC	1010083712	BUESAQUILLO LUNA ANDERSON CAMILO	230301	2	$133,020	$21,300	ESSC18	2	$133,020	$0	CCF63	2	$0	$0	14-4	2	$133,020	$0	2	$0	$0
47	CC	18130732	BUESAQUILLO IMBACHI RENE FABIAN	230301	28	$1,871,612	$299,500	ESSC18	28	$1,871,612	$74,900	CCF63	28	$1,871,612	$74,900	14-4	28	$1,871,612	$130,300	28	$0	$0
48	CC	1124866940	BURBANO SOLARTE ANDRES ALIRIO	230301	29	$1,920,027	$307,300	ESSC18	29	$1,920,027	$76,900	CCF63	29	$1,920,027	$76,900	14-4	29	$1,920,027	$133,700	29	$0	$0
49	CC	1124866940	BURBANO SOLARTE ANDRES ALIRIO	230301	1	$69,236	$11,100	ESSC18	1	$69,236	$0	CCF63	1	$0	$0	14-4	1	$69,236	$0	1	$0	$0
50	CC	1075222458	BURGOS MORALES WILLIAM STIVEN	230301	28	$1,881,560	$301,100	EPS002	28	$1,881,560	$75,300	CCF63	28	$1,881,560	$75,300	14-4	28	$1,881,560	$131,000	28	$0	$0
51	CC	49725639	CACERES CACERES FAIDAR	230301	5	$355,166	$56,900	EPS037	5	$355,166	$14,300	CCF63	5	$355,166	$14,300	14-4	5	$355,166	$0	5	$0	$0
52	CC	49725639	CACERES CACERES FAIDAR	230301	25	$2,159,251	$345,500	EPS037	25	$2,159,251	$86,400	CCF63	25	$2,159,251	$86,400	14-4	25	$2,159,251	$150,300	25	$0	$0
53	CC	1030080056	CAICEDO RIVERA HERNAN DARIO	230301	30	$2,481,775	$397,100	ESSC18	30	$2,481,775	$99,300	CCF63	30	$2,481,775	$99,300	14-4	30	$2,481,775	$172,800	30	$0	$0
54	CC	1135014076	CALDERON GARCES LENIN SLEMAN	230301	30	$2,514,140	$402,300	EPS037	30	$2,514,140	$100,600	CCF63	30	$2,514,140	$100,600	14-4	30	$2,514,140	$175,000	30	$0	$0
55	CC	1124861456	CANAMEJOY CHANCHI WILLIAM DAVID	230301	30	$2,543,852	$407,100	EPS037	30	$2,543,852	$101,800	CCF63	30	$2,543,852	$101,800	14-4	30	$2,543,852	$110,700	30	$0	$0
56	CC	1039048213	CAÑAVERAL WBEYMAR STIVES	230201	4	$690,000	$110,400	EPS010	4	$690,000	$27,600	CCF63	4	$690,000	$27,600	14-4	4	$690,000	$0	4	$0	$0
57	CC	1039048213	CAÑAVERAL WBEYMAR STIVES	230201	26	$4,485,000	$717,600	EPS010	26	$4,485,000	$179,400	CCF63	26	$4,485,000	$179,400	14-4	26	$4,485,000	$312,200	26	$0	$0
58	CC	1064706720	CAÑIZARES GUILLEN ALVARO MIGUEL	231001	4	$344,133	$55,100	EPS037	4	$344,133	$13,800	CCF63	4	$344,133	$13,800	14-4	4	$344,133	$0	4	$0	$0
59	CC	1064706720	CAÑIZARES GUILLEN ALVARO MIGUEL	231001	26	$2,794,519	$447,200	EPS037	26	$2,794,519	$111,800	CCF63	26	$2,794,519	$111,800	14-4	26	$2,794,519	$194,500	26	$0	$0
60	CC	1124856452	CAÑON CARDENAS WILMER HERNAN	230301	30	$2,325,341	$372,100	EPS037	30	$2,325,341	$93,100	CCF63	30	$2,325,341	$93,100	14-4	30	$2,325,341	$161,900	30	$0	$0
61	CC	1094859065	CARDENAS NUNCIRA RUBEN DARIO	230301	4	$344,133	$55,100	EPS037	4	$344,133	$13,800	CCF63	4	$344,133	$13,800	14-4	4	$344,133	$0	4	$0	$0
62	CC	1094859065	CARDENAS NUNCIRA RUBEN DARIO	230301	26	$3,138,262	$502,200	EPS037	26	$3,138,262	$125,600	CCF63	26	$3,138,262	$125,600	14-4	26	$3,138,262	$218,500	26	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
63	CC	1062327932	CARDONA LONDOÑO EDWIN JULIAN	230301	14	$875,452	$140,100	EPS037	14	$875,452	$35,100	CCF63	14	$875,452	$35,100	14-4	14	$875,452	$61,000	14	$0	$0
64	CC	1124858712	CASANOVA VILLARREAL LISETH VIVIANA	230301	30	$2,208,527	$353,400	ESSC18	30	$2,208,527	$88,400	CCF63	30	$2,208,527	$88,400	14-4	30	$2,208,527	$153,800	30	$0	$0
65	CC	1054555828	CASTILLO GIRALDO YEISON STIVENS	230301	30	$2,300,716	$368,200	ESSC18	30	$2,300,716	$92,100	CCF63	30	$2,300,716	$92,100	14-4	30	$2,300,716	$160,200	30	$0	$0
66	CC	1007767767	CASTRILLON ROJAS BAIRON ANTONIO	25-14	19	$1,557,908	$249,300	CCFC55	19	$1,557,908	$62,400	CCF63	19	$1,557,908	$62,400	14-4	19	$1,557,908	$108,500	19	$0	$0
67	CC	1007767767	CASTRILLON ROJAS BAIRON ANTONIO	25-14	1	$73,665	$11,800	CCFC55	1	$73,665	$0	CCF63	1	$0	$0	14-4	1	$73,665	$0	1	$0	$0
68	CC	1007767767	CASTRILLON ROJAS BAIRON ANTONIO	25-14	1	$58,364	$9,400	CCFC55	1	$58,364	$2,400	CCF63	1	$58,363	$2,400	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
69	CC	1007767767	CASTRILLON ROJAS BAIRON ANTONIO	25-14	1	$58,364	$9,400	CCFC55	1	$58,364	$2,400	CCF63	1	$58,363	$2,400	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
70	CC	1007767767	CASTRILLON ROJAS BAIRON ANTONIO	25-14	1	$58,364	$9,400	CCFC55	1	$58,364	$2,400	CCF63	1	$58,363	$2,400	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
71	CC	1007767767	CASTRILLON ROJAS BAIRON ANTONIO	25-14	1	$58,364	$9,400	CCFC55	1	$58,364	$2,400	CCF63	1	$58,363	$2,400	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
72	CC	98342043	CHARFUELAN JUAN RAMON	230201	1	$97,349	$15,600	EPS037	1	$97,349	$0	CCF63	1	$0	$0	14-4	1	$97,349	$0	1	$0	$0
73	CC	98342043	CHARFUELAN JUAN RAMON	230201	4	$364,400	$58,400	EPS037	4	$364,400	$14,600	CCF63	4	$364,400	$14,600	14-4	4	$364,400	$0	4	$0	$0
74	CC	98342043	CHARFUELAN JUAN RAMON	230201	19	$2,881,450	$461,100	EPS037	19	$2,881,450	$115,300	CCF63	19	$3,140,423	$125,700	14-4	19	$2,881,450	$200,600	19	$0	$0
75	CC	1006907764	CHASOY JACANAMEJOY OSCAR ANDRES	230301	27	$2,022,163	$323,600	EPS037	27	$2,022,163	$80,900	CCF63	27	$2,022,163	$80,900	14-4	27	$2,022,163	$140,800	27	$0	$0
76	CC	1006907764	CHASOY JACANAMEJOY OSCAR ANDRES	230301	1	$73,176	$11,800	EPS037	1	$73,176	$0	CCF63	1	$0	$0	14-4	1	$73,176	$0	1	$0	$0
77	CC	1006907764	CHASOY JACANAMEJOY OSCAR ANDRES	230301	2	$146,351	$23,500	EPS037	2	$146,351	$0	CCF63	2	$0	$0	14-4	2	$146,351	$0	2	$0	$0
78	CC	1087960746	CHAVES JHON NICOLAS	230301	30	$2,286,477	$365,900	ESSC18	30	$2,286,477	$91,500	CCF63	30	$2,286,477	$91,500	14-4	30	$2,286,477	$159,200	30	$0	$0
79	CC	1087959512	CHAVEZ CORDOBA CARLOS HOLMER	230301	30	$2,276,250	$364,200	ESSC18	30	$2,276,250	$91,100	CCF63	30	$2,276,250	$91,100	14-4	30	$2,276,250	$158,500	30	$0	$0
80	CC	98346272	CHAVEZ RAMOS JOSE ISIDRO	231001	30	$3,833,703	$613,400	EPS037	30	$3,833,703	$153,400	CCF63	30	$3,833,703	$153,400	14-4	30	$3,833,703	$266,900	30	$0	$0
81	CC	1124859275	CHAVEZ CALVACHE MARIA NATALYA	230301	30	$2,867,707	$458,900	EPS037	30	$2,867,707	$114,800	CCF63	30	$2,867,707	$114,800	14-4	30	$2,867,707	$199,600	30	$0	$0
82	CC	1112474839	COBO URBANO BRANDO	230301	30	$3,593,067	$574,900	EPS037	30	$3,593,067	$143,800	CCF63	30	$3,593,067	$143,800	14-4	30	$3,593,067	$250,100	30	$0	$0
83	CC	13039488	COLIMBA CORAL EFRAIN EDUARDO	25-14	11	$2,148,667	$343,800	EPS037	11	$2,148,667	$86,000	CCF63	11	$2,148,666	$86,000	14-4	11	$2,148,667	$0	11	$0	$0
84	CC	13039488	COLIMBA CORAL EFRAIN EDUARDO	25-14	19	$3,711,333	$593,900	EPS037	19	$3,711,333	$148,500	CCF63	19	$5,688,160	$227,600	14-4	19	$3,711,333	$258,400	19	$0	$0
85	CC	1117806758	COLORADO GARZON WILMAR	25-14	28	$1,969,105	$315,100	ESSC18	28	$1,969,105	$78,800	CCF63	28	$1,969,105	$78,800	14-4	28	$1,969,105	$137,100	28	$0	$0
86	CC	1121508393	CORAL HERNANDEZ DEIBER ALEJANDRO	230301	30	$3,169,217	$507,100	EPS037	30	$3,169,217	$126,800	CCF63	30	$3,169,217	$126,800	14-4	30	$3,169,217	$137,900	30	$0	$0
87	CC	5268824	CORDOBA ALEXIS ALBEIRO	230301	30	$2,326,581	$372,300	EPS037	30	$2,326,581	$93,100	CCF63	30	$2,326,581	$93,100	14-4	30	$2,326,581	$162,000	30	$0	$0
88	CC	1124851181	CORREDOR TIMANA EMIDIO	230301	30	$2,293,752	$367,100	ESSC18	30	$2,293,752	$91,800	CCF63	30	$2,293,752	$91,800	14-4	30	$2,293,752	$159,700	30	$0	$0
89	CC	87551096	CUASTUMAL GUTIERREZ BERNARDO	230301	30	$2,301,710	$368,300	EPS037	30	$2,301,710	$92,100	CCF63	30	$2,301,710	$92,100	14-4	30	$2,301,710	$160,200	30	$0	$0
90	CC	1035582517	DAVID DAVID RICARDO ANTONIO	25-14	30	$2,948,863	$471,900	EPS037	30	$2,948,863	$118,000	CCF63	30	$2,948,863	$118,000	14-4	30	$2,948,863	$205,300	30	$0	$0
91	CC	1091667188	DAZA GONZALEZ LUIS EDUARDO	230301	3	$665,700	$106,600	EPS037	3	$665,700	$26,700	CCF63	3	$665,700	$26,700	14-4	3	$665,700	$0	3	$0	$0
92	CC	1091667188	DAZA GONZALEZ LUIS EDUARDO	230301	27	$5,991,300	$958,700	EPS037	27	$5,991,300	$239,700	CCF63	27	$5,991,300	$239,700	14-4	27	$5,991,300	$146,000	27	$0	$0
93	CC	18112761	DE LA CRUZ JOJOA RENE ALDEMAR	230301	4	$280,133	$44,900	ESSC18	4	$280,133	$11,300	CCF63	4	$280,133	$11,300	14-4	4	$280,133	$0	4	$0	$0
94	CC	18112761	DE LA CRUZ JOJOA RENE ALDEMAR	230301	26	$2,398,244	$383,800	ESSC18	26	$2,398,244	$96,000	CCF63	26	$2,398,244	$96,000	14-4	26	$2,398,244	$167,000	26	$0	$0
95	CC	1122339883	DELGADO PIEDRAHITA EDDIER BRYAM	230301	1	$58,364	$9,400	EPSIC5	1	$58,364	$2,400	CCF63	1	$0	$0	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
96	CC	1122339883	DELGADO PIEDRAHITA EDDIER BRYAM	230301	1	$68,427	$11,000	EPSIC5	1	$68,427	$2,800	CCF63	1	$0	$0	14-4	1	$68,427	$0	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
97	CC	1122339883	DELGADO PIEDRAHITA EDDIER BRYAM	230301	28	$1,931,301	$309,100	EPSIC5	28	$1,931,301	$77,300	CCF63	28	$1,931,301	$77,300	14-4	28	$1,931,301	$134,500	28	$0	$0
98	CC	1123304189	DIAZ VARGAS INGRID NAYIVE	230201	30	$2,195,264	$351,300	EPS037	30	$2,195,264	$87,900	CCF63	30	$2,195,264	$87,900	14-4	30	$2,195,264	$152,800	30	$0	$0
99	CC	1125179520	DIAZ ORDOÑEZ JARLINSON ALEJANDRO	230301	24	$2,134,911	$341,600	ESSC18	24	$2,134,911	$85,400	CCF63	24	$2,297,423	$91,900	14-4	24	$2,134,911	$148,600	24	$0	$0
100	CC	1097397748	DIAZ RESTREPO WILLMER ONORIO	230201	30	$3,421,285	$547,500	EPS002	30	$3,421,285	$136,900	CCF63	30	$3,421,285	$136,900	14-4	30	$3,421,285	$238,200	30	$0	$0
101	CC	1094169446	DUARTE JOSE ISAAC	230301	30	$2,207,201	$353,200	EPS037	30	$2,207,201	$88,300	CCF63	30	$2,207,201	$88,300	14-4	30	$2,207,201	$153,700	30	$0	$0
102	CC	72259259	DUQUE RUIZ JEISON EDUARDO	230201	6	$374,000	$59,900	EPS037	6	$374,000	$15,000	CCF63	6	$374,000	$15,000	14-4	6	$374,000	$0	6	$0	$0
103	CC	72259259	DUQUE RUIZ JEISON EDUARDO	230201	24	$1,919,583	$307,200	EPS037	24	$1,919,583	$76,800	CCF63	24	$1,919,583	$76,800	14-4	24	$1,919,583	$133,700	24	$0	$0
104	CC	1115072643	ENRIQUEZ VELEZ JAIME FERNANDO	230301	30	$3,717,557	$594,900	EPS037	30	$3,717,557	$148,800	CCF63	30	$3,717,557	$148,800	14-4	30	$3,717,557	$258,800	30	$0	$0
105	CC	1124853315	ENRIQUEZ DIAZ JUAN JOSE	25-14	12	$758,726	$121,400	EPSIC5	12	$758,726	$30,400	CCF63	12	$758,726	$30,400	14-4	12	$758,726	$52,900	12	$0	$0
106	CC	1086895597	ERAZO RIASCOS LEYDER YOVAN	230301	30	$3,124,959	$500,000	ESSC18	30	$3,124,959	$125,000	CCF63	30	$3,124,959	$125,000	14-4	30	$3,124,959	$136,000	30	$0	$0
107	CC	1128275538	ESCOBAR CASTAÑO LUIS GUILLERMO	230201	6	$1,219,400	$195,200	EPS010	6	$1,219,400	$48,800	CCF63	6	$1,219,400	$48,800	14-4	6	$1,219,400	$0	6	$0	$0
108	CC	1128275538	ESCOBAR CASTAÑO LUIS GUILLERMO	230201	24	$4,877,600	$780,500	EPS010	24	$4,877,600	$195,200	CCF63	24	$4,877,600	$195,200	14-4	24	$4,877,600	$339,500	24	$0	$0
109	CC	1131084832	ESPADA VILLOTA LUIS ARMANDO	230301	30	$2,906,273	$465,100	EPS005	30	$2,906,273	$116,300	CCF63	30	$2,906,273	$116,300	14-4	30	$2,906,273	$126,500	30	$0	$0
110	CC	27359475	ESPAÑA AGREDA LUDY MARCELA	230301	30	$1,936,109	$309,800	EPS037	30	$1,936,109	$77,500	CCF63	30	$1,936,109	$77,500	14-4	30	$1,936,109	$47,200	30	$0	$0
111	CC	1082746220	ESTRELLA GUACAN DANY SANTIAGO	230201	28	$1,712,438	$274,000	ESSC18	28	$1,712,438	$68,500	CCF63	28	$1,712,438	$68,500	14-4	28	$1,712,438	$119,200	28	$0	$0
112	CC	1082746220	ESTRELLA GUACAN DANY SANTIAGO	230201	2	$116,728	$18,700	ESSC18	2	$116,728	$0	CCF63	2	$0	$0	14-4	2	$116,728	$0	2	$0	$0
113	CC	1120067014	EVANJUANOY MUCHAVISOY BRAYAN CEBASTIAN	230301	30	$2,286,788	$365,900	EPSIC5	30	$2,286,788	$91,500	CCF63	30	$2,286,788	$91,500	14-4	30	$2,286,788	$159,200	30	$0	$0
114	CC	1120066498	EVANJUANOY CHINDOY LUIS ARBEY	25-14	1	$69,396	$11,200	ESSC18	1	$69,396	$0	CCF63	1	$0	$0	14-4	1	$69,396	$0	1	$0	$0
115	CC	1120066498	EVANJUANOY CHINDOY LUIS ARBEY	25-14	2	$138,791	$22,300	ESSC18	2	$138,791	$0	CCF63	2	$0	$0	14-4	2	$138,791	$0	2	$0	$0
116	CC	1120066498	EVANJUANOY CHINDOY LUIS ARBEY	25-14	27	$2,052,008	$328,400	ESSC18	27	$2,052,008	$82,100	CCF63	27	$2,052,008	$82,100	14-4	27	$2,052,008	$142,900	27	$0	$0
117	CC	1144187014	FERNANDEZ MELLIZO ANDRES FELIPE	230301	12	$758,726	$121,400	EPSIC5	12	$758,726	$30,400	CCF63	12	$758,726	$30,400	14-4	12	$758,726	$52,900	12	$0	$0
118	CC	1124852508	GARCIA IMBAJOA JAIME CRISTIAN	230201	27	$2,229,088	$356,700	EPS037	27	$2,229,088	$89,200	CCF63	27	$2,229,088	$89,200	14-4	27	$2,229,088	$155,200	27	$0	$0
119	CC	1124852508	GARCIA IMBAJOA JAIME CRISTIAN	230201	1	$70,152	$11,300	EPS037	1	$70,152	$0	CCF63	1	$0	$0	14-4	1	$70,152	$0	1	$0	$0
120	CC	1124852508	GARCIA IMBAJOA JAIME CRISTIAN	230201	2	$140,303	$22,500	EPS037	2	$140,303	$0	CCF63	2	$0	$0	14-4	2	$140,303	$0	2	$0	$0
121	CC	1067857761	GARCIA PEÑA JHON JAIRO	230301	30	$2,339,214	$374,300	EPS041	30	$2,339,214	$93,600	CCF63	30	$2,339,214	$93,600	14-4	30	$2,339,214	$162,900	30	$0	$0
122	CC	1053848117	GARCIA FONSECA MARIA ALEJANDRA	230201	14	$2,462,000	$394,000	EPS010	14	$2,462,000	$98,500	CCF63	14	$0	$0	14-4	14	$2,462,000	$0	14	$0	$0
123	CC	1053848117	GARCIA FONSECA MARIA ALEJANDRA	230201	16	$2,626,133	$420,200	EPS010	16	$2,626,133	$105,100	CCF63	16	$0	$0	14-4	16	$2,626,133	$0	16	$0	$0
124	CC	18126799	GARRETA SANTACRUZ CARLOS ORLANDO	230301	2	$116,767	$18,700	ESSC18	2	$116,767	$4,700	CCF63	2	$116,767	$4,700	14-4	2	$116,767	$0	2	$0	$0
125	CC	18126799	GARRETA SANTACRUZ CARLOS ORLANDO	230301	28	$2,127,284	$340,400	ESSC18	28	$2,127,284	$85,100	CCF63	28	$2,127,284	$85,100	14-4	28	$2,127,284	$148,100	28	$0	$0
126	CC	1115911357	GARZON RIVERA EUSEBIO	230201	5	$374,500	$60,000	EPS037	5	$374,500	$15,000	CCF63	5	$374,500	$15,000	14-4	5	$374,500	$0	5	$0	$0
127	CC	1115911357	GARZON RIVERA EUSEBIO	230201	24	$2,269,130	$363,100	EPS037	24	$2,269,130	$90,800	CCF63	24	$2,269,130	$90,800	14-4	24	$2,269,130	$158,000	24	$0	$0
128	CC	1115911357	GARZON RIVERA EUSEBIO	230201	1	$98,940	$15,900	EPS037	1	$98,940	$0	CCF63	1	$0	$0	14-4	1	$98,940	$0	1	$0	$0
129	CC	1023367615	GARZON CHITIVA MIGUEL ANGEL	230301	30	$2,331,754	$373,100	EPS037	30	$2,331,754	$93,300	CCF63	30	$2,331,754	$93,300	14-4	30	$2,331,754	$162,300	30	$0	$0
130	CC	98396510	GELPUD ROSERO ARCECIO	230301	30	$3,929,389	$628,800	EPS005	30	$3,929,389	$157,200	CCF63	30	$3,929,389	$157,200	14-4	30	$3,929,389	$273,500	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
131	CC	13068886	GELPUD URBANO LUCAS LEON	230301	30	$2,461,082	$393,800	EPS037	30	$2,461,082	$98,500	CCF63	30	$2,461,082	$98,500	14-4	30	$2,461,082	$171,300	30	$0	$0
132	CC	1005060370	GOMEZ LAGUADO DANIEL RICARDO	230201	6	$594,280	$95,100	EPS041	6	$594,280	$23,800	CCF63	6	$560,467	$22,500	14-4	6	$594,280	$41,400	6	$0	$0
133	CC	1193533299	GOMEZ MONTOYA DUBAN CAMILO	230201	30	$2,610,506	$417,700	EPS002	30	$2,610,506	$104,500	CCF63	30	$2,610,506	$104,500	14-4	30	$2,610,506	$181,700	30	$0	$0
134	CC	1089077659	GRIJALBA POPAYAN VICTOR ALEJANDRO	230301	30	$2,677,184	$428,400	EPS037	30	$2,677,184	$107,100	CCF63	30	$2,677,184	$107,100	14-4	30	$2,677,184	$186,400	30	$0	$0
135	CC	98346708	GUERRERO INSUASTY EDISON GUSTAVO	230301	22	$2,576,681	$412,300	EPS037	22	$2,576,681	$103,100	CCF63	22	$2,576,681	$103,100	14-4	22	$2,576,681	$179,400	22	$0	$0
136	CC	98346708	GUERRERO INSUASTY EDISON GUSTAVO	230301	8	$728,800	$116,700	EPS037	8	$728,800	$29,200	CCF63	8	$728,800	$29,200	14-4	8	$728,800	$0	8	$0	$0
137	CC	98136689	GUERRERO PANTOJA ELADIO JESUS DIOMEDES	230301	4	$240,000	$38,400	EPS005	4	$240,000	$9,600	CCF63	4	$240,000	$9,600	14-4	4	$240,000	$0	4	$0	$0
138	CC	98136689	GUERRERO PANTOJA ELADIO JESUS DIOMEDES	230301	26	$2,018,864	$323,100	EPS005	26	$2,018,864	$80,800	CCF63	26	$2,018,864	$80,800	14-4	26	$2,018,864	$140,600	26	$0	$0
139	CC	87030219	GUERRERO BENITEZ OSCAR OLIMPO	230301	30	$2,207,201	$353,200	ESSC18	30	$2,207,201	$88,300	CCF63	30	$2,207,201	$88,300	14-4	30	$2,207,201	$153,700	30	$0	$0
140	CC	10346575	GUERRERO REY RODRIGO	25-14	30	$2,372,344	$379,600	EPS037	30	$2,372,344	$94,900	CCF63	30	$2,372,344	$94,900	14-4	30	$2,372,344	$165,200	30	$0	$0
141	CC	14010819	GUTIERREZ QUINTERO ERLINTO FERNEY	25-14	30	$2,691,194	$430,600	EPS037	30	$2,691,194	$107,700	CCF63	30	$2,691,194	$107,700	14-4	30	$2,691,194	$187,400	30	$0	$0
142	CC	17640214	HENAO ARCE CARLOS EDUARDO	25-14	30	$4,432,117	$709,200	EPS037	30	$4,432,117	$177,300	CCF63	30	$4,432,117	$177,300	14-4	30	$4,432,117	$308,500	30	$0	$0
143	CC	1124862235	HERMOSA JAMIOY ANDERSSON JUVENAL	230301	30	$2,407,163	$385,200	EPSIC5	30	$2,407,163	$96,300	CCF63	30	$2,407,163	$96,300	14-4	30	$2,407,163	$104,800	30	$0	$0
144	CC	1126452133	HERNANDEZ BENAVIDES DARIO FERNANDO	231001	6	$458,200	$73,400	EPS037	6	$458,200	$18,400	CCF63	6	$458,200	$18,400	14-4	6	$458,200	$0	6	$0	$0
145	CC	1126452133	HERNANDEZ BENAVIDES DARIO FERNANDO	231001	24	$2,570,433	$411,300	EPS037	24	$2,570,433	$102,900	CCF63	24	$2,570,433	$102,900	14-4	24	$2,570,433	$111,900	24	$0	$0
146	CC	53084064	HERNANDEZ RAMOS EDITH YOLIMA	230301	30	$7,090,000	$1,205,400	EPS005	30	$7,090,000	$283,600	CCF63	30	$7,090,000	$283,600	14-4	30	$7,090,000	$308,500	30	$0	$0
147	CC	1124866039	HERNANDEZ MAVISOY EDWIN CAMILO	25-14	30	$2,346,477	$375,500	ESSC18	30	$2,346,477	$93,900	CCF63	30	$2,346,477	$93,900	14-4	30	$2,346,477	$163,400	30	$0	$0
148	CC	1122336150	HERNANDEZ GARCIA JAVIER OSWALDO	230301	14	$875,452	$140,100	EPSIC5	14	$875,452	$35,100	CCF63	14	$875,452	$35,100	14-4	14	$875,452	$61,000	14	$0	$0
149	CC	1067930912	HERNANDEZ ORTEGA JHON KELLI	231001	3	$255,000	$40,800	EPS002	3	$255,000	$10,200	CCF63	3	$255,000	$10,200	14-4	3	$255,000	$0	3	$0	$0
150	CC	1067930912	HERNANDEZ ORTEGA JHON KELLI	231001	27	$3,490,409	$558,500	EPS002	27	$3,490,409	$139,700	CCF63	27	$3,490,409	$139,700	14-4	27	$3,490,409	$243,000	27	$0	$0
151	CC	1006947539	HERNANDEZ WILLINGTON ANDRES	230301	30	$2,187,304	$350,000	EPS037	30	$2,187,304	$87,500	CCF63	30	$2,187,304	$87,500	14-4	30	$2,187,304	$152,300	30	$0	$0
152	CC	1006812950	HOLDA MARROQUIN OSCAR ANLLEDIS	230301	30	$2,266,891	$362,800	EPS037	30	$2,266,891	$90,700	CCF63	30	$2,266,891	$90,700	14-4	30	$2,266,891	$157,800	30	$0	$0
153	CC	1090149473	IDARRAGA GUZMAN DIANA CAROLINA	230201	30	$2,891,582	$462,700	EPS037	30	$2,891,582	$115,700	CCF63	30	$2,891,582	$115,700	14-4	30	$2,891,582	$201,300	30	$0	$0
154	CC	1002975947	IJAJI QUINAYAS JAMER DUBAN	25-14	30	$2,680,543	$428,900	EPSIC3	30	$2,680,543	$107,300	CCF63	30	$2,680,543	$107,300	14-4	30	$2,680,543	$186,600	30	$0	$0
155	CC	1087799722	INSUASTY CHAVEZ JHON HENRY	25-14	30	$2,404,178	$384,700	ESSC18	30	$2,404,178	$96,200	CCF63	30	$2,404,178	$96,200	14-4	30	$2,404,178	$167,400	30	$0	$0
156	CC	1006908515	INSUASTY DIAZ MANUELA	230301	30	$3,044,000	$487,100	EPS037	30	$3,044,000	$121,800	CCF63	30	$3,044,000	$121,800	14-4	30	$3,044,000	$211,900	30	$0	$0
157	CC	1003035822	JOAQUI PEREZ CAMILO	230301	30	$2,743,217	$439,000	ESSC18	30	$2,743,217	$109,800	CCF63	30	$2,743,217	$109,800	14-4	30	$2,743,217	$119,400	30	$0	$0
158	CC	1063807094	JOAQUI RENGIFO JUAN PABLO	230301	6	$516,200	$82,600	EPS002	6	$516,200	$20,700	CCF63	6	$516,200	$20,700	14-4	6	$516,200	$0	6	$0	$0
159	CC	1063807094	JOAQUI RENGIFO JUAN PABLO	230301	24	$2,668,793	$427,100	EPS002	24	$2,668,793	$106,800	CCF63	24	$2,668,793	$106,800	14-4	24	$2,668,793	$185,800	24	$0	$0
160	CC	1124866314	JOJOA PAI EIDER JHONATAN	230301	6	$408,544	$65,400	EPSIC5	6	$408,544	$16,400	CCF63	6	$408,544	$16,400	14-4	6	$408,544	$28,500	6	$0	$0
161	CC	5252411	LAZO ENRIQUEZ LUIS EDUARDO	25-14	30	$3,016,136	$482,600	ESSC18	30	$3,016,136	$120,700	CCF63	30	$3,016,136	$120,700	14-4	30	$3,016,136	$131,300	30	$0	$0
162	CC	1127080009	LOPEZ BECERRA DUVAN DARIO	230301	30	$2,235,719	$357,800	EPSIC5	30	$2,235,719	$89,500	CCF63	30	$2,235,719	$89,500	14-4	30	$2,235,719	$155,700	30	$0	$0
163	CC	1073242624	LOPEZ PIANDA JARLY ALVEIRO	230301	8	$640,533	$102,500	EPS037	8	$640,533	$25,700	CCF63	8	$640,533	$25,700	14-4	8	$640,533	$0	8	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
164	CC	1073242624	LOPEZ PIANDA JARLY ALVEIRO	230301	22	$2,348,683	$375,800	EPS037	22	$2,348,683	$94,000	CCF63	22	$2,348,683	$94,000	14-4	22	$2,348,683	$163,500	22	$0	$0
165	CC	18130773	LOPEZ LOPEZ JESUS ANTONIO	25-14	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$0	$0	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
166	CC	18130773	LOPEZ LOPEZ JESUS ANTONIO	25-14	8	$466,908	$74,800	EPS037	8	$466,908	$18,700	CCF63	8	$0	$0	14-4	8	$466,908	$0	8	$0	$0
167	CC	18130773	LOPEZ LOPEZ JESUS ANTONIO	25-14	8	$466,908	$74,800	EPS037	8	$466,908	$18,700	CCF63	8	$0	$0	14-4	8	$466,908	$0	8	$0	$0
168	CC	18130773	LOPEZ LOPEZ JESUS ANTONIO	25-14	8	$466,908	$74,800	EPS037	8	$466,908	$18,700	CCF63	8	$0	$0	14-4	8	$466,908	$0	8	$0	$0
169	CC	18130773	LOPEZ LOPEZ JESUS ANTONIO	25-14	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$0	CCF63	4	$0	$0	14-4	4	$233,454	$0	4	$0	$0
170	CC	1007681964	LOPEZ BERNAL JOSE REINALDO	230301	30	$2,556,587	$409,100	EPS037	30	$2,556,587	$102,300	CCF63	30	$2,556,587	$102,300	14-4	30	$2,556,587	$178,000	30	$0	$0
171	CC	1006956831	LOZADA DELGADO CESAR ANDRES	230301	30	$2,310,664	$369,800	ESSC18	30	$2,310,664	$92,500	CCF63	30	$2,310,664	$92,500	14-4	30	$2,310,664	$160,900	30	$0	$0
172	CC	71994984	LOZANO MORALES HERNEL EVARISTO	230301	3	$500,977	$80,200	EPS037	3	$500,977	$20,100	CCF63	3	$538,932	$21,600	14-4	3	$500,977	$34,900	3	$0	$0
173	CC	98411861	LUCANO ROQUE EDER	230301	4	$344,266	$55,100	EPS005	4	$344,266	$13,800	CCF63	4	$344,266	$13,800	14-4	4	$344,266	$0	4	$0	$0
174	CC	98411861	LUCANO ROQUE EDER	230301	26	$2,734,573	$437,600	EPS005	26	$2,734,573	$109,400	CCF63	26	$2,734,573	$109,400	14-4	26	$2,734,573	$190,400	26	$0	$0
175	CC	1124866475	LUNA CRISTIAN CAMILO	230301	30	$2,207,201	$353,200	ESSC18	30	$2,207,201	$88,300	CCF63	30	$2,207,201	$88,300	14-4	30	$2,207,201	$153,700	30	$0	$0
176	CC	1124859286	LUNA MENESES JONATHAN	230301	30	$2,564,546	$410,400	EPSIC5	30	$2,564,546	$102,600	CCF63	30	$2,564,546	$102,600	14-4	30	$2,564,546	$178,500	30	$0	$0
177	CC	18126597	LUNA ROJAS LUIS FERNANDO	25-14	30	$1,819,217	$291,100	EPS037	30	$1,819,217	$72,800	CCF63	30	$1,819,217	$72,800	14-4	30	$1,819,217	$126,700	30	$0	$0
178	CC	1122723803	MACHADO ORTIZ JOSE FRAILEN	25-14	21	$1,363,584	$218,200	EPSIC5	21	$1,363,584	$54,600	CCF63	21	$1,363,584	$54,600	14-4	21	$1,363,584	$95,000	21	$0	$0
179	CC	1124848123	MACIAS REALPE YONATAN MAURICIO	230301	30	$2,372,344	$379,600	EPS037	30	$2,372,344	$94,900	CCF63	30	$2,372,344	$94,900	14-4	30	$2,372,344	$165,200	30	$0	$0
180	CC	18112846	MADRIÑAN ORTIZ GUIDO FLORIBERTO	230301	5	$374,500	$60,000	ESSC18	5	$374,500	$15,000	CCF63	5	$374,500	$15,000	14-4	5	$374,500	$0	5	$0	$0
181	CC	18112846	MADRIÑAN ORTIZ GUIDO FLORIBERTO	230301	25	$2,451,698	$392,300	ESSC18	25	$2,451,698	$98,100	CCF63	25	$2,451,698	$98,100	14-4	25	$2,451,698	$170,700	25	$0	$0
182	CC	1007403382	MADROÑERO ERAZO GERMAN DAVID	25-14	28	$1,919,363	$307,100	EPS037	28	$1,919,363	$76,800	CCF63	28	$1,919,363	$76,800	14-4	28	$1,919,363	$133,600	28	$0	$0
183	CC	1124851802	MANQUILLO BURBANO JEAN CARLOS	25-14	28	$1,891,508	$302,700	EPSIC5	28	$1,891,508	$75,700	CCF63	28	$1,891,508	$75,700	14-4	28	$1,891,508	$131,700	28	$0	$0
184	CC	1049605656	MARTINEZ HUERTAS EDGAR FERNANDO	25-14	30	$6,250,000	$1,000,000	EPS037	30	$6,250,000	$250,000	CCF63	30	$6,250,000	$250,000	14-4	30	$6,250,000	$435,000	30	$0	$0
185	CC	1124861151	MARTINEZ CORDOBA JAMES REINEL	230301	30	$2,683,704	$429,400	EPS037	30	$2,683,704	$107,400	CCF63	30	$2,683,704	$107,400	14-4	30	$2,683,704	$186,800	30	$0	$0
186	CC	98567100	MARTINEZ JORGE ANDERSON	230301	30	$3,358,037	$537,300	EPS002	30	$3,358,037	$134,400	CCF63	30	$3,358,037	$134,400	14-4	30	$3,358,037	$233,800	30	$0	$0
187	CC	1124852629	MARTINEZ ORTEGA JUAN DIEGO	230301	30	$2,472,224	$395,600	ESSC18	30	$2,472,224	$98,900	CCF63	30	$2,472,224	$98,900	14-4	30	$2,472,224	$172,100	30	$0	$0
188	CC	1006947505	MELO PIANDA JEFERZON ANDRES	230301	19	$1,576,478	$252,300	EPS037	19	$1,576,478	$63,100	CCF63	19	$1,697,208	$67,900	14-4	19	$1,576,478	$109,800	19	$0	$0
189	CC	1006947505	MELO PIANDA JEFERZON ANDRES	230301	1	$65,460	$10,500	EPS037	1	$65,460	$0	CCF63	1	$0	$0	14-4	1	$65,460	$0	1	$0	$0
190	CC	1006947505	MELO PIANDA JEFERZON ANDRES	230301	4	$261,840	$41,900	EPS037	4	$261,840	$0	CCF63	4	$0	$0	14-4	4	$261,840	$0	4	$0	$0
191	CC	1006946815	MELO MACHOA OMAR DAIR	230301	30	$2,234,858	$357,600	EPS037	30	$2,234,858	$89,400	CCF63	30	$2,234,858	$89,400	14-4	30	$2,234,858	$97,300	30	$0	$0
192	CC	6802400	MENDOZA CHILATRA BENJAMIN	230301	30	$3,513,808	$562,300	EPS002	30	$3,513,808	$140,600	CCF63	30	$3,513,808	$140,600	14-4	30	$3,513,808	$244,600	30	$0	$0
193	CC	1192731463	MENDOZA TOVAR EDER EDUARDO	230301	14	$875,452	$140,100	ESSC07	14	$875,452	$35,100	CCF63	14	$875,452	$35,100	14-4	14	$875,452	$61,000	14	$0	$0
194	CC	1087961133	MINGAN SEGOVIA YEFERSON ENRIQUE	230301	30	$2,549,527	$408,000	EPS037	30	$2,549,527	$102,000	CCF63	30	$2,549,527	$102,000	14-4	30	$2,549,527	$177,500	30	$0	$0
195	CC	18130746	MONCAYO GUERRERO JAIME ANDRES	230301	30	$2,640,948	$422,600	EPS037	30	$2,640,948	$105,700	CCF63	30	$2,640,948	$105,700	14-4	30	$2,640,948	$114,900	30	$0	$0
196	CC	1124859805	MONCAYO TOVAR WILIAM JAVIER	25-14	30	$2,593,794	$415,100	EPS037	30	$2,593,794	$103,800	CCF63	30	$2,593,794	$103,800	14-4	30	$2,593,794	$112,900	30	$0	$0
197	CC	1073675380	MONTAÑEZ NOVOA EDILSON GONZALO	230201	30	$3,822,266	$611,600	EPS037	30	$3,822,266	$152,900	CCF63	30	$3,822,266	$152,900	14-4	30	$3,822,266	$266,100	30	$0	$0
198	CC	1006850378	MONTENEGRO CASANOVA JOSUE RODRIGO	230301	28	$1,891,508	$302,700	ESSC18	28	$1,891,508	$75,700	CCF63	28	$1,891,508	$75,700	14-4	28	$1,891,508	$131,700	28	$0	$0
199	CC	1124853103	MORA CUARAN CARLOS ANDRES	25-14	14	$875,452	$140,100	ESSC18	14	$875,452	$35,100	CCF63	14	$875,452	$35,100	14-4	14	$875,452	$61,000	14	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
200	CC	97481000	MORENO MORENO ALBERTH ALEXANDER	230301	30	$2,929,703	$468,800	ESSC18	30	$2,929,703	$117,200	CCF63	30	$2,929,703	$117,200	14-4	30	$2,929,703	$127,500	30	$0	$0
201	CC	1124853231	MUÑOZ BENAVIDES ANEIBER	25-14	30	$2,377,516	$380,500	EPS037	30	$2,377,516	$95,200	CCF63	30	$2,377,516	$95,200	14-4	30	$2,377,516	$165,500	30	$0	$0
202	CC	1124861325	MUÑOZ MAYA FREDY JEYSSON	230301	30	$2,432,201	$389,200	EPS037	30	$2,432,201	$97,300	CCF63	30	$2,432,201	$97,300	14-4	30	$2,432,201	$169,300	30	$0	$0
203	CC	1061738891	MUÑOZ JOAQUI GUSTAVO ADOLFO	230301	30	$3,376,809	$540,300	ESSC18	30	$3,376,809	$135,100	CCF63	30	$3,376,809	$135,100	14-4	30	$3,376,809	$235,100	30	$0	$0
204	CC	5348860	MUÑOZ RAUL	230201	30	$2,273,855	$363,900	EPSIC5	30	$2,273,855	$91,000	CCF63	30	$2,273,855	$91,000	14-4	30	$2,273,855	$158,300	30	$0	$0
205	CC	18403072	MURCIA CARDONA DIEGO FERNANDO	25-14	1	$134,719	$21,600	EPS002	1	$134,719	$0	CCF63	1	$0	$0	14-4	1	$134,719	$0	1	$0	$0
206	CC	18403072	MURCIA CARDONA DIEGO FERNANDO	25-14	29	$4,641,540	$742,700	EPS002	29	$4,641,540	$185,700	CCF63	29	$4,641,540	$185,700	14-4	29	$4,641,540	$323,100	29	$0	$0
207	CC	1122725604	NARVAEZ ORTIZ EDIVER ALEXANDER	230301	30	$2,404,178	$384,700	ESSC18	30	$2,404,178	$96,200	CCF63	30	$2,404,178	$96,200	14-4	30	$2,404,178	$167,400	30	$0	$0
208	CC	1124850558	NARVAEZ ALVAREZ FABIO LEONEL	230301	30	$2,187,304	$350,000	ESSC18	30	$2,187,304	$87,500	CCF63	30	$2,187,304	$87,500	14-4	30	$2,187,304	$152,300	30	$0	$0
209	CC	1124856687	NARVAEZ PANTOJA JIMMY DANILO	230301	2	$116,727	$18,700	ESSC18	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$0	$0	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
210	CC	1124856687	NARVAEZ PANTOJA JIMMY DANILO	230301	28	$2,453,986	$392,700	ESSC18	28	$2,453,986	$98,200	CCF63	28	$2,453,986	$98,200	14-4	28	$2,453,986	$170,800	28	$0	$0
211	CC	8031405	OCHOA CORREA JUAN GABRIEL	230201	2	$984,666	$167,600	EPS010	2	$984,666	$39,400	CCF63	2	$984,666	$39,400	14-4	2	$984,666	$0	2	$0	$0
212	CC	8031405	OCHOA CORREA JUAN GABRIEL	230201	28	$13,785,334	$2,343,700	EPS010	28	$13,785,334	$551,500	CCF63	28	$13,785,333	$551,500	14-4	28	$13,785,334	$959,500	28	$0	$0
213	CC	1006957011	ORDOÑEZ GARAVITO ALEX	230301	29	$2,128,941	$340,700	EPS037	29	$2,128,941	$85,200	CCF63	29	$2,128,941	$85,200	14-4	29	$2,128,941	$148,200	29	$0	$0
214	CC	1006957011	ORDOÑEZ GARAVITO ALEX	230301	1	$63,758	$10,300	EPS037	1	$63,758	$0	CCF63	1	$0	$0	14-4	1	$63,758	$0	1	$0	$0
215	CC	1058666433	ORTEGA RIVERA JEFERSON FERNANDO	230301	2	$116,727	$18,700	EPSIC5	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$0	$0	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
216	CC	1058666433	ORTEGA RIVERA JEFERSON FERNANDO	230301	2	$116,727	$18,700	EPSIC5	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$0	$0	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
217	CC	1058666433	ORTEGA RIVERA JEFERSON FERNANDO	230301	12	$700,363	$112,100	EPSIC5	12	$700,363	$28,100	CCF63	12	$0	$0	14-4	12	$700,363	$0	12	$0	$0
218	CC	1058666433	ORTEGA RIVERA JEFERSON FERNANDO	230301	12	$858,209	$137,400	EPSIC5	12	$858,209	$34,400	CCF63	12	$858,209	$34,400	14-4	12	$858,209	$59,800	12	$0	$0
219	CC	1058666433	ORTEGA RIVERA JEFERSON FERNANDO	230301	1	$61,769	$9,900	EPSIC5	1	$61,769	$0	CCF63	1	$0	$0	14-4	1	$61,769	$0	1	$0	$0
220	CC	1058666433	ORTEGA RIVERA JEFERSON FERNANDO	230301	1	$61,769	$9,900	EPSIC5	1	$61,769	$0	CCF63	1	$0	$0	14-4	1	$61,769	$0	1	$0	$0
221	CC	1124863576	ORTEGA PORTILLO JHON CRISTHIAN	230301	7	$466,908	$74,800	ESSC18	7	$466,908	$18,700	CCF63	7	$0	$0	14-4	7	$466,908	$0	7	$0	$0
222	CC	1124863576	ORTEGA PORTILLO JHON CRISTHIAN	230301	18	$1,844,219	$295,100	ESSC18	18	$1,844,219	$73,800	CCF63	18	$1,844,219	$73,800	14-4	18	$1,844,219	$128,400	18	$0	$0
223	CC	1124863576	ORTEGA PORTILLO JHON CRISTHIAN	230301	2	$116,727	$18,700	ESSC18	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$0	$0	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
224	CC	1124863576	ORTEGA PORTILLO JHON CRISTHIAN	230301	3	$175,091	$28,100	ESSC18	3	$175,091	$7,100	CCF63	3	$0	$0	14-4	3	$175,091	$0	3	$0	$0
225	CC	1127078426	ORTEGA PORTILLA LUIS MARIO	230301	30	$3,222,847	$515,700	EPS037	30	$3,222,847	$129,000	CCF63	30	$3,222,847	$129,000	14-4	30	$3,222,847	$140,200	30	$0	$0
226	CC	1080048788	ORTIZ BARREIRO JIMMY BIANEY	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC18	1	$58,364	$2,400	CCF63	1	$0	$0	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
227	CC	1080048788	ORTIZ BARREIRO JIMMY BIANEY	230301	2	$116,727	$18,700	ESSC18	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$0	$0	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
228	CC	1080048788	ORTIZ BARREIRO JIMMY BIANEY	230301	27	$2,059,966	$329,600	ESSC18	27	$2,059,966	$82,400	CCF63	27	$2,059,966	$82,400	14-4	27	$2,059,966	$143,400	27	$0	$0
229	CC	12749069	ORTIZ BOTINA LUIS HERNAN	230301	30	$2,692,405	$430,800	EPS037	30	$2,692,405	$107,700	CCF63	30	$2,692,405	$107,700	14-4	30	$2,692,405	$187,400	30	$0	$0
230	CC	1048044633	OSORIO ORTIZ NELSON ALBERTO	230301	30	$2,584,691	$413,600	EPS005	30	$2,584,691	$103,400	CCF63	30	$2,584,691	$103,400	14-4	30	$2,584,691	$179,900	30	$0	$0
231	CC	1063590818	OSPINA RENDON JHON LEDER	230301	4	$280,133	$44,900	EPS037	4	$280,133	$11,300	CCF63	4	$280,133	$11,300	14-4	4	$280,133	$0	4	$0	$0
232	CC	1063590818	OSPINA RENDON JHON LEDER	230301	26	$2,410,181	$385,700	EPS037	26	$2,410,181	$96,500	CCF63	26	$2,410,181	$96,500	14-4	26	$2,410,181	$167,800	26	$0	$0
233	CC	1124860970	PACHICHANA FIGUEROA HAIMEN HORACIO	230301	30	$2,293,752	$367,100	ESSC18	30	$2,293,752	$91,800	CCF63	30	$2,293,752	$91,800	14-4	30	$2,293,752	$159,700	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
234	CC	98346493	PALACIOS CABRERA HUGO FREDY	25-14	30	$3,651,965	$584,400	EPS037	30	$3,651,965	$146,100	CCF63	30	$3,651,965	$146,100	14-4	30	$3,651,965	$254,200	30	$0	$0
235	CC	1125409679	PANTOJA IPIA EDUAR ARLEY	230301	30	$2,384,281	$381,500	EPSIC5	30	$2,384,281	$95,400	CCF63	30	$2,384,281	$95,400	14-4	30	$2,384,281	$166,000	30	$0	$0
236	CC	1006663100	PANTOJA JOJOA JHONIER ALEXANDER	230301	30	$2,276,839	$364,300	EPSIC5	30	$2,276,839	$91,100	CCF63	30	$2,276,839	$91,100	14-4	30	$2,276,839	$158,500	30	$0	$0
237	CC	1006961914	PAREDES OSPINA WILLIAM DAVID	230301	21	$1,343,687	$215,000	ESSC18	21	$1,343,687	$53,800	CCF63	21	$1,343,687	$53,800	14-4	21	$1,343,687	$93,600	21	$0	$0
238	CC	1087961164	PARRA GUAITARILLA ROBINSON JHONATAN	230201	30	$4,003,048	$640,500	EPS037	30	$4,003,048	$160,200	CCF63	30	$4,003,048	$160,200	14-4	30	$4,003,048	$278,700	30	$0	$0
239	CC	1216723881	PEÑA GRACIANO BRANDO ANDRES	230201	14	$1,201,000	$192,200	EPS010	14	$1,201,000	$48,100	CCF63	14	$1,201,000	$48,100	14-4	14	$1,201,000	$83,600	14	$0	$0
240	CC	1125180584	PEÑA MUCHACHASOY YORMAN ANDRES	230301	30	$2,481,775	$397,100	EPS037	30	$2,481,775	$99,300	CCF63	30	$2,481,775	$99,300	14-4	30	$2,481,775	$172,800	30	$0	$0
241	CC	18371422	PEREZ GIRALDO ANDRES MAURICIO	230301	30	$9,474,000	$1,610,700	EPS005	30	$9,474,000	$379,000	CCF63	30	$9,474,000	$379,000	14-4	30	$9,474,000	$659,400	30	$0	$0
242	CC	1125410692	PEREZ CAICEDO ELIAS	231001	4	$489,600	$78,400	EPS037	4	$489,600	$19,600	CCF63	4	$489,600	$19,600	14-4	4	$489,600	$0	4	$0	$0
243	CC	1125410692	PEREZ CAICEDO ELIAS	231001	26	$3,182,400	$509,200	EPS037	26	$3,182,400	$127,300	CCF63	26	$3,182,400	$127,300	14-4	26	$3,182,400	$16,700	26	$0	$0
244	CC	1124848328	PEREZ GOMEZ HAMILTON ALEX	230301	30	$2,246,994	$359,600	EPS037	30	$2,246,994	$89,900	CCF63	30	$2,246,994	$89,900	14-4	30	$2,246,994	$156,400	30	$0	$0
245	CC	1122723107	PEREZ MONTERO WILMER EXLEIDER	230301	11	$700,362	$112,100	ESSC18	11	$700,362	$28,100	CCF63	11	$0	$0	14-4	11	$700,362	$0	11	$0	$0
246	CC	1122723107	PEREZ MONTERO WILMER EXLEIDER	230301	1	$1,154,006	$184,700	ESSC18	1	$1,154,006	$46,200	CCF63	1	$1,154,006	$46,200	14-4	1	$1,154,006	$80,400	1	$0	$0
247	CC	1122723107	PEREZ MONTERO WILMER EXLEIDER	230301	1	$64,248	$10,300	ESSC18	1	$64,248	$0	CCF63	1	$0	$0	14-4	1	$64,248	$0	1	$0	$0
248	CC	1122723107	PEREZ MONTERO WILMER EXLEIDER	230301	3	$192,743	$30,900	ESSC18	3	$192,743	$0	CCF63	3	$0	$0	14-4	3	$192,743	$0	3	$0	$0
249	CC	1122723107	PEREZ MONTERO WILMER EXLEIDER	230301	14	$899,467	$144,000	ESSC18	14	$899,467	$0	CCF63	14	$0	$0	14-4	14	$899,467	$0	14	$0	$0
250	CC	1006843253	PORTILLA ALVARADO JHEN ANDERSON	230301	30	$2,391,444	$382,700	ESSC18	30	$2,391,444	$95,700	CCF63	30	$2,391,444	$95,700	14-4	30	$2,391,444	$166,500	30	$0	$0
251	CC	1087958615	PORTILLO AREBALO JOSE ALEJANDRO	230301	6	$494,400	$79,200	EPS037	6	$494,400	$19,800	CCF63	6	$494,400	$19,800	14-4	6	$494,400	$0	6	$0	$0
252	CC	1087958615	PORTILLO AREBALO JOSE ALEJANDRO	230301	24	$2,537,545	$406,100	EPS037	24	$2,537,545	$101,600	CCF63	24	$2,537,545	$101,600	14-4	24	$2,537,545	$176,700	24	$0	$0
253	CC	87514934	PUENAYAN AREVALO RICHARD ANDRES	230301	25	$2,268,809	$363,100	EPSIC5	25	$2,268,809	$90,800	CCF63	25	$2,268,809	$90,800	14-4	25	$2,268,809	$158,000	25	$0	$0
254	CC	87514934	PUENAYAN AREVALO RICHARD ANDRES	230301	1	$82,400	$13,200	EPSIC5	1	$82,400	$3,300	CCF63	1	$82,400	$3,300	14-4	1	$82,400	$0	1	$0	$0
255	CC	87514934	PUENAYAN AREVALO RICHARD ANDRES	230301	4	$329,600	$52,800	EPSIC5	4	$329,600	$13,200	CCF63	4	$329,600	$13,200	14-4	4	$329,600	$0	4	$0	$0
256	CC	1006948389	QUINTERO ACEVEDO JUAN JOSE	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF63	1	$58,363	$2,400	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
257	CC	1006948389	QUINTERO ACEVEDO JUAN JOSE	230301	25	$1,815,901	$290,600	EPS037	25	$1,815,901	$72,700	CCF63	25	$1,815,901	$72,700	14-4	25	$1,815,901	$126,400	25	$0	$0
258	CC	1006948389	QUINTERO ACEVEDO JUAN JOSE	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF63	1	$58,363	$2,400	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
259	CC	1006948389	QUINTERO ACEVEDO JUAN JOSE	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF63	1	$58,363	$2,400	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
260	CC	1006948389	QUINTERO ACEVEDO JUAN JOSE	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF63	1	$58,363	$2,400	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
261	CC	1006948389	QUINTERO ACEVEDO JUAN JOSE	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF63	1	$58,363	$2,400	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
262	CC	4614781	QUINTERO FERRER LEONARDO ENRIQUE	230301	30	$2,269,278	$363,100	EPS037	30	$2,269,278	$90,800	CCF63	30	$2,269,278	$90,800	14-4	30	$2,269,278	$98,800	30	$0	$0
263	CC	1124857020	QUIROZ HERNANDEZ FELIX RUBIEL	25-14	30	$2,364,385	$378,400	ESSC18	30	$2,364,385	$94,600	CCF63	30	$2,364,385	$94,600	14-4	30	$2,364,385	$164,600	30	$0	$0
264	CC	1122733150	RAMIREZ HURTADO JEFERSON	25-14	26	$2,013,540	$322,200	EPSIC5	26	$2,013,540	$80,600	CCF63	26	$2,013,540	$80,600	14-4	26	$2,013,540	$140,200	26	$0	$0
265	CC	1122733150	RAMIREZ HURTADO JEFERSON	25-14	4	$292,702	$46,900	EPSIC5	4	$292,702	$0	CCF63	4	$0	$0	14-4	4	$292,702	$0	4	$0	$0
266	CC	1098725885	RAMOS RONDON DUVAN JEYDER	230301	4	$300,000	$48,000	EPS037	4	$300,000	$12,000	CCF63	4	$300,000	$12,000	14-4	4	$300,000	$0	4	$0	$0
267	CC	1098725885	RAMOS RONDON DUVAN JEYDER	230301	26	$2,229,545	$356,800	EPS037	26	$2,229,545	$89,200	CCF63	26	$2,229,545	$89,200	14-4	26	$2,229,545	$155,200	26	$0	$0
268	CC	18112559	RAMOS REVELO HERNANDO	230201	5	$381,833	$61,100	ESSC18	5	$381,833	$15,300	CCF63	5	$381,833	$15,300	14-4	5	$381,833	$0	5	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
269	CC	18112559	RAMOS REVELO HERNANDO	230201	25	$3,268,975	$523,100	ESSC18	25	$3,268,975	$130,800	CCF63	25	$2,622,848	$105,000	14-4	25	$3,268,975	$142,300	25	$0	$0
270	CC	1087960194	RAMOS SEGOVIA LEIDY YAMILE	230301	30	$2,541,000	$406,600	EPS037	30	$2,541,000	$101,700	CCF63	30	$2,541,000	$101,700	14-4	30	$2,541,000	$13,300	30	$0	$0
271	CC	1059710637	RESTREPO GUERRERO JHON FAVER	230301	8	$654,933	$104,800	EPS037	8	$654,933	$26,200	CCF63	8	$654,933	$26,200	14-4	8	$654,933	$0	8	$0	$0
272	CC	1059710637	RESTREPO GUERRERO JHON FAVER	230301	22	$1,801,067	$288,200	EPS037	22	$1,801,067	$72,100	CCF63	22	$1,801,067	$72,100	14-4	22	$1,801,067	$78,400	22	$0	$0
273	CC	72236780	RIOS RUBIO REINALDO	25-14	30	$4,050,989	$648,200	EPS002	30	$4,050,989	$162,100	CCF63	30	$4,050,989	$162,100	14-4	30	$4,050,989	$282,000	30	$0	$0
274	CC	1020447826	RIVAS LOSADA MAIDY LORENA	230201	5	$896,000	$143,400	EPS010	5	$896,000	$35,900	CCF63	5	$896,000	$35,900	14-4	5	$896,000	$0	5	$0	$0
275	CC	1020447826	RIVAS LOSADA MAIDY LORENA	230201	25	$4,480,000	$716,800	EPS010	25	$4,480,000	$179,200	CCF63	25	$4,480,000	$179,200	14-4	25	$4,480,000	$23,400	25	$0	$0
276	CC	1075300110	RIVAS OSORIO YILBER ADRIAN	230201	4	$710,267	$113,700	EPS005	4	$710,267	$28,500	CCF63	4	$1,042,131	$41,700	14-4	4	$710,267	$49,500	4	$0	$0
277	CC	1075300110	RIVAS OSORIO YILBER ADRIAN	230201	2	$229,734	$36,800	EPS005	2	$229,734	$0	CCF63	2	$0	$0	14-4	2	$229,734	$0	2	$0	$0
278	CC	97426370	RIVERA OLMOS FLORENCIO	230301	8	$466,908	$74,800	EPS037	8	$466,908	$18,700	CCF63	8	$466,908	$18,700	14-4	8	$466,908	$0	8	$0	$0
279	CC	97426370	RIVERA OLMOS FLORENCIO	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF63	1	$29,181	$1,200	14-4	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0
280	CC	97426370	RIVERA OLMOS FLORENCIO	230301	21	$1,225,634	$196,200	EPS037	21	$1,225,634	$49,100	CCF63	21	$0	$0	14-4	21	$1,225,634	$0	21	$0	$0
281	CC	1124852563	RODRIGUEZ MUÑOZ VICTOR ALBEIRO	230301	30	$3,122,355	$499,600	EPS037	30	$3,122,355	$124,900	CCF63	30	$3,122,355	$124,900	14-4	30	$3,122,355	$135,900	30	$0	$0
282	CC	1007344608	RODRIGUEZ BENAVIDES WILLIAN ANDRES	230301	23	$2,215,501	$354,500	ESSC18	23	$2,215,501	$88,700	CCF63	23	$2,215,501	$88,700	14-4	23	$2,215,501	$96,400	23	$0	$0
283	CC	1007344608	RODRIGUEZ BENAVIDES WILLIAN ANDRES	230301	3	$229,100	$36,700	ESSC18	3	$229,100	$9,200	CCF63	3	$229,100	$9,200	14-4	3	$229,100	$0	3	$0	$0
284	CC	1007344608	RODRIGUEZ BENAVIDES WILLIAN ANDRES	230301	4	$305,466	$48,900	ESSC18	4	$305,466	$12,300	CCF63	4	$305,466	$12,300	14-4	4	$305,466	$0	4	$0	$0
285	CC	1105612732	ROJAS BOHORQUEZ ALLIVER	230201	4	$279,066	$44,700	EPS037	4	$279,066	$11,200	CCF63	4	$279,066	$11,200	14-4	4	$279,066	$0	4	$0	$0
286	CC	1105612732	ROJAS BOHORQUEZ ALLIVER	230201	26	$2,412,896	$386,100	EPS037	26	$2,412,896	$96,600	CCF63	26	$2,412,896	$96,600	14-4	26	$2,412,896	$168,000	26	$0	$0
287	CC	1124863841	ROMO BRAVO JONATHAN GABRIEL	25-14	30	$2,726,901	$436,400	EPSIC5	30	$2,726,901	$109,100	CCF63	30	$2,726,901	$109,100	14-4	30	$2,726,901	$189,800	30	$0	$0
288	CC	1124862490	ROSERO BEDOYA JHOIMER HERNAN	230301	30	$2,533,507	$405,400	EPS037	30	$2,533,507	$101,400	CCF63	30	$2,533,507	$101,400	14-4	30	$2,533,507	$176,400	30	$0	$0
289	CC	98393128	ROSERO MUÑOZ JOSE GUILLERMO	230201	14	$1,366,500	$218,700	EPS037	14	$1,366,500	$54,700	CCF63	14	$1,366,500	$54,700	14-4	14	$1,366,500	$95,200	14	$0	$0
290	CC	1124866813	RUALES ERAZO MARIA VALENTINA	230301	1	$65,833	$10,600	EPS037	1	$65,833	$2,700	CCF63	1	$65,833	$2,700	14-4	1	$65,833	$0	1	$0	$0
291	CC	1124866813	RUALES ERAZO MARIA VALENTINA	230301	29	$1,993,328	$319,000	EPS037	29	$1,993,328	$79,800	CCF63	29	$1,993,328	$79,800	14-4	29	$1,993,328	$10,500	29	$0	$0
292	CC	1115089666	RUBIO SUAREZ JHON EDINSSON	230301	6	$619,480	$99,200	EPS002	6	$619,480	$24,800	CCF63	6	$602,467	$24,100	14-4	6	$619,480	$43,200	6	$0	$0
293	CC	1123325279	RUIZ MORALES LUIS ARBEY	230201	27	$1,823,196	$291,800	EPS037	27	$1,823,196	$73,000	CCF63	27	$1,823,196	$73,000	14-4	27	$1,823,196	$126,900	27	$0	$0
294	CC	1123325279	RUIZ MORALES LUIS ARBEY	230201	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$0	CCF63	1	$0	$0	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
295	CC	70552517	SALAZAR PARRA ANIBAL DE JESUS		0	$0	$0	EPS010	30	$6,243,564	$249,800	CCF63	30	$6,243,564	$249,800	14-4	30	$6,243,564	$434,600	30	$0	$0
296	CC	1097729157	SALAZAR JIMENEZ HERMIS HERNANDO	230301	30	$2,600,359	$416,100	EPS037	30	$2,600,359	$104,100	CCF63	30	$2,600,359	$104,100	14-4	30	$2,600,359	$181,000	30	$0	$0
297	CC	14899096	SALAZAR JOHN ALEXANDER	230301	30	$7,090,000	$1,205,400	EPS018	30	$7,090,000	$283,600	CCF63	30	$7,090,000	$283,600	14-4	30	$7,090,000	$493,500	30	$0	$0
298	CC	1122341957	SALAZAR MELENDEZ OSWALDO JAVIER	230301	30	$2,313,648	$370,200	ESSC62	30	$2,313,648	$92,600	CCF63	30	$2,313,648	$92,600	14-4	30	$2,313,648	$161,100	30	$0	$0
299	CC	1125178821	SALINAS VALENCIA RONAL SNEIDER	230301	2	$116,727	$18,700	ESSC18	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$0	$0	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
300	CC	1125178821	SALINAS VALENCIA RONAL SNEIDER	230301	11	$641,999	$102,800	ESSC18	11	$641,999	$25,700	CCF63	11	$0	$0	14-4	11	$641,999	$0	11	$0	$0
301	CC	1125178821	SALINAS VALENCIA RONAL SNEIDER	230301	15	$933,816	$149,500	ESSC18	15	$933,816	$37,400	CCF63	15	$0	$0	14-4	15	$933,816	$0	15	$0	$0
302	CC	1125178821	SALINAS VALENCIA RONAL SNEIDER	230301	2	$116,727	$18,700	ESSC18	2	$116,727	$4,700	CCF63	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$116,727	$8,200	2	$0	$0
303	CC	1083911927	SAMBONI NARVAEZ CRISTIAN ALEJANDRO	230301	30	$2,361,600	$377,900	EPS037	30	$2,361,600	$94,500	CCF63	30	$2,361,600	$94,500	14-4	30	$2,361,600	$164,400	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
304	CC	98326488	SANTACRUZ ANDRADE FRANCO JAVIER	230301	29	$2,528,363	$404,600	EPS037	29	$2,528,363	$101,200	CCF63	29	$2,528,363	$101,200	14-4	29	$2,528,363	$176,000	29	$0	$0
305	CC	98326488	SANTACRUZ ANDRADE FRANCO JAVIER	230301	1	$88,263	$14,200	EPS037	1	$88,263	$0	CCF63	1	$0	$0	14-4	1	$88,263	$0	1	$0	$0
306	CC	1124856095	SANTACRUZ CHANCHI JOSE EULICER	230301	28	$1,929,312	$308,700	ESSC18	28	$1,929,312	$77,200	CCF63	28	$1,929,312	$77,200	14-4	28	$1,929,312	$134,300	28	$0	$0
307	CC	18955658	SARABIA PICON EMIRO ALFONSO	230301	30	$2,187,304	$350,000	ESSC18	30	$2,187,304	$87,500	CCF63	30	$2,187,304	$87,500	14-4	30	$2,187,304	$152,300	30	$0	$0
308	CC	1006955775	SAYALPUD SIERRA BRAYAN STYBEN	25-14	30	$2,207,201	$353,200	EPS037	30	$2,207,201	$88,300	CCF63	30	$2,207,201	$88,300	14-4	30	$2,207,201	$153,700	30	$0	$0
309	CC	1124863575	SEGURA AREVALO RUFO	230301	14	$875,452	$140,100	ESSC18	14	$875,452	$35,100	CCF63	14	$875,452	$35,100	14-4	14	$875,452	$61,000	14	$0	$0
310	CC	1007462559	SEMANATE QUIJANO APOLONIO	230301	30	$2,207,201	$353,200	ESSC62	30	$2,207,201	$88,300	CCF63	30	$2,207,201	$88,300	14-4	30	$2,207,201	$153,700	30	$0	$0
311	CC	1049629896	SEPULVEDA PALACIOS JESUS MARIA	230301	5	$430,166	$68,900	EPS010	5	$430,166	$17,300	CCF63	5	$430,166	$17,300	14-4	5	$430,166	$0	5	$0	$0
312	CC	1049629896	SEPULVEDA PALACIOS JESUS MARIA	230301	25	$2,823,457	$451,800	EPS010	25	$2,823,457	$113,000	CCF63	25	$2,823,457	$113,000	14-4	25	$2,823,457	$196,600	25	$0	$0
313	CC	1006955920	SERNA FIGUEROA GEFERSON ALEXANDER	230301	30	$2,310,664	$369,800	CCFC33	30	$2,310,664	$92,500	CCF63	30	$2,310,664	$92,500	14-4	30	$2,310,664	$160,900	30	$0	$0
314	CC	17414485	SERNA OVIEDO OVER	25-14	4	$364,400	$58,400	EPS037	4	$364,400	$14,600	CCF63	4	$364,400	$14,600	14-4	4	$364,400	$0	4	$0	$0
315	CC	17414485	SERNA OVIEDO OVER	25-14	20	$3,265,107	$522,500	EPS037	20	$3,265,107	$130,700	CCF63	20	$4,194,472	$167,800	14-4	20	$3,265,107	$227,300	20	$0	$0
316	CC	1075235686	SERRATO CANO YEISON ENRIQUE	231001	30	$2,582,452	$413,200	EPS005	30	$2,582,452	$103,300	CCF63	30	$2,582,452	$103,300	14-4	30	$2,582,452	$179,800	30	$0	$0
317	CC	1006789585	SOLARTE VACA JEFERSON SEBASTIAN	25-14	21	$1,363,584	$218,200	EPS037	21	$1,363,584	$54,600	CCF63	21	$1,363,584	$54,600	14-4	21	$1,363,584	$95,000	21	$0	$0
318	CC	1105789639	SUAREZ VILLARREAL KATHERINE	230301	29	$2,622,567	$419,700	EPS037	29	$2,622,567	$105,000	CCF63	29	$2,622,567	$105,000	14-4	29	$2,622,567	$182,600	29	$0	$0
319	CC	1105789639	SUAREZ VILLARREAL KATHERINE	230301	1	$90,433	$14,500	EPS037	1	$90,433	$3,700	CCF63	1	$90,433	$3,700	14-4	1	$90,433	$0	1	$0	$0
320	CC	1103949187	TAMAYO LAZARO JESUS ANGEL	230301	30	$3,358,072	$537,300	EPS037	30	$3,358,072	$134,400	CCF63	30	$3,358,072	$134,400	14-4	30	$3,358,072	$233,800	30	$0	$0
321	CC	1006947903	TEZ MENDEZ YEISON CAMILO	230301	30	$2,590,609	$414,500	ESSC18	30	$2,590,609	$103,700	CCF63	30	$2,590,609	$103,700	14-4	30	$2,590,609	$180,400	30	$0	$0
322	CC	1007478159	TIMANA QUISOBONY RENSON ORLANDO	25-14	30	$2,227,098	$356,400	EPSIC5	30	$2,227,098	$89,100	CCF63	30	$2,227,098	$89,100	14-4	30	$2,227,098	$155,100	30	$0	$0
323	CC	98714281	TOBON GARCIA HECTOR ALONSO	230201	4	$344,133	$55,100	EPS010	4	$344,133	$13,800	CCF63	4	$344,133	$13,800	14-4	4	$344,133	$0	4	$0	$0
324	CC	98714281	TOBON GARCIA HECTOR ALONSO	230201	20	$2,485,191	$397,700	EPS010	20	$2,485,191	$99,500	CCF63	20	$2,485,191	$99,500	14-4	20	$2,485,191	$173,000	20	$0	$0
325	CC	1006788676	TORIJANO MURCIA DIEGO ARMANDO	230301	30	$2,286,788	$365,900	EPS037	30	$2,286,788	$91,500	CCF63	30	$2,286,788	$91,500	14-4	30	$2,286,788	$159,200	30	$0	$0
326	CC	1004214043	TORO MERA ALVARO JAVIER	230301	30	$2,296,736	$367,500	EPS005	30	$2,296,736	$91,900	CCF63	30	$2,296,736	$91,900	14-4	30	$2,296,736	$159,900	30	$0	$0
327	CC	1028018292	TORRES CELADA ILDYN SLEYDER	230201	30	$2,109,044	$337,500	EPS037	30	$2,109,044	$84,400	CCF63	30	$2,109,044	$84,400	14-4	30	$2,109,044	$91,800	30	$0	$0
328	CC	1040379081	TUBERQUIA RAMIRES EDLER	230201	4	$260,400	$41,700	EPS037	4	$260,400	$10,500	CCF63	4	$260,400	$10,500	14-4	4	$260,400	$0	4	$0	$0
329	CC	1040379081	TUBERQUIA RAMIRES EDLER	230201	26	$2,212,660	$354,100	EPS037	26	$2,212,660	$88,600	CCF63	26	$2,212,660	$88,600	14-4	26	$2,212,660	$154,100	26	$0	$0
330	CC	1040358821	TUBERQUIA RAMIREZ WILFREDO	230301	4	$299,600	$48,000	EPS037	4	$299,600	$12,000	CCF63	4	$299,600	$12,000	14-4	4	$299,600	$0	4	$0	$0
331	CC	1040358821	TUBERQUIA RAMIREZ WILFREDO	230301	26	$2,520,215	$403,300	EPS037	26	$2,520,215	$100,900	CCF63	26	$2,520,215	$100,900	14-4	26	$2,520,215	$175,500	26	$0	$0
332	CC	1124865352	URBANO LOAIZA HEYDER DAYAN	230301	30	$2,497,891	$399,700	ESSC18	30	$2,497,891	$100,000	CCF63	30	$2,497,891	$100,000	14-4	30	$2,497,891	$173,900	30	$0	$0
333	CC	1022954689	URBINA SANTACRUZ EDWIN ALEXANDER	230301	28	$1,921,353	$307,500	EPS005	28	$1,921,353	$76,900	CCF63	28	$1,921,353	$76,900	14-4	28	$1,921,353	$133,800	28	$0	$0
334	CC	18131234	VALLEJO DIAZ EDWIN JAVIER	230301	27	$2,213,170	$354,200	ESSC18	27	$2,213,170	$88,600	CCF63	27	$2,213,170	$88,600	14-4	27	$2,213,170	$154,100	27	$0	$0
335	CC	18131234	VALLEJO DIAZ EDWIN JAVIER	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC18	1	$58,364	$0	CCF63	1	$0	$0	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
336	CC	18131234	VALLEJO DIAZ EDWIN JAVIER	230301	2	$116,727	$18,700	ESSC18	2	$116,727	$0	CCF63	2	$0	$0	14-4	2	$116,727	$0	2	$0	$0
337	CC	1105793427	VANEGAS RIAÑOS CATHERINNE MAYERLI	230201	30	$2,339,117	$374,300	EPS037	30	$2,339,117	$93,600	CCF63	30	$2,339,117	$93,600	14-4	30	$2,339,117	$162,900	30	$0	$0
338	CC	1086920426	VARGAS LOPEZ MAIKOL STIVEN	230201	12	$758,726	$121,400	ESSC18	12	$758,726	$30,400	CCF63	12	$758,726	$30,400	14-4	12	$758,726	$52,900	12	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
339	CC	1002129549	VASQUEZ CUESVAS IVAN DAVID	230301	24	$1,903,483	$304,600	EPS037	24	$1,903,483	$76,200	CCF63	24	$3,921,628	$156,900	14-4	24	$1,903,483	$132,500	24	$0	$0
340	CC	1127076510	VELASQUEZ NARVAEZ EIDER SEBASTIAN	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC18	1	$58,364	$2,400	CCF63	1	$0	$0	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
341	CC	1127076510	VELASQUEZ NARVAEZ EIDER SEBASTIAN	230301	3	$175,091	$28,100	ESSC18	3	$175,091	$7,100	CCF63	3	$0	$0	14-4	3	$175,091	$0	3	$0	$0
342	CC	1127076510	VELASQUEZ NARVAEZ EIDER SEBASTIAN	230301	3	$175,091	$28,100	ESSC18	3	$175,091	$7,100	CCF63	3	$0	$0	14-4	3	$175,091	$0	3	$0	$0
343	CC	1127076510	VELASQUEZ NARVAEZ EIDER SEBASTIAN	230301	5	$291,818	$46,700	ESSC18	5	$291,818	$11,700	CCF63	5	$0	$0	14-4	5	$291,818	$0	5	$0	$0
344	CC	1127076510	VELASQUEZ NARVAEZ EIDER SEBASTIAN	230301	5	$291,818	$46,700	ESSC18	5	$291,818	$11,700	CCF63	5	$0	$0	14-4	5	$291,818	$0	5	$0	$0
345	CC	1127076510	VELASQUEZ NARVAEZ EIDER SEBASTIAN	230301	5	$291,818	$46,700	ESSC18	5	$291,818	$11,700	CCF63	5	$0	$0	14-4	5	$291,818	$0	5	$0	$0
346	CC	1127076510	VELASQUEZ NARVAEZ EIDER SEBASTIAN	230301	6	$408,545	$65,400	ESSC18	6	$408,545	$16,400	CCF63	6	$0	$0	14-4	6	$408,545	$0	6	$0	$0
347	CC	1127076510	VELASQUEZ NARVAEZ EIDER SEBASTIAN	230301	1	$145,875	$23,400	ESSC18	1	$145,875	$5,900	CCF63	1	$145,875	$5,900	14-4	1	$145,875	$10,200	1	$0	$0
348	CC	1127076510	VELASQUEZ NARVAEZ EIDER SEBASTIAN	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC18	1	$58,364	$0	CCF63	1	$0	$0	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0
349	CC	1193101329	VILLAVICENCIO CASTRO STIVEN DARIO	230301	28	$1,931,302	$309,100	ESSC18	28	$1,931,302	$77,300	CCF63	28	$1,931,302	$77,300	14-4	28	$1,931,302	$134,500	28	$0	$0
350	CC	72155724	VILLEGAS VERGARA JOSE SILVESTRE	25-14	30	$2,832,582	$453,300	EPS037	30	$2,832,582	$113,400	CCF63	30	$2,832,582	$113,400	14-4	30	$2,832,582	$197,200	30	$0	$0
351	CC	1088736952	VILLOTA CASTILLO DAVID SEBASTIAN	230301	30	$2,753,761	$440,700	ESSC18	30	$2,753,761	$110,200	CCF63	30	$2,753,761	$110,200	14-4	30	$2,753,761	$191,700	30	$0	$0
352	CC	1085267088	VILLOTA UYAQUE JORGE ARMANDO	230301	30	$2,383,009	$381,300	EPS005	30	$2,383,009	$95,400	CCF63	30	$2,383,009	$95,400	14-4	30	$2,383,009	$165,900	30	$0	$0
353	CC	1123303277	VITERI CASTILLO LUIS CARLOS	230301	30	$2,658,083	$425,300	EPS002	30	$2,658,083	$106,400	CCF63	30	$2,658,083	$106,400	14-4	30	$2,658,083	$185,100	30	$0	$0
354	CC	87491961	YANDAR JOSSA WILLIAN ANDRES	230201	5	$350,166	$56,100	ESSC18	5	$350,166	$14,100	CCF63	5	$350,166	$14,100	14-4	5	$350,166	$0	5	$0	$0
355	CC	87491961	YANDAR JOSSA WILLIAN ANDRES	230201	24	$2,061,208	$329,800	ESSC18	24	$2,061,208	$82,500	CCF63	24	$2,061,208	$82,500	14-4	24	$2,061,208	$143,500	24	$0	$0
356	CC	87491961	YANDAR JOSSA WILLIAN ANDRES	230201	1	$81,498	$13,100	ESSC18	1	$81,498	$0	CCF63	1	$0	$0	14-4	1	$81,498	$0	1	$0	$0
357	CC	1124852239	ZAMBRANO DAGOBERTO	230301	30	$2,577,368	$412,400	EPS037	30	$2,577,368	$103,100	CCF63	30	$2,577,368	$103,100	14-4	30	$2,577,368	$179,400	30	$0	$0
358	CC	18184508	ZAMBRANO MUÑOZ DONALDO	25-14	30	$2,596,924	$415,600	EPS037	30	$2,596,924	$103,900	CCF63	30	$2,596,924	$103,900	14-4	30	$2,596,924	$180,800	30	$0	$0
359	CC	1124867348	ZAMBRANO RODRIGUEZ JHON FELIPE	230301	30	$2,013,602	$322,200	EPS037	30	$2,013,602	$80,600	CCF63	30	$2,013,602	$80,600	14-4	30	$2,013,602	$87,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(238)**			**$636,978,019**	**$102,318,900**			**$643,221,583**	**$25,565,400**			**$626,284,692**	**$25,064,800**			**$643,221,583**	**$38,113,900**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				237	$102,318,900	$0	$0	$102,318,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$3,499,600	$0	$0	$3,499,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	42	$18,737,200	$0	$0	$18,737,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	156	$64,211,000	$0	$0	$64,211,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	32	$15,871,100	$0	$0	$15,871,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				238	$38,113,900	$0	$0	$38,113,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	238	$38,113,900	$0	$0	$38,113,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				238	$25,064,800	$0	$0	$25,064,800
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	238	$25,064,800	$0	$0	$25,064,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				238	$25,565,400	$0	$0	$25,565,400
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$107,300	$0	$0	$107,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$180,900	$0	$0	$180,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	62	$5,514,700	$0	$0	$5,514,700
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	2	$127,600	$0	$0	$127,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	$2,002,100	$0	$0	$2,002,100
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	19	$1,440,500	$0	$0	$1,440,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$35,100	$0	$0	$35,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	111	$12,036,800	$0	$0	$12,036,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$117,400	$0	$0	$117,400
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$72,000	$0	$0	$72,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$283,600	$0	$0	$283,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$1,585,600	$0	$0	$1,585,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$2,061,800	$0	$0	$2,061,800
TOTAL				**238**	**$191,063,000**	**$0**	**$0**	**$191,063,000**

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que JOSSER FABIAN ARCOS REY identificado(a) con CC 1065892333 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A NI 890922447

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	222740852	9502429757	E	2026-04-14									X				L				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	1	16%	$81,100	$13,000
AFP	PORVENIR	3	16%	$243,300	$39,000
AFP	PORVENIR	26	16%	$3,127,235	$500,400
ARL	COLPATRIA ARP	1	0%	$81,100	$0
ARL	COLPATRIA ARP	3	0%	$243,300	$0
ARL	COLPATRIA ARP	26	6.96%	$3,127,235	$217,700
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	1	4%	$81,100	$3,300
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	3	4%	$243,300	$9,800
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	26	4%	$3,127,235	$125,100
EPS	SANITAS	1	4%	$81,100	$3,300
EPS	SANITAS	3	4%	$243,300	$9,800
EPS	SANITAS	26	4%	$3,127,235	$125,100

Este certificado se expide el día 2026-04-22 a las 02:36.

Certificados de Aportes

Se certifica que JOHN BEYCKKER CARO ECHAVARRIA identificado(a) con CC 13851758 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A NI 890922447

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	222740852	9502429757	E	2026-04-14									X				L				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	24	16%	$1,900,159	$304,100
AFP	PROTECCION	6	16%	$360,000	$57,600
ARL	COLPATRIA ARP	24	6.96%	$1,900,159	$132,300
ARL	COLPATRIA ARP	6	0%	$360,000	$0
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	24	4%	$1,900,159	$76,100
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	6	4%	$360,000	$14,400
EPS	NUEVA E.P.S.	24	4%	$1,900,159	$76,100
EPS	NUEVA E.P.S.	6	4%	$360,000	$14,400

Este certificado se expide el día 2026-04-22 a las 02:36.

Certificados de Aportes

Se certifica que JULIO HERNANDO GUSTIN DELGADO identificado(a) con CC 98395588 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A NI 890922447

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	222740852	9502429757	E	2026-04-14									X				L				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	24	16%	$2,567,890	$410,900
AFP	PROTECCION	6	16%	$530,000	$84,800
ARL	COLPATRIA ARP	24	6.96%	$2,567,890	$178,800
ARL	COLPATRIA ARP	6	0%	$530,000	$0
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	24	4%	$2,567,890	$102,800
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	6	4%	$530,000	$21,200
EPS	NUEVA E.P.S.	24	4%	$2,567,890	$102,800
EPS	NUEVA E.P.S.	6	4%	$530,000	$21,200

Este certificado se expide el día 2026-04-22 a las 02:36.

Certificados de Aportes

Se certifica que GUSTAVO ALBERTO JARAMILLO CEBALLOS identificado(a) con CC 8129450 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A NI 890922447

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	222740852	9502429757	E	2026-04-14													L				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	4	16%	$690,000	$110,400
AFP	PROTECCION	26	16%	$4,485,000	$717,600
ARL	COLPATRIA ARP	4	0%	$690,000	$0
ARL	COLPATRIA ARP	26	6.96%	$4,485,000	$312,200
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	4	4%	$690,000	$27,600
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	26	4%	$4,485,000	$179,400
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	4	4%	$690,000	$27,600
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	26	4%	$4,485,000	$179,400

Este certificado se expide el día 2026-04-22 a las 02:36.

Certificados de Aportes

Se certifica que HECTOR ALFONSO PARRA BERRIO identificado(a) con CC 92536594 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A NI 890922447

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	222740852	9502429757	E	2026-04-14									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$4,133,775	$661,500
ARL	COLPATRIA ARP	30	6.96%	$4,133,775	$287,800
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$4,133,775	$165,400
EPS	SANITAS	30	4%	$4,133,775	$165,400

Este certificado se expide el día 2026-04-22 a las 02:36.

Certificados de Aportes

Se certifica que LUIS ANIBAL PIARPUEZAN NAZATE identificado(a) con CC 87513093 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A NI 890922447

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	222740852	9502429757	E	2026-04-14									X				L				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	4	16%	$305,466	$48,900
AFP	PORVENIR	26	16%	$2,408,153	$385,400
ARL	COLPATRIA ARP	4	0%	$305,466	$0
ARL	COLPATRIA ARP	26	4.35%	$2,408,153	$104,800
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	4	4%	$305,466	$12,300
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	26	4%	$2,408,153	$96,400
EPS	MALLAMAS	4	4%	$305,466	$12,300
EPS	MALLAMAS	26	4%	$2,408,153	$96,400

Este certificado se expide el día 2026-04-22 a las 02:36.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que HUBER GUSTAVO QUISCUALTUD ORDOÑEZ identificado(a) con CC 1087415509 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A NI 890922447

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	222740852	9502429757	E	2026-04-14									X				L				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	22	16%	$2,451,451	$392,300
AFP	PORVENIR	8	16%	$706,666	$113,100
ARL	COLPATRIA ARP	22	6.96%	$2,451,451	$170,700
ARL	COLPATRIA ARP	8	0%	$706,666	$0
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	22	4%	$2,451,451	$98,100
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	8	4%	$706,666	$28,300
EPS	NUEVA E.P.S.	22	4%	$2,451,451	$98,100
EPS	NUEVA E.P.S.	8	4%	$706,666	$28,300

Este certificado se expide el día 2026-04-22 a las 02:36.

Certificados de Aportes

Se certifica que LINA MARCELA RODRIGUEZ TORRES identificado(a) con CC 1061723358 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A NI 890922447

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	222740852	9502429757	E	2026-04-14													L				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	6	16%	$1,102,200	$176,400
AFP	PORVENIR	24	16%	$4,408,800	$705,500
ARL	COLPATRIA ARP	6	0%	$1,102,200	$0
ARL	COLPATRIA ARP	24	6.96%	$4,408,800	$306,900
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	6	4%	$1,102,200	$44,100
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	24	4%	$4,408,800	$176,400
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	6	4%	$1,102,200	$44,100
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	24	4%	$4,408,800	$176,400

Este certificado se expide el día 2026-04-22 a las 02:36.

Certificados de Aportes

Se certifica que DAVID ALBERTO SALCEDO RODRIGUEZ identificado(a) con CC 1108928481 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A NI 890922447

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	222740852	9502429757	E	2026-04-14									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$3,362,390	$538,000
ARL	COLPATRIA ARP	30	4.35%	$3,362,390	$146,300
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$3,362,390	$134,500
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$3,362,390	$134,500

Este certificado se expide el día 2026-04-22 a las 02:36.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que ANCIZAR SANCHEZ AVILES identificado(a) con CC 1117511252 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A NI 890922447

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	222740852	9502429757	E	2026-04-14									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$3,477,982	$556,500
ARL	COLPATRIA ARP	30	4.35%	$3,477,982	$151,300
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$3,477,982	$139,200
EPS	SANITAS	30	4%	$3,477,982	$139,200

Este certificado se expide el día 2026-04-22 a las 02:36.

Certificados de Aportes

Se certifica que CARLOS URBANO VILLARREAL CASAS identificado(a) con CC 1098679475 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A NI 890922447

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	222740852	9502429757	E	2026-04-14									X				L				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	4	16%	$324,400	$52,000
AFP	PORVENIR	26	16%	$2,937,387	$470,000
ARL	COLPATRIA ARP	4	0%	$324,400	$0
ARL	COLPATRIA ARP	26	6.96%	$2,937,387	$204,500
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	4	4%	$324,400	$13,000
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	26	4%	$2,937,387	$117,500
EPS	NUEVA E.P.S.	4	4%	$324,400	$13,000
EPS	NUEVA E.P.S.	26	4%	$2,937,387	$117,500

Este certificado se expide el día 2026-04-22 a las 02:36.

Certificados de Aportes

Se certifica que CRISTIAN ARMANDO VILLOTA LOPEZ identificado(a) con CC 1086895176 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A NI 890922447

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	222740852	9502429757	E	2026-04-14									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$3,658,137	$585,400
ARL	COLPATRIA ARP	30	4.35%	$3,658,137	$159,200
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$3,658,137	$146,400
EPS	SANITAS	30	4%	$3,658,137	$146,400

Este certificado se expide el día 2026-04-22 a las 02:36.

Certificado de Aportes

Se certifica que MARIO ALEJANDRO BEDOYA MUÑOZ identificado(a) con CC 18130466 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	210078806	9502915516	E	2026-04-09																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$2,500,000	$400,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$2,500,000	$174,000
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$2,500,000	$100,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$2,500,000	$100,000

Este certificado se expide el día 2026-04-15 a las 08:53.

Certificado de Aportes

Se certifica que CESAR AUGUSTO GOMEZ ROJAS identificado(a) con CC 91252330 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	210078806	9502915516	E	2026-04-09																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$6,000,000	$960,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$6,000,000	$417,600
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$6,000,000	$240,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$6,000,000	$240,000

Este certificado se expide el día 2026-04-15 a las 08:52.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900982213-1	Sermar Ingenieros SAS	CLL 128 BIS NO 131 B 15	3224259346	administrativa@sermaring.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73730304	09/04/2026	4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$7,659,680	$2.367.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	96.000	0		0		0	2	200	0	96.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	140.400	0		0		0	2	200	0	140.600	2
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	67.900	0		0		0	2	100	0	68.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.225.800	0	0	0	0	2	1.700	0	1.227.500	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	529.200				529.200	2	800	530.000			5.292	530.000	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	96.000	2	200	96.200	1
CCF63	Comfamiliar Putumayo	891200337-8	208.300	2	300	208.600	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	304.300	304.800
Pensión	1	1.225.800	1.227.500
Riesgos Laborales	1	529.200	530.000
CCF	2	304.300	304.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.363.600	2.367.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900982213-1	Sermar Ingenieros SAS	CLL 128 BIS NO 131 B 15	3224259346	administrativa@sermaring.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73730304	09/04/2026	4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$7,659,680	$2.367.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1086500484	ASCUNTAR BOTACHE EDUAR ANTONIO	1	0			S								X									230301	1.695.328	29	271.300	0	0	0	0	ESSC18	1.695.328	29	67.900	14-4	1.695.328	29	5	118.000	CCF63	1.695.328	29	67.900	0	0	0	0	0
2	CC 1086500484	ASCUNTAR BOTACHE EDUAR ANTONIO	1	0			S									X								230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	ESSC18	58.364	1	0	14-4	58.364	1	5	0	CCF63	58.364	1	0	0	0	0	0	0
3	CC 1124856781	QUENORAN GARCIA JEYSSON DAVID	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	5	121.900	CCF63	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1124869146	AJON TASCCON IBAN ANDRES	1	0			S								X									230301	1.755.083	30	280.900	0	0	0	0	EPS037	1.755.083	30	70.300	14-4	1.755.083	30	5	122.200	CCF63	1.755.083	30	70.300	0	0	0	0	0
5	CC 1072748704	GRISALES LASSO ELIANA MARIA	1	0			S																	230301	2.400.000	30	384.000	0	0	0	0	EPS005	2.400.000	30	96.000	14-4	2.400.000	30	5	167.100	CCF24	2.400.000	30	96.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900982213-1	Sermar Ingenieros SAS	CLL 128 BIS NO 131 B 15	3224259346	administrativa@sermaring.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73384667	09/04/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$14,000,000	$4.340.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	220.000	0		0		0	2	300	0	220.300	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	220.000	0		0		0	2	300	0	220.300	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	120.000	0		0		0	2	200	0	120.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	880.000	0	0	0	0	2	1.200	0	881.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.360.000	0	0	0	0	2	1.900	0	1.361.900	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	974.400				974.400	2	1.400	975.800			9.744	975.800	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	560.000	2	800	560.800	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	560.000	560.800
Pensión	2	2.240.000	2.243.100
Riesgos Laborales	1	974.400	975.800
CCF	1	560.000	560.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	4.334.400	4.340.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900982213-1	Sermar Ingenieros SAS	CLL 128 BIS NO 131 B 15	3224259346	administrativa@sermaring.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73384667	09/04/2026	3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$14,000,000	$4.340.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1018453872	BOHORQUEZ RANGEL JHOAN EMILIO	1	0			S																	230301	5.500.000	30	880.000	0	0	0	0	EPS005	5.500.000	30	220.000	14-4	5.500.000	30	5	382.800	CCF24	5.500.000	30	220.000	0	0	0	0	0
2	CC 1019059363	GARCIA MARTIN JUAN PABLO	1	0			S																	230201	5.500.000	30	880.000	0	0	0	0	EPS008	5.500.000	30	220.000	14-4	5.500.000	30	5	382.800	CCF24	5.500.000	30	220.000	0	0	0	0	0
3	CC 1111200339	MELO LINARES FRANCY LINDAY	1	0			S																	230301	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	30	120.000	14-4	3.000.000	30	5	208.800	CCF24	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900982213-1	Sermar Ingenieros SAS	CLL 128 BIS NO 131 B 15	3224259346	administrativa@sermaring.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73308961	22/04/2026	11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$20,906,407	$6.487.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	213.700	0		0		0	15	2.200	0	215.900	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	78.000	0		0		0	15	800	0	78.800	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	462.300	0		0		0	15	4.700	0	467.000	6
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	70.100	0		0		0	15	800	0	70.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	592.700	0	0	0	0	15	6.100	0	598.800	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.880.200	0	0	0	0	15	19.100	0	1.899.300	6
231001	Colfondos	800227940-6	280.300	0	0	0	0	15	2.900	0	283.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	592.200	0	0	0	0	15	6.100	0	598.300	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.430.100				1.430.100	15	14.600	1.444.700			14.301	1.444.700	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	88.000	15	900	88.900	1
CCF63	Comfamiliar Putumayo	891200337-8	733.700	15	7.500	741.200	10

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	15	0	0	0
ICBF				
0	15	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	824.100	832.600
Pensión	4	3.345.400	3.379.600
Riesgos Laborales	1	1.430.100	1.444.700
CCF	2	821.700	830.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	6.421.300	6.487.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900982213-1	Sermar Ingenieros SAS	CLL 128 BIS NO 131 B 15	3224259346	administrativa@sermaring.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73308961	22/04/2026	11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$20,906,407	$6.487.000	

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900982213-1	Sermar Ingenieros SAS	CLL 128 BIS NO 131 B 15	3224259346	administrativa@sermaring.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73308961	22/04/2026	11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$20,906,407	$6.487.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1018343307	CHAVEZ CHAVEZ JHEFFERSON DUVAN	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC18	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	5	121.900	CCF63	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1076018563	PALACIOS BEJARANO JUNIOR	1	0			S																	230201	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS037	1.950.000	30	78.000	14-4	1.950.000	30	5	135.800	CCF63	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
3	CC 1077600602	VALENCIA MOSQUERA FERNANDES	1	0			S																	230301	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS037	1.950.000	30	78.000	14-4	1.950.000	30	5	135.800	CCF63	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
4	CC 1080185172	BUITRAGO CORTES MARIA FERNANDA	1	0			S																	230301	2.200.000	30	352.000	0	0	0	0	EPS037	2.200.000	30	88.000	14-4	2.200.000	30	5	153.200	CCF32	2.200.000	30	88.000	0	0	0	0	0
5	CC 1133679921	FONSECA GOMEZ ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS037	1.950.000	30	78.000	14-4	1.950.000	30	5	135.800	CCF63	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
6	CC 11936555	ORDOÑEZ MURILLO VICTOR ADIAM	1	0			S																	230301	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS017	1.950.000	30	78.000	14-4	1.950.000	30	5	135.800	CCF63	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
7	CC 11708947	MOSQUERA HURTADO YESID	1	0			S																	230301	1.755.000	27	280.800	0	0	0	0	EPS002	1.755.000	27	70.200	14-4	1.755.000	27	5	122.200	CCF63	1.755.000	27	70.200	0	0	0	0	0
8	CC 11708947	MOSQUERA HURTADO YESID	1	0			S									X								230301	195.000	3	31.200	0	0	0	0	EPS002	195.000	3	0	14-4	195.000	3	5	0	CCF63	195.000	3	0	0	0	0	0	0
9	CC 18124394	TRUJILLO LOPEZ JESUS LEONEL	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	5	121.900	CCF63	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
10	CC 82060092	MOSQUERA MARTINEZ LEONARDO FAVIO	1	0			S																	25-14	1.950.000	30	312.000	0	0	0	0	EPS002	1.950.000	30	78.000	14-4	1.950.000	30	5	135.800	CCF63	1.950.000	30	78.000	0	0	0	0	0
11	CC 79789707	AVILA GARCIA JUAN ANDRES	1	0			S																	231001	1.692.542	29	270.900	0	0	0	0	EPS037	1.692.542	29	67.800	14-4	1.692.542	29	5	117.900	CCF63	1.692.542	29	67.800	0	0	0	0	0
12	CC 79789707	AVILA GARCIA JUAN ANDRES	1	0			S										X							231001	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS037	58.364	1	2.400	14-4	58.364	1	5	0	CCF63	58.364	1	0	0	0	0	0	0
13	CC 14013566	ROBLES BARRETO JESUS ORLANDO	1	0			S								X									230201	1.636.964	28	262.000	0	0	0	0	EPS002	1.636.964	28	65.500	14-4	1.636.964	28	5	114.000	CCF63	1.636.964	28	65.500	0	0	0	0	0
14	CC 14013566	ROBLES BARRETO JESUS ORLANDO	1	0			S									X								230201	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	2	0	14-4	116.727	2	5	0	CCF63	116.727	2	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Certificado de Aportes

Se certifica que OSCAR EDUARDO JIMENEZ RODRIGUEZ identificado(a) con CC 1076220363 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSTRUCIVIL ARL SAS NI 900654642

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	232991458	9503181448	E	2026-04-17																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,750,905	$280,200
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	6.96%	$1,750,905	$121,900
CCF	COMPENSAR	30	4%	$1,750,905	$70,100
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,750,905	$70,100

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-02	2026-03	232971697	9503181292	E	2026-04-17	X																

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	29	16%	$1,692,542	$270,900
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	29	6.96%	$1,692,542	$117,900
CCF	COMPENSAR	29	4%	$1,692,542	$67,800
EPS	NUEVA E.P.S.	29	4%	$1,692,542	$67,800

Este certificado se expide el día 2026-04-22 a las 03:24.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que WILLIAM VILLALOBOS ORDOÑEZ identificado(a) con CC 1072748512 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSTRUCIVIL ARL SAS NI 900654642

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	222748775	9503070217	E	2026-04-14																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,750,905	$280,200
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	6.96%	$1,750,905	$121,900
CCF	COMPENSAR	30	4%	$1,750,905	$70,100
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,750,905	$70,100

Este certificado se expide el día 2026-04-22 a las 03:24.

Certificado de Aportes

Se certifica que ABRAHAN RUIZ LEON identificado(a) con CC 79002415 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSTRUCIVIL ARL SAS NI 900654642

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	220487239	9503040776	E	2026-04-14																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$5,000,000	$800,000
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	6.96%	$5,000,000	$348,000
CCF	COMPENSAR	30	4%	$5,000,000	$200,000
EPS	FAMISANAR	30	4%	$5,000,000	$200,000

Este certificado se expide el día 2026-04-13 a las 07:04.

Certificados de Aportes

Se certifica que JHON JENNER CORTES QUIÑONES identificado(a) con CC 1006665639 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSTRUCIVIL ARL SAS NI 900654642

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	227755730	9503125842	E	2026-04-16																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,750,905	$280,200
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	6.96%	$1,750,905	$121,900
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$1,750,905	$70,100
EPS	EMSSANAR	30	4%	$1,750,905	$70,100

Este certificado se expide el día 2026-04-22 a las 03:04.

Certificados de Aportes

Se certifica que HERNAN DARIO GARCIA SERRATO identificado(a) con CC 17221980 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSTRUCIVIL ARL SAS NI 900654642

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	227755730	9503125842	E	2026-04-16	X	X															

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	1	16%	$61,667	$9,900
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	6.96%	$61,667	$4,300
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	1	4%	$61,667	$2,500
EPS	NUEVA EPS MOVILIDAD	1	4%	$61,667	$2,500

Este certificado se expide el día 2026-04-22 a las 03:04.

Certificados de Aportes

Se certifica que ALVARO MARLON MORENO MENDOZA identificado(a) con CC 1022425373 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSTRUCIVIL ARL SAS NI 900654642

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	227755730	9503125842	E	2026-04-16																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$2,400,000	$384,000
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	6.96%	$2,400,000	$167,100
CCF	COMPENSAR	30	4%	$2,400,000	$96,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$2,400,000	$96,000

Este certificado se expide el día 2026-04-22 a las 03:04.

Certificados de Aportes

Se certifica que ESTEVAN CAMILO MUTUMBAJOY MAVISOY identificado(a) con CC 1006663456 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSTRUCIVIL ARL SAS NI 900654642

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	227755730	9503125842	E	2026-04-16																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,750,905	$280,200
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	6.96%	$1,750,905	$121,900
CCF	COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	4%	$1,750,905	$70,100
EPS	MALLAMAS	30	4%	$1,750,905	$70,100

Este certificado se expide el día 2026-04-22 a las 03:04.

Certificados de Aportes

Se certifica que JAIRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ identificado(a) con CC 6646599 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSTRUCIVIL ARL SAS NI 900654642

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-03	2026-04	227755730	9503125842	E	2026-04-16		X															

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	1	16%	$58,364	$9,400
ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	6.96%	$58,364	$4,100
CCF	COMFAMA	1	4%	$58,363	$2,400
EPS	NUEVA E.P.S.	1	4%	$58,364	$2,400

Este certificado se expide el día 2026-04-22 a las 03:04.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 30/04/2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 964 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES EL CONDOR

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: abr-26 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2,

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	18	18	15	20	16	24	24	16	15	16	19	18	24	24	17	24	20	18	24	24	18	20	18	16	610
Lluvias moderadas							6	4	3	2	6			4	6	3	2	6			4		4	5			4	2	3	3	67
Lluvias intensas								2	6	2	2			4	3	5	3				3			1			2	2	3	5	43
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

VÍA EXISTENTE SAN FRANCISCO MOCOA RUTA 1003

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

ESTACION CAMPUCANA

Firma
Nombre: JUAN GABRIEL OCHOA CORREA
Director de obra
Matrícula Profesional No.: 05202-214414 ANT

Firma
Nombre: CÉSAR GONZÁLEZ ERAZO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-80021 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/03/2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 964 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES EL CONDOR

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-26 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MODULO 2,

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total
Seco	24	24	12	24	24	24	16	22	20	20	19	24	24	22	22	20	18	24	24	24	24	24	24	24	24	24	18	20	17	24	654
Lluvias moderadas			6				8	2	4	2	5			2		4	6										4	4	6		53
Lluvias intensas			6							2					2												2		1		13
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

SECTOR 3 VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

ESTACION CAMPUCANA

Firma
Nombre: JUAN GABRIEL OCHOA CORREA
Director de obra
Matrícula Profesional No.: 05202-214414 ANT

Firma
Nombre: CÉSAR GONZÁLEZ ERAZO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-80021 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 22/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No.: 964-2021 **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Abril de 2026 **PROYECTO:** VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
10378	21/03/2026	Granulometría Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	Dentro de la franja	SI	Relleno estructural Mocoa
10379	21/03/2026	Límites Indice de Plasticidad (%) Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E 125 - 126- 13	Procedencia Mocoa	1	NP	NP	SI	Relleno estructural Mocoa
10380	21/03/2026	Límites Limite Liquido (%) Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E 125 - 126- 13	Procedencia Mocoa	1	NL	NL	SI	Relleno estructural Mocoa
10381	21/03/2026	Granulometría AF-13	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	"Se valida por desempeño satisfactorio de la mezcla de concreto, según INV-630,2,2,1 y se controla según gradaciones teóricas conjuntas"	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10382	21/03/2026	Límites Indice de Plasticidad (%) AF-13	INV E 125 - 13	Procedencia Mocoa	1	NP	NP	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10383	21/03/2026	Límites Limite Liquido (%) AF-13	INV E 125 - 13	Procedencia Mocoa	1	NL	NL	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10384	21/03/2026	Granulometría AG25	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	Dentro de la franja	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10385	21/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 9+990 / 9+990 Clz. Úni. Car. Izq. Losa canal - 4359 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	27,47 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/14
10386	21/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+500 / 11+500 Car. Izq. Dados en sitio Talud 9, Linea A (44 Al 49) Linea B (43 al 48) Linea C (41 al 51) Linea D (del 40 al 43) Linea E (39 AL 44) - 4231 Procedencia planta - PD-01	3	>= 35 MPa	44,58 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 35 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/02/21
10387	21/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+500 / 11+500 Clz. Úni. Car. Izq. Dados en sitio talud 9 - 4357 Procedencia planta - PD-01	3	>= 35 MPa	34,95 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 35 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/14
10388	21/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 3+425 / 3+492 Clz. Úni. Car. Der. Cunetas - 4230 Procedencia planta - PD-01	3	>= 21 MPa	28,02 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 21 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/02/21
10389	21/03/2026	Densidad de campo Material R.E SBG-38 Mocoa	INV E-142 - 13	SECTOR 3 10+956.5 / 10+965 - Vástago muro N°3 Módulo No 6 - Capa No 4 SECTOR 3 10+965 / 10+977 - Vástago muro N°3 Módulo No 12 - Capa No 26 SECTOR 3 10+956.5 / 10+965 - Vástago muro N°3 Módulo No 6 - Capa No 5 SECTOR 3 10+965 / 10+977 - Vástago muro N°3 Módulo No 12 - Capa No 27	5	≥ 90	96.6%	SI	Relleno estructural Mocoa
10390	21/03/2026	Densidad de campo Material R.E SBG-38 Mocoa	INV E-142 - 13	SECTOR 3 10+956.5 / 10+965 - Vástago muro N°3 Módulo No 6 - Capa No 6 SECTOR 3 10+965 / 10+977 - Vástago muro N°3 Módulo No 12 - Capa No 28 SECTOR 3 10+956.5 / 10+965 - Vástago muro N°3 Módulo No 6 - Capa No 7 SECTOR 3 10+965 / 10+977 - Vástago muro N°3 Módulo No 12 - Capa No 29	5	≥ 90	97.8%	SI	Relleno estructural Mocoa
10391	21/03/2026	Densidad de campo Material R.E SBG-38 Mocoa	INV E-142 - 13	SECTOR 3 10+965 / 10+977 - Vástago muro N°3 Módulo No 12 - Capa No 30 SECTOR 3 10+956.5 / 10+965 - Vástago muro N°3 Módulo No 6 - Capa No 8	5	≥ 90	0,959	SI	Relleno estructural Mocoa
10392	21/03/2026	Densidad de campo Material R.E SBG-38 Mocoa	INV E-142 - 13	SECTOR 3 10+965 / 10+977 - Vástago muro N°3 Módulo No 12 - Capa No 31 SECTOR 3 10+956.5 / 10+965 - Vástago muro N°3 Módulo No 6 - Capa No 9	5	≥ 90	96.2%	SI	Relleno estructural Mocoa
10393	21/03/2026	Densidad de campo Material R.E SBG-38 Mocoa	INV E-142 - 13	SECTOR 3 10+956.5 / 10+965 - Vástago muro N°3 Módulo No 6 - Capa No 10 SECTOR 3 10+965 / 10+977 - Vástago muro N°3 Módulo No 12 - Capa No 32	5	≥ 90	98.2%	SI	Relleno estructural Mocoa
10394	21/03/2026	Densidad de campo Material R.E SBG-38 Mocoa	INV E-142 - 13	SECTOR 3 10+956.5 / 10+965 - Vástago muro N°3 Módulo No 6 - Capa No 11 SECTOR 3 10+965 / 10+977 - Vástago muro N°3 Módulo No 12 - Capa No 33	5	≥ 90	98.9%	SI	Relleno estructural Mocoa
10395	23/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+400 / 11+440 Clz. Úni. Lleno de anclajes talud 9, terraza 4, fila E anclajes 1, 2, 7 y 14. Presión de anclajes D7, E1, D14, E14. - 378 Procedencia planta - SECTOR 3 11+400 / 11+400. Contratista: Villalobos perforaciones	3	>= 30 MPa	39,55 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 30 Lechada, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/02/23
10396	23/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+600 / 11+630 Clz. Úni. Lleno de anclajes talud 13, terraza 2, anclajes D19, D20, D21. Terraza 3 anclaje D23. - 379 Procedencia planta - SECTOR 3 11+600 / 11+600. Contratista: Villalobos perforaciones	3	>= 30 MPa	38,79 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 30 Lechada, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/02/23
10397	23/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+500 / 11+520 Clz. Úni. Lleno de anclajes talud 9, terreno natural, fila B anclajes 67, 68, 72 y 73. Fila C anclajes 67 y 71. Fila D anclaje 62, 63 y 64. Fila E anclajes 71, 72 y 73. - 386 Procedencia planta - SECTOR 3 11+500 / 11+500. Contratista: Construcciones el cóndor	3	>= 30 MPa	30 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 30 Lechada, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/16
10398	23/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+700 / 11+700 Clz. Úni. Car. Izq. Concreto lanzado con fibra acceso talud 13-4237 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	37,88 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Lanzados, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/02/23
10399	23/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+470 / 11+485 Clz. Úni. Car. Izq. Concreto lanzado con fibra talud 9 Terraza 5 Fila B - 4368 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	28,08 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Lanzados, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/16
10400	23/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 3+710 / 3+710 Clz. Úni. Car. Der. Cuneta de descole - 4369 Procedencia planta - PD-01	3	>= 21 MPa	20,13 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 21 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/16
10401	23/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+500 / 11+500 Clz. Úni. Muro 8, caisson 8, anillo 15. - CC-14 Procedencia planta - SECTOR 3 11+500 / 11+500	3	>= 21 MPa	18,57 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 21 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/16
10402	23/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 3+440 / 3+490 Clz. Úni. Car. Der. Cunetas - 4235 Procedencia planta - PD-01	3	>= 21 MPa	27,45 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 21 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/02/23
10403	23/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+682 / 11+682 Clz. Úni. Caisson 1 puente 4-9 anillo 1, realce de Caisson - SM-17 Procedencia planta - SECTOR 3 11+682 / 11+682	3	>= 21 MPa	28,23 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 21 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/02/23
10404	24/03/2026	Granulometría Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	Dentro de la franja	SI	Relleno estructural Mocoa
10405	24/03/2026	Límites Indice de Plasticidad (%) Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E 125 - 126- 13	Procedencia Mocoa	1	NP	NP	SI	Relleno estructural Mocoa
10406	24/03/2026	Límites Limite Liquido (%) Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E 125 - 126- 13	Procedencia Mocoa	1	NL	NL	SI	Relleno estructural Mocoa
10407	24/03/2026	Equivalente Arena Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E 133 - 13	Procedencia Mocoa	1	> 25%	48.0%	SI	Relleno estructural Mocoa
10408	24/03/2026	Terrones de arcilla y partículas deleznables Porcentaje terrones fracción gruesa Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E 211 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 2%	0.05%	SI	Relleno estructural Mocoa
10409	24/03/2026	Terrones de arcilla y partículas deleznables Porcentaje terrones fracción fina Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E 211 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 2%	0.10%	SI	Relleno estructural Mocoa
10410	24/03/2026	Proctor Modificado Densidad máxima (g/cm3) Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E-142 - 13	Procedencia Mocoa	1	0%	2234	SI	Relleno estructural Mocoa
10411	24/03/2026	Contenido de fibra Lanzado Mocoa PD-01	EFNARC 9.6	Procedencia PD-01	1	<= 75%	101.0%	SI	Concreto lanzado PD-01
10412	24/03/2026	Granulometría AF-13	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	"Se valida por desempeño satisfactorio de la mezcla de concreto, según INV-630,2,2,1 y se controla según gradaciones teóricas conjuntas"	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10413	24/03/2026	Límites Indice de Plasticidad (%) AF-13	INV E 125 - 13	Procedencia Mocoa	1	NP	NP	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10414	24/03/2026	Límites Limite Liquido (%) AF-13	INV E 125 - 13	Procedencia Mocoa	1	NL	NL	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10415	24/03/2026	Equivalente Arena AF-13	INV E 133 - 13	Procedencia Mocoa	1	> 60%	61.0%	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10416	24/03/2026	Azul de metileno AF-13	INV E 235 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 5	0.75	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10417	24/03/2026	Mat organica color AF-13	INV E 212 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 3	2.00	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10418	24/03/2026	Terrones de arcilla y partículas deleznables AF-13	INV E 211 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 1%	0.12%	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10419	24/03/2026	Grav Especifica Fino AF-13	INV E 222 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 5%	2.36%	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10420	24/03/2026	Partículas livianas AF-13	INV E 221 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 0,5%	0.105%	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10421	24/03/2026	Granulometría AG25	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	Dentro de la franja	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10422	24/03/2026	Indice aplanamiento global AG25	INV E 230 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 25%	16.0%	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10423	24/03/2026	Indice alargameinto global AG25	INV E 230 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 25%	18.0%	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10424	24/03/2026	Terrones de arcilla y partículas deleznables AG25	INV E 211 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 0,25%	0.09%	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10425	24/03/2026	Partículas livianas AG25	INV E 221 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 0,5%	0.013%	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10426	24/03/2026	Granulometría AF-EFNARC Lanzado	EFNARC Lanzado	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	Franja AF-EFNARC Lanzado	Dentro de la franja	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10427	24/03/2026	Límites Indice de Plasticidad (%) AF-EFNARC Lanzado	INV E 125 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	NP	NP	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10428	24/03/2026	Límites Limite Liquido (%) AF-EFNARC Lanzado	INV E 125 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	NL	NL	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10429	24/03/2026	Equivalente Arena AF-EFNARC Lanzado	INV E 133 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	> 60%	60.0%	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10430	24/03/2026	Azul de metileno AF-EFNARC Lanzado	INV E 235 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	<= 5	1.15	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10431	24/03/2026	Mat organica color AF-EFNARC Lanzado	INV E 212 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	<= 3	1.00	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10432	24/03/2026	Terrones de arcilla y partículas deleznables AF-EFNARC Lanzado	INV E 211 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	<= 1%	0.21%	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10433	24/03/2026	Grav Especifica Fino AF-EFNARC Lanzado	INV E 222 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	<= 4%	1.87%	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10434	24/03/2026	Partículas livianas AF-EFNARC Lanzado	INV E 221 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	<= 0,5%	0.110%	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10435	24/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 3+750 / 3+750 Clz. Úni. Car. Der. , SECTOR 4 9+990 / 9+990 Clz. Úni. Car. Izq. Muro de confinamiento ODT - 4372 / Muro canal - 4372 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	28,08 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/17
10436	24/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+700 / 11+700 Clz. Úni. Car. Izq. Concreto lanzado con fibra acceso talud 13 - 4241 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	37,73 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Lanzados, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/02/24
10437	24/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+500 / 11+500 Clz. Úni. Car. Izq. Dados en sitio, Talud 9 Terraza 4 (19 und) - 4375 Procedencia planta - PD-01	3	>= 35 MPa	34,55 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 35 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/17
10438	24/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 3+463 / 3+540 Clz. Úni. Car. Izq. Cunetas - 4239A Procedencia planta - PD-01	3	>= 21 MPa	27,47 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 21 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/02/24
10439	24/03/2026	Densidad de campo Material R.E SBG-38 Mocoa	INV E-142 - 13	SECTOR 3 10+956.5 / 10+965 - Vástago muro N°3 Módulo No 6 - Capa No 12 SECTOR 3 10+965 / 10+977 - Vástago muro N°3 Módulo No 12 - Capa No 34 SECTOR 3 10+977 / 10+990 - Vástago muro N°3 Módulo No 6 - Capa No 1	5	≥ 90	96.10%	SI	Relleno estructural Mocoa
10440	25/03/2026	Granulometría Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	Dentro de la franja	SI	Relleno estructural Mocoa
10441	25/03/2026	Límites Indice de Plasticidad (%) Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E 125 - 126- 13	Procedencia Mocoa	1	NP	NP	SI	Relleno estructural Mocoa
10442	25/03/2026	Límites Limite Liquido (%) Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E 125 - 126- 13	Procedencia Mocoa	1	NL	NL	SI	Relleno estructural Mocoa

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 22/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No.: 964-2021 — **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Abril de 2026 — **PROYECTO:** VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 de 2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
10443	25/03/2026	Granulometría AF-13	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	"Se valida por desempeño satisfactorio de la mezcla de concreto, según INV-630,2,2,1 y se controla según gradaciones teóricas conjuntas"	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10444	25/03/2026	Límites Indice de Plasticidad (%) AF-13	INV E 125 - 13	Procedencia Mocoa	1	NP	NP	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10445	25/03/2026	Límites Limite Liquido (%) AF-13	INV E 125 - 13	Procedencia Mocoa	1	NL	NL	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10446	25/03/2026	Granulometría AG25	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	Dentro de la franja	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10447	25/03/2026	Granulometría AF-EFNARC Lanzado	EFNARC Lanzado	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	Franja AF-EFNARC Lanzado	Dentro de la franja	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10448	25/03/2026	Límites Indice de Plasticidad (%) AF-EFNARC Lanzado	INV E 125 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	NP	NP	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10449	25/03/2026	Límites Limite Liquido (%) AF-EFNARC Lanzado	INV E 125 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	NL	NL	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10450	25/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 3+310 / 3+310 Clz. Úni. Car. Izq. Alcantarilla realce - 4377 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	26,66 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/18
10451	25/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+500 / 11+550 Clz. Úni. Lleno de anclajes talud 9, terraza 5 fila B anclajes 76 y 77. Fila C anclajes 74 y 75. Fila D anclaje 66. Fila E anclajes 73 y 74. Talud 13, fila C anclaje 19. Fila C anclaje 20, 21 y 23. - 387 Procedencia planta - SECTOR 3 11+500 / 11+500. Contratista: Construcciones el Cóndor	3	>= 30 MPa	31,02 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 30 Lechada, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/18
10452	25/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+710 / 11+725 Clz. Úni. Car. Der. Lanzado con fibra talud 9 Terraza 5 fila B - 4247 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	37,74 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Lanzados, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/02/25
10453	25/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+465 / 11+465 Clz. Úni. Muro 7, caisson 5, anillo 11. - SM-21 Procedencia planta - SECTOR 3 11+465 / 11+465	3	>= 21 MPa	19,79 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 21 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/18
10454	25/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 3+500 / 3+540 Clz. Úni. Car. Der. Cunetas - 4244A Procedencia planta - PD-01	3	>= 21 MPa	27,02 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 21 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/02/25
10455	25/03/2026	Densidad de campo Material R.E SBG-38 Mocoa	INV E-142 - 13	SECTOR 3 10+965 / 10+977 - Vástago muro N°3 Módulo No 12 - Capa No 35 SECTOR 3 10+956.5 / 10+965 - Vástago muro N°3 Módulo No 6 - Capa No 13 SECTOR 3 10+977 / 10+990 - Vástago muro N°3 Módulo No 6 - Capa No 2	5	≥ 90	96.1%	SI	Relleno estructural Mocoa
10456	25/03/2026	Densidad de campo Material R.E SBG-38 Mocoa	INV E-142 - 13	SECTOR 3 10+956.5 / 10+965 - Vástago muro N°3 Módulo No 6 - Capa No 14 SECTOR 3 10+965 / 10+977 - Vástago muro N°3 Módulo No 12 - Capa No 36	5	≥ 90	96.0%	SI	Relleno estructural Mocoa
10457	25/03/2026	Densidad de campo Material R.E SBG-38 Mocoa	INV E-142 - 13	SECTOR 3 10+956.5 / 10+965 - Vástago muro N°3 Módulo No 6 - Capa No 15 SECTOR 3 10+965 / 10+977 - Vástago muro N°3 Módulo No 12 - Capa No 37 SECTOR 3 10+977 / 10+990 - Vástago muro N°3 Módulo No 6 - Capa No 3	5	≥ 90	95.5%	SI	Relleno estructural Mocoa
10458	25/03/2026	Densidad de campo Material R.E SBG-38 Mocoa	INV E-142 - 13	SECTOR 3 10+956.5 / 10+965 - Vástago muro N°3 Módulo No 6 - Capa No 16 SECTOR 3 10+977 / 10+990 - Vástago muro N°3 Módulo No 6 - Capa No 4	5	≥ 90	96.8%	SI	Relleno estructural Mocoa
10459	25/03/2026	Densidad de campo Material R.E SBG-38 Mocoa	INV E-142 - 13	SECTOR 3 10+877 / 10+879 - Vástago muro N°2 Módulo No 7, alcantarilla N°3 - Capa No 21	5	≥ 90	95.5%	SI	Relleno estructural Mocoa
10460	25/03/2026	Densidad de campo Material R.E SBG-38 Mocoa	INV E-142 - 13	SECTOR 3 10+877 / 10+879 - Vástago muro N°2 Módulo No 7, alcantarilla N°3 - Capa No 22	5	≥ 90	95.4%	SI	Relleno estructural Mocoa
10461	26/03/2026	Granulometría Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	Dentro de la franja	SI	Relleno estructural Mocoa
10462	26/03/2026	Límites Indice de Plasticidad (%) Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E 125 - 126- 13	Procedencia Mocoa	1	NP	NP	SI	Relleno estructural Mocoa
10463	26/03/2026	Límites Limite Liquido (%) Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E 125 - 126- 13	Procedencia Mocoa	1	NL	NL	SI	Relleno estructural Mocoa
10464	26/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 10+003 / 10+003 Clz. Úni. Car. Izq. Losa canal - 4250A Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	37,13 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/02/26
10465	26/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 3+700 / 3+700 Clz. Úni. Car. Der. Revestimiento de gaviones - 4385 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	27,32 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/19
10466	26/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 10+810 / 10+810 Clz. Úni. Car. Der. New jersey Muro 1 - 4385 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	27,08 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/19
10467	26/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+600 / 11+615 Clz. Úni. Lleno de anclajes talud 13, terraza 3, fila A anclajes 17, 21 y 16. Fila B anclajes 16, 17, 18 y 21. - 380 Procedencia planta - SECTOR 3 11+600 / 11+600. Contratista: Construcciones el Cóndor	3	>= 30 MPa	39,06 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 30 Lechada, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/02/26
10468	26/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+500 / 11+500 Clz. Úni. Dados en sitio Talud 9 Natural Linea B 4 Unidades linea C 4 Unidades Linea D 4 Unidades E 4 Unidades - 4249 Procedencia planta - PD-01	3	>= 35 MPa	44,67 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 35 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/02/26
10469	26/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 3+500 / 3+570 Clz. Úni. Car. Izq. , SECTOR 4 3+504 / 3+560 Clz. Úni. Car. Der. Cunetas - 4248 Procedencia planta - PD-01	3	>= 21 MPa	28,26 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 21 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/02/26
10470	26/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+500 / 11+500 Clz. Úni. Muro 8, caisson 8, anillo 15. Caisson 8, anillo 15. Caisson 9, anillo 10. Caisson 7, anillo 16. - CC-13 Procedencia planta - SECTOR 3 11+500 / 11+500	3	>= 21 MPa	26,75 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 21 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/02/26
10471	26/03/2026	Densidad de campo Material R.E SBG-38 Mocoa	INV E-142 - 13	SECTOR 3 10+965 / 10+977 - Vástago muro N°3 Módulo No 12 - Capa No 38 SECTOR 3 10+965 / 10+977 - Vástago muro N°3 Módulo No 12 - Capa No 39	5	≥ 90	97.4%	SI	Relleno estructural Mocoa
10472	26/03/2026	Densidad de campo Material R.E SBG-38 Mocoa	INV E-142 - 13	SECTOR 3 10+965 / 10+977 - Vástago muro N°3 Módulo No 12 - Capa No 40 SECTOR 3 10+956.5 / 10+965 - Vástago muro N°3 Módulo No 6 - Capa No 17 SECTOR 3 10+965 / 10+977 - Vástago muro N°3 Módulo No 12 - Capa No 41	5	≥ 90	96.0%	SI	Relleno estructural Mocoa
10473	26/03/2026	Densidad de campo Material R.E SBG-38 Mocoa	INV E-142 - 13	SECTOR 3 10+977 / 10+990 - Vástago muro N°3 Módulo No 6 - Capa No 5 SECTOR 3 10+977 / 10+990 - Vástago muro N°3 Módulo No 6 - Capa No 6 SECTOR 3 10+965 / 10+977 - Vástago muro N°3 Módulo No 12 - Capa No 42 SECTOR 3 10+956.5 / 10+965 - Vástago muro N°3 Módulo No 6 - Capa No 18	5	≥ 90	96.5%	SI	Relleno estructural Mocoa
10474	26/03/2026	Densidad de campo Material R.E SBG-38 Mocoa	INV E-142 - 13	SECTOR 3 10+877 / 10+879 - Vástago muro N°2 Módulo No 7, alcantarilla N°3 - Capa No 23 SECTOR 3 10+877 / 10+879 - Vástago muro N°2 Módulo No 7, alcantarilla N°3 - Capa No 24 SECTOR 3 10+877 / 10+879 - Vástago muro N°2 Módulo No 7, alcantarilla N°3 - Capa No 25	5	≥ 90	95:4%	SI	Relleno estructural Mocoa
10475	26/03/2026	Densidad de campo Material R.E SBG-38 Mocoa	INV E-142 - 13	SECTOR 3 10+877 / 10+879 - Vástago muro N°2 Módulo No 7, alcantarilla N°3 - Capa No 26 SECTOR 3 10+877 / 10+879 - Vástago muro N°2 Módulo No 7, alcantarilla N°3 - Capa No 27	5	≥ 90	96.3%	SI	Relleno estructural Mocoa
10476	27/03/2026	Granulometría Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	Dentro de la franja	SI	Relleno estructural Mocoa
10477	27/03/2026	Límites Indice de Plasticidad (%) Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E 125 - 126- 13	Procedencia Mocoa	1	NP	NP	SI	Relleno estructural Mocoa
10478	27/03/2026	Límites Limite Liquido (%) Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E 125 - 126- 13	Procedencia Mocoa	1	NL	NL	SI	Relleno estructural Mocoa
10479	27/03/2026	Granulometría AF-13	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	"Se valida por desempeño satisfactorio de la mezcla de concreto, según INV-630,2,2,1 y se controla según gradaciones teóricas conjuntas"	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10480	27/03/2026	Límites Indice de Plasticidad (%) AF-13	INV E 125 - 13	Procedencia Mocoa	1	NP	NP	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10481	27/03/2026	Límites Limite Liquido (%) AF-13	INV E 125 - 13	Procedencia Mocoa	1	NL	NL	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10482	27/03/2026	Granulometría AG25	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	Dentro de la franja	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10483	27/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+504 / 11+520 Clz. Úni. Car. Der. Lanzado con fibra acceso Talud 9 Terraza 5 - 4257 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	36,29 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Lanzados, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/02/27
10484	27/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+500 / 11+500 Clz. Úni. Car. Izq. Dados en sitios talud 9 Terraza 4 C#29-30-31-32-33-34 D#30-31-32-33-34-35 E#30-31-32-33-34-35. 17 unidades - 4392 Procedencia planta - PD-01	3	>= 35 MPa	35,29 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 35 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/20
10485	27/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 10+518 / 10+518 Clz. Úni. Car. Der. , SECTOR 3 10+870 / 10+870 Clz. Úni. Car. Der. Solado de losa de aproximación Puente campucana - 4393 / Solado para tubería ODT03 Muro 2 - 4393 Procedencia planta - PD-01	3	>= 21 MPa	20,29 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 21 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/20
10486	27/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 3+540 / 3+600 Clz. Úni. Car. Izq. Cunetas - 4253A Procedencia planta - PD-01	3	>= 21 MPa	28,39 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 21 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/02/27
10487	27/03/2026	Densidad de campo Material R.E SBG-38 Mocoa	INV E-142 - 13	SECTOR 3 10+965 / 10+977 - Vástago muro N°3 Módulo No 12 - Capa No 43 SECTOR 3 10+965 / 10+977 - Vástago muro N°3 Módulo No 12 - Capa No 44 SECTOR 3 10+965 / 10+977 - Vástago muro N°3 Módulo No 12 - Capa No 45	5	≥ 90	97.8%	SI	Relleno estructural Mocoa
10488	27/03/2026	Densidad de campo Material R.E SBG-38 Mocoa	INV E-142 - 13	SECTOR 3 10+977 / 10+990 - Vástago muro N°3 Módulo No 6 - Capa No 7 SECTOR 3 10+977 / 10+990 - Vástago muro N°3 Módulo No 6 - Capa No 8 SECTOR 3 10+977 / 10+990 - Vástago muro N°3 Módulo No 6 - Capa No 9	5	≥ 90	97:3%	SI	Relleno estructural Mocoa
10489	27/03/2026	Densidad de campo Material R.E SBG-38 Mocoa	INV E-142 - 13	SECTOR 3 10+977 / 10+990 - Vástago muro N°3 Módulo No 6 - Capa No 10 SECTOR 3 10+956.5 / 10+965 - Vástago muro N°3 Módulo No 6 - Capa No 19	5	≥ 90	97.1%	SI	Relleno estructural Mocoa
10490	28/03/2026	Granulometría AF-13	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	"Se valida por desempeño satisfactorio de la mezcla de concreto, según INV-630,2,2,1 y se controla según gradaciones teóricas conjuntas"	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10491	28/03/2026	Límites Indice de Plasticidad (%) AF-13	INV E 125 - 13	Procedencia Mocoa	1	NP	NP	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10492	28/03/2026	Límites Limite Liquido (%) AF-13	INV E 125 - 13	Procedencia Mocoa	1	NL	NL	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10493	28/03/2026	Granulometría AG25	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	Dentro de la franja	SI	AG - Concreto estructural Mocoa

FECHA: 22/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No.: 964-2021 — **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Abril de 2026 — **PROYECTO:** VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 de 2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
10494	28/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 9+980 / 9+980 Clz. Úni. Car. Izq. Losa canal - 4397 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	28,6 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/21
10495	28/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 10+820 / 10+820 Clz. Úni. Car. Der. New jersey - 4397 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	28,6 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/21
10496	28/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+465 / 11+495 Clz. Úni. Car. Izq. Concreto lanzado Revestimiento de talud acceso 9 tramo 5 - S1370 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	37,45 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Lanzados, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/02/28
10497	28/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 3+560 / 3+640 Clz. Úni. Car. Der. Cunetas - S1369 Procedencia planta - PD-01	3	>= 21 MPa	28,07 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 21 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/02/28
10498	28/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+260 / 11+260 Clz. Úni. Car. Der. Atraque tubería ODT -OD0011 - S1369 Procedencia planta - PD-01	3	>= 21 MPa	28,07 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 21 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/02/28
10499	30/03/2026	Granulometría AF-13	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	"Se valida por desempeño satisfactorio de la mezcla de concreto, según INV-630,2,2,1 y se controla según gradaciones teóricas conjuntas"	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10500	30/03/2026	Límites Indice de Plasticidad (%) AF-13	INV E 125 - 13	Procedencia Mocoa	1	NP	NP	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10501	30/03/2026	Límites Limite Liquido (%) AF-13	INV E 125 - 13	Procedencia Mocoa	1	NL	NL	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10502	30/03/2026	Equivalente Arena AF-13	INV E 133 - 13	Procedencia Mocoa	1	> 60%	61.0%	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10503	30/03/2026	Azul de metileno AF-13	INV E 235 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 5	0.85	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10504	30/03/2026	Mat organica color AF-13	INV E 212 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 3	2.00	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10505	30/03/2026	Terrones de arcilla y partículas deleznables AF-13	INV E 211 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 1%	0.17%	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10506	30/03/2026	Grav Especifica Fino AF-13	INV E 222 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 5%	2.24%	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10507	30/03/2026	Partículas livianas AF-13	INV E 221 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 0,5%	0.060%	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10508	30/03/2026	Granulometría AG25	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	Dentro de la franja	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10509	30/03/2026	Indice aplanamiento global AG25	INV E 230 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 25%	15.0%	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10510	30/03/2026	Indice alargameinto global AG25	INV E 230 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 25%	15.0%	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10511	30/03/2026	Terrones de arcilla y partículas deleznables AG25	INV E 211 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 0,25%	0.11%	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10512	30/03/2026	Partículas livianas AG25	INV E 221 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 0,5%	0.012%	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10513	30/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 3+560 / 3+640 Clz. Úni. Car. Der. , SECTOR 4 3+520 / 3+600 Clz. Úni. Car. Izq. Cunetas - 4268 Procedencia planta - PD-01	3	>= 21 MPa	28,26 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 21 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/02
10514	31/03/2026	Contenido de fibra Lanzado Mocoa PD-01	EFNARC 9.6	Procedencia PD-01	1	<= 75%	98.0%	SI	Concreto lanzado PD-01
10515	31/03/2026	Granulometría AF-13	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	"Se valida por desempeño satisfactorio de la mezcla de concreto, según INV-630,2,2,1 y se controla según gradaciones teóricas conjuntas"	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10516	31/03/2026	Límites Indice de Plasticidad (%) AF-13	INV E 125 - 13	Procedencia Mocoa	1	NP	NP	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10517	31/03/2026	Límites Limite Liquido (%) AF-13	INV E 125 - 13	Procedencia Mocoa	1	NL	NL	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10518	31/03/2026	Granulometría AG25	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	Dentro de la franja	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10519	31/03/2026	Granulometría AF-EFNARC Lanzado	EFNARC Lanzado	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	Franja AF-EFNARC Lanzado	Dentro de la franja	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10520	31/03/2026	Límites Indice de Plasticidad (%) AF-EFNARC Lanzado	INV E 125 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	NP	NP	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10521	31/03/2026	Límites Limite Liquido (%) AF-EFNARC Lanzado	INV E 125 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	NL	NL	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10522	31/03/2026	Equivalente Arena AF-EFNARC Lanzado	INV E 133 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	> 60%	61.0%	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10523	31/03/2026	Azul de metileno AF-EFNARC Lanzado	INV E 235 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	<= 5	1.40	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10524	31/03/2026	Mat organica color AF-EFNARC Lanzado	INV E 212 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	<= 3	1.00	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10525	31/03/2026	Terrones de arcilla y partículas deleznables AF-EFNARC Lanzado	INV E 211 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	<= 1%	0.42%	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10526	31/03/2026	Grav Especifica Fino AF-EFNARC Lanzado	INV E 222 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	<= 4%	1.84%	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10527	31/03/2026	Partículas livianas AF-EFNARC Lanzado	INV E 221 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	<= 0,5%	0.120%	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10528	31/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+490 / 11+500 Clz. Úni. Lleno de anclajes talud 9, terraza 5, fila A anclajes 15, 16, 24, 28 y 29. - 381 Procedencia planta - SECTOR 3 11+490 / 11+490. Contratista: Construcciones el cóndor	3	>= 30 MPa	39,31 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 30 Lechada, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/03
10529	31/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+660 / 11+670 Clz. Úni. Car. Der. Lanzado con fibra Protección Puente Y4 Eje 1 Caisson 2 - 4277 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	37,34 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Lanzados, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/03
10530	31/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+728 / 11+740 Clz. Úni. Car. Izq. Concreto lanzado con fibra Talud 13 Acceso via industrial - 4402 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	28,01 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Lanzados, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/24
10531	31/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+500 / 11+500 Clz. Úni. Car. Izq. Dados en sitio Talud 9 Terreno natural , Linea A Linea B, linea C, Linea D , Linea E 19 Unidades - 4280 Procedencia planta - PD-01	3	>= 35 MPa	44,55 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 35 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/03
10532	31/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+600 / 11+600 Clz. Úni. Car. Izq. Dados en sitio Talud 13 Terraza 2 y 3 19 unidades - 4405 Procedencia planta - PD-01	3	>= 35 MPa	34,65 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 35 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/24
10533	31/03/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 3+640 / 3+640 Clz. Úni. Car. Izq. Cunetas - 4279 Procedencia planta - PD-01	3	>= 21 MPa	27,49 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 21 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/03
10534	1/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 9+970 / 9+990 Clz. Úni. Car. Izq. , SECTOR 4 10+530 / 10+530 Clz. Úni. Car. Izq. Losa canal - 4408 / Losa de aproximación puente campucana - 4408 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	28,32 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/25
10535	1/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 10+820 / 10+820 Clz. Úni. Car. Der. , SECTOR 3 10+870 / 10+870 Clz. Úni. Car. Izq. New jersey Muro 1 Modulo 3 - 4408 / Losa alcantarilla ODT3 - 4408 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	28,32 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/25
10536	1/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+535 / 11+550 Clz. Úni. Car. Izq. Lanzado con fibra proteccion Talud 9 Terraza 4 y berma terraza 4 - 4299 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	36,05 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Lanzados, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/04
10537	1/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+618 / 11+634 Clz. Úni. Car. Izq. Concreto lanzado con fibra talud 13 Terraza 3 fila C - 4413 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	28,03 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Lanzados, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/25
10538	1/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+500 / 11+500 Clz. Úni. Car. Izq. Dados en sitio Talud 9 Terreno natural , Linea A Linea B, linea C, Linea D , Linea E 13 Unidades - 4296 Procedencia planta - PD-01	3	>= 35 MPa	44,89 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 35 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/04
10539	1/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 3+640 / 3+688 Clz. Úni. Cunetas (11 losas) - 4294A Procedencia planta - PD-01	3	>= 21 MPa	27,82 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 21 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/04
10540	2/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 10+030 / 10+030 Clz. Úni. Car. Izq. muros canal - 4303A Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	35,32 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/05
10541	2/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 10+030 / 10+030 Clz. Úni. Car. Izq. muro losa canal - 4303B Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	36,96 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/05
10542	2/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+100 / 11+100 Clz. Úni. Dados prefabricados - S1384 Procedencia planta - PD-01	3	>= 35 MPa	46,64 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 35 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/05
10543	2/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 3+610 / 3+800 Clz. Úni. Car. Der. Cunetas - S1382 Procedencia planta - PD-01	3	>= 21 MPa	26,86 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 21 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/05
10544	3/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 10+019 / 10+019 Clz. Úni. Car. Izq. Losa canal - 4311 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	35,43 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/06
10545	3/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 10+830 / 10+830 Clz. Úni. Car. Der. New jersey muro 1 modulo 4 - 4423 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	28,2 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/27
10546	3/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+500 / 11+600 Clz. Úni. Lleno de pernos talud 9, terraza 5, fila A pernos 1 a 13, 37, 38 y 39. Talud 13 terraza 3 fila A pernos 17 y 21. Fila B pernos 24 y 25. Fila C perno 25. - 382 Procedencia planta - SECTOR 3 11+500 / 11+500. Contratista: Construcciones el cóndor	3	>= 30 MPa	40,07 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 30 Lechada, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/06
10547	3/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+500 / 11+520 Clz. Úni. Lleno de anclajes talud 9 terreno natural, fila A anclajes 9, 10 y 11. Fila B anclajes 9 y 10. - 388 Procedencia planta - SECTOR 3 11+500 / 11+500. Contratista: Villalobos perforaciones	3	>= 30 MPa	30,37 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 30 Lechada, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/27
10548	3/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 3+800 / 3+800 Clz. Úni. Car. Der. Cunetas - 4310 Procedencia planta - PD-01	3	>= 21 MPa	26,88 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 21 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/06
10549	3/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+682 / 11+682 Clz. Úni. Car. Izq. Caisson 1, puente 9-4. Caisson 1 anillo 3. - SM-18 Procedencia planta - SECTOR 3 11+682 / 11+682	3	>= 21 MPa	27,05 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 21 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/06
10550	4/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 9+970 / 9+980 Clz. Úni. Car. Izq. Muro canal - 4431 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	28,14 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/28
10551	4/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+618 / 11+618 Clz. Úni. Car. Izq. Dados en sitio Talud 9. 16 Unidades - 4433 Procedencia planta - PD-01	3	>= 35 MPa	34,87 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 35 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/28
10552	4/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 3+700 / 3+760 Clz. Úni. Car. Izq. Cunetas - 4315 Procedencia planta - PD-01	3	>= 21 MPa	26,84 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 21 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/07
10553	6/04/2026	Granulometría AF-13	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	"Se valida por desempeño satisfactorio de la mezcla de concreto, según INV-630,2,2,1 y se controla según gradaciones teóricas conjuntas"	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10554	6/04/2026	Límites Indice de Plasticidad (%) AF-13	INV E 125 - 13	Procedencia Mocoa	1	NP	NP	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10555	6/04/2026	Límites Limite Liquido (%) AF-13	INV E 125 - 13	Procedencia Mocoa	1	NL	NL	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10556	6/04/2026	Equivalente Arena AF-13	INV E 133 - 13	Procedencia Mocoa	1	> 60%	61.0%	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10557	6/04/2026	Azul de metileno AF-13	INV E 235 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 5	0.80	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10558	6/04/2026	Mat organica color AF-13	INV E 212 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 3	2.00	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10559	6/04/2026	Terrones de arcilla y partículas deleznables AF-13	INV E 211 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 1%	0.10%	SI	AF - Concreto estructural Mocoa

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 22/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No.: 964-2021 **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Abril de 2026 **PROYECTO:** VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
10560	6/04/2026	Grav Especifica Fino AF-13	INV E 222 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 5%	2.24%	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10561	6/04/2026	Solidez Sulfato de Sodio AF-13	INV E 220 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 10%	3.0%	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10562	6/04/2026	Solidez Sulfato de Magnesio AF-13	INV E 220 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 15%	5.00%	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10563	6/04/2026	Partículas livianas AF-13	INV E 221 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 0,5%	0.070%	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10564	6/04/2026	Granulometría AG25	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	Dentro de la franja	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10565	6/04/2026	Indice aplanamiento global AG25	INV E 230 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 25%	14.0%	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10566	6/04/2026	Indice alargameinto global AG25	INV E 230 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 25%	16.0%	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10567	6/04/2026	Terrones de arcilla y partículas deleznables AG25	INV E 211 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 0,25%	0.08%	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10568	6/04/2026	Desgaste Maquina de los Angeles Desgaste seco 100 rev AG25	INV E 218 - 13	Procedencia Mocoa	1	<=8%	3.0%	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10569	6/04/2026	Desgaste Maquina de los Angeles Desgaste seco 500 rev AG25	INV E 218 - 13	Procedencia Mocoa	1	<=40%	18.9%	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10570	6/04/2026	Solidez Sulfato de Sodio AG25	INV E 220 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 12%	2.0%	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10571	6/04/2026	Solidez Sulfato de Magnesio AG25	INV E 220 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 18%	3.00%	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10572	6/04/2026	Partículas livianas AG25	INV E 221 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 0,5%	0.013%	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10573	6/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+260 / 11+260 Clz. Úni. Car. Izq. , SECTOR 3 10+855 / 10+867 Clz. Úni. Car. Der. , SECTOR 3 10+980 / 10+980 Clz. Úni. Car. Der. Caja alcantarilla ODT Muro 6 - 4439 / New jersey muro 1 - 4439 / Solado de alcantarilla muro 3 - 4439 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	28,01 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/30
10574	6/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+600 / 11+670 Clz. Úni. Lleno de anclajes talud 13. terraza 2, fila D anclajes 23, 29 y 30. Terraza 3, fila A anclaje 27. Fila B anclajes 2, 4, 5, 6, 23 y 25. Contingencia anclaje A2 y D1. - 383 Procedencia planta - SECTOR 3 11+600 / 11+600. Contratista: Construcciones el cóndor	3	>= 30 MPa	38,5 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 30 Lechada, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/09
10575	6/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+560 / 11+560 Clz. Úni. Car. Der. Caisson #6 Muro 8 Modulo 2 - 4322 Procedencia planta - PD-01	3	>= 35 MPa	36,99 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Termie, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/09
10576	6/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+560 / 11+560 Clz. Úni. Car. Der. Caisson #6 Muro 8 Modulo 2 - 4322A Procedencia planta - PD-01	3	>= 35 MPa	37,32 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa)28 Termie, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/09
10577	6/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+600 / 11+600 Clz. Úni. Car. Izq. Dados en sitio, talud 13 fila B. 8 unidades - 4442 Procedencia planta - PD-01	3	>= 35 MPa	34,98 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 35 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/30
10578	7/04/2026	Contenido de fibra Lanzado Mocoa PD-01	EFNARC 9.6	Procedencia PD-01	1	<= 75%	100.0%	SI	Concreto lanzado PD-01
10579	7/04/2026	Granulometría AF-EFNARC Lanzado	EFNARC Lanzado	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	Franja AF-EFNARC Lanzado	Dentro de la franja	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10580	7/04/2026	Límites Indice de Plasticidad (%) AF-EFNARC Lanzado	INV E 125 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	NP	NP	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10581	7/04/2026	Límites Limite Liquido (%) AF-EFNARC Lanzado	INV E 125 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	NL	NL	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10582	7/04/2026	Equivalente Arena AF-EFNARC Lanzado	INV E 133 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	> 60%	62.0%	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10583	7/04/2026	Azul de metileno AF-EFNARC Lanzado	INV E 235 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	<= 5	0.95	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10584	7/04/2026	Mat organica color AF-EFNARC Lanzado	INV E 212 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	<= 3	1.00	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10585	7/04/2026	Terrones de arcilla y partículas deleznables AF-EFNARC Lanzado	INV E 211 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	<= 1%	0.11%	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10586	7/04/2026	Grav Especifica Fino AF-EFNARC Lanzado	INV E 222 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	<= 4%	1.80%	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10587	7/04/2026	Solidez Sulfato de Sodio AF-EFNARC Lanzado	INV E 220 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	<= 10%	2.0%	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10588	7/04/2026	Solidez Sulfato de Magnesio AF-EFNARC Lanzado	INV E 220 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	<= 15%	4.00%	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10589	7/04/2026	Partículas livianas AF-EFNARC Lanzado	INV E 221 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	<= 0,5%	0.105%	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10590	7/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 10+008 / 10+008 Clz. Úni. Car. Izq. Muro y losa canal - 4331 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	37,77 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/10
10591	7/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+600 / 11+675 Clz. Úni. Lleno de anclajes talud 13, terraza 3, fila C anclajes 8 a 17. - 389 Procedencia planta - SECTOR 3 11+600 / 11+600. Contratista: Construcciones el cóndor	3	>= 30 MPa	28,11 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 30 Lechada, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/31
10592	7/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+690 / 11+750 Clz. Úni. Car. Izq. Lanzado con fibra talud 13 vía industrial (sachamates) - 4328 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	36,97 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Lanzados, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/10
10593	7/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+740 / 11+747 Clz. Úni. Car. Izq. Concreto lanzado con fibra talud 13N, terraza 1, fila A - 4448 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	28,46 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Lanzados, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/31
10594	7/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+560 / 11+560 Clz. Úni. Car. Der. Anillo 1, muro 8, caisson 3 - 4447 Procedencia planta - PD-01	3	>= 21 MPa	21,49 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 21 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/31
10595	7/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 10+518 / 10+518 Clz. Úni. Solado losa de aproximación puente Campucana - 4447 Procedencia planta - PD-01	3	>= 21 MPa	21,49 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 21 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/31
10596	7/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 3+600 / 3+700 Clz. Úni. Car. Izq. , SECTOR 4 3+760 / 3+820 Clz. Úni. Car. Izq. Cunetas - 4326 Procedencia planta - PD-01	3	>= 21 MPa	27,3 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 21 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/10
10597	8/04/2026	Granulometría AF-13	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	"Se valida por desempeño satisfactorio de la mezcla de concreto, según INV-630,2,2,1 y se controla según gradaciones teóricas conjuntas"	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10598	8/04/2026	Límites Indice de Plasticidad (%) AF-13	INV E 125 - 13	Procedencia Mocoa	1	NP	NP	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10599	8/04/2026	Límites Limite Liquido (%) AF-13	INV E 125 - 13	Procedencia Mocoa	1	NL	NL	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10600	8/04/2026	Granulometría AG25	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	Dentro de la franja	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10601	8/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+720 / 11+720 Clz. Úni. Losa puente provisional Vía industrial - 4338 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	37,15 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/11
10602	8/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+720 / 11+720 Clz. Úni. Losa puente provisional Vía industrial - 4338A Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	36,69 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/11
10603	8/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+600 / 11+650 Clz. Úni. Lleno de anclajes talud 13, vía contingencia fila A, anclaje 2, Fila D anclaje 1. Terraza 3 fila A anclaje 17. Fila B anclaje 2. Fila C anclaje 23, 24, 25 y 26. - 384 Procedencia planta - SECTOR 3 11+600 / 11+600. Contratista: Construcciones el cóndor	3	>= 30 MPa	39,8 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 30 Lechada, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/11
10604	8/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+500 / 11+500 Clz. Úni. Car. Izq. Dados en sitio Talud 13 Fila A-B-C 11 Unidades - 4334 Procedencia planta - PD-01	3	>= 35 MPa	44,63 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 35 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/11
10605	8/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 3+760 / 3+848 Clz. Úni. Car. Izq. , SECTOR 4 3+750 / 3+800 Clz. Úni. Car. Der. Cunetas - 4335 Procedencia planta - PD-01	3	>= 21 MPa	26,75 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 21 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/11
10606	9/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+636 / 11+657 Clz. Úni. Car. Izq. Lanzado con fibra talud 13 Terraza 3 fila C - 4344 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	36,84 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Lanzados, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/12
10607	9/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 3+800 / 3+848 Clz. Úni. Car. Der. Cunetas - 4346 Procedencia planta - PD-01	3	>= 21 MPa	27,28 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 21 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/12
10608	9/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+682 / 11+682 Clz. Úni. Puente Y-4, caisson 1, anillo 5. - SM-20 Procedencia planta - SECTOR 3 11+682 / 11+682	3	>= 21 MPa	27,26 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 21 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/12
10609	10/04/2026	Granulometría AF-13	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	"Se valida por desempeño satisfactorio de la mezcla de concreto, según INV-630,2,2,1 y se controla según gradaciones teóricas conjuntas"	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10610	10/04/2026	Límites Indice de Plasticidad (%) AF-13	INV E 125 - 13	Procedencia Mocoa	1	NP	NP	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10611	10/04/2026	Límites Limite Liquido (%) AF-13	INV E 125 - 13	Procedencia Mocoa	1	NL	NL	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10612	10/04/2026	Granulometría AG25	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	Dentro de la franja	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10613	10/04/2026	Granulometría AF-EFNARC Lanzado	EFNARC Lanzado	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	Franja AF-EFNARC Lanzado	Dentro de la franja	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10614	10/04/2026	Límites Indice de Plasticidad (%) AF-EFNARC Lanzado	INV E 125 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	NP	NP	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10615	10/04/2026	Límites Limite Liquido (%) AF-EFNARC Lanzado	INV E 125 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	NL	NL	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10616	10/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 10+002 / 10+002 Clz. Úni. Car. Izq. Muro canal - 4348 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	38,01 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/13
10617	10/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+485 / 11+500 Clz. Úni. Lleno de anclajes talud 9, terraza 4, fila C anclaje 34. Fila D anclajes 31, 32, 33, 34, 35. Fila E anclajes 30, 31, 32, 33, 34 y 35. Terraza 5, fila B, anclajes 15, 16 y 17. - 385 Procedencia planta - SECTOR 3 11+500 / 11+500. Contratista: Construcciones el cóndor	3	>= 30 MPa	39,47 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 30 Lechada, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/13
10618	10/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+485 / 11+502 Clz. Úni. Car. Izq. Lanzado con fibra talud 9 Terraza 5 fila B - 4351 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	36,2 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Lanzados, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/13
10619	11/04/2026	Granulometría AF-13	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	"Se valida por desempeño satisfactorio de la mezcla de concreto, según INV-630,2,2,1 y se controla según gradaciones teóricas conjuntas"	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10620	11/04/2026	Límites Indice de Plasticidad (%) AF-13	INV E 125 - 13	Procedencia Mocoa	1	NP	NP	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10621	11/04/2026	Límites Limite Liquido (%) AF-13	INV E 125 - 13	Procedencia Mocoa	1	NL	NL	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10622	11/04/2026	Granulometría AG25	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	Dentro de la franja	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10623	11/04/2026	Granulometría AF-EFNARC Lanzado	EFNARC Lanzado	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	Franja AF-EFNARC Lanzado	Dentro de la franja	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10624	11/04/2026	Límites Indice de Plasticidad (%) AF-EFNARC Lanzado	INV E 125 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	NP	NP	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10625	11/04/2026	Límites Limite Liquido (%) AF-EFNARC Lanzado	INV E 125 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	NL	NL	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10626	11/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 9+990 / 9+990 Clz. Úni. Car. Izq. Losa canal - 4359 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	35,34 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/14

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 22/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No.: 964-2021 — **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Abril de 2026 — **PROYECTO:** VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 de 2021 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
				A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA					
10627	11/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+500 / 11+500 Clz. Úni. Car. Izq. Dados en sitio talud 9 - 4357 Procedencia planta - PD-01	3	>= 35 MPa	45,62 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 35 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/14
10628	13/04/2026	Granulometría Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	Dentro de la franja	SI	Relleno estructural Mocoa
10629	13/04/2026	Límites Indice de Plasticidad (%) Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E 125 - 126- 13	Procedencia Mocoa	1	NP	NP	SI	Relleno estructural Mocoa
10630	13/04/2026	Límites Límite Líquido (%) Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E 125 - 126- 13	Procedencia Mocoa	1	NL	NL	SI	Relleno estructural Mocoa
10631	13/04/2026	Equivalente Arena Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E 133 - 13	Procedencia Mocoa	1	> 25%	55.0%	SI	Relleno estructural Mocoa
10632	13/04/2026	Terrones de arcilla y partículas deleznables Porcentaje terrones fracción gruesa Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E 211 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 2%	0.04%	SI	Relleno estructural Mocoa
10633	13/04/2026	Terrones de arcilla y partículas deleznables Porcentaje terrones fracción fina Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E 211 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 2%	0.15%	SI	Relleno estructural Mocoa
10634	13/04/2026	Proctor Modificado Densidad máxima (g/cm3) Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E-142 - 13	Procedencia Mocoa	1	0%	2233	SI	Relleno estructural Mocoa
10635	13/04/2026	Desgaste Maquina de los Angeles Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E 218 - 13	Procedencia Mocoa	1	<=50%	20.0%	SI	Relleno estructural Mocoa
10636	13/04/2026	Solidez Sulfato de Sodio Porcentaje terrones fracción fina Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E 220 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 12%	3.0%	SI	Relleno estructural Mocoa
10637	13/04/2026	Solidez Sulfato de Sodio Perdida Total Gruesos Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E 220 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 12%	1.0%	SI	Relleno estructural Mocoa
10638	13/04/2026	Solidez Sulfato de Magnesio Perdida Total Finos Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E 220 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 18%	5.00%	SI	Relleno estructural Mocoa
10639	13/04/2026	Solidez Sulfato de Magnesio Perdida Total Gruesos Relleno Estructura - SubBase granular clase C / RE SBG-38 Mocoa	INV E 220 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 18%	3.00%	SI	Relleno estructural Mocoa
10640	13/04/2026	Granulometría AF-13	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	"Se valida por desempeño satisfactorio de la mezcla de concreto, según INV-630,2,2,1 y se controla según gradaciones teóricas conjuntas"	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10641	13/04/2026	Límites Indice de Plasticidad (%) AF-13	INV E 125 - 13	Procedencia Mocoa	1	NP	NP	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10642	13/04/2026	Límites Límite Líquido (%) AF-13	INV E 125 - 13	Procedencia Mocoa	1	NL	NL	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10643	13/04/2026	Equivalente Arena AF-13	INV E 133 - 13	Procedencia Mocoa	1	> 60%	63.0%	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10644	13/04/2026	Azul de metileno AF-13	INV E 235 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 5	0.65	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10645	13/04/2026	Mat organica color AF-13	INV E 212 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 3	2.00	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10646	13/04/2026	Terrones de arcilla y partículas deleznables AF-13	INV E 211 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 1%	0.14%	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10647	13/04/2026	Grav Especifica Fino AF-13	INV E 222 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 5%	2.28%	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10648	13/04/2026	Partículas livianas AF-13	INV E 221 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 0,5%	0.140%	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10649	13/04/2026	Granulometría AG25	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	Dentro de la franja	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10650	13/04/2026	Indice aplanamiento global AG25	INV E 230 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 25%	17.0%	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10651	13/04/2026	Indice alargameinto global AG25	INV E 230 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 25%	19.0%	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10652	13/04/2026	Terrones de arcilla y partículas deleznables AG25	INV E 211 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 0,25%	0.09%	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10653	13/04/2026	Partículas livianas AG25	INV E 221 - 13	Procedencia Mocoa	1	<= 0,5%	0.022%	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10654	13/04/2026	Granulometría AF-EFNARC Lanzado	EFNARC Lanzado	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	Franja AF-EFNARC Lanzado	Dentro de la franja	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10655	13/04/2026	Límites Indice de Plasticidad (%) AF-EFNARC Lanzado	INV E 125 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	NP	NP	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10656	13/04/2026	Límites Límite Líquido (%) AF-EFNARC Lanzado	INV E 125 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	NL	NL	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10657	13/04/2026	Equivalente Arena AF-EFNARC Lanzado	INV E 133 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	> 60%	62.0%	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10658	13/04/2026	Azul de metileno AF-EFNARC Lanzado	INV E 235 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	<= 5	1.00	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10659	13/04/2026	Mat organica color AF-EFNARC Lanzado	INV E 212 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	<= 3	1.00	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10660	13/04/2026	Terrones de arcilla y partículas deleznables AF-EFNARC Lanzado	INV E 211 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	<= 1%	0.13%	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10661	13/04/2026	Grav Especifica Fino AF-EFNARC Lanzado	INV E 222 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	<= 4%	1.92%	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10662	13/04/2026	Partículas livianas AF-EFNARC Lanzado	INV E 221 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	<= 0,5%	0.095%	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10663	13/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 9+960 / 9+970 Clz. Úni. Car. Izq. , SECTOR 4 10+530 / 10+530 Clz. Úni. Car. Der. Muro canal - 4458 / Losa de aproximación puente campucana - 4458 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	27,61 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/04/06
10664	13/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+250 / 11+250 Clz. Úni. Car. Der. , SECTOR 3 10+870 / 10+870 Clz. Úni. Car. Der. , SECTOR 3 10+980 / 10+980 Clz. Úni. Car. Der. Losa caja alcantarilla - 4458 / New jersey Muro1 - 4458 / Atraque tubería obra hidráulica - 4458 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	27,61 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/04/06
10665	13/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+500 / 11+520 Clz. Úni. Lleno de anclajes talud 9, terreno natural, fila B anclajes 67, 68, 72 y 73. Fila C anclajes 67 y 71. Fila D anclaje 62, 63 y 64. Fila E anclajes 71, 72 y 73. - 386 Procedencia planta - SECTOR 3 11+500 / 11+500. Contratista: Construcciones el cóndor	3	>= 30 MPa	40,07 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 30 Lechada, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/16
10666	13/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+450 / 11+504 Clz. Úni. Lleno de anclajes talud 9, terraza 3, fila B anclajes 1 y 3. fila C anclajes 1 a 6.- 390 Procedencia planta - SECTOR 3 11+450 / 11+450. Contratista: Construcciones el cóndor	3	>= 30 MPa	29,05 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 30 Lechada, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/04/06
10667	13/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+470 / 11+485 Clz. Úni. Car. Izq. Concreto lanzado con fibra talud 9 Terraza 5 Fila B - 4368 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	36,78 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Lanzados, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/16
10668	13/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 3+710 / 3+710 Clz. Úni. Car. Der. Cuneta de descole - 4369 Procedencia planta - PD-01	3	>= 21 MPa	26,9 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 21 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/16
10669	13/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+500 / 11+500 Clz. Úni. Muro 8, caisson 8, anillo 15. - CC-14 Procedencia planta - SECTOR 3 11+500 / 11+500	3	>= 21 MPa	26,1 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 21 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/16
10670	13/04/2026	Densidad de campo Material R.E SBG-38 Mocoa	INV E-142 - 13	SECTOR 3 10+965 / 10+977 - Vástago muro N°3 Módulo No 12 - Capa No 46 SECTOR 3 10+977 / 10+990 - Vástago muro N°3 Módulo No 6 - Capa No 11 SECTOR 3 10+965 / 10+977 - Vástago muro N°3 Módulo No 12 - Capa No 47 SECTOR 3 10+977 / 10+990 - Vástago muro N°3 Módulo No 6 - Capa No 12 SECTOR 3 10+973 / 10+975 - Vástago muro N°3 Módulo No 12 Alcantarilla ODT-4 - Capa No 48	5	≥ 90	96.5%	SI	Relleno estructural Mocoa
10671	14/04/2026	Contenido de fibra Lanzado Mocoa PD-01	EFNARC 9.6	Procedencia PD-01	1	<= 75%	101.0%	SI	Concreto lanzado PD-01
10672	14/04/2026	Granulometría AF-13	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	"Se valida por desempeño satisfactorio de la mezcla de concreto, según INV-630,2,2,1 y se controla según gradaciones teóricas conjuntas"	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10673	14/04/2026	Límites Indice de Plasticidad (%) AF-13	INV E 125 - 13	Procedencia Mocoa	1	NP	NP	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10674	14/04/2026	Límites Límite Líquido (%) AF-13	INV E 125 - 13	Procedencia Mocoa	1	NL	NL	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10675	14/04/2026	Granulometría AG25	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	Dentro de la franja	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10676	14/04/2026	Granulometría AF-EFNARC Lanzado	EFNARC Lanzado	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	Franja AF-EFNARC Lanzado	Dentro de la franja	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10677	14/04/2026	Límites Indice de Plasticidad (%) AF-EFNARC Lanzado	INV E 125 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	NP	NP	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10678	14/04/2026	Límites Límite Líquido (%) AF-EFNARC Lanzado	INV E 125 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	NL	NL	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado-Mocoa+Mocoa
10679	14/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 3+750 / 3+750 Clz. Úni. Car. Der. , SECTOR 4 9+990 / 9+990 Clz. Úni. Car. Izq. Muro de confinamiento ODT - 4372 / Muro canal - 4372 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	36,79 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/17
10680	14/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+450 / 11+490 Clz. Úni. Car. Der. Lleno de anclajes talud 9, terreno natural, muro 7, fila A, anclajes 1 y 2. Fila B anclajes 1 y 2. Fila C anclaje 1. Fila D anclaje 1. - 391 Procedencia planta - SECTOR 3 11+450 / 11+450. Contratista: Construcciones el Cóndor	3	>= 30 MPa	27,18 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 30 Lechada, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/04/07
10681	14/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+600 / 11+600 Clz. Úni. Car. Izq. Concreto lanzado con fibra talud #13 Contingencia - 4466 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	25,92 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Lanzados, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/04/07
10682	14/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+500 / 11+500 Clz. Úni. Car. Izq. Dados en sitio, Talud 9 Terraza 4 (19 und) - 4375 Procedencia planta - PD-01	3	>= 35 MPa	45,66 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 35 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/17
10683	15/04/2026	Granulometría Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	Dentro de la franja	SI	Relleno estructural Mocoa
10684	15/04/2026	Límites Indice de Plasticidad (%) Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E 125 - 126- 13	Procedencia Mocoa	1	NP	NP	SI	Relleno estructural Mocoa
10685	15/04/2026	Límites Límite Líquido (%) Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E 125 - 126- 13	Procedencia Mocoa	1	NL	NL	SI	Relleno estructural Mocoa
10686	15/04/2026	Granulometría AF-13	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	"Se valida por desempeño satisfactorio de la mezcla de concreto, según INV-630,2,2,1 y se controla según gradaciones teóricas conjuntas"	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10687	15/04/2026	Límites Indice de Plasticidad (%) AF-13	INV E 125 - 13	Procedencia Mocoa	1	NP	NP	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10688	15/04/2026	Límites Límite Líquido (%) AF-13	INV E 125 - 13	Procedencia Mocoa	1	NL	NL	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10689	15/04/2026	Granulometría AG25	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	Dentro de la franja	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10690	15/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 3+310 / 3+310 Clz. Úni. Car. Izq. Alcantarilla realce - 4377 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	36,72 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/18
10691	15/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 9+950 / 9+970 Clz. Úni. Car. Izq. Losa canal - 4468 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	25,43 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/04/08
10692	15/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 10+870 / 10+870 Clz. Úni. Car. Der. , SECTOR 3 10+960 / 10+960 Clz. Úni. Car. Der. , SECTOR 3 10+960 / 10+960 Clz. Úni. Car. Der. New jersey muro 2 Modulo 3 - 4468 / New jersey Muro 3 Modulo 1 - 4468 / Realce tubería Muro 3 - 4468 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	25,43 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/04/08
10693	15/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+500 / 11+550 Clz. Úni. Lleno de anclajes talud 9, terraza 5 fila B anclajes 76 y 77. Fila C anclajes 74 y 75. Fila D anclaje 66. Fila E anclajes 73 y 74. Talud 13, fila C anclaje 19. Fila C anclaje 20, 21 y 23. - 387 Procedencia planta - SECTOR 3 11+500 / 11+500. Contratista: Construcciones el Cóndor	3	>= 30 MPa	40,27 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 30 Lechada, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/18

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 22/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No.: 964-2021 **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Abril de 2026 **PROYECTO:** VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
10694	15/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+465 / 11+465 Clz. Úni. Muro 7, caisson 5, anillo 11. - SM-21 Procedencia planta - SECTOR 3 11+465 / 11+465	3	>= 21 MPa	26,86 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 21 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/18
10695	15/04/2026	Densidad de campo Material R.E SBG-38 Mocoa	INV E-142 - 13	SECTOR 3 10+965 / 10+977 - Vástago muro N°3 Módulo No 12 - Capa No 49 SECTOR 3 10+977 / 10+990 - Vástago muro N°3 Módulo No 6 - Capa No 13 SECTOR 3 10+977 / 10+990 - Vástago muro N°3 Módulo No 6 - Capa No 14 SECTOR 3 10+977 / 10+990 - Vástago muro N°3 Módulo No 6 - Capa No 15	5	≥ 90	97.0%	SI	Relleno estructural Mocoa
10696	16/04/2026	Granulometría Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	Dentro de la franja	SI	Relleno estructural Mocoa
10697	16/04/2026	Límites Indice de Plasticidad (%) Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E 125 - 126- 13	Procedencia Mocoa	1	NP	NP	SI	Relleno estructural Mocoa
10698	16/04/2026	Límites Limite Liquido (%) Relleno Estructura - SubBase granular clase C / SBG-38 Mocoa	INV E 125 - 126- 13	Procedencia Mocoa	1	NL	NL	SI	Relleno estructural Mocoa
10699	16/04/2026	Granulometría AF-13	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	"Se valida por desempeño satisfactorio de la mezcla de concreto, según INV-630,2,2,1 y se controla según gradaciones teóricas conjuntas"	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10700	16/04/2026	Límites Indice de Plasticidad (%) AF-13	INV E 125 - 13	Procedencia Mocoa	1	NP	NP	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10701	16/04/2026	Límites Limite Liquido (%) AF-13	INV E 125 - 13	Procedencia Mocoa	1	NL	NL	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10702	16/04/2026	Granulometría AG25	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	Dentro de la franja	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10703	16/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 3+700 / 3+700 Clz. Úni. Car. Der. Revestimiento de gaviones - 4385 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	36,46 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/19
10704	16/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 10+810 / 10+810 Clz. Úni. Car. Der. New jersey Muro 1 - 4385 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	36,46 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/19
10705	16/04/2026	Densidad de campo Material R.E SBG-38 Mocoa	INV E-142 - 13	SECTOR 3 10+977 / 10+990 - Vástago muro N°3 Módulo No 6 - Capa No 16 SECTOR 3 10+977 / 10+990 - Vástago muro N°3 Módulo No 6 - Capa No 17	5	≥ 90	96.3%	SI	Relleno estructural Mocoa
10706	17/04/2026	Granulometría AF-13	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	"Se valida por desempeño satisfactorio de la mezcla de concreto, según INV-630,2,2,1 y se controla según gradaciones teóricas conjuntas"	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10707	17/04/2026	Límites Indice de Plasticidad (%) AF-13	INV E 125 - 13	Procedencia Mocoa	1	NP	NP	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10708	17/04/2026	Límites Limite Liquido (%) AF-13	INV E 125 - 13	Procedencia Mocoa	1	NL	NL	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10709	17/04/2026	Granulometría AG25	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	Dentro de la franja	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10710	17/04/2026	Granulometría AF-EFNARC Lanzado	EFNARC Lanzado	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	Franja AF-EFNARC Lanzado	Dentro de la franja	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa
10711	17/04/2026	Límites Indice de Plasticidad (%) AF-EFNARC Lanzado	INV E 125 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	NP	NP	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa
10712	17/04/2026	Límites Limite Liquido (%) AF-EFNARC Lanzado	INV E 125 - 13	Procedencia - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa	1	NL	NL	SI	AF-EFNARC Lanzado - Arena mixta lanzado- Mocoa+Mocoa
10713	17/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 9+940 / 9+950 Clz. Úni. Car. Izq. Losa canal ramal 3 - 4477 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	27,22 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/04/10
10714	17/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 10+960 / 10+960 Clz. Úni. Caja alcantarilla encole ODT 2 - 4477 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	27,22 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/04/10
10715	17/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+590 / 11+600 Clz. Úni. Lleno de anclajes a presión, talud 13, terraza 3, fila C anclajes 18 a 27. Fila D anclajes 9 a 28. - 392 Procedencia planta - SECTOR 3 11+600 / 11+600. Contratista: Construcciones el Cóndor	3	>= 30 MPa	30,48 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 30 Lechada, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/04/10
10716	17/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+740 / 11+760 Clz. Úni. Car. Izq. Concreto lanzado con fibra talud 13 Terraza 1 Fila A - 4479 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	25,68 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Lanzados, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/04/10
10717	17/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+500 / 11+500 Clz. Úni. Car. Izq. Dados en sitios talud 9 Terraza 4 C#29-30-31-32-33-34 D#30-31-32-33-34-35 E#30-31-32-33-34-35. 17 unidades - 4392 Procedencia planta - PD-01	3	>= 35 MPa	45,82 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 35 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/20
10718	17/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+500 / 11+500 Clz. Úni. Car. Izq. Dados en sitio Talud 9 Tn 8 unidades D=66 E=70 AL 76 - 4474 Procedencia planta - PD-01	3	>= 35 MPa	34,9 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 35 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/04/10
10719	17/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 10+518 / 10+518 Clz. Úni. Car. Der. , SECTOR 3 10+870 / 10+870 Clz. Úni. Car. Der. Solado de losa de aproximación Puente campucana - 4393 / Solado para tubería ODT03 Muro 2 - 4393 Procedencia planta - PD-01	3	>= 21 MPa	28,06 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 21 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/20
10720	18/04/2026	Granulometría AF-13	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	"Se valida por desempeño satisfactorio de la mezcla de concreto, según INV-630,2,2,1 y se controla según gradaciones teóricas conjuntas"	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10721	18/04/2026	Límites Indice de Plasticidad (%) AF-13	INV E 125 - 13	Procedencia Mocoa	1	NP	NP	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10722	18/04/2026	Límites Limite Liquido (%) AF-13	INV E 125 - 13	Procedencia Mocoa	1	NL	NL	SI	AF - Concreto estructural Mocoa
10723	18/04/2026	Granulometría AG25	INV E 213 - 13	Procedencia Mocoa	1	Franja INVIAS 2013	Dentro de la franja	SI	AG - Concreto estructural Mocoa
10724	18/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 9+980 / 9+980 Clz. Úni. Car. Izq. Losa canal - 4397 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	36,89 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/21
10725	18/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 28 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 10+820 / 10+820 Clz. Úni. Car. Der. New jersey - 4397 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	36,89 MPa	SI	RESISTENCIA A 28 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/03/21
10726	18/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+030 / 11+030 Clz. Úni. Car. Der. , SECTOR 3 10+960 / 10+960 Clz. Úni. Car. Der. New jersey Muro 4 Modulo 1 - 4482 / New jersey Muro 3 Modulo 2 - 4482 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	28,01 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/04/11
10727	18/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+030 / 11+030 Clz. Úni. Car. Der. , SECTOR 3 10+960 / 10+960 Clz. Úni. Car. Der. New jersey Muro 4 Modulo 1 - 4482A / New jersey Muro 3 Modulo 2 - 4482A Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	26,73 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/04/11
10728	18/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+600 / 11+620 Clz. Úni. Car. Izq. Concreto lanzado con fibra talud 13 Terraza 3 Fila D - 4485 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	26,83 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Lanzados, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/04/11
10729	18/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+560 / 11+560 Clz. Úni. Car. Der. Muro 8, caisson N°3 anillo 1, 2, 3 y 4. - C-01 Procedencia planta - SECTOR 3 11+560 / 11+560	3	>= 21 MPa	19,13 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 21 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/04/11
10730	20/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 4 9+950 / 9+950 Clz. Úni. Car. Izq. Muro canal - 4496 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	27,2 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/04/13
10731	20/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+350 / 11+350 Clz. Úni. Car. Izq. Caja alcantarilla encole ODT02 2da elevación - 4496 Procedencia planta - PD-01	3	>= 28 MPa	27,2 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 28 Convencional, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/04/13
10732	20/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+850 / 11+850 Clz. Úni. Car. Der. Concreto lanzado Sin fibra -Muro Y2 Anillo 1, Anillo 6,Anillo 7, Anillo 8 - 4498 Procedencia planta - PD-01	3	>= 21 MPa	21,4 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 21 Lanzado, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/04/13
10733	20/04/2026	Resistencia a la compresion de concreto a 7 dias (MPa)	INV E 410 - 13	SECTOR 3 11+600 / 11+650 Clz. Úni. Lleno de anclajes talud 13, terraza 3, fila D anclajes 4 a 9 y 22 a 28. - 393 Procedencia planta - SECTOR 3 11+600 / 11+600. Contratista: Construcciones el Cóndor	3	>= 30 MPa	28,8 MPa	SI	RESISTENCIA A 7 DÍAS, Tipo de concreto Resistencia (f'c) (MPa) 30 Lechada, FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA 2026/04/13

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: Juan Gabriel Ochoa Correa
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.: 05202-214414 ANT

Firma

Nombre: José Ignacio Cadena López
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 31528 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Construcciones EL CONDOR S.A.
Ingeniería de Infraestructura e Inversiones

CONTROL DE CALIDAD - CONCRETO ESTRUCTURAL
ARTÍCULO INV-630

Proyecto	Mocoa - Putumayo	**Tramo**				**Ejecutor**	Construcciones El Cóndor
Tipo de concreto	Convencional	**Resistencia (f'c) (MPa)**	21	**Criterio aceptación (f'c-k1) [MPa]**	17,5	**Periodo**	21/02/2026 a 20/04/2026
Tipo de producción	Premezclado	**Fuente de agregado grueso**	Mocoa	**Fuente de agregado fino**	Arena natural Mocoa	**Fecha de actualización**	22/04/2026

N° MUESTRA	SITIO TOMA CILINDRO	CANTIDAD DE CONCRETO (m3)	TEMP. (°C)	ESPESOR DE PANTALLA (cms)	FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA			LOCALIZACIÓN	ELEMENTO FUNDIDO	ASENTAMIENTO PLANTA (cm)	FLUIDEZ (seg)	RESISTENCIA OBTENIDA Y RANGOS EN Kg/cm3																			PROCEDENCIA	56 DÍAS
												RESISTENCIA A 7 DÍAS							RESISTENCIA A 28 DÍAS							MEDIA MÓVIL 28 DÍAS (MPa) (fm)	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN					
												FECHA FALLA 7d			RESISTENCIA (MPa)			PROMEDIO (MPa)	%	FECHA FALLA 28d			RESISTENCIA (MPa)			PROMEDIO (MPa) (fi)	%		fi ≥ (f´c - k1)	fm ≥ f´c	ACEPTA		
					D	M	A					D	M	A						D	M	A										
3472	Planta	7,0	28		21	2	2026	SECTOR 4 3+425 / 3+492 Clz. Úni. Car. Der.	Cunetas - 4230	15,2		28	2	2026	20,78	21,39	21,09	21,09	100	21	3	2026	27,75	28,28	28,02	28,02	133	28,02	OK	OK	OK	PD-01	No
3475	Planta	7,0	28		23	2	2026	SECTOR 4 3+440 / 3+490 Clz. Úni. Car. Der.	Cunetas - 4235	14,6		2	3	2026	19,29	20,63	19,97	19,96	95	23	3	2026	27,49	27,08	27,79	27,45	131	27,74	OK	OK	OK	PD-01	No
3477	Planta	7,0	29		24	2	2026	SECTOR 4 3+463 / 3+540 Clz. Úni. Car. Izq.	Cunetas - 4239A	17,8		3	3	2026	20,31	21,54	20,93	20,93	100	24	3	2026	27,68	27,26	27,47	27,47	131	27,65	OK	OK	OK	PD-01	No
3479	Planta	7,0	28		25	2	2026	SECTOR 4 3+500 / 3+540 Clz. Úni. Car. Der.	Cunetas - 4244A	17,8		4	3	2026	20,04	21,75	20,90	20,90	100	25	3	2026	27,15	26,88	27,02	27,02	129	27,31	OK	OK	OK	PD-01	No
3480	Planta	14,0	28,5		26	2	2026	SECTOR 4 3+500 / 3+570 Clz. Úni. Car. Izq. , SECTOR 4 3+504 / 3+560 Clz. Úni. Car. Der.	Cunetas - 4248	17,2		5	3	2026	20,83	21,66	21,25	21,25	101	26	3	2026	27,66	28,19	28,93	28,26	135	27,58	OK	OK	OK	PD-01	No
3483	Planta	7,0	27		27	2	2026	SECTOR 4 3+540 / 3+600 Clz. Úni. Car. Izq.	Cunetas - 4253A	17,8		6	3	2026	20,66	21,80	21,23	21,23	101	27	3	2026	28,60	28,17	28,39	28,39	135	27,89	OK	OK	OK	PD-01	No
3485	Planta	6,0	25		28	2	2026	SECTOR 4 3+560 / 3+640 Clz. Úni. Car. Der.	Cunetas - S1369	15,9		7	3	2026	21,90	20,21	21,06	21,06	100	28	3	2026	28,44	27,69	28,07	28,07	134	28,24	OK	OK	OK	PD-01	No
3488	Planta	14,0	28,4		2	3	2026	SECTOR 4 3+560 / 3+640 Clz. Úni. Car. Der. , SECTOR 4 3+520 / 3+600 Clz. Úni. Car. Izq.	Cunetas - 4268	17,8		9	3	2026	21,44	20,92	21,18	21,18	101	30	3	2026	29,43	27,09	28,26	28,26	135	28,24	OK	OK	OK	PD-01	No
3490	Planta	3,0	29		3	3	2026	SECTOR 4	Cunetas -	17,8		10	3	2026	21,03	20,78	20,95	20,92	100	31	3	2026	26,87	28,11	27,49	27,49	131	27,94	OK	OK	OK	PD-01	No

							3+640 / 3+640 Clz. Úni. Car. Izq.	4279																												
3493	Planta	7,0	30		4	3	2026	SECTOR 4 3+640 / 3+688 Clz. Úni.	Cunetas (11 losas) - 4294A	17,8		11	3	2026	21,32	20,91	21,12	21,12	101	1	4	2026	28,53	27,10	27,82	27,82	132	27,86	OK	OK	OK	PD-01	No
3495	Planta	7,0	25,6		5	3	2026	SECTOR 4 3+610 / 3+800 Clz. Úni. Car. Der.	Cunetas - S1382	17,8		12	3	2026	21,87	20,85	21,36	21,36	102	2	4	2026	26,29	27,43	26,86	26,86	128	27,39	OK	OK	OK	PD-01	No
3498	Planta	14,0	29,5		6	3	2026	SECTOR 4 3+800 / 3+800 Clz. Úni. Car. Der.	Cunetas - 4310	17,8		13	3	2026	20,09	19,90	20,00	20,00	95	3	4	2026	27,13	26,74	26,78	26,88	128	27,19	OK	OK	OK	PD-01	No
3500	Planta	7,0	28		7	3	2026	SECTOR 4 3+700 / 3+760 Clz. Úni. Car. Izq.	Cunetas - 4315	16,5		14	3	2026	21,62	20,87	21,25	21,25	101	4	4	2026	26,75	26,74	27,02	26,84	128	26,86	OK	OK	OK	PD-01	No
3511	Planta	14,0	29		10	3	2026	SECTOR 4 3+600 / 3+700 Clz. Úni. Car. Izq. , SECTOR 4 3+760 / 3+820 Clz. Úni. Car. Izq.	Cunetas - 4326	14,9		17	3	2026	21,66	21,12	21,39	21,39	102	7	4	2026	26,60	27,87	27,43	27,30	130	27,01	OK	OK	OK	PD-01	No
3515	Planta	12,0	28		11	3	2026	SECTOR 4 3+760 / 3+848 Clz. Úni. Car. Izq. , SECTOR 4 3+750 / 3+800 Clz. Úni. Car. Der.	Cunetas - 4335	16,5		18	3	2026	19,21	22,33	20,72	20,75	99	8	4	2026	25,98	27,62	26,64	26,75	127	26,96	OK	OK	OK	PD-01	No
3519	Planta	7,0	29		12	3	2026	SECTOR 4 3+800 / 3+848 Clz. Úni. Car. Der.	Cunetas - 4346	17,8		19	3	2026	21,65	20,81	21,23	21,23	101	9	4	2026	27,68	26,91	27,24	27,28	130	27,11	OK	OK	OK	PD-01	No
3525	Planta	2,0	31		16	3	2026	SECTOR 4 3+710 / 3+710 Clz. Úni. Car. Der.	Cuneta de descole - 4369	17,8		23	3	2026	20,54	19,99	19,87	20,13	96	13	4	2026	27,85	25,95	26,90	26,90	128	26,97	OK	OK	OK	PD-01	No
3558	Planta	1,3	29		31	3	2026	SECTOR 4 10+518 / 10+518 Clz. Úni.	Solado losa de aproximación puente Campucana - 4447	20,3		7	4	2026	20,62	21,82	22,03	21,49	102	28	4	2026				0,00	0	26,97		OK		PD-01	
Promedio																**21,0**								**27,5**		**27,5**								

Elaboró Aprobó



Katherine Suarez Villareal

Laboratorista



Wilson Enrique Ureña

Ingeniero de Materiales

Construcciones EL CONDOR S.A.
Ingeniería de Infraestructura e Inversiones

CONTROL DE CALIDAD - CONCRETO ESTRUCTURAL
ARTÍCULO INV-630

Proyecto	Mocoa - Putumayo	**Tramo**				**Ejecutor**	Construcciones El Cóndor
Tipo de concreto	Convencional	**Resistencia (f'c) (MPa)**	21	**Criterio aceptación (f'c-k1) [MPa]**	17,5	**Periodo**	21/02/2026 a 20/04/2026
Tipo de producción	Premezclado, Preparación en obra	**Fuente de agregado grueso**	Mocoa	**Fuente de agregado fino**	Arena natural Mocoa	**Fecha de actualización**	22/04/2026

N° MUESTRA	SITIO TOMA CILINDRO	CANTIDAD DE CONCRETO (m3)	TEMP. (°C)	ESPESOR DE PANTALLA (cms)	FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA			LOCALIZACIÓN	ELEMENTO FUNDIDO	ASENTAMIENTO PLANTA (cm)	FLUIDEZ (seg)	RESISTENCIA OBTENIDA Y RANGOS EN Kg/cm3																		MEDIA MÓVIL 28 DÍAS (MPa) (fm)	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN			PROCEDENCIA	56 DÍAS
												RESISTENCIA A 7 DÍAS								RESISTENCIA A 28 DÍAS															
												FECHA FALLA 7d			RESISTENCIA (MPa)			PROMEDIO (MPa)	%	FECHA FALLA 28d			RESISTENCIA (MPa)			PROMEDIO (MPa) (fi)	%								
					D	M	A					D	M	A						D	M	A													
3502	Obra	1,0	29		23	2	2026	SECTOR 3 11+682 / 11+682 Clz. Úni.	Caisson 1 puente 4-9 anillo 1, realce de Caisson - SM-17	15,2		2	3	2026	18,18	20,06	19,12	19,12	91	23	3	2026	28,37	27,96	28,36	28,23	134	28,23	OK	OK	OK	SECTOR 3 11+682 / 11+682	No
3503	Obra	1,0	29		26	2	2026	SECTOR 3 11+500 / 11+500 Clz. Úni.	Muro 8, caisson 8, anillo 15. Caisson 8, anillo 15. Caisson 9, anillo 10. Caisson 7, anillo 16. - CC-13	14,0		5	3	2026	21,96	20,05	21,00	21,00	100	26	3	2026	27,61	25,89	26,75	26,75	127	27,49	OK	OK	OK	SECTOR 3 11+500 / 11+500	No
3486	Planta	1,0	25		28	2	2026	SECTOR 3 11+260 / 11+260 Clz. Úni. Car. Der.	Atraque tubería ODT -OD0011 - S1369	15,9		7	3	2026	21,90	20,21	21,06	21,06	100	28	3	2026	28,44	27,69	28,07	28,07	134	27,68	OK	OK	OK	PD-01	No
3504	Obra	1,0	29		6	3	2026	SECTOR 3 11+682 / 11+682 Clz. Úni. Car. Izq.	Caisson 1, puente 9-4. Caisson 1 anillo 3. - SM-18	16,5		13	3	2026	19,97	18,34	19,16	19,16	91	3	4	2026	27,48	26,62	27,05	27,05	129	27,29	OK	OK	OK	SECTOR 3 11+682 / 11+682	No
3532	Obra	1,0	28		12	3	2026	SECTOR 3 11+682 / 11+682 Clz. Úni.	Puente Y-4, caisson 1, anillo 5. - SM-20	15,2		19	3	2026	20,12	20,83	20,47	20,47	97	9	4	2026	27,70	27,25	26,83	27,26	130	27,46	OK	OK	OK	SECTOR 3 11+682 / 11+682	No
3552	Obra	1,0	29		16	3	2026	SECTOR 3 11+500 / 11+500 Clz. Úni.	Muro 8, caisson 8, anillo 15. - CC-14	16,5		23	3	2026	18,64	18,49	18,57	18,57	88	13	4	2026	26,55	25,66	26,10	26,10	124	26,80	OK	OK	OK	SECTOR 3 11+500 / 11+500	No
3551	Obra	1,0	30		18	3	2026	SECTOR 3 11+465 / 11+465 Clz. Úni.	Muro 7, caisson 5, anillo 11. - SM-21	15,2		25	3	2026	20,45	19,13	19,79	19,79	94	15	4	2026	26,30	27,43	26,86	26,86	128	26,74	OK	OK	OK	SECTOR 3 11+465 / 11+465	No
3539	Planta	2,5	30		20	3	2026	SECTOR 3 10+518 / 10+518 Clz. Úni.	Solado de losa de aproximación	20,3		27	3	2026	21,17	19,41	20,29	20,29	97	17	4	2026	28,25	27,88	28,06	28,06	134	27,01	OK	OK	OK	PD-01	No

								Car. Der. , SECTOR 3 10+870 / 10+870 Clz. Úni. Car. Der.	Puente campucana - 4393 / Solado para tubería ODT03 Muro 2 - 4393																									
3559	Planta	1,3	29		31	3	2026	SECTOR 3 11+560 / 11+560 Clz. Úni. Car. Der.	Anillo 1, muro 8, caisson 3 - 4447	20,3		7	4	2026	20,62	21,82	22,03	21,49	102	28	4	2026				0,00	0	27,01		OK		PD-01	
3595	Obra	1,0	30		11	4	2026	SECTOR 3 11+560 / 11+560 Clz. Úni. Car. Der.	Muro 8, caisson N°3 anillo 1, 2, 3 y 4. - C-01	14,0		18	4	2026	19,27	18,99	19,13	19,13	91	9	5	2026				0,00	0	27,01		OK		SECTOR 3 11+560 / 11+560	
Promedio																**20,0**							**27,3**			**27,3**							

Elaboró



Katherine Suarez Villareal

Laboratorista

Aprobó



Wilson Enrique Ureña

Ingeniero de Materiales

Construcciones EL CONDOR S.A.
Ingeniería de Infraestructura e Inversiones

CONTROL DE CALIDAD - CONCRETO ESTRUCTURAL
ARTÍCULO INV-630

Proyecto	Mocoa - Putumayo	**Tramo**				**Ejecutor**	Construcciones El Cóndor
Tipo de concreto	Lanzados	**Resistencia (f'c) (MPa)**	21	**Criterio aceptación (f'c-k1) [MPa]**	17,5	**Periodo**	21/02/2026 a 20/04/2026
Tipo de producción	Premezclado	**Fuente de agregado grueso**	Mocoa	**Fuente de agregado fino**	Arena mixta lanzado - Mocoa + Mocoa	**Fecha de actualización**	22/04/2026

N° MUESTRA	SITIO TOMA CILINDRO	CANTIDAD DE CONCRETO (m3)	TEMP. (°C)	ESPESOR DE PANTALLA (cms)	FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA			LOCALIZACIÓN	ELEMENTO FUNDIDO	ASENTAMIENTO PLANTA (cm)	FLUIDEZ (seg)	RESISTENCIA OBTENIDA Y RANGOS EN Kg/cm3																		PROCEDENCIA	56 DÍAS
												RESISTENCIA A 7 DÍAS							RESISTENCIA A 28 DÍAS							MEDIA MÓVIL 28 DÍAS (MPa) (fm)	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN					
					D	M	A					FECHA FALLA 7d			RESISTENCIA (MPa)			PROMEDIO (MPa)	%	FECHA FALLA 28d			RESISTENCIA (MPa)			PROMEDIO (MPa) (fi)	%		fi ≥ (f´c - k1)	fm ≥ f´c	ACEPTA		
												D	M	A						D	M	A										
3578	Obra	5,0	30	10	13	4	2026	SECTOR 3 11+850 / 11+850 Clz. Úni. Car. Der.	Concreto lanzado Sin fibra -Muro Y2 Anillo 1, Anillo 6,Anillo 7, Anillo 8 - 4498	20,3		20	4	2026	22,10	20,70	21,40	21,40	102	11	5	2026				0,00	0	0,00				PD-01	
Promedio																**21,4**								**0,0**			**0,0**					

Elaboró

Katherine Suarez Villareal

Laboratorista

Aprobó

Wilson Enrique Ureña

Ingeniero de Materiales

Construcciones EL CONDOR S.A.
Ingeniería de Infraestructura e Inversiones

CONTROL DE CALIDAD - CONCRETO ESTRUCTURAL
ARTÍCULO INV-630

Proyecto	Mocoa - Putumayo	**Tramo**				**Ejecutor**	Construcciones El Cóndor
Tipo de concreto	Convencional	**Resistencia (f'c) (MPa)**	28	**Criterio aceptación (f'c-k1) [MPa]**	24,5	**Periodo**	21/02/2026 a 20/04/2026
Tipo de producción	Premezclado	**Fuente de agregado grueso**	Mocoa	**Fuente de agregado fino**	Arena natural Mocoa	**Fecha de actualización**	22/04/2026

N° MUESTRA	SITIO TOMA CILINDRO	CANTIDAD DE CONCRETO (m3)	TEMP. (°C)	ESPESOR DE PANTALLA (cms)	FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA			LOCALIZACIÓN	ELEMENTO FUNDIDO	ASENTAMIENTO PLANTA (cm)	FLUIDEZ (seg)	RESISTENCIA OBTENIDA Y RANGOS EN Kg/cm3																		PROCEDENCIA	56 DÍAS
												RESISTENCIA A 7 DÍAS							RESISTENCIA A 28 DÍAS							MEDIA MÓVIL 28 DÍAS (MPa) (fm)	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN					
					D	M	A					FECHA FALLA 7d			RESISTENCIA (MPa)			PROMEDIO (MPa)	%	FECHA FALLA 28d			RESISTENCIA (MPa)			PROMEDIO (MPa) (fi)	%		fi ≥ (f´c - k1)	fm ≥ f´c	ACEPTA		
												D	M	A						D	M	A										
3497	Planta	7,5	30		5	3	2026	SECTOR 3 10+030 / 10+030 Clz. Úni. Car. Izq.	muros canal - 4303A	20,3		12	3	2026	28,32	27,19	27,76	27,76	99	2	4	2026	34,48	36,16	35,32	35,32	126	35,32	OK	OK	OK	PD-01	No
3550	Obra	7,5	31,9		5	3	2026	SECTOR 3 10+030 / 10+030 Clz. Úni. Car. Izq.	muro losa canal - 4303B	19,1		12	3	2026	28,10	27,68	27,87	27,88	100	2	4	2026	37,22	36,69	36,96	36,96	132	36,14	OK	OK	OK	PD-01	No
3499	Planta	2,6	29		6	3	2026	SECTOR 3 10+019 / 10+019 Clz. Úni. Car. Izq.	Losa canal - 4311	20,3		13	3	2026	26,70	27,35	27,03	27,03	97	3	4	2026	36,78	34,07	35,43	35,43	127	35,90	OK	OK	OK	PD-01	No
3513	Planta	7,0	30		10	3	2026	SECTOR 3 10+008 / 10+008 Clz. Úni. Car. Izq.	Muro y losa canal - 4331	20,3		17	3	2026	27,82	28,53	28,18	28,18	101	7	4	2026	37,79	37,82	37,71	37,77	135	36,72	OK	OK	OK	PD-01	No
3516	Planta	14,5	28,6		11	3	2026	SECTOR 3 11+720 / 11+720 Clz. Úni.	Losa puente provisional Vía industrial - 4338	20,3		18	3	2026	28,37	27,17	27,77	27,77	99	8	4	2026	37,19	37,19	37,06	37,15	133	36,78	OK	OK	OK	PD-01	No
3517	Obra	14,5	31,3		11	3	2026	SECTOR 3 11+720 / 11+720 Clz. Úni.	Losa puente provisional Vía industrial - 4338A	20,3		18	3	2026	28,37	27,28	27,83	27,83	99	8	4	2026	37,17	36,58	36,33	36,69	131	37,20	OK	OK	OK	PD-01	No
3520	Planta	5,0	27,5		13	3	2026	SECTOR 3 10+002 / 10+002 Clz. Úni. Car. Izq.	Muro canal - 4348	19,7		20	3	2026	28,66	28,14	28,40	28,40	101	10	4	2026	38,64	37,82	37,58	38,01	136	37,28	OK	OK	OK	PD-01	No
3530	Planta	3,5	31		19	3	2026	SECTOR 3 10+810 / 10+810 Clz. Úni. Car. Der.	New jersey Muro 1 - 4385	20,3		26	3	2026	27,37	26,78	27,08	27,08	97	16	4	2026	36,61	36,31	36,46	36,46	130	37,06	OK	OK	OK	PD-01	No
3540	Planta	4,5	30		21	3	2026	SECTOR 3 10+820 / 10+820 Clz. Úni. Car. Der.	New jersey - 4397	20,3		28	3	2026	29,01	28,19	28,60	28,60	102	18	4	2026	37,03	36,74	36,89	36,89	132	37,12	OK	OK	OK	PD-01	No
3544	Planta	3,5	29		25	3	2026	SECTOR 3	New jersey	20,3		1	4	2026	28,35	28,20	28,41	28,32	101	22	4	2026				0,00	0	37,12		OK		PD-01	

								10+820 / 10+820 Clz. Úni. Car. Der. , SECTOR 3 10+870 / 10+870 Clz. Úni. Car. Izq.	Muro 1 Modulo 3 - 4408 / Losa alcantarilla ODT3 - 4408																								
3547	Planta	2,6	29		27	3	2026	SECTOR 3 10+830 / 10+830 Clz. Úni. Car. Der.	New jersey muro 1 modulo 4 - 4423	20,3		3	4	2026	27,92	28,66	28,03	28,20	101	24	4	2026				0,00	0	37,12		OK		PD-01	
3556	Planta	6,4	30		30	3	2026	SECTOR 3 11+260 / 11+260 Clz. Úni. Car. Izq. , SECTOR 3 10+855 / 10+867 Clz. Úni. Car. Der. , SECTOR 3 10+980 / 10+980 Clz. Úni. Car. Der.	Caja alcantarilla ODT Muro 6 - 4439 / New jersey muro 1 - 4439 / Solado de alcantarilla muro 3 - 4439	20,3		6	4	2026	27,69	28,21	28,12	28,01	100	27	4	2026				0,00	0	37,12		OK		PD-01	
3566	Planta	4,4	29,7		6	4	2026	SECTOR 3 11+250 / 11+250 Clz. Úni. Car. Der. , SECTOR 3 10+870 / 10+870 Clz. Úni. Car. Der. , SECTOR 3 10+980 / 10+980 Clz. Úni. Car. Der.	Losa caja alcantarilla - 4458 / New jersey Muro1 - 4458 / Atraque tubería obra hidráulica - 4458	20,3		13	4	2026	26,20	29,02	27,61	27,61	99	4	5	2026				0,00	0	37,12		OK		PD-01	
3569	Planta	5,5	32		8	4	2026	SECTOR 3 10+870 / 10+870 Clz. Úni. Car. Der. , SECTOR 3 10+960 / 10+960 Clz. Úni. Car. Der. , SECTOR 3 10+960 / 10+960 Clz. Úni. Car. Der.	New jersey muro 2 Modulo 3 - 4468 / New jersey Muro 3 Modulo 1 - 4468 / Realce tubería Muro 3 - 4468	20,3		15	4	2026	25,19	25,67	25,43	25,43	91	6	5	2026				0,00	0	37,12		OK		PD-01	
3571	Planta	3,0	30		10	4	2026	SECTOR 3 10+960 / 10+960 Clz. Úni.	Caja alcantarilla encole ODT 2 - 4477	20,3		17	4	2026	26,38	28,06	27,22	27,22	97	8	5	2026				0,00	0	37,12		OK		PD-01	
3574	Planta	6,9	30		11	4	2026	SECTOR 3 11+030 / 11+030 Clz. Úni. Car. Der. , SECTOR 3 10+960 / 10+960 Clz. Úni. Car. Der.	New jersey Muro 4 Modulo 1 - 4482 / New jersey Muro 3 Modulo 2 - 4482	20,3		18	4	2026	27,31	28,71	28,01	28,01	100	9	5	2026				0,00	0	37,12		OK		PD-01	
3587	Obra	6,9	30		11	4	2026	SECTOR 3	New jersey	20,3		18	4	2026	26,14	27,32	26,73	26,73	95	9	5	2026				0,00	0	37,12		OK		PD-01	

								11+030 / 11+030 Clz. Úni. Car. Der. , SECTOR 3 10+960 / 10+960 Clz. Úni. Car. Der.	Muro 4 Modulo 1 - 4482A / New jersey Muro 3 Modulo 2 - 4482A																							
3577	Planta	2,0	30		13	4	2026	SECTOR 3 11+350 / 11+350 Clz. Úni. Car. Izq.	Caja alcantarilla encole ODT02 2da elevación - 4496	20,3		20	4	2026	26,47	27,93	27,20	27,20	97	11	5	2026				0,00	0	37,12		OK		PD-01	
Promedio																**27,6**							**36,7**			**36,9**					

Elaboró

Katherine Suarez Villareal

Laboratorista

Aprobó

Wilson Enrique Ureña

Ingeniero de Materiales

Construcciones EL CONDOR S.A.
Ingeniería de Infraestructura e Inversiones

CONTROL DE CALIDAD - CONCRETO ESTRUCTURAL
ARTÍCULO INV-630

Proyecto	Mocoa - Putumayo	**Tramo**				**Ejecutor**	Construcciones El Cóndor
Tipo de concreto	Convencional	**Resistencia (f'c) (MPa)**	28	**Criterio aceptación (f'c-k1) [MPa]**	24,5	**Periodo**	21/02/2026 a 20/04/2026
Tipo de producción	Premezclado	**Fuente de agregado grueso**	Mocoa	**Fuente de agregado fino**	Arena natural Mocoa	**Fecha de actualización**	22/04/2026

N° MUESTRA	SITIO TOMA CILINDRO	CANTIDAD DE CONCRETO (m3)	TEMP. (°C)	ESPESOR DE PANTALLA (cms)	FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA			LOCALIZACIÓN	ELEMENTO FUNDIDO	ASENTAMIENTO PLANTA (cm)	FLUIDEZ (seg)	RESISTENCIA OBTENIDA Y RANGOS EN Kg/cm3																MEDIA MÓVIL 28 DÍAS (MPa) (fm)	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN			PROCEDENCIA	56 DÍAS
												RESISTENCIA A 7 DÍAS								RESISTENCIA A 28 DÍAS												
												FECHA FALLA 7d			RESISTENCIA (MPa)			PROMEDIO (MPa)	%	FECHA FALLA 28d			RESISTENCIA (MPa)			PROMEDIO (MPa) (fi)	%		fi ≥ (f´c - k1)	fm ≥ f´c	ACEPTA		
					D	M	A					D	M	A						D	M	A										
3482	Planta	3,2	28		26	2	2026	SECTOR 4 10+003 / 10+003 Clz. Úni. Car. Izq.	Losa canal - 4250A	20,3		5	3	2026	26,04	28,83	27,44	27,44	98	26	3	2026	36,15	38,11	37,13	37,13	133	37,13	OK	OK	OK	PD-01	No
3523	Planta	2,7	29		14	3	2026	SECTOR 4 9+990 / 9+990 Clz. Úni. Car. Izq.	Losa canal - 4359	20,3		21	3	2026	28,14	26,80	27,47	27,47	98	11	4	2026	35,48	35,28	35,25	35,34	126	36,23	OK	OK	OK	PD-01	No
3526	Planta	9,0	30,5		17	3	2026	SECTOR 4 3+750 / 3+750 Clz. Úni. Car. Der. , SECTOR 4 9+990 / 9+990 Clz. Úni. Car. Izq.	Muro de confinamiento ODT - 4372 / Muro canal - 4372	20,3		24	3	2026	28,01	28,82	27,42	28,08	100	14	4	2026	37,20	36,38	36,79	36,79	131	36,42	OK	OK	OK	PD-01	No
3529	Planta	1,8	28		18	3	2026	SECTOR 4 3+310 / 3+310 Clz. Úni. Car. Izq.	Alcantarilla realce - 4377	19,7		25	3	2026	26,00	27,31	26,66	26,66	95	15	4	2026	36,06	37,37	36,72	36,72	131	36,28	OK	OK	OK	PD-01	No
3531	Planta	0,7	31		19	3	2026	SECTOR 4 3+700 / 3+700 Clz. Úni. Car. Der.	Revestimiento de gaviones - 4385	20,3		26	3	2026	27,37	26,78	27,80	27,32	98	16	4	2026	36,61	36,31	36,46	36,46	130	36,66	OK	OK	OK	PD-01	No
3541	Planta	2,2	30		21	3	2026	SECTOR 4 9+980 / 9+980 Clz. Úni. Car. Izq.	Losa canal - 4397	20,3		28	3	2026	29,01	28,19	28,60	28,60	102	18	4	2026	37,03	36,74	36,89	36,89	132	36,69	OK	OK	OK	PD-01	No
3545	Planta	8,2	29,5		25	3	2026	SECTOR 4 9+970 / 9+990 Clz. Úni. Car. Izq. , SECTOR 4 10+530 / 10+530 Clz. Úni. Car. Izq.	Losa canal - 4408 / Losa de aproximación puente campucana - 4408	20,3		1	4	2026	28,35	28,20	28,41	28,32	101	22	4	2026				0,00	0	36,69		OK		PD-01	
3548	Planta	5,0	29		28	3	2026	SECTOR 4 9+970 / 9+980 Clz. Úni. Car. Izq.	Muro canal - 4431	20,3		4	4	2026	27,69	28,66	28,07	28,14	101	25	4	2026				0,00	0	36,69		OK		PD-01	
3565	Planta	10,9	29		6	4	2026	SECTOR 4	Muro canal -	20,3		13	4	2026	26,20	29,02	27,61	27,61	99	4	5	2026				0,00	0	36,69		OK		PD-01	

								9+960 / 9+970 Clz. Úni. Car. Izq. , SECTOR 4 10+530 / 10+530 Clz. Úni. Car. Der.	4458 / Losa de aproximación puente campucana - 4458																									
3568	Planta	4,5	30		8	4	2026	SECTOR 4 9+950 / 9+970 Clz. Úni. Car. Izq.	Losa canal - 4468	20,3		15	4	2026	25,19	25,67	25,43	25,43	91	6	5	2026				0,00	0	36,69		OK		PD-01	
3572	Planta	2,4	30		10	4	2026	SECTOR 4 9+940 / 9+950 Clz. Úni. Car. Izq.	Losa canal ramal 3 - 4477	20,3		17	4	2026	26,38	28,06	27,22	27,22	97	8	5	2026				0,00	0	36,69		OK		PD-01	
3576	Planta	6,0	30		13	4	2026	SECTOR 4 9+950 / 9+950 Clz. Úni. Car. Izq.	Muro canal - 4496	20,3		20	4	2026	26,47	27,93	27,20	27,20	97	11	5	2026				0,00	0	36,69		OK		PD-01	
Promedio																**27,5**							**36,6**			**36,6**						

Elaboró



Katherine Suarez Villareal

Laboratorista

Aprobó



Wilson Enrique Ureña

Ingeniero de Materiales

Construcciones EL CONDOR S.A.
Ingeniería de Infraestructura e Inversiones

CONTROL DE CALIDAD - CONCRETO ESTRUCTURAL
ARTÍCULO INV-630

Proyecto	Mocoa - Putumayo	**Tramo**				**Ejecutor**	Construcciones El Cóndor
Tipo de concreto	Lanzados	**Resistencia (f'c) (MPa)**	28	**Criterio aceptación (f'c-k1) [MPa]**	24,5	**Periodo**	21/02/2026 a 20/04/2026
Tipo de producción	Premezclado	**Fuente de agregado grueso**	Mocoa	**Fuente de agregado fino**	Arena mixta lanzado - Mocoa + Mocoa	**Fecha de actualización**	22/04/2026

N° MUESTRA	SITIO TOMA CILINDRO	CANTIDAD DE CONCRETO (m3)	TEMP. (°C)	ESPESOR DE PANTALLA (cms)	FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA			LOCALIZACIÓN	ELEMENTO FUNDIDO	ASENTAMIENTO PLANTA (cm)	FLUIDEZ (seg)	RESISTENCIA OBTENIDA Y RANGOS EN Kg/cm3																		MEDIA MÓVIL 28 DÍAS (MPa) (fm)	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN			PROCEDENCIA	56 DÍAS
												RESISTENCIA A 7 DÍAS							RESISTENCIA A 28 DÍAS															
												FECHA FALLA 7d			RESISTENCIA (MPa)			PROMEDIO (MPa)	%	FECHA FALLA 28d			RESISTENCIA (MPa)			PROMEDIO (MPa) (fi)	%						
					D	M	A					D	M	A						D	M	A							fi ≥ (f´c - k1)	fm ≥ f´c	ACEPTA		
3474	Obra	5,0	31	10	23	2	2026	SECTOR 3 11+700 / 11+700 Clz. Úni. Car. Izq.	Concreto lanzado con fibra acceso talud 13-4237	20,3		2	3	2026	28,16	27,15	27,66	27,66	99	23	3	2026	37,14	38,62	37,88	37,88	135	37,88	OK	OK	OK	PD-01	No
3476	Obra	5,0	29,9	10	24	2	2026	SECTOR 3 11+700 / 11+700 Clz. Úni. Car. Izq.	Concreto lanzado con fibra acceso talud 13 - 4241	20,3		3	3	2026	27,30	28,18	27,74	27,74	99	24	3	2026	38,27	37,18	37,73	37,73	135	37,80	OK	OK	OK	PD-01	No
3478	Obra	17,1	30,3	10	25	2	2026	SECTOR 3 11+710 / 11+725 Clz. Úni. Car. Der.	Lanzado con fibra talud 9 Terraza 5 fila B - 4247	21,0		4	3	2026	27,51	28,49	28,00	28,00	100	25	3	2026	38,73	36,74	37,74	37,74	135	37,78	OK	OK	OK	PD-01	No
3484	Obra	10,0	31	10	27	2	2026	SECTOR 3 11+504 / 11+520 Clz. Úni. Car. Der.	Lanzado con fibra acceso Talud 9 Terraza 5 - 4257	20,3		6	3	2026	26,89	27,69	27,29	27,29	97	27	3	2026	35,69	36,89	36,29	36,29	130	37,25	OK	OK	OK	PD-01	No
3487	Obra	4,0	32	10	28	2	2026	SECTOR 3 11+465 / 11+495 Clz. Úni. Car. Izq.	Concreto lanzado Revestimiento de talud acceso 9 tramo 5 - S1370	20,3		7	3	2026	26,33	28,84	27,59	27,59	99	28	3	2026	37,71	37,18	37,45	37,45	134	37,16	OK	OK	OK	PD-01	No
3489	Obra	3,0	32	10	3	3	2026	SECTOR 3 11+660 / 11+670 Clz. Úni. Car. Der.	Lanzado con fibra Protección Puente Y4 Eje 1 Caisson 2 - 4277	20,3		10	3	2026	26,15	27,50	26,83	26,83	96	31	3	2026	36,76	37,91	37,34	37,34	133	37,02	OK	OK	OK	PD-01	No
3494	Obra	5,5	32	10	4	3	2026	SECTOR 3 11+535 / 11+550 Clz. Úni. Car. Izq.	Lanzado con fibra proteccion Talud 9 Terraza 4 y berma terraza 4 - 4299	20,3		11	3	2026	29,24	29,72	29,48	29,48	105	1	4	2026	35,27	36,84	36,05	36,05	129	36,95	OK	OK	OK	PD-01	No
3512	Obra	20,0	31,4	10	10	3	2026	SECTOR 3 11+690 /	Lanzado con fibra talud 13	19,4		17	3	2026	27,31	28,54	27,93	27,93	100	7	4	2026	36,17	37,69	37,06	36,97	132	36,79	OK	OK	OK	PD-01	No

								11+750 Clz. Úni. Car. Izq.	vía industrial (sachamates) - 4328																													
3518	Obra	8,0	31,5	10	12	3	2026	SECTOR 3 11+636 / 11+657 Clz. Úni. Car. Izq.	Lanzado con fibra talud 13 Terraza 3 fila C - 4344	19,1		19	3	2026	25,62	27,31	26,46	26,46	95	9	4	2026	36,69	36,98	36,86	36,84	132	36,62	OK	OK	OK	PD-01	No
3521	Obra	14,0	31,3	10	13	3	2026	SECTOR 3 11+485 / 11+502 Clz. Úni. Car. Izq.	Lanzado con fibra talud 9 Terraza 5 fila B - 4351	19,1		20	3	2026	27,35	26,25	26,80	26,80	96	10	4	2026	35,88	36,52	36,19	36,20	129	36,67	OK	OK	OK	PD-01	No
3524	Obra	5,0	32	10	16	3	2026	SECTOR 3 11+470 / 11+485 Clz. Úni. Car. Izq.	Concreto lanzado con fibra talud 9 Terraza 5 Fila B - 4368	20,3		23	3	2026	27,66	28,49	28,08	28,08	100	13	4	2026	36,59	36,97	36,78	36,78	131	36,61	OK	OK	OK	PD-01	No
3542	Obra	7,0	29,7	10	24	3	2026	SECTOR 3 11+728 / 11+740 Clz. Úni. Car. Izq.	Concreto lanzado con fibra Talud 13 Acceso via industrial - 4402	20,3		31	3	2026	27,89	28,30	27,85	28,01	100	21	4	2026	37,89	36,41	37,15	37,15	133	36,71	OK	OK	OK	PD-01	No
3546	Obra	10,0	31,1	10	25	3	2026	SECTOR 3 11+618 / 11+634 Clz. Úni. Car. Izq.	Concreto lanzado con fibra talud 13 Terraza 3 fila C - 4413	20,3		1	4	2026	27,74	28,26	28,08	28,03	100	22	4	2026				0,00	0	36,71		OK		PD-01	
3560	Obra	7,0	30,7	10	31	3	2026	SECTOR 3 11+740 / 11+747 Clz. Úni. Car. Izq.	Concreto lanzado con fibra talud 13N, terraza 1, fila A - 4448	20,3		7	4	2026	28,72	28,41	28,26	28,46	102	28	4	2026				0,00	0	36,71		OK		PD-01	
3567	Obra	10,0	31,1	10	7	4	2026	SECTOR 3 11+600 / 11+600 Clz. Úni. Car. Izq.	Concreto lanzado con fibra talud #13 Contingencia - 4466	20,3		14	4	2026	25,66	26,19	25,92	25,92	93	5	5	2026				0,00	0	36,71		OK		PD-01	
3573	Obra	12,0	30,8	10	10	4	2026	SECTOR 3 11+740 / 11+760 Clz. Úni. Car. Izq.	Concreto lanzado con fibra talud 13 Terraza 1 Fila A - 4479	19,7		17	4	2026	26,05	25,32	25,68	25,68	92	8	5	2026				0,00	0	36,71		OK		PD-01	
3575	Obra	12,0	31,5	10	11	4	2026	SECTOR 3 11+600 / 11+620 Clz. Úni. Car. Izq.	Concreto lanzado con fibra talud 13 Terraza 3 Fila D - 4485	19,1		18	4	2026	27,85	25,82	26,83	26,83	96	9	5	2026				0,00	0	36,71		OK		PD-01	
3579	Obra	5,0	30,4	10	14	4	2026	SECTOR 3 11+640 / 11+665 Clz. Úni. Car. Izq.	Concreto lanzado con fibra talud 13 Terraza 3 Fila E - 4503	20,3		21	4	2026	26,39	25,55	25,97	25,97	93	12	5	2026				0,00	0	36,71		OK		PD-01	
Promedio																**27,4**								**37,0**		**37,0**									

Elaboró



Katherine Suarez Villareal

Laboratorista

Aprobó



Wilson Enrique Ureña

Ingeniero de Materiales

Construcciones EL CONDOR S.A.
Ingeniería de Infraestructura e Inversiones

CONTROL DE CALIDAD - CONCRETO ESTRUCTURAL
ARTÍCULO INV-630

Proyecto	Mocoa - Putumayo	**Tramo**				**Ejecutor**	Construcciones El Cóndor
Tipo de concreto	Tremie	**Resistencia (f'c) (MPa)**	28	**Criterio aceptación (f'c-k1) [MPa]**	24,5	**Periodo**	21/02/2026 a 20/04/2026
Tipo de producción	Premezclado	**Fuente de agregado grueso**	Mocoa	**Fuente de agregado fino**	Arena natural Mocoa	**Fecha de actualización**	22/04/2026

N° MUESTRA	SITIO TOMA CILINDRO	CANTIDAD DE CONCRETO (m3)	TEMP. (°C)	ESPESOR DE PANTALLA (cms)	FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA			LOCALIZACIÓN	ELEMENTO FUNDIDO	ASENTAMIENTO PLANTA (cm)	FLUIDEZ (seg)	RESISTENCIA OBTENIDA Y RANGOS EN Kg/cm3																		PROCEDENCIA	56 DÍAS
												RESISTENCIA A 7 DÍAS								RESISTENCIA A 28 DÍAS								MEDIA MÓVIL 28 DÍAS (MPa) (fm)	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN				
					D	M	A					FECHA FALLA 7d			RESISTENCIA (MPa)			PROMEDIO (MPa)	%	FECHA FALLA 28d			RESISTENCIA (MPa)			PROMEDIO (MPa) (fi)	%		fi ≥ (f´c - k1)	fm ≥ f´c	ACEPTA		
												D	M	A						D	M	A										
3501	Planta	36,5	31		9	3	2026	SECTOR 3 11+560 / 11+560 Clz. Úni. Car. Der.	Caisson #6 Muro 8 Modulo 2 - 4322	22,9		16	3	2026	28,03	27,81	27,98	27,94	100	6	4	2026	37,66	36,58	36,73	36,99	132	36,99	OK	OK	OK	PD-01	No
3510	Obra	36,5	31,1		9	3	2026	SECTOR 3 11+560 / 11+560 Clz. Úni. Car. Der.	Caisson #6 Muro 8 Modulo 2 - 4322A	20,6		16	3	2026	27,72	28,90	28,31	28,31	101	6	4	2026	36,99	37,49	37,49	37,32	133	37,16	OK	OK	OK	PD-01	No
3580	Planta	22,5	30,5		14	4	2026	SECTOR 3 11+450 / 11+450 Clz. Úni. Car. Der.	Caisson #5 Muro 7, modulo 2 - 4505	22,9		21	4	2026	27,33	29,10	28,21	28,21	101	12	5	2026				0,00	0	37,16		OK		PD-01	
3594	Obra	22,5	30,8		14	4	2026	SECTOR 3 11+450 / 11+450 Clz. Úni. Car. Der.	Caisson #5 Muro 7, modulo 2 - 4505A	22,2		21	4	2026	27,29	28,66	27,97	27,97	100	12	5	2026				0,00	0	37,16		OK		PD-01	
Promedio																**28,1**								**37,2**			**37,1**					

Elaboró

Katherine Suarez Villareal

Aprobó

Wilson Enrique Ureña

Ingeniero de Materiales

Laboratorista

Construcciones EL CONDOR S.A.
Ingeniería de Infraestructura e Inversiones

CONTROL DE CALIDAD - CONCRETO ESTRUCTURAL
ARTÍCULO INV-630

Proyecto	Mocoa - Putumayo	**Tramo**				**Ejecutor**	Construcciones El Cóndor
Tipo de concreto	Lechada	**Resistencia (f'c) (MPa)**	30	**Criterio aceptación (f'c-k1) [MPa]**	26,5	**Periodo**	21/02/2026 a 20/04/2026
Tipo de producción	Preparación en obra	**Fuente de agregado grueso**		**Fuente de agregado fino**	Arena natural Mocoa	**Fecha de actualización**	22/04/2026

N° MUESTRA	SITIO TOMA CILINDRO	CANTIDAD DE CONCRETO (m3)	TEMP. (°C)	ESPESOR DE PANTALLA (cms)	FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA			LOCALIZACIÓN	ELEMENTO FUNDIDO	ASENTAMIENTO PLANTA (cm)	FLUIDEZ (seg)	RESISTENCIA OBTENIDA Y RANGOS EN Kg/cm3																		PROCEDENCIA	56 DÍAS
												RESISTENCIA A 7 DÍAS								RESISTENCIA A 28 DÍAS								MEDIA MÓVIL 28 DÍAS (MPa) (fm)	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN				
					D	M	A					FECHA FALLA 7d			RESISTENCIA (MPa)			PROMEDIO (MPa)	%	FECHA FALLA 28d			RESISTENCIA (MPa)			PROMEDIO (MPa) (fi)	%		fi ≥ (f´c - k1)	fm ≥ f´c	ACEPTA		
												D	M	A						D	M	A										
3505	Obra	1,0	28,8		23	2	2026	SECTOR 3 11+400 / 11+440 Clz. Úni.	Lleno de anclajes talud 9, terraza 4, fila E anclajes 1, 2, 7 y 14. Presión de anclajes D7, E1, D14, E14. - 378	0,0	64	2	3	2026	27,01	28,98	28,00	28,00	93	23	3	2026	39,68	39,41	39,55	39,55	132	39,55	OK	OK	OK	SECTOR 3 11+400 / 11+400. Contratista: Villalobos perforaciones	No
3506	Obra	1,0	27,3		23	2	2026	SECTOR 3 11+600 / 11+630 Clz. Úni.	Lleno de anclajes talud 13, terraza 2, anclajes D19, D20, D21. Terraza 3 anclaje D23. - 379	0,0	64	2	3	2026	26,89	28,60	27,74	27,74	92	23	3	2026	39,22	38,23	38,93	38,79	129	39,17	OK	OK	OK	SECTOR 3 11+600 / 11+600. Contratista: Villalobos perforaciones	No
3507	Obra	1,0	28		26	2	2026	SECTOR 3 11+600 / 11+615 Clz. Úni.	Lleno de anclajes talud 13, terraza 3, fila A anclajes 17, 21 y 16. Fila B anclajes 16, 17, 18 y 21. - 380	0,0	60	5	3	2026	25,86	26,45	26,16	26,16	87	26	3	2026	39,32	38,79	39,06	39,06	130	39,13	OK	OK	OK	SECTOR 3 11+600 / 11+600. Contratista: Construcciones el Cóndor	No
3533	Obra	1,0	28		3	3	2026	SECTOR 3 11+490 / 11+500 Clz. Úni.	Lleno de anclajes talud 9, terraza 5, fila A anclajes 15, 16, 24, 28 y 29. - 381	0,0	66	10	3	2026	27,99	28,55	28,27	28,27	94	31	3	2026	39,66	38,96	39,31	39,31	131	39,05	OK	OK	OK	SECTOR 3 11+490 / 11+490. Contratista: Construcciones el cóndor	No
3508	Obra	1,0	28		6	3	2026	SECTOR 3 11+500 / 11+600 Clz. Úni.	Lleno de pernos talud 9, terraza 5, fila A pernos	0,0	64	13	3	2026	29,72	30,68	30,20	30,20	101	3	4	2026	40,73	40,01	39,48	40,07	134	39,48	OK	OK	OK	SECTOR 3 11+500 / 11+500. Contratista:	No

									1 a 13, 37, 38 y 39. Talud 13 terraza 3 fila A pernos 17 y 21. Fila B pernos 24 y 25. Fila C perno 25. - 382																									Construcciones el cóndor	
3534	Obra	1,0	28,2		9	3	2026	SECTOR 3 11+600 / 11+670 Clz. Úni.	Lleno de anclajes talud 13. terraza 2, fila D anclajes 23, 29 y 30. Terraza 3, fila A anclaje 27. Fila B anclajes 2, 4, 5, 6, 23 y 25. Contingencia anclaje A2 y D1. - 383	0,0	64	16	3	2026	30,45	29,80	30,12	30,12	100	6	4	2026	39,10	38,29	38,12	38,50	128	39,30	OK	OK	OK	SECTOR 3 11+600 / 11+600. Contratista: Construcciones el cóndor	No
3535	Obra	1,0	27		11	3	2026	SECTOR 3 11+600 / 11+650 Clz. Úni.	Lleno de anclajes talud 13, vía contingencia fila A, anclaje 2, Fila D anclaje 1. Terraza 3 fila A anclaje 17. Fila B anclaje 2. Fila C anclaje 23, 24, 25 y 26. - 384	0,0	66	18	3	2026	30,19	31,50	30,84	30,84	103	8	4	2026	39,01	40,32	40,06	39,80	133	39,46	OK	OK	OK	SECTOR 3 11+600 / 11+600. Contratista: Construcciones el cóndor	No
3536	Obra	1,0	30		13	3	2026	SECTOR 3 11+485 / 11+500 Clz. Úni.	Lleno de anclajes talud 9, terraza 4, fila C anclaje 34. Fila D anclajes 31, 32, 33, 34, 35. Fila E anclajes 30, 31, 32, 33, 34 y 35. Terraza 5, fila B, anclajes 15, 16 y 17. - 385	0,0	59	20	3	2026	29,64	30,45	30,05	30,05	100	10	4	2026	38,74	40,21	39,47	39,47	132	39,26	OK	OK	OK	SECTOR 3 11+500 / 11+500. Contratista: Construcciones el cóndor	No
3537	Obra	1,0	29		16	3	2026	SECTOR 3 11+500 / 11+520 Clz. Úni.	Lleno de anclajes talud 9, terreno	0,0	60	23	3	2026	30,61	29,38	30,00	30,00	100	13	4	2026	39,95	40,18	40,07	40,07	134	39,78	OK	OK	OK	SECTOR 3 11+500 / 11+500. Contratista:	No

									natural, fila B anclajes 67, 68, 72 y 73. Fila C anclajes 67 y 71. Fila D anclaje 62, 63 y 64. Fila E anclajes 71, 72 y 73. - 386																								Construcciones el cóndor	
3584	Obra	1,0	29		18	3	2026	SECTOR 3 11+500 / 11+550 Clz. Úni.	Lleno de anclajes talud 9, terraza 5 fila B anclajes 76 y 77. Fila C anclajes 74 y 75. Fila D anclaje 66. Fila E anclajes 73 y 74. Talud 13, fila C anclaje 19. Fila C anclaje 20, 21 y 23. - 387	0,0	59	25	3	2026	32,07	29,98	31,02	31,02	103	15	4	2026	39,81	40,72	40,27	40,27	134	39,94	OK	OK	OK	SECTOR 3 11+500 / 11+500. Contratista: Construcciones el Cóndor	No
3561	Obra	1,0	28,2		27	3	2026	SECTOR 3 11+500 / 11+520 Clz. Úni.	Lleno de anclajes talud 9 terreno natural, fila A anclajes 9, 10 y 11. Fila B anclajes 9 y 10. - 388	0,0	60	3	4	2026	30,62	30,13	30,37	30,37	101	24	4	2026				0,00	0	39,94		OK		SECTOR 3 11+500 / 11+500. Contratista: Villalobos perforaciones	
3562	Obra	1,0	28		31	3	2026	SECTOR 3 11+600 / 11+675 Clz. Úni.	Lleno de anclajes talud 13, terraza 3, fila C anclajes 8 a 17. - 389	0,0	63	7	4	2026	27,87	28,36	28,11	28,11	94	28	4	2026				0,00	0	39,94		OK		SECTOR 3 11+600 / 11+600. Contratista: Construcciones el cóndor	
3563	Obra	1,0	29		6	4	2026	SECTOR 3 11+450 / 11+504 Clz. Úni.	Lleno de anclajes talud 9, terraza 3, fila B anclajes 1 y 3. fila C anclajes 1 a 6.- 390	0,0	62	13	4	2026	30,29	27,81	29,05	29,05	97	4	5	2026				0,00	0	39,94		OK		SECTOR 3 11+450 / 11+450. Contratista: Construcciones el cóndor	
3564	Obra	1,0	29		7	4	2026	SECTOR 3 11+450 / 11+490 Clz. Úni. Car. Der.	Lleno de anclajes talud 9, terreno natural, muro 7, fila A, anclajes 1 y 2. Fila B anclajes 1 y 2. Fila C	0,0	59	14	4	2026	27,42	26,93	27,18	27,18	91	5	5	2026				0,00	0	39,94		OK		SECTOR 3 11+450 / 11+450. Contratista: Construcciones el Cóndor	

									anclaje 1. Fila D anclaje 1. - 391																								
3585	Obra	1,0	28		10	4	2026	SECTOR 3 11+590 / 11+600 Clz. Úni.	Lleno de anclajes a presión, talud 13, terraza 3, fila C anclajes 18 a 27. Fila D anclajes 9 a 28. - 392	0,0	62	17	4	2026	31,70	29,26	30,48	30,48	102	8	5	2026			0,00	0	39,94		OK		SECTOR 3 11+600 / 11+600. Contratista: Construcciones el Cóndor	
3586	Obra	1,0	28,3		13	4	2026	SECTOR 3 11+600 / 11+650 Clz. Úni.	Lleno de anclajes talud 13, terraza 3, fila D anclajes 4 a 9 y 22 a 28. - 393	0,0	66	20	4	2026	27,44	30,16	28,80	28,80	96	11	5	2026			0,00	0	39,94		OK		SECTOR 3 11+600 / 11+600. Contratista: Construcciones el Cóndor	
Promedio																**29,1**						**39,5**		**39,6**							

Elaboró



Katherine Suarez Villareal

Laboratorista

Aprobó



Wilson Enrique Ureña

Ingeniero de Materiales

Construcciones EL CONDOR S.A.
Ingeniería de Infraestructura e Inversiones

CONTROL DE CALIDAD - CONCRETO ESTRUCTURAL
ARTÍCULO INV-630

Proyecto	Mocoa - Putumayo	**Tramo**				**Ejecutor**	Construcciones El Cóndor
Tipo de concreto	Convencional	**Resistencia (f'c) (MPa)**	35	**Criterio aceptación (f'c-k1) [MPa]**	31,5	**Periodo**	21/02/2026 a 20/04/2026
Tipo de producción	Premezclado	**Fuente de agregado grueso**	Mocoa	**Fuente de agregado fino**	Arena natural Mocoa	**Fecha de actualización**	22/04/2026

N° MUESTRA	SITIO TOMA CILINDRO	CANTIDAD DE CONCRETO (m3)	TEMP. (°C)	ESPESOR DE PANTALLA (cms)	FECHA DE CREACIÓN DE LA MUESTRA			LOCALIZACIÓN	ELEMENTO FUNDIDO	ASENTAMIENTO PLANTA (cm)	FLUIDEZ (seg)	RESISTENCIA OBTENIDA Y RANGOS EN Kg/cm3																			PROCEDENCIA	56 DÍAS
												RESISTENCIA A 7 DÍAS								RESISTENCIA A 28 DÍAS								MEDIA MÓVIL 28 DÍAS (MPa) (fm)	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN					
												FECHA FALLA 7d			RESISTENCIA (MPa)			PROMEDIO (MPa)	%	FECHA FALLA 28d			RESISTENCIA (MPa)			PROMEDIO (MPa) (fi)	%		fi ≥ (f´c - k1)	fm ≥ f´c	ACEPTA		
					D	M	A					D	M	A						D	M	A											
3473	Planta	4,5	29		21	2	2026	SECTOR 3 11+500 / 11+500 Car. Izq.	Dados en sitio Talud 9, Linea A (44 Al 49) Linea B (43 al 48) Linea C (41 al 51) Linea D (del 40 al 43) Linea E (39 AL 44) - 4231	20,3		28	2	2026	33,89	34,62	34,26	34,26	98	21	3	2026	42,82	46,33	44,58	44,58	127	44,58	OK	OK	OK	PD-01	No
3481	Planta	7,0	29		26	2	2026	SECTOR 3 11+500 / 11+500 Clz. Úni.	Dados en sitio Talud 9 Natural Linea B 4 Unidades linea C 4 Unidades Linea D 4 Unidades E 4 Unidades - 4249	20,3		5	3	2026	32,53	33,25	32,89	32,89	94	26	3	2026	45,89	43,44	44,67	44,67	128	44,62	OK	OK	OK	PD-01	No
3491	Planta	6,5	31		3	3	2026	SECTOR 3 11+500 / 11+500 Clz. Úni. Car. Izq.	Dados en sitio Talud 9 Terreno natural , Linea A Linea B, linea C, Linea D , Linea E 19 Unidades - 4280	20,3		10	3	2026	34,60	35,37	34,99	34,99	100	31	3	2026	43,37	45,72	44,55	44,55	127	44,60	OK	OK	OK	PD-01	No
3492	Planta	5,0	30		4	3	2026	SECTOR 3 11+500 / 11+500 Clz. Úni. Car. Izq.	Dados en sitio Talud 9 Terreno natural , Linea A Linea B, linea C, Linea D , Linea E 13 Unidades - 4296	20,3		11	3	2026	35,49	33,77	34,63	34,63	99	1	4	2026	43,91	45,88	44,89	44,89	128	44,70	OK	OK	OK	PD-01	No

3496	Planta	5,0	28,5		5	3	2026	SECTOR 3 11+100 / 11+100 Clz. Úni.	Dados prefabricados - S1384	19,1		12	3	2026	35,47	37,01	36,24	36,24	104	2	4	2026	47,61	45,67	46,64	46,64	133	45,36	OK	OK	OK	PD-01	No
3514	Planta	7,0	28,5		11	3	2026	SECTOR 3 11+500 / 11+500 Clz. Úni. Car. Izq.	Dados en sitio Talud 13 Fila A-B-C 11 Unidades - 4334	20,3		18	3	2026	35,26	33,57	34,42	34,42	98	8	4	2026	45,34	43,92	44,63	44,63	128	45,39	OK	OK	OK	PD-01	No
3522	Planta	8,0	29		14	3	2026	SECTOR 3 11+500 / 11+500 Clz. Úni. Car. Izq.	Dados en sitio talud 9 - 4357	20,0		21	3	2026	34,61	35,28	34,95	34,95	100	11	4	2026	44,59	46,66	45,62	45,62	130	45,63	OK	OK	OK	PD-01	No
3528	Planta	12,0	30,5		17	3	2026	SECTOR 3 11+500 / 11+500 Clz. Úni. Car. Izq.	Dados en sitio, Talud 9 Terraza 4 (19 und) - 4375	17,8		24	3	2026	34,50	34,64	34,52	34,55	99	14	4	2026	46,28	45,04	45,66	45,66	130	45,30	OK	OK	OK	PD-01	No
3538	Planta	10,0	31		20	3	2026	SECTOR 3 11+500 / 11+500 Clz. Úni. Car. Izq.	Dados en sitios talud 9 Terraza 4 C#29-30-31-32-33-34 D#30-31-32-33-34-35 E#30-31-32-33-34-35. 17 unidades - 4392	20,3		27	3	2026	34,80	35,78	35,29	35,29	101	17	4	2026	45,42	46,22	45,82	45,82	131	45,70	OK	OK	OK	PD-01	No
3543	Planta	10,0	30		24	3	2026	SECTOR 3 11+600 / 11+600 Clz. Úni. Car. Izq.	Dados en sitio Talud 13 Terraza 2 y 3 19 unidades - 4405	20,3		31	3	2026	34,16	35,14	34,65	34,65	99	21	4	2026	47,29	46,21	46,75	46,75	134	46,08	OK	OK	OK	PD-01	No
3549	Planta	9,0	30		28	3	2026	SECTOR 3 11+618 / 11+618 Clz. Úni. Car. Izq.	Dados en sitio Talud 9. 16 Unidades - 4433	20,3		4	4	2026	35,29	34,83	34,50	34,87	100	25	4	2026				0,00	0	46,08		OK		PD-01	
3557	Planta	6,0	30		30	3	2026	SECTOR 3 11+600 / 11+600 Clz. Úni. Car. Izq.	Dados en sitio, talud 13 fila B. 8 unidades - 4442	20,3		6	4	2026	35,62	34,50	34,82	34,98	100	27	4	2026				0,00	0	46,08		OK		PD-01	
3570	Planta	4,5	30		10	4	2026	SECTOR 3 11+500 / 11+500 Clz. Úni. Car. Izq.	Dados en sitio Talud 9 Tn 8 unidades D=66 E=70 AL 76 - 4474	20,3		17	4	2026	35,02	34,78	34,90	34,90	100	8	5	2026				0,00	0	46,08		OK		PD-01	
Promedio																**34,7**								**45,4**		**45,4**							

Elaboró Aprobó



Katherine Suarez Villareal

Laboratorista



Wilson Enrique Ureña

Ingeniero de Materiales

Construcciones EL CONDOR S.A.
Ingeniería de Infraestructura e Inversiones

AG - CONCRETO ESTRUCTURAL

CÓDIGO INTERNO	MP-ART-630-13-037
FECHA	22/04/2026

PROYECTO	MOCOA - PUTUMAYO	**PROCEDENCIA**	MOCOA			**LOCALIZACIÓN**	
PERIODO	21/03/2026 AL 20/04/2026	**EJECUTOR**	CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR	**TIPO DE MATERIAL**	AG - CONCRETO ESTRUCTURAL	**MATERIAL**	AG25

NORMA						GRANULOMETRÍA						ÍNDICES DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO		TERRONES DE ARCILLA Y PARTÍCULAS DELEZNABLES	PARTÍCULAS LIVIANAS	DESGASTE MAQUINA DE LOS ANGELES		SOLIDEZ SULFATO DE SODIO	SOLIDEZ SULFATO DE MAGNESIO	
						% QUE PASA N 4	% QUE PASA N 8	% QUE PASA 1"	% QUE PASA 3/4"	% QUE PASA 1/2"	% QUE PASA 3/8"	INDICE APLANAMIENTO GLOBAL	INDICE ALARGAMEINTO GLOBAL	PORCENTAJE TERRONES FRACCIÓN GRUESA	RESULTADO PARA ENSAYOS EXT. E INT.	DESGASTE SECO 100 REV	DESGASTE SECO 500 REV	PERDIDA TOTAL GRUESOS	PERDIDA TOTAL GRUESOS	
						>=0 Y <=10	>=0 Y <=5	<=100 Y >=100	>=95 Y <=100		>=20 Y <=55	<=25	<=25	<=0,25	<=1	<=8	<=40	<=12	<=18	
FRECUENCIA						JORNADA						SEMANAL		SEMANAL	MENSUAL	MENSUAL		MENSUAL	MENSUAL	
DÍA	MES	AÑO	MUESTRA	LOCALIZACIÓN	PROCEDENCIA															CUMPLE
21	3	2026	MP-AG25-13-1715	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6083	MOCOA	4.0	3.5	100.0	100.0	62.3	29.1									SÍ
24	3	2026	MP-AG25-13-1714	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6100	MOCOA	4.5	3.7	100.0	100.0	57.8	29.6	16	18	0.09	0.013					SÍ
25	3	2026	MP-AG25-13-1716	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6102	MOCOA	4.0	3.5	100.0	100.0	60.0	24.5									SÍ
27	3	2026	MP-AG25-13-1717	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6113	MOCOA	2.3	1.4	100.0	100.0	62.2	27.3									SÍ
28	3	2026	MP-AG25-13-1718	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6124	MOCOA	3.0	2.2	100.0	100.0	55.1	28.1									SÍ
30	3	2026	MP-AG25-13-1719	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6144	MOCOA	2.5	2.1	100.0	100.0	57.3	23.3	15	15	0.11	0.012					SÍ
31	3	2026	MP-AG25-13-1720	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6146	MOCOA	3.1	2.6	100.0	100.0	56.8	24.1									SÍ
6	4	2026	MP-AG25-13-1721	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. DER. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE	MOCOA	4.2	3.6	100.0	100.0	54.9	20.1	14	16	0.08	0.013	3	18.9	2	3.00	SÍ

				CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6174															
8	**4**	**2026**	**MP-AG25-13-1722**	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6192	MOCOA	**3.2**	**2.6**	**100.0**	**100.0**	**56.4**	**23.8**								SÍ
10	**4**	**2026**	**MP-AG25-13-1723**	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6208	MOCOA	**3.2**	**2.5**	**100.0**	**100.0**	**60.0**	**25.9**								SÍ
11	**4**	**2026**	**MP-AG25-13-1724**	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6211	MOCOA	**3.0**	**2.3**	**100.0**	**100.0**	**59.9**	**25.8**								SÍ
13	**4**	**2026**	**MP-AG25-13-1725**	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6231	MOCOA	**3.3**	**2.9**	**100.0**	**100.0**	**52.8**	**25.3**	**17**	**19**	**0.09**	**0.022**				SÍ
14	**4**	**2026**	**MP-AG25-13-1726**	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6235	MOCOA	**2.7**	**2.4**	**100.0**	**100.0**	**55.5**	**22.5**								SÍ
15	**4**	**2026**	**MP-AG25-13-1727**	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6248	MOCOA	**3.2**	**2.7**	**100.0**	**100.0**	**55.7**	**26.2**								SÍ
16	**4**	**2026**	**MP-AG25-13-1728**	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6252	MOCOA	**2.9**	**1.8**	**100.0**	**100.0**	**56.0**	**28.1**								SÍ
17	**4**	**2026**	**MP-AG25-13-1729**	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6267	MOCOA	**3.7**	**2.1**	**100.0**	**100.0**	**58.4**	**25.4**								SÍ
18	**4**	**2026**	**MP-AG25-13-1730**	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6271	MOCOA	**3.7**	**2.1**	**100.0**	**100.0**	**53.7**	**24.0**								SÍ
PROMEDIO						**3.33**	**2.59**	**100.00**	**100.00**	**57.35**	**25.47**	**15.69**	**17.20**	**0.09**	**0.01**	**3.30**	**18.87**	**2.50**	**2.50**	

ELABORÓ APROBÓ





Katherine Suarez Villareal — Laboratorista

Wilson Enrique Ureña — Ingeniero de Materiales

Construcciones EL CONDOR S.A.
Ingeniería de Infraestructura e Inversiones

AF -13 CONCRETO ESTRUCTURAL

CÓDIGO INTERNO	MP-ART-630-13-169
FECHA	22/04/2026

PROYECTO	MOCOA - PUTUMAYO	**PROCEDENCIA**	MOCOA			**LOCALIZACIÓN**	
PERIODO	21/03/2026 AL 20/04/2026	**EJECUTOR**	CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR	**TIPO DE MATERIAL**	AF - CONCRETO ESTRUCTURAL	**MATERIAL**	AF-13

NORMA						GRANULOMETRÍA							LÍMITES		EQUIVALENTE ARENA	AZUL DE METILENO	MAT ORGANICA COLOR	TERRONES DE ARCILLA Y PARTÍCULAS DELEZNABLES	GRAV ESPECIFICA FINO	PARTÍCULAS LIVIANAS	SOLIDEZ SULFATO DE SODIO	SOLIDEZ SULFATO DE MAGNESIO	
						% QUE PASA N 4	% QUE PASA N 8	% QUE PASA N 16	% QUE PASA N 30	% QUE PASA N 50	% QUE PASA N 100	% QUE PASA 3/8"	INDICE DE PLASTICIDAD (%)	LIMITE LIQUIDO (%)	EQUIV. DE ARENA PROMEDIO (%)	VALOR DE AZUL DE METILENO (MG)	COLOR OBSERVADO	PORCENTAJE TERRONES FRACCIÓN FINA	ABSORCION PROMEDIO	RESULTADO PARA ENSAYOS EXT. E INT.	PERDIDA TOTAL FINOS	PERDIDA TOTAL FINOS	
						>=95 Y <=100	>=80 Y <=100	>=50 Y <=85	>=25 Y <=60	>=10 Y <=30	>=2 Y <=10	<=100 Y =100	=0		>=60	<=5		<=1	<=4	<=0,5	<=10	<=15	
FRECUENCIA						JORNADA							JORNADA		SEMANAL	SEMANAL	SEMANAL	SEMANAL	SEMANAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	
DÍA	MES	AÑO	MUESTRA	LOCALIZACIÓN	PROCEDENCIA																		CUMPLE
21	3	2026	MP-AF-13-1710	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6082	MOCOA	90.8	80.4	64.4	46.4	24.9	10.0	100.0	NP	NL									SÍ
24	3	2026	MP-AF-13-1709	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6101	MOCOA	91.9	80.6	64.3	43.2	24.8	9.4	100.0	NP	NL	61	0.75	2.00	0.12	2.36	0.105			SÍ
25	3	2026	MP-AF-13-1711	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6103	MOCOA	92.6	82.3	67.7	44.6	22.5	9.6	100.0	NP	NL									SÍ
27	3	2026	MP-AF-13-1712	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6112	MOCOA	91.9	81.2	65.3	43.1	21.3	9.7	100.0	NP	NL									SÍ
28	3	2026	MP-AF-13-1713	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6125	MOCOA	90.7	80.2	65.1	43.2	22.0	9.9	100.0	NP	NL									SÍ
30	3	2026	MP-AF-13-1714	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ.	MOCOA	92.1	82.1	68.1	44.2	19.2	9.5	100.0	NP	NL	61	0.85	2.00	0.17	2.24	0.060			SÍ

				PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6145																			
31	**3**	**2026**	**MP-AF-13-1715**	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6147	MOCOA	**92.6**	**83.4**	**70.1**	**44.3**	**20.2**	**9.6**	**100.0**	**NP**	**NL**										SÍ
6	**4**	**2026**	**MP-AF-13-1716**	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6175	MOCOA	**91.5**	**81.6**	**67.8**	**45.5**	**22.0**	**9.7**	**100.0**	**NP**	**NL**	**61**	**0.80**	**2.00**	**0.10**	**2.24**	**0.070**	**3**	**5.00**	SÍ
8	**4**	**2026**	**MP-AF-13-1717**	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6193	MOCOA	**93.6**	**83.9**	**70.0**	**46.0**	**21.1**	**9.8**	**100.0**	**NP**	**NL**									SÍ
10	**4**	**2026**	**MP-AF-13-1718**	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6209	MOCOA	**92.9**	**82.7**	**68.9**	**46.2**	**20.9**	**9.4**	**100.0**	**NP**	**NL**									SÍ
11	**4**	**2026**	**MP-AF-13-1719**	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6212	MOCOA	**92.7**	**83.2**	**65.7**	**46.3**	**21.6**	**9.8**	**100.0**	**NP**	**NL**									SÍ
13	**4**	**2026**	**MP-AF-13-1720**	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6232	MOCOA	**91.9**	**82.6**	**69.0**	**45.4**	**20.1**	**9.5**	**100.0**	**NP**	**NL**	**63**	**0.65**	**2.00**	**0.14**	**2.28**	**0.140**			SÍ
14	**4**	**2026**	**MP-AF-13-1721**	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6236	MOCOA	**91.7**	**81.6**	**67.9**	**45.3**	**21.3**	**10.0**	**100.0**	**NP**	**NL**									SÍ
15	**4**	**2026**	**MP-AF-13-1722**	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6249	MOCOA	**90.4**	**80.0**	**65.8**	**47.0**	**25.2**	**9.7**	**100.0**	**NP**	**NL**									SÍ
16	**4**	**2026**	**MP-AF-13-1723**	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE	MOCOA	**91.5**	**81.3**	**65.5**	**44.8**	**24.8**	**10.0**	**100.0**	**NP**	**NL**									SÍ

				CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6251																		
17	**4**	**2026**	**MP-AF-13-1724**	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6269	MOCOA	**91.0**	**80.5**	**65.1**	**46.4**	**26.0**	**10.0**	**100.0**	**NP**	**NL**									SÍ
18	**4**	**2026**	**MP-AF-13-1725**	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6270	MOCOA	**91.0**	**80.5**	**65.1**	**46.4**	**26.0**	**10.0**	**100.0**	**NP**	**NL**									SÍ
PROMEDIO						**91.81**	**81.66**	**66.81**	**45.18**	**22.60**	**9.73**	**100.00**	**0.00**		**61.50**	**0.76**	**2.00**	**0.13**	**2.28**	**0.09**	**4.00**	**4.00**	

ELABORÓ APROBÓ





Katherine Suarez Villareal Wilson Enrique Ureña

Laboratorista Ingeniero de Materiales

Construcciones EL CONDOR S.A.
Ingeniería de Infraestructura e Inversiones

AF -13 CONCRETO ESTRUCTURAL

CÓDIGO INTERNO	MP-ART-630-13-170
FECHA	22/04/2026

PROYECTO	MOCOA - PUTUMAYO	**PROCEDENCIA**	- ARENA MIXTA LANZADO- MOCOA+MOCOA			**LOCALIZACIÓN**	SECTOR 3 10+600 / 23+571
PERIODO	21/03/2026 AL 20/04/2026	**EJECUTOR**	CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR	**TIPO DE MATERIAL**	AF - CONCRETO ESTRUCTURAL	**MATERIAL**	AF-EFNARC LANZADO

NORMA						GRANULOMETRÍA							LÍMITES		EQUIVALENTE ARENA	AZUL DE METILENO	MAT ORGANICA COLOR	TERRONES DE ARCILLA Y PARTÍCULAS DELEZNABLES	GRAV ESPECIFICA FINO	PARTÍCULAS LIVIANAS	SOLIDEZ SULFATO DE SODIO	SOLIDEZ SULFATO DE MAGNESIO	
						% QUE PASA N 4	% QUE PASA N 8	% QUE PASA N 16	% QUE PASA N 30	% QUE PASA N 50	% QUE PASA N 100	% QUE PASA 3/8"	INDICE DE PLASTICIDAD (%)	LIMITE LIQUIDO (%)	EQUIV. DE ARENA PROMEDIO (%)	VALOR DE AZUL DE METILENO (MG)	COLOR OBSERVADO	PORCENTAJE TERRONES FRACCIÓN FINA	ABSORCION PROMEDIO	RESULTADO PARA ENSAYOS EXT. E INT.	PERDIDA TOTAL FINOS	PERDIDA TOTAL FINOS	
						>=73 Y <=100	>=55 Y <=90	>=37 Y <=72	>=22 Y <=50	>=11 Y <=26	>=4 Y <=12	<=100 Y =100	=0		>=60	<=5	<=3	<=1	<=4		<=10	<=15	
FRECUENCIA						JORNADA							JORNADA		SEMANAL	SEMANAL	SEMANAL	SEMANAL	SEMANAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	
DÍA	MES	AÑO	MUESTRA	LOCALIZACIÓN	PROCEDENCIA																		CUMPLE
24	3	2026	MP-AF-EFNARC-1712	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6099	- ARENA MIXTA LANZADO- MOCOA+MOCOA	86.0	70.2	56.7	40.7	24.0	10.6	100.0	NP	NL	60	1.15	1.00	0.21	1.87	0.110			SÍ
25	3	2026	MP-AF-EFNARC-1713	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6104	- ARENA MIXTA LANZADO- MOCOA+MOCOA	86.7	71.7	54.8	37.5	22.0	11.2	100.0	NP	NL									SÍ
31	3	2026	MP-AF-EFNARC-1714	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6148	- ARENA MIXTA LANZADO- MOCOA+MOCOA	82.6	66.4	52.7	36.5	20.7	11.4	100.0	NP	NL	61	1.40	1.00	0.42	1.84	0.120			SÍ
7	4	2026	MP-AF-EFNARC-1715	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6176	- ARENA MIXTA LANZADO- MOCOA+MOCOA	86.7	72.7	56.2	39.6	23.8	10.8	100.0	NP	NL	62	0.95	1.00	0.11	1.80	0.105	2	4.00	SÍ
10	4	2026	MP-AF-EFNARC-1716	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6210	- ARENA MIXTA LANZADO- MOCOA+MOCOA	87.7	73.7	57.1	38.8	23.2	11.9	100.0	NP	NL									SÍ
11	4	2026	MP-AF-EFNARC-1717	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ.	- ARENA MIXTA LANZADO- MOCOA+MOCOA	86.8	72.6	57.5	40.1	22.4	11.6	100.0	NP	NL									SÍ

				PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6213																		
13	**4**	**2026**	**MP-AF-EFNARC-1718**	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6233	- ARENA MIXTA LANZADO-MOCOA+MOCOA	**85.9**	**70.5**	**55.9**	**39.6**	**22.8**	**11.6**	**100.0**	**NP**	**NL**	**62**	**1.00**	**1.00**	**0.13**	**1.92**	**0.095**			SÍ
14	**4**	**2026**	**MP-AF-EFNARC-1719**	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6237	- ARENA MIXTA LANZADO-MOCOA+MOCOA	**86.9**	**72.1**	**56.7**	**38.0**	**20.7**	**10.1**	**100.0**	**NP**	**NL**									SÍ
17	**4**	**2026**	**MP-AF-EFNARC-1720**	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6268	- ARENA MIXTA LANZADO-MOCOA+MOCOA	**86.5**	**72.7**	**56.9**	**39.7**	**22.3**	**10.5**	**100.0**	**NP**	**NL**									SÍ
PROMEDIO						**86.19**	**71.41**	**56.05**	**38.94**	**22.43**	**11.07**	**100.00**	**0.00**		**61.25**	**1.13**	**1.00**	**0.22**	**1.86**	**0.11**	**3.00**	**3.00**	

ELABORÓ APROBÓ





Katherine Suarez Villareal Wilson Enrique Ureña

Laboratorista Ingeniero de Materiales

Construcciones EL CONDOR S.A. Ingeniería de Infraestructura e Inversiones	**CONTENIDO DE FIBRA**	CÓDIGO INTERNO	MP-CF-041
		FECHA	22/04/2026

PROYECTO	MOCOA - PUTUMAYO	**PROCEDENCIA**	PD-01			**LOCALIZACIÓN**	SECTOR 3 10+600 / 23+571
PERIODO	21/03/2026 AL 20/04/2026	**EJECUTOR**	CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR	**TIPO DE MATERIAL**	CONCRETO LANZADO	**MATERIAL**	LANZADO MOCOA

NORMA						**CONTENIDO DE FIBRA**	
						CONTENIDO DE FIBRA PROMEDIO	
						>=75	
FRECUENCIA						**SEMANAL**	
DÍA	**MES**	**AÑO**	**MUESTRA**	**LOCALIZACIÓN**	**PROCEDENCIA**		**CUMPLE**
24	**3**	**2026**	**MP-LANZADO MOCOA-1306**	SECTOR 3 11+728 / 11+740 CLZ. UNI. CAR. IZQ. CONCRETO LANZADO TALUD 13 ACCESO VIA INDUSTRIAL. DOSIS DE FIBRA 7.25KG/M3 SIKA FIBER FORCE - 60	PD-01	**101**	SÍ
31	**3**	**2026**	**MP-LANZADO MOCOA-1307**	SECTOR 3 11+740 / 11+747 CLZ. UNI. CAR. IZQ. CONCRETO LANZADO TALUD 13N, TERRAZA 1, FILA A. DOSIS DE FIBRA 7.25KG/M3 SIKA FIBER FORCE - 60	PD-01	**98**	SÍ
7	**4**	**2026**	**MP-LANZADO MOCOA-1308**	SECTOR 3 11+600 / 11+600 CLZ. UNI. CAR. IZQ. LANZADO TALUD #13 CONTINGENCIA. DOSIS DE FIBRA 7.25KG/M3 SIKA FIBER FORCE - 60	PD-01	**100**	SÍ
14	**4**	**2026**	**MP-LANZADO MOCOA-1309**	SECTOR 3 11+640 / 11+665 CLZ. UNI. CAR. DER. CONCRETO LANZADO CON FIBRA TALUD 13 TERRAZA 3 FILA E. DOSIS DE FIBRA 7.25KG/M3 SIKA FIBER FORCE - 60	PD-01	**101**	SÍ
PROMEDIO						**99.95**	

ELABORÓ APROBÓ





Katherine Suarez Villareal — Wilson Enrique Ureña

Laboratorista — Ingeniero de Materiales

Construcciones EL CONDOR S.A.
Ingeniería de Infraestructura e Inversiones

RE_SBG_38 NT-2

CÓDIGO INTERNO	MP-RE_SBG_38-038
FECHA	22/04/2026

PROYECTO	MOCOA - PUTUMAYO	**PROCEDENCIA**	MOCOA			**LOCALIZACIÓN**	SECTOR 3 10+600 / 23+571
PERIODO	21/03/2026 AL 20/04/2026	**EJECUTOR**	CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR	**TIPO DE MATERIAL**	RELLENO ESTRUCTURAL	**MATERIAL**	RELLENO ESTRUCTURA - SUBBASE GRANULAR CLASE C / RE SBG-38

NORMA						GRANULOMETRÍA									LÍMITES		EQUIVALENTE ARENA	TERRONES DE ARCILLA Y PARTÍCULAS DELEZNABLES		PROCTOR MODIFICADO		DESGASTE MAQUINA DE LOS ANGELES	SOLIDEZ SULFATO DE SODIO		SOLIDEZ SULFATO DE MAGNESIO		
						TAMANO MAXIMO (MM)	% QUE PASA N 4	% QUE PASA N 10	% QUE PASA N 40	% QUE PASA N 200	% QUE PASA 1 1/2"	% QUE PASA 1"	% QUE PASA 1/2"	% QUE PASA 3/8"	RELACION 200/40 (%)	INDICE DE PLASTICIDAD (%)	LIMITE LIQUIDO (%)	EQUIV. DE ARENA PROMEDIO (%)	PORCENTAJE TERRONES FRACCIÓN GRUESA	PORCENTAJE TERRONES FRACCIÓN FINA	HUMEDAD ÓPTIMA (%)	DENSIDAD MÁXIMA (G/CM3)	DESGASTE SECO 500 REV	PERDIDA TOTAL FINOS	PERDIDA TOTAL GRUESOS	PERDIDA TOTAL FINOS	PERDIDA TOTAL GRUESOS	
							>=30 Y <=60	>=20 Y <=45	>=8 Y <=30	>=2 Y <=15	<=100 Y >=100	>=75 Y <=95	>=55 Y <=85	>=45 Y <=75		<=6	<=25	>=25	<=2	<=2			<=50	<=12	<=12	<=18	<=18	
FRECUENCIA						JORNADA										JORNADA		SEMANAL	SEMANAL		MENSUAL		MENSUAL	MENSUAL		MENSUAL		
DÍA	MES	AÑO	MUESTRA	LOCALIZACIÓN	PROCEDENCIA																								CUM
21	3	2026	MP-RE SBG-38-153	SECTOR 3 10+956 / 10+965 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 6 - CAPA NO 4 SECTOR 3 10+956 / 10+965 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 6 - CAPA NO 5 SECTOR 3 10+956 / 10+965 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 6 - CAPA NO 6 SECTOR 3 10+956 / 10+965 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 6 - CAPA NO 7 SECTOR 3 10+956 / 10+965 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3	MOCOA	37.50	40.1	28.8	14.8	4.8	100.0	90.1	63.5	54.3	0.32	NP	NL													SÍ

				MÓDULO NO 6 - CAPA NO 8 SECTOR 3 10+956 / 10+965 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 6 - CAPA NO 9 SECTOR 3 10+956 / 10+965 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 6 - CAPA NO 10 SECTOR 3 10+956 / 10+965 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 6 - CAPA NO 11 SECTOR 3 10+965 / 10+977 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 12 - CAPA NO 26 SECTOR 3 10+965 / 10+977 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 12 - CAPA NO 27 SECTOR 3 10+965 / 10+977 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 12 - CAPA NO 28 SECTOR 3 10+965 / 10+977 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 12 - CAPA NO 29 SECTOR 3 10+965 / 10+977 CLZ. UNI. CAR. DER.																												

				VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 12 - CAPA NO 30 SECTOR 3 10+695 / 10+977 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 12 - CAPA NO 31 SECTOR 3 10+965 / 10+977 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 12 - CAPA NO 32 SECTOR 3 10+965 / 10+977 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 12 - CAPA NO 33																							
24	**3**	**2026**	**MP-RE SBG-38-152**	SECTOR 3 10+965 / 10+977 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 12 - CAPA NO 34 SECTOR 3 10+956 / 10+965 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 6 - CAPA NO 12 SECTOR 3 10+977 / 10+990 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 6 - CAPA NO 1	MOCOA	**37.50**	**43.5**	**28.9**	**13.0**	**4.8**	**100.0**	**89.6**	**65.9**	**57.4**	**0.37**	**NP**	**NL**	**48**	**0.05**	**0.10**	**6.15**	**2.234**						**SÍ**
25	**3**	**2026**	**MP-RE SBG-38-154**	SECTOR 3 10+977 / 10+990 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 6 - CAPA NO 2	MOCOA	**37.50**	**43.7**	**28.8**	**14.0**	**4.7**	**100.0**	**90.0**	**65.2**	**57.3**	**0.34**	**NP**	**NL**										**SÍ**

				SECTOR 3 10+977 / 10+990 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 6 - CAPA NO 3 SECTOR 3 10+977 / 10+990 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 6 - CAPA NO 4 SECTOR 3 10+965 / 10+977 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 12 - CAPA NO 35 SECTOR 3 10+695 / 10+977 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 12 - CAPA NO 36 SECTOR 3 10+965 / 10+977 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 12 - CAPA NO 37 SECTOR 3 10+956 / 10+965 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 6 - CAPA NO 13 SECTOR 3 10+956 / 10+965 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 6 - CAPA NO 14 SECTOR 3 10+956 / 10+965 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 6																												

				- CAPA NO 15 SECTOR 3 10+956 / 10+965 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 6 - CAPA NO 16 SECTOR 3 10+877 / 10+879 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°2 MÓDULO NO 7, ALCANTARILLA N°3 - CAPA NO 21 SECTOR 3 10+877 / 10+879 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°2 MÓDULO NO 7, ALCANTARILLA N°3 - CAPA NO 22																										
26	**3**	**2026**	**MP-RE SBG-38-155**	SECTOR 3 10+965 / 10+977 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 12 - CAPA NO 38 SECTOR 3 10+965 / 10+977 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 12 - CAPA NO 39 SECTOR 3 10+965 / 10+977 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 12 - CAPA NO 40 SECTOR 3 10+965 / 10+977 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 12 - CAPA NO 41 SECTOR 3	MOCOA	**37.50**	**44.6**	**30.1**	**13.0**	**4.6**	**100.0**	**88.7**	**65.1**	**57.4**	**0.36**	**NP**	**NL**												SÍ

				10+965 / 10+977 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 12 - CAPA NO 42 SECTOR 3 10+956 / 10+965 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 6 - CAPA NO 17 SECTOR 3 10+956 / 10+965 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 6 - CAPA NO 18 SECTOR 3 10+977 / 10+990 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 6 - CAPA NO 5 SECTOR 3 10+977 / 10+990 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 6 - CAPA NO 6 SECTOR 3 10+877 / 10+879 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°2 MÓDULO NO 7, ALCANTARILLA N°3 - CAPA NO 23 SECTOR 3 10+877 / 10+879 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°2 MÓDULO NO 7, ALCANTARILLA N°3 - CAPA NO 24 SECTOR 3 10+877 / 10+879 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°2																											

				MÓDULO NO 7, ALCANTARILLA N°3 - CAPA NO 25 SECTOR 3 10+877 / 10+879 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°2 MÓDULO NO 7, ALCANTARILLA N°3 - CAPA NO 26 SECTOR 3 10+877 / 10+879 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°2 MÓDULO NO 7, ALCANTARILLA N°3 - CAPA NO 27																									
27	**3**	**2026**	**MP-RE SBG-38-156**	SECTOR 3 10+965 / 10+977 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 12 - CAPA NO 43 SECTOR 3 10+965 / 10+977 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 12 - CAPA NO 44 SECTOR 3 10+965 / 10+977 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 12 - CAPA NO 45 SECTOR 3 10+977 / 10+990 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 6 - CAPA NO 7 SECTOR 3 10+977 / 10+990 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 6	MOCOA	**37.50**	**45.6**	**31.1**	**14.3**	**5.9**	**100.0**	**90.4**	**67.4**	**60.2**	**0.42**	**NP**	**NL**												SÍ

				- CAPA NO 8 SECTOR 3 10+977 / 10+990 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 6 - CAPA NO 9 SECTOR 3 10+977 / 10+990 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 6 - CAPA NO 10 SECTOR 3 10+956 / 10+965 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 6 - CAPA NO 19																						
13	**4**	**2026**	**MP-RE SBG-38-157**	SECTOR 3 10+965 / 10+977 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 12 - CAPA NO 46 SECTOR 3 10+965 / 10+977 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 12 - CAPA NO 47 SECTOR 3 10+977 / 10+990 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 6 - CAPA NO 11 SECTOR 3 10+977 / 10+990 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 6 - CAPA NO 12	MOCOA	**37.50**	**41.5**	**29.1**	**14.3**	**4.4**	**100.0**	**91.7**	**66.2**	**55.7**	**0.30**	**NP**	**NL**	**55**	**0.04**	**0.15**	**6.55**	**2.233**	**20.0**	**3**	**1**	**5.00**	**3.00**	SÍ
15	**4**	**2026**	**MP-RE SBG-38-158**	SECTOR 3 10+965 / 10+977 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3	MOCOA	**37.50**	**45.3**	**29.6**	**12.6**	**5.4**	**100.0**	**92.2**	**68.0**	**59.4**	**0.43**	**NP**	**NL**											SÍ

				MÓDULO NO 12 - CAPA NO 48 SECTOR 3 10+977 / 10+990 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 6 - CAPA NO 13 SECTOR 3 10+977 / 10+990 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 6 - CAPA NO 14 SECTOR 3 10+977 / 10+990 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 6 - CAPA NO 15																							
16	**4**	**2026**	**MP-RE SBG-38-159**	SECTOR 3 10+977 / 10+990 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 6 - CAPA NO 16 SECTOR 3 10+977 / 10+990 CLZ. UNI. CAR. DER. VÁSTAGO MURO N°3 MÓDULO NO 6 - CAPA NO 17	MOCOA	**37.50**	**45.1**	**29.7**	**13.3**	**5.2**	**100.0**	**90.4**	**66.2**	**58.6**	**0.39**	**NP**	**NL**										SÍ
PROMEDIO						**37.50**	**43.67**	**29.51**	**13.66**	**4.98**	**100.00**	**90.38**	**65.94**	**57.52**	**0.37**	**0.00**		**51.50**	**0.05**	**0.13**	**6.35**	**2.23**	**20.02**	**4.00**	**2.00**	**4.00**	**2.00**	

ELABORÓ APROBÓ





Katherine Suarez Villareal Wilson Enrique Ureña

Laboratorista Ingeniero de Materiales

Construcciones EL CONDOR S.A.
Ingeniería de Infraestructura e Inversiones

AF -13 CONCRETO ESTRUCTURAL

CÓDIGO INTERNO	MP-ART-630-13-169
FECHA	22/04/2026

PROYECTO	MOCOA - PUTUMAYO	**PROCEDENCIA**	MOCOA			**LOCALIZACIÓN**	
PERIODO	21/03/2026 AL 20/04/2026	**EJECUTOR**	CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR	**TIPO DE MATERIAL**	AF - CONCRETO ESTRUCTURAL	**MATERIAL**	AF-13

NORMA						GRANULOMETRÍA							LÍMITES		EQUIVALENTE ARENA	AZUL DE METILENO	MAT ORGANICA COLOR	TERRONES DE ARCILLA Y PARTÍCULAS DELEZNABLES	GRAV ESPECIFICA FINO	PARTÍCULAS LIVIANAS	SOLIDEZ SULFATO DE SODIO	SOLIDEZ SULFATO DE MAGNESIO	
						% QUE PASA N 4	% QUE PASA N 8	% QUE PASA N 16	% QUE PASA N 30	% QUE PASA N 50	% QUE PASA N 100	% QUE PASA 3/8"	INDICE DE PLASTICIDAD (%)	LIMITE LIQUIDO (%)	EQUIV. DE ARENA PROMEDIO (%)	VALOR DE AZUL DE METILENO (MG)	COLOR OBSERVADO	PORCENTAJE TERRONES FRACCIÓN FINA	ABSORCION PROMEDIO	RESULTADO PARA ENSAYOS EXT. E INT.	PERDIDA TOTAL FINOS	PERDIDA TOTAL FINOS	
						>=95 Y <=100	>=80 Y <=100	>=50 Y <=85	>=25 Y <=60	>=10 Y <=30	>=2 Y <=10	<=100 Y =100	=0		>=60	<=5		<=1	<=4	<=0,5	<=10	<=15	
FRECUENCIA						JORNADA							JORNADA		SEMANAL	SEMANAL	SEMANAL	SEMANAL	SEMANAL	MENSUAL	MENSUAL	MENSUAL	
DÍA	MES	AÑO	MUESTRA	LOCALIZACIÓN	PROCEDENCIA																		CUMPLE
21	3	2026	MP-AF-13-1710	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6082	MOCOA	90.8	80.4	64.4	46.4	24.9	10.0	100.0	NP	NL									SÍ
24	3	2026	MP-AF-13-1709	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6101	MOCOA	91.9	80.6	64.3	43.2	24.8	9.4	100.0	NP	NL	61	0.75	2.00	0.12	2.36	0.105			SÍ
25	3	2026	MP-AF-13-1711	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6103	MOCOA	92.6	82.3	67.7	44.6	22.5	9.6	100.0	NP	NL									SÍ
27	3	2026	MP-AF-13-1712	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6112	MOCOA	91.9	81.2	65.3	43.1	21.3	9.7	100.0	NP	NL									SÍ
28	3	2026	MP-AF-13-1713	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6125	MOCOA	90.7	80.2	65.1	43.2	22.0	9.9	100.0	NP	NL									SÍ
30	3	2026	MP-AF-13-1714	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ.	MOCOA	92.1	82.1	68.1	44.2	19.2	9.5	100.0	NP	NL	61	0.85	2.00	0.17	2.24	0.060			SÍ

				PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6145																			
31	**3**	**2026**	**MP-AF-13-1715**	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6147	MOCOA	**92.6**	**83.4**	**70.1**	**44.3**	**20.2**	**9.6**	**100.0**	**NP**	**NL**										SÍ
6	**4**	**2026**	**MP-AF-13-1716**	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6175	MOCOA	**91.5**	**81.6**	**67.8**	**45.5**	**22.0**	**9.7**	**100.0**	**NP**	**NL**	**61**	**0.80**	**2.00**	**0.10**	**2.24**	**0.070**	**3**	**5.00**	SÍ
8	**4**	**2026**	**MP-AF-13-1717**	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6193	MOCOA	**93.6**	**83.9**	**70.0**	**46.0**	**21.1**	**9.8**	**100.0**	**NP**	**NL**									SÍ
10	**4**	**2026**	**MP-AF-13-1718**	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6209	MOCOA	**92.9**	**82.7**	**68.9**	**46.2**	**20.9**	**9.4**	**100.0**	**NP**	**NL**									SÍ
11	**4**	**2026**	**MP-AF-13-1719**	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6212	MOCOA	**92.7**	**83.2**	**65.7**	**46.3**	**21.6**	**9.8**	**100.0**	**NP**	**NL**									SÍ
13	**4**	**2026**	**MP-AF-13-1720**	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6232	MOCOA	**91.9**	**82.6**	**69.0**	**45.4**	**20.1**	**9.5**	**100.0**	**NP**	**NL**	**63**	**0.65**	**2.00**	**0.14**	**2.28**	**0.140**			SÍ
14	**4**	**2026**	**MP-AF-13-1721**	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6236	MOCOA	**91.7**	**81.6**	**67.9**	**45.3**	**21.3**	**10.0**	**100.0**	**NP**	**NL**									SÍ
15	**4**	**2026**	**MP-AF-13-1722**	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6249	MOCOA	**90.4**	**80.0**	**65.8**	**47.0**	**25.2**	**9.7**	**100.0**	**NP**	**NL**									SÍ
16	**4**	**2026**	**MP-AF-13-1723**	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE	MOCOA	**91.5**	**81.3**	**65.5**	**44.8**	**24.8**	**10.0**	**100.0**	**NP**	**NL**									SÍ

				CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6251																		
17	**4**	**2026**	**MP-AF-13-1724**	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6269	MOCOA	**91.0**	**80.5**	**65.1**	**46.4**	**26.0**	**10.0**	**100.0**	**NP**	**NL**									SÍ
18	**4**	**2026**	**MP-AF-13-1725**	SECTOR 3 10+600 / 23+571 CLZ. UNI. CAR. IZQ. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PD-01 - REG. BITÁCORA - 6270	MOCOA	**91.0**	**80.5**	**65.1**	**46.4**	**26.0**	**10.0**	**100.0**	**NP**	**NL**									SÍ
PROMEDIO						**91.81**	**81.66**	**66.81**	**45.18**	**22.60**	**9.73**	**100.00**	**0.00**		**61.50**	**0.76**	**2.00**	**0.13**	**2.28**	**0.09**	**4.00**	**4.00**	

ELABORÓ APROBÓ





Katherine Suarez Villareal Wilson Enrique Ureña


Laboratorista Ingeniero de Materiales

Construcciones EL CONDOR S.A.	**Análisis Granulométrico de Agregados Gruesos y Finos** **INV E-213**	Versión	6
		Página	

Obra	Mocoa - Putumayo	Código	MP-AF-13-1709-001-3
Procedencia	Mocoa	Muestra	MP-AF-13-1709
Material	AF - Concreto estructural AF-13	Fecha	24/03/2026
Localizacion	SECTOR 3 10+600 / 23+571 Clz. Úni. Car. Izq. Producción de concreto PD-01 - Reg. Bitácora - 6101	Observaciones	
Especificación	INV-2013	Parámetro	INV E-123, INV E-213
Equipos utilizados	LBL3100-03, LHE-18		

PESO SECO INICIAL		1466.00	**¿LAVÓ LA MUESTRA?**	Sí	**PESO SECO DESPUÉS DE LAVADO**		1393.70
TAMIZ		**PESO RETENIDO INDIVIDUAL**	**% RETENIDO INDIVIDUAL**	**% RETENIDO ACUMULADO**	**% QUE PASA**	**ESPECIFICACIÓN**	
Número	**mm**					**LIMITE INF**	**LIMITE SUP**
3/8"	**9.5**	0.00	0.0	0.0	100.0	100	100
Nº 4	**4.75**	119.10	8.1	8.1	91.9	95	100
Nº 8	**2.36**	165.30	11.3	19.4	80.6	80	100
N° 16	**1.18**	239.40	16.3	35.7	64.3	50	85
N° 30	**0.600**	308.60	21.1	56.8	43.2	25	60
Nº 50	**0.300**	269.90	18.4	75.2	24.8	10	30
Nº 100	**0.150**	225.50	15.4	90.6	9.4	2	10
N° 200	**0.075**	54.40	3.7	94.3	5.7		5
FONDO		11.50					
FONDO CON LAVADO		83.8					
TOTALES		1466.0					

Grava (%)	8.1	**Arena (%)**	86.2	**Pasa 200 (%)**	5.7
Módulo de finura	2.86				

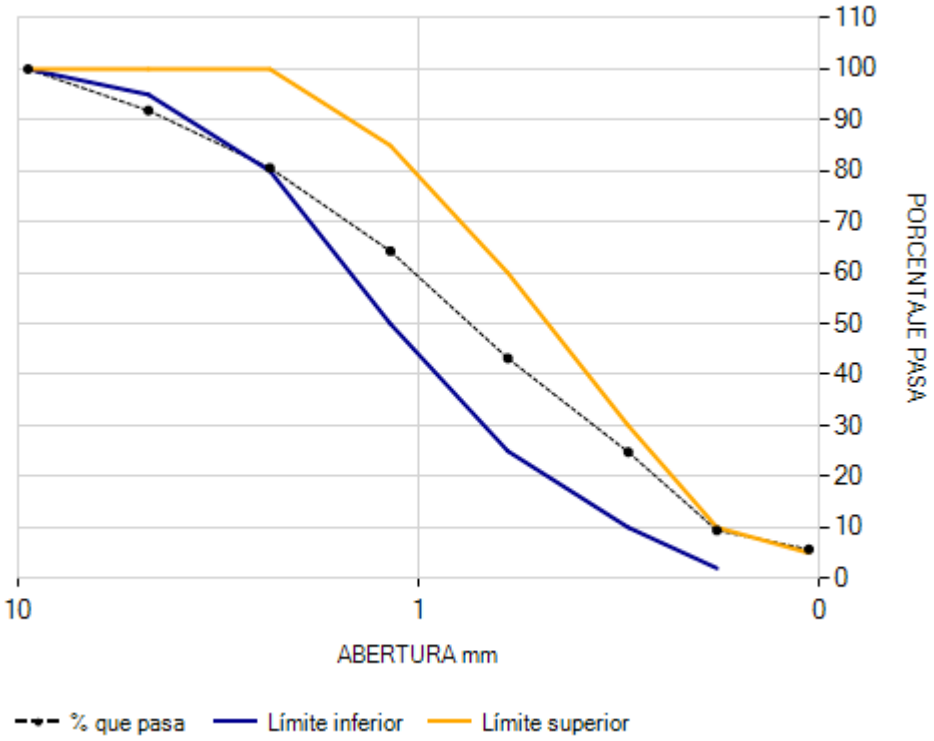

Ensayo de límites	Límite líquido	Índice de plasticidad
MP-AF-13-1709-002-5	NL	NP

Observaciones

“Se valida por desempeño satisfactorio de la mezcla de concreto, según INV-630.2.2.1 y se controla según gradaciones teóricas conjuntas”

Elaboró Anggy lizeth liscano

Anggy Lizeth Liscano Solano

Ayudante de Laboratorio

Aprobó

Katherine Suarez Villareal


Laboratorista

Construcciones EL CONDOR S.A.	**Análisis Granulométrico de Agregados Gruesos y Finos** **INV E-213**	Versión	6
		Página	

Obra	Mocoa - Putumayo	Código	MP-AF-13-1710-001-1
Procedencia	Mocoa	Muestra	MP-AF-13-1710
Material	AF - Concreto estructural AF-13	Fecha	21/03/2026
Localizacion	SECTOR 3 10+600 / 23+571 Clz. Úni. Car. Izq. Producción de concreto PD-01 - Reg. Bitácora - 6082	Observaciones	
Especificación	INV-2013	Parámetro	INV E-123, INV E-213
Equipos utilizados	LBL3100-03, LHE-18		

PESO SECO INICIAL		1425.00	**¿LAVÓ LA MUESTRA?**	Sí	**PESO SECO DESPUÉS DE LAVADO**		1356.50
TAMIZ		**PESO RETENIDO INDIVIDUAL**	**% RETENIDO INDIVIDUAL**	**% RETENIDO ACUMULADO**	**% QUE PASA**	**ESPECIFICACIÓN**	
Número	**mm**					**LIMITE INF**	**LIMITE SUP**
3/8"	**9.5**	0.00	0.0	0.0	100.0	100	100
Nº 4	**4.75**	131.30	9.2	9.2	90.8	95	100
Nº 8	**2.36**	147.90	10.4	19.6	80.4	80	100
N° 16	**1.18**	227.50	16.0	35.6	64.4	50	85
N° 30	**0.600**	257.30	18.1	53.6	46.4	25	60
Nº 50	**0.300**	305.50	21.4	75.1	24.9	10	30
Nº 100	**0.150**	213.20	15.0	90.0	10.0	2	10
N° 200	**0.075**	61.70	4.3	94.3	5.7		5
FONDO		12.10					
FONDO CON LAVADO		80.6					
TOTALES		1425.0					

Grava (%)	9.2	**Arena (%)**	85.1	**Pasa 200 (%)**	5.7
Módulo de finura	2.83				

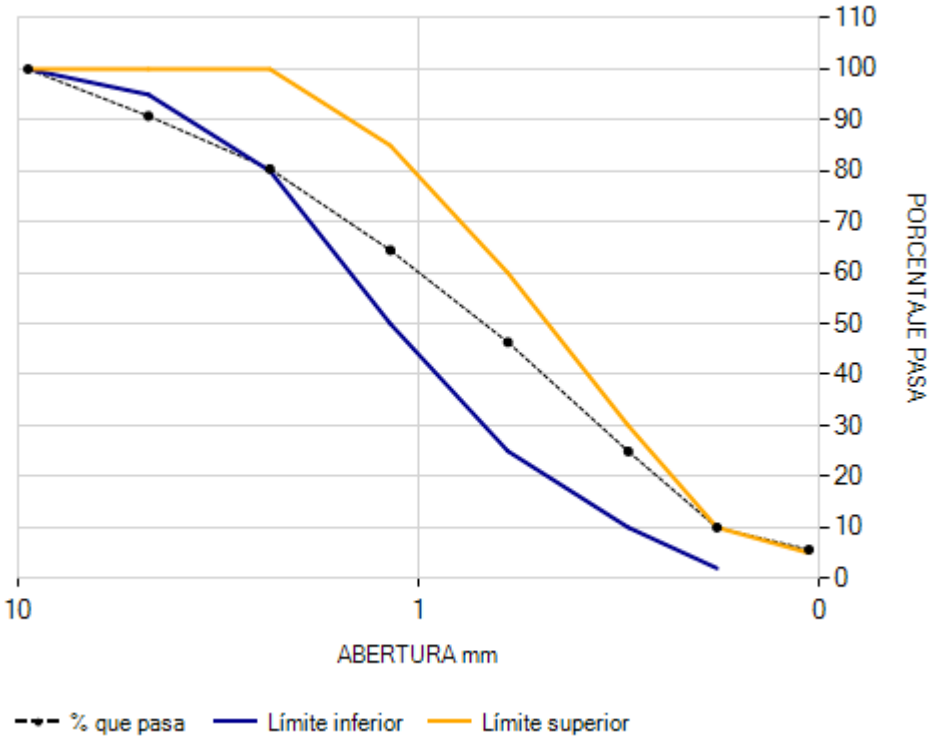

Ensayo de límites	Límite líquido	Índice de plasticidad
MP-AF-13-1710-002-2	NL	NP

Observaciones

“Se valida por desempeño satisfactorio de la mezcla de concreto, según INV-630.2.2.1 y se controla según gradaciones teóricas conjuntas”

Elaboró Anggy lizeth liscano

Anggy Lizeth Liscano Solano

Ayudante de Laboratorio

Aprobó

Katherine Suarez Villareal


Laboratorista

Construcciones EL CONDOR S.A.	**Análisis Granulométrico de Agregados Gruesos y Finos** **INV E-213**	Versión	6
		Página	

Obra	Mocoa - Putumayo	Código	MP-AF-13-1711-001-1
Procedencia	Mocoa	Muestra	MP-AF-13-1711
Material	AF - Concreto estructural AF-13	Fecha	25/03/2026
Localizacion	SECTOR 3 10+600 / 23+571 Clz. Úni. Car. Izq. Producción de concreto PD-01 - Reg. Bitácora - 6103	Observaciones	
Especificación	INV-2013	Parámetro	INV E-123, INV E-213
Equipos utilizados	LBL3100-03, LHE-18		

PESO SECO INICIAL		1439.00	**¿LAVÓ LA MUESTRA?**	Sí	**PESO SECO DESPUÉS DE LAVADO**		1365.20
TAMIZ		**PESO RETENIDO INDIVIDUAL**	**% RETENIDO INDIVIDUAL**	**% RETENIDO ACUMULADO**	**% QUE PASA**	**ESPECIFICACIÓN**	
Número	**mm**					**LIMITE INF**	**LIMITE SUP**
3/8"	**9.5**	0.00	0.0	0.0	100.0	100	100
Nº 4	**4.75**	106.70	7.4	7.4	92.6	95	100
Nº 8	**2.36**	148.40	10.3	17.7	82.3	80	100
N° 16	**1.18**	210.00	14.6	32.3	67.7	50	85
N° 30	**0.600**	332.60	23.1	55.4	44.6	25	60
Nº 50	**0.300**	317.70	22.1	77.5	22.5	10	30
Nº 100	**0.150**	186.10	12.9	90.4	9.6	2	10
N° 200	**0.075**	55.60	3.9	94.3	5.7		5
FONDO		8.10					
FONDO CON LAVADO		81.9					
TOTALES		1439.0					

Grava (%)	7.4	**Arena (%)**	86.9	**Pasa 200 (%)**	5.7
Módulo de finura	2.81				

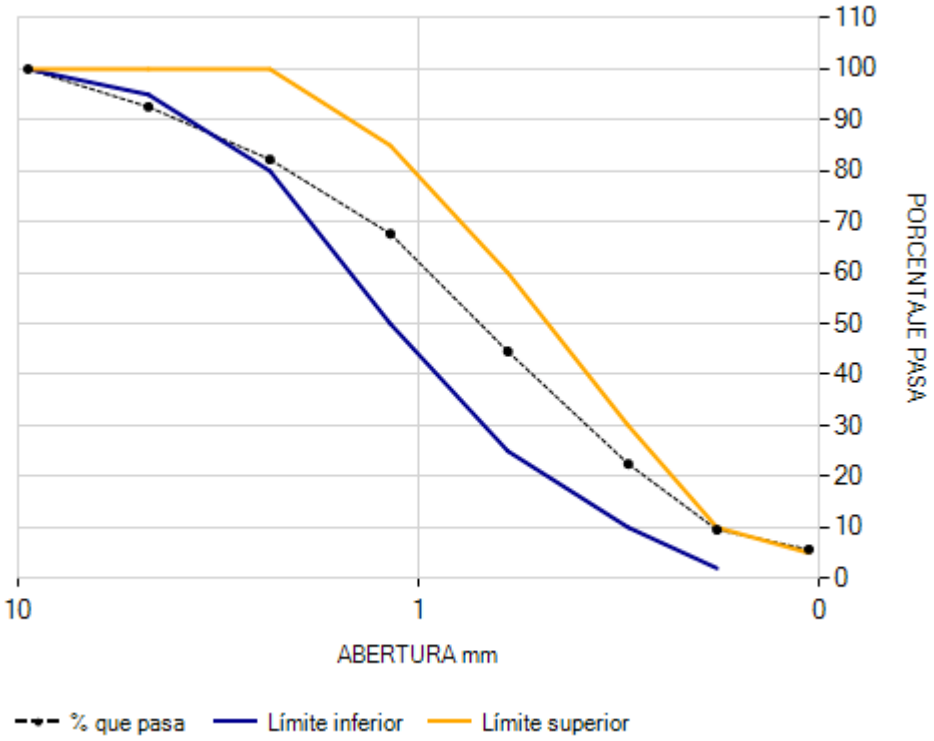

Ensayo de límites	Límite líquido	Índice de plasticidad
MP-AF-13-1711-002-2	NL	NP

Observaciones

“Se valida por desempeño satisfactorio de la mezcla de concreto, según INV-630.2.2.1 y se controla según gradaciones teóricas conjuntas”

Elaboró Anggy lizeth liscano

Anggy Lizeth Liscano Solano

Ayudante de Laboratorio

Aprobó

Katherine Suarez Villareal


Laboratorista

Construcciones EL CONDOR S.A.	**Análisis Granulométrico de Agregados Gruesos y Finos** **INV E-213**	Versión	6
		Página	

Obra	Mocoa - Putumayo	Código	MP-AF-13-1712-001-1
Procedencia	Mocoa	Muestra	MP-AF-13-1712
Material	AF - Concreto estructural AF-13	Fecha	27/03/2026
Localizacion	SECTOR 3 10+600 / 23+571 Clz. Úni. Car. Izq. Producción de concreto PD-01 - Reg. Bitácora - 6112	Observaciones	
Especificación	INV-2013	Parámetro	INV E-123, INV E-213
Equipos utilizados	LBL3100-03, LHE-18		

PESO SECO INICIAL		1479.30	**¿LAVÓ LA MUESTRA?**	Sí	**PESO SECO DESPUÉS DE LAVADO**		1394.60
TAMIZ		**PESO RETENIDO INDIVIDUAL**	**% RETENIDO INDIVIDUAL**	**% RETENIDO ACUMULADO**	**% QUE PASA**	**ESPECIFICACIÓN**	
Número	**mm**					**LIMITE INF**	**LIMITE SUP**
3/8"	**9.5**	0.00	0.0	0.0	100.0	100	100
Nº 4	**4.75**	119.60	8.1	8.1	91.9	95	100
Nº 8	**2.36**	159.00	10.7	18.8	81.2	80	100
N° 16	**1.18**	234.20	15.8	34.7	65.3	50	85
N° 30	**0.600**	329.40	22.3	56.9	43.1	25	60
Nº 50	**0.300**	321.90	21.8	78.7	21.3	10	30
Nº 100	**0.150**	171.60	11.6	90.3	9.7	2	10
N° 200	**0.075**	52.40	3.5	93.8	6.2		5
FONDO		6.50					
FONDO CON LAVADO		91.2					
TOTALES		1479.3					

Grava (%)	8.1	**Arena (%)**	85.8	**Pasa 200 (%)**	6.2
Módulo de finura	2.88				

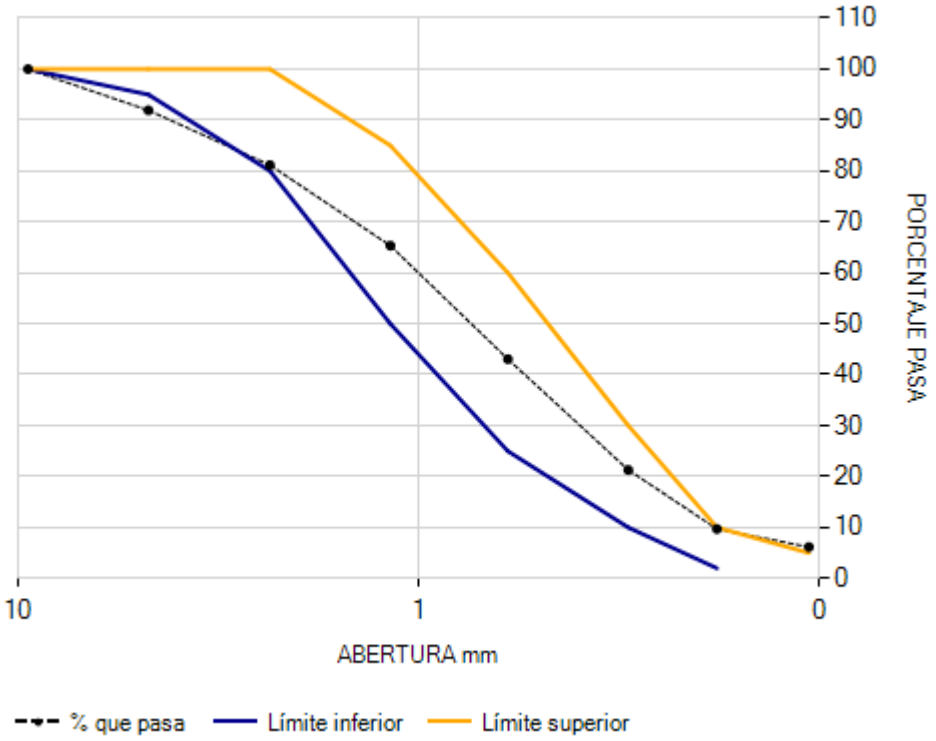

Ensayo de límites	Límite líquido	Índice de plasticidad
MP-AF-13-1712-002-2	NL	NP

Observaciones

“Se valida por desempeño satisfactorio de la mezcla de concreto, según INV-630.2.2.1 y se controla según gradaciones teóricas conjuntas”

Elaboró Anggy lizeth liscano

Anggy Lizeth Liscano Solano

Ayudante de Laboratorio

Aprobó

Katherine Suarez Villareal


Laboratorista

Construcciones EL CONDOR S.A.	**Análisis Granulométrico de Agregados Gruesos y Finos** **INV E-213**	Versión	6
		Página	

Obra	Mocoa - Putumayo	Código	MP-AF-13-1713-001-1
Procedencia	Mocoa	Muestra	MP-AF-13-1713
Material	AF - Concreto estructural AF-13	Fecha	28/03/2026
Localizacion	SECTOR 3 10+600 / 23+571 Clz. Úni. Car. Izq. Producción de concreto PD-01 - Reg. Bitácora - 6125	Observaciones	
Especificación	INV-2013	Parámetro	INV E-123, INV E-213
Equipos utilizados	LBL3100-03, LHE-18		

PESO SECO INICIAL		1360.20	**¿LAVÓ LA MUESTRA?**	Sí	**PESO SECO DESPUÉS DE LAVADO**		1279.20
TAMIZ		**PESO RETENIDO INDIVIDUAL**	**% RETENIDO INDIVIDUAL**	**% RETENIDO ACUMULADO**	**% QUE PASA**	**ESPECIFICACIÓN**	
Número	**mm**					**LIMITE INF**	**LIMITE SUP**
3/8"	**9.5**	0.00	0.0	0.0	100.0	100	100
Nº 4	**4.75**	126.50	9.3	9.3	90.7	95	100
Nº 8	**2.36**	142.30	10.5	19.8	80.2	80	100
N° 16	**1.18**	205.90	15.1	34.9	65.1	50	85
N° 30	**0.600**	297.40	21.9	56.8	43.2	25	60
Nº 50	**0.300**	288.20	21.2	78.0	22.0	10	30
Nº 100	**0.150**	165.10	12.1	90.1	9.9	2	10
N° 200	**0.075**	48.10	3.5	93.6	6.4		5
FONDO		5.70					
FONDO CON LAVADO		86.7					
TOTALES		1360.2					

Grava (%)	9.3	**Arena (%)**	84.3	**Pasa 200 (%)**	6.4
Módulo de finura	2.89				

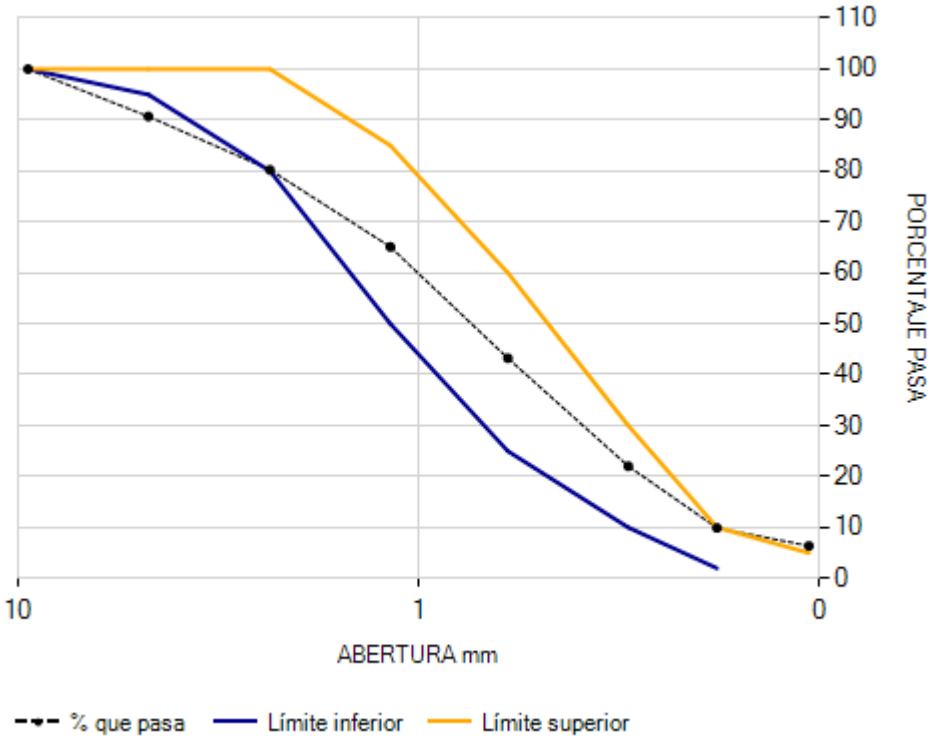

Ensayo de límites	Límite líquido	Índice de plasticidad
MP-AF-13-1713-002-2	NL	NP

Observaciones

“Se valida por desempeño satisfactorio de la mezcla de concreto, según INV-630.2.2.1 y se controla según gradaciones teóricas conjuntas”

Elaboró Anggy lizeth liscano

Anggy Lizeth Liscano Solano

Ayudante de Laboratorio

Aprobó

Katherine Suarez Villareal


Laboratorista

Construcciones EL CONDOR S.A.	**Análisis Granulométrico de Agregados Gruesos y Finos** **INV E-213**	Versión	6
		Página	

Obra	Mocoa - Putumayo	Código	MP-AF-13-1714-001-3
Procedencia	Mocoa	Muestra	MP-AF-13-1714
Material	AF - Concreto estructural AF-13	Fecha	30/03/2026
Localizacion	SECTOR 3 10+600 / 23+571 Clz. Úni. Car. Izq. Producción de concreto PD-01 - Reg. Bitácora - 6145	Observaciones	
Especificación	INV-2013	Parámetro	INV E-123, INV E-213
Equipos utilizados	LBL3100-03, LHE-18		

PESO SECO INICIAL		1313.90	**¿LAVÓ LA MUESTRA?**	Sí	**PESO SECO DESPUÉS DE LAVADO**		1247.00
TAMIZ		**PESO RETENIDO INDIVIDUAL**	**% RETENIDO INDIVIDUAL**	**% RETENIDO ACUMULADO**	**% QUE PASA**	**ESPECIFICACIÓN**	
Número	**mm**					**LIMITE INF**	**LIMITE SUP**
3/8"	**9.5**	0.00	0.0	0.0	100.0	100	100
Nº 4	**4.75**	104.40	7.9	7.9	92.1	95	100
Nº 8	**2.36**	130.90	10.0	17.9	82.1	80	100
N° 16	**1.18**	184.00	14.0	31.9	68.1	50	85
N° 30	**0.600**	314.20	23.9	55.8	44.2	25	60
Nº 50	**0.300**	328.10	25.0	80.8	19.2	10	30
Nº 100	**0.150**	128.00	9.7	90.5	9.5	2	10
N° 200	**0.075**	50.30	3.8	94.4	5.6		5
FONDO		7.10					
FONDO CON LAVADO		74.0					
TOTALES		1313.9					

Grava (%)	7.9	**Arena (%)**	86.4	**Pasa 200 (%)**	5.6
Módulo de finura	2.85				

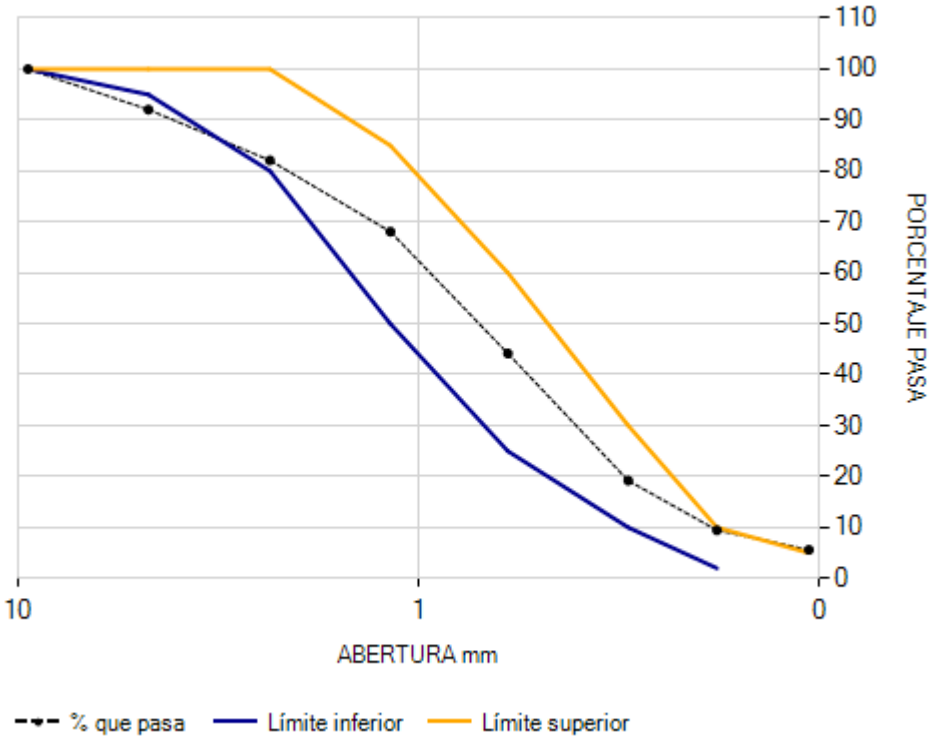

Ensayo de límites	Límite líquido	Índice de plasticidad
MP-AF-13-1714-002-5	NL	NP

Observaciones

“Se valida por desempeño satisfactorio de la mezcla de concreto, según INV-630.2.2.1 y se controla según gradaciones teóricas conjuntas”

Elaboró Anggy lizeth liscano

Anggy Lizeth Liscano Solano

Ayudante de Laboratorio

Aprobó

Katherine Suarez Villareal


Laboratorista

Construcciones EL CONDOR S.A.	**Análisis Granulométrico de Agregados Gruesos y Finos** **INV E-213**	Versión	6
		Página	

Obra	Mocoa - Putumayo	Código	MP-AF-13-1715-001-1
Procedencia	Mocoa	Muestra	MP-AF-13-1715
Material	AF - Concreto estructural AF-13	Fecha	31/03/2026
Localizacion	SECTOR 3 10+600 / 23+571 Clz. Úni. Car. Izq. Producción de concreto PD-01 - Reg. Bitácora - 6147	Observaciones	
Especificación	INV-2013	Parámetro	INV E-123, INV E-213
Equipos utilizados	LBL3000-01, LHE-18		

PESO SECO INICIAL		1320.50	**¿LAVÓ LA MUESTRA?**	Sí	**PESO SECO DESPUÉS DE LAVADO**		1245.20
TAMIZ		**PESO RETENIDO INDIVIDUAL**	**% RETENIDO INDIVIDUAL**	**% RETENIDO ACUMULADO**	**% QUE PASA**	**ESPECIFICACIÓN**	
Número	**mm**					**LIMITE INF**	**LIMITE SUP**
3/8"	**9.5**	0.00	0.0	0.0	100.0	100	100
Nº 4	**4.75**	97.70	7.4	7.4	92.6	95	100
Nº 8	**2.36**	121.50	9.2	16.6	83.4	80	100
N° 16	**1.18**	175.60	13.3	29.9	70.1	50	85
N° 30	**0.600**	340.70	25.8	55.7	44.3	25	60
Nº 50	**0.300**	318.20	24.1	79.8	20.2	10	30
Nº 100	**0.150**	140.00	10.6	90.4	9.6	2	10
N° 200	**0.075**	48.90	3.7	94.1	5.9		5
FONDO		2.60					
FONDO CON LAVADO		77.9					
TOTALES		1320.5					

Grava (%)	7.4	**Arena (%)**	86.7	**Pasa 200 (%)**	5.9
Módulo de finura	2.80				

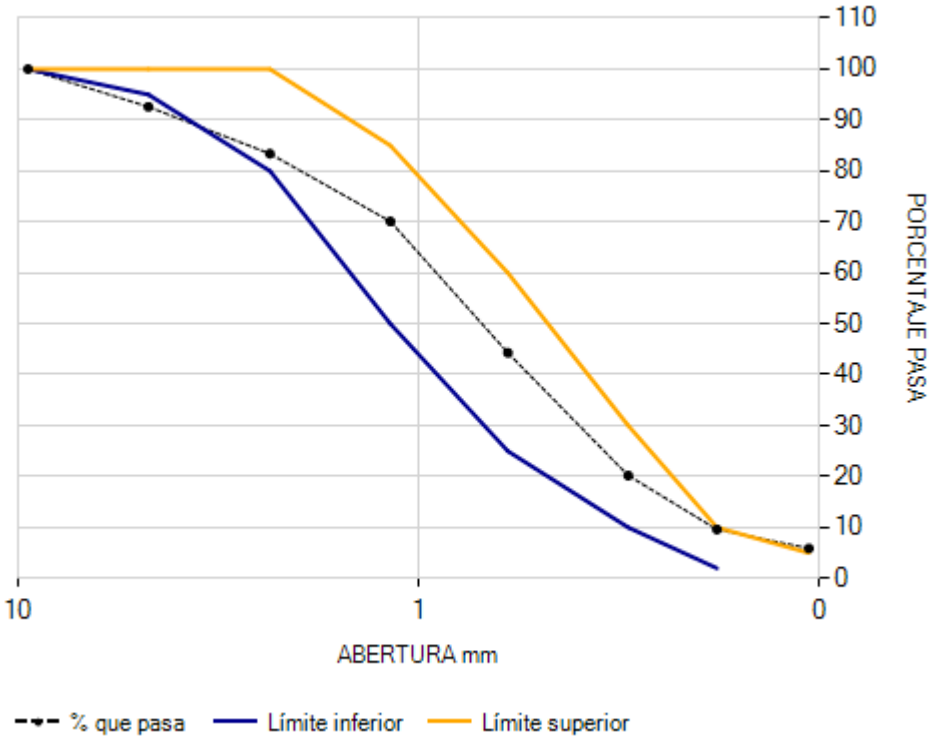

Ensayo de límites	Límite líquido	Índice de plasticidad
MP-AF-13-1715-002-2	NL	NP

Observaciones

“Se valida por desempeño satisfactorio de la mezcla de concreto, según INV-630.2.2.1 y se controla según gradaciones teóricas conjuntas”

Elaboró Anggy lizeth liscano

Anggy Lizeth Liscano Solano

Ayudante de Laboratorio

Aprobó

Katherine Suarez Villareal


Laboratorista

Construcciones EL CONDOR S.A.	**Análisis Granulométrico de Agregados Gruesos y Finos** **INV E-213**	Versión	6
		Página	

Obra	Mocoa - Putumayo	Código	MP-AF-13-1716-001-3
Procedencia	Mocoa	Muestra	MP-AF-13-1716
Material	AF - Concreto estructural AF-13	Fecha	06/04/2026
Localizacion	SECTOR 3 10+600 / 23+571 Clz. Úni. Car. Izq. Producción de concreto PD-01 - Reg. Bitácora - 6175	Observaciones	
Especificación	INV-2013	Parámetro	INV E-123, INV E-213
Equipos utilizados	LBL3100-03, LHE-18		

PESO SECO INICIAL		1606.70	**¿LAVÓ LA MUESTRA?**	Sí	**PESO SECO DESPUÉS DE LAVADO**		1520.30
TAMIZ		**PESO RETENIDO INDIVIDUAL**	**% RETENIDO INDIVIDUAL**	**% RETENIDO ACUMULADO**	**% QUE PASA**	**ESPECIFICACIÓN**	
Número	**mm**					**LIMITE INF**	**LIMITE SUP**
3/8"	**9.5**	0.00	0.0	0.0	100.0	100	100
Nº 4	**4.75**	136.80	8.5	8.5	91.5	95	100
Nº 8	**2.36**	159.20	9.9	18.4	81.6	80	100
N° 16	**1.18**	220.80	13.7	32.2	67.8	50	85
N° 30	**0.600**	359.60	22.4	54.5	45.5	25	60
Nº 50	**0.300**	377.50	23.5	78.0	22.0	10	30
Nº 100	**0.150**	197.00	12.3	90.3	9.7	2	10
N° 200	**0.075**	62.50	3.9	94.2	5.8		5
FONDO		6.90					
FONDO CON LAVADO		93.3					
TOTALES		1606.7					

Grava (%)	8.5	**Arena (%)**	85.7	**Pasa 200 (%)**	5.8
Módulo de finura	2.82				

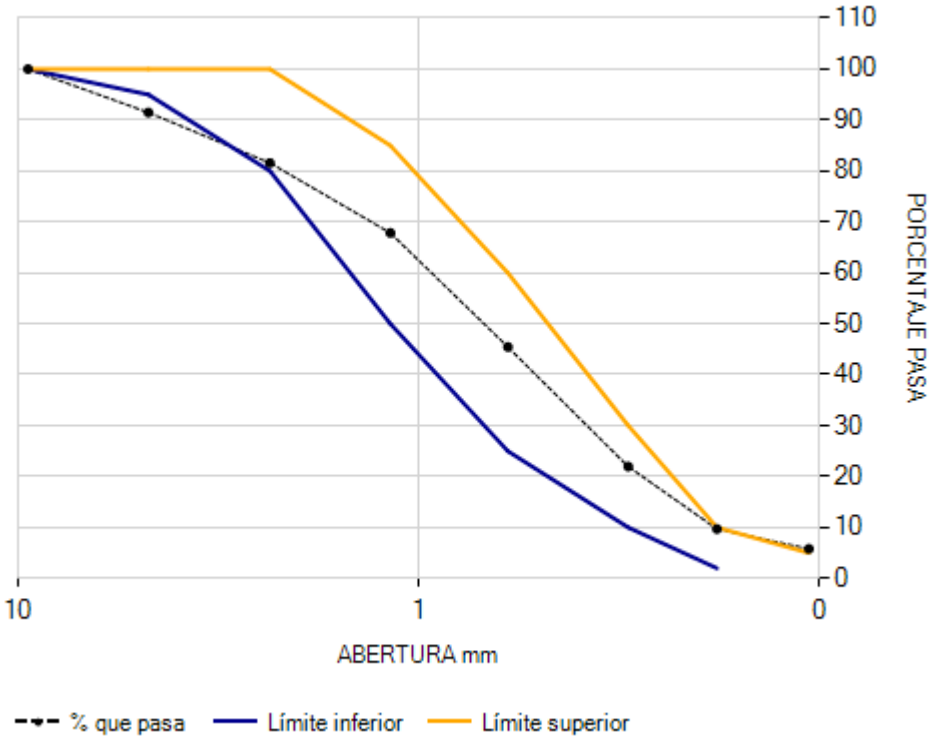

Ensayo de límites	Límite líquido	Índice de plasticidad
MP-AF-13-1716-002-5	NL	NP

Observaciones

“Se valida por desempeño satisfactorio de la mezcla de concreto, según INV-630.2.2.1 y se controla según gradaciones teóricas conjuntas”

Elaboró Anggy lizeth liscano

Anggy Lizeth Liscano Solano

Ayudante de Laboratorio

Aprobó

Katherine Suarez Villareal


Laboratorista

Construcciones EL CONDOR S.A.	**Análisis Granulométrico de Agregados Gruesos y Finos** **INV E-213**	Versión	6
		Página	

Obra	Mocoa - Putumayo	Código	MP-AF-13-1717-001-1
Procedencia	Mocoa	Muestra	MP-AF-13-1717
Material	AF - Concreto estructural AF-13	Fecha	08/04/2026
Localizacion	SECTOR 3 10+600 / 23+571 Clz. Úni. Car. Izq. Producción de concreto PD-01 - Reg. Bitácora - 6193	Observaciones	
Especificación	INV-2013	Parámetro	INV E-123, INV E-213
Equipos utilizados	LBL3100-03, LHE-18		

PESO SECO INICIAL		1447.00	**¿LAVÓ LA MUESTRA?**	Sí	**PESO SECO DESPUÉS DE LAVADO**		1364.40
TAMIZ		**PESO RETENIDO INDIVIDUAL**	**% RETENIDO INDIVIDUAL**	**% RETENIDO ACUMULADO**	**% QUE PASA**	**ESPECIFICACIÓN**	
Número	**mm**					**LIMITE INF**	**LIMITE SUP**
3/8"	**9.5**	0.00	0.0	0.0	100.0	100	100
Nº 4	**4.75**	92.70	6.4	6.4	93.6	95	100
Nº 8	**2.36**	140.70	9.7	16.1	83.9	80	100
N° 16	**1.18**	200.30	13.8	30.0	70.0	50	85
N° 30	**0.600**	347.50	24.0	54.0	46.0	25	60
Nº 50	**0.300**	359.80	24.9	78.9	21.1	10	30
Nº 100	**0.150**	164.60	11.4	90.2	9.8	2	10
N° 200	**0.075**	46.70	3.2	93.5	6.5		5
FONDO		12.10					
FONDO CON LAVADO		94.7					
TOTALES		1447.0					

Grava (%)	6.4	**Arena (%)**	87.0	**Pasa 200 (%)**	6.5
Módulo de finura	2.76				

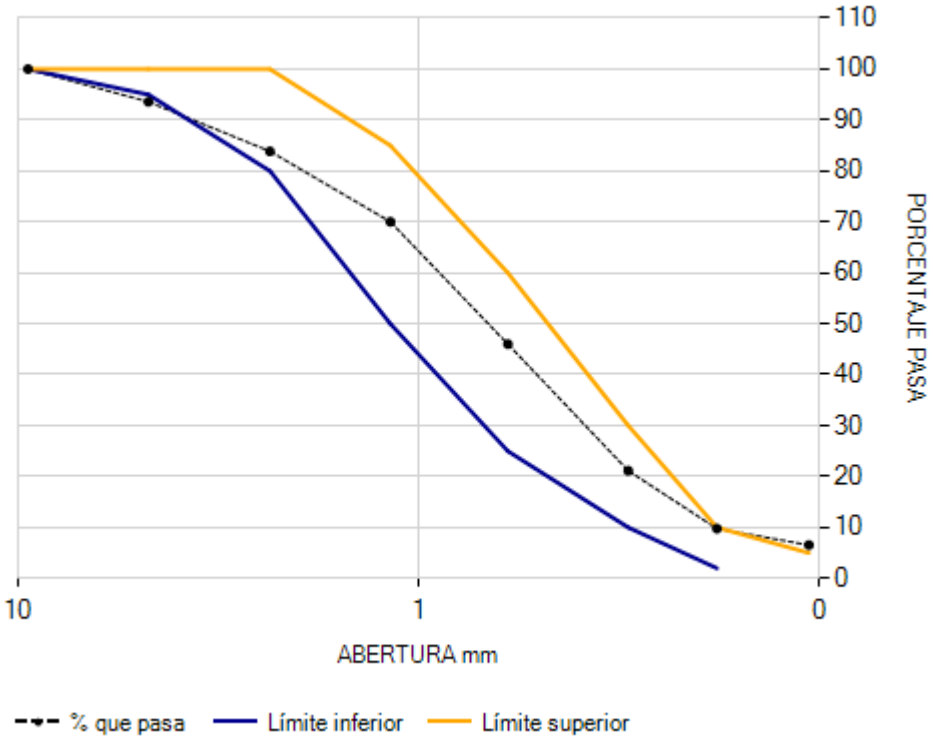

Ensayo de límites	Límite líquido	Índice de plasticidad
MP-AF-13-1717-002-2	NL	NP

Observaciones

“Se valida por desempeño satisfactorio de la mezcla de concreto, según INV-630.2.2.1 y se controla según gradaciones teóricas conjuntas”

Elaboró Anggy lizeth liscano

Anggy Lizeth Liscano Solano

Ayudante de Laboratorio

Aprobó

Katherine Suarez Villareal


Laboratorista

Construcciones EL CONDOR S.A.	**Análisis Granulométrico de Agregados Gruesos y Finos** **INV E-213**	Versión	6
		Página	

Obra	Mocoa - Putumayo	Código	MP-AF-13-1718-001-1
Procedencia	Mocoa	Muestra	MP-AF-13-1718
Material	AF - Concreto estructural AF-13	Fecha	10/04/2026
Localizacion	SECTOR 3 10+600 / 23+571 Clz. Úni. Car. Izq. Producción de concreto PD-01 - Reg. Bitácora - 6209	Observaciones	
Especificación	INV-2013	Parámetro	INV E-123, INV E-213
Equipos utilizados	LBL3100-03, LHE-18		

PESO SECO INICIAL		1422.00	**¿LAVÓ LA MUESTRA?**	Sí	**PESO SECO DESPUÉS DE LAVADO**		1347.60
TAMIZ		**PESO RETENIDO INDIVIDUAL**	**% RETENIDO INDIVIDUAL**	**% RETENIDO ACUMULADO**	**% QUE PASA**	**ESPECIFICACIÓN**	
Número	**mm**					**LIMITE INF**	**LIMITE SUP**
3/8"	**9.5**	0.00	0.0	0.0	100.0	100	100
Nº 4	**4.75**	100.90	7.1	7.1	92.9	95	100
Nº 8	**2.36**	144.70	10.2	17.3	82.7	80	100
N° 16	**1.18**	196.50	13.8	31.1	68.9	50	85
N° 30	**0.600**	322.30	22.7	53.8	46.2	25	60
Nº 50	**0.300**	359.80	25.3	79.1	20.9	10	30
Nº 100	**0.150**	164.60	11.6	90.6	9.4	2	10
N° 200	**0.075**	46.70	3.3	93.9	6.1		5
FONDO		12.10					
FONDO CON LAVADO		86.5					
TOTALES		1422.0					

Grava (%)	7.1	**Arena (%)**	86.8	**Pasa 200 (%)**	6.1
Módulo de finura	2.79				

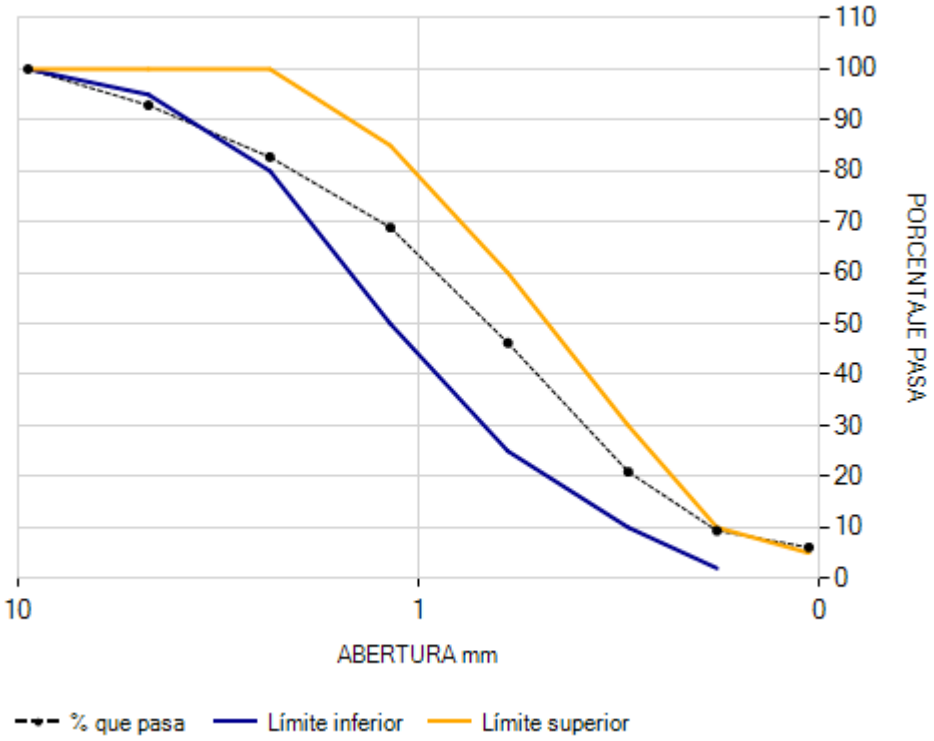

Ensayo de límites	Límite líquido	Índice de plasticidad
MP-AF-13-1718-002-2	NL	NP

Observaciones

“Se valida por desempeño satisfactorio de la mezcla de concreto, según INV-630.2.2.1 y se controla según gradaciones teóricas conjuntas”

Elaboró Anggy lizeth liscano

Anggy Lizeth Liscano Solano

Ayudante de Laboratorio

Aprobó

Katherine Suarez Villareal


Laboratorista

Construcciones EL CONDOR S.A.	**Análisis Granulométrico de Agregados Gruesos y Finos** **INV E-213**	Versión	6
		Página	

Obra	Mocoa - Putumayo	Código	MP-AF-13-1719-001-1
Procedencia	Mocoa	Muestra	MP-AF-13-1719
Material	AF - Concreto estructural AF-13	Fecha	11/04/2026
Localizacion	SECTOR 3 10+600 / 23+571 Clz. Úni. Car. Izq. Producción de concreto PD-01 - Reg. Bitácora - 6212	Observaciones	
Especificación	INV-2013	Parámetro	INV E-123, INV E-213
Equipos utilizados	LBL3100-03, LHE-18		

PESO SECO INICIAL		1328.80	**¿LAVÓ LA MUESTRA?**	Sí	**PESO SECO DESPUÉS DE LAVADO**		1254.60
TAMIZ		**PESO RETENIDO INDIVIDUAL**	**% RETENIDO INDIVIDUAL**	**% RETENIDO ACUMULADO**	**% QUE PASA**	**ESPECIFICACIÓN**	
Número	**mm**					**LIMITE INF**	**LIMITE SUP**
3/8"	**9.5**	0.00	0.0	0.0	100.0	100	100
Nº 4	**4.75**	96.50	7.3	7.3	92.7	95	100
Nº 8	**2.36**	127.30	9.6	16.8	83.2	80	100
N° 16	**1.18**	232.30	17.5	34.3	65.7	50	85
N° 30	**0.600**	257.40	19.4	53.7	46.3	25	60
Nº 50	**0.300**	328.30	24.7	78.4	21.6	10	30
Nº 100	**0.150**	156.50	11.8	90.2	9.8	2	10
N° 200	**0.075**	51.30	3.9	94.0	6.0		5
FONDO		5.00					
FONDO CON LAVADO		79.2					
TOTALES		1328.8					

Grava (%)	7.3	**Arena (%)**	86.8	**Pasa 200 (%)**	6.0
Módulo de finura	2.81				

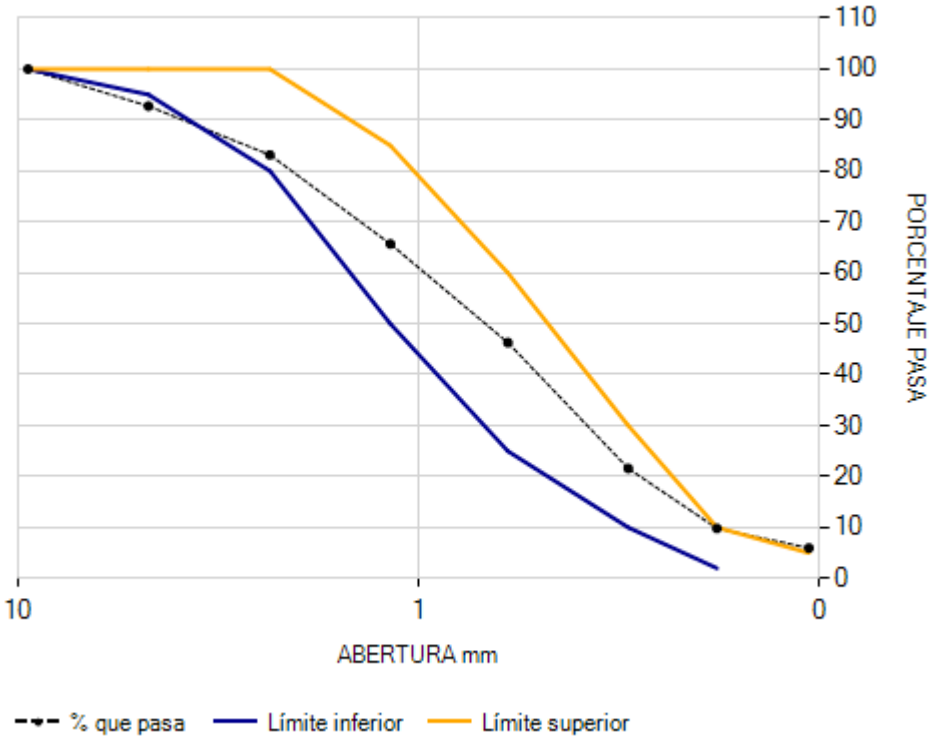

Ensayo de límites	Límite líquido	Índice de plasticidad
MP-AF-13-1719-002-2	NL	NP

Observaciones

“Se valida por desempeño satisfactorio de la mezcla de concreto, según INV-630.2.2.1 y se controla según gradaciones teóricas conjuntas”

Elaboró Anggy lizeth liscano

Anggy Lizeth Liscano Solano

Ayudante de Laboratorio

Aprobó

Katherine Suarez Villareal


Laboratorista

Construcciones EL CONDOR S.A.	**Análisis Granulométrico de Agregados Gruesos y Finos** **INV E-213**	Versión	6
		Página	

Obra	Mocoa - Putumayo	Código	MP-AF-13-1720-001-3
Procedencia	Mocoa	Muestra	MP-AF-13-1720
Material	AF - Concreto estructural AF-13	Fecha	13/04/2026
Localizacion	SECTOR 3 10+600 / 23+571 Clz. Úni. Car. Izq. Producción de concreto PD-01 - Reg. Bitácora - 6232	Observaciones	
Especificación	INV-2013	Parámetro	INV E-123, INV E-213
Equipos utilizados	LBL3100-03, LHE-18		

PESO SECO INICIAL		1413.00	**¿LAVÓ LA MUESTRA?**	Sí	**PESO SECO DESPUÉS DE LAVADO**		1326.60
TAMIZ		**PESO RETENIDO INDIVIDUAL**	**% RETENIDO INDIVIDUAL**	**% RETENIDO ACUMULADO**	**% QUE PASA**	**ESPECIFICACIÓN**	
Número	**mm**					**LIMITE INF**	**LIMITE SUP**
3/8"	**9.5**	0.00	0.0	0.0	100.0	100	100
Nº 4	**4.75**	114.90	8.1	8.1	91.9	95	100
Nº 8	**2.36**	131.10	9.3	17.4	82.6	80	100
N° 16	**1.18**	192.10	13.6	31.0	69.0	50	85
N° 30	**0.600**	333.30	23.6	54.6	45.4	25	60
Nº 50	**0.300**	356.90	25.3	79.9	20.1	10	30
Nº 100	**0.150**	149.90	10.6	90.5	9.5	2	10
N° 200	**0.075**	43.80	3.1	93.6	6.4		5
FONDO		4.60					
FONDO CON LAVADO		91.0					
TOTALES		1413.0					

Grava (%)	8.1	**Arena (%)**	85.4	**Pasa 200 (%)**	6.4
Módulo de finura	2.81				

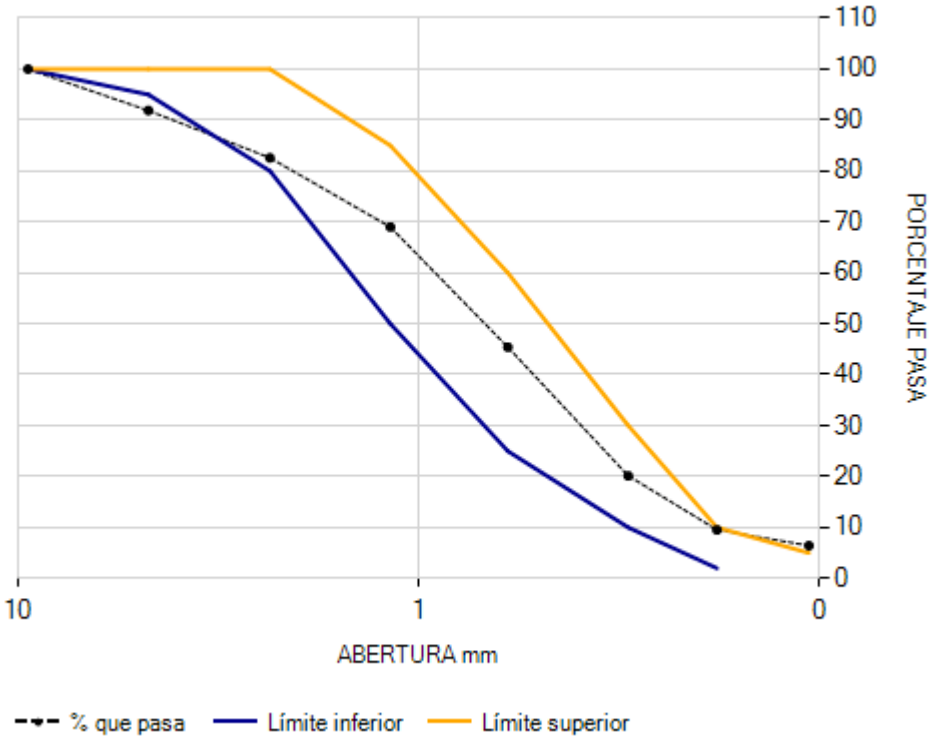

Ensayo de límites	Límite líquido	Índice de plasticidad
MP-AF-13-1720-002-5	NL	NP

Observaciones

“Se valida por desempeño satisfactorio de la mezcla de concreto, según INV-630.2.2.1 y se controla según gradaciones teóricas conjuntas”

Elaboró Anggy lizeth liscano

Anggy Lizeth Liscano Solano

Ayudante de Laboratorio

Aprobó

Katherine Suarez Villareal


Laboratorista

Construcciones EL CONDOR S.A.	**Análisis Granulométrico de Agregados Gruesos y Finos** **INV E-213**	Versión	6
		Página	

Obra	Mocoa - Putumayo	Código	MP-AF-13-1721-001-1
Procedencia	Mocoa	Muestra	MP-AF-13-1721
Material	AF - Concreto estructural AF-13	Fecha	14/04/2026
Localizacion	SECTOR 3 10+600 / 23+571 Clz. Úni. Car. Izq. Producción de concreto PD-01 - Reg. Bitácora - 6236	Observaciones	
Especificación	INV-2013	Parámetro	INV E-123, INV E-213
Equipos utilizados	LBL3100-03, LHE-18		

PESO SECO INICIAL		1585.40	**¿LAVÓ LA MUESTRA?**	Sí	**PESO SECO DESPUÉS DE LAVADO**		1506.30
TAMIZ		**PESO RETENIDO INDIVIDUAL**	**% RETENIDO INDIVIDUAL**	**% RETENIDO ACUMULADO**	**% QUE PASA**	**ESPECIFICACIÓN**	
Número	**mm**					**LIMITE INF**	**LIMITE SUP**
3/8"	**9.5**	0.00	0.0	0.0	100.0	100	100
Nº 4	**4.75**	130.90	8.3	8.3	91.7	95	100
Nº 8	**2.36**	160.10	10.1	18.4	81.6	80	100
N° 16	**1.18**	218.70	13.8	32.1	67.9	50	85
N° 30	**0.600**	358.30	22.6	54.7	45.3	25	60
Nº 50	**0.300**	380.40	24.0	78.7	21.3	10	30
Nº 100	**0.150**	178.90	11.3	90.0	10.0	2	10
N° 200	**0.075**	63.40	4.0	94.0	6.0		5
FONDO		15.60					
FONDO CON LAVADO		94.7					
TOTALES		1585.4					

Grava (%)	8.3	**Arena (%)**	85.8	**Pasa 200 (%)**	6.0
Módulo de finura	2.82				

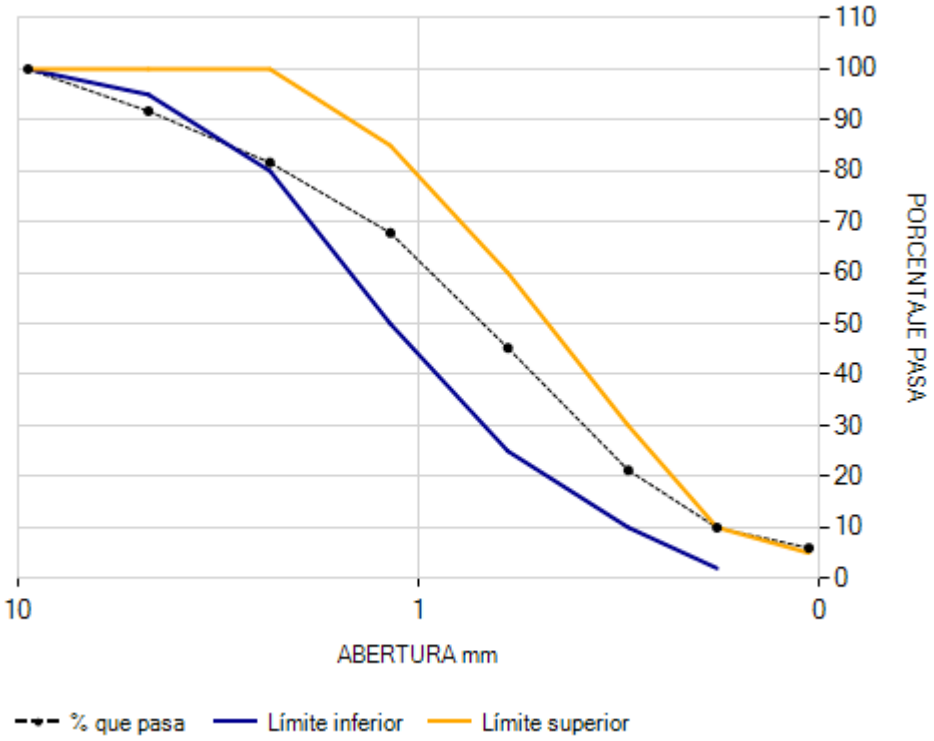

Ensayo de límites	Límite líquido	Índice de plasticidad
MP-AF-13-1721-002-2	NL	NP

Observaciones

“Se valida por desempeño satisfactorio de la mezcla de concreto, según INV-630.2.2.1 y se controla según gradaciones teóricas conjuntas”

Elaboró Anggy lizeth liscano

Anggy Lizeth Liscano Solano

Ayudante de Laboratorio

Aprobó

Katherine Suarez Villareal


Laboratorista

Construcciones EL CONDOR S.A.	**Análisis Granulométrico de Agregados Gruesos y Finos** **INV E-213**	Versión	6
		Página	

Obra	Mocoa - Putumayo	Código	MP-AF-13-1722-001-1
Procedencia	Mocoa	Muestra	MP-AF-13-1722
Material	AF - Concreto estructural AF-13	Fecha	15/04/2026
Localizacion	SECTOR 3 10+600 / 23+571 Clz. Úni. Car. Izq. Producción de concreto PD-01 - Reg. Bitácora - 6249	Observaciones	
Especificación	INV-2013	Parámetro	INV E-123, INV E-213
Equipos utilizados	LBL3100-03, LHE-18		

PESO SECO INICIAL		1258.50	**¿LAVÓ LA MUESTRA?**	Sí	**PESO SECO DESPUÉS DE LAVADO**		1195.10
TAMIZ		**PESO RETENIDO INDIVIDUAL**	**% RETENIDO INDIVIDUAL**	**% RETENIDO ACUMULADO**	**% QUE PASA**	**ESPECIFICACIÓN**	
Número	**mm**					**LIMITE INF**	**LIMITE SUP**
3/8"	**9.5**	0.00	0.0	0.0	100.0	100	100
Nº 4	**4.75**	121.40	9.6	9.6	90.4	95	100
Nº 8	**2.36**	130.10	10.3	20.0	80.0	80	100
N° 16	**1.18**	179.50	14.3	34.2	65.8	50	85
N° 30	**0.600**	236.00	18.8	53.0	47.0	25	60
Nº 50	**0.300**	274.00	21.8	74.8	25.2	10	30
Nº 100	**0.150**	195.00	15.5	90.3	9.7	2	10
N° 200	**0.075**	48.00	3.8	94.1	5.9		5
FONDO		11.10					
FONDO CON LAVADO		74.5					
TOTALES		1258.5					

Grava (%)	9.6	**Arena (%)**	84.4	**Pasa 200 (%)**	5.9
Módulo de finura	2.82				

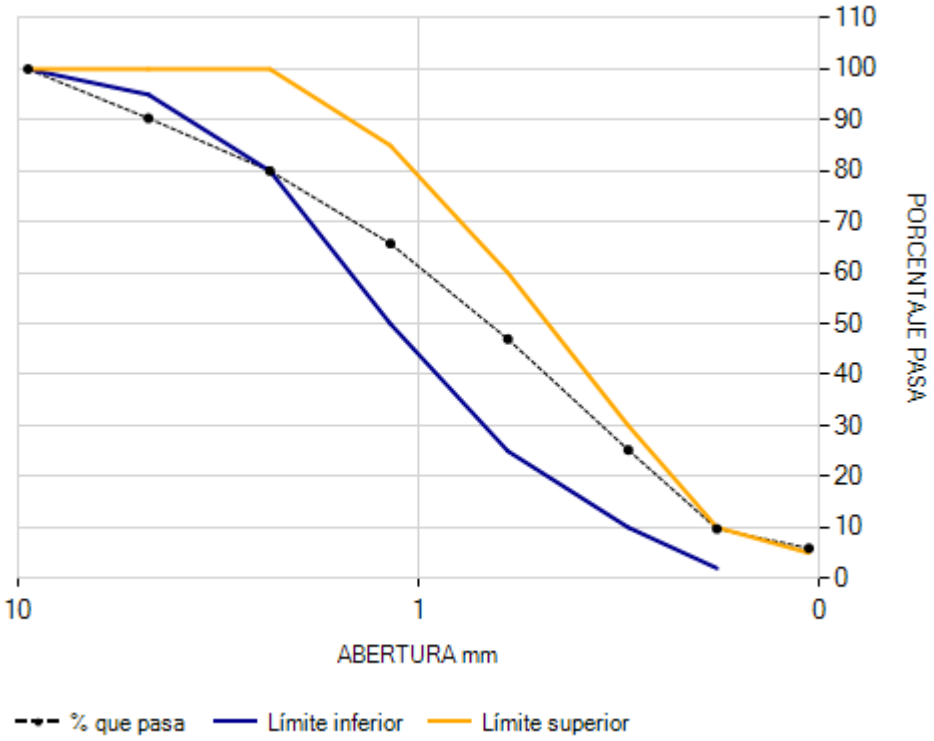

Ensayo de límites	Límite líquido	Índice de plasticidad
MP-AF-13-1722-002-2	NL	NP

Observaciones

“Se valida por desempeño satisfactorio de la mezcla de concreto, según INV-630.2.2.1 y se controla según gradaciones teóricas conjuntas”

Elaboró Anggy lizeth liscano

Anggy Lizeth Liscano Solano

Ayudante de Laboratorio

Aprobó

Katherine Suarez Villareal


Laboratorista

Construcciones EL CONDOR S.A.	**Análisis Granulométrico de Agregados Gruesos y Finos** **INV E-213**	Versión	6
		Página	

Obra	Mocoa - Putumayo	Código	MP-AF-13-1723-001-1
Procedencia	Mocoa	Muestra	MP-AF-13-1723
Material	AF - Concreto estructural AF-13	Fecha	16/04/2026
Localizacion	SECTOR 3 10+600 / 23+571 Clz. Úni. Car. Izq. Producción de concreto PD-01 - Reg. Bitácora - 6251	Observaciones	
Especificación	INV-2013	Parámetro	INV E-123, INV E-213
Equipos utilizados	LBL3100-03, LHE-18		

PESO SECO INICIAL		1802.50	**¿LAVÓ LA MUESTRA?**	Sí	**PESO SECO DESPUÉS DE LAVADO**		1716.40
TAMIZ		**PESO RETENIDO INDIVIDUAL**	**% RETENIDO INDIVIDUAL**	**% RETENIDO ACUMULADO**	**% QUE PASA**	**ESPECIFICACIÓN**	
Número	**mm**					**LIMITE INF**	**LIMITE SUP**
3/8"	**9.5**	0.00	0.0	0.0	100.0	100	100
Nº 4	**4.75**	152.80	8.5	8.5	91.5	95	100
Nº 8	**2.36**	183.60	10.2	18.7	81.3	80	100
N° 16	**1.18**	285.00	15.8	34.5	65.5	50	85
N° 30	**0.600**	374.00	20.7	55.2	44.8	25	60
Nº 50	**0.300**	359.20	19.9	75.2	24.8	10	30
Nº 100	**0.150**	268.50	14.9	90.0	10.0	2	10
N° 200	**0.075**	85.00	4.7	94.8	5.2		5
FONDO		8.30					
FONDO CON LAVADO		94.4					
TOTALES		1802.5					

Grava (%)	8.5	**Arena (%)**	86.3	**Pasa 200 (%)**	5.2
Módulo de finura	2.82				

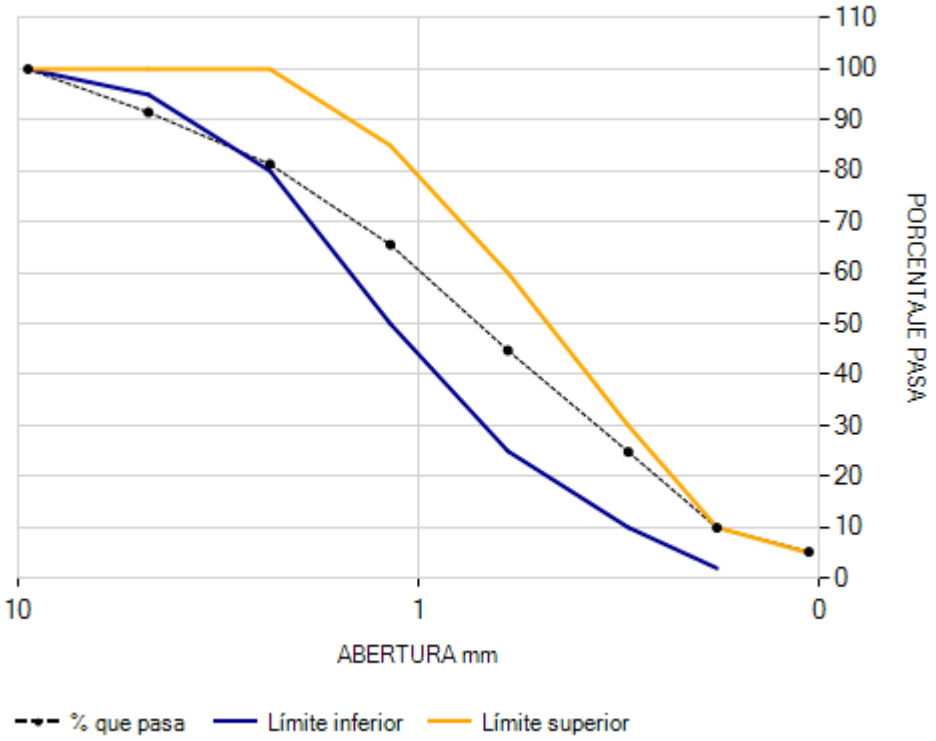

Ensayo de límites	Límite líquido	Índice de plasticidad
MP-AF-13-1723-002-2	NL	NP

Observaciones

“Se valida por desempeño satisfactorio de la mezcla de concreto, según INV-630.2.2.1 y se controla según gradaciones teóricas conjuntas”

Elaboró Anggy lizeth liscano

Anggy Lizeth Liscano Solano

Ayudante de Laboratorio

Aprobó

Katherine Suarez Villareal


Laboratorista

Construcciones EL CONDOR S.A.	**Análisis Granulométrico de Agregados Gruesos y Finos** **INV E-213**	Versión	6
		Página	

Obra	Mocoa - Putumayo	Código	MP-AF-13-1724-001-1
Procedencia	Mocoa	Muestra	MP-AF-13-1724
Material	AF - Concreto estructural AF-13	Fecha	17/04/2026
Localizacion	SECTOR 3 10+600 / 23+571 Clz. Úni. Car. Izq. Producción de concreto PD-01 - Reg. Bitácora - 6269	Observaciones	
Especificación	INV-2013	Parámetro	INV E-123, INV E-213
Equipos utilizados	LBL3100-03, LHE-18		

PESO SECO INICIAL		1422.00	**¿LAVÓ LA MUESTRA?**	Sí	**PESO SECO DESPUÉS DE LAVADO**		1348.70
TAMIZ		**PESO RETENIDO INDIVIDUAL**	**% RETENIDO INDIVIDUAL**	**% RETENIDO ACUMULADO**	**% QUE PASA**	**ESPECIFICACIÓN**	
Número	**mm**					**LIMITE INF**	**LIMITE SUP**
3/8"	**9.5**	0.00	0.0	0.0	100.0	100	100
Nº 4	**4.75**	128.00	9.0	9.0	91.0	95	100
Nº 8	**2.36**	149.00	10.5	19.5	80.5	80	100
N° 16	**1.18**	219.90	15.5	34.9	65.1	50	85
N° 30	**0.600**	266.00	18.7	53.6	46.4	25	60
Nº 50	**0.300**	289.00	20.3	74.0	26.0	10	30
Nº 100	**0.150**	228.40	16.1	90.0	10.0	2	10
N° 200	**0.075**	61.00	4.3	94.3	5.7		5
FONDO		7.40					
FONDO CON LAVADO		80.7					
TOTALES		1422.0					

Grava (%)	9.0	**Arena (%)**	85.3	**Pasa 200 (%)**	5.7
Módulo de finura	2.81				

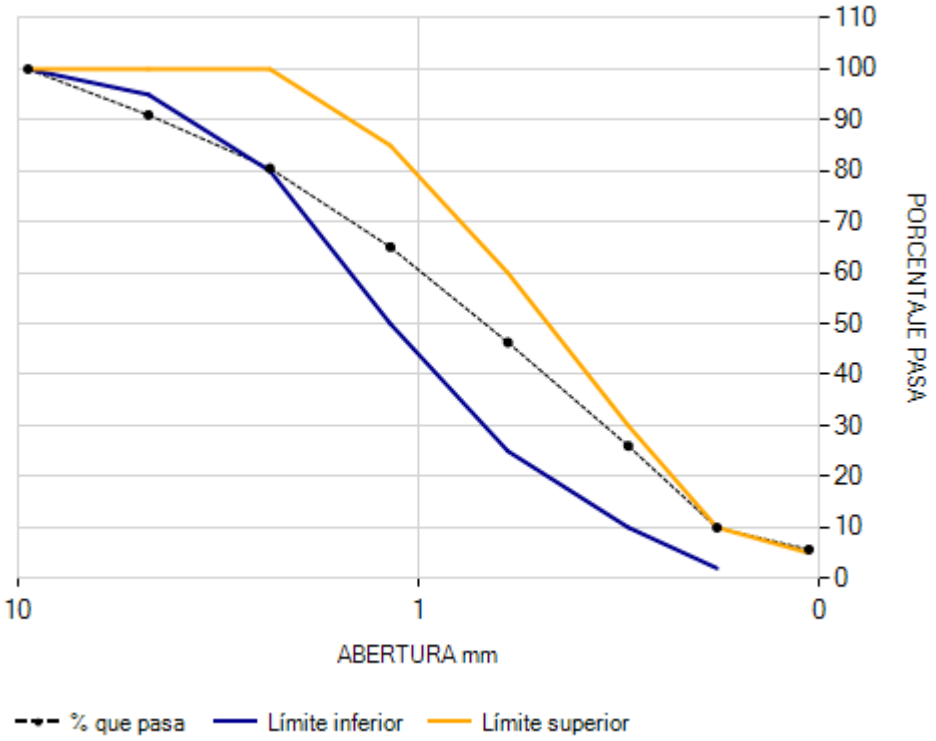

Ensayo de límites	Límite líquido	Índice de plasticidad
MP-AF-13-1724-002-2	NL	NP

Observaciones

“Se valida por desempeño satisfactorio de la mezcla de concreto, según INV-630.2.2.1 y se controla según gradaciones teóricas conjuntas”

Elaboró Anggy lizeth liscano

Anggy Lizeth Liscano Solano

Ayudante de Laboratorio

Aprobó

Katherine Suarez Villareal


Laboratorista

Construcciones EL CONDOR S.A.	**Análisis Granulométrico de Agregados Gruesos y Finos** **INV E-213**	Versión	6
		Página	

Obra	Mocoa - Putumayo	Código	MP-AF-13-1725-001-1
Procedencia	Mocoa	Muestra	MP-AF-13-1725
Material	AF - Concreto estructural AF-13	Fecha	18/04/2026
Localizacion	SECTOR 3 10+600 / 23+571 Clz. Úni. Car. Izq. Producción de concreto PD-01 - Reg. Bitácora - 6270	Observaciones	
Especificación	INV-2013	Parámetro	INV E-123, INV E-213
Equipos utilizados	LBL3100-03, LHE-18		

PESO SECO INICIAL		1422.00	**¿LAVÓ LA MUESTRA?**	Sí	**PESO SECO DESPUÉS DE LAVADO**		1348.70
TAMIZ		**PESO RETENIDO INDIVIDUAL**	**% RETENIDO INDIVIDUAL**	**% RETENIDO ACUMULADO**	**% QUE PASA**	**ESPECIFICACIÓN**	
Número	**mm**					**LIMITE INF**	**LIMITE SUP**
3/8"	**9.5**	0.00	0.0	0.0	100.0	100	100
Nº 4	**4.75**	128.00	9.0	9.0	91.0	95	100
Nº 8	**2.36**	149.00	10.5	19.5	80.5	80	100
N° 16	**1.18**	219.90	15.5	34.9	65.1	50	85
N° 30	**0.600**	266.00	18.7	53.6	46.4	25	60
Nº 50	**0.300**	289.00	20.3	74.0	26.0	10	30
Nº 100	**0.150**	228.40	16.1	90.0	10.0	2	10
N° 200	**0.075**	61.00	4.3	94.3	5.7		5
FONDO		7.40					
FONDO CON LAVADO		80.7					
TOTALES		1422.0					

Grava (%)	9.0	**Arena (%)**	85.3	**Pasa 200 (%)**	5.7
Módulo de finura	2.81				

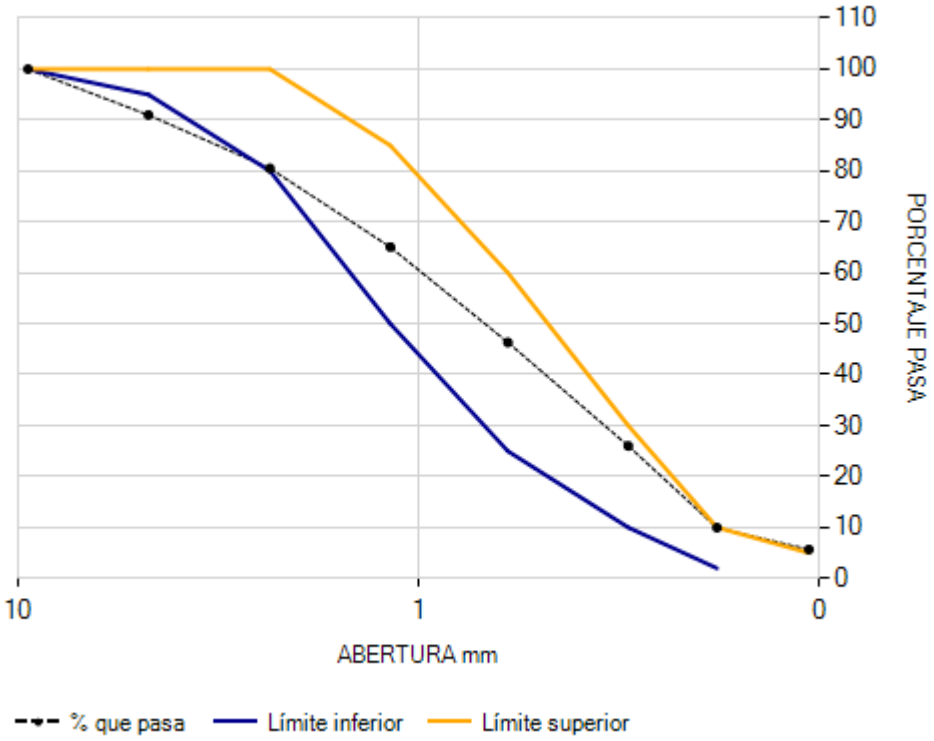

Ensayo de límites	Límite líquido	Índice de plasticidad
MP-AF-13-1725-002-2	NL	NP

Observaciones

“Se valida por desempeño satisfactorio de la mezcla de concreto, según INV-630.2.2.1 y se controla según gradaciones teóricas conjuntas”

Elaboró Anggy Lizeth Liscano

Anggy Lizeth Liscano Solano

Ayudante de Laboratorio

Aprobó

Katherine Suarez Villareal

Laboratorista

Construcciones EL CONDOR S.A.	**Cantidad de partículas livianas en un agregado pétreo** **INV E-221**	Versión	6
		Página	

Obra	Mocoa - Putumayo	Código	MP-AF-13-1709-021-7
Procedencia	Mocoa	Muestra	MP-AF-13-1709
Material	AF - Concreto estructural AF-13	Fecha	24/03/2026
Localizacion	SECTOR 3 10+600 / 23+571 Clz. Úni. Car. Izq. Producción de concreto PD-01 - Reg. Bitácora - 6101	Observaciones	
Especificación	INV-2013	Parámetro	INV E-221
Equipos utilizados	LBL3100-03, LHE-18		

Peso Inicial Seco - M2 (g)	200.0	Peso Muestra Retenida en el Colador - M1 (g)	0.21	Gravedad Especifica Liquido (g/cm3)	2.00

% Particulas Livianas	0.105
% Especificacion	0.5

Observaciones

Elaboró Anggy Lizeth Liscano

Anggy Lizeth Liscano Solano
Ayudante de Laboratorio

Aprobó

Katherine Suarez Villareal
Laboratorista

Construcciones EL CONDOR S.A.	**Cantidad de partículas livianas en un agregado pétreo** **INV E-221**	Versión	6
		Página	

Obra	Mocoa - Putumayo	Código	MP-AF-13-1714-021-7
Procedencia	Mocoa	Muestra	MP-AF-13-1714
Material	AF - Concreto estructural AF-13	Fecha	30/03/2026
Localizacion	SECTOR 3 10+600 / 23+571 Clz. Úni. Car. Izq. Producción de concreto PD-01 - Reg. Bitácora - 6145	Observaciones	
Especificación	INV-2013	Parámetro	INV E-221
Equipos utilizados	LBL3100-03, LHE-18		

Peso Inicial Seco - M2 (g)	200.0	Peso Muestra Retenida en el Colador - M1 (g)	0.12	Gravedad Especifica Liquido (g/cm3)	2.00

% Particulas Livianas	0.060
% Especificacion	0.5

Observaciones

Elaboró Anggy liteth liscano

Anggy Lizeth Liscano Solano
Ayudante de Laboratorio

Aprobó

Katherine Suarez Villareal
Laboratorista

Construcciones EL CONDOR S.A.	**Cantidad de partículas livianas en un agregado pétreo** **INV E-221**	Versión	6
		Página	

Obra	Mocoa - Putumayo	Código	MP-AF-13-1716-021-7
Procedencia	Mocoa	Muestra	MP-AF-13-1716
Material	AF - Concreto estructural AF-13	Fecha	06/04/2026
Localizacion	SECTOR 3 10+600 / 23+571 Clz. Úni. Car. Izq. Producción de concreto PD-01 - Reg. Bitácora - 6175	Observaciones	
Especificación	INV-2013	Parámetro	INV E-221
Equipos utilizados	LBL3100-03, LHE-18		

Peso Inicial Seco - M2 (g)	200.0	Peso Muestra Retenida en el Colador - M1 (g)	0.14	Gravedad Especifica Liquido (g/cm3)	2.00

% Particulas Livianas	0.070
% Especificacion	0.5

Observaciones

Elaboró Anggy liteth liscano

Anggy Lizeth Liscano Solano
Ayudante de Laboratorio

Aprobó

Katherine Suarez Villareal
Laboratorista

Construcciones EL CONDOR S.A.	**Cantidad de partículas livianas en un agregado pétreo** **INV E-221**	Versión	6
		Página	

Obra	Mocoa - Putumayo	Código	MP-AF-13-1720-021-7
Procedencia	Mocoa	Muestra	MP-AF-13-1720
Material	AF - Concreto estructural AF-13	Fecha	13/04/2026
Localizacion	SECTOR 3 10+600 / 23+571 Clz. Úni. Car. Izq. Producción de concreto PD-01 - Reg. Bitácora - 6232	Observaciones	
Especificación	INV-2013	Parámetro	INV E-221
Equipos utilizados	LBL3100-03, LHE-18		

Peso Inicial Seco - M2 (g)	200.2	Peso Muestra Retenida en el Colador - M1 (g)	0.28	Gravedad Especifica Liquido (g/cm3)	2.00

% Particulas Livianas	0.140
% Especificacion	0.5

Observaciones

Elaboró Anggy Lizeth Liscano

Anggy Lizeth Liscano Solano
Ayudante de Laboratorio

Aprobó

Katherine Suarez Villareal
Laboratorista

Construcciones EL CONDOR S.A.	**Límites de Consistencia** **INV E-125**	Versión	6
		Página	

Obra	Mocoa - Putumayo	Código	MP-AF-13-1709-002-5
Procedencia	Mocoa	Muestra	MP-AF-13-1709
Material	AF - Concreto estructural AF-13	Fecha	24/03/2026
Localizacion	SECTOR 3 10+600 / 23+571 Clz. Úni. Car. Izq. Producción de concreto PD-01 - Reg. Bitácora - 6101	Observaciones	
Especificación	INV-2013	Parámetro	INV E-125
Equipos utilizados	LBL400-03-1, LCCG_32, LHE-18		

LÍMITE LÍQUIDO				
NÚMERO DE GOLPES				
PESO TARA + MUESTRA HÚMEDA				
PESO TARA + MUESTRA SECA				
PESO TARA				
% DE HUMEDAD				
LÍMITE PLÁSTICO				
PRUEBA Nº	**1**	**2**	**3**	
PESO TARA + MUESTRA HÚMEDA				
PESO TARA + MUESTRA SECA				
PESO TARA				
% DE HUMEDAD				

Límites de Consistencia

- Límite Líquido — Tendencia

	Norma <=	Resultado
Límite Líquido %		NL
Límite Plástico %		NP
Índice de Plasticidad %	**0**	NP

Observaciones

Elaboró Anggy lizeth liscano Aprobó

Anggy Lizeth Liscano Solano
Ayudante de Laboratorio

Katherine Suarez Villareal
Laboratorista

Construcciones EL CONDOR S.A.	**Límites de Consistencia** **INV E-125**	Versión	6
		Página	

Obra	Mocoa - Putumayo	Código	MP-AF-13-1710-002-2
Procedencia	Mocoa	Muestra	MP-AF-13-1710
Material	AF - Concreto estructural AF-13	Fecha	21/03/2026
Localizacion	SECTOR 3 10+600 / 23+571 Clz. Úni. Car. Izq. Producción de concreto PD-01 - Reg. Bitácora - 6082	Observaciones	
Especificación	INV-2013	Parámetro	INV E-125
Equipos utilizados	LBL400-03-1, LCCG_02, LHE-18		

LÍMITE LÍQUIDO				
NÚMERO DE GOLPES				
PESO TARA + MUESTRA HÚMEDA				
PESO TARA + MUESTRA SECA				
PESO TARA				
% DE HUMEDAD				
LÍMITE PLÁSTICO				
PRUEBA Nº	**1**	**2**	**3**	
PESO TARA + MUESTRA HÚMEDA				
PESO TARA + MUESTRA SECA				
PESO TARA				
% DE HUMEDAD				
