

Proyecto: IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB8-20221201
Fecha: mar 23/06/26

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
1		1	**CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ –**	**1183,25 d**	**jue 2/12/21**	**vie 31/07/26**	**$ 74.841.600.149**	**$ 70.194.080.1...**	**$ 71.330.956.943**
2		1.1	**ETAPA PRELIMINARES**	**270 d**	**jue 2/12/21**	**sáb 1/07/23**	**$ 648.459.616**	**$ 648.459.616**	**$ 648.459.616**
3		1.1.1	Acta de Inicio	0 d	jue 2/12/21	jue 2/12/21	$ 0	$ 0	$ 0
4		1.1.2	Suspension 1	0 d	mar 22/02/22	mar 22/02/22	$ 0	$ 0	$ 0
5		1.1.3	Reinicio suspension 1	0 d	jue 1/09/22	jue 1/09/22	$ 0	$ 0	$ 0
6		1.1.4	Suspension 2	0 d	lun 5/09/22	lun 5/09/22	$ 0	$ 0	$ 0
7		1.1.5	Reinicio suspension 2	0 d	mar 27/09/22	mar 27/09/22	$ 0	$ 0	$ 0
8		1.1.6	Prorroga Etapa preliminar 1	0 d	jue 29/09/22	jue 29/09/22	$ 0	$ 0	$ 0
9		1.1.7	Suspensión 3	0 d	sáb 25/03/23	sáb 25/03/23	$ 0	$ 0	$ 0
10		1.1.8	Reinicio suspension 3	0 d	mar 2/05/23	mar 2/05/23	$ 0	$ 0	$ 0
11		1.1.9	Prorroga Etapa preliminar 2	0 d	jue 4/05/23	jue 4/05/23	$ 0	$ 0	$ 0
12		1.1.10	**FASE DE PRELIMINARES (INCLUYE ENSAYOS DE LABORATORIO, CAMBIO DE**	**270 d**	**jue 2/12/21**	**sáb 1/07/23**	**$ 174.331.227**	**$ 174.331.227**	**$ 174.331.227**
13		1.1.10.1	Adquirir información del contrato	0 d	jue 2/12/21	jue 2/12/21	$ 0	$ 0	$ 0
14		1.1.10.2	Revisión de Diseños	143 d	jue 2/12/21	vie 23/12/22	$ 0	$ 0	$ 0
15		1.1.10.3	**DESGLOSE DEL AIU OFERTADO**	**53 d**	**jue 6/01/22**	**vie 7/10/22**	**$ 4.661.563**	**$ 4.661.563**	**$ 4.661.563**
16		1.1.10.3.1	Elaboracion y entrega a la interventoria de desglose AIU	3 d	jue 6/01/22	mar 11/01/22	$ 932.313	$ 932.313	$ 932.313
17		1.1.10.3.2	Revision desglose por parte de la interventoria y generacion de observaciones y comentarios	2 d	mar 11/01/22	jue 13/01/22	$ 621.542	$ 621.542	$ 621.542
18		1.1.10.3.3	Atencion a obsercaciones y entrega de documento a la interventoria (version corregida)	1 d	lun 5/09/22	mar 27/09/22	$ 621.542	$ 621.542	$ 621.542
19		1.1.10.3.4	Revision por parte de la interventoria y aprobacion de desglose	9 d	mar 27/09/22	vie 7/10/22	$ 2.486.167	$ 2.486.167	$ 2.486.167
20		1.1.10.4	fin de desglose del AIU ofertado	0 d	vie 7/10/22	vie 7/10/22	$ 0	$ 0	$ 0
21		1.1.10.5	**ANTICIPO**	**5 d**	**jue 2/12/21**	**jue 9/12/21**	**$ 3.962.329**	**$ 3.962.329**	**$ 3.962.329**
22		1.1.10.5.1	Plan detallado de inversion del anticipo	5 d	jue 2/12/21	jue 9/12/21	$ 1.981.164	$ 1.981.164	$ 1.981.164
23		1.1.10.5.2	Suscribir contrato de fiducia para el manejo de los recursos del anticipo	5 d	jue 2/12/21	jue 9/12/21	$ 1.981.164	$ 1.981.164	$ 1.981.164
24		1.1.10.6	fin actividades Anticipo	0 d	jue 9/12/21	jue 9/12/21	$ 0	$ 0	$ 0
25		1.1.10.7	**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU CONTRACTUALES**	**85 d**	**vie 31/12/21**	**vie 11/11/22**	**$ 37.898.507**	**$ 37.898.507**	**$ 37.898.507**
26		1.1.10.7.1	Elaboracion y entrega a la interventoria de precios unitarios version 0	25 d	vie 31/12/21	mar 1/02/22	$ 11.703.951	$ 11.703.951	$ 11.703.951
27		1.1.10.7.2	Revision de precios unitarios por parte de la interventoria y generacion de observaciones y comentarios	18 d	mié 2/02/22	jue 1/09/22	$ 8.917.296	$ 8.917.296	$ 8.917.296
28		1.1.10.7.3	Atencion a observaciones y entrega de documento a la interventoria (version corregida)	19 d	mar 27/09/22	jue 20/10/22	$ 8.917.296	$ 8.917.296	$ 8.917.296
29		1.1.10.7.4	Revision por parte de la interventoria y aprobacion de precios unitaros version final	18 d	jue 20/10/22	vie 11/11/22	$ 8.359.965	$ 8.359.965	$ 8.359.965
30		1.1.10.8	fin analisis de precios unitarios APU contractuales	0 d	vie 11/11/22	vie 11/11/22	$ 0	$ 0	$ 0
31		1.1.10.9	**ELABORACION Y APROBACION PLAN DE CALIDAD - PLAN DE INSPECCION Y**	**100 d**	**jue 2/12/21**	**mar 1/11/22**	**$ 8.390.813**	**$ 8.390.813**	**$ 8.390.813**
32		1.1.10.9.1	Elaboracion y entrega a la interventoria plan de calidad - plan de inspeccion y ensayos version 0	33 d	jue 2/12/21	vie 14/01/22	$ 3.401.681	$ 3.401.681	$ 3.401.681
33		1.1.10.9.2	Revision del informe por parte de la interventoria y generacion de observaciones y comentarios	43 d	sáb 15/01/22	mar 4/10/22	$ 2.834.734	$ 2.834.734	$ 2.834.734
34		1.1.10.9.3	Atencion a observaciones y entrega de documento a la interventoria (version corregida)	11 d	mié 5/10/22	mié 19/10/22	$ 1.133.894	$ 1.133.894	$ 1.133.894
35		1.1.10.9.4	Revision por parte de la interventoria y aprobacion del producto final	10 d	jue 20/10/22	mar 1/11/22	$ 1.020.504	$ 1.020.504	$ 1.020.504
36		1.1.10.9.5	Aprobacion del idu del plan de inspeccion y ensayos.	0 d	mar 1/11/22	mar 1/11/22	$ 0	$ 0	$ 0
37		1.1.10.10	fin elaboracion y aprobacion plan de calidad - plan de inspeccion y ensayos	0 d	mar 1/11/22	mar 1/11/22	$ 0	$ 0	$ 0
38		1.1.10.11	**Tramite ante Empresas de Servicios Públicos**	**267 d**	**jue 2/12/21**	**mié 28/06/23**	**$ 92.857.161**	**$ 92.857.161**	**$ 92.857.161**
39		1.1.10.11.1	Revisión de Interferencias	62 d	jue 2/12/21	jue 17/02/22	$ 15.831.723	$ 15.831.723	$ 15.831.723
40		1.1.10.11.2	Inventario e Inspección de redes existentes	66 d	jue 2/12/21	mar 22/02/22	$ 16.711.263	$ 16.711.263	$ 16.711.263
41		1.1.10.11.3	Verificación de otros Proyectos Dentro del Área del Proyecto	72 d	jue 2/12/21	mié 28/09/22	$ 18.177.164	$ 18.177.164	$ 18.177.164
42		1.1.10.11.4	Solicitud por parte de la interventoria al IDU del listado de delegados de las ESP	0 d	jue 2/12/21	jue 2/12/21	$ 0	$ 0	$ 0
43		1.1.10.11.5	Informar a las ESP el inicio de las actividades de obra	0 d	lun 12/12/22	lun 12/12/22	$ 0	$ 0	$ 0
44		1.1.10.11.6	Apovar gestion del IDU para obtencion de las autorizaciones y permisos frente a las ESP	147 d	jue 2/12/21	mié 28/12/22	$ 36.061.147	$ 36.061.147	$ 36.061.147
45		1.1.10.11.7	Ajuste de actas de competencia (Primera parte)	18 d	lun 28/11/22	mar 20/12/22	$ 4.127.975	$ 4.127.975	$ 4.127.975
46		1.1.10.11.8	Ajuste de actas de competencia (Segunda parte)	7 d	mié 31/05/23	jue 8/06/23	$ 644.996	$ 644.996	$ 644.996
47		1.1.10.11.9	Revision de actas de actas de competencia por parte de interventoria	5 d	jue 8/06/23	jue 15/06/23	$ 464.397	$ 464.397	$ 464.397
48		1.1.10.11.10	Atencion de observaciones emitidas por interventoria a las actas de competencias	5 d	jue 15/06/23	jue 22/06/23	$ 580.497	$ 580.497	$ 580.497
49		1.1.10.11.11	Revision por parte del IDU a las actas de competencias	5 d	mié 21/06/23	mar 27/06/23	$ 193.499	$ 193.499	$ 193.499
50		1.1.10.11.12	Atencion de las observaciones emitidas por el IDU a las actas de competencias	2 d	lun 26/06/23	mié 28/06/23	$ 64.500	$ 64.500	$ 64.500
51		1.1.10.12	Fin del tramite ante Empresas de Servicios Publicos	0 d	mié 28/06/23	mié 28/06/23	$ 0	$ 0	$ 0
52		1.1.10.13	**ELABORACION Y APROBACION DE PRESUPUESTO DE OBRA**	**148 d**	**lun 28/11/22**	**sáb 1/07/23**	**$ 11.653.907**	**$ 11.653.907**	**$ 11.653.907**
53		1.1.10.13.1	Elaboracion y entrega a la interventoria de presupuesto de obra version 0 (Primera parte)	24 d	lun 28/11/22	mar 27/12/22	$ 582.695	$ 582.695	$ 582.695
54		1.1.10.13.2	Elaboracion y entrega a la interventoria de presupuesto de obra version 0 (Segunda parte)	8 d	mié 7/06/23	sáb 17/06/23	$ 4.215.973	$ 4.215.973	$ 4.215.973
55		1.1.10.13.3	Revision del presupuesto por parte de la interventoria y generacion de observaciones y comentarios	4 d	sáb 17/06/23	vie 23/06/23	$ 2.742.096	$ 2.742.096	$ 2.742.096
56		1.1.10.13.4	Atencion a observaciones y entrega de documento a la interventoria (version corregida)	4 d	vie 23/06/23	mié 28/06/23	$ 2.742.096	$ 2.742.096	$ 2.742.096
57		1.1.10.13.5	Revision por parte de la interventoria y aprobacion del presupuesto final	3 d	mié 28/06/23	sáb 1/07/23	$ 1.371.048	$ 1.371.048	$ 1.371.048

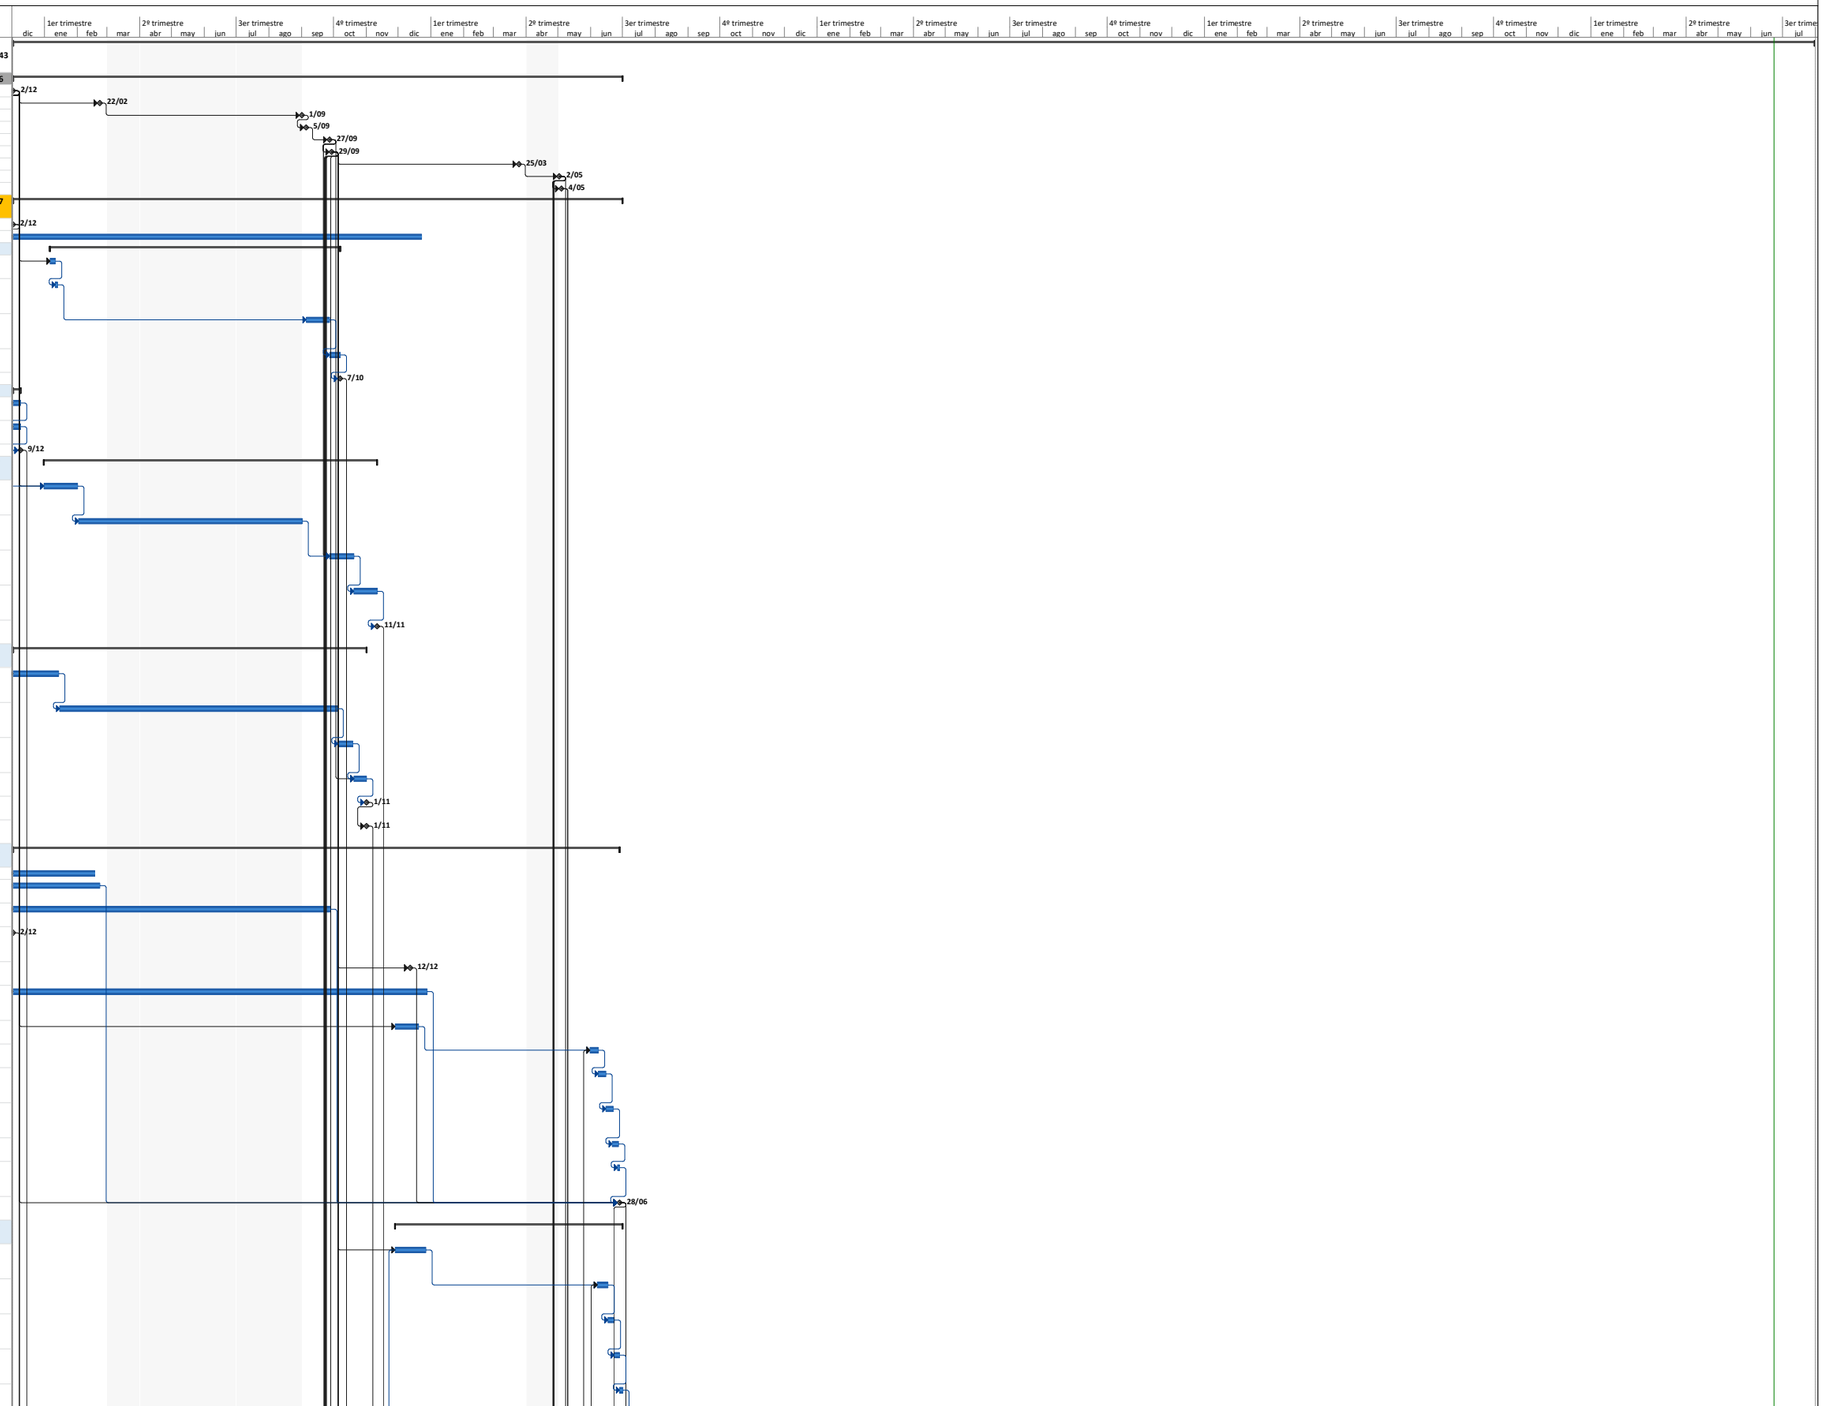

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito externo · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · Sólo el comienzo · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo · Sólo duración · Resumen manual · Sólo fin · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
58		1.1.10.14	Fin Elabotacion y Aprobacion de presupuesto de obra	0 d	sáb 1/07/23	sáb 1/07/23	$ 0	$ 0	$ 0
59		**1.1.10.15**	**ELABORACION Y APROBACION PDT DETALLADO ACTIVIDADES DE OBRA**	**19 d**	**mié 7/06/23**	**sáb 1/07/23**	**$ 8.349.682**	**$ 8.349.682**	**$ 8.349.682**
60		1.1.10.15.1	elaboracion y entrega a la interventoria pdt detallado actividades de obra version 0	5 d	mié 7/06/23	mié 14/06/23	$ 2.879.201	$ 2.879.201	$ 2.879.201
61		1.1.10.15.2	revision del pdt por parte de la interventoria y generacion de observaciones y comentarios	5 d	mié 14/06/23	mié 21/06/23	$ 2.303.361	$ 2.303.361	$ 2.303.361
62		1.1.10.15.3	atencion a observaciones y entrega de documento a la interventoria (version corregida)	5 d	mié 21/06/23	mar 27/06/23	$ 2.303.361	$ 2.303.361	$ 2.303.361
63		1.1.10.15.4	revision por parte de la interventoria y aprobacion del pdt final	4 d	mar 27/06/23	sáb 1/07/23	$ 863.760	$ 863.760	$ 863.760
64		1.1.10.16	fin Elaboracion y Aprobacion PDT detallado Actividades de obra	0 d	sáb 1/07/23	sáb 1/07/23	$ 0	$ 0	$ 0
65		**1.1.10.17**	**ELABORACION Y APROBACION PAC DE ETAPA DE OBRA**	**148 d**	**lun 28/11/22**	**sáb 1/07/23**	**$ 4.226.484**	**$ 4.226.484**	**$ 4.226.484**
66		1.1.10.17.1	Elaboracion y entrega a la interventoria pac version 0	26 d	lun 28/11/22	jue 29/12/22	$ 4.008.944	$ 4.008.944	$ 4.008.944
67		1.1.10.17.2	Elaboracion y entrega a la interventoria pac version Final	4 d	mié 21/06/23	lun 26/06/23	$ 145.026	$ 145.026	$ 145.026
68		1.1.10.17.3	revision del pac por parte de la interventoria y generacion de observaciones y comentarios	5 d	lun 26/06/23	sáb 1/07/23	$ 72.513	$ 72.513	$ 72.513
69		1.1.10.18	Fin Elaboracion y aprobacion PAC de etapa de obra	0 d	sáb 1/07/23	sáb 1/07/23	$ 0	$ 0	$ 0
70		1.1.10.19	RELACIÓN DEL EQUIPO MÍNIMO OBLIGATORIO.	26 d	lun 28/11/22	jue 29/12/22	$ 2.330.782	$ 2.330.782	$ 2.330.782
71		**1.1.11**	**COMPONENTES**	**270 d**	**jue 2/12/21**	**sáb 1/07/23**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
72		1.1.11.1	ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST (B)	1 d	jue 2/12/21	vie 3/12/21	$ 0	$ 0	$ 0
73		**1.1.11.2**	**SST, AMBIENTAL Y FORESTAL**	**148 d**	**jue 2/12/21**	**jue 29/12/22**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
74		**1.1.11.2.1**	**SST**	**148 d**	**jue 2/12/21**	**jue 29/12/22**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
75		1.1.11.2.1.1	Sistema de gestión y seguridad en el Trabajo / SG-SST	106 d	jue 2/12/21	mié 9/11/22	$ 0	$ 0	$ 0
76		1.1.11.2.1.2	Visita al Área de Intervención	45 d	vie 7/01/22	jue 29/09/22	$ 0	$ 0	$ 0
77		1.1.11.2.1.3	Aprobación de Hojas de Vida-Etapa Preliminares	11 d	jue 29/09/22	mié 12/10/22	$ 0	$ 0	$ 0
78		1.1.11.2.1.4	Presentación documentos de vinculación personal mínimo (Etapa preliminares)	10 d	jue 29/09/22	mar 11/10/22	$ 0	$ 0	$ 0
79		1.1.11.2.1.5	Aprobación de Hojas de Vida-Etapa de Construcción	15 d	lun 28/11/22	vie 16/12/22	$ 0	$ 0	$ 0
80		1.1.11.2.1.6	Seguimiento para actividades de obra etapa preliminar	26 d	lun 28/11/22	jue 29/12/22	$ 0	$ 0	$ 0
81		1.1.11.2.2	fin de Actividades SST	0 d	jue 29/12/22	jue 29/12/22	$ 0	$ 0	$ 0
82		**1.1.11.2.3**	**AMBIENTAL**	**148 d**	**jue 2/12/21**	**jue 29/12/22**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
83		1.1.11.2.3.1	Cronograma detallado de actividades A&SST (Plazos desde su formulación hasta la aprobación de la Interventoria)	27 d	mar 4/10/22	sáb 5/11/22	$ 0	$ 0	$ 0
84		1.1.11.2.3.2	Manejo Ambiental de Obra MAO (Actividades desde su formulación hasta la aprobación de interventoria y visto bueno del IDU)	135 d	vie 17/12/21	mié 28/12/22	$ 0	$ 0	$ 0
85		1.1.11.2.3.3	Plan de gestión de RCD (Actividades desde su formulación hasta la adquisición del PIN)	21 d	jue 29/09/22	mar 25/10/22	$ 0	$ 0	$ 0
86		1.1.11.2.3.4	Publicidad Exterior visual (revisión de registro de publicidad exterior)	94 d	jue 2/12/21	mar 25/10/22	$ 0	$ 0	$ 0
87		1.1.11.2.3.5	Elaboración documentos técnicos para el trámite de permisos ambientales	21 d	jue 29/09/22	mar 25/10/22	$ 0	$ 0	$ 0
88		1.1.11.2.3.6	Seguimiento para actividades de obra etapa preliminar	26 d	lun 28/11/22	jue 29/12/22	$ 0	$ 0	$ 0
89		1.1.11.2.4	fin de Actividades Ambientales	0 d	jue 29/12/22	jue 29/12/22	$ 0	$ 0	$ 0
90		**1.1.11.2.5**	**FORESTAL**	**148 d**	**jue 2/12/21**	**jue 29/12/22**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
91		1.1.11.2.5.1	Inventario forestal	86 d	jue 2/12/21	vie 14/10/22	$ 0	$ 0	$ 0
92		1.1.11.2.5.2	Inventario y balance de zonas verdes	86 d	jue 2/12/21	vie 14/10/22	$ 0	$ 0	$ 0
93		1.1.11.2.5.3	Actividades silviculturales frentes iniciales	28 d	vie 25/11/22	jue 29/12/22	$ 0	$ 0	$ 0
94		1.1.11.2.5.4	Seguimiento para actividades de obra etapa preliminar	26 d	lun 28/11/22	jue 29/12/22	$ 0	$ 0	$ 0
95		1.1.11.2.6	fin de Actividades Forestales	0 d	jue 29/12/22	jue 29/12/22	$ 0	$ 0	$ 0
96		1.1.11.3	Fin actividades Ambientales y SST	0 d	jue 29/12/22	jue 29/12/22	$ 0	$ 0	$ 0
97		**1.1.11.4**	**DIÁLOGO CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA (C)**	**195 d**	**jue 2/12/21**	**jue 23/02/23**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
98		1.1.11.4.1	Directorio de Actores	49 d	jue 2/12/21	mié 2/02/22	$ 0	$ 0	$ 0
99		1.1.11.4.2	Inventario de Predios, metodología y Cronograma para el Programa de Acompañamiento de Actividades técnicas - Según PMT etapa 1	86 d	jue 2/12/21	vie 14/10/22	$ 0	$ 0	$ 0
100		1.1.11.4.3	Recorrido con el Área Técnica	72 d	jue 2/12/21	mié 28/09/22	$ 0	$ 0	$ 0
101		1.1.11.4.4	Inventario de Rampas y Accesos a Garajes	72 d	jue 2/12/21	mié 28/09/22	$ 0	$ 0	$ 0
102		1.1.11.4.5	Inventario de Vías a Utilizar	94 d	jue 2/12/21	mar 25/10/22	$ 0	$ 0	$ 0
103		1.1.11.4.6	Estado Actual de Vías a Utilizar Según PMT	94 d	jue 2/12/21	mar 25/10/22	$ 0	$ 0	$ 0
104		1.1.11.4.7	Elaboracion Actas de Vecindad	34 d	mar 20/12/22	lun 30/01/23	$ 0	$ 0	$ 0
105		1.1.11.4.8	Revision por parte de interventoria a las actas de vecindad	9 d	lun 30/01/23	jue 9/02/23	$ 0	$ 0	$ 0
106		1.1.11.4.9	Informe de antecedentes (incluye revision documental y gestión ciudadana en el sector)	25 d	jue 10/11/22	sáb 10/12/22	$ 0	$ 0	$ 0
107		1.1.11.4.10	Inicio Informe de Preliminares - Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica	12 d	jue 9/02/23	jue 23/02/23	$ 0	$ 0	$ 0
108		1.1.11.5	Fin de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica	0 d	jue 23/02/23	jue 23/02/23	$ 0	$ 0	$ 0
109		**1.1.11.6**	**Plan de Manejo de Trafico PMT (D)**	**270 d**	**jue 2/12/21**	**sáb 1/07/23**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
110		**1.1.11.6.1**	**ETAPA 1**	**96 d**	**jue 2/12/21**	**jue 27/10/22**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
111		1.1.11.6.1.1	Presentación de Plan de Manejo de Trafico (Fase 1)	42 d	jue 2/12/21	mar 25/01/22	$ 0	$ 0	$ 0
112		1.1.11.6.1.2	Validación de Documento (Etapa 1) por Parte de la Interventoria	2 d	mié 2/02/22	vie 4/02/22	$ 0	$ 0	$ 0
113		1.1.11.6.1.3	Revisión y Ajustes Necesarios por Observaciones de parte de Interventoría	5 d	sáb 5/02/22	vie 11/02/22	$ 0	$ 0	$ 0
114		1.1.11.6.1.4	Presentacion y Revisión de documento (Etapa 1) por Secretaria de Movilidad	8 d	vie 11/02/22	lun 21/02/22	$ 0	$ 0	$ 0
115		1.1.11.6.1.5	Revisión y Ajustes Necesarios por Observaciones de parte de Secretaría de Movilidad (SDM)	7 d	lun 21/02/22	mié 28/09/22	$ 0	$ 0	$ 0

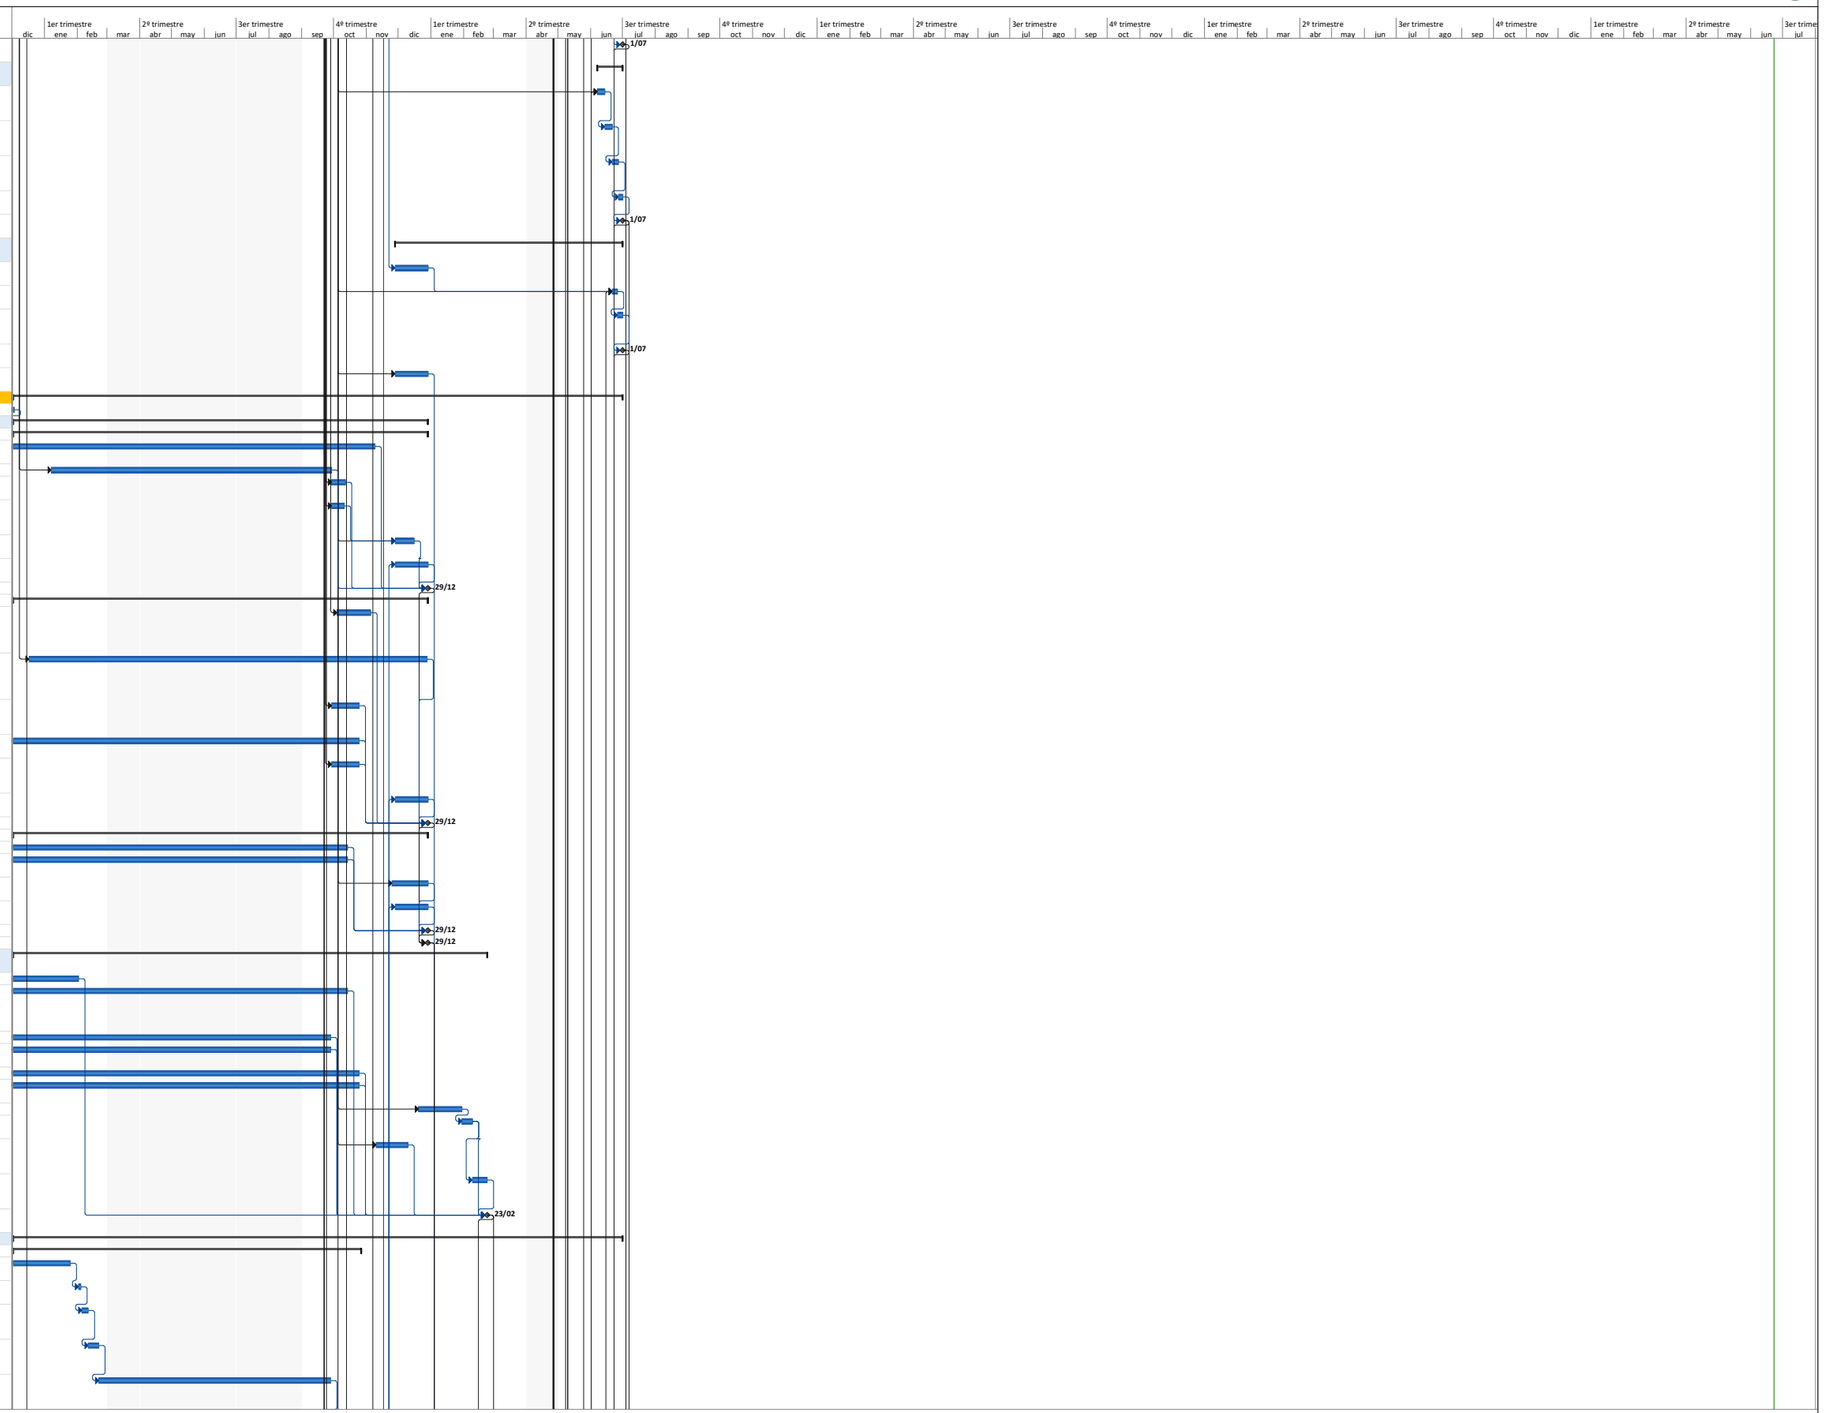

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito externo · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · Sólo el comienzo · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo · Sólo duración · Resumen manual · Sólo fin · Tareas críticas · Progreso

Proyecto: IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB8-20221201
Fecha: mar 23/06/26


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
116		1.1.11.6.1.6	Aprobación de PMT (Etapa 1) por SDM	0 d	mié 28/09/22	mié 28/09/22	$ 0	$ 0	$ 0
117		1.1.11.6.1.7	Presentación actualización de Plan de Manejo de Trafico (PDA)	9 d	vie 30/09/22	mar 11/10/22	$ 0	$ 0	$ 0
118		1.1.11.6.1.8	Validación de actualización Documento (PDA) por Parte de la Interventoria	1 d	mar 11/10/22	mié 12/10/22	$ 0	$ 0	$ 0
119		1.1.11.6.1.9	Revisión y Ajustes Necesarios por Observaciones de parte de Interventoría de la actualización de Plan de Manejo de Trafico (PDA)	3 d	mié 12/10/22	sáb 15/10/22	$ 0	$ 0	$ 0
120		1.1.11.6.1.10	Presentacion y Revisión de documento (Etapa 1) por Secretaria de Movilidad de la actualización de Plan de Manejo de Trafico (PDA)	5 d	sáb 15/10/22	sáb 22/10/22	$ 0	$ 0	$ 0
121		1.1.11.6.1.11	Revisión y Ajustes Necesarios por Observaciones de parte de Secretaría de Movilidad (SDM) de la actualización de Plan de Manejo de Trafico (PDA)	4 d	sáb 22/10/22	jue 27/10/22	$ 0	$ 0	$ 0
122		1.1.11.6.1.12	Aprobación de actualizacion de PMT (PDA) por SDM	0 d	jue 27/10/22	jue 27/10/22	$ 0	$ 0	$ 0
123		1.1.11.6.2	Fin de PMT Etapa 1	0 d	jue 27/10/22	jue 27/10/22	$ 0	$ 0	$ 0
124		**1.1.11.6.3**	**PMT Autopista Norte**	**199 d**	**mar 27/09/22**	**sáb 1/07/23**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
125		1.1.11.6.3.1	Presentación a la interventoria de propuesta de Plan de Manejo de Trafico (Autopista Norte)	9 d	mar 27/09/22	vie 7/10/22	$ 0	$ 0	$ 0
126		1.1.11.6.3.2	Validación de Propuesta (Autopista Norte) por Parte de la Interventoria	3 d	vie 7/10/22	mar 11/10/22	$ 0	$ 0	$ 0
127		1.1.11.6.3.3	Revisión y Ajustes Necesarios por Observaciones a la propuesta de parte de Interventoría (Autopista Norte)	4 d	mar 11/10/22	sáb 15/10/22	$ 0	$ 0	$ 0
128		1.1.11.6.3.4	Presentacion y Revisión de propuesta (Autopista Norte) a Secretaria de Movilidad	2 d	sáb 15/10/22	mié 19/10/22	$ 0	$ 0	$ 0
129		1.1.11.6.3.5	Radicacion y aprobacion de la SDM a la metodologia	19 d	mar 27/12/22	jue 19/01/23	$ 0	$ 0	$ 0
130		1.1.11.6.3.6	Toma de informacion y presentacion de la linea base (primera etapa)	30 d	jue 19/01/23	jue 23/02/23	$ 0	$ 0	$ 0
131		1.1.11.6.3.7	Toma de informacion y presentacion de la linea base (segunda etapa)	27 d	mar 2/05/23	sáb 3/06/23	$ 0	$ 0	$ 0
132		1.1.11.6.3.8	Revision interventoria a linea base	3 d	sáb 3/06/23	mié 7/06/23	$ 0	$ 0	$ 0
133		1.1.11.6.3.9	Atencion observaciones interventoria a linea base	3 d	mié 7/06/23	sáb 10/06/23	$ 0	$ 0	$ 0
134		1.1.11.6.3.10	Presentacion de linea base ante (SDM)	1 d	sáb 10/06/23	mar 13/06/23	$ 0	$ 0	$ 0
135		1.1.11.6.3.11	Atención de observaciones de la SDM a line base	8 d	mar 13/06/23	vie 23/06/23	$ 0	$ 0	$ 0
136		1.1.11.6.3.12	Aprobación de la linea base por la SDM	1 d	vie 23/06/23	sáb 24/06/23	$ 0	$ 0	$ 0
137		1.1.11.6.3.13	Elaboracion de Plan de Manejo de Trafico (Autopista Norte)	6 d	sáb 24/06/23	sáb 1/07/23	$ 0	$ 0	$ 0
138		1.1.11.6.4	Fin de Linea Base PMT Autopista Norte	0 d	sáb 1/07/23	sáb 1/07/23	$ 0	$ 0	$ 0
139		1.1.11.6.5	Seguimiento para actividades de obra etapa preliminar	26 d	lun 28/11/22	jue 29/12/22	$ 0	$ 0	$ 0
140		1.1.11.7	Fin de Plan de Manejo de Tráfico PMT's Preliminares	0 d	sáb 1/07/23	sáb 1/07/23	$ 0	$ 0	$ 0
141		1.1.11.8	Fin de Componentes	0 d	jue 23/02/23	jue 23/02/23	$ 0	$ 0	$ 0
142		**1.1.12**	**PDA**	**133 d**	**mié 28/09/22**	**mar 7/03/23**	**$ 288.863.198**	**$ 288.863.198**	**$ 288.863.198**
143		**1.1.12.1**	**NP's y Presupuesto para PDA**	**51 d**	**mié 28/09/22**	**mar 29/11/22**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
144		1.1.12.1.1	Presentacion de propuesta PDA (metodologia, cantidades a ejecutar, cronograma, localizacion)	6 d	mié 28/09/22	mié 5/10/22	$ 0	$ 0	$ 0
145		1.1.12.1.2	Revision de interventoria a la propuesta PDA (metodologia, cantidades a ejecutar, cronograma, localizacion)	5 d	mié 5/10/22	mar 11/10/22	$ 0	$ 0	$ 0
146		1.1.12.1.3	Presentación de documentación para inicio de actividades de pilotes de prueba (personal, NP's, presupuesto).	3 d	mar 4/10/22	vie 7/10/22	$ 0	$ 0	$ 0
147		1.1.12.1.4	Revision por parte de la interventoría a la Presentación de documentación para inicio de actividades de pilotes de prueba (personal, NP's,	6 d	vie 7/10/22	vie 14/10/22	$ 0	$ 0	$ 0
148		1.1.12.1.5	Atencion de observaciones emitidas por la interventoria a la Presentación de documentación para inicio de actividades de pilotes de prueba (personal, NP's, presupuesto).	1 d	vie 14/10/22	sáb 15/10/22	$ 0	$ 0	$ 0
149		1.1.12.1.6	Revision por parte del IDU a la Presentación de documentación para inicio de actividades de pilotes de prueba (personal, NP's, presupuesto).	7 d	sáb 15/10/22	mar 25/10/22	$ 0	$ 0	$ 0
150		1.1.12.1.7	Atencion de observaciones emitidas por el IDU a la Presentación de documentación para inicio de actividades de pilotes de prueba (personal, NP's, presupuesto).	1 d	mar 25/10/22	mié 26/10/22	$ 0	$ 0	$ 0
151		1.1.12.1.8	Modificacion contractual (NP's)	28 d	mié 26/10/22	mar 29/11/22	$ 0	$ 0	$ 0
152		**1.1.12.2**	**Pilotaje**	**1 d**	**lun 28/11/22**	**mar 29/11/22**	**$ 214.909.689**	**$ 214.909.689**	**$ 214.909.689**
153		1.1.12.2.1	Armado de Acero	1 d	lun 28/11/22	mar 29/11/22	$ 23.886.413	$ 23.886.413	$ 23.886.413
154		1.1.12.2.2	Excavación, plataforma de pilotaje y fundida de Pilotes concreto de 4000 PSI	1 d	lun 28/11/22	mar 29/11/22	$ 191.023.276	$ 191.023.276	$ 191.023.276
155		**1.1.12.3**	**Alistamiento para PDA**	**9 d**	**mar 29/11/22**	**sáb 10/12/22**	**$ 7.539.566**	**$ 7.539.566**	**$ 7.539.566**
156		1.1.12.3.1	Descabece de Pilotes	2 d	mar 29/11/22	jue 1/12/22	$ 120.866	$ 120.866	$ 120.866
157		1.1.12.3.2	Armado de Acero Recrecido	2 d	jue 1/12/22	sáb 3/12/22	$ 1.218.525	$ 1.218.525	$ 1.218.525
158		1.1.12.3.3	Realce de Pilotes (Vaciado de Concreto)	1 d	lun 5/12/22	mar 6/12/22	$ 5.200.175	$ 5.200.175	$ 5.200.175
159		1.1.12.3.4	Resistencia del realce concreto de 5000 PSI	4 d	lun 5/12/22	sáb 10/12/22	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000
160		**1.1.12.4**	**Prueba PDA**	**83 d**	**lun 28/11/22**	**mar 7/03/23**	**$ 66.413.943**	**$ 66.413.943**	**$ 66.413.943**
161		1.1.12.4.1	Disipacion de Poros	12 d	lun 28/11/22	mar 13/12/22	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000
162		1.1.12.4.2	PDA	5 d	lun 12/12/22	sáb 17/12/22	$ 53.472.860	$ 53.472.860	$ 53.472.860
163		1.1.12.4.3	Procesamiento de Información PDA por laboratorio	10 d	sáb 17/12/22	jue 29/12/22	$ 11.441.083	$ 11.441.083	$ 11.441.083
164		1.1.12.4.4	Revision de los resultados de la PDA por parte de Interventoria	38 d	jue 19/01/23	sáb 4/03/23	$ 0	$ 0	$ 0
165		1.1.12.4.5	Entrega al IDU de los resultados de la PDA	2 d	sáb 4/03/23	mar 7/03/23	$ 0	$ 0	$ 0
166		1.1.13	fin Actividades de la PDA	0 d	mar 7/03/23	mar 7/03/23	$ 0	$ 0	$ 0
167		**1.1.14**	**CORRECCION YERROS TECNICOS**	**49 d**	**mar 2/05/23**	**sáb 1/07/23**	**$ 182.303.321**	**$ 182.303.321**	**$ 182.303.321**
168		1.1.14.1	Configuración Yerro Tecnico por parte del IDU	1 d	mar 2/05/23	mié 3/05/23	$ 2.071.629	$ 2.071.629	$ 2.071.629

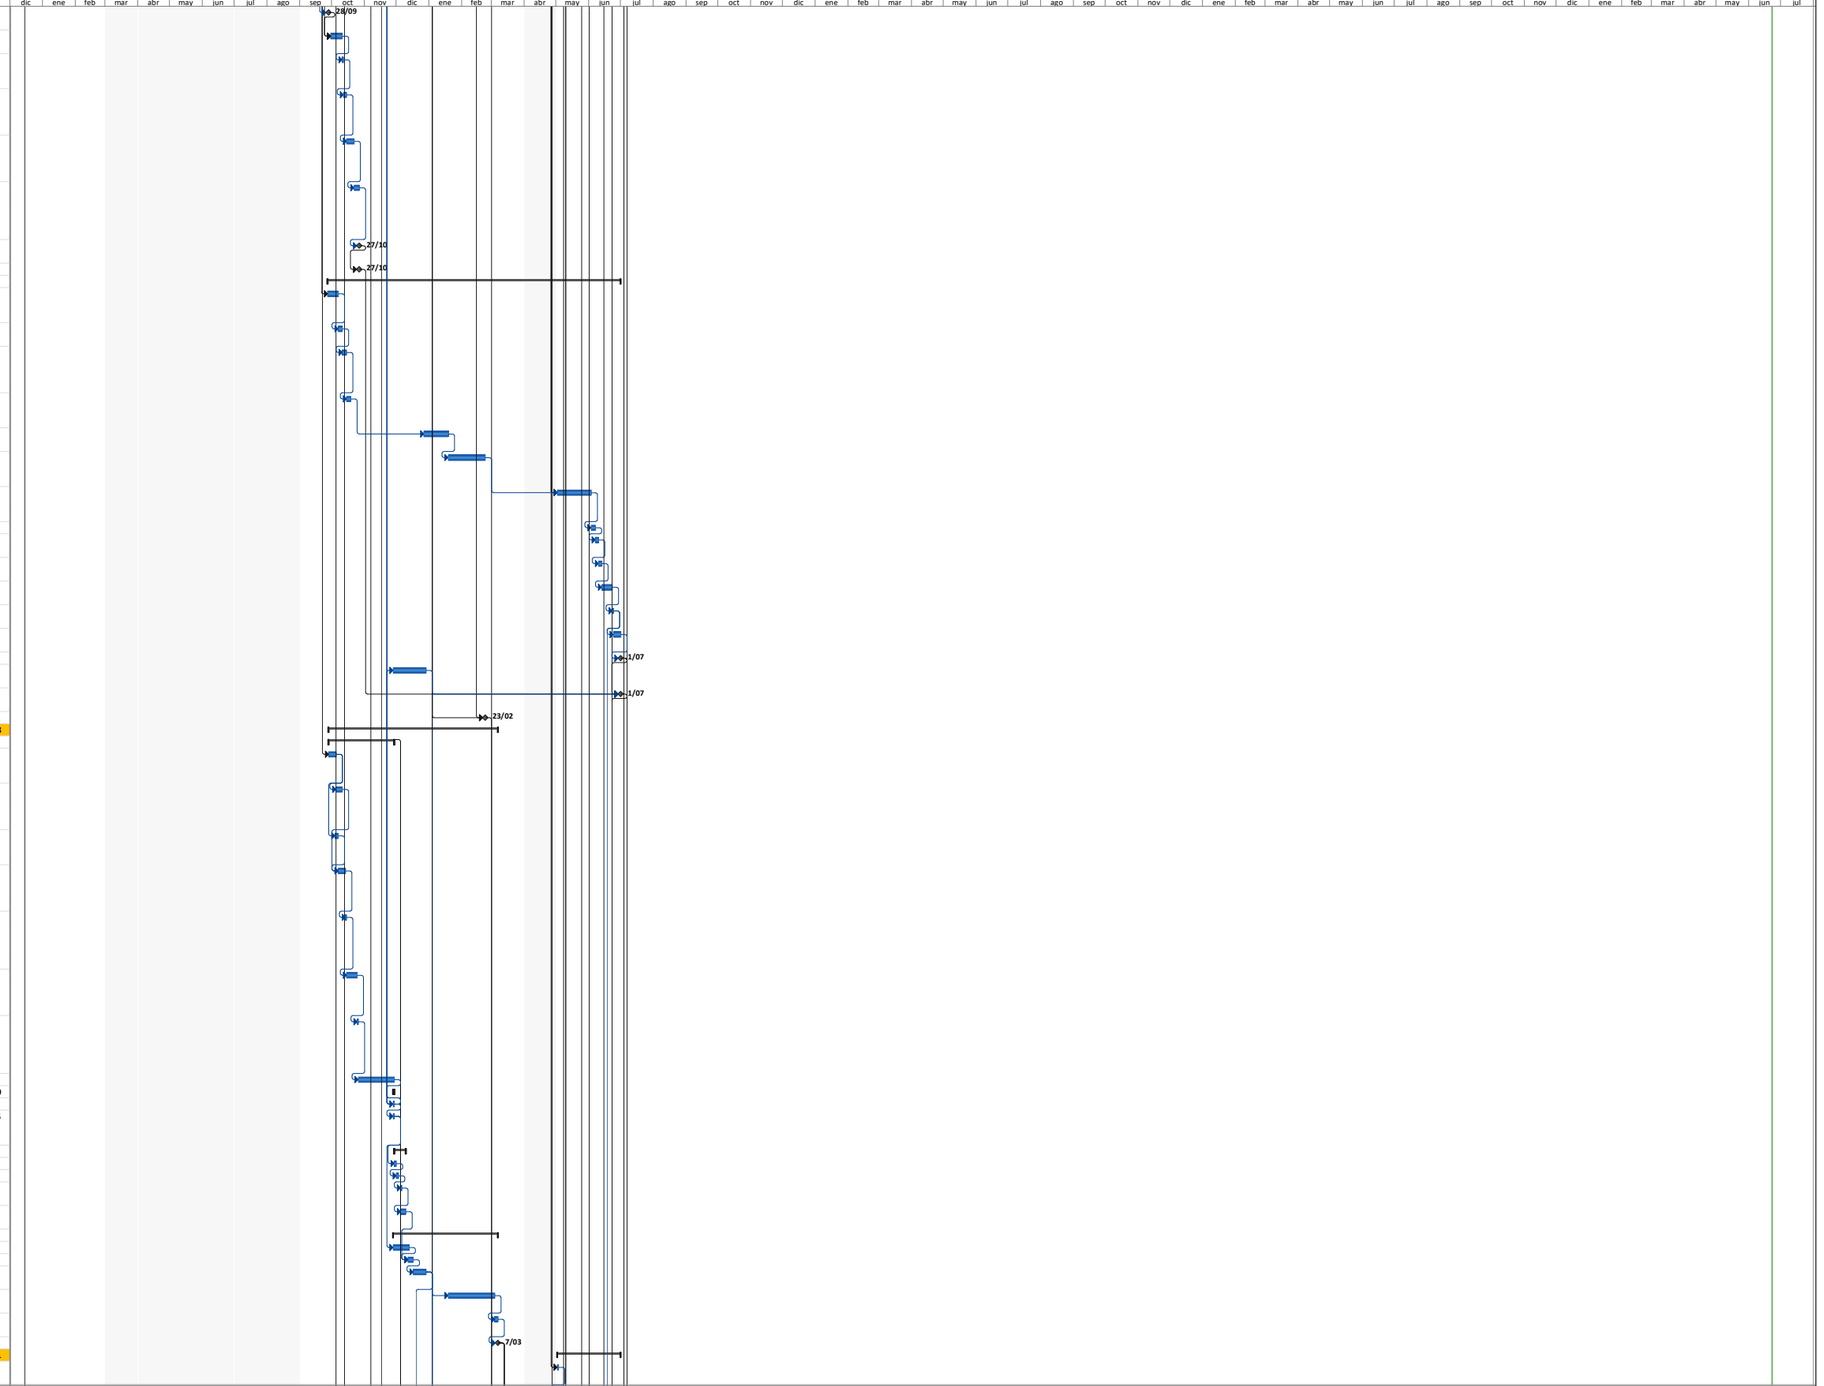

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | Sólo el comienzo | Fecha límite | División crítica | Progreso manual
División | Resumen | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo | Sólo duración | Resumen manual | Sólo fin | Tareas críticas | Progreso


Proyecto: IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB8-20221201
Fecha: mar 23/06/26

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
169		**1.1.14.2**	**Geotecnia**	**39 d**	**mié 3/05/23**	**mié 21/06/23**	**$ 80.793.531**	**$ 80.793.531**	**$ 80.793.531**
170		1.1.14.2.1	Entrega producto geotecnico	25 d	mié 3/05/23	vie 2/06/23	$ 51.790.725	$ 51.790.725	$ 51.790.725
171		1.1.14.2.2	Revisión parte de interventoria del producto geotecnico	5 d	vie 2/06/23	jue 8/06/23	$ 10.358.145	$ 10.358.145	$ 10.358.145
172		1.1.14.2.3	Atención de observaciones del producto geotecnico por parte del contratista	6 d	jue 8/06/23	vie 16/06/23	$ 12.429.774	$ 12.429.774	$ 12.429.774
173		1.1.14.2.4	Aprobacion por parte de interventoria del producto geotecnico	3 d	vie 16/06/23	mié 21/06/23	$ 6.214.887	$ 6.214.887	$ 6.214.887
174		1.1.14.3	Fin producto geotecnico	0 d	mié 21/06/23	mié 21/06/23	$ 0	$ 0	$ 0
175		**1.1.14.4**	**Estructuras**	**48 d**	**mié 3/05/23**	**sáb 1/07/23**	**$ 99.438.161**	**$ 99.438.161**	**$ 99.438.161**
176		**1.1.14.4.1**	**Cimentación**	**48 d**	**mié 3/05/23**	**sáb 1/07/23**	**$ 99.438.161**	**$ 99.438.161**	**$ 99.438.161**
177		1.1.14.4.1.1	Primer avance	41 d	mié 3/05/23	vie 23/06/23	$ 84.936.789	$ 84.936.789	$ 84.936.789
178		1.1.14.4.1.2	Revisión parte de interventoria del producto estructural	3 d	vie 23/06/23	mar 27/06/23	$ 6.214.887	$ 6.214.887	$ 6.214.887
179		1.1.14.4.1.3	Atención de observaciones del producto estructural por parte del contratista	2 d	mar 27/06/23	jue 29/06/23	$ 4.143.258	$ 4.143.258	$ 4.143.258
180		1.1.14.4.1.4	Aprobacion por parte de interventoria del producto estructural	2 d	jue 29/06/23	sáb 1/07/23	$ 4.143.227	$ 4.143.227	$ 4.143.227
181		1.1.14.4.2	Fin Cimentación	0 d	sáb 1/07/23	sáb 1/07/23	$ 0	$ 0	$ 0
182		1.1.14.5	Fin producto estructural	0 d	sáb 1/07/23	sáb 1/07/23	$ 0	$ 0	$ 0
183		1.1.15	Finalización corrección yerro tecnico	0 d	sáb 1/07/23	sáb 1/07/23	$ 0	$ 0	$ 0
184		1.1.16	Fin de Fase de Preliminares con traslapo	0 d	sáb 1/07/23	sáb 1/07/23	$ 0	$ 0	$ 0
185		1.1.17	Inicio Informe de Preliminares	12 d	sáb 17/12/22	sáb 31/12/22	$ 2.961.870	$ 2.961.870	$ 2.961.870
186		***1.2***	***fin de Preliminares***	***0 d***	***mié 28/12/22***	***mié 28/12/22***	***$ 0***	***$ 0***	***$ 0***
187		**1.3**	**FASE DE EJECUCIÓN**	**1035,25 d**	**jue 29/12/22**	**vie 31/07/26**	**$ 74.490.787.566**	**$ 69.833.834...**	**$ 70.929.544....**
188		**1.3.1**	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**	**139 d**	**sáb 24/06/23**	**mié 13/12/23**	**$ 45.944.259**	**$ 45.944.259**	**$ 45.897.496**
189		**1.3.1.1**	**ACTAS DE COMPETENCIAS**	**20 d**	**sáb 18/11/23**	**mié 13/12/23**	**$ 374.098**	**$ 374.098**	**$ 327.336**
190		1.3.1.1.1	Ajuste de actas de competencia ENEL (Modificaciones avaladas por las ESP)	10 d	sáb 18/11/23	jue 30/11/23	$ 46.762	$ 46.762	$ 46.762
191		1.3.1.1.2	Revision de actas de actas de competencia por parte de interventoria ENEL (Modificaciones avaladas por las ESP)	5 d	jue 30/11/23	mié 6/12/23	$ 23.381	$ 23.381	$ 23.381
192		1.3.1.1.3	Atencion de observaciones emitidas por interventoria a las actas de competencias ENEL	5 d	mié 6/12/23	mié 13/12/23	$ 23.381	$ 23.381	$ 23.381
193		1.3.1.1.4	Revisión, aval y firma IDU y ENEL	0 d	mié 13/12/23	mié 13/12/23	$ 0	$ 0	$ 0
194		1.3.1.1.5	Ajuste de actas de competencia ETB (Modificaciones avaladas por las ESP)	10 d	sáb 18/11/23	jue 30/11/23	$ 46.762	$ 46.762	$ 46.762
195		1.3.1.1.6	Revision de actas de actas de competencia por parte de interventoria ETB (Modificaciones avaladas por las ESP)	5 d	jue 30/11/23	mié 6/12/23	$ 23.381	$ 23.381	$ 23.381
196		1.3.1.1.7	Atencion de observaciones emitidas por interventoria a las actas de competencias ETB	5 d	mié 6/12/23	mié 13/12/23	$ 23.381	$ 23.381	$ 23.381
197		1.3.1.1.8	Revisión, aval y firma IDU y ETB	0 d	mié 13/12/23	mié 13/12/23	$ 0	$ 0	$ 0
198		1.3.1.1.9	Ajuste de actas de competencia VANTI (Modificaciones avaladas por las ESP)	10 d	sáb 18/11/23	jue 30/11/23	$ 46.762	$ 46.762	$ 46.762
199		1.3.1.1.10	Revision de actas de actas de competencia por parte de interventoria VANTI (Modificaciones avaladas por las ESP)	5 d	jue 30/11/23	mié 6/12/23	$ 23.381	$ 23.381	$ 23.381
200		1.3.1.1.11	Atencion de observaciones emitidas por interventoria a las actas de competencias VANTI	5 d	mié 6/12/23	mié 13/12/23	$ 23.381	$ 23.381	$ 23.381
201		1.3.1.1.12	Revisión, aval y firma IDU y VANTI	0 d	mié 13/12/23	mié 13/12/23	$ 0	$ 0	$ 0
202		1.3.1.1.13	Ajuste de actas de competencia EAAB (Modificaciones avaladas por las ESP)	10 d	sáb 18/11/23	jue 30/11/23	$ 46.762	$ 46.762	$ 46.762
203		1.3.1.1.14	Revision de actas de actas de competencia por parte de interventoria EAAB (Modificaciones avaladas por las ESP)	5 d	jue 30/11/23	mié 6/12/23	$ 23.381	$ 23.381	$ 0
204		1.3.1.1.15	Atencion de observaciones emitidas por interventoria a las actas de competencias EAAB	5 d	mié 6/12/23	mié 13/12/23	$ 23.381	$ 23.381	$ 0
205		1.3.1.1.16	Revisión, aval y firma IDU y EAAB	0 d	mié 13/12/23	mié 13/12/23	$ 0	$ 0	$ 0
206		1.3.1.2	Fin actas de competencias	0 d	mié 13/12/23	mié 13/12/23	$ 0	$ 0	$ 0
207		**1.3.1.3**	**PDT V8**	**8 d**	**sáb 18/11/23**	**mar 28/11/23**	**$ 1.439.600**	**$ 1.439.600**	**$ 1.439.600**
208		1.3.1.3.1	Atencion a observaciones y entrega de documento a la interventoria V8	5 d	sáb 18/11/23	vie 24/11/23	$ 899.750	$ 899.750	$ 899.750
209		1.3.1.3.2	Revision por parte de la interventoria y aprobacion del pdt final	3 d	vie 24/11/23	mar 28/11/23	$ 539.850	$ 539.850	$ 539.850
210		1.3.1.4	Fin PDT V8	0 d	mar 28/11/23	mar 28/11/23	$ 0	$ 0	$ 0
211		**1.3.1.5**	**PAC PDT V8**	**10 d**	**mar 28/11/23**	**lun 11/12/23**	**$ 435.079**	**$ 435.079**	**$ 435.079**
212		1.3.1.5.1	Elaboracion y entrega a la interventoria pac	4 d	mar 28/11/23	sáb 2/12/23	$ 174.032	$ 174.032	$ 174.032
213		1.3.1.5.2	revision del pac por parte de la interventoria y generacion de observaciones y comentarios	2 d	sáb 2/12/23	mar 5/12/23	$ 87.016	$ 87.016	$ 87.016
214		1.3.1.5.3	atencion a observaciones y entrega de documento a la interventoria	2 d	mar 5/12/23	jue 7/12/23	$ 87.016	$ 87.016	$ 87.016
215		1.3.1.5.4	revision por parte de la interventoria y aprobacion del pac	2 d	jue 7/12/23	lun 11/12/23	$ 87.016	$ 87.016	$ 87.016
216		1.3.1.6	Fin PAC PDT V8	0 d	lun 11/12/23	lun 11/12/23	$ 0	$ 0	$ 0
217		**1.3.1.7**	**PMT Autopista Norte**	**41,13 d**	**sáb 24/06/23**	**mar 15/08/23**	**$ 11.217.540**	**$ 11.217.540**	**$ 11.217.540**
218		1.3.1.7.1	Elaboracion de Plan de Manejo de Trafico (Autopista Norte)	15 d	sáb 24/06/23	jue 13/07/23	$ 3.891.442	$ 3.891.442	$ 3.891.442
219		1.3.1.7.2	Validación del Plan de Manejo de Trafico (Autopista Norte) por Parte de la Interventoria	5 d	jue 13/07/23	mié 19/07/23	$ 1.202.506	$ 1.202.506	$ 1.202.506
220		1.3.1.7.3	Revisión y Ajustes Necesarios por Observaciones al documento de parte de Interventoría (Autopista Norte)	7 d	mié 19/07/23	vie 28/07/23	$ 1.502.506	$ 1.502.506	$ 1.502.506
221		1.3.1.7.4	Presentacion y Revisión de documento (Autopista Norte) a Secretaria de Movilidad	5 d	vie 28/07/23	jue 3/08/23	$ 1.702.506	$ 1.702.506	$ 1.702.506
222		1.3.1.7.5	Revisión y Ajustes Necesarios por Observaciones de parte de Secretaría de Movilidad (SDM) (Autopista Norte)	7 d	jue 3/08/23	sáb 12/08/23	$ 2.432.151	$ 2.432.151	$ 2.432.151
223		1.3.1.7.6	Aprobación de PMT (Autopista Norte) por SDM	1 d	lun 14/08/23	mar 15/08/23	$ 486.430	$ 486.430	$ 486.430
224		1.3.1.8	Fin PMT Autopista Norte	0 d	mar 15/08/23	mar 15/08/23	$ 0	$ 0	$ 0
225		**1.3.1.9**	**PANTALLA DE PROTECCIÓN RED MATRIZ**	**40 d**	**sáb 1/07/23**	**mar 22/08/23**	**$ 32.477.941**	**$ 32.477.941**	**$ 32.477.941**
226		1.3.1.9.1	Ajuste de la pantalla de proteccion a la red matriz	22 d	sáb 1/07/23	sáb 29/07/23	$ 9.552.336	$ 9.552.336	$ 9.552.336
227		1.3.1.9.2	Revision por parte de interventoria al ajuste de la pantalla de proteccion a la red matriz	5 d	sáb 29/07/23	vie 4/08/23	$ 2.388.084	$ 2.388.084	$ 2.388.084
228		1.3.1.9.3	Atencion de observaciones emitidas por la interventoria al ajuste de la pantalla de proteccion a la red matriz	2 d	vie 4/08/23	mar 8/08/23	$ 6.209.018	$ 6.209.018	$ 6.209.018

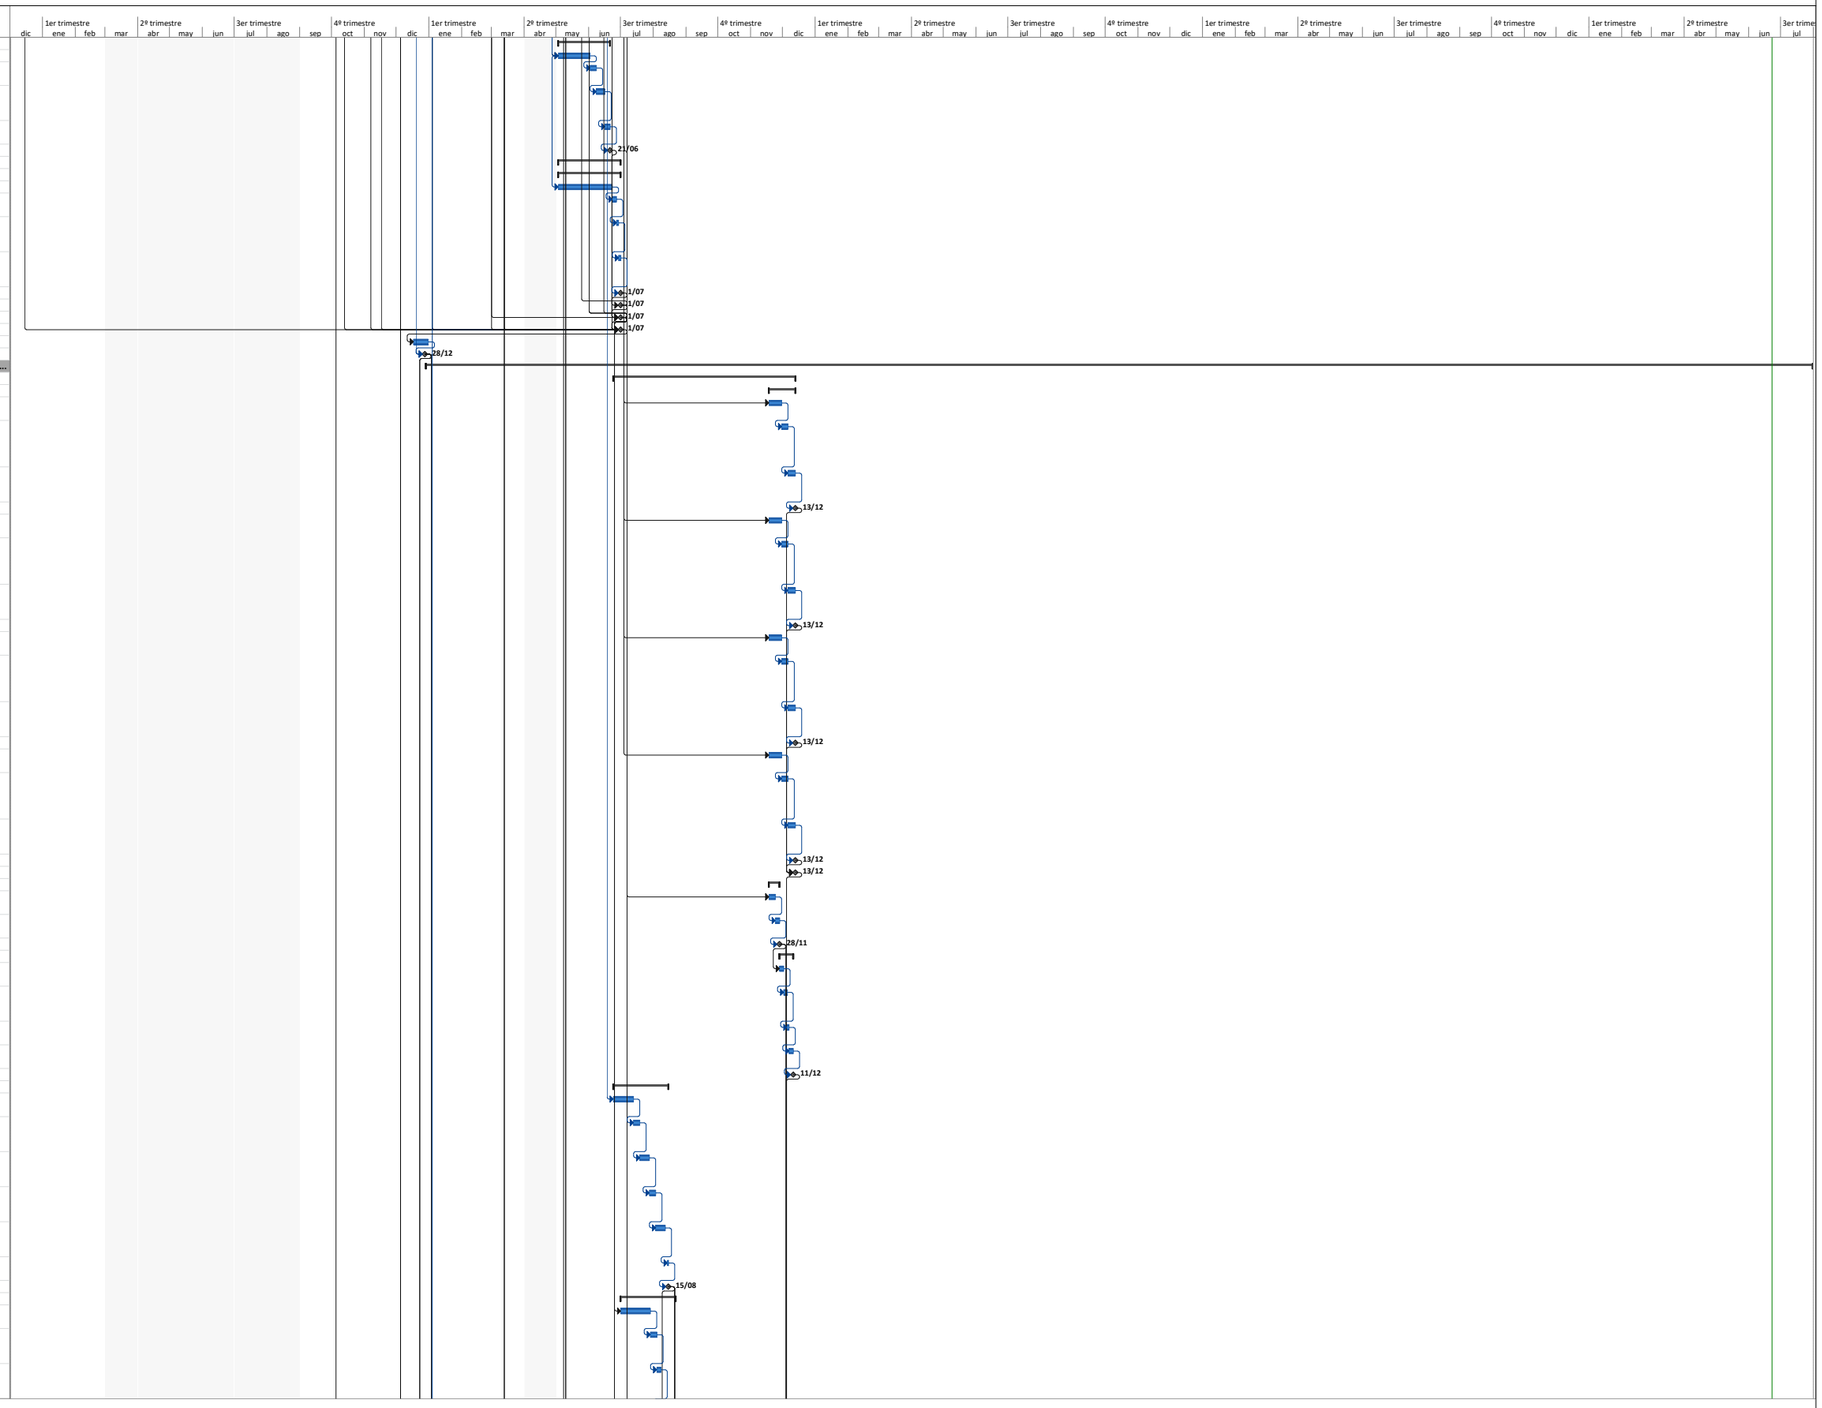

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | Sólo el comienzo | Fecha límite | División crítica | Progreso manual
División | Resumen | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo | Sólo duración | Resumen manual | Sólo fin | Tareas críticas | Progreso


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
229		1.3.1.9.4	No objeción EAAB del ajuste de la pantalla de proteccion a la red matriz	11 d	mar 8/08/23	mar 22/08/23	$ 14.328.503	$ 14.328.503	$ 14.328.503
230		1.3.1.10	Fin ajuste a la pantalla de protección red matriz	0 d	mar 22/08/23	mar 22/08/23	$ 0	$ 0	$ 0
231		1.3.1.11	Fin actividades complementarias	0 d	mié 13/12/23	mié 13/12/23	$ 0	$ 0	$ 0
232		1.3.2	Avales a terceros	2 d	jue 13/06/24	sáb 15/06/24	$ 43.562.560	$ 43.562.560	$ 43.562.560
233		1.3.3	Avales a terceros 2	156 d	mar 30/07/24	vie 14/02/25	$ 440.026	$ 0	$ 0
234		**1.3.4**	**ACTIVIDADES DE OBRA (A) Y ACTIVIDADES DE ACERO (F)**	**1032,25 d**	**jue 29/12/22**	**mar 28/07/26**	**$ 60.775.063.014**	**$ 59.081.507.6...**	**$ 57.585.553.246**
235		1.3.4.1	Replanteo General	24 d	jue 29/12/22	vie 27/01/23	$ 20.043.999	$ 20.043.999	$ 20.043.999
236		1.3.4.2	Intervención Silvicultural Etapa Inicial	24 d	jue 29/12/22	vie 27/01/23	$ 15.399.274	$ 15.399.274	$ 15.399.274
237		1.3.4.3	Intervención Silvicultural Etapa Inicial (Reinicio)	25 d	lun 29/05/23	jue 29/06/23	$ 2.818.850	$ 2.818.850	$ 2.818.850
238		1.3.4.4	Intervención Silvicultural Segunda Etapa	25 d	mar 15/08/23	jue 14/09/23	$ 9.135.163	$ 9.135.163	$ 9.135.163
239		**1.3.4.5**	**COSTADO ORIENTAL**	**986,88 d**	**mar 21/02/23**	**mar 28/07/26**	**$ 14.549.043.488**	**$ 13.738.742....**	**$ 13.175.227....**
240		**1.3.4.5.1**	**APROCHE ORIENTAL**	**942,38 d**	**mar 21/02/23**	**lun 1/06/26**	**$ 3.702.265.242**	**$ 3.702.265....**	**$ 3.702.265.242**
241		1.3.4.5.1.1	APROBACIÓN PMT DESVÍO ORIENTA	0 d	mié 9/07/25	mié 9/07/25	$ 0	$ 0	$ 0
242		1.3.4.5.1.2	IMPLEMENTACIÓN DESVÍO SEMAFÓRICO	0 d	sáb 16/08/25	sáb 16/08/25	$ 0	$ 0	$ 0
243		1.3.4.5.1.3	Demolición	5 d	jue 14/03/24	mié 20/03/24	$ 1.135.018	$ 1.135.018	$ 1.135.018
244		**1.3.4.5.1.4**	**EJE 1-2**	**506,5 d**	**lun 11/03/24**	**lun 24/11/25**	**$ 262.587.957**	**$ 262.587.957**	**$ 262.587.957**
245		1.3.4.5.1.4.1	Excavación	3 d	lun 11/03/24	jue 14/03/24	$ 1.648.372	$ 1.648.372	$ 1.648.372
246		1.3.4.5.1.4.2	Pilotes FDP	2 d	lun 12/08/24	mié 14/08/24	$ 31.000.000	$ 31.000.000	$ 31.000.000
247		1.3.4.5.1.4.3	CAPA DE TRANSFERENCIA	5 d	mié 9/10/24	mié 16/10/24	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
248		1.3.4.5.1.4.4	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	5 d	mié 9/10/24	mié 16/10/24	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
249		**1.3.4.5.1.4.5**	**Estructura**	**320,75 d**	**sáb 19/10/24**	**sáb 15/11/25**	**$ 36.392.044**	**$ 36.392.044**	**$ 36.392.044**
250		**1.3.4.5.1.4.5**	**Zapatas**	**7 d**	**sáb 19/10/24**	**lun 28/10/24**	**$ 14.154.985**	**$ 14.154.985**	**$ 14.154.985**
251		1.3.4.5.1.4.5	Solado	2 d	sáb 19/10/24	mar 22/10/24	$ 24.985	$ 24.985	$ 24.985
252		1.3.4.5.1.4.5	Acero	2 d	mar 22/10/24	jue 24/10/24	$ 7.800.000	$ 7.800.000	$ 7.800.000
253		1.3.4.5.1.4.5	Concreto	3 d	jue 24/10/24	lun 28/10/24	$ 6.330.000	$ 6.330.000	$ 6.330.000
254		**1.3.4.5.1.4.5**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**mar 22/10/24**	**jue 31/10/24**	**$ 4.536.649**	**$ 4.536.649**	**$ 4.536.649**
255		1.3.4.5.1.4.5	Acero	3 d	mar 22/10/24	vie 25/10/24	$ 2.004.649	$ 2.004.649	$ 2.004.649
256		1.3.4.5.1.4.5	Concreto	5 d	vie 25/10/24	jue 31/10/24	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
257		**1.3.4.5.1.4.5**	**Columnas**	**18 d**	**mar 22/10/24**	**vie 15/11/24**	**$ 6.016.710**	**$ 6.016.710**	**$ 6.016.710**
258		1.3.4.5.1.4.5	Acero	4 d	mar 22/10/24	sáb 26/10/24	$ 3.484.710	$ 3.484.710	$ 3.484.710
259		1.3.4.5.1.4.5	Concreto	10 d	vie 1/11/24	vie 15/11/24	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
260		**1.3.4.5.1.4.5**	**Vigas Longitudinales**	**19 d**	**mar 14/10/25**	**jue 6/11/25**	**$ 5.204.860**	**$ 5.204.860**	**$ 5.204.860**
261		1.3.4.5.1.4.5	Acero	7 d	mar 14/10/25	mié 22/10/25	$ 2.672.860	$ 2.672.860	$ 2.672.860
262		1.3.4.5.1.4.5	Concreto	12 d	mié 22/10/25	jue 6/11/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
263		**1.3.4.5.1.4.5**	**Vigas Transversales**	**19 d**	**mié 22/10/25**	**sáb 15/11/25**	**$ 6.478.840**	**$ 6.478.840**	**$ 6.478.840**
264		1.3.4.5.1.4.5	Acero	7 d	mié 22/10/25	jue 30/10/25	$ 3.946.840	$ 3.946.840	$ 3.946.840
265		1.3.4.5.1.4.5	Concreto	12 d	jue 30/10/25	sáb 15/11/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
266		**1.3.4.5.1.4.6**	**Tierra Armada**	**71 d**	**lun 21/07/25**	**sáb 18/10/25**	**$ 141.479.110**	**$ 141.479.110**	**$ 141.479.110**
267		1.3.4.5.1.4.6	RELLENO CON GEOBLOQUE 1	44 d	lun 21/07/25	lun 15/09/25	$ 93.372.750	$ 93.372.750	$ 93.372.750
268		1.3.4.5.1.4.6	RELLENO CON GEOBLOQUE 2	27 d	lun 15/09/25	sáb 18/10/25	$ 48.106.360	$ 48.106.360	$ 48.106.360
269		**1.3.4.5.1.4.7**	**Fachada en Mampostería**	**255 d**	**jue 2/01/25**	**lun 24/11/25**	**$ 48.485.515**	**$ 48.485.515**	**$ 48.485.515**
270		**1.3.4.5.1.4.7**	**Dobelas**	**1 d**	**jue 2/01/25**	**jue 2/01/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
271		1.3.4.5.1.4.7	Acero	1 d	jue 2/01/25	jue 2/01/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
272		**1.3.4.5.1.4.7**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**2 d**	**vie 3/01/25**	**mar 7/01/25**	**$ 13.368.121**	**$ 13.368.121**	**$ 13.368.121**
273		1.3.4.5.1.4.7	Concreto	1 d	sáb 4/01/25	mar 7/01/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
274		1.3.4.5.1.4.7	Bloque en Concreto	2 d	vie 3/01/25	mar 7/01/25	$ 10.829.876	$ 10.829.876	$ 10.829.876
275		**1.3.4.5.1.4.7**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**216 d**	**mié 15/01/25**	**vie 17/10/25**	**$ 6.245**	**$ 6.245**	**$ 6.245**
276		1.3.4.5.1.4.7	Concreto	215 d	jue 16/01/25	vie 17/10/25	$ 6.245	$ 6.245	$ 6.245
277		1.3.4.5.1.4.7	Bloque en Concreto	4 d	mié 15/01/25	lun 20/01/25	$ 0	$ 0	$ 0
278		**1.3.4.5.1.4.7**	**Viga de Amarre**	**232 d**	**mar 7/01/25**	**mar 28/10/25**	**$ 732.912**	**$ 732.912**	**$ 732.912**
279		1.3.4.5.1.4.7	Acero	225 d	mar 7/01/25	lun 20/10/25	$ 99.912	$ 99.912	$ 99.912
280		1.3.4.5.1.4.7	Concreto	230 d	jue 9/01/25	mar 28/10/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
281		1.3.4.5.1.4.7	Losa de aproximación	6 d	sáb 15/11/25	lun 24/11/25	$ 32.648.372	$ 32.648.372	$ 32.648.372
282		1.3.4.5.1.5	Fin de Eje 1-2	0 d	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
283		**1.3.4.5.1.6**	**EJE 2-3**	**741,5 d**	**mar 7/03/23**	**sáb 22/11/25**	**$ 229.549.759**	**$ 229.549.759**	**$ 229.549.759**
284		1.3.4.5.1.6.1	Excavación N: -1.2 m	3 d	mar 7/03/23	vie 10/03/23	$ 461.544	$ 461.544	$ 461.544
285		1.3.4.5.1.6.2	Excavación N:-4.5 m	3 d	lun 11/03/24	jue 14/03/24	$ 1.186.828	$ 1.186.828	$ 1.186.828
286		1.3.4.5.1.6.3	Pilotes FDP	2 d	mié 14/08/24	vie 16/08/24	$ 31.000.000	$ 31.000.000	$ 31.000.000
287		1.3.4.5.1.6.4	CAPA DE TRANSFERENCIA	5 d	mié 9/10/24	mié 16/10/24	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
288		1.3.4.5.1.6.5	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	5 d	mié 9/10/24	mié 16/10/24	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
289		**1.3.4.5.1.6.6**	**Estructura**	**308,75 d**	**mar 22/10/24**	**sáb 22/11/25**	**$ 36.616.860**	**$ 36.616.860**	**$ 36.616.860**
290		**1.3.4.5.1.6.6**	**Zapatas**	**7 d**	**mar 22/10/24**	**mié 30/10/24**	**$ 14.154.985**	**$ 14.154.985**	**$ 14.154.985**
291		1.3.4.5.1.6.6	Solado	2 d	mar 22/10/24	jue 24/10/24	$ 24.985	$ 24.985	$ 24.985
292		1.3.4.5.1.6.6	Acero	2 d	jue 24/10/24	sáb 26/10/24	$ 7.800.000	$ 7.800.000	$ 7.800.000
293		1.3.4.5.1.6.6	Concreto	3 d	lun 28/10/24	mié 30/10/24	$ 6.330.000	$ 6.330.000	$ 6.330.000
294		**1.3.4.5.1.6.6**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**jue 24/10/24**	**mar 5/11/24**	**$ 4.499.175**	**$ 4.499.175**	**$ 4.499.175**
295		1.3.4.5.1.6.6	Acero	3 d	jue 24/10/24	lun 28/10/24	$ 1.967.175	$ 1.967.175	$ 1.967.175
296		1.3.4.5.1.6.6	Concreto	5 d	mar 29/10/24	mar 5/11/24	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
297		**1.3.4.5.1.6.6**	**Columnas**	**18 d**	**jue 24/10/24**	**lun 18/11/24**	**$ 5.972.995**	**$ 5.972.995**	**$ 5.972.995**
298		1.3.4.5.1.6.6	Acero	7 d	jue 24/10/24	vie 1/11/24	$ 3.440.995	$ 3.440.995	$ 3.440.995
299		1.3.4.5.1.6.6	Concreto	10 d	mar 5/11/24	lun 18/11/24	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
300		**1.3.4.5.1.6.6**	**Vigas Longitudinales**	**17 d**	**jue 30/10/25**	**sáb 22/11/25**	**$ 5.286.045**	**$ 5.286.045**	**$ 5.286.045**
301		1.3.4.5.1.6.6	Acero	7 d	jue 30/10/25	lun 10/11/25	$ 2.754.045	$ 2.754.045	$ 2.754.045
302		1.3.4.5.1.6.6	Concreto	10 d	lun 10/11/25	sáb 22/11/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
303		**1.3.4.5.1.6.6**	**Vigas Transversales**	**24 d**	**mié 22/10/25**	**sáb 22/11/25**	**$ 6.703.660**	**$ 6.703.660**	**$ 6.703.660**
304		1.3.4.5.1.6.6	Acero	3 d	mié 22/10/25	sáb 25/10/25	$ 4.171.660	$ 4.171.660	$ 4.171.660
305		1.3.4.5.1.6.6	Concreto	10 d	lun 10/11/25	sáb 22/11/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
306		**1.3.4.5.1.6.7**	**Tierra Armada**	**71 d**	**jue 24/07/25**	**mié 22/10/25**	**$ 141.479.110**	**$ 141.479.110**	**$ 141.479.110**
307		1.3.4.5.1.6.7	RELLENO CON GEOBLOQUE	41 d	jue 24/07/25	lun 15/09/25	$ 78.347.250	$ 78.347.250	$ 78.347.250
308		1.3.4.5.1.6.7	RELLENO CON GEOBLOQUE 2	30 d	lun 15/09/25	mié 22/10/25	$ 63.131.860	$ 63.131.860	$ 63.131.860
309		**1.3.4.5.1.6.8**	**Fachada en Mampostería**	**241 d**	**jue 12/12/24**	**vie 17/10/25**	**$ 15.222.501**	**$ 15.222.501**	**$ 15.222.501**
310		**1.3.4.5.1.6.8**	**Dobelas**	**1 d**	**jue 12/12/24**	**vie 13/12/24**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
311		1.3.4.5.1.6.8	Acero	1 d	jue 12/12/24	vie 13/12/24	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
312		**1.3.4.5.1.6.8**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**2 d**	**vie 20/12/24**	**lun 23/12/24**	**$ 13.199.121**	**$ 13.199.121**	**$ 13.199.121**
313		1.3.4.5.1.6.8	Concreto	1 d	lun 23/12/24	lun 23/12/24	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
314		1.3.4.5.1.6.8	Bloque en Concreto	2 d	vie 20/12/24	lun 23/12/24	$ 10.660.876	$ 10.660.876	$ 10.660.876
315		**1.3.4.5.1.6.8**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**226 d**	**jue 2/01/25**	**vie 17/10/25**	**$ 174.860**	**$ 174.860**	**$ 174.860**
316		1.3.4.5.1.6.8	Concreto	225 d	vie 3/01/25	vie 17/10/25	$ 174.860	$ 174.860	$ 174.860
317		1.3.4.5.1.6.8	Bloque enconcreto	225 d	jue 2/01/25	jue 16/10/25	$ 0	$ 0	$ 0
318		**1.3.4.5.1.6.8**	**Viga de Amarre**	**226 d**	**mar 24/12/24**	**jue 9/10/25**	**$ 118.655**	**$ 118.655**	**$ 118.655**
319		1.3.4.5.1.6.8	Acero	225 d	mar 24/12/24	mié 8/10/25	$ 118.655	$ 118.655	$ 118.655
320		1.3.4.5.1.6.8	Concreto	225 d	mar 24/12/24	jue 9/10/25	$ 0	$ 0	$ 0
321		1.3.4.5.1.7	Fin de Eje 2-3	0 d	sáb 22/11/25	sáb 22/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
322		**1.3.4.5.1.8**	**EJE 3-4**	**750,25 d**	**vie 3/03/23**	**sáb 29/11/25**	**$ 230.814.989**	**$ 230.814.989**	**$ 230.814.989**
323		1.3.4.5.1.8.1	Excavación N: -1.2 m	3 d	vie 3/03/23	mar 7/03/23	$ 478.028	$ 478.028	$ 478.028
324		1.3.4.5.1.8.2	Excavación N:-4.5 m	3 d	jue 7/03/24	lun 11/03/24	$ 1.170.344	$ 1.170.344	$ 1.170.344
325		1.3.4.5.1.8.3	Pilotes FDP	2 d	mié 14/08/24	vie 16/08/24	$ 31.000.000	$ 31.000.000	$ 31.000.000
326		1.3.4.5.1.8.4	CAPA DE TRANSFERENCIA	3 d	mié 9/10/24	sáb 12/10/24	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
327		1.3.4.5.1.8.5	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	3 d	mié 9/10/24	sáb 12/10/24	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
328		**1.3.4.5.1.8.6**	**Estructura**	**314,75 d**	**mar 22/10/24**	**sáb 29/11/25**	**$ 36.997.805**	**$ 36.997.805**	**$ 36.997.805**
329		**1.3.4.5.1.8.6**	**Zapatas**	**7 d**	**mar 22/10/24**	**mié 30/10/24**	**$ 14.154.985**	**$ 14.154.985**	**$ 14.154.985**
330		1.3.4.5.1.8.6	Solado	2 d	mar 22/10/24	jue 24/10/24	$ 24.985	$ 24.985	$ 24.985
331		1.3.4.5.1.8.6	Acero	2 d	jue 24/10/24	sáb 26/10/24	$ 7.800.000	$ 7.800.000	$ 7.800.000
332		1.3.4.5.1.8.6	Concreto	3 d	lun 28/10/24	mié 30/10/24	$ 6.330.000	$ 6.330.000	$ 6.330.000
333		**1.3.4.5.1.8.6**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**jue 24/10/24**	**mar 5/11/24**	**$ 4.761.465**	**$ 4.761.465**	**$ 4.761.465**
334		1.3.4.5.1.8.6	Acero	3 d	jue 24/10/24	lun 28/10/24	$ 2.229.465	$ 2.229.465	$ 2.229.465
335		1.3.4.5.1.8.6	Concreto	5 d	mar 29/10/24	mar 5/11/24	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
336		**1.3.4.5.1.8.6**	**Columnas**	**13 d**	**jue 24/10/24**	**mar 12/11/24**	**$ 6.010.465**	**$ 6.010.465**	**$ 6.010.465**

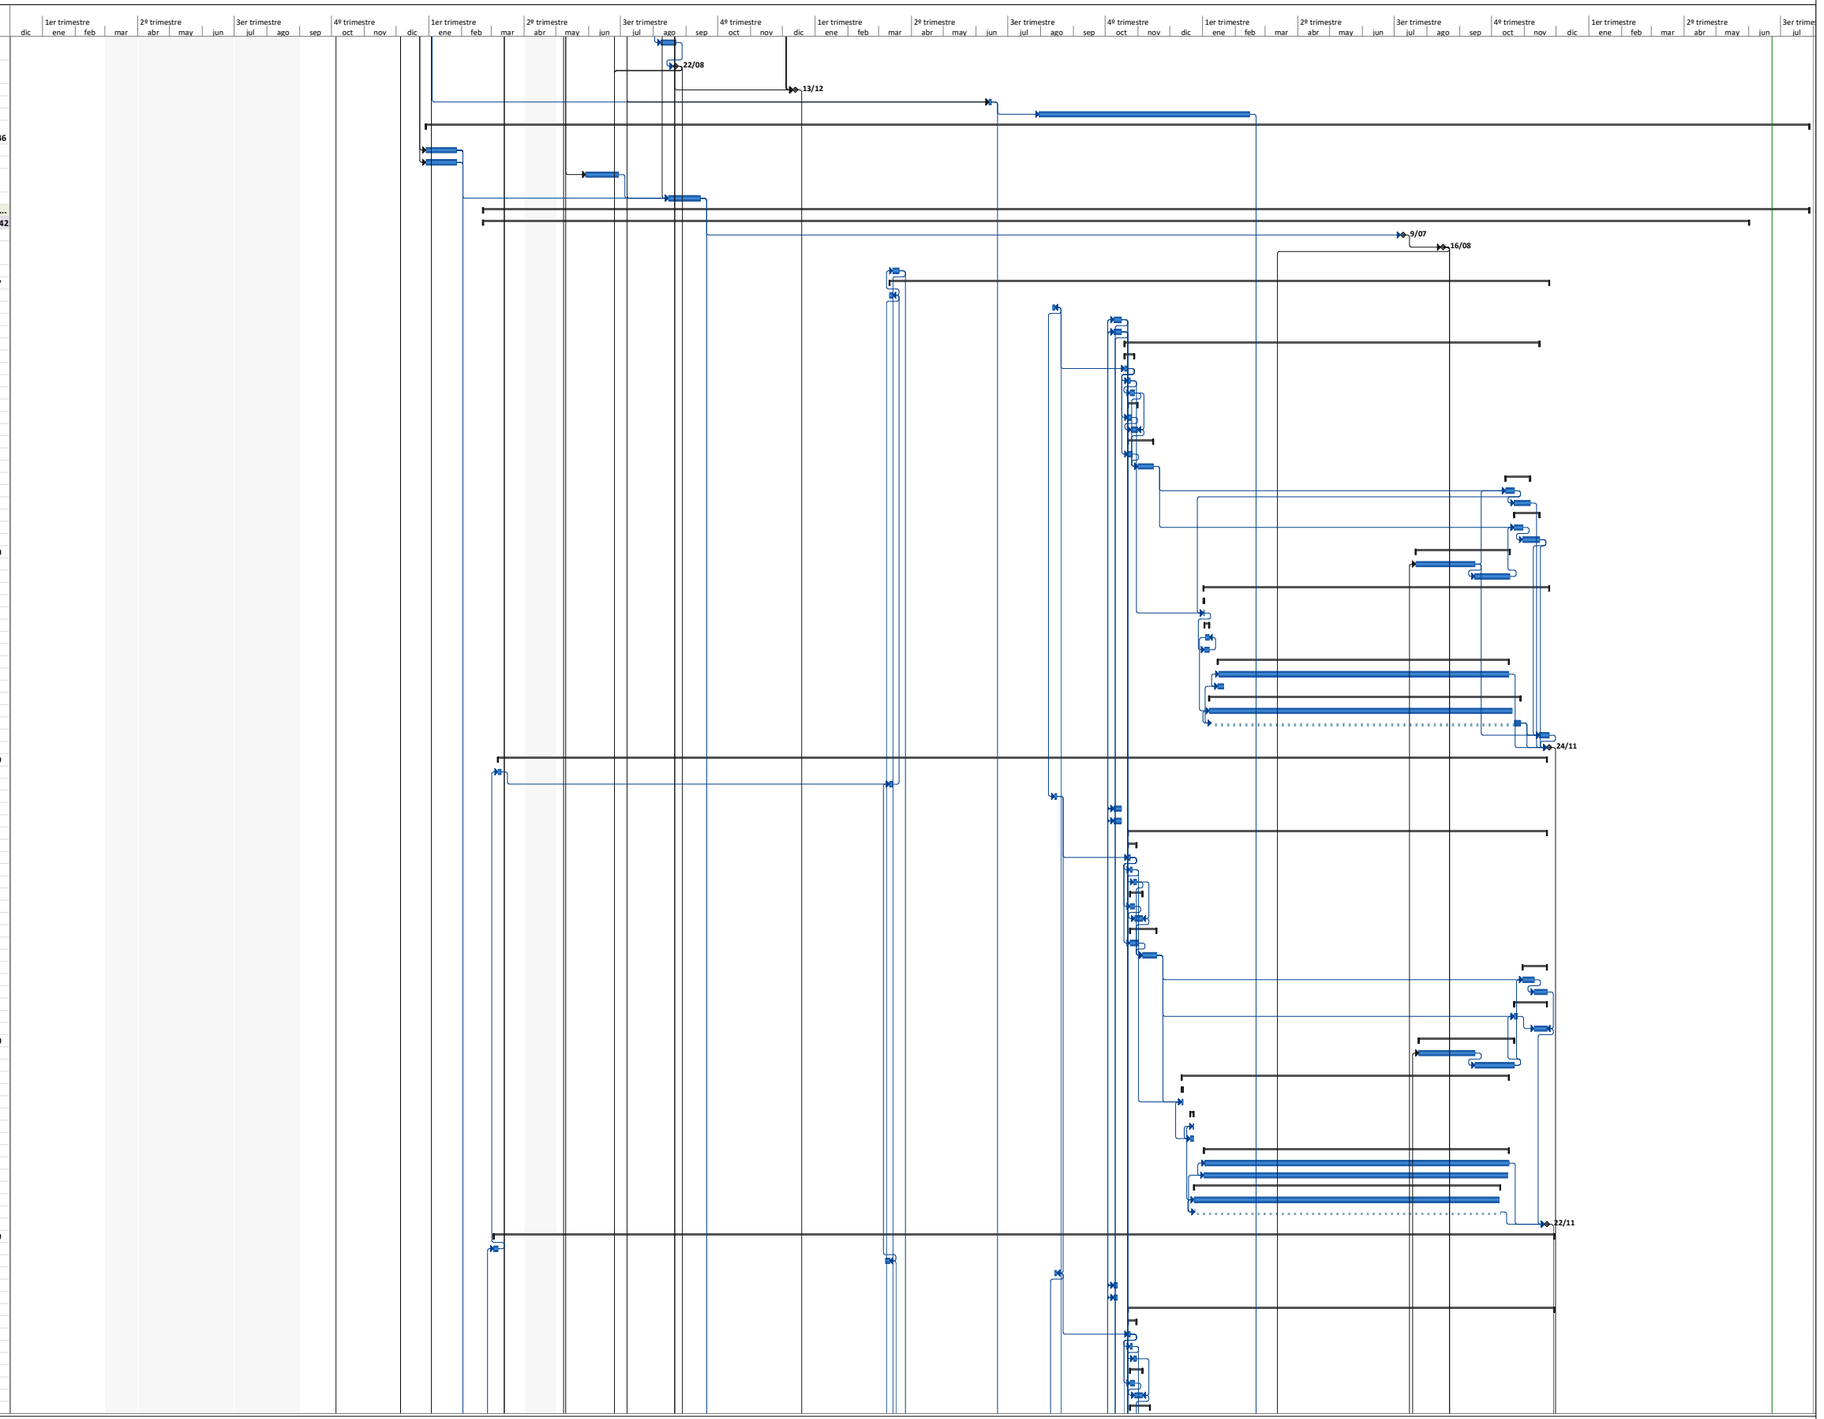

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito externo · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · Sólo el comienzo · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo · Sólo duración · Resumen manual · Sólo fin · Tareas críticas · Progreso

Proyecto: IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB8-20221201
Fecha: mar 23/06/26


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
337		1.3.4.5.1.8.6	Acero	3 d	jue 24/10/24	lun 28/10/24	$ 3.478.465	$ 3.478.465	$ 3.478.465
338		1.3.4.5.1.8.6	Concreto	5 d	mar 5/11/24	mar 12/11/24	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
339		**1.3.4.5.1.8.6**	**Vigas Longitudinales**	**17 d**	**vie 7/11/25**	**vie 28/11/25**	**$ 5.642.010**	**$ 5.642.010**	**$ 5.642.010**
340		1.3.4.5.1.8.6	Acero	7 d	vie 7/11/25	sáb 15/11/25	$ 3.110.010	$ 3.110.010	$ 3.110.010
341		1.3.4.5.1.8.6	Concreto	10 d	sáb 15/11/25	vie 28/11/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
342		**1.3.4.5.1.8.6**	**Vigas Transversales**	**17 d**	**sáb 8/11/25**	**sáb 29/11/25**	**$ 6.428.880**	**$ 6.428.880**	**$ 6.428.880**
343		1.3.4.5.1.8.6	Acero	7 d	sáb 8/11/25	mar 18/11/25	$ 3.896.880	$ 3.896.880	$ 3.896.880
344		1.3.4.5.1.8.6	Concreto	10 d	mar 18/11/25	sáb 29/11/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
345		**1.3.4.5.1.8.7**	**Tierra Armada**	**81 d**	**jue 24/07/25**	**mar 4/11/25**	**$ 141.479.110**	**$ 141.479.110**	**$ 141.479.110**
346		1.3.4.5.1.8.7	RELLENO CON GEOBLOQUE	41 d	jue 24/07/25	lun 15/09/25	$ 82.436.200	$ 82.436.200	$ 82.436.200
347		1.3.4.5.1.8.7	RELLENO CON GEOBLOQUE 2	40 d	lun 15/09/25	mar 4/11/25	$ 59.042.910	$ 59.042.910	$ 59.042.910
348		**1.3.4.5.1.8.8**	**Fachada en Mamposteria**	**225 d**	**mar 17/12/24**	**mié 1/10/25**	**$ 16.106.786**	**$ 16.106.786**	**$ 16.106.786**
349		**1.3.4.5.1.8.8**	**Dobelas**	**1 d**	**mar 17/12/24**	**mié 18/12/24**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
350		1.3.4.5.1.8.8	Acero	1 d	mar 17/12/24	mié 18/12/24	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
351		**1.3.4.5.1.8.8**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**2 d**	**mié 18/12/24**	**vie 20/12/24**	**$ 12.861.121**	**$ 12.861.121**	**$ 12.861.121**
352		1.3.4.5.1.8.8	Concreto	1 d	jue 19/12/24	vie 20/12/24	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
353		1.3.4.5.1.8.8	Bloque en Concreto	2 d	mié 18/12/24	vie 20/12/24	$ 10.322.876	$ 10.322.876	$ 10.322.876
354		**1.3.4.5.1.8.8**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**218 d**	**jue 26/12/24**	**mié 1/10/25**	**$ 789.125**	**$ 789.125**	**$ 789.125**
355		1.3.4.5.1.8.8	Concreto	2 d	mar 30/09/25	mié 1/10/25	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
356		1.3.4.5.1.8.8	Bloque en Concreto	218 d	jue 26/12/24	mié 1/10/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
357		**1.3.4.5.1.8.8**	**Viga de Amarre**	**3 d**	**jue 19/12/24**	**lun 23/12/24**	**$ 726.675**	**$ 726.675**	**$ 726.675**
358		1.3.4.5.1.8.8	Acero	2 d	vie 20/12/24	lun 23/12/24	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
359		1.3.4.5.1.8.8	Concreto	3 d	jue 19/12/24	lun 23/12/24	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
360		1.3.4.5.1.9	Fin de Eje 3-4	0 d	sáb 29/11/25	sáb 29/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
361		**1.3.4.5.1.10**	**EJE 4-5**	**756,25 d**	**mar 28/02/23**	**mié 3/12/25**	**$ 230.390.329**	**$ 230.390.329**	**$ 230.390.329**
362		1.3.4.5.1.10	Excavación N: -1.2 m	3 d	mar 28/02/23	vie 3/03/23	$ 560.447	$ 560.447	$ 560.447
363		1.3.4.5.1.10	Excavación N:-4.5 m	3 d	jue 7/03/24	lun 11/03/24	$ 1.087.926	$ 1.087.926	$ 1.087.926
364		1.3.4.5.1.10	Pilotes FDP	2 d	vie 16/08/24	mar 20/08/24	$ 31.000.000	$ 31.000.000	$ 31.000.000
365		1.3.4.5.1.10	CAPA DE TRANSFERENCIA	10,75 d	mié 9/10/24	mar 22/10/24	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
366		1.3.4.5.1.10	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	10,75 d	mié 9/10/24	mar 22/10/24	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
367		**1.3.4.5.1.10**	**Estructura**	**316 d**	**jue 24/10/24**	**mié 3/12/25**	**$ 36.573.145**	**$ 36.573.145**	**$ 36.573.145**
368		**1.3.4.5.1.10**	**Zapatas**	**7 d**	**jue 24/10/24**	**vie 1/11/24**	**$ 14.154.985**	**$ 14.154.985**	**$ 14.154.985**
369		1.3.4.5.1.10	Solado	2 d	jue 24/10/24	sáb 26/10/24	$ 24.985	$ 24.985	$ 24.985
370		1.3.4.5.1.10	Acero	2 d	sáb 26/10/24	mar 29/10/24	$ 7.800.000	$ 7.800.000	$ 7.800.000
371		1.3.4.5.1.10	Concreto	3 d	mar 29/10/24	vie 1/11/24	$ 6.330.000	$ 6.330.000	$ 6.330.000
372		**1.3.4.5.1.10**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**sáb 26/10/24**	**mié 6/11/24**	**$ 4.624.075**	**$ 4.624.075**	**$ 4.624.075**
373		1.3.4.5.1.10	Acero	3 d	sáb 26/10/24	mié 30/10/24	$ 2.092.075	$ 2.092.075	$ 2.092.075
374		1.3.4.5.1.10	Concreto	5 d	mié 30/10/24	mié 6/11/24	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
375		**1.3.4.5.1.10**	**Columnas**	**13 d**	**sáb 26/10/24**	**jue 14/11/24**	**$ 6.004.220**	**$ 6.004.220**	**$ 6.004.220**
376		1.3.4.5.1.10	Acero	3 d	sáb 26/10/24	mié 30/10/24	$ 3.472.220	$ 3.472.220	$ 3.472.220
377		1.3.4.5.1.10	Concreto	5 d	jue 7/11/24	jue 14/11/24	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
378		**1.3.4.5.1.10**	**Vigas Longitudinales**	**14 d**	**sáb 15/11/25**	**mié 3/12/25**	**$ 5.229.840**	**$ 5.229.840**	**$ 5.229.840**
379		1.3.4.5.1.10	Acero	4 d	sáb 15/11/25	vie 21/11/25	$ 2.697.840	$ 2.697.840	$ 2.697.840
380		1.3.4.5.1.10	Concreto	10 d	vie 21/11/25	mié 3/12/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
381		**1.3.4.5.1.10**	**Vigas Transversales**	**20 d**	**sáb 8/11/25**	**mié 3/12/25**	**$ 6.560.025**	**$ 6.560.025**	**$ 6.560.025**
382		1.3.4.5.1.10	Acero	4 d	sáb 8/11/25	jue 13/11/25	$ 4.028.025	$ 4.028.025	$ 4.028.025
383		1.3.4.5.1.10	Concreto	10 d	vie 21/11/25	mié 3/12/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
384		**1.3.4.5.1.10**	**Tierra Armada**	**87 d**	**jue 24/07/25**	**mié 12/11/25**	**$ 141.479.110**	**$ 141.479.110**	**$ 141.479.110**
385		1.3.4.5.1.10	RELLENO CON GEOBLOQUE	41 d	jue 24/07/25	lun 15/09/25	$ 77.083.200	$ 77.083.200	$ 77.083.200
386		1.3.4.5.1.10	RELLENO CON GEOBLOQUE 2	46 d	lun 15/09/25	mié 12/11/25	$ 64.395.910	$ 64.395.910	$ 64.395.910
387		**1.3.4.5.1.10**	**Fachada en Mamposteria**	**230 d**	**vie 6/12/24**	**vie 26/09/25**	**$ 16.106.786**	**$ 16.106.786**	**$ 16.106.786**
388		**1.3.4.5.1.10**	**Dobelas**	**1 d**	**vie 6/12/24**	**vie 6/12/24**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
389		1.3.4.5.1.10	Acero	1 d	vie 6/12/24	vie 6/12/24	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
390		**1.3.4.5.1.10**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**3 d**	**sáb 7/12/24**	**mié 11/12/24**	**$ 12.861.121**	**$ 12.861.121**	**$ 12.861.121**
391		1.3.4.5.1.10	Concreto	1 d	mar 10/12/24	mié 11/12/24	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
392		1.3.4.5.1.10	Bloque en Concreto	2 d	sáb 7/12/24	mar 10/12/24	$ 10.322.876	$ 10.322.876	$ 10.322.876
393		**1.3.4.5.1.10**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**217 d**	**lun 16/12/24**	**sáb 20/09/25**	**$ 789.125**	**$ 789.125**	**$ 789.125**
394		1.3.4.5.1.10	Concreto	215 d	mié 18/12/24	sáb 20/09/25	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
395		1.3.4.5.1.10	Bloque en Concreto	3 d	lun 16/12/24	jue 19/12/24	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
396		**1.3.4.5.1.10**	**Viga de Amarre**	**226 d**	**mié 11/12/24**	**vie 26/09/25**	**$ 726.675**	**$ 726.675**	**$ 726.675**
397		1.3.4.5.1.10	Acero	225 d	mié 11/12/24	jue 25/09/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
398		1.3.4.5.1.10	Concreto	225 d	jue 12/12/24	vie 26/09/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
399		1.3.4.5.1.11	Fin de Eje 4-5	0 d	mié 3/12/25	mié 3/12/25	$ 0	$ 0	$ 0
400		**1.3.4.5.1.12**	**EJE 5-6**	**777,13 d**	**vie 24/02/23**	**lun 29/12/25**	**$ 263.709.500**	**$ 263.709.500**	**$ 263.709.500**
401		1.3.4.5.1.12	Excavación N: -1.2 m	3 d	vie 24/02/23	mar 28/02/23	$ 626.381	$ 626.381	$ 626.381
402		1.3.4.5.1.12	Excavación N:-4.5 m	3 d	lun 4/03/24	jue 7/03/24	$ 1.021.991	$ 1.021.991	$ 1.021.991
403		1.3.4.5.1.12	Pilotes FDP	2 d	vie 16/08/24	mar 20/08/24	$ 67.000.000	$ 67.000.000	$ 67.000.000
404		1.3.4.5.1.12	CAPA DE TRANSFERENCIA	3 d	mié 9/10/24	sáb 12/10/24	$ 855.712	$ 855.712	$ 855.712
405		1.3.4.5.1.12	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	3 d	mié 9/10/24	sáb 12/10/24	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
406		**1.3.4.5.1.12**	**Estructura**	**54 d**	**sáb 18/10/25**	**lun 29/12/25**	**$ 37.091.480**	**$ 37.091.480**	**$ 37.091.480**
407		**1.3.4.5.1.12**	**Zapatas**	**9 d**	**sáb 18/10/25**	**mié 29/10/25**	**$ 14.154.985**	**$ 14.154.985**	**$ 14.154.985**
408		1.3.4.5.1.12	Solado	2 d	sáb 18/10/25	mar 21/10/25	$ 24.985	$ 24.985	$ 24.985
409		1.3.4.5.1.12	Acero	2 d	mar 21/10/25	jue 23/10/25	$ 7.800.000	$ 7.800.000	$ 7.800.000
410		1.3.4.5.1.12	Concreto	5 d	jue 23/10/25	mié 29/10/25	$ 6.330.000	$ 6.330.000	$ 6.330.000
411		**1.3.4.5.1.12**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**mar 21/10/25**	**jue 30/10/25**	**$ 4.836.405**	**$ 4.836.405**	**$ 4.836.405**
412		1.3.4.5.1.12	Acero	3 d	mar 21/10/25	vie 24/10/25	$ 2.304.405	$ 2.304.405	$ 2.304.405
413		1.3.4.5.1.12	Concreto	5 d	vie 24/10/25	jue 30/10/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
414		**1.3.4.5.1.12**	**Columnas**	**13 d**	**mar 21/10/25**	**vie 7/11/25**	**$ 6.022.955**	**$ 6.022.955**	**$ 6.022.955**
415		1.3.4.5.1.12	Acero	3 d	mar 21/10/25	vie 24/10/25	$ 3.490.955	$ 3.490.955	$ 3.490.955
416		1.3.4.5.1.12	Concreto	5 d	jue 30/10/25	vie 7/11/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
417		**1.3.4.5.1.12**	**Vigas Longitudinales**	**10 d**	**lun 15/12/25**	**lun 29/12/25**	**$ 5.642.010**	**$ 5.642.010**	**$ 5.642.010**
418		1.3.4.5.1.12	Acero	3 d	lun 15/12/25	jue 18/12/25	$ 3.110.010	$ 3.110.010	$ 3.110.010
419		1.3.4.5.1.12	Concreto	7 d	jue 18/12/25	lun 29/12/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
420		**1.3.4.5.1.12**	**Vigas Transversales**	**38 d**	**vie 7/11/25**	**vie 26/12/25**	**$ 6.435.125**	**$ 6.435.125**	**$ 6.435.125**
421		1.3.4.5.1.12	Acero	3 d	vie 7/11/25	mar 11/11/25	$ 3.903.125	$ 3.903.125	$ 3.903.125
422		1.3.4.5.1.12	Concreto	7 d	mié 17/12/25	vie 26/12/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
423		**1.3.4.5.1.12**	**Tierra Armada**	**25 d**	**sáb 15/11/25**	**jue 18/12/25**	**$ 141.479.110**	**$ 141.479.110**	**$ 141.479.110**
424		1.3.4.5.1.12	RELLENO CON GEOBLOQUE	25 d	sáb 15/11/25	jue 18/12/25	$ 141.479.110	$ 141.479.110	$ 141.479.110
425		**1.3.4.5.1.12**	**Fachada en Mamposteria**	**28 d**	**mié 22/10/25**	**jue 27/11/25**	**$ 12.460.910**	**$ 12.460.910**	**$ 12.460.910**
426		**1.3.4.5.1.12**	**Dobelas**	**2 d**	**mié 22/10/25**	**vie 24/10/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
427		1.3.4.5.1.12	Acero	2 d	mié 22/10/25	vie 24/10/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
428		**1.3.4.5.1.12**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**8 d**	**vie 24/10/25**	**mié 5/11/25**	**$ 10.481.245**	**$ 10.481.245**	**$ 10.481.245**
429		1.3.4.5.1.12	Concreto	2 d	vie 31/10/25	mié 5/11/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
430		1.3.4.5.1.12	Bloque en Concreto	8 d	vie 24/10/25	mié 5/11/25	$ 7.943.000	$ 7.943.000	$ 7.943.000
431		**1.3.4.5.1.12**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**9 d**	**sáb 15/11/25**	**jue 27/11/25**	**$ 156.125**	**$ 156.125**	**$ 156.125**
432		1.3.4.5.1.12	Concreto	2 d	mar 25/11/25	jue 27/11/25	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
433		1.3.4.5.1.12	Bloque en Concreto	9 d	sáb 15/11/25	jue 27/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
434		**1.3.4.5.1.12**	**Viga de Amarre**	**9 d**	**mié 5/11/25**	**sáb 15/11/25**	**$ 93.675**	**$ 93.675**	**$ 93.675**
435		1.3.4.5.1.12	Acero	2 d	mié 5/11/25	vie 7/11/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
436		1.3.4.5.1.12	Concreto	7 d	vie 7/11/25	sáb 15/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
437		1.3.4.5.1.13	Fin de Eje 5-6	0 d	lun 29/12/25	lun 29/12/25	$ 0	$ 0	$ 0
438		**1.3.4.5.1.14**	**EJE 6-7**	**767,88 d**	**mar 21/02/23**	**vie 12/12/25**	**$ 227.894.213**	**$ 227.894.213**	**$ 227.894.213**
439		1.3.4.5.1.14	Excavación N: -1.2 m	3 d	mar 21/02/23	vie 24/02/23	$ 672.644	$ 672.644	$ 672.644
440		1.3.4.5.1.14	Excavación N:-4.5 m	3 d	lun 4/03/24	jue 7/03/24	$ 967.952	$ 967.952	$ 967.952
441		1.3.4.5.1.14	Pilotes FDP	2 d	mar 20/08/24	jue 22/08/24	$ 31.000.000	$ 31.000.000	$ 31.000.000
442		1.3.4.5.1.14	CAPA DE TRANSFERENCIA	3 d	mié 9/10/24	sáb 12/10/24	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
443		1.3.4.5.1.14	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	3 d	mié 9/10/24	sáb 12/10/24	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
444		**1.3.4.5.1.14**	**Estructura**	**44 d**	**jue 16/10/25**	**vie 12/12/25**	**$ 36.364.805**	**$ 36.364.805**	**$ 36.364.805**
445		**1.3.4.5.1.14**	**Zapatas**	**7 d**	**jue 16/10/25**	**vie 24/10/25**	**$ 13.521.985**	**$ 13.521.985**	**$ 13.521.985**
446		1.3.4.5.1.14	Solado	2 d	jue 16/10/25	sáb 18/10/25	$ 24.985	$ 24.985	$ 24.985
447		1.3.4.5.1.14	Acero	2 d	sáb 18/10/25	mar 21/10/25	$ 7.800.000	$ 7.800.000	$ 7.800.000
448		1.3.4.5.1.14	Concreto	3 d	mar 21/10/25	vie 24/10/25	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000

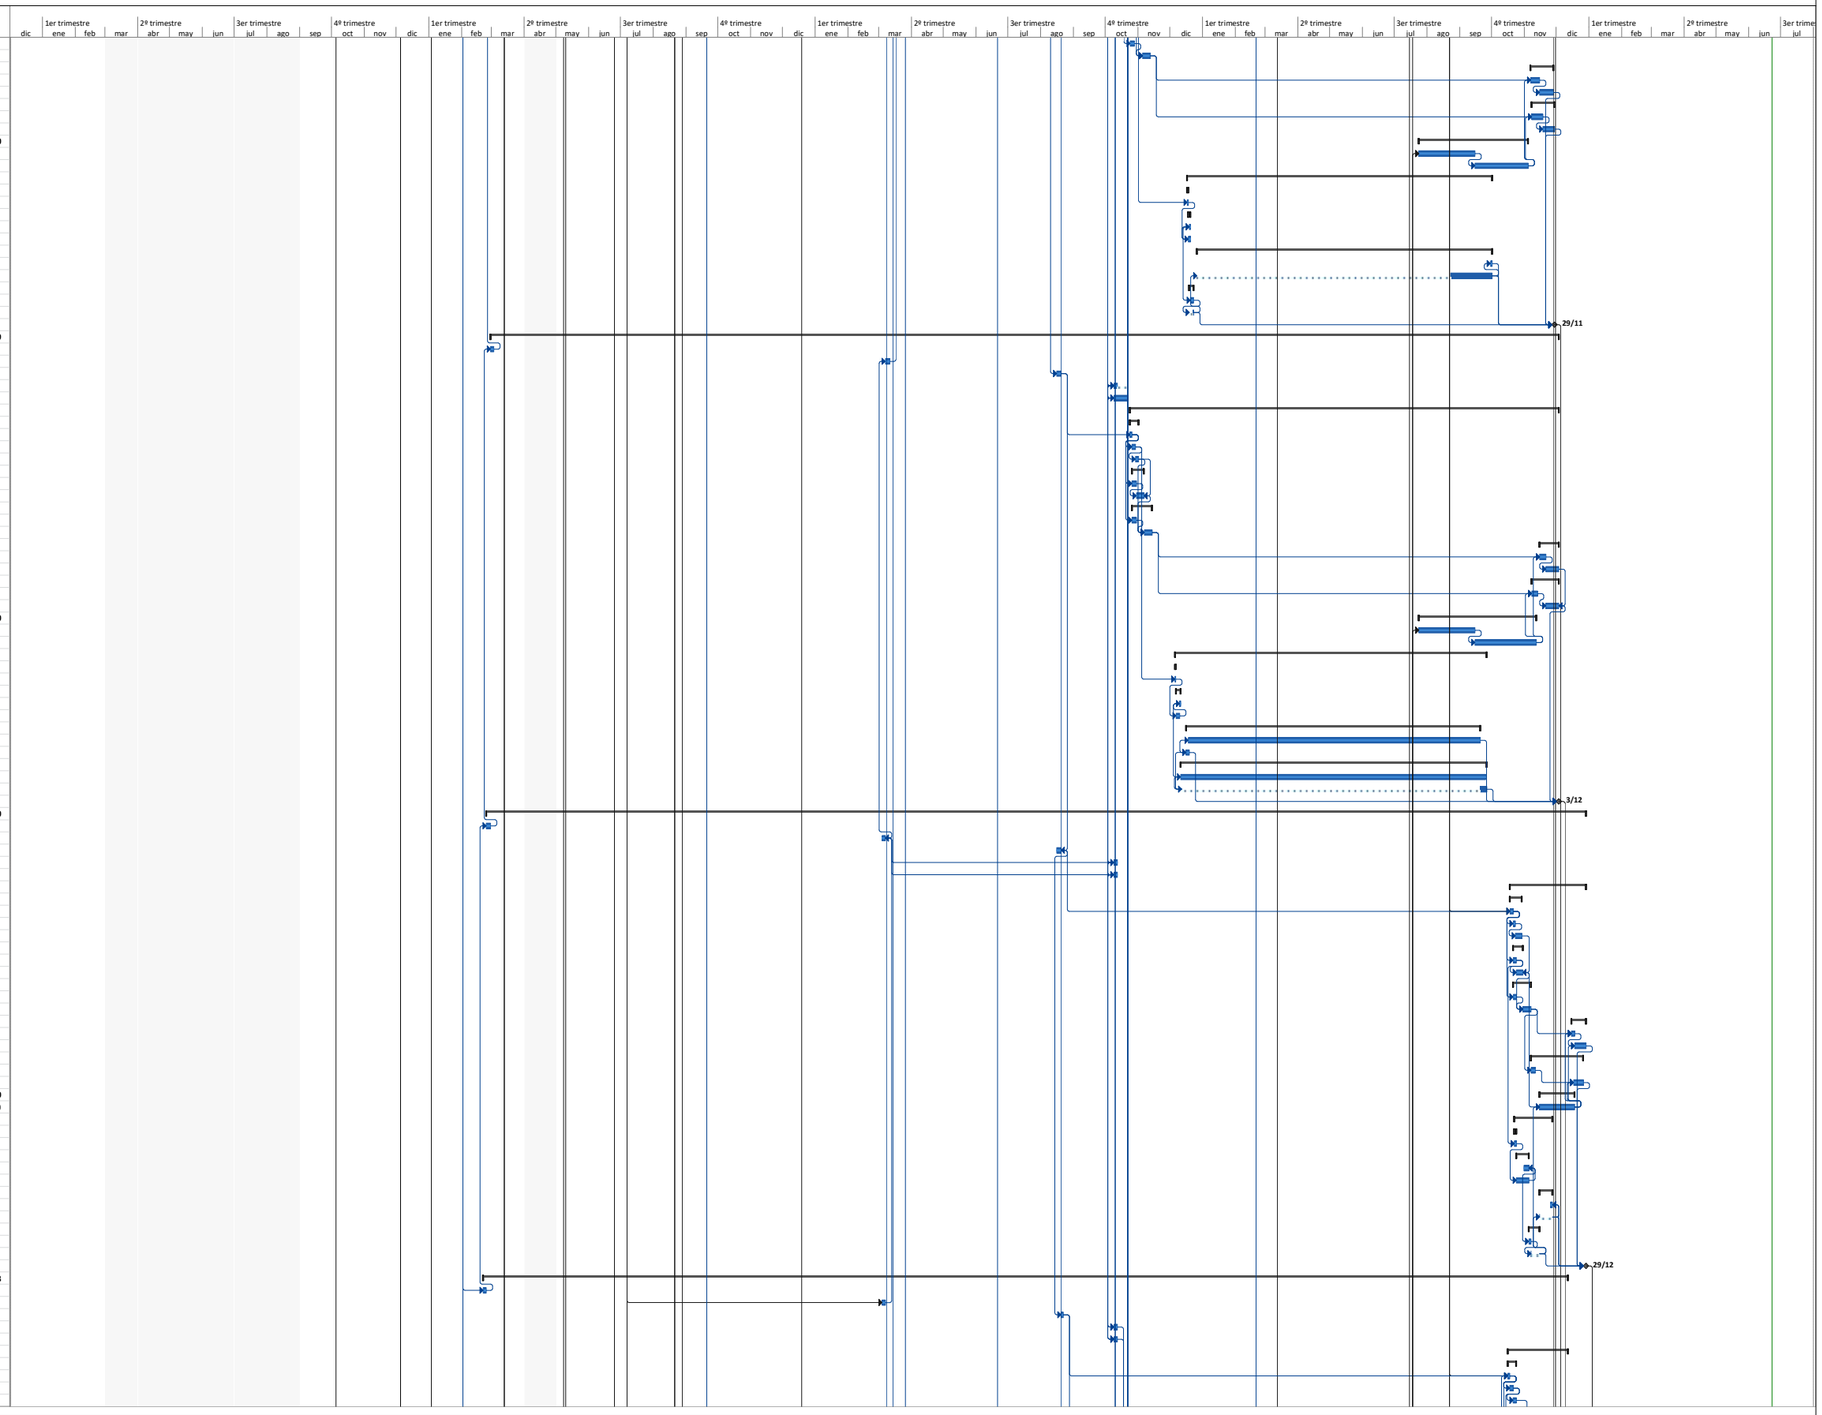

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | Sólo el comienzo | Fecha límite | División crítica | Progreso manual
División | Resumen | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo | Sólo duración | Resumen manual | Sólo fin | Tareas críticas | Progreso

Proyecto: IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB8-20221201
Fecha: mar 23/06/26


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
449		1.3.4.5.1.14	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**sáb 18/10/25**	**mar 28/10/25**	**$ 4.836.405**	**$ 4.836.405**	**$ 4.836.405**
450		1.3.4.5.1.14	Acero	3 d	sáb 18/10/25	mié 22/10/25	$ 2.304.405	$ 2.304.405	$ 2.304.405
451		1.3.4.5.1.14	Concreto	5 d	mié 22/10/25	mar 28/10/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
452		1.3.4.5.1.14	**Columnas**	**13 d**	**sáb 18/10/25**	**mar 4/11/25**	**$ 6.010.465**	**$ 6.010.465**	**$ 6.010.465**
453		1.3.4.5.1.14	Acero	3 d	sáb 18/10/25	mié 22/10/25	$ 3.478.465	$ 3.478.465	$ 3.478.465
454		1.3.4.5.1.14	Concreto	5 d	mar 28/10/25	mar 4/11/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
455		1.3.4.5.1.14	**Vigas Longitudinales**	**8 d**	**lun 1/12/25**	**vie 12/12/25**	**$ 5.567.070**	**$ 5.567.070**	**$ 5.567.070**
456		1.3.4.5.1.14	Acero	3 d	lun 1/12/25	jue 4/12/25	$ 3.035.070	$ 3.035.070	$ 3.035.070
457		1.3.4.5.1.14	Concreto	5 d	jue 4/12/25	vie 12/12/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
458		1.3.4.5.1.14	**Vigas Transversales**	**8 d**	**lun 1/12/25**	**vie 12/12/25**	**$ 6.428.880**	**$ 6.428.880**	**$ 6.428.880**
459		1.3.4.5.1.14	Acero	3 d	lun 1/12/25	jue 4/12/25	$ 3.896.880	$ 3.896.880	$ 3.896.880
460		1.3.4.5.1.14	Concreto	5 d	jue 4/12/25	vie 12/12/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
461		1.3.4.5.1.14	**Tierra Armada**	**25 d**	**lun 10/11/25**	**vie 12/12/25**	**$ 141.479.110**	**$ 141.479.110**	**$ 141.479.110**
462		1.3.4.5.1.14	RELLENO CON GEOBLOQUE	25 d	lun 10/11/25	vie 12/12/25	$ 141.479.110	$ 141.479.110	$ 141.479.110
463		1.3.4.5.1.14	**Fachada en Mamposteria**	**27 d**	**lun 20/10/25**	**lun 24/11/25**	**$ 13.826.786**	**$ 13.826.786**	**$ 13.826.786**
464		1.3.4.5.1.14	**Dobelas**	**1 d**	**lun 20/10/25**	**mar 21/10/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
465		1.3.4.5.1.14	Acero	1 d	lun 20/10/25	mar 21/10/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
466		1.3.4.5.1.14	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**9 d**	**mar 21/10/25**	**vie 31/10/25**	**$ 11.847.121**	**$ 11.847.121**	**$ 11.847.121**
467		1.3.4.5.1.14	Concreto	2 d	mié 29/10/25	vie 31/10/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
468		1.3.4.5.1.14	Bloque en Concreto	7 d	mar 21/10/25	mié 29/10/25	$ 9.308.876	$ 9.308.876	$ 9.308.876
469		1.3.4.5.1.14	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**11 d**	**lun 10/11/25**	**lun 24/11/25**	**$ 156.125**	**$ 156.125**	**$ 156.125**
470		1.3.4.5.1.14	Concreto	2 d	vie 21/11/25	lun 24/11/25	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
471		1.3.4.5.1.14	Bloque en Concreto	9 d	lun 10/11/25	vie 21/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
472		1.3.4.5.1.14	**Viga de Amarre**	**6 d**	**vie 31/10/25**	**lun 10/11/25**	**$ 93.675**	**$ 93.675**	**$ 93.675**
473		1.3.4.5.1.14	Acero	2 d	vie 31/10/25	mar 4/11/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
474		1.3.4.5.1.14	Concreto	4 d	mar 4/11/25	lun 10/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
475		1.3.4.5.1.15	Fin de Eje 6-7	0 d	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0	$ 0	$ 0
476		1.3.4.5.1.16	**EJE 7-8**	**503,63 d**	**mié 20/03/24**	**mar 30/12/25**	**$ 226.847.863**	**$ 226.847.863**	**$ 226.847.863**
477		1.3.4.5.1.16	Excavación	1 d	mié 20/03/24	jue 21/03/24	$ 635.712	$ 635.712	$ 635.712
478		1.3.4.5.1.16	Excavación 2	2 d	vie 2/08/24	lun 5/08/24	$ 953.568	$ 953.568	$ 953.568
479		1.3.4.5.1.16	Pilotes FDP	4 d	mié 24/09/25	lun 29/09/25	$ 31.000.000	$ 31.000.000	$ 31.000.000
480		1.3.4.5.1.16	CAPA DE TRANSFERENCIA	3 d	mar 7/10/25	vie 10/10/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
481		1.3.4.5.1.16	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	4 d	vie 10/10/25	jue 16/10/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
482		1.3.4.5.1.16	**Estructura**	**58 d**	**jue 16/10/25**	**mar 30/12/25**	**$ 36.133.740**	**$ 36.133.740**	**$ 36.133.740**
483		1.3.4.5.1.16	**Zapatas**	**9 d**	**jue 16/10/25**	**lun 27/10/25**	**$ 13.521.985**	**$ 13.521.985**	**$ 13.521.985**
484		1.3.4.5.1.16	Solado	2 d	jue 16/10/25	sáb 18/10/25	$ 24.985	$ 24.985	$ 24.985
485		1.3.4.5.1.16	Acero	2 d	sáb 18/10/25	mar 21/10/25	$ 7.800.000	$ 7.800.000	$ 7.800.000
486		1.3.4.5.1.16	Concreto	5 d	mar 21/10/25	lun 27/10/25	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
487		1.3.4.5.1.16	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**sáb 18/10/25**	**mar 28/10/25**	**$ 4.761.465**	**$ 4.761.465**	**$ 4.761.465**
488		1.3.4.5.1.16	Acero	3 d	sáb 18/10/25	mié 22/10/25	$ 2.229.465	$ 2.229.465	$ 2.229.465
489		1.3.4.5.1.16	Concreto	5 d	mié 22/10/25	mar 28/10/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
490		1.3.4.5.1.16	**Columnas**	**10 d**	**mié 22/10/25**	**mar 4/11/25**	**$ 6.022.955**	**$ 6.022.955**	**$ 6.022.955**
491		1.3.4.5.1.16	Acero	3 d	mié 22/10/25	sáb 25/10/25	$ 3.490.955	$ 3.490.955	$ 3.490.955
492		1.3.4.5.1.16	Concreto	5 d	mar 28/10/25	mar 4/11/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
493		1.3.4.5.1.16	**Vigas Longitudinales**	**14 d**	**vie 12/12/25**	**mar 30/12/25**	**$ 5.398.455**	**$ 5.398.455**	**$ 5.398.455**
494		1.3.4.5.1.16	Acero	4 d	vie 12/12/25	mié 17/12/25	$ 2.866.455	$ 2.866.455	$ 2.866.455
495		1.3.4.5.1.16	Concreto	10 d	mié 17/12/25	mar 30/12/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
496		1.3.4.5.1.16	**Vigas Transversales**	**14 d**	**vie 12/12/25**	**mar 30/12/25**	**$ 6.428.880**	**$ 6.428.880**	**$ 6.428.880**
497		1.3.4.5.1.16	Acero	4 d	vie 12/12/25	mié 17/12/25	$ 3.896.880	$ 3.896.880	$ 3.896.880
498		1.3.4.5.1.16	Concreto	10 d	mié 17/12/25	mar 30/12/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
499		1.3.4.5.1.16	**Tierra Armada**	**30 d**	**jue 6/11/25**	**mar 16/12/25**	**$ 141.479.110**	**$ 141.479.110**	**$ 141.479.110**
500		1.3.4.5.1.16	RELLENO CON GEOBLOQUE	30 d	jue 6/11/25	mar 16/12/25	$ 141.479.110	$ 141.479.110	$ 141.479.110
501		1.3.4.5.1.16	**Fachada en Mamposteria**	**23 d**	**lun 27/10/25**	**mié 26/11/25**	**$ 13.062.817**	**$ 13.062.817**	**$ 13.062.817**
502		1.3.4.5.1.16	**Dobelas**	**2 d**	**lun 27/10/25**	**mié 29/10/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
503		1.3.4.5.1.16	Acero	2 d	lun 27/10/25	mié 29/10/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
504		1.3.4.5.1.16	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**8 d**	**mié 29/10/25**	**lun 10/11/25**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**
505		1.3.4.5.1.16	Concreto	2 d	jue 6/11/25	lun 10/11/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
506		1.3.4.5.1.16	Bloque en Concreto	6 d	mié 29/10/25	jue 6/11/25	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
507		1.3.4.5.1.16	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**9 d**	**vie 14/11/25**	**mié 26/11/25**	**$ 156.125**	**$ 156.125**	**$ 156.125**
508		1.3.4.5.1.16	Concreto	2 d	lun 24/11/25	mié 26/11/25	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
509		1.3.4.5.1.16	Bloque en concerto	7 d	vie 14/11/25	lun 24/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
510		1.3.4.5.1.16	**Viga de Amarre**	**6 d**	**lun 10/11/25**	**mar 18/11/25**	**$ 93.675**	**$ 93.675**	**$ 93.675**
511		1.3.4.5.1.16	Acero	2 d	lun 10/11/25	mié 12/11/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
512		1.3.4.5.1.16	Concreto	4 d	mié 12/11/25	mar 18/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
513		1.3.4.5.1.17	Fin de Eje 7-8	0 d	mar 30/12/25	mar 30/12/25	$ 0	$ 0	$ 0
514		1.3.4.5.1.18	**EJE 8-9**	**312,88 d**	**vie 29/11/24**	**mar 6/01/26**	**$ 226.710.473**	**$ 226.710.473**	**$ 226.710.473**
515		1.3.4.5.1.18	Excavación	31 d	vie 29/11/24	jue 9/01/25	$ 1.589.280	$ 1.589.280	$ 1.589.280
516		1.3.4.5.1.18	Pilotes FDP	4 d	lun 29/09/25	vie 3/10/25	$ 31.000.000	$ 31.000.000	$ 31.000.000
517		1.3.4.5.1.18	CAPA DE TRANSFERENCIA	3 d	vie 10/10/25	jue 16/10/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
518		1.3.4.5.1.18	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	3 d	vie 10/10/25	mié 15/10/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
519		1.3.4.5.1.18	**Estructura**	**47 d**	**mié 5/11/25**	**mar 6/01/26**	**$ 35.996.350**	**$ 35.996.350**	**$ 35.996.350**
520		1.3.4.5.1.18	**Zapatas**	**10 d**	**mié 5/11/25**	**mar 18/11/25**	**$ 13.521.985**	**$ 13.521.985**	**$ 13.521.985**
521		1.3.4.5.1.18	Solado	2 d	mié 5/11/25	vie 7/11/25	$ 24.985	$ 24.985	$ 24.985
522		1.3.4.5.1.18	Acero	3 d	vie 7/11/25	mar 11/11/25	$ 7.800.000	$ 7.800.000	$ 7.800.000
523		1.3.4.5.1.18	Concreto	5 d	mar 11/11/25	mar 18/11/25	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
524		1.3.4.5.1.18	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**vie 7/11/25**	**mar 18/11/25**	**$ 4.630.320**	**$ 4.630.320**	**$ 4.630.320**
525		1.3.4.5.1.18	Acero	3 d	vie 7/11/25	mar 11/11/25	$ 2.098.320	$ 2.098.320	$ 2.098.320
526		1.3.4.5.1.18	Concreto	5 d	mar 11/11/25	mar 18/11/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
527		1.3.4.5.1.18	**Columnas**	**13 d**	**vie 7/11/25**	**lun 24/11/25**	**$ 6.022.955**	**$ 6.022.955**	**$ 6.022.955**
528		1.3.4.5.1.18	Acero	3 d	vie 7/11/25	mar 11/11/25	$ 3.490.955	$ 3.490.955	$ 3.490.955
529		1.3.4.5.1.18	Concreto	5 d	mar 18/11/25	lun 24/11/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
530		1.3.4.5.1.18	**Vigas Longitudinales**	**8 d**	**mié 24/12/25**	**mar 6/01/26**	**$ 5.385.965**	**$ 5.385.965**	**$ 5.385.965**
531		1.3.4.5.1.18	Acero	3 d	mié 24/12/25	mar 30/12/25	$ 2.853.965	$ 2.853.965	$ 2.853.965
532		1.3.4.5.1.18	Concreto	5 d	mar 30/12/25	mar 6/01/26	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
533		1.3.4.5.1.18	**Vigas Transversales**	**8 d**	**mié 24/12/25**	**mar 6/01/26**	**$ 6.435.125**	**$ 6.435.125**	**$ 6.435.125**
534		1.3.4.5.1.18	Acero	3 d	mié 24/12/25	mar 30/12/25	$ 3.903.125	$ 3.903.125	$ 3.903.125
535		1.3.4.5.1.18	Concreto	5 d	mar 30/12/25	mar 6/01/26	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
536		1.3.4.5.1.18	**Tierra Armada**	**30 d**	**jue 20/11/25**	**mar 30/12/25**	**$ 141.479.110**	**$ 141.479.110**	**$ 141.479.110**
537		1.3.4.5.1.18	RELLENO CON GEOBLOQUE	30 d	jue 20/11/25	mar 30/12/25	$ 141.479.110	$ 141.479.110	$ 141.479.110
538		1.3.4.5.1.18	**Fachada en Mamposteria**	**16 d**	**mar 11/11/25**	**mar 2/12/25**	**$ 13.062.817**	**$ 13.062.817**	**$ 13.062.817**
539		1.3.4.5.1.18	**Dobelas**	**2 d**	**mar 11/11/25**	**jue 13/11/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
540		1.3.4.5.1.18	Acero	2 d	mar 11/11/25	jue 13/11/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
541		1.3.4.5.1.18	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**5 d**	**jue 13/11/25**	**jue 20/11/25**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**
542		1.3.4.5.1.18	Concreto	2 d	sáb 15/11/25	mié 19/11/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
543		1.3.4.5.1.18	Bloque en Concreto	5 d	jue 13/11/25	jue 20/11/25	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
544		1.3.4.5.1.18	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**10 d**	**mié 19/11/25**	**mar 2/12/25**	**$ 156.125**	**$ 156.125**	**$ 156.125**
545		1.3.4.5.1.18	Concreto	3 d	mié 19/11/25	sáb 22/11/25	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
546		1.3.4.5.1.18	Bloque en concreto	6 d	lun 24/11/25	mar 2/12/25	$ 0	$ 0	$ 0
547		1.3.4.5.1.18	**Viga de Amarre**	**6 d**	**jue 20/11/25**	**jue 27/11/25**	**$ 93.675**	**$ 93.675**	**$ 93.675**
548		1.3.4.5.1.18	Acero	2 d	jue 20/11/25	sáb 22/11/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
549		1.3.4.5.1.18	Concreto	4 d	sáb 22/11/25	jue 27/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
550		1.3.4.5.1.19	Fin de Eje 8-9	0 d	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
551		1.3.4.5.1.20	**EJE 9-10**	**300,88 d**	**vie 10/01/25**	**sáb 31/01/26**	**$ 226.244.653**	**$ 226.244.653**	**$ 226.244.653**
552		1.3.4.5.1.20	Excavación	3 d	vie 10/01/25	mar 14/01/25	$ 1.589.280	$ 1.589.280	$ 1.589.280
553		1.3.4.5.1.20	Pilotes FDP	4 d	lun 6/10/25	vie 10/10/25	$ 31.000.000	$ 31.000.000	$ 31.000.000
554		1.3.4.5.1.20	CAPA DE TRANSFERENCIA	3 d	jue 16/10/25	lun 20/10/25	$ 168.000	$ 168.000	$ 168.000
555		1.3.4.5.1.20	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	3 d	jue 16/10/25	lun 20/10/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
556		1.3.4.5.1.20	**Estructura**	**79,5 d**	**lun 20/10/25**	**sáb 31/01/26**	**$ 35.771.530**	**$ 35.771.530**	**$ 35.771.530**
557		1.3.4.5.1.20	**Zapatas**	**7 d**	**lun 20/10/25**	**mar 28/10/25**	**$ 13.521.985**	**$ 13.521.985**	**$ 13.521.985**
558		1.3.4.5.1.20	Solado	2 d	lun 20/10/25	mié 22/10/25	$ 24.985	$ 24.985	$ 24.985
559		1.3.4.5.1.20	Acero	2 d	mié 22/10/25	vie 24/10/25	$ 7.800.000	$ 7.800.000	$ 7.800.000
560		1.3.4.5.1.20	Concreto	3 d	vie 24/10/25	mar 28/10/25	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000

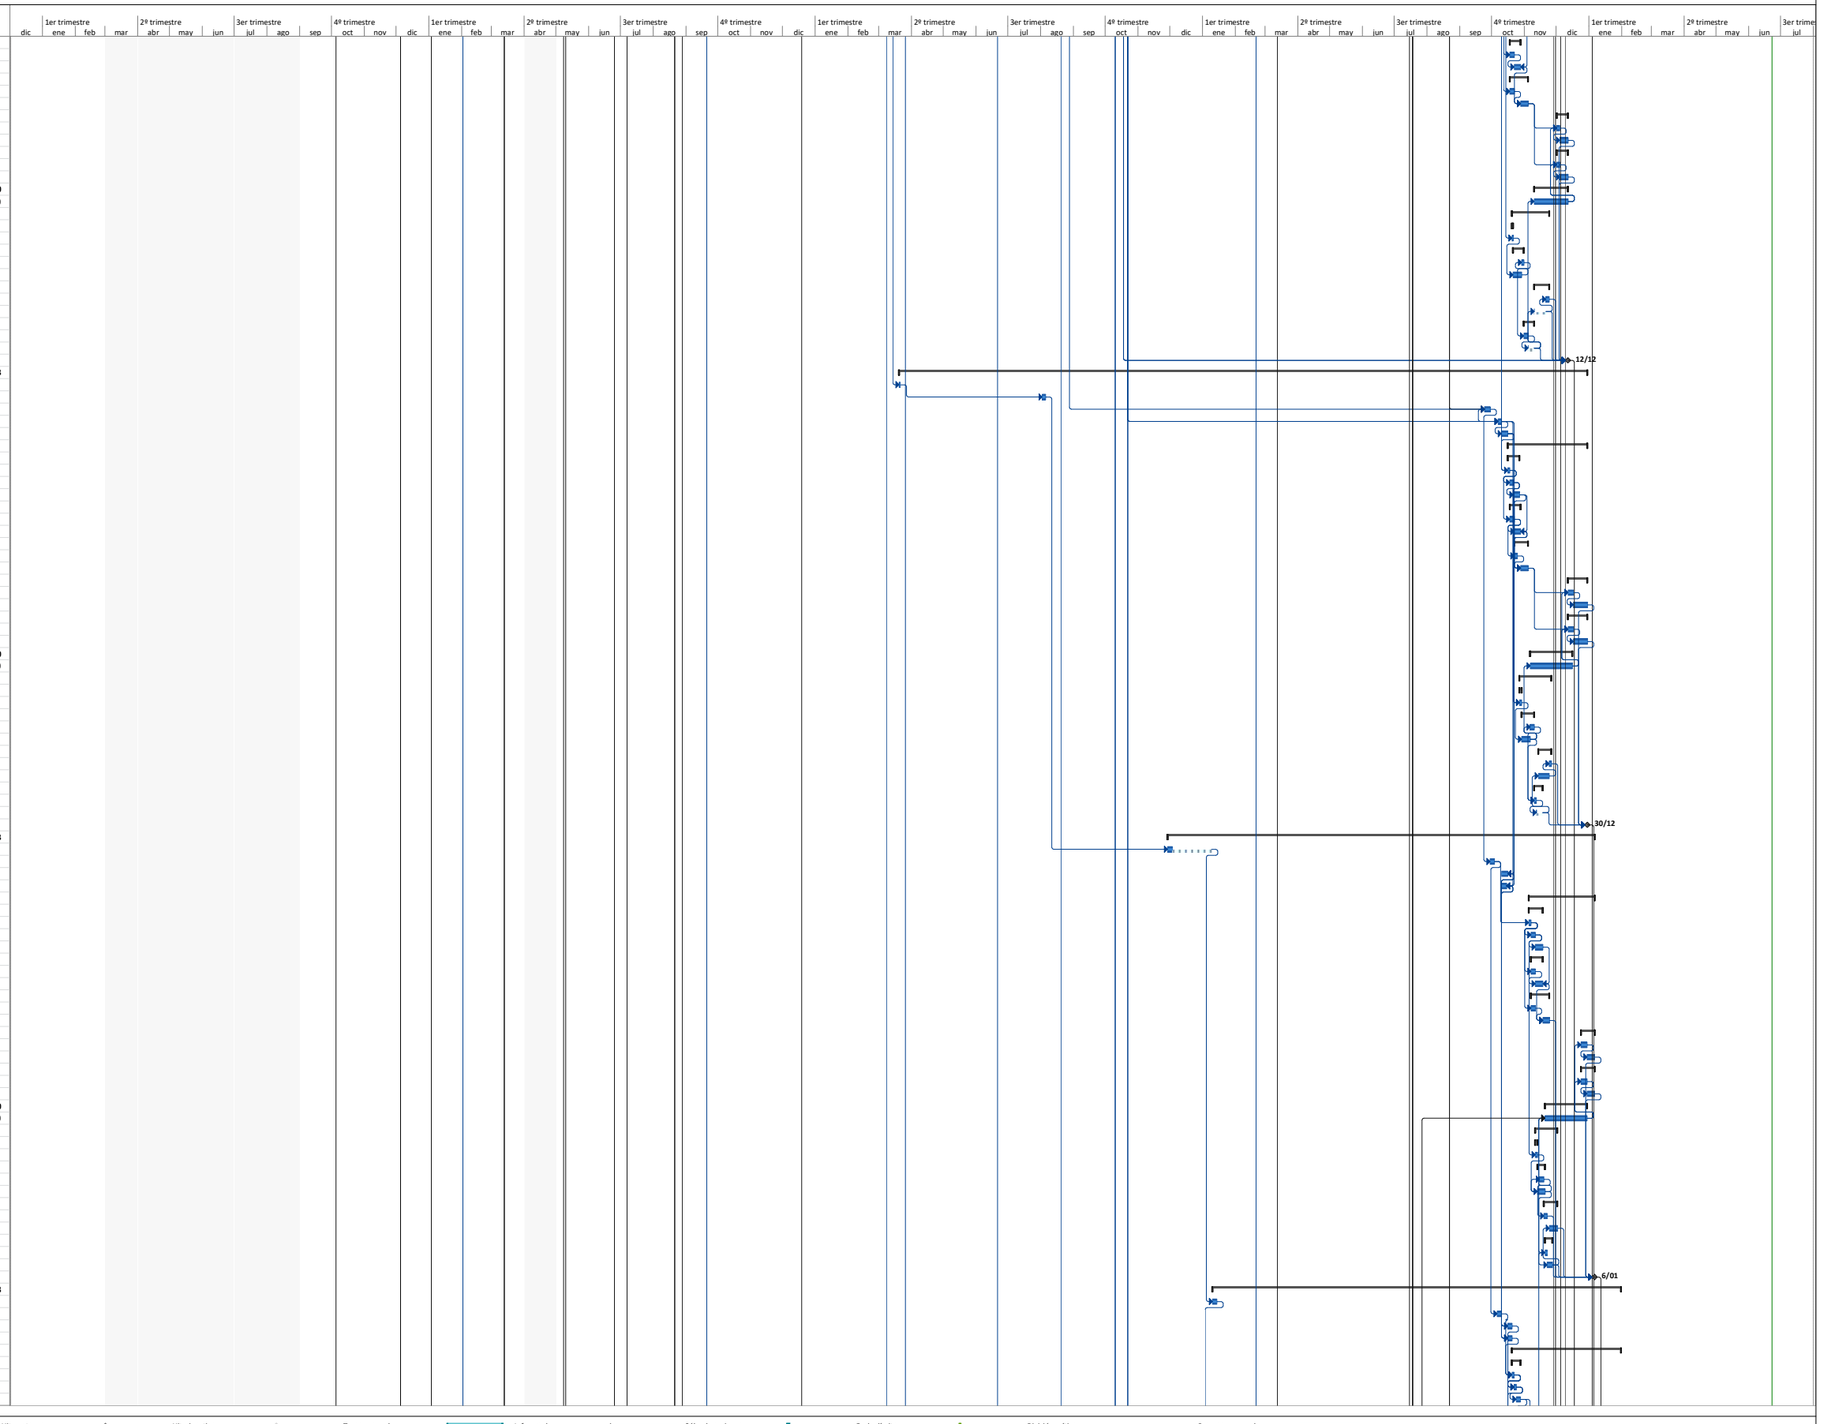

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | Sólo el comienzo | Fecha límite | División crítica | Progreso manual
División | Resumen | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo | Sólo duración | Resumen manual | Sólo fin | Tareas críticas | Progreso

Proyecto: IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB8-20221201
Fecha: mar 23/06/26


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
561		**1.3.4.5.1.20**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**mié 22/10/25**	**vie 31/10/25**	**$ 4.561.625**	**$ 4.561.625**	**$ 4.561.625**
562		1.3.4.5.1.20.	Acero	3 d	mié 22/10/25	sáb 25/10/25	$ 2.029.625	$ 2.029.625	$ 2.029.625
563		1.3.4.5.1.20.	Concreto	5 d	sáb 25/10/25	vie 31/10/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
564		**1.3.4.5.1.20**	**Columnas**	**13 d**	**mié 22/10/25**	**vie 7/11/25**	**$ 6.010.465**	**$ 6.010.465**	**$ 6.010.465**
565		1.3.4.5.1.20.	Acero	3 d	mié 22/10/25	sáb 25/10/25	$ 3.478.465	$ 3.478.465	$ 3.478.465
566		1.3.4.5.1.20.	Concreto	5 d	vie 31/10/25	vie 7/11/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
567		**1.3.4.5.1.20**	**Vigas Longitudinales**	**13 d**	**vie 2/01/26**	**lun 19/01/26**	**$ 5.248.575**	**$ 5.248.575**	**$ 5.248.575**
568		1.3.4.5.1.20.	Acero	3 d	vie 2/01/26	mar 6/01/26	$ 2.716.575	$ 2.716.575	$ 2.716.575
569		1.3.4.5.1.20.	Concreto	10 d	mar 6/01/26	lun 19/01/26	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
570		**1.3.4.5.1.20**	**Vigas Transversales**	**22 d**	**sáb 3/01/26**	**sáb 31/01/26**	**$ 6.428.880**	**$ 6.428.880**	**$ 6.428.880**
571		1.3.4.5.1.20.	Acero	3 d	sáb 3/01/26	mié 7/01/26	$ 3.896.880	$ 3.896.880	$ 3.896.880
572		1.3.4.5.1.20.	Concreto	10 d	lun 19/01/26	sáb 31/01/26	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
573		**1.3.4.5.1.20**	**Tierra Armada**	**35 d**	**jue 20/11/25**	**mar 6/01/26**	**$ 141.479.110**	**$ 141.479.110**	**$ 141.479.110**
574		1.3.4.5.1.20.	RELLENO CON GEOBLOQUE	35 d	jue 20/11/25	mar 6/01/26	$ 141.479.110	$ 141.479.110	$ 141.479.110
575		**1.3.4.5.1.20**	**Fachada en Mamposteria**	**21 d**	**mié 22/10/25**	**mié 19/11/25**	**$ 13.062.817**	**$ 13.062.817**	**$ 13.062.817**
576		**1.3.4.5.1.20**	**Dobelas**	**1 d**	**mié 22/10/25**	**jue 23/10/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
577		1.3.4.5.1.20.	Acero	1 d	mié 22/10/25	jue 23/10/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
578		**1.3.4.5.1.20**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**3 d**	**vie 31/10/25**	**mié 5/11/25**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**
579		1.3.4.5.1.20.	Concreto	1 d	mar 4/11/25	mié 5/11/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
580		1.3.4.5.1.20.	Bloque en Concreto	2 d	vie 31/10/25	mar 4/11/25	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
581		**1.3.4.5.1.20**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**10 d**	**mié 5/11/25**	**mié 19/11/25**	**$ 156.125**	**$ 156.125**	**$ 156.125**
582		1.3.4.5.1.20.	Concreto	2 d	mié 5/11/25	vie 7/11/25	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
583		1.3.4.5.1.20.	Bloque en concreto	5 d	mar 11/11/25	mié 19/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
584		**1.3.4.5.1.20**	**Viga de Amarre**	**6 d**	**mar 4/11/25**	**mar 11/11/25**	**$ 93.675**	**$ 93.675**	**$ 93.675**
585		1.3.4.5.1.20.	Acero	2 d	mar 4/11/25	jue 6/11/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
586		1.3.4.5.1.20.	Concreto	4 d	jue 6/11/25	mar 11/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
587		1.3.4.5.1.21	Fin de Eje 9-10	0 d	sáb 31/01/26	sáb 31/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
588		**1.3.4.5.1.22**	**EJE 10-11**	**357 d**	**jue 10/10/24**	**mié 14/01/26**	**$ 226.982.688**	**$ 226.982.688**	**$ 226.982.688**
589		1.3.4.5.1.22.	Excavación	3 d	jue 9/01/25	lun 13/01/25	$ 1.589.280	$ 1.589.280	$ 1.589.280
590		1.3.4.5.1.22.	Pilotes FDP	285 d	jue 10/10/24	vie 10/10/25	$ 30.604.000	$ 30.604.000	$ 30.604.000
591		1.3.4.5.1.22.	CAPA DE TRANSFERENCIA	279 d	sáb 19/10/24	sáb 11/10/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
592		1.3.4.5.1.22.	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	295 d	sáb 19/10/24	jue 16/10/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
593		**1.3.4.5.1.22**	**Estructura**	**68 d**	**jue 16/10/25**	**mié 14/01/26**	**$ 36.664.565**	**$ 36.664.565**	**$ 36.664.565**
594		**1.3.4.5.1.22**	**Zapatas**	**10 d**	**jue 16/10/25**	**mar 28/10/25**	**$ 13.803.010**	**$ 13.803.010**	**$ 13.803.010**
595		1.3.4.5.1.22.	Solado	2 d	jue 16/10/25	sáb 18/10/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
596		1.3.4.5.1.22.	Acero	3 d	sáb 18/10/25	mié 22/10/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
597		1.3.4.5.1.22.	Concreto	5 d	mié 22/10/25	mar 28/10/25	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
598		**1.3.4.5.1.22**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**mar 21/10/25**	**jue 30/10/25**	**$ 5.017.510**	**$ 5.017.510**	**$ 5.017.510**
599		1.3.4.5.1.22.	Acero	3 d	mar 21/10/25	vie 24/10/25	$ 2.485.510	$ 2.485.510	$ 2.485.510
600		1.3.4.5.1.22.	Concreto	5 d	vie 24/10/25	jue 30/10/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
601		**1.3.4.5.1.22**	**Columnas**	**16 d**	**sáb 18/10/25**	**sáb 8/11/25**	**$ 6.022.955**	**$ 6.022.955**	**$ 6.022.955**
602		1.3.4.5.1.22.	Acero	3 d	sáb 18/10/25	mié 22/10/25	$ 3.490.955	$ 3.490.955	$ 3.490.955
603		1.3.4.5.1.22.	Concreto	6 d	vie 31/10/25	sáb 8/11/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
604		**1.3.4.5.1.22**	**Vigas Longitudinales**	**14 d**	**vie 26/12/25**	**mié 14/01/26**	**$ 5.392.210**	**$ 5.392.210**	**$ 5.392.210**
605		1.3.4.5.1.22.	Acero	4 d	vie 26/12/25	mié 31/12/25	$ 2.860.210	$ 2.860.210	$ 2.860.210
606		1.3.4.5.1.22.	Concreto	10 d	mié 31/12/25	mié 14/01/26	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
607		**1.3.4.5.1.22**	**Vigas Transversales**	**14 d**	**vie 19/12/25**	**jue 8/01/26**	**$ 6.428.880**	**$ 6.428.880**	**$ 6.428.880**
608		1.3.4.5.1.22.	Acero	4 d	vie 19/12/25	mié 24/12/25	$ 3.896.880	$ 3.896.880	$ 3.896.880
609		1.3.4.5.1.22.	Concreto	10 d	vie 26/12/25	jue 8/01/26	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
610		**1.3.4.5.1.22**	**Tierra Armada**	**35 d**	**vie 7/11/25**	**lun 22/12/25**	**$ 141.479.110**	**$ 141.479.110**	**$ 141.479.110**
611		1.3.4.5.1.22.	RELLENO CON GEOBLOQUE	35 d	vie 7/11/25	lun 22/12/25	$ 141.479.110	$ 141.479.110	$ 141.479.110
612		**1.3.4.5.1.22**	**Fachada en Mamposteria**	**26 d**	**mar 21/10/25**	**lun 24/11/25**	**$ 13.062.817**	**$ 13.062.817**	**$ 13.062.817**
613		**1.3.4.5.1.22**	**Dobelas**	**2 d**	**mar 21/10/25**	**jue 23/10/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
614		1.3.4.5.1.22.	Acero	2 d	mar 21/10/25	jue 23/10/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
615		**1.3.4.5.1.22**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**5 d**	**vie 31/10/25**	**vie 7/11/25**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**
616		1.3.4.5.1.22.	Concreto	1 d	jue 6/11/25	vie 7/11/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
617		1.3.4.5.1.22.	Bloque en Concreto	5 d	vie 31/10/25	vie 7/11/25	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
618		**1.3.4.5.1.22**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**9 d**	**mié 12/11/25**	**lun 24/11/25**	**$ 156.125**	**$ 156.125**	**$ 156.125**
619		1.3.4.5.1.22.	Concreto	2 d	vie 21/11/25	lun 24/11/25	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
620		1.3.4.5.1.22.	Bloque en Concreto	7 d	mié 12/11/25	vie 21/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
621		**1.3.4.5.1.22**	**Viga de Amarre**	**6 d**	**vie 7/11/25**	**vie 14/11/25**	**$ 93.675**	**$ 93.675**	**$ 93.675**
622		1.3.4.5.1.22.	Acero	2 d	vie 7/11/25	lun 10/11/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
623		1.3.4.5.1.22.	Concreto	4 d	lun 10/11/25	vie 14/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
624		1.3.4.5.1.23	Fin de Eje 10-11	0 d	mié 14/01/26	mié 14/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
625		**1.3.4.5.1.24**	**EJE 11-12**	**351 d**	**jue 10/10/24**	**mar 6/01/26**	**$ 228.662.308**	**$ 228.662.308**	**$ 228.662.308**
626		1.3.4.5.1.24.	Excavación	1 d	lun 13/01/25	mar 14/01/25	$ 1.589.280	$ 1.589.280	$ 1.589.280
627		1.3.4.5.1.24.	Pilotes FDP	2 d	jue 10/10/24	sáb 12/10/24	$ 30.604.000	$ 30.604.000	$ 30.604.000
628		1.3.4.5.1.24.	CAPA DE TRANSFERENCIA	278 d	mié 23/10/24	mié 15/10/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
629		1.3.4.5.1.24.	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	294 d	mié 23/10/24	sáb 18/10/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
630		**1.3.4.5.1.24**	**Estructura**	**59,75 d**	**lun 20/10/25**	**mar 6/01/26**	**$ 36.208.680**	**$ 36.208.680**	**$ 36.208.680**
631		**1.3.4.5.1.24**	**Zapatas**	**10 d**	**lun 20/10/25**	**vie 31/10/25**	**$ 13.803.010**	**$ 13.803.010**	**$ 13.803.010**
632		1.3.4.5.1.24.	Solado	2 d	lun 20/10/25	mar 21/10/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
633		1.3.4.5.1.24.	Acero	3 d	mié 22/10/25	vie 24/10/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
634		1.3.4.5.1.24.	Concreto	5 d	sáb 25/10/25	vie 31/10/25	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
635		**1.3.4.5.1.24**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**mié 22/10/25**	**vie 31/10/25**	**$ 4.742.730**	**$ 4.742.730**	**$ 4.742.730**
636		1.3.4.5.1.24.	Acero	3 d	mié 22/10/25	vie 24/10/25	$ 2.210.730	$ 2.210.730	$ 2.210.730
637		1.3.4.5.1.24.	Concreto	5 d	sáb 25/10/25	vie 31/10/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
638		**1.3.4.5.1.24**	**Columnas**	**13 d**	**mié 22/10/25**	**vie 7/11/25**	**$ 6.022.955**	**$ 6.022.955**	**$ 6.022.955**
639		1.3.4.5.1.24.	Acero	3 d	mié 22/10/25	vie 24/10/25	$ 3.490.955	$ 3.490.955	$ 3.490.955
640		1.3.4.5.1.24.	Concreto	5 d	vie 31/10/25	vie 7/11/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
641		**1.3.4.5.1.24**	**Vigas Longitudinales**	**13 d**	**jue 18/12/25**	**mar 6/01/26**	**$ 4.767.710**	**$ 4.767.710**	**$ 4.767.710**
642		1.3.4.5.1.24.	Acero	3 d	jue 18/12/25	lun 22/12/25	$ 2.235.710	$ 2.235.710	$ 2.235.710
643		1.3.4.5.1.24.	Concreto	10 d	mar 23/12/25	mar 6/01/26	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
644		**1.3.4.5.1.24**	**Vigas Transversales**	**13 d**	**jue 18/12/25**	**mar 6/01/26**	**$ 6.872.275**	**$ 6.872.275**	**$ 6.872.275**
645		1.3.4.5.1.24.	Acero	3 d	jue 18/12/25	lun 22/12/25	$ 4.340.275	$ 4.340.275	$ 4.340.275
646		1.3.4.5.1.24.	Concreto	10 d	mar 23/12/25	mar 6/01/26	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
647		**1.3.4.5.1.24**	**Tierra armada**	**35 d**	**vie 7/11/25**	**lun 22/12/25**	**$ 143.614.615**	**$ 143.614.615**	**$ 143.614.615**
648		1.3.4.5.1.24.	RELLENO CON GEOBLOQUE	35 d	vie 7/11/25	lun 22/12/25	$ 143.614.615	$ 143.614.615	$ 143.614.615
649		**1.3.4.5.1.24**	**Fachada en Mamposteria**	**21 d**	**vie 24/10/25**	**jue 20/11/25**	**$ 13.062.817**	**$ 13.062.817**	**$ 13.062.817**
650		**1.3.4.5.1.24**	**Dobelas**	**2 d**	**vie 24/10/25**	**lun 27/10/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
651		1.3.4.5.1.24.	Acero	2 d	vie 24/10/25	lun 27/10/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
652		**1.3.4.5.1.24**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**5 d**	**lun 27/10/25**	**sáb 1/11/25**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**
653		1.3.4.5.1.24.	Concreto	1 d	vie 31/10/25	sáb 1/11/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
654		1.3.4.5.1.24.	Bloque en Concreto	5 d	lun 27/10/25	sáb 1/11/25	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
655		**1.3.4.5.1.24**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**8 d**	**lun 10/11/25**	**jue 20/11/25**	**$ 156.125**	**$ 156.125**	**$ 156.125**
656		1.3.4.5.1.24.	Concreto	2 d	mié 19/11/25	jue 20/11/25	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
657		1.3.4.5.1.24.	Bloque en Concreto	6 d	lun 10/11/25	mar 18/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
658		**1.3.4.5.1.24**	**Viga de Amarre**	**6 d**	**sáb 1/11/25**	**lun 10/11/25**	**$ 93.675**	**$ 93.675**	**$ 93.675**
659		1.3.4.5.1.24.	Acero	2 d	sáb 1/11/25	mié 5/11/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
660		1.3.4.5.1.24.	Concreto	4 d	mié 5/11/25	lun 10/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
661		1.3.4.5.1.25	Fin de Eje 11-12	0 d	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
662		1.3.4.5.1.26	PLACA DE PROTECCIÓN	10 d	mar 20/01/26	sáb 31/01/26	$ 75.046.246	$ 75.046.246	$ 75.046.246
663		**1.3.4.5.1.27**	**PAVIMENTO**	**64 d**	**sáb 31/01/26**	**jue 23/04/26**	**$ 349.717.706**	**$ 349.717.706**	**$ 349.717.706**
664		1.3.4.5.1.27.	Subbase	22 d	sáb 31/01/26	vie 27/02/26	$ 101.866.925	$ 101.866.925	$ 101.866.925
665		1.3.4.5.1.27.	Base	22 d	vie 27/02/26	vie 27/03/26	$ 104.982.171	$ 104.982.171	$ 104.982.171
666		1.3.4.5.1.27.	Mezcla Asfaltica - GCR	10 d	vie 27/03/26	vie 10/04/26	$ 107.465.110	$ 107.465.110	$ 107.465.110
667		1.3.4.5.1.27.	Mezcla Asfaltica - MD12	10 d	vie 10/04/26	jue 23/04/26	$ 35.403.500	$ 35.403.500	$ 35.403.500
668		1.3.4.5.1.28	Baranda Vehicular	47 d	mar 31/03/26	lun 1/06/26	$ 338.624.580	$ 338.624.580	$ 338.624.580
669		1.3.4.5.1.29	RELLENO GEOBLOQUE EXTERNO	9 d	mié 20/05/26	sáb 30/05/26	$ 357.346.960	$ 357.346.960	$ 357.346.960
670		1.3.4.5.2	Fin de Aproche Oriental	0 d	lun 1/06/26	lun 1/06/26	$ 0	$ 0	$ 0
671		**1.3.4.5.3**	**OREJA ORIENTAL**	**553 d**	**lun 22/07/24**	**vie 3/07/26**	**$ 3.490.685.809**	**$ 3.490.414.…**	**$ 3.495.693.520**
672		1.3.4.5.3.1	Demolición	10 d	mar 18/03/25	mar 1/04/25	$ 4.129.834	$ 4.129.834	$ 4.129.834

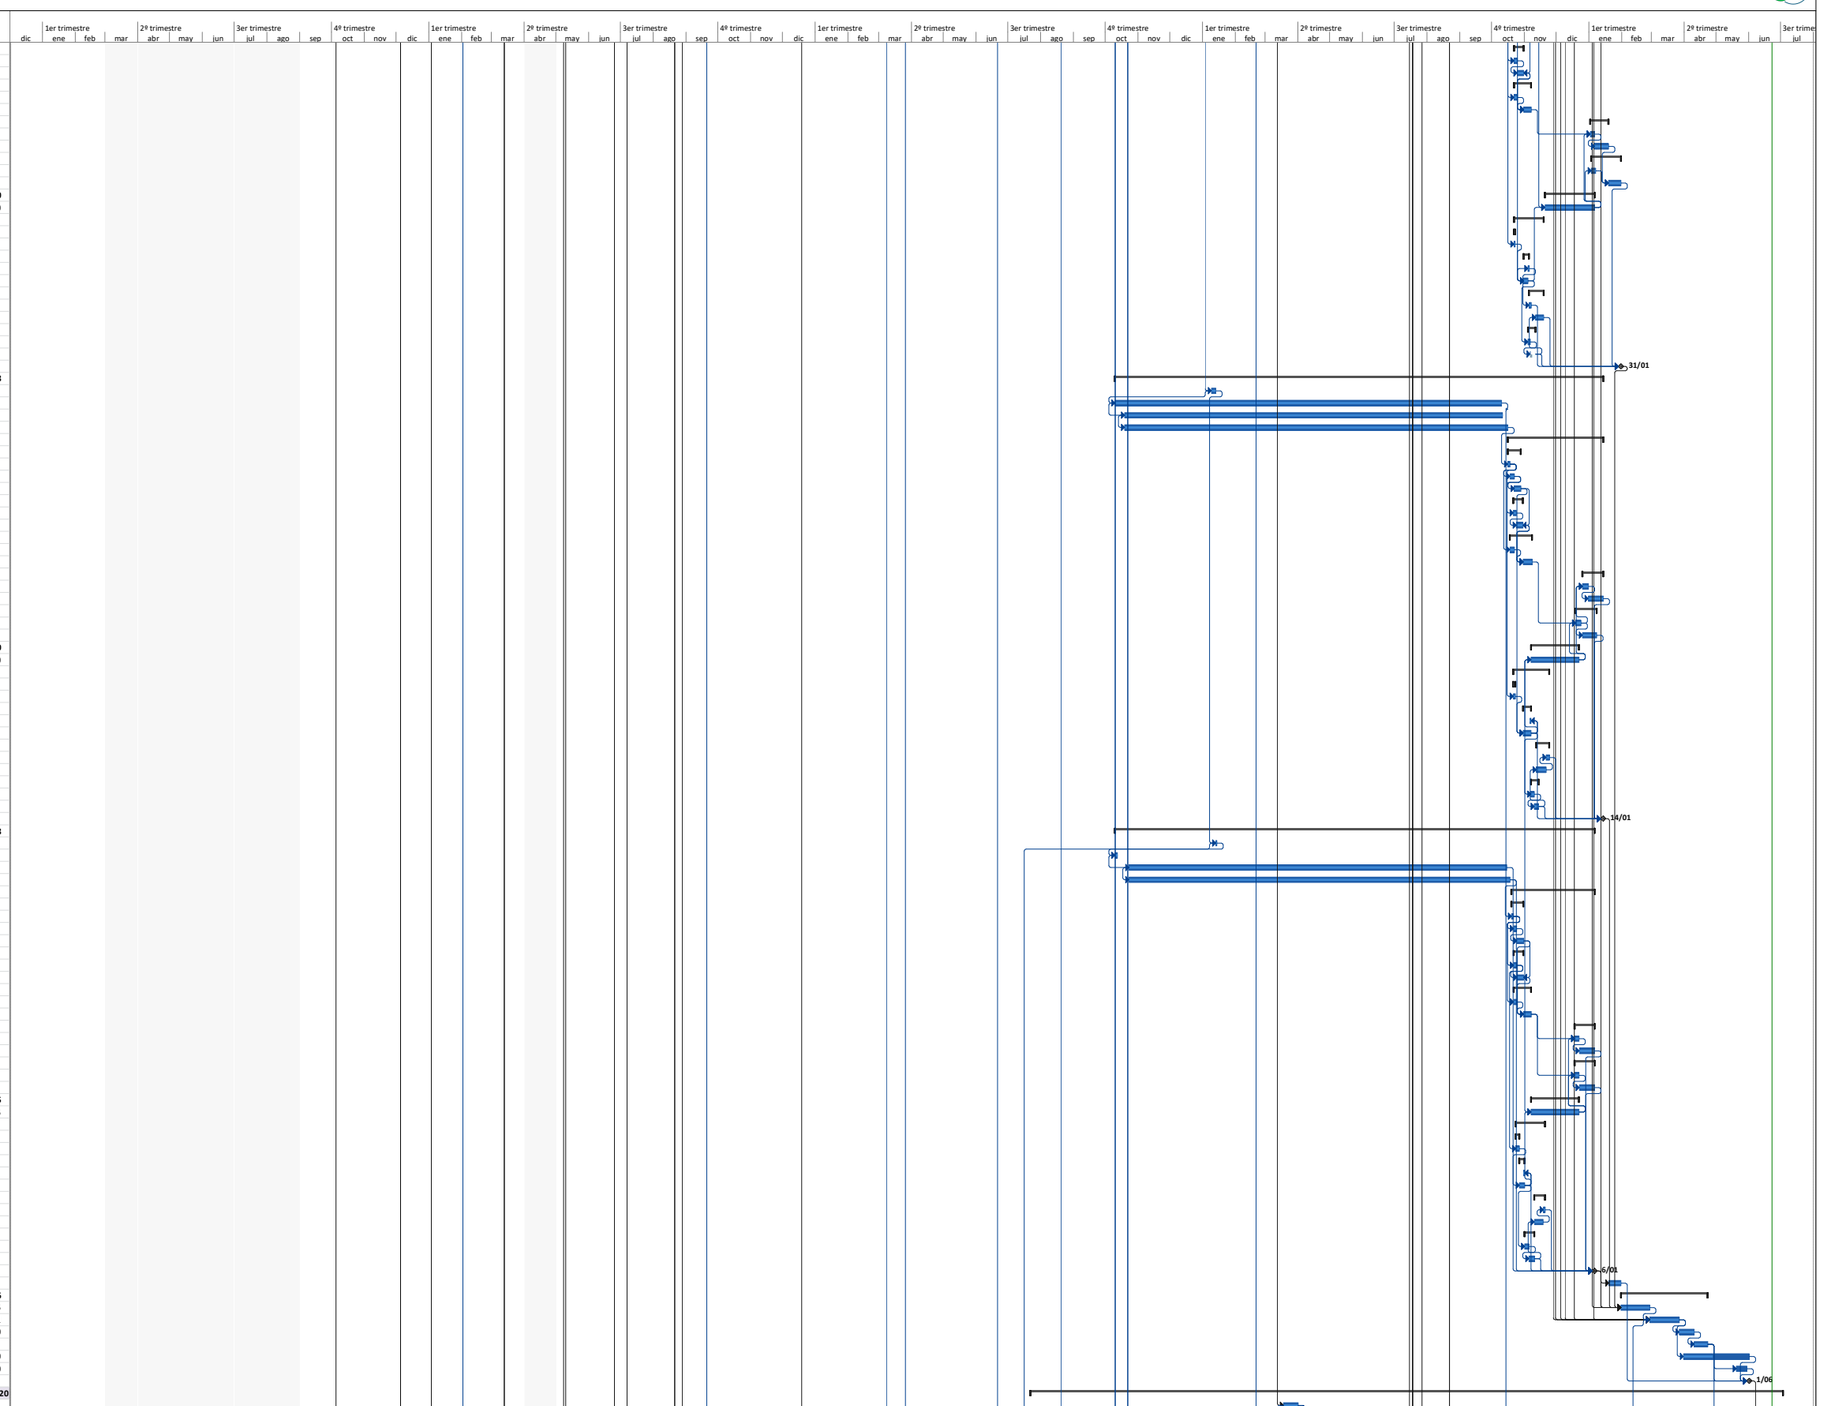

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito externo · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · Sólo el comienzo · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo · Sólo duración · Resumen manual · Sólo fin · Tareas críticas · Progreso

Proyecto: IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB8-20221201
Fecha: mar 23/06/26


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
673		1.3.4.5.3.2	**EJE 1-2**	**175,37 d**	**mar 10/06/25**	**vie 23/01/26**	**$ 55.380.438**	**$ 55.380.438**	**$ 55.380.438**
674		1.3.4.5.3.2.1	Excavación	85 d	mar 10/06/25	vie 26/09/25	$ 1.455.544	$ 1.455.544	$ 1.455.544
675		1.3.4.5.3.2.2	Mejoramiento de Subrasante	4 d	mar 30/09/25	lun 6/10/25	$ 255.544	$ 255.544	$ 255.544
676		1.3.4.5.3.2.3	**Estructura**	**80,37 d**	**jue 9/10/25**	**vie 23/01/26**	**$ 53.669.350**	**$ 53.669.350**	**$ 53.669.350**
677		1.3.4.5.3.2.3	**Zapatas**	**7 d**	**jue 9/10/25**	**sáb 18/10/25**	**$ 16.335.010**	**$ 16.335.010**	**$ 16.335.010**
678		1.3.4.5.3.2.3	Solado	2 d	jue 9/10/25	sáb 11/10/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
679		1.3.4.5.3.2.3	Acero	2 d	sáb 11/10/25	mié 15/10/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
680		1.3.4.5.3.2.3	Concreto	3 d	mié 15/10/25	sáb 18/10/25	$ 8.229.000	$ 8.229.000	$ 8.229.000
681		1.3.4.5.3.2.3	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**sáb 11/10/25**	**mié 22/10/25**	**$ 6.735.405**	**$ 6.735.405**	**$ 6.735.405**
682		1.3.4.5.3.2.3	Acero	3 d	sáb 11/10/25	jue 16/10/25	$ 2.304.405	$ 2.304.405	$ 2.304.405
683		1.3.4.5.3.2.3	Concreto	5 d	jue 16/10/25	mié 22/10/25	$ 4.431.000	$ 4.431.000	$ 4.431.000
684		1.3.4.5.3.2.3	**Columnas**	**13 d**	**sáb 11/10/25**	**mar 28/10/25**	**$ 7.909.465**	**$ 7.909.465**	**$ 7.909.465**
685		1.3.4.5.3.2.3	Acero	3 d	sáb 11/10/25	jue 16/10/25	$ 3.478.465	$ 3.478.465	$ 3.478.465
686		1.3.4.5.3.2.3	Concreto	5 d	mié 22/10/25	mar 28/10/25	$ 4.431.000	$ 4.431.000	$ 4.431.000
687		1.3.4.5.3.2.3	**Vigas Longitudinales**	**7,75 d**	**vie 12/12/25**	**lun 22/12/25**	**$ 7.528.520**	**$ 7.528.520**	**$ 7.528.520**
688		1.3.4.5.3.2.3	Acero	3 d	vie 12/12/25	mar 16/12/25	$ 3.097.520	$ 3.097.520	$ 3.097.520
689		1.3.4.5.3.2.3	Concreto	5 d	mar 16/12/25	lun 22/12/25	$ 4.431.000	$ 4.431.000	$ 4.431.000
690		1.3.4.5.3.2.3	**Vigas Transversales**	**7,75 d**	**vie 12/12/25**	**lun 22/12/25**	**$ 8.327.880**	**$ 8.327.880**	**$ 8.327.880**
691		1.3.4.5.3.2.3	Acero	3 d	vie 12/12/25	mar 16/12/25	$ 3.896.880	$ 3.896.880	$ 3.896.880
692		1.3.4.5.3.2.3	Concreto	5 d	mar 16/12/25	lun 22/12/25	$ 4.431.000	$ 4.431.000	$ 4.431.000
693		1.3.4.5.3.2.3	**Placa de Concreto**	**30 d**	**lun 15/12/25**	**vie 23/01/26**	**$ 6.833.070**	**$ 6.833.070**	**$ 6.833.070**
694		1.3.4.5.3.2.3	Acero	15 d	lun 15/12/25	sáb 3/01/26	$ 3.035.070	$ 3.035.070	$ 3.035.070
695		1.3.4.5.3.2.3	Concreto	15 d	sáb 3/01/26	vie 23/01/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
696		1.3.4.5.3.3	Fin de Eje 1-2	0 d	vie 23/01/26	vie 23/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
697		1.3.4.5.3.4	**EJE 2-3**	247,63 d	**mié 29/01/25**	**vie 12/12/25**	**$ 308.160.670**	**$ 308.160.670**	**$ 308.160.670**
698		1.3.4.5.3.4.1	Excavación	**137 d**	mar 15/04/25	jue 9/10/25	$ 1.455.544	$ 1.455.544	$ 1.455.544
699		1.3.4.5.3.4.2	Pilotes FDP	**3 d**	jue 9/10/25	mar 14/10/25	$ 42.830.000	$ 42.830.000	$ 42.830.000
700		1.3.4.5.3.4.3	CAPA DE TRANSFERENCIA	1 d	mié 29/01/25	jue 30/01/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
701		1.3.4.5.3.4.4	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	1 d	jue 30/01/25	vie 31/01/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
702		1.3.4.5.3.4.5	**Estructura**	**238,63 d**	**lun 10/02/25**	**vie 12/12/25**	**$ 42.526.190**	**$ 42.526.190**	**$ 42.526.190**
703		1.3.4.5.3.4.5	**Zapatas**	11 d	**lun 10/02/25**	**sáb 22/02/25**	**$ 15.069.010**	**$ 15.069.010**	**$ 15.069.010**
704		1.3.4.5.3.4.5	Solado	2 d	lun 10/02/25	mar 11/02/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
705		1.3.4.5.3.4.5	Acero	**4 d**	jue 13/02/25	mar 18/02/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
706		1.3.4.5.3.4.5	Concreto	3 d	mié 19/02/25	sáb 22/02/25	$ 6.963.000	$ 6.963.000	$ 6.963.000
707		1.3.4.5.3.4.5	**Vigas de Cimentación**	11 d	**jue 13/02/25**	**mié 26/02/25**	**$ 6.027.465**	**$ 6.027.465**	**$ 6.027.465**
708		1.3.4.5.3.4.5	Acero	**4 d**	jue 13/02/25	mar 18/02/25	$ 2.229.465	$ 2.229.465	$ 2.229.465
709		1.3.4.5.3.4.5	Concreto	3 d	sáb 22/02/25	mié 26/02/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
710		1.3.4.5.3.4.5	**Columnas**	18 d	**jue 13/02/25**	**jue 6/03/25**	**$ 7.282.710**	**$ 7.282.710**	**$ 7.282.710**
711		1.3.4.5.3.4.5	Acero	8 d	jue 13/02/25	sáb 22/02/25	$ 3.484.710	$ 3.484.710	$ 3.484.710
712		1.3.4.5.3.4.5	Concreto	7 d	mié 26/02/25	jue 6/03/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
713		1.3.4.5.3.4.5	**Vigas Longitudinales**	**10 d**	**vie 28/11/25**	**vie 12/12/25**	**$ 6.452.125**	**$ 6.452.125**	**$ 6.452.125**
714		1.3.4.5.3.4.5	Acero	3 d	vie 28/11/25	mié 3/12/25	$ 2.654.125	$ 2.654.125	$ 2.654.125
715		1.3.4.5.3.4.5	Concreto	7 d	mié 3/12/25	vie 12/12/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
716		1.3.4.5.3.4.5	**Vigas Transversales**	**10 d**	**vie 28/11/25**	**vie 12/12/25**	**$ 7.694.880**	**$ 7.694.880**	**$ 7.694.880**
717		1.3.4.5.3.4.5	Acero	3 d	vie 28/11/25	mié 3/12/25	$ 3.896.880	$ 3.896.880	$ 3.896.880
718		1.3.4.5.3.4.5	Concreto	7 d	mié 3/12/25	vie 12/12/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
719		1.3.4.5.3.4.6	APROBACIÓN GEOBLOQUE	0 d	lun 21/07/25	lun 21/07/25	$ 0	$ 0	$ 0
720		1.3.4.5.3.4.7	**Tierra armada**	**25 d**	**mar 28/10/25**	**lun 1/12/25**	**$ 203.437.203**	**$ 203.437.203**	**$ 203.437.203**
721		1.3.4.5.3.4.7	RELLENO CON GEOBLOQUE	25 d	mar 28/10/25	lun 1/12/25	$ 203.437.203	$ 203.437.203	$ 203.437.203
722		1.3.4.5.3.4.8	**Fachada en Mampostería**	**22 d**	**mar 14/10/25**	**mar 11/11/25**	**$ 14.328.817**	**$ 14.328.817**	**$ 14.328.817**
723		1.3.4.5.3.4.8	**Dobelas**	**1 d**	**mar 14/10/25**	**mié 15/10/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
724		1.3.4.5.3.4.8	Acero	1 d	mar 14/10/25	mié 15/10/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
725		1.3.4.5.3.4.8	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**4 d**	**vie 17/10/25**	**mié 22/10/25**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**
726		1.3.4.5.3.4.8	Concreto	1 d	lun 20/10/25	mar 21/10/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
727		1.3.4.5.3.4.8	Bloque en Concreto	4 d	vie 17/10/25	mié 22/10/25	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
728		1.3.4.5.3.4.8	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**9 d**	**mié 29/10/25**	**mar 11/11/25**	**$ 789.125**	**$ 789.125**	**$ 789.125**
729		1.3.4.5.3.4.8	Concreto	2 d	mié 5/11/25	vie 7/11/25	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
730		1.3.4.5.3.4.8	Bloque en Concreto	9 d	mié 29/10/25	mar 11/11/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
731		1.3.4.5.3.4.8	**Viga de Amarre**	**6 d**	**mié 22/10/25**	**mié 29/10/25**	**$ 726.675**	**$ 726.675**	**$ 726.675**
732		1.3.4.5.3.4.8	Acero	2 d	mié 22/10/25	vie 24/10/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
733		1.3.4.5.3.4.8	Concreto	4 d	vie 24/10/25	mié 29/10/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
734		1.3.4.5.3.5	Fin de Eje 2-3	0 d	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 0	$ 0	$ 0
735		1.3.4.5.3.6	**EJE 3-4**	**269,75 d**	**jue 30/01/25**	**mar 13/01/26**	**$ 307.303.150**	**$ 307.303.150**	**$ 307.303.150**
736		1.3.4.5.3.6.1	Excavación	2 d	sáb 12/04/25	mar 15/04/25	$ 1.455.544	$ 1.455.544	$ 1.455.544
737		1.3.4.5.3.6.2	Pilotes FDP	3 d	mié 30/04/25	lun 5/05/25	$ 42.589.000	$ 42.589.000	$ 42.589.000
738		1.3.4.5.3.6.3	CAPA DE TRANSFERENCIA	4 d	jue 30/01/25	mar 4/02/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
739		1.3.4.5.3.6.4	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	4 d	lun 3/02/25	vie 7/02/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
740		1.3.4.5.3.6.5	**Estructura**	**61,12 d**	**jue 23/10/25**	**mar 13/01/26**	**$ 43.175.670**	**$ 43.175.670**	**$ 43.175.670**
741		1.3.4.5.3.6.5	**Zapatas**	**7 d**	**jue 23/10/25**	**vie 31/10/25**	**$ 15.069.010**	**$ 15.069.010**	**$ 15.069.010**
742		1.3.4.5.3.6.5	Solado	2 d	jue 23/10/25	sáb 25/10/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
743		1.3.4.5.3.6.5	Acero	2 d	sáb 25/10/25	mar 28/10/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
744		1.3.4.5.3.6.5	Concreto	3 d	mar 28/10/25	vie 31/10/25	$ 6.963.000	$ 6.963.000	$ 6.963.000
745		1.3.4.5.3.6.5	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**sáb 25/10/25**	**jue 6/11/25**	**$ 5.971.260**	**$ 5.971.260**	**$ 5.971.260**
746		1.3.4.5.3.6.5	Acero	3 d	sáb 25/10/25	mié 29/10/25	$ 2.173.260	$ 2.173.260	$ 2.173.260
747		1.3.4.5.3.6.5	Concreto	5 d	mié 29/10/25	jue 6/11/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
748		1.3.4.5.3.6.5	**Columnas**	**13 d**	**sáb 25/10/25**	**mié 12/11/25**	**$ 7.276.465**	**$ 7.276.465**	**$ 7.276.465**
749		1.3.4.5.3.6.5	Acero	3 d	sáb 25/10/25	mié 29/10/25	$ 3.478.465	$ 3.478.465	$ 3.478.465
750		1.3.4.5.3.6.5	Concreto	5 d	jue 6/11/25	mié 12/11/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
751		1.3.4.5.3.6.5	**Vigas Longitudinales**	**12 d**	**sáb 27/12/25**	**mar 13/01/26**	**$ 6.701.925**	**$ 6.701.925**	**$ 6.701.925**
752		1.3.4.5.3.6.5	Acero	5 d	sáb 27/12/25	sáb 3/01/26	$ 2.903.925	$ 2.903.925	$ 2.903.925
753		1.3.4.5.3.6.5	Concreto	7 d	sáb 3/01/26	mar 13/01/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
754		1.3.4.5.3.6.5	**Vigas Transversales**	**12 d**	**sáb 27/12/25**	**mar 13/01/26**	**$ 8.157.010**	**$ 8.157.010**	**$ 8.157.010**
755		1.3.4.5.3.6.5	Acero	5 d	sáb 27/12/25	sáb 3/01/26	$ 4.359.010	$ 4.359.010	$ 4.359.010
756		1.3.4.5.3.6.5	Concreto	7 d	sáb 3/01/26	mar 13/01/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
757		1.3.4.5.3.6.6	**Tierra armada**	**25 d**	**jue 27/11/25**	**mar 30/12/25**	**$ 203.437.203**	**$ 203.437.203**	**$ 203.437.203**
758		1.3.4.5.3.6.6	RELLENO CON GEOBLOQUE	25 d	jue 27/11/25	mar 30/12/25	$ 203.437.203	$ 203.437.203	$ 203.437.203
759		1.3.4.5.3.6.7	**Fachada en Mampostería**	**19 d**	**lun 27/10/25**	**vie 21/11/25**	**$ 13.062.817**	**$ 13.062.817**	**$ 13.062.817**
760		1.3.4.5.3.6.7	**Dobelas**	**1 d**	**lun 27/10/25**	**mar 28/10/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
761		1.3.4.5.3.6.7	Acero	1 d	lun 27/10/25	mar 28/10/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
762		1.3.4.5.3.6.7	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**7 d**	**mar 28/10/25**	**vie 7/11/25**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**
763		1.3.4.5.3.6.7	Concreto	1 d	jue 6/11/25	vie 7/11/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
764		1.3.4.5.3.6.7	Bloque en Concreto	6 d	mar 28/10/25	jue 6/11/25	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
765		1.3.4.5.3.6.7	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**11 d**	**vie 7/11/25**	**vie 21/11/25**	**$ 156.125**	**$ 156.125**	**$ 156.125**
766		1.3.4.5.3.6.7	Concreto	2 d	mié 19/11/25	vie 21/11/25	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
767		1.3.4.5.3.6.7	Bloque en Concreto	9 d	vie 7/11/25	mié 19/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
768		1.3.4.5.3.6.7	**Viga de Amarre**	**5 d**	**jue 6/11/25**	**mié 12/11/25**	**$ 93.675**	**$ 93.675**	**$ 93.675**
769		1.3.4.5.3.6.7	Acero	2 d	jue 6/11/25	sáb 8/11/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
770		1.3.4.5.3.6.7	Concreto	3 d	sáb 8/11/25	mié 12/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
771		1.3.4.5.3.7	Fin de Eje 3-4	0 d	mar 13/01/26	mar 13/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
772		1.3.4.5.3.8	**EJE 4-5**	**410,75 d**	**jue 1/08/24**	**sáb 10/01/26**	**$ 306.791.060**	**$ 306.791.060**	**$ 306.791.060**
773		1.3.4.5.3.8.1	Excavación	2 d	jue 10/04/25	sáb 12/04/25	$ 1.455.544	$ 1.455.544	$ 1.455.544
774		1.3.4.5.3.8.2	Pilotes FDP	3 d	lun 28/04/25	vie 2/05/25	$ 42.589.000	$ 42.589.000	$ 42.589.000
775		1.3.4.5.3.8.3	CAPA DE TRANSFERENCIA	4 d	jue 1/08/24	mar 6/08/24	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
776		1.3.4.5.3.8.4	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	4 d	jue 1/08/24	mar 6/08/24	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
777		1.3.4.5.3.8.5	**Estructura**	**58,12 d**	**sáb 25/10/25**	**sáb 10/01/26**	**$ 42.663.580**	**$ 42.663.580**	**$ 42.663.580**
778		1.3.4.5.3.8.5	**Zapatas**	**7 d**	**sáb 25/10/25**	**mié 5/11/25**	**$ 15.069.010**	**$ 15.069.010**	**$ 15.069.010**
779		1.3.4.5.3.8.5	Solado	2 d	sáb 25/10/25	mar 28/10/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
780		1.3.4.5.3.8.5	Acero	2 d	mar 28/10/25	jue 30/10/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
781		1.3.4.5.3.8.5	Concreto	3 d	jue 30/10/25	mié 5/11/25	$ 6.963.000	$ 6.963.000	$ 6.963.000
782		1.3.4.5.3.8.5	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**mar 28/10/25**	**sáb 8/11/25**	**$ 6.077.425**	**$ 6.077.425**	**$ 6.077.425**
783		1.3.4.5.3.8.5	Acero	3 d	mar 28/10/25	vie 31/10/25	$ 2.279.425	$ 2.279.425	$ 2.279.425
784		1.3.4.5.3.8.5	Concreto	5 d	vie 31/10/25	sáb 8/11/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000

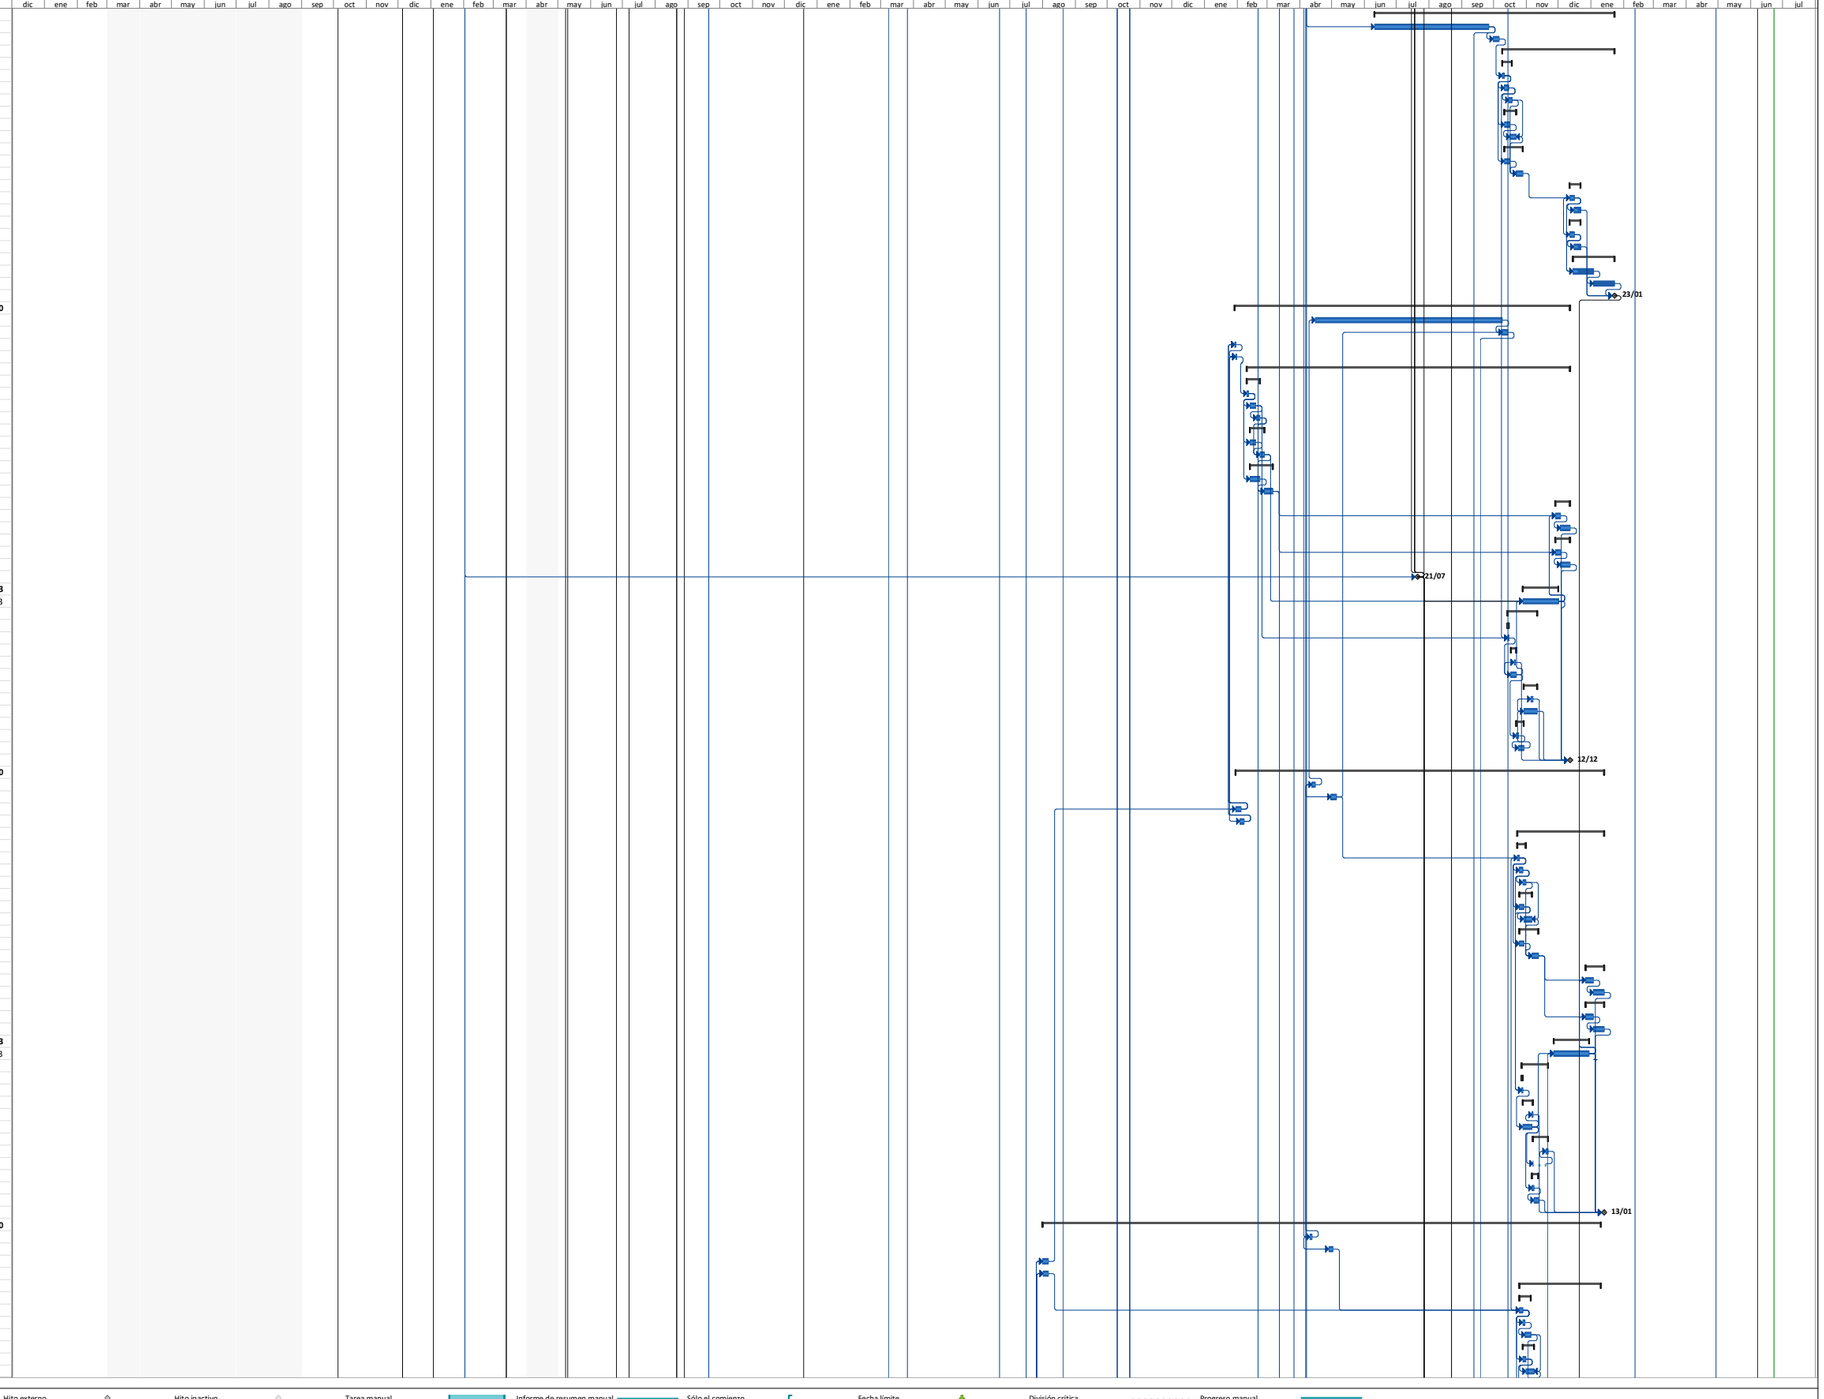

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | Sólo el comienzo | Fecha límite | División crítica | Progreso manual
División | Resumen | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo | Sólo duración | Resumen manual | Sólo fin | Tareas críticas | Progreso


Proyecto: IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB8-20221201
Fecha: mar 23/06/26

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
785		1.3.4.5.3.8.5	**Columnas**	**13 d**	**mar 28/10/25**	**vie 14/11/25**	**$ 7.282.710**	**$ 7.282.710**	**$ 7.282.710**
786		1.3.4.5.3.8.5	Acero	3 d	mar 28/10/25	vie 31/10/25	$ 3.484.710	$ 3.484.710	$ 3.484.710
787		1.3.4.5.3.8.5	Concreto	5 d	sáb 8/11/25	vie 14/11/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
788		1.3.4.5.3.8.5	**Vigas Longitudinales**	**10 d**	**lun 29/12/25**	**sáb 10/01/26**	**$ 6.539.555**	**$ 6.539.555**	**$ 6.539.555**
789		1.3.4.5.3.8.5	Acero	3 d	lun 29/12/25	vie 2/01/26	$ 2.741.555	$ 2.741.555	$ 2.741.555
790		1.3.4.5.3.8.5	Concreto	7 d	vie 2/01/26	sáb 10/01/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
791		1.3.4.5.3.8.6	**Vigas Transversales**	**10 d**	**lun 29/12/25**	**sáb 10/01/26**	**$ 7.694.880**	**$ 7.694.880**	**$ 7.694.880**
792		1.3.4.5.3.8.6	Acero	3 d	lun 29/12/25	vie 2/01/26	$ 3.896.880	$ 3.896.880	$ 3.896.880
793		1.3.4.5.3.8.6	Concreto	7 d	vie 2/01/26	sáb 10/01/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
794		1.3.4.5.3.8.6	**Tierra armada**	**25 d**	**jue 27/11/25**	**mar 30/12/25**	**$ 203.437.203**	**$ 203.437.203**	**$ 203.437.203**
795		1.3.4.5.3.8.6	RELLENO CON GEOBLOQUE	25 d	jue 27/11/25	mar 30/12/25	$ 203.437.203	$ 203.437.203	$ 203.437.203
796		1.3.4.5.3.8.7	**Fachada en Mampostería**	**23 d**	**jue 30/10/25**	**lun 1/12/25**	**$ 13.062.817**	**$ 13.062.817**	**$ 13.062.817**
797		1.3.4.5.3.8.7	**Dobelas**	**1 d**	**jue 30/10/25**	**vie 31/10/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
798		1.3.4.5.3.8.7	Acero	1 d	jue 30/10/25	vie 31/10/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
799		1.3.4.5.3.8.7	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**3 d**	**vie 31/10/25**	**jue 6/11/25**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**
800		1.3.4.5.3.8.7	Concreto	1 d	mié 5/11/25	jue 6/11/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
801		1.3.4.5.3.8.7	Bloque en Concreto	2 d	vie 31/10/25	mié 5/11/25	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
802		1.3.4.5.3.8.7	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**12 d**	**vie 14/11/25**	**lun 1/12/25**	**$ 156.125**	**$ 156.125**	**$ 156.125**
803		1.3.4.5.3.8.7	Concreto	3 d	mié 26/11/25	lun 1/12/25	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
804		1.3.4.5.3.8.7	Bloque en concreto	9 d	vie 14/11/25	mié 26/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
805		1.3.4.5.3.8.7	**Viga de Amarre**	**7 d**	**jue 6/11/25**	**vie 14/11/25**	**$ 93.675**	**$ 93.675**	**$ 93.675**
806		1.3.4.5.3.8.7	Acero	2 d	jue 6/11/25	sáb 8/11/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
807		1.3.4.5.3.8.7	Concreto	5 d	sáb 8/11/25	vie 14/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
808		1.3.4.5.3.9	Fin de Eje 4-5	0 d	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
809		1.3.4.5.3.10	**EJE 5-6**	**409 d**	**mié 31/07/24**	**jue 8/01/26**	**$ 343.666.911**	**$ 343.666.911**	**$ 343.666.911**
810		1.3.4.5.3.10	Excavación	2 d	mié 31/07/24	vie 2/08/24	$ 1.447.768	$ 1.447.768	$ 1.447.768
811		1.3.4.5.3.10	Pilotes FDP	3 d	vie 16/08/24	mié 21/08/24	$ 79.035.712	$ 79.035.712	$ 79.035.712
812		1.3.4.5.3.10	CAPA DE TRANSFERENCIA	4 d	mar 6/08/24	lun 12/08/24	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
813		1.3.4.5.3.10	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	4 d	mar 6/08/24	lun 12/08/24	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
814		1.3.4.5.3.10	**Estructura**	**57 d**	**vie 24/10/25**	**jue 8/01/26**	**$ 43.100.495**	**$ 43.100.495**	**$ 43.100.495**
815		1.3.4.5.3.10	**Zapatas**	**7 d**	**vie 24/10/25**	**mar 4/11/25**	**$ 15.075.020**	**$ 15.075.020**	**$ 15.075.020**
816		1.3.4.5.3.10	Solado	2 d	vie 24/10/25	lun 27/10/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
817		1.3.4.5.3.10	Acero	2 d	mar 28/10/25	mié 29/10/25	$ 8.106.010	$ 8.106.010	$ 8.106.010
818		1.3.4.5.3.10	Concreto	3 d	jue 30/10/25	mar 4/11/25	$ 6.963.000	$ 6.963.000	$ 6.963.000
819		1.3.4.5.3.10	**Vigas de Cimentación**	**9 d**	**mar 28/10/25**	**sáb 8/11/25**	**$ 6.102.405**	**$ 6.102.405**	**$ 6.102.405**
820		1.3.4.5.3.10	Acero	4 d	mar 28/10/25	vie 31/10/25	$ 2.304.405	$ 2.304.405	$ 2.304.405
821		1.3.4.5.3.10	Concreto	5 d	sáb 1/11/25	sáb 8/11/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
822		1.3.4.5.3.10	**Columnas**	**14 d**	**mar 28/10/25**	**vie 14/11/25**	**$ 7.288.955**	**$ 7.288.955**	**$ 7.288.955**
823		1.3.4.5.3.10	Acero	3 d	mar 28/10/25	jue 30/10/25	$ 3.490.955	$ 3.490.955	$ 3.490.955
824		1.3.4.5.3.10	Concreto	5 d	sáb 8/11/25	vie 14/11/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
825		1.3.4.5.3.10	**Vigas Longitudinales**	**8 d**	**lun 29/12/25**	**jue 8/01/26**	**$ 6.726.905**	**$ 6.726.905**	**$ 6.726.905**
826		1.3.4.5.3.10	Acero	3 d	lun 29/12/25	vie 2/01/26	$ 2.928.905	$ 2.928.905	$ 2.928.905
827		1.3.4.5.3.10	Concreto	5 d	vie 2/01/26	jue 8/01/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
828		1.3.4.5.3.10	**Vigas Transversales**	**8 d**	**lun 29/12/25**	**jue 8/01/26**	**$ 7.907.210**	**$ 7.907.210**	**$ 7.907.210**
829		1.3.4.5.3.10	Acero	3 d	lun 29/12/25	vie 2/01/26	$ 4.109.210	$ 4.109.210	$ 4.109.210
830		1.3.4.5.3.10	Concreto	5 d	vie 2/01/26	jue 8/01/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
831		1.3.4.5.3.10	**Tierra armada**	**25 d**	**jue 27/11/25**	**mar 30/12/25**	**$ 203.437.203**	**$ 203.437.203**	**$ 203.437.203**
832		1.3.4.5.3.10	RELLENO CON GEOBLOQUE	25 d	jue 27/11/25	mar 30/12/25	$ 203.437.203	$ 203.437.203	$ 203.437.203
833		1.3.4.5.3.10	**Fachada en Mampostería**	**23 d**	**vie 7/11/25**	**sáb 6/12/25**	**$ 13.062.817**	**$ 13.062.817**	**$ 13.062.817**
834		1.3.4.5.3.10	**Dobelas**	**1 d**	**vie 7/11/25**	**sáb 8/11/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
835		1.3.4.5.3.10	Acero	1 d	vie 7/11/25	sáb 8/11/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
836		1.3.4.5.3.10	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**7 d**	**sáb 8/11/25**	**mar 18/11/25**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**
837		1.3.4.5.3.10	Concreto	1 d	sáb 15/11/25	mar 18/11/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
838		1.3.4.5.3.10	Bloque en Concreto	5 d	sáb 8/11/25	vie 14/11/25	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
839		1.3.4.5.3.10	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**12 d**	**vie 21/11/25**	**sáb 6/12/25**	**$ 156.125**	**$ 156.125**	**$ 156.125**
840		1.3.4.5.3.10	Concreto	2 d	jue 4/12/25	sáb 6/12/25	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
841		1.3.4.5.3.10	Bloque en concretno	9 d	vie 21/11/25	mié 3/12/25	$ 0	$ 0	$ 0
842		1.3.4.5.3.10	**Viga de Amarre**	**5 d**	**vie 14/11/25**	**vie 21/11/25**	**$ 93.675**	**$ 93.675**	**$ 93.675**
843		1.3.4.5.3.10	Acero	2 d	vie 14/11/25	mar 18/11/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
844		1.3.4.5.3.10	Concreto	3 d	mar 18/11/25	vie 21/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
845		1.3.4.5.3.11	Fin de Eje 5-6	0 d	jue 8/01/26	jue 8/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
846		1.3.4.5.3.12	**EJE 6-7**	**409 d**	**lun 29/07/24**	**mar 6/01/26**	**$ 306.753.184**	**$ 306.753.184**	**$ 306.753.184**
847		1.3.4.5.3.12	Excavación	2 d	lun 29/07/24	mié 31/07/24	$ 1.447.768	$ 1.447.768	$ 1.447.768
848		1.3.4.5.3.12	Pilotes FDP	3 d	sáb 17/08/24	jue 22/08/24	$ 42.434.000	$ 42.434.000	$ 42.434.000
849		1.3.4.5.3.12	CAPA DE TRANSFERENCIA	4 d	mar 13/08/24	sáb 17/08/24	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
850		1.3.4.5.3.12	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	5 d	lun 12/08/24	sáb 17/08/24	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
851		1.3.4.5.3.12	**Estructura**	**57 d**	**mié 22/10/25**	**mar 6/01/26**	**$ 42.788.480**	**$ 42.788.480**	**$ 42.788.480**
852		1.3.4.5.3.12	**Zapatas**	**10 d**	**mié 22/10/25**	**mié 5/11/25**	**$ 15.069.010**	**$ 15.069.010**	**$ 15.069.010**
853		1.3.4.5.3.12	Solado	2 d	mié 22/10/25	vie 24/10/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
854		1.3.4.5.3.12	Acero	5 d	vie 24/10/25	jue 30/10/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
855		1.3.4.5.3.12	Concreto	3 d	vie 31/10/25	mié 5/11/25	$ 6.963.000	$ 6.963.000	$ 6.963.000
856		1.3.4.5.3.12	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**vie 24/10/25**	**mié 5/11/25**	**$ 6.202.325**	**$ 6.202.325**	**$ 6.202.325**
857		1.3.4.5.3.12	Acero	3 d	vie 24/10/25	mar 28/10/25	$ 2.404.325	$ 2.404.325	$ 2.404.325
858		1.3.4.5.3.12	Concreto	5 d	mié 29/10/25	mié 5/11/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
859		1.3.4.5.3.12	**Columnas**	**13 d**	**vie 24/10/25**	**mar 11/11/25**	**$ 7.257.730**	**$ 7.257.730**	**$ 7.257.730**
860		1.3.4.5.3.12	Acero	3 d	vie 24/10/25	mar 28/10/25	$ 3.459.730	$ 3.459.730	$ 3.459.730
861		1.3.4.5.3.12	Concreto	5 d	mié 5/11/25	mar 11/11/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
862		1.3.4.5.3.12	**Vigas Longitudinales**	**8 d**	**vie 26/12/25**	**mar 6/01/26**	**$ 6.539.555**	**$ 6.539.555**	**$ 6.539.555**
863		1.3.4.5.3.12	Acero	3 d	vie 26/12/25	mar 30/12/25	$ 2.741.555	$ 2.741.555	$ 2.741.555
864		1.3.4.5.3.12	Concreto	5 d	mar 30/12/25	mar 6/01/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
865		1.3.4.5.3.12	**Vigas Transversales**	**8 d**	**vie 26/12/25**	**mar 6/01/26**	**$ 7.719.860**	**$ 7.719.860**	**$ 7.719.860**
866		1.3.4.5.3.12	Acero	3 d	vie 26/12/25	mar 30/12/25	$ 3.921.860	$ 3.921.860	$ 3.921.860
867		1.3.4.5.3.12	Concreto	5 d	mar 30/12/25	mar 6/01/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
868		1.3.4.5.3.12	**Tierra armada**	**25 d**	**jue 27/11/25**	**mar 30/12/25**	**$ 203.437.203**	**$ 203.437.203**	**$ 203.437.203**
869		1.3.4.5.3.12	RELLENO CON GEOBLOQUE	25 d	jue 27/11/25	mar 30/12/25	$ 203.437.203	$ 203.437.203	$ 203.437.203
870		1.3.4.5.3.12	**Fachada en Mampostería**	**25 d**	**mar 28/10/25**	**vie 28/11/25**	**$ 13.062.817**	**$ 13.062.817**	**$ 13.062.817**
871		1.3.4.5.3.12	**Dobelas**	**1 d**	**mar 28/10/25**	**mar 28/10/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
872		1.3.4.5.3.12	Acero	1 d	mar 28/10/25	mar 28/10/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
873		1.3.4.5.3.12	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**9 d**	**mié 29/10/25**	**lun 10/11/25**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**
874		1.3.4.5.3.12	Concreto	1 d	sáb 8/11/25	lun 10/11/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
875		1.3.4.5.3.12	Bloque en Concreto	5 d	mié 29/10/25	mié 5/11/25	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
876		1.3.4.5.3.12	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**12 d**	**jue 13/11/25**	**vie 28/11/25**	**$ 156.125**	**$ 156.125**	**$ 156.125**
877		1.3.4.5.3.12	Concreto	2 d	jue 27/11/25	vie 28/11/25	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
878		1.3.4.5.3.12	Bloque en Concreto	8 d	jue 13/11/25	lun 24/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
879		1.3.4.5.3.12	**Viga de Amarre**	**6 d**	**mié 5/11/25**	**mié 12/11/25**	**$ 93.675**	**$ 93.675**	**$ 93.675**
880		1.3.4.5.3.12	Acero	2 d	mié 5/11/25	vie 7/11/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
881		1.3.4.5.3.12	Concreto	4 d	vie 7/11/25	mié 12/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
882		1.3.4.5.3.13	Fin de Eje 6-7	0 d	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
883		1.3.4.5.3.14	**EJE 7-8**	**416 d**	**vie 26/07/24**	**mar 13/01/26**	**$ 340.823.173**	**$ 340.823.173**	**$ 340.823.173**
884		1.3.4.5.3.14	Excavación	2 d	vie 26/07/24	lun 29/07/24	$ 1.396.452	$ 1.396.452	$ 1.396.452
885		1.3.4.5.3.14	Pilotes FDP	5 d	lun 12/08/24	sáb 17/08/24	$ 42.434.000	$ 42.434.000	$ 42.434.000
886		1.3.4.5.3.14	CAPA DE TRANSFERENCIA	4 d	vie 16/08/24	jue 22/08/24	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
887		1.3.4.5.3.14	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	4 d	vie 16/08/24	jue 22/08/24	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
888		1.3.4.5.3.14	**Estructura**	**62 d**	**mié 22/10/25**	**mar 13/01/26**	**$ 76.909.785**	**$ 76.909.785**	**$ 76.909.785**
889		1.3.4.5.3.14	**Zapatas**	**7 d**	**mié 22/10/25**	**jue 30/10/25**	**$ 15.069.010**	**$ 15.069.010**	**$ 15.069.010**
890		1.3.4.5.3.14	Solado	2 d	mié 22/10/25	vie 24/10/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
891		1.3.4.5.3.14	Acero	2 d	vie 24/10/25	lun 27/10/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
892		1.3.4.5.3.14	Concreto	3 d	mar 28/10/25	jue 30/10/25	$ 6.963.000	$ 6.963.000	$ 6.963.000
893		1.3.4.5.3.14	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**vie 24/10/25**	**mié 5/11/25**	**$ 6.008.730**	**$ 6.008.730**	**$ 6.008.730**
894		1.3.4.5.3.14	Acero	3 d	vie 24/10/25	mar 28/10/25	$ 2.210.730	$ 2.210.730	$ 2.210.730
895		1.3.4.5.3.14	Concreto	5 d	mié 29/10/25	mié 5/11/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
896		1.3.4.5.3.14	**Columnas**	**13 d**	**vie 24/10/25**	**mar 11/11/25**	**$ 41.541.405**	**$ 41.541.405**	**$ 41.541.405**

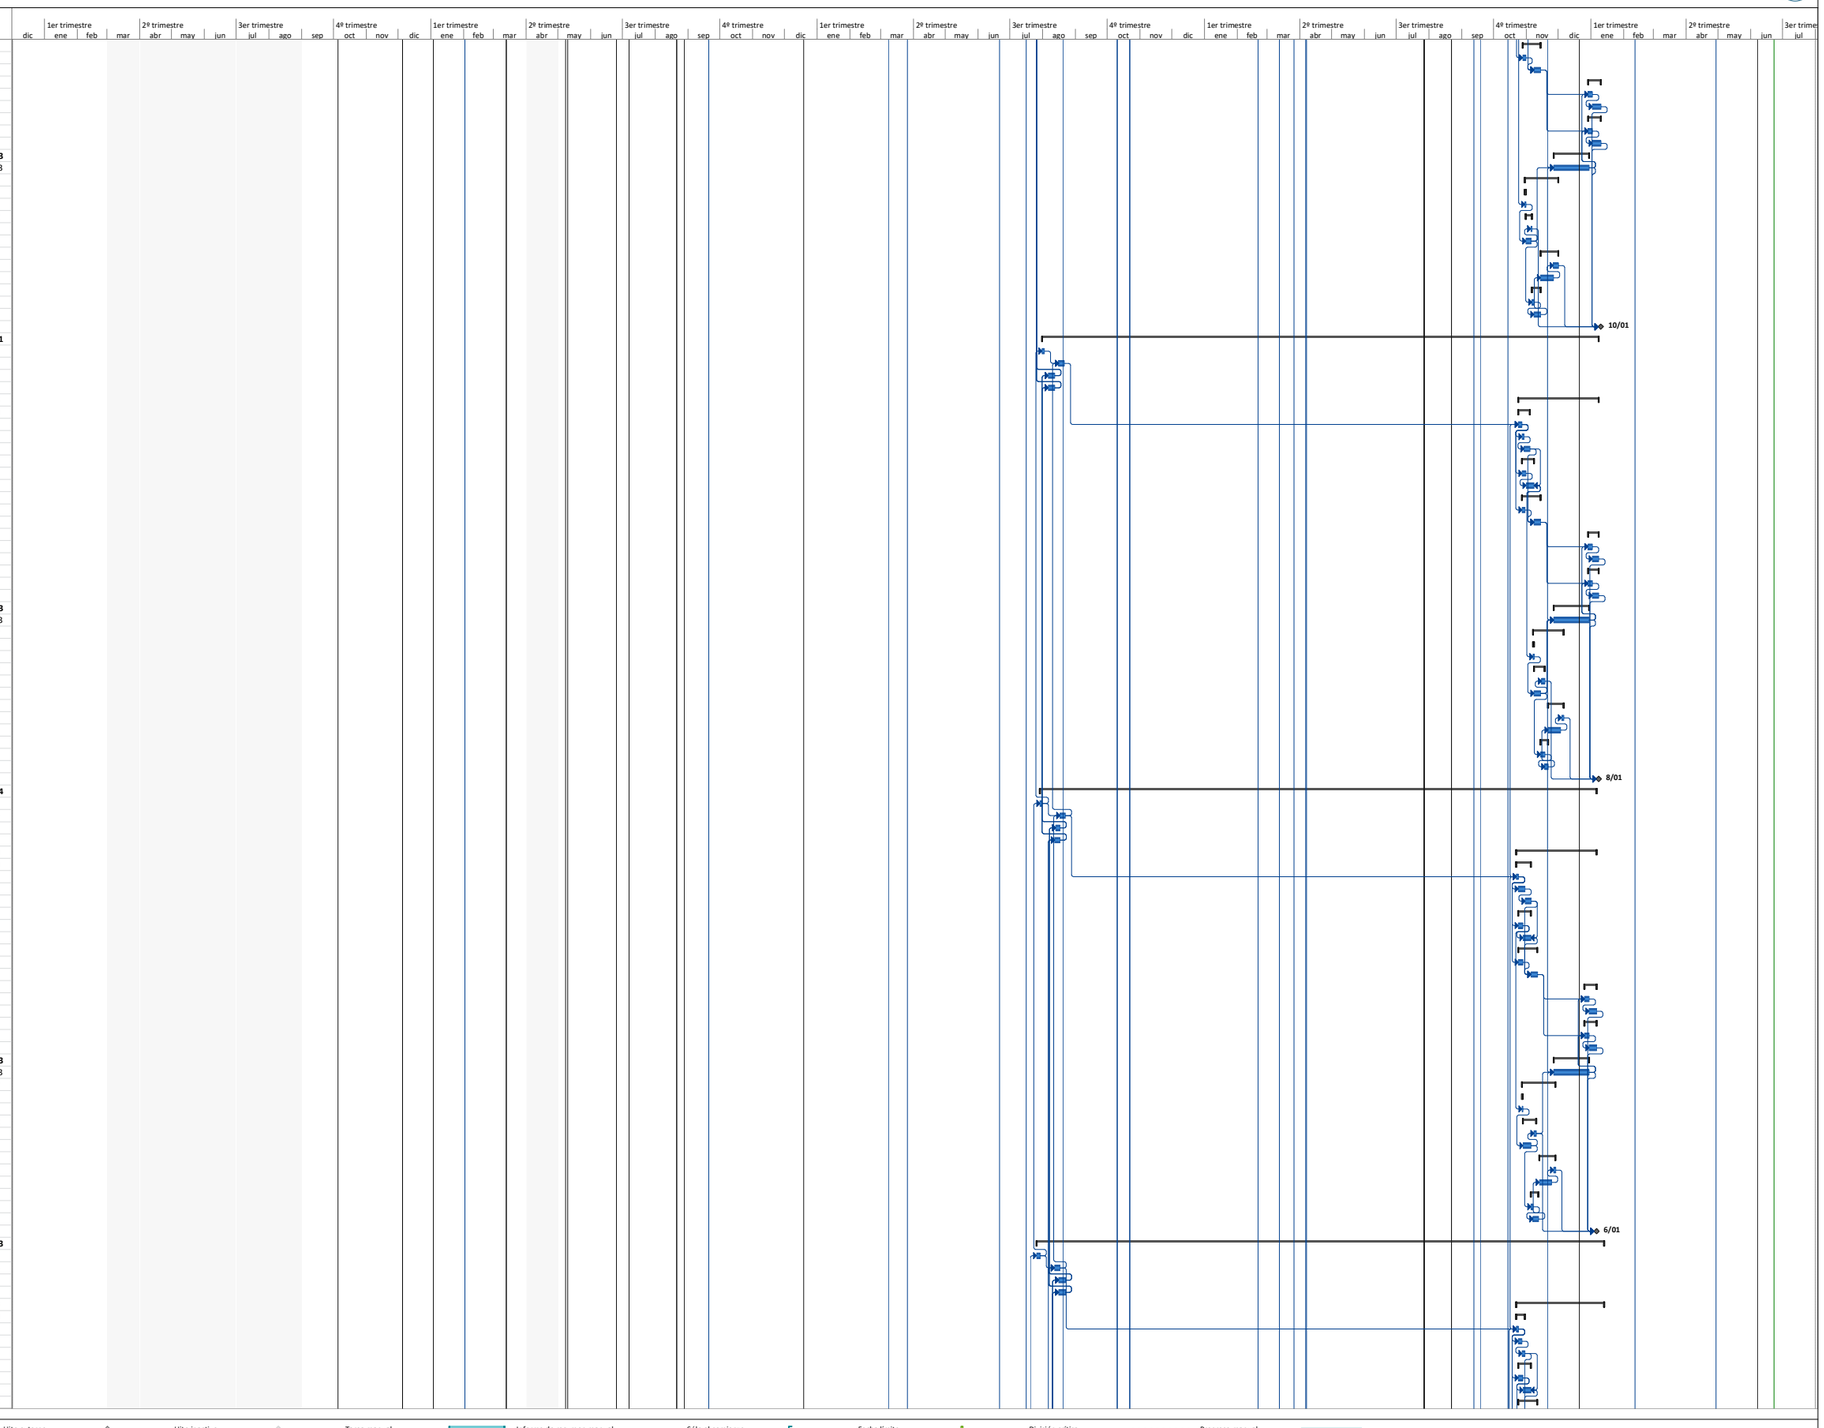

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | Sólo el comienzo | Fecha límite | División crítica | Progreso manual
División | Resumen | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo | Sólo duración | Resumen manual | Sólo fin | Tareas críticas | Progreso


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
897		1.3.4.5.3.14	Acero	3 d	vie 24/10/25	mar 28/10/25	$ 3.553.405	$ 3.553.405	$ 3.553.405
898		1.3.4.5.3.14	Concreto	5 d	mié 5/11/25	mar 11/11/25	$ 37.988.000	$ 37.988.000	$ 37.988.000
899		**1.3.4.5.3.14**	**Vigas Longitudinales**	**10 d**	**sáb 27/12/25**	**vie 9/01/26**	**$ 6.458.370**	**$ 6.458.370**	**$ 6.458.370**
900		1.3.4.5.3.14	Acero	3 d	sáb 27/12/25	mié 31/12/25	$ 2.660.370	$ 2.660.370	$ 2.660.370
901		1.3.4.5.3.14	Concreto	7 d	mié 31/12/25	vie 9/01/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
902		**1.3.4.5.3.14**	**Vigas Transversales**	**10 d**	**mar 30/12/25**	**mar 13/01/26**	**$ 7.832.270**	**$ 7.832.270**	**$ 7.832.270**
903		1.3.4.5.3.14	Acero	3 d	mar 30/12/25	sáb 3/01/26	$ 4.034.270	$ 4.034.270	$ 4.034.270
904		1.3.4.5.3.14	Concreto	7 d	sáb 3/01/26	mar 13/01/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
905		**1.3.4.5.3.14**	**Tierra armada**	**25 d**	**jue 27/11/25**	**mar 30/12/25**	**$ 203.437.203**	**$ 203.437.203**	**$ 203.437.203**
906		1.3.4.5.3.14	RELLENO CON GEOBLOQUE	25 d	jue 27/11/25	mar 30/12/25	$ 203.437.203	$ 203.437.203	$ 203.437.203
907		**1.3.4.5.3.14**	**Fachada en Mampostería**	**25 d**	**mié 29/10/25**	**lun 1/12/25**	**$ 13.062.817**	**$ 13.062.817**	**$ 13.062.817**
908		**1.3.4.5.3.14**	**Dobelas**	**1 d**	**mié 29/10/25**	**mié 29/10/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
909		1.3.4.5.3.14	Acero	1 d	mié 29/10/25	mié 29/10/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
910		**1.3.4.5.3.14**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**4 d**	**mar 4/11/25**	**sáb 8/11/25**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**
911		1.3.4.5.3.14	Concreto	4 d	mar 4/11/25	sáb 8/11/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
912		1.3.4.5.3.14	Bloque en Concreto	4 d	mar 4/11/25	sáb 8/11/25	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
913		**1.3.4.5.3.14**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**11 d**	**sáb 15/11/25**	**lun 1/12/25**	**$ 156.125**	**$ 156.125**	**$ 156.125**
914		1.3.4.5.3.14	Concreto	2 d	vie 28/11/25	lun 1/12/25	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
915		1.3.4.5.3.14	Bloque en Concreto	8 d	sáb 15/11/25	mié 26/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
916		**1.3.4.5.3.14**	**Viga de Amarre**	**5 d**	**sáb 8/11/25**	**vie 14/11/25**	**$ 93.675**	**$ 93.675**	**$ 93.675**
917		1.3.4.5.3.14	Acero	2 d	sáb 8/11/25	mar 11/11/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
918		1.3.4.5.3.14	Concreto	3 d	mar 11/11/25	vie 14/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
919		1.3.4.5.3.15	Fin de Eje 7-8	0 d	mar 13/01/26	mar 13/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
920		**1.3.4.5.3.16**	**EJE 8-9**	**417 d**	**mié 24/07/24**	**sáb 10/01/26**	**$ 307.213.958**	**$ 307.213.958**	**$ 307.213.958**
921		1.3.4.5.3.16	Excavación	2 d	mié 24/07/24	vie 26/07/24	$ 1.396.452	$ 1.396.452	$ 1.396.452
922		1.3.4.5.3.16	Pilotes FDP	2 d	vie 9/08/24	lun 12/08/24	$ 42.434.000	$ 42.434.000	$ 42.434.000
923		1.3.4.5.3.16	CAPA DE TRANSFERENCIA	4 d	lun 12/08/24	vie 16/08/24	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
924		1.3.4.5.3.16	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	4 d	lun 12/08/24	vie 16/08/24	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
925		**1.3.4.5.3.16**	**Estructura**	**62 d**	**mar 21/10/25**	**sáb 10/01/26**	**$ 43.300.570**	**$ 43.300.570**	**$ 43.300.570**
926		**1.3.4.5.3.16**	**Zapatas**	**9 d**	**mar 21/10/25**	**vie 31/10/25**	**$ 15.069.010**	**$ 15.069.010**	**$ 15.069.010**
927		1.3.4.5.3.16	Solado	2 d	mar 21/10/25	jue 23/10/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
928		1.3.4.5.3.16	Acero	4 d	jue 23/10/25	mar 28/10/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
929		1.3.4.5.3.16	Concreto	3 d	mié 29/10/25	vie 31/10/25	$ 6.963.000	$ 6.963.000	$ 6.963.000
930		**1.3.4.5.3.16**	**Vigas de Cimentación**	**9 d**	**jue 23/10/25**	**mié 5/11/25**	**$ 6.271.020**	**$ 6.271.020**	**$ 6.271.020**
931		1.3.4.5.3.16	Acero	4 d	jue 23/10/25	mar 28/10/25	$ 2.473.020	$ 2.473.020	$ 2.473.020
932		1.3.4.5.3.16	Concreto	5 d	mié 29/10/25	mié 5/11/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
933		**1.3.4.5.3.16**	**Columnas**	**14 d**	**jue 23/10/25**	**mar 11/11/25**	**$ 7.345.160**	**$ 7.345.160**	**$ 7.345.160**
934		1.3.4.5.3.16	Acero	3 d	jue 23/10/25	lun 27/10/25	$ 3.547.160	$ 3.547.160	$ 3.547.160
935		1.3.4.5.3.16	Concreto	5 d	mié 5/11/25	mar 11/11/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
936		**1.3.4.5.3.16**	**Vigas Longitudinales**	**10 d**	**lun 29/12/25**	**sáb 10/01/26**	**$ 6.514.575**	**$ 6.514.575**	**$ 6.514.575**
937		1.3.4.5.3.16	Acero	3 d	lun 29/12/25	vie 2/01/26	$ 2.716.575	$ 2.716.575	$ 2.716.575
938		1.3.4.5.3.16	Concreto	7 d	vie 2/01/26	sáb 10/01/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
939		**1.3.4.5.3.16**	**Vigas Transversales**	**10 d**	**lun 29/12/25**	**sáb 10/01/26**	**$ 8.100.805**	**$ 8.100.805**	**$ 8.100.805**
940		1.3.4.5.3.16	Acero	3 d	lun 29/12/25	vie 2/01/26	$ 4.302.805	$ 4.302.805	$ 4.302.805
941		1.3.4.5.3.16	Concreto	7 d	vie 2/01/26	sáb 10/01/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
942		**1.3.4.5.3.16**	**Tierra armada**	**25 d**	**jue 27/11/25**	**mar 30/12/25**	**$ 203.437.203**	**$ 203.437.203**	**$ 203.437.203**
943		1.3.4.5.3.16	RELLENO CON GEOBLOQUE	25 d	jue 27/11/25	mar 30/12/25	$ 203.437.203	$ 203.437.203	$ 203.437.203
944		**1.3.4.5.3.16**	**Fachada en Mampostería**	**28 d**	**jue 30/10/25**	**vie 5/12/25**	**$ 13.062.817**	**$ 13.062.817**	**$ 13.062.817**
945		**1.3.4.5.3.16**	**Dobelas**	**1 d**	**jue 30/10/25**	**jue 30/10/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
946		1.3.4.5.3.16	Acero	1 d	jue 30/10/25	jue 30/10/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
947		**1.3.4.5.3.16**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**8 d**	**vie 31/10/25**	**mar 11/11/25**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**
948		1.3.4.5.3.16	Concreto	2 d	sáb 8/11/25	mar 11/11/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
949		1.3.4.5.3.16	Bloque en Concreto	5 d	vie 31/10/25	vie 7/11/25	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
950		**1.3.4.5.3.16**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**13 d**	**mié 19/11/25**	**vie 5/12/25**	**$ 156.125**	**$ 156.125**	**$ 156.125**
951		1.3.4.5.3.16	Concreto	3 d	mar 2/12/25	vie 5/12/25	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
952		1.3.4.5.3.16	Bloque en Concreto	9 d	mié 19/11/25	lun 1/12/25	$ 0	$ 0	$ 0
953		**1.3.4.5.3.16**	**Viga de Amarre**	**8 d**	**vie 7/11/25**	**mar 18/11/25**	**$ 93.675**	**$ 93.675**	**$ 93.675**
954		1.3.4.5.3.16	Acero	3 d	vie 7/11/25	mar 11/11/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
955		1.3.4.5.3.16	Concreto	5 d	mar 11/11/25	mar 18/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
956		1.3.4.5.3.17	Fin de Eje 8-9	0 d	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
957		**1.3.4.5.3.18**	**EJE 9-10**	**415 d**	**lun 22/07/24**	**mar 6/01/26**	**$ 367.527.686**	**$ 367.527.686**	**$ 367.527.686**
958		1.3.4.5.3.18	Excavación	2 d	lun 22/07/24	mié 24/07/24	$ 1.396.452	$ 1.396.452	$ 1.396.452
959		1.3.4.5.3.18	Pilotes FDP	2 d	mar 6/08/24	jue 8/08/24	$ 42.434.000	$ 42.434.000	$ 42.434.000
960		1.3.4.5.3.18	CAPA DE TRANSFERENCIA	4 d	mar 6/08/24	lun 12/08/24	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
961		1.3.4.5.3.18	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	4 d	mar 6/08/24	sáb 10/08/24	$ 203.589.847	$ 203.589.847	$ 203.589.847
962		**1.3.4.5.3.18**	**Estructura**	**59 d**	**lun 20/10/25**	**mar 6/01/26**	**$ 43.300.570**	**$ 43.300.570**	**$ 43.300.570**
963		**1.3.4.5.3.18**	**Zapatas**	**7 d**	**lun 20/10/25**	**mar 28/10/25**	**$ 15.069.010**	**$ 15.069.010**	**$ 15.069.010**
964		1.3.4.5.3.18	Solado	2 d	lun 20/10/25	mié 22/10/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
965		1.3.4.5.3.18	Acero	2 d	mié 22/10/25	vie 24/10/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
966		1.3.4.5.3.18	Concreto	3 d	vie 24/10/25	mar 28/10/25	$ 6.963.000	$ 6.963.000	$ 6.963.000
967		**1.3.4.5.3.18**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**mié 22/10/25**	**vie 31/10/25**	**$ 6.271.020**	**$ 6.271.020**	**$ 6.271.020**
968		1.3.4.5.3.18	Acero	3 d	mié 22/10/25	sáb 25/10/25	$ 2.473.020	$ 2.473.020	$ 2.473.020
969		1.3.4.5.3.18	Concreto	5 d	lun 27/10/25	vie 31/10/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
970		**1.3.4.5.3.18**	**Columnas**	**13 d**	**mié 22/10/25**	**sáb 8/11/25**	**$ 7.345.160**	**$ 7.345.160**	**$ 7.345.160**
971		1.3.4.5.3.18	Acero	3 d	mié 22/10/25	sáb 25/10/25	$ 3.547.160	$ 3.547.160	$ 3.547.160
972		1.3.4.5.3.18	Concreto	5 d	sáb 1/11/25	sáb 8/11/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
973		**1.3.4.5.3.18**	**Vigas Longitudinales**	**8 d**	**vie 26/12/25**	**mar 6/01/26**	**$ 6.514.575**	**$ 6.514.575**	**$ 6.514.575**
974		1.3.4.5.3.18	Acero	3 d	vie 26/12/25	mar 30/12/25	$ 2.716.575	$ 2.716.575	$ 2.716.575
975		1.3.4.5.3.18	Concreto	5 d	mar 30/12/25	mar 6/01/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
976		**1.3.4.5.3.18**	**Vigas Transversales**	**8 d**	**vie 26/12/25**	**mar 6/01/26**	**$ 8.100.805**	**$ 8.100.805**	**$ 8.100.805**
977		1.3.4.5.3.18	Acero	3 d	vie 26/12/25	mar 30/12/25	$ 4.302.805	$ 4.302.805	$ 4.302.805
978		1.3.4.5.3.18	Concreto	5 d	mar 30/12/25	mar 6/01/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
979		**1.3.4.5.3.18**	**Tierra armada**	**25 d**	**jue 27/11/25**	**mar 30/12/25**	**$ 63.335.000**	**$ 63.335.000**	**$ 63.335.000**
980		1.3.4.5.3.18	RELLENO CON GEOBLOQUE	25 d	jue 27/11/25	mar 30/12/25	$ 63.335.000	$ 63.335.000	$ 63.335.000
981		**1.3.4.5.3.18**	**Fachada en Mampostería**	**23 d**	**vie 31/10/25**	**lun 1/12/25**	**$ 13.062.817**	**$ 13.062.817**	**$ 13.062.817**
982		**1.3.4.5.3.18**	**Dobelas**	**1 d**	**vie 31/10/25**	**vie 31/10/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
983		1.3.4.5.3.18	Acero	1 d	vie 31/10/25	vie 31/10/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
984		**1.3.4.5.3.18**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**5 d**	**sáb 1/11/25**	**sáb 8/11/25**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**
985		1.3.4.5.3.18	Concreto	1 d	vie 7/11/25	sáb 8/11/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
986		1.3.4.5.3.18	Bloque en Concreto	5 d	sáb 1/11/25	sáb 8/11/25	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
987		**1.3.4.5.3.18**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**8 d**	**jue 20/11/25**	**lun 1/12/25**	**$ 156.125**	**$ 156.125**	**$ 156.125**
988		1.3.4.5.3.18	Concreto	2 d	vie 28/11/25	lun 1/12/25	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
989		1.3.4.5.3.18	Bloque en Concreto	5 d	jue 20/11/25	mié 26/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
990		**1.3.4.5.3.18**	**Viga de Amarre**	**8 d**	**sáb 8/11/25**	**mié 19/11/25**	**$ 93.675**	**$ 93.675**	**$ 93.675**
991		1.3.4.5.3.18	Acero	3 d	sáb 8/11/25	mié 12/11/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
992		1.3.4.5.3.18	Concreto	4 d	jue 13/11/25	mié 19/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
993		1.3.4.5.3.19	Fin de Eje 9-10	0 d	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
994		1.3.4.5.3.20	PLACA DE PROTECCIÓN	4 d	mar 17/02/26	vie 20/02/26	$ 78.334.704	$ 78.334.704	$ 78.334.704
995		**1.3.4.5.3.21**	**PAVIMENTO**	**112 d**	**mié 4/02/26**	**mar 30/06/26**	**$ 194.719.816**	**$ 190.983.843**	**$ 190.727.527**
996		1.3.4.5.3.21	Subbase	101 d	mié 4/02/26	mar 16/06/26	$ 3.259.200	$ 3.251.133	$ 3.259.200
997		1.3.4.5.3.21	Base	17 d	jue 5/02/26	jue 26/02/26	$ 74.379.725	$ 74.379.725	$ 74.379.725
998		1.3.4.5.3.21	Mezcla Asfaltica - GCR	7 d	vie 27/02/26	sáb 7/03/26	$ 88.564.541	$ 88.564.541	$ 88.564.541
999		1.3.4.5.3.21	Mezcla Asfaltica - MD12	84 d	mar 10/03/26	mar 30/06/26	$ 28.516.350	$ 24.788.444	$ 24.524.061
1000		1.3.4.5.3.22	Baranda Vehicular	21 d	jue 19/02/26	lun 16/03/26	$ 335.399.584	$ 335.399.584	$ 335.399.584
1001		1.3.4.5.3.23	Baranda Peatonal	100 d	lun 23/02/26	vie 3/07/26	$ 38.854.062	$ 33.318.685	$ 38.854.062
1002		1.3.4.5.3.24	RELLENO GEOBLOQUE EXTERNO	10 d	vie 27/02/26	mié 11/03/26	$ 204.627.579	$ 204.627.579	$ 204.627.579
1003		1.3.4.5.4	Fin de Oreja Oriental	0 d	mié 18/03/26	mié 18/03/26	$ 0	$ 0	$ 0
1004		**1.3.4.5.5**	**FINAL DE OREJA ORIENTAL**	**345 d**	**mié 9/04/25**	**mié 1/07/26**	**$ 2.274.207.518**	**$ 2.056.142....**	**$ 2.073.843.514**
1005		1.3.4.5.5.1	Demolición	125 d	mié 9/04/25	jue 18/09/25	$ 4.233.082	$ 4.233.082	$ 4.233.082
1006		**1.3.4.5.5.2**	**EJE 1"-2"**	**64 d**	**vie 19/09/25**	**jue 11/12/25**	**$ 153.714.321**	**$ 153.714.321**	**$ 153.714.321**
1007		1.3.4.5.5.2.1	Excavación	2 d	vie 19/09/25	lun 22/09/25	$ 817.968	$ 817.968	$ 817.968
1008		1.3.4.5.5.2.2	Pilotes FDP	2 d	mié 1/10/25	vie 3/10/25	$ 46.429.000	$ 46.429.000	$ 46.429.000

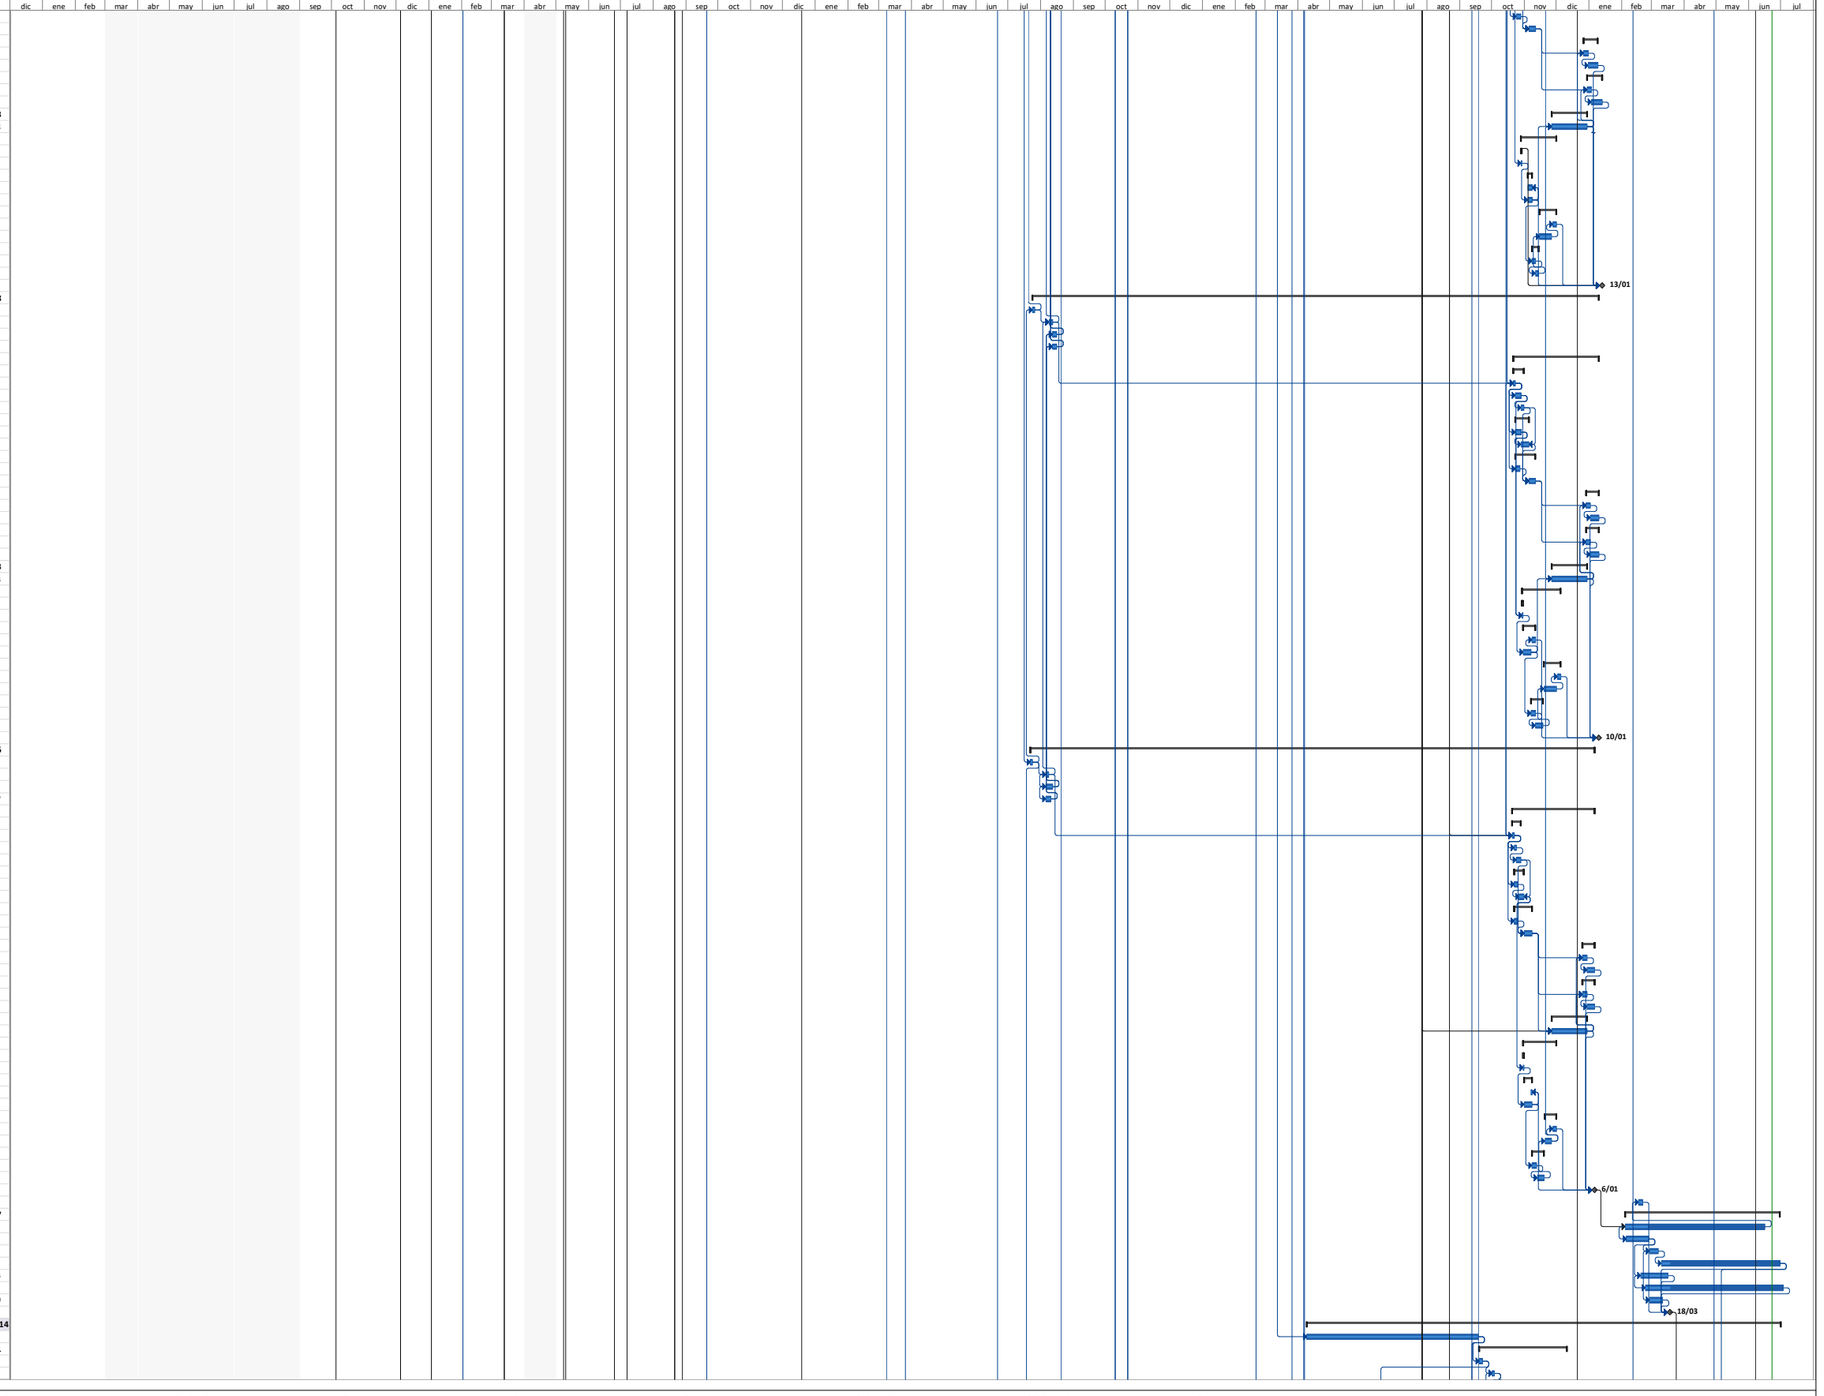

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | Sólo el comienzo | Fecha límite | División crítica | Progreso manual
División | Resumen | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo | Sólo duración | Resumen manual | Sólo fin | Tareas críticas | Progreso

Proyecto: IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB8-20221201
Fecha: mar 23/06/26


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
1009		1.3.4.5.5.2.3	CAPA DE TRANSFERENCIA	4 d	vie 17/10/25	mié 22/10/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
1010		1.3.4.5.5.2.4	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	4 d	vie 17/10/25	mié 22/10/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
1011		**1.3.4.5.5.2.5**	**Estructura**	**45 d**	**mar 14/10/25**	**jue 11/12/25**	**$ 36.354.707**	**$ 36.354.707**	**$ 36.354.707**
1012		**1.3.4.5.5.2.5**	**Zapatas**	**7 d**	**mar 14/10/25**	**mié 22/10/25**	**$ 13.187.147**	**$ 13.187.147**	**$ 13.187.147**
1013		1.3.4.5.5.2.5	Solado	2 d	mar 14/10/25	jue 16/10/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
1014		1.3.4.5.5.2.5	Acero	2 d	jue 16/10/25	sáb 18/10/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
1015		1.3.4.5.5.2.5	Concreto	3 d	sáb 18/10/25	mié 22/10/25	$ 5.081.137	$ 5.081.137	$ 5.081.137
1016		**1.3.4.5.5.2.6**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**jue 16/10/25**	**sáb 25/10/25**	**$ 5.005.020**	**$ 5.005.020**	**$ 5.005.020**
1017		1.3.4.5.5.2.6	Acero	3 d	jue 16/10/25	lun 20/10/25	$ 2.473.020	$ 2.473.020	$ 2.473.020
1018		1.3.4.5.5.2.6	Concreto	5 d	lun 20/10/25	sáb 25/10/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
1019		**1.3.4.5.5.2.6**	**Columnas**	**13 d**	**jue 16/10/25**	**vie 31/10/25**	**$ 6.079.160**	**$ 6.079.160**	**$ 6.079.160**
1020		1.3.4.5.5.2.6	Acero	3 d	jue 16/10/25	lun 20/10/25	$ 3.547.160	$ 3.547.160	$ 3.547.160
1021		1.3.4.5.5.2.6	Concreto	5 d	sáb 25/10/25	vie 31/10/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
1022		**1.3.4.5.5.2.6**	**Vigas Longitudinales**	**8 d**	**lun 1/12/25**	**jue 11/12/25**	**$ 5.248.575**	**$ 5.248.575**	**$ 5.248.575**
1023		1.3.4.5.5.2.6	Acero	3 d	lun 1/12/25	jue 4/12/25	$ 2.716.575	$ 2.716.575	$ 2.716.575
1024		1.3.4.5.5.2.6	Concreto	5 d	jue 4/12/25	jue 11/12/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
1025		**1.3.4.5.5.2.6**	**Vigas transversales**	**8 d**	**lun 1/12/25**	**jue 11/12/25**	**$ 6.834.805**	**$ 6.834.805**	**$ 6.834.805**
1026		1.3.4.5.5.2.6	Acero	3 d	lun 1/12/25	jue 4/12/25	$ 4.302.805	$ 4.302.805	$ 4.302.805
1027		1.3.4.5.5.2.6	Concreto	5 d	jue 4/12/25	jue 11/12/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
1028		**1.3.4.5.5.2.6**	**Tierra armada**	**20 d**	**vie 31/10/25**	**jue 27/11/25**	**$ 52.200.913**	**$ 52.200.913**	**$ 52.200.913**
1029		1.3.4.5.5.2.6	RELLENO CON GEOBLOQUE	20 d	vie 31/10/25	jue 27/11/25	$ 52.200.913	$ 52.200.913	$ 52.200.913
1030		**1.3.4.5.5.2.7**	**Fachada en Mamposteria**	**20 d**	**lun 20/10/25**	**vie 14/11/25**	**$ 14.328.817**	**$ 14.328.817**	**$ 14.328.817**
1031		**1.3.4.5.5.2.7**	**Dobelas**	**1 d**	**lun 20/10/25**	**mar 21/10/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
1032		1.3.4.5.5.2.7	Acero	1 d	lun 20/10/25	mar 21/10/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
1033		**1.3.4.5.5.2.7**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**5 d**	**mar 21/10/25**	**lun 27/10/25**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**
1034		1.3.4.5.5.2.7	Concreto	1 d	sáb 25/10/25	lun 27/10/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
1035		1.3.4.5.5.2.7	Bloque en Concreto	4 d	mar 21/10/25	sáb 25/10/25	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
1036		**1.3.4.5.5.2.7**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**9 d**	**mar 4/11/25**	**vie 14/11/25**	**$ 789.125**	**$ 789.125**	**$ 789.125**
1037		1.3.4.5.5.2.7	Concreto	2 d	mié 12/11/25	vie 14/11/25	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
1038		1.3.4.5.5.2.7	Bloque en Concreto	7 d	mar 4/11/25	mié 12/11/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
1039		**1.3.4.5.5.2.7**	**Viga de Amarre**	**6 d**	**sáb 25/10/25**	**mar 4/11/25**	**$ 726.675**	**$ 726.675**	**$ 726.675**
1040		1.3.4.5.5.2.7	Acero	2 d	sáb 25/10/25	mar 28/10/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
1041		1.3.4.5.5.2.7	Concreto	4 d	mar 28/10/25	mar 4/11/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
1042		1.3.4.5.5.3	Fin de Eje 1"-2"	0 d	jue 11/12/25	jue 11/12/25	$ 0	$ 0	$ 0
1043		**1.3.4.5.5.4**	**EJE 2"-3"**	**59 d**	**mar 23/09/25**	**mar 9/12/25**	**$ 153.965.719**	**$ 153.965.719**	**$ 153.965.719**
1044		1.3.4.5.5.4.1	Excavación	2 d	mar 23/09/25	jue 25/09/25	$ 817.968	$ 817.968	$ 817.968
1045		1.3.4.5.5.4.2	Pilotes FDP	2 d	lun 29/09/25	mié 1/10/25	$ 46.429.000	$ 46.429.000	$ 46.429.000
1046		1.3.4.5.5.4.3	CAPA DE TRANSFERENCIA	4 d	vie 10/10/25	vie 17/10/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
1047		1.3.4.5.5.4.4	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	4 d	sáb 11/10/25	vie 17/10/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
1048		**1.3.4.5.5.4.5**	**Estructura**	**49 d**	**lun 6/10/25**	**mar 9/12/25**	**$ 36.606.105**	**$ 36.606.105**	**$ 36.606.105**
1049		**1.3.4.5.5.4.5**	**Zapatas**	**7 d**	**lun 6/10/25**	**mié 15/10/25**	**$ 13.170.010**	**$ 13.170.010**	**$ 13.170.010**
1050		1.3.4.5.5.4.5	Solado	2 d	lun 6/10/25	mié 8/10/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
1051		1.3.4.5.5.4.5	Acero	2 d	mié 8/10/25	vie 10/10/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
1052		1.3.4.5.5.4.5	Concreto	3 d	vie 10/10/25	mié 15/10/25	$ 5.064.000	$ 5.064.000	$ 5.064.000
1053		**1.3.4.5.5.4.6**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**mié 8/10/25**	**sáb 18/10/25**	**$ 5.273.555**	**$ 5.273.555**	**$ 5.273.555**
1054		1.3.4.5.5.4.6	Acero	3 d	mié 8/10/25	sáb 11/10/25	$ 2.741.555	$ 2.741.555	$ 2.741.555
1055		1.3.4.5.5.4.6	Concreto	5 d	sáb 11/10/25	sáb 18/10/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
1056		**1.3.4.5.5.4.6**	**Columnas**	**13 d**	**mié 8/10/25**	**vie 24/10/25**	**$ 6.079.160**	**$ 6.079.160**	**$ 6.079.160**
1057		1.3.4.5.5.4.6	Acero	3 d	mié 8/10/25	sáb 11/10/25	$ 3.547.160	$ 3.547.160	$ 3.547.160
1058		1.3.4.5.5.4.6	Concreto	5 d	sáb 18/10/25	vie 24/10/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
1059		**1.3.4.5.5.4.6**	**Vigas Longitudinales**	**8 d**	**jue 27/11/25**	**mar 9/12/25**	**$ 5.248.575**	**$ 5.248.575**	**$ 5.248.575**
1060		1.3.4.5.5.4.6	Acero	3 d	jue 27/11/25	mar 2/12/25	$ 2.716.575	$ 2.716.575	$ 2.716.575
1061		1.3.4.5.5.4.6	Concreto	5 d	mar 2/12/25	mar 9/12/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
1062		**1.3.4.5.5.4.6**	**Vigas Transversales**	**8 d**	**jue 27/11/25**	**mar 9/12/25**	**$ 6.834.805**	**$ 6.834.805**	**$ 6.834.805**
1063		1.3.4.5.5.4.6	Acero	3 d	jue 27/11/25	mar 2/12/25	$ 4.302.805	$ 4.302.805	$ 4.302.805
1064		1.3.4.5.5.4.6	Concreto	5 d	mar 2/12/25	mar 9/12/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
1065		**1.3.4.5.5.4.6**	**Tierra armada**	**20 d**	**mié 29/10/25**	**mar 25/11/25**	**$ 52.200.913**	**$ 52.200.913**	**$ 52.200.913**
1066		1.3.4.5.5.4.6	RELLENO CON GEOBLOQUE	20 d	mié 29/10/25	mar 25/11/25	$ 52.200.913	$ 52.200.913	$ 52.200.913
1067		**1.3.4.5.5.4.7**	**Fachada en Mamposteria**	**10 d**	**jue 9/10/25**	**mié 22/10/25**	**$ 14.328.817**	**$ 14.328.817**	**$ 14.328.817**
1068		**1.3.4.5.5.4.7**	**Dobelas**	**1 d**	**jue 9/10/25**	**vie 10/10/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
1069		1.3.4.5.5.4.7	Acero	1 d	jue 9/10/25	vie 10/10/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
1070		**1.3.4.5.5.4.7**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**2 d**	**vie 10/10/25**	**mar 14/10/25**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**
1071		1.3.4.5.5.4.7	Concreto	1 d	sáb 11/10/25	mar 14/10/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
1072		1.3.4.5.5.4.7	Bloque en Concreto	2 d	vie 10/10/25	mar 14/10/25	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
1073		**1.3.4.5.5.4.7**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**3 d**	**sáb 18/10/25**	**mié 22/10/25**	**$ 789.125**	**$ 789.125**	**$ 789.125**
1074		1.3.4.5.5.4.7	Concreto	2 d	lun 20/10/25	mié 22/10/25	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
1075		1.3.4.5.5.4.7	Bloque en Concreto	3 d	sáb 18/10/25	mié 22/10/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
1076		**1.3.4.5.5.4.7**	**Viga de Amarre**	**4 d**	**mar 14/10/25**	**sáb 18/10/25**	**$ 726.675**	**$ 726.675**	**$ 726.675**
1077		1.3.4.5.5.4.7	Acero	2 d	mar 14/10/25	jue 16/10/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
1078		1.3.4.5.5.4.7	Concreto	2 d	jue 16/10/25	sáb 18/10/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
1079		1.3.4.5.5.5	Fin de Eje 2"-3"	0 d	mar 9/12/25	mar 9/12/25	$ 0	$ 0	$ 0
1080		**1.3.4.5.5.6**	**EJE 3"-4"**	**57 d**	**sáb 20/09/25**	**mié 3/12/25**	**$ 155.964.119**	**$ 155.964.119**	**$ 155.964.119**
1081		1.3.4.5.5.6.1	Excavación	2 d	sáb 20/09/25	mar 23/09/25	$ 817.968	$ 817.968	$ 817.968
1082		1.3.4.5.5.6.2	Pilotes FDP	2 d	vie 26/09/25	lun 29/09/25	$ 46.429.000	$ 46.429.000	$ 46.429.000
1083		1.3.4.5.5.6.3	CAPA DE TRANSFERENCIA	5 d	lun 6/10/25	mar 14/10/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
1084		1.3.4.5.5.6.4	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	5 d	lun 6/10/25	sáb 11/10/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
1085		**1.3.4.5.5.6.5**	**Estructura**	**47 d**	**jue 2/10/25**	**mié 3/12/25**	**$ 38.604.505**	**$ 38.604.505**	**$ 38.604.505**
1086		**1.3.4.5.5.6.5**	**Zapatas**	**7 d**	**jue 2/10/25**	**sáb 11/10/25**	**$ 13.170.010**	**$ 13.170.010**	**$ 13.170.010**
1087		1.3.4.5.5.6.5	Solado	2 d	jue 2/10/25	lun 6/10/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
1088		1.3.4.5.5.6.5	Acero	2 d	lun 6/10/25	mié 8/10/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
1089		1.3.4.5.5.6.5	Concreto	3 d	mié 8/10/25	sáb 11/10/25	$ 5.064.000	$ 5.064.000	$ 5.064.000
1090		**1.3.4.5.5.6.6**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**lun 6/10/25**	**jue 16/10/25**	**$ 5.560.825**	**$ 5.560.825**	**$ 5.560.825**
1091		1.3.4.5.5.6.6	Acero	3 d	lun 6/10/25	jue 9/10/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
1092		1.3.4.5.5.6.6	Concreto	5 d	jue 9/10/25	jue 16/10/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
1093		**1.3.4.5.5.6.6**	**Columnas**	**13 d**	**lun 6/10/25**	**mié 22/10/25**	**$ 6.628.720**	**$ 6.628.720**	**$ 6.628.720**
1094		1.3.4.5.5.6.6	Acero	3 d	lun 6/10/25	jue 9/10/25	$ 4.096.720	$ 4.096.720	$ 4.096.720
1095		1.3.4.5.5.6.6	Concreto	5 d	jue 16/10/25	mié 22/10/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
1096		**1.3.4.5.5.6.6**	**Vigas longitudinales**	**8 d**	**sáb 22/11/25**	**mié 3/12/25**	**$ 5.810.625**	**$ 5.810.625**	**$ 5.810.625**
1097		1.3.4.5.5.6.6	Acero	3 d	sáb 22/11/25	mié 26/11/25	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
1098		1.3.4.5.5.6.6	Concreto	5 d	mié 26/11/25	mié 3/12/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
1099		**1.3.4.5.5.6.6**	**Vigas Transversales**	**8 d**	**sáb 22/11/25**	**mié 3/12/25**	**$ 7.434.325**	**$ 7.434.325**	**$ 7.434.325**
1100		1.3.4.5.5.6.6	Acero	3 d	sáb 22/11/25	mié 26/11/25	$ 4.902.325	$ 4.902.325	$ 4.902.325
1101		1.3.4.5.5.6.6	Concreto	5 d	mié 26/11/25	mié 3/12/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
1102		**1.3.4.5.5.6.6**	**Tierra armada**	**20 d**	**sáb 25/10/25**	**vie 21/11/25**	**$ 52.200.913**	**$ 52.200.913**	**$ 52.200.913**
1103		1.3.4.5.5.6.6	RELLENO CON GEOBLOQUE	20 d	sáb 25/10/25	vie 21/11/25	$ 52.200.913	$ 52.200.913	$ 52.200.913
1104		**1.3.4.5.5.6.7**	**Fachada en Mamposteria**	**22 d**	**vie 3/10/25**	**vie 31/10/25**	**$ 14.328.817**	**$ 14.328.817**	**$ 14.328.817**
1105		**1.3.4.5.5.6.7**	**Dobelas**	**1 d**	**vie 3/10/25**	**lun 6/10/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
1106		1.3.4.5.5.6.7	Acero	1 d	vie 3/10/25	lun 6/10/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
1107		**1.3.4.5.5.6.7**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**6 d**	**lun 6/10/25**	**mar 14/10/25**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**
1108		1.3.4.5.5.6.7	Concreto	1 d	sáb 11/10/25	mar 14/10/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
1109		1.3.4.5.5.6.7	Bloque en Concreto	6 d	lun 6/10/25	mar 14/10/25	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
1110		**1.3.4.5.5.6.7**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**9 d**	**mar 21/10/25**	**vie 31/10/25**	**$ 789.125**	**$ 789.125**	**$ 789.125**
1111		1.3.4.5.5.6.7	Concreto	2 d	mié 29/10/25	vie 31/10/25	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
1112		1.3.4.5.5.6.7	Bloque en Concreto	9 d	mar 21/10/25	vie 31/10/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
1113		**1.3.4.5.5.6.7**	**Viga de Amarre**	**6 d**	**mar 14/10/25**	**mar 21/10/25**	**$ 726.675**	**$ 726.675**	**$ 726.675**
1114		1.3.4.5.5.6.7	Acero	2 d	mar 14/10/25	jue 16/10/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
1115		1.3.4.5.5.6.7	Concreto	4 d	jue 16/10/25	mar 21/10/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
1116		1.3.4.5.5.7	Fin de Eje 3"-4"	0 d	mié 3/12/25	mié 3/12/25	$ 0	$ 0	$ 0
1117		**1.3.4.5.5.8**	**EJE 4"-5"**	**77 d**	**jue 18/09/25**	**vie 26/12/25**	**$ 192.204.515**	**$ 192.204.515**	**$ 192.204.515**
1118		1.3.4.5.5.8.1	Excavación	2 d	jue 18/09/25	sáb 20/09/25	$ 766.652	$ 766.652	$ 766.652
1119		1.3.4.5.5.8.2	Pilotes FDP	2 d	mié 24/09/25	vie 26/09/25	$ 82.720.712	$ 82.720.712	$ 82.720.712
1120		1.3.4.5.5.8.3	CAPA DE TRANSFERENCIA	4 d	vie 26/09/25	mié 1/10/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000

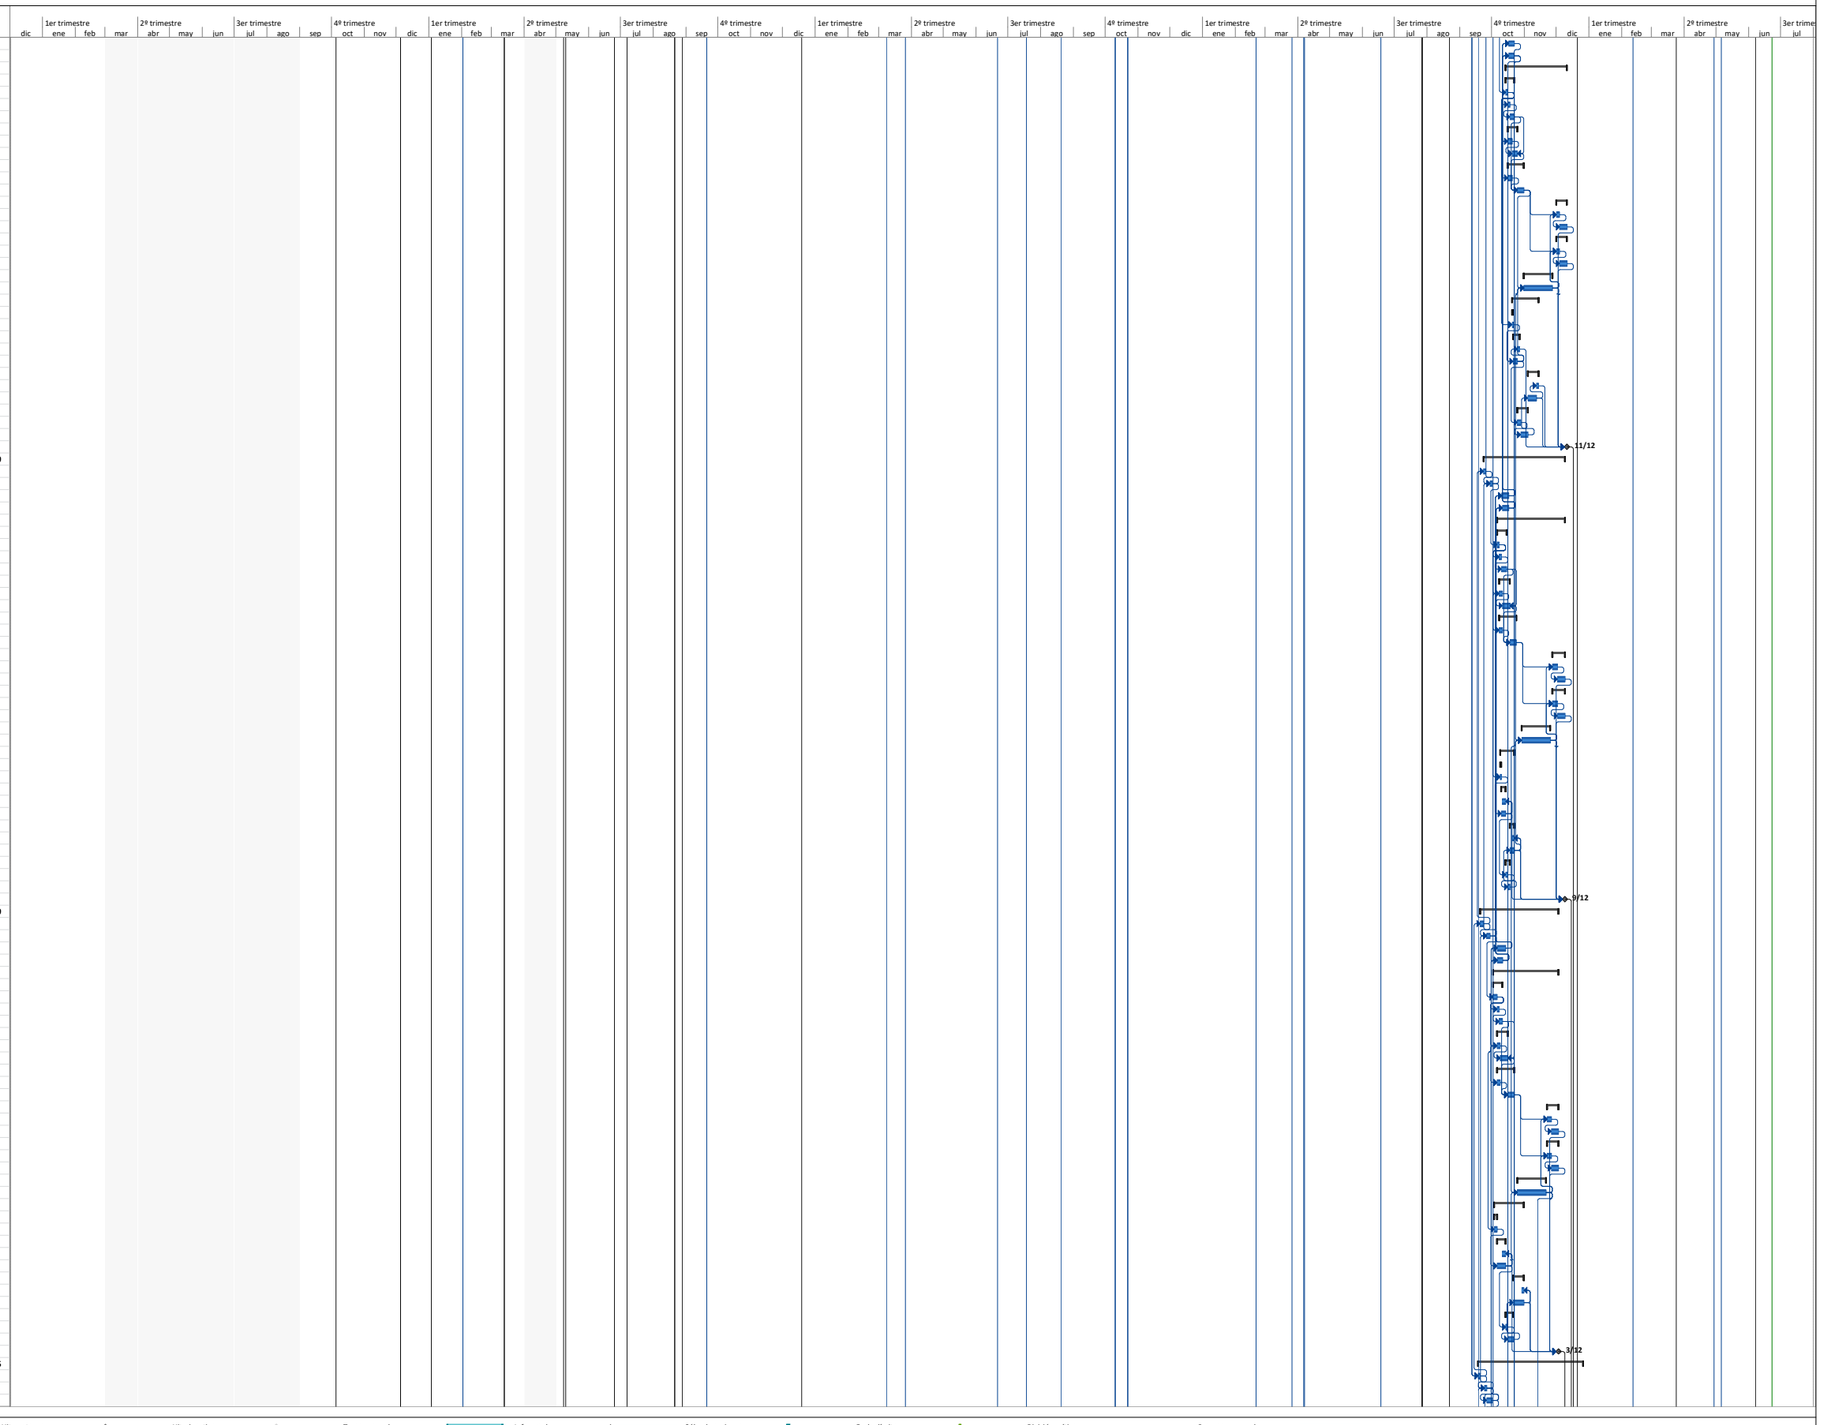

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | Sólo el comienzo | Fecha límite | División crítica | Progreso manual
División | Resumen | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo | Sólo duración | Resumen manual | Sólo fin | Tareas críticas | Progreso

Proyecto: IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB8-20221201
Fecha: mar 23/06/26


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
1121		1.3.4.5.5.8.4	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	5 d	mié 1/10/25	mar 7/10/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
1122		**1.3.4.5.5.8.5**	**Estructura**	**67 d**	**mar 30/09/25**	**vie 26/12/25**	**$ 38.604.505**	**$ 38.604.505**	**$ 38.604.505**
1123		**1.3.4.5.5.8.5**	**Zapatas**	**7 d**	**mar 30/09/25**	**jue 9/10/25**	**$ 13.170.010**	**$ 13.170.010**	**$ 13.170.010**
1124		1.3.4.5.5.8.5	Solado	2 d	mar 30/09/25	jue 2/10/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
1125		1.3.4.5.5.8.5	Acero	2 d	jue 2/10/25	lun 6/10/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
1126		1.3.4.5.5.8.5	Concreto	3 d	lun 6/10/25	jue 9/10/25	$ 5.064.000	$ 5.064.000	$ 5.064.000
1127		**1.3.4.5.5.8.5**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**jue 2/10/25**	**mar 14/10/25**	**$ 5.560.825**	**$ 5.560.825**	**$ 5.560.825**
1128		1.3.4.5.5.8.5	Acero	3 d	jue 2/10/25	mar 7/10/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
1129		1.3.4.5.5.8.5	Concreto	5 d	mar 7/10/25	mar 14/10/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
1130		**1.3.4.5.5.8.5**	**Columnas**	**13 d**	**jue 2/10/25**	**lun 20/10/25**	**$ 6.628.720**	**$ 6.628.720**	**$ 6.628.720**
1131		1.3.4.5.5.8.5	Acero	3 d	jue 2/10/25	mar 7/10/25	$ 4.096.720	$ 4.096.720	$ 4.096.720
1132		1.3.4.5.5.8.5	Concreto	5 d	mar 14/10/25	lun 20/10/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
1133		**1.3.4.5.5.8.5**	**Vigas Longitudinales**	**10 d**	**sáb 13/12/25**	**vie 26/12/25**	**$ 5.810.625**	**$ 5.810.625**	**$ 5.810.625**
1134		1.3.4.5.5.8.5	Acero	3 d	sáb 13/12/25	mié 17/12/25	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
1135		1.3.4.5.5.8.5	Concreto	7 d	mié 17/12/25	vie 26/12/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
1136		**1.3.4.5.5.8.5**	**Vigas Transversales**	**10 d**	**sáb 13/12/25**	**vie 26/12/25**	**$ 7.434.325**	**$ 7.434.325**	**$ 7.434.325**
1137		1.3.4.5.5.8.5	Acero	3 d	sáb 13/12/25	mié 17/12/25	$ 4.902.325	$ 4.902.325	$ 4.902.325
1138		1.3.4.5.5.8.5	Concreto	7 d	mié 17/12/25	vie 26/12/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
1139		**1.3.4.5.5.8.6**	**Tierra armada**	**20 d**	**mié 19/11/25**	**lun 15/12/25**	**$ 52.200.913**	**$ 52.200.913**	**$ 52.200.913**
1140		1.3.4.5.5.8.6	RELLENO CON GEOBLOQUE	20 d	mié 19/11/25	lun 15/12/25	$ 52.200.913	$ 52.200.913	$ 52.200.913
1141		**1.3.4.5.5.8.7**	**Fachada en Mamposteria**	**20 d**	**lun 6/10/25**	**jue 30/10/25**	**$ 14.328.817**	**$ 14.328.817**	**$ 14.328.817**
1142		**1.3.4.5.5.8.7**	**Dobelas**	**1 d**	**lun 6/10/25**	**mar 7/10/25**	**$ 2.538.245**	**$ 2.538.245**	**$ 2.538.245**
1143		1.3.4.5.5.8.7	Acero	1 d	lun 6/10/25	mar 7/10/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
1144		**1.3.4.5.5.8.8**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**6 d**	**mar 7/10/25**	**mié 15/10/25**	**$ 10.274.772**	**$ 10.274.772**	**$ 10.274.772**
1145		1.3.4.5.5.8.7	Concreto	1 d	mar 14/10/25	mié 15/10/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
1146		1.3.4.5.5.8.7	Bloque en Concreto	5 d	mar 7/10/25	mar 14/10/25	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
1147		**1.3.4.5.5.8.7**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**8 d**	**mar 21/10/25**	**jue 30/10/25**	**$ 789.125**	**$ 789.125**	**$ 789.125**
1148		1.3.4.5.5.8.7	Concreto	2 d	mar 28/10/25	jue 30/10/25	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
1149		1.3.4.5.5.8.7	Bloque en Concreto	6 d	mar 21/10/25	mar 28/10/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
1150		**1.3.4.5.5.8.7**	**Viga de Amarre**	**6 d**	**mar 14/10/25**	**mar 21/10/25**	**$ 726.675**	**$ 726.675**	**$ 726.675**
1151		1.3.4.5.5.8.7	Acero	2 d	mar 14/10/25	jue 16/10/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
1152		1.3.4.5.5.8.7	Concreto	4 d	jue 16/10/25	mar 21/10/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
1153		1.3.4.5.5.9	Fin de Eje 4"-5"	0 d	vie 26/12/25	vie 26/12/25	$ 0	$ 0	$ 0
1154		**1.3.4.5.5.10**	**EJE 1'-2'**	**214 d**	**mar 16/09/25**	**sáb 20/06/26**	**$ 155.750.027**	**$ 153.810.727**	**$ 155.750.027**
1155		1.3.4.5.5.10	Excavación	2 d	mar 16/09/25	jue 18/09/25	$ 758.876	$ 758.876	$ 758.876
1156		1.3.4.5.5.10	Pilotes FDP	2 d	lun 29/09/25	mié 1/10/25	$ 46.274.000	$ 46.274.000	$ 46.274.000
1157		1.3.4.5.5.10	CAPA DE TRANSFERENCIA	4 d	mié 19/11/25	lun 24/11/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
1158		1.3.4.5.5.10	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	4 d	mié 19/11/25	lun 24/11/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
1159		**1.3.4.5.5.10**	**Estructura**	**198 d**	**lun 6/10/25**	**sáb 20/06/26**	**$ 38.604.505**	**$ 37.979.777**	**$ 38.604.505**
1160		**1.3.4.5.5.10**	**Zapatas**	**7 d**	**lun 6/10/25**	**mié 15/10/25**	**$ 13.170.010**	**$ 13.170.010**	**$ 13.170.010**
1161		1.3.4.5.5.10	Solado	2 d	lun 6/10/25	mié 8/10/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
1162		1.3.4.5.5.10	Acero	2 d	mié 8/10/25	vie 10/10/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
1163		1.3.4.5.5.10	Concreto	3 d	vie 10/10/25	mié 15/10/25	$ 5.064.000	$ 5.064.000	$ 5.064.000
1164		**1.3.4.5.5.10**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**mié 8/10/25**	**sáb 18/10/25**	**$ 5.560.825**	**$ 5.560.825**	**$ 5.560.825**
1165		1.3.4.5.5.10	Acero	3 d	mié 8/10/25	sáb 11/10/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
1166		1.3.4.5.5.10	Concreto	5 d	sáb 11/10/25	sáb 18/10/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
1167		**1.3.4.5.5.10**	**Columnas**	**13 d**	**mié 8/10/25**	**vie 24/10/25**	**$ 6.628.720**	**$ 6.628.720**	**$ 6.628.720**
1168		1.3.4.5.5.10	Acero	3 d	mié 8/10/25	sáb 11/10/25	$ 4.096.720	$ 4.096.720	$ 4.096.720
1169		1.3.4.5.5.10	Concreto	5 d	sáb 18/10/25	vie 24/10/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
1170		**1.3.4.5.5.10**	**Vigas Longitudinales**	**152 d**	**jue 4/12/25**	**sáb 20/06/26**	**$ 5.810.625**	**$ 5.185.897**	**$ 5.810.625**
1171		1.3.4.5.5.10	Acero	149 d	jue 4/12/25	mié 17/06/26	$ 3.278.625	$ 3.269.352	$ 3.278.625
1172		1.3.4.5.5.10	Concreto	149 d	mar 9/12/25	sáb 20/06/26	$ 2.532.000	$ 1.916.546	$ 2.532.000
1173		**1.3.4.5.5.10**	**Vigas Transversales**	**8 d**	**jue 4/12/25**	**lun 15/12/25**	**$ 7.434.325**	**$ 7.434.325**	**$ 7.434.325**
1174		1.3.4.5.5.10	Acero	3 d	jue 4/12/25	mar 9/12/25	$ 4.902.325	$ 4.902.325	$ 4.902.325
1175		1.3.4.5.5.10	Concreto	5 d	mar 9/12/25	lun 15/12/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
1176		**1.3.4.5.5.10**	**Tierra armada**	**164 d**	**mié 19/11/25**	**sáb 20/06/26**	**$ 52.200.913**	**$ 50.886.341**	**$ 52.200.913**
1177		1.3.4.5.5.10	RELLENO CON GEOBLOQUE	164 d	mié 19/11/25	sáb 20/06/26	$ 52.200.913	$ 50.886.341	$ 52.200.913
1178		**1.3.4.5.5.10**	**Fachada en Mamposteria**	**18 d**	**vie 10/10/25**	**mar 4/11/25**	**$ 14.328.817**	**$ 14.328.817**	**$ 14.328.817**
1179		**1.3.4.5.5.10**	**Dobelas**	**1 d**	**vie 10/10/25**	**sáb 11/10/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
1180		1.3.4.5.5.10	Acero	1 d	vie 10/10/25	sáb 11/10/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
1181		**1.3.4.5.5.10**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**6 d**	**mar 14/10/25**	**mar 21/10/25**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**
1182		1.3.4.5.5.10	Concreto	1 d	lun 20/10/25	mar 21/10/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
1183		1.3.4.5.5.10	Bloque en Concreto	5 d	mar 14/10/25	lun 20/10/25	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
1184		**1.3.4.5.5.10**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**6 d**	**sáb 25/10/25**	**mar 4/11/25**	**$ 789.125**	**$ 789.125**	**$ 789.125**
1185		1.3.4.5.5.10	Concreto	1 d	mar 28/10/25	mié 29/10/25	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
1186		1.3.4.5.5.10	Bloque en Concreto	6 d	sáb 25/10/25	mar 4/11/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
1187		**1.3.4.5.5.10**	**Viga de Amarre**	**6 d**	**lun 20/10/25**	**lun 27/10/25**	**$ 726.675**	**$ 726.675**	**$ 726.675**
1188		1.3.4.5.5.10	Acero	2 d	lun 20/10/25	mié 22/10/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
1189		1.3.4.5.5.10	Concreto	4 d	mié 22/10/25	lun 27/10/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
1190		1.3.4.5.5.11	Fin de Eje 1'-2'	0 d	lun 15/12/25	lun 15/12/25	$ 0	$ 0	$ 0
1191		**1.3.4.5.5.12**	**EJE 2'-3'**	**218,62 d**	**sáb 13/09/25**	**mar 23/06/26**	**$ 155.918.027**	**$ 153.395.941**	**$ 155.918.027**
1192		1.3.4.5.5.12	Excavación	2 d	sáb 13/09/25	mar 16/09/25	$ 758.876	$ 758.876	$ 758.876
1193		1.3.4.5.5.12	Pilotes FDP	2 d	mié 12/11/25	jue 13/11/25	$ 46.442.000	$ 46.442.000	$ 46.442.000
1194		1.3.4.5.5.12	CAPA DE TRANSFERENCIA	5 d	mié 12/11/25	jue 20/11/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
1195		1.3.4.5.5.12	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	5 d	mié 12/11/25	mié 19/11/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
1196		**1.3.4.5.5.12**	**Estructura**	**167 d**	**mié 19/11/25**	**mar 23/06/26**	**$ 38.604.505**	**$ 37.970.187**	**$ 38.604.505**
1197		**1.3.4.5.5.12**	**Zapatas**	**7 d**	**mié 19/11/25**	**jue 27/11/25**	**$ 13.170.010**	**$ 13.170.010**	**$ 13.170.010**
1198		1.3.4.5.5.12	Solado	2 d	mié 19/11/25	vie 21/11/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
1199		1.3.4.5.5.12	Acero	2 d	vie 21/11/25	lun 24/11/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
1200		1.3.4.5.5.12	Concreto	3 d	lun 24/11/25	jue 27/11/25	$ 5.064.000	$ 5.064.000	$ 5.064.000
1201		**1.3.4.5.5.12**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**vie 21/11/25**	**lun 1/12/25**	**$ 5.560.825**	**$ 5.560.825**	**$ 5.560.825**
1202		1.3.4.5.5.12	Acero	3 d	vie 21/11/25	mar 25/11/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
1203		1.3.4.5.5.12	Concreto	5 d	mar 25/11/25	lun 1/12/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
1204		**1.3.4.5.5.12**	**Columnas**	**13 d**	**vie 21/11/25**	**sáb 6/12/25**	**$ 6.628.720**	**$ 6.628.720**	**$ 6.628.720**
1205		1.3.4.5.5.12	Acero	3 d	vie 21/11/25	mar 25/11/25	$ 4.096.720	$ 4.096.720	$ 4.096.720
1206		1.3.4.5.5.12	Concreto	5 d	lun 1/12/25	sáb 6/12/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
1207		**1.3.4.5.5.12**	**Vigas Longitudinales**	**152 d**	**mar 9/12/25**	**mar 23/06/26**	**$ 5.810.625**	**$ 5.176.307**	**$ 5.810.625**
1208		1.3.4.5.5.12	Acero	149 d	mar 9/12/25	vie 19/06/26	$ 3.278.625	$ 3.248.631	$ 3.278.625
1209		1.3.4.5.5.12	Concreto	149 d	vie 12/12/25	mar 23/06/26	$ 2.532.000	$ 1.927.676	$ 2.532.000
1210		**1.3.4.5.5.12**	**Vigas Transversales**	**8 d**	**mar 9/12/25**	**jue 18/12/25**	**$ 7.434.325**	**$ 7.434.325**	**$ 7.434.325**
1211		1.3.4.5.5.12	Acero	3 d	mar 9/12/25	jue 11/12/25	$ 4.902.325	$ 4.902.325	$ 4.902.325
1212		1.3.4.5.5.12	Concreto	5 d	vie 12/12/25	jue 18/12/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
1213		**1.3.4.5.5.12**	**Tierra armada**	**159 d**	**jue 27/11/25**	**lun 22/06/26**	**$ 52.200.913**	**$ 50.313.144**	**$ 52.200.913**
1214		1.3.4.5.5.12	RELLENO CON GEOBLOQUE	159 d	jue 27/11/25	lun 22/06/26	$ 52.200.913	$ 50.313.144	$ 52.200.913
1215		**1.3.4.5.5.12**	**Fachada en Mamposteria**	**9 d**	**lun 24/11/25**	**jue 4/12/25**	**$ 14.328.817**	**$ 14.328.817**	**$ 14.328.817**
1216		**1.3.4.5.5.12**	**Dobelas**	**1 d**	**lun 24/11/25**	**mar 25/11/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
1217		1.3.4.5.5.12	Acero	1 d	lun 24/11/25	mar 25/11/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
1218		**1.3.4.5.5.12**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**2 d**	**mar 25/11/25**	**jue 27/11/25**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**
1219		1.3.4.5.5.12	Concreto	1 d	mié 26/11/25	jue 27/11/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
1220		1.3.4.5.5.12	Bloque en Concreto	2 d	mar 25/11/25	jue 27/11/25	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
1221		**1.3.4.5.5.12**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**2 d**	**mar 2/12/25**	**jue 4/12/25**	**$ 789.125**	**$ 789.125**	**$ 789.125**
1222		1.3.4.5.5.12	Concreto	2 d	mar 2/12/25	jue 4/12/25	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
1223		1.3.4.5.5.12	Bloque en Concreto	2 d	mar 2/12/25	jue 4/12/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
1224		**1.3.4.5.5.12**	**Viga de Amarre**	**4 d**	**jue 27/11/25**	**mar 2/12/25**	**$ 726.675**	**$ 726.675**	**$ 726.675**
1225		1.3.4.5.5.12	Acero	2 d	jue 27/11/25	sáb 29/11/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
1226		1.3.4.5.5.12	Concreto	2 d	sáb 29/11/25	mar 2/12/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
1227		1.3.4.5.5.13	Fin de Eje 2'-3'	0 d	jue 18/12/25	jue 18/12/25	$ 0	$ 0	$ 0
1228		**1.3.4.5.5.14**	**EJE 3'-4'**	**218,62 d**	**jue 11/09/25**	**sáb 20/06/26**	**$ 155.509.027**	**$ 154.620.021**	**$ 155.509.027**
1229		1.3.4.5.5.14	Excavación	2 d	jue 11/09/25	sáb 13/09/25	$ 758.876	$ 758.876	$ 758.876
1230		1.3.4.5.5.14	Pilotes FDP	2 d	jue 13/11/25	vie 14/11/25	$ 46.033.000	$ 46.033.000	$ 46.033.000
1231		1.3.4.5.5.14	CAPA DE TRANSFERENCIA	4 d	mar 4/11/25	sáb 8/11/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
1232		1.3.4.5.5.14	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	4 d	lun 3/11/25	vie 7/11/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916

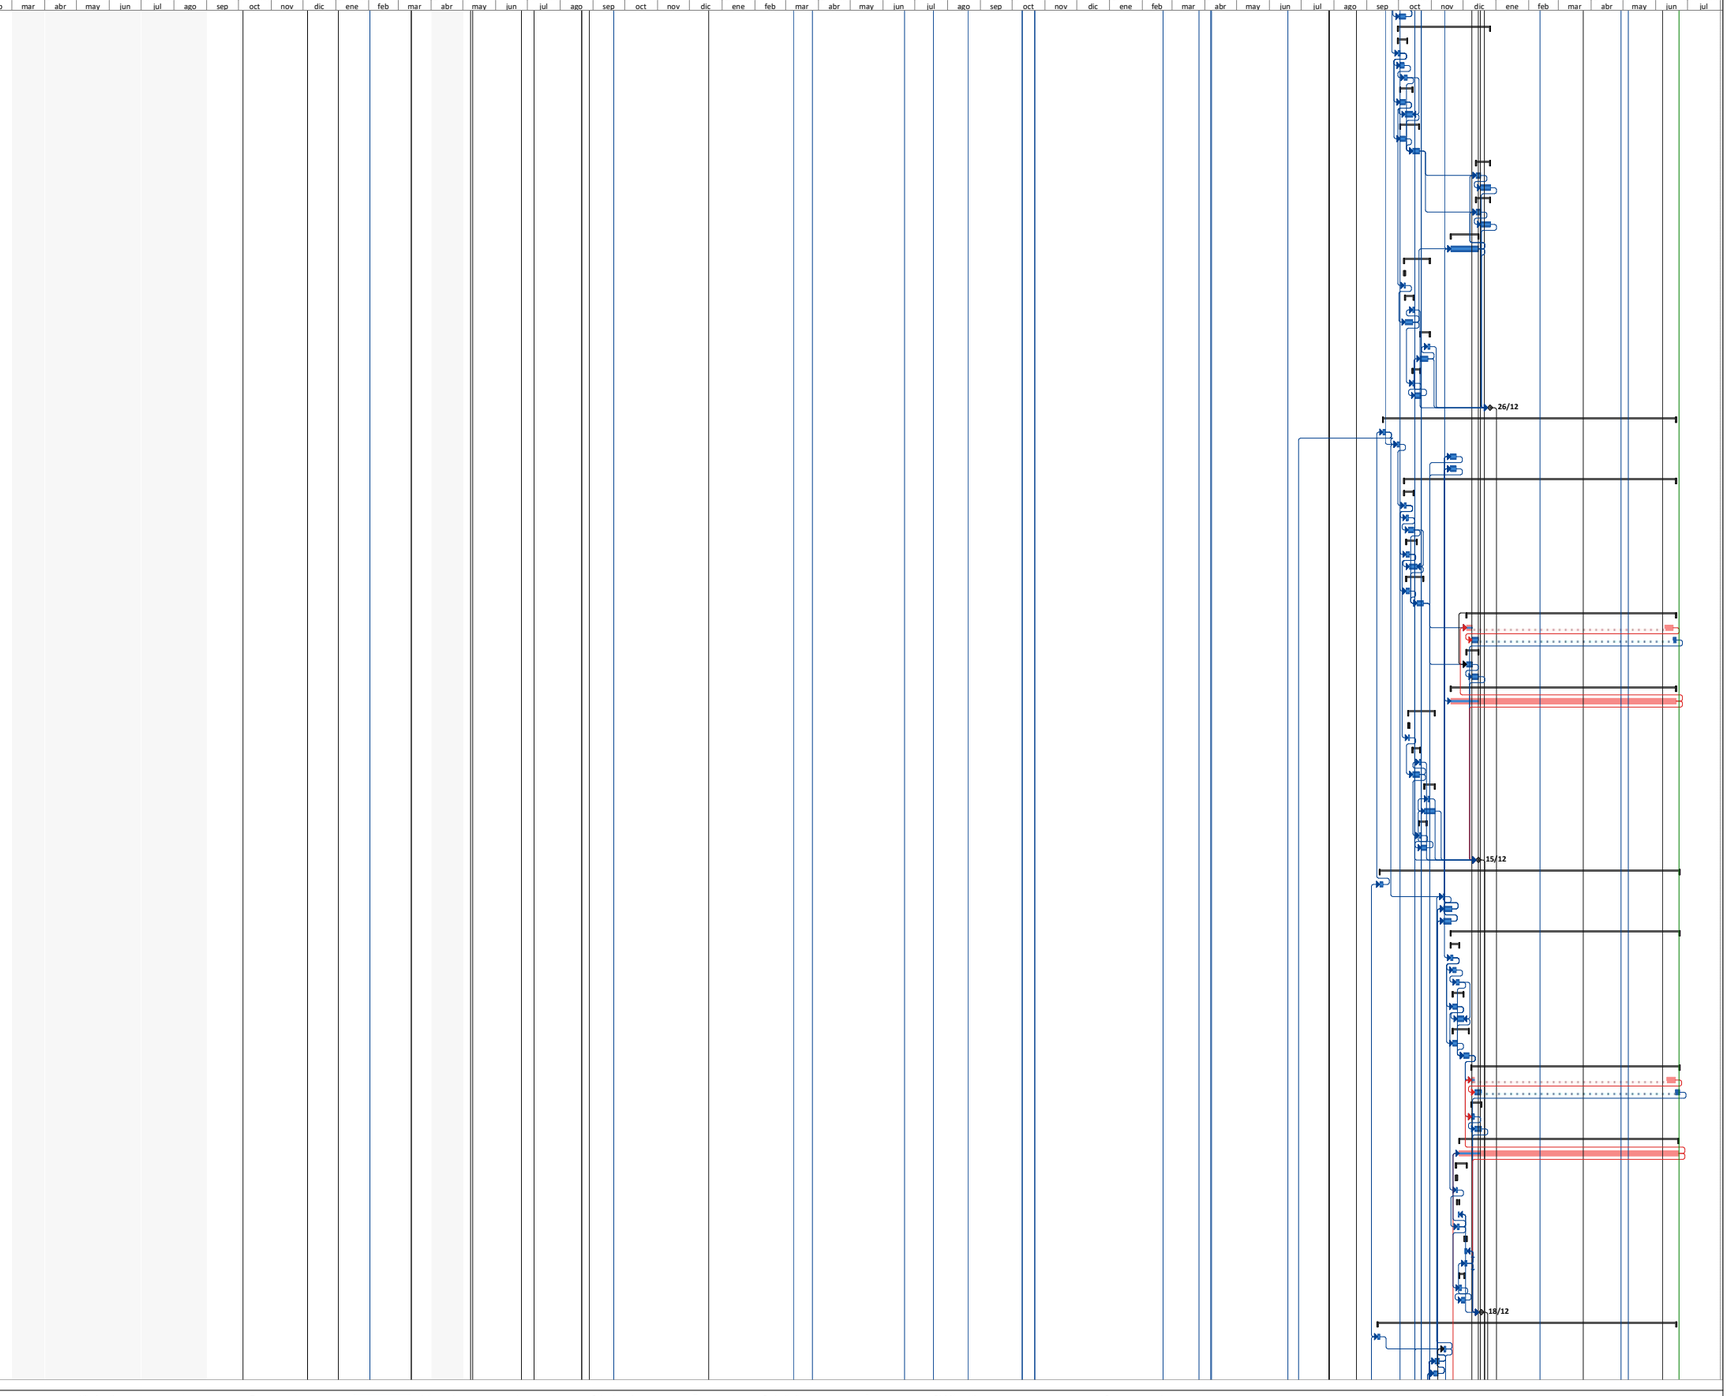

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | Sólo el comienzo | Fecha límite | División crítica | Progreso manual
División | Resumen | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo | Sólo duración | Resumen manual | Sólo fin | Tareas críticas | Progreso

Proyecto: IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB8-20221201
Fecha: mar 23/06/26


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
1233		**1.3.4.5.5.14**	**Estructura**	**164 d**	**jue 20/11/25**	**sáb 20/06/26**	**$ 38.604.505**	**$ 37.976.504**	**$ 38.604.505**
1234		**1.3.4.5.5.14**	**Zapatas**	**7 d**	**jue 20/11/25**	**vie 28/11/25**	**$ 13.170.010**	**$ 13.170.010**	**$ 13.170.010**
1235		1.3.4.5.5.14	Solado	2 d	jue 20/11/25	sáb 22/11/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
1236		1.3.4.5.5.14	Acero	2 d	sáb 22/11/25	mar 25/11/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
1237		1.3.4.5.5.14	Concreto	3 d	mar 25/11/25	vie 28/11/25	$ 5.064.000	$ 5.064.000	$ 5.064.000
1238		**1.3.4.5.5.14**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**sáb 22/11/25**	**mar 2/12/25**	**$ 5.560.825**	**$ 5.560.825**	**$ 5.560.825**
1239		1.3.4.5.5.14	Acero	3 d	sáb 22/11/25	mié 26/11/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
1240		1.3.4.5.5.14	Concreto	5 d	mié 26/11/25	mar 2/12/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
1241		**1.3.4.5.5.14**	**Columnas**	**13 d**	**sáb 22/11/25**	**mar 9/12/25**	**$ 6.628.720**	**$ 6.628.720**	**$ 6.628.720**
1242		1.3.4.5.5.14	Acero	3 d	sáb 22/11/25	mié 26/11/25	$ 4.096.720	$ 4.096.720	$ 4.096.720
1243		1.3.4.5.5.14	Concreto	5 d	mar 2/12/25	mar 9/12/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
1244		**1.3.4.5.5.14**	**Vigas Longitudinales**	**141 d**	**vie 19/12/25**	**sáb 20/06/26**	**$ 5.810.625**	**$ 5.182.624**	**$ 5.810.625**
1245		1.3.4.5.5.14	Acero	138 d	vie 19/12/25	mié 17/06/26	$ 3.278.625	$ 3.261.836	$ 3.278.625
1246		1.3.4.5.5.14	Concreto	138 d	mar 23/12/25	sáb 20/06/26	$ 2.532.000	$ 1.920.788	$ 2.532.000
1247		**1.3.4.5.5.14**	**Vigas Transversales**	**8 d**	**vie 19/12/25**	**mar 30/12/25**	**$ 7.434.325**	**$ 7.434.325**	**$ 7.434.325**
1248		1.3.4.5.5.14	Acero	3 d	vie 19/12/25	mar 23/12/25	$ 4.902.325	$ 4.902.325	$ 4.902.325
1249		1.3.4.5.5.14	Concreto	5 d	mar 23/12/25	mar 30/12/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
1250		**1.3.4.5.5.14**	**Tierra armada**	**150 d**	**mar 2/12/25**	**mar 16/06/26**	**$ 52.200.913**	**$ 51.939.908**	**$ 52.200.913**
1251		1.3.4.5.5.14	RELLENO CON GEOBLOQUE	150 d	mar 2/12/25	mar 16/06/26	$ 52.200.913	$ 51.939.908	$ 52.200.913
1252		**1.3.4.5.5.14**	**Fachada en Mampostería**	**16 d**	**mar 25/11/25**	**mar 16/12/25**	**$ 14.328.817**	**$ 14.328.817**	**$ 14.328.817**
1253		**1.3.4.5.5.14**	**Dobelas**	**1 d**	**mar 25/11/25**	**mié 26/11/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
1254		1.3.4.5.5.14	Acero	1 d	mar 25/11/25	mié 26/11/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
1255		**1.3.4.5.5.14**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**5 d**	**mié 26/11/25**	**mar 2/12/25**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**
1256		1.3.4.5.5.14	Concreto	1 d	lun 1/12/25	mar 2/12/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
1257		1.3.4.5.5.14	Bloque en Concreto	5 d	mié 26/11/25	mar 2/12/25	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
1258		**1.3.4.5.5.14**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**6 d**	**mar 9/12/25**	**mar 16/12/25**	**$ 789.125**	**$ 789.125**	**$ 789.125**
1259		1.3.4.5.5.14	Concreto	2 d	sáb 13/12/25	mar 16/12/25	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
1260		1.3.4.5.5.14	Bloque en Concreto	6 d	mar 9/12/25	mar 16/12/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
1261		**1.3.4.5.5.14**	**Viga de Amarre**	**4 d**	**mar 2/12/25**	**sáb 6/12/25**	**$ 726.675**	**$ 726.675**	**$ 726.675**
1262		1.3.4.5.5.14	Acero	2 d	mar 2/12/25	jue 4/12/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
1263		1.3.4.5.5.14	Concreto	2 d	jue 4/12/25	sáb 6/12/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
1264		1.3.4.5.5.15	Fin de Eje 3'-4'	0 d	mar 30/12/25	mar 30/12/25	$ 0	$ 0	$ 0
1265		**1.3.4.5.5.16**	**EJE 4'-5'**	**282,62 d**	**mar 24/06/25**	**mar 23/06/26**	**$ 177.199.157**	**$ 157.799.332**	**$ 177.199.157**
1266		1.3.4.5.5.16	Excavación	77 d	mar 24/06/25	lun 29/09/25	$ 758.876	$ 758.876	$ 758.876
1267		1.3.4.5.5.16	Pilotes FDP	2 d	mié 8/10/25	vie 10/10/25	$ 46.033.000	$ 46.033.000	$ 46.033.000
1268		1.3.4.5.5.16	CAPA DE TRANSFERENCIA	5 d	mié 22/10/25	mar 28/10/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
1269		1.3.4.5.5.16	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	4 d	mar 28/10/25	sáb 1/11/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
1270		**1.3.4.5.5.16**	**Estructura**	**186,12 d**	**vie 24/10/25**	**mar 23/06/26**	**$ 58.923.496**	**$ 40.038.811**	**$ 58.923.496**
1271		**1.3.4.5.5.16**	**Zapatas**	**7 d**	**vie 24/10/25**	**sáb 1/11/25**	**$ 13.170.010**	**$ 13.170.010**	**$ 13.170.010**
1272		1.3.4.5.5.16	Solado	2 d	vie 24/10/25	lun 27/10/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
1273		1.3.4.5.5.16	Acero	2 d	lun 27/10/25	mié 29/10/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
1274		1.3.4.5.5.16	Concreto	3 d	mié 29/10/25	sáb 1/11/25	$ 5.064.000	$ 5.064.000	$ 5.064.000
1275		**1.3.4.5.5.16**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**lun 27/10/25**	**jue 6/11/25**	**$ 5.560.825**	**$ 5.560.825**	**$ 5.560.825**
1276		1.3.4.5.5.16	Acero	3 d	lun 27/10/25	jue 30/10/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
1277		1.3.4.5.5.16	Concreto	5 d	jue 30/10/25	jue 6/11/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
1278		**1.3.4.5.5.16**	**Columnas**	**12,75 d**	**lun 27/10/25**	**mié 12/11/25**	**$ 6.634.965**	**$ 6.634.965**	**$ 6.634.965**
1279		1.3.4.5.5.16	Acero	4 d	lun 27/10/25	jue 30/10/25	$ 4.102.965	$ 4.102.965	$ 4.102.965
1280		1.3.4.5.5.16	Concreto	5 d	jue 6/11/25	mié 12/11/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
1281		**1.3.4.5.5.16**	**Vigas Longitudinales**	**169 d**	**mié 12/11/25**	**vie 19/06/26**	**$ 5.810.625**	**$ 3.278.625**	**$ 5.810.625**
1282		1.3.4.5.5.16	Acero	165 d	mié 12/11/25	sáb 13/06/26	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
1283		1.3.4.5.5.16	Concreto	4 d	mar 16/06/26	vie 19/06/26	$ 2.532.000	$ 0	$ 2.532.000
1284		**1.3.4.5.5.16**	**Vigas Transversales**	**13 d**	**mié 3/12/25**	**vie 19/12/25**	**$ 7.434.325**	**$ 7.434.325**	**$ 7.434.325**
1285		1.3.4.5.5.16	Acero	10 d	mié 3/12/25	mar 16/12/25	$ 4.902.325	$ 4.902.325	$ 4.902.325
1286		1.3.4.5.5.16	Concreto	6 d	vie 12/12/25	vie 19/12/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
1287		**1.3.4.5.5.16**	**Losa Aproximación**	**17 d**	**lun 1/06/26**	**mar 23/06/26**	**$ 20.312.746**	**$ 3.960.061**	**$ 20.312.746**
1288		1.3.4.5.5.16	Acero	3 d	mié 17/06/26	sáb 20/06/26	$ 13.744.840	$ 0	$ 13.744.840
1289		1.3.4.5.5.16	Concreto	17 d	lun 1/06/26	mar 23/06/26	$ 6.567.906	$ 3.960.061	$ 6.567.906
1290		**1.3.4.5.5.16**	**Tierra armada**	**168 d**	**mar 11/11/25**	**mié 17/06/26**	**$ 52.200.913**	**$ 51.685.772**	**$ 52.200.913**
1291		1.3.4.5.5.16	RELLENO CON GEOBLOQUE	168 d	mar 11/11/25	mié 17/06/26	$ 52.200.913	$ 51.685.772	$ 52.200.913
1292		**1.3.4.5.5.16**	**Fachada en Mampostería**	**11,75 d**	**mié 29/10/25**	**jue 13/11/25**	**$ 15.699.956**	**$ 15.699.956**	**$ 15.699.956**
1293		**1.3.4.5.5.16**	**Dobelas**	**2 d**	**mié 29/10/25**	**jue 30/10/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
1294		1.3.4.5.5.16	Acero	2 d	mié 29/10/25	jue 30/10/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
1295		**1.3.4.5.5.16**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**3 d**	**jue 30/10/25**	**mar 4/11/25**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**
1296		1.3.4.5.5.16	Concreto	1 d	sáb 1/11/25	mar 4/11/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
1297		1.3.4.5.5.16	Bloque en Concreto	2 d	jue 30/10/25	vie 31/10/25	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
1298		**1.3.4.5.5.16**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**5 d**	**vie 7/11/25**	**jue 13/11/25**	**$ 789.125**	**$ 789.125**	**$ 789.125**
1299		1.3.4.5.5.16	Concreto	2 d	mar 11/11/25	mié 12/11/25	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
1300		1.3.4.5.5.16	Bloque en Concreto	3 d	vie 7/11/25	mar 11/11/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
1301		**1.3.4.5.5.16**	**Viga de Amarre**	**5 d**	**sáb 1/11/25**	**sáb 8/11/25**	**$ 2.097.814**	**$ 2.097.814**	**$ 2.097.814**
1302		1.3.4.5.5.16	Acero	2 d	sáb 1/11/25	mié 5/11/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
1303		1.3.4.5.5.16	Concreto	3 d	mié 5/11/25	vie 7/11/25	$ 2.004.139	$ 2.004.139	$ 2.004.139
1304		1.3.4.5.5.17	Fin de Eje 4'-5'	0 d	vie 19/06/26	vie 19/06/26	$ 0	$ 0	$ 0
1305		**1.3.4.5.5.18**	**EJE 1-2**	**263,5 d**	**vie 11/07/25**	**mié 17/06/26**	**$ 91.952.524**	**$ 91.392.738**	**$ 91.952.524**
1306		1.3.4.5.5.18	Excavación	59 d	vie 11/07/25	mié 24/09/25	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000
1307		1.3.4.5.5.18	Mejoramiento de Subrasante	4 d	jue 6/11/25	mar 11/11/25	$ 58.876	$ 58.876	$ 58.876
1308		**1.3.4.5.5.18**	**Estructura**	**44 d**	**mar 11/11/25**	**jue 8/01/26**	**$ 38.992.735**	**$ 38.992.735**	**$ 38.992.735**
1309		**1.3.4.5.5.18**	**Zapatas**	**7 d**	**mar 11/11/25**	**vie 21/11/25**	**$ 14.246.405**	**$ 14.246.405**	**$ 14.246.405**
1310		1.3.4.5.5.18	Solado	2 d	mar 11/11/25	jue 13/11/25	$ 9.405	$ 9.405	$ 9.405
1311		1.3.4.5.5.18	Acero	2 d	jue 13/11/25	mar 18/11/25	$ 8.540.000	$ 8.540.000	$ 8.540.000
1312		1.3.4.5.5.18	Concreto	3 d	mar 18/11/25	vie 21/11/25	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
1313		**1.3.4.5.5.18**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**jue 13/11/25**	**mar 25/11/25**	**$ 7.262.240**	**$ 7.262.240**	**$ 7.262.240**
1314		1.3.4.5.5.18	Acero	3 d	jue 13/11/25	mié 19/11/25	$ 2.198.240	$ 2.198.240	$ 2.198.240
1315		1.3.4.5.5.18	Concreto	5 d	mié 19/11/25	mar 25/11/25	$ 5.064.000	$ 5.064.000	$ 5.064.000
1316		**1.3.4.5.5.18**	**Muros Laterales**	**11 d**	**mar 18/11/25**	**lun 1/12/25**	**$ 10.594.815**	**$ 10.594.815**	**$ 10.594.815**
1317		1.3.4.5.5.18	Acero	3 d	mar 18/11/25	vie 21/11/25	$ 6.163.815	$ 6.163.815	$ 6.163.815
1318		1.3.4.5.5.18	Concreto	5 d	mar 25/11/25	lun 1/12/25	$ 4.431.000	$ 4.431.000	$ 4.431.000
1319		**1.3.4.5.5.18**	**Vigas Longitudinales**	**9 d**	**sáb 27/12/25**	**jue 8/01/26**	**$ 6.889.275**	**$ 6.889.275**	**$ 6.889.275**
1320		1.3.4.5.5.18	Acero	3 d	sáb 27/12/25	mié 31/12/25	$ 3.091.275	$ 3.091.275	$ 3.091.275
1321		1.3.4.5.5.18	Concreto	6 d	mié 31/12/25	jue 8/01/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
1322		**1.3.4.5.5.18**	**Tierra Armada**	**152 d**	**lun 1/12/25**	**mié 17/06/26**	**$ 52.200.913**	**$ 51.641.127**	**$ 52.200.913**
1323		1.3.4.5.5.18	RELLENO CON GEOBLOQUE	152 d	lun 1/12/25	mié 17/06/26	$ 52.200.913	$ 51.641.127	$ 52.200.913
1324		1.3.4.5.5.19	Fin de Eje 1-2	0 d	jue 8/01/26	jue 8/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
1325		**1.3.4.5.5.20**	**EJE 2-3**	**265,37 d**	**mié 9/07/25**	**mié 17/06/26**	**$ 92.585.524**	**$ 92.070.383**	**$ 92.585.524**
1326		1.3.4.5.5.20	Excavación	62 d	mié 9/07/25	jue 25/09/25	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000
1327		1.3.4.5.5.20	Mejoramiento de Subrasante	4 d	mar 4/11/25	sáb 8/11/25	$ 58.876	$ 58.876	$ 58.876
1328		**1.3.4.5.5.20**	**Estructura**	**45,87 d**	**lun 10/11/25**	**vie 9/01/26**	**$ 39.625.735**	**$ 39.625.735**	**$ 39.625.735**
1329		**1.3.4.5.5.20**	**Zapatas**	**7 d**	**lun 10/11/25**	**jue 20/11/25**	**$ 14.879.405**	**$ 14.879.405**	**$ 14.879.405**
1330		1.3.4.5.5.20	Solado	1 d	lun 10/11/25	mar 11/11/25	$ 9.405	$ 9.405	$ 9.405
1331		1.3.4.5.5.20	Acero	2 d	mié 12/11/25	vie 14/11/25	$ 8.540.000	$ 8.540.000	$ 8.540.000
1332		1.3.4.5.5.20	Concreto	3 d	vie 14/11/25	jue 20/11/25	$ 6.330.000	$ 6.330.000	$ 6.330.000
1333		**1.3.4.5.5.20**	**Vigas de Cimentación**	**7,87 d**	**mié 12/11/25**	**lun 24/11/25**	**$ 6.629.240**	**$ 6.629.240**	**$ 6.629.240**
1334		1.3.4.5.5.20	Acero	3 d	mié 12/11/25	sáb 15/11/25	$ 2.198.240	$ 2.198.240	$ 2.198.240
1335		1.3.4.5.5.20	Concreto	5 d	mar 18/11/25	lun 24/11/25	$ 4.431.000	$ 4.431.000	$ 4.431.000
1336		**1.3.4.5.5.20**	**Muros Laterales**	**9,87 d**	**mié 19/11/25**	**lun 1/12/25**	**$ 10.594.815**	**$ 10.594.815**	**$ 10.594.815**
1337		1.3.4.5.5.20	Acero	3 d	mié 19/11/25	sáb 22/11/25	$ 6.163.815	$ 6.163.815	$ 6.163.815
1338		1.3.4.5.5.20	Concreto	7 d	sáb 22/11/25	lun 1/12/25	$ 4.431.000	$ 4.431.000	$ 4.431.000
1339		**1.3.4.5.5.20**	**Vigas Longitudinales**	**10 d**	**sáb 27/12/25**	**vie 9/01/26**	**$ 7.522.275**	**$ 7.522.275**	**$ 7.522.275**
1340		1.3.4.5.5.20	Acero	3 d	sáb 27/12/25	mié 31/12/25	$ 3.091.275	$ 3.091.275	$ 3.091.275
1341		1.3.4.5.5.20	Concreto	7 d	mié 31/12/25	vie 9/01/26	$ 4.431.000	$ 4.431.000	$ 4.431.000
1342		**1.3.4.5.5.20**	**Tierra Armada**	**152 d**	**lun 1/12/25**	**mié 17/06/26**	**$ 52.200.913**	**$ 51.685.772**	**$ 52.200.913**
1343		1.3.4.5.5.20	RELLENO CON GEOBLOQUE	152 d	lun 1/12/25	mié 17/06/26	$ 52.200.913	$ 51.685.772	$ 52.200.913
1344		1.3.4.5.5.21	Fin de Eje 2-3	0 d	vie 9/01/26	vie 9/01/26	$ 0	$ 0	$ 0

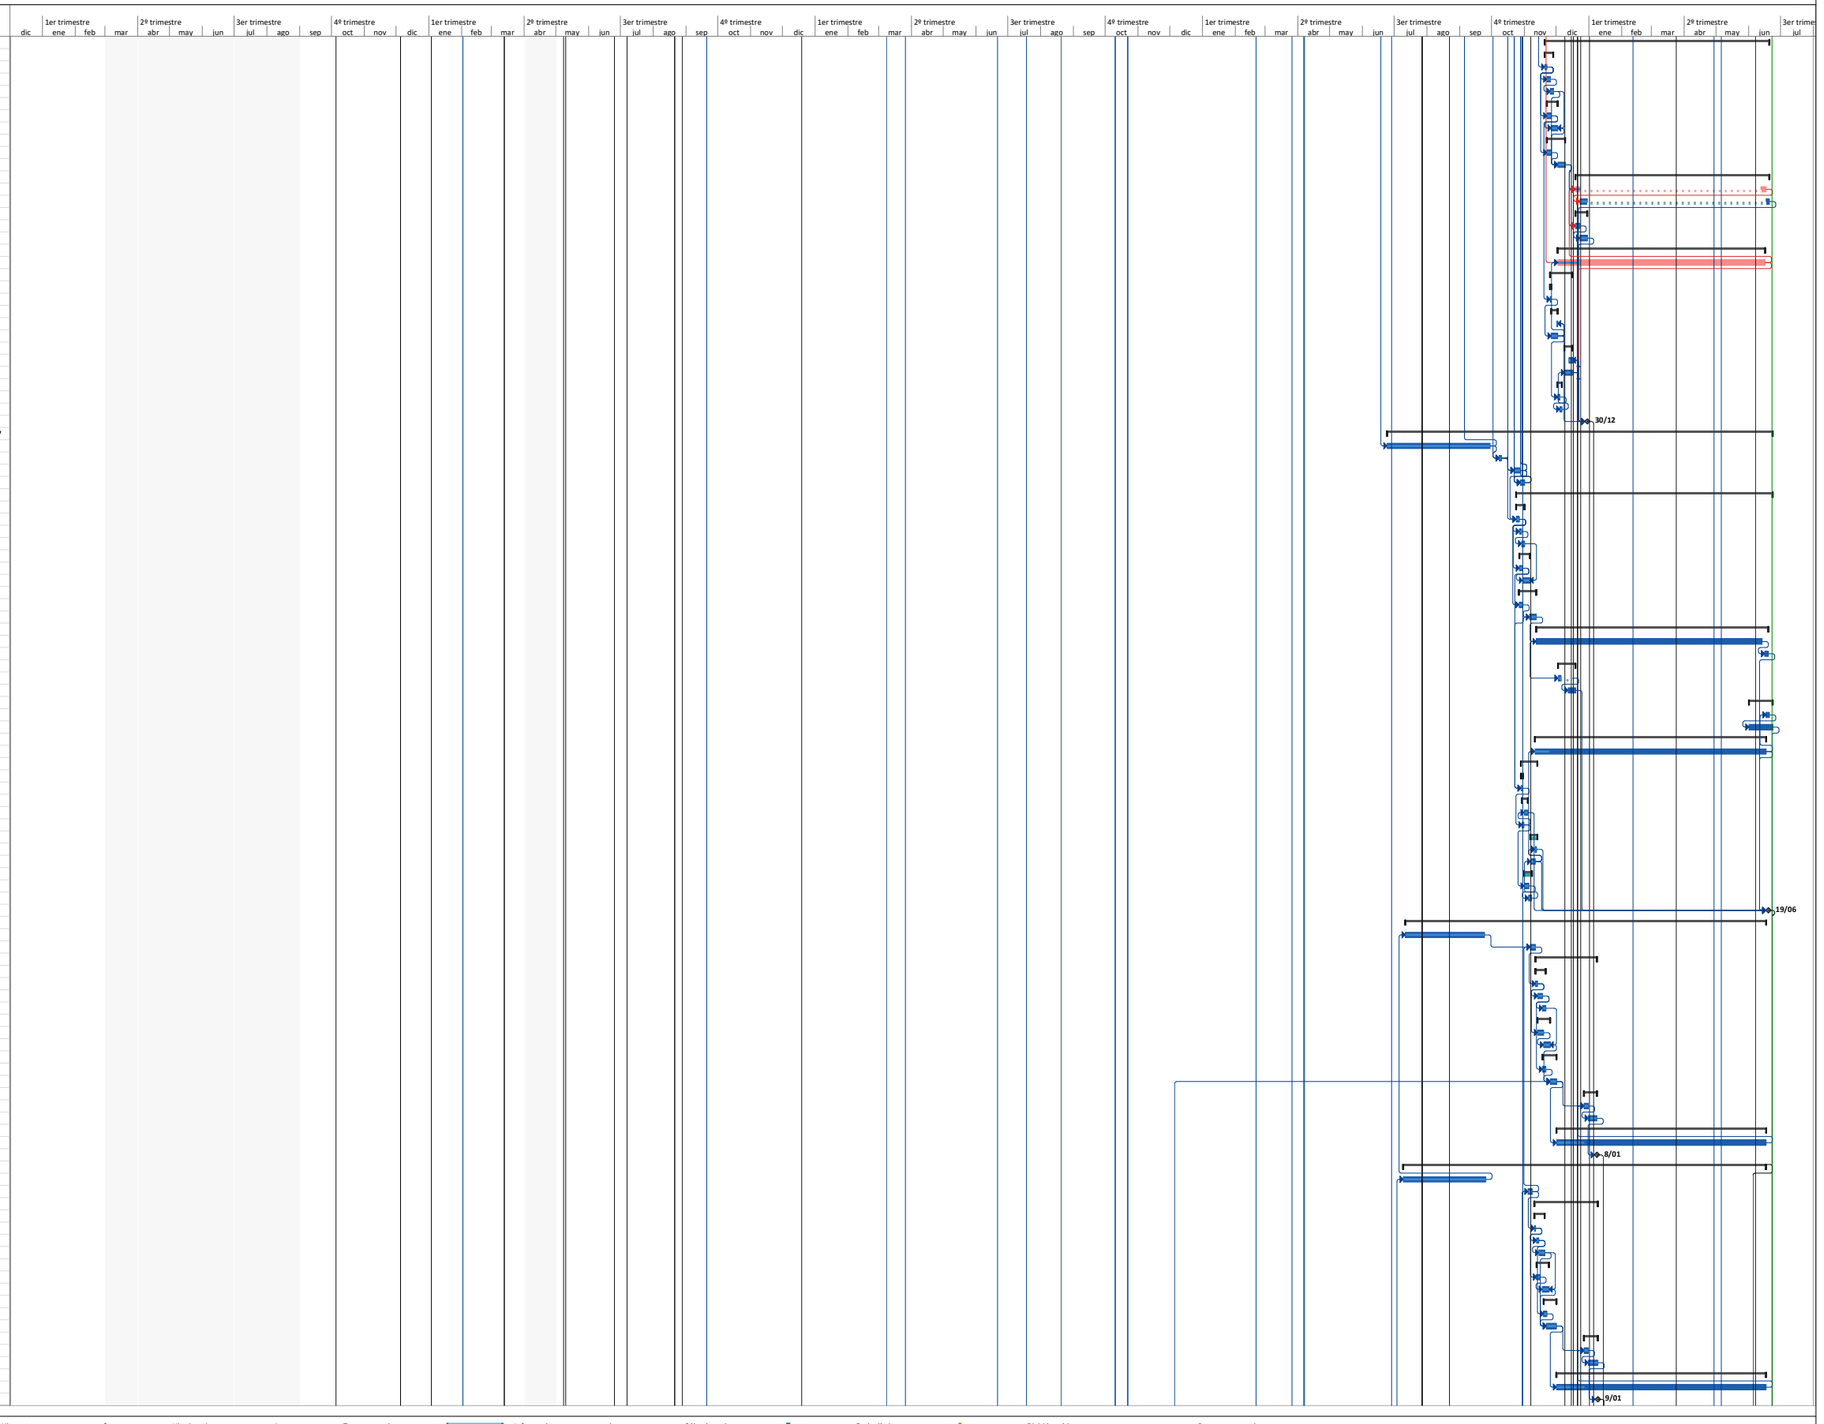

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito externo · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · Sólo el comienzo · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo · Sólo duración · Resumen manual · Sólo fin · Tareas críticas · Progreso

Proyecto: IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB8-20221201
Fecha: mar 23/06/26


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
1345		**1.3.4.5.5.22**	**EJE 3-4**	**268,5 d**	**lun 7/07/25**	**jue 18/06/26**	**$ 92.585.524**	**$ 91.651.589**	**$ 92.585.524**
1346		1.3.4.5.5.22	Excavación	65 d	lun 7/07/25	vie 26/09/25	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000
1347		1.3.4.5.5.22	Mejoramiento de Subrasante	4 d	mar 4/11/25	sáb 8/11/25	$ 58.876	$ 58.876	$ 58.876
1348		**1.3.4.5.5.22**	**Estructura**	**41 d**	**sáb 8/11/25**	**vie 2/01/26**	**$ 39.625.735**	**$ 39.625.735**	**$ 39.625.735**
1349		**1.3.4.5.5.22**	**Zapatas**	**8 d**	**sáb 8/11/25**	**jue 20/11/25**	**$ 14.879.405**	**$ 14.879.405**	**$ 14.879.405**
1350		1.3.4.5.5.22	Solado	2 d	sáb 8/11/25	mar 11/11/25	$ 9.405	$ 9.405	$ 9.405
1351		1.3.4.5.5.22	Acero	1 d	mié 12/11/25	jue 13/11/25	$ 8.540.000	$ 8.540.000	$ 8.540.000
1352		1.3.4.5.5.22	Concreto	3 d	vie 14/11/25	jue 20/11/25	$ 6.330.000	$ 6.330.000	$ 6.330.000
1353		**1.3.4.5.5.22**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**mié 12/11/25**	**lun 24/11/25**	**$ 6.629.240**	**$ 6.629.240**	**$ 6.629.240**
1354		1.3.4.5.5.22	Acero	2 d	mié 12/11/25	vie 14/11/25	$ 2.198.240	$ 2.198.240	$ 2.198.240
1355		1.3.4.5.5.22	Concreto	5 d	mar 18/11/25	lun 24/11/25	$ 4.431.000	$ 4.431.000	$ 4.431.000
1356		**1.3.4.5.5.22**	**Muros Laterales**	**10 d**	**mié 26/11/25**	**mar 9/12/25**	**$ 10.594.815**	**$ 10.594.815**	**$ 10.594.815**
1357		1.3.4.5.5.22	Acero	3 d	mié 26/11/25	sáb 29/11/25	$ 6.163.815	$ 6.163.815	$ 6.163.815
1358		1.3.4.5.5.22	Concreto	7 d	sáb 29/11/25	mar 9/12/25	$ 4.431.000	$ 4.431.000	$ 4.431.000
1359		**1.3.4.5.5.22**	**Vigas Longitudinales**	**8 d**	**lun 22/12/25**	**vie 2/01/26**	**$ 7.522.275**	**$ 7.522.275**	**$ 7.522.275**
1360		1.3.4.5.5.22	Acero	3 d	lun 22/12/25	vie 26/12/25	$ 3.091.275	$ 3.091.275	$ 3.091.275
1361		1.3.4.5.5.22	Concreto	5 d	vie 26/12/25	vie 2/01/26	$ 4.431.000	$ 4.431.000	$ 4.431.000
1362		**1.3.4.5.5.22**	**Tierra Armada**	**147 d**	**mar 9/12/25**	**jue 18/06/26**	**$ 52.200.913**	**$ 51.266.978**	**$ 52.200.913**
1363		1.3.4.5.5.22	RELLENO CON GEOBLOQUE	147 d	mar 9/12/25	jue 18/06/26	$ 52.200.913	$ 51.266.978	$ 52.200.913
1364		1.3.4.5.5.23	Fin de Eje 3-4	0 d	vie 2/01/26	vie 2/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
1365		**1.3.4.5.5.24**	**EJE 4-5**	**269,25 d**	**vie 4/07/25**	**mié 17/06/26**	**$ 91.986.980**	**$ 91.518.485**	**$ 91.986.980**
1366		1.3.4.5.5.24	Excavación	65 d	vie 4/07/25	mié 24/09/25	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000
1367		1.3.4.5.5.24	Mejoramiento de Subrasante	4 d	mié 5/11/25	lun 10/11/25	$ 58.876	$ 58.876	$ 58.876
1368		**1.3.4.5.5.24**	**Estructura**	**43,5 d**	**lun 10/11/25**	**mié 7/01/26**	**$ 39.625.735**	**$ 39.625.735**	**$ 39.625.735**
1369		**1.3.4.5.5.24**	**Zapatas**	**7 d**	**lun 10/11/25**	**jue 20/11/25**	**$ 14.879.405**	**$ 14.879.405**	**$ 14.879.405**
1370		1.3.4.5.5.24	Solado	2 d	lun 10/11/25	mié 12/11/25	$ 9.405	$ 9.405	$ 9.405
1371		1.3.4.5.5.24	Acero	2 d	mié 12/11/25	vie 14/11/25	$ 8.540.000	$ 8.540.000	$ 8.540.000
1372		1.3.4.5.5.24	Concreto	3 d	vie 14/11/25	jue 20/11/25	$ 6.330.000	$ 6.330.000	$ 6.330.000
1373		**1.3.4.5.5.24**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**mié 12/11/25**	**lun 24/11/25**	**$ 6.629.240**	**$ 6.629.240**	**$ 6.629.240**
1374		1.3.4.5.5.24	Acero	3 d	mié 12/11/25	mar 18/11/25	$ 2.198.240	$ 2.198.240	$ 2.198.240
1375		1.3.4.5.5.24	Concreto	4 d	mié 19/11/25	lun 24/11/25	$ 4.431.000	$ 4.431.000	$ 4.431.000
1376		**1.3.4.5.5.24**	**Muros Laterales**	**10,75 d**	**jue 20/11/25**	**mié 3/12/25**	**$ 10.594.815**	**$ 10.594.815**	**$ 10.594.815**
1377		1.3.4.5.5.24	Acero	3 d	jue 20/11/25	lun 24/11/25	$ 6.163.815	$ 6.163.815	$ 6.163.815
1378		1.3.4.5.5.24	Concreto	7 d	mar 25/11/25	mié 3/12/25	$ 4.431.000	$ 4.431.000	$ 4.431.000
1379		**1.3.4.5.5.24**	**Vigas Longitudinales**	**7,75 d**	**sáb 27/12/25**	**mié 7/01/26**	**$ 7.522.275**	**$ 7.522.275**	**$ 7.522.275**
1380		1.3.4.5.5.24	Acero	3 d	sáb 27/12/25	mié 31/12/25	$ 3.091.275	$ 3.091.275	$ 3.091.275
1381		1.3.4.5.5.24	Concreto	5 d	mié 31/12/25	mié 7/01/26	$ 4.431.000	$ 4.431.000	$ 4.431.000
1382		**1.3.4.5.5.24**	**Tierra Armada**	**152 d**	**lun 1/12/25**	**mié 17/06/26**	**$ 51.602.369**	**$ 51.133.874**	**$ 51.602.369**
1383		1.3.4.5.5.24	RELLENO CON GEOBLOQUE	152 d	lun 1/12/25	mié 17/06/26	$ 51.602.369	$ 51.133.874	$ 51.602.369
1384		1.3.4.5.5.25	Fin de Eje 5-4	0 d	mié 7/01/26	mié 7/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
1385		1.3.4.5.5.26	PLACA DE PROTECCIÓN	124 d	sáb 10/01/26	sáb 20/06/26	$ 78.292.421	$ 78.134.854	$ 78.292.421
1386		**1.3.4.5.5.27**	**PAVIMENTO**	**13,5 d**	**jue 11/06/26**	**mar 30/06/26**	**$ 184.917.482**	**$ 31.439.426**	**$ 94.573.085**
1387		1.3.4.5.5.27	Subbase	7 d	jue 11/06/26	sáb 20/06/26	$ 74.573.085	$ 29.296.569	$ 74.573.085
1388		1.3.4.5.5.27	Base	7 d	sáb 13/06/26	mar 23/06/26	$ 20.000.000	$ 2.142.857	$ 20.000.000
1389		1.3.4.5.5.27	Mezcla Asfaltica - GCR	4 d	mar 23/06/26	vie 26/06/26	$ 68.151.947	$ 0	$ 0
1390		1.3.4.5.5.27	Mezcla Asfaltica - MD12	2 d	vie 26/06/26	mar 30/06/26	$ 22.192.450	$ 0	$ 0
1391		1.3.4.5.5.28	Baranda Vehicular	109 d	lun 9/02/26	mié 1/07/26	$ 293.474.636	$ 261.174.378	$ 205.432.245
1392		1.3.4.5.5.29	baranda Peatonal	109 d	lun 9/02/26	mié 1/07/26	$ 43.954.433	$ 39.053.340	$ 21.977.217
1393		1.3.4.5.6	Fin de Final de oreja Oriental	0 d	mié 1/07/26	mié 1/07/26	$ 0	$ 0	$ 0
1394		**1.3.4.5.7**	**FINAL DE APROCHE ORIENTAL**	**560,75 d**	**jue 14/03/24**	**vie 6/03/26**	**$ 1.410.729.145**	**$ 1.410.729....**	**$ 1.410.729.145**
1395		**1.3.4.5.7.1**	**EJE JC1-JC2**	**512,75 d**	**jue 14/03/24**	**mar 6/01/26**	**$ 181.572.068**	**$ 181.572.068**	**$ 181.572.068**
1396		1.3.4.5.7.1.1	Excavación	1 d	jue 14/03/24	vie 15/03/24	$ 1.258.056	$ 1.258.056	$ 1.258.056
1397		1.3.4.5.7.1.2	Pilotes FDP	2 d	lun 12/08/24	mié 14/08/24	$ 35.064.000	$ 35.064.000	$ 35.064.000
1398		1.3.4.5.7.1.3	CAPA DE TRANSFERENCIA	3 d	mié 16/10/24	sáb 19/10/24	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
1399		1.3.4.5.7.1.4	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	4 d	mié 22/10/25	lun 27/10/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
1400		**1.3.4.5.7.1.5**	**Estructura**	**314 d**	**lue 28/11/24**	**mar 6/01/26**	**$ 47.999.932**	**$ 47.999.932**	**$ 47.999.932**
1401		**1.3.4.5.7.1.5**	**Zapatas**	**7 d**	**jue 28/11/24**	**vie 6/12/24**	**$ 18.070.947**	**$ 18.070.947**	**$ 18.070.947**
1402		1.3.4.5.7.1.5	Solado	2 d	jue 28/11/24	vie 29/11/24	$ 9.405	$ 9.405	$ 9.405
1403		1.3.4.5.7.1.5	Acero	2 d	sáb 30/11/24	mar 3/12/24	$ 8.549.405	$ 8.549.405	$ 8.549.405
1404		1.3.4.5.7.1.5	Concreto	3 d	mar 3/12/24	vie 6/12/24	$ 9.512.137	$ 9.512.137	$ 9.512.137
1405		**1.3.4.5.7.1.5**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**sáb 30/11/24**	**mar 10/12/24**	**$ 9.242.425**	**$ 9.242.425**	**$ 9.242.425**
1406		1.3.4.5.7.1.5	Acero	3 d	sáb 30/11/24	mié 4/12/24	$ 2.279.425	$ 2.279.425	$ 2.279.425
1407		1.3.4.5.7.1.5	Concreto	5 d	mié 4/12/24	mar 10/12/24	$ 6.963.000	$ 6.963.000	$ 6.963.000
1408		**1.3.4.5.7.1.5**	**Muros Laterales**	**13 d**	**sáb 30/11/24**	**lun 16/12/24**	**$ 11.954.490**	**$ 11.954.490**	**$ 11.954.490**
1409		1.3.4.5.7.1.5	Acero	3 d	sáb 30/11/24	mié 4/12/24	$ 6.257.490	$ 6.257.490	$ 6.257.490
1410		1.3.4.5.7.1.5	Concreto	5 d	mar 10/12/24	lun 16/12/24	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
1411		**1.3.4.5.7.1.5**	**Vigas Longitudinales**	**7 d**	**sáb 27/12/25**	**mar 6/01/26**	**$ 8.732.070**	**$ 8.732.070**	**$ 8.732.070**
1412		1.3.4.5.7.1.5	Acero	3 d	sáb 27/12/25	mié 31/12/25	$ 3.035.070	$ 3.035.070	$ 3.035.070
1413		1.3.4.5.7.1.5	Concreto	5 d	mar 30/12/25	mar 6/01/26	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
1414		**1.3.4.5.7.1.6**	**Tierra Armada**	**290 d**	**lun 16/12/24**	**mar 23/12/25**	**$ 93.667.164**	**$ 93.667.164**	**$ 93.667.164**
1415		1.3.4.5.7.1.6	RELLENO CON GEOBLOQUE	260 d	lun 16/12/24	vie 14/11/25	$ 29.404.400	$ 29.404.400	$ 29.404.400
1416		1.3.4.5.7.1.6	RELLENO CON GEOBLOQUE	30 d	vie 14/11/25	mar 23/12/25	$ 64.262.764	$ 64.262.764	$ 64.262.764
1417		1.3.4.5.7.2	Fin de Eje JC1-JC2	0 d	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
1418		1.3.4.5.7.3	Losa de aproximación	6 d	mié 7/01/26	jue 15/01/26	$ 15.607.239	$ 15.607.239	$ 15.607.239
1419		**1.3.4.5.7.4**	**EJE JC2-JC3**	**511,75 d**	**jue 14/03/24**	**lun 5/01/26**	**$ 181.503.575**	**$ 181.503.575**	**$ 181.503.575**
1420		1.3.4.5.7.4.1	Excavación	1 d	jue 14/03/24	vie 15/03/24	$ 1.258.056	$ 1.258.056	$ 1.258.056
1421		1.3.4.5.7.4.2	Pilotes FDP	2 d	vie 9/08/24	lun 12/08/24	$ 35.064.000	$ 35.064.000	$ 35.064.000
1422		1.3.4.5.7.4.3	CAPA DE TRANSFERENCIA	3 d	lun 21/10/24	jue 24/10/24	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
1423		1.3.4.5.7.4.4	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	3 d	vie 17/10/25	mar 21/10/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
1424		**1.3.4.5.7.4.5**	**Estructura**	**315 d**	**mar 26/11/24**	**lun 5/01/26**	**$ 47.929.675**	**$ 47.929.675**	**$ 47.929.675**
1425		**1.3.4.5.7.4.5**	**Zapatas**	**7 d**	**mar 26/11/24**	**mié 4/12/24**	**$ 18.044.405**	**$ 18.044.405**	**$ 18.044.405**
1426		1.3.4.5.7.4.5	Solado	2 d	mar 26/11/24	mié 27/11/24	$ 9.405	$ 9.405	$ 9.405
1427		1.3.4.5.7.4.5	Acero	2 d	jue 28/11/24	vie 29/11/24	$ 8.540.000	$ 8.540.000	$ 8.540.000
1428		1.3.4.5.7.4.5	Concreto	3 d	sáb 30/11/24	mié 4/12/24	$ 9.495.000	$ 9.495.000	$ 9.495.000
1429		**1.3.4.5.7.4.5**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**jue 28/11/24**	**sáb 7/12/24**	**$ 9.186.220**	**$ 9.186.220**	**$ 9.186.220**
1430		1.3.4.5.7.4.5	Acero	3 d	jue 28/11/24	lun 2/12/24	$ 2.223.220	$ 2.223.220	$ 2.223.220
1431		1.3.4.5.7.4.5	Concreto	5 d	lun 2/12/24	sáb 7/12/24	$ 6.963.000	$ 6.963.000	$ 6.963.000
1432		**1.3.4.5.7.4.5**	**Muros Laterales**	**13 d**	**jue 28/11/24**	**vie 13/12/24**	**$ 11.973.225**	**$ 11.973.225**	**$ 11.973.225**
1433		1.3.4.5.7.4.5	Acero	3 d	jue 28/11/24	lun 2/12/24	$ 6.276.225	$ 6.276.225	$ 6.276.225
1434		1.3.4.5.7.4.5	Concreto	5 d	sáb 7/12/24	vie 13/12/24	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
1435		**1.3.4.5.7.4.5**	**Vigas Longitudinales**	**7 d**	**vie 26/12/25**	**lun 5/01/26**	**$ 8.725.825**	**$ 8.725.825**	**$ 8.725.825**
1436		1.3.4.5.7.4.5	Acero	3 d	vie 26/12/25	mar 30/12/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
1437		1.3.4.5.7.4.5	Concreto	5 d	lun 29/12/25	lun 5/01/26	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
1438		**1.3.4.5.7.4.6**	**Tierra Armada**	**318 d**	**mié 13/11/24**	**mié 24/12/25**	**$ 93.668.928**	**$ 93.668.928**	**$ 93.668.928**
1439		1.3.4.5.7.4.6	RELLENO CON GEOBLOQUE	238 d	mié 13/11/24	sáb 13/09/25	$ 39.071.600	$ 39.071.600	$ 39.071.600
1440		1.3.4.5.7.4.6	RELLENO CON GEOBLOQUE 2	79 d	lun 15/09/25	mié 24/12/25	$ 54.597.328	$ 54.597.328	$ 54.597.328
1441		1.3.4.5.7.5	Fin de Eje JC2-JC3	0 d	lun 5/01/26	lun 5/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
1442		**1.3.4.5.7.6**	**EJE JC3-JC4**	**509,75 d**	**vie 15/03/24**	**sáb 3/01/26**	**$ 181.434.880**	**$ 181.434.880**	**$ 181.434.880**
1443		1.3.4.5.7.6.1	Excavación	1 d	vie 15/03/24	sáb 16/03/24	$ 1.258.056	$ 1.258.056	$ 1.258.056
1444		1.3.4.5.7.6.2	Pilotes FDP	2 d	vie 9/08/24	lun 12/08/24	$ 35.064.000	$ 35.064.000	$ 35.064.000
1445		1.3.4.5.7.6.3	CAPA DE TRANSFERENCIA	3 d	jue 24/10/24	lun 28/10/24	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
1446		1.3.4.5.7.6.4	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	3 d	mar 21/10/25	vie 24/10/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
1447		**1.3.4.5.7.6.5**	**Estructura**	**314 d**	**mar 26/11/24**	**sáb 3/01/26**	**$ 47.860.980**	**$ 47.860.980**	**$ 47.860.980**
1448		**1.3.4.5.7.6.5**	**Zapatas**	**7 d**	**mar 26/11/24**	**mié 4/12/24**	**$ 18.044.405**	**$ 18.044.405**	**$ 18.044.405**
1449		1.3.4.5.7.6.5	Solado	2 d	mar 26/11/24	mié 27/11/24	$ 9.405	$ 9.405	$ 9.405
1450		1.3.4.5.7.6.5	Acero	2 d	jue 28/11/24	vie 29/11/24	$ 8.540.000	$ 8.540.000	$ 8.540.000
1451		1.3.4.5.7.6.5	Concreto	3 d	sáb 30/11/24	mié 4/12/24	$ 9.495.000	$ 9.495.000	$ 9.495.000
1452		**1.3.4.5.7.6.5**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**jue 28/11/24**	**sáb 7/12/24**	**$ 8.867.725**	**$ 8.867.725**	**$ 8.867.725**
1453		1.3.4.5.7.6.5	Acero	3 d	jue 28/11/24	lun 2/12/24	$ 1.904.725	$ 1.904.725	$ 1.904.725
1454		1.3.4.5.7.6.5	Concreto	5 d	lun 2/12/24	sáb 7/12/24	$ 6.963.000	$ 6.963.000	$ 6.963.000
1455		**1.3.4.5.7.6.5**	**Muros Laterales**	**13 d**	**jue 28/11/24**	**vie 13/12/24**	**$ 12.347.925**	**$ 12.347.925**	**$ 12.347.925**
1456		1.3.4.5.7.6.5	Acero	3 d	jue 28/11/24	lun 2/12/24	$ 6.650.925	$ 6.650.925	$ 6.650.925

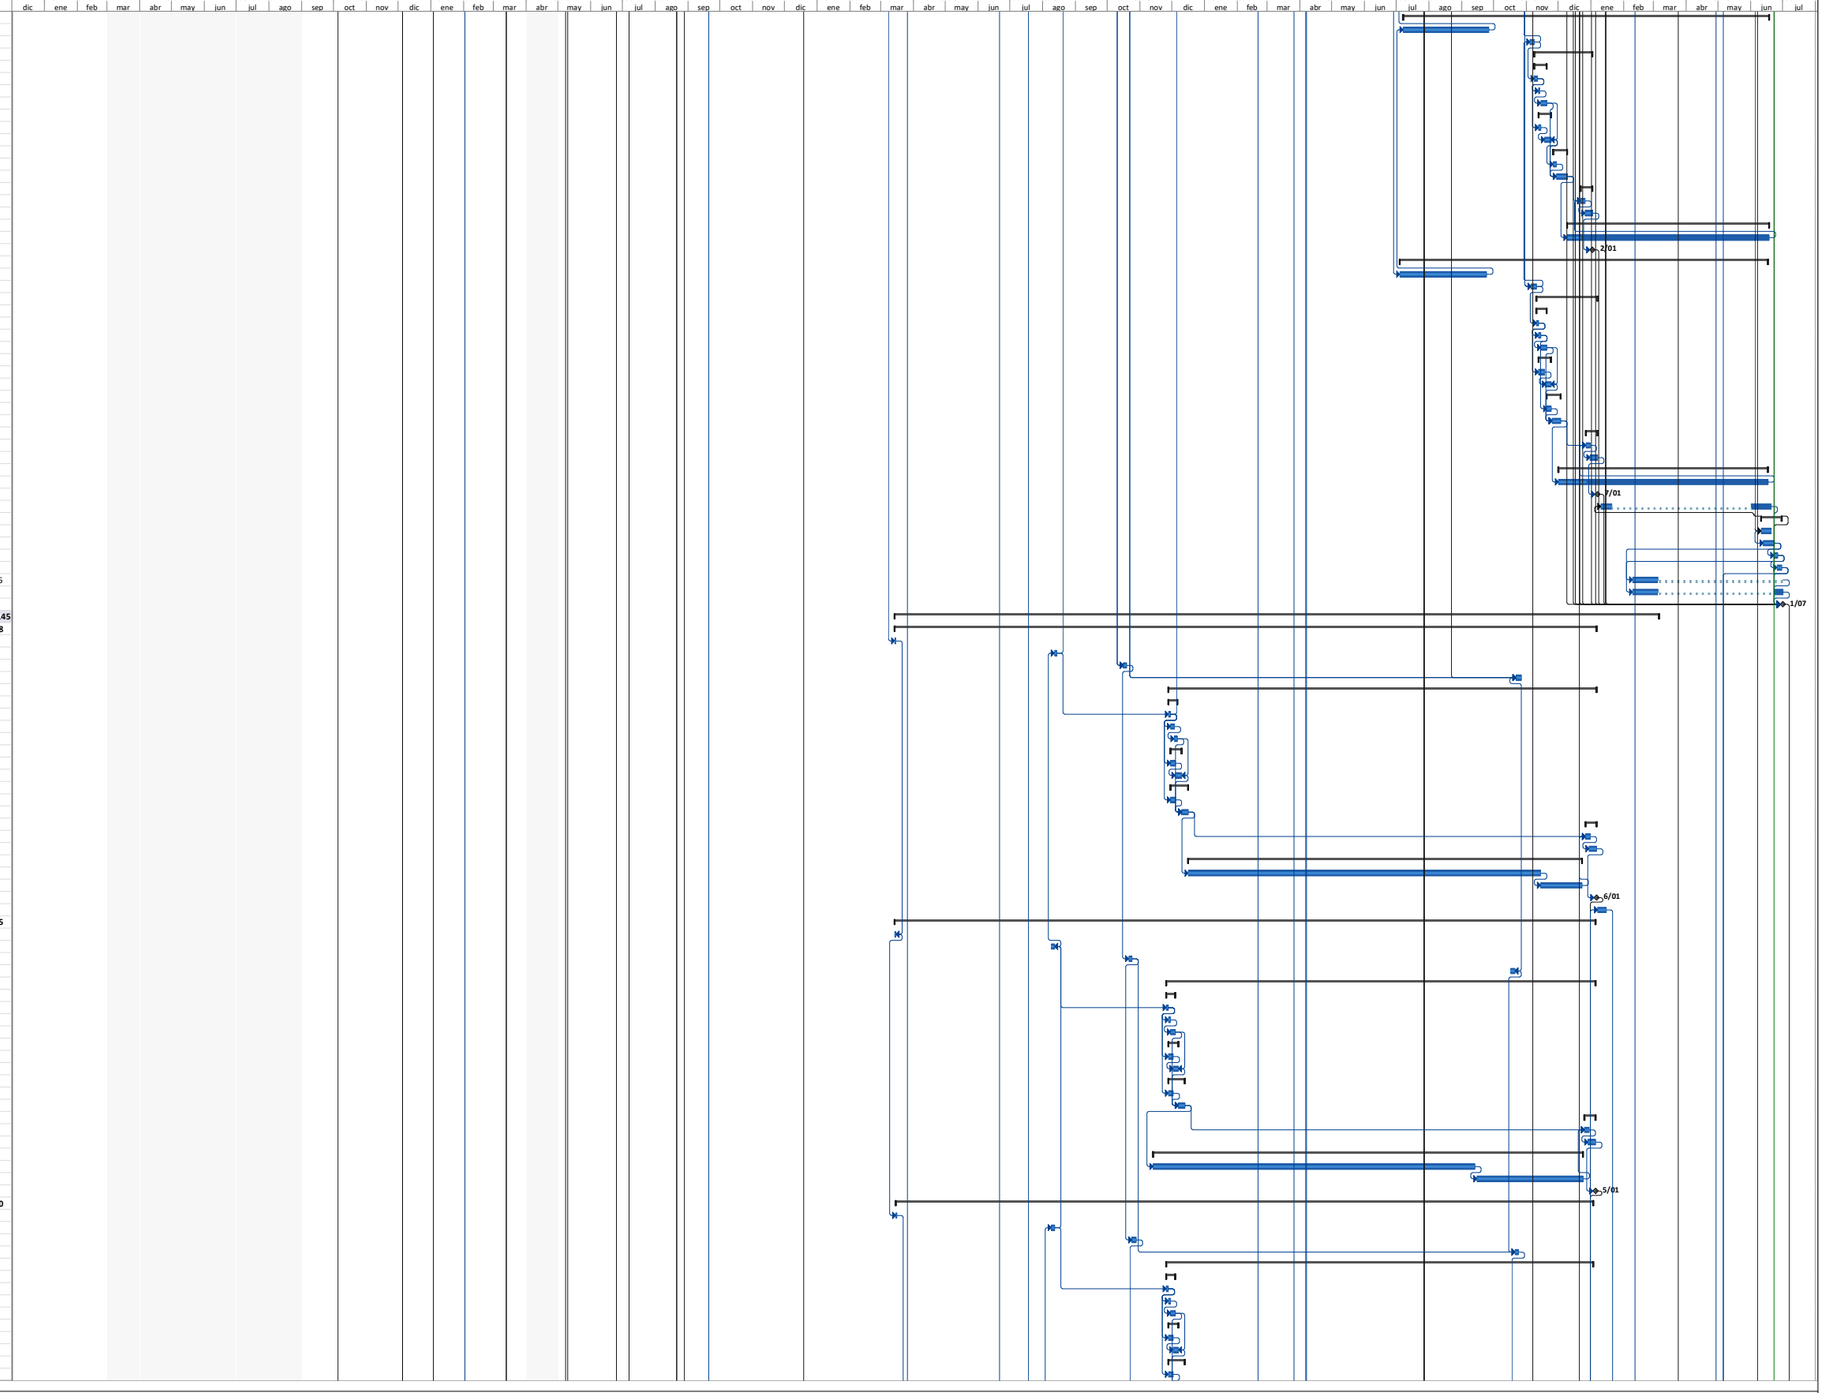

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Proyecto: IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB8-20221201
Fecha: mar 23/06/26


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
1457		1.3.4.5.7.6.5	Concreto	5 d	sáb 7/12/24	vie 13/12/24	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
1458		1.3.4.5.7.6.6	**Vigas Longitudinales**	**8 d**	**mar 23/12/25**	**sáb 3/01/26**	**$ 8.600.925**	**$ 8.600.925**	**$ 8.600.925**
1459		1.3.4.5.7.6.6	Acero	3 d	mar 23/12/25	vie 26/12/25	$ 2.903.925	$ 2.903.925	$ 2.903.925
1460		1.3.4.5.7.6.6	Concreto	5 d	sáb 27/12/25	sáb 3/01/26	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
1461		1.3.4.5.7.6.6	**Tierra Armada**	**315 d**	**jue 14/11/24**	**lun 22/12/25**	**$ 93.668.928**	**$ 93.668.928**	**$ 93.668.928**
1462		1.3.4.5.7.6.6	RELLENO CON GEOBLOQUE	237 d	jue 14/11/24	sáb 13/09/25	$ 38.668.800	$ 38.668.800	$ 38.668.800
1463		1.3.4.5.7.6.6	RELLENO CON GEOBLOQUE 2	77 d	lun 15/09/25	lun 22/12/25	$ 55.000.128	$ 55.000.128	$ 55.000.128
1464		1.3.4.5.7.7	Fin de Eje JC3-JC4	0 d	sáb 3/01/26	sáb 3/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
1465		1.3.4.5.7.8	**EJE JC4-JC5**	**510 d**	**vie 15/03/24**	**sáb 3/01/26**	**$ 217.288.617**	**$ 217.288.617**	**$ 217.288.617**
1466		1.3.4.5.7.8.1	Excavación	1 d	vie 15/03/24	sáb 16/03/24	$ 1.258.056	$ 1.258.056	$ 1.258.056
1467		1.3.4.5.7.8.2	Pilotes FDP	2 d	mar 6/08/24	vie 9/08/24	$ 71.269.712	$ 71.269.712	$ 71.269.712
1468		1.3.4.5.7.8.3	CAPA DE TRANSFERENCIA	3 d	lun 28/10/24	jue 31/10/24	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
1469		1.3.4.5.7.8.4	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	3 d	vie 24/10/25	mar 28/10/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
1470		1.3.4.5.7.8.5	**Estructura**	**316 d**	**sáb 23/11/24**	**sáb 3/01/26**	**$ 47.509.005**	**$ 47.509.005**	**$ 47.509.005**
1471		1.3.4.5.7.8.6	**Zapatas**	**7 d**	**sáb 23/11/24**	**lun 2/12/24**	**$ 18.044.405**	**$ 18.044.405**	**$ 18.044.405**
1472		1.3.4.5.7.8.6	Solado	2 d	sáb 23/11/24	mar 26/11/24	$ 9.405	$ 9.405	$ 9.405
1473		1.3.4.5.7.8.6	Acero	2 d	mar 26/11/24	jue 28/11/24	$ 8.540.000	$ 8.540.000	$ 8.540.000
1474		1.3.4.5.7.8.6	Concreto	3 d	jue 28/11/24	lun 2/12/24	$ 9.495.000	$ 9.495.000	$ 9.495.000
1475		1.3.4.5.7.8.6	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**mar 26/11/24**	**jue 5/12/24**	**$ 9.198.710**	**$ 9.198.710**	**$ 9.198.710**
1476		1.3.4.5.7.8.6	Acero	3 d	mar 26/11/24	vie 29/11/24	$ 2.235.710	$ 2.235.710	$ 2.235.710
1477		1.3.4.5.7.8.6	Concreto	5 d	vie 29/11/24	jue 5/12/24	$ 6.963.000	$ 6.963.000	$ 6.963.000
1478		1.3.4.5.7.8.6	**Muros Laterales**	**10 d**	**vie 29/11/24**	**mié 11/12/24**	**$ 12.166.820**	**$ 12.166.820**	**$ 12.166.820**
1479		1.3.4.5.7.8.6	Acero	3 d	vie 29/11/24	mar 3/12/24	$ 6.469.820	$ 6.469.820	$ 6.469.820
1480		1.3.4.5.7.8.6	Concreto	5 d	jue 5/12/24	mié 11/12/24	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
1481		1.3.4.5.7.8.6	**Vigas Longitudinales**	**8 d**	**mar 23/12/25**	**sáb 3/01/26**	**$ 8.099.070**	**$ 8.099.070**	**$ 8.099.070**
1482		1.3.4.5.7.8.6	Acero	3 d	mar 23/12/25	sáb 27/12/25	$ 3.035.070	$ 3.035.070	$ 3.035.070
1483		1.3.4.5.7.8.6	Concreto	5 d	sáb 27/12/25	sáb 3/01/26	$ 5.064.000	$ 5.064.000	$ 5.064.000
1484		1.3.4.5.7.8.6	**Tierra Armada**	**316 d**	**mié 13/11/24**	**mar 23/12/25**	**$ 93.668.928**	**$ 93.668.928**	**$ 93.668.928**
1485		1.3.4.5.7.8.6	RELLENO CON GEOBLOQUE	258 d	mié 13/11/24	mié 8/10/25	$ 40.015.000	$ 40.015.000	$ 40.015.000
1486		1.3.4.5.7.8.6	RELLENO CON GEOBLOQUE 2	57 d	jue 9/10/25	mar 23/12/25	$ 53.653.928	$ 53.653.928	$ 53.653.928
1487		1.3.4.5.7.9	Fin de Eje JC4-JC5	0 d	sáb 3/01/26	sáb 3/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
1488		1.3.4.5.7.10	**EJE JC5-JC6**	**509,88 d**	**vie 15/03/24**	**sáb 3/01/26**	**$ 179.717.777**	**$ 179.717.777**	**$ 179.717.777**
1489		1.3.4.5.7.10.1	Excavación	1 d	vie 15/03/24	sáb 16/03/24	$ 1.258.056	$ 1.258.056	$ 1.258.056
1490		1.3.4.5.7.10.2	Pilotes FDP	2 d	mar 6/08/24	vie 9/08/24	$ 34.823.000	$ 34.823.000	$ 34.823.000
1491		1.3.4.5.7.10.3	CAPA DE TRANSFERENCIA	3 d	jue 31/10/24	mar 5/11/24	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
1492		1.3.4.5.7.10.4	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	3 d	mar 28/10/25	vie 31/10/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
1493		1.3.4.5.7.10.5	**Estructura**	**48 d**	**vie 31/10/25**	**sáb 3/01/26**	**$ 47.452.800**	**$ 47.452.800**	**$ 47.452.800**
1494		1.3.4.5.7.10.6	**Zapatas**	**7 d**	**vie 31/10/25**	**lun 10/11/25**	**$ 18.044.405**	**$ 18.044.405**	**$ 18.044.405**
1495		1.3.4.5.7.10.6	Solado	2 d	vie 31/10/25	mar 4/11/25	$ 9.405	$ 9.405	$ 9.405
1496		1.3.4.5.7.10.6	Acero	2 d	mar 4/11/25	jue 6/11/25	$ 8.540.000	$ 8.540.000	$ 8.540.000
1497		1.3.4.5.7.10.6	Concreto	3 d	jue 6/11/25	lun 10/11/25	$ 9.495.000	$ 9.495.000	$ 9.495.000
1498		1.3.4.5.7.10.6	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**mar 4/11/25**	**jue 13/11/25**	**$ 9.173.730**	**$ 9.173.730**	**$ 9.173.730**
1499		1.3.4.5.7.10.6	Acero	3 d	mar 4/11/25	vie 7/11/25	$ 2.210.730	$ 2.210.730	$ 2.210.730
1500		1.3.4.5.7.10.6	Concreto	5 d	vie 7/11/25	jue 13/11/25	$ 6.963.000	$ 6.963.000	$ 6.963.000
1501		1.3.4.5.7.10.6	**Muros Laterales**	**13 d**	**mar 4/11/25**	**jue 20/11/25**	**$ 12.266.740**	**$ 12.266.740**	**$ 12.266.740**
1502		1.3.4.5.7.10.6	Acero	3 d	mar 4/11/25	vie 7/11/25	$ 6.569.740	$ 6.569.740	$ 6.569.740
1503		1.3.4.5.7.10.6	Concreto	5 d	jue 13/11/25	jue 20/11/25	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
1504		1.3.4.5.7.10.6	**Vigas Longitudinales**	**8 d**	**mar 23/12/25**	**sáb 3/01/26**	**$ 7.967.925**	**$ 7.967.925**	**$ 7.967.925**
1505		1.3.4.5.7.10.6	Acero	3 d	mar 23/12/25	sáb 27/12/25	$ 2.903.925	$ 2.903.925	$ 2.903.925
1506		1.3.4.5.7.10.6	Concreto	5 d	sáb 27/12/25	sáb 3/01/26	$ 5.064.000	$ 5.064.000	$ 5.064.000
1507		1.3.4.5.7.10.6	**Tierra Armada**	**315 d**	**jue 14/11/24**	**mar 23/12/25**	**$ 92.601.005**	**$ 92.601.005**	**$ 92.601.005**
1508		1.3.4.5.7.10.6	RELLENO CON GEOBLOQUE	237 d	jue 14/11/24	sáb 13/09/25	$ 38.414.400	$ 38.414.400	$ 38.414.400
1509		1.3.4.5.7.10.6	RELLENO CON GEOBLOQUE 2	77 d	lun 15/09/25	mar 23/12/25	$ 54.186.605	$ 54.186.605	$ 54.186.605
1510		1.3.4.5.7.11	Fin de Eje JC5-JC6	0 d	sáb 3/01/26	sáb 3/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
1511		1.3.4.5.7.12	PLACA DE PROTECCIÓN	7 d	vie 26/12/25	lun 5/01/26	$ 36.932.912	$ 36.932.912	$ 36.932.912
1512		1.3.4.5.7.13	**PAVIMENTO**	**35 d**	**mar 6/01/26**	**mié 18/02/26**	**$ 197.372.349**	**$ 197.372.349**	**$ 197.372.349**
1513		1.3.4.5.7.13.1	Subbase	19 d	mar 6/01/26	vie 30/01/26	$ 23.771.607	$ 23.771.607	$ 23.771.607
1514		1.3.4.5.7.13.2	Base	13 d	lun 26/01/26	mar 10/02/26	$ 20.328.000	$ 20.328.000	$ 20.328.000
1515		1.3.4.5.7.13.3	Mezcla Asfaltica - GCR	3 d	mié 11/02/26	sáb 14/02/26	$ 59.009.647	$ 59.009.647	$ 59.009.647
1516		1.3.4.5.7.13.4	Mezcla Asfaltica - MD12	3 d	lun 16/02/26	mié 18/02/26	$ 94.263.095	$ 94.263.095	$ 94.263.095
1517		1.3.4.5.7.14	Baranda Vehicular	20 d	mar 10/02/26	vie 6/03/26	$ 219.299.728	$ 219.299.728	$ 219.299.728
1518		1.3.4.5.8	Fin de Final de Aproche Oriental	0 d	vie 6/03/26	vie 6/03/26	$ 0	$ 0	$ 0
1519		1.3.4.5.9	**CALLE 153 NE**	**865 d**	**mar 13/06/23**	**vie 3/07/26**	**$ 818.532.080**	**$ 816.830.812**	**$ 788.672.526**
1520		1.3.4.5.9.1	Demolición	1 d	vie 19/12/25	sáb 20/12/25	$ 1.498.639	$ 1.498.639	$ 0
1521		1.3.4.5.9.2	**Via**	**829 d**	**mar 13/06/23**	**vie 15/05/26**	**$ 688.467.144**	**$ 688.467.144**	**$ 688.467.144**
1522		1.3.4.5.9.2.1	Excavación Via Nueva	6 d	mar 13/06/23	mié 21/06/23	$ 21.653.409	$ 21.653.409	$ 21.653.409
1523		1.3.4.5.9.2.2	Mejoramiento con Rajón Via Nue	6 d	mié 21/06/23	mié 28/06/23	$ 119.469.958	$ 119.469.958	$ 119.469.958
1524		1.3.4.5.9.2.3	Subbase Granular Via Nueva	11 d	mié 28/06/23	mié 12/07/23	$ 57.306.484	$ 57.306.484	$ 57.306.484
1525		1.3.4.5.9.2.4	Base Granular Via Nueva	11 d	sáb 21/10/23	vie 3/11/23	$ 46.724.659	$ 46.724.659	$ 46.724.659
1526		1.3.4.5.9.2.5	Mezcla Asfaltica - GCR Via Nueva	6 d	jue 14/11/24	jue 21/11/24	$ 73.844.769	$ 73.844.769	$ 73.844.769
1527		1.3.4.5.9.2.6	Mezcla Asfaltica - MD12 Via Nuev	6 d	jue 21/11/24	jue 28/11/24	$ 24.044.150	$ 24.044.150	$ 24.044.150
1528		1.3.4.5.9.2.7	Excavación Rehabilitación de via	18 d	sáb 3/01/26	mar 27/01/26	$ 21.653.409	$ 21.653.409	$ 21.653.409
1529		1.3.4.5.9.2.8	Mejoramiento con Rajón Rehabilitación de via	20 d	lun 2/03/26	vie 27/03/26	$ 119.469.958	$ 119.469.958	$ 119.469.958
1530		1.3.4.5.9.2.9	Subbase Granular Rehabilitación c	12 d	vie 27/03/26	lun 13/04/26	$ 57.306.484	$ 57.306.484	$ 57.306.484
1531		1.3.4.5.9.2.1	Base Granular Rehabilitación de vi	12 d	mar 14/04/26	mar 28/04/26	$ 36.372.000	$ 36.372.000	$ 36.372.000
1532		1.3.4.5.9.2.1	Mezcla Asfaltica - GCR Rehabilitac	7 d	mar 28/04/26	jue 7/05/26	$ 73.844.769	$ 73.844.769	$ 73.844.769
1533		1.3.4.5.9.2.1	Mezcla Asfaltica - MD12 Rehabilitación de via	7 d	jue 7/05/26	vie 15/05/26	$ 36.777.096	$ 36.777.096	$ 36.777.096
1534		1.3.4.5.9.3	**Espacio Público**	**97 d**	**jue 26/02/26**	**vie 3/07/26**	**$ 128.566.297**	**$ 126.865.029**	**$ 100.205.382**
1535		1.3.4.5.9.3.1	Excavación	90 d	jue 26/02/26	mié 24/06/26	$ 60.886.707	$ 60.271.730	$ 60.886.707
1536		1.3.4.5.9.3.2	Rellenos	84 d	lun 9/03/26	sáb 27/06/26	$ 10.957.760	$ 10.952.932	$ 10.957.760
1537		1.3.4.5.9.3.3	Acabados	85 d	jue 12/03/26	vie 3/07/26	$ 56.721.830	$ 55.640.366	$ 28.360.915
1538		1.3.4.5.10	Fin Calle 153 NE	0 d	vie 3/07/26	vie 3/07/26	$ 0	$ 0	$ 0
1539		1.3.4.5.11	**CONECTANTE NE**	**370 d**	**mar 11/03/25**	**vie 3/07/26**	**$ 1.916.101.669**	**$ 1.570.761....**	**$ 1.457.912.938**
1540		1.3.4.5.11.1	Demolición	180 d	mar 11/03/25	mar 28/10/25	$ 4.285.178	$ 4.285.178	$ 4.285.178
1541		1.3.4.5.11.2	**Via**	**243,5 d**	**mar 19/08/25**	**mar 30/06/26**	**$ 998.560.169**	**$ 667.289.820**	**$ 657.466.291**
1542		1.3.4.5.11.2	Excavación	15 d	lun 27/10/25	vie 14/11/25	$ 134.022.313	$ 134.022.313	$ 134.022.313
1543		1.3.4.5.11.2	Rellenos en geobloque	7 d	mar 19/08/25	mié 27/08/25	$ 188.938.034	$ 188.938.034	$ 188.938.034
1544		1.3.4.5.11.2	Placa de Protección Geobloque	7 d	mié 27/08/25	jue 4/09/25	$ 5.732.343	$ 5.732.343	$ 5.732.343
1545		1.3.4.5.11.2	Subbase Granular	166 d	vie 14/11/25	jue 18/06/26	$ 116.545.224	$ 116.544.947	$ 116.545.224
1546		1.3.4.5.11.2	Base Granular - Estabilizada con Asfalto	167 d	sáb 15/11/25	sáb 20/06/26	$ 224.168.725	$ 222.052.183	$ 112.084.363
1547		1.3.4.5.11.2	Mezcla Asfaltica - GCR	3 d	sáb 20/06/26	mié 24/06/26	$ 200.288.030	$ 0	$ 100.144.015
1548		1.3.4.5.11.2	Mezcla Asfaltica - MD12	3 d	jue 25/06/26	mar 30/06/26	$ 128.865.500	$ 0	$ 0
1549		1.3.4.5.11.3	**Espacio Público**	**360 d**	**mar 25/03/25**	**vie 3/07/26**	**$ 860.569.167**	**$ 856.065.400**	**$ 796.161.469**
1550		1.3.4.5.11.3	Excavación	287 d	mar 25/03/25	sáb 28/03/26	$ 34.152.123	$ 34.152.123	$ 34.152.123
1551		1.3.4.5.11.3	Muros	335 d	mar 8/04/25	mié 17/06/26	$ 53.140.987	$ 52.942.700	$ 53.140.987
1552		1.3.4.5.11.3	Rellenos	276 d	mar 1/07/25	lun 22/06/26	$ 552.610.493	$ 542.962.251	$ 497.349.444
1553		1.3.4.5.11.3	Rellenos en geobloque	7 d	sáb 18/04/26	lun 27/04/26	$ 202.335.861	$ 202.335.861	$ 202.335.861
1554		1.3.4.5.11.3	Placa de Protección Geobloque	4 d	lun 27/04/26	sáb 2/05/26	$ 8.166.760	$ 8.166.760	$ 8.166.760
1555		1.3.4.5.11.3	Acabados	278 d	jue 10/07/25	vie 3/07/26	$ 10.162.943	$ 15.505.705	$ 1.016.294
1556		1.3.4.5.11.4	Pompeyano	217,5 d	vie 19/09/25	mar 30/06/26	$ 12.073.456	$ 11.476.722	$ 0
1557		1.3.4.5.11.5	Baranda M82	61 d	mar 14/04/26	jue 2/07/26	$ 40.613.700	$ 31.644.841	$ 0
1558		1.3.4.5.12	Fin Conectante NE	0 d	vie 3/07/26	vie 3/07/26	$ 0	$ 0	$ 0
1559		1.3.4.5.13	**RAMAL TRANSICIÓN NE**	**155 d**	**sáb 13/12/25**	**vie 3/07/26**	**$ 124.881.186**	**$ 124.066.575**	**$ 0**
1560		1.3.4.5.13.1	Demolición	135 d	sáb 13/12/25	vie 5/06/26	$ 972.551	$ 972.551	$ 0
1561		1.3.4.5.13.2	**Via**	**150 d**	**vie 19/12/25**	**vie 3/07/26**	**$ 123.908.635**	**$ 123.094.024**	**$ 0**
1562		1.3.4.5.13.2	Excavación	138 d	vie 19/12/25	jue 18/06/26	$ 18.356.180	$ 18.356.180	$ 0
1563		1.3.4.5.13.2	Subbase Granular	131 d	sáb 3/01/26	lun 22/06/26	$ 33.633.544	$ 33.633.544	$ 0
1564		1.3.4.5.13.2	Base Granular	126 d	jue 15/01/26	vie 26/06/26	$ 18.648.000	$ 18.492.333	$ 0
1565		1.3.4.5.13.2	Mezcla Asfaltica - GCR	118 d	mar 27/01/26	sáb 27/06/26	$ 40.037.561	$ 40.037.561	$ 0
1566		1.3.4.5.13.2	Mezcla Asfaltica - MD12	118 d	sáb 31/01/26	vie 3/07/26	$ 13.233.350	$ 12.574.406	$ 0

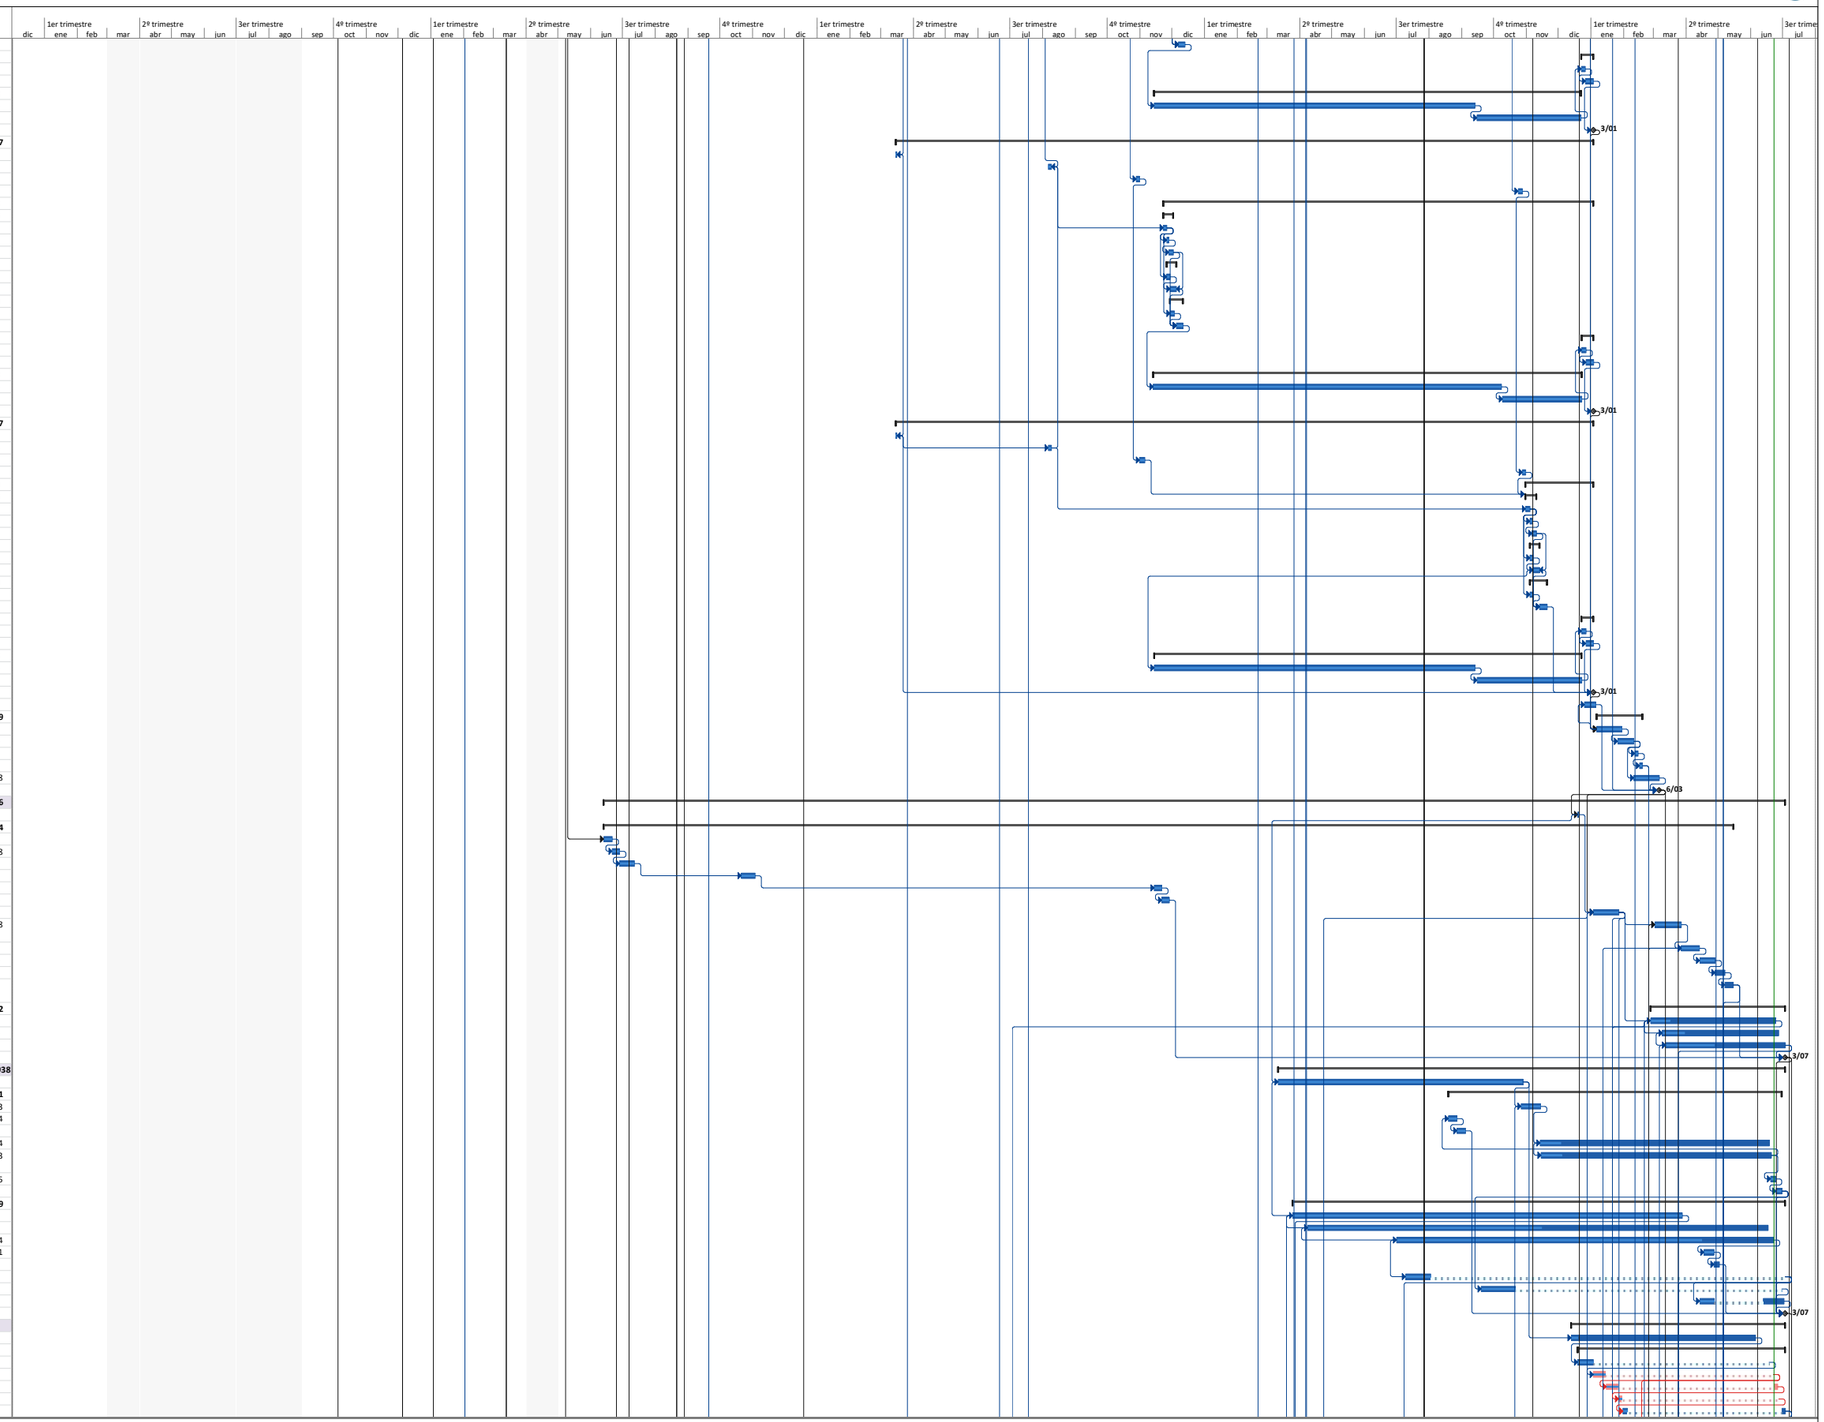

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | Sólo el comienzo | Fecha límite | División crítica | Progreso manual
División | Resumen | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo | Sólo duración | Resumen manual | Sólo fin | Tareas críticas | Progreso


Proyecto: IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB8-20221201
Fecha: mar 23/06/26

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
1567		1.3.4.5.14	Fin Ramal Transición NE	0 d	mar 23/06/26	mar 23/06/26	$ 0	$ 0	$ 0
1568		**1.3.4.5.15**	**CARRIL DESACELERACIÓN AUTONORT**	**96 d**	**jue 26/02/26**	**jue 2/07/26**	**$ 491.546.855**	**$ 287.295.074**	**$ 53.833.674**
1569		1.3.4.5.15.1	APROBACIÓN PMT	0 d	jue 26/02/26	jue 26/02/26	$ 0	$ 0	$ 0
1570		1.3.4.5.15.2	IMPLEMENTACIÓN PMT	20 d	vie 27/02/26	mié 25/03/26	$ 0	$ 0	$ 0
1571		1.3.4.5.15.3	Demolición	55 d	mié 25/03/26	jue 4/06/26	$ 13.147.854	$ 13.147.854	$ 0
1572		**1.3.4.5.15.4**	**Via**	**68 d**	**sáb 4/04/26**	**jue 2/07/26**	**$ 478.399.001**	**$ 274.147.220**	**$ 53.833.674**
1573		1.3.4.5.15.4	Excavación	57 d	sáb 4/04/26	jue 18/06/26	$ 37.436.222	$ 37.208.642	$ 0
1574		1.3.4.5.15.4	Subbase Granular	54 d	mié 8/04/26	jue 18/06/26	$ 53.339.566	$ 52.652.919	$ 0
1575		1.3.4.5.15.4	Base Granular - Estabilizada con Asfalto	45 d	mar 21/04/26	vie 19/06/26	$ 196.758.000	$ 184.285.659	$ 0
1576		1.3.4.5.15.4	Mezcla Asfaltica - GCR	6 d	vie 19/06/26	vie 26/06/26	$ 137.031.539	$ 0	$ 0
1577		1.3.4.5.15.4	Mezcla Asfaltica - MD12	4 d	vie 26/06/26	jue 2/07/26	$ 53.833.674	$ 0	$ 53.833.674
1578		1.3.4.5.16	Fin Carril Desaceleración NE	0 d	jue 2/07/26	jue 2/07/26	$ 0	$ 0	$ 0
1579		**1.3.4.5.17**	**ESPACIO PUBLICO BAJO PUENTE - ORI**	**726,63 d**	**mié 3/01/24**	**mar 28/07/26**	**$ 311.093.983**	**$ 280.236.010**	**$ 192.276.477**
1580		1.3.4.5.17.1	Demolición	21 d	sáb 27/12/25	vie 23/01/26	$ 1.890.219	$ 1.890.219	$ 1.890.219
1581		1.3.4.5.17.2	Excavación	25 d	lun 26/01/26	mar 24/02/26	$ 29.144.443	$ 29.144.443	$ 29.144.443
1582		1.3.4.5.17.3	Relleno	4 d	mié 3/01/24	mar 9/01/24	$ 5.413.633	$ 5.413.633	$ 5.413.633
1583		1.3.4.5.17.4	Rellenos 2	107 d	lun 2/03/26	mar 21/07/26	$ 21.822.672	$ 21.317.474	$ 18.549.271
1584		1.3.4.5.17.5	Acabados	110 d	mié 4/03/26	mar 28/07/26	$ 249.598.020	$ 219.758.499	$ 137.278.911
1585		1.3.4.5.17.6	Baranda Vehicular	104 d	jue 12/03/26	mar 28/07/26	$ 3.224.996	$ 2.711.743	$ 0
1586		1.3.4.5.18	Fin de Espacio Público	0 d	mar 28/07/26	mar 28/07/26	$ 0	$ 0	$ 0
1587		1.3.4.6	**Paisajismo**	71 d	lun 30/03/26	vie 3/07/26	$ 19.305.172	$ 10.323.436	$ 9.652.586
1588		1.3.4.7	Fin Costado Oriental	0 d	mar 28/07/26	mar 28/07/26	$ 0	$ 0	$ 0
1589		**1.3.4.8**	**COSTADO OCCIDENTAL**	**677,25 d**	**mar 5/03/24**	**mar 28/07/26**	**$ 15.425.337.294**	**$ 15.066.322....**	**$ 14.809.825....**
1590		**1.3.4.8.1**	**APROCHE OCCIDENTAL**	**635,75 d**	**mar 5/03/24**	**mar 2/06/26**	**$ 2.692.924.358**	**$ 2.692.924....**	**$ 2.692.924.358**
1591		1.3.4.8.1.1	Demolición	7 d	mié 5/06/24	vie 14/06/24	$ 1.702.527	$ 1.702.527	$ 1.702.527
1592		**1.3.4.8.1.2**	**EJE 1-2**	**411 d**	**lun 5/08/24**	**vie 16/01/26**	**$ 267.647.101**	**$ 267.647.101**	**$ 267.647.101**
1593		1.3.4.8.1.2.1	Excavación	3 d	mié 11/12/24	sáb 14/12/24	$ 2.463.224	$ 2.463.224	$ 2.463.224
1594		1.3.4.8.1.2.2	Pilotes FDP	1 d	lun 5/08/24	mar 6/08/24	$ 35.563.500	$ 35.563.500	$ 35.563.500
1595		1.3.4.8.1.2.3	CAPA DE TRANSFERENCIA	6 d	mar 11/02/25	mar 18/02/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
1596		1.3.4.8.1.2.4	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	4 d	jue 13/02/25	mar 18/02/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
1597		**1.3.4.8.1.2.5**	**Estructura**	**321 d**	**mié 30/10/24**	**mié 17/12/25**	**$ 42.402.505**	**$ 42.402.505**	**$ 42.402.505**
1598		**1.3.4.8.1.2.5**	**Zapatas**	**6 d**	**mié 30/10/24**	**jue 7/11/24**	**$ 14.436.010**	**$ 14.436.010**	**$ 14.436.010**
1599		1.3.4.8.1.2.5	Solado	1 d	mié 30/10/24	jue 31/10/24	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
1600		1.3.4.8.1.2.5	Acero	2 d	jue 31/10/24	sáb 2/11/24	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
1601		1.3.4.8.1.2.5	Concreto	3 d	mar 5/11/24	jue 7/11/24	$ 6.330.000	$ 6.330.000	$ 6.330.000
1602		**1.3.4.8.1.2.5**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**jue 31/10/24**	**mié 13/11/24**	**$ 6.193.825**	**$ 6.193.825**	**$ 6.193.825**
1603		1.3.4.8.1.2.5	Acero	3 d	jue 31/10/24	mar 5/11/24	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
1604		1.3.4.8.1.2.5	Concreto	5 d	mié 6/11/24	mié 13/11/24	$ 3.165.000	$ 3.165.000	$ 3.165.000
1605		**1.3.4.8.1.2.5**	**Columnas**	**13 d**	**jue 31/10/24**	**mar 19/11/24**	**$ 7.261.720**	**$ 7.261.720**	**$ 7.261.720**
1606		1.3.4.8.1.2.5	Acero	3 d	jue 31/10/24	mar 5/11/24	$ 4.096.720	$ 4.096.720	$ 4.096.720
1607		1.3.4.8.1.2.5	Concreto	5 d	mié 13/11/24	mar 19/11/24	$ 3.165.000	$ 3.165.000	$ 3.165.000
1608		**1.3.4.8.1.2.5**	**Vigas Longitudinales**	**17 d**	**mar 25/11/25**	**mié 17/12/25**	**$ 6.443.625**	**$ 6.443.625**	**$ 6.443.625**
1609		1.3.4.8.1.2.5	Acero	5 d	mar 25/11/25	lun 1/12/25	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
1610		1.3.4.8.1.2.5	Concreto	12 d	mar 2/12/25	mié 17/12/25	$ 3.165.000	$ 3.165.000	$ 3.165.000
1611		**1.3.4.8.1.2.5**	**Vigas Transversales**	**15 d**	**jue 6/11/25**	**mar 25/11/25**	**$ 8.067.325**	**$ 8.067.325**	**$ 8.067.325**
1612		1.3.4.8.1.2.5	Acero	5 d	jue 6/11/25	mié 12/11/25	$ 4.902.325	$ 4.902.325	$ 4.902.325
1613		1.3.4.8.1.2.5	Concreto	10 d	mié 12/11/25	mar 25/11/25	$ 3.165.000	$ 3.165.000	$ 3.165.000
1614		**1.3.4.8.1.2.6**	**Tierra Armada**	**225 d**	**mar 21/01/25**	**mar 4/11/25**	**$ 135.136.943**	**$ 135.136.943**	**$ 135.136.943**
1615		1.3.4.8.1.2.6	RELLENO EN GEOBLOQUE	185 d	mar 21/01/25	lun 15/09/25	$ 48.418.343	$ 48.418.343	$ 48.418.343
1616		1.3.4.8.1.2.6	RELLENO EN GEOBLOQUE 2	39 d	mar 16/09/25	mar 4/11/25	$ 86.718.600	$ 86.718.600	$ 86.718.600
1617		**1.3.4.8.1.2.7**	**Fachada en Mamposteria**	**327 d**	**jue 21/11/24**	**vie 16/01/26**	**$ 48.498.013**	**$ 48.498.013**	**$ 48.498.013**
1618		**1.3.4.8.1.2.7**	**Dobelas**	**2 d**	**jue 21/11/24**	**sáb 23/11/24**	**$ 1.736.110**	**$ 1.736.110**	**$ 1.736.110**
1619		1.3.4.8.1.2.7	Acero	2 d	jue 21/11/24	sáb 23/11/24	$ 1.736.110	$ 1.736.110	$ 1.736.110
1620		**1.3.4.8.1.2.7**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**2 d**	**vie 22/11/24**	**lun 25/11/24**	**$ 13.368.121**	**$ 13.368.121**	**$ 13.368.121**
1621		1.3.4.8.1.2.7	Concreto	1 d	sáb 23/11/24	lun 25/11/24	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
1622		1.3.4.8.1.2.7	Bloque en Concreto	2 d	vie 22/11/24	lun 25/11/24	$ 10.829.876	$ 10.829.876	$ 10.829.876
1623		**1.3.4.8.1.2.7**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**176 d**	**vie 29/11/24**	**lun 14/07/25**	**$ 645.490**	**$ 645.490**	**$ 645.490**
1624		1.3.4.8.1.2.7	Concreto	175 d	lun 2/12/24	lun 14/07/25	$ 12.490	$ 12.490	$ 12.490
1625		1.3.4.8.1.2.7	Bloque en Concreto	4 d	vie 29/11/24	mié 4/12/24	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
1626		**1.3.4.8.1.2.7**	**Viga de Amarre**	**4 d**	**lun 25/11/24**	**vie 29/11/24**	**$ 99.920**	**$ 99.920**	**$ 99.920**
1627		1.3.4.8.1.2.7	Acero	2 d	lun 25/11/24	mié 27/11/24	$ 99.920	$ 99.920	$ 99.920
1628		1.3.4.8.1.2.7	Concreto	2 d	mié 27/11/24	vie 29/11/24	$ 0	$ 0	$ 0
1629		1.3.4.8.1.2.7	Losa de Aproximación	20 d	vie 19/12/25	vie 16/01/26	$ 32.648.372	$ 32.648.372	$ 32.648.372
1630		1.3.4.8.1.3	Fin de Eje 1-2	0 d	vie 16/01/26	vie 16/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
1631		**1.3.4.8.1.4**	**EJE 2-3**	**435,5 d**	**sáb 8/06/24**	**vie 19/12/25**	**$ 207.909.296**	**$ 207.909.296**	**$ 207.909.296**
1632		1.3.4.8.1.4.1	Excavación	3 d	sáb 8/06/24	jue 13/06/24	$ 2.463.224	$ 2.463.224	$ 2.463.224
1633		1.3.4.8.1.4.2	Pilotes FDP	2 d	mar 11/06/24	jue 13/06/24	$ 20.507.200	$ 20.507.200	$ 20.507.200
1634		1.3.4.8.1.4.3	Pilotes FDP 2	2 d	jue 1/08/24	sáb 3/08/24	$ 30.760.800	$ 30.760.800	$ 30.760.800
1635		1.3.4.8.1.4.4	CAPA DE TRANSFERENCIA	6 d	sáb 1/02/25	sáb 8/02/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
1636		1.3.4.8.1.4.5	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	4 d	lun 3/02/25	vie 7/02/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
1637		**1.3.4.8.1.4.6**	**Estructura**	**275 d**	**jue 2/01/25**	**vie 19/12/25**	**$ 42.402.505**	**$ 42.402.505**	**$ 42.402.505**
1638		**1.3.4.8.1.4.6**	**Zapatas**	**6 d**	**jue 2/01/25**	**vie 10/01/25**	**$ 14.436.010**	**$ 14.436.010**	**$ 14.436.010**
1639		1.3.4.8.1.4.6	Solado	1 d	jue 2/01/25	jue 2/01/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
1640		1.3.4.8.1.4.6	Acero	2 d	vie 3/01/25	mar 7/01/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
1641		1.3.4.8.1.4.6	Concreto	3 d	mar 7/01/25	vie 10/01/25	$ 6.330.000	$ 6.330.000	$ 6.330.000
1642		**1.3.4.8.1.4.6**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**vie 3/01/25**	**mar 14/01/25**	**$ 6.193.825**	**$ 6.193.825**	**$ 6.193.825**
1643		1.3.4.8.1.4.6	Acero	3 d	vie 3/01/25	mié 8/01/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
1644		1.3.4.8.1.4.6	Concreto	5 d	mié 8/01/25	mar 14/01/25	$ 3.165.000	$ 3.165.000	$ 3.165.000
1645		**1.3.4.8.1.4.6**	**Columnas**	**13 d**	**vie 3/01/25**	**lun 20/01/25**	**$ 7.261.720**	**$ 7.261.720**	**$ 7.261.720**
1646		1.3.4.8.1.4.6	Acero	3 d	vie 3/01/25	mié 8/01/25	$ 4.096.720	$ 4.096.720	$ 4.096.720
1647		1.3.4.8.1.4.6	Concreto	5 d	mar 14/01/25	lun 20/01/25	$ 3.165.000	$ 3.165.000	$ 3.165.000
1648		**1.3.4.8.1.4.6**	**Vigas Longitudinales**	**17 d**	**jue 27/11/25**	**vie 19/12/25**	**$ 6.443.625**	**$ 6.443.625**	**$ 6.443.625**
1649		1.3.4.8.1.4.6	Acero	5 d	jue 27/11/25	mié 3/12/25	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
1650		1.3.4.8.1.4.6	Concreto	12 d	jue 4/12/25	vie 19/12/25	$ 3.165.000	$ 3.165.000	$ 3.165.000
1651		**1.3.4.8.1.4.6**	**Vigas Transversales**	**15 d**	**sáb 8/11/25**	**jue 27/11/25**	**$ 8.067.325**	**$ 8.067.325**	**$ 8.067.325**
1652		1.3.4.8.1.4.6	Acero	5 d	sáb 8/11/25	vie 14/11/25	$ 4.902.325	$ 4.902.325	$ 4.902.325
1653		1.3.4.8.1.4.6	Concreto	10 d	vie 14/11/25	jue 27/11/25	$ 3.165.000	$ 3.165.000	$ 3.165.000
1654		**1.3.4.8.1.4.7**	**Tierra Armada**	**227 d**	**mar 21/01/25**	**jue 6/11/25**	**$ 92.988.500**	**$ 92.988.500**	**$ 92.988.500**
1655		1.3.4.8.1.4.7	RELLENO EN GEOBLOQUE	185 d	mar 21/01/25	lun 15/09/25	$ 32.988.500	$ 32.988.500	$ 32.988.500
1656		1.3.4.8.1.4.7	RELLENO EN GEOBLOQUE 2	41 d	mar 16/09/25	jue 6/11/25	$ 60.000.000	$ 60.000.000	$ 60.000.000
1657		**1.3.4.8.1.4.8**	**Fachada en Mamposteria**	**193 d**	**vie 31/01/25**	**vie 3/10/25**	**$ 15.204.151**	**$ 15.204.151**	**$ 15.204.151**
1658		**1.3.4.8.1.4.8**	**Dobelas**	**1 d**	**vie 31/01/25**	**vie 31/01/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
1659		1.3.4.8.1.4.8	Acero	1 d	vie 31/01/25	vie 31/01/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
1660		**1.3.4.8.1.4.8**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**2 d**	**lun 10/02/25**	**mié 12/02/25**	**$ 13.368.121**	**$ 13.368.121**	**$ 13.368.121**
1661		1.3.4.8.1.4.8	Concreto	1 d	mar 11/02/25	mié 12/02/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
1662		1.3.4.8.1.4.8	Bloque en Concreto	2 d	lun 10/02/25	mié 12/02/25	$ 10.829.876	$ 10.829.876	$ 10.829.876
1663		**1.3.4.8.1.4.8**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**179 d**	**lun 17/02/25**	**vie 3/10/25**	**$ 6.245**	**$ 6.245**	**$ 6.245**
1664		1.3.4.8.1.4.8	Concreto	178 d	mar 18/02/25	vie 3/10/25	$ 6.245	$ 6.245	$ 6.245
1665		1.3.4.8.1.4.8	Bloque en Concreto	3 d	lun 17/02/25	jue 20/02/25	$ 0	$ 0	$ 0
1666		**1.3.4.8.1.4.8**	**Viga de Amarre**	**4 d**	**mié 12/02/25**	**lun 17/02/25**	**$ 99.920**	**$ 99.920**	**$ 99.920**
1667		1.3.4.8.1.4.8	Acero	2 d	mié 12/02/25	vie 14/02/25	$ 99.920	$ 99.920	$ 99.920
1668		1.3.4.8.1.4.8	Concreto	2 d	vie 14/02/25	lun 17/02/25	$ 0	$ 0	$ 0
1669		1.3.4.8.1.5	Fin de Eje 2-3	0 d	vie 19/12/25	vie 19/12/25	$ 0	$ 0	$ 0
1670		**1.3.4.8.1.6**	**EJE 3-4**	**428 d**	**mar 11/06/24**	**jue 11/12/25**	**$ 269.470.509**	**$ 269.470.509**	**$ 269.470.509**
1671		1.3.4.8.1.6.1	Excavación	2 d	mar 11/06/24	jue 13/06/24	$ 2.463.224	$ 2.463.224	$ 2.463.224
1672		1.3.4.8.1.6.2	Pilotes FDP	2 d	mié 12/06/24	vie 14/06/24	$ 70.047.770	$ 70.047.770	$ 70.047.770
1673		1.3.4.8.1.6.3	CAPA DE TRANSFERENCIA	5 d	vie 24/01/25	jue 30/01/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
1674		1.3.4.8.1.6.4	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	5 d	vie 24/01/25	jue 30/01/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
1675		**1.3.4.8.1.6.5**	**Estructura**	**270 d**	**lun 30/12/24**	**jue 11/12/25**	**$ 42.402.505**	**$ 42.402.505**	**$ 42.402.505**
1676		**1.3.4.8.1.6.5**	**Zapatas**	**7 d**	**lun 30/12/24**	**jue 9/01/25**	**$ 14.436.010**	**$ 14.436.010**	**$ 14.436.010**
1677		1.3.4.8.1.6.5	Solado	2 d	lun 30/12/24	jue 2/01/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010

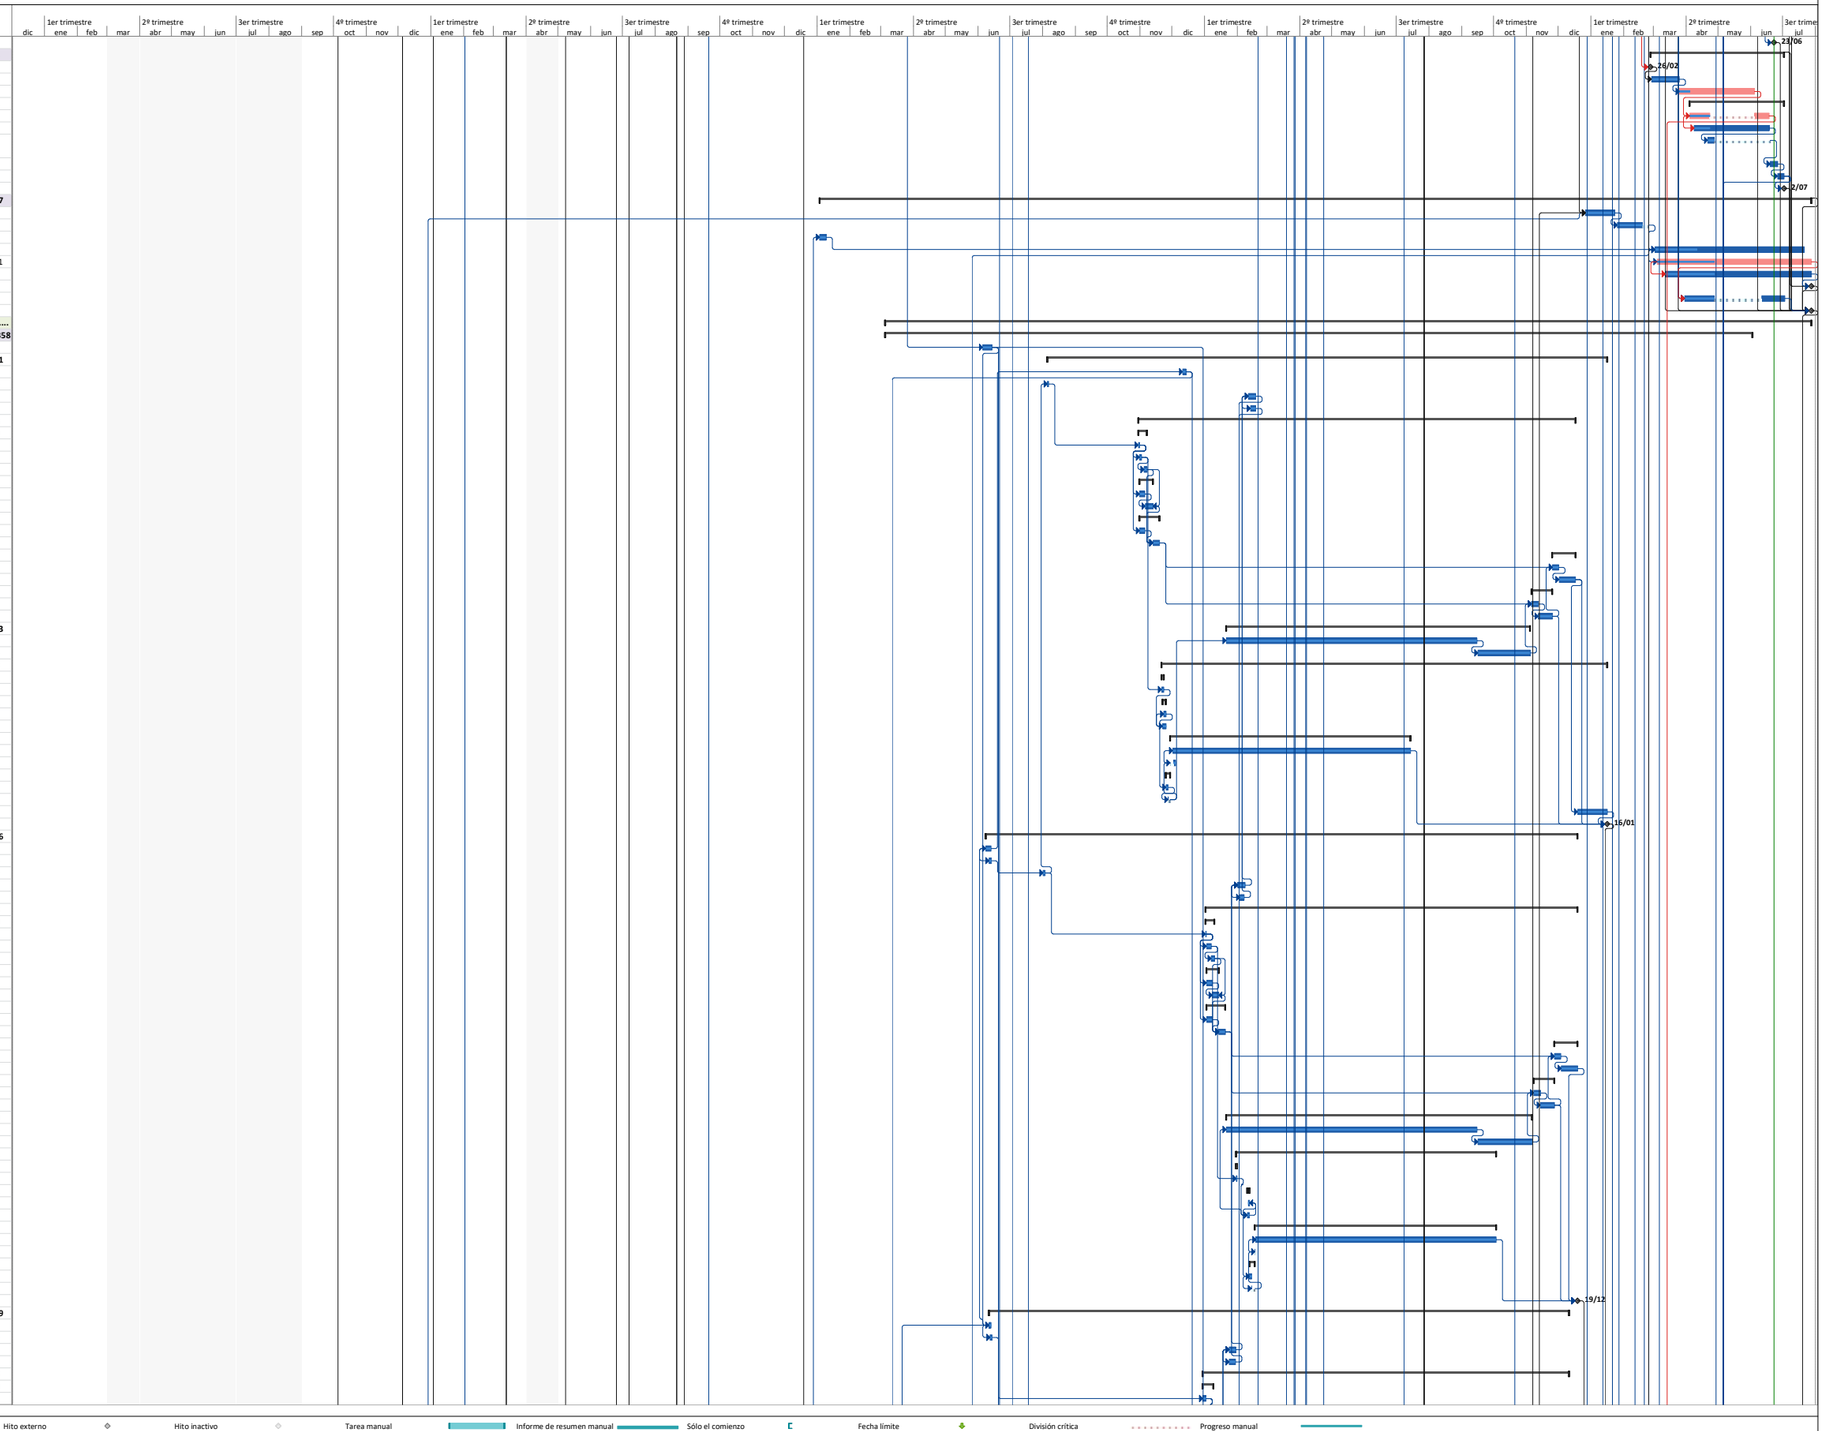


Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | Sólo el comienzo | Fecha límite | División crítica | Progreso manual
División | Resumen | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo | Sólo duración | Resumen manual | Sólo fin | Tareas críticas | Progreso

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
1678		1.3.4.8.1.6.5	Acero	2 d	jue 2/01/25	sáb 4/01/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
1679		1.3.4.8.1.6.5	Concreto	3 d	sáb 4/01/25	jue 9/01/25	$ 6.330.000	$ 6.330.000	$ 6.330.000
1680		**1.3.4.8.1.6.5**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**jue 2/01/25**	**lun 13/01/25**	**$ 6.193.825**	**$ 6.193.825**	**$ 6.193.825**
1681		1.3.4.8.1.6.5	Acero	3 d	jue 2/01/25	mar 7/01/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
1682		1.3.4.8.1.6.5	Concreto	5 d	mar 7/01/25	lun 13/01/25	$ 3.165.000	$ 3.165.000	$ 3.165.000
1683		**1.3.4.8.1.6.6**	**Columnas**	**13 d**	**jue 2/01/25**	**sáb 18/01/25**	**$ 7.261.720**	**$ 7.261.720**	**$ 7.261.720**
1684		1.3.4.8.1.6.6	Acero	3 d	jue 2/01/25	mar 7/01/25	$ 4.096.720	$ 4.096.720	$ 4.096.720
1685		1.3.4.8.1.6.6	Concreto	5 d	lun 13/01/25	sáb 18/01/25	$ 3.165.000	$ 3.165.000	$ 3.165.000
1686		**1.3.4.8.1.6.5**	**Vigas Longitudinales**	**17 d**	**mié 19/11/25**	**jue 11/12/25**	**$ 6.443.625**	**$ 6.443.625**	**$ 6.443.625**
1687		1.3.4.8.1.6.5	Acero	5 d	mié 19/11/25	mar 25/11/25	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
1688		1.3.4.8.1.6.5	Concreto	12 d	mié 26/11/25	jue 11/12/25	$ 3.165.000	$ 3.165.000	$ 3.165.000
1689		**1.3.4.8.1.6.5**	**Vigas Transversales**	**15 d**	**jue 30/10/25**	**mié 19/11/25**	**$ 8.067.325**	**$ 8.067.325**	**$ 8.067.325**
1690		1.3.4.8.1.6.5	Acero	5 d	jue 30/10/25	jue 6/11/25	$ 4.902.325	$ 4.902.325	$ 4.902.325
1691		1.3.4.8.1.6.5	Concreto	10 d	jue 6/11/25	mié 19/11/25	$ 3.165.000	$ 3.165.000	$ 3.165.000
1692		**1.3.4.8.1.6.6**	**Tierra Armada**	**219 d**	**jue 23/01/25**	**mar 28/10/25**	**$ 135.136.943**	**$ 135.136.943**	**$ 135.136.943**
1693		1.3.4.8.1.6.6	RELLENO EN GEOBLOQUE	183 d	jue 23/01/25	sáb 13/09/25	$ 37.338.693	$ 37.338.693	$ 37.338.693
1694		1.3.4.8.1.6.6	RELLENO EN GEOBLOQUE 2	35 d	lun 15/09/25	mar 28/10/25	$ 97.798.250	$ 97.798.250	$ 97.798.250
1695		**1.3.4.8.1.6.7**	**Fachada en Mampostería**	**195 d**	**vie 31/01/25**	**mar 7/10/25**	**$ 15.837.151**	**$ 15.837.151**	**$ 15.837.151**
1696		**1.3.4.8.1.6.7**	**Dobelas**	**1 d**	**vie 31/01/25**	**sáb 1/02/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
1697		1.3.4.8.1.6.7	Acero	1 d	vie 31/01/25	sáb 1/02/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
1698		**1.3.4.8.1.6.7**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**2 d**	**lun 10/02/25**	**mié 12/02/25**	**$ 13.368.121**	**$ 13.368.121**	**$ 13.368.121**
1699		1.3.4.8.1.6.7	Concreto	1 d	mar 11/02/25	mié 12/02/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
1700		1.3.4.8.1.6.7	Bloque en Concreto	2 d	lun 10/02/25	mié 12/02/25	$ 10.829.876	$ 10.829.876	$ 10.829.876
1701		**1.3.4.8.1.6.7**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**181 d**	**lun 17/02/25**	**mar 7/10/25**	**$ 639.245**	**$ 639.245**	**$ 639.245**
1702		1.3.4.8.1.6.7	Concreto	180 d	mié 19/02/25	mar 7/10/25	$ 6.245	$ 6.245	$ 6.245
1703		1.3.4.8.1.6.7	Bloque en Concreto	3 d	lun 17/02/25	jue 20/02/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
1704		**1.3.4.8.1.6.7**	**Viga de Amarre**	**87,88 d**	**mié 12/02/25**	**jue 5/06/25**	**$ 99.920**	**$ 99.920**	**$ 99.920**
1705		1.3.4.8.1.6.7	Acero	2 d	mié 12/02/25	vie 14/02/25	$ 99.920	$ 99.920	$ 99.920
1706		1.3.4.8.1.6.7	Concreto	85,88 d	vie 14/02/25	jue 5/06/25	$ 0	$ 0	$ 0
1707		1.3.4.8.1.7	Fin de Eje 3-4	0 d	jue 11/12/25	jue 11/12/25	$ 0	$ 0	$ 0
1708		**1.3.4.8.1.8**	**EJE 4-5**	**525 d**	**mar 12/03/24**	**mar 20/01/26**	**$ 250.535.739**	**$ 250.535.739**	**$ 250.535.739**
1709		1.3.4.8.1.8.1	Excavación	3 d	mar 12/03/24	vie 15/03/24	$ 2.463.224	$ 2.463.224	$ 2.463.224
1710		1.3.4.8.1.8.2	Pilotes FDP	2 d	jue 13/06/24	sáb 15/06/24	$ 51.113.000	$ 51.113.000	$ 51.113.000
1711		1.3.4.8.1.8.3	CAPA DE TRANSFERENCIA	6 d	mié 15/01/25	mié 22/01/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
1712		1.3.4.8.1.8.4	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	4 d	jue 16/01/25	mar 21/01/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
1713		**1.3.4.8.1.8.5**	**Estructura**	**298 d**	**mar 31/12/24**	**mar 20/01/26**	**$ 42.402.505**	**$ 42.402.505**	**$ 42.402.505**
1714		**1.3.4.8.1.8.5**	**Zapatas**	**7 d**	**mar 31/12/24**	**vie 10/01/25**	**$ 14.436.010**	**$ 14.436.010**	**$ 14.436.010**
1715		1.3.4.8.1.8.5	Solado	2 d	mar 31/12/24	vie 3/01/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
1716		1.3.4.8.1.8.5	Acero	2 d	vie 3/01/25	mar 7/01/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
1717		1.3.4.8.1.8.5	Concreto	3 d	mar 7/01/25	vie 10/01/25	$ 6.330.000	$ 6.330.000	$ 6.330.000
1718		**1.3.4.8.1.8.5**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**vie 3/01/25**	**mar 14/01/25**	**$ 6.193.825**	**$ 6.193.825**	**$ 6.193.825**
1719		1.3.4.8.1.8.5	Acero	3 d	vie 3/01/25	mié 8/01/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
1720		1.3.4.8.1.8.5	Concreto	5 d	mié 8/01/25	mar 14/01/25	$ 3.165.000	$ 3.165.000	$ 3.165.000
1721		**1.3.4.8.1.8.6**	**Columnas**	**13 d**	**vie 3/01/25**	**mar 21/01/25**	**$ 7.261.720**	**$ 7.261.720**	**$ 7.261.720**
1722		1.3.4.8.1.8.6	Acero	3 d	vie 3/01/25	mié 8/01/25	$ 4.096.720	$ 4.096.720	$ 4.096.720
1723		1.3.4.8.1.8.6	Concreto	5 d	mié 15/01/25	mar 21/01/25	$ 3.165.000	$ 3.165.000	$ 3.165.000
1724		**1.3.4.8.1.8.5**	**Vigas Longitudinales**	**21 d**	**lun 22/12/25**	**mar 20/01/26**	**$ 6.443.625**	**$ 6.443.625**	**$ 6.443.625**
1725		1.3.4.8.1.8.5	Acero	9 d	lun 22/12/25	sáb 3/01/26	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
1726		1.3.4.8.1.8.5	Concreto	12 d	sáb 3/01/26	mar 20/01/26	$ 3.165.000	$ 3.165.000	$ 3.165.000
1727		**1.3.4.8.1.8.5**	**Vigas Transversales**	**19 d**	**mié 26/11/25**	**vie 19/12/25**	**$ 8.067.325**	**$ 8.067.325**	**$ 8.067.325**
1728		1.3.4.8.1.8.5	Acero	9 d	mié 26/11/25	sáb 6/12/25	$ 4.902.325	$ 4.902.325	$ 4.902.325
1729		1.3.4.8.1.8.5	Concreto	10 d	sáb 6/12/25	vie 19/12/25	$ 3.165.000	$ 3.165.000	$ 3.165.000
1730		**1.3.4.8.1.8.6**	**Tierra Armada**	**242 d**	**mar 21/01/25**	**mié 26/11/25**	**$ 135.136.943**	**$ 135.136.943**	**$ 135.136.943**
1731		1.3.4.8.1.8.6	RELLENO EN GEOBLOQUE	186 d	mar 21/01/25	lun 15/09/25	$ 32.528.943	$ 32.528.943	$ 32.528.943
1732		1.3.4.8.1.8.6	RELLENO EN GEOBLOQUE 2	55 d	mar 16/09/25	mié 26/11/25	$ 102.608.000	$ 102.608.000	$ 102.608.000
1733		**1.3.4.8.1.8.7**	**Fachada en Mampostería**	**194 d**	**sáb 1/02/25**	**mar 7/10/25**	**$ 15.837.151**	**$ 15.837.151**	**$ 15.837.151**
1734		**1.3.4.8.1.8.7**	**Dobelas**	**1 d**	**sáb 1/02/25**	**lun 3/02/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
1735		1.3.4.8.1.8.7	Acero	1 d	sáb 1/02/25	lun 3/02/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
1736		**1.3.4.8.1.8.7**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**2 d**	**mié 12/02/25**	**jue 13/02/25**	**$ 13.368.121**	**$ 13.368.121**	**$ 13.368.121**
1737		1.3.4.8.1.8.7	Concreto	1 d	jue 13/02/25	jue 13/02/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
1738		1.3.4.8.1.8.7	Bloque en Concreto	2 d	mié 12/02/25	jue 13/02/25	$ 10.829.876	$ 10.829.876	$ 10.829.876
1739		**1.3.4.8.1.8.7**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**181 d**	**mar 18/02/25**	**mar 7/10/25**	**$ 639.245**	**$ 639.245**	**$ 639.245**
1740		1.3.4.8.1.8.7	Concreto	180 d	mié 19/02/25	mar 7/10/25	$ 6.245	$ 6.245	$ 6.245
1741		1.3.4.8.1.8.7	Bloque en Concreto	3 d	mar 18/02/25	vie 21/02/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
1742		**1.3.4.8.1.8.7**	**Viga de Amarre**	**5 d**	**vie 14/02/25**	**jue 20/02/25**	**$ 99.920**	**$ 99.920**	**$ 99.920**
1743		1.3.4.8.1.8.7	Acero	2 d	vie 14/02/25	lun 17/02/25	$ 99.920	$ 99.920	$ 99.920
1744		1.3.4.8.1.8.7	Concreto	3 d	lun 17/02/25	jue 20/02/25	$ 0	$ 0	$ 0
1745		1.3.4.8.1.9	Fin de Eje 4-5	0 d	mar 20/01/26	mar 20/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
1746		**1.3.4.8.1.10**	**EJE 5-6**	**519,25 d**	**vie 8/03/24**	**jue 8/01/26**	**$ 249.843.647**	**$ 249.843.647**	**$ 249.843.647**
1747		1.3.4.8.1.10	Excavación	3 d	vie 8/03/24	mar 12/03/24	$ 2.404.132	$ 2.404.132	$ 2.404.132
1748		1.3.4.8.1.10	Pilotes FDP	2 d	mar 11/06/24	mié 12/06/24	$ 51.113.000	$ 51.113.000	$ 51.113.000
1749		1.3.4.8.1.10	CAPA DE TRANSFERENCIA	6 d	jue 9/01/25	jue 16/01/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
1750		1.3.4.8.1.10	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	4 d	vie 10/01/25	mié 15/01/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
1751		**1.3.4.8.1.10**	**Estructura**	**285 d**	**mié 8/01/25**	**jue 8/01/26**	**$ 42.402.505**	**$ 42.402.505**	**$ 42.402.505**
1752		**1.3.4.8.1.10**	**Zapatas**	**7 d**	**mié 8/01/25**	**jue 16/01/25**	**$ 14.436.010**	**$ 14.436.010**	**$ 14.436.010**
1753		1.3.4.8.1.10	Solado	2 d	mié 8/01/25	vie 10/01/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
1754		1.3.4.8.1.10	Acero	2 d	vie 10/01/25	lun 13/01/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
1755		1.3.4.8.1.10	Concreto	3 d	lun 13/01/25	jue 16/01/25	$ 6.330.000	$ 6.330.000	$ 6.330.000
1756		**1.3.4.8.1.10**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**vie 10/01/25**	**lun 20/01/25**	**$ 6.193.825**	**$ 6.193.825**	**$ 6.193.825**
1757		1.3.4.8.1.10	Acero	3 d	vie 10/01/25	mar 14/01/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
1758		1.3.4.8.1.10	Concreto	5 d	mar 14/01/25	lun 20/01/25	$ 3.165.000	$ 3.165.000	$ 3.165.000
1759		**1.3.4.8.1.10**	**Columnas**	**13 d**	**vie 10/01/25**	**sáb 25/01/25**	**$ 7.261.720**	**$ 7.261.720**	**$ 7.261.720**
1760		1.3.4.8.1.10	Acero	3 d	vie 10/01/25	mar 14/01/25	$ 4.096.720	$ 4.096.720	$ 4.096.720
1761		1.3.4.8.1.10	Concreto	5 d	lun 20/01/25	sáb 25/01/25	$ 3.165.000	$ 3.165.000	$ 3.165.000
1762		**1.3.4.8.1.10**	**Vigas Longitudinales**	**16 d**	**mié 17/12/25**	**jue 8/01/26**	**$ 6.443.625**	**$ 6.443.625**	**$ 6.443.625**
1763		1.3.4.8.1.10	Acero	4 d	mié 17/12/25	lun 22/12/25	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
1764		1.3.4.8.1.10	Concreto	12 d	lun 22/12/25	jue 8/01/26	$ 3.165.000	$ 3.165.000	$ 3.165.000
1765		**1.3.4.8.1.10**	**Vigas Transversales**	**15 d**	**mié 26/11/25**	**mar 16/12/25**	**$ 8.067.325**	**$ 8.067.325**	**$ 8.067.325**
1766		1.3.4.8.1.10	Acero	5 d	mié 26/11/25	mar 2/12/25	$ 4.902.325	$ 4.902.325	$ 4.902.325
1767		1.3.4.8.1.10	Concreto	10 d	mié 3/12/25	mar 16/12/25	$ 3.165.000	$ 3.165.000	$ 3.165.000
1768		**1.3.4.8.1.10**	**Tierra Armada**	**240 d**	**mié 22/01/25**	**mar 25/11/25**	**$ 135.136.943**	**$ 135.136.943**	**$ 135.136.943**
1769		1.3.4.8.1.10	RELLENO EN GEOBLOQUE	184 d	mié 22/01/25	lun 15/09/25	$ 27.719.193	$ 27.719.193	$ 27.719.193
1770		1.3.4.8.1.10	RELLENO EN GEOBLOQUE 2	55 d	mar 16/09/25	mar 25/11/25	$ 107.417.750	$ 107.417.750	$ 107.417.750
1771		**1.3.4.8.1.10**	**Fachada en Mampostería**	**217,88 d**	**vie 31/01/25**	**mié 5/11/25**	**$ 15.204.151**	**$ 15.204.151**	**$ 15.204.151**
1772		**1.3.4.8.1.10**	**Dobelas**	**1 d**	**vie 31/01/25**	**vie 31/01/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
1773		1.3.4.8.1.10	Acero	1 d	vie 31/01/25	vie 31/01/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
1774		**1.3.4.8.1.10**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**2 d**	**lun 10/02/25**	**mié 12/02/25**	**$ 13.368.121**	**$ 13.368.121**	**$ 13.368.121**
1775		1.3.4.8.1.10	Concreto	1 d	mar 11/02/25	mié 12/02/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
1776		1.3.4.8.1.10	Bloque en Concreto	2 d	lun 10/02/25	mié 12/02/25	$ 10.829.876	$ 10.829.876	$ 10.829.876
1777		**1.3.4.8.1.10**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**181 d**	**lun 17/02/25**	**lun 6/10/25**	**$ 6.245**	**$ 6.245**	**$ 6.245**
1778		1.3.4.8.1.10	Concreto	180 d	mar 18/02/25	lun 6/10/25	$ 6.245	$ 6.245	$ 6.245
1779		1.3.4.8.1.10	Bloque en Concreto	7 d	lun 17/02/25	mar 25/02/25	$ 0	$ 0	$ 0
1780		**1.3.4.8.1.10**	**Viga de Amarre**	**207,88 d**	**mié 12/02/25**	**mié 5/11/25**	**$ 99.920**	**$ 99.920**	**$ 99.920**
1781		1.3.4.8.1.10	Acero	2 d	mié 12/02/25	vie 14/02/25	$ 99.920	$ 99.920	$ 99.920
1782		1.3.4.8.1.10	Concreto	205,88 d	vie 14/02/25	mié 5/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
1783		1.3.4.8.1.11	Fin de Eje 5-6	0 d	jue 8/01/26	jue 8/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
1784		**1.3.4.8.1.12**	**EJE 6-7**	**517,75 d**	**vie 8/03/24**	**mar 6/01/26**	**$ 249.849.892**	**$ 249.849.892**	**$ 249.849.892**
1785		1.3.4.8.1.12	Excavación	3 d	vie 8/03/24	mar 12/03/24	$ 2.404.132	$ 2.404.132	$ 2.404.132
1786		1.3.4.8.1.12	Pilotes FDP	2 d	mar 11/06/24	jue 13/06/24	$ 51.113.000	$ 51.113.000	$ 51.113.000
1787		1.3.4.8.1.12	CAPA DE TRANSFERENCIA	6 d	jue 2/01/25	vie 10/01/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
1788		1.3.4.8.1.12	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	5 d	vie 3/01/25	vie 10/01/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
1789		**1.3.4.8.1.12**	**Estructura**	**282 d**	**jue 9/01/25**	**mar 6/01/26**	**$ 42.402.505**	**$ 42.402.505**	**$ 42.402.505**

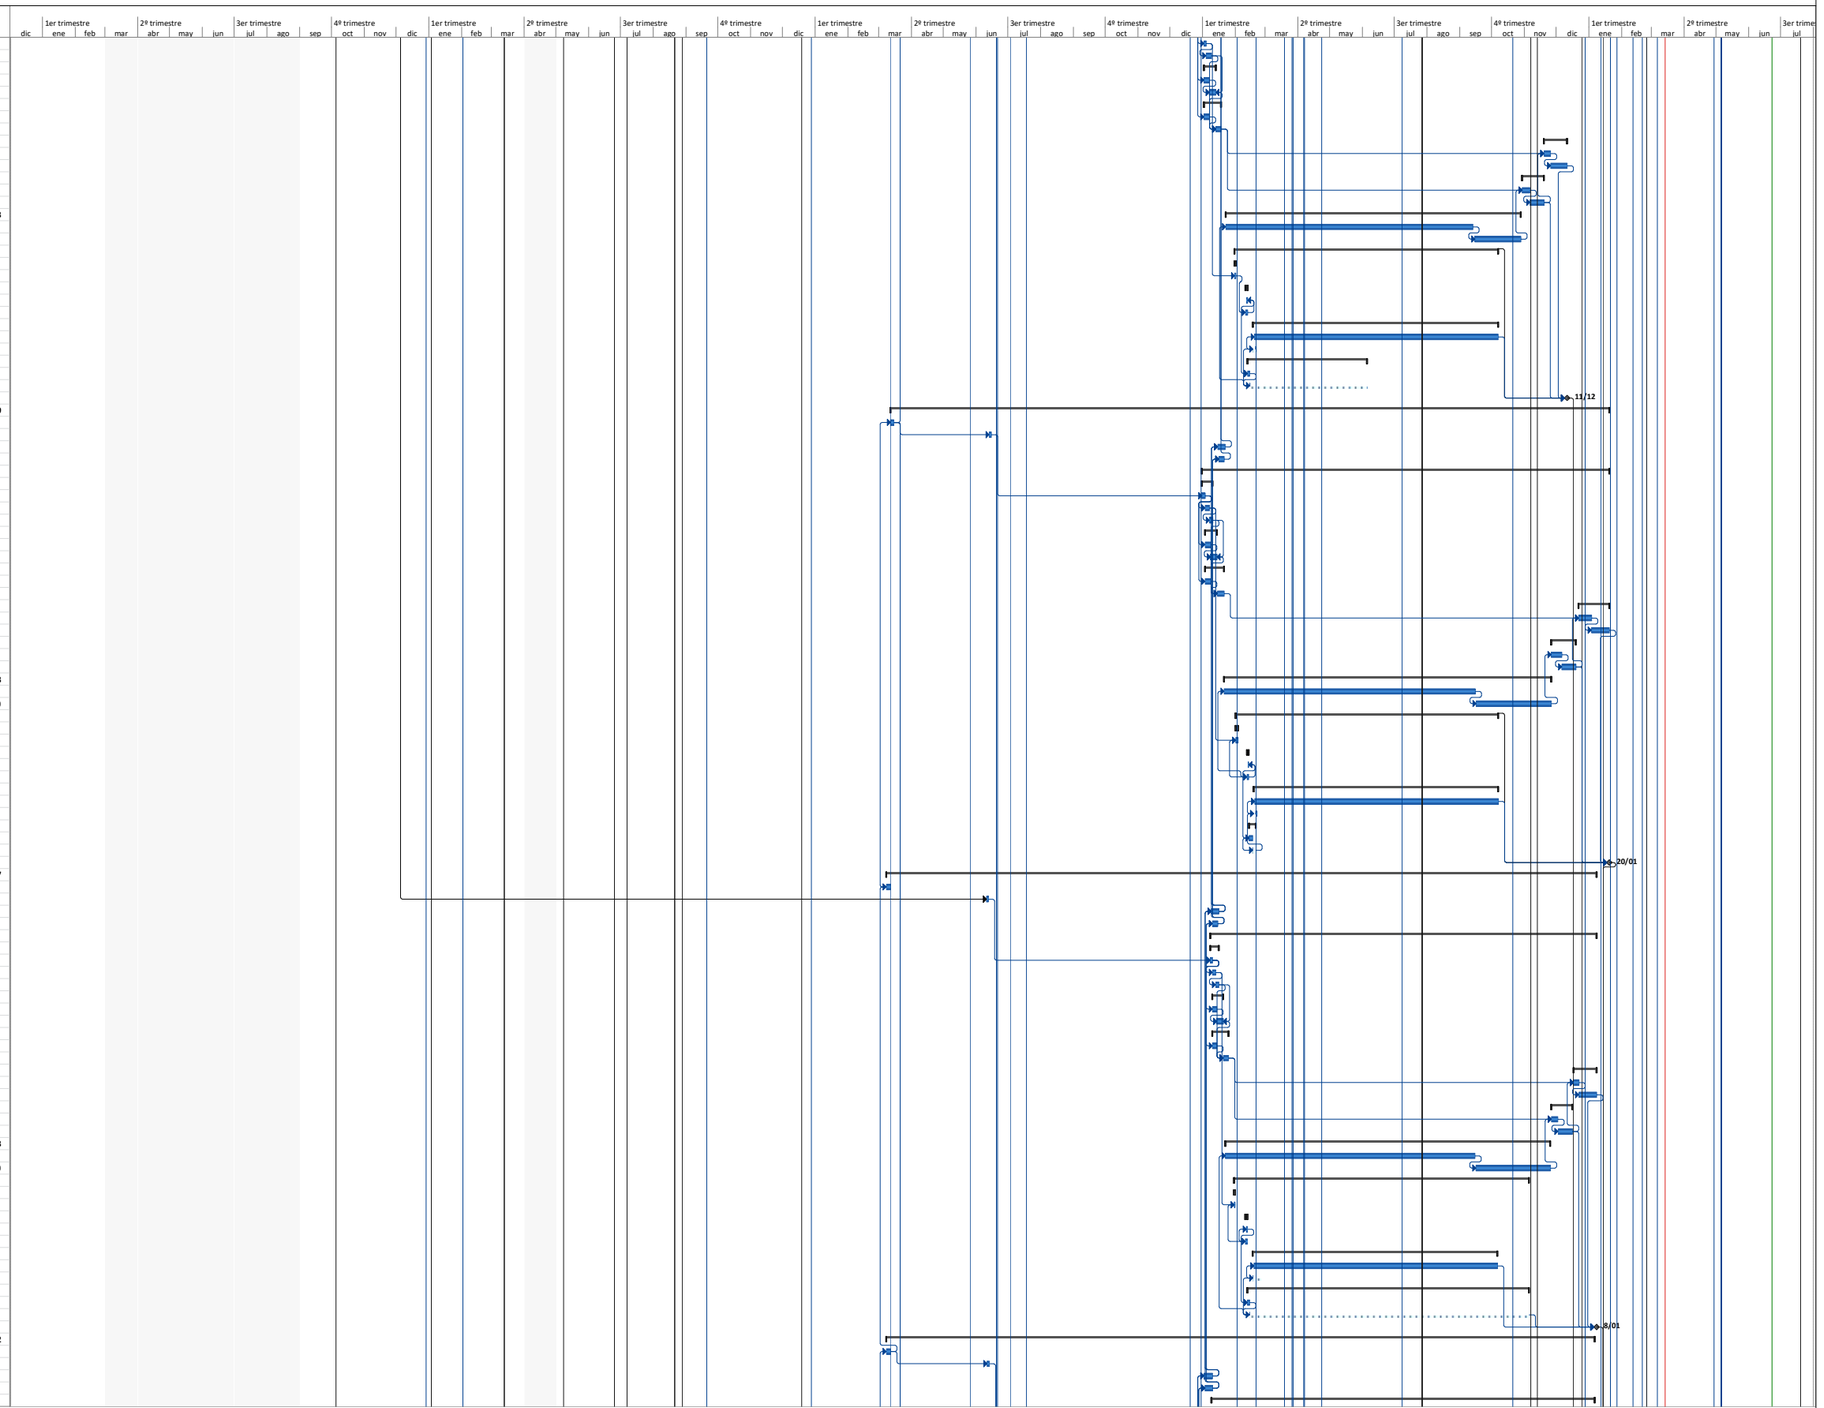

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito externo · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · Sólo el comienzo · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo · Sólo duración · Resumen manual · Sólo fin · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
1790		**1.3.4.8.1.12**	**Zapatas**	**7 d**	**jue 9/01/25**	**vie 17/01/25**	**$ 14.436.010**	**$ 14.436.010**	**$ 14.436.010**
1791		1.3.4.8.1.12	Solado	2 d	jue 9/01/25	sáb 11/01/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
1792		1.3.4.8.1.12	Acero	2 d	lun 13/01/25	mar 14/01/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
1793		1.3.4.8.1.12	Concreto	3 d	mié 15/01/25	vie 17/01/25	$ 6.330.000	$ 6.330.000	$ 6.330.000
1794		**1.3.4.8.1.12**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**lun 13/01/25**	**mié 22/01/25**	**$ 6.193.825**	**$ 6.193.825**	**$ 6.193.825**
1795		1.3.4.8.1.12	Acero	3 d	lun 13/01/25	mié 15/01/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
1796		1.3.4.8.1.12	Concreto	5 d	jue 16/01/25	mié 22/01/25	$ 3.165.000	$ 3.165.000	$ 3.165.000
1797		**1.3.4.8.1.12**	**Columnas**	**13 d**	**lun 13/01/25**	**mar 28/01/25**	**$ 7.261.720**	**$ 7.261.720**	**$ 7.261.720**
1798		1.3.4.8.1.12	Acero	3 d	lun 13/01/25	mié 15/01/25	$ 4.096.720	$ 4.096.720	$ 4.096.720
1799		1.3.4.8.1.12	Concreto	5 d	mié 22/01/25	mar 28/01/25	$ 3.165.000	$ 3.165.000	$ 3.165.000
1800		**1.3.4.8.1.12**	**Vigas Longitudinales**	**16 d**	**mar 16/12/25**	**mar 6/01/26**	**$ 6.443.625**	**$ 6.443.625**	**$ 6.443.625**
1801		1.3.4.8.1.12	Acero	4 d	mar 16/12/25	vie 19/12/25	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
1802		1.3.4.8.1.12	Concreto	12 d	sáb 20/12/25	mar 6/01/26	$ 3.165.000	$ 3.165.000	$ 3.165.000
1803		**1.3.4.8.1.12**	**Vigas Transversales**	**14 d**	**jue 27/11/25**	**lun 15/12/25**	**$ 8.067.325**	**$ 8.067.325**	**$ 8.067.325**
1804		1.3.4.8.1.12	Acero	4 d	jue 27/11/25	mar 2/12/25	$ 4.902.325	$ 4.902.325	$ 4.902.325
1805		1.3.4.8.1.12	Concreto	10 d	mar 2/12/25	lun 15/12/25	$ 3.165.000	$ 3.165.000	$ 3.165.000
1806		**1.3.4.8.1.12**	**Tierra Armada**	**240 d**	**jue 23/01/25**	**mié 26/11/25**	**$ 135.136.943**	**$ 135.136.943**	**$ 135.136.943**
1807		1.3.4.8.1.12	RELLENO EN GEOBLOQUE	184 d	jue 23/01/25	lun 15/09/25	$ 19.702.943	$ 19.702.943	$ 19.702.943
1808		1.3.4.8.1.12	RELLENO EN GEOBLOQUE 2	55 d	mar 16/09/25	mié 26/11/25	$ 115.434.000	$ 115.434.000	$ 115.434.000
1809		**1.3.4.8.1.12**	**Fachada en Mampostería**	**197 d**	**sáb 1/02/25**	**vie 10/10/25**	**$ 15.210.396**	**$ 15.210.396**	**$ 15.210.396**
1810		**1.3.4.8.1.12**	**Dobelas**	**1 d**	**sáb 1/02/25**	**lun 3/02/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
1811		1.3.4.8.1.12	Acero	1 d	sáb 1/02/25	lun 3/02/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
1812		**1.3.4.8.1.12**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**2 d**	**mié 12/02/25**	**jue 13/02/25**	**$ 13.368.121**	**$ 13.368.121**	**$ 13.368.121**
1813		1.3.4.8.1.12	Concreto	1 d	jue 13/02/25	jue 13/02/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
1814		1.3.4.8.1.12	Bloque en Concreto	2 d	mié 12/02/25	jue 13/02/25	$ 10.829.876	$ 10.829.876	$ 10.829.876
1815		**1.3.4.8.1.12**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**183 d**	**mié 19/02/25**	**vie 10/10/25**	**$ 12.490**	**$ 12.490**	**$ 12.490**
1816		1.3.4.8.1.12	Concreto	180 d	sáb 22/02/25	vie 10/10/25	$ 12.490	$ 12.490	$ 12.490
1817		1.3.4.8.1.12	Bloque en Concreto	3 d	mié 19/02/25	sáb 22/02/25	$ 0	$ 0	$ 0
1818		**1.3.4.8.1.12**	**Viga de Amarre**	**4 d**	**vie 14/02/25**	**mié 19/02/25**	**$ 99.920**	**$ 99.920**	**$ 99.920**
1819		1.3.4.8.1.12	Acero	2 d	vie 14/02/25	lun 17/02/25	$ 99.920	$ 99.920	$ 99.920
1820		1.3.4.8.1.12	Concreto	2 d	lun 17/02/25	mié 19/02/25	$ 0	$ 0	$ 0
1821		1.3.4.8.1.13	Fin de Eje 6-7	0 d	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
1822		**1.3.4.8.1.14**	**EJE 7-8**	**521 d**	**mar 5/03/24**	**mar 6/01/26**	**$ 252.196.749**	**$ 252.196.749**	**$ 252.196.749**
1823		1.3.4.8.1.14	Excavación	3 d	mar 5/03/24	vie 8/03/24	$ 2.404.132	$ 2.404.132	$ 2.404.132
1824		1.3.4.8.1.14	Pilotes FDP	2 d	jue 6/06/24	sáb 8/06/24	$ 51.113.000	$ 51.113.000	$ 51.113.000
1825		1.3.4.8.1.14	CAPA DE TRANSFERENCIA	5 d	jue 26/12/24	jue 2/01/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
1826		1.3.4.8.1.14	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	6 d	jue 26/12/24	vie 3/01/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
1827		**1.3.4.8.1.14**	**Estructura**	**284 d**	**mié 8/01/25**	**mar 6/01/26**	**$ 42.402.505**	**$ 42.402.505**	**$ 42.402.505**
1828		**1.3.4.8.1.14**	**Zapatas**	**7 d**	**mié 8/01/25**	**jue 16/01/25**	**$ 14.436.010**	**$ 14.436.010**	**$ 14.436.010**
1829		1.3.4.8.1.14	Solado	2 d	mié 8/01/25	jue 9/01/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
1830		1.3.4.8.1.14	Acero	2 d	vie 10/01/25	lun 13/01/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
1831		1.3.4.8.1.14	Concreto	3 d	lun 13/01/25	jue 16/01/25	$ 6.330.000	$ 6.330.000	$ 6.330.000
1832		**1.3.4.8.1.14**	**Vigas de Cimentación**	**7 d**	**vie 10/01/25**	**sáb 18/01/25**	**$ 6.193.825**	**$ 6.193.825**	**$ 6.193.825**
1833		1.3.4.8.1.14	Acero	3 d	vie 10/01/25	mar 14/01/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
1834		1.3.4.8.1.14	Concreto	4 d	mar 14/01/25	sáb 18/01/25	$ 3.165.000	$ 3.165.000	$ 3.165.000
1835		**1.3.4.8.1.14**	**Columnas**	**12 d**	**vie 10/01/25**	**vie 24/01/25**	**$ 7.261.720**	**$ 7.261.720**	**$ 7.261.720**
1836		1.3.4.8.1.14	Acero	3 d	vie 10/01/25	mar 14/01/25	$ 4.096.720	$ 4.096.720	$ 4.096.720
1837		1.3.4.8.1.14	Concreto	5 d	sáb 18/01/25	vie 24/01/25	$ 3.165.000	$ 3.165.000	$ 3.165.000
1838		**1.3.4.8.1.14**	**Vigas Longitudinales**	**16 d**	**mar 16/12/25**	**mar 6/01/26**	**$ 6.443.625**	**$ 6.443.625**	**$ 6.443.625**
1839		1.3.4.8.1.14	Acero	4 d	mar 16/12/25	sáb 20/12/25	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
1840		1.3.4.8.1.14	Concreto	12 d	sáb 20/12/25	mar 6/01/26	$ 3.165.000	$ 3.165.000	$ 3.165.000
1841		**1.3.4.8.1.14**	**Vigas Transversales**	**16 d**	**mar 25/11/25**	**mar 16/12/25**	**$ 8.067.325**	**$ 8.067.325**	**$ 8.067.325**
1842		1.3.4.8.1.14	Acero	6 d	mar 25/11/25	mar 2/12/25	$ 4.902.325	$ 4.902.325	$ 4.902.325
1843		1.3.4.8.1.14	Concreto	10 d	mar 2/12/25	mar 16/12/25	$ 3.165.000	$ 3.165.000	$ 3.165.000
1844		**1.3.4.8.1.14**	**Tierra Armada**	**240 d**	**jue 23/01/25**	**mié 26/11/25**	**$ 136.112.661**	**$ 136.112.661**	**$ 136.112.661**
1845		1.3.4.8.1.14	RELLENO EN GEOBLOQUE	184 d	jue 23/01/25	lun 15/09/25	$ 14.265.661	$ 14.265.661	$ 14.265.661
1846		1.3.4.8.1.14	RELLENO EN GEOBLOQUE 2	55 d	mié 17/09/25	mié 26/11/25	$ 121.847.000	$ 121.847.000	$ 121.847.000
1847		**1.3.4.8.1.14**	**Fachada en Mampostería**	**189 d**	**lun 3/02/25**	**mié 1/10/25**	**$ 16.581.535**	**$ 16.581.535**	**$ 16.581.535**
1848		**1.3.4.8.1.14**	**Dobelas**	**1 d**	**lun 3/02/25**	**lun 3/02/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
1849		1.3.4.8.1.14	Acero	1 d	lun 3/02/25	lun 3/02/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
1850		**1.3.4.8.1.14**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**2 d**	**mar 11/02/25**	**jue 13/02/25**	**$ 13.368.121**	**$ 13.368.121**	**$ 13.368.121**
1851		1.3.4.8.1.14	Concreto	1 d	mié 12/02/25	jue 13/02/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
1852		1.3.4.8.1.14	Bloque en Concreto	2 d	mar 11/02/25	jue 13/02/25	$ 10.829.876	$ 10.829.876	$ 10.829.876
1853		**1.3.4.8.1.14**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**176 d**	**mar 18/02/25**	**mié 1/10/25**	**$ 1.383.629**	**$ 1.383.629**	**$ 1.383.629**
1854		1.3.4.8.1.14	Concreto	175 d	mié 19/02/25	mié 1/10/25	$ 12.490	$ 12.490	$ 12.490
1855		1.3.4.8.1.14	Bloque en Concreto	3 d	mar 18/02/25	vie 21/02/25	$ 1.371.139	$ 1.371.139	$ 1.371.139
1856		**1.3.4.8.1.14**	**Viga de Amarre**	**5 d**	**jue 13/02/25**	**mié 19/02/25**	**$ 99.920**	**$ 99.920**	**$ 99.920**
1857		1.3.4.8.1.14	Acero	2 d	jue 13/02/25	sáb 15/02/25	$ 99.920	$ 99.920	$ 99.920
1858		1.3.4.8.1.14	Concreto	3 d	sáb 15/02/25	mié 19/02/25	$ 0	$ 0	$ 0
1859		1.3.4.8.1.15	Fin de Eje 7-8	0 d	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
1860		**1.3.4.8.1.16**	**EJE 8-9**	**523 d**	**mar 5/03/24**	**jue 8/01/26**	**$ 250.819.365**	**$ 250.819.365**	**$ 250.819.365**
1861		1.3.4.8.1.16	Excavación	3 d	mar 5/03/24	vie 8/03/24	$ 2.404.132	$ 2.404.132	$ 2.404.132
1862		1.3.4.8.1.16	Pilotes FDP	2 d	jue 6/06/24	sáb 8/06/24	$ 51.113.000	$ 51.113.000	$ 51.113.000
1863		1.3.4.8.1.16	CAPA DE TRANSFERENCIA	5 d	jue 19/12/24	jue 26/12/24	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
1864		1.3.4.8.1.16	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	5 d	jue 19/12/24	jue 26/12/24	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
1865		**1.3.4.8.1.16**	**Estructura**	**286 d**	**mié 8/01/25**	**jue 8/01/26**	**$ 42.402.505**	**$ 42.402.505**	**$ 42.402.505**
1866		**1.3.4.8.1.16**	**Zapatas**	**7 d**	**mié 8/01/25**	**jue 16/01/25**	**$ 14.436.010**	**$ 14.436.010**	**$ 14.436.010**
1867		1.3.4.8.1.16	Solado	2 d	mié 8/01/25	jue 9/01/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
1868		1.3.4.8.1.16	Acero	2 d	vie 10/01/25	lun 13/01/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
1869		1.3.4.8.1.16	Concreto	3 d	lun 13/01/25	jue 16/01/25	$ 6.330.000	$ 6.330.000	$ 6.330.000
1870		**1.3.4.8.1.16**	**Vigas de Cimentación**	**7 d**	**vie 10/01/25**	**sáb 18/01/25**	**$ 6.193.825**	**$ 6.193.825**	**$ 6.193.825**
1871		1.3.4.8.1.16	Acero	3 d	vie 10/01/25	mar 14/01/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
1872		1.3.4.8.1.16	Concreto	4 d	mar 14/01/25	sáb 18/01/25	$ 3.165.000	$ 3.165.000	$ 3.165.000
1873		**1.3.4.8.1.16**	**Columnas**	**12 d**	**vie 10/01/25**	**vie 24/01/25**	**$ 7.261.720**	**$ 7.261.720**	**$ 7.261.720**
1874		1.3.4.8.1.16	Acero	3 d	vie 10/01/25	mar 14/01/25	$ 4.096.720	$ 4.096.720	$ 4.096.720
1875		1.3.4.8.1.16	Concreto	5 d	sáb 18/01/25	vie 24/01/25	$ 3.165.000	$ 3.165.000	$ 3.165.000
1876		**1.3.4.8.1.16**	**Vigas Longitudinales**	**15 d**	**vie 19/12/25**	**jue 8/01/26**	**$ 6.443.625**	**$ 6.443.625**	**$ 6.443.625**
1877		1.3.4.8.1.16	Acero	5 d	vie 19/12/25	vie 26/12/25	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
1878		1.3.4.8.1.16	Concreto	10 d	vie 26/12/25	jue 8/01/26	$ 3.165.000	$ 3.165.000	$ 3.165.000
1879		**1.3.4.8.1.16**	**Vigas Transversales**	**19 d**	**mar 25/11/25**	**vie 19/12/25**	**$ 8.067.325**	**$ 8.067.325**	**$ 8.067.325**
1880		1.3.4.8.1.16	Acero	7 d	mar 25/11/25	mié 3/12/25	$ 4.902.325	$ 4.902.325	$ 4.902.325
1881		1.3.4.8.1.16	Concreto	12 d	mié 3/12/25	vie 19/12/25	$ 3.165.000	$ 3.165.000	$ 3.165.000
1882		**1.3.4.8.1.16**	**Tierra Armada**	**240 d**	**jue 23/01/25**	**mié 26/11/25**	**$ 136.112.661**	**$ 136.112.661**	**$ 136.112.661**
1883		1.3.4.8.1.16	RELLENO EN GEOBLOQUE	184 d	jue 23/01/25	lun 15/09/25	$ 9.455.911	$ 9.455.911	$ 9.455.911
1884		1.3.4.8.1.16	RELLENO EN GEOBLOQUE 2	55 d	mié 17/09/25	mié 26/11/25	$ 126.656.750	$ 126.656.750	$ 126.656.750
1885		**1.3.4.8.1.16**	**Fachada en Mampostería**	**190 d**	**lun 3/02/25**	**jue 2/10/25**	**$ 15.204.151**	**$ 15.204.151**	**$ 15.204.151**
1886		**1.3.4.8.1.16**	**Dobelas**	**1 d**	**lun 3/02/25**	**lun 3/02/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
1887		1.3.4.8.1.16	Acero	1 d	lun 3/02/25	lun 3/02/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
1888		**1.3.4.8.1.16**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**2 d**	**mar 11/02/25**	**jue 13/02/25**	**$ 13.368.121**	**$ 13.368.121**	**$ 13.368.121**
1889		1.3.4.8.1.16	Concreto	1 d	mié 12/02/25	jue 13/02/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
1890		1.3.4.8.1.16	Bloque en Concreto	2 d	mar 11/02/25	jue 13/02/25	$ 10.829.876	$ 10.829.876	$ 10.829.876
1891		**1.3.4.8.1.16**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**177 d**	**mar 18/02/25**	**jue 2/10/25**	**$ 6.245**	**$ 6.245**	**$ 6.245**
1892		1.3.4.8.1.16	Concreto	176 d	mié 19/02/25	jue 2/10/25	$ 6.245	$ 6.245	$ 6.245
1893		1.3.4.8.1.16	Bloque en Concreto	4 d	mar 18/02/25	sáb 22/02/25	$ 0	$ 0	$ 0
1894		**1.3.4.8.1.16**	**Viga de Amarre**	**4 d**	**jue 13/02/25**	**mar 18/02/25**	**$ 99.920**	**$ 99.920**	**$ 99.920**
1895		1.3.4.8.1.16	Acero	2 d	jue 13/02/25	sáb 15/02/25	$ 99.920	$ 99.920	$ 99.920
1896		1.3.4.8.1.16	Concreto	2 d	sáb 15/02/25	mar 18/02/25	$ 0	$ 0	$ 0
1897		1.3.4.8.1.17	Fin de Eje 8-9	0 d	jue 8/01/26	jue 8/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
1898		1.3.4.8.1.18	PLACA DE PROTECCIÓN	7 d	mié 4/02/26	jue 12/02/26	$ 54.546.546	$ 54.546.546	$ 54.546.546
1899		**1.3.4.8.1.19**	**PAVIMENTO**	**60 d**	**mar 20/01/26**	**lun 6/04/26**	**$ 158.149.631**	**$ 158.149.631**	**$ 158.149.631**
1900		1.3.4.8.1.19	Subbase	20 d	mar 20/01/26	jue 12/02/26	$ 33.995.200	$ 33.995.200	$ 33.995.200
1901		1.3.4.8.1.19	Base	20 d	vie 13/02/26	lun 9/03/26	$ 32.088.000	$ 32.088.000	$ 32.088.000

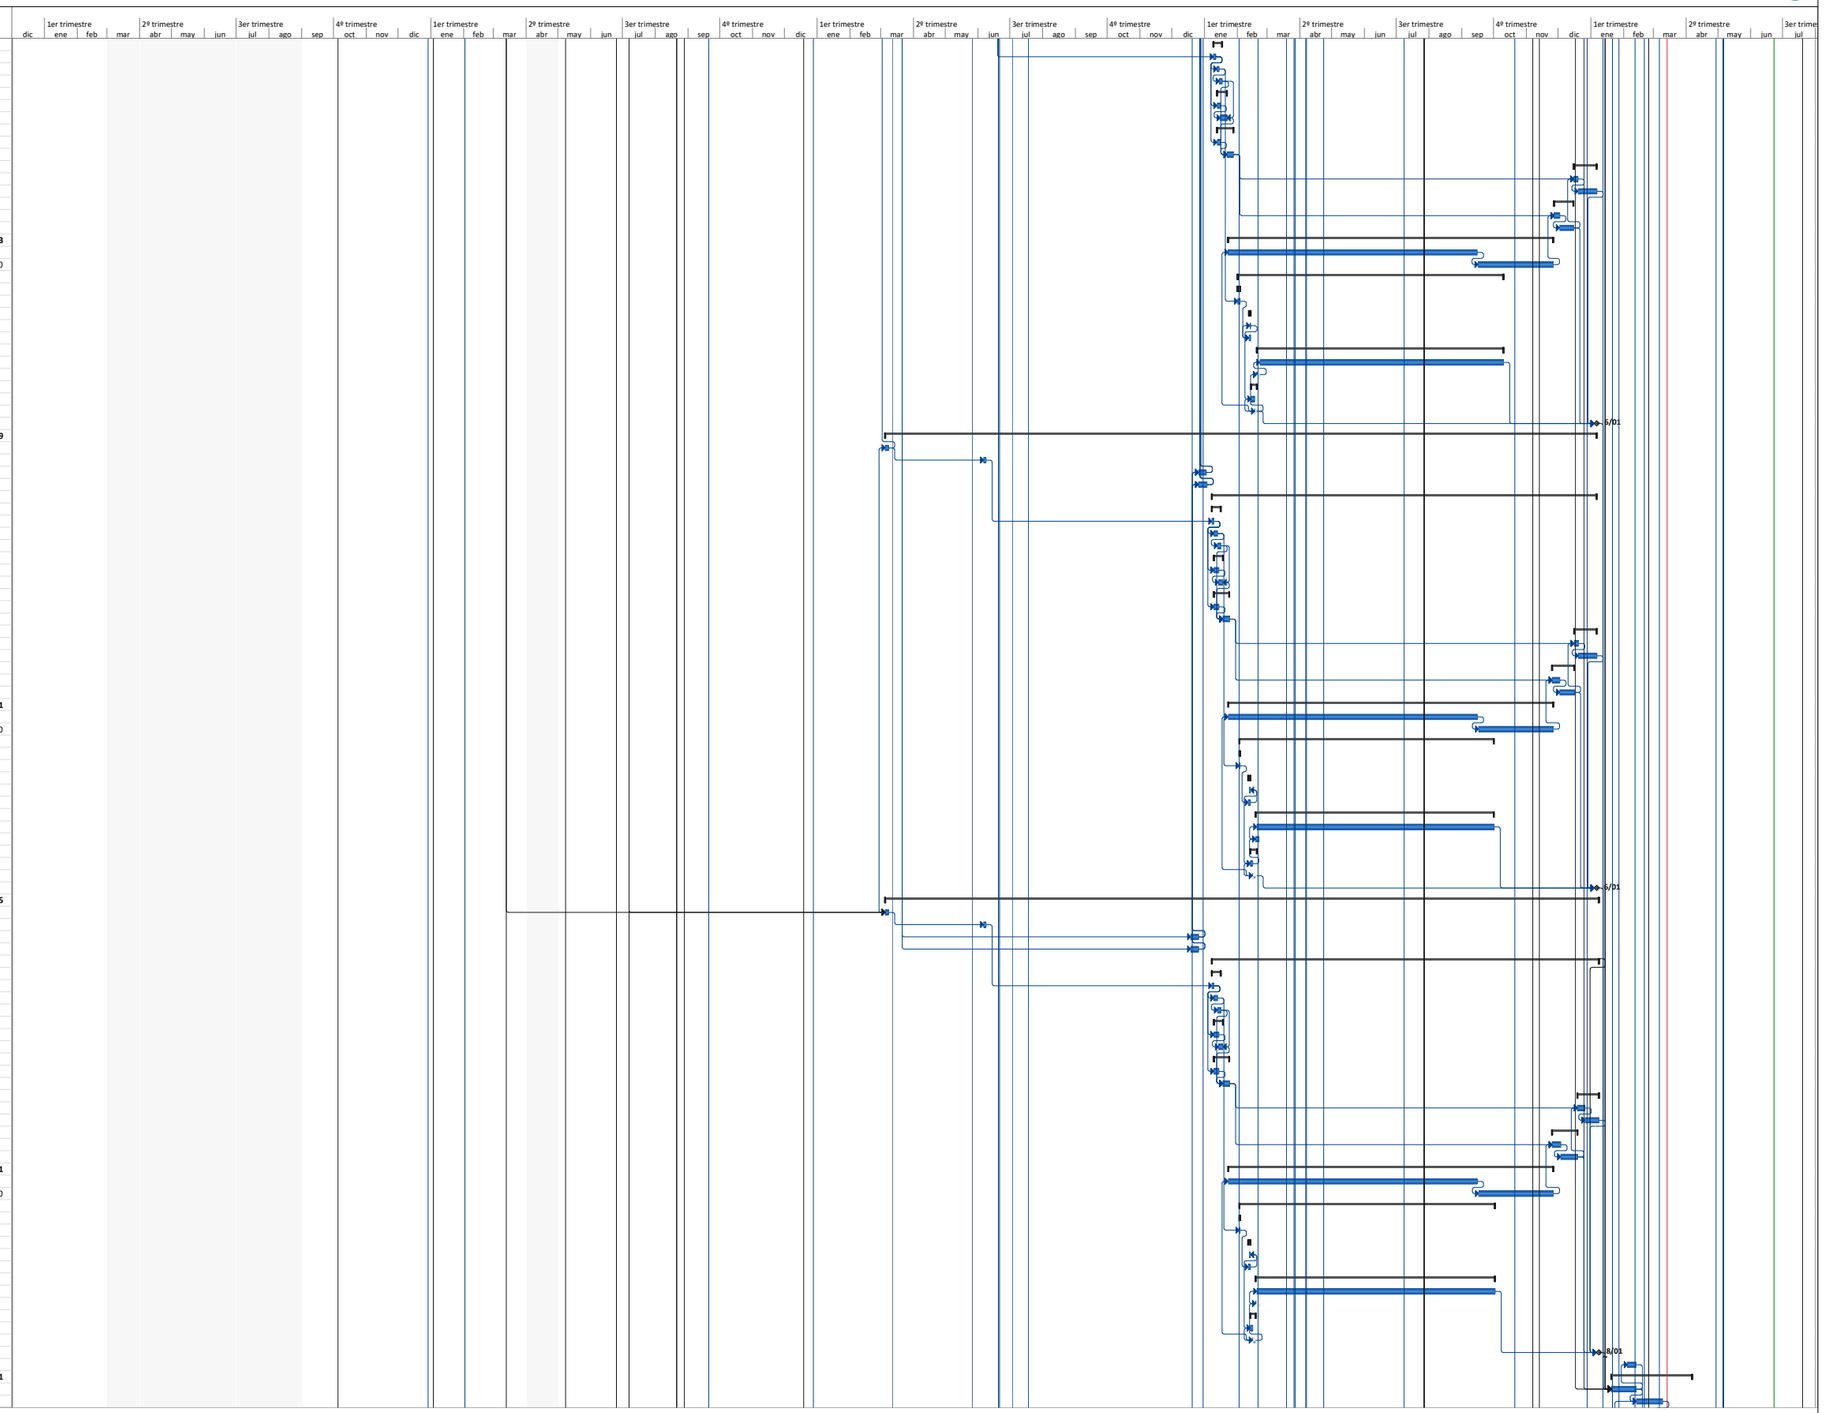

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | Sólo el comienzo | Fecha límite | División crítica | Progreso manual
División | Resumen | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo | Sólo duración | Resumen manual | Sólo fin | Tareas críticas | Progreso


Proyecto: IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB8-20221201
Fecha: mar 23/06/26

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
1902		1.3.4.8.1.19	Mezcla Asfaltica - GCR	10 d	mar 10/03/26	sáb 21/03/26	$ 68.987.081	$ 68.987.081	$ 68.987.081
1903		1.3.4.8.1.19	Mezcla Asfaltica - MD12	10 d	sáb 21/03/26	lun 6/04/26	$ 23.079.350	$ 23.079.350	$ 23.079.350
1904		1.3.4.8.1.20	Baranda Vehicular	47 d	mié 1/04/26	mar 2/06/26	$ 254.774.684	$ 254.774.684	$ 254.774.684
1905		1.3.4.8.1.21	RELLENO GEOBLOQUE EXTERNO	10 d	mar 12/05/26	lun 25/05/26	$ 225.478.673	$ 225.478.673	$ 225.478.673
1906		1.3.4.8.2	Fin de Aproche Occidental	0 d	mar 2/06/26	mar 2/06/26	$ 0	$ 0	$ 0
1907		**1.3.4.8.3**	**TRANSICION**	**599 d**	**mié 6/03/24**	**vie 17/04/26**	**$ 2.243.593.319**	**$ 2.243.593....**	**$ 2.243.593.319**
1908		1.3.4.8.3.1	Demolición	2 d	lun 23/12/24	mar 24/12/24	$ 7.489.537	$ 7.489.537	$ 7.489.537
1909		**1.3.4.8.3.2**	**EJE 1-2**	**416 d**	**vie 12/07/24**	**lun 29/12/25**	**$ 386.556.308**	**$ 386.556.308**	**$ 386.556.308**
1910		1.3.4.8.3.2.1	Excavación-1	1 d	vie 12/07/24	sáb 13/07/24	$ 1.326.791	$ 1.326.791	$ 1.326.791
1911		1.3.4.8.3.2.2	Excavación	3 d	jue 16/01/25	lun 20/01/25	$ 294.842	$ 294.842	$ 294.842
1912		1.3.4.8.3.2.3	Pilotes FDP	2 d	jue 20/03/25	vie 21/03/25	$ 35.460.000	$ 35.460.000	$ 35.460.000
1913		1.3.4.8.3.2.4	CAPA DE TRANSFERENCIA	6 d	mar 11/02/25	mar 18/02/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
1914		1.3.4.8.3.2.5	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	3 d	mié 12/02/25	sáb 15/02/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
1915		**1.3.4.8.3.2.6**	**Estructura**	**214 d**	**jue 27/03/25**	**lun 29/12/25**	**$ 52.601.733**	**$ 52.601.733**	**$ 52.601.733**
1916		**1.3.4.8.3.2.6**	**Zapatas**	**8 d**	**jue 27/03/25**	**sáb 5/04/25**	**$ 17.672.238**	**$ 17.672.238**	**$ 17.672.238**
1917		1.3.4.8.3.2.6	Solado	3 d	jue 27/03/25	lun 31/03/25	$ 60.101	$ 60.101	$ 60.101
1918		1.3.4.8.3.2.6	Acero	2 d	lun 31/03/25	mié 2/04/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
1919		1.3.4.8.3.2.6	Concreto	3 d	mié 2/04/25	sáb 5/04/25	$ 9.512.137	$ 9.512.137	$ 9.512.137
1920		**1.3.4.8.3.2.6**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**lun 31/03/25**	**mié 9/04/25**	**$ 9.358.825**	**$ 9.358.825**	**$ 9.358.825**
1921		1.3.4.8.3.2.6	Acero	3 d	lun 31/03/25	jue 3/04/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
1922		1.3.4.8.3.2.6	Concreto	5 d	jue 3/04/25	mié 9/04/25	$ 6.330.000	$ 6.330.000	$ 6.330.000
1923		**1.3.4.8.3.2.6**	**Columnas**	**13 d**	**lun 31/03/25**	**mar 15/04/25**	**$ 8.527.720**	**$ 8.527.720**	**$ 8.527.720**
1924		1.3.4.8.3.2.6	Acero	3 d	lun 31/03/25	jue 3/04/25	$ 4.096.720	$ 4.096.720	$ 4.096.720
1925		1.3.4.8.3.2.6	Concreto	5 d	mié 9/04/25	mar 15/04/25	$ 4.431.000	$ 4.431.000	$ 4.431.000
1926		**1.3.4.8.3.2.6**	**Vigas Longitudinales**	**19 d**	**mié 3/12/25**	**lun 29/12/25**	**$ 7.709.625**	**$ 7.709.625**	**$ 7.709.625**
1927		1.3.4.8.3.2.6	Acero	7 d	mié 3/12/25	vie 12/12/25	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
1928		1.3.4.8.3.2.6	Concreto	12 d	vie 12/12/25	lun 29/12/25	$ 4.431.000	$ 4.431.000	$ 4.431.000
1929		**1.3.4.8.3.2.6**	**Vigas Transversales**	**17 d**	**sáb 8/11/25**	**lun 1/12/25**	**$ 9.333.325**	**$ 9.333.325**	**$ 9.333.325**
1930		1.3.4.8.3.2.6	Acero	7 d	sáb 8/11/25	mar 18/11/25	$ 4.902.325	$ 4.902.325	$ 4.902.325
1931		1.3.4.8.3.2.6	Concreto	10 d	mar 18/11/25	lun 1/12/25	$ 4.431.000	$ 4.431.000	$ 4.431.000
1932		**1.3.4.8.3.2.7**	**Tierra Armada**	**218 d**	**sáb 1/02/25**	**vie 7/11/25**	**$ 278.079.630**	**$ 278.079.630**	**$ 278.079.630**
1933		1.3.4.8.3.2.7	RELLENOS EN GEOBLOQUE	175 d	sáb 1/02/25	sáb 13/09/25	$ 73.561.350	$ 73.561.350	$ 73.561.350
1934		1.3.4.8.3.2.7	RELLENOS EN GEOBLOQUE 2	45 d	lun 15/09/25	vie 7/11/25	$ 204.518.280	$ 204.518.280	$ 204.518.280
1935		**1.3.4.8.3.2.8**	**Fachada en Mamposteria**	**135 d**	**lun 21/04/25**	**jue 9/10/25**	**$ 15.210.396**	**$ 15.210.396**	**$ 15.210.396**
1936		**1.3.4.8.3.2.8**	**Dobelas**	**1 d**	**lun 21/04/25**	**mar 22/04/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
1937		1.3.4.8.3.2.8	Acero	1 d	lun 21/04/25	mar 22/04/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
1938		**1.3.4.8.3.2.8**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**2 d**	**mar 22/04/25**	**jue 24/04/25**	**$ 13.368.121**	**$ 13.368.121**	**$ 13.368.121**
1939		1.3.4.8.3.2.8	Concreto	1 d	mié 23/04/25	jue 24/04/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
1940		1.3.4.8.3.2.8	Bloque en Concreto	2 d	mar 22/04/25	jue 24/04/25	$ 10.829.876	$ 10.829.876	$ 10.829.876
1941		**1.3.4.8.3.2.8**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**128 d**	**mar 29/04/25**	**jue 9/10/25**	**$ 12.490**	**$ 12.490**	**$ 12.490**
1942		1.3.4.8.3.2.8	Concreto	127 d	mié 30/04/25	jue 9/10/25	$ 12.490	$ 12.490	$ 12.490
1943		1.3.4.8.3.2.8	Bloque en Concreto	122 d	mar 29/04/25	mié 1/10/25	$ 0	$ 0	$ 0
1944		**1.3.4.8.3.2.8**	**Viga de Amarre**	**4 d**	**jue 24/04/25**	**mar 29/04/25**	**$ 99.920**	**$ 99.920**	**$ 99.920**
1945		1.3.4.8.3.2.8	Acero	2 d	jue 24/04/25	sáb 26/04/25	$ 99.920	$ 99.920	$ 99.920
1946		1.3.4.8.3.2.8	Concreto	2 d	sáb 26/04/25	mar 29/04/25	$ 0	$ 0	$ 0
1947		1.3.4.8.3.3	Fin de Eje 1-2	0 d	lun 29/12/25	lun 29/12/25	$ 0	$ 0	$ 0
1948		**1.3.4.8.3.4**	**EJE 2-3**	**424 d**	**mié 17/07/24**	**mié 14/01/26**	**$ 387.460.219**	**$ 387.460.219**	**$ 387.460.219**
1949		1.3.4.8.3.4.1	Excavación -1	1 d	mié 17/07/24	jue 18/07/24	$ 1.319.792	$ 1.319.792	$ 1.319.792
1950		1.3.4.8.3.4.2	Excavación	3 d	lun 13/01/25	jue 16/01/25	$ 301.841	$ 301.841	$ 301.841
1951		1.3.4.8.3.4.3	Pilotes FDP	2 d	jue 20/03/25	vie 21/03/25	$ 35.064.000	$ 35.064.000	$ 35.064.000
1952		1.3.4.8.3.4.4	CAPA DE TRANSFERENCIA	6 d	mié 5/02/25	mié 12/02/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
1953		1.3.4.8.3.4.5	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	4 d	jue 6/02/25	mar 11/02/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
1954		**1.3.4.8.3.4.6**	**Estructura**	**227 d**	**mié 26/03/25**	**mié 14/01/26**	**$ 52.530.505**	**$ 52.530.505**	**$ 52.530.505**
1955		**1.3.4.8.3.4.6**	**Zapatas**	**7 d**	**mié 26/03/25**	**jue 3/04/25**	**$ 17.601.010**	**$ 17.601.010**	**$ 17.601.010**
1956		1.3.4.8.3.4.6	Solado	2 d	mié 26/03/25	vie 28/03/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
1957		1.3.4.8.3.4.6	Acero	2 d	vie 28/03/25	lun 31/03/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
1958		1.3.4.8.3.4.6	Concreto	3 d	lun 31/03/25	jue 3/04/25	$ 9.495.000	$ 9.495.000	$ 9.495.000
1959		**1.3.4.8.3.4.6**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**vie 28/03/25**	**lun 7/04/25**	**$ 9.358.825**	**$ 9.358.825**	**$ 9.358.825**
1960		1.3.4.8.3.4.6	Acero	3 d	vie 28/03/25	mar 1/04/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
1961		1.3.4.8.3.4.6	Concreto	5 d	mar 1/04/25	lun 7/04/25	$ 6.330.000	$ 6.330.000	$ 6.330.000
1962		**1.3.4.8.3.4.6**	**Columnas**	**13 d**	**vie 28/03/25**	**sáb 12/04/25**	**$ 8.527.720**	**$ 8.527.720**	**$ 8.527.720**
1963		1.3.4.8.3.4.6	Acero	3 d	vie 28/03/25	mar 1/04/25	$ 4.096.720	$ 4.096.720	$ 4.096.720
1964		1.3.4.8.3.4.6	Concreto	5 d	lun 7/04/25	sáb 12/04/25	$ 4.431.000	$ 4.431.000	$ 4.431.000
1965		**1.3.4.8.3.4.6**	**Vigas Longitudinales**	**19 d**	**jue 18/12/25**	**mié 14/01/26**	**$ 7.709.625**	**$ 7.709.625**	**$ 7.709.625**
1966		1.3.4.8.3.4.6	Acero	7 d	jue 18/12/25	lun 29/12/25	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
1967		1.3.4.8.3.4.6	Concreto	12 d	lun 29/12/25	mié 14/01/26	$ 4.431.000	$ 4.431.000	$ 4.431.000
1968		**1.3.4.8.3.4.6**	**Vigas Transversales**	**17 d**	**mié 26/11/25**	**mié 17/12/25**	**$ 9.333.325**	**$ 9.333.325**	**$ 9.333.325**
1969		1.3.4.8.3.4.6	Acero	7 d	mié 26/11/25	jue 4/12/25	$ 4.902.325	$ 4.902.325	$ 4.902.325
1970		1.3.4.8.3.4.6	Concreto	10 d	jue 4/12/25	mié 17/12/25	$ 4.431.000	$ 4.431.000	$ 4.431.000
1971		**1.3.4.8.3.4.7**	**Tierra Armada**	**231 d**	**sáb 1/02/25**	**lun 24/11/25**	**$ 278.079.630**	**$ 278.079.630**	**$ 278.079.630**
1972		1.3.4.8.3.4.7	RELLENOS EN GEOBLOQUE	175 d	sáb 1/02/25	sáb 13/09/25	$ 74.698.200	$ 74.698.200	$ 74.698.200
1973		1.3.4.8.3.4.7	RELLENOS EN GEOBLOQUE 2	55 d	lun 15/09/25	lun 24/11/25	$ 203.381.430	$ 203.381.430	$ 203.381.430
1974		**1.3.4.8.3.4.8**	**Fachada en Mamposteria**	**132 d**	**sáb 19/04/25**	**vie 3/10/25**	**$ 16.581.535**	**$ 16.581.535**	**$ 16.581.535**
1975		**1.3.4.8.3.4.8**	**Dobelas**	**1 d**	**sáb 19/04/25**	**lun 21/04/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
1976		1.3.4.8.3.4.8	Acero	1 d	sáb 19/04/25	lun 21/04/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
1977		**1.3.4.8.3.4.8**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**2 d**	**sáb 19/04/25**	**mar 22/04/25**	**$ 13.368.121**	**$ 13.368.121**	**$ 13.368.121**
1978		1.3.4.8.3.4.8	Concreto	1 d	lun 21/04/25	mar 22/04/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
1979		1.3.4.8.3.4.8	Bloque en Concreto	2 d	sáb 19/04/25	mar 22/04/25	$ 10.829.876	$ 10.829.876	$ 10.829.876
1980		**1.3.4.8.3.4.8**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**126 d**	**sáb 26/04/25**	**vie 3/10/25**	**$ 1.383.629**	**$ 1.383.629**	**$ 1.383.629**
1981		1.3.4.8.3.4.8	Concreto	125 d	lun 28/04/25	vie 3/10/25	$ 12.490	$ 12.490	$ 12.490
1982		1.3.4.8.3.4.8	Bloque en Concreto	123 d	sáb 26/04/25	mar 30/09/25	$ 1.371.139	$ 1.371.139	$ 1.371.139
1983		**1.3.4.8.3.4.8**	**Viga de Amarre**	**125 d**	**mar 22/04/25**	**sáb 27/09/25**	**$ 99.920**	**$ 99.920**	**$ 99.920**
1984		1.3.4.8.3.4.8	Acero	2 d	mar 22/04/25	jue 24/04/25	$ 99.920	$ 99.920	$ 99.920
1985		1.3.4.8.3.4.8	Concreto	122 d	vie 25/04/25	sáb 27/09/25	$ 0	$ 0	$ 0
1986		1.3.4.8.3.5	Fin de Eje 2-3	0 d	mié 14/01/26	mié 14/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
1987		**1.3.4.8.3.6**	**EJE 3-4**	**423 d**	**lun 15/07/24**	**vie 9/01/26**	**$ 385.692.883**	**$ 385.692.883**	**$ 385.692.883**
1988		1.3.4.8.3.6.1	Excavación -1	1 d	lun 15/07/24	mar 16/07/24	$ 1.319.792	$ 1.319.792	$ 1.319.792
1989		1.3.4.8.3.6.2	Excavación	3 d	jue 9/01/25	lun 13/01/25	$ 146.644	$ 146.644	$ 146.644
1990		1.3.4.8.3.6.3	Pilotes FDP	2 d	jue 20/03/25	vie 21/03/25	$ 34.823.000	$ 34.823.000	$ 34.823.000
1991		1.3.4.8.3.6.4	CAPA DE TRANSFERENCIA	6 d	vie 7/02/25	vie 14/02/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
1992		1.3.4.8.3.6.5	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	4 d	sáb 8/02/25	jue 13/02/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
1993		**1.3.4.8.3.6.6**	**Estructura**	**224 d**	**mié 26/03/25**	**vie 9/01/26**	**$ 52.530.505**	**$ 52.530.505**	**$ 52.530.505**
1994		**1.3.4.8.3.6.6**	**Zapatas**	**7 d**	**mié 26/03/25**	**jue 3/04/25**	**$ 17.601.010**	**$ 17.601.010**	**$ 17.601.010**
1995		1.3.4.8.3.6.6	Solado	2 d	mié 26/03/25	vie 28/03/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
1996		1.3.4.8.3.6.6	Acero	2 d	vie 28/03/25	lun 31/03/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
1997		1.3.4.8.3.6.6	Concreto	3 d	lun 31/03/25	jue 3/04/25	$ 9.495.000	$ 9.495.000	$ 9.495.000
1998		**1.3.4.8.3.6.6**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**vie 28/03/25**	**lun 7/04/25**	**$ 9.358.825**	**$ 9.358.825**	**$ 9.358.825**
1999		1.3.4.8.3.6.6	Acero	3 d	vie 28/03/25	mar 1/04/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
2000		1.3.4.8.3.6.6	Concreto	5 d	mar 1/04/25	lun 7/04/25	$ 6.330.000	$ 6.330.000	$ 6.330.000
2001		**1.3.4.8.3.6.6**	**Columnas**	**13 d**	**vie 28/03/25**	**sáb 12/04/25**	**$ 8.527.720**	**$ 8.527.720**	**$ 8.527.720**
2002		1.3.4.8.3.6.6	Acero	3 d	vie 28/03/25	mar 1/04/25	$ 4.096.720	$ 4.096.720	$ 4.096.720
2003		1.3.4.8.3.6.6	Concreto	5 d	lun 7/04/25	sáb 12/04/25	$ 4.431.000	$ 4.431.000	$ 4.431.000
2004		**1.3.4.8.3.6.6**	**Vigas Longitudinales**	**18 d**	**mar 16/12/25**	**vie 9/01/26**	**$ 7.709.625**	**$ 7.709.625**	**$ 7.709.625**
2005		1.3.4.8.3.6.6	Acero	6 d	mar 16/12/25	mar 23/12/25	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
2006		1.3.4.8.3.6.6	Concreto	12 d	mié 24/12/25	vie 9/01/26	$ 4.431.000	$ 4.431.000	$ 4.431.000
2007		**1.3.4.8.3.6.6**	**Vigas Transversales**	**16 d**	**mié 26/11/25**	**mar 16/12/25**	**$ 9.333.325**	**$ 9.333.325**	**$ 9.333.325**
2008		1.3.4.8.3.6.6	Acero	6 d	mié 26/11/25	mié 3/12/25	$ 4.902.325	$ 4.902.325	$ 4.902.325
2009		1.3.4.8.3.6.6	Concreto	10 d	mié 3/12/25	mar 16/12/25	$ 4.431.000	$ 4.431.000	$ 4.431.000
2010		**1.3.4.8.3.6.7**	**Tierra Armada**	**231 d**	**sáb 1/02/25**	**lun 24/11/25**	**$ 278.079.630**	**$ 278.079.630**	**$ 278.079.630**
2011		1.3.4.8.3.6.7	RELLENOS EN GEOBLOQUE	175 d	sáb 1/02/25	sáb 13/09/25	$ 78.561.900	$ 78.561.900	$ 78.561.900
2012		1.3.4.8.3.6.7	RELLENOS EN GEOBLOQUE 2	55 d	lun 15/09/25	lun 24/11/25	$ 199.517.730	$ 199.517.730	$ 199.517.730
2013		**1.3.4.8.3.6.8**	**Fachada en Mamposteria**	**135 d**	**sáb 19/04/25**	**mié 8/10/25**	**$ 15.210.396**	**$ 15.210.396**	**$ 15.210.396**

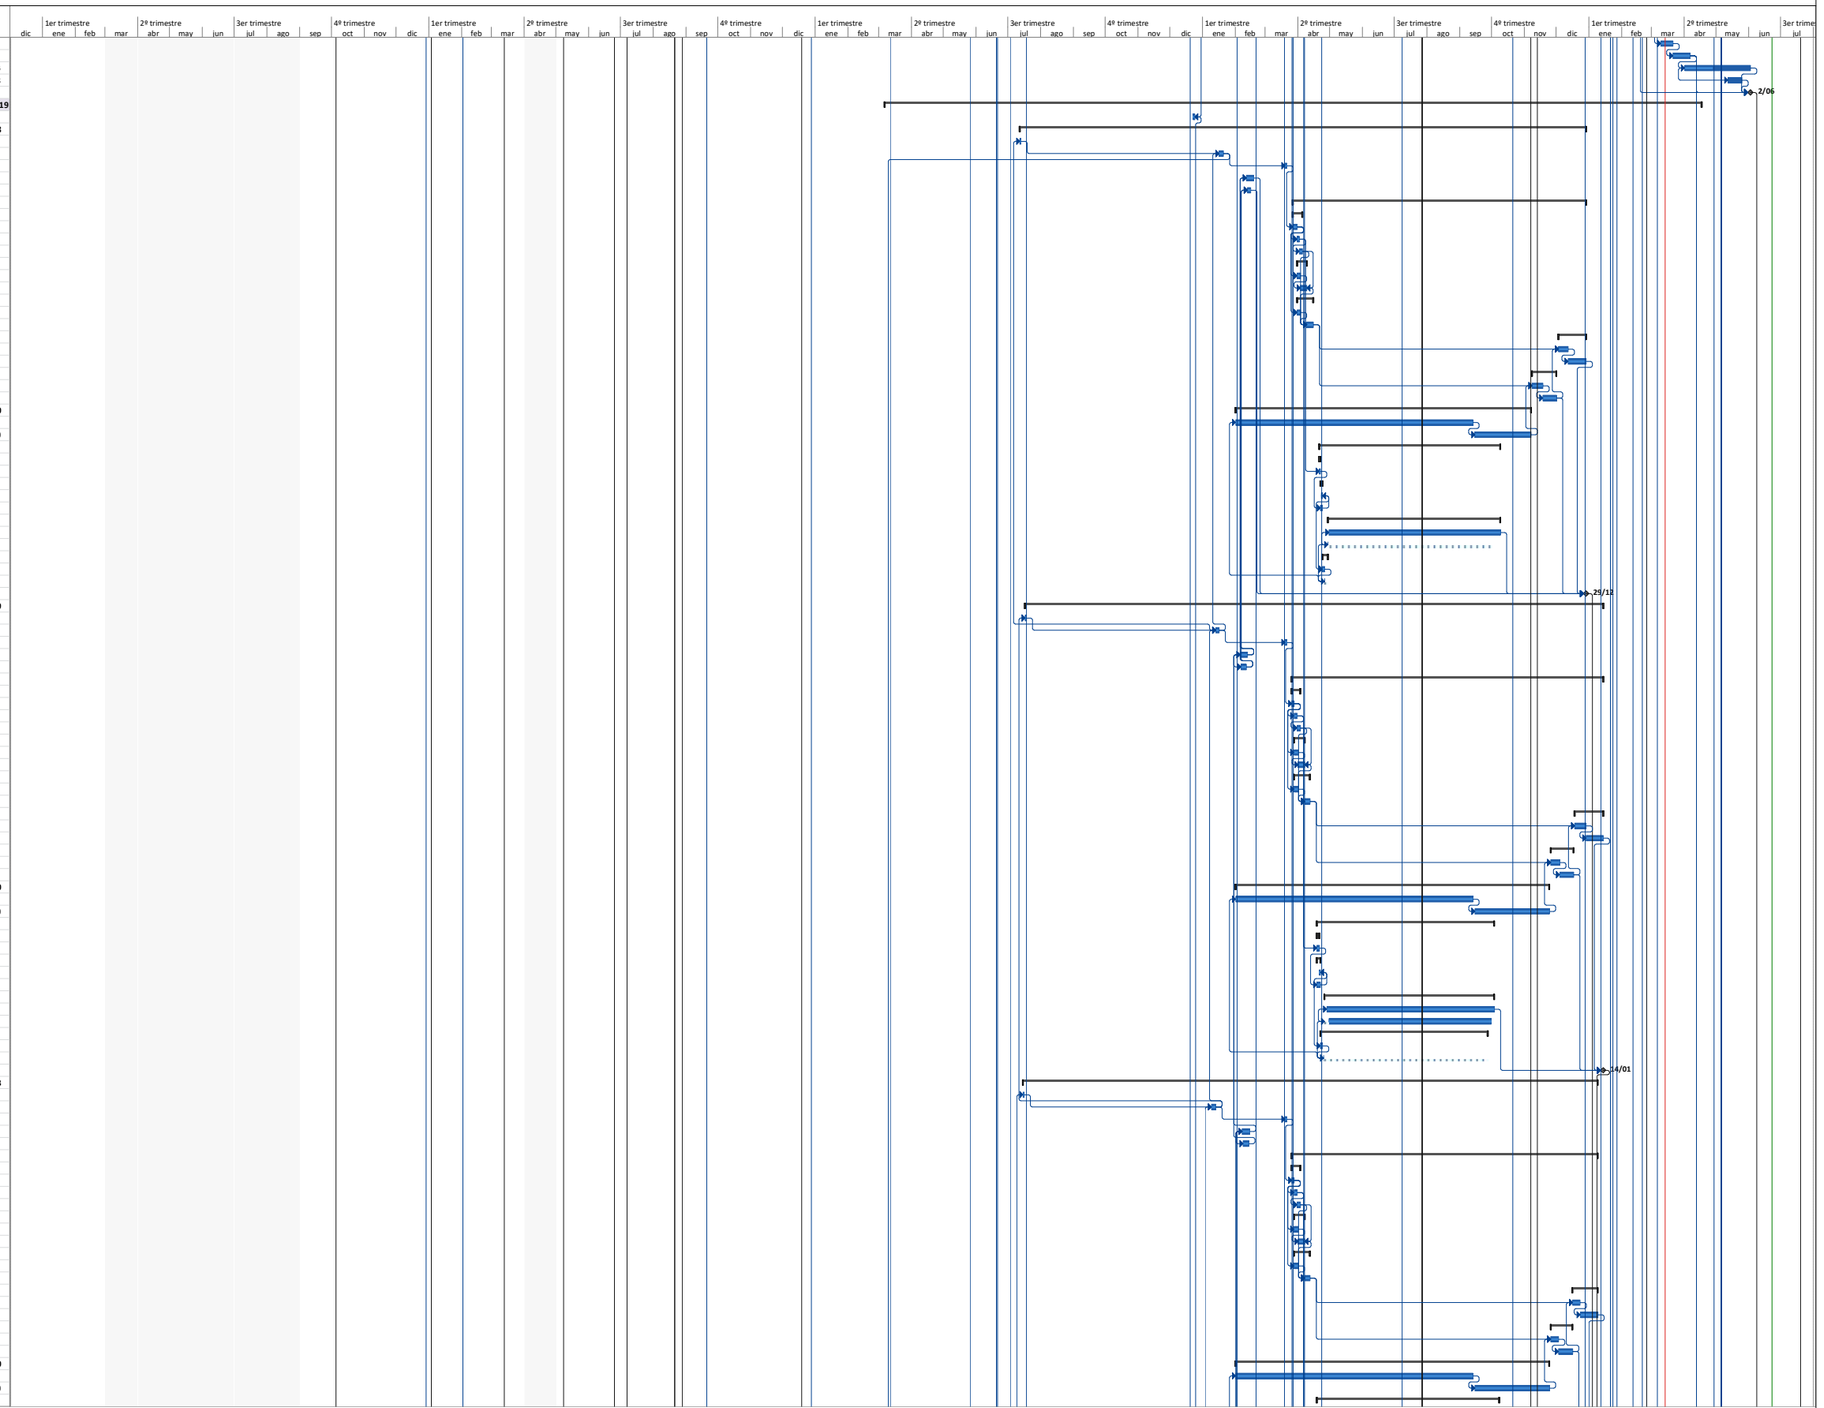


Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | Sólo el comienzo | Fecha límite | División crítica | Progreso manual
División | Resumen | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo | Sólo duración | Resumen manual | Sólo fin | Tareas críticas | Progreso

Id	Modo de tare	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
2014		1.3.4.8.3.6.1	**Dobelas**	**1 d**	**sáb 19/04/25**	**lun 21/04/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
2015		1.3.4.8.3.6.8	Acero	1 d	sáb 19/04/25	lun 21/04/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
2016		1.3.4.8.3.6.9	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**2 d**	**sáb 19/04/25**	**mar 22/04/25**	**$ 13.368.121**	**$ 13.368.121**	**$ 13.368.121**
2017		1.3.4.8.3.6.8	Concreto	1 d	lun 21/04/25	mar 22/04/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
2018		1.3.4.8.3.6.8	Bloque en Concreto	2 d	sáb 19/04/25	mar 22/04/25	$ 10.829.876	$ 10.829.876	$ 10.829.876
2019		1.3.4.8.3.6.9	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**129 d**	**sáb 26/04/25**	**mié 8/10/25**	**$ 12.490**	**$ 12.490**	**$ 12.490**
2020		1.3.4.8.3.6.8	Concreto	128 d	lun 28/04/25	mié 8/10/25	$ 12.490	$ 12.490	$ 12.490
2021		1.3.4.8.3.6.8	Bloque en Concreto	125 d	sáb 26/04/25	jue 2/10/25	$ 0	$ 0	$ 0
2022		1.3.4.8.3.6.1	**Viga de Amarre**	**5 d**	**mar 22/04/25**	**lun 28/04/25**	**$ 99.920**	**$ 99.920**	**$ 99.920**
2023		1.3.4.8.3.6.8	Acero	2 d	mar 22/04/25	jue 24/04/25	$ 99.920	$ 99.920	$ 99.920
2024		1.3.4.8.3.6.8	Concreto	2 d	vie 25/04/25	lun 28/04/25	$ 0	$ 0	$ 0
2025		1.3.4.8.3.7	Fin de Eje 3-4	0 d	vie 9/01/26	vie 9/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
2026		1.3.4.8.3.8	**EJE 4-5**	**524 d**	**mié 6/03/24**	**mar 13/01/26**	**$ 422.133.350**	**$ 422.133.350**	**$ 422.133.350**
2027		1.3.4.8.3.8.1	Excavación -1	2 d	mié 6/03/24	vie 8/03/24	$ 1.319.792	$ 1.319.792	$ 1.319.792
2028		1.3.4.8.3.8.2	Excavación	3 d	sáb 4/01/25	jue 9/01/25	$ 146.644	$ 146.644	$ 146.644
2029		1.3.4.8.3.8.3	Pilotes FDP	2 d	mar 18/03/25	mié 19/03/25	$ 71.269.712	$ 71.269.712	$ 71.269.712
2030		1.3.4.8.3.8.4	CAPA DE TRANSFERCIA	6 d	vie 7/02/25	vie 14/02/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
2031		1.3.4.8.3.8.5	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	3 d	lun 10/02/25	jue 13/02/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
2032		1.3.4.8.3.8.6	**Estructura**	**228 d**	**sáb 22/03/25**	**mar 13/01/26**	**$ 52.530.505**	**$ 52.530.505**	**$ 52.530.505**
2033		1.3.4.8.3.8.6	**Zapatas**	**7 d**	**sáb 22/03/25**	**mar 1/04/25**	**$ 17.601.010**	**$ 17.601.010**	**$ 17.601.010**
2034		1.3.4.8.3.8.6	Solado	2 d	sáb 22/03/25	mié 26/03/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
2035		1.3.4.8.3.8.6	Acero	2 d	jue 27/03/25	sáb 29/03/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
2036		1.3.4.8.3.8.6	Concreto	2 d	sáb 29/03/25	mar 1/04/25	$ 9.495.000	$ 9.495.000	$ 9.495.000
2037		1.3.4.8.3.8.6	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**mié 26/03/25**	**vie 4/04/25**	**$ 9.358.825**	**$ 9.358.825**	**$ 9.358.825**
2038		1.3.4.8.3.8.6	Acero	3 d	mié 26/03/25	sáb 29/03/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
2039		1.3.4.8.3.8.6	Concreto	5 d	sáb 29/03/25	vie 4/04/25	$ 6.330.000	$ 6.330.000	$ 6.330.000
2040		1.3.4.8.3.8.6	**Columnas**	**13 d**	**mié 26/03/25**	**jue 10/04/25**	**$ 8.527.720**	**$ 8.527.720**	**$ 8.527.720**
2041		1.3.4.8.3.8.6	Acero	3 d	mié 26/03/25	sáb 29/03/25	$ 4.096.720	$ 4.096.720	$ 4.096.720
2042		1.3.4.8.3.8.6	Concreto	5 d	vie 4/04/25	jue 10/04/25	$ 4.431.000	$ 4.431.000	$ 4.431.000
2043		1.3.4.8.3.8.6	**Vigas Longitudinales**	**18 d**	**jue 18/12/25**	**mar 13/01/26**	**$ 7.709.625**	**$ 7.709.625**	**$ 7.709.625**
2044		1.3.4.8.3.8.6	Acero	6 d	jue 18/12/25	vie 26/12/25	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
2045		1.3.4.8.3.8.6	Concreto	12 d	sáb 27/12/25	mar 13/01/26	$ 4.431.000	$ 4.431.000	$ 4.431.000
2046		1.3.4.8.3.8.6	**Vigas Transversales**	**16 d**	**mié 26/11/25**	**mar 16/12/25**	**$ 9.333.325**	**$ 9.333.325**	**$ 9.333.325**
2047		1.3.4.8.3.8.6	Acero	6 d	mié 26/11/25	mié 3/12/25	$ 4.902.325	$ 4.902.325	$ 4.902.325
2048		1.3.4.8.3.8.6	Concreto	10 d	mié 3/12/25	mar 16/12/25	$ 4.431.000	$ 4.431.000	$ 4.431.000
2049		1.3.4.8.3.8.7	**Tierra Armada**	**231 d**	**sáb 1/02/25**	**lun 24/11/25**	**$ 278.079.630**	**$ 278.079.630**	**$ 278.079.630**
2050		1.3.4.8.3.8.7	RELLENOS EN GEOBLOQUE	175 d	sáb 1/02/25	sáb 13/09/25	$ 82.425.600	$ 82.425.600	$ 82.425.600
2051		1.3.4.8.3.8.7	RELLENOS EN GEOBLOQUE 2	55 d	lun 15/09/25	lun 24/11/25	$ 195.654.030	$ 195.654.030	$ 195.654.030
2052		1.3.4.8.3.8.8	**Fachada en Mamposteria**	**135 d**	**mar 15/04/25**	**lun 6/10/25**	**$ 15.204.151**	**$ 15.204.151**	**$ 15.204.151**
2053		1.3.4.8.3.8.8	**Dobelas**	**1 d**	**mar 15/04/25**	**mar 15/04/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
2054		1.3.4.8.3.8.8	Acero	1 d	mar 15/04/25	mar 15/04/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
2055		1.3.4.8.3.8.9	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**2 d**	**mié 16/04/25**	**lun 21/04/25**	**$ 13.368.121**	**$ 13.368.121**	**$ 13.368.121**
2056		1.3.4.8.3.8.8	Concreto	1 d	sáb 19/04/25	lun 21/04/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
2057		1.3.4.8.3.8.8	Bloque en Concreto	2 d	mié 16/04/25	lun 21/04/25	$ 10.829.876	$ 10.829.876	$ 10.829.876
2058		1.3.4.8.3.8.9	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**128 d**	**vie 25/04/25**	**lun 6/10/25**	**$ 6.245**	**$ 6.245**	**$ 6.245**
2059		1.3.4.8.3.8.8	Concreto	128 d	vie 25/04/25	lun 6/10/25	$ 6.245	$ 6.245	$ 6.245
2060		1.3.4.8.3.8.8	Bloque en Concreto	125 d	vie 25/04/25	mié 1/10/25	$ 0	$ 0	$ 0
2061		1.3.4.8.3.8.1	**Viga de Amarre**	**4 d**	**lun 21/04/25**	**vie 25/04/25**	**$ 99.920**	**$ 99.920**	**$ 99.920**
2062		1.3.4.8.3.8.8	Acero	2 d	lun 21/04/25	mié 23/04/25	$ 99.920	$ 99.920	$ 99.920
2063		1.3.4.8.3.8.8	Concreto	2 d	mié 23/04/25	vie 25/04/25	$ 0	$ 0	$ 0
2064		1.3.4.8.3.9	Fin de Eje 4-5	0 d	mar 13/01/26	mar 13/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
2065		1.3.4.8.3.10	**EJE 5-6**	**514,25 d**	**lun 18/03/24**	**sáb 10/01/26**	**$ 385.686.638**	**$ 385.686.638**	**$ 385.686.638**
2066		1.3.4.8.3.10	Excavación -1	2 d	lun 18/03/24	mar 19/03/24	$ 1.319.792	$ 1.319.792	$ 1.319.792
2067		1.3.4.8.3.10	Excavación	3 d	mar 31/12/24	sáb 4/01/25	$ 146.644	$ 146.644	$ 146.644
2068		1.3.4.8.3.10	Pilotes FDP	2 d	mar 18/03/25	mié 19/03/25	$ 34.823.000	$ 34.823.000	$ 34.823.000
2069		1.3.4.8.3.10	CAPA DE TRANSFERENCIA	6 d	sáb 8/02/25	sáb 15/02/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
2070		1.3.4.8.3.10	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	3 d	mar 11/02/25	vie 14/02/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
2071		1.3.4.8.3.10	**Estructura**	**227 d**	**sáb 22/03/25**	**sáb 10/01/26**	**$ 52.530.505**	**$ 52.530.505**	**$ 52.530.505**
2072		1.3.4.8.3.10	**Zapatas**	**7 d**	**sáb 22/03/25**	**mar 1/04/25**	**$ 17.601.010**	**$ 17.601.010**	**$ 17.601.010**
2073		1.3.4.8.3.10	Solado	2 d	sáb 22/03/25	mié 26/03/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
2074		1.3.4.8.3.10	Acero	2 d	mié 26/03/25	vie 28/03/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
2075		1.3.4.8.3.10	Concreto	3 d	vie 28/03/25	mar 1/04/25	$ 9.495.000	$ 9.495.000	$ 9.495.000
2076		1.3.4.8.3.10	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**mié 26/03/25**	**vie 4/04/25**	**$ 9.358.825**	**$ 9.358.825**	**$ 9.358.825**
2077		1.3.4.8.3.10	Acero	3 d	mié 26/03/25	sáb 29/03/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
2078		1.3.4.8.3.10	Concreto	5 d	sáb 29/03/25	vie 4/04/25	$ 6.330.000	$ 6.330.000	$ 6.330.000
2079		1.3.4.8.3.10	**Columnas**	**13 d**	**mié 26/03/25**	**jue 10/04/25**	**$ 8.527.720**	**$ 8.527.720**	**$ 8.527.720**
2080		1.3.4.8.3.10	Acero	3 d	mié 26/03/25	sáb 29/03/25	$ 4.096.720	$ 4.096.720	$ 4.096.720
2081		1.3.4.8.3.10	Concreto	5 d	vie 4/04/25	jue 10/04/25	$ 4.431.000	$ 4.431.000	$ 4.431.000
2082		1.3.4.8.3.10	**Vigas Longitudinales**	**18 d**	**mié 17/12/25**	**sáb 10/01/26**	**$ 7.709.625**	**$ 7.709.625**	**$ 7.709.625**
2083		1.3.4.8.3.10	Acero	6 d	mié 17/12/25	mié 24/12/25	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
2084		1.3.4.8.3.10	Concreto	12 d	vie 26/12/25	sáb 10/01/26	$ 4.431.000	$ 4.431.000	$ 4.431.000
2085		1.3.4.8.3.10	**Vigas Transversales**	**16 d**	**jue 27/11/25**	**mié 17/12/25**	**$ 9.333.325**	**$ 9.333.325**	**$ 9.333.325**
2086		1.3.4.8.3.10	Acero	6 d	jue 27/11/25	jue 4/12/25	$ 4.902.325	$ 4.902.325	$ 4.902.325
2087		1.3.4.8.3.10	Concreto	10 d	jue 4/12/25	mié 17/12/25	$ 4.431.000	$ 4.431.000	$ 4.431.000
2088		1.3.4.8.3.10	**Tierra Armada**	**231 d**	**sáb 1/02/25**	**lun 24/11/25**	**$ 278.079.630**	**$ 278.079.630**	**$ 278.079.630**
2089		1.3.4.8.3.10	RELLENOS EN GEOBLOQUE	175 d	sáb 1/02/25	sáb 13/09/25	$ 79.849.800	$ 79.849.800	$ 79.849.800
2090		1.3.4.8.3.10	RELLENOS EN GEOBLOQUE 2	55 d	lun 15/09/25	lun 24/11/25	$ 198.229.830	$ 198.229.830	$ 198.229.830
2091		1.3.4.8.3.10	**Fachada en Mamposteria**	**135 d**	**mar 15/04/25**	**lun 6/10/25**	**$ 15.204.151**	**$ 15.204.151**	**$ 15.204.151**
2092		1.3.4.8.3.10	**Dobelas**	**1 d**	**mar 15/04/25**	**mar 15/04/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
2093		1.3.4.8.3.10	Acero	1 d	mar 15/04/25	mar 15/04/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
2094		1.3.4.8.3.10	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**2 d**	**mié 16/04/25**	**lun 21/04/25**	**$ 13.368.121**	**$ 13.368.121**	**$ 13.368.121**
2095		1.3.4.8.3.10	Concreto	1 d	sáb 19/04/25	lun 21/04/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
2096		1.3.4.8.3.10	Bloque en Concreto	2 d	mié 16/04/25	lun 21/04/25	$ 10.829.876	$ 10.829.876	$ 10.829.876
2097		1.3.4.8.3.10	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**128 d**	**vie 25/04/25**	**lun 6/10/25**	**$ 6.245**	**$ 6.245**	**$ 6.245**
2098		1.3.4.8.3.10	Concreto	128 d	vie 25/04/25	lun 6/10/25	$ 6.245	$ 6.245	$ 6.245
2099		1.3.4.8.3.10	Bloque en Concreto	125 d	vie 25/04/25	mié 1/10/25	$ 0	$ 0	$ 0
2100		1.3.4.8.3.10	**Viga de Amarre**	**4 d**	**lun 21/04/25**	**vie 25/04/25**	**$ 99.920**	**$ 99.920**	**$ 99.920**
2101		1.3.4.8.3.10	Acero	2 d	lun 21/04/25	mié 23/04/25	$ 99.920	$ 99.920	$ 99.920
2102		1.3.4.8.3.10	Concreto	2 d	mié 23/04/25	vie 25/04/25	$ 0	$ 0	$ 0
2103		1.3.4.8.3.11	Fin de Eje 5-6	0 d	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
2104		1.3.4.8.3.12	PLACA DE PROTECCIÓN	8 d	mar 27/01/26	jue 5/02/26	$ 54.881.908	$ 54.881.908	$ 54.881.908
2105		1.3.4.8.3.13	**PAVIMENTO**	**54 d**	**mié 14/01/26**	**vie 20/03/26**	**$ 66.225.950**	**$ 66.225.950**	**$ 66.225.950**
2106		1.3.4.8.3.13	Subbase	17 d	mié 14/01/26	mié 4/02/26	$ 6.519.680	$ 6.519.680	$ 6.519.680
2107		1.3.4.8.3.13	Base	17 d	mié 4/02/26	mié 25/02/26	$ 8.400.000	$ 8.400.000	$ 8.400.000
2108		1.3.4.8.3.13	Mezcla Asfaltica - GCR	10 d	mié 25/02/26	lun 9/03/26	$ 39.084.770	$ 39.084.770	$ 39.084.770
2109		1.3.4.8.3.13	Mezcla Asfaltica - MD12	10 d	lun 9/03/26	vie 20/03/26	$ 12.221.500	$ 12.221.500	$ 12.221.500
2110		1.3.4.8.3.14	Baranda Vehicular	40 d	sáb 21/02/26	mar 14/04/26	$ 136.282.413	$ 136.282.413	$ 136.282.413
2111		1.3.4.8.3.15	Baranda Peatonal	40 d	mié 25/02/26	vie 17/04/26	$ 11.184.113	$ 11.184.113	$ 11.184.113
2112		1.3.4.8.4	Fin de Transición	0 d	vie 17/04/26	vie 17/04/26	$ 0	$ 0	$ 0
2113		1.3.4.8.5	**OREJA OCCIDENTAL**	**624,75 d**	**sáb 16/03/24**	**lun 1/06/26**	**$ 3.067.824.998**	**$ 3.067.824....**	**$ 3.067.824.998**
2114		1.3.4.8.5.1	Demolición	7 d	sáb 25/01/25	lun 3/02/25	$ 6.763.637	$ 6.763.637	$ 6.763.637
2115		1.3.4.8.5.2	**EJE 1-2**	**514 d**	**sáb 16/03/24**	**vie 9/01/26**	**$ 285.623.260**	**$ 285.623.260**	**$ 285.623.260**
2116		1.3.4.8.5.2.1	Excavación	2 d	sáb 16/03/24	lun 18/03/24	$ 1.239.388	$ 1.239.388	$ 1.239.388
2117		1.3.4.8.5.2.2	Pilotes FDP	2 d	sáb 23/03/24	mié 27/03/24	$ 57.846.000	$ 57.846.000	$ 57.846.000
2118		1.3.4.8.5.2.3	CAPA DE TRANSFERENCIA	4 d	lun 18/03/24	jue 21/03/24	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
2119		1.3.4.8.5.2.4	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	4 d	vie 22/03/24	sáb 30/03/24	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
2120		1.3.4.8.5.2.5	**Estructura**	**505 d**	**sáb 30/03/24**	**vie 9/01/26**	**$ 46.200.505**	**$ 46.200.505**	**$ 46.200.505**
2121		1.3.4.8.5.2.6	**Zapatas**	**7 d**	**sáb 30/03/24**	**lun 8/04/24**	**$ 15.702.010**	**$ 15.702.010**	**$ 15.702.010**
2122		1.3.4.8.5.2.6	Solado	2 d	sáb 30/03/24	mar 2/04/24	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
2123		1.3.4.8.5.2.6	Acero	2 d	mar 2/04/24	jue 4/04/24	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
2124		1.3.4.8.5.2.6	Concreto	3 d	jue 4/04/24	lun 8/04/24	$ 7.596.000	$ 7.596.000	$ 7.596.000
2125		1.3.4.8.5.2.6	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**mar 2/04/24**	**jue 11/04/24**	**$ 6.826.825**	**$ 6.826.825**	**$ 6.826.825**

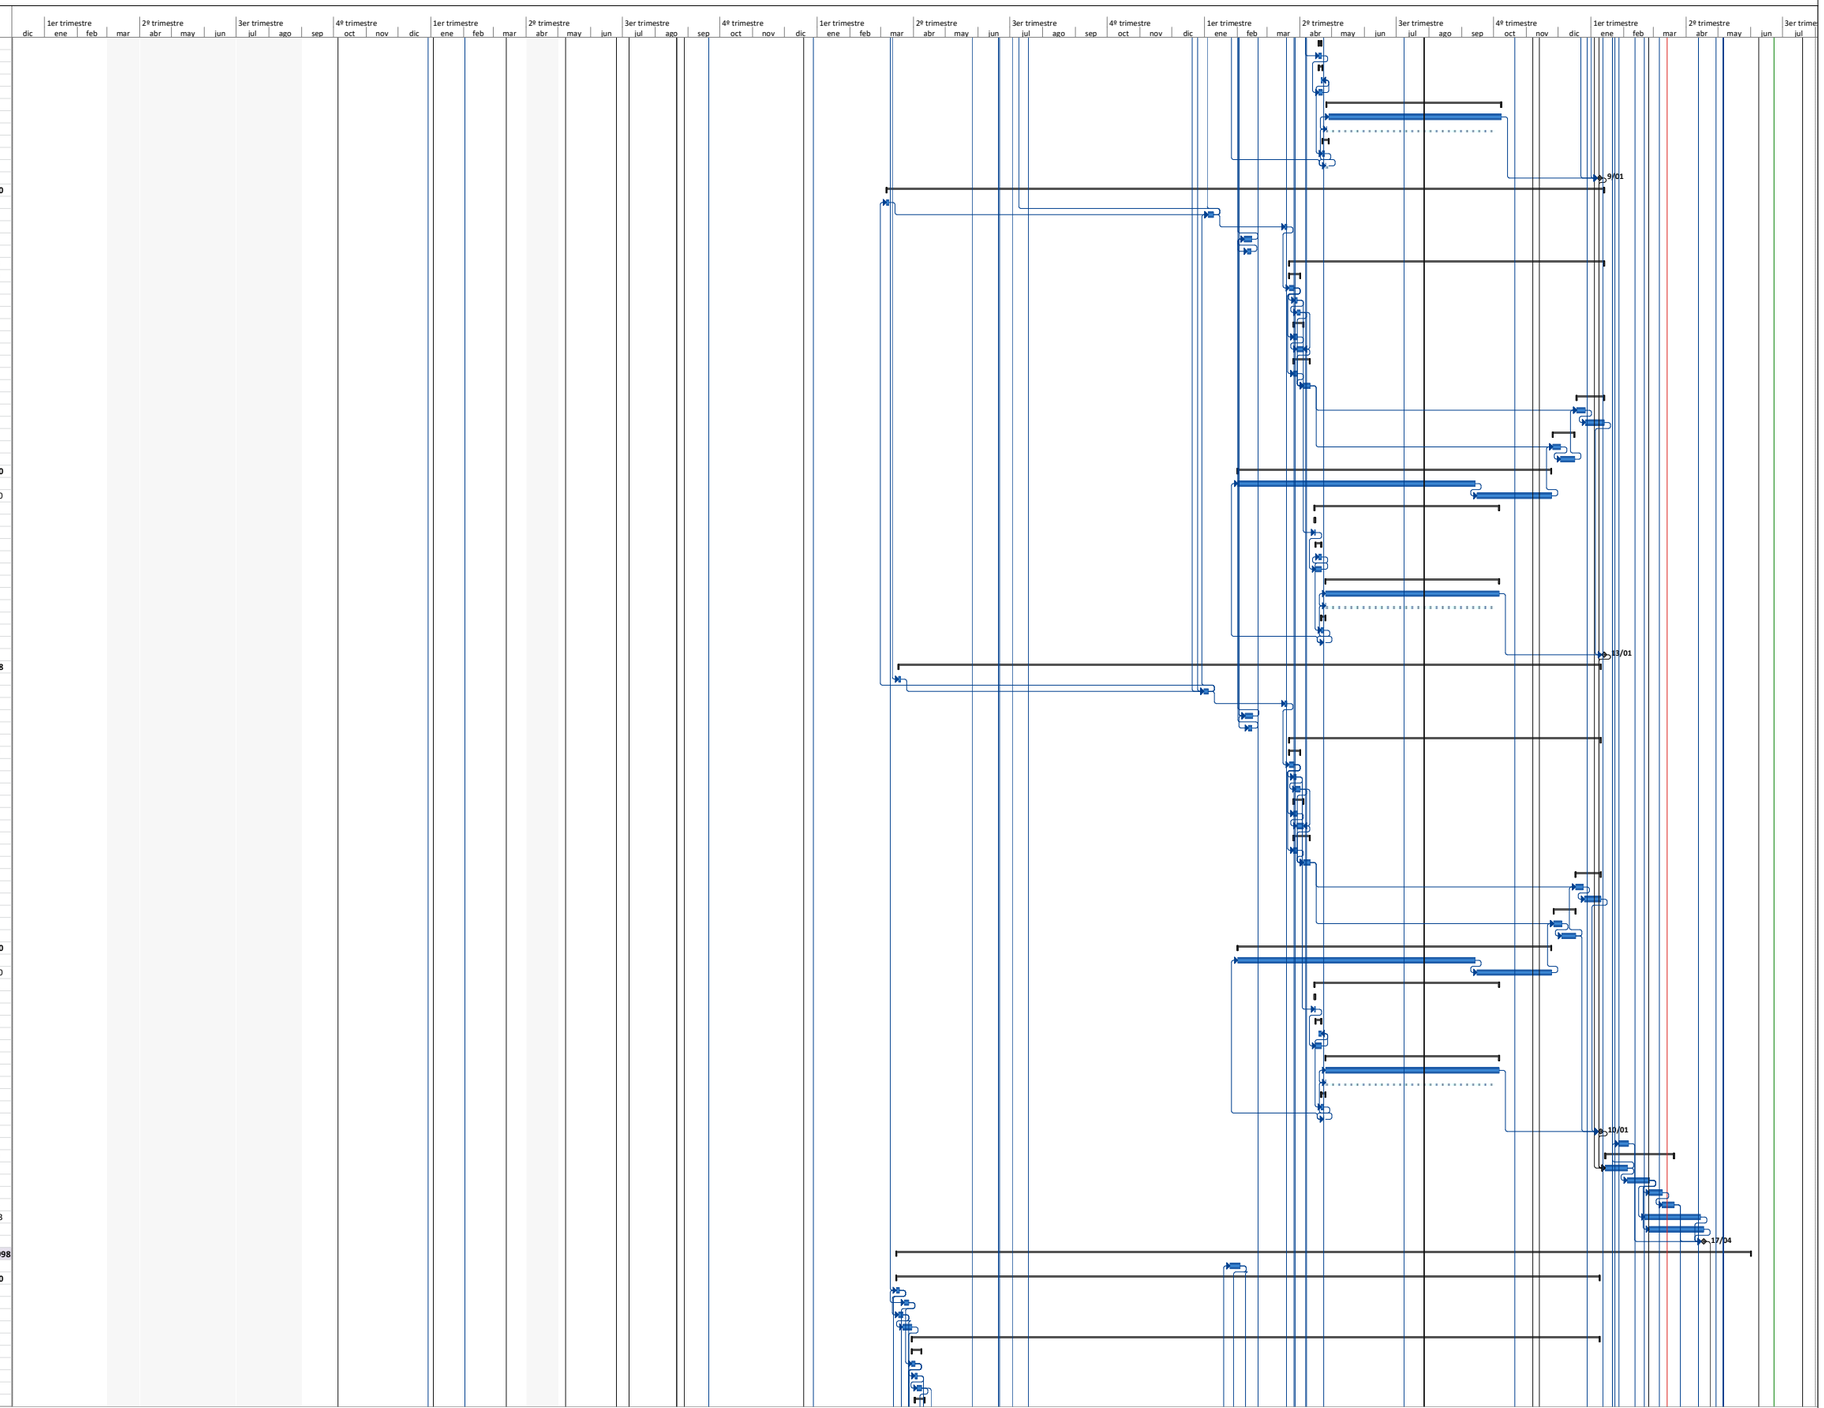

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito externo · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · Sólo el comienzo · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo · Sólo duración · Resumen manual · Sólo fin · Tareas críticas · Progreso


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
2126		1.3.4.8.5.2.5	Acero	3 d	mar 2/04/24	vie 5/04/24	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
2127		1.3.4.8.5.2.5	Concreto	5 d	vie 5/04/24	jue 11/04/24	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2128		**1.3.4.8.5.2.5**	**Columnas**	**14 d**	**mar 2/04/24**	**vie 19/04/24**	**$ 7.894.720**	**$ 7.894.720**	**$ 7.894.720**
2129		1.3.4.8.5.2.5	Acero	3 d	mar 2/04/24	vie 5/04/24	$ 4.096.720	$ 4.096.720	$ 4.096.720
2130		1.3.4.8.5.2.5	Concreto	5 d	sáb 13/04/24	vie 19/04/24	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2131		**1.3.4.8.5.2.6**	**Vigas Longitudinales**	**16 d**	**jue 18/12/25**	**vie 9/01/26**	**$ 7.076.625**	**$ 7.076.625**	**$ 7.076.625**
2132		1.3.4.8.5.2.6	Acero	6 d	jue 18/12/25	vie 26/12/25	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
2133		1.3.4.8.5.2.6	Concreto	10 d	sáb 27/12/25	vie 9/01/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2134		**1.3.4.8.5.2.7**	**Vigas Transversales**	**18 d**	**mié 26/11/25**	**jue 18/12/25**	**$ 8.700.325**	**$ 8.700.325**	**$ 8.700.325**
2135		1.3.4.8.5.2.7	Acero	6 d	mié 26/11/25	mié 3/12/25	$ 4.902.325	$ 4.902.325	$ 4.902.325
2136		1.3.4.8.5.2.7	Concreto	12 d	mié 3/12/25	jue 18/12/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2137		**1.3.4.8.5.2.8**	**Tierra armada**	**167 d**	**jue 24/04/25**	**lun 24/11/25**	**$ 162.457.047**	**$ 162.457.047**	**$ 162.457.047**
2138		1.3.4.8.5.2.8	RELLENOS EN GEOBLOQUE	111 d	jue 24/04/25	sáb 13/09/25	$ 17.156.100	$ 17.156.100	$ 17.156.100
2139		1.3.4.8.5.2.8	RELLENOS EN GEOBLOQUE 2	55 d	lun 15/09/25	lun 24/11/25	$ 145.300.947	$ 145.300.947	$ 145.300.947
2140		**1.3.4.8.5.2.9**	**Fachada en Mamposteria**	**131 d**	**mar 6/05/25**	**lun 20/10/25**	**$ 14.297.404**	**$ 14.297.404**	**$ 14.297.404**
2141		**1.3.4.8.5.2.1**	**Dobelas**	**1 d**	**mar 6/05/25**	**mié 7/05/25**	**$ 1.698.452**	**$ 1.698.452**	**$ 1.698.452**
2142		1.3.4.8.5.2.1	Acero	1 d	mar 6/05/25	mié 7/05/25	$ 1.698.452	$ 1.698.452	$ 1.698.452
2143		**1.3.4.8.5.2.1**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**2 d**	**jue 15/05/25**	**vie 16/05/25**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**
2144		1.3.4.8.5.2.1	Concreto	1 d	vie 16/05/25	vie 16/05/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
2145		1.3.4.8.5.2.1	Bloque en Concreto	2 d	jue 15/05/25	vie 16/05/25	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
2146		**1.3.4.8.5.2.1**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**119 d**	**mié 21/05/25**	**lun 20/10/25**	**$ 789.125**	**$ 789.125**	**$ 789.125**
2147		1.3.4.8.5.2.1	Concreto	118 d	jue 22/05/25	lun 20/10/25	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
2148		1.3.4.8.5.2.1	Bloque en Concreto	115 d	mié 21/05/25	mié 15/10/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
2149		**1.3.4.8.5.2.1**	**Viga de Amarre**	**4 d**	**vie 16/05/25**	**mié 21/05/25**	**$ 726.675**	**$ 726.675**	**$ 726.675**
2150		1.3.4.8.5.2.1	Acero	2 d	vie 16/05/25	lun 19/05/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
2151		1.3.4.8.5.2.1	Concreto	2 d	lun 19/05/25	mié 21/05/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
2152		1.3.4.8.5.3	Fin de Eje 1-2	0 d	vie 9/01/26	vie 9/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
2153		**1.3.4.8.5.4**	**EJE 2-3**	**515,25 d**	**mar 19/03/24**	**mié 14/01/26**	**$ 285.660.918**	**$ 285.660.918**	**$ 285.660.918**
2154		1.3.4.8.5.4.1	Excavación	2 d	mar 19/03/24	mié 20/03/24	$ 1.239.388	$ 1.239.388	$ 1.239.388
2155		1.3.4.8.5.4.2	Pilotes FDP	2 d	mar 26/03/24	sáb 30/03/24	$ 57.846.000	$ 57.846.000	$ 57.846.000
2156		1.3.4.8.5.4.3	CAPA DE TRANSFERENCIA	4 d	mar 2/04/24	sáb 6/04/24	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
2157		1.3.4.8.5.4.4	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	4 d	mar 2/04/24	sáb 6/04/24	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
2158		**1.3.4.8.5.4.5**	**Estructura**	**506 d**	**mar 2/04/24**	**mié 14/01/26**	**$ 46.200.505**	**$ 46.200.505**	**$ 46.200.505**
2159		**1.3.4.8.5.4.5**	**Zapatas**	**7 d**	**mar 2/04/24**	**mié 10/04/24**	**$ 15.702.010**	**$ 15.702.010**	**$ 15.702.010**
2160		1.3.4.8.5.4.5	Solado	2 d	mar 2/04/24	jue 4/04/24	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
2161		1.3.4.8.5.4.5	Acero	2 d	jue 4/04/24	sáb 6/04/24	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
2162		1.3.4.8.5.4.5	Concreto	3 d	lun 8/04/24	mié 10/04/24	$ 7.596.000	$ 7.596.000	$ 7.596.000
2163		**1.3.4.8.5.4.5**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**jue 4/04/24**	**lun 15/04/24**	**$ 6.826.825**	**$ 6.826.825**	**$ 6.826.825**
2164		1.3.4.8.5.4.5	Acero	3 d	jue 4/04/24	lun 8/04/24	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
2165		1.3.4.8.5.4.5	Concreto	5 d	mar 9/04/24	lun 15/04/24	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2166		**1.3.4.8.5.4.5**	**Columnas**	**15 d**	**jue 4/04/24**	**mar 23/04/24**	**$ 7.894.720**	**$ 7.894.720**	**$ 7.894.720**
2167		1.3.4.8.5.4.5	Acero	3 d	jue 4/04/24	lun 8/04/24	$ 4.096.720	$ 4.096.720	$ 4.096.720
2168		1.3.4.8.5.4.5	Concreto	7 d	lun 15/04/24	mar 23/04/24	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2169		**1.3.4.8.5.4.6**	**Vigas Longitudinales**	**17 d**	**lun 22/12/25**	**mié 14/01/26**	**$ 7.076.625**	**$ 7.076.625**	**$ 7.076.625**
2170		1.3.4.8.5.4.6	Acero	5 d	lun 22/12/25	lun 29/12/25	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
2171		1.3.4.8.5.4.6	Concreto	12 d	lun 29/12/25	mié 14/01/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2172		**1.3.4.8.5.4.7**	**Vigas Transversales**	**20 d**	**mié 26/11/25**	**sáb 20/12/25**	**$ 8.700.325**	**$ 8.700.325**	**$ 8.700.325**
2173		1.3.4.8.5.4.7	Acero	10 d	mié 26/11/25	mar 9/12/25	$ 4.902.325	$ 4.902.325	$ 4.902.325
2174		1.3.4.8.5.4.7	Concreto	10 d	mar 9/12/25	sáb 20/12/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2175		**1.3.4.8.5.4.8**	**Tierra armada**	**167 d**	**jue 24/04/25**	**lun 24/11/25**	**$ 162.457.047**	**$ 162.457.047**	**$ 162.457.047**
2176		1.3.4.8.5.4.8	RELLENOS EN GEOBLOQUE	111 d	jue 24/04/25	sáb 13/09/25	$ 19.795.500	$ 19.795.500	$ 19.795.500
2177		1.3.4.8.5.4.8	RELLENOS EN GEOBLOQUE 2	55 d	lun 15/09/25	lun 24/11/25	$ 142.661.547	$ 142.661.547	$ 142.661.547
2178		**1.3.4.8.5.4.9**	**Fachada en Mamposteria**	**140 d**	**mar 7/05/24**	**vie 1/11/24**	**$ 14.335.062**	**$ 14.335.062**	**$ 14.335.062**
2179		**1.3.4.8.5.4.1**	**Dobelas**	**1 d**	**mar 7/05/24**	**mar 7/05/24**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
2180		1.3.4.8.5.4.1	Acero	1 d	mar 7/05/24	mar 7/05/24	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
2181		**1.3.4.8.5.4.1**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**2 d**	**mar 14/05/24**	**jue 16/05/24**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**
2182		1.3.4.8.5.4.1	Concreto	1 d	mié 15/05/24	jue 16/05/24	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
2183		1.3.4.8.5.4.1	Bloque en Concreto	2 d	mar 14/05/24	jue 16/05/24	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
2184		**1.3.4.8.5.4.1**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**128 d**	**mar 21/05/24**	**vie 1/11/24**	**$ 795.370**	**$ 795.370**	**$ 795.370**
2185		1.3.4.8.5.4.1	Concreto	128 d	mié 22/05/24	vie 1/11/24	$ 162.370	$ 162.370	$ 162.370
2186		1.3.4.8.5.4.1	Bloque en Concreto	125 d	mar 21/05/24	lun 28/10/24	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
2187		**1.3.4.8.5.4.1**	**Viga de Amarre**	**4 d**	**jue 16/05/24**	**mar 21/05/24**	**$ 726.675**	**$ 726.675**	**$ 726.675**
2188		1.3.4.8.5.4.1	Acero	2 d	jue 16/05/24	sáb 18/05/24	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
2189		1.3.4.8.5.4.1	Concreto	2 d	sáb 18/05/24	mar 21/05/24	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
2190		1.3.4.8.5.5	Fin de Eje 2-3	0 d	mié 14/01/26	mié 14/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
2191		**1.3.4.8.5.6**	**EJE 3-4**	**509,25 d**	**jue 21/03/24**	**jue 8/01/26**	**$ 285.660.918**	**$ 285.660.918**	**$ 285.660.918**
2192		1.3.4.8.5.6.1	Excavación	2 d	jue 21/03/24	vie 22/03/24	$ 1.239.388	$ 1.239.388	$ 1.239.388
2193		1.3.4.8.5.6.2	Pilotes FDP	2 d	sáb 30/03/24	mar 2/04/24	$ 57.846.000	$ 57.846.000	$ 57.846.000
2194		1.3.4.8.5.6.3	CAPA DE TRANSFERENCIA	4 d	sáb 6/04/24	jue 11/04/24	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
2195		1.3.4.8.5.6.4	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	4 d	sáb 6/04/24	jue 11/04/24	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
2196		**1.3.4.8.5.6.5**	**Estructura**	**500 d**	**jue 4/04/24**	**jue 8/01/26**	**$ 46.200.505**	**$ 46.200.505**	**$ 46.200.505**
2197		**1.3.4.8.5.6.5**	**Zapatas**	**7 d**	**jue 4/04/24**	**vie 12/04/24**	**$ 15.702.010**	**$ 15.702.010**	**$ 15.702.010**
2198		1.3.4.8.5.6.5	Solado	2 d	jue 4/04/24	sáb 6/04/24	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
2199		1.3.4.8.5.6.5	Acero	2 d	lun 8/04/24	mar 9/04/24	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
2200		1.3.4.8.5.6.5	Concreto	3 d	mié 10/04/24	vie 12/04/24	$ 7.596.000	$ 7.596.000	$ 7.596.000
2201		**1.3.4.8.5.6.6**	**Vigas de Cimentación**	**10 d**	**lun 8/04/24**	**vie 19/04/24**	**$ 6.826.825**	**$ 6.826.825**	**$ 6.826.825**
2202		1.3.4.8.5.6.6	Acero	3 d	lun 8/04/24	mié 10/04/24	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
2203		1.3.4.8.5.6.6	Concreto	7 d	jue 11/04/24	vie 19/04/24	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2204		**1.3.4.8.5.6.5**	**Columnas**	**15 d**	**lun 8/04/24**	**jue 25/04/24**	**$ 7.894.720**	**$ 7.894.720**	**$ 7.894.720**
2205		1.3.4.8.5.6.5	Acero	3 d	lun 8/04/24	mié 10/04/24	$ 4.096.720	$ 4.096.720	$ 4.096.720
2206		1.3.4.8.5.6.5	Concreto	5 d	vie 19/04/24	jue 25/04/24	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2207		**1.3.4.8.5.6.6**	**Vigas Longitudinales**	**17 d**	**mar 16/12/25**	**jue 8/01/26**	**$ 7.076.625**	**$ 7.076.625**	**$ 7.076.625**
2208		1.3.4.8.5.6.6	Acero	5 d	mar 16/12/25	lun 22/12/25	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
2209		1.3.4.8.5.6.6	Concreto	12 d	mar 23/12/25	jue 8/01/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2210		**1.3.4.8.5.6.7**	**Vigas Transversales**	**15 d**	**jue 27/11/25**	**mar 16/12/25**	**$ 8.700.325**	**$ 8.700.325**	**$ 8.700.325**
2211		1.3.4.8.5.6.7	Acero	5 d	jue 27/11/25	mié 3/12/25	$ 4.902.325	$ 4.902.325	$ 4.902.325
2212		1.3.4.8.5.6.7	Concreto	10 d	mié 3/12/25	mar 16/12/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2213		**1.3.4.8.5.6.8**	**Tierra armada**	**167 d**	**jue 24/04/25**	**lun 24/11/25**	**$ 162.457.047**	**$ 162.457.047**	**$ 162.457.047**
2214		1.3.4.8.5.6.8	RELLENOS EN GEOBLOQUE	111 d	jue 24/04/25	sáb 13/09/25	$ 21.115.200	$ 21.115.200	$ 21.115.200
2215		1.3.4.8.5.6.8	RELLENOS EN GEOBLOQUE 2	55 d	lun 15/09/25	lun 24/11/25	$ 141.341.847	$ 141.341.847	$ 141.341.847
2216		**1.3.4.8.5.6.9**	**Fachada en Mamposteria**	**136 d**	**mar 6/05/25**	**sáb 25/10/25**	**$ 14.335.062**	**$ 14.335.062**	**$ 14.335.062**
2217		**1.3.4.8.5.6.1**	**Dobelas**	**1 d**	**mar 6/05/25**	**mié 7/05/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
2218		1.3.4.8.5.6.1	Acero	1 d	mar 6/05/25	mié 7/05/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
2219		**1.3.4.8.5.6.1**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**2 d**	**jue 15/05/25**	**vie 16/05/25**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**
2220		1.3.4.8.5.6.1	Concreto	1 d	vie 16/05/25	vie 16/05/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
2221		1.3.4.8.5.6.1	Bloque en Concreto	2 d	jue 15/05/25	vie 16/05/25	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
2222		**1.3.4.8.5.6.1**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**124 d**	**mié 21/05/25**	**sáb 25/10/25**	**$ 795.370**	**$ 795.370**	**$ 795.370**
2223		1.3.4.8.5.6.1	Concreto	113 d	jue 22/05/25	mar 14/10/25	$ 162.370	$ 162.370	$ 162.370
2224		1.3.4.8.5.6.1	Bloque en Concreto	124 d	mié 21/05/25	sáb 25/10/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
2225		**1.3.4.8.5.6.1**	**Viga de Amarre**	**4 d**	**vie 16/05/25**	**mié 21/05/25**	**$ 726.675**	**$ 726.675**	**$ 726.675**
2226		1.3.4.8.5.6.1	Acero	2 d	vie 16/05/25	lun 19/05/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
2227		1.3.4.8.5.6.1	Concreto	2 d	lun 19/05/25	mié 21/05/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
2228		1.3.4.8.5.7	Fin de Eje 3-4	0 d	jue 8/01/26	jue 8/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
2229		**1.3.4.8.5.8**	**EJE 4-5**	**515 d**	**lun 1/04/24**	**vie 23/01/26**	**$ 322.062.559**	**$ 322.062.559**	**$ 322.062.559**
2230		1.3.4.8.5.8.1	Excavación	2 d	mar 25/06/24	jue 27/06/24	$ 1.188.072	$ 1.188.072	$ 1.188.072
2231		1.3.4.8.5.8.2	Pilotes FDP	2 d	lun 1/04/24	mié 3/04/24	$ 94.292.712	$ 94.292.712	$ 94.292.712
2232		1.3.4.8.5.8.3	CAPA DE TRANSFERENCIA	4 d	vie 12/04/24	mié 17/04/24	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
2233		1.3.4.8.5.8.4	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	4 d	vie 12/04/24	mié 17/04/24	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
2234		**1.3.4.8.5.8.5**	**Estructura**	**510 d**	**lun 8/04/24**	**vie 23/01/26**	**$ 46.200.505**	**$ 46.200.505**	**$ 46.200.505**
2235		**1.3.4.8.5.8.5**	**Zapatas**	**7 d**	**lun 8/04/24**	**mar 16/04/24**	**$ 15.702.010**	**$ 15.702.010**	**$ 15.702.010**
2236		1.3.4.8.5.8.5	Solado	2 d	lun 8/04/24	mar 9/04/24	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
2237		1.3.4.8.5.8.5	Acero	2 d	mié 10/04/24	jue 11/04/24	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000

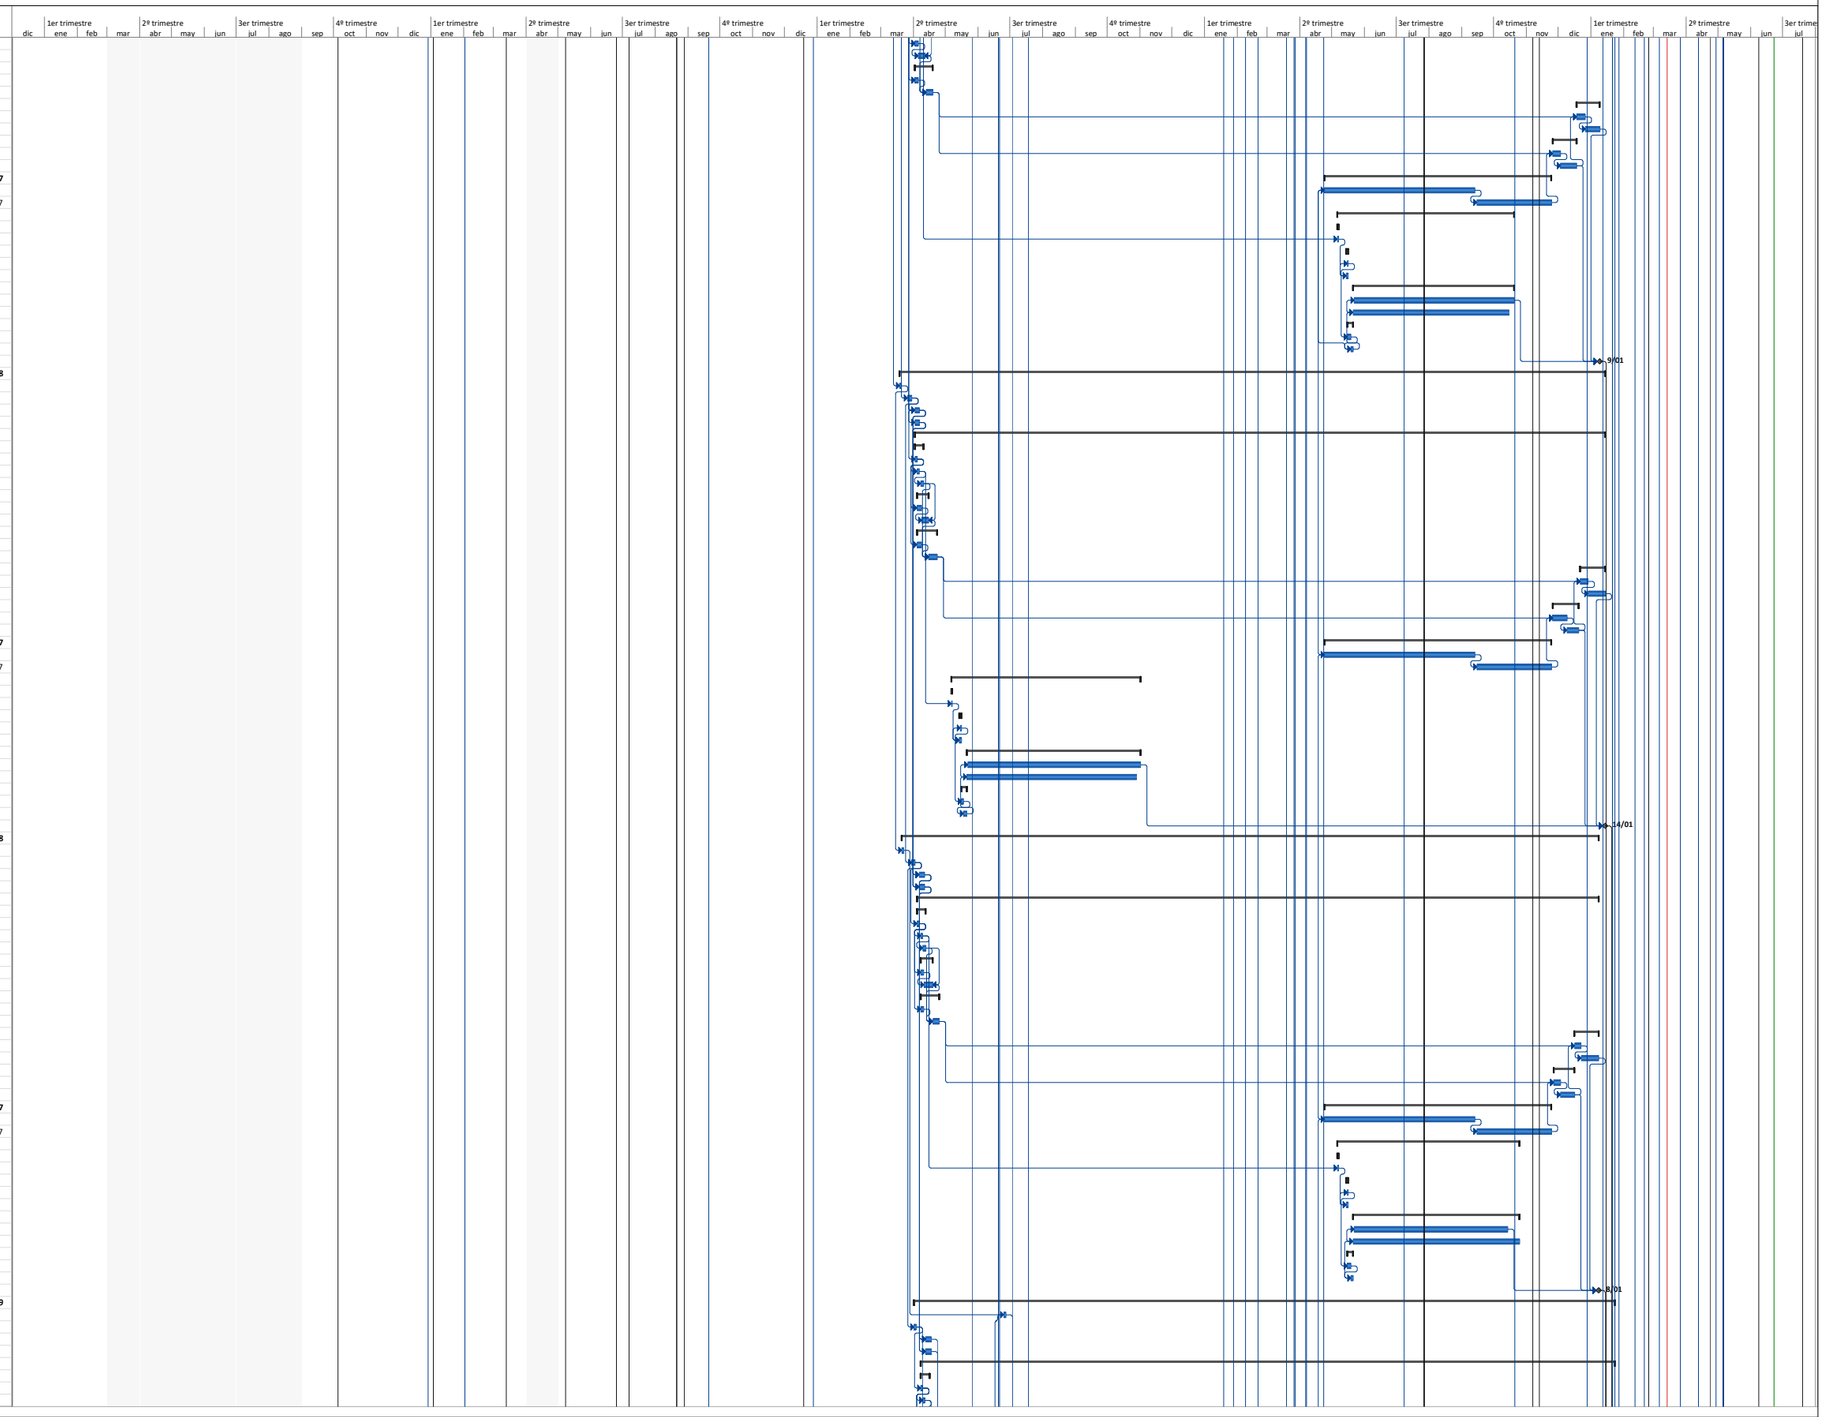

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito externo · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · Sólo el comienzo · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo · Sólo duración · Resumen manual · Sólo fin · Tareas críticas · Progreso


Proyecto: IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB8-20221201
Fecha: mar 23/06/26

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
2238		1.3.4.8.5.8.5	Concreto	3 d	vie 12/04/24	mar 16/04/24	$ 7.596.000	$ 7.596.000	$ 7.596.000
2239		**1.3.4.8.5.8.6**	**Vigas de Cimentación**	**10 d**	**mié 10/04/24**	**lun 22/04/24**	**$ 6.826.825**	**$ 6.826.825**	**$ 6.826.825**
2240		1.3.4.8.5.8.6	Acero	3 d	mié 10/04/24	vie 12/04/24	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
2241		1.3.4.8.5.8.6	Concreto	7 d	sáb 13/04/24	lun 22/04/24	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2242		**1.3.4.8.5.8.7**	**Columnas**	**15 d**	**mié 10/04/24**	**sáb 27/04/24**	**$ 7.894.720**	**$ 7.894.720**	**$ 7.894.720**
2243		1.3.4.8.5.8.7	Acero	3 d	mié 10/04/24	vie 12/04/24	$ 4.096.720	$ 4.096.720	$ 4.096.720
2244		1.3.4.8.5.8.7	Concreto	5 d	lun 22/04/24	sáb 27/04/24	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2245		**1.3.4.8.5.8.8**	**Vigas Longitudinales**	**24 d**	**mar 23/12/25**	**vie 23/01/26**	**$ 7.076.625**	**$ 7.076.625**	**$ 7.076.625**
2246		1.3.4.8.5.8.8	Acero	12 d	mar 23/12/25	jue 8/01/26	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
2247		1.3.4.8.5.8.8	Concreto	12 d	jue 8/01/26	vie 23/01/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2248		**1.3.4.8.5.8.9**	**Vigas Transversales**	**20 d**	**jue 27/11/25**	**lun 22/12/25**	**$ 8.700.325**	**$ 8.700.325**	**$ 8.700.325**
2249		1.3.4.8.5.8.9	Acero	10 d	jue 27/11/25	mié 10/12/25	$ 4.902.325	$ 4.902.325	$ 4.902.325
2250		1.3.4.8.5.8.9	Concreto	10 d	mié 10/12/25	lun 22/12/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2251		**1.3.4.8.5.8.4**	**Tierra armada**	**167 d**	**jue 24/04/25**	**lun 24/11/25**	**$ 162.457.047**	**$ 162.457.047**	**$ 162.457.047**
2252		1.3.4.8.5.8.4	RELLENOS EN GEOBLOQUE	111 d	jue 24/04/25	sáb 13/09/25	$ 23.094.750	$ 23.094.750	$ 23.094.750
2253		1.3.4.8.5.8.4	RELLENOS EN GEOBLOQUE 2	55 d	lun 15/09/25	lun 24/11/25	$ 139.362.297	$ 139.362.297	$ 139.362.297
2254		**1.3.4.8.5.8.3**	**Fachada en Mamposteria**	**126 d**	**mar 6/05/25**	**mar 14/10/25**	**$ 14.341.307**	**$ 14.341.307**	**$ 14.341.307**
2255		**1.3.4.8.5.8.1**	**Dobelas**	**1 d**	**mar 6/05/25**	**mié 7/05/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
2256		1.3.4.8.5.8.1	Acero	1 d	mar 6/05/25	mié 7/05/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
2257		**1.3.4.8.5.8.2**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**2 d**	**jue 15/05/25**	**vie 16/05/25**	**$ 11.089.397**	**$ 11.089.397**	**$ 11.089.397**
2258		1.3.4.8.5.8.2	Concreto	1 d	vie 16/05/25	vie 16/05/25	$ 2.544.490	$ 2.544.490	$ 2.544.490
2259		1.3.4.8.5.8.2	Bloque en Concreto	2 d	jue 15/05/25	vie 16/05/25	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
2260		**1.3.4.8.5.8.3**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**114 d**	**mié 21/05/25**	**mar 14/10/25**	**$ 795.370**	**$ 795.370**	**$ 795.370**
2261		1.3.4.8.5.8.3	Concreto	113 d	jue 22/05/25	mar 14/10/25	$ 162.370	$ 162.370	$ 162.370
2262		1.3.4.8.5.8.3	Bloque en Concreto	3 d	mié 21/05/25	sáb 24/05/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
2263		**1.3.4.8.5.8.4**	**Viga de Amarre**	**4 d**	**vie 16/05/25**	**mié 21/05/25**	**$ 726.675**	**$ 726.675**	**$ 726.675**
2264		1.3.4.8.5.8.4	Acero	2 d	vie 16/05/25	lun 19/05/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
2265		1.3.4.8.5.8.4	Concreto	2 d	lun 19/05/25	mié 21/05/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
2266		1.3.4.8.5.9	Fin de Eje 4-5	0 d	vie 23/01/26	vie 23/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
2267		**1.3.4.8.5.10**	**EJE 5-6**	**440,25 d**	**mar 25/06/24**	**mar 13/01/26**	**$ 285.609.602**	**$ 285.609.602**	**$ 285.609.602**
2268		1.3.4.8.5.10	Excavacion -1	0 d	mar 25/06/24	mar 25/06/24	$ 950.457	$ 950.457	$ 950.457
2269		1.3.4.8.5.10	Excavación	2 d	sáb 1/02/25	mar 4/02/25	$ 237.615	$ 237.615	$ 237.615
2270		1.3.4.8.5.10	Pilotes FDP	2 d	jue 3/04/25	sáb 5/04/25	$ 57.846.000	$ 57.846.000	$ 57.846.000
2271		1.3.4.8.5.10	CAPA DE TRANSFERENCIA	4 d	mar 15/04/25	mar 22/04/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
2272		1.3.4.8.5.10	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	4 d	mar 15/04/25	mar 22/04/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
2273		**1.3.4.8.5.10**	**Estructura**	**214 d**	**mié 9/04/25**	**mar 13/01/26**	**$ 46.200.505**	**$ 46.200.505**	**$ 46.200.505**
2274		**1.3.4.8.5.10**	**Zapatas**	**8 d**	**mié 9/04/25**	**mar 22/04/25**	**$ 15.702.010**	**$ 15.702.010**	**$ 15.702.010**
2275		1.3.4.8.5.10	Solado	2 d	mié 9/04/25	vie 11/04/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
2276		1.3.4.8.5.10	Acero	2 d	lun 14/04/25	mar 15/04/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
2277		1.3.4.8.5.10	Concreto	3 d	mié 16/04/25	mar 22/04/25	$ 7.596.000	$ 7.596.000	$ 7.596.000
2278		**1.3.4.8.5.10**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**lun 14/04/25**	**vie 25/04/25**	**$ 6.826.825**	**$ 6.826.825**	**$ 6.826.825**
2279		1.3.4.8.5.10	Acero	3 d	lun 14/04/25	mié 16/04/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
2280		1.3.4.8.5.10	Concreto	5 d	sáb 19/04/25	vie 25/04/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2281		**1.3.4.8.5.10**	**Columnas**	**12 d**	**lun 14/04/25**	**mié 30/04/25**	**$ 7.894.720**	**$ 7.894.720**	**$ 7.894.720**
2282		1.3.4.8.5.10	Acero	3 d	lun 14/04/25	mié 16/04/25	$ 4.096.720	$ 4.096.720	$ 4.096.720
2283		1.3.4.8.5.10	Concreto	4 d	vie 25/04/25	mié 30/04/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2284		**1.3.4.8.5.10**	**Vigas Longitudinales**	**18 d**	**jue 18/12/25**	**mar 13/01/26**	**$ 7.076.625**	**$ 7.076.625**	**$ 7.076.625**
2285		1.3.4.8.5.10	Acero	6 d	jue 18/12/25	vie 26/12/25	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
2286		1.3.4.8.5.10	Concreto	12 d	sáb 27/12/25	mar 13/01/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2287		**1.3.4.8.5.10**	**Vigas Transversales**	**16 d**	**vie 28/11/25**	**jue 18/12/25**	**$ 8.700.325**	**$ 8.700.325**	**$ 8.700.325**
2288		1.3.4.8.5.10	Acero	6 d	vie 28/11/25	vie 5/12/25	$ 4.902.325	$ 4.902.325	$ 4.902.325
2289		1.3.4.8.5.10	Concreto	10 d	vie 5/12/25	jue 18/12/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2290		**1.3.4.8.5.10**	**Tierra armada**	**169 d**	**jue 24/04/25**	**mié 26/11/25**	**$ 162.457.047**	**$ 162.457.047**	**$ 162.457.047**
2291		1.3.4.8.5.10	RELLENOS EN GEOBLOQUE	111 d	jue 24/04/25	sáb 13/09/25	$ 18.475.800	$ 18.475.800	$ 18.475.800
2292		1.3.4.8.5.10	RELLENOS EN GEOBLOQUE 2	57 d	lun 15/09/25	mié 26/11/25	$ 143.981.247	$ 143.981.247	$ 143.981.247
2293		**1.3.4.8.5.10**	**Fachada en Mamposteria**	**123 d**	**mar 6/05/25**	**jue 9/10/25**	**$ 14.335.062**	**$ 14.335.062**	**$ 14.335.062**
2294		**1.3.4.8.5.10**	**Dobelas**	**1 d**	**mar 6/05/25**	**mié 7/05/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
2295		1.3.4.8.5.10	Acero	1 d	mar 6/05/25	mié 7/05/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
2296		**1.3.4.8.5.10**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**116 d**	**jue 15/05/25**	**jue 9/10/25**	**$ 11.089.397**	**$ 11.089.397**	**$ 11.089.397**
2297		1.3.4.8.5.10	Concreto	115 d	vie 16/05/25	jue 9/10/25	$ 2.544.490	$ 2.544.490	$ 2.544.490
2298		1.3.4.8.5.10	Bloque en Concreto	2 d	jue 15/05/25	vie 16/05/25	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
2299		**1.3.4.8.5.10**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**3 d**	**mié 21/05/25**	**sáb 24/05/25**	**$ 789.125**	**$ 789.125**	**$ 789.125**
2300		1.3.4.8.5.10	Concreto	2 d	jue 22/05/25	sáb 24/05/25	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
2301		1.3.4.8.5.10	Bloque en Concreto	3 d	mié 21/05/25	sáb 24/05/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
2302		**1.3.4.8.5.10**	**Viga de Amarre**	**4 d**	**vie 16/05/25**	**mié 21/05/25**	**$ 726.675**	**$ 726.675**	**$ 726.675**
2303		1.3.4.8.5.10	Acero	2 d	vie 16/05/25	lun 19/05/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
2304		1.3.4.8.5.10	Concreto	2 d	lun 19/05/25	mié 21/05/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
2305		1.3.4.8.5.11	Fin de Eje 5-6	0 d	mar 13/01/26	mar 13/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
2306		**1.3.4.8.5.12**	**EJE 6-7**	**447,25 d**	**mar 25/06/24**	**mié 21/01/26**	**$ 319.636.602**	**$ 319.636.602**	**$ 319.636.602**
2307		1.3.4.8.5.12	Excavación -1	2 d	mar 25/06/24	jue 27/06/24	$ 950.457	$ 950.457	$ 950.457
2308		1.3.4.8.5.12	Excavación	2 d	lun 3/02/25	mié 5/02/25	$ 237.615	$ 237.615	$ 237.615
2309		1.3.4.8.5.12	Pilotes FDP	2 d	sáb 5/04/25	mar 8/04/25	$ 57.691.000	$ 57.691.000	$ 57.691.000
2310		1.3.4.8.5.12	CAPA DE TRANSFERENCIA	4 d	mar 22/04/25	sáb 26/04/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
2311		1.3.4.8.5.12	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	4 d	mar 22/04/25	sáb 26/04/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
2312		**1.3.4.8.5.12**	**Estructura**	**218 d**	**lun 14/04/25**	**mié 21/01/26**	**$ 80.382.505**	**$ 80.382.505**	**$ 80.382.505**
2313		**1.3.4.8.5.12**	**Zapatas**	**7 d**	**lun 14/04/25**	**jue 24/04/25**	**$ 15.702.010**	**$ 15.702.010**	**$ 15.702.010**
2314		1.3.4.8.5.12	Solado	2 d	lun 14/04/25	mar 15/04/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
2315		1.3.4.8.5.12	Acero	2 d	mié 16/04/25	lun 21/04/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
2316		1.3.4.8.5.12	Concreto	3 d	lun 21/04/25	jue 24/04/25	$ 7.596.000	$ 7.596.000	$ 7.596.000
2317		**1.3.4.8.5.12**	**Vigas de Cimentación**	**7 d**	**mié 16/04/25**	**sáb 26/04/25**	**$ 6.826.825**	**$ 6.826.825**	**$ 6.826.825**
2318		1.3.4.8.5.12	Acero	3 d	mié 16/04/25	mar 22/04/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
2319		1.3.4.8.5.12	Concreto	5 d	lun 21/04/25	sáb 26/04/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2320		**1.3.4.8.5.12**	**Columnas**	**12 d**	**mié 16/04/25**	**sáb 3/05/25**	**$ 7.894.720**	**$ 7.894.720**	**$ 7.894.720**
2321		1.3.4.8.5.12	Acero	3 d	mié 16/04/25	mar 22/04/25	$ 4.096.720	$ 4.096.720	$ 4.096.720
2322		1.3.4.8.5.12	Concreto	5 d	sáb 26/04/25	sáb 3/05/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2323		**1.3.4.8.5.12**	**Vigas Longitudinales**	**17 d**	**mar 30/12/25**	**mié 21/01/26**	**$ 41.258.625**	**$ 41.258.625**	**$ 41.258.625**
2324		1.3.4.8.5.12	Acero	5 d	mar 30/12/25	mar 6/01/26	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
2325		1.3.4.8.5.12	Concreto	12 d	mar 6/01/26	mié 21/01/26	$ 37.980.000	$ 37.980.000	$ 37.980.000
2326		**1.3.4.8.5.12**	**Vigas Transversales**	**15 d**	**mié 10/12/25**	**mar 30/12/25**	**$ 8.700.325**	**$ 8.700.325**	**$ 8.700.325**
2327		1.3.4.8.5.12	Acero	5 d	mié 10/12/25	mar 16/12/25	$ 4.902.325	$ 4.902.325	$ 4.902.325
2328		1.3.4.8.5.12	Concreto	10 d	mar 16/12/25	mar 30/12/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2329		**1.3.4.8.5.12**	**Tierra armada**	**177 d**	**jue 24/04/25**	**sáb 6/12/25**	**$ 162.457.047**	**$ 162.457.047**	**$ 162.457.047**
2330		1.3.4.8.5.12	RELLENOS EN GEOBLOQUE	111 d	jue 24/04/25	sáb 13/09/25	$ 4.618.950	$ 4.618.950	$ 4.618.950
2331		1.3.4.8.5.12	RELLENOS EN GEOBLOQUE 2	65 d	lun 15/09/25	sáb 6/12/25	$ 157.838.097	$ 157.838.097	$ 157.838.097
2332		**1.3.4.8.5.12**	**Fachada en Mamposteria**	**126 d**	**mar 6/05/25**	**mar 14/10/25**	**$ 14.335.062**	**$ 14.335.062**	**$ 14.335.062**
2333		**1.3.4.8.5.12**	**Dobelas**	**1 d**	**mar 6/05/25**	**mié 7/05/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
2334		1.3.4.8.5.12	Acero	1 d	mar 6/05/25	mié 7/05/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
2335		**1.3.4.8.5.12**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**2 d**	**jue 15/05/25**	**vie 16/05/25**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**
2336		1.3.4.8.5.12	Concreto	1 d	vie 16/05/25	vie 16/05/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
2337		1.3.4.8.5.12	Bloque en Concreto	2 d	jue 15/05/25	vie 16/05/25	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
2338		**1.3.4.8.5.12**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**114 d**	**mié 21/05/25**	**mar 14/10/25**	**$ 795.370**	**$ 795.370**	**$ 795.370**
2339		1.3.4.8.5.12	Concreto	113 d	jue 22/05/25	mar 14/10/25	$ 162.370	$ 162.370	$ 162.370
2340		1.3.4.8.5.12	Bloque en Concreto	3 d	mié 21/05/25	sáb 24/05/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
2341		**1.3.4.8.5.12**	**Viga de Amarre**	**4 d**	**vie 16/05/25**	**mié 21/05/25**	**$ 726.675**	**$ 726.675**	**$ 726.675**
2342		1.3.4.8.5.12	Acero	2 d	vie 16/05/25	lun 19/05/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
2343		1.3.4.8.5.12	Concreto	2 d	lun 19/05/25	mié 21/05/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
2344		1.3.4.8.5.13	Fin de Eje 6-7	0 d	mié 21/01/26	mié 21/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
2345		**1.3.4.8.5.14**	**EJE 7-8**	**317,25 d**	**mié 5/02/25**	**mar 17/03/26**	**$ 285.999.781**	**$ 285.999.781**	**$ 285.999.781**
2346		1.3.4.8.5.14	Excavación	2 d	mié 5/02/25	vie 7/02/25	$ 1.188.072	$ 1.188.072	$ 1.188.072
2347		1.3.4.8.5.14	Pilotes FDP	2 d	mar 8/04/25	jue 10/04/25	$ 57.691.000	$ 57.691.000	$ 57.691.000
2348		1.3.4.8.5.14	CAPA DE TRANSFERENCIA	4 d	lun 28/04/25	vie 2/05/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
2349		1.3.4.8.5.14	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	4 d	lun 28/04/25	vie 2/05/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916

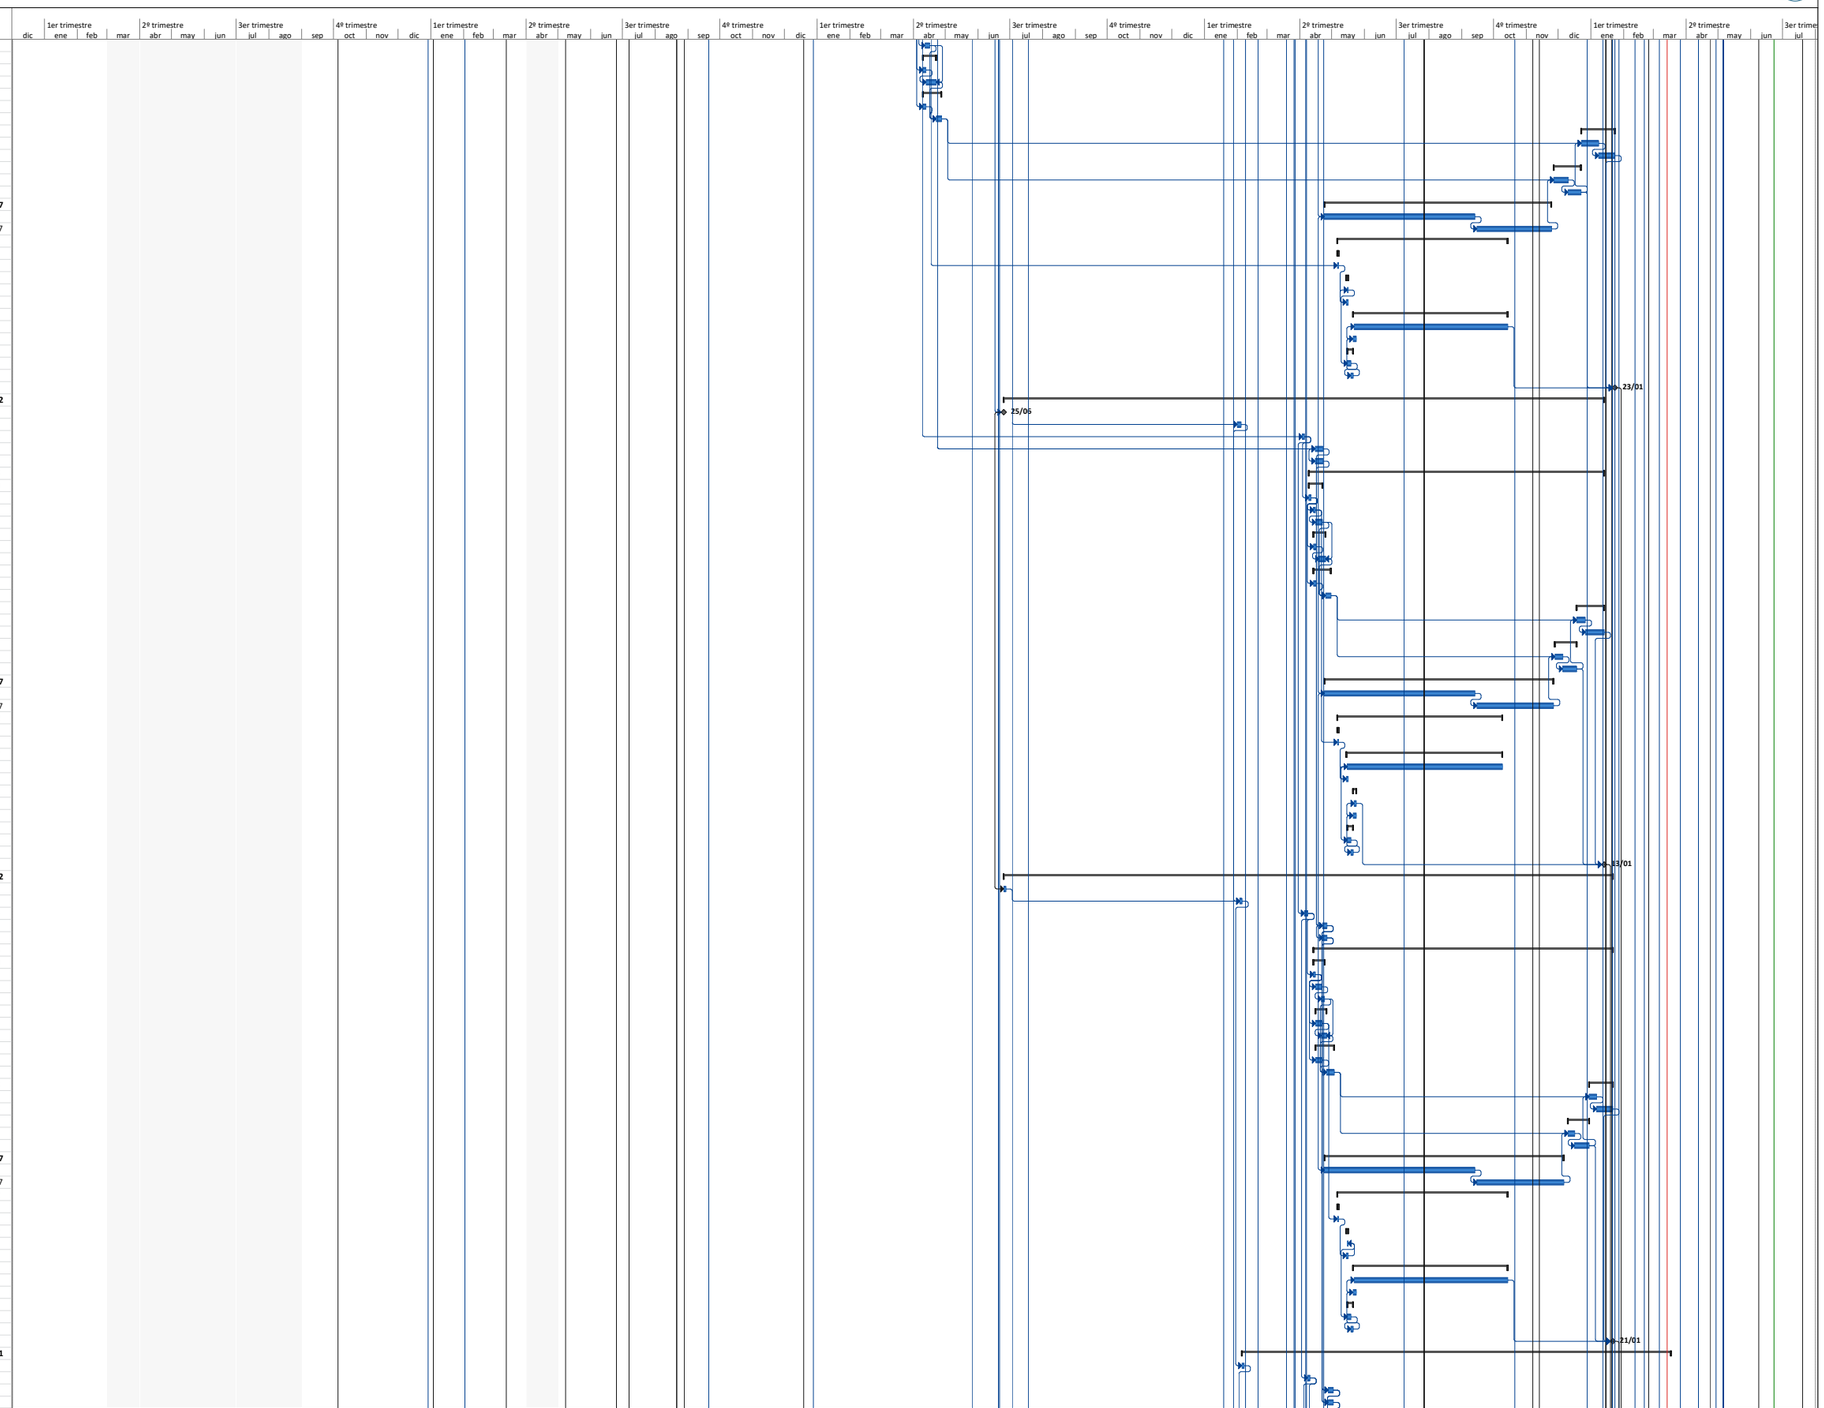


Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | Sólo el comienzo | Fecha límite | División crítica | Progreso manual
División | Resumen | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo | Sólo duración | Resumen manual | Sólo fin | Tareas críticas | Progreso

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
2350		**1.3.4.8.5.14**	**Estructura**	**261 d**	**mié 16/04/25**	**mar 17/03/26**	**$ 46.751.929**	**$ 46.751.929**	**$ 46.751.929**
2351		1.3.4.8.5.14.	**Zapatas**	**157 d**	**mié 16/04/25**	**mié 5/11/25**	**$ 16.254.202**	**$ 16.254.202**	**$ 16.254.202**
2352		1.3.4.8.5.14.	Solado	2 d	mié 16/04/25	lun 21/04/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
2353		1.3.4.8.5.14.	Acero	3 d	sáb 19/04/25	mié 23/04/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
2354		1.3.4.8.5.14.	Concreto	154 d	mar 22/04/25	mié 5/11/25	$ 8.148.192	$ 8.148.192	$ 8.148.192
2355		1.3.4.8.5.14.	**Vigas de Cimentación**	**157 d**	**lun 21/04/25**	**vie 7/11/25**	**$ 6.826.057**	**$ 6.826.057**	**$ 6.826.057**
2356		1.3.4.8.5.14.	Acero	3 d	lun 21/04/25	jue 24/04/25	$ 3.028.057	$ 3.028.057	$ 3.028.057
2357		1.3.4.8.5.14.	Concreto	5 d	vie 31/10/25	vie 7/11/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2358		1.3.4.8.5.14.	**Columnas**	**12 d**	**vie 7/11/25**	**sáb 22/11/25**	**$ 7.894.720**	**$ 7.894.720**	**$ 7.894.720**
2359		1.3.4.8.5.14.	Acero	5 d	vie 7/11/25	jue 13/11/25	$ 4.096.720	$ 4.096.720	$ 4.096.720
2360		1.3.4.8.5.14.	Concreto	7 d	jue 13/11/25	sáb 22/11/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2361		1.3.4.8.5.14.	**Vigas Longitudinales**	**18 d**	**mar 24/02/26**	**mar 17/03/26**	**$ 7.076.625**	**$ 7.076.625**	**$ 7.076.625**
2362		1.3.4.8.5.14.	Acero	6 d	mar 24/02/26	mar 3/03/26	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
2363		1.3.4.8.5.14.	Concreto	12 d	mar 3/03/26	mar 17/03/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2364		1.3.4.8.5.14.	**Vigas Transversales**	**16 d**	**mar 3/02/26**	**lun 23/02/26**	**$ 8.700.325**	**$ 8.700.325**	**$ 8.700.325**
2365		1.3.4.8.5.14.	Acero	6 d	mar 3/02/26	mar 10/02/26	$ 4.902.325	$ 4.902.325	$ 4.902.325
2366		1.3.4.8.5.14.	Concreto	10 d	mar 10/02/26	lun 23/02/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2367		1.3.4.8.5.14.	**Tierra armada**	**45 d**	**mié 3/12/25**	**sáb 31/01/26**	**$ 162.457.047**	**$ 162.457.047**	**$ 162.457.047**
2368		1.3.4.8.5.14.	RELLENOS EN GEOBLOQUE	45 d	mié 3/12/25	sáb 31/01/26	$ 162.457.047	$ 162.457.047	$ 162.457.047
2369		1.3.4.8.5.14.	**Fachada en Mamposteria**	**38 d**	**vie 31/10/25**	**vie 19/12/25**	**$ 14.328.817**	**$ 14.328.817**	**$ 14.328.817**
2370		1.3.4.8.5.14.	**Dobelas**	**2 d**	**vie 31/10/25**	**mar 4/11/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
2371		1.3.4.8.5.14.	Acero	2 d	vie 31/10/25	mar 4/11/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
2372		1.3.4.8.5.14.	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**7 d**	**sáb 8/11/25**	**mar 18/11/25**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**
2373		1.3.4.8.5.14.	Concreto	2 d	vie 14/11/25	mar 18/11/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
2374		1.3.4.8.5.14.	Bloque en Concreto	7 d	sáb 8/11/25	mar 18/11/25	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
2375		1.3.4.8.5.14.	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**12 d**	**jue 4/12/25**	**vie 19/12/25**	**$ 789.125**	**$ 789.125**	**$ 789.125**
2376		1.3.4.8.5.14.	Concreto	3 d	mar 16/12/25	vie 19/12/25	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
2377		1.3.4.8.5.14.	Bloque en Concreto	9 d	jue 4/12/25	mar 16/12/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
2378		1.3.4.8.5.14.	**Viga de Amarre**	**12 d**	**mar 18/11/25**	**mié 3/12/25**	**$ 726.675**	**$ 726.675**	**$ 726.675**
2379		1.3.4.8.5.14.	Acero	5 d	mar 18/11/25	lun 24/11/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
2380		1.3.4.8.5.14.	Concreto	7 d	mar 25/11/25	mié 3/12/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
2381		1.3.4.8.5.15	Fin de Eje 7-8	0 d	mar 17/03/26	mar 17/03/26	$ 0	$ 0	$ 0
2382		**1.3.4.8.5.16**	**EJE 8-9**	**314,25 d**	**sáb 8/02/25**	**mar 17/03/26**	**$ 288.350.766**	**$ 288.350.766**	**$ 288.350.766**
2383		1.3.4.8.5.16.	Excavación	2 d	sáb 8/02/25	mar 11/02/25	$ 1.180.296	$ 1.180.296	$ 1.180.296
2384		1.3.4.8.5.16.	Pilotes FDP	2 d	jue 10/04/25	sáb 12/04/25	$ 57.691.000	$ 57.691.000	$ 57.691.000
2385		1.3.4.8.5.16.	CAPA DE TRANSFERENCIA	4 d	sáb 3/05/25	jue 8/05/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
2386		1.3.4.8.5.16.	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	4 d	sáb 3/05/25	jue 8/05/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
2387		1.3.4.8.5.16.	**Estructura**	**260 d**	**sáb 19/04/25**	**mar 17/03/26**	**$ 48.111.995**	**$ 48.111.995**	**$ 48.111.995**
2388		1.3.4.8.5.16.	**Zapatas**	**155 d**	**sáb 19/04/25**	**mar 4/11/25**	**$ 16.335.010**	**$ 16.335.010**	**$ 16.335.010**
2389		1.3.4.8.5.16.	Solado	2 d	sáb 19/04/25	mar 22/04/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
2390		1.3.4.8.5.16.	Acero	3 d	mar 22/04/25	vie 25/04/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
2391		1.3.4.8.5.16.	Concreto	5 d	mar 28/10/25	mar 4/11/25	$ 8.229.000	$ 8.229.000	$ 8.229.000
2392		1.3.4.8.5.16.	**Vigas de Cimentación**	**155 d**	**mar 22/04/25**	**jue 6/11/25**	**$ 7.466.070**	**$ 7.466.070**	**$ 7.466.070**
2393		1.3.4.8.5.16.	Acero	3 d	mar 22/04/25	vie 25/04/25	$ 3.035.070	$ 3.035.070	$ 3.035.070
2394		1.3.4.8.5.16.	Concreto	5 d	jue 30/10/25	jue 6/11/25	$ 4.431.000	$ 4.431.000	$ 4.431.000
2395		1.3.4.8.5.16.	**Columnas**	**15 d**	**mar 4/11/25**	**sáb 22/11/25**	**$ 8.533.965**	**$ 8.533.965**	**$ 8.533.965**
2396		1.3.4.8.5.16.	Acero	5 d	mar 4/11/25	lun 10/11/25	$ 4.102.965	$ 4.102.965	$ 4.102.965
2397		1.3.4.8.5.16.	Concreto	10 d	lun 10/11/25	sáb 22/11/25	$ 4.431.000	$ 4.431.000	$ 4.431.000
2398		1.3.4.8.5.16.	**Vigas Longitudinales**	**19 d**	**lun 23/02/26**	**mar 17/03/26**	**$ 7.076.625**	**$ 7.076.625**	**$ 7.076.625**
2399		1.3.4.8.5.16.	Acero	7 d	lun 23/02/26	mar 3/03/26	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
2400		1.3.4.8.5.16.	Concreto	12 d	mar 3/03/26	mar 17/03/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2401		1.3.4.8.5.16.	**Vigas Transversales**	**14 d**	**mar 3/02/26**	**jue 19/02/26**	**$ 8.700.325**	**$ 8.700.325**	**$ 8.700.325**
2402		1.3.4.8.5.16.	Acero	4 d	mar 3/02/26	sáb 7/02/26	$ 4.902.325	$ 4.902.325	$ 4.902.325
2403		1.3.4.8.5.16.	Concreto	10 d	sáb 7/02/26	jue 19/02/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2404		1.3.4.8.5.16.	**Tierra armada**	**45 d**	**mié 3/12/25**	**sáb 31/01/26**	**$ 163.455.742**	**$ 163.455.742**	**$ 163.455.742**
2405		1.3.4.8.5.16.	RELLENOS EN GEOBLOQUE	45 d	mié 3/12/25	sáb 31/01/26	$ 163.455.742	$ 163.455.742	$ 163.455.742
2406		1.3.4.8.5.16.	**Fachada en Mamposteria**	**31 d**	**vie 31/10/25**	**jue 11/12/25**	**$ 14.328.817**	**$ 14.328.817**	**$ 14.328.817**
2407		1.3.4.8.5.16.	**Dobelas**	**2 d**	**vie 31/10/25**	**mar 4/11/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
2408		1.3.4.8.5.16.	Acero	2 d	vie 31/10/25	mar 4/11/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
2409		1.3.4.8.5.16.	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**8 d**	**mié 5/11/25**	**vie 14/11/25**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**
2410		1.3.4.8.5.16.	Concreto	2 d	mié 12/11/25	vie 14/11/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
2411		1.3.4.8.5.16.	Bloque en Concreto	8 d	mié 5/11/25	vie 14/11/25	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
2412		1.3.4.8.5.16.	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**9 d**	**sáb 29/11/25**	**jue 11/12/25**	**$ 789.125**	**$ 789.125**	**$ 789.125**
2413		1.3.4.8.5.16.	Concreto	3 d	sáb 6/12/25	jue 11/12/25	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
2414		1.3.4.8.5.16.	Bloque en Concreto	9 d	sáb 29/11/25	jue 11/12/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
2415		1.3.4.8.5.16.	**Viga de Amarre**	**11 d**	**vie 14/11/25**	**vie 28/11/25**	**$ 726.675**	**$ 726.675**	**$ 726.675**
2416		1.3.4.8.5.16.	Acero	4 d	vie 14/11/25	jue 20/11/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
2417		1.3.4.8.5.16.	Concreto	7 d	jue 20/11/25	vie 28/11/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
2418		1.3.4.8.5.17	Fin de Eje 8-9	0 d	mar 17/03/26	mar 17/03/26	$ 0	$ 0	$ 0
2419		**1.3.4.8.5.18**	**EJE 9-10**	**322 d**	**mar 11/02/25**	**mar 31/03/26**	**$ 59.144.471**	**$ 59.144.471**	**$ 59.144.471**
2420		1.3.4.8.5.18.	Excavación	1 d	mar 11/02/25	mié 12/02/25	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000
2421		1.3.4.8.5.18.	Mejoramiento de Subrasante	3 d	mié 12/02/25	sáb 15/02/25	$ 180.296	$ 180.296	$ 180.296
2422		1.3.4.8.5.18.	**Estructura**	**318 d**	**sáb 15/02/25**	**mar 31/03/26**	**$ 57.964.175**	**$ 57.964.175**	**$ 57.964.175**
2423		1.3.4.8.5.18.	**Zapatas**	**206 d**	**sáb 15/02/25**	**jue 6/11/25**	**$ 15.702.010**	**$ 15.702.010**	**$ 15.702.010**
2424		1.3.4.8.5.18.	Solado	2 d	sáb 15/02/25	mar 18/02/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
2425		1.3.4.8.5.18.	Acero	2 d	mar 18/02/25	jue 20/02/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
2426		1.3.4.8.5.18.	Concreto	5 d	jue 30/10/25	jue 6/11/25	$ 7.596.000	$ 7.596.000	$ 7.596.000
2427		1.3.4.8.5.18.	**Vigas de Cimentación**	**207 d**	**mar 18/02/25**	**mar 11/11/25**	**$ 7.459.825**	**$ 7.459.825**	**$ 7.459.825**
2428		1.3.4.8.5.18.	Acero	3 d	mar 18/02/25	vie 21/02/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
2429		1.3.4.8.5.18.	Concreto	5 d	mié 5/11/25	mar 11/11/25	$ 4.431.000	$ 4.431.000	$ 4.431.000
2430		1.3.4.8.5.18.	**Columnas**	**14 d**	**jue 6/11/25**	**lun 24/11/25**	**$ 7.894.720**	**$ 7.894.720**	**$ 7.894.720**
2431		1.3.4.8.5.18.	Acero	3 d	jue 6/11/25	lun 10/11/25	$ 4.096.720	$ 4.096.720	$ 4.096.720
2432		1.3.4.8.5.18.	Concreto	10 d	mar 11/11/25	lun 24/11/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2433		1.3.4.8.5.18.	**Vigas Longitudinales**	**14 d**	**jue 11/12/25**	**lun 29/12/25**	**$ 7.076.625**	**$ 7.076.625**	**$ 7.076.625**
2434		1.3.4.8.5.18.	Acero	4 d	jue 11/12/25	mar 16/12/25	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
2435		1.3.4.8.5.18.	Concreto	10 d	mar 16/12/25	lun 29/12/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2436		1.3.4.8.5.18.	**Vigas Transversales**	**13 d**	**lun 24/11/25**	**jue 11/12/25**	**$ 8.700.325**	**$ 8.700.325**	**$ 8.700.325**
2437		1.3.4.8.5.18.	Acero	4 d	lun 24/11/25	vie 28/11/25	$ 4.902.325	$ 4.902.325	$ 4.902.325
2438		1.3.4.8.5.18.	Concreto	9 d	vie 28/11/25	jue 11/12/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2439		1.3.4.8.5.18.	**Placa de Concreto**	**45 d**	**jue 8/01/26**	**jue 5/03/26**	**$ 5.890.075**	**$ 5.890.075**	**$ 5.890.075**
2440		1.3.4.8.5.18.	Acero	25 d	jue 8/01/26	lun 9/02/26	$ 2.092.075	$ 2.092.075	$ 2.092.075
2441		1.3.4.8.5.18.	Concreto	20 d	lun 9/02/26	jue 5/03/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2442		1.3.4.8.5.18.	**Bordillo Peatonal**	**20 d**	**jue 5/03/26**	**mar 31/03/26**	**$ 5.240.595**	**$ 5.240.595**	**$ 5.240.595**
2443		1.3.4.8.5.18.	Acero	10 d	jue 5/03/26	mar 17/03/26	$ 1.442.595	$ 1.442.595	$ 1.442.595
2444		1.3.4.8.5.18.	Concreto	10 d	mar 17/03/26	mar 31/03/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2445		1.3.4.8.5.19	Fin de Eje 1-2	0 d	mar 31/03/26	mar 31/03/26	$ 0	$ 0	$ 0
2446		1.3.4.8.5.20	PLACA DE PROTECCIÓN	8 d	sáb 11/04/26	mar 21/04/26	$ 77.727.338	$ 77.727.338	$ 77.727.338
2447		**1.3.4.8.5.21**	**PAVIMENTO**	**37 d**	**mar 31/03/26**	**mar 19/05/26**	**$ 137.979.091**	**$ 137.979.091**	**$ 137.979.091**
2448		1.3.4.8.5.21.	Subbase	15 d	mar 31/03/26	lun 20/04/26	$ 3.259.200	$ 3.259.200	$ 3.259.200
2449		1.3.4.8.5.21.	Base	15 d	sáb 11/04/26	jue 30/04/26	$ 30.000.000	$ 30.000.000	$ 30.000.000
2450		1.3.4.8.5.21.	Mezcla Asfaltica - GCR	7 d	jue 30/04/26	sáb 9/05/26	$ 79.191.541	$ 79.191.541	$ 79.191.541
2451		1.3.4.8.5.21.	Mezcla Asfaltica - MD12	7 d	sáb 9/05/26	mar 19/05/26	$ 25.528.350	$ 25.528.350	$ 25.528.350
2452		1.3.4.8.5.22	Baranda Vehicular	18 d	mié 29/04/26	vie 22/05/26	$ 209.599.614	$ 209.599.614	$ 209.599.614
2453		1.3.4.8.5.23	Baranda Peatonal	25 d	mié 29/04/26	lun 1/06/26	$ 23.175.071	$ 23.175.071	$ 23.175.071
2454		1.3.4.8.5.24	RELLENO GEOBLOQUE EXTERNO	8 d	lun 4/05/26	mié 13/05/26	$ 194.831.370	$ 194.831.370	$ 194.831.370
2455		1.3.4.8.6	Fin de Oreja Occidental	0 d	lun 1/06/26	lun 1/06/26	$ 0	$ 0	$ 0
2456		1.3.4.8.7	APROBACIÓN PMT DESVÍO OCCIDENTA	0 d	mié 24/09/25	mié 24/09/25	$ 0	$ 0	$ 0
2457		1.3.4.8.8	IMPLEMENTACIÓN PMT DESVÍO OCCIDENTAL	22 d	mié 24/09/25	mié 22/10/25	$ 0	$ 0	$ 0
2458		**1.3.4.8.9**	**FINAL DE OREJA OCCIDENTAL**	**407,75 d**	**lun 23/12/24**	**lun 1/06/26**	**$ 1.879.795.117**	**$ 1.879.795....**	**$ 1.879.795.117**
2459		1.3.4.8.9.1	Demolición	7 d	lun 3/02/25	mar 11/02/25	$ 5.162.981	$ 5.162.981	$ 5.162.981
2460		**1.3.4.8.9.2**	**EJE 1-2**	**297,75 d**	**lun 23/12/24**	**sáb 10/01/26**	**$ 161.545.123**	**$ 161.545.123**	**$ 161.545.123**

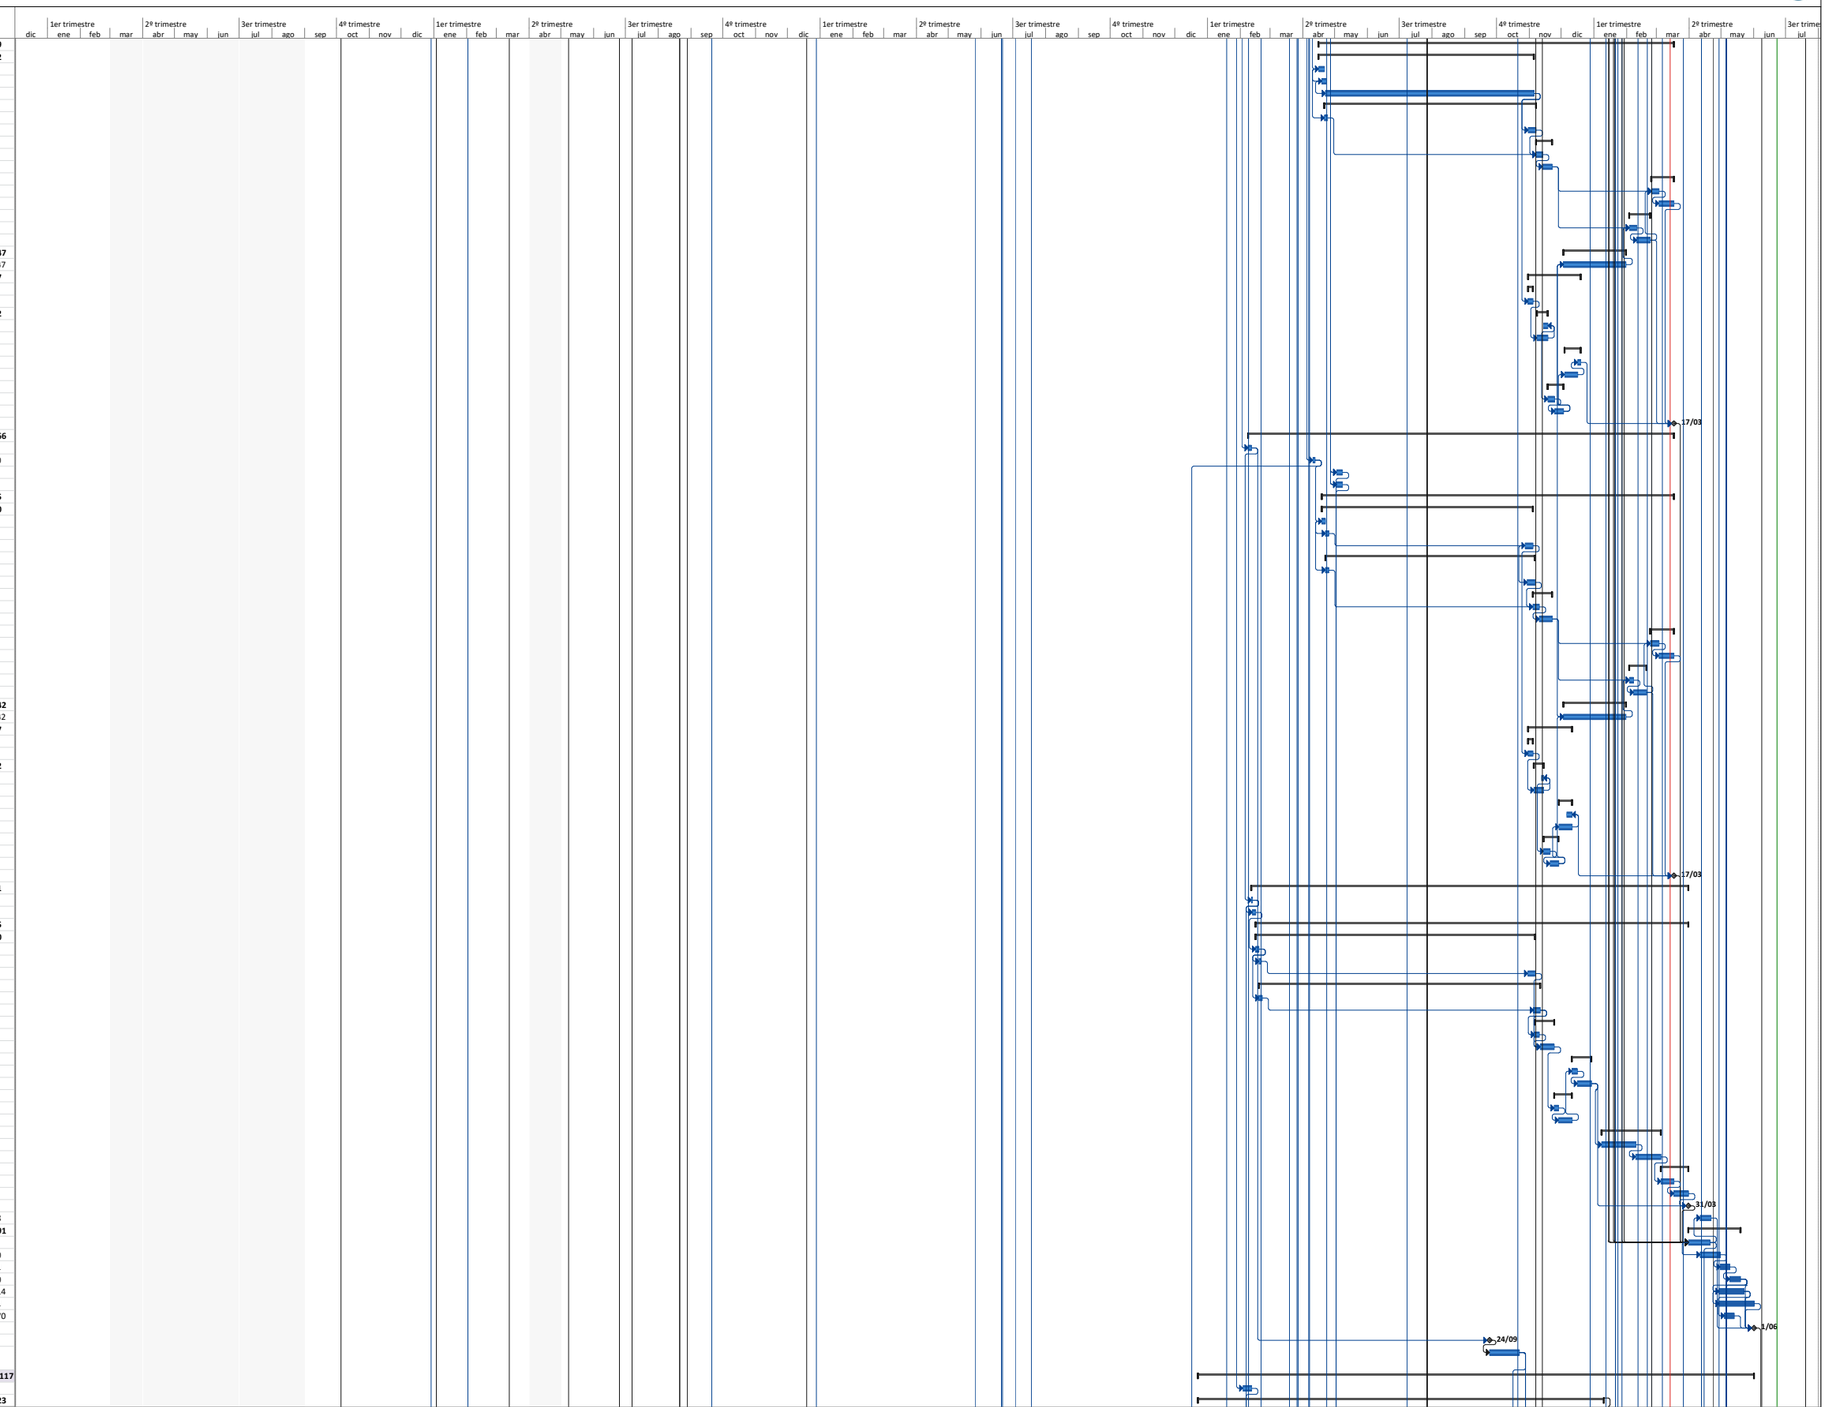


Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | Sólo el comienzo | Fecha límite | División crítica | Progreso manual
División | Resumen | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo | Sólo duración | Resumen manual | Sólo fin | Tareas críticas | Progreso

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
2461		1.3.4.8.9.2.1.3	Excavación	2 d	mié 12/02/25	vie 14/02/25	$ 869.284	$ 869.284	$ 869.284
2462		1.3.4.8.9.2.2	Pilotes FDP	2 d	lun 23/12/24	mar 24/12/24	$ 56.675.000	$ 56.675.000	$ 56.675.000
2463		1.3.4.8.9.2.3	CAPA DE TRANSFERENCIA	4 d	jue 8/05/25	mar 13/05/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
2464		1.3.4.8.9.2.4	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	4 d	jue 8/05/25	mar 13/05/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
2465		**1.3.4.8.9.2.5**	**Estructura**	**61 d**	**mié 22/10/25**	**sáb 10/01/26**	**$ 39.254.642**	**$ 39.254.642**	**$ 39.254.642**
2466		**1.3.4.8.9.2.5**	**Zapatas**	**9 d**	**mié 22/10/25**	**sáb 1/11/25**	**$ 13.820.147**	**$ 13.820.147**	**$ 13.820.147**
2467		1.3.4.8.9.2.5	Solado	2 d	mié 22/10/25	vie 24/10/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
2468		1.3.4.8.9.2.5	Acero	2 d	vie 24/10/25	lun 27/10/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
2469		1.3.4.8.9.2.5	Concreto	5 d	lun 27/10/25	sáb 1/11/25	$ 5.714.137	$ 5.714.137	$ 5.714.137
2470		**1.3.4.8.9.2.5**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**vie 24/10/25**	**mar 4/11/25**	**$ 5.560.825**	**$ 5.560.825**	**$ 5.560.825**
2471		1.3.4.8.9.2.5	Acero	3 d	vie 24/10/25	mar 28/10/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
2472		1.3.4.8.9.2.5	Concreto	5 d	mar 28/10/25	mar 4/11/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
2473		**1.3.4.8.9.2.5**	**Columnas**	**9 d**	**mié 29/10/25**	**mar 11/11/25**	**$ 6.628.720**	**$ 6.628.720**	**$ 6.628.720**
2474		1.3.4.8.9.2.5	Acero	3 d	mié 29/10/25	sáb 1/11/25	$ 4.096.720	$ 4.096.720	$ 4.096.720
2475		1.3.4.8.9.2.5	Concreto	5 d	mié 5/11/25	mar 11/11/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
2476		**1.3.4.8.9.2.5**	**Vigas Longitudinales**	**17 d**	**jue 18/12/25**	**sáb 10/01/26**	**$ 5.810.625**	**$ 5.810.625**	**$ 5.810.625**
2477		1.3.4.8.9.2.5	Acero	5 d	jue 18/12/25	mié 24/12/25	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
2478		1.3.4.8.9.2.5	Concreto	12 d	mié 24/12/25	sáb 10/01/26	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
2479		**1.3.4.8.9.2.5**	**Vigas Transversales**	**15 d**	**vie 28/11/25**	**jue 18/12/25**	**$ 7.434.325**	**$ 7.434.325**	**$ 7.434.325**
2480		1.3.4.8.9.2.5	Acero	5 d	vie 28/11/25	jue 4/12/25	$ 4.902.325	$ 4.902.325	$ 4.902.325
2481		1.3.4.8.9.2.5	Concreto	10 d	vie 5/12/25	jue 18/12/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
2482		**1.3.4.8.9.2.6**	**Tierra armada**	**10 d**	**mar 18/11/25**	**sáb 29/11/25**	**$ 46.834.464**	**$ 46.834.464**	**$ 46.834.464**
2483		1.3.4.8.9.2.6	RELLENOS CON GEOBLOQUE	10 d	mar 18/11/25	sáb 29/11/25	$ 46.834.464	$ 46.834.464	$ 46.834.464
2484		**1.3.4.8.9.2.7**	**Fachada en Mampostería**	**20 d**	**sáb 8/11/25**	**mié 3/12/25**	**$ 14.328.817**	**$ 14.328.817**	**$ 14.328.817**
2485		**1.3.4.8.9.2.7**	**Dobelas**	**2 d**	**sáb 8/11/25**	**mar 11/11/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
2486		1.3.4.8.9.2.7	Acero	2 d	sáb 8/11/25	mar 11/11/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
2487		**1.3.4.8.9.2.7**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**5 d**	**mar 11/11/25**	**mar 18/11/25**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**
2488		1.3.4.8.9.2.7	Concreto	2 d	vie 14/11/25	mar 18/11/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
2489		1.3.4.8.9.2.7	Bloque en Concreto	5 d	mar 11/11/25	mar 18/11/25	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
2490		**1.3.4.8.9.2.7**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**6 d**	**mié 26/11/25**	**mié 3/12/25**	**$ 789.125**	**$ 789.125**	**$ 789.125**
2491		1.3.4.8.9.2.7	Concreto	2 d	mar 2/12/25	mié 3/12/25	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
2492		1.3.4.8.9.2.7	Bloque en Concreto	6 d	mié 26/11/25	mié 3/12/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
2493		**1.3.4.8.9.2.7**	**Viga de Amarre**	**7 d**	**mar 18/11/25**	**mié 26/11/25**	**$ 726.675**	**$ 726.675**	**$ 726.675**
2494		1.3.4.8.9.2.7	Acero	3 d	mar 18/11/25	vie 21/11/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
2495		1.3.4.8.9.2.7	Concreto	4 d	vie 21/11/25	mié 26/11/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
2496		1.3.4.8.9.3	Fin de Eje 1-2	0 d	sáb 10/01/26	sáb 10/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
2497		**1.3.4.8.9.4**	**EJE 2-3**	**298,75 d**	**jue 26/12/24**	**jue 15/01/26**	**$ 161.527.986**	**$ 161.527.986**	**$ 161.527.986**
2498		1.3.4.8.9.4.1	Excavación	2 d	vie 14/02/25	lun 17/02/25	$ 869.284	$ 869.284	$ 869.284
2499		1.3.4.8.9.4.2	Pilotes FDP	2 d	jue 26/12/24	vie 27/12/24	$ 56.675.000	$ 56.675.000	$ 56.675.000
2500		1.3.4.8.9.4.3	CAPA DE TRANSFERENCIA	4 d	mar 13/05/25	sáb 17/05/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
2501		1.3.4.8.9.4.4	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	4 d	mar 13/05/25	sáb 17/05/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
2502		**1.3.4.8.9.4.5**	**Estructura**	**59 d**	**mar 28/10/25**	**jue 15/01/26**	**$ 39.237.505**	**$ 39.237.505**	**$ 39.237.505**
2503		**1.3.4.8.9.4.5**	**Zapatas**	**9 d**	**mar 28/10/25**	**lun 10/11/25**	**$ 13.803.010**	**$ 13.803.010**	**$ 13.803.010**
2504		1.3.4.8.9.4.5	Solado	2 d	mar 28/10/25	jue 30/10/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
2505		1.3.4.8.9.4.5	Acero	2 d	jue 30/10/25	sáb 1/11/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
2506		1.3.4.8.9.4.5	Concreto	5 d	mar 4/11/25	lun 10/11/25	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
2507		**1.3.4.8.9.4.5**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**jue 30/10/25**	**mar 11/11/25**	**$ 5.560.825**	**$ 5.560.825**	**$ 5.560.825**
2508		1.3.4.8.9.4.5	Acero	3 d	jue 30/10/25	mar 4/11/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
2509		1.3.4.8.9.4.5	Concreto	5 d	mié 5/11/25	mar 11/11/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
2510		**1.3.4.8.9.4.5**	**Columnas**	**15 d**	**jue 30/10/25**	**jue 20/11/25**	**$ 6.628.720**	**$ 6.628.720**	**$ 6.628.720**
2511		1.3.4.8.9.4.5	Acero	4 d	jue 30/10/25	mié 5/11/25	$ 4.096.720	$ 4.096.720	$ 4.096.720
2512		1.3.4.8.9.4.5	Concreto	7 d	mar 11/11/25	jue 20/11/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
2513		**1.3.4.8.9.4.5**	**Vigas Longitudinales**	**13 d**	**lun 29/12/25**	**jue 15/01/26**	**$ 5.810.625**	**$ 5.810.625**	**$ 5.810.625**
2514		1.3.4.8.9.4.5	Acero	3 d	lun 29/12/25	mié 31/12/25	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
2515		1.3.4.8.9.4.5	Concreto	10 d	vie 2/01/26	jue 15/01/26	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
2516		**1.3.4.8.9.4.5**	**Vigas Transversales**	**12 d**	**vie 12/12/25**	**sáb 27/12/25**	**$ 7.434.325**	**$ 7.434.325**	**$ 7.434.325**
2517		1.3.4.8.9.4.5	Acero	3 d	vie 12/12/25	mar 16/12/25	$ 4.902.325	$ 4.902.325	$ 4.902.325
2518		1.3.4.8.9.4.5	Concreto	9 d	mar 16/12/25	sáb 27/12/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
2519		**1.3.4.8.9.4.6**	**Tierra armada**	**10 d**	**jue 27/11/25**	**jue 11/12/25**	**$ 46.834.464**	**$ 46.834.464**	**$ 46.834.464**
2520		1.3.4.8.9.4.6	RELLENOS CON GEOBLOQUE	10 d	jue 27/11/25	jue 11/12/25	$ 46.834.464	$ 46.834.464	$ 46.834.464
2521		**1.3.4.8.9.4.7**	**Fachada en Mampostería**	**19 d**	**mié 19/11/25**	**sáb 13/12/25**	**$ 14.328.817**	**$ 14.328.817**	**$ 14.328.817**
2522		**1.3.4.8.9.4.7**	**Dobelas**	**2 d**	**mié 19/11/25**	**vie 21/11/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
2523		1.3.4.8.9.4.7	Acero	2 d	mié 19/11/25	vie 21/11/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
2524		**1.3.4.8.9.4.7**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**5 d**	**vie 21/11/25**	**jue 27/11/25**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**
2525		1.3.4.8.9.4.7	Concreto	2 d	mar 25/11/25	jue 27/11/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
2526		1.3.4.8.9.4.7	Bloque en Concreto	5 d	vie 21/11/25	jue 27/11/25	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
2527		**1.3.4.8.9.4.7**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**6 d**	**vie 5/12/25**	**sáb 13/12/25**	**$ 789.125**	**$ 789.125**	**$ 789.125**
2528		1.3.4.8.9.4.7	Concreto	3 d	mié 10/12/25	sáb 13/12/25	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
2529		1.3.4.8.9.4.7	Bloque en Concreto	6 d	vie 5/12/25	sáb 13/12/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
2530		**1.3.4.8.9.4.7**	**Viga de Amarre**	**6 d**	**jue 27/11/25**	**jue 4/12/25**	**$ 726.675**	**$ 726.675**	**$ 726.675**
2531		1.3.4.8.9.4.7	Acero	2 d	jue 27/11/25	sáb 29/11/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
2532		1.3.4.8.9.4.7	Concreto	4 d	lun 1/12/25	jue 4/12/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
2533		1.3.4.8.9.5	Fin de Eje 2-3	0 d	jue 15/01/26	jue 15/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
2534		**1.3.4.8.9.6**	**EJE 3-4**	**261 d**	**lun 17/02/25**	**mar 20/01/26**	**$ 161.286.986**	**$ 161.286.986**	**$ 161.286.986**
2535		1.3.4.8.9.6.1	Excavación	2 d	lun 17/02/25	mié 19/02/25	$ 869.284	$ 869.284	$ 869.284
2536		1.3.4.8.9.6.2	Pilotes FDP	2 d	lun 21/04/25	mié 23/04/25	$ 56.434.000	$ 56.434.000	$ 56.434.000
2537		1.3.4.8.9.6.3	CAPA DE TRANSFERENCIA	4 d	sáb 17/05/25	jue 22/05/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
2538		1.3.4.8.9.6.4	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	4 d	sáb 17/05/25	jue 22/05/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
2539		**1.3.4.8.9.6.5**	**Estructura**	**61 d**	**jue 30/10/25**	**mar 20/01/26**	**$ 39.237.505**	**$ 39.237.505**	**$ 39.237.505**
2540		**1.3.4.8.9.6.5**	**Zapatas**	**9 d**	**jue 30/10/25**	**mié 12/11/25**	**$ 13.803.010**	**$ 13.803.010**	**$ 13.803.010**
2541		1.3.4.8.9.6.5	Solado	2 d	jue 30/10/25	sáb 1/11/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
2542		1.3.4.8.9.6.5	Acero	2 d	mar 4/11/25	mié 5/11/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
2543		1.3.4.8.9.6.5	Concreto	5 d	jue 6/11/25	mié 12/11/25	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
2544		**1.3.4.8.9.6.5**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**mar 4/11/25**	**jue 13/11/25**	**$ 5.560.825**	**$ 5.560.825**	**$ 5.560.825**
2545		1.3.4.8.9.6.5	Acero	3 d	mar 4/11/25	jue 6/11/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
2546		1.3.4.8.9.6.5	Concreto	5 d	vie 7/11/25	jue 13/11/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
2547		**1.3.4.8.9.6.5**	**Columnas**	**15 d**	**mar 4/11/25**	**sáb 22/11/25**	**$ 6.628.720**	**$ 6.628.720**	**$ 6.628.720**
2548		1.3.4.8.9.6.5	Acero	4 d	mar 4/11/25	vie 7/11/25	$ 4.096.720	$ 4.096.720	$ 4.096.720
2549		1.3.4.8.9.6.5	Concreto	7 d	jue 13/11/25	sáb 22/11/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
2550		**1.3.4.8.9.6.5**	**Vigas Longitudinales**	**13 d**	**sáb 3/01/26**	**mar 20/01/26**	**$ 5.810.625**	**$ 5.810.625**	**$ 5.810.625**
2551		1.3.4.8.9.6.5	Acero	3 d	sáb 3/01/26	mié 7/01/26	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
2552		1.3.4.8.9.6.5	Concreto	10 d	mié 7/01/26	mar 20/01/26	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
2553		**1.3.4.8.9.6.5**	**Vigas Transversales**	**12 d**	**mié 17/12/25**	**vie 2/01/26**	**$ 7.434.325**	**$ 7.434.325**	**$ 7.434.325**
2554		1.3.4.8.9.6.5	Acero	3 d	mié 17/12/25	sáb 20/12/25	$ 4.902.325	$ 4.902.325	$ 4.902.325
2555		1.3.4.8.9.6.5	Concreto	9 d	sáb 20/12/25	vie 2/01/26	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
2556		**1.3.4.8.9.6.6**	**Tierra armada**	**10 d**	**mié 3/12/25**	**mar 16/12/25**	**$ 46.834.464**	**$ 46.834.464**	**$ 46.834.464**
2557		1.3.4.8.9.6.6	RELLENOS CON GEOBLOQUE	10 d	mié 3/12/25	mar 16/12/25	$ 46.834.464	$ 46.834.464	$ 46.834.464
2558		**1.3.4.8.9.6.7**	**Fachada en Mampostería**	**19 d**	**lun 24/11/25**	**jue 18/12/25**	**$ 14.328.817**	**$ 14.328.817**	**$ 14.328.817**
2559		**1.3.4.8.9.6.7**	**Dobelas**	**2 d**	**lun 24/11/25**	**mié 26/11/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
2560		1.3.4.8.9.6.7	Acero	2 d	lun 24/11/25	mié 26/11/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
2561		**1.3.4.8.9.6.7**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**5 d**	**mié 26/11/25**	**mar 2/12/25**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**
2562		1.3.4.8.9.6.7	Concreto	2 d	lun 1/12/25	mar 2/12/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
2563		1.3.4.8.9.6.7	Bloque en Concreto	5 d	mié 26/11/25	mar 2/12/25	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
2564		**1.3.4.8.9.6.7**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**6 d**	**jue 11/12/25**	**jue 18/12/25**	**$ 789.125**	**$ 789.125**	**$ 789.125**
2565		1.3.4.8.9.6.7	Concreto	2 d	mar 16/12/25	jue 18/12/25	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
2566		1.3.4.8.9.6.7	Bloque en Concreto	6 d	jue 11/12/25	jue 18/12/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
2567		**1.3.4.8.9.6.7**	**Viga de Amarre**	**6 d**	**mié 3/12/25**	**jue 11/12/25**	**$ 726.675**	**$ 726.675**	**$ 726.675**
2568		1.3.4.8.9.6.7	Acero	2 d	mié 3/12/25	jue 4/12/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
2569		1.3.4.8.9.6.7	Concreto	4 d	vie 5/12/25	jue 11/12/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
2570		1.3.4.8.9.7	Fin de Eje 3-4	0 d	mar 20/01/26	mar 20/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
2571		**1.3.4.8.9.8**	**EJE 4-5**	**262 d**	**mié 19/02/25**	**vie 23/01/26**	**$ 197.582.382**	**$ 197.582.382**	**$ 197.582.382**
2572		1.3.4.8.9.8.1	Excavación	2 d	mié 19/02/25	vie 21/02/25	$ 817.968	$ 817.968	$ 817.968

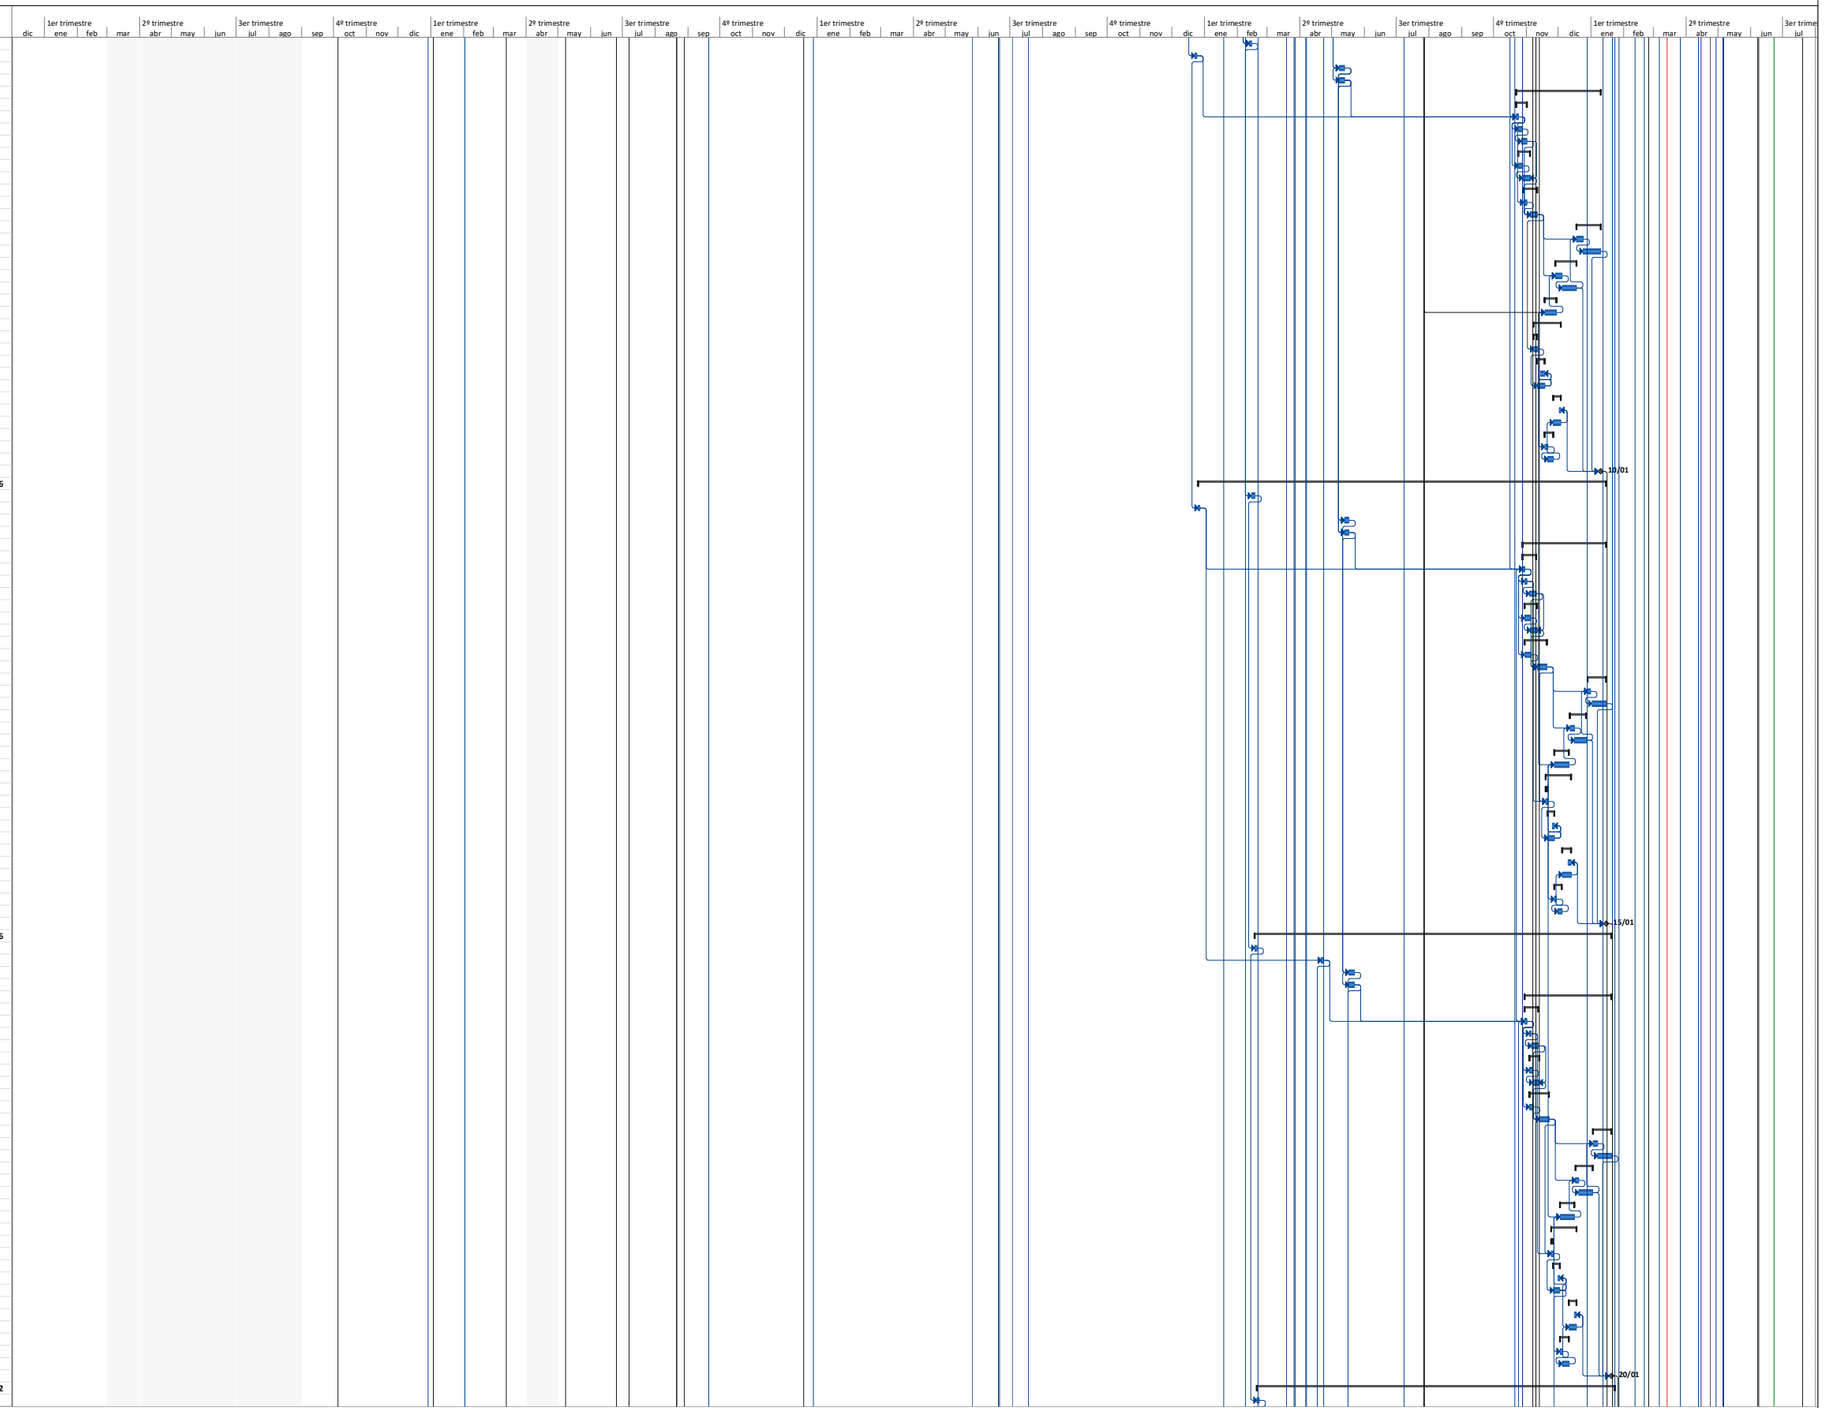

Proyecto: IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB8-20221201
Fecha: mar 23/06/26

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
2573		1.3.4.8.9.8.2	Pilotes FDP	2 d	mié 23/04/25	vie 25/04/25	$ 92.880.712	$ 92.880.712	$ 92.880.712
2574		1.3.4.8.9.8.3	CAPA DE TRANSFERENCIA	4 d	jue 22/05/25	mar 27/05/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
2575		1.3.4.8.9.8.4	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	4 d	jue 22/05/25	mar 27/05/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
2576		**1.3.4.8.9.8.5**	**Estructura**	**60 d**	**jue 6/11/25**	**vie 23/01/26**	**$ 39.137.505**	**$ 39.137.505**	**$ 39.137.505**
2577		**1.3.4.8.9.8.5**	**Zapatas**	**10 d**	**jue 6/11/25**	**mié 19/11/25**	**$ 13.803.010**	**$ 13.803.010**	**$ 13.803.010**
2578		1.3.4.8.9.8.5	Solado	2 d	jue 6/11/25	vie 7/11/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
2579		1.3.4.8.9.8.5	Acero	3 d	sáb 8/11/25	mié 12/11/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
2580		1.3.4.8.9.8.5	Concreto	5 d	mié 12/11/25	mié 19/11/25	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
2581		**1.3.4.8.9.8.5**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**sáb 8/11/25**	**mié 19/11/25**	**$ 5.560.825**	**$ 5.560.825**	**$ 5.560.825**
2582		1.3.4.8.9.8.5	Acero	3 d	sáb 8/11/25	mié 12/11/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
2583		1.3.4.8.9.8.5	Concreto	5 d	mié 12/11/25	mié 19/11/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
2584		**1.3.4.8.9.8.5**	**Columnas**	**15 d**	**sáb 8/11/25**	**jue 27/11/25**	**$ 6.628.720**	**$ 6.628.720**	**$ 6.628.720**
2585		1.3.4.8.9.8.5	Acero	5 d	sáb 8/11/25	vie 14/11/25	$ 4.096.720	$ 4.096.720	$ 4.096.720
2586		1.3.4.8.9.8.5	Concreto	7 d	mié 19/11/25	jue 27/11/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
2587		**1.3.4.8.9.8.6**	**Vigas Longitudinales**	**12 d**	**jue 8/01/26**	**vie 23/01/26**	**$ 5.710.625**	**$ 5.710.625**	**$ 5.710.625**
2588		1.3.4.8.9.8.6	Acero	3 d	jue 8/01/26	mar 13/01/26	$ 3.178.625	$ 3.178.625	$ 3.178.625
2589		1.3.4.8.9.8.6	Concreto	9 d	mar 13/01/26	vie 23/01/26	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
2590		**1.3.4.8.9.8.7**	**Vigas Transversales**	**13 d**	**sáb 20/12/25**	**jue 8/01/26**	**$ 7.434.325**	**$ 7.434.325**	**$ 7.434.325**
2591		1.3.4.8.9.8.7	Acero	3 d	sáb 20/12/25	mié 24/12/25	$ 4.902.325	$ 4.902.325	$ 4.902.325
2592		1.3.4.8.9.8.7	Concreto	10 d	mié 24/12/25	jue 8/01/26	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
2593		**1.3.4.8.9.8.8**	**Tierra armada**	**10 d**	**sáb 6/12/25**	**vie 19/12/25**	**$ 46.834.464**	**$ 46.834.464**	**$ 46.834.464**
2594		1.3.4.8.9.8.8	RELLENOS CON GEOBLOQUE	10 d	sáb 6/12/25	vie 19/12/25	$ 46.834.464	$ 46.834.464	$ 46.834.464
2595		**1.3.4.8.9.8.9**	**Fachada en Mampostería**	**21 d**	**mié 26/11/25**	**mar 23/12/25**	**$ 14.328.817**	**$ 14.328.817**	**$ 14.328.817**
2596		**1.3.4.8.9.8.9**	**Dobelas**	**2 d**	**mié 26/11/25**	**vie 28/11/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
2597		1.3.4.8.9.8.7	Acero	2 d	mié 26/11/25	vie 28/11/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
2598		**1.3.4.8.9.8.7**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**6 d**	**vie 28/11/25**	**vie 5/12/25**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**
2599		1.3.4.8.9.8.7	Concreto	2 d	jue 4/12/25	vie 5/12/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
2600		1.3.4.8.9.8.7	Bloque en Concreto	6 d	vie 28/11/25	vie 5/12/25	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
2601		**1.3.4.8.9.8.7**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**7 d**	**lun 15/12/25**	**mar 23/12/25**	**$ 789.125**	**$ 789.125**	**$ 789.125**
2602		1.3.4.8.9.8.7	Concreto	2 d	sáb 20/12/25	mar 23/12/25	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
2603		1.3.4.8.9.8.7	Bloque en Concreto	7 d	lun 15/12/25	mar 23/12/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
2604		**1.3.4.8.9.8.7**	**Viga de Amarre**	**6 d**	**sáb 6/12/25**	**lun 15/12/25**	**$ 726.675**	**$ 726.675**	**$ 726.675**
2605		1.3.4.8.9.8.7	Acero	2 d	sáb 6/12/25	mié 10/12/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
2606		1.3.4.8.9.8.7	Concreto	4 d	mié 10/12/25	lun 15/12/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
2607		1.3.4.8.9.9	Fin de Eje 4-5	0 d	vie 23/01/26	vie 23/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
2608		**1.3.4.8.9.10**	**EJE 5-6**	**281 d**	**vie 21/02/25**	**mié 18/02/26**	**$ 161.235.670**	**$ 161.235.670**	**$ 161.235.670**
2609		1.3.4.8.9.10	Excavación	2 d	vie 21/02/25	lun 24/02/25	$ 817.968	$ 817.968	$ 817.968
2610		1.3.4.8.9.10	Pilotes FDP	2 d	mié 30/04/25	sáb 3/05/25	$ 56.434.000	$ 56.434.000	$ 56.434.000
2611		1.3.4.8.9.10	CAPA DE TRANSFERENCIA	4 d	mié 28/05/25	mar 3/06/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
2612		1.3.4.8.9.10	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	4 d	mié 28/05/25	mar 3/06/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
2613		**1.3.4.8.9.10**	**Estructura**	**78 d**	**lun 10/11/25**	**mié 18/02/26**	**$ 39.237.505**	**$ 39.237.505**	**$ 39.237.505**
2614		**1.3.4.8.9.10**	**Zapatas**	**14 d**	**lun 10/11/25**	**jue 27/11/25**	**$ 13.803.010**	**$ 13.803.010**	**$ 13.803.010**
2615		1.3.4.8.9.10	Solado	**7 d**	lun 10/11/25	mié 19/11/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
2616		1.3.4.8.9.10	Acero	2 d	mié 19/11/25	vie 21/11/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
2617		1.3.4.8.9.10	Concreto	5 d	vie 21/11/25	jue 27/11/25	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
2618		**1.3.4.8.9.10**	**Vigas de Cimentación**	**13 d**	**mié 19/11/25**	**jue 4/12/25**	**$ 5.560.825**	**$ 5.560.825**	**$ 5.560.825**
2619		1.3.4.8.9.10	Acero	8 d	mié 19/11/25	vie 28/11/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
2620		1.3.4.8.9.10	Concreto	5 d	vie 28/11/25	jue 4/12/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
2621		**1.3.4.8.9.10**	**Columnas**	**23 d**	**mié 19/11/25**	**jue 18/12/25**	**$ 6.628.720**	**$ 6.628.720**	**$ 6.628.720**
2622		1.3.4.8.9.10	Acero	7 d	mié 19/11/25	jue 27/11/25	$ 4.096.720	$ 4.096.720	$ 4.096.720
2623		1.3.4.8.9.10	Concreto	10 d	vie 5/12/25	jue 18/12/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
2624		**1.3.4.8.9.10**	**Vigas Longitudinales**	**15 d**	**sáb 31/01/26**	**mié 18/02/26**	**$ 5.810.625**	**$ 5.810.625**	**$ 5.810.625**
2625		1.3.4.8.9.10	Acero	5 d	sáb 31/01/26	vie 6/02/26	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
2626		1.3.4.8.9.10	Concreto	10 d	vie 6/02/26	mié 18/02/26	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
2627		**1.3.4.8.9.10**	**Vigas Transversales**	**14 d**	**mié 14/01/26**	**vie 30/01/26**	**$ 7.434.325**	**$ 7.434.325**	**$ 7.434.325**
2628		1.3.4.8.9.10	Acero	5 d	mié 14/01/26	mar 20/01/26	$ 4.902.325	$ 4.902.325	$ 4.902.325
2629		1.3.4.8.9.10	Concreto	9 d	mar 20/01/26	vie 30/01/26	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
2630		**1.3.4.8.9.10**	**Tierra armada**	12 d	**vie 26/12/25**	**mar 13/01/26**	$ 46.834.464	**$ 46.834.464**	**$ 46.834.464**
2631		1.3.4.8.9.10	RELLENOS CON GEOBLOQUE	12 d	vie 26/12/25	mar 13/01/26	$ 46.834.464	$ 46.834.464	$ 46.834.464
2632		**1.3.4.8.9.10**	**Fachada en Mampostería**	21 d	**mié 17/12/25**	**jue 15/01/26**	**$ 14.328.817**	**$ 14.328.817**	**$ 14.328.817**
2633		**1.3.4.8.9.10**	**Dobelas**	**2 d**	**mié 17/12/25**	**vie 19/12/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
2634		1.3.4.8.9.10	Acero	2 d	mié 17/12/25	vie 19/12/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
2635		**1.3.4.8.9.10**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	5 d	**vie 19/12/25**	**vie 26/12/25**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**
2636		1.3.4.8.9.10	Concreto	**2 d**	mar 23/12/25	vie 26/12/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
2637		1.3.4.8.9.10	Bloque en Concreto	5 d	vie 19/12/25	vie 26/12/25	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
2638		**1.3.4.8.9.10**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	7 d	**mar 6/01/26**	**jue 15/01/26**	**$ 789.125**	**$ 789.125**	**$ 789.125**
2639		1.3.4.8.9.10	Concreto	**3 d**	sáb 10/01/26	jue 15/01/26	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
2640		1.3.4.8.9.10	Bloque en Concreto	7 d	mar 6/01/26	jue 15/01/26	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
2641		**1.3.4.8.9.10**	**Viga de Amarre**	**7 d**	**vie 26/12/25**	**mar 6/01/26**	**$ 726.675**	**$ 726.675**	**$ 726.675**
2642		1.3.4.8.9.10	Acero	3 d	vie 26/12/25	mar 30/12/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
2643		1.3.4.8.9.10	Concreto	4 d	mié 31/12/25	mar 6/01/26	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
2644		1.3.4.8.9.11	Fin de Eje 5-6	0 d	mié 18/02/26	mié 18/02/26	$ 0	$ 0	$ 0
2645		**1.3.4.8.9.12**	**EJE 6-7**	**287 d**	**mar 25/02/25**	**vie 27/02/26**	**$ 181.548.416**	**$ 181.548.416**	**$ 181.548.416**
2646		1.3.4.8.9.12	Excavación	2 d	mar 25/02/25	mié 26/02/25	$ 817.968	$ 817.968	$ 817.968
2647		1.3.4.8.9.12	Pilotes FDP	2 d	sáb 7/06/25	mar 10/06/25	$ 56.434.000	$ 56.434.000	$ 56.434.000
2648		1.3.4.8.9.12	CAPA DE TRANSFERENCIA	4 d	mar 3/06/25	sáb 7/06/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
2649		1.3.4.8.9.12	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	4 d	mar 3/06/25	sáb 7/06/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
2650		**1.3.4.8.9.12**	**Estructura**	**85 d**	**mar 11/11/25**	**vie 27/02/26**	**$ 59.550.251**	**$ 59.550.251**	**$ 59.550.251**
2651		**1.3.4.8.9.12**	**Zapatas**	**10 d**	**mar 11/11/25**	**lun 24/11/25**	**$ 13.803.010**	**$ 13.803.010**	**$ 13.803.010**
2652		1.3.4.8.9.12	Solado	2 d	mar 11/11/25	jue 13/11/25	$ 6.010	$ 6.010	$ 6.010
2653		1.3.4.8.9.12	Acero	3 d	jue 13/11/25	mar 18/11/25	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 8.100.000
2654		1.3.4.8.9.12	Concreto	5 d	mar 18/11/25	lun 24/11/25	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
2655		**1.3.4.8.9.12**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**jue 13/11/25**	**lun 24/11/25**	**$ 5.560.825**	**$ 5.560.825**	**$ 5.560.825**
2656		1.3.4.8.9.12	Acero	3 d	jue 13/11/25	mar 18/11/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
2657		1.3.4.8.9.12	Concreto	5 d	mar 18/11/25	lun 24/11/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
2658		**1.3.4.8.9.12**	**Columnas**	**18 d**	**jue 13/11/25**	**vie 5/12/25**	**$ 6.628.720**	**$ 6.628.720**	**$ 6.628.720**
2659		1.3.4.8.9.12	Acero	7 d	jue 13/11/25	sáb 22/11/25	$ 4.096.720	$ 4.096.720	$ 4.096.720
2660		1.3.4.8.9.12	Concreto	10 d	lun 24/11/25	vie 5/12/25	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
2661		**1.3.4.8.9.12**	**Vigas Longitudinales**	**17 d**	**vie 30/01/26**	**jue 19/02/26**	**$ 5.810.625**	**$ 5.810.625**	**$ 5.810.625**
2662		1.3.4.8.9.12	Acero	5 d	vie 30/01/26	jue 5/02/26	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
2663		1.3.4.8.9.12	Concreto	12 d	jue 5/02/26	jue 19/02/26	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
2664		**1.3.4.8.9.12**	**Vigas Transversales**	**15 d**	**sáb 10/01/26**	**jue 29/01/26**	**$ 7.434.325**	**$ 7.434.325**	**$ 7.434.325**
2665		1.3.4.8.9.12	Acero	5 d	sáb 10/01/26	sáb 17/01/26	$ 4.902.325	$ 4.902.325	$ 4.902.325
2666		1.3.4.8.9.12	Concreto	10 d	sáb 17/01/26	jue 29/01/26	$ 2.532.000	$ 2.532.000	$ 2.532.000
2667		**1.3.4.8.9.12**	**Losa Aproximación**	**27 d**	**mar 27/01/26**	**vie 27/02/26**	**$ 20.312.746**	**$ 20.312.746**	**$ 20.312.746**
2668		1.3.4.8.9.12	Acero	10 d	mar 27/01/26	sáb 7/02/26	$ 13.744.840	$ 13.744.840	$ 13.744.840
2669		1.3.4.8.9.12	Concreto	20 d	mié 4/02/26	vie 27/02/26	$ 6.567.906	$ 6.567.906	$ 6.567.906
2670		**1.3.4.8.9.12**	**Tierra armada**	**12 d**	**vie 26/12/25**	**mar 13/01/26**	**$ 46.834.464**	**$ 46.834.464**	**$ 46.834.464**
2671		1.3.4.8.9.12	RELLENOS CON GEOBLOQUE	12 d	vie 26/12/25	mar 13/01/26	$ 46.834.464	$ 46.834.464	$ 46.834.464
2672		**1.3.4.8.9.12**	**Fachada en Mampostería**	**21 d**	**vie 5/12/25**	**vie 2/01/26**	**$ 14.328.817**	**$ 14.328.817**	**$ 14.328.817**
2673		**1.3.4.8.9.12**	**Dobelas**	**2 d**	**vie 5/12/25**	**mar 9/12/25**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**	**$ 1.729.865**
2674		1.3.4.8.9.12	Acero	2 d	vie 5/12/25	mar 9/12/25	$ 1.729.865	$ 1.729.865	$ 1.729.865
2675		**1.3.4.8.9.12**	**Muro Ecobloque Etapa 1**	**6 d**	**mar 9/12/25**	**mar 16/12/25**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**	**$ 11.083.152**
2676		1.3.4.8.9.12	Concreto	2 d	sáb 13/12/25	mar 16/12/25	$ 2.538.245	$ 2.538.245	$ 2.538.245
2677		1.3.4.8.9.12	Bloque en Concreto	6 d	mar 9/12/25	mar 16/12/25	$ 8.544.907	$ 8.544.907	$ 8.544.907
2678		**1.3.4.8.9.12**	**Muro Ecobloque Etapa 2**	**7 d**	**mar 23/12/25**	**vie 2/01/26**	**$ 789.125**	**$ 789.125**	**$ 789.125**
2679		1.3.4.8.9.12	Concreto	3 d	mar 30/12/25	vie 2/01/26	$ 156.125	$ 156.125	$ 156.125
2680		1.3.4.8.9.12	Bloque en Concreto	7 d	mar 23/12/25	vie 2/01/26	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
2681		**1.3.4.8.9.12**	**Viga de Amarre**	**6 d**	**mar 16/12/25**	**mar 23/12/25**	**$ 726.675**	**$ 726.675**	**$ 726.675**
2682		1.3.4.8.9.12	Acero	2 d	mar 16/12/25	jue 18/12/25	$ 93.675	$ 93.675	$ 93.675
2683		1.3.4.8.9.12	Concreto	4 d	jue 18/12/25	mar 23/12/25	$ 633.000	$ 633.000	$ 633.000
2684		1.3.4.8.9.13	Fin de Eje 6-7	0 d	vie 27/02/26	vie 27/02/26	$ 0	$ 0	$ 0

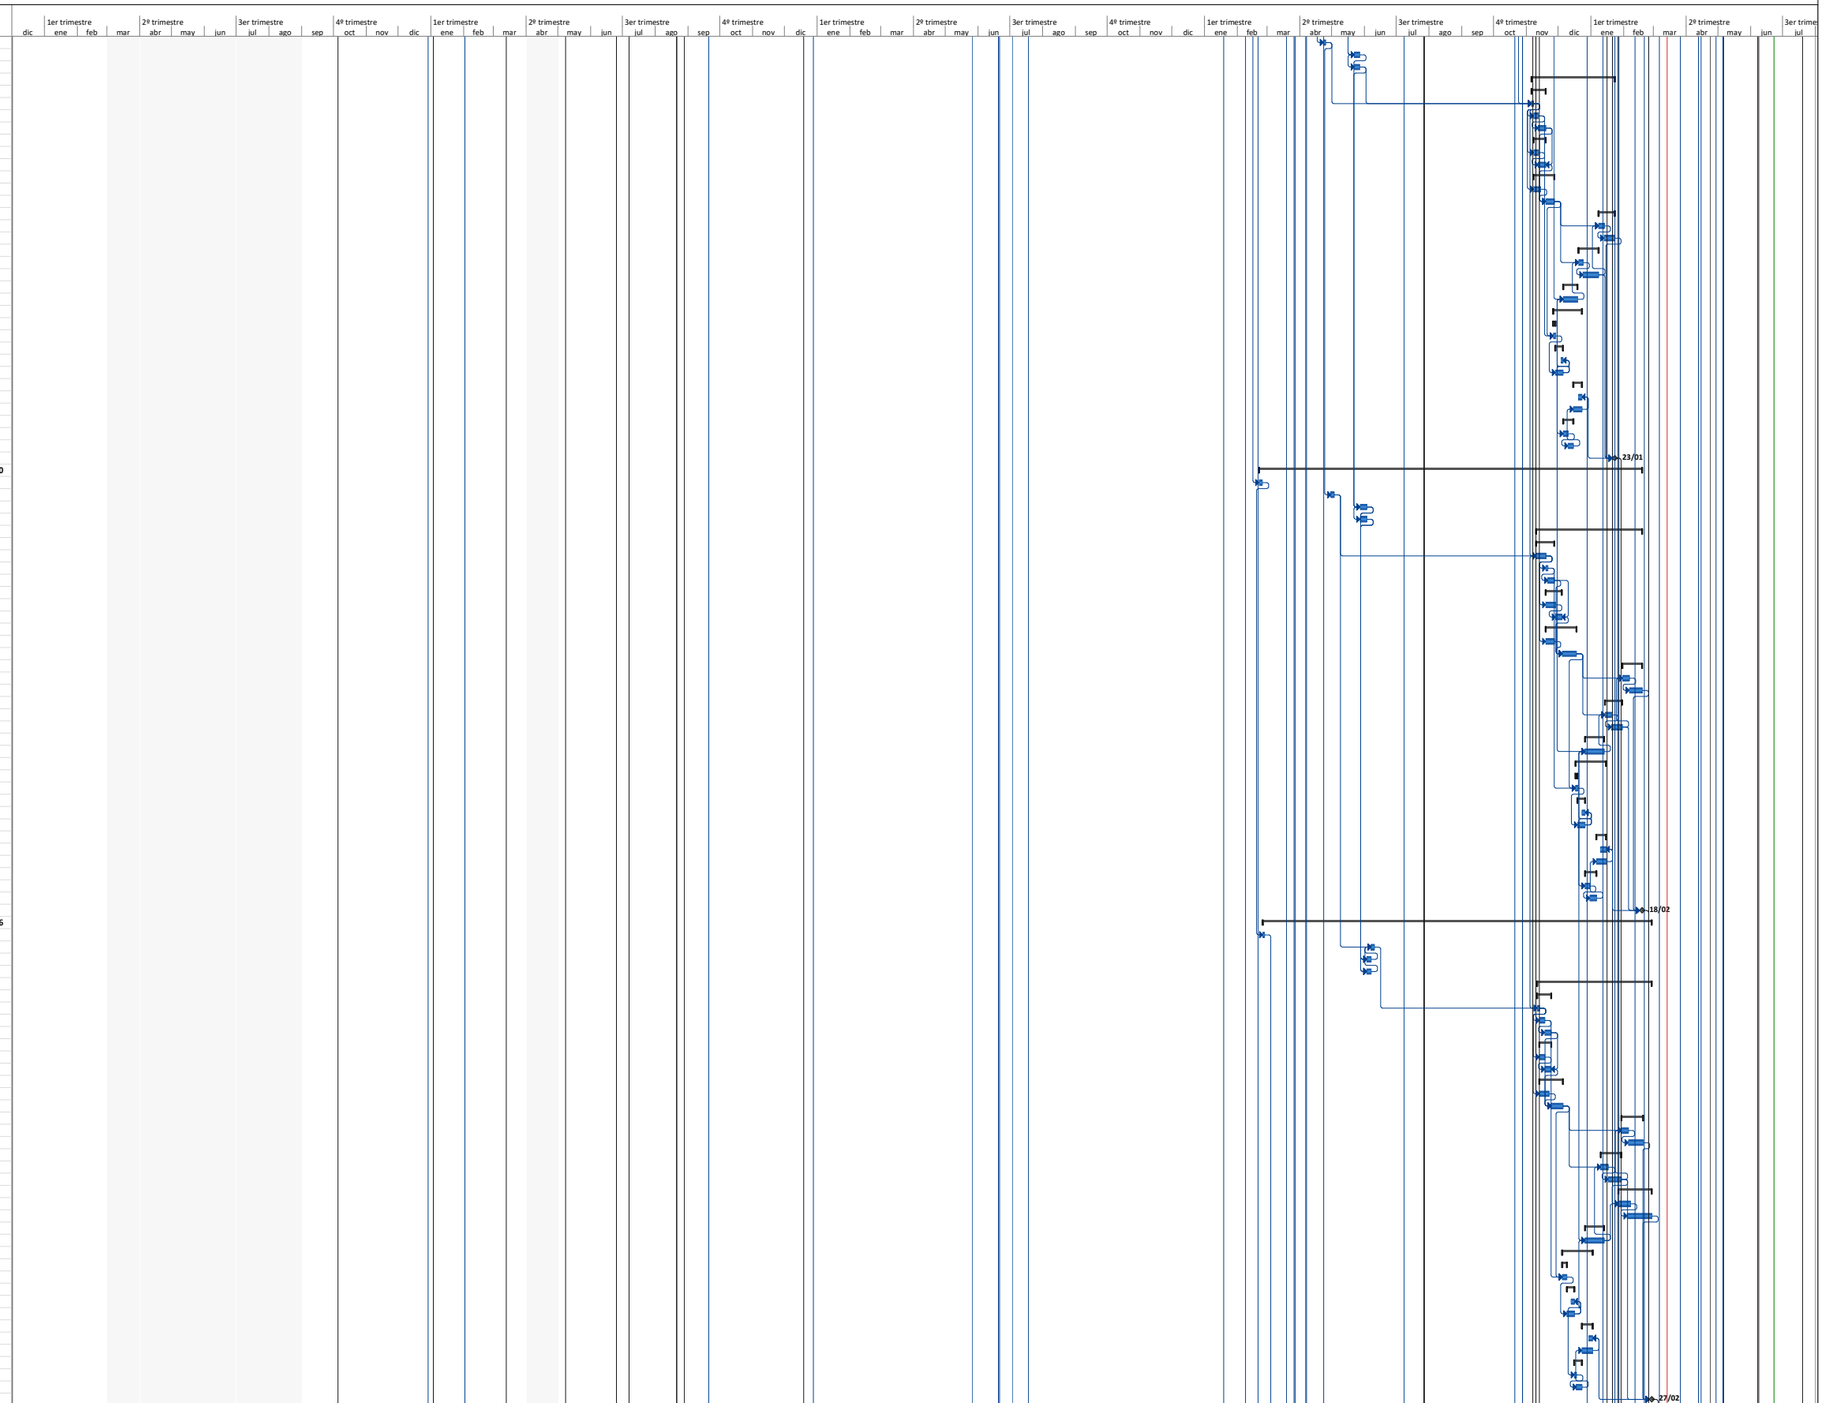
dic
1er trimestre
ene
feb
mar
2º trimestre
abr
may
jun
3er trimestre
jul
ago
sep
4º trimestre
oct
nov


Proyecto: IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB8-20221201
Fecha: mar 23/06/26

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
2685		**1.3.4.8.9.14**	**Eje 1'-2'**	**51 d**	**sáb 15/11/25**	**jue 22/01/26**	**$ 86.351.132**	**$ 86.351.132**	**$ 86.351.132**
2686		1.3.4.8.9.14	Excavación	1 d	sáb 15/11/25	mar 18/11/25	$ 800.000	$ 800.000	$ 800.000
2687		1.3.4.8.9.14	Mejoramiento de Subrasante	5 d	mié 19/11/25	mar 25/11/25	$ 17.968	$ 17.968	$ 17.968
2688		**1.3.4.8.9.14**	**Estructura**	**44 d**	**mar 25/11/25**	**jue 22/01/26**	**$ 38.698.700**	**$ 38.698.700**	**$ 38.698.700**
2689		**1.3.4.8.9.14**	**Zapatas**	**9 d**	**mar 25/11/25**	**vie 5/12/25**	**$ 14.246.405**	**$ 14.246.405**	**$ 14.246.405**
2690		1.3.4.8.9.14	Solado	2 d	mar 25/11/25	jue 27/11/25	$ 9.405	$ 9.405	$ 9.405
2691		1.3.4.8.9.14	Acero	3 d	jue 27/11/25	lun 1/12/25	$ 8.540.000	$ 8.540.000	$ 8.540.000
2692		1.3.4.8.9.14	Concreto	4 d	mar 2/12/25	vie 5/12/25	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
2693		**1.3.4.8.9.14**	**Vigas de Cimentación**	**12 d**	**jue 27/11/25**	**sáb 13/12/25**	**$ 6.826.825**	**$ 6.826.825**	**$ 6.826.825**
2694		1.3.4.8.9.14	Acero	3 d	jue 27/11/25	lun 1/12/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
2695		1.3.4.8.9.14	Concreto	5 d	sáb 6/12/25	sáb 13/12/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2696		**1.3.4.8.9.14**	**Muros Laterales**	**15 d**	**mar 2/12/25**	**sáb 20/12/25**	**$ 10.548.845**	**$ 10.548.845**	**$ 10.548.845**
2697		1.3.4.8.9.14	Acero	3 d	mar 2/12/25	jue 4/12/25	$ 6.750.845	$ 6.750.845	$ 6.750.845
2698		1.3.4.8.9.14	Concreto	10 d	mar 9/12/25	sáb 20/12/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2699		**1.3.4.8.9.14**	**Vigas Longitudinales**	**13 d**	**mar 6/01/26**	**jue 22/01/26**	**$ 7.076.625**	**$ 7.076.625**	**$ 7.076.625**
2700		1.3.4.8.9.14	Acero	3 d	mar 6/01/26	vie 9/01/26	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
2701		1.3.4.8.9.14	Concreto	10 d	vie 9/01/26	jue 22/01/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2702		**1.3.4.8.9.14**	**Tierra Armada**	**6 d**	**mié 24/12/25**	**vie 2/01/26**	**$ 46.834.464**	**$ 46.834.464**	**$ 46.834.464**
2703		1.3.4.8.9.14	RELLENOS CON GEOBLOQUE	6 d	mié 24/12/25	vie 2/01/26	$ 46.834.464	$ 46.834.464	$ 46.834.464
2704		1.3.4.8.9.15	Fin de Eje 1'-2'	0 d	jue 22/01/26	jue 22/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
2705		**1.3.4.8.9.16**	**EJE 2'-3'**	**43 d**	**vie 21/11/25**	**sáb 17/01/26**	**$ 86.351.132**	**$ 86.351.132**	**$ 86.351.132**
2706		1.3.4.8.9.16	Excavación	1 d	vie 21/11/25	sáb 22/11/25	$ 800.000	$ 800.000	$ 800.000
2707		1.3.4.8.9.16	Mejoramiento de Subrasante	3 d	lun 24/11/25	jue 27/11/25	$ 17.968	$ 17.968	$ 17.968
2708		**1.3.4.8.9.16**	**Estructura**	**25 d**	**sáb 6/12/25**	**vie 9/01/26**	**$ 38.698.700**	**$ 38.698.700**	**$ 38.698.700**
2709		**1.3.4.8.9.16**	**Zapatas**	**9 d**	**sáb 6/12/25**	**jue 18/12/25**	**$ 14.246.405**	**$ 14.246.405**	**$ 14.246.405**
2710		1.3.4.8.9.16	Solado	2 d	sáb 6/12/25	mié 10/12/25	$ 9.405	$ 9.405	$ 9.405
2711		1.3.4.8.9.16	Acero	2 d	mié 10/12/25	vie 12/12/25	$ 8.540.000	$ 8.540.000	$ 8.540.000
2712		1.3.4.8.9.16	Concreto	5 d	vie 12/12/25	jue 18/12/25	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
2713		**1.3.4.8.9.16**	**Vigas de Cimentación**	**13 d**	**mié 10/12/25**	**vie 26/12/25**	**$ 6.826.825**	**$ 6.826.825**	**$ 6.826.825**
2714		1.3.4.8.9.16	Acero	3 d	mié 10/12/25	sáb 13/12/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
2715		1.3.4.8.9.16	Concreto	10 d	sáb 13/12/25	vie 26/12/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2716		**1.3.4.8.9.16**	**Muros Laterales**	**21 d**	**vie 12/12/25**	**vie 9/01/26**	**$ 10.548.845**	**$ 10.548.845**	**$ 10.548.845**
2717		1.3.4.8.9.16	Acero	3 d	vie 12/12/25	mar 16/12/25	$ 6.750.845	$ 6.750.845	$ 6.750.845
2718		1.3.4.8.9.16	Concreto	10 d	vie 26/12/25	vie 9/01/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2719		**1.3.4.8.9.16**	**Vigas Longitudinales**	**13 d**	**mar 16/12/25**	**vie 2/01/26**	**$ 7.076.625**	**$ 7.076.625**	**$ 7.076.625**
2720		1.3.4.8.9.16	Acero	3 d	mar 16/12/25	vie 19/12/25	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
2721		1.3.4.8.9.16	Concreto	10 d	vie 19/12/25	vie 2/01/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2722		**1.3.4.8.9.16**	**Tierra Armada**	**10 d**	**lun 5/01/26**	**sáb 17/01/26**	**$ 46.834.464**	**$ 46.834.464**	**$ 46.834.464**
2723		1.3.4.8.9.16	RELLENOS CON GEOBLOQUE	10 d	lun 5/01/26	sáb 17/01/26	$ 46.834.464	$ 46.834.464	$ 46.834.464
2724		1.3.4.8.9.17	Fin de Eje 2'-3'	0 d	sáb 17/01/26	sáb 17/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
2725		**1.3.4.8.9.18**	**EJE 3'-4'**	**48 d**	**mar 25/11/25**	**mar 27/01/26**	**$ 86.351.132**	**$ 86.351.132**	**$ 86.351.132**
2726		1.3.4.8.9.18	Excavación	1 d	mar 25/11/25	mié 26/11/25	$ 800.000	$ 800.000	$ 800.000
2727		1.3.4.8.9.18	Mejoramiento de Subrasante	3 d	jue 27/11/25	lun 1/12/25	$ 17.968	$ 17.968	$ 17.968
2728		**1.3.4.8.9.18**	**Estructura**	**43 d**	**mar 2/12/25**	**mar 27/01/26**	**$ 38.698.700**	**$ 38.698.700**	**$ 38.698.700**
2729		**1.3.4.8.9.18**	**Zapatas**	**9 d**	**mar 2/12/25**	**sáb 13/12/25**	**$ 14.246.405**	**$ 14.246.405**	**$ 14.246.405**
2730		1.3.4.8.9.18	Solado	2 d	mar 2/12/25	mié 3/12/25	$ 9.405	$ 9.405	$ 9.405
2731		1.3.4.8.9.18	Acero	2 d	jue 4/12/25	vie 5/12/25	$ 8.540.000	$ 8.540.000	$ 8.540.000
2732		1.3.4.8.9.18	Concreto	5 d	sáb 6/12/25	sáb 13/12/25	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
2733		**1.3.4.8.9.18**	**Vigas de Cimentación**	**17 d**	**jue 4/12/25**	**vie 26/12/25**	**$ 6.826.825**	**$ 6.826.825**	**$ 6.826.825**
2734		1.3.4.8.9.18	Acero	3 d	jue 4/12/25	mar 9/12/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
2735		1.3.4.8.9.18	Concreto	10 d	sáb 13/12/25	vie 26/12/25	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2736		**1.3.4.8.9.18**	**Muros Laterales**	**25 d**	**sáb 6/12/25**	**vie 9/01/26**	**$ 10.548.845**	**$ 10.548.845**	**$ 10.548.845**
2737		1.3.4.8.9.18	Acero	3 d	sáb 6/12/25	jue 11/12/25	$ 6.750.845	$ 6.750.845	$ 6.750.845
2738		1.3.4.8.9.18	Concreto	10 d	vie 26/12/25	vie 9/01/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2739		**1.3.4.8.9.18**	**Vigas Longitudinales**	**12 d**	**mar 13/01/26**	**mar 27/01/26**	**$ 7.076.625**	**$ 7.076.625**	**$ 7.076.625**
2740		1.3.4.8.9.18	Acero	2 d	mar 13/01/26	jue 15/01/26	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
2741		1.3.4.8.9.18	Concreto	10 d	jue 15/01/26	mar 27/01/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2742		**1.3.4.8.9.18**	**Tierra Armada**	**7 d**	**vie 9/01/26**	**lun 19/01/26**	**$ 46.834.464**	**$ 46.834.464**	**$ 46.834.464**
2743		1.3.4.8.9.18	RELLENOS CON GEOBLOQUE	7 d	vie 9/01/26	lun 19/01/26	$ 46.834.464	$ 46.834.464	$ 46.834.464
2744		1.3.4.8.9.19	Fin de Eje 3'-4'	0 d	mar 27/01/26	mar 27/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
2745		**1.3.4.8.9.20**	**EJE 4'-5'**	**49 d**	**vie 28/11/25**	**lun 2/02/26**	**$ 86.351.132**	**$ 86.351.132**	**$ 86.351.132**
2746		1.3.4.8.9.20	Excavación	1 d	vie 28/11/25	sáb 29/11/25	$ 800.000	$ 800.000	$ 800.000
2747		1.3.4.8.9.20	Mejoramiento de Subrasante	3 d	mar 2/12/25	jue 4/12/25	$ 17.968	$ 17.968	$ 17.968
2748		**1.3.4.8.9.20**	**Estructura**	**29 d**	**mié 24/12/25**	**lun 2/02/26**	**$ 38.698.700**	**$ 38.698.700**	**$ 38.698.700**
2749		**1.3.4.8.9.20**	**Zapatas**	**7 d**	**mié 24/12/25**	**lun 5/01/26**	**$ 14.246.405**	**$ 14.246.405**	**$ 14.246.405**
2750		1.3.4.8.9.20	Solado	2 d	mié 24/12/25	sáb 27/12/25	$ 9.405	$ 9.405	$ 9.405
2751		1.3.4.8.9.20	Acero	2 d	lun 29/12/25	mar 30/12/25	$ 8.540.000	$ 8.540.000	$ 8.540.000
2752		1.3.4.8.9.20	Concreto	3 d	mié 31/12/25	lun 5/01/26	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
2753		**1.3.4.8.9.20**	**Vigas de Cimentación**	**6 d**	**lun 29/12/25**	**mar 6/01/26**	**$ 6.826.825**	**$ 6.826.825**	**$ 6.826.825**
2754		1.3.4.8.9.20	Acero	3 d	lun 29/12/25	mié 31/12/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
2755		1.3.4.8.9.20	Concreto	3 d	vie 2/01/26	mar 6/01/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2756		**1.3.4.8.9.20**	**Muros Laterales**	**14 d**	**mié 31/12/25**	**lun 19/01/26**	**$ 10.548.845**	**$ 10.548.845**	**$ 10.548.845**
2757		1.3.4.8.9.20	Acero	3 d	mié 31/12/25	lun 5/01/26	$ 6.750.845	$ 6.750.845	$ 6.750.845
2758		1.3.4.8.9.20	Concreto	10 d	mar 6/01/26	lun 19/01/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2759		**1.3.4.8.9.20**	**Vigas Longitudinales**	**11 d**	**lun 19/01/26**	**lun 2/02/26**	**$ 7.076.625**	**$ 7.076.625**	**$ 7.076.625**
2760		1.3.4.8.9.20	Acero	3 d	lun 19/01/26	jue 22/01/26	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
2761		1.3.4.8.9.20	Concreto	10 d	mar 20/01/26	lun 2/02/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2762		**1.3.4.8.9.20**	**Tierra Armada**	**10 d**	**mar 13/01/26**	**sáb 24/01/26**	**$ 46.834.464**	**$ 46.834.464**	**$ 46.834.464**
2763		1.3.4.8.9.20	RELLENOS CON GEOBLOQUE	10 d	mar 13/01/26	sáb 24/01/26	$ 46.834.464	$ 46.834.464	$ 46.834.464
2764		1.3.4.8.9.21	Fin de Eje 4'-5'	0 d	lun 2/02/26	lun 2/02/26	$ 0	$ 0	$ 0
2765		**1.3.4.8.9.22**	**EJE 5'-6'**	**48 d**	**mié 3/12/25**	**mié 4/02/26**	**$ 88.541.748**	**$ 88.541.748**	**$ 88.541.748**
2766		1.3.4.8.9.22	Excavación	1 d	mié 3/12/25	mié 3/12/25	$ 800.000	$ 800.000	$ 800.000
2767		1.3.4.8.9.22	Mejoramiento de Subrasante	3 d	vie 5/12/25	mié 10/12/25	$ 17.968	$ 17.968	$ 17.968
2768		**1.3.4.8.9.22**	**Estructura**	**30 d**	**vie 26/12/25**	**mié 4/02/26**	**$ 38.698.700**	**$ 38.698.700**	**$ 38.698.700**
2769		**1.3.4.8.9.22**	**Zapatas**	**9 d**	**vie 26/12/25**	**jue 8/01/26**	**$ 14.246.405**	**$ 14.246.405**	**$ 14.246.405**
2770		1.3.4.8.9.22	Solado	2 d	vie 26/12/25	lun 29/12/25	$ 9.405	$ 9.405	$ 9.405
2771		1.3.4.8.9.22	Acero	2 d	mar 30/12/25	mié 31/12/25	$ 8.540.000	$ 8.540.000	$ 8.540.000
2772		1.3.4.8.9.22	Concreto	5 d	vie 2/01/26	jue 8/01/26	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
2773		**1.3.4.8.9.22**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**mar 30/12/25**	**vie 9/01/26**	**$ 6.826.825**	**$ 6.826.825**	**$ 6.826.825**
2774		1.3.4.8.9.22	Acero	3 d	mar 30/12/25	vie 2/01/26	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
2775		1.3.4.8.9.22	Concreto	5 d	sáb 3/01/26	vie 9/01/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2776		**1.3.4.8.9.22**	**Muros Laterales**	**16 d**	**vie 2/01/26**	**jue 22/01/26**	**$ 10.548.845**	**$ 10.548.845**	**$ 10.548.845**
2777		1.3.4.8.9.22	Acero	3 d	vie 2/01/26	mar 6/01/26	$ 6.750.845	$ 6.750.845	$ 6.750.845
2778		1.3.4.8.9.22	Concreto	10 d	vie 9/01/26	jue 22/01/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2779		**1.3.4.8.9.22**	**Vigas Longitudinales**	**13 d**	**lun 19/01/26**	**mié 4/02/26**	**$ 7.076.625**	**$ 7.076.625**	**$ 7.076.625**
2780		1.3.4.8.9.22	Acero	3 d	lun 19/01/26	jue 22/01/26	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
2781		1.3.4.8.9.22	Concreto	10 d	jue 22/01/26	mié 4/02/26	$ 3.798.000	$ 3.798.000	$ 3.798.000
2782		**1.3.4.8.9.22**	**Tierra Armada**	**5 d**	**jue 22/01/26**	**mié 28/01/26**	**$ 49.025.080**	**$ 49.025.080**	**$ 49.025.080**
2783		1.3.4.8.9.22	RELLENOS CON GEOBLOQUE	5 d	jue 22/01/26	mié 28/01/26	$ 49.025.080	$ 49.025.080	$ 49.025.080
2784		1.3.4.8.9.23	Fin de Eje 5'-6'	0 d	mié 4/02/26	mié 4/02/26	$ 0	$ 0	$ 0
2785		1.3.4.8.9.24	PLACA DE PROTECCIÓN	4 d	mar 28/04/26	lun 4/05/26	$ 71.880.481	$ 71.880.481	$ 71.880.481
2786		**1.3.4.8.9.25**	**PAVIMENTO**	**22 d**	**mar 21/04/26**	**mar 19/05/26**	**$ 110.226.887**	**$ 110.226.887**	**$ 110.226.887**
2787		1.3.4.8.9.25	Subbase	15 d	mar 21/04/26	sáb 9/05/26	$ 1.815.360	$ 1.815.360	$ 1.815.360
2788		1.3.4.8.9.25	Base	15 d	mié 29/04/26	mar 19/05/26	$ 30.000.000	$ 30.000.000	$ 30.000.000
2789		1.3.4.8.9.25	Mezcla Asfaltica - GCR	5 d	mié 29/04/26	mié 6/05/26	$ 58.986.577	$ 58.986.577	$ 58.986.577
2790		1.3.4.8.9.25	Mezcla Asfaltica - MD12	5 d	mié 29/04/26	mié 6/05/26	$ 19.424.950	$ 19.424.950	$ 19.424.950
2791		1.3.4.8.9.26	Baranda Vehicular	30 d	jue 23/04/26	lun 1/06/26	$ 177.112.106	$ 177.112.106	$ 177.112.106
2792		1.3.4.8.9.27	baranda Peatonal	29 d	vie 24/04/26	lun 1/06/26	$ 56.739.823	$ 56.739.823	$ 56.739.823
2793		1.3.4.8.10	Fin de Final de Oreja Occidental	0 d	lun 1/06/26	lun 1/06/26	$ 0	$ 0	$ 0
2794		**1.3.4.8.11**	**FINAL DE APROCHE OCCIDENTAL**	**511 d**	**mar 11/06/24**	**vie 27/03/26**	**$ 1.843.226.060**	**$ 1.843.226....**	**$ 1.843.226.060**
2795		1.3.4.8.11.1	Demolición	7 d	mié 25/06/25	vie 4/07/25	$ 9.648.654	$ 9.648.654	$ 9.648.654
2796		**1.3.4.8.11.2**	**EJE JC1-JC2**	**437 d**	**mié 12/06/24**	**mié 24/12/25**	**$ 171.515.560**	**$ 171.515.560**	**$ 171.515.560**



Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | Sólo el comienzo | Fecha límite | División crítica | Progreso manual
División | Resumen | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo | Sólo duración | Resumen manual | Sólo fin | Tareas críticas | Progreso


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
2797		1.3.4.8.11.2	Excavación	1 d	mié 12/06/24	jue 13/06/24	$ 1.026.348	$ 1.026.348	$ 1.026.348
2798		1.3.4.8.11.2	Pilotes FDP	2 d	mié 12/06/24	vie 14/06/24	$ 19.170.000	$ 19.170.000	$ 19.170.000
2799		1.3.4.8.11.2	CAPA DE TRANSFERENCIA	3 d	vie 18/07/25	mar 22/07/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
2800		1.3.4.8.11.2	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	3 d	vie 18/07/25	mar 22/07/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
2801		**1.3.4.8.11.2**	**Estructura**	**121 d**	**mié 23/07/25**	**mié 24/12/25**	**$ 49.676.637**	**$ 49.676.637**	**$ 49.676.637**
2802		**1.3.4.8.11.2**	**Zapatas**	**7 d**	**mié 23/07/25**	**jue 31/07/25**	**$ 19.527.342**	**$ 19.527.342**	**$ 19.527.342**
2803		1.3.4.8.11.2	Solado	2 d	mié 23/07/25	jue 24/07/25	$ 9.405	$ 9.405	$ 9.405
2804		1.3.4.8.11.2	Acero	2 d	vie 25/07/25	lun 28/07/25	$ 8.540.000	$ 8.540.000	$ 8.540.000
2805		1.3.4.8.11.2	Concreto	3 d	lun 28/07/25	jue 31/07/25	$ 10.977.937	$ 10.977.937	$ 10.977.937
2806		**1.3.4.8.11.2**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**vie 25/07/25**	**lun 4/08/25**	**$ 8.725.825**	**$ 8.725.825**	**$ 8.725.825**
2807		1.3.4.8.11.2	Acero	3 d	vie 25/07/25	mar 29/07/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
2808		1.3.4.8.11.2	Concreto	5 d	mar 29/07/25	lun 4/08/25	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
2809		**1.3.4.8.11.2**	**Muros Laterales**	**11 d**	**lun 28/07/25**	**lun 11/08/25**	**$ 12.447.845**	**$ 12.447.845**	**$ 12.447.845**
2810		1.3.4.8.11.2	Acero	3 d	lun 28/07/25	jue 31/07/25	$ 6.750.845	$ 6.750.845	$ 6.750.845
2811		1.3.4.8.11.2	Concreto	5 d	lun 4/08/25	lun 11/08/25	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
2812		**1.3.4.8.11.2**	**Vigas Longitudinales**	**15 d**	**jue 4/12/25**	**mié 24/12/25**	**$ 8.975.625**	**$ 8.975.625**	**$ 8.975.625**
2813		1.3.4.8.11.2	Acero	5 d	jue 4/12/25	jue 11/12/25	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
2814		1.3.4.8.11.2	Concreto	10 d	vie 12/12/25	mié 24/12/25	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
2815		**1.3.4.8.11.2**	**Tierra Armada**	**87 d**	**jue 14/08/25**	**mié 3/12/25**	**$ 98.059.659**	**$ 98.059.659**	**$ 98.059.659**
2816		1.3.4.8.11.2	RELLENOS EN GEOBLOQUE	48 d	jue 14/08/25	mar 14/10/25	$ 36.172.500	$ 36.172.500	$ 36.172.500
2817		1.3.4.8.11.2	RELLENOS EN GEOBLOQUE 2	25 d	vie 31/10/25	mié 3/12/25	$ 61.887.159	$ 61.887.159	$ 61.887.159
2818		1.3.4.8.11.3	Fin de Eje JC1-JC2	0 d	mié 24/12/25	mié 24/12/25	$ 0	$ 0	$ 0
2819		**1.3.4.8.11.4**	**EJE JC2-JC3**	**441 d**	**mié 12/06/24**	**mar 30/12/25**	**$ 171.290.847**	**$ 171.290.847**	**$ 171.290.847**
2820		1.3.4.8.11.4	Excavación	1 d	mié 12/06/24	jue 13/06/24	$ 1.018.572	$ 1.018.572	$ 1.018.572
2821		1.3.4.8.11.4	Pilotes FDP	2 d	mar 18/06/24	mié 19/06/24	$ 19.170.000	$ 19.170.000	$ 19.170.000
2822		1.3.4.8.11.4	CAPA DE TRANSFERENCIA	3 d	jue 26/06/25	mar 1/07/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
2823		1.3.4.8.11.4	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	3 d	jue 26/06/25	mar 1/07/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
2824		**1.3.4.8.11.4**	**Estructura**	**143 d**	**mar 1/07/25**	**mar 30/12/25**	**$ 49.459.700**	**$ 49.459.700**	**$ 49.459.700**
2825		**1.3.4.8.11.4**	**Zapatas**	**7 d**	**mar 1/07/25**	**mié 9/07/25**	**$ 19.310.405**	**$ 19.310.405**	**$ 19.310.405**
2826		1.3.4.8.11.4	Solado	2 d	mar 1/07/25	jue 3/07/25	$ 9.405	$ 9.405	$ 9.405
2827		1.3.4.8.11.4	Acero	2 d	jue 3/07/25	sáb 5/07/25	$ 8.540.000	$ 8.540.000	$ 8.540.000
2828		1.3.4.8.11.4	Concreto	3 d	sáb 5/07/25	mié 9/07/25	$ 10.761.000	$ 10.761.000	$ 10.761.000
2829		**1.3.4.8.11.4**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**jue 3/07/25**	**sáb 12/07/25**	**$ 8.725.825**	**$ 8.725.825**	**$ 8.725.825**
2830		1.3.4.8.11.4	Acero	3 d	jue 3/07/25	lun 7/07/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
2831		1.3.4.8.11.4	Concreto	5 d	lun 7/07/25	sáb 12/07/25	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
2832		**1.3.4.8.11.4**	**Muros Laterales**	**11 d**	**sáb 5/07/25**	**vie 18/07/25**	**$ 12.447.845**	**$ 12.447.845**	**$ 12.447.845**
2833		1.3.4.8.11.4	Acero	3 d	sáb 5/07/25	mié 9/07/25	$ 6.750.845	$ 6.750.845	$ 6.750.845
2834		1.3.4.8.11.4	Concreto	5 d	sáb 12/07/25	vie 18/07/25	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
2835		**1.3.4.8.11.4**	**Vigas Longitudinales**	**15 d**	**jue 11/12/25**	**mar 30/12/25**	**$ 8.975.625**	**$ 8.975.625**	**$ 8.975.625**
2836		1.3.4.8.11.4	Acero	5 d	jue 11/12/25	mié 17/12/25	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
2837		1.3.4.8.11.4	Concreto	10 d	mié 17/12/25	mar 30/12/25	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
2838		**1.3.4.8.11.4**	**Tierra Armada**	**114 d**	**jue 17/07/25**	**mié 10/12/25**	**$ 98.059.659**	**$ 98.059.659**	**$ 98.059.659**
2839		1.3.4.8.11.4	RELLENOS EN GEOBLOQUE	70 d	jue 17/07/25	mar 14/10/25	$ 37.762.500	$ 37.762.500	$ 37.762.500
2840		1.3.4.8.11.4	RELLENOS EN GEOBLOQUE 2	34 d	lun 27/10/25	mié 10/12/25	$ 60.297.159	$ 60.297.159	$ 60.297.159
2841		1.3.4.8.11.5	Fin de Eje JC2-JC3	0 d	mar 30/12/25	mar 30/12/25	$ 0	$ 0	$ 0
2842		**1.3.4.8.11.6**	**EJE JC3-JC4**	**433 d**	**mié 12/06/24**	**vie 19/12/25**	**$ 207.496.559**	**$ 207.496.559**	**$ 207.496.559**
2843		1.3.4.8.11.6	Excavación	1 d	mié 12/06/24	jue 13/06/24	$ 1.018.572	$ 1.018.572	$ 1.018.572
2844		1.3.4.8.11.6	Pilotes FDP	2 d	vie 28/06/24	mar 2/07/24	$ 55.375.712	$ 55.375.712	$ 55.375.712
2845		1.3.4.8.11.6	CAPA DE TRANSFERENCIA	3 d	sáb 9/08/25	mié 13/08/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
2846		1.3.4.8.11.6	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	3 d	sáb 9/08/25	mié 13/08/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
2847		**1.3.4.8.11.6**	**Estructura**	**100 d**	**mié 13/08/25**	**vie 19/12/25**	**$ 49.459.700**	**$ 49.459.700**	**$ 49.459.700**
2848		**1.3.4.8.11.6**	**Zapatas**	**7 d**	**mié 13/08/25**	**vie 22/08/25**	**$ 19.310.405**	**$ 19.310.405**	**$ 19.310.405**
2849		1.3.4.8.11.6	Solado	2 d	mié 13/08/25	vie 15/08/25	$ 9.405	$ 9.405	$ 9.405
2850		1.3.4.8.11.6	Acero	2 d	vie 15/08/25	mar 19/08/25	$ 8.540.000	$ 8.540.000	$ 8.540.000
2851		1.3.4.8.11.6	Concreto	3 d	mié 20/08/25	vie 22/08/25	$ 10.761.000	$ 10.761.000	$ 10.761.000
2852		**1.3.4.8.11.6**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**vie 15/08/25**	**mié 27/08/25**	**$ 8.725.825**	**$ 8.725.825**	**$ 8.725.825**
2853		1.3.4.8.11.6	Acero	3 d	vie 15/08/25	mié 20/08/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
2854		1.3.4.8.11.6	Concreto	5 d	jue 21/08/25	mié 27/08/25	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
2855		**1.3.4.8.11.6**	**Muros Laterales**	**11 d**	**mié 20/08/25**	**mar 2/09/25**	**$ 12.447.845**	**$ 12.447.845**	**$ 12.447.845**
2856		1.3.4.8.11.6	Acero	3 d	mié 20/08/25	vie 22/08/25	$ 6.750.845	$ 6.750.845	$ 6.750.845
2857		1.3.4.8.11.6	Concreto	5 d	mié 27/08/25	mar 2/09/25	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
2858		**1.3.4.8.11.6**	**Vigas Longitudinales**	**15 d**	**sáb 29/11/25**	**vie 19/12/25**	**$ 8.975.625**	**$ 8.975.625**	**$ 8.975.625**
2859		1.3.4.8.11.6	Acero	5 d	sáb 29/11/25	vie 5/12/25	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
2860		1.3.4.8.11.6	Concreto	10 d	vie 5/12/25	vie 19/12/25	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
2861		**1.3.4.8.11.6**	**Tierra Armada**	**80 d**	**jue 21/08/25**	**sáb 29/11/25**	**$ 98.059.659**	**$ 98.059.659**	**$ 98.059.659**
2862		1.3.4.8.11.6	RELLENOS EN GEOBLOQUE	80 d	jue 21/08/25	sáb 29/11/25	$ 98.059.659	$ 98.059.659	$ 98.059.659
2863		1.3.4.8.11.7	Fin de Eje JC3-JC4	0 d	vie 19/12/25	vie 19/12/25	$ 0	$ 0	$ 0
2864		**1.3.4.8.11.8**	**EJE JC4-JC5**	**448 d**	**jue 13/06/24**	**vie 9/01/26**	**$ 172.334.582**	**$ 172.334.582**	**$ 172.334.582**
2865		1.3.4.8.11.8	Excavación	1 d	jue 13/06/24	vie 14/06/24	$ 1.018.572	$ 1.018.572	$ 1.018.572
2866		1.3.4.8.11.8	Pilotes FDP	1 d	sáb 29/06/24	mar 2/07/24	$ 16.278.940	$ 16.278.940	$ 16.278.940
2867		1.3.4.8.11.8	Pilotes FDP 2	2 d	lun 29/07/24	mié 31/07/24	$ 2.650.060	$ 2.650.060	$ 2.650.060
2868		1.3.4.8.11.8	CAPA DE TRANSFERENCIA	3 d	lun 5/08/24	vie 9/08/24	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
2869		1.3.4.8.11.8	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	3 d	lun 5/08/24	vie 9/08/24	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
2870		**1.3.4.8.11.8**	**Estructura**	**404 d**	**vie 9/08/24**	**vie 9/01/26**	**$ 50.744.435**	**$ 50.744.435**	**$ 50.744.435**
2871		**1.3.4.8.11.8**	**Zapatas**	**79 d**	**vie 9/08/24**	**mar 19/11/24**	**$ 19.949.650**	**$ 19.949.650**	**$ 19.949.650**
2872		1.3.4.8.11.8	Solado	70 d	vie 9/08/24	mié 6/11/24	$ 9.405	$ 9.405	$ 9.405
2873		1.3.4.8.11.8	Acero	73 d	lun 12/08/24	mié 13/11/24	$ 8.546.245	$ 8.546.245	$ 8.546.245
2874		1.3.4.8.11.8	Concreto	75 d	mié 14/08/24	mar 19/11/24	$ 11.394.000	$ 11.394.000	$ 11.394.000
2875		**1.3.4.8.11.8**	**Vigas de Cimentación**	**80 d**	**lun 12/08/24**	**vie 22/11/24**	**$ 9.365.070**	**$ 9.365.070**	**$ 9.365.070**
2876		1.3.4.8.11.8	Acero	75 d	lun 12/08/24	vie 15/11/24	$ 3.035.070	$ 3.035.070	$ 3.035.070
2877		1.3.4.8.11.8	Concreto	77 d	jue 15/08/24	vie 22/11/24	$ 6.330.000	$ 6.330.000	$ 6.330.000
2878		**1.3.4.8.11.8**	**Muros Laterales**	**165 d**	**mié 23/04/25**	**vie 21/11/25**	**$ 12.454.090**	**$ 12.454.090**	**$ 12.454.090**
2879		1.3.4.8.11.8	Acero	160 d	mié 23/04/25	jue 13/11/25	$ 6.757.090	$ 6.757.090	$ 6.757.090
2880		1.3.4.8.11.8	Concreto	162 d	lun 28/04/25	vie 21/11/25	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
2881		**1.3.4.8.11.8**	**Vigas Longitudinales**	**13 d**	**mar 23/12/25**	**vie 9/01/26**	**$ 8.975.625**	**$ 8.975.625**	**$ 8.975.625**
2882		1.3.4.8.11.8	Acero	3 d	mar 23/12/25	sáb 27/12/25	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
2883		1.3.4.8.11.8	Concreto	10 d	sáb 27/12/25	vie 9/01/26	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
2884		**1.3.4.8.11.8**	**Tierra Armada**	**25 d**	**vie 21/11/25**	**mar 23/12/25**	**$ 98.059.659**	**$ 98.059.659**	**$ 98.059.659**
2885		1.3.4.8.11.8	RELLENOS EN GEOBLOQUE	25 d	vie 21/11/25	mar 23/12/25	$ 98.059.659	$ 98.059.659	$ 98.059.659
2886		1.3.4.8.11.9	Fin de Eje JC4-JC5	0 d	vie 9/01/26	vie 9/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
2887		**1.3.4.8.11.1**	**EJE JC5-JC6**	**457 d**	**jue 13/06/24**	**jue 22/01/26**	**$ 171.049.847**	**$ 171.049.847**	**$ 171.049.847**
2888		1.3.4.8.11.1	Excavación	1 d	jue 13/06/24	vie 14/06/24	$ 1.018.572	$ 1.018.572	$ 1.018.572
2889		1.3.4.8.11.1	Pilotes FDP	2 d	vie 14/06/24	lun 17/06/24	$ 14.196.750	$ 14.196.750	$ 14.196.750
2890		1.3.4.8.11.1	Pilotes FDP 2	2 d	mié 31/07/24	vie 2/08/24	$ 4.732.250	$ 4.732.250	$ 4.732.250
2891		1.3.4.8.11.1	CAPA DE TRANSFERENCIA	3 d	vie 6/06/25	mar 10/06/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
2892		1.3.4.8.11.1	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	3 d	vie 6/06/25	mar 10/06/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
2893		**1.3.4.8.11.1**	**Estructura**	**55 d**	**mar 11/11/25**	**jue 22/01/26**	**$ 49.459.700**	**$ 49.459.700**	**$ 49.459.700**
2894		**1.3.4.8.11.1**	**Zapatas**	**9 d**	**mar 11/11/25**	**sáb 22/11/25**	**$ 19.310.405**	**$ 19.310.405**	**$ 19.310.405**
2895		1.3.4.8.11.1	Solado	2 d	mar 11/11/25	mié 12/11/25	$ 9.405	$ 9.405	$ 9.405
2896		1.3.4.8.11.1	Acero	2 d	jue 13/11/25	vie 14/11/25	$ 8.540.000	$ 8.540.000	$ 8.540.000
2897		1.3.4.8.11.1	Concreto	5 d	sáb 15/11/25	sáb 22/11/25	$ 10.761.000	$ 10.761.000	$ 10.761.000
2898		**1.3.4.8.11.1**	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**sáb 22/11/25**	**mar 2/12/25**	**$ 8.725.825**	**$ 8.725.825**	**$ 8.725.825**
2899		1.3.4.8.11.1	Acero	3 d	sáb 22/11/25	mié 26/11/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
2900		1.3.4.8.11.1	Concreto	5 d	mié 26/11/25	mar 2/12/25	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
2901		**1.3.4.8.11.1**	**Muros Laterales**	**11 d**	**sáb 15/11/25**	**sáb 29/11/25**	**$ 12.447.845**	**$ 12.447.845**	**$ 12.447.845**
2902		1.3.4.8.11.1	Acero	3 d	sáb 15/11/25	jue 20/11/25	$ 6.750.845	$ 6.750.845	$ 6.750.845
2903		1.3.4.8.11.1	Concreto	8 d	jue 20/11/25	sáb 29/11/25	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
2904		**1.3.4.8.11.1**	**Vigas Longitudinales**	**15 d**	**vie 2/01/26**	**jue 22/01/26**	**$ 8.975.625**	**$ 8.975.625**	**$ 8.975.625**
2905		1.3.4.8.11.1	Acero	5 d	vie 2/01/26	jue 8/01/26	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
2906		1.3.4.8.11.1	Concreto	10 d	vie 9/01/26	jue 22/01/26	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
2907		**1.3.4.8.11.1**	**Tierra Armada**	**25 d**	**sáb 29/11/25**	**vie 2/01/26**	**$ 98.059.659**	**$ 98.059.659**	**$ 98.059.659**
2908		1.3.4.8.11.1	RELLENOS EN GEOBLOQUE	25 d	sáb 29/11/25	vie 2/01/26	$ 98.059.659	$ 98.059.659	$ 98.059.659

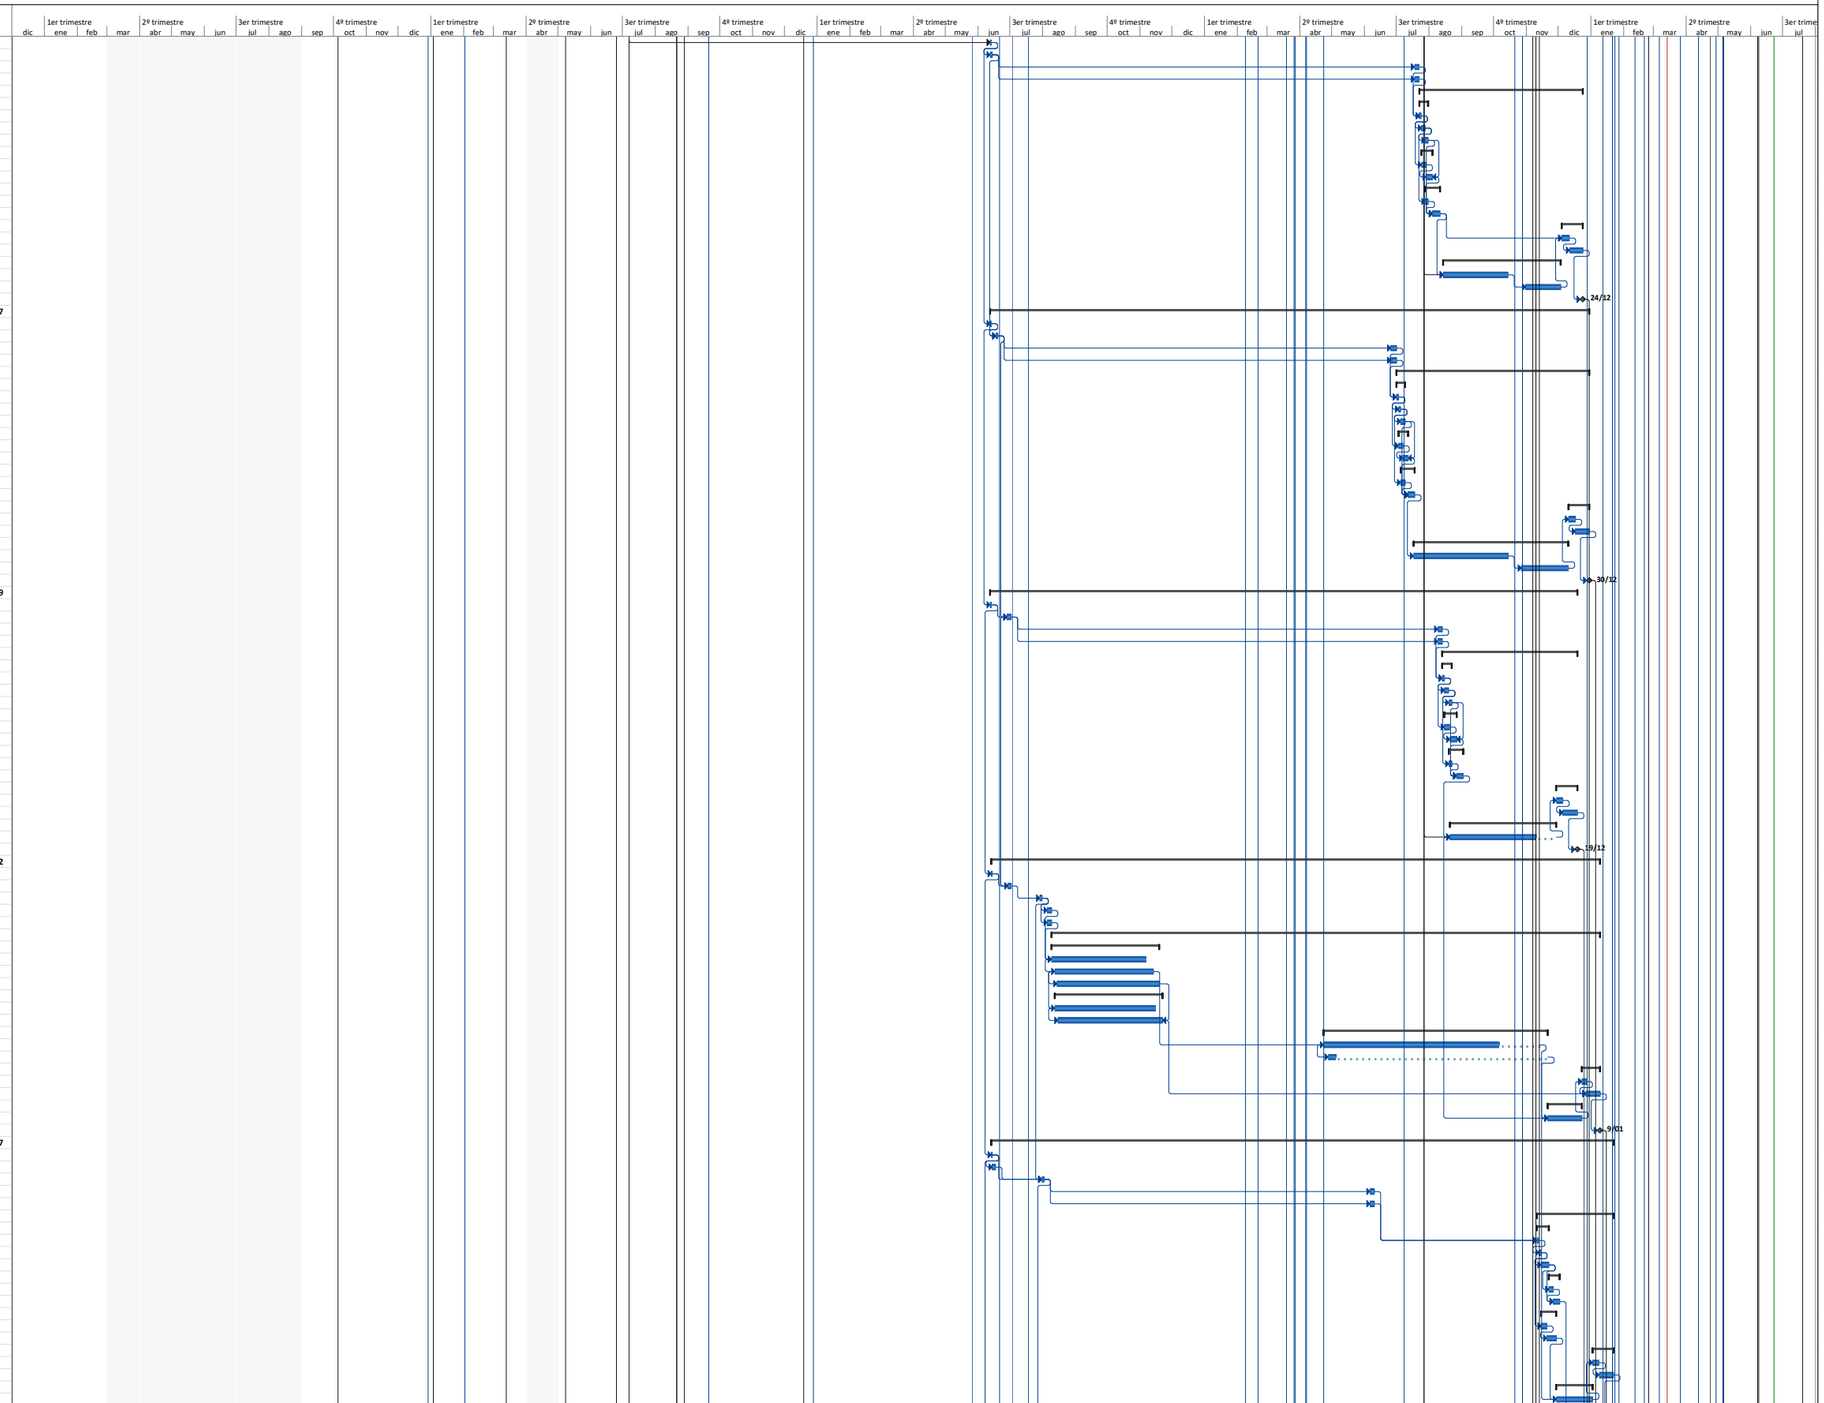

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | Sólo el comienzo | Fecha límite | División crítica | Progreso manual
División | Resumen | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo | Sólo duración | Resumen manual | Sólo fin | Tareas críticas | Progreso


Proyecto: IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB8-20221201
Fecha: mar 23/06/26

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
2909		1.3.4.8.11.1	Fin de Eje JC5-JC6	0 d	jue 22/01/26	jue 22/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
2910		1.3.4.8.11.1	**EJE JC6-JC7**	**460 d**	**jue 13/06/24**	**lun 26/01/26**	**$ 170.894.847**	**$ 170.894.847**	**$ 170.894.847**
2911		1.3.4.8.11.1	Excavación	1 d	jue 13/06/24	vie 14/06/24	$ 1.018.572	$ 1.018.572	$ 1.018.572
2912		1.3.4.8.11.1	Pilotes FDP	2 d	vie 14/06/24	lun 17/06/24	$ 14.080.500	$ 14.080.500	$ 14.080.500
2913		1.3.4.8.11.1	Pilotes FDP 2	2 d	vie 2/08/24	lun 5/08/24	$ 4.693.500	$ 4.693.500	$ 4.693.500
2914		1.3.4.8.11.1	CAPA DE TRANSFERENCIA	3 d	lun 11/08/25	jue 14/08/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
2915		1.3.4.8.11.1	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	3 d	lun 11/08/25	jue 14/08/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
2916		1.3.4.8.11.1	**Estructura**	**53 d**	**mar 18/11/25**	**lun 26/01/26**	**$ 49.459.700**	**$ 49.459.700**	**$ 49.459.700**
2917		1.3.4.8.11.1	**Zapatas**	**10 d**	**mar 18/11/25**	**sáb 29/11/25**	**$ 19.310.405**	**$ 19.310.405**	**$ 19.310.405**
2918		1.3.4.8.11.1	Solado	2 d	mar 18/11/25	jue 20/11/25	$ 9.405	$ 9.405	$ 9.405
2919		1.3.4.8.11.1	Acero	3 d	jue 20/11/25	lun 24/11/25	$ 8.540.000	$ 8.540.000	$ 8.540.000
2920		1.3.4.8.11.1	Concreto	5 d	lun 24/11/25	sáb 29/11/25	$ 10.761.000	$ 10.761.000	$ 10.761.000
2921		1.3.4.8.11.1	**Vigas de Cimentación**	**13 d**	**jue 20/11/25**	**vie 5/12/25**	**$ 8.725.825**	**$ 8.725.825**	**$ 8.725.825**
2922		1.3.4.8.11.1	Acero	3 d	jue 20/11/25	lun 24/11/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
2923		1.3.4.8.11.1	Concreto	5 d	sáb 29/11/25	vie 5/12/25	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
2924		1.3.4.8.11.1	**Muros Laterales**	**20 d**	**lun 24/11/25**	**vie 19/12/25**	**$ 12.447.845**	**$ 12.447.845**	**$ 12.447.845**
2925		1.3.4.8.11.1	Acero	3 d	lun 24/11/25	jue 27/11/25	$ 6.750.845	$ 6.750.845	$ 6.750.845
2926		1.3.4.8.11.1	Concreto	10 d	vie 5/12/25	vie 19/12/25	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
2927		1.3.4.8.11.1	**Vigas Longitudinales**	**15 d**	**mié 7/01/26**	**lun 26/01/26**	**$ 8.975.625**	**$ 8.975.625**	**$ 8.975.625**
2928		1.3.4.8.11.1	Acero	5 d	mié 7/01/26	mié 14/01/26	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
2929		1.3.4.8.11.1	Concreto	10 d	mié 14/01/26	lun 26/01/26	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
2930		1.3.4.8.11.1	**Tierra Armada**	**10 d**	**lun 22/12/25**	**lun 5/01/26**	**$ 98.059.659**	**$ 98.059.659**	**$ 98.059.659**
2931		1.3.4.8.11.1	RELLENOS EN GEOBLOQUE	10 d	lun 22/12/25	lun 5/01/26	$ 98.059.659	$ 98.059.659	$ 98.059.659
2932		1.3.4.8.11.1	Fin de Eje JC6-JC7	0 d	lun 26/01/26	lun 26/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
2933		1.3.4.8.11.1	**EJE JC7-JC8**	**457 d**	**mar 11/06/24**	**mar 20/01/26**	**$ 171.529.064**	**$ 171.529.064**	**$ 171.529.064**
2934		1.3.4.8.11.1	Excavación	1 d	mar 11/06/24	mié 12/06/24	$ 1.018.572	$ 1.018.572	$ 1.018.572
2935		1.3.4.8.11.1	Pilotes FDP	2 d	mié 12/06/24	vie 14/06/24	$ 14.455.980	$ 14.455.980	$ 14.455.980
2936		1.3.4.8.11.1	Pilotes FDP 2	2 d	mar 27/08/24	jue 29/08/24	$ 4.318.020	$ 4.318.020	$ 4.318.020
2937		1.3.4.8.11.1	CAPA DE TRANSFERENCIA	3 d	sáb 2/08/25	mié 6/08/25	$ 409.000	$ 409.000	$ 409.000
2938		1.3.4.8.11.1	Mejoramiento CAPA DE TRANSFEI	3 d	sáb 2/08/25	mié 6/08/25	$ 3.173.916	$ 3.173.916	$ 3.173.916
2939		1.3.4.8.11.1	**Estructura**	**33 d**	**lun 24/11/25**	**mar 6/01/26**	**$ 49.459.700**	**$ 49.459.700**	**$ 49.459.700**
2940		1.3.4.8.11.1	**Zapatas**	**10 d**	**lun 24/11/25**	**vie 5/12/25**	**$ 19.310.405**	**$ 19.310.405**	**$ 19.310.405**
2941		1.3.4.8.11.1	Solado	2 d	lun 24/11/25	mié 26/11/25	$ 9.405	$ 9.405	$ 9.405
2942		1.3.4.8.11.1	Acero	3 d	mié 26/11/25	sáb 29/11/25	$ 8.540.000	$ 8.540.000	$ 8.540.000
2943		1.3.4.8.11.1	Concreto	5 d	sáb 29/11/25	vie 5/12/25	$ 10.761.000	$ 10.761.000	$ 10.761.000
2944		1.3.4.8.11.1	**Vigas de Cimentación**	**8 d**	**mié 26/11/25**	**vie 5/12/25**	**$ 8.725.825**	**$ 8.725.825**	**$ 8.725.825**
2945		1.3.4.8.11.1	Acero	3 d	mié 26/11/25	sáb 29/11/25	$ 3.028.825	$ 3.028.825	$ 3.028.825
2946		1.3.4.8.11.1	Concreto	5 d	sáb 29/11/25	vie 5/12/25	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
2947		1.3.4.8.11.1	**Muros Laterales**	**15 d**	**sáb 29/11/25**	**vie 19/12/25**	**$ 12.447.845**	**$ 12.447.845**	**$ 12.447.845**
2948		1.3.4.8.11.1	Acero	3 d	sáb 29/11/25	mié 3/12/25	$ 6.750.845	$ 6.750.845	$ 6.750.845
2949		1.3.4.8.11.1	Concreto	10 d	vie 5/12/25	vie 19/12/25	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
2950		1.3.4.8.11.1	**Vigas Longitudinales**	**13 d**	**vie 19/12/25**	**mar 6/01/26**	**$ 8.975.625**	**$ 8.975.625**	**$ 8.975.625**
2951		1.3.4.8.11.1	Acero	3 d	vie 19/12/25	mar 23/12/25	$ 3.278.625	$ 3.278.625	$ 3.278.625
2952		1.3.4.8.11.1	Concreto	10 d	mar 23/12/25	mar 6/01/26	$ 5.697.000	$ 5.697.000	$ 5.697.000
2953		1.3.4.8.11.1	**Tierra Armada**	**20 d**	**mar 23/12/25**	**mar 20/01/26**	**$ 98.693.876**	**$ 98.693.876**	**$ 98.693.876**
2954		1.3.4.8.11.1	RELLENOS EN GEOBLOQUE	20 d	mar 23/12/25	mar 20/01/26	$ 98.693.876	$ 98.693.876	$ 98.693.876
2955		1.3.4.8.11.1	Fin de Eje JC7-JC8	0 d	mar 20/01/26	mar 20/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
2956		1.3.4.8.11.1	PLACA DE PROTECCIÓN	7 d	lun 9/02/26	mar 17/02/26	$ 78.515.902	$ 78.515.902	$ 78.515.902
2957		1.3.4.8.11.1	**PAVIMENTO**	**26 d**	**lun 26/01/26**	**jue 26/02/26**	**$ 191.707.817**	**$ 191.707.817**	**$ 191.707.817**
2958		1.3.4.8.11.1	Subbase	13 d	lun 26/01/26	mié 11/02/26	$ 28.847.600	$ 28.847.600	$ 28.847.600
2959		1.3.4.8.11.1	Base	13 d	jue 29/01/26	sáb 14/02/26	$ 20.496.000	$ 20.496.000	$ 20.496.000
2960		1.3.4.8.11.1	Mezcla Asfaltica - GCR	5 d	sáb 14/02/26	vie 20/02/26	$ 107.582.767	$ 107.582.767	$ 107.582.767
2961		1.3.4.8.11.1	Mezcla Asfaltica - MD12	5 d	vie 20/02/26	jue 26/02/26	$ 34.781.450	$ 34.781.450	$ 34.781.450
2962		1.3.4.8.11.1	Baranda Vehicular	30 d	mié 18/02/26	vie 27/03/26	$ 327.242.381	$ 327.242.381	$ 327.242.381
2963		1.3.4.8.12	Fin de Final de Aproche Occidental	0 d	vie 27/03/26	vie 27/03/26	$ 0	$ 0	$ 0
2964		1.3.4.8.13	**CALLE 153 NW**	**444 d**	**mié 11/09/24**	**lun 6/04/26**	**$ 657.145.016**	**$ 657.145.016**	**$ 657.145.016**
2965		1.3.4.8.13.1	Demolición	1 d	mié 11/09/24	jue 12/09/24	$ 4.745.901	$ 4.745.901	$ 4.745.901
2966		1.3.4.8.13.2	**Via**	**340 d**	**mié 16/10/24**	**vie 26/12/25**	**$ 540.602.764**	**$ 540.602.764**	**$ 540.602.764**
2967		1.3.4.8.13.2	Excavación	13 d	mié 16/10/24	jue 31/10/24	$ 130.181.003	$ 130.181.003	$ 130.181.003
2968		1.3.4.8.13.2	Mejoramiento con Rajón	15 d	mar 22/10/24	sáb 9/11/24	$ 12.650.782	$ 12.650.782	$ 12.650.782
2969		1.3.4.8.13.2	Mejoramiento Capa de TRANSFERENCIA	310 d	mar 22/10/24	lun 24/11/25	$ 3.173.955	$ 3.173.955	$ 3.173.955
2970		1.3.4.8.13.2	Subbase Granular	312 d	lun 28/10/24	mar 2/12/25	$ 147.872.712	$ 147.872.712	$ 147.872.712
2971		1.3.4.8.13.2	Base Granular	325 d	sáb 2/11/24	vie 26/12/25	$ 97.533.800	$ 97.533.800	$ 97.533.800
2972		1.3.4.8.13.2	Mezcla Asfaltica - GCR	10 d	sáb 6/12/25	vie 19/12/25	$ 110.893.312	$ 110.893.312	$ 110.893.312
2973		1.3.4.8.13.2	Mezcla Asfaltica - MD12	8 d	mié 10/12/25	vie 19/12/25	$ 38.297.200	$ 38.297.200	$ 38.297.200
2974		1.3.4.8.13.3	**Espacio Público**	**68 d**	**jue 8/01/26**	**lun 6/04/26**	**$ 111.796.351**	**$ 111.796.351**	**$ 111.796.351**
2975		1.3.4.8.13.3	Excavación	25 d	jue 8/01/26	lun 9/02/26	$ 6.440.069	$ 6.440.069	$ 6.440.069
2976		1.3.4.8.13.3	Rellenos	35 d	mié 4/02/26	mié 18/03/26	$ 81.015.570	$ 81.015.570	$ 81.015.570
2977		1.3.4.8.13.3	Acabados	45 d	vie 6/02/26	lun 6/04/26	$ 24.340.712	$ 24.340.712	$ 24.340.712
2978		1.3.4.8.14	Fin Calle 153 NE	0 d	lun 6/04/26	lun 6/04/26	$ 0	$ 0	$ 0
2979		1.3.4.8.15	**CONECTANTE NW**	**587,25 d**	**jue 6/06/24**	**vie 3/07/26**	**$ 2.181.450.798**	**$ 2.071.989....**	**$ 2.153.898.838**
2980		1.3.4.8.15.1	Demolición	335 d	sáb 31/08/24	sáb 1/11/25	$ 25.439.631	$ 25.439.631	$ 17.807.742
2981		1.3.4.8.15.2	**Via**	**483,25 d**	**jue 6/06/24**	**mar 17/02/26**	**$ 826.030.677**	**$ 826.030.677**	**$ 826.030.677**
2982		1.3.4.8.15.2	Excavacion -2	5 d	jue 6/06/24	jue 13/06/24	$ 14.084.571	$ 14.084.571	$ 14.084.571
2983		1.3.4.8.15.2	Excavación	25 d	mar 18/11/25	vie 19/12/25	$ 114.019.998	$ 114.019.998	$ 114.019.998
2984		1.3.4.8.15.2	Rellenos en geobloque	5 d	vie 28/11/25	jue 4/12/25	$ 149.997.128	$ 149.997.128	$ 149.997.128
2985		1.3.4.8.15.2	Placa de Protección Geobloque	3 d	mié 3/12/25	vie 5/12/25	$ 5.746.319	$ 5.746.319	$ 5.746.319
2986		1.3.4.8.15.2	Subbase Granular	25 d	mié 26/11/25	lun 29/12/25	$ 103.356.792	$ 103.356.792	$ 103.356.792
2987		1.3.4.8.15.2	Base Granular - Estabilizada con Asfalto	25 d	mar 30/12/25	vie 30/01/26	$ 110.596.000	$ 110.596.000	$ 110.596.000
2988		1.3.4.8.15.2	Mezcla Asfaltica - GCR	10 d	vie 30/01/26	mié 11/02/26	$ 201.518.815	$ 201.518.815	$ 201.518.815
2989		1.3.4.8.15.2	Mezcla Asfaltica - MD12	10 d	jue 5/02/26	mar 17/02/26	$ 126.711.055	$ 126.711.055	$ 126.711.055
2990		1.3.4.8.15.3	**Espacio Público**	**472 d**	**jue 31/10/24**	**vie 3/07/26**	**$ 1.329.980.490**	**$ 1.220.518....**	**$ 1.310.060.420**
2991		1.3.4.8.15.3	Excavación	374 d	jue 31/10/24	mar 24/02/26	$ 45.117.354	$ 45.117.354	$ 45.117.354
2992		1.3.4.8.15.3	Muros	374 d	sáb 16/11/24	mar 10/03/26	$ 66.045.327	$ 66.045.327	$ 66.045.327
2993		1.3.4.8.15.3	Rellenos en geobloque	7 d	sáb 11/04/26	lun 20/04/26	$ 330.222.000	$ 330.222.000	$ 330.222.000
2994		1.3.4.8.15.3	Placa de Protección Geobloque	4 d	mar 21/04/26	vie 24/04/26	$ 12.459.197	$ 12.459.197	$ 12.459.197
2995		1.3.4.8.15.3	Rellenos	365 d	mié 15/01/25	mar 28/04/26	$ 523.835.523	$ 523.835.523	$ 523.835.523
2996		1.3.4.8.15.3	Acabados	57 d	lun 20/04/26	vie 3/07/26	$ 293.386.499	$ 230.765.910	$ 287.518.769
2997		1.3.4.8.15.3	Pompeyano	30 d	mar 17/02/26	jue 26/03/26	$ 12.073.456	$ 12.073.456	$ 12.073.456
2998		1.3.4.8.15.3	Baranda M82	13 d	mié 17/06/26	vie 3/07/26	$ 46.841.134	$ 0	$ 32.788.794
2999		1.3.4.8.16	Fin Conectante NE	0 d	vie 3/07/26	vie 3/07/26	$ 0	$ 0	$ 0
3000		1.3.4.8.17	**RAMAL TRANSICIÓN NW**	**164 d**	**lun 1/12/25**	**jue 2/07/26**	**$ 164.882.288**	**$ 152.703.385**	**$ 22.628.300**
3001		1.3.4.8.17.1	Demolición	145 d	lun 1/12/25	vie 5/06/26	$ 3.616.263	$ 3.616.263	$ 0
3002		1.3.4.8.17.2	**Via**	**158 d**	**mar 9/12/25**	**jue 2/07/26**	**$ 161.266.025**	**$ 149.087.122**	**$ 22.628.300**
3003		1.3.4.8.17.2	Excavación	150 d	mar 9/12/25	lun 22/06/26	$ 25.204.103	$ 25.174.695	$ 0
3004		1.3.4.8.17.2	Subbase Granular	119 d	mié 21/01/26	mié 24/06/26	$ 23.739.664	$ 23.581.464	$ 0
3005		1.3.4.8.17.2	Base Granular	110 d	mar 3/02/26	jue 25/06/26	$ 20.496.000	$ 20.340.218	$ 0
3006		1.3.4.8.17.2	Mezcla Asfaltica - GCR	103 d	sáb 14/02/26	mar 30/06/26	$ 69.197.958	$ 60.753.071	$ 0
3007		1.3.4.8.17.2	Mezcla Asfaltica - MD12	104 d	lun 16/02/26	jue 2/07/26	$ 22.628.300	$ 19.237.675	$ 22.628.300
3008		1.3.4.8.18	Fin Ramal Transición NE	0 d	jue 2/07/26	jue 2/07/26	$ 0	$ 0	$ 0
3009		1.3.4.8.19	**CARRIL DESACELERACIÓN AUTONORT**	**114 d**	**jue 5/02/26**	**vie 3/07/26**	**$ 335.470.759**	**$ 200.012.113**	**$ 49.440.048**
3010		1.3.4.8.19.1	APROBACIÓN PMT AUTOPISTA NOR	0 d	jue 5/02/26	jue 5/02/26	$ 0	$ 0	$ 0
3011		1.3.4.8.19.2	IMPLEMENTACIÓN PMT	20 d	vie 6/02/26	mar 3/03/26	$ 0	$ 0	$ 0
3012		1.3.4.8.19.3	Demolición	77 d	mié 4/03/26	vie 12/06/26	$ 12.854.861	$ 12.854.861	$ 0
3013		1.3.4.8.19.4	**Via**	**89 d**	**sáb 7/03/26**	**vie 3/07/26**	**$ 322.615.898**	**$ 187.157.252**	**$ 49.440.048**
3014		1.3.4.8.19.4	Excavación	79 d	sáb 7/03/26	vie 19/06/26	$ 107.180.643	$ 103.416.100	$ 0
3015		1.3.4.8.19.4	Subbase Granular	61 d	sáb 4/04/26	mar 23/06/26	$ 53.599.111	$ 51.297.600	$ 0
3016		1.3.4.8.19.4	Base Granular - Estabilizada con Asfalto	52 d	mar 21/04/26	sáb 27/06/26	$ 36.651.000	$ 32.443.552	$ 0
3017		1.3.4.8.19.4	Mezcla Asfaltica - GCR	5 d	jue 25/06/26	jue 2/07/26	$ 75.745.096	$ 0	$ 0
3018		1.3.4.8.19.4	Mezcla Asfaltica - MD12	6 d	jue 25/06/26	vie 3/07/26	$ 49.440.048	$ 0	$ 49.440.048

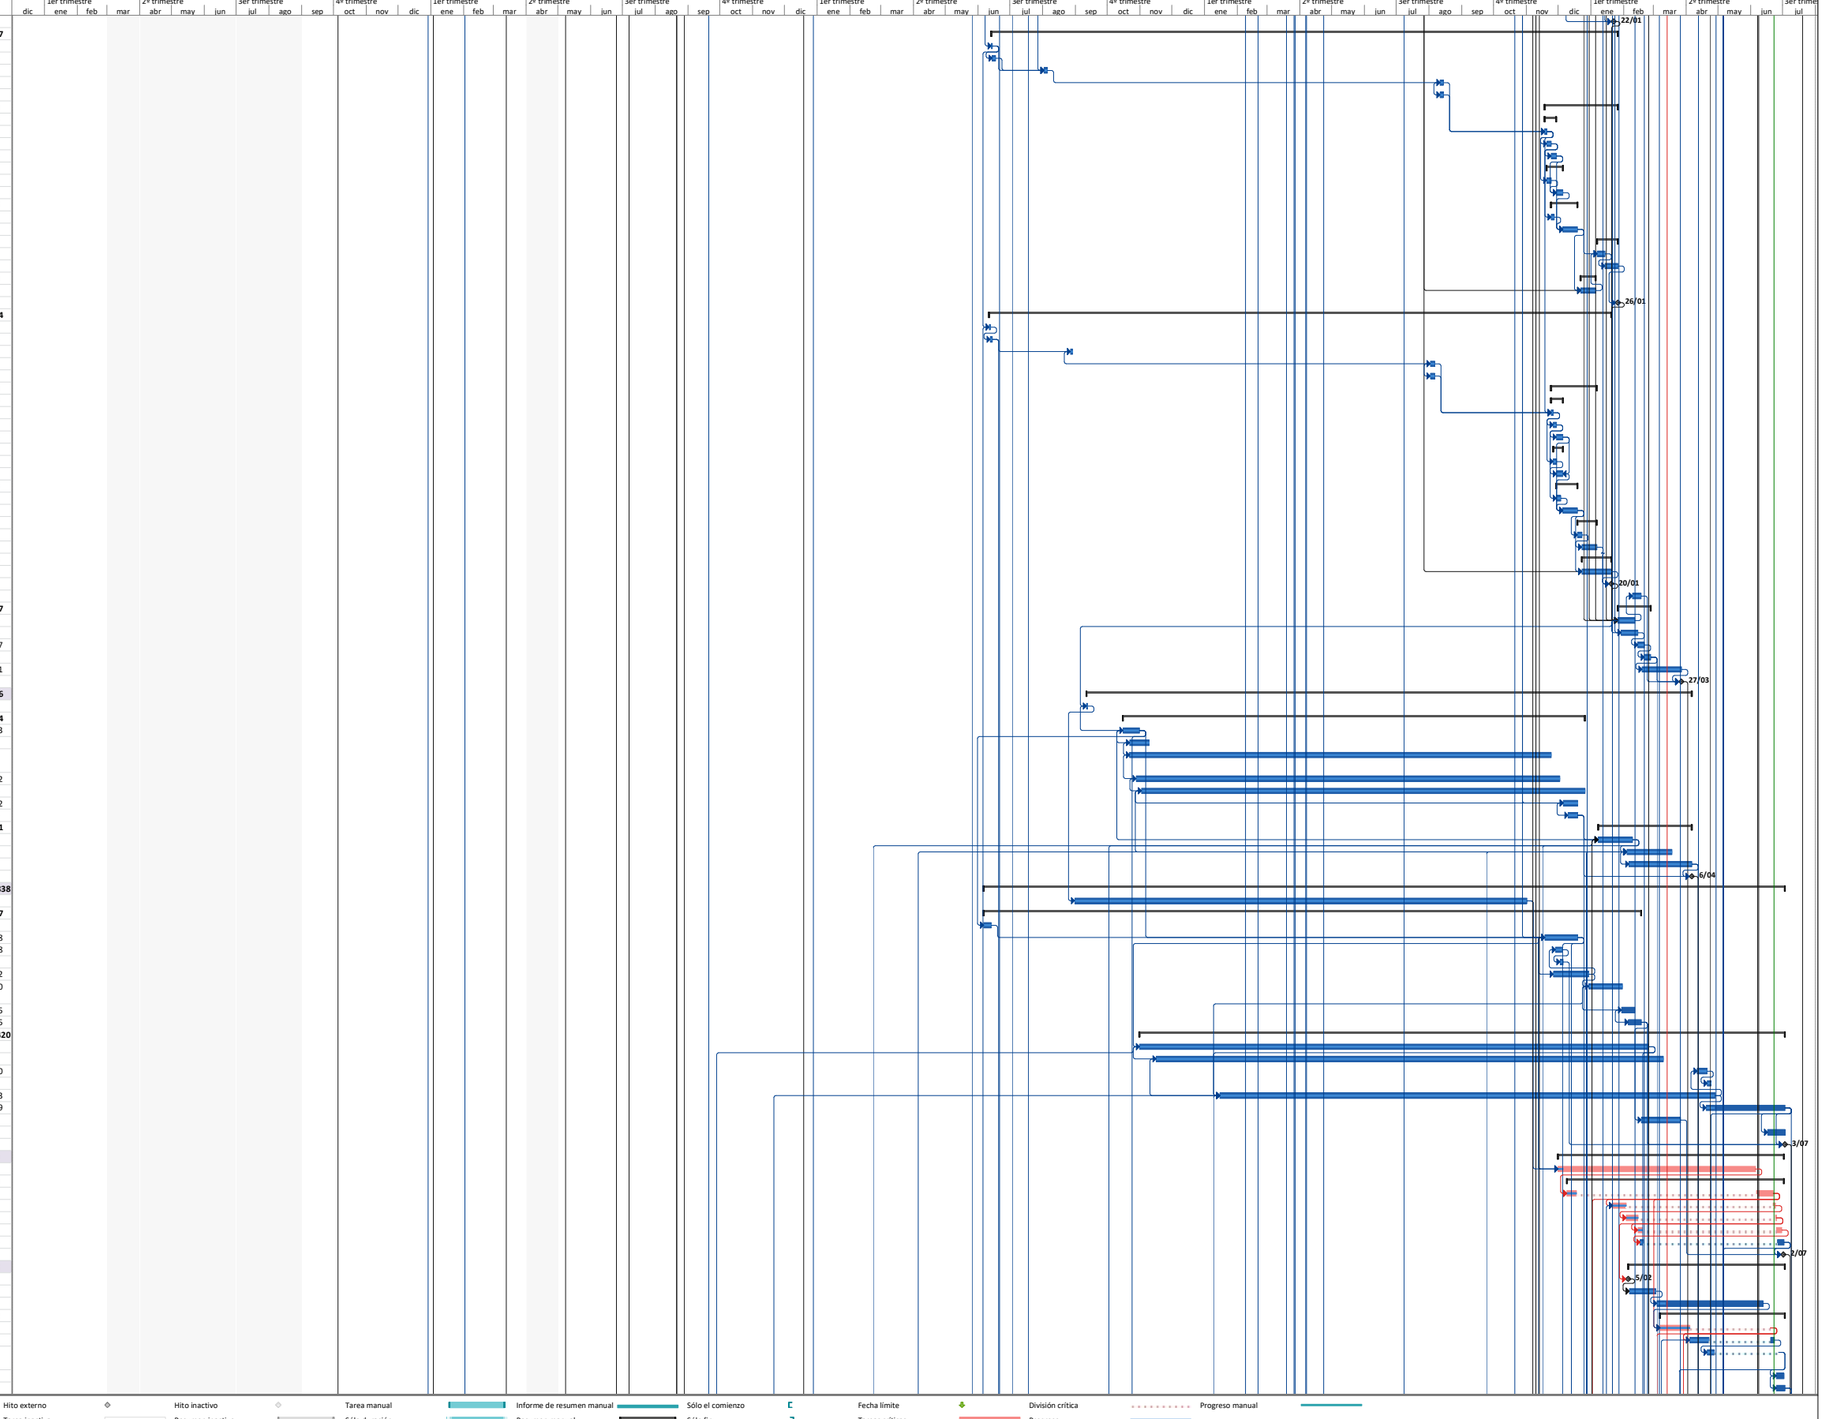


Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | Sólo el comienzo | Fecha límite | División crítica | Progreso manual
División | Resumen | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo | Sólo duración | Resumen manual | Sólo fin | Tareas críticas | Progreso

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
3019		1.3.4.8.20	Fin Carril Desaceleración NE	0 d	vie 3/07/26	vie 3/07/26	$ 0	$ 0	$ 0
3020		**1.3.4.8.21**	**ESPACIO PUBLICO BAJO PUENTE - OCCIDENTE**	**622 d**	**vie 17/05/24**	**mar 28/07/26**	**$ 338.733.354**	**$ 241.777.850**	**$ 181.087.837**
3021		1.3.4.8.21.1	Demolición	10 d	vie 20/02/26	jue 5/03/26	$ 2.055.467	$ 2.055.467	$ 2.055.467
3022		1.3.4.8.21.2	Excavación	25 d	jue 5/03/26	mié 8/04/26	$ 33.481.362	$ 33.481.362	$ 33.481.362
3023		1.3.4.8.21.3	Relleno	2 d	vie 17/05/24	lun 20/05/24	$ 4.454.175	$ 4.454.175	$ 4.454.175
3024		1.3.4.8.21.4	Rellenos 2	88 d	sáb 4/04/26	mar 28/07/26	$ 57.224.728	$ 42.176.437	$ 45.779.783
3025		1.3.4.8.21.5	Acabados	85 d	mié 8/04/26	mar 28/07/26	$ 238.292.626	$ 157.752.275	$ 95.317.051
3026		1.3.4.8.21.6	Baranda Vehicular	71 d	sáb 25/04/26	mar 28/07/26	$ 3.224.996	$ 1.858.135	$ 0
3027		1.3.4.8.22	Fin de Espacio Público	0 d	mar 28/07/26	mar 28/07/26	$ 0	$ 0	$ 0
3028		1.3.4.8.23	**Paisajismo**	45 d	jue 30/04/26	mar 30/06/26	$ 20.291.227	$ 15.331.149	$ 18.262.104
3029		1.3.4.9	Fin Costado Occidental	0 d	mar 28/07/26	mar 28/07/26	$ 0	$ 0	$ 0
3030		**1.3.4.10**	**PUENTE**	**844,25 d**	**sáb 1/07/23**	**jue 25/06/26**	**$ 21.607.760.140**	**$ 21.581.999....**	**$ 21.517.759....**
3031		**1.3.4.10.1**	**SUBESTRUCTURA**	**574,25 d**	**sáb 1/07/23**	**vie 11/07/25**	**$ 9.157.554.849**	**$ 9.157.554....**	**$ 9.157.554.849**
3032		1.3.4.10.1.1	Lecturas e informes de instrumentac	39 d	jue 18/01/24	sáb 2/03/24	$ 29.382.858	$ 29.382.858	$ 29.382.858
3033		1.3.4.10.1.2	Lecturas e informes de instrumentac	130 d	vie 26/07/24	vie 10/01/25	$ 125.263.762	$ 125.263.762	$ 125.263.762
3034		1.3.4.10.1.3	Desvio Separador Central Autonorte para sistema BRT	39 d	jue 14/12/23	jue 1/02/24	$ 285.131.845	$ 285.131.845	$ 285.131.845
3035		1.3.4.10.1.4	Desvio Separador Central Autonorte para sistema BRT 2	89 d	vie 20/09/24	mar 14/01/25	$ 15.006.939	$ 15.006.939	$ 15.006.939
3036		**1.3.4.10.1.5**	**EJE 1**	**349,25 d**	**mié 23/10/24**	**lun 31/07/23**	**$ 1.219.660.330**	**$ 1.219.660....**	**$ 1.219.660.330**
3037		**1.3.4.10.1.5**	**Pilotes**	**311,25 d**	**lun 31/07/23**	**jue 5/09/24**	**$ 718.013.417**	**$ 718.013.417**	**$ 718.013.417**
3038		1.3.4.10.1.5	Acero	17 d	lun 31/07/23	mar 22/08/23	$ 238.941.647	$ 238.941.647	$ 238.941.647
3039		1.3.4.10.1.5	Acero pilote uno	5 d	mié 28/08/24	mar 3/09/24	$ 28.570.875	$ 28.570.875	$ 28.570.875
3040		1.3.4.10.1.5	Excavación y Fundida	15 d	vie 8/09/23	mar 26/09/23	$ 382.080.000	$ 382.080.000	$ 382.080.000
3041		1.3.4.10.1.5	Excavación y Fundida pilote unc	1 d	mar 3/09/24	mié 4/09/24	$ 49.920.000	$ 49.920.000	$ 49.920.000
3042		1.3.4.10.1.5	Descabece (Pilotes 7, 8,9, 10)	11 d	mié 27/09/23	mar 10/10/23	$ 1.793.362	$ 1.793.362	$ 1.793.362
3043		1.3.4.10.1.5	Descabece (Pilotes 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,	24 d	mar 31/10/23	jue 30/11/23	$ 15.705.081	$ 15.705.081	$ 15.705.081
3044		1.3.4.10.1.5	Descabece 2 (Pilotes 1)	1 d	mié 4/09/24	jue 5/09/24	$ 1.002.452	$ 1.002.452	$ 1.002.452
3045		**1.3.4.10.1.5**	**Zapatas**	**261,5 d**	**lun 9/10/23**	**jue 12/09/24**	**$ 232.991.078**	**$ 232.991.078**	**$ 232.991.078**
3046		1.3.4.10.1.5	Excavación y Solado (Zapata 2)	2 d	lun 9/10/23	mié 11/10/23	$ 26.961.777	$ 26.961.777	$ 26.961.777
3047		1.3.4.10.1.5	Excavación y Solado (Zapatas 3,	17 d	mié 27/12/23	jue 18/01/24	$ 16.674.340	$ 16.674.340	$ 16.674.340
3048		1.3.4.10.1.5	Excavación y Solado 2 (Zapatas	6 d	jue 5/09/24	jue 12/09/24	$ 8.212.735	$ 8.212.735	$ 8.212.735
3049		1.3.4.10.1.5	Acero	6 d	vie 19/01/24	vie 26/01/24	$ 75.642.932	$ 75.642.932	$ 75.642.932
3050		1.3.4.10.1.5	Acero zapata uno	3 d	jue 5/09/24	lun 9/09/24	$ 25.214.311	$ 25.214.311	$ 25.214.311
3051		1.3.4.10.1.5	Concreto	2 d	mar 30/01/24	jue 1/02/24	$ 60.213.737	$ 60.213.737	$ 60.213.737
3052		1.3.4.10.1.5	Concreto zapata uno	1 d	lun 9/09/24	mar 10/09/24	$ 20.071.246	$ 20.071.246	$ 20.071.246
3053		**1.3.4.10.1.5**	**Columnas**	**177,5 d**	**mar 30/01/24**	**sáb 14/09/24**	$ 110.026.012	**$ 110.026.012**	**$ 110.026.012**
3054		1.3.4.10.1.5	Acero	14 d	mar 30/01/24	jue 15/02/24	$ 78.420.117	$ 78.420.117	$ 78.420.117
3055		1.3.4.10.1.5	Acero 2	2 d	mar 10/09/24	jue 12/09/24	$ 10.693.652	$ 10.693.652	$ 10.693.652
3056		1.3.4.10.1.5	Concreto	4 d	vie 16/02/24	mié 21/02/24	$ 15.684.182	$ 15.684.182	$ 15.684.182
3057		1.3.4.10.1.5	Concreto 2	2 d	jue 12/09/24	sáb 14/09/24	$ 5.228.061	$ 5.228.061	$ 5.228.061
3058		**1.3.4.10.1.5**	**Viga Cabezal**	**101 d**	**lun 17/06/24**	**mié 23/10/24**	$ 158.629.823	**$ 158.629.823**	**$ 158.629.823**
3059		1.3.4.10.1.5	Acero	3 d	lun 17/06/24	mié 19/06/24	$ 41.948.496	$ 41.948.496	$ 41.948.496
3060		1.3.4.10.1.5	Acero 2	18 d	vie 27/09/24	lun 21/10/24	$ 41.948.496	$ 41.948.496	$ 41.948.496
3061		1.3.4.10.1.5	Concreto	2 d	lun 21/10/24	mié 23/10/24	$ 74.732.831	$ 74.732.831	$ 74.732.831
3062		1.3.4.10.1.6	Fin de Eje 1	0 d	mié 23/10/24	mié 23/10/24	$ 0	$ 0	$ 0
3063		**1.3.4.10.1.7**	**EJE 2**	**178 d**	**vie 14/07/23**	**lun 19/02/24**	**$ 1.151.321.886**	**$ 1.151.321....**	**$ 1.151.321.886**
3064		**1.3.4.10.1.7**	**Pilotes**	**125 d**	**vie 14/07/23**	**vie 15/12/23**	**$ 765.982.751**	**$ 765.982.751**	**$ 765.982.751**
3065		1.3.4.10.1.7	Acero (Pilotes 20,19,23,28,31,35,21,22,25,29,	13 d	vie 14/07/23	lun 31/07/23	$ 226.421.375	$ 226.421.375	$ 226.421.375
3066		1.3.4.10.1.7	Acero (24,26,27,30,32,33,36)	8 d	mar 7/11/23	vie 17/11/23	$ 104.759.875	$ 104.759.875	$ 104.759.875
3067		1.3.4.10.1.7	Excavación y Fundida (20,19,23,28,31,35,21,22,25,29	12 d	vie 25/08/23	vie 8/09/23	$ 299.000.000	$ 299.000.000	$ 299.000.000
3068		1.3.4.10.1.7	Excavación y Fundida (24,26,27,30,32,33,36)	10 d	mar 7/11/23	lun 20/11/23	$ 134.010.623	$ 134.010.623	$ 134.010.623
3069		1.3.4.10.1.7	Descabece	15 d	lun 27/11/23	vie 15/12/23	$ 1.790.878	$ 1.790.878	$ 1.790.878
3070		**1.3.4.10.1.7**	**Zapatas**	**20 d**	**sáb 9/12/23**	**jue 4/01/24**	$ 163.294.724	**$ 163.294.724**	**$ 163.294.724**
3071		1.3.4.10.1.7	Excavación y Solado	4 d	sáb 9/12/23	jue 14/12/23	$ 25.203.259	$ 25.203.259	$ 25.203.259
3072		1.3.4.10.1.7	Acero	8 d	mié 20/12/23	sáb 30/12/23	$ 75.140.693	$ 75.140.693	$ 75.140.693
3073		1.3.4.10.1.7	Concreto	3 d	sáb 30/12/23	jue 4/01/24	$ 62.950.772	$ 62.950.772	$ 62.950.772
3074		**1.3.4.10.1.7**	**Columnas**	**21 d**	**sáb 30/12/23**	**vie 26/01/24**	$ 91.318.437	**$ 91.318.437**	**$ 91.318.437**
3075		1.3.4.10.1.7	Acero	15 d	sáb 30/12/23	vie 19/01/24	$ 71.561.573	$ 71.561.573	$ 71.561.573
3076		1.3.4.10.1.7	Concreto	6 d	vie 19/01/24	vie 26/01/24	$ 19.756.864	$ 19.756.864	$ 19.756.864
3077		**1.3.4.10.1.7**	**Viga Cabezal**	**20 d**	**vie 26/01/24**	**lun 19/02/24**	$ 130.725.974	**$ 130.725.974**	**$ 130.725.974**
3078		1.3.4.10.1.7	Acero	18 d	vie 26/01/24	vie 16/02/24	$ 58.408.302	$ 58.408.302	$ 58.408.302
3079		1.3.4.10.1.7	Concreto	2 d	vie 16/02/24	lun 19/02/24	$ 72.317.672	$ 72.317.672	$ 72.317.672
3080		1.3.4.10.1.8	Fin de Eje 2	0 d	lun 19/02/24	lun 19/02/24	$ 0	$ 0	$ 0
3081		**1.3.4.10.1.9**	**EJE 3**	**571,25 d**	**sáb 1/07/23**	**mar 8/07/25**	**$ 1.530.051.347**	**$ 1.530.051....**	**$ 1.530.051.347**
3082		1.3.4.10.1.9	Instrumentación para Red Matriz	30 d	sáb 1/07/23	mié 9/08/23	$ 61.439.801	$ 61.439.801	$ 61.439.801
3083		1.3.4.10.1.9	Protección de Red Matriz	11 d	lun 4/03/24	sáb 16/03/24	$ 177.298.919	$ 177.298.919	$ 177.298.919
3084		1.3.4.10.1.9	Protección de Red Matriz 2	44 d	jue 24/10/24	mié 18/12/24	$ 86.888.810	$ 86.888.810	$ 86.888.810
3085		**1.3.4.10.1.9**	**Pilotes**	**41 d**	**mié 18/12/24**	**lun 10/02/25**	$ 833.982.751	**$ 833.982.751**	**$ 833.982.751**
3086		1.3.4.10.1.9	Acero	13 d	mié 18/12/24	mar 7/01/25	$ 348.244.808	$ 348.244.808	$ 348.244.808
3087		1.3.4.10.1.9	Excavación y Fundida	20 d	mar 7/01/25	jue 30/01/25	$ 483.947.065	$ 483.947.065	$ 483.947.065
3088		1.3.4.10.1.9	Descabece	8 d	vie 31/01/25	lun 10/02/25	$ 1.790.878	$ 1.790.878	$ 1.790.878
3089		**1.3.4.10.1.9**	**Zapatas**	**15 d**	**lun 28/04/25**	**vie 16/05/25**	$ 160.966.732	**$ 160.966.732**	**$ 160.966.732**
3090		1.3.4.10.1.9	Excavación y Solado	4 d	lun 28/04/25	sáb 3/05/25	$ 25.133.470	$ 25.133.470	$ 25.133.470
3091		1.3.4.10.1.9	Acero	8 d	sáb 3/05/25	mar 13/05/25	$ 75.140.693	$ 75.140.693	$ 75.140.693
3092		1.3.4.10.1.9	Concreto	3 d	mar 13/05/25	vie 16/05/25	$ 60.692.569	$ 60.692.569	$ 60.692.569
3093		**1.3.4.10.1.9**	**Columnas**	**18 d**	**sáb 24/05/25**	**lun 16/06/25**	$ 92.977.382	**$ 92.977.382**	**$ 92.977.382**
3094		1.3.4.10.1.9	Acero	12 d	sáb 24/05/25	lun 9/06/25	$ 72.660.336	$ 72.660.336	$ 72.660.336
3095		1.3.4.10.1.9	Concreto	6 d	lun 9/06/25	lun 16/06/25	$ 20.317.046	$ 20.317.046	$ 20.317.046
3096		**1.3.4.10.1.9**	**Viga Cabezal**	**9 d**	**jue 26/06/25**	**mar 8/07/25**	$ 116.496.952	**$ 116.496.952**	**$ 116.496.952**
3097		1.3.4.10.1.9	Acero	7 d	jue 26/06/25	sáb 5/07/25	$ 55.028.397	$ 55.028.397	$ 55.028.397
3098		1.3.4.10.1.9	Concreto	2 d	sáb 5/07/25	mar 8/07/25	$ 61.468.555	$ 61.468.555	$ 61.468.555
3099		1.3.4.10.1.9	Fin de Eje 3	0 d	vie 11/07/25	vie 11/07/25	$ 0	$ 0	$ 0
3100		**1.3.4.10.1.1**	**EJE 4**	**310 d**	**mié 10/04/24**	**mié 14/05/25**	**$ 1.083.758.674**	**$ 1.083.758....**	**$ 1.083.758.674**
3101		**1.3.4.10.1.1**	**Pilotes**	**104 d**	**mié 10/04/24**	**sáb 24/08/24**	$ 700.162.269	**$ 700.162.269**	**$ 700.162.269**
3102		1.3.4.10.1.1	Acero	12 d	mié 10/04/24	mié 24/04/24	$ 203.244.808	$ 203.244.808	$ 203.244.808
3103		1.3.4.10.1.1	Excavación y Fundida	14 d	mié 10/04/24	sáb 27/04/24	$ 442.089.759	$ 442.089.759	$ 442.089.759
3104		1.3.4.10.1.1	Excavación y Fundida 2	23 d	lun 15/07/24	mar 13/08/24	$ 53.036.824	$ 53.036.824	$ 53.036.824
3105		1.3.4.10.1.1	Descabece	8 d	mié 14/08/24	sáb 24/08/24	$ 1.790.878	$ 1.790.878	$ 1.790.878
3106		**1.3.4.10.1.1**	**Zapatas**	**15 d**	**sáb 1/03/25**	**mié 19/03/25**	$ 170.338.850	**$ 170.338.850**	**$ 170.338.850**
3107		1.3.4.10.1.1	Excavación y Solado	4 d	sáb 1/03/25	jue 6/03/25	$ 28.121.585	$ 28.121.585	$ 28.121.585
3108		1.3.4.10.1.1	Acero	8 d	jue 6/03/25	sáb 15/03/25	$ 75.140.693	$ 75.140.693	$ 75.140.693
3109		1.3.4.10.1.1	Concreto	3 d	sáb 15/03/25	mié 19/03/25	$ 67.076.572	$ 67.076.572	$ 67.076.572
3110		**1.3.4.10.1.1**	**Columnas**	**18 d**	**vie 28/03/25**	**lun 21/04/25**	$ 96.760.603	**$ 96.760.603**	**$ 96.760.603**
3111		1.3.4.10.1.1	Acero	12 d	vie 28/03/25	vie 11/04/25	$ 76.117.481	$ 76.117.481	$ 76.117.481
3112		1.3.4.10.1.1	Concreto	6 d	vie 11/04/25	lun 21/04/25	$ 20.643.122	$ 20.643.122	$ 20.643.122
3113		**1.3.4.10.1.1**	**Viga Cabezal**	**12 d**	**mar 29/04/25**	**mié 14/05/25**	$ 116.496.952	**$ 116.496.952**	**$ 116.496.952**
3114		1.3.4.10.1.1	Acero	10 d	mar 29/04/25	lun 12/05/25	$ 55.028.397	$ 55.028.397	$ 55.028.397
3115		1.3.4.10.1.1	Concreto	2 d	lun 12/05/25	mié 14/05/25	$ 61.468.555	$ 61.468.555	$ 61.468.555
3116		1.3.4.10.1.1	Fin de Eje 4	0 d	mié 14/05/25	mié 14/05/25	$ 0	$ 0	$ 0
3117		**1.3.4.10.1.1**	**EJE 5**	**460,25 d**	**sáb 1/07/23**	**vie 14/02/25**	**$ 1.594.403.328**	**$ 1.594.403....**	**$ 1.594.403.328**
3118		1.3.4.10.1.1	Instrumentación para Red Matriz	30 d	sáb 1/07/23	mié 9/08/23	$ 71.648.954	$ 71.648.954	$ 71.648.954
3119		1.3.4.10.1.1	Protección de Red Matriz	16 d	jue 11/01/24	mar 30/01/24	$ 263.792.398	$ 263.792.398	$ 263.792.398
3120		1.3.4.10.1.1	Protección de Red Matriz 2	44 d	mar 23/07/24	mar 17/09/24	$ 65.948.099	$ 65.948.099	$ 65.948.099
3121		**1.3.4.10.1.1**	**Pilotes**	**229,5 d**	**jue 25/01/24**	**sáb 16/11/24**	$ 813.982.751	**$ 813.982.751**	**$ 813.982.751**
3122		1.3.4.10.1.1	Acero	3 d	jue 25/01/24	lun 29/01/24	$ 251.630.950	$ 251.630.950	$ 251.630.950
3123		1.3.4.10.1.1	Acero 2	15 d	vie 27/09/24	jue 17/10/24	$ 76.613.858	$ 76.613.858	$ 76.613.858
3124		1.3.4.10.1.1	Excavación y Fundida	32 d	mié 25/09/24	mar 5/11/24	$ 483.947.065	$ 483.947.065	$ 483.947.065

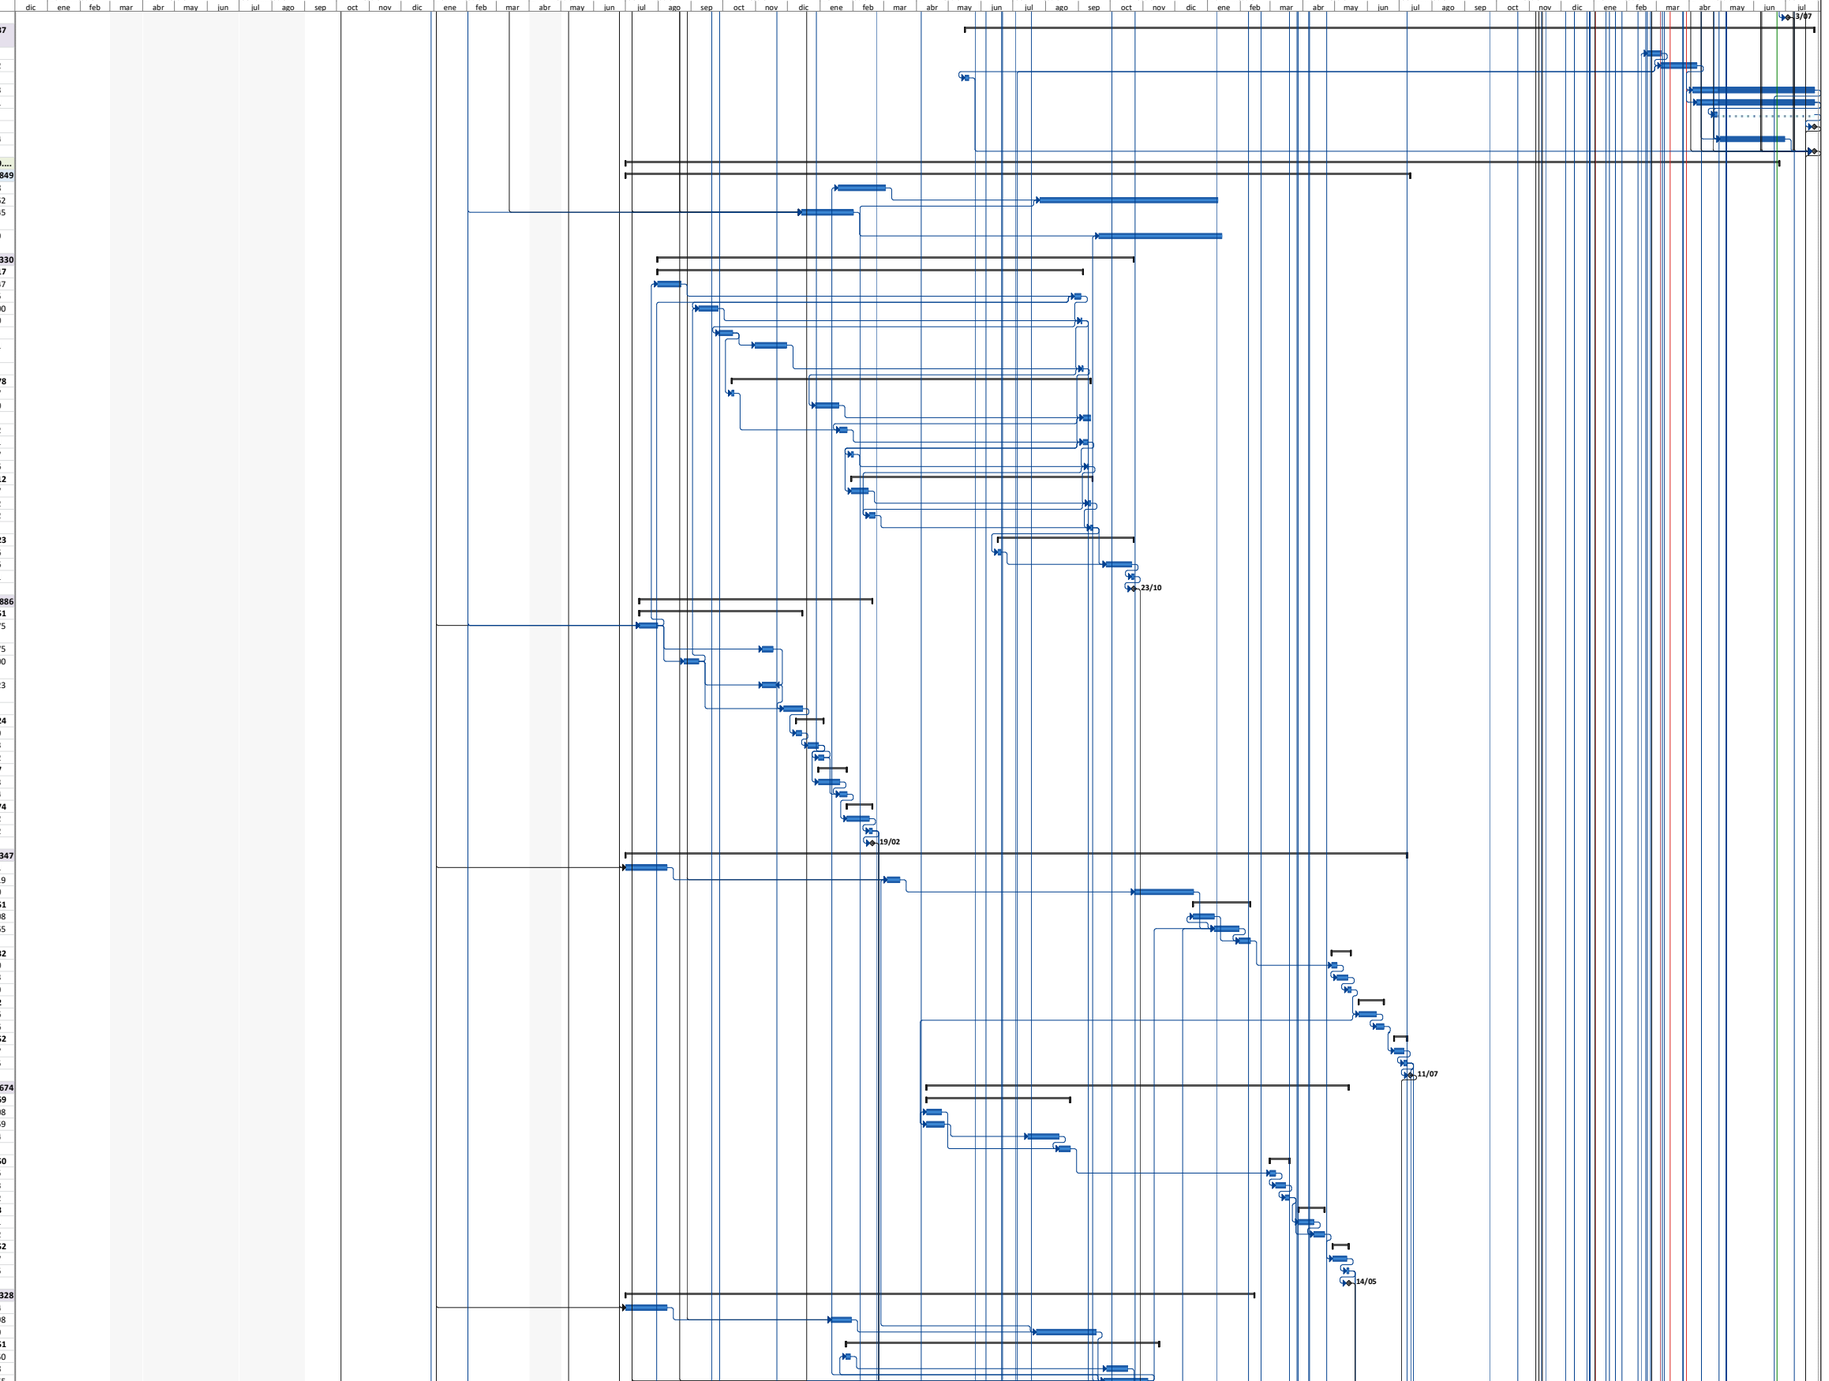

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | Sólo el comienzo | Fecha límite | División crítica | Progreso manual
División | Resumen | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo | Sólo duración | Resumen manual | Sólo fin | Tareas críticas | Progreso


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
3125		1.3.4.10.1.1	Descabece	8 d	mié 6/11/24	sáb 16/11/24	$ 1.790.878	$ 1.790.878	$ 1.790.878
3126		**1.3.4.10.1.1**	**Zapatas**	**15 d**	**mar 19/11/24**	**vie 6/12/24**	$ 164.329.537	**$ 164.329.537**	**$ 164.329.537**
3127		1.3.4.10.1.1	Excavación y Solado	4 d	mar 19/11/24	sáb 23/11/24	$ 25.828.284	$ 25.828.284	$ 25.828.284
3128		1.3.4.10.1.1	Acero	8 d	sáb 23/11/24	mar 3/12/24	$ 75.140.693	$ 75.140.693	$ 75.140.693
3129		1.3.4.10.1.1	Concreto	3 d	mié 4/12/24	vie 6/12/24	$ 63.360.560	$ 63.360.560	$ 63.360.560
3130		**1.3.4.10.1.1**	**Columnas**	**21 d**	**sáb 14/12/24**	**lun 13/01/25**	$ 98.204.642	**$ 98.204.642**	**$ 98.204.642**
3131		1.3.4.10.1.1	Acero	15 d	sáb 14/12/24	vie 3/01/25	$ 76.976.256	$ 76.976.256	$ 76.976.256
3132		1.3.4.10.1.1	Concreto	6 d	sáb 4/01/25	lun 13/01/25	$ 21.228.386	$ 21.228.386	$ 21.228.386
3133		**1.3.4.10.1.1**	**Viga Cabezal**	**20 d**	**mar 21/01/25**	**vie 14/02/25**	$ 116.496.947	**$ 116.496.947**	**$ 116.496.947**
3134		1.3.4.10.1.1	Acero	18 d	mar 21/01/25	mié 12/02/25	$ 55.028.397	$ 55.028.397	$ 55.028.397
3135		1.3.4.10.1.1	Concreto	2 d	mié 12/02/25	vie 14/02/25	$ 61.468.550	$ 61.468.550	$ 61.468.550
3136		1.3.4.10.1.1	Fin de Eje 5	0 d	vie 14/02/25	vie 14/02/25	$ 0	$ 0	$ 0
3137		**1.3.4.10.1.1**	**EJE 6**	**118 d**	**mié 29/11/23**	**mar 30/04/24**	**$ 1.238.705.265**	**$ 1.238.705....**	**$ 1.238.705.265**
3138		**1.3.4.10.1.1**	**Pilotes**	**67 d**	**mié 29/11/23**	**vie 23/02/24**	$ 863.982.751	**$ 863.982.751**	**$ 863.982.751**
3139		1.3.4.10.1.1	Acero (Para pilotes que no requieren de maniobra de	7 d	mié 29/11/23	jue 7/12/23	$ 164.122.404	$ 164.122.404	$ 164.122.404
3140		1.3.4.10.1.1	Acero (Para pilotes que requieren de maniobra de	7 d	jue 11/01/24	vie 19/01/24	$ 164.122.404	$ 164.122.404	$ 164.122.404
3141		1.3.4.10.1.1	Excavación y Fundida (No requieren maniobra de	8 d	jue 30/11/23	mar 12/12/23	$ 266.973.532	$ 266.973.532	$ 266.973.532
3142		1.3.4.10.1.1	Excavación y Fundida (Requieren maniobra de	14 d	sáb 20/01/24	mié 7/02/24	$ 266.973.533	$ 266.973.533	$ 266.973.533
3143		1.3.4.10.1.1	Descabece	14 d	mié 7/02/24	vie 23/02/24	$ 1.790.878	$ 1.790.878	$ 1.790.878
3144		**1.3.4.10.1.1**	**Zapatas**	**13 d**	**lun 26/02/24**	**mar 12/03/24**	$ 162.259.062	**$ 162.259.062**	**$ 162.259.062**
3145		1.3.4.10.1.1	Excavación y Solado	3 d	lun 26/02/24	mié 28/02/24	$ 24.577.720	$ 24.577.720	$ 24.577.720
3146		1.3.4.10.1.1	Acero	7 d	vie 1/03/24	sáb 9/03/24	$ 75.140.693	$ 75.140.693	$ 75.140.693
3147		1.3.4.10.1.1	Concreto	2 d	sáb 9/03/24	mar 12/03/24	$ 62.540.649	$ 62.540.649	$ 62.540.649
3148		**1.3.4.10.1.1**	**Columnas**	**20 d**	**sáb 9/03/24**	**sáb 6/04/24**	$ 95.966.500	**$ 95.966.500**	**$ 95.966.500**
3149		1.3.4.10.1.1	Acero	14 d	sáb 9/03/24	mié 27/03/24	$ 74.478.926	$ 74.478.926	$ 74.478.926
3150		1.3.4.10.1.1	Concreto	6 d	sáb 30/03/24	sáb 6/04/24	$ 21.487.574	$ 21.487.574	$ 21.487.574
3151		**1.3.4.10.1.1**	**Viga Cabezal**	**19 d**	**sáb 6/04/24**	**mar 30/04/24**	$ 116.496.952	**$ 116.496.952**	**$ 116.496.952**
3152		1.3.4.10.1.1	Acero	17 d	sáb 6/04/24	vie 26/04/24	$ 55.028.397	$ 55.028.397	$ 55.028.397
3153		1.3.4.10.1.1	Concreto	2 d	sáb 27/04/24	mar 30/04/24	$ 61.468.555	$ 61.468.555	$ 61.468.555
3154		1.3.4.10.1.1	Fin de Eje 6	0 d	mar 30/04/24	mar 30/04/24	$ 0	$ 0	$ 0
3155		**1.3.4.10.1.1**	**EJE 7**	**143 d**	**sáb 5/08/23**	**mié 7/02/24**	**$ 884.868.616**	**$ 884.868.616**	**$ 884.868.616**
3156		**1.3.4.10.1.1**	**Pilotes**	**104 d**	**sáb 5/08/23**	**lun 18/12/23**	$ 532.848.818	**$ 532.848.818**	**$ 532.848.818**
3157		1.3.4.10.1.1	Acero	12 d	sáb 5/08/23	mié 23/08/23	$ 231.181.250	$ 231.181.250	$ 231.181.250
3158		1.3.4.10.1.1	Excavación y Fundida (109,110,111,113,114,116,117,	9 d	mié 23/08/23	sáb 2/09/23	$ 218.040.000	$ 218.040.000	$ 218.040.000
3159		1.3.4.10.1.1	Excavación y Fundida (112,115,	4 d	vie 24/11/23	mié 29/11/23	$ 82.234.443	$ 82.234.443	$ 82.234.443
3160		1.3.4.10.1.1	Descabece	13 d	jue 30/11/23	lun 18/12/23	$ 1.393.125	$ 1.393.125	$ 1.393.125
3161		**1.3.4.10.1.1**	**Zapatas**	**13 d**	**mar 19/12/23**	**vie 5/01/24**	$ 159.905.321	**$ 159.905.321**	**$ 159.905.321**
3162		1.3.4.10.1.1	Excavación y Solado	3 d	mar 19/12/23	vie 22/12/23	$ 22.436.774	$ 22.436.774	$ 22.436.774
3163		1.3.4.10.1.1	Acero	7 d	sáb 23/12/23	mié 3/01/24	$ 80.537.941	$ 80.537.941	$ 80.537.941
3164		1.3.4.10.1.1	Concreto	2 d	jue 4/01/24	vie 5/01/24	$ 56.930.606	$ 56.930.606	$ 56.930.606
3165		**1.3.4.10.1.1**	**Columnas**	**19 d**	**jue 4/01/24**	**sáb 27/01/24**	$ 92.977.382	**$ 92.977.382**	**$ 92.977.382**
3166		1.3.4.10.1.1	Acero	13 d	jue 4/01/24	sáb 20/01/24	$ 72.660.336	$ 72.660.336	$ 72.660.336
3167		1.3.4.10.1.1	Concreto	5 d	lun 22/01/24	sáb 27/01/24	$ 20.317.046	$ 20.317.046	$ 20.317.046
3168		**1.3.4.10.1.1**	**Viga Cabezal**	**7 d**	**mar 30/01/24**	**mié 7/02/24**	$ 99.137.095	**$ 99.137.095**	**$ 99.137.095**
3169		1.3.4.10.1.1	Acero	6 d	mar 30/01/24	mar 6/02/24	$ 48.123.035	$ 48.123.035	$ 48.123.035
3170		1.3.4.10.1.1	Concreto	1 d	mar 6/02/24	mié 7/02/24	$ 51.014.060	$ 51.014.060	$ 51.014.060
3171		1.3.4.10.1.1	Fin de Eje 7	0 d	mié 7/02/24	mié 7/02/24	$ 0	$ 0	$ 0
3172		1.3.4.10.2	Fin de Subestructura	0 d	vie 11/07/25	vie 11/07/25	$ 0	$ 0	$ 0
3173		1.3.4.10.3	APROBACIÓN SDM PARA TRANSPORTE E IZAJE	0 d	jue 2/05/24	jue 2/05/24	$ 0	$ 0	$ 0
3174		1.3.4.10.4	TRANSPORTE Y CARGUE DE VIGAS - VANOS 1-2,6-7	3 d	jue 2/05/24	lun 6/05/24	$ 107.582.703	$ 107.582.703	$ 107.582.703
3175		1.3.4.10.5	TRANSPORTE Y CARGUE DE VIGAS - VANOS 2-3	5 d	vie 18/07/25	jue 24/07/25	$ 179.304.515	$ 179.304.515	$ 179.304.515
3176		1.3.4.10.6	TRANSPORTE Y CARGUE DE VIGAS - VANOS 3-4	5 d	mié 30/07/25	mar 5/08/25	$ 179.304.515	$ 179.304.515	$ 179.304.515
3177		1.3.4.10.7	TRANSPORTE Y CARGUE DE VIGAS - VANOS 4-5	5 d	lun 28/07/25	sáb 2/08/25	$ 179.304.515	$ 179.304.515	$ 179.304.515
3178		1.3.4.10.8	TRANSPORTE Y CARGUE DE VIGAS - VANOS 5-6	10 d	mar 24/06/25	lun 7/07/25	$ 179.304.515	$ 179.304.515	$ 179.304.515
3179		**1.3.4.10.9**	**SUPERESTRUCTURA**	**778,5 d**	**sáb 2/09/23**	**lun 1/06/26**	**$ 11.486.941.660**	**$ 11.486.941....**	**$ 11.486.941....**
3180		**1.3.4.10.9.1**	**LUZ 1 (EJE 1 Y 2)**	**453,5 d**	**jue 4/04/24**	**vie 7/11/25**	**$ 1.333.818.025**	**$ 1.333.818....**	**$ 1.333.818.025**
3181		**1.3.4.10.9.1**	**Vigas Postensadas**	**453,5 d**	**jue 4/04/24**	**vie 7/11/25**	**$ 835.703.864**	**$ 835.703.864**	**$ 835.703.864**
3182		1.3.4.10.9.1	Acero	10 d	jue 4/04/24	mar 16/04/24	$ 80.622.950	$ 80.622.950	$ 80.622.950
3183		1.3.4.10.9.1	Acero 2	10 d	lun 12/08/24	sáb 24/08/24	$ 80.622.950	$ 80.622.950	$ 80.622.950
3184		1.3.4.10.9.1	Concreto	2 d	mar 16/04/24	jue 18/04/24	$ 62.720.000	$ 62.720.000	$ 62.720.000
3185		1.3.4.10.9.1	Concreto 2	6 d	sáb 24/08/24	sáb 31/08/24	$ 62.720.000	$ 62.720.000	$ 62.720.000
3186		**1.3.4.10.9.1**	**Tensionamiento**	**326 d**	**lun 16/09/24**	**vie 7/11/25**	**$ 239.083.222**	**$ 239.083.222**	**$ 239.083.222**
3187		1.3.4.10.9.1	Etapa 1	6 d	lun 16/09/24	lun 23/09/24	$ 159.388.205	$ 159.388.205	$ 159.388.205
3188		1.3.4.10.9.1	Etapa 2	140 d	mar 13/05/25	vie 7/11/25	$ 79.695.017	$ 79.695.017	$ 79.695.017
3189		1.3.4.10.9.1	Izaje de vigas	6 d	lun 7/10/24	mar 15/10/24	$ 309.934.742	$ 309.934.742	$ 309.934.742
3190		**1.3.4.10.9.1**	**Losa Superior**	**160 d**	**mar 8/04/25**	**jue 30/10/25**	**$ 498.114.161**	**$ 498.114.161**	**$ 498.114.161**
3191		1.3.4.10.9.1	Obra Falsa	4 d	mar 8/04/25	sáb 12/04/25	$ 31.609.799	$ 31.609.799	$ 31.609.799
3192		1.3.4.10.9.1	Acero	5 d	lun 14/04/25	mar 22/04/25	$ 183.315.730	$ 183.315.730	$ 183.315.730
3193		1.3.4.10.9.1	Concreto (2/3 tablero)	115 d	mar 22/04/25	mar 16/09/25	$ 183.188.632	$ 183.188.632	$ 183.188.632
3194		1.3.4.10.9.1	Concreto (2/3 tablero) 2a parte	36 d	mar 16/09/25	jue 30/10/25	$ 100.000.000	$ 100.000.000	$ 100.000.000
3195		1.3.4.10.9.2	Fin Luz 1	0 d	vie 7/11/25	vie 7/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
3196		**1.3.4.10.9.3**	**LUZ 2 (EJE 2 Y 3)**	**614,5 d**	**sáb 2/09/23**	**jue 30/10/25**	**$ 1.175.709.463**	**$ 1.175.709....**	**$ 1.175.709.463**
3197		**1.3.4.10.9.3**	**Vigas Postensadas**	**568,75 d**	**sáb 2/09/23**	**mié 3/09/25**	**$ 766.186.703**	**$ 766.186.703**	**$ 766.186.703**
3198		1.3.4.10.9.3	Acero	18 d	sáb 2/09/23	sáb 23/09/23	$ 135.204.250	$ 135.204.250	$ 135.204.250
3199		1.3.4.10.9.3	Concreto	4 d	lun 25/09/23	vie 29/09/23	$ 112.000.000	$ 112.000.000	$ 112.000.000
3200		1.3.4.10.9.3	Concreto 2	1 d	vie 30/08/24	vie 30/08/24	$ 22.400.000	$ 22.400.000	$ 22.400.000
3201		**1.3.4.10.9.3**	**Tensionamiento**	**538,5 d**	**mar 10/10/23**	**mié 3/09/25**	**$ 199.236.628**	**$ 199.236.628**	**$ 199.236.628**
3202		1.3.4.10.9.3	Etapa 1	5 d	mar 10/10/23	sáb 14/10/23	$ 57.114.238	$ 57.114.238	$ 57.114.238
3203		1.3.4.10.9.3	Etapa 2 de 1	4 d	lun 30/09/24	vie 4/10/24	$ 75.709.571	$ 75.709.571	$ 75.709.571
3204		1.3.4.10.9.3	Etapa 2	30 d	sáb 26/07/25	mié 3/09/25	$ 66.412.819	$ 66.412.819	$ 66.412.819
3205		1.3.4.10.9.3	Izaje de Vigas	5 d	mar 15/07/25	lun 21/07/25	$ 297.345.825	$ 297.345.825	$ 297.345.825
3206		**1.3.4.10.9.3**	**Losa Superior**	**83 d**	**vie 18/07/25**	**jue 30/10/25**	**$ 409.522.760**	**$ 409.522.760**	**$ 409.522.760**
3207		1.3.4.10.9.3	Obra Falsa	7 d	vie 18/07/25	sáb 26/07/25	$ 31.609.799	$ 31.609.799	$ 31.609.799
3208		1.3.4.10.9.3	Acero	6 d	sáb 26/07/25	sáb 2/08/25	$ 178.557.040	$ 178.557.040	$ 178.557.040
3209		1.3.4.10.9.3	Concreto	30 d	mié 6/08/25	lun 15/09/25	$ 81.425.147	$ 81.425.147	$ 81.425.147
3210		1.3.4.10.9.3	Concreto 2a parte	37 d	lun 15/09/25	jue 30/10/25	$ 117.930.774	$ 117.930.774	$ 117.930.774
3211		1.3.4.10.9.4	Fin Luz 2	0 d	jue 30/10/25	jue 30/10/25	$ 0	$ 0	$ 0
3212		**1.3.4.10.9.5**	**LUZ 3 (EJE 3 Y 4)**	**593,25 d**	**lun 25/09/23**	**lun 27/10/25**	**$ 1.101.571.009**	**$ 1.101.571....**	**$ 1.101.571.009**
3213		**1.3.4.10.9.5**	**Vigas Postensadas**	**552,5 d**	**lun 25/09/23**	**vie 5/09/25**	**$ 787.681.123**	**$ 787.681.123**	**$ 787.681.123**
3214		1.3.4.10.9.5	Acero Etapa 1	18 d	lun 25/09/23	mar 17/10/23	$ 81.122.550	$ 81.122.550	$ 81.122.550
3215		1.3.4.10.9.5	Acero Etapa 2 de 1	7 d	jue 5/09/24	vie 13/09/24	$ 43.265.360	$ 43.265.360	$ 43.265.360
3216		1.3.4.10.9.5	Acero Etapa 2	6 d	jue 10/10/24	vie 18/10/24	$ 97.347.060	$ 97.347.060	$ 97.347.060
3217		1.3.4.10.9.5	concreto -2	5 d	mar 17/10/23	lun 23/10/23	$ 67.200.000	$ 67.200.000	$ 67.200.000
3218		1.3.4.10.9.5	Concreto	4 d	vie 18/10/24	mié 23/10/24	$ 44.800.000	$ 44.800.000	$ 44.800.000
3219		**1.3.4.10.9.5**	**Tensionamiento**	**490,5 d**	**jue 14/12/23**	**vie 5/09/25**	**$ 199.238.457**	**$ 199.238.457**	**$ 199.238.457**
3220		1.3.4.10.9.5	Etapa	5 d	jue 14/12/23	mié 20/12/23	$ 57.114.238	$ 57.114.238	$ 57.114.238
3221		1.3.4.10.9.5	Etapa 1	5 d	jue 24/10/24	mié 30/10/24	$ 75.709.571	$ 75.709.571	$ 75.709.571
3222		1.3.4.10.9.5	Etapa 2	20 d	mar 12/08/25	vie 5/09/25	$ 66.414.648	$ 66.414.648	$ 66.414.648
3223		1.3.4.10.9.5	Izaje de Vigas	5 d	jue 31/07/25	mié 6/08/25	$ 254.707.696	$ 254.707.696	$ 254.707.696
3224		**1.3.4.10.9.5**	**Losa Superior**	**63 d**	**vie 8/08/25**	**lun 27/10/25**	**$ 313.889.886**	**$ 313.889.886**	**$ 313.889.886**
3225		1.3.4.10.9.5	Obra Falsa	5 d	vie 8/08/25	jue 14/08/25	$ 31.609.799	$ 31.609.799	$ 31.609.799
3226		1.3.4.10.9.5	Acero	5 d	vie 15/08/25	vie 22/08/25	$ 174.934.940	$ 174.934.940	$ 174.934.940

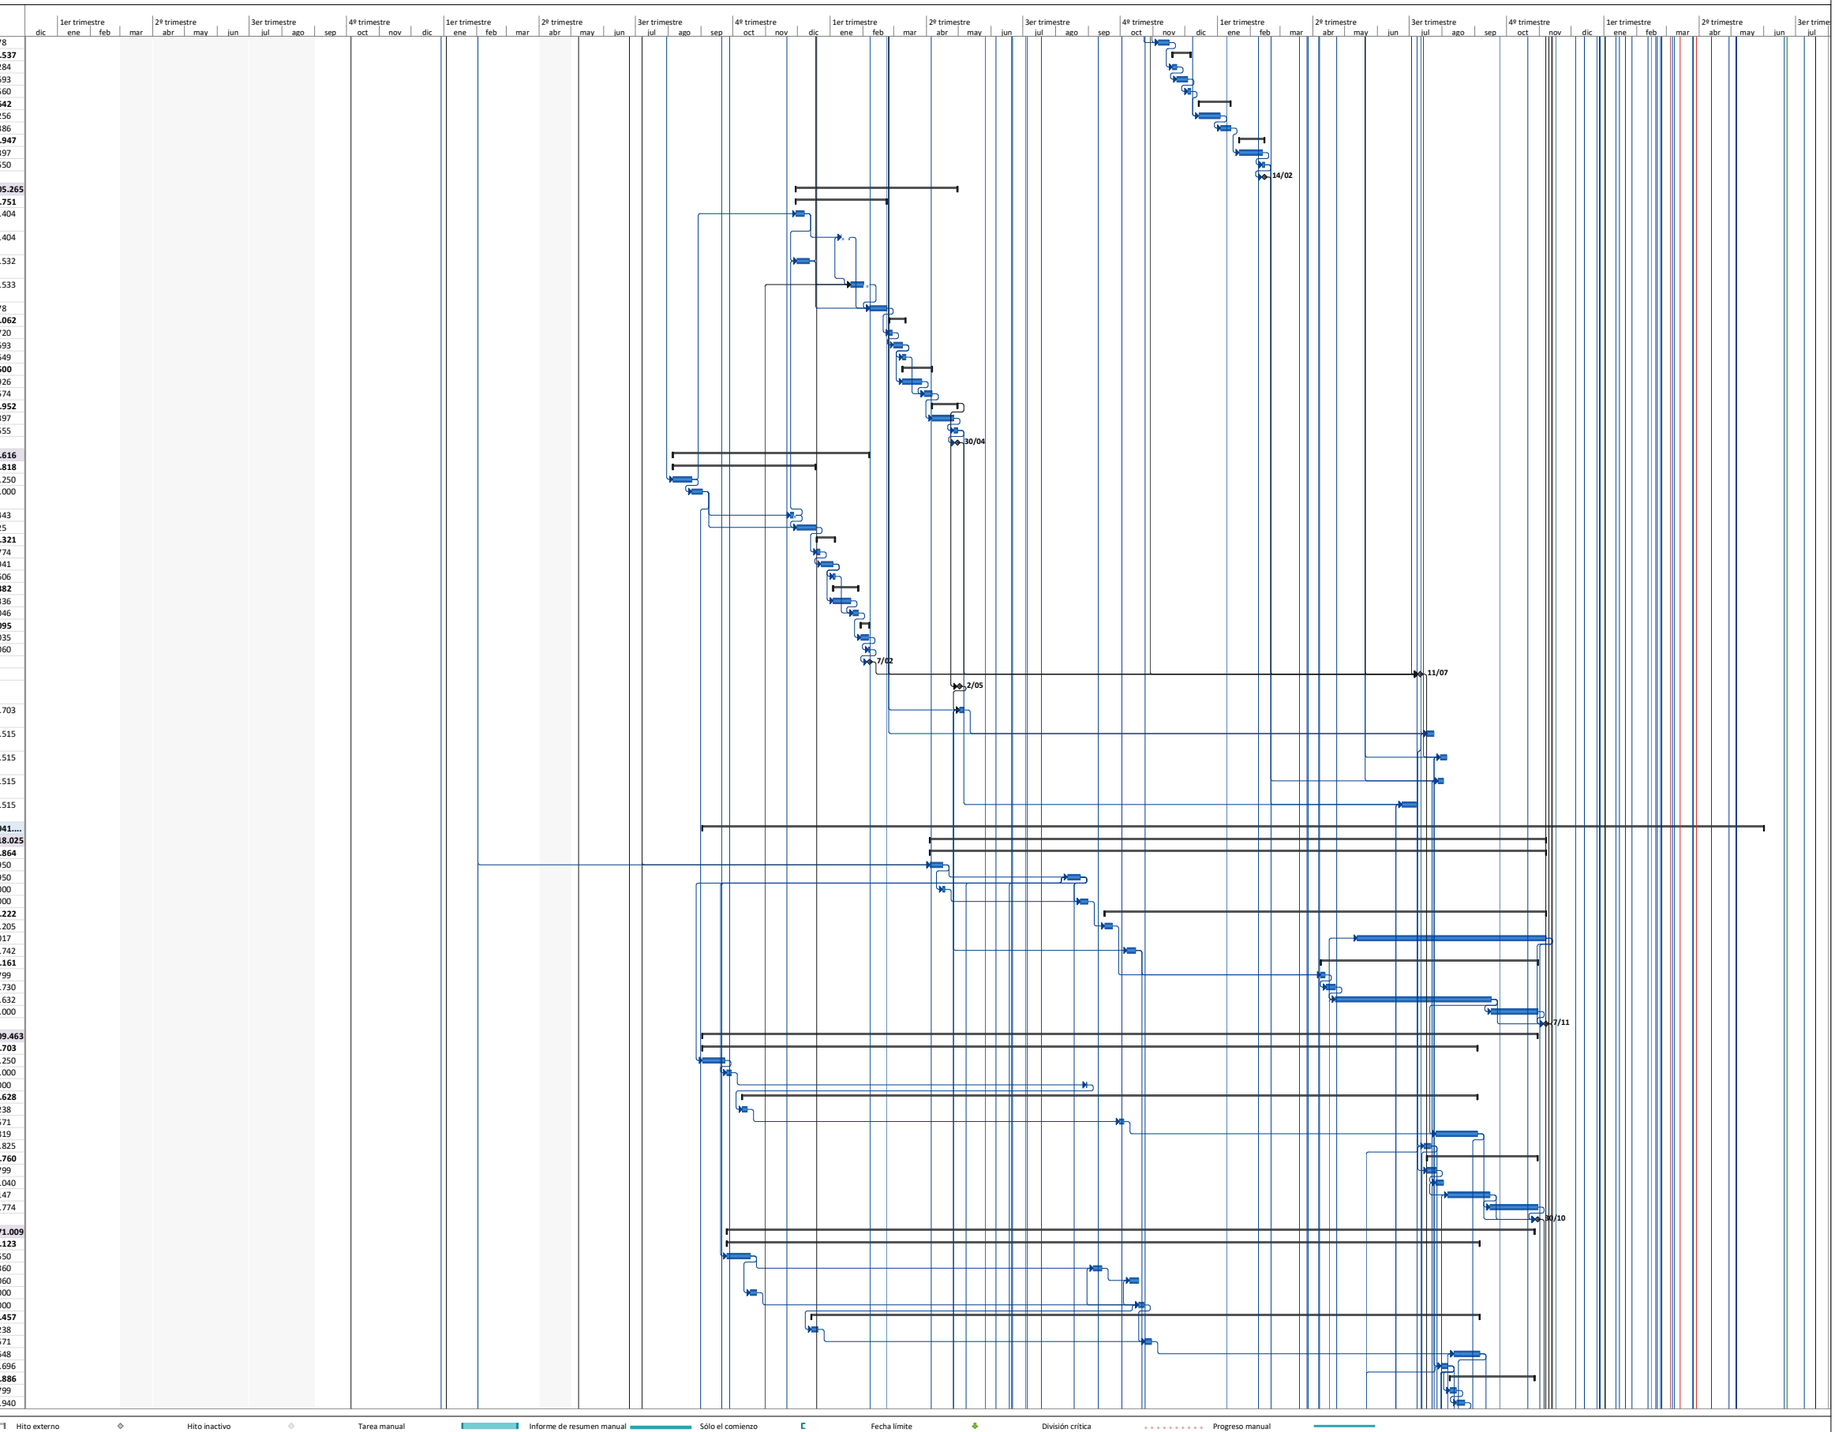

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | Sólo el comienzo | Fecha límite | División crítica | Progreso manual
División | Resumen | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo | Sólo duración | Resumen manual | Sólo fin | Tareas críticas | Progreso

Proyecto: IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB8-20221201
Fecha: mar 23/06/26


Id	Modo de tare	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
3227		1.3.4.10.9.5	Concreto	19 d	vie 22/08/25	lun 15/09/25	$ 67.345.147	$ 67.345.147	$ 67.345.147
3228		1.3.4.10.9.5	Concreto 2a parte	34 d	lun 15/09/25	lun 27/10/25	$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ 40.000.000
3229		1.3.4.10.9.6	Fin Luz 3	0 d	lun 27/10/25	lun 27/10/25	$ 0	$ 0	$ 0
3230		**1.3.4.10.9.7**	**LUZ 4 (EJE 4 Y 5)**	**637,25 d**	**mar 26/09/23**	**mié 24/12/25**	**$ 1.023.743.990**	**$ 1.023.743....**	**$ 1.023.743.990**
3231		**1.3.4.10.9.7**	**Vigas Postensadas**	**554,5 d**	**mar 26/09/23**	**mié 10/09/25**	**$ 703.765.229**	**$ 703.765.229**	**$ 703.765.229**
3232		1.3.4.10.9.7	Acero	17 d	mar 26/09/23	mar 17/10/23	$ 137.820.905	$ 137.820.905	$ 137.820.905
3233		1.3.4.10.9.7	Concreto	4 d	mié 18/10/23	lun 23/10/23	$ 112.000.000	$ 112.000.000	$ 112.000.000
3234		**1.3.4.10.9.7**	**Tensionamiento**	**537,25 d**	**mié 18/10/23**	**mié 10/09/25**	**$ 199.236.628**	**$ 199.236.628**	**$ 199.236.628**
3235		1.3.4.10.9.7	Etapa	5 d	mié 18/10/23	mar 24/10/23	$ 57.114.238	$ 57.114.238	$ 57.114.238
3236		1.3.4.10.9.7	Etapa 1	5 d	mar 29/10/24	mar 5/11/24	$ 75.709.571	$ 75.709.571	$ 75.709.571
3237		1.3.4.10.9.7	Etapa 2	15 d	vie 22/08/25	mié 10/09/25	$ 66.412.819	$ 66.412.819	$ 66.412.819
3238		1.3.4.10.9.7	Izaje de Vigas	5 d	mar 29/07/25	lun 4/08/25	$ 254.707.696	$ 254.707.696	$ 254.707.696
3239		**1.3.4.10.9.7**	**Losa Superior**	**106 d**	**mar 12/08/25**	**mié 24/12/25**	**$ 319.978.761**	**$ 319.978.761**	**$ 319.978.761**
3240		1.3.4.10.9.7	Obra Falsa	5 d	mar 12/08/25	mar 19/08/25	$ 31.609.799	$ 31.609.799	$ 31.609.799
3241		1.3.4.10.9.7	Acero	4 d	vie 15/08/25	jue 21/08/25	$ 181.023.815	$ 181.023.815	$ 181.023.815
3242		1.3.4.10.9.7	Concreto (tablero 2/3)	60 d	mié 20/08/25	sáb 1/11/25	$ 57.345.147	$ 57.345.147	$ 57.345.147
3243		1.3.4.10.9.7	Concreto (tablero 2/3) 2a parte	40 d	mar 4/11/25	mié 24/12/25	$ 50.000.000	$ 50.000.000	$ 50.000.000
3244		1.3.4.10.9.8	Fin Luz 4	0 d	mié 24/12/25	mié 24/12/25	$ 0	$ 0	$ 0
3245		**1.3.4.10.9.9**	**LUZ 5 (EJE 5 Y 6)**	**415 d**	**lun 27/05/24**	**mar 11/11/25**	**$ 1.088.780.364**	**$ 1.088.780....**	**$ 1.088.780.364**
3246		**1.3.4.10.9.9**	**Vigas Postensadas**	**367,25 d**	**lun 27/05/24**	**jue 11/09/25**	**$ 751.441.243**	**$ 751.441.243**	**$ 751.441.243**
3247		1.3.4.10.9.9	Acero	4 d	jue 6/06/24	mié 12/06/24	$ 114.288.496	$ 114.288.496	$ 114.288.496
3248		1.3.4.10.9.9	Acero 2	18 d	sáb 24/08/24	sáb 14/09/24	$ 28.572.124	$ 28.572.124	$ 28.572.124
3249		1.3.4.10.9.9	Concreto	1 d	jue 6/06/24	jue 6/06/24	$ 44.800.000	$ 44.800.000	$ 44.800.000
3250		1.3.4.10.9.9	Concreto 2	5 d	sáb 14/09/24	vie 20/09/24	$ 67.200.000	$ 67.200.000	$ 67.200.000
3251		**1.3.4.10.9.9**	**Tensionamiento**	**367,25 d**	**lun 27/05/24**	**jue 11/09/25**	**$ 199.234.799**	**$ 199.234.799**	**$ 199.234.799**
3252		1.3.4.10.9.9	Etapa 1	5 d	lun 27/05/24	sáb 1/06/24	$ 57.113.451	$ 57.113.451	$ 57.113.451
3253		1.3.4.10.9.9	Etapa 2 de 1	4 d	mié 28/05/25	mar 3/06/25	$ 75.708.529	$ 75.708.529	$ 75.708.529
3254		1.3.4.10.9.9	Etapa 2	5 d	vie 5/09/25	jue 11/09/25	$ 66.412.819	$ 66.412.819	$ 66.412.819
3255		1.3.4.10.9.9	Izaje de Vigas	10 d	mié 25/06/25	mar 8/07/25	$ 297.345.824	$ 297.345.824	$ 297.345.824
3256		**1.3.4.10.9.9**	**Losa Superior**	**98 d**	**mié 9/07/25**	**mar 11/11/25**	**$ 337.339.121**	**$ 337.339.121**	**$ 337.339.121**
3257		1.3.4.10.9.9	Obra Falsa	6 d	mié 9/07/25	mié 16/07/25	$ 29.750.399	$ 29.750.399	$ 29.750.399
3258		1.3.4.10.9.9	Acero	8 d	jue 17/07/25	sáb 26/07/25	$ 181.323.575	$ 181.323.575	$ 181.323.575
3259		1.3.4.10.9.9	Concreto	39 d	sáb 26/07/25	lun 15/09/25	$ 66.265.147	$ 66.265.147	$ 66.265.147
3260		1.3.4.10.9.9	Concreto 2a parte	45 d	lun 15/09/25	mar 11/11/25	$ 60.000.000	$ 60.000.000	$ 60.000.000
3261		1.3.4.10.9.10	Fin Luz 5	0 d	mar 11/11/25	mar 11/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
3262		**1.3.4.10.9.1**	**LUZ 6 (EJE 6 Y 7)**	**436,5 d**	**mar 14/05/24**	**mar 25/11/25**	**$ 1.202.052.986**	**$ 1.202.052....**	**$ 1.202.052.986**
3263		**1.3.4.10.9.1**	**Vigas Postensadas**	**427 d**	**mar 14/05/24**	**mié 12/11/25**	**$ 731.132.591**	**$ 731.132.591**	**$ 731.132.591**
3264		1.3.4.10.9.1	Acero	3 d	mar 14/05/24	vie 17/05/24	$ 114.233.540	$ 114.233.540	$ 114.233.540
3265		1.3.4.10.9.1	Acero 2	15 d	sáb 27/07/24	vie 16/08/24	$ 28.558.385	$ 28.558.385	$ 28.558.385
3266		1.3.4.10.9.1	Concreto	1 d	vie 17/05/24	sáb 18/05/24	$ 67.200.000	$ 67.200.000	$ 67.200.000
3267		1.3.4.10.9.1	Concreto 2	5 d	lun 30/09/24	vie 4/10/24	$ 67.200.000	$ 67.200.000	$ 67.200.000
3268		**1.3.4.10.9.1**	**Tensionamiento**	**314 d**	**sáb 5/10/24**	**mié 12/11/25**	**$ 199.232.970**	**$ 199.232.970**	**$ 199.232.970**
3269		1.3.4.10.9.1	Etapa 1	6 d	sáb 5/10/24	sáb 12/10/24	$ 132.821.980	$ 132.821.980	$ 132.821.980
3270		1.3.4.10.9.1	Etapa 2	4 d	vie 7/11/25	mié 12/11/25	$ 66.410.990	$ 66.410.990	$ 66.410.990
3271		1.3.4.10.9.1	Izaje vigas	5 d	mié 22/05/24	mar 28/05/24	$ 254.707.696	$ 254.707.696	$ 254.707.696
3272		**1.3.4.10.9.1**	**Losa Superior**	**196 d**	**lun 17/03/25**	**mar 25/11/25**	**$ 470.920.395**	**$ 470.920.395**	**$ 470.920.395**
3273		1.3.4.10.9.1	Obra Falsa	4 d	lun 17/03/25	vie 21/03/25	$ 29.750.399	$ 29.750.399	$ 29.750.399
3274		1.3.4.10.9.1	Acero	4 d	vie 21/03/25	jue 27/03/25	$ 187.156.405	$ 187.156.405	$ 187.156.405
3275		1.3.4.10.9.1	Concreto	133 d	jue 27/03/25	lun 15/09/25	$ 154.013.591	$ 154.013.591	$ 154.013.591
3276		1.3.4.10.9.1	Concreto 2a parte	55 d	mar 16/09/25	mar 25/11/25	$ 100.000.000	$ 100.000.000	$ 100.000.000
3277		1.3.4.10.9.1	Fin Luz 6	0 d	mar 25/11/25	mar 25/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
3278		**1.3.4.10.9.1**	**VIGAS DIAFRAGMA O RIOSTRAS**	**190 d**	**sáb 5/07/25**	**jue 5/03/26**	**$ 3.072.890.464**	**$ 3.072.890....**	**$ 3.072.890.464**
3279		1.3.4.10.9.1	Luces 1-2 y 3/3 tablero	45 d	sáb 19/07/25	lun 15/09/25	$ 15.734.299	$ 15.734.299	$ 15.734.299
3280		1.3.4.10.9.1	Luces 1-2 y 3/3 tablero 2a parte (\	75 d	lun 15/09/25	vie 19/12/25	$ 593.636.334	$ 593.636.334	$ 593.636.334
3281		1.3.4.10.9.1	Luces 2-3	55 d	mar 5/08/25	mié 15/10/25	$ 15.734.299	$ 15.734.299	$ 15.734.299
3282		1.3.4.10.9.1	Luces 2-3 2a parte (V3)	75 d	mié 15/10/25	mié 21/01/26	$ 476.969.667	$ 476.969.667	$ 476.969.667
3283		1.3.4.10.9.1	Luces 3-4	21 d	mar 7/10/25	sáb 1/11/25	$ 15.734.299	$ 15.734.299	$ 15.734.299
3284		1.3.4.10.9.1	Luces 3-4 2a parte (V4)	95 d	mar 4/11/25	jue 5/03/26	$ 476.969.667	$ 476.969.667	$ 476.969.667
3285		1.3.4.10.9.1	Luces 4-5 y 3/3 tablero	21 d	mar 7/10/25	sáb 1/11/25	$ 15.734.299	$ 15.734.299	$ 15.734.299
3286		1.3.4.10.9.1	Luces 4-5 y 3/3 tablero 2a parte (\	95 d	mar 4/11/25	jue 5/03/26	$ 476.969.667	$ 476.969.667	$ 476.969.667
3287		1.3.4.10.9.1	Luces 5-6	57 d	sáb 5/07/25	mar 16/09/25	$ 15.734.299	$ 15.734.299	$ 15.734.299
3288		1.3.4.10.9.1	Luces 5-6 2a parte (V 6)	85 d	mar 16/09/25	lun 5/01/26	$ 476.969.667	$ 476.969.667	$ 476.969.667
3289		1.3.4.10.9.1	Luces 6-7	50 d	mar 5/08/25	mar 7/10/25	$ 15.734.299	$ 15.734.299	$ 15.734.299
3290		1.3.4.10.9.1	Luces 6-7 2a parte(V 7)	65 d	mié 8/10/25	mié 31/12/25	$ 476.969.667	$ 476.969.667	$ 476.969.667
3291		1.3.4.10.9.1	Mezcla Asfaltica-MD12	25 d	jue 5/03/26	mié 8/04/26	$ 417.947.903	$ 417.947.903	$ 417.947.903
3292		1.3.4.10.9.1	Junta de Expansión Eje 1 y eje 7	25 d	sáb 7/03/26	vie 10/04/26	$ 40.107.147	$ 40.107.147	$ 40.107.147
3293		1.3.4.10.9.1	Baranda Vehicular	50 d	vie 27/03/26	lun 1/06/26	$ 597.778.288	$ 597.778.288	$ 597.778.288
3294		1.3.4.10.9.1	Baranda peatonal	30 d	lun 30/03/26	vie 8/05/26	$ 432.542.022	$ 432.542.022	$ 432.542.022
3295		1.3.4.10.10	Fin de Super Estructura (Prueba de Car	43 d	mié 29/04/26	jue 25/06/26	$ 138.462.868	$ 112.702.334	$ 48.462.004
3296		1.3.4.11	Restitución separador Autopista Norte	20 d	mié 6/05/26	lun 1/06/26	$ 0	$ 0	$ 0
3297		1.3.4.12	Pintura Barrera vehicular	29 d	jue 23/04/26	sáb 30/05/26	$ 263.253.053	$ 263.253.053	$ 263.253.053
3298		1.3.4.13	Rellenos Entre Puentes	22 d	mié 6/05/26	mié 3/06/26	$ 279.362.699	$ 279.362.699	$ 279.362.699
3299		1.3.4.14	Fin de Puente	0 d	jue 25/06/26	jue 25/06/26	$ 0	$ 0	$ 0
3300		**1.3.4.15**	**REDES HIDROSANITARIAS**	**816,25 d**	**mié 16/08/23**	**vie 3/07/26**	**$ 1.588.798.136**	**$ 1.505.342....**	**$ 1.109.626.282**
3301		**1.3.4.15.1**	**ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**550,75 d**	**mié 24/07/24**	**vie 3/07/26**	**$ 1.126.978.418**	**$ 1.045.599....**	**$ 672.616.285**
3302		**1.3.4.15.1.1**	**CALLE 153 NE**	**241 d**	**mar 29/04/25**	**mié 4/03/26**	**$ 35.620.199**	**$ 35.620.199**	**$ 35.620.199**
3303		1.3.4.15.1.1	Excavación Boca Calle	2 d	lun 2/02/26	mié 4/02/26	$ 2.098.567	$ 2.098.567	$ 2.098.567
3304		1.3.4.15.1.1	Instalación de Tubería (10"-sum) Boca Calle	8 d	mié 4/02/26	vie 13/02/26	$ 3.819.662	$ 3.819.662	$ 3.819.662
3305		1.3.4.15.1.1	Sumideros - Anden Boca Calle	15 d	vie 13/02/26	mié 4/03/26	$ 5.422.617	$ 5.422.617	$ 5.422.617
3306		1.3.4.15.1.1	Rellenos Boca Calle	4 d	vie 13/02/26	mié 18/02/26	$ 2.062.206	$ 2.062.206	$ 2.062.206
3307		1.3.4.15.1.1	Excavación Cll 153	175 d	mar 29/04/25	mié 10/12/25	$ 3.422.851	$ 3.422.851	$ 3.422.851
3308		1.3.4.15.1.1	Instalación de Tubería (10"-sum) Cll 153	175 d	vie 2/05/25	vie 12/12/25	$ 5.819.662	$ 5.819.662	$ 5.819.662
3309		1.3.4.15.1.1	Sumideros - Anden Cll 153	15 d	vie 12/12/25	vie 2/01/26	$ 5.303.250	$ 5.303.250	$ 5.303.250
3310		1.3.4.15.1.1	Rellenos Cll 153	3 d	vie 2/01/26	mar 6/01/26	$ 7.671.384	$ 7.671.384	$ 7.671.384
3311		1.3.4.15.1.2	Fin de Calle 153 NE	0 d	mié 4/03/26	mié 4/03/26	$ 0	$ 0	$ 0
3312		**1.3.4.15.1.3**	**CONECTANTE NE**	**185 d**	**lun 27/10/25**	**mié 24/06/26**	**$ 171.639.525**	**$ 171.302.167**	**$ 165.444.555**
3313		1.3.4.15.1.3	Excavación	22 d	lun 27/10/25	lun 24/11/25	$ 13.166.371	$ 13.166.371	$ 13.166.371
3314		1.3.4.15.1.3	Instalación de Tubería (10"-sum)	6 d	mar 28/10/25	mié 5/11/25	$ 7.339.922	$ 7.339.922	$ 7.339.922
3315		1.3.4.15.1.3	Sumideros - Anden	182 d	mié 29/10/25	mar 23/06/26	$ 22.318.109	$ 22.014.070	$ 17.854.487
3316		1.3.4.15.1.3	Instalación de Tubería (20")	16 d	mar 4/11/25	lun 24/11/25	$ 102.174.824	$ 102.174.824	$ 102.174.824
3317		1.3.4.15.1.3	Pozo de Inspección	162 d	mar 25/11/25	mar 23/06/26	$ 17.313.483	$ 17.243.139	$ 15.582.135
3318		1.3.4.15.1.3	Rellenos	163 d	mar 25/11/25	mié 24/06/26	$ 9.326.816	$ 9.363.841	$ 9.326.816
3319		1.3.4.15.1.4	Fin de Conectante NE	0 d	lun 22/12/25	lun 22/12/25	$ 0	$ 0	$ 0
3320		**1.3.4.15.1.5**	**CARRIL DE DESACELERACIÓN AUTOMORTE NE**	**76 d**	**vie 20/03/26**	**mar 30/06/26**	**$ 179.726.561**	**$ 180.274.437**	**$ 143.019.409**
3321		1.3.4.15.1.5	Excavación de 0-2m	69 d	vie 20/03/26	sáb 20/06/26	$ 926.652	$ 1.445.849	$ 555.991
3322		1.3.4.15.1.5	Excavación mayor a 2 m	64 d	lun 6/04/26	sáb 27/06/26	$ 5.349.030	$ 4.422.269	$ 3.209.418
3323		1.3.4.15.1.5	Instalación de Tubería (10"-sum)	64 d	mar 7/04/26	mar 30/06/26	$ 16.650.314	$ 14.258.278	$ 4.162.579
3324		1.3.4.15.1.5	Sumideros - Anden	62 d	sáb 4/04/26	mié 24/06/26	$ 20.773.887	$ 23.798.756	$ 2.700.605
3325		1.3.4.15.1.5	Instalación de Tubería (20")	6 d	mié 25/03/26	mié 1/04/26	$ 15.088.648	$ 15.088.648	$ 15.088.648
3326		1.3.4.15.1.5	Instalación de Tubería (18")	6 d	lun 30/03/26	mié 8/04/26	$ 50.256.418	$ 50.256.418	$ 50.256.418
3327		1.3.4.15.1.5	Instalación de Tubería (16")	6 d	mié 1/04/26	vie 10/04/26	$ 22.014.340	$ 22.014.340	$ 22.014.340
3328		1.3.4.15.1.5	Instalación de Tubería (12")	7 d	sáb 4/04/26	lun 13/04/26	$ 27.007.836	$ 27.007.836	$ 27.007.836
3329		1.3.4.15.1.5	Pozo de Inspección	7 d	vie 10/04/26	lun 20/04/26	$ 12.569.782	$ 12.569.782	$ 12.569.782
3330		1.3.4.15.1.5	Rellenos	66 d	lun 30/03/26	jue 25/06/26	$ 9.089.654	$ 9.412.262	$ 5.453.792
3331		1.3.4.15.1.6	Fin de Carril de Desaceleración	0 d	mar 21/04/26	mar 21/04/26	$ 0	$ 0	$ 0
3332		**1.3.4.15.1.7**	**OREJA ORIENTAL**	**548,38 d**	**mié 24/07/24**	**mié 1/07/26**	**$ 76.356.953**	**$ 66.971.559**	**$ 5.341.077**
3333		1.3.4.15.1.7	Demolición Retiro de redes Existentes	10 d	mié 24/07/24	lun 5/08/24	$ 5.341.077	$ 5.341.077	$ 5.341.077
3334		1.3.4.15.1.7	Carcamo aguas lluvias	88 d	jue 5/03/26	mié 1/07/26	$ 71.015.876	$ 61.630.482	$ 0
3335		1.3.4.15.1.8	Fin de Oreja Oriental	0 d	mar 17/03/26	mar 17/03/26	$ 0	$ 0	$ 0

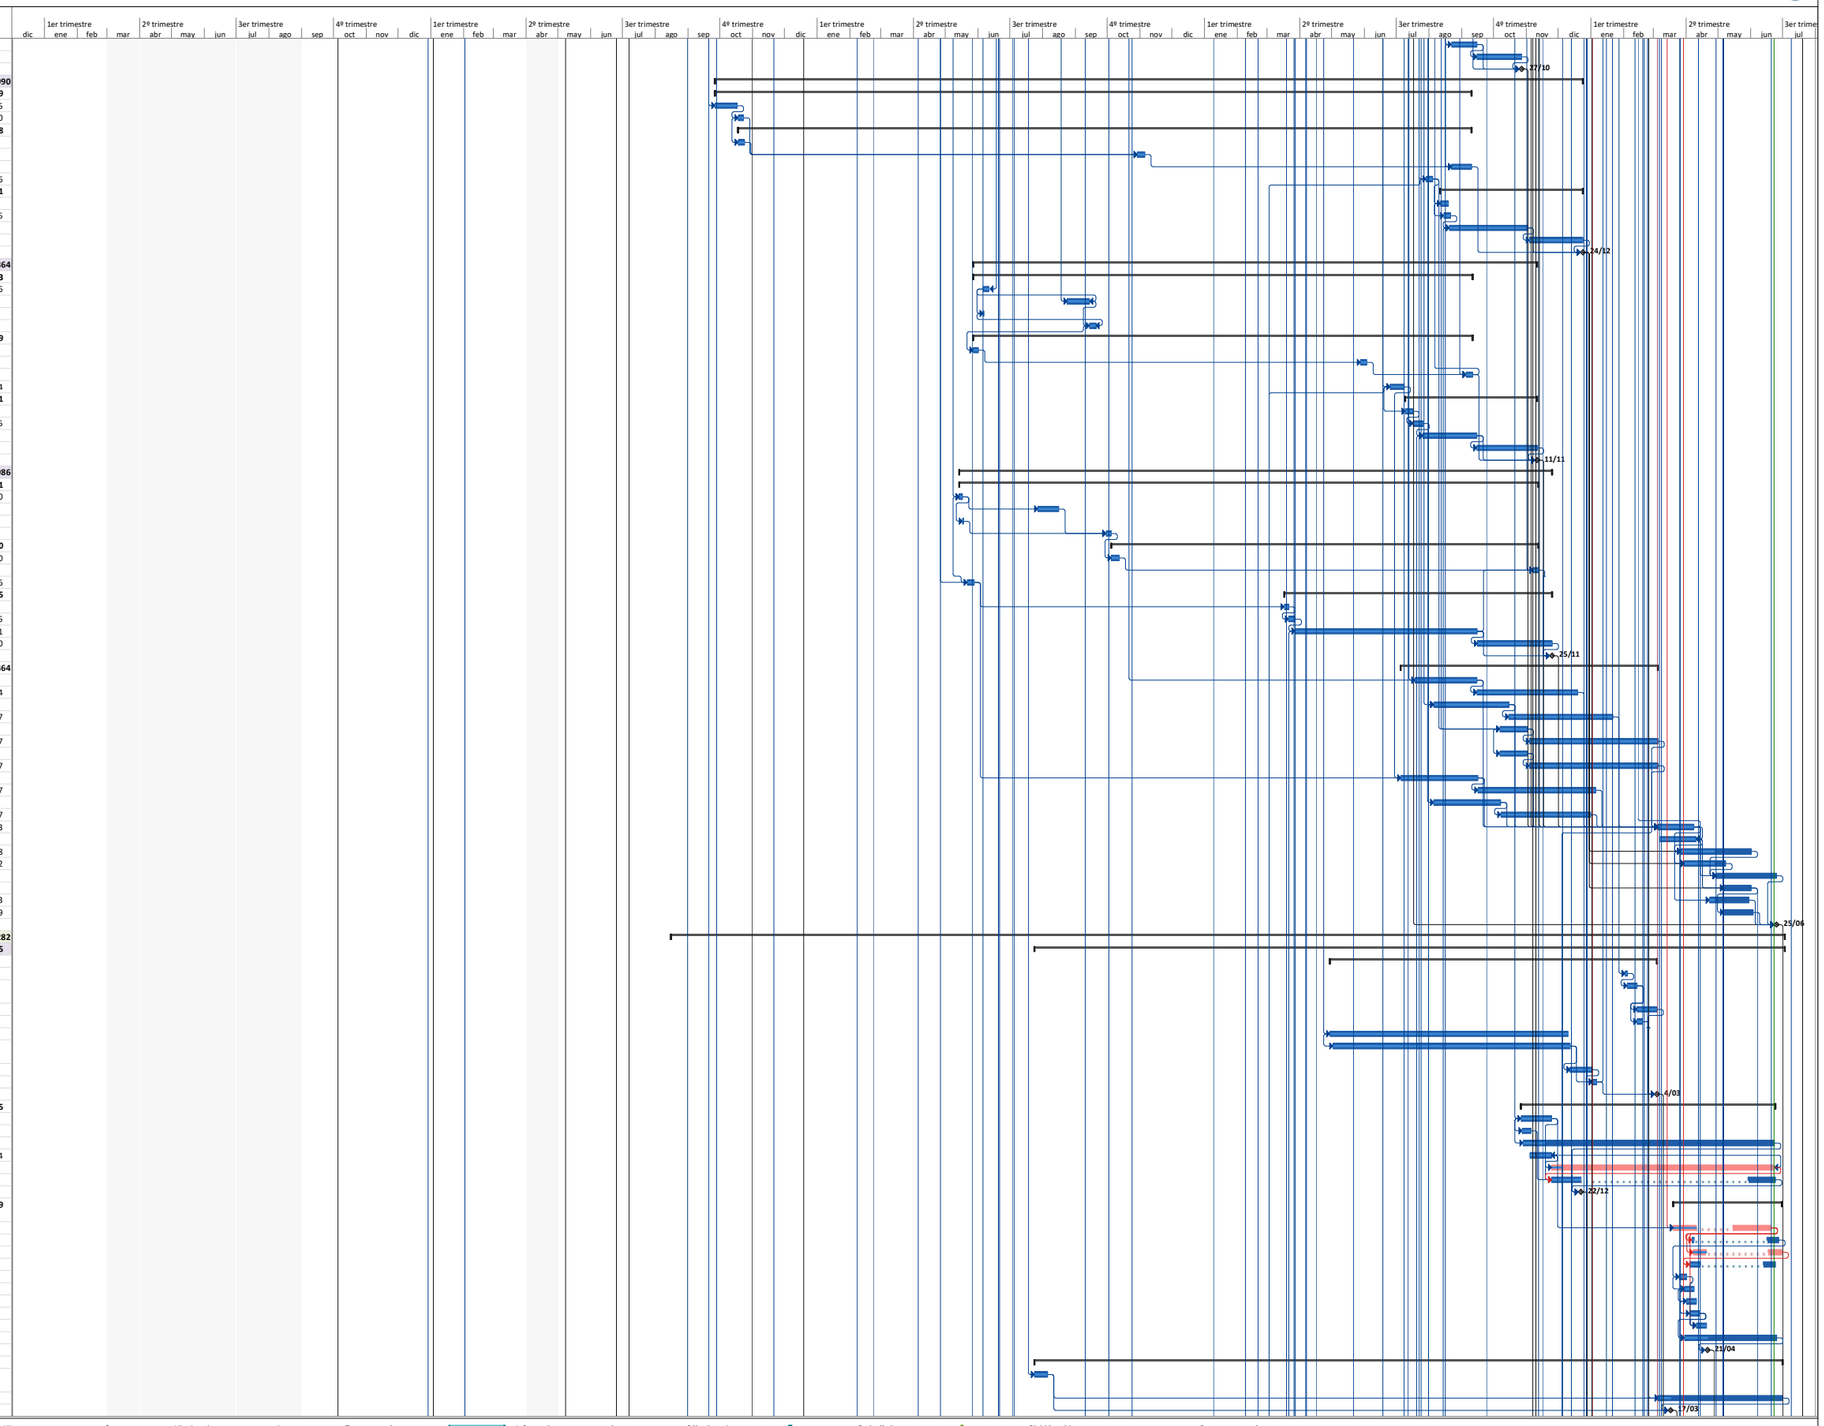

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | Sólo el comienzo | Fecha límite | División crítica | Progreso manual
División | Resumen | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo | Sólo duración | Resumen manual | Sólo fin | Tareas críticas | Progreso

Proyecto: IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB8-20221201
Fecha: mar 23/06/26


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
3336		**1.3.4.15.1.9**	**CALLE 153 NW**	**337 d**	**mié 30/10/24**	**mié 7/01/26**	$ 50.406.377	**$ 50.406.377**	**$ 50.406.377**
3337		1.3.4.15.1.9	Excavación 0-2 m	285 d	mié 30/10/24	jue 30/10/25	$ 2.568.332	$ 2.568.332	$ 2.568.332
3338		1.3.4.15.1.9	Excavación mayor a 2 m	285 d	jue 21/11/24	vie 21/11/25	$ 2.635.868	$ 2.635.868	$ 2.635.868
3339		1.3.4.15.1.9	Instalación de Tubería (10"-sum)	35 d	jue 30/10/25	mar 16/12/25	$ 5.574.414	$ 5.574.414	$ 5.574.414
3340		1.3.4.15.1.9	Sumideros - Anden	8 d	mar 16/12/25	vie 26/12/25	$ 5.067.698	$ 5.067.698	$ 5.067.698
3341		1.3.4.15.1.9	Instalación de Tubería (16")	5 d	vie 21/11/25	jue 27/11/25	$ 15.797.888	$ 15.797.888	$ 15.797.888
3342		1.3.4.15.1.9	Pozo de Inspección	5 d	jue 27/11/25	mié 3/12/25	$ 8.130.686	$ 8.130.686	$ 8.130.686
3343		1.3.4.15.1.9	Rellenos	9 d	vie 26/12/25	mié 7/01/26	$ 10.631.491	$ 10.631.491	$ 10.631.491
3344		1.3.4.15.1.9	Fin de Calle 153 NW	0 d	mié 7/01/26	mié 7/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
3345		**1.3.4.15.1.1**	**CONECTANTE NW**	**152 d**	**jue 11/12/25**	**vie 26/06/26**	**$ 131.439.574**	**$ 131.166.874**	**$ 130.404.139**
3346		1.3.4.15.1.1	Excavación 0-2 m	20 d	jue 11/12/25	mié 7/01/26	$ 2.755.194	$ 2.755.194	$ 2.755.194
3347		1.3.4.15.1.1	Excavación mayor a 2 m	1 d	mié 7/01/26	jue 8/01/26	$ 25.628.604	$ 25.628.604	$ 25.628.604
3348		1.3.4.15.1.1	Instalación de Tubería (10"-sum)	5 d	mié 7/01/26	mié 14/01/26	$ 10.846.744	$ 10.846.744	$ 10.846.744
3349		1.3.4.15.1.1	Sumideros - Anden	131 d	mié 7/01/26	jue 25/06/26	$ 18.312.206	$ 17.708.086	$ 18.312.206
3350		1.3.4.15.1.1	Instalación de Tubería (14")	9 d	jue 8/01/26	mar 20/01/26	$ 17.851.083	$ 17.851.083	$ 17.851.083
3351		1.3.4.15.1.1	Instalación de Tubería (12")	6 d	mar 20/01/26	mar 27/01/26	$ 18.353.041	$ 18.353.041	$ 18.353.041
3352		1.3.4.15.1.1	Pozo de Inspección	129 d	sáb 10/01/26	vie 26/06/26	$ 20.708.694	$ 21.040.114	$ 19.673.259
3353		1.3.4.15.1.1	Rellenos	26 d	lun 29/12/25	vie 30/01/26	$ 16.984.008	$ 16.984.008	$ 16.984.008
3354		1.3.4.15.1.1	Fin de Conectante NW	0 d	lun 2/02/26	lun 2/02/26	$ 0	$ 0	$ 0
3355		**1.3.4.15.1.1**	**CARRIL DE DESACELERACIÓN AUTONORTE NW**	**87 d**	**mar 10/03/26**	**vie 3/07/26**	$ 146.454.044	**$ 79.787.265**	**$ 0**
3356		1.3.4.15.1.1	Excavación 0-2 m	76 d	mar 10/03/26	jue 18/06/26	$ 3.474.451	$ 3.695.538	$ 0
3357		1.3.4.15.1.1	Excavación mayor a 2 m	70 d	jue 19/03/26	lun 22/06/26	$ 19.411.977	$ 18.953.592	$ 0
3358		1.3.4.15.1.1	Instalación de Tubería (10"-sum)	72 d	jue 19/03/26	mié 24/06/26	$ 13.251.330	$ 12.207.550	$ 0
3359		1.3.4.15.1.1	Sumideros - Anden	70 d	vie 27/03/26	sáb 27/06/26	$ 10.652.221	$ 15.873.476	$ 0
3360		1.3.4.15.1.1	Caja de Aguas Lluvias	67 d	vie 27/03/26	mié 24/06/26	$ 3.320.556	$ 2.973.632	$ 0
3361		1.3.4.15.1.1	Carcamo de Aguas lluvias	5 d	vie 26/06/26	vie 3/07/26	$ 67.105.868	$ 0	$ 0
3362		1.3.4.15.1.1	Instalación de Tubería (12")	72 d	vie 20/03/26	jue 25/06/26	$ 10.192.374	$ 9.848.139	$ 0
3363		1.3.4.15.1.1	Pozo de Inspección	72 d	vie 20/03/26	jue 25/06/26	$ 13.703.345	$ 10.061.259	$ 0
3364		1.3.4.15.1.1	Rellenos	79 d	sáb 14/03/26	sáb 27/06/26	$ 5.341.922	$ 6.174.079	$ 0
3365		1.3.4.15.1.1	Fin de Carril de Desaceleración	0 d	vie 3/07/26	vie 3/07/26	$ 0	$ 0	$ 0
3366		**1.3.4.15.1.1**	**PUENTE VEHICULAR - EJE 2**	**4 d**	**mié 26/11/25**	**lun 1/12/25**	$ 5.215.404	**$ 5.215.404**	**$ 5.215.404**
3367		1.3.4.15.1.1	Demolición Retiro de redes Existentes	4 d	mié 26/11/25	lun 1/12/25	$ 5.215.404	$ 5.215.404	$ 5.215.404
3368		1.3.4.15.1.1	Fin de Eje 2	0 d	lun 1/12/25	lun 1/12/25	$ 0	$ 0	$ 0
3369		**1.3.4.15.1.1**	**PUENTE VEHICULAR - EJE 3**	**112 d**	**mié 5/11/25**	**sáb 28/03/26**	$ 119.089.015	**$ 119.089.015**	**$ 119.089.015**
3370		1.3.4.15.1.1	Demolición	25 d	mié 5/11/25	sáb 6/12/25	$ 11.356.703	$ 11.356.703	$ 11.356.703
3371		1.3.4.15.1.1	Excavación	25 d	mar 9/12/25	vie 9/01/26	$ 5.105.215	$ 5.105.215	$ 5.105.215
3372		1.3.4.15.1.1	Entibado	25 d	sáb 10/01/26	mié 11/02/26	$ 25.678.234	$ 25.678.234	$ 25.678.234
3373		1.3.4.15.1.1	Instalación de Tubería (24")	25 d	sáb 10/01/26	mié 11/02/26	$ 32.711.801	$ 32.711.801	$ 32.711.801
3374		1.3.4.15.1.1	Reposición lozas	30 d	jue 19/02/26	sáb 28/03/26	$ 22.999.113	$ 22.999.113	$ 22.999.113
3375		1.3.4.15.1.1	Pozo de Inspección	25 d	mié 11/02/26	vie 13/03/26	$ 10.852.128	$ 10.852.128	$ 10.852.128
3376		1.3.4.15.1.1	Rellenos	25 d	vie 13/02/26	lun 16/03/26	$ 10.385.821	$ 10.385.821	$ 10.385.821
3377		1.3.4.15.1.1	Fin de Eje 3	0 d	sáb 28/03/26	sáb 28/03/26	$ 0	$ 0	$ 0
3378		**1.3.4.15.1.1**	**PUENTE VEHICULAR - EJE 5**	**171 d**	**mié 19/11/25**	**mar 30/06/26**	$ 211.030.766	**$ 205.766.008**	**$ 18.076.109**
3379		1.3.4.15.1.1	Demolición	156 d	mié 19/11/25	mar 9/06/26	$ 3.679.659	$ 3.679.659	$ 3.679.659
3380		1.3.4.15.1.1	Excavación	160 d	lun 24/11/25	vie 19/06/26	$ 14.396.450	$ 14.059.033	$ 14.396.450
3381		1.3.4.15.1.1	Entibado	135 d	vie 2/01/26	jue 25/06/26	$ 45.259.779	$ 42.326.275	$ 0
3382		1.3.4.15.1.1	Instalación de Tubería (36")	152 d	mar 9/12/25	mar 23/06/26	$ 91.698.735	$ 92.990.890	$ 0
3383		1.3.4.15.1.1	Reposición de lozas	116 d	mié 28/01/26	vie 26/06/26	$ 41.303.561	$ 37.831.926	$ 0
3384		1.3.4.15.1.1	Pozo de Inspección	111 d	sáb 24/01/26	mié 17/06/26	$ 5.357.611	$ 5.413.670	$ 0
3385		1.3.4.15.1.1	Rellenos	82 d	jue 12/03/26	mar 30/06/26	$ 9.334.971	$ 9.464.555	$ 0
3386		1.3.4.15.1.2	Fin de Eje 5	0 d	mié 22/04/26	mié 22/04/26	$ 0	$ 0	$ 0
3387		1.3.4.15.2	Fin de Alcantarillado Pluvial	0 d	vie 3/07/26	vie 3/07/26	$ 0	$ 0	$ 0
3388		**1.3.4.15.3**	**ALCANTARILLADO SANITARIO**	**138 d**	**lun 5/01/26**	**jue 2/07/26**	**$ 73.738.081**	**$ 73.734.999**	**$ 55.715.100**
3389		**1.3.4.15.3.1**	**CALLE 153 NE**	**138 d**	**lun 5/01/26**	**jue 2/07/26**	**$ 55.204.582**	**$ 55.201.500**	**$ 37.181.601**
3390		1.3.4.15.3.1	Excavación de 0-2 m Boca Calle	2 d	mar 27/01/26	jue 29/01/26	$ 2.054.800	$ 2.054.800	$ 2.054.800
3391		1.3.4.15.3.1	Demolición pozo existente	2 d	mar 27/01/26	jue 29/01/26	$ 756.850	$ 756.850	$ 756.850
3392		1.3.4.15.3.1	Demolición Red existente	2 d	mar 27/01/26	jue 29/01/26	$ 2.362.404	$ 2.362.404	$ 2.362.404
3393		1.3.4.15.3.1	Excavación mayor a 2 m Boca Calle	2 d	jue 29/01/26	sáb 31/01/26	$ 1.513.700	$ 1.513.700	$ 1.513.700
3394		1.3.4.15.3.1	Instalación de Tubería (8") Boca Ca	2 d	sáb 31/01/26	mar 3/02/26	$ 3.104.536	$ 3.104.536	$ 3.104.536
3395		1.3.4.15.3.1	Rellenos Boca Calle	2 d	mar 3/02/26	jue 5/02/26	$ 1.803.417	$ 1.803.417	$ 1.803.417
3396		1.3.4.15.3.1	Excavación de 0-2 m Cll 153	5 d	lun 5/01/26	sáb 10/01/26	$ 2.541.100	$ 2.541.100	$ 2.541.100
3397		1.3.4.15.3.1	Conexión a predio	3 d	jue 26/02/26	lun 2/03/26	$ 196.370	$ 196.370	$ 196.370
3398		1.3.4.15.3.1	Excavación mayor a 2 m Cll 153	2 d	sáb 10/01/26	mié 14/01/26	$ 3.513.700	$ 3.513.700	$ 3.513.700
3399		1.3.4.15.3.1	Instalación de Tubería (8") Cll 153	5 d	mié 14/01/26	mar 20/01/26	$ 13.531.307	$ 13.531.307	$ 13.531.307
3400		1.3.4.15.3.1	Pozo de Inspección Cll 153	131 d	mié 14/01/26	jue 2/07/26	$ 18.022.981	$ 18.019.899	$ 0
3401		1.3.4.15.3.1	Rellenos Cll 153	8 d	mié 21/01/26	vie 30/01/26	$ 5.803.417	$ 5.803.417	$ 5.803.417
3402		1.3.4.15.3.2	Fin de Calle 153 NE	0 d	lun 2/03/26	lun 2/03/26	$ 0	$ 0	$ 0
3403		**1.3.4.15.3.3**	**CONECTANTE NE**	**5 d**	**lun 16/02/26**	**vie 20/02/26**	$ 18.533.499	**$ 18.533.499**	**$ 18.533.499**
3404		1.3.4.15.3.3	Excavación de 0-2 m	4 d	lun 16/02/26	jue 19/02/26	$ 3.730.564	$ 3.730.564	$ 3.730.564
3405		1.3.4.15.3.3	Excavación mayor a 2 m	4 d	mar 17/02/26	vie 20/02/26	$ 2.705.074	$ 2.705.074	$ 2.705.074
3406		1.3.4.15.3.3	Instalación de Tubería (8")	4 d	mar 17/02/26	vie 20/02/26	$ 6.902.846	$ 6.902.846	$ 6.902.846
3407		1.3.4.15.3.3	Rellenos	4 d	mar 17/02/26	vie 20/02/26	$ 5.195.015	$ 5.195.015	$ 5.195.015
3408		1.3.4.15.3.4	Fin de Conectante NE	0 d	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0	$ 0	$ 0
3409		1.3.4.15.4	Fin de Alcantarillado Sanitario	0 d	lun 2/03/26	lun 2/03/26	$ 0	$ 0	$ 0
3410		**1.3.4.15.5**	**ACUEDUCTO**	**814,5 d**	**mié 16/08/23**	**mié 1/07/26**	**$ 388.081.637**	**$ 386.008.571**	**$ 381.294.897**
3411		**1.3.4.15.5.1**	**CALLE 153 NE - INICIO CONECTANTE**	**120 d**	**mar 27/01/26**	**mié 1/07/26**	**$ 46.864.475**	**$ 45.074.809**	**$ 45.167.790**
3412		1.3.4.15.5.1	Excavación	7 d	mar 27/01/26	mié 4/02/26	$ 9.176.772	$ 9.176.772	$ 9.176.772
3413		1.3.4.15.5.1	Instalación de Tubería (6")	3 d	mié 4/02/26	sáb 7/02/26	$ 16.903.893	$ 16.903.893	$ 16.903.893
3414		1.3.4.15.5.1	Solicitud de Empalme a EAAB	103 d	mié 11/02/26	jue 25/06/26	$ 0	$ 0	$ 0
3415		1.3.4.15.5.1	Empalme de Tubería a existente (I	107 d	mié 11/02/26	mié 1/07/26	$ 1.696.685	-$ 92.981	$ 0
3416		1.3.4.15.5.1	Rellenos	7 d	jue 12/02/26	vie 20/02/26	$ 19.087.125	$ 19.087.125	$ 19.087.125
3417		1.3.4.15.5.2	Fin Calle 153 NE - Conectante NW	0 d	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0	$ 0	$ 0
3418		**1.3.4.15.5.3**	**CONECTANTE NE - ESQUINA AUTONORTE**	**351 d**	**mié 2/04/25**	**mié 1/07/26**	**$ 19.737.014**	**$ 19.453.614**	**$ 14.646.959**
3419		1.3.4.15.5.3	Excavación	165 d	mié 2/04/25	jue 30/10/25	$ 1.856.473	$ 1.856.473	$ 1.856.473
3420		1.3.4.15.5.3	Instalación de Tubería (6")	2 d	sáb 18/10/25	mar 21/10/25	$ 7.327.322	$ 7.327.322	$ 7.327.322
3421		1.3.4.15.5.3	Solicitud de Empalme a EAAB	169 d	vie 14/11/25	mar 23/06/26	$ 0	$ 0	$ 0
3422		1.3.4.15.5.3	Empalme de Tubería a existente (I	174 d	sáb 15/11/25	mié 1/07/26	$ 5.090.055	$ 4.806.655	$ 0
3423		1.3.4.15.5.3	Rellenos	2 d	sáb 15/11/25	mié 19/11/25	$ 5.463.164	$ 5.463.164	$ 5.463.164
3424		1.3.4.15.5.4	Fin Conectante NE	0 d	mié 19/11/25	mié 19/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
3425		**1.3.4.15.5.5**	**CALLE 153 NW**	**487 d**	**mar 8/10/24**	**mar 30/06/26**	$ 195.011.255	**$ 195.011.255**	**$ 195.011.255**
3426		1.3.4.15.5.5	Excavación	301 d	mar 8/10/24	mié 29/10/25	$ 15.327.898	$ 15.327.898	$ 15.327.898
3427		1.3.4.15.5.5	Instalación de Tubería (12"-PVC)	281 d	lun 21/10/24	mié 15/10/25	$ 51.505.644	$ 51.505.644	$ 51.505.644
3428		1.3.4.15.5.5	Instalación de Tubería (12"-HA)	5 d	sáb 20/09/25	vie 26/09/25	$ 20.741.737	$ 20.741.737	$ 20.741.737
3429		1.3.4.15.5.5	Accesorios y Tratamiento Tubería	5 d	sáb 20/09/25	vie 26/09/25	$ 85.335.219	$ 85.335.219	$ 85.335.219
3430		1.3.4.15.5.5	Solicitud de Empalme a EAAB	207 d	jue 2/10/25	mar 30/06/26	$ 0	$ 0	$ 0
3431		1.3.4.15.5.5	Empalme de Tubería a existente (	5 d	jue 2/10/25	mié 8/10/25	$ 1.986.119	$ 1.986.119	$ 1.986.119
3432		1.3.4.15.5.5	Rellenos	14 d	mar 30/09/25	vie 17/10/25	$ 20.114.638	$ 20.114.638	$ 20.114.638
3433		1.3.4.15.5.6	Fin Conectante NE	0 d	vie 17/10/25	vie 17/10/25	$ 0	$ 0	$ 0
3434		**1.3.4.15.5.7**	**CONECTANTE NW - ESQUINA AUTONORTE**	**19 d**	**mié 25/02/26**	**jue 19/03/26**	$ 31.192.260	**$ 31.192.260**	**$ 31.192.260**
3435		1.3.4.15.5.7	Excavación	5 d	mié 25/02/26	mar 3/03/26	$ 5.262.001	$ 5.262.001	$ 5.262.001
3436		1.3.4.15.5.7	Instalación de Tubería (12"-HA)	2 d	mar 3/03/26	jue 5/03/26	$ 10.185.894	$ 10.185.894	$ 10.185.894
3437		1.3.4.15.5.7	Solicitud de Empalme a EAAB	0 d	mié 11/03/26	mié 11/03/26	$ 0	$ 0	$ 0
3438		1.3.4.15.5.7	Empalme de Tubería a existente (	1 d	mié 11/03/26	jue 12/03/26	$ 5.244.895	$ 5.244.895	$ 5.244.895
3439		1.3.4.15.5.7	Rellenos	6 d	jue 12/03/26	jue 19/03/26	$ 10.499.470	$ 10.499.470	$ 10.499.470
3440		1.3.4.15.5.8	Fin Conectante NW	0 d	jue 19/03/26	jue 19/03/26	$ 0	$ 0	$ 0
3441		**1.3.4.15.5.9**	**RAMAL DE TRANSICIÓN NW**	**10 d**	**jue 8/01/26**	**mié 21/01/26**	$ 24.192.260	**$ 24.192.260**	**$ 24.192.260**
3442		1.3.4.15.5.9	Excavación	1 d	jue 8/01/26	vie 9/01/26	$ 2.262.001	$ 2.262.001	$ 2.262.001
3443		1.3.4.15.5.9	Instalación de Tubería (12"-HA)	2 d	vie 9/01/26	mar 13/01/26	$ 10.185.894	$ 10.185.894	$ 10.185.894
3444		1.3.4.15.5.9	Solicitud de Empalme a EAAB	0 d	lun 19/01/26	lun 19/01/26	$ 0	$ 0	$ 0

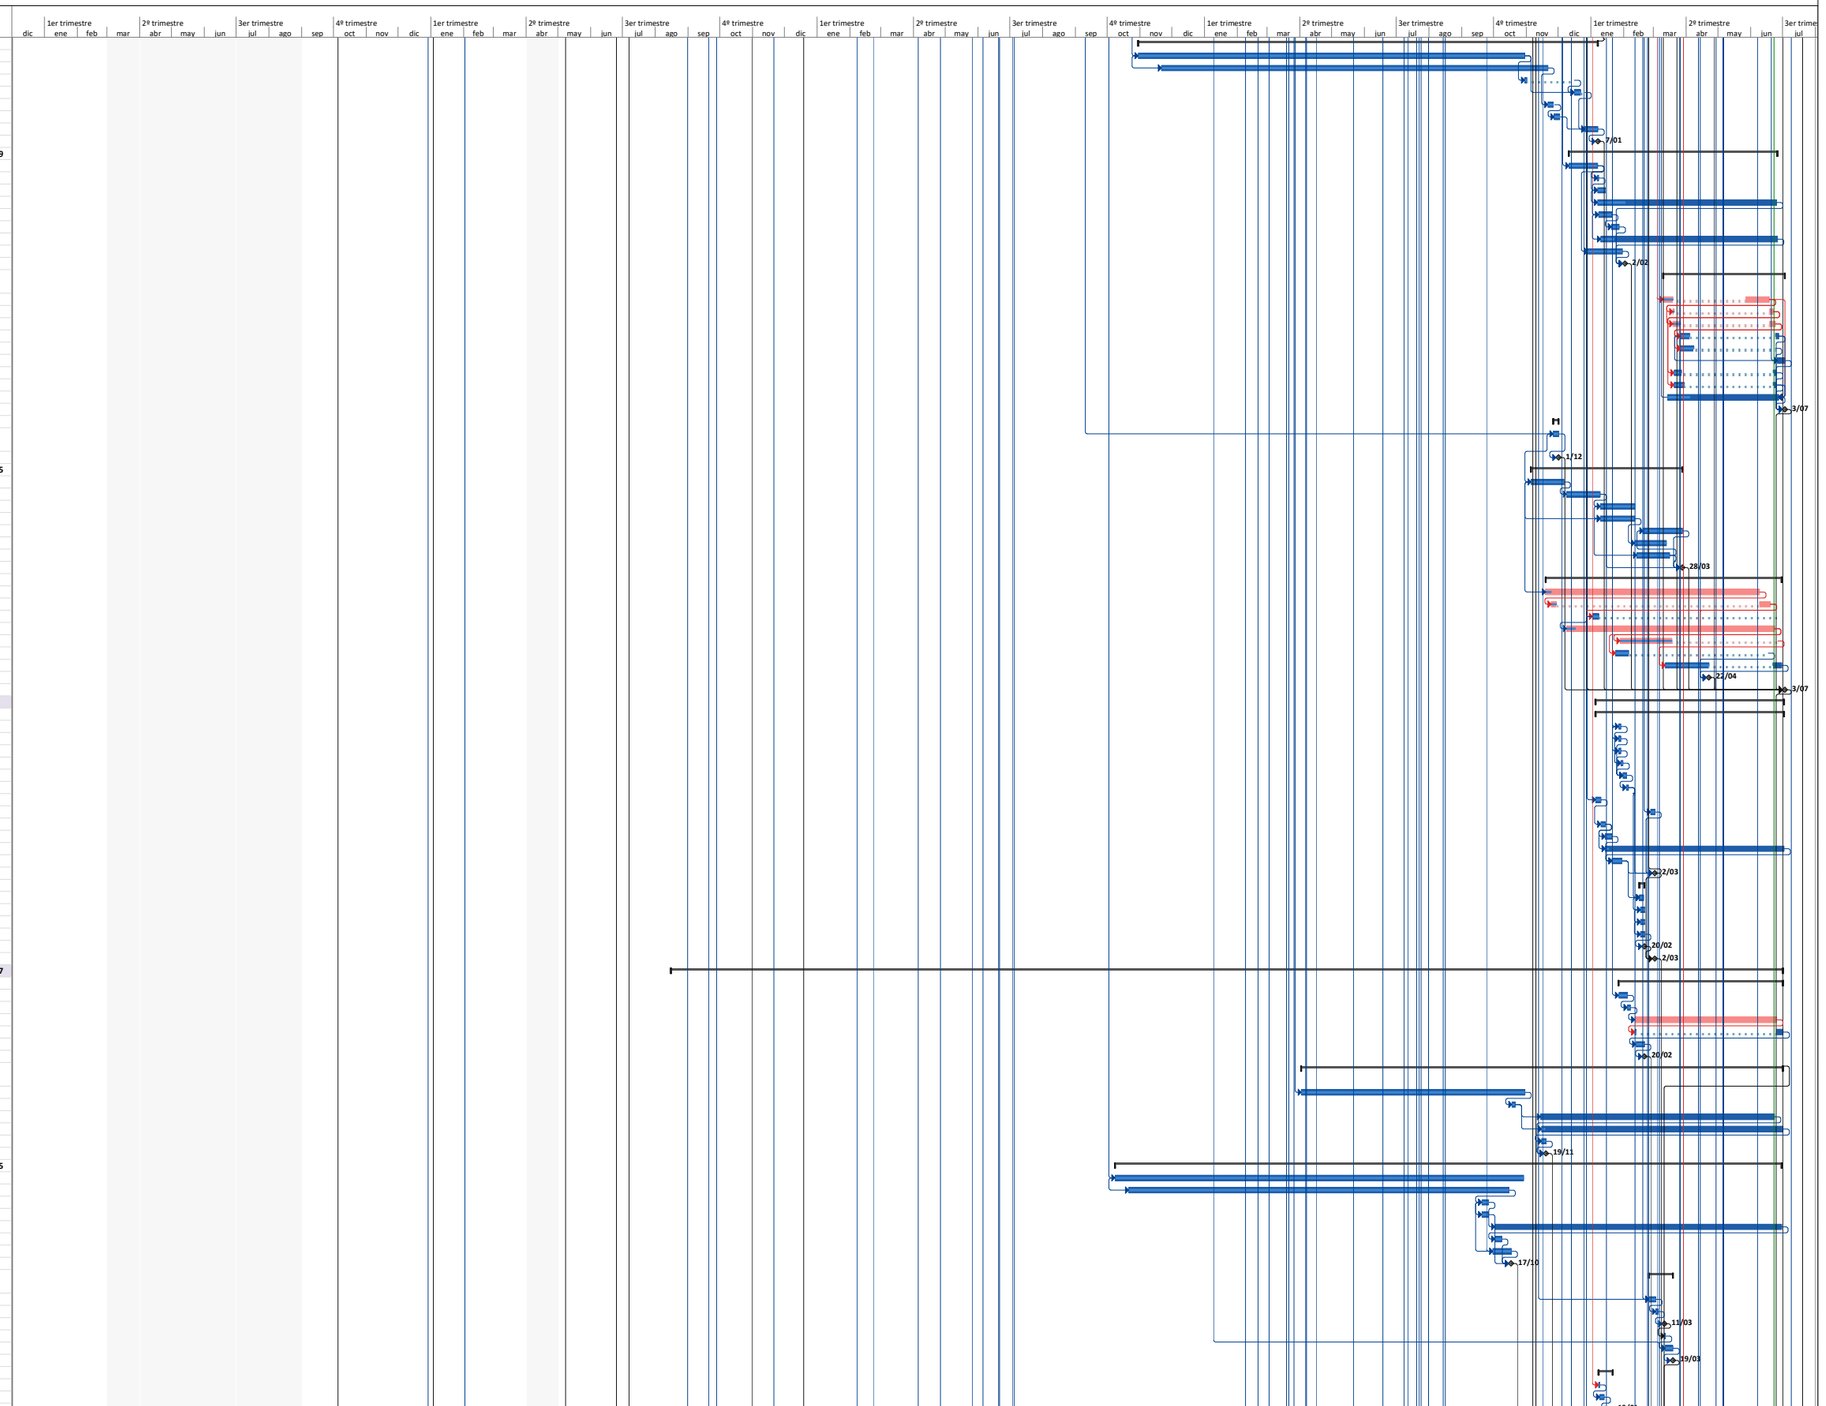

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | Sólo el comienzo | Fecha límite | División crítica | Progreso manual
División | Resumen | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo | Sólo duración | Resumen manual | Sólo fin | Tareas críticas | Progreso


Proyecto: IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB8-20221201
Fecha: mar 23/06/26

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
3445		1.3.4.15.5.9	Empalme de Tubería a existente (	1 d	lun 19/01/26	mar 20/01/26	$ 5.244.895	$ 5.244.895	$ 5.244.895
3446		1.3.4.15.5.9	Rellenos	2 d	lun 19/01/26	mié 21/01/26	$ 6.499.470	$ 6.499.470	$ 6.499.470
3447		1.3.4.15.5.1	Fin Ramal Transición NW	0 d	mié 21/01/26	mié 21/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
3448		**1.3.4.15.5.1**	**PUENTE VEHICULAR - EJE 6**	**56 d**	**mié 16/08/23**	**mié 25/10/23**	**$ 71.084.373**	**$ 71.084.373**	**$ 71.084.373**
3449		1.3.4.15.5.1	Excavación Bajo puente existente	6 d	mié 6/09/23	mié 13/09/23	$ 5.129.790	$ 5.129.790	$ 5.129.790
3450		1.3.4.15.5.1	Excavación Paralela a cimentación	6 d	jue 14/09/23	jue 21/09/23	$ 3.697.271	$ 3.697.271	$ 3.697.271
3451		1.3.4.15.5.1	Instalación de Tubería (12")	3 d	mié 20/09/23	sáb 23/09/23	$ 46.361.632	$ 46.361.632	$ 46.361.632
3452		1.3.4.15.5.1	Solicitud de Empalme a EAAB	0 d	sáb 23/09/23	sáb 23/09/23	$ 0	$ 0	$ 0
3453		1.3.4.15.5.1	Empalme de Tubería a existente (	1 d	sáb 23/09/23	lun 25/09/23	$ 5.180.146	$ 5.180.146	$ 5.180.146
3454		1.3.4.15.5.1	Rellenos Según normal NP-040 EA	5 d	mié 16/08/23	mié 23/08/23	$ 3.404.532	$ 3.404.532	$ 3.404.532
3455		1.3.4.15.5.1	Rellenos Según normal NP-040 EA	24 d	lun 25/09/23	mié 25/10/23	$ 7.311.002	$ 7.311.002	$ 7.311.002
3456		1.3.4.15.5.1	Fin Calle 153 NE - Conectante NW	0 d	mié 25/10/23	mié 25/10/23	$ 0	$ 0	$ 0
3457		1.3.4.15.6	Fin de Acueducto	0 d	jue 19/03/26	jue 19/03/26	$ 0	$ 0	$ 0
3458		1.3.4.16	Fin de Redes Hidrosanitarias	0 d	vie 3/07/26	vie 3/07/26	$ 0	$ 0	$ 0
3459		**1.3.4.17**	**REDES SECAS**	**962,25 d**	**mié 4/01/23**	**vie 3/07/26**	**$ 1.272.884.393**	**$ 1.257.545....**	**$ 1.271.774.765**
3460		**1.3.4.17.1**	**GAS NATURAL (VANTI)**	**780,25 d**	**mié 15/02/23**	**lun 22/12/25**	**$ 10.039.742**	**$ 10.039.742**	**$ 10.039.742**
3461		**1.3.4.17.1.1**	**PUENTE VEHICULAR - EJE 2 (HASTA CONEXIÓN EN CONECTAN NE)**	**775,88 d**	**mié 15/02/23**	**mar 16/12/25**	**$ 6.342.913**	**$ 6.342.913**	**$ 6.342.913**
3462		1.3.4.17.1.1	Excavación Bajo puente existente	11 d	mié 15/02/23	mar 28/02/23	$ 1.893.112	$ 1.893.112	$ 1.893.112
3463		1.3.4.17.1.1	Maniobra de Instalación (PE-2") puente existente	1 d	mar 28/02/23	mié 1/03/23	$ 510.616	$ 510.616	$ 510.616
3464		1.3.4.17.1.1	Relleno puente existente	1 d	mié 13/11/24	jue 14/11/24	$ 1.366.821	$ 1.366.821	$ 1.366.821
3465		1.3.4.17.1.1	Excavación Paso Bajo Oreja	11 d	sáb 12/04/25	mar 29/04/25	$ 671.892	$ 671.892	$ 671.892
3466		1.3.4.17.1.1	Maniobra de Instalación (PE-2") Paso Bajo Oreja	0 d	mié 10/12/25	mié 10/12/25	$ 0	$ 0	$ 0
3467		1.3.4.17.1.1	Relleno Paso Bajo Oreja	5 d	mié 10/12/25	mar 16/12/25	$ 1.900.472	$ 1.900.472	$ 1.900.472
3468		1.3.4.17.1.2	Fin de Eje 2	0 d	mar 16/12/25	mar 16/12/25	$ 0	$ 0	$ 0
3469		**1.3.4.17.1.3**	**PUENTE VEHICULAR - EJE 6**	**763 d**	**mié 8/03/23**	**lun 22/12/25**	**$ 3.696.829**	**$ 3.696.829**	**$ 3.696.829**
3470		1.3.4.17.1.3	Excavación Bajo puente existente	12 d	mié 8/03/23	jue 23/03/23	$ 1.889.742	$ 1.889.742	$ 1.889.742
3471		1.3.4.17.1.3	Maniobra de Instalación (PE-3") Bajo puente existente	0 d	lun 22/12/25	lun 22/12/25	$ 0	$ 0	$ 0
3472		1.3.4.17.1.3	Relleno Bajo puente existente	2 d	sáb 6/05/23	mar 9/05/23	$ 1.300.986	$ 1.300.986	$ 1.300.986
3473		1.3.4.17.1.3	Excavación Paso Bajo Oreja	0 d	mar 18/11/25	mar 18/11/25	$ 361.379	$ 361.379	$ 361.379
3474		1.3.4.17.1.3	Maniobra de Instalación (PE-3") Paso Bajo Oreja	0 d	mié 10/12/25	mié 10/12/25	$ 0	$ 0	$ 0
3475		1.3.4.17.1.3	Relleno Paso Bajo Oreja	0 d	mié 10/12/25	mié 10/12/25	$ 144.722	$ 144.722	$ 144.722
3476		1.3.4.17.1.4	Fin de Eje 7	0 d	mié 10/12/25	mié 10/12/25	$ 0	$ 0	$ 0
3477		1.3.4.17.2	Fin de Gas Natural	0 d	mar 16/12/25	mar 16/12/25	$ 0	$ 0	$ 0
3478		**1.3.4.17.3**	**ETB**	**944 d**	**vie 27/01/23**	**vie 3/07/26**	**$ 367.924.741**	**$ 352.953.096**	**$ 367.497.920**
3479		**1.3.4.17.3.1**	**CALLE 153 NE**	**15 d**	**jue 12/03/26**	**mié 1/04/26**	$ 10.294.937	**$ 10.294.937**	**$ 10.294.937**
3480		1.3.4.17.3.1	Renivelación de Camaras	15 d	jue 12/03/26	mié 1/04/26	$ 10.294.937	$ 10.294.937	$ 10.294.937
3481		1.3.4.17.3.2	Fin de Calle 153 NE	0 d	mié 1/04/26	mié 1/04/26	$ 0	$ 0	$ 0
3482		**1.3.4.17.3.3**	**CONECTANTE NE**	**267 d**	**lun 14/07/25**	**mar 23/06/26**	$ 24.873.404	**$ 24.586.792**	**$ 24.873.404**
3483		1.3.4.17.3.3	Renivelación de Camaras	267 d	lun 14/07/25	mar 23/06/26	$ 24.873.404	$ 24.586.792	$ 24.873.404
3484		1.3.4.17.3.4	Fin de Conectante NE	0 d	lun 2/03/26	lun 2/03/26	$ 0	$ 0	$ 0
3485		**1.3.4.17.3.5**	**OREJA ORIENTAL**	**153,62 d**	**sáb 10/05/25**	**lun 24/11/25**	**$ 86.730.034**	**$ 86.730.034**	**$ 86.303.213**
3486		1.3.4.17.3.5	Excavación	5 d	sáb 10/05/25	vie 16/05/25	$ 13.081.489	$ 13.081.489	$ 13.081.489
3487		1.3.4.17.3.5	Demolición	4 d	vie 16/05/25	jue 22/05/25	$ 1.027.371	$ 1.027.371	$ 1.027.371
3488		1.3.4.17.3.5	Instalación de Tubería (12d4")	8 d	vie 16/05/25	mar 27/05/25	$ 45.939.909	$ 45.939.909	$ 45.939.909
3489		1.3.4.17.3.5	Camaras	30 d	vie 16/05/25	mié 25/06/25	$ 4.268.210	$ 4.268.210	$ 3.841.389
3490		1.3.4.17.3.5	Retiro de red existente-Maniobra	0 d	jue 20/11/25	jue 20/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
3491		1.3.4.17.3.5	Rellenos	3 d	jue 20/11/25	lun 24/11/25	$ 22.413.055	$ 22.413.055	$ 22.413.055
3492		1.3.4.17.3.6	Fin de Oreja Oriental	0 d	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
3493		**1.3.4.17.3.7**	**PUENTE VEHICULAR EJE 2- ESPACIO PÚBLICO BAJO PUENTE**	**798,5 d**	**vie 27/01/23**	**vie 26/12/25**	**$ 68.993.783**	**$ 68.993.783**	**$ 68.993.783**
3494		1.3.4.17.3.7	Excavación Bajo puente Existente	4 d	vie 27/01/23	mié 1/02/23	$ 109.661	$ 109.661	$ 109.661
3495		1.3.4.17.3.7	Excavación Paralelo a cimentación	5 d	lun 29/05/23	sáb 3/06/23	$ 118.799	$ 118.799	$ 118.799
3496		1.3.4.17.3.7	Demolición Bajo puente Existente	3 d	sáb 3/06/23	mié 7/06/23	$ 878.952	$ 878.952	$ 878.952
3497		1.3.4.17.3.7	Instalación de Tubería (12d4") Bajo puente Existente	4 d	sáb 3/06/23	jue 8/06/23	$ 8.414.256	$ 8.414.256	$ 8.414.256
3498		1.3.4.17.3.7	Camaras Bajo puente Existente	8 d	sáb 3/06/23	mié 14/06/23	$ 6.116.456	$ 6.116.456	$ 6.116.456
3499		1.3.4.17.3.7	Retiro de red existente-Maniobras ETB Bajo	0 d	vie 26/12/25	vie 26/12/25	$ 0	$ 0	$ 0
3500		1.3.4.17.3.7	Rellenos Bajo puente Existente	5 d	mié 21/06/23	mar 27/06/23	$ 326.081	$ 326.081	$ 326.081
3501		1.3.4.17.3.7	Rellenos Paralelo a cimentación n	5 d	sáb 1/06/24	sáb 8/06/24	$ 10.802.228	$ 10.802.228	$ 10.802.228
3502		1.3.4.17.3.7	Aprobación ampliación límite de intervención	0 d	jue 8/06/23	jue 8/06/23	$ 0	$ 0	$ 0
3503		1.3.4.17.3.7	Excavación Paso bajo Oreja	3 d	jue 8/06/23	mar 13/06/23	$ 95.953	$ 95.953	$ 95.953
3504		1.3.4.17.3.7	Excavación Paso de via	3 d	sáb 1/06/24	jue 6/06/24	$ 13.474.316	$ 13.474.316	$ 13.474.316
3505		1.3.4.17.3.7	Demolición Paso bajo Oreja	2 d	jue 20/11/25	sáb 22/11/25	$ 410.178	$ 410.178	$ 410.178
3506		1.3.4.17.3.7	Demolición Paso de via	2 d	vie 31/05/24	mar 4/06/24	$ 1.449.200	$ 1.449.200	$ 1.449.200
3507		1.3.4.17.3.7	Instalación de Tubería (12d4") Paso bajo Oreja	3 d	vie 21/11/25	mar 25/11/25	$ 4.417.484	$ 4.417.484	$ 4.417.484
3508		1.3.4.17.3.7	Instalación de Tubería (12d4") Paso de via	3 d	sáb 3/08/24	jue 8/08/24	$ 1.192.700	$ 1.192.700	$ 1.192.700
3509		1.3.4.17.3.7	Camaras Paso bajo Oreja	3 d	sáb 15/11/25	jue 20/11/25	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 1.400.000
3510		1.3.4.17.3.7	Camaras Paso de via	3 d	jue 8/08/24	lun 12/08/24	$ 7.317.393	$ 7.317.393	$ 7.317.393
3511		1.3.4.17.3.7	Retiro de red existente-Maniobras ETB Paso	0 d	jue 20/11/25	jue 20/11/25	$ 0	$ 0	$ 0
3512		1.3.4.17.3.7	Rellenos Paso bajo Oreja	3 d	sáb 22/11/25	mié 26/11/25	$ 195.649	$ 195.649	$ 195.649
3513		1.3.4.17.3.7	Rellenos Paso de via	3 d	jue 8/08/24	lun 12/08/24	$ 10.802.228	$ 10.802.228	$ 10.802.228
3514		1.3.4.17.3.7	Reparación de muros de camaras Paso bajo Oreja	2 d	mié 26/11/25	vie 28/11/25	$ 205.570	$ 205.570	$ 205.570
3515		1.3.4.17.3.7	Reparación de muros de camaras	2 d	jue 8/08/24	sáb 10/08/24	$ 1.266.680	$ 1.266.680	$ 1.266.680
3516		1.3.4.17.3.8	Fin de Eje 2	0 d	vie 26/12/25	vie 26/12/25	$ 0	$ 0	$ 0
3517		**1.3.4.17.3.9**	**CALLE 153 NW**	**37 d**	**sáb 22/11/25**	**vie 9/01/26**	**$ 12.654.277**	**$ 12.654.277**	**$ 12.654.277**
3518		1.3.4.17.3.9	Excavación	15 d	sáb 22/11/25	jue 11/12/25	$ 1.281.746	$ 1.281.746	$ 1.281.746
3519		1.3.4.17.3.9	Demolición	6 d	vie 2/01/26	vie 9/01/26	$ 1.149.902	$ 1.149.902	$ 1.149.902
3520		1.3.4.17.3.9	Instalación de Tubería (8d4")	13 d	vie 28/11/25	mar 16/12/25	$ 886.676	$ 886.676	$ 886.676
3521		1.3.4.17.3.9	Construcción carcamos	4 d	lun 1/12/25	vie 5/12/25	$ 886.676	$ 886.676	$ 886.676
3522		1.3.4.17.3.9	Camaras	12 d	mar 16/12/25	mié 31/12/25	$ 7.594.713	$ 7.594.713	$ 7.594.713
3523		1.3.4.17.3.9	Retiro de red existente-Maniobra	1 d	mié 31/12/25	vie 2/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
3524		1.3.4.17.3.9	Rellenos	6 d	vie 2/01/26	vie 9/01/26	$ 854.564	$ 854.564	$ 854.564
3525		1.3.4.17.3.1	Fin de calle 153 NW	0 d	vie 9/01/26	vie 9/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
3526		**1.3.4.17.3.1**	**CALLE 153 NW-APROCHE OCCIDENT**	**52 d**	**mié 8/01/25**	**mié 12/03/25**	**$ 50.565.326**	**$ 50.565.326**	**$ 50.565.326**
3527		1.3.4.17.3.1	Excavación	10 d	mié 8/01/25	lun 20/01/25	$ 11.262.984	$ 11.262.984	$ 11.262.984
3528		1.3.4.17.3.1	Demolición	5 d	jue 27/02/25	mié 5/03/25	$ 1.027.371	$ 1.027.371	$ 1.027.371
3529		1.3.4.17.3.1	Instalación de Tubería (8d4")	10 d	mar 4/02/25	sáb 15/02/25	$ 16.274.276	$ 16.274.276	$ 16.274.276
3530		1.3.4.17.3.1	Camaras	5 d	sáb 15/02/25	vie 21/02/25	$ 13.458.691	$ 13.458.691	$ 13.458.691
3531		1.3.4.17.3.1	Retiro de red existente-Maniobra	0 d	jue 27/02/25	jue 27/02/25	$ 0	$ 0	$ 0
3532		1.3.4.17.3.1	Rellenos	10 d	jue 27/02/25	mié 12/03/25	$ 8.542.004	$ 8.542.004	$ 8.542.004
3533		1.3.4.17.3.1	Fin de calle 153 NW	0 d	mié 12/03/25	mié 12/03/25	$ 0	$ 0	$ 0
3534		**1.3.4.17.3.1**	**CONECTANTE NW**	**150 d**	**vie 19/12/25**	**vie 3/07/26**	**$ 48.200.402**	**$ 37.877.218**	**$ 48.200.402**
3535		1.3.4.17.3.1	Renivelación de Camaras	6 d	jue 25/06/26	vie 3/07/26	$ 10.323.184	$ 0	$ 10.323.184
3536		1.3.4.17.3.1	Carcamos de protección en vía	6 d	vie 19/12/25	sáb 27/12/25	$ 37.877.218	$ 37.877.218	$ 37.877.218
3537		1.3.4.17.3.1	Fin de Conectante NW	0 d	vie 3/07/26	vie 3/07/26	$ 0	$ 0	$ 0
3538		**1.3.4.17.3.1**	**OREJA OCCIDENTAL - CARRIL DE DESACELERACIÓN NW**	**64 d**	**mar 31/03/26**	**mié 24/06/26**	**$ 65.612.578**	**$ 61.250.730**	**$ 65.612.578**
3539		1.3.4.17.3.1	Renivelación de Camaras	64 d	mar 31/03/26	mié 24/06/26	$ 38.923.060	$ 34.561.212	$ 38.923.060
3540		1.3.4.17.3.1	Carcamos de protección en vía	5 d	sáb 4/04/26	vie 10/04/26	$ 26.689.518	$ 26.689.518	$ 26.689.518
3541		1.3.4.17.3.1	Fin de Oreja Occidental - Carril de Desaceleración NW	0 d	vie 10/04/26	vie 10/04/26	$ 0	$ 0	$ 0
3542		1.3.4.17.4	Fin de ETB	0 d	vie 3/07/26	vie 3/07/26	$ 0	$ 0	$ 0

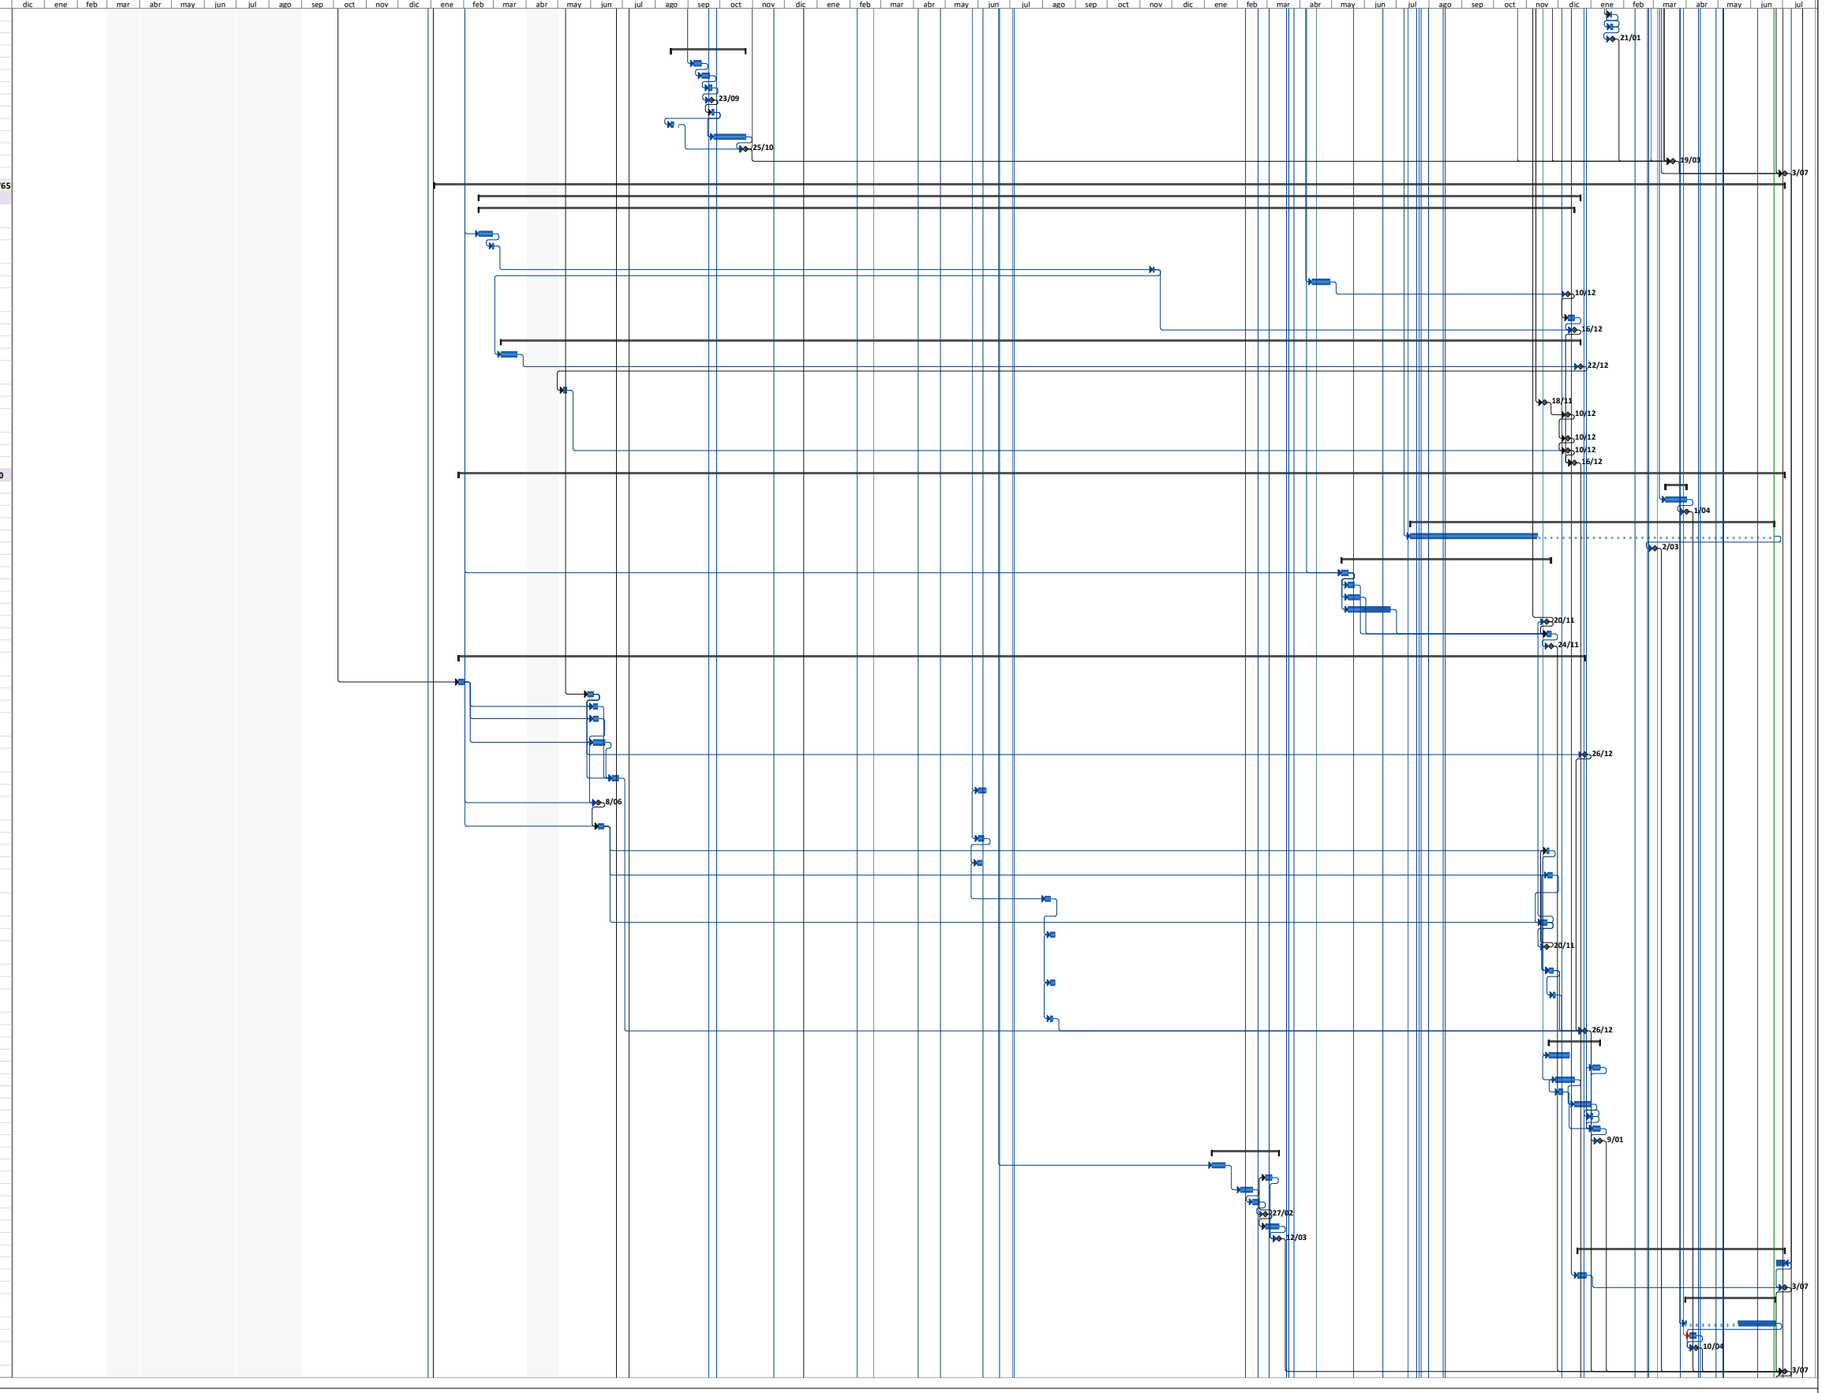

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | Sólo el comienzo | Fecha límite | División crítica | Progreso manual
División | Resumen | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo | Sólo duración | Resumen manual | Sólo fin | Tareas críticas | Progreso


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
3543		**1.3.4.17.5**	**CODENSA**	**959 d**	**mié 4/01/23**	**mar 30/06/26**	**$ 894.919.910**	**$ 894.553.072**	**$ 894.237.103**
3544		1.3.4.17.5.1	**CALLE 153 NE**	**424 d**	**mar 9/07/24**	**lun 5/01/26**	$ 99.511.828	**$ 99.511.828**	**$ 99.511.828**
3545		1.3.4.17.5.1	Excavación	13 d	mar 9/07/24	jue 25/07/24	$ 19.780.229	$ 19.780.229	$ 19.780.229
3546		1.3.4.17.5.1	Demoliciones	3 d	jue 25/07/24	lun 29/07/24	$ 3.240.773	$ 3.240.773	$ 3.240.773
3547		1.3.4.17.5.1	Instalación de tubería	16 d	jue 25/07/24	jue 15/08/24	$ 39.565.199	$ 39.565.199	$ 39.565.199
3548		1.3.4.17.5.1	Construcción de cajas -1	3 d	lun 29/07/24	jue 1/08/24	$ 4.897.569	$ 4.897.569	$ 4.897.569
3549		1.3.4.17.5.1	Construcción de Cajas	395 d	jue 15/08/24	lun 5/01/26	$ 9.095.485	$ 9.095.485	$ 9.095.485
3550		1.3.4.17.5.1	Rellenos	13 d	jue 29/08/24	sáb 14/09/24	$ 22.932.573	$ 22.932.573	$ 22.932.573
3551		1.3.4.17.5.2	Fin de Calle 153 NE	0 d	sáb 14/09/24	sáb 14/09/24	$ 0	$ 0	$ 0
3552		**1.3.4.17.5.3**	**CONECTANTE NE**	**252 d**	**mié 2/04/25**	**vie 20/02/26**	$ 107.459.614	**$ 107.459.614**	**$ 107.459.614**
3553		1.3.4.17.5.3	Excavación	220 d	mié 2/04/25	mar 13/01/26	$ 19.780.229	$ 19.780.229	$ 19.780.229
3554		1.3.4.17.5.3	Demolición	200 d	jue 24/04/25	mié 7/01/26	$ 3.240.773	$ 3.240.773	$ 3.240.773
3555		1.3.4.17.5.3	Instalación de tubería	200 d	mié 30/04/25	mié 14/01/26	$ 47.512.983	$ 47.512.983	$ 47.512.983
3556		1.3.4.17.5.3	Construcción de Cajas	14 d	mié 14/01/26	sáb 31/01/26	$ 13.993.056	$ 13.993.056	$ 13.993.056
3557		1.3.4.17.5.3	Rellenos	17 d	sáb 31/01/26	vie 20/02/26	$ 22.932.573	$ 22.932.573	$ 22.932.573
3558		1.3.4.17.5.4	Fin de Conectante NE	0 d	vie 20/02/26	vie 20/02/26	$ 0	$ 0	$ 0
3559		**1.3.4.17.5.5**	**APROCHE ORIENTAL**	**41 d**	**mar 17/02/26**	**sáb 11/04/26**	$ 105.137.817	**$ 105.137.817**	**$ 105.137.817**
3560		1.3.4.17.5.5	Excavación	12 d	mar 17/02/26	mié 4/03/26	$ 19.780.229	$ 19.780.229	$ 19.780.229
3561		1.3.4.17.5.5	Instalación de tubería	12 d	mié 4/03/26	mié 18/03/26	$ 48.431.959	$ 48.431.959	$ 48.431.959
3562		1.3.4.17.5.5	Construcción de Cajas	5 d	mié 18/03/26	jue 26/03/26	$ 13.993.056	$ 13.993.056	$ 13.993.056
3563		1.3.4.17.5.5	Rellenos	12 d	jue 26/03/26	sáb 11/04/26	$ 22.932.573	$ 22.932.573	$ 22.932.573
3564		1.3.4.17.5.6	Fin de Aproche Oriental	0 d	sáb 11/04/26	sáb 11/04/26	$ 0	$ 0	$ 0
3565		**1.3.4.17.5.7**	**OREJA ORIENTAL**	**48 d**	**mar 1/04/25**	**mar 3/06/25**	$ 108.378.590	**$ 108.378.590**	**$ 108.378.590**
3566		1.3.4.17.5.7	Excavación	14 d	mar 1/04/25	lun 21/04/25	$ 13.446.829	$ 13.446.829	$ 13.446.829
3567		1.3.4.17.5.7	Demolición	6 d	lun 21/04/25	lun 28/04/25	$ 3.240.773	$ 3.240.773	$ 3.240.773
3568		1.3.4.17.5.7	Retiro de Infraestructura Existente	4 d	mié 28/05/25	mar 3/06/25	$ 6.333.400	$ 6.333.400	$ 6.333.400
3569		1.3.4.17.5.7	Maniobras Codensa	0 d	mié 28/05/25	mié 28/05/25	$ 0	$ 0	$ 0
3570		1.3.4.17.5.7	Instalación de tubería	8 d	vie 9/05/25	mar 20/05/25	$ 48.431.959	$ 48.431.959	$ 48.431.959
3571		1.3.4.17.5.7	Construcción de Cajas	6 d	lun 28/04/25	mar 6/05/25	$ 13.993.056	$ 13.993.056	$ 13.993.056
3572		1.3.4.17.5.7	Rellenos	7 d	mar 20/05/25	mié 28/05/25	$ 22.932.573	$ 22.932.573	$ 22.932.573
3573		1.3.4.17.5.8	Fin de Oreja Oriental	0 d	mié 4/06/25	mié 4/06/25	$ 0	$ 0	$ 0
3574		**1.3.4.17.5.9**	**ESPACIO PÚBLICO BAJO PUENTE ORIENTAL Enel**	**959 d**	**mié 4/01/23**	**mar 30/06/26**	$ 20.689.693	**$ 20.403.169**	**$ 20.689.693**
3575		1.3.4.17.5.9	Excavación	6 d	mié 4/01/23	jue 12/01/23	$ 463.021	$ 463.021	$ 463.021
3576		1.3.4.17.5.9	Demolición	1 d	jue 12/01/23	vie 13/01/23	$ 474.731	$ 474.731	$ 474.731
3577		1.3.4.17.5.9	Demolición Segunda Etapa	670 d	mié 2/08/23	jue 11/12/25	$ 3.240.773	$ 3.240.773	$ 3.240.773
3578		1.3.4.17.5.9	Instalación de tubería	8 d	jue 12/01/23	sáb 21/01/23	$ 510.850	$ 510.850	$ 510.850
3579		1.3.4.17.5.9	Construcción de Cajas	4 d	vie 13/01/23	mié 18/01/23	$ 1.266.680	$ 1.266.680	$ 1.266.680
3580		1.3.4.17.5.9	Renivelación de cajas	525 d	vie 23/08/24	mar 30/06/26	$ 13.993.056	$ 13.706.532	$ 13.993.056
3581		1.3.4.17.5.9	Rellenos	7 d	vie 4/08/23	lun 14/08/23	$ 740.582	$ 740.582	$ 740.582
3582		1.3.4.17.5.10	Fin de Espacio Público Enel	0 d	lun 19/01/26	lun 19/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
3583		**1.3.4.17.5.1**	**CALLE 153 NW**	**514 d**	**jue 29/02/24**	**lun 22/12/25**	$ 108.378.590	**$ 108.378.590**	**$ 108.378.590**
3584		1.3.4.17.5.1	Excavación	14 d	jue 29/02/24	sáb 16/03/24	$ 19.780.229	$ 19.780.229	$ 19.780.229
3585		1.3.4.17.5.1	Demolición	3 d	sáb 16/03/24	mié 20/03/24	$ 3.240.773	$ 3.240.773	$ 3.240.773
3586		1.3.4.17.5.1	Instalación de tubería	15 d	sáb 16/03/24	lun 8/04/24	$ 48.431.959	$ 48.431.959	$ 48.431.959
3587		1.3.4.17.5.1	Construccion de cajas 1	2 d	mié 20/03/24	vie 22/03/24	$ 4.897.570	$ 4.897.570	$ 4.897.570
3588		1.3.4.17.5.1	Construcción de Cajas	497 d	mié 20/03/24	lun 22/12/25	$ 9.095.486	$ 9.095.486	$ 9.095.486
3589		1.3.4.17.5.1	Rellenos	15 d	jue 11/04/24	mar 30/04/24	$ 22.932.573	$ 22.932.573	$ 22.932.573
3590		1.3.4.17.5.1	Fin de Calle 153 NW	0 d	mar 30/04/24	mar 30/04/24	$ 0	$ 0	$ 0
3591		**1.3.4.17.5.1**	**CONECTANTE NW**	**336 d**	**mié 4/10/23**	**mié 11/12/24**	$ 108.378.590	**$ 108.378.590**	**$ 108.378.590**
3592		1.3.4.17.5.1	Excavación	275 d	mié 4/10/23	mar 24/09/24	$ 13.446.829	$ 13.446.829	$ 13.446.829
3593		1.3.4.17.5.1	Demolición	255 d	sáb 21/10/23	mar 17/09/24	$ 3.240.773	$ 3.240.773	$ 3.240.773
3594		1.3.4.17.5.1	Instalación de tubería	265 d	sáb 21/10/23	sáb 28/09/24	$ 48.431.959	$ 48.431.959	$ 48.431.959
3595		1.3.4.17.5.1	Construcción de Cajas	263 d	mar 7/11/23	jue 10/10/24	$ 13.993.056	$ 13.993.056	$ 13.993.056
3596		1.3.4.17.5.1	Retiro de Infraestructura Existente	245 d	vie 3/11/23	mar 17/09/24	$ 6.333.400	$ 6.333.400	$ 6.333.400
3597		1.3.4.17.5.1	Maniobras Codensa	0 d	mié 11/12/24	mié 11/12/24	$ 0	$ 0	$ 0
3598		1.3.4.17.5.1	Rellenos	243 d	lun 27/11/23	vie 4/10/24	$ 22.932.573	$ 22.932.573	$ 22.932.573
3599		1.3.4.17.5.1	Fin de Conectante NW	0 d	mié 11/12/24	mié 11/12/24	$ 0	$ 0	$ 0
3600		**1.3.4.17.5.1**	**APROCHE OCCIDENTAL-TRANSICIÓN**	**60 d**	**lun 15/12/25**	**sáb 28/02/26**	$ 105.137.817	**$ 105.137.817**	**$ 105.137.817**
3601		1.3.4.17.5.1	Excavación	18 d	lun 15/12/25	mié 7/01/26	$ 19.780.229	$ 19.780.229	$ 19.780.229
3602		1.3.4.17.5.1	Instalación de tubería	14 d	jue 8/01/26	lun 26/01/26	$ 48.431.959	$ 48.431.959	$ 48.431.959
3603		1.3.4.17.5.1	Construcción de Cajas	10 d	lun 26/01/26	vie 6/02/26	$ 13.993.056	$ 13.993.056	$ 13.993.056
3604		1.3.4.17.5.1	Rellenos	18 d	sáb 7/02/26	sáb 28/02/26	$ 22.932.573	$ 22.932.573	$ 22.932.573
3605		1.3.4.17.5.1	Fin de Aproche Occidental - Transición	0 d	sáb 28/02/26	sáb 28/02/26	$ 0	$ 0	$ 0
3606		**1.3.4.17.5.1**	**OREJA OCCIDENTAL**	**38 d**	**vie 14/02/25**	**jue 3/04/25**	$ 108.378.590	**$ 108.378.590**	**$ 108.378.590**
3607		1.3.4.17.5.1	Excavación	15 d	vie 14/02/25	mié 5/03/25	$ 13.446.829	$ 13.446.829	$ 13.446.829
3608		1.3.4.17.5.1	Demolición	5 d	mié 5/03/25	mar 11/03/25	$ 3.240.773	$ 3.240.773	$ 3.240.773
3609		1.3.4.17.5.1	Retiro de Infraestructura Existente	5 d	vie 28/03/25	jue 3/04/25	$ 6.333.400	$ 6.333.400	$ 6.333.400
3610		1.3.4.17.5.1	Maniobras Codensa	0 d	vie 28/03/25	vie 28/03/25	$ 0	$ 0	$ 0
3611		1.3.4.17.5.1	Instalación de tubería	8 d	mié 5/03/25	vie 14/03/25	$ 48.431.959	$ 48.431.959	$ 48.431.959
3612		1.3.4.17.5.1	Construcción de Cajas	6 d	mar 11/03/25	mar 18/03/25	$ 13.993.056	$ 13.993.056	$ 13.993.056
3613		1.3.4.17.5.1	Rellenos	7 d	mié 19/03/25	vie 28/03/25	$ 22.932.573	$ 22.932.573	$ 22.932.573
3614		1.3.4.17.5.1	Fin de Oreja Occidental	0 d	jue 3/04/25	jue 3/04/25	$ 0	$ 0	$ 0
3615		**1.3.4.17.5.1**	**ESPACIO PÚBLICO BAJO PUENTE OCCIDENTAL**	**40 d**	**jue 11/07/24**	**sáb 31/08/24**	$ 7.209.198	**$ 7.209.198**	**$ 7.209.198**
3616		1.3.4.17.5.1	Excavación	9 d	jue 11/07/24	mar 23/07/24	$ 416.317	$ 416.317	$ 416.317
3617		1.3.4.17.5.1	Demolición	2 d	mié 24/07/24	vie 26/07/24	$ 802.429	$ 802.429	$ 802.429
3618		1.3.4.17.5.1	Instalación de tubería	10 d	mié 24/07/24	lun 5/08/24	$ 4.655.603	$ 4.655.603	$ 4.655.603
3619		1.3.4.17.5.1	Construcción de Cajas	19 d	vie 26/07/24	mié 21/08/24	$ 761.052	$ 761.052	$ 761.052
3620		1.3.4.17.5.1	Rellenos	9 d	mié 21/08/24	sáb 31/08/24	$ 573.797	$ 573.797	$ 573.797
3621		1.3.4.17.5.2	Fin de Espacio Público	0 d	sáb 31/08/24	sáb 31/08/24	$ 0	$ 0	$ 0
3622		**1.3.4.17.5.2**	**ALUMBRADO PÚBLICO**	**149 d**	**mié 10/12/25**	**lun 22/06/26**	**$ 16.259.583**	**$ 16.179.269**	**$ 15.576.776**
3623		1.3.4.17.5.2	Pedestales para postes	149 d	mié 10/12/25	lun 22/06/26	$ 2.731.226	$ 2.650.913	$ 2.048.420
3624		1.3.4.17.5.2	Canalización Bajo Puente	31 d	vie 17/04/26	jue 28/05/26	$ 4.424.270	$ 4.424.270	$ 4.424.270
3625		1.3.4.17.5.2	Instalación postes	13 d	mié 25/02/26	jue 12/03/26	$ 9.104.087	$ 9.104.087	$ 9.104.087
3626		**1.3.4.17.5.2**	**PUENTE (MANIOBRA)**	**62 d**	**mar 25/02/25**	**jue 15/05/25**	$ 0	**$ 0**	**$ 0**
3627		1.3.4.17.5.2	Solicitud de suspensión Red de Alta Tensión Eje 3	0 d	jue 15/05/25	jue 15/05/25	$ 0	$ 0	$ 0
3628		1.3.4.17.5.2	Solicitud de suspensión Red de Alta Tensión Eje 5	0 d	mar 25/02/25	mar 25/02/25	$ 0	$ 0	$ 0
3629		1.3.4.17.5.2	Fin de Puente	0 d	jue 15/05/25	jue 15/05/25	$ 0	$ 0	$ 0
3630		1.3.4.17.6	Fin de CODENSA	0 d	jue 28/05/26	jue 28/05/26	$ 0	$ 0	$ 0
3631		1.3.4.18	Fin de Redes Secas	0 d	vie 3/07/26	vie 3/07/26	$ 0	$ 0	$ 0
3632		**1.3.4.19**	**LA SIRENA**	**693 d**	**mar 6/02/24**	**sáb 18/07/26**	**$ 2.291.144.324**	**$ 2.286.243....**	**$ 2.274.827.267**
3633		1.3.4.19.1	Intervensión silvicultural	39 d	mar 6/02/24	mar 26/03/24	$ 10.173.967	$ 10.173.967	$ 10.173.967
3634		**1.3.4.19.2**	**Via**	**414,87 d**	**mié 21/02/24**	**vie 8/08/25**	$ 603.273.289	**$ 603.273.289**	**$ 603.273.289**
3635		1.3.4.19.2.1	Excavación	27 d	mié 21/02/24	mar 26/03/24	$ 95.536.774	$ 95.536.774	$ 95.536.774
3636		1.3.4.19.2.2	Excavación 2	3 d	jue 15/08/24	mar 20/08/24	$ 10.615.197	$ 10.615.197	$ 10.615.197
3637		1.3.4.19.2.3	Rajon	27 d	sáb 23/03/24	lun 29/04/24	$ 131.241.094	$ 131.241.094	$ 131.241.094
3638		1.3.4.19.2.4	Rajon 2	3 d	mar 20/08/24	vie 23/08/24	$ 14.582.344	$ 14.582.344	$ 14.582.344
3639		1.3.4.19.2.5	Subbase Granular	30 d	jue 22/08/24	vie 27/09/24	$ 105.620.423	$ 105.620.423	$ 105.620.423
3640		1.3.4.19.2.6	Base Granular BGA	30 d	mié 29/01/25	jue 6/03/25	$ 44.287.469	$ 44.287.469	$ 44.287.469
3641		1.3.4.19.2.7	Mezcla Asfaltica - asfalcaucho	1 d	jue 6/03/25	vie 7/03/25	$ 130.436.989	$ 130.436.989	$ 130.436.989
3642		1.3.4.19.2.8	Mezcla Asfaltica - MD12	1 d	mié 6/08/25	vie 8/08/25	$ 70.952.999	$ 70.952.999	$ 70.952.999
3643		1.3.4.19.3	Fin Vía	0 d	vie 8/08/25	vie 8/08/25	$ 0	$ 0	$ 0
3644		**1.3.4.19.4**	**Espacio Público**	**395 d**	**mié 4/09/24**	**lun 26/01/26**	$ 1.227.671.744	**$ 1.227.671....**	**$ 1.227.671.744**
3645		1.3.4.19.4.1	Excavación	30 d	mié 4/09/24	vie 11/10/24	$ 44.665.522	$ 44.665.522	$ 44.665.522
3646		1.3.4.19.4.2	Rellenos	35 d	sáb 12/10/24	mié 27/11/24	$ 1.068.333.734	$ 1.068.333....	$ 1.068.333.734
3647		1.3.4.19.4.3	Acabados	335 d	mié 20/11/24	lun 26/01/26	$ 114.672.488	$ 114.672.488	$ 114.672.488
3648		1.3.4.19.5	Fin Espacio Publico	0 d	lun 26/01/26	lun 26/01/26	$ 0	$ 0	$ 0
3649		**1.3.4.19.6**	**Redes Secas**	**418 d**	**sáb 27/04/24**	**vie 17/10/25**	**$ 73.162.259**	**$ 73.162.259**	**$ 73.162.259**
3650		**1.3.4.19.6.1**	**ENEL**	**418 d**	**sáb 27/04/24**	**vie 17/10/25**	**$ 73.162.259**	**$ 73.162.259**	**$ 73.162.259**
3651		1.3.4.19.6.1	Excavación	15 d	sáb 27/04/24	sáb 18/05/24	$ 11.773.658	$ 11.773.658	$ 11.773.658

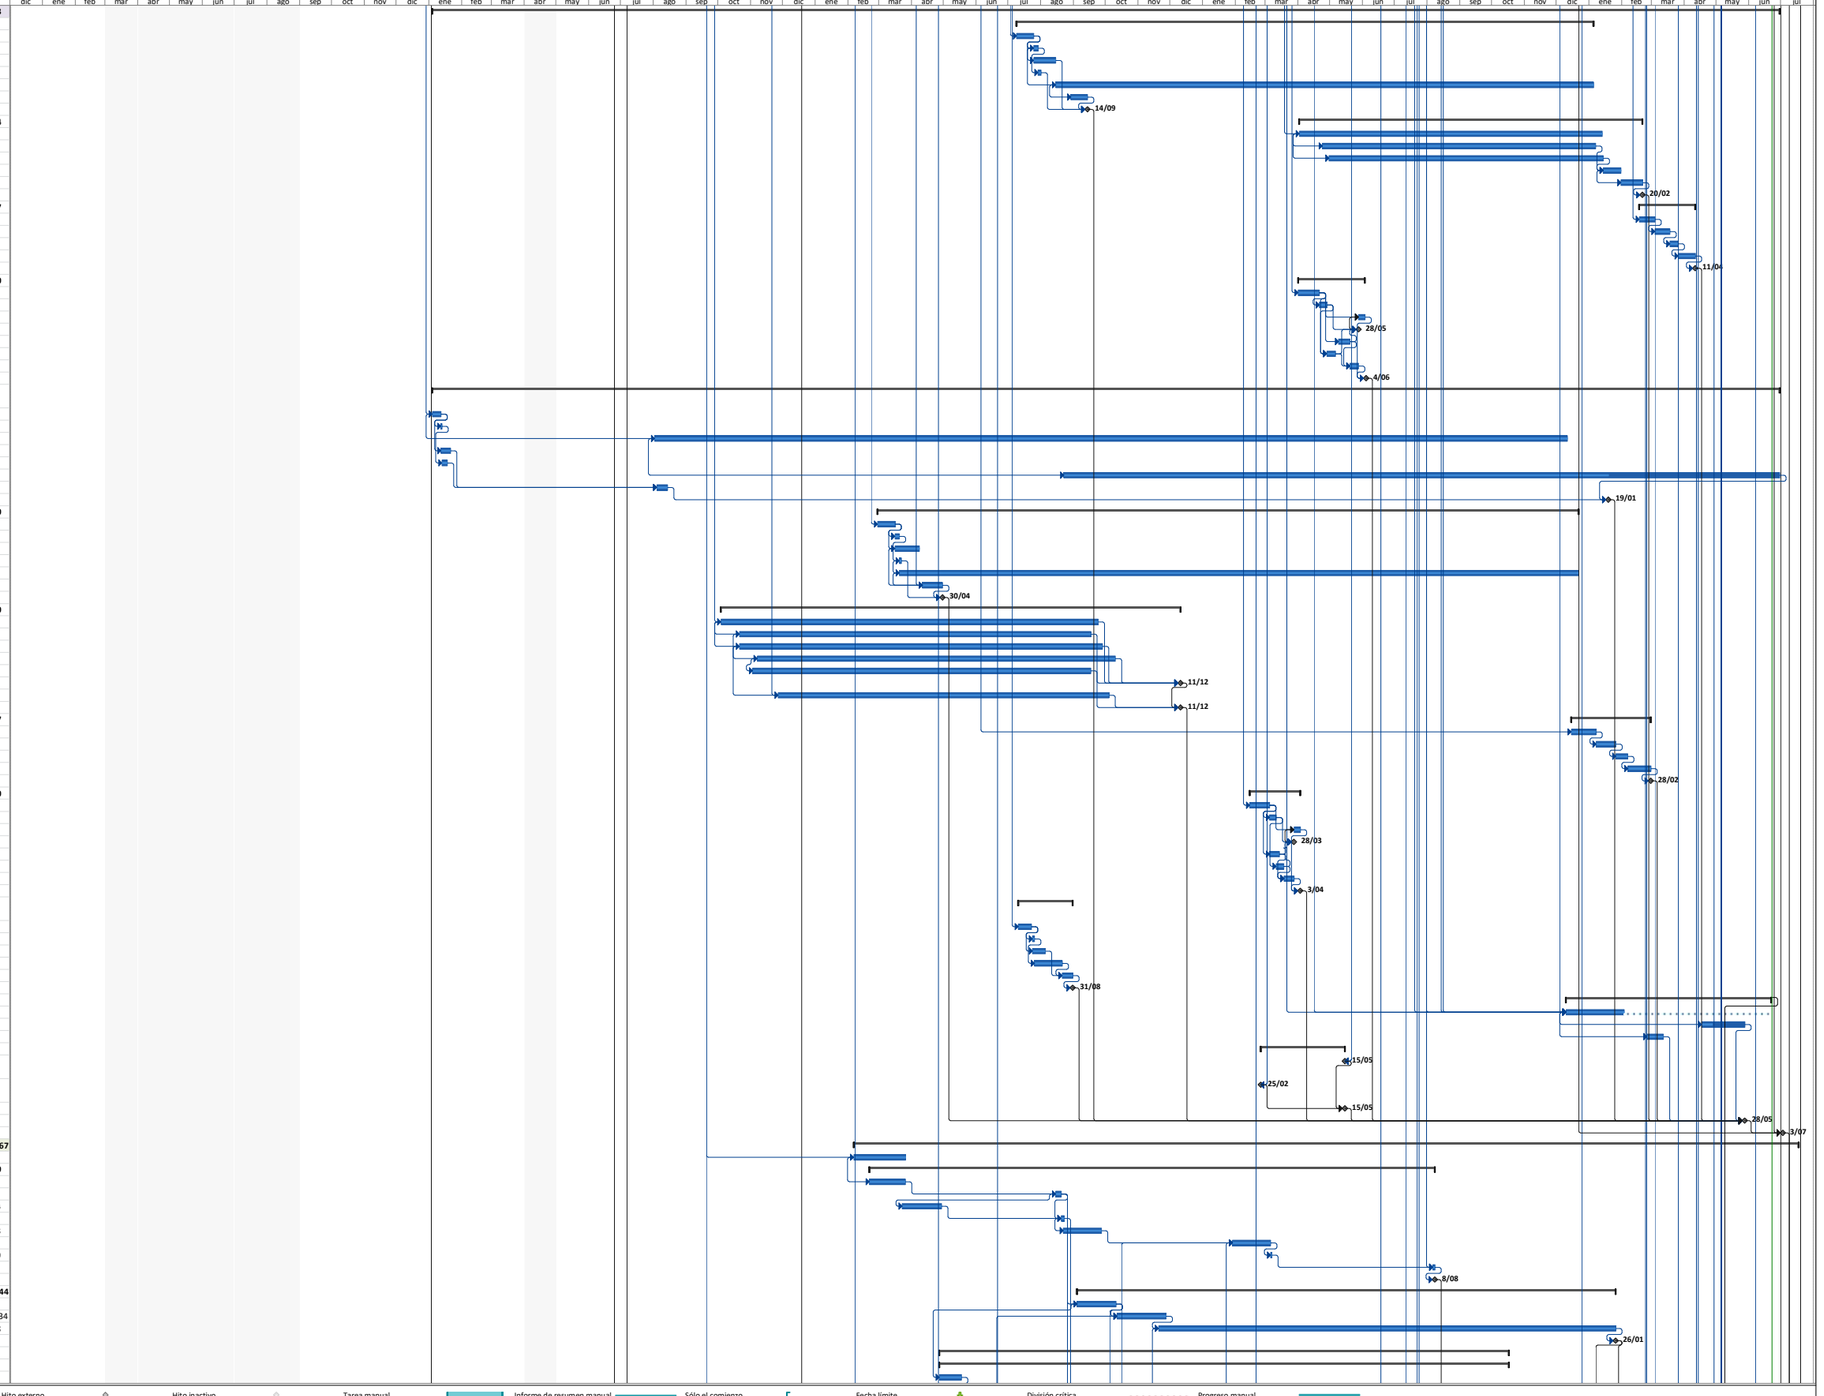

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | Sólo el comienzo | Fecha límite | División crítica | Progreso manual
División | Resumen | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo | Sólo duración | Resumen manual | Sólo fin | Tareas críticas | Progreso

Proyecto: IDU-1737-2021-PUENTECLL153PORAUTONORTE-CLB8-20221201
Fecha: mar 23/06/26

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	CPTP	CPTR
3652		1.3.4.19.6.1	Instalación de tubería	15 d	sáb 18/05/24	jue 6/06/24	$ 28.427.670	$ 28.427.670	$ 28.427.670
3653		1.3.4.19.6.1	Construcción de Cajas	9 d	sáb 18/05/24	mié 29/05/24	$ 10.258.919	$ 10.258.919	$ 10.258.919
3654		1.3.4.19.6.1	Construcción de Cajas 2	395 d	mar 28/05/24	vie 17/10/25	$ 6.839.280	$ 6.839.280	$ 6.839.280
3655		1.3.4.19.6.1	Rellenos	15 d	mié 26/06/24	mar 16/07/24	$ 15.862.732	$ 15.862.732	$ 15.862.732
3656		1.3.4.19.6.2	Fin de ENEL La Sirena	0 d	mar 16/07/24	mar 16/07/24	$ 0	$ 0	$ 0
3657		**1.3.4.19.7**	**Redes Humedas**	**315 d**	**lun 9/09/24**	**jue 16/10/25**	**$ 349.667.970**	**$ 349.667.970**	**$ 349.667.970**
3658		**1.3.4.19.7.1**	**ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**315 d**	**lun 9/09/24**	**jue 16/10/25**	**$ 195.409.795**	**$ 195.409.795**	**$ 195.409.795**
3659		1.3.4.19.7.1	Excavación de 0-2 m	10 d	lun 9/09/24	vie 20/09/24	$ 2.028.984	$ 2.028.984	$ 2.028.984
3660		1.3.4.19.7.1	Excavación mayor a 2 m	10 d	jue 26/09/24	mié 9/10/24	$ 41.101.892	$ 41.101.892	$ 41.101.892
3661		1.3.4.19.7.1	Instalación de Tubería para colect	10 d	vie 20/09/24	mié 2/10/24	$ 109.705.902	$ 109.705.902	$ 109.705.902
3662		1.3.4.19.7.1	Sumideros	300 d	jue 26/09/24	jue 16/10/25	$ 14.099.173	$ 14.099.173	$ 14.099.173
3663		1.3.4.19.7.1	Pozo de Inspección placa de fondo y mamposteria	10 d	jue 26/09/24	mié 9/10/24	$ 4.222.686	$ 4.222.686	$ 4.222.686
3664		1.3.4.19.7.1	Pozo de Inspección cargue y acab	290 d	mié 9/10/24	jue 16/10/25	$ 3.049.286	$ 3.049.286	$ 3.049.286
3665		1.3.4.19.7.1	Rellenos Atraque NP-040	10 d	lun 21/10/24	vie 1/11/24	$ 5.260.627	$ 5.260.627	$ 5.260.627
3666		1.3.4.19.7.1	Rellenos sobre tuberia NP-040	10 d	mar 22/10/24	mar 5/11/24	$ 15.941.245	$ 15.941.245	$ 15.941.245
3667		1.3.4.19.7.2	Fin Alcantarillado Pluvial	0 d	mar 5/11/24	mar 5/11/24	$ 0	$ 0	$ 0
3668		**1.3.4.19.7.3**	**ALCANTARILLADO SANITARIO**	**26 d**	**jue 9/01/25**	**lun 10/02/25**	**$ 99.446.477**	**$ 99.446.477**	**$ 99.446.477**
3669		1.3.4.19.7.3	Excavación de 0-2 m	5 d	jue 9/01/25	mié 15/01/25	$ 9.327.427	$ 9.327.427	$ 9.327.427
3670		1.3.4.19.7.3	Excavación mayor a 2 m	5 d	vie 10/01/25	jue 16/01/25	$ 10.831.438	$ 10.831.438	$ 10.831.438
3671		1.3.4.19.7.3	Instalación de Tubería	10 d	jue 16/01/25	mié 29/01/25	$ 70.311.168	$ 70.311.168	$ 70.311.168
3672		1.3.4.19.7.3	Rellenos	10 d	mié 29/01/25	lun 10/02/25	$ 8.976.444	$ 8.976.444	$ 8.976.444
3673		1.3.4.19.7.4	Fin de Alcantarillado Sanitario	0 d	lun 10/02/25	lun 10/02/25	$ 0	$ 0	$ 0
3674		**1.3.4.19.7.5**	**ACUEDUCTO**	**91 d**	**vie 11/10/24**	**jue 6/02/25**	**$ 54.811.698**	**$ 54.811.698**	**$ 54.811.698**
3675		1.3.4.19.7.5	Excavación	20 d	vie 11/10/24	jue 7/11/24	$ 7.961.981	$ 7.961.981	$ 7.961.981
3676		1.3.4.19.7.5	Instalación de Tubería	20 d	jue 7/11/24	mar 3/12/24	$ 40.136.554	$ 40.136.554	$ 40.136.554
3677		1.3.4.19.7.5	Solicitud de Empalme a EAAB	0 d	mar 3/12/24	mar 3/12/24	$ 0	$ 0	$ 0
3678		1.3.4.19.7.5	Empalme de Tubería a existente	1 d	lun 30/12/24	mar 31/12/24	$ 2.590.073	$ 2.590.073	$ 2.590.073
3679		1.3.4.19.7.5	Rellenos	30 d	lun 30/12/24	jue 6/02/25	$ 4.123.090	$ 4.123.090	$ 4.123.090
3680		1.3.4.19.7.6	Fin Acueducto	0 d	jue 6/02/25	jue 6/02/25	$ 0	$ 0	$ 0
3681		1.3.4.19.8	Señalización de la Sirena	145 d	mar 13/01/26	sáb 18/07/26	$ 27.195.096	$ 22.294.352	$ 10.878.038
3682		1.3.4.20	Fin La Sirena	0 d	vie 6/02/26	vie 6/02/26	$ 0	$ 0	$ 0
3683		1.3.4.21	PINTURA FRANJAS CICLOPEATONALES	38 d	vie 15/05/26	vie 3/07/26	$ 238.598.238	$ 149.123.898	$ 0
3684		1.3.4.22	SEÑALIZACIÓN	57 d	mar 12/05/26	sáb 25/07/26	$ 579.797.847	$ 261.926.221	$ 231.919.139
3685		1.3.4.23	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA DEL ACERO	15 d	jue 31/08/23	lun 18/09/23	$ 89.511.927	$ 89.511.927	$ 89.511.927
3686		1.3.4.24	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA DEL ACERO (SEGUNDA ETAPA)	15 d	mar 13/02/24	vie 1/03/24	$ 24.639.884	$ 24.639.884	$ 24.639.884
3687		1.3.4.25	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA DEL ACERO (SEGUNDA ETAPA) 2	317 d	sáb 3/08/24	sáb 13/09/25	$ 216.173.917	$ 216.173.917	$ 216.173.917
3688		1.3.4.26	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA DEL ACERO (SEGUNDA ETAPA) 3	170 d	lun 15/09/25	mié 22/04/26	$ 1.357.791.740	$ 1.357.791.740	$ 1.357.791.740
3689		1.3.4.27	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA DEL ACERO (SEGUNDA ETAPA) 4	128 d	vie 16/01/26	mar 30/06/26	$ 1.372.269.917	$ 1.248.980.042	$ 1.303.656.421
3690		1.3.4.28	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA DEL ACERO (SEGUNDA ETAPA) 5	52 d	mar 19/05/26	sáb 25/07/26	-$ 226.890.315	-$ 89.447.143	-$ 215.545.799
3691		1.3.4.29	**Fin de Actividades de Construcción Puen**	0 d	mar 28/07/26	mar 28/07/26	$ 0	$ 0	$ 0
3692		1.3.5	**FIN DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS**	0 d	mar 28/07/26	mar 28/07/26	$ 0	$ 0	$ 0
3693		**1.3.6**	**ENTREGA DEL PROYECTO**	**13 d**	**mié 15/07/26**	**vie 31/07/26**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
3694		1.3.6.1	Entrega Vanti	13 d	mié 15/07/26	vie 31/07/26	$ 0	$ 0	$ 0
3695		1.3.6.2	Entrega ENEL AP	13 d	mié 15/07/26	vie 31/07/26	$ 0	$ 0	$ 0
3696		1.3.6.3	Entrega ENEL MT y BT	13 d	mié 15/07/26	vie 31/07/26	$ 0	$ 0	$ 0
3697		1.3.6.4	Entrega ENEL AT	13 d	mié 15/07/26	vie 31/07/26	$ 0	$ 0	$ 0
3698		1.3.6.5	Entrega ETB	13 d	mié 15/07/26	vie 31/07/26	$ 0	$ 0	$ 0
3699		1.3.6.6	Entrega EAAB	13 d	mié 15/07/26	vie 31/07/26	$ 0	$ 0	$ 0
3700		**1.3.7**	**COMPONETES DEL PROYECTO**	**868,75 d**	**sáb 1/07/23**	**lun 27/07/26**	**$ 13.625.777.707**	**$ 10.662.379....**	**$ 13.254.531....**
3701		1.3.7.1	ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST (B)	63 d	sáb 1/07/23	lun 18/09/23	$ 316.295.243	$ 316.295.243	$ 316.295.243
3702		1.3.7.2	ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST (B) (SEGUNDA ETAPA)	484 d	mar 13/02/24	mar 30/09/25	$ 709.154.925	$ 709.154.925	$ 709.154.925
3703		1.3.7.3	ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST (B) (TERCERA ETAPA)	230 d	mié 1/10/25	lun 27/07/26	$ 557.193.156	$ 478.459.341	$ 557.193.156
3704		1.3.7.4	DIÁLOGO CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA (C)	63 d	sáb 1/07/23	lun 18/09/23	$ 127.674.345	$ 127.674.345	$ 127.674.345
3705		1.3.7.5	DIÁLOGO CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	395 d	mar 4/06/24	mié 1/10/25	$ 156.497.175	$ 156.497.175	$ 156.497.175
3706		1.3.7.6	DIÁLOGO CIUDADANO Y DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA (TERCERA	230 d	mié 1/10/25	lun 27/07/26	$ 492.822.973	$ 423.184.944	$ 492.822.973
3707		1.3.7.7	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (D)	63 d	sáb 1/07/23	lun 18/09/23	$ 182.571.415	$ 182.571.415	$ 182.571.415
3708		1.3.7.8	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (D) (SEGUNDA PARTE)	394 d	mar 4/06/24	mar 30/09/25	$ 424.174.335	$ 424.174.335	$ 424.174.335
3709		1.3.7.9	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (D) (TERCERA PARTE)	230 d	mié 1/10/25	lun 27/07/26	$ 461.948.563	$ 396.673.223	$ 461.948.563
3710		1.3.7.10	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-PGS-PMT (E)	63 d	sáb 1/07/23	lun 18/09/23	$ 602.246.660	$ 602.246.660	$ 602.246.660
3711		1.3.7.11	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-PGS-PMT (SEGUNDA ETAPA)	45 d	mar 13/02/24	mar 9/04/24	$ 78.771.192	$ 78.771.192	$ 78.771.192
3712		1.3.7.12	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-PGS-PMT (SEGUNDA ETAPA) 2	355 d	vie 2/08/24	jue 30/10/25	$ 691.085.926	$ 691.085.926	$ 691.085.926
3713		1.3.7.13	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-PGS-PMT	160 d	vie 31/10/25	mié 27/05/26	$ 3.518.461.199	$ 3.518.461.199	$ 3.518.461.199
3714		1.3.7.14	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRA-AIU-PMA-PGS-PMT	128 d	jue 15/01/26	sáb 27/06/26	$ 1.832.544.630	$ 1.682.218.703	$ 1.740.917.399
3715		1.3.7.15	AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRA-AIU-PMA-PGS-PMT (QUINTA	10 d	mar 16/06/26	sáb 27/06/26	$ 2.592.380.089	$ 0	$ 2.462.761.085
3716		1.3.7.16	AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA VIGAS Y PLATAFORMA TRANSFERENCIA	20 d	mié 30/07/25	mar 26/08/25	$ 622.106.182	$ 622.106.182	$ 622.106.182
3717		1.3.7.17	ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCIÓN (G)	63 d	sáb 1/07/23	lun 18/09/23	$ 56.416.853	$ 56.416.853	$ 56.416.853
3718		1.3.7.18	ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCIÓN (G) (SEGUNDA ETAPA)	234 d	mié 3/09/25	vie 3/07/26	$ 119.885.813	$ 112.841.241	$ 0
3719		1.3.7.19	COMPENSACIONES, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO SDA (H)	219 d	lun 22/09/25	jue 2/07/26	$ 55.488.777	$ 55.488.777	$ 38.842.144
3720		1.3.7.20	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (J)	63 d	sáb 1/07/23	lun 18/09/23	$ 14.590.293	$ 14.590.293	$ 14.590.293
3721		1.3.7.21	MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (J) (SEGUNDA ETAPA)	190 d	jue 18/09/25	jue 21/05/26	$ 13.467.963	$ 13.467.963	$ 0
3722		1.3.7.22	Fin de Componentes del proyecto	0 d	lun 27/07/26	lun 27/07/26	$ 0	$ 0	$ 0
3723		1.4	Fin de Fase de Ejecución	0 d	vie 31/07/26	vie 31/07/26	$ 0	$ 0	$ 0
3724		2	Finalización del proyecto	0 d	vie 31/07/26	vie 31/07/26	$ 0	$ 0	$ 0

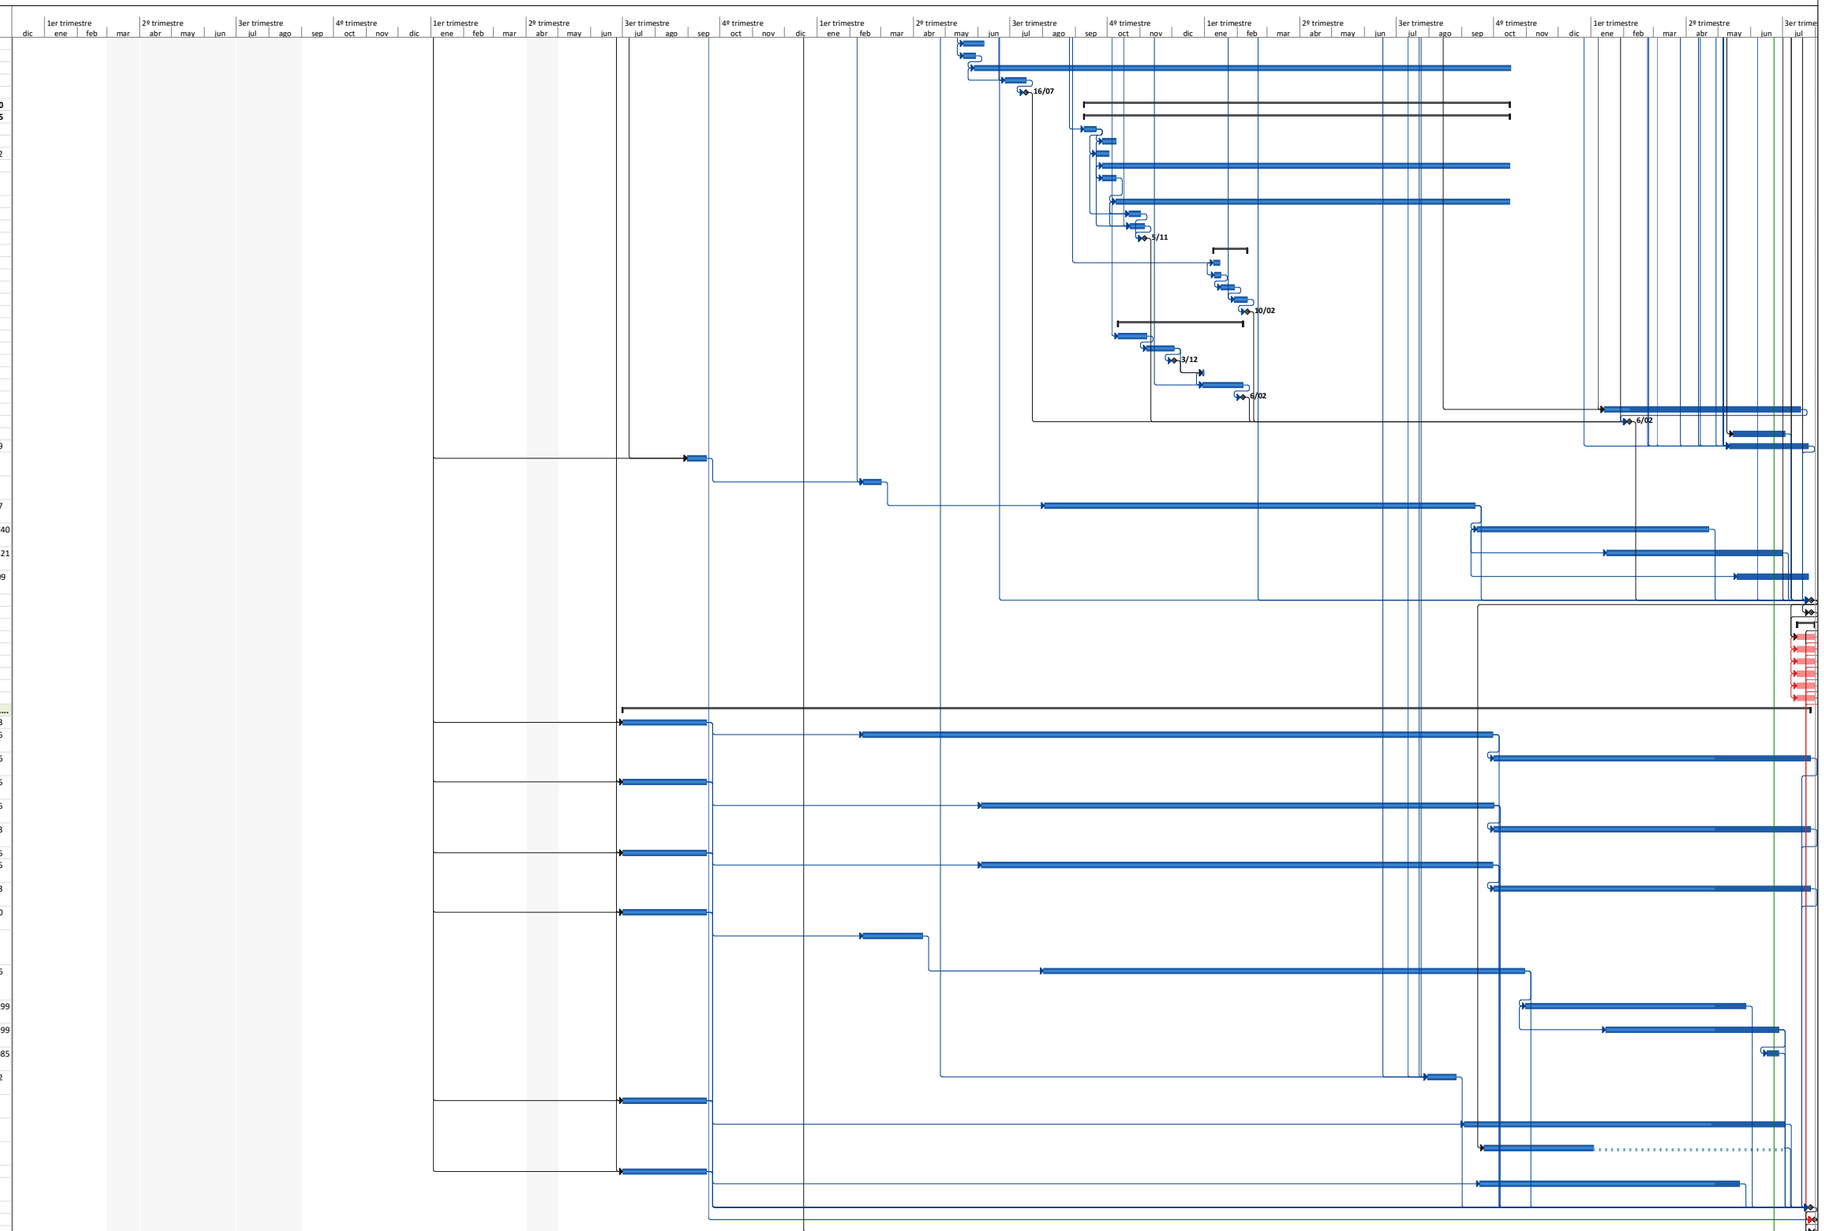

Carlos Javier Varón Robayo
Director de Interventoría

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito externo | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | Sólo el comienzo | Fecha límite | División crítica | Progreso manual
División | Resumen | Tareas externas | Tarea inactiva | Resumen inactivo | Sólo duración | Resumen manual | Sólo fin | Tareas críticas | Progreso
