
CONSORCIO SUBA VIAL VR

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
0	0	**CONTRATO 1009 - LP**	127,88 días?	1/04/2026	31/08/2026	
1	**1**	**ADICION #2 CTO 1009-2024**	**78 días**	**1/06/2026**	**31/08/2026**	
2	**2**	**CIV 11002207 PK_ID 59622 PK_ID 59623 ANDENES (TURINGIA) COSTADO ORIENTAL Y OCCIDENTAL**	**113 días?**	**21/04/2026**	**31/08/2026**	
3	2.1	HITO 1: APROBACION ESTIMADA POR PARTE DE SDM OTORGANDO PMT	15 días	21/04/2026	8/05/2026	
4	**2.2**	ACTIVIDADES PRELIMINARES (reunion de inicio, instalacion semalizacion y adecuacion accesos a predios	7,5 días?	9/05/2026	16/05/2026	
5	2.2.1	Demolicion de placas de concreto existentes costado oriental y occidental	15 días	18/05/2026	3/06/2026	
6	2.2.2	Excavacion manual de material granular existente	12 días	20/05/2026	3/06/2026	5CC+2 días
7	2.2.3	Nivelacion de cajillas y cajas de inspeccion sanitarias	8 días	4/06/2026	16/06/2026	6FC+1 día
8	2.2.4	Construccion de cajas domiliarias a predios	14 días	6/06/2026	24/06/2026	7CC+2 días
9	2.2.5	Nivelacion y compactacion de subrasante andenes	6 días	22/06/2026	27/06/2026	8FC-3 días
10	2.2.6	Sum E Int Geotextil 60KN	4 días	29/06/2026	3/07/2026	9FC+1 día
11	2.2.7	Relleno en SBG anden	10 días	4/07/2026	15/07/2026	10FC+1 día
12	2.2.8	Compactacion anden granulares	10 días	17/07/2026	30/07/2026	11FC+2 días
13	2.2.9	Suministro e Instalacion de concreto 3000 psi y malla elctrosoldada	6 días	21/07/2026	28/07/2026	12CC+3 días
14	2.2.10	Remates y entrega final	8 días	22/07/2026	1/08/2026	13CC+1 día
15	2.2.11	Transporte y disposicion de RCDs	64,88 días	19/05/2026	4/08/2026	5CC+1 día
16	2.2.12	señalizacion según APROBACION SDM	4 días	26/08/2026	31/08/2026	13FC+25 días
17	**3**	**CIV 11003244 PK_ID 48820 ANDEN SUR (GILMAR)**	**87,75 días?**	**28/04/2026**	**10/08/2026**	
18	**3.1**	**HITO 1: ADECUACION A 22 PREDIOS RED DE GAS 1/2" y 3/4" POR SUPERFIALIDAD TUBERIA CON CAJAS DE INSPECCION SANITARIA EXISTENTES U PLACAS DE ANDEN (LABORES EFECTUADAS POR VANTI SAS)**	**20 días?**	**28/04/2026**	**22/05/2026**	
19	3.1.1	Retiro de material RCDs anden costado sur	22 días	21/05/2026	17/06/2026	
20	3.1.2	Nivelacion y compactacion anden costado sur	9 días	22/05/2026	2/06/2026	19CC+2 días
21	3.1.3	Nivelacion o realces de mamposterias en cajas de inspeccion para 22 predios en anden costado sur, posterior a arreglos ESP Vanti SAS	10 días	29/05/2026	11/06/2026	20CC+6 días
22	3.1.4	Instalacion de Geotextil de separacion 60KN	2 días	10/06/2026	12/06/2026	21FC-1 día
23	3.1.5	Relleno y compactacion de subbase contornos a cajas de inspeccion sanitaria de 22 predios y adecuacion areas intervenidas por red gas natural anden costado sur	4 días	10/06/2026	16/06/2026	22CC
24	3.1.6	Suministro e instalacion de concreto MR 41 con malla electrosoldada 5mm en placas de andenes costado oriental y occidental	3 días	18/06/2026	22/06/2026	23FC+2 días
25	3.1.7	Curado Concreto	28 días	22/06/2026	22/07/2026	24
26	3.1.8	Remates general	15 días	23/07/2026	10/08/2026	25
27	4	**CIV 11002971 y CIV 11002792 ESTRUCTURA VIA + REDES SANITARIAS + FRANJAS DE ANDEN ORIENTE Y OCCIDENTE (LOMBARDIA)**	96,38 días	28/04/2026	19/08/2026	
28	**4.1**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES (reunion de inicio, instalacion señalizacion y cerramiento, traslado de maquinaria)**	**96,38 días**	**28/04/2026**	**19/08/2026**	
29	4.1.1	Excavacion Redes sanitarias D= 8" Costado oriental	10 días	28/04/2026	9/05/2026	
30	4.1.2	Demolicion de tuberias existentes gres red sanitaria costado oriental	10 días	28/04/2026	9/05/2026	29CC
31	4.1.3	Instalacion de gravilla cama tuberias red sanitaria costado oriental	10 días	28/04/2026	9/05/2026	30CC
32	4.1.4	Instalacion de tuberia PVC D= 8" y YEEs 8x6"	10 días	28/04/2026	9/05/2026	31CC
33	4.1.5	Relleno con material granular B-200 conpactada red sanitaria costado oriental	10 días	29/04/2026	12/05/2026	32CC+2 días
34	4.1.6	Construccion de cajas conexión 40x40 cm en red sanitaria en espacio publico no intervencion	11 días	30/04/2026	14/05/2026	33CC+1 día
35	4.1.7	Excavacion Redes sanitarias D= 8" Costado occidental	15 días	4/05/2026	22/05/2026	34CC+2 días
36	4.1.8	Demolicion de tuberias existentes gres red sanitaria costado oriental	15 días	7/05/2026	26/05/2026	35CC+3 días
37	4.1.9	Instalacion de gravilla cama tuberias red sanitaria costado oriental	15 días	7/05/2026	26/05/2026	35CC+3 días
38	4.1.10	Instalacion de tuberia PVC D= 8" y YEEs 8x6"	15 días	7/05/2026	26/05/2026	35CC+3 días
39	4.1.11	Relleno con material granular B-200 conpactada red sanitaria costado oriental	15 días	7/05/2026	26/05/2026	35CC+3 días
40	4.1.12	Construccion de cajas conexión 40x40 cm en red sanitaria en espacio publico no intervencion	17 días	8/05/2026	28/05/2026	39CC+1 día
41	4.1.13	Demolicion de asfalto existente	7,38 días	8/05/2026	16/05/2026	39CC+1 día
42	4.1.14	Excavacion caja de via	10 días	16/05/2026	29/05/2026	41
43	4.1.15	Retiro de material RCDs andenes oriental y occidental	70 días	29/05/2026	19/08/2026	42
44	4.1.16	Nivelacion de subrasante	5,63 días	30/05/2026	5/06/2026	42FC+1 día
45	4.1.17	Instalacion de Geotextil de separacion 90KN	7 días	30/05/2026	9/06/2026	42FC+1 día
46	4.1.18	Suministro e Instalacion de Geocelda H=15cm	14 días	9/06/2026	25/06/2026	45
47	4.1.19	Relleno y compactacion de AR-SBG-50	15 días	9/06/2026	26/06/2026	45
48	4.1.20	Relleno con AR-BG-38 estabilizada según diseño	15 días	10/06/2026	27/06/2026	47CC+1 día
49	4.1.21	Suministro e Instalacion A-10 sardinel	15 días	12/06/2026	1/07/2026	47CC+4 días
50	4.1.22	Nivelacion o realce pozos existentes	4 días	27/06/2026	2/07/2026	49CC+12 días
51	4.1.23	Suministro E Instalacion Imprimacion	1 día	10/07/2026	10/07/2026	50FC+7 días
52	4.1.24	Suministro e Instalación Mezcla Asfaltica MCC-19	2 días	14/07/2026	15/07/2026	50FC+9 días
53	4.1.25	Remates Juntas de anden	12 días	26/06/2026	9/07/2026	49CC+11 días
54	4.1.26	señalizacion según aprobacion SDM	4 días	14/08/2026	19/08/2026	52FC+26 días
55	5	**CIV 11002729 VIA (POA)**	**86,88 dias**	**24/04/2026**	**5/08/2026**	
56	**5.1**	**APROBACION POR PARTE DE SDM OTORGANDO PMT**	**33 días**	**24/04/2026**	**2/06/2026**	
57	5.1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES (reunion de inicio, instalacion señalizacion y adecuacion accesos a predios	4 días	28/04/2026	2/05/2026	
58	5.1.2	**Demolicion de placas existentes seccionS SECCION 1**	10 días	30/04/2026	12/05/2026	57FF
59	5.1.3	Excavacion caja de via	13 días	2/05/2026	16/05/2026	58FF
60	5.1.4	Nivelacion y Compactacion subrasante	3 días	14/05/2026	19/05/2026	59FF+1 día
61	5.1.5	Retiro y demolicion de serdinel existente	13 días	2/05/2026	16/05/2026	58FF+3 días
62	5.1.6	Retiro de RCDs a centros de disposicion	56 días	2/05/2026	8/07/2026	58FF+3 días

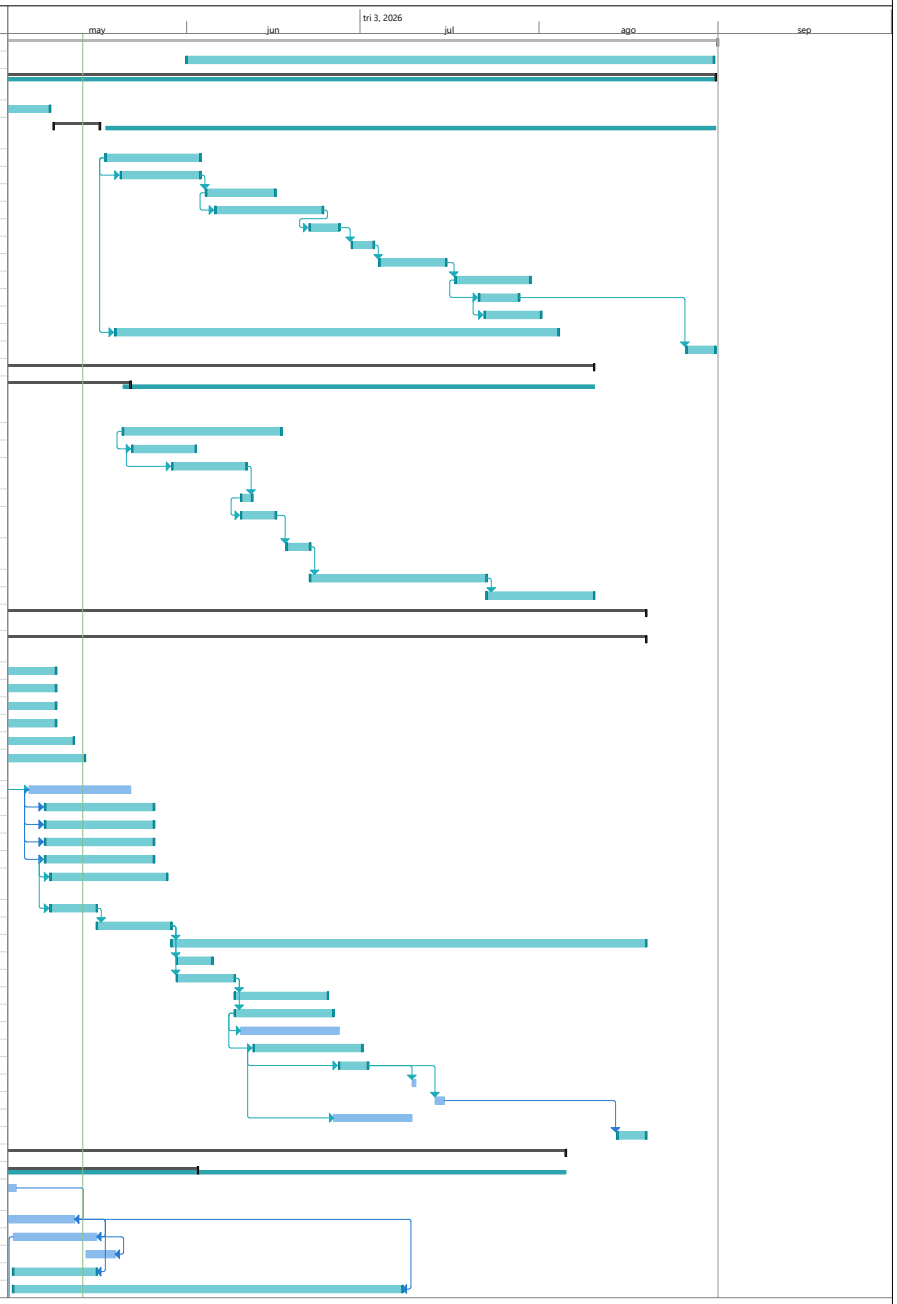


Proyecto: CONTRATO 1009 - LP
Fecha: 14/05/2026

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso

Directora
Sandra Cuestas

CONSORCIO SUBA VIAL VR

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
63	5.1.7	Suministro e Instalacion Geotextil 90KN	6 días	8/05/2026	14/05/2026	59CC+5 días
64	5.1.8	Sum e Inst Geocelda H=15 cm	7 días	8/05/2026	15/05/2026	63CC
65	5.1.9	Sum e Instal AR-SBG 50	8 días	8/05/2026	16/05/2026	64CC
66	5.1.10	Sum e Inst AR-BG estabilizada según diseño	11 días	11/05/2026	23/05/2026	65CC+2 días
67	5.1.11	**Demolicion de placas existentes SECCION 2 CONDICIONADA PARQUEADERO INGRESO CONJUNTO**	4 días	25/05/2026	29/05/2026	66CC+12 días
68	5.1.12	Excavacion caja de via	4 días	27/05/2026	1/06/2026	66CC+14 días
69	5.1.13	Nivelacion y Compactacion subrasante	2 días	2/06/2026	4/06/2026	68CC+5 días
70	5.1.14	Retiro de sardinel existente	2 días	25/05/2026	26/05/2026	66CC+12 días
71	5.1.15	Suministro e Instalacion Geotextil 90KN	3 días	25/05/2026	27/05/2026	70FF+1 día
72	5.1.16	Sum e Inst Geocelda H=15 cm	5 días	25/05/2026	30/05/2026	71CC+1 día
73	5.1.17	Sum e Instal AR-SBG 50	4 días	27/05/2026	1/06/2026	72FF+1 día
74	5.1.18	Sum e Inst AR-BG estabilizada según diseño	7 días	3/06/2026	12/06/2026	73FF+8 días
75	5.1.19	**Nivelacion y realce de pozos existente s**	4 días	10/06/2026	16/06/2026	74FF+1 día
76	5.1.20	Sum E Inst acero	5 días	16/06/2026	22/06/2026	75FF+5 días
77	5.1.21	Sumi E Ins canastillas y dovelas	2 días	19/06/2026	23/06/2026	76CC+4 días
78	5.1.22	Sum E Instalacion MR45 acelerado a 3 dias	5 días	25/06/2026	1/07/2026	77CC+5 días
79	5.1.23	Corte placas e instalacion sellos	4 días	1/07/2026	6/07/2026	78FF+4 días
80	5.1.24	curado de losas	28 días	1/07/2026	3/08/2026	78
81	5.1.25	Remates y acabados para entrega	30 días	2/07/2026	5/08/2026	78FF
82	**6**	**ACUERDOS PARTICIPATIVOS PIPs CIV autorizados por FDLS (según alcance presupuestal con intervencion de redes)**	**127,5 días?**	**1/04/2026**	**31/08/2026**	
83	**6.1**	**Diagnosticos y Diseños aprobados 110012503-11014535-11002168-11002053-11001059-11013175-11007996-11008029-(11001615-11001600-11001584-11001576-11001562-11001609)**	**55 días?**	**1/04/2026**	**6/06/2026**	
84	6.1.1	Toma de muestras CIVs pertenencientes a PIPs	17 días	1/04/2026	22/04/2026	
85	6.1.2	Procesamiento de muestras en laboratorio y expedicion de resultados	13 días	13/04/2026	27/04/2026	84CC+8 días
86	6.1.3	Analisis de resultados y elaboracion de Diagnosticos	16 días	22/04/2026	11/05/2026	85FF+10 días
87	6.1.4	Elaboracion de Diseños CIVs perteneicentes a PIPs	10 días	13/05/2026	25/05/2026	86
88	6.1.5	Aprobacion diseños	7 días	25/05/2026	1/06/2026	
89	6.1.6	HITO 1: PENDIENTE CUMPLIMIENTO COMPROMISO EAAB REALIZAR VACTOR A RED SANITARIA A CIVS 11001615-11001600-11001584-11001576-11001562-11001609 (LISBOA) PARA CONOCER EL ESTADO RED Y AUTORIZACION POR PARTE DEL FDLS SU INTERVNCION CON O SIN REDES	45 días	1/04/2026	27/05/2026	
90	**6.1.7**	**HITO 2: APROBACION ESTIMADA POR PARTE DE SDM OTORGANDO PMTs A PIPs AUTORIZADOS POR EL FDLS PARA CAMBIO DE REDES Y CONSERVACION VIAL (SEGÚN ALCANCE PRESUPUESTAL)**	**18,75 días?**	**19/05/2026**	**8/06/2026**	
91	**6.1.7.1**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES (reunion de inicio, instalacion señalizacion y adecuacion accesos a predios**	**8 días**	**8/06/2026**	**17/06/2026**	
92	6.1.7.1.1	Demolicion de asfalto o placas de concreto existentes a PIPs autorizados a intervenir	28 días	18/06/2026	20/07/2026	
93	6.1.7.1.2	Excavaciones cajas de via a PIPs autorizados a intervenir	24 días	23/06/2026	20/07/2026	92CC+4 días
94	6.1.7.1.3	Demolicion de sardineles existentes a PIPs autorizados a intervenir	24 días	24/06/2026	21/07/2026	93CC+2 días
95	6.1.7.1.4	Transporte y disposicion de RCDs a PIPs autorizados a intervenir	65 días	18/06/2026	31/08/2026	94CC-6 días
96	6.1.7.1.5	Excavacion mecanica para redes desde de 0--2 m de profundidad para tuberias existentes a PIPs autorizados a intervenir	45 días	30/06/2026	20/08/2026	94CC+5 días
97	6.1.7.1.6	Instalacion de triturado para base cama a redes pluvial o sanitarias a PIPs autorizados a intervenir	45 días	2/07/2026	22/08/2026	96CC+2 días
98	6.1.7.1.7	Instalacion de tuberias PVC diferentes diametros (pluvial y sanitaria) inlcuye intalacion de yees a PIPs autorizados a intervenir	45 días	2/07/2026	22/08/2026	96CC+2 días
99	6.1.7.1.8	Instalacion de B-200 compactado para redes pluvial o sanitarias a PIPs autorizados a intervenir	30 días	4/07/2026	8/08/2026	96CC+4 días
100	6.1.7.1.9	Nivelacion y compactacion a subrasante para PIPs autorizados a intervenir	31 días	4/07/2026	10/08/2026	99CC
101	6.1.7.1.10	Sum e Inst Geotextil según diseño aprobado para PIPs autorizados a intervenir	15 días	9/07/2026	25/07/2026	100CC+4 días
102	6.1.7.1.11	Sum e Inst Gocelda H=15cm para PIPs autorizados a intervenir	15 días	10/07/2026	27/07/2026	101CC+1 día
103	6.1.7.1.12	Sum e Inst SBG-50 según diseño aprobado para PIPs autorizados a intervenir	16 días	10/07/2026	28/07/2026	102CC
104	6.1.7.1.13	Sum e Inst sardinel A-10 diseño aprobado para PIPs autorizados a intervenir	30 días	13/07/2026	17/08/2026	103CC+2 días
105	6.1.7.1.14	Sum e Inst SBG-38 según diseño aprobado para PIPs autorizados a intervenir	35 días	21/07/2026	31/08/2026	104CC+8 días
106	6.1.7.1.15	Sum e Inst de imprimacion para PIPs autorizados a intervenir	21 días	30/07/2026	22/08/2026	105CC+7 días
107	6.1.7.1.16	Sum e Inst de ASFALTO para PIPs autorizados a intervenir	18 días	3/08/2026	22/08/2026	106CC+3 días
108	6.1.7.1.17	Sum e Inst de ACERO para PIPs autorizados a intervenir	20 días	31/07/2026	22/08/2026	106CC+1 día
109	6.1.7.1.18	Sum e Inst de canastillas y dovelas según diseño para PIPs autorizados a interve	22 días	1/08/2026	26/08/2026	108CC+1 día
110	6.1.7.1.19	Sum e Inst de CONCRETO MR-45 según diseño para PIPs autorizados a interven	24 días	4/08/2026	31/08/2026	109CC+2 días
111	6.1.7.1.20	Sum e Inst de corte y sellos a placas de concreto según diseño para PIPs autorizados a intervenir	23 días	5/08/2026	31/08/2026	109CC+3 días
112	6.1.7.1.21	Remates, corado capa final y acabados	44 días	11/07/2026	31/08/2026	98CC+8 días
113	**7**	**ENTORNOS ESCOLARES**	**123,38 días**	**9/04/2026**	**31/08/2026**	
114	7.1	HITO 1: PENDIENTE DETERMINAR AREAS DE INTERVENCION (ALCANCE PRESUPUESTAL) DE ANDENES POR PARTE DEL CONTRATANTE A CIVs 11002412-11002411-11002322/11002151/11013031-1101332-11004786/11013480-11	16 días	9/04/2026	25/04/2026	
115	**7.2**	**HITO 2: SOLICITUD DE PRORROGAS DE PMTS O INICIO DE TRAMITES DE PMT ANTE SDI**	**45 días**	**9/04/2026**	**30/05/2026**	
116	**7.2.1**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES (reunion de inicio, instalacion señalizacion y cerramiento, traslado de equipos y/o maquinaria)**	**15 días**	**9/04/2026**	**25/04/2026**	
117	7.2.1.1	Demolicion de placas de concreto existentes costado a andenes autorizados	70 días	27/04/2026	18/07/2026	
118	7.2.1.2	Excavacion manual de material granular existente	70 días	28/04/2026	20/07/2026	117CC+2 días
119	7.2.1.3	Demolicion de prefabricados	70 días	30/04/2026	22/07/2026	118CC+2 días

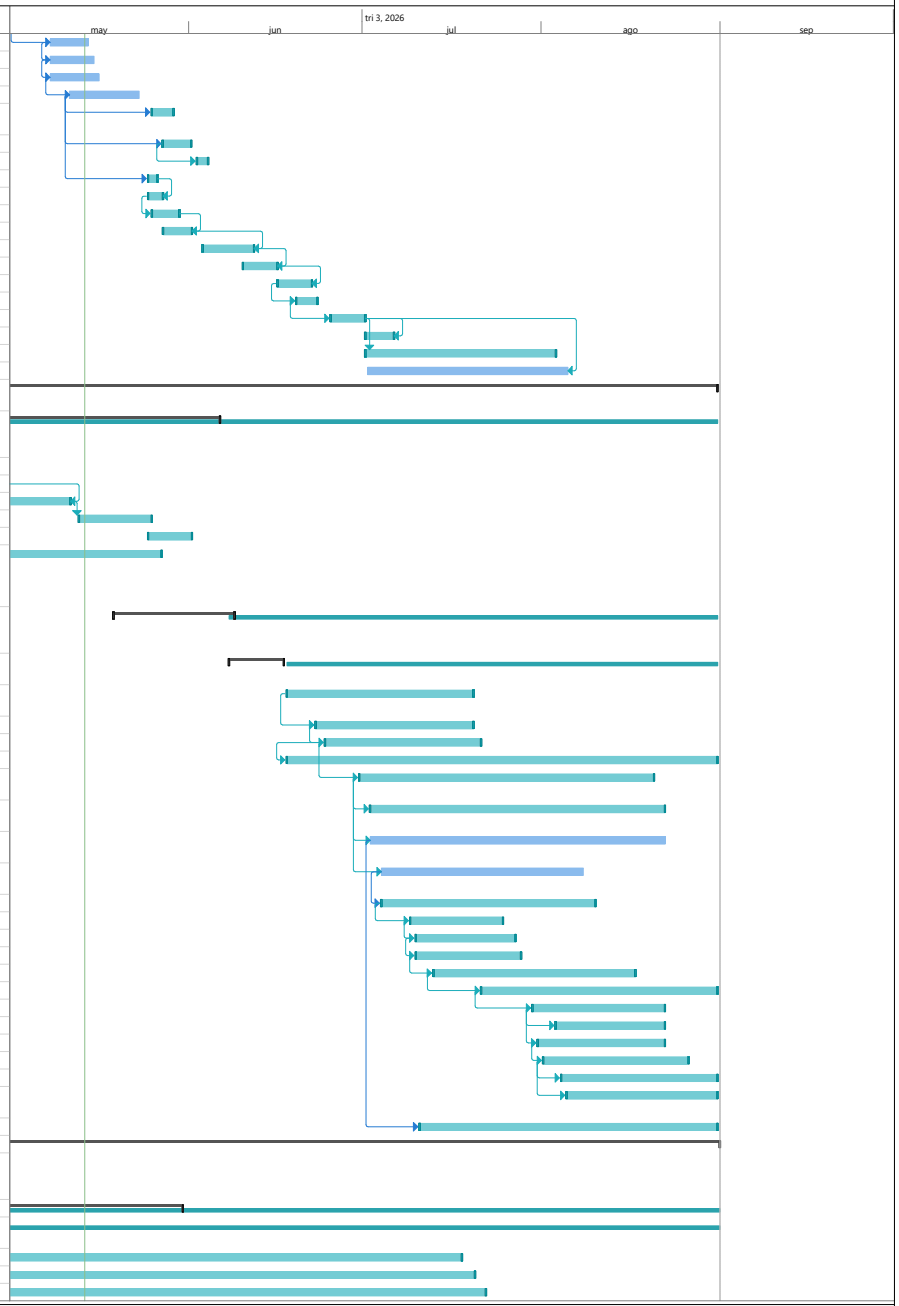

Proyecto: CONTRATO 1009 - LP
Fecha: 14/05/2026

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso

Directora
Sandra Cuestas

CONSORCIO SUBA VIAL VR

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
120	7.2.1.4	Instalacion de prefabricados	80 días	4/05/2026	6/08/2026	119CC+2 días
121	7.2.1.5	Nivelacion de cajillas y cajas de inspeccion sanitarias	80 días	12/05/2026	14/08/2026	120CC+8 días
122	7.2.1.6	Construccion de cajas domiliarias a predios	80 días	19/05/2026	20/08/2026	121CC+5 días
123	7.2.1.7	Nivelacion y compactacion de subrasante andenes	80 días	13/05/2026	15/08/2026	122CC+8 días
124	7.2.1.8	Sum E Int Geotextil 60KN	80 días	23/05/2026	25/08/2026	123CC+8 días
125	7.2.1.9	Relleno en SBG anden	80 días	28/05/2026	29/08/2026	124CC+4 días
126	7.2.1.10	Compactacion anden granulares	69 días	30/05/2026	19/08/2026	125CC+2 días
127	7.2.1.11	Suministro e Instalacion de concreto 3000 psi y malla elctrosoldada	66 días	10/06/2026	25/08/2026	126CC+8 días
128	7.2.1.12	sellos y cortes modulacion	66 días	16/06/2026	31/08/2026	127CC+5 días
129	7.2.1.13	Transporte de RCDs	108 días	27/04/2026	31/08/2026	



Proyecto: CONTRATO 1009 - LP
Fecha: 14/05/2026

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso

Directora
Sandra Cuestas
