	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3186 de 2023 **Contratista:** CONSORCIO CONSTRUCTORES JL

Contrato de Interventoría 2714 de 2023 **Interventoría:** HERBY LUNA CRUZ

Objeto Contrato de Obra:
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE.

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** DICIEMBRE 1-31 DE 2023

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		3
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		4
2.1	Localización		5 a 6
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		7
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		7 a 8
2.4	Características técnicas del proyecto		9
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		10
3.1	Información general del contrato		10
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		10
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		12
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		12
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		13
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	13- 15
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	16
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	17
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	18
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	19
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	21
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	22- 32
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	33
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	34
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	34
	• Seguimiento Programa de Obra		35-43
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	34
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	34
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	44
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	44
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		45
5.1	Información general del contrato		45
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		45
5.3	Informes especialistas y profesionales		46- 62
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		No aplica
5.5	Informe matriz de riesgos.		No aplica
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		No aplica
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		No aplica
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		63
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	63
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	64
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	65
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	66- 69
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	70
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		71
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	71
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	71
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	72
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	73
7	**Conclusiones y recomendaciones**		74
8	**Anexos**		74
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		75
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		76
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		No aplica
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		77

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: MONICA MONTENEGRO Q.
Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 055 con fecha septiembre 29 de 2023

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1 de 2
FECHA	01/01/2024

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **PERIODO MES:** DICIEMBRE 1 al 31 DE 2023

CONTRATO DE OBRA No.: 3186 de 2023

OBJETO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTORES JL

PLAZO INICIAL: 3 meses y 2 días
FECHA DE INICIO: 29 de septiembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023
PRÓRROGA Hasta el 31 de Diciembre
PLAZO ACUMULADO: 3 meses y 2 días
FECHA VENCIMIENTO FINAL: 31/12/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 199,505,641.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 199,505,641.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2714 de 2023 **INTERVENTOR:** HERBY LUNA CRUZ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD (Asfalto)
Pavimentación	REPARCHEO	m3	116 m3
Estructuras	GAVIONES	und	30 m3
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	REPARCHEO	m3	116 m3	116 m3
Estructuras	GAVIONES	und	30 m3	30 m3
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 199,505,641.00		
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE COMPENSACION AMBIENTAL / O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ 199,505,641.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ -	$ -	$ -
IMPLEMENTACION TOTAL PROTOCOLO BIOSEGURIDAD POR COVID 19	$ -		$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199,505,641.00	$ -	$ 199,505,641.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 193,244,211.00	$ 1,412,169.24	$ 194,656,380.24	$ 194,656,380.24
AJUSTES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
VALOR EJECUTADO	$ 193,244,211.00	$ 1,412,169.24	$ 194,656,380.24	$ 194,656,380.24

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 199,505,641.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 194,656,380.24
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 97.57%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Foto 2

TERMINADO DE OBRAS EN DOS FRENTES DE OBRA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

En este periodo terminaron obras de reparcheo y construcción de gavión en sector de Sabanalarga.

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 2520242574 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

s

1 INTRODUCCION

Con el objetivo de atender los sitios críticos en la red vial terciaria del departamento de Casanare, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) ha llevado a cabo un proceso de contratación para mejorar las condiciones de transitabilidad en estas vías, garantizando la seguridad y continuidad del transporte. A través del proceso SA-MC-DT-CAS-002-2023, se adjudicó el contrato de obra No. 3186 de 2023 al Consorcio Constructores JL (NIT 901.741.595-8), cuya finalidad es la intervención y reparación de los tramos más afectados de la red terciaria del departamento, utilizando el sistema de monto agotable. Estas obras son de vital importancia para garantizar la movilidad y conectividad en las zonas rurales de Casanare, afectadas por el deterioro vial y condiciones climáticas adversas. La orden de inicio de las actividades fue impartida el 29 de septiembre de 2023.

Asimismo, para asegurar la correcta ejecución y seguimiento de las actividades, el INVIAS, mediante el proceso de mínima cuantía IP-DT-CAS-007-2023, suscribió el contrato de interventoría No. 2714 de 2023 con Herby Luna Cruz, quien tiene la responsabilidad de la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del proyecto. Esta interventoría supervisa la atención de los sitios críticos en las vías terciarias del departamento de Casanare, también bajo el sistema de monto agotable. La orden de inicio de la interventoría fue emitida el 29 de septiembre de 2023.

Este Informe Mensual de Interventoría N° 03 corresponde al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2023, y presenta un resumen detallado de las actividades realizadas, los avances en la atención de los sitios críticos, y el estado actual de las obras en las vías terciarias a cargo de la Dirección Territorial Casanare. Entre las vías intervenidas se incluyen sectores estratégicos de la red terciaria, esenciales para mejorar la conectividad y seguridad vial en las zonas rurales del departamento.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto objeto de la selección de menor cuantía No. **SA-MC-DT-CAS-002-2023** es el de **"ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE.",** lo cual implica la ejecución de obras de emergencia y/o sitios críticos que amenacen con afectar las vías terciarias a cargo de la Dirección Territorial Casanare.

Los procesos de atención de obras de emergencia por el sistema de monto agotable tienen como objetivo atender las situaciones de emergencia en las vías terciarias a cargo del Instituto Nacional de Vías, entendiéndose como emergencia cualquier evento ocasionado por sucesos naturales, antrópicos o de alteración del orden público, que interrumpan o pongan en riesgo la continuidad del tránsito por estas vías.

Por lo anterior, se pretende garantizar la atención oportuna de las emergencias viales que se presenten en las carreteras, para restituir el libre tránsito vehicular en el menor tiempo posible y/o intervenir sitios críticos que presenten un nivel de riesgo, con la ejecución de obras preventivas, de mitigación y/o correctivas, garantizar la continuidad al Servicio de Transporte Terrestre. La atención de la emergencia será de manera inmediata y oportuna, en un plazo que no supere las cuatro (4) horas contadas a partir de la ocurrencia del evento, manteniendo las especificaciones técnicas de la vía y facilitando el desplazamiento de los vehículos, bajo condiciones de comodidad y seguridad a los usuarios.

Con la ejecución y desarrollo de este contrato, la Dirección Territorial Casanare busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del Estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y de esta manera evitarles perjuicios a los ciudadanos con ocasión de sus actividades económicas.

Por tal razón, se tendrá un monto agotable con la finalidad de que esta territorial atienda en forma oportuna, ágil y eficiente, situaciones de emergencia que se presenten en las vías terciarias a su jurisdicción, en el Departamentos de Casanare

2.1 Localización y alcance

Localización del corredor y Puntos de intervención

K38+300 vía Yopal - Paz de Ariporo hacia Tocaría – Orocue sector La Nevera- Guanapalo K47+70.



Punto 1

Latitud: 5°22'49.73"N

Longitud:71°50'51.43"O

Punto 2

Latitud: 5°23'5.95"N

Longitud: 71°51'12.74"O

Tramo resaltado en verde en el mapa

K14+900 de la vía Yopal – Paz de Ariporo hacia El Refugio – Palo Bajito – Aracal K8+98.



Punto 1

Latitud: 5°27'35.64"N

Longitud: 72°18'52.61"O

Punto 2

Latitud: 5°27'8.89"N

Longitud: 72°18'49.58"O

Punto 3

Latitud: 5°26'36.80"N

Longitud: 72°19'9.80"O

Tramo resaltado en verde en el mapa

Sabanalarga – La Piñalera a 300m de la iglesia de Sabanalarga K14+20



Punto 1

Latitud: 4°53'15.41"N

Longitud: 73° 0'21.33"O

Punto 2

Latitud: 4°53'19.83"N

Longitud: 73° 0'18.04"O

Punto 3

Latitud: 4°53'48.80"N

Longitud: 72°59'41.84"O

Tramo resaltado en verde en el mapa

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Los municipios por beneficiarse se encuentran Yopal, Orocue, Sabanalarga, Nunchia y San Luis de Palenque de las cuales, dentro de los sectores priorizados para la atención de sitios críticos, se encuentran todas las vías terciaras del departamento de Casanare a cargo de la dirección territorial Casanare. Estas zonas se beneficiarán ya al atender sitios críticos y/o emergencias que se presentan en las vías, se mejoraran considerablemente las condiciones de transitabilidad y seguridad vial en las carreteras de este sector.

CARRETERAS	CÓDIGO	MUNICIPIO	LONGITUD	DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN K0
Tocaría – Orocue sector La Nevera - Guanapalo	90657	Nunchia	47.70	K38+300 vía Yopal - Paz de Ariporo
Sabanalarga – La Piñalera	89438	Sabanalarga	14.20	300m de la iglesia de Sabanalarga
El Refugio – Palo Bajito - Aracal	89700	Yopal	8.98	K14+900 de la vía Yopal – Paz de Ariporo

2.3 Inventario y estado inicial de la vía

Dentro de las funciones del INVIAS, se encuentra la de prevenir y solucionar las emergencias que se presenten en las Carreteras a cargo, bien por fenómenos de la naturaleza o por acciones relacionadas con la perturbación del orden público, con el fin de evitar el cierre de las vías afectadas y la suspensión del servicio.

Dadas dichas circunstancias, se requiere solucionar de manera urgente los problemas presentados en las vías terciarias; por lo tanto, con la ejecución y desarrollo de este contrato, la Dirección Territorial CASANARE busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del Estado, como es el de darle continuidad al Servicio de Transporte Terrestre y de esta manera evitarles perjuicios a los ciudadanos con ocasión de sus actividades económicas.

La Dirección Territorial Casanare del Instituto Nacional de Vías, tiene la necesidad de realizar la contratación de ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE, con lo cual la Entidad considera necesario atender de manera oportuna las situaciones de emergencia y/o construir obras para la atención y/o mitigación de sitios críticos en las vías terciarias a cargo del Instituto Nacional de Vías, facilitando el desplazamiento de los vehículos bajo condiciones de seguridad a los usuarios, reduciendo los riesgos de afectación al transporte.

La vulnerabilidad de la red vial terciaria y los fenómenos climatológicos, especialmente las temporadas invernales que se presentan en la región, plantean la necesidad de implementar un programa de mantenimiento, de tal forma que los corredores a cargo mejoren su nivel de servicio.

Por lo anterior, se pretende garantizar la atención oportuna de las emergencias viales que se presenten en las carreteras, para restituir el libre tránsito vehicular en el menor tiempo posible y/o intervenir sitios críticos que presenten un nivel de riesgo, con la ejecución de obras preventivas, de mitigación y/o correctivas, garantizar la continuidad al Servicio de Transporte Terrestre y de esta manera evitar perjuicios a los ciudadanos con ocasión de sus actividades económicas.

Especificamente los tres tramos viales a intervenir se hace una descripción de estos basados en su estado inicial:

- Sector La Nevera - Guanapalo: Este tramo muestra una vía pavimentada con presencia de baches y desgaste en la superficie. La calzada presenta deterioro moderado, con baches que pueden afectar el tránsito, requiere mantenimiento correctivo.
- Sector Sabanalarga - La Piñalera: Se observa una falla geológica en la vía con un deslizamiento de tierra en la ladera, afectando el paso y la seguridad vial. Este es un punto crítico debido al deslizamiento, lo que puede comprometer la estabilidad de la vía. La construcción de un muro en gavión está planeada para estabilizar la ladera y evitar futuros deslizamientos.
- Sector El Refugio - Palo Bajito: La imagen muestra una vía pavimentada con una fisura considerable que atraviesa el carril. El agrietamiento de la calzada indica un problema estructural que podría empeorar si no se interviene y es indicativo de un potencial sitio crítico que debe ser atendido para evitar que el daño se extienda.

Cada sector requiere un tipo de intervención específico, siendo el más urgente el del sector Sabanalarga - La Piñalera por la presencia del deslizamiento, mientras que los otros dos requieren reparaciones de pavimento.

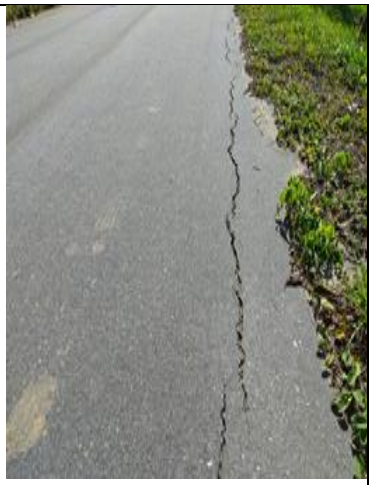
		
SECTOR LA NEVERA - GUANAPALO	SECTOR SABANALARGA – LA PIÑALERA	SECTOR EL REFUGIO-PALO BAJITO

Ilustración 2. Estado inicial de la vía.

2.4 Características técnicas del proyecto

El objetivo del proyecto es garantizar la atención oportuna de emergencias viales en las carreteras afectadas, permitiendo restituir el libre tránsito vehicular en el menor tiempo posible e intervenir sitios críticos que presenten riesgo para la continuidad del Servicio de Transporte Terrestre.

Para ello, se ejecutarán obras preventivas, correctivas y de mitigación en diversos sectores. Construcción de Gaviones en el Sector Sabanalarga - La Piñalera a 300 m de la iglesia de Sabanalarga: En este tramo, afectado por deslizamientos de taludes superiores debido a las fuertes lluvias, se llevará a cabo la construcción de muros de gavión para la contención de los taludes. Se utilizarán gaviones de malla de alambre de acero entrelazado, clase 1, con recubrimiento de zinc (galvanizado), que proporcionan alta durabilidad frente a las condiciones climáticas de la zona. El acero de refuerzo será Fy 4200 MP, garantizando la estabilidad estructural requerida para mitigar futuros deslizamientos y preservar la seguridad vial en este sector.

Reparación de Pavimento en el Sector La Nevera - Guanapalo (Km 38+300 vía Yopal – Paz de Ariporo) En los tramos más críticos de este sector, se realizarán intervenciones para mejorar la transitabilidad de los vehículos. Las actividades incluyen: Instalación de base granular en los puntos donde se requiera la mejora del soporte estructural de la vía. Aplicación de mezcla densa en caliente (MDC), que incluye la colocación de una capa de carpeta asfáltica. Este proceso abarca el suministro y transporte de la mezcla, el riego de liga y el uso de equipos de compactación. La intervención también incluirá el uso de cortadoras de pavimento para retirar las secciones deterioradas y la correcta colocación del nuevo material.

Además, se retirarán los sobrantes generados por la intervención. Estos trabajos tienen como finalidad mejorar la transitabilidad, reducir el riesgo de accidentes y asegurar la durabilidad de la vía, optimizando las condiciones de operación en los sectores mencionados.

3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del contrato

En la siguiente tabla se muestra la información general del contrato de obra.

Tabla 1. Información general del contrato de obra

CONTRATO No.	3186 de 2023
OBJETO	ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE.
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTORES JL
NIT	901.741.595-8
FECHA INICIACIÓN	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	TRES MESES Y DOS DIAS
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION DEL CONTRATO N.1	No aplica
TIEMPO DE SUSPENSION	No aplica
AMPLIACION SUSPENSION	No aplica
REANUDACION	No aplica
FECHA TERMINACION FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($199.505.641, oo) INCLUIDO IVA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199.505.641, oo

3.2 Descripción de actividades ejecutadas en el mes

En este periodo se terminaron obras de gavión ejecutadas en sector de vereda del municipio de Sabanalarga, así dando termino las metas físicas del proyecto, obras siguientes sectores:

CARRETERAS	CÓDIGO	MUNICIPIO	LONGITUD	DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN K0
Tocaría – Orocue sector La Nevera - Guanapalo	90657	Nunchia	47.70	K38+300 vía Yopal - Paz de Ariporo
Sabanalarga-La piñalera	89438	Sabanalarga	14.20	300 m de la iglesia de Sabanalarga

Gavión terminado en vereda del municipio de Sabanalarga



3.3 Seguimiento Ítems No Previstos.

En este periodo no se necesitó precios no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

Estado de avance de obras, 100% del proyecto. Cumplida metas físicas del proyecto.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Nº. 03
(01 al 31 de diciembre de 2023)

4 REPORTES DE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Informes Semanales

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	11/13/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL CASANARE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — SEMANA No.: 10 del 4/12/2023 al 10/12/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Reparcheo pavimento y construcción gaviones.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Reparcheo del pavimento existente vereda la Nevera, y construcción gaviones para estabilización de taludes de la via en sector rural del municipio de sabanalarga.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTORES JL
INTEGRANTES: JULIANA HORRILLO AMADO, identificada con cedula de ciudadanía No.40.439.257 de Villavicencio, con una participación del noventa por ciento (90%) y Arquitectos e Ingenieros Diseños LO SAS ZOMAC, con una participación del diez por ciento (10%).
CONTRATO No. 3186 de 2023
FECHA DE INICIO: Sept 29 de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: Nov 30 de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: Nov 30 de 2023

VALOR INICIAL:	$	199.505.641,00
VALOR ADICIONES:	$	-
VALOR ACUMULADO:	$	199.505.641,00
VALOR ANTICIPO:	$	-
	$	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ
INTEGRANTES: HERBY LUNA CRUZ
CONTRATO No. 2714 de 2023
FECHA DE INICIO: Sept 29 de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: Noviembre 30 de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: Noviembre 30 de 2023

VALOR INICIAL:	$	24.489.965,00
VALOR ADICIONES:	$	-
VALOR ACUMULADO:	$	24.489.965,00
VALOR ANTICIPO:	$	-
VALOR AMORTIZADO:	$	-
SALDO POR AMORTIZAR:	$	-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.505.641,00	$		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.505.641,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 24.489.965,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 24.489.965,00			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	199.505.641,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	191.000.000,00	95,74%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	191.000.000,00	95,74%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	-	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
VALOR BÁSICO ESTUDIO Y DISEÑOS	$	-	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	-	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	-	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	2.000.000,00	1,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	2.000.000,00	1,00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: A la fecha el contratista no ha facturado. Contrato de obra con la alcaldía de Timará.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	24.489.965,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	24.489.963,00	100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	24.489.963,00	100,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	24.489.963,00	100,00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: La interventoria ha tramitado cuentas de septiembre, octubre y noviembre, pendiente respuesta del INVIAS.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR EC	
En el mes:	$ 7,80
Acumulado:	$ 7,80

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)
Estudios y diseños	GL		2023	
			2023	
Obra	Und		2023	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico		Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	$	-			-	
Ejec	$	-			-	
Prog	$	191.000.000,00			-	95,74%
Ejec	$	191.000.000,00			-	95,74%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora	1	1,00
volquetas	1	1,00
Total		2,00

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI / NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI / NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI / NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI / NO	

OBSERVACIONES:
Se atienden observaciones al documento ambiental del proyecto, pendiente respuesta del INVIAS.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	

OBSERVACIONES:
Se atienden observaciones al documento ambiental del proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Proceso de parte del contratista de obra

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	1
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
Este tipo de Gestión No aplica para este proyecto.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica para este proyecto

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Inicia obras construcción gavión en sabanalarga

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

continuar obras de gavion

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







Inicio obras de gavion

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

Se inicia actividades construcción gaviones en vereda de Sabanalarga

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: HERBY LUNA CRUZ
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Nº. 03
(01 al 31 de diciembre de 2023)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	18/12/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL CASANARE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — SEMANA No.: 11 (Numeración consecutiva) del 11/12/2023 al 17/12/2023 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Reparcheo pavimento y construcción gaviones.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Reparcheo del pavimento existente vereda la Nevera, y construcción gaviones para estabilización de taludes de la via en sector rural del municipio de sabanalarga.

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTORES JL	INTERVENTOR:	HERBY LUNA CRUZ		
INTEGRANTES:	JULIANA HORRILLO AMADO, identificada con cedula de ciudadanía No.40.439.257 de Villavicencio, con una participación del noventa por ciento (90%) y Arquitectura e Ingeniera + Diseños LD SAS ZOMAC, con una participación del diez por ciento (10%).	INTEGRANTES:	HERBY LUNA CRUZ		
CONTRATO No.	3186 de 2023	CONTRATO No.	2714 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 24.489.965,00
FECHA DE INICIO:	Sept 29 de 2023	FECHA DE INICIO:	Sept 29 de 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	Nov 30 de 2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	Noviembre 30 de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 24.489.965,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	Nov 30 de 2023	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE	Noviembre 30 de 2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR INICIAL:	$ 199.505.641,00			VALOR AMORTIZADO:	$ -
VALOR ADICIONES:	$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 199.505.641,00				
VALOR ANTICIPO:	$ -				
	$ -				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.505.641,00	$ -		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.505.641,00	$ -		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 24.489.965,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA	$ 24.489.965,00			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.505.641,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 192.000.000,00	96,24%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 192.000.000,00	96,24%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
VALOR BÁSICO ESTUDIO Y DISEÑOS	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.000.000,00	1,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.000.000,00	0,50%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: A la fecha el contratista no ha facturado. Contrato de obra con la alcaldía de Timará.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 24.489.965,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 24.489.963,00	100,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.489.963,00	100,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.489.963,00	100,00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: La Interventoria ha tramitado cuentas de septiembre, octubre y noviembre, pendiente respuesta del INVIAS.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR IC	
En el mes:	$ 7,84
Acumulado:	$ 7,84

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GL		2023		Prog	$ -			-	
					Ejec	$ -			-	
*			2023		Prog	$ 192.000.000,00			-	96,24%
*									-	
*	Obra	Und	2023						-	
*					Ejec	$ 192.000.000,00			-	96,24%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora	1	1,00
volquetas	1	1,00
Total		2,00

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI / NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI / NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI / NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI / NO	

OBSERVACIONES:
Se atienden observaciones al documento ambiental del proyecto, pendiente respuesta del INVIAS.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

OBSERVACIONES:
Se atienden observaciones al documento ambiental del proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Proceso de parte del contratista de obra

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	1
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
Este tipo de Gestión No aplica para este proyecto.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica para este proyecto

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

continuidad construcción gavión en sabanalarga

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continua y terminacion construccion gavión en sector vereda de sabanalarga

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







continua construcción de gaviones en sabalarga

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

continua construcción gaviones en vereda de Sabanalarga

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: HERBY LUNA CRUZ
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Nº. 03
(01 al 31 de diciembre de 2023)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	
	FECHA	25/12/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL CASANARE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE — SEMANA No.: 12 del 18/12/2023 al 24/12/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Reparcheo pavimento y construcción gaviones.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Reparcheo del pavimento existente vereda la Nevera, y construcción gaviones para estabilización de taludes de la vía en sector rural del municipio de sabanalarga.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTORES JL
INTEGRANTES: JULIANA HORRILLO AMADO, identificada con cedula de ciudadanía No.40.439.257 de Villavicencio, con una participación del noventa por ciento (90%) y Arquitectura e Ingeniera + Diseños LD SAS ZOMAC, con una participación del diez por ciento (10%).
CONTRATO No.: 3186 de 2023
FECHA DE INICIO: Sept 29 de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: Nov 30 de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: Nov 30 de 2023

VALOR INICIAL:	$ 199.505.641,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 199.505.641,00
VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -
	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ
INTEGRANTES: HERBY LUNA CRUZ
CONTRATO No.: 2714 de 2023
FECHA DE INICIO: Sept 29 de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: Noviembre 30 de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: Noviembre 30 de 2023

VALOR INICIAL:	$ 24.489.965,00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 24.489.965,00
VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.505.641,00	$ -		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	-			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.505.641,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 24.489.965,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	-			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 24.489.965,00			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 199.505.641,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 194.656.380,58	97,57%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 194.656.380,58	97,57%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
VALOR BÁSICO ESTUDIO Y DISEÑOS	$ -	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.000.000,00	1,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.000.000,00	1,00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: A la fecha el contratista no ha facturado. Contrato de obra con la alcaldía de Timará.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 24.489.965,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 27.211.070,00	111,11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 27.211.070,00	111,11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 27.211.070,00	111,11%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: La interventoria ha tramitado cuentas de septiembre, octubre y noviembre, pendiente respuesta del INVIAS.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	$ 7,15
Acumulado:	$ 7,15

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)
Estudios y diseños	GL		2023	
			2023	
Obra	Und		2023	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	$ -			-	
Ejec	$ -			-	
Prog	$ 194.656.380,58			-	97,57%
				-	
				-	
Ejec	$ 194.656.380,58			-	97,57%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora	1	1,00
volquetas	1	1,00
Total		2,00

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES:
Se atienden observaciones al documento ambiental del proyecto, pendiente respuesta del INVIAS.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:
Se atienden observaciones al documento ambiental del proyecto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: Proceso de parte del contratista de obra

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	-	-
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	1
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
Este tipo de Gestión No aplica para este proyecto.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

No aplica para este proyecto

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se termina obras de gaviones, ultima actividad por ejecutar en el proyecto.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Inicio proceso liquidacion contratos de obra e interventoria.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





Terminacion obras alcance fisico del proyecto: Reparcheo y gaviones



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

Terminadas las obras, inicio proceso de liquidación contratos de obra e interventoria.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: HERBY LUNA CRUZ
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 1/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: dic-23 **PROYECTO:** ATENDER SITIOS CRÌTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE

CONTRATO No. 3186 de 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRUCTORES JL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2714 de 2023 **INTERVENTORÍA:** HERBY LUNA CRUZ

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RETROEXCAVADORA	HITACHE		SABANALARGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
VOLQUETAS	INTERNACIONAL		SABANALARGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																															
			TOTAL ACTIVO																															
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	4	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Ejecutaron y terminaron obras de CONSTRUCCION de gavión en vereda en municipio de SABANALARGA.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO MOZO MALAVER
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202 42573 CND

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

En el siguiente formato se relaciona profesional de obra, en este caso únicamente el residente. Cabe aclarar que si se utilizó cuadrilla de obreros para obras de reparcheo sin embargo no se relacionan en el formato ya que no son personal profesional de obra.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	1/01/2024 (Día/ Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 3186 de 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRUCTORES JL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: diciembre de 2023 **PROYECTO:** ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2714 de 2023 **INTERVENTOR:** HERBY LUNA CRUZ

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** SURA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	LUIS EDUARDO MOZO MALAVER	793.677.871	Residente y Director de obra	$ 3.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 3.200.000,00	$ 222.720	V	SALUD SANITAS S.A.	8627062322	$ 128.000	COLPENSIONES	8627062322	$ 512.000	$ 128.000	$ -	$ -	
																																								$ -	$ -	$ -	
																																								$ -	$ -	$ -	
																																								$ -	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 01 de enero de 2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO MOZO MALAVER
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:25202 42573 CND

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Nº. 03
(01 al 31 de diciembre de 2023)

4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2
		FECHA	1/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 3186 de 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRUCTORES JL

MES INFORME MENSUAL: dic-23 **PROYECTO:** ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2714 de 2023 **INTERVENTOR:** HERBY LUNA CRUZ

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1042023	PROYECTO	11	Nacion	Contrato Principal	199.505.641, oo	$ 12.793.329,42
			TOTAL			199.505.641, oo	$ 12.793.329,42

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 199.505.641, oo **VALOR BÁSICO DEL CONTRATO OBRA:** 199.505.641, oo

ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA: $ 0,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
										199.505.641, oo	199.505.641, oo				
1	acta parcial	sept de 2023	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1042023	199.505.641, oo	199.505.641, oo			X	
2	acta parcial	oct de 2023	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1042023	199.505.641, oo	199.505.641, oo				
3	acta parcial	nov de 2023	$ 185.357.774,00	$ 1.354.537,58	$ 186.712.311,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1042023	$ 12.793.329,42	$ 12.793.329,42				
4	acta parcial	dic de 2023	$ 7.886.437,00	$ 57.632,00	$ 7.944.069,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1042023	$ 4.849.260,42	$ 4.849.260,42				
TOTALES			$ 193.244.211,00	$ 1.412.169,58	$ 194.656.380,58	$ 0,00	$ 0,00	$ -		$ 4.849.260,42	$ 4.849.260,42				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 193.244.211,00	$ 1.412.169,58	**$ 194.656.380,58**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	$ 193.244.211,00	$ 1.412.169,58	**$ 194.656.380,58**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

NOTA 2: En este periodo no facturo el contratista de obra. Se adelantaron actividades de estudios y diseños

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO MOZO MALAVER
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202 42573 CND

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5 Estado general del tiempo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-10 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1

FECHA: 1/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 3186 de 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRUCTORES JL

ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: diciembre de 2024 **PROYECTO:** AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2714 de 2023 **INTERVENTOR:** HERBY LUNA CRUZ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	2	1	1	1	4	3	3	2	2	4	5	2	3	2	2	5	4	5	3	2	3	4	6	5	4	6	4	3	5	4	5	96
Lluvias moderadas	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	42
Lluvias intensas																																
Total horas																																

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.


NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
El tiempo se presento seco y con lluvias moderadas.

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO MOZO MALAVER
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:25202 42573 CND

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

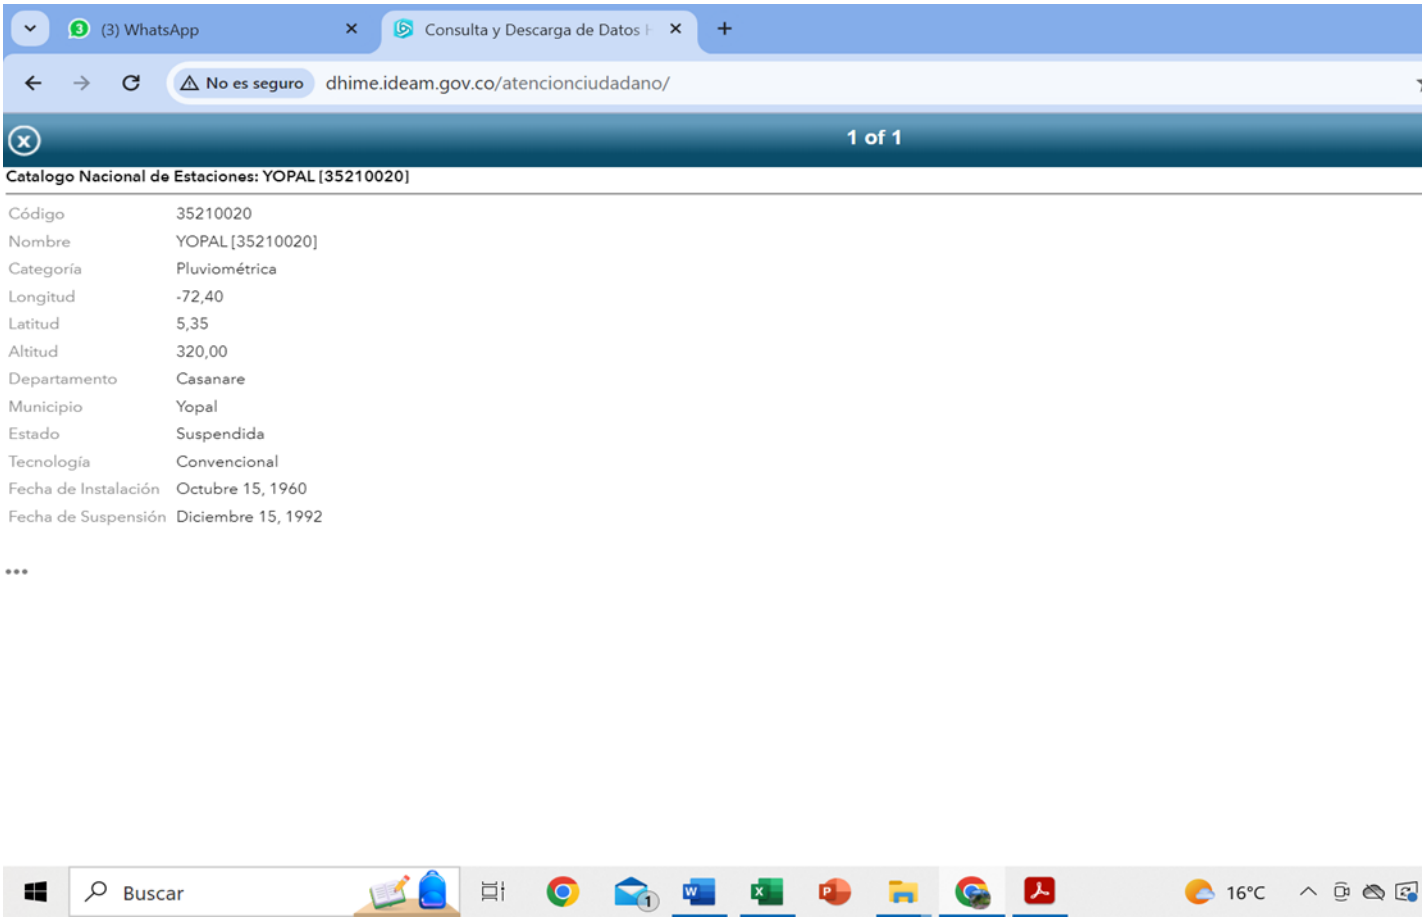
(3) WhatsApp
Consulta y Descarga de Datos
No es seguro
dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/
1 of 1
Catalogo Nacional de Estaciones: YOPAL [35210020]
Código 35210020
Nombre YOPAL [35210020]
Categoría Pluviométrica
Longitud -72,40
Latitud 5,35
Altitud 320,00
Departamento Casanare
Municipio Yopal
Estado Suspendida
Tecnología Convencional
Fecha de Instalación Octubre 15, 1960
Fecha de Suspensión Diciembre 15, 1992
Buscar
16°C

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1

FECHA: 1/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No.: 3186 de 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRUCTORES JL

ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2714 de 2023 **INTERVENTOR:** HERBY LUNA CRUZ

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									

OBSERVACIONES:

En este periodo no se realizó ni hubo necesidad de este tipo de control técnico.

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO MOZO MALAVER
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:25202 42573 CND

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Directoe de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520242574 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 1 (Día) 1 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 3186 de 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRUCTORES JL

OBJETO DEL CONTRATO:
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE

FECHA DE INICIO: 29/09/2023
PLAZO INICIAL: 3 meses y dos dias
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 199.505.641,00
VALOR ACUMULADO: $ 199.505.641,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 0,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 0,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2714 de 2023 **INTERVENTOR:** HERBY LUNA CRUZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 19.950.564,10	7	9	2023	24	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 39.901.128,20	7	9	2023	24	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.851.692,30	5 años, 0 meses, 0 dias					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101425072
Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	116,29%	$ 232.000.000,00	7	9	2023	24	12	2023
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101218806 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento			7	9	2023	24	7	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			NA					
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			7	9	2023	24	1	2027
Calidad de Estudios y Diseños			NA					
Estabilidad y/o Calidad de Obra			14	12	2023	14	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101425072
Certificado de modificación o anexo No.: 6 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232.000.000,00	7	9	2023	24	1	2024
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 21-40-101218806 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No. 2 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Representante Legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520242574 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101425072	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	09	2023	07	09	2023	00:00	02	12	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CONSTRUCTORES JL	NIT: 901.741.595-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 18 A NRO. 182 - 59 T.7 OFC.303	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3105877275

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CRA. 59 NO.26-60 CAN	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUO10N, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EN VIRTUD DEL CONTRATO NUMERO 3184 DE 2023, PROCESO DE CONTRATACION NUMERO SA-DT-CAS-002-2023; CUYO OBJETO ES ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE.
-NOTA: LA VIGENCIA PARA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
-NOTA: LA VIGENCIA PARA LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/09/2023	02/06/2024	$19,950,564.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/09/2023	02/12/2026	$39,901,128.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$59,851,692.30

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
MORRILLO AMADO JULIANA	40439257	90.00
ARQUITECTURA E INGENIERIA DISEÑOS LD S.A.S.ZOMAC.	901699282-9	10.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,774,015.00	$ ******20,000.00	$ *****340,862.00	$ *********2,134,877.00	$ ******119,703,384.60	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
AGENCIA DE SEGUROS MARCO TRIANA & C	143772	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101425072
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101218806	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	09	2023	07	09	2023	00:00	02	12	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CONSTRUCTORES JL		NIT: 901.741.586-8
DIRECCIÓN: CR 18 A NRO. 182 - 59 T.7 OFC.303	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3105877275

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CRA. 59 NO.26-60 CAN	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 7056000

BENEFICIARIO: 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN R-RCE-002A RESIS 04-09 / R-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA,

LA PRESENTE POLIZA AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE SE PUEDA GENERAR EN VIRTUD DEL CONTRATO NUMERO 3186 DE 2023, PROCESO DE CONTRATACION NUMERO SA-DT-CAS-002-2023, CUYO OBJETO ES ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE.
-ASEGURADOS: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT. 800.215.807-2 Y CONSORCIO CONSTRUCTORES JL NIT. 901.741.586-8.
-BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT. 800.215.807-2

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMDLV	07/09/2023	02/12/2023	$232,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMDLV	07/09/2023	02/12/2023	$232,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMDLV	07/09/2023	02/12/2023	$232,000,000.00

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL .

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
HORRILLO AMADO JULIANA	40419257	90.00
ARQUITECTURA E INGENIERIA DISEÑOS LD S.A.S.ZOMAC.	901699282-9	10.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****218,652.00	$ *******3,000.00	$ ******42,113.00	$ **********263,765.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS MARCO TRIANA & C	143772	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-40-101218806

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante G. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2139877, 601-4019330 DLP143772A 1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101218806	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	09	2023	07	09	2023	00:00	02	12	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CONSTRUCTORES JL		NIT: 901.741.586-8
DIRECCIÓN: CR 18 A NRO. 182 - 59 T.7 OFC.303	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3105877275

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CRA. 59 NO.26-60 CAN	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 7056000

BENEFICIARIO: 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA.

LA PRESENTE POLIZA AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE SE PUEDA GENERAR EN VIRTUD DEL CONTRATO NUMERO 3196 DE 2023, PROCESO DE CONTRATACION NUMERO SA-DT-CAS-002-2023, CUYO OBJETO ES ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE.
-ASEGURADOS: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT. 800.215.807-2 Y CONSORCIO CONSTRUCTORES JL NIT. 901.741.586-8.
-BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT. 800.215.807-2

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/09/2023	02/12/2023	$232,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/09/2023	02/12/2023	$232,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/09/2023	02/12/2023	$232,000,000.00

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL .

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
HORNILLO AMADO JULIANA	40439257	90.00
ARQUITECTURA E INGENIERIA DISEÑOS LD S.A.S.ZOMAC.	901699282-9	10.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****218,652.00	$ *******3,000.00	$ ******42,113.00	$ **********263,765.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS MARCO TRIANA & C	143772	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-40-101218806
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186877, 601-6019350 DLP143772A 1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101218806	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	09	2023	07	09	2023	00:00	02	12	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CONSTRUCTORES JL		NIT: 901.741.586-8
DIRECCIÓN: CR 18 A NRO. 182 - 59 T.7 OFC.303	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3105877275

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.216.807-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		
DIRECCIÓN: CRA. 59 NO.26-60 CAN	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 7056000
BENEFICIARIO:	ADICIONAL:	

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · Diners Club International · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Móvil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****218,652.00	$ *******3,000.00	$ ******42,113.00	$ **********263,765.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS MARCO TRIANA & C	143772	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998025167 (8020) 110061333598646 (3900) 000000263765 (96) 20240906

REFERENCIA PAGO: 110061333598646

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101218806	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	12	2023	07	09	2023	00:00	24	01	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CONSTRUCTORES JL	NIT: 901.741.595-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 18 A NRO. 182 - 59 T.7 OFC.303	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3105877275

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.216.807-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA. 59 NO.26-60 CAN	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

BENEFICIARIO: 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-H-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-H-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA PRESENTE POLIZA AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE SE PUEDA GENERAR EN VIRTUD DEL CONTRATO NUMERO 3186 DE 2023, PROCESO DE CONTRATACION NUMERO SA-IT-CAS-002-2023; CUYO OBJETO ES ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE.

-ASEGURADOS: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT: 800.215.807-2 Y CONSORCIO CONSTRUCTORES JL NIT: 901.741.595-8.

-BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT: 800.215.807-2

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/09/2023	24/01/2024	$232,000,000.00	$232,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/09/2023	24/01/2024	$232,000,000.00	$232,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/09/2023	24/01/2024	$232,000,000.00	$232,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN CONTRATO NUMERO 3186 DE 2023 PRORROGA NUMERO UNO (1) DE 2023; SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA COMO APARECE INDICADO EN EL CUADRO DE AMPAROS.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******78,816.00	$ *******3,000.00	$ ******15,545.00	$ **********97,361.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS MARCO TRIANA & C	143772	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101218806

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2180877, 601-6019330 DLF143772A 1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101218806	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	12	2023	07	09	2023	00:00	24	01	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO CONSTRUCTORES JL		NIT: 901.741.595-8	
DIRECCIÓN: CR 18 A NRO. 182 - 59 T.7 OFC.303	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 3105877275	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		NIT: 800.215.807-2	
DIRECCIÓN: CRA. 59 NO.26-60 CAN	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 7056000	

BENEFICIARIO: 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/09/2023	24/01/2024	$232,000,000.00	$232,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/09/2023	24/01/2024	$232,000,000.00	$232,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/09/2023	24/01/2024	$232,000,000.00	$232,000,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/09/2023	24/01/2024	$232,000,000.00	$232,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101218806

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF143772A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101218806	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	12	2023	07	09	2023	00:00	24	01	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CONSTRUCTORES JL		NIT: 901.741.595-8
DIRECCIÓN: CR 18 A NRO. 182 - 59 T.7 OFC.303	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	3105877275

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CRA. 59 NO.26-60 CAN	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	7056000
BENEFICIARIO:	ADICIONAL:		

PSEGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito Gana Gana cooperativo

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******78,816.00	$ *******3,000.00	$ ******15,545.00	$ **********97,361.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS MARCO TRIANA & C	143772	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)110051342629 61(3900)000000097361(96)20240906

REFERENCIA PAGO: 1100513426296-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101218806	2

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	12	2023	07	09	2023	00:00	24	01	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO CONSTRUCTORES JL		NIT: 901.741.595-6	
DIRECCIÓN: CR 18 A NRO. 182 - 59 T.7 OFC.303	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	3105877275

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		NIT: 800.215.807-2	
DIRECCIÓN: CRA. 59 NO.26-60 CAN	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	7056000

BENEFICIARIO: 800215807 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
HORRILLO AMADO JULIANA	40439257	90.00
ARQUITECTURA E INGENIERIA DISEÑOS LD S.A.S.ZOMAC.	901699282-9	10.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101218806

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF143772A 3

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101425072	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	02	2024	07	09	2023	00:00	14	12	2028	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CONSTRUCTORES JL	NIT: 901.741.595-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 18 A NRO. 182 - 59 T.7 OFC.303	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3105877275

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.216.807-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CRA. 59 NO.26-60 CAN	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN RCU010S, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EN VIRTUD DEL CONTRATO NUMERO 3186 DE 2023, PROCESO DE CONTRATACION NUMERO SA-DT-CAS-002-2023; CUYO OBJETO ES ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE.
-NOTA: LA VIGENCIA PARA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
-NOTA: LA VIGENCIA PARA LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/09/2023	24/07/2024	$19,950,564.10	$19,950,564.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/09/2023	24/01/2027	$39,901,128.20	$39,901,128.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	14/12/2023	14/12/2028	$59,851,692.30	$59,851,692.30

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE HACE CONSTAR QUE SEGUN CONTRATO NUMERO 3186 DE 2023 MODIFICACION NUMERO UNO (01) DE 2023; SE APECTUA LA SIGUIENTE ACLARACION A LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS:PLAZO DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO -ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023. VIGENCIA DESDE: 14-12-2023 HASTA: 14-12-2028
EXCEPCION PARA LA VIGENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE TIPO REPARCHEO A LA ESTRUCTURA DE HOCADURA SOBRE LAS CUALES LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DEBERA SER DE UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO. -ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023. VIGENCIA DESDE: 14-12-2023 HASTA: 14-12-2024
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******119,703,384.60	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS MARCO TRIANA & C	143772	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101425072

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2160977, 601-6019330 DLF143772A 1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101425072	6

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	02	2024	07	09	2023	00:00	14	12	2028	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO CONSTRUCTORES JL		NIT: 901.741.595-8	
DIRECCIÓN: CR 18 A NRO. 182 - 59 T.7 OFC.303	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3105877275

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		NIT: 800.215.807-2	
DIRECCIÓN: CRA. 59 NO.26-60 CAN	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
BORRILLO AMADO JULIANA	40439257	90.00
ARQUITECTURA E INGENIERIA DISEÑOS LD S.A.S.ZOMAC.	901699282-9	10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 93 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101425072

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF1437728A 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Nº. 03
(01 al 31 de diciembre de 2023)

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 01/01/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 3186 de 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTORES JL

FECHA DE INICIO: 29/09/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 meses y dos días **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2714 de 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------ NO -------X-- APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: **DICIEMBRE**

OBSERVACIONES:
No aplica para este proyecto

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ---------- NO --------X---- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ..... FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ..... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ---------- N --------X----

OBSERVACIONES:
No aplica para este proyecto.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO -------X- APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: .....

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ N ------

OBSERVACIONES:
No aplica para este proyecto
El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:
No aplica para este proyecto

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:
No aplica para este proyecto
Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:
No aplica para este proyecto

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:
No aplica para este proyecto.

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO MOZO MALAVER
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.: 25202 42573 CND

Firma NA
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520242574 CND

Firma NA
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

4.9 Otros documentos seguimiento mensual:

Seguidamente se menciona la gestión de los siguientes documentos durante el desarrollo del proyecto:

✓ Seguimiento a la inversión del Anticipo:

Para este proyecto no se tiene contemplado anticipo.

✓ Seguimiento Programa de Inversiones

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 01/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL DEL CASANARE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

PROGRAMA DE INVERSIONES ☑

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 3186 DE 2023

OBJETO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE.

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTORES JL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2714 de 2023 — **INTERVENTOR:** HERBY LUNA CRUZ

PLAZO INICIAL: 2 (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 2 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/09/2023 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/11/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 199,505,641.00 — VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 199,505,641.00 (Según contrato principal)

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA pesos Miles de / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA pesos Miles de	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	%Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / %Ejecutado	1 oct-23 Semana 1	1 oct-23 semana 2	1 oct-23 semana 3	1 oct-23 semana 4	2 nov-23 Semana 1	2 nov-23 semana 2	2 nov-23 semana 3	2 nov-23 semana 4	3 Indicar mes y año	4 Indicar mes y año	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año N…	
I. EXPLANACIONES	$3,541.6	1.78%			% P		0.59%	0.59%	0.59%										100%
					$ P		$1,181	$1,181	$1,181										
					$ E														
					% E														
II. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES	$2,257.2	1.13%			% P			0.57%	0.57%										
					$ P			$1,129	$1,129										
					$ E														
					% E														
III. PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	$26,670	13.37%			% P						13.37%								
					$ P						$26,670								
					$ E														
					% E														
IV. ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$76,605	38.40%			% P				7.68%	7.68%	7.68%	7.68%	7.68%						
					$ P				$15,321	$15,321	$15,321	$15,321	$15,321						
					$ E														
					% E														
VI. OBRAS VARIAS	$67,286	33.73%			% P			5.62%	5.62%	5.62%	5.62%	5.62%	5.62%						
					$ P			$11,214	$11,214	$11,214	$11,214	$11,214	$11,214						50%
					$ E														
					% E														
VII. TRANSPORTE	$16,885	8.46%			% P	1.21%	1.21%	1.21%	1.21%	1.21%	1.21%	1.21%	1.21%						1236%
					$ P	$2,412	$2,412	$2,412	$2,412	$2,412	$2,412	$2,412	$2,412						
					$ E														
					% E														
GPP7					% P														36%
					$ P														
					$ E														
					% E														
GPP8					% P														24%
					$ P														
					$ E														
					% E														
TOTAL OTROS ITEMS					% P														12%
					$ P														
					$ E														
					% E														0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 199,505.89**	**97%**												Reprogramación No.1					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																			

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	25.46%	71.41%	3%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$50,785	$142,460	$6,260,641				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	25.46%	96.86%	100.00%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$50,785	$193,245	$199,505,641				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	94%	3.98%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$186,712,312	$7,944,068				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	94%	98%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$186,712,312	$194,656,380				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 199,505,641.00	$ 194,656,380.24	98%
	$ -		
"	$ -	$ -	%
	$ -		
"	$ -	$ -	%
	$ -		
"	$ -	$ -	%
	$ -		
"	$ -	$ -	%
	$ -		
"	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)		$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -	$ 194,656,380.24	98%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 199,505,641.00		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

PROGRAMADO	EJECUTADO
$ Valor	$ Valor

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: — Nombre: JULIANA HORRILLO AMADO — Representante legal o apoderado del Contratista

Firma: — Nombre: HERBY LUNA CRUZ — DIRECTOR INTERVENTORIA — Matrícula Profesional No.: 25202-73281 CND

Revisó Firma: — Nombre: — Titular Gerencia: — Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma — Nombre: — Jefe de Unidad Ejecutora — Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: — Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO — Supervisor de Contrato de Interventoría — Matrícula Profesional No.: 25202 276582 CND

Firma: — Nombre: — Director Territorial — Matrícula Profesional No.:


Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- ✓ Seguimiento Programa de Obra:

  Se hace control y seguimiento al programa de obra.

  Se adjunta programa de obra en Project


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS**	**57,25 días**	**vie 29/09/23**	**jue 30/11/23**
2		**INICIO**	0 días	vie 29/09/23	vie 29/09/23
3		**OBRAS PRELIMINAR**	**3 días**	**vie 29/09/23**	**lun 2/10/23**
4		VISITA DE OBRA	3 días	vie 29/09/23	lun 2/10/23
5		**I. EXPLANACIONES**	**15 días**	**mar 7/11/23**	**jue 23/11/23**
6		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	8 días	mar 7/11/23	jue 16/11/23
7		EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE PRESTAMOS	15 días	mar 7/11/23	jue 23/11/23
8		REMOCIÓN DE DERRUMBES	15 días	mar 7/11/23	jue 23/11/23
9		**II. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES**	**9,63 días**	**mar 7/11/23**	**vie 17/11/23**
10		AFIRMADO	4 días	mar 7/11/23	vie 10/11/23
11		SUBBASE GRANULAR	4 días	vie 10/11/23	mié 15/11/23
12		BASE GRANULAR CLASE A	4 días	mar 14/11/23	vie 17/11/23
13		**III. PAVIMENTOS ASFÁLTICOS**	**8 días**	**mié 15/11/23**	**jue 23/11/23**

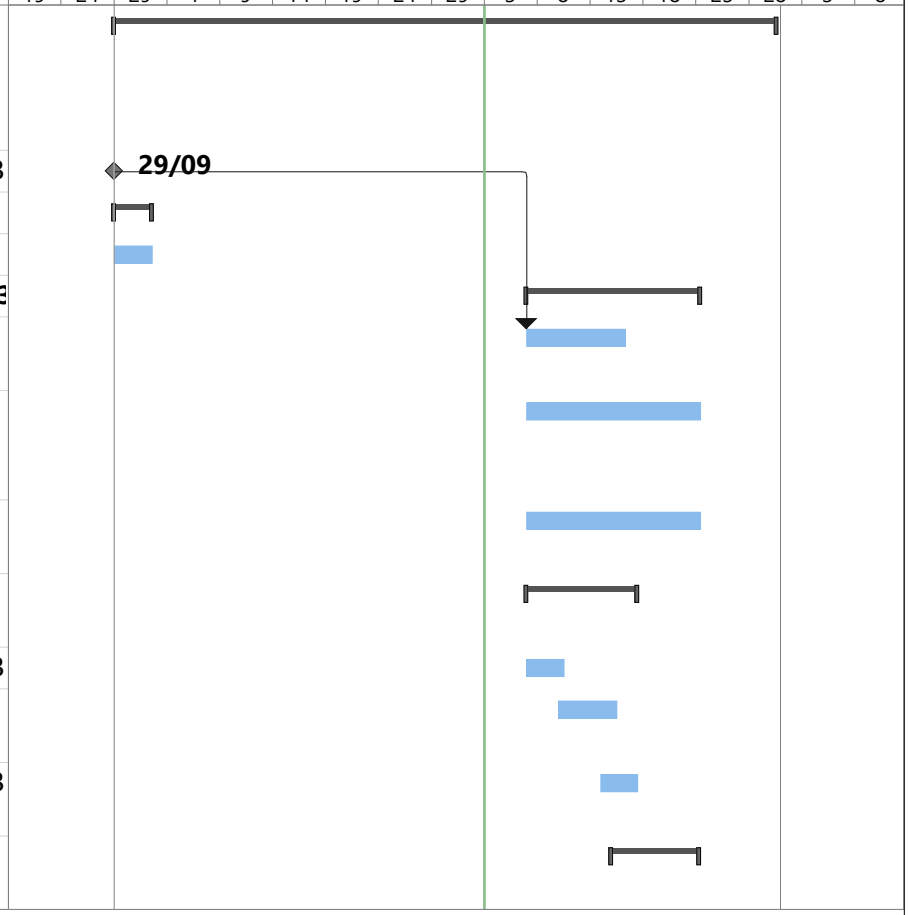

Proyecto: P_OBRA_C3186_2023
Fecha: vie 3/11/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
14			MEZCLA DENSA EN CALIENTE , INCLUYE CEMENTO ASFALTICO, TRANSPORTE DE MEZCLA, RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPACTACION, CORTADORA DE PAVIMENTO, RETIRO DE	8 días	mié 15/11/23	jue 23/11/23
15			**IV. ESTRUCTURAS Y DRENAJES**	**25,63 días**	**jue 2/11/23**	**jue 30/11/23**
16			RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	11 días	lun 20/11/23	jue 30/11/23
17			CONCRETO RESISTENCIA 21	15 días	mar 14/11/23	mié 29/11/23
18			CONCRETO CLASE 14 MPA	10 días	mar 14/11/23	jue 23/11/23
19			Concreto Resistencia	10 días	mar 14/11/23	jue 23/11/23

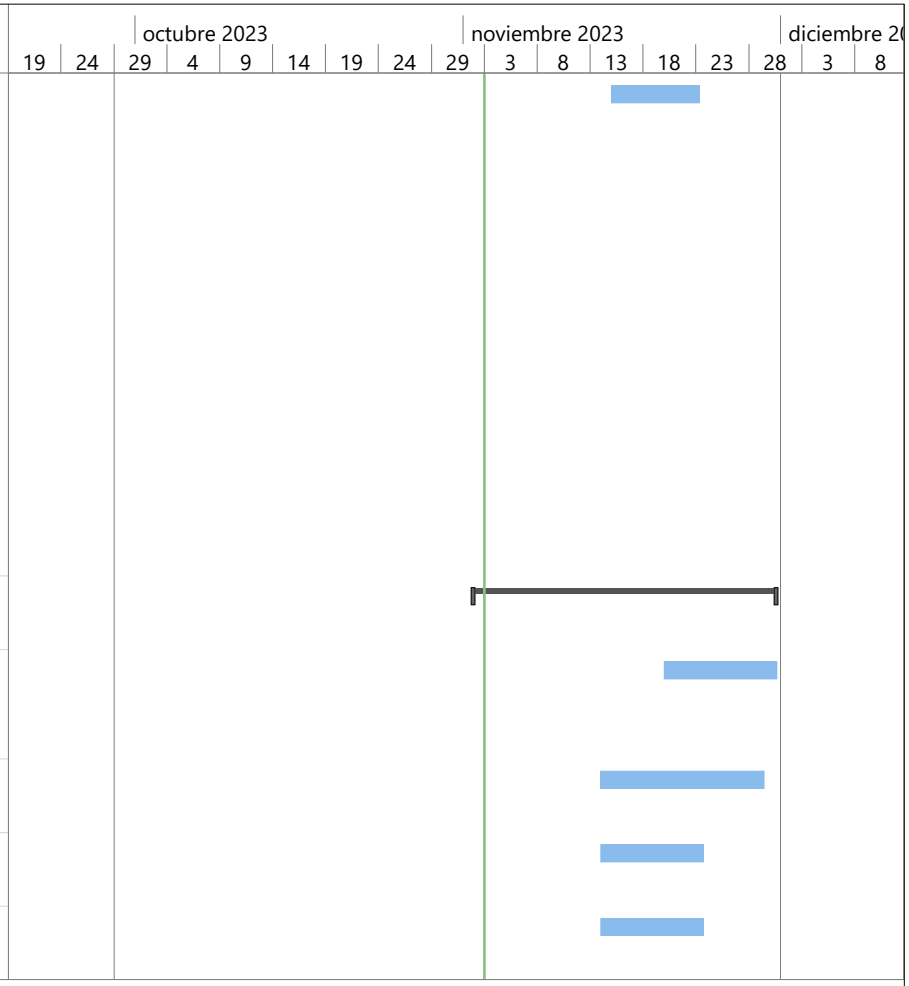

Proyecto: P_OBRA_C3186_2023
Fecha: vie 3/11/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
20		TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO	8 días	mar 7/11/23	jue 16/11/23
21		Geotextil Tipo NT-2500 o similar	8 días	jue 2/11/23	sáb 11/11/23
22		Gaviónes de Malla de Alambre de Acero Entrelazado Clase 1;	20 días	mar 7/11/23	mar 28/11/23
23		Acero de Refuerzo Fy 4200	15 días	vie 10/11/23	lun 27/11/23
24		**VI. OBRAS VARIAS**	**19 días**	**vie 10/11/23**	**jue 30/11/23**
25		SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLSACRETO	14 días	vie 10/11/23	sáb 25/11/23
26		ENROCADO DE PROTECCIÓN CONSTRUIDO CON PIEDRA >1.0 M3 (INCLUYE SUMINISTRO DE LA PIEDRA, CARGUE DESCARGUE Y	19 días	vie 10/11/23	jue 30/11/23

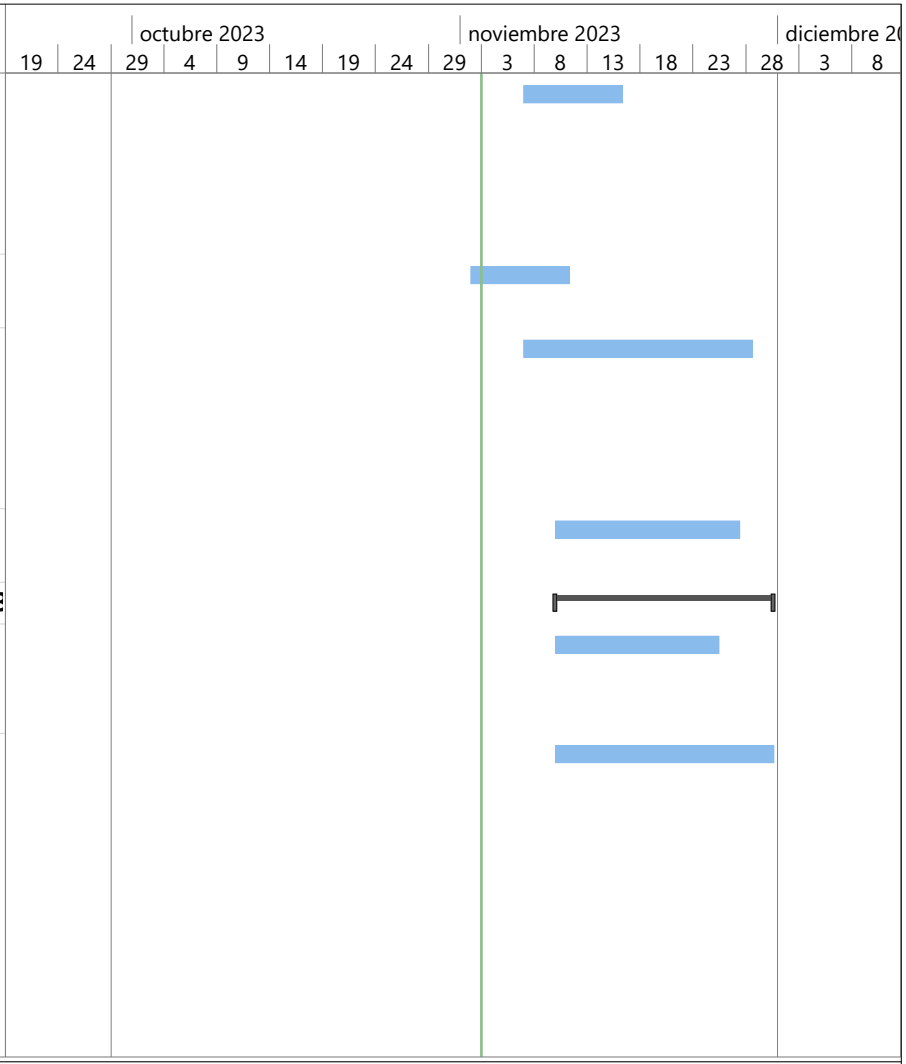

Proyecto: P_OBRA_C3186_2023
Fecha: vie 3/11/23


Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
27			**VII. TRANSPORTE**	**20,25 días**	**mié 8/11/23**	**jue 30/11/23**
28			TRANSPORTE DE ROCAS MAYORES A 1 M3 (MAS DE	19 días	jue 9/11/23	mié 29/11/23
29			Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir	8 días	mié 8/11/23	vie 17/11/23
30			**FIN**	0 días	jue 30/11/23	jue 30/11/23

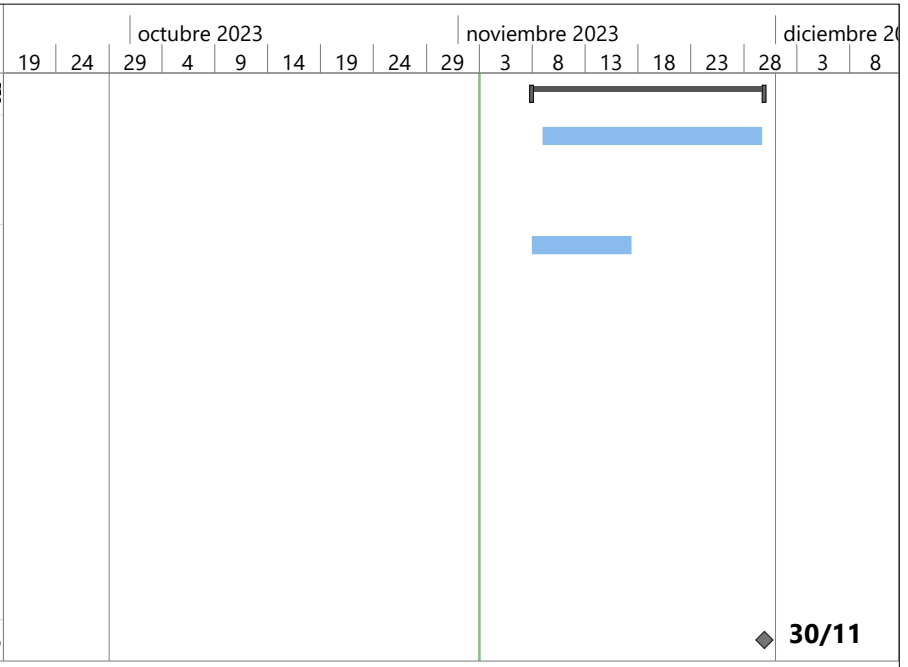


Proyecto: P_OBRA_C3186_2023
Fecha: vie 3/11/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

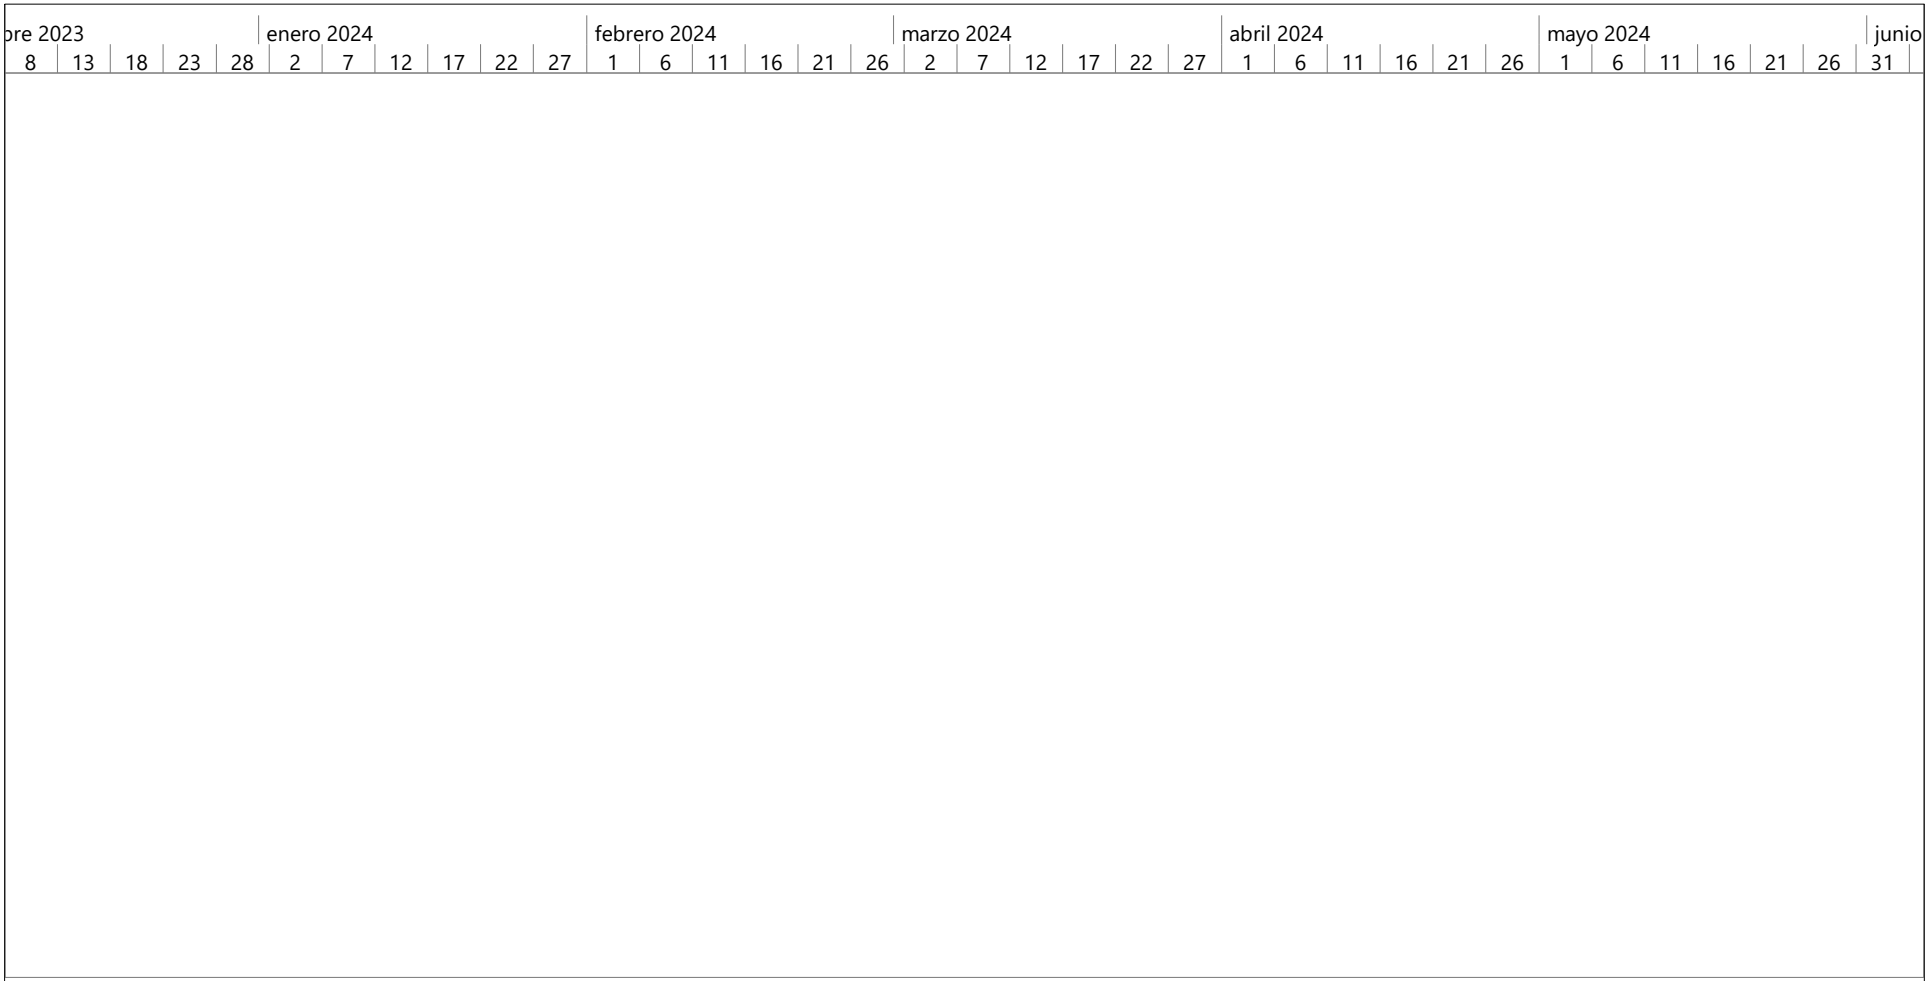


Proyecto: P_OBRA_C3186_2023
Fecha: vie 3/11/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

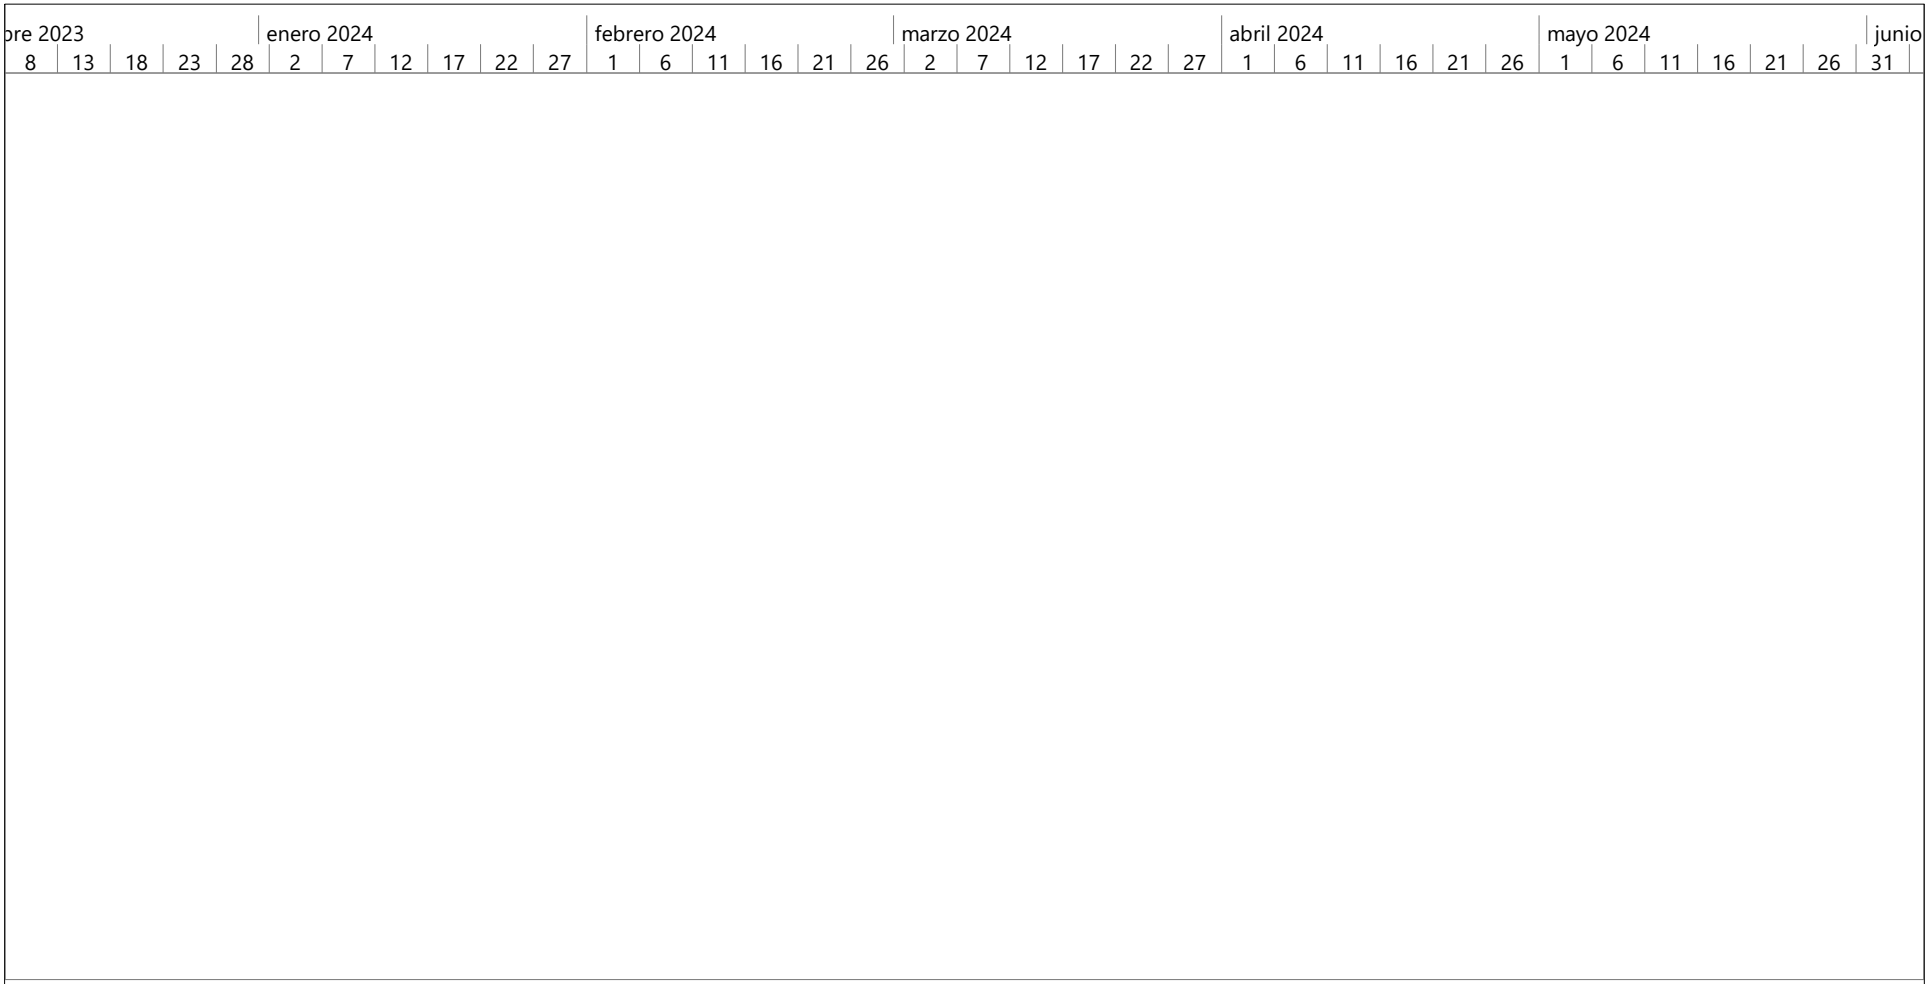


Proyecto: P_OBRA_C3186_2023
Fecha: vie 3/11/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

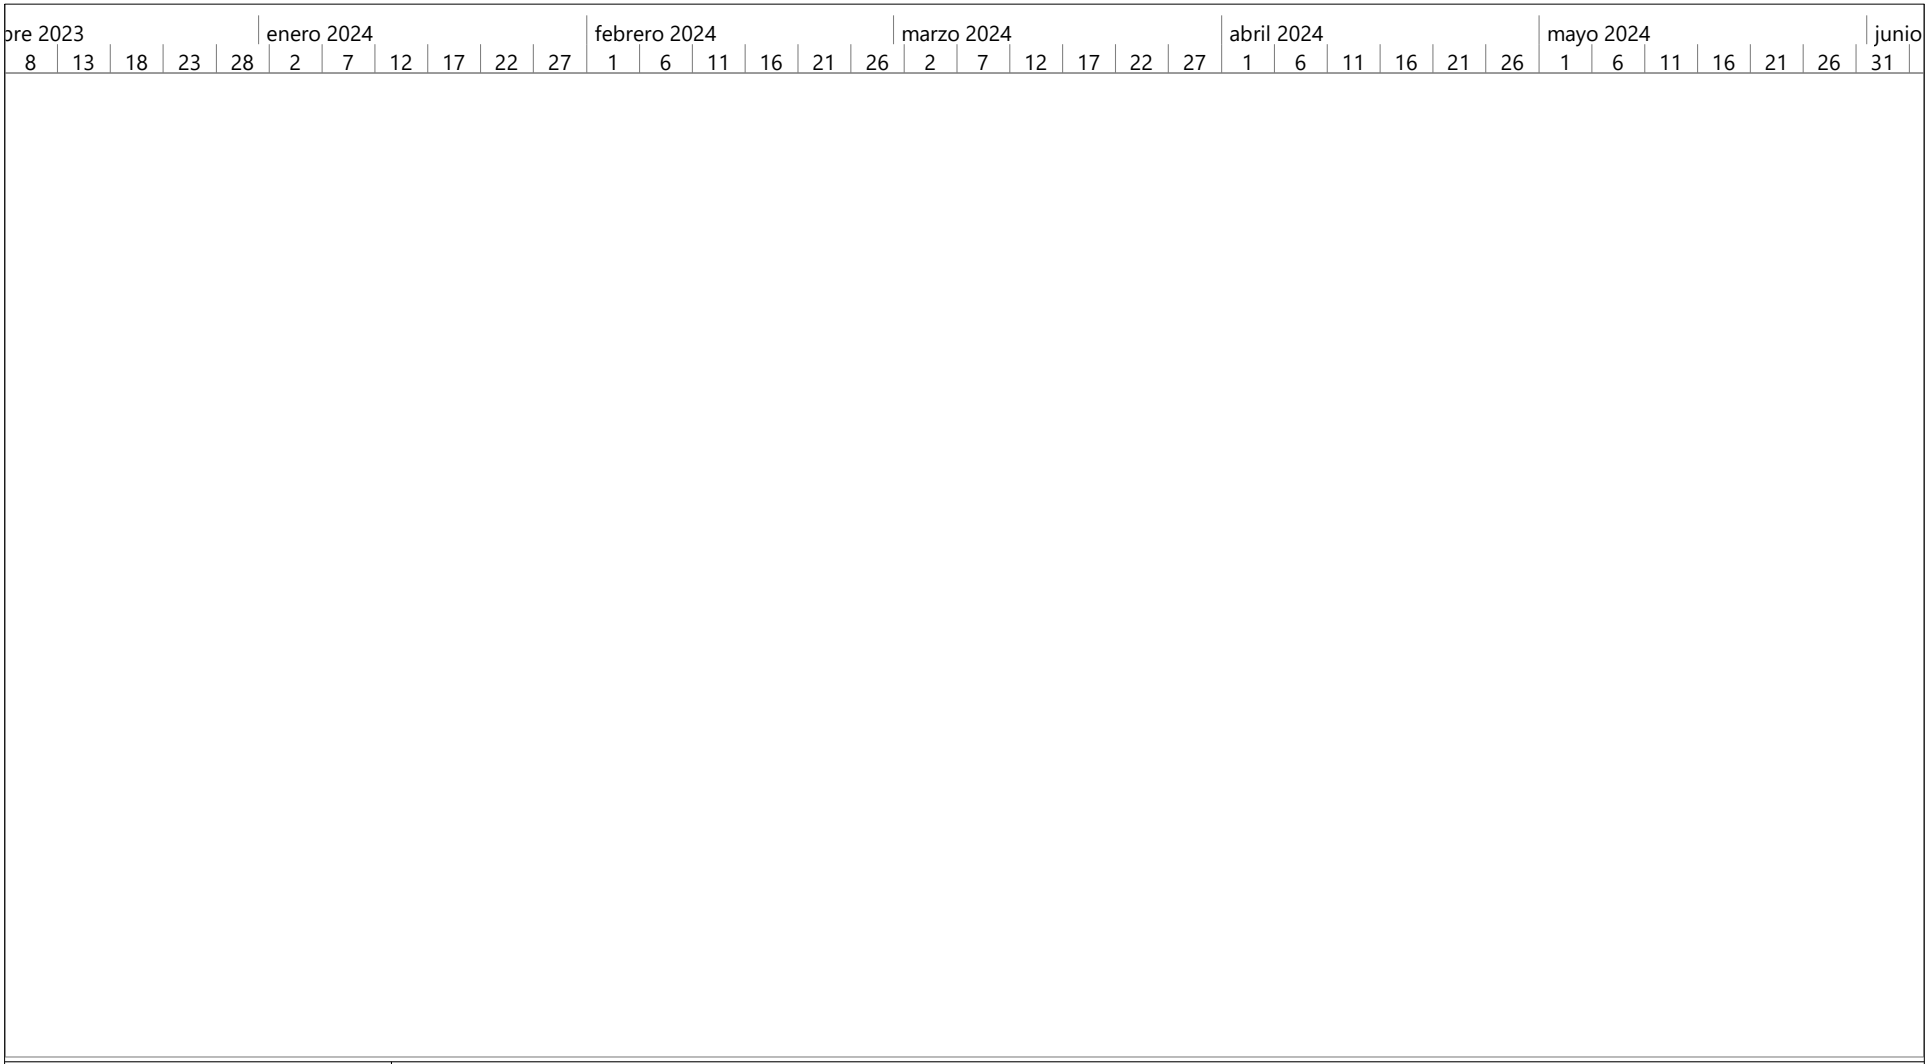

Proyecto: P_OBRA_C3186_2023
Fecha: vie 3/11/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	



11

Proyecto: P_OBRA_C3186_2023
Fecha: vie 3/11/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

- ✓ Acta de comité de obra

No hubieron este tipo de documentos.

5 INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 Información General del Contrato

En la siguiente tabla se muestra la información general del contrato de interventoría.

Tabla 4. Información General del Contrato de interventoría

CONTRATO No.	2714 de 2023
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE".
INTERVENTOR	HERBY LUNA CRUZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
FECHA INICIACIÓN	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	3 MESES y DOS DIAS
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	HASTA 31 DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION DEL CONTRATO N.1	NO APLICA
TIEMPO DE SUSPENSION	NO APLICA
FECHA VENCIMIENTO FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL Y FINALDEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 24.489.965,00).

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

Con el objetivo de mantener una adecuada ejecución del proyecto se realizaron las siguientes actividades:

Técnica: Se Terminaron obras de construcción de gaviones en sector de vereda de Sabanalarga, así se culminan metas físicas del proyecto. Por parte de la interventoría se realizó verificación y seguimiento técnico de este tipo de actividades para garantizar su correcto funcionamiento y servicio a la comunidad.

Ambiental: Como interventoría se hace seguimiento al recibo de la respuesta de INVIAS respecto a atención de observaciones realizadas al documento ambiental del proyecto.

Informes semanales: Elaboración y seguimiento del Informes semanales correspondientes al periodo.

Informe Mensual (diciembre/2023): Control y elaboración del tercer Informe mensual de Interventoría correspondiente a este periodo.

Correspondencia: Elaboración y respuesta de correspondencia mediante comunicados como mensajes de correos electrónicos, dirigida y recibida del contratista y el Invías.

5.3 Informes especialistas y profesionales.

En el presente documento, se adjuntan los informes del director de interventoría que aplican en este periodo, informes de acuerdo con el avance de obras llevado a cabo.

Informe director de interventoría:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2714 DE 2023

"**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE**".

INFORME EJECUTIVO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA No. 03
PERIODO: 01 al 31 de diciembre de 2023

ING. HERBY LUNA CRUZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Tabla Contenido

1 INTRODUCCION 5
2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ..... ¡Error! Marcador no definido.
2.1 Localización y alcance ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.2 Inventario y estado inicial de la vía ..... **¡Error! Marcador no definido.**
4. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 6
a. Información general del Contrato 6
b. Descripción de actividades ejecutadas en el mes ..... **¡Error! Marcador no definido.**
c. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría **¡Error! Marcador no definido.**
4. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 1
4.1 Información general del Contrato 1
4.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 1
4.3 Información otros programas y aplicativos ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 2
6 REGISTRO FOTOGRAFICO 3

1 INTRODUCCION

El contrato de obra número **3186 de 2023** celebrado entre el Instituto Nacional de vías con el Contratista **CONSORCIO CONSTRUCTORES JL** identificado número de NIT **901.741.595-8**, para ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE, la selección del contratista se realizó a través del proceso de contratación No. SA-MC-DT-CAS-002-2023. Se impartió orden de iniciación al contrato de Obra con fecha 29 de septiembre de 2023.

Por otra parte, mediante el proceso de selección de mínima cuantía No. **IP-DT-CAS-007-2023**, El Instituto Nacional de Vías, celebró el contrato No **2714 de 2023**, entre el INVIAS y **HERBY LUNA CRUZ** la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE"."**.** Mediante invitación pública No. **IP-DT-CAS-007-2023** por el **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS**, asimismo, se impartió orden de iniciación al contrato de Interventoría con fecha 29 de septiembre de 2023.

El presente informe mensual de Interventoría N° 03 describe las actividades realizadas en el periodo de 01 al 31 de diciembre de 2023, de acuerdo con los lineamientos descritos en el Manual de Interventoría de la versión.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

a. Información general del Contrato

En la siguiente tabla se muestra la información general del contrato de obra.

Tabla 1. Información general del contrato de obra

CONTRATO No.	3186 de 2023
OBJETO	ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE.
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTORES JL
NIT	901.741.595-8
FECHA INICIACIÓN	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	TRES MESES Y DOS DIAS
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION DEL CONTRATO N.1	No aplica
TIEMPO DE SUSPENSION	No aplica
AMPLIACION SUSPENSION	No aplica
REANUDACION	No aplica
FECHA TERMINACION FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($199.505.641, oo) INCLUIDO IVA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199.505.641, oo

i. Técnica

En este periodo se terminaron obras de gaviones que estaban pendientes, así se da por culminado las metas físicas del proyecto, obras además del reparcheo se ejecutaron en los siguientes sitios:

CARRETERAS	CÓDIGO	MUNICIPIO	LONGITUD	DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN K0
Tocaría – Orocue sector La Nevera - Guanapalo	90657	Nunchia	47.70	K38+300 vía Yopal - Paz de Ariporo
Sabanalarga – La Piñalera	89438	Sabanalarga	14.20	300m de la iglesia de Sabanalarga
El Refugio – Palo Bajito - Aracal	89700	Yopal	8.98	K14+900 de la vía Yopal – Paz de Ariporo

4. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.1 Información general del Contrato

En la siguiente tabla se muestra la información general del contrato de interventoría.

Tabla 4. Información General del Contrato de interventoría

CONTRATO No.	2714 de 2023
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE".
INTERVENTOR	HERBY LUNA CRUZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
FECHA INICIACIÓN	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	3 MESES y DOS DIAS
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	HASTA 31 DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION DEL CONTRATO N.1	NO APLICA
TIEMPO DE SUSPENSION	NO APLICA
FECHA VENCIMIENTO FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL Y FINALDEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 24.489.965,00).

4.2 Descripción de las actividades realizadas por el director de Interventor

Ambiental: Estar Pendiente respuesta del INVIAS a la atención observaciones del documento PAGA.

Informes semanales: Elaboración y seguimiento del Informes semanales correspondientes al periodo.

Informe Mensual (diciembre de 2023): Control y elaboración del tercer informe mensual de noviembre de 2023 de Interventoría correspondiente a este periodo.

Correspondencia: Elaboración y respuesta de correspondencia mediante comunicados como mensajes de correos electrónicos, dirigida y recibida del contratista y el Invías.

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Terminadas obras de gaviones en sector vereda del municipio de Sabanalarga, se terminan las metas físicas del proyecto.

- Se procede inicio de liquidación de los contratos de obra e interventoría.

6 REGISTRO FOTOGRAFICO

OBRA FINALES DE REPARCHEO Y GAVIONES













Informe Ambiental:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2714 de 2023

"**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE**".

INFORME FINAL ESPECIALISTA AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA
PERIODO: 1 al 31 DICIEMBRE DE 2023

ING. MARTHA CONRADO
ESPECIALISTA AMBIENTAL

Tabla Contenido

1 INTRODUCCION 7
2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. ..... ¡Error! Marcador no definido.
2.1 Localización y alcance ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.2 Inventario y estado inicial de la vía ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.3 Características técnicas del proyecto ..... **¡Error! Marcador no definido.**
3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA ..... ¡Error! Marcador no definido.
3.1 Información general del Contrato obra ..... **¡Error! Marcador no definido.**
4. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 8
4.1 Información General Del Contrato 9
4.2 Concepto de especialista ambiental 10
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 11
6. DOCUMENTO AMBIENTAL 10

2 INTRODUCCION

El contrato de obra número **3186 de 2023** celebrado entre el Instituto Nacional de vías con el Contratista **CONSORCIO CONSTRUCTORES JL** identificado número de NIT **901.741.595-8**, para ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE, la selección del contratista se realizó a través del proceso de contratación No. SA-MC-DT-CAS-002-2023. Se impartió orden de iniciación al contrato de Obra con fecha 29 de septiembre de 2023.

Por otra parte, mediante el proceso de selección de mínima cuantía No. **IP-DT-CAS-007-2023**, El Instituto Nacional de Vías, celebró el contrato No **2714 de 2023**, entre el INVIAS y **HERBY LUNA CRUZ** la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE"."**.** Mediante invitación pública No. **IP-DT-CAS-007-2023** por el **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS**, asimismo, se impartió orden de iniciación al contrato de Interventoría con fecha 29 de septiembre de 2023.

El presente informe mensual ambiental de Interventoría N° 03 describe las actividades realizadas en el periodo de 01 al 31 de diciembre de 2023, de acuerdo con los lineamientos descritos en el Manual de Interventoría de la versión.

3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del Contrato

En la siguiente tabla se muestra la información general del contrato de obra.

Tabla 1. Información general del contrato de obra

CONTRATO No.	3186 de 2023
OBJETO	ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE.
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCTORES JL
NIT	901.741.595-8
FECHA INICIACIÓN	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	TRES MESES Y DOS DIAS
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION DEL CONTRATO N.1	No aplica
TIEMPO DE SUSPENSION	No aplica
AMPLIACION SUSPENSION	No aplica
REANUDACION	No aplica
FECHA TERMINACION FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($199.505.641, oo) INCLUIDO IVA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 199.505.641, oo

3.2 Descripción de actividades ejecutadas en el mes

Del documento PAGA, está pendiente respuesta del INVIAS en atención a unas observaciones realizadas por la entidad.

4. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 Información General Del Contrato

En la siguiente tabla se muestra la información general del contrato de interventoría.

Tabla 4. Información General del Contrato de interventoría

CONTRATO No.	2714 de 2023
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE".
INTERVENTOR	HERBY LUNA CRUZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
FECHA INICIACIÓN	29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	3 MESES y DOS DIAS
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	HASTA 31 DICIEMBRE DE 2023
SUSPENSION DEL CONTRATO N.1	NO APLICA
TIEMPO DE SUSPENSION	NO APLICA
FECHA VENCIMIENTO FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL Y FINALDEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 24.489.965,00).

6.2 Concepto de especialista ambiental

En atención a esta disciplina del proyecto que tiene como objeto: ***"ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE***". Seguidamente lo siguiente:

Se reciben atención observaciones del documento ambiental del proyecto, atendidas por el contratista, revisadas la interventoría considera que están atendidas de acuerdo con lo solicitado por la entidad, asimismo se radican estos documentos corregidos y los faltantes que solicito la entidad, enviados mediante comunicado de la interventoría CAS-YOP-012-2023 con fecha de noviembre 21 de 2023,

.

Atentamente



MARTHA ISABEL CONRADO LÓPEZ
Especialista Ambiental

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Pendiente respuesta de la entidad ya atendida las observaciones realizadas al documento ambiental del proyecto.

6 REPORTES DE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 Equipo y vehículos contrato de interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 1/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE de 2023 **PROYECTO:** ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2714 de 2023 **INTERVENTORÍA:** HERBY LUNA CRUZ

CONTRATO DE OBRA No. 3186 de 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRUCTORES JL

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DICIEMBRE																													ENERO				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
CAMIONETA	Camioneta outlandert modelo 2015	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A						

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

Se terminan las obras objeto del contrato de obra

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.2520242574 CND

Firma
Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 25202 276582 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Nº. 03
(01 al 31 diciembre de 2023)

6.2 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	1/01/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2714 de 2023 **INTERVENTOR:** HERBY LUNA CRUZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE

CONTRATO DE OBRA No.: 3186 de 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRUCTORES JL

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES				Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF		
1	HERBY LUNA CRUZ	4197343	DIRECTOR INTERVENTORIA	$ 5.000.000,00	X X X X X	10	HERBY LUNA CRUZ	$ 500.000,00	$ 34.800	V	FAMISANAR	4524374599	$ 62.500	PORVENIR	4524374599	$ 80.000					
3	MARTHA ISABEL CONRADO LÓPEZ	52966252	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 3.800.000,00	X X X X X	10	HERBY LUNA CRUZ	$ 380.000,00	$ 26.448	V	NUEVA EPS	4478669525	$ 47.500	PORVENIR	4478669525	$ 60.800					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
N																					
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 8.800.000,00																	

El Interventor adjunta la certificación de fecha ENERO 02 DE 2023 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND.

Firma
Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 25202 276582 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.3 Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 1/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2714 de 2023 **INTERVENTOR:** HERBY LUNA CRUZ

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2023 **PROYECTO:** ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 3186 de 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRUCTORES JL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	938323	C-2402-0600-11-0-2402098-02	11	Nación	Contrato principal	$ 24.489.965,00	$ 3.295.354,57
			TOTAL				$ 3.295.354,57

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 24.489.965,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
									$ 24.489.965	$ 24.489.965		
1	OCTUBRE DE 2023	$ 5.142.400,00	$ 977.056	$ 6.119.456,00	$ 0	$ -	$ -	938323	$ 18.370.509,00	$ 18.370.509,00		
2	NOVIEMBRE DE 2023	$ 12.668.197,00	$ 2.406.957	$ 15.075.154,43	$ 0	$ -	$ -	938323	$ 3.295.354,57	$ 3.295.354,57		
3	DICIEMBRE DE 2023	$ 2.006.800,00	$ 381.292	$ 2.388.092,00	$ 0	$ -	$ -	938323	$ 907.262,57	$ 907.262,57		
	TOTALES	$ 19.817.397,00	$ 3.765.305	$ 23.582.702,43	$ -	$ -	$ 0		$ 907.262,57	$ 907.262,57		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
Acta de costos No. 1	$ 5.142.400,00	$ 977.056,00	$ 6.119.456,00
Acta de costos No. 2	$ 12.668.197,00	$ 2.406.957,43	$ 15.075.154,43
Acta de costos No. 3	$ 2.006.800,00	$ 381.292,00	$ 2.388.092,00
Acta de costos No. 4	$ -	$ -	$ -
Acta de costos No. 5	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	$ 19.817.397,00	$ 3.765.305,43	$ 23.582.702,43

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520242574 CND.

Firma
Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 25202 276582 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4 Seguimiento a garantías contrato de interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 1/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2714 de 2023 **INTERVENTOR:** HERBY LUNA CRUZ

OBJETO DEL CONTRATO:
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE

FECHA DE INICIO: 29/09/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES y DOS DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 24.489.965,00

VALOR ACUMULADO: $ 24.489.965,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 2.448.996,50	11	8	2023	10	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 4.897.993,00	11	8	2023	10	12	2026
Calidad del servicio	10%	$ 7.346.989,50	11	8	2023	11	8	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 39-44-101153916

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad del servicio								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:


NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Representante Legal - Interventoría
Matrícula Profesional No.:2520242574 CND

Firma
Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 25202 276582 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

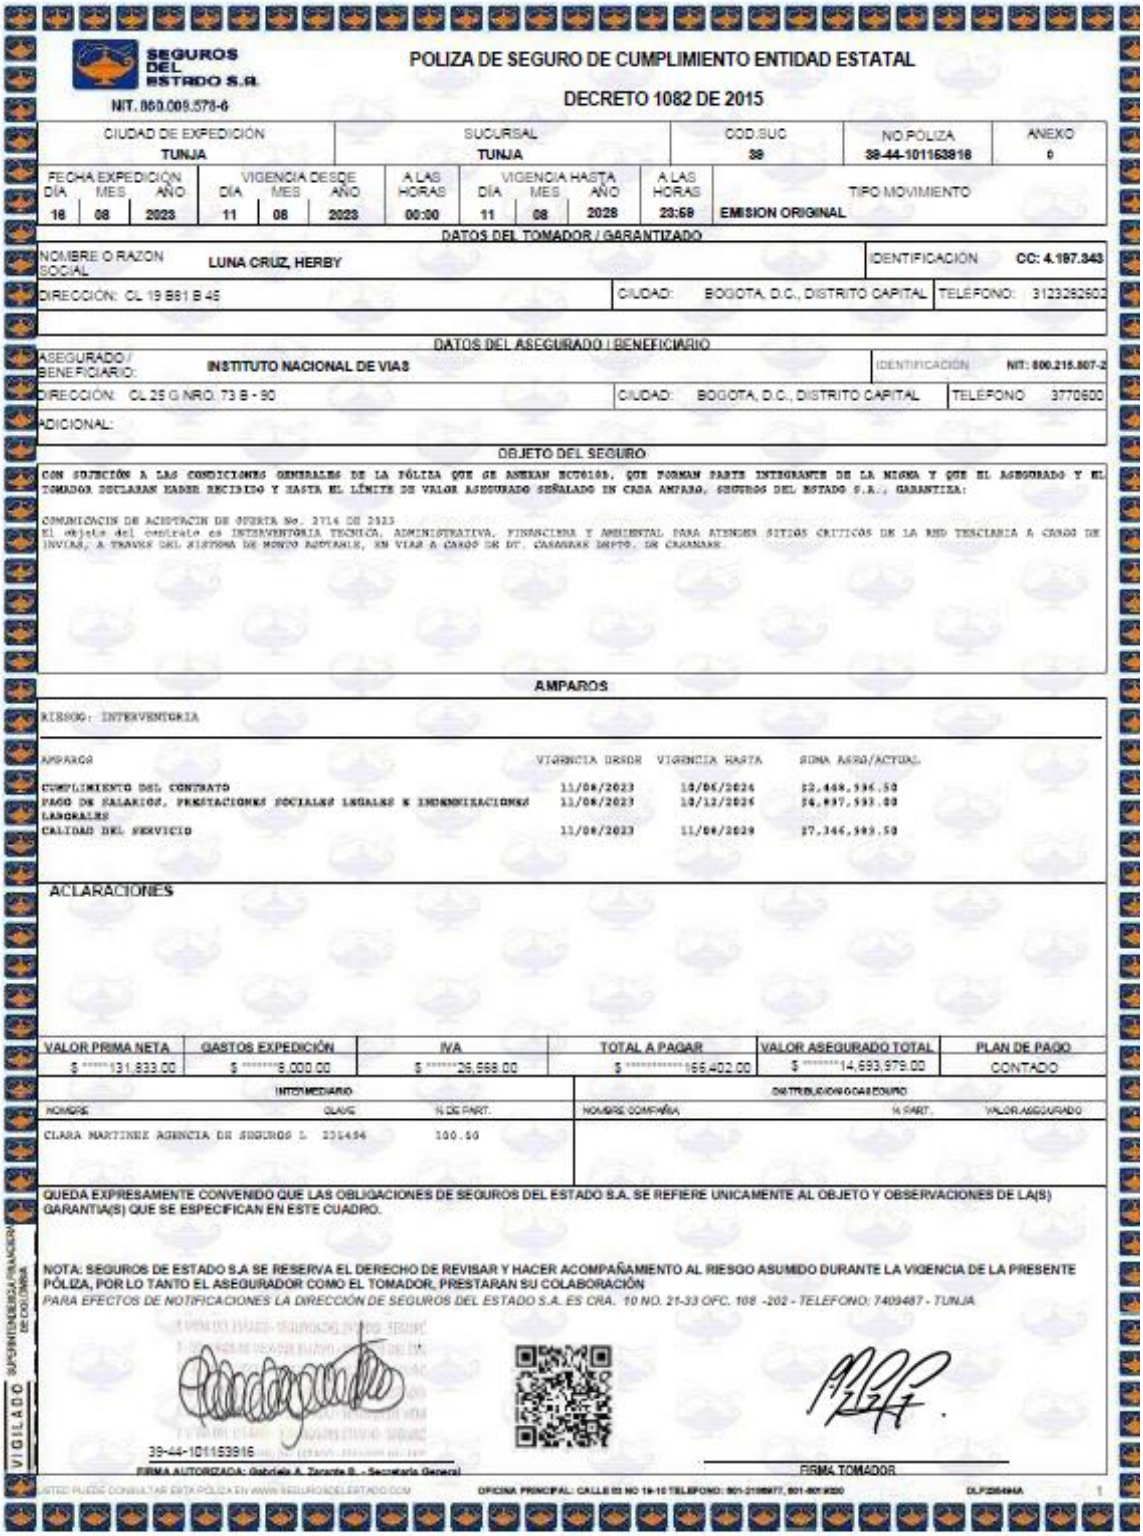

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	38	38-44-101163816	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	08	2023	11	08	2023	00:00	11	08	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
LUNA CRUZ, HERBY	CC: 4.197.343

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 19 B81 B 45	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3123282602

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
CL 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3770600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN EC70105, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No. 2714 DE 2023
El objeto del contrato es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/08/2023	10/06/2026	$2,448,596.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/08/2023	10/12/2025	$4,897,593.00
CALIDAD DEL SERVICIO	11/08/2023	11/08/2028	$7,346,589.50

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ 131,833.00	$ 9,000.00	$ 26,568.00	$ 166,402.00	$ 14,693,979.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN DEL SEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CLARA MARTINEZ AGENCIA DE SEGUROS L	235494	100.50			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA

39-44-101163816

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante S. - Secretaria General


FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 72 NO 10-15 TELEFONO: 601-3108677, 601-6013300

DLP2564HA

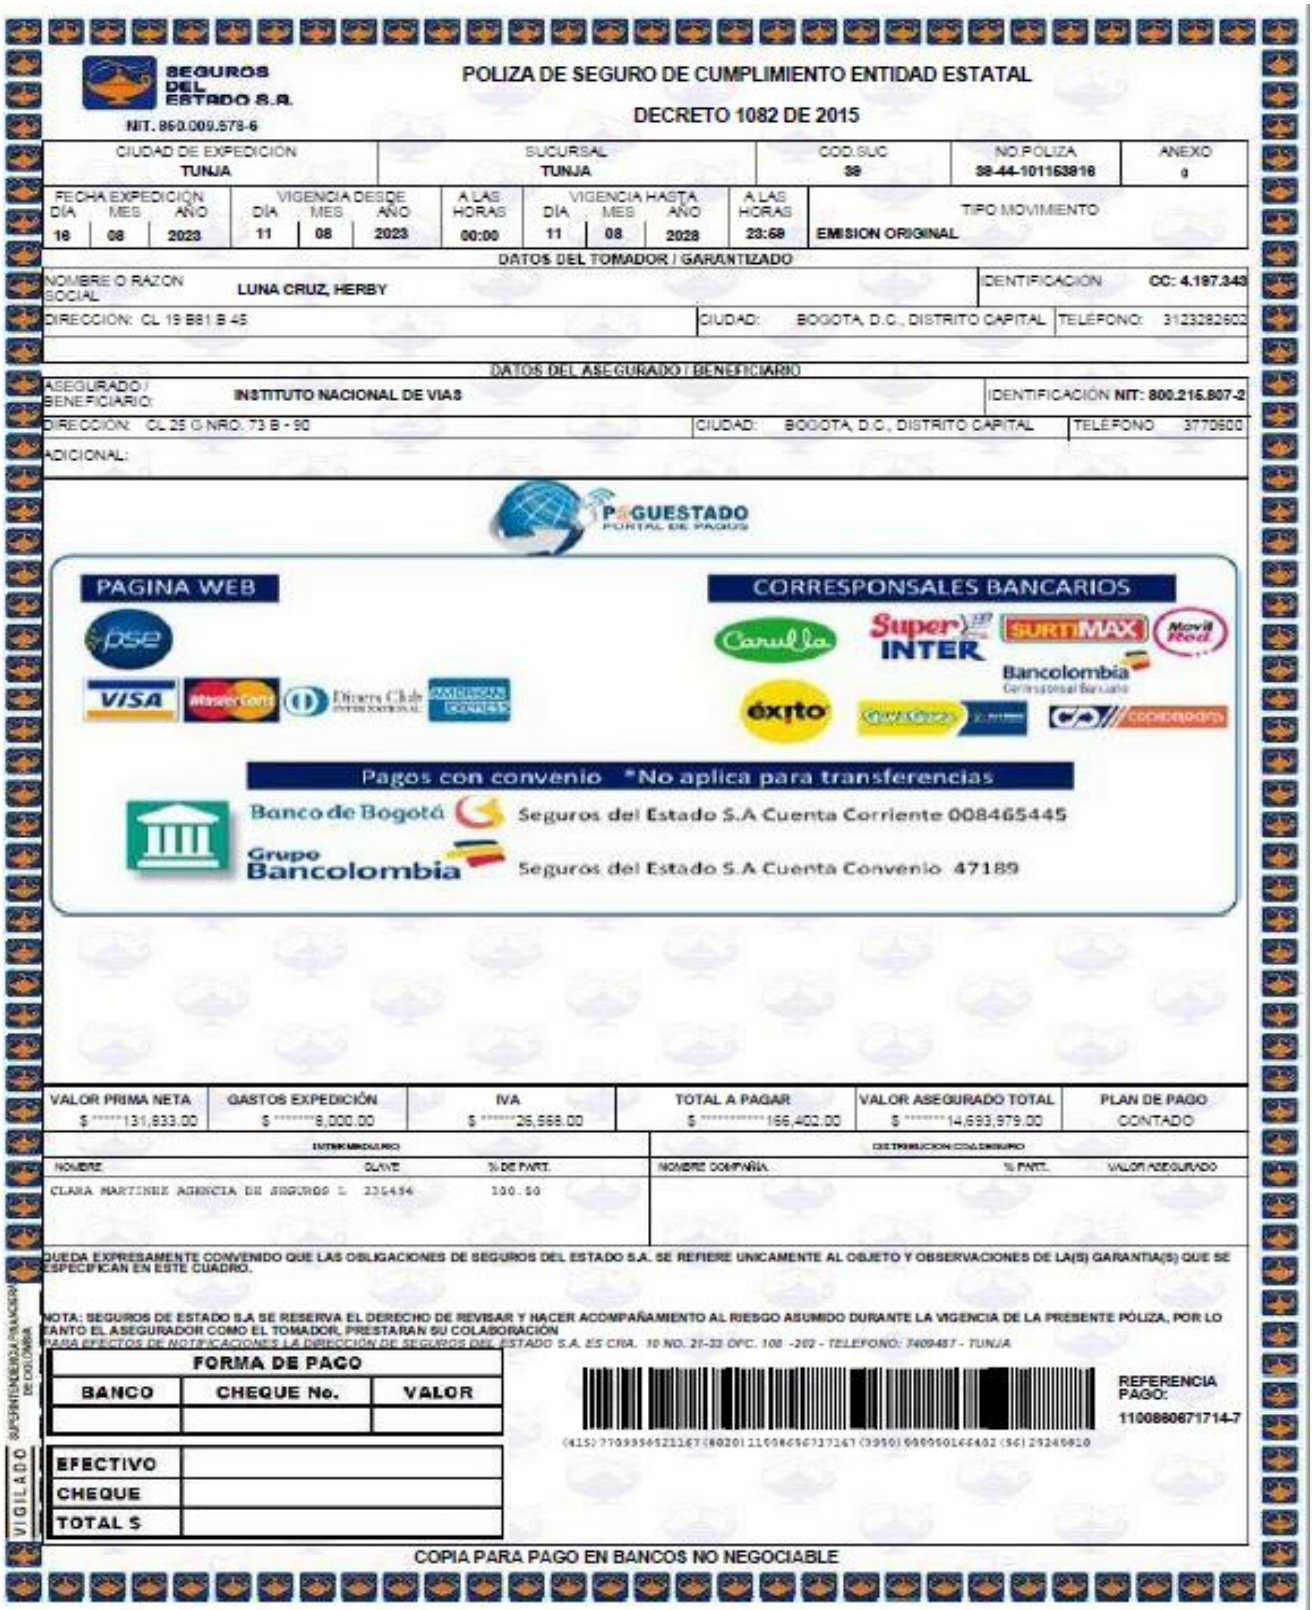

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO POLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	38	38-44-101163816	0

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	08	2023	11	08	2023	00:00	11	08	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACION	
LUNA CRUZ, HERBY			CC: 4.187.343
DIRECCION: CL 19 B81 B 45	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELEFONO:	3123282602

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			NIT: 800.215.807-2
DIRECCION: CL 25 G NRO. 73 B - 90	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELEFONO	3770800

ADICIONAL:

PSEGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ 131,833.00	$ 8,000.00	$ 26,568.00	$ 166,402.00	$ 14,693,979.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
CLARA MARTINEZ AGENCIA DE SEGUROS L	235454	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709995021167(8020)110586567171(3900)000050166402(96)29240810

REFERENCIA PAGO: 1100880671714-7

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101163916	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	09	2023	11	08	2023	00:00	11	08	2028	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACION	
LUNA CRUZ, HERBY		CC: 4.197.343	
DIRECCIÓN: CL 19 B81 B 45	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	3123282602

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		NIT: 800.215.807-2	
DIRECCIÓN: CL 25 G NRO. 73 B - 90	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3770600
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN BC70105, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

COMUNICACIN DE ACEPTACIN DE OFERTA No. 2714 DE 2023
El objeto del contrato es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/08/2023	10/06/2026	$2,448,596.50	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/08/2023	10/12/2026	$4,897,593.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	11/08/2023	11/08/2028	$7,346,589.50	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA QUE EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES POR 5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO DE LA OBRA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 14,693,979.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUIDORA DE SEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CLARA MARTINEZ AGENCIA DE SEGUROS L	236454	100.50			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

39-44-101163916

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante S. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 85 NO 19-10 TELEFONO: 901-2109677, 601-6019200 DLP2564HA

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 01/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2714 de 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE

INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ

FECHA DE INICIO: 29/09/2023 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 3 MESES y DOS DIAS **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 3186 de 2023 (Indicar número y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTORES JL

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------ NO --X-- APROBADO: SI ------ N ------ VERSIÓN No. ____ FECHA DE VERSIÓN: **DICIEMBRE**

OBSERVACIONES:
NO APLICA PARA ESTE PROYECTO.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ----- NO ----------X---- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ----- NO ----------X---- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

OBSERVACIONES:
NO APLICA PARA ESTE PROYECTO.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO ---X-- APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ N ------

OBSERVACIONES:
NO APLICA PARA ESTE PROYECTO.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:
NO APLICA PARA ESTE PROYECTO.

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:
Para este proyecto No aplica esta actividad.

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:
NO APLICA PARA ESTE PROYECTO.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:
NO APLICA PARA ESTE PROYECTO.

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Representante Legal de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND

Firma NA
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 25202 276582 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

6.6 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a la inversión del Anticipo:

  Este contrato de interventoría no cuenta con anticipo

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Nº. 03
(01 al 31 diciembre de 2023)

- Plan de Cargas o Reprogramación al Plan de Cargas aprobado

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	01/01/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☒

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☐ **No.** ____
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1313 de 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SIACHOQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL TERRITORIAL BOYACA.

INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
RESOLUCIÓN No.: 55 DE 29/09/2023 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 3186 de 2023 CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTORES JL

PLAZO INICIAL: 3.5 meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/09/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 24,489,965.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 24,489,965.00

PLAZO ACUMULADO: 3.5 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 3.5 meses (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 0.00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ___ de fecha ____		2023																								TOTAL	
											Septiembre		octubre		noviembre		diciembre		2024 enero		febrero		MES		MES		MES		MES		MES		MES		MES			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																		
		PERSONAL PROFESIONAL																																		
	1	Director de Interventoría	$ 5,000,000.00		0.30	$ 1,500,000.00					0.00	$ -	0.15	$ 750,000	0.10	$ 500,000	0.05	$ 250,000	0.00	$ -	0.00	$ -	$ -		$ -											0.30	$ 1,500,000
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 3,500,000.00		1.20	$ 4,200,000.00					0.00	$ -	0.20	$ 700,000	1.00	$ 3,500,000	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	$ -		$ -											1.20	$ 4,200,000
	1	Especialista Ambiental	$ 3,800,000.00		0.30	$ 1,140,000.00					0.00	$ -	0.15	$ 570,000	0.15	$ 570,000	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	$ -		$ -											0.30	$ 1,140,000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 6,840,000.00					$ -		$ 2,020,000.00		$ 4,570,000.00		$ 250,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -											$ 6,840,000
FACTOR MULTIPLICADOR						2.14						2.14		2.14		2.14		2.14		2.14		2.14		2.14												2.14
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 14,637,600.00					$ -		$ 4,322,800.0		$ 9,779,800.0		$ 535,000.0		$ -		$ -		$ -		$ -											$ 14,637,600

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2023 Septiembre H-M	VALOR	octubre H-M	VALOR	noviembre H-M	VALOR	diciembre H-M	VALOR	2024 enero H-M	VALOR	febrero H-M	VALOR	0 MES H-M	VALOR	MES H-M	VALOR	MES H-M	VALOR	MES H-M	VALOR	MES H-M	VALOR	MES H-M	VALOR	MES H-M	VALOR	TOTAL H-M	TOTAL VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																																				
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																																				
	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1) 4x4 (Incluye peajes y Combustible) 01 modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior	$ 3,000,000.00	MES	1.20	$ 3,600,000.00					0.00	$ -	0.20	$ 600,000	0.80	$ 2,400,000	0.20	$ 600,000	0.00	$ -	0.00	$ -	$ -		$ -											1.20	$ 3,600,000
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y enseres públicos)	$ 550,000.00	Según comprobante por mes	3.50	$ 1,925,000.00					0.00	$ -	1.00	$ 550,000	1.00	$ 550,000	1.00	$ 550,000	0.50	$ 275,000	0.00	$ -	$ -		$ -											3.50	$ 1,925,000
	1	Trabajos de topografía (incluye personal equipo y transporte)	$ 1,800,000.00	Según comprobante por mes	1.20	$ 2,160,000.00					0.00	$ -	0.20	$ 360,000	1.00	$ 1,800,000	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	$ -		$ -											1.20	$ 2,160,000
	1	Ensayos de Laboratorio	$ 450,000.00	Según comprobante por mes	1.20	$ 540,000.00					0.0	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 450,000	0.2	$ 90,000	0.00	$ -	0.00	$ -	$ -		$ -											1.20	$ 540,000
		OTROS COSTOS																																				
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc	$ 100,000.00	Según comprobante por mes	3.50	$ 350,000.00					0.0	$ -	1.00	$ 100,000	1.00	$ 100,000	1.00	$ 100,000	0.50	$ 50,000	0.00	$ -	$ -		$ -											3.50	$ 350,000
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 100,000.00	Según comprobante por mes	3.50	$ 350,000.00					0.0	$ -	1.00	$ 100,000	1.00	$ 100,000	1.00	$ 100,000	0.50	$ 50,000	0.00	$ -	$ -		$ -											3.50	$ 350,000
	1	Vivedurla Comunitaria	$ 50,000.00	Según comprobante por mes	3.50	$ 175,000.00					0.0	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 50,000	1.00	$ 50,000	1.00	$ 50,000	$ -		$ -		$ -											3.00	$ 150,000
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																																				$ -
	* SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)					$ 9,100,000.00					$ -		$ 1,710,000		$ 5,450,000		$ 1,490,000		$ 425,000		$ -		$ -		$ -											$ 9,075,000.00	
	* SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)					$ 23,737,600.00					$ -		$ 6,032,800		$ 15,229,800		$ 2,025,000		$ 425,000		$ -		$ -		$ -											$ 23,712,600.00	
	* IVA = 19% * (C) = (D)					$ -					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -											$ -	
	* PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)					$ 752,365.00					$ -		$ -		$ -		$ 752,365.00		$ -		$ -		$ -		$ -											$ 752,365.00	
	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = €																																					
	IVA = 19% * (E) = (F)																																					
	* COSTO TOTAL = (E) + (F)					$ 24,489,965.00					$ -		$ 6,032,800.00		$ 15,229,800.00		$ 2,777,365.00		$ 425,000.00		$ -		$ -		$ -											$ 24,464,965.00	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS												

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
PLAN DE CARGAS INICIAL

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND.

Firma
Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 25202 276582 CND
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutiva, Interventor y Dirección Territorial.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA Nº. 03
(01 al 31 diciembre de 2023)

- Seguimiento al plan de carga

Se adjunta seguimiento con lo ejecutado hasta el 31 de diciembre de 2023

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPIMINO-IN-9-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	01/01/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL X

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☐ **No.** _____ (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1313 de 2022**

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SIACHOQUE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL TERRITORIAL BOYACA.

INTERVENTOR: HERBY LUNA CRUZ

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO

RESOLUCIÓN No.: 55 DE 29/09/2023 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.: 3186 de 2023 CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTORES JL

PLAZO INICIAL: 3,5 meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/09/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 24.489.965,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 24.489.965,00

PLAZO ACUMULADO: 3,5 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 3,5 meses (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 0,00

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____		2023								2024												TOTAL	
											Septiembre		octubre		noviembre		diciembre		enero		febrero		MES		MES		MES		MES		MES		
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																														
		PERSONAL PROFESIONAL																														
	1	Director de Interventoría	$ 5.000.000,00		0,30	$ 1.500.000,00					0,00	$ -	0,15	$ 750.000	0,10	$ 500.000	0,05	$ 250.000	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -									0,30	$ 1.500.000
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 3.500.000,00		1,20	$ 4.200.000,00					0,00	$ -	0,20	$ 700.000	1,00	$ 3.500.000	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -									1,20	$ 4.200.000
	1	Especialista Ambiental	$ 3.800.000,00		0,30	$ 1.140.000,00					0,00	$ -	0,15	$ 570.000	0,15	$ 570.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -									0,30	$ 1.140.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 6.840.000,00					$ -		$ 2.020.000,00		$ 4.570.000,00		$ 250.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -								$ 6.840.000
FACTOR MULTIPLICADOR						2,14						2,14		2,14		2,14		2,14		2,14		2,14		2,14									2,14
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 14.637.600,00					$ -		$ 4.322.800,0		$ 9.779.800,0		$ 535.000,0		$ -		$ -		$ -		$ -								$ 14.637.600

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2023 Septiembre		octubre		noviembre		diciembre		0												TOTAL	
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR													H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																														
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																														
	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1) 4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior	$ 3.000.000,00	MES	1,20	$ 3.600.000,00					0,00	$ -	0,20	$ 600.000	0,80	$ 2.400.000	0,20	$ 600.000	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -							1,20	$ 3.600.000
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 550.000,00	Según comprobante por mes	3,50	$ 1.925.000,00					0,00	$ -	1,00	$ 550.000	1,00	$ 550.000	1,00	$ 550.000	0,50	$ 275.000	0,00	$ -		$ -		$ -							3,50	$ 1.925.000
	1	Trabajos de topografía (Incluye personal,equipo y transporte)	$ 1.800.000,00	Según comprobante por mes	1,20	$ 2.160.000,00					0,00	$ -	0,20	$ 360.000	1,00	$ 1.800.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -							1,20	$ 2.160.000
	1	Ensayos de Laboratorio	$ 450.000,00	Según comprobante por mes	1,20	$ 540.000,00					0,0	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 450.000	0,2	$ 90.000	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -							1,20	$ 540.000
		OTROS COSTOS																														
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc	$ 100.000,00	Según comprobante por mes	3,50	$ 350.000,00					0,0	$ -	1,00	$ 100.000	1,00	$ 100.000	1,00	$ 100.000	0,50	$ 50.000	0,00	$ -		$ -		$ -							3,50	$ 350.000
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 100.000,00	Según comprobante por mes	3,50	$ 350.000,00					0,0	$ -	1,00	$ 100.000	1,00	$ 100.000	1,00	$ 100.000	0,50	$ 50.000	0,00	$ -		$ -		$ -							3,50	$ 350.000
	1	Veeduría Comunitaria	$ 50.000,00	Según comprobante por mes	3,50	$ 175.000,00					0,0	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 50.000	1,00	$ 50.000	1,00	$ 50.000		$ -		$ -		$ -							3,00	$ 150.000
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																														$ -
		*SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				$ 9.100.000,00					$ -		$ 1.710.000		$ 5.450.000		$ 1.490.000		$ 425.000		$ -		$ -		$ -								$ 9.075.000,00
		*SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 23.737.600,00					$ -		$ 6.032.800		$ 15.229.800		$ 2.025.000		$ 425.000		$ -		$ -		$ -								$ 23.712.600,00
		*IVA = 19% * (C) = (D)				$ -					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -								$ -
		*PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)				$ 752.365,00					$ -		$ -		$ -		$ 752.365,00		$ -		$ -		$ -		$ -								$ 752.365,00
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = €																														
		IVA = 19% * (E) = (F)																														
		*COSTO TOTAL = (E) + (F)				$ 24.489.965,00					$ -		$ 6.032.800,00		$ 15.229.800,00		$ 2.777.365,00		$ 425.000,00		$ -		$ -		$ -								$ 24.464.965,00
		VALOR PROGRAMADO											$ 6.116.241,25		$ 6.116.241,25		$ 6.116.241,25		$ 6.116.241,25														$ 24.464.965,00
		PORCENTAJE PROGRAMADO											25,00%		25,00%		25,00%		25,00%														100%
		VALOR EJECUTADO											$ 6.133.456,00		$ 15.075.154,43		$ 2.388.092,00		$ -														$ 23.582.702,43
		PORCENTAJE EJECUTADO											25,01%		61,62%		9,76%		0,00%														96,39%

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

PLAN DE CARGAS INICIAL

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma _____
Nombre: HERBY LUNA CRUZ
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202 42574 CND.

Firma _____
Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No. 25202 276582 CND
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se terminan obras de reparcheo y construcción de gaviones, así cumpliendo con metas físicas del proyecto.
- Se procede dar inicio con liquidación de los contratos de obra e interventoría.

8 ANEXOS

- ✓ Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo. Ver Anexo 19
- ✓ Registro fotográfico sectores a intervenir. Ver Anexo 20
- ✓ Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas. Para este periodo NO APLICA. Ver Anexo 21
- ✓ Copia de la Bitácora del mes correspondiente. Para este periodo No aplica. Ver Anexo 22.

8.1 RELACION DE CORRESPONDENCIA

CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA						
FECHA DE ENVÌO	NÙMERO CONSECUTIVO	NÙMERO RADICADO	FECHA DE RADICACIÒN	ASUNTO:	QUIÈN LO DIRIGE:	DIRIGIDO A:
DIC 1 DE 2023	CAS-YOP-021-2023			ACTA 3 DE OBRA	HERBY LUNA CRUZ	INVIAS
DIC 4 DE 2023	CAS-YOP-022-2023			ACTA DE MOD COSTOS # 1 DE INTERVENTORIA	HERBY LUNA CRUZ	INVIAS
DIC 9 DE 2023	CAS-YOP-024-2023			INFORME # 2 DE INTERVENTORIA	HERBY LUNA CRUZ	INVIAS
DIC 11 DE 2023	CAS-YOP-025-2023			MODIFICACION CONTRATO DE OBRA	HERBY LUNA CRUZ	INVIAS
DIC 12 DE 2023	CAS-YOP-026-2023			ACTA COSTOS # 3 DE INTERVENTORIA	HERBY LUNA CRUZ	INVIAS
DIC 13 DE 2023	CAS-YOP-027-2023			ACTA COSTOS # 4 DE INTERVENTORIA	HERBY LUNA CRUZ	INVIAS

CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA						
FECHA RECIBIDO	**FECHA DE DOCUMENTO**	**NUMERO CONSECUTIVO**	**ASUNTO:**	**QUIEN REMITE**	**QUIEN FIRMA**	**DIRIGIDO A:**
11/12/2023		2023S-VBOG-027194	RESPUESTA OBSERVACIONES AMBIENTALES	INVIAS	Jairo Fernando Arguello Urrego SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD-INVIAS.	HERBY LUNA CRUZ.
12/12/2023		2023S-VBOG-027914	OBSERVACIONES ACTA PARCIAL # 3 DE OBRA	INVIAS	Juan Gabriel Rodríguez Solano DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE (E)	HERBY LUNA CRUZ

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBRAS DE REPARCHEO Y CONSTRUCCION DE GAVIONES FINALES DEL PROYECTO

ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE DT. CASANARE DEPTO. DE CASANARE











8.4 Copia de la bitácora del mes correspondiente

Diciembre 4 /2023

Reparcheo asfalto

Se realiza finalizacion Reparcheo de asfalto Vereda la Nevera

Luis Eduardo Mozo Malaver
Residente Obra.

Herby Luna Cruz
Director Interventoria

Diciembre 5 / 2023
Inicio Construccion Gavión. Sabanalarga.
Se realiza inicio de proceso constructivo de gavión.

Luis Eduardo Mozo Malaver
Residente obra

Herby Luna Cruz
Director Interventoria

Diciembre 23/ 2023

Finalizacion Obras

Se culmina con terminacion de proceso constructivo de Gavion sector Sabanalarga

Luis Eduardo Mozo Malaver
Residente Obra

Herby Luna Cruz
Director Interventoría

Scanned with CamScanner
