Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA QUE

CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL, identificado con **CC** No. **901899883**, cumplió a satisfacción técnica, administrativa, financiera y jurídicamente con el objeto y las obligaciones del contrato de **Obra Pública No. 4346/2024**, en la forma y oportunidad pactadas.

En caso que se haya generado un pago anterior en virtud del contrato, CERTIFICO que el informe de ejecución correspondiente a dicho periodo se encuentra publicado en SECOP II.(1)

Por lo anterior, se genera registro de reevaluación al proveedor donde autoriza cancelar la suma de **$ 447.971.690,77 "CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 77/100 PESOS M/Cte.";** correspondientes al **Tercer Pago** y tras previa verificación del cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales.

Afecta los siguientes usos presupuestales:

No. COMPROMISO	RUBRO	USO	VALOR
34725	C-3302-1603-15-20302B1-3302073-02	AA-02-01-01-001-003-18	$ 447.971.690,77
T O T A L			**$ 447.971.690,77**

Se expide en Bogotá, D.C. a los 12 días del mes de mayo de 2026

MONICA ORDUÑA MONSALVE
DIRECTOR(A) DE PATRIMONIO Y MEMORIA
Supervisor

Vo. Bo.: DANIEL RICARDO CEPEDA HERNÁNDEZ
MARÍA CAROLINA ESCOBAR SOLANO

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO No.:
PERIODO DEL INFORME:
VIGENCIA DEL CONTRATO:
CONTRATISTA:
OBJETO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EL PERIODO EN MENCIÓN

Para el cumplimiento del objeto del contrato desarrolle las siguientes actividades acorde con el contrato en mención:

No.	Tipo	Obligación	Actividad	Porcentaje Avance	Soporte

Fecha de Entrega:

Nota 1: Previo envío del informe verifique que el documento adjunto como evidencia corresponda al soporte de la actividad reportada.

Nota 2: En caso de que en las evidencias sean aportadas mediante enlaces que dirijan a los soportes, verifique que los enlaces correspondan a correos institucionales, sean públicos y se encuentren actualizados.

MINISTERIO DE CULTURA
INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES ADICIONALES

No.	Actividad

Cordial saludo,

En mi calidad de contratista me comprometo a publicar el presente informe y la certificación de cumplimiento en el SECOP II dentro de los 3 días hábiles siguientes a la aprobación del mismo.(1)

CONTRATISTA

Vo. Bo.:

Ministerio de Cultura
Supervisor

(1) Solo aplica para contratos que están publicados en SECOP II

Fecha de Entrega:

Nota 1: Previo envío del informe verifique que el documento adjunto como evidencia corresponda al soporte de la actividad reportada.

Nota 2: En caso de que en las evidencias sean aportadas mediante enlaces que dirijan a los soportes, verifique que los enlaces correspondan a correos institucionales, sean públicos y se encuentren actualizados.

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

■ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Página 1 de

Código:
Versión:
Fecha:

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL — **FECHA:** 6/04/2026 — **OBRA:** GRUPO 6. CAPILLA - CONVENTO

INTERVENTOR: IBP INGENIERIA SAS — **CONTRATO No:** 4346-2024 — **PERIODO (desde - hasta):** 1/11/2025 31/01/2026

OBJETO: Realizar las obras de intervención integral de varios inmuebles que hacen parte del Hospital San Juan de Dios de Instituto Materno Infantil, en la ciudad de Bogotá D.C.declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, de acuerdo con lo establecido para cada Grupo — **VALOR:** $ 14.732.771.385,00 — **N° ACTA** 2

N°	1. ITEM	2. COD	3. CONDICIONES CONTRACTUALES					4. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		5. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		6. ACTUALIZADAS (31/01/2026)			7. OBRA EJECUTADA ACTA 2			8. ACUMULADO			9. PENDIENTE POR EJECUTAR		
			DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL			CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
			ETAPA 1																				
		1	**PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE**				$ 112.499.668,00		$ 118.770.499,00		$ 118.770.499,00		$ 118.770.499,00	$ -		$ -	0,00%		$ 118.770.499,00	100,00%		$ -	0,00%
01.01	01.01.01	APR001	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	M2	$ 48.561,00	2.122,99	$ 103.094.368,00	2252,12	$ 109.365.199,00	2252,12	$ 109.365.199,00	2252,12	$ 109.365.199,00	$ -		$ -	0,00%	2.252,12	$ 109.365.199,00	100,00%	-	$ -	0,00%
01.02	01.01.02	APR004	VERIFICACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL INMUEBLE	UND	$ 9.405.300,00	1,00	$ 9.405.300,00	1,00	$ 9.405.300,00	1,00	$ 9.405.300,00	1,00	$ 9.405.300,00	$ -		$ -	0,00%	1,00	$ 9.405.300,00	100,00%	-	$ -	0,00%
			ETAPA 2																				
		2	**PRELIMINARES ETAPA 1**				$ 324.042.413,00		$ 616.701.587,00		$ 618.116.877,00		$ 620.668.075,00	$ 2.551.198,00		$ -	0,00%		$ 620.668.075,00	100,00%		$ -	0,00%
02.01	24.01.01	BIM005	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y MODELADORES (15%, QUINCE PORCIENTO PARA ESTE COMPONENTE)	UND	$ 693.676.269,00	0,15	$ 104.051.440,00	0,15	$ 104.051.440,00	0,15	$ 104.051.440,00	0,15	$ 104.051.440,00	$ -		$ -	0,00%	0,15	$ 104.051.440,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.02		**NP001**	EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA Y ESTUDIO DE SUELOS COMPLEMENTARIO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO CAPILLA Y CONVENTO (INCLUYE PERFORACIONES Y LABORATORIOS).	GL	$ 32.000.000,00		$ -	1,00	$ 32.000.000,00	1,00	$ 32.000.000,00	1,00	$ 32.000.000,00	$ -		$ -	0,00%	1,00	$ 32.000.000,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.03		**NP002**	RETIRO DE PAÑETES PATRIMONIALES CON HERRAMIENTAS MANUALES, INCLUYE DISPOSICION FINAL	m2	$ 50.680,00		$ -	1292,88	$ 65.523.158,00	1292,88	$ 65.523.158,00	1292,88	$ 65.523.158,00	$ -		$ -	0,00%	1.292,88	$ 65.523.158,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.04	02.01.20	PRE021	PROTECCIÓN DE ÁRBOLES EN EL PERIMETRO DE LA INTERVENCIÓN. H=1 M.	UND	$ 24.518,00	8,00	$ 196.144,00	29,00	$ 711.022,00	29,00	$ 711.022,00	29,00	$ 711.022,00	$ -		$ -	0,00%	29,00	$ 711.022,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.05	02.01.04	PRE004	VALLA INFORMATIVA EN LONA DE 2,50X1,5M. IMPRESA FULL COLOR. ESTRUCTURA EN MADERA. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN, INCLUYE DESMOTE Y RETIRO A LA TERMINACION DE LA OBRA)	UND	$ 582.920,00	1,00	$ 582.920,00	1,00	$ 582.920,00	1,00	$ 582.920,00	1,00	$ 582.920,00	$ -		$ -	0,00%	1,00	$ 582.920,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.06	02.01.09	PRE009	CONTROL DE ACCESO PROVISIONAL DE OBRA. CASETA DE CELADURÍA.	UND	$ 3.322.955,00	1,00	$ 3.322.955,00	1,00	$ 3.322.955,00	1,00	$ 3.322.955,00	1,00	$ 3.322.955,00	$ -		$ -	0,00%	1,00	$ 3.322.955,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.07	02.01.10	PRE010	ASEO INICIAL. RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	$ 5.050,00	5.650,88	$ 28.536.944,00	5115,36	$ 25.832.568,00	5115,36	$ 25.832.568,00	5115,36	$ 25.832.568,00	$ -		$ -	0,00%	5.115,36	$ 25.832.568,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.08	02.01.11	PRE011	FUMIGACIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO CON HERBICIDA. INCLUYE RETIRO DE MALEZA EN LAS FACHADAS	M2	$ 1.759,00	5.650,88	$ 9.939.898,00	5115,36	$ 8.997.918,00	5115,36	$ 8.997.918,00	5115,36	$ 8.997.918,00	$ -		$ -	0,00%	5.115,36	$ 8.997.918,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.09	02.01.23	PRE025	DISEÑO ESTRUCTURAL SOBRE CUBIERTA TEMPORAL.	M2	$ 2.808,00	2.064,70	$ 5.797.678,00	2612,45	$ 7.335.760,00	2612,45	$ 7.335.760,00	2612,45	$ 7.335.760,00	$ -		$ -	0,00%	2.612,45	$ 7.335.760,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.10	02.01.13	PRE013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE	GLB	$ 4.745.636,00	1,00	$ 4.745.636,00	1,00	$ 4.745.636,00	1,00	$ 4.745.636,00	1,00	$ 4.745.636,00	$ -		$ -	0,00%	1,00	$ 4.745.636,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.11	02.01.16	PRE017	INVENTARIO FORESTAL PARA INDIVIDUOS ARBÓREOS, INCLUYE: ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, PLANOS GEORREFERENCIADOS, CONSIGNACIÓN PAGO POR EVALUACIÓN Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE.	UND	$ 134.459,00	8,00	$ 1.075.672,00	29,00	$ 3.899.311,00	29,00	$ 3.899.311,00	29,00	$ 3.899.311,00	$ -		$ -	0,00%	29,00	$ 3.899.311,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.12	02.01.17	PRE018	TALA DE ÁRBOL <5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	UND	$ 197.115,00	1,00	$ 197.115,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
02.13	02.01.18	PRE019	TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE 1 A 5 METROS. INCLUYE TRANSPORTE	UND	$ 940.530,00	2,00	$ 1.881.060,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
02.14	02.01.02	PRE002	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M	$ 233.653,00	300,51	$ 70.215.063,00	270,33	$ 63.163.415,00	270,33	$ 63.163.415,00	270,33	$ 63.163.415,00	$ -		$ -	0,00%	270,33	$ 63.163.415,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.15	02.01.03	PRE003	CONSTRUCCIÓN CAMPAMENTO DE OBRA. INCLUYE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DESMONTABLE, REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES Y LOS DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO USO Y FUNCIONAMIENTO	M2	$ 244.203,00	80,00	$ 19.536.240,00	80,00	$ 19.536.240,00	80,00	$ 19.536.240,00	80,00	$ 19.536.240,00	$ -		$ -	0,00%	80,00	$ 19.536.240,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.16	02.01.06	PRE006	PUERTA DOBLE HOJA EN LÁMINA TEJA DE ZINC 6,00X2,40 M Y ESTRUCTURA EN MADERA, PARA ACCESO DE OBRA	UND	$ 603.944,00	1,00	$ 603.944,00	2,00	$ 1.207.888,00	2,00	$ 1.207.888,00	2,00	$ 1.207.888,00	$ -		$ -	0,00%	2,00	$ 1.207.888,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.17	02.01.07	PRE007	PUERTA PROVISIONAL DE ACCESO PEATONAL 1,00X2,40M EN LÁMINA TEJA DE ZINC Y ESTRUCTURA EN MADERA	UND	$ 156.783,00	1,00	$ 156.783,00	1,00	$ 156.783,00	1,00	$ 156.783,00	1,00	$ 156.783,00	$ -		$ -	0,00%	1,00	$ 156.783,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.18	02.01.22	PRE024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ALCANTARILLADO	GLB	$ 6.519.411,00	1,00	$ 6.519.411,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
02.19	02.01.14	PRE014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA	GLB	$ 37.066.410,00	1,00	$ 37.066.410,00	1,00	$ 37.066.410,00	1,00	$ 37.066.410,00	1,00	$ 37.066.410,00	$ -		$ -	0,00%	1,00	$ 37.066.410,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.20	03,02,02	DEM002	DEMOLICIÓN DE TODO TIPO DE PAÑETES, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 12.392,00	1.144,58	$ 14.183.635,00	1982,28	$ 24.564.414,00	2096,49	$ 25.979.704,00	2096,49	$ 25.979.704,00	$ -		$ -	0,00%	2.096,49	$ 25.979.704,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.21	03.01.01	DYR001	RETIRO DE PLAFÓN MACHIMBRADO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 21.540,00	247,12	$ 5.322.965,00	1375,88	$ 29.636.455,00	1375,88	$ 29.636.455,00	1494,32	$ 32.187.653,00	$ 2.551.198,00		$ -	0,00%	1.494,32	$ 32.187.653,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.22	03.01.02	DYR003	DESMONTAJE DE ACCESORIOS E INCRUSTACIONES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 3.783,00	50,00	$ 189.150,00	48,00	$ 181.584,00	48,00	$ 181.584,00	48,00	$ 181.584,00	$ -		$ -	0,00%	48,00	$ 181.584,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.23	03.01.03	DYR004	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 21.231,00	34,00	$ 721.854,00	48,00	$ 1.019.088,00	48,00	$ 1.019.088,00	48,00	$ 1.019.088,00	$ -		$ -	0,00%	48,00	$ 1.019.088,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.24	03.01.05	DYR013	DESMONTAJE DE DIVISIONES DE BAÑOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 4.455,00	27,99	$ 124.695,00	28,45	$ 126.745,00	28,45	$ 126.745,00	28,45	$ 126.745,00	$ -		$ -	0,00%	28,45	$ 126.745,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.25	03.01.09	DYR026	DESMONTAJE DE TANQUE AÉREO PLÁSTICO DE 1000 LT EN CUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 45.227,00	2,00	$ 90.454,00	2,00	$ 90.454,00	2,00	$ 90.454,00	2,00	$ 90.454,00	$ -		$ -	0,00%	2,00	$ 90.454,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.26	03.01.18	DYR048	RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 6.571,00	15,00	$ 98.565,00	29,00	$ 190.559,00	29,00	$ 190.559,00	29,00	$ 190.559,00	$ -		$ -	0,00%	29,00	$ 190.559,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.27	03.01.19	DYR056	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M	$ 17.598,00	7,20	$ 126.706,00	13,20	$ 232.294,00	13,20	$ 232.294,00	13,20	$ 232.294,00	$ -		$ -	0,00%	13,20	$ 232.294,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.28	03,02,03	DEM008	DEMOLICIÓN ESCALERA EN MADERA, INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMÁS ELEMENTOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 28.646,00	13,38	$ 383.226,00	13,09	$ 374.976,00	13,09	$ 374.976,00	13,09	$ 374.976,00	$ -		$ -	0,00%	13,09	$ 374.976,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.29	02.01.24	PRE026	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M	$ 279.195,00	30,00	$ 8.375.850,00	58,23	$ 16.257.525,00	58,23	$ 16.257.525,00	58,23	$ 16.257.525,00	$ -		$ -	0,00%	58,23	$ 16.257.525,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.30		**NP003**	RETIRO, PROTECCION Y TRASCIEGO INTERNO DE SILLAS DE CAPILLA	UND	$ 101.875,00		$ -	49,00	$ 4.991.875,00	49,00	$ 4.991.875,00	49,00	$ 4.991.875,00	$ -		$ -	0,00%	49,00	$ 4.991.875,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.31		**NP004**	RETIRO Y TRASCIEGO INTERNO DE GUACALES	UND	$ 366.494,00		$ -	40,00	$ 14.659.760,00	40,00	$ 14.659.760,00	40,00	$ 14.659.760,00	$ -		$ -	0,00%	40,00	$ 14.659.760,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.32		**NP005**	DEMOLICION DE GUARDAESCOBA EN GRAVILLA Y/O MADERA Y/O CERAMICA	ml	$ 25.715,00		$ -	776,97	$ 19.979.784,00	776,97	$ 19.979.784,00	776,97	$ 19.979.784,00	$ -		$ -	0,00%	776,97	$ 19.979.784,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.33		**NP006**	LEVANTAMIENTO MANUAL DE PISOS PATRIMONIALES (BALDOSA HIDRAULICA, PIEDRA, MOSAICO) INCLUYE PROTECCION Y ACOPIO PROVISIONAL	M2	$ 158.443,00		$ -	604,80	$ 95.826.326,00	604,80	$ 95.826.326,00	604,80	$ 95.826.326,00	$ -		$ -	0,00%	604,80	$ 95.826.326,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.34		**NP007**	MEJORAMIENTO DE VÍA EN RECEBO COMPACTADO, ESTABILIZADO CON CEMENTO CAPA DE 7CM DE ESPESOR.	M2	$ 88.416,00		$ -	344,24	$ 30.436.324,00	344,24	$ 30.436.324,00	344,24	$ 30.436.324,00	$ -		$ -	0,00%	344,24	$ 30.436.324,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		3	**PRELIMINARES ETAPA 2**				$ 95.763.454,00		$ 280.734.761,00		$ 250.637.801,00		$ 198.397.856,00	-$ 52.239.945,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 198.397.856,00	100,00%
03.01	02.01.21	PRE022	DESINFECCIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO POR MEDIO DE AGUA, JABÓN NEUTRO, ÁCIDO MURIÁTICO Y/O ÁCIDO OXÁLICO	M2	$ 4.007,00	5.650,88	$ 22.643.076,00	2252,12	$ 9.024.245,00	2252,12	$ 9.024.245,00	2252,12	$ 9.024.245,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2.252,12	$ 9.024.245,00	100,00%
03.02	02.01.08	PRE008	CÁRCAMO LAVA LLANTAS ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO CON SECCIÓN EXTERNA DE 60X60CM Y SECCIÓN INTERNA 30X50CM. INCLUYE FORMALETA, REJILLA METÁLICA Y REFUERZO	M	$ 847.032,00	10,00	$ 8.470.320,00	10,00	$ 8.470.320,00	10,00	$ 8.470.320,00	0,00	$ -	-$ 8.470.320,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
03.03	02.01.25	PRE027	MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS SUBTERRANEAS Y/O NIVEL FREÁTICO	M	$ 648.010,00	37,00	$ 23.976.370,00	60,00	$ 38.880.600,00	60,00	$ 38.880.600,00	20,00	$ 12.960.200,00	-$ 25.920.400,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,00	$ 12.960.200,00	100,00%
03.04	02.01.26	PRE028	PROTECCIÓN Y/O REFUERZOS ESTRUCTURALES PROVISIONALES DEL ÓRGANO Y ARMÓNIOS PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA	GLB	$ 30.096.960,00	1,00	$ 30.096.960,00	1,00	$ 30.096.960,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
03.05		**NP008**	DEMOLICION DE ALFAJIAS EN CONCRETO ALTURA NO MAYOR A 6METROS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	ml	$ 80.784,00		$ -	441,90	$ 35.698.450,00	441,90	$ 35.698.450,00	220,95	$ 17.849.225,00	-$ 17.849.225,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	220,95	$ 17.849.225,00	100,00%
03.06		**NP009**	DESMONTAJE DE CAMPANA PEQUEÑA UBICADA EN CUBIERTA DE TORRE CAMPANARIO (ALTURA 18 m). INCLUYE LIMPIEZA, RETIRO, EMBALAJE Y TRASLADO A SITIO DE ALMACENAMIENTO AUTORIZADO POR EL CLIENTE.	und	$ 1.331.414,00		$ -	2,00	$ 2.662.828,00	2,00	$ 2.662.828,00	2,00	$ 2.662.828,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 2.662.828,00	100,00%
03.07		**NP010**	TALA Y ESTACONAMIENTO DE INDIVIDUO ARBOREO H= 15M A 20M INCLUYE RETIRO	UND	$ 6.426.000,00		$ -	3,00	$ 19.278.000,00	3,00	$ 19.278.000,00	3,00	$ 19.278.000,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 19.278.000,00	100,00%
03.08		**NP011**	DESMONTAJE, DOCUMENTACIÓN Y ACCIONES DE CONSERVACIÓN DEL ÓRGANO TUBULAR UBICADO EN LA CAPILLA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	UN	$ 126.046.630,00		$ -	1,00	$ 126.046.630,00	1,00	$ 126.046.630,00	1,00	$ 126.046.630,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 126.046.630,00	100,00%
03.09	02.01.05	PRE005	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES (6 MESES PARA ESTE COMPONENTE)	MES	$ 1.762.788,00	6,00	$ 10.576.728,00	6,00	$ 10.576.728,00	6,00	$ 10.576.728,00	6,00	$ 10.576.728,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 10.576.728,00	100,00%
		4	**PRELIMINARES BIENES MUEBLES**				$ 582.456.424,00		$ 701.736.277,00		$ 658.991.436,00		$ 679.203.549,00	$ 20.212.113,00		$ 677.052.111,00	99,68%		$ 679.203.549,00	100,00%		$ -	0,00%
04.01	20.01.01	RBMCC001	ADECUACIÓN DE TALLER PARA PROCESOS DE RESTAURACIÓN	M2	$ 278.284,00	60,00	$ 16.697.040,00	60,00	$ 16.697.040,00	60,00	$ 16.697.040,00	60,00	$ 16.697.040,00	$ -	60,00	$ 16.697.040,00	100,00%	60,00	$ 16.697.040,00	100,00%	-	$ -	0,00%
04.02	20.01.02	RBMCC002	DESMONTE Y TRASLADO DE PANELES DE VITRAL AL TALLER, INCLUYE CAJA DE ALMACENAMIENTO	UND	$ 110.626,00	292,00	$ 32.302.792,00	304,00	$ 33.630.304,00	304,00	$ 33.630.304,00	304,00	$ 33.630.304,00	$ -	304,00	$ 33.630.304,00	100,00%	304,00	$ 33.630.304,00	100,00%	-	$ -	0,00%
04.03	20.06.01	RBMCC044	DESMONTE DE LA LAMPARA DE PARED DEL LUGAR DE UBICACIÓN	UND	$ 179.636,00	14,00	$ 2.514.904,00	14,00	$ 2.514.904,00	14,00	$ 2.514.904,00	14,00	$ 2.514.904,00	$ -	14,00	$ 2.514.904,00	100,00%	14,00	$ 2.514.904,00	100,00%	-	$ -	0,00%
04.04	20.05.02	PRO001	EMBALAJE RÍGIDO PARA PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES	UND	$ 173.532,00	14,00	$ 2.429.448,00	14,00	$ 2.429.448,00	14,00	$ 2.602.980,00	15,00	$ 2.602.980,00	$ 173.532,00	15,00	$ 2.602.980,00	100,00%	15,00	$ 2.602.980,00	100,00%	-	$ -	0,00%
04.05	20.06.03	RBMCC045	REGISTRO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA	UND	$ 190.367,00	14,00	$ 2.665.138,00	14,00	$ 2.665.138,00	14,00	$ 2.665.138,00	14,00	$ 2.665.138,00	$ -	14,00	$ 2.665.138,00	100,00%	14,00	$ 2.665.138,00	100,00%	-	$ -	0,00%
04.06	20.05.01	RBMCC033	DESMONTE DE LA LAMPARA DEL LUGAR DE UBICACIÓN	UND	$ 510.309,00	1,00	$ 510.309,00	1,00	$ 510.309,00	1,00	$ 510.309,00	1,00	$ 510.309,00	$ -	1,00	$ 510.309,00	100,00%	1,00	$ 510.309,00	100,00%	-	$ -	0,00%
04.07	20.05.02	PRO001	EMBALAJE RÍGIDO PARA PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES	UND	$ 173.532,00	1,00	$ 173.532,00	1,00	$ 173.532,00	1,00	$ 173.532,00	-	$ -	$ 173.532,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
04.08	20.05.03	RBMCC034	REGISTRO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LÁMPARA EN TECHO DE CAPILLA	UND	$ 285.550,00	1,00	$ 285.550,00	1,00	$ 285.550,00	1,00	$ 285.550,00	1,00	$ 285.550,00	$ -	1,00	$ 285.550,00	100,00%	1,00	$ 285.550,00	100,00%	-	$ -	0,00%
04.09		**NP012**	RETIRO, PROTECCION Y TRASCIEGO INTERNO DE MUEBLES LITURGICOS ENTRE EL EDIFICIO CAPILLA CONVENTO Y EL EDIFICIO UVO REQUIERE DESARMADO EN SITIO MEDIDAS (3MX1,2MX1,2M)	UND	$ 443.296,00		$ -	3,00	$ 1.329.888,00	3,00	$ 1.329.888,00	9,00	$ 3.989.664,00	$ 2.659.776,00	9,00	$ 3.989.664,00	100,00%	9,00	$ 3.989.664,00	100,00%	-	$ -	0,00%

04.10	02.01.15	PRE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES.	M2	$	254.215,00	2.064,70	$	524.877.711,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
04.11		**NP013**	REPARACIONES LOCATIVAS PARA ADECUACION DE SALON DE ALMACENAMIENTO DE BIENES MUEBLES EN EDIFICIO UVO	UN	$	401.363,00		$	-	1,00	$ 401.363,00	1,00	$ 401.363,00	1,00	$ 401.363,00	$ -	1,00	$ 401.363,00	100,00%	1,00	$ 401.363,00	100,00%	-	$ -	0,00%
04.12		**NP014**	RETIRO, CONSERVACIÓN Y EMBALAJE DE HERRAJES ORIGINALES DE PUERTAS Y VENTANAS	un	$	21.110,00		$	-	126,00	$ 2.659.860,00	126,00	$ 2.659.860,00	88,00	$ 1.857.680,00	-$ 802.180,00	88,00	$ 1.857.680,00	100,00%	88,00	$ 1.857.680,00	100,00%	-	$ -	0,00%
04.13		**NP015**	PROTECCIÓN PARA CERRAMIENTO DE VENTANAS Y PUERTAS PERIMETRALES. Y VITRALES	M2	$	37.585,00		$	-	210,00	$ 7.892.850,00	210,00	$ 7.892.850,00	57,26	$ 2.152.117,00	-$ 5.740.733,00	57,26	$ 679,00	0,03%	57,26	$ 2.152.117,00	100,00%	-	$ -	0,00%
04.14		**NP016**	RETIRO MANUAL DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADAS EN BÓVEDAS Y MOLDURAS (ALTURA MAYOR A 15MT)	UN	$	116.490,00		$	-	366,94	$ 42.744.841,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
04.15		**NP017**	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRECUBIERTA EN ESTRUCTURA EN GUADUA Y TEJA DE ZINC CAL 35	m2	$	225.000,00		$	-	2612,45	$ 587.801.250,00	2612,45	$ 587.801.250,00	2719,54	$ 611.896.500,00	$ 24.095.250,00	2.719,54	$ 611.896.500,00	100,00%	2.719,54	$ 611.896.500,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		5	**DESMONTES Y RETIROS**					$	174.617.793,00		**$ 239.935.912,00**		**$ 239.935.912,00**		**$ 239.935.912,00**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ 239.935.912,00**	**100,00%**		**$ -**	**0,00%**
05.01	24.01.01	BIM005	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES (15%, QUINCE PORCIENTO PARA ESTE COMPONENTE)	UND	$	693.676.269,00	0,15	$	104.051.440,00	0,15	$ 104.051.440,00	0,15	$ 104.051.440,00	0,15	$ 104.051.440,00	$ -	0,15	$ -	0,00%	0,15	$ 104.051.440,00	100,00%	-	$ -	0,00%
05.02		**NP018**	DESMONTE Y DISPOSICION FINAL DE VIGAS EN MADERA DE ENTREPISO	ml	$	42.836,00		$	-	694,86	$ 29.765.023,00	694,86	$ 29.765.023,00	694,86	$ 29.765.023,00	$ -	-	$ -	0,00%	694,86	$ 29.765.023,00	100,00%	-	$ -	0,00%
05.03	03.01.04	DYR012	DESMONTAJE TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CIELO RASO EXISTENTE (OTROS MATERIALES). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	14.293,00	668,87	$	9.560.159,00	438,21	$ 6.263.336,00	438,21	$ 6.263.336,00	438,21	$ 6.263.336,00	$ -	438,21	$ -	0,00%	438,21	$ 6.263.336,00	100,00%	-	$ -	0,00%
05.04	03.01.06	DYR021	DESMONTAJE DE RED ELÉCTRICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO PUNTO ELÉCTRICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	6.460,00	325,52	$	2.102.859,00	1564,96	$ 10.109.642,00	1564,96	$ 10.109.642,00	1564,96	$ 10.109.642,00	$ -	1564,96	$ -	0,00%	1.564,96	$ 10.109.642,00	100,00%	-	$ -	0,00%
05.05	03.01.07	DYR022	DESMONTAJE DE RED HIDRÁULICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO HIDRÁULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	7.754,00	325,52	$	2.524.082,00	233,37	$ 1.809.551,00	233,37	$ 1.809.551,00	233,37	$ 1.809.551,00	$ -	233,37	$ -	0,00%	233,37	$ 1.809.551,00	100,00%	-	$ -	0,00%
05.06	03.01.08	DYR023	DESMONTAJE DE RED SANITARIA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO SANITARIO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	9.394,00	325,52	$	3.057.935,00	157,31	$ 1.477.770,00	157,31	$ 1.477.770,00	157,31	$ 1.477.770,00	$ -	157,31	$ -	0,00%	157,31	$ 1.477.770,00	100,00%	-	$ -	0,00%
05.07	03.01.13	DYR036	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPNTERÍA DE PUERTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$	67.771,00	47,00	$	3.185.237,00	84,00	$ 5.692.764,00	84,00	$ 5.692.764,00	84,00	$ 5.692.764,00	$ -	84,00	$ -	0,00%	84,00	$ 5.692.764,00	100,00%	-	$ -	0,00%
05.08	03.01.14	DYR037	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPNTERÍA DE VENTANAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$	60.106,00	41,00	$	2.464.346,00	121,00	$ 7.272.826,00	121,00	$ 7.272.826,00	121,00	$ 7.272.826,00	$ -	121,00	$ -	0,00%	121,00	$ 7.272.826,00	100,00%	-	$ -	0,00%
05.09	03.01.15	DYR039	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO BALDOSA EN CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	12.497,00	286,38	$	3.578.891,00	1013,26	$ 12.662.710,00	1013,26	$ 12.662.710,00	1013,26	$ 12.662.710,00	$ -	1013,26	$ -	0,00%	1.013,26	$ 12.662.710,00	100,00%	-	$ -	0,00%
05.10	03.01.16	DYR040	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO EN MADERA DE 3CM. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	22.277,00	506,63	$	11.286.197,00	572,14	$ 12.745.563,00	572,14	$ 12.745.563,00	572,14	$ 12.745.563,00	$ -	572,14	$ -	0,00%	572,14	$ 12.745.563,00	100,00%	-	$ -	0,00%
05.11	03.01.17	DYR044	DESMONTE ZÓCALO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	11.139,00	1,00	$	11.139,00	257,63	$ 2.869.741,00	257,63	$ 2.869.741,00	257,63	$ 2.869.741,00	$ -	257,63	$ -	0,00%	257,63	$ 2.869.741,00	100,00%	-	$ -	0,00%
05.12		**NP019**	DEMOLICION MANUAL DE ESCALERAS EN CONCRETO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION	M2	$	39.740,00		$	-	19,02	$ 755.855,00	19,02	$ 755.855,00	19,02	$ 755.855,00	$ -	-	$ -	0,00%	19,02	$ 755.855,00	100,00%	-	$ -	0,00%
05.13	03.02.04	DEM013	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE HMAX=0.18 METROS - DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	31.036,00	1.056,69	$	32.795.508,00	1432,52	$ 44.459.691,00	1432,52	$ 44.459.691,00	1432,52	$ 44.459.691,00	$ -	1432,52	$ -	0,00%	1.432,52	$ 44.459.691,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		6	**EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, LLENOS Y RETIROS – CONVENTO**					**$**	**179.496.080,00**		**$ 672.787.773,00**		**$ 672.787.773,00**		**$ 566.041.053,00**	**-$ 106.746.720,00**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 566.041.053,00**	**100,00%**
06.01	02.02.01	APT001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMIENTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	$	14.112,00	106,31	$	1.500.287,00	882,05	$ 12.447.490,00	882,05	$ 12.447.490,00	882,05	$ 12.447.490,00	$ -	882,05	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	882,05	$ 12.447.490,00	100,00%
06.02	02.02.02	APT002	ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO	TORRE - MES	$	3.822.841,00	15,00	$	57.342.615,00	31,67	$ 121.069.374,00	31,67	$ 121.069.374,00	31,67	$ 121.069.374,00	$ -	31,67	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	31,67	$ 121.069.374,00	100,00%
06.03	03,02,05	DEM022	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	$	205.284,00	6,87	$	1.409.275,00	6,87	$ 1.410.301,00	6,87	$ 1.410.301,00	13,74	$ 2.820.602,00	$ 1.410.301,00	13,74	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	13,74	$ 2.820.602,00	100,00%
06.04	03,02,06	DEM026	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA EMAX=20CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	18.768,00	338,62	$	6.355.126,00	635,63	$ 11.929.504,00	635,63	$ 11.929.504,00	587,58	$ 11.027.701,00	-$ 901.803,00	587,58	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	587,58	$ 11.027.701,00	100,00%
06.05	03,02,07	DEM028	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	54.590,00	92,12	$	5.028.558,00	142,95	$ 7.803.641,00	142,95	$ 7.803.641,00	56,55	$ 3.087.065,00	-$ 4.716.576,00	56,55	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	56,55	$ 3.087.065,00	100,00%
06.06	04.03.02	MOV001	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	$	91.345,00	642,88	$	58.723.417,00	1419,36	$ 129.650.982,00	1419,36	$ 129.650.982,00	1135,48	$ 103.720.421,00	-$ 25.930.561,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.135,48	$ 103.720.421,00	100,00%
06.07		**NP020**	EXCAVACION PARA TANQUE MAYOR A 3M	m3	$	49.430,00		$	-	180,00	$ 8.897.400,00	180,00	$ 8.897.400,00	-	$ -	-$ 8.897.400,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
06.08	04,01,01	MT01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$	28.933,00	135,00	$	3.905.955,00	157,67	$ 4.561.866,00	157,67	$ 4.561.866,00	1040,55	$ 30.106.233,00	$ 25.544.367,00	1040,55	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.040,55	$ 30.106.233,00	100,00%
06.09	04,01,02	MT02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$	31.648,00	507,88	$	16.073.228,00	1300,69	$ 41.164.237,00	1300,69	$ 41.164.237,00	157,00	$ 4.968.736,00	-$ 36.195.501,00	157,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	157,00	$ 4.968.736,00	100,00%
06.10	04,02,01	MT03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM., ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	$	54.601,00	347,73	$	18.986.406,00	491,51	$ 26.836.828,00	491,51	$ 26.836.828,00	491,50	$ 26.836.392,00	-$ 436,00	491,50	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	491,50	$ 26.836.392,00	100,00%
06.11	04,02,03	MT08	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	$	217.449,00	16,87	$	3.668.365,00	1146,85	$ 249.381.821,00	1146,85	$ 249.381.821,00	884,46	$ 192.324.943,00	-$ 57.056.878,00	884,46	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	884,46	$ 192.324.943,00	100,00%
06.12	04,03,01	MT06	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$	40.606,00	160,15	$	6.502.848,00	1419,36	$ 57.634.329,00	1419,36	$ 57.634.329,00	1419,30	$ 57.632.096,00	-$ 2.233,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.419,30	$ 57.632.096,00	100,00%
		7	**EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, LLENOS Y RETIROS – CAPILLA**					**$**	**179.496.080,00**		**$ 522.952.219,00**		**$ 522.952.219,00**		**$ 468.207.711,00**	**-$ 54.744.508,00**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 468.207.711,00**	**100,00%**
07.01	02.02.01	APT001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMIENTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	$	14.112,00	106,31	$	1.500.287,00	882,05	$ 12.447.490,00	882,05	$ 12.447.490,00	882,05	$ 12.447.490,00	$ -	882,05	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	882,05	$ 12.447.490,00	100,00%
07.02	02.02.02	APT002	ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO	TORRE - MES	$	3.822.841,00	15,00	$	57.342.615,00	31,67	$ 121.069.374,00	31,67	$ 121.069.374,00	31,67	$ 121.069.374,00	$ -	31,67	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	31,67	$ 121.069.374,00	100,00%
07.03	03,02,05	DEM022	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	$	205.284,00	6,87	$	1.409.275,00	6,87	$ 1.410.301,00	6,87	$ 1.410.301,00	6,87	$ 1.410.301,00	$ -	6,87	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,87	$ 1.410.301,00	100,00%
07.04	03,02,06	DEM026	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA EMAX=20CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	18.768,00	338,62	$	6.355.126,00	73,16	$ 1.373.067,00	73,16	$ 1.373.067,00	98,40	$ 1.846.771,00	$ 473.704,00	98,40	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	98,40	$ 1.846.771,00	100,00%
07.05	03,02,07	DEM028	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	54.590,00	92,12	$	5.028.558,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
07.06	04.03.02	MOV001	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	$	91.345,00	642,88	$	58.723.417,00	642,88	$ 58.723.874,00	642,88	$ 58.723.874,00	514,30	$ 46.978.734,00	-$ 11.745.140,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	514,30	$ 46.978.734,00	100,00%
07.07	04,01,01	MT01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$	28.933,00	135,00	$	3.905.955,00	135,00	$ 3.905.955,00	135,00	$ 3.905.955,00	1040,55	$ 30.106.233,00	$ 26.200.278,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.040,55	$ 30.106.233,00	100,00%
07.08	04,01,02	MT02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$	31.648,00	507,88	$	16.073.228,00	1300,69	$ 41.164.237,00	1300,69	$ 41.164.237,00	135,00	$ 4.272.480,00	-$ 36.891.757,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	135,00	$ 4.272.480,00	100,00%
07.09	04,02,01	MT03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM., ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	$	54.601,00	347,73	$	18.986.406,00	430,71	$ 23.517.033,00	430,71	$ 23.517.033,00	430,70	$ 23.516.651,00	-$ 382,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	430,70	$ 23.516.651,00	100,00%
07.10	04,02,03	MT08	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	$	217.449,00	16,87	$	3.668.365,00	1004,98	$ 218.532.548,00	1004,98	$ 218.532.548,00	854,23	$ 185.751.459,00	-$ 32.781.089,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	854,23	$ 185.751.459,00	100,00%
07.11	04,03,01	MT06	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$	40.606,00	160,15	$	6.502.848,00	1004,98	$ 40.808.340,00	1004,98	$ 40.808.340,00	1004,98	$ 40.808.218,00	-$ 122,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.004,98	$ 40.808.218,00	100,00%
		8	**CIMENTACIÓN - CONVENTO**					**$**	**547.844.362,00**		**$ 592.217.351,00**		**$ 592.217.351,00**		**$ 561.868.108,00**	**-$ 30.349.243,00**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 561.868.108,00**	**100,00%**
08.01	05,01,01	CI01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	$	36.888,00	10,87	$	401.102,00	389,46	$ 14.366.400,00	389,46	$ 14.366.400,00	-	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	389,46	$ 14.366.400,00	100,00%
08.02	05,01,02	CI03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$	1.349.521,00	21,69	$	29.271.110,00	56,73	$ 76.558.326,00	56,73	$ 76.558.326,00	56,73	$ 76.558.326,00	$ -	56,73	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	56,73	$ 76.558.326,00	100,00%
08.03	05,01,03	CI04	PILOTES PREEXCAVADOS EN CONCRETO Ø 25CM EN CONCRETO 3000PSI (F'C=21MPA) GRAVILLA FINA, PREMEZCLADO . NO INCLUYE REFUERZO	M	$	173.672,00	90,00	$	15.630.480,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
08.04	05,01,04	CI05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$	1.020.341,00	77,36	$	78.933.580,00	77,36	$ 78.933.580,00	77,36	$ 78.933.580,00	77,36	$ 78.933.580,00	$ -	77,36	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	77,36	$ 78.933.580,00	100,00%
08.05	04,02,02	MT04	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	M3	$	175.500,00	172,93	$	30.348.338,00	172,93	$ 30.349.215,00	0,00	$ -	-$ 30.349.215,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
08.06	05,01,05	CI06	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	$	384.275,00	593,79	$	228.176.731,00	841,91	$ 323.524.965,00	841,91	$ 323.524.965,00	841,91	$ -	$ -	841,91	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	841,91	$ 323.524.965,00	100,00%
08.07	05,01,06	CI08	CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).	M	$	19.485,00	197,95	$	3.856.958,00	197,95	$ 3.857.056,00	197,95	$ 3.857.056,00	-	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	197,95	$ 3.857.056,00	100,00%
08.08	05,01,07	CI09	RECONFORMACIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA BAJO TÉCNICA "MURRIADO"	M2	$	57.147,00	15,00	$	857.205,00	15,00	$ 857.205,00	15,00	$ 857.205,00	15,00	$ 857.205,00	$ -	15,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	15,00	$ 857.205,00	100,00%
08.09	02.01.01	PRE001	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS; COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABSCISADO, DETALLES). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	$	7.157,00	2.825,44	$	20.221.674,00	1412,72	$ 10.110.837,00	1412,72	$ 10.110.837,00	1412,72	$ 10.110.837,00	$ -	1412,72	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.412,72	$ 10.110.837,00	100,00%
08.10	05,05,01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$	8.992,00	14.553,43	$	130.864.430,00	3087,03	$ 27.758.574,00	3087,03	$ 27.758.574,00	3087,03	$ 27.758.574,00	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3.087,03	$ 27.758.574,00	100,00%
08.11	05,05,02	A02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	$	8.740,00	1.062,10	$	9.282.754,00	2963,52	$ 25.901.193,00	2963,52	$ 25.901.193,00	2963,52	$ 25.901.165,00	-$ 28,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2.963,52	$ 25.901.165,00	100,00%
		9	**CIMENTACIÓN - CAPILLA**					**$**	**651.895.802,00**		**$ 729.864.109,00**		**$ 729.864.109,00**		**$ 699.514.831,00**	**-$ 30.349.278,00**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 699.514.831,00**	**100,00%**
09.01	24.01.01	BIM005	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES (15%, QUINCE PORCIENTO PARA ESTE COMPONENTE)	UND	$	693.676.269,00	0,15	$	104.051.440,00	0,15	$ 104.051.440,00	0,15	$ 104.051.440,00	0,15	$ 104.051.440,00	$ -	0,15	$ -	0,00%	0,15	$ 104.051.440,00	100,00%	-	$ -	0,00%
09.02	05,01,01	CI01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	$	36.888,00	10,87	$	401.102,00	311,81	$ 11.502.047,00	311,81	$ 11.502.047,00	311,81	$ 11.502.047,00	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	311,81	$ 11.502.047,00	100,00%

09.03	05,01,02	CI03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$	1.349.521,00	21,69	$	29.271.110,00	101,80	$ 137.381.238,00	101,80	$ 137.381.238,00	101,80	$	137.381.238,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	101,80	$	137.381.238,00	100,00%
09.04	05,01,03	CI04	PILOTES PREEXCAVADOS EN CONCRETO Ø 25CM EN CONCRETO 3000PSI (F'C=21MPA) GRAVILLA FINA, PREMEZCLADO . NO INCLUYE REFUERZO	M	$	173.672,00	90,00	$	15.630.480,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$	-	0,00%
09.05	05,01,04	CI05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$	1.020.341,00	77,36	$	78.933.580,00	77,36	$ 78.933.580,00	77,36	$ 78.933.580,00	77,36	$	78.933.580,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	77,36	$	78.933.580,00	100,00%
09.06	04,02,02	MT04	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM .	M3	$	175.500,00	172,93	$	30.348.338,00	172,93	$ 30.349.215,00	172,93	$ 30.349.215,00	0,00	$	-	$ -30.349.215,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$	-	0,00%
09.07	05,01,05	CI06	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	$	384.275,00	593,79	$	228.176.731,00	515,36	$ 198.039.964,00	515,36	$ 198.039.964,00	515,36	$	198.039.964,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	515,36	$	198.039.964,00	100,00%
09.08	05,01,06	CI08	CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).	M	$	19.485,00	197,95	$	3.856.958,00	197,95	$ 3.857.056,00	197,95	$ 3.857.056,00	197,95	$	3.857.056,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	197,95	$	3.857.056,00	100,00%
09.09	05,01,07	CI09	RECONFORMACIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA BAJO TÉCNICA "MURRIADO"	M2	$	57.147,00	15,00	$	857.205,00	15,00	$ 857.205,00	15,00	$ 857.205,00	15,00	$	857.205,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	15,00	$	857.205,00	100,00%
09.10	02.01.01	PRE001	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABSCISADO, DETALLES). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	$	7.157,00	2.825,44	$	20.221.674,00	1412,72	$ 10.110.837,00	1412,72	$ 10.110.837,00	1412,72	$	10.110.837,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.412,72	$	10.110.837,00	100,00%
09.11	05,05,01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$	8.992,00	14.553,43	$	130.864.430,00	15450,02	$ 138.926.580,00	15450,02	$ 138.926.580,00	15450,02	$	138.926.580,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	15.450,02	$	138.926.580,00	100,00%
09.12	05,05,02	A02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	$	8.740,00	1.062,10	$	9.282.754,00	1814,07	$ 15.854.947,00	1814,07	$ 15.854.947,00	1814,06	$	15.854.884,00	$ -63,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.814,06	$	15.854.884,00	100,00%
		10	**COLUMNAS - CONVENTO**					**$**	**267.771.067,00**		**$ 273.444.682,00**		**$ 273.444.682,00**		**$**	**273.444.682,00**	**$ -**	**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$**	**273.444.682,00**	**100,00%**
10.01	05,02,01	CO02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$	1.476.290,00	27,92	$	41.218.017,00	27,92	$ 41.218.017,00	27,92	$ 41.218.017,00	27,92	$	41.218.017,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	27,92	$	41.218.017,00	100,00%
10.02	05,02,02	CO03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 24,5 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$	1.525.592,00	36,30	$	55.371.362,00	37,99	$ 57.957.240,00	37,99	$ 57.957.240,00	37,99	$	57.957.240,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	37,99	$	57.957.240,00	100,00%
10.03	05,02,03	CO04	PANTALLA EN CONCRETO DE F'C=24.5 MPA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$	1.798.272,00	22,42	$	40.317.258,00	24,83	$ 44.651.094,00	24,83	$ 44.651.094,00	24,83	$	44.651.094,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	24,83	$	44.651.094,00	100,00%
10.04	05,05,01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$	8.992,00	14.553,43	$	130.864.430,00	14414,85	$ 129.618.331,00	14414,85	$ 129.618.331,00	14414,85	$	129.618.331,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14.414,85	$	129.618.331,00	100,00%
		11	**COLUMNAS - CAPILLA**					**$**	**267.771.067,00**		**$ 587.509.705,00**		**$ 587.509.705,00**		**$**	**587.509.705,00**	**$ -**	**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$**	**587.509.705,00**	**100,00%**
11.01	05,02,01	CO02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$	1.476.290,00	27,92	$	41.218.017,00	27,92	$ 41.218.017,00	27,92	$ 41.218.017,00	27,92	$	41.218.017,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	27,92	$	41.218.017,00	100,00%
11.02	05,02,02	CO03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 24,5 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$	1.525.592,00	36,30	$	55.371.362,00	37,99	$ 57.957.240,00	37,99	$ 57.957.240,00	37,99	$	57.957.240,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	37,99	$	57.957.240,00	100,00%
11.03	05,02,03	CO04	PANTALLA EN CONCRETO DE F'C=24.5 MPA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$	1.798.272,00	22,42	$	40.317.258,00	24,83	$ 44.651.094,00	24,83	$ 44.651.094,00	24,83	$	44.651.094,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	24,83	$	44.651.094,00	100,00%
11.04	05,05,01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$	8.992,00	14.553,43	$	130.864.430,00	49342,01	$ 443.683.354,00	49342,01	$ 443.683.354,00	49342,01	$	443.683.354,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	49.342,01	$	443.683.354,00	100,00%
		12	**VIGAS Y PLACAS - CONVENTO**					**$**	**280.643.818,00**		**$ 409.293.068,00**		**$ 409.293.068,00**		**$**	**409.293.068,00**	**$ -**	**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$**	**409.293.068,00**	**100,00%**
12.01	02.02.01	APT001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	$	14.112,00	106,31	$	1.500.287,00	882,05	$ 12.447.490,00	882,05	$ 12.447.490,00	882,05	$	12.447.490,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	882,05	$	12.447.490,00	100,00%
12.02	02.02.02	APT002	ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO	TORRE - MES	$	3.822.841,00	15,00	$	57.342.615,00	31,67	$ 121.069.374,00	31,67	$ 121.069.374,00	31,67	$	121.069.374,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	31,67	$	121.069.374,00	100,00%
12.03	05,03,01	CVP01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$	1.504.239,00	31,23	$	46.969.863,00	31,23	$ 46.977.384,00	31,23	$ 46.977.384,00	31,23	$	46.977.384,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	31,23	$	46.977.384,00	100,00%
12.04	05,03,02	CVP02	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$	1.510.434,00	20,69	$	31.250.879,00	20,69	$ 31.250.879,00	20,69	$ 31.250.879,00	20,69	$	31.250.879,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,69	$	31.250.879,00	100,00%
12.05	05,03,03	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0.10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	$	14.530,00	187,50	$	2.724.375,00	187,50	$ 2.724.375,00	187,50	$ 2.724.375,00	187,50	$	2.724.375,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	187,50	$	2.724.375,00	100,00%
12.06	05,03,04	CVP10	PLACA MACIZA ENTREPISO MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	$	141.723,00	5,00	$	708.615,00	5,00	$ 708.615,00	5,00	$ 708.615,00	5,00	$	708.615,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,00	$	708.615,00	100,00%
12.07	05,05,01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$	8.992,00	14.553,43	$	130.864.430,00	21570,41	$ 193.961.127,00	21570,41	$ 193.961.127,00	21570,41	$	193.961.127,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	21.570,41	$	193.961.127,00	100,00%
12.08	05,05,02	A02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	$	8.740,00	1.062,10	$	9.282.754,00	17,60	$ 153.824,00	17,60	$ 153.824,00	17,60	$	153.824,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	17,60	$	153.824,00	100,00%
		13	**VIGAS Y PLACAS - CAPILLA**					**$**	**280.643.818,00**		**$ 414.856.778,00**		**$ 414.856.778,00**		**$**	**414.856.778,00**	**$ -**	**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$**	**414.856.778,00**	**100,00%**
13.01	02.02.01	APT001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	$	14.112,00	106,31	$	1.500.287,00	882,05	$ 12.447.490,00	882,05	$ 12.447.490,00	882,05	$	12.447.490,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	882,05	$	12.447.490,00	100,00%
13.02	02.02.02	APT002	ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO	TORRE - MES	$	3.822.841,00	15,00	$	57.342.615,00	31,67	$ 121.069.374,00	31,67	$ 121.069.374,00	31,67	$	121.069.374,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	31,67	$	121.069.374,00	100,00%
13.03	05,03,01	CVP01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$	1.504.239,00	31,23	$	46.969.863,00	31,23	$ 46.977.384,00	31,23	$ 46.977.384,00	31,23	$	46.977.384,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	31,23	$	46.977.384,00	100,00%
13.04	05,03,02	CVP02	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$	1.510.434,00	20,69	$	31.250.879,00	20,69	$ 31.250.879,00	20,69	$ 31.250.879,00	20,69	$	31.250.879,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,69	$	31.250.879,00	100,00%
13.05	05,03,03	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0.10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	$	14.530,00	187,50	$	2.724.375,00	187,50	$ 2.724.375,00	187,50	$ 2.724.375,00	187,50	$	2.724.375,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	187,50	$	2.724.375,00	100,00%
13.06	05,03,04	CVP10	PLACA MACIZA ENTREPISO MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	$	141.723,00	5,00	$	708.615,00	5,00	$ 708.615,00	5,00	$ 708.615,00	5,00	$	708.615,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,00	$	708.615,00	100,00%
13.07	05,05,01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$	8.992,00	14.553,43	$	130.864.430,00	22189,15	$ 199.524.837,00	22189,15	$ 199.524.837,00	22189,15	$	199.524.837,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	22.189,15	$	199.524.837,00	100,00%
13.08	05,05,02	A02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	$	8.740,00	1.062,10	$	9.282.754,00	17,60	$ 153.824,00	17,60	$ 153.824,00	17,60	$	153.824,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	17,60	$	153.824,00	100,00%
		14	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA - CONVENTO**					**$**	**267.300.671,00**		**$ 301.822.941,00**		**$ 301.822.941,00**		**$**	**301.822.864,00**	**-$ 77,00**	**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$**	**301.822.864,00**	**100,00%**
14.01	24.01.01	BIM005	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES (15%, QUINCE PORCIENTO PARA ESTE COMPONENTE)	UND	$	693.676.269,00	0,15	$	104.051.440,00	0,15	$ 104.051.440,00	0,15	$ 104.051.440,00	0,15	$	104.051.440,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,15	$	104.051.440,00	100,00%
14.02	02.02.01	APT001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	$	14.112,00	106,31	$	1.500.287,00	882,05	$ 12.447.490,00	882,05	$ 12.447.490,00	882,05	$	12.447.490,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	882,05	$	12.447.490,00	100,00%
14.03	02.02.02	APT002	ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO	TORRE - MES	$	3.822.841,00	15,00	$	57.342.615,00	31,67	$ 121.069.374,00	31,67	$ 121.069.374,00	31,67	$	121.069.374,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	31,67	$	121.069.374,00	100,00%
14.04	03.01.10	DYR028	DESMONTAJE DE TEJA EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	15.304,00	992,38	$	15.187.307,00	1279,22	$ 19.577.183,00	1279,22	$ 19.577.183,00	1279,22	$	19.577.183,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.279,22	$	19.577.183,00	100,00%
14.05	03.01.11	DYR033	DESMONTAJE Y RETIRO DE LUCARNAS. INCLUYE DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$	6.347,00	216,06	$	1.371.349,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$	-	0,00%
14.06	03.01.12	DYR035	DESMONTAJE, CLASIFICACIÓN Y LIMPIEZA INICIAL DE TEJAS DE BARRO, INCLUYE RETIRO DE MORTERO DE PEGA, TRANSPORTE A SITIO DE ACOPIO Y RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE DE ELEMENTOS DAÑADOS Y/O EN MAL ESTADO Y/O ELEMENTOS RETIRADOS DE LA TEJA	M2	$	28.659,00	992,38	$	28.440.475,00	1279,22	$ 36.661.166,00	1279,22	$ 36.661.166,00	1279,22	$	36.661.166,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.279,22	$	36.661.166,00	100,00%
14.07	07,01,01	RES-MM09	RETIRO MANUAL DE HUELLAS DE ANIMALES, LIMPIEZA CON ACCIÓN MECÁNICA EN SECO, POSTERIOR LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON JABÓN NEUTRO Y AGUA.	M2	$	3.695,00	6,63	$	24.479,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$	-	0,00%
14.08	07,01,02	RES-CU02	RECUPERACIÓN DE TEJA DE BARRO 60% (LAVADO, APLICACIÓN DE HIDRO PROTECCIÓN, ALISTADO PARA INSTALACIÓN)	M2	$	9.584,00	595,43	$	5.706.553,00	511,69	$ 4.904.018,00	511,69	$ 4.904.018,00	511,68	$	4.903.941,00	$ -77,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	511,68	$	4.903.941,00	100,00%
14.09	07,01,03	RES-CU03	TRATAMIENTO RECUPERACIÓN TEJA DE ZINC, PELADO, FIJACIÓN Y APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVO.	M2	$	28.341,00	30,90	$	875.595,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$	-	0,00%
14.10	07,01,04	RES-CU04	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL PERIMETRAL EN MATERIAL GALVANIZADO. (RETIRO DE SUCIEDAD DEPOSITADA EN LA CANAL PERIMETRAL DEL EDIFICIO, REVISIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE, VERIFICACIÓN DE PENDIENTES Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO)	M	$	17.156,00	181,41	$	3.112.184,00	181,41	$ 3.112.270,00	181,41	$ 3.112.270,00	181,41	$	3.112.270,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	181,41	$	3.112.270,00	100,00%
14.11	07,01,05	RES-CU05	RECUPERACIÓN (RETIRO, LAVADO Y ACOPIO DE CUBIERTA) Y RESTAURACIÓN (RETIRO DE ESMALTE Y RESTAURACIÓN DE PUNTOS DE SOLDADURA EN ÁREAS REQUERIDAS) DE TEJA ROMBOIDAL TIPO SHINGLE	M2	$	50.522,00	983,50	$	49.688.387,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$	-	0,00%
		15	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA - CAPILLA**					**$**	**163.249.231,00**		**$ 173.469.956,00**		**$ -**		**$**	**97.644.090,00**	**$ 97.644.090,00**	**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$**	**97.644.090,00**	**100,00%**
15.01	02.02.01	APT001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	$	14.112,00	106,31	$	1.500.287,00	882,05	$ 12.447.490,00	0,00	$ 0,00	106,31	$	1.500.247,00	$ 1.500.247,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	106,31	$	1.500.247,00	100,00%
15.02	02.02.02	APT002	ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO	TORRE - MES	$	3.822.841,00	15,00	$	57.342.615,00	31,67	$ 121.069.374,00	0,00	$ 0,00	16,00	$	61.165.456,00	$ 61.165.456,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	16,00	$	61.165.456,00	100,00%
15.03	03.01.10	DYR028	DESMONTAJE DE TEJA EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	15.304,00	992,38	$	15.187.307,00	705,47	$ 10.796.513,00	0,00	$ 0,00	641,00	$	9.809.864,00	$ 9.809.864,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	641,00	$	9.809.864,00	100,00%
15.04	03.01.11	DYR033	DESMONTAJE Y RETIRO DE LUCARNAS. INCLUYE DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$	6.347,00	216,06	$	1.371.349,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$	-	0,00%
15.05	03.01.12	DYR035	DESMONTAJE, CLASIFICACIÓN Y LIMPIEZA INICIAL DE TEJAS DE BARRO, INCLUYE RETIRO DE MORTERO DE PEGA, TRANSPORTE A SITIO DE ACOPIO Y RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE DE ELEMENTOS DAÑADOS Y/O EN MAL ESTADO Y/O ELEMENTOS RETIRADOS DE LA TEJA	M2	$	28.659,00	992,38	$	28.440.475,00	705,47	$ 20.218.065,00	0,00	$ 0,00	641,00	$	18.370.419,00	$ 18.370.419,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	641,00	$	18.370.419,00	100,00%
15.06	07,01,01	RES-MM09	RETIRO MANUAL DE HUELLAS DE ANIMALES, LIMPIEZA CON ACCIÓN MECÁNICA EN SECO, POSTERIOR LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON JABÓN NEUTRO Y AGUA.	M2	$	3.695,00	6,63	$	24.479,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$	-	0,00%
15.07	07,01,02	RES-CU02	RECUPERACIÓN DE TEJA DE BARRO 60% (LAVADO, APLICACIÓN DE HIDRO PROTECCIÓN, ALISTADO PARA INSTALACIÓN)	M2	$	9.584,00	595,43	$	5.706.553,00	282,19	$ 2.704.490,00		$ 0,00	384,60	$	3.686.006,00	$ 3.686.006,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	384,60	$	3.686.006,00	100,00%
15.08	07,01,03	RES-CU03	TRATAMIENTO RECUPERACIÓN TEJA DE ZINC, PELADO, FIJACIÓN Y APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVO.	M2	$	28.341,00	30,90	$	875.595,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$	-	0,00%
15.09	07,01,04	RES-CU04	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL PERIMETRAL EN MATERIAL GALVANIZADO. (RETIRO DE SUCIEDAD DEPOSITADA EN LA CANAL PERIMETRAL DEL EDIFICIO, REVISIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE, VERIFICACIÓN DE PENDIENTES Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO)	M	$	17.156,00	181,41	$	3.112.184,00	181,41	$ 3.112.270,00		$ 0,00	181,40	$	3.112.098,00	$ 3.112.098,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	181,40	$	3.112.098,00	100,00%
15.10	07,01,05	RES-CU05	RECUPERACIÓN (RETIRO, LAVADO Y ACOPIO DE CUBIERTA) Y RESTAURACIÓN (RETIRO DE ESMALTE Y RESTAURACIÓN DE PUNTOS DE SOLDADURA EN ÁREAS REQUERIDAS) DE TEJA ROMBOIDAL TIPO SHINGLE	M2	$	50.522,00	983,50	$	49.688.387,00	61,79	$ 3.121.754,00		$ 0,00		$	-	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$	-	0,00%
		16	**MADERA CUBIERTA - CONVENTO**					**$**	**292.667.653,00**		**$ 1.878.878.634,00**		**$ 1.808.828.913,00**		**$**	**1.808.826.255,00**	**-$ 2.658,00**	**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$**	**1.808.826.255,00**	**100,00%**

16.01	07,03,01	MAD-02	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 17) X 35. LONGITUD < 3M (CORREA, VIGA, TIRANTE, DIAGONAL, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	2.072.610,00	3,50	$	7.254.135,00	3,00	$	6.217.830,00	3,00	$	6.217.830,00	3,00	$	6.217.830,00	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	3,00	$	6.217.830,00	100,00%
16.02	07,03,02	MAD-03	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 17) X 35. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M (CORREA, VIGA, TIRANTE, DIAGONAL, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	4.545.859,00	3,00	$	13.637.577,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
16.03	07,03,03	MAD-04	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD < 1,5 M (SOLERA, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE. ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	537.734,00	18,00	$	9.679.212,00	144,00	$	77.433.696,00	144,00	$	77.433.696,00	144,00	$	77.433.696,00	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	144,00	$	77.433.696,00	100,00%
16.04	07,03,04	MAD-05	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M (SOBRESOLERA, CUMBRERA, DIAGONAL). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	1.985.049,00	121,50	$	241.183.454,00	380,00	$	754.318.620,00	344,71	$	684.268.899,00	344,71	$	684.266.241,00	-$	2.658,00		$	-	0,00%		$	-	0,00%	344,71	$	684.266.241,00	100,00%
16.05	07,03,05	MAD-06	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 16) X 10. LONGITUD < 3,0 M (CAN, PENDOLÓN, SOBRESOLERA, SOLERA, VIGA DE CIELORRASO). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	878.083,00	20,00	$	17.561.660,00	332,00	$	291.523.556,00	332,00	$	291.523.556,00	332,00	$	291.523.556,00	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	332,00	$	291.523.556,00	100,00%
16.06	07,03,06	MAD-07	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO 16 X 10. LONGITUD 3,0 M A 8,0 M (PAR, TIRANTE, VIGA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	1.599.383,00	0,50	$	799.692,00	185,00	$	295.885.855,00	185,00	$	295.885.855,00	185,00	$	295.885.855,00	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	185,00	$	295.885.855,00	100,00%
16.07	07,03,07	MAD-09	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO (4 A 6) X 10. LONGITUD < 2 M (DIAGONAL, TORNAPUNTA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	462.255,00	3,50	$	1.617.893,00	584,00	$	269.956.920,00	584,00	$	269.956.920,00	584,00	$	269.956.920,00	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	584,00	$	269.956.920,00	100,00%
16.08	07,03,08	MAD-11	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO 7 X 7. LONGITUD 1,5 A 2,5 M (ARRIOSTRE, DIAGONAL, TORNAPUNTA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	458.649,00	0,50	$	229.325,00	182,00	$	83.474.118,00	182,00	$	83.474.118,00	182,00	$	83.474.118,00	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	182,00	$	83.474.118,00	100,00%
16.09	07,03,09	MAD-12	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO 4 X 4. LONGITUD 1,4 A 1,6 M (CORREA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	469.803,00	1,50	$	704.705,00	213,00	$	100.068.039,00	213,00	$	100.068.039,00	213,00	$	100.068.039,00	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	213,00	$	100.068.039,00	100,00%
		17	**MADERA CUBIERTA - CAPILLA**					$	**292.667.653,00**		$	**1.880.749.676,00**		$	-		$	-	$	-		$	-	**0,00%**		$	-	**0,00%**		$	-	**0,00%**
17.01	07,03,01	MAD-02	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 17) X 35. LONGITUD < 3M (CORREA, VIGA, TIRANTE, DIAGONAL, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	2.072.610,00	3,50	$	7.254.135,00	2,00	$	4.145.220,00		$	0,00		$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
17.02	07,03,02	MAD-03	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 17) X 35. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M (CORREA, VIGA, TIRANTE, DIAGONAL, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	4.545.859,00	3,00	$	13.637.577,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
17.03	07,03,03	MAD-04	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD < 1,5 M (SOLERA, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE. ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	537.734,00	18,00	$	9.679.212,00	145,00	$	77.971.430,00		$	0,00		$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
17.04	07,03,04	MAD-05	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M (SOBRESOLERA, CUMBRERA, DIAGONAL). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	1.985.049,00	121,50	$	241.183.454,00	380,00	$	754.318.620,00		$	0,00		$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
17.05	07,03,05	MAD-06	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 16) X 10. LONGITUD < 3,0 M (CAN, PENDOLÓN, SOBRESOLERA, SOLERA, VIGA DE CIELORRASO). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	878.083,00	20,00	$	17.561.660,00	333,00	$	292.401.639,00		$	0,00		$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
17.06	07,03,06	MAD-07	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO 16 X 10. LONGITUD 3,0 M A 8,0 M (PAR, TIRANTE, VIGA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	1.599.383,00	0,50	$	799.692,00	186,00	$	297.485.238,00		$	0,00		$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
17.07	07,03,07	MAD-09	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO (4 A 6) X 10. LONGITUD < 2 M (DIAGONAL, TORNAPUNTA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	462.255,00	3,50	$	1.617.893,00	584,00	$	269.956.920,00		$	0,00		$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
17.08	07,03,08	MAD-11	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO 7 X 7. LONGITUD 1,5 A 2,5 M (ARRIOSTRE, DIAGONAL, TORNAPUNTA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	458.649,00	0,50	$	229.325,00	183,00	$	83.932.767,00		$	0,00		$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
17.09	07,03,09	MAD-12	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO 4 X 4. LONGITUD 1,4 A 1,6 M (CORREA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	469.803,00	1,50	$	704.705,00	214,00	$	100.537.842,00		$	0,00		$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
		18	**CUBIERTA - CONVENTO**					$	**122.095.305,00**		$	**176.484.261,00**		$	**176.484.261,00**		$	**176.483.213,00**	-$	**1.048,00**	$	-	**0,00%**		$	-	**0,00%**		$	**176.483.213,00**	**100,00%**
18.01	07,04,01	CUB006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO FALTANTE. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO	M2	$	129.262,00	396,95	$	51.310.551,00	767,53	$	99.212.721,00	767,53	$	99.212.721,00	767,53	$	99.212.463,00	-$	258,00	$	-	0,00%		$	-	0,00%	767,53	$	99.212.463,00	100,00%
18.02	07,04,02	CUB007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 NO. 6 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	$	41.820,00	421,10	$	17.610.477,00	767,53	$	32.098.188,00	767,53	$	32.098.188,00	767,53	$	32.098.105,00	-$	83,00	$	-	0,00%		$	-	0,00%	767,53	$	32.098.105,00	100,00%
18.03	07,04,03	CUB010	INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO RECUPERADA. DISTINTAS MEDIDAS	M2	$	16.793,00	631,65	$	10.607.344,00	511,69	$	8.592.777,00	511,69	$	8.592.777,00	511,68	$	8.592.642,00	-$	135,00	$	-	0,00%		$	-	0,00%	511,68	$	8.592.642,00	100,00%
18.04	07,04,04	CUB016	INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO RECUPERADA. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO	M2	$	71.490,00	595,43	$	42.566.933,00	511,69	$	36.580.575,00	511,69	$	36.580.575,00	511,68	$	36.580.003,00	-$	572,00	$	-	0,00%		$	-	0,00%	511,68	$	36.580.003,00	100,00%
		19	**CUBIERTA - CAPILLA**					$	**122.095.305,00**		$	**109.784.536,00**		$	-		$	**84.235.990,00**	$	**84.235.990,00**	$	-	**0,00%**		$	-	**0,00%**		$	**84.235.990,00**	**100,00%**
19.01	07,04,01	CUB006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO FALTANTE. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO	M2	$	129.262,00	396,95	$	51.310.551,00	423,28	$	54.714.278,00		$	0,00	256,40	$	33.142.777,00	$	33.142.777,00	$	-	0,00%		$	-	0,00%	256,40	$	33.142.777,00	100,00%
19.02	07,04,02	CUB007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 NO. 6 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	$	41.820,00	421,10	$	17.610.477,00	423,28	$	17.701.653,00		$	0,00	512,80	$	21.445.296,00	$	21.445.296,00	$	-	0,00%		$	-	0,00%	512,80	$	21.445.296,00	100,00%
19.03	07,04,03	CUB010	INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO RECUPERADA. DISTINTAS MEDIDAS	M2	$	16.793,00	631,65	$	10.607.344,00	423,28	$	7.108.175,00		$	0,00	128,20	$	2.152.863,00	$	2.152.863,00	$	-	0,00%		$	-	0,00%	128,20	$	2.152.863,00	100,00%
19.04	07,04,04	CUB016	INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO RECUPERADA. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO	M2	$	71.490,00	595,43	$	42.566.933,00	423,28	$	30.260.430,00		$	0,00	384,60	$	27.495.054,00	$	27.495.054,00	$	-	0,00%		$	-	0,00%	384,60	$	27.495.054,00	100,00%
		20	**RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA**					$	**71.890.752,00**		$	**182.187.299,00**		$	**4.405.843,00**		$	**4.405.843,00**	$	-	$	-	**0,00%**		$	-	**0,00%**		$	**4.405.843,00**	**100,00%**
20.01	07,02,01	RES-EM01	RESTAURACIÓN DE VENTANAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MENOR AL 30% (N1). INCLUYE RETIRO, LIMPIEZA, LIJADO MASILLADO, PINTURA SOBRE ZONAS EFECTADAS Y REINSTALACIÓN	UND	$	350.947,00	14,00	$	4.913.258,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
20.02	07,02,02	RES-EM02	RESTAURACIÓN DE VENTANAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MAYOR AL 30% (N2). INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.	UND	$	481.225,00	14,00	$	6.737.150,00	17,00	$	8.180.825,00	0,00	$	0,00	0,00	$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
20.03	07,02,03	RES-EM03	RESTAURACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MENOR AL 30% (N1). SECCIÓN 1.30X3.7M. INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.	UND	$	88.005,00	10,00	$	880.050,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
20.04	07,02,04	RES-EM04	RESTAURACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MAYOR AL 30% (N2). SECCIÓN 1.30X3.7M. INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.	UND	$	999.242,00	10,00	$	9.992.420,00	40,00	$	39.969.680,00	0,00	$	0,00	0,00	$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
20.05	07,02,05	RES-EM07	RESTAURACIÓN BASAMENTO EN PIEDRA PIES DERECHOS QUE FUERON REEMPLAZADOS POR OTROS ELEMENTOS O CUYA MADERA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.	UND	$	133.885,00	3,00	$	401.655,00	3,00	$	401.655,00	0,00	$	0,00	0,00	$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
20.06	07,02,06	RES-EM08	REEMPLAZO DE PUERTAS DE CARPINTERÍA DE MADERA (N3). SECCIÓN 1.30X3.7M. INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.B	UND	$	1.910.756,00	6,00	$	11.464.536,00	6,00	$	11.464.536,00	0,00	$	0,00	0,00	$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
20.07	07,02,07	RES-EM11	RESTITUCIÓN VENTANAS DE MADERA CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES L=1.2 DE ANCHO POR 1.4M DE ALTO. INCLUYE RETIRO DEL ELEMENTO LIJADO, MASILLADO, INMUNIZADO, PINTURA DE ACABADO Y REINSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	UND	$	1.240.626,00	6,00	$	7.443.756,00	66,00	$	81.881.316,00	0,00	$	0,00	0,00	$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
20.08	07,02,08	RES-EM12	RESTITUCIÓN PUERTAS DE MADERA CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES L=1.1 A 1.3M DE ANCHO POR 2.8M DE ALTO. INCLUYE RETIRO DEL ELEMENTO LIJADO, MASILLADO, INMUNIZADO, PINTURA DE ACABADO Y REINSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	UND	$	1.370.854,00	6,00	$	8.225.124,00	4,00	$	5.483.416,00	0,00	$	0,00	0,00	$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
20.09	07,02,09	RES-EM13	RESTITUCIÓN PIE DERECHOS DE MADERA DE 20X20 CON BASE EN PIEDRA. 1.MAX=1M	UND	$	1.344.310,00	3,00	$	4.032.930,00	3,00	$	4.032.930,00	0,00	$	-	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
20.10	07,02,10	RES-EM14	RESTAURACIÓN ZÓCALOS DE APROXIMÁDAMENTE 4M DE LARGO O SIMILAR, EN MADERA CON AFECTACIÓN MAYOR AL 30% (N2). INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.	UND	$	451.472,00	10,00	$	4.514.720,00	49,00	$	22.122.128,00	0,00	$	0,00	0,00	$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
20.11	07,02,11	RES-EM15	RESTAURACIÓN ZÓCALOS DE APROXIMÁDAMENTE 4M DE LARGO O SIMILAR, EN MADERA CON AFECTACIÓN MENOR AL 30% (N1). INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.	UND	$	424.497,00	10,00	$	4.244.970,00	10,00	$	4.244.970,00	0,00	$	0,00	0,00	$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
20.12	07,02,12	RES-EM16	RESTAURACIÓN ZÓCALOS DE MADERA CON AFECTACIÓN (N3) DE HASTA 20CM DE ESPESOR. INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.	UND	$	463.434,00	10,00	$	4.634.340,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
20.13	07,02,13	RES-EM17	RESTAURACIÓN ESCALERA DE MADERA DE ACCESO (INTERIOR) DE HASTA 1.20M DE ANCHO. INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.	UND	$	4.405.843,00	1,00	$	4.405.843,00	1,00	$	4.405.843,00	1,00	$	4.405.843,00	1,00	$	4.405.843,00	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	1,00	$	4.405.843,00	100,00%
		21	**CORTES, DEMOLICIONES Y RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA**					$	**30.412.073,00**		$	**44.749.059,00**		$	**41.346.756,00**		$	**41.346.756,00**	$	-	$	-	**0,00%**		$	-	**0,00%**		$	**41.346.756,00**	**100,00%**
21.01	03,02,01	DEM001	CORTE Y REGATA EN MUROS Y MAMPOSTERÍA, ANCHO MÁXIMO DE 10CM. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$	3.614,00	134,00	$	484.276,00	2420,72	$	8.748.482,00	2420,72	$	8.748.482,00	2420,72	$	8.748.482,00	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	2.420,72	$	8.748.482,00	100,00%
21.02	08,01,01	RES-MM01	RESTAURACIÓN INTEGRAL MAMPOSTERÍA EXISTENTE PARA SELLO DE GRIETAS O FISURAS CON APLICACIÓN DE RESINA EPÓXICA CONSOLIDANTE.	M	$	20.521,00	4,07	$	83.520,00	300,00	$	6.156.300,00	300,00	$	6.156.300,00	300,00	$	6.156.300,00	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	300,00	$	6.156.300,00	100,00%
21.03	08,01,02	RES-MM02	LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA APLICADA POR GRAVEDAD Y MANUAL EN MURO INTERIOR	M2	$	10.344,00	5,17	$	53.478,00	5,17	$	53.478,00	5,17	$	53.478,00	5,17	$	53.478,00	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	5,17	$	53.478,00	100,00%
21.04	08,01,03	RES-MM03	RETIRO MECÁNICO DE PIEZAS AFECTADAS SOBRE MUROS EN MAMPOSTERÍA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	17.862,00	197,54	$	3.528.459,00	197,54	$	3.528.459,00	197,54	$	3.528.459,00	197,54	$	3.528.459,00	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	197,54	$	3.528.459,00	100,00%
21.05	08,01,04	RES-MM04	RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERÍA MURO LADRILLO A LA VISTA CON MEDIO LADRILLO PRENSADO LIVIANO DE 6 CMS EN TONO TERRACOTA ACABADO DE JUNTA PÉRDIDA	M2	$	114.507,00	197,54	$	22.619.713,00	197,54	$	22.619.713,00	197,54	$	22.619.713,00	197,54	$	22.619.713,00	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	197,54	$	22.619.713,00	100,00%
21.06	08,01,05	RES-MM05	RETIRO MANUAL DE CAPA DE MUSGO Y/O CAPA VEGETAL CON MEDIOS MANUALES EN MUROS DE MAMPOSTERÍA, LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y APLICACIÓN DE HERBICIDA SOBRE SUPERFICIES.	M2	$	20.027,00	12,00	$	240.324,00	12,00	$	240.324,00	12,00	$	240.324,00	12,00	$	240.324,00	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	12,00	$	240.324,00	100,00%
21.07	08,01,06	RES-MM06	SELLO QUÍMICO EN LOS MUROS DE MAMPOSTERÍA PARA CONTROLAR LA HUMEDAD ASCENDENTE. E=15CM	M	$	26.198,00	128,00	$	3.353.344,00	128,00	$	3.353.344,00	0,00	$	0,00	0,00	$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
21.08	07,01,01	RES-MM09	RETIRO MANUAL DE HUELLAS DE ANIMALES, LIMPIEZA CON ACCIÓN MECÁNICA EN SECO, POSTERIOR LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON JABÓN NEUTRO Y AGUA.	M2	$	3.695,00	13,25	$	48.959,00	13,25	$	48.959,00	0,00	$	0,00	0,00	$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
		22	**RESTAURACIÓN Y RESANE FACHADA**					$	**376.590.274,00**		$	**376.590.274,00**		$	**1.745.858,00**		$	**1.745.858,00**	$	-	$	-	**0,00%**		$	-	**0,00%**		$	**1.745.858,00**	**100,00%**

22.01	08,02,01	RMF001	LADRILLO A LA VISTA: LIBERACIÓN DE AGREGADOS ARQUITECTÓNICOS, LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPUESTOS Y JUNTAS AFECTADAS.	M2	$	59.940,00	66,51	$	3.986.609,00	66,51	$ 3.986.609,00		$ 0,00		$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
22.02	08,02,02	RMF002	RESTAURACIÓN POR ZONAS AFECTADAS POR COSTRA NEGRA. APLICACIÓN CLORURO DE BENZALCONIO AL 10%. INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADO Y JABÓN NEUTRO	M2	$	32.158,00	54,29	$	1.745.858,00	54,29	$ 1.745.858,00	54,29	$ 1.745.858,00	54,29	$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	54,29	$	1.745.858,00	100,00%
22.03	08,02,03	RMF003	RESANE DE ABOMBAMIENTOS EN FACHADAS (INCLUYE APLICACIÓN EN MORTERO DE CEMENTO EN PROPORCIÓN 1:3 Y ESTUCO PLÁSTICO)	M2	$	42.909,00	8,54	$	366.443,00	8,54	$ 366.443,00		$ 0,00		$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
22.04	08,02,04	RMF004	RESANE DE DESCASCARAMIENTOS. RASPADO DE SUPERFICIE Y LIJADO HASTA GENERAR UNA SUPERFICIE HOMOGÉNEA	M2	$	27.839,00	9,98	$	277.833,00	9,98	$ 277.833,00		$ 0,00		$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
22.05	08,02,05	RMF005	ALFAJÍAS EN PIEDRA: INCLUYE DESINFECCIÓN, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO	M	$	27.985,00	35,00	$	979.475,00	35,00	$ 979.475,00		$ 0,00		$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
22.06	08,02,06	RMF006	EROSIÓN 2OCALO EN CEMENTO: LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO ÁREA AFECTADA Y APLICACIÓN DE UN CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO.	M2	$	39.407,00	8,44	$	332.595,00	8,44	$ 332.595,00		$ 0,00		$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
22.07	08,02,07	RMF008	LIMPIEZA MECÁNICA DE GRAFITIS POR MEDIO DE JABÓN NEUTRO, QUITA GRAFITIS Y APLICACIÓN DE AGUA A PRESIÓN. POR ACCIONES VANDÁLICAS	M2	$	32.345,00	0,15	$	4.852,00	0,15	$ 4.852,00		$ 0,00		$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
22.08	08,02,08	RMF009	APLICACIÓN DE HERBICIDA Y RETIRO MANUAL DE CAPA DE MUSGO Y/O CAPA VEGETAL EN FACHADAS UNA VEZ SE ENCUENTRE SECO. POR VEGETACIÓN INVASIVA.	M2	$	14.909,00	33,00	$	491.997,00	33,00	$ 491.997,00		$ 0,00		$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
22.09	08,02,09	RMF010	ALFAJÍAS EN CONCRETO: LIMPIEZA CON AGUA Y TEXAPON AL 10%, APLICACIÓN DE SILICATO DE ETILO PURO SEGÚN REQUERIMIENTO, SEGÚN GRADO DE DETERIORO APLICAR VARIAS CAPAS CADA QUINCE DÍAS.	UND	$	34.877,00	16,00	$	558.032,00	16,00	$ 558.032,00		$ 0,00		$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
22.10	08,02,10	RMF012	EN PIEDRA: APLICACIÓN DE SILICATO DE ETILO PURO Y JABÓN NEUTRO, SEGÚN GRADO DE DETERIORO APLICAR VARIAS CAPAS CADA QUINCE DÍAS.	M2	$	42.408,00	54,29	$	2.302.330,00	54,29	$ 2.302.330,00		$ 0,00		$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
22.11	08,02,11	RMF013	MUROS EXTERNOS: LIMPIEZA EN SECO ESCOBILLADO MANUAL CON ESCOBA DE CERDA, SEGUIDO DE LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO, CLORURO DE BENZALCONIO Y AGUA SIN PRESIÓN, APLICACIÓN DE FUNGICIDA.	M2	$	102.564,00	3.564,06	$	365.544.250,00	3564,06	$ 365.544.250,00		$ 0,00		$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
		23	**MAMPOSTERÍA**					**$**	**124.580.154,00**		**$ 124.580.154,00**		**$ 124.580.154,00**		**$**	**124.580.154,00**	**$**	**-**	**$**	**-**	**0,00%**		**$**	**-**	**0,00%**		**$**	**124.580.154,00**	**100,00%**
23.01	08,05,01	MMA004	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30) E=12CM	M2	$	62.352,00	0,50	$	31.176,00	0,50	$ 31.176,00	0,50	$ 31.176,00	0,50	$	31.176,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	0,50	$	31.176,00	100,00%
23.02	08,05,02	MMA005	DOBLE MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30). PARA MUROS DE ESPESOR DE 42 CM A 68 CM.	M2	$	124.155,00	140,73	$	17.472.333,00	140,73	$ 17.472.333,00	140,73	$ 17.472.333,00	140,73	$	17.472.333,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	140,73	$	17.472.333,00	100,00%
23.03	08,05,03	MMA006	MURO LADRILLO A LA VISTA CON NÚCLEO EN BLOQUE NO. 5. ESPESOR EMAX=45 CM. INCLUYE MORTERO DE PEGA	M2	$	172.137,00	36,50	$	6.283.001,00	36,50	$ 6.283.001,00	36,50	$ 6.283.001,00	36,50	$	6.283.001,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	36,50	$	6.283.001,00	100,00%
23.04	08,05,04	MMA007	MURO LADRILLO A LA VISTA CON NÚCLEO EN BLOQUE NO. 5. ESPESOR EMAX=30 CM. INCLUYE MORTERO DE PEGA	M2	$	145.068,00	16,10	$	2.335.595,00	16,10	$ 2.335.595,00	16,10	$ 2.335.595,00	16,10	$	2.335.595,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	16,10	$	2.335.595,00	100,00%
23.05	08,06,01	ML01	MUROS EN PLACA DE YESO DE 1/2" E=10 CM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$	108.661,00	78,54	$	8.534.235,00	78,54	$ 8.534.235,00	78,54	$ 8.534.235,00	78,54	$	8.534.235,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	78,54	$	8.534.235,00	100,00%
23.06	08,06,02	ML02	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA,Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$	106.403,00	13,43	$	1.428.992,00	13,43	$ 1.428.992,00	13,43	$ 1.428.992,00	13,43	$	1.428.992,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	13,43	$	1.428.992,00	100,00%
23.07	08,06,03	ML06	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 12MM DOS CARAS. ESPESOR 12 CM. UNA CARA SUPERBOARD RH Y ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS. OTRA CARA EN SUPERBOARD Y ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$	207.142,00	113,53	$	23.516.831,00	113,53	$ 23.516.831,00	113,53	$ 23.516.831,00	113,53	$	23.516.831,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	113,53	$	23.516.831,00	100,00%
23.08	08,06,04	ML07	MUROS EN SUPERBOARD DE 12MM EN DOS CARAS. ESPESOR 12CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$	185.605,00	194,45	$	36.090.892,00	194,45	$ 36.090.892,00	194,45	$ 36.090.892,00	194,45	$	36.090.892,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	194,45	$	36.090.892,00	100,00%
23.09	08,06,05	ML11	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A DOS CARAS. ESPESOR 12 CM A 15CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	M2	$	191.496,00	113,59	$	21.752.031,00	113,59	$ 21.752.031,00	113,59	$ 21.752.031,00	113,59	$	21.752.031,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	113,59	$	21.752.031,00	100,00%
23.10	08,06,06	ML12	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	M2	$	117.974,00	60,48	$	7.135.068,00	60,48	$ 7.135.068,00	60,48	$ 7.135.068,00	60,48	$	7.135.068,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	60,48	$	7.135.068,00	100,00%
		24	**CIELO RASO, MOLDURAS Y ZOCALOS**					**$**	**96.879.883,00**		**$ 125.332.857,00**		**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**0,00%**		**$**	**-**	**0,00%**		**$**	**-**	**0,00%**
24.01	08,04,01	RST-MO05	RESTITUCIÓN DE ZOCALO EN CONCRETO H-MIN=0.35M A HMAX=1.40M.	M2	$	15.729,00	22,15	$	348.397,00	22,15	$ 348.397,00		$ 0,00		$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
24.02		**NP021**	CIELO RASO EN DRYWALL RF 1/2" CON ESTRUCTURA METÁLICA Y ACABADO EN PINTURA TIPO UNO TRES MANOS	M2	$	89.229,00		$	-	1184,43	$ 105.685.504,00		$ 0,00		$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
24.03	11,02,01	CR01	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 6 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA.	M2	$	102.632,00	877,06	$	90.014.422,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
24.04	11,02,02	CR04	CIELORRASO EN SUPERBOARD RH DE 8MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA	M2	$	103.977,00	56,89	$	5.915.252,00	179,82	$ 18.697.144,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
24.05	08,07,01	RST-MO01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA EN RESINA POLIÉSTER. SECCIÓN 5X5CM; SIN POROS CON TERMINACIÓN A BORDE DELGADO DE SOBREPONER EN OBRA YA TERMINADA. INCLUYE MATERIAL PARA PEGUE	M	$	50.743,00	11,86	$	601.812,00	11,86	$ 601.812,00		$ 0,00		$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
			RESTAURACIÓN MOLDURAS					**$**	**17.792.873,00**		**$ 17.793.745,00**		**$ 13.756.599,00**		**$**	**13.756.599,00**	**$**	**-**	**$**	**-**	**0,00%**		**$**	**-**	**0,00%**		**$**	**13.756.599,00**	**100,00%**
24.06	08,03,01	RMY001	MOLDURAS 5X5CM: RETIRO DE SECCIÓN AFECTADA, ELABORACIÓN DE MOLDE EN YESO SEGÚN FORMATO EXISTENTE, RESTITUCIÓN DE LA PIEZA COMPLETA.	M	$	261.668,00	48,37	$	12.656.009,00	48,37	$ 12.656.881,00	48,37	$ 12.656.881,00	48,37	$	12.656.881,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	48,37	$	12.656.881,00	100,00%
24.07	08,03,02	RMY002	ROSETÓN DE D=.30M APROXIMÁDAMENTE: RETIRO DE SECCIÓN AFECTADA, ELABORACIÓN DEL MOLDE PARA CUADRANTE FALTANTE Y RESTITUCIÓN DEL ELEMENTO EN YESO.	UND	$	549.859,00	2,00	$	1.099.718,00	2,00	$ 1.099.718,00	2,00	$ 1.099.718,00	2,00	$	1.099.718,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	2,00	$	1.099.718,00	100,00%
24.08	08,03,03	RMY003	MOLDURAS EXTERNAS: LIMPIEZA MECÁNICA CON ESCOBILLADO EN SECO, SEGUIDO DE LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA SIN PRESIÓN. APLICACIÓN DE FUNGICIDA.	M2	$	13.751,00	118,14	$	1.624.543,00	118,14	$ 1.624.543,00		$ 0,00		$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
24.09	08,03,04	RMY004	RESTAURACIÓN DE BALAUSTRADA EN CONCRETO (INCLUYE LIJADA DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA)	M	$	51.371,00	11,34	$	582.547,00	11,34	$ 582.547,00		$ 0,00		$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
24.10	08,03,05	RMY005	RESTITUCIÓN DE BALAUSTRE Y PINÁCULO EN CONCRETO (INCLUYE MODELADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M	$	52.683,00	1,00	$	52.683,00	1,00	$ 52.683,00		$ 0,00		$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
24.11	08,03,06	RMY006	RESTAURACIÓN DE CORNISAS Y MOLDURAS EN MORTERO Y CEMENTO BLANCO - FACHADA	M	$	27.569,00	64,47	$	1.777.373,00	64,47	$ 1.777.373,00		$ 0,00		$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
		25	**RESTAURACIÓN CARPINTERÍA**					**$**	**352.922.952,00**		**$ 352.922.952,00**		**$ 44.146.032,00**		**$**	**44.146.032,00**	**$**	**-**	**$**	**-**	**0,00%**		**$**	**-**	**0,00%**		**$**	**44.146.032,00**	**100,00%**
25.01	09,02,01	CRPM06	PUERTA ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMÍNICO COLOR BLANCO DE 6 MM ESTÁNDAR, ENCHAPADO EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE LA PUERTA DE 2.4 X 0.75 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO. MARCO EN MELAMINA RH DE 50 MM ANCHO. INCLUYE BISAGRAS Y CHAPA.	UND	$	743.388,00	7,00	$	5.203.716,00	7,00	$ 5.203.716,00	2,00	$ 1.486.776,00	2,00	$	1.486.776,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	2,00	$	1.486.776,00	100,00%
25.02	09,02,02	CRPM15	PUERTA CORREDIZA UNA (1) HOJA ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMÍNICO DE 6 MM ESTÁNDAR, ENCHAPADO EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE LA PUERTA. MARCO EN MELAMINA RH DE 50 MM ANCHO. INCLUYE SISTEMA DE RIEL Y CHAPA. ANCHO 0.90M, ALTO 2.40M	UND	$	1.553.314,00	1,00	$	1.553.314,00	1,00	$ 1.553.314,00	1,00	$ 1.553.314,00	1,00	$	1.553.314,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	1,00	$	1.553.314,00	100,00%
25.03	09,03,01	CRPM25	CELOSÍAS EN MADERA. (MURO DIVISORIO) 0.05X 5.M	UND	$	3.518.874,00	68,00	$	239.283.432,00	68,00	$ 239.283.432,00	10,00	$ 35.188.740,00	10,00	$	35.188.740,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	10,00	$	35.188.740,00	100,00%
25.04	09,04,01	RES-CM01	BARANDA CON ALTURA DE 0.90 METROS O SIMILAR: LIMPIEZA MECÁNICA CON GRATA Y LIJA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA, REINSTALACIÓN.	M	$	64.708,00	10,42	$	674.257,00	10,42	$ 674.257,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
25.05	09,04,02	RES-CM02	RESTAURACIÓN DE ÓCULOS D=1.20M, INCLUYE RETIRO DE CARPINTERÍA METÁLICA, LIMPIEZA MECÁNICA CON GRATA Y LIJA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA, REINSTALACIÓN POR MEDIO DE CHAZO EXPANSIVO O SIMILAR GARANTIZANDO UN ANCLAJE SEGURO.	UND	$	199.937,00	2,00	$	399.874,00	2,00	$ 399.874,00	2,00	$ 399.874,00	2,00	$	399.874,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	2,00	$	399.874,00	100,00%
25.06	09,05,01	CME004	PUERTA PARA CUARTOS TÉCNICOS 0.90X2.40 O SIMILAR. FABRICADA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED O GALVANIZADA CALIBRES 20 O 18. MARCO FABRICADO EN ACERO COLD ROLLED O GALVANIZADO CALIBRE 16 O 18. REJILLAS TIPO LOUVER CON DIVISORES PARA VENTILACIÓN. INCLUYE CERRADURA CON MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE, ANCLAJES DE NYLON PARA SUJECIÓN A PARED Y BISAGRAS. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA.	UND	$	2.758.664,00	6,00	$	16.551.984,00	6,00	$ 16.551.984,00	2,00	$ 5.517.328,00	2,00	$	5.517.328,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	2,00	$	5.517.328,00	100,00%
25.07	09,05,02	CME008	PUERTAS Y DIVISIONES FLOTANTES EN ACERO INOXIDABLE DE H MAX =2.5M	M2	$	2.856.204,00	31,25	$	89.256.375,00	31,25	$ 89.256.375,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
			MUEBLES MADERA					**$**	**219.939.127,00**		**$ 219.939.127,00**		**$ 104.051.440,00**		**$**	**104.051.440,00**	**$**	**-**	**$**	**-**	**0,00%**		**$**	**-**	**0,00%**		**$**	**104.051.440,00**	**100,00%**
25.08	09,01,01	CRPM01	MUEBLES FIJOS ALTURA DE ANTEPECHOS CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y/O CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO	M	$	68.692,00	16,49	$	1.132.731,00	16,49	$ 1.132.731,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
25.09	09,01,02	CRPM02	MUEBLE DE RECEPCIÓN CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO	UND	$	3.545.571,00	1,00	$	3.545.571,00	1,00	$ 3.545.571,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
25.10	09,01,03	CRPM09	MUEBLES FIJOS INCRUSTADOS EN EL MURO DE CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO DE 0,60 PROFUNDIDAD	M	$	78.388,00	28,92	$	2.266.981,00	28,92	$ 2.266.981,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
25.11	09,01,04	CRPM10	MESÓN PARA COCINA QUARZTONE CLOUDY O SIMILAR. MESÓN CARPINTERÍA EN MADERA CON MUEBLE INFERIOR DE COCINA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO (BLANCO), CON PUERTAS, ENTREPAÑOS Y CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO. INCLUYE POCETA LAVAPLATOS VALENCIA 40X40 DE BAJO PONER EN ACERO INOXIDABLE	M	$	1.484.745,00	1,20	$	1.781.694,00	1,20	$ 1.781.694,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
25.12	09,01,05	CRPM21	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA PARA LIBROS. DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO DE 0.80X1.6 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO. DEBE INCLUIR SOPORTE PARA LIBROS Y RODACHINES CON FRENO. NOTA: LAS DIMENSIONES DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA	UND	$	2.034.349,00	49,00	$	99.683.101,00	49,00	$ 99.683.101,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
25.13	09,01,06	CRPM22	MUEBLES FIJOS FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO Y LAMINADO MELAMÍNICO DE 4.30X2.40M O SIMILAR. PUERTAS CORREDIZAS Y ENTREPAÑOS PARA ALMACENAMIENTO. COLOR SEGÚN RESTAURACIÓN INTEGRAL.	UND	$	1.594.490,00	1,00	$	1.594.490,00	1,00	$ 1.594.490,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
25.14	09,01,07	CRPM23	CONSTRUCCIÓN DE PEDESTALES EN MADERA SESCCIÓN 20X20CM O SIMILAR, FABRICADOS EN TABLERO AGLOMERADO Y LAMINADO MELAMÍNICO DE 15MM DE ESPESOR COLOR DELFINES AL ATARDECER.	UND	$	2.749.121,00	2,00	$	5.498.242,00	2,00	$ 5.498.242,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
25.15	09,01,08	CRPM24	MUEBLES FIJOS ALTURA DE ANTEPECHOS CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO. PARA ABSIDE CAPILLA (0,4 X 0,4)	UND	$	384.877,00	1,00	$	384.877,00	1,00	$ 384.877,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
25.16	24.01.01	BIM005	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM: INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES (15%, QUINCE PORCIENTO PARA ESTE COMPONENTE)	UND	$	693.676.269,00	0,15	$	104.051.440,00	0,15	$ 104.051.440,00	0,15	$ 104.051.440,00	0,15	$	104.051.440,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	0,15	$	104.051.440,00	100,00%
		26	**PUERTAS, VENTANAS PVC Y BARANDAS**					**$**	**217.268.073,00**		**$ 219.434.707,00**		**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**0,00%**		**$**	**-**	**0,00%**		**$**	**-**	**0,00%**

26.01	09,06,01	CPV004	PUERTA CON CUERPO FIJO SUPERIOR EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8 MM AHUMADO. MARCO EN PVC, CON CERRADURAS INDEPENDIENTES EN ACERO INOXIDABLE. AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. INCLUYE BISAGRAS Y MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE.	M2	$	1.107.497,00	14,24	$	15.770.757,00	14,24	$ 15.770.757,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
26.02	09,06,02	CPV012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO, CON MARCO EN PVC SEGÚN DISEÑO DE 0.90X2.40 M. INCLUYE AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO.	UND	$	3.064.345,00	2,00	$	6.128.690,00	2,00	$ 6.128.690,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
26.03	09,06,03	CPV013	PUERTA VENTANA. PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO ALTURA VARIABLE SIN MARCO. VENTANA FIJA. MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO. VANO APROX. ANCHO 3.40M X ALTO 2.46M	UND	$	8.750.967,00	6,00	$	52.505.802,00	6,00	$ 52.505.802,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
26.04	09,07,01	CPV006	VENTANERÍA FIJA: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO.	M2	$	1.133.018,00	31,15	$	35.297.967,00	31,15	$ 35.293.511,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
26.05	09,07,02	CPV007	VENTANA FIJA. MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO. 1.20X2.81M	UND	$	3.701.811,00	11,00	$	40.719.921,00	11,00	$ 40.719.921,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
26.06	09,07,03	CPV010	VENTANA ABATIBLE DE 2.80M DE ALTO X 1.2M DE ANCHO. MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO.	UND	$	1.223.443,00	7,00	$	8.564.101,00	7,00	$ 8.564.101,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
26.07	09,08,01	VID01	VENTANA FIJA CON DIVISIONES -MURO CORTINA GALERÍA SENCILLA VIDRIO ENERGY ADVANTAGE 4MM O SUPERIOR	M2	$	844.941,00	50,41	$	42.593.476,00	50,41	$ 42.593.476,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
26.08	09,09,01	CME044	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE ALTURA 0.93 M. Ø0.03M INCLUYE HERRAJES Y ANCLAJES A PISO.	M	$	537.983,00	27,29	$	14.681.556,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
26.09	09,09,02	CME047	BARANDA A PARED (PASAMANOS) EN ACERO INOXIBABLE. TUBULAR REDONDE DE Ø2". ANCLAJE PLATINA 2"X1/4"	M	$	158.379,00	2,40	$	380.110,00	2,40	$ 380.110,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
26.10		**NP022**	BARANDA EN TUBERÍA DE ESTRUCTURA METÁLICA 2" DE ALTURA 1.20 M ELEMENTOS VERTICALES CADA 0,90CM Y 2 ELEMENTOS HORIZONTALES 1/2" . INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	$	546.100,00		$	-	30,86	$ 16.852.646,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
26.11	09,09,03	CME048	BARANDA DE VIDRIO 6+6 PERFIL EN ALUMINIO (CORO)	M	$	391.058,00	1,60	$	625.693,00	1,60	$ 625.693,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		27	**RESTAURACIÓN DE PISOS**					**$**	**175.493.842,00**		**$ 175.494.129,00**		**$ -**		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**
27.01	10,01,01	REP005	RETIRO MANUAL DE HUELLAS DE ANIMALES, LIMPIEZA CON ACCIÓN MECÁNICA EN SECO, POSTERIOR LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON JABÓN NEUTRO Y AGUA.	M2	$	3.661,00	13,25	$	48.508,00	13,25	$ 48.508,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
27.02	10,01,02	REP006	RESTAURACIÓN DE ALISTADO EN MADERA COLOR NATURAL EXISTENTE, APLICACIÓN DE LACA (CORO)	M2	$	18.686,00	56,20	$	1.050.116,00	56,20	$ 1.050.153,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
27.03	10,01,03	REP007	RETIRO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RESTITUCIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN DE CEMENTO DE PIEZAS DAÑADAS (APROXIMÁDAMENTE 30% DEL ÁREA) VERIFICANDO TAMAÑO A LAS EXISTENTES.	M2	$	47.002,00	3,70	$	173.813,00	3,70	$ 173.907,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
27.04	10,01,04	REP008	DESTRONQUE, PULIDA Y ESMALTADA DE PISO EN MÁRMOL BLANCO ESMALTADO CON PATRÓN IRREGULAR	M2	$	32.691,00	61,02	$	1.994.805,00	61,02	$ 1.994.805,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
27.05	10,01,05	REP009	LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA DE PISOS EXTERIORES BALDOSÍN DE CEMENTO Y/O SIMILAR	M2	$	9.461,00	277,48	$	2.625.267,00	277,48	$ 2.625.238,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
27.06	10,02,01	PYE001	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR. E = 0.04M	M2	$	38.734,00	715,13	$	27.699.845,00	715,13	$ 27.699.845,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
27.07	10,02,02	PYE002	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4 E = 0.04M	M2	$	32.361,00	1.072,05	$	34.692.610,00	1072,05	$ 34.692.610,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
27.08	10,02,05	PYE005	INSTALACIÓN DE PISO EN PORCELANATO PARA ZONAS HÚMEDAS COLOR BEIGE	M2	$	109.244,00	83,60	$	9.133.017,00	83,60	$ 9.132.798,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
27.09	10,02,06	PYE006	PISO EN TABLÓN DE GRES 30X30	M2	$	98.685,00	833,45	$	82.248.915,00	833,45	$ 82.249.013,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
27.10	10,02,07	PYE007	PISO SEMIPERMEABLE - GRAMOQUÍN PREFABRICADO	M2	$	88.326,00	105,53	$	9.320.866,00	105,53	$ 9.321.043,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
27.11	10,02,08	PYE008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA VIBRO PRENSADA 30X30CM, TONO BLANCO HUILA Y/O SIMILAR. INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA Y TODOS LOS ELEMENTOS	M2	$	117.856,00	20,00	$	2.357.120,00	20,00	$ 2.357.120,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
27.12	10,02,09	PYE036	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA PREFABRICADAS CON GRANITO, SECCIÓN DE 4X5X50 CMS.	M	$	32.156,00	129,03	$	4.148.960,00	129,03	$ 4.149.089,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		28	**RESTAURACIÓN CIELO RASOS**					**$**	**113.033.124,00**		**$ 113.033.124,00**		**$ 10.713.962,00**		**$ 10.713.962,00**	**$ -**	**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 10.713.962,00**	**100,00%**
28.01	11,01,01	RMC001	RETIRO DE TUBERÍA PARASITA, LIMPIEZA MECÁNICA EN SECO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$	6.391,00	129,25	$	826.037,00	129,25	$ 826.037,00	129,25	$ 826.037,00	129,25	$ 826.037,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	129,25	$ 826.037,00	100,00%
28.02	11,01,02	RMC002	LIMPIEZA EN SECO, CON ESCOBA DE CERDAS SUAVES, RECOLECCIÓN CON ASPIRADORA EN PUNTOS DE ALTA CONCENTRACIÓN.	M2	$	16.780,00	259,50	$	4.354.410,00	259,50	$ 4.354.410,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
28.03	11,01,03	RMC003	RELLENO EN MASILLA EN ÁREA AFECTADA EN TECHOS, CON MORTERO DE CAL Y ARENA DE PEÑA.	M2	$	27.976,00	247,41	$	6.921.542,00	247,41	$ 6.921.542,00	247,41	$ 6.921.542,00	247,41	$ 6.921.542,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	247,41	$ 6.921.542,00	100,00%
28.04	11,01,04	RMC004	RESTAURACIÓN DE MADERA DE CUBIERTAS CATALOGADAS COMO MEDIANAMENTE RESISTENTES CON AFECTACIÓN MAYOR DEL 30% (SECCIÓN TRANVERSAL, NO DISMINUIDA MAS DEL 20%) MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE UN NUEVO ELEMENTO ASUMIENDO SU FUNCIÓN ESTRUCTURAL.	M	$	337.089,00	8,80	$	2.966.383,00	8,80	$ 2.966.383,00	8,80	$ 2.966.383,00	8,80	$ 2.966.383,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8,80	$ 2.966.383,00	100,00%
28.05	11,01,05	RMC006	LIBERACIÓN DE AGREGADOS ARQUITECTÓNICOS, LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPUESTOS Y JUNTAS AFECTADAS.	M2	$	59.751,00	1.639,55	$	97.964.752,00	1639,55	$ 97.964.752,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		29	**PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA**					**$**	**51.511.491,00**		**$ 273.978.095,00**		**$ -**		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**
29.01	12,01,01	PN01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	$	28.013,00	322,13	$	9.023.716,00	3742,88	$ 104.849.297,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.02	12,01,02	PN03	ACABADO CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, ESPESOR 1.5CM. INCLUYE ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE PRESENTACIÓN PLÁSTICA, SELLADOR ACRÍLICO Y PINTURA EPÓXICA SEMI MATE DE DOS COMPONENTES (EPOXI-POLIAMIDA)	M2	$	67.411,00	80,53	$	5.428.709,00	80,53	$ 5.428.608,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.03	12,02,01	PN08	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE	M2	$	21.945,00	80,53	$	1.767.264,00	3742,88	$ 82.137.502,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.04	12,02,02	PN04	ACABADO EN PINTURA VINÍLICA TIPO 1, 3 MANOS.	M2	$	18.586,00	1.449,57	$	26.941.652,00	4242,88	$ 78.858.168,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.05	12,02,03	PN05	ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS EN 3 MANOS, COLOR A DEFINIR	M2	$	16.792,00	161,06	$	2.704.570,00	161,06	$ 2.704.520,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.06	12,02,04	PN12	PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASOS	M2	$	17.526,00	322,13	$	5.645.580,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		30	**ALIMENTADORES, ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Y SALIDAS**					**$**	**31.048.478,00**		**$ 31.048.478,00**		**$ 31.048.478,00**		**$ 31.048.478,00**	**$ -**	**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 31.048.478,00**	**100,00%**
30.01	13,01,01	ELE002	SUBCONTRATO DE EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS 275 NORMA CODENSA, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS.	UND	$	2.265.049,00	12,00	$	27.180.588,00	12,00	$ 27.180.588,00	12,00	$ 27.180.588,00	12,00	$ 27.180.588,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	12,00	$ 27.180.588,00	100,00%
30.02	13,01,02	ELE003	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO NORMAL DE CIRCUITOS 1ER PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.	M	$	33.415,00	6,00	$	200.490,00	6,00	$ 200.490,00	6,00	$ 200.490,00	6,00	$ 200.490,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 200.490,00	100,00%
30.03	13,01,03	ELE004	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO NORMAL DE CIRCUITOS 2DO PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X6+1X6+1X10T CU LSZH.	M	$	46.170,00	17,00	$	784.890,00	17,00	$ 784.890,00	17,00	$ 784.890,00	17,00	$ 784.890,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	17,00	$ 784.890,00	100,00%
30.04	13,01,04	ELE005	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA UPS DE 15KVA EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X6+1X6+1X10T CU LSZH.	M	$	46.170,00	6,00	$	277.020,00	6,00	$ 277.020,00	6,00	$ 277.020,00	6,00	$ 277.020,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 277.020,00	100,00%
30.05	13,01,05	ELE006	ACOMETIDA EN B.T. DESDE UPS HASTA TABLERO REGULADO 1ER PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X6+1X6+1X10T CU LSZH.	M	$	46.170,00	6,00	$	277.020,00	6,00	$ 277.020,00	6,00	$ 277.020,00	6,00	$ 277.020,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 277.020,00	100,00%
30.06	13,01,06	ELE007	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TABLERO REGULADO 1ER PISO HASTA TABLERO REGULADO 2DO PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.	M	$	33.415,00	20,00	$	668.300,00	20,00	$ 668.300,00	20,00	$ 668.300,00	20,00	$ 668.300,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,00	$ 668.300,00	100,00%
30.07	13,01,07	ELE010	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO BOMBAS EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.	M	$	33.415,00	22,00	$	735.130,00	22,00	$ 735.130,00	22,00	$ 735.130,00	22,00	$ 735.130,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	22,00	$ 735.130,00	100,00%
30.08	13,01,08	ELE011	DUCTO PVC DE 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M	$	11.563,00	80,00	$	925.040,00	80,00	$ 925.040,00	80,00	$ 925.040,00	80,00	$ 925.040,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	80,00	$ 925.040,00	100,00%
			SALIDAS					**$**	**158.083.151,00**		**$ 158.083.151,00**		**$ 158.083.151,00**		**$ 158.083.151,00**	**$ -**	**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 158.083.151,00**	**100,00%**
30.09	13,03,01	ELE041	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$	162.308,00	301,00	$	48.854.708,00	301,00	$ 48.854.708,00	301,00	$ 48.854.708,00	301,00	$ 48.854.708,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	301,00	$ 48.854.708,00	100,00%
30.10	13,03,02	ELE042	SALIDA PARA LUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$	164.120,00	58,00	$	9.518.960,00	58,00	$ 9.518.960,00	58,00	$ 9.518.960,00	58,00	$ 9.518.960,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	58,00	$ 9.518.960,00	100,00%
30.11	13,03,03	ELE043	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$	173.020,00	124,00	$	21.454.480,00	124,00	$ 21.454.480,00	124,00	$ 21.454.480,00	124,00	$ 21.454.480,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	124,00	$ 21.454.480,00	100,00%
30.12	13,03,04	ELE045	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH	M	$	13.601,00	1.500,00	$	20.401.500,00	1500,00	$ 20.401.500,00	1500,00	$ 20.401.500,00	1500,00	$ 20.401.500,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.500,00	$ 20.401.500,00	100,00%
30.13	13,03,05	ELE046	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4 . INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$	165.340,00	167,00	$	27.611.780,00	167,00	$ 27.611.780,00	167,00	$ 27.611.780,00	167,00	$ 27.611.780,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	167,00	$ 27.611.780,00	100,00%
30.14	13,03,06	ELE047	SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$	202.783,00	10,00	$	2.027.830,00	10,00	$ 2.027.830,00	10,00	$ 2.027.830,00	10,00	$ 2.027.830,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 2.027.830,00	100,00%
30.15	13,03,07	ELE048	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$	136.664,00	30,00	$	4.099.920,00	30,00	$ 4.099.920,00	30,00	$ 4.099.920,00	30,00	$ 4.099.920,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	30,00	$ 4.099.920,00	100,00%
30.16	13,03,08	ELE050	SALIDA CIRCUITO EXCLUSIVO TOMACORRIENTE SECA MANOS, HORNO MICROONDAS Y OTROS CON POLO A TIERRA EN MURO 15A 120V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE CABLE 3X12	UND	$	128.051,00	6,00	$	768.306,00	6,00	$ 768.306,00	6,00	$ 768.306,00	6,00	$ 768.306,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 768.306,00	100,00%
30.17	13,03,09	ELE051	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL COLOR BLANCO POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12. NO SE INCLUYE CANALETA	UND	$	92.956,00	82,00	$	7.622.392,00	82,00	$ 7.622.392,00	82,00	$ 7.622.392,00	82,00	$ 7.622.392,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	82,00	$ 7.622.392,00	100,00%
30.18	13,03,10	ELE052	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12	UND	$	70.728,00	35,00	$	2.475.480,00	35,00	$ 2.475.480,00	35,00	$ 2.475.480,00	35,00	$ 2.475.480,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	35,00	$ 2.475.480,00	100,00%
30.19	13,03,11	ELE054	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT	UND	$	240.869,00	55,00	$	13.247.795,00	55,00	$ 13.247.795,00	55,00	$ 13.247.795,00	55,00	$ 13.247.795,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	55,00	$ 13.247.795,00	100,00%
		31	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO, CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**					**$**	**29.772.544,00**		**$ 29.772.544,00**		**$ 29.772.544,00**		**$ 29.772.544,00**	**$ -**	**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 29.772.544,00**	**100,00%**
31.01	13,04,01	ELE072	BANDEJA TIPO MALLA DE 30 CM GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO	M	$	129.297,00	140,00	$	18.101.580,00	140,00	$ 18.101.580,00	140,00	$ 18.101.580,00	140,00	$ 18.101.580,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	140,00	$ 18.101.580,00	100,00%
31.02	13,04,02	ELE073	CANALETA PERIMETRAL METÁLICA DE 12X5 CM EN LAMINA DE COLD ROLL DOBLE DIVISIÓN PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO	M	$	44.799,00	92,00	$	4.121.508,00	92,00	$ 4.121.508,00	92,00	$ 4.121.508,00	92,00	$ 4.121.508,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	92,00	$ 4.121.508,00	100,00%
31.03	13,06,01	ELE105	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA.	UND	$	291.915,00	4,00	$	1.167.660,00	4,00	$ 1.167.660,00	4,00	$ 1.167.660,00	4,00	$ 1.167.660,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 1.167.660,00	100,00%
31.04	13,06,02	ELE106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU	M	$	90.199,00	65,00	$	5.862.935,00	65,00	$ 5.862.935,00	65,00	$ 5.862.935,00	65,00	$ 5.862.935,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	65,00	$ 5.862.935,00	100,00%
31.05	13,06,03	ELE107	SOLDADURA EXOTÉRMICA	UND	$	54.718,00	6,00	$	328.308,00	6,00	$ 328.308,00	6,00	$ 328.308,00	6,00	$ 328.308,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 328.308,00	100,00%
31.06	13,06,04	ELE108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA. INCLUYE MARCO	UND	$	190.553,00	1,00	$	190.553,00	1,00	$ 190.553,00	1,00	$ 190.553,00	1,00	$ 190.553,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 190.553,00	100,00%
		32	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**					**$**	**17.877.508,00**		**$ 17.877.508,00**		**$ 11.109.434,00**		**$ 11.109.434,00**	**$ -**	**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 11.109.434,00**	**100,00%**
32.02	14,01,01	CYS001	CAJA DE MAMPOSTERÍA SENCILLA PARA COMUNICACIONES.	UND	$	534.265,00	2,00	$	1.068.530,00	2,00	$ 1.068.530,00	2,00	$ 1.068.530,00	2,00	$ 1.068.530,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 1.068.530,00	100,00%
32.03	14,01,02	CYS002	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS PVC DE 2" (SOLO INCLUYE LOS TUBOS)	M	$	89.299,00	32,00	$	2.857.568,00	32,00	$ 2.857.568,00	32,00	$ 2.857.568,00	32,00	$ 2.857.568,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	32,00	$ 2.857.568,00	100,00%
32.04	14,01,03	CYS003	SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN CANALETA. INCLUYE CANALETA	UND	$	121.304,00	31,00	$	3.760.424,00	31,00	$ 3.760.424,00	31,00	$ 3.760.424,00	31,00	$ 3.760.424,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	31,00	$ 3.760.424,00	100,00%
32.05	14,01,04	CYS004	SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN DUCTO. INCLUYE DUCTO	UND	$	121.566,00	11,00	$	1.337.226,00	11,00	$ 1.337.226,00	11,00	$ 1.337.226,00	11,00	$ 1.337.226,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	11,00	$ 1.337.226,00	100,00%
32.06	14,01,05	CYS005	CABLE UTP 4 PARES CATEGORÍA 6A	M	$	6.775,00	800,00	$	5.420.000,00	800,00	$ 5.420.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%

32.07	14,01,06	CYS006	SALIDA DOBLE PARA DATOS. INCLUYE CAJA 5800. FACEPLATE CON JACK DE 2 INSERTOS RJ 45	UND	$ 45.341,00	46,00	$ 2.085.686,00	46,00	$ 2.085.686,00	46,00	$ 2.085.686,00	46,00	$ 2.085.686,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	46,00	$ 2.085.686,00	100,00%
32.08	14,01,07	CYS007	PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A 1.00M	UND	$ 32.097,00	42,00	$ 1.348.074,00	42,00	$ 1.348.074,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		33	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 38.587.350,00**		**$ 38.587.350,00**		**$ 24.393.600,00**		**$ 24.393.600,00**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 24.393.600,00**	**100,00%**
33.01	14,02,01	CYS031	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO (INCLUYE SENSOR FOTOELÉCTRICO)	UND	$ 383.837,00	45,00	$ 17.272.665,00	45,00	$ 17.272.665,00	45,00	$ 17.272.665,00	45,00	$ 17.272.665,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	45,00	$ 17.272.665,00	100,00%
33.02	14,02,02	CYS032	SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL (INCLUYE ESTACIÓN MANUAL)	UND	$ 474.729,00	15,00	$ 7.120.935,00	15,00	$ 7.120.935,00	15,00	$ 7.120.935,00	15,00	$ 7.120.935,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	15,00	$ 7.120.935,00	100,00%
33.03	14,02,03	CYS034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR ANTI FLAMA PARA DETECCIÓN DE INCENDIO 2X16	M	$ 9.738,00	410,00	$ 3.992.580,00	410,00	$ 3.992.580,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
33.04	14,02,04	CYS042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND	$ 680.078,00	15,00	$ 10.201.170,00	15,00	$ 10.201.170,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		34	**SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA**				**$ 12.701.271,00**		**$ 12.701.271,00**		**$ 2.819.283,00**		**$ 2.819.283,00**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 2.819.283,00**	**100,00%**
34.01	14,03,01	CYS046	SALIDA PARA CÁMARAS CCTV EN DUCTO EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CAJA GALVANIZADA. NO INCLUYE CÁMARA.	UND	$ 76.870,00	24,00	$ 1.844.880,00	24,00	$ 1.844.880,00	24,00	$ 1.844.880,00	24,00	$ 1.844.880,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	24,00	$ 1.844.880,00	100,00%
34.02	14,03,02	CYS047	CABLE UTP CAT 6A	M	$ 6.775,00	600,00	$ 4.065.000,00	600,00	$ 4.065.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
34.03	14,03,03	CYS048	MONITOR 34" HD 4K	UND	$ 2.469.869,00	1,00	$ 2.469.869,00	1,00	$ 2.469.869,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
34.04	14,03,05	CYS050	NVR 16 CANALES POE IP 8MP 4K	UND	$ 1.531.762,00	2,00	$ 3.063.524,00	2,00	$ 3.063.524,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
34.05	14,04,01	CYS061	SALIDA DE SONIDO INCLUYENDO CAJAS, DUCTO DE PVC DE 3/4" Y ALAMBRE DE ACERO GUÍA (NO INCLUYE BAFLE, CORNETA O PARLANTE)	UND	$ 123.147,00	6,00	$ 738.882,00	6,00	$ 738.882,00	6,00	$ 738.882,00	6,00	$ 738.882,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 738.882,00	100,00%
34.06	14,04,02	CYS062	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE 30X30X12CM Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO.	UND	$ 235.521,00	1,00	$ 235.521,00	1,00	$ 235.521,00	1,00	$ 235.521,00	1,00	$ 235.521,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 235.521,00	100,00%
34.07	14,04,05	CYS065	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE SONIDO 2X16 AWG, PVC, LIBRE DE OXÍGENO Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO	M	$ 4.363,00	65,00	$ 283.595,00	65,00	$ 283.595,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		35	**PVC PRESIÓN**				**$ 24.583.523,00**		**$ 24.583.523,00**		**$ 24.583.523,00**		**$ 24.583.523,00**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 24.583.523,00**	**100,00%**
35.01	15,01,01	HIS02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 2"	UND	$ 30.464,00	2,00	$ 60.928,00	2,00	$ 60.928,00	2,00	$ 60.928,00	2,00	$ 60.928,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 60.928,00	100,00%
35.02	15,01,02	HIS03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 2"	UND	$ 23.748,00	1,00	$ 23.748,00	1,00	$ 23.748,00	1,00	$ 23.748,00	1,00	$ 23.748,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 23.748,00	100,00%
35.03	15,01,03	HIS04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 2X1 1/4"	UND	$ 34.777,00	2,00	$ 69.554,00	2,00	$ 69.554,00	2,00	$ 69.554,00	2,00	$ 69.554,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 69.554,00	100,00%
35.04	15,01,04	HIS05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 2X1/2"	UND	$ 36.808,00	2,00	$ 73.616,00	2,00	$ 73.616,00	2,00	$ 73.616,00	2,00	$ 73.616,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 73.616,00	100,00%
35.05	15,01,05	HIS06	TUBERÍA PVC.P Ø 1.1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 20.447,00	237,30	$ 4.852.073,00	237,30	$ 4.852.073,00	237,30	$ 4.852.073,00	237,30	$ 4.852.073,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	237,30	$ 4.852.073,00	100,00%
35.06	15,01,06	HIS07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1.1/2"	M	$ 13.513,00	46,00	$ 621.598,00	46,00	$ 621.598,00	46,00	$ 621.598,00	46,00	$ 621.598,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	46,00	$ 621.598,00	100,00%
35.07	15,01,07	HIS08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1. 1/2"	UND	$ 16.266,00	15,00	$ 243.990,00	15,00	$ 243.990,00	15,00	$ 243.990,00	15,00	$ 243.990,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	15,00	$ 243.990,00	100,00%
35.08	15,01,08	HIS09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1. 1/2X1"	UND	$ 9.402,00	4,00	$ 37.608,00	4,00	$ 37.608,00	4,00	$ 37.608,00	4,00	$ 37.608,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 37.608,00	100,00%
35.09	15,01,09	HIS10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1. 1/2X1. 1/4"	UND	$ 13.513,00	14,00	$ 189.182,00	14,00	$ 189.182,00	14,00	$ 189.182,00	14,00	$ 189.182,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14,00	$ 189.182,00	100,00%
35.10	15,01,10	HIS11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1. 1/2"	UND	$ 16.266,00	4,00	$ 65.064,00	4,00	$ 65.064,00	4,00	$ 65.064,00	4,00	$ 65.064,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 65.064,00	100,00%
35.11	15,01,11	HIS12	TUBERÍA PVC.P Ø 1.1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 21.126,00	112,20	$ 2.370.337,00	112,20	$ 2.370.337,00	112,20	$ 2.370.337,00	112,20	$ 2.370.337,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	112,20	$ 2.370.337,00	100,00%
35.12	15,01,12	HIS13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1.1/4"	UND	$ 8.036,00	110,90	$ 891.192,00	110,90	$ 891.192,00	110,90	$ 891.192,00	110,90	$ 891.192,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	110,90	$ 891.192,00	100,00%
35.13	15,01,13	HIS14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1. 1/4"	UND	$ 12.250,00	8,00	$ 98.000,00	8,00	$ 98.000,00	8,00	$ 98.000,00	8,00	$ 98.000,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8,00	$ 98.000,00	100,00%
35.14	15,01,14	HIS15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1. 1/4X3/4"	UND	$ 9.044,00	1,00	$ 9.044,00	1,00	$ 9.044,00	1,00	$ 9.044,00	1,00	$ 9.044,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 9.044,00	100,00%
35.15	15,01,15	HS-270	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1. 1/4X1/2"	UND	$ 7.785,00	1,00	$ 7.785,00	1,00	$ 7.785,00	1,00	$ 7.785,00	1,00	$ 7.785,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 7.785,00	100,00%
35.16	15,01,16	HIS16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1. 1/4X1"	UND	$ 9.044,00	18,00	$ 162.792,00	18,00	$ 162.792,00	18,00	$ 162.792,00	18,00	$ 162.792,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	18,00	$ 162.792,00	100,00%
35.17	15,01,17	HIS17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1. 1/4"	UND	$ 37.020,00	3,00	$ 111.060,00	3,00	$ 111.060,00	3,00	$ 111.060,00	3,00	$ 111.060,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 111.060,00	100,00%
35.18	15,01,18	HIS18	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 17.885,00	197,70	$ 3.535.865,00	197,70	$ 3.535.865,00	197,70	$ 3.535.865,00	197,70	$ 3.535.865,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	197,70	$ 3.535.865,00	100,00%
35.19	15,01,19	HIS19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"	UND	$ 5.522,00	27,00	$ 149.094,00	27,00	$ 149.094,00	27,00	$ 149.094,00	27,00	$ 149.094,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	27,00	$ 149.094,00	100,00%
35.20	15,01,20	HIS20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1"	UND	$ 14.399,00	2,00	$ 28.798,00	2,00	$ 28.798,00	2,00	$ 28.798,00	2,00	$ 28.798,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 28.798,00	100,00%
35.21	15,01,21	HIS21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"	UND	$ 5.748,00	3,00	$ 17.244,00	3,00	$ 17.244,00	3,00	$ 17.244,00	3,00	$ 17.244,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 17.244,00	100,00%
35.22	15,01,22	HIS22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X1/2"	UND	$ 5.748,00	2,00	$ 11.496,00	2,00	$ 11.496,00	2,00	$ 11.496,00	2,00	$ 11.496,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 11.496,00	100,00%
35.23	15,01,23	HIS23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 1X3/4"	UND	$ 9.806,00	1,00	$ 9.806,00	1,00	$ 9.806,00	1,00	$ 9.806,00	1,00	$ 9.806,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 9.806,00	100,00%
35.24	15,01,24	HIS24	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1"	UND	$ 156.274,00	3,00	$ 468.822,00	3,00	$ 468.822,00	3,00	$ 468.822,00	3,00	$ 468.822,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 468.822,00	100,00%
35.25	15,01,25	HIS25	REGISTRO DE CORTE Ø 1"	UND	$ 27.715,00	2,00	$ 55.430,00	2,00	$ 55.430,00	2,00	$ 55.430,00	2,00	$ 55.430,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 55.430,00	100,00%
35.26	15,01,26	HIS26	CAJILLA PARA MEDIDOR DE PISO Ø 1"	UND	$ 61.207,00	1,00	$ 61.207,00	1,00	$ 61.207,00	1,00	$ 61.207,00	1,00	$ 61.207,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 61.207,00	100,00%
35.27	15,01,27	HIS27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR Ø 1"	UND	$ 663.842,00	2,00	$ 1.327.684,00	2,00	$ 1.327.684,00	2,00	$ 1.327.684,00	2,00	$ 1.327.684,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 1.327.684,00	100,00%
35.28	15,01,28	HIS28	CHEQUE Ø 1"	UND	$ 53.005,00	1,00	$ 53.005,00	1,00	$ 53.005,00	1,00	$ 53.005,00	1,00	$ 53.005,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 53.005,00	100,00%
35.29	15,01,29	HIS29	FLOTADOR MECÁNICO Ø 1"	UND	$ 54.236,00	2,00	$ 108.472,00	2,00	$ 108.472,00	2,00	$ 108.472,00	2,00	$ 108.472,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 108.472,00	100,00%
35.30	15,01,30	HIS30	CAJILLA PARA UN MEDIDOR DE PISO Ø 1" PARA INCENDIO	UND	$ 61.207,00	1,00	$ 61.207,00	1,00	$ 61.207,00	1,00	$ 61.207,00	1,00	$ 61.207,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 61.207,00	100,00%
35.31	15,01,31	HIS31	TUBERÍA PVC.P Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 15.475,00	126,20	$ 1.952.945,00	126,20	$ 1.952.945,00	126,20	$ 1.952.945,00	126,20	$ 1.952.945,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	126,20	$ 1.952.945,00	100,00%
35.32	15,01,32	HIS32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 4.071,00	38,00	$ 154.698,00	38,00	$ 154.698,00	38,00	$ 154.698,00	38,00	$ 154.698,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	38,00	$ 154.698,00	100,00%
35.33	15,01,33	HIS33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 5.361,00	6,00	$ 32.166,00	6,00	$ 32.166,00	6,00	$ 32.166,00	6,00	$ 32.166,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 32.166,00	100,00%
35.34	15,01,34	HIS34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 21.439,00	3,00	$ 64.317,00	3,00	$ 64.317,00	3,00	$ 64.317,00	3,00	$ 64.317,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 64.317,00	100,00%
35.35	15,01,35	HIS35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2"	UND	$ 4.538,00	11,00	$ 49.918,00	11,00	$ 49.918,00	11,00	$ 49.918,00	11,00	$ 49.918,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	11,00	$ 49.918,00	100,00%
35.36	15,01,36	HIS36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2"	UND	$ 6.403,00	4,00	$ 25.612,00	4,00	$ 25.612,00	4,00	$ 25.612,00	4,00	$ 25.612,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 25.612,00	100,00%
35.37	15,01,37	HIS37	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4"	UND	$ 112.418,00	2,00	$ 224.836,00	2,00	$ 224.836,00	2,00	$ 224.836,00	2,00	$ 224.836,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 224.836,00	100,00%
35.38	15,01,38	HIS38	FLOTADOR MECÁNICO Ø 3/4"	UND	$ 54.236,00	2,00	$ 108.472,00	2,00	$ 108.472,00	2,00	$ 108.472,00	2,00	$ 108.472,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 108.472,00	100,00%
35.39	15,01,39	HIS39	VÁLVULA SOLENOIDE Ø 3/4"	UND	$ 236.099,00	1,00	$ 236.099,00	1,00	$ 236.099,00	1,00	$ 236.099,00	1,00	$ 236.099,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 236.099,00	100,00%
35.40	15,01,40	HIS40	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE Ø 3/4"	UND	$ 398.644,00	2,00	$ 797.288,00	2,00	$ 797.288,00	2,00	$ 797.288,00	2,00	$ 797.288,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 797.288,00	100,00%
35.41	15,01,41	HIS41	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 10.249,00	89,00	$ 912.161,00	89,00	$ 912.161,00	89,00	$ 912.161,00	89,00	$ 912.161,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	89,00	$ 912.161,00	100,00%
35.42	15,01,42	HIS42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 4.017,00	48,00	$ 192.816,00	48,00	$ 192.816,00	48,00	$ 192.816,00	48,00	$ 192.816,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	48,00	$ 192.816,00	100,00%
35.43	15,01,43	HIS43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 6.464,00	13,00	$ 84.032,00	13,00	$ 84.032,00	13,00	$ 84.032,00	13,00	$ 84.032,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	13,00	$ 84.032,00	100,00%
35.44	15,01,44	HIS44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 16.051,00	4,00	$ 64.204,00	4,00	$ 64.204,00	4,00	$ 64.204,00	4,00	$ 64.204,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 64.204,00	100,00%
35.45	15,01,45	HIS151	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1.1/2"	UND	$ 310.712,00	4,00	$ 1.242.848,00	4,00	$ 1.242.848,00	4,00	$ 1.242.848,00	4,00	$ 1.242.848,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 1.242.848,00	100,00%
35.46	15,01,46	HIS45	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1.1/4"	UND	$ 233.371,00	3,00	$ 700.113,00	3,00	$ 700.113,00	3,00	$ 700.113,00	3,00	$ 700.113,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 700.113,00	100,00%
35.47	15,01,47	HIS46	ABRAZADERAS Ø 1,1/2"-1/2"	UND	$ 7.774,00	58,00	$ 450.892,00	58,00	$ 450.892,00	58,00	$ 450.892,00	58,00	$ 450.892,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	58,00	$ 450.892,00	100,00%
35.48	15,01,48	HIS47	ABRAZADERAS Ø 1.1/4"-1/2"	UND	$ 8.927,00	24,00	$ 214.248,00	24,00	$ 214.248,00	24,00	$ 214.248,00	24,00	$ 214.248,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	24,00	$ 214.248,00	100,00%
35.49	15,01,49	HIS48	LLAVE MANGUERA Ø 1/2"	UND	$ 48.400,00	6,00	$ 290.400,00	6,00	$ 290.400,00	6,00	$ 290.400,00	6,00	$ 290.400,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 290.400,00	100,00%
35.50	15,01,50	HIS110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1. 1/4"	UND	$ 9.385,00	28,00	$ 262.780,00	28,00	$ 262.780,00	28,00	$ 262.780,00	28,00	$ 262.780,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	28,00	$ 262.780,00	100,00%
35.51	15,01,51	HIS111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 6.829,00	7,00	$ 47.803,00	7,00	$ 47.803,00	7,00	$ 47.803,00	7,00	$ 47.803,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,00	$ 47.803,00	100,00%
35.52	15,01,52	HS-272	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1/2"	UND	$ 116.529,00	6,00	$ 699.174,00	6,00	$ 699.174,00	6,00	$ 699.174,00	6,00	$ 699.174,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 699.174,00	100,00%
		36	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**				**$ 126.836.118,00**		**$ 274.561.857,00**		**$ 145.392.460,00**		**$ 145.392.460,00**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 145.392.460,00**	**100,00%**
36.01	15,02,01	HIS49	TUBERÍA PVC.S Ø 6". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 103.405,00	318,80	$ 32.965.514,00	318,80	$ 32.965.514,00	318,80	$ 32.965.514,00	318,80	$ 32.965.514,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	318,80	$ 32.965.514,00	100,00%
36.02	15,02,02	HIS50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 6"	UND	$ 157.233,00	4,00	$ 628.932,00	4,00	$ 628.932,00	4,00	$ 628.932,00	4,00	$ 628.932,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 628.932,00	100,00%
36.03	15,02,03	HS-201	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 6"	UND	$ 172.366,00	1,00	$ 172.366,00	1,00	$ 172.366,00	1,00	$ 172.366,00	1,00	$ 172.366,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 172.366,00	100,00%
36.04	15,02,04	HIS51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 6X4"	UND	$ 163.020,00	12,00	$ 1.956.240,00	12,00	$ 1.956.240,00	12,00	$ 1.956.240,00	12,00	$ 1.956.240,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	12,00	$ 1.956.240,00	100,00%
36.05	15,02,05	HS-202	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 6X3"	UND	$ 168.676,00	6,00	$ 1.012.056,00	6,00	$ 1.012.056,00	6,00	$ 1.012.056,00	6,00	$ 1.012.056,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 1.012.056,00	100,00%
36.06	15,02,06	HIS53	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 52.701,00	54,40	$ 2.866.934,00	54,40	$ 2.866.934,00	54,40	$ 2.866.934,00	54,40	$ 2.866.934,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	54,40	$ 2.866.934,00	100,00%
36.07	15,02,07	HIS54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"	UND	$ 30.168,00	35,00	$ 1.055.880,00	35,00	$ 1.055.880,00	35,00	$ 1.055.880,00	35,00	$ 1.055.880,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	35,00	$ 1.055.880,00	100,00%
36.08	15,02,08	HIS55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 4"	UND	$ 35.581,00	4,00	$ 142.324,00	4,00	$ 142.324,00	4,00	$ 142.324,00	4,00	$ 142.324,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 142.324,00	100,00%
36.09	15,02,09	HIS56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 4"	UND	$ 47.449,00	15,00	$ 711.735,00	15,00	$ 711.735,00	15,00	$ 711.735,00	15,00	$ 711.735,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	15,00	$ 711.735,00	100,00%
36.10	15,02,10	HIS57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 4"	UND	$ 19.658,00	72,00	$ 1.415.376,00	72,00	$ 1.415.376,00	72,00	$ 1.415.376,00	72,00	$ 1.415.376,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	72,00	$ 1.415.376,00	100,00%
36.11	15,02,11	HIS58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC.S Ø 4"	UND	$ 35.371,00	3,00	$ 106.113,00	3,00	$ 106.113,00	3,00	$ 106.113,00	3,00	$ 106.113,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 106.113,00	100,00%
36.12	15,02,12	HS-61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 4"	UND	$ 37.153,00	4,00	$ 148.612,00	4,00	$ 148.612,00	4,00	$ 148.612,00	4,00	$ 148.612,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 148.612,00	100,00%
36.13	15,02,13	HIS61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 36.837,00	14,00	$ 515.718,00	14,00	$ 515.718,00	14,00	$ 515.718,00	14,00	$ 515.718,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14,00	$ 515.718,00	100,00%
36.14	15,02,14	HIS62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"	UND	$ 36.837,00	14,00	$ 515.718,00	14,00	$ 515.718,00	14,00	$ 515.718,00	14,00	$ 515.718,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14,00	$ 515.718,00	100,00%
36.15	15,02,15	HIS63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 20.072,00	23,00	$ 461.656,00	23,00	$ 461.656,00	23,00	$ 461.656,00	23,00	$ 461.656,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	23,00	$ 461.656,00	100,00%
36.16	15,02,16	HIS64	TUBERÍA PVC.S Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 33.984,00	19,80	$ 672.883,00	19,80	$ 672.883,00	19,80	$ 672.883,00	19,80	$ 672.883,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	19,80	$ 672.883,00	100,00%
36.17	15,02,17	HIS65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 3"	UND	$ 19.592,00	174,00	$ 3.409.008,00	174,00	$ 3.409.008,00	174,00	$ 3.409.008,00	174,00	$ 3.409.008,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	174,00	$ 3.409.008,00	100,00%
36.18	15,02,18	HS-206	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 3"	UND	$ 23.937,00	3,00	$ 71.811,00	3,00	$ 71.811,00	3,00	$ 71.811,00	3,00	$ 71.811,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 71.811,00	100,00%
36.19	15,02,19	HS-207	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 3"	UND	$ 34.550,00	7,00	$ 241.850,00	7,00	$ 241.850,00	7,00	$ 241.850,00	7,00	$ 241.850,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,00	$ 241.850,00	100,00%
36.20	15,02,20	HIS66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 3"	UND	$ 24.443,00	14,00	$ 342.202,00	14,00	$ 342.202,00	14,00	$ 342.202,00	14,00	$ 342.202,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14,00	$ 342.202,00	100,00%
36.21	15,02,21	HIS67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 3X2"	UND	$ 23.584,00	7,00	$ 165.088,00	7,00	$ 165.088,00	7,00	$ 165.088,00	7,00	$ 165.088,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,00	$ 165.088,00	100,00%
36.22	15,02,22	HIS68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 3X2"	UND	$ 12.184,00	5,00	$ 60.920,00	5,00	$ 60.920,00	5,00	$ 60.920,00	5,00	$ 60.920,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,00	$ 60.920,00	100,00%
36.23	15,02,23	HIS149	TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 25.927,00	33,40	$ 865.962,00	33,40	$ 865.962,00	33,40	$ 865.962,00	33,40	$ 865.962,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	33,40	$ 865.962,00	100,00%
36.24	15,02,24	HIS69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"	UND	$ 9.087,00	46,00	$ 418.002,00	46,00	$ 418.002,00	46,00	$ 418.002,00	46,00	$ 418.002,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	46,00	$ 418.002,00	100,00%
36.25	15,02,25	HIS70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 2"	UND	$ 15.631,00	1,00	$ 15.631,00	1,00	$ 15.631,00	1,00	$ 15.631,00	1,00	$ 15.631,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 15.631,00	100,00%
36.26	15,02,26	HS-274	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 2"	UND	$ 10.522,00	15,00	$ 157.830,00	15,00	$ 157.830,00	15,00	$ 157.830,00	15,00	$ 157.830,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	15,00	$ 157.830,00	100,00%
36.27	15,02,27	HIS71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 2"	UND	$ 14.447,00	8,00	$ 115.576,00	8,00	$ 115.576,00	8,00	$ 115.576,00	8,00	$ 115.576,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8,00	$ 115.576,00	100,00%
36.28	15,02,28	HIS72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 2"	UND	$ 10.821,00	18,00	$ 194.778,00	18,00	$ 194.778,00	18,00	$ 194.778,00	18,00	$ 194.778,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	18,00	$ 194.778,00	100,00%
36.29	15,02,29	HIS73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 180º PVC.S Ø 2"	UND	$ 16.144,00	1,00	$ 16.144,00	1,00	$ 16.144,00	1,00	$ 16.144,00	1,00	$ 16.144,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 16.144,00	100,00%
36.30	15,02,30	HIS146	TUBERÍA PVC.L Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 37.817,00	111,60	$ 4.220.377,00	111,60	$ 4.220.377,00	111,60	$ 4.220.377,00	111,60	$ 4.220.377,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	111,60	$ 4.220.377,00	100,00%
36.31	15,02,31	HIS145	TUBERÍA PVC.L Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 23.298,00	505,80	$ 11.784.128,00	505,80	$ 11.784.128,00	505,80	$ 11.784.128,00	505,80	$ 11.784.128,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	505,80	$ 11.784.128,00	100,00%
36.32	15,02,32	HIS75	VÁLVULA DE ADMISIONES DE AIRE P.A.P.A Ø 3"	UND	$ 2.381.934,00	3,00	$ 7.145.802,00	3,00	$ 7.145.802,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
36.33	15,02,33	HIS76	ABRAZADERAS Ø 4"-2"	UND	$ 44.268,00	6,00	$ 265.608,00	6,00	$ 265.608,00	6,00	$ 265.608,00	6,00	$ 265.608,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 265.608,00	100,00%
36.34	15,02,34	HIS77	TUBERÍA PVC. ALC Ø 8". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 75.073,00	129,60	$ 9.729.461,00	129,60	$ 9.729.461,00	129,60	$ 9.729.461,00	129,60	$ 9.729.461,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	129,60	$ 9.729.461,00	100,00%
36.35		**NP023**	DESMONTAJE DE CAMPANA GRANDE Y ESTRUCTURA DE SOPORTE UBICADA EN CUBIERTA DE TORRE CAMPANARIO (ALTURA 18 m). INCLUYE LIMPIEZA, RETIRO, EMBALAJE Y TRASLADO A SITIO DE ALMACENAMIENTO AUTORIZADO POR EL CLIENTE.	UND	$ 2.188.636,00		$ -	1,00	$ 2.188.636,00	1,00	$ 2.188.636,00	1,00	$ 2.188.636,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 2.188.636,00	100,00%
36.36		**NP024**	DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA CON SECCION ENTRE LOS 40CM2 y 139CM2 , INCLUYE DISPOSICION FINAL	ML	$ 29.460,00		$ -	3088,00	$ 90.972.480,00	1544,00	$ 45.486.240,00	1544,00	$ 45.486.240,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.544,00	$ 45.486.240,00	100,00%
36.37		**NP025**	TUBERÍA PVC.L Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	ML	$ 15.488,00		$ -	40,90	$ 633.459,00	40,90	$ 633.459,00	40,90	$ 633.459,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	40,90	$ 633.459,00	100,00%
36.38		**NP026**	TUBERÍA PVC.P Ø 1 1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	ML	$ 14.210,00		$ -	45,77	$ 650.392,00	45,77	$ 650.392,00	45,77	$ 650.392,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	45,77	$ 650.392,00	100,00%
36.39		**NP027**	DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA CON SECCION ENTRE LOS 140CM2 y 280CM2 , INCLUYE DISPOSICION FINAL	ML	$ 49.380,00		$ -	770,00	$ 38.022.600,00	385,00	$ 19.011.300,00	385,00	$ 19.011.300,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	385,00	$ 19.011.300,00	100,00%
36.40		**NP028**	VÁLVULA DE DILUVIO MARCA HI-FOG® MODELO SVM-20 (25/25), CÓDIGO D00050.1 O SIMILAR CON SENSOR DE FLUJO, MANÓMETRO, TOMA DE PRUEBAS Y VÁLVULA SUPERVISADA DE CIERRE Y APERTURA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERÍA DE 25 MM.	UND	$ 7.629.086,00		$ -	2,00	$ 15.258.172,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
36.41	15,02,35	HIS78	FILTRO DE DRENAJE 4" PVC CORRUGADO. INCLUYE TUBERÍA. GEOTEXTIL Y GRAVILLA	M	$ 150.366,00	281,10	$ 42.267.883,00	281,10	$ 42.267.883,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		37	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA Y APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**				**$ 103.501.836,00**		**$ 103.501.836,00**		**$ 90.988.031,00**		**$ 90.988.031,00**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 90.988.031,00**	**100,00%**
37.01	15,03,01	HIS105	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1. 1/4"	UND	$ 42.168,00	12,00	$ 506.016,00	12,00	$ 506.016,00	12,00	$ 506.016,00	12,00	$ 506.016,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	12,00	$ 506.016,00	100,00%
37.02	15,03,02	HIS106	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1/2"	UND	$ 29.393,00	22,00	$ 646.646,00	22,00	$ 646.646,00	22,00	$ 646.646,00	22,00	$ 646.646,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	22,00	$ 646.646,00	100,00%
37.03	15,03,03	HIS107	PUNTO HIDRÁULICO Ø 3/4"	UND	$ 32.094,00	5,00	$ 160.470,00	5,00	$ 160.470,00	5,00	$ 160.470,00	5,00	$ 160.470,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,00	$ 160.470,00	100,00%

37.04	15,04,01	HIS112	SALIDA SANITARIA Ø 4"	UND	$ 88.457,00	12,00	$ 1.061.484,00	12,00	$ 1.061.484,00	12,00	$ 1.061.484,00	12.00	$ 1.061.484,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	12,00	$ 1.061.484,00	100,00%
37.05	15,04,02	HIS113	SALIDA SANITARIA Ø 2"	UND	$ 72.679,00	22,00	$ 1.598.938,00	22,00	$ 1.598.938,00	22,00	$ 1.598.938,00	22.00	$ 1.598.938,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	22,00	$ 1.598.938,00	100,00%
37.06	15,04,03	HIS114	SIFÓN Ø 3". INCLUYE REJILLA	UND	$ 52.483,00	8,00	$ 419.864,00	8,00	$ 419.864,00	8,00	$ 419.864,00	8.00	$ 419.864,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8,00	$ 419.864,00	100,00%
37.07	15,05,01	HIS152	CAJA DE INSPECCIÓN 0.6X0.6	UND	$ 493.300,00	33,00	$ 16.278.900,00	33,00	$ 16.278.900,00	33,00	$ 16.278.900,00	33.00	$ 16.278.900,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	33,00	$ 16.278.900,00	100,00%
37.08	15,05,02	HS-191	SUMIDEROS DE 65X15CM TIPO EAAB	UND	$ 764.009,00	7,00	$ 5.348.063,00	7,00	$ 5.348.063,00	7,00	$ 5.348.063,00	7.00	$ 5.348.063,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,00	$ 5.348.063,00	100,00%
37.09	15,05,03	HS-263	SUMIDEROS - CÁRCAMO CON REJA TIPO IDU 83.5X45 CM	M	$ 476.074,00	14,00	$ 6.665.036,00	14,00	$ 6.665.036,00	14,00	$ 6.665.036,00	14.00	$ 6.665.036,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14,00	$ 6.665.036,00	100,00%
37.10	16,01,01	HIS161	KIT TAZA BÁLTICA PLUS ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.737.544,00	12,00	$ 20.850.528,00	12,00	$ 20.850.528,00	12,00	$ 20.850.528,00	12.00	$ 20.850.528,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	12,00	$ 20.850.528,00	100,00%
37.11	16,01,02	HS-178	ORINAL GOTTA ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.301.303,00	5,00	$ 6.506.515,00	5,00	$ 6.506.515,00	5,00	$ 6.506.515,00	5.00	$ 6.506.515,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,00	$ 6.506.515,00	100,00%
37.12	16,01,03	HS-180	LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO PIGMENTADO FUNDIDO EN SITIO. NO INCLUYE GRIFERÍA	M	$ 631.520,00	8,40	$ 5.304.768,00	8,40	$ 5.304.768,00	8,40	$ 5.304.768,00	8.40	$ 5.304.768,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8,40	$ 5.304.768,00	100,00%
37.13	16,01,04	HS-181	LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL ELECTRÓNICA Y/O SIMILAR.	UND	$ 706.177,00	3,00	$ 2.118.531,00	3,00	$ 2.118.531,00	3,00	$ 2.118.531,00	3,00	$ 2.118.531,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 2.118.531,00	100,00%
37.14	16,01,05	HS-182	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SENSOR TUBULAR LARGO Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.470.142,00	16,00	$ 23.522.272,00	16,00	$ 23.522.272,00	16,00	$ 23.522.272,00	16.00	$ 23.522.272,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	16,00	$ 23.522.272,00	100,00%
37.15	16,01,06	HS-183	DISPENSADOR DE JABÓN DE PARED EN ACERO INOX.	UND	$ 329.335,00	8,00	$ 2.634.680,00	8,00	$ 2.634.680,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
37.16	16,01,07	HS-184	DISPENSADOR DE ROLLO PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO SOPORTE DEL ROLLO 40MM, INCLUYE SUPLEMENTO PARA ROLLOS CON CONO DE70MM.	UND	$ 256.038,00	12,00	$ 3.072.456,00	12,00	$ 3.072.456,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
37.17	16,01,08	HS-185	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL DIMENSIONES 0.28X20.3X10.2CM. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO.	UND	$ 378.785,00	8,00	$ 3.030.280,00	8,00	$ 3.030.280,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
37.18	16,01,09	HS-186	BARRA DE SEGURIDAD CROMO 30" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE ABATIBLE.	UND	$ 422.776,00	2,00	$ 845.552,00	2,00	$ 845.552,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
37.19	16,01,10	HS-187	ESPEJOS 4MM, EN CRISTAL PULIDO, ENMARCADO EN U DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y ADHERIDOS A LA PARED	M2	$ 389.739,00	7,52	$ 2.930.837,00	7,52	$ 2.930.837,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		38	**EQUIPOS 1**				**$ 13.111.498,00**		**$ 13.111.498,00**		**$ -**		**$ -**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**
38.01	13,07,03	ELE114	DUCTO EN LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE 14 DIÁMETRO ESPECIFICADO, INCLUYE ACCESORIOS DE REMATE, CODOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M	$ 151.502,00	25,00	$ 3.787.550,00	25,00	$ 3.787.550,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.02	13,07,04	ELE115	RECUBRIMIENTO DE DUCTO DE ESCAPE EN LÁMINA DE ALUMINIO Y LANA DE VIDRIO ESPESOR 2"	M	$ 187.957,00	20,00	$ 3.759.140,00	20,00	$ 3.759.140,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.03	13,07,05	ELE116	INSTALACIÓN DE DUCTO Y SILENCIADOR	UND	$ 1.304.762,00	1,00	$ 1.304.762,00	1,00	$ 1.304.762,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.04	13,07,06	ELE117	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) DE LLENADO INICIAL DE LOS TANQUES	GAL	$ 12.810,00	1,00	$ 12.810,00	1,00	$ 12.810,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.05	13,07,07	ELE118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO TRAMPA DE AIRE CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIONES	UND	$ 2.109.212,00	1,00	$ 2.109.212,00	1,00	$ 2.109.212,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.06	13,07,08	ELE119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PARA TOMA DE AIRE FRESCO SEGÚN ESPECIFICACIONES	M	$ 2.138.024,00	1,00	$ 2.138.024,00	1,00	$ 2.138.024,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
			EQUIPOS 2				**$ 79.036.682,00**		**$ 59.311.696,00**		**$ -**		**$ -**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**
38.07	18,01,01	ELM011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND MINI SPLIT TIPO PARED DE 9.000 BTU/H INVERTER	UND	$ 4.833.586,00	4,00	$ 19.334.344,00	2,00	$ 9.667.172,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.08	18,01,02	ELM012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 203 CFM, @ 0.36 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.693.781,00	2,00	$ 3.387.562,00	1,00	$ 1.693.781,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.09	18,01,03	ELM013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 372 CFM, @ 0.40 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.855.110,00	2,00	$ 3.710.220,00	1,00	$ 1.855.110,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.10	18,01,04	ELM014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO PLAFÓN, CAUDAL DE 168 CFM, @ 0.38 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.512.582,00	2,00	$ 3.025.164,00	1,00	$ 1.512.582,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.11	18,01,05	ELM015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELIO CENTRÍFUGO, CAUDAL DE 241 CFM, @ 0.39 INWG, PARA LA ZONA DE ASEO	UND	$ 1.789.978,00	2,00	$ 3.579.956,00	1,00	$ 1.789.978,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.12	18,01,06	ELM016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 436 CFM, @ 0.4 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.855.110,00	2,00	$ 3.710.220,00	2,00	$ 3.710.220,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.13	18,01,07	ELM017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELIO CENTRÍFUGO, CAUDAL DE 186 CFM, @ 0.38 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.512.582,00	2,00	$ 3.025.164,00	1,00	$ 1.512.582,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.14	18,01,08	ELM018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 404 CFM, @ 0.4 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.855.110,00	2,00	$ 3.710.220,00	2,00	$ 3.710.220,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.15	18,01,09	ELM019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELIO CENTRÍFUGO, CAUDAL DE 215 CFM, @ 0.18 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.693.781,00	2,00	$ 3.387.562,00	1,00	$ 1.693.781,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.16	18,01,10	ELM020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELIO CENTRÍFUGO, CAUDAL DE 243 CFM, @ 0.19 INWG, PARA LA ZONA DE ASEO	UND	$ 1.789.978,00	6,00	$ 10.739.868,00	6,00	$ 10.739.868,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.17	18,01,11	ELM021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO CAJA DE VENTILACIÓN, CAUDAL DE 1285 CFM, @ 0.1 INWG, PARA LA ZONA DE VENTILACIÓN	UND	$ 3.571.067,00	6,00	$ 21.426.402,00	6,00	$ 21.426.402,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		39	**CONDUCTOS E ILUMINACIÓN**				**$ 321.115.275,00**		**$ 321.115.754,00**		**$ 205.853.978,00**		**$ 205.853.978,00**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 205.853.978,00**	**100,00%**
39.01	24.01.01	BIM005	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES (15%, QUINCE PORCIENTO PARA ESTE COMPONENTE)	UND	$ 693.676.269,00	0,15	$ 104.051.440,00	0,15	$ 104.051.440,00	0,15	$ 104.051.440,00	0,15	$ 104.051.440,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,15	$ 104.051.440,00	100,00%
39.02	18,02,01	ELM051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA	KG	$ 122.403,00	774,07	$ 94.748.011,00	774,07	$ 94.748.490,00	774,07	$ 94.748.490,00	774,07	$ 94.748.490,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	774,07	$ 94.748.490,00	100,00%
39.03	18,03,01	ELM067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE 8"X8" ALETA FIJA MODELO L-RA	UND	$ 169.073,00	11,00	$ 1.859.803,00	11,00	$ 1.859.803,00	11,00	$ 1.859.803,00	11.00	$ 1.859.803,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	11,00	$ 1.859.803,00	100,00%
39.04	18,03,02	ELM068	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE 18"X16" ALETA FIJA MODELO L-RA	UND	$ 508.162,00	6,00	$ 3.048.972,00	6,00	$ 3.048.972,00	6,00	$ 3.048.972,00	6.00	$ 3.048.972,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 3.048.972,00	100,00%
39.05	18,03,03	ELM069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONTRA ROEDORES PARA DESCARGA DE EXTRACCIONES	UND	$ 165.021,00	13,00	$ 2.145.273,00	13,00	$ 2.145.273,00	13,00	$ 2.145.273,00	13,00	$ 2.145.273,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	13,00	$ 2.145.273,00	100,00%
39.06	13,05,01	ELE078	LUMINARIA TIPO PANEL RD CIRCULAR 30 CM, 30W, 120V	UND	$ 54.238,00	47,00	$ 2.549.186,00	47,00	$ 2.549.186,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
39.07	13,05,02	ELE080	LUMINARIAS DESCOLGADAS EN PASILLO 26W, 120V	UND	$ 487.554,00	68,00	$ 33.153.672,00	68,00	$ 33.153.672,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
39.08	13,05,03	ELE081	LUMINARIAS DE EMERGENCIA 2.6W.120V	UND	$ 183.712,00	65,00	$ 11.941.280,00	65,00	$ 11.941.280,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
39.09	13,05,04	ELE082	LUMINARIA COLGANTE CONTINUUM 80W, 120V 220X8 CM	UND	$ 556.529,00	34,00	$ 18.921.986,00	34,00	$ 18.921.986,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
39.10	13,05,05	ELE083	BAÑADORES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE 1M	UND	$ 752.824,00	57,00	$ 42.910.968,00	57,00	$ 42.910.968,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
39.11	13,05,06	ELE084	REFLECTORES EXTERIORES 70W	UND	$ 78.239,00	6,00	$ 469.434,00	6,00	$ 469.434,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
39.12	13,05,07	ELE085	CINTA LED ARQUITECTÓNICA 8W STR800	UND	$ 42.522,00	125,00	$ 5.315.250,00	125,00	$ 5.315.250,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		40	**ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO**				**$ 286.921.390,00**		**$ 286.921.390,00**		**$ 256.403.319,00**		**$ 256.403.319,00**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 256.403.319,00**	**100,00%**
40.01	13,07,01	ELE112	TRANSFERENCIA PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO CON PROTECCIÓN INDUSTRIAL DE 3X63 A. I MAGNÉTICA DE 400 A. ICC 100KA	UND	$ 12.825.065,00	2,00	$ 25.650.130,00	2,00	$ 25.650.130,00	2,00	$ 25.650.130,00	2,00	$ 25.650.130,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 25.650.130,00	100,00%
40.02	13,07,02	ELE113	SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA, PARA SUPLENCIA TOTAL, STAND BY DE EMERGENCIA ENCABINADA DE 100 KVA S.B. EFECTIVOS A LA ALTURA DE BOGOTÁ 208/120 V 3F-4H 60HZ.	UND	$ 163.794.336,00	1,00	$ 163.794.336,00	1,00	$ 163.794.336,00	1,00	$ 163.794.336,00	1,00	$ 163.794.336,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 163.794.336,00	100,00%
40.03	13,07,09	ELE120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS	UND	$ 265.798,00	1,00	$ 265.798,00	1,00	$ 265.798,00	1,00	$ 265.798,00	1.00	$ 265.798,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 265.798,00	100,00%
40.04	13,07,10	ELE121	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA Y CABLEADO SISTEMA DE CONTROL DESDE LAS PLANTA HASTA TRANSFERENCIA	M	$ 54.197,00	25,00	$ 1.354.925,00	25,00	$ 1.354.925,00	25,00	$ 1.354.925,00	25,00	$ 1.354.925,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	25,00	$ 1.354.925,00	100,00%
40.05	13,07,11	ELE122	UPS ONLINE DE 7 KVA TRIFÁSICA VOLTAJE DE ENTRADA 208 V AC Y DE SALIDA 208V AC, 60 HZ, INCLUYE BANCO DE BATERÍAS CON AUTONOMÍA DE 5 MINUTOS.	UND	$ 11.108.117,00	2,00	$ 22.216.234,00	2,00	$ 22.216.234,00	2,00	$ 22.216.234,00	2,00	$ 22.216.234,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 22.216.234,00	100,00%
40.06	18,04,01	ELM086	CONEXIÓN DE EQUIPO A RED ELÉCTRICA	UND	$ 5.558.403,00	4,00	$ 22.233.612,00	4,00	$ 22.233.612,00	4,00	$ 22.233.612,00	4.00	$ 22.233.612,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 22.233.612,00	100,00%
40.07	18,04,02	ELM087	PRUEBAS DE BALANCEO DEL SISTEMA, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA	GLB	$ 1.490.624,00	1,00	$ 1.490.624,00	1,00	$ 1.490.624,00	1,00	$ 1.490.624,00	1.00	$ 1.490.624,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 1.490.624,00	100,00%
40.08	14,01,08	CYS008	RACK PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE 90CM X 60CM, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES DE ALTA DENSIDAD Y ORGANIZADORES HORIZONTALES	UND	$ 2.449.180,00	2,00	$ 4.898.360,00	2,00	$ 4.898.360,00	2,00	$ 4.898.360,00	2,00	$ 4.898.360,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 4.898.360,00	100,00%
40.09	14,01,09	CYS009	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS	UND	$ 938.680,00	2,00	$ 1.877.360,00	2,00	$ 1.877.360,00	2,00	$ 1.877.360,00	2.00	$ 1.877.360,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 1.877.360,00	100,00%
40.10	14,01,10	CYS010	SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS	UND	$ 9.620.282,00	1,00	$ 9.620.282,00	1,00	$ 9.620.282,00	1,00	$ 9.620.282,00	1,00	$ 9.620.282,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 9.620.282,00	100,00%
40.11	14,01,11	CYS012	STRIP TELEFÓNICO 20 PARES 60X60X10	UND	$ 198.152,00	1,00	$ 198.152,00	1,00	$ 198.152,00	1,00	$ 198.152,00	1.00	$ 198.152,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 198.152,00	100,00%
40.12	14,01,12	CYS013	CERTIFICACIÓN PUNTOS CAT 6A Y FIBRA OPTICA	UND	$ 20.983,00	46,00	$ 965.218,00	46,00	$ 965.218,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
40.13	14,03,04	CYS049	CÁMARA IP POE ULTRA HD 4K DE 8MP	UND	$ 1.057.832,00	24,00	$ 25.387.968,00	24,00	$ 25.387.968,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
40.14	14,04,03	CYS063	SUMINISTRO. TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARLANTES AMBIENTALES	UND	$ 467.251,00	6,00	$ 2.803.506,00	6,00	$ 2.803.506,00	6,00	$ 2.803.506,00	6.00	$ 2.803.506,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 2.803.506,00	100,00%
40.15	14,04,04	CYS064	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLANTA AMPLIFICADORA DE SONIDO DE 14 CANALES	UND	$ 4.164.885,00	1,00	$ 4.164.885,00	1,00	$ 4.164.885,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		41	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO. SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**				**$ 28.769.450,00**		**$ 28.769.450,00**		**$ -**		**$ -**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**
41.01	19,02,01	SÑL002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 22X15CM EN BASE DE POLIESTIRENO PARA ADHERIR.	UND	$ 43.339,00	8,00	$ 346.712,00	8,00	$ 346.712,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
41.02	19,02,02	SÑL003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 20X20CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2	UND	$ 64.661,00	9,00	$ 581.949,00	9,00	$ 581.949,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
41.03	19,02,03	SÑL004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X20CM FOTOLUMINISCENTE 60 MINUTOS, BASE ACRÍLICA CON ACCESORIOS PARA DESCOLGAR	UND	$ 73.681,00	58,00	$ 4.273.498,00	58,00	$ 4.273.498,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
41.04	19,02,04	SÑL005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2	UND	$ 88.713,00	1,00	$ 88.713,00	1,00	$ 88.713,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
41.05	19,02,05	SÑL006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 40X30CM FOTOLUMINISCENTE 60 MINUTOS, BASE ACRÍLICA CON ACCESORIOS PARA DESCOLGAR EN PARED	UND	$ 100.738,00	7,00	$ 705.166,00	7,00	$ 705.166,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
41.06	19,02,06	SÑL007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 40X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2	UND	$ 102.241,00	1,00	$ 102.241,00	1,00	$ 102.241,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
41.07	19,02,07	SÑL010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL EN PLATINA CALIBRE 1/4" ANCHO 3CM, LARGO 60CM - PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. PIEZA DE MADERA 10 X 15 CM - MADERA NATURAL O TABLERO LAMINADO. ACRÍLICO TRANSPARENTE CALIBRE 5MM. DE 50X10CM	UND	$ 153.166,00	57,00	$ 8.730.462,00	57,00	$ 8.730.462,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
41.08	19,02,08	SÑL011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL AUTO ILUMINADA 90MIN - 30X20CM RETROILUMINADA CHASIS EN PLÁSTICO, BATERÍA DURACIÓN 90 MINUTOS	UND	$ 453.442,00	15,00	$ 6.801.630,00	15,00	$ 6.801.630,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
41.09	19,01,01	RMB001	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO EXISTENTE FRENTE A HUELLAS DE ANIMALES	UND	$ 189.348,00	19,00	$ 3.597.612,00	19,00	$ 3.597.612,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
41.10	19,01,02	RMB002	RESTAURACIÓN DE PEDESTALES DE MADERA PARA LAS ESCULTURAS. SECCIÓN CUADRADA DE 0.52M DE LADO POR 1.70M DE ALTO. INCLUYE LIJADO, LIMPIEZA, INMUNIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LACA SELLADORA PARA MADERA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.	UND	$ 118.265,00	19,00	$ 2.247.035,00	19,00	$ 2.247.035,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
41.11	19,03,01	DT01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÓCKER METÁLICO DE 12 PUESTOS, ALTURA 2.00 MT. FONDO 0.30, ANCHO 93 CON ESTRUCTURA METÁLICA COLD ROLLED CALIBRE 24. MEDIDAS DE CADA COMPARTIMENTO: ALTO 0.46 X 0.28 X 0.30 M. MANIJA EN PVC CON RÓTULO IDENTIFICADOR EN CADA PUERTA Y PORTACANDADO. PINTURA ELECTROSTÁTICA GRIS.	UND	$ 1.294.432,00	1,00	$ 1.294.432,00	1,00	$ 1.294.432,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		42	**VITRALES CAPILLA**				**$ 319.829.920,00**		**$ 336.935.404,00**		**$ 150.529.921,00**		**$ 150.529.921,00**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 150.529.921,00**	**100,00%**
42.01	20.01.03	RBMCC003	DESMONTE Y RESTAURACIÓN DE MARCO DE MADERA DE CEDRO QUE SOPORTA LOS PANELES VITRALES	M2	$ 1.391.916,00	90,00	$ 125.272.440,00	97,52	$ 135.739.648,00	97,52	$ 135.739.648,00	97,52	$ 135.739.648,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	97,52	$ 135.739.648,00	100,00%
42.02	20.01.04	RBMCC004	LIMPIEZA DEL VITRAL POR AMBAS CARAS, INCLUYE ELIMINACIÓN DE MASILLA	M2	$ 151.664,00	90,00	$ 13.649.760,00	97,52	$ 14.790.273,00	97,52	$ 14.790.273,00	97,52	$ 14.790.273,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	97,52	$ 14.790.273,00	100,00%
42.03	20.01.05	RBMCC005	UNIÓN DE FRACTURAS CON RESINA EPÓXICA	UND	$ 34.487,00	100,00	$ 3.448.700,00	100,00	$ 3.448.700,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%

42.04	20.01.06	RBMCC006	RECUPERACIÓN DE PLANO DE PANELES, INCLUYE REFUERZOS CON PUNTOS DE SOLDADURA EN PLOMOS.	UND	$ 141.854,00	30,00	$ 4.255.620,00	30,00	$ 4.255.620,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
42.05	20.01.07	RBMCC007	RESTITUCIÓN Y ACOMODACIÓN DE CAÑUELAS DE PLOMO.	M	$ 55.482,00	100,00	$ 5.548.200,00	100,00	$ 5.548.200,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
42.06	20.01.08	RBMCC008	RESTITUCIÓN DE FALTANTES DE VIDRIO DE ACUERDO CON TÉCNICA ORIGINAL	M2	$ 6.635.168,00	0,50	$ 3.317.584,00	0,50	$ 3.317.584,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
42.07	20.01.09	RBMCC009	PUNTOS DE SOLDADURA EN LOS CRUCES DE UNIÓN ENTRE LAS CAÑUELAS DE PLOMO DETERIORADAS O FISURADAS.	UND	$ 28.991,00	1.800,00	$ 52.183.800,00	1800,00	$ 52.183.800,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
42.08	20.01.10	RBMCC010	ADICIÓN DE MASILLA ENTRE PLOMOS. INCLUYE LIMPIEZA.	M2	$ 540.094,00	90,00	$ 48.608.460,00	97,52	$ 52.669.967,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
42.09	20.01.11	RBMCC011	LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO EN VARILLAS DE REFUERZO.	M	$ 73.806,00	130,00	$ 9.594.780,00	130,00	$ 9.594.780,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
42.10	20.01.12	RBMCC012	RESTITUCIÓN DE AMARRES A VARILLAS METÁLICAS DE REFUERZO.	UND	$ 20.654,00	920,00	$ 19.001.680,00	920,00	$ 19.001.680,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
42.11	20.01.13	RBMCC013	MONTAJE DE PANELES DE VITRAL AL MARCO DE MADERA. INCLUYE TRASLADO.	UND	$ 119.688,00	292,00	$ 34.948.896,00	304,00	$ 36.385.152,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		43	**BIENES MUEBLES CAPILLA**						**$ 1.271.834,00**		**$ 934.687,00**		**$ 934.687,00**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 934.687,00**	**100,00%**
			PLACA # 1 CAPILLA. SOPORTE EN MÁRMOL.				**$ 1.271.834,00**																
43.01	20.02.01	RBMCC014	LIMPIEZA EN SECO CON BROCHAS DE CERDA SUAVE EN PLACA #1 CAPILLA	M2	$ 153.361,00	0,53	$ 81.281,00	0,53	$ 81.281,00	0,53	$ 81.281,00	0,53	$ 81.281,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,53	$ 81.281,00	100,00%
43.02	20.02.02	RBMCC015	LIMPIEZA EN HÚMEDO CON DETERGENTE NEUTRO Y CEPILLOS DE CERDA PLÁSTICA	M2	$ 260.538,00	0,53	$ 138.085,00	0,53	$ 138.085,00	0,53	$ 138.085,00	0,53	$ 138.085,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,53	$ 138.085,00	100,00%
43.03	20.02.03	RBMCC016	LIMPIEZA DE MANCHAS RENUENTES POR MEDIO DE PRUEBAS DE TEST DE SOLVENTES	M2	$ 120.859,00	0,53	$ 64.055,00	0,53	$ 64.055,00	0,53	$ 64.055,00	0,53	$ 64.055,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,53	$ 64.055,00	100,00%
43.04	20.02.04	RBMCC017	ELIMINACIÓN DE REPINTE DE PINTURA NEGRA MEDIANTE PRUEBAS DE TEST DE SOLVENTES	M2	$ 145.311,00	0,53	$ 77.015,00	0,53	$ 77.015,00	0,53	$ 77.015,00	0,53	$ 77.015,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,53	$ 77.015,00	100,00%
43.05	20.02.05	RBMCC018	REINTEGRACIÓN CROMÁTICA MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA DORADA SOBRE LAS LETRAS.	M2	$ 417.729,00	0,53	$ 221.396,00	0,53	$ 221.396,00	0,53	$ 221.396,00	0,53	$ 221.396,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,53	$ 221.396,00	100,00%
43.06	20.03.01	RBMCC019	LIMPIEZA EN SECO CON BROCHAS DE CERDA SUAVE	M2	$ 153.434,00	0,53	$ 81.320,00	0,53	$ 81.320,00	0,53	$ 81.320,00	0,53	$ 81.320,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,53	$ 81.320,00	100,00%
43.07	20.03.02	RBMCC020	LIMPIEZA EN HÚMEDO CON DETERGENTE NEUTRO	M2	$ 260.553,00	0,53	$ 138.093,00	0,53	$ 138.093,00	0,53	$ 138.093,00	0,53	$ 138.093,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,53	$ 138.093,00	100,00%
43.08	20.03.03	RBMCC021	LIMPIEZA DE MANCHAS RENUENTES EN PLACA CON TEST DE SOLVENTES	M2	$ 121.633,00	0,53	$ 64.465,00	0,53	$ 64.465,00	0,53	$ 64.465,00	0,53	$ 64.465,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,53	$ 64.465,00	100,00%
43.09	20.03.04	RBMCC022	ELIMINACIÓN MECÁNICA DE INTERVENCIONES ANTERIORES EN BORDES DE LA PLACA	M2	$ 130.145,00	0,53	$ 68.977,00	0,53	$ 68.977,00	0,53	$ 68.977,00	0,53	$ 68.977,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,53	$ 68.977,00	100,00%
43.10	20.03.05	RBMCC023	RESTITUCIÓN DE FALTANTES DE SOPORTE DE PLACA CON MORTERO DE CEMENTO BLANCO Y POLVO DE MÁRMOL	M2	$ 181.875,00	0,53	$ 96.394,00	0,53	$ 96.394,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.11	20.03.06	RBMCC024	REINTEGRACIÓN DE LAS LETRAS TALLADAS DE LA INSCRIPCIÓN CON PINTURA DORADA	M2	$ 454.250,00	0,53	$ 240.753,00	0,53	$ 240.753,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
			MOLDURAS CAPILLA.				**$ 95.975.262,00**		**$ 95.975.262,00**		**$ -**		**$ -**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**
43.12	20.04.01	RBMCC025	LIMPIEZA SUPERFICIAL DE MOLDURAS EN CAPILLA CON BROCHAS Y ASPIRADORA	M	$ 80.560,00	120,00	$ 9.667.200,00	120,00	$ 9.667.200,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.13	20.04.02	RBMCC026	ELIMINACIÓN MECÁNICA DE INTERVENCIONES ANTERIORES EN MOLDURAS EN CAPILLA	M	$ 290.849,00	24,00	$ 6.980.376,00	24,00	$ 6.980.376,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.14	20.04.03	RBMCC027	LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE PICTÓRICA DE MOLDURAS EN CAPILLA MEDIANTE TEST DE SOLVENTES	M	$ 327.706,00	120,00	$ 39.324.720,00	120,00	$ 39.324.720,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.15	20.04.04	RBMCC028	CONSOLIDACIÓN DE LA SUPERFICIE DE MOLDURAS EN CAPILLA CON RESINAS SINTÉTICAS	M	$ 215.861,00	24,00	$ 5.180.664,00	24,00	$ 5.180.664,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.16	20.04.05	RBMCC029	RESANES CON YESO TIPO 3	M	$ 245.866,00	50,00	$ 12.293.300,00	50,00	$ 12.293.300,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.17	20.04.06	RBMCC030	ELABORACIÓN DE PIEZAS FALTANTES DE MOLDURAS EN CAPILLA PREVIO ELABORACIÓN DE MOLDES	UND	$ 455.612,00	10,00	$ 4.556.120,00	10,00	$ 4.556.120,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.18	20.04.07	RBMCC031	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MOLDURAS EN CAPILLA CON MATERIALES SINTÉTICOS	M	$ 184.241,00	10,00	$ 1.842.410,00	10,00	$ 1.842.410,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.19	20.04.08	RBMCC032	REINTEGRACIÓN CROMÁTICA DE MOLDURAS EN CAPILLA CON MICA O LAMINILLA DE ORO	M	$ 672.103,00	24,00	$ 16.130.472,00	24,00	$ 16.130.472,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
			LAMPARAS				**$ 6.998.195,00**		**$ 6.998.195,00**		**$ -**		**$ -**	$ -		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**
43.20	20.05.04	RBMCC035	LIMPIEZA EN SECO CON BROCHAS Y ASPIRADORA DE LÁMPARA EN TECHO	M2	$ 134.851,00	1,65	$ 222.504,00	1,65	$ 222.504,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.21	20.05.05	RBMCC036	LIMPIEZA DE LÁMPARA EN HÚMEDO CON DETERGENTE NEUTRO	M2	$ 748.842,00	1,65	$ 1.235.589,00	1,65	$ 1.235.589,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.22	20.05.06	RBMCC037	PASIVACIÓN DE PRODUCTOS DE CORROSIÓN EN LÁMPARA DE TECHO CON HEXAMETAFOSFATO	M2	$ 665.107,00	1,65	$ 1.097.427,00	1,65	$ 1.097.427,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.23	20.05.07	RBMCC038	LIMPIEZA PUNTUAL QUÍMICA DE LOS PRODUCTOS DE CORROSIÓN CON ACIDO CÍTRICO O FÓRMICO EN LÁMPARA	M2	$ 143.443,00	1,65	$ 236.681,00	1,65	$ 236.681,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.24	20.05.08	RBMCC039	PASIVACIÓN POR MEDIOS QUÍMICOS EN LÁMPARA	M2	$ 254.600,00	1,65	$ 420.090,00	1,65	$ 420.090,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.25	20.05.09	RBMCC040	INHIBICIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CORROSIÓN CON SOLUCIÓN ACUOSA CON BENZOTRIAZOL EN LÁMPARA DE TECHO	M2	$ 217.204,00	1,65	$ 358.387,00	1,65	$ 358.387,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.26	20.05.10	RBMCC041	APLICACIÓN DE CAPA DE PROTECCIÓN TIPO RESINA ACRÍLICA PARA LÁMPARA DE TECHO EN CAPILLA	M2	$ 285.059,00	1,65	$ 470.347,00	1,65	$ 470.347,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.27	20.05.11	RBMCC042	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LÁMPARA TECHO	UND	$ 1.426.173,00	1,00	$ 1.426.173,00	1,00	$ 1.426.173,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.28	20.05.12	RBMCC043	ARMADO E INSTALACIÓN DE LA LAMPARA	UND	$ 1.530.997,00	1,00	$ 1.530.997,00	1,00	$ 1.530.997,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
			LAMPARAS PARED CAPILLA.				**$ 45.595.412,00**		**$ 45.595.412,00**		**$ -**		**$ -**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**
43.29	20.06.04	RBMCC046	LIMPIEZA EN SECO CON BROCHAS Y ASPIRADORA EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA	M2	$ 66.519,00	4,90	$ 325.943,00	4,90	$ 325.943,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.30	20.06.05	RBMCC047	LIMPIEZA EN HÚMEDO CON DETERGENTE NEUTRO EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA	M2	$ 187.226,00	4,90	$ 917.407,00	4,90	$ 917.407,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.31	20.06.06	RBMCC048	PASIVACIÓN DE PRODUCTOS DE CORROSIÓN CON HEXAMETAFOSFATO EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA	M2	$ 192.368,00	4,90	$ 942.603,00	4,90	$ 942.603,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.32	20.06.07	RBMCC049	LIMPIEZA PUNTUAL QUÍMICA DE LOS PRODUCTOS DE CORROSIÓN CON ACIDO CÍTRICO O FÓRMICO EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA	M2	$ 177.212,00	2,00	$ 354.424,00	2,00	$ 354.424,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.33	20.06.08	RBMCC050	PASIVACIÓN POR MEDIOS QUÍMICOS EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA	M2	$ 116.245,00	2,00	$ 232.490,00	2,00	$ 232.490,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.34	20.06.09	RBMCC051	INHIBICIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CORROSIÓN CON SOLUCIÓN ACUOSA CON BENZOTRIAZOL EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA	M2	$ 180.925,00	2,00	$ 361.850,00	2,00	$ 361.850,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.35	20.06.10	RBMCC052	APLICACIÓN DE CAPA DE PROTECCIÓN TIPO RESINA ACRÍLICA EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA	M2	$ 209.685,00	4,90	$ 1.027.457,00	4,90	$ 1.027.457,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.36	20.06.11	RBMCC053	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA	UND	$ 1.428.520,00	14,00	$ 19.999.280,00	14,00	$ 19.999.280,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.37	20.06.12	RBMCC054	ARMADO E INSTALACIÓN DE LA LAMPARA DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA	UND	$ 1.530.997,00	14,00	$ 21.433.958,00	14,00	$ 21.433.958,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		44	**TANQUE , CUARTO DE BOMBAS, EQUIPOS Y TABLEROS**				**$ 292.028.793,00**		**$ 279.780.001,00**		**$ 279.780.001,00**		**$ 349.570.087,00**	**$ 69.790.086,00**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 349.570.087,00**	**100,00%**
44.01	05,04,01	CT01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 1.806.381,00	41,41	$ 74.802.237,00	44,89	$ 81.088.443,00	44,89	$ 81.088.443,00		$ -	-$ 81.088.443,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.02	05,04,02	CT02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 2.170.448,00	39,79	$ 86.362.126,00	47,44	$ 102.966.053,00	47,44	$ 102.966.053,00		$ -	-$ 102.966.053,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.03	05,05,01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.992,00	14.553,43	$ 130.864.430,00	10645,63	$ 95.725.505,00	10645,63	$ 95.725.505,00	38875,676970	$ 349.570.087,00	$ 253.844.582,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	38.875,68	$ 349.570.087,00	100,00%
			CUARTO BOMBAS				**$ 230.168.726,00**		**$ 233.925.871,00**		**$ 43.658.887,00**		**$ 43.658.887,00**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 43.658.887,00**	**100,00%**
44.04	17,01,01	HIS81	TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 169.906,00	18,10	$ 3.075.299,00	18,10	$ 3.075.299,00	18,10	$ 3.075.299,00	18.10	$ 3.075.299,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	18,10	$ 3.075.299,00	100,00%
44.05	17,01,02	HIS82	ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 2"	UND	$ 51.076,00	29,00	$ 1.481.204,00	29,00	$ 1.481.204,00	29,00	$ 1.481.204,00	29.00	$ 1.481.204,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	29,00	$ 1.481.204,00	100,00%
44.06	17,01,03	HIS83	TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1.1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 114.893,00	28,00	$ 3.217.004,00	28,00	$ 3.217.004,00	28,00	$ 3.217.004,00	28.00	$ 3.217.004,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	28,00	$ 3.217.004,00	100,00%
44.07	17,01,04	HIS84	ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1.1/2"	UND	$ 41.228,00	30,00	$ 1.236.840,00	337,00	$ 13.893.836,00	337,00	$ 13.893.836,00	337.00	$ 13.893.836,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	337,00	$ 13.893.836,00	100,00%
44.08	17,01,05	HIS85	TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 90.296,00	14,00	$ 1.264.144,00	14,00	$ 1.264.144,00	14,00	$ 1.264.144,00	14.00	$ 1.264.144,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14,00	$ 1.264.144,00	100,00%
44.09	17,01,06	HIS86	ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1.1/4"	UND	$ 34.360,00	14,00	$ 481.040,00	14,00	$ 481.040,00	14,00	$ 481.040,00	14.00	$ 481.040,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14,00	$ 481.040,00	100,00%
44.10	17,01,07	HIS87	TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 58.068,00	10,00	$ 580.680,00	10,00	$ 580.680,00	10,00	$ 580.680,00	10.00	$ 580.680,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 580.680,00	100,00%
44.11	17,01,08	HIS88	ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1"	UND	$ 24.348,00	22,00	$ 535.656,00	32,00	$ 779.136,00	32,00	$ 779.136,00	32.00	$ 779.136,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	32,00	$ 779.136,00	100,00%
44.12	17,01,09	HIS89	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 2"	UND	$ 409.880,00	6,00	$ 2.459.280,00	6,00	$ 2.459.280,00	6,00	$ 2.459.280,00	6.00	$ 2.459.280,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 2.459.280,00	100,00%
44.13	17,01,10	HIS90	CHEQUE Ø 1,1/2"	UND	$ 276.939,00	4,00	$ 1.107.756,00	4,00	$ 1.107.756,00	4,00	$ 1.107.756,00	4.00	$ 1.107.756,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 1.107.756,00	100,00%
44.14	17,01,11	HIS91	CHEQUE Ø 1,1/4"	UND	$ 207.113,00	1,00	$ 207.113,00	1,00	$ 207.113,00	1,00	$ 207.113,00	1.00	$ 207.113,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 207.113,00	100,00%
44.15	17,01,12	HIS92	VÁLVULA DE PIE Ø 1.1/2"	UND	$ 71.407,00	2,00	$ 142.814,00	2,00	$ 142.814,00	2,00	$ 142.814,00	2.00	$ 142.814,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 142.814,00	100,00%
44.16	17,01,13	HIS93	VÁLVULA DE PIE Ø 2"	UND	$ 194.837,00	2,00	$ 389.674,00	2,00	$ 389.674,00	2,00	$ 389.674,00	2.00	$ 389.674,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 389.674,00	100,00%
44.17	17,01,14	HIS94	COPA CONCÉNTRICA EN ACERO SCH 10 Ø 2"X1,1/2"	UND	$ 22.434,00	6,00	$ 134.604,00	6,00	$ 134.604,00	6,00	$ 134.604,00	6.00	$ 134.604,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 134.604,00	100,00%
44.18	17,01,15	HIS95	BRIDA ACERO ROSCAR Ø 1.1/2". INCLUYE TORNILLOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND	$ 92.007,00	14,00	$ 1.288.098,00	14,00	$ 1.288.098,00	14,00	$ 1.288.098,00	14.00	$ 1.288.098,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14,00	$ 1.288.098,00	100,00%
44.19	17,01,16	HIS96	JUNTAS DE EXPANSIÓN BORRACHA Ø 1,1/2"	UND	$ 165.926,00	7,00	$ 1.161.482,00	7,00	$ 1.161.482,00	7,00	$ 1.161.482,00	7.00	$ 1.161.482,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,00	$ 1.161.482,00	100,00%
44.20	17,01,17	HIS97	NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 3/4". LONGITUD DE 30CM	UND	$ 48.995,00	1,00	$ 48.995,00	1,00	$ 48.995,00	1,00	$ 48.995,00	1.00	$ 48.995,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 48.995,00	100,00%
44.21	17,01,18	HIS101	TUBERÍA PVC.P Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 57.400,00	19,00	$ 1.090.600,00	19,00	$ 1.090.600,00	19,00	$ 1.090.600,00	19.00	$ 1.090.600,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	19,00	$ 1.090.600,00	100,00%
44.22	17,01,19	HIS102	ACCESORIOS PVC.P Ø 3"	UND	$ 66.648,00	22,00	$ 1.466.256,00	22,00	$ 1.466.256,00	22,00	$ 1.466.256,00	22.00	$ 1.466.256,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	22,00	$ 1.466.256,00	100,00%
44.23	17,01,20	HIS103	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3"	UND	$ 798.540,00	2,00	$ 1.597.080,00	2,00	$ 1.597.080,00	2,00	$ 1.597.080,00	2.00	$ 1.597.080,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 1.597.080,00	100,00%
44.24	17,01,21	HIS104	CHEQUE Ø 3"	UND	$ 486.560,00	2,00	$ 973.120,00	2,00	$ 973.120,00	2,00	$ 973.120,00	2.00	$ 973.120,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 973.120,00	100,00%
44.25	17,01,22	HS-212	VÁLVULA DE PIE Ø 1"	UND	$ 73.110,00	1,00	$ 73.110,00	1,00	$ 73.110,00	1,00	$ 73.110,00	1.00	$ 73.110,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 73.110,00	100,00%
44.26	17,01,23	HS-278	MICROMEDIDOR 3/4"	UND	$ 349.887,00	1,00	$ 349.887,00	1,00	$ 349.887,00	1,00	$ 349.887,00	1.00	$ 349.887,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 349.887,00	100,00%
44.27	16,02,04	HS-221	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLAS NEBULIZADORAS CERRADA HI-FOG	UND	$ 304.891,00	366,00	$ 111.590.106,00	368,00	$ 112.199.888,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.28	16,02,05	HS-222	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLAS NEBULIZADORAS ABIERTA HI-FOG	UND	$ 938.047,00	2,00	$ 1.876.094,00	10,00	$ 9.380.470,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.29	16,02,07	HS-226	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DE CONTROL MARCA HI-FOG MODELO SBA-40, CÓDIGO DO6151 CON INDICADOR DE PASO DE AGUA, MANÓMETRO, TOMA DE PRUEBAS Y VÁLVULA SUPERVISADA DE CIERRE Y APERTURA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERÍA DE 30 MM	UND	$ 12.452.192,00	3,00	$ 37.356.576,00	2,00	$ 24.904.384,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.30	16,02,08	HS-227	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA ELECTROVÁLVULA SELECTORA MARCA HIG-FOG MODELO SVM-12 CÓDIGO D01550.1 SIN ENCLAVAMIENTO, EQUIPADA CON SOLENOIDE (24 V DC, 900 MA) Y ACTUADOR DE APERTURA MANUAL DE EMERGENCIA CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERÍA DE 12 MM.	UND	$ 6.254.606,00	7,00	$ 43.782.242,00	7,00	$ 43.782.242,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.31	17,02,01	HIS147	ACOPLES Ø 2"	UND	$ 100.829,00	14,00	$ 1.411.606,00	14,00	$ 1.411.606,00	14,00	$ 1.411.606,00	14.00	$ 1.411.606,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14,00	$ 1.411.606,00	100,00%
44.32	17,02,02	HS-229	VÁLVULA MARIPOSA Ø 4"	UND	$ 686.471,00	10,00	$ 6.864.710,00	3,00	$ 2.059.413,00	3,00	$ 2.059.413,00	3.00	$ 2.059.413,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 2.059.413,00	100,00%
44.33	17,02,03	HIS158	CHEQUE Ø 2"	UND	$ 695.452,00	3,00	$ 2.086.356,00	3,00	$ 2.086.356,00	3,00	$ 2.086.356,00	3.00	$ 2.086.356,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 2.086.356,00	100,00%
44.34	17,02,04	HIS159	PLACA ANTIOVORTICE Ø 4" EN ACERO AL CARBÓN	UND	$ 716.610,00	1,00	$ 716.610,00	1,00	$ 716.610,00	1,00	$ 716.610,00	1.00	$ 716.610,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 716.610,00	100,00%
44.35	17,02,05	HIS160	MANÓMETRO CON CARATULA 2.5" CON GLICERINA	UND	$ 61.345,00	2,00	$ 122.690,00	2,00	$ 122.690,00	2,00	$ 122.690,00	2.00	$ 122.690,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 122.690,00	100,00%
			RED GENERAL AGUA INCENDIO				**$ 18.167.978,00**		**$ 28.720.089,00**		**$ -**		**$ -**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**
44.36	16,02,01	HIS138	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 1,1/2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 68.363,00	10,90	$ 745.157,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.37	16,02,02	HIS139	ACCESORIOS RANURADOS ACERO Ø 1.1/2"	UND	$ 100.491,00	10,00	$ 1.004.910,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.38	16,02,03	HS-219	EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO 10LBS	UND	$ 357.852,00	6,00	$ 2.147.112,00	6,00	$ 2.147.112,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.39	16,02,06	HS-223	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 1/2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 19.317,00	621,10	$ 11.997.789,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.40		**NP029**	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 1" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	ML	$ 36.542,00		$ -	727,19	$ 26.572.977,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.41	16,02,09	HS-228	ENCAMISADO PARA TUBERÍA A. INOXIDABLE	M	$ 151.534,00	15,00	$ 2.273.010,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%

			EQUIPOS					**$ 623.060.442,00**		**$ 1.886.589.338,00**		**$ 44.267,00**		**$ 44.267,00**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 44.267,00**	**100,00%**
44.42	17,03,01	HI5133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 15 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO	UND	$ 18.885.987,00	1,00	$ 18.885.987,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.43	17,03,02	HI5134	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 30 + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO	UND	$ 21.661.624,00	1,00	$ 21.661.624,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.44	17,03,03	HI5135	SISTEMA DE BOMBEO DE RECIRCULACIÓN AGUAS LLUVIAS. SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 15 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO Q=14GPM, H=34PSI + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO	UND	$ 18.595.988,00	1,00	$ 18.595.988,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.45	17,03,04	HS-264	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO LISTADO CERTIFICADO UL/FM ÁRA AGUA NEBULIZADA HIFOG 11000GPM@ 2050 PSI + TABLERO DE CONTROL CON TRANSFERENCIA LISTADA+ BOMBA JOCKEY+ TABLERO BOMBA JOCKEY	UND	$ 545.553.628,00	1,00	$ 545.553.628,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.46	17,03,05	HI5137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA EYECTOR COMPUESTO POR DOS BOMBAS EYECTORAS GQSM 50 -6-60 + TABLERO ARRANQUE DIRECTO CON ADICIÓN Y ALTERNACIÓN Y FLOTADOR DE NIVEL POR BOMBA	UND	$ 9.874.183,00	1,00	$ 9.874.183,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.47	17,03,06	HS-234	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPÓSITO ATMOSFÉRICO ADJUABLOCK PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TAPA SUPERIOR DE DN250 Y POSIBILIDAD DE MONTAR BOYA CON FLOTADOR Y/O REBOSADERO CON MEDIDAS 2200*990*1565 Y UNA CAPACIDAD DE 3000 LITROS	UND	$ 8.444.765,00	1,00	$ 8.444.765,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.48		**NP030**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRUPO DE BOMBEO MODULAR DE AGUA NEBULIZADA MARCA HI-FOG® MODELO LPU05 CON UN CAUDAL TOTAL DE 439 LPM, COMPUESTO POR 05 BOMBAS DE PISTONES, PRESIÓN MÁXIMA DE 140 BAR, MOVIDAS POR CINCO MOTORES ELÉCTRICOS (440 V AC, 60 HZ, 27,0 KW CADA UNO), COLECTOR DE PRUEBAS E INSTRUMENTACIÓN COMPLETA, TODO EL CONJUNTO MONTADO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA. SE INCLUYE APARTE CUADRO DE CONTROL DEL GRUPO DE BOMBAS.MOTORES CON VARIADOR DE VELOCIDAD POR MOTOR.	UN	$ 879.461.380,00		$ -	1,00	$ 879.461.380,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.49		**NP031**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE ACERO INOXIDABLE MARCA HI-FOG MODELO BIH-12 PARA TUBERÍA DE 12 MM CON LIMIT SWITCH, CÓDIGO D30005.1 PARA PURGA DE LA INSTALACIÓN.	UN	$ 1.963.252,00		$ -	7,00	$ 13.742.764,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.50		**NP032**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PREACCION MARCA Hi-FOG® MODELO SVM-20 (25/25), CÓDIGO D00050.1 CON INDICADOR DE PASO DE AGUA, MANOMETRO, TOMA DE PRUEBAS Y VÁLVULA SUPERVISADA DE CIERRE Y APERTURA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERÍA DE 30 MM. INCLUYE COMPRESOR.	UN	$ 13.365.963,00		$ -	2,00	$ 26.731.926,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.51		**NP033**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DI-METRO EXTERIOR 30 MM X 2,5 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEG N DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS)	ML	$ 402.060,00		$ -	732,64	$ 294.565.238,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.52		**NP034**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DI-METRO EXTERIOR 25 MM X 2,0 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEG N DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS)	ML	$ 324.785,00		$ -	19,33	$ 6.278.094,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.53		**NP035**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DI-METRO EXTERIOR 12 MM X 1,2 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEG N DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS)	ML	$ 166.225,00		$ -	636,44	$ 105.792.239,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.54		**NP036**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE DE 43,15M3 (SEGÚN EL ESQUEMA), CONSTRUIDO CON LINER EN CRISTALÁN 870 DE ANDERCOL (ISOFTÁLICA) Y RESINA CRISTALÁN 805 DE ANDERCOL(ORTOFTÁLICA)	und	$ 59.973.430,00		$ -	1,00	$ 59.973.430,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.55	17,04,01	HS-190	DESINFECCIÓN SISTEMA	UND	$ 44.267,00	1,00	$ 44.267,00	1,00	$ 44.267,00	1,00	$ 44.267,00	1,00	$ 44.267,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 44.267,00	100,00%
			TABLEROS					**$ 88.647.097,00**		**$ 88.647.097,00**		**$ -**		**$ -**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**
44.56	13,02,01	ELE025	TRANSFERENCIA GENERAL MOTORIZADA CON BREAKERS DE 3X250 AMP. INCLUYE TGD NO 1, FABRICADO EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 16 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON PROTECCIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL. CON BARRAJES DE FASE, NEUTRO Y TIERRA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS POR EL DIAGRAMA UNIFILAR.	UND	$ 32.898.130,00	1,00	$ 32.898.130,00	1,00	$ 32.898.130,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.57	13,02,02	ELE026	EQUIPO DE MEDIDA BAJA TENSIÓN NORMA AE319 ENEL CODENSA DE DIMENSIONES 200X80X40 CM,INCLUYE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y BREAKER TOTALIZADORES DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR	UND	$ 10.143.872,00	1,00	$ 10.143.872,00	1,00	$ 10.143.872,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.58	13,02,03	ELE027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND	$ 672.026,00	3,00	$ 2.016.078,00	3,00	$ 2.016.078,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.59	13,02,04	ELE029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND	$ 744.071,00	2,00	$ 1.488.142,00	2,00	$ 1.488.142,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.60	13,02,05	ELE031	GABINETE METÁLICO CERTIFICADO PARA BOMBAS, AGUA POTABLE, SANITARIA Y LLUVIAS. DIMENSIONES 60X60X30 CM, CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TIPO INDUSTRIAL 3-3X20A. INCLUYE MATERIAL DE FABRICACIÓN, INCLUYE PUERTA, DPS, BARRAJES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO	UND	$ 3.960.538,00	1,00	$ 3.960.538,00	1,00	$ 3.960.538,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.61	13,02,06	ELE032	BREAKER TIPO INDUSTRIAL ICC: 25KA, 3X20A HASTA 3X60 A	UND	$ 299.336,00	10,00	$ 2.993.360,00	10,00	$ 2.993.360,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.62	13,02,07	ELE033	BREAKER ENCHUFABLE ICC:10KA. 1X20A.	UND	$ 20.590,00	74,00	$ 1.523.660,00	74,00	$ 1.523.660,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.63	13,02,08	ELE053	GABINETE METÁLICO PARA CONTROL ILUMINACIÓN POR MEDIO DE CONTACTORES DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE MATERIAL DE FABRICACIÓN, PUERTA, BARRAJES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑOS.	UND	$ 4.669.019,00	1,00	$ 4.669.019,00	1,00	$ 4.669.019,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.64	13,08,01	ELE133	CERTIFICACIONES RETIE	UND	$ 14.477.149,00	1,00	$ 14.477.149,00	1,00	$ 14.477.149,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.65	13,08,02	ELE134	CERTIFICACIÓN RETILAP	UND	$ 14.477.149,00	1,00	$ 14.477.149,00	1,00	$ 14.477.149,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		45	**OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES**					**$ 449.902.959,00**		**$ 552.564.264,00**		**$ 348.842.531,00**		**$ 348.842.531,00**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 348.842.531,00**	**100,00%**
45.01	24.01.01	BIM005	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES (10%, DIEZ PORCIENTO PARA ESTE COMPONENTE)	UND	$ 693.676.269,00	0,10	$ 69.367.627,00	0,10	$ 69.367.627,00	0,10	$ 69.367.627,00	0,10	$ 69.367.627,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,10	$ 69.367.627,00	100,00%
45.02	02.01.05	PRE005	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES (6 MESES PARA ESTE COMPONENTE)	MES	$ 1.762.788,00	6,00	$ 10.576.728,00	6,00	$ 10.576.728,00	6,00	$ 10.576.728,00	6,00	$ 10.576.728,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 10.576.728,00	100,00%
45.03	02.01.12	PRE012	CONTROL DE ROEDORES CON CEBO Y RATICIDA (150 UNIDADES PARA ESTE COMPONENTE)	UND	$ 32.177,00	150,00	$ 4.826.550,00	50,00	$ 1.608.850,00	50,00	$ 1.608.850,00	50,00	$ 1.608.850,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	50,00	$ 1.608.850,00	100,00%
45.04		**NP037**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVA EN LA LAVADA N.P 2 PARA PISOS EXTERIORES	M2	$ 59.825,00		$ -	103,81	$ 6.210.413,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
45.05	02.01.19	PRE020	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ÁRBOL. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO, TUTOR Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	UND	$ 224.368,00	1,00	$ 224.368,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
45.06	10,02,03	PYE003	ANDÉN ACABADO EN CONCRETO ESCOBILLADO. E=15CM - COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON RECEBO COMÚN.	M2	$ 461.476,00	329,94	$ 152.257.546,00	546,40	$ 252.150.486,00	546,40	$ 252.150.486,00	546,40	$ 252.150.486,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	546,40	$ 252.150.486,00	100,00%
45.07	10,02,04	PYE004	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO A81 (15X35X80CM)	M	$ 58.334,00	259,52	$ 15.138.840,00	259,52	$ 15.138.840,00	259,52	$ 15.138.840,00	259,52	$ 15.138.840,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	259,52	$ 15.138.840,00	100,00%
45.08	22.01.01	UR001	OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)	GLB	$ 197.511.300,00	1,00	$ 197.511.300,00	1,00	$ 197.511.300,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		46	**ASEO, REMATES Y NP**				**$ 106.005.134,00**		**$ 109.964.331,00**		**$ 77.431.044,00**		**$ 77.431.044,00**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 77.431.044,00**	**100,00%**
46.01	19,04,01	GR01	ASEO FINAL GENERAL	M2	$ 3.864,00	5.650,88	$ 21.835.000,00	5650,88	$ 21.835.000,00	5650,88	$ 21.835.000,00	5650,88	$ 21.835.000,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5.650,88	$ 21.835.000,00	100,00%
46.02	19,04,02	GR02	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 27.020,00	300,51	$ 8.119.780,00	270,33	$ 7.304.317,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
46.03	19,04,04	GR04	REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO	M2	$ 360.411,00	70,00	$ 25.228.770,00	70,00	$ 25.228.770,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
46.04	02.01.12	PRE012	CONTROL DE ROEDORES CON CEBO Y RATICIDA. (SALDO. PARA ESTE COMPONENTE)	UND	$ 32.177,00	173,00	$ 5.566.621,00	50,00	$ 1.608.850,00	50,00	$ 1.608.850,00	50,00	$ 1.608.850,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	50,00	$ 1.608.850,00	100,00%
46.05	02.01.05	PRE005	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES (SALDO EN MESES PARA ESTE COMPONENTE)	MES	$ 1.762.788,00	7,00	$ 12.339.516,00	7,00	$ 12.339.516,00	7,00	$ 12.339.516,00	7,00	$ 12.339.516,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,00	$ 12.339.516,00	100,00%
46.06	19,04,03	GR03	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 15.942,00	2.064,70	$ 32.915.447,00	2612,45	$ 41.647.678,00	2612,45	$ 41.647.678,00	2612,45	$ 41.647.678,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2.612,45	$ 41.647.678,00	100,00%

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los item)		**$ 10.602.930.108.00**	**$ 17.474.944.451.00**	**$ 10.602.930.108.00**	**$ 10.602.930.108.00**	**$ 677.052.111.00**	**6,39%**	**$ 1.658.578.035.00**	15,64%	**$ 8.944.352.073.00**	84,36%
IPC MES - DICIEMBRE 2025						**152,27**					
IPC DIC 2024						**144,88**					
COSTO DIRECTO - CD (95% del sub total costos directos)						**$ 676.007.653,00**		**$ 1.648.797.995,00**			
ADMINISTRACIÓN	32%	$ 3.392.937.635,00	$ 5.591.982.224,00	$ 3.392.937.635,00	$ 3.392.937.635,00	**$ 216.322.449,00**		$ 527.615.358,00		$ 2.862.192.663,00	
IMPREVISTOS	1%	$ 106.029.301,00	$ 174.749.445,00	$ 106.029.301,00	$ 106.029.301,00	**$ 6.760.077,00**		$ 16.487.980,00		$ 89.443.521,00	
UTILIDAD	5%	$ 530.146.505,00	$ 873.747.223,00	$ 530.146.505,00	$ 530.146.505,00	**$ 33.800.383,00**		$ 82.439.900,00		$ 447.217.604,00	
IVA UTILIDAD	19%	$ 100.727.836,00	$ 166.011.972,00	$ 100.727.836,00	$ 100.727.836,00	**$ 6.422.072,77**		$ 15.663.580,77		$ 84.971.345,00	
VALOR DE LA RETRIBUCIÓN - VR		**$ 14.732.771.385,00**	**$ 24.281.435.315,00**	**$ 14.732.771.385,00**	**$ 14.732.771.385,00**	**$ 939.312.634,77**		**$ 2.291.004.813,77**		**$ 12.428.177.206,00**	
VALOR PARA AJUSTES IPC 2025		$ 892.869.815,00	$ 892.869.815,00	$ 892.869.815,00	$ 892.869.815,00	**$ 45.586.920,00**	**5,11%**	$ 104.480.295,00	11,70%	$ 788.389.520,00	88,30%
VALOR PARA AJUSTES IPC 2026		$ 194.056.635,00	$ 194.056.635,00	$ 194.056.635,00	$ 194.056.635,00		**0,00%**		0,00%	$ 194.056.635,00	100,00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 15.819.697.835,00**	**$ 25.368.361.765,00**	**$ 15.819.697.835,00**	**$ 15.819.697.835,00**						
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO		**$ 7.366.385.693,00**	**$ 7.366.385.693,00**	**$ 7.366.385.693,00**	**$ 7.366.385.693,00**						
ANA -VALOR DEL ANTICIPO A LA FECHA DE CORTE						**$ 6.659.751.474,00**					
RP - VALOR RETRIBUCIÓN PENDIENTE POR CANCELAR PRESENTE ACTA						**$ 13.381.079.206,00**					
VALOR DE LA AMORTIZACIÓN - VAA - AM						**$ 491.340.944,00**	**6,67%**	**$ 1.197.975.163,00**	16,26%	**$ 6.168.410.530,00**	83,74%
VALOR EFECTIVO A PAGAR - VP EN LA PRESENTE ACTA						**$ 447.971.690,77**					

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ASTRID DIAZ CABEZAS
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
CONSTRUCTOR

KAROL STEFANY RAMIREZ MENA
REPRESENTANTE LEGAL IBP INGENIERIA SAS
INTERVENTOR

Culturas

ACTA PARCIAL DE RECIBO DE CANTIDADES

■ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

Página 1 de

Código:
Versión:
Fecha:

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL — **FECHA:** 6/04/2026 — **OBRA:** GRUPO 6. CAPILLA - CONVENTO

INTERVENTOR: IBP INGENIERIA SAS — **CONTRATO No:** 4346-2024 — **PERIODO (desde - hasta):** 1/11/2025 31/01/2026

OBJETO: Realizar las obras de intervención integral de varios inmuebles que hacen parte del Hospital San Juan de Dios de Instituto Materno Infantil, en la ciudad de Bogotá D.C.declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, de acuerdo con lo establecido para cada Grupo — **VALOR:** $ 14.732.771.385,00 — **N° ACTA** 2

N°	1. ITEM	2. COD	3. CONDICIONES CONTRACTUALES					4. CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		5. BALANCE SEGÚN EL PRESUPUESTO OFICIAL INICIAL Y LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS AL CIERRE DE LA FASE 1		6. ACTUALIZADAS (31/01/2026)			7. OBRA EJECUTADA ACTA 2			8. ACUMULADO			9. PENDIENTE POR EJECUTAR		
			DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL			CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	VARIACIÓN	CANT	V. TOTAL	% EJEC.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.	CANT	V. TOTAL	% ACUM.
			ETAPA 1																				
		1	**PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE**				$ 112.499.668,00		$ 118.770.499,00		$ 118.770.499,00		$ 118.770.499,00	$ -		$ -	0,00%		$ 118.770.499,00	100,00%		$ -	0,00%
01.01	01.01.01	APR001	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	M2	$ 48.561,00	2.122,99	$ 103.094.368,00	2252,12	$ 109.365.199,00	2252,12	$ 109.365.199,00	2252,12	$ 109.365.199,00	$ -		$ -	0,00%	2.252,12	$ 109.365.199,00	100,00%	-	$ -	0,00%
01.02	01.01.02	APR004	VERIFICACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL INMUEBLE	UND	$ 9.405.300,00	1,00	$ 9.405.300,00	1,00	$ 9.405.300,00	1,00	$ 9.405.300,00	1,00	$ 9.405.300,00	$ -		$ -	0,00%	1,00	$ 9.405.300,00	100,00%	-	$ -	0,00%
			ETAPA 2																				
		2	**PRELIMINARES ETAPA 1**				$ 324.042.413,00		$ 616.701.587,00		$ 618.116.877,00		$ 620.668.075,00	$ 2.551.198,00		$ -	0,00%		$ 620.668.075,00	100,00%		$ -	0,00%
02.01	24.01.01	BIM005	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y MODELADORES (15%, QUINCE PORCIENTO PARA ESTE COMPONENTE)	UND	$ 693.676.269,00	0,15	$ 104.051.440,00	0,15	$ 104.051.440,00	0,15	$ 104.051.440,00	0,15	$ 104.051.440,00	$ -		$ -	0,00%	0,15	$ 104.051.440,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.02		**NP001**	EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA Y ESTUDIO DE SUELOS COMPLEMENTARIO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO CAPILLA Y CONVENTO (INCLUYE PERFORACIONES Y LABORATORIOS).	GL	$ 32.000.000,00		$ -	1,00	$ 32.000.000,00	1,00	$ 32.000.000,00	1,00	$ 32.000.000,00	$ -		$ -	0,00%	1,00	$ 32.000.000,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.03		**NP002**	RETIRO DE PAÑETES PATRIMONIALES CON HERRAMIENTAS MANUALES, INCLUYE DISPOSICION FINAL	m2	$ 50.680,00		$ -	1292,88	$ 65.523.158,00	1292,88	$ 65.523.158,00	1292,88	$ 65.523.158,00	$ -		$ -	0,00%	1.292,88	$ 65.523.158,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.04	02.01.20	PRE021	PROTECCIÓN DE ÁRBOLES EN EL PERIMETRO DE LA INTERVENCIÓN. H=1 M.	UND	$ 24.518,00	8,00	$ 196.144,00	29,00	$ 711.022,00	29,00	$ 711.022,00	29,00	$ 711.022,00	$ -		$ -	0,00%	29,00	$ 711.022,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.05	02.01.04	PRE004	VALLA INFORMATIVA EN LONA DE 2,50X1,5M. IMPRESA FULL COLOR. ESTRUCTURA EN MADERA. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN, INCLUYE DESMOTE Y RETIRO A LA TERMINACION DE LA OBRA)	UND	$ 582.920,00	1,00	$ 582.920,00	1,00	$ 582.920,00	1,00	$ 582.920,00	1,00	$ 582.920,00	$ -		$ -	0,00%	1,00	$ 582.920,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.06	02.01.09	PRE009	CONTROL DE ACCESO PROVISIONAL DE OBRA. CASETA DE CELADURÍA.	UND	$ 3.322.955,00	1,00	$ 3.322.955,00	1,00	$ 3.322.955,00	1,00	$ 3.322.955,00	1,00	$ 3.322.955,00	$ -		$ -	0,00%	1,00	$ 3.322.955,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.07	02.01.10	PRE010	ASEO INICIAL. RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	$ 5.050,00	5.650,88	$ 28.536.944,00	5115,36	$ 25.832.568,00	5115,36	$ 25.832.568,00	5115,36	$ 25.832.568,00	$ -		$ -	0,00%	5.115,36	$ 25.832.568,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.08	02.01.11	PRE011	FUMIGACIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO CON HERBICIDA. INCLUYE RETIRO DE MALEZA EN LAS FACHADAS	M2	$ 1.759,00	5.650,88	$ 9.939.898,00	5115,36	$ 8.997.918,00	5115,36	$ 8.997.918,00	5115,36	$ 8.997.918,00	$ -		$ -	0,00%	5.115,36	$ 8.997.918,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.09	02.01.23	PRE025	DISEÑO ESTRUCTURAL SOBRE CUBIERTA TEMPORAL.	M2	$ 2.808,00	2.064,70	$ 5.797.678,00	2612,45	$ 7.335.760,00	2612,45	$ 7.335.760,00	2612,45	$ 7.335.760,00	$ -		$ -	0,00%	2.612,45	$ 7.335.760,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.10	02.01.13	PRE013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE	GLB	$ 4.745.636,00	1,00	$ 4.745.636,00	1,00	$ 4.745.636,00	1,00	$ 4.745.636,00	1,00	$ 4.745.636,00	$ -		$ -	0,00%	1,00	$ 4.745.636,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.11	02.01.16	PRE017	INVENTARIO FORESTAL PARA INDIVIDUOS ARBÓREOS, INCLUYE: ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, PLANOS GEORREFERENCIADOS, CONSIGNACIÓN PAGO POR EVALUACIÓN Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE.	UND	$ 134.459,00	8,00	$ 1.075.672,00	29,00	$ 3.899.311,00	29,00	$ 3.899.311,00	29,00	$ 3.899.311,00	$ -		$ -	0,00%	29,00	$ 3.899.311,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.12	02.01.17	PRE018	TALA DE ÁRBOL <5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	UND	$ 197.115,00	1,00	$ 197.115,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
02.13	02.01.18	PRE019	TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE 1 A 5 METROS. INCLUYE TRANSPORTE	UND	$ 940.530,00	2,00	$ 1.881.060,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
02.14	02.01.02	PRE002	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M	$ 233.653,00	300,51	$ 70.215.063,00	270,33	$ 63.163.415,00	270,33	$ 63.163.415,00	270,33	$ 63.163.415,00	$ -		$ -	0,00%	270,33	$ 63.163.415,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.15	02.01.03	PRE003	CONSTRUCCIÓN CAMPAMENTO DE OBRA. INCLUYE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DESMONTABLE, REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES Y LOS DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO USO Y FUNCIONAMIENTO	M2	$ 244.203,00	80,00	$ 19.536.240,00	80,00	$ 19.536.240,00	80,00	$ 19.536.240,00	80,00	$ 19.536.240,00	$ -		$ -	0,00%	80,00	$ 19.536.240,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.16	02.01.06	PRE006	PUERTA DOBLE HOJA EN LÁMINA TEJA DE ZINC 6,00X2,40 M Y ESTRUCTURA EN MADERA, PARA ACCESO DE OBRA	UND	$ 603.944,00	1,00	$ 603.944,00	2,00	$ 1.207.888,00	2,00	$ 1.207.888,00	2,00	$ 1.207.888,00	$ -		$ -	0,00%	2,00	$ 1.207.888,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.17	02.01.07	PRE007	PUERTA PROVISIONAL DE ACCESO PEATONAL 1,00X2,40M EN LÁMINA TEJA DE ZINC Y ESTRUCTURA EN MADERA	UND	$ 156.783,00	1,00	$ 156.783,00	1,00	$ 156.783,00	1,00	$ 156.783,00	1,00	$ 156.783,00	$ -		$ -	0,00%	1,00	$ 156.783,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.18	02.01.22	PRE024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ALCANTARILLADO	GLB	$ 6.519.411,00	1,00	$ 6.519.411,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
02.19	02.01.14	PRE014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA	GLB	$ 37.066.410,00	1,00	$ 37.066.410,00	1,00	$ 37.066.410,00	1,00	$ 37.066.410,00	1,00	$ 37.066.410,00	$ -		$ -	0,00%	1,00	$ 37.066.410,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.20	03,02,02	DEM002	DEMOLICIÓN DE TODO TIPO DE PAÑETES, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 12.392,00	1.144,58	$ 14.183.635,00	1982,28	$ 24.564.414,00	2096,49	$ 25.979.704,00	2096,49	$ 25.979.704,00	$ -		$ -	0,00%	2.096,49	$ 25.979.704,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.21	03.01.01	DYR001	RETIRO DE PLAFÓN MACHIMBRADO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 21.540,00	247,12	$ 5.322.965,00	1375,88	$ 29.636.455,00	1375,88	$ 29.636.455,00	1494,32	$ 32.187.653,00	$ 2.551.198,00		$ -	0,00%	1.494,32	$ 32.187.653,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.22	03.01.02	DYR003	DESMONTAJE DE ACCESORIOS E INCRUSTACIONES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 3.783,00	50,00	$ 189.150,00	48,00	$ 181.584,00	48,00	$ 181.584,00	48,00	$ 181.584,00	$ -		$ -	0,00%	48,00	$ 181.584,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.23	03.01.03	DYR004	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 21.231,00	34,00	$ 721.854,00	48,00	$ 1.019.088,00	48,00	$ 1.019.088,00	48,00	$ 1.019.088,00	$ -		$ -	0,00%	48,00	$ 1.019.088,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.24	03.01.05	DYR013	DESMONTAJE DE DIVISIONES DE BAÑOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 4.455,00	27,99	$ 124.695,00	28,45	$ 126.745,00	28,45	$ 126.745,00	28,45	$ 126.745,00	$ -		$ -	0,00%	28,45	$ 126.745,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.25	03.01.09	DYR026	DESMONTAJE DE TANQUE AÉREO PLÁSTICO DE 1000 LT EN CUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 45.227,00	2,00	$ 90.454,00	2,00	$ 90.454,00	2,00	$ 90.454,00	2,00	$ 90.454,00	$ -		$ -	0,00%	2,00	$ 90.454,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.26	03.01.18	DYR048	RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 6.571,00	15,00	$ 98.565,00	29,00	$ 190.559,00	29,00	$ 190.559,00	29,00	$ 190.559,00	$ -		$ -	0,00%	29,00	$ 190.559,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.27	03.01.19	DYR056	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M	$ 17.598,00	7,20	$ 126.706,00	13,20	$ 232.294,00	13,20	$ 232.294,00	13,20	$ 232.294,00	$ -		$ -	0,00%	13,20	$ 232.294,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.28	03,02,03	DEM008	DEMOLICIÓN ESCALERA EN MADERA, INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMÁS ELEMENTOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 28.646,00	13,38	$ 383.226,00	13,09	$ 374.976,00	13,09	$ 374.976,00	13,09	$ 374.976,00	$ -		$ -	0,00%	13,09	$ 374.976,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.29	02.01.24	PRE026	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M	$ 279.195,00	30,00	$ 8.375.850,00	58,23	$ 16.257.525,00	58,23	$ 16.257.525,00	58,23	$ 16.257.525,00	$ -		$ -	0,00%	58,23	$ 16.257.525,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.30		**NP003**	RETIRO, PROTECCION Y TRASCIEGO INTERNO DE SILLAS DE CAPILLA	UND	$ 101.875,00		$ -	49,00	$ 4.991.875,00	49,00	$ 4.991.875,00	49,00	$ 4.991.875,00	$ -		$ -	0,00%	49,00	$ 4.991.875,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.31		**NP004**	RETIRO Y TRASCIEGO INTERNO DE GUACALES	UND	$ 366.494,00		$ -	40,00	$ 14.659.760,00	40,00	$ 14.659.760,00	40,00	$ 14.659.760,00	$ -		$ -	0,00%	40,00	$ 14.659.760,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.32		**NP005**	DEMOLICION DE GUARDAESCOBA EN GRAVILLA Y/O MADERA Y/O CERAMICA	ml	$ 25.715,00		$ -	776,97	$ 19.979.784,00	776,97	$ 19.979.784,00	776,97	$ 19.979.784,00	$ -		$ -	0,00%	776,97	$ 19.979.784,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.33		**NP006**	LEVANTAMIENTO MANUAL DE PISOS PATRIMONIALES (BALDOSA HIDRAULICA, PIEDRA, MOSAICO) INCLUYE PROTECCION Y ACOPIO PROVISIONAL	M2	$ 158.443,00		$ -	604,80	$ 95.826.326,00	604,80	$ 95.826.326,00	604,80	$ 95.826.326,00	$ -		$ -	0,00%	604,80	$ 95.826.326,00	100,00%	-	$ -	0,00%
02.34		**NP007**	MEJORAMIENTO DE VÍA EN RECEBO COMPACTADO, ESTABILIZADO CON CEMENTO CAPA DE 7CM DE ESPESOR.	M2	$ 88.416,00		$ -	344,24	$ 30.436.324,00	344,24	$ 30.436.324,00	344,24	$ 30.436.324,00	$ -		$ -	0,00%	344,24	$ 30.436.324,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		3	**PRELIMINARES ETAPA 2**				$ 95.763.454,00		$ 280.734.761,00		$ 250.637.801,00		$ 198.397.856,00	-$ 52.239.945,00		$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ 198.397.856,00	100,00%
03.01	02.01.21	PRE022	DESINFECCIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO POR MEDIO DE AGUA, JABÓN NEUTRO, ÁCIDO MURIÁTICO Y/O ÁCIDO OXÁLICO	M2	$ 4.007,00	5.650,88	$ 22.643.076,00	2252,12	$ 9.024.245,00	2252,12	$ 9.024.245,00	2252,12	$ 9.024.245,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2.252,12	$ 9.024.245,00	100,00%
03.02	02.01.08	PRE008	CÁRCAMO LAVA LLANTAS ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO CON SECCIÓN EXTERNA DE 60X60CM Y SECCIÓN INTERNA 30X50CM. INCLUYE FORMALETA, REJILLA METÁLICA Y REFUERZO	M	$ 847.032,00	10,00	$ 8.470.320,00	10,00	$ 8.470.320,00	10,00	$ 8.470.320,00	0,00	$ -	-$ 8.470.320,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
03.03	02.01.25	PRE027	MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS SUBTERRANEAS Y/O NIVEL FREÁTICO	M	$ 648.010,00	37,00	$ 23.976.370,00	60,00	$ 38.880.600,00	60,00	$ 38.880.600,00	20,00	$ 12.960.200,00	-$ 25.920.400,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,00	$ 12.960.200,00	100,00%
03.04	02.01.26	PRE028	PROTECCIÓN Y/O REFUERZOS ESTRUCTURALES PROVISIONALES DEL ÓRGANO Y ARMÓNIOS PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA	GLB	$ 30.096.960,00	1,00	$ 30.096.960,00	1,00	$ 30.096.960,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
03.05		**NP008**	DEMOLICION DE ALFAJIAS EN CONCRETO ALTURA NO MAYOR A 6METROS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	ml	$ 80.784,00		$ -	441,90	$ 35.698.450,00	441,90	$ 35.698.450,00	220,95	$ 17.849.225,00	-$ 17.849.225,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	220,95	$ 17.849.225,00	100,00%
03.06		**NP009**	DESMONTAJE DE CAMPANA PEQUEÑA UBICADA EN CUBIERTA DE TORRE CAMPANARIO (ALTURA 18 m). INCLUYE LIMPIEZA, RETIRO, EMBALAJE Y TRASLADO A SITIO DE ALMACENAMIENTO AUTORIZADO POR EL CLIENTE.	und	$ 1.331.414,00		$ -	2,00	$ 2.662.828,00	2,00	$ 2.662.828,00	2,00	$ 2.662.828,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 2.662.828,00	100,00%
03.07		**NP010**	TALA Y ESTACONAMIENTO DE INDIVIDUO ARBOREO H= 15M A 20M INCLUYE RETIRO	UND	$ 6.426.000,00		$ -	3,00	$ 19.278.000,00	3,00	$ 19.278.000,00	3,00	$ 19.278.000,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 19.278.000,00	100,00%
03.08		**NP011**	DESMONTAJE, DOCUMENTACIÓN Y ACCIONES DE CONSERVACIÓN DEL ÓRGANO TUBULAR UBICADO EN LA CAPILLA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	UN	$ 126.046.630,00		$ -	1,00	$ 126.046.630,00	1,00	$ 126.046.630,00	1,00	$ 126.046.630,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 126.046.630,00	100,00%
03.09	02.01.05	PRE005	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES (6 MESES PARA ESTE COMPONENTE)	MES	$ 1.762.788,00	6,00	$ 10.576.728,00	6,00	$ 10.576.728,00	6,00	$ 10.576.728,00	6,00	$ 10.576.728,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 10.576.728,00	100,00%
		4	**PRELIMINARES BIENES MUEBLES**				$ 582.456.424,00		$ 701.736.277,00		$ 658.991.436,00		$ 679.203.549,00	$ 20.212.113,00		$ 677.052.111,00	99,68%		$ 679.203.549,00	100,00%		$ -	0,00%
04.01	20.01.01	RBMCC001	ADECUACIÓN DE TALLER PARA PROCESOS DE RESTAURACIÓN	M2	$ 278.284,00	60,00	$ 16.697.040,00	60,00	$ 16.697.040,00	60,00	$ 16.697.040,00	60,00	$ 16.697.040,00	$ -	60,00	$ 16.697.040,00	100,00%	60,00	$ 16.697.040,00	100,00%	-	$ -	0,00%
04.02	20.01.02	RBMCC002	DESMONTE Y TRASLADO DE PANELES DE VITRAL AL TALLER, INCLUYE CAJA DE ALMACENAMIENTO	UND	$ 110.626,00	292,00	$ 32.302.792,00	304,00	$ 33.630.304,00	304,00	$ 33.630.304,00	304,00	$ 33.630.304,00	$ -	304,00	$ 33.630.304,00	100,00%	304,00	$ 33.630.304,00	100,00%	-	$ -	0,00%
04.03	20.06.01	RBMCC044	DESMONTE DE LA LAMPARA DE PARED DEL LUGAR DE UBICACIÓN	UND	$ 179.636,00	14,00	$ 2.514.904,00	14,00	$ 2.514.904,00	14,00	$ 2.514.904,00	14,00	$ 2.514.904,00	$ -	14,00	$ 2.514.904,00	100,00%	14,00	$ 2.514.904,00	100,00%	-	$ -	0,00%
04.04	20.05.02	PRO001	EMBALAJE RÍGIDO PARA PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES	UND	$ 173.532,00	14,00	$ 2.429.448,00	14,00	$ 2.429.448,00	14,00	$ 2.602.980,00	15,00	$ 2.602.980,00	$ 173.532,00	15,00	$ 2.602.980,00	100,00%	15,00	$ 2.602.980,00	100,00%	-	$ -	0,00%
04.05	20.06.03	RBMCC045	REGISTRO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA	UND	$ 190.367,00	14,00	$ 2.665.138,00	14,00	$ 2.665.138,00	14,00	$ 2.665.138,00	14,00	$ 2.665.138,00	$ -	14,00	$ 2.665.138,00	100,00%	14,00	$ 2.665.138,00	100,00%	-	$ -	0,00%
04.06	20.05.01	RBMCC033	DESMONTE DE LA LAMPARA DEL LUGAR DE UBICACIÓN	UND	$ 510.309,00	1,00	$ 510.309,00	1,00	$ 510.309,00	1,00	$ 510.309,00	1,00	$ 510.309,00	$ -	1,00	$ 510.309,00	100,00%	1,00	$ 510.309,00	100,00%	-	$ -	0,00%
04.07	20.05.02	PRO001	EMBALAJE RÍGIDO PARA PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES	UND	$ 173.532,00	1,00	$ 173.532,00	1,00	$ 173.532,00	1,00	$ 173.532,00	-	$ -	$ 173.532,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
04.08	20.05.03	RBMCC034	REGISTRO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LÁMPARA EN TECHO DE CAPILLA	UND	$ 285.550,00	1,00	$ 285.550,00	1,00	$ 285.550,00	1,00	$ 285.550,00	1,00	$ 285.550,00	$ -	1,00	$ 285.550,00	100,00%	1,00	$ 285.550,00	100,00%	-	$ -	0,00%
04.09		**NP012**	RETIRO, PROTECCION Y TRASCIEGO INTERNO DE MUEBLES LITURGICOS ENTRE EL EDIFICIO CAPILLA CONVENTO Y EL EDIFICIO UVO REQUIERE DESARMADO EN SITIO MEDIDAS (3MX1,2MX1,2M)	UND	$ 443.296,00		$ -	3,00	$ 1.329.888,00	3,00	$ 1.329.888,00	9,00	$ 3.989.664,00	$ 2.659.776,00	9,00	$ 3.989.664,00	100,00%	9,00	$ 3.989.664,00	100,00%	-	$ -	0,00%

04.10	02.01.15	PRE015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES.	M2	$	254.215,00	2.064,70	$	524.877.711,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
04.11		**NP013**	REPARACIONES LOCATIVAS PARA ADECUACION DE SALON DE ALMACENAMIENTO DE BIENES MUEBLES EN EDIFICIO UVO	UN	$	401.363,00		$	-	1,00	$ 401.363,00	1,00	$ 401.363,00	1,00	$ 401.363,00	$ -	1,00	$ 401.363,00	100,00%	1,00	$ 401.363,00	100,00%	-	$ -	0,00%
04.12		**NP014**	RETIRO, CONSERVACIÓN Y EMBALAJE DE HERRAJES ORIGINALES DE PUERTAS Y VENTANAS	un	$	21.110,00		$	-	126,00	$ 2.659.860,00	126,00	$ 2.659.860,00	88,00	$ 1.857.680,00	-$ 802.180,00	88,00	$ 1.857.680,00	100,00%	88,00	$ 1.857.680,00	100,00%	-	$ -	0,00%
04.13		**NP015**	PROTECCIÓN PARA CERRAMIENTO DE VENTANAS Y PUERTAS PERIMETRALES. Y VITRALES	M2	$	37.585,00		$	-	210,00	$ 7.892.850,00	210,00	$ 7.892.850,00	57,26	$ 2.152.117,00	-$ 5.740.733,00	57,26	$ 679,00	0,03%	57,26	$ 2.152.117,00	100,00%	-	$ -	0,00%
04.14		**NP016**	RETIRO MANUAL DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADAS EN BÓVEDAS Y MOLDURAS (ALTURA MAYOR A 15MT)	UN	$	116.490,00		$	-	366,94	$ 42.744.841,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
04.15		**NP017**	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRECUBIERTA EN ESTRUCTURA EN GUADUA Y TEJA DE ZINC CAL 35	m2	$	225.000,00		$	-	2612,45	$ 587.801.250,00	2612,45	$ 587.801.250,00	2719,54	$ 611.896.500,00	$ 24.095.250,00	2.719,54	$ 611.896.500,00	100,00%	2.719,54	$ 611.896.500,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		5	**DESMONTES Y RETIROS**					$	174.617.793,00		**$ 239.935.912,00**		**$ 239.935.912,00**		**$ 239.935.912,00**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ 239.935.912,00**	**100,00%**		**$ -**	**0,00%**
05.01	24.01.01	BIM005	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES (15%, QUINCE PORCIENTO PARA ESTE COMPONENTE)	UND	$	693.676.269,00	0,15	$	104.051.440,00	0,15	$ 104.051.440,00	0,15	$ 104.051.440,00	0,15	$ 104.051.440,00	$ -	0,15	$ -	0,00%	0,15	$ 104.051.440,00	100,00%	-	$ -	0,00%
05.02		**NP018**	DESMONTE Y DISPOSICION FINAL DE VIGAS EN MADERA DE ENTREPISO	ml	$	42.836,00		$	-	694,86	$ 29.765.023,00	694,86	$ 29.765.023,00	694,86	$ 29.765.023,00	$ -	-	$ -	0,00%	694,86	$ 29.765.023,00	100,00%	-	$ -	0,00%
05.03	03.01.04	DYR012	DESMONTAJE TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CIELO RASO EXISTENTE (OTROS MATERIALES). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	14.293,00	668,87	$	9.560.159,00	438,21	$ 6.263.336,00	438,21	$ 6.263.336,00	438,21	$ 6.263.336,00	$ -	438,21	$ -	0,00%	438,21	$ 6.263.336,00	100,00%	-	$ -	0,00%
05.04	03.01.06	DYR021	DESMONTAJE DE RED ELÉCTRICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO PUNTO ELÉCTRICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	6.460,00	325,52	$	2.102.859,00	1564,96	$ 10.109.642,00	1564,96	$ 10.109.642,00	1564,96	$ 10.109.642,00	$ -	1564,96	$ -	0,00%	1.564,96	$ 10.109.642,00	100,00%	-	$ -	0,00%
05.05	03.01.07	DYR022	DESMONTAJE DE RED HIDRÁULICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO HIDRÁULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	7.754,00	325,52	$	2.524.082,00	233,37	$ 1.809.551,00	233,37	$ 1.809.551,00	233,37	$ 1.809.551,00	$ -	233,37	$ -	0,00%	233,37	$ 1.809.551,00	100,00%	-	$ -	0,00%
05.06	03.01.08	DYR023	DESMONTAJE DE RED SANITARIA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO SANITARIO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	9.394,00	325,52	$	3.057.935,00	157,31	$ 1.477.770,00	157,31	$ 1.477.770,00	157,31	$ 1.477.770,00	$ -	157,31	$ -	0,00%	157,31	$ 1.477.770,00	100,00%	-	$ -	0,00%
05.07	03.01.13	DYR036	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPNTERÍA DE PUERTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$	67.771,00	47,00	$	3.185.237,00	84,00	$ 5.692.764,00	84,00	$ 5.692.764,00	84,00	$ 5.692.764,00	$ -	84,00	$ -	0,00%	84,00	$ 5.692.764,00	100,00%	-	$ -	0,00%
05.08	03.01.14	DYR037	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPNTERÍA DE VENTANAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$	60.106,00	41,00	$	2.464.346,00	121,00	$ 7.272.826,00	121,00	$ 7.272.826,00	121,00	$ 7.272.826,00	$ -	121,00	$ -	0,00%	121,00	$ 7.272.826,00	100,00%	-	$ -	0,00%
05.09	03.01.15	DYR039	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO BALDOSA EN CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	12.497,00	286,38	$	3.578.891,00	1013,26	$ 12.662.710,00	1013,26	$ 12.662.710,00	1013,26	$ 12.662.710,00	$ -	1013,26	$ -	0,00%	1.013,26	$ 12.662.710,00	100,00%	-	$ -	0,00%
05.10	03.01.16	DYR040	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO EN MADERA DE 3CM. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	22.277,00	506,63	$	11.286.197,00	572,14	$ 12.745.563,00	572,14	$ 12.745.563,00	572,14	$ 12.745.563,00	$ -	572,14	$ -	0,00%	572,14	$ 12.745.563,00	100,00%	-	$ -	0,00%
05.11	03.01.17	DYR044	DESMONTE ZÓCALO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	11.139,00	1,00	$	11.139,00	257,63	$ 2.869.741,00	257,63	$ 2.869.741,00	257,63	$ 2.869.741,00	$ -	257,63	$ -	0,00%	257,63	$ 2.869.741,00	100,00%	-	$ -	0,00%
05.12		**NP019**	DEMOLICION MANUAL DE ESCALERAS EN CONCRETO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION	M2	$	39.740,00		$	-	19,02	$ 755.855,00	19,02	$ 755.855,00	19,02	$ 755.855,00	$ -	-	$ -	0,00%	19,02	$ 755.855,00	100,00%	-	$ -	0,00%
05.13	03.02.04	DEM013	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE HMAX=0.18 METROS - DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	31.036,00	1.056,69	$	32.795.508,00	1432,52	$ 44.459.691,00	1432,52	$ 44.459.691,00	1432,52	$ 44.459.691,00	$ -	1432,52	$ -	0,00%	1.432,52	$ 44.459.691,00	100,00%	-	$ -	0,00%
		6	**EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, LLENOS Y RETIROS – CONVENTO**					**$**	**179.496.080,00**		**$ 672.787.773,00**		**$ 672.787.773,00**		**$ 566.041.053,00**	**-$ 106.746.720,00**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 566.041.053,00**	**100,00%**
06.01	02.02.01	APT001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMIENTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	$	14.112,00	106,31	$	1.500.287,00	882,05	$ 12.447.490,00	882,05	$ 12.447.490,00	882,05	$ 12.447.490,00	$ -	882,05	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	882,05	$ 12.447.490,00	100,00%
06.02	02.02.02	APT002	ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO	TORRE - MES	$	3.822.841,00	15,00	$	57.342.615,00	31,67	$ 121.069.374,00	31,67	$ 121.069.374,00	31,67	$ 121.069.374,00	$ -	31,67	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	31,67	$ 121.069.374,00	100,00%
06.03	03,02,05	DEM022	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	$	205.284,00	6,87	$	1.409.275,00	6,87	$ 1.410.301,00	6,87	$ 1.410.301,00	13,74	$ 2.820.602,00	$ 1.410.301,00	13,74	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	13,74	$ 2.820.602,00	100,00%
06.04	03,02,06	DEM026	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA EMAX=20CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	18.768,00	338,62	$	6.355.126,00	635,63	$ 11.929.504,00	635,63	$ 11.929.504,00	587,58	$ 11.027.701,00	-$ 901.803,00	587,58	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	587,58	$ 11.027.701,00	100,00%
06.05	03,02,07	DEM028	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	54.590,00	92,12	$	5.028.558,00	142,95	$ 7.803.641,00	142,95	$ 7.803.641,00	56,55	$ 3.087.065,00	-$ 4.716.576,00	56,55	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	56,55	$ 3.087.065,00	100,00%
06.06	04.03.02	MOV001	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	$	91.345,00	642,88	$	58.723.417,00	1419,36	$ 129.650.982,00	1419,36	$ 129.650.982,00	1135,48	$ 103.720.421,00	-$ 25.930.561,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.135,48	$ 103.720.421,00	100,00%
06.07		**NP020**	EXCAVACION PARA TANQUE MAYOR A 3M	m3	$	49.430,00		$	-	180,00	$ 8.897.400,00	180,00	$ 8.897.400,00	-	$ -	-$ 8.897.400,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
06.08	04,01,01	MT01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$	28.933,00	135,00	$	3.905.955,00	157,67	$ 4.561.866,00	157,67	$ 4.561.866,00	1040,55	$ 30.106.233,00	$ 25.544.367,00	1040,55	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.040,55	$ 30.106.233,00	100,00%
06.09	04,01,02	MT02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$	31.648,00	507,88	$	16.073.228,00	1300,69	$ 41.164.237,00	1300,69	$ 41.164.237,00	157,00	$ 4.968.736,00	-$ 36.195.501,00	157,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	157,00	$ 4.968.736,00	100,00%
06.10	04,02,01	MT03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM., ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	$	54.601,00	347,73	$	18.986.406,00	491,51	$ 26.836.828,00	491,51	$ 26.836.828,00	491,50	$ 26.836.392,00	-$ 436,00	491,50	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	491,50	$ 26.836.392,00	100,00%
06.11	04,02,03	MT08	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	$	217.449,00	16,87	$	3.668.365,00	1146,85	$ 249.381.821,00	1146,85	$ 249.381.821,00	884,46	$ 192.324.943,00	-$ 57.056.878,00	884,46	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	884,46	$ 192.324.943,00	100,00%
06.12	04,03,01	MT06	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$	40.606,00	160,15	$	6.502.848,00	1419,36	$ 57.634.329,00	1419,36	$ 57.634.329,00	1419,30	$ 57.632.096,00	-$ 2.233,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.419,30	$ 57.632.096,00	100,00%
		7	**EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, LLENOS Y RETIROS – CAPILLA**					**$**	**179.496.080,00**		**$ 522.952.219,00**		**$ 522.952.219,00**		**$ 468.207.711,00**	**-$ 54.744.508,00**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 468.207.711,00**	**100,00%**
07.01	02.02.01	APT001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMIENTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	$	14.112,00	106,31	$	1.500.287,00	882,05	$ 12.447.490,00	882,05	$ 12.447.490,00	882,05	$ 12.447.490,00	$ -	882,05	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	882,05	$ 12.447.490,00	100,00%
07.02	02.02.02	APT002	ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO	TORRE - MES	$	3.822.841,00	15,00	$	57.342.615,00	31,67	$ 121.069.374,00	31,67	$ 121.069.374,00	31,67	$ 121.069.374,00	$ -	31,67	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	31,67	$ 121.069.374,00	100,00%
07.03	03,02,05	DEM022	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	$	205.284,00	6,87	$	1.409.275,00	6,87	$ 1.410.301,00	6,87	$ 1.410.301,00	6,87	$ 1.410.301,00	$ -	6,87	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,87	$ 1.410.301,00	100,00%
07.04	03,02,06	DEM026	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA EMAX=20CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	18.768,00	338,62	$	6.355.126,00	73,16	$ 1.373.067,00	73,16	$ 1.373.067,00	98,40	$ 1.846.771,00	$ 473.704,00	98,40	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	98,40	$ 1.846.771,00	100,00%
07.05	03,02,07	DEM028	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	54.590,00	92,12	$	5.028.558,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
07.06	04.03.02	MOV001	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	$	91.345,00	642,88	$	58.723.417,00	642,88	$ 58.723.874,00	642,88	$ 58.723.874,00	514,30	$ 46.978.734,00	-$ 11.745.140,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	514,30	$ 46.978.734,00	100,00%
07.07	04,01,01	MT01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$	28.933,00	135,00	$	3.905.955,00	135,00	$ 3.905.955,00	135,00	$ 3.905.955,00	1040,55	$ 30.106.233,00	$ 26.200.278,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.040,55	$ 30.106.233,00	100,00%
07.08	04,01,02	MT02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$	31.648,00	507,88	$	16.073.228,00	1300,69	$ 41.164.237,00	1300,69	$ 41.164.237,00	135,00	$ 4.272.480,00	-$ 36.891.757,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	135,00	$ 4.272.480,00	100,00%
07.09	04,02,01	MT03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM., ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	$	54.601,00	347,73	$	18.986.406,00	430,71	$ 23.517.033,00	430,71	$ 23.517.033,00	430,70	$ 23.516.651,00	-$ 382,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	430,70	$ 23.516.651,00	100,00%
07.10	04,02,03	MT08	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	$	217.449,00	16,87	$	3.668.365,00	1004,98	$ 218.532.548,00	1004,98	$ 218.532.548,00	854,23	$ 185.751.459,00	-$ 32.781.089,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	854,23	$ 185.751.459,00	100,00%
07.11	04,03,01	MT06	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$	40.606,00	160,15	$	6.502.848,00	1004,98	$ 40.808.340,00	1004,98	$ 40.808.340,00	1004,98	$ 40.808.218,00	-$ 122,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.004,98	$ 40.808.218,00	100,00%
		8	**CIMENTACIÓN - CONVENTO**					**$**	**547.844.362,00**		**$ 592.217.351,00**		**$ 592.217.351,00**		**$ 561.868.108,00**	**-$ 30.349.243,00**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 561.868.108,00**	**100,00%**
08.01	05,01,01	CI01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	$	36.888,00	10,87	$	401.102,00	389,46	$ 14.366.400,00	389,46	$ 14.366.400,00	-	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	389,46	$ 14.366.400,00	100,00%
08.02	05,01,02	CI03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$	1.349.521,00	21,69	$	29.271.110,00	56,73	$ 76.558.326,00	56,73	$ 76.558.326,00	56,73	$ 76.558.326,00	$ -	56,73	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	56,73	$ 76.558.326,00	100,00%
08.03	05,01,03	CI04	PILOTES PREEXCAVADOS EN CONCRETO Ø 25CM EN CONCRETO 3000PSI (F'C=21MPA) GRAVILLA FINA, PREMEZCLADO . NO INCLUYE REFUERZO	M	$	173.672,00	90,00	$	15.630.480,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
08.04	05,01,04	CI05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$	1.020.341,00	77,36	$	78.933.580,00	77,36	$ 78.933.580,00	77,36	$ 78.933.580,00	77,36	$ 78.933.580,00	$ -	77,36	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	77,36	$ 78.933.580,00	100,00%
08.05	04,02,02	MT04	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	M3	$	175.500,00	172,93	$	30.348.338,00	172,93	$ 30.349.215,00	0,00	$ -	-$ 30.349.215,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
08.06	05,01,05	CI06	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	$	384.275,00	593,79	$	228.176.731,00	841,91	$ 323.524.965,00	841,91	$ 323.524.965,00	841,91	$ -	$ -	841,91	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	841,91	$ 323.524.965,00	100,00%
08.07	05,01,06	CI08	CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).	M	$	19.485,00	197,95	$	3.856.958,00	197,95	$ 3.857.056,00	197,95	$ 3.857.056,00	-	$ -	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	197,95	$ 3.857.056,00	100,00%
08.08	05,01,07	CI09	RECONFORMACIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA BAJO TÉCNICA "MURRIADO"	M2	$	57.147,00	15,00	$	857.205,00	15,00	$ 857.205,00	15,00	$ 857.205,00	15,00	$ 857.205,00	$ -	15,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	15,00	$ 857.205,00	100,00%
08.09	02.01.01	PRE001	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS; COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABSCISADO, DETALLES). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	$	7.157,00	2.825,44	$	20.221.674,00	1412,72	$ 10.110.837,00	1412,72	$ 10.110.837,00	1412,72	$ 10.110.837,00	$ -	1412,72	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.412,72	$ 10.110.837,00	100,00%
08.10	05,05,01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$	8.992,00	14.553,43	$	130.864.430,00	3087,03	$ 27.758.574,00	3087,03	$ 27.758.574,00	3087,03	$ 27.758.574,00	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3.087,03	$ 27.758.574,00	100,00%
08.11	05,05,02	A02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	$	8.740,00	1.062,10	$	9.282.754,00	2963,52	$ 25.901.193,00	2963,52	$ 25.901.193,00	2963,52	$ 25.901.165,00	-$ 28,00	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2.963,52	$ 25.901.165,00	100,00%
		9	**CIMENTACIÓN - CAPILLA**					**$**	**651.895.802,00**		**$ 729.864.109,00**		**$ 729.864.109,00**		**$ 699.514.831,00**	**-$ 30.349.278,00**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 699.514.831,00**	**100,00%**
09.01	24.01.01	BIM005	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES (15%, QUINCE PORCIENTO PARA ESTE COMPONENTE)	UND	$	693.676.269,00	0,15	$	104.051.440,00	0,15	$ 104.051.440,00	0,15	$ 104.051.440,00	0,15	$ 104.051.440,00	$ -	0,15	$ -	0,00%	0,15	$ 104.051.440,00	100,00%	-	$ -	0,00%
09.02	05,01,01	CI01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	$	36.888,00	10,87	$	401.102,00	311,81	$ 11.502.047,00	311,81	$ 11.502.047,00	311,81	$ 11.502.047,00	$ -	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	311,81	$ 11.502.047,00	100,00%

09.03	05,01,02	CI03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$	1.349.521,00	21,69	$	29.271.110,00	101,80	$ 137.381.238,00	101,80	$ 137.381.238,00	101,80	$	137.381.238,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	101,80	$	137.381.238,00	100,00%
09.04	05,01,03	CI04	PILOTES PREEXCAVADOS EN CONCRETO Ø 25CM EN CONCRETO 3000PSI (F'C=21MPA) GRAVILLA FINA, PREMEZCLADO . NO INCLUYE REFUERZO	M	$	173.672,00	90,00	$	15.630.480,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$	-	0,00%
09.05	05,01,04	CI05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$	1.020.341,00	77,36	$	78.933.580,00	77,36	$ 78.933.580,00	77,36	$ 78.933.580,00	77,36	$	78.933.580,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	77,36	$	78.933.580,00	100,00%
09.06	04,02,02	MT04	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM .	M3	$	175.500,00	172,93	$	30.348.338,00	172,93	$ 30.349.215,00	172,93	$ 30.349.215,00	0,00	$	-	$ -30.349.215,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$	-	0,00%
09.07	05,01,05	CI06	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	$	384.275,00	593,79	$	228.176.731,00	515,36	$ 198.039.964,00	515,36	$ 198.039.964,00	515,36	$	198.039.964,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	515,36	$	198.039.964,00	100,00%
09.08	05,01,06	CI08	CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).	M	$	19.485,00	197,95	$	3.856.958,00	197,95	$ 3.857.056,00	197,95	$ 3.857.056,00	197,95	$	3.857.056,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	197,95	$	3.857.056,00	100,00%
09.09	05,01,07	CI09	RECONFORMACIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA BAJO TÉCNICA "MURRIADO"	M2	$	57.147,00	15,00	$	857.205,00	15,00	$ 857.205,00	15,00	$ 857.205,00	15,00	$	857.205,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	15,00	$	857.205,00	100,00%
09.10	02.01.01	PRE001	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABSCISADO, DETALLES). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	$	7.157,00	2.825,44	$	20.221.674,00	1412,72	$ 10.110.837,00	1412,72	$ 10.110.837,00	1412,72	$	10.110.837,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.412,72	$	10.110.837,00	100,00%
09.11	05,05,01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$	8.992,00	14.553,43	$	130.864.430,00	15450,02	$ 138.926.580,00	15450,02	$ 138.926.580,00	15450,02	$	138.926.580,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	15.450,02	$	138.926.580,00	100,00%
09.12	05,05,02	A02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	$	8.740,00	1.062,10	$	9.282.754,00	1814,07	$ 15.854.947,00	1814,07	$ 15.854.947,00	1814,06	$	15.854.884,00	$ -63,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.814,06	$	15.854.884,00	100,00%
		10	**COLUMNAS - CONVENTO**					**$**	**267.771.067,00**		**$ 273.444.682,00**		**$ 273.444.682,00**		**$**	**273.444.682,00**	**$ -**	**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$**	**273.444.682,00**	**100,00%**
10.01	05,02,01	CO02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$	1.476.290,00	27,92	$	41.218.017,00	27,92	$ 41.218.017,00	27,92	$ 41.218.017,00	27,92	$	41.218.017,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	27,92	$	41.218.017,00	100,00%
10.02	05,02,02	CO03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 24,5 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$	1.525.592,00	36,30	$	55.371.362,00	37,99	$ 57.957.240,00	37,99	$ 57.957.240,00	37,99	$	57.957.240,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	37,99	$	57.957.240,00	100,00%
10.03	05,02,03	CO04	PANTALLA EN CONCRETO DE F'C=24.5 MPA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$	1.798.272,00	22,42	$	40.317.258,00	24,83	$ 44.651.094,00	24,83	$ 44.651.094,00	24,83	$	44.651.094,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	24,83	$	44.651.094,00	100,00%
10.04	05,05,01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$	8.992,00	14.553,43	$	130.864.430,00	14414,85	$ 129.618.331,00	14414,85	$ 129.618.331,00	14414,85	$	129.618.331,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14.414,85	$	129.618.331,00	100,00%
		11	**COLUMNAS - CAPILLA**					**$**	**267.771.067,00**		**$ 587.509.705,00**		**$ 587.509.705,00**		**$**	**587.509.705,00**	**$ -**	**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$**	**587.509.705,00**	**100,00%**
11.01	05,02,01	CO02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$	1.476.290,00	27,92	$	41.218.017,00	27,92	$ 41.218.017,00	27,92	$ 41.218.017,00	27,92	$	41.218.017,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	27,92	$	41.218.017,00	100,00%
11.02	05,02,02	CO03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 24,5 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$	1.525.592,00	36,30	$	55.371.362,00	37,99	$ 57.957.240,00	37,99	$ 57.957.240,00	37,99	$	57.957.240,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	37,99	$	57.957.240,00	100,00%
11.03	05,02,03	CO04	PANTALLA EN CONCRETO DE F'C=24.5 MPA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$	1.798.272,00	22,42	$	40.317.258,00	24,83	$ 44.651.094,00	24,83	$ 44.651.094,00	24,83	$	44.651.094,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	24,83	$	44.651.094,00	100,00%
11.04	05,05,01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$	8.992,00	14.553,43	$	130.864.430,00	49342,01	$ 443.683.354,00	49342,01	$ 443.683.354,00	49342,01	$	443.683.354,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	49.342,01	$	443.683.354,00	100,00%
		12	**VIGAS Y PLACAS - CONVENTO**					**$**	**280.643.818,00**		**$ 409.293.068,00**		**$ 409.293.068,00**		**$**	**409.293.068,00**	**$ -**	**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$**	**409.293.068,00**	**100,00%**
12.01	02.02.01	APT001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	$	14.112,00	106,31	$	1.500.287,00	882,05	$ 12.447.490,00	882,05	$ 12.447.490,00	882,05	$	12.447.490,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	882,05	$	12.447.490,00	100,00%
12.02	02.02.02	APT002	ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO	TORRE - MES	$	3.822.841,00	15,00	$	57.342.615,00	31,67	$ 121.069.374,00	31,67	$ 121.069.374,00	31,67	$	121.069.374,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	31,67	$	121.069.374,00	100,00%
12.03	05,03,01	CVP01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$	1.504.239,00	31,23	$	46.969.863,00	31,23	$ 46.977.384,00	31,23	$ 46.977.384,00	31,23	$	46.977.384,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	31,23	$	46.977.384,00	100,00%
12.04	05,03,02	CVP02	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$	1.510.434,00	20,69	$	31.250.879,00	20,69	$ 31.250.879,00	20,69	$ 31.250.879,00	20,69	$	31.250.879,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,69	$	31.250.879,00	100,00%
12.05	05,03,03	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0.10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	$	14.530,00	187,50	$	2.724.375,00	187,50	$ 2.724.375,00	187,50	$ 2.724.375,00	187,50	$	2.724.375,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	187,50	$	2.724.375,00	100,00%
12.06	05,03,04	CVP10	PLACA MACIZA ENTREPISO MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	$	141.723,00	5,00	$	708.615,00	5,00	$ 708.615,00	5,00	$ 708.615,00	5,00	$	708.615,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,00	$	708.615,00	100,00%
12.07	05,05,01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$	8.992,00	14.553,43	$	130.864.430,00	21570,41	$ 193.961.127,00	21570,41	$ 193.961.127,00	21570,41	$	193.961.127,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	21.570,41	$	193.961.127,00	100,00%
12.08	05,05,02	A02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	$	8.740,00	1.062,10	$	9.282.754,00	17,60	$ 153.824,00	17,60	$ 153.824,00	17,60	$	153.824,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	17,60	$	153.824,00	100,00%
		13	**VIGAS Y PLACAS - CAPILLA**					**$**	**280.643.818,00**		**$ 414.856.778,00**		**$ 414.856.778,00**		**$**	**414.856.778,00**	**$ -**	**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$**	**414.856.778,00**	**100,00%**
13.01	02.02.01	APT001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	$	14.112,00	106,31	$	1.500.287,00	882,05	$ 12.447.490,00	882,05	$ 12.447.490,00	882,05	$	12.447.490,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	882,05	$	12.447.490,00	100,00%
13.02	02.02.02	APT002	ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO	TORRE - MES	$	3.822.841,00	15,00	$	57.342.615,00	31,67	$ 121.069.374,00	31,67	$ 121.069.374,00	31,67	$	121.069.374,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	31,67	$	121.069.374,00	100,00%
13.03	05,03,01	CVP01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$	1.504.239,00	31,23	$	46.969.863,00	31,23	$ 46.977.384,00	31,23	$ 46.977.384,00	31,23	$	46.977.384,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	31,23	$	46.977.384,00	100,00%
13.04	05,03,02	CVP02	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$	1.510.434,00	20,69	$	31.250.879,00	20,69	$ 31.250.879,00	20,69	$ 31.250.879,00	20,69	$	31.250.879,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,69	$	31.250.879,00	100,00%
13.05	05,03,03	CO08	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0.10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	$	14.530,00	187,50	$	2.724.375,00	187,50	$ 2.724.375,00	187,50	$ 2.724.375,00	187,50	$	2.724.375,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	187,50	$	2.724.375,00	100,00%
13.06	05,03,04	CVP10	PLACA MACIZA ENTREPISO MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	$	141.723,00	5,00	$	708.615,00	5,00	$ 708.615,00	5,00	$ 708.615,00	5,00	$	708.615,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,00	$	708.615,00	100,00%
13.07	05,05,01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$	8.992,00	14.553,43	$	130.864.430,00	22189,15	$ 199.524.837,00	22189,15	$ 199.524.837,00	22189,15	$	199.524.837,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	22.189,15	$	199.524.837,00	100,00%
13.08	05,05,02	A02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	$	8.740,00	1.062,10	$	9.282.754,00	17,60	$ 153.824,00	17,60	$ 153.824,00	17,60	$	153.824,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	17,60	$	153.824,00	100,00%
		14	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA - CONVENTO**					**$**	**267.300.671,00**		**$ 301.822.941,00**		**$ 301.822.941,00**		**$**	**301.822.864,00**	**-$ 77,00**	**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$**	**301.822.864,00**	**100,00%**
14.01	24.01.01	BIM005	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES (15%, QUINCE PORCIENTO PARA ESTE COMPONENTE)	UND	$	693.676.269,00	0,15	$	104.051.440,00	0,15	$ 104.051.440,00	0,15	$ 104.051.440,00	0,15	$	104.051.440,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,15	$	104.051.440,00	100,00%
14.02	02.02.01	APT001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	$	14.112,00	106,31	$	1.500.287,00	882,05	$ 12.447.490,00	882,05	$ 12.447.490,00	882,05	$	12.447.490,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	882,05	$	12.447.490,00	100,00%
14.03	02.02.02	APT002	ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO	TORRE - MES	$	3.822.841,00	15,00	$	57.342.615,00	31,67	$ 121.069.374,00	31,67	$ 121.069.374,00	31,67	$	121.069.374,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	31,67	$	121.069.374,00	100,00%
14.04	03.01.10	DYR028	DESMONTAJE DE TEJA EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	15.304,00	992,38	$	15.187.307,00	1279,22	$ 19.577.183,00	1279,22	$ 19.577.183,00	1279,22	$	19.577.183,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.279,22	$	19.577.183,00	100,00%
14.05	03.01.11	DYR033	DESMONTAJE Y RETIRO DE LUCARNAS. INCLUYE DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$	6.347,00	216,06	$	1.371.349,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$	-	0,00%
14.06	03.01.12	DYR035	DESMONTAJE, CLASIFICACIÓN Y LIMPIEZA INICIAL DE TEJAS DE BARRO, INCLUYE RETIRO DE MORTERO DE PEGA, TRANSPORTE A SITIO DE ACOPIO Y RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE DE ELEMENTOS DAÑADOS Y/O EN MAL ESTADO Y/O ELEMENTOS RETIRADOS DE LA TEJA	M2	$	28.659,00	992,38	$	28.440.475,00	1279,22	$ 36.661.166,00	1279,22	$ 36.661.166,00	1279,22	$	36.661.166,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.279,22	$	36.661.166,00	100,00%
14.07	07,01,01	RES-MM09	RETIRO MANUAL DE HUELLAS DE ANIMALES, LIMPIEZA CON ACCIÓN MECÁNICA EN SECO, POSTERIOR LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON JABÓN NEUTRO Y AGUA.	M2	$	3.695,00	6,63	$	24.479,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$	-	0,00%
14.08	07,01,02	RES-CU02	RECUPERACIÓN DE TEJA DE BARRO 60% (LAVADO, APLICACIÓN DE HIDRO PROTECCIÓN, ALISTADO PARA INSTALACIÓN)	M2	$	9.584,00	595,43	$	5.706.553,00	511,69	$ 4.904.018,00	511,69	$ 4.904.018,00	511,68	$	4.903.941,00	$ -77,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	511,68	$	4.903.941,00	100,00%
14.09	07,01,03	RES-CU03	TRATAMIENTO RECUPERACIÓN TEJA DE ZINC, PELADO, FIJACIÓN Y APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVO.	M2	$	28.341,00	30,90	$	875.595,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$	-	0,00%
14.10	07,01,04	RES-CU04	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL PERIMETRAL EN MATERIAL GALVANIZADO. (RETIRO DE SUCIEDAD DEPOSITADA EN LA CANAL PERIMETRAL DEL EDIFICIO, REVISIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE, VERIFICACIÓN DE PENDIENTES Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO)	M	$	17.156,00	181,41	$	3.112.184,00	181,41	$ 3.112.270,00	181,41	$ 3.112.270,00	181,41	$	3.112.270,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	181,41	$	3.112.270,00	100,00%
14.11	07,01,05	RES-CU05	RECUPERACIÓN (RETIRO, LAVADO Y ACOPIO DE CUBIERTA) Y RESTAURACIÓN (RETIRO DE ESMALTE Y RESTAURACIÓN DE PUNTOS DE SOLDADURA EN ÁREAS REQUERIDAS) DE TEJA ROMBOIDAL TIPO SHINGLE	M2	$	50.522,00	983,50	$	49.688.387,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$	-	0,00%
		15	**RESTAURACIÓN DE CUBIERTA - CAPILLA**					**$**	**163.249.231,00**		**$ 173.469.956,00**		**$ -**		**$**	**97.644.090,00**	**$ 97.644.090,00**	**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$**	**97.644.090,00**	**100,00%**
15.01	02.02.01	APT001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	$	14.112,00	106,31	$	1.500.287,00	882,05	$ 12.447.490,00	0,00	$ 0,00	106,31	$	1.500.247,00	$ 1.500.247,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	106,31	$	1.500.247,00	100,00%
15.02	02.02.02	APT002	ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO	TORRE - MES	$	3.822.841,00	15,00	$	57.342.615,00	31,67	$ 121.069.374,00	0,00	$ 0,00	16,00	$	61.165.456,00	$ 61.165.456,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	16,00	$	61.165.456,00	100,00%
15.03	03.01.10	DYR028	DESMONTAJE DE TEJA EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	15.304,00	992,38	$	15.187.307,00	705,47	$ 10.796.513,00	0,00	$ 0,00	641,00	$	9.809.864,00	$ 9.809.864,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	641,00	$	9.809.864,00	100,00%
15.04	03.01.11	DYR033	DESMONTAJE Y RETIRO DE LUCARNAS. INCLUYE DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$	6.347,00	216,06	$	1.371.349,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$	-	0,00%
15.05	03.01.12	DYR035	DESMONTAJE, CLASIFICACIÓN Y LIMPIEZA INICIAL DE TEJAS DE BARRO, INCLUYE RETIRO DE MORTERO DE PEGA, TRANSPORTE A SITIO DE ACOPIO Y RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE DE ELEMENTOS DAÑADOS Y/O EN MAL ESTADO Y/O ELEMENTOS RETIRADOS DE LA TEJA	M2	$	28.659,00	992,38	$	28.440.475,00	705,47	$ 20.218.065,00	0,00	$ 0,00	641,00	$	18.370.419,00	$ 18.370.419,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	641,00	$	18.370.419,00	100,00%
15.06	07,01,01	RES-MM09	RETIRO MANUAL DE HUELLAS DE ANIMALES, LIMPIEZA CON ACCIÓN MECÁNICA EN SECO, POSTERIOR LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON JABÓN NEUTRO Y AGUA.	M2	$	3.695,00	6,63	$	24.479,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$	-	0,00%
15.07	07,01,02	RES-CU02	RECUPERACIÓN DE TEJA DE BARRO 60% (LAVADO, APLICACIÓN DE HIDRO PROTECCIÓN, ALISTADO PARA INSTALACIÓN)	M2	$	9.584,00	595,43	$	5.706.553,00	282,19	$ 2.704.490,00		$ 0,00	384,60	$	3.686.006,00	$ 3.686.006,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	384,60	$	3.686.006,00	100,00%
15.08	07,01,03	RES-CU03	TRATAMIENTO RECUPERACIÓN TEJA DE ZINC, PELADO, FIJACIÓN Y APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVO.	M2	$	28.341,00	30,90	$	875.595,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$	-	0,00%
15.09	07,01,04	RES-CU04	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL PERIMETRAL EN MATERIAL GALVANIZADO. (RETIRO DE SUCIEDAD DEPOSITADA EN LA CANAL PERIMETRAL DEL EDIFICIO, REVISIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE, VERIFICACIÓN DE PENDIENTES Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO)	M	$	17.156,00	181,41	$	3.112.184,00	181,41	$ 3.112.270,00		$ 0,00	181,40	$	3.112.098,00	$ 3.112.098,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	181,40	$	3.112.098,00	100,00%
15.10	07,01,05	RES-CU05	RECUPERACIÓN (RETIRO, LAVADO Y ACOPIO DE CUBIERTA) Y RESTAURACIÓN (RETIRO DE ESMALTE Y RESTAURACIÓN DE PUNTOS DE SOLDADURA EN ÁREAS REQUERIDAS) DE TEJA ROMBOIDAL TIPO SHINGLE	M2	$	50.522,00	983,50	$	49.688.387,00	61,79	$ 3.121.754,00		$ 0,00		$	-	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$	-	0,00%
		16	**MADERA CUBIERTA - CONVENTO**					**$**	**292.667.653,00**		**$ 1.878.878.634,00**		**$ 1.808.828.913,00**		**$**	**1.808.826.255,00**	**-$ 2.658,00**	**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$**	**1.808.826.255,00**	**100,00%**

16.01	07,03,01	MAD-02	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 17) X 35. LONGITUD < 3M (CORREA, VIGA, TIRANTE, DIAGONAL, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	2.072.610,00	3,50	$	7.254.135,00	3,00	$	6.217.830,00	3,00	$	6.217.830,00	3,00	$	6.217.830,00	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	3,00	$	6.217.830,00	100,00%
16.02	07,03,02	MAD-03	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 17) X 35. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M (CORREA, VIGA, TIRANTE, DIAGONAL, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	4.545.859,00	3,00	$	13.637.577,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
16.03	07,03,03	MAD-04	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD < 1,5 M (SOLERA, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE. ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	537.734,00	18,00	$	9.679.212,00	144,00	$	77.433.696,00	144,00	$	77.433.696,00	144,00	$	77.433.696,00	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	144,00	$	77.433.696,00	100,00%
16.04	07,03,04	MAD-05	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M (SOBRESOLERA, CUMBRERA, DIAGONAL). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	1.985.049,00	121,50	$	241.183.454,00	380,00	$	754.318.620,00	344,71	$	684.268.899,00	344,71	$	684.266.241,00	-$	2.658,00		$	-	0,00%		$	-	0,00%	344,71	$	684.266.241,00	100,00%
16.05	07,03,05	MAD-06	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 16) X 10. LONGITUD < 3,0 M (CAN, PENDOLÓN, SOBRESOLERA, SOLERA, VIGA DE CIELORRASO). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	878.083,00	20,00	$	17.561.660,00	332,00	$	291.523.556,00	332,00	$	291.523.556,00	332,00	$	291.523.556,00	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	332,00	$	291.523.556,00	100,00%
16.06	07,03,06	MAD-07	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO 16 X 10. LONGITUD 3,0 M A 8,0 M (PAR, TIRANTE, VIGA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	1.599.383,00	0,50	$	799.692,00	185,00	$	295.885.855,00	185,00	$	295.885.855,00	185,00	$	295.885.855,00	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	185,00	$	295.885.855,00	100,00%
16.07	07,03,07	MAD-09	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO (4 A 6) X 10. LONGITUD < 2 M (DIAGONAL, TORNAPUNTA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	462.255,00	3,50	$	1.617.893,00	584,00	$	269.956.920,00	584,00	$	269.956.920,00	584,00	$	269.956.920,00	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	584,00	$	269.956.920,00	100,00%
16.08	07,03,08	MAD-11	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO 7 X 7. LONGITUD 1,5 A 2,5 M (ARRIOSTRE, DIAGONAL, TORNAPUNTA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	458.649,00	0,50	$	229.325,00	182,00	$	83.474.118,00	182,00	$	83.474.118,00	182,00	$	83.474.118,00	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	182,00	$	83.474.118,00	100,00%
16.09	07,03,09	MAD-12	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO 4 X 4. LONGITUD 1,4 A 1,6 M (CORREA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	469.803,00	1,50	$	704.705,00	213,00	$	100.068.039,00	213,00	$	100.068.039,00	213,00	$	100.068.039,00	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	213,00	$	100.068.039,00	100,00%
		17	**MADERA CUBIERTA - CAPILLA**					$	**292.667.653,00**		$	**1.880.749.676,00**		$	-		$	-	$	-		$	-	**0,00%**		$	-	**0,00%**		$	-	**0,00%**
17.01	07,03,01	MAD-02	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 17) X 35. LONGITUD < 3M (CORREA, VIGA, TIRANTE, DIAGONAL, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	2.072.610,00	3,50	$	7.254.135,00	2,00	$	4.145.220,00		$	0,00		$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
17.02	07,03,02	MAD-03	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 17) X 35. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M (CORREA, VIGA, TIRANTE, DIAGONAL, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	4.545.859,00	3,00	$	13.637.577,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
17.03	07,03,03	MAD-04	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD < 1,5 M (SOLERA, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE. ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	537.734,00	18,00	$	9.679.212,00	145,00	$	77.971.430,00		$	0,00		$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
17.04	07,03,04	MAD-05	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M (SOBRESOLERA, CUMBRERA, DIAGONAL). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	1.985.049,00	121,50	$	241.183.454,00	380,00	$	754.318.620,00		$	0,00		$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
17.05	07,03,05	MAD-06	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 16) X 10. LONGITUD < 3,0 M (CAN, PENDOLÓN, SOBRESOLERA, SOLERA, VIGA DE CIELORRASO). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	878.083,00	20,00	$	17.561.660,00	333,00	$	292.401.639,00		$	0,00		$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
17.06	07,03,06	MAD-07	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO 16 X 10. LONGITUD 3,0 M A 8,0 M (PAR, TIRANTE, VIGA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	1.599.383,00	0,50	$	799.692,00	186,00	$	297.485.238,00		$	0,00		$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
17.07	07,03,07	MAD-09	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO (4 A 6) X 10. LONGITUD < 2 M (DIAGONAL, TORNAPUNTA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	462.255,00	3,50	$	1.617.893,00	584,00	$	269.956.920,00		$	0,00		$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
17.08	07,03,08	MAD-11	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO 7 X 7. LONGITUD 1,5 A 2,5 M (ARRIOSTRE, DIAGONAL, TORNAPUNTA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	458.649,00	0,50	$	229.325,00	183,00	$	83.932.767,00		$	0,00		$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
17.09	07,03,09	MAD-12	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO 4 X 4. LONGITUD 1,4 A 1,6 M (CORREA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$	469.803,00	1,50	$	704.705,00	214,00	$	100.537.842,00		$	0,00		$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
		18	**CUBIERTA - CONVENTO**					$	**122.095.305,00**		$	**176.484.261,00**		$	**176.484.261,00**		$	**176.483.213,00**	-$	**1.048,00**	$	-	**0,00%**		$	-	**0,00%**		$	**176.483.213,00**	**100,00%**
18.01	07,04,01	CUB006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO FALTANTE. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO	M2	$	129.262,00	396,95	$	51.310.551,00	767,53	$	99.212.721,00	767,53	$	99.212.721,00	767,53	$	99.212.463,00	-$	258,00	$	-	0,00%		$	-	0,00%	767,53	$	99.212.463,00	100,00%
18.02	07,04,02	CUB007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 NO. 6 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	$	41.820,00	421,10	$	17.610.477,00	767,53	$	32.098.188,00	767,53	$	32.098.188,00	767,53	$	32.098.105,00	-$	83,00	$	-	0,00%		$	-	0,00%	767,53	$	32.098.105,00	100,00%
18.03	07,04,03	CUB010	INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO RECUPERADA. DISTINTAS MEDIDAS	M2	$	16.793,00	631,65	$	10.607.344,00	511,69	$	8.592.777,00	511,69	$	8.592.777,00	511,68	$	8.592.642,00	-$	135,00	$	-	0,00%		$	-	0,00%	511,68	$	8.592.642,00	100,00%
18.04	07,04,04	CUB016	INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO RECUPERADA. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO	M2	$	71.490,00	595,43	$	42.566.933,00	511,69	$	36.580.575,00	511,69	$	36.580.575,00	511,68	$	36.580.003,00	-$	572,00	$	-	0,00%		$	-	0,00%	511,68	$	36.580.003,00	100,00%
		19	**CUBIERTA - CAPILLA**					$	**122.095.305,00**		$	**109.784.536,00**		$	-		$	**84.235.990,00**	$	**84.235.990,00**	$	-	**0,00%**		$	-	**0,00%**		$	**84.235.990,00**	**100,00%**
19.01	07,04,01	CUB006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO FALTANTE. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO	M2	$	129.262,00	396,95	$	51.310.551,00	423,28	$	54.714.278,00		$	0,00	256,40	$	33.142.777,00	$	33.142.777,00	$	-	0,00%		$	-	0,00%	256,40	$	33.142.777,00	100,00%
19.02	07,04,02	CUB007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 NO. 6 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	$	41.820,00	421,10	$	17.610.477,00	423,28	$	17.701.653,00		$	0,00	512,80	$	21.445.296,00	$	21.445.296,00	$	-	0,00%		$	-	0,00%	512,80	$	21.445.296,00	100,00%
19.03	07,04,03	CUB010	INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO RECUPERADA. DISTINTAS MEDIDAS	M2	$	16.793,00	631,65	$	10.607.344,00	423,28	$	7.108.175,00		$	0,00	128,20	$	2.152.863,00	$	2.152.863,00	$	-	0,00%		$	-	0,00%	128,20	$	2.152.863,00	100,00%
19.04	07,04,04	CUB016	INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO RECUPERADA. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO	M2	$	71.490,00	595,43	$	42.566.933,00	423,28	$	30.260.430,00		$	0,00	384,60	$	27.495.054,00	$	27.495.054,00	$	-	0,00%		$	-	0,00%	384,60	$	27.495.054,00	100,00%
		20	**RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA**					$	**71.890.752,00**		$	**182.187.299,00**		$	**4.405.843,00**		$	**4.405.843,00**	$	-	$	-	**0,00%**		$	-	**0,00%**		$	**4.405.843,00**	**100,00%**
20.01	07,02,01	RES-EM01	RESTAURACIÓN DE VENTANAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MENOR AL 30% (N1). INCLUYE RETIRO, LIMPIEZA, LIJADO MASILLADO, PINTURA SOBRE ZONAS EFECTADAS Y REINSTALACIÓN	UND	$	350.947,00	14,00	$	4.913.258,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
20.02	07,02,02	RES-EM02	RESTAURACIÓN DE VENTANAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MAYOR AL 30% (N2). INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.	UND	$	481.225,00	14,00	$	6.737.150,00	17,00	$	8.180.825,00	0,00	$	0,00	0,00	$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
20.03	07,02,03	RES-EM03	RESTAURACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MENOR AL 30% (N1). SECCIÓN 1.30X3.7M. INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.	UND	$	88.005,00	10,00	$	880.050,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
20.04	07,02,04	RES-EM04	RESTAURACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MAYOR AL 30% (N2). SECCIÓN 1.30X3.7M. INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.	UND	$	999.242,00	10,00	$	9.992.420,00	40,00	$	39.969.680,00	0,00	$	0,00	0,00	$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
20.05	07,02,05	RES-EM07	RESTAURACIÓN BASAMENTO EN PIEDRA PIES DERECHOS QUE FUERON REEMPLAZADOS POR OTROS ELEMENTOS O CUYA MADERA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.	UND	$	133.885,00	3,00	$	401.655,00	3,00	$	401.655,00	0,00	$	0,00	0,00	$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
20.06	07,02,06	RES-EM08	REEMPLAZO DE PUERTAS DE CARPINTERÍA DE MADERA (N3). SECCIÓN 1.30X3.7M. INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.B	UND	$	1.910.756,00	6,00	$	11.464.536,00	6,00	$	11.464.536,00	0,00	$	0,00	0,00	$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
20.07	07,02,07	RES-EM11	RESTITUCIÓN VENTANAS DE MADERA CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES L=1.2 DE ANCHO POR 1.4M DE ALTO. INCLUYE RETIRO DEL ELEMENTO LIJADO, MASILLADO, INMUNIZADO, PINTURA DE ACABADO Y REINSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	UND	$	1.240.626,00	6,00	$	7.443.756,00	66,00	$	81.881.316,00	0,00	$	0,00	0,00	$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
20.08	07,02,08	RES-EM12	RESTITUCIÓN PUERTAS DE MADERA CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES L=1.1 A 1.3M DE ANCHO POR 2.8M DE ALTO. INCLUYE RETIRO DEL ELEMENTO LIJADO, MASILLADO, INMUNIZADO, PINTURA DE ACABADO Y REINSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	UND	$	1.370.854,00	6,00	$	8.225.124,00	4,00	$	5.483.416,00	0,00	$	0,00	0,00	$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
20.09	07,02,09	RES-EM13	RESTITUCIÓN PIE DERECHOS DE MADERA DE 20X20 CON BASE EN PIEDRA. 1.MAX=1M	UND	$	1.344.310,00	3,00	$	4.032.930,00	3,00	$	4.032.930,00	0,00	$	-	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
20.10	07,02,10	RES-EM14	RESTAURACIÓN ZÓCALOS DE APROXIMÁDAMENTE 4M DE LARGO O SIMILAR, EN MADERA CON AFECTACIÓN MAYOR AL 30% (N2). INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.	UND	$	451.472,00	10,00	$	4.514.720,00	49,00	$	22.122.128,00	0,00	$	0,00	0,00	$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
20.11	07,02,11	RES-EM15	RESTAURACIÓN ZÓCALOS DE APROXIMÁDAMENTE 4M DE LARGO O SIMILAR, EN MADERA CON AFECTACIÓN MENOR AL 30% (N1). INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.	UND	$	424.497,00	10,00	$	4.244.970,00	10,00	$	4.244.970,00	0,00	$	0,00	0,00	$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
20.12	07,02,12	RES-EM16	RESTAURACIÓN ZÓCALOS DE MADERA CON AFECTACIÓN (N3) DE HASTA 20CM DE ESPESOR. INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.	UND	$	463.434,00	10,00	$	4.634.340,00	0,00	$	0,00	0,00	$	0,00	0,00	$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
20.13	07,02,13	RES-EM17	RESTAURACIÓN ESCALERA DE MADERA DE ACCESO (INTERIOR) DE HASTA 1.20M DE ANCHO. INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.	UND	$	4.405.843,00	1,00	$	4.405.843,00	1,00	$	4.405.843,00	1,00	$	4.405.843,00	1,00	$	4.405.843,00	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	1,00	$	4.405.843,00	100,00%
		21	**CORTES, DEMOLICIONES Y RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA**					$	**30.412.073,00**		$	**44.749.059,00**		$	**41.346.756,00**		$	**41.346.756,00**	$	-	$	-	**0,00%**		$	-	**0,00%**		$	**41.346.756,00**	**100,00%**
21.01	03,02,01	DEM001	CORTE Y REGATA EN MUROS Y MAMPOSTERÍA, ANCHO MÁXIMO DE 10CM. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$	3.614,00	134,00	$	484.276,00	2420,72	$	8.748.482,00	2420,72	$	8.748.482,00	2420,72	$	8.748.482,00	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	2.420,72	$	8.748.482,00	100,00%
21.02	08,01,01	RES-MM01	RESTAURACIÓN INTEGRAL MAMPOSTERÍA EXISTENTE PARA SELLO DE GRIETAS O FISURAS CON APLICACIÓN DE RESINA EPÓXICA CONSOLIDANTE.	M	$	20.521,00	4,07	$	83.520,00	300,00	$	6.156.300,00	300,00	$	6.156.300,00	300,00	$	6.156.300,00	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	300,00	$	6.156.300,00	100,00%
21.03	08,01,02	RES-MM02	LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA APLICADA POR GRAVEDAD Y MANUAL EN MURO INTERIOR	M2	$	10.344,00	5,17	$	53.478,00	5,17	$	53.478,00	5,17	$	53.478,00	5,17	$	53.478,00	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	5,17	$	53.478,00	100,00%
21.04	08,01,03	RES-MM03	RETIRO MECÁNICO DE PIEZAS AFECTADAS SOBRE MUROS EN MAMPOSTERÍA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$	17.862,00	197,54	$	3.528.459,00	197,54	$	3.528.459,00	197,54	$	3.528.459,00	197,54	$	3.528.459,00	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	197,54	$	3.528.459,00	100,00%
21.05	08,01,04	RES-MM04	RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERÍA MURO LADRILLO A LA VISTA CON MEDIO LADRILLO PRENSADO LIVIANO DE 6 CMS EN TONO TERRACOTA ACABADO DE JUNTA PÉRDIDA	M2	$	114.507,00	197,54	$	22.619.713,00	197,54	$	22.619.713,00	197,54	$	22.619.713,00	197,54	$	22.619.713,00	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	197,54	$	22.619.713,00	100,00%
21.06	08,01,05	RES-MM05	RETIRO MANUAL DE CAPA DE MUSGO Y/O CAPA VEGETAL CON MEDIOS MANUALES EN MUROS DE MAMPOSTERÍA, LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y APLICACIÓN DE HERBICIDA SOBRE SUPERFICIES.	M2	$	20.027,00	12,00	$	240.324,00	12,00	$	240.324,00	12,00	$	240.324,00	12,00	$	240.324,00	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	12,00	$	240.324,00	100,00%
21.07	08,01,06	RES-MM06	SELLO QUÍMICO EN LOS MUROS DE MAMPOSTERÍA PARA CONTROLAR LA HUMEDAD ASCENDENTE. E=15CM	M	$	26.198,00	128,00	$	3.353.344,00	128,00	$	3.353.344,00	0,00	$	0,00	0,00	$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
21.08	07,01,01	RES-MM09	RETIRO MANUAL DE HUELLAS DE ANIMALES, LIMPIEZA CON ACCIÓN MECÁNICA EN SECO, POSTERIOR LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON JABÓN NEUTRO Y AGUA.	M2	$	3.695,00	13,25	$	48.959,00	13,25	$	48.959,00	0,00	$	0,00	0,00	$	-	$	-		$	-	0,00%		$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
		22	**RESTAURACIÓN Y RESANE FACHADA**					$	**376.590.274,00**		$	**376.590.274,00**		$	**1.745.858,00**		$	**1.745.858,00**	$	-	$	-	**0,00%**		$	-	**0,00%**		$	**1.745.858,00**	**100,00%**

22.01	08,02,01	RMF001	LADRILLO A LA VISTA: LIBERACIÓN DE AGREGADOS ARQUITECTÓNICOS, LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPUESTOS Y JUNTAS AFECTADAS.	M2	$	59.940,00	66,51	$	3.986.609,00	66,51	$ 3.986.609,00		$ 0,00		$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
22.02	08,02,02	RMF002	RESTAURACIÓN POR ZONAS AFECTADAS POR COSTRA NEGRA. APLICACIÓN CLORURO DE BENZALCONIO AL 10%. INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADO Y JABÓN NEUTRO	M2	$	32.158,00	54,29	$	1.745.858,00	54,29	$ 1.745.858,00	54,29	$ 1.745.858,00	54,29	$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	54,29	$	1.745.858,00	100,00%
22.03	08,02,03	RMF003	RESANE DE ABOMBAMIENTOS EN FACHADAS (INCLUYE APLICACIÓN EN MORTERO DE CEMENTO EN PROPORCIÓN 1:3 Y ESTUCO PLÁSTICO)	M2	$	42.909,00	8,54	$	366.443,00	8,54	$ 366.443,00		$ 0,00		$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
22.04	08,02,04	RMF004	RESANE DE DESCASCARAMIENTOS. RASPADO DE SUPERFICIE Y LIJADO HASTA GENERAR UNA SUPERFICIE HOMOGÉNEA	M2	$	27.839,00	9,98	$	277.833,00	9,98	$ 277.833,00		$ 0,00		$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
22.05	08,02,05	RMF005	ALFAJÍAS EN PIEDRA: INCLUYE DESINFECCIÓN, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO	M	$	27.985,00	35,00	$	979.475,00	35,00	$ 979.475,00		$ 0,00		$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
22.06	08,02,06	RMF006	EROSIÓN 2OCALO EN CEMENTO: LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO ÁREA AFECTADA Y APLICACIÓN DE UN CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO.	M2	$	39.407,00	8,44	$	332.595,00	8,44	$ 332.595,00		$ 0,00		$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
22.07	08,02,07	RMF008	LIMPIEZA MECÁNICA DE GRAFITIS POR MEDIO DE JABÓN NEUTRO, QUITA GRAFITIS Y APLICACIÓN DE AGUA A PRESIÓN. POR ACCIONES VANDÁLICAS	M2	$	32.345,00	0,15	$	4.852,00	0,15	$ 4.852,00		$ 0,00		$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
22.08	08,02,08	RMF009	APLICACIÓN DE HERBICIDA Y RETIRO MANUAL DE CAPA DE MUSGO Y/O CAPA VEGETAL EN FACHADAS UNA VEZ SE ENCUENTRE SECO. POR VEGETACIÓN INVASIVA.	M2	$	14.909,00	33,00	$	491.997,00	33,00	$ 491.997,00		$ 0,00		$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
22.09	08,02,09	RMF010	ALFAJÍAS EN CONCRETO: LIMPIEZA CON AGUA Y TEXAPON AL 10%, APLICACIÓN DE SILICATO DE ETILO PURO SEGÚN REQUERIMIENTO, SEGÚN GRADO DE DETERIORO APLICAR VARIAS CAPAS CADA QUINCE DÍAS.	UND	$	34.877,00	16,00	$	558.032,00	16,00	$ 558.032,00		$ 0,00		$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
22.10	08,02,10	RMF012	EN PIEDRA: APLICACIÓN DE SILICATO DE ETILO PURO Y JABÓN NEUTRO, SEGÚN GRADO DE DETERIORO APLICAR VARIAS CAPAS CADA QUINCE DÍAS.	M2	$	42.408,00	54,29	$	2.302.330,00	54,29	$ 2.302.330,00		$ 0,00		$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
22.11	08,02,11	RMF013	MUROS EXTERNOS: LIMPIEZA EN SECO ESCOBILLADO MANUAL CON ESCOBA DE CERDA, SEGUIDO DE LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO, CLORURO DE BENZALCONIO Y AGUA SIN PRESIÓN, APLICACIÓN DE FUNGICIDA.	M2	$	102.564,00	3.564,06	$	365.544.250,00	3564,06	$ 365.544.250,00		$ 0,00		$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
		23	**MAMPOSTERÍA**					**$**	**124.580.154,00**		**$ 124.580.154,00**		**$ 124.580.154,00**		**$**	**124.580.154,00**	**$**	**-**	**$**	**-**	**0,00%**		**$**	**-**	**0,00%**		**$**	**124.580.154,00**	**100,00%**
23.01	08,05,01	MMA004	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30) E=12CM	M2	$	62.352,00	0,50	$	31.176,00	0,50	$ 31.176,00	0,50	$ 31.176,00	0,50	$	31.176,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	0,50	$	31.176,00	100,00%
23.02	08,05,02	MMA005	DOBLE MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30). PARA MUROS DE ESPESOR DE 42 CM A 68 CM.	M2	$	124.155,00	140,73	$	17.472.333,00	140,73	$ 17.472.333,00	140,73	$ 17.472.333,00	140,73	$	17.472.333,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	140,73	$	17.472.333,00	100,00%
23.03	08,05,03	MMA006	MURO LADRILLO A LA VISTA CON NÚCLEO EN BLOQUE NO. 5. ESPESOR EMAX=45 CM. INCLUYE MORTERO DE PEGA	M2	$	172.137,00	36,50	$	6.283.001,00	36,50	$ 6.283.001,00	36,50	$ 6.283.001,00	36,50	$	6.283.001,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	36,50	$	6.283.001,00	100,00%
23.04	08,05,04	MMA007	MURO LADRILLO A LA VISTA CON NÚCLEO EN BLOQUE NO. 5. ESPESOR EMAX=30 CM. INCLUYE MORTERO DE PEGA	M2	$	145.068,00	16,10	$	2.335.595,00	16,10	$ 2.335.595,00	16,10	$ 2.335.595,00	16,10	$	2.335.595,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	16,10	$	2.335.595,00	100,00%
23.05	08,06,01	ML01	MUROS EN PLACA DE YESO DE 1/2" E=10 CM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$	108.661,00	78,54	$	8.534.235,00	78,54	$ 8.534.235,00	78,54	$ 8.534.235,00	78,54	$	8.534.235,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	78,54	$	8.534.235,00	100,00%
23.06	08,06,02	ML02	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA,Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$	106.403,00	13,43	$	1.428.992,00	13,43	$ 1.428.992,00	13,43	$ 1.428.992,00	13,43	$	1.428.992,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	13,43	$	1.428.992,00	100,00%
23.07	08,06,03	ML06	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 12MM DOS CARAS. ESPESOR 12 CM. UNA CARA SUPERBOARD RH Y ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS. OTRA CARA EN SUPERBOARD Y ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$	207.142,00	113,53	$	23.516.831,00	113,53	$ 23.516.831,00	113,53	$ 23.516.831,00	113,53	$	23.516.831,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	113,53	$	23.516.831,00	100,00%
23.08	08,06,04	ML07	MUROS EN SUPERBOARD DE 12MM EN DOS CARAS. ESPESOR 12CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$	185.605,00	194,45	$	36.090.892,00	194,45	$ 36.090.892,00	194,45	$ 36.090.892,00	194,45	$	36.090.892,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	194,45	$	36.090.892,00	100,00%
23.09	08,06,05	ML11	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A DOS CARAS. ESPESOR 12 CM A 15CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	M2	$	191.496,00	113,59	$	21.752.031,00	113,59	$ 21.752.031,00	113,59	$ 21.752.031,00	113,59	$	21.752.031,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	113,59	$	21.752.031,00	100,00%
23.10	08,06,06	ML12	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	M2	$	117.974,00	60,48	$	7.135.068,00	60,48	$ 7.135.068,00	60,48	$ 7.135.068,00	60,48	$	7.135.068,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	60,48	$	7.135.068,00	100,00%
		24	**CIELO RASO, MOLDURAS Y ZOCALOS**					**$**	**96.879.883,00**		**$ 125.332.857,00**		**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**0,00%**		**$**	**-**	**0,00%**		**$**	**-**	**0,00%**
24.01	08,04,01	RST-MO05	RESTITUCIÓN DE ZOCALO EN CONCRETO H-MIN=0.35M A HMAX=1.40M.	M2	$	15.729,00	22,15	$	348.397,00	22,15	$ 348.397,00		$ 0,00		$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
24.02		**NP021**	CIELO RASO EN DRYWALL RF 1/2" CON ESTRUCTURA METÁLICA Y ACABADO EN PINTURA TIPO UNO TRES MANOS	M2	$	89.229,00		$	-	1184,43	$ 105.685.504,00		$ 0,00		$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
24.03	11,02,01	CR01	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 6 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA.	M2	$	102.632,00	877,06	$	90.014.422,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
24.04	11,02,02	CR04	CIELORRASO EN SUPERBOARD RH DE 8MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA	M2	$	103.977,00	56,89	$	5.915.252,00	179,82	$ 18.697.144,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
24.05	08,07,01	RST-MO01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA EN RESINA POLIÉSTER. SECCIÓN 5X5CM; SIN POROS CON TERMINACIÓN A BORDE DELGADO DE SOBREPONER EN OBRA YA TERMINADA. INCLUYE MATERIAL PARA PEGUE	M	$	50.743,00	11,86	$	601.812,00	11,86	$ 601.812,00		$ 0,00		$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
			RESTAURACIÓN MOLDURAS					**$**	**17.792.873,00**		**$ 17.793.745,00**		**$ 13.756.599,00**		**$**	**13.756.599,00**	**$**	**-**	**$**	**-**	**0,00%**		**$**	**-**	**0,00%**		**$**	**13.756.599,00**	**100,00%**
24.06	08,03,01	RMY001	MOLDURAS 5X5CM: RETIRO DE SECCIÓN AFECTADA, ELABORACIÓN DE MOLDE EN YESO SEGÚN FORMATO EXISTENTE, RESTITUCIÓN DE LA PIEZA COMPLETA.	M	$	261.668,00	48,37	$	12.656.009,00	48,37	$ 12.656.881,00	48,37	$ 12.656.881,00	48,37	$	12.656.881,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	48,37	$	12.656.881,00	100,00%
24.07	08,03,02	RMY002	ROSETÓN DE D=.30M APROXIMÁDAMENTE: RETIRO DE SECCIÓN AFECTADA, ELABORACIÓN DEL MOLDE PARA CUADRANTE FALTANTE Y RESTITUCIÓN DEL ELEMENTO EN YESO.	UND	$	549.859,00	2,00	$	1.099.718,00	2,00	$ 1.099.718,00	2,00	$ 1.099.718,00	2,00	$	1.099.718,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	2,00	$	1.099.718,00	100,00%
24.08	08,03,03	RMY003	MOLDURAS EXTERNAS: LIMPIEZA MECÁNICA CON ESCOBILLADO EN SECO, SEGUIDO DE LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA SIN PRESIÓN. APLICACIÓN DE FUNGICIDA.	M2	$	13.751,00	118,14	$	1.624.543,00	118,14	$ 1.624.543,00		$ 0,00		$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
24.09	08,03,04	RMY004	RESTAURACIÓN DE BALAUSTRADA EN CONCRETO (INCLUYE LIJADA DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA)	M	$	51.371,00	11,34	$	582.547,00	11,34	$ 582.547,00		$ 0,00		$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
24.10	08,03,05	RMY005	RESTITUCIÓN DE BALAUSTRE Y PINÁCULO EN CONCRETO (INCLUYE MODELADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M	$	52.683,00	1,00	$	52.683,00	1,00	$ 52.683,00		$ 0,00		$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
24.11	08,03,06	RMY006	RESTAURACIÓN DE CORNISAS Y MOLDURAS EN MORTERO Y CEMENTO BLANCO - FACHADA	M	$	27.569,00	64,47	$	1.777.373,00	64,47	$ 1.777.373,00		$ 0,00		$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
		25	**RESTAURACIÓN CARPINTERÍA**					**$**	**352.922.952,00**		**$ 352.922.952,00**		**$ 44.146.032,00**		**$**	**44.146.032,00**	**$**	**-**	**$**	**-**	**0,00%**		**$**	**-**	**0,00%**		**$**	**44.146.032,00**	**100,00%**
25.01	09,02,01	CRPM06	PUERTA ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMÍNICO COLOR BLANCO DE 6 MM ESTÁNDAR, ENCHAPADO EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE LA PUERTA DE 2.4 X 0.75 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO. MARCO EN MELAMINA RH DE 50 MM ANCHO. INCLUYE BISAGRAS Y CHAPA.	UND	$	743.388,00	7,00	$	5.203.716,00	7,00	$ 5.203.716,00	2,00	$ 1.486.776,00	2,00	$	1.486.776,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	2,00	$	1.486.776,00	100,00%
25.02	09,02,02	CRPM15	PUERTA CORREDIZA UNA (1) HOJA ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMÍNICO DE 6 MM ESTÁNDAR, ENCHAPADO EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE LA PUERTA. MARCO EN MELAMINA RH DE 50 MM ANCHO. INCLUYE SISTEMA DE RIEL Y CHAPA. ANCHO 0.90M, ALTO 2.40M	UND	$	1.553.314,00	1,00	$	1.553.314,00	1,00	$ 1.553.314,00	1,00	$ 1.553.314,00	1,00	$	1.553.314,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	1,00	$	1.553.314,00	100,00%
25.03	09,03,01	CRPM25	CELOSÍAS EN MADERA. (MURO DIVISORIO) 0.05X 5.M	UND	$	3.518.874,00	68,00	$	239.283.432,00	68,00	$ 239.283.432,00	10,00	$ 35.188.740,00	10,00	$	35.188.740,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	10,00	$	35.188.740,00	100,00%
25.04	09,04,01	RES-CM01	BARANDA CON ALTURA DE 0.90 METROS O SIMILAR: LIMPIEZA MECÁNICA CON GRATA Y LIJA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA, REINSTALACIÓN.	M	$	64.708,00	10,42	$	674.257,00	10,42	$ 674.257,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
25.05	09,04,02	RES-CM02	RESTAURACIÓN DE ÓCULOS D=1.20M, INCLUYE RETIRO DE CARPINTERÍA METÁLICA, LIMPIEZA MECÁNICA CON GRATA Y LIJA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA, REINSTALACIÓN POR MEDIO DE CHAZO EXPANSIVO O SIMILAR GARANTIZANDO UN ANCLAJE SEGURO.	UND	$	199.937,00	2,00	$	399.874,00	2,00	$ 399.874,00	2,00	$ 399.874,00	2,00	$	399.874,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	2,00	$	399.874,00	100,00%
25.06	09,05,01	CME004	PUERTA PARA CUARTOS TÉCNICOS 0.90X2.40 O SIMILAR. FABRICADA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED O GALVANIZADA CALIBRES 20 O 18. MARCO FABRICADO EN ACERO COLD ROLLED O GALVANIZADO CALIBRE 16 O 18. REJILLAS TIPO LOUVER CON DIVISORES PARA VENTILACIÓN. INCLUYE CERRADURA CON MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE, ANCLAJES DE NYLON PARA SUJECIÓN A PARED Y BISAGRAS. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA.	UND	$	2.758.664,00	6,00	$	16.551.984,00	6,00	$ 16.551.984,00	2,00	$ 5.517.328,00	2,00	$	5.517.328,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	2,00	$	5.517.328,00	100,00%
25.07	09,05,02	CME008	PUERTAS Y DIVISIONES FLOTANTES EN ACERO INOXIDABLE DE H MAX =2.5M	M2	$	2.856.204,00	31,25	$	89.256.375,00	31,25	$ 89.256.375,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
			MUEBLES MADERA					**$**	**219.939.127,00**		**$ 219.939.127,00**		**$ 104.051.440,00**		**$**	**104.051.440,00**	**$**	**-**	**$**	**-**	**0,00%**		**$**	**-**	**0,00%**		**$**	**104.051.440,00**	**100,00%**
25.08	09,01,01	CRPM01	MUEBLES FIJOS ALTURA DE ANTEPECHOS CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y/O CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO	M	$	68.692,00	16,49	$	1.132.731,00	16,49	$ 1.132.731,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
25.09	09,01,02	CRPM02	MUEBLE DE RECEPCIÓN CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO	UND	$	3.545.571,00	1,00	$	3.545.571,00	1,00	$ 3.545.571,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
25.10	09,01,03	CRPM09	MUEBLES FIJOS INCRUSTADOS EN EL MURO DE CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO DE 0,60 PROFUNDIDAD	M	$	78.388,00	28,92	$	2.266.981,00	28,92	$ 2.266.981,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
25.11	09,01,04	CRPM10	MESÓN PARA COCINA QUARZTONE CLOUDY O SIMILAR. MESÓN CARPINTERÍA EN MADERA CON MUEBLE INFERIOR DE COCINA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO (BLANCO), CON PUERTAS, ENTREPAÑOS Y CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO. INCLUYE POCETA LAVAPLATOS VALENCIA 40X40 DE BAJO PONER EN ACERO INOXIDABLE	M	$	1.484.745,00	1,20	$	1.781.694,00	1,20	$ 1.781.694,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
25.12	09,01,05	CRPM21	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA PARA LIBROS. DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO DE 0.80X1.6 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO. DEBE INCLUIR SOPORTE PARA LIBROS Y RODACHINES CON FRENO. NOTA: LAS DIMENSIONES DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA	UND	$	2.034.349,00	49,00	$	99.683.101,00	49,00	$ 99.683.101,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
25.13	09,01,06	CRPM22	MUEBLES FIJOS FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO Y LAMINADO MELAMÍNICO DE 4.30X2.40M O SIMILAR. PUERTAS CORREDIZAS Y ENTREPAÑOS PARA ALMACENAMIENTO. COLOR SEGÚN RESTAURACIÓN INTEGRAL.	UND	$	1.594.490,00	1,00	$	1.594.490,00	1,00	$ 1.594.490,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
25.14	09,01,07	CRPM23	CONSTRUCCIÓN DE PEDESTALES EN MADERA SESCCIÓN 20X20CM O SIMILAR, FABRICADOS EN TABLERO AGLOMERADO Y LAMINADO MELAMÍNICO DE 15MM DE ESPESOR COLOR DELFINES AL ATARDECER.	UND	$	2.749.121,00	2,00	$	5.498.242,00	2,00	$ 5.498.242,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
25.15	09,01,08	CRPM24	MUEBLES FIJOS ALTURA DE ANTEPECHOS CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO. PARA ABSIDE CAPILLA (0,4 X 0,4)	UND	$	384.877,00	1,00	$	384.877,00	1,00	$ 384.877,00	0,00	$ 0,00	0,00	$	-	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%
25.16	24.01.01	BIM005	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM: INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES (15%, QUINCE PORCIENTO PARA ESTE COMPONENTE)	UND	$	693.676.269,00	0,15	$	104.051.440,00	0,15	$ 104.051.440,00	0,15	$ 104.051.440,00	0,15	$	104.051.440,00	$	-	$	-	0,00%	-	$	-	0,00%	0,15	$	104.051.440,00	100,00%
		26	**PUERTAS, VENTANAS PVC Y BARANDAS**					**$**	**217.268.073,00**		**$ 219.434.707,00**		**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**$**	**-**	**0,00%**		**$**	**-**	**0,00%**		**$**	**-**	**0,00%**

26.01	09,06,01	CPV004	PUERTA CON CUERPO FIJO SUPERIOR EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8 MM AHUMADO. MARCO EN PVC, CON CERRADURAS INDEPENDIENTES EN ACERO INOXIDABLE. AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. INCLUYE BISAGRAS Y MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE.	M2	$	1.107.497,00	14,24	$	15.770.757,00	14,24	$ 15.770.757,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
26.02	09,06,02	CPV012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO, CON MARCO EN PVC SEGÚN DISEÑO DE 0.90X2.40 M. INCLUYE AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO.	UND	$	3.064.345,00	2,00	$	6.128.690,00	2,00	$ 6.128.690,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
26.03	09,06,03	CPV013	PUERTA VENTANA. PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO ALTURA VARIABLE SIN MARCO. VENTANA FIJA. MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO. VANO APROX. ANCHO 3.40M X ALTO 2.46M	UND	$	8.750.967,00	6,00	$	52.505.802,00	6,00	$ 52.505.802,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
26.04	09,07,01	CPV006	VENTANERÍA FIJA: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO.	M2	$	1.133.018,00	31,15	$	35.297.967,00	31,15	$ 35.293.511,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
26.05	09,07,02	CPV007	VENTANA FIJA. MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO. 1.20X2.81M	UND	$	3.701.811,00	11,00	$	40.719.921,00	11,00	$ 40.719.921,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
26.06	09,07,03	CPV010	VENTANA ABATIBLE DE 2.80M DE ALTO X 1.2M DE ANCHO. MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO.	UND	$	1.223.443,00	7,00	$	8.564.101,00	7,00	$ 8.564.101,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
26.07	09,08,01	VID01	VENTANA FIJA CON DIVISIONES -MURO CORTINA GALERÍA SENCILLA VIDRIO ENERGY ADVANTAGE 4MM O SUPERIOR	M2	$	844.941,00	50,41	$	42.593.476,00	50,41	$ 42.593.476,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
26.08	09,09,01	CME044	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE ALTURA 0.93 M. Ø0.03M INCLUYE HERRAJES Y ANCLAJES A PISO.	M	$	537.983,00	27,29	$	14.681.556,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
26.09	09,09,02	CME047	BARANDA A PARED (PASAMANOS) EN ACERO INOXIBABLE. TUBULAR REDONDE DE Ø2". ANCLAJE PLATINA 2"X1/4"	M	$	158.379,00	2,40	$	380.110,00	2,40	$ 380.110,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
26.10		**NP022**	BARANDA EN TUBERÍA DE ESTRUCTURA METÁLICA 2" DE ALTURA 1.20 M ELEMENTOS VERTICALES CADA 0,90CM Y 2 ELEMENTOS HORIZONTALES 1/2" . INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	$	546.100,00		$	-	30,86	$ 16.852.646,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
26.11	09,09,03	CME048	BARANDA DE VIDRIO 6+6 PERFIL EN ALUMINIO (CORO)	M	$	391.058,00	1,60	$	625.693,00	1,60	$ 625.693,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		27	**RESTAURACIÓN DE PISOS**					**$**	**175.493.842,00**		**$ 175.494.129,00**		**$ -**		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**
27.01	10,01,01	REP005	RETIRO MANUAL DE HUELLAS DE ANIMALES, LIMPIEZA CON ACCIÓN MECÁNICA EN SECO, POSTERIOR LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON JABÓN NEUTRO Y AGUA.	M2	$	3.661,00	13,25	$	48.508,00	13,25	$ 48.508,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
27.02	10,01,02	REP006	RESTAURACIÓN DE ALISTADO EN MADERA COLOR NATURAL EXISTENTE, APLICACIÓN DE LACA (CORO)	M2	$	18.686,00	56,20	$	1.050.116,00	56,20	$ 1.050.153,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
27.03	10,01,03	REP007	RETIRO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RESTITUCIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN DE CEMENTO DE PIEZAS DAÑADAS (APROXIMÁDAMENTE 30% DEL ÁREA) VERIFICANDO TAMAÑO A LAS EXISTENTES.	M2	$	47.002,00	3,70	$	173.813,00	3,70	$ 173.907,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
27.04	10,01,04	REP008	DESTRONQUE, PULIDA Y ESMALTADA DE PISO EN MÁRMOL BLANCO ESMALTADO CON PATRÓN IRREGULAR	M2	$	32.691,00	61,02	$	1.994.805,00	61,02	$ 1.994.805,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
27.05	10,01,05	REP009	LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA DE PISOS EXTERIORES BALDOSÍN DE CEMENTO Y/O SIMILAR	M2	$	9.461,00	277,48	$	2.625.267,00	277,48	$ 2.625.238,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
27.06	10,02,01	PYE001	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR. E = 0.04M	M2	$	38.734,00	715,13	$	27.699.845,00	715,13	$ 27.699.845,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
27.07	10,02,02	PYE002	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4 E = 0.04M	M2	$	32.361,00	1.072,05	$	34.692.610,00	1072,05	$ 34.692.610,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
27.08	10,02,05	PYE005	INSTALACIÓN DE PISO EN PORCELANATO PARA ZONAS HÚMEDAS COLOR BEIGE	M2	$	109.244,00	83,60	$	9.133.017,00	83,60	$ 9.132.798,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
27.09	10,02,06	PYE006	PISO EN TABLÓN DE GRES 30X30	M2	$	98.685,00	833,45	$	82.248.915,00	833,45	$ 82.249.013,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
27.10	10,02,07	PYE007	PISO SEMIPERMEABLE - GRAMOQUÍN PREFABRICADO	M2	$	88.326,00	105,53	$	9.320.866,00	105,53	$ 9.321.043,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
27.11	10,02,08	PYE008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA VIBRO PRENSADA 30X30CM, TONO BLANCO HUILA Y/O SIMILAR. INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA Y TODOS LOS ELEMENTOS	M2	$	117.856,00	20,00	$	2.357.120,00	20,00	$ 2.357.120,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
27.12	10,02,09	PYE036	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA PREFABRICADAS CON GRANITO, SECCIÓN DE 4X5X50 CMS.	M	$	32.156,00	129,03	$	4.148.960,00	129,03	$ 4.149.089,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		28	**RESTAURACIÓN CIELO RASOS**					**$**	**113.033.124,00**		**$ 113.033.124,00**		**$ 10.713.962,00**		**$ 10.713.962,00**	**$ -**	**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 10.713.962,00**	**100,00%**
28.01	11,01,01	RMC001	RETIRO DE TUBERÍA PARASITA, LIMPIEZA MECÁNICA EN SECO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$	6.391,00	129,25	$	826.037,00	129,25	$ 826.037,00	129,25	$ 826.037,00	129,25	$ 826.037,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	129,25	$ 826.037,00	100,00%
28.02	11,01,02	RMC002	LIMPIEZA EN SECO, CON ESCOBA DE CERDAS SUAVES, RECOLECCIÓN CON ASPIRADORA EN PUNTOS DE ALTA CONCENTRACIÓN.	M2	$	16.780,00	259,50	$	4.354.410,00	259,50	$ 4.354.410,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
28.03	11,01,03	RMC003	RELLENO EN MASILLA EN ÁREA AFECTADA EN TECHOS, CON MORTERO DE CAL Y ARENA DE PEÑA.	M2	$	27.976,00	247,41	$	6.921.542,00	247,41	$ 6.921.542,00	247,41	$ 6.921.542,00	247,41	$ 6.921.542,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	247,41	$ 6.921.542,00	100,00%
28.04	11,01,04	RMC004	RESTAURACIÓN DE MADERA DE CUBIERTAS CATALOGADAS COMO MEDIANAMENTE RESISTENTES CON AFECTACIÓN MAYOR DEL 30% (SECCIÓN TRANVERSAL, NO DISMINUIDA MAS DEL 20%) MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE UN NUEVO ELEMENTO ASUMIENDO SU FUNCIÓN ESTRUCTURAL.	M	$	337.089,00	8,80	$	2.966.383,00	8,80	$ 2.966.383,00	8,80	$ 2.966.383,00	8,80	$ 2.966.383,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8,80	$ 2.966.383,00	100,00%
28.05	11,01,05	RMC006	LIBERACIÓN DE AGREGADOS ARQUITECTÓNICOS, LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPUESTOS Y JUNTAS AFECTADAS.	M2	$	59.751,00	1.639,55	$	97.964.752,00	1639,55	$ 97.964.752,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		29	**PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA**					**$**	**51.511.491,00**		**$ 273.978.095,00**		**$ -**		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**
29.01	12,01,01	PN01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	$	28.013,00	322,13	$	9.023.716,00	3742,88	$ 104.849.297,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.02	12,01,02	PN03	ACABADO CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, ESPESOR 1.5CM. INCLUYE ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE PRESENTACIÓN PLÁSTICA, SELLADOR ACRÍLICO Y PINTURA EPÓXICA SEMI MATE DE DOS COMPONENTES (EPOXI-POLIAMIDA)	M2	$	67.411,00	80,53	$	5.428.709,00	80,53	$ 5.428.608,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.03	12,02,01	PN08	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE	M2	$	21.945,00	80,53	$	1.767.264,00	3742,88	$ 82.137.502,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.04	12,02,02	PN04	ACABADO EN PINTURA VINÍLICA TIPO 1, 3 MANOS.	M2	$	18.586,00	1.449,57	$	26.941.652,00	4242,88	$ 78.858.168,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.05	12,02,03	PN05	ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS EN 3 MANOS, COLOR A DEFINIR	M2	$	16.792,00	161,06	$	2.704.570,00	161,06	$ 2.704.520,00		$ 0,00		$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
29.06	12,02,04	PN12	PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASOS	M2	$	17.526,00	322,13	$	5.645.580,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		30	**ALIMENTADORES, ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Y SALIDAS**					**$**	**31.048.478,00**		**$ 31.048.478,00**		**$ 31.048.478,00**		**$ 31.048.478,00**	**$ -**	**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 31.048.478,00**	**100,00%**
30.01	13,01,01	ELE002	SUBCONTRATO DE EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS 275 NORMA CODENSA, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS.	UND	$	2.265.049,00	12,00	$	27.180.588,00	12,00	$ 27.180.588,00	12,00	$ 27.180.588,00	12,00	$ 27.180.588,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	12,00	$ 27.180.588,00	100,00%
30.02	13,01,02	ELE003	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO NORMAL DE CIRCUITOS 1ER PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.	M	$	33.415,00	6,00	$	200.490,00	6,00	$ 200.490,00	6,00	$ 200.490,00	6,00	$ 200.490,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 200.490,00	100,00%
30.03	13,01,03	ELE004	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO NORMAL DE CIRCUITOS 2DO PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X6+1X6+1X10T CU LSZH.	M	$	46.170,00	17,00	$	784.890,00	17,00	$ 784.890,00	17,00	$ 784.890,00	17,00	$ 784.890,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	17,00	$ 784.890,00	100,00%
30.04	13,01,04	ELE005	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA UPS DE 15KVA EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X6+1X6+1X10T CU LSZH.	M	$	46.170,00	6,00	$	277.020,00	6,00	$ 277.020,00	6,00	$ 277.020,00	6,00	$ 277.020,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 277.020,00	100,00%
30.05	13,01,05	ELE006	ACOMETIDA EN B.T. DESDE UPS HASTA TABLERO REGULADO 1ER PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X6+1X6+1X10T CU LSZH.	M	$	46.170,00	6,00	$	277.020,00	6,00	$ 277.020,00	6,00	$ 277.020,00	6,00	$ 277.020,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 277.020,00	100,00%
30.06	13,01,06	ELE007	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TABLERO REGULADO 1ER PISO HASTA TABLERO REGULADO 2DO PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.	M	$	33.415,00	20,00	$	668.300,00	20,00	$ 668.300,00	20,00	$ 668.300,00	20,00	$ 668.300,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	20,00	$ 668.300,00	100,00%
30.07	13,01,07	ELE010	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO BOMBAS EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.	M	$	33.415,00	22,00	$	735.130,00	22,00	$ 735.130,00	22,00	$ 735.130,00	22,00	$ 735.130,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	22,00	$ 735.130,00	100,00%
30.08	13,01,08	ELE011	DUCTO PVC DE 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M	$	11.563,00	80,00	$	925.040,00	80,00	$ 925.040,00	80,00	$ 925.040,00	80,00	$ 925.040,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	80,00	$ 925.040,00	100,00%
			SALIDAS					**$**	**158.083.151,00**		**$ 158.083.151,00**		**$ 158.083.151,00**		**$ 158.083.151,00**	**$ -**	**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 158.083.151,00**	**100,00%**
30.09	13,03,01	ELE041	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$	162.308,00	301,00	$	48.854.708,00	301,00	$ 48.854.708,00	301,00	$ 48.854.708,00	301,00	$ 48.854.708,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	301,00	$ 48.854.708,00	100,00%
30.10	13,03,02	ELE042	SALIDA PARA LUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$	164.120,00	58,00	$	9.518.960,00	58,00	$ 9.518.960,00	58,00	$ 9.518.960,00	58,00	$ 9.518.960,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	58,00	$ 9.518.960,00	100,00%
30.11	13,03,03	ELE043	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$	173.020,00	124,00	$	21.454.480,00	124,00	$ 21.454.480,00	124,00	$ 21.454.480,00	124,00	$ 21.454.480,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	124,00	$ 21.454.480,00	100,00%
30.12	13,03,04	ELE045	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH	M	$	13.601,00	1.500,00	$	20.401.500,00	1500,00	$ 20.401.500,00	1500,00	$ 20.401.500,00	1500,00	$ 20.401.500,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.500,00	$ 20.401.500,00	100,00%
30.13	13,03,05	ELE046	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V, 15 AMP; EN TUBERÍA EMT 3/4 . INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$	165.340,00	167,00	$	27.611.780,00	167,00	$ 27.611.780,00	167,00	$ 27.611.780,00	167,00	$ 27.611.780,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	167,00	$ 27.611.780,00	100,00%
30.14	13,03,06	ELE047	SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$	202.783,00	10,00	$	2.027.830,00	10,00	$ 2.027.830,00	10,00	$ 2.027.830,00	10,00	$ 2.027.830,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 2.027.830,00	100,00%
30.15	13,03,07	ELE048	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$	136.664,00	30,00	$	4.099.920,00	30,00	$ 4.099.920,00	30,00	$ 4.099.920,00	30,00	$ 4.099.920,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	30,00	$ 4.099.920,00	100,00%
30.16	13,03,08	ELE050	SALIDA CIRCUITO EXCLUSIVO TOMACORRIENTE SECA MANOS, HORNO MICROONDAS Y OTROS CON POLO A TIERRA EN MURO 15A 120V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE CABLE 3X12	UND	$	128.051,00	6,00	$	768.306,00	6,00	$ 768.306,00	6,00	$ 768.306,00	6,00	$ 768.306,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 768.306,00	100,00%
30.17	13,03,09	ELE051	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL COLOR BLANCO POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12. NO SE INCLUYE CANALETA	UND	$	92.956,00	82,00	$	7.622.392,00	82,00	$ 7.622.392,00	82,00	$ 7.622.392,00	82,00	$ 7.622.392,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	82,00	$ 7.622.392,00	100,00%
30.18	13,03,10	ELE052	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12	UND	$	70.728,00	35,00	$	2.475.480,00	35,00	$ 2.475.480,00	35,00	$ 2.475.480,00	35,00	$ 2.475.480,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	35,00	$ 2.475.480,00	100,00%
30.19	13,03,11	ELE054	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT	UND	$	240.869,00	55,00	$	13.247.795,00	55,00	$ 13.247.795,00	55,00	$ 13.247.795,00	55,00	$ 13.247.795,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	55,00	$ 13.247.795,00	100,00%
		31	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO, CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES**					**$**	**29.772.544,00**		**$ 29.772.544,00**		**$ 29.772.544,00**		**$ 29.772.544,00**	**$ -**	**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 29.772.544,00**	**100,00%**
31.01	13,04,01	ELE072	BANDEJA TIPO MALLA DE 30 CM GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO	M	$	129.297,00	140,00	$	18.101.580,00	140,00	$ 18.101.580,00	140,00	$ 18.101.580,00	140,00	$ 18.101.580,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	140,00	$ 18.101.580,00	100,00%
31.02	13,04,02	ELE073	CANALETA PERIMETRAL METÁLICA DE 12X5 CM EN LAMINA DE COLD ROLL DOBLE DIVISIÓN PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO	M	$	44.799,00	92,00	$	4.121.508,00	92,00	$ 4.121.508,00	92,00	$ 4.121.508,00	92,00	$ 4.121.508,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	92,00	$ 4.121.508,00	100,00%
31.03	13,06,01	ELE105	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA.	UND	$	291.915,00	4,00	$	1.167.660,00	4,00	$ 1.167.660,00	4,00	$ 1.167.660,00	4,00	$ 1.167.660,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 1.167.660,00	100,00%
31.04	13,06,02	ELE106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU	M	$	90.199,00	65,00	$	5.862.935,00	65,00	$ 5.862.935,00	65,00	$ 5.862.935,00	65,00	$ 5.862.935,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	65,00	$ 5.862.935,00	100,00%
31.05	13,06,03	ELE107	SOLDADURA EXOTÉRMICA	UND	$	54.718,00	6,00	$	328.308,00	6,00	$ 328.308,00	6,00	$ 328.308,00	6,00	$ 328.308,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 328.308,00	100,00%
31.06	13,06,04	ELE108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA. INCLUYE MARCO	UND	$	190.553,00	1,00	$	190.553,00	1,00	$ 190.553,00	1,00	$ 190.553,00	1,00	$ 190.553,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 190.553,00	100,00%
		32	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**					**$**	**17.877.508,00**		**$ 17.877.508,00**		**$ 11.109.434,00**		**$ 11.109.434,00**	**$ -**	**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 11.109.434,00**	**100,00%**
32.02	14,01,01	CYS001	CAJA DE MAMPOSTERÍA SENCILLA PARA COMUNICACIONES.	UND	$	534.265,00	2,00	$	1.068.530,00	2,00	$ 1.068.530,00	2,00	$ 1.068.530,00	2,00	$ 1.068.530,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 1.068.530,00	100,00%
32.03	14,01,02	CYS002	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS PVC DE 2" (SOLO INCLUYE LOS TUBOS)	M	$	89.299,00	32,00	$	2.857.568,00	32,00	$ 2.857.568,00	32,00	$ 2.857.568,00	32,00	$ 2.857.568,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	32,00	$ 2.857.568,00	100,00%
32.04	14,01,03	CYS003	SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN CANALETA. INCLUYE CANALETA	UND	$	121.304,00	31,00	$	3.760.424,00	31,00	$ 3.760.424,00	31,00	$ 3.760.424,00	31,00	$ 3.760.424,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	31,00	$ 3.760.424,00	100,00%
32.05	14,01,04	CYS004	SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN DUCTO. INCLUYE DUCTO	UND	$	121.566,00	11,00	$	1.337.226,00	11,00	$ 1.337.226,00	11,00	$ 1.337.226,00	11,00	$ 1.337.226,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	11,00	$ 1.337.226,00	100,00%
32.06	14,01,05	CYS005	CABLE UTP 4 PARES CATEGORÍA 6A	M	$	6.775,00	800,00	$	5.420.000,00	800,00	$ 5.420.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%

32.07	14,01,06	CYS006	SALIDA DOBLE PARA DATOS. INCLUYE CAJA 5800, FACEPLATE CON JACK DE 2 INSERTOS RJ 45	UND	$ 45.341,00	46,00	$ 2.085.686,00	46,00	$ 2.085.686,00	46,00	$ 2.085.686,00	46,00	$ 2.085.686,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	46,00	$ 2.085.686,00	100,00%
32.08	14,01,07	CYS007	PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A 1.00M	UND	$ 32.097,00	42,00	$ 1.348.074,00	42,00	$ 1.348.074,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		33	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**				**$ 38.587.350,00**		**$ 38.587.350,00**		**$ 24.393.600,00**		**$ 24.393.600,00**	**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 24.393.600,00**	**100,00%**
33.01	14,02,01	CYS031	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO (INCLUYE SENSOR FOTOELÉCTRICO)	UND	$ 383.837,00	45,00	$ 17.272.665,00	45,00	$ 17.272.665,00	45,00	$ 17.272.665,00	45,00	$ 17.272.665,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	45,00	$ 17.272.665,00	100,00%
33.02	14,02,02	CYS032	SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL (INCLUYE ESTACIÓN MANUAL)	UND	$ 474.729,00	15,00	$ 7.120.935,00	15,00	$ 7.120.935,00	15,00	$ 7.120.935,00	15,00	$ 7.120.935,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	15,00	$ 7.120.935,00	100,00%
33.03	14,02,03	CYS034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR ANTI FLAMA PARA DETECCIÓN DE INCENDIO 2X16	M	$ 9.738,00	410,00	$ 3.992.580,00	410,00	$ 3.992.580,00		$ 0,00		$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
33.04	14,02,04	CYS042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND	$ 680.078,00	15,00	$ 10.201.170,00	15,00	$ 10.201.170,00		$ 0,00		$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		34	**SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA**				**$ 12.701.271,00**		**$ 12.701.271,00**		**$ 2.819.283,00**		**$ 2.819.283,00**	**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 2.819.283,00**	**100,00%**
34.01	14,03,01	CYS046	SALIDA PARA CÁMARAS CCTV EN DUCTO EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CAJA GALVANIZADA. NO INCLUYE CÁMARA.	UND	$ 76.870,00	24,00	$ 1.844.880,00	24,00	$ 1.844.880,00	24,00	$ 1.844.880,00	24,00	$ 1.844.880,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	24,00	$ 1.844.880,00	100,00%
34.02	14,03,02	CYS047	CABLE UTP CAT 6A	M	$ 6.775,00	600,00	$ 4.065.000,00	600,00	$ 4.065.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
34.03	14,03,03	CYS048	MONITOR 34" HD 4K	UND	$ 2.469.869,00	1,00	$ 2.469.869,00	1,00	$ 2.469.869,00		$ 0,00		$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
34.04	14,03,05	CYS050	NVR 16 CANALES POE IP 8MP 4K	UND	$ 1.531.762,00	2,00	$ 3.063.524,00	2,00	$ 3.063.524,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
34.05	14,04,01	CYS061	SALIDA DE SONIDO INCLUYENDO CAJAS, DUCTO DE PVC DE 3/4" Y ALAMBRE DE ACERO GUÍA (NO INCLUYE BAFLE, CORNETA O PARLANTE)	UND	$ 123.147,00	6,00	$ 738.882,00	6,00	$ 738.882,00	6,00	$ 738.882,00	6,00	$ 738.882,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 738.882,00	100,00%
34.06	14,04,02	CYS062	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE 30X30X12CM Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO.	UND	$ 235.521,00	1,00	$ 235.521,00	1,00	$ 235.521,00	1,00	$ 235.521,00	1,00	$ 235.521,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 235.521,00	100,00%
34.07	14,04,05	CYS065	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE SONIDO 2X16 AWG, PVC, LIBRE DE OXÍGENO Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO	M	$ 4.363,00	65,00	$ 283.595,00	65,00	$ 283.595,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		35	**PVC PRESIÓN**				**$ 24.583.523,00**		**$ 24.583.523,00**		**$ 24.583.523,00**		**$ 24.583.523,00**	**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 24.583.523,00**	**100,00%**
35.01	15,01,01	HIS02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 2"	UND	$ 30.464,00	2,00	$ 60.928,00	2,00	$ 60.928,00	2,00	$ 60.928,00	2,00	$ 60.928,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 60.928,00	100,00%
35.02	15,01,02	HIS03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 2"	UND	$ 23.748,00	1,00	$ 23.748,00	1,00	$ 23.748,00	1,00	$ 23.748,00	1,00	$ 23.748,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 23.748,00	100,00%
35.03	15,01,03	HIS04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 2X1 1/4"	UND	$ 34.777,00	2,00	$ 69.554,00	2,00	$ 69.554,00	2,00	$ 69.554,00	2,00	$ 69.554,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 69.554,00	100,00%
35.04	15,01,04	HIS05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 2X1/2"	UND	$ 36.808,00	2,00	$ 73.616,00	2,00	$ 73.616,00	2,00	$ 73.616,00	2,00	$ 73.616,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 73.616,00	100,00%
35.05	15,01,05	HIS06	TUBERÍA PVC.P Ø 1.1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 20.447,00	237,30	$ 4.852.073,00	237,30	$ 4.852.073,00	237,30	$ 4.852.073,00	237,30	$ 4.852.073,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	237,30	$ 4.852.073,00	100,00%
35.06	15,01,06	HIS07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1.1/2"	M	$ 13.513,00	46,00	$ 621.598,00	46,00	$ 621.598,00	46,00	$ 621.598,00	46,00	$ 621.598,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	46,00	$ 621.598,00	100,00%
35.07	15,01,07	HIS08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1. 1/2"	UND	$ 16.266,00	15,00	$ 243.990,00	15,00	$ 243.990,00	15,00	$ 243.990,00	15,00	$ 243.990,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	15,00	$ 243.990,00	100,00%
35.08	15,01,08	HIS09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1. 1/2X1"	UND	$ 9.402,00	4,00	$ 37.608,00	4,00	$ 37.608,00	4,00	$ 37.608,00	4,00	$ 37.608,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 37.608,00	100,00%
35.09	15,01,09	HIS10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1. 1/2X1. 1/4"	UND	$ 13.513,00	14,00	$ 189.182,00	14,00	$ 189.182,00	14,00	$ 189.182,00	14,00	$ 189.182,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14,00	$ 189.182,00	100,00%
35.10	15,01,10	HIS11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1. 1/2"	UND	$ 16.266,00	4,00	$ 65.064,00	4,00	$ 65.064,00	4,00	$ 65.064,00	4,00	$ 65.064,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 65.064,00	100,00%
35.11	15,01,11	HIS12	TUBERÍA PVC.P Ø 1.1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 21.126,00	112,20	$ 2.370.337,00	112,20	$ 2.370.337,00	112,20	$ 2.370.337,00	112,20	$ 2.370.337,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	112,20	$ 2.370.337,00	100,00%
35.12	15,01,12	HIS13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1.1/4"	UND	$ 8.036,00	110,90	$ 891.192,00	110,90	$ 891.192,00	110,90	$ 891.192,00	110,90	$ 891.192,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	110,90	$ 891.192,00	100,00%
35.13	15,01,13	HIS14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1. 1/4"	UND	$ 12.250,00	8,00	$ 98.000,00	8,00	$ 98.000,00	8,00	$ 98.000,00	8,00	$ 98.000,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8,00	$ 98.000,00	100,00%
35.14	15,01,14	HIS15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1. 1/4X3/4"	UND	$ 9.044,00	1,00	$ 9.044,00	1,00	$ 9.044,00	1,00	$ 9.044,00	1,00	$ 9.044,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 9.044,00	100,00%
35.15	15,01,15	HS-270	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1. 1/4X1/2"	UND	$ 7.785,00	1,00	$ 7.785,00	1,00	$ 7.785,00	1,00	$ 7.785,00	1,00	$ 7.785,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 7.785,00	100,00%
35.16	15,01,16	HIS16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1. 1/4X1"	UND	$ 9.044,00	18,00	$ 162.792,00	18,00	$ 162.792,00	18,00	$ 162.792,00	18,00	$ 162.792,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	18,00	$ 162.792,00	100,00%
35.17	15,01,17	HIS17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1. 1/4"	UND	$ 37.020,00	3,00	$ 111.060,00	3,00	$ 111.060,00	3,00	$ 111.060,00	3,00	$ 111.060,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 111.060,00	100,00%
35.18	15,01,18	HIS18	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 17.885,00	197,70	$ 3.535.865,00	197,70	$ 3.535.865,00	197,70	$ 3.535.865,00	197,70	$ 3.535.865,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	197,70	$ 3.535.865,00	100,00%
35.19	15,01,19	HIS19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"	UND	$ 5.522,00	27,00	$ 149.094,00	27,00	$ 149.094,00	27,00	$ 149.094,00	27,00	$ 149.094,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	27,00	$ 149.094,00	100,00%
35.20	15,01,20	HIS20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1"	UND	$ 14.399,00	2,00	$ 28.798,00	2,00	$ 28.798,00	2,00	$ 28.798,00	2,00	$ 28.798,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 28.798,00	100,00%
35.21	15,01,21	HIS21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"	UND	$ 5.748,00	3,00	$ 17.244,00	3,00	$ 17.244,00	3,00	$ 17.244,00	3,00	$ 17.244,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 17.244,00	100,00%
35.22	15,01,22	HIS22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X1/2"	UND	$ 5.748,00	2,00	$ 11.496,00	2,00	$ 11.496,00	2,00	$ 11.496,00	2,00	$ 11.496,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 11.496,00	100,00%
35.23	15,01,23	HIS23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 1X3/4"	UND	$ 9.806,00	1,00	$ 9.806,00	1,00	$ 9.806,00	1,00	$ 9.806,00	1,00	$ 9.806,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 9.806,00	100,00%
35.24	15,01,24	HIS24	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1"	UND	$ 156.274,00	3,00	$ 468.822,00	3,00	$ 468.822,00	3,00	$ 468.822,00	3,00	$ 468.822,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 468.822,00	100,00%
35.25	15,01,25	HIS25	REGISTRO DE CORTE Ø 1"	UND	$ 27.715,00	2,00	$ 55.430,00	2,00	$ 55.430,00	2,00	$ 55.430,00	2,00	$ 55.430,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 55.430,00	100,00%
35.26	15,01,26	HIS26	CAJILLA PARA MEDIDOR DE PISO Ø 1"	UND	$ 61.207,00	1,00	$ 61.207,00	1,00	$ 61.207,00	1,00	$ 61.207,00	1,00	$ 61.207,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 61.207,00	100,00%
35.27	15,01,27	HIS27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR Ø 1"	UND	$ 663.842,00	2,00	$ 1.327.684,00	2,00	$ 1.327.684,00	2,00	$ 1.327.684,00	2,00	$ 1.327.684,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 1.327.684,00	100,00%
35.28	15,01,28	HIS28	CHEQUE Ø 1"	UND	$ 53.005,00	1,00	$ 53.005,00	1,00	$ 53.005,00	1,00	$ 53.005,00	1,00	$ 53.005,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 53.005,00	100,00%
35.29	15,01,29	HIS29	FLOTADOR MECÁNICO Ø 1"	UND	$ 54.236,00	2,00	$ 108.472,00	2,00	$ 108.472,00	2,00	$ 108.472,00	2,00	$ 108.472,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 108.472,00	100,00%
35.30	15,01,30	HIS30	CAJILLA PARA UN MEDIDOR DE PISO Ø 1" PARA INCENDIO	UND	$ 61.207,00	1,00	$ 61.207,00	1,00	$ 61.207,00	1,00	$ 61.207,00	1,00	$ 61.207,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 61.207,00	100,00%
35.31	15,01,31	HIS31	TUBERÍA PVC.P Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 15.475,00	126,20	$ 1.952.945,00	126,20	$ 1.952.945,00	126,20	$ 1.952.945,00	126,20	$ 1.952.945,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	126,20	$ 1.952.945,00	100,00%
35.32	15,01,32	HIS32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 4.071,00	38,00	$ 154.698,00	38,00	$ 154.698,00	38,00	$ 154.698,00	38,00	$ 154.698,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	38,00	$ 154.698,00	100,00%
35.33	15,01,33	HIS33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 5.361,00	6,00	$ 32.166,00	6,00	$ 32.166,00	6,00	$ 32.166,00	6,00	$ 32.166,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 32.166,00	100,00%
35.34	15,01,34	HIS34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 21.439,00	3,00	$ 64.317,00	3,00	$ 64.317,00	3,00	$ 64.317,00	3,00	$ 64.317,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 64.317,00	100,00%
35.35	15,01,35	HIS35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2"	UND	$ 4.538,00	11,00	$ 49.918,00	11,00	$ 49.918,00	11,00	$ 49.918,00	11,00	$ 49.918,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	11,00	$ 49.918,00	100,00%
35.36	15,01,36	HIS36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2"	UND	$ 6.403,00	4,00	$ 25.612,00	4,00	$ 25.612,00	4,00	$ 25.612,00	4,00	$ 25.612,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 25.612,00	100,00%
35.37	15,01,37	HIS37	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4"	UND	$ 112.418,00	2,00	$ 224.836,00	2,00	$ 224.836,00	2,00	$ 224.836,00	2,00	$ 224.836,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 224.836,00	100,00%
35.38	15,01,38	HIS38	FLOTADOR MECÁNICO Ø 3/4"	UND	$ 54.236,00	2,00	$ 108.472,00	2,00	$ 108.472,00	2,00	$ 108.472,00	2,00	$ 108.472,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 108.472,00	100,00%
35.39	15,01,39	HIS39	VÁLVULA SOLENOIDE Ø 3/4"	UND	$ 236.099,00	1,00	$ 236.099,00	1,00	$ 236.099,00	1,00	$ 236.099,00	1,00	$ 236.099,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 236.099,00	100,00%
35.40	15,01,40	HIS40	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE Ø 3/4"	UND	$ 398.644,00	2,00	$ 797.288,00	2,00	$ 797.288,00	2,00	$ 797.288,00	2,00	$ 797.288,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 797.288,00	100,00%
35.41	15,01,41	HIS41	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 10.249,00	89,00	$ 912.161,00	89,00	$ 912.161,00	89,00	$ 912.161,00	89,00	$ 912.161,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	89,00	$ 912.161,00	100,00%
35.42	15,01,42	HIS42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 4.017,00	48,00	$ 192.816,00	48,00	$ 192.816,00	48,00	$ 192.816,00	48,00	$ 192.816,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	48,00	$ 192.816,00	100,00%
35.43	15,01,43	HIS43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 6.464,00	13,00	$ 84.032,00	13,00	$ 84.032,00	13,00	$ 84.032,00	13,00	$ 84.032,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	13,00	$ 84.032,00	100,00%
35.44	15,01,44	HIS44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 16.051,00	4,00	$ 64.204,00	4,00	$ 64.204,00	4,00	$ 64.204,00	4,00	$ 64.204,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 64.204,00	100,00%
35.45	15,01,45	HIS151	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1.1/2"	UND	$ 310.712,00	4,00	$ 1.242.848,00	4,00	$ 1.242.848,00	4,00	$ 1.242.848,00	4,00	$ 1.242.848,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 1.242.848,00	100,00%
35.46	15,01,46	HIS45	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1.1/4"	UND	$ 233.371,00	3,00	$ 700.113,00	3,00	$ 700.113,00	3,00	$ 700.113,00	3,00	$ 700.113,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 700.113,00	100,00%
35.47	15,01,47	HIS46	ABRAZADERAS Ø 1.1/2"-1/2"	UND	$ 7.774,00	58,00	$ 450.892,00	58,00	$ 450.892,00	58,00	$ 450.892,00	58,00	$ 450.892,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	58,00	$ 450.892,00	100,00%
35.48	15,01,48	HIS47	ABRAZADERAS Ø 1.1/4"-1/2"	UND	$ 8.927,00	24,00	$ 214.248,00	24,00	$ 214.248,00	24,00	$ 214.248,00	24,00	$ 214.248,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	24,00	$ 214.248,00	100,00%
35.49	15,01,49	HIS48	LLAVE MANGUERA Ø 1/2"	UND	$ 48.400,00	6,00	$ 290.400,00	6,00	$ 290.400,00	6,00	$ 290.400,00	6,00	$ 290.400,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 290.400,00	100,00%
35.50	15,01,50	HIS110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1. 1/4"	UND	$ 9.385,00	28,00	$ 262.780,00	28,00	$ 262.780,00	28,00	$ 262.780,00	28,00	$ 262.780,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	28,00	$ 262.780,00	100,00%
35.51	15,01,51	HIS111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 6.829,00	7,00	$ 47.803,00	7,00	$ 47.803,00	7,00	$ 47.803,00	7,00	$ 47.803,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,00	$ 47.803,00	100,00%
35.52	15,01,52	HS-272	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1/2"	UND	$ 116.529,00	6,00	$ 699.174,00	6,00	$ 699.174,00	6,00	$ 699.174,00	6,00	$ 699.174,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 699.174,00	100,00%
		36	**PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO**				**$ 126.836.118,00**		**$ 274.561.857,00**		**$ 145.392.460,00**		**$ 145.392.460,00**	**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 145.392.460,00**	**100,00%**
36.01	15,02,01	HIS49	TUBERÍA PVC.S Ø 6". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 103.405,00	318,80	$ 32.965.514,00	318,80	$ 32.965.514,00	318,80	$ 32.965.514,00	318,80	$ 32.965.514,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	318,80	$ 32.965.514,00	100,00%
36.02	15,02,02	HIS50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 6"	UND	$ 157.233,00	4,00	$ 628.932,00	4,00	$ 628.932,00	4,00	$ 628.932,00	4,00	$ 628.932,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 628.932,00	100,00%
36.03	15,02,03	HS-201	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 6"	UND	$ 172.366,00	1,00	$ 172.366,00	1,00	$ 172.366,00	1,00	$ 172.366,00	1,00	$ 172.366,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 172.366,00	100,00%
36.04	15,02,04	HIS51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 6X4"	UND	$ 163.020,00	12,00	$ 1.956.240,00	12,00	$ 1.956.240,00	12,00	$ 1.956.240,00	12,00	$ 1.956.240,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	12,00	$ 1.956.240,00	100,00%
36.05	15,02,05	HS-202	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 6X3"	UND	$ 168.676,00	6,00	$ 1.012.056,00	6,00	$ 1.012.056,00	6,00	$ 1.012.056,00	6,00	$ 1.012.056,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 1.012.056,00	100,00%
36.06	15,02,06	HIS53	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 52.701,00	54,40	$ 2.866.934,00	54,40	$ 2.866.934,00	54,40	$ 2.866.934,00	54,40	$ 2.866.934,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	54,40	$ 2.866.934,00	100,00%
36.07	15,02,07	HIS54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"	UND	$ 30.168,00	35,00	$ 1.055.880,00	35,00	$ 1.055.880,00	35,00	$ 1.055.880,00	35,00	$ 1.055.880,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	35,00	$ 1.055.880,00	100,00%
36.08	15,02,08	HIS55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 4"	UND	$ 35.581,00	4,00	$ 142.324,00	4,00	$ 142.324,00	4,00	$ 142.324,00	4,00	$ 142.324,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 142.324,00	100,00%
36.09	15,02,09	HIS56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 4"	UND	$ 47.449,00	15,00	$ 711.735,00	15,00	$ 711.735,00	15,00	$ 711.735,00	15,00	$ 711.735,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	15,00	$ 711.735,00	100,00%
36.10	15,02,10	HIS57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 4"	UND	$ 19.658,00	72,00	$ 1.415.376,00	72,00	$ 1.415.376,00	72,00	$ 1.415.376,00	72,00	$ 1.415.376,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	72,00	$ 1.415.376,00	100,00%
36.11	15,02,11	HIS58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC.S Ø 4"	UND	$ 35.371,00	3,00	$ 106.113,00	3,00	$ 106.113,00	3,00	$ 106.113,00	3,00	$ 106.113,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 106.113,00	100,00%
36.12	15,02,12	HS-61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 4"	UND	$ 37.153,00	4,00	$ 148.612,00	4,00	$ 148.612,00	4,00	$ 148.612,00	4,00	$ 148.612,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 148.612,00	100,00%
36.13	15,02,13	HIS61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 36.837,00	14,00	$ 515.718,00	14,00	$ 515.718,00	14,00	$ 515.718,00	14,00	$ 515.718,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14,00	$ 515.718,00	100,00%
36.14	15,02,14	HIS62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"	UND	$ 36.837,00	14,00	$ 515.718,00	14,00	$ 515.718,00	14,00	$ 515.718,00	14,00	$ 515.718,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14,00	$ 515.718,00	100,00%
36.15	15,02,15	HIS63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 20.072,00	23,00	$ 461.656,00	23,00	$ 461.656,00	23,00	$ 461.656,00	23,00	$ 461.656,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	23,00	$ 461.656,00	100,00%
36.16	15,02,16	HIS64	TUBERÍA PVC.S Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 33.984,00	19,80	$ 672.883,00	19,80	$ 672.883,00	19,80	$ 672.883,00	19,80	$ 672.883,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	19,80	$ 672.883,00	100,00%
36.17	15,02,17	HIS65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 3"	UND	$ 19.592,00	174,00	$ 3.409.008,00	174,00	$ 3.409.008,00	174,00	$ 3.409.008,00	174,00	$ 3.409.008,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	174,00	$ 3.409.008,00	100,00%
36.18	15,02,18	HS-206	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 3"	UND	$ 23.937,00	3,00	$ 71.811,00	3,00	$ 71.811,00	3,00	$ 71.811,00	3,00	$ 71.811,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 71.811,00	100,00%
36.19	15,02,19	HS-207	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 3"	UND	$ 34.550,00	7,00	$ 241.850,00	7,00	$ 241.850,00	7,00	$ 241.850,00	7,00	$ 241.850,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,00	$ 241.850,00	100,00%
36.20	15,02,20	HIS66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 3"	UND	$ 24.443,00	14,00	$ 342.202,00	14,00	$ 342.202,00	14,00	$ 342.202,00	14,00	$ 342.202,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14,00	$ 342.202,00	100,00%
36.21	15,02,21	HIS67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 3X2"	UND	$ 23.584,00	7,00	$ 165.088,00	7,00	$ 165.088,00	7,00	$ 165.088,00	7,00	$ 165.088,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,00	$ 165.088,00	100,00%
36.22	15,02,22	HIS68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 3X2"	UND	$ 12.184,00	5,00	$ 60.920,00	5,00	$ 60.920,00	5,00	$ 60.920,00	5,00	$ 60.920,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,00	$ 60.920,00	100,00%
36.23	15,02,23	HIS149	TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 25.927,00	33,40	$ 865.962,00	33,40	$ 865.962,00	33,40	$ 865.962,00	33,40	$ 865.962,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	33,40	$ 865.962,00	100,00%
36.24	15,02,24	HIS69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"	UND	$ 9.087,00	46,00	$ 418.002,00	46,00	$ 418.002,00	46,00	$ 418.002,00	46,00	$ 418.002,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	46,00	$ 418.002,00	100,00%
36.25	15,02,25	HIS70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 2"	UND	$ 15.631,00	1,00	$ 15.631,00	1,00	$ 15.631,00	1,00	$ 15.631,00	1,00	$ 15.631,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 15.631,00	100,00%
36.26	15,02,26	HS-274	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 2"	UND	$ 10.522,00	15,00	$ 157.830,00	15,00	$ 157.830,00	15,00	$ 157.830,00	15,00	$ 157.830,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	15,00	$ 157.830,00	100,00%
36.27	15,02,27	HIS71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 2"	UND	$ 14.447,00	8,00	$ 115.576,00	8,00	$ 115.576,00	8,00	$ 115.576,00	8,00	$ 115.576,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8,00	$ 115.576,00	100,00%
36.28	15,02,28	HIS72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 2"	UND	$ 10.821,00	18,00	$ 194.778,00	18,00	$ 194.778,00	18,00	$ 194.778,00	18,00	$ 194.778,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	18,00	$ 194.778,00	100,00%
36.29	15,02,29	HIS73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 180º PVC.S Ø 2"	UND	$ 16.144,00	1,00	$ 16.144,00	1,00	$ 16.144,00	1,00	$ 16.144,00	1,00	$ 16.144,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 16.144,00	100,00%
36.30	15,02,30	HIS146	TUBERÍA PVC.L Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 37.817,00	111,60	$ 4.220.377,00	111,60	$ 4.220.377,00	111,60	$ 4.220.377,00	111,60	$ 4.220.377,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	111,60	$ 4.220.377,00	100,00%
36.31	15,02,31	HIS145	TUBERÍA PVC.L Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 23.298,00	505,80	$ 11.784.128,00	505,80	$ 11.784.128,00	505,80	$ 11.784.128,00	505,80	$ 11.784.128,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	505,80	$ 11.784.128,00	100,00%
36.32	15,02,32	HIS75	VÁLVULA DE ADMISIONES DE AIRE P.A.P.A Ø 3"	UND	$ 2.381.934,00	3,00	$ 7.145.802,00	3,00	$ 7.145.802,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
36.33	15,02,33	HIS76	ABRAZADERAS Ø 4"-2"	UND	$ 44.268,00	6,00	$ 265.608,00	6,00	$ 265.608,00	6,00	$ 265.608,00	6,00	$ 265.608,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 265.608,00	100,00%
36.34	15,02,34	HIS77	TUBERÍA PVC. ALC Ø 8". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 75.073,00	129,60	$ 9.729.461,00	129,60	$ 9.729.461,00	129,60	$ 9.729.461,00	129,60	$ 9.729.461,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	129,60	$ 9.729.461,00	100,00%
36.35		**NP023**	DESMONTAJE DE CAMPANA GRANDE Y ESTRUCTURA DE SOPORTE UBICADA EN CUBIERTA DE TORRE CAMPANARIO (ALTURA 18 m). INCLUYE LIMPIEZA, RETIRO, EMBALAJE Y TRASLADO A SITIO DE ALMACENAMIENTO AUTORIZADO POR EL CLIENTE.	UND	$ 2.188.636,00		$ -	1,00	$ 2.188.636,00	1,00	$ 2.188.636,00	1,00	$ 2.188.636,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 2.188.636,00	100,00%
36.36		**NP024**	DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA CON SECCION ENTRE LOS 40CM2 y 139CM2 , INCLUYE DISPOSICION FINAL	ML	$ 29.460,00		$ -	3088,00	$ 90.972.480,00	1544,00	$ 45.486.240,00	1544,00	$ 45.486.240,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1.544,00	$ 45.486.240,00	100,00%
36.37		**NP025**	TUBERÍA PVC.L Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	ML	$ 15.488,00		$ -	40,90	$ 633.459,00	40,90	$ 633.459,00	40,90	$ 633.459,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	40,90	$ 633.459,00	100,00%
36.38		**NP026**	TUBERÍA PVC.P Ø 1 1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	ML	$ 14.210,00		$ -	45,77	$ 650.392,00	45,77	$ 650.392,00	45,77	$ 650.392,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	45,77	$ 650.392,00	100,00%
36.39		**NP027**	DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA CON SECCION ENTRE LOS 140CM2 y 280CM2 , INCLUYE DISPOSICION FINAL	ML	$ 49.380,00		$ -	770,00	$ 38.022.600,00	385,00	$ 19.011.300,00	385,00	$ 19.011.300,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	385,00	$ 19.011.300,00	100,00%
36.40		**NP028**	VÁLVULA DE DILUVIO MARCA HI-FOG® MODELO SVM-20 (25/25), CÓDIGO D00050.1 O SIMILAR CON SENSOR DE FLUJO, MANÓMETRO, TOMA DE PRUEBAS Y VÁLVULA SUPERVISADA DE CIERRE Y APERTURA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERÍA DE 25 MM.	UND	$ 7.629.086,00		$ -	2,00	$ 15.258.172,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
36.41	15,02,35	HIS78	FILTRO DE DRENAJE 4" PVC CORRUGADO. INCLUYE TUBERÍA. GEOTEXTIL Y GRAVILLA	M	$ 150.366,00	281,10	$ 42.267.883,00	281,10	$ 42.267.883,00		$ 0,00		$ -	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		37	**PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA Y APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS**				**$ 103.501.836,00**		**$ 103.501.836,00**		**$ 90.988.031,00**		**$ 90.988.031,00**	**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 90.988.031,00**	**100,00%**
37.01	15,03,01	HIS105	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1. 1/4"	UND	$ 42.168,00	12,00	$ 506.016,00	12,00	$ 506.016,00	12,00	$ 506.016,00	12,00	$ 506.016,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	12,00	$ 506.016,00	100,00%
37.02	15,03,02	HIS106	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1/2"	UND	$ 29.393,00	22,00	$ 646.646,00	22,00	$ 646.646,00	22,00	$ 646.646,00	22,00	$ 646.646,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	22,00	$ 646.646,00	100,00%
37.03	15,03,03	HIS107	PUNTO HIDRÁULICO Ø 3/4"	UND	$ 32.094,00	5,00	$ 160.470,00	5,00	$ 160.470,00	5,00	$ 160.470,00	5,00	$ 160.470,00	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,00	$ 160.470,00	100,00%

37.04	15,04,01	HIS112	SALIDA SANITARIA Ø 4"	UND	$ 88.457,00	12,00	$ 1.061.484,00	12,00	$ 1.061.484,00	12,00	$ 1.061.484,00	12.00	$ 1.061.484,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	12,00	$ 1.061.484,00	100,00%
37.05	15,04,02	HIS113	SALIDA SANITARIA Ø 2"	UND	$ 72.679,00	22,00	$ 1.598.938,00	22,00	$ 1.598.938,00	22,00	$ 1.598.938,00	22.00	$ 1.598.938,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	22,00	$ 1.598.938,00	100,00%
37.06	15,04,03	HIS114	SIFÓN Ø 3". INCLUYE REJILLA	UND	$ 52.483,00	8,00	$ 419.864,00	8,00	$ 419.864,00	8,00	$ 419.864,00	8.00	$ 419.864,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8,00	$ 419.864,00	100,00%
37.07	15,05,01	HIS152	CAJA DE INSPECCIÓN 0.6X0.6	UND	$ 493.300,00	33,00	$ 16.278.900,00	33,00	$ 16.278.900,00	33,00	$ 16.278.900,00	33.00	$ 16.278.900,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	33,00	$ 16.278.900,00	100,00%
37.08	15,05,02	HS-191	SUMIDEROS DE 65X15CM TIPO EAAB	UND	$ 764.009,00	7,00	$ 5.348.063,00	7,00	$ 5.348.063,00	7,00	$ 5.348.063,00	7.00	$ 5.348.063,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,00	$ 5.348.063,00	100,00%
37.09	15,05,03	HS-263	SUMIDEROS - CÁRCAMO CON REJA TIPO IDU 83.5X45 CM	M	$ 476.074,00	14,00	$ 6.665.036,00	14,00	$ 6.665.036,00	14,00	$ 6.665.036,00	14.00	$ 6.665.036,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14,00	$ 6.665.036,00	100,00%
37.10	16,01,01	HIS161	KIT TAZA BÁLTICA PLUS ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.737.544,00	12,00	$ 20.850.528,00	12,00	$ 20.850.528,00	12,00	$ 20.850.528,00	12.00	$ 20.850.528,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	12,00	$ 20.850.528,00	100,00%
37.11	16,01,02	HS-178	ORINAL GOTTA ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.301.303,00	5,00	$ 6.506.515,00	5,00	$ 6.506.515,00	5,00	$ 6.506.515,00	5.00	$ 6.506.515,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5,00	$ 6.506.515,00	100,00%
37.12	16,01,03	HS-180	LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO PIGMENTADO FUNDIDO EN SITIO. NO INCLUYE GRIFERÍA	M	$ 631.520,00	8,40	$ 5.304.768,00	8,40	$ 5.304.768,00	8,40	$ 5.304.768,00	8.40	$ 5.304.768,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	8,40	$ 5.304.768,00	100,00%
37.13	16,01,04	HS-181	LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL ELECTRÓNICA Y/O SIMILAR.	UND	$ 706.177,00	3,00	$ 2.118.531,00	3,00	$ 2.118.531,00	3,00	$ 2.118.531,00	3,00	$ 2.118.531,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 2.118.531,00	100,00%
37.14	16,01,05	HS-182	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SENSOR TUBULAR LARGO Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.470.142,00	16,00	$ 23.522.272,00	16,00	$ 23.522.272,00	16,00	$ 23.522.272,00	16.00	$ 23.522.272,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	16,00	$ 23.522.272,00	100,00%
37.15	16,01,06	HS-183	DISPENSADOR DE JABÓN DE PARED EN ACERO INOX.	UND	$ 329.335,00	8,00	$ 2.634.680,00	8,00	$ 2.634.680,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
37.16	16,01,07	HS-184	DISPENSADOR DE ROLLO PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO SOPORTE DEL ROLLO 40MM, INCLUYE SUPLEMENTO PARA ROLLOS CON CONO DE70MM.	UND	$ 256.038,00	12,00	$ 3.072.456,00	12,00	$ 3.072.456,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
37.17	16,01,08	HS-185	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL DIMENSIONES 0.28X20.3X10.2CM. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO.	UND	$ 378.785,00	8,00	$ 3.030.280,00	8,00	$ 3.030.280,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
37.18	16,01,09	HS-186	BARRA DE SEGURIDAD CROMO 30" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE ABATIBLE.	UND	$ 422.776,00	2,00	$ 845.552,00	2,00	$ 845.552,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
37.19	16,01,10	HS-187	ESPEJOS 4MM, EN CRISTAL PULIDO, ENMARCADO EN U DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y ADHERIDOS A LA PARED	M2	$ 389.739,00	7,52	$ 2.930.837,00	7,52	$ 2.930.837,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		38	**EQUIPOS 1**				**$ 13.111.498,00**		**$ 13.111.498,00**		**$ -**		**$ -**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**
38.01	13,07,03	ELE114	DUCTO EN LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE 14 DIÁMETRO ESPECIFICADO, INCLUYE ACCESORIOS DE REMATE, CODOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M	$ 151.502,00	25,00	$ 3.787.550,00	25,00	$ 3.787.550,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.02	13,07,04	ELE115	RECUBRIMIENTO DE DUCTO DE ESCAPE EN LÁMINA DE ALUMINIO Y LANA DE VIDRIO ESPESOR 2"	M	$ 187.957,00	20,00	$ 3.759.140,00	20,00	$ 3.759.140,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.03	13,07,05	ELE116	INSTALACIÓN DE DUCTO Y SILENCIADOR	UND	$ 1.304.762,00	1,00	$ 1.304.762,00	1,00	$ 1.304.762,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.04	13,07,06	ELE117	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) DE LLENADO INICIAL DE LOS TANQUES	GAL	$ 12.810,00	1,00	$ 12.810,00	1,00	$ 12.810,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.05	13,07,07	ELE118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO TRAMPA DE AIRE CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIONES	UND	$ 2.109.212,00	1,00	$ 2.109.212,00	1,00	$ 2.109.212,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.06	13,07,08	ELE119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PARA TOMA DE AIRE FRESCO SEGÚN ESPECIFICACIONES	M	$ 2.138.024,00	1,00	$ 2.138.024,00	1,00	$ 2.138.024,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
			EQUIPOS 2				**$ 79.036.682,00**		**$ 59.311.696,00**		**$ -**		**$ -**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**
38.07	18,01,01	ELM011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND MINI SPLIT TIPO PARED DE 9.000 BTU/H INVERTER	UND	$ 4.833.586,00	4,00	$ 19.334.344,00	2,00	$ 9.667.172,00	0,00	$ 0,00	0.00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.08	18,01,02	ELM012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 203 CFM, @ 0.36 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.693.781,00	2,00	$ 3.387.562,00	1,00	$ 1.693.781,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.09	18,01,03	ELM013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 372 CFM, @ 0.40 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.855.110,00	2,00	$ 3.710.220,00	1,00	$ 1.855.110,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.10	18,01,04	ELM014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO PLAFÓN, CAUDAL DE 168 CFM, @ 0.38 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.512.582,00	2,00	$ 3.025.164,00	1,00	$ 1.512.582,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.11	18,01,05	ELM015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELIO CENTRÍFUGO, CAUDAL DE 241 CFM, @ 0.39 INWG, PARA LA ZONA DE ASEO	UND	$ 1.789.978,00	2,00	$ 3.579.956,00	1,00	$ 1.789.978,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.12	18,01,06	ELM016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 436 CFM, @ 0.4 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.855.110,00	2,00	$ 3.710.220,00	2,00	$ 3.710.220,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.13	18,01,07	ELM017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELIO CENTRÍFUGO, CAUDAL DE 186 CFM, @ 0.38 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.512.582,00	2,00	$ 3.025.164,00	1,00	$ 1.512.582,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.14	18,01,08	ELM018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 404 CFM, @ 0.4 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.855.110,00	2,00	$ 3.710.220,00	2,00	$ 3.710.220,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.15	18,01,09	ELM019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELIO CENTRÍFUGO, CAUDAL DE 215 CFM, @ 0.18 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.693.781,00	2,00	$ 3.387.562,00	1,00	$ 1.693.781,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.16	18,01,10	ELM020	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELIO CENTRÍFUGO, CAUDAL DE 243 CFM, @ 0.19 INWG, PARA LA ZONA DE ASEO	UND	$ 1.789.978,00	6,00	$ 10.739.868,00	6,00	$ 10.739.868,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
38.17	18,01,11	ELM021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO CAJA DE VENTILACIÓN, CAUDAL DE 1285 CFM, @ 0.1 INWG, PARA LA ZONA DE VENTILACIÓN	UND	$ 3.571.067,00	6,00	$ 21.426.402,00	6,00	$ 21.426.402,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		39	**CONDUCTOS E ILUMINACIÓN**				**$ 321.115.275,00**		**$ 321.115.754,00**		**$ 205.853.978,00**		**$ 205.853.978,00**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 205.853.978,00**	**100,00%**
39.01	24.01.01	BIM005	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES (15%, QUINCE PORCIENTO PARA ESTE COMPONENTE)	UND	$ 693.676.269,00	0,15	$ 104.051.440,00	0,15	$ 104.051.440,00	0,15	$ 104.051.440,00	0,15	$ 104.051.440,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,15	$ 104.051.440,00	100,00%
39.02	18,02,01	ELM051	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA	KG	$ 122.403,00	774,07	$ 94.748.011,00	774,07	$ 94.748.490,00	774,07	$ 94.748.490,00	774.07	$ 94.748.490,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	774,07	$ 94.748.490,00	100,00%
39.03	18,03,01	ELM067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE 8"X8" ALETA FIJA MODELO L-RA	UND	$ 169.073,00	11,00	$ 1.859.803,00	11,00	$ 1.859.803,00	11,00	$ 1.859.803,00	11.00	$ 1.859.803,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	11,00	$ 1.859.803,00	100,00%
39.04	18,03,02	ELM068	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE 18"X16" ALETA FIJA MODELO L-RA	UND	$ 508.162,00	6,00	$ 3.048.972,00	6,00	$ 3.048.972,00	6,00	$ 3.048.972,00	6.00	$ 3.048.972,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 3.048.972,00	100,00%
39.05	18,03,03	ELM069	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONTRA ROEDORES PARA DESCARGA DE EXTRACCIONES	UND	$ 165.021,00	13,00	$ 2.145.273,00	13,00	$ 2.145.273,00	13,00	$ 2.145.273,00	13,00	$ 2.145.273,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	13,00	$ 2.145.273,00	100,00%
39.06	13,05,01	ELE078	LUMINARIA TIPO PANEL RD CIRCULAR 30 CM, 30W, 120V	UND	$ 54.238,00	47,00	$ 2.549.186,00	47,00	$ 2.549.186,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
39.07	13,05,02	ELE080	LUMINARIAS DESCOLGADAS EN PASILLO 26W, 120V	UND	$ 487.554,00	68,00	$ 33.153.672,00	68,00	$ 33.153.672,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
39.08	13,05,03	ELE081	LUMINARIAS DE EMERGENCIA 2.6W.120V	UND	$ 183.712,00	65,00	$ 11.941.280,00	65,00	$ 11.941.280,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
39.09	13,05,04	ELE082	LUMINARIA COLGANTE CONTINUUM 80W, 120V 220X8 CM	UND	$ 556.529,00	34,00	$ 18.921.986,00	34,00	$ 18.921.986,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
39.10	13,05,05	ELE083	BAÑADORES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE 1M	UND	$ 752.824,00	57,00	$ 42.910.968,00	57,00	$ 42.910.968,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
39.11	13,05,06	ELE084	REFLECTORES EXTERIORES 70W	UND	$ 78.239,00	6,00	$ 469.434,00	6,00	$ 469.434,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
39.12	13,05,07	ELE085	CINTA LED ARQUITECTÓNICA 8W STR800	UND	$ 42.522,00	125,00	$ 5.315.250,00	125,00	$ 5.315.250,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		40	**ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO**				**$ 286.921.390,00**		**$ 286.921.390,00**		**$ 256.403.319,00**		**$ 256.403.319,00**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 256.403.319,00**	**100,00%**
40.01	13,07,01	ELE112	TRANSFERENCIA PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO CON PROTECCIÓN INDUSTRIAL DE 3X63 A. I MAGNÉTICA DE 400 A. ICC 100KA	UND	$ 12.825.065,00	2,00	$ 25.650.130,00	2,00	$ 25.650.130,00	2,00	$ 25.650.130,00	2,00	$ 25.650.130,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 25.650.130,00	100,00%
40.02	13,07,02	ELE113	SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA, PARA SUPLENCIA TOTAL, STAND BY DE EMERGENCIA ENCABINADA DE 100 KVA S.B. EFECTIVOS A LA ALTURA DE BOGOTÁ 208/120 V 3F-4H 60HZ.	UND	$ 163.794.336,00	1,00	$ 163.794.336,00	1,00	$ 163.794.336,00	1,00	$ 163.794.336,00	1,00	$ 163.794.336,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 163.794.336,00	100,00%
40.03	13,07,09	ELE120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS	UND	$ 265.798,00	1,00	$ 265.798,00	1,00	$ 265.798,00	1,00	$ 265.798,00	1.00	$ 265.798,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 265.798,00	100,00%
40.04	13,07,10	ELE121	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA Y CABLEADO SISTEMA DE CONTROL DESDE LAS PLANTA HASTA TRANSFERENCIA	M	$ 54.197,00	25,00	$ 1.354.925,00	25,00	$ 1.354.925,00	25,00	$ 1.354.925,00	25,00	$ 1.354.925,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	25,00	$ 1.354.925,00	100,00%
40.05	13,07,11	ELE122	UPS ONLINE DE 7 KVA TRIFÁSICA VOLTAJE DE ENTRADA 208 V AC Y DE SALIDA 208V AC, 60 HZ, INCLUYE BANCO DE BATERÍAS CON AUTONOMÍA DE 5 MINUTOS.	UND	$ 11.108.117,00	2,00	$ 22.216.234,00	2,00	$ 22.216.234,00	2,00	$ 22.216.234,00	2,00	$ 22.216.234,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 22.216.234,00	100,00%
40.06	18,04,01	ELM086	CONEXIÓN DE EQUIPO A RED ELÉCTRICA	UND	$ 5.558.403,00	4,00	$ 22.233.612,00	4,00	$ 22.233.612,00	4,00	$ 22.233.612,00	4.00	$ 22.233.612,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 22.233.612,00	100,00%
40.07	18,04,02	ELM087	PRUEBAS DE BALANCEO DEL SISTEMA, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA	GLB	$ 1.490.624,00	1,00	$ 1.490.624,00	1,00	$ 1.490.624,00	1,00	$ 1.490.624,00	1.00	$ 1.490.624,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 1.490.624,00	100,00%
40.08	14,01,08	CYS008	RACK PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE 90CM X 60CM, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES DE ALTA DENSIDAD Y ORGANIZADORES HORIZONTALES	UND	$ 2.449.180,00	2,00	$ 4.898.360,00	2,00	$ 4.898.360,00	2,00	$ 4.898.360,00	2,00	$ 4.898.360,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 4.898.360,00	100,00%
40.09	14,01,09	CYS009	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS	UND	$ 938.680,00	2,00	$ 1.877.360,00	2,00	$ 1.877.360,00	2,00	$ 1.877.360,00	2.00	$ 1.877.360,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 1.877.360,00	100,00%
40.10	14,01,10	CYS010	SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS	UND	$ 9.620.282,00	1,00	$ 9.620.282,00	1,00	$ 9.620.282,00	1,00	$ 9.620.282,00	1.00	$ 9.620.282,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 9.620.282,00	100,00%
40.11	14,01,11	CYS012	STRIP TELEFÓNICO 20 PARES 60X60X10	UND	$ 198.152,00	1,00	$ 198.152,00	1,00	$ 198.152,00	1,00	$ 198.152,00	1.00	$ 198.152,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 198.152,00	100,00%
40.12	14,01,12	CYS013	CERTIFICACIÓN PUNTOS CAT 6A Y FIBRA OPTICA	UND	$ 20.983,00	46,00	$ 965.218,00	46,00	$ 965.218,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
40.13	14,03,04	CYS049	CÁMARA IP POE ULTRA HD 4K DE 8MP	UND	$ 1.057.832,00	24,00	$ 25.387.968,00	24,00	$ 25.387.968,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
40.14	14,04,03	CYS063	SUMINISTRO. TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARLANTES AMBIENTALES	UND	$ 467.251,00	6,00	$ 2.803.506,00	6,00	$ 2.803.506,00	6,00	$ 2.803.506,00	6.00	$ 2.803.506,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 2.803.506,00	100,00%
40.15	14,04,04	CYS064	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLANTA AMPLIFICADORA DE SONIDO DE 14 CANALES	UND	$ 4.164.885,00	1,00	$ 4.164.885,00	1,00	$ 4.164.885,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		41	**RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO. SEÑALIZACION Y SEÑALETICA**				**$ 28.769.450,00**		**$ 28.769.450,00**		**$ -**		**$ -**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**
41.01	19,02,01	SÑL002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 22X15CM EN BASE DE POLIESTIRENO PARA ADHERIR.	UND	$ 43.339,00	8,00	$ 346.712,00	8,00	$ 346.712,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
41.02	19,02,02	SÑL003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 20X20CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2	UND	$ 64.661,00	9,00	$ 581.949,00	9,00	$ 581.949,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
41.03	19,02,03	SÑL004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X20CM FOTOLUMINISCENTE 60 MINUTOS, BASE ACRÍLICA CON ACCESORIOS PARA DESCOLGAR	UND	$ 73.681,00	58,00	$ 4.273.498,00	58,00	$ 4.273.498,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
41.04	19,02,04	SÑL005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2	UND	$ 88.713,00	1,00	$ 88.713,00	1,00	$ 88.713,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
41.05	19,02,05	SÑL006	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 40X30CM FOTOLUMINISCENTE 60 MINUTOS, BASE ACRÍLICA CON ACCESORIOS PARA DESCOLGAR EN PARED	UND	$ 100.738,00	7,00	$ 705.166,00	7,00	$ 705.166,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
41.06	19,02,06	SÑL007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 40X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2	UND	$ 102.241,00	1,00	$ 102.241,00	1,00	$ 102.241,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
41.07	19,02,07	SÑL010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL EN PLATINA CALIBRE 1/4" ANCHO 3CM, LARGO 60CM - PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. PIEZA DE MADERA 10 X 15 CM - MADERA NATURAL O TABLERO LAMINADO. ACRÍLICO TRANSPARENTE CALIBRE 5MM. DE 50X10CM	UND	$ 153.166,00	57,00	$ 8.730.462,00	57,00	$ 8.730.462,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
41.08	19,02,08	SÑL011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL AUTO ILUMINADA 90MIN - 30X20CM RETROILUMINADA CHASIS EN PLÁSTICO, BATERÍA DURACIÓN 90 MINUTOS	UND	$ 453.442,00	15,00	$ 6.801.630,00	15,00	$ 6.801.630,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
41.09	19,01,01	RMB001	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO EXISTENTE FRENTE A HUELLAS DE ANIMALES	UND	$ 189.348,00	19,00	$ 3.597.612,00	19,00	$ 3.597.612,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
41.10	19,01,02	RMB002	RESTAURACIÓN DE PEDESTALES DE MADERA PARA LAS ESCULTURAS. SECCIÓN CUADRADA DE 0.52M DE LADO POR 1.70M DE ALTO. INCLUYE LIJADO, LIMPIEZA, INMUNIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LACA SELLADORA PARA MADERA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.	UND	$ 118.265,00	19,00	$ 2.247.035,00	19,00	$ 2.247.035,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
41.11	19,03,01	DT01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÓCKER METÁLICO DE 12 PUESTOS, ALTURA 2.00 MT. FONDO 0.30, ANCHO 93 CON ESTRUCTURA METÁLICA COLD ROLLED CALIBRE 24. MEDIDAS DE CADA COMPARTIMENTO: ALTO 0.46 X 0.28 X 0.30 M. MANIJA EN PVC CON RÓTULO IDENTIFICADOR EN CADA PUERTA Y PORTACANDADO. PINTURA ELECTROSTÁTICA GRIS.	UND	$ 1.294.432,00	1,00	$ 1.294.432,00	1,00	$ 1.294.432,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		42	**VITRALES CAPILLA**				**$ 319.829.920,00**		**$ 336.935.404,00**		**$ 150.529.921,00**		**$ 150.529.921,00**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 150.529.921,00**	**100,00%**
42.01	20.01.03	RBMCC003	DESMONTE Y RESTAURACIÓN DE MARCO DE MADERA DE CEDRO QUE SOPORTA LOS PANELES VITRALES	M2	$ 1.391.916,00	90,00	$ 125.272.440,00	97,52	$ 135.739.648,00	97,52	$ 135.739.648,00	97,52	$ 135.739.648,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	97,52	$ 135.739.648,00	100,00%
42.02	20.01.04	RBMCC004	LIMPIEZA DEL VITRAL POR AMBAS CARAS, INCLUYE ELIMINACIÓN DE MASILLA	M2	$ 151.664,00	90,00	$ 13.649.760,00	97,52	$ 14.790.273,00	97,52	$ 14.790.273,00	97,52	$ 14.790.273,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	97,52	$ 14.790.273,00	100,00%
42.03	20.01.05	RBMCC005	UNIÓN DE FRACTURAS CON RESINA EPÓXICA	UND	$ 34.487,00	100,00	$ 3.448.700,00	100,00	$ 3.448.700,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%

42.04	20.01.06	RBMCC006	RECUPERACIÓN DE PLANO DE PANELES, INCLUYE REFUERZOS CON PUNTOS DE SOLDADURA EN PLOMOS.	UND	$ 141.854,00	30,00	$ 4.255.620,00	30,00	$ 4.255.620,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
42.05	20.01.07	RBMCC007	RESTITUCIÓN Y ACOMODACIÓN DE CAÑUELAS DE PLOMO.	M	$ 55.482,00	100,00	$ 5.548.200,00	100,00	$ 5.548.200,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
42.06	20.01.08	RBMCC008	RESTITUCIÓN DE FALTANTES DE VIDRIO DE ACUERDO CON TÉCNICA ORIGINAL	M2	$ 6.635.168,00	0,50	$ 3.317.584,00	0,50	$ 3.317.584,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
42.07	20.01.09	RBMCC009	PUNTOS DE SOLDADURA EN LOS CRUCES DE UNIÓN ENTRE LAS CAÑUELAS DE PLOMO DETERIORADAS O FISURADAS.	UND	$ 28.991,00	1.800,00	$ 52.183.800,00	1800,00	$ 52.183.800,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
42.08	20.01.10	RBMCC010	ADICIÓN DE MASILLA ENTRE PLOMOS. INCLUYE LIMPIEZA.	M2	$ 540.094,00	90,00	$ 48.608.460,00	97,52	$ 52.669.967,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
42.09	20.01.11	RBMCC011	LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO EN VARILLAS DE REFUERZO.	M	$ 73.806,00	130,00	$ 9.594.780,00	130,00	$ 9.594.780,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
42.10	20.01.12	RBMCC012	RESTITUCIÓN DE AMARRES A VARILLAS METÁLICAS DE REFUERZO.	UND	$ 20.654,00	920,00	$ 19.001.680,00	920,00	$ 19.001.680,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
42.11	20.01.13	RBMCC013	MONTAJE DE PANELES DE VITRAL AL MARCO DE MADERA. INCLUYE TRASLADO.	UND	$ 119.688,00	292,00	$ 34.948.896,00	304,00	$ 36.385.152,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		43	**BIENES MUEBLES CAPILLA**						**$ 1.271.834,00**		**$ 934.687,00**		**$ 934.687,00**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 934.687,00**	**100,00%**
			PLACA # 1 CAPILLA. SOPORTE EN MÁRMOL.				**$ 1.271.834,00**																
43.01	20.02.01	RBMCC014	LIMPIEZA EN SECO CON BROCHAS DE CERDA SUAVE EN PLACA #1 CAPILLA	M2	$ 153.361,00	0,53	$ 81.281,00	0,53	$ 81.281,00	0,53	$ 81.281,00	0,53	$ 81.281,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,53	$ 81.281,00	100,00%
43.02	20.02.02	RBMCC015	LIMPIEZA EN HÚMEDO CON DETERGENTE NEUTRO Y CEPILLOS DE CERDA PLÁSTICA	M2	$ 260.538,00	0,53	$ 138.085,00	0,53	$ 138.085,00	0,53	$ 138.085,00	0,53	$ 138.085,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,53	$ 138.085,00	100,00%
43.03	20.02.03	RBMCC016	LIMPIEZA DE MANCHAS RENUENTES POR MEDIO DE PRUEBAS DE TEST DE SOLVENTES	M2	$ 120.859,00	0,53	$ 64.055,00	0,53	$ 64.055,00	0,53	$ 64.055,00	0,53	$ 64.055,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,53	$ 64.055,00	100,00%
43.04	20.02.04	RBMCC017	ELIMINACIÓN DE REPINTE DE PINTURA NEGRA MEDIANTE PRUEBAS DE TEST DE SOLVENTES	M2	$ 145.311,00	0,53	$ 77.015,00	0,53	$ 77.015,00	0,53	$ 77.015,00	0,53	$ 77.015,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,53	$ 77.015,00	100,00%
43.05	20.02.05	RBMCC018	REINTEGRACIÓN CROMÁTICA MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA DORADA SOBRE LAS LETRAS.	M2	$ 417.729,00	0,53	$ 221.396,00	0,53	$ 221.396,00	0,53	$ 221.396,00	0,53	$ 221.396,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,53	$ 221.396,00	100,00%
43.06	20.03.01	RBMCC019	LIMPIEZA EN SECO CON BROCHAS DE CERDA SUAVE	M2	$ 153.434,00	0,53	$ 81.320,00	0,53	$ 81.320,00	0,53	$ 81.320,00	0,53	$ 81.320,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,53	$ 81.320,00	100,00%
43.07	20.03.02	RBMCC020	LIMPIEZA EN HÚMEDO CON DETERGENTE NEUTRO	M2	$ 260.553,00	0,53	$ 138.093,00	0,53	$ 138.093,00	0,53	$ 138.093,00	0,53	$ 138.093,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,53	$ 138.093,00	100,00%
43.08	20.03.03	RBMCC021	LIMPIEZA DE MANCHAS RENUENTES EN PLACA CON TEST DE SOLVENTES	M2	$ 121.633,00	0,53	$ 64.465,00	0,53	$ 64.465,00	0,53	$ 64.465,00	0,53	$ 64.465,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,53	$ 64.465,00	100,00%
43.09	20.03.04	RBMCC022	ELIMINACIÓN MECÁNICA DE INTERVENCIONES ANTERIORES EN BORDES DE LA PLACA	M2	$ 130.145,00	0,53	$ 68.977,00	0,53	$ 68.977,00	0,53	$ 68.977,00	0,53	$ 68.977,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,53	$ 68.977,00	100,00%
43.10	20.03.05	RBMCC023	RESTITUCIÓN DE FALTANTES DE SOPORTE DE PLACA CON MORTERO DE CEMENTO BLANCO Y POLVO DE MÁRMOL	M2	$ 181.875,00	0,53	$ 96.394,00	0,53	$ 96.394,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.11	20.03.06	RBMCC024	REINTEGRACIÓN DE LAS LETRAS TALLADAS DE LA INSCRIPCIÓN CON PINTURA DORADA	M2	$ 454.250,00	0,53	$ 240.753,00	0,53	$ 240.753,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
			MOLDURAS CAPILLA.				**$ 95.975.262,00**		**$ 95.975.262,00**		**$ -**		**$ -**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**
43.12	20.04.01	RBMCC025	LIMPIEZA SUPERFICIAL DE MOLDURAS EN CAPILLA CON BROCHAS Y ASPIRADORA	M	$ 80.560,00	120,00	$ 9.667.200,00	120,00	$ 9.667.200,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.13	20.04.02	RBMCC026	ELIMINACIÓN MECÁNICA DE INTERVENCIONES ANTERIORES EN MOLDURAS EN CAPILLA	M	$ 290.849,00	24,00	$ 6.980.376,00	24,00	$ 6.980.376,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.14	20.04.03	RBMCC027	LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE PICTÓRICA DE MOLDURAS EN CAPILLA MEDIANTE TEST DE SOLVENTES	M	$ 327.706,00	120,00	$ 39.324.720,00	120,00	$ 39.324.720,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.15	20.04.04	RBMCC028	CONSOLIDACIÓN DE LA SUPERFICIE DE MOLDURAS EN CAPILLA CON RESINAS SINTÉTICAS	M	$ 215.861,00	24,00	$ 5.180.664,00	24,00	$ 5.180.664,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.16	20.04.05	RBMCC029	RESANES CON YESO TIPO 3	M	$ 245.866,00	50,00	$ 12.293.300,00	50,00	$ 12.293.300,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.17	20.04.06	RBMCC030	ELABORACIÓN DE PIEZAS FALTANTES DE MOLDURAS EN CAPILLA PREVIO ELABORACIÓN DE MOLDES	UND	$ 455.612,00	10,00	$ 4.556.120,00	10,00	$ 4.556.120,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.18	20.04.07	RBMCC031	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MOLDURAS EN CAPILLA CON MATERIALES SINTÉTICOS	M	$ 184.241,00	10,00	$ 1.842.410,00	10,00	$ 1.842.410,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.19	20.04.08	RBMCC032	REINTEGRACIÓN CROMÁTICA DE MOLDURAS EN CAPILLA CON MICA O LAMINILLA DE ORO	M	$ 672.103,00	24,00	$ 16.130.472,00	24,00	$ 16.130.472,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
			LAMPARAS				**$ 6.998.195,00**		**$ 6.998.195,00**		**$ -**		**$ -**	$ -		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**
43.20	20.05.04	RBMCC035	LIMPIEZA EN SECO CON BROCHAS Y ASPIRADORA DE LÁMPARA EN TECHO	M2	$ 134.851,00	1,65	$ 222.504,00	1,65	$ 222.504,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.21	20.05.05	RBMCC036	LIMPIEZA DE LÁMPARA EN HÚMEDO CON DETERGENTE NEUTRO	M2	$ 748.842,00	1,65	$ 1.235.589,00	1,65	$ 1.235.589,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.22	20.05.06	RBMCC037	PASIVACIÓN DE PRODUCTOS DE CORROSIÓN EN LÁMPARA DE TECHO CON HEXAMETAFOSFATO	M2	$ 665.107,00	1,65	$ 1.097.427,00	1,65	$ 1.097.427,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.23	20.05.07	RBMCC038	LIMPIEZA PUNTUAL QUÍMICA DE LOS PRODUCTOS DE CORROSIÓN CON ACIDO CÍTRICO O FÓRMICO EN LÁMPARA	M2	$ 143.443,00	1,65	$ 236.681,00	1,65	$ 236.681,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.24	20.05.08	RBMCC039	PASIVACIÓN POR MEDIOS QUÍMICOS EN LÁMPARA	M2	$ 254.600,00	1,65	$ 420.090,00	1,65	$ 420.090,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.25	20.05.09	RBMCC040	INHIBICIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CORROSIÓN CON SOLUCIÓN ACUOSA CON BENZOTRIAZOL EN LÁMPARA DE TECHO	M2	$ 217.204,00	1,65	$ 358.387,00	1,65	$ 358.387,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.26	20.05.10	RBMCC041	APLICACIÓN DE CAPA DE PROTECCIÓN TIPO RESINA ACRÍLICA PARA LÁMPARA DE TECHO EN CAPILLA	M2	$ 285.059,00	1,65	$ 470.347,00	1,65	$ 470.347,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.27	20.05.11	RBMCC042	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LÁMPARA TECHO	UND	$ 1.426.173,00	1,00	$ 1.426.173,00	1,00	$ 1.426.173,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.28	20.05.12	RBMCC043	ARMADO E INSTALACIÓN DE LA LAMPARA	UND	$ 1.530.997,00	1,00	$ 1.530.997,00	1,00	$ 1.530.997,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
			LAMPARAS PARED CAPILLA.				**$ 45.595.412,00**		**$ 45.595.412,00**		**$ -**		**$ -**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**
43.29	20.06.04	RBMCC046	LIMPIEZA EN SECO CON BROCHAS Y ASPIRADORA EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA	M2	$ 66.519,00	4,90	$ 325.943,00	4,90	$ 325.943,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.30	20.06.05	RBMCC047	LIMPIEZA EN HÚMEDO CON DETERGENTE NEUTRO EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA	M2	$ 187.226,00	4,90	$ 917.407,00	4,90	$ 917.407,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.31	20.06.06	RBMCC048	PASIVACIÓN DE PRODUCTOS DE CORROSIÓN CON HEXAMETAFOSFATO EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA	M2	$ 192.368,00	4,90	$ 942.603,00	4,90	$ 942.603,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.32	20.06.07	RBMCC049	LIMPIEZA PUNTUAL QUÍMICA DE LOS PRODUCTOS DE CORROSIÓN CON ACIDO CÍTRICO O FÓRMICO EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA	M2	$ 177.212,00	2,00	$ 354.424,00	2,00	$ 354.424,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.33	20.06.08	RBMCC050	PASIVACIÓN POR MEDIOS QUÍMICOS EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA	M2	$ 116.245,00	2,00	$ 232.490,00	2,00	$ 232.490,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.34	20.06.09	RBMCC051	INHIBICIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CORROSIÓN CON SOLUCIÓN ACUOSA CON BENZOTRIAZOL EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA	M2	$ 180.925,00	2,00	$ 361.850,00	2,00	$ 361.850,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.35	20.06.10	RBMCC052	APLICACIÓN DE CAPA DE PROTECCIÓN TIPO RESINA ACRÍLICA EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA	M2	$ 209.685,00	4,90	$ 1.027.457,00	4,90	$ 1.027.457,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.36	20.06.11	RBMCC053	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA	UND	$ 1.428.520,00	14,00	$ 19.999.280,00	14,00	$ 19.999.280,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
43.37	20.06.12	RBMCC054	ARMADO E INSTALACIÓN DE LA LAMPARA DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA	UND	$ 1.530.997,00	14,00	$ 21.433.958,00	14,00	$ 21.433.958,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		44	**TANQUE , CUARTO DE BOMBAS, EQUIPOS Y TABLEROS**				**$ 292.028.793,00**		**$ 279.780.001,00**		**$ 279.780.001,00**		**$ 349.570.087,00**	**$ 69.790.086,00**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 349.570.087,00**	**100,00%**
44.01	05,04,01	CT01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 1.806.381,00	41,41	$ 74.802.237,00	44,89	$ 81.088.443,00	44,89	$ 81.088.443,00		$ -	-$ 81.088.443,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.02	05,04,02	CT02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 2.170.448,00	39,79	$ 86.362.126,00	47,44	$ 102.966.053,00	47,44	$ 102.966.053,00		$ -	-$ 102.966.053,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.03	05,05,01	A01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.992,00	14.553,43	$ 130.864.430,00	10645,63	$ 95.725.505,00	10645,63	$ 95.725.505,00	38875,676970	$ 349.570.087,00	$ 253.844.582,00		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	38.875,68	$ 349.570.087,00	100,00%
			CUARTO BOMBAS				**$ 230.168.726,00**		**$ 233.925.871,00**		**$ 43.658.887,00**		**$ 43.658.887,00**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 43.658.887,00**	**100,00%**
44.04	17,01,01	HIS81	TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 169.906,00	18,10	$ 3.075.299,00	18,10	$ 3.075.299,00	18,10	$ 3.075.299,00	18,10	$ 3.075.299,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	18,10	$ 3.075.299,00	100,00%
44.05	17,01,02	HIS82	ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 2"	UND	$ 51.076,00	29,00	$ 1.481.204,00	29,00	$ 1.481.204,00	29,00	$ 1.481.204,00	29,00	$ 1.481.204,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	29,00	$ 1.481.204,00	100,00%
44.06	17,01,03	HIS83	TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1.1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 114.893,00	28,00	$ 3.217.004,00	28,00	$ 3.217.004,00	28,00	$ 3.217.004,00	28,00	$ 3.217.004,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	28,00	$ 3.217.004,00	100,00%
44.07	17,01,04	HIS84	ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1.1/2"	UND	$ 41.228,00	30,00	$ 1.236.840,00	337,00	$ 13.893.836,00	337,00	$ 13.893.836,00	337,00	$ 13.893.836,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	337,00	$ 13.893.836,00	100,00%
44.08	17,01,05	HIS85	TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 90.296,00	14,00	$ 1.264.144,00	14,00	$ 1.264.144,00	14,00	$ 1.264.144,00	14,00	$ 1.264.144,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14,00	$ 1.264.144,00	100,00%
44.09	17,01,06	HIS86	ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1.1/4"	UND	$ 34.360,00	14,00	$ 481.040,00	14,00	$ 481.040,00	14,00	$ 481.040,00	14,00	$ 481.040,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14,00	$ 481.040,00	100,00%
44.10	17,01,07	HIS87	TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 58.068,00	10,00	$ 580.680,00	10,00	$ 580.680,00	10,00	$ 580.680,00	10,00	$ 580.680,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	10,00	$ 580.680,00	100,00%
44.11	17,01,08	HIS88	ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1"	UND	$ 24.348,00	22,00	$ 535.656,00	32,00	$ 779.136,00	32,00	$ 779.136,00	32,00	$ 779.136,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	32,00	$ 779.136,00	100,00%
44.12	17,01,09	HIS89	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 2"	UND	$ 409.880,00	6,00	$ 2.459.280,00	6,00	$ 2.459.280,00	6,00	$ 2.459.280,00	6,00	$ 2.459.280,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 2.459.280,00	100,00%
44.13	17,01,10	HIS90	CHEQUE Ø 1,1/2"	UND	$ 276.939,00	4,00	$ 1.107.756,00	4,00	$ 1.107.756,00	4,00	$ 1.107.756,00	4,00	$ 1.107.756,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	4,00	$ 1.107.756,00	100,00%
44.14	17,01,11	HIS91	CHEQUE Ø 1,1/4"	UND	$ 207.113,00	1,00	$ 207.113,00	1,00	$ 207.113,00	1,00	$ 207.113,00	1,00	$ 207.113,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 207.113,00	100,00%
44.15	17,01,12	HIS92	VÁLVULA DE PIE Ø 1.1/2"	UND	$ 71.407,00	2,00	$ 142.814,00	2,00	$ 142.814,00	2,00	$ 142.814,00	2,00	$ 142.814,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 142.814,00	100,00%
44.16	17,01,13	HIS93	VÁLVULA DE PIE Ø 2"	UND	$ 194.837,00	2,00	$ 389.674,00	2,00	$ 389.674,00	2,00	$ 389.674,00	2,00	$ 389.674,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 389.674,00	100,00%
44.17	17,01,14	HIS94	COPA CONCÉNTRICA EN ACERO SCH 10 Ø 2"X1,1/2"	UND	$ 22.434,00	6,00	$ 134.604,00	6,00	$ 134.604,00	6,00	$ 134.604,00	6,00	$ 134.604,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 134.604,00	100,00%
44.18	17,01,15	HIS95	BRIDA ACERO ROSCAR Ø 1.1/2". INCLUYE TORNILLOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND	$ 92.007,00	14,00	$ 1.288.098,00	14,00	$ 1.288.098,00	14,00	$ 1.288.098,00	14,00	$ 1.288.098,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14,00	$ 1.288.098,00	100,00%
44.19	17,01,16	HIS96	JUNTAS DE EXPANSIÓN BORRACHA Ø 1,1/2"	UND	$ 165.926,00	7,00	$ 1.161.482,00	7,00	$ 1.161.482,00	7,00	$ 1.161.482,00	7,00	$ 1.161.482,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,00	$ 1.161.482,00	100,00%
44.20	17,01,17	HIS97	NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 3/4". LONGITUD DE 30CM	UND	$ 48.995,00	1,00	$ 48.995,00	1,00	$ 48.995,00	1,00	$ 48.995,00	1,00	$ 48.995,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 48.995,00	100,00%
44.21	17,01,18	HIS101	TUBERÍA PVC.P Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 57.400,00	19,00	$ 1.090.600,00	19,00	$ 1.090.600,00	19,00	$ 1.090.600,00	19,00	$ 1.090.600,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	19,00	$ 1.090.600,00	100,00%
44.22	17,01,19	HIS102	ACCESORIOS PVC.P Ø 3"	UND	$ 66.648,00	22,00	$ 1.466.256,00	22,00	$ 1.466.256,00	22,00	$ 1.466.256,00	22,00	$ 1.466.256,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	22,00	$ 1.466.256,00	100,00%
44.23	17,01,20	HIS103	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3"	UND	$ 798.540,00	2,00	$ 1.597.080,00	2,00	$ 1.597.080,00	2,00	$ 1.597.080,00	2,00	$ 1.597.080,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 1.597.080,00	100,00%
44.24	17,01,21	HIS104	CHEQUE Ø 3"	UND	$ 486.560,00	2,00	$ 973.120,00	2,00	$ 973.120,00	2,00	$ 973.120,00	2,00	$ 973.120,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 973.120,00	100,00%
44.25	17,01,22	HS-212	VÁLVULA DE PIE Ø 1"	UND	$ 73.110,00	1,00	$ 73.110,00	1,00	$ 73.110,00	1,00	$ 73.110,00	1,00	$ 73.110,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 73.110,00	100,00%
44.26	17,01,23	HS-278	MICROMEDIDOR 3/4"	UND	$ 349.887,00	1,00	$ 349.887,00	1,00	$ 349.887,00	1,00	$ 349.887,00	1,00	$ 349.887,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 349.887,00	100,00%
44.27	16,02,04	HS-221	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLAS NEBULIZADORAS CERRADA HI-FOG	UND	$ 304.891,00	366,00	$ 111.590.106,00	368,00	$ 112.199.888,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.28	16,02,05	HS-222	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLAS NEBULIZADORAS ABIERTA HI-FOG	UND	$ 938.047,00	2,00	$ 1.876.094,00	10,00	$ 9.380.470,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.29	16,02,07	HS-226	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DE CONTROL MARCA HI-FOG MODELO SBA-40, CÓDIGO DO6151 CON INDICADOR DE PASO DE AGUA, MANÓMETRO, TOMA DE PRUEBAS Y VÁLVULA SUPERVISADA DE CIERRE Y APERTURA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERÍA DE 30 MM	UND	$ 12.452.192,00	3,00	$ 37.356.576,00	2,00	$ 24.904.384,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.30	16,02,08	HS-227	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA ELECTROVÁLVULA SELECTORA MARCA HIG-FOG MODELO SVM-12 CÓDIGO D01550.1 SIN ENCLAVAMIENTO, EQUIPADA CON SOLENOIDE (24 V DC, 900 MA) Y ACTUADOR DE APERTURA MANUAL DE EMERGENCIA CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERÍA DE 12 MM.	UND	$ 6.254.606,00	7,00	$ 43.782.242,00	7,00	$ 43.782.242,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.31	17,02,01	HIS147	ACOPLES Ø 2"	UND	$ 100.829,00	14,00	$ 1.411.606,00	14,00	$ 1.411.606,00	14,00	$ 1.411.606,00	14,00	$ 1.411.606,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	14,00	$ 1.411.606,00	100,00%
44.32	17,02,02	HS-229	VÁLVULA MARIPOSA Ø 4"	UND	$ 686.471,00	10,00	$ 6.864.710,00	3,00	$ 2.059.413,00	3,00	$ 2.059.413,00	3,00	$ 2.059.413,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 2.059.413,00	100,00%
44.33	17,02,03	HIS158	CHEQUE Ø 2"	UND	$ 695.452,00	3,00	$ 2.086.356,00	3,00	$ 2.086.356,00	3,00	$ 2.086.356,00	3,00	$ 2.086.356,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	3,00	$ 2.086.356,00	100,00%
44.34	17,02,04	HIS159	PLACA ANTIOVORTICE Ø 4" EN ACERO AL CARBÓN	UND	$ 716.610,00	1,00	$ 716.610,00	1,00	$ 716.610,00	1,00	$ 716.610,00	1,00	$ 716.610,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 716.610,00	100,00%
44.35	17,02,05	HIS160	MANÓMETRO CON CARATULA 2.5" CON GLICERINA	UND	$ 61.345,00	2,00	$ 122.690,00	2,00	$ 122.690,00	2,00	$ 122.690,00	2,00	$ 122.690,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2,00	$ 122.690,00	100,00%
			RED GENERAL AGUA INCENDIO				**$ 18.167.978,00**		**$ 28.720.089,00**		**$ -**		**$ -**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**
44.36	16,02,01	HIS138	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 1,1/2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 68.363,00	10,90	$ 745.157,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.37	16,02,02	HIS139	ACCESORIOS RANURADOS ACERO Ø 1.1/2"	UND	$ 100.491,00	10,00	$ 1.004.910,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.38	16,02,03	HS-219	EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO 10LBS	UND	$ 357.852,00	6,00	$ 2.147.112,00	6,00	$ 2.147.112,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.39	16,02,06	HS-223	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 1/2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 19.317,00	621,10	$ 11.997.789,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.40		**NP029**	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 1" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	ML	$ 36.542,00		$ -	727,19	$ 26.572.977,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.41	16,02,09	HS-228	ENCAMISADO PARA TUBERÍA A. INOXIDABLE	M	$ 151.534,00	15,00	$ 2.273.010,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%

			EQUIPOS					**$ 623.060.442,00**		**$ 1.886.589.338,00**		**$ 44.267,00**		**$ 44.267,00**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 44.267,00**	**100,00%**
44.42	17,03,01	HI5133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 15 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO	UND	$ 18.885.987,00	1,00	$ 18.885.987,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.43	17,03,02	HI5134	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 30 + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO	UND	$ 21.661.624,00	1,00	$ 21.661.624,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.44	17,03,03	HI5135	SISTEMA DE BOMBEO DE RECIRCULACIÓN AGUAS LLUVIAS. SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 15 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO Q=14GPM, H=34PSI + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO	UND	$ 18.595.988,00	1,00	$ 18.595.988,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.45	17,03,04	HS-264	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO LISTADO CERTIFICADO UL/FM ÁRA AGUA NEBULIZADA HIFOG 11000GPM@ 2050 PSI + TABLERO DE CONTROL CON TRANSFERENCIA LISTADA+ BOMBA JOCKEY+ TABLERO BOMBA JOCKEY	UND	$ 545.553.628,00	1,00	$ 545.553.628,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.46	17,03,05	HI5137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA EYECTOR COMPUESTO POR DOS BOMBAS EYECTORAS GQSM 50 -6-60 + TABLERO ARRANQUE DIRECTO CON ADICIÓN Y ALTERNACIÓN Y FLOTADOR DE NIVEL POR BOMBA	UND	$ 9.874.183,00	1,00	$ 9.874.183,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.47	17,03,06	HS-234	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPÓSITO ATMOSFÉRICO ADJUABLOCK PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TAPA SUPERIOR DE DN250 Y POSIBILIDAD DE MONTAR BOYA CON FLOTADOR Y/O REBOSADERO CON MEDIDAS 2200*990*1565 Y UNA CAPACIDAD DE 3000 LITROS	UND	$ 8.444.765,00	1,00	$ 8.444.765,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.48		**NP030**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRUPO DE BOMBEO MODULAR DE AGUA NEBULIZADA MARCA HI-FOG® MODELO LPU05 CON UN CAUDAL TOTAL DE 439 LPM, COMPUESTO POR 05 BOMBAS DE PISTONES, PRESIÓN MÁXIMA DE 140 BAR, MOVIDAS POR CINCO MOTORES ELÉCTRICOS (440 V AC, 60 HZ, 27,0 KW CADA UNO), COLECTOR DE PRUEBAS E INSTRUMENTACIÓN COMPLETA, TODO EL CONJUNTO MONTADO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA. SE INCLUYE APARTE CUADRO DE CONTROL DEL GRUPO DE BOMBAS.MOTORES CON VARIADOR DE VELOCIDAD POR MOTOR.	UN	$ 879.461.380,00		$ -	1,00	$ 879.461.380,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.49		**NP031**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE ACERO INOXIDABLE MARCA HI-FOG MODELO BIH-12 PARA TUBERÍA DE 12 MM CON LIMIT SWITCH, CÓDIGO D30005.1 PARA PURGA DE LA INSTALACIÓN.	UN	$ 1.963.252,00		$ -	7,00	$ 13.742.764,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.50		**NP032**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PREACCION MARCA Hi-FOG® MODELO SVM-20 (25/25), CÓDIGO D00050.1 CON INDICADOR DE PASO DE AGUA, MANOMETRO, TOMA DE PRUEBAS Y VÁLVULA SUPERVISADA DE CIERRE Y APERTURA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERÍA DE 30 MM. INCLUYE COMPRESOR.	UN	$ 13.365.963,00		$ -	2,00	$ 26.731.926,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.51		**NP033**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DI-METRO EXTERIOR 30 MM X 2,5 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEG N DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS)	ML	$ 402.060,00		$ -	732,64	$ 294.565.238,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.52		**NP034**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DI-METRO EXTERIOR 25 MM X 2,0 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEG N DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS)	ML	$ 324.785,00		$ -	19,33	$ 6.278.094,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.53		**NP035**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DI-METRO EXTERIOR 12 MM X 1,2 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEG N DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS)	ML	$ 166.225,00		$ -	636,44	$ 105.792.239,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.54		**NP036**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE DE 43,15M3 (SEGÚN EL ESQUEMA), CONSTRUIDO CON LINER EN CRISTALÁN 870 DE ANDERCOL (ISOFTÁLICA) Y RESINA CRISTALÁN 805 DE ANDERCOL(ORTOFTÁLICA)	und	$ 59.973.430,00		$ -	1,00	$ 59.973.430,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.55	17,04,01	HS-190	DESINFECCIÓN SISTEMA	UND	$ 44.267,00	1,00	$ 44.267,00	1,00	$ 44.267,00	1,00	$ 44.267,00	1,00	$ 44.267,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	1,00	$ 44.267,00	100,00%
			TABLEROS					**$ 88.647.097,00**		**$ 88.647.097,00**		**$ -**		**$ -**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**
44.56	13,02,01	ELE025	TRANSFERENCIA GENERAL MOTORIZADA CON BREAKERS DE 3X250 AMP. INCLUYE TGD NO 1, FABRICADO EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 16 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON PROTECCIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL. CON BARRAJES DE FASE, NEUTRO Y TIERRA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS POR EL DIAGRAMA UNIFILAR.	UND	$ 32.898.130,00	1,00	$ 32.898.130,00	1,00	$ 32.898.130,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.57	13,02,02	ELE026	EQUIPO DE MEDIDA BAJA TENSIÓN NORMA AE319 ENEL CODENSA DE DIMENSIONES 200X80X40 CM,INCLUYE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y BREAKER TOTALIZADORES DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR	UND	$ 10.143.872,00	1,00	$ 10.143.872,00	1,00	$ 10.143.872,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.58	13,02,03	ELE027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE.	UND	$ 672.026,00	3,00	$ 2.016.078,00	3,00	$ 2.016.078,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.59	13,02,04	ELE029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND	$ 744.071,00	2,00	$ 1.488.142,00	2,00	$ 1.488.142,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.60	13,02,05	ELE031	GABINETE METÁLICO CERTIFICADO PARA BOMBAS, AGUA POTABLE, SANITARIA Y LLUVIAS. DIMENSIONES 60X60X30 CM, CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TIPO INDUSTRIAL 3-3X20A. INCLUYE MATERIAL DE FABRICACIÓN, INCLUYE PUERTA, DPS, BARRAJES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO	UND	$ 3.960.538,00	1,00	$ 3.960.538,00	1,00	$ 3.960.538,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.61	13,02,06	ELE032	BREAKER TIPO INDUSTRIAL ICC: 25KA, 3X20A HASTA 3X60 A	UND	$ 299.336,00	10,00	$ 2.993.360,00	10,00	$ 2.993.360,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.62	13,02,07	ELE033	BREAKER ENCHUFABLE ICC:10KA. 1X20A.	UND	$ 20.590,00	74,00	$ 1.523.660,00	74,00	$ 1.523.660,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.63	13,02,08	ELE053	GABINETE METÁLICO PARA CONTROL ILUMINACIÓN POR MEDIO DE CONTACTORES DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE MATERIAL DE FABRICACIÓN, PUERTA, BARRAJES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑOS.	UND	$ 4.669.019,00	1,00	$ 4.669.019,00	1,00	$ 4.669.019,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.64	13,08,01	ELE133	CERTIFICACIONES RETIE	UND	$ 14.477.149,00	1,00	$ 14.477.149,00	1,00	$ 14.477.149,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
44.65	13,08,02	ELE134	CERTIFICACIÓN RETILAP	UND	$ 14.477.149,00	1,00	$ 14.477.149,00	1,00	$ 14.477.149,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		45	**OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES**					**$ 449.902.959,00**		**$ 552.564.264,00**		**$ 348.842.531,00**		**$ 348.842.531,00**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 348.842.531,00**	**100,00%**
45.01	24.01.01	BIM005	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES (10%, DIEZ PORCIENTO PARA ESTE COMPONENTE)	UND	$ 693.676.269,00	0,10	$ 69.367.627,00	0,10	$ 69.367.627,00	0,10	$ 69.367.627,00	0,10	$ 69.367.627,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	0,10	$ 69.367.627,00	100,00%
45.02	02.01.05	PRE005	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES (6 MESES PARA ESTE COMPONENTE)	MES	$ 1.762.788,00	6,00	$ 10.576.728,00	6,00	$ 10.576.728,00	6,00	$ 10.576.728,00	6,00	$ 10.576.728,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	6,00	$ 10.576.728,00	100,00%
45.03	02.01.12	PRE012	CONTROL DE ROEDORES CON CEBO Y RATICIDA (150 UNIDADES PARA ESTE COMPONENTE)	UND	$ 32.177,00	150,00	$ 4.826.550,00	50,00	$ 1.608.850,00	50,00	$ 1.608.850,00	50,00	$ 1.608.850,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	50,00	$ 1.608.850,00	100,00%
45.04		**NP037**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVA EN LA LAVADA N.P 2 PARA PISOS EXTERIORES	M2	$ 59.825,00		$ -	103,81	$ 6.210.413,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
45.05	02.01.19	PRE020	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ÁRBOL. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO, TUTOR Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	UND	$ 224.368,00	1,00	$ 224.368,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
45.06	10,02,03	PYE003	ANDÉN ACABADO EN CONCRETO ESCOBILLADO. E=15CM - COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON RECEBO COMÚN.	M2	$ 461.476,00	329,94	$ 152.257.546,00	546,40	$ 252.150.486,00	546,40	$ 252.150.486,00	546,40	$ 252.150.486,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	546,40	$ 252.150.486,00	100,00%
45.07	10,02,04	PYE004	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO A81 (15X35X80CM)	M	$ 58.334,00	259,52	$ 15.138.840,00	259,52	$ 15.138.840,00	259,52	$ 15.138.840,00	259,52	$ 15.138.840,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	259,52	$ 15.138.840,00	100,00%
45.08	22.01.01	UR001	OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)	GLB	$ 197.511.300,00	1,00	$ 197.511.300,00	1,00	$ 197.511.300,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
		46	**ASEO, REMATES Y NP**				**$ 106.005.134,00**		**$ 109.964.331,00**		**$ 77.431.044,00**		**$ 77.431.044,00**	**$ -**		**$ -**	**0,00%**		**$ -**	**0,00%**		**$ 77.431.044,00**	**100,00%**
46.01	19,04,01	GR01	ASEO FINAL GENERAL	M2	$ 3.864,00	5.650,88	$ 21.835.000,00	5650,88	$ 21.835.000,00	5650,88	$ 21.835.000,00	5650,88	$ 21.835.000,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	5.650,88	$ 21.835.000,00	100,00%
46.02	19,04,02	GR02	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 27.020,00	300,51	$ 8.119.780,00	270,33	$ 7.304.317,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
46.03	19,04,04	GR04	REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO	M2	$ 360.411,00	70,00	$ 25.228.770,00	70,00	$ 25.228.770,00		$ 0,00		$ -	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	-	$ -	0,00%
46.04	02.01.12	PRE012	CONTROL DE ROEDORES CON CEBO Y RATICIDA. (SALDO. PARA ESTE COMPONENTE)	UND	$ 32.177,00	173,00	$ 5.566.621,00	50,00	$ 1.608.850,00	50,00	$ 1.608.850,00	50,00	$ 1.608.850,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	50,00	$ 1.608.850,00	100,00%
46.05	02.01.05	PRE005	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES (SALDO EN MESES PARA ESTE COMPONENTE)	MES	$ 1.762.788,00	7,00	$ 12.339.516,00	7,00	$ 12.339.516,00	7,00	$ 12.339.516,00	7,00	$ 12.339.516,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	7,00	$ 12.339.516,00	100,00%
46.06	19,04,03	GR03	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 15.942,00	2.064,70	$ 32.915.447,00	2612,45	$ 41.647.678,00	2612,45	$ 41.647.678,00	2612,45	$ 41.647.678,00	$ -		$ -	0,00%	-	$ -	0,00%	2.612,45	$ 41.647.678,00	100,00%

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los item)		**$ 10.602.930.108.00**	**$ 17.474.944.451.00**	**$ 10.602.930.108.00**	**$ 10.602.930.108.00**	**$ 677.052.111.00**	**6,39%**	**$ 1.658.578.035.00**	15,64%	**$ 8.944.352.073.00**	84,36%
IPC MES - DICIEMBRE 2025						**152,27**					
IPC DIC 2024						**144,88**					
COSTO DIRECTO - CD (95% del sub total costos directos)						**$ 676.007.653,00**		**$ 1.648.797.995,00**			
ADMINISTRACIÓN	32%	$ 3.392.937.635,00	$ 5.591.982.224,00	$ 3.392.937.635,00	$ 3.392.937.635,00	**$ 216.322.449,00**		$ 527.615.358,00		$ 2.862.192.663,00	
IMPREVISTOS	1%	$ 106.029.301,00	$ 174.749.445,00	$ 106.029.301,00	$ 106.029.301,00	**$ 6.760.077,00**		$ 16.487.980,00		$ 89.443.521,00	
UTILIDAD	5%	$ 530.146.505,00	$ 873.747.223,00	$ 530.146.505,00	$ 530.146.505,00	**$ 33.800.383,00**		$ 82.439.900,00		$ 447.217.604,00	
IVA UTILIDAD	19%	$ 100.727.836,00	$ 166.011.972,00	$ 100.727.836,00	$ 100.727.836,00	**$ 6.422.072,77**		$ 15.663.580,77		$ 84.971.345,00	
VALOR DE LA RETRIBUCIÓN - VR		**$ 14.732.771.385,00**	**$ 24.281.435.315,00**	**$ 14.732.771.385,00**	**$ 14.732.771.385,00**	**$ 939.312.634,77**		**$ 2.291.004.813,77**		**$ 12.428.177.206,00**	
VALOR PARA AJUSTES IPC 2025		$ 892.869.815,00	$ 892.869.815,00	$ 892.869.815,00	$ 892.869.815,00	**$ 45.586.920,00**	**5,11%**	$ 104.480.295,00	11,70%	$ 788.389.520,00	88,30%
VALOR PARA AJUSTES IPC 2026		$ 194.056.635,00	$ 194.056.635,00	$ 194.056.635,00	$ 194.056.635,00		**0,00%**		0,00%	$ 194.056.635,00	100,00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 15.819.697.835,00**	**$ 25.368.361.765,00**	**$ 15.819.697.835,00**	**$ 15.819.697.835,00**						
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO		**$ 7.366.385.693,00**	**$ 7.366.385.693,00**	**$ 7.366.385.693,00**	**$ 7.366.385.693,00**						
ANA -VALOR DEL ANTICIPO A LA FECHA DE CORTE						**$ 6.659.751.474,00**					
RP - VALOR RETRIBUCIÓN PENDIENTE POR CANCELAR PRESENTE ACTA						**$ 13.381.079.206,00**					
VALOR DE LA AMORTIZACIÓN - VAA - AM						**$ 491.340.944,00**	**6,67%**	**$ 1.197.975.163,00**	16,26%	**$ 6.168.410.530,00**	83,74%
VALOR EFECTIVO A PAGAR - VP EN LA PRESENTE ACTA						**$ 447.971.690,77**					

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ASTRID DIAZ CABEZAS
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
CONSTRUCTOR

KAROL STEFANY RAMIREZ MENA
REPRESENTANTE LEGAL IBP INGENIERIA SAS
INTERVENTOR

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 001

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
INTERVENTOR: IBP INGENIERIA SAS

CONTRATO No: 4346-2024
VALOR: $ 14.732.771.385,00

OBRA: CAPILLA CONVENTO
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: (01/11/25) - (31/01/26)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					MAYORES (+) & MENORES (-)						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (31/01/2026)		JUSTIFICACIÓN
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	MAYORES (+)		MENORES (-)	MAYORES (+)		MENORES (-)	CANT	V. TOTAL	
	ETAPA 1													
	PRECONSTRUCCIÓN - ESTUDIOS DE DETALLE													
01.01.01	APROPIACIÓN DE DISEÑOS	M2	$ 48.561,00	2.122,99	$ 103.094.368,00	129,13	+	0,00	$ 6.270.831,00	+	$ 0,00	2.252,120	$ 109.365.199,00	
01.01.02	VERIFICACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL INMUEBLE	UND	$ 9.405.300,00	1,00	$ 9.405.300,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	1,000	$ 9.405.300,00	
	ETAPA 2													
	PRELIMINARES ETAPA 1													
24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y MODELADORES (15%, QUINCE PORCIENTO PARA ESTE COMPONENTE)	UND	$ 693.676.269,00	0,15	$ 104.051.440,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,150	$ 104.051.440,00	
	EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA Y ESTUDIO DE SUELOS COMPLEMENTARIO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE RESTAURACIÓN DEL EDIFICIO CAPILLA Y CONVENTO (INCLUYE PERFORACIONES Y LABORATORIOS)	GL	C$ 32.000.000,00		$ 0,00	1,00	+	0,00	$ 32.000.000,00	+	$ 0,00	1,000	$ 32.000.000,00	
	RETIRO DE PAÑETES PATRIMONIALES CON HERRAMIENTAS MANUALES, INCLUYE DISPOSICION FINAL	m2	$ 50.680,00		$ 0,00	1.292,88	+	0,00	$ 65.523.158,00	+	$ 0,00	1.292,880	$ 65.523.158,00	
02.01.20	PROTECCIÓN DE ÁRBOLES EN EL PERIMETRO DE LA INTERVENCIÓN. H=1 M	UND	$ 24.518,00	8,00	$ 196.144,00	21,00	+	0,00	$ 514.878,00	+	$ 0,00	29,000	$ 711.022,00	
02.01.04	VALLA INFORMATIVA EN LONA DE 2,50X1,5M. IMPRESA FULL COLOR. ESTRUCTURA EN MADERA. (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN, INCLUYE DESMOTE Y RETIRO A LA TERMINACION DE LA OBRA)	UND	$ 582.920,00	1,00	$ 582.920,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	1,000	$ 582.920,00	
02.01.09	CONTROL DE ACCESO PROVISIONAL DE OBRA, CASETA DE CELADURÍA.	UND	$ 3.322.955,00	1,00	$ 3.322.955,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	1,000	$ 3.322.955,00	
02.01.10	ASEO INICIAL, RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	$ 5.050,00	5.650,88	$ 28.536.944,00	0,00	-	-535,52	$ 0,00	-	-$ 2.704.376,00	5.115,360	$ 25.832.568,00	
02.01.11	FUMIGACIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO CON HERBICIDA. INCLUYE RETIRO DE MALEZA EN LAS FACHADAS	M2	$ 1.759,00	5.650,88	$ 9.939.898,00	0,00	-	-535,52	$ 0,00	-	-$ 941.980,00	5.115,360	$ 8.997.918,00	
02.01.23	DISEÑO ESTRUCTURAL SOBRE CUBIERTA TEMPORAL	M2	$ 2.808,00	2.064,70	$ 5.797.678,00	547,75	+	0,00	$ 1.538.082,00	+	$ 0,00	2.612,450	$ 7.335.760,00	
02.01.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL AGUA POTABLE	GLB	$ 4.745.636,00	1,00	$ 4.745.636,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	1,000	$ 4.745.636,00	
02.01.16	INVENTARIO FORESTAL PARA INDIVIDUOS ARBÓREOS, INCLUYE: ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS, PLANOS GEORREFERENCIADOS, CONSIGNACIÓN PAGO POR EVALUACIÓN Y RADICACIÓN DE DOCUMENTOS ANTE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE	UND	$ 134.459,00	8,00	$ 1.075.672,00	21,00	+	0,00	$ 2.823.639,00	+	$ 0,00	29,000	$ 3.899.311,00	
02.01.17	TALA DE ÁRBOL <5M. INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	UND	$ 197.115,00	1,00	$ 197.115,00	0,00	-	-1,00	$ 0,00	-	-$ 197.115,00	0,000	$ 0,00	
02.01.18	TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE 1 A 5 METROS. INCLUYE TRANSPORTE	UND	$ 940.530,00	2,00	$ 1.881.060,00	0,00	-	-2,00	$ 0,00	-	-$ 1.881.060,00	0,000	$ 0,00	
02.01.02	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON ESTRUCTURA METÁLICA, LÁMINA GALVANIZADA LISA CON BAÑO DE ZINC Y ROTULACIÓN CON VINILO LAMINADO	M	$ 233.653,00	300,51	$ 70.215.063,00	0,00	-	-30,18	$ 0,00	-	-$ 7.051.648,00	270,330	$ 63.163.415,00	
02.01.03	CONSTRUCCIÓN CAMPAMENTO DE OBRA. INCLUYE CERRAMIENTO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DESMONTABLE, REDES ELÉCTRICAS PROVISIONALES Y LOS DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO USO Y FUNCIONAMIENTO	M2	$ 244.203,00	80,00	$ 19.536.240,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	80,000	$ 19.536.240,00	
02.01.06	PUERTA DOBLE HOJA EN LÁMINA TEJA DE ZINC 6,00X2,40 M Y ESTRUCTURA EN MADERA. PARA ACCESO DE OBRA	UND	$ 603.944,00	1,00	$ 603.944,00	1,00	+	0,00	$ 603.944,00	+	$ 0,00	2,000	$ 1.207.888,00	
02.01.07	PUERTA PROVISIONAL DE ACCESO PEATONAL 1,00X2,40M EN LÁMINA TEJA DE ZINC Y ESTRUCTURA EN MADERA	UND	$ 156.783,00	1,00	$ 156.783,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	1,000	$ 156.783,00	
02.01.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ALCANTARILLADO	GLB	$ 6.519.411,00	1,00	$ 6.519.411,00	0,00	-	-1,00	$ 0,00	-	-$ 6.519.411,00	0,000	$ 0,00	
02.01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PROVISIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA	GLB	$ 37.066.410,00	1,00	$ 37.066.410,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	1,000	$ 37.066.410,00	
03,02,02	DEMOLICIÓN DE TODO TIPO DE PAÑETES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 12.392,00	1.144,58	$ 14.183.635,00	951,91	+	0,00	$ 11.796.069,00	+	$ 0,00	2.096,490	$ 25.979.704,00	
03.01.01	RETIRO DE PLAFÓN MACHIMBRADO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 21.540,00	247,12	$ 5.322.965,00	1.247,20	+	0,00	$ 26.864.688,00	+	$ 0,00	1.494,320	$ 32.187.653,00	
03.01.02	DESMONTAJE DE ACCESORIOS E INCRUSTACIONES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 3.783,00	50,00	$ 189.150,00	0,00	-	-2,00	$ 0,00	-	-$ 7.566,00	48,000	$ 181.584,00	
03.01.03	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE GRIFERÍA Y ELEMENTOS ADOSADOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 21.231,00	34,00	$ 721.854,00	14,00	+	0,00	$ 297.234,00	+	$ 0,00	48,000	$ 1.019.088,00	
03.01.05	DESMONTAJE DE DIVISIONES DE BAÑOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 4.455,00	27,99	$ 124.695,00	0,46	+	0,00	$ 2.049,00	+	$ 0,00	28,450	$ 126.745,00	
03.01.09	DESMONTAJE DE TANQUE AÉREO PLÁSTICO DE 1000 LT EN CUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 45.227,00	2,00	$ 90.454,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	2,000	$ 90.454,00	
03.01.18	RETIRO DE REFLECTORES EN SENDERO PERIMETRAL. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 6.571,00	15,00	$ 98.565,00	14,00	+	0,00	$ 91.994,00	+	$ 0,00	29,000	$ 190.559,00	
03.01.19	DESMONTAJE DE MESONES EN CONCRETO Y/O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE - METRO	M	$ 17.598,00	7,20	$ 126.706,00	6,00	+	0,00	$ 105.588,00	+	$ 0,00	13,200	$ 232.294,00	
03,02,03	DEMOLICIÓN ESCALERA EN MADERA, INCLUYE ESTRUCTURA Y DEMÁS ELEMENTOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 28.646,00	13,38	$ 383.226,00	0,00	-	-0,29	$ 0,00	-	-$ 8.250,00	13,090	$ 374.976,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 001

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
INTERVENTOR: IBP INGENIERIA SAS

CONTRATO No: 4346-2024
VALOR: $ 14.732.771.385,00

OBRA: CAPILLA CONVENTO
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: (01/11/25) - (31/01/26)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					MAYORES (+) & MENORES (-)						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (31/01/2026)		JUSTIFICACIÓN
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	MAYORES (+)		MENORES (-)	MAYORES (+)		MENORES (-)	CANT	V. TOTAL	
02.01.24	ADECUACIÓN DE VÍA PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. ANCHO 3,5 M. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO, ACABADO, SEÑALIZACIÓN, PALETERO Y LAS REPARACIONES NECESARIAS	M	$ 279.195,00	30,00	$ 8.375.850,00	28,23	+	0,00	$ 7.881.675,00	+	$ 0,00	58,230	$ 16.257.525,00	
	RETIRO, PROTECCION Y TRASCIEGO INTERNO DE SILLAS DE CAPILLA	UND	$ 101.875,00		$ 0,00	49,00	+	0,00	$ 4.991.875,00	+	$ 0,00	49,000	$ 4.991.875,00	
	RETIRO Y TRASCIEGO INTERNO DE GUACALES	UND	$ 366.494,00		$ 0,00	40,00	+	0,00	$ 14.659.760,00	+	$ 0,00	40,000	$ 14.659.760,00	
	DEMOLICION DE GUARDAESCOBA EN GRAVILLA Y/O MADERA Y/O CERAMICA	ml	$ 25.715,00		$ 0,00	776,97	+	0,00	$ 19.979.784,00	+	$ 0,00	776,970	$ 19.979.784,00	
	LEVANTAMIENTO MANUAL DE PISOS PATRIMONIALES (BALDOSA HIDRÁULICA, PIEDRA, MOSAICO) INCLUYE PROTECCION Y ACOPIO PROVISIONAL	M2	$ 158.443,00		$ 0,00	604,80	+	0,00	$ 95.826.326,00	+	$ 0,00	604,800	$ 95.826.326,00	
	MEJORAMIENTO DE VÍA EN RECEBO COMPACTADO, ESTABILIZADO CON CEMENTO CAPA DE 7CM DE ESPESOR.	M2	$ 88.416,00		$ 0,00	344,24	+	0,00	$ 30.436.324,00	+	$ 0,00	344,240	$ 30.436.324,00	
	PRELIMINARES ETAPA 2													
02.01.21	DESINFECCIÓN INICIAL ÁREAS DE TRABAJO POR MEDIO DE AGUA, JABÓN NEUTRO. ÁCIDO MURIÁTICO Y/O ÁCIDO OXÁLICO	M2	$ 4.007,00	5.650,88	$ 22.643.076,00	0,00	-	-3398,76	$ 0,00	-	-$ 13.618.831,00	2.252,120	$ 9.024.245,00	
02.01.08	CÁRCAMO LAVA LLANTAS ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO CON SECCIÓN EXTERNA DE 60X60CM Y SECCIÓN INTERNA 30X50CM. INCLUYE FORMALETA. REJILLA METÁLICA Y REFUERZO	M	$ 847.032,00	10,00	$ 8.470.320,00	0,00	-	-10,00	$ 0,00	-	-$ 8.470.320,00	0,000	$ 0,00	
02.01.25	MANEJO DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS SUBTERRANEAS Y/O NIVEL FREÁTICO	M	$ 648.010,00	37,00	$ 23.976.370,00	0,00	-	-17,00	$ 0,00	-	-$ 11.016.170,00	20,000	$ 12.960.200,00	
02.01.26	PROTECCIÓN Y/O REFUERZOS ESTRUCTURALES PROVISIONALES DEL ÓRGANO Y ARMÓNIOS PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA	GLB	$ 30.096.960,00	1,00	$ 30.096.960,00	0,00	-	-1,00	$ 0,00	-	-$ 30.096.960,00	0,000	$ 0,00	
	DEMOLICION DE ALFAJIAS EN CONCRETO ALTURA NO MAYOR A 6METROS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	ml	$ 80.784,00		$ 0,00	220,95	+	0,00	$ 17.849.225,00	+	$ 0,00	220,950	$ 17.849.225,00	
	DESMONTAJE DE CAMPANA PEQUEÑA UBICADA EN CUBIERTA DE TORRE CAMPANARIO (ALTURA 18 m). INCLUYE LIMPIEZA, RETIRO, EMBALAJE Y TRASLADO A SITIO DE ALMACENAMIENTO AUTORIZADO POR EL CLIENTE.	und	$ 1.331.414,00		$ 0,00	2,00	+	0,00	$ 2.662.828,00	+	$ 0,00	2,000	$ 2.662.828,00	
	TALA Y ESTACONAMIENTO DE INDIVIDUO ARBOREO H= 15M A 20M INCLUYE RETIRO	UND	$ 6.426.000,00		$ 0,00	3,00	+	0,00	$ 19.278.000,00	+	$ 0,00	3,000	$ 19.278.000,00	
	DESMONTAJE, DOCUMENTACIÓN Y ACCIONES DE CONSERVACIÓN DEL ÓRGANO TUBULAR UBICADO EN LA CAPILLA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS	UN	$ 126.046.630,00		$ 0,00	1,00	+	0,00	$ 126.046.630,00	+	$ 0,00	1,000	$ 126.046.630,00	
02.01.05	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES (6 MESES PARA ESTE COMPONENTE)	MES	$ 1.762.788,00	6,00	$ 10.576.728,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	6,000	$ 10.576.728,00	
	PRELIMINARES BIENES MUEBLES													
20.01.01	ADECUACIÓN DE TALLER PARA PROCESOS DE RESTAURACIÓN	M2	$ 278.284,00	60,00	$ 16.697.040,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	60,000	$ 16.697.040,00	
20.01.02	DESMONTE Y TRASLADO DE PANELES DE VITRAL AL TALLER, INCLUYE CAJA DE ALMACENAMIENTO	UND	$ 110.626,00	292,00	$ 32.302.792,00	12,00	+	0,00	$ 1.327.512,00	+	$ 0,00	304,000	$ 33.630.304,00	
20.06.01	DESMONTE DE LA LAMPARA DE PARED DEL LUGAR DE UBICACIÓN	UND	$ 179.636,00	14,00	$ 2.514.904,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	14,000	$ 2.514.904,00	
20.05.02	EMBALAJE RÍGIDO PARA PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES	UND	$ 173.532,00	14,00	$ 2.429.448,00	1,00	+	0,00	$ 173.532,00	+	$ 0,00	15,000	$ 2.602.980,00	
20.06.03	REGISTRO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA	UND	$ 190.367,00	14,00	$ 2.665.138,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	14,000	$ 2.665.138,00	
20.05.01	DESMONTE DE LA LAMPARA DEL LUGAR DE UBICACIÓN	UND	$ 510.309,00	1,00	$ 510.309,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	1,000	$ 510.309,00	
20.05.02	EMBALAJE RÍGIDO PARA PROTECCIÓN TEMPORAL DE BIENES MUEBLES	UND	$ 173.532,00	1,00	$ 173.532,00	0,00	-	-1,00	$ 0,00	-	-$ 173.532,00		$ 0,00	
20.05.03	REGISTRO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LÁMPARA EN TECHO DE CAPILLA	UND	$ 285.550,00	1,00	$ 285.550,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	1,000	$ 285.550,00	
	RETIRO, PROTECCION Y TRASCIEGO INTERNO DE MUEBLES LITURGICOS ENTRE EL EDIFICIO CAPILLA CONVENTO Y EL EDIFICIO UVO REQUIERE DESARMADO EN SITIO MEDIDAS (3MX1,2MX1,2M)	UND	$ 443.296,00		$ 0,00	9,00	+	0,00	$ 3.989.664,00	+	$ 0,00	9,000	$ 3.989.664,00	
02.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN TEJA LÁMINA DE ZINC C35. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA METÁLICA DEBIDAMENTE SOLDADA Y PINTADA, CONCRETO Y ACERO PARA PEDESTALES	M2	$ 254.215,00	2.064,70	$ 524.877.711,00	0,00	-	-2064,70	$ 0,00	-	-$ 524.877.711,00	0,000	$ 0,00	
	REPARACIONES LOCATIVAS PARA ADECUACION DE SALON DE ALMACENAMIENTO DE BIENES MUEBLES EN EDIFICIO UVO	UN	$ 401.363,00		$ 0,00	1,00	+	0,00	$ 401.363,00	+	$ 0,00	1,000	$ 401.363,00	
	RETIRO, CONSERVACIÓN Y EMBALAJE DE HERRAJES ORIGINALES DE PUERTAS Y VENTANAS	un	$ 21.110,00		$ 0,00	88,00	+	0,00	$ 1.857.680,00	+	$ 0,00	88,000	$ 1.857.680,00	
	PROTECCIÓN PARA CERRAMIENTO DE VENTANAS Y PUERTAS PERIMETRALES. Y VITRALES	M2	$ 37.585,00		$ 0,00	57,26	+	0,00	$ 2.152.117,00	+	$ 0,00	57,260	$ 2.152.117,00	
	RETIRO MANUAL DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADAS EN BÓVEDAS Y MOLDURAS (ALTURA MAYOR A 15MT)	UN	$ 116.490,00		$ 0,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,000	$ 0,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 001

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
INTERVENTOR: IBP INGENIERIA SAS

CONTRATO No: 4346-2024
VALOR: $ 14.732.771.385,00

OBRA: CAPILLA CONVENTO
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: (01/11/25) - (31/01/26)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					MAYORES (+) & MENORES (-)						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (31/01/2026)		JUSTIFICACIÓN
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	MAYORES (+)		MENORES (-)	MAYORES (+)		MENORES (-)	CANT	V. TOTAL	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRECUBIERTA EN ESTRUCTURA EN GUADUA Y TEJA DE ZINC CAL 35	m2	$ 225.000,00		$ 0,00	2.719,54	+	0,00	$ 611.896.500,00	+	$ 0,00	2.719,540	$ 611.896.500,00	En relación con el incremento en la cantidad de la sobrecubierta, es importante precisar que este obedece a un ajuste técnico derivado de las condiciones reales verificadas en obra, así como a la ausencia de información detallada en la documentación contractual respecto al método de cálculo del área inicialmente considerada. En primera instancia, se realizó una revisión exhaustiva de la documentación suministrada por la consultoría (planos, memorias y cantidades de obra), evidenciándose que no se encontró un soporte técnico específico que detallara la metodología empleada para determinar la cantidad contractual de 2.074 m². Esto limitó la trazabilidad del cálculo inicial y generó la necesidad de validar dicha información directamente en campo. Posteriormente, durante la etapa de ejecución, se llevaron a cabo mediciones detalladas en obra, mediante levantamiento físico de la cubierta, lo cual permitió establecer un área real intervenida de 2.719 m². Esta diferencia se sustenta en varios factores técnicos: En primer lugar, el levantamiento en sitio permitió identificar variaciones geométricas y condiciones reales de la cubierta que no estaban plenamente reflejadas en los diseños preliminares, tales como irregularidades en la configuración y desarrollo de los planos inclinados. En segundo lugar, se debe considerar que la cubierta presenta pendientes, las cuales inciden directamente en el cálculo del área real. El valor inicialmente contemplado corresponde, presumiblemente, a una proyección en planta, mientras que la medición ejecutada considera la superficie real inclinada, generando un incremento natural en la cantidad. Adicionalmente, durante la ejecución se presentaron ajustes derivados del cambio de materialidad del sistema estructural, pasando de una solución inicialmente prevista en estructura metálica a una en guadua. Este cambio implicó modificaciones en el diseño y en la disposición de los elementos de la sobrecubierta, incluyendo mayores requerimientos de empalmes, traslapos y adecuaciones constructivas necesarias para garantizar la estabilidad, funcionalidad y estanqueidad del sistema. Así mismo, se incorporaron consideraciones constructivas propias de la instalación, tales como traslapos longitudinales y transversales, remates, encuentros y ajustes en bordes, los cuales no se encontraban claramente cuantificados en la cantidad contractual, pero que son indispensables para la correcta ejecución del sistema. En este sentido, la variación entre la cantidad contractual (2.074 m²) y la cantidad final ejecutada (2.719 m²) corresponde a un ajuste técnico debidamente sustentado en verificaciones de campo, en las condiciones reales de la cubierta y en las modificaciones de diseño implementadas durante la ejecución del proyecto. Por lo tanto, dicha variación no obedece a un incremento arbitrario, sino a la necesidad de garantizar la correcta ejecución de la actividad, acorde con los requerimientos técnicos, constructivos y de calidad exigidos para este tipo de intervención.
	DESMONTES Y RETIROS													
24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES (15%, QUINCE PORCIENTO PARA ESTE COMPONENTE)	UND	$ 693.676.269,00	0,15	$ 104.051.440,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,150	$ 104.051.440,00	
	DESMONTE Y DISPOSICION FINAL DE VIGAS EN MADERA DE ENTREPISO	ml	$ 42.836,00		$ 0,00	694,86	+	0,00	$ 29.765.023,00	+	$ 0,00	694,860	$ 29.765.023,00	
03.01.04	DESMONTAJE TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CIELO RASO EXISTENTE (OTROS MATERIALES). INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 14.293,00	668,87	$ 9.560.159,00	0,00	-	-230,66	$ 0,00	-	-$ 3.296.823,00	438,210	$ 6.263.336,00	
03.01.06	DESMONTAJE DE RED ELÉCTRICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO PUNTO ELÉCTRICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 6.460,00	325,52	$ 2.102.859,00	1.239,44	+	0,00	$ 8.006.782,00	+	$ 0,00	1.564,960	$ 10.109.642,00	
03.01.07	DESMONTAJE DE RED HIDRÁULICA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO HIDRÁULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 7.754,00	325,52	$ 2.524.082,00	0,00	-	-92,15	$ 0,00	-	-$ 714.531,00	233,370	$ 1.809.551,00	
03.01.08	DESMONTAJE DE RED SANITARIA AÉREA A LA VISTA CON SELLADO DE PUNTO SANITARIO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 9.394,00	325,52	$ 3.057.935,00	0,00	-	-168,21	$ 0,00	-	-$ 1.580.165,00	157,310	$ 1.477.770,00	
03.01.13	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE PUERTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 67.771,00	47,00	$ 3.185.237,00	37,00	+	0,00	$ 2.507.527,00	+	$ 0,00	84,000	$ 5.692.764,00	
03.01.14	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE OBRA DE CARPINTERÍA DE VENTANAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 60.106,00	41,00	$ 2.464.346,00	80,00	+	0,00	$ 4.808.480,00	+	$ 0,00	121,000	$ 7.272.826,00	
03.01.15	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO BALDOSA EN CERÁMICA, PORCELANATO O SIMILAR. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 12.497,00	286,38	$ 3.578.891,00	726,88	+	0,00	$ 9.083.819,00	+	$ 0,00	1.013,260	$ 12.662.710,00	
03.01.16	DESMONTAJE, TRASLADO A ACOPIO PARA RETIRO DE PISO EN MADERA DE 3CM. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 22.277,00	506,63	$ 11.286.197,00	65,51	+	0,00	$ 1.459.366,00	+	$ 0,00	572,140	$ 12.745.563,00	
03.01.17	DESMONTE ZÓCALO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 11.139,00	1,00	$ 11.139,00	256,63	+	0,00	$ 2.858.602,00	+	$ 0,00	257,630	$ 2.869.741,00	
	DEMOLICION MANUAL DE ESCALERAS EN CONCRETO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION	M2	$ 39.740,00		$ 0,00	19,02	+	0,00	$ 755.855,00	+	$ 0,00	19,020	$ 755.855,00	
03,02,04	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EXISTENTE HMAX=0.18 METROS - DEMOLICIÓN DE ANDEN EN CONCRETO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 31.036,00	1.056,69	$ 32.795.508,00	375,83	+	0,00	$ 11.664.182,00	+	$ 0,00	1.432,520	$ 44.459.691,00	
	EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, LLENOS Y RETIROS - CONVENTO													
02.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	$ 14.112,00	106,31	$ 1.500.287,00	775,74	+	0,00	$ 10.947.203,00	+	$ 0,00	882,050	$ 12.447.490,00	
02.02.02	ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO	TORRE - MES	$ 3.822.841,00	15,00	$ 57.342.615,00	16,67	+	0,00	$ 63.726.759,00	+	$ 0,00	31,670	$ 121.069.374,00	
03,02,05	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	$ 205.284,00	6,87	$ 1.409.275,00	6,88	+	0,00	$ 1.411.328,00	+	$ 0,00	13,740	$ 2.820.602,00	
03,02,06	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA EMAX=20CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 18.768,00	338,62	$ 6.355.126,00	248,97	+	0,00	$ 4.672.575,00	+	$ 0,00	587,580	$ 11.027.701,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 001

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
INTERVENTOR: IBP INGENIERIA SAS

CONTRATO No: 4346-2024
VALOR: $ 14.732.771.385,00

OBRA: CAPILLA CONVENTO
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: (01/11/25) - (31/01/26)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					MAYORES (+) & MENORES (-)						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (31/01/2026)		JUSTIFICACIÓN
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	MAYORES (+)		MENORES (-)	MAYORES (+)		MENORES (-)	CANT	V. TOTAL	
03,02,07	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 54.590,00	92,12	$ 5.028.558,00	0,00	-	-35,57	$ 0,00	-	-$ 1.941.493,00	56,550	$ 3.087.065,00	
04,03,02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	$ 91.345,00	642,88	$ 58.723.417,00	492,61	+	0,00	$ 44.997.004,00	+	$ 0,00	1.135,480	$ 103.720.421,00	
	EXCAVACION PARA TANQUE MAYOR A 3M	m3	$ 49.430,00		$ 0,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
04,01,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 28.933,00	135,00	$ 3.905.955,00	905,55	+	0,00	$ 26.200.278,00	+	$ 0,00	1.040,550	$ 30.106.233,00	
04,01,02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 31.648,00	507,88	$ 16.073.228,00	0,00	-	-350,88	$ 0,00	-	-$ 11.104.492,00	157,000	$ 4.968.736,00	
04,02,01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	$ 54.601,00	347,73	$ 18.986.406,00	143,77	+	0,00	$ 7.849.986,00	+	$ 0,00	491,500	$ 26.836.392,00	
04,02,03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	$ 217.449,00	16,87	$ 3.668.365,00	867,59	+	0,00	$ 188.656.578,00	+	$ 0,00	884,460	$ 192.324.943,00	
04,03,01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$ 40.606,00	160,15	$ 6.502.848,00	1.259,16	+	0,00	$ 51.129.248,00	+	$ 0,00	1.419,300	$ 57.632.096,00	
	EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, LLENOS Y RETIROS - CAPILLA													
02.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	$ 14.112,00	106,31	$ 1.500.287,00	775,74	+	0,00	$ 10.947.203,00	+	$ 0,00	882,050	$ 12.447.490,00	
02.02.02	ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO	TORRE - MES	$ 3.822.841,00	15,00	$ 57.342.615,00	16,67	+	0,00	$ 63.726.759,00	+	$ 0,00	31,670	$ 121.069.374,00	
03,02,05	DEMOLICIÓN DE ZAPATAS, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A ZONA DE DISPOSICIÓN)	M3	$ 205.284,00	6,87	$ 1.409.275,00	0,00	+	0,00	$ 1.026,00	+	$ 0,00	6,870	$ 1.410.301,00	
03,02,06	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA EMAX=20CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 18.768,00	338,62	$ 6.355.126,00	0,00	-	-240,22	$ 0,00	-	-$ 4.508.355,00	98,400	$ 1.846.771,00	
03,02,07	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES EN MAMPOSTERÍA E=DE 40 A 65CM. INCLUYE ELEMENTOS ADOSADOS NO RECUPERABLES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 54.590,00	92,12	$ 5.028.558,00	0,00	-	-92,12	$ 0,00	-	-$ 5.028.558,00	0,000	$ 0,00	
04,03,02	TRASIEGO DENTRO DE LA OBRA	M3	$ 91.345,00	642,88	$ 58.723.417,00	0,00	-	-128,58	$ 0,00	-	-$ 11.744.683,00	514,300	$ 46.978.734,00	
04,01,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 28.933,00	135,00	$ 3.905.955,00	905,55	+	0,00	$ 26.200.278,00	+	$ 0,00	1.040,550	$ 30.106.233,00	
04,01,02	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO PARA CIMIENTOS HASTA UNA ALTURA DE 2M. NO INCLUYE CARGUE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ZONA PERMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.	M3	$ 31.648,00	507,88	$ 16.073.228,00	0,00	-	-372,88	$ 0,00	-	-$ 11.800.748,00	135,000	$ 4.272.480,00	
04,02,01	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CADA 30CM, ALTURAS HASTA DE 2M.	M3	$ 54.601,00	347,73	$ 18.986.406,00	82,97	+	0,00	$ 4.530.245,00	+	$ 0,00	430,700	$ 23.516.651,00	
04,02,03	RELLENO EN SUB BASE GRANULAR , ESTABILIZADO CON CEMENTO AL 4% PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO SEGÚN DISEÑOS.	M3	$ 217.449,00	16,87	$ 3.668.365,00	837,36	+	0,00	$ 182.083.095,00	+	$ 0,00	854,230	$ 185.751.459,00	
04,03,01	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN, INCLUYE CARGUE Y DEPÓSITO EN LUGAR CERTIFICADO	M3	$ 40.606,00	160,15	$ 6.502.848,00	844,84	+	0,00	$ 34.305.370,00	+	$ 0,00	1.004,980	$ 40.808.218,00	
	CIMENTACIÓN - CONVENTO													
05,01,01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	$ 36.888,00	10,87	$ 401.102,00	378,59	+	0,00	$ 13.965.299,00	+	$ 0,00	389,460	$ 14.366.400,00	
05,01,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.349.521,00	21,69	$ 29.271.110,00	35,04	+	0,00	$ 47.287.216,00	+	$ 0,00	56,730	$ 76.558.326,00	
05,01,03	PILOTES PREEXCAVADOS EN CONCRETO Ø 25CM EN CONCRETO 3000PSI (F´C=21MPA) GRAVILLA FINA, PREMEZCLADO . NO INCLUYE REFUERZO	M	$ 173.672,00	90,00	$ 15.630.480,00	0,00	-	-90,00	$ 0,00	-	-$ 15.630.480,00	0,000	$ 0,00	
05,01,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.020.341,00	77,36	$ 78.933.580,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	77,360	$ 78.933.580,00	
04,02,02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	M3	$ 175.500,00	172,93	$ 30.348.338,00	0,00	-	-172,93	$ 0,00	-	-$ 30.348.338,00	0,000	$ 0,00	
05,01,05	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	$ 384.275,00	593,79	$ 228.176.731,00	248,13	+	0,00	$ 95.348.234,00	+	$ 0,00	841,910	$ 323.524.965,00	
05,01,06	CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).	M	$ 19.485,00	197,95	$ 3.856.958,00	0,00	+	0,00	$ 97,00	+	$ 0,00	197,950	$ 3.857.056,00	
05,01,07	RECONFORMACIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA BAJO TÉCNICA "MURRIADO"	M2	$ 57.147,00	15,00	$ 857.205,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	15,000	$ 857.205,00	
02.01.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABSCISADO, DETALLES). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	$ 7.157,00	2.825,44	$ 20.221.674,00	0,00	-	-1412,72	$ 0,00	-	-$ 10.110.837,00	1.412,720	$ 10.110.837,00	
05,05,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO. CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.992,00	14.553,43	$ 130.864.430,00	0,00	-	-11466,40	$ 0,00	-	-$ 103.105.856,00	3.087,030	$ 27.758.574,00	
05,05,02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	$ 8.740,00	1.062,10	$ 9.282.754,00	1.901,42	+	0,00	$ 16.618.411,00	+	$ 0,00	2.963,520	$ 25.901.165,00	
	CIMENTACIÓN - CAPILLA													
24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES (15%, QUINCE PORCIENTO PARA ESTE COMPONENTE)	UND	$ 693.676.269,00	0,15	$ 104.051.440,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,150	$ 104.051.440,00	
05,01,01	BASE DE LIMPIEZA EN CONCRETO POBRE DE 14MPA E=5CM	M2	$ 36.888,00	10,87	$ 401.102,00	300,94	+	0,00	$ 11.100.946,00	+	$ 0,00	311,810	$ 11.502.047,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 001

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
INTERVENTOR: IBP INGENIERIA SAS

CONTRATO No: 4346-2024
VALOR: $ 14.732.771.385,00

OBRA: CAPILLA CONVENTO
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: (01/11/25) - (31/01/26)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					MAYORES (+) & MENORES (-)						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (31/01/2026)		JUSTIFICACIÓN
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	MAYORES (+)		MENORES (-)	MAYORES (+)		MENORES (-)	CANT	V. TOTAL	
05,01,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE F'C=21MPA PARA ZAPATAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.349.521,00	21,69	$ 29.271.110,00	80,11	+	0,00	$ 108.110.127,00	+	$ 0,00	101,800	$ 137.381.238,00	
05,01,03	PILOTES PREEXCAVADOS EN CONCRETO Ø 25CM EN CONCRETO 3000PSI (F´C=21MPA) GRAVILLA FINA, PREMEZCLADO . NO INCLUYE REFUERZO	M	$ 173.672,00	90,00	$ 15.630.480,00	0,00	-	-90,00	$ 0,00	-	-$ 15.630.480,00	0,000	$ 0,00	
05,01,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO F'C=21MPA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.020.341,00	77,36	$ 78.933.580,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	77,360	$ 78.933.580,00	
04,02,02	BASE GRANULAR COMPACTADA A MANO HASTA EL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. COMPACTADO EN CAPAS DE H=30CM	M3	$ 175.500,00	172,93	$ 30.348.338,00	0,00	-	-172,93	$ 0,00	-	-$ 30.348.338,00	0,000	$ 0,00	
05,01,05	PLACA DE CONTRAPISO DE E=0.12 EN CONCRETO DE F'C=21MPA. INCLUYE ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M2	$ 384.275,00	593,79	$ 228.176.731,00	0,00	-	-78,43	$ 0,00	-	-$ 30.136.767,00	515,360	$ 198.039.964,00	
05,01,06	CORTE Y SELLADO DE JUNTA EN PLACA DE CONTRAPISO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE).	M	$ 19.485,00	197,95	$ 3.856.958,00	0,00	+	0,00	$ 97,00	+	$ 0,00	197,950	$ 3.857.056,00	
05,01,07	RECONFORMACIÓN DE CIMIENTO EN PIEDRA BAJO TÉCNICA "MURRIADO"	M2	$ 57.147,00	15,00	$ 857.205,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	15,000	$ 857.205,00	
02.01.01	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO MANUAL (ALTIMETRÍA: COTAS NEGRAS, COTAS DE SUBRASANTE, COTAS DE RELLENOS, COTAS RASANTES, REDES, ETC.; PLANIMETRÍA: EJES, ABSCISADO, DETALLES). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	$ 7.157,00	2.825,44	$ 20.221.674,00	0,00	-	-1412,72	$ 0,00	-	-$ 10.110.837,00	1.412,720	$ 10.110.837,00	
05,05,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.992,00	14.553,43	$ 130.864.430,00	896,59	+	0,00	$ 8.062.150,00	+	$ 0,00	15.450,020	$ 138.926.580,00	
05,05,02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	$ 8.740,00	1.062,10	$ 9.282.754,00	751,96	+	0,00	$ 6.572.130,00	+	$ 0,00	1.814,060	$ 15.854.884,00	
	COLUMNAS - CONVENTO													
05,02,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.476.290,00	27,92	$ 41.218.017,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	27,920	$ 41.218.017,00	
05,02,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 24,5 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.525.592,00	36,30	$ 55.371.362,00	1,70	+	0,00	$ 2.585.878,00	+	$ 0,00	37,990	$ 57.957.240,00	
05,02,03	PANTALLA EN CONCRETO DE F'C=24.5 MPA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.798.272,00	22,42	$ 40.317.258,00	2,41	+	0,00	$ 4.333.836,00	+	$ 0,00	24,830	$ 44.651.094,00	
05,05,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.992,00	14.553,43	$ 130.864.430,00	0,00	-	-138,58	$ 0,00	-	-$ 1.246.099,00	14.414,850	$ 129.618.331,00	
	COLUMNAS - CAPILLA													
05,02,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.476.290,00	27,92	$ 41.218.017,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	27,920	$ 41.218.017,00	
05,02,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 24,5 MPA PARA COLUMNAS. (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.525.592,00	36,30	$ 55.371.362,00	1,70	+	0,00	$ 2.585.878,00	+	$ 0,00	37,990	$ 57.957.240,00	
05,02,03	PANTALLA EN CONCRETO DE F'C=24.5 MPA (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3	$ 1.798.272,00	22,42	$ 40.317.258,00	2,41	+	0,00	$ 4.333.836,00	+	$ 0,00	24,830	$ 44.651.094,00	
05,05,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.992,00	14.553,43	$ 130.864.430,00	34.788,58	+	0,00	$ 312.818.924,00	+	$ 0,00	49.342,010	$ 443.683.354,00	
	VIGAS Y PLACAS - CONVENTO													
02.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	$ 14.112,00	106,31	$ 1.500.287,00	775,74	+	0,00	$ 10.947.203,00	+	$ 0,00	882,050	$ 12.447.490,00	
02.02.02	ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO	TORRE - MES	$ 3.822.841,00	15,00	$ 57.342.615,00	16,67	+	0,00	$ 63.726.759,00	+	$ 0,00	31,670	$ 121.069.374,00	
05,03,01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 1.504.239,00	31,23	$ 46.969.863,00	0,00	+	0,00	$ 7.521,00	+	$ 0,00	31,230	$ 46.977.384,00	
05,03,02	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 1.510.434,00	20,69	$ 31.250.879,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	20,690	$ 31.250.879,00	
05,03,03	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	$ 14.530,00	187,50	$ 2.724.375,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	187,500	$ 2.724.375,00	
05,03,04	PLACA MACIZA ENTREPISO MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	$ 141.723,00	5,00	$ 708.615,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	5,000	$ 708.615,00	
05,05,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.992,00	14.553,43	$ 130.864.430,00	7.016,98	+	0,00	$ 63.096.697,00	+	$ 0,00	21.570,410	$ 193.961.127,00	
05,05,02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	$ 8.740,00	1.062,10	$ 9.282.754,00	0,00	-	-1044,50	$ 0,00	-	-$ 9.128.930,00	17,600	$ 153.824,00	
	VIGAS Y PLACAS - CAPILLA													
02.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	$ 14.112,00	106,31	$ 1.500.287,00	775,74	+	0,00	$ 10.947.203,00	+	$ 0,00	882,050	$ 12.447.490,00	
02.02.02	ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO	TORRE - MES	$ 3.822.841,00	15,00	$ 57.342.615,00	16,67	+	0,00	$ 63.726.759,00	+	$ 0,00	31,670	$ 121.069.374,00	
05,03,01	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 1.504.239,00	31,23	$ 46.969.863,00	0,00	+	0,00	$ 7.521,00	+	$ 0,00	31,230	$ 46.977.384,00	
05,03,02	VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 24,5 MPA. INCLUYE SECCIONES DE ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FABRICACIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 1.510.434,00	20,69	$ 31.250.879,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	20,690	$ 31.250.879,00	
05,03,03	CONSTRUCCIÓN ANCLAJES (L= 0,10 M - D =3/8"). INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	$ 14.530,00	187,50	$ 2.724.375,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	187,500	$ 2.724.375,00	
05,03,04	PLACA MACIZA ENTREPISO MAX=0,10 M EN CONCRETO F'C=3.000 PSI. INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	$ 141.723,00	5,00	$ 708.615,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	5,000	$ 708.615,00	
05,05,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.992,00	14.553,43	$ 130.864.430,00	7.635,72	+	0,00	$ 68.660.407,00	+	$ 0,00	22.189,150	$ 199.524.837,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 001

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
INTERVENTOR: IBP INGENIERIA SAS

CONTRATO No: 4346-2024
VALOR: $ 14.732.771.385,00

OBRA: CAPILLA CONVENTO
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: (01/11/25) - (31/01/26)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					MAYORES (+) & MENORES (-)						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (31/01/2026)		JUSTIFICACIÓN
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	MAYORES (+)		MENORES (-)	MAYORES (+)		MENORES (-)	CANT	V. TOTAL	
05,05,02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15 DIÁMETRO 6.5 MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	$ 8.740,00	1.062,10	$ 9.282.754,00	0,00	-	-1044,50	$ 0,00	-	-$ 9.128.930,00	17,600	$ 153.824,00	
	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA - CONVENTO													
24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES (15%, QUINCE PORCIENTO PARA ESTE COMPONENTE)	UND	$ 693.676.269,00	0,15	$ 104.051.440,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,150	$ 104.051.440,00	
02.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	$ 14.112,00	106,31	$ 1.500.287,00	775,74	+	0,00	$ 10.947.203,00	+	$ 0,00	882,050	$ 12.447.490,00	
02.02.02	ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO	TORRE - MES	$ 3.822.841,00	15,00	$ 57.342.615,00	16,67	+	0,00	$ 63.726.759,00	+	$ 0,00	31,670	$ 121.069.374,00	
03.01.10	DESMONTAJE DE TEJA EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 15.304,00	992,38	$ 15.187.307,00	286,85	+	0,00	$ 4.389.876,00	+	$ 0,00	1.279,220	$ 19.577.183,00	
03.01.11	DESMONTAJE Y RETIRO DE LUCARNAS. INCLUYE DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 6.347,00	216,06	$ 1.371.349,00	0,00	-	-216,06	$ 0,00	-	-$ 1.371.349,00	0,000	$ 0,00	
03.01.12	DESMONTAJE, CLASIFICACIÓN Y LIMPIEZA INICIAL DE TEJAS DE BARRO, INCLUYE RETIRO DE MORTERO DE PEGA, TRANSPORTE A SITIO DE ACOPIO Y RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE DE ELEMENTOS DAÑADOS Y/O EN MAL ESTADO Y/O ELEMENTOS RETIRADOS DE LA TEJA	M2	$ 28.659,00	992,38	$ 28.440.475,00	286,85	+	0,00	$ 8.220.691,00	+	$ 0,00	1.279,220	$ 36.661.166,00	
07,01,01	RETIRO MANUAL DE HUELLAS DE ANIMALES, LIMPIEZA CON ACCIÓN MECÁNICA EN SECO, POSTERIOR LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON JABÓN NEUTRO Y AGUA.	M2	$ 3.695,00	6,63	$ 24.479,00	0,00	-	-6,63	$ 0,00	-	-$ 24.479,00	0,000	$ 0,00	
07,01,02	RECUPERACIÓN DE TEJA DE BARRO 60% (LAVADO, APLICACIÓN DE HIDRO PROTECCIÓN, ALISTADO PARA INSTALACIÓN)	M2	$ 9.584,00	595,43	$ 5.706.553,00	0,00	-	-83,74	$ 0,00	-	-$ 802.612,00	511,680	$ 4.903.941,00	
07,01,03	TRATAMIENTO RECUPERACIÓN TEJA DE ZINC, PELADO, FIJACIÓN Y APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVO.	M2	$ 28.341,00	30,90	$ 875.595,00	0,00	-	-30,90	$ 0,00	-	-$ 875.595,00	0,000	$ 0,00	
07,01,04	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL PERIMETRAL EN MATERIAL GALVANIZADO. (RETIRO DE SUCIEDAD DEPOSITADA EN LA CANAL PERIMETRAL DEL EDIFICIO, REVISIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE, VERIFICACIÓN DE PENDIENTES Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO)	M	$ 17.156,00	181,41	$ 3.112.184,00	0,00	+	0,00	$ 86,00	+	$ 0,00	181,410	$ 3.112.270,00	
07,01,05	RECUPERACIÓN (RETIRO, LAVADO Y ACOPIO DE CUBIERTA) Y RESTAURACIÓN (RETIRO DE ESMALTE Y RESTAURACIÓN DE PUNTOS DE SOLDADURA EN ÁREAS REQUERIDAS) DE TEJA ROMBOIDAL TIPO SHINGLE	M2	$ 50.522,00	983,50	$ 49.688.387,00	0,00	-	-983,50	$ 0,00	-	-$ 49.688.387,00	0,000	$ 0,00	
	RESTAURACIÓN DE CUBIERTA - CAPILLA													
02.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APUNTALAMEINTO TEMPORAL CON PARAL METÁLICO	M2	$ 14.112,00	106,31	$ 1.500.287,00	0,00	-	0,00	$ 0,00	-	-$ 40,00	106,310	$ 1.500.247,00	
02.02.02	ANDAMIO DE CARGA, TORRE DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE LARGO	TORRE - MES	$ 3.822.841,00	15,00	$ 57.342.615,00	1,00	+	0,00	$ 3.822.841,00	+	$ 0,00	16,000	$ 61.165.456,00	
03.01.10	DESMONTAJE DE TEJA EN FIBROCEMENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 15.304,00	992,38	$ 15.187.307,00	0,00	-	-351,38	$ 0,00	-	-$ 5.377.443,00	641,000	$ 9.809.864,00	
03.01.11	DESMONTAJE Y RETIRO DE LUCARNAS. INCLUYE DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	UND	$ 6.347,00	216,06	$ 1.371.349,00	0,00	-	-216,06	$ 0,00	-	-$ 1.371.349,00	0,000	$ 0,00	
03.01.12	DESMONTAJE, CLASIFICACIÓN Y LIMPIEZA INICIAL DE TEJAS DE BARRO, INCLUYE RETIRO DE MORTERO DE PEGA, TRANSPORTE A SITIO DE ACOPIO Y RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE DE ELEMENTOS DAÑADOS Y/O EN MAL ESTADO Y/O ELEMENTOS RETIRADOS DE LA TEJA	M2	$ 28.659,00	992,38	$ 28.440.475,00	0,00	-	-351,38	$ 0,00	-	-$ 10.070.056,00	641,000	$ 18.370.419,00	
07,01,01	RETIRO MANUAL DE HUELLAS DE ANIMALES, LIMPIEZA CON ACCIÓN MECÁNICA EN SECO, POSTERIOR LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON JABÓN NEUTRO Y AGUA.	M2	$ 3.695,00	6,63	$ 24.479,00	0,00	-	-6,63	$ 0,00	-	-$ 24.479,00	0,000	$ 0,00	
07,01,02	RECUPERACIÓN DE TEJA DE BARRO 60% (LAVADO, APLICACIÓN DE HIDRO PROTECCIÓN, ALISTADO PARA INSTALACIÓN)	M2	$ 9.584,00	595,43	$ 5.706.553,00	0,00	-	-210,83	$ 0,00	-	-$ 2.020.547,00	384,600	$ 3.686.006,00	
07,01,03	TRATAMIENTO RECUPERACIÓN TEJA DE ZINC, PELADO, FIJACIÓN Y APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVO.	M2	$ 28.341,00	30,90	$ 875.595,00	0,00	-	-30,90	$ 0,00	-	-$ 875.595,00	0,000	$ 0,00	
07,01,04	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL PERIMETRAL EN MATERIAL GALVANIZADO. (RETIRO DE SUCIEDAD DEPOSITADA EN LA CANAL PERIMETRAL DEL EDIFICIO, REVISIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE, VERIFICACIÓN DE PENDIENTES Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO)	M	$ 17.156,00	181,41	$ 3.112.184,00	0,00	-	0,00	$ 0,00	-	-$ 86,00	181,400	$ 3.112.098,00	
07,01,05	RECUPERACIÓN (RETIRO, LAVADO Y ACOPIO DE CUBIERTA) Y RESTAURACIÓN (RETIRO DE ESMALTE Y RESTAURACIÓN DE PUNTOS DE SOLDADURA EN ÁREAS REQUERIDAS) DE TEJA ROMBOIDAL TIPO SHINGLE	M2	$ 50.522,00	983,50	$ 49.688.387,00	0,00	-	-983,50	$ 0,00	-	-$ 49.688.387,00		$ 0,00	
	MADERA CUBIERTA - CONVENTO													
07,03,01	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 17) X 35. LONGITUD < 3M (CORREA, VIGA, TIRANTE, DIAGONAL, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO. TRASIEGO. CORTES. IZAJE. ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 2.072.610,00	3,50	$ 7.254.135,00	0,00	-	-0,50	$ 0,00	-	-$ 1.036.305,00	3,000	$ 6.217.830,00	
07,03,02	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 17) X 35. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M (CORREA, VIGA, TIRANTE, DIAGONAL, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 4.545.859,00	3,00	$ 13.637.577,00	0,00	-	-3,00	$ 0,00	-	-$ 13.637.577,00	0,000	$ 0,00	
07,03,03	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD < 1,5 M (SOLERA, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 537.734,00	18,00	$ 9.679.212,00	126,00	+	0,00	$ 67.754.484,00	+	$ 0,00	144,000	$ 77.433.696,00	
07,03,04	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M (SOBRESOLERA, CUMBRERA, DIAGONAL). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 1.985.049,00	121,50	$ 241.183.454,00	223,21	+	0,00	$ 443.082.787,00	+	$ 0,00	344,710	$ 684.266.241,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 001

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
INTERVENTOR: IBP INGENIERIA SAS

CONTRATO No: 4346-2024
VALOR: $ 14.732.771.385,00

OBRA: CAPILLA CONVENTO
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: (01/11/25) - (31/01/26)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					MAYORES (+) & MENORES (-)						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (31/01/2026)		JUSTIFICACIÓN
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	MAYORES (+)		MENORES (-)	MAYORES (+)		MENORES (-)	CANT	V. TOTAL	
07,03,05	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 16) X 10. LONGITUD < 3,0 M (CAN, PENDOLÓN, SOBRESOLERA, SOLERA, VIGA DE CIELORRASO). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 878.083,00	20,00	$ 17.561.660,00	312,00	+	0,00	$ 273.961.896,00	+	$ 0,00	332,000	$ 291.523.556,00	
07,03,06	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO 16 X 10. LONGITUD 3,0 M A 8,0 M (PAR, TIRANTE, VIGA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 1.599.383,00	0,50	$ 799.692,00	184,50	+	0,00	$ 295.086.164,00	+	$ 0,00	185,000	$ 295.885.855,00	
07,03,07	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO (4 A 6) X 10. LONGITUD < 2 M (DIAGONAL, TORNAPUNTA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 462.255,00	3,50	$ 1.617.893,00	580,50	+	0,00	$ 268.339.028,00	+	$ 0,00	584,000	$ 269.956.920,00	
07,03,08	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO 7 X 7. LONGITUD 1,5 A 2,5 M (ARRIOSTRE, DIAGONAL, TORNAPUNTA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 458.649,00	0,50	$ 229.325,00	181,50	+	0,00	$ 83.244.794,00	+	$ 0,00	182,000	$ 83.474.118,00	
07,03,09	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO 4 X 4. LONGITUD 1,4 A 1,6 M (CORREA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 469.803,00	1,50	$ 704.705,00	211,50	+	0,00	$ 99.363.335,00	+	$ 0,00	213,000	$ 100.068.039,00	
	MADERA CUBIERTA - CAPILLA													
07,03,01	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 17) X 35. LONGITUD < 3M (CORREA, VIGA, TIRANTE, DIAGONAL, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO. TRASIEGO. CORTES. IZAJE. ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 2.072.610,00	3,50	$ 7.254.135,00	0,00	-	-3,50	$ 0,00	-	-$ 7.254.135,00		$ 0,00	
07,03,02	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 17) X 35. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M (CORREA, VIGA, TIRANTE, DIAGONAL, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 4.545.859,00	3,00	$ 13.637.577,00	0,00	-	-3,00	$ 0,00	-	-$ 13.637.577,00	0,000	$ 0,00	
07,03,03	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD < 1,5 M (SOLERA, SOBRESOLERA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES. IZAJE. ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 537.734,00	18,00	$ 9.679.212,00	0,00	-	-18,00	$ 0,00	-	-$ 9.679.212,00		$ 0,00	
07,03,04	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (10 A 12) X 20. LONGITUD 3,0 M A 8,5 M (SOBRESOLERA, CUMBRERA, DIAGONAL). INCLUYE SUMINISTRO. TRASIEGO. CORTES. IZAJE. ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 1.985.049,00	121,50	$ 241.183.454,00	0,00	-	-121,50	$ 0,00	-	-$ 241.183.454,00		$ 0,00	
07,03,05	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO (15 A 16) X 10. LONGITUD < 3,0 M (CAN, PENDOLÓN, SOBRESOLERA, SOLERA, VIGA DE CIELORRASO). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 878.083,00	20,00	$ 17.561.660,00	0,00	-	-20,00	$ 0,00	-	-$ 17.561.660,00		$ 0,00	
07,03,06	VIGA LAMINADA E INMUNIZADA EN PINO 16 X 10. LONGITUD 3,0 M A 8,0 M (PAR, TIRANTE, VIGA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 1.599.383,00	0,50	$ 799.692,00	0,00	-	-0,50	$ 0,00	-	-$ 799.692,00		$ 0,00	
07,03,07	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO (4 A 6) X 10. LONGITUD < 2 M (DIAGONAL, TORNAPUNTA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 462.255,00	3,50	$ 1.617.893,00	0,00	-	-3,50	$ 0,00	-	-$ 1.617.893,00		$ 0,00	
07,03,08	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO 7 X 7. LONGITUD 1,5 A 2,5 M (ARRIOSTRE, DIAGONAL, TORNAPUNTA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 458.649,00	0,50	$ 229.325,00	0,00	-	-0,50	$ 0,00	-	-$ 229.325,00		$ 0,00	
07,03,09	VIGA MACIZA E INMUNIZADA EN ABARCO 4 X 4. LONGITUD 1,4 A 1,6 M (CORREA). INCLUYE SUMINISTRO, TRASIEGO, CORTES, IZAJE, ENSAMBLE Y FIJACIÓN.	UND	$ 469.803,00	1,50	$ 704.705,00	0,00	-	-1,50	$ 0,00	-	-$ 704.705,00		$ 0,00	
	CUBIERTA - CONVENTO													
07,04,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO FALTANTE. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO	M2	$ 129.262,00	396,95	$ 51.310.551,00	370,58	+	0,00	$ 47.901.912,00	+	$ 0,00	767,530	$ 99.212.463,00	
07,04,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 NO. 6 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	$ 41.820,00	421,10	$ 17.610.477,00	346,43	+	0,00	$ 14.487.627,00	+	$ 0,00	767,530	$ 32.098.105,00	
07,04,03	INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO RECUPERADA, DISTINTAS MEDIDAS	M2	$ 16.793,00	631,65	$ 10.607.344,00	0,00	-	-119,97	$ 0,00	-	-$ 2.014.702,00	511,680	$ 8.592.642,00	
07,04,04	INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO RECUPERADA. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO	M2	$ 71.490,00	595,43	$ 42.566.933,00	0,00	-	-83,74	$ 0,00	-	-$ 5.986.930,00	511,680	$ 36.580.003,00	
	CUBIERTA - CAPILLA													
07,04,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO FALTANTE. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO	M2	$ 129.262,00	396,95	$ 51.310.551,00	0,00	-	-140,55	$ 0,00	-	-$ 18.167.774,00	256,400	$ 33.142.777,00	
07,04,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE FIBROCEMENTO, PERFIL 7 NO. 6 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	$ 41.820,00	421,10	$ 17.610.477,00	91,70	+	0,00	$ 3.834.819,00	+	$ 0,00	512,800	$ 21.445.296,00	
07,04,03	INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO RECUPERADA, DISTINTAS MEDIDAS	M2	$ 16.793,00	631,65	$ 10.607.344,00	0,00	-	-503,45	$ 0,00	-	-$ 8.454.481,00	128,200	$ 2.152.863,00	
07,04,04	INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO RECUPERADA. INCLUYE MANTO ASFÁLTICO	M2	$ 71.490,00	595,43	$ 42.566.933,00	0,00	-	-210,83	$ 0,00	-	-$ 15.071.879,00	384,600	$ 27.495.054,00	
	RESTAURACIÓN ELEMENTOS DE MADERA													
07,02,01	RESTAURACIÓN DE VENTANAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MENOR AL 30% (N1). INCLUYE RETIRO, LIMPIEZA, LIJADO MASILLADO, PINTURA SOBRE ZONAS EFECTADAS Y REINSTALACIÓN	UND	$ 350.947,00	14,00	$ 4.913.258,00	0,00	-	-14,00	$ 0,00	-	-$ 4.913.258,00	0,000	$ 0,00	
07,02,02	RESTAURACIÓN DE VENTANAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MAYOR AL 30% (N2). INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS	UND	$ 481.225,00	14,00	$ 6.737.150,00	0,00	-	-14,00	$ 0,00	-	-$ 6.737.150,00	0,000	$ 0,00	
07,02,03	RESTAURACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MENOR AL 30% (N1). SECCIÓN 1.30X3.7M. INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS	UND	$ 88.005,00	10,00	$ 880.050,00	0,00	-	-10,00	$ 0,00	-	-$ 880.050,00	0,000	$ 0,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 001

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
INTERVENTOR: IBP INGENIERIA SAS

CONTRATO No: 4346-2024
VALOR: $ 14.732.771.385,00

OBRA: CAPILLA CONVENTO
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: (01/11/25) - (31/01/26)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					MAYORES (+) & MENORES (-)						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (31/01/2026)		JUSTIFICACIÓN
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	MAYORES (+)		MENORES (-)	MAYORES (+)		MENORES (-)	CANT	V. TOTAL	
07,02,04	RESTAURACIÓN DE PUERTAS DE CARPINTERÍA DE MADERA CON AFECTACIÓN MAYOR AL 30% (N2). SECCIÓN 1.30X3.7M. INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.	UND	$ 999.242,00	10,00	$ 9.992.420,00	0,00	-	-10,00	$ 0,00	-	-$ 9.992.420,00	0,000	$ 0,00	
07,02,05	RESTAURACIÓN BASAMENTO EN PIEDRA PIES DERECHOS QUE FUERON REEMPLAZADOS POR OTROS ELEMENTOS O CUYA MADERA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.	UND	$ 133.885,00	3,00	$ 401.655,00	0,00	-	-3,00	$ 0,00	-	-$ 401.655,00	0,000	$ 0,00	
07,02,06	REEMPLAZO DE PUERTAS DE CARPINTERÍA DE MADERA (N3). SECCIÓN 1.30X3.7M. INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.⁉	UND	$ 1.910.756,00	6,00	$ 11.464.536,00	0,00	-	-6,00	$ 0,00	-	-$ 11.464.536,00	0,000	$ 0,00	
07,02,07	RESTITUCIÓN VENTANAS DE MADERA CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES L=1.2 DE ANCHO POR 1.4M DE ALTO. INCLUYE RETIRO DEL ELEMENTO LIJADO, MASILLADO, INMUNIZADO, PINTURA DE ACABADO Y REINSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	UND	$ 1.240.626,00	6,00	$ 7.443.756,00	0,00	-	-6,00	$ 0,00	-	-$ 7.443.756,00	0,000	$ 0,00	
07,02,08	RESTITUCION PUERTAS DE MADERA CON CARACTERISTICAS SIMILARES A LAS EXISTENTES L=1.1 A 1.3M DE ANCHO POR 2.8M DE ALTO. INCLUYE RETIRO DEL ELEMENTO LIJADO, MASILLADO, INMUNIZADO, PINTURA DE ACABADO Y REINSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	UND	$ 1.370.854,00	6,00	$ 8.225.124,00	0,00	-	-6,00	$ 0,00	-	-$ 8.225.124,00	0,000	$ 0,00	
07,02,09	RESTITUCIÓN PIE DERECHOS DE MADERA DE 20X20 CON BASE EN PIEDRA. LMAX=1M	UND	$ 1.344.310,00	3,00	$ 4.032.930,00	0,00	-	-3,00	$ 0,00	-	-$ 4.032.930,00	0,000	$ 0,00	
07,02,10	RESTAURACIÓN ZÓCALOS DE APROXIMADAMENTE 4M DE LARGO O SIMILAR, EN MADERA CON AFECTACIÓN MAYOR AL 30% (N2). INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.	UND	$ 451.472,00	10,00	$ 4.514.720,00	0,00	-	-10,00	$ 0,00	-	-$ 4.514.720,00	0,000	$ 0,00	
07,02,11	RESTAURACIÓN ZÓCALOS DE APROXIMÁDAMENTE 4M DE LARGO O SIMILAR, EN MADERA CON AFECTACIÓN MENOR AL 30% (N1). INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.	UND	$ 424.497,00	10,00	$ 4.244.970,00	0,00	-	-10,00	$ 0,00	-	-$ 4.244.970,00	0,000	$ 0,00	
07,02,12	RESTAURACIÓN ZÓCALOS DE MADERA CON AFECTACIÓN (N3) DE HASTA 20CM DE ESPESOR. INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.	UND	$ 463.434,00	10,00	$ 4.634.340,00	0,00	-	-10,00	$ 0,00	-	-$ 4.634.340,00	0,000	$ 0,00	
07,02,13	RESTAURACIÓN ESCALERA DE MADERA DE ACCESO (INTERIOR) DE HASTA 1.20M DE ANCHO. INCLUYE INMUNIZACIÓN, REPARACIONES NECESARIAS CON MASILLA Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS.	UND	$ 4.405.843,00	1,00	$ 4.405.843,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	1,000	$ 4.405.843,00	
	CORTES, DEMOLICIONES Y RESTAURACIÓN DE MAMPOSTERÍA													
03,02,01	CORTE Y REGATA EN MUROS Y MAMPOSTERÍA, ANCHO MÁXIMO DE 10CM. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 3.614,00	134,00	$ 484.276,00	2.286,72	+	0,00	$ 8.264.206,00	+	$ 0,00	2.420,720	$ 8.748.482,00	
08,01,01	RESTAURACIÓN INTEGRAL MAMPOSTERÍA EXISTENTE PARA SELLO DE GRIETAS O FISURAS CON APLICACIÓN DE RESINA EPÓXICA CONSOLIDANTE.	M	$ 20.521,00	4,07	$ 83.520,00	295,93	+	0,00	$ 6.072.780,00	+	$ 0,00	300,000	$ 6.156.300,00	
08,01,02	LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA APLICADA POR GRAVEDAD Y MANUAL EN MURO INTERIOR	M2	$ 10.344,00	5,17	$ 53.478,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	5,170	$ 53.478,00	
08,01,03	RETIRO MECÁNICO DE PIEZAS AFECTADAS SOBRE MUROS EN MAMPOSTERÍA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 17.862,00	197,54	$ 3.528.459,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	197,540	$ 3.528.459,00	
08,01,04	RESTITUCIÓN DE MAMPOSTERÍA MURO LADRILLO A LA VISTA CON MEDIO LADRILLO PRENSADO LIVIANO DE 6 CMS EN TONO TERRACOTA ACABADO DE JUNTA PÉRDIDA	M2	$ 114.507,00	197,54	$ 22.619.713,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	197,540	$ 22.619.713,00	
08,01,05	RETIRO MANUAL DE CAPA DE MUSGO Y/O CAPA VEGETAL CON MEDIOS MANUALES EN MUROS DE MAMPOSTERÍA, LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y APLICACIÓN DE HERBICIDA SOBRE SUPERFICIES.	M2	$ 20.027,00	12,00	$ 240.324,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	12,000	$ 240.324,00	
08,01,06	SELLO QUÍMICO EN LOS MUROS DE MAMPOSTERÍA PARA CONTROLAR LA HUMEDAD ASCENDENTE. E=15CM	M	$ 26.198,00	128,00	$ 3.353.344,00	0,00	-	-128,00	$ 0,00	-	-$ 3.353.344,00	0,000	$ 0,00	
07,01,01	RETIRO MANUAL DE HUELLAS DE ANIMALES, LIMPIEZA CON ACCIÓN MECÁNICA EN SECO, POSTERIOR LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON JABÓN NEUTRO Y AGUA.	M2	$ 3.695,00	13,25	$ 48.959,00	0,00	-	-13,25	$ 0,00	-	-$ 48.959,00	0,000	$ 0,00	
	RESTAURACIÓN Y RESANE FACHADA													
08,02,01	LADRILLO A LA VISTA: LIBERACIÓN DE AGREGADOS ARQUITECTÓNICOS, LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPUESTOS Y JUNTAS AFECTADAS.	M2	$ 59.940,00	66,51	$ 3.986.609,00	0,00	-	-66,51	$ 0,00	-	-$ 3.986.609,00		$ 0,00	
08,02,02	RESTAURACIÓN POR ZONAS AFECTADAS POR COSTRA NEGRA. APLICACIÓN CLORURO DE BENZALCONIO AL 10%. INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADO Y JABÓN NEUTRO	M2	$ 32.158,00	54,29	$ 1.745.858,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	54,290	$ 1.745.858,00	
08,02,03	RESANE DE ABOMBAMIENTOS EN FACHADAS (INCLUYE APLICACIÓN EN MORTERO DE CEMENTO EN PROPORCIÓN 1:3 Y ESTUCO PLÁSTICO)	M2	$ 42.909,00	8,54	$ 366.443,00	0,00	-	-8,54	$ 0,00	-	-$ 366.443,00		$ 0,00	
08,02,04	RESANE DE DESCASCARAMIENTOS. RASPADO DE SUPERFICIE Y LIJADO HASTA GENERAR UNA SUPERFICIE HOMOGÉNEA	M2	$ 27.839,00	9,98	$ 277.833,00	0,00	-	-9,98	$ 0,00	-	-$ 277.833,00		$ 0,00	
08,02,05	ALFAJÍAS EN PIEDRA: INCLUYE DESINFECCIÓN, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO	M	$ 27.985,00	35,00	$ 979.475,00	0,00	-	-35,00	$ 0,00	-	-$ 979.475,00		$ 0,00	
08,02,06	EROSIÓN ZÓCALO EN CEMENTO: LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO ÁREA AFECTADA Y APLICACIÓN DE UN CONSOLIDANTE A BASE DE SILICATO DE ETILO.	M2	$ 39.407,00	8,44	$ 332.595,00	0,00	-	-8,44	$ 0,00	-	-$ 332.595,00		$ 0,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 001

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
INTERVENTOR: IBP INGENIERIA SAS

CONTRATO No: 4346-2024
VALOR: $ 14.732.771.385,00

OBRA: CAPILLA CONVENTO
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: (01/11/25) - (31/01/26)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					MAYORES (+) & MENORES (-)						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (31/01/2026)		JUSTIFICACIÓN
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	MAYORES (+)		MENORES (-)	MAYORES (+)		MENORES (-)	CANT	V. TOTAL	
08,02,07	LIMPIEZA MECÁNICA DE GRAFITIS POR MEDIO DE JABÓN NEUTRO, QUITA GRAFITIS Y APLICACIÓN DE AGUA A PRESIÓN, POR ACCIONES VANDÁLICAS.	M2	$ 32.345,00	0,15	$ 4.852,00	0,00	-	-0,15	$ 0,00	-	-$ 4.852,00		$ 0,00	
08,02,08	APLICACIÓN DE HERBICIDA Y RETIRO MANUAL DE CAPA DE MUSGO Y/O CAPA VEGETAL EN FACHADAS UNA VEZ SE ENCUENTRE SECO. POR VEGETACIÓN INVASIVA.	M2	$ 14.909,00	33,00	$ 491.997,00	0,00	-	-33,00	$ 0,00	-	-$ 491.997,00		$ 0,00	
08,02,09	ALFAJÍAS EN CONCRETO: LIMPIEZA CON AGUA Y TEXAPON AL 10%, APLICACIÓN DE SILICATO DE ETILO PURO SEGÚN REQUERIMIENTO, SEGÚN GRADO DE DETERIORO APLICAR VARIAS CAPAS CADA QUINCE DÍAS.	UND	$ 34.877,00	16,00	$ 558.032,00	0,00	-	-16,00	$ 0,00	-	-$ 558.032,00		$ 0,00	
08,02,10	EN PIEDRA: APLICACIÓN DE SILICATO DE ETILO PURO Y JABÓN NEUTRO, SEGÚN GRADO DE DETERIORO APLICAR VARIAS CAPAS CADA QUINCE DÍAS.	M2	$ 42.408,00	54,29	$ 2.302.330,00	0,00	-	-54,29	$ 0,00	-	-$ 2.302.330,00		$ 0,00	
08,02,11	MUROS EXTERNOS: LIMPIEZA EN SECO ESCOBILLADO MANUAL CON ESCOBA DE CERDA, SEGUIDO DE LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO, CLORURO DE BENZALCONIO Y AGUA SIN PRESIÓN, APLICACIÓN DE FUNGICIDA.	M2	$ 102.564,00	3.564,06	$ 365.544.250,00	0,00	-	-3564,06	$ 0,00	-	-$ 365.544.250,00		$ 0,00	
	MAMPOSTERÍA													
08,05,01	MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30) E=12CM	M2	$ 62.352,00	0,50	$ 31.176,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,500	$ 31.176,00	
08,05,02	DOBLE MURO EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO 5 (12X20X30). PARA MUROS DE ESPESOR DE 42 CM A 68 CM	M2	$ 124.155,00	140,73	$ 17.472.333,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	140,730	$ 17.472.333,00	
08,05,03	MURO LADRILLO A LA VISTA CON NÚCLEO EN BLOQUE NO. 5. ESPESOR EMAX=45 CM. INCLUYE MORTERO DE PEGA	M2	$ 172.137,00	36,50	$ 6.283.001,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	36,500	$ 6.283.001,00	
08,05,04	MURO LADRILLO A LA VISTA CON NÚCLEO EN BLOQUE NO. 5. ESPESOR EMAX=30 CM. INCLUYE MORTERO DE PEGA	M2	$ 145.068,00	16,10	$ 2.335.595,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	16,100	$ 2.335.595,00	
08,06,01	MUROS EN PLACA DE YESO DE 1/2" E=10 CM DOBLE CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA, ANDAMIOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$ 108.661,00	78,54	$ 8.534.235,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	78,540	$ 8.534.235,00	
08,06,02	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM UNA CARA, INCLUYE ESTUCADO Y 1 MANO DE PINTURA TIPO VINILO PARA INTERIORES, ALTURAS DE 0 A 3M. INCLUYE ESTRUCTURA,Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	$ 106.403,00	13,43	$ 1.428.992,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	13,430	$ 1.428.992,00	
08,06,03	MUROS EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 12MM DOS CARAS. ESPESOR 12 CM. UNA CARA SUPERBOARD RH Y ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS. OTRA CARA EN SUPERBOARD Y ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 207.142,00	113,53	$ 23.516.831,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	113,530	$ 23.516.831,00	
08,06,04	MUROS EN SUPERBOARD DE 12MM EN DOS CARAS. ESPESOR 12CM. ACABADO EN PINTURA ACRÍLICA COLOR "DÍA DE OCIO" 2 A 3 MANOS.	M2	$ 185.605,00	194,45	$ 36.090.892,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	194,450	$ 36.090.892,00	
08,06,05	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A DOS CARAS. ESPESOR 12 CM A 15CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	M2	$ 191.496,00	113,59	$ 21.752.031,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	113,590	$ 21.752.031,00	
08,06,06	MUROS EN SUPERBOARD RH DE 12MM A UNA CARA. ESPESOR 10 CM. ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS.	M2	$ 117.974,00	60,48	$ 7.135.068,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	60,480	$ 7.135.068,00	
	CIELO RASO. MOLDURAS Y ZOCALOS													
08,04,01	RESTITUCIÓN DE ZÓCALO EN CONCRETO HMIN=0.35M A HMAX=1.40M.	M2	$ 15.729,00	22,15	$ 348.397,00	0,00	-	-22,15	$ 0,00	-	-$ 348.397,00		$ 0,00	
	CIELO RASO EN DRYWALL RF 1/2" CON ESTRUCTURA METÁLICA Y ACABADO EN PINTURA TIPO UNO TRES MANOS	M2	$ 89.229,00		$ 0,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
11,02,01	CIELO RASO EN PLACA FIBROCEMENTO 6 MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA.	M2	$ 102.632,00	877,06	$ 90.014.422,00	0,00	-	-877,06	$ 0,00	-	-$ 90.014.422,00	0,000	$ 0,00	
11,02,02	CIELORRASO EN SUPERBOARD RH DE 8MM, ESTRUCTURA EN VIGUETAS Y OMEGAS G60 CAL 24, OMEGAS C/D 407MM, VIGUETAS 39MM C/D 813MM, TENSORES DE ALAMBRE CAL 14 CD 915MM. INCLUYE MASILLA Y PINTURA	M2	$ 103.977,00	56,89	$ 5.915.252,00	0,00	-	-56,89	$ 0,00	-	-$ 5.915.252,00	0,000	$ 0,00	
08,07,01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA EN RESINA POLIÉSTER. SECCIÓN 5X5CM; SIN POROS CON TERMINACIÓN A BORDE DELGADO DE SOBREPONER EN OBRA YA TERMINADA. INCLUYE MATERIAL PARA PEGUE	M	$ 50.743,00	11,86	$ 601.812,00	0,00	-	-11,86	$ 0,00	-	-$ 601.812,00		$ 0,00	
	RESTAURACIÓN MOLDURAS													
08,03,01	MOLDURAS 5X5CM: RETIRO DE SECCIÓN AFECTADA, ELABORACIÓN DE MOLDE EN YESO SEGÚN FORMATO EXISTENTE, RESTITUCIÓN DE LA PIEZA COMPLETA.	M	$ 261.668,00	48,37	$ 12.656.009,00	0,00	+	0,00	$ 872,00	+	$ 0,00	48,370	$ 12.656.881,00	
08,03,02	ROSETÓN DE D=.30M APROXIMÁDAMENTE: RETIRO DE SECCIÓN AFECTADA, ELABORACIÓN DEL MOLDE PARA CUADRANTE FALTANTE Y RESTITUCIÓN DEL ELEMENTO EN YESO.	UND	$ 549.859,00	2,00	$ 1.099.718,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	2,000	$ 1.099.718,00	
08,03,03	MOLDURAS EXTERNAS: LIMPIEZA MECÁNICA CON ESCOBILLADO EN SECO, SEGUIDO DE LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA SIN PRESIÓN, APLICACIÓN DE FUNGICIDA.	M2	$ 13.751,00	118,14	$ 1.624.543,00	0,00	-	-118,14	$ 0,00	-	-$ 1.624.543,00		$ 0,00	
08,03,04	RESTAURACIÓN DE BALAUSTRADA EN CONCRETO (INCLUYE LIJADA DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA).	M	$ 51.371,00	11,34	$ 582.547,00	0,00	-	-11,34	$ 0,00	-	-$ 582.547,00		$ 0,00	
08,03,05	RESTITUCIÓN DE BALAUSTRE Y PINÁCULO EN CONCRETO (INCLUYE MODELADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M	$ 52.683,00	1,00	$ 52.683,00	0,00	-	-1,00	$ 0,00	-	-$ 52.683,00		$ 0,00	
08,03,06	RESTAURACIÓN DE CORNISAS Y MOLDURAS EN MORTERO Y CEMENTO BLANCO - FACHADA	M	$ 27.569,00	64,47	$ 1.777.373,00	0,00	-	-64,47	$ 0,00	-	-$ 1.777.373,00		$ 0,00	
	RESTAURACIÓN CARPINTERÍA													
09,02,01	PUERTA ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMÍNICO COLOR BLANCO DE 6 MM ESTÁNDAR, ENCHAPADO EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE LA PUERTA DE 2.4 X 0.75 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO. MARCO EN MELAMINA RH DE 50 MM ANCHO. INCLUYE BISAGRAS Y CHAPA	UND	$ 743.388,00	7,00	$ 5.203.716,00	0,00	-	-5,00	$ 0,00	-	-$ 3.716.940,00	2,000	$ 1.486.776,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 001

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
INTERVENTOR: IBP INGENIERIA SAS

CONTRATO No: 4346-2024
VALOR: $ 14.732.771.385,00

OBRA: CAPILLA CONVENTO
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: (01/11/25) - (31/01/26)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					MAYORES (+) & MENORES (-)						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (31/01/2026)		JUSTIFICACIÓN
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	MAYORES (+)		MENORES (-)	MAYORES (+)		MENORES (-)	CANT	V. TOTAL	
09,02,02	PUERTA CORREDIZA UNA (1) HOJA ENTAMBORADA EN TABLERO MELAMÍNICO DE 6 MM ESTÁNDAR, ENCHAPADO EN CANTO PVC FLEXIBLE SIMILAR AL COLOR DE LA PUERTA. MARCO EN MELAMINA RH DE 50 MM ANCHO. INCLUYE SISTEMA DE RIEL Y CHAPA. ANCHO 0.90M, ALTO ? 4/M	UND	$ 1.553.314,00	1,00	$ 1.553.314,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	1,000	$ 1.553.314,00	
09,03,01	CELOSÍAS EN MADERA, (MURO DIVISORIO) 0,05X 5 M	UND	$ 3.518.874,00	68,00	$ 239.283.432,00	0,00	-	-58,00	$ 0,00	-	-$ 204.094.692,00	10,000	$ 35.188.740,00	
09,04,01	BARANDA CON ALTURA DE 0.90 METROS O SIMILAR: LIMPIEZA MECÁNICA CON GRATA Y LIJA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA. REINSTALACIÓN.	M	$ 64.708,00	10,42	$ 674.257,00	0,00	-	-10,42	$ 0,00	-	-$ 674.257,00	0,000	$ 0,00	
09,04,02	RESTAURACIÓN DE ÓCULOS D=1.20M, INCLUYE RETIRO DE CARPINTERÍA METÁLICA, LIMPIEZA MECÁNICA CON GRATA Y LIJA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA, REINSTALACIÓN POR MEDIO DE CHAZO EXPANSIVO O SIMILAR GARANTIZANDO UN ANCLAJE SEGURO.	UND	$ 199.937,00	2,00	$ 399.874,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	2,000	$ 399.874,00	
09,05,01	PUERTA PARA CUARTOS TECNICOS 0.90X2.40 O SIMILAR. FABRICADA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED O GALVANIZADA CALIBRES 20 O 18. MARCO FABRICADO EN ACERO COLD ROLLED O GALVANIZADO CALIBRE 16 O 18. REJILLAS TIPO LOUVER CON DIVISORES PARA VENTILACIÓN. INCLUYE CERRADURA CON MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE, ANCLAJES DE NYLON PARA SUJECIÓN A PARED Y BISAGRAS. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	UND	$ 2.758.664,00	6,00	$ 16.551.984,00	0,00	-	-4,00	$ 0,00	-	-$ 11.034.656,00	2,000	$ 5.517.328,00	
09,05,02	PUERTAS Y DIVISIONES FLOTANTES EN ACERO INOXIDABLE DE H MAX =2.5M	M2	$ 2.856.204,00	31,25	$ 89.256.375,00	0,00	-	-31,25	$ 0,00	-	-$ 89.256.375,00	0,000	$ 0,00	
	MUEBLES MADERA													
09,01,01	MUEBLES FIJOS ALTURA DE ANTEPECHOS CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y/O CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO	M	$ 68.692,00	16,49	$ 1.132.731,00	0,00	-	-16,49	$ 0,00	-	-$ 1.132.731,00	0,000	$ 0,00	
09,01,02	MUEBLE DE RECEPCIÓN CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO	UND	$ 3.545.571,00	1,00	$ 3.545.571,00	0,00	-	-1,00	$ 0,00	-	-$ 3.545.571,00	0,000	$ 0,00	
09,01,03	MUEBLES FIJOS INCRUSTADOS EN EL MURO DE CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO DE 0,60 PROFUNDIDAD	M	$ 78.388,00	28,92	$ 2.266.981,00	0,00	-	-28,92	$ 0,00	-	-$ 2.266.981,00	0,000	$ 0,00	
09,01,04	MESÓN PARA COCINA QUARZTONE CLOUDY O SIMILAR. MESÓN CARPINTERÍA EN MADERA CON MUEBLE INFERIOR DE COCINA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO (BLANCO), CON PUERTAS, ENTREPAÑOS Y CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO. INCLUYE POCETA LAVAPLATOS VALENCIA 40X40 DE BAJO PONER EN ACERO INOXIDABLE	M	$ 1.484.745,00	1,20	$ 1.781.694,00	0,00	-	-1,20	$ 0,00	-	-$ 1.781.694,00	0,000	$ 0,00	
09,01,05	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA PARA LIBROS. DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO DE 0.80X1.6 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO. DEBE INCLUIR SOPORTE PARA LIBROS Y RODACHINES CON FRENO. NOTA: LAS DIMENSIONES DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA	UND	$ 2.034.349,00	49,00	$ 99.683.101,00	0,00	-	-49,00	$ 0,00	-	-$ 99.683.101,00	0,000	$ 0,00	
09,01,06	MUEBLES FIJOS FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO Y LAMINADO MELAMÍNICO DE 4.30X2.40M O SIMILAR. PUERTAS CORREDIZAS Y ENTREPAÑOS PARA ALMACENAMIENTO. COLOR SEGÚN RESTAURACIÓN INTEGRAL.	UND	$ 1.594.490,00	1,00	$ 1.594.490,00	0,00	-	-1,00	$ 0,00	-	-$ 1.594.490,00	0,000	$ 0,00	
09,01,07	CONSTRUCCIÓN DE PEDESTALES EN MADERA SESCCIÓN 20X20CM O SIMILAR, FABRICADOS EN TABLERO AGLOMERADO Y LAMINADO MELAMÍNICO DE 15MM DE ESPESOR COLOR DELFINES AL ATARDECER.	UND	$ 2.749.121,00	2,00	$ 5.498.242,00	0,00	-	-2,00	$ 0,00	-	-$ 5.498.242,00	0,000	$ 0,00	
09,01,08	MUEBLES FIJOS ALTURA DE ANTEPECHOS CARPINTERÍA EN MADERA FABRICADO EN TABLERO AGLOMERADO, ENTREPAÑOS Y CAJONERAS PARA ALMACENAMIENTO. PARA ABSIDE CAPILLA (0,4 X 0,4)	UND	$ 384.877,00	1,00	$ 384.877,00	0,00	-	-1,00	$ 0,00	-	-$ 384.877,00	0,000	$ 0,00	
24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES (15%, QUINCE PORCIENTO PARA ESTE COMPONENTE)	UND	$ 693.676.269,00	0,15	$ 104.051.440,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,150	$ 104.051.440,00	
	PUERTAS, VENTANAS PVC Y BARANDAS													
09,06,01	PUERTA CON CUERPO FIJO SUPERIOR EN VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO DE 8 MM AHUMADO. MARCO EN PVC, CON CERRADURAS INDEPENDIENTES EN ACERO INOXIDABLE. AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. INCLUYE BISAGRAS Y MANIJA INSTITUCIONAL EN ACERO INOXIDABLE	M2	$ 1.107.497,00	14,24	$ 15.770.757,00	0,00	-	-14,24	$ 0,00	-	-$ 15.770.757,00	0,000	$ 0,00	
09,06,02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO, CON MARCO EN PVC SEGÚN DISEÑO DE 0.90X2.40 M. INCLUYE AISLAMIENTO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO.	UND	$ 3.064.345,00	2,00	$ 6.128.690,00	0,00	-	-2,00	$ 0,00	-	-$ 6.128.690,00	0,000	$ 0,00	
09,06,03	PUERTA VENTANA. PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO ALTURA VARIABLE SIN MARCO. VENTANA FIJA. MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO. VANO APROX. ANCHO 3.40M X ALTO 2.46M	UND	$ 8.750.967,00	6,00	$ 52.505.802,00	0,00	-	-6,00	$ 0,00	-	-$ 52.505.802,00	0,000	$ 0,00	
09,07,01	VENTANERÍA FIJA: MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO.	M2	$ 1.133.018,00	31,15	$ 35.297.967,00	0,00	-	-31,15	$ 0,00	-	-$ 35.297.967,00	0,000	$ 0,00	
09,07,02	VENTANA FIJA. MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO. 1.20X2.81M	UND	$ 3.701.811,00	11,00	$ 40.719.921,00	0,00	-	-11,00	$ 0,00	-	-$ 40.719.921,00	0,000	$ 0,00	
09,07,03	VENTANA ABATIBLE DE 2.80M DE ALTO X 1.2M DE ANCHO. MARCO EN PVC Y SELLO ACÚSTICO PERIMETRAL CON POLIURETANO EXPANSIVO O NEOPRENO. VIDRIO TEMPLADO Y LAMINADO.	UND	$ 1.223.443,00	7,00	$ 8.564.101,00	0,00	-	-7,00	$ 0,00	-	-$ 8.564.101,00	0,000	$ 0,00	
09,08,01	VENTANA FIJA CON DIVISIONES -MURO CORTINA GALERÍA SENCILLA VIDRIO ENERGY ADVANTAGE 4MM O SUPERIOR	M2	$ 844.941,00	50,41	$ 42.593.476,00	0,00	-	-50,41	$ 0,00	-	-$ 42.593.476,00	0,000	$ 0,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 001

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
INTERVENTOR: IBP INGENIERIA SAS

CONTRATO No: 4346-2024
VALOR: $ 14.732.771.385,00

OBRA: CAPILLA CONVENTO
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: (01/11/25) - (31/01/26)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					MAYORES (+) & MENORES (-)						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (31/01/2026)		JUSTIFICACIÓN
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	MAYORES (+)		MENORES (-)	MAYORES (+)		MENORES (-)	CANT	V. TOTAL	
09,09,01	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE ALTURA 0.93 M. Ø0.03M INCLUYE HERRAJES Y ANCLAJES A PISO.	M	$ 537.983,00	27,29	$ 14.681.556,00	0,00	-	-27,29	$ 0,00	-	-$ 14.681.556,00	0,000	$ 0,00	
09,09,02	BARANDA A PARED (PASAMANOS) EN ACERO INOXIBABLE. TUBULAR REDONDE DE Ø2", ANCLAJE PLATINA 2"X1/4"	M	$ 158.379,00	2,40	$ 380.110,00	0,00	-	-2,40	$ 0,00	-	-$ 380.110,00	0,000	$ 0,00	
	BARANDA EN TUBERÍA DE ESTRUCTURA METÁLICA 2" DE ALTURA 1.20 M ELEMENTOS VERTICALES CADA 0,90CM Y 2 ELEMENTOS HORIZONTALES 1/2" . INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ML	$ 546.100,00		$ 0,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,000	$ 0,00	
09,09,03	BARANDA DE VIDRIO 6+6 PERFIL EN ALUMINIO (CORO)	M	$ 391.058,00	1,60	$ 625.693,00	0,00	-	-1,60	$ 0,00	-	-$ 625.693,00	0,000	$ 0,00	
	RESTAURACIÓN DE PISOS													
10,01,01	RETIRO MANUAL DE HUELLAS DE ANIMALES, LIMPIEZA CON ACCIÓN MECÁNICA EN SECO, POSTERIOR LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON JABÓN NEUTRO Y AGUA.	M2	$ 3.661,00	13,25	$ 48.508,00	0,00	-	-13,25	$ 0,00	-	-$ 48.508,00		$ 0,00	
10,01,02	RESTAURACIÓN DE ALISTADO EN MADERA COLOR NATURAL EXISTENTE, APLICACIÓN DE LACA (CORO)	M2	$ 18.686,00	56,20	$ 1.050.116,00	0,00	-	-56,20	$ 0,00	-	-$ 1.050.116,00		$ 0,00	
10,01,03	RETIRO, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RESTITUCIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN DE CEMENTO DE PIEZAS DAÑADAS (APROXIMÁDAMENTE 30% DEL ÁREA) VERIFICANDO TAMAÑO A LAS EXISTENTES.	M2	$ 47.002,00	3,70	$ 173.813,00	0,00	-	-3,70	$ 0,00	-	-$ 173.813,00		$ 0,00	
10,01,04	DESTRONQUE, PULIDA Y ESMALTADA DE PISO EN MÁRMOL BLANCO ESMALTADO CON PATRÓN IRREGULAR	M2	$ 32.691,00	61,02	$ 1.994.805,00	0,00	-	-61,02	$ 0,00	-	-$ 1.994.805,00		$ 0,00	
10,01,05	LIMPIEZA CON JABÓN NEUTRO Y AGUA DE PISOS EXTERIORES BALDOSÍN DE CEMENTO Y/O SIMILAR	M2	$ 9.461,00	277,48	$ 2.625.267,00	0,00	-	-277,48	$ 0,00	-	-$ 2.625.267,00		$ 0,00	
10,02,01	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, E = 0.04M	M2	$ 38.734,00	715,13	$ 27.699.845,00	0,00	-	-715,13	$ 0,00	-	-$ 27.699.845,00		$ 0,00	
10,02,02	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:4, E = 0.04M	M2	$ 32.361,00	1.072,05	$ 34.692.610,00	0,00	-	-1072,05	$ 0,00	-	-$ 34.692.610,00		$ 0,00	
10,02,05	INSTALACIÓN DE PISO EN PORCELANATO PARA ZONAS HÚMEDAS COLOR BEIGE	M2	$ 109.244,00	83,60	$ 9.133.017,00	0,00	-	-83,60	$ 0,00	-	-$ 9.133.017,00		$ 0,00	
10,02,06	PISO EN TABLÓN DE GRES 30X30	M2	$ 98.685,00	833,45	$ 82.248.915,00	0,00	-	-833,45	$ 0,00	-	-$ 82.248.915,00		$ 0,00	
10,02,07	PISO SEMIPERMEABLE - GRAMOQUÍN PREFABRICADO	M2	$ 88.326,00	105,53	$ 9.320.866,00	0,00	-	-105,53	$ 0,00	-	-$ 9.320.866,00		$ 0,00	
10,02,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA VIBRO PRENSADA 30X30CM, TONO BLANCO HUILA Y/O SIMILAR. INCLUYE PEGAMENTO, BOQUILLA Y TODOS LOS ELEMENTOS	M2	$ 117.856,00	20,00	$ 2.357.120,00	0,00	-	-20,00	$ 0,00	-	-$ 2.357.120,00		$ 0,00	
10,02,09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA PREFABRICADAS CON GRANITO. SECCIÓN DE 4X5X50 CMS	M	$ 32.156,00	129,03	$ 4.148.960,00	0,00	-	-129,03	$ 0,00	-	-$ 4.148.960,00		$ 0,00	
	RESTAURACIÓN CIELO RASOS													
11,01,01	RETIRO DE TUBERÍA PARASITA, LIMPIEZA MECÁNICA EN SECO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 6.391,00	129,25	$ 826.037,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	129,250	$ 826.037,00	
11,01,02	LIMPIEZA EN SECO, CON ESCOBA DE CERDAS SUAVES, RECOLECCIÓN CON ASPIRADORA EN PUNTOS DE ALTA CONCENTRACIÓN.	M2	$ 16.780,00	259,50	$ 4.354.410,00	0,00	-	-259,50	$ 0,00	-	-$ 4.354.410,00		$ 0,00	
11,01,03	RELLENO EN MASILLA EN ÁREA AFECTADA EN TECHOS, CON MORTERO DE CAL Y ARENA DE PEÑA.	M2	$ 27.976,00	247,41	$ 6.921.542,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	247,410	$ 6.921.542,00	
11,01,04	RESTAURACIÓN DE MADERA DE CUBIERTAS CATALOGADAS COMO MEDIANAMENTE RESISTENTES CON AFECTACIÓN MAYOR DEL 30% (SECCIÓN TRANSVERSAL, NO DISMINUIDA MAS DEL 20%). MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE UN NUEVO ELEMENTO ASUMIENDO SU FUNCIÓN ESTRUCTURAL	M	$ 337.089,00	8,80	$ 2.966.383,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	8,800	$ 2.966.383,00	
11,01,05	LIBERACIÓN DE AGREGADOS ARQUITECTÓNICOS, LIMPIEZA CON AGUA Y JABÓN NEUTRO Y RESTITUCIÓN DE MAMPUESTOS Y JUNTAS AFECTADAS.	M2	$ 59.751,00	1.639,55	$ 97.964.752,00	0,00	-	-1639,55	$ 0,00	-	-$ 97.964.752,00		$ 0,00	
	PAÑETE. ESTUCO Y PINTURA													
12,01,01	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 PARA MUROS INTERIORES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	$ 28.013,00	322,13	$ 9.023.716,00	0,00	-	-322,13	$ 0,00	-	-$ 9.023.716,00		$ 0,00	
12,01,02	ACABADO CON PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, ESPESOR 1.5CM. INCLUYE ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE PRESENTACIÓN PLÁSTICA, SELLADOR ACRÍLICO Y PINTURA EPÓXICA SEMI MATE DE DOS COMPONENTES (EPOXI-POLIAMIDA)	M2	$ 67.411,00	80,53	$ 5.428.709,00	0,00	-	-80,53	$ 0,00	-	-$ 5.428.709,00		$ 0,00	
12,02,01	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE	M2	$ 21.945,00	80,53	$ 1.767.264,00	0,00	-	-80,53	$ 0,00	-	-$ 1.767.264,00		$ 0,00	
12,02,02	ACABADO EN PINTURA VINÍLICA TIPO 1, 3 MANOS.	M2	$ 18.586,00	1.449,57	$ 26.941.652,00	0,00	-	-1449,57	$ 0,00	-	-$ 26.941.652,00		$ 0,00	
12,02,03	ACABADO EN PINTURA ANTIHONGOS EN 3 MANOS, COLOR A DEFINIR	M2	$ 16.792,00	161,06	$ 2.704.570,00	0,00	-	-161,06	$ 0,00	-	-$ 2.704.570,00		$ 0,00	
12,02,04	PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASOS	M2	$ 17.526,00	322,13	$ 5.645.580,00	0,00	-	-322,13	$ 0,00	-	-$ 5.645.580,00	0,000	$ 0,00	
	ALIMENTADORES, ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Y SALIDAS													
13,01,01	SUBCONTRATO DE EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS 275 NORMA CODENSA, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS	UND	$ 2.265.049,00	12,00	$ 27.180.588,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	12,000	$ 27.180.588,00	
13,01,02	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO NORMAL DE CIRCUITOS 1ER PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.	M	$ 33.415,00	6,00	$ 200.490,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	6,000	$ 200.490,00	
13,01,03	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO NORMAL DE CIRCUITOS 2DO PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X6+1X6+1X10T CU LSZH.	M	$ 46.170,00	17,00	$ 784.890,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	17,000	$ 784.890,00	
13,01,04	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA UPS DE 15KVA EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X6+1X6+1X10T CU LSZH.	M	$ 46.170,00	6,00	$ 277.020,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	6,000	$ 277.020,00	
13,01,05	ACOMETIDA EN B.T. DESDE UPS HASTA TABLERO REGULADO 1ER PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X6+1X6+1X10T CU LSZH.	M	$ 46.170,00	6,00	$ 277.020,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	6,000	$ 277.020,00	
13,01,06	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TABLERO REGULADO 1ER PISO HASTA TABLERO REGULADO 2DO PISO EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.	M	$ 33.415,00	20,00	$ 668.300,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	20,000	$ 668.300,00	
13,01,07	ACOMETIDA EN B.T. DESDE TGD HASTA TABLERO BOMBAS EN CABLE BAJO EN HALÓGENOS 3X8+1X8+1X10T CU LSZH.	M	$ 33.415,00	22,00	$ 735.130,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	22,000	$ 735.130,00	
13,01,08	DUCTO PVC DE 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M	$ 11.563,00	80,00	$ 925.040,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	80,000	$ 925.040,00	
	SALIDAS													

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 001

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
INTERVENTOR: IBP INGENIERIA SAS

CONTRATO No: 4346-2024
VALOR: $ 14.732.771.385,00

OBRA: CAPILLA CONVENTO
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: (01/11/25) - (31/01/26)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					MAYORES (+) & MENORES (-)					4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (31/01/2026)		JUSTIFICACIÓN
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	MAYORES (+)		MENORES (-)	MAYORES (+)		MENORES (-)	CANT	V. TOTAL	
13,03,01	SALIDA PARA LUMINARIAS (SOLO INCLUYE TUBERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 162.308,00	301,00	$ 48.854.708,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	301,000	$ 48.854.708,00	
13,03,02	SALIDA PARA ILUMINARIAS EMERGERGENCIA (SOLO INCLUYE TUNERÍA EMT DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 164.120,00	58,00	$ 9.518.960,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	58,000	$ 9.518.960,00	
13,03,03	SALIDA PARA LUMINARIAS EXTERIORES (SOLO INCLUYE TUBERÍA PVC DE 3/4", CABLEADO, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y EMPALMES)	UND	$ 173.020,00	124,00	$ 21.454.480,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	124,000	$ 21.454.480,00	
13,03,04	ALIMENTACIÓN CIRCUITOS RAMALES DESDE TABLERO DE CIRCUITOS HASTA LA PRIMERA SALIDA DE CADA CIRCUITO 3X12 LSZH	M	$ 13.601,00	1.500,00	$ 20.401.500,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	1.500,000	$ 20.401.500,00	
13,03,05	SALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, 120V. 15 AMP: EN TUBERÍA EMT 3/4¨. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 165.340,00	167,00	$ 27.611.780,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	167,000	$ 27.611.780,00	
13,03,06	SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 202.783,00	10,00	$ 2.027.830,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	10,000	$ 2.027.830,00	
13,03,07	SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA COLOR NARANJA POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12	UND	$ 136.664,00	30,00	$ 4.099.920,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	30,000	$ 4.099.920,00	
13,03,08	SALIDA CIRCUITO EXCLUSIVO TOMACORRIENTE SECA MANOS, HORNO MICROONDAS Y OTROS CON POLO A TIERRA EN MURO 15A 120V, EN TUBERÍA PVC 3/4. INCLUYE CABLE 3X12	UND	$ 128.051,00	6,00	$ 768.306,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	6,000	$ 768.306,00	
13,03,09	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL COLOR BLANCO POLO A TIERRA EN MURO 15A 125V. INCLUYE TOMA Y CABLE 3X12. NO SE INCLUYE CANALETA	UND	$ 92.956,00	82,00	$ 7.622.392,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	82,000	$ 7.622.392,00	
13,03,10	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERÍA EMT 3/4. INCLUYE INTERRUPTOR Y CABLE 3X12	UND	$ 70.728,00	35,00	$ 2.475.480,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	35,000	$ 2.475.480,00	
13,03,11	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°. INCLUYE CABLEADO 3X12, SENSOR Y TUBERÍA EMT	UND	$ 240.869,00	55,00	$ 13.247.795,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	55,000	$ 13.247.795,00	
	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO, CANALETAS - BANDEJAS PORTACABLES													
13,04,01	BANDEJA TIPO MALLA DE 30 CM GALVANIZADA PERIMETRAL DE 300X54 MM PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO	M	$ 129.297,00	140,00	$ 18.101.580,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	140,000	$ 18.101.580,00	
13,04,02	CANALETA PERIMETRAL METÁLICA DE 12X5 CM EN LAMINA DE COLD ROLL DOBLE DIVISIÓN PARA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA ELÉCTRICO	M	$ 44.799,00	92,00	$ 4.121.508,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	92,000	$ 4.121.508,00	
13,06,01	ELECTRODO O VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4 M CU PARA PUESTA A TIERRA.	UND	$ 291.915,00	4,00	$ 1.167.660,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	4,000	$ 1.167.660,00	
13,06,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO 2/0 EN CU	M	$ 90.199,00	65,00	$ 5.862.935,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	65,000	$ 5.862.935,00	
13,06,03	SOLDADURA EXOTÉRMICA	UND	$ 54.718,00	6,00	$ 328.308,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	6,000	$ 328.308,00	
13,06,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA INSPECCIÓN PARA VARILLA PUESTA A TIERRA DE 30X30X30 CM PREFABRICADA. INCLUYE MARCO	UND	$ 190.553,00	1,00	$ 190.553,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	1,000	$ 190.553,00	
	SISTEMAS DE COMUNICACIONES													
14,01,01	CAJA DE MAMPOSTERÍA SENCILLA PARA COMUNICACIONES	UND	$ 534.265,00	2,00	$ 1.068.530,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	2,000	$ 1.068.530,00	
14,01,02	CANALIZACIÓN 2 DUCTOS PVC DE 2" (SOLO INCLUYE LOS TUBOS)	M	$ 89.299,00	32,00	$ 2.857.568,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	32,000	$ 2.857.568,00	
14,01,03	SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN CANALETA. INCLUYE CANALETA	UND	$ 121.304,00	31,00	$ 3.760.424,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	31,000	$ 3.760.424,00	
14,01,04	SALIDA PARA VOZ Y DATOS EN DUCTO. INCLUYE DUCTO	UND	$ 121.566,00	11,00	$ 1.337.226,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	11,000	$ 1.337.226,00	
14,01,05	CABLE UTP 4 PARES CATEGORÍA 6A	M	$ 6.775,00	800,00	$ 5.420.000,00	0,00	-	-800,00	$ 0,00	-	-$ 5.420.000,00	0,000	$ 0,00	
14,01,06	SALIDA DOBLE PARA DATOS. INCLUYE CAJA 5800, FACEPLATE CON JACK DE 2 INSERTOS RJ 45	UND	$ 45.341,00	46,00	$ 2.085.686,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	46,000	$ 2.085.686,00	
14,01,07	PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A 1,00M	UND	$ 32.097,00	42,00	$ 1.348.074,00	0,00	-	-42,00	$ 0,00	-	-$ 1.348.074,00	0,000	$ 0,00	
	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS													
14,02,01	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO (INCLUYE SENSOR FOTOELÉCTRICO)	UND	$ 383.837,00	45,00	$ 17.272.665,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	45,000	$ 17.272.665,00	
14,02,02	SALIDA PARA ESTACIÓN MANUAL (INCLUYE ESTACIÓN MANUAL)	UND	$ 474.729,00	15,00	$ 7.120.935,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	15,000	$ 7.120.935,00	
14,02,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FPLR ANTI FLAMA PARA DETECCIÓN DE INCENDIO 2X16	M	$ 9.738,00	410,00	$ 3.992.580,00	0,00	-	-410,00	$ 0,00	-	-$ 3.992.580,00		$ 0,00	
14,02,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA EN TECHO	UND	$ 680.078,00	15,00	$ 10.201.170,00	0,00	-	-15,00	$ 0,00	-	-$ 10.201.170,00		$ 0,00	
	SISTEMA AUDIOVISUAL INFRAESTRUCTURA													
14,03,01	SALIDA PARA CÁMARAS CCTV EN DUCTO EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CAJA GALVANIZADA. NO INCLUYE CÁMARA.	UND	$ 76.870,00	24,00	$ 1.844.880,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	24,000	$ 1.844.880,00	
14,03,02	CABLE UTP CAT 6A	M	$ 6.775,00	600,00	$ 4.065.000,00	0,00	-	-600,00	$ 0,00	-	-$ 4.065.000,00	0,000	$ 0,00	
14,03,03	MONITOR 34" HD 4K	UND	$ 2.469.869,00	1,00	$ 2.469.869,00	0,00	-	-1,00	$ 0,00	-	-$ 2.469.869,00		$ 0,00	
14,03,05	NVR 16 CANALES POE IP 8MP 4K	UND	$ 1.531.762,00	2,00	$ 3.063.524,00	0,00	-	-2,00	$ 0,00	-	-$ 3.063.524,00	0,000	$ 0,00	
14,04,01	SALIDA DE SONIDO INCLUYENDO CAJAS, DUCTO DE PVC DE 3/4" Y ALAMBRE DE ACERO GUÍA (NO INCLUYE BAFLE, CORNETA O PARLANTE)	UND	$ 123.147,00	6,00	$ 738.882,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	6,000	$ 738.882,00	
14,04,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA DE 30X30X12CM Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO.	UND	$ 235.521,00	1,00	$ 235.521,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	1,000	$ 235.521,00	
14,04,05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE SONIDO 2X16 AWG. PVC. LIBRE DE OXÍGENO Y ACCESORIOS PARA CONEXIONADO	M	$ 4.363,00	65,00	$ 283.595,00	0,00	-	-65,00	$ 0,00	-	-$ 283.595,00	0,000	$ 0,00	
	PVC PRESIÓN													
15,01,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 2"	UND	$ 30.464,00	2,00	$ 60.928,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	2,000	$ 60.928,00	
15,01,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 2"	UND	$ 23.748,00	1,00	$ 23.748,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	1,000	$ 23.748,00	
15,01,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 2X1 1/4"	UND	$ 34.777,00	2,00	$ 69.554,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	2,000	$ 69.554,00	
15,01,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 2X1/2"	UND	$ 36.808,00	2,00	$ 73.616,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	2,000	$ 73.616,00	
15,01,05	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 20.447,00	237,30	$ 4.852.073,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	237,300	$ 4.852.073,00	
15,01,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/2"	M	$ 13.513,00	46,00	$ 621.598,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	46,000	$ 621.598,00	
15,01,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/2"	UND	$ 16.266,00	15,00	$ 243.990,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	15,000	$ 243.990,00	
15,01,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1"	UND	$ 9.402,00	4,00	$ 37.608,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	4,000	$ 37.608,00	
15,01,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/2X1, 1/4"	UND	$ 13.513,00	14,00	$ 189.182,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	14,000	$ 189.182,00	
15,01,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/2"	UND	$ 16.266,00	4,00	$ 65.064,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	4,000	$ 65.064,00	
15,01,11	TUBERÍA PVC.P Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 21.126,00	112,20	$ 2.370.337,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	112,200	$ 2.370.337,00	
15,01,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1,1/4"	UND	$ 8.036,00	110,90	$ 891.192,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	110,900	$ 891.192,00	
15,01,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 12.250,00	8,00	$ 98.000,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	8,000	$ 98.000,00	
15,01,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/4X3/4"	UND	$ 9.044,00	1,00	$ 9.044,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	1,000	$ 9.044,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 001

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
INTERVENTOR: IBP INGENIERIA SAS

CONTRATO No: 4346-2024
VALOR: $ 14.732.771.385,00

OBRA: CAPILLA CONVENTO
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: (01/11/25) - (31/01/26)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					MAYORES (+) & MENORES (-)					4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (31/01/2026)		JUSTIFICACIÓN
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	MAYORES (+)		MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	CANT	V. TOTAL	
15,01,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/4X1/2"	UND	$ 7.785,00	1,00	$ 7.785,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	1,000	$ 7.785,00	
15,01,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1, 1/4X1"	UND	$ 9.044,00	18,00	$ 162.792,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	18,000	$ 162.792,00	
15,01,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 37.020,00	3,00	$ 111.060,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	3,000	$ 111.060,00	
15,01,18	TUBERÍA PVC.P Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 17.885,00	197,70	$ 3.535.865,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	197,700	$ 3.535.865,00	
15,01,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1"	UND	$ 5.522,00	27,00	$ 149.094,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	27,000	$ 149.094,00	
15,01,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1"	UND	$ 14.399,00	2,00	$ 28.798,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	2,000	$ 28.798,00	
15,01,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X3/4"	UND	$ 5.748,00	3,00	$ 17.244,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	3,000	$ 17.244,00	
15,01,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 1X1/2"	UND	$ 5.748,00	2,00	$ 11.496,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	2,000	$ 11.496,00	
15,01,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 1X3/4"	UND	$ 9.806,00	1,00	$ 9.806,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	1,000	$ 9.806,00	
15,01,24	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1"	UND	$ 156.274,00	3,00	$ 468.822,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	3,000	$ 468.822,00	
15,01,25	REGISTRO DE CORTE Ø 1"	UND	$ 27.715,00	2,00	$ 55.430,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	2,000	$ 55.430,00	
15,01,26	CAJILLA PARA MEDIDOR DE PISO Ø 1"	UND	$ 61.207,00	1,00	$ 61.207,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	1,000	$ 61.207,00	
15,01,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR Ø 1"	UND	$ 663.842,00	2,00	$ 1.327.684,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	2,000	$ 1.327.684,00	
15,01,28	CHEQUE Ø 1"	UND	$ 53.005,00	1,00	$ 53.005,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	1,000	$ 53.005,00	
15,01,29	FLOTADOR MECÁNICO Ø 1"	UND	$ 54.236,00	2,00	$ 108.472,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	2,000	$ 108.472,00	
15,01,30	CAJILLA PARA UN MEDIDOR DE PISO Ø 1" PARA INCENDIO	UND	$ 61.207,00	1,00	$ 61.207,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	1,000	$ 61.207,00	
15,01,31	TUBERÍA PVC.P Ø 3/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 15.475,00	126,20	$ 1.952.945,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	126,200	$ 1.952.945,00	
15,01,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 4.071,00	38,00	$ 154.698,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	38,000	$ 154.698,00	
15,01,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 5.361,00	6,00	$ 32.166,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	6,000	$ 32.166,00	
15,01,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 21.439,00	3,00	$ 64.317,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	3,000	$ 64.317,00	
15,01,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.P Ø 3/4X1/2"	UND	$ 4.538,00	11,00	$ 49.918,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	11,000	$ 49.918,00	
15,01,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE REDUCIDA PVC.P Ø 3/4X1/2"	UND	$ 6.403,00	4,00	$ 25.612,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	4,000	$ 25.612,00	
15,01,37	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3/4"	UND	$ 112.418,00	2,00	$ 224.836,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	2,000	$ 224.836,00	
15,01,38	FLOTADOR MECÁNICO Ø 3/4"	UND	$ 54.236,00	2,00	$ 108.472,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	2,000	$ 108.472,00	
15,01,39	VÁLVULA SOLENOIDE Ø 3/4"	UND	$ 236.099,00	1,00	$ 236.099,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	1,000	$ 236.099,00	
15,01,40	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE Ø 3/4"	UND	$ 398.644,00	2,00	$ 797.288,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	2,000	$ 797.288,00	
15,01,41	TUBERÍA PVC.P Ø 1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 10.249,00	89,00	$ 912.161,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	89,000	$ 912.161,00	
15,01,42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 4.017,00	48,00	$ 192.816,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	48,000	$ 192.816,00	
15,01,43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 6.464,00	13,00	$ 84.032,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	13,000	$ 84.032,00	
15,01,44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA ROSCADA PVC.P Ø 1/2"	UND	$ 16.051,00	4,00	$ 64.204,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	4,000	$ 64.204,00	
15,01,45	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/2"	UND	$ 310.712,00	4,00	$ 1.242.848,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	4,000	$ 1.242.848,00	
15,01,46	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1,1/4"	UND	$ 233.371,00	3,00	$ 700.113,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	3,000	$ 700.113,00	
15,01,47	ABRAZADERAS Ø 1,1/2"-1/2"	UND	$ 7.774,00	58,00	$ 450.892,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	58,000	$ 450.892,00	
15,01,48	ABRAZADERAS Ø 1,1/4"-1/2"	UND	$ 8.927,00	24,00	$ 214.248,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	24,000	$ 214.248,00	
15,01,49	LLAVE MANGUERA Ø 1/2"	UND	$ 48.400,00	6,00	$ 290.400,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	6,000	$ 290.400,00	
15,01,50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 1, 1/4"	UND	$ 9.385,00	28,00	$ 262.780,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	28,000	$ 262.780,00	
15,01,51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC.P Ø 3/4"	UND	$ 6.829,00	7,00	$ 47.803,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	7,000	$ 47.803,00	
15,01,52	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 1/2"	UND	$ 116.529,00	6,00	$ 699.174,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	6,000	$ 699.174,00	
	PVC SANITARIA Y ALCANTARILLADO												
15,02,01	TUBERÍA PVC.S Ø 6". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 103.405,00	318,80	$ 32.965.514,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	318,800	$ 32.965.514,00	
15,02,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 6"	UND	$ 157.233,00	4,00	$ 628.932,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	4,000	$ 628.932,00	
15,02,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 6"	UND	$ 172.366,00	1,00	$ 172.366,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	1,000	$ 172.366,00	
15,02,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 6X4"	UND	$ 163.020,00	12,00	$ 1.956.240,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	12,000	$ 1.956.240,00	
15,02,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 6X3"	UND	$ 168.676,00	6,00	$ 1.012.056,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	6,000	$ 1.012.056,00	
15,02,06	TUBERÍA PVC.S Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 52.701,00	54,40	$ 2.866.934,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	54,400	$ 2.866.934,00	
15,02,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 4"	UND	$ 30.168,00	35,00	$ 1.055.880,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	35,000	$ 1.055.880,00	
15,02,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 4"	UND	$ 35.581,00	4,00	$ 142.324,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	4,000	$ 142.324,00	
15,02,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 4"	UND	$ 47.449,00	15,00	$ 711.735,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	15,000	$ 711.735,00	
15,02,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 4"	UND	$ 19.658,00	72,00	$ 1.415.376,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	72,000	$ 1.415.376,00	
15,02,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE LIMPIEZA PVC.S Ø 4"	UND	$ 35.371,00	3,00	$ 106.113,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	3,000	$ 106.113,00	
15,02,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 4"	UND	$ 37.153,00	4,00	$ 148.612,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	4,000	$ 148.612,00	
15,02,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 36.837,00	14,00	$ 515.718,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	14,000	$ 515.718,00	
15,02,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 4X2"	UND	$ 36.837,00	14,00	$ 515.718,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	14,000	$ 515.718,00	
15,02,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 4X3"	UND	$ 20.072,00	23,00	$ 461.656,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	23,000	$ 461.656,00	
15,02,16	TUBERÍA PVC.S Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 33.984,00	19,80	$ 672.883,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	19,800	$ 672.883,00	
15,02,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 3"	UND	$ 19.592,00	174,00	$ 3.409.008,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	174,000	$ 3.409.008,00	
15,02,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 3"	UND	$ 23.937,00	3,00	$ 71.811,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	3,000	$ 71.811,00	
15,02,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 3"	UND	$ 34.550,00	7,00	$ 241.850,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	7,000	$ 241.850,00	
15,02,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 135º PVC.S Ø 3"	UND	$ 24.443,00	14,00	$ 342.202,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	14,000	$ 342.202,00	
15,02,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE REDUCIDA PVC.S Ø 3X2"	UND	$ 23.584,00	7,00	$ 165.088,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	7,000	$ 165.088,00	
15,02,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC.S Ø 3X2"	UND	$ 12.184,00	5,00	$ 60.920,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	5,000	$ 60.920,00	
15,02,23	TUBERÍA PVC.S Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 25.927,00	33,40	$ 865.962,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	33,400	$ 865.962,00	
15,02,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC.S Ø 2"	UND	$ 9.087,00	46,00	$ 418.002,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	46,000	$ 418.002,00	
15,02,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC.S Ø 2"	UND	$ 15.631,00	1,00	$ 15.631,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	1,000	$ 15.631,00	
15,02,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC.S Ø 2"	UND	$ 10.522,00	15,00	$ 157.830,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	15,000	$ 157.830,00	
15,02,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC.S Ø 2"	UND	$ 14.447,00	8,00	$ 115.576,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	8,000	$ 115.576,00	
15,02,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE PRUEBA PVC.S Ø 2"	UND	$ 10.821,00	18,00	$ 194.778,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	18,000	$ 194.778,00	
15,02,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN 180º PVC.S Ø 2"	UND	$ 16.144,00	1,00	$ 16.144,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	1,000	$ 16.144,00	
15,02,30	TUBERÍA PVC.L Ø 4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 37.817,00	111,60	$ 4.220.377,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	111,600	$ 4.220.377,00	
15,02,31	TUBERÍA PVC.L Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 23.298,00	505,80	$ 11.784.128,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	505,800	$ 11.784.128,00	
15,02,32	VÁLVULA DE ADMISIONES DE AIRE P.A.P.A Ø 3"	UND	$ 2.381.934,00	3,00	$ 7.145.802,00	0,00	-	-3,00	$ 0,00	-$ 7.145.802,00	0,000	$ 0,00	
15,02,33	ABRAZADERAS Ø 4"-2"	UND	$ 44.268,00	6,00	$ 265.608,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	6,000	$ 265.608,00	
15,02,34	TUBERÍA PVC. ALC Ø 8". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 75.073,00	129,60	$ 9.729.461,00	0,00		0,00	$ 0,00	$ 0,00	129,600	$ 9.729.461,00	
	DESMONTAJE DE CAMPANA GRANDE Y ESTRUCTURA DE SOPORTE UBICADA EN CUBIERTA DE TORRE CAMPANARIO (ALTURA 18 m). INCLUYE LIMPIEZA, RETIRO, EMBALAJE Y TRASLADO A SITIO DE ALMACENAMIENTO AUTORIZADO POR EL CLIENTE	UND	$ 2.188.636,00		$ 0,00	1,00	+	0,00	$ 2.188.636,00	$ 0,00	1,000	$ 2.188.636,00	
	DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA CON SECCION ENTRE LOS 40CM2 y 139CM2 . INCLUYE DISPOSICION FINAL	ML	$ 29.460,00		$ 0,00	1.544,00	+	0,00	$ 45.486.240,00	$ 0,00	1.544,000	$ 45.486.240,00	
	TUBERÍA PVC.L Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	ML	$ 15.488,00		$ 0,00	40,90	+	0,00	$ 633.459,00	$ 0,00	40,900	$ 633.459,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 001

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
INTERVENTOR: IBP INGENIERIA SAS

CONTRATO No: 4346-2024
VALOR: $ 14.732.771.385,00

OBRA: CAPILLA CONVENTO
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: (01/11/25) - (31/01/26)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					MAYORES (+) & MENORES (-)						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (31/01/2026)		JUSTIFICACIÓN
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	MAYORES (+)		MENORES (-)	MAYORES (+)		MENORES (-)	CANT	V. TOTAL	
	TUBERÍA PVC.P Ø 1 1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	ML	$ 14.210,00		$ 0,00	45,77	+	0,00	$ 650.392,00	+	$ 0,00	45,770	$ 650.392,00	
	DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA CON SECCION ENTRE LOS 140CM2 y 280CM2 . INCLUYE DISPOSICION FINAL	ML	$ 49.380,00		$ 0,00	385,00	+	0,00	$ 19.011.300,00	+	$ 0,00	385,000	$ 19.011.300,00	
	VÁLVULA DE DILUVIO MARCA HI-FOG® MODELO SVM-20 (25/25), CÓDIGO D00050.1 O SIMILAR CON SENSOR DE FLUJO, MANÓMETRO, TOMA DE PRUEBAS Y VÁLVULA SUPERVISADA DE CIERRE Y APERTURA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERÍA DE 25 MM	UND	$ 7.629.086,00		$ 0,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,000	$ 0,00	
15,02,35	FILTRO DE DRENAJE 4" PVC CORRUGADO. INCLUYE TUBERÍA, GEOTEXTIL Y GRAVILLA	M	$ 150.366,00	281,10	$ 42.267.883,00	0,00	-	-281,10	$ 0,00	-	-$ 42.267.883,00		$ 0,00	
	PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA Y APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS													
15,03,01	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1, 1/4"	UND	$ 42.168,00	12,00	$ 506.016,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	12,000	$ 506.016,00	
15,03,02	PUNTO HIDRÁULICO Ø 1/2"	UND	$ 29.393,00	22,00	$ 646.646,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	22,000	$ 646.646,00	
15,03,03	PUNTO HIDRÁULICO Ø 3/4"	UND	$ 32.094,00	5,00	$ 160.470,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	5,000	$ 160.470,00	
15,04,01	SALIDA SANITARIA Ø 4"	UND	$ 88.457,00	12,00	$ 1.061.484,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	12,000	$ 1.061.484,00	
15,04,02	SALIDA SANITARIA Ø 2"	UND	$ 72.679,00	22,00	$ 1.598.938,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	22,000	$ 1.598.938,00	
15,04,03	SIFÓN Ø 3". INCLUYE REJILLA	UND	$ 52.483,00	8,00	$ 419.864,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	8,000	$ 419.864,00	
15,05,01	CAJA DE INSPECCIÓN 0.6X0.6	UND	$ 493.300,00	33,00	$ 16.278.900,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	33,000	$ 16.278.900,00	
15,05,02	SUMIDEROS DE 65X15CM TIPO EAAB	UND	$ 764.009,00	7,00	$ 5.348.063,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	7,000	$ 5.348.063,00	
15,05,03	SUMIDEROS - CÁRCAMO CON REJA TIPO IDU 83.5X45 CM	M	$ 476.074,00	14,00	$ 6.665.036,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	14,000	$ 6.665.036,00	
16,01,01	KIT TAZA BALTICA PLUS ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.737.544,00	12,00	$ 20.850.528,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	12,000	$ 20.850.528,00	
16,01,02	ORINAL GOTTA ENTRADA POSTERIOR CON FLUXÓMETRO DE SENSOR Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.301.303,00	5,00	$ 6.506.515,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	5,000	$ 6.506.515,00	
16,01,03	LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO PIGMENTADO FUNDIDO EN SITIO. NO INCLUYE GRIFERÍA	M	$ 631.520,00	8,40	$ 5.304.768,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	8,400	$ 5.304.768,00	
16,01,04	LAVAMANOS FREE INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL ELECTRÓNICA Y/O SIMILAR.	UND	$ 706.177,00	3,00	$ 2.118.531,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	3,000	$ 2.118.531,00	
16,01,05	GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE SENSOR TUBULAR LARGO Y/O SIMILAR.	UND	$ 1.470.142,00	16,00	$ 23.522.272,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	16,000	$ 23.522.272,00	
16,01,06	DISPENSADOR DE JABÓN DE PARED EN ACERO INOX.	UND	$ 329.335,00	8,00	$ 2.634.680,00	0,00	-	-8,00	$ 0,00	-	-$ 2.634.680,00	0,000	$ 0,00	
16,01,07	DISPENSADOR DE ROLLO PAPEL HIGIÉNICO EN ACERO SOPORTE DEL ROLLO 40MM, INCLUYE SUPLEMENTO PARA ROLLOS CON CONO DE70MM.	UND	$ 256.038,00	12,00	$ 3.072.456,00	0,00	-	-12,00	$ 0,00	-	-$ 3.072.456,00	0,000	$ 0,00	
16,01,08	DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL DIMENSIONES 0.28X20.3X10.2CM. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO.	UND	$ 378.785,00	8,00	$ 3.030.280,00	0,00	-	-8,00	$ 0,00	-	-$ 3.030.280,00	0,000	$ 0,00	
16,01,09	BARRA DE SEGURIDAD CROMO 30" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE ABATIBLE.	UND	$ 422.776,00	2,00	$ 845.552,00	0,00	-	-2,00	$ 0,00	-	-$ 845.552,00	0,000	$ 0,00	
16,01,10	ESPEJOS 4MM, EN CRISTAL PULIDO, ENMARCADO EN U DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y ADHERIDOS A LA PARED	M2	$ 389.739,00	7,52	$ 2.930.837,00	0,00	-	-7,52	$ 0,00	-	-$ 2.930.837,00	0,000	$ 0,00	
	EQUIPOS 1													
13,07,03	DUCTO EN LÁMINA DE ACERO CR CALIBRE 14 DIÁMETRO ESPECIFICADO, INCLUYE ACCESORIOS DE REMATE, CODOS Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN.	M	$ 151.502,00	25,00	$ 3.787.550,00	0,00	-	-25,00	$ 0,00	-	-$ 3.787.550,00	0,000	$ 0,00	
13,07,04	RECUBRIMIENTO DE DUCTO DE ESCAPE EN LÁMINA DE ALUMINIO Y LANA DE VIDRIO ESPESOR 2"	M	$ 187.957,00	20,00	$ 3.759.140,00	0,00	-	-20,00	$ 0,00	-	-$ 3.759.140,00	0,000	$ 0,00	
13,07,05	INSTALACIÓN DE DUCTO Y SILENCIADOR	UND	$ 1.304.762,00	1,00	$ 1.304.762,00	0,00	-	-1,00	$ 0,00	-	-$ 1.304.762,00	0,000	$ 0,00	
13,07,06	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) DE LLENADO INICIAL DE LOS TANQUES	GAL	$ 12.810,00	1,00	$ 12.810,00	0,00	-	-1,00	$ 0,00	-	-$ 12.810,00	0,000	$ 0,00	
13,07,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO TRAMPA DE AIRE CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIONES	UND	$ 2.109.212,00	1,00	$ 2.109.212,00	0,00	-	-1,00	$ 0,00	-	-$ 2.109.212,00	0,000	$ 0,00	
13,07,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PARA TOMA DE AIRE FRESCO SEGÚN ESPECIFICACIONES	M	$ 2.138.024,00	1,00	$ 2.138.024,00	0,00	-	-1,00	$ 0,00	-	-$ 2.138.024,00	0,000	$ 0,00	
	EQUIPOS 2													
18,01,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND MINI SPLIT TIPO PARED DE 9.000 BTU/H INVERTER	UND	$ 4.833.586,00	4,00	$ 19.334.344,00	0,00	-	-4,00	$ 0,00	-	-$ 19.334.344,00	0,000	$ 0,00	
18,01,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 203 CFM, @ 0.36 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.693.781,00	2,00	$ 3.387.562,00	0,00	-	-2,00	$ 0,00	-	-$ 3.387.562,00	0,000	$ 0,00	
18,01,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 372 CFM, @ 0.40 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.855.110,00	2,00	$ 3.710.220,00	0,00	-	-2,00	$ 0,00	-	-$ 3.710.220,00	0,000	$ 0,00	
18,01,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO PLAFÓN, CAUDAL DE 168 CFM, @ 0.38 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.512.582,00	2,00	$ 3.025.164,00	0,00	-	-2,00	$ 0,00	-	-$ 3.025.164,00	0,000	$ 0,00	
18,01,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELIO CENTRÍFUGO, CAUDAL DE 241 CFM, @ 0.39 INWG, PARA LA ZONA DE ASEO	UND	$ 1.789.978,00	2,00	$ 3.579.956,00	0,00	-	-2,00	$ 0,00	-	-$ 3.579.956,00	0,000	$ 0,00	
18,01,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 436 CFM, @ 0.4 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.855.110,00	2,00	$ 3.710.220,00	0,00	-	-2,00	$ 0,00	-	-$ 3.710.220,00	0,000	$ 0,00	
18,01,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELIO CENTRÍFUGO, CAUDAL DE 186 CFM, @ 0.38 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.512.582,00	2,00	$ 3.025.164,00	0,00	-	-2,00	$ 0,00	-	-$ 3.025.164,00	0,000	$ 0,00	
18,01,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELICOCENTRÍFUGO, CAUDAL DE 404 CFM, @ 0.4 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.855.110,00	2,00	$ 3.710.220,00	0,00	-	-2,00	$ 0,00	-	-$ 3.710.220,00	0,000	$ 0,00	
18,01,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELIO CENTRÍFUGO, CAUDAL DE 215 CFM, @ 0.18 INWG, PARA LA ZONA DE BAÑO	UND	$ 1.693.781,00	2,00	$ 3.387.562,00	0,00	-	-2,00	$ 0,00	-	-$ 3.387.562,00	0,000	$ 0,00	
18,01,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO HELIO CENTRÍFUGO, CAUDAL DE 243 CFM, @ 0.19 INWG, PARA LA ZONA DE ASEO	UND	$ 1.789.978,00	6,00	$ 10.739.868,00	0,00	-	-6,00	$ 0,00	-	-$ 10.739.868,00	0,000	$ 0,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 001

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
INTERVENTOR: IBP INGENIERIA SAS

CONTRATO No: 4346-2024
VALOR: $ 14.732.771.385,00

OBRA: CAPILLA CONVENTO
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: (01/11/25) - (31/01/26)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					MAYORES (+) & MENORES (-)						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (31/01/2026)		JUSTIFICACIÓN
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	MAYORES (+)		MENORES (-)	MAYORES (+)		MENORES (-)	CANT	V. TOTAL	
18,01,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UND EXTRACCIÓN TIPO CAJA DE VENTILACIÓN, CAUDAL DE 1285 CFM, @ 0.1 INWG, PARA LA ZONA DE VENTILACIÓN	UND	$ 3.571.067,00	6,00	$ 21.426.402,00	0,00	-	-6,00	$ 0,00	-	-$ 21.426.402,00	0,000	$ 0,00	
	CONDUCTOS E ILUMINACIÓN													
24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES (15%, QUINCE PORCIENTO PARA ESTE COMPONENTE)	UND	$ 693.676.269,00	0,15	$ 104.051.440,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,150	$ 104.051.440,00	
18,02,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA	KG	$ 122.403,00	774,07	$ 94.748.011,00	0,00	+	0,00	$ 479,00	+	$ 0,00	774,070	$ 94.748.490,00	
18,03,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE 8"X8" ALETA FIJA MODELO L-RA	UND	$ 169.073,00	11,00	$ 1.859.803,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	11,000	$ 1.859.803,00	
18,03,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE 18"X16" ALETA FIJA MODELO L-RA	UND	$ 508.162,00	6,00	$ 3.048.972,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	6,000	$ 3.048.972,00	
18,03,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONTRA ROEDORES PARA DESCARGA DE EXTRACCIONES	UND	$ 165.021,00	13,00	$ 2.145.273,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	13,000	$ 2.145.273,00	
13,05,01	LUMINARIA TIPO PANEL RD CIRCULAR 30 CM, 30W, 120V	UND	$ 54.238,00	47,00	$ 2.549.186,00	0,00	-	-47,00	$ 0,00	-	-$ 2.549.186,00		$ 0,00	
13,05,02	LUMINARIAS DESCOLGADAS EN PASILLO 26W, 120V	UND	$ 487.554,00	68,00	$ 33.153.672,00	0,00	-	-68,00	$ 0,00	-	-$ 33.153.672,00		$ 0,00	
13,05,03	LUMINARIAS DE EMERGENCIA 2,6W,120V	UND	$ 183.712,00	65,00	$ 11.941.280,00	0,00	-	-65,00	$ 0,00	-	-$ 11.941.280,00		$ 0,00	
13,05,04	LUMINARIA COLGANTE CONTINUUM 80W, 120V 220X8 CM	UND	$ 556.529,00	34,00	$ 18.921.986,00	0,00	-	-34,00	$ 0,00	-	-$ 18.921.986,00		$ 0,00	
13,05,05	BAÑADORES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE 1M	UND	$ 752.824,00	57,00	$ 42.910.968,00	0,00	-	-57,00	$ 0,00	-	-$ 42.910.968,00		$ 0,00	
13,05,06	REFLECTORES EXTERIORES 70W	UND	$ 78.239,00	6,00	$ 469.434,00	0,00	-	-6,00	$ 0,00	-	-$ 469.434,00		$ 0,00	
13,05,07	CINTA LED ARQUITECTÓNICA 8W STR800	UND	$ 42.522,00	125,00	$ 5.315.250,00	0,00	-	-125,00	$ 0,00	-	-$ 5.315.250,00		$ 0,00	
	ARRANQUE Y PUESTA A PUNTO													
13,07,01	TRANSFERENCIA PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO CON PROTECCIÓN INDUSTRIAL DE 3X63 A. I MAGNÉTICA DE 400 A. ICC 100KA	UND	$ 12.825.065,00	2,00	$ 25.650.130,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	2,000	$ 25.650.130,00	
13,07,02	SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA, PARA SUPLENCIA TOTAL, STAND BY DE EMERGENCIA ENCABINADA DE 100 KVA S.B. EFECTIVOS A LA ALTURA DE BOGOTÁ 208/120 V 3F-4H 60HZ.	UND	$ 163.794.336,00	1,00	$ 163.794.336,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	1,000	$ 163.794.336,00	
13,07,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍAS	UND	$ 265.798,00	1,00	$ 265.798,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	1,000	$ 265.798,00	
13,07,10	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA Y CABLEADO SISTEMA DE CONTROL DESDE LAS PLANTA HASTA TRANSFERENCIA	M	$ 54.197,00	25,00	$ 1.354.925,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	25,000	$ 1.354.925,00	
13,07,11	UPS ONLINE DE 7 KVA TRIFÁSICA VOLTAJE DE ENTRADA 208 V AC Y DE SALIDA 208V AC, 60 HZ, INCLUYE BANCO DE BATERÍAS CON AUTONOMÍA DE 5 MINUTOS.	UND	$ 11.108.117,00	2,00	$ 22.216.234,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	2,000	$ 22.216.234,00	
18,04,01	CONEXIÓN DE EQUIPO A RED ELÉCTRICA	UND	$ 5.558.403,00	4,00	$ 22.233.612,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	4,000	$ 22.233.612,00	
18,04,02	PRUEBAS DE BALANCEO DEL SISTEMA, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA	GLB	$ 1.490.624,00	1,00	$ 1.490.624,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	1,000	$ 1.490.624,00	
14,01,08	RACK PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN DE 90CM X 60CM, INCLUYE ORGANIZADORES VERTICALES DE ALTA DENSIDAD Y ORGANIZADORES HORIZONTALES	UND	$ 2.449.180,00	2,00	$ 4.898.360,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	2,000	$ 4.898.360,00	
14,01,09	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS	UND	$ 938.680,00	2,00	$ 1.877.360,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	2,000	$ 1.877.360,00	
14,01,10	SWITCH ADMINISTRABLE DE 48 PUERTOS	UND	$ 9.620.282,00	1,00	$ 9.620.282,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	1,000	$ 9.620.282,00	
14,01,11	STRIP TELEFÓNICO 20 PARES 60X60X10	UND	$ 198.152,00	1,00	$ 198.152,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	1,000	$ 198.152,00	
14,01,12	CERTIFICACIÓN PUNTOS CAT 6A Y FIBRA OPTICA	UND	$ 20.983,00	46,00	$ 965.218,00	0,00	-	-46,00	$ 0,00	-	-$ 965.218,00		$ 0,00	
14,03,04	CÁMARA IP POE ULTRA HD 4K DE 8MP	UND	$ 1.057.832,00	24,00	$ 25.387.968,00	0,00	-	-24,00	$ 0,00	-	-$ 25.387.968,00		$ 0,00	
14,04,03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PARLANTES AMBIENTALES	UND	$ 467.251,00	6,00	$ 2.803.506,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	6,000	$ 2.803.506,00	
14,04,04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLANTA AMPLIFICADORA DE SONIDO DE 14 CANALES	UND	$ 4.164.885,00	1,00	$ 4.164.885,00	0,00	-	-1,00	$ 0,00	-	-$ 4.164.885,00		$ 0,00	
	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO, SEÑALIZACION Y SEÑALETICA													
19,02,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 22X15CM EN BASE DE POLIESTIRENO PARA ADHERIR.	UND	$ 43.339,00	8,00	$ 346.712,00	0,00	-	-8,00	$ 0,00	-	-$ 346.712,00		$ 0,00	
19,02,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 20X20CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2	UND	$ 64.661,00	9,00	$ 581.949,00	0,00	-	-9,00	$ 0,00	-	-$ 581.949,00		$ 0,00	
19,02,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X20CM FOTOLUMINISCENTE 60 MINUTOS. BASE ACRÍLICA CON ACCESORIOS PARA DESCOLGAR	UND	$ 73.681,00	58,00	$ 4.273.498,00	0,00	-	-58,00	$ 0,00	-	-$ 4.273.498,00		$ 0,00	
19,02,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 30X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2	UND	$ 88.713,00	1,00	$ 88.713,00	0,00	-	-1,00	$ 0,00	-	-$ 88.713,00		$ 0,00	
19,02,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 40X30CM FOTOLUMINISCENTE 60 MINUTOS, BASE ACRÍLICA CON ACCESORIOS PARA DESCOLGAR EN PARED	UND	$ 100.738,00	7,00	$ 705.166,00	0,00	-	-7,00	$ 0,00	-	-$ 705.166,00		$ 0,00	
19,02,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL 40X30CM EN BASE ACRÍLICA DE 20X20CM Y PIEZA DE MADERA DE 8X8X3CM DE GROSOR X2	UND	$ 102.241,00	1,00	$ 102.241,00	0,00	-	-1,00	$ 0,00	-	-$ 102.241,00		$ 0,00	
19,02,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL EN PLATINA CALIBRE 1/4" ANCHO 3CM, LARGO 60CM - PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. PIEZA DE MADERA 10 X 15 CM - MADERA NATURAL O TABLERO LAMINADO. ACRÍLICO TRANSPARENTE CALIBRE 5MM. DE 50X10CM	UND	$ 153.166,00	57,00	$ 8.730.462,00	0,00	-	-57,00	$ 0,00	-	-$ 8.730.462,00		$ 0,00	
19,02,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL AUTO ILUMINADA 90MIN - 30X20CM RETROILUMINADA CHASIS EN PLÁSTICO, BATERÍA DURACIÓN 90 MINUTOS	UND	$ 453.442,00	15,00	$ 6.801.630,00	0,00	-	-15,00	$ 0,00	-	-$ 6.801.630,00		$ 0,00	
19,01,01	RESTAURACIÓN DE MOBILIARIO EXISTENTE FRENTE A HUELLAS DE ANIMALES	UND	$ 189.348,00	19,00	$ 3.597.612,00	0,00	-	-19,00	$ 0,00	-	-$ 3.597.612,00		$ 0,00	
19,01,02	RESTAURACIÓN DE PEDESTALES DE MADERA PARA LAS ESCULTURAS. SECCIÓN CUADRADA DE 0.52M DE LADO POR 1.70M DE ALTO. INCLUYE LIJADO, LIMPIEZA, INMUNIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LACA SELLADORA PARA MADERA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS	UND	$ 118.265,00	19,00	$ 2.247.035,00	0,00	-	-19,00	$ 0,00	-	-$ 2.247.035,00		$ 0,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 001

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
INTERVENTOR: IBP INGENIERIA SAS

CONTRATO No: 4346-2024
VALOR: $ 14.732.771.385,00

OBRA: CAPILLA CONVENTO
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: (01/11/25) - (31/01/26)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					MAYORES (+) & MENORES (-)						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (31/01/2026)		JUSTIFICACIÓN
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	MAYORES (+)		MENORES (-)	MAYORES (+)		MENORES (-)	CANT	V. TOTAL	
19,03,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÓCKER METÁLICO DE 12 PUESTOS, ALTURA 2.00 MT. FONDO 0.30, ANCHO 93 CON ESTRUCTURA METÁLICA COLD ROLLED CALIBRE 24. MEDIDAS DE CADA COMPARTIMENTO: ALTO 0.46 X 0.28 X 0.30 M. MANIJA EN PVC CON RÓTULO IDENTIFICADOR EN CADA PUERTA Y PORTACANDADO. PINTURA ELECTROSTÁTICA GRIS.	UND	$ 1.294.432,00	1,00	$ 1.294.432,00	0,00	-	-1,00	$ 0,00	-	-$ 1.294.432,00		$ 0,00	
	VITRALES CAPILLA													
20.01.03	DESMONTE Y RESTAURACIÓN DE MARCO DE MADERA DE CEDRO QUE SOPORTA LOS PANELES VITRALES	M2	$ 1.391.916,00	90,00	$ 125.272.440,00	7,52	+	0,00	$ 10.467.208,00	+	$ 0,00	97,520	$ 135.739.648,00	
20.01.04	LIMPIEZA DEL VITRAL POR AMBAS CARAS, INCLUYE ELIMINACIÓN DE MASILLA	M2	$ 151.664,00	90,00	$ 13.649.760,00	7,52	+	0,00	$ 1.140.513,00	+	$ 0,00	97,520	$ 14.790.273,00	
20.01.05	UNIÓN DE FRACTURAS CON RESINA EPÓXICA	UND	$ 34.487,00	100,00	$ 3.448.700,00	0,00	-	-100,00	$ 0,00	-	-$ 3.448.700,00		$ 0,00	
20.01.06	RECUPERACIÓN DE PLANO DE PANELES, INCLUYE REFUERZOS CON PUNTOS DE SOLDADURA EN PLOMOS.	UND	$ 141.854,00	30,00	$ 4.255.620,00	0,00	-	-30,00	$ 0,00	-	-$ 4.255.620,00		$ 0,00	
20.01.07	RESTITUCIÓN Y ACOMODACIÓN DE CAÑUELAS DE PLOMO.	M	$ 55.482,00	100,00	$ 5.548.200,00	0,00	-	-100,00	$ 0,00	-	-$ 5.548.200,00		$ 0,00	
20.01.08	RESTITUCIÓN DE FALTANTES DE VIDRIO DE ACUERDO CON TÉCNICA ORIGINAL	M2	$ 6.635.168,00	0,50	$ 3.317.584,00	0,00	-	-0,50	$ 0,00	-	-$ 3.317.584,00		$ 0,00	
20.01.09	PUNTOS DE SOLDADURA EN LOS CRUCES DE UNIÓN ENTRE LAS CAÑUELAS DE PLOMO DETERIORADAS O FISURADAS.	UND	$ 28.991,00	1.800,00	$ 52.183.800,00	0,00	-	-1800,00	$ 0,00	-	-$ 52.183.800,00		$ 0,00	
20.01.10	ADICIÓN DE MASILLA ENTRE PLOMOS, INCLUYE LIMPIEZA.	M2	$ 540.094,00	90,00	$ 48.608.460,00	0,00	-	-90,00	$ 0,00	-	-$ 48.608.460,00		$ 0,00	
20.01.11	LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO EN VARILLAS DE REFUERZO.	M	$ 73.806,00	130,00	$ 9.594.780,00	0,00	-	-130,00	$ 0,00	-	-$ 9.594.780,00		$ 0,00	
20.01.12	RESTITUCIÓN DE AMARRES A VARILLAS METÁLICAS DE REFUERZO.	UND	$ 20.654,00	920,00	$ 19.001.680,00	0,00	-	-920,00	$ 0,00	-	-$ 19.001.680,00		$ 0,00	
20.01.13	MONTAJE DE PANELES DE VITRAL AL MARCO DE MADERA, INCLUYE TRASLADO.	UND	$ 119.688,00	292,00	$ 34.948.896,00	0,00	-	-292,00	$ 0,00	-	-$ 34.948.896,00		$ 0,00	
	BIENES MUEBLES CAPILLA													
	PLACA # 1 CAPILLA. SOPORTE EN MÁRMOL.										$ 0,00			
20.02.01	LIMPIEZA EN SECO CON BROCHAS DE CERDA SUAVE EN PLACA #1 CAPILLA	M2	$ 153.361,00	0,53	$ 81.281,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,530	$ 81.281,00	
20.02.02	LIMPIEZA EN HÚMEDO CON DETERGENTE NEUTRO Y CEPILLOS DE CERDA PLÁSTICA	M2	$ 260.538,00	0,53	$ 138.085,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,530	$ 138.085,00	
20.02.03	LIMPIEZA DE MANCHAS RENUENTES POR MEDIO DE PRUEBAS DE TEST DE SOLVENTES	M2	$ 120.859,00	0,53	$ 64.055,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,530	$ 64.055,00	
20.02.04	ELIMINACIÓN DE REPINTE DE PINTURA NEGRA MEDIANTE PRUEBAS DE TEST DE SOLVENTES	M2	$ 145.311,00	0,53	$ 77.015,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,530	$ 77.015,00	
20.02.05	REINTEGRACIÓN CROMÁTICA MEDIANTE APLICACIÓN DE PINTURA DORADA SOBRE LAS LETRAS.	M2	$ 417.729,00	0,53	$ 221.396,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,530	$ 221.396,00	
20.03.01	LIMPIEZA EN SECO CON BROCHAS DE CERDA SUAVE	M2	$ 153.434,00	0,53	$ 81.320,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,530	$ 81.320,00	
20.03.02	LIMPIEZA EN HÚMEDO CON DETERGENTE NEUTRO	M2	$ 260.553,00	0,53	$ 138.093,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,530	$ 138.093,00	
20.03.03	LIMPIEZA DE MANCHAS RENUENTES EN PLACA CON TEST DE SOLVENTES	M2	$ 121.633,00	0,53	$ 64.465,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,530	$ 64.465,00	
20.03.04	ELIMINACIÓN MECÁNICA DE INTERVENCIONES ANTERIORES EN BORDES DE LA PLACA	M2	$ 130.145,00	0,53	$ 68.977,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,530	$ 68.977,00	
20.03.05	RESTITUCIÓN DE FALTANTES DE SOPORTE DE PLACA CON MORTERO DE CEMENTO BLANCO Y POLVO DE MÁRMOL	M2	$ 181.875,00	0,53	$ 96.394,00	0,00	-	-0,53	$ 0,00	-	-$ 96.394,00		$ 0,00	
20.03.06	REINTEGRACIÓN DE LAS LETRAS TALLADAS DE LA INSCRIPCIÓN CON PINTURA DORADA	M2	$ 454.250,00	0,53	$ 240.753,00	0,00	-	-0,53	$ 0,00	-	-$ 240.753,00		$ 0,00	
	MOLDURAS CAPILLA.													
20.04.01	LIMPIEZA SUPERFICIAL DE MOLDURAS EN CAPILLA CON BROCHAS Y ASPIRADORA	M	$ 80.560,00	120,00	$ 9.667.200,00	0,00	-	-120,00	$ 0,00	-	-$ 9.667.200,00		$ 0,00	
20.04.02	ELIMINACIÓN MECÁNICA DE INTERVENCIONES ANTERIORES EN MOLDURAS EN CAPILLA	M	$ 290.849,00	24,00	$ 6.980.376,00	0,00	-	-24,00	$ 0,00	-	-$ 6.980.376,00		$ 0,00	
20.04.03	LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE PICTÓRICA DE MOLDURAS EN CAPILLA MEDIANTE TEST DE SOLVENTES	M	$ 327.706,00	120,00	$ 39.324.720,00	0,00	-	-120,00	$ 0,00	-	-$ 39.324.720,00		$ 0,00	
20.04.04	CONSOLIDACIÓN DE LA SUPERFICIE DE MOLDURAS EN CAPILLA CON RESINAS SINTÉTICAS	M	$ 215.861,00	24,00	$ 5.180.664,00	0,00	-	-24,00	$ 0,00	-	-$ 5.180.664,00		$ 0,00	
20.04.05	RESANES CON YESO TIPO 3	M	$ 245.866,00	50,00	$ 12.293.300,00	0,00	-	-50,00	$ 0,00	-	-$ 12.293.300,00		$ 0,00	
20.04.06	ELABORACIÓN DE PIEZAS FALTANTES DE MOLDURAS EN CAPILLA PREVIO ELABORACIÓN DE MOLDES	UND	$ 455.612,00	10,00	$ 4.556.120,00	0,00	-	-10,00	$ 0,00	-	-$ 4.556.120,00		$ 0,00	
20.04.07	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MOLDURAS EN CAPILLA CON MATERIALES SINTÉTICOS	M	$ 184.241,00	10,00	$ 1.842.410,00	0,00	-	-10,00	$ 0,00	-	-$ 1.842.410,00		$ 0,00	
20.04.08	REINTEGRACIÓN CROMÁTICA DE MOLDURAS EN CAPILLA CON MICA O LAMINILLA DE ORO	M	$ 672.103,00	24,00	$ 16.130.472,00	0,00	-	-24,00	$ 0,00	-	-$ 16.130.472,00		$ 0,00	
	LAMPARAS													
20.05.04	LIMPIEZA EN SECO CON BROCHAS Y ASPIRADORA DE LÁMPARA EN TECHO	M2	$ 134.851,00	1,65	$ 222.504,00	0,00	-	-1,65	$ 0,00	-	-$ 222.504,00		$ 0,00	
20.05.05	LIMPIEZA DE LÁMPARA EN HÚMEDO CON DETERGENTE NEUTRO	M2	$ 748.842,00	1,65	$ 1.235.589,00	0,00	-	-1,65	$ 0,00	-	-$ 1.235.589,00		$ 0,00	
20.05.06	PASIVACIÓN DE PRODUCTOS DE CORROSIÓN EN LÁMPARA DE TECHO CON HEXAMETAFOSFATO	M2	$ 665.107,00	1,65	$ 1.097.427,00	0,00	-	-1,65	$ 0,00	-	-$ 1.097.427,00		$ 0,00	
20.05.07	LIMPIEZA PUNTUAL QUÍMICA DE LOS PRODUCTOS DE CORROSIÓN CON ACIDO CÍTRICO O FÓRMICO EN LÁMPARA	M2	$ 143.443,00	1,65	$ 236.681,00	0,00	-	-1,65	$ 0,00	-	-$ 236.681,00		$ 0,00	
20.05.08	PASIVACIÓN POR MEDIOS QUÍMICOS EN LÁMPARA	M2	$ 254.600,00	1,65	$ 420.090,00	0,00	-	-1,65	$ 0,00	-	-$ 420.090,00		$ 0,00	
20.05.09	INHIBICIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CORROSIÓN CON SOLUCIÓN ACUOSA CON BENZOTRIAZOL EN LÁMPARA DE TECHO	M2	$ 217.204,00	1,65	$ 358.387,00	0,00	-	-1,65	$ 0,00	-	-$ 358.387,00		$ 0,00	
20.05.10	APLICACIÓN DE CAPA DE PROTECCIÓN TIPO RESINA ACRÍLICA PARA LÁMPARA DE TECHO EN CAPILLA	M2	$ 285.059,00	1,65	$ 470.347,00	0,00	-	-1,65	$ 0,00	-	-$ 470.347,00		$ 0,00	
20.05.11	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LÁMPARA TECHO	UND	$ 1.426.173,00	1,00	$ 1.426.173,00	0,00	-	-1,00	$ 0,00	-	-$ 1.426.173,00		$ 0,00	
20.05.12	ARMADO E INSTALACIÓN DE LA LAMPARA	UND	$ 1.530.997,00	1,00	$ 1.530.997,00	0,00	-	-1,00	$ 0,00	-	-$ 1.530.997,00		$ 0,00	
	LAMPARAS PARED CAPILLA.													
20.06.04	LIMPIEZA EN SECO CON BROCHAS Y ASPIRADORA EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL. PRESBITERIO DE LA CAPILLA	M2	$ 66.519,00	4,90	$ 325.943,00	0,00	-	-4,90	$ 0,00	-	-$ 325.943,00		$ 0,00	
20.06.05	LIMPIEZA EN HÚMEDO CON DETERGENTE NEUTRO EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA	M2	$ 187.226,00	4,90	$ 917.407,00	0,00	-	-4,90	$ 0,00	-	-$ 917.407,00		$ 0,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 001

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
INTERVENTOR: IBP INGENIERIA SAS

CONTRATO No: 4346-2024
VALOR: $ 14.732.771.385,00

OBRA: CAPILLA CONVENTO
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: (01/11/25) - (31/01/26)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					MAYORES (+) & MENORES (-)						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (31/01/2026)		JUSTIFICACIÓN
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	MAYORES (+)		MENORES (-)	MAYORES (+)		MENORES (-)	CANT	V. TOTAL	
20.06.06	PASIVACIÓN DE PRODUCTOS DE CORROSIÓN CON HEXAMETAFOSFATO EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA	M2	$ 192.368,00	4,90	$ 942.603,00	0,00	-	-4,90	$ 0,00	-	-$ 942.603,00		$ 0,00	
20.06.07	LIMPIEZA PUNTUAL QUÍMICA DE LOS PRODUCTOS DE CORROSIÓN CON ACIDO CÍTRICO O FÓRMICO EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA	M2	$ 177.212,00	2,00	$ 354.424,00	0,00	-	-2,00	$ 0,00	-	-$ 354.424,00		$ 0,00	
20.06.08	PASIVACIÓN POR MEDIOS QUÍMICOS EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA	M2	$ 116.245,00	2,00	$ 232.490,00	0,00	-	-2,00	$ 0,00	-	-$ 232.490,00		$ 0,00	
20.06.09	INHIBICIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CORROSIÓN CON SOLUCIÓN ACUOSA CON BENZOTRIAZOL EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA	M2	$ 180.925,00	2,00	$ 361.850,00	0,00	-	-2,00	$ 0,00	-	-$ 361.850,00		$ 0,00	
20.06.10	APLICACIÓN DE CAPA DE PROTECCIÓN TIPO RESINA ACRÍLICA EN LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA	M2	$ 209.685,00	4,90	$ 1.027.457,00	0,00	-	-4,90	$ 0,00	-	-$ 1.027.457,00		$ 0,00	
20.06.11	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LÁMPARAS DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA	UND	$ 1.428.520,00	14,00	$ 19.999.280,00	0,00	-	-14,00	$ 0,00	-	-$ 19.999.280,00		$ 0,00	
20.06.12	ARMADO E INSTALACIÓN DE LA LAMPARA DE PARED UBICADA EN LA NAVE CENTRAL, PRESBITERIO DE LA CAPILLA	UND	$ 1.530.997,00	14,00	$ 21.433.958,00	0,00	-	-14,00	$ 0,00	-	-$ 21.433.958,00		$ 0,00	
	TANQUE , CUARTO DE BOMBAS, EQUPOS Y TABLEROS													
05,04,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA PLACA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 1.806.381,00	41,41	$ 74.802.237,00	0,00	-	-41,41	$ 0,00	-	-$ 74.802.237,00		$ 0,00	
05,04,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4.000 PSI (F'C=28 MPA) PARA MURO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. INCLUYE PASES, JUNTAS Y CINTAS. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	$ 2.170.448,00	39,79	$ 86.362.126,00	0,00	-	-39,79	$ 0,00	-	-$ 86.362.126,00		$ 0,00	
05,05,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI. INCLUYE FIGURADO, CORTE Y AMARRE.	KG	$ 8.992,00	14.553,43	$ 130.864.430,00	24.322,25	+	0,00	$ 218.705.658,00	+	$ 0,00	38875,68	$ 349.570.087,00	
	CUARTO BOMBAS													
17,01,01	TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 169.906,00	18,10	$ 3.075.299,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	18,100	$ 3.075.299,00	
17,01,02	ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 2"	UND	$ 51.076,00	29,00	$ 1.481.204,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	29,000	$ 1.481.204,00	
17,01,03	TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1,1/2". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 114.893,00	28,00	$ 3.217.004,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	28,000	$ 3.217.004,00	
17,01,04	ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1,1/2"	UND	$ 41.228,00	30,00	$ 1.236.840,00	307,00	+	0,00	$ 12.656.996,00	+	$ 0,00	337,000	$ 13.893.836,00	
17,01,05	TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1,1/4". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 90.296,00	14,00	$ 1.264.144,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	14,000	$ 1.264.144,00	
17,01,06	ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1,1/4"	UND	$ 34.360,00	14,00	$ 481.040,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	14,000	$ 481.040,00	
17,01,07	TUBERÍA PVC.P SCH 80 Ø 1". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 58.068,00	10,00	$ 580.680,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	10,000	$ 580.680,00	
17,01,08	ACCESORIOS PVC.P SCH 80 Ø 1"	UND	$ 24.348,00	22,00	$ 535.656,00	10,00	+	0,00	$ 243.480,00	+	$ 0,00	32,000	$ 779.136,00	
17,01,09	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 2"	UND	$ 409.880,00	6,00	$ 2.459.280,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	6,000	$ 2.459.280,00	
17,01,10	CHEQUE Ø 1,1/2"	UND	$ 276.939,00	4,00	$ 1.107.756,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	4,000	$ 1.107.756,00	
17,01,11	CHEQUE Ø 1,1/4"	UND	$ 207.113,00	1,00	$ 207.113,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	1,000	$ 207.113,00	
17,01,12	VÁLVULA DE PIE Ø 1,1/2"	UND	$ 71.407,00	2,00	$ 142.814,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	2,000	$ 142.814,00	
17,01,13	VÁLVULA DE PIE Ø 2"	UND	$ 194.837,00	2,00	$ 389.674,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	2,000	$ 389.674,00	
17,01,14	COPA CONCÉNTRICA EN ACERO SCH 10 Ø 2"X1,1/2"	UND	$ 22.434,00	6,00	$ 134.604,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	6,000	$ 134.604,00	
17,01,15	BRIDA ACERO ROSCAR Ø 1,1/2". INCLUYE TORNILLOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE FIJACIÓN	UND	$ 92.007,00	14,00	$ 1.288.098,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	14,000	$ 1.288.098,00	
17,01,16	JUNTAS DE EXPANSIÓN BORRACHA Ø 1,1/2"	UND	$ 165.926,00	7,00	$ 1.161.482,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	7,000	$ 1.161.482,00	
17,01,17	NIPLES PASAMUROS A. INOXIDABLE Ø 3/4". LONGITUD DE 30CM	UND	$ 48.995,00	1,00	$ 48.995,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	1,000	$ 48.995,00	
17,01,18	TUBERÍA PVC.P Ø 3". NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 57.400,00	19,00	$ 1.090.600,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	19,000	$ 1.090.600,00	
17,01,19	ACCESORIOS PVC.P Ø 3"	UND	$ 66.648,00	22,00	$ 1.466.256,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	22,000	$ 1.466.256,00	
17,01,20	REGISTRO PASO DIRECTO Ø 3"	UND	$ 798.540,00	2,00	$ 1.597.080,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	2,000	$ 1.597.080,00	
17,01,21	CHEQUE Ø 3"	UND	$ 486.560,00	2,00	$ 973.120,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	2,000	$ 973.120,00	
17,01,22	VÁLVULA DE PIE Ø 1"	UND	$ 73.110,00	1,00	$ 73.110,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	1,000	$ 73.110,00	
17,01,23	MICROMEDIDOR 3/4"	UND	$ 349.887,00	1,00	$ 349.887,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	1,000	$ 349.887,00	
16,02,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLAS NEBULIZADORAS CERRADA HI-FOG	UND	$ 304.891,00	366,00	$ 111.590.106,00	0,00	-	-366,00	$ 0,00	-	-$ 111.590.106,00	0,000	$ 0,00	
16,02,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLAS NEBULIZADORAS ABIERTA HI-FOG	UND	$ 938.047,00	2,00	$ 1.876.094,00	0,00	-	-2,00	$ 0,00	-	-$ 1.876.094,00	0,000	$ 0,00	
16,02,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA VALVULA DE CONTROL MARCA HI-FOG MODELO SBA-40, CÓDIGO DO6151 CON INDICADOR DE PASO DE AGUA, MANÓMETRO, TOMA DE PRUEBAS Y VÁLVULA SUPERVISADA DE CIERRE Y APERTURA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERÍA DE 30 MM	UND	$ 12.452.192,00	3,00	$ 37.356.576,00	0,00	-	-3,00	$ 0,00	-	-$ 37.356.576,00	0,000	$ 0,00	
16,02,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA ELECTROVÁLVULA SELECTORA MARCA HIG-FOG MODELO SVM-12 CÓDIGO D01550.1 SIN ENCLAVAMIENTO, EQUIPADA CON SOLENOIDE (24 V DC, 900 MA) Y ACTUADOR DE APERTURA MANUAL DE EMERGENCIA CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERÍA DE 12 MM	UND	$ 6.254.606,00	7,00	$ 43.782.242,00	0,00	-	-7,00	$ 0,00	-	-$ 43.782.242,00	0,000	$ 0,00	
17,02,01	ACOPLES Ø 2"	UND	$ 100.829,00	14,00	$ 1.411.606,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	14,000	$ 1.411.606,00	
17,02,02	VÁLVULA MARIPOSA Ø 4"	UND	$ 686.471,00	10,00	$ 6.864.710,00	0,00	-	-7,00	$ 0,00	-	-$ 4.805.297,00	3,000	$ 2.059.413,00	
17,02,03	CHEQUE Ø 2"	UND	$ 695.452,00	3,00	$ 2.086.356,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	3,000	$ 2.086.356,00	
17,02,04	PLACA ANTIOVORTICE Ø 4" EN ACERO AL CARBÓN	UND	$ 716.610,00	1,00	$ 716.610,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	1,000	$ 716.610,00	
17,02,05	MANÓMETRO CON CARATULA 2.5" CON GLICERINA	UND	$ 61.345,00	2,00	$ 122.690,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	2,000	$ 122.690,00	
	RED GENERAL AGUA INCENDIO													
16,02,01	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 1,1/2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 68.363,00	10,90	$ 745.157,00	0,00	-	-10,90	$ 0,00	-	-$ 745.157,00	0,000	$ 0,00	
16,02,02	ACCESORIOS RANURADOS ACERO Ø 1,1/2"	UND	$ 100.491,00	10,00	$ 1.004.910,00	0,00	-	-10,00	$ 0,00	-	-$ 1.004.910,00	0,000	$ 0,00	
16,02,03	EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO 10LBS	UND	$ 357.852,00	6,00	$ 2.147.112,00	0,00	-	-6,00	$ 0,00	-	-$ 2.147.112,00		$ 0,00	
16,02,06	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 1/2" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 19.317,00	621,10	$ 11.997.789,00	0,00	-	-621,10	$ 0,00	-	-$ 11.997.789,00	0,000	$ 0,00	
	TUBERÍA ACERO SCH10 Ø 1" ROSCADA. NO INCLUYE ACCESORIOS	ML	$ 36.542,00		$ 0,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
16,02,09	ENCAMISADO PARA TUBERÍA A. INOXIDABLE	M	$ 151.534,00	15,00	$ 2.273.010,00	0,00	-	-15,00	$ 0,00	-	-$ 2.273.010,00	0,000	$ 0,00	
	EQUIPOS													

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 001

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
INTERVENTOR: IBP INGENIERIA SAS

CONTRATO No: 4346-2024
VALOR: $ 14.732.771.385,00

OBRA: CAPILLA CONVENTO
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: (01/11/25) - (31/01/26)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					MAYORES (+) & MENORES (-)						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (31/01/2026)		JUSTIFICACIÓN
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	MAYORES (+)		MENORES (-)	MAYORES (+)		MENORES (-)	CANT	V. TOTAL	
17,03,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 15 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO	UND	$ 18.885.987,00	1,00	$ 18.885.987,00	0,00	-	-1,00	$ 0,00	-	-$ 18.885.987,00	0,000	$ 0,00	
17,03,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 30 + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO	UND	$ 21.661.624,00	1,00	$ 21.661.624,00	0,00	-	-1,00	$ 0,00	-	-$ 21.661.624,00	0,000	$ 0,00	
17,03,03	SISTEMA DE BOMBDEO DE RECIRCULACIÓN AGUAS LLUVIAS. SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS MARCA PEARL C2P 15 O SIMILAR SEGÚN DISEÑO HIDRÁULICO Q=14GPM, H=34PSI + TANQUE HIDROACUMULARO DE 100 LT + VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA Y PREENSAMBLE Y ACCESORIOS EN GALVANIZADO	UND	$ 18.595.988,00	1,00	$ 18.595.988,00	0,00	-	-1,00	$ 0,00	-	-$ 18.595.988,00	0,000	$ 0,00	
17,03,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO LISTADO CERTIFICADO UL/FM ÀRA AGUA NEBULIZADA HIFOG 11000GPM@ 2050 PSI + TABLERO DE CONTROL CON TRANSFERENCIA LISTADA+ BOMBA JOCKEY+ TABLERO BOMBA JOCKEY	UND	$ 545.553.628,00	1,00	$ 545.553.628,00	0,00	-	-1,00	$ 0,00	-	-$ 545.553.628,00	0,000	$ 0,00	
17,03,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA EYECTOR COMPUESTO POR DOS BOMBAS EYECTORAS GQSM 50 -6-60 + TABLERO ARRANQUE DIRECTO CON ADICIÓN Y ALTERNACIÓN Y FLOTADOR DE NIVEL POR BOMBA	UND	$ 9.874.183,00	1,00	$ 9.874.183,00	0,00	-	-1,00	$ 0,00	-	-$ 9.874.183,00	0,000	$ 0,00	
17,03,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEPÓSITO ATMOSFÉRICO AQUABLOCK PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TAPA SUPERIOR DE DN250 Y POSIBILIDAD DE MONTAR BOYA CON FLOTADOR Y/O REBOSADERO CON MEDIDAS 2200*990*1565 Y UNA CAPACIDAD DE 3000 LITROS	UND	$ 8.444.765,00	1,00	$ 8.444.765,00	0,00	-	-1,00	$ 0,00	-	-$ 8.444.765,00	0,000	$ 0,00	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRUPO DE BOMBEO MODULAR DE AGUA NEBULIZADA MARCA HI-FOG® MODELO LPU05 CON UN CAUDAL TOTAL DE 439 LPM, COMPUESTO POR 05 BOMBAS DE PISTONES, PRESIÓN MÁXIMA DE 140 BAR, MOVIDAS POR CINCO MOTORES ELÉCTRICOS (440 V AC, 60 HZ, 27,0 KW CADA UNO), COLECTOR DE PRUEBAS E INSTRUMENTACIÓN COMPLETA, TODO EL CONJUNTO MONTADO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA. SE INCLUYE APARTE CUADRO DE CONTROL DEL GRUPO DE BOMBAS.MOTORES CON VARIADOR DE VELOCIDAD POR MOTOR	UN	$ 879.461.380,00		$ 0,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,000	$ 0,00	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE ACERO INOXIDABLE MARCA HI-FOG MODELO BKH-12 PARA TUBERÍA DE 12 MM CON LIMIT SWITCH, CÓDIGO D30005.1 PARA PURGA DE LA INSTALACIÓN	UN	$ 1.963.252,00		$ 0,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,000	$ 0,00	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PREACCION MARCA HI-FOGÆ MODELO SVM-20 (25/25), CÛDIGO D00050.1 CON INDICADOR DE PASO DE AGUA, MANOMETRO, TOMA DE PRUEBAS Y VÁLVULA SUPERVISADA DE CIERRE Y APERTURA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO CON ENTRADA Y SALIDA PARA TUBERÌA DE 30 MM. INCLUYE COMPRESOR.	UN	$ 13.365.963,00		$ 0,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,000	$ 0,00	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DI-METRO EXTERIOR 30 MM X 2,5 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEG´N DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS)	ML	$ 402.060,00		$ 0,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,000	$ 0,00	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DI-METRO EXTERIOR 25 MM X 2,0 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEG´N DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS)	ML	$ 324.785,00		$ 0,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,000	$ 0,00	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE CON SOLDADURA EN CALIDAD 1.4404 EN 10217-7 CON CLASE DE TOLERANCIA D4/T3 DE DI-METRO EXTERIOR 12 MM X 1,2 MM CON P.P. DE TES, UNIONES Y REDUCCIONES SEG´N DIN 2353 (SOPORTES INCLUIDOS)	ML	$ 166.225,00		$ 0,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,000	$ 0,00	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE DE 43,15M3 (SEGÚN EL ESQUEMA), CONSTRUIDO CON LINER EN CRISTALÁN 870 DE ANDERCOL (ISOFTÁLICA) Y RESINA CRISTALÁN 805 DE ANDERCOL(ORTOFTÁLICA).	und	$ 59.973.430,00		$ 0,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,000	$ 0,00	
17,04,01	DESINFECCIÓN SISTEMA	UND	$ 44.267,00	1,00	$ 44.267,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	1,000	$ 44.267,00	
	TABLEROS													
13,02,01	TRANSFERENCIA GENERAL MOTORIZADA CON BREAKERS DE 3X250 AMP. INCLUYE TGD NO 1, FABRICADO EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 16 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON PROTECCIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL. CON BARRAJES DE FASE, NEUTRO Y TIERRA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DADAS POR EL DIAGRAMA UNIFILAR.	UND	$ 32.898.130,00	1,00	$ 32.898.130,00	0,00	-	-1,00	$ 0,00	-	-$ 32.898.130,00		$ 0,00	
13,02,02	EQUIPO DE MEDIDA BAJA TENSIÓN NORMA AE319 ENEL CODENSA DE DIMENSIONES 200X80X40 CM,INCLUYE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y BREAKER TOTALIZADORES DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR	UND	$ 10.143.872,00	1,00	$ 10.143.872,00	0,00	-	-1,00	$ 0,00	-	-$ 10.143.872,00		$ 0,00	
13,02,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND	$ 672.026,00	3,00	$ 2.016.078,00	0,00	-	-3,00	$ 0,00	-	-$ 2.016.078,00		$ 0,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 001

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
INTERVENTOR: IBP INGENIERIA SAS

CONTRATO No: 4346-2024
VALOR: $ 14.732.771.385,00

OBRA: CAPILLA CONVENTO
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA: (01/11/25) - (31/01/26)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					MAYORES (+) & MENORES (-)						4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (31/01/2026)		JUSTIFICACIÓN
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	MAYORES (+)		MENORES (-)	MAYORES (+)		MENORES (-)	CANT	V. TOTAL	
13,02,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ENCHUFABLE, TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS, 208V, ICC: 10KA CON BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, PUERTA, CHAPA, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE	UND	$ 744.071,00	2,00	$ 1.488.142,00	0,00	-	-2,00	$ 0,00	-	-$ 1.488.142,00		$ 0,00	
13,02,05	GABINETE METÁLICO CERTIFICADO PARA BOMBAS, AGUA POTABLE, SANITARIA Y LLUVIAS. DIMENSIONES 60X60X30 CM, CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TIPO INDUSTRIAL 3-3X20A. INCLUYE MATERIAL DE FABRICACIÓN, INCLUYE PUERTA, DPS, BARRAJES TY DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO	UND	$ 3.960.538,00	1,00	$ 3.960.538,00	0,00	-	-1,00	$ 0,00	-	-$ 3.960.538,00		$ 0,00	
13,02,06	BREAKER TIPO INDUSTRIAL ICC 25KA, 3X20A HASTA 3X60 A	UND	$ 299.336,00	10,00	$ 2.993.360,00	0,00	-	-10,00	$ 0,00	-	-$ 2.993.360,00		$ 0,00	
13,02,07	BREAKER ENCHUFABLE ICC10KA, 1X20A	UND	$ 20.590,00	74,00	$ 1.523.660,00	0,00	-	-74,00	$ 0,00	-	-$ 1.523.660,00		$ 0,00	
13,02,08	GABINETE METÁLICO PARA CONTROL ILUMINACIÓN POR MEDIO DE CONTACTORES DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR. INCLUYE MATERIAL DE FABRICACIÓN, PUERTA, BARRAJES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑOS	UND	$ 4.669.019,00	1,00	$ 4.669.019,00	0,00	-	-1,00	$ 0,00	-	-$ 4.669.019,00		$ 0,00	
13,08,01	CERTIFICACIONES RETIE	UND	$ 14.477.149,00	1,00	$ 14.477.149,00	0,00	-	-1,00	$ 0,00	-	-$ 14.477.149,00		$ 0,00	
13,08,02	CERTIFICACIÓN RETILAP	UND	$ 14.477.149,00	1,00	$ 14.477.149,00	0,00	-	-1,00	$ 0,00	-	-$ 14.477.149,00		$ 0,00	
	OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES													
24.01.01	IMPLEMENTACIÓN Y MODELADO BIM INCLUYE COMPUTADOR, ENTORNO COMÚN DE DATOS, SOFTWARE (3D, 4D, 5D), COORDINADOR, RESIDENTE Y 3 MODELADORES (10%, DIEZ PORCIENTO PARA ESTE COMPONENTE)	UND	$ 693.676.269,00	0,10	$ 69.367.627,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,100	$ 69.367.627,00	
02.01.05	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES (6 MESES PARA ESTE COMPONENTE)	MES	$ 1.762.788,00	6,00	$ 10.576.728,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	6,000	$ 10.576.728,00	
02.01.12	CONTROL DE ROEDORES CON CEBO Y RATICIDA (150 UNIDADES PARA ESTE COMPONENTE)	UND	$ 32.177,00	150,00	$ 4.826.550,00	0,00	-	-100,00	$ 0,00	-	-$ 3.217.700,00	50,000	$ 1.608.850,00	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVILLA LAVADA N.º 2 PARA PISOS EXTERIORES	M2	$ 59.825,00		$ 0,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
02.01.19	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ÁRBOL. INCLUYE SIEMBRA, CAJA, TIERRA NEGRA, ABONO, TUTOR Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	UND	$ 224.368,00	1,00	$ 224.368,00	0,00	-	-1,00	$ 0,00	-	-$ 224.368,00	0,000	$ 0,00	
10,02,03	ANDÉN ACABADO EN CONCRETO ESCOBILLADO. E=15CM - COLOR SEGÚN DISEÑO. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON RECEBO COMÚN	M2	$ 461.476,00	329,94	$ 152.257.546,00	216,46	+	0,00	$ 99.892.941,00	+	$ 0,00	546,400	$ 252.150.486,00	
10,02,04	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO TIPO A81 (15X35X80CM)	M	$ 58.334,00	259,52	$ 15.138.840,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	259,520	$ 15.138.840,00	
22.01.01	OBRAS EXTERIORES PERIMETRALES (RESULTANTE DE LA APROPIACIÓN DE DISEÑOS)	GLB	$ 197.511.300,00	1,00	$ 197.511.300,00	0,00	-	-1,00	$ 0,00	-	-$ 197.511.300,00		$ 0,00	
	ASEO, REMATES Y NP													
19,04,01	ASEO FINAL GENERAL	M2	$ 3.864,00	5.650,88	$ 21.835.000,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	5.650,880	$ 21.835.000,00	
19,04,02	DESMONTAJE DE CERRAMIENTO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M	$ 27.020,00	300,51	$ 8.119.780,00	0,00	-	-300,51	$ 0,00	-	-$ 8.119.780,00		$ 0,00	
19,04,04	REPARACIÓN DE VÍA UTILIZADA EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE OBRA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, NIVELACIÓN CON RECEBO COMPACTADO Y ACABADO	M2	$ 360.411,00	70,00	$ 25.228.770,00	0,00	-	-70,00	$ 0,00	-	-$ 25.228.770,00		$ 0,00	
02.01.12	CONTROL DE ROEDORES CON CEBO Y RATICIDA (SALDO PARA ESTE COMPONENTE)	UND	$ 32.177,00	173,00	$ 5.566.621,00	0,00	-	-123,00	$ 0,00	-	-$ 3.957.771,00	50,000	$ 1.608.850,00	
02.01.05	SERVICIOS SANITARIOS PORTÁTILES (SALDO EN MESES PARA ESTE COMPONENTE)	MES	$ 1.762.788,00	7,00	$ 12.339.516,00	0,00		0,00	$ 0,00		$ 0,00	7,000	$ 12.339.516,00	
19,04,03	DESMONTE DE SOBRECUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE	M2	$ 15.942,00	2.064,70	$ 32.915.447,00	547,75	+	0,00	$ 8.732.231,00	+	$ 0,00	2.612,450	$ 41.647.678,00	

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 001

CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
INTERVENTOR: IBP INGENIERIA SAS

CONTRATO No: 4346-2024
VALOR: $ 14.732.771.385,00

OBRA: CAPILLA CONVENTO
MUNICIPIO: BOGOTA
FECHA (01/11/25) - (31/01/26)

1. ITEM	2. CONDICIONES CONTRACTUALES (DATOS PRESENTADOS EN EL PROCESO LICITATORIO)					MAYORES (+) & MENORES (-)				4. CONDICIONES ACTUALIZADAS (31/01/2026)		JUSTIFICACIÓN
	DESCRIPCION	UNID.	V. UNITARIO	CANT	V. TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)	CANT	V. TOTAL	
A	SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los items)				$ 10.602.930.108,00			$ 4.939.292.342,00	-$ 4.939.292.342,00		$ 10.602.930.108,00	
B	ADMINISTRACION + IMPREVISTOS			0,33	$ 3.498.966.936,00			$ 1.629.966.473,00	-$ 1.629.966.473,00		3.498.966.936,00	
C	UTILIDAD			0,05	$ 530.146.505,00			$ 246.964.617,00	-$ 246.964.617,00		530.146.505,00	
D	**SUBTOTALTOTALES (A+B+C)**				**$ 14.632.043.549,00**			**$ 6.816.223.432,00**	**-$ 6.816.223.432,00**	**SUBTOTALTOTALES (A+B+C)**	**14.632.043.549,00**	
	IVA SOBRE UTILIDAD (19% sobre utilidad)			0,19	$ 100.727.836,00			$ 46.923.277,00	-$ 46.923.277,00	**IVA SOBRE UTILIDAD (19% sobre utilidad)**	100.727.836,00	
	TOTAL				**$ 14.732.771.385,00**			**$ 6.863.146.709,00**	**-$ 6.863.146.709,00**	**TOTAL**	**14.732.771.385,00**	
	VALOR PARA AJUSTES IPC				**$ 0,00**					**VALOR PARA AJUSTES IPC**	$ 0,00	
	VALOR TOTAL + AJUSTES IPC				**$ 14.732.771.385,00**					**VALOR TOTAL + AJUSTES IPC**	**$ 14.732.771.385,00**	

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ASTRID DIAZ CABEZAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTOR - CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL

KAROL STEFANY RAMIREZ MENA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR - IBP INGENIERIA SAS

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 4346-2024, CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CAPILLA - CONVENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO.

INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICO – CORTE 001

PERIODO DEL CORTE: 1/11/2025 – 31/01/2026

CONTRATISTA

CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL

BOGOTA D.C. ENERO DE 2026

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. INFORMACION DEL CONTRATO 5
3. ASPECTOS LEGALES 6
4. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO 8
5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 9
6. ALCANCE DEL CONTRATO EN EL PRESENTA CORTE 10
6.1 RESUMEN EJECUTIVO 10
6.2 APLICACIÓN DEL IPC 11
6.3. ANÁLISIS FINANCIERO DEL CORTE 12
7. ANÁLISIS POR FASES Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 14
7.1 RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS – COMPONENTE 4 14
7.2 ANÁLISIS TÉCNICO DEL COMPONENTE 4 16
7.3 ANÁLISIS TÉCNICO POR GRUPOS DE ACTIVIDADES 16
7.1. ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA RESTAURACIÓN 16
7.2. DESMONTAJE Y TRASLADO DE ELEMENTOS PATRIMONIALES 17
7.3. PROTECCIÓN Y EMBALAJE DE BIENES MUEBLES 17
7.4. REGISTRO TÉCNICO Y DIAGNÓSTICO DE CONSERVACIÓN 18
7.5. TRASLADO Y PROTECCIÓN DE MOBILIARIO LITÚRGICO 18
7.6. ADECUACIÓN DE ÁREAS DE ALMACENAMIENTO 19
7.7. PROTECCIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y VITRALES 19
7. 8. PROTECCIÓN TEMPORAL DEL EDIFICIO 20
8. ANÁLISIS DE FASES DE EJECUCIÓN (SEMANAS) 20
9. ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 4 CON EJECUCIÓN EN CERO 22

CONCLUSION 23
10. LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE CONSERVACIÓN Y ESTADO DE LAS LÁMPARAS 24
11. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 25
12. OBSERVACIONES TÉCNICAS Y CONTROL DE CALIDAD 26
13. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 27
14. GESTIÓN AMBIENTAL 30
15. GESTIÓN SOCIAL 32
16. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) 34
17. GESTIÓN ESTRUCTURAL 35
18. GESTIÓN ARQUEOLÓGICA 38
19. CONCLUSIONES 40
REGISTRO FOTOGRAFICO 42

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como propósito principal evaluar el desarrollo y la gestión adelantada por el *Consorcio Alianza Patrimonial*, contratista responsable de la ejecución de las obras correspondientes al *Contrato No. 4346 de 2024*. Dicho contrato se ejecuta en estricto cumplimiento de su objeto contractual, orientado a la intervención integral del Proyecto *Capilla Convento*, conforme a los lineamientos técnicos y normativos aplicables.

La supervisión y el control técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental del contrato están a cargo de la Interventoría del Proyecto, ejercida mediante el *Contrato No. 4381 de 2024*, suscrito con la firma *IBP Ingeniería S.A.S.*. Esta entidad es responsable de verificar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como de asegurar la adecuada ejecución y calidad de las actividades desarrolladas por el constructor.

El presente informe mensual compila y describe de manera sintética pero integral las actividades ejecutadas durante el periodo evaluado, abarcando aspectos operativos, administrativos, financieros, legales y técnicos asociados al proyecto. Su finalidad es servir como herramienta de seguimiento, control y verificación del avance real de la obra, permitiendo valorar el cumplimiento de los compromisos establecidos y el desarrollo progresivo del Proyecto Capilla Convento.

2. INFORMACION DEL CONTRATO

Contrato	4346-2024- CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
Objeto	El objeto del contrato es la ejecución de las intervenciones integrales del Edificio Capilla – Convento del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la Ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.
Obligaciones	Serán obligaciones del contratista, las consagradas en el anexo denominado "ANEXO TECNICO" Y CONTRATO DE OBRA 4346-2024.
Valor	El presupuesto oficial del proyecto según lo estipulado en el contrato 4346-2024 es de Quince mil ochocientos diecinueve millones seiscientos noventa y siete mil ochocientos treinta y cinco pesos ($15.819.697.835) moneda legal colombiana
Plazo de ejecución	El plazo de ejecución es de VEINTICUATRO (24) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
Vigencia del contrato	El plazo de la vigencia es de VEINTICUATRO (19) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y 4 meses contractuales para la ejecución de la liquidación.
Interventor o supervisor:	IBP INGENIERIA SAS
Suspensiones	N/A
Adiciones	N/A
Prorrogas	N/A

TABLA 1. DATOS GENERALES CONTRATO

3. ASPECTOS LEGALES

En relación con los aspectos legales y jurídicos del contrato, se presenta el cuadro actualizado de vigencia de las pólizas que amparan la correcta ejecución del Proyecto Capilla Convento. Este resumen permite verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia de garantías y asegurar que las coberturas permanecen vigentes durante el desarrollo de las actividades ejecutadas.

ESTADO DE GARANTÍAS PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO						
NUMERO DE PÓLIZA	CONCEPTO	VALOR	VIGENCIA DE FECHAS		COMPAÑIA DE SEGUROS	ANEXO
			DESDE	HASTA		
96-40-101069048	PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	$790.984.891.75	10/02/2025	10/09/2026	SEGURUROS DEL ESTADO S.A.	ANEXO3
96-40-101069048	DAÑO EMERGENTE Y UCRO CESANTE	$790.984.891.75	10/02/2025	10/09/2026	SEGURUROS DEL ESTADO S.A.	ANEXO3
96-40-101069048	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$790.984.891.75	10/02/2025	10/09/2026	SEGURUROS DEL ESTADO S.A.	ANEXO3

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL – DECRETO 1082DE 2015						
NUMERO DE PÓLIZA	CONCEPTO	VALOR	VIGENCIA DE FECHAS		COMPAÑIA DE SEGUROS	ANEXO
			DESDE	HASTA		
96-44-101194638	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$3.163.939.567.00	10/02/2025	11/01/2027	SEGURUROS DEL ESTADO S.A.	ANEXO4
96-44-101194638	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$7.366.385.693.00	10/02/2025	11/01/2027	SEGURUROS DEL ESTADO S.A.	ANEXO4
96-44-101194638	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$790.984.891.75	10/02/2025	10/09/2029	SEGURUROS DEL ESTADO S.A.	ANEXO4
96-44-101194638	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$790.984.891.75	SI AMPARA 2 AÑOS	0 MESES Y 0 DIAS	SEGURUROS DEL ESTADO S.A.	ANEXO4
96-44-101194638	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$3.163.939.567.00	SI AMPARA 5 AÑOS	0 MESES Y 0 DIAS	SEGURUROS DEL ESTADO S.A.	ANEXO4

4. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO

El Proyecto Capilla Convento se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá D.C., en la Localidad de Antonio Nariño, sector Policarpa, específicamente en la Carrera 10 No. 159 Sur. El inmueble está identificado con el CHIP No. AAA0262XCNX y la matrícula inmobiliaria No. 50S-40727785. Esta edificación hace parte del conjunto patrimonial del Hospital San Juan de Dios y se encuentra protegida bajo la normativa del PEMP San Juan de Dios.



5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Contrato de Obra No. 4346 de 2024, cuyo objeto consiste en la ejecución de las obras de restauración, conservación, adecuación y demás actividades complementarias para la intervención integral de la Capilla y el Convento del Hospital San Juan de Dios, se desarrolla mediante etapas que permiten la ejecución organizada y progresiva del proyecto.

- La primera etapa corresponde al alistamiento técnico y administrativo, que incluye la revisión, ajuste y complementación de los estudios y diseños, así como la gestión de trámites, requerimientos y autorizaciones derivadas del PEMP San Juan de Dios y de las entidades competentes.
- La segunda etapa comprende las actividades preliminares y de adecuación inicial, tales como la protección del bien, la organización del frente de obra, la implementación de medidas de conservación preventiva y la ejecución de los planes de manejo y seguridad necesarios para la intervención.
- La tercera etapa está orientada a la ejecución de las obras de restauración y conservación arquitectónica, abordando tratamientos especializados, corrección de patologías, recuperación de elementos originales y puesta en valor de los espacios que conforman el conjunto histórico.
- Finalmente, la cuarta etapa integra las actividades complementarias y de cierre, relacionadas con acabados, limpieza general, adecuaciones finales permitidas y entrega del inmueble en condiciones óptimas de conservación y funcionalidad.

6. ALCANCE DEL CONTRATO EN EL PRESENTA CORTE

6.1 RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe corresponde al **Corte de Obra No. 2**, correspondiente al periodo comprendido entre el **1 de noviembre de 2025 y el 31 de enero de 2026**, en el marco de la ejecución del **Contrato No. 43-46-2024**, cuyo objeto corresponde a la intervención del **Edificio Capilla Convento**.

Durante este periodo se ejecutaron actividades correspondientes principalmente al **Componente 4 – Preliminares Bienes Muebles**, las cuales contemplan labores de protección, desmontaje, registro técnico, traslado y conservación preventiva de elementos patrimoniales del inmueble, así como actividades de adecuación de espacios de almacenamiento y protección temporal del edificio.

El **valor total ejecutado del componente durante el periodo evaluado asciende a:**

$677.052.111

Este valor corresponde al subtotal de las actividades ejecutadas y verificadas en campo, soportadas mediante registros técnicos, actas de obra y evidencias documentales cargadas en la plataforma de gestión del proyecto.

Las actividades ejecutadas dentro de este componente alcanzan un **avance físico del 100%**, garantizando la adecuada protección de los bienes muebles y elementos patrimoniales antes del desarrollo de las etapas posteriores de intervención arquitectónica y estructural.

Dentro de las principales actividades ejecutadas se destacan:

- Adecuación del taller de restauración para procesos de conservación de bienes muebles.

- Desmonte y traslado especializado de **paneles de vitrales** hacia áreas de intervención.
- Desmontaje controlado de **luminarias patrimoniales** y registro técnico de su estado de conservación.
- Embalaje rígido y protección especializada de bienes muebles.
- Retiro, protección y traslado interno de **muebles litúrgicos** hacia áreas de almacenamiento temporal.
- Retiro y conservación de **herrajes originales de carpintería**.
- Protección temporal de **puertas, ventanas y vitrales del edificio**.
- Retiro manual de capas de pintura deterioradas en bóvedas y molduras.
- Instalación de **cubierta provisional en estructura de guadua y teja de zinc**, con el fin de proteger el inmueble frente a condiciones climáticas durante la intervención.

6.2 APLICACIÓN DEL IPC

Conforme a lo establecido en las condiciones contractuales, el valor de las actividades ejecutadas es objeto de **actualización mediante la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC)**.

Para el presente corte se tomaron como referencia los siguientes índices:

- **IPC base:** 144,88
- **IPC de actualización:** 152,27

Lo anterior representa una variación la cual se aplica sobre el valor ejecutado del componente con el fin de mantener el equilibrio económico del contrato.

Como resultado de la aplicación del factor de actualización, el valor ajustado del componente corresponde aproximadamente a:

$676.007.653

Este ajuste refleja la actualización económica del valor de obra ejecutada de acuerdo con la variación inflacionaria registrada en el periodo correspondiente.

6.3. ANÁLISIS FINANCIERO DEL CORTE

Dentro del análisis financiero del corte se contemplan los siguientes conceptos contractuales:

Concepto	Valor (COP)
Valor obra ejecutada (Subtotal componente)	$ 677.052.111.00
Ajuste por IPC	$ (45.586.920.00)
Subtotal ajustado	$ 676.007.653.00
AIU	
Administración (32%)	$ 216.322.449.00
Imprevistos	$ 6.760.077.00
Utilidad (5%)	$ 33.800.383.00
IVA sobre utilidad	$ 6.422.073.00
Subtotal AIU	$ 263.304.982.00

Concepto	Valor (COP)
Total parcial (Subtotal ajustado + AIU)	$ 939.312.635.00
Amortización	$ 491.340.944.00
TOTAL FINAL A PAGAR	$ 447.971.691.00

ANÁLISIS TÉCNICO DEL CUADRO

El valor de la obra ejecutada presenta un subtotal inicial de **$677.052.111**, con una variación por la formulación del IPC, generando un **subtotal ajustado de $676.007.653**, lo que indica una variación marginal en los precios.

Posteriormente, se calcula el **AIU**, donde:

- La **Administración (32%)** corresponde a **$216.322.449**, siendo el componente más representativo del AIU.
- Los **Imprevistos** ascienden a **$6.760.077** (equivalente al 1%).
- La **Utilidad (5%)** es de **$33.800.383**.
- El **IVA sobre la utilidad** corresponde a **$6.422.073**.

Esto da como resultado un **subtotal AIU de $263.304.982**, que equivale aproximadamente al **39% del subtotal ajustado**, lo cual es coherente con estructuras contractuales que incluyen administración alta.

Al sumar el subtotal ajustado y el AIU, se obtiene un **total parcial de $939.312.635**.

Finalmente, se aplica una **amortización de $491.340.944**, que representa cerca del **52% del total parcial**, indicando que ya se ha realizado un pago anticipado significativo o recuperación de anticipo.

Como resultado, el valor final a pagar es de $447.971.691, correspondiente al saldo después de la amortización.

Conclusión

El acta refleja una estructura financiera consistente, con un ajuste por IPC poco significativo, una carga de AIU acorde a los porcentajes establecidos y una amortización elevada que reduce considerablemente el valor a pagar en esta cuenta. En general, los valores mantienen coherencia interna y proporcionalidad dentro del esquema contractual.

7. ANÁLISIS POR FASES Y DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

7.1 RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS – COMPONENTE 4

Preliminares Bienes Muebles

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUCIÓN
RBMCC001	Adecuación de taller para procesos de restauración	m²	60	$16.697.040	100%
RBMCC002	Desmonte y traslado de paneles de vitral al taller	und	304	$33.630.304	100%
RBMCC044	Desmonte de lámparas de pared	und	14	$2.514.904	100%

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUCIÓN
PRO001	Embalaje rígido para protección de bienes muebles	und	15	$2.602.980	100%
RBMCC045	Registro de estado de conservación de lámparas	und	14	$2.665.138	100%
RBMCC033	Desmonte de lámpara principal	und	1	$510.309	100%
RBMCC034	Registro conservación lámpara techo	und	1	$285.550	100%
NP012	Retiro y traslado interno de muebles litúrgicos	und	9	$3.989.664	100%
NP013	Reparaciones locativas en área de almacenamiento UVO	und	1	$401.363	100%
NP014	Retiro y conservación de herrajes originales	und	88	$1.857.680	100%
NP015	Protección para cerramientos y vitrales	m²	57,26	$2.152.117	100%
NP017	Sobre cubierta provisional en guadua y teja de zinc	m²	2.719,54	$611.896.500	100%

Valor total ejecutado componente

$677.052.111

Porcentaje de ejecución

100 %

7.2 ANÁLISIS TÉCNICO DEL COMPONENTE 4

PRELIMINARES – BIENES MUEBLES

El componente de **Preliminares de Bienes Muebles** corresponde a las actividades necesarias para garantizar la **protección, documentación, traslado y conservación preventiva de los elementos patrimoniales presentes en el edificio Capilla Convento**, previo al inicio de las intervenciones estructurales y arquitectónicas del proyecto.

Las actividades ejecutadas dentro de este componente permitieron garantizar condiciones adecuadas de seguridad y conservación de los elementos muebles del inmueble, asegurando su integridad física durante el proceso constructivo.

El valor total ejecutado dentro de este componente corresponde a **$677.052.111**, equivalente al **100% de las actividades programadas dentro de este grupo**, las cuales fueron verificadas por la interventoría y soportadas mediante registros técnicos y actas de campo.

7.3 ANÁLISIS TÉCNICO POR GRUPOS DE ACTIVIDADES

7.1. ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA RESTAURACIÓN

Dentro de esta fase se ejecutó la **adecuación del taller de restauración**, espacio destinado al manejo, limpieza, evaluación y conservación de los elementos patrimoniales retirados del edificio.

Esta actividad incluyó:

- adecuación de áreas de trabajo

- condiciones de almacenamiento temporal
- zonas de manipulación controlada
- condiciones de ventilación y seguridad para el manejo de piezas.

El taller permite desarrollar las labores de restauración y conservación bajo condiciones técnicas adecuadas.

7.2. DESMONTAJE Y TRASLADO DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

Se realizaron actividades especializadas para el retiro controlado de elementos patrimoniales, entre los que se destacan:

- paneles de vitrales
- luminarias históricas
- elementos litúrgicos
- herrajes originales de carpintería.

El desmontaje se realizó aplicando protocolos de conservación preventiva, evitando daños en piezas originales mediante procedimientos manuales y herramientas especializadas.

Posteriormente, los elementos fueron trasladados al área de almacenamiento y restauración bajo condiciones de embalaje y protección.

7.3. PROTECCIÓN Y EMBALAJE DE BIENES MUEBLES

Con el fin de garantizar la integridad de los elementos retirados del edificio, se ejecutaron actividades de:

- embalaje rígido especializado

- protección individual de piezas
- clasificación y rotulación
- almacenamiento temporal controlado.

Este procedimiento permite conservar las piezas durante el periodo de intervención del edificio.

7.4. REGISTRO TÉCNICO Y DIAGNÓSTICO DE CONSERVACIÓN

Antes del retiro de los elementos se realizó el registro del estado de conservación, que incluye:

- documentación fotográfica
- diagnóstico preliminar
- registro técnico de daños o deterioros
- identificación de materiales y técnicas constructivas.

Este registro constituye la base documental para los procesos posteriores de restauración.

7.5. TRASLADO Y PROTECCIÓN DE MOBILIARIO LITÚRGICO

Se ejecutó el traslado interno de muebles litúrgicos desde el edificio Capilla Convento hacia el edificio UVO, incluyendo:

- desarme controlado de piezas
- manipulación especializada
- transporte interno

- reinstalación temporal en el área de almacenamiento.

Estas actividades se realizaron teniendo en cuenta las dimensiones de los elementos y las condiciones de circulación dentro del conjunto arquitectónico.

7.6. ADECUACIÓN DE ÁREAS DE ALMACENAMIENTO

Para garantizar la conservación de los elementos retirados, se ejecutaron reparaciones locativas en el edificio UVO, permitiendo habilitar un área adecuada para el almacenamiento de bienes muebles del proyecto.

Las intervenciones incluyeron adecuaciones menores que permitieran mejorar las condiciones de seguridad, iluminación y protección de los elementos almacenados.

7.7. PROTECCIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y VITRALES

Se ejecutó la protección temporal de puertas, ventanas y vitrales, mediante cerramientos y recubrimientos protectores, con el fin de evitar afectaciones durante el desarrollo de las actividades constructivas.

Estas protecciones permiten reducir el riesgo de:

- impactos accidentales
- acumulación de polvo
- vibraciones durante demoliciones.

7. 8. PROTECCIÓN TEMPORAL DEL EDIFICIO

Como parte de las medidas de protección del inmueble, se ejecutó la instalación de una sobre cubierta provisional en estructura de guadua y teja de zinc, la cual permite proteger el edificio frente a:

- filtraciones de agua
- deterioro por lluvia
- exposición a condiciones climáticas.

Esta cubierta provisional constituye una medida fundamental para garantizar la estabilidad y conservación del edificio durante el proceso de intervención.

8. ANÁLISIS DE FASES DE EJECUCIÓN (SEMANAS)

El desarrollo de las actividades del componente se estructuró en las siguientes fases:

Fase 1 – Preparación (Semanas 1 – 2)

- adecuación del taller de restauración
- preparación de áreas de almacenamiento

Fase 2 – Documentación (Semanas 2 – 3)

- registro de estado de conservación
- levantamiento fotográfico
- diagnóstico de elementos

Fase 3 – Desmontaje (Semanas 3 – 5)

- retiro de vitrales

- desmontaje de luminarias
- retiro de herrajes

Fase 4 – Protección (Semanas 5 – 6)

- embalaje de elementos
- protección de vitrales y carpinterías

Fase 5 – Traslado y almacenamiento (Semanas 6 – 7)

- traslado de muebles litúrgicos
- organización en área UVO

Fase 6 – Protección estructural del edificio (Semanas 7 – 8)

- instalación de sobre cubierta provisional

CONCLUSIÓN DEL COMPONENTE

El Componente 4 – Preliminares Bienes Muebles presenta una ejecución del 100 %, cumpliendo con las actividades necesarias para garantizar la conservación y protección de los elementos patrimoniales del edificio Capilla Convento antes del inicio de las fases constructivas del proyecto.

Las actividades fueron ejecutadas conforme a los lineamientos técnicos de conservación patrimonial y verificadas por la interventoría, garantizando la adecuada trazabilidad técnica y documental del proceso.

9. ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 4 CON EJECUCIÓN EN CERO

En el marco de la revisión del **Componente 4**, se identifican algunos ítems cuya ejecución se reporta en **cero (0)**, debido a ajustes técnicos, optimización de recursos y redefinición de necesidades durante el desarrollo del proyecto. A continuación, se presenta la justificación correspondiente para cada caso:

Ítem 02015 – Suministro e instalación de sobrecubierta en teja en lámina de zinc
Este ítem, que contemplaba el suministro e instalación de sobrecubierta en lámina de zinc, incluyendo estructura en perfilería metálica, soldadura, pintura y pedestales en concreto reforzado, no fue ejecutado.

Lo anterior obedece a que fue **reemplazado por el ítem NP17**, mediante el cual se implementó una solución en **guadua**, permitiendo una **optimización significativa de recursos y costos**.
Adicionalmente, esta alternativa ofreció **mayor facilidad constructiva, practicidad y agilidad en la ejecución**, lo que a su vez permitió dar inicio oportuno a otras actividades prioritarias dentro del proyecto.

Ítem 200502 – Embalaje rígido para protección temporal de bienes muebles
Este ítem se reporta en cero (0), dado que las actividades asociadas al embalaje y protección de bienes muebles **fueron ejecutadas bajo otro ítem del mismo componente**, correspondiente al retiro y manejo de luminarias.

Se evidenció una **duplicidad en la formulación de actividades**, ya que tanto el embalaje como el retiro de elementos (lámparas de pared y lámpara de techo) implicaban procesos similares de protección, manipulación y resguardo.

En consecuencia, y considerando que dichas actividades tienen la misma naturaleza y valor asociado, se consolidaron dentro de un solo ítem, evitando así duplicidades en la ejecución y en el reconocimiento económico.

Ítem NPCS – Retiro manual de capas de pintura deterioradas en bóvedas y molduras
Este ítem no fue ejecutado y, por tanto, se reporta en cero (0), debido a que fue retirado del alcance del proyecto.

Durante las actividades de exploración y diagnóstico, se determinó que la intervención planteada en este ítem no era necesaria ni procedente, por lo cual perdió validez técnica dentro del desarrollo del proyecto.
En ese sentido, su no ejecución responde a una decisión técnica debidamente sustentada, alineada con las condiciones reales encontradas en obra.

CONCLUSION

Los ítems anteriormente descritos fueron ajustados conforme a criterios técnicos, operativos y económicos, garantizando la optimización de los recursos y la coherencia con las condiciones reales del proyecto, sin afectar el cumplimiento del alcance general del componente.

10. LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE CONSERVACIÓN Y ESTADO DE LAS LÁMPARAS

En el desarrollo de las actividades del componente, se llevó a cabo la **elaboración de fichas de conservación y registro del estado de conservación de las lámparas existentes en el inmueble**, con el fin de documentar sus características, condiciones físicas y requerimientos de manejo.

Estas fichas constituyen un instrumento técnico mediante el cual se realizó la **identificación, caracterización y evaluación del estado de cada elemento**, permitiendo establecer criterios adecuados para su desmontaje, manipulación, traslado y almacenamiento.

Dentro de este proceso, se identificaron un total de **quince (15) luminarias**, clasificadas de la siguiente manera:

- **Catorce (14) lámparas de pared**, correspondientes a un diseño **tipo isabelino de tres luces**, distribuidas en los muros del inmueble.
- **Una (1) lámpara de techo**, correspondiente al ítem N.° 15, ubicada **debajo del sobrepiso del coro**.

Cada una de las lámparas fue registrada de manera individual dentro de las fichas, incluyendo su identificación, tipología, localización y estado de conservación, lo cual permitió contar con un soporte técnico detallado para las actividades posteriores de intervención.

Este levantamiento garantiza la trazabilidad de los elementos intervenidos y respalda las decisiones técnicas adoptadas durante el proceso, especialmente en lo relacionado con su protección, manejo y conservación.

11. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Durante el periodo correspondiente al Corte 2, la gestión documental y de comunicaciones del contrato dio continuidad a su implementación, en cumplimiento de los lineamientos establecidos para el proyecto y las obligaciones contractuales en materia de control de la información.

En esta fase se mantuvo el seguimiento permanente a los procesos de generación, radicación, almacenamiento y trazabilidad documental, garantizando la organización, integridad y disponibilidad de la información producida en el marco del contrato. La gestión se ha desarrollado de manera articulada con todos los componentes del proyecto, asegurando el flujo adecuado de información entre contratista, interventoría y supervisión.

Toda la documentación generada durante el periodo, incluyendo oficios radicados, informes técnicos, soportes administrativos, actas de obra y reportes de gestión, ha sido debidamente gestionada a través de los canales oficiales definidos. En este sentido, se ha utilizado el correo institucional del proyecto como medio formal de comunicación, permitiendo el registro, control y seguimiento de la correspondencia emitida y recibida.

De manera complementaria, se ha garantizado el cargue sistemático y organizado de la información en la plataforma Trimble Connect, consolidándola como repositorio oficial del proyecto. Esta herramienta ha permitido mantener la trazabilidad documental, facilitar el acceso oportuno a la información por parte de los diferentes actores del contrato y asegurar el respaldo digital de todos los soportes generados.

Durante el periodo, se dio continuidad a la organización y actualización de los expedientes digitales, asegurando la correcta clasificación de la información, su correspondencia con los componentes técnicos, administrativos y operativos, y su alineación con la estructura documental definida para el proyecto.

Así mismo, se mantuvo el control sobre los tiempos de respuesta, la radicación de comunicaciones y el seguimiento a compromisos documentales, fortaleciendo la eficiencia en la gestión y la transparencia en el desarrollo contractual.

La gestión documental y de comunicaciones se ha desarrollado bajo un enfoque de mejora continua, permitiendo optimizar los procesos de registro, consulta y control de la información, y garantizando el cumplimiento de los estándares requeridos por la interventoría y la supervisión.

Toda la información correspondiente se encuentra debidamente soportada en los informes mensuales y registrada en la plataforma Trimble Connect, asegurando la trazabilidad, control y evidencia del cumplimiento del componente.

No se presentaron novedades relevantes durante el periodo, manteniéndose un adecuado flujo de información y una gestión documental organizada y eficiente.

12. OBSERVACIONES TÉCNICAS Y CONTROL DE CALIDAD

Durante el periodo correspondiente al Corte 2, se dio continuidad al seguimiento y control de las actividades ejecutadas, garantizando su cumplimiento conforme a los lineamientos técnicos, contractuales y de interventoría.

Se verificó que la totalidad de las partidas asociadas a este componente fueron ejecutadas al 100%, contando con la validación de la interventoría y el respectivo respaldo mediante actas de campo, lo que asegura la trazabilidad y conformidad de las actividades desarrolladas.

Las actividades de desmonte se llevaron a cabo bajo estrictos protocolos de conservación, en coherencia con la naturaleza del proyecto, utilizando herramientas manuales y

procedimientos controlados que permitieron minimizar afectaciones a los elementos intervenidos. Así mismo, se implementaron medidas de embalaje y protección adecuadas, garantizando la integridad de los componentes desmontados y su correcto manejo durante el proceso.

En cuanto a la gestión de residuos y materiales resultantes, se mantuvo el cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos, asegurando su adecuada recolección, clasificación, transporte y disposición final en sitios autorizados. Estas actividades se ejecutaron bajo seguimiento permanente, en articulación con el componente ambiental, garantizando el manejo responsable de los materiales generados.

Todas las actuaciones desarrolladas durante el periodo se encuentran debidamente soportadas en los registros de obra, actas de campo y reportes correspondientes, asegurando el control, la trazabilidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales.

No se presentaron novedades relevantes, manteniéndose un desarrollo adecuado de las actividades y el cumplimiento de lo programado.

13. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

Durante el periodo correspondiente al Corte 2, el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo dio continuidad a la implementación del programa SST, garantizando el cumplimiento de los lineamientos normativos vigentes y las obligaciones contractuales del proyecto.

En esta fase se mantuvo el seguimiento permanente a las condiciones de seguridad en obra, asegurando la aplicación de medidas preventivas, controles operativos y acciones de mejora orientadas a la protección de la integridad física y la salud de los trabajadores. La gestión SST se desarrolló de manera articulada con las actividades constructivas,

permitiendo la identificación oportuna de peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de controles adecuados.

Se continuó con la actualización y seguimiento al análisis de las actividades de obra, incluyendo la revisión del método constructivo y las condiciones reales de ejecución, lo que permitió ajustar los controles de riesgo conforme al avance del proyecto.

En cuanto a las políticas del sistema, se mantuvo la aplicación y divulgación de los lineamientos establecidos, tales como:

- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Política de prevención del consumo de alcohol, drogas y tabaquismo.
- Política de prevención del acoso laboral.
- Política de preparación y respuesta ante emergencias.

Estas políticas fueron socializadas y reforzadas mediante procesos de inducción, reinducción y capacitaciones periódicas al personal, dejando evidencia de su apropiación.

Se garantizó la implementación de roles, funciones y responsabilidades en SST, con seguimiento a su cumplimiento en campo, así como la ejecución de capacitaciones dirigidas al personal operativo y administrativo, fortaleciendo la cultura de prevención.

Durante el periodo, se mantuvo el funcionamiento activo del COPASST y del Comité de Convivencia Laboral, desarrollando reuniones periódicas, seguimiento a compromisos y registro de actas, conforme a la normatividad vigente.

Se dio continuidad a la identificación, evaluación y control de peligros y riesgos, aplicando metodologías que consideran variables como nivel de exposición, frecuencia, probabilidad y consecuencias, lo que permitió establecer controles específicos para cada actividad. Este proceso se mantuvo actualizado de acuerdo con la evolución de la obra.

Asimismo, se continuó con la implementación de procedimientos operativos normalizados y análisis de seguridad en tareas críticas, tales como trabajo en alturas, espacios confinados, actividades de soldadura, riesgos eléctricos, operación de maquinaria y manejo de señalización, asegurando condiciones seguras para su ejecución.

En el marco del Programa de Seguridad Industrial, se realizaron actividades permanentes de control y verificación, incluyendo:

- Validación de afiliación y pago al sistema de seguridad social del personal.
- Entrega, uso y reposición de Elementos de Protección Personal (EPP).
- Seguimiento a condiciones de orden y aseo en obra.
- Verificación de condiciones de campamentos, áreas de almacenamiento y frentes de trabajo.
- Ejecución de inspecciones preoperacionales y del programa de inspecciones planeadas.

De igual manera, se mantuvo la implementación del Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias, asegurando la disponibilidad de recursos, rutas de evacuación, señalización y brigadas capacitadas para la atención de posibles eventos.

Se realizó el seguimiento y consolidación de indicadores del sistema, incluyendo estadísticas de accidentalidad, incidentes, condiciones inseguras y acciones correctivas, lo que ha permitido mantener un control efectivo del desempeño en SST y promover la mejora continua.

Toda la información generada durante el periodo se encuentra debidamente soportada en los informes mensuales y registrada en la plataforma Trimble, garantizando la trazabilidad, control y evidencia del cumplimiento del componente SST.

No se presentaron novedades críticas durante el periodo, manteniéndose condiciones seguras en el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de la programación establecida.

14. GESTIÓN AMBIENTAL

Durante el periodo correspondiente al Corte 2, el componente ambiental dio continuidad a la implementación del Plan de Gestión Ambiental, en cumplimiento del marco normativo vigente, los lineamientos establecidos en el expediente contractual y las condiciones propias del desarrollo constructivo del proyecto.

En esta fase se mantuvo el seguimiento permanente a las obligaciones ambientales, asegurando la correcta aplicación de los controles, medidas preventivas y acciones de manejo definidas. La gestión ambiental se desarrolló de manera articulada con las actividades de obra, permitiendo la identificación oportuna de aspectos e impactos, así como la adopción de medidas de mitigación y control.

Se continuó con la revisión y aplicación del marco normativo ambiental aplicable, garantizando que las actividades ejecutadas en campo se ajustaran a los requerimientos legales y a las buenas prácticas ambientales. De igual manera, se realizó la actualización y seguimiento del organigrama ambiental, asegurando su correspondencia con la dinámica operativa del proyecto y las responsabilidades asignadas.

Durante el periodo, se efectuó el control sistemático de las demandas ambientales, mediante inspecciones y verificaciones periódicas en obra, abarcando aspectos como el manejo de materiales, la gestión integral de residuos, el control de aguas residuales, las condiciones de equipos y el almacenamiento de insumos, entre otros.

Se mantuvo la ejecución del Plan de Manejo Ambiental por Fichas, garantizando la aplicación de cada uno de los programas establecidos, los cuales se describen de manera general a continuación:

Ficha de Gestión Ambiental: establece los lineamientos generales para la implementación, seguimiento y control del componente ambiental en obra.

Ficha de Acciones Correctivas: define los procedimientos para la identificación, registro y cierre de no conformidades ambientales.

Ficha de Manejo de Campamentos y Centros de Acopio: regula las condiciones de instalación, operación y mantenimiento de estas áreas, minimizando impactos asociados.

Ficha de Manejo de Materiales: orienta el almacenamiento, manipulación y uso adecuado de materiales de construcción, evitando afectaciones al entorno.

Ficha de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos: establece las directrices para la separación, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos.

Ficha de Disposición de Materiales Sobrantes: define los procedimientos para la evacuación y disposición adecuada de excedentes de obra.

Ficha de Control de Emisiones Atmosféricas: contempla medidas para reducir la generación de polvo, material particulado y emisiones contaminantes.

Ficha de Control de Ruido: establece acciones para mitigar los niveles de ruido generados durante las actividades constructivas.

Ficha de Manejo de Agua y Vertimientos / Sumideros: regula el uso eficiente del recurso hídrico y el manejo adecuado de vertimientos.

Ficha de Manejo de Vegetación: define las acciones para la protección, manejo o intervención de cobertura vegetal presente en el área del proyecto.

Programa de señalización y control ambiental: orienta la instalación de señalización preventiva e informativa asociada a riesgos e impactos ambientales.

Adicionalmente, se continuó con la ejecución del Plan de Capacitación y Sensibilización Ambiental, mediante jornadas dirigidas al personal de obra, enfocadas en el cumplimiento de las medidas ambientales, la adopción de buenas prácticas y la prevención de impactos.

El componente ambiental se ha desarrollado bajo un enfoque de mejora continua, basado en el seguimiento, control y análisis de la información recopilada durante el periodo, lo que ha permitido optimizar la implementación de las medidas y fortalecer la gestión ambiental en obra.

Toda la información generada se encuentra debidamente registrada en los informes mensuales y cargada en la plataforma Trimble, garantizando la trazabilidad, control y soporte del cumplimiento de las obligaciones ambientales.

No se presentaron novedades relevantes durante el periodo, manteniéndose un adecuado desempeño ambiental y el cumplimiento de las actividades programadas.

15. GESTIÓN SOCIAL

Durante el periodo correspondiente al Corte 2, el componente social mantuvo la ejecución continua de las actividades establecidas en el Plan de Gestión Social, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el acompañamiento permanente al desarrollo del proyecto.

En este sentido, se realizó el seguimiento sistemático a los procesos sociales, asegurando la atención oportuna de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), así como la implementación de estrategias de comunicación efectiva con la comunidad del área de

influencia directa e indirecta. Se mantuvo un canal de diálogo abierto y permanente, orientado a fortalecer la confianza, la transparencia y la apropiación social del proyecto.

Durante el periodo, se llevaron a cabo jornadas de socialización del proyecto, en las cuales se brindó información actualizada sobre el avance de obra, las actividades programadas y las posibles afectaciones temporales, promoviendo espacios de participación y retroalimentación con la comunidad. Estas actividades permitieron resolver inquietudes, gestionar expectativas y fortalecer la articulación entre el proyecto y los actores sociales del entorno.

De manera paralela, se continuó con la gestión administrativa e informativa del componente social, la cual se encuentra debidamente documentada en los informes mensuales cargados en la plataforma Trimble. Esta gestión incluye la actualización permanente de aspectos como:

- Antecedentes y descripción del proyecto.
- Datos de localización.
- Identificación y caracterización del área de influencia social.
- Implementación del programa de atención al ciudadano.
- Desarrollo del programa de articulación interinstitucional.
- Acompañamiento a actividades técnicas y sociales en obra.
- Ejecución del programa de comunicaciones, divulgación e información.
- Seguimiento al cronograma de actividades sociales.
- Aplicación del marco jurídico vigente.

Asimismo, el equipo social realizó acompañamiento permanente en campo, apoyando las actividades técnicas del proyecto desde un enfoque social, contribuyendo a la prevención

y manejo de posibles conflictos, y promoviendo el cumplimiento de buenas prácticas en la relación con la comunidad.

El componente social ha mantenido un enfoque de mejora continua, basado en el análisis de la información recopilada durante el periodo, lo que ha permitido ajustar estrategias de intervención, optimizar los mecanismos de comunicación y fortalecer la gestión territorial del proyecto.

Toda la información generada durante este periodo se encuentra debidamente soportada en los informes mensuales y registrada en la plataforma Trimble, garantizando la trazabilidad, control y evidencia del cumplimiento de las actividades del componente social.

No se presentaron novedades relevantes durante el periodo, manteniéndose una adecuada relación con la comunidad y un desarrollo normal de las actividades programadas.

16. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

Durante el periodo evaluado se mantuvo el seguimiento y control a la gestión integral de movilidad del proyecto, con el fin de garantizar el acceso seguro de vehículos y la adecuada operación de los frentes de obra. Esta gestión se articuló con los proyectos aledaños: Proyecto Capilla Convento – Consorcio Alianza Patrimonial, Proyecto Jardín Infantil y Proyecto Santiago Samper (según proyección informada por el Ministerio), asegurando la coordinación interinstitucional requerida.

En este marco, se desarrollaron mesas de trabajo y se consolidaron acuerdos administrativos y financieros entre los proyectos principales, lo que permitió la implementación y operación efectiva de un acceso común.

El Plan de Manejo de Tránsito (PMT), elaborado por la firma Castillo Asociados, cuenta con aprobación de la Secretaría Distrital de Movilidad desde el 16 de abril de 2025, bajo

radicado No. 15000666 y código de identificación vial No. 15000717, para el acceso ubicado en la Calle 2ª Sur con Carrera 12A. Este se encuentra vigente desde el 17 de abril de 2025, con una duración inicial hasta el 16 de abril de 2026, en jornada de operación continua (24 horas).

Durante su implementación, se ha verificado el cumplimiento integral de las condiciones establecidas en la aprobación, incluyendo la correcta señalización vial y peatonal, la presencia de auxiliares de tránsito, la coordinación con otros contratos activos en la zona, así como el cumplimiento de la normatividad urbanística, ambiental y de convivencia vigente. De igual forma, se han aplicado las medidas de manejo operativo requeridas, tales como el control de materiales transportados, el lavado de llantas, el mantenimiento de vías y la adecuada gestión del espacio público.

Adicionalmente, se implementó un PMT interno que ha facilitado la organización de los accesos y la circulación entre los diferentes frentes de obra, contribuyendo a una operación más eficiente y segura.

No se presentaron novedades relevantes durante el periodo. Actualmente, y considerando la proximidad del vencimiento del PMT en la primera semana de abril, se iniciará el proceso de renovación, con el fin de garantizar la continuidad de las condiciones operativas y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la autoridad competente.

17. GESTIÓN ESTRUCTURAL

Durante el periodo correspondiente al Corte 2, se dio continuidad a la gestión estructural del proyecto, avanzando de manera progresiva desde la fase de estudios y apropiación hacia la ejecución de las intervenciones estructurales definidas, en cumplimiento de los lineamientos técnicos, normativos y contractuales establecidos.

En esta etapa se consolidó la transición hacia actividades constructivas, materializando en campo las soluciones estructurales previamente analizadas, modeladas y aprobadas. Como parte del desarrollo del proyecto, se presentaron algunas variaciones técnicas frente a los planteamientos iniciales, derivadas principalmente de condiciones reales identificadas en

obra y de la necesidad de optimizar las soluciones estructurales. Estas variaciones fueron oportunamente evaluadas, socializadas y avaladas por la interventoría, garantizando su trazabilidad mediante los registros correspondientes en la plataforma Trimble y en la bitácora oficial de obra.

Se dio inicio a las actividades de fundida de elementos estructurales, las cuales se ejecutan bajo estrictos controles técnicos y de calidad, conforme a las especificaciones de diseño ajustadas y aprobadas. Estas actividades se desarrollan en cumplimiento de los procedimientos constructivos definidos, asegurando la adecuada resistencia, estabilidad y durabilidad de los elementos intervenidos, así como la compatibilidad con el sistema estructural existente.

En el marco de los ajustes aprobados y con el aval de la interventoría del Ministerio, se vienen adelantando actuaciones estructurales orientadas al mejoramiento del desempeño global de la edificación, especialmente en términos de seguridad estructural y respuesta sísmica. Entre las principales intervenciones ejecutadas y en desarrollo se destacan:

- La implementación de medidas de corrección sísmica en la Capilla, orientadas a mejorar la capacidad de disipación de energía y el comportamiento estructural ante solicitaciones sísmicas, en concordancia con la normatividad vigente.

- La adición de elementos verticales estructurales, específicamente la incorporación de dos (2) columnas en la sacristía y dos (2) columnas en la casa cural, diseñadas para optimizar la distribución de cargas y reforzar zonas críticas identificadas durante el diagnóstico.

- La ejecución de cimentaciones complementarias, así como la construcción de pilastras en ladrillo y pies derechos en madera, en coherencia con los criterios estructurales y arquitectónicos del proyecto, garantizando compatibilidad con el sistema constructivo existente.

- La **sustitución de pantallas estructurales por dispositivos metálicos**, solución adoptada para mejorar la eficiencia estructural, facilitar la constructibilidad y optimizar el comportamiento ante cargas laterales.

- Intervenciones específicas en el **campanario y el sistema de escaleras**, enfocadas en su estabilización, refuerzo y adecuación a las condiciones de seguridad requeridas.

- Actuaciones en el **ábside**, considerando su importancia estructural y patrimonial dentro del conjunto arquitectónico.

- Refuerzo e intervención de **columnas de entrepiso**, garantizando la continuidad estructural y la adecuada transferencia de cargas entre niveles.

- Desarrollo de la **modulación e instalación de losas aéreas metálicas**, incorporando soluciones que optimizan tiempos constructivos y mejoran el desempeño estructural del sistema de entrepisos.

Todas las actividades ejecutadas durante este periodo se encuentran debidamente parametrizadas de acuerdo con los ajustes aprobados, bajo un esquema de control técnico permanente. Se ha garantizado el cumplimiento de las especificaciones de diseño, los estándares de calidad y los procedimientos constructivos definidos, contando en todo momento con el acompañamiento y aval de la interventoría.

Adicionalmente, la información técnica generada y las actuaciones ejecutadas han sido registradas de manera sistemática en los informes mensuales de gestión, en la plataforma Trimble y en la bitácora de obra, asegurando la trazabilidad, control y transparencia en el desarrollo del componente estructural del proyecto.

No se presentaron novedades críticas que comprometieran la estabilidad estructural ni el desarrollo de las actividades programadas. El avance alcanzado en este periodo permite

consolidar la fase constructiva del componente estructural y garantiza la continuidad de las intervenciones conforme a la programación establecida.

18. GESTIÓN ARQUEOLÓGICA

Durante el periodo correspondiente al Corte 2, el componente arqueológico dio continuidad a la implementación del Plan de Manejo Arqueológico, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el ICANH y las obligaciones contractuales del proyecto.

En esta fase se mantuvo el seguimiento permanente a las actividades arqueológicas en campo, garantizando la adecuada articulación entre la ejecución de obra y la protección del patrimonio arqueológico. Se continuó con la aplicación de los protocolos definidos, asegurando que las intervenciones se desarrollaran bajo criterios técnicos, preventivos y de control.

Como parte de la gestión adelantada, se consolidó la inclusión del polígono arqueológico inmediato correspondiente al área inicial definida en la Resolución del ICANH, en coherencia con la zona de intervención del proyecto. Así mismo, se gestionó y obtuvo la aprobación del polígono arqueológico ampliado, correspondiente a las áreas exteriores, lo cual permitió contar con un marco de actuación más amplio, funcional y acorde con las necesidades operativas del proyecto. Esta ampliación facilitó el desarrollo de las actividades constructivas, manteniendo el cumplimiento de los requisitos de protección y manejo del patrimonio.

Durante el periodo, se realizaron de manera continua reconocimientos y monitoreos arqueológicos en obra, especialmente en las zonas intervenidas, con el fin de identificar, registrar y analizar los elementos o evidencias que pudieran presentarse. Los hallazgos

identificados fueron manejados conforme a los protocolos establecidos, incluyendo su documentación, georreferenciación y reporte oportuno.

Se mantuvo la implementación de los procedimientos de hallazgo fortuito, la delimitación de áreas sensibles y la aplicación de medidas preventivas, garantizando la protección de los posibles bienes de interés arqueológico. Estas acciones se desarrollaron en coordinación permanente con la dirección arqueológica, la interventoría y la supervisión del proyecto.

De igual manera, se continuó con el registro sistemático de la información arqueológica generada, incluyendo fichas de campo, reportes técnicos y soportes gráficos, los cuales hacen parte integral de los informes mensuales del componente. Esta información se encuentra debidamente cargada en la plataforma Trimble, asegurando la trazabilidad, control y cumplimiento de los requerimientos establecidos por el ICANH.

El componente arqueológico se ha desarrollado bajo un enfoque preventivo y de acompañamiento continuo a obra, permitiendo la identificación oportuna de condiciones relevantes y la toma de decisiones técnicas adecuadas, sin generar afectaciones significativas al desarrollo del proyecto.

No se presentaron novedades críticas durante el periodo, y las actividades se ejecutaron conforme a la planificación establecida, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente y la adecuada gestión del patrimonio arqueológico.

19. CONCLUSIONES

- Durante el periodo correspondiente al Corte 2, el proyecto evidenció un avance significativo en la transición hacia la fase constructiva, materializando en campo las intervenciones previamente definidas en la etapa de apropiación y ajuste técnico.
- Las actividades estructurales iniciadas se han ejecutado conforme a los diseños aprobados y a los lineamientos técnicos establecidos, contando con el aval de la interventoría y garantizando condiciones de calidad, seguridad y estabilidad en los elementos intervenidos.
- Las variaciones técnicas presentadas durante el periodo fueron debidamente evaluadas, socializadas y documentadas, asegurando su trazabilidad en la plataforma Trimble y su incorporación adecuada dentro del desarrollo del proyecto.
- El proyecto ha mantenido un cumplimiento integral en los componentes SST, Ambiental, Social, Estructural y Arqueológico, con ejecución continua de los planes de gestión, seguimiento permanente y disponibilidad de soportes técnicos verificables.
- La gestión documental y de comunicaciones ha permitido garantizar la trazabilidad, control y acceso oportuno a la información, consolidando la plataforma Trimble como repositorio oficial del proyecto.
- La coordinación interinstitucional se ha mantenido activa y efectiva, facilitando la articulación entre los diferentes actores del proyecto y permitiendo el desarrollo adecuado de las actividades en campo.
- El Plan de Manejo de Tránsito (PMT) ha operado de manera adecuada durante el periodo, permitiendo la organización de accesos, la movilidad en la zona y la seguridad en la operación del proyecto.

- El componente arqueológico ha sido ejecutado bajo un enfoque preventivo y de acompañamiento permanente, destacándose la funcionalidad del polígono ampliado como herramienta que facilita el desarrollo de las actividades sin afectar la protección del patrimonio.
- La gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo se ha mantenido conforme a los lineamientos normativos, sin presentarse novedades críticas, asegurando condiciones adecuadas para la ejecución de las actividades constructivas.
- En términos generales, el proyecto presenta un avance técnico, administrativo y operativo acorde con las obligaciones contractuales, sin evidenciarse situaciones críticas que afecten su continuidad, consolidando las bases para el desarrollo de las siguientes etapas.

ELABORO

EQUIPO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL

AVALO:



WILSON DANILO VARGAS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL

CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO NOVIEMBRE DE 2025 – CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL






































4 nov. 2025 3:15:00 p. m.
324° NW












4 nov. 2025 3:13:15 p. m.





















































































JARDIN INFANTIL
CONSORCIO




CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
CAPILLA CONVENTO
Xtreme
DTS555B
CLASE 1.0 4 Hilos
Fabricado en RPC
No. 240908836









REGISTRO FOTOGRAFICO DICIEMBRE DE 2025 CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL


4 dic. 2025 9:59:07 p.
#CHS JD-CAPILLA CONVENTO #C








26 dic. 2
#CHSJD-CAPILLA
























19 jul. 2025 10:40:38 a. m.
111° E
#CHISJO-CAPILLA CONVENTO #CAP








24 036306 m³


24 036306 m³
24036306200015











REGISTRO FOTOGRAFICO ENERO 2026 CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL




















Bogotá, D.C.









































































































Culturas	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 4346 DE 2024, CUYO OBJETO ES "EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CAPILLA –CONVENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO."	

FICHA TÉCNICA ESTADO DE CONSERVACION					
ENTIDAD RESPONSABLE:	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL		FICHA No. (COD. LAMP1. 12/09/2025) DE REGISTRO		
REGISTRADO POR:	RESTAURADOR HECTOR OSWALDO PRIETO GORDILLO		ARHIVO No.	FECHA DE REGISTRO:	12/09/2025
DENOMINACION DEL BIEN INMUEBLE			CODIGO DE BIENES:	RES-EM04	
EDIFICIO CAPILLA CONVENTO (COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS)			CODIFO CATASTRAL:	No aplica	

TENENCIA		USOS	LOCALIZACION		
MUNICIPAL		ORIGINAL:	DIRECCION:	CIUDAD:	DEPARTAMENTO:
DEPARTAMENTAL		CONTINUO ACCESO CASA CURAL	Carrera 2 sur No 12 - 90	Bogotá	Cundinamarca
NACIONAL	X		CODIGO DEL ELEMENTO:	UBICACIÓN EXACTA (Muro, Vano, Techo, Ejes, No. Piso)	
MILITAR			LAMP-1	CAPILLA- FRENTE ALTAR - MURO	
RELIGIOSO		ACTUAL:	Lámparas de tipo isabelino de tres luces, con sistema eléctrico de cableado realizadas en bronce. Cada lámpara está compuesta por un aplique redondo decorado con un relieve floral central y motivos repetitivos geométricos en los bordes de la circunferencia, que sirve de anclaje a la pared central. Del aplique principal se desprenden tres brazos curvados decorados con hojas de acanto a lo largo de su recorrido, finalizando en un aplique redondo con relieves de veneras y volutas que soportan unas tulipas semi globulares de cristal tallado con figuras geométricas.		
PRIVADO		GUACAL- EDIFICIO EL UVO			
OTROS					

Tipología: [Arquitectónico / Decorativo / Complementario]	Material principal: [Madera / Piedra / Yeso / Metal / Otro]	Nivel de originalidad: [Original / Intervenido / Sustituto / Moderno]
DECORATIVO	BRONCE Y CRISTAL	
Técnica constructiva: [Tallado / Forja / Enlucido / Otro]	Estado de conservación: [Bueno / Regular / Malo / Riesgo inminente]	ORIGINAL
OTRO	REGULAR	
PROPUESTA DE TRATAMIENTO:		

Criterios de intervención

Los criterios de intervención de estos objetos se deben considerar teniendo en cuenta que se trata un conjunto de objetos con las mismas características, en este sentido, las actividades que se realicen deben estar encaminadas a la unicidad estética de todo el conjunto, así como la recuperación de la funcionalidad de los elementos dentro del espacio al que pertenecen.

Cabe señalar que todos los procesos deben realizarse respetando la originalidad de los objetos, su carácter utilitario y sus características como piezas de un conjunto.

METODOLOGÍA PARA LA INTERVENCIÓN

1. Desmonte de las lámparas de los lugares de ubicación:
2. Desmonte de piezas de la lampara, clasificación y registro: que componen cada una de las lámparas con su nomenclatura, clasificación y registro correspondiente de cada una de ellas.
3. Limpieza en seco: se realizara el proceso de limpieza en seco de las piezas metálicas con brochas, bisturí y en caso de ser necesario lápices de fibra de vidrio para eliminar depósitos muy adheridos y materiales agregados.
4. Limpieza en húmedo: de las tulipas de vidrio con una solución de jabón neutro, posterior secado
5. Limpieza química de los productos de corrosión: de las piezas metálicas por medio de impregnación con solución acuosa de Hexametafosfato de sodio al 5% (pudiendo subir la concentración al no ser efectiva hasta el 15% máximo), teniendo en cuenta que al aumentar la temperatura puede ser más efectiva la acción de la solución. En caso de tener puntos concretos de corrosión más gruesos puede utilizarse puntualmente una solución acuosa de ácido cítrico en una concentración no mayor al 3%, o ácido fórmico en una concentración no superior al 30%, y por un tiempo no superior a los 20 minutos, teniendo mucho cuidado en la eliminación de las patinas propias del material.

El pasivado se realizará por medio de inmersiones en sesquicarbonato de sodio en una concentración entre el 5% y el 15%, para eliminar las sales de cloruros que se dispersaran sin riesgos para la pátina, posterior lavado con agua destilada y secado riguroso con solventes (alcohol).

Es importante definir el nivel de limpieza al cual se quiere llegar, con el fin de lograr una homogeneidad en todo el conjunto.

6. Aplicación de capa de protección: para el metal, por medio de una resina acrílica en solución tipo Paraloid B 44, B72 en acetona al 40%, o Incralac. Se recomienda el Incralac ya que la solución contiene dentro de su composición un inhibidor (Benzotriazol) que puede considerarse adecuado para la protección del metal.
7. Armado e instalación: las lámparas serán armadas de nuevo de acuerdo con la información de las piezas levantadas durante el desarmado, de ser necesario se realizarán puntos de soldadura si las lámparas lo requieren para quedar correctamente armada, se revisara y adecuara el sistema eléctrico de cada lampara y posteriormente se instalarán de nuevo en su lugar original.
8. Reposición de tulipas: dañadas, rotas y faltantes por unas de las mismas características, reposición de bombillas faltantes.

FOTOGRAFIAS 1	FOTOGRAFIAS 2
	
FOTOGRAFIAS 3	FOTOGRAFIAS 4
	

AREA CONSTRUIDA:		AREA DE EJECUCION:	AREA DEL TERRENO:				LOCALIZACION
EPOCA DE CONSTRUCCION			VULNERABILIDAD				
SIGLO		FECHA O DECADA	NATURALES		ANTROPICOS		
ANTERIOR AL SIGLO XVI			SISMOS		CONFLICTO TENENCIA		
XVI (1500 - 1599)			REMOCIONES EN MASA		MALAS INTERVENCIONES		
XVII (1600 - 1699)							
XVIII (1700 - 1799)			INUNDACIONES		ABANDONO	X	
XIX (1800 - 1899)			FALLAS GEOLOGICAS				
XX (1900 - 1999)	X		ERUPCIONES		OTROS		
XXI (2000 En adelante)			OTROS				



CRITERIOS DE LIBERACIÓN		INTERVENCIÓN PERMITIDA (según liberación actual)		
No se compromete ningún componente estructural ni	NO APLICA	Limpieza superficial	APLICA	
Todos los elementos son desmontables o tratables sin	NO APLICA	Protección temporal	APLICA	
Se justifica técnicamente la intervención por razones	APLICA	Desmonte técnico	APLICA	
Se cuenta con trazabilidad documental en matrices y	APLICA	Consolidación puntual	APLICA	
Limpieza superficial (en seco o con métodos no invasivos).	APLICA	OBSERVACIONES: Presenta suciedad superficial, así como manchas de cemento, pintura, excremento y plumas de aves. Se observan productos de corrosión sobre el metal de tonos marrón, rojizo, verde y blanco. Los elementos en cristal se encuentran en buen estado. El sistema eléctrico se encuentra desactualizado, así como el mecanismo de la lámpara.		
Desmonte técnico con protección y embalaje.	APLICA PARCIALMENTE			
Aplicación de tratamientos conservativos mínimos	APLICA			FECHA DE EJECUCION : 12/09/2025
Diligenciamiento de matriz de intervención y bitácora técnica.	NO APLICA			VOBO. PROFESIONAL RESPONSABLE : 

Culturas	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 4346 DE 2024, CUYO OBJETO ES "EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CAPILLA –CONVENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO."	

FICHA TÉCNICA ESTADO DE CONSERVACION					
ENTIDAD RESPONSABLE:	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL		FICHA No. (COD. LAMP2. 12/09/2025) DE REGISTRO		
REGISTRADO POR:	RESTAURADOR HECTOR OSWALDO PRIETO GORDILLO		ARHIVO No.	FECHA DE REGISTRO:	12/09/2025
DENOMINACION DEL BIEN INMUEBLE			CODIGO DE BIENES:	RES-EM04	
EDIFICIO CAPILLA CONVENTO (COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS)			CODIFO CATASTRAL:	No aplica	

TENENCIA		USOS	LOCALIZACION		
MUNICIPAL		ORIGINAL:	DIRECCION:	CIUDAD:	DEPARTAMENTO:
DEPARTAMENTAL		MURO ORIENTE	Carrera 2 sur No 12 - 90	Bogotá	Cundinamarca
NACIONAL	X		CODIGO DEL ELEMENTO:	UBICACIÓN EXACTA (Muro, Vano, Techo, Ejes, No. Piso)	
MILITAR			LAMP-2	CAPILLA- MURO ORIENTAL	
RELIGIOSO		ACTUAL:	Lámparas de tipo isabelino de tres luces, con sistema eléctrico de cableado realizadas en bronce. Cada lámpara está compuesta por un aplique redondo decorado con un relieve floral central y motivos repetitivos geométricos en los bordes de la circunferencia, que sirve de anclaje a la pared central. Del aplique principal se desprenden tres brazos curvados decorados con hojas de acanto a lo largo de su recorrido, finalizando en un aplique redondo con relieves de veneras y volutas que soportan unas tulipas semi globulares de cristal tallado con figuras geométricas.		
PRIVADO		GUACAL- EDIFICIO EL UVO			
OTROS					

Tipología: [Arquitectónico / Decorativo / Complementario]	Material principal: [Madera / Piedra / Yeso / Metal / Otro]	Nivel de originalidad: [Original / Intervenido / Sustituto / Moderno]
DECORATIVO	BRONCE Y CRISTAL	
Técnica constructiva: [Tallado / Forja / Enlucido / Otro]	Estado de conservación: [Bueno / Regular / Malo / Riesgo inminente]	ORIGINAL
OTRO	REGULAR	
PROPUESTA DE TRATAMIENTO:		

Criterios de intervención

Los criterios de intervención de estos objetos se deben considerar teniendo en cuenta que se trata un conjunto de objetos con las mismas características, en este sentido, las actividades que se realicen deben estar encaminadas a la unicidad estética de todo el conjunto, así como la recuperación de la funcionalidad de los elementos dentro del espacio al que pertenecen.

Cabe señalar que todos los procesos deben realizarse respetando la originalidad de los objetos, su carácter utilitario y sus características como piezas de un conjunto.

METODOLOGÍA PARA LA INTERVENCIÓN

1. Desmonte de las lámparas de los lugares de ubicación:
2. Desmonte de piezas de la lampara, clasificación y registro: que componen cada una de las lámparas con su nomenclatura, clasificación y registro correspondiente de cada una de ellas.
3. Limpieza en seco: se realizara el proceso de limpieza en seco de las piezas metálicas con brochas, bisturí y en caso de ser necesario lápices de fibra de vidrio para eliminar depósitos muy adheridos y materiales agregados.
4. Limpieza en húmedo: de las tulipas de vidrio con una solución de jabón neutro, posterior secado
5. Limpieza química de los productos de corrosión: de las piezas metálicas por medio de impregnación con solución acuosa de Hexametafosfato de sodio al 5% (pudiendo subir la concentración al no ser efectiva hasta el 15% máximo), teniendo en cuenta que al aumentar la temperatura puede ser más efectiva la acción de la solución. En caso de tener puntos concretos de corrosión más gruesos puede utilizarse puntualmente una solución acuosa de ácido cítrico en una concentración no mayor al 3%, o ácido fórmico en una concentración no superior al 30%, y por un tiempo no superior a los 20 minutos, teniendo mucho cuidado en la eliminación de las patinas propias del material.

El pasivado se realizará por medio de inmersiones en sesquicarbonato de sodio en una concentración entre el 5% y el 15%, para eliminar las sales de cloruros que se dispersaran sin riesgos para la pátina, posterior lavado con agua destilada y secado riguroso con solventes (alcohol).

Es importante definir el nivel de limpieza al cual se quiere llegar, con el fin de lograr una homogeneidad en todo el conjunto.

6. Aplicación de capa de protección: para el metal, por medio de una resina acrílica en solución tipo Paraloid B 44, B72 en acetona al 40%, o Incralac. Se recomienda el Incralac ya que la solución contiene dentro de su composición un inhibidor (Benzotriazol) que puede considerarse adecuado para la protección del metal.
7. Armado e instalación: las lámparas serán armadas de nuevo de acuerdo con la información de las piezas levantadas durante el desarmado, de ser necesario se realizarán puntos de soldadura si las lámparas lo requieren para quedar correctamente armada, se revisara y adecuara el sistema eléctrico de cada lampara y posteriormente se instalarán de nuevo en su lugar original.
8. Reposición de tulipas: dañadas, rotas y faltantes por unas de las mismas características, reposición de bombillas faltantes.

FOTOGRAFIAS 1	FOTOGRAFIAS 2
	
FOTOGRAFIAS 3	FOTOGRAFIAS 4
	

AREA CONSTRUIDA:		AREA DE EJECUCION:	AREA DEL TERRENO:		LOCALIZACION
EPOCA DE CONSTRUCCION			VULNERABILIDAD		
SIGLO		FECHA O DECADA	NATURALES	ANTROPICOS	
ANTERIOR AL SIGLO XVI			SISMOS	CONFLICTO TENENCIA	
XVI (1500 - 1599)			REMOCIONES EN MASA	MALAS INTERVENCIONES	
XVII (1600 - 1699)			INUNDACIONES	ABANDONO	X
XVIII (1700 - 1799)			FALLAS GEOLOGICAS		
XIX (1800 - 1899)			ERUPCIONES	OTROS	
XX (1900 - 1999)	X		OTROS		
XXI (2000 En adelante)					

CRITERIOS DE LIBERACIÓN		INTERVENCIÓN PERMITIDA (según liberación actual)	
No se compromete ningún componente estructural ni	NO APLICA	Limpieza superficial	APLICA
Todos los elementos son desmontables o tratables sin	NO APLICA	Protección temporal	APLICA
Se justifica técnicamente la intervención por razones	APLICA	Desmonte técnico	APLICA
Se cuenta con trazabilidad documental en matrices y	APLICA	Consolidación puntual	APLICA
Limpieza superficial (en seco o con métodos no invasivos).	APLICA		
Desmonte técnico con protección y embalaje.	APLICA PARCIALMENTE		
Aplicación de tratamientos conservativos mínimos	APLICA		

OBSERVACIONES: Presenta suciedad superficial y acumulada, así como manchas de pintura. Se observan
productos de corrosión de tonos marrón oscuro,



FECHA DE EJECUCION : 12/09/2025

Diligenciamiento de matriz de intervención y bitácora técnica.	NO APLICA	rojizos y algunos puntos verdes. Se observa una tulipa sin bombilla.	VOBO. PROFESIONAL RESPONSABLE : 

Culturas	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 4346 DE 2024, CUYO OBJETO ES "EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CAPILLA –CONVENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO."				

FICHA TÉCNICA ESTADO DE CONSERVACION					
ENTIDAD RESPONSABLE:	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL		FICHA No. (COD. LAMP3. 12/09/2025) DE REGISTRO		
REGISTRADO POR:	RESTAURADOR HECTOR OSWALDO PRIETO GORDILLO		ARHIVO No.	FECHA DE REGISTRO:	12/09/2025
DENOMINACION DEL BIEN INMUEBLE			CODIGO DE BIENES:	RES-EM04	
EDIFICIO CAPILLA CONVENTO (COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS)			CODIFO CATASTRAL:	No aplica	

TENENCIA		USOS	LOCALIZACION		
MUNICIPAL		ORIGINAL:	DIRECCION:	CIUDAD:	DEPARTAMENTO:
DEPARTAMENTAL		MURO ORIENTE	Carrera 2 sur No 12 - 90	Bogotá	Cundinamarca
NACIONAL	X		CODIGO DEL ELEMENTO:	UBICACIÓN EXACTA (Muro, Vano, Techo, Ejes, No. Piso)	
MILITAR			LAMP-3	CAPILLA- MURO ORIENTAL	
RELIGIOSO		ACTUAL:	Lámparas de tipo isabelino de tres luces, con sistema eléctrico de cableado realizadas en bronce. Cada lámpara está compuesta por un aplique redondo decorado con un relieve floral central y motivos repetitivos geométricos en los bordes de la circunferencia, que sirve de anclaje a la pared central. Del aplique principal se desprenden tres brazos curvados decorados con hojas de acanto a lo largo de su recorrido, finalizando en un aplique redondo con relieves de veneras y volutas que soportan unas tulipas semi globulares de cristal tallado con figuras geométricas.		
PRIVADO		GUACAL- EDIFICIO EL UVO			
OTROS					

Tipología: [Arquitectónico / Decorativo / Complementario]	Material principal: [Madera / Piedra / Yeso / Metal / Otro]	Nivel de originalidad: [Original / Intervenido / Sustituto / Moderno]
DECORATIVO	BRONCE Y CRISTAL	ORIGINAL
Técnica constructiva: [Tallado / Forja / Enlucido / Otro]	Estado de conservación: [Bueno / Regular / Malo / Riesgo inminente]	
OTRO	REGULAR	
PROPUESTA DE TRATAMIENTO:		

Criterios de intervención

Los criterios de intervención de estos objetos se deben considerar teniendo en cuenta que se trata un conjunto de objetos con las mismas características, en este sentido, las actividades que se realicen deben estar encaminadas a la unicidad estética de todo el conjunto, así como la recuperación de la funcionalidad de los elementos dentro del espacio al que pertenecen.

Cabe señalar que todos los procesos deben realizarse respetando la originalidad de los objetos, su carácter utilitario y sus características como piezas de un conjunto.

METODOLOGÍA PARA LA INTERVENCIÓN

1. Desmonte de las lámparas de los lugares de ubicación:
2. Desmonte de piezas de la lampara, clasificación y registro: que componen cada una de las lámparas con su nomenclatura, clasificación y registro correspondiente de cada una de ellas.
3. Limpieza en seco: se realizara el proceso de limpieza en seco de las piezas metálicas con brochas, bisturí y en caso de ser necesario lápices de fibra de vidrio para eliminar depósitos muy adheridos y materiales agregados.
4. Limpieza en húmedo: de las tulipas de vidrio con una solución de jabón neutro, posterior secado
5. Limpieza química de los productos de corrosión: de las piezas metálicas por medio de impregnación con solución acuosa de Hexametafosfato de sodio al 5% (pudiendo subir la concentración al no ser efectiva hasta el 15% máximo), teniendo en cuenta que al aumentar la temperatura puede ser más efectiva la acción de la solución. En caso de tener puntos concretos de corrosión más gruesos puede utilizarse puntualmente una solución acuosa de ácido cítrico en una concentración no mayor al 3%, o ácido fórmico en una concentración no superior al 30%, y por un tiempo no superior a los 20 minutos, teniendo mucho cuidado en la eliminación de las patinas propias del material.

El pasivado se realizará por medio de inmersiones en sesquicarbonato de sodio en una concentración entre el 5% y el 15%, para eliminar las sales de cloruros que se dispersaran sin riesgos para la pátina, posterior lavado con agua destilada y secado riguroso con solventes (alcohol).

Es importante definir el nivel de limpieza al cual se quiere llegar, con el fin de lograr una homogeneidad en todo el conjunto.

6. Aplicación de capa de protección: para el metal, por medio de una resina acrílica en solución tipo Paraloid B 44, B72 en acetona al 40%, o Incralac. Se recomienda el Incralac ya que la solución contiene dentro de su composición un inhibidor (Benzotriazol) que puede considerarse adecuado para la protección del metal.
7. Armado e instalación: las lámparas serán armadas de nuevo de acuerdo con la información de las piezas levantadas durante el desarmado, de ser necesario se realizarán puntos de soldadura si las lámparas lo requieren para quedar correctamente armada, se revisara y adecuara el sistema eléctrico de cada lampara y posteriormente se instalarán de nuevo en su lugar original.
8. Reposición de tulipas: dañadas, rotas y faltantes por unas de las mismas características, reposición de bombillas faltantes.

FOTOGRAFIAS 1	FOTOGRAFIAS 2
	
FOTOGRAFIAS 3	FOTOGRAFIAS 4
	

AREA CONSTRUIDA:		AREA DE EJECUCION:	AREA DEL TERRENO:		LOCALIZACION
EPOCA DE CONSTRUCCION			VULNERABILIDAD		
SIGLO		FECHA O DECADA	NATURALES	ANTROPICOS	
ANTERIOR AL SIGLO XVI			SISMOS	CONFLICTO TENENCIA	
XVI (1500 - 1599)			REMOCIONES EN MASA	MALAS INTERVENCIONES	
XVII (1600 - 1699)			INUNDACIONES	ABANDONO	X
XVIII (1700 - 1799)			FALLAS GEOLOGICAS		
XIX (1800 - 1899)			ERUPCIONES	OTROS	
XX (1900 - 1999)	X		OTROS		
XXI (2000 En adelante)					
CRITERIOS DE LIBERACIÓN			INTERVENCIÓN PERMITIDA (según liberación actual)		
No se compromete ningún componente estructural ni	NO APLICA		Limpieza superficial	APLICA	
Todos los elementos son desmontables o tratables sin	NO APLICA		Protección temporal	APLICA	
Se justifica técnicamente la intervención por razones	APLICA		Desmonte técnico	APLICA	
Se cuenta con trazabilidad documental en matrices y	APLICA		Consolidación puntual	APLICA	
Limpieza superficial (en seco o con métodos no invasivos).	APLICA				
Desmonte técnico con protección y embalaje.	APLICA PARCIALMENTE		OBSERVACIONES: Se observa suciedad superficial y acumulada, así como manchas de pintura y productos de		FECHA DE EJECUCION : 12/09/2025
Aplicación de tratamientos conservativos mínimos	APLICA				



Diligenciamiento de matriz de intervención y bitácora técnica.	NO APLICA	corrosión de tonos marrón y rojizos.	VOBO. PROFESIONAL RESPONSABLE : 

Culturas	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 4346 DE 2024, CUYO OBJETO ES "EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CAPILLA –CONVENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO."	

FICHA TÉCNICA ESTADO DE CONSERVACION					
ENTIDAD RESPONSABLE:	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL		FICHA No. (COD. LAMP4. 12/09/2025) DE REGISTRO		
REGISTRADO POR:	RESTAURADOR HECTOR OSWALDO PRIETO GORDILLO		ARHIVO No.	FECHA DE REGISTRO:	12/09/2025
DENOMINACION DEL BIEN INMUEBLE			CODIGO DE BIENES:	RES-EM04	
EDIFICIO CAPILLA CONVENTO (COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS)			CODIFO CATASTRAL:	No aplica	

TENENCIA		USOS	LOCALIZACION		
MUNICIPAL		ORIGINAL:	DIRECCION:	CIUDAD:	DEPARTAMENTO:
DEPARTAMENTAL		MURO ORIENTE	Carrera 2 sur No 12 - 90	Bogotá	Cundinamarca
NACIONAL	X		CODIGO DEL ELEMENTO:	UBICACIÓN EXACTA (Muro, Vano, Techo, Ejes, No. Piso)	
MILITAR			LAMP-4	CAPILLA- MURO ORIENTAL	
RELIGIOSO		ACTUAL:	Lámparas de tipo isabelino de tres luces, con sistema eléctrico de cableado realizadas en bronce. Cada lámpara está compuesta por un aplique redondo decorado con un relieve floral central y motivos repetitivos geométricos en los bordes de la circunferencia, que sirve de anclaje a la pared central. Del aplique principal se desprenden tres brazos curvados decorados con hojas de acanto a lo largo de su recorrido, finalizando en un aplique redondo con relieves de veneras y volutas que soportan unas tulipas semi globulares de cristal tallado con figuras geométricas.		
PRIVADO		GUACAL- EDIFICIO EL UVO			
OTROS					

Tipología: [Arquitectónico / Decorativo / Complementario]	Material principal: [Madera / Piedra / Yeso / Metal / Otro]	Nivel de originalidad: [Original / Intervenido / Sustituto / Moderno]
DECORATIVO	BRONCE Y CRISTAL	
Técnica constructiva: [Tallado / Forja / Enlucido / Otro]	Estado de conservación: [Bueno / Regular / Malo / Riesgo inminente]	ORIGINAL
OTRO	REGULAR	
PROPUESTA DE TRATAMIENTO:		

Criterios de intervención

Los criterios de intervención de estos objetos se deben considerar teniendo en cuenta que se trata un conjunto de objetos con las mismas características, en este sentido, las actividades que se realicen deben estar encaminadas a la unicidad estética de todo el conjunto, así como la recuperación de la funcionalidad de los elementos dentro del espacio al que pertenecen.

Cabe señalar que todos los procesos deben realizarse respetando la originalidad de los objetos, su carácter utilitario y sus características como piezas de un conjunto.

METODOLOGÍA PARA LA INTERVENCIÓN

1. Desmonte de las lámparas de los lugares de ubicación:
2. Desmonte de piezas de la lampara, clasificación y registro: que componen cada una de las lámparas con su nomenclatura, clasificación y registro correspondiente de cada una de ellas.
3. Limpieza en seco: se realizara el proceso de limpieza en seco de las piezas metálicas con brochas, bisturí y en caso de ser necesario lápices de fibra de vidrio para eliminar depósitos muy adheridos y materiales agregados.
4. Limpieza en húmedo: de las tulipas de vidrio con una solución de jabón neutro, posterior secado
5. Limpieza química de los productos de corrosión: de las piezas metálicas por medio de impregnación con solución acuosa de Hexametafosfato de sodio al 5% (pudiendo subir la concentración al no ser efectiva hasta el 15% máximo), teniendo en cuenta que al aumentar la temperatura puede ser más efectiva la acción de la solución. En caso de tener puntos concretos de corrosión más gruesos puede utilizarse puntualmente una solución acuosa de ácido cítrico en una concentración no mayor al 3%, o ácido fórmico en una concentración no superior al 30%, y por un tiempo no superior a los 20 minutos, teniendo mucho cuidado en la eliminación de las patinas propias del material.

El pasivado se realizará por medio de inmersiones en sesquicarbonato de sodio en una concentración entre el 5% y el 15%, para eliminar las sales de cloruros que se dispersaran sin riesgos para la pátina, posterior lavado con agua destilada y secado riguroso con solventes (alcohol).

Es importante definir el nivel de limpieza al cual se quiere llegar, con el fin de lograr una homogeneidad en todo el conjunto.

6. Aplicación de capa de protección: para el metal, por medio de una resina acrílica en solución tipo Paraloid B 44, B72 en acetona al 40%, o Incralac. Se recomienda el Incralac ya que la solución contiene dentro de su composición un inhibidor (Benzotriazol) que puede considerarse adecuado para la protección del metal.
7. Armado e instalación: las lámparas serán armadas de nuevo de acuerdo con la información de las piezas levantadas durante el desarmado, de ser necesario se realizarán puntos de soldadura si las lámparas lo requieren para quedar correctamente armada, se revisara y adecuara el sistema eléctrico de cada lampara y posteriormente se instalarán de nuevo en su lugar original.
8. Reposición de tulipas: dañadas, rotas y faltantes por unas de las mismas características, reposición de bombillas faltantes.

FOTOGRAFIAS 1	FOTOGRAFIAS 2
	
FOTOGRAFIAS 3	FOTOGRAFIAS 4
	

AREA CONSTRUIDA:		AREA DE EJECUCION:	AREA DEL TERRENO:		LOCALIZACION
EPOCA DE CONSTRUCCION			VULNERABILIDAD		
SIGLO		FECHA O DECADA	NATURALES	ANTROPICOS	
ANTERIOR AL SIGLO XVI			SISMOS	CONFLICTO TENENCIA	
XVI (1500 - 1599)			REMOCIONES EN MASA	MALAS INTERVENCIONES	
XVII (1600 - 1699)			INUNDACIONES	ABANDONO	X
XVIII (1700 - 1799)			FALLAS GEOLOGICAS		
XIX (1800 - 1899)			ERUPCIONES	OTROS	
XX (1900 - 1999)	X		OTROS		
XXI (2000 En adelante)					

CRITERIOS DE LIBERACIÓN		INTERVENCIÓN PERMITIDA (según liberación actual)	
No se compromete ningún componente estructural ni	NO APLICA	Limpieza superficial	APLICA
Todos los elementos son desmontables o tratables sin	NO APLICA	Protección temporal	APLICA
Se justifica técnicamente la intervención por razones	APLICA	Desmonte técnico	APLICA
Se cuenta con trazabilidad documental en matrices y	APLICA	Consolidación puntual	APLICA
Limpieza superficial (en seco o con métodos no invasivos).	APLICA		
Desmonte técnico con protección y embalaje.	APLICA PARCIALMENTE		
Aplicación de tratamientos conservativos mínimos	APLICA		

OBSERVACIONES: Se observa suciedad superficial y acumulada, así como telarañas. Presenta productos de



FECHA DE EJECUCION : 12/09/2025

Diligenciamiento de matriz de intervención y bitácora técnica.	NO APLICA	de corrosión de tonos marrones.	VOBO. PROFESIONAL RESPONSABLE : 

Culturas	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 4346 DE 2024, CUYO OBJETO ES "EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CAPILLA –CONVENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO."	

FICHA TÉCNICA ESTADO DE CONSERVACION					
ENTIDAD RESPONSABLE:	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL		FICHA No. (COD. LAMP5. 12/09/2025) DE REGISTRO		
REGISTRADO POR:	RESTAURADOR HECTOR OSWALDO PRIETO GORDILLO		ARHIVO No.	FECHA DE REGISTRO:	12/09/2025
DENOMINACION DEL BIEN INMUEBLE			CODIGO DE BIENES:	RES-EM04	
EDIFICIO CAPILLA CONVENTO (COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS)			CODIFO CATASTRAL:	No aplica	

TENENCIA		USOS	LOCALIZACION		
MUNICIPAL		ORIGINAL:	DIRECCION:	CIUDAD:	DEPARTAMENTO:
DEPARTAMENTAL		MURO ORIENTE	Carrera 2 sur No 12 - 90	Bogotá	Cundinamarca
NACIONAL	X		CODIGO DEL ELEMENTO:	UBICACIÓN EXACTA (Muro, Vano, Techo, Ejes, No. Piso)	
MILITAR			LAMP-5	CAPILLA- MURO ORIENTAL	
RELIGIOSO		ACTUAL:	Lámparas de tipo isabelino de tres luces, con sistema eléctrico de cableado realizadas en bronce. Cada lámpara está compuesta por un aplique redondo decorado con un relieve floral central y motivos repetitivos geométricos en los bordes de la circunferencia, que sirve de anclaje a la pared central. Del aplique principal se desprenden tres brazos curvados decorados con hojas de acanto a lo largo de su recorrido, finalizando en un aplique redondo con relieves de veneras y volutas que soportan unas tulipas semi globulares de cristal tallado con figuras geométricas.		
PRIVADO		GUACAL- EDIFICIO EL UVO			
OTROS					

Tipología: [Arquitectónico / Decorativo / Complementario]	Material principal: [Madera / Piedra / Yeso / Metal / Otro]	Nivel de originalidad: [Original / Intervenido / Sustituto / Moderno]
DECORATIVO	BRONCE Y CRISTAL	
Técnica constructiva: [Tallado / Forja / Enlucido / Otro]	Estado de conservación: [Bueno / Regular / Malo / Riesgo inminente]	ORIGINAL
OTRO	REGULAR	
PROPUESTA DE TRATAMIENTO:		

Criterios de intervención

Los criterios de intervención de estos objetos se deben considerar teniendo en cuenta que se trata un conjunto de objetos con las mismas características, en este sentido, las actividades que se realicen deben estar encaminadas a la unicidad estética de todo el conjunto, así como la recuperación de la funcionalidad de los elementos dentro del espacio al que pertenecen.

Cabe señalar que todos los procesos deben realizarse respetando la originalidad de los objetos, su carácter utilitario y sus características como piezas de un conjunto.

METODOLOGÍA PARA LA INTERVENCIÓN

1. Desmonte de las lámparas de los lugares de ubicación:
2. Desmonte de piezas de la lampara, clasificación y registro: que componen cada una de las lámparas con su nomenclatura, clasificación y registro correspondiente de cada una de ellas.
3. Limpieza en seco: se realizara el proceso de limpieza en seco de las piezas metálicas con brochas, bisturí y en caso de ser necesario lápices de fibra de vidrio para eliminar depósitos muy adheridos y materiales agregados.
4. Limpieza en húmedo: de las tulipas de vidrio con una solución de jabón neutro, posterior secado
5. Limpieza química de los productos de corrosión: de las piezas metálicas por medio de impregnación con solución acuosa de Hexametafosfato de sodio al 5% (pudiendo subir la concentración al no ser efectiva hasta el 15% máximo), teniendo en cuenta que al aumentar la temperatura puede ser más efectiva la acción de la solución. En caso de tener puntos concretos de corrosión más gruesos puede utilizarse puntualmente una solución acuosa de ácido cítrico en una concentración no mayor al 3%, o ácido fórmico en una concentración no superior al 30%, y por un tiempo no superior a los 20 minutos, teniendo mucho cuidado en la eliminación de las patinas propias del material.

El pasivado se realizará por medio de inmersiones en sesquicarbonato de sodio en una concentración entre el 5% y el 15%, para eliminar las sales de cloruros que se dispersaran sin riesgos para la pátina, posterior lavado con agua destilada y secado riguroso con solventes (alcohol).

Es importante definir el nivel de limpieza al cual se quiere llegar, con el fin de lograr una homogeneidad en todo el conjunto.

6. Aplicación de capa de protección: para el metal, por medio de una resina acrílica en solución tipo Paraloid B 44, B72 en acetona al 40%, o Incralac. Se recomienda el Incralac ya que la solución contiene dentro de su composición un inhibidor (Benzotriazol) que puede considerarse adecuado para la protección del metal.
7. Armado e instalación: las lámparas serán armadas de nuevo de acuerdo con la información de las piezas levantadas durante el desarmado, de ser necesario se realizarán puntos de soldadura si las lámparas lo requieren para quedar correctamente armada, se revisara y adecuara el sistema eléctrico de cada lampara y posteriormente se instalarán de nuevo en su lugar original.
8. Reposición de tulipas: dañadas, rotas y faltantes por unas de las mismas características, reposición de bombillas faltantes.

FOTOGRAFIAS 1	FOTOGRAFIAS 2
	
FOTOGRAFIAS 3	FOTOGRAFIAS 4
	

AREA CONSTRUIDA:		AREA DE EJECUCION:	AREA DEL TERRENO:		LOCALIZACION
EPOCA DE CONSTRUCCION			VULNERABILIDAD		
SIGLO		FECHA O DECADA	NATURALES	ANTROPICOS	
ANTERIOR AL SIGLO XVI			SISMOS	CONFLICTO TENENCIA	
XVI (1500 - 1599)			REMOCIONES EN MASA	MALAS INTERVENCIONES	
XVII (1600 - 1699)			INUNDACIONES	ABANDONO	X
XVIII (1700 - 1799)			FALLAS GEOLOGICAS		
XIX (1800 - 1899)			ERUPCIONES	OTROS	
XX (1900 - 1999)	X		OTROS		
XXI (2000 En adelante)					

CRITERIOS DE LIBERACIÓN		INTERVENCIÓN PERMITIDA (según liberación actual)	
No se compromete ningún componente estructural ni	NO APLICA	Limpieza superficial	APLICA
Todos los elementos son desmontables o tratables sin	NO APLICA	Protección temporal	APLICA
Se justifica técnicamente la intervención por razones	APLICA	Desmonte técnico	APLICA
Se cuenta con trazabilidad documental en matrices y	APLICA	Consolidación puntual	APLICA
Limpieza superficial (en seco o con métodos no invasivos).	APLICA		
Desmonte técnico con protección y embalaje.	APLICA PARCIALMENTE		
Aplicación de tratamientos conservativos mínimos	APLICA		

OBSERVACIONES: Presenta suciedad superficial y acumulada, así como telarañas. Se observan productos de

FECHA DE EJECUCION : 12/09/2025

Diligenciamiento de matriz de intervención y bitácora técnica.	NO APLICA	corrosión marrones y rojizos.	VOBO. PROFESIONAL RESPONSABLE : 

Culturas	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 4346 DE 2024, CUYO OBJETO ES "EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CAPILLA –CONVENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO."	

FICHA TÉCNICA ESTADO DE CONSERVACION					
ENTIDAD RESPONSABLE:	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL		FICHA No. (COD. LAMP6. 12/09/2025) DE REGISTRO		
REGISTRADO POR:	RESTAURADOR HECTOR OSWALDO PRIETO GORDILLO		ARHIVO No.	FECHA DE REGISTRO:	12/09/2025
DENOMINACION DEL BIEN INMUEBLE			CODIGO DE BIENES:	RES-EM04	
EDIFICIO CAPILLA CONVENTO (COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS)			CODIFO CATASTRAL:	No aplica	

TENENCIA		USOS	LOCALIZACION		
MUNICIPAL		ORIGINAL:	DIRECCION:	CIUDAD:	DEPARTAMENTO:
DEPARTAMENTAL		MURO ORIENTE	Carrera 2 sur No 12 - 90	Bogotá	Cundinamarca
NACIONAL	X		CODIGO DEL ELEMENTO:	UBICACIÓN EXACTA (Muro, Vano, Techo, Ejes, No. Piso)	
MILITAR			LAMP-6	CAPILLA- MURO ORIENTAL	
RELIGIOSO		ACTUAL:	Lámparas de tipo isabelino de tres luces, con sistema eléctrico de cableado realizadas en bronce. Cada lámpara está compuesta por un aplique redondo decorado con un relieve floral central y motivos repetitivos geométricos en los bordes de la circunferencia, que sirve de anclaje a la pared central. Del aplique principal se desprenden tres brazos curvados decorados con hojas de acanto a lo largo de su recorrido, finalizando en un aplique redondo con relieves de veneras y volutas que soportan unas tulipas semi globulares de cristal tallado con figuras geométricas.		
PRIVADO		GUACAL- EDIFICIO EL UVO			
OTROS					

Tipología: [Arquitectónico / Decorativo / Complementario]	Material principal: [Madera / Piedra / Yeso / Metal / Otro]	Nivel de originalidad: [Original / Intervenido / Sustituto / Moderno]
DECORATIVO	BRONCE Y CRISTAL	
Técnica constructiva: [Tallado / Forja / Enlucido / Otro]	Estado de conservación: [Bueno / Regular / Malo / Riesgo inminente]	ORIGINAL
OTRO	REGULAR	
PROPUESTA DE TRATAMIENTO:		

Criterios de intervención

Los criterios de intervención de estos objetos se deben considerar teniendo en cuenta que se trata un conjunto de objetos con las mismas características, en este sentido, las actividades que se realicen deben estar encaminadas a la unicidad estética de todo el conjunto, así como la recuperación de la funcionalidad de los elementos dentro del espacio al que pertenecen.

Cabe señalar que todos los procesos deben realizarse respetando la originalidad de los objetos, su carácter utilitario y sus características como piezas de un conjunto.

METODOLOGÍA PARA LA INTERVENCIÓN

1. Desmonte de las lámparas de los lugares de ubicación:
2. Desmonte de piezas de la lampara, clasificación y registro: que componen cada una de las lámparas con su nomenclatura, clasificación y registro correspondiente de cada una de ellas.
3. Limpieza en seco: se realizara el proceso de limpieza en seco de las piezas metálicas con brochas, bisturí y en caso de ser necesario lápices de fibra de vidrio para eliminar depósitos muy adheridos y materiales agregados.
4. Limpieza en húmedo: de las tulipas de vidrio con una solución de jabón neutro, posterior secado
5. Limpieza química de los productos de corrosión: de las piezas metálicas por medio de impregnación con solución acuosa de Hexametafosfato de sodio al 5% (pudiendo subir la concentración al no ser efectiva hasta el 15% máximo), teniendo en cuenta que al aumentar la temperatura puede ser más efectiva la acción de la solución. En caso de tener puntos concretos de corrosión más gruesos puede utilizarse puntualmente una solución acuosa de ácido cítrico en una concentración no mayor al 3%, o ácido fórmico en una concentración no superior al 30%, y por un tiempo no superior a los 20 minutos, teniendo mucho cuidado en la eliminación de las patinas propias del material.

El pasivado se realizará por medio de inmersiones en sesquicarbonato de sodio en una concentración entre el 5% y el 15%, para eliminar las sales de cloruros que se dispersaran sin riesgos para la pátina, posterior lavado con agua destilada y secado riguroso con solventes (alcohol).

Es importante definir el nivel de limpieza al cual se quiere llegar, con el fin de lograr una homogeneidad en todo el conjunto.

6. Aplicación de capa de protección: para el metal, por medio de una resina acrílica en solución tipo Paraloid B 44, B72 en acetona al 40%, o Incralac. Se recomienda el Incralac ya que la solución contiene dentro de su composición un inhibidor (Benzotriazol) que puede considerarse adecuado para la protección del metal.
7. Armado e instalación: las lámparas serán armadas de nuevo de acuerdo con la información de las piezas levantadas durante el desarmado, de ser necesario se realizarán puntos de soldadura si las lámparas lo requieren para quedar correctamente armada, se revisara y adecuara el sistema eléctrico de cada lampara y posteriormente se instalarán de nuevo en su lugar original.
8. Reposición de tulipas: dañadas, rotas y faltantes por unas de las mismas características, reposición de bombillas faltantes.

FOTOGRAFIAS 1	FOTOGRAFIAS 2
	
FOTOGRAFIAS 3	FOTOGRAFIAS 4
	

AREA CONSTRUIDA:		AREA DE EJECUCION:	AREA DEL TERRENO:		LOCALIZACION
EPOCA DE CONSTRUCCION			VULNERABILIDAD		
SIGLO		FECHA O DECADA	NATURALES	ANTROPICOS	
ANTERIOR AL SIGLO XVI			SISMOS	CONFLICTO TENENCIA	
XVI (1500 - 1599)			REMOCIONES EN MASA	MALAS INTERVENCIONES	
XVII (1600 - 1699)			INUNDACIONES	ABANDONO	X
XVIII (1700 - 1799)			FALLAS GEOLOGICAS		
XIX (1800 - 1899)			ERUPCIONES	OTROS	
XX (1900 - 1999)	X		OTROS		
XXI (2000 En adelante)					

CRITERIOS DE LIBERACIÓN		INTERVENCIÓN PERMITIDA (según liberación actual)	
No se compromete ningún componente estructural ni	NO APLICA	Limpieza superficial	APLICA
Todos los elementos son desmontables o tratables sin	NO APLICA	Protección temporal	APLICA
Se justifica técnicamente la intervención por razones	APLICA	Desmonte técnico	APLICA
Se cuenta con trazabilidad documental en matrices y	APLICA	Consolidación puntual	APLICA
Limpieza superficial (en seco o con métodos no invasivos).	APLICA		
Desmonte técnico con protección y embalaje.	APLICA PARCIALMENTE		
Aplicación de tratamientos conservativos mínimos	APLICA		

OBSERVACIONES: Presenta suciedad superficial y acumulada, manchas de pintura blanca, así como productos



FECHA DE EJECUCION : 12/09/2025

Diligenciamiento de matriz de intervención y bitácora técnica.	NO APLICA	de corrosión marrones, se observa una rotura en una de las tulipas de cristal.	VOBO. PROFESIONAL RESPONSABLE : 

Culturas	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 4346 DE 2024, CUYO OBJETO ES "EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CAPILLA –CONVENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO."	

FICHA TÉCNICA ESTADO DE CONSERVACION					
ENTIDAD RESPONSABLE:	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL		FICHA No. (COD. LAMP7. 12/09/2025) DE REGISTRO		
REGISTRADO POR:	RESTAURADOR HECTOR OSWALDO PRIETO GORDILLO		ARHIVO No.	FECHA DE REGISTRO:	12/09/2025
DENOMINACION DEL BIEN INMUEBLE			CODIGO DE BIENES:	RES-EM04	
EDIFICIO CAPILLA CONVENTO (COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS)			CODIFO CATASTRAL:	No aplica	

TENENCIA		USOS	LOCALIZACION		
MUNICIPAL		ORIGINAL:	DIRECCION:	CIUDAD:	DEPARTAMENTO:
DEPARTAMENTAL		MURO OCCIDENTAL	Carrera 2 sur No 12 - 90	Bogotá	Cundinamarca
NACIONAL	X		CODIGO DEL ELEMENTO:	UBICACIÓN EXACTA (Muro, Vano, Techo, Ejes, No. Piso)	
MILITAR			LAMP-7	CAPILLA- MURO OCCIDENTAL	
RELIGIOSO		ACTUAL:	Lámparas de tipo isabelino de tres luces, con sistema eléctrico de cableado realizadas en bronce. Cada lámpara está compuesta por un aplique redondo decorado con un relieve floral central y motivos repetitivos geométricos en los bordes de la circunferencia, que sirve de anclaje a la pared central. Del aplique principal se desprenden tres brazos curvados decorados con hojas de acanto a lo largo de su recorrido, finalizando en un aplique redondo con relieves de veneras y volutas que soportan unas tulipas semi globulares de cristal tallado con figuras geométricas.		
PRIVADO		GUACAL- EDIFICIO EL UVO			
OTROS					

Tipología: [Arquitectónico / Decorativo / Complementario]	Material principal: [Madera / Piedra / Yeso / Metal / Otro]	Nivel de originalidad: [Original / Intervenido / Sustituto / Moderno]
DECORATIVO	BRONCE Y CRISTAL	ORIGINAL
Técnica constructiva: [Tallado / Forja / Enlucido / Otro]	Estado de conservación: [Bueno / Regular / Malo / Riesgo inminente]	
OTRO	REGULAR	
PROPUESTA DE TRATAMIENTO:		

Criterios de intervención

Los criterios de intervención de estos objetos se deben considerar teniendo en cuenta que se trata un conjunto de objetos con las mismas características, en este sentido, las actividades que se realicen deben estar encaminadas a la unicidad estética de todo el conjunto, así como la recuperación de la funcionalidad de los elementos dentro del espacio al que pertenecen.

Cabe señalar que todos los procesos deben realizarse respetando la originalidad de los objetos, su carácter utilitario y sus características como piezas de un conjunto.

METODOLOGÍA PARA LA INTERVENCIÓN

1. Desmonte de las lámparas de los lugares de ubicación:
2. Desmonte de piezas de la lampara, clasificación y registro: que componen cada una de las lámparas con su nomenclatura, clasificación y registro correspondiente de cada una de ellas.
3. Limpieza en seco: se realizara el proceso de limpieza en seco de las piezas metálicas con brochas, bisturí y en caso de ser necesario lápices de fibra de vidrio para eliminar depósitos muy adheridos y materiales agregados.
4. Limpieza en húmedo: de las tulipas de vidrio con una solución de jabón neutro, posterior secado
5. Limpieza química de los productos de corrosión: de las piezas metálicas por medio de impregnación con solución acuosa de Hexametafosfato de sodio al 5% (pudiendo subir la concentración al no ser efectiva hasta el 15% máximo), teniendo en cuenta que al aumentar la temperatura puede ser más efectiva la acción de la solución. En caso de tener puntos concretos de corrosión más gruesos puede utilizarse puntualmente una solución acuosa de ácido cítrico en una concentración no mayor al 3%, o ácido fórmico en una concentración no superior al 30%, y por un tiempo no superior a los 20 minutos, teniendo mucho cuidado en la eliminación de las patinas propias del material.

El pasivado se realizará por medio de inmersiones en sesquicarbonato de sodio en una concentración entre el 5% y el 15%, para eliminar las sales de cloruros que se dispersaran sin riesgos para la pátina, posterior lavado con agua destilada y secado riguroso con solventes (alcohol).

Es importante definir el nivel de limpieza al cual se quiere llegar, con el fin de lograr una homogeneidad en todo el conjunto.

6. Aplicación de capa de protección: para el metal, por medio de una resina acrílica en solución tipo Paraloid B 44, B72 en acetona al 40%, o Incralac. Se recomienda el Incralac ya que la solución contiene dentro de su composición un inhibidor (Benzotriazol) que puede considerarse adecuado para la protección del metal.
7. Armado e instalación: las lámparas serán armadas de nuevo de acuerdo con la información de las piezas levantadas durante el desarmado, de ser necesario se realizarán puntos de soldadura si las lámparas lo requieren para quedar correctamente armada, se revisara y adecuara el sistema eléctrico de cada lampara y posteriormente se instalarán de nuevo en su lugar original.
8. Reposición de tulipas: dañadas, rotas y faltantes por unas de las mismas características, reposición de bombillas faltantes.

FOTOGRAFIAS 1	FOTOGRAFIAS 2
	
FOTOGRAFIAS 3	FOTOGRAFIAS 4
	

AREA CONSTRUIDA:		AREA DE EJECUCION:	AREA DEL TERRENO:		LOCALIZACION
EPOCA DE CONSTRUCCION			VULNERABILIDAD		
SIGLO		FECHA O DECADA	NATURALES	ANTROPICOS	
ANTERIOR AL SIGLO XVI			SISMOS	CONFLICTO TENENCIA	
XVI (1500 - 1599)			REMOCIONES EN MASA	MALAS INTERVENCIONES	
XVII (1600 - 1699)			INUNDACIONES	ABANDONO	X
XVIII (1700 - 1799)			FALLAS GEOLOGICAS		
XIX (1800 - 1899)			ERUPCIONES	OTROS	
XX (1900 - 1999)	X		OTROS		
XXI (2000 En adelante)					

CRITERIOS DE LIBERACIÓN		INTERVENCIÓN PERMITIDA (según liberación actual)	
No se compromete ningún componente estructural ni	NO APLICA	Limpieza superficial	APLICA
Todos los elementos son desmontables o tratables sin	NO APLICA	Protección temporal	APLICA
Se justifica técnicamente la intervención por razones	APLICA	Desmonte técnico	APLICA
Se cuenta con trazabilidad documental en matrices y	APLICA	Consolidación puntual	APLICA
Limpieza superficial (en seco o con métodos no invasivos).	APLICA		
Desmonte técnico con protección y embalaje.	APLICA PARCIALMENTE	OBSERVACIONES: Presenta suciedad superficial y acumulada, manchas de pintura gris y blanca, así como	
Aplicación de tratamientos conservativos mínimos	APLICA		



FECHA DE EJECUCION : 12/09/2025

Diligenciamiento de matriz de intervención y bitácora técnica.	NO APLICA	productos de corrosión de tonos marrón, rojizo y blanquecinos.	VOBO. PROFESIONAL RESPONSABLE : 

Culturas	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 4346 DE 2024, CUYO OBJETO ES "EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CAPILLA –CONVENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO."	

FICHA TÉCNICA ESTADO DE CONSERVACION					
ENTIDAD RESPONSABLE:	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL		FICHA No. (COD. LAMP8. 12/09/2025) DE REGISTRO		
REGISTRADO POR:	RESTAURADOR HECTOR OSWALDO PRIETO GORDILLO		ARHIVO No.	FECHA DE REGISTRO:	12/09/2025
DENOMINACION DEL BIEN INMUEBLE			CODIGO DE BIENES:	RES-EM04	
EDIFICIO CAPILLA CONVENTO (COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS)			CODIFO CATASTRAL:	No aplica	

TENENCIA		USOS	LOCALIZACION		
MUNICIPAL		ORIGINAL:	DIRECCION:	CIUDAD:	DEPARTAMENTO:
DEPARTAMENTAL		MURO OCCIDENTAL	Carrera 2 sur No 12 - 90	Bogotá	Cundinamarca
NACIONAL	X		CODIGO DEL ELEMENTO:	UBICACIÓN EXACTA (Muro, Vano, Techo, Ejes, No. Piso)	
MILITAR			LAMP-8	CAPILLA- MURO OCCIDENTAL	
RELIGIOSO		ACTUAL:	Lámparas de tipo isabelino de tres luces, con sistema eléctrico de cableado realizadas en bronce. Cada lámpara está compuesta por un aplique redondo decorado con un relieve floral central y motivos repetitivos geométricos en los bordes de la circunferencia, que sirve de anclaje a la pared central. Del aplique principal se desprenden tres brazos curvados decorados con hojas de acanto a lo largo de su recorrido, finalizando en un aplique redondo con relieves de veneras y volutas que soportan unas tulipas semi globulares de cristal tallado con figuras geométricas.		
PRIVADO		GUACAL- EDIFICIO EL UVO			
OTROS					

Tipología: [Arquitectónico / Decorativo / Complementario]	Material principal: [Madera / Piedra / Yeso / Metal / Otro]	Nivel de originalidad: [Original / Intervenido / Sustituto / Moderno]
DECORATIVO	BRONCE Y CRISTAL	
Técnica constructiva: [Tallado / Forja / Enlucido / Otro]	Estado de conservación: [Bueno / Regular / Malo / Riesgo inminente]	ORIGINAL
OTRO	REGULAR	
PROPUESTA DE TRATAMIENTO:		

Criterios de intervención

Los criterios de intervención de estos objetos se deben considerar teniendo en cuenta que se trata un conjunto de objetos con las mismas características, en este sentido, las actividades que se realicen deben estar encaminadas a la unicidad estética de todo el conjunto, así como la recuperación de la funcionalidad de los elementos dentro del espacio al que pertenecen.

Cabe señalar que todos los procesos deben realizarse respetando la originalidad de los objetos, su carácter utilitario y sus características como piezas de un conjunto.

METODOLOGÍA PARA LA INTERVENCIÓN

1. Desmonte de las lámparas de los lugares de ubicación:
2. Desmonte de piezas de la lampara, clasificación y registro: que componen cada una de las lámparas con su nomenclatura, clasificación y registro correspondiente de cada una de ellas.
3. Limpieza en seco: se realizara el proceso de limpieza en seco de las piezas metálicas con brochas, bisturí y en caso de ser necesario lápices de fibra de vidrio para eliminar depósitos muy adheridos y materiales agregados.
4. Limpieza en húmedo: de las tulipas de vidrio con una solución de jabón neutro, posterior secado
5. Limpieza química de los productos de corrosión: de las piezas metálicas por medio de impregnación con solución acuosa de Hexametafosfato de sodio al 5% (pudiendo subir la concentración al no ser efectiva hasta el 15% máximo), teniendo en cuenta que al aumentar la temperatura puede ser más efectiva la acción de la solución. En caso de tener puntos concretos de corrosión más gruesos puede utilizarse puntualmente una solución acuosa de ácido cítrico en una concentración no mayor al 3%, o ácido fórmico en una concentración no superior al 30%, y por un tiempo no superior a los 20 minutos, teniendo mucho cuidado en la eliminación de las patinas propias del material.

El pasivado se realizará por medio de inmersiones en sesquicarbonato de sodio en una concentración entre el 5% y el 15%, para eliminar las sales de cloruros que se dispersaran sin riesgos para la pátina, posterior lavado con agua destilada y secado riguroso con solventes (alcohol).

Es importante definir el nivel de limpieza al cual se quiere llegar, con el fin de lograr una homogeneidad en todo el conjunto.

6. Aplicación de capa de protección: para el metal, por medio de una resina acrílica en solución tipo Paraloid B 44, B72 en acetona al 40%, o Incralac. Se recomienda el Incralac ya que la solución contiene dentro de su composición un inhibidor (Benzotriazol) que puede considerarse adecuado para la protección del metal.
7. Armado e instalación: las lámparas serán armadas de nuevo de acuerdo con la información de las piezas levantadas durante el desarmado, de ser necesario se realizarán puntos de soldadura si las lámparas lo requieren para quedar correctamente armada, se revisara y adecuara el sistema eléctrico de cada lampara y posteriormente se instalarán de nuevo en su lugar original.
8. Reposición de tulipas: dañadas, rotas y faltantes por unas de las mismas características, reposición de bombillas faltantes.

FOTOGRAFIAS 1	FOTOGRAFIAS 2
	
FOTOGRAFIAS 3	FOTOGRAFIAS 4
	

AREA CONSTRUIDA:		AREA DE EJECUCION:	AREA DEL TERRENO:		LOCALIZACION
EPOCA DE CONSTRUCCION			VULNERABILIDAD		
SIGLO		FECHA O DECADA	NATURALES	ANTROPICOS	
ANTERIOR AL SIGLO XVI			SISMOS	CONFLICTO TENENCIA	
XVI (1500 - 1599)			REMOCIONES EN MASA	MALAS INTERVENCIONES	
XVII (1600 - 1699)			INUNDACIONES	ABANDONO	X
XVIII (1700 - 1799)			FALLAS GEOLOGICAS		
XIX (1800 - 1899)			ERUPCIONES	OTROS	
XX (1900 - 1999)	X		OTROS		
XXI (2000 En adelante)					

CRITERIOS DE LIBERACIÓN		INTERVENCIÓN PERMITIDA (según liberación actual)	
No se compromete ningún componente estructural ni	NO APLICA	Limpieza superficial	APLICA
Todos los elementos son desmontables o tratables sin	NO APLICA	Protección temporal	APLICA
Se justifica técnicamente la intervención por razones	APLICA	Desmonte técnico	APLICA
Se cuenta con trazabilidad documental en matrices y	APLICA	Consolidación puntual	APLICA
Limpieza superficial (en seco o con métodos no invasivos).	APLICA		
Desmonte técnico con protección y embalaje.	APLICA PARCIALMENTE		
Aplicación de tratamientos conservativos mínimos	APLICA		

OBSERVACIONES: Presenta suciedad superficial y acumulada, manchas de pintura blanca, gris y cemento



FECHA DE EJECUCION : 12/09/2025

Diligenciamiento de matriz de intervención y bitácora técnica.	NO APLICA	generalizadas por toda la superficie, se observan productos de corrosión marrón.	VOBO. PROFESIONAL RESPONSABLE : 

Culturas	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 4346 DE 2024, CUYO OBJETO ES "EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CAPILLA –CONVENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO."				

FICHA TÉCNICA ESTADO DE CONSERVACION					
ENTIDAD RESPONSABLE:	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL		FICHA No. (COD. LAMP9. 12/09/2025) DE REGISTRO		
REGISTRADO POR:	RESTAURADOR HECTOR OSWALDO PRIETO GORDILLO		ARHIVO No.	FECHA DE REGISTRO:	12/09/2025
DENOMINACION DEL BIEN INMUEBLE			CODIGO DE BIENES:	RES-EM04	
EDIFICIO CAPILLA CONVENTO (COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS)			CODIFO CATASTRAL:	No aplica	

TENENCIA		USOS	LOCALIZACION		
MUNICIPAL		ORIGINAL:	DIRECCION:	CIUDAD:	DEPARTAMENTO:
DEPARTAMENTAL		MURO OCCIDENTAL	Carrera 2 sur No 12 - 90	Bogotá	Cundinamarca
NACIONAL	X		CODIGO DEL ELEMENTO:	UBICACIÓN EXACTA (Muro, Vano, Techo, Ejes, No. Piso)	
MILITAR			LAMP-9	CAPILLA- MURO OCCIDENTAL	
RELIGIOSO		ACTUAL:	Lámparas de tipo isabelino de tres luces, con sistema eléctrico de cableado realizadas en bronce. Cada lámpara está compuesta por un aplique redondo decorado con un relieve floral central y motivos repetitivos geométricos en los bordes de la circunferencia, que sirve de anclaje a la pared central. Del aplique principal se desprenden tres brazos curvados decorados con hojas de acanto a lo largo de su recorrido, finalizando en un aplique redondo con relieves de veneras y volutas que soportan unas tulipas semi globulares de cristal tallado con figuras geométricas.		
PRIVADO		GUACAL- EDIFICIO EL UVO			
OTROS					

Tipología: [Arquitectónico / Decorativo / Complementario]	Material principal: [Madera / Piedra / Yeso / Metal / Otro]	Nivel de originalidad: [Original / Intervenido / Sustituto / Moderno]
DECORATIVO	BRONCE Y CRISTAL	ORIGINAL
Técnica constructiva: [Tallado / Forja / Enlucido / Otro]	Estado de conservación: [Bueno / Regular / Malo / Riesgo inminente]	
OTRO	REGULAR	
PROPUESTA DE TRATAMIENTO:		

Criterios de intervención

Los criterios de intervención de estos objetos se deben considerar teniendo en cuenta que se trata un conjunto de objetos con las mismas características, en este sentido, las actividades que se realicen deben estar encaminadas a la unicidad estética de todo el conjunto, así como la recuperación de la funcionalidad de los elementos dentro del espacio al que pertenecen.

Cabe señalar que todos los procesos deben realizarse respetando la originalidad de los objetos, su carácter utilitario y sus características como piezas de un conjunto.

METODOLOGÍA PARA LA INTERVENCIÓN

1. Desmonte de las lámparas de los lugares de ubicación:
2. Desmonte de piezas de la lampara, clasificación y registro: que componen cada una de las lámparas con su nomenclatura, clasificación y registro correspondiente de cada una de ellas.
3. Limpieza en seco: se realizara el proceso de limpieza en seco de las piezas metálicas con brochas, bisturí y en caso de ser necesario lápices de fibra de vidrio para eliminar depósitos muy adheridos y materiales agregados.
4. Limpieza en húmedo: de las tulipas de vidrio con una solución de jabón neutro, posterior secado
5. Limpieza química de los productos de corrosión: de las piezas metálicas por medio de impregnación con solución acuosa de Hexametafosfato de sodio al 5% (pudiendo subir la concentración al no ser efectiva hasta el 15% máximo), teniendo en cuenta que al aumentar la temperatura puede ser más efectiva la acción de la solución. En caso de tener puntos concretos de corrosión más gruesos puede utilizarse puntualmente una solución acuosa de ácido cítrico en una concentración no mayor al 3%, o ácido fórmico en una concentración no superior al 30%, y por un tiempo no superior a los 20 minutos, teniendo mucho cuidado en la eliminación de las patinas propias del material.

El pasivado se realizará por medio de inmersiones en sesquicarbonato de sodio en una concentración entre el 5% y el 15%, para eliminar las sales de cloruros que se dispersaran sin riesgos para la pátina, posterior lavado con agua destilada y secado riguroso con solventes (alcohol).

Es importante definir el nivel de limpieza al cual se quiere llegar, con el fin de lograr una homogeneidad en todo el conjunto.

6. Aplicación de capa de protección: para el metal, por medio de una resina acrílica en solución tipo Paraloid B 44, B72 en acetona al 40%, o Incralac. Se recomienda el Incralac ya que la solución contiene dentro de su composición un inhibidor (Benzotriazol) que puede considerarse adecuado para la protección del metal.
7. Armado e instalación: las lámparas serán armadas de nuevo de acuerdo con la información de las piezas levantadas durante el desarmado, de ser necesario se realizarán puntos de soldadura si las lámparas lo requieren para quedar correctamente armada, se revisara y adecuara el sistema eléctrico de cada lampara y posteriormente se instalarán de nuevo en su lugar original.
8. Reposición de tulipas: dañadas, rotas y faltantes por unas de las mismas características, reposición de bombillas faltantes.

FOTOGRAFIAS 1	FOTOGRAFIAS 2
	
FOTOGRAFIAS 3	FOTOGRAFIAS 4
	

AREA CONSTRUIDA:		AREA DE EJECUCION:	AREA DEL TERRENO:		LOCALIZACION
EPOCA DE CONSTRUCCION			VULNERABILIDAD		
SIGLO		FECHA O DECADA	NATURALES	ANTROPICOS	
ANTERIOR AL SIGLO XVI			SISMOS	CONFLICTO TENENCIA	
XVI (1500 - 1599)			REMOCIONES EN MASA	MALAS INTERVENCIONES	
XVII (1600 - 1699)			INUNDACIONES	ABANDONO	X
XVIII (1700 - 1799)			FALLAS GEOLOGICAS		
XIX (1800 - 1899)			ERUPCIONES	OTROS	
XX (1900 - 1999)	X		OTROS		
XXI (2000 En adelante)					

CRITERIOS DE LIBERACIÓN		INTERVENCIÓN PERMITIDA (según liberación actual)	
No se compromete ningún componente estructural ni	NO APLICA	Limpieza superficial	APLICA
Todos los elementos son desmontables o tratables sin	NO APLICA	Protección temporal	APLICA
Se justifica técnicamente la intervención por razones	APLICA	Desmonte técnico	APLICA
Se cuenta con trazabilidad documental en matrices y	APLICA	Consolidación puntual	APLICA
Limpieza superficial (en seco o con métodos no invasivos).	APLICA		
Desmonte técnico con protección y embalaje.	APLICA PARCIALMENTE		
Aplicación de tratamientos conservativos mínimos	APLICA		

OBSERVACIONES: Presenta suciedad superficial y acumulada, manchas de pintura y productos de corrosión



FECHA DE EJECUCION : 12/09/2025

Diligenciamiento de matriz de intervención y bitácora técnica.	NO APLICA	de color marrón oscuro y verdosos	VOBO. PROFESIONAL RESPONSABLE : 

Culturas	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 4346 DE 2024, CUYO OBJETO ES "EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CAPILLA –CONVENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO."	

FICHA TÉCNICA ESTADO DE CONSERVACION					
ENTIDAD RESPONSABLE:	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL		FICHA No. (COD. LAMP10. 12/09/2025) DE REGISTRO		
REGISTRADO POR:	RESTAURADOR HECTOR OSWALDO PRIETO GORDILLO		ARHIVO No.	FECHA DE REGISTRO:	12/09/2025
DENOMINACION DEL BIEN INMUEBLE			CODIGO DE BIENES:	RES-EM04	
EDIFICIO CAPILLA CONVENTO (COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS)			CODIFO CATASTRAL:	No aplica	

TENENCIA		USOS	LOCALIZACION		
MUNICIPAL		ORIGINAL:	DIRECCION:	CIUDAD:	DEPARTAMENTO:
DEPARTAMENTAL		MURO OCCIDENTAL	Carrera 2 sur No 12 - 90	Bogotá	Cundinamarca
NACIONAL	X		CODIGO DEL ELEMENTO:	UBICACIÓN EXACTA (Muro, Vano, Techo, Ejes, No. Piso)	
MILITAR			LAMP-10	CAPILLA- MURO OCCIDENTAL	
RELIGIOSO		ACTUAL:	Lámparas de tipo isabelino de tres luces, con sistema eléctrico de cableado realizadas en bronce. Cada lámpara está compuesta por un aplique redondo decorado con un relieve floral central y motivos repetitivos geométricos en los bordes de la circunferencia, que sirve de anclaje a la pared central. Del aplique principal se desprenden tres brazos curvados decorados con hojas de acanto a lo largo de su recorrido, finalizando en un aplique redondo con relieves de veneras y volutas que soportan unas tulipas semi globulares de cristal tallado con figuras geométricas.		
PRIVADO		GUACAL- EDIFICIO EL UVO			
OTROS					

Tipología: [Arquitectónico / Decorativo / Complementario]	Material principal: [Madera / Piedra / Yeso / Metal / Otro]	Nivel de originalidad: [Original / Intervenido / Sustituto / Moderno]
DECORATIVO	BRONCE Y CRISTAL	
Técnica constructiva: [Tallado / Forja / Enlucido / Otro]	Estado de conservación: [Bueno / Regular / Malo / Riesgo inminente]	ORIGINAL
OTRO	REGULAR	
PROPUESTA DE TRATAMIENTO:		

Criterios de intervención

Los criterios de intervención de estos objetos se deben considerar teniendo en cuenta que se trata un conjunto de objetos con las mismas características, en este sentido, las actividades que se realicen deben estar encaminadas a la unicidad estética de todo el conjunto, así como la recuperación de la funcionalidad de los elementos dentro del espacio al que pertenecen.

Cabe señalar que todos los procesos deben realizarse respetando la originalidad de los objetos, su carácter utilitario y sus características como piezas de un conjunto.

METODOLOGÍA PARA LA INTERVENCIÓN

1. Desmonte de las lámparas de los lugares de ubicación:
2. Desmonte de piezas de la lampara, clasificación y registro: que componen cada una de las lámparas con su nomenclatura, clasificación y registro correspondiente de cada una de ellas.
3. Limpieza en seco: se realizara el proceso de limpieza en seco de las piezas metálicas con brochas, bisturí y en caso de ser necesario lápices de fibra de vidrio para eliminar depósitos muy adheridos y materiales agregados.
4. Limpieza en húmedo: de las tulipas de vidrio con una solución de jabón neutro, posterior secado
5. Limpieza química de los productos de corrosión: de las piezas metálicas por medio de impregnación con solución acuosa de Hexametafosfato de sodio al 5% (pudiendo subir la concentración al no ser efectiva hasta el 15% máximo), teniendo en cuenta que al aumentar la temperatura puede ser más efectiva la acción de la solución. En caso de tener puntos concretos de corrosión más gruesos puede utilizarse puntualmente una solución acuosa de ácido cítrico en una concentración no mayor al 3%, o ácido fórmico en una concentración no superior al 30%, y por un tiempo no superior a los 20 minutos, teniendo mucho cuidado en la eliminación de las patinas propias del material.

El pasivado se realizará por medio de inmersiones en sesquicarbonato de sodio en una concentración entre el 5% y el 15%, para eliminar las sales de cloruros que se dispersaran sin riesgos para la pátina, posterior lavado con agua destilada y secado riguroso con solventes (alcohol).

Es importante definir el nivel de limpieza al cual se quiere llegar, con el fin de lograr una homogeneidad en todo el conjunto.

6. Aplicación de capa de protección: para el metal, por medio de una resina acrílica en solución tipo Paraloid B 44, B72 en acetona al 40%, o Incralac. Se recomienda el Incralac ya que la solución contiene dentro de su composición un inhibidor (Benzotriazol) que puede considerarse adecuado para la protección del metal.
7. Armado e instalación: las lámparas serán armadas de nuevo de acuerdo con la información de las piezas levantadas durante el desarmado, de ser necesario se realizarán puntos de soldadura si las lámparas lo requieren para quedar correctamente armada, se revisara y adecuara el sistema eléctrico de cada lampara y posteriormente se instalarán de nuevo en su lugar original.
8. Reposición de tulipas: dañadas, rotas y faltantes por unas de las mismas características, reposición de bombillas faltantes.

FOTOGRAFIAS 1	FOTOGRAFIAS 2
	
FOTOGRAFIAS 3	FOTOGRAFIAS 4
	

AREA CONSTRUIDA:		AREA DE EJECUCION:	AREA DEL TERRENO:		LOCALIZACION
EPOCA DE CONSTRUCCION			VULNERABILIDAD		
SIGLO		FECHA O DECADA	NATURALES	ANTROPICOS	
ANTERIOR AL SIGLO XVI			SISMOS	CONFLICTO TENENCIA	
XVI (1500 - 1599)			REMOCIONES EN MASA	MALAS INTERVENCIONES	
XVII (1600 - 1699)			INUNDACIONES	ABANDONO	X
XVIII (1700 - 1799)			FALLAS GEOLOGICAS		
XIX (1800 - 1899)			ERUPCIONES	OTROS	
XX (1900 - 1999)	X		OTROS		
XXI (2000 En adelante)					

CRITERIOS DE LIBERACIÓN		INTERVENCIÓN PERMITIDA (según liberación actual)	
No se compromete ningún componente estructural ni	NO APLICA	Limpieza superficial	APLICA
Todos los elementos son desmontables o tratables sin	NO APLICA	Protección temporal	APLICA
Se justifica técnicamente la intervención por razones	APLICA	Desmonte técnico	APLICA
Se cuenta con trazabilidad documental en matrices y	APLICA	Consolidación puntual	APLICA
Limpieza superficial (en seco o con métodos no invasivos).	APLICA	OBSERVACIONES: Presenta suciedad superficial y acumulada, manchas de cemento, pintura y guano de aves; también se observa una cinta adhesiva en el brazo del extremo derecho. Se observa una tulipa de cristal	
Desmonte técnico con protección y embalaje.	APLICA PARCIALMENTE		
Aplicación de tratamientos conservativos mínimos	APLICA		



FECHA DE EJECUCION : 12/09/2025

Diligenciamiento de matriz de intervención y bitácora técnica.	NO APLICA	faltante en el brazo central, y la ausencia de las tres bombillas de la luminaria. Presenta así mismo productos de corrosión de color marrón oscuro.	VOBO. PROFESIONAL RESPONSABLE : 

Culturas	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 4346 DE 2024, CUYO OBJETO ES "EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CAPILLA –CONVENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO."	

FICHA TÉCNICA ESTADO DE CONSERVACION				
ENTIDAD RESPONSABLE:	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL	FICHA No. (COD. LAMP11. 12/09/2025) DE REGISTRO		
REGISTRADO POR:	RESTAURADOR HECTOR OSWALDO PRIETO GORDILLO	ARHIVO No.	FECHA DE REGISTRO:	12/09/2025
DENOMINACION DEL BIEN INMUEBLE		CODIGO DE BIENES:	RES-EM04	
EDIFICIO CAPILLA CONVENTO (COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS)		CODIFO CATASTRAL:	No aplica	

TENENCIA		USOS	LOCALIZACION		
MUNICIPAL		ORIGINAL:	DIRECCION:	CIUDAD:	DEPARTAMENTO:
DEPARTAMENTAL		MURO OCCIDENTAL	Carrera 2 sur No 12 - 90	Bogotá	Cundinamarca
NACIONAL	X		CODIGO DEL ELEMENTO:	UBICACIÓN EXACTA (Muro, Vano, Techo, Ejes, No. Piso)	
MILITAR			LAMP-11	CAPILLA- MURO OCCIDENTAL	
RELIGIOSO		ACTUAL:	Lámparas de tipo isabelino de tres luces, con sistema eléctrico de cableado realizadas en bronce. Cada lámpara está compuesta por un aplique redondo decorado con un relieve floral central y motivos repetitivos geométricos en los bordes de la circunferencia, que sirve de anclaje a la pared central. Del aplique principal se desprenden tres brazos curvados decorados con hojas de acanto a lo largo de su recorrido, finalizando en un aplique redondo con relieves de veneras y volutas que soportan unas tulipas semi globulares de cristal tallado con figuras geométricas.		
PRIVADO		GUACAL- EDIFICIO EL UVO			
OTROS					

Tipología: [Arquitectónico / Decorativo / Complementario]	Material principal: [Madera / Piedra / Yeso / Metal / Otro]	Nivel de originalidad: [Original / Intervenido / Sustituto / Moderno]
DECORATIVO	BRONCE Y CRISTAL	
Técnica constructiva: [Tallado / Forja / Enlucido / Otro]	Estado de conservación: [Bueno / Regular / Malo / Riesgo inminente]	ORIGINAL
OTRO	REGULAR	
PROPUESTA DE TRATAMIENTO:		

Criterios de intervención

Los criterios de intervención de estos objetos se deben considerar teniendo en cuenta que se trata un conjunto de objetos con las mismas características, en este sentido, las actividades que se realicen deben estar encaminadas a la unicidad estética de todo el conjunto, así como la recuperación de la funcionalidad de los elementos dentro del espacio al que pertenecen.

Cabe señalar que todos los procesos deben realizarse respetando la originalidad de los objetos, su carácter utilitario y sus características como piezas de un conjunto.

METODOLOGÍA PARA LA INTERVENCIÓN

1. Desmonte de las lámparas de los lugares de ubicación:
2. Desmonte de piezas de la lampara, clasificación y registro: que componen cada una de las lámparas con su nomenclatura, clasificación y registro correspondiente de cada una de ellas.
3. Limpieza en seco: se realizara el proceso de limpieza en seco de las piezas metálicas con brochas, bisturí y en caso de ser necesario lápices de fibra de vidrio para eliminar depósitos muy adheridos y materiales agregados.
4. Limpieza en húmedo: de las tulipas de vidrio con una solución de jabón neutro, posterior secado
5. Limpieza química de los productos de corrosión: de las piezas metálicas por medio de impregnación con solución acuosa de Hexametafosfato de sodio al 5% (pudiendo subir la concentración al no ser efectiva hasta el 15% máximo), teniendo en cuenta que al aumentar la temperatura puede ser más efectiva la acción de la solución. En caso de tener puntos concretos de corrosión más gruesos puede utilizarse puntualmente una solución acuosa de ácido cítrico en una concentración no mayor al 3%, o ácido fórmico en una concentración no superior al 30%, y por un tiempo no superior a los 20 minutos, teniendo mucho cuidado en la eliminación de las patinas propias del material.

El pasivado se realizará por medio de inmersiones en sesquicarbonato de sodio en una concentración entre el 5% y el 15%, para eliminar las sales de cloruros que se dispersaran sin riesgos para la pátina, posterior lavado con agua destilada y secado riguroso con solventes (alcohol).

Es importante definir el nivel de limpieza al cual se quiere llegar, con el fin de lograr una homogeneidad en todo el conjunto.

6. Aplicación de capa de protección: para el metal, por medio de una resina acrílica en solución tipo Paraloid B 44, B72 en acetona al 40%, o Incralac. Se recomienda el Incralac ya que la solución contiene dentro de su composición un inhibidor (Benzotriazol) que puede considerarse adecuado para la protección del metal.
7. Armado e instalación: las lámparas serán armadas de nuevo de acuerdo con la información de las piezas levantadas durante el desarmado, de ser necesario se realizarán puntos de soldadura si las lámparas lo requieren para quedar correctamente armada, se revisara y adecuara el sistema eléctrico de cada lampara y posteriormente se instalarán de nuevo en su lugar original.
8. Reposición de tulipas: dañadas, rotas y faltantes por unas de las mismas características, reposición de bombillas faltantes.

FOTOGRAFIAS 1	FOTOGRAFIAS 2
	
FOTOGRAFIAS 3	FOTOGRAFIAS 4
	

AREA CONSTRUIDA:		AREA DE EJECUCION:	AREA DEL TERRENO:		LOCALIZACION
EPOCA DE CONSTRUCCION			VULNERABILIDAD		
SIGLO		FECHA O DECADA	NATURALES	ANTROPICOS	
ANTERIOR AL SIGLO XVI			SISMOS	CONFLICTO TENENCIA	
XVI (1500 - 1599)			REMOCIONES EN MASA	MALAS INTERVENCIONES	
XVII (1600 - 1699)			INUNDACIONES	ABANDONO	X
XVIII (1700 - 1799)			FALLAS GEOLOGICAS		
XIX (1800 - 1899)			ERUPCIONES	OTROS	
XX (1900 - 1999)	X		OTROS		
XXI (2000 En adelante)					
CRITERIOS DE LIBERACIÓN			INTERVENCIÓN PERMITIDA (según liberación actual)		
No se compromete ningún componente estructural ni	NO APLICA		Limpieza superficial	APLICA	
Todos los elementos son desmontables o tratables sin	NO APLICA		Protección temporal	APLICA	
Se justifica técnicamente la intervención por razones	APLICA		Desmonte técnico	APLICA	
Se cuenta con trazabilidad documental en matrices y	APLICA		Consolidación puntual	APLICA	
Limpieza superficial (en seco o con métodos no invasivos).	APLICA		OBSERVACIONES: Presenta suciedad superficial y acumulada, manchas de pintura, y productos de corrosión de color marrón oscuro. Se observa faltante de tulipa		FECHA DE EJECUCION : 12/09/2025
Desmonte técnico con protección y embalaje.	APLICA PARCIALMENTE				
Aplicación de tratamientos conservativos mínimos	APLICA				



Diligenciamiento de matriz de intervención y bitácora técnica.	NO APLICA	de color marrón oscuro. Se observa faltante de tulipa y bombilla en el brazo central.	VOBO. PROFESIONAL RESPONSABLE : 

Culturas	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 4346 DE 2024, CUYO OBJETO ES "EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CAPILLA –CONVENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO."	

FICHA TÉCNICA ESTADO DE CONSERVACION					
ENTIDAD RESPONSABLE:	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL		FICHA No. (COD. LAMP12. 12/09/2025) DE REGISTRO		
REGISTRADO POR:	RESTAURADOR HECTOR OSWALDO PRIETO GORDILLO		ARHIVO No.	FECHA DE REGISTRO:	12/09/2025
DENOMINACION DEL BIEN INMUEBLE			CODIGO DE BIENES:	RES-EM04	
EDIFICIO CAPILLA CONVENTO (COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS)			CODIFO CATASTRAL:	No aplica	

TENENCIA		USOS	LOCALIZACION		
MUNICIPAL		ORIGINAL:	DIRECCION:	CIUDAD:	DEPARTAMENTO:
DEPARTAMENTAL		MURO OCCIDENTAL	Carrera 2 sur No 12 - 90	Bogotá	Cundinamarca
NACIONAL	X		CODIGO DEL ELEMENTO:	UBICACIÓN EXACTA (Muro, Vano, Techo, Ejes, No. Piso)	
MILITAR			LAMP-12	CAPILLA- MURO OCCIDENTAL	
RELIGIOSO		ACTUAL:	Lámparas de tipo isabelino de tres luces, con sistema eléctrico de cableado realizadas en bronce. Cada lámpara está compuesta por un aplique redondo decorado con un relieve floral central y motivos repetitivos geométricos en los bordes de la circunferencia, que sirve de anclaje a la pared central. Del aplique principal se desprenden tres brazos curvados decorados con hojas de acanto a lo largo de su recorrido, finalizando en un aplique redondo con relieves de veneras y volutas que soportan unas tulipas semi globulares de cristal tallado con figuras geométricas.		
PRIVADO		GUACAL- EDIFICIO EL UVO			
OTROS					

Tipología: [Arquitectónico / Decorativo / Complementario]	Material principal: [Madera / Piedra / Yeso / Metal / Otro]	Nivel de originalidad: [Original / Intervenido / Sustituto / Moderno]
DECORATIVO	BRONCE Y CRISTAL	ORIGINAL
Técnica constructiva: [Tallado / Forja / Enlucido / Otro]	Estado de conservación: [Bueno / Regular / Malo / Riesgo inminente]	
OTRO	REGULAR	
PROPUESTA DE TRATAMIENTO:		

Criterios de intervención

Los criterios de intervención de estos objetos se deben considerar teniendo en cuenta que se trata un conjunto de objetos con las mismas características, en este sentido, las actividades que se realicen deben estar encaminadas a la unicidad estética de todo el conjunto, así como la recuperación de la funcionalidad de los elementos dentro del espacio al que pertenecen.

Cabe señalar que todos los procesos deben realizarse respetando la originalidad de los objetos, su carácter utilitario y sus características como piezas de un conjunto.

METODOLOGÍA PARA LA INTERVENCIÓN

1. Desmonte de las lámparas de los lugares de ubicación:
2. Desmonte de piezas de la lampara, clasificación y registro: que componen cada una de las lámparas con su nomenclatura, clasificación y registro correspondiente de cada una de ellas.
3. Limpieza en seco: se realizara el proceso de limpieza en seco de las piezas metálicas con brochas, bisturí y en caso de ser necesario lápices de fibra de vidrio para eliminar depósitos muy adheridos y materiales agregados.
4. Limpieza en húmedo: de las tulipas de vidrio con una solución de jabón neutro, posterior secado
5. Limpieza química de los productos de corrosión: de las piezas metálicas por medio de impregnación con solución acuosa de Hexametafosfato de sodio al 5% (pudiendo subir la concentración al no ser efectiva hasta el 15% máximo), teniendo en cuenta que al aumentar la temperatura puede ser más efectiva la acción de la solución. En caso de tener puntos concretos de corrosión más gruesos puede utilizarse puntualmente una solución acuosa de ácido cítrico en una concentración no mayor al 3%, o ácido fórmico en una concentración no superior al 30%, y por un tiempo no superior a los 20 minutos, teniendo mucho cuidado en la eliminación de las patinas propias del material.

El pasivado se realizará por medio de inmersiones en sesquicarbonato de sodio en una concentración entre el 5% y el 15%, para eliminar las sales de cloruros que se dispersaran sin riesgos para la pátina, posterior lavado con agua destilada y secado riguroso con solventes (alcohol).

Es importante definir el nivel de limpieza al cual se quiere llegar, con el fin de lograr una homogeneidad en todo el conjunto.

6. Aplicación de capa de protección: para el metal, por medio de una resina acrílica en solución tipo Paraloid B 44, B72 en acetona al 40%, o Incralac. Se recomienda el Incralac ya que la solución contiene dentro de su composición un inhibidor (Benzotriazol) que puede considerarse adecuado para la protección del metal.
7. Armado e instalación: las lámparas serán armadas de nuevo de acuerdo con la información de las piezas levantadas durante el desarmado, de ser necesario se realizarán puntos de soldadura si las lámparas lo requieren para quedar correctamente armada, se revisara y adecuara el sistema eléctrico de cada lampara y posteriormente se instalarán de nuevo en su lugar original.
8. Reposición de tulipas: dañadas, rotas y faltantes por unas de las mismas características, reposición de bombillas faltantes.

FOTOGRAFIAS 1	FOTOGRAFIAS 2
	
FOTOGRAFIAS 3	FOTOGRAFIAS 4
	

AREA CONSTRUIDA:		AREA DE EJECUCION:		AREA DEL TERRENO:				LOCALIZACION
EPOCA DE CONSTRUCCION				VULNERABILIDAD				
SIGLO		FECHA O DECADA		NATURALES		ANTROPICOS		
ANTERIOR AL SIGLO XVI				SISMOS		CONFLICTO TENENCIA		
XVI (1500 - 1599)				REMOCIONES EN MASA		MALAS INTERVENCIONES		
XVII (1600 - 1699)								
XVIII (1700 - 1799)				INUNDACIONES		ABANDONO	X	
XIX (1800 - 1899)				FALLAS GEOLOGICAS				
XX (1900 - 1999)	X			ERUPCIONES		OTROS		
XXI (2000 En adelante)				OTROS				

CRITERIOS DE LIBERACIÓN		INTERVENCIÓN PERMITIDA (según liberación actual)	
No se compromete ningún componente estructural ni	NO APLICA	Limpieza superficial	APLICA
Todos los elementos son desmontables o tratables sin	NO APLICA	Protección temporal	APLICA
Se justifica técnicamente la intervención por razones	APLICA	Desmonte técnico	APLICA
Se cuenta con trazabilidad documental en matrices y	APLICA	Consolidación puntual	APLICA
Limpieza superficial (en seco o con métodos no invasivos).	APLICA		
Desmonte técnico con protección y embalaje.	APLICA PARCIALMENTE		
Aplicación de tratamientos conservativos mínimos	APLICA		

OBSERVACIONES: Presenta suciedad superficial, acumulada, manchas de pintura y cemento, así como excrementos y plumas de ave. Se observan productos



FECHA DE EJECUCION : 12/09/2025

Diligenciamiento de matriz de intervención y bitácora técnica.	NO APLICA	de corrosion de tonos rojizos, marron oscuro y verdosos.	VOBO. PROFESIONAL RESPONSABLE : 

Culturas	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 4346 DE 2024, CUYO OBJETO ES "EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CAPILLA –CONVENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO."				

FICHA TÉCNICA ESTADO DE CONSERVACION					
ENTIDAD RESPONSABLE:	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL		FICHA No. (COD. LAMP13. 12/09/2025) DE REGISTRO		
REGISTRADO POR:	RESTAURADOR HECTOR OSWALDO PRIETO GORDILLO		ARHIVO No.	FECHA DE REGISTRO:	12/09/2025
DENOMINACION DEL BIEN INMUEBLE			CODIGO DE BIENES:	RES-EM04	
EDIFICIO CAPILLA CONVENTO (COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS)			CODIFO CATASTRAL:	No aplica	

TENENCIA		USOS	LOCALIZACION		
MUNICIPAL		ORIGINAL:	DIRECCION:	CIUDAD:	DEPARTAMENTO:
DEPARTAMENTAL		MURO OCCIDENTAL	Carrera 2 sur No 12 - 90	Bogotá	Cundinamarca
NACIONAL	X		CODIGO DEL ELEMENTO:	UBICACIÓN EXACTA (Muro, Vano, Techo, Ejes, No. Piso)	
MILITAR			LAMP-12	CAPILLA- MURO OCCIDENTAL	
RELIGIOSO		ACTUAL:	Lámparas de tipo isabelino de tres luces, con sistema eléctrico de cableado realizadas en bronce. Cada lámpara está compuesta por un aplique redondo decorado con un relieve floral central y motivos repetitivos geométricos en los bordes de la circunferencia, que sirve de anclaje a la pared central. Del aplique principal se desprenden tres brazos curvados decorados con hojas de acanto a lo largo de su recorrido, finalizando en un aplique redondo con relieves de veneras y volutas que soportan unas tulipas semi globulares de cristal tallado con figuras geométricas.		
PRIVADO		GUACAL- EDIFICIO EL UVO			
OTROS					

Tipología: [Arquitectónico / Decorativo / Complementario]	Material principal: [Madera / Piedra / Yeso / Metal / Otro]	Nivel de originalidad: [Original / Intervenido / Sustituto / Moderno]
DECORATIVO	BRONCE Y CRISTAL	ORIGINAL
Técnica constructiva: [Tallado / Forja / Enlucido / Otro]	Estado de conservación: [Bueno / Regular / Malo / Riesgo inminente]	
OTRO	REGULAR	
PROPUESTA DE TRATAMIENTO:		

Criterios de intervención

Los criterios de intervención de estos objetos se deben considerar teniendo en cuenta que se trata un conjunto de objetos con las mismas características, en este sentido, las actividades que se realicen deben estar encaminadas a la unicidad estética de todo el conjunto, así como la recuperación de la funcionalidad de los elementos dentro del espacio al que pertenecen.

Cabe señalar que todos los procesos deben realizarse respetando la originalidad de los objetos, su carácter utilitario y sus características como piezas de un conjunto.

METODOLOGÍA PARA LA INTERVENCIÓN

1. Desmonte de las lámparas de los lugares de ubicación:
2. Desmonte de piezas de la lampara, clasificación y registro: que componen cada una de las lámparas con su nomenclatura, clasificación y registro correspondiente de cada una de ellas.
3. Limpieza en seco: se realizara el proceso de limpieza en seco de las piezas metálicas con brochas, bisturí y en caso de ser necesario lápices de fibra de vidrio para eliminar depósitos muy adheridos y materiales agregados.
4. Limpieza en húmedo: de las tulipas de vidrio con una solución de jabón neutro, posterior secado
5. Limpieza química de los productos de corrosión: de las piezas metálicas por medio de impregnación con solución acuosa de Hexametafosfato de sodio al 5% (pudiendo subir la concentración al no ser efectiva hasta el 15% máximo), teniendo en cuenta que al aumentar la temperatura puede ser más efectiva la acción de la solución. En caso de tener puntos concretos de corrosión más gruesos puede utilizarse puntualmente una solución acuosa de ácido cítrico en una concentración no mayor al 3%, o ácido fórmico en una concentración no superior al 30%, y por un tiempo no superior a los 20 minutos, teniendo mucho cuidado en la eliminación de las patinas propias del material.

El pasivado se realizará por medio de inmersiones en sesquicarbonato de sodio en una concentración entre el 5% y el 15%, para eliminar las sales de cloruros que se dispersaran sin riesgos para la pátina, posterior lavado con agua destilada y secado riguroso con solventes (alcohol).

Es importante definir el nivel de limpieza al cual se quiere llegar, con el fin de lograr una homogeneidad en todo el conjunto.

6. Aplicación de capa de protección: para el metal, por medio de una resina acrílica en solución tipo Paraloid B 44, B72 en acetona al 40%, o Incralac. Se recomienda el Incralac ya que la solución contiene dentro de su composición un inhibidor (Benzotriazol) que puede considerarse adecuado para la protección del metal.
7. Armado e instalación: las lámparas serán armadas de nuevo de acuerdo con la información de las piezas levantadas durante el desarmado, de ser necesario se realizarán puntos de soldadura si las lámparas lo requieren para quedar correctamente armada, se revisara y adecuara el sistema eléctrico de cada lampara y posteriormente se instalarán de nuevo en su lugar original.
8. Reposición de tulipas: dañadas, rotas y faltantes por unas de las mismas características, reposición de bombillas faltantes.

FOTOGRAFIAS 1	FOTOGRAFIAS 2
	
FOTOGRAFIAS 3	FOTOGRAFIAS 4
	

AREA CONSTRUIDA:		AREA DE EJECUCION:	AREA DEL TERRENO:		LOCALIZACION
EPOCA DE CONSTRUCCION			VULNERABILIDAD		
SIGLO		FECHA O DECADA	NATURALES	ANTROPICOS	
ANTERIOR AL SIGLO XVI			SISMOS	CONFLICTO TENENCIA	
XVI (1500 - 1599)			REMOCIONES EN MASA	MALAS INTERVENCIONES	
XVII (1600 - 1699)			INUNDACIONES	ABANDONO	X
XVIII (1700 - 1799)			FALLAS GEOLOGICAS		
XIX (1800 - 1899)			ERUPCIONES	OTROS	
XX (1900 - 1999)	X		OTROS		
XXI (2000 En adelante)					

CRITERIOS DE LIBERACIÓN		INTERVENCIÓN PERMITIDA (según liberación actual)	
No se compromete ningún componente estructural ni	NO APLICA	Limpieza superficial	APLICA
Todos los elementos son desmontables o tratables sin	NO APLICA	Protección temporal	APLICA
Se justifica técnicamente la intervención por razones	APLICA	Desmonte técnico	APLICA
Se cuenta con trazabilidad documental en matrices y	APLICA	Consolidación puntual	APLICA
Limpieza superficial (en seco o con métodos no invasivos).	APLICA		
Desmonte técnico con protección y embalaje.	APLICA PARCIALMENTE		
Aplicación de tratamientos conservativos mínimos	APLICA		

OBSERVACIONES: Presenta suciedad superficial, acumulada, manchas de pintura y cemento, así como excrementos y plumas de ave. Se observan productos



FECHA DE EJECUCION : 12/09/2025

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901899883	3	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL	CL93B#12-28OF307	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3196088434	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2054253735	9497173916	E	2026/01/22	2026/01/05	BANCOLOMBIA	0	$11,356,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.		Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL (11 Afiliados)						$36,400,000	$5,884,000			$36,400,000	$1,473,000			$36,400,000	$1,456,000			$36,400,000	$2,533,600		$200,000	$10,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (4 Afiliados)						$10,100,000	$1,676,000			$10,100,000	$421,000			$10,100,000	$404,000			$10,100,000	$703,100		$200,000	$10,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$10,100,000	$1,676,000			$10,100,000	$421,000			$10,100,000	$404,000			$10,100,000	$703,100		$200,000	$10,000
1	CC	1014260685	BASTIDAS VALLEJO SEBASTIAN	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS041	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
2	CC	79354213	CURREA ROMERO JUAN CARLOS	25-14	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF22	30	$6,000,000	$240,000	14-23	30	$6,000,000	$417,600	30	$0	$0
3	CC	1098766304	GOMEZ HERREÑO MARTHA CECILIA	230301	9	$900,000	$144,000	EPS002	9	$900,000	$36,000	CCF22	9	$900,000	$36,000	14-23	9	$900,000	$62,700	9	$0	$0
4	CC	52539833	VELA HURTADO JAQUELINE	231001	2	$200,000	$32,000	EPS010	2	$200,000	$25,000	CCF22	2	$200,000	$8,000	14-23	2	$200,000	$14,000	2	$200,000	$10,000
Centro de Trabajo: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL (7 Afiliados)						$26,300,000	$4,208,000			$26,300,000	$1,052,000			$26,300,000	$1,052,000			$26,300,000	$1,830,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)						$26,300,000	$4,208,000			$26,300,000	$1,052,000			$26,300,000	$1,052,000			$26,300,000	$1,830,500		$0	$0
5	CC	1032432766	AGUILAR SERRANO CARLOS ANDRES	25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS008	30	$5,000,000	$200,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-23	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
6	CC	1019054130	CERA MARTINEZ IVAN DARIO	230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS017	30	$4,000,000	$160,000	CCF22	30	$4,000,000	$160,000	14-23	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
7	CC	65631213	CLARES MENDOZA LAURA MELISA	230201	30	$5,000,000	$800,000	EPS010	30	$5,000,000	$200,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-23	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
8	CC	52832228	LOPEZ ARGENIS	230301	13	$1,300,000	$208,000	EPS002	13	$1,300,000	$52,000	CCF22	13	$1,300,000	$52,000	14-23	13	$1,300,000	$90,500	13	$0	$0
9	CC	1023001616	PULIDO CASTELLANOS ANGEL DAVID	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
10	CC	80206707	RODRIGUEZ PINZON RUBEN DARIO	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
11	CC	3506930	SALAZAR GIRALDO CAMILO ANDRES	230201	30	$5,000,000	$800,000	EPS010	30	$5,000,000	$200,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-23	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
Total Afiliados(11)						$36,400,000	$5,884,000			$36,400,000	$1,473,000			$36,400,000	$1,456,000			$36,400,000	$2,533,600		$200,000	$10,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$5,884,000	$0	$0	$5,884,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$32,000	$0	$0	$32,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$2,300,000	$0	$0	$2,300,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,952,000	$0	$0	$1,952,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,600,000	$0	$0	$1,600,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$2,533,600	$0	$0	$2,533,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$2,533,600	$0	$0	$2,533,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,456,000	$0	$0	$1,456,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	11	$1,456,000	$0	$0	$1,456,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				11	$1,473,000	$0	$0	$1,473,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$200,000	$0	$0	$200,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$425,000	$0	$0	$425,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$120,000	$0	$0	$120,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$88,000	$0	$0	$88,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$480,000	$0	$0	$480,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,000	$0	$0	$6,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$6,000	$0	$0	$6,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,000	$0	$0	$4,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$4,000	$0	$0	$4,000
TOTAL				**11**	**$11,356,600**	**$0**	**$0**	**$11,356,600**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901899883	3	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL	CL93B#12-28OF307	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3196088434	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2054253735	9496686744	E	2025/12/19	2026/01/05	BANCOLOMBIA	17	$1,314,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL (1 Afiliados)						**$4,200,000**	**$672,000**			**$4,200,000**	**$168,000**			**$4,200,000**	**$168,000**			**$4,200,000**	**$292,400**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)						**$4,200,000**	**$672,000**			**$4,200,000**	**$168,000**			**$4,200,000**	**$168,000**			**$4,200,000**	**$292,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						**$4,200,000**	**$672,000**			**$4,200,000**	**$168,000**			**$4,200,000**	**$168,000**			**$4,200,000**	**$292,400**		**$0**	**$0**
1	CC	79354213	CURREA ROMERO JUAN CARLOS	25-14	21	$4,200,000	$672,000	EPS005	21	$4,200,000	$168,000	CCF22	21	$4,200,000	$168,000	14-23	21	$4,200,000	$292,400	21	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			**$4,200,000**	**$672,000**			**$4,200,000**	**$168,000**			**$4,200,000**	**$168,000**			**$4,200,000**	**$292,400**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$672,000	$7,200	$0	$679,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$672,000	$7,200	$0	$679,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$292,400	$3,200	$0	$295,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$292,400	$3,200	$0	$295,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$168,000	$1,800	$0	$169,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$168,000	$1,800	$0	$169,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$168,000	$1,800	$0	$169,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$168,000	$1,800	$0	$169,800
TOTAL				**1**	**$1,300,400**	**$14,000**	**$0**	**$1,314,400**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901899883	3	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL	CL93B#12-28OF307	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3196088434	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL (6 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$12,977,167	$903,400		$0	$0
Centro de Trabajo: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL (6 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$12,977,167	$903,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$12,977,167	$903,400		$0	$0
1	CC	79354213	CURREA ROMERO JUAN CARLOS		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	29	$2,706,667	$188,400	0	$0	$0
2	CC	1073692214	HERRERA DIEGO ARMANDO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
3	CC	1121888407	PIÑEROS LEAL KATHERINE		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
4	CC	79162535	PRIETO GORDILLO HECTOR OSWALDO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$2,400,000	$167,100	0	$0	$0
5	CC	40034338	SUSPES CIPAMOCHA MARIA EFIGENIA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
6	CC	80232870	VARGAS MARTINEZ WILSON DANILO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$3,600,000	$250,600	0	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$12,977,167	$903,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2000108591	9496320973	Y	2025/12/19	2025/12/11	BANCO DE BOGOTA	0	$903,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$903,400	$0	$0	$903,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$903,400	$0	$0	$903,400
TOTAL				**6**	**$903,400**	**$0**	**$0**	**$903,400**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901899883	3	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL	CL93B#12-28OF307	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3196088434	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	57317833	9499368092	Y	2026/02/19	2026/02/12	BANCO DE BOGOTA	0	$626,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL (5 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,993,628	$626,200		$0	$0
Centro de Trabajo: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL (5 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,993,628	$626,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,993,628	$626,200		$0	$0
1	CC	51745375	MENESES SIERRA MYRIAM AURORA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	5	$291,818	$20,400	0	$0	$0
2	CC	1121888407	PIÑEROS LEAL KATHERINE		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0
3	CC	79162535	PRIETO GORDILLO HECTOR OSWALDO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$2,400,000	$167,100	0	$0	$0
4	CC	40034338	SUSPES CIPAMOCHA MARIA EFIGENIA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0
5	CC	80232870	VARGAS MARTINEZ WILSON DANILO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$2,800,000	$194,900	0	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$8,993,628	$626,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$626,200	$0	$0	$626,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$626,200	$0	$0	$626,200
TOTAL				**5**	**$626,200**	**$0**	**$0**	**$626,200**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901899883	3	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL	CL93B#12-28OF307	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3196088434	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2054253735	9497173916	E	2026/01/22	2026/01/05	BANCOLOMBIA	0	$11,356,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.		Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL (11 Afiliados)						$36,400,000	$5,884,000			$36,400,000	$1,473,000			$36,400,000	$1,456,000			$36,400,000	$2,533,600		$200,000	$10,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (4 Afiliados)						$10,100,000	$1,676,000			$10,100,000	$421,000			$10,100,000	$404,000			$10,100,000	$703,100		$200,000	$10,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$10,100,000	$1,676,000			$10,100,000	$421,000			$10,100,000	$404,000			$10,100,000	$703,100		$200,000	$10,000
1	CC	1014260685	BASTIDAS VALLEJO SEBASTIAN	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS041	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
2	CC	79354213	CURREA ROMERO JUAN CARLOS	25-14	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF22	30	$6,000,000	$240,000	14-23	30	$6,000,000	$417,600	30	$0	$0
3	CC	1098766304	GOMEZ HERREÑO MARTHA CECILIA	230301	9	$900,000	$144,000	EPS002	9	$900,000	$36,000	CCF22	9	$900,000	$36,000	14-23	9	$900,000	$62,700	9	$0	$0
4	CC	52539833	VELA HURTADO JAQUELINE	231001	2	$200,000	$32,000	EPS010	2	$200,000	$25,000	CCF22	2	$200,000	$8,000	14-23	2	$200,000	$14,000	2	$200,000	$10,000
Centro de Trabajo: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL (7 Afiliados)						$26,300,000	$4,208,000			$26,300,000	$1,052,000			$26,300,000	$1,052,000			$26,300,000	$1,830,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)						$26,300,000	$4,208,000			$26,300,000	$1,052,000			$26,300,000	$1,052,000			$26,300,000	$1,830,500		$0	$0
5	CC	1032432766	AGUILAR SERRANO CARLOS ANDRES	25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS008	30	$5,000,000	$200,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-23	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
6	CC	1019054130	CERA MARTINEZ IVAN DARIO	230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS017	30	$4,000,000	$160,000	CCF22	30	$4,000,000	$160,000	14-23	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
7	CC	65631213	CLARES MENDOZA LAURA MELISA	230201	30	$5,000,000	$800,000	EPS010	30	$5,000,000	$200,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-23	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
8	CC	52832228	LOPEZ ARGENIS	230301	13	$1,300,000	$208,000	EPS002	13	$1,300,000	$52,000	CCF22	13	$1,300,000	$52,000	14-23	13	$1,300,000	$90,500	13	$0	$0
9	CC	1023001616	PULIDO CASTELLANOS ANGEL DAVID	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
10	CC	80206707	RODRIGUEZ PINZON RUBEN DARIO	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
11	CC	3506930	SALAZAR GIRALDO CAMILO ANDRES	230201	30	$5,000,000	$800,000	EPS010	30	$5,000,000	$200,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-23	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
Total Afiliados(11)						$36,400,000	$5,884,000			$36,400,000	$1,473,000			$36,400,000	$1,456,000			$36,400,000	$2,533,600		$200,000	$10,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$5,884,000	$0	$0	$5,884,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$32,000	$0	$0	$32,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$2,300,000	$0	$0	$2,300,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,952,000	$0	$0	$1,952,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,600,000	$0	$0	$1,600,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$2,533,600	$0	$0	$2,533,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$2,533,600	$0	$0	$2,533,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,456,000	$0	$0	$1,456,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	11	$1,456,000	$0	$0	$1,456,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				11	$1,473,000	$0	$0	$1,473,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$200,000	$0	$0	$200,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$425,000	$0	$0	$425,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$120,000	$0	$0	$120,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$88,000	$0	$0	$88,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$480,000	$0	$0	$480,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,000	$0	$0	$6,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$6,000	$0	$0	$6,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,000	$0	$0	$4,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$4,000	$0	$0	$4,000
TOTAL				**11**	**$11,356,600**	**$0**	**$0**	**$11,356,600**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901899883	3	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL	CL93B#12-28OF307	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3196088434	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2054253735	9496803794	Y	2026/01/22	2026/01/05	BANCOLOMBIA	0	$715,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL (5 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,270,500	$715,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL (5 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,270,500	$715,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,270,500	$715,000		$0	$0
1	CC	1073692214	HERRERA DIEGO ARMANDO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
2	CC	1121888407	PIÑEROS LEAL KATHERINE		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
3	CC	79162535	PRIETO GORDILLO HECTOR OSWALDO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$2,400,000	$167,100	0	$0	$0
4	CC	40034338	SUSPES CIPAMOCHA MARIA EFIGENIA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
5	CC	80232870	VARGAS MARTINEZ WILSON DANILO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$3,600,000	$250,600	0	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,270,500	$715,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$715,000	$0	$0	$715,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$715,000	$0	$0	$715,000
TOTAL				**5**	**$715,000**	**$0**	**$0**	**$715,000**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901899883	3	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL	CL93B#12-28OF307	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3196088434	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2054253735	9496803794	Y	2026/01/22	2026/01/05	BANCOLOMBIA	0	$715,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL (5 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,270,500	$715,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL (5 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,270,500	$715,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,270,500	$715,000		$0	$0
1	CC	1073692214	HERRERA DIEGO ARMANDO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
2	CC	1121888407	PIÑEROS LEAL KATHERINE		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
3	CC	79162535	PRIETO GORDILLO HECTOR OSWALDO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$2,400,000	$167,100	0	$0	$0
4	CC	40034338	SUSPES CIPAMOCHA MARIA EFIGENIA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
5	CC	80232870	VARGAS MARTINEZ WILSON DANILO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$3,600,000	$250,600	0	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,270,500	$715,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$715,000	$0	$0	$715,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$715,000	$0	$0	$715,000
TOTAL				**5**	**$715,000**	**$0**	**$0**	**$715,000**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1073692214	DIEGO ARMANDO HERRERA	CR 78H 58K 20 SUR	3915800	Ing.diegoh7@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	04/11/2025	90180121	$570.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	570.000	570.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1073692214	DIEGO ARMANDO HERRERA		CR 78H 58K 20 SUR	3915800	Ing.diegoh7@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	04/11/2025	90180121	$570.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1073692214	HERRERA DIEGO ARMANDO	3	0			N																	231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	250.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40034338		SUSPES CIPAMOCHA MARIA EFIGENIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	clle 20 # 19 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$4,270,500	$683,300			$4,270,500	$533,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,217,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$4,270,500	$683,300			$4,270,500	$533,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,217,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$4,270,500	$683,300			$4,270,500	$533,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,217,200
1	CC	40034338	SUSPES MARIA																	25-14	30	$4,270,500	$683,300	EPS017	30	$4,270,500	$533,900		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$1,217,200
Total	**Afiliados(1)**																					$4,270,500	$683,300			$4,270,500	$533,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$1,217,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1953608338	9495297872	I	2025/12/10	2025/11/25	BANCOLOMBIA	0	$1,217,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$683,300	$0	$0	$683,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$683,300	$0	$0	$683,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$533,900	$0	$0	$533,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$533,900	$0	$0	$533,900
TOTAL				**1**	**$1,217,200**	**$0**	**$0**	**$1,217,200**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40034338		SUSPES CIPAMOCHA MARIA EFIGENIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	clle 20 # 19 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2074391411	9497797493	I	2026/01/13	2026/01/13	BANCOLOMBIA	0	$1,217,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,270,500	$683,300			$4,270,500	$533,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,270,500	$683,300			$4,270,500	$533,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$4,270,500	$683,300			$4,270,500	$533,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	40034338	SUSPES MARIA	25-14	30	$4,270,500	$683,300	EPS017	30	$4,270,500	$533,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$4,270,500	$683,300			$4,270,500	$533,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40034338		SUSPES CIPAMOCHA MARIA EFIGENIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	clle 20 # 19 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2074391411	9497797493	I	2026/01/13	2026/01/13	BANCOLOMBIA	0	$1,217,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$683,300	$0	$0	$683,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$683,300	$0	$0	$683,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$533,900	$0	$0	$533,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$533,900	$0	$0	$533,900
TOTAL				**1**	**$1,217,200**	**$0**	**$0**	**$1,217,200**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40034338		SUSPES CIPAMOCHA MARIA EFIGENIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	clle 20 # 19 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	46816638	9499161406	I	2026/02/10	2026/02/09	BANCOLOMBIA	0	$1,217,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,270,500	$683,300			$4,270,500	$533,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,270,500	$683,300			$4,270,500	$533,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$4,270,500	$683,300			$4,270,500	$533,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	40034338	SUSPES MARIA	25-14	30	$4,270,500	$683,300	EPS017	30	$4,270,500	$533,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$4,270,500	$683,300			$4,270,500	$533,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40034338		SUSPES CIPAMOCHA MARIA EFIGENIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	clle 20 # 19 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	46816638	9499161406	I	2026/02/10	2026/02/09	BANCOLOMBIA	0	$1,217,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$683,300	$0	$0	$683,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$683,300	$0	$0	$683,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$533,900	$0	$0	$533,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$533,900	$0	$0	$533,900
TOTAL				**1**	**$1,217,200**	**$0**	**$0**	**$1,217,200**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79162535	HECTOR OSWALDO PRIETO GORDILLO	Cra 20 A No. 173 A 03 INT 2 APTO 505	3586697	heopsan@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	03/12/2025	92022033	$2.699.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	1.104.700	0		0		0	0	0	0	1.104.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.414.000	0	0	44.200	44.200	0	0		1.502.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	92.300				92.300	0	0	92.300			923	92.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.104.700	1.104.700
Pensión	1	1.502.400	1.502.400
Riesgos Laborales	1	92.300	92.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	2.699.400	2.699.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79162535	HECTOR OSWALDO PRIETO GORDILLO	Cra 20 A No. 173 A 03 INT 2 APTO 505	3586697	heopsan@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	03/12/2025	92022033	$2.699.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79162535	PRIETO GORDILLO HECTOR OSWALDO	57	0			N								X								25-14	8.837.075	1.414.000	0	0	44.200	44.200	EPS001	8.837.075	1.104.700	14-11	8.837.075	2	92.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79162535	HECTOR OSWALDO PRIETO GORDILLO	Cra 20 A No. 173 A 03 INT 2 APTO 505	3586697	heopsan@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	08/01/2026	3987174	$9.792.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	3.303.000	0		0		0	0	0	0	3.303.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.227.800	0	0	132.200	290.700	0	0		4.650.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.839.100				1.839.100	0	0	1.839.100			18.391	1.839.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	3.303.000	3.303.000
Pensión	1	4.650.700	4.650.700
Riesgos Laborales	1	1.839.100	1.839.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	9.792.800	9.792.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79162535	HECTOR OSWALDO PRIETO GORDILLO	Cra 20 A No. 173 A 03 INT 2 APTO 505	3586697	heopsan@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	08/01/2026	3987174	$9.792.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79162535	PRIETO GORDILLO HECTOR OSWALDO	57	0			N								X								25-14	26.423.487	4.227.800	0	0	132.200	290.700	EPS001	26.423.487	3.303.000	14-11	26.423.487	5	1.839.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79162535	HECTOR OSWALDO PRIETO GORDILLO	Cra 20 A No. 173 A 03 INT 2 APTO 505	3586697	heopsan@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		83483912	22/01/2025	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	$0	$1.143.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	483.800	0		0		0	0	0	0	483.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	619.200	0	0	0	0	0	0		619.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	40.500				40.500	0	0	40.500			405	40.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	483.800	483.800
Pensión	1	619.200	619.200
Riesgos Laborales	1	40.500	40.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.143.500	1.143.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79162535	HECTOR OSWALDO PRIETO GORDILLO	Cra 20 A No. 173 A 03 INT 2 APTO 505	3586697	heopsan@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		83483912	22/01/2025	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	$0	$1.143.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 79162535	PRIETO GORDILLO HECTOR OSWALDO	57	0			N								X									230301	3.870.000	30	619.200	0	0	0	0	EPS001	3.870.000	30	483.800	14-11	3.870.000	30	2	40.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80232870		VARGAS MARTINEZ WILSON DANILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 130 c # 59 d 75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1984324901	9495349084	I	2025/12/17	2025/12/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$1,044,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$3,600,000	$576,000			$3,600,000	$450,000			$0	$0			$3,600,000		$18,800		$0	$0		$1,044,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																					$3,600,000	$576,000			$3,600,000	$450,000			$0	$0			$3,600,000		$18,800		$0	$0		$1,044,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$3,600,000	$576,000			$3,600,000	$450,000			$0	$0			$3,600,000		$18,800		$0	$0		$1,044,800
1	CC	80232870	VARGAS WILSON																	230201	30	$3,600,000	$576,000	EPS001	30	$3,600,000	$450,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,600,000	0.522%	$18,800	0	$0	$0	No	$1,044,800
Total	**Afiliados(1)**																					$3,600,000	$576,000			$3,600,000	$450,000			$0	$0			$3,600,000		$18,800		$0	$0		$1,044,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$576,000	$0	$0	$576,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$576,000	$0	$0	$576,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,800	$0	$0	$18,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,800	$0	$0	$18,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$450,000	$0	$0	$450,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$450,000	$0	$0	$450,000
TOTAL				**1**	**$1,044,800**	**$0**	**$0**	**$1,044,800**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80232870		VARGAS MARTINEZ WILSON DANILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 130 c # 59 d 75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	54254277	9495349085	I	2026/01/20	2026/02/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	22	$1,081,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$3,600,000**	**$576,000**			**$3,600,000**	**$450,000**			**$3,600,000**	**$21,600**			**$3,600,000**	**$18,800**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)					**$3,600,000**	**$576,000**			**$3,600,000**	**$450,000**			**$3,600,000**	**$21,600**			**$3,600,000**	**$18,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					**$3,600,000**	**$576,000**			**$3,600,000**	**$450,000**			**$3,600,000**	**$21,600**			**$3,600,000**	**$18,800**		**$0**	**$0**
1	CC 80232870	VARGAS WILSON	230201	30	$3,600,000	$576,000	EPS001	30	$3,600,000	$450,000	CCF22	30	$3,600,000	$21,600	14-23	30	$3,600,000	$18,800	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					**$3,600,000**	**$576,000**			**$3,600,000**	**$450,000**			**$3,600,000**	**$21,600**			**$3,600,000**	**$18,800**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$576,000	$7,900	$0	$583,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$576,000	$7,900	$0	$583,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,800	$300	$0	$19,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,800	$300	$0	$19,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,600	$300	$0	$21,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$21,600	$300	$0	$21,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$450,000	$6,200	$0	$456,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$450,000	$6,200	$0	$456,200
TOTAL				**1**	**$1,066,400**	**$14,700**	**$0**	**$1,081,100**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80232870		VARGAS MARTINEZ WILSON DANILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 130 c # 59 d 75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	54325704	9499530313	I	2026/02/17	2026/02/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$829,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$2,800,000	$16,800			$2,800,000	$14,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$2,800,000	$16,800			$2,800,000	$14,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$2,800,000	$16,800			$2,800,000	$14,700		$0	$0
1	CC 80232870	VARGAS WILSON	230201	30	$2,800,000	$448,000	EPS001	30	$2,800,000	$350,000	CCF22	30	$2,800,000	$16,800	14-23	30	$2,800,000	$14,700	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$2,800,000	$16,800			$2,800,000	$14,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$448,000	$0	$0	$448,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$448,000	$0	$0	$448,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,700	$0	$0	$14,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,700	$0	$0	$14,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$16,800	$0	$0	$16,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$16,800	$0	$0	$16,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$350,000	$0	$0	$350,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$350,000	$0	$0	$350,000
TOTAL				**1**	**$829,500**	**$0**	**$0**	**$829,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900555880	1	ANGULO CONSTRUCCIONES S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA CENTRO 6	CLL 68 N 76 67	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8887659	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	9496515837	9496515837	E	2025/12/18	2025/12/19	BANCO DE BOGOTA	1	$4,571,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA CENTRO 6 (15 Afiliados)																								$13,048,750	$2,088,300			$13,618,150	$545,300			$13,613,854	$545,300			$13,618,150		$948,600		$0	$0		$4,127,500
Centro de Trabajo: OBRA BOGOTA II (15 Afiliados)																								$13,048,750	$2,088,300			$13,618,150	$545,300			$13,613,854	$545,300			$13,618,150		$948,600		$0	$0		$4,127,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)																								$13,048,750	$2,088,300			$13,618,150	$545,300			$13,613,854	$545,300			$13,618,150		$948,600		$0	$0		$4,127,500
1	CC	19595337	HENRIQUEZ EFRAIN		X																	230201	29	$1,376,050	$220,200	EPS002	29	$1,376,050	$55,100	CCF24	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	6.960%	$95,800	29	$0	$0	Si	$426,200
2	CC	1137195515	HERRERA JULIAN																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,000	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
3	CC	1118802021	MEDINA LUIS																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,000	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
4	CC	1077465375	PANESSO YESIER																			230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,000	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
5	CC	1004348796	PEREZ MANUEL	X	X																	230301	22	$1,043,900	$167,100	EPS037	22	$1,043,900	$41,800	CCF24	22	$1,043,534	$41,800	14-4	22	$1,043,900	6.960%	$72,700	22	$0	$0	Si	$323,400
6	CC	11645023	RIVAS ROBER																			231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,000	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
7	CC	4825402	RIVAS SIPRIAN																			231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,000	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
8	CC	1077443483	SANCHEZ HERNANDO	X	X																	230201	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF24	1	$47,434	$1,900	14-4	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
9	PT	6398361	SUAREZ JOSE	X	X																	25-14	10	$474,500	$76,000	EPS041	10	$474,500	$19,000	CCF24	10	$474,334	$19,000	14-4	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	Si	$147,100
10	CC	3179371	TEQUIA JOSE	X																			0	$0	$0	EPS002	12	$569,400	$22,800	CCF24	12	$569,200	$22,800	14-4	12	$569,400	6.960%	$39,700	12	$0	$0	Si	$85,300
11	CC	1016714270	VALENCIA EINER																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,000	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
12	CC	1193214941	VASQUEZ WOLFRAN																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,000	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
13	CC	1026597578	VELASQUEZ JOSE	X	X																	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF24	1	$47,434	$1,900	14-4	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
14	CC	11975134	VELASQUEZ JOSE	X	X																	231001	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$1,900	CCF24	1	$47,434	$1,900	14-4	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
15	CC	1062963815	VELASQUEZ LUIS	X	X																	230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF24	1	$47,434	$1,900	14-4	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA CAJICA (1 Afiliados)																								$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,000	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
Centro de Trabajo: OBRA CAJICA (1 Afiliados)																								$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,000	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																								$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,000	$57,000			$1,423,500		$99,100		$0	$0		$440,900
16	CC	80373674	ANGULO CESAR																			230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,000	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total			**Afiliados(16)**																					$14,472,250	$2,316,100			$15,041,650	$602,300			$15,036,854	$602,300			$15,041,650		$1,047,700		$0	$0		$4,568,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$2,316,100	$1,600	$0	$2,317,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$463,200	$300	$0	$463,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$76,000	$100	$0	$76,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,093,500	$700	$0	$1,094,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$683,400	$500	$0	$683,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,047,700	$700	$0	$1,048,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	16	$1,047,700	$700	$0	$1,048,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$602,300	$400	$0	$602,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	16	$602,300	$400	$0	$602,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				16	$602,300	$700	$0	$603,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$58,900	$100	$0	$59,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$214,700	$200	$0	$214,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$20,900	$100	$0	$21,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$250,800	$200	$0	$251,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$100	$0	$57,100
TOTAL				**16**	**$4,568,400**	**$3,400**	**$0**	**$4,571,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900555880	1	ANGULO CONSTRUCCIONES S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA CENTRO 6	CLL 68 N 76 67	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8887659	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	9498102907	9498102907	E	2026/01/21	2026/01/19	BANCO DE BOGOTA	0	$2,533,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA CENTRO 6 (7 Afiliados)																						$8,066,500	$1,291,400			$9,490,000	$380,000			$9,486,667	$380,000			$9,490,000		$482,500		$0	$0		$2,533,900
Centro de Trabajo: OBRA BOGOTA II (7 Afiliados)																						$8,066,500	$1,291,400			$9,490,000	$380,000			$9,486,667	$380,000			$9,490,000		$482,500		$0	$0		$2,533,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																						$8,066,500	$1,291,400			$9,490,000	$380,000			$9,486,667	$380,000			$9,490,000		$482,500		$0	$0		$2,533,900
1	CC	1137195515	HERRERA JULIAN																	230301	21	$996,450	$159,500	EPS037	21	$996,450	$39,900	CCF24	21	$996,100	$39,900	14-4	21	$996,450	6.960%	$69,400	21	$0	$0	Si	$308,700
2	CC	1137195515	HERRERA JULIAN													X				230301	9	$427,050	$68,400	EPS037	9	$427,050	$17,100	CCF24	9	$426,900	$17,100	14-4	9	$427,050	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$102,600
3	CC	1118802021	MEDINA LUIS																	230301	21	$996,450	$159,500	EPS037	21	$996,450	$39,900	CCF24	21	$996,100	$39,900	14-4	21	$996,450	6.960%	$69,400	21	$0	$0	Si	$308,700
4	CC	1118802021	MEDINA LUIS													X				230301	9	$427,050	$68,400	EPS037	9	$427,050	$17,100	CCF24	9	$426,900	$17,100	14-4	9	$427,050	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$102,600
5	CC	1077465375	PANESSO YESIER		X															230201	20	$949,000	$151,900	EPS002	20	$949,000	$38,000	CCF24	20	$948,667	$38,000	14-4	20	$949,000	6.960%	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
6	CC	11645023	RIVAS ROBER																	231001	21	$996,450	$159,500	EPS005	21	$996,450	$39,900	CCF24	21	$996,100	$39,900	14-4	21	$996,450	6.960%	$69,400	21	$0	$0	Si	$308,700
7	CC	11645023	RIVAS ROBER													X				231001	9	$427,050	$68,400	EPS005	9	$427,050	$17,100	CCF24	9	$426,900	$17,100	14-4	9	$427,050	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$102,600
8	CC	4825402	RIVAS SIPRIAN																	231001	21	$996,450	$159,500	EPS002	21	$996,450	$39,900	CCF24	21	$996,100	$39,900	14-4	21	$996,450	6.960%	$69,400	21	$0	$0	Si	$308,700
9	CC	4825402	RIVAS SIPRIAN													X				231001	9	$427,050	$68,400	EPS002	9	$427,050	$17,100	CCF24	9	$426,900	$17,100	14-4	9	$427,050	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$102,600
10	CC	3179371	TEQUIA JOSE																		0	$0	$0	EPS002	21	$996,450	$39,900	CCF24	21	$996,100	$39,900	14-4	21	$996,450	6.960%	$69,400	21	$0	$0	Si	$149,200
11	CC	3179371	TEQUIA JOSE													X					0	$0	$0	EPS002	9	$427,050	$17,100	CCF24	9	$426,900	$17,100	14-4	9	$427,050	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$34,200
12	CC	1193214941	VASQUEZ WOLFRAN																	230301	21	$996,450	$159,500	EPS037	21	$996,450	$39,900	CCF24	21	$996,100	$39,900	14-4	21	$996,450	6.960%	$69,400	21	$0	$0	Si	$308,700
13	CC	1193214941	VASQUEZ WOLFRAN													X				230301	9	$427,050	$68,400	EPS037	9	$427,050	$17,100	CCF24	9	$426,900	$17,100	14-4	9	$427,050	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$102,600
Total			**Afiliados(7)**																			$8,066,500	$1,291,400			$9,490,000	$380,000			$9,486,667	$380,000			$9,490,000		$482,500		$0	$0		$2,533,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,291,400	$0	$0	$1,291,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$455,800	$0	$0	$455,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$683,700	$0	$0	$683,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$151,900	$0	$0	$151,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$482,500	$0	$0	$482,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	$482,500	$0	$0	$482,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$380,000	$0	$0	$380,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	$380,000	$0	$0	$380,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$380,000	$0	$0	$380,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$171,000	$0	$0	$171,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$152,000	$0	$0	$152,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				**7**	**$2,533,900**	**$0**	**$0**	**$2,533,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900555880	1	ANGULO CONSTRUCCIONES S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA CENTRO 6	CLL 68 N 76 67	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8887659	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	9498102907	9498102907	E	2026/01/21	2026/01/19	BANCO DE BOGOTA	0	$2,533,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OBRA CENTRO 6 (7 Afiliados)						$8,066,500	$1,291,400			$9,490,000	$380,000			$9,486,667	$380,000			$9,490,000	$482,500		$0	$0
Centro de Trabajo: OBRA BOGOTA II (7 Afiliados)						$8,066,500	$1,291,400			$9,490,000	$380,000			$9,486,667	$380,000			$9,490,000	$482,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)						$8,066,500	$1,291,400			$9,490,000	$380,000			$9,486,667	$380,000			$9,490,000	$482,500		$0	$0
1	CC	1137195515	HERRERA JULIAN	230301	21	$996,450	$159,500	EPS037	21	$996,450	$39,900	CCF24	21	$996,100	$39,900	14-4	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0
2	CC	1137195515	HERRERA JULIAN	230301	9	$427,050	$68,400	EPS037	9	$427,050	$17,100	CCF24	9	$426,900	$17,100	14-4	9	$427,050	$0	9	$0	$0
3	CC	1118802021	MEDINA LUIS	230301	21	$996,450	$159,500	EPS037	21	$996,450	$39,900	CCF24	21	$996,100	$39,900	14-4	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0
4	CC	1118802021	MEDINA LUIS	230301	9	$427,050	$68,400	EPS037	9	$427,050	$17,100	CCF24	9	$426,900	$17,100	14-4	9	$427,050	$0	9	$0	$0
5	CC	1077465375	PANESSO YESIER	230201	20	$949,000	$151,900	EPS002	20	$949,000	$38,000	CCF24	20	$948,667	$38,000	14-4	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
6	CC	11645023	RIVAS ROBER	231001	21	$996,450	$159,500	EPS005	21	$996,450	$39,900	CCF24	21	$996,100	$39,900	14-4	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0
7	CC	11645023	RIVAS ROBER	231001	9	$427,050	$68,400	EPS005	9	$427,050	$17,100	CCF24	9	$426,900	$17,100	14-4	9	$427,050	$0	9	$0	$0
8	CC	4825402	RIVAS SIPRIAN	231001	21	$996,450	$159,500	EPS002	21	$996,450	$39,900	CCF24	21	$996,100	$39,900	14-4	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0
9	CC	4825402	RIVAS SIPRIAN	231001	9	$427,050	$68,400	EPS002	9	$427,050	$17,100	CCF24	9	$426,900	$17,100	14-4	9	$427,050	$0	9	$0	$0
10	CC	3179371	TEQUIA JOSE		0	$0	$0	EPS002	21	$996,450	$39,900	CCF24	21	$996,100	$39,900	14-4	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0
11	CC	3179371	TEQUIA JOSE		0	$0	$0	EPS002	9	$427,050	$17,100	CCF24	9	$426,900	$17,100	14-4	9	$427,050	$0	9	$0	$0
12	CC	1193214941	VASQUEZ WOLFRAN	230301	21	$996,450	$159,500	EPS037	21	$996,450	$39,900	CCF24	21	$996,100	$39,900	14-4	21	$996,450	$69,400	21	$0	$0
13	CC	1193214941	VASQUEZ WOLFRAN	230301	9	$427,050	$68,400	EPS037	9	$427,050	$17,100	CCF24	9	$426,900	$17,100	14-4	9	$427,050	$0	9	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			$8,066,500	$1,291,400			$9,490,000	$380,000			$9,486,667	$380,000			$9,490,000	$482,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900555880	1	ANGULO CONSTRUCCIONES S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA CENTRO 6	CLL 68 N 76 67	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8887659	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	9498102907	9498102907	E	2026/01/21	2026/01/19	BANCO DE BOGOTA	0	$2,533,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,291,400	$0	$0	$1,291,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$455,800	$0	$0	$455,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$683,700	$0	$0	$683,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$151,900	$0	$0	$151,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$482,500	$0	$0	$482,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	$482,500	$0	$0	$482,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$380,000	$0	$0	$380,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	$380,000	$0	$0	$380,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$380,000	$0	$0	$380,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$171,000	$0	$0	$171,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$152,000	$0	$0	$152,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				7	$2,533,900	$0	$0	$2,533,900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900872778
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES RAFAEL ESPANOL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	GD 63B N 73F 51 SUR	TELÉFONO:	7824165
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - CONSTRUCCION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7996245998**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	3						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/24			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1952089731		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	18	$ 2.779.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 0	$ 2.779.200	$ 5.300	$ 2.784.500
230201	230201- PROTECCION	10	$ 1.177.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 0	$ 1.177.000	$ 2.300	$ 1.179.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	9	$ 1.169.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 0	$ 1.169.400	$ 2.300	$ 1.171.700
SUBTOTALES:										**$ 5.125.600**	**$ 9.900**	**$ 5.135.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 114.000	$ 300	$ 0	$ 114.300
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	10		$ 0		$ 0		$ 0	$ 294.500	$ 0	$ 600	$ 0	$ 294.500	$ 600	$ 0	$ 295.100
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 57.000	$ 200	$ 0	$ 57.200
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 58.900	$ 0	$ 200	$ 0	$ 58.900	$ 200	$ 0	$ 59.100
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 119.700	$ 0	$ 300	$ 0	$ 119.700	$ 300	$ 0	$ 120.000
CCFC33	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 57.000	$ 200	$ 0	$ 57.200
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 57.000	$ 200	$ 0	$ 57.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60.800	$ 0	$ 200	$ 0	$ 60.800	$ 200	$ 0	$ 61.000
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 114.000	$ 300	$ 0	$ 114.300
EPS017	EPS017-FAMISANAR	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 172.900	$ 0	$ 400	$ 0	$ 172.900	$ 400	$ 0	$ 173.300
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 115.900	$ 0	$ 300	$ 0	$ 115.900	$ 300	$ 0	$ 116.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 174.800	$ 0	$ 400	$ 0	$ 174.800	$ 400	$ 0	$ 175.200
SUBTOTALES:													**$ 1.396.500**	**$ 3.600**	**$ 0**	**$ 1.400.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	39		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.429.400	$ 2.429.400	$ 4.600	$ 0	$ 2.434.000
SUBTOTALES:									**$ 2.429.400**	**$ 4.600**	**$ 0**	**$ 2.434.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	39	$ 1.396.500	$ 2.700	$ 1.399.200
SUBTOTALES:			**$ 1.396.500**	**$ 2.700**	**$ 1.399.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP														
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1000115656	CASTELLANOS MORENO JONATHAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		01															230201-PROTECCION	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-11 - ARL SURA	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF21-CAFAM	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1000255389	GUAMAN PORTELA MARLON SANTIAGO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	15	15															230301-PORVENIR	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-11 - ARL SURA	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF21-CAFAM	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1000615194	REY TORRES SAUL DAVID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		01															230201-PROTECCION	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-11 - ARL SURA	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF21-CAFAM	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1000730688	MARTINEZ DAZA MARIA PAULA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1007276339	ROJAS MONTOYA LEYSON	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1022340823	SOLER LEON OSCAR JULIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	11	11															25-14 COLPENSIONES	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-11 - ARL SURA	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF21-CAFAM	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1023946242	RIOS RUIZ MIGUEL DAVID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1024585910	GARCIA QUIROGA DAYANNA JULIETH	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900872778
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES RAFAEL ESPANOL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	GD 63B N 73F 51 SUR	TELÉFONO:	7824165
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - CONSTRUCCION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7996245998**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	3						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/24			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1952089731		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
9	CC 1024586566	GUZMAN PERDOMO MARIO ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1049896155	AVILA LERMA JANER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	09	09															230301-PORVENIR	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-11 - ARL SURA	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF21-CAFAM	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1050428208	MARTINEZ ZAMBRANO SOLANGER ENRIQUE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1050429686	VIDES ZAMBRANO CARLOS MANUEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1069767986	MOLINA RAMIREZ HAROL EDUARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		01															230201-PROTECCION	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-11 - ARL SURA	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF21-CAFAM	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1073672449	VARGAS DIAZ JHON FREDDY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		01															25-14 COLPENSIONES	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS017-FAMISANAR	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-11 - ARL SURA	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF21-CAFAM	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1082914109	LOAIZA ALEAN JHON JAIRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1094274927	SANCHEZ CERVERA ARMANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		01															230301-PORVENIR	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-11 - ARL SURA	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF21-CAFAM	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 10980634	ARTEAGA LOPEZ YOIMER ANTONIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 11039905	MAFIOLY MARTINEZ ANTONIO CARLOS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1115859198	ORTIZ MENDIVELSO FERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 1126239507	MEDINA MADRID JAROL RAFAEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1130267913	ZAMUDIO JULIO PEDRO AGUSTIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 1130267914	ZAMUDIO JULIO MARCO AGUSTIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	11	11															230201-PROTECCION	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-11 - ARL SURA	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF21-CAFAM	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 1193137220	CASTRO MANJARRES ANDRES FELIPE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	06	06															230301-PORVENIR	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-11 - ARL SURA	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF21-CAFAM	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 14225838	MOLINA CAICEDO CARLOS JULIO	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.423.500	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 16112222	RAIGOZA ARIAS ALCIDIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 36067405	PERDOMO ARTEAGA YIRLEY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 4211043	ESPANOL VARGAS RAFAEL ANTONIO	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1.423.500	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 4211300	LIMAS DAZA LUIS ISRAEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 53134684	ALVARADO MURCIA FABIOLA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 64543644	CASTELLANOS PEREZ OLGA OMAIRA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 64561170	CASTELLANOS PEREZ MARIA INES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900872778
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES RAFAEL ESPANOL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	GD 63B N 73F 51 SUR	TELÉFONO:	7824165
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - CONSTRUCCION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7996245998**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	3						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/24			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1952089731		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																							PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																			CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
32	CC 79815714	CARRENO CABRERA RODOLFO ENRIQUE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	11	11															230301-PORVENIR	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-11 - ARL SURA	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF21-CAFAM	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	CC 79919519	CARRENO HURTADO JOSE EULOGIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		01															230301-PORVENIR	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-11 - ARL SURA	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF21-CAFAM	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	PT 5071095	CALZADILLA VALERA CHRISTIAN ADRIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	PT 5424722	GUZMAN ZAPATA FRANKLIN EDUARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	PT 5895106	MARQUEZ PAREDES PEDRO LEONARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		01															230201-PROTECCION	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-11 - ARL SURA	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF21-CAFAM	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	PT 6165470	TUBINEZ RUIZ ANGEL ENRIQUE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		01															25-14 COLPENSIONES	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-11 - ARL SURA	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF21-CAFAM	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
38	PT 6297908	MORENO SUAREZ NILSON FRANCO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	PT 6427294	GARCIA GUZMAN ELIECER SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	07	07															25-14 COLPENSIONES	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-11 - ARL SURA	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF21-CAFAM	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 10.368.800

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900872778
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES RAFAEL ESPANOL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	GD 63B N 73F 51 SUR	TELÉFONO:	7824165
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - CONSTRUCCION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6000050512**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/18			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2019412544		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	16	$ 2.847.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.847.600	$ 0	$ 2.847.600
230201	230201- PROTECCION	6	$ 1.184.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.184.600	$ 0	$ 1.184.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 865.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 865.700	$ 0	$ 865.700
SUBTOTALES:										**$ 4.897.900**	**$ 0**	**$ 4.897.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 58.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.900	$ 0	$ 0	$ 58.900
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 58.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.900	$ 0	$ 0	$ 58.900
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 138.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 138.700	$ 0	$ 0	$ 138.700
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 58.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.900	$ 0	$ 0	$ 58.900
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 324.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 324.900	$ 0	$ 0	$ 324.900
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 115.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.900	$ 0	$ 0	$ 115.900
CCFC33	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 182.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 182.400	$ 0	$ 0	$ 182.400
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 58.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.900	$ 0	$ 0	$ 58.900
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:													**$ 1.339.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.339.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	31		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.329.600	$ 2.329.600	$ 0	$ 0	$ 2.329.600
SUBTOTALES:									**$ 2.329.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.329.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	31	$ 1.339.500	$ 0	$ 1.339.500
SUBTOTALES:			**$ 1.339.500**	**$ 0**	**$ 1.339.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP														
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1000730688	MARTINEZ DAZA MARIA PAULA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		01														230301-PORVENIR	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS017-FAMISANAR	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-11 - ARL SURA	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF21-CAFAM	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1007276339	ROJAS MONTOYA LEYSON	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1007597157	TRUJILLO RONDON KEIDER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	25															230201-PROTECCION	6	$ 284.700	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 45.600	EPS005-SANITAS S.A.	6	$ 284.700	$ 11.400	$ 0	$ 11.400	14-11 - ARL SURA	6	$ 284.700		$ 19.900	6	$ 284.700	CCF21-CAFAM	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1023946242	RIOS RUIZ MIGUEL DAVID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1024543144	OROZCO PEREZ YEISON FABIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	26	26														230301-PORVENIR	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-11 - ARL SURA	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF21-CAFAM	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1024585910	GARCIA QUIROGA DAYANNA JULIETH	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1024586566	GUZMAN PERDOMO MARIO ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1050428208	MARTINEZ ZAMBRANO SOLANGER ENRIQUE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900872778
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES RAFAEL ESPANOL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	GD 63B N 73F 51 SUR	TELÉFONO:	7824165
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - CONSTRUCCION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6000050512**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/18			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2019412544		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD							ARP														
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
9	CC 1050429686	VIDES ZAMBRANO CARLOS MANUEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1082914109	LOAIZA ALEAN JHON JAIRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1087113068	ARBOLEDA CARABALI JOHAN ESTEBAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	05	05															25-14 COLPENSIONES	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-11 - ARL SURA	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF21-CAFAM	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 10980634	ARTEAGA LOPEZ YOIMER ANTONIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 11039905	MAFIOLY MARTINEZ ANTONIO CARLOS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1115859198	ORTIZ MENDIVELSO FERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1126239507	MEDINA MADRID JAROL RAFAEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1130267913	ZAMUDIO JULIO PEDRO AGUSTIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1143382647	BANQUEZ NARVAEZ CARLOS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	11	11															230301-PORVENIR	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-11 - ARL SURA	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF21-CAFAM	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 14225838	MOLINA CAICEDO CARLOS JULIO	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.423.500	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 16112222	RAIGOZA ARIAS ALCIDIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 36067405	PERDOMO ARTEAGA YIRLEY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 4211043	ESPANOL VARGAS RAFAEL ANTONIO	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1.423.500	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 4211300	LIMAS DAZA LUIS ISRAEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 53134684	ALVARADO MURCIA FABIOLA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 64543644	CASTELLANOS PEREZ OLGA OMAIRA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 64561170	CASTELLANOS PEREZ MARIA INES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		01															25-14 COLPENSIONES	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-11 - ARL SURA	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF21-CAFAM	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 7366236	TUMAY TUMAY OSCAR	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	10																230301-PORVENIR	21	$ 996.450	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	EPS037-NUEVA EPS	21	$ 996.450	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-11 - ARL SURA	21	$ 996.450		$ 69.400	21	$ 996.450	CCF21-CAFAM	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 78113850	PEREZ ARCIA JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	10																230301-PORVENIR	21	$ 996.450	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	EPS002-SALUD TOTAL	21	$ 996.450	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-11 - ARL SURA	21	$ 996.450		$ 69.400	21	$ 996.450	CCF21-CAFAM	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	PT 5071095	CALZADILLA VALERA CHRISTIAN ADRIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	PT 5424722	GUZMAN ZAPATA FRANKLIN EDUARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		01															25-14 COLPENSIONES	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS008-COMPENSAR	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-11 - ARL SURA	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF21-CAFAM	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	PT 6297908	MORENO SUAREZ NILSON FRANCO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900872778
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES RAFAEL ESPANOL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	GD 63B N 73F 51 SUR	TELÉFONO:	7824165
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - CONSTRUCCION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6000050512**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/18			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2019412544		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD					ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
31	PT 7395393	ANGULO ALVARADO ANGELO ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	10																25-14 COLPENSIONES	21	$ 996.450	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	EPS037-NUEVA EPS	21	$ 996.450	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-11 - ARL SURA	21	$ 996.450		$ 69.400	21	$ 996.450	CCF21-CAFAM	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 9.906.500

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900872778
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES RAFAEL ESPANOL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	GD 63B N 73F 51 SUR	TELÉFONO:	7824165
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - CONSTRUCCION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6004061349**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/01/20			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2097768891		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	8	$ 1.792.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.792.000	$ 0	$ 1.792.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 918.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 918.800	$ 0	$ 918.800
230301	230301-PORVENIR	16	$ 2.991.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.991.800	$ 0	$ 2.991.800
SUBTOTALES:										**$ 5.702.600**	**$ 0**	**$ 5.702.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 1.900
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 171.000
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 228.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.000	$ 0	$ 0	$ 228.000
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 110.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 110.200	$ 0	$ 0	$ 110.200
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 58.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.900	$ 0	$ 0	$ 58.900
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
CCFC33	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 404.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 404.700	$ 0	$ 0	$ 404.700
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 167.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167.200	$ 0	$ 0	$ 167.200
SUBTOTALES:													**$ 1.540.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.540.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	31		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.679.400	$ 2.679.400	$ 0	$ 0	$ 2.679.400
SUBTOTALES:									**$ 2.679.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.679.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	31	$ 1.540.900	$ 0	$ 1.540.900
SUBTOTALES:			**$ 1.540.900**	**$ 0**	**$ 1.540.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1007276339	ROJAS MONTOYA LEYSON	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		01														230301-PORVENIR	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-11 - ARL SURA	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF21-CAFAM	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1007597157	TRUJILLO RONDON KEIDER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1023946242	RIOS RUIZ MIGUEL DAVID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1024585910	GARCIA QUIROGA DAYANNA JULIETH	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1024586566	GUZMAN PERDOMO MARIO ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1043638504	TORRES ORTEGA WENDY JOHANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	16	16														25-14 COLPENSIONES	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-11 - ARL SURA	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF21-CAFAM	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1048607805	FUENTES PALENCIA JAIRO LUIS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	03	03														230301-PORVENIR	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-11 - ARL SURA	1	$ 47.450		$ 3.400	1	$ 47.450	CCF21-CAFAM	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1050428208	MARTINEZ ZAMBRANO SOLANGER ENRIQUE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900872778
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES Y RESTAURACIONES RAFAEL ESPANOL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	GD 63B N 73F 51 SUR	TELÉFONO:	7824165
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - CONSTRUCCION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6004061349**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/01/20			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2097768891		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP														
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
9	CC 1050429686	VIDES ZAMBRANO CARLOS MANUEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1082914109	LOAIZA ALEAN JHON JAIRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 10980634	ARTEAGA LOPEZ YOIMER ANTONIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 11039905	MAFIOLY MARTINEZ ANTONIO CARLOS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1115859198	ORTIZ MENDIVELSO FERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1123733379	MONTENEGRO MUÑOZ ANDRES EDUARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	03																230201-PROTECCION	28	$ 1.328.600	$ 212.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 212.600	EPS017-FAMISANAR	28	$ 1.328.600	$ 53.200	$ 0	$ 53.200	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.328.600		$ 92.500	28	$ 1.328.600	CCF21-CAFAM	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1123733872	PIÑERES MARTINEZ ANDRES ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	03																230201-PROTECCION	28	$ 1.328.600	$ 212.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 212.600	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	28	$ 1.328.600	$ 53.200	$ 0	$ 53.200	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.328.600		$ 92.500	28	$ 1.328.600	CCF21-CAFAM	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1126239507	MEDINA MADRID JAROL RAFAEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1130267913	ZAMUDIO JULIO PEDRO AGUSTIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 14225838	MOLINA CAICEDO CARLOS JULIO	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.423.500	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CCFC33-EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 16112222	RAIGOZA ARIAS ALCIDIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 36067405	PERDOMO ARTEAGA YIRLEY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 4211043	ESPAÑOL VARGAS RAFAEL ANTONIO	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1.423.500	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 4211300	LIMAS DAZA LUIS ISRAEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 53134684	ALVARADO MURCIA FABIOLA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 64543644	CASTELLANOS PEREZ OLGA OMAIRA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 7366236	TUMAY TUMAY OSCAR	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 78113850	PEREZ ARCIA JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 79583396	BECERRA RUIZ MILTON	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	15																230301-PORVENIR	16	$ 759.200	$ 121.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.500	EPS002-SALUD TOTAL	16	$ 759.200	$ 30.400	$ 0	$ 30.400	14-11 - ARL SURA	16	$ 759.200		$ 52.900	16	$ 759.200	CCF21-CAFAM	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	PT 5071095	CALZADILLA VALERA CHRISTIAN ADRIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	PT 6297908	MORENO SUAREZ NILSON FRANCO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	PT 6546748	SILVA YANEZ JOSMER RAIME	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	15																230301-PORVENIR	16	$ 759.200	$ 121.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.500	EPS002-SALUD TOTAL	16	$ 759.200	$ 30.400	$ 0	$ 30.400	14-11 - ARL SURA	16	$ 759.200		$ 52.900	16	$ 759.200	CCF21-CAFAM	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	PT 7395393	ANGULO ALVARADO ANGELO ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF21-CAFAM	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 11.463.800

Planilla Pagada

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901710851	6	VISION INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 93 BIS NO. 19 50 OF 105	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5872589	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2024541608	9496687302	E	2025/12/12	2025/12/22	NEQUI	10	$3,698,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (13 Afiliados)					$7,070,050	$1,131,800			$8,920,600	$1,116,000			$8,920,600	$357,200			$8,920,600	$621,700		$8,920,600	$447,500
Centro de Trabajo: Principal (13 Afiliados)					$7,070,050	$1,131,800			$8,920,600	$1,116,000			$8,920,600	$357,200			$8,920,600	$621,700		$8,920,600	$447,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)					$7,070,050	$1,131,800			$8,920,600	$1,116,000			$8,920,600	$357,200			$8,920,600	$621,700		$8,920,600	$447,500
1	CC	13761593	CASTILLO MARIO	230201	20	$949,000	$151,900	EPS010	20	$949,000	$118,700	CCF24	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$949,000	$47,500
2	CC	19350311	CASTRO EDILBERTO		0	$0	$0	EPS010	13	$616,850	$77,200	CCF24	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	$43,000	13	$616,850	$31,000
3	CC	1077421956	CORDOBA CARLOS	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$6,000	CCF24	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$47,450	$2,500
4	CC	1001278397	GONZALEZ EDGAR	230201	11	$521,950	$83,600	EPS002	11	$521,950	$65,300	CCF24	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$521,950	$26,200
5	CC	78708671	GUZMAN RAMON	230301	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$11,900	CCF24	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$94,900	$4,800
6	CC	19303455	MORENO JOSE		0	$0	$0	EPS017	13	$616,850	$77,200	CCF24	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	$43,000	13	$616,850	$31,000
7	CC	19489506	MORENO JUAN		0	$0	$0	EPS008	13	$616,850	$77,200	CCF24	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	$43,000	13	$616,850	$31,000
8	CC	1022967834	MURCIA EYDER	230301	20	$949,000	$151,900	EPS002	20	$949,000	$118,700	CCF24	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$949,000	$47,500
9	CC	1001187352	ORTIGOZA CRISTIAN	231001	21	$996,450	$159,500	EPS017	21	$996,450	$124,600	CCF24	21	$996,450	$39,900	14-11	21	$996,450	$69,400	21	$996,450	$49,900
10	CC	1023043839	PARRA JEFER	230201	5	$237,250	$38,000	EPS005	5	$237,250	$29,700	CCF24	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$237,250	$12,000
11	CC	1001061776	PATIÑO DAVID	230301	23	$1,091,350	$174,700	EPS005	23	$1,091,350	$136,500	CCF24	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$1,091,350	$54,700
12	CC	1012455621	ROMERO BRAYAN	230301	23	$1,091,350	$174,700	EPS008	23	$1,091,350	$136,500	CCF24	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$1,091,350	$54,700
13	CC	80864962	VALENCIA EMERSON	230301	23	$1,091,350	$174,700	EPS017	23	$1,091,350	$136,500	CCF24	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$1,091,350	$54,700
Total		**Afiliados(13)**				$7,070,050	$1,131,800			$8,920,600	$1,116,000			$8,920,600	$357,200			$8,920,600	$621,700		$8,920,600	$447,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901710851	6	VISION INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 93 BIS NO. 19 50 OF 105	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5872589	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2024541608	9496687302	E	2025/12/12	2025/12/22	NEQUI	10	$3,698,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,131,800	$7,300	$0	$1,139,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$159,500	$1,100	$0	$160,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$698,800	$4,400	$0	$703,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$273,500	$1,800	$0	$275,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$621,700	$4,000	$0	$625,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$621,700	$4,000	$0	$625,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$357,200	$2,300	$0	$359,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	13	$357,200	$2,300	$0	$359,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$1,116,000	$7,300	$0	$1,123,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$213,700	$1,400	$0	$215,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$195,900	$1,300	$0	$197,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$350,200	$2,300	$0	$352,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$190,000	$1,200	$0	$191,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$166,200	$1,100	$0	$167,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$268,400	$1,700	$0	$270,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	13	$268,400	$1,700	$0	$270,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$179,100	$1,200	$0	$180,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	13	$179,100	$1,200	$0	$180,300
TOTAL				**13**	**$3,674,200**	**$23,800**	**$0**	**$3,698,000**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901710851	6	VISION INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 93 BIS NO. 19 50 OF 105	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5872589	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (6 Afiliados)						$6,548,100	$1,047,900			$7,971,600	$996,800			$7,971,600	$319,200			$7,971,600	$555,000		$7,971,600	$399,300
Centro de Trabajo: Principal (6 Afiliados)						$6,548,100	$1,047,900			$7,971,600	$996,800			$7,971,600	$319,200			$7,971,600	$555,000		$7,971,600	$399,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)						$6,548,100	$1,047,900			$7,971,600	$996,800			$7,971,600	$319,200			$7,971,600	$555,000		$7,971,600	$399,300
1	CC	38235389	DIAZ CABEZAS ASTRID		0	$0	$0	EPS017	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
2	CC	8191657	DIAZ HERNANDO	230301	18	$854,100	$136,700	EPS037	18	$854,100	$106,800	CCF24	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	$59,500	18	$854,100	$42,800
3	CC	1007384456	DIAZ MONCALEANO JEISSON ANDRES	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
4	CC	1022936918	PEREZ FAJARDO WILFREDO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
5	CC	1024477227	ROMERO SIERRA MARTIN SANTIAGO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
6	CC	1022966762	SARMIENTO RODRIGUEZ BRANDON STIVEN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
Total Afiliados(6)						$6,548,100	$1,047,900			$7,971,600	$996,800			$7,971,600	$319,200			$7,971,600	$555,000		$7,971,600	$399,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1997336712	9495362554	E	2025/12/12	2025/12/10	BANCOLOMBIA	0	$3,318,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,047,900	$0	$0	$1,047,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$592,300	$0	$0	$592,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$555,000	$0	$0	$555,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$555,000	$0	$0	$555,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$319,200	$0	$0	$319,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$319,200	$0	$0	$319,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$996,800	$0	$0	$996,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$284,800	$0	$0	$284,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$534,000	$0	$0	$534,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$239,700	$0	$0	$239,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$239,700	$0	$0	$239,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$159,600	$0	$0	$159,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$159,600	$0	$0	$159,600
TOTAL				6	$3,318,200	$0	$0	$3,318,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901710851	6	VISION INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 93 BIS NO. 19 50 OF 105	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5872589	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2024541608	9496687302	E	2025/12/12	2025/12/22	NEQUI	10	$3,698,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (13 Afiliados)					$7,070,050	$1,131,800			$8,920,600	$1,116,000			$8,920,600	$357,200			$8,920,600	$621,700		$8,920,600	$447,500
Centro de Trabajo: Principal (13 Afiliados)					$7,070,050	$1,131,800			$8,920,600	$1,116,000			$8,920,600	$357,200			$8,920,600	$621,700		$8,920,600	$447,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)					$7,070,050	$1,131,800			$8,920,600	$1,116,000			$8,920,600	$357,200			$8,920,600	$621,700		$8,920,600	$447,500
1	CC	13761593	CASTILLO MARIO	230201	20	$949,000	$151,900	EPS010	20	$949,000	$118,700	CCF24	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$949,000	$47,500
2	CC	19350311	CASTRO EDILBERTO		0	$0	$0	EPS010	13	$616,850	$77,200	CCF24	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	$43,000	13	$616,850	$31,000
3	CC	1077421956	CORDOBA CARLOS	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$6,000	CCF24	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$47,450	$2,500
4	CC	1001278397	GONZALEZ EDGAR	230201	11	$521,950	$83,600	EPS002	11	$521,950	$65,300	CCF24	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$521,950	$26,200
5	CC	78708671	GUZMAN RAMON	230301	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$11,900	CCF24	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$6,700	2	$94,900	$4,800
6	CC	19303455	MORENO JOSE		0	$0	$0	EPS017	13	$616,850	$77,200	CCF24	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	$43,000	13	$616,850	$31,000
7	CC	19489506	MORENO JUAN		0	$0	$0	EPS008	13	$616,850	$77,200	CCF24	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	$43,000	13	$616,850	$31,000
8	CC	1022967834	MURCIA EYDER	230301	20	$949,000	$151,900	EPS002	20	$949,000	$118,700	CCF24	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$949,000	$47,500
9	CC	1001187352	ORTIGOZA CRISTIAN	231001	21	$996,450	$159,500	EPS017	21	$996,450	$124,600	CCF24	21	$996,450	$39,900	14-11	21	$996,450	$69,400	21	$996,450	$49,900
10	CC	1023043839	PARRA JEFER	230201	5	$237,250	$38,000	EPS005	5	$237,250	$29,700	CCF24	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	$16,600	5	$237,250	$12,000
11	CC	1001061776	PATIÑO DAVID	230301	23	$1,091,350	$174,700	EPS005	23	$1,091,350	$136,500	CCF24	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$1,091,350	$54,700
12	CC	1012455621	ROMERO BRAYAN	230301	23	$1,091,350	$174,700	EPS008	23	$1,091,350	$136,500	CCF24	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$1,091,350	$54,700
13	CC	80864962	VALENCIA EMERSON	230301	23	$1,091,350	$174,700	EPS017	23	$1,091,350	$136,500	CCF24	23	$1,091,350	$43,700	14-11	23	$1,091,350	$76,000	23	$1,091,350	$54,700
Total		**Afiliados(13)**				$7,070,050	$1,131,800			$8,920,600	$1,116,000			$8,920,600	$357,200			$8,920,600	$621,700		$8,920,600	$447,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901710851	6	VISION INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 93 BIS NO. 19 50 OF 105	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5872589	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2024541608	9496687302	E	2025/12/12	2025/12/22	NEQUI	10	$3,698,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,131,800	$7,300	$0	$1,139,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$159,500	$1,100	$0	$160,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$698,800	$4,400	$0	$703,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$273,500	$1,800	$0	$275,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$621,700	$4,000	$0	$625,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$621,700	$4,000	$0	$625,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$357,200	$2,300	$0	$359,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	13	$357,200	$2,300	$0	$359,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$1,116,000	$7,300	$0	$1,123,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$213,700	$1,400	$0	$215,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$195,900	$1,300	$0	$197,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$350,200	$2,300	$0	$352,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$190,000	$1,200	$0	$191,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$166,200	$1,100	$0	$167,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$268,400	$1,700	$0	$270,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	13	$268,400	$1,700	$0	$270,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$179,100	$1,200	$0	$180,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	13	$179,100	$1,200	$0	$180,300
TOTAL				**13**	**$3,674,200**	**$23,800**	**$0**	**$3,698,000**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901710851	6	VISION INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 93 BIS NO. 19 50 OF 105	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5872589	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2083810320	9497839437	Y	2026/01/15	2026/01/15	BANCOLOMBIA	0	$125,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,800,000	$125,300		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,800,000	$125,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,800,000	$125,300		$0	$0
1	CC	1054709498 TORRES JESUS		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,800,000	$125,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,800,000	$125,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901710851	6	VISION INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 93 BIS NO. 19 50 OF 105	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5872589	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2083810320	9497839437	Y	2026/01/15	2026/01/15	BANCOLOMBIA	0	$125,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,300	$0	$0	$125,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$125,300	$0	$0	$125,300
TOTAL				1	$125,300	$0	$0	$125,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901710851	6	VISION INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 93 BIS NO. 19 50 OF 105	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5872589	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2083778683	9497925180	E	2026/01/15	2026/01/15	BANCOLOMBIA	0	$12,069,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (22 Afiliados)						$23,487,750	$3,758,800			$29,181,750	$3,649,000			$29,181,750	$1,168,500			$29,181,750	$2,031,700		$29,181,750	$1,461,600
Centro de Trabajo: Principal (22 Afiliados)						$23,487,750	$3,758,800			$29,181,750	$3,649,000			$29,181,750	$1,168,500			$29,181,750	$2,031,700		$29,181,750	$1,461,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (22 Afiliados)						$23,487,750	$3,758,800			$29,181,750	$3,649,000			$29,181,750	$1,168,500			$29,181,750	$2,031,700		$29,181,750	$1,461,600
1	CC	1000348098	ARIAS DUBAN	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS017	29	$1,376,050	$172,100	CCF24	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$95,800	29	$1,376,050	$68,900
2	CC	1111743190	CAICEDO ARLEY	230301	19	$901,550	$144,300	EPS037	19	$901,550	$112,700	CCF24	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$901,550	$45,200
3	CC	13761593	CASTILLO MARIO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
4	CC	19350311	CASTRO EDILBERTO		0	$0	$0	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
5	CC	1013635829	CONTRERAS LEYDI	230201	20	$949,000	$151,900	EPS017	20	$949,000	$118,700	CCF24	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$949,000	$47,500
6	CC	38235389	DIAZ ASTRID		0	$0	$0	EPS017	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
7	CC	1007384456	DIAZ JEISSON	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
8	CC	1140916392	GOMEZ SEBASTIAN	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS017	28	$1,328,600	$166,100	CCF24	28	$1,328,600	$53,200	14-11	28	$1,328,600	$92,500	28	$1,328,600	$66,500
9	CC	1001278397	GONZALEZ EDGAR	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
10	CC	19303455	MORENO JOSE		0	$0	$0	EPS017	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
11	CC	19489506	MORENO JUAN		0	$0	$0	EPS008	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
12	CC	1022967834	MURCIA EYDER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
13	CC	1023030944	OTALORA BRAYAN	230301	20	$949,000	$151,900	EPS010	20	$949,000	$118,700	CCF24	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$949,000	$47,500
14	CC	1023043839	PARRA JEFER	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
15	CC	1001061776	PATIÑO DAVID	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
16	CC	80741555	PEREZ OLIMPO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
17	CC	1022936918	PEREZ WILFREDO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
18	CC	1012455621	ROMERO BRAYAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
19	CC	1024477227	ROMERO MARTIN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
20	CC	73592066	SALAS DAYBER	230201	19	$901,550	$144,300	EPS017	19	$901,550	$112,700	CCF24	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$901,550	$45,200
21	CC	1022966762	SARMIENTO BRANDON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
22	CC	80864962	VALENCIA EMERSON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
Total			**Afiliados(22)**			$23,487,750	$3,758,800			$29,181,750	$3,649,000			$29,181,750	$1,168,500			$29,181,750	$2,031,700		$29,181,750	$1,461,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901710851	6	VISION INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 93 BIS NO. 19 50 OF 105	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5872589	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2083778683	9497925180	E	2026/01/15	2026/01/15	BANCOLOMBIA	0	$12,069,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$3,758,800	$0	$0	$3,758,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,095,800	$0	$0	$2,095,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,435,200	$0	$0	$1,435,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$2,031,700	$0	$0	$2,031,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	$2,031,700	$0	$0	$2,031,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,168,500	$0	$0	$1,168,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	22	$1,168,500	$0	$0	$1,168,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				22	$3,649,000	$0	$0	$3,649,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$356,000	$0	$0	$356,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$474,700	$0	$0	$474,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$1,103,600	$0	$0	$1,103,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$290,700	$0	$0	$290,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$1,068,000	$0	$0	$1,068,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$356,000	$0	$0	$356,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$877,200	$0	$0	$877,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	22	$877,200	$0	$0	$877,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$584,400	$0	$0	$584,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	22	$584,400	$0	$0	$584,400
TOTAL				22	$12,069,600	$0	$0	$12,069,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901710851	6	VISION INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 93 BIS NO. 19 50 OF 105	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5872589	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2083778683	9497925180	E	2026/01/15	2026/01/15	BANCOLOMBIA	0	$12,069,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (22 Afiliados)						$23,487,750	$3,758,800			$29,181,750	$3,649,000			$29,181,750	$1,168,500			$29,181,750	$2,031,700		$29,181,750	$1,461,600
Centro de Trabajo: Principal (22 Afiliados)						$23,487,750	$3,758,800			$29,181,750	$3,649,000			$29,181,750	$1,168,500			$29,181,750	$2,031,700		$29,181,750	$1,461,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (22 Afiliados)						$23,487,750	$3,758,800			$29,181,750	$3,649,000			$29,181,750	$1,168,500			$29,181,750	$2,031,700		$29,181,750	$1,461,600
1	CC	1000348098	ARIAS DUBAN	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS017	29	$1,376,050	$172,100	CCF24	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$95,800	29	$1,376,050	$68,900
2	CC	1111743190	CAICEDO ARLEY	230301	19	$901,550	$144,300	EPS037	19	$901,550	$112,700	CCF24	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$901,550	$45,200
3	CC	13761593	CASTILLO MARIO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
4	CC	19350311	CASTRO EDILBERTO		0	$0	$0	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
5	CC	1013635829	CONTRERAS LEYDI	230201	20	$949,000	$151,900	EPS017	20	$949,000	$118,700	CCF24	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$949,000	$47,500
6	CC	38235389	DIAZ ASTRID		0	$0	$0	EPS017	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
7	CC	1007384456	DIAZ JEISSON	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
8	CC	1140916392	GOMEZ SEBASTIAN	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS017	28	$1,328,600	$166,100	CCF24	28	$1,328,600	$53,200	14-11	28	$1,328,600	$92,500	28	$1,328,600	$66,500
9	CC	1001278397	GONZALEZ EDGAR	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
10	CC	19303455	MORENO JOSE		0	$0	$0	EPS017	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
11	CC	19489506	MORENO JUAN		0	$0	$0	EPS008	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
12	CC	1022967834	MURCIA EYDER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
13	CC	1023030944	OTALORA BRAYAN	230301	20	$949,000	$151,900	EPS010	20	$949,000	$118,700	CCF24	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$949,000	$47,500
14	CC	1023043839	PARRA JEFER	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
15	CC	1001061776	PATIÑO DAVID	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
16	CC	80741555	PEREZ OLIMPO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
17	CC	1022936918	PEREZ WILFREDO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
18	CC	1012455621	ROMERO BRAYAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
19	CC	1024477227	ROMERO MARTIN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
20	CC	73592066	SALAS DAYBER	230201	19	$901,550	$144,300	EPS017	19	$901,550	$112,700	CCF24	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$901,550	$45,200
21	CC	1022966762	SARMIENTO BRANDON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
22	CC	80864962	VALENCIA EMERSON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
Total			**Afiliados(22)**			$23,487,750	$3,758,800			$29,181,750	$3,649,000			$29,181,750	$1,168,500			$29,181,750	$2,031,700		$29,181,750	$1,461,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901710851	6	VISION INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 93 BIS NO. 19 50 OF 105	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5872589	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2083778683	9497925180	E	2026/01/15	2026/01/15	BANCOLOMBIA	0	$12,069,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$3,758,800	$0	$0	$3,758,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,095,800	$0	$0	$2,095,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,435,200	$0	$0	$1,435,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$2,031,700	$0	$0	$2,031,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	$2,031,700	$0	$0	$2,031,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,168,500	$0	$0	$1,168,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	22	$1,168,500	$0	$0	$1,168,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				22	$3,649,000	$0	$0	$3,649,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$356,000	$0	$0	$356,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$474,700	$0	$0	$474,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$1,103,600	$0	$0	$1,103,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$290,700	$0	$0	$290,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$1,068,000	$0	$0	$1,068,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$356,000	$0	$0	$356,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$877,200	$0	$0	$877,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	22	$877,200	$0	$0	$877,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$584,400	$0	$0	$584,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	22	$584,400	$0	$0	$584,400
TOTAL				**22**	**$12,069,600**	**$0**	**$0**	**$12,069,600**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901710851	6	VISION INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 93 BIS NO. 19 50 OF 105	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5872589	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2083778683	9497925180	E	2026/01/15	2026/01/15	BANCOLOMBIA	0	$12,069,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (22 Afiliados)						$23,487,750	$3,758,800			$29,181,750	$3,649,000			$29,181,750	$1,168,500			$29,181,750	$2,031,700		$29,181,750	$1,461,600
Centro de Trabajo: Principal (22 Afiliados)						$23,487,750	$3,758,800			$29,181,750	$3,649,000			$29,181,750	$1,168,500			$29,181,750	$2,031,700		$29,181,750	$1,461,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (22 Afiliados)						$23,487,750	$3,758,800			$29,181,750	$3,649,000			$29,181,750	$1,168,500			$29,181,750	$2,031,700		$29,181,750	$1,461,600
1	CC	1000348098	ARIAS DUBAN	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS017	29	$1,376,050	$172,100	CCF24	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$95,800	29	$1,376,050	$68,900
2	CC	1111743190	CAICEDO ARLEY	230301	19	$901,550	$144,300	EPS037	19	$901,550	$112,700	CCF24	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$901,550	$45,200
3	CC	13761593	CASTILLO MARIO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
4	CC	19350311	CASTRO EDILBERTO		0	$0	$0	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
5	CC	1013635829	CONTRERAS LEYDI	230201	20	$949,000	$151,900	EPS017	20	$949,000	$118,700	CCF24	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$949,000	$47,500
6	CC	38235389	DIAZ ASTRID		0	$0	$0	EPS017	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
7	CC	1007384456	DIAZ JEISSON	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
8	CC	1140916392	GOMEZ SEBASTIAN	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS017	28	$1,328,600	$166,100	CCF24	28	$1,328,600	$53,200	14-11	28	$1,328,600	$92,500	28	$1,328,600	$66,500
9	CC	1001278397	GONZALEZ EDGAR	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
10	CC	19303455	MORENO JOSE		0	$0	$0	EPS017	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
11	CC	19489506	MORENO JUAN		0	$0	$0	EPS008	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
12	CC	1022967834	MURCIA EYDER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
13	CC	1023030944	OTALORA BRAYAN	230301	20	$949,000	$151,900	EPS010	20	$949,000	$118,700	CCF24	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$949,000	$47,500
14	CC	1023043839	PARRA JEFER	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
15	CC	1001061776	PATIÑO DAVID	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
16	CC	80741555	PEREZ OLIMPO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
17	CC	1022936918	PEREZ WILFREDO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
18	CC	1012455621	ROMERO BRAYAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
19	CC	1024477227	ROMERO MARTIN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
20	CC	73592066	SALAS DAYBER	230201	19	$901,550	$144,300	EPS017	19	$901,550	$112,700	CCF24	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$62,800	19	$901,550	$45,200
21	CC	1022966762	SARMIENTO BRANDON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
22	CC	80864962	VALENCIA EMERSON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
Total			**Afiliados(22)**			$23,487,750	$3,758,800			$29,181,750	$3,649,000			$29,181,750	$1,168,500			$29,181,750	$2,031,700		$29,181,750	$1,461,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901710851	6	VISION INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 93 BIS NO. 19 50 OF 105	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5872589	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2083778683	9497925180	E	2026/01/15	2026/01/15	BANCOLOMBIA	0	$12,069,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$3,758,800	$0	$0	$3,758,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,095,800	$0	$0	$2,095,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,435,200	$0	$0	$1,435,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$2,031,700	$0	$0	$2,031,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	$2,031,700	$0	$0	$2,031,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,168,500	$0	$0	$1,168,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	22	$1,168,500	$0	$0	$1,168,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				22	$3,649,000	$0	$0	$3,649,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$356,000	$0	$0	$356,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$474,700	$0	$0	$474,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$1,103,600	$0	$0	$1,103,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$290,700	$0	$0	$290,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$1,068,000	$0	$0	$1,068,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$356,000	$0	$0	$356,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$877,200	$0	$0	$877,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	22	$877,200	$0	$0	$877,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$584,400	$0	$0	$584,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	22	$584,400	$0	$0	$584,400
TOTAL				**22**	**$12,069,600**	**$0**	**$0**	**$12,069,600**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901710851	6	VISION INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 93 BIS NO. 19 50 OF 105	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5872589	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	73165385	9499836110	E	2026/02/12	2026/02/18	BANCOLOMBIA	6	$14,564,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (26 Afiliados)						$28,131,212	$4,502,000			$35,134,832	$4,392,900			$35,134,832	$1,406,900			$35,134,832	$2,446,600		$35,134,832	$1,760,300
Centro de Trabajo: Principal (26 Afiliados)						$28,131,212	$4,502,000			$35,134,832	$4,392,900			$35,134,832	$1,406,900			$35,134,832	$2,446,600		$35,134,832	$1,760,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (26 Afiliados)						$28,131,212	$4,502,000			$35,134,832	$4,392,900			$35,134,832	$1,406,900			$35,134,832	$2,446,600		$35,134,832	$1,760,300
1	CC	1000348098	ARIAS DUBAN	230301	15	$875,453	$140,100	EPS017	15	$875,453	$109,500	CCF24	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	$61,000	15	$875,453	$43,900
2	CC	1016593870	AVELLANEDA LUIS	25-14	11	$641,999	$102,800	EPS002	11	$641,999	$80,300	CCF24	11	$641,999	$25,700	14-11	11	$641,999	$44,700	11	$641,999	$32,200
3	CC	1143381601	BERNAL RANDY	231001	11	$641,999	$102,800	EPS017	11	$641,999	$80,300	CCF24	11	$641,999	$25,700	14-11	11	$641,999	$44,700	11	$641,999	$32,200
4	CC	1111743190	CAICEDO ARLEY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
5	CC	13761593	CASTILLO MARIO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
6	CC	19350311	CASTRO EDILBERTO		0	$0	$0	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
7	CC	1013635829	CONTRERAS LEYDI	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
8	CC	38235389	DIAZ ASTRID		0	$0	$0	EPS017	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
9	CC	1007384456	DIAZ JEISSON	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
10	CC	1140916392	GOMEZ SEBASTIAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
11	CC	1001278397	GONZALEZ EDGAR	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
12	CC	79699076	GUERRERO HECTOR	25-14	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$14,600	CCF24	2	$116,727	$4,700	14-11	2	$116,727	$8,200	2	$116,727	$6,000
13	CC	1193134231	GUILLEN ANGEL	231001	23	$1,342,361	$214,800	EPS037	23	$1,342,361	$167,800	CCF24	23	$1,342,361	$53,700	14-11	23	$1,342,361	$93,500	23	$1,342,361	$67,200
14	CC	19303455	MORENO JOSE		0	$0	$0	EPS017	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
15	CC	19489506	MORENO JUAN		0	$0	$0	EPS008	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
16	CC	1022967834	MURCIA EYDER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
17	CC	1023030944	OTALORA BRAYAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
18	CC	1023043839	PARRA JEFER	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
19	CC	1001061776	PATIÑO DAVID	230301	15	$875,453	$140,100	EPS005	15	$875,453	$109,500	CCF24	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	$61,000	15	$875,453	$43,900
20	CC	80741555	PEREZ OLIMPO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
21	CC	1022936918	PEREZ WILFREDO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
22	CC	1012455621	ROMERO BRAYAN	230301	15	$875,453	$140,100	EPS008	15	$875,453	$109,500	CCF24	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	$61,000	15	$875,453	$43,900
23	CC	1024477227	ROMERO MARTIN	230301	5	$291,818	$46,700	EPS002	5	$291,818	$36,500	CCF24	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	$20,400	5	$291,818	$14,700
24	CC	73592066	SALAS DAYBER	230201	13	$758,726	$121,400	EPS017	13	$758,726	$94,900	CCF24	13	$758,726	$30,400	14-11	13	$758,726	$52,900	13	$758,726	$38,000
25	CC	1022966762	SARMIENTO BRANDON	230301	15	$875,453	$140,100	EPS037	15	$875,453	$109,500	CCF24	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	$61,000	15	$875,453	$43,900
26	CC	80864962	VALENCIA EMERSON	230301	27	$1,575,815	$252,200	EPS017	27	$1,575,815	$197,000	CCF24	27	$1,575,815	$63,100	14-11	27	$1,575,815	$109,700	27	$1,575,815	$78,900
Total			**Afiliados(26)**			$28,131,212	$4,502,000			$35,134,832	$4,392,900			$35,134,832	$1,406,900			$35,134,832	$2,446,600		$35,134,832	$1,760,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901710851	6	VISION INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 93 BIS NO. 19 50 OF 105	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5872589	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	73165385	9499836110	E	2026/02/12	2026/02/18	BANCOLOMBIA	6	$14,564,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$4,502,000	$17,400	$0	$4,519,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$317,600	$1,300	$0	$318,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$401,700	$1,600	$0	$403,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$1,980,100	$7,600	$0	$1,987,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,802,600	$6,900	$0	$1,809,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$2,446,600	$9,400	$0	$2,456,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	26	$2,446,600	$9,400	$0	$2,456,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,406,900	$5,400	$0	$1,412,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	26	$1,406,900	$5,400	$0	$1,412,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				26	$4,392,900	$17,000	$0	$4,409,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$328,400	$1,300	$0	$329,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$656,700	$2,600	$0	$659,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$1,357,300	$5,200	$0	$1,362,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$496,200	$1,900	$0	$498,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$1,225,900	$4,700	$0	$1,230,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$328,400	$1,300	$0	$329,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,055,600	$4,100	$0	$1,059,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	26	$1,055,600	$4,100	$0	$1,059,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$704,700	$2,700	$0	$707,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	26	$704,700	$2,700	$0	$707,400
TOTAL				**26**	**$14,508,700**	**$56,000**	**$0**	**$14,564,700**

IBP INGENIERIA S.A.S

Bogotá D.C, 13 de abril de 2025

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

REFERENCIA: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL EDIFICIO CAPILLA CONVENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL"

En cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades establecidas en el contrato de referencia, esta interventoría llevó a cabo la revisión correspondiente al corte de obra No.2 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, de acuerdo con los lineamientos definidos en el contrato de obra numeral ***27.4 Procedimiento para la Suscripción de Actas Parciales de Obra*** y anexo técnico numeral ***5.1.1 Requisitos adicionales para los pagos.*** Por consiguiente, emitimos el presente certificado de cumplimiento a las especificaciones técnicas y demás obligaciones establecidas en el contrato de obra, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones.

1. Que las cantidades aquí cobradas se ejecutaron acorde con las especificaciones técnicas del proyecto y están debidamente soportadas con sus memorias de cálculo desde el modelado BIM.

2. Que ninguna cantidad o valor aquí cobrado, supera la cantidad o el valor estipulado en el balance de mayores y menores cantidades ajustado para este corte de obra.

3. Que se aporta toda la documentación requerida según lo señalado en la cláusula 27.4 del contrato de obra y numeral 5.1.1 del anexo técnico como se relaciona a continuación.

ACTA DE PAGO	REQUISITOS CLAUSALA 27.4 CONTRATO DE OBRA	REQUISITOS ADICIONLES ANEXO TECNICO NUMERAL 5.1.1	OTROS
2	• Factura • Informe del avance de actividades ejecutadas. • Cumplimiento de especificaciones técnicas aprobadas por interventoría • Memorias gráficas de Cantidades de Obra ejecutadas y aprobadas • Porcentaje de actividades ejecutadas y porcentaje por ejecutar del mes correspondiente • Certificación de cumplimiento por parte del interventor de las demás obligaciones establecidas en el contrato	•El Contratista acreditará a la Interventoría y al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.	• REGISTRO SECOP

De acuerdo con lo anterior, esta interventoría considera procedente realizar el pago de las actividades consignadas en el acta parcial de avance de obra No. 1 del contrato de obra 4346 de 2024 por la suma de ($ 447.971.690,77) CUATROCIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE, que corresponde al 6,39% sobre el valor total del contrato, como se detalla a continuación.

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (sumatoria valor total de los item)		$ 677.052.111,00
IPC MES - DICIEMBRE 2025		152,27
IPC DIC 2024		144,88
COSTO DIRECTO - CD (95% del sub total costos directos)		$ 676.007.653,00
ADMINISTRACIÓN	32%	$ 216.322.449,00
IMPREVISTOS	1%	$ 6.760.077,00
UTILIDAD	5%	$ 33.800.383,00
IVA UTILIDAD	19%	$ 6.422.072,77
VALOR DE LA RETRIBUCIÓN - VR		$ 939.312.634,77
VALOR PARA AJUSTES IPC 2025		$ 45.586.920,00
VALOR PARA AJUSTES IPC 2026		
ANA -VALOR DEL ANTICIPO A LA FECHA DE CORTE		$ 6.659.751.474,00
RP - VALOR RETRIBUCIÓN PENDIENTE POR CANCELAR PRESENTE ACTA		$ 13.381.079.206,00
VALOR DE LA AMORTIZACIÓN - VAA - AM		$ 491.340.944,00
VALOR EFECTIVO A PAGAR - VP EN LA PRESENTE ACTA		$ 447.971.690,77

Así mismo, se ha verificado por parte de la interventoría, que el CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL cumplió con el pago de sus obligaciones correspondientes al sistema de seguridad social integral (salud y pensión) y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, y demás normatividad aplicable vigente.

Nota: La Retribución del Contratista corresponderá a la sumatoria de los valores que se consignen en las Actas Parciales de Obra y en el Acta de Terminación y Recibo Final de Obra, las cuales serán calculadas conforme se establece en el numeral 11.2 del contrato de obra

La documentación completa del corte de obra No.2 se localiza en:

https://web.connect.trimble.com/projects/PRcL02Cdcs0/data/folder/5fppS8DnCvQ

Cordialmente,

YOHAN FAIR BERMUDEZ PARRA
Director de Interventoría
IBP INGENIERÍA SAS

Proceso de Contratación MC-LP-004-2024

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
Calle 9 No. 8 - 31
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Proceso de Contratación **MC-LP-004-2024** en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto:
""*Realizar las obras de intervención integral de varios inmuebles que hacen parte del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, de acuerdo con lo establecido para cada Grupo*"

Lote(s): 1,2,3,4,5,6,7

Grupo	Presento oferta
Grupo 1: Edificio Salud Mental	SI
Grupo 2: Edificio San Roque	SI
Grupo 3: Edificio Jardín Infantil	SI
Grupo 4: Edificio Cundifarma	SI
Grupo 5: Edificio Inmunológico	SI
Grupo 6: Edificio Capilla – Convento	SI
Grupo 7: Edificio San Jorge	SI

Estimados señores:

Los suscritos, ASTRID DIAZ CABEZAS, CARMELO ESPINOSA GUTIERREZ, ROMERO SANDOVAL LUIS FERNANDO y YESICA PAOLA OCAMPO AFANADOR debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AR SAS, BYGGA INFRAESTRUCTURA S.E, EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS y OHM INVERSIONES SAS, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está conformado por los siguientes integrantes:

Nombre del integrante	Compromiso (%)	NIT
BYGGA INFRAESTRUCTURA S.E	10%	901.206.662-1
PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AR SAS	40%	802.009.210-0
EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS	40%	901.347.937-4
OHM INVERSIONES SAS	10%	900.969.692-0

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina Consorcio Alianza Patrimonial.

3. El objeto del Consorcio es: Realizar las obras de intervención integral de varios inmuebles que hacen parte del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, de acuerdo con lo establecido para cada Grupo.

4. La duración del Consorcio es igual a la duración del contrato y dos años más.
5. El representante del Consorcio es ASTRID DIAZ CABEZAS, identificado con la C. C. 38.235.389 de Ibagué, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
6. El representante suplente del Consorcio es RAFAEL ANDRES CAMACHO NAVARRO, identificado con la C. C. 7.184.740 de Tunja, y ROMERO SANDOVAL LUIS FERNANDO, identificado con la C.C 93.123.714, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

   El representante legal suplente reemplazará al representante legal en sus faltas absolutas, temporales o accidentales.
7. El señor[a] ASTRID DIAZ CABEZAS acepta su nombramiento como representante legal del Consorcio Alianza Patrimonial.
8. El domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo	Calle 93B # 12-28, oficina 307
Dirección electrónica	licitaciones.picar1@gmail.com
Teléfono	3014882837
Telefax	
Ciudad	Bogotá D.C

En constancia, se firma en Bogotá D.C, a los 10 días del mes de noviembre de 2024.

BYGGA INFRAESTRUCTURA S.E
NIT. 901.206.662-1
CARMELO ESPINOSA GUTIERREZ
Representante Legal

PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUC
A.R. S.A.S.
NIT. 802.009.210-0
ASTRID DIAZ CABEZAS
C.C. 38.235.389
Representante Legal

EMPRESAS GRUPO ROMERO SAS
NIT. **901347937-4**
ROMERO SANDOVAL LUIS FERNANDO
Representante Legal

OHM INVERSIONES SAS
NIT. 900.969.692-0
YESICA PAOLA OCAMPO AFANADOR
C.C. 38.602.221
Representante legal

Aceptación del **CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL**

ASTRID DIAZ CABEZAS
Representante Legal
CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL

ROMERO SANDOVAL LUIS FERNANDO
Representante Legal Suplente
CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL

RAFAEL ANDRES CAMACHO NAVARRO
C.C. 7.184.740
Representante Legal Suplente
CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL

Banco de Bogotá


EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL identificado(a) con NITPJ 9018998833 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 008638330 desde el 26 de diciembre de 2024, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 12 de marzo de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
NIT. 901.899.883-3

CONTRATO DE OBRA 4346-2024
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo; **LUDIVIA RODRIGUEZ CUBILLOS**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.322.089 de Bogotá en mi calidad de Contadora, manifiesto bajo la gravedad del Juramento que el **CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL**, identificado con NIT 901.899.883-3, hasta la presente fecha ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, A.R.P., pensiones, obligaciones parafiscales en relación con sus empleados, y a la fecha se encuentra a paz y salvo.

Atentamente,

LUDIVIA RODRIGUEZ CUBILLOS
C. C. No. 52.322.089 de Bogotá
T.P. 111129-T
Calidad: Contadora

ASTRID DIAZ CABEZAS
Representante Legal
Consorcio Alianza Patrimonial

Bogotá D.C. 29 de abril de 2026

Certificado No:

B70A1E2F78A31625

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUDIVIA RODRIGUEZ CUBILLOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52322089 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 111129-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
38.235.389
NUMERO
DIAZ CABEZAS
APELLIDOS
ASTRID
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO
14-OCT-1956
IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.50
ESTATURA
B+
G.S. RH
F
SEXO
10-MAY-1977 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-1500103-42129121-F-0038235389-20050401
02809 05091A 02 154722024

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.322.089**

RODRIGUEZ CUBILLOS

APELLIDOS

LUDIVIA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-MAR-1976**

PLANADAS
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-ABR-1994 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00179915-F-0052322089-20090920 **00163**29336A 2 1290023179

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141209541428

(415)7707212489984(8020) **000014120954142 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 8 8 3	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 93 B # 12 - 28 OF 307

42. Correo electrónico consorcioalianzapatrimonial@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 9 6 0 8 8 4 3 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 1 2 1 7							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DIAZ CABEZAS ASTRID

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141209541428

(415)7707212489984(8020) **000014120954142 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 8 8 3	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 1 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 1 1 1 0	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141209541428

(415)7707212489984(8020) **000014120954142 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 8 8 3	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 1 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 8 2 3 5 3 8 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DIAZ	CABEZAS	ASTRID	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 1 1 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 1 8 4 7 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CAMACHO	NAVARRO	RAFAEL	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 1 1 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 3 1 2 3 7 1 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROMERO	SANDOVAL	LUIS	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141209541428

(415)7707212489984(8020) **000014120954142 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 8 8 3	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 2 0 6 6 6 2	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: BYGGA INFRAESTRUCTURA (SUCURSAL EXTRANJERA)

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 4 1 1 1 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 2 0 0 9 2 1 0	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: PROYECTOS DE INGENERIA Y CONSTRUCCIONES A.R. SAS.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 4 1 1 1 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 3 4 7 9 3 7	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 4 1 1 1 0	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 9 6 9 6 9 2	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: OHM INVERSIONES S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 4 1 1 1 0	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141209541428

(415)7707212489984(8020) **000014120954142 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 8 8 3	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 4 5 5 9 8 4 5	4	3 3 5 9 1 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
DEVIA	OJEDA	LUIS	FERNANDO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 3 0 3

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

11129-T



LUDIVIA
RODRIGUEZ CUBILLOS
C.C. 52322089
RESOLUCION INSCRIPCION 067 FECHA 2005/05/26
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. LOS LIBERTADORES

PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 120970

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS CONM. 2922566

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141209541428

(415)7707212489984(8020) **000014120954142 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 8 8 3	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 93 B # 12 - 28 OF 307

42. Correo electrónico consorcioalianzapatrimonial@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 9 6 0 8 8 4 3 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 1 2 1 7							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DIAZ CABEZAS ASTRID

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141209541428

(415)7707212489984(8020) **000014120954142 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 8 8 3	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 1 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 1 1 1 0
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141209541428

(415)7707212489984(8020) **000014120954142 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 8 8 3	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 1 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 8 2 3 5 3 8 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DIAZ	CABEZAS	ASTRID	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 1 1 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 1 8 4 7 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CAMACHO	NAVARRO	RAFAEL	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 1 1 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 3 1 2 3 7 1 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROMERO	SANDOVAL	LUIS	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141209541428

(415)7707212489984(8020) **000014120954142 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 8 8 3	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 2 0 6 6 6 2	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: BYGGA INFRAESTRUCTURA (SUCURSAL EXTRANJERA)

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 4 1 1 1 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 2 0 0 9 2 1 0	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: PROYECTOS DE INGENERIA Y CONSTRUCCIONES A.R. SAS.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 4 1 1 1 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 3 4 7 9 3 7	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 4 1 1 1 0	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 9 6 9 6 9 2	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: OHM INVERSIONES S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 4 1 1 1 0	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141209541428

(415)7707212489984(8020) **000014120954142 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 8 8 3	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 4 5 5 9 8 4 5	4	3 3 5 9 1 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
DEVIA	OJEDA	LUIS	FERNANDO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 3 0 3

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141195729745

(415)7707212489984(8020) 000014119572974 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 0 6 6 6 2	1	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
BYGGA INFRAESTRUCTURA (SUCURSAL EXTRANJERA)

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Sabaneta 6 3 1

41. Dirección principal
CR 43 65 SUR 146 IN 103

42. Correo electrónico contabilidad.bygga@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 4 8 8 2 8 3 7	3 1 8 7 1 1 6 7 8 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 2 2 0 9 0 1	4 3 9 0	2 0 2 2 0 9 0 1		4 1 1 1	4 1 1 2

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ESPINOSA GUTIERREZ CARMELO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141195729745

(415)7707212489984(8020) **000014119572974 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 0 6 6 6 2	1	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	1 0
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	
72. Número	2 3 1 5	
73. Fecha	2 0 1 8 0 8 1 3	
74. Número de notaría	2 0	
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8 0 8 2 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 1 2 4 6 9	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 8 0 8 1 3	
81. Hasta	2 1 1 7 0 8 1 2	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 8 0 9 2 8		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
15155666797-2-2018	PANAMA 5 8 0		

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141195729745

(415)7707212489984(8020) **000014119572974 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 0 6 6 6 2	1	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 0 8 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjerí 2 2	4 5 9 6 0 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ESPINOSA	GUTIERREZ	CARMELO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 4 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 2 1 8 5 4 7 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AHCAR	BETTS	DAVID	ADOLFO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141195729745

(415)7707212489984(8020) **000014119572974 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 0 6 6 6 2	1	Impuestos de Medellín 1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 4 4 5 1 1 0		6 7 5 6 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
TASCON	TASCON	OSCAR	ARMANDO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 1 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 4 5 5 9 8 4 5		3 3 5 9 1 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
DEVIA	OJEDA	LUIS	FERNANDO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 8 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141166488070

(415)7707212489984(8020) 000014116648807 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 4 7 9 3 7	4	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
MZ H 9 B F 8 CA 8 D URB PRADOS DE MAVICURE

42. Correo electrónico valenromero98@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 8 6 8 4 8 3 2 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 1 9 1 1 2 7	4 2 9 0	2 0 1 9 1 1 2 7	7 7 1 0	7 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ROMERO SANDOVAL LUIS FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141166488070

(415)7707212489984(8020) **000014116648807 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 4 7 9 3 7	4	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 9 1 0 1 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 1 2 1 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 3 6 2 3 8 2	
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 1 2 1 1	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 9 1 2 0 2		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141166488070

(415)7707212489984(8020) **000014116648807 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 4 7 9 3 7	4	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 1 2 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 3 1 2 3 7 1 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROMERO	SANDOVAL	LUIS	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141166488070

(415)7707212489984(8020) **000014116648807 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 4 7 9 3 7	4	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 3 1 2 3 9 0 8	9	6 5 3 3 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
RAMIREZ	RAMIREZ	CARLOS	ADOLFO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 1 0 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141127887322

(415)7707212489984(8020) 000014112788732 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 6 9 6 9 2	0	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
OHM INVERSIONES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
CR 3 8 06 ED MONTELIBANO OF 601

42. Correo electrónico facturacion@ohminv.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 5 7 3 3 2 5 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 2 1 0 1 0 1	4 2 2 0	2 0 2 1 0 1 0 1	4 2 9 0 / 9 5 1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	8	5	2	5	5															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre OCAMPO AFANADOR YESICA PAOLA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141127887322

(415)7707212489984(8020) **000014112788732 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 6 9 6 9 2	0	Impuestos de Cartagena 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 6 0 4 2 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 5 1 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 9 3 6 1 1 6 6 1 2	
78. Departamento	1 3	
79. Ciudad/Municipio	9	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 6 0 4 2 1	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141127887322

(415)7707212489984(8020) **000014112788732 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 6 9 6 9 2	0	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 9 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 8 6 0 2 2 2 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
OCAMPO	AFANADOR	YESICA	PAOLA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 1 1 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 1 8 4 7 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CAMACHO	NAVARRO	RAFAEL	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141127887322

(415)7707212489984(8020) **000014112788732 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 6 9 6 9 2	0	Impuestos de Cartagena	6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 8 0 4 4 0 9 5		1 5 0 0 0 1 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
CABARCAS	MANJARREZ	MAIRA	ALEJANDRA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 1 3 0

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141127887322

(415)7707212489984(8020) **000014112788732 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 6 9 6 9 2	0	Impuestos de Cartagena 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Agencia 0 1	Construcción de edificios no residenciales 4 1 1 2

162. Nombre del establecimiento: OHM INVERSIONES SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CR 11 A 89 10

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 3 6 8 7 5 8 9	2 0 2 3 0 6 0 1
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
3 1 0 3 0 7 8 5 3 7	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141126465841

(415)7707212489984(8020) 000014112646584 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 2 0 0 9 2 1 0	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PROYECTOS DE INGENERIA Y CONSTRUCCIONES A.R. SAS.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 93 BIS 19 50 OF 105

42. Correo electrónico contabilidad.picar@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 9 6 0 8 8 4 3 4	6 0 1 4 1 0 2 4 3 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 9 0	1 9 9 9 0 1 2 9	7 1 1 2	2 0 2 1 0 1 2 9		4 2 2 0	7 4 1 0		0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DIAZ CABEZAS ASTRID

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141126465841

(415)7707212489984(8020) **000014112646584 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 2 0 0 9 2 1 0	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	1 2 3	1 3 9 8
73. Fecha	1 9 9 9 0 1 2 9	2 0 0 2 1 1 0 6
74. Número de notaría	4	4
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 9 0 2 2 2	2 0 0 2 1 1 0 6
77. No. Matrícula mercantil	2 7 0 7 9 5	2 7 0 7 9 5
78. Departamento	0 8	0 8
79. Ciudad/Municipio	3	3
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 9 0 1 2 9	2 0 0 2 1 1 0 6
81. Hasta	2 0 1 2 1 0 2 5	2 0 1 2 1 0 2 5

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141126465841

(415)7707212489984(8020) **000014112646584 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 2 0 0 9 2 1 0	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 2 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 8 2 3 5 3 8 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DIAZ	CABEZAS	ASTRID	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141126465841

(415)7707212489984(8020) **000014112646584 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 2 0 0 9 2 1 0	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 8 2 3 5 3 8 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
DIAZ	CABEZAS	ASTRID	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
9,500,000		9 5 2 0 0 2 1 0 0 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141126465841

(415)7707212489984(8020) **000014112646584 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 2 0 0 9 2 1 0	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 3 3 7 3 6 9		2 8 0 0 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
SEGURA	PINZON	GUSTAVO	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 6 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 2 2 8 2 8 0	5	2 8 3 3 8 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
VERGARA	GRANADOS	GUSTAVO	

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 6 0 1

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Cancel | Previous Step | Buyer Evaluation | Next Step

VIEW CONTRACT

Contract Execution

Percentage ItemReception

Reference	Expected Delivery Date	Expected % Execution	Real Delivery Date	Real % Execution	State	
Pago 001	10/06/2025 12:00 PM *(UTC -5 hours)*	46,00	8/04/2025 12:00 PM *(UTC -5 hours)*	46,00	Confirmed	View

Contract Invoice

Registration authorization is needed? Yes No

Payment ID	Invoice Nr	Issue Date	Reception Date	Invoice Total Value	State	
Payment 001	001	10/03/2025 11:05:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	8/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	7.366.385.693 COP	Paid	Detail
Payment 002	FVE 1	2/12/2025 2:29:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	1.351.872.179 COP	SentToBuyer	Detail

Create

Culturas

INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PAGOS

☐ Público ☒ Clasificado ☐ Reservado

Código: F-GFC-096
Versión: 6
Fecha: 31/12/2024

Señores
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Fecha **13 DE MARZO DE 2026**
Ciudad BOGOTÁ D.C,

De acuerdo con lo establecido por el SIIF Nación, en el procedimiento para el *Pago a beneficiario final*, me permito informar que para el pago de las obligaciones a mi favor se realizarán de acuerdo con la certificación adjunta y los siguientes datos:

Entidad bancaria BANCO DE BOGOTA

Número de cuenta bancaria 8638330

Tipo de Cuenta: Ahorros X Corriente ____

Dejó constancia que estos datos son reales y me hago responsable de las consignaciones que se efectúen al número y tipo de cuenta arriba relacionado y me comprometo a actualizar e informar de forma escrita al Supervisor las respectivas novedades oportunamente.

INFORMACION TRIBUTARIA PARA PERSONA NATURAL

Nombre y apellidos:____ No. Documento de Identidad: ____

Usted es residente en Colombia: SI ☐ NO ☐

Si su respuesta es NO indique el país de residencia:____

Dirección principal (Casilla 41 RUT):____ Número de Identificación Tributaria (NIT) + DV Casilla 5 y 6 RUT ____

Código postal 6 digitos (Dirección de residencia):____

Departamento:____

Municipio:____

Nota: La información solicitada es requerida para cargue de información en la pagina de la Dian - Documento soporte no obligados a facturar electrónicamente, el código se puede verificar en la página de 472 código postal con la dirección de residencia que indica el rut en la casilla 41.

INFORMACION PARA PERSONA JURIDICA

No. Identificación: 901.899.883-3 C.C. ☐ NIT ☒ C.E. ☐ PASAPORTE ☐

Tipo de entidad u organización participante	Personas jurídicas del sector público	
	Personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector privado	**X**
	A título colectivo resguardos, cabildos o asociaciones indígenas	
	Personas jurídicas **con ánimo** de lucro del sector privado	
	A título colectivo consejos comunitarios de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras o raizales y autoridades del pueblo Rom	

ICA: Tarifa correspondiente a su actividad económica 8,66 POR MIL.

El objeto del contrato se desarrolla en Bogotá? SI X NO ____

En caso negativo indique en dónde ____ ICA: Tarifa correspondiente a su actividad económica 4390

Nombre Contador(a): LUIS FERNANDO DEVIA OJEDA

Numero de Contacto: 3013170235

Email contabilidad.picar@gmail.com

EN CASO DE SER ENTIDAD PÚBLICA DILIGENCIE:

El código de consolidación y el nombre de la entidad inscrita ante la CGN no aplica para organizaciones privadas.

Código Consolidación CGN ____ *Nombre de la entidad Inscrita ante la CGN ____

Cordialmente,

Firma Contratista o Representante Legal ASTRID DIAZ CABEZAS

Nombre o razón social CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL

No. Documento de identificación: 38235389

1. Nota: Para Consorcios y/o Uniones Temporales, si el giro se realiza a uno de los integrantes deberán diligenciar otro formato F-GFC-096, con su certificación bancaria.

2. Nota: Para los Contratos de obra y tengan anticipo deben diligenciar otro formato F-GFC-096, para la fiducia.

Anexo: Certificación Bancaría

Autorizo al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para dar tratamiento de mis datos personales aquí registrados, conforme a la Ley 1581 de 2012 y a la Política de Tratamiento de Datos Personales, con la finalidad de efectuar las funciones propias y procedentes de la Entidad. Consulte nuestra política de tratamiento en la página www.mincultura.gov.co

*** CGN: Contaduría General de la Nación**

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LO SABERES

Culturas

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 4346-2024, CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CAPILLA - CONVENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO.

ITEM NO PREVISTO

NP 12

Culturas	APROBACIÓN ITEM NO PREVISTO	Página 1 de 2
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-GIN-105 Versión: 4 Fecha: 25/jun/2020

FECHA: 9/09/2025

PROYECTO: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - EDIFICIO CAPILLA CONVENTO

ÍTEM: ITEM NP 012 — RETIRO, PROTECCIÓN Y TRASIEGO INTERNO DE MUEBLES LITÚRGICOS ENTRE EL EDIFICIO CAPILLA CONVENTO Y EL EDIFICIO UVO REQUIERE DESARMADO EN SITIO MEDIDAS (3MX1,2MX1,2M)

UNIDAD DE MEDIDA: UND

CAPITULO: ITEMS NO PREVISTOS

A. EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	hr	$ 4.190,27	1,00	$ 4.190,27
					$ -
					$ -
					$ 4.190,27

B. MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
LL040	CINTA DE ENMASCARAR	Rollo	$ 12.931,47	0,525	$ 6.789,02
	PAPEL BURBUJA DOBLE CAPA DE ALTA DENSIDAD	Rollo	$ 38.990,00	2,000	$ 77.980,00
	ESQUINEROS DE CARTON RIGIDO DE 40 CM 3MM	Und	$ 2.862,50	8,000	$ 22.900,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 107.669,02

C. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO DD	CUADRILLA TIPO DD CARPINTERÍA MADERA (1 CARPINTERO + 1 AYUDANTE T2)	1	$ 289.184,00	$ 36.148,00	8,00	$ 289.184,00
						$ -
						$ -
						$ 289.184,00

D. TRANSPORTE

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	Viaje	$ 422.531,12	0,10	$ 42.253,11
					$ -
					$ -
					$ 42.253,11

ELABORÓ: EQUIPO CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 443.296,00**

Nota: Para el Análisis del Precio Unitario, solo se deben tener en cuenta los costos directos.

E. NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN	
Normatividad asociada: NO APLICA	

Especificaciones de construcción:

Preparación e inspección del área de trabajo

Se realiza la verificación física del estado de cada ELEMENTO (MUEBLE), identificación de riesgos de acceso, definición de rutas de traslado y preparación de las superficies.

Manipulación y desmontaje

Mediante el mediante el uso de la Cuadrilla tipo DD (1 carpintero + 1 ayudante), la cual cuenta con la experticia en mobiliario, realiza la desconsolidación y manipulación cuidada, evitando impactos o tensiones en la estructura de cada elemento que compone el mueble litugico, la seleccion y organizacion para su posterior embalaje.

Acondicionamiento y protección

Aplicación de elementos de protección como:

- Embalaje mediante el uso de Papel burbuja doble capa alta densidad, de cada elemento
- Instalacion de Esquineros rígidos en carton, para la proteccion de las esquinas o bordes.
- Cinta de enmascarar para asegurar sin dañar superficies.

Traslado interno

Trasiego de los muebles de forma manual o con ayuda de elementos de transporte menor, desde el punto de desarme o desmontaje hasta el punto de acopio provisional, dentro del area interna del proyecto.

Traslado externo

Traslado de los muebles por medio de vehiculo transporte conforme a los recursos referenciado en el apu, segun listado de insumos contractuales, desde el punto de acopio provisional hasta el punto de acopio en el edificio el UVO.

F. JUSTIFICACIÓN ITEM NO PREVISTO

Se incorporó este ítem no previsto ya que no estaba contemplado de manera contractual y resultaba necesario, dado que la permanencia de los muebles litúrgicos patrimoniales en la capilla obstaculizaba el desarrollo de otras labores constructivas. Este APU no previsto es necesario para garantizar el retiro, protección y trasiego seguro de dichos muebles, atendiendo la identificación, desconsolidación, manipulación manual o asistida, y traslado controlado hasta el espacio provisional designado por la Interventoría y el Cliente.

La actividad incluye además la protección dedicada de cada mueble (mantas, plásticos, cartón, burbuja, etc.) con el fin de evitar rayones o daños estructurales. Está alineada con el ítem técnico “RETIRO, PROTECCIÓN Y TRASIEGO INTERNO DE MUEBLES LITÚRGICOS… (3 m × 1,2 m × 1,2 m)”, y contempla mano de obra especializada, herramientas menores, logística interna y embalaje técnico, asegurando la integridad del bien y del entorno sin alterar la estructura arquitectónica.

Justificación técnica – Transporte

El componente de transporte contemplado en este ítem corresponde al traslado interno controlado de muebles litúrgicos patrimoniales entre el edificio Capilla Convento y el edificio UVO, con una distancia aproximada de 100 metros. Este desplazamiento requiere condiciones de operación especiales debido al peso, volumen y fragilidad de los elementos, los cuales presentan dimensiones promedio de 3,00 m x 1,20 m x 1,20 m y una configuración estructural robusta que dificulta su manipulación manual directa.

Para garantizar un traslado seguro y evitar daños físicos o deformaciones en las piezas, fue necesario realizar el desarme parcial y embalaje técnico de cada mueble utilizando materiales de protección como papel burbuja de alta densidad, esquineros de cartón rígido y cinta de enmascarar, según las especificaciones indicadas en el APU. Posteriormente, se efectuó el movimiento controlado hasta el punto de almacenamiento temporal designado, empleando personal especializado y medios de transporte adecuados a las condiciones del terreno y al peso estimado de cada elemento.

El cobro de este transporte por unidad de elemento se justifica en razón de la complejidad logística y el tratamiento individualizado que exige cada pieza, dado su tamaño, masa y valor patrimonial, lo cual impide la estandarización del traslado como una operación convencional. Asimismo, las condiciones del terreno entre los dos edificios presentan variaciones en nivelación y textura superficial, lo que requiere maniobras cuidadosas y apoyos mecánicos complementarios para garantizar la integridad física de los bienes y la seguridad del personal durante la operación.

Justificacion Recursos:


Respecto al consumo de dos (2) rollos de papel burbuja de alta densidad, este se requiere debido a que el mobiliario no corresponde a elementos convencionales, sino a piezas de gran formato y robustez, que no fueron ensambladas en sitio y por tanto deben ser desarmadas para su traslado. Esta condición implica que cada componente resultante (laterales, cubiertas, bases, elementos estructurales y decorativos) deba ser protegido de manera independiente, garantizando la integridad de superficies, aristas y acabados. En este sentido, el volumen total de piezas a embalar supera la cobertura de un solo rollo, haciendo necesario el uso de dos unidades para asegurar una protección adecuada contra impactos, fricción y manipulación.

En cuanto a la mano de obra estimada en ocho (8) horas, esta corresponde a una jornada completa de una cuadrilla especializada en carpintería, necesaria para ejecutar actividades secuenciales que incluyen: desarme técnico en sitio, clasificación de piezas, embalaje individual, manipulación cuidadosa, traslado interno y disposición organizada en el punto de destino. La complejidad del proceso se incrementa debido al peso, dimensiones y cantidad de elementos de cada mobiliario, lo cual exige maniobras controladas, tiempos de ejecución mayores y personal calificado, garantizando condiciones de seguridad tanto para los operarios como para los elementos intervenidos.

En lo referente al transporte, se realizó el ajuste adoptando el criterio de cobro por viaje y no por camión, en concordancia con lo establecido en la PO, donde se contempla el ítem de transporte de materiales. En este sentido, se consideró el uso de un vehículo destinado al transporte bajo condiciones operativas controladas, priorizando la adecuada movilización de los elementos y no la ocupación total del camión. Así mismo, dentro del análisis de mercado y las valoraciones económicas realizadas con proveedores, se evidenció que no existe disponibilidad para el transporte bajo la modalidad de camión convencional, sino que se requiere un vehículo especializado que garantice la protección y correcta manipulación de los materiales. Adicionalmente, debido a la complejidad para estimar el peso a partir del volumen transportado, se adoptó como criterio técnico un estándar de dos (2) toneladas por viaje para el traslado de estos elementos, asegurando coherencia en la estructuración del costo.

En relación con las dimensiones indicadas en el APU, estas obedecen a un criterio de estandarización previamente concertado entre el contratista y la interventoría. Dicho criterio fue adoptado con el propósito de evitar la realización de múltiples análisis derivados de la variabilidad de medidas en campo, y en su lugar, establecer un único APU que integrara y representara de manera eficiente el conjunto de dichas condiciones.

Nota 2.: Adjuntar la cotización del material en el mercado con aprobación del interventor.

INTERVENTORÍA - DIRECCION DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA
FIRMA	

CONTRATISTA - DIRECCION DE OBRA	
NOMBRE	WILSON DANILO VARGAS MARTINEZ
FIRMA	

CODIGOS CONTRACTUALES – NP012

EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4.190,27

MATERIALES

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO
LL040	CINTA DE ENMASCARAR	ROLLO	$ 12.931,47

MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR X HR
TIPO DD	CUADRILLA TIPO DD CARPINTERÍA MADERA (1 CARPINTERO + 1 AYUDANTE T2)	$ 36.148,00

TRANSPORTE

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	VALOR UNITARIO
TRN005	TRANSPORTE DE MATERIALES HASTA 2 TON	VIAJE	$ 422.531,12


PROYECTO:	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - EDIFICIO CAPILLA CONVENTO**	
ÍTEM:	**ITEM NP 012**	RETIRO, PROTECCIÓN Y TRASIEGO INTERNO DE MUEBLES LITÚRGICOS ENTRE EL EDIFICIO CAPILLA CONVENTO Y EL EDIFICIO UVO REQUIERE DESARMADO EN SITIO MEDIDAS (3MX1,2MX1,2M)
UNIDAD DE MEDIDA:	**UND**	**CAPITULO:** **ITEMS NO PREVISTOS**


CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES					**OFERTA PROPUESTA INTERVENTORIA (IBP INGENIERIA SAS)**
DESCRIPCION	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PROVEEDOR 1: EASY**	**PROVEEDOR 2: JUMBO**	**PROVEEDOR 3: RYS ROLLOS Y SOBRES SAS**	**PROVEEDOR 4: HOMECENTER**
		PRECIO UNITARIO CON IVA	**PRECIO UNITARIO CON IVA**	**PRECIO UNITARIO CON IVA**	**PRECIO UNITARIO CON IVA**
PAPEL BURBUJA DOBLE CAPA DE ALTA DENSIDAD	ROLLO	**$ 38.990,00**	$ 38.990,00	**$ 72.590,00**	**$ 43.900,00**
DESCRIPCION	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PROVEEDOR 1: HOMECENTER**	**PROVEEDOR 2: FALABELLA**	**PROVEEDOR 3: MERCADO LIBRE**	**PROVEEDOR 4: VIDA URBANA**
ESQUINEROS DE CARTON RIGIDO DE 40 CM 3MM	UND	**$ 2.862,50**	$ 2.862,50	**$ 5.737,50**	**$ 3.780,00**

PROVEEDOR SELECCIONADO		PAPEL BURBUJA DOBLE CAPA DE ALTA DENSIDAD
PROVEEDOR 1: EASY	**VALOR TOTAL**	**JUSTIFICACION**
DIRECCION: https://www.easy.com.co/plastico-burbuja-rollo-100cm-x-8m/p?srsltid=AfmBOopCsdo5hUeTv-kHapA-KeawT4pJz14Lv_zplviqCJTMJl0hdE39	**$ 38.990,00**	Se ha elegido la adquisición del papel burbuja doble capa de alta densidad en la tienda de construcción Easy, luego de un proceso de verificación técnica y comercial, en el cual se constató que dicho producto cumple con todos los requisitos técnicos, funcionales y de calidad establecidos para su uso en las actividades del proyecto.
CONTACTO:		

PROVEEDOR SELECCIONADO		ESQUINEROS DE CARTON RIGIDO DE 40 CM 3MM
PROVEEDOR 1: HOMECENTER	**VALOR TOTAL**	**JUSTIFICACION**
DIRECCION: https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/241579/esquineros-40cm-3mm-8und/241579/	**JUSTIFICACION**	Se justifica la adquisición de esquineros de cartón rígido de 40 cm de longitud y 3 mm de espesor en la tienda de construcción Homecenter, con base en el cumplimiento total de los requerimientos técnicos y funcionales establecidos para la protección de materiales y componentes utilizados en el proyecto. Este insumo fue evaluado frente a criterios de calidad, resistencia y compatibilidad con los procesos logísticos del proyecto.
CONTACTO:		


PAPEL BURBUJA DOBLE CAPA DE ALTA DENSIDAD









ESQUINEROS DE CARTON RIGIDO DE 40 CM 3MM

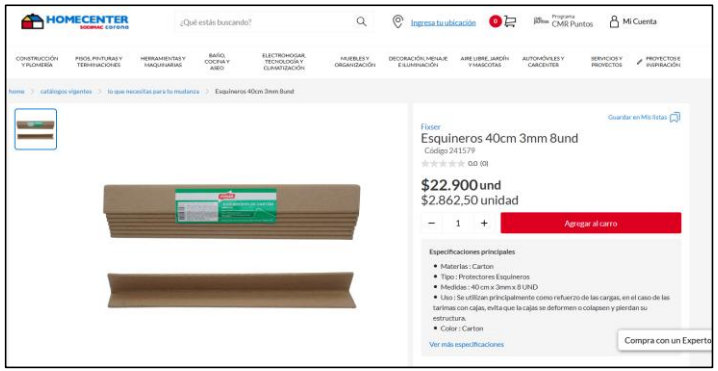

SE IDENTIFICA UN VALOR DE $22,900 PAQUETE POR 8 UNIDADES LO INDICA UN VALOR UNITARIO DE $2.862,50




SE IDENTIFICA UN VALOR DE $22,900 PAQUETE POR 8 UNIDADES LO INDICA UN VALOR UNITARIO DE $2.862,50




SE IDENTIFICA UN VALOR DE $45.900 PAQUETE POR 8 UNIDADES LO INDICA UN VALOR UNITARIO DE $5.737,50

IBP INGENIERIA SAS

PAPEL BURBUJA DOBLE CAPA DE ALTA DENSIDAD

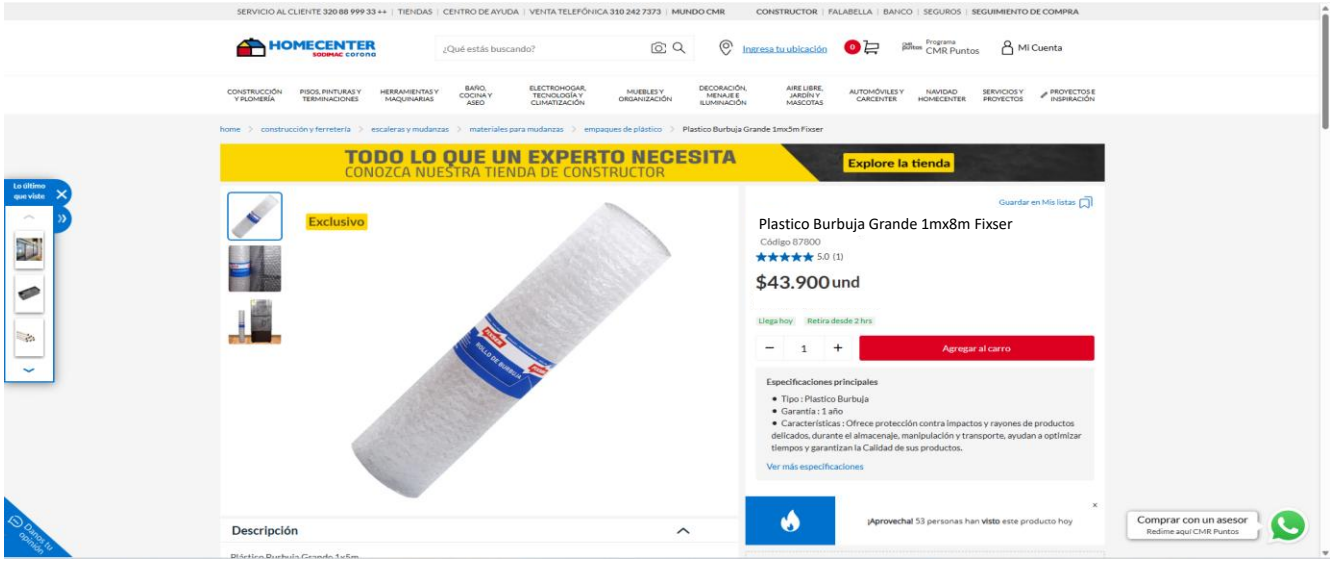

ESQUINEROS DE CARTON RIGIDO DE 40 CM 3MM

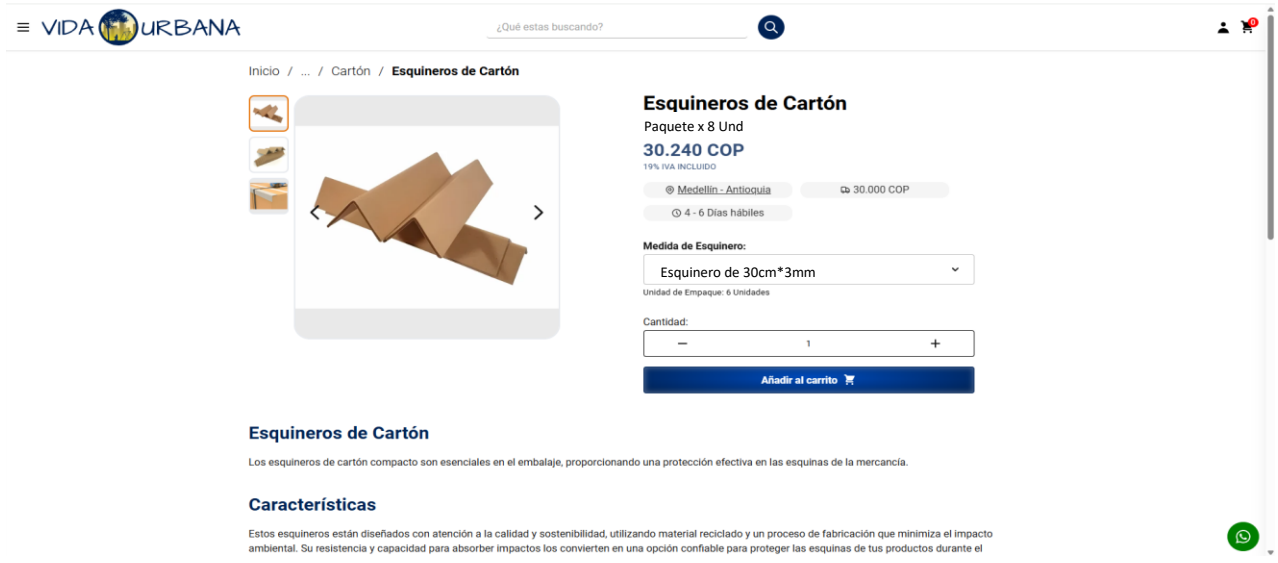

SE IDENTIFICA UN VALOR DE $30.240 PAQUETE POR 8 UNIDADES LO INDICA UN VALOR UNITARIO DE $3.780,00

ITEM NP 012	RETIRO, PROTECCIÓN Y TRASIEGO INTERNO DE MUEBLES LITÚRGICOS ENTRE EL EDIFICIO CAPILLA CONVENTO Y EL EDIFICIO UVO REQUIERE DESARMADO EN SITIO MEDIDAS (3MX1,2MX1,2M)
3. UNIDAD DE MEDIDA	UND – Unidad

4. DESCRIPCIÓN

Este APU no previsto contempla las actividades necesarias para el retiro, protección y trasiego interno de muebles ubicados en la capilla, dentro del área del proyecto. Las labores comprenden la identificación individual de las piezas, su desconsolidación si aplica, manipulación cuidadosa y traslado manual o asistido desde su ubicación original hasta el sitio temporal definido por la Interventoría y el Cliente.

Se incluye además la protección individualizada de cada mueble mediante el uso de mantas, plásticos, cartón corrugado, papel burbuja y otros materiales adecuados, con el objetivo de evitar rayones, deformaciones o daños estructurales durante su traslado.

Este ítem se encuentra plenamente alineado con el alcance y las condiciones técnicas establecidas, haciendo especial énfasis en las actividades de retiro, protección y manejo integral del mobiliario institucional y/o patrimonial. En este sentido, contempla la ejecución de procedimientos adecuados para el desmonte, embalaje, traslado interno, garantizando en todo momento la conservación de las características físicas y estéticas de los elementos, así como la seguridad durante su manipulación. Lo anterior se desarrolla bajo criterios técnicos que minimizan riesgos de deterioro, pérdida o afectación, asegurando el cumplimiento de las condiciones de protección y preservación requeridas.

El APU contempla todos los costos asociados a la mano de obra especializada, herramientas menores, logística interna, y medios necesarios para ejecutar esta actividad sin alterar la estructura del bien ni comprometer la integridad del entorno.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Preparación e inspección del área de trabajo

Se realiza la verificación física del estado de cada ELEMENTO (MUEBLE), identificación de riesgos de acceso, definición de rutas de traslado y preparación de las superficies.

Manipulación y desmontaje

Mediante el mediante el uso de la Cuadrilla tipo DD (1 carpintero + 1 ayudante), la cual cuenta con la experticia en mobiliario, realiza la desconsolidación y manipulación cuidada, evitando impactos o tensiones en la estructura de cada elemento que compone el mueble litúrgico, la selección y organización para su posterior embalaje.

Acondicionamiento y protección

Aplicación de elementos de protección como:

- Embalaje mediante el uso de Papel burbuja doble capa alta densidad, de cada elemento
- Instalación de Esquineros rígidos en cartón, para la protección de las esquinas o bordes.
- Cinta de enmascarar para asegurar sin dañar superficies.

Traslado interno

Trasiego de los muebles de forma manual o con ayuda de elementos de transporte menor, desde el punto de desarme o desmontaje hasta el punto de acopio provisional, dentro del área interna del proyecto.

Traslado externo

Traslado de los muebles por medio de vehículo transporte conforme a los recursos referenciado en el apu, según listado de insumos contractuales, desde el punto de acopio provisional hasta el punto de acopio en el edificio el UVO.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

- Las determinadas por el cliente.

7. ENSAYOS A REALIZAR

- No es requerido.

8. MATERIALES

Cinta de Enmascarar

Papel Burbuja

Esquinero de cartón

9. EQUIPO

Incluye:

- Guantes de seguridad
- Cintas métricas
- Destornilladores
- Correas de sujeción
- Cutter / bisturí industrial
- Carretillas/plataformas menores
- Señalización temporal

10. DESPERDICIOS

Incluidos ☐ Si ☒ No

11. MANO DE OBRA

Incluidos ☒ Si ☐ No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Levantamiento planimétrico del mobiliario

• Comparativos de cotizaciones

• Procedimiento similar: APU Retiro y Trasiego de Muebles de Conservación

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La actividad será medida y pagada por unidad (UND), siempre y cuando haya sido debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por parte de la Interventoría y el Cliente. Para su reconocimiento formal dentro del contrato, la entidad contratante deberá establecer el procedimiento correspondiente para la oficialización de la actividad. En este sentido, la forma de pago será objeto de conciliación entre las partes, garantizando que en ningún caso se vea comprometido el flujo financiero del proyecto.


14. NO CONFORMIDAD

En caso de presentarse No Conformidades con las especificaciones técnicas, ya sea durante el tiempo de ejecución, a su terminación o en el momento de la entrega, y si la Interventoría determina que el proceso de instalación no fue correctamente realizado, el constructor estará en la obligación de ejecutar la reconstrucción correspondiente por su cuenta, sin que ello implique modificaciones ni adiciones al plazo ni al valor del contrato.

15. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS ELEMENTO EN REFERENCIA





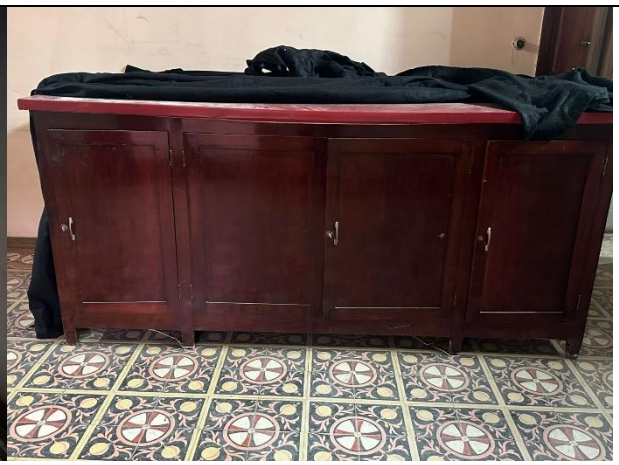


Red 18/06/2025, 11:52:18 a.m. COT
Observación: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
CHSJD-CAPILLA CONVENTO


Red 18/06/2025, 11:52:03 a.m. COT
Observación: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
CHSJD-CAPILLA CONVENTO




Red 18/06/2025, 11:51:14 a.m. COT
Observación: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
CHSJD-CAPILLA CONVENTO


Red 18/06/2025, 11:51:57 a.m. COT
Observación: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
CHSJD-CAPILLA CONVENTO

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LO SABERES

Culturas

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 4346-2024, CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CAPILLA - CONVENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO.

ITEM NO PREVISTO

NP 13

Culturas	APROBACIÓN ITEM NO PREVISTO	Página 1 de 2
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-GIN-105 Versión: 4 Fecha: 25/jun/2020

FECHA: 9/09/2025

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - EDIFICIO CAPILLA CONVENTO

ÍTEM: ITEM NP 013 — REPARACIONES LOCATIVAS PARA ADECUACIÓN DE SALÓN DE ALMACENAMIENTO DE BIENES MUEBLES EN EDIFICIO UVO

UNIDAD DE MEDIDA: UND **CAPITULO:** ITEMS NO PREVISTOS

A. EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	hr	$ 4.190,27	1,00	$ 4.190,27
					$ -
					$ -
					$ 4.190,27

B. MATERIALES

CÓDIGO		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
	CERRADURA DE SEGURIDAD	UNIDAD	$ 180.000,00	1,00	$ 180.000,00
	BALDOSA INSOLUX 20x20	UNIDAD	$ 12.900,00	6,00	$ 77.400,00
	Triplex 15mm 1.22x2.44 Metros	UND	$ 157.900,00	0,30	$ 47.370,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 304.770,00

C. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)	1	$ 231.008,00	$ 28.876,00	0,40	$ 92.403,20
						$ -
						$ -
						$ 92.403,20

D. TRANSPORTE

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

ELABORÓ: EQUIPO CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL

TOTAL PRECIO UNITARIO: **$ 401.363,00**

Nota: Para el Análisis del Precio Unitario, solo se deben tener en cuenta los costos directos.

E. NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN	
Normas de seguridad y salud en el trabajo (Ley 1562 de 2012, Resolución 1409 de 2012). Lineamientos de conservación patrimonial aplicables al edificio UVO. Especificaciones técnicas de los materiales suministrados.	

Especificaciones de construcción:

Planeación y preparación

Revisión de planos y levantamiento de condiciones iniciales del salón.

Señalización del área de trabajo y adecuación de andamios certificados cuando sea necesario.

Intervenciones locativas

Instalación de cerradura de seguridad en accesos definidos.

Colocación de baldosas Insolux de 20x20 en áreas requeridas.

Corte, ajuste y fijación de piezas de triplex de 15 mm.

Realización de reparaciones menores de acabados, limpieza y terminación.

Finalización

Revisión general del espacio acondicionado.

Entrega del área limpia y en condiciones de uso.

F. JUSTIFICACIÓN ITEM NO PREVISTO

Este ítem se incorporó dentro de las actividades no previstas, debido a la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y almacenamiento para bienes muebles de carácter patrimonial en el edificio UVO del complejo San Juan de Dios. Inicialmente, se contemplaba únicamente el traslado y disposición de dichos elementos; sin embargo, durante la ejecución se evidenció la necesidad de adecuar un espacio que permitiera su correcta conservación y custodia temporal, en razón a que estos no podían permanecer en el entorno de la Capilla Convento por las actividades constructivas en desarrollo.

En este sentido, los elementos trasladados corresponden al órgano musical, los guacales existentes provenientes del Contrato 4242 —los cuales ya se encontraban en el proyecto—, así como los generados a partir del desmonte de vitrales de los campanarios y de la capilla. Lo anterior implicó la adecuación locativa del espacio mediante la instalación de baldosas tipo Insolux 20x20, la incorporación de elementos en triplex de 15 mm y demás ajustes necesarios, con el fin de habilitar un área funcional y apta para el almacenamiento temporal de este tipo de bienes.

Respecto a la seguridad del área, se contempló la instalación de una (1) cerradura, la cual resulta suficiente dado que el espacio intervenido cuenta con un único punto de acceso, permitiendo así el control efectivo de ingreso y la restricción de personal no autorizado. Esta medida responde a un criterio técnico de optimización, garantizando la protección de los elementos almacenados sin incurrir en intervenciones innecesarias.

Nota 2.: Adjuntar la cotización del material en el mercado con aprobación del interventor.

INTERVENTORÍA - DIRECCION DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA
FIRMA	

CONTRATISTA - DIRECCION DE OBRA	
NOMBRE	WILSON DANILO VARGAS MARTINEZ
FIRMA	

CODIGOS CONTRACTUALES – NP013

EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18.882,67
AA	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA X HORA	HR	$ 4.190,27

MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR X HR
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)	$ 28.876,00

	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - EDIFICIO CAPILLA CONVENTO	
ÍTEM:	ITEM NP 013	REPARACIONES LOCATIVAS PARA ADECUACIÓN DE SALÓN DE ALMACENAMIENTO DE BIENES MUEBLES EN EDIFICIO UVO
UNIDAD DE MEDIDA:	UND	CAPITULO: ITEMS NO PREVISTOS

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES					OFERTA PROPUESTA INTERVENTORIA (IBP INGENIERIA SAS)
DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROVEEDOR 1: ITALUMINIO	PROVEEDOR 2: HOMECENTER	PROVEEDOR 3: FALLABELLA	PROVEEDOR 4: MERCADO LIBRE
		PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA
CERRADURA DE SEGURIDAD	UND	$ 180.000,00	$ 184.900,00	$ 184.900,00	$ 295.990,00
DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROVEEDOR 1: HOMECENTER	PROVEEDOR 2: FALLABELLA	PROVEEDOR 3: EL DIAMANTE	PROVEEDOR 4: FERROMATERIALES
BALDOSA INSOLUX 20x20	UND	$ 12.900,00	$ 12.900,00	$ 13.500,00	$ 13.000,00
DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROVEEDOR 1: HOMECENTER	PROVEEDOR 2: MONOMERADOS SAS	PROVEEDOR 3: FALLABELLA	PROVEEDOR 4: EASY
Triplex 15mm 1.22x2.44 Metros	UND	$ 157.900,00	$ 167.999,00	$ 157.900,00	$ 157.650,00

PROVEEDOR SELECCIONADO

PROVEEDOR 1: ITALUMINIO	VALOR TOTAL	JUSTIFICACION
https://italuminio.com/product/170c-plus-cerrojo-yale-llave-multipunto/	$ 180.000,00	MEJOR PRECIO Y CALIDAD
CONTACTO:		

PROVEEDOR SELECCIONADO


PROVEEDOR 1: HOMECENTER	VALOR TOTAL	JUSTIFICACION
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/16574/baldosa-insolux-20-x-20-cm-piso-incolora/16574/	$ 12.900,00	MEJOR PRECIO Y CALIDAD
CONTACTO:		

PROVEEDOR SELECCIONADO


PROVEEDOR 1: HOMECENTER	VALOR TOTAL	JUSTIFICACION
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/884275/triplex-15mm-122x244-metros/884275/?kid=goosho_1161562&shop=googleShopping&gad_source=1&gad_campaignid=17622046044&gbraid=0AAAADt6wnojTn-u0COU0hAhZSO-P7o98&gclid=Cj0KCQjwrJTGBhCbARIsANFBfgsSxEVRGL4M3F4efGrg8dfcTJqBuRuxPQnlpMXMstZKwpSyDqI6--saAhZlEALw_wcB	$ 157.900,00	MEJOR PRECIO Y CALIDAD
CONTACTO:		

CERRADURA DE SEGURIDAD


https://italuminio.com/product/170c-plus-cerrojo-yale-llave-multipunto/

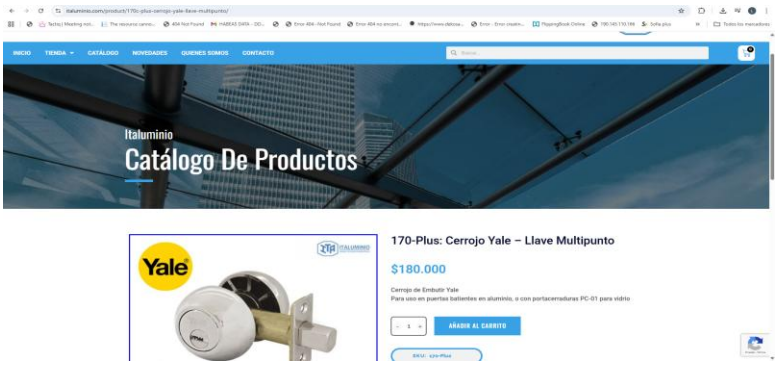

https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/311019/cerrojo-sencillo-170-multipunto/311019/




https://homecenter.falabella.com.co/homecenter-co/product/118866855/Cerrojo-Sencillo-170-Multipunto/118866857?exp=homecenter




BALDOSA INSOLUX 20x20

https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/16574/baldosa-insolux-20-x-20-cm-piso-incolora/16574/

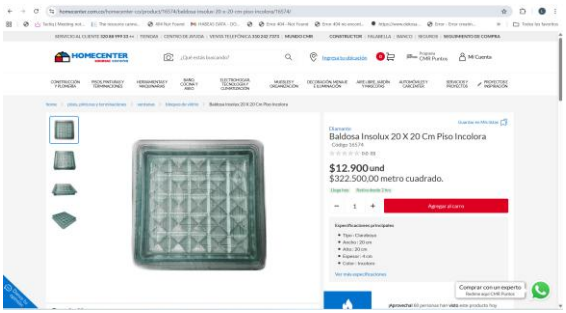

https://homecenter.falabella.com.co/homecenter-co/product/118870446/Baldosa-Insolux-20x20cm/118870449




https://vidrioseldiamante.com.co/baldosas-insolux/




TRIPLEX 15MM


https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/884275/triplex-15mm-122x244-metros/884275/?kid=goosho_1161562&shop=googleShopping&gad_source=1&gad_campaignid=17622046044&gbraid=0AAAADt6wnojTn-u0COU0hAhZSO-P7o98&gclid=Cj0KCQjwrJTGBhCbARIsANFBfgsSxEVRGL4M3F4efGrq8dfcTJqBuRuxPQnlpMXMstZKwpSyDqI6--saAhZIEALw_wcB

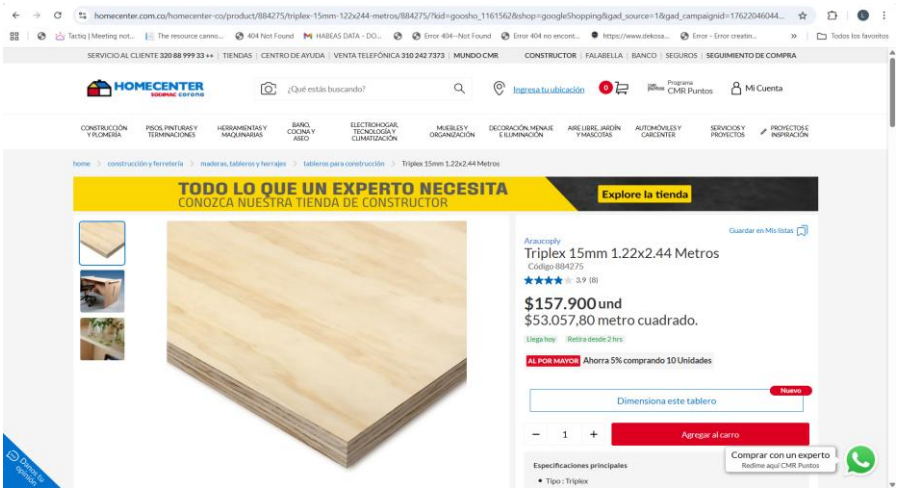


https://monomerados.com/tienda/mdf-triplex-y-tableros/imporplex/triplex-pino/?srsltid=AfmBOooqze30bFotcTxsQHL_sUzqAhU5-V1mCwsVAjiZ9cgtb_nncl2j

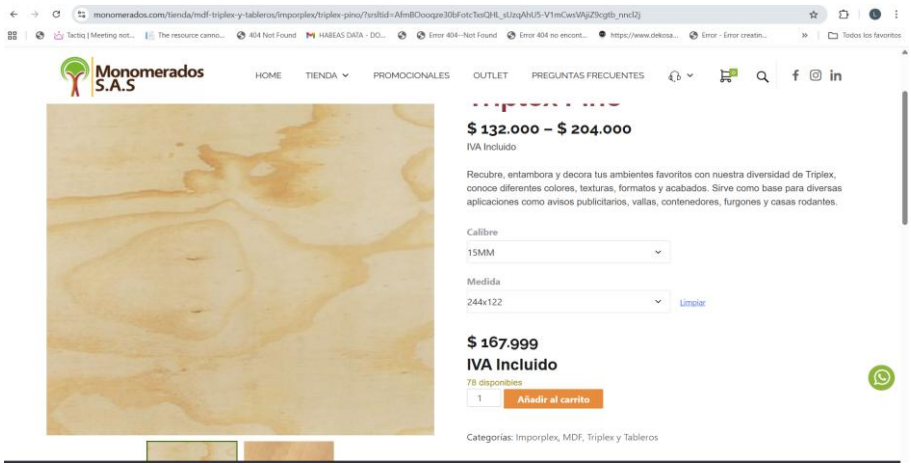


https://homecenter.falabella.com.co/homecenter-co/product/118826542/Triplex-15mm-1.22x2.44-Metros/118826544

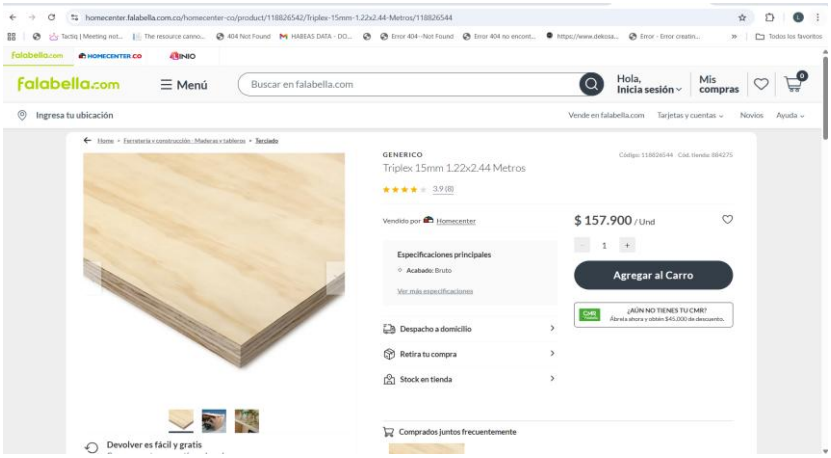


PROPUESTA IBP INGENIERIA SAS
CERRADURA

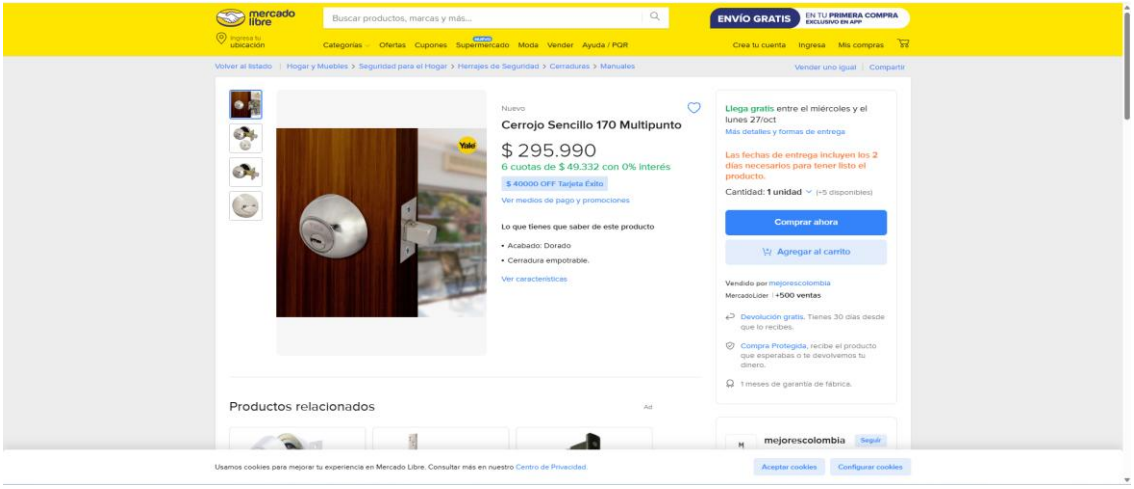

BALDOSA INSOLUX 20x20

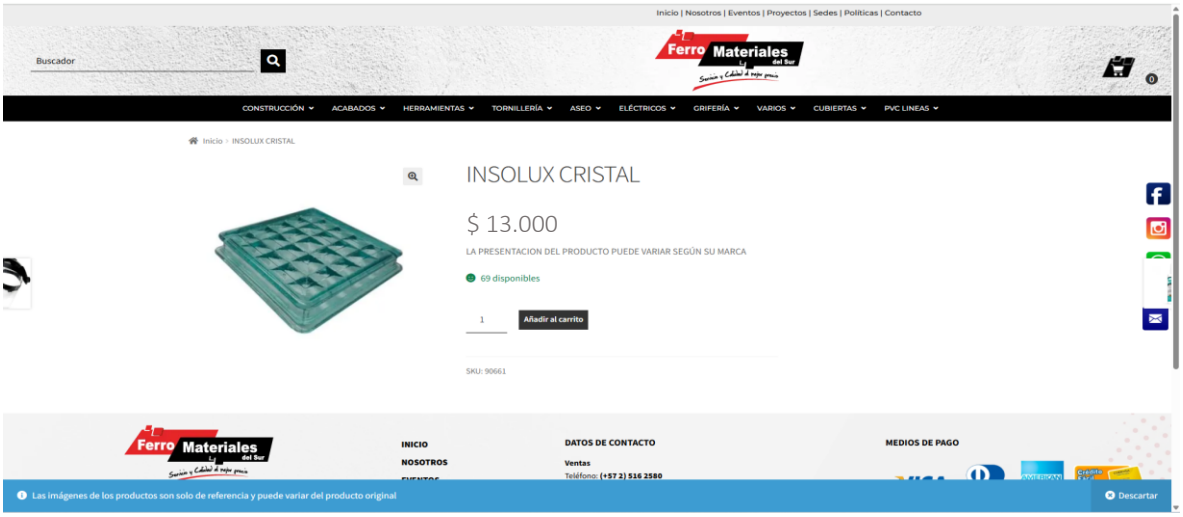

Triplex 15mm 1.22x2.44 Metros

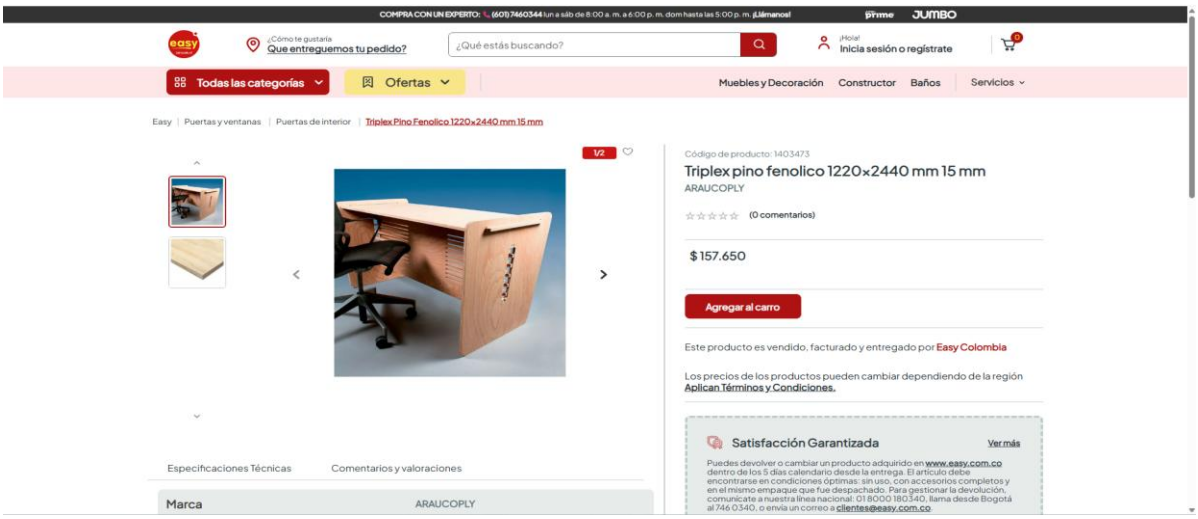

ITEM NP 013	REPARACIONES LOCATIVAS PARA ADECUACIÓN DE SALÓN DE ALMACENAMIENTO DE BIENES MUEBLES EN EDIFICIO UVO

3. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD

4. DESCRIPCIÓN

El APU no previsto correspondiente a las reparaciones locativas tiene como finalidad adecuar el salón destinado al almacenamiento de bienes muebles en el edificio UVO, garantizando condiciones de seguridad, funcionalidad y conservación. La actividad contempla ajustes en acabados, instalación de una cerradura de seguridad, colocación de baldosas tipo Insolux de 20x20, instalación de elementos en triplex de 15 mm, así como otras intervenciones menores que aseguren el correcto acondicionamiento del espacio. Se incluyen equipos, materiales, mano de obra y medidas de seguridad requeridas para la ejecución.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Planeación y preparación

- Revisión de planos y levantamiento de condiciones iniciales del salón.
- Señalización del área de trabajo y adecuación de andamios certificados cuando sea necesario.

Intervenciones locativas

- Instalación de cerradura de seguridad en accesos definidos.
- Colocación de baldosas Insolux de 20x20 en áreas requeridas.
- Corte, ajuste y fijación de piezas de triplex de 15 mm.
- Realización de reparaciones menores de acabados, limpieza y terminación.

Finalización

- Revisión general del espacio acondicionado.
- Entrega del área limpia y en condiciones de uso.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

- Cerradura de seguridad instaladas y en correcto funcionamiento.
- Baldosas niveladas y correctamente adheridas.
- Piezas de triplex ajustadas según diseño y sin desprendimientos.
- Área de almacenamiento terminada conforme a especificaciones y validada por la interventoría.

7. ENSAYOS A REALIZAR

- Inspección visual de acabados y materiales instalados.
- Verificación del correcto funcionamiento de cerradura.
- Registro fotográfico de la intervención antes y después.

8. MATERIALES

- Cerradura de seguridad.
- Baldosas Insolux 20x20.
- Triplex de 15 mm.

9. EQUIPO

Herramientas menores de carpintería y albañilería.

10. DESPERDICIOS

Incluidos ☒ Si ☐ No

11. MANO DE OBRA

Incluidos ☒ Si ☐ No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Normas de seguridad y salud en el trabajo (Ley 1562 de 2012, Resolución 1409 de 2012).
- Lineamientos de conservación patrimonial aplicables al edificio UVO.

- Especificaciones técnicas de los materiales suministrados.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La actividad será medida y pagada por unidad (UND) de salón intervenido, previa verificación de la interventoría y entrega conforme a especificaciones.

14. NO CONFORMIDAD

Si las reparaciones no cumplen con las especificaciones técnicas, se deberán repetir o corregir por cuenta del contratista, sin reconocimiento adicional.

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LO SABERES

Culturas

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 4346-2024, CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CAPILLA - CONVENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO.

ITEM NO PREVISTO

NP 14

Culturas	APROBACIÓN ITEM NO PREVISTO	Página 1 de 2
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-GIN-105 Versión: 4 Fecha: 25/jun/2020

FECHA: 9/09/2025

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - EDIFICIO CAPILLA CONVENTO

ÍTEM: ITEM NP 014 — RETIRO, CONSERVACIÓN Y EMBALAJE DE HERRAJES ORIGINALES DE PUERTAS Y VENTANAS

UNIDAD DE MEDIDA: UND

CAPITULO: ITEMS NO PREVISTOS

A. EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	hr	$ 2.184,64	0,15	$ 327,70
					$ 327,70

B. MATERIALES

CÓDIGO		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
ALB165	TELA QUIRURGICA DE 60GR YUMBOLON DE 5MM DE ESPESOR	M2	$ 6.669,36	0,05	$ 333,47
ALB167	GUACAL EN MADERA	M3	$ 927.334,78	0,00461	$ 4.278,21
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 4.611,68

C. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)	1	231008	$ 28.876,00	0,07	$ 16.170,56
						$ -
						$ -
						$ 16.170,56

D. TRANSPORTE

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

ELABORÓ: HAROLD EDGARDO SOSA SABOYA

TOTAL PRECIO UNITARIO: $ 21.110,00

Nota: Para el Análisis del Precio Unitario, solo se deben tener en cuenta los costos directos.

E. NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN	
Lineamientos del Ministerio de Cultura para manejo y conservación de bienes muebles patrimoniales. Protocolos internacionales de conservación preventiva para metales y herrajes históricos. Normas de seguridad y salud en el trabajo (Ley 1562 de 2012).	

Especificaciones de construcción:

Planeación y preparación

Identificación y registro fotográfico de los herrajes a intervenir.

Etiquetado y codificación de cada pieza para garantizar su trazabilidad.

Retiro y conservación

Desmonte manual de los herrajes utilizando herramientas menores, evitando afectar las piezas y la madera o metal soporte.

Limpieza inicial de partículas sueltas o corrosión ligera.

Embalaje y almacenamiento

Embalaje individual con materiales de protección (Tela Quirurgica,caja rígida).

Almacenamiento en condiciones secas y seguras, garantizando control de humedad y manipulación restringida.

F. JUSTIFICACIÓN ITEM NO PREVISTO

Este ítem se incorpora dentro del Acta de Fijación de Ítems No Previstos debido a que contractualmente no existía una actividad específica que contemplara el retiro, conservación y embalaje de herrajes originales de puertas y ventanas, siendo una labor primordial para la preservación del patrimonio de bien cultural nacional y en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la planeación de conservación de estos elementos patrimoniales; la actividad incluye el registro y codificación de cada pieza, su desmonte cuidadoso con herramientas menores para evitar daños, la limpieza inicial de partículas sueltas, el embalaje individual con materiales especializados de conservación (papel libre de ácido, plásticos y cajas rígidas) y su almacenamiento en condiciones seguras, garantizando la trazabilidad, integridad y protección de los herrajes para su posterior restitución, bajo los protocolos de conservación preventiva y normas técnicas de patrimonio y seguridad laboral vigentes.

Nota 2.: Adjuntar la cotización del material en el mercado con aprobación del interventor.

INTERVENTORÍA - DIRECCION DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA
FIRMA	

CONTRATISTA - DIRECCION DE OBRA	
NOMBRE	WILSON DANILO VARGAS MARTINEZ
FIRMA	

CODIGOS CONTRACTUALES – NP014

EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2.184,64

MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR X HR
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)	$ 28.876,00

MATERIALES

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	VALOR UNITARIO
ALB165	TELA QUIRURGICA DE 60GR YUMBOLON DE 5MM DE ESPESOR	M2	$ 6.669,36
ALB167	GUACAL EN MADERA	M3	$ 927.334,78

ITEM NP 014	RETIRO, CONSERVACIÓN Y EMBALAJE DE HERRAJES ORIGINALES DE PUERTAS Y VENTANAS

3. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD

4. DESCRIPCIÓN

El APU no previsto correspondiente al retiro, conservación y embalaje de herrajes originales de puertas y ventanas contempla la desinstalación cuidadosa de estos elementos patrimoniales para su preservación, almacenamiento y protección durante el desarrollo de las obras de restauración del edificio Capilla y Convento del Hospital San Juan de Dios. La actividad tiene como propósito garantizar la conservación de los herrajes, evitando su deterioro, pérdida o daño, y asegurar que se mantengan disponibles para su posterior restitución o integración en los elementos restaurados.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Planeación y preparación

- Identificación y registro fotográfico de los herrajes a intervenir.
- Etiquetado y codificación de cada pieza para garantizar su trazabilidad.

Retiro y conservación

- Desmonte manual de los herrajes utilizando herramientas menores, evitando afectar las piezas y la madera o metal soporte.
- Limpieza inicial de partículas sueltas o corrosión ligera.

Embalaje y almacenamiento

- Embalaje individual con materiales de protección (papel libre de ácido, plásticos, cajas rígidas).
- Almacenamiento en condiciones secas y seguras, garantizando control de humedad y manipulación restringida.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

- Retiro completo de los herrajes especificados sin daño en las piezas.

- Correcto embalaje y codificación de todos los elementos.
- Registro y trazabilidad de cada pieza entregada a custodia.

7. ENSAYOS A REALIZAR

- Inspección visual y documental de cada herraje antes y después del retiro.
- Validación de embalaje y condiciones de almacenamiento por parte de la interventor

8. MATERIALES

Materiales de embalaje y conservación (tela quirúrgica y caja rigida).

9. EQUIPO

Herramientas menores de carpintería y cerrajería.

10. DESPERDICIOS

Incluidos ☒ Si ☐ No

No aplica, al tratarse de retiro y conservación de piezas originales.

11. MANO DE OBRA

Incluidos ☒ Si ☐ No

Cuadrilla Tipo AA (1 oficial T1 + 1 ayudante T1), con experiencia en restauración, carpintería y manipulación de elementos patrimoniales.

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Lineamientos del Ministerio de Cultura para manejo y conservación de bienes muebles patrimoniales.
- Protocolos internacionales de conservación preventiva para metales y herrajes históricos.
- Normas de seguridad y salud en el trabajo (Ley 1562 de 2012).

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La actividad será medida y pagada por unidad (UND) de herraje retirado, conservado y embalado, previa verificación de la interventoría.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de daño, pérdida o embalaje inadecuado de algún herraje, el contratista deberá asumir su restauración o reposición, sin reconocimiento económico adicional.

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LO SABERES

Culturas

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 4346-2024, CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CAPILLA - CONVENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO.

ITEM NO PREVISTO

NP 15

Culturas	APROBACIÓN ITEM NO PREVISTO	Página 1 de 2
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-GIN-105 Versión: 4 Fecha: 25/jun/2020

FECHA: 9/09/2025

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - EDIFICIO CAPILLA CONVENTO

ÍTEM: ITEM NP 015 — PROTECCIÓN PARA CERRAMIENTO DE VANOS DE VENTANAS,PUERTAS Y VITRALES.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **CAPITULO:** ITEMS NO PREVISTOS

A. EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	hr	$ 2.184,64	0,50	$ 1.092,32
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18.882,67	0,50	$ 9.441,34
					$ -
					$ 10.533,66

B. MATERIALES

CÓDIGO		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
	Angeo Mosquitero Malla Aluminio	M2	$ 9.166,67	1,08	$ 9.900,00
	Liston madera 4x4	ML	$ 2.666,67	2,50	$ 6.666,67
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 16.566,67

C. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)	1	$ 231.008,00	$ 28.876,00	0,05	$ 10.484,96
						$ -
						$ -
						$ 10.484,96

D. TRANSPORTE

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

ELABORÓ: EQUIPO CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL **TOTAL PRECIO UNITARIO:** **$ 37.585,00**

Nota: Para el Análisis del Precio Unitario, solo se deben tener en cuenta los costos directos.

E. NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN	
Lineamientos del Ministerio de Cultura para conservación de bienes patrimoniales. Normas de seguridad y salud en el trabajo (Ley 1562 de 2012 y Resolución 1409 de 2012). Especificaciones técnicas de materiales empleados.	

Especificaciones de construcción:

Planeación y preparación

Delimitación y señalización de las áreas de trabajo.

Medición de vanos de ventanas, puertas y vitrales a proteger.

Corte y preparación de listones de madera.

Ejecución del cerramiento

Instalación de andamios multidireccionales certificados para acceso seguro.

Colocación y fijación de listones de madera 4x4 en el perímetro de los vanos.

Tensado e instalación de la malla angeo mosquitera de aluminio.

Verificación de estabilidad y acabado final.

Finalización

Limpieza del área de trabajo y retiro de sobrantes.


Registro fotográfico del cerramiento instalado.

F. JUSTIFICACIÓN ITEM NO PREVISTO

Este ítem se incorpora como no previsto, toda vez que contractualmente no se contemplaba una actividad específica para la protección de los vanos.
Durante la ejecución del proyecto, y particularmente a partir del desmonte de los vitrales del campanario, se generaron aberturas que dejaron expuestos diversos espacios, haciendo necesaria la implementación de protecciones temporales. Esta condición anulo el ingreso de palomas y otros agentes externos, lo cual representa un riesgo directo para la conservación de los espacios interiores, debido a la acumulación de excrementos, la proliferación de agentes biológicos y la consecuente afectación tanto de superficies como de elementos patrimoniales.
En este sentido, la instalación de protecciones se ejecutó de manera puntual y exclusivamente en los vanos que quedaron abiertos como resultado del desmonte de vitrales en el campanario.
Adicionalmente, durante la ejecución se evidenció la necesidad de utilizar ciertos espacios del convento como áreas de almacenamiento temporal para el material resultante del desmonte de los vitrales. En dichos espacios se dispusieron panelotecas para el resguardo de los vitrales desmontados de la capilla, los cuales, por su alto valor patrimonial, requerían condiciones mínimas de protección frente a agentes externos.
De igual forma, en estas áreas se almacenaron de manera provisional bienes muebles adicionales que no estaban contemplados para ser trasladados al espacio inicialmente dispuesto (UVO), lo que hizo necesario garantizar condiciones adecuadas de protección y salubridad para su conservación mientras se definía su disposición final.
Por lo anterior, este ítem responde a una necesidad real surgida en obra, orientada a mitigar riesgos derivados de la exposición de los espacios intervenidos y a salvaguardar tanto los elementos desmontados como los bienes muebles patrimoniales bajo custodia.
En este sentido, la solución técnica adoptada consiste en la instalación de cerramientos temporales mediante malla de aluminio y listones de madera, apoyados en andamios certificados y ejecutados con mano de obra calificada, cumpliendo criterios de seguridad, control de acceso y conservación del patrimonio, evitando el ingreso de fauna y agentes contaminantes que puedan generar deterioro en el interior de las áreas intervenidas.

Respecto al rendimiento considerado de una sección de 1,50 m x 1,50 m en medio día por metro cuadrado de protección, este se justifica en razón a las condiciones particulares del sitio de intervención. Los vanos presentan alturas predominantes y geometrías irregulares, lo cual dificulta las labores de acceso, medición, corte y ajuste de los materiales. Adicionalmente, la instalación requiere el uso de andamios certificados, el aseguramiento de puntos de anclaje y la manipulación cuidadosa de los elementos para evitar afectaciones a superficies existentes de carácter patrimonial. Estas condiciones incrementan los tiempos de ejecución frente a un cerramiento convencional, haciendo necesario contemplar un rendimiento conservador que garantice la correcta instalación, estabilidad del sistema y condiciones seguras de trabajo.

Nota 2.: Adjuntar la cotización del material en el mercado con aprobación del interventor.

INTERVENTORÍA - DIRECCION DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA
FIRMA	

CONTRATISTA - DIRECCION DE OBRA	
NOMBRE	WILSON DANILO VARGAS MARTINEZ
FIRMA	

	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - EDIFICIO CAPILLA CONVENTO	
ÍTEM:	ITEM NP 015	PROTECCIÓN PARA CERRAMIENTO DE VANOS DE VENTANAS,PUERTAS Y VITRALES PERIMETRALES
UNIDAD DE MEDIDA:	M2	CAPITULO: ITEMS NO PREVISTOS

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES					PRECIO REFERENCIA (IBP INGENIERIA SAS)
DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROVEEDOR 1: PRODUCABOS	PROVEEDOR 2: MACHO	PROVEEDOR 3: BERVAR FERRETERIA	PROVEEDOR 4: HOMECENTER
		PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA
Angeo Mosquitero Malla Aluminio	M2	$ 9.166,67	$ 9.347,85	$ 12.730,00	$ 14.096,67
DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROVEEDOR 1: BERVAR FERRETERIA	PROVEEDOR 2: FORANDES	PROVEEDOR 3: HOMECENTER	PROVEEDOR 4: IMPORMADERAS
		PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA
Liston madera 4x4	ML	$ 2.666,67	$ 4.760,00	$ 6.531,25	$ 3.833,33


PROVEEDOR SELECCIONADO

PROVEEDOR 1: PRODUCABOS	VALOR TOTAL	JUSTIFICACION
https://www.producabos.com/producto/angeo-galvanizado-1-20-x-30-mts-colmallas/	$ 9.166,67	POR PRECIO Y CALIDAD
CONTACTO: EL QUE TIENE LA OFERTA		

PROVEEDOR 1: BERVAR FERRETERIA	VALOR TOTAL	JUSTIFICACION
https://www.ferreteriabervar.com/products/bastidor-4x4-liston?srsltid=AfmBOorjxsTzkvGmgrzDjlyHsD5KqBDG74CpaTC_o7vokYavFzb3yk2N	$ 2.666,67	POR PRECIO Y CALIDAD
CONTACTO:		

Angeo Mosquitero Malla Aluminio

https://macho.com.co/mallas-colmallas/anjeo-galvanizado-090-x-30-mts-r894?srsltid=AfmBOorF5kr6pxPCtafD-gj4VDGY-xPplVj8UzEXbt9Qlt0Lm9dbaXQG

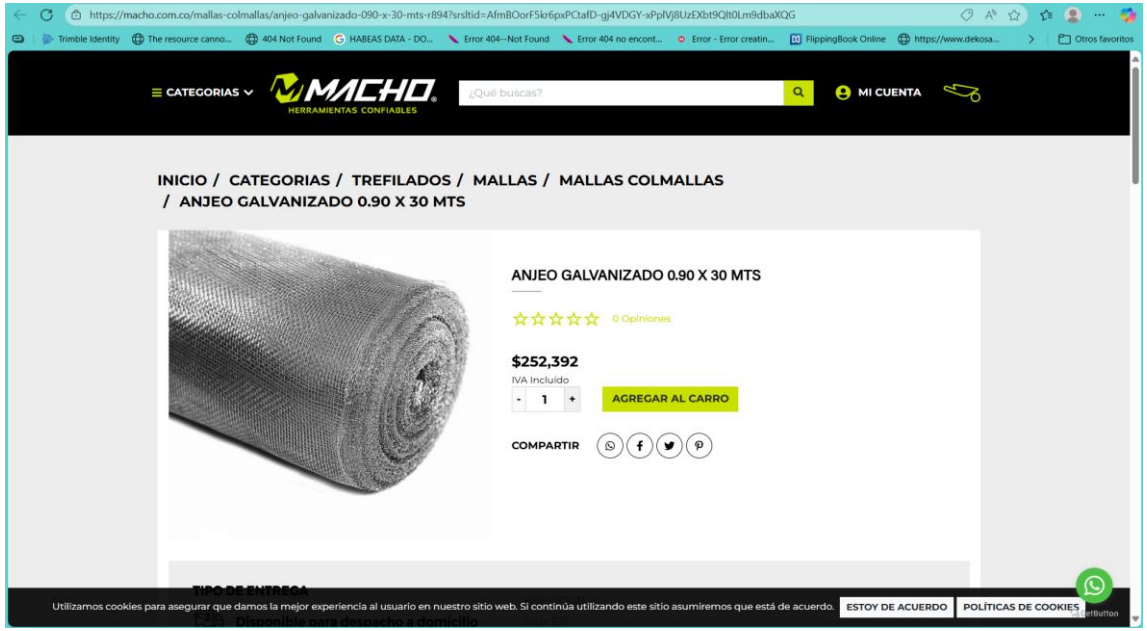

MALLA DE 0,90 X 30 MT = 27 MT	VALOR TOTAL X 27M2	$	252.392,00	VALOR POR M2	$ 9.347,85

https://www.producabos.com/producto/angeo-galvanizado-1-20-x-30-mts-colmallas/



MALLA DE 1,20 X 30 MT = 36MT	VALOR TOTAL X 36M2	$	330.000,00	VALOR POR M2	$ 9.166,67


https://www.ferreteriabervar.com/products/angeo-fibra-de-vidrio-gris-rollo-30mts?srsltid=AfmBOorLPNFlJC6l865rbXiSB5nevoZwr2bDgFJzijgyHZGnnxJHWi2s



MALLA DE 1,00 X 30 MT = 30MT	VALOR TOTAL X 30M2	$	381.900,00	VALOR POR M2	$ 12.730,00


Liston madera 4x4

https://www.ferreteriabervar.com/products/bastidor-4x4-liston?srsltid=AfmBOorjxsTzkvGmgrzDjlyHsD5KqBDG74CpaTC_o7vokYavFzb3yk2N

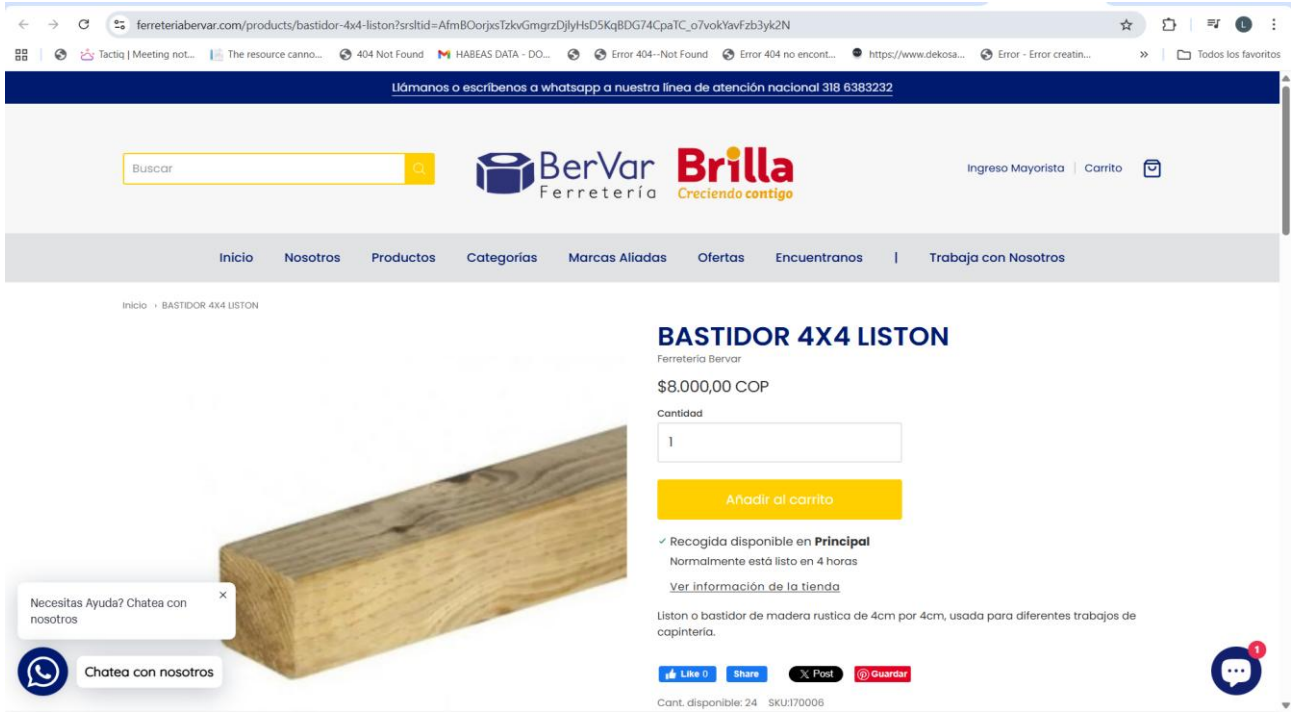


LISTON X 3 METROS	$	8.000,00	VALOR X 1ML	$	2.666,67

https://forandes.com/producto/durmiente-pino-4-cm-x-4cm-por-unidad/?srsltid=AfmBOoqkRhXGv7briBQXUAUAcqMXZeNhEkBfbDrxKkvWVJaPCPk5XnVD

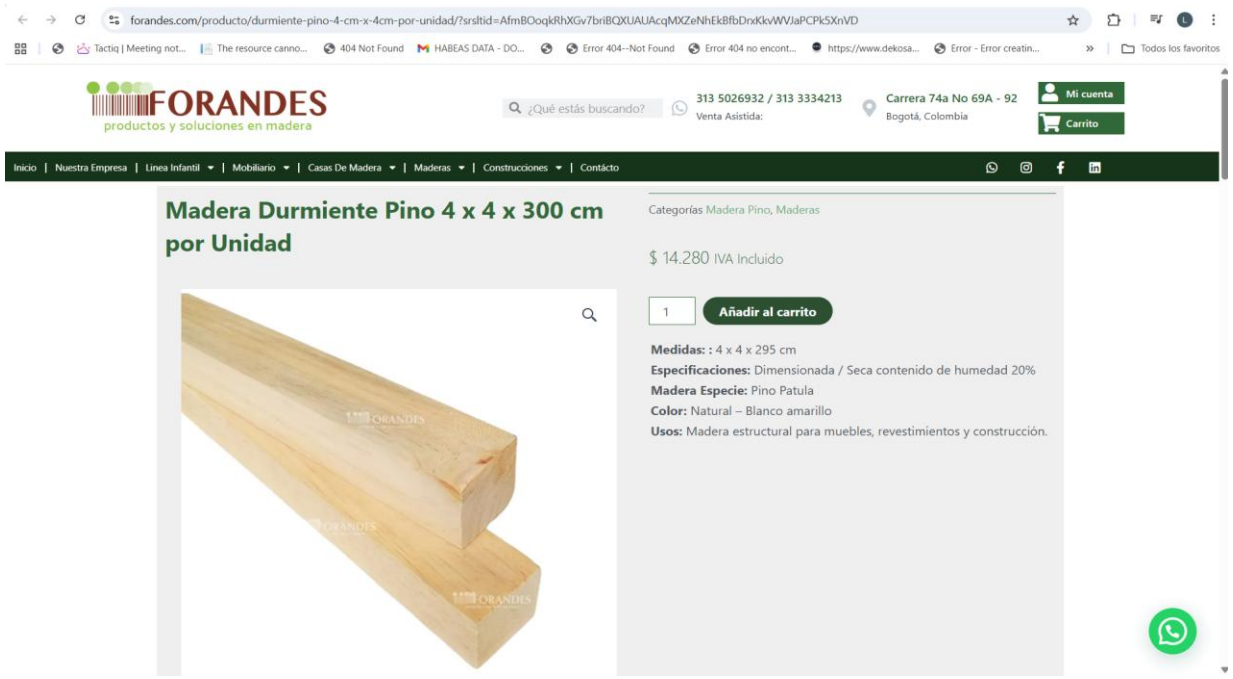



LISTON X 3 METROS	$	14.280,00	VALOR X 1ML	$	4.760,00

https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/48757/pino-2x2-pulgadas-32-mts-cepillado-41x41cm/48757/

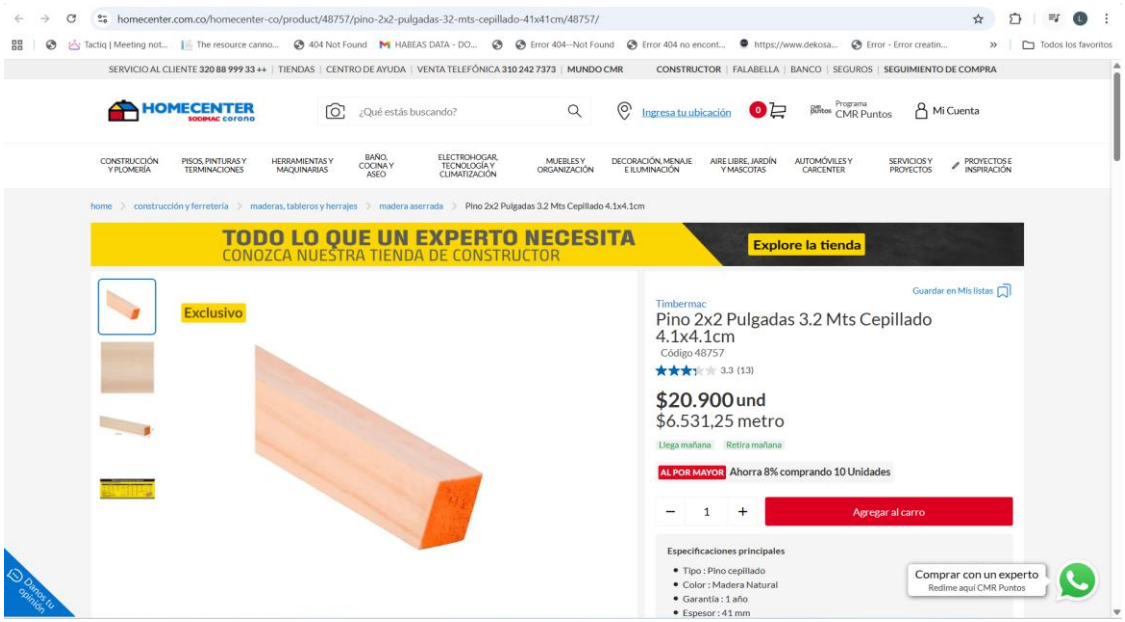

LISTON X 3,2 METROS	$	20.900,00	VALOR X 1ML	$	6.531,25

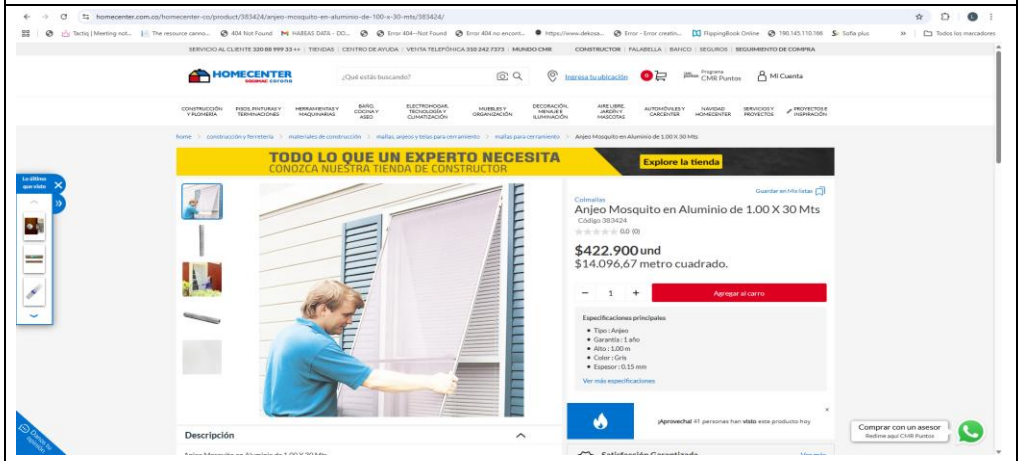PROPUESTA IBP INGENIERIA SAS				
Angeo Mosquitero Malla Aluminio				
				
MALLA DE 1,0 X 30 MT = 30 MT	VALOR TOTAL X 30M2	$ 422.900	VALOR X M2	$ 14.096,67

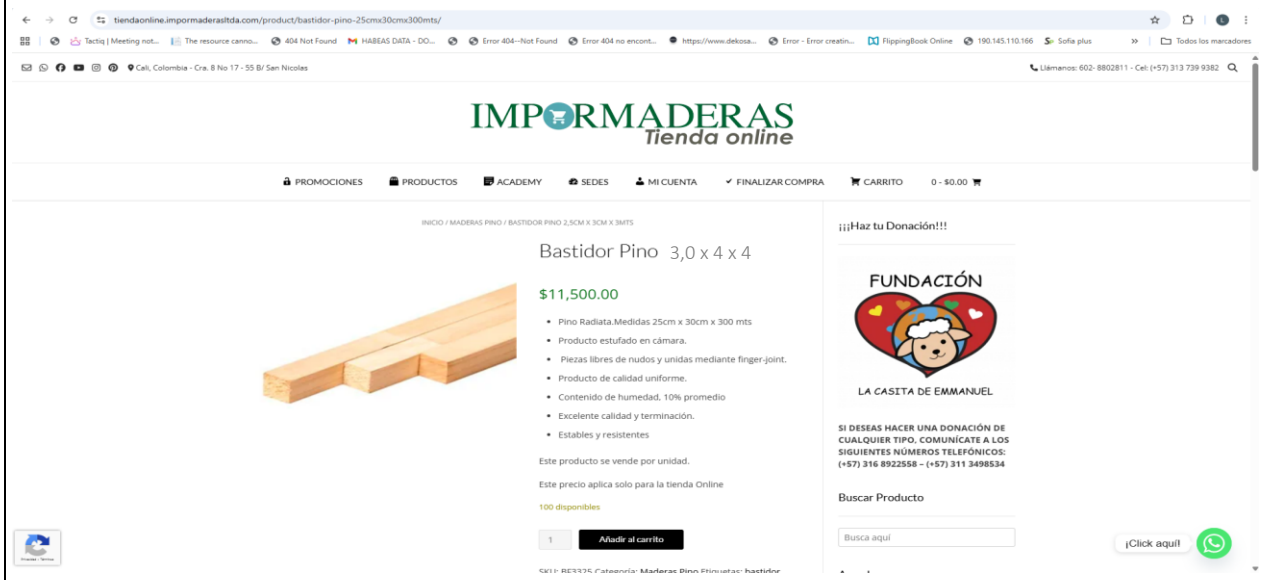Liston madera 4x4

VALOR POR 3MT=$11.500 DIVIDIDO EN 3 = $3.833,33 X ML

CODIGOS CONTRACTUALES – NP015

EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO
DD	HERRAMIENTA MENOR -CUADRILLA DD CARPINTERÍA EN MADERA X HORA	HR	$ 2.184,64
M1	ALQUILER ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICADO (SECCIÓN DE 1.50X1.50M)	SECCIÓN·DIA	$ 18.882,67

MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR X HR
TIPO AA	CUADRILLA TIPO AA ALBAÑILERÍA (1 OFICIAL T1 + 1 AYUDANTE T1)	$ 28.876,00

ITEM NP 015	PROTECCIÓN PARA CERRAMIENTO DE VANOS DE VENTANAS, PUERTAS Y VITRALES PERIMETRALES

3. UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

El APU no previsto correspondiente a la protección para cerramiento de vanos de ventanas, puertas y vitrales perimetrales contempla la instalación de cerramientos temporales con el fin de garantizar la preservación del patrimonio y la seguridad de los espacios durante el desarrollo de las obras de restauración del edificio Capilla y Convento del Hospital San Juan de Dios. La actividad incluye la colocación de malla tipo angeo mosquitera en aluminio fijada sobre listones de madera 4x4, así como el uso de andamios certificados para la instalación en niveles superiores, evitando el ingreso de agentes externos y reduciendo riesgos sobre los bienes patrimoniales.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Planeación y preparación

- Delimitación y señalización de las áreas de trabajo.
- Medición de vanos de ventanas, puertas y vitrales a proteger.
- Corte y preparación de listones de madera.

Ejecución del cerramiento

- Instalación de andamios multidireccionales certificados para acceso seguro.
- Colocación y fijación de listones de madera 4x4 en el perímetro de los vanos.
- Tensado e instalación de la malla angeo mosquitera de aluminio.
- Verificación de estabilidad y acabado final.

Finalización

- Limpieza del área de trabajo y retiro de sobrantes.
- Registro fotográfico del cerramiento instalado.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

- Cubrimiento total de los vanos especificados.
- Fijación firme y estable de la malla.
- Correcta alineación de los listones y terminaciones sin defectos.

7. ENSAYOS A REALIZAR

- Inspección visual de la instalación.
- Verificación de fijaciones y tensado de la malla.

8. MATERIALES

- Malla angeo mosquitera en aluminio.
- Listones de madera 4x4.

9. EQUIPO

- Herramientas menores de carpintería.
- Andamio multidireccional certificado.

10. DESPERDICIOS

Incluidos ☒ Si ☐ No

Retales de madera y malla generados durante la instalación, a retirar del área de trabajo.

11. MANO DE OBRA

Incluidos ☒ Si ☐ No

Cuadrilla Tipo AA de albañilería (1 oficial T1 + 1 ayudante T1).

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Lineamientos del Ministerio de Cultura para conservación de bienes patrimoniales.
- Normas de seguridad y salud en el trabajo (Ley 1562 de 2012 y Resolución 1409 de 2012).
- Especificaciones técnicas de materiales empleados.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La actividad será medida y pagada por metro cuadrado (M^2) de cerramiento instalado, previa verificación de la interventoría.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de cubrimientos incompletos, fijaciones deficientes o incumplimiento de protocolos de seguridad, la actividad deberá repetirse o corregirse por cuenta del contratista, sin reconocimiento económico adicional.

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LO SABERES

Culturas

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 4346-2024, CUYO OBJETO ES LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CAPILLA - CONVENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO.

ITEM NO PREVISTO

NP 17

Culturas	APROBACIÓN ITEM NO PREVISTO	Página 1 de 2
	☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado	Código: F-GIN-105 Versión: 4 Fecha: 25/jun/2020

FECHA: 9/09/2025

PROYECTO: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - EDIFICIO CAPILLA CONVENTO

ÍTEM: ITEM NP 017 — SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRECUBIERTA EN ESTRUCTURA EN GUADUA Y TEJA DE ZINC CAL 35

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **CAPITULO:** ITEMS NO PREVISTOS

A. EQUIPOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

B. MATERIALES

CÓDIGO		UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V. UNITARIO
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRECUBIERTA EN ESTRUCTURA EN GUADUA Y TEJA DE ZINC CAL 35	UND	$ 225.000,00	1,0	$ 225.000,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ 225.000,00

C. MANO DE OBRA

CÓDIGO	CATEGORÍA	CANTIDAD	JORNAL TOTAL	TARIFA / Hora	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -

D. TRANSPORTE

CÓDIGO	MATERIAL	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	V. UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

ELABORÓ: HAROLD EDGARDO SOSA SABOYA

TOTAL PRECIO UNITARIO: $ 225.000,00

Nota: Para el Análisis del Precio Unitario, solo se deben tener en cuenta los costos directos.

E. NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN	
Normatividad asociada: Normativa del Ministerio de las Culturas sobre restauración de bienes inmuebles.	

Especificaciones de construcción:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN – INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN GUADUA

PROYECTO: CAPILLA MONUMENTOS

1. PREPARACIÓN DEL ÁREA Y CONDICIONES INICIALES

Previo al inicio de las actividades constructivas, se realizará una **inspección técnica integral del sitio**, verificando:

- Estado estructural de la cubierta existente (elementos portantes, correas, cerchas).
- Geometría, niveles y pendientes actuales.
- Condiciones de acceso y maniobrabilidad.
- Identificación de interferencias físicas (instalaciones, elementos arquitectónicos o estructurales existentes).

Se validará la correspondencia de estas condiciones con los **planos estructurales aprobados**, especialmente en lo relacionado con:

- Altura proyectada de la sobrecubierta.
- Puntos de apoyo independientes.
- Separación entre estructura nueva y cubierta existente (cámara de ventilación).

Adecuación del área

- Limpieza general del área de trabajo.
- Retiro de elementos sueltos o en desuso.

- Protección de la cubierta existente para evitar daños durante la ejecución.

Seguridad industrial

- Instalación de andamios certificados, conforme a normativa vigente de trabajo en alturas.
- Implementación de líneas de vida, puntos de anclaje y sistemas anticaídas.
- Señalización preventiva y delimitación del área.
- Socialización de riesgos y procedimientos con el personal.

2. EJECUCIÓN DE APOYOS Y FUNDACIONES EN CONCRETO

Dado que la sobrecubierta trabaja como un sistema independiente, se ejecutarán apoyos puntuales en concreto, diseñados para transmitir adecuadamente las cargas al suelo.

2.1. Preparación de la base

- Nivelación y compactación del terreno natural.
- Verificación de capacidad portante del suelo.

2.2. Placa de distribución

- Construcción de placas de concreto de 10 cm de espesor, reforzadas con malla electrosoldada.
- Función:
    - Distribuir cargas.
    - Evitar asentamientos diferenciales.
    - Servir como base nivelada para los apoyos.

2.3. Conformación de apoyos

- Uso de **elementos cilíndricos (canecas de 55 L)** como formaleta perdida.
- Fundida con concreto estructural (mínimo f’c según diseño).
- Inclusión de:
    - Platinas o pernos de anclaje embebidos.
    - Elementos metálicos de conexión con la guadua.

2.4. Control técnico

- Verificación de:
    - Verticalidad (aplomado).
    - Nivelación entre apoyos.
    - Alineación según ejes estructurales.
- Curado del concreto mínimo 7 días antes de recibir carga.

3. FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA EN GUADUA

La estructura se proyecta como un sistema elevado, separado de la cubierta existente, con el fin de:

- Mejorar ventilación.
- Reducir carga térmica.
- Proteger la cubierta original.

3.1. Selección y tratamiento del material

- Guadua **inmunizada y tratada** contra humedad, insectos y hongos.

- Verificación de:
    - Rectitud.
    - Ausencia de fisuras longitudinales críticas.
    - Diámetro y espesor adecuados según diseño.

3.2. Corte y preensamblaje

- Corte según planos estructurales.
- Ejecución de:
    - Entalles.
    - Perforaciones controladas.
    - Preparación de uniones.
- Prearmado en piso para verificación dimensional.

3.3. Montaje estructural

- Izaje de elementos mediante medios manuales o mecánicos.
- Instalación de:
    - Columnas o elementos verticales sobre apoyos en concreto.
    - Cerchas principales.
    - Vigas secundarias y correas.

3.4. Sistema de uniones

- Uso de:
    - Pernos galvanizados.
    - Platinas metálicas.
    - Abrazaderas y amarres estructurales.

- Consideraciones:
    - Evitar aplastamiento de la guadua.
    - Uso de arandelas para distribución de carga.
    - Protección anticorrosiva en elementos metálicos.

3.5. Control geométrico

- Verificación permanente de:
    - Nivelación.
    - Aplome.
    - Escuadría.
    - Rigidez del conjunto.
- Instalación de elementos de arriostramiento para estabilidad lateral.

4. INSTALACIÓN DE LA SOBRECUBIERTA (TEJA DE ZINC)

La cubierta se instalará sobre la estructura de guadua garantizando condiciones de estanqueidad, ventilación y durabilidad.

4.1. Disposición general

- Instalación desde el **alero hacia la cumbrera**.
- Orientación según dirección del viento predominante.

4.2. Sistema de fijación

- Tornillos autoperforantes galvanizados.
- Arandelas de neopreno para sellado.

4.3. Traslapos

- Traslapo lateral: mínimo una onda.
- Traslapo longitudinal: mínimo 20 cm.

4.4. Detalles constructivos

- Instalación de:
  - Cumbreras.
  - Remates laterales.
  - Elementos de borde.
- Aplicación de sellantes en puntos críticos para evitar filtraciones.

4.5. Consideración clave (sobrecubierta)

- Se debe garantizar una **separación suficiente entre la cubierta existente y la nueva**, permitiendo:
  - Circulación de aire.
  - Disipación térmica.
  - Evacuación de humedad.

5. CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACIÓN FINAL

5.1. Inspección estructural

- Revisión de:
  - Uniones.
  - Rigidez del sistema.
  - Correcta transmisión de cargas.

5.2. Inspección de cubierta

- Verificación de:
    - Alineación de tejas.
    - Fijaciones completas.
    - Ausencia de filtraciones.

5.3. Pruebas funcionales

- Inspección visual ante lluvias o simulación de escorrentía.
- Verificación de comportamiento frente a viento.

5.4. Ajustes

- Corrección de:
    - Elementos sueltos.
    - Sellos deficientes.
    - Desalineaciones.

6. LIMPIEZA Y ENTREGA


- Retiro de residuos de obra.
- Limpieza de la cubierta y estructura.
- Disposición adecuada de sobrantes.

Finalmente, se realizará la **entrega técnica del sistema**, dejando constancia del cumplimiento de especificaciones estructurales, constructivas y de seguridad.

F. JUSTIFICACIÓN ITEM NO PREVISTO

La modificación de la actividad se justifica en la necesidad de sustituir la estructura metálica inicialmente prevista en el contrato por una sobrecubierta provisional en guadua inmunizada con teja de zinc galvanizado calibre 35, dado que la solución original resultaba más invasiva y demandaba mayores intervenciones técnicas sobre la estructura patrimonial existente. La utilización de guadua ofrece una alternativa más liviana, flexible y de rápida instalación, que reduce significativamente el impacto sobre los elementos arquitectónicos originales, facilita las maniobras de montaje y desmontaje, y mantiene la estabilidad estructural requerida para la protección temporal del edificio. Adicionalmente, esta solución mejora la capacidad de adaptación a las condiciones climáticas y morfológicas del entorno, minimiza el riesgo de filtraciones y optimiza los recursos económicos y logísticos del proyecto. Desde el punto de vista de conservación, la guadua, al ser un material natural y reversible, garantiza una intervención compatible con los principios de mínima afectación y sostenibilidad patrimonial, contribuyendo a preservar la integridad del conjunto arquitectónico del Edificio Capilla Convento durante las labores de intervención en la cubierta original.

Nota 2.: Adjuntar la cotización del material en el mercado con aprobación del interventor.

INTERVENTORÍA - DIRECCION DE INTERVENTORIA	
NOMBRE	YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA
FIRMA	

CONTRATISTA - DIRECCION DE OBRA	
NOMBRE	WILSON DANILO VARGAS MARTINEZ
FIRMA	

PROYECTO:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - EDIFICIO CAPILLA CONVENTO		
ÍTEM:	**ITEM NP 017**	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRECUBIERTA EN ESTRUCTURA EN GUADUA Y TEJA DE ZINC CAL 35	
UNIDAD DE MEDIDA:	M2	**CAPITULO:**	ITEMS NO PREVISTOS

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES					**PROPUESTA ECONOMICA IBP INGENIERIA SAS**
DESCRIPCION	**UNIDAD DE MEDIDA**	**PROVEEDOR 1: Construcciones y Restauraciones Rafael Español SAS**	**PROVEEDOR 2: UNIVERSAL SEC SAS**	**PROVEEDOR 3: VIGAR DESARROLLOS Y ASESORIAS SAS**	**PROVEEDOR 4: VISION INGENIERIA SAS**
		PRECIO UNITARIO CON IVA	**PRECIO UNITARIO CON IVA**	**PRECIO UNITARIO CON IVA**	**PRECIO UNITARIO CON IVA**
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRECUBIERTA EN ESTRUCTURA EN GUADUA Y TEJA DE ZINC CAL 35	M2	**$ 225.000**	$ 400.585	**$ 437.213**	**$ 330.000,00**

PROVEEDOR SELECCIONADO

PROVEEDOR 1: Construcciones y Restauraciones Rafael Español SAS	**VALOR TOTAL**	**JUSTIFICACION**
DIRECCION: DG 63B N°73F - 51 SUR	**$ 225.000,00**	La presente actividad se justifica en la necesidad de proteger adecuadamente las áreas interiores del Edificio Capilla Convento durante las intervenciones técnicas en su cubierta original, asegurando así la conservación del patrimonio y la continuidad de los trabajos sin riesgo de afectaciones por agentes climáticos. La instalación de una sobrecubierta provisional en guadua inmunizada y teja de zinc galvanizado calibre 35, permite establecer una solución liviana, resistente e impermeable, que se adapta a las condiciones del entorno y garantiza estabilidad estructural temporal. Esta medida contempla integralmente el suministro, corte, armado, elevación y fijación de la estructura, así como la instalación segura de la cubierta, incluyendo todos los recursos materiales, humanos y técnicos necesarios para su ejecución eficiente y segura.
CONTACTO:320-2818833 - RAFAEL ESPAÑOL		



Construcciones y
Restauraciones Rafael Español SAS
NIT 900.872.778-7

Bogotá D.C. Julio 31 de 2025

Señores
Consorcio Alianza Patrimonial.
Proyecto de restauración integral Capilla-Convento
Hospital San Juan de Dios-Bien de Interés Cultural Nacional.
L. C,

Referencia: CONTRAPROPUESTA Técnico-Económica para la construcción de la sobrecubierta del BIC-Capilla convento.

Respetados Señores,

Por medio de la presente, me permito presentar propuesta económica para la construcción de la sobrecubierta para el inmueble patrimonial Capilla-Convento que hace parte del complejo Hospitalario San Juan de Dios, declarado Bien de interés Cultural del ámbito Nacional.

Es importante informar que mi empresa, su experiencia ha sido en proyectos para la recuperación y protección de bienes de interés cultural, proyecto de restauración y reforzamiento estructural, intervención de cubiertas, intervención en maderas y sistemas constructivos históricos dentro de la memoria colectiva de ciudad por este motivo es un plus importante para la consolidación y ejecución de proyectos de restauración e intervención.

Luego de la invitación para conocer y recorrer las instalaciones del proyecto me permito presentar la siguiente propuesta para la ejecución de dicho proyecto.

Es importante resaltar que esta propuesta técnica se basa dentro de los criterios de conservar la integridad del inmueble por lo tanto se plantea una sobrecubierta en guadua con cubierta en lamina de zinc, como elemento independiente, que garantice la integridad del Bic como tal, tanto en su integridad estructural como los valores arquitectónicos e histórico que no vulneren estos elementos que hacen parte del lenguaje integral al inmueble patrimonial.

- **PROPUESTA TECNICA**

1. **IMPLANTACION-LOCALIZACION Y REPLANTEO.**

Una vez se tenga el diseño planteado propuesto aprobado, se realizará en campo la localización y replanteo de dicha sobrecubierta tanto en el modulo de la capilla como el claustro del convento, se garantiza la circulación perimetral para los trabajos en primer piso.

2. **INSTALACIÓN DE CANECAS DE 55 GALONES COMO SOPORTE DE ESTRUCTURAL COLUMNAS**

para garantizar la integridad del inmueble no se plantea ni excavaciones ni construcciones de cimentaciones que afecten el desarrollo de la obra, esto ayudara que no se necesite un monitoreo arqueológico para la cimentación por lo tanto se plantea una solución práctica y funcional, una vez se replantee los ejes estructurales se prosigue con la ubicación de dichas canecas donde se propone un relleno donde la tercera parte sea de material compactado y capa final de concreto, allí se iza las columnas conformada por elementos de guadua de diámetro de 12 a 15 cms de diámetro.

3. **ELEMENTOS ESTRUCTURALES COLUMNAS, CERCHAS, CORREAS Y CUMBRERA.**

Una vez izada los elementos de columnas en guadua de 12 a 15 cms se complementa un elemento que articule y garantice estabilidad estructural un elemento de viga perimetral en guadua a su vez un arriostramiento en X para los elementos verticales (columnas) que garantice la rigidez estructural para este elemento, luego de instalación de una cercha en guadua se complementa con la instalación de correas para complementar y garantizar un solo elemento estructural.


4. **INSTALACION DE CUBIERTA.**

Una vez terminado el componente estructural en guadua, se continua el proceso constructivo con la instalación de teja de zinc calibre 35 que garantice la continuidad en la ejecución de actividades dentro del proceso constructivo de la restauración e intervención esta teja será instalada y fijada con elementos de amarres metálicos con neopreno.


5. PASARELA PERIMETRAL EXTERIOR

Una vez terminada la construcción de la sobrecubierta temporal en guadua se propone la instalación perimetral de una pasarela perimetral exterior a nivel de alero, ese elemento garantiza la óptima ejecución de las obras de intervención en la cubierta, así mismo como circulación de personal en altura y trasiegos de materiales.

PROPUESTAS DE DISEÑOS EMPLEADAS EN VARIOS PROYECTOS EJECUTADOS POR LA FIRMA.

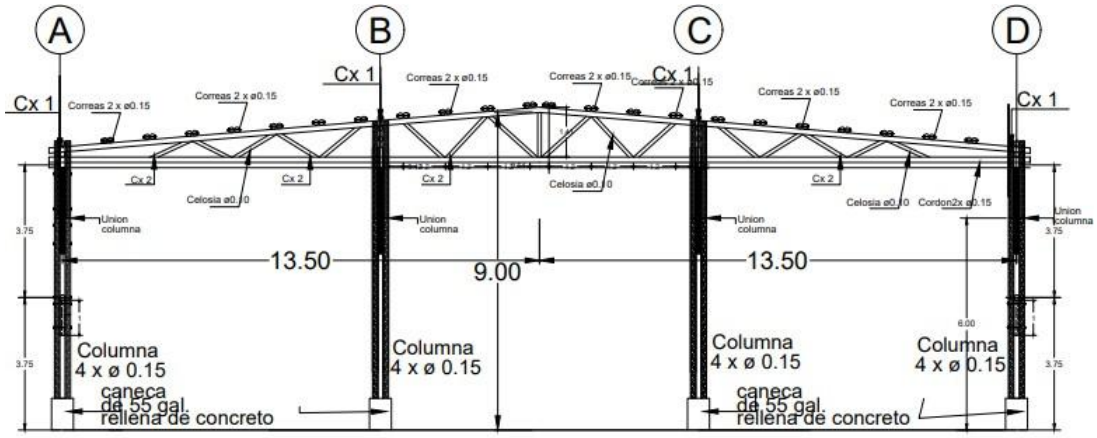


Corte transversal Modulo 1 y 2 Esc 1 : 75

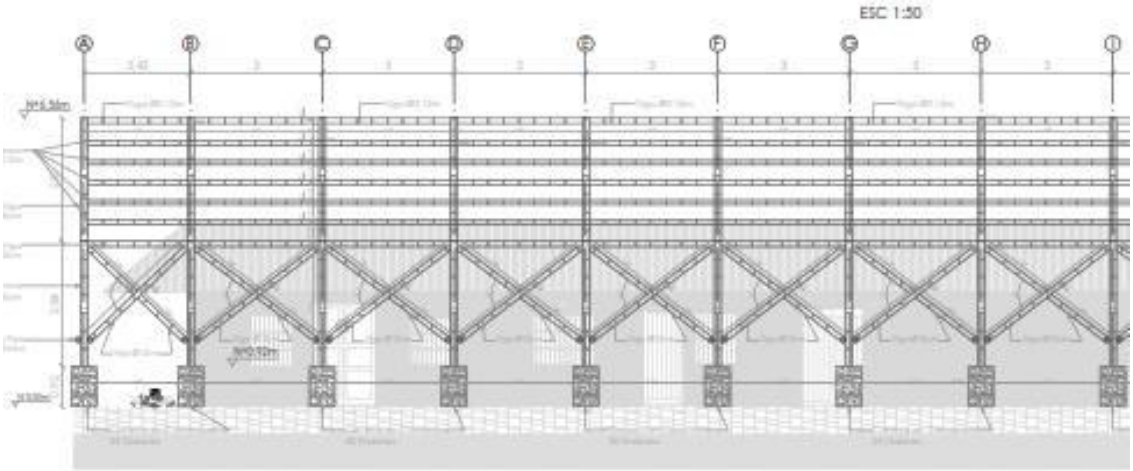

Construcciones y

Restauraciones Rafael Español SAS

NIT 900.872.778-7

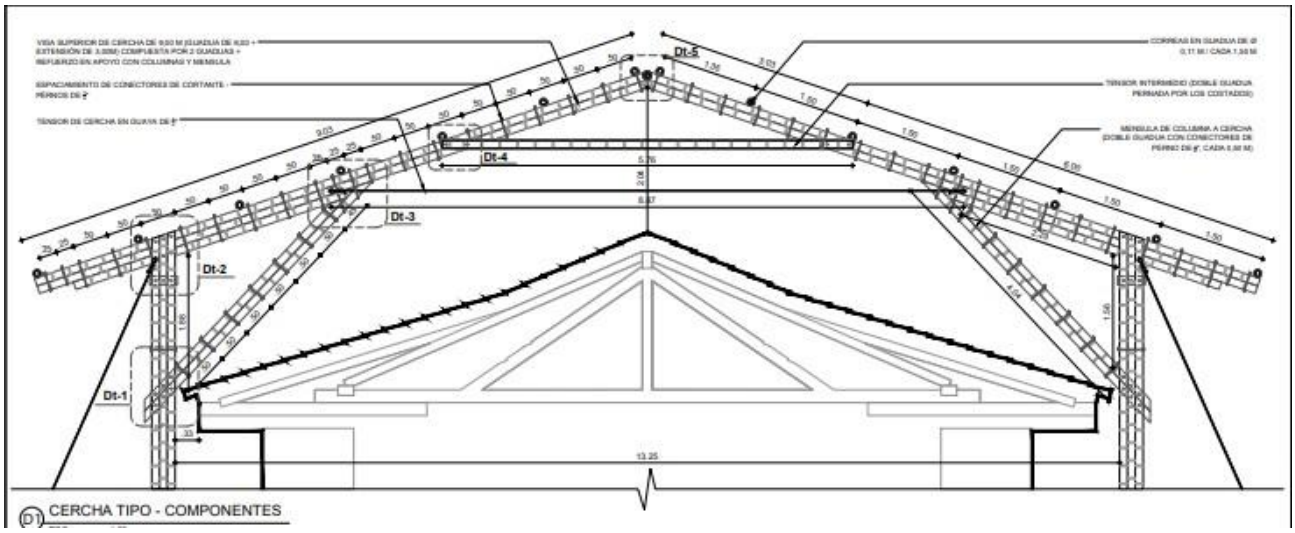

- **PROPUESTA ECONOMICA OPCION 1**
  SOBRECUBIERTA A TODO COSTO CON PASARELA.

PROPUESTA ECONOMICA					
N	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRECUBIERTA EN ESTRUCTURA EN GUADUA Y TEJA DE ZINC CAL 35 (incluido AIU+IVA SOBRE LA UTILIDAD)	M2	2094	$225.000,00	$471.150.000,00

- **TIEMPO DE EJECUCION:**

Se contempla 2 meses y medio en la ejecución.

- **VALIDEZ DE LA OFERTA:**

1O días después de reciba la propuesta técnico-económica.

- **EQUIPO DE TRABAJO**

- Arquitecto restaurador asesor.
- Residente de obra- Arquitecto dedicación 100%
- Maestro de obra-dedicación 100%
- Inspector de obra- dedicación 100%
- Inspector SST con curso de alturas
- Mano de obra calificada.
- Implementación de dos cuadrillas de obra: 1 cuadrilla para capilla y 1 cuadrilla para claustro convento.

ENTREGABLES

- DISEÑO ESTRUCTURAL.
- MEMORIAS DE CALCULO

- **REFERENCIAS LABORALES.**

- Arq. Restaurador Max Ojeda 310-2321991
- Arq. Restaurador Néstor Vargas 315-3578237
- Arq. Restaurador Pedro Rojas 300-2097220
- Ing. Restaurador Samuel Carrillo 311-2717072
- Arq. Restaurador Carlos Arteaga 317-3713143

- **NOTA- una vez sea aprobada la propuesta se entregará diseño de sobrecubierta, diseño de pasarela, modelo REVIT. Planimetría técnica, detalles constructivos.**
- **Una vez aprobada la propuesta, legalizada mediante el contrato de obra se expedirán las pólizas correspondientes.**
  Para los cortes de obra se realizarán de acuerdo a las cantidades ejecutadas.

En espera de estar dentro de los estándares contemplados para la selección de la propuesta.

RAFAEL ESPAÑOL
Representante legal
Celular 320-2818833

VIGAR DESARROLLOS Y ASESORIAS SAS

www.vigarcolombia.com

Bogotá, Julio 29 de 2025

Arquitecto
HAROLD SOSA
PROYECTO CAPILLA CONVENTO
Complejo Hospitalario san Juan de Dios

ASUNTO: COTIZACION SOBRECUBIERTA EN GUADUA

Estimado arquitecto Sosa

De conformidad con su solicitud, nos permitimos presentar propuesta económica para la construcción de sobrecubierta en guadua con teja de zinc para la protección del inmueble patrimonial y así garantizar la estabilidad en la ejecución de las obras de restauración integral de los edificios capilla convento.

COTIZACION A TODO COSTO - PROPUESTA					
ITEM	**ACTIVIDADES / DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRECUBIERTA EN ESTRUCTURA EN GUADUA Y TEJA DE ZINC CAL 35 INCLUIDO AIU + IVA	M2	2094.00	$437.213,00	$915.524.022.00

FORMA DE PAGO

ANTICIPO Y LEGALIZACION DE CONTRATO	40%
CORTES DE OBRA QUINCENALES	35%
ENTREGA FINAL	25%

DURACION DE LA EJECUCION DE OBRA: 3 y medio meses a partir de legalización y firma de acta de inicio.

La presente propuesta no contempla:

- Andamio certificado
- Retiro de escombros certificación y disposición de material
- Desmonte de sobrecubierta

Reciba un cordial saludo

OSCAR E. VILLAMIZAR GARZON
ARQUITECTO
REPRESENTANTE LEGAL
VIGAR DESARROLLOS Y ASESORIAS SAS
NIT 900.057.731-6

UNIVERSAL SEC SAS

COTIZACION 132-2025

Bogotá, 29 de julio de 2025

Consorcio
Alianza Patrimonial
Restauración integral edificio capilla convento
Harold Edgardo Sosa
Arquitecto
Bogotá D.C.

Ref.: cotización para la construcción de sobrecubierta en guadua para adelantar trabajos de restauración edificio capilla convento-complejo Hospitalario San Juan de Dios.

Cordial saludo,

Como empresa experta en la ejecución de obras de restauración, me permito enviar oferta económica cuyo objeto es para la construcción de una sobrecubierta en materialidad de guadua y cubierta con teja de zinc, este elemento provisional garantiza una optima ejecución para todo proyecto de intervención de edificaciones patrimoniales, por lo tanto me permito ofertar dicha construcción.

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRECUBIERTA EN ESTRUCTURA EN GUADUA Y TEJA DE ZINC CAL 35 – INCLUIDO AIU_IVA	M2	2094	$ 400.585.00	$ 838.824.990.00


- TIEMPO DE EJECION: 4 MESES Y MEDIO
- VALIDEZ DE LA OFERTA: 1 MES DEPUES DE RADICADO
- FORMA DE PAGO : ANTICIPO 30% CORTES DE OBRA 60% ENTREGA 10%

OBSERVACIONES:

1. El consorcio debe entregar diseños estructurales para la ejecución de la sobrecubierta.
2. El consorcio debe facilitar andamios para ejecutar la sobrecubierta.
3. El consorcio debe retirar escombros y material sobrante en la ejecución de la obra.
4. El consorcio debe asignar campamento de obra para el personal de la compañía.

Sin ningún adicional agradecemos su atención.

Cordialmente,



Samuel Eduardo Carrillo Rojas
Representante Legal
C.C. No. 7.717.488 de Neiva

Calle 98 No. 70-91 Oficina 812
BOGOTÁ D.C.

VISIÓN INGENIERÍA S.A.S.

www.visioningenieria.com.co

Bogotá D.C., octubre de 2025

Ingeniero
Mauricio Ávila
IBP INGENIERIA SAS
Proyecto Capilla Convento
Complejo Hospitalario San Juan de Dios

ASUNTO: COTIZACIÓN – SOBRECUBIERTA EN GUADUA

Estimado ingeniero:

De conformidad con su solicitud, VISIÓN INGENIERÍA S.A.S. se permite presentar la propuesta económica para la construcción de una sobrecubierta provisional en guadua inmunizada y teja de zinc galvanizado calibre 35, con el fin de garantizar la protección del inmueble patrimonial y asegurar la estabilidad y continuidad de las obras de restauración integral de los edificios Capilla y Convento del Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

PROPUESTA ECONÓMICA – A TODO COSTO

Ítem	Actividades / Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.00	Suministro e instalación de sobrecubierta provisional en estructura de guadua	m²	2.094,00	$330.000,00	$691.020.000,00

	inmunizada y teja de zinc galvanizado calibre 35, incluyendo todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, seguridad industrial, administración, imprevistos, utilidad y tributos aplicables.				

CONDICIONES COMERCIALES

• Forma de pago:

- 40 % anticipo a la legalización del contrato
- 35 % mediante cortes de obra quincenales
- 25 % contra entrega final y acta de recibo a satisfacción


• Plazo de ejecución:

3 meses y medio a partir de la firma del acta de inicio.

• La propuesta no incluye:
  - Andamios certificados
  - Retiro y disposición final de escombros
  - Desmonte posterior de la sobrecubierta

Reciba un cordial saludo,

Atentamente,



Santiago Agudelo
Representante Legal
VISIÓN INGENIERÍA S.A.S.
www.visioningenieria.com.co

ITEM NP 017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN ESTRUCTURA EN GUADUA Y TEJA DE ZINC CALIBRE 35

3. UNIDAD DE MEDIDA M2

4. DESCRIPCIÓN

Esta actividad contempla el suministro e instalación de una sobrecubierta provisional, compuesta por estructura liviana en guadua inmunizada y lámina de teja de zinc galvanizado calibre 35, con el fin de proteger las áreas interiores durante las intervenciones técnicas en la cubierta original del Edificio Capilla Convento.

Incluye el corte, ensamblaje, elevación y fijación de la estructura de guadua, así como la instalación alineada y segura de la teja metálica, garantizando impermeabilidad, resistencia y estabilidad. Se incorporan todos los materiales, mano de obra, herramientas, transporte y equipos necesarios para su correcta ejecución.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

5.1 PREPARACIÓN DEL ÁREA

- Revisión técnica del sitio y diseño estructural aprobado, Instalación de Andamios
- Limpieza y despeje del área de instalación.
- Señalización, cerramiento y montaje de sistema de seguridad para trabajo en alturas.

5.2 INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA EN GUADUA

- Corte y preensamblaje de la guadua inmunizada según especificaciones técnicas.
- Montaje de cerchas y elementos de apoyo sobre puntos definidos.
- Unión mediante conectores metálicos, amarres estructurales o pernos, según el diseño.
- Verificación de nivelación y firmeza de la estructura.

5.3 INSTALACIÓN DE LA TEJA DE ZINC

- Colocación ordenada desde el alero hacia la cumbrera, respetando el sentido del viento predominante.
- Traslape lateral mínimo de una cresta y longitudinal de 20 cm.
- Fijación con tornillos autoperforantes con arandela de neopreno en cumbreras y solapes.
- Sellado en encuentros y remates, si se requiere, instalación de teja en zinc

5.4 REVISIÓN FINAL Y LIMPIEZA

- Inspección de alineación, fijaciones y posibles filtraciones.
- Refuerzos o correcciones donde sea necesario.
- Limpieza general del área y disposición del material sobrante.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

- Alineación uniforme de la cubierta: ±2 cm.
- Traslapes correctamente ejecutados.
- Ausencia de filtraciones o piezas sueltas.
- Estructura de guadua sin deformaciones ni giros.

7. ENSAYOS A REALIZAR

- Inspección visual y verificación estructural por parte de la supervisión técnica.
- Prueba de impermeabilidad (simulación o inspección posterior a lluvia leve).

8. MATERIALES

- Guadua inmunizada, libre de hongos, plagas o humedad.
- Teja de zinc galvanizado calibre 35.
- Tornillos autoperforantes con arandela de neopreno.
- Conectores metálicos, pernos, platinas y elementos de unión.
- Sellantes impermeables (cuando aplique).

9. EQUIPO

- Herramientas manuales (sierras, taladros, alicates).
- Andamiaje certificado o plataformas móviles.
- Arnés y sistema de línea de vida para trabajo en alturas.
- Vehículo para transporte de material.

10. DESPERDICIOS

Incluidos ☒ Si ☐No

11. MANO DE OBRA

Incluidos ☒ Si ☐ No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Normativa del Ministerio de las Culturas sobre restauración de bienes inmuebles.
- Recomendaciones ICCROM e ICOMOS sobre retiro de materiales incompatibles.
- Manuales de intervención arquitectónica patrimonial.
- Planes de manejo e intervención del proyecto aprobado

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La actividad será medida por metro cuadrado (m^2) efectivamente instalado y verificado. El pago incluye el suministro de materiales, instalación, elementos de fijación, medidas de seguridad, transporte, limpieza y demás insumos requeridos para su correcta ejecución.

14. NO CONFORMIDAD

- No se aceptarán instalaciones que presenten:
- Fijaciones defectuosas o incompletas.
- Tejas desplazadas, con filtraciones o traslapes insuficientes.

- Estructura de guadua mal ensamblada, inestable o sin inmunización.

- Falta de documentación que certifique la calidad del material.

CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
NIT. 901.899.885-3
CONTRATO DE OBRA 4546-2024
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

INFORME DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

ÍTEM NP017: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBRECUBIERTA EN ESTRUCTURA EN GUADUA Y TEJA DE ZINC CALIBRE 35

PROYECTO: CAPILLA CONVENTO – COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
ÍTEM NP 017 – ÍTEMS NO PREVISTOS

1. ANTECEDENTES

En el marco de la ejecución del proyecto Capilla Convento, y con base en los lineamientos establecidos en el contrato vigente, se contempló la instalación de una sobrecubierta como medida provisional de protección durante las intervenciones estructurales y arquitectónicas en la cubierta original del inmueble. La solución propuesta inicialmente requería una estructura metálica con cerramiento en lámina, la cual implicaba un alto costo por metro cuadrado.

2. NECESIDAD DEL CAMBIO

Durante la revisión técnica y financiera del proyecto, se identificó que las cantidades requeridas de sobrecubierta en el diseño contractual superaban ampliamente el presupuesto asignado para esta actividad, lo que representaba una afectación directa en la viabilidad económica de la

obra y ponía en riesgo el cumplimiento del cronograma y alcance general del contrato.

3. PROPUESTA TÉCNICA HOMOLOGADA

Como alternativa viable y ajustada a las condiciones presupuestales, se definió el uso de una solución constructiva basada en estructura liviana de guadua inmunizada, complementada con teja de zinc galvanizado calibre 35, cumpliendo con todos los criterios de:

- Estabilidad estructural temporal
- Protección contra agentes climáticos
- Compatibilidad con el bien patrimonial intervenido
- Seguridad durante la ejecución de obras
- Facilidad de instalación y desmonte

Esta solución fue avalada por la supervisión técnica y verificada en mesa de trabajo con el equipo técnico del proyecto, validando su equivalencia funcional respecto a la solución originalmente definida.

4. VENTAJAS DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA

- Reducción significativa del costo por m², permitiendo ampliar el alcance de instalación sin extralimitar el presupuesto general de obra.
- Uso de materiales sostenibles y tradicionales (guadua), compatibles con la arquitectura del inmueble patrimonial.

- Facilidad de montaje, desmontaje y adaptación a las condiciones particulares del edificio.
- Mantenimiento de los niveles de seguridad, impermeabilidad y funcionalidad requeridos.

5. CONCLUSIÓN

El ítem "Suministro e instalación de sobrecubierta en estructura en guadua y teja de zinc calibre 35" se presenta como una alternativa técnicamente válida y financieramente favorable, homologada frente a la propuesta contractual inicial, permitiendo dar cumplimiento a los objetivos del proyecto sin superar el presupuesto asignado.

Esta decisión se enmarca dentro de los criterios de optimización técnica y económica, y fue concertada y avalada con la supervisión del contrato. Por lo tanto, se justifica su incorporación como ítem no previsto (NP 110) dentro del alcance de ejecución del proyecto Capilla Convento.

Culturas

Código TRD: 1110-2026

Bogotá, 30 de abril de 2025

LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 4346 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y EL CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL

CERTIFICA QUE

El **CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL** identificado con NIT N° 901.899.883-3, representado legalmente por Astrid Diaz Cabezas identificada con cédula de ciudadanía N° 38.235.389, integrado por BYGGA INFRAESTRUCTURA S.E. con NIT 901.206.662-1, PROYECTOS DE INGENERIA Y CONSTRUCCIONES A.R. SAS. con NIT 802.009.210-0, EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S con NIT 901.347.937-4 y OHM INVERSIONES S.A.S. con NIT 900.969.692-0, dio cumplimiento con lo establecido en la Cláusula 11 – Forma de pago del contrato de obra N° 4346 de 2024, permitiendo efectuar el pago del Acta de Avance de Obra N° 2 que corresponde a las actividades ejecutadas del componente 4. Preliminares Bienes Muebles, en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, por un valor total de $939.312.634,77.

Para lo cual, el Contratista de Obra presentó, a través de Plataforma BIM - Trimble Connect, a la Interventoría IBP INGENIERÍA SAS los siguientes requisitos, los cuales fueron revisados, verificados, aceptados, aprobados y recibidos a satisfacción por esta:

1. Factura
2. Acta de pago parcial
3. Memorias gráficas de Cantidades de Obra ejecutadas y aprobadas
4. Informe del avance de actividades ejecutadas con registro fotográfico, implementación de planes y registro fotográfico.
5. Certificación de porcentajes de actividades ejecutadas y pendientes por ejecutar

6. Acreditación del cumplimiento de obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales
7. Planillas de seguridad social del personal
8. Formato de información financiera
9. Certificación bancaria
10. Acta de mayores y menores cantidades
11. Registro Único Tributario del Consorcio y consorciados
12. Documentos de actividades no previstas (NP)
13. Soporte de cargue de información a SECOP II

Dado lo anterior, es procedente realizar al contratista de obra el CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL el pago del valor del Acta de Avance de Obra N° 2 la cual corresponde a las actividades ejecutadas del componente 4. Preliminares Bienes Muebles, por un valor total de $939.312.634,77 el cual se detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del Pago por Acta de Avance de Obra N°1	**$ 939.312.634,77**
Amortización del Anticipo:	$ 491.340.944,00
Valor a pagar:	**$ 447.971.690,77**

El valor certificado a pagar en el Acta de Avance de Obra N° 2 previa amortización del anticipo corresponde a la suma de **$ 447.971.690,77.**

Lo anterior tras efectuar la verificación por parte de la Interventoría IBP INGENIERÍA SAS del cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de seguridad social integral (salud y pensión) y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) de conformidad con lo indicado en la **CLÁUSULA 51. "SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN"** respecto del control y vigilancia Administrativa a la ejecución del contrato, y con lo señalado en el Manual de Supervisión e interventoría, en particular en su capítulo Quinto **"CONCURRENCIA DE LA INTERVENTORÍA Y LA SUPERVISIÓN"**, y de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, y demás normatividad aplicable vigente, así como de la entrega del informe y sus soportes ajustados, estando almacenados digitalmente en la Plataforma BIM - Trimble Connect en el siguiente enlace:

https://web.connect.trimble.com/projects/PRcL02Cdcs0/data/folder/5fppS8DnCvQ

Para dicho pago se debe tener en cuenta el siguiente uso presupuestal:

N°. CONTRATO: 4346-2024
No. COMPROMISO: 34725
RUBRO: C-3302-1603-15-20302B1-3302073-02
USO: A-02-01-01-001-003-18
Valor: $ 447.971.690,77

Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada.

MÓNICA ORDUÑA MONSALVE
Directora de Patrimonio y Memoria
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Anexos: Documentos de soporte
Copia: Jenny Carolina Velandia Martínez, Coordinadora Grupo de Contratos y Convenios, Ministerio de Cultura. **(Para Archivo documental)**

Proyectó: Alexander Yazo Martínez - Apoyo a la supervisión - Dirección de Patrimonio y Memoria AYM
Revisó: Daniel Cepeda Hernández – Apoyo a la Coordinación de obras - Dirección de Patrimonio y Memoria

Culturas

Código TRD: 1110-2026

MEMORANDO

PARA: Jenny Carolina Velandia Martínez, Coordinadora del Grupo de Convenios y Contratos.

DE: Mónica Orduña Monsalve, Directora de Patrimonio y Memoria.

ASUNTO: **Remisión de documentos pago Acta de Avance de Obra N° 2, la cual corresponde a las actividades ejecutadas del componente 4. Preliminares Bienes Muebles, del Contrato de obra N° 4346 de 2024, cuyo objeto es: "la ejecución de las Intervenciones integrales del Edificio Capilla - Convento del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá D.C., declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo establecido en el presente Contrato".**

FECHA: 30 de abril de 2026

Respetada Jenny,

Atentamente remito para la carpeta del expediente del contrato del asunto, copia en formato digital de los siguientes documentos que hacen parte del Acta de Avance de Obra N° 2 la cual corresponde a las actividades ejecutadas componente 4. Preliminares Bienes Muebles, debidamente aprobados por la interventoría, IBP Ingeniería SAS, por un valor total de $939.312.634,77, siendo estos:

- Acta parcial de obra 002 Capilla; en 1 folios
- Factura electrónica; en un 1 folio
- Informe del contratista; en 140 folios
- Memorias de cálculo de cantidades de obra; en 19 folios
- Certificados de pago parafiscales consorcio y consorciados; en 21 folios

- Certificación bancaría consorcio ALIANZA PATRIMONIAL.; en 1 folio
- Formato de información financiera; en 1 folio
- RUT consorcio y consorciados; en 23 folios
- Planillas de pago de seguridad del personal en obra del periodo del 01 de noviembre de 2025 a 31 de enero de 2026; en 64 folios
- Evidencia del cargue en el secop del último pago efectuado; en 2 folios
- Acta de mayores y menores cantidades; en 20 folios
- APU de ítems no previstos del acta de corte; en 81 folios
- Certificación de cumplimiento por parte del interventor Consorcio IBP INGENIERÍA SAS; en 3 folios

De acuerdo con lo establecido en el contrato 4346-2024, se remite copia en formato digital del informe de avance de obra No. 2 junto con los soportes de este.

Debido al volumen de la información, los anexos del informe han sido cargados en la plataforma Onedrive en el siguiente link:

CORTE DE OBRA 02

Sin otro particular y agradeciendo la atención brindada.

Cordialmente,

MÓNICA ORDUÑA MONSALVE
Directora de Patrimonio y Memoria
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Anexos: Lo enunciado
Proyectó: Alexander Yazo Martínez - Apoyo a la supervisión - Dirección de Patrimonio y Memoria AYM
Revisó: Daniel Cepeda Hernández – Apoyo a la Coordinación de obras - Dirección de Patrimonio y Memoria

CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
NIT. 901.899.883-3
CONTRATO DE OBRA 4546-2024
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo; **LUDIVIA RODRIGUEZ CUBILLOS**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.322.089 de Bogotá en mi calidad de Contadora, manifiesto bajo la gravedad del Juramento que el **CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL**, identificado con NIT 901.899.883-3, hasta la presente fecha ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, A.R.P., pensiones, obligaciones parafiscales en relación con sus empleados, y a la fecha se encuentra a paz y salvo.

Atentamente,

LUDIVIA RODRIGUEZ CUBILLOS
C. C. No. 52.322.089 de Bogotá
T.P. 111129-T
Calidad: Contadora

ASTRID DIAZ CABEZAS
Representante Legal
Consorcio Alianza Patrimonial

Bogotá D.C. 29 de abril de 2026

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B70A1E2F78A31625

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUDIVIA RODRIGUEZ CUBILLOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52322089 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 111129-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
38.235.389
NUMERO
DIAZ CABEZAS
APELLIDOS
ASTRID
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO
14-OCT-1956
IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.50
ESTATURA
B+
G.S. RH
F
SEXO
10-MAY-1977 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.322.089**

RODRIGUEZ CUBILLOS

APELLIDOS

LUDIVIA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-MAR-1976**

PLANADAS
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-ABR-1994 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00179915-F-0052322089-20090920 **00163**29336A 2 1290023179

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

11129-T



LUDIVIA
RODRIGUEZ CUBILLOS
C.C. 52322089
RESOLUCION INSCRIPCION 067 FECHA 2005/05/26
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. LOS LIBERTADORES

PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 120970

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

BYGGA INFRAESTRUCTURA

Nit:901.206.662-1

Sabaneta, 29 de Abril del 2026

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

yo, CARMELO ESPINOSA GUTIERREZ con CE 459602 Representante legal y Oscar Armando Tascon Tascon, identificado con cédula de ciudadanía No. 6445110, en mi calidad de REVISOR FISCAL manifiesto bajo la gravedad del Juramento que BYGGA INFRAESTRUCTURA, 901.206.662-1, hasta la presente fecha ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, A.R.P., pensiones, y obligaciones parafiscales en relación con sus empleados, y a la fecha se encuentra a paz y salvo.

Atentamente.

CARMELO ESPINOSA GUTIERREZ
CE. 459602
Rep Legal BYGGA INFRAESTRUCTURA
NIT: 901.206.662-1
EMAIL: bygga.gerencia@gmail.com

OSCAR ARMANDO TASCON TASCON
REVISOR FISCAL T.P. 67569-T


COL
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cédula de Extranjería
VISITANTE No. 459602
APELLIDOS ESPINOSA GUTIERREZ
NOMBRES CARMELO
NACIONALIDAD ESP
FECHA DE NACIMIENTO 1957/08/22
SEXO M RH O+
EXPEDICION 2023/03/16
VENCE 2025/02/28


PE170427
www.migracioncolombia.gov.co
Fernando Garcia Manosalva
I<COL459602<<<6<<<<<<<<<<<<<<<
5708220M2502287ESP<<<<<<<<<<<4
ESPINOSA<GUTIERREZ<<CARMELO<<<


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
6.445.110
TASCON TASCON
OSCAR ARMANDO
REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA


08-ENE-1969
BUGA
(VALLE)
1.70
O-
M
31-JUL-1987 SAN PEDRO


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
67569-T
OSCAR ARMANDO
TASCON TASCON
C.C. 6445110
RES. INSCRIPCION 123 DEL 21/10/1999
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL
264331
76055


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.
FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AA52BFAE9C532E00

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OSCAR ARMANDO TASCON TASCON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 6445110 de SAN PEDRO (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 67569-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 09 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

EMPRESAS
GRUPO ROMERO S.A.S.
Nit. 901.347.937-4

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALESARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ identificado con C.C. 93.123.908, y con tarjeta profesional 65338 – T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal, de EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S, identificada con Nit. 901.347.937–4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Villavicencio, luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certificó el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S, identificada con Nit. 901.347.937–4 se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes de impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en VILLAVICENCIO, a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2026.



CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
REVISOR FISCAL EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S
Cedula: 93.123.908
Matricula Profesional: 65338-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 93.123.714

ROMERO SANDOVAL

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES





FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO 20-SEP-1967
ESPINAL
(TOLIMA)

ESTATURA G.S. RH SEXO

1.76 O+ M

01-OCT-1985 ESPINAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



A-0300100-93123714-M-0001967-20141001 0052401001


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 93.123.908
RAMIREZ RAMIREZ
APELLIDOS
CARLOS ADOLFO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 03-AGO-1967
ESPINAL
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61
ESTATURA
B+
G.S. RH
M
SEXO
26-SEP-1985 ESPINAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
65338-T
CARLOS ADOLFO
RAMIREZ RAMIREZ
C.C. 93123908
RESOLUCION INSCRIPCION 43
FECHA 27/05/99
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
Presidente


FIRMA DEL TITULAR
022100
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores.
93123908

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6199132450D3C52CC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93123908 de ESPINAL (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 65338-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Cartagena, 29 de abril 2026

Yo, MAIRA ALEJANDRA CABARCAS MANJARREZ., identificado con C.C. No. 1.128.044.095 de Cartagena, en mi condición de Revisora Fiscal de OHM INVERSIONES SAS identificado con NIT. No.900.969.692-0, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Cartagena, certifico el pago de los aportes deseguridad social (Pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servcio Nacional de aprendizaje SENA y Caja de Compensación familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

Atentamente,



MAIRA CABARCAS MANJARREZ
C.C. 1.128.044.095
T.P.150001-T
Revisor Fiscal
OHM INVERSIONES SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **38602221**

OCAMPO AFANADOR
APELLIDOS

YESICA PAOLA
NOMBRES

Jessica Y. Ocampo
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-FEB-1983**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

06-ABR-2001 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-3100100-66101281-F-0038602221-20020220 **00602** 02051H 01 120269063


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.128.044.095
CAPARCAS MANJARREZ
MAIRA ALEJANDRA


FECHA DE NACIMIENTO 18-NOV-1985
EL CARMEN DE BOLIVAR
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61
O+
F
09-DIC-2003 CARTAGENA
REGISTRADOR NACIONAL


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
150001-T
MAIRA ALEJANDRA
CABARCAS MANJARREZ
C.C. 1128044096
RESOLUCION INSCRIPCION 179 FECHA 03/08/2010
UNIVERSIDAD : C. JAIME ISAZA CADAVID
PRESIDENTE
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 159865


74958
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6A3A5A0490E88749

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MAIRA ALEJANDRA CABARCAS MANJARREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1128044095 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 150001-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados apartir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005


Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PICAR
Proyectos de Ingenieria y Construcciones A.R. S.A.S.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo; GUSTAVO SEGURA PINZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.337.369 de Bogotá, en mi calidad de REVISOR FISCAL manifiesto bajo la gravedad del Juramento que PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AR SAS, con **NIT 802*.009.210-0***, *hasta la presente fecha ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, A.R.P., pensiones, y obligaciones parafiscales en relación con sus empleados, y a la fecha se encuentra a paz y salvo.*

Atentamente,



GUSTAVO SEGURA PINZÓN
C. C. No. 19.337.369 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 28000-T
Calidad: revisor fiscal

Bogotá D.C. 29 de abril de 2026


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
38.235.389
NUMERO
DIAZ CABEZAS
APELLIDOS
ASTRID
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO
14-OCT-1956
IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.50
ESTATURA
B+
G.S. RH
F
SEXO
10-MAY-1977 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

28000-T

GUSTAVO
SEGURA PINZON
C.C. 19.337.369
RESOLUCION INSCRIPCION 1956-T FECHA 16-VIII-90
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

00035497



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
19.337.369
SEGURA PINZON
GUSTAVO
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 22-SEP-1953
ANOLAIMA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
17-MAY-1977 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

ABBCCCDCD83F8BE4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GUSTAVO SEGURA PINZON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19337369 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 28000-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *
* *
* *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
NIT. 901.899.883-3

CONTRATO DE OBRA 4346-2024
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo; ASTRID DIAZ CABEZAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 38.235.389 de Ibague en mi calidad de Representante Legal, manifiesto bajo la gravedad del Juramento que el CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL, identificado con NIT 901.899.883-3, hasta la presente fecha ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, A.R.P., pensiones, obligaciones parafiscales en relación con sus empleados, y a la fecha se encuentra a paz y salvo.



ASTRID DIAZ CABEZAS
Representante Legal
Consorcio Alianza Patrimonial

Bogotá D.C. 29 de abril de 2026

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B70A1E2F78A31625

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUDIVIA RODRIGUEZ CUBILLOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52322089 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 111129-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
38.235.389
NUMERO
DIAZ CABEZAS
APELLIDOS
ASTRID
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO
14-OCT-1956
IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.50
ESTATURA
B+
G.S. RH
F
SEXO
10-MAY-1977 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-1500103-42129121-F-0038235389-20050401
02809 05091A 02 154722024

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.322.089**

RODRIGUEZ CUBILLOS

APELLIDOS

LUDIVIA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-MAR-1976**

PLANADAS
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-ABR-1994 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00179915-F-0052322089-20090920 **00163**29336A 2 1290023179

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

11129-T



LUDIVIA
RODRIGUEZ CUBILLOS
C.C. 52322089
RESOLUCION INSCRIPCION 067 FECHA 2005/05/26
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. LOS LIBERTADORES

PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 120970

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS CONM. 2922566

BYGGA INFRAESTRUCTURA

Nit:901.206.662-1

Sabaneta, 29 de Abril del 2026

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL


yo, CARMELO ESPINOSA GUTIERREZ con CE 459602 Representante legal y Oscar Armando Tascon Tascon, identificado con cédula de ciudadanía No. 6445110, en mi calidad de REVISOR FISCAL manifiesto bajo la gravedad del Juramento que BYGGA INFRAESTRUCTURA, 901.206.662-1, hasta la presente fecha ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, A.R.P., pensiones, y obligaciones parafiscales en relación con sus empleados, y a la fecha se encuentra a paz y salvo.

Atentamente.

CARMELO ESPINOSA GUTIERREZ
CE. 459602
Rep Legal BYGGA INFRAESTRUCTURA
NIT: 901.206.662-1
EMAIL: bygga.gerencia@gmail.com

OSCAR ARMANDO TASCON TASCON
REVISOR FISCAL T.P. 67569-T


COL
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Cédula de Extranjería
VISITANTE No. 459602
459602
APELLIDOS: ESPINOSA GUTIERREZ
NOMBRES: CARMELO
NACIONALIDAD: ESP
FECHA DE NACIMIENTO: 1957/08/22
SEXO: M RH: O+
F. EXPEDICIÓN: 2023/03/16
VENCE: 2025/02/28

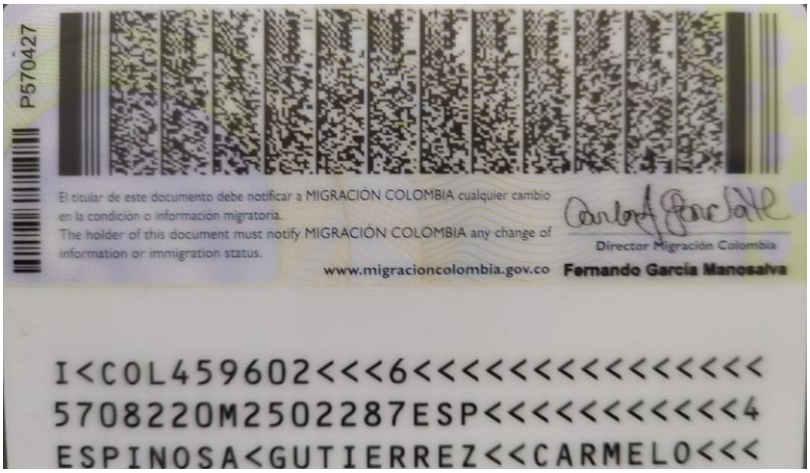
P570427
El titular de este documento debe notificar a MIGRACIÓN COLOMBIA cualquier cambio en la condición o información migratoria.
The holder of this document must notify MIGRACIÓN COLOMBIA any change of information or immigration status.
www.migracioncolombia.gov.co
Director Migración Colombia
Fernando García Manosalva
I<COL459602<<<6<<<<<<<<<<<<<<<
5708220M2502287ESP<<<<<<<<<<<4
ESPINOSA<GUTIERREZ<<CARMELO<<<


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 6.445.110
TASCON TASCON
APELLIDOS
OSCAR ARMANDO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 08-ENE-1969
BUGA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O-
G.S. RH
M
SEXO
31-JUL-1967 SAN PEDRO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-3109400-00143003-M-0006445110-20081226
00088 50501A 1
9925159360


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
67569-T
OSCAR ARMANDO
TASCON TASCON
C.C. 6445110
RES. INSCRIPCION 123
DEL 21/10/1999
UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL
264331
76055


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.
FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AA52BFAE9C532E00

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OSCAR ARMANDO TASCON TASCON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 6445110 de SAN PEDRO (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 67569-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 09 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

EMPRESAS
GRUPO ROMERO S.A.S.
Nit. 901.347.937-4

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALESARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ identificado con C.C. 93.123.908, y con tarjeta profesional 65338 – T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal, de EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S, identificada con Nit. 901.347.937–4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Villavicencio, luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certificó el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S, identificada con Nit. 901.347.937–4 se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes de impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en VILLAVICENCIO, a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2026.



CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
REVISOR FISCAL EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S
Cedula: 93.123.908
Matricula Profesional: 65338-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **93.123.714**

ROMERO SANDOVAL

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-SEP-1967**

ESPINAL
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.76	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

01-OCT-1985 ESPINAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-5200100-00282951-M-0093123714-20110304 0026014335A 1 35573435

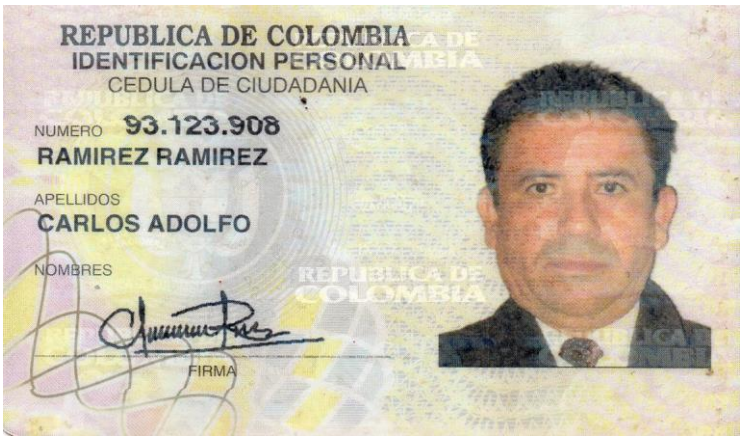

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 93.123.908
RAMIREZ RAMIREZ

APELLIDOS
CARLOS ADOLFO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-AGO-1967
ESPINAL
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.61 ESTATURA | B+ G.S. RH | M SEXO

26-SEP-1985 ESPINAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2904600-00058663-M-0093123908-20080824 0002582362A 1 6480012717

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

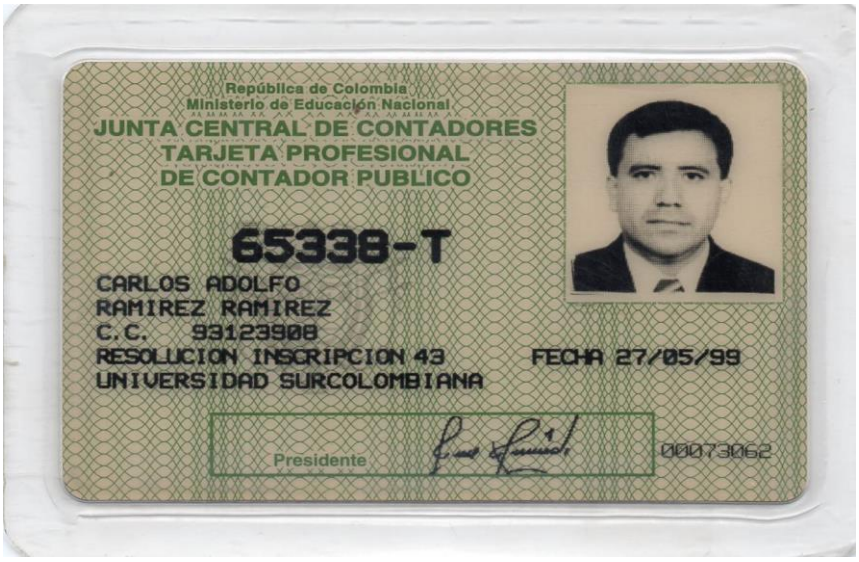
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
65338-T
CARLOS ADOLFO
RAMIREZ RAMIREZ
C.C. 93123908
RESOLUCION INSCRIPCION 43
FECHA 27/05/99
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
Presidente
00073062


CARVAJAL S.A.
06/98-23280
FIRMA DEL TITULAR
022100
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.
93123908

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

61991324503C52CC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 93123908 de ESPINAL (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 65338-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Cartagena, 29 de abril 2026

Yo, MAIRA ALEJANDRA CABARCAS MANJARREZ., identificado con C.C. No. 1.128.044.095 de Cartagena, en mi condición de Revisora Fiscal de OHM INVERSIONES SAS identificado con NIT. No.900.969.692-0, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Cartagena, certifico el pago de los aportes deseguridad social (Pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servcio Nacional de aprendizaje SENA y Caja de Compensación familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

Atentamente,



MAIRA CABARCAS MANJARREZ
C.C. 1.128.044.095
T.P.150001-T
Revisor Fiscal
OHM INVERSIONES SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **38602221**

OCAMPO AFANADOR
APELLIDOS

YESICA PAOLA
NOMBRES

Jessica Y. Ocampo
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-FEB-1983**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

06-ABR-2001 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-3100100-66101281-F-0038602221-20020220 **00602** 02051H 01 120269063



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.128.044.095
CABARCAS MANJARREZ
APELLIDOS
MAIRA ALEJANDRA
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-NOV-1985
EL CARMEN DE BOLIVAR
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
09-DIC-2003 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
P-0500100-30125076-F-1128044095-20040517 0057104138P 02 151250886

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

150001-T



MAIRA ALEJANDRA
CABARCAS MANJARREZ
C.C. 1128044095
RESOLUCION INSCRIPCION 179 FECHA 03/06/2010
UNIVERSIDAD U. C. JAIME ISAZA CADAVID

PRESIDENTE LEONARDO SANCHEZ G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 159865

FIRMA DEL TITULAR 74958

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6A9A5A0490E88749

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MAIRA ALEJANDRA CABARCAS MANJARREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1128044095 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 150001-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados apartir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL


ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo; GUSTAVO SEGURA PINZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.337.369 de Bogotá, en mi calidad de REVISOR FISCAL manifiesto bajo la gravedad del Juramento que PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AR SAS, con **NIT 802*.009.210-0***, *hasta la presente fecha ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, A.R.P., pensiones, y obligaciones parafiscales en relación con sus empleados, y a la fecha se encuentra a paz y salvo.*

Atentamente,



GUSTAVO SEGURA PINZÓN
C. C. No. 19.337.369 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 28000-T
Calidad: revisor fiscal

Bogotá D.C. 29 de abril de 2026


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
38.235.389
NUMERO
DIAZ CABEZAS
APELLIDOS
ASTRID
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO
14-OCT-1956
IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.50
ESTATURA
B+
G.S. RH
F
SEXO
10-MAY-1977 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-1500103-42129121-F-0038235389-20050401
02809 05091A 02 154722024



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

28000-T

GUSTAVO
SEGURA PINZON
C.C. 19.337.369
RESOLUCION INSCRIPCION 1956-T FECHA 16-VIII-90
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

00035497



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 19.337.369
SEGURA PINZON
APELLIDOS
GUSTAVO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 22-SEP-1953
ANOLAIMA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
17-MAY-1977 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00028322-M-0019337369-20080721 0001362533A 1 1120001623

Certificado No:

ABBCCCDCD89F8BE4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GUSTAVO SEGURA PINZON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19337369 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 28000-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d64f393fbe931b0cc4279415a977d9e689a75571873b6eba699f4c3e27b859e63e0683224ab04676b35d908ba05ac092

Número de Factura: CAFV-1
Fecha de Emisión: 24/04/2026
Fecha de Vencimiento: 24/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido: CO-001
Fecha de orden de pedido: 24/04/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
Nombre Comercial: CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL
Nit del Emisor: 901899883
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 93 B # 12 - 28 OF 307
Teléfono / Móvil: 3196088434
Correo: consorcioalianzapatrimonial@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE LAS CULTURAS,LAS ARTES Y LOS SABERES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830034348
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 8 8 55
Teléfono / Móvil: 6013424100
Correo: mvargasm1@mincultura.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	PPFV CONSTRUCCION	CONTRATO DE OBRA	NIU	1,00	$ 676.007.653,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 676.007.653,00
2	PPFV ADMINISTRACION	ADMINISTRACION 62	NIU	1,00	$ 216.322.449,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 216.322.449,00
3	PPFV ADMINISTRACION	IMPREVISTO 1	NIU	1,00	$ 6.760.077,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.760.077,00
4	PPFV ADMINISTRACION	UTILIDAD 5	NIU	1,00	$ 33.800.383,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.422.072,77	19.00			$ 33.800.383,00

Notas Finales

PAGO N° 2 . ACTA PARCIAL DE OBRA 002- CONTRATO DE OBRA 4346-2024 CUYO OBJETO ES LA EJECUCION DE LAS INTERVENSIONES INTEGRALES DEL EDIFICIO CAPILLA CONVENTO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E INSTITUTO MATERNO INFANTIL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C DECLARADO BIEN DE INTERES CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO CON EL PRESENTE CONTRATO 4346-2024 $ 676.007.653

OBSERVACIONES: INTEGRANTES DEL CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL: PRODELINC PANAMA S.A. NIT 901.206.662-1... -10% PROYECTO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AR SAS - NIT 802.009.210-0 40% EMPRESA GRUPO ROMERO SAS EXTRANJERA NIT 901.347.937-4 40% OHM INVERSIONES SAS NIT 900.969.692.0 - 10%

#$33-01-01-4346-24-morduna@mincultura.gov.co#$

SE REALIZA LA AMORTIZACION POR VALOR DE $ 491.340.944 LA CUAL CORRESPONDE A LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO GENERADO EN EL MARCO DEL CONTRATO

EL VALOR DEL ACTA 02. CORRESPONDIENTE AL 95% DEL COSTO DIRECTO, INCLUYE EL AJUSTE A VALOR PRESENTE (IPC) POR UN MONTO DE $ 45.586.920

DETALLE DEL PAGO: NOMBRE DEL BENEFICIARIO CONSORCIO ALIANZA PATRIMONIAL NIT: 901.899.883-3 ... BANCO DE BOGOTA ... NUMERO DE CUENTA AHORROS N°008638330

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
24/04/2026 12:41:42
Documento validado por la DIAN:
24/04/2026 12:41:42
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	932890562
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	932890562
IVA	6422072.77
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	6422072.77
Total neto factura (=)	939312634.77
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 939312634.77

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	932.890.562,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	932.890.562,00
IVA	6.422.072,77
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	6.422.072,77
Total neto factura (=)	939.312.634,77
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$939.312.634,77

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764108891277 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2028-04-24
