DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2233 DE 2025

REALIZAR ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.



INFORME MENSUAL DE OBRA No. 02
(17 DE FEBRERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026)

FEBRERO DE 2026

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVO 4
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
4. LOCALIZACIÓN 5
5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 6
5.1. GENERALIDADES 6
6. POLIZAS Y GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA. 7
6.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 7
6.2. POLIZA SEGÚN ACTA DE INICIO. 7
7. ACTIVIDADES DEL CONTRATO 8
7.1. RESUMEN GENERAL 8
PRELIMINARES 8
MAMPOSTERIA 8
CARPINTERIA METALICA 9
ACABADOS ARQUITECTONICOS 9
INSTALACIONES ELECTRICAS 9
EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA 10
CUARTO EQUIPOS CAD 10
TARIMA CANCHA DE FUTBOL 12
8. PRESUPUESTO INICIALMENTE CONTRATADO 15
9. INFORME DE PERSONAL Y EQUIPO 19
PERSONAL TÉCNICO DE LA PROPUESTA 19
10. ACTIVIDADES EJECUTADAS 20
11. ITEMS DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO. 22
12. AVANCE FISICO DE OBRA. 34
13. ACTAS DE REUNIONES. 35
14. CORRESPONDECIA ENVIADA/RECIBIDA 35
15. CONCLUSIONES 36

1. INTRODUCCIÓN

En el departamento del Meta, la Policía Nacional enfrenta limitaciones estructurales y operativas que afectan directamente el cumplimiento de su misión de garantizar la seguridad y a convivencia ciudadana. Estas limitaciones se manifiestan en tres ámbitos críticos: infraestructura, tecnología y bienestar del personal.

Infraestructura física en deterioro y desactualizada
Las instalaciones del Departamento de Policía Meta, de la Escuela de carabineros Eduardo Cuevas Garcia y de la Regional de Incorporaciones presentan deficiencias en su infraestructura que van desde problemas de mantenimiento, desgaste por el uso y antigüedad de las edificaciones, hasta la falta de adecuaciones técnicas acordes con los estándares actuales de funcionamiento institucional.

- Estas falencias generan incomodidad y condiciones inadecuadas para el personal policial, afectando su bienestar y capacidad de desempeño.

- Se dificulta la realización de procesos de formación, incorporación, alistamiento y operación con la calidad y eficacia que demanda la dinámica de seguridad del territorio.

- La ausencia de espacios óptimos repercute también en la percepción ciudadana frente a la capacidad institucional de respuesta.

El presente informe pretende hacer una recopilación de las actividades ejecutadas, avance físico y financiero, entre otros, por el CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS en el periodo comprendido del **17 de FEBRERO al 28 de FEBRERO de 2026.**

2. OBJETIVO

El objetivo fundamental del presente documento es dar a conocer, a la entidad contratante y a la interventoría, el desarrollo de las actividades del Contrato No. 2233 de noviembre de 2025 y el avance obtenido desde el momento en que se dio inicio a la ejecución de la obra hasta el momento de presentación de este informe.

Mediante este informe también se busca constatar el cumplimiento y las condiciones establecidas para la ejecución de las obras y se puedan determinar oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos en el contrato.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

EL DEPARTAMENTO cumpliendo con los objetivos trazados desde el Plan de Desarrollo 2024-2027, denominado "El Gobierno de la Unidad", considera necesario contratar:

"REALIZAR ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIAS, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3, EN EL DEPARTAMENTO DEL META"

El cual se encuentra registrado en el Banco de Programa y Proyectos de inversión, Departamento BPPID bajo el número 2024005500227, para el Fortalecimiento EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE LAS ENTIDADES QUE HACEN PARTE DEL COMITÉ DE ORDEN PUBLICO EN EL DEPARTAMENTO DEL META, bajo la estructura del Plan de Desarrollo "EL GOBIERNO DE LA UNIDAD 2024-2027" PILAR 1. SEGURIDAD TOTAL Y DERECHOS HUMANOS EN EL META. 1.1. EJE ESTRATEGICO CIUDADANIA SEGURA. 1.1.1. LINEA ESTRATEGICA FORTALECER LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD. 1.1.1.1. PROGRAMA CAPACIDADES INSTITUCIONALES. 1.1.1.1.1. Subprograma Infraestructura y Dotación para la seguridad. Sector 45 - Gobierno Territorial. Meta 11011014504. Construir, remodelar, y/o adquirir infraestructura para la seguridad y convivencia ciudadana en seis (6) espacios, de acuerdo con lo establecido en la mesa conjunta para la infraestructura de seguridad departamental.

Ello con el propósito de apoyar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos institucionales, la conservación del orden público, la seguridad ciudadana, la búsqueda de la paz y seguridad total y protección y garantía de los Derechos Humanos del Departamento del
Meta.

4. LOCALIZACIÓN

El área general del proyecto se localiza en la República de Colombia, Departamento del Meta Municipio de Villavicencio.

Los límites geográficos del Municipio de villavicencio están definidos de la siguiente manera:

- Norte: Restrepo y El Calvario
- Oriente: Puerto Lopez.
- Occidente: Acacias y Departamento de Cundinamarca

El acceso al proyecto se encuentra sobre la vía puerto López.

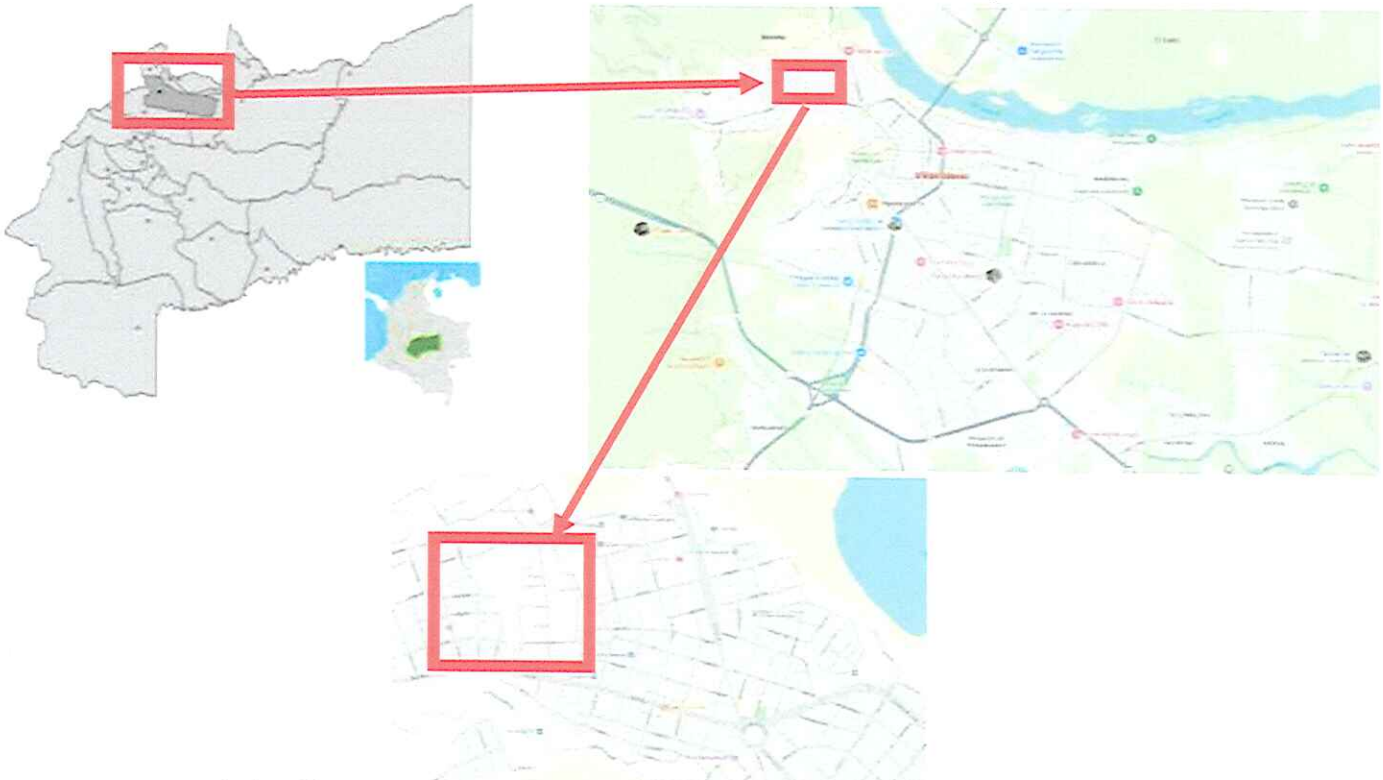


Ilustración 1. Localización general del proyecto en el Municipio de Villavicencio.

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

5.1. GENERALIDADES

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA No.	2233 DE 07 NOVIEMBRE DEL 2025
CONTRATANTE	GOBERNACION DEL META
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS NIT: 902.001.555-2 R/L: JUAN CAMILO POSADA VARELA C.C. 1.094.921.302 consorciocarabineros@gmail.com
OBJETO	REALIZAR ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIAS, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3, EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($1,226,177,526.20)
TERMINO DE EJECUCIÓN	HASTA EL TREINTA Y UNO (31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	25 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2326 DE 05 NOVIEMBRE DE 2025
INTERVENTORÍA	BIMCON SAS
SUPERVISOR	CAMILO ANDRES NUÑEZ ROJAS
FECHA DE SUSPENSION No. 1	19 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSION No. 1	TREINTA (30) DIAS
AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No. 1	TREINTA (30) DIAS
FECHA DE REINICIO No. 1	17 DE FEBRERO DE 2026

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO	
PRORROGA No. 1	25 DE FEBRERO DE 2026
TIEMPO PRORROGA No. 1	CUATRO (04) MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	01 DE JULIO DE 2026
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO	**9.43%**

6. POLIZAS Y GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA.

En cumplimiento de lo establecido en la minuta contractual No 2233 se establecieron las respectivas pólizas de cumplimiento con la Compañía Chubb Seguros Colombia S.A, como se detalla a continuación:

6.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	**82098**
ANEXO N°	**0**
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO N°	**75572**
ANEXO N°	**0**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A**

Pólizas según minuta.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2025/11/07	2026/04/30	$122.617.752,62
CALIDAD Y CORRECTO FUNCION	2025/11/07	2026/04/30	$122.617.752,62
PRESTACIONES SOCIALES	2025/11/07	2028/12/31	$ 61.308.867,31
ESTABILIDAD DE LA OBRA	2025/12/31	2030/12/31	$122.617.752,62
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	07/11/2025	31/12/2025	$284,700,000.00
GASTOS DE DEFENSA	07/11/2025	31/12/2025	$284,700,000.00
RC CRUZADA	07/11/2025	31/12/2025	$284,700,000.00
CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS	07/11/2025	31/12/2025	$284,700,000.00

Amparos según minuta.

6.2. POLIZA SEGÚN ACTA DE INICIO.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	**82098**
ANEXO N°	**1**

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO N°	75572
ANEXO N°	1
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A**

Pólizas según acta de inicio.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2025/11/25	2025/12/31	$122.617.752,62
CALIDAD Y CORRECTO FUNCION	2025/11/25	2025/12/31	$122.617.752,62
PRESTACIONES SOCIALES	2025/11/25	2028/12/31	$ 61.308.867,31
ESTABILIDAD DE LA OBRA	2025/12/31	2030/12/31	$122.617.752,62
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	25/11/2025	31/12/2025	$284,700,000.00
GASTOS DE DEFENSA	25/11/2025	31/12/2025	$284,700,000.00
RC CRUZADA	25/11/2025	31/12/2025	$284,700,000.00
CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS	25/11/2025	31/12/2025	$284,700,000.00

Amparos según acta de inicio.

7. ACTIVIDADES DEL CONTRATO

7.1. RESUMEN GENERAL

A continuación, se presenta un listado de las principales actividades a ejecutar por el CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS:

CAD – CENTRO AUTOMATICO DE DESPACHO

PRELIMINARES

- DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E=0.07M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
- PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
- DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
- DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO

MAMPOSTERIA

- MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)
- PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN
- ESTUCO PREPARADO
- PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)
- MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA
- PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
- MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500MPA. FIGURADO, ARMADO ,COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- PORCELANATO BEIGE
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON TABLILLA EN PVC. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA.
- TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m
- PISO EN GRAVILLA LAVADA No. 2 Espesor de 2cm
- BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO
- RELLENO CON GRAVILLA
- GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 50 X 10

CARPINTERIA METALICA

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM
- SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE CELOSIA EN PERFIL RECTANGULAR DE 60x40x 2.0 MM. INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y CHAZOS DE ANCLAJE

ACABADOS ARQUITECTONICOS

- VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, CERRADURA, MANIJA, PIVOTE.

INSTALACIONES ELECTRICAS

- SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PUNTO DE RED DE DATOS ESTRUCTURADO DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Ups 60 KVA trifásica TIPO TORRE
- TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- TABLERO GENERAL ,BAJA TENSIÓN INCLUYE GABINETE METÁLICO,TOTALIZADOR 3X125A. 25KA240V,CONTADOR DE ENERGIA ACTIVA5A ,CONTADOR DE ENERGIA REACTIVA 5 A, TRES (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE MEDIDA 5 A DE PLATINA

EQUIPOS DE VENTILACION MECANICA

- SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 12000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

CUARTO EQUIPOS CAD

- PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN

PASILLO ZONA INSTRUCCIÓN SISTEMA TACTICO BASICO POLICIAL

- DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
- PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
- TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m
- PISO EN GRAVILLA LAVADA No 2 espesor de 2 cm

ADECUACION MANDOS NIVEL EJECUTIVO Y AULA AMBIENTAL AXP

- DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.
- PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE
- DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON TABLILLA EN PVC. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA.
- AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM
- PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA

- DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA

BATERIA SANITARIA SUBOFICIALES

- DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
- DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
- SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA
- MONTAJE SANITARIO DE FLUXOMETRO
- LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
- MONTAJE LAVAMANOS
- JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO
- SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- ACCESORIO CPVC 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM
- ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN

INSTALACIONES ELECTRICAS

- ACOMETIDA PARCIAL 2No10+1No12 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON CORREDIZO EN PERFILERIA ESTRUCTURAL CON RIEL EN ANGULO Y PERFILERIA INTERNA CAL 16. INCLUYE PINTURA PREMIER Y ESMALTE, MOTOR BFT 2000A - 220V (VELOCIDAD DE HOJA 9M/3) , BOTON DE EMERGENCIA, LETREROS, SENSORES FOTOELÉCTRICOS PARA CIERRE, BALIZA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO EMITIDO POR LA ONAC

- SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- CIMENTACIÓN DE POSTES EN TERRENO NORMAL NORMA LA009/LA009-1 CODENSA
- POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 8M X 510KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN
- LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP65/65 (CONJUNTO ÓPTICO / CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 16LEDS.120-277VOLTOS, 38W, 4000°K. CON FOTOCELDA COMPLETA. REF: RALED I 16 LEDS RA02. SUMINISTRO E INSTALACIÓNW

TARIMA CANCHA DE FUTBOL

- TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACIÓN

BAÑO DE INSTRUCCIÓN ZONA DE AUXILIARES DE POLICIA

- ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA
- CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS
- BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN

BATERIA SANITARIA

- ZAPATA EN CONCRETO 20.7MPa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
- DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
- EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0-2.00M INCLUYE CARGUE
- VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
- COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

- VIGA AEREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
- ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE
- MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)
- PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN
- PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN
- ESTUCO PREPARADO
- PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS
- PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)
- ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM
- SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA
- ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO
- JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO
- LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
- MESÓN EN CONCRETO 20.7MPa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
- SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SALIDA SANITARIA ORINAL 2"
- TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- TRAMPA DE GRASAS EN PVC95 LITROS. INCLUYE TUBERÍA DE CONEXIÓN PVC Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN
- ACOMETIDA PARCIAL 2No10+1No12 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN

- SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES
- TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN

ALOJAMIENTO AXP FRENTE AUDITORIO

- DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
- DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
- DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
- DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
- PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
- DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS.INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
- PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE
- AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM
- PORCELANATO BEIGE
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON TABLILLA EN PVC. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM
- SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA
- MONTAJE SANITARIO DE TANQUE
- JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO
- LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS
- MONTAJE LAVAMANOS
- DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
- CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL
- MONTAJE DE DUCHA
- ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓ

INSTALACIONES ELECTRICAS

- SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACIÓN
- PANEL LED REDONDO 18 W
- SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

8. PRESUPUESTO INICIALMENTE CONTRATADO

"REALIZAR ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIAS, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3, EN EL DEPARTAMENTO DEL META"						
ITEM	REFERENCIA	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INC. AIU 34%	VALOR TOTAL
		CAD - CENTRO AUTOMATICO DE DESPACHO				
1		PRELIMINARES				
1,1	14010224	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E=0.07M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	284,14	$ 31.545,00	$ 8.963.196,00
1,2	14010233	PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	284,14	$ 9.529,00	$ 2.707.570,00
1,3	14010215	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	85,52	$ 24.938,00	$ 2.132.698,00
1,4	14010212	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4,00	$ 116.955,00	$ 467.820,00
2		MAMPOSTERIA				
2,1	14050201	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	11,60	$ 74.942,00	$ 869.327,00
2,2	14060103	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	23,20	$ 36.223,00	$ 840.374,00
2,3	14070104	ESTUCO PREPARADO	M2	255,17	$ 13.072,00	$ 3.335.582,00
2,4	14070102	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	318,56	$ 16.193,00	$ 5.158.442,00
2,5	14090101	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA	M2	40,59	$ 238.870,00	$ 9.695.733,00
2,6	14020301	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	31,24	$ 1.116.750,00	$ 34.887.270,00
2,7	17010202	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500MPA. FIGURADO, ARMADO ,COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	411,60	$ 11.548,00	$ 4.753.157,00
2,8	14080111	PORCELANATO BEIGE	M2	218,65	$ 180.184,00	$ 39.396.646,00
2,9	PRECIO POLICIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON TABLILLA EN PVC. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA.	M2	236,60	$ 152.656,45	$ 36.118.783,00
2,10	14080201	TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m	M2	27,90	$ 126.920,00	$ 3.541.068,00
2,11	CREADO CON INSUMOS AIM	PISO EN GRAVILLA LAVADA No. 2 Espesor de 2cm	M2	27,90	$ 116.432,00	$ 3.248.453,00
2,12	11062206	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	63,20	$ 133.716,00	$ 8.450.851,00
2,13	11060211	RELLENO CON GRAVILLA	M3	4,20	$ 136.483,00	$ 573.229,00
2,14	14080309	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 50 X 10	ML	99,60	$ 28.250,00	$ 2.813.700,00
3		CARPINTERIA METALICA				
3,1	14120201	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	M2	50,06	$ 405.066,00	$ 20.277.604,00
3,2	14120102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	21,97	$ 984.861,00	$ 21.637.396,00
3,3	COTIZACION	SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE CELOSIA EN PERFIL RECTANGULAR DE 60x40x 2.0 MM. INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y CHAZOS DE ANCLAJE	M2	211,20	$ 807.350,00	$ 170.512.320,00
4		ACABADOS ARQUITECTONICOS				
4,1	CREADO CON INSUMOS AIM	VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM	M2	48,91	$ 529.855,00	$ 25.915.208,00

4,2	14120104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, CERRADURA, MANIJA, PIVOTE.	M2	15,12	$ 1.558.843,00	$ 23.569.706,00
5		INSTALACIONES ELECTRICAS				
5,1	CREADO CON INSUMOS AIM	SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	20,00	$ 216.613,00	$ 4.332.260,00
5,2	15011201	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	8,00	$ 158.050,00	$ 1.264.400,00
5,3	COTIZACION	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PUNTO DE RED DE DATOS ESTRUCTURADO DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA.	PTO	50,00	$ 2.414.769,00	$ 120.738.450,00
5,4	COTIZACIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Ups 60 KVA trifásica TIPO TORRE	UN	1,00	$ 137.737.260,00	$ 137.737.260,00
5,5	15011001	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 719.209,00	$ 2.876.836,00
5,6	15011012	TABLERO GENERAL ,BAJA TENSIÓN INCLUYE GABINETE METÁLICO,TOTALIZADOR 3X125A. 25KA240V,CONTADOR DE ENERGIA ACTIVA5A ,CONTADOR DE ENERGIA REACTIVA 5 A, TRES (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE MEDIDA 5 A DE PLATINA	UN	1,00	$ 5.098.095,00	$ 5.098.095,00
6		EQUIPOS DE VENTILACION MECÁNICA				
6,1	15011302	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 12000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5,00	$ 3.072.550,00	$ 15.362.750,00
		CUARTO EQUIPOS CAD				
7		PISOS				
7,1	15010508	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 619.678,00	$ 619.678,00
		PASILLO ZONA INSTRUCCIÓN SISTEMA TACTICO BASICO POLICIAL				
8		PISOS DE PASILLOS Y REJILLAS				
8,1	14010224	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	118,50	$ 31.545,00	$ 3.738.083,00
8,2	14010233	PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	118,50	$ 9.529,00	$ 1.129.187,00
8,3	14080201	TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m	M2	59,25	$ 126.920,00	$ 7.520.010,00
8,4	CREADO CON INSUMOS AIM	PISO EN GRAVILLA LAVADA No 2 espesor de 2 cm	M2	59,25	$ 116.432,00	$ 6.898.596,00
		ADECUACION MANDOS NIVEL EJECUTIVO Y AULA AMBIENTAL AXP				
9		PISOS				
9,1	14010230	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	14,35	$ 17.404,00	$ 249.747,00
9,2	14080108	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	14,35	$ 166.115,00	$ 2.383.750,00
9,3	14010204	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	25,50	$ 8.411,00	$ 214.481,00
9,4	PRECIO POLICIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON TABLILLA EN PVC. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA.	M2	25,50	$ 152.656,45	$ 3.892.739,00
9,5	14080302	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	89,25	$ 49.270,00	$ 4.397.348,00
9,6	14080103	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	89,25	$ 96.720,00	$ 8.632.260,00
9,7	14010218	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	475,00	$ 8.976,00	$ 4.263.600,00
9,8	14100208	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	475,00	$ 139.079,00	$ 66.062.525,00
		BATERIA SANITARIA SUBOFICIALES				
9,9	14010203	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	$ 54.387,00	$ 54.387,00
9,10	14010202	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	$ 43.510,00	$ 43.510,00
9,11	14150102	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	1,00	$ 522.194,00	$ 522.194,00
9,12	14150203	MONTAJE SANITARIO DE FLUXOMETRO	UN	1,00	$ 104.440,00	$ 104.440,00
9,13	14150108	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	1,00	$ 697.960,00	$ 697.960,00
9,14	14150205	MONTAJE LAVAMANOS	UN	1,00	$ 70.381,00	$ 70.381,00
9,15	14150305	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN	1,00	$ 157.132,00	$ 157.132,00
9,16	14140213	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 111.219,00	$ 111.219,00
9,17	14140206	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 117.783,00	$ 117.783,00
9,18	14140102	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	1,00	$ 38.173,00	$ 38.173,00

9,19	14130115	ACCESORIO CPVC 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 123.752,00	$ 123.752,00
9,20	14070102	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	52,42	$ 16.193,00	$ 848.837,00
9,21	14120201	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	M2	6,30	$ 405.066,00	$ 2.551.916,00
9,22	14120102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	1,37	$ 984.861,00	$ 1.344.335,00
9,23	14170104	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	0,56	$ 206.979,00	$ 115.908,24
10		INSTALACIONES ELECTRICAS				
10,1	15011105	ACOMETIDA PARCIAL 2No10+1No12 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	20,00	$ 37.966,00	$ 759.320,00
10,2	15011001	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 719.209,00	$ 719.209,00
10,3	15011201	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	4,00	$ 158.050,00	$ 632.200,00
10,4	CREADO CON INSUMOS AIM	SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	3,00	$ 216.613,00	$ 649.839,00
10,5	NR 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON CORREDIZO EN PERFILERIA ESTRUCTURAL CON RIEL EN ANGULO Y PERFILERIA INTERNA CAL 16. INCLUYE PINTURA PREMIER Y ESMALTE, MOTOR BFT 2000A - 220V (VELOCIDAD DE HOJA 9M/3) , BOTON DE EMERGENCIA, LETREROS, SENSORES FOTOELÉCTRICOS PARA CIERRE, BALIZA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO EMITIDO POR LA ONAC	UND	3,00	$ 41.338.464,00	$ 124.015.392,00
10,6	15011202	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 261.500,00	$ 784.500,00
10,7	15010215	CIMENTACIÓN DE POSTES EN TERRENO NORMAL NORMA LA009/LA009-1 CODENSA	M3	2,70	$ 268.949,00	$ 580.930,00
10,8	15010201	POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 8M X 510KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	5,00	$ 1.167.780,00	$ 4.671.120,00
10,9	15010803	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP65/65 (CONJUNTO ÓPTICO / CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 16LEDS.120-277VOLTOS, 38W, 4000°K. CON FOTOCELDA COMPLETA. REF: RALED I 16 LEDS RA02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5,00	$ 1.978.986,00	$ 7.915.944,00
		TARIMA CANCHA DE FUTBOL				
11		INSTALACIONES ELECTRICAS				
11,1	15011001	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 719.209,00	$ 719.209,00
11,2	15011201	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	4,00	$ 158.050,00	$ 632.200,00
11,3	CREADO CON INSUMOS AIM	SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	6,00	$ 216.613,00	$ 1.299.678,00
		BAÑO DE INSTRUCCIÓN ZONA DE AUXILIARES DE POLICIA				
12		CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA				
12,1	17010302	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	845,78	$ 41.276,00	$ 34.910.415,00
12,2	14100208	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	33,75	$ 139.079,00	$ 4.693.916,00
12,3	14040453	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	7,50	$ 139.096,00	$ 1.043.220,00
12,4	14140306	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	12,00	$ 35.851,00	$ 430.212,00
13		BATERIA SANITARIA				
13.0	14020101	ZAPATA EN CONCRETO 20.7MPa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,43	$ 1.271.782,00	$ 3.090.430,00
13,1	14010223	DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	4,20	$ 528.760,00	$ 2.220.792,00
13,2	11060101	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0-2.00M INCLUYE CARGUE	M3	21,88	$ 108.755,00	$ 2.379.559,00
13,3	14020201	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,56	$ 1.363.125,00	$ 2.126.475,00
13,4	14030101	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,13	$ 1.855.935,00	$ 2.097.207,00
13,5	14030201	VIGA AEREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,24	$ 1.809.011,00	$ 2.243.174,00

13,6	17010201	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	868,12	$ 10.800,00	$ 9.375.696,00
13,7	14050201	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	96,15	$ 74.942,00	$ 7.205.673,00
13,8	14060103	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	114,66	$ 36.223,00	$ 4.153.329,00
13,9	14060102	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	58,38	$ 50.735,00	$ 2.961.909,00
13,10	14070104	ESTUCO PREPARADO	M2	58,38	$ 13.072,00	$ 763.143,00
13,11	14070101	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	58,38	$ 19.391,00	$ 1.132.047,00
13,12	14070102	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	38,22	$ 16.193,00	$ 618.896,00
13,13	14170104	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	4,00	$ 206.979,00	$ 827.916,00
13,14	14080108	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	76,44	$ 166.115,00	$ 12.697.831,00
13,15	14120102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	13,02	$ 984.861,00	$ 12.822.890,00
13,16	14150102	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	6,00	$ 522.194,00	$ 3.133.164,00
13,17	14150110	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UN	2,00	$ 1.212.062,00	$ 2.424.124,00
13,18	14150305	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN	6,00	$ 157.132,00	$ 942.792,00
13,19	14150108	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	4,00	$ 697.960,00	$ 2.791.840,00
13,20	14030403	MESÓN EN CONCRETO 20.7MPa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,24	$ 2.659.742,00	$ 638.338,00
13,21	14140213	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	$ 111.219,00	$ 667.314,00
13,22	14140206	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 117.783,00	$ 471.132,00
13,23	14140210	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UN	2,00	$ 116.734,00	$ 233.468,00
13,24	14140102	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	5,57	$ 38.173,00	$ 212.624,00
13,25	14140106	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	$ 14.372,00	$ 86.232,00
13,26	14130120	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	73,64	$ 20.912,00	$ 1.539.960,00
13,27	14130127	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 4.552,00	$ 18.208,00
13,28	14140503	TRAMPA DE GRASAS EN PVC95 LITROS. INCLUYE TUBERÍA DE CONEXIÓN PVC Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 881.962,00	$ 881.962,00
13,29	14140403	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	1,00	$ 1.005.060,00	$ 1.005.060,00
13,30	15011105	ACOMETIDA PARCIAL 2No10+1No12 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	16,00	$ 37.966,00	$ 607.456,00
13,31	15011001	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 719.209,00	$ 719.209,00
13,32	15011201	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	4,00	$ 158.050,00	$ 632.200,00
13,33	15011209	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	4,00	$ 230.177,00	$ 920.708,00
13,34	CREADO CON INSUMOS AIM	SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	6,00	$ 216.613,00	$ 1.299.678,00
13,35	11090207	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	500,00	$ 2.309,00	$ 1.154.500,00
13,36	CREADO CON INSUMOS AIM	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	30,35	$ 70.732,00	$ 2.146.716,00
		ALOJAMIENTO AXP FRENTE AUDITORIO				
14		MAMPOSTERIA				
14,1	14010205	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	132,00	$ 11.413,00	$ 1.506.516,00
14,2	14010213	DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	224,56	$ 13.053,00	$ 2.931.182,00
14,3	14010203	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	$ 54.387,00	$ 108.774,00
14,4	14010202	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	$ 43.510,00	$ 87.020,00
14,5	14010233	PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	224,56	$ 9.529,00	$ 2.139.832,00
14,6	14010230	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERAMICO MUROS.INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	12,03	$ 17.404,00	$ 209.370,00
14,7	14080108	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	12,03	$ 166.115,00	$ 1.998.363,00
14,8	14080302	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	224,56	$ 49.270,00	$ 11.064.071,00

14,9	14080111	PORCELANATO BEIGE	M2	224,56	$ 180.184,00	$ 40.462.119,00
14,10	PRECIO POLICIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON TABLILLA EN PVC. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA.	M2	132,00	$ 152.656,45	$ 20.150.651,00
14,11	14120201	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	M2	9,60	$ 405.066,00	$ 3.888.634,00
14,12	14120102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	18,79	$ 984.861,00	$ 18.505.538,00
14,13	14150102	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	2,00	$ 522.194,00	$ 1.044.388,00
14,14	14150202	MONTAJE SANITARIO DE TANQUE	UN	2,00	$ 77.540,00	$ 155.080,00
14,15	14150305	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN	6,00	$ 157.132,00	$ 942.792,00
14,16	14150108	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	2,00	$ 697.960,00	$ 1.395.920,00
14,17	14150205	MONTAJE LAVAMANOS	UN	2,00	$ 70.381,00	$ 140.762,00
14,18	14010221	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	6,00	$ 21.755,00	$ 130.530,00
14,19	14150306	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN	6,00	$ 203.321,00	$ 1.219.926,00
14,2	14150204	MONTAJE DE DUCHA	UN	6,00	$ 66.571,00	$ 399.426,00
14,21	14170104	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	2,24	$ 206.979,00	$ 463.632,96
15		INSTALACIONES ELECTRICAS				
15,1	15011201	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	8,00	$ 158.050,00	$ 1.264.400,00
15,2	CREADO CON INSUMOS AIM	SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	8,00	$ 216.613,00	$ 1.732.904,00
15,3	15010814	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	21,00	$ 64.733,00	$ 1.359.393,00
15,4	15011304	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 4.995.231,00	$ 4.995.231,00
TOTAL COSTO DIRECTO						$ 1.226.177.526,20
ADMINISTRACION 28%						INCLUYE AIM 34%
UTILIDAD 5%						
IMPREVISTOS 1%						
VALOR TOTAL						**$ 1.226.177.526,20**

9. INFORME DE PERSONAL Y EQUIPO

PERSONAL TÉCNICO DE LA PROPUESTA

A continuación, se relaciona el equipo mínimo de trabajo ofrecido por el CONSORSOCIO ESCUELA DE CARABINEROS para el mes del **17 de febrero 2026 al 28 de febrero de 2025.**

- **PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ACTIVO**

CONSORCIO MANTENIMIENTO EJERCITO		
CARGO	**NOMBRE**	**DEDICACIÓN**
DIRECTOR DE OBRA	JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO	50%
RESIDENTE DE OBRA	NICOL VANESSA HERNANDEZ	100%
SST	JUAN CAMILO POSADA VARELA	50%

	DEMET				
	NOMBRES	CC	PENSION	EPS	CARGO
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	PORVENIR	CAPITAL SALUD	AYUDANTE
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	PROTECCION	CAPITAL SALUD	AYUDANTE
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	PORVENIR	SANITAS	AYUDANTE

10. ACTIVIDADES EJECUTADAS.

MEJORAMIENTO INSTALACIONES COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA META							
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INC. AIU 34%	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
CAD - CENTRO AUTOMATICO DE DESPACHO							
1	PRELIMINARES						
1.1	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E=0.07M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	284,14	$ 31.545,00	$ 8.963.196,00	284,14	$ 8.963.196,00
1.2	PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	284,14	$ 9.529,00	$ 2.707.570,00	284,14	$ 2.707.570,00
1.3	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	85,52	$ 24.938,00	$ 2.132.698,00	85,52	$ 2.132.698,00
1.4	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4,00	$ 116.955,00	$ 467.820,00	4,00	$ 467.820,00
2	MAMPOSTERIA						
2.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	11,60	$ 74.942,00	$ 869.327,00	11,60	$ 74.942,00
2.2	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	23,20	$ 36.223,00	$ 840.374,00	23,20	$ 36.223,00
2.5	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA	M2	40,59	$ 238.870,00	$ 9.695.733,00	40,59	$ 238.870,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS						
5.2	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	8,00	$ 158.050,00	$ 1.264.400,00	8,00	$ 1.264.400,00
5.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PUNTO DE RED DE DATOS ESTRUCTURADO DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA.	PTO	50,00	$ 2.414.769,00	$ 120.738.450,00	9,00	$ 21.732.921,00
ALOJAMIENTO AXP FRENTE AUDITORIO							
14	MAMPOSTERIA						
14,1	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	132,00	$11.413,00	$1.506.516,00	132,00	$1.506.516,00
14,2	DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	224,56	$13.053,00	$2.931.182,00	132,00	$1.722.996,00
14,3	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	$54.387,00	$108.774,00	2,00	$108.774,00

14,4	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	$43.510,00	$87.020,00	2,00	$87.020,00
14,5	PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	224,56	$9.529,00	$2.139.832,00	224,56	$2.139.832,00
14,6	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS.INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	12,03	$17.404,00	$209.370,00	12,03	$209.370,12
14.7	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	12,03	$166.115,00	$ 1.998.363,00	12,03	$ 1.998.363,00
14.8	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	224,56	$49.270,00	$ 11.064.071,00	88,00	$ 4.335.760,00
14.9	PORCELANATO BEIGE	M2	224,56	$ 180.184,00	$ 40.462.119,00	88,00	$ 15.856.192,00
14.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON TABLILLA EN PVC. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA.	M2	132,00	$ 152.656,45	$ 20.150.651,00	88,00	$ 13.433.768,00
14.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	M2	9,60	$405.066,00	$ 3.888.634,00	9,60	$ 3.888.634,00
14.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	18,79	$984.861,00	$ 18.505.538,00	11,27	$ 11.103.323,00
14.13	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	2,00	$522.194,00	$ 1.044.388,00	2,00	$ 1.044.388,00
14.15	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN	6,00	$157.132,00	$ 942.792,00	6,00	$ 942.792,00
14.16	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	2,00	$697.960,00	$ 1.395.920,00	2,00	$ 1.395.920,00
14.18	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	6,00	$21.755,00	$ 130.530,00	6,00	$ 130.530,00
14.19	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN	6,00	$203.321,00	$ 1.219.926,00	6,00	$ 1.219.926,00
14.20	MONTAJE DE DUCHA	UN	6,00	$66.571,00	$ 399.426,00	6,00	$ 399.426,00
15	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						
15.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	8,00	$158.050,00	$ 1.264.400,00	8,00	$ 1.264.400,00
15.4	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	1,00	$4.995.231,00	$ 4.995.231,00	1,00	$ 4.995.231,00
						VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 117.665.386,00**

Según la tabla anterior, la cual muestra las actividades ejecutadas del 17 de febrero al 28 de febrero de 2026, se ha alcanzado un avance del **9.60%,** lo que financieramente se traduce a un monto de **($ 117.665.386,00) CIENTO DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS.**

11. ITEMS DE ACTIVIDADES DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO.

CAD - CENTRO AUTOMATICO DE DESPACHO							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
1.1	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E=0.07M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	284,14	284,14	284,14	100%	100%



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
1.2	PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	284.14	284.14	284.14	100%	100%





CAD - CENTRO AUTOMATICO DE DESPACHO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
1.3	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	85.52	85.52	85.52	100%	100%





CAD - CENTRO AUTOMATICO DE DESPACHO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
1.4	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4.00	4.00	4.00	100%	100%





CAD - CENTRO AUTOMATICO DE DESPACHO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
2.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	11.60	11.60	11.60	100%	100%








CAD - CENTRO AUTOMATICO DE DESPACHO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
2.2	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	23.20	23.20	23.20	100%	100%

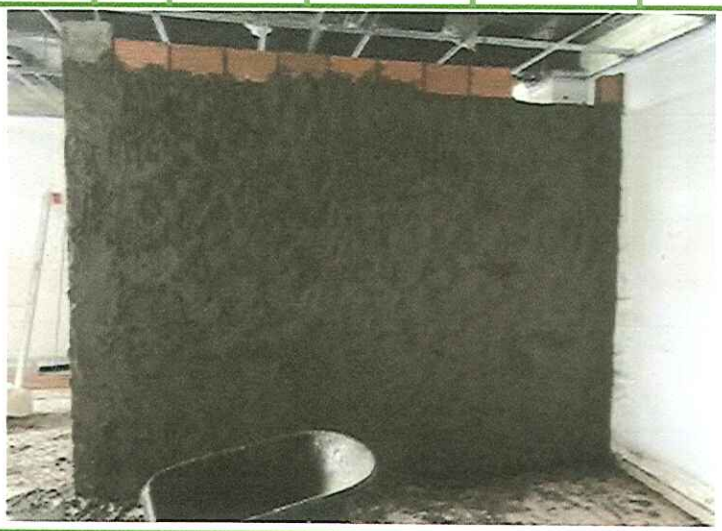

CAD - CENTRO AUTOMATICO DE DESPACHO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
2.5	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA	M2	40.59	40.59	40.59	100%	100%





CAD - CENTRO AUTOMATICO DE DESPACHO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
5.2	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	8.00	8.00	8.00	100%	100%






CAD - CENTRO AUTOMATICO DE DESPACHO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
5.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PUNTO DE RED DE DATOS ESTRUCTURADO DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA.	PTO	50.00	9.00	9.00	18.00%	18.00%



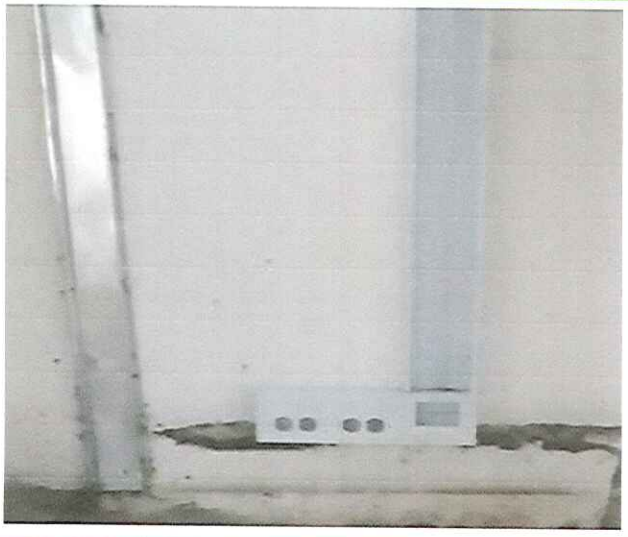

ALOJAMIENTO AXP FRENTE AUDITORIO							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
14.7	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	12.03	12.03	12.03	100%	100%



ALOJAMIENTO AXP FRENTE AUDITORIO							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
14.8	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	224.56	88.00	88.00	39.19%	39.19%





ALOJAMIENTO AXP FRENTE AUDITORIO							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
14.9	PORCELANATO BEIGE	M2	224.56	88.00	88.00	39.19%	39.19%





ALOJAMIENTO AXP FRENTE AUDITORIO							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
14.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON TABLILLA EN PVC. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA.	M2	132.00	88.00	88.00	66.67%	66.67%



ALOJAMIENTO AXP FRENTE AUDITORIO							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
14.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	M2	9.60	9.60	9.60	100%	100%



ALOJAMIENTO AXP FRENTE AUDITORIO							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
14.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	18.79	11.27	11.27	60.00%	60.00%





ALOJAMIENTO AXP FRENTE AUDITORIO							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
14.13	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	2.00	2.00	2.00	100%	100%



ALOJAMIENTO AXP FRENTE AUDITORIO							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
14.15	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN	6.00	6.00	6.00	100%	100%



ALOJAMIENTO AXP FRENTE AUDITORIO							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
14.16	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	2.00	2.00	2.00	100%	100%




ALOJAMIENTO AXP FRENTE AUDITORIO							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
14.18	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	6.00	6.00	6.00	100%	100%




ALOJAMIENTO AXP FRENTE AUDITORIO							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
14.19	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN	6.00	6.00	6.00	100%	100%





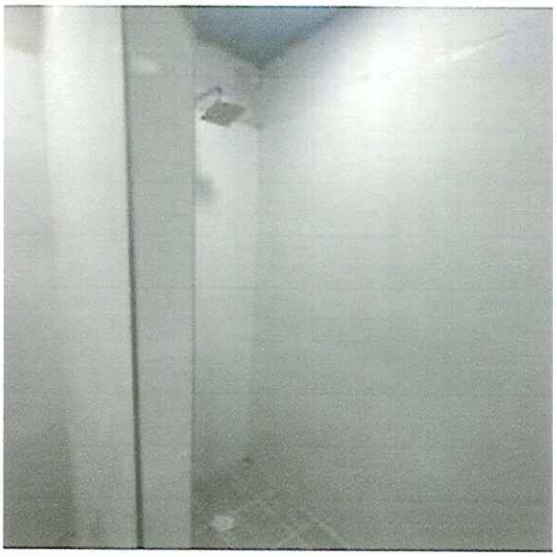


ALOJAMIENTO AXP FRENTE AUDITORIO							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
14.20	MONTAJE DE DUCHA	UN	6.00	6.00	6.00	100%	100%



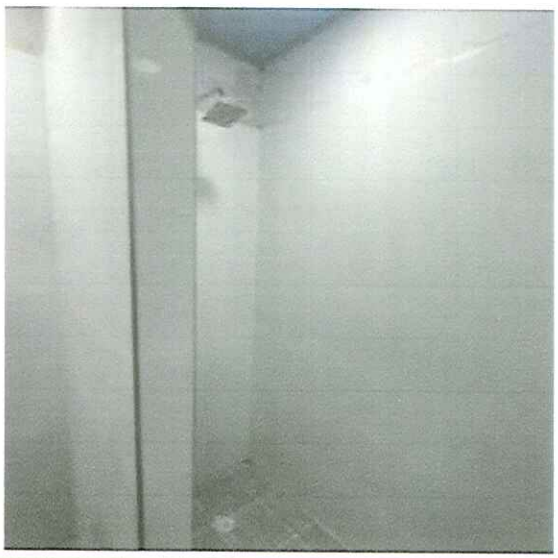

ALOJAMIENTO AXP FRENTE AUDITORIO							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
15.1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	8.00	8.00	8.00	100%	100%

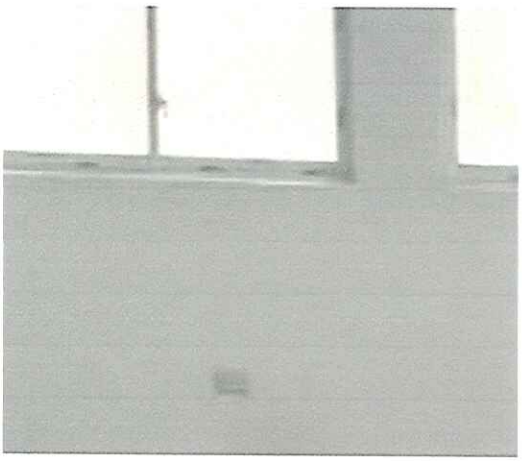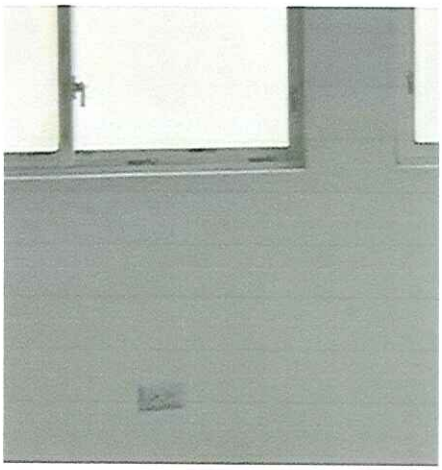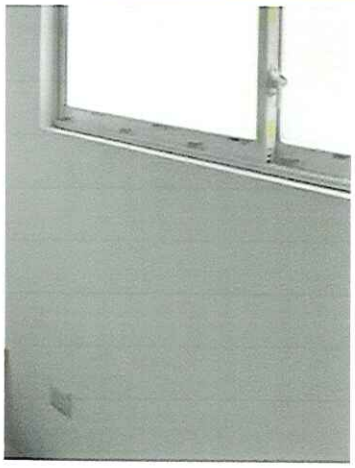ALOJAMIENTO AXP FRENTE AUDITORIO							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA	% DE AVANCE EN EL PERIODO	% DE AVANCE ACUMULADO
15.4	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	1.00	1.00	1.00	100%	100%




12. AVANCE FISICO DE OBRA.

Durante el período comprendido entre el 17 y el 28 de febrero de 2026, se llevaron a cabo actividades de construcción y adecuación en dos frentes de trabajo principales dentro del proyecto de Mejoramiento de las Instalaciones del Comando del Departamento de Policía Meta.

En el frente del CAD – Centro Automático de Despacho, los trabajos iniciaron con las actividades preliminares de demolición y desmonte, ejecutándose la demolición manual de baldosa de piso en un área de 284,14 m², junto con la picada del mismo y el correspondiente trasiego y cargue manual del material. Así mismo, se realizó el desmonte de rejas y ventanas metálicas en 85,52 m² y el desmonte de 4 marcos con sus respectivas puertas, incluyendo el traslado del material hasta sitio de cargue o almacenamiento. En materia de mampostería, se construyeron muros en bloque Flexa No. 4 y se ejecutaron trabajos de pañete con mortero 1:4 en muros interiores, complementados con la instalación de muros en Super Board doble cara de 40,59 m². En cuanto a las instalaciones eléctricas, se instalaron 8 salidas para toma corriente doble con polo a tierra y 9 puntos de red de datos estructurada conforme a la ficha técnica del proyecto.

En el frente de Alojamiento AXP Frente Auditorio, se adelantaron trabajos de pisos con la instalación de porcelanato Cedar Blanco brillante de 0.30x0.60 en 12,03 m², afinado de pisos con mortero 1:4 en 88 m², e instalación de porcelanato Beige en igual área. Para los cielos rasos, se ejecutó el suministro e instalación de PVC con estructura metálica en 88 m². En carpintería de aluminio se instalaron ventanas corredizas con vidrio de 4 mm en 6,60 m² y puertas con sistema bisagra y vidrio de 4 mm en 11,27 m². En el componente de aparatos sanitarios se instalaron 2 sanitarios Acuacer Blanco Corona, 6 juegos de incrustaciones blanco, 2 lavamanos Corona con grifería y accesorios, y se realizó el desmonte, suministro e instalación de 6 conjuntos de ducha y registro Grival incluyendo su respectivo montaje. Finalmente, en instalaciones eléctricas se instalaron 8 salidas de toma corriente doble con polo a tierra y 1 sistema de aire acondicionado tipo Split con tecnología Inverter de 24.000 BTU a 220V, incluyendo unidad interior, unidad exterior y kit completo de instalación.

Al cierre del período reportado, el valor total ejecutado asciende a $115.575.195, cifra que refleja el avance físico y financiero acumulado de las actividades desarrolladas en ambos frentes de trabajo.

13. ACTAS DE REUNIONES.

ACTAS DE COMITÉ SUSCRITAS		
No. ACTA	**TEMAS**	**FECHA**
03	La reunión se centró en el seguimiento al avance del contrato de adecuaciones físicas en instalaciones del Departamento de Policía Meta (DEMET). El principal tema fue la imposibilidad técnica de fundir una placa de concreto sobre la acometida eléctrica existente, por contravenir el RETIE y generar riesgos de mantenimiento y seguridad. Como consecuencia, se planteó la necesidad de tramitar una suspensión temporal del contrato y una modificación de cantidades, para ajustar el alcance contractual a la normativa vigente.	**01-12-2025**

14. CORRESPONDECIA ENVIADA/RECIBIDA

OFICIO	FECHA	DE	PARA	ASUNTO
INT-DEMET-2025-001	28-nov.2025	Interventoría	Contratista de Obra	Requerimiento – Cumplimiento de obligaciones contractuales del contrato de obra 2233 de 2025
INT-DEMET-2025-002	28-nov.2025	Interventoría	Contratista de Obra	Requerimiento – Cumplimiento inicio de ejecución actividades del contrato de obra 2233 de 2025.
OFI-2025-002	03-dic.2025	Contratista de Obra	Interventoría	Remisión pólizas actualizadas según acta de inicio para aprobación.
OFI-2025-003	03-dic.2025	Contratista de Obra	Interventoría	Solicitud Acta de Suspensión No.1 del contrato de obra No. 2233 de 2025.
OFI-2025-004	15-dic.2025	Contratista de Obra	Interventoría	Solicitud aprobación diseño valla informativa.
OFI-2025-005	07-ene.2026	Contratista de Obra	Interventoría	Cambio de Profesional del Contrato No. 2233 de 2025.

OFICIO	FECHA	DE	PARA	ASUNTO
OFI-2025-006	13-ene.2026	Contratista de Obra	Interventoría	Solicitud de Ampliación al Acta de Suspensión No.1 del contrato de obra No. 2233 de 2025.
INT-DEMET-2025-007	25-ene.2026	Interventoría	Contratista de Obra	Instrucción de revisión técnica integral y estructuración de propuesta de ajuste contractual
OFI-2025-007	25-ene.2026	Contratista de Obra	Interventoría	Solicitud de prórroga por cuatro (4) meses – Contrato de Obra N.° 2233 de 2025.

15. CONCLUSIONES

- **Avance de Obra**: Durante el periodo comprendido entre el 17 de febrero al 28 de febrero de 2026, el contratista ha alcanzado un avance del 9.60% en la ejecución del proyecto, lo cual corresponde a un valor financiero de $117.665.386,00.
- No obstante, el desarrollo de la obra se ha visto afectado por la identificación de múltiples situaciones técnicas que no pudieron ser evidenciadas previamente y que solo se hicieron manifiestas una vez iniciadas las actividades de desmonte y demolición, particularmente relacionadas con la presencia de redes internas existentes y condiciones constructivas no visibles, las cuales requieren revisión y análisis detallado para definir las intervenciones a ejecutar.
- En este sentido, dichas condiciones generan la necesidad de adelantar evaluaciones técnicas y definición de soluciones constructivas que permitan suplir de manera adecuada las necesidades encontradas en sitio, lo cual impacta la programación inicialmente prevista. Por lo anterior, solicitamos una prórroga del plazo contractual, con el fin de contar con el tiempo requerido para realizar el análisis técnico correspondiente, definir las alternativas de intervención y garantizar la correcta ejecución del proyecto conforme a los criterios de calidad, seguridad y funcionalidad exigidos.

ING. JUAN CAMILO POSADA VARELA
R/L CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS

DEPARTAMENTO DEL META

AVANCE MENSUAL DE OBRA

POLICÍA ESCUELA DE CARABINEROS
CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS

CONTRATO DE OBRA No.	2233 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2025	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.**	2326 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025
AVANCE MENSUAL No.	2		
OBJETO CONTRATO:	"REALIZAR ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIAS, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3, EN EL DEPARTAMENTO DEL META"	**OBJETO CONTRATO INTERVENTORIA:**	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA PARA LAS ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3, EN EL DEPARTAMENTO DEL META".
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($ 1,226,177,526,20) MONEDA LEGAL COLOMBIANA	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:**	SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS ($ 68.143.081,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS R/L: JUAN CAMILO POSADA VARELA CC. Nº 1.094.921.302 de Armenia	**CONTRATISTA INTERVENTORIA**	BIMCON S.A.S RL: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO CC. 1.122.143.748 de Acacias.
NIT:	902.001.555-2	**NIT:**	901.253.373-6
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	consorcioescarabineros@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:**	bimcon.cia@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	CAMILO ANDRES NUÑEZ ROJAS	**FECHA PRESENTE ACTA:**	28 DE FEBRERP DE 2026
CORREO ELECTRONICO SUPERVISION:	gerenciadeseguridad@meta.gov.co		

INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA,

CONDICIONES CONTRACTUALES						AVANCE MENSUAL							
						MES 1		MES 2		ACUMULADO		CANTIDAD ACTUALIZADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD (-)	VALOR	CANTIDAD (-)	VALOR	CANTIDAD (+)	VALOR	CANT	VALOR
1	CAD - CENTRO AUTOMATICO DE DESPACHO PRELIMINARES												
1,1	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E=0.07M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	284,14	$ 31.545,00	$ 8.963.196,00	0,00	$ -	284,14	$ 8.963.196,00	284,14	$ 8.963.196,00	0,00	$ -
1,2	PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	284,14	$ 9.529,00	$ 2.707.570,00	0,00	$ -	284,14	$ 2.707.570,00	284,14	$ 2.707.570,00	0,00	$ -
1,3	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	85,52	$ 24.938,00	$ 2.132.698,00	0,00	$ -	85,52	$ 2.132.698,00	85,52	$ 2.132.698,00	0,00	$ -
1,4	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4,00	$ 116.955,00	$ 467.820,00	0,00	$ -	4,00	$ 467.820,00	4,00	$ 467.820,00	0,00	$ -
2	MAMPOSTERIA												
2,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	11,60	$ 74.942,00	$ 869.327,00	0,00	$ -	11,60	$ 869.327,00	11,60	$ 869.327,00	0,00	$ -
2,2	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	23,20	$ 36.223,00	$ 840.374,00	0,00	$ -	23,20	$ 840.374,00	23,20	$ 840.374,00	0,00	$ -
2,3	ESTUCO PREPARADO	M2	255,17	$ 13.072,00	$ 3.335.582,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	255,17	$ 3.335.582,00
2,4	PINTURA VINILO TIPO 1 SIMURO (ALTA CALIDAD)	M2	318,56	$ 16.193,00	$ 5.158.442,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	318,56	$ 5.158.442,00
2,5	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA	M2	40,59	$ 238.870,00	$ 9.695.733,00	0,00	$ -	40,59	$ 9.695.733,00	40,59	$ 9.695.733,00	0,00	$ -
2,6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	31,24	$ 1.116.750,00	$ 34.887.270,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	31,24	$ 34.887.270,00
2,7	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500MPA, FIGURADO, ARMADO ,COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	411,60	$ 11.548,00	$ 4.753.157,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	411,60	$ 4.753.157,00
2,8	PORCELANATO BEIGE	M2	218,65	$ 180.184,00	$ 39.396.646,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	218,65	$ 39.396.646,00
2,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON TABLILLA EN PVC. INCLUYE ESTRUCTURA METALICA.	M2	236,60	$ 152.656,45	$ 36.118.783,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	236,60	$ 36.118.783,00
2,10	TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m	M2	27,90	$ 126.920,00	$ 3.541.068,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	27,90	$ 3.541.068,00
2,11	PISO EN GRAVILLA LAVADA No. 2 Espesor de 2cm	M2	27,90	$ 116.432,00	$ 3.248.453,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	27,90	$ 3.248.453,00
2,12	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	63,20	$ 133.716,00	$ 8.450.851,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	63,20	$ 8.450.851,00
2,13	RELLENO CON GRAVILLA	M3	4,20	$ 136.483,00	$ 573.229,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,20	$ 573.229,00
2,14	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 50 X 10	ML	99,60	$ 28.250,00	$ 2.813.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	99,60	$ 2.813.700,00
3	CARPINTERIA METALICA												
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	M2	50,06	$ 405.066,00	$ 20.277.604,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	50,06	$ 20.277.604,00
3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	21,97	$ 984.861,00	$ 21.637.396,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	21,97	$ 21.637.396,00
3,3	SUMINISTRO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE CELOSIA EN PERFIL RECTANGULAR DE 60x40x 2.0 MM. INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE Y CHAZOS DE ANCLAJE	M2	211,20	$ 807.350,00	$ 170.512.320,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	211,20	$ 170.512.320,00
4	ACABADOS ARQUITECTONICOS												
4,1	VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 10MM	M2	48,91	$ 529.855,00	$ 25.915.208,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	48,91	$ 25.915.208,00
4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, CERRADURA, MANIJA, PIVOTE.	M2	15,12	$ 1.558.843,00	$ 23.569.706,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	15,12	$ 23.569.706,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS												
5,1	SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	20,00	$ 216.613,00	$ 4.332.260,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 4.332.260,00
5,2	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	8,00	$ 158.050,00	$ 1.264.400,00	0,00	$ -	8,00	$ 1.264.400,00	8,00	$ 1.264.400,00	0,00	$ -
5,3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PUNTO DE RED DE DATOS ESTRUCTURADO DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA.	PTO	50,00	$ 2.414.769,00	$ 120.738.450,00	0,00	$ -	9,00	$ 21.732.921,00	9,00	$ 21.732.921,00	41,00	$ 99.005.529,00
5,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Ups 60 KVA trifasica TIPO TORRE	UN	1,00	$ 137.737.260,00	$ 137.737.260,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 137.737.260,00
5,5	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 719.209,00	$ 2.876.836,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 2.876.836,00
5,6	TABLERO GENERAL ,BAJA TENSIÓN INCLUYE GABINETE METALICO,TOTALIZADOR 3X125A, 25KA240V,CONTADOR DE ENERGIA ACTIVASA ,CONTADOR DE ENERGIA REACTIVA 5 A, TRES (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE MEDIDA 5 A DE PLATINA	UN	1,00	$ 5.098.095,00	$ 5.098.095,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.098.095,00
6	EQUIPOS DE VENTILACION MECÁNICA												
6,1	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGIA INVERTER DE 12000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5,00	$ 3.072.550,00	$ 15.362.750,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 15.362.750,00

CUARTO EQUIPOS CAD														
7	PISOS													
7,1	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 619.678,00	$ 619.678,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 619.678,00
PASILLO ZONA INSTRUCCIÓN SISTEMA TACTICO BASICO POLICIAL														
8	PISOS DE PASILLOS Y REJILLAS													
8,1	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	118,50	$ 31.545,00	$ 3.738.083,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	118,50	$ 3.738.083,00
8,2	PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	118,50	$ 9.529,00	$ 1.129.187,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	118,50	$ 1.129.187,00
8,3	TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m	M2	59,25	$ 126.920,00	$ 7.520.010,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	59,25	$ 7.520.010,00
8,4	PISO EN GRAVILLA LAVADA No 2 espesor de 2 cm	M2	59,25	$ 116.432,00	$ 6.898.596,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	59,25	$ 6.898.596,00
ADECUACION MANDOS NIVEL EJECUTIVO Y AULA AMBIENTAL AXP														
9	PISOS													
9,1	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	14,35	$ 17.404,00	$ 249.747,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	14,35	$ 249.747,00
9,2	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	14,35	$ 166.115,00	$ 2.383.750,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	14,35	$ 2.383.750,00
9,3	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRALADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	25,50	$ 8.411,00	$ 214.481,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	25,50	$ 214.481,00
9,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON TABLILLA EN PVC. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA.	M2	25,50	$ 152.656,45	$ 3.892.739,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	25,50	$ 3.892.739,00
9,5	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	89,25	$ 49.270,00	$ 4.397.348,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	89,25	$ 4.397.348,00
9,6	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	89,25	$ 96.720,00	$ 8.632.260,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	89,25	$ 8.632.260,00
9,7	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	475,00	$ 8.976,00	$ 4.263.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	475,00	$ 4.263.600,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	475,00	$ 139.079,00	$ 66.062.525,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	475,00	$ 66.062.525,00
	BATERIA SANITARIA SUBOFICIALES													
9,9	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	$ 54.387,00	$ 54.387,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 54.387,00
9,10	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	$ 43.510,00	$ 43.510,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 43.510,00
9,11	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	1,00	$ 522.194,00	$ 522.194,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 522.194,00
9,12	MONTAJE SANITARIO DE FLUXOMETRO	UN	1,00	$ 104.440,00	$ 104.440,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 104.440,00
9,13	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	1,00	$ 697.960,00	$ 697.960,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 697.960,00
9,14	MONTAJE LAVAMANOS	UN	1,00	$ 70.381,00	$ 70.381,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 70.381,00
9,15	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN	1,00	$ 157.132,00	$ 157.132,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 157.132,00
9,16	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 111.219,00	$ 111.219,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 111.219,00
9,17	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 117.783,00	$ 117.783,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 117.783,00
9,18	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	1,00	$ 38.173,00	$ 38.173,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 38.173,00
9,19	ACCESORIO CPVC 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 123.752,00	$ 123.752,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 123.752,00
9,20	PINTURA VINILO TIPO 1 SIMURO (ALTA CALIDAD)	M2	52,42	$ 16.193,00	$ 848.837,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	52,42	$ 848.837,00
9,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	M2	6,30	$ 405.066,00	$ 2.551.916,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,30	$ 2.551.916,00
[illegible]	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	1,37	$ 984.861,00	$ 1.344.335,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,37	$ 1.344.335,00
[illegible]	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	0,56	$ 206.979,00	$ 115.908,24	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,56	$ 115.908,00
10	INSTALACIONES ELECTRICAS													
10,1	ACOMETIDA PARCIAL 2No10+1No12 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	20,00	$ 37.966,00	$ 759.320,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 759.320,00
10,2	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 719.209,00	$ 719.209,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 719.209,00
10,3	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	4,00	$ 158.050,00	$ 632.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 632.200,00
10,4	SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	3,00	$ 216.613,00	$ 649.839,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 649.839,00
10,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON CORREDIZO EN PERFILERIA ESTRUCTURAL CON RIEL EN ANGULO Y PERFILERIA INTERNA CAL 16. INCLUYE PINTURA PREMIER Y ESMALTE, MOTOR 8FT 2000A - 220V (VELOCIDAD DE HOJA 9M/3) , BOTON DE EMERGENCIA, LETREROS, SENSORES FOTOELECTRICOS PARA CIERRE, BALIZA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO EMITIDO POR LA ONAC	UND	3,00	$ 41.338.464,00	$ 124.015.392,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 124.015.392,00
10,6	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 261.500,00	$ 784.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 784.500,00
10,7	CIMENTACIÓN DE POSTES EN TERRENO NORMAL NORMA LA009/LA009-1 CODENSA	M3	2,70	$ 268.949,00	$ 580.930,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,70	$ 580.930,00
10,8	POSTE DE CONCRETO LINEA DE 8M X 510KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	5,00	$ 1.167.780,00	$ 4.671.120,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 4.671.120,00
10,9	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP65/65 (CONJUNTO OPTICO / CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECANICOS. 16LEDS.120-277VOLTOS, 38W, 4000°K. CON FOTOCELDA COMPLETA. REF: RALED I 16 LEDS RA02. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5,00	$ 1.978.986,00	$ 7.915.944,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 7.915.944,00
TARIMA CANCHA DE FUTBOL														
11	INSTALACIONES ELECTRICAS													
11,1	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 719.209,00	$ 719.209,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 719.209,00

11,2	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACION	PTO	4,00	$ 158.050,00	$ 632.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 632.200,00
11,3	SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACION	PTO	6,00	$ 216.613,00	$ 1.299.678,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 1.299.678,00
	BAÑO DE INSTRUCCIÓN ZONA DE AUXILIARES DE POLICIA												
12	CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA												
12,1	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A500 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	KG	845,78	$ 41.276,00	$ 34.910.415,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	845,78	$ 34.910.415,00
12,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	33,75	$ 139.079,00	$ 4.693.916,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	33,75	$ 4.693.916,00
12,3	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	7,50	$ 139.096,00	$ 1.043.220,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7,50	$ 1.043.220,00
12,4	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	12,00	$ 35.851,00	$ 430.212,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 430.212,00
13	BATERIA SANITARIA												
13,0	ZAPATA EN CONCRETO 20.7MPa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,43	$ 1.271.782,00	$ 3.090.430,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,43	$ 3.090.430,00
13,1	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	4,20	$ 528.760,00	$ 2.220.792,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,20	$ 2.220.792,00
13,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0-2.00M INCLUYE CARGUE	M3	21,88	$ 108.755,00	$ 2.379.559,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	21,88	$ 2.379.559,00
13,3	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,56	$ 1.363.125,00	$ 2.126.475,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,56	$ 2.126.475,00
13,4	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,13	$ 1.855.935,00	$ 2.097.207,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,13	$ 2.097.207,00
13,5	VIGA AEREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	1,24	$ 1.809.011,00	$ 2.243.174,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,24	$ 2.243.174,00
13,6	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	868,12	$ 10.800,00	$ 9.375.696,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	868,12	$ 9.375.696,00
13,7	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	96,15	$ 74.942,00	$ 7.205.673,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	96,15	$ 7.205.673,00
	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	114,66	$ 36.223,00	$ 4.153.329,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	114,66	$ 4.153.329,00
13,9	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACION	M2	58,38	$ 50.735,00	$ 2.961.909,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	58,38	$ 2.961.909,00
13,10	ESTUCO PREPARADO	M2	58,38	$ 13.072,00	$ 763.143,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	58,38	$ 763.143,00
13,11	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	58,38	$ 19.391,00	$ 1.132.047,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	58,38	$ 1.132.047,00
13,12	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	38,22	$ 16.193,00	$ 618.896,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	38,22	$ 618.896,00
13,13	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	4,00	$ 206.979,00	$ 827.916,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 827.916,00
13,14	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	76,44	$ 166.115,00	$ 12.697.831,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	76,44	$ 12.697.831,00
13,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	13,02	$ 984.861,00	$ 12.822.890,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	13,02	$ 12.822.890,00
13,16	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	6,00	$ 522.194,00	$ 3.133.164,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 3.133.164,00
13,17	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UN	2,00	$ 1.212.062,00	$ 2.424.124,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.424.124,00
13,18	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN	6,00	$ 157.132,00	$ 942.792,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 942.792,00
13,19	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	4,00	$ 697.960,00	$ 2.791.840,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 2.791.840,00
13,20	MESON EN CONCRETO 20.7MPa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	0,24	$ 2.659.742,00	$ 638.338,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,24	$ 638.338,00
13,21	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	$ 111.219,00	$ 667.314,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 667.314,00
13,22	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	4,00	$ 117.783,00	$ 471.132,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 471.132,00
13,23	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UN	2,00	$ 116.734,00	$ 233.468,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 233.468,00
	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	5,57	$ 38.173,00	$ 212.624,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,57	$ 212.624,00
13,25	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	$ 14.372,00	$ 86.232,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 86.232,00
13,26	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	73,64	$ 20.912,00	$ 1.539.960,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	73,64	$ 1.539.960,00
13,27	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 4.552,00	$ 18.208,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 18.208,00
13,28	TRAMPA DE GRASAS EN PVC95 LITROS. INCLUYE TUBERIA DE CONEXION PVC Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 881.962,00	$ 881.962,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 881.962,00
13,29	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	1,00	$ 1.005.060,00	$ 1.005.060,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.005.060,00
13,30	ACOMETIDA PARCIAL 2No10+1No12 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	16,00	$ 37.966,00	$ 607.456,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	16,00	$ 607.456,00
13,31	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 719.209,00	$ 719.209,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 719.209,00
13,32	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	4,00	$ 158.050,00	$ 632.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 632.200,00
13,33	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	4,00	$ 230.177,00	$ 920.708,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 920.708,00
13,34	SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	6,00	$ 216.613,00	$ 1.299.678,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 1.299.678,00
13,35	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	500,00	$ 2.309,00	$ 1.154.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	500,00	$ 1.154.500,00
13,36	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	30,35	$ 70.732,00	$ 2.146.716,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	30,35	$ 2.146.716,00
	ALOJAMIENTO AXP FRENTE AUDITORIO												
14	MAMPOSTERIA												
14,1	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	132,00	$ 11.413,00	$ 1.506.516,00	132,00	$ 1.506.516,00	0,00	$ -	132,00	$ 1.506.516,00	0,00	$ -
14,2	DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	224,56	$ 13.053,00	$ 2.931.182,00	224,56	$ 2.931.182,00	0,00	$ -	224,56	$ 2.931.182,00	0,00	$ -
14,3	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	$ 54.387,00	$ 108.774,00	2,00	$ 108.774,00	0,00	$ -	2,00	$ 108.774,00	0,00	$ -

14,4	DESMONTE DE LAVAMANOS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	$ 43.510,00	$ 87.020,00	2,00	$ 87.020,00	0,00	$ -	2,00	$ 87.020,00	0,00	$ -
14,5	PICADA DE PISO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	224,56	$ 9.529,00	$ 2.139.632,00	224,56	$ 2.139.632,00	0,00	$ -	224,56	$ 2.139.632,00	0,00	$ -
14,6	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS,INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	12,00	$ 17.404,00	$ 209.370,00	12,00	$ 209.370,00	0,00	$ -	12,00	$ 209.370,00	0,00	$ -
14,7	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	12,00	$ 166.115,00	$ 1.998.363,00	0,00	$ -	12,00	$ 1.998.363,00	12,00	$ 1.998.363,00	0,00	$ -
14,8	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	224,56	$ 49.270,00	$ 11.064.071,00	0,00	$ -	88,00	$ 4.335.760,00	88,00	$ 4.335.760,00	136,56	$ 6.728.310,00
14,9	PORCELANATO BEIGE	M2	224,56	$ 180.184,00	$ 40.462.119,00	0,00	$ -	88,00	$ 15.856.192,00	88,00	$ 15.856.192,00	136,56	$ 24.605.927,00
14,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO CON TABULLA EN PVC, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA.	M2	132,00	$ 152.656,45	$ 20.150.651,00	0,00	$ -	88,00	$ 13.433.768,00	88,00	$ 13.433.768,00	44,00	$ 6.716.884,00
14,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	M2	9,60	$ 405.066,00	$ 3.888.634,00	0,00	$ -	9,60	$ 3.888.634,00	9,60	$ 3.888.634,00	0,00	$ -
14,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	18,79	$ 984.961,00	$ 18.505.538,00	0,00	$ -	11,27	$ 11.103.323,00	11,27	$ 11.103.323,00	7,52	$ 7.402.215,00
14,13	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	2,00	$ 522.194,00	$ 1.044.388,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.044.388,00	2,00	$ 1.044.388,00	0,00	$ -
14,14	MONTAJE SANITARIO DE TANQUE	UN	2,00	$ 77.540,00	$ 155.080,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 155.080,00
14,15	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	UN	6,00	$ 157.132,00	$ 942.792,00	0,00	$ -	6,00	$ 942.792,00	6,00	$ 942.792,00	0,00	$ -
14,16	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	2,00	$ 697.960,00	$ 1.395.920,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.395.920,00	2,00	$ 1.395.920,00	0,00	$ -
14,17	MONTAJE LAVAMANOS	UN	2,00	$ 70.381,00	$ 140.762,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 140.762,00
14,18	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	6,00	$ 21.755,00	$ 130.530,00	0,00	$ -	6,00	$ 130.530,00	6,00	$ 130.530,00	0,00	$ -
14,19	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN	6,00	$ 203.321,00	$ 1.219.926,00	0,00	$ -	6,00	$ 1.219.926,00	6,00	$ 1.219.926,00	0,00	$ -
14,2	MONTAJE DE DUCHA	UN	6,00	$ 66.571,00	$ 399.426,00	0,00	$ -	6,00	$ 399.426,00	6,00	$ 399.426,00	0,00	$ -
14,21	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	2,24	$ 206.979,00	$ 463.632,96	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,24	$ 463.633,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS												
15,1	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	8,00	$ 158.050,00	$ 1.264.400,00	0,00	$ -	8,00	$ 1.264.400,00	8,00	$ 1.264.400,00	0,00	$ -
15,2	SALIDA PARA PANEL LED DE 18W SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	8,00	$ 216.613,00	$ 1.732.904,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 1.732.904,00
15,3	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	21,00	$ 64.733,00	$ 1.359.393,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	21,00	$ 1.359.393,00
15,4	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 4.995.231,00	$ 4.995.231,00	0,00	$ -	1,00	$ 4.995.231,00	1,00	$ 4.995.231,00	0,00	$ -
	COSTOS DIRECTOS + AIU				$ 1.226.177.626,20		$ 6.982.694,00		$ 110.682.692,00		$ 117.665.386,00		$ 1.108.512.140,00
	VALOR TOTAL				$ 1.226.177.626,20		$ 6.982.694,00		$ 110.682.692,00		$ 117.665.386,00		$ 1.108.512.140,00

CONDICIONES GENERALES			
VALOR DEL CONTRATO INCIAL	$ 1.226.177.626,20	100%	MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTI SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS
VALOR EJECUTADO LA PRESENTE ACTA	$ 110.682.692,00	9,03%	CIENTO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
VALOR ACUMULADO	$ 117.665.386,00	9,60%	CIENTO DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS.
VALOR POR EJECUTAR	$ 1.108.512.140,00	90,40%	MIL CIENTO OCHO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA PESOS

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el dia 28 de FEBRERO de 2026:

JUAN CAMILO POSADA VARELA
R/L: CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS
CONTRATO DE OBRA No. 2233 DE 2025

ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO
R/L: BIMCON S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2326 DE 2025

INFORME MENSUAL DE SST N°2

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2233 DE 2025

REALIZAR ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.



PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 17 DE FEBRERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVO GENERAL 3
2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3
2.2. LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO 4
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 5
3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y ALCANCE DEL PROYECTO 6
3.2. GENERALIDADES DEL SG-SST 7
4. RELACION DEL PERSONAL VINCULADO A LA OBRA 8
PERSONAL TÉCNICO DE LA PROPUESTA 8
5. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 8
6. CONTROL DE PERSONAL Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 10
7. ENTREGA EPP Y DOTACIÓN 10
8. ACCIDENTES LABORALES Y AUSENTISMO 10
9. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-COPASST 11
10. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS EN OBRA. 11
11. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD 12
12. INDUCCIÓN DE PERSONAL 13
13. INSPECCIONES PREOPERACIONALES 13
13.1. INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Y CAMILLA 13
13.2. INSPECCIÓN DE EXTINTOR 13
13.3. INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO. 13
14. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 15
15. KIT DE EMERGENCIA 15
16. MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE A RECOMENDACIONES DE SST POR IDCM 16

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se da a conocer la gestión realizada durante el periodo comprendido del 17 de febrero del 2026 al 28 de febrero DE 2026, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco de las actividades ejecutadas por el CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS, en las instalaciones del Departamento de Policía del Meta, la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García y la Regional de Incorporaciones. Dichas actividades son registradas en función del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, permitiendo optimizar las acciones preventivas durante la jornada laboral.

Es por ello que el consorcio tiene como propósito desarrollar la prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta las condiciones actuales de la infraestructura, las cuales presentan deterioro, desgaste y falta de adecuaciones técnicas, con el fin de mejorar la calidad de vida laboral del personal que desempeña sus funciones en estas instalaciones.

Asimismo, se da cumplimiento establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, en el desarrollo de las actividades como contratista. La prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la obra está orientada a lograr una adecuada administración de los riesgos, que permita mantener el control permanente de los mismos en los diferentes procesos de intervención, formación y operación, contribuyendo al bienestar físico, mental y social del personal, así como al adecuado funcionamiento de los recursos e instalaciones.

2. OBJETIVO GENERAL

El objetivo fundamental del presente documento es dar a conocer a la entidad contratante y a la interventoría el desarrollo de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco del Contrato No. 2233 de noviembre de 2025, así como el avance obtenido desde el inicio de la ejecución de la obra hasta la fecha de presentación del presente informe.

Lo anterior, en relación con la ejecución del CONTRATO No. 2233 de noviembre de 2025, cuyo objeto es: "Realizar adecuaciones físicas a las instalaciones del Comando del Departamento de Policía Meta (DEMET), la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, la Regional de Incorporaciones y el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad SIES 1,2,3, en el departamento del Meta".

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar los soportes de los parámetros ejecutados en el desarrollo del cronograma SST.
- Cumplir las acciones propuestas para un proceso de interventoría.
- Dar cumplimiento a los criterios del contrato de obra.

2.2. LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO

El área general del proyecto se localiza en la República de Colombia, Departamento del Meta Municipio de Villavicencio.

Los límites geográficos del Municipio de Villavicencio están definidos de la siguiente manera:

- Norte: Restrepo y El Calvario
- Oriente: Puerto López.
- Occidente: Acacias y Departamento de Cundinamarca

El acceso al proyecto se encuentra sobre la vía puerto López.



Ilustración 1. Localización general del proyecto en el Municipio de Villavicencio.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA No.	2233 DE 07 NOVIEMBRE DEL 2025
CONTRATANTE	GOBERNACION DEL META
CONTRATISTA	CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS NIT: 902.001.555-2 R/L: JUAN CAMILO POSADA VARELA C.C. 1.094.921.302 consorciocarabineros@gmail.com
OBJETO	REALIZAR ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIAS, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3, EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($1,226,177,526.20)
TERMINO DE EJECUCIÓN	HASTA EL TREINTA Y UNO (31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	25 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2326 DE 05 NOVIEMBRE DE 2025
INTERVENTORÍA	BIMCON SAS
SUPERVISOR	CAMILO ANDRES NUÑEZ ROJAS
FECHA DE SUSPENSION No. 1	19 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSION No. 1	TREINTA (30) DIAS
AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No. 1	TREINTA (30) DIAS
FECHA DE REINICIO No. 1	17 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA No. 1	25 DE FEBRERO DE 2026
TIEMPO PRORROGA No. 1	CUATRO (04) MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	01 DE JULIO DE 2026

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO	**9.43%**

Tabla 1. Información del proyecto

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y ALCANCE DEL PROYECTO

El Departamento del Meta, en cumplimiento del Plan de Desarrollo 2024–2027 "El Gobierno de la Unidad", adelanta el proyecto:

"REALIZAR ADECUACIONES FÍSICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA META (DEMET), ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCÍA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3, EN EL DEPARTAMENTO DEL META".

Este proyecto se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental (BPPID) bajo el No. 2024005500227 y está orientado al fortalecimiento de la infraestructura de las entidades de seguridad del departamento, en el marco del pilar de Seguridad Total y Derechos Humanos.

Su ejecución tiene como propósito contribuir al fortalecimiento institucional, la seguridad ciudadana, la conservación del orden público y la garantía de los Derechos Humanos en el Departamento del Meta.

Durante el período comprendido entre el 17 y el 28 de febrero de 2026, se llevaron a cabo actividades de construcción y adecuación en dos frentes de trabajo principales dentro del proyecto de Mejoramiento de las Instalaciones del Comando del Departamento de Policía Meta. Entre las principales labores realizadas se encuentran:

Centro Automático de Despacho (CAD)

- Demolición manual de baldosa de piso.
- Picada de piso.
- Desmonte de rejas y ventanas metálicas.
- Desmonte de marcos y puertas.
- Construcción de muro en bloque Flexa.
- Pañete de muros interiores.
- Construcción de muro en Super Board doble cara con pintura.
- Instalación de salidas para tomacorriente doble con polo a tierra.
- Instalación de puntos de red de datos estructurado.

Alojamiento AXP frente auditorio

- Desmonte de cielo raso en drywall.
- Desmonte de piso en baldosa cerámica o gres.
- Desmonte de sanitario.

- Desmonte de lavamanos.
- Picada de piso.
- Demolición manual de enchape cerámico en muros.
- Instalación de porcelanato (Cedar blanco y beige).
- Afinado de pisos en mortero.
- Suministro e instalación de cielo raso en PVC.
- Suministro e instalación de ventanas en aluminio corredizo.
- Suministro e instalación de puertas en aluminio.
- Instalación de sanitario.
- Instalación de juego de incrustaciones.
- Instalación de lavamanos con grifería.
- Desmonte de duchas y griferías.
- Instalación de conjunto de ducha y registro.
- Montaje de duchas.

Instalaciones eléctricas

- Instalación de salidas para tomacorriente doble con polo a tierra.
- Suministro e instalación de sistema de aire acondicionado tipo Split.

3.2. GENERALIDADES DEL SG-SST

Conscientes de la importancia de la seguridad y salud en el Trabajo (SST) y consecuentes con la reglamentación legal existente en el país, el **CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS** en cabeza de su representante legal, asume la responsabilidad de la planeación y ejecución de las actividades del presente Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el Trabajo SG-SST; en todos los campos; condiciones de salud y condiciones de trabajo para el **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2233 DE 2025**

El presente documento corresponde al informe mensual de las actividades desarrolladas y aplicadas por los colaboradores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la normatividad en materia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), como lo son la ley 9 de 1979, resolución 1016 de 1983, resolución 2413 de 1979, la resolución 2400 de 1979, decreto No. 1295 de 1994, ley 1262 de 2012, decreto 1072 de 2015; Resolución 0312 de 2019 entre otros.

4. RELACION DEL PERSONAL VINCULADO A LA OBRA

PERSONAL TÉCNICO DE LA PROPUESTA

A continuación, se relaciona el equipo mínimo de trabajo ofrecido por el CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS para el mes del **17 de febrero 2026 al 28 de febrero de 2026.**

- **PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ACTIVO**

PERSONAL ADMINISTRATIVO		
CARGO	**NOMBRE**	**DEDICACIÓN**
DIRECTOR DE OBRA	JEYNI LISEB NARVAEZ NIETO	50%
RESIDENTE DE OBRA	PEDRO GONZALO HERNANDEZ BARRERA	100%
SST	JUAN CAMILO POSADA VARELA	50%

	PERSONAL OPERATIVO				
	NOMBRES	**CC**	**PENSION**	**EPS**	**CARGO**
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	PORVENIR	CAPITAL SALUD	AYUDANTE
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	PROTECCION	CAPITAL SALUD	AYUDANTE
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	PORVENIR	SANITAS	AYUDANTE

5. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

De acuerdo con lo estipulado con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y la Política SST del **CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS** en el siguiente cuadro se evidencia la ejecución de las actividades, durante el periodo del 17 de febrero del 2026 al 28 de febrero de 2026:

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CUMPLE (SI/NO)
1. LIDERAZGO / COMPROMISO / DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
Inspecciones Gerenciales- Director de obra / Residente de obra	SI
Revisión de desempeño en SST	SI
Divulgación de Políticas, Misión, Visión, objetivos y responsabilidades de SST	SI
Reuniones del COPASST - COCOLAB	SI
2. PROCEDIMIENTOS Y PRACTICAS SEGURAS	
Actualización de Matriz de Peligros	SI
Inspecciones de Frente de obra	NO
Inspección Locativa	SI
Inspección de Herramientas, Maquinaria y equipos	SI

Inspección de EPP´S	SI
Inspección de trabajos en alturas	N/A
3. GESTION DEL RIESGO	
Identificación y divulgación de Peligros	SI
Definición y divulgación de procedimientos y tareas de alto riesgo	SI
Reporte de Actos / Condiciones Inseguras	SI
Investigación de Incidentes / Accidentes del periodo	NO
Ejecución de Planes de acción de las Investigaciones de Eventos reportados	NO
Capacitaciones del Plan SST	SI
3.1. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
Demarcación y señalización de área de trabajo	SI
Entrega de Elementos de Protección Personal	SI
Actualización de cartelera informativa HSEQ.	NO
Mantenimiento de dique perimetral para productos químicos.	N/A
Accidentes / Incidentes reportados en el mes	NINGUNO
Charlas diarias de Seguridad y Salud en el Trabajo	SI
Inducción de seguridad y salud en el trabajo	SI
Inspección de Puestos de trabajo	SI
Mediciones Higiénicas	NO
Campañas de SST	SI
Divulgación del MEDEVAC, líneas de emergencias, rutas de evacuación	SI
Inspección de Botiquines	SI
Inspección de Extintores	SI
Simulacros	NO
3.2. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	
Afiliación a seguridad social	SI
Exámenes médicos preocupacionales - periódicos -Posincapacidad y de egreso	NO
Seguimiento a los Programas de Vigilancia Epidemiológico	NO
Seguimiento a observaciones, restricciones y recomendaciones médicas ocupacionales	NO
Capacitación control de enfermedades endémicas propias de la región y Salud Pública.	NO
Capacitación estilos de vida saludable / Prevención de enfermedades crónicas	NO
Calistenia, Ejercicios físicos	SI
3.3. SANEAMIENTO BASICO / GESTIÓN AMBIENTAL	
Divulgación del Plan de Gestión de Residuos	SI
Fumigación, control de vectores	NO
Suministro de hidratación	SI
Charla de gestión ambiental	SI
Inspecciones de gestión de residuos y orden y aseo.	SI
Jornadas de Orden y Aseo	SI
4. SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Seguimiento a los exámenes ocupacionales con observaciones del personal	N/A
Seguimiento a ejecución de Acciones preventivas/ correctivas / cierre de hallazgos	N/A

Seguimiento de los indicadores, objetivos y análisis de tendencias.	SI
Seguimiento del programa de capacitación y entrenamiento en SST	NO
Seguimiento al Plan de Trabajo Anual	SI
Seguimiento Gerencial a Gestión SST	NO
Seguimiento de entrega de informes mensuales	SI

6. CONTROL DE PERSONAL Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Durante el 17 de febrero del 2026 al 28 de febrero de 2026, **CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS** se verifica que el contratista cumplió a cabalidad con el pago de la seguridad social.
El cual da cumplimiento a los lineamientos establecidos en La ley 100 de 1993 (Marco Legal General De La Seguridad Social).

ANEXO 1. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

7. ENTREGA EPP Y DOTACIÓN

Los Equipos de Protección Personal (EPP) son suministrados a cada trabajador al momento de su ingreso a la obra, y su reposición se realiza en función del desgaste derivado de su uso.

No obstante, es importante precisar que durante el periodo anterior se llevaron a cabo las entregas correspondientes; en consecuencia, a la fecha no ha sido necesario efectuar reposiciones por desgaste. El registro de dichas entregas se realiza mediante el formato establecido para la entrega de Equipos de Protección Personal y Dotación, en el cual se consigna el tipo de equipo entregado, la cantidad, la fecha de entrega y la firma del trabajador en señal de conformidad.

Lo anterior se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 230 – Suministro de calzado y vestido de labor del Código Sustantivo del Trabajo, así como en el artículo 2.2.1.4.2 (favorabilidad respecto a la dotación de calzado y vestido) y el artículo 2.2.4.6.24 (medidas de prevención y control, literal 5) del Decreto 1072 de 2015.

8. ACCIDENTES LABORALES Y AUSENTISMO

Para el periodo del 17 de febrero del 2026 al 28 de febrero de 2026, se reporta 0 accidente de origen laboral y 0 ausentismo por enfermedad laboral.
Tal como se representa en la siguiente tabla.

ITEM	INDICADOR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
1	No. trabajadores expuestos por mes	0	6	0	0	0	0
2	No. De accidentes laborales por mes	0%	0%	0%	0%	0%	0%

3	No. De accidentes de trabajo mortales	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	No. De días de incapacidad por accidente de trabajo	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5	No. Casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6	No. De casos nuevos de enfermedad laboral	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7	No. De días de ausencia por incapacidad laboral o común	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Tabla 2. tabla de accidentalidad

ANEXO 2. CERTIFICADO DE SINIESTRALIDAD DE LA ARL

9. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-COPASST

Designación de Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

De acuerdo con la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) debe conformarse únicamente en aquellas empresas que cuenten con más de diez (10) trabajadores. Dado que **CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS** no supera este número de colaboradores, no es posible conformar formalmente el COPASST. No obstante, en cumplimiento de la normatividad aplicable y con el fin de garantizar el seguimiento y mejora continua de las condiciones de trabajo, el día 24 de febrero de 2026 se realizó seguimiento a las actividades de SST mediante el Vigía.

a la **designación del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)**, quien asumirá las funciones de promoción, vigilancia y apoyo en la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. La persona designada como vigía SST es:

NOMBRES Y APELLIDOS	DESIGNACION	CARGO	ASISTENCIA
PEDRO GONZALO HERNANDEZ BARRERA	EMPLEADOR	PRINCIPAL	SI

ANEXO 3. SEGUIMIENTO DEL VIGÍA SST

10. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS EN OBRA.

La obra cuenta con señalización con la finalidad de llamar la atención sobre situaciones de riesgo de una forma rápida y fácilmente comprensible, De este modo el personal se mantiene bien informado con respecto a la señalización preventiva de obra

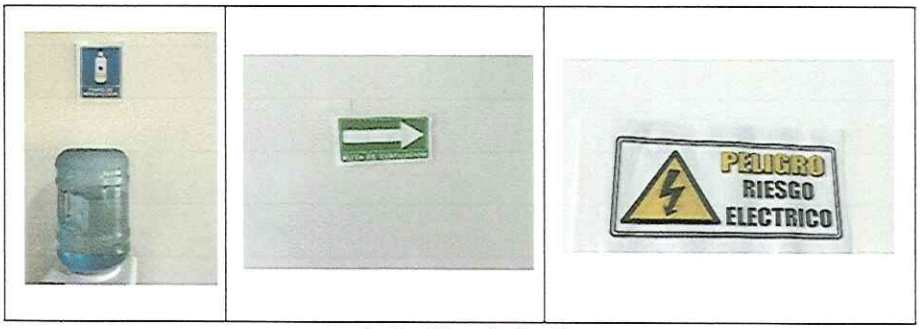


Ilustración señalización

11. CAPACITACIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD

Se realizaron las charlas y capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo por parte del profesional SST encargado, abarcando temas con referencia a la obra para el personal, logrando así, reforzar el comportamiento proactivo ante los peligros asociados al trabajo que realizan en obra y potenciar sus habilidades de observación preventiva. A continuación, se detallará los temas tratados.



CRONOGRAMA DE CHARLAS DEL 17 DE FEBRERO DEL 2026 al 28 DE FEBRERO DEL 2026	
Uso adecuado de elementos de protección personal	17/02/2026
Señalización y demarcación de áreas de trabajo	18/02/2026
Prevención de riesgos locativos	19/02/2026
Seguridad en trabajos de demolición y manejo de escombros	20/02/2026
Fatiga laboral y prevención del estrés	21/02/2026
Prevención de incendios y uso de extintores	23/02/2026
Seguridad en el uso de escaleras	24/02/2026
Cuidado de la espalda y prevención de lesiones lumbares	25/02/2026
Autocuidado y cultura de la seguridad	26/02/2026
Seguridad en el uso de herramientas manuales	27/02/2026
Prevención de riesgos por ruido y uso de protección auditiva	28/02/2026

ANEXO 4. CHARLA DE SEGURIDAD Y ASISTENCIA

12. INDUCCIÓN DE PERSONAL

Para el mes correspondiente al presente informe, en las instalaciones provisionales del equipo constructor, se llevó a cabo la inducción al personal, para el inicio de actividades. Esta inducción es básica para que el trabajador conozca la gestión en seguridad, salud a realizarse en el proyecto, adquiriendo conocimiento de las políticas, reglas y normas de trabajo. Teniendo como instructor al profesional SST a cargo de esta labor.

No obstante, se deja constancia de que durante el periodo evaluado no se presentó ingreso de personal nuevo; por ende, no fue necesario llevar a cabo inducciones, teniendo en cuenta que estas se realizan al momento del ingreso del trabajador a la obra.

13. INSPECCIONES PREOPERACIONALES

Las inspecciones de seguridad es una herramienta que nos permite identificar condiciones inseguras en la obra, relacionadas con el estado de equipos, herramientas, equipos de protección personal entre otros, y se realiza de acuerdo a los estándares establecidos en el plan de seguridad y salud en el trabajo, inspecciones pre operacionales a realizar, herramientas manuales, camilla, extintor e inspecciones de SST.

ANEXO 5. INSPECCIONES PREOPERACIONALES DE SST

13.1. INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN Y CAMILLA

Se ha realizado la inspección mensual correspondiente del botiquín y camilla de primeros auxilios para verificar la existencia de insumos básicos para la atención de lesiones menores en el tópico de la obra. En la obra se cuenta con uno (01) botiquín de primeros auxilios el cual se encuentran en obra, y en la los cuales serán reabastecidos a medida que se agoten los medicamentos; se cuenta con una (1) camilla de primeros auxilios que contamos en la obra

13.2. INSPECCIÓN DE EXTINTOR

Se ha realizado la inspección del extintor existente en obra para verificar las condiciones en las que se encuentran, se verificó fecha de recarga, tipo de carga, fecha de vencimiento de recarga y capacidad de los extintores, encontrándose el extintor en perfectas condiciones.

13.3. INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO.

Se ha realizado la inspección de orden y aseo de la obra para verificar las condiciones en las que se encuentra la obra, para el desarrollo de actividades seguras.





a. Jornada de Aseo

Se realizan jornadas de aseo semanal y clasificación de materiales, las cuales se desarrollan al inicio y final de las labores, limpieza y adecuación de bodega de almacenamiento de materiales a fin de garantizar y mantener en buenas condiciones las diferentes locaciones de la obra

b. Punto ecológico

Se cuenta con un punto Ecológico en la obra, con la finalidad de mantener un buen manejo de residuos y así promover el orden y aseo en obra, dando a conocer a los trabajadores la ubicación del punto y brindándoles la información sobre el buen manejo y separación de residuos de obra.

c. Disposición de residuos

Se clasificarán los residuos domésticos, industriales y especiales, los residuos son llevados a un lugar o punto ecológico para que sean dispuestos por la empresa prestadora del servicio del municipio.
El punto ecológico es la zona especial claramente demarcada y señalizada, para incentivar, motivar y sensibilizar a los trabajadores a actuar responsablemente en la separación en la fuente de todos los residuos sólidos que producen.

Con la unificación del código de colores a nivel nacional, la separación de residuos en la fuente será más fácil, los colores a usar serán los mismos. Los colores son:

- **Blanco:** residuos aprovechables limpios y secos, como plástico, vidrio, metales, papel y cartón.
- **Negro:** residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros.
- **Verde:** residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín, etc



Ilustración 2 Separación de los residuos

14. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Teniendo en cuenta que la reunión del Comité de Convivencia Laboral tiene una periodicidad trimestral, se aclara que durante el periodo evaluado fue necesario realizar una reunión extraordinaria el día 20 de febrero de 2026, debido a la actualización en la conformación del comité, específicamente en el cargo de secretario Suplente.

En dicha reunión se realizó el cambio del integrante designado anteriormente, siendo reemplazado por el señor PEDRO GONZALO HERNÁNDEZ BARRERA, quien asume el cargo de secretario Suplente del Comité de Convivencia Laboral, con el fin de dar continuidad al correcto funcionamiento del mismo y garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ASISTENCIA
JUAN CAMILO POSADA	R/LEGAL PRESIDENTE	SI
PEDRO GONZALO HERNANDEZ BARRERA	SECRETARIO SUPLENTE	SI
YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	INTEGRANTE – TRABAJADORES	SI

ANEXO 6. ACTA DE REUNION DE COCOLAB

15. KIT DE EMERGENCIA

CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS, con el propósito de contar con los elementos necesarios para la atención oportuna de situaciones de emergencia, da cumplimiento a lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y a la normatividad legal vigente, mediante la disposición de un kit de emergencia que permite atender de manera inmediata cualquier eventualidad que pueda presentarse en el lugar de trabajo.

De igual manera, se generan los registros de verificación del kit de emergencia, en los cuales se realizan las respectivas inspecciones para comprobar el estado y disponibilidad de los elementos, con el fin de identificar si se requieren acciones de mejora, reposición o cambio de alguno de los componentes. A continuación, se detallan las inspecciones realizadas.

EXTINTOR	BOTIQUIN y CAMILLA
	

TIPO DE INSPECCION	FECHA	LUGAR	RESPONSABLE	HALLAZGO
BOTIQUIN	NOVIEMBRE 2025	OBRA	JUAN CAMILO POSADA	NINGUNO
EXTINTOR	OCT 2025	OBRA	JUAN CAMILO POSADA	VENCE EL 2026

16. MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE A RECOMENDACIONES DE SST POR IDCM

En el periodo del 17 de febrero al 28 de febrero no se realizaron recomendaciones por parte de IDCM

ANEXO 1. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
ANEXO 2. CERTIFICADO DE SINIESTRALIDAD DE LA ARL
ANEXO 3. SEGUIMIENTO DEL VIGÍA SST

ANEXO 4. CHARLA DE SEGURIDAD Y ASISTENCIA

ANEXO 5. INSPECCIONES PREOPERACIONALES DE SST

ANEXO 6. ACTA REUNION DE COCOLAB

JUAN CAMILO POSADA
RESIDENTE DE OBRA Y COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURA

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902001555	2	CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUAN CAMILO POSADA VARELA	CR 39A 17 28	VILLAVICENCIO-META	3133928947	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	218672469	9503002713	E	2026/03/12	2026/04/13	BANCOLOMBIA		$1,743,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1026260090	HERNANDEZ PEDRO	X																	230301	14	$1,073,334	$171,800	EPS005	14	$1,073,334	$43,000	CCF34	14	$1,073,334	$43,000	14-11	14	$1,073,334	$74,800	14	$0	$0	SI	$332,600
2	CC	1121838357	HERRERA YUBER	X																	230301	14	$817,089	$130,800	EPS005	14	$817,089	$32,700	CCF34	14	$817,089	$32,700	14-11	14	$817,089	$56,900	14	$0	$0	SI	$253,100
3	CC	1122132436	NARVAEZ JEYNI	X																	230301	12	$700,362	$112,100	EPS002	12	$700,362	$28,100	CCF34	12	$700,362	$28,100	14-11	12	$700,362	$48,800	12	$0	$0	SI	$217,100
4	CC	1066511658	OJEDA IVAN	X																	230301	14	$817,089	$130,800	EPSC34	14	$817,089	$32,700	CCF34	14	$817,089	$32,700	14-11	14	$817,089	$56,900	14	$0	$0	SI	$253,100
5	CC	1121928879	ORTIZ EDGAR	X																	230301	12	$700,362	$112,100	EPS005	12	$700,362	$28,100	CCF34	12	$700,362	$28,100	14-11	12	$700,362	$48,800	12	$0	$0	SI	$217,100
6	CC	1094921302	POSADA JUAN	X																	230301	12	$700,362	$112,100	EPS005	12	$700,362	$28,100	CCF34	12	$700,362	$28,100	14-11	12	$700,362	$48,800	12	$0	$0	SI	$217,100
7	CC	1006821713	TORRES JERSSON	X																	230301	12	$700,362	$112,100	EPS005	12	$700,362	$28,100	CCF34	12	$700,362	$28,100	14-11	12	$700,362	$48,800	12	$0	$0	SI	$217,100
Total	Afiliados(7)																						$5,508,960	$881,800			$5,508,960	$220,800			$5,508,960	$220,800			$5,508,960	$383,800		$0	$0		$1,707,200

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902001555	2	CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUAN CAMILO POSADA VARELA	CR 39A 17 28	VILLAVICENCIO-META	3133928947	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	218672469	9503002713	E	2026/03/12	2026/04/13	BANCOLOMBIA		$1,743,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$881,800	$0	$900,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$881,800	$0	$900,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$383,800	$0	$391,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$383,800	$0	$391,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$220,800	$0	$225,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	7	$220,800	$0	$225,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$220,800	$0	$225,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$32,700	$0	$33,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$28,100	$0	$28,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$160,000	$0	$163,400
TOTAL				7	$1,707,200	$0	$1,743,300

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902001555	2	CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUAN CAMILO POSADA VARELA	CR 39A 17 28	VILLAVICENCIO-META	3133926947	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	383687200	9504513831	N	2026/03/12	2026/06/12	BANCOLOMBIA		$560,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1026260090	HERNANDEZ PEDRO	X							A			o	o						230301	14	($1,073,334)	($171,800)	EPS005	14	($1,073,334)	($43,000)	CCF34	14	($1,073,334)	($43,000)	14-11	14	($1,073,334)	($74,800)	14	$0	$0	SI	($332,600)
2	CC	1026260090	HERNANDEZ PEDRO	X							C										230301	14	$2,325,050	$372,100	EPS005	14	$2,325,050	$93,100	CCF34	14	$2,325,050	$93,100	14-11	14	$2,325,050	$161,900	14	$0	$0	SI	$720,200
3	CC	1122132436	NARVAEZ JEYNI	X							C										230301	12	$1,138,800	$182,300	EPS002	12	$1,138,800	$45,600	CCF34	12	$1,138,800	$45,600	14-11	12	$1,138,800	$79,300	12	$0	$0	SI	$352,800
4	CC	1122132436	NARVAEZ JEYNI	X							A			o	o						230301	12	($700,362)	($112,100)	EPS002	12	($700,362)	($28,100)	CCF34	12	($700,362)	($28,100)	14-11	12	($700,362)	($48,800)	12	$0	$0	SI	($217,100)
5	CC	1094921302	POSADA JUAN	X							A			o	o						230301	12	($700,362)	($112,100)	EPS005	12	($700,362)	($28,100)	CCF34	12	($700,362)	($28,100)	14-11	12	($700,362)	($48,800)	12	$0	$0	SI	($217,100)
6	CC	1094921302	POSADA JUAN	X							C										230301	12	$711,750	$113,900	EPS005	12	$711,750	$28,500	CCF34	12	$711,750	$28,500	14-11	12	$711,750	$49,600	12	$0	$0	SI	$220,500
Total	Afiliados(3)																						$1,701,542	$272,300			$1,701,542	$68,600			$1,701,542	$68,600			$1,701,542	$118,400		$0	$0		$526,700

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902001555	2	CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUAN CAMILO POSADA VARELA	CR 39A 17 28	VILLAVICENCIO-META	3133928947	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	383687200	9504513831	N	2026/03/12	2026/06/12	BANCOLOMBIA		$560,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$272,300	$0	$289,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$272,300	$0	$289,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$118,400	$0	$126,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$118,400	$0	$126,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$68,000	$0	$72,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	$68,000	$0	$72,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$68,000	$0	$72,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$17,500	$0	$18,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$50,500	$0	$53,800
TOTAL				3	$526,700	$0	$560,500

2026/06/11 08:14 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902001555	2	CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JUAN CAMILO POSADA VARELA	CR 39A 17 28	VILLAVICENCIO-META	3133928947	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	218672469	9503002713	E	2026/03/12	2026/04/13	BANCOLOMBIA	32	$1,743,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1026260090	HERNANDEZ PEDRO	230301	14	$1,073,334	$171,800	EPS005	14	$1,073,334	$43,000	CCF34	14	$1,073,334	$43,000	14-11	14	$1,073,334	$74,800	14	$0	$0
2	CC	1121838357	HERRERA YUBER	230301	14	$817,089	$130,800	EPS005	14	$817,089	$32,700	CCF34	14	$817,089	$32,700	14-11	14	$817,089	$56,900	14	$0	$0
3	CC	1122132435	NARVAEZ JEYNI	230301	12	$700,362	$112,100	EPS002	12	$700,362	$28,100	CCF34	12	$700,362	$28,100	14-11	12	$700,362	$48,800	12	$0	$0
4	CC	1066511658	OJEDA IVAN	230301	14	$817,089	$130,800	EPSC34	14	$817,089	$32,700	CCF34	14	$817,089	$32,700	14-11	14	$817,089	$56,900	14	$0	$0
5	CC	1121928879	ORTIZ EDGAR	230301	12	$700,362	$112,100	EPS005	12	$700,362	$28,100	CCF34	12	$700,362	$28,100	14-11	12	$700,362	$48,800	12	$0	$0
6	CC	1094921302	POSADA JUAN	230301	12	$700,362	$112,100	EPS005	12	$700,362	$28,100	CCF34	12	$700,362	$28,100	14-11	12	$700,362	$48,800	12	$0	$0
7	CC	1006821713	TORRES JERSSON	230301	12	$700,362	$112,100	EPS005	12	$700,362	$28,100	CCF34	12	$700,362	$28,100	14-11	12	$700,362	$48,800	12	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			$5,508,960	$881,800			$5,508,960	$220,800			$5,508,960	$220,800			$5,508,960	$383,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$881,800	$18,600	$0	$900,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$881,800	$18,600	$0	$900,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$383,800	$8,100	$0	$391,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$383,800	$8,100	$0	$391,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$220,800	$4,700	$0	$225,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	7	$220,800	$4,700	$0	$225,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$220,800	$4,700	$0	$225,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$32,700	$700	$0	$33,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$28,100	$600	$0	$28,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$160,000	$3,400	$0	$163,400
TOTAL				7	$1,707,200	$36,100	$0	$1,743,300

ARL | sura

Medellín, 18 de marzo de 2026

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa CONSORCIO ESCULA DE CARABINEROS, NIT N902001555, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de enero de 2026 hasta el 28 de febrero de 2026.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 181.51.35.11, 192.230.104.15, 172.16.42.57.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO ESCUELA CARABINEROS

CARTA DE CONFORMACIÓN DEL VIGÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Proyecto: REALIZAR ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

Fecha: 20 de febrero 2026

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, las empresas con diez (10) o menos trabajadores no están obligadas a conformar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). En su lugar, deberán contar con la designación de un Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), elegido por los trabajadores, quien tendrá la función de vigilar el cumplimiento de las normas, promover la prevención de riesgos y servir de enlace entre empleador y trabajadores en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En cumplimiento de la normatividad vigente, el día 24 de febrero 2026, se llevó a cabo la reunión para la conformación del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo de la consorcia Rancho y comedor cantón militar

	'DESIGNACIO	CARGO	ASISTENCIA
PEDRO GONZALO HERNANDEZ BARRERA	EMPLEADOR	PRINCIPAL	Gonzalo H.

Conclusión de la reunión

- La empresa cumplió con la obligación de conformar el cargo de Vigía SST.

Firma de vigía de SST

Firma de coordinador de SST

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1,0
POLICIA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA:28/02/2026				

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	I Van Andres Ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jesson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Prevención de riesgos por ruido y uso de protección auditiva

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1,0
POLICIA ESCUELA DE CARABINEROS	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA			FIRMA:	
FECHA: 27/02/2026				

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan Andres Ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jesson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Seguridad en el uso de herramientas manuales

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1,0
POLICIA ESCUELA DE CARABINEROS COMPOSITE ESCUELA DE CARABINEROS	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA			FIRMA:	
FECHA: 26/02/2026				

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan Andres Ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jesson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Autocuidado y cultura de la seguridad

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1,0
POLICIA ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA			FIRMA:	
FECHA: 25/02/2026				

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan Andres ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jesson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Cuidado de la espalda y prevención de lesiones lumbares

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001
		VERSIÓN: 1,0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA			FIRMA:	
FECHA: 24/02/2026				

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

Nº	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan Andres Ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jesson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Seguridad en el uso de escaleras

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1.0
POLICIA ESCUELA DE CARABINEROS	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 23/02/2026				

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

Nº	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan Andres Ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jerson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Prevención de incendios y uso de extintores

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1.0
POLICIA ESCUELA DE CARABINEROS	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 21/02/2026				

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan Andres Ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jerson Torres
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Fatiga laboral y prevención del estrés

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR 001 VERSIÓN: 1.0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 20/02/2026				

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan Ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jerson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Seguridad en trabajos de demolición y manejo de escombros

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1.0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA				FIRMA:
FECHA: 19/02/2026				

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan Andres Ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jerson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Prevención de riesgos locativos

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT-HSEQ-FOR-001 VERSIÓN: 1.0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA			FIRMA:	
FECHA: 18/02/2026				

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan Andres Ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jerson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Señalización y demarcación de áreas de trabajo

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	INTERCONS COLOMBIA S.A.S	CÓDIGO: CT-PMSO-FOR-001 VERSIÓN: 1.0
	CONTROL DE ASISTENCIA	

TIPO DE ASISTENCIA: CAPACITACIÓN		CHARLA DE SEGURIDAD	X	OTRO, CUAL _____
INSTRUCTOR: JUAN CAMILO POSADA VARELA			FIRMA:	
FECHA: 17/02/2026				

PROYECTO: ADECUACIONES FISICAS A LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA META DEMET, ESCUELA DE CARABINEROS EDUARDO CUEVAS GARCIA, REGIONAL DE INCORPORACIONES Y SISTEMA DE INTEGRADO DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES 1,2,3 EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DURACIÓN: 5MIN

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
1	IVAN ANDRES OJEDA FLORIAN	1066511658	AYUDANTE	Ivan Andres Ojeda
2	YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	1121838357	AYUDANTE	
3	JERSSON YAMIT TORRES PEREZ	1006821713	AYUDANTE	Jerson Torres
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

TEMAS TRATADOS:

Uso adecuado de elementos de protección personal

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

INSPECCION PREOPERACIONAL ESCALERA

INSPECCIÓN MES Y AÑO DE: feb 2026 CAPACIDAD: _____ MATERIAL DE LA ESCALERA: _____ UBICACIÓN: _____

TIPO DE ESCALERA: [ ] Caracol [ ] Tipo Tijera [ ] Fija [X] Tipo Tijera [ ] Extensión [ ] Portátil

LONGITUD: _____ SERIAL: _____

CRITERIO DE INSPECCIÓN: B: CUMPLE (Buen estado / Completo) M: NO CUMPLE (Incompleto o en mal estado) NA: NO APLICA

ITEM	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	LA ESCALERA SE ENCUENTRA SIN CORROSIÓN, OXIDACIÓN, PARTES SUELTAS O FISURAS	B	B	B	B	B	B																									
2	TODOS LOS EMPAQUES, PELDAÑOS Y PLATAFORMA DE LA ESCALERA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y COMPLETOS	B	B	B	B	B	B																									
3	TODOS LOS PELDAÑOS DE LA ESCALERA CUENTAN CON ANTIDESLIZANTE	B	B	B	B	B	B																									
4	LOS PELDAÑOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO (SIN ROTURA DE ASIENTO O FALLAS APARENTES)	B	B	B	B	B	B																									
5	LA ESCALERA CUENTA CON ZAPATAS ANTIDESLIZANTES EN SU BASE O SOPORTE	B	B	B	B	B	B																									
6	LAS PIEZAS DE SOPORTE DE LA ESCALERA (TENSORES, PERNOS) SE ENCUENTRAN FIJAS	B	B	B	B	B	B																									
7	SE EVIDENCIA ASEO EN LA ESCALERA Y LIBRE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS U OTROS CONTAMINANTES	B	B	B	B	B	B																									
8	LAS SUPERFICIES DONDE SE APOYA LOS PIES Y LAS MANOS SE ENCUENTRAN LISAS	B	B	B	B	B	B																									
9	LAS BISAGRAS Y PASADORES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO (APLICA PARA ESCALERA TIPO TIJERA)	B	B	B	B	B	B																									
10	LA CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA ESTÁ INDICADA EN LA ESCALERA	N	N	N	N	N	N																									
11	LA ESCALERA SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE ASEGURADA (ESCALERAS DE MANO, FIJAS Y PORTÁTILES)	B	B	B	B	B	B																									
12	EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (POR EJEMPLO, PASADOR) DE LA ESCALERA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO (ESCALERAS TIJERA)	NA	NA	NA	NA	NA	NA																									
13	LA ESCALERA SE ENCUENTRA ESTABLE	B	B	B	B	B	B																									
14	LA ESCALERA SE ENCUENTRA LIBRE DE BORDES AFILADOS, RASGOS O SUELTOS	B	B	B	B	B	B																									
	Firma del Operador	Juan Andres Ayeda																														
	Firma supervisor SST	Juan Camilo Posada																														

Observaciones: Todas las condiciones que No Cumplan con los criterios de aceptación deben ser resueltas antes del uso de la escalera

LISTA DE CHEQUEO INSPECCIONES
ORDEN Y ASEO

LUGAR DE INSPECCIÓN: Escuela carabineros **INSPECCIONADO POR:** Juan Camilo Rosada

FECHA DE INSPECCIÓN: Feb 2026 **CARGO:** Prof SST **FIRMA:**

Convenciones: Marque con X Cumple (C) No cumple (N) N/A No Aplica (N/A)

Item	CONDICIONES LOCATIVAS	C	N	N/A
1	Los materiales (hierro, madera, escombro, barro, entre otros) están separados y ordenados.	X		
2	Las materias primas están bien apiladas y en forma ordenada.	X		
3	Se tiene un programa de reciclaje y protección del medio ambiente.	X		
4	Los contenedores están colocados próximos y accesibles a los lugares de trabajo	X		
5	Se cuenta punto ecologico.	X		
6	Los extintores están señalizados, demarcados, de fácil acceso y vigentes.	✓		
7	La iluminación, ventilación general del área de trabajo es suficiente.	X		
8	Existe señalización informativa, preventiva visible, bien ubicada y en buenas condiciones	X		
9	Los materiales y sustancias almacenados se encuentran correctamente identificados	X		
10	Las escaleras y plataformas están limpias, en buen estado y libres de obstáculos	X		

Item	CONDICIONES LOCATIVAS	C	N	N/A
11	El área se encuentra libre de caída de objetos.	X		
12	Los recipientes donde se deposita la basura son adecuados en tamaño y número.	X		
13	Los pasillos y áreas de trabajo están debidamente señalizados y demarcados.	X		
14	Los pasillos y/o áreas de circulación están libres de obstáculos.	X		
15	Los pisos tienen superficie segura, están limpios, secos y libres de obstáculos.	X		
16	La señalización, camillas, botiquines y extintores se observan limpios	X		
17	Los baños están debidamente dotados y está en condiciones de uso.	X		
18	Las herramientas y equipos están debidamente protegidos.	X		
19	Las herramientas están limpias y libres de suciedad	X		
20	Están las vías de circulación de personas y vehículos diferenciadas y señalizadas			X

OBSERVACIONES:

INSPECCION PREOPERACIONAL PARA MARTILLO DEMOLEDOR

SISTEMA ELÉCTRICO / MECÁNICO | Mes y año de Inspección: Feb 2026 | Lugar / Obra: Obra | Nombre del Operador: Yuber Herrera | Codigo

CRITERIO DE INSPECCIÓN: B : CUMPLE (Buen estado / Completo) M : NO CUMPLE (Incompleto o en mal estado) NA : NO APLICA

ITEM	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Cable de alimentación y enchufe sin cortes ni empalmes	B		B	B																											
2	Carcasa exterior sin grietas ni roturas	B		B	B																											
3	Gatillo de encendido y bloqueo funcionan correctamente	B		B	B																											
4	Ausencia de fugas de aceite o grasa en el cuerpo	B		B	B																											
5	Mangos y empuñaduras firmes y con caucho protector	B		B	B																											
6	Punta o cincel afilado y sin fisuras	B		B	B																											
7	El retenedor (seguro) sujeta la punta correctamente	B		B	B																											
8	Portaherramientas limpio y lubricado (si aplica)	B		B	B																											
9	Uso de protección auditiva y visual	B		B	B																											
10	Uso de guantes y botas de seguridad	B		B	B																											
11	Área de trabajo delimitada y libre de obstáculos	B		B	B																											
12	Ausencia de cables o tuberías vivas en la zona de impacto	B		B	B																											
Nombre Operador																																
Nombre Supervisor SST		Juan Camilo Parada																														

Observaciones

INSPECCION PREOPERACIONAL PARA TALADRO

Mes de Inspección: feb 2026 | Nombre del Operador: Jesus Torres | Número de Serie:

Lugar / Obra: Oaxaca | Empresa ejecutante: Escuela Corabneics | Tipo de Mantenimiento:

CRITERIO DE INSPECCIÓN: B : CUMPLE (Buen estado / Completo) M: NO CUMPLE (Incompleto o en mal estado) N/A : NO APLICA

ITEM	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ENCHUFE CON POLO A TIERRA		NA		NA		NA		NA																							
2	CABLE		NA		NA		NA		NA																							
3	SWITCH DE ENCENDIDO		B		B		B		B																							
4	MANDRIL		NA		NA		NA		NA																							
5	LLAVE DE MANDRIL		NA		NA		NA		NA																							
6	MANIJA DE SUJECCIÓN		B		B		B		B																							
7	VOLTAJE		B		B		B		B																							
8	MANIJAS DE AGARRE		B		B		B		B																							
9	CARCAZA		B		B		B		B																							
10	CORDON DE SEGURIDAD		B		B		B		B																							
11	BROCAS		B		B		B		B																							
12	OTROS		B		B		B		B																							
	Firma del Operador																															
	Firma de Supervisor		Juan		Camilo		Pascual																									

Observaciones

INSPECCION PREOPERACIONAL PARA PULIDORA

Mes y año de Inspección: feb 2026 | Nombre del Operador: Yuba Herrera | Codigo:

Lugar / Obra: Obra | Empresa ejecutante: Escuela carolinianos | Tipo de Herramienta:

CRITERIO DE INSPECCION: B: CUMPLE (Buen estado / Completo) M: NO CUMPLE (Incompleto o en mal estado) N/A: NO APLICA

ITEM	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	SE VERIFICA EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)		B	B	B		B		B																						
2	ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (NUEVO/USADO)		B	B	B		B		B																						
3	CUENTA CON LOS ACCESORIOS ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS		B	B	B		B		B																						
4	ESTADO E INSTALACION DEL MANGO		B	B	B		B		B																						
5	ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y DISPOSITIVO		B	B	B		B		B																						
6	ESTADO DE LA CUBIERTA DE LA GUARDA		B	B	B		B		B																						
7	SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM (6500 - 15000)		NA	NA	NA		NA		NA																						
8	ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (GUARDA, BOTONES, ASEO ETC)		B	B	B		B		B																						
9	SE HAN INSTALADO BARRERAS Y O AISLAMIENTOS APROPIADOS		B	B	B		B		B																						
10	ESTADO DEL DISCO		B	B	B		B		B																						
11	CAPUCHA PARA PULIR		B	B	B		B		B																						
12	GUANTES DE CARNAZA		B	B	B		B		B																						
13	GAFAS OSCURAS DE COPA		B	B	B		B		B																						
	Nombre Operador																														
	Firma Supervisor SST		Juan	Camilo	Rosero																										

Observaciones

POLICIA ESCUELA DE CARABINEROS
CÁNACERO ESTACIÓN DE CARABINEROS

EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y CONTENIDO DEL BOTIQUIN

Proyecto: Contrato NO 2233

Nombre quién realiza la inspección: Juan Camilo Posada

Ubicación o Codigo: Obra

Empresa: Escuela Carabineros

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD/ PAQUETE	CANTIDAD	USO Y REPOSICIÓN
1	Aplicadores	1	50	
2	Apositos	1	8	
3	Aposito Ocular	1	8	
4	Bajalenguas	1	20	
5	Bolsa plastica de diferentes tamaños (Roja)	NO		
6	Compresas	1		
7	Curitas	1	20	
8	Esparadrapo de 2"	1		
9	Jabon desinfectante Liquido	1	120ml	
10	Jeringa para lavado de heridas	1		
11	Micropore 1/2"	1		
12	Gasa Esteril	1		
13	Guantes de Latex	1	100	
14	Libreta y lapiz o lapicereo	1		
15	Linterna con pilas (Exclusivo para el botiquin)	1		
16	Lista de telefonos de emergencia	1		
17	Manual de primeros auxilios	1		
18	Protector para reanimación respiratoria	NO		
19	Suero fisiologico o solución salina normal 0,9% 250cc	1	500Cm2	
20	Suero Oral	1		
21	Suero Antiofidico	NO		
22	Tapabocas	1		
23	Termometro Oral	1		
24	Tijera	1		
25	Toallas higienicas	1		
26	Venda de tela de 1" o de 2"	1		
27	Cuello Multitalla.	1		
28	Inmovilizador de cuello, brazos y piernas	1		

Responda con X según sea el caso SI, NO y No Aplica

	Camilla Primero auxilios	SI	NO	N/A	
	Se encuentra en buen estado	X			
	Se encuentra bien ubicada	X			
	Se encuentra en un área despejada	X			
	Las riatas de la camilla estan en buen estado	X			

Firma quién realiza inspección	Aprobado personal SST Nombre y Firma Juan Camilo Posada

INSPECCION PREOPERACIONAL PARA ANDAMIOS

VERSION 01

Mes y año de Inspección: Feb 2026

Lugar / Obra: Escuela Carabineros

Nombre del Operador: Jason Tome

Codigo:

CRITERIO DE INSPECCIÓN: B: CUMPLE (Buen estado / Completo) M: NO CUMPLE (Incompleto o en mal estado) N/A: NO APLICA

ITEM	DESCRIPCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Marcos estructurales		B		B		B		B		B																				
2	Largeros y diagonales		B		B		B		B		B																				
3	Uniones estructurales		B		B		B		B		B																				
4	Elementos de fijación		B		B		B		B		B																				
5	Pasadores Pines		B		B		B		B		B																				
6	Agarraderas y Tornillos		B		B		B		B		B																				
7	Mordazas y Tornillos		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A																				
8	Pasarelas		B		B		B		B		B																				
9	Rodapies		B		B		B		B		B																				
10	Barandas		B		B		B		B		B																				
11	Escaleras y Puntos de apoyo deben corresponder al sistema		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A																				
12	Ruedas y Frenos		B		B		B		B		B																				
13	Tornillo de nivelación		B		B		B		B		B																				
14	Pasadores de nivelación		B		B		B		B		B																				
15	Andamio Libre de y contrapeso		B		B		B		B		B																				
	Firma del Andamiero																															
	Nombre Supervisor SST		Juan		Camilo		Pasoffo																									

Observaciones

POLICÍA ESCUELA DE CARABINEROS
FRANCISCO ANTONIO ENCINA

INSPECCIÓN EXTINTORES

Fecha Inspección: Ene 2026 **Proyecto:** Contrato N° 2233

Nombre y cargo personal quien realiza la Inspección: Juan Camilo Rosada **Firma:**

Convenciones Marque en la columna B Si esta bueno, M si esta malo, N/A Si no aplica

UBICACIÓN	CLASE	CAP.	FECHA VENC.	MANOM	PRESIÓN	CUERPO	ETIQ	PASADOR/ SELLO	MANGUERA/ BOQUILLA	SEÑALIZACIÓN/ DEMARCACIÓN	EMPRESA
Obra	ABC	20LB	OCT26	B	150	B	B	B	B	B	Escuela Carabineros

Convenciones: Marque en la columna B Si esta bueno, M si esta malo, N/A Si no aplica.

Observaciones:

ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL


En la ciudad de _____ ,siendo las 10:00 am horas del día **20 de febrero de 2026,** en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, se procede a la conformación del Comité de Convivencia Laboral del consorcio _____

4. Objetivo

Constituir formalmente el Comité de Convivencia Laboral, con el fin de promover la sana convivencia, prevenir conductas de acoso laboral, mediar en situaciones de conflicto y fomentar un ambiente de trabajo armónico.

5. Integrantes del Comité

Se designan como miembros del Comité de Convivencia Laboral a los siguientes colaboradores:

Nombre completo	Cargo	Rol (Principal/Suplente)	Firma
JUAN CAMILO POSADA	R/LEGAL	R/LEGAL	
PEDRO GONZALO HERNANDEZ BARRERA	ING RESIDENTE	SECRETARIO SUPLENTE	
YUBER MAURICIO HERRERA RESTREPO	TRABAJADOR	INTEGRANTE – TRABAJADORES	

6. Compromisos del Comité

- Reunirse de manera ordinaria mínimo cada tres (3) meses y extraordinaria cuando sea necesario.
- Promover actividades de sensibilización y prevención en temas de convivencia laboral. - Atender las quejas o solicitudes relacionadas con presuntas conductas de acoso laboral.

Mantener la confidencialidad de la información recibida y tramitada
