CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR
CORPOCESAR

INFORME DE INTERVENTORIA N° 1

CONTRATO N°.19-6-0220-0-2025

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO "REHABILITACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA EN LOS HUMEDALES MENORES DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR"

CONTRATISTA PRIDA S.A.S

AGUACHICA, CESAR.

DICIEMBRE 2025

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe describe las actividades realizadas por LA UNION TEMPORAL HUMEDALES 2025, responsable del Contrato de obra pública No. 19-6-0219-0-2025, cuyo objeto es "REHABILITACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA EN LOS HUMEDALES MENORES DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR" En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de diciembre de 2025, de igual manera las actividades ejecutadas por la empresa interventora PRIDA S.A.S. responsable del contrato de consultoría **19-6-0220-0-2025** el cual tiene por objeto "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO "REHABILITACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA EN LOS HUMEDALES MENORES DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR"" en el mismo periodo de tiempo, las cuales corresponden a los componente, técnicos, administrativo, financiero, contable, social y jurídico.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Descripción Del Proyecto

El contrato 19-6-0219-0-2025 el cual tiene por objeto ": REHABILITACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA EN LOS HUMEDALES MENORES DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR." contempla actividades de realizar establecimiento de material vegetal, realizar el aislamiento de control de tensionantes, establecer parcelas permanentes de monitoreo georreferenciadas, talleres de socialización, sensibilización ambiental, acuerdos de conservación en las comunidades y limpiezas de caños.

2.2. Objetivo General:

Disminuir la degradación ambiental de los humedales menores priorizados por su importancia ecosistémica, localizados en el sur del departamento del cesar.

2.3. Objetivos Específicos:

- Aumentar la cobertura vegetal en las rondas y áreas aledañas a las ciénagas priorizadas como mecanismo para la regeneración de los ecosistemas.
- Recuperar la conectividad hidrológica de los humedales priorizados como medida de adaptación y resiliencia a los desafíos climáticos.
- Fortalecer la articulación institucional con las comunidades locales consolidando acuerdos sociales con los diferentes actores del territorio.

2.4. Metas Del Proyecto

Con la puesta en marcha de este proyecto, se obtendrán los siguientes resultados:

1. Realizar el establecimiento de las plantaciones forestales de Seiscientas (600) hectáreas en zonas degradadas con su respectiva georreferenciación.
2. Realizar el cercado de 99,6 kilómetros de las plantaciones forestales establecidas y

áreas intervenidas, con su respetiva georreferenciación.
3. Establecer coberturas arbóreas mediante sistemas agroforestales- SAF correspondientes a 90 hectáreas.
4. Implementar una (1) estrategia de monitoreo, seguimiento y evaluación del proceso de restauración.
5. Realizar la extracción de material vegetal flotante (buchón de agua) incluye transporte de material extraído, a zonas de disposición final ubicadas en distancias no menores a (4km) correspondiente a 133.138,15 m3
6. Realizar la extracción de material vegetal tipo firmal, incluye transporte de material extraído, a zonas de disposición final ubicadas en distancias no menores a (4km) correspondiente a 88.758,77 m3
7. Realizar el aprovechamiento del residuo generado por la extracción del material flotante y firmal 44.379,38 m3
8. Desarrollar 12 jornadas para la promoción, divulgación y socialización del proyecto a las comunidades del área de influencia.
9. Realizar 30 tallares de sensibilización y educación ambiental comunitaria
10. Construir un modelo de gobernanza para los humedales menores del sur del departamento del cesar

2.5. ALCANCE DEL OBJETO (ACTIVIDADES ESPECÍFICAS)

Las actividades requeridas para el cumplimiento de las obligaciones del objeto contratado, con las que se garantizan la satisfacción y el logro de la finalidad son las siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	**ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y SU RELACION CON EL AGUA Y LOS ECOSISTEMAS**		
1.1	Establecer plantaciones forestales con especies nativas (restauración ecológica activa)	hectáreas	600,0
1.2	Aislar áreas para establecer las plantaciones forestales con especies nativas	Kilómetros	99,6
1.3	Establecer coberturas arbóreas mediante sistemas agroforestales- SAF	Hectáreas	90,0
1.4	Implementar la estrategia de monitoreo, seguimiento y evaluación del proceso de restauración.	Numero	1,0
2	**Gestión adaptativa a la crisis climática para un desarrollo resiliente al clima bajo en carbono**		
2.1	Realizar la extracción de material vegetal flotante (buchón de agua) incluye transporte de material extraído, a zonas de disposición final ubicadas en distancias no menores a (4km)	M3	133.138,15
2.2	Realizar la extracción de material vegetal tipo firmal, incluye transporte de material extraído, a zonas de disposición final ubicadas en distancias no menores a (4km)	M3	88.758,77
2.3	Realizar el aprovechamiento del residuo generado por la extracción del material flotante y firmal	M3	44.379,38
3	**COMPONENTE DE GOBERNANZA PARA EL ORDENAMIENTO ALREDEDOR DEL AGUA**		
3.1	Desarrollar jornadas para la promoción, divulgación y	Numero	12,00

	socialización del proyecto a las comunidades del área de influencia.		
3.2	Realizar tallares de sensibilización y educación ambiental comunitaria	Numero	30,00
3.3	Construir un modelo de gobernanza para los humedales menores del sur del departamento del cesar	Numero	1,00
3.4	Realizar seguimiento técnico, administrativo y financiero al proyecto (Interventoría)	Numero	16

3. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato será ejecutado en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional Del Cesar – CORPOCESAR, en los humedales menores del sur del departamento del Cesar, en las ciénagas Juncal-Baquero, Doña María-Musanda, El Congo, Morales, Costilla-Sahaya, localizadas en los municipios de Aguachica, Gamarra, La Gloria, Pelaya y San Martin.

Tabla 2. Ubicación geográfica ciénagas priorizadas por el proyecto

HUMEDAL	ÁREA DEL HUMEDAL EN SEQUIA (HA)	AREA DEL HUMEDAL EN INUNDACIÓN (HA)	MUNICIPIO	COORDENADAS	
				Norte	Oeste
Costilla/Sahaya	2.125,8	3.561,6	Pelaya	8°42'55,49"	73°46'55,65"
Morales	508,4	933	La Gloria	8°32'28,75"	73°44'56,55"
Juncal-Baquero	361,3	820,4	Gamarra	8°18'54,53"	73°44'11,01"
Doña María-Musanda	1.189	1.794,3	Aguachica	7°52'58,22"	73°39'19,37"
El Congo	29,8	274	San Martin	8°01'51,42" 8°01'04,93"	73°43'30,55" 73°43'13,94"

Fuente: Estudios previos contrato de obras N°.19-6-0219-0-2025

4. CONTRATO DE OBRA

4.1. Información General del contrato

CONTRATO No.	19-6-0219-0-2025
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRAS
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL HUMEDALES 2025 R.L. ANDRES EDUARDO BRISSON AMADO
NIT	902007849-1
INTERVENTORIA	PRIDA S.A.S. R.L. JUAN CARLOS AMAYA BAUTISTA
SUPERVISOR	LIBARDO RAUL LASCARRO DITTA, COORDINADOR GIT para la gestión del ordenamiento ambiental territorial.
OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA EN LOS HUMEDALES MENORES DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTIVIDADES	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA CLAUSULA TERCERA- ACTIVIDADES ESPECIFICAS CONTRATO DE OBRAS No. 19-6-0219-0-2025, Y en el estudio previo
VALOR	Once mil cuatrocientos catorce millones setecientos treinta y un mil cuatrocientos noventa y nueve pesos ($11.414.731.499) M/CTE
PLAZO	Quince (15) Meses
FECHA DE INICIACION	01 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACION	28 e febrero de 2027

4.2. EJECUCION DE ACTIVIDADES.

Durante el periodo del 01 al 30 de diciembre del 2025 el contratista manifiesta en su informe haber desarrollado las siguientes actividades contractuales:

4.2.1. Validación de las áreas a intervenir

Haber realizado la validación cartográfica de las áreas identificadas para la ejecución del proyecto, tomando como base las zonificaciones definidas en el Plan de Manejo Ambiental de los humedales, las determinantes ambientales y demás información secundaria disponible. En este sentido, identificaron las áreas susceptibles de intervención, las cuales se relacionan a continuación:

Tabla 3. Relación predios susceptibles de intervención

N°	PROPIETARIO	PREDIO	VEREDA	X	Y	MUNICIPIO	HECTAREAS A INTERVENIR (HA)
1	EDITH VACA	LA CECILIA	PUERTO PATIÑO	8,104139	-73,66327	AGUACHICA	13
2	ILCE VACA	LOS CAÑAGUATES	PUERTO PATIÑO	8,10414	-73,66441	AGUACHICA	12
3	CARLOS VACA	LA CECILIA	PUERTO PATIÑO	8,101588	-73,66533	AGUACHICA	42
4	LISMENIA RINCON	LA GUAJIRA	PUERTO PATIÑO	8,54256	-73,40184	AGUACHICA	6
5	CRISTIAN SERRANO	EL PUEBLO	PUERTO PATIÑO	8,094271	-73,7078	AGUACHICA	14
6	ENEIRO AVENDAÑO	YATALUCA	PUERTO PATIÑO	8,050495	-73,41074	AGUACHICA	5
7	FABIO NAVARRO	SARAVITA	PUERTO PATIÑO	8,043666	-73,40456	AGUACHICA	9
8	MELQUIS GOMEZ	LAS PALMAS	PUERTO PATIÑO	8,044727	-73,40591	AGUACHICA	7
9	CRISTIAN SERRANO	LA JULIANA	PUERTO PATIÑO	8,086159	-73,6975	AGUACHICA	7
10	PEDRO QUINTERO	LA MUSANDA	BARRANCA LEBRIJA	8,025592	-73,71073	AGUACHICA	2
11	JOSE SARMIENTO	SANTA JOSEFA	BARRANCA LEBRIJA	8,0163	-73,6870	AGUACHICA	15
12	YOVANY AREVALO	PALMA SOLA	BARRANCA LEBRIJA	8,02961	-73,64581	AGUACHICA	36
13	LUIS EDUARDO HERNANDEZ	RANCHERIA	BARRANCA LEBRIJA	8,00710	-73,64580	AGUACHICA	32
14	MARLENY SANCHEZ	VILLA SOFIA	BARRANCA LEBRIJA	8,01957	-73,63028	AGUACHICA	10
15	NORBERTO AFANADOR	EL LIMONCITO	BARRANCA LEBRIJA	8,03228	-73,73667	AGUACHICA	50
16	WILMER DIAZ	LAS FLOREZ	TERRAPLEN	7,88189	-73,65509	SAN MARTIN	30
17	NEMECIO ROPERO	LETICIA 2	TERRAPLEN	7,89650	-73,65023	SAN MARTIN	1
18	ALIRIO AMARIS	LOS SUANES	TERRAPLEN	7,84378	-73,67221	SAN MARTIN	1
19	ALEXANDER NAVARRO	LA GAYUA	TERRAPLEN	7,82495	-73,67618	SAN MARTIN	1
20	JUAN ARCELINO SENIN REYES	LA CACHITA	TERRAPLEN	7,83119	-73,68250	SAN MARTIN	1
21	JORGE TAPIAS	NUEVO HORIZONTE	EL CAIRO	8,01593	-73,47761	SAN MARTIN	12
22	DORIS MANOSALVA	VILLA OLIVA	CUATRO BOCAS	7,96606	-73,57771	SAN MARTIN	181
23	JADER QUINTERO BADILLO	SAN MIGUEL	PALENQUILLO	8,44946	-73,70033	GAMARRA	20
24	MIGUEL ANGEL FUENTES	HACIENDA LA LOMA	COSTILLA	8,711855	-73,75779	PELAYA	93
TOTAL							600

Fuente: Estudios previos contrato de obras N°.19-6-0219-0-2025

Posteriormente, proyectó la realización de visitas en territorio con el fin de validar en campo las áreas previamente identificadas, así como confirmar la voluntad de los propietarios y/o poseedores de los predios para participar en la ejecución del proyecto. No obstante, debido a las condiciones de orden público en la zona de influencia del proyecto, no fue posible llevar a cabo las visitas programadas en los municipios correspondientes.

4.2.2. Desarrollar jornadas para la promoción, divulgación y socialización del proyecto a las comunidades del área de influencia


Durante el periodo reportado, el contratista manifiesta haber realizado relacionamiento con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y líderes comunitarios de los corregimientos y veredas ubicados en la zona de influencia del proyecto, con el fin de concertar los espacios adecuados para el desarrollo de las jornadas de socialización. No obstante, debido a las condiciones de orden público en la zona de influencia del proyecto, no fue posible llevar a cabo las jornadas programadas.

En todo caso, realizaron visitas a las alcaldías de los municipios donde se ejecutará el proyecto, con el propósito de socializar su alcance, informar sobre las actividades previstas y coordinar acciones interinstitucionales que permitan facilitar su implementación en el territorio.

Por su parte, como estrategia de promoción y divulgación del proyecto, el contratista realizó el diseño de las vallas informativas que serán instaladas en los sitios de ejecución del mismo. Cada valla cuenta con dimensiones de 6 x 3 metros y en ellas se indicará de manera visible la información requerida, de conformidad con lo establecido en la Circular N°. 006 del 05 de marzo de 2014 del Sistema General de Regalías (SGR).

A continuación, se presenta:

Figura 1. Diseño preliminar valla informativa.

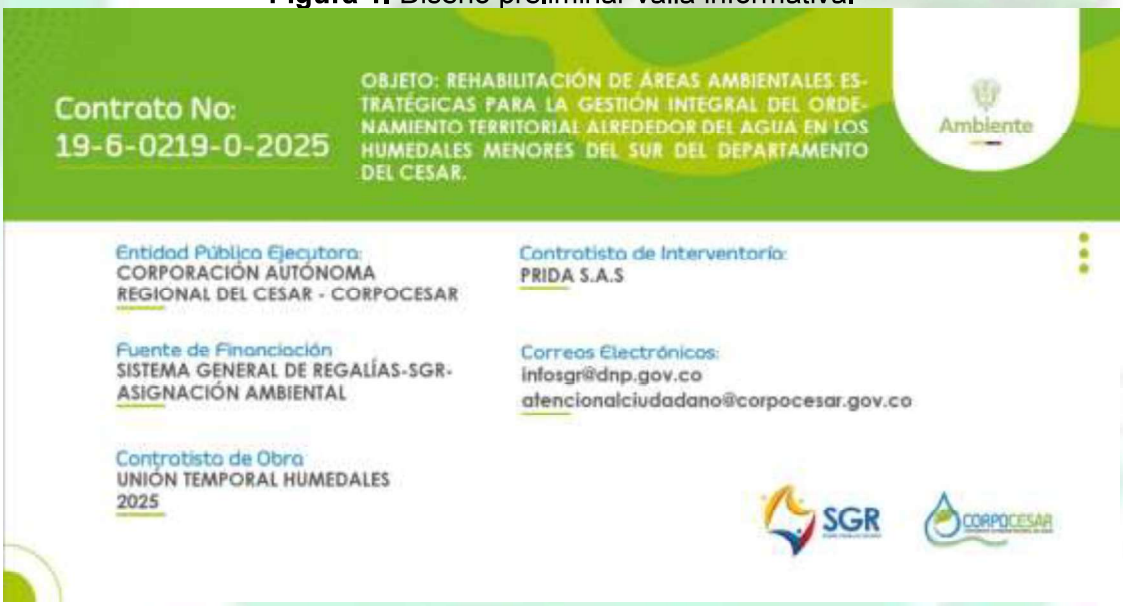

Fuente: Informe de obra No.1

4.2.3. Situaciones Presentadas Durante El Periodo Reportado

El contratista manifiesta que, durante el periodo reportado, se presentaron situaciones externas que incidieron en el normal desarrollo de las actividades programadas del proyecto. En particular, las condiciones de orden público en la zona de influencia, especialmente en los municipios del sur del departamento del Cesar, limitaron el acceso y la movilidad del equipo técnico en el territorio.

De manera particular, el paro armado declarado por el ELN entre el 14 y el 17 de diciembre de 2025 afectó significativamente al departamento del Cesar, especialmente a los municipios del sur, correspondientes a la zona de influencia del proyecto. A continuación, se presentan algunas noticias que evidencian las afectaciones registradas en el territorio durante dicho periodo.

EVIDENCIAS SITUACIONES PRESENTADAS


EL PAÍS América Colombia

El ELN asesina al menos a siete soldados en un ataque al batallón de Aguachica

La guerrilla colombiana ha emprendido una ofensiva desde el fin de semana en el marco de un "paro armado nacional"


EL TIEMPO

Paro armado del Eln: insurgentes bloquean vía Pelaya (Cesar) con un tractocamión cargado con presuntos cilindros explosivos

En el sur de Bolívar, retaguardia del Eln, Ejército cierra el cerco en municipios como Santa Rosa.

Como consecuencia de lo anterior, no fue posible realizar las visitas de campo previstas ni desarrollar las jornadas de promoción, divulgación y socialización con las comunidades beneficiarias. En tal sentido, mediante oficio de fecha 28 de diciembre de 2025, solicitó a la interventoría la suspensión del contrato de obra, la cual fue formalizada mediante acta de suspensión de fecha 30 de diciembre de 2025, celebrada entre la supervisión de la entidad contratante y el representante legal de PRIDA S.A.S.
Al tratarse de una circunstancia constitutiva de fuerza mayor, ajena a la voluntad del contratista,

se estableció la suspensión del contrato por un término de un (1) mes, contado a partir del 30 de diciembre de 2025, o hasta tanto se restablezcan las condiciones mínimas de seguridad en el territorio.

4.2.4. Programación De Obra

A través de un documento Adjunto en el informe de obra No. 1, el contratista anexa la programación de obra elaborada en la herramienta MS Project, estructurada a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y en concordancia con lo establecido en los estudios previos, mediante la cual se proyecta el cumplimiento de las actividades contratadas dentro del plazo establecido.

No obstante, es preciso señalar que, durante el periodo reportado, no se desarrollaron las actividades programadas, debido a las situaciones previamente descritas que impidieron la normal ejecución del proyecto.

4.3. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES EN EL PERIODO

Para determinar el avance del contrato se establece una comparación del avance del mes en estudio vs cantidades contratadas.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNIT ($)	TOTAL ($)	CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO
1	ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA Y SU RELACIÓN CON EL AGUA Y LOS ECOSISTEMAS						
1,1	Establecer plantaciones forestales con especies nativas (Restauracion ecologica activa)	Hectareas	600,00	$ 7.913.207,00	$ 4.747.924.200,00	0,0	$ -
1,2	Aislar areas para establecer las plantaciones forestales con especies nativas	Kilometros	99,60	$ 17.718.770,00	$ 1.764.789.492,00	0,0	$ -
1,3	Establecer coberturas Arboreas mediante sistemas agroforestales-SAF	Hectareas	90,00	$ 5.163.449,00	$ 464.710.410,00	0,0	$ -
1,4	Implementar la estrategia de monitoreo, seguimiento y evaluación del proceso de restauración	Numero	1,00	$ 86.062.132,00	$ 86.062.132,00	0,0	$ -
2	GESTIÓN ADAPTATIVA A LA CRISIS CLIMÁTICA PARA UN DESARROLLO RESILIENTE AL CLIMA Y BAJO EN CARBONO						
2,1	Realizar la extracción de material vegetal flotante (buchón de agua). - Incluye transporte del material extraído, a zonas de disposición final ubicadas en distancia no menores a (4km).	M3	133.138,15	$ 4.887,00	$ 650.646.139,05	0,0	$ -
2,2	Realizar la extracción de material vegetal tipo firmal. Incluye transporte del material extraído, a zonas de disposición final ubicadas en distancia no menores a (4km).	M3	88.758,77	$ 5.253,00	$ 466.249.818,81	0,0	$ -
2,3	Realizar el aprovechamiento del residuo generado por la extracción del material flotante y firmal	M3	44.379,38	$ 21.024,00	$ 933.032.085,12	0,0	$ -
3	COMPONENTE DE GOBERNANZA PARA EL ORDENAMIENTO ALREDEDOR DEL AGUA						
3,1	Desarrollar jornadas para la promoción, divulgación y socialización del proyecto a las comunidades del área de influencia	Numero	12,00	$ 1.050.000,00	$ 12.600.000,00	0,0	$ -
3,2	Realizar talleres de sensibilización y educación ambiental comunitaria.	Numero	30,00	$ 1.920.000,00	$ 57.600.000,00	0,0	$ -
3,3	Construir un modelo de gobernanza para los humedales menores del sur del departamento del Cesar	Numero	1,00	$ 115.252.468,00	$ 115.252.468,00	0,0	$ -
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 9.298.866.744,98	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	$ -
	ADMINISTRACION (17,9%)				$ 1.664.497.147,00	ADMINISTRACION (17,9%)	$ -
	IMPREVISTOS (1%) EXLUIDOS ITEMS 1.4 Y CAPITULO 3				$ 90.273.521,00	IMPREVISTOS (1%) EXLUIDOS ITEMS 1.4 Y CAPITULO 3	$ -
	UTILIDAD (4%) EXLUIDOS ITEMS 1.4 Y CAPITULO 3				$ 361.094.086,00	UTILIDAD (4%) EXLUIDOS ITEMS 1.4 Y CAPITULO 3	$ -
	TOTAL COSTO OBRAS				$ 11.414.731.499,00	TOTAL COSTO OBRAS	$ -

Durante el periodo reportado, el contrato no presentó avance físico ni financiero respecto al valor total contratado.

4.4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

4.4.1. Equipo De Trabajo

A continuación, se relacionan los profesionales ofertados para la ejecución del contrato:

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, se anexan los soportes de pago de los aportes realizados al Sistema de Seguridad Social Integral.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CANT.	DEDICACIÓN	PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO (MESES)
Jaime Machado López	Director de proyect0	1,0	50%	15
Juan David González Diaz	Residente 1	1,0	100%	15
	Residente 2	1,0	100%	15
	Trabajador social	2,0	100%	15
	Auxiliares de campo	3,0	100%	15
	Profesional SIG	1,0	100%	15
	Profesional Project	1,0	100%	15

4.4.2. Aspectos financieros

De acuerdo con lo definido en la Cláusula 4-Valor Del Contrato Y Forma De Pago el valor del presente contrato corresponde a la suma de **ONCE MIL CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($ 11.414.731.499,00) M/CTE,** el cual se pagará teniendo en cuenta que el precio se pactó mediante el sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin formula de ajuste.

4.4.3. Manejo Del Anticipo

El contratista realizó el contrato de fiducia mercantil irrevocable para la administración de los recursos recibidos a título de anticipo, celebrado entre quienes integran la Unión Temporal Humedales 2025 y Alianza Fiduciaria S.A. Fideicomisos, vinculada al Banco Davivienda a través de la cuenta de ahorros No. 0550482800058687.

4.4.4. Plan de inversión del anticipo

La Unión Temporal Humedales 2025 presentó el plan de inversión del anticipo, el cual fue aprobado por la interventoría y enviado a la supervisión de la entidad contratante para el trámite respectivo. Dicho plan contempla la destinación de los recursos en un 28,09 % para mano de obra, un 11,95 % para transporte, y un 59,96 % para la compra y suministro de materiales e insumos, para un total del 100 % de la inversión del anticipo.



4.5. DIFICULTADES PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

Durante la ejecución de las acciones anteriormente referidas, el contratista presentó las siguientes dificultades:

- Durante el periodo reportado, se presentaron dificultades de orden externo que afectaron el normal desarrollo de las actividades del proyecto. Principalmente, las condiciones de orden público en la zona de influencia, especialmente en los municipios del sur del departamento del Cesar, limitaron el acceso y la movilidad del equipo técnico en el territorio.
- En particular, el paro armado declarado por el ELN entre el 14 y el 17 de diciembre de 2025 generó restricciones en la circulación y riesgos para la seguridad del personal, lo que impidió la ejecución de actividades programadas en campo.
- Estas condiciones derivaron en la suspensión del contrato de obra, afectando el cumplimiento del cronograma inicialmente establecido y el desarrollo de las actividades programadas para el periodo.
- Adicionalmente, las limitaciones de acceso al territorio dificultaron la interacción directa con las comunidades y actores locales, lo cual incidió en la reprogramación de actividades clave para la implementación del proyecto.

5. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Información General Del Contrato

NO. DE CONTRATO	19-6-0220-0-2025
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO "REHABILITACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA EN LOS HUMEDALES MENORES DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR"
CONTRATISTA	PRIDA SAS R.L. Juan Carlos Amaya Bautista.
NIT	900026388-1
SUPERVISOR	LIBARDO RAUL LASCARRO DITTA, Coordinador Git para La Gestión Del Ordenamiento Ambiental Territorial.
VALOR	MIL TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($1.036.689.920.00) M/CTE
ACTIVIDADES	Ejecutar las actividades contempladas en la clausula tercera-actividades especificas contratos de obra No. 19-6-0220-0-2025, y en el estudio previo.
PLAZO	Dieciséis (16) MESES
FECHA DE INICIO	01 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACION	30 de marzo de 2027

5.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

5.2.1. Actividades Administrativas

5.2.1.1. Correspondencia enviada y recibida

- Documentos Tramite Anticipo Contrato 19-6-0219-0-2025– 09 de diciembre de 2025
- Solicitud Suspensión Contrato 19-6-0219-0-2025- 09 de diciembre de 2025
- Solicitud Suspensión Contrato 19-6-0220-0-2025- 29 de diciembre 2025
- Documentos Anticipo Unión Temporal humedales 2025- enviado a la supervisión el 10 de diciembre de 2025
- Advertencia sobre posibles retrasos en la ejecución del contrato por situación de orden público- recibido el 16 de diciembre 2025 - por unión temporal humedales 2025

Ver anexo 2

5.2.1.2. Actas generadas en el desarrollo del contrato

Durante el periodo de ejecución del contrato se generaron 5 actas. Ver *anexo 1*

5.2.1.3. Actas de comité técnico

RELACIÓN ACTAS GENERADAS		
NO.	**NOMBRE DEL EVENTO**	**FECHA**
1	Comité de seguimiento técnico	30 de diciembre de 2025

5.2.1.4. Sistema Integral de seguridad social

El personal de interventoría se encuentra afiliado a los sistemas de seguridadsocial.

5.2.1.5. Revisión de Vigencia de las Garantías.

Las garantías fueron aprobadas por la oficina jurídica de la corporación.

5.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS.

5.3.1. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

La interventoría realizó revisión y seguimiento a las actividades desarrolladas por el contratista durante el periodo reportado, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, administrativas y técnicas establecidas en el contrato y documentos anexos.

5.3.2. ACTIVIDADES VERIFICADAS POR LA INTERVENTORÍA

- Revisión del relacionamiento institucional adelantado con alcaldías municipales y líderes comunitarios.
- Verificación del diseño preliminar de las vallas informativas del proyecto.
- Revisión de la programación de obra elaborada en MS Project.
- Verificación de la constitución y actualización de pólizas contractuales.
- Revisión y aprobación del plan de inversión del anticipo y de la constitución de la fiducia mercantil para el manejo de recursos.

5.3.3. SITUACIONES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO

La interventoría evidenció que las condiciones de orden público en la zona de influencia del proyecto afectaron el desarrollo normal de las actividades programadas. Particularmente, el paro armado declarado por el ELN entre el 14 y el 17 de diciembre de 2025 generó restricciones de movilidad y riesgos para el personal técnico.

Como consecuencia de lo anterior, no fue posible realizar las visitas de campo programadas ni las jornadas de socialización previstas con las comunidades beneficiarias.

5.3.4. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

La interventoría recibió y revisó la solicitud de suspensión presentada por el contratista mediante oficio de fecha 28 de diciembre de 2025. Posteriormente, se formalizó la suspensión del contrato mediante acta suscrita el 30 de diciembre de 2025, debido a circunstancias constitutivas de fuerza mayor ajenas a la voluntad del contratista.

5.3.5. SEGUIMIENTO A ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO DE OBRA

La interventoría verificó el cumplimiento de los requisitos administrativos relacionados con:

- Actualización de pólizas.
- Vinculación del personal profesional ofertado.
- Constitución de la fiducia para el manejo del anticipo.
- Presentación y aprobación del plan de inversión del anticipo.
- Presentación de soportes de seguridad social.


5.3.6. Actividades Administrativas y Financieras

Para el mes de diciembre, se efecto el pago del anticipo.

5.3.6.1. Cuadros control de personal y equipo

ITEMS	CANTIDAD
Director de Interventoría	1
Profesional Residente	2
Profesional área social	2
Transporte (alquilervehículo)	3

5.3.6.2. Ejecución financiera programada Contrato de interventoría

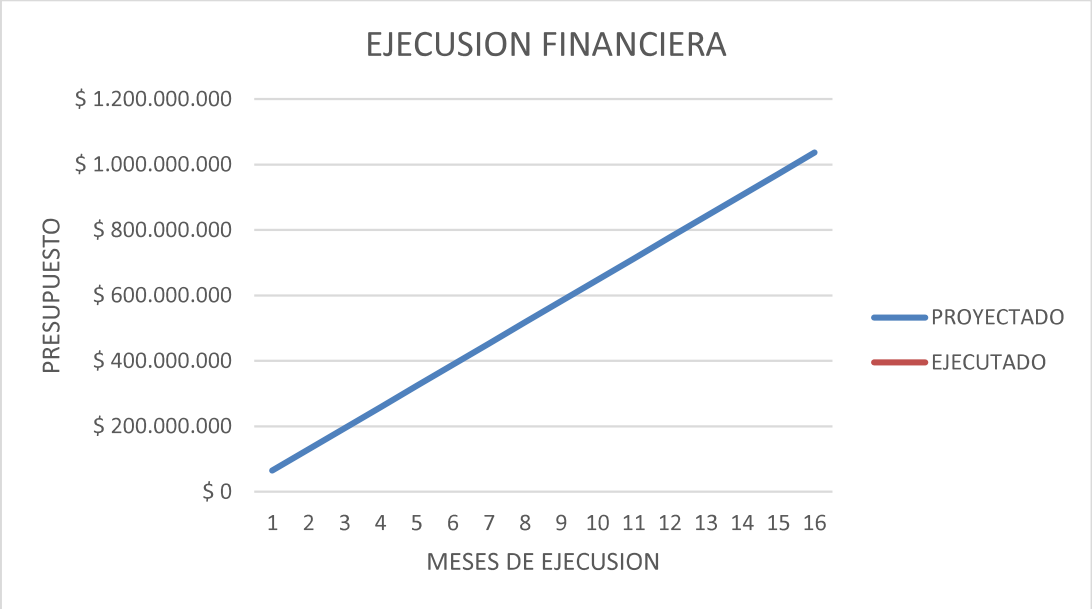

En la gráfica se observa la ejecución financiera proyectada y la ejecutada, por lotanto, la ejecución financiera está de acuerdo a lo planificado.

5.3.6.3. Ejecución financiera del periodo Contrato de interventoría

El contrato financieramente se encuentra ejecutando de acuerdo a la programación, para el mes 1

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MESES	VALOR MENSUAL	FACTOR MULTIPLICADOR	DEDICACION	TOTAL
1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	1	$ 4.950.000	2,00	50%	$ 4.950.000
1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	2	1	$ 3.400.000	2,00	100%	$ 13.600.000
1.3	PROFESIONAL AREA SOCIAL	2	1	$ 2.600.000	2,00	70%	$ 7.280.000
1.4	AUXILIARES DE CAMPO	3	1	$ 1.900.000	2,00	100%	$ 11.400.000
SUBTOTAL PERSONAL							**$ 37.230.000**
2. COSTOS DIRECTOS							
	DESCRIPCION	UNIDAD		MESES	VALOR	CANTIDAD	
2.1	ARRIENDO DE OFICINA INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS	MES		1	$ 2.000.000	1	$ 2.000.000
2.2	UTILES DE OFICINA EDIXCION DE INFORMES, MAPAS, CARTOGRAFIA, IMÁGENES, ENTRE OTROS				$ 1.368.000		$ 1.368.000

2.3	SERVICIO DE TRNASPORTE SEGÚN EPECIFICACIONES TECNICAS			$ 13.850.000		$ 13.850.000
SUBTOTAL PERSONAL						**$ 17.218.000**
SUBTOTAL						$ 54.448.000
IVA						$ 10.345.120
TOTAL						**$ 64.793.120**

4.2.3.4 Ejecución financiera Acumulada Contrato de interventoría

En la actualidad el proyecto presenta un avance

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO "REHABILITACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA EN LOS HUMEDALES MENORES DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MESES	VALOR MENSUAL	FACTOR MULTIPLICADOR	DEDICACION	TOTAL
1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	1	$ 4.950.000	2,00	50%	$ 4.950.000
1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	2	1	$ 3.400.000	2,00	100%	$ 13.600.000
1.3	PROFESIONAL AREA SOCIAL	2	1	$ 2.600.000	2,00	70%	$ 7.280.000
1.4	AUXILIARES DE CAMPO	3	1	$ 1.900.000	2,00	100%	$ 11.400.000
SUBTOTAL PERSONAL							**$ 37.230.000**
2. COSTOS DIRECTOS							
	DESCRIPCION	UNIDAD	MESES	VALOR	CANTIDAD		
2.1	ARRIENDO DE OFICINA INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS	MES	1	$ 2.000.000	1		$ 2.000.000
2.2	UTILES DE OFICINA EDIXCION DE INFORMES, MAPAS, CARTOGRAFIA, IMÁGENES, ENTRE OTROS			$ 1.368.000			$ 1.368.000
2.3	SERVICIO DE TRNASPORTE SEGÚN EPECIFICACIONES TECNICAS			$ 13.850.000			$ 13.850.000
SUBTOTAL PERSONAL							**$ 17.218.000**
SUBTOTAL							$ 54.448.000
IVA							$ 10.345.120
TOTAL							**$ 64.793.120**

4.2.3.5 Manejo de anticipo

ITEM	VALOR MENSUAL	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
SALARIOS	$ 22.560.000	$ 22.560.000	$ 22.560.000	$ 22.560.000	$ 22.560.000	$ 20.139.984
SEGURIDAD SOCIAL	$ 7.021.500	$ 7.021.500	$ 7.021.500	$ 7.021.500	$ 7.021.500	
ARRIENDO DE OFICINA INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	
UTILES DE OFICINA EDICION DE INFORMES, MAPAS, CARTOGRAFIA, IMÁGENES, ENTRE OTROS	$ 1.368.000	$ 1.368.000	$ 1.368.000	$ 1.368.000	$ 1.368.000	
SERVICIO DE TRNASPORTE SEGÚN EPECIFICACIONES TECNICAS	$ 13.850.000	$ 13.850.000	$ 13.850.000	$ 13.850.000	$ 13.850.000	
TOTAL		$ 46.799.500	$ 46.799.500	$ 46.799.500	$ 46.799.500	$ 20.139.984

4.2.3.10 Aportes parafiscales

Ver anexo 4

4.2.3.11 Información financiera contrato de interventoría

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO "REHABILITACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALREDEDOR DEL AGUA EN LOS HUMEDALES MENORES DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MESES	VALOR MENSUAL	FACTOR MULTIPLICADOR	DEDICACION	VALOR TOTAL
1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	16	$ 4.950.000	2,00	50%	$ 79.200.000
1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	2	16	$ 3.400.000	2,00	100%	$ 217.600.000
1.3	PROFESIONAL AREA SOCIAL	2	16	$ 2.600.000	2,00	70%	$ 116.480.000
1.4	AUXILIARES DE CAMPO	3	16	$ 1.900.000	2,00	100%	$ 182.400.000
SUBTOTAL PERSONAL							**$ 595.680.000**
2. COSTOS DIRECTOS							
	DESCRIPCION	UNIDAD	MESES	VALOR	CANTIDAD		
2.1	ARRIENDO DE OFICINA INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS	MES	16	$ 2.000.000	1		$ 32.000.000
2.2	UTILES DE OFICINA EDIXCION DE INFORMES, MAPAS, CARTOGRAFIA, IMÁGENES, ENTRE OTROS			$ 1.368.000			$ 21.888.000

2.3	SERVICIO DE TRNASPORTE SEGÚN EPECIFICACIONES TECNICAS			$ 13.850.000		$ 221.600.000
SUBTOTAL PERSONAL						**$ 275.488.000**
SUBTOTAL						$ 871.168.000
IVA						$ 165.521.920
TOTAL						**$ 1.036.689.920**

6. OBSERVACIONES, RECOMENDACIÓN Y CONCLUSIONES

6.1 OBSERVACIONES

El contrato no se logró desarrollar en base a lo acordado en la programación y plan de trabajo por las dificultades anteriormente mencionadas.

6.2. RECOMENDACIONES

La interventoría recomienda mantener la articulación institucional con las autoridades locales y realizar seguimiento permanente a las condiciones de seguridad en la zona de influencia del proyecto, previo al reinicio de actividades

6.3. CONCLUSIONES

El contratista adelantó actividades administrativas y técnicas preliminares acordes con las obligaciones contractuales.


Las condiciones de orden público afectaron significativamente la ejecución de actividades en campo.

La suspensión del contrato se realizó conforme a los procedimientos contractuales y legales aplicables.

La interventoría continuará realizando seguimiento permanente una vez se restablezcan las condiciones de seguridad necesarias para reiniciar las actividades.

ANEXOS

EVIDENCIA REGISTRO FOTOGRÁFICO

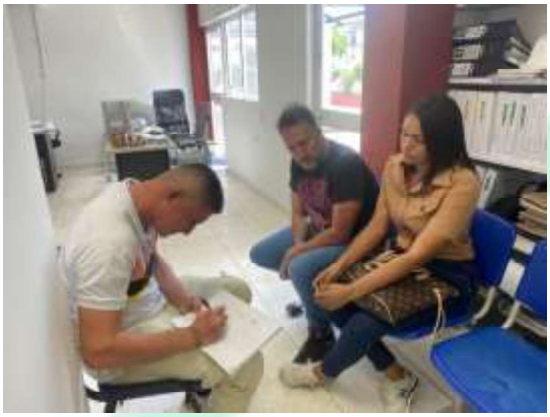REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
Fotografia 1 y 2 Reunion alcadia pelaya	
	
Fotografia 3. Reunion en el ATA San Martin	Fotografia 4. Reunion alcaldia de gamarra
	
Fotografia 5. Reunion alcaldia de aguachica	Fotografia 6. Reunion alcaldia de La Gloria

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

ANEXO 2. CORRESPONDENCIA ENVIADOS/RECIBIDOS
ANEXO 3 APORTES PARAFISCALES

Juan Carlos Amaya Bautista
Representante Legal
Prida Sas

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-03-06, 05:29:52 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1080250536

Periodo Cotización 202512 **Periodo Servicio** 202601

PAGADA 2026-03-06 00:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PRIDA SAS				
Documento	NI 900026388	**Dirección**	CR 101 #73 - 02		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4454396		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	AMAYA BAUTISTA JUAN CARLOS	**Identificación**	CC 79555163		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79555163		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					AMAYA BAUTISTA JUAN CARLOS	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 6.563.000	230301		16 %	$ 6.563.000	$ 1.050.100	$ 32.900	$ 32.900	EPS017		4 %	$ 6.563.000	$ 262.600	$ 0	14-11	3	2,436 %	$ 6.563.000	$ 159.900	CCF24	4 %	$ 6.563.000	$ 262.600	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.050.100	$ 32.900	$ 32.900	$ 262.600	$ 159.900	$ 262.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.801.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900026388	1	PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRIDA SAS	CR 101 73 02	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3102340904	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	121791895	9501184926	E	2026/01/23	2026/03/09	BANCO CAJA SOCIAL	45	$3,227,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 1074414364	BE..TRAN JOHN	230301	30	$3,341,170	$534,600	EPS017	30	$3,341,170	$133,700	CCF24	30	$3,341,170	$133,700	14-1'	30	$3,341,170	$17,500	30	$0	$0
2	CC 1122410841	CE..EDON CAROLAINE	230301	30	$4,534,450	$725,600	EPS041	30	$4,534,450	$181,400	CCF24	30	$4,534,450	$181,400	14-1'	30	$4,534,450	$23,700	30	$0	$0
3	CC 13924224	CAICEDO JAVIER	230301	30	$4,534,450	$725,600	EPS041	30	$4,534,450	$181,400	CCF24	30	$4,534,450	$181,400	14-1'	30	$4,534,450	$23,700	30	$0	$0
4	CC 80378430	FONSECA REINEL	230201	30	$3,341,170	$534,600	EPS037	30	$3,341,170	$133,700	CCF24	30	$3,341,170	$181,400	14-1'	30	$4,534,450	$23,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**				**$15,751,240**	**2,520,400**			**$15,751,240**	**$630,200**			**$15,751,240**	**$630,200**			**$15,751,240**	**$88,600**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900026388	1	PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRIDA SAS	CR 101 73 02	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3102340904	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	329246692	9505161894	E	2026/01/23	2026/05/22	NEQUI	119	$2,777,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1119836743	FRAGOZO YISRLEN	231001	30	$2,600,000	$416,000	EPS041	30	$2,600,000	$104,000	CCF24	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	$13,600	30	$0	$0
2	CC	1122405578	LOPEZ HEISER	230301	30	$3,400,000	$544,000	EPS005	30	$3,400,000	$136,000	CCF24	30	$3,400,000	$136,000	14-11	30	$3,400,000	$17,800	30	$0	$0
3	CC	55223064	SALAMANCA JANNY	230301	30	$2,600,000	$416,000	EPSIC4	30	$2,600,000	$104,000	CCF24	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	$13,600	30	$0	$0
4	CC	4617687	VERGARA NELSON	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS005	30	$1,900,000	$76,000	CCF24	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	$10,000	30	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**					**$10,500,000**	**$1,680,000**			**$10,500,000**	**$420,000**			**$10,500,000**	**$420,000**			**$10,500,000**	**$55,000**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,680,000	$132,200	$0	$1,812,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$416,000	$32,800	$0	$448,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,264,000	$99,400	$0	$1,363,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$55,000	$4,400	$0	$59,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$55,000	$4,400	$0	$59,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$420,000	$33,100	$0	$453,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$420,000	$33,100	$0	$453,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$420,000	$33,100	$0	$453,100
ANAS WAYUU	EPSIC4	839,000,495	6	1	$104,000	$8,200	$0	$112,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$104,000	$8,200	$0	$112,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$212,000	$16,700	$0	$228,700
TOTAL				**4**	**$2,575,000**	**$202,800**	**$0**	**$2,777,800**
