CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA

SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT
PROYECTO - DIRECCIÓN DE OPERACIONES
INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

CÓDIGO No.	
VERSIÓN:	V-0
FECHA	feb-26
PÁGINA:	1 de 6

1. FECHA DE ELABORACIÓN	12	5	2026	**2. INFORME No.**	13	**3. SEMANA No.**	14	**4. PERIODO:**	4	5	al	10	5

5. NOMBRE DE LA INTERVENTORÍA:	Consorcio Perseverar SDHT Barrios BGTA	**6. NIT:**	902.016.365-5

7. CONTRATO No.	1330-2025	**8. FECHA CONTRATO:**	22/12/2025	**9. VALOR DEL CONTRATO:**	$1'752.539.631
10. FECHA ACTA INICIO:	4/02/2026	**11. FECHAS DE TERMINACIÓN:**	3/10/2027	**12. PLAZO:**	21 meses

13. OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.

14. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

15. NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	Consorcio Construhábitat 001	**16. NIT:**	902.005.653-4

17. CONTRATO No.	1269-2025	**18. FECHA CONTRATO:**	27/11/2025	**19. VALOR DEL CONTRATO:**	$16´415.325.538
20. FECHA ACTA INICIO:	4/02/2026	**21. FECHAS DE TERMINACIÓN:**	3/10/2027	**22. PLAZO:**	21 meses

23. OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.

Valor Inicial	$16´415.325.538	Valor Inicial	$1'752.539.631
Valor Adicional	N/A	Valor Adicional	N/A
Valor Adicional	N/A	Valor Adicional	N/A
Plazo Inicial	21 meses	Plazo Inicial	21 meses
Plazo Prorroga 1		Plazo Prorroga 1	
Plazo Actualizado		Plazo Actualizado	
Fecha de Iniciación		Fecha de Iniciación	
Fecha de Suspensión No. 1		Fecha de Suspensión No. 1	
Fecha de Ampliación No. 1 Suspensión No. 1		Fecha de Ampliación No. 1 Suspensión No. 1	
Fecha de Reinicio No. 1		Fecha de Reinicio No. 1	
Fecha de Terminación Inicial	3/10/2027	Fecha de Terminación Inicial	3/10/2027
Fecha de Terminación Actual	3/10/2027	Fecha de Terminación Actual	3/10/2027

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
VR. CONTRATO	$ 16.415.325.538,00	VR. CONTRATO	$ 1.752.539.631,00
VR. ETAPA 1	$ 947.833.365,00	VR. ETAPA 1	$ 422.876.893,00
VR. ETAPA 2	$ 15.467.492.173,00	VR. ETAPA 2	$ 1.329.662.738,00

No. Acta	Valor del Acta	VR. Deducciones	Fecha Acta
Acta No. 1			
Acta No. 3			
Acta No. 4			
Acta No. 5			
Acta No. 7			
Acta No. 8			
Acta No. 9			
Acta No. 10			
Acta No. 11			
Acta No. 12			
Acta No. 13			
Acta No. 14			
Acta No. 15			
Acta No. 16			
Acta No. 17			
Acta No. 18			
Acta No. 19			
Acta No. 20			

No. Acta	Valor del Acta	VR. Deducciones	Fecha Acta
Acta No. 1	$ 14.272.095		13/04/2026
Acta No. 3			
Acta No. 4			
Acta No. 5			
Acta No. 7			
Acta No. 8			
Acta No. 9			
Acta No. 10			
Acta No. 11			
Acta No. 12			
Acta No. 13			
Acta No. 14			
Acta No. 15			
Acta No. 16			
Acta No. 17			
Acta No. 18			
Acta No. 19			
Acta No. 20			

VALOR EJECUTADO ET1		% Avc.	0
VALOR POR EJECUTAR ET1	$ 947.833.365,00	% Falt.	100,00%
VALOR EJECUTADO ET2		% Avc.	0
VALOR POR EJECUTAR ET2	$ 15.467.492.173,00	% Falt.	100,00%
VALOR RETEGARANTIA		% Avc.	
VALOR POR DEDUCCIÓN		% Falt.	

VALOR EJECUTADO ET1	$ 14.272.095,00	% Avc.	3,37%
VALOR POR EJECUTAR ET1	$ 408.604.798,00	% Falt.	96,63%
VALOR EJECUTADO ET2		% Avc.	0
VALOR POR EJECUTAR ET2	$ 1.329.662.738,00	% Falt.	100,00%
VALOR RETEGARANTIA		% Avc.	
VALOR POR DEDUCCIÓN		% Falt.	


ETAPA DE FACTIBILIDAD


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO(+)
Acumulado Anterior	43,00%	34,00%	9,00%
Durante la semana	2,00%	0,00%	2,00%
Actual Acumulado	43,00%	36,00%	7,00%


Valor Etapa 1	

EJECUCIÓN	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programado		
Valor de la Obra		

EJECUCIÓN	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutado		
Valor de la Obra		

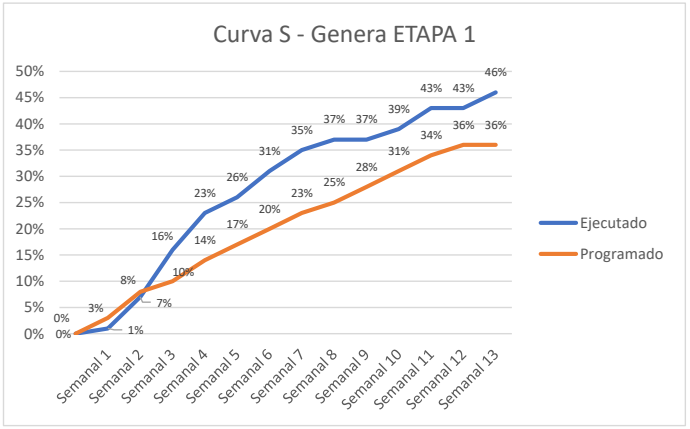

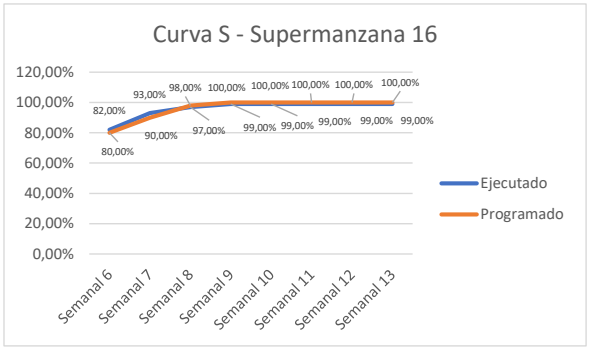

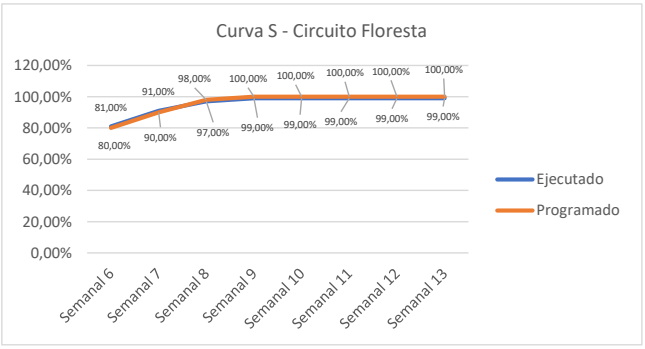



PORCENTAJES FISCOS

Estado de cronograma por componente FASE I

Resumen de la semana

SUPERMANZANA 16	**99%**	**100%**
Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	100%	100%
Topografía	100%	100%
Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor	100%	100%
Vías transporte y movilidad: Ajustes por el consultor de Entrega Recopilación y análisis de información, Falta la aprobación del PMT por parte de Secretaria de Movilidad	100%	100%
Redes Hidráulicas: Se encuentra en revisión los entregables por parte del Consultor	98%	100%
Redes Secas: Falta la entrega del Informe de Factibilidad por parte del Consultor	100%	100%
Componente BIM: Se continua en elaboración el modelo de condiciones existentes.	100%	100%
Arqueología:	100%	100%
Presupuesto y cronograma: En atención de observaciones por parte del Consultor	100%	100%
Geotecnia	100%	100%
Pavimentos: Se encuentra en revisión por la interventoría	100%	100%
Estructuras: No se ha recibido el informe técnico de estructuras	100%	100%
Ambiental y SST	100%	100%
Social	100%	100%
CIRQUITO FLORESTA	**99%**	**100%**
Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	100%	100%
Topografía	100%	100%
Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor	100%	100%
Vías transporte y movilidad: Ajustes por el consultor de Entrega Recopilación y análisis de información, Falta la aprobación del PMT por parte de Secretaria de Movilidad	100%	100%
Redes Hidráulicas: Se encuentra en revisión los entregables por parte del Consultor	98%	100%
Redes Secas: Falta la entrega del Informe de Factibilidad	100%	100%
Componente BIM: Se continua en elaboración el modelo de condiciones existentes.	100%	100%
Arqueología:	100%	100%
Presupuesto y cronograma: En atención de observaciones por parte del Consultor	100%	100%
Geotecnia	100%	100%
Pavimentos: Se encuentra en revisión por la interventoría	100%	100%
Estructuras: No se a recibido el informe técnico de estructuras	100%	100%
Ambiental y SST	100%	100%
Social	100%	100%

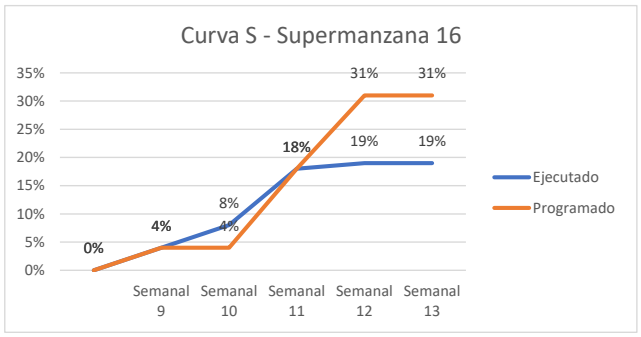

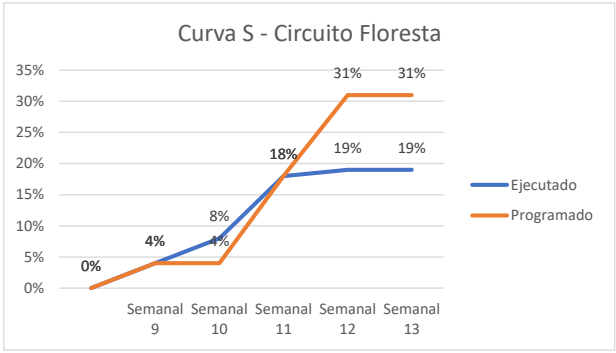

	Estado de cronograma por componente FASE II		
Resumen de la semana	**SUPERMANZANA 16**	**31%**	**19%**
	Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	67%	67%
	Topografía	69%	69%
	Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor	27%	24%
	Vías transporte y movilidad: Ajustes por el consultor de Entrega Recopilación y análisis de información, Falta la aprobación del PMT por parte de	32%	3%
	Redes Hidráulicas: Se encuentra en revisión los entregables	0%	0%
	Redes Secas: Falta la entrega del Informe de Factibilidad	0%	0%
	Arqueología:	32%	32%
	Presupuesto y cronograma: Subsanación por el consultor	0%	0%
	Geotecnia	32%	23%
	Pavimentos: Se encuentra en revisión por la interventoría	8%	7%
	Estructuras: No se a recibido el informe técnico de estructuras	0%	0%
	Ambiental y SST	31%	24%
	Social	32%	66%
	Componente BIM: Aun no se llega a el entregable de esta componente	35%	0%
	CIRCUITO FLORESTA SUR	**31%**	**19%**
	Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	67%	67%
	Topografía	69%	69%
	Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor	27%	24%
	Vías transporte y movilidad: Ajustes por el consultor de Entrega Recopilación y análisis de información, Falta la aprobación del PMT por parte de	32%	3%
	Redes Hidráulicas: Se encuentra en revisión los entregables	0%	0%
	Redes Secas: Falta la entrega del Informe de Factibilidad	0%	0%
	Arqueología:	32%	32%
	Presupuesto y cronograma: Subsanación por el consultor	0%	0%
	Geotecnia	32%	23%
	Pavimentos: Se encuentra en revisión por la interventoría	8%	7%
	Estructuras: No se a recibido el informe técnico de estructuras	0%	0%
	Ambiental y SST	31%	24%
	Social	32%	66%
	Componente BIM: Aun no se llega a el entregable de esta componente	35%	0%

27. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE TÉCNICO

Resumen de la semana	Durante la semana comprendida entre el 04/05/2026 y el 10/05/2026 Se tuvo reunión con a secretaria de movilidad - modalidad virtual el 04 de mayo Se realizo reunión para revisión del cronograma el día 05 de mayo Comité de seguimiento N14 - Virtual el día 07 de mayo a las 8:00 a.m.

CIRCUITO FLORESTA

Actividades ejecutado	Actividades programado
04/05/2026 Mesa de trabajo con la Secretaría de Movilidad 07/05/2026 Comité de seguimiento N14 - Virtual	11/05/2026 Mesa de trabajo presencial componente Arqueología 12/05/2026 Comité de seguimiento componente BIM 13/05/2026 Mesa de trabajo presencial componente de Transito 13/05/2026 Mesa de trabajo para revisan de presentación a SDA 13/05/2026 Mesa de trabajo entidad de la UAESP 14/05/2026 Mesa de trabajo del componente de normatividad 14/05/2026 Reunión virtual con SDA 14/05/2026 Comité de seguimiento N15 - Presencial Supermanzana 16 2:30 p.m. 14/05/2026 Reunión social con SDHT

KENNEDY SUPERMANZANA 16

Actividades ejecutado	Actividades programado
04/05/2026 Mesa de trabajo con la Secretaría de Movilidad 07/05/2026 Comité de seguimiento N14 - Virtual	11/05/2026 Mesa de trabajo presencial componente Arqueología 12/05/2026 Comité de seguimiento componente BIM 13/05/2026 Mesa de trabajo presencial componente de transito 13/05/2026 Mesa de trabajo para revisan de presentación a SDA 13/05/2026 Mesa de trabajo entidad de la UAESP 14/05/2026 Mesa de trabajo del componente de normatividad 14/05/2026 Reunión virtual con SDA 14/05/2026 Comité de seguimiento N15 - Presencial Supermanzana 16 2:30 p.m. 14/05/2026 Reunión social con SDHT

ITEM	Nombre de tarea	Du	Comienzo	Fin	Costo	Costo Programado	Costo Ejecutado	%Programadc real	%Completado real	%DIFER	%PROGRAMADO	para diligenciar	Texto20
1	REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.	162 dias	4 febrero 2026 9:00 a. m.	2 octubre 2026 7:00 p. m.	$ 947.833.395,99	$ 303.424.962,61	$ 319.901.433,03	32%	34%	2%	36%	46%	41%
1.1	ETAPA 1	162 d	4 febrero 202	2 octubre 20	$ 947.833.395,99	$ 303.424.962,61	$ 319.901.433,03	32%	34%	2%	36%	46%	41%
1.1.1	Acta de inicio	0 dias	4 febrero 202	4 febrero 202	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%
1.1.2	Entrega de documentos de ingreso personal de trabajo	0 dias	5 febrero 2026 7:00	5 febrero 2026 7:00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%
1.1.3	Revision de documentos de ingreso por Interventoria	3 dias	6 febrero 2026 9:00	10 febrero 2026 7:00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%
1.1.4	Ajuste de observaciones	2 dias	11 febrero 20	12 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%
1.1.5	Entrega plan de trabajo / Cronograma - Etapa 1	0 dias	11 febrero 20	11 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%
1.1.6	Revisión de cronograma por Interventoria	3 dias	12 febrero 20	16 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%
1.1.7	Ajuste de observaciones	2 dias	17 febrero 20	18 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%
1.1.8	Trámites de verificación y armonización en las zonas de influencia del proyecto	0 dias	13 febrero 2026 7:00	13 febrero 2026 7:00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%
1.1.9	Revisión de radicados por Interventoria	3 dias	16 febrero 20	18 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%
1.1.10	Ajuste de observaciones	2 dias	19 febrero 20	20 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%
1.1.11	CIRCUITO FLORESTA	162 d	4 febrero 202	2 octubre 20	$ 473.916.712,99	$ 154.119.386,49	$ 159.582.616,99	33%	34%	1%	36%	45%	42%
1.1.11.1	FASE 1 - FACTIBILIDAD	41 dia	4 febrero 202	6 abril 2026 7	$ 105.304.281,00	$ 105.304.281,00	$ 105.172.650,60	100%	100%	0%	100%	99%	99%
1.1.11.2	FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 dia	7 abril 2026 9	3 julio 2026 7	$ 157.956.467,99	$ 48.815.105,49	$ 54.409.966,39	31%	34%	4%	31%	19%	11%
1.1.11.3	FASE 3 - APROBACIONES	62 dia	3 julio 2026 7	2 octubre 20	$ 210.655.964,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.1.12	SUPERMANZANA 16	162 d	4 febrero 202	2 octubre 20	$ 473.916.683,00	$ 149.305.576,12	$ 160.318.816,04	32%	34%	2%	36%	45%	41%
1.1.12.1	FASE 1 - FACTIBILIDAD	41 dia	4 febrero 202	6 abril 2026 7	$ 105.304.281,00	$ 105.304.281,00	$ 105.304.281,00	100%	100%	0%	100%	99%	99%
1.1.12.2	FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 dia	7 abril 2026 9	3 julio 2026 7	$ 157.956.438,00	$ 44.001.295,12	$ 55.014.535,04	28%	35%	7%	31%	19%	8%
1.1.12.3	FASE 3 - APROBACIONES	62 dia	3 julio 2026 7	2 octubre 20	$ 210.655.964,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%

28. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE SST - AMBIENTAL

COMPONENTE SST	COMPONENTE AMBIENTAL
Se recibió la entrega del SG-SST V1 con el comunicado CCH001-SDHT-1269-2025-255 Se recibió respuesta al comunicado SDH-1330-2025-220 Documentación con el comunicado CCH001-SDHT-1269-2025-256 Se enviaron observaciones al PAPSO con el comunicado SDH-1330-2025-0222	El 6 de mayo se recibió la subsanación de las observaciones de la metodología de riesgos V3 mediante el oficio CCH001-SDHT1269-2025-253 y se inicia revisión. El 7 de mayo se asistió a comité integral virtual. El 8 de mayo se recibió el informe mensual 3 - abril mediante el oficio CH001-SDHT1269-2025-262 y se inicia revisión.

29. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA COMPONENTE SOCIAL

OBJETO DEL CONTRATO	
"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA".	
TIPO DE DOCUMENTO	CONTRATO No Y NOMBRE
INFORME SEMANAL No 13	Consorcio Perseverar SDHT / 1330 DE 2025

CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES			PERIODO DE INFORME : INFORME SEMANAL No. 13 DEL 04 DE MAYO AL 10 DE MAYO DE 2026	
PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA	FECHA INICIAL Y FINAL DE LAS ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA / PLAN DE SEGUIMIENTO	APROBADO	02/03/2026 20/04/2026	20/04/2026	Plan de gestión Social contratista: SDH-1330-2025-0056 del 02/03/2026 Plan de seguimiento y evaluación al Plan de gestión social llega comunicado de aprobación con numero de radicado 2-2026-23930 del 17 de abril del 2026
CARACTERIZACIÓN SOCIAL	El contratista presentó avance de la Caracterización social el 09 de marzo del año en curso, de acuerdo a lo establecido en el componente social EL contratista remite mediante oficio CCH-001-SDHT-1269-258 encuesta de caracterización para revisión y aprobación.	09/03/2026 07/05/2026	12/03/2026 07/05/2026	Se da aprobación al avance de Caracterización mediante oficio SDH-1330-2025-0086 del 12/03/2026. Se tiene estipulado como fecha límite de entrega el 22 de junio del 2026. Se realiza verificación del documento y encuesta, por lo que al remitir se verifica que sea el mismo para dar ella correspondiente aprobación por parte de la interventoría para su aplicación.
PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANIA	NA	NA	NA	NA
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Se remite desde el contratista las actas de formación de circuito floresta sur y parque los periodistas Supermanzana16 ajustadas	5/05/2026	5/05/2026	Se realiza lectura del acta donde se evidencian ajustes solicitados, por lo anterior se da aprobación y se remite con copia a la entidad para visto Bueno
	Se remite desde el contratista las actas del comité Mi Hábitat N°02 de circuito floresta sur y parque los periodistas Supermanzana16 ajustadas	5/05/2026	5/05/2026	Se realiza lectura del acta donde se evidencian ajustes solicitados, por lo anterior se da aprobación y se remite con copia a la entidad para visto Bueno
SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Se recibe informe semanal N°12 por parte del contratista	4/05/2026	04/05/2026 al 05/05/2026	Se da aprobación al informe semanal del contratista y se remite a la entidad para su visto bueno.
	Se asiste al comité técnico semanal N°14 con el acompañamiento de las especialidades del contratista, la entidad y la interventoría, esta actividad se realiza de manera virtual	7/05/2026	7/05/2026	Se asistió al comité en donde se logra informar a las áreas sobre las actividades realizadas durante la semana anterior.
	Se recibe visto bueno oficial de los informes semanales 8, 9, 10, 11 de la interventoría por parte de la entidad	7/05/2026	7/05/2026	Se da aprobación mediante correo electrónico a los informes semanales del 8 al 11 por parte del área social de la entidad
	Se remite por parte de la interventoría observaciones al documento de caracterización social del contratista	4/05/2026	5/05/2026	Se da aprobación a la encuesta, con finalidad de iniciar su aplicación

30. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE BIOSEGURIDAD

Teniendo en cuenta que a la fecha no se encuentra en ejecución el contrato de obra, no se ejecutan actividades referentes al componente de Bioseguridad diferentes a las medidas que se implementan dentro de las oficinas de la interventoría

DESCRIPCIÓN	No. DE CASOS
CASOS (+)	
EN AISLAMIENTO	

DESCRIPCIÓN	No. DE CASOS
CASOS (+)	
EN ALISTAMIENTO	

TOTAL PERSONAL OBRA ADMINISTRATIVO	
TOTAL PERSONAL OBRA - OPERATIVO	

TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA	

N/A

31. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE PMT

Se radico nuevamente el PMT del poligono de Supermanzana 16 y se realizo mesa de trabajo para revision de la metodologia presentada a la SDM

32. PERSONAL INTERVENTORÍA		33. PERSONAL DE OBRA		34. ESTADO DE EQUIPOS EN OBRA			35. ESTADO DEL TIEMPO		
CARGO	**CANT.**	**CARGO**	**CANT.**	**EQUIPO / MAQUINARÍA**	**CANT.**	**UBICACIÓN**	**DÍA**	**HORAS DE LLUVIA**	**ESTADO**
DIRECTOR INTERVENTORÍA	1	DIRECTOR CONSULTORÍA	1				LUNES		
ESP. DISEÑO ARQUITECTÓNICO	1	ESP. DISEÑO ARQUITECTÓNICO	1				MARTES		
ESP. EN PAISAJISMO	1	ESP. EN PAISAJISMO	1				MIÉRCOLES		
ESP. EN VÍAS	1	ESP. EN VÍAS	1				JUEVES		
ESP. EN TRANSITO Y MOVILIDAD	1	ESP. EN TRANSITO Y MOVILIDAD	1				VIERNES		
ESP. ELÉCTRICO	1	ESP. ELÉCTRICO	1				SÁBADO		
ESP. AMBIENTAL	1	ESP. AMBIENTAL	1				DOMINGO		
ING. FORESTAL	1	ING. FORESTAL	1						
ARQUEÓLOGO	1	ARQUEÓLOGO	1						
PROF. DE PRESUPUESTO	1	PROF. DE PRESUPUESTO	1						
PROF. SST	1	PROF. SST	1						
PROF. SOCIAL	1	PROF. SOCIAL	1						
ESP. EN URBANISMO	1	ESP. EN NORMATIVIDAD	1						
ING. SIG	1	ESP. DERECHO URBANO	1						
ESP. DERECHO URBANO	1	TEC. REGISTRO FOTOGRÁFICO	1						
ING. TOPOGRÁFICO	1	PROF. SOPORTE SI G	1						
		MODELADOR BIM (ARQ.)	1						
		MODELADOR BIM (ESTRC)	1						
		MODELADOR BIM (MEP)	1						
		COORDINADOR BIM	1						
		ING. TOPOGRÁFICO	1				**ESTADO**		
		CADENERO 2	1						
		VIGILANTE	1				**LLUVIOSO (L)**		
		AFORADOR PARA MOV. 1	1				**FAVORABLE (F)**		
		AFORADOR PARA MOV. 2	1				**SOLEADO (S)**		

TOTAL DE PERSONAL	**16**	**TOTAL DE PERSONAL**	**25**	**TOTAL DE MAQUINARIA / EQUIPO**	

36. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

FECHA DEL COMPROMISO	COMPROMISO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
4/09/2026	Finalización de la Fase I - Entrega de todos los productos	consultoría	En ejecución

38. OBSERVACIONES
Durante la semana se recibieron subsanación de productos de la Fase I, lo cual esta pendiente el componente de redes hidrosanitaria y pavimentos.
Se mantiene la observación por parte de la interventoría frente al posible riesgo de los tiempos del contrato, teniendo en cuenta la programación presentada por parte del Consultor y avalada por la Secretaria de Hábitat, amparados en los términos contractuales del contrato pero que a la evaluación de la interventoría podrá generar atrasos en el final de cada una de las etapas del proyecto.
39. RECOMENDACIONES
Se recomienda continuar con la metodología de la radicación de derechos de petición ante las entidades que no den respuesta oportuna para los requerimientos realizados.



DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA

Descripción:	Descripción:	Descripción:
Descripción:	Descripción:	Descripción:
