CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA

**SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT**
**PROYECTO - DIRECCIÓN DE OPERACIONES**
**INFORME SEMANAL INTERVENTORIA**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO No. | |
| VERSIÓN: | V-0 |
| FECHA | feb-26 |
| PÁGINA: | 1 de 7 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. FECHA DE ELABORACIÓN** | 26 | 5 | 2026 | **2. INFORME No.** | 15 | **3. SEMANA No.** | 16 | **4. PERIODO:** | 19 | 5 | al | 24 | 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **5. NOMBRE DE LA INTERVENTORÍA:** | Consorcio Perseverar SDHT Barrios BGTA | **6. NIT:** | 902.016.365-5 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **7. CONTRATO No.** | 1330-2025 | **8. FECHA CONTRATO:** | 22/12/2025 | **9. VALOR DEL CONTRATO:** | $1'752.539.631 |
| **10. FECHA ACTA INICIO:** | 4/02/2026 | **11. FECHAS DE TERMINACIÓN:** | 3/10/2027 | **12. PLAZO:** | 21 meses |

| | |
|---|---|
| **13. OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT. |

**14. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **15. NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:** | Consorcio Construhábitat 001 | **16. NIT:** | 902.005.653-4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **17. CONTRATO No.** | 1269-2025 | **18. FECHA CONTRATO:** | 27/11/2025 | **19. VALOR DEL CONTRATO:** | $16'415.325.538 |
| **20. FECHA ACTA INICIO:** | 4/02/2026 | **21. FECHAS DE TERMINACIÓN:** | 3/10/2027 | **22. PLAZO:** | 21 meses |

| | |
|---|---|
| **23. OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA** | REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial | $16'415.325.538 | Valor Inicial | $1'752.539.631 |
| Valor Adicional | N/A | Valor Adicional | N/A |
| Valor Adicional | N/A | Valor Adicional | N/A |
| Plazo Inicial | 21 meses | Plazo Inicial | 21 meses |
| Plazo Prorroga 1 | | Plazo Prorroga 1 | |
| Plazo Actualizado | | Plazo Actualizado | |
| Fecha de Iniciación | | Fecha de Iniciación | |
| Fecha de Suspensión No. 1 | | Fecha de Suspensión No. 1 | |
| Fecha de Ampliación No. 1 Suspensión No. 1 | | Fecha de Ampliación No. 1 Suspensión No. 1 | |
| Fecha de Reinicio No. 1 | | Fecha de Reinicio No. 1 | |
| Fecha de Terminación Inicial | 3/10/2027 | Fecha de Terminación Inicial | 3/10/2027 |
| Fecha de Terminación Actual | 3/10/2027 | Fecha de Terminación Actual | 3/10/2027 |

**CONTRATO DE OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VR. CONTRATO | $ | 16,415,325,538.00 |
| VR. ETAPA 1 | $ | 947,833,365.00 |
| VR. ETAPA 2 | $ | 15,467,492,173.00 |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| VR. CONTRATO | $ | 1,752,539,631.00 |
| VR. ETAPA 1 | $ | 422,876,893.00 |
| VR. ETAPA 2 | $ | 1,329,662,738.00 |

| No. Acta | Valor del Acta | VR. Deducciones | Fecha Acta |
|---|---|---|---|
| Acta No. 1 | $189.480.993,00 | 0 | |
| Acta No. 2 | | | |
| Acta No. 3 | | | |
| Acta No. 4 | | | |
| Acta No. 5 | | | |
| Acta No. 6 | | | |
| Acta No. 7 | | | |
| Acta No. 8 | | | |
| Acta No. 9 | | | |
| Acta No. 10 | | | |
| Acta No. 11 | | | |
| Acta No. 12 | | | |
| Acta No. 13 | | | |
| Acta No. 14 | | | |
| Acta No. 15 | | | |
| Acta No. 16 | | | |
| Acta No. 17 | | | |
| Acta No. 18 | | | |
| VALOR TOTAL | $189.480.993,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR EJECUTADO ET1 | $189.480.993,00 | % Avc. | |
| VALOR POR EJECUTAR ET1 | | % Falt. | 100.00% |
| VALOR EJECUTADO ET2 | | % Avc. | 0 |
| VALOR POR EJECUTAR ET2 | | % Falt. | 100.00% |
| VALOR RETEGARANTIA | | % Avc. | |
| VALOR POR DEDUCCIÓN | | % Falt. | |

| No. Acta | Valor del Acta | VR. Deducciones | Fecha Acta |
|---|---|---|---|
| Acta No. 1 | $ 14,272,095.00 | $246.696,00 | 13/04/2026 |
| Acta No. 2 | | | |
| Acta No. 3 | | | |
| Acta No. 4 | | | |
| Acta No. 5 | | | |
| Acta No. 6 | | | |
| Acta No. 7 | | | |
| Acta No. 8 | | | |
| Acta No. 9 | | | |
| Acta No. 10 | | | |
| Acta No. 11 | | | |
| Acta No. 12 | | | |
| Acta No. 13 | | | |
| Acta No. 14 | | | |
| Acta No. 15 | | | |
| Acta No. 16 | | | |
| Acta No. 17 | | | |
| Acta No. 18 | | | |
| VALOR TOTAL | $ 14,272,095.00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR EJECUTADO ET1 | $ | 14,272,095.00 | % Avc. | 3.37% | |
| VALOR POR EJECUTAR ET1 | $ | 408,604,798.00 | % Falt. | 96.63% | |
| VALOR EJECUTADO ET2 | | | % Avc. | 0 | |
| VALOR POR EJECUTAR ET2 | $ | 1,329,662,738.00 | % Falt. | 100.00% | |
| VALOR RETEGARANTIA | | | % Avc. | | |
| VALOR POR DEDUCCIÓN | | | % Falt. | | |


## ETAPA DE FACTIBILIDAD


| EJECUCIÓN | EJECUTADO | PROGRAMADO | ATRASO(-) ADELANTO(+) |
|---|---|---|---|
| Acumulado Anterior | 29.33% | 37.89% | -8.56% |
| Durante la semana | 5.56% | 2.33% | 3.23% |
| Actual Acumulado | 34.89% | 40.22% | -5.33% |


| Valor Etapa 1 | |
|---|---|

| EJECUCIÓN | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Programado | | |
| Valor de la Obra | | |

| EJECUCIÓN | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Ejecutado | | |
| Valor de la Obra | | |

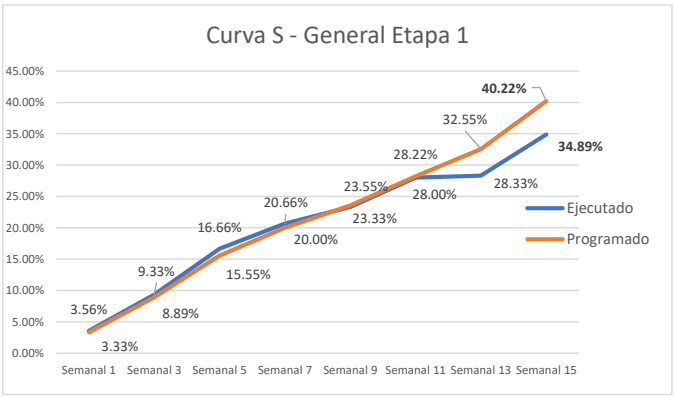

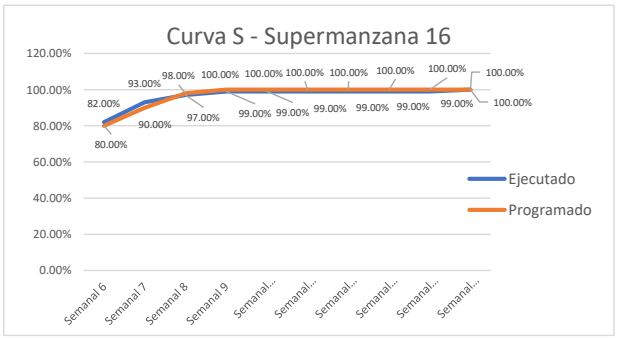


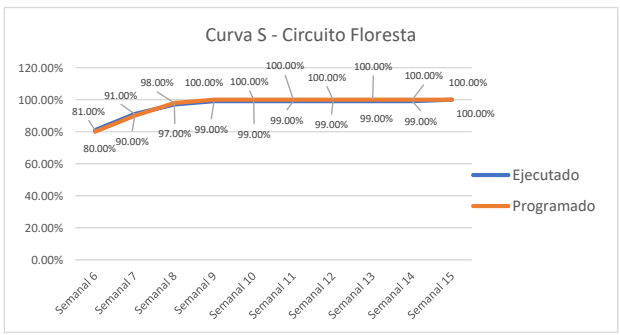
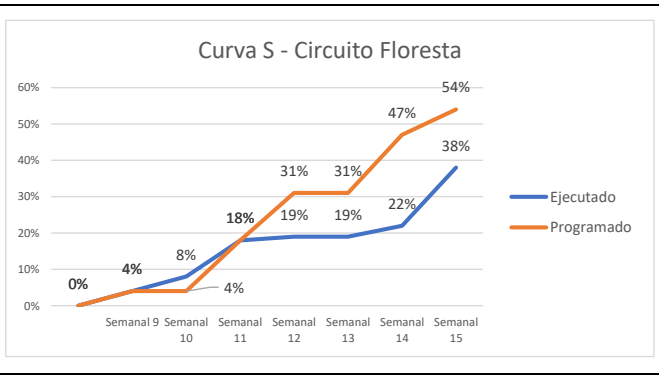




## PORCENTAJES FISCOS

Estado de cronograma por componente FASE I
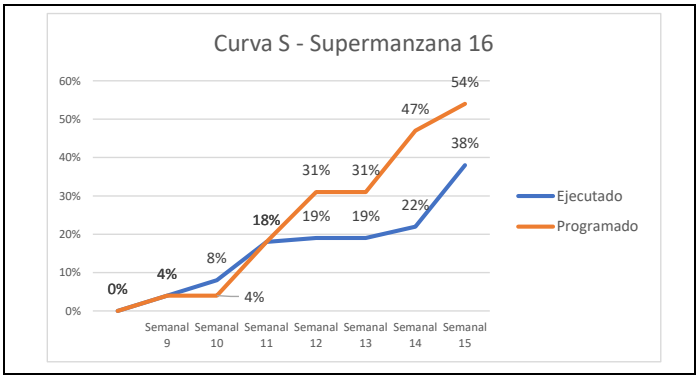
| Resumen de la semana | | | |
|---|---|---|---|
| | **SUPERMANZANA 16** | **100%** | **100%** |
| | Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades | 100% | 100% |
| | Topografía | 100% | 100% |
| | Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor | 100% | 100% |
| | Vías transporte y movilidad: Ajustes por el consultor de Entrega Recopilación y análisis de información, Falta la aprobación del PMT por parte de Secretaria de Movilidad | 100% | 100% |
| | Redes Hidráulicas: Se encuentra en revisión los entregables por parte del Consultor | 100% | 100% |
| | Redes Secas: Falta la entrega del Informe de Factibilidad por parte del Consultor | 100% | 100% |
| | Componente BIM: Se continua en elaboración el modelo de condiciones existentes. | 100% | 100% |
| | Arqueología: | 100% | 100% |
| | Presupuesto y cronograma: En atención de observaciones por parte del Consultor | 100% | 100% |
| | Geotecnia | 100% | 100% |
| | Pavimentos: Se encuentra en revisión por la interventoría | 100% | 100% |
| | Estructuras: No se ha recibido el informe técnico de estructuras | 100% | 100% |
| | Ambiental y SST | 100% | 100% |
| | Social | 100% | 100% |
| | **CIRCUITO FLORESTA** | **100%** | **100%** |
| | Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades | 100% | 100% |
| | Topografía | 100% | 100% |
| | Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor | 100% | 100% |
| | Vías transporte y movilidad: Ajustes por el consultor de Entrega Recopilación y análisis de información, Falta la aprobación del PMT por parte de Secretaria de Movilidad | 100% | 100% |
| | Redes Hidráulicas: Se encuentra en revisión los entregables por parte del Consultor | 100% | 100% |
| | Redes Secas: Falta la entrega del Informe de Factibilidad | 100% | 100% |
| | Componente BIM: Se continua en elaboración el modelo de condiciones existentes. | 100% | 100% |
| | Arqueología: | 100% | 100% |
| | Presupuesto y cronograma: En atención de observaciones por parte del Consultor | 100% | 100% |
| | Geotecnia | 100% | 100% |
| | Pavimentos: Se encuentra en revisión por la interventoría | 100% | 100% |
| | Estructuras: No se a recibido el informe técnico de estructuras | 100% | 100% |
| | Ambiental y SST | 100% | 100% |
| | Social | 100% | 100% |




| | Estado de cronograma por componente FASE II | | |
|---|---|---|---|
| | **SUPERMANZANA 16** | **54%** | **38%** |
| | Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades | 100% | 93% |
| | Topografía | 100% | 99% |
| | Arquitectónico y Urbano Atraso | 54% | 26% |
| | Vías transporte y movilidad Atraso | 57% | 14% |
| | Redes Hidráulicas | 33% | 32% |
| | Redes Secas | 33% | 22% |
| | Arqueología: | 56% | 98% |
| | Presupuesto y cronograma | 32% | 11% |
| | Geotecnia | 56% | 53% |
| | Pavimentos | 45% | 30% |
| | Estructuras | 33% | 46% |
| | Ambiental y SST | 54% | 46% |
| | Social | 57% | 63% |
| | Componente BIM | 63% | 23% |
| Resumen de la semana | **CIRCUITO FLORESTA SUR** | **54%** | **38%** |
| | Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades | 100% | 93% |
| | Topografía | 100% | 99% |
| | Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor | 54% | 26% |
| | Vías transporte y movilidad | 57% | 14% |
| | Redes Hidráulicas | 33% | 32% |
| | Redes Secas | 33% | 22% |
| | Arqueología: | 56% | 98% |
| | Presupuesto y cronograma | 32% | 11% |
| | Geotecnia | 56% | 53% |
| | Pavimentos | 45% | 30% |
| | Estructuras | 33% | 46% |
| | Ambiental y SST | 54% | 46% |
| | Social | 57% | 63% |
| | Componente BIM | 63% | 23% |

## 27. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE TÉCNICO

Resumen de la semana

Durante la semana comprendida entre el 19/05/2026 y el 24/05/2026
Revisión Componente BIM - Virtual
Revisión de Diseño Arquitectónico - Presencial
Comité de seguimiento N 16 - Virtual
Reunión presencial con IDRD
Reunión revisión de avances al componente de transito

**CIRCUITO FLORESTA**

| Actividades ejecutado | Actividades programado |
|---|---|
| 19/05/2026 Revisión del componente BIM<br>20/05/2026 Revisión de diseño arquitectónico en la SDHT<br>21/05/2026 Comité de seguimiento N16 - Virtual<br>21/05/2026 Reunión con el IDRD | 25/05/2026 Taller de participación ciudadana<br>26/05/2026 Mesa de trabajo componente de Geotecnia y pavimentos<br>26/05/2026 Mesa de trabajo Verificación matriz de impactos<br>26/05/2026 Comité de seguimiento BIM<br>28/05/2026 Comité de seguimiento N17 Virtual<br>29/05/2026 Reunión avance componente de transito<br>29/05/2026 Comité mi Habitat Salón Comunal |

**KENNEDY SUPERMANZANA 16**

| Actividades ejecutado | Actividades programado |
|---|---|
| 19/05/2026 Revisión del componente BIM<br>20/05/2026 Revisión de diseño arquitectónico en la SDHT<br>21/05/2026 Comité de seguimiento N16 - Virtual<br>21/05/2026 Reunión con el IDRD | 27/05/2026 Comité mi Habitat<br>28/05/2026 Comité de seguimiento N17 Virtual |

| ITEM | Nombre de tarea | Du | Comienzo | Fin | Costo | Programado | Costo Ejecutado | real | real | %DIFER | %PROGRAMADO | diligenciar | Texto20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT. | 162 dias | 4 febrero 2026 9:00 a. m. | 2 octubre 2026 7:00 p. m. | $ 947.833.395,99 | $ 406.397.166,52 | $ 367.865.115,93 | 43% | 39% | -4% | 45% | 53% | 47% |
| 1.1 | ETAPA 1 | 162 d | 4 febrero 202 | 2 octubre 20 | $ 947.833.395,99 | $ 406.397.166,52 | $ 367.865.115,93 | 43% | 39% | -4% | 45% | 53% | 47% |
| 1.1.1 | Acta de inicio | 0 dias | 4 febrero 202 | 4 febrero 202 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1.2 | Entrega de documentos de ingreso personal de trabajo | 0 dias | 5 febrero 2026 7:00 | 5 febrero 2026 7:00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1.3 | Revision de documentos de ingreso por Interventoria | 3 dias | 6 febrero 2026 9:00 | 10 febrero 2026 7:00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1.4 | Ajuste de observaciones | 2 dias | 11 febrero 20 | 12 febrero 20 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1.5 | Entrega plan de trabajo / Cronograma - Etapa 1 | 0 dias | 11 febrero 20 | 11 febrero 20 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1.6 | Revisión de cronograma por Interventoria | 3 dias | 12 febrero 20 | 16 febrero 20 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1.7 | Ajuste de observaciones | 2 dias | 17 febrero 20 | 18 febrero 20 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1.8 | Trámites de verificación y armonización en las zonas de influencia del proyecto | 0 dias | 13 febrero 2026 7:00 | 13 febrero 2026 7:00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1.9 | Revisión de radicados por Interventoria | 3 dias | 16 febrero 20 | 18 febrero 20 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1.10 | Ajuste de observaciones | 2 dias | 19 febrero 20 | 20 febrero 20 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1.11 | CIRCUITO FLORESTA | 162 d | 4 febrero 202 | 2 octubre 20 | $ 473.916.712,99 | $ 204.582.327,19 | $ 185.907.232,69 | 43% | 39% | -4% | 45% | 54% | 47% |
| 1.1.11.1 | FASE 1 - FACTIBILIDAD | 41 dia | 4 febrero 202 | 6 abril 2026 7 | $ 105.304.281,00 | $ 105.304.281,00 | $ 105.304.281,00 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 99% |
| 1.1.11.2 | FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS | 59 dia | 7 abril 2026 9 | 3 julio 2026 7 | $ 157.956.467,99 | $ 99.278.046,19 | $ 80.602.951,69 | 63% | 51% | -12% | 54% | 38% | 22% |
| 1.1.11.3 | FASE 3 - APROBACIONES | 62 dia | 3 julio 2026 7 | 2 octubre 20 | $ 210.655.964,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.1.12 | SUPERMANZANA 16 | 162 d | 4 febrero 202 | 2 octubre 20 | $ 473.916.683,00 | $ 201.814.839,33 | $ 181.957.883,24 | 43% | 38% | -4% | 45% | 53% | 47% |
| 1.1.12.1 | FASE 1 - FACTIBILIDAD | 41 dia | 4 febrero 202 | 6 abril 2026 7 | $ 105.304.281,00 | $ 105.304.281,00 | $ 105.304.281,00 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 99% |
| 1.1.12.2 | FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS | 59 dia | 7 abril 2026 9 | 3 julio 2026 7 | $ 157.956.438,00 | $ 96.510.558,33 | $ 76.653.602,24 | 61% | 49% | -13% | 54% | 37% | 22% |
| 1.1.12.3 | FASE 3 - APROBACIONES | 62 dia | 3 julio 2026 7 | 2 octubre 20 | $ 210.655.964,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

## 28. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE SST - AMBIENTAL

| COMPONENTE SST | COMPONENTE AMBIENTAL |
|---|---|
| El 19 de mayo se recibe respuesta a las observaciones del informe mensual N3 con el comunicado CCH001-SDHT-1269-2025-273 | El 21 de mayo se asistió a comité integral virtual.<br><br>El 21 de mayo se programó mesa de trabajo con el componente ambiental y social del contratista y con la supervisión ambiental.<br>El 22 de mayo se envió oficio SDH-1330-2025-0252 con aprobación del informe mensual 3 - abril del componente ambiental y del componente de riesgos. |

## 29. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA COMPONENTE SOCIAL

| OBJETO DEL CONTRATO | |
|---|---|
| "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA". | |
| **TIPO DE DOCUMENTO** | **CONTRATO No Y NOMBRE** |
| INFORME SEMANAL No 15 | Consorcio Perseverar SDHT / 1330 DE 2025 |

| CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES | | | PERIODO DE INFORME : INFORME SEMANAL No. 15 DEL 19 AL 24 DE MAYO DE 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMA** | **ACTIVIDAD** | **FECHA** | **FECHA INICIAL Y FINAL DE LAS ACTIVIDADES** | **SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA** |
| PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA / PLAN DE SEGUIMIENTO | APROBADO | 02/03/2026<br>20/04/2026 | 20/04/2026 | Plan de gestión Social contratista: SDH-1330-2025-0056 del 02/03/2026<br>Plan de seguimiento y evaluación al Plan de gestión social llega comunicado de aprobación con numero de radicado 2-2026-23930 del 17 de abril del 2026 |
| CARACTERIZACIÓN SOCIAL | El contratista presentó avance de la Caracterización social el 09 de marzo del año en curso, de acuerdo a lo establecido en el componente social<br><br>EL contratista remite mediante oficio CCH-001-SDHT-1269-258 encuesta de caracterización para revisión y aprobación. | 09/03/2026<br><br>07/05/2026 | 12/03/2026<br><br>07/05/2026 | Se da aprobación al avance de Caracterización mediante oficio SDH-1330-2025-0086 del 12/03/2026. Se tiene estipulado como fecha limite de entrega el 22 de junio del 2026.<br><br>Se realiza verificación del documento y encuesta, por lo que al remitir se verifica que sea el mismo para dar ella correspondiente aprobación por parte de la interventoría para su aplicación. |
| PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANIA | Se recibe correo electrónico con ajustes de metodología de identificación y evaluación de impactos | 19/05/2026 | 19/05/2026 al 21/05/2026 | se da aprobación a la metodología ajustada, para iniciar aplicación y alimentar el documento, el documento se encuentra en el Drive del área social. |
| | Se remite por parte del contratista, la metodología del tercer comité mi Habitat poligono supermanzana 16 | 20/05/2026 | 20/05/2026 al 22/05/2026 | Se realizan los ajustes por parte del contratista, por lo que se da aprobación a la metodología y se remite a la entidad para visto bueno. |
| | Se remite por parte del contratista, la metodología del tercer comité mi Habitat poligono Circuito floresta sur | 22/05/2026 | 22/05/2026 | se da aprobación a la metodología y se remite a la entidad para visto bueno. |
| PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | se recibe informe de encuestas de percepción realizadas en las actividades de formación N°1 para revisión y concepto de la interventoría. | 19/05/2026 | 19/05/2026 | Los documentos se encuentran en revisión por parte de la interventoría para concepto. |
| SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | Se recibe informe semanal N°14 por parte del contratista | 19/05/2026 | 19/05/2026 al 20/05/2026 | Se da aprobación al informe semanal N 14 del contratista y se remite a la entidad para su visto bueno. |
| | Se asiste al comité técnico semanal N°16 de manera virtual con el acompañamiento de las especialidades del contratista, la entidad y la interventoría. | 21/05/2026 | 21/05/2026 | Se asistió al comité en donde se logra informar a las áreas sobre las actividades realizadas durante la semana anterior. |
| | Se recibe aprobación mediante correo electrónico del informe mensual social 02 de interventoría | 20/05/2026 | 20/05/226 | Se recibe por parte de la entidad mediante correo electrónico, aprobación del informe mensual social N°02 |
| | Se remite Aprobación al informe social N.° 03 del contratista bajo radicado SDH-1330-2025-024 | 19/05/2026 | 19/05/2026 | Se da aprobación al informe mensual social Mensual N°3 del contratista y se remite para revisión de la entidad |

**30. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE BIOSEGURIDAD**

Teniendo en cuenta que a la fecha no se encuentra en ejecución el contrato de obra, no se ejecutan actividades referentes al componente de Bioseguridad diferentes a las medidas que se implementan dentro de las oficinas de la interventoría

| DESCRIPCIÓN | No. DE CASOS |
|---|---|
| CASOS (+) | |
| EN AISLAMIENTO | |

| DESCRIPCIÓN | No. DE CASOS |
|---|---|
| CASOS (+) | |
| EN ALISTAMIENTO | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PERSONAL OBRA ADMINISTRATIVO** | |
| **TOTAL PERSONAL OBRA - OPERATIVO** | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA** | |

N/A

**31. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE PMT**

Se radico nuevamente el PMT del poligono de Supermanzana 16 y se realizo mesa de trabajo para revision de la metodologia presentada a la SDM

| 32. PERSONAL INTERVENTORÍA | | 33. PERSONAL DE OBRA | | 34. ESTADO DE EQUIPOS EN OBRA | | | 35. ESTADO DEL TIEMPO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CARGO** | **CANT.** | **CARGO** | **CANT.** | **EQUIPO / MAQUINARÍA** | **CANT.** | **UBICACIÓN** | **DÍA** | **HORAS DE LLUVIA** | **ESTADO** |
| DIRECTOR INTERVENTORÍA | 1 | DIRECTOR CONSULTORÍA | 1 | | | | LUNES | | |
| ESP. DISEÑO ARQUITECTÓNICO | 1 | ESP. DISEÑO ARQUITECTÓNICO | 1 | | | | MARTES | | |
| ESP. EN PAISAJISMO | 1 | ESP. EN PAISAJISMO | 1 | | | | MIÉRCOLES | | |
| ESP. EN VÍAS | 1 | ESP. EN VÍAS | 1 | | | | JUEVES | | |
| ESP. EN TRANSITO Y MOVILIDAD | 1 | ESP. EN TRANSITO Y MOVILIDAD | 1 | | | | VIERNES | | |
| ESP. ELÉCTRICO | 1 | ESP. ELÉCTRICO | 1 | | | | SÁBADO | | |
| ESP. AMBIENTAL | 1 | ESP. AMBIENTAL | 1 | | | | DOMINGO | | |
| ING. FORESTAL | 1 | ING. FORESTAL | 1 | | | | | | |
| ARQUEÓLOGO | 1 | ARQUEÓLOGO | 1 | | | | | | |
| PROF. DE PRESUPUESTO | 1 | PROF. DE PRESUPUESTO | 1 | | | | | | |
| PROF. SST | 1 | PROF. SST | 1 | | | | | | |
| PROF. SOCIAL | 1 | PROF. SOCIAL | 1 | | | | | | |
| ESP. EN URBANISMO | 1 | ESP. EN NORMATIVIDAD | 1 | | | | | | |
| ING. SIG | 1 | ESP. DERECHO URBANO | 1 | | | | | | |
| ESP. DERECHO URBANO | 1 | TEC. REGISTRO FOTOGRÁFICO | 1 | | | | | | |
| ING. TOPOGRÁFICO | 1 | PROF. SOPORTE SI G | 1 | | | | | | |
| | | MODELADOR BIM (ARQ.) | 1 | | | | | | |
| | | MODELADOR BIM (ESTRC) | 1 | | | | | | |
| | | MODELADOR BIM (MEP) | 1 | | | | | | |
| | | COORDINADOR BIM | 1 | | | | | | |
| | | ING. TOPOGRÁFICO | 1 | | | | **ESTADO** | | |
| | | CADENERO 2 | 1 | | | | | | |
| | | VIGILANTE | 1 | | | | **LLUVIOSO (L)** | | |
| | | AFORADOR PARA MOV. 1 | 1 | | | | **FAVORABLE (F)** | | |
| | | AFORADOR PARA MOV. 2 | 1 | | | | **SOLEADO (S)** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DE PERSONAL** | **16** | **TOTAL DE PERSONAL** | **25** | **TOTAL DE MAQUINARIA / EQUIPO** | |

**36. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA**

| FECHA DEL COMPROMISO | COMPROMISO | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|
| 4/09/2026 | Finalización de la Fase I - Entrega de todos los productos | consultoría | En ejecución |
| | | | |
| | | | |

| **38. OBSERVACIONES** |
|---|
| Se envio comunicado solicitando plan de contingencia por atraso generado la semana anterior a la del informe actal. |
| Se mantiene la observación por parte de la interventoría frente al posible riesgo de los tiempos del contrato, teniendo en cuenta la programación presentada por parte del Consultor y avalada por la Secretaria de Hábitat, amparados en los términos contractuales del contrato pero que a la evaluación de la interventoría podrá generar atrasos en el final de cada una de las etapas del proyecto. |
| |
| |
| **39. RECOMENDACIONES** |
| Se recomienda continuar con la metodología de la radicación de derechos de petición ante las entidades que no den respuesta oportuna para los requerimientos realizados. |
| |



DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA

| | | |
|---|---|---|
| Descripción: Reunión presencial con IDRD | Descripción: | Descripción: |
|  | | |
| Descripción: | Descripción: | Descripción: |
| | | |
