CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA	SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT PROYECTO - DIRECCIÓN DE OPERACIONES INFORME SEMANAL INTERVENTORIA	CÓDIGO No.	
		VERSIÓN:	V-0
		FECHA	feb-26
		PÁGINA:	1 de 7

1. FECHA DE ELABORACIÓN	2	6	2026	2. INFORME No.	16	3. SEMANA No.	17	4. PERIODO:	25	5	al	31	5

5. NOMBRE DE LA INTERVENTORÍA:		Consorcio Perseverar SDHT Barrios BGTA	6. NIT:	902.016.365-5

7. CONTRATO No.	1330-2025	8. FECHA CONTRATO:	22/12/2025	9. VALOR DEL CONTRATO:	$1'752.539.631
10. FECHA ACTA INICIO:	4/02/2026	11. FECHAS DE TERMINACIÓN:	3/10/2027	12. PLAZO:	21 meses

13. OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.

14. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

15. NOMBRE CONTRATISTA DE OBRA:	Consorcio Construhábitat 001	16. NIT:	902.005.653-4

17. CONTRATO No.	1269-2025	18. FECHA CONTRATO:	27/11/2025	19. VALOR DEL CONTRATO:	$16'415.325.538
20. FECHA ACTA INICIO:	4/02/2026	21. FECHAS DE TERMINACIÓN:	3/10/2027	22. PLAZO:	21 meses

23. OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.

Valor Inicial	$16'415.325.538	Valor Inicial	$1'752.539.631
Valor Adicional	N/A	Valor Adicional	N/A
Valor Adicional	N/A	Valor Adicional	N/A
Plazo Inicial	21 meses	Plazo Inicial	21 meses
Plazo Prorroga 1		Plazo Prorroga 1	
Plazo Actualizado		Plazo Actualizado	
Fecha de Iniciación		Fecha de Iniciación	
Fecha de Suspensión No. 1		Fecha de Suspensión No. 1	
Fecha de Ampliación No. 1 Suspensión No. 1		Fecha de Ampliación No. 1 Suspensión No. 1	
Fecha de Reinicio No. 1		Fecha de Reinicio No. 1	
Fecha de Terminación Inicial	3/10/2027	Fecha de Terminación Inicial	3/10/2027
Fecha de Terminación Actual	3/10/2027	Fecha de Terminación Actual	3/10/2027

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
VR. CONTRATO	$ 16,415,325,538.00	VR. CONTRATO	$ 1,752,539,631.00
VR. ETAPA 1	$ 947,833,365.00	VR. ETAPA 1	$ 422,876,893.00
VR. ETAPA 2	$ 15,467,492,173.00	VR. ETAPA 2	$ 1,329,662,738.00

No. Acta	Valor del Acta	VR. Deducciones	Fecha Acta
Acta No. 1	$189.480.993,00	0	
Acta No. 2			
Acta No. 3			
Acta No. 4			
Acta No. 5			
Acta No. 6			
Acta No. 7			
Acta No. 8			
Acta No. 9			
Acta No. 10			
Acta No. 11			
Acta No. 12			
Acta No. 13			
Acta No. 14			
Acta No. 15			
Acta No. 16			
Acta No. 17			
Acta No. 18			
VALOR TOTAL	$189.480.993,00		

No. Acta	Valor del Acta	VR. Deducciones	Fecha Acta
Acta No. 1	$ 14,272,095.00	$246.696,00	13/04/2026
Acta No. 2			
Acta No. 3			
Acta No. 4			
Acta No. 5			
Acta No. 6			
Acta No. 7			
Acta No. 8			
Acta No. 9			
Acta No. 10			
Acta No. 11			
Acta No. 12			
Acta No. 13			
Acta No. 14			
Acta No. 15			
Acta No. 16			
Acta No. 17			
Acta No. 18			
VALOR TOTAL	$ 14,272,095.00		

VALOR EJECUTADO ET1	$189.480.993,00	% Avc.	
VALOR POR EJECUTAR ET1		% Falt.	100.00%
VALOR EJECUTADO ET2		% Avc.	0
VALOR POR EJECUTAR ET2		% Falt.	100.00%
VALOR RETEGARANTIA		% Avc.	
VALOR POR DEDUCCIÓN		% Falt.	

VALOR EJECUTADO ET1	$ 14,272,095.00	% Avc.	3.37%
VALOR POR EJECUTAR ET1	$ 408,604,798.00	% Falt.	96.63%
VALOR EJECUTADO ET2		% Avc.	0
VALOR POR EJECUTAR ET2	$ 1,329,662,738.00	% Falt.	100.00%
VALOR RETEGARANTIA		% Avc.	
VALOR POR DEDUCCIÓN		% Falt.	


ETAPA DE FACTIBILIDAD


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO(+)
Acumulado Anterior	34.89%	40.22%	-5.33%
Durante la semana	3.66%	3.00%	0.66%
Actual Acumulado	38.55%	43.22%	-4.67%


Valor Etapa 1	

EJECUCIÓN	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programado		
Valor de la Obra		

EJECUCIÓN	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutado		
Valor de la Obra		

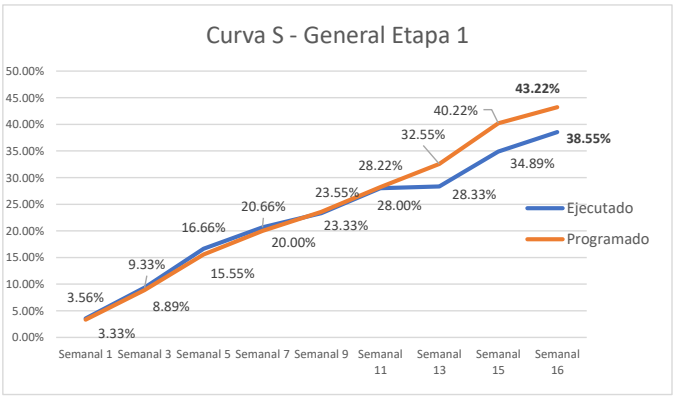

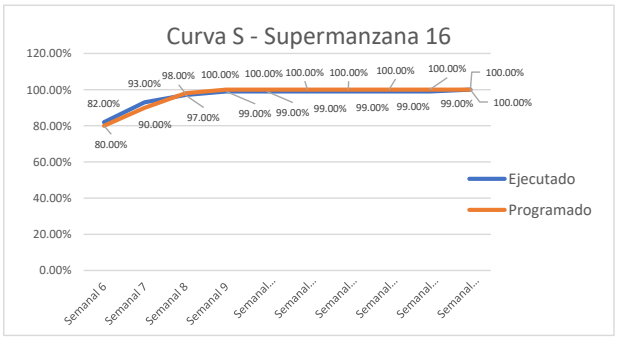

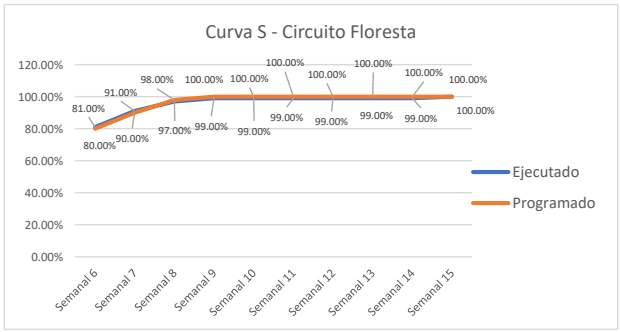



PORCENTAJES FISCOS

Estado de cronograma por componente FASE I

Resumen de la semana

SUPERMANZANA 16	**100%**	**100%**
Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	100%	100%
Topografía	100%	100%
Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor	100%	100%
Vías transporte y movilidad: Ajustes por el consultor de Entrega Recopilación y análisis de información, Falta la aprobación del PMT por parte de Secretaria de Movilidad	100%	100%
Redes Hidráulicas: Se encuentra en revisión los entregables por parte del Consultor	100%	100%
Redes Secas: Falta la entrega del Informe de Factibilidad por parte del Consultor	100%	100%
Componente BIM: Se continua en elaboración el modelo de condiciones existentes.	100%	100%
Arqueología:	100%	100%
Presupuesto y cronograma: En atención de observaciones por parte del Consultor	100%	100%
Geotecnia	100%	100%
Pavimentos: Se encuentra en revisión por la interventoría	100%	100%
Estructuras: No se ha recibido el informe técnico de estructuras	100%	100%
Ambiental y SST	100%	100%
Social	100%	100%
CIRCUITO FLORESTA	**100%**	**100%**
Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	100%	100%
Topografía	100%	100%
Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor	100%	100%
Vías transporte y movilidad: Ajustes por el consultor de Entrega Recopilación y análisis de información, Falta la aprobación del PMT por parte de Secretaria de Movilidad	100%	100%
Redes Hidráulicas: Se encuentra en revisión los entregables por parte del Consultor	100%	100%
Redes Secas: Falta la entrega del Informe de Factibilidad	100%	100%
Componente BIM: Se continua en elaboración el modelo de condiciones existentes.	100%	100%
Arqueología:	100%	100%
Presupuesto y cronograma: En atención de observaciones por parte del Consultor	100%	100%
Geotecnia	100%	100%
Pavimentos: Se encuentra en revisión por la interventoría	100%	100%
Estructuras: No se a recibido el informe técnico de estructuras	100%	100%
Ambiental y SST	100%	100%
Social	100%	100%

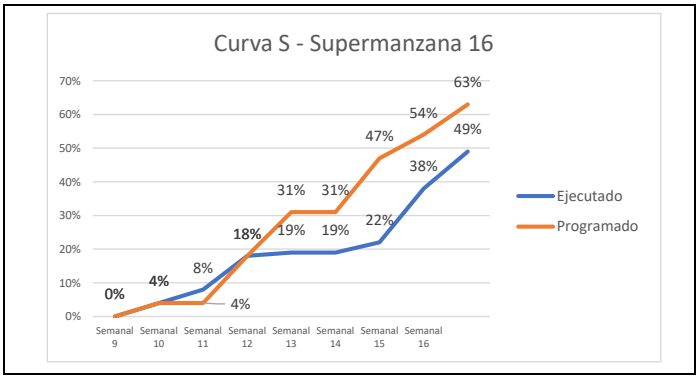

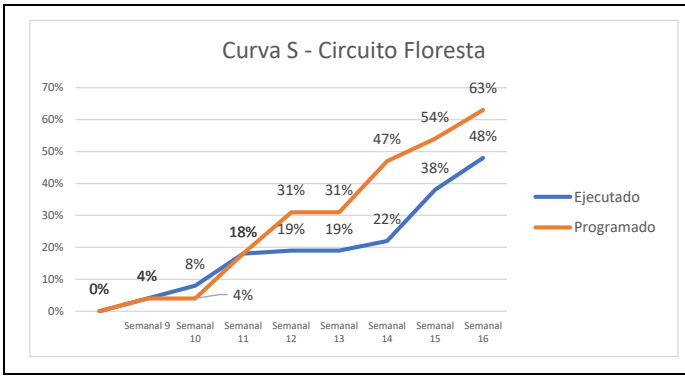

	Estado de cronograma por componente FASE II		
	SUPERMANZANA 16	**63%**	**49%**
	Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	100%	93%
	Topografía	100%	99%
	Arquitectónico y Urbano Atraso	63%	77%
	Vías transporte y movilidad Atraso	66%	17%
	Redes Hidráulicas	47%	32%
	Redes Secas	47%	40%
	Arqueología:	65%	99%
	Presupuesto y cronograma	46%	19%
	Geotecnia	65%	61%
	Pavimentos	58%	52%
	Estructuras	47%	46%
	Ambiental y SST	63%	56%
	Social	66%	63%
	Componente BIM	73%	27%
Resumen de la semana	**CIRCUITO FLORESTA SUR**	**63%**	**48%**
	Verificación Normatividad: Informe de matriz consulta a entidades	100%	93%
	Topografía	100%	99%
	Arquitectónico y Urbano: Revisión del RAI por parte del consultor	63%	77%
	Vías transporte y movilidad	66%	17%
	Redes Hidráulicas	47%	32%
	Redes Secas	47%	40%
	Arqueología:	65%	99%
	Presupuesto y cronograma	46%	19%
	Geotecnia	65%	61%
	Pavimentos	58%	52%
	Estructuras	47%	46%
	Ambiental y SST	63%	56%
	Social	66%	63%
	Componente BIM	73%	27%

27. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE TÉCNICO

Resumen de la semana

Durante la semana comprendida entre el 25/05/2026 y el 31/05/2026
Talleres de participacion ciudadana en Supermanzana 16
Mesa de trabajo componete de geotecnia y pavimentos
Comité mi Hábitat en Supermanzana 16 y Circuito Floresta
Comité de seguimiento semanal N17
Reunión de seguimiento componente Transito

CIRCUITO FLORESTA

Actividades ejecutado	Actividades programado
25/05/2026 Taller de participación ciudadana	03/06/2026 Revisión de diseño arquitectonico - Virtual
26/05/2026 Mesa de trabajo componente de Geotecnia y pavimentos	03/06/2026 Capacitacion de riesgo público y divulgación
26/05/2026 Mesa de trabajo Verificación matriz de impactos	04/06/2026 Comité de seguimiento N18 - Presencial
26/05/2026 Comité de seguimiento BIM	04/06/2026 IDRD - Presencial
28/05/2026 Comité de seguimiento N17 Virtual	05/06/2025 Reunion avance de transito
29/05/2026 Reunión avance componente de transito	
29/05/2026 Comité mi Habitat Salón Comunal	

KENNEDY SUPERMANZANA 16

Actividades ejecutado	Actividades programado
19/05/2026 Revisión del componente BIM	03/06/2026 Revisión de diseño arquitectonico - Virtual
20/05/2026 Revisión de diseño arquitectónico en la SDHT	03/06/2026 Capacitacion de riesgo público y divulgación
21/05/2026 Comité de seguimiento N16 - Virtual	04/06/2026 Comité de seguimiento N18 - Presencial
21/05/2026 Reunión con el IDRD	04/06/2026 IDRD - Presencial
	05/06/2025 Reunion avance de transito

ITEM	Nombre de tarea	Du	Comienzo	Fin	Costo	Costo Programado	Costo Ejecutado	real	real	%DIFER	%PROGRAMADO	diligenciar	Texto20
1	REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT.	162 dias	4 febrero 2026 9:00 a. m.	2 octubre 2026 7:00 p. m.	$ 947.833.395,99	$ 427.822.161,98	$ 391.938.405,69	45%	41%	-4%	48%	58%	53%
1.1	ETAPA 1	162 d	4 febrero 202	2 octubre 20	$ 947.833.395,99	$ 427.822.161,98	$ 391.938.405,69	45%	41%	-4%	48%	58%	53%
1.1.1	Acta de inicio	0 dias	4 febrero 202	4 febrero 202	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%
1.1.2	Entrega de documentos de ingreso personal de trabajo	0 dias	5 febrero 2026 7:00	5 febrero 2026 7:00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%
1.1.3	Revision de documentos de ingreso por Interventoria	3 dias	6 febrero 2026 9:00	10 febrero 2026 7:00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%
1.1.4	Ajuste de observaciones	2 dias	11 febrero 20	12 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%
1.1.5	Entrega plan de trabajo / Cronograma - Etapa 1	0 dias	11 febrero 20	11 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%
1.1.6	Revisión de cronograma por Interventoria	3 dias	12 febrero 20	16 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%
1.1.7	Ajuste de observaciones	2 dias	17 febrero 20	18 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%
1.1.8	Trámites de verificación y armonización en las zonas de influencia del proyecto	0 dias	13 febrero 2026 7:00	13 febrero 2026 7:00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%
1.1.9	Revisión de radicados por Interventoria	3 dias	16 febrero 20	18 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%
1.1.10	Ajuste de observaciones	2 dias	19 febrero 20	20 febrero 20	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	100%	100%	100%
1.1.11	CIRCUITO FLORESTA	162 d	4 febrero 202	2 octubre 20	$ 473.916.712,99	$ 215.279.710,53	$ 197.263.781,39	45%	42%	-4%	48%	58%	54%
1.1.11.1	FASE 1 - FACTIBILIDAD	41 dia	4 febrero 202	6 abril 2026 7	$ 105.304.281,00	$ 105.304.281,00	$ 105.304.281,00	100%	100%	0%	100%	100%	100%
1.1.11.2	FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 dia	7 abril 2026 9	3 julio 2026 7	$ 157.956.467,99	$ 109.975.429,53	$ 91.959.500,39	70%	58%	-11%	63%	49%	38%
1.1.11.3	FASE 3 - APROBACIONES	62 dia	3 julio 2026 7	2 octubre 20	$ 210.655.964,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.1.12	SUPERMANZANA 16	162 d	4 febrero 202	2 octubre 20	$ 473.916.683,00	$ 212.542.451,45	$ 194.674.624,30	45%	41%	-4%	48%	58%	53%
1.1.12.1	FASE 1 - FACTIBILIDAD	41 dia	4 febrero 202	6 abril 2026 7	$ 105.304.281,00	$ 105.304.281,00	$ 105.304.281,00	100%	100%	0%	100%	100%	100%
1.1.12.2	FASE 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS	59 dia	7 abril 2026 9	3 julio 2026 7	$ 157.956.438,00	$ 107.238.170,45	$ 89.370.343,30	68%	57%	-11%	63%	48%	37%
1.1.12.3	FASE 3 - APROBACIONES	62 dia	3 julio 2026 7	2 octubre 20	$ 210.655.964,00	$ 0,00	$ 0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%

28. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE SST - AMBIENTAL

COMPONENTE SST	COMPONENTE AMBIENTAL
Se recibió respuesta alas observaciones del SG-SST V2 el día 27 de mayo con el comunicado CCH001-SDHT-1269-2025-289 Se envía respuesta al informe mensual 03 el día 28 de mi yo con el comunicado SDH-1330-2025-0261 Se envía respuesta al comunicado CCH001-SDHT-1269-2025-255 OBS ENTREGA DE SG-SST V2 el día 29 de mayo con el comunicado SDH-1330-2025-0265	Se recibió el plan de gestión de riesgos el día 27 de mayo con el comunicado CCH001-SDHT-1269-2025-288 Se recibió el avance del MAO ambiental el día 28 de mayo con el comunicado CCH001-SDHT-1269-2025-293 Se enviaron observaciones de la matriz de impacto el día 28 de mayo con el comunicado SDH-1330-2025-0260

29. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA COMPONENTE SOCIAL

OBJETO DEL CONTRATO	
"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA".	
TIPO DE DOCUMENTO	CONTRATO No Y NOMBRE
INFORME SEMANAL No 16	Consorcio Perseverar SDHT / 1330 DE 2025

CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES			PERIODO DE INFORME : INFORME SEMANAL No. 16 DEL 25 AL 31 DE MAYO DE 2026	
PROGRAMA	**ACTIVIDAD**	**FECHA**	**FECHA INICIAL Y FINAL DE LAS ACTIVIDADES**	**SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA**
PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA / PLAN DE SEGUIMIENTO	APROBADO	02/03/2026 20/04/2026	20/04/2026	Plan de gestión Social contratista: SDH-1330-2025-0056 del 02/03/2026 Plan de seguimiento y evaluación al Plan de gestión social llega comunicado de aprobación con numero de radicado 2-2026-23930 del 17 de abril del 2026
CARACTERIZACIÓN SOCIAL	El contratista presentó avance de la Caracterización social el 09 de marzo del año en curso, de acuerdo a lo establecido en el componente social EL contratista remite mediante oficio CCH-001-SDHT-1269-258 encuesta de caracterización para revisión y aprobación.	09/03/2026 07/05/2026	12/03/2026 07/05/2026	Se da aprobación al avance de Caracterización mediante oficio SDH-1330-2025-0086 del 12/03/2026. Se tiene estipulado como fecha límite de entrega el 22 de junio del 2026. Se realiza verificación del documento y encuesta, por lo que al remitir se verifica que sea el mismo para dar ella correspondiente aprobación por parte de la interventoría para su aplicación.
PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANIA	Se recibe correo electrónico del contratista con ajustes del acta del segundo comité mi Hábitat	26/05/2026	26/05/2026	se da aprobación al acta del segundo comité por parte de la interventoría y visto bueno de la entidad.
	Se realiza seguimiento al PAC	25/05/2026	25/05/2026	Se realiza verificación al PAC, donde se evidencia cumplimiento en las consideraciones contractuales de atención a la ciudadanía
	Se realiza seguimiento al PSI de circuito floresta sur	29/05/2026	29/05/2026	Se realiza seguimiento al PSI de circuito floresta sur, donde no se reportaron solicitudes de la comunidad
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Se programa reunión de Eco barrios para programación de actividad del 27 de mayo del 2026, en supermanzana 16- Parque los periodistas	26/05/2026	26/05/2026	Se realiza reunión con profesionales de la estrategia de eco barrios, entidad, contratista e interventoría.
SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Se recibe informe semanal N°15 por parte del contratista	26/05/2026	26/05/2026	Se da aprobación al informe semanal N 14 del contratista y se remite a la entidad para su visto bueno.
	Se asiste al comité técnico semanal N°17 de manera virtual con el acompañamiento de las especialidades del contratista, la entidad y la interventoría.	25/05/2026	25/05/2026	Se asistió al comité en donde se logra informar a las áreas sobre las actividades realizadas durante la semana anterior.
	Se recibe visto bueno mediante correo electrónico de la entidad del informe semanal 13 del contratista	27/05/2026	27/05/226	Se recibe visto bueno de la entidad mediante correo electrónico, al informe social semanal 13 del contratista
	Se recibe visto bueno mediante correo electrónico de la entidad del informe semanal 12 de la interventoría	27/05/2026	27/05/226	Se recibe visto bueno de la entidad mediante correo electrónico, al informe social semanal 12 de la interventoría

30. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE BIOSEGURIDAD

Teniendo en cuenta que a la fecha no se encuentra en ejecución el contrato de obra, no se ejecutan actividades referentes al componente de Bioseguridad diferentes a las medidas que se implementan dentro de las oficinas de la interventoría

DESCRIPCIÓN	No. DE CASOS
CASOS (+)	
EN AISLAMIENTO	

DESCRIPCIÓN	No. DE CASOS
CASOS (+)	
EN ALISTAMIENTO	

TOTAL PERSONAL OBRA ADMINISTRATIVO	
TOTAL PERSONAL OBRA - OPERATIVO	

TOTAL PERSONAL INTERVENTORÍA	

N/A

31. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE PMT

Se radico nuevamente el PMT del poligono de Supermanzana 16 y se realizo mesa de trabajo para revision de la metodologia presentada a la SDM

32. PERSONAL INTERVENTORÍA		33. PERSONAL DE OBRA		34. ESTADO DE EQUIPOS EN OBRA			35. ESTADO DEL TIEMPO		
CARGO	**CANT.**	**CARGO**	**CANT.**	**EQUIPO / MAQUINARÍA**	**CANT.**	**UBICACIÓN**	**DÍA**	**HORAS DE LLUVIA**	**ESTADO**
DIRECTOR INTERVENTORÍA	1	DIRECTOR CONSULTORÍA	1				LUNES		
ESP. DISEÑO ARQUITECTÓNICO	1	ESP. DISEÑO ARQUITECTÓNICO	1				MARTES		
ESP. EN PAISAJISMO	1	ESP. EN PAISAJISMO	1				MIÉRCOLES		
ESP. EN VÍAS	1	ESP. EN VÍAS	1				JUEVES		
ESP. EN TRANSITO Y MOVILIDAD	1	ESP. EN TRANSITO Y MOVILIDAD	1				VIERNES		
ESP. ELÉCTRICO	1	ESP. ELÉCTRICO	1				SÁBADO		
ESP. AMBIENTAL	1	ESP. AMBIENTAL	1				DOMINGO		
ING. FORESTAL	1	ING. FORESTAL	1						
ARQUEÓLOGO	1	ARQUEÓLOGO	1						
PROF. DE PRESUPUESTO	1	PROF. DE PRESUPUESTO	1						
PROF. SST	1	PROF. SST	1						
PROF. SOCIAL	1	PROF. SOCIAL	1						
ESP. EN URBANISMO	1	ESP. EN NORMATIVIDAD	1						
ING. SIG	1	ESP. DERECHO URBANO	1						
ESP. DERECHO URBANO	1	TEC. REGISTRO FOTOGRÁFICO	1						
ING. TOPOGRÁFICO	1	PROF. SOPORTE SI G	1						
		MODELADOR BIM (ARQ.)	1						
		MODELADOR BIM (ESTRC)	1						
		MODELADOR BIM (MEP)	1						
		COORDINADOR BIM	1						
		ING. TOPOGRÁFICO	1				**ESTADO**		
		CADENERO 2	1						
		VIGILANTE	1				**LLUVIOSO (L)**		
		AFORADOR PARA MOV. 1	1				**FAVORABLE (F)**		
		AFORADOR PARA MOV. 2	1				**SOLEADO (S)**		

TOTAL DE PERSONAL	**16**	**TOTAL DE PERSONAL**	**25**	**TOTAL DE MAQUINARIA / EQUIPO**	

36. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

FECHA DEL COMPROMISO	COMPROMISO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO

38. OBSERVACIONES
Se mantiene la observación por parte de la interventoría frente al posible riesgo de los tiempos del contrato, teniendo en cuenta la programación presentada por parte del Consultor y avalada por la Secretaria de Hábitat, amparados en los términos contractuales del contrato pero que a la evaluación de la interventoría podrá generar atrasos en el final de cada una de las etapas del proyecto.
39. RECOMENDACIONES
Se recomienda continuar con la metodología de la radicación de derechos de petición ante las entidades que no den respuesta oportuna para los requerimientos realizados.



DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA

Descripción: Taller con la comunidad	Descripción: Comité mi Hábitat supermanzana 16	Descripción: Comité mi Hábitat supermanzana 16
		
Descripción: Comité mi Hábitat - Circuito floresta sur	Descripción:	Descripción:
		
