INFORME INTERVENTORÍA No. 2



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000620 DE 2025

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

CONTRATO DE OBRA N. COP-2025-002 (22 DE ABRIL DEL 2025)

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

OBJETO: "ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, UNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ."

PERIODO DE EJECUCION

22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - 21 DE OCTUBRE DE 2025

Contenido

INTRODUCCIÓN 4
ANTECEDENTES DEL PROYECTO 5
- DESCRIPCION GENERAL 5
- LOCALIZACION 5
- ALCANCE 6
- ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA 6
- ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 7
- MODIFICACIONES EN EL TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES 7
- INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 8
- RELACIÓN DE PAGOS 9
- BALANCE DEL ANTICIPO 9
- MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO 9
- VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS 10
- SUPERVISORES E INTERVENTORES DELEGADOS AL CONTRATO 10
- INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 10

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA VERIFICACION DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES 15
- EQUIPOS DE OBRA 16
- MATERIALES DE OBRA 16
- REPORTE DE VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA OBJETO DE LA INTERVENTORIA 16
- BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO LO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO 18
- INFORME DE AVANCE DE EJECUCION FISICO, FINANCIERO Y CRONOLOGICO DEL PERIODO Y ACUMULADO 19

Componente y porcentaje de ejecución 19

CRONOLOGICO DEL PERIODO Y ACUMULADO 19
- CONDICIONES CLIMATICAS 21
- INFORME DE SEGUIMIENTO A: PLAN DE TRABAJO, ASPECTOS SISO, MANEJO AMBIENTAL, RELACIÓN Y ORGANIGRAMA DEL PERSONAL DE NÓMINA Y CONTRATADO 22

FICHAS AMBIENTALES DEL PROYECTO 22

Programas ambientales con presupuesto 22
- INFORMES TÉCNICOS DESARROLLADOS Y/O APROBADOS EN EL PERIODO 24
- MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS O MODIFICADAS 25
- RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS DENTRO DEL PERIODO 31
- RELACIONAR Y ADJUNTAR COPIAS DE ACTAS Y SOPORTES 35
- INFORME DEL ESTADO DEL TRAMITE DE LOS PERMISOS 35

➢ OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR 36
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 37
A. INFORMACION BASICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 37
B. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 37
C. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES 37
D. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 38
E. RELACIÓN DE PAGOS 38
F. BALANCE DEL ANTICIPO DE INTERVENTORIA 38
G. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO 38
H. VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS 38
I. SUPERVISORES E INTERVENTORES DELEGADOS AL CONTRATO 39
J. VERIFICACIÓN DE PERSONAL DE INTERVENTORIA 40
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO APORTES SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA 41
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 44
CONSORCIO SAN ANTONIO 2025CERTIFICADO DE CALIDAD DE OBRAS EJECUTADAS 44
CERTIFICADO DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO DE OBRA 46

INTRODUCCIÓN

En el presente documento se despliega el análisis constructivo la construcción de adecuación y canalización de aguas lluvias en la calle 4, entre cra 2 a la cra 6, del casco urbano de la inspección de san Antonio de Getucha, Municipio de Milán, departamento del Caquetá.". Cabe aclarar que el proyecto antes mencionado se ubica en la zona de urbana de PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MILAN

En cumplimiento con la alcaldía municipal de Milan Caquetá y el PDA Caquetá, en el siguiente informe se presenta la información correspondiente al desarrollo del **CONTRATO DE OBRA N. COP-2025-002 (22 DE ABRIL DEL 2025)** cuyo objeto es "ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, UNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.". Dicho informe es el resultado de la información recopilada en campo y oficina del periodo correspondiente y su veracidad corresponde a la misma.

	Número de Revisión
Elaboro:	Equipo de interventoría
Reviso:	Carlos Darío Cano Sánchez
Aprobó:	Carlos Darío Cano Sánchez

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

➢ DESCRIPCION GENERAL

Con el siguiente proyecto se proyecta construir sistema de alcantarillado pluvial que tendrá los siguientes componentes

La estructura del proyecto del proyecto es construir un alcantarillado pluvial en la inspección de San Antonio de Getucha

- PRELIMINARES
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
- POZOS DE INSPECCION
- CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROSY CABEZA DE SALIDA
- ASEO GENERAL

➢ LOCALIZACION

El lugar de ejecución del contrato de obra se ubica en la inspección de San Antonio de Getucha, Caquetá, en las coordenadas de ubicación 1°06´33.55¨ N – Longitud -75°24´03.96¨ O, con una altura 283, sobre la vía central de la inspección.



Ilustración 1- GOOGLEAERTH.COM

➢ ALCANCE

El proyecto tiene como alcance la construcción de una línea de alcantarillado pluvial de 415.77 ml, con 9 pozos de inspección, con un cabezal de descarga y 18 sumideros según actualizaciones de diseño.



➢ ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACIÓN BÁSICA

Unidad Ejecutora:	MUNICIPIO DE MILAN CAQUETA
Número del contrato:	**CONTRATO DE OBRA N.** COP- 2025-002
Objeto:	ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, UNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
Nombre del contratista:	CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
Fecha del contrato:	22 DE ABRIL DEL 2025
Plazo de Ejecución Inicial:	5 MESES
Valor Inicial:	NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

	($988.082.242,00) M/CTE, equivalentes a 694,7 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2025
Valor Anticipado:	El anticipo es del 30%, el contratista renuncio al anticipo
Fecha de iniciación:	22 DE AGOSTO DE 2025
Fecha de Terminación Contractual inicial:	21 DE ENERO DE 2025

➢ ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato actualmente se encuentra en ejecución, desde el 22 de agosto de 2025, hasta el 21 octubre de 2025.

➢ MODIFICACIONES EN EL TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

SUSPENSIÓN/ PRÓRROGA	MOTIVO	FECHA DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	PERIODO DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
ACTA DE MODIFICACIÓN No. 001 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-2025-002	**Renuncia al anticipo por parte del contratista**			**(22) días del mes de agosto de 2025.**
ACTA DE MODIFICACIÓN No. 002 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-2025-002	**Modificación de cantidades e item no previstos**			**veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2025.**

➢ INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE MILAN

PROYECTO: Adecuación y canalización de aguas lluvias en la calle 4, entre cra 2 a la cra 6, del casco urbano de la inspección de San Antonio de Getucha, en el municipio de Milán, Departamento del Caquetá

ANÁLISIS DE ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD

		813.27	35860.V

Costo directo estimado de obra en pesos	$	742.366.340	
Programas (capitación Gob ambiental y otros			
Tiempo estimado de ejecución obra en meses		5,00	
AIU valores de impuestos y pólizas		30,00%	

Costo total de Obras del Proyecto: $ 1.057.248.000

COSTOS DE PERSONAL

Personal Profesional	Cantidad de personal	Dedicación	Meses requeridos de labores	Salario mensual	Valor Total
Director de Obra	1	15%	5	$4.000.000,00	$3.000.000,00
Residente de Obra	1	100%	5	$2.800.000,00	$11.000.000,00
Funcionario Habilitado	1	40%	5	$2.500.000,00	$3.250.000,00
SISOMA	1	15%	5	$2.200.000,00	$1.650.000,00
COSTO TOTAL PERSONAL PROFESIONAL					$17.900.000,00

COSTOS VARIOS

Descripción	Cantidad	Unidad	Duración	Valor Unitario	Valor Parcial
GASTOS GENERALES					$ 3.700.845,00
Logística Previa					$ 2.344.000,00
Campamento					$ 2.344.000,00
Valla informativa obra	1,0	GL	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00
Acondicionamiento para campamento	1,0	MES	1	$ 344.000,00	$ 1.744.000,00
Gastos Generales					$ 1.356.845,00
SERVICIOS PUBLICOS					$ 450.845,00
Consumo Servicio Agua	1,0	MES	1	$ 50.000,00	$ 250.000,00
Consumo Servicio Enel	1,0	MES	1	$ 41.969,00	$ 209.845,00
Consumo Servicio Tel e Inter	1,0	MES	1		
Sistema Comunic. Cel	1,0	MES	1		
GASTOS VARIOS				$	$ 906.000,00
Gastos Gen. y Aseo	1,0	Mes	1	$ 80.000,00	$ 400.000,00
Papelería Interventoría	1,0	MES	1	$ 80.000,00	$ 400.000,00
Copias Planos -Fotos	1,0	GL	1	$ 20.000,00	$ 100.000,00

OTROS COSTOS

Descripción	Tasa Impuesto	Valor
Estampilla Pro adulto mayor	4,00%	$ 42.289.920,0
Estampilla Procultura	2,00%	$ 21.144.960,0
Estampilla Pro Universidad de la Amazonia	0,50%	$ 5.286.240,0
Estampilla pro Electrificación Rural	0,50%	$ 5.286.240,0
Estampilla prodeportes	0,50%	$ 5.286.240,0
Estampilla para la Justicia Familiar	2,00%	$ 21.144.960,0
Contribución Sobre Contratos de Obras	5,00%	$ 52.862.400,0
COSTO TOTAL DE IMPUESTOS		$153.380.968,00

COSTOS POLIZAS DE GARANTIA

Descripción	% Asegurado	Meses de Vigencia	Valor Base	Tasa de Aseguradora	Valor Póliza
Cumplimiento	10%	16,00	$1.057.248.000,00	0,10%	$1.057.248,00
Salarios y prestaciones sociales	5%	48,00	$1.057.248.000,00	0,07%	$740.073,60
Estabilidad de la obra	10%	60,00	$1.057.248.000,00	0,10%	$1.057.248,00
Responsabilidad civil extracontractual	400smmlv	60,00	$1.057.248.000,00	0,10%	$1.057.248,00
COSTO POLIZAS					$3.911.817,60

VALOR TOTAL ADMINISTRACION DE OBRA	$ 178.318.722,00	24,00%
VALOR TOTAL DE IMPREVISTOS	$ 14.850.727,00	2,00%
VALOR TOTAL DE UTILIDAD	$ 29.710.454,00	4,00%
VALOR TOTAL AIU DE OBRA	$ 222.895.903,00	30,00%

➢ RELACIÓN DE PAGOS

Acta No	Mes/ Año	Valor Facturado	Valor Total	Amortización Anticipo	Saldo Anticipo	Saldo Registro presup.
			$988.082.242,00			
Anticipo			$ 395.232.897			$ 988.082.242 NO FUE COBRADO
1			$ 646.148.872,20			Por pagar
TOTALES		$ -	$ -	$ -	$ -	$988.082.242

El cobro n. 1 se encuentra en tramite

ANEXO 1 COPIA ANEXO FINANCIERO DE OBRA

➢ BALANCE DEL ANTICIPO

El contrato tiene anticipo, el contratista no presenta plan de manejo del anticipo, El contratista renuncio al anticipo, entrego oficio manifestando esto, el oficio fue enviado el 19 de junio de 2025.

BALANCE			
PAGO	**VALOR DESEMBOLSO**	**AMORTIZADO**	**SALDO POR AMORTIZAR**
			N.A
TOTAL			**N. A**

➢ MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO

No se han realizado modificatorios y/o aclaratorios hasta el momento.

CONTRATO ADICIONAL No.	CLÁUSULA ACLARADA Y/O MODIFICADA
Aclaratorio o Modificatorio No. 1	**ACTA DE MODIFICACIÓN No. 001 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-2025-002**
Descripción	**Renuncia al anticipo por parte del contratista**
Aclaratorio o Modificatorio No. 2	**ACTA DE MODIFICACIÓN No. 002 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-2025-002**
Descripción	**1.1.** Modificar la Cláusula 5- Valor del **Contrato de Obra Nº COP-2025-002** del 22 de abril de 2025, **únicamente en el sentido de aplicar la discriminación efectuada en el numeral anterior de la presente acta**, conforme al balance de mayores y menores cantidades de obra e

	inclusión de ítems no previstos, que como consecuencia generan la afectación de algunos valores unitarios y totales; sin que aquello pueda entenderse como una afectación al valor total del contrato, que continúa siendo la suma de **NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($988.082.242,00) M/CTE,** equivalentes a 694,7 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2025.

➢ VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS

Las pólizas solicitadas en el contrato fueron expedidas por compañía ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO

- Pólizas n. 11-40—101077292
- pólizas 11-44-101253742

A continuación, se relaciona las pólizas entregadas por el contratista en cada momento contractual.

PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

Legalización Del Contrato De Obra

ANEXO 2 SEGUIMIENTOS A LAS GARANTIAS CONTRACTUALES DE OBRA

➢ SUPERVISORES E INTERVENTORES DELEGADOS AL CONTRATO

INTERVENTOR/SUPERVISOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	22 DE AGOSTO DE 2025	21 DE FEBERO DE 2025

➢ INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Revisión documental: Verificación de diseños, planos, estudios de suelos y especificaciones técnicas.

Gestión social y ambiental: Socialización del proyecto con la comunidad, señalización ambiental, gestión de permisos requeridos.

Se debió realizar dos simulaciones hidráulicas desde el acta de inicio, inicialmente se modificó el trazado para cambio del costado, se identificaron presencia de enramadas, pozos de extracción de aguas subterráneas para consumo domiciliario, andenes en concreto entre otras estructuras construidas por la comunidad. Se realizo una localización y replanteo, equivalente a un levantamiento topográfico en donde se ubicó el siguiente trazado



Se realizo con la simulación hidráulica, se realizó un prebalance de obra, que se origina como base el acta de modificación n.1, pero el día


Las actividades ejecutadas durante el primer mes del proyecto son las mencionadas a continuación:

"Reciba un cordial saludo por parte de la administración municipal y de la secretaria de planeación, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y con el fin de realizar seguimiento al contrato de referencia, me permito convocarlos cordialmente a participar en el Comité de Obra, que se llevará a cabo el día 06 de septiembre de 2025, a las 9:30 a.m., en la zona de intervención.


El propósito de la reunión será resolver dudas e inquietudes por parte de la comunidad, así como tratar aspectos técnicos, administrativos y contractuales que contribuyan al adecuado desarrollo del proyecto. Se solicita puntual asistencia y la de los equipos de trabajo; personal de obra, interventoría y demás actores pertinentes), con el fin de garantizar una revisión integral y oportuna de las actividades ejecutadas y programadas."

En donde básicamente se recibió el sentir de la comunidad sobre la preocupación y la oposición de la afectación de la carpeta asfáltica en la calle que inicia desde el parque principal hasta la institución educativa, obligando nuevamente a realizar una tercera simulación hidráulica y la generación de un

prebalance, teniendo como referencia los principios técnicos, financieros y sociales del proyecto, dando como resultado el nuevo trazado del proyecto.

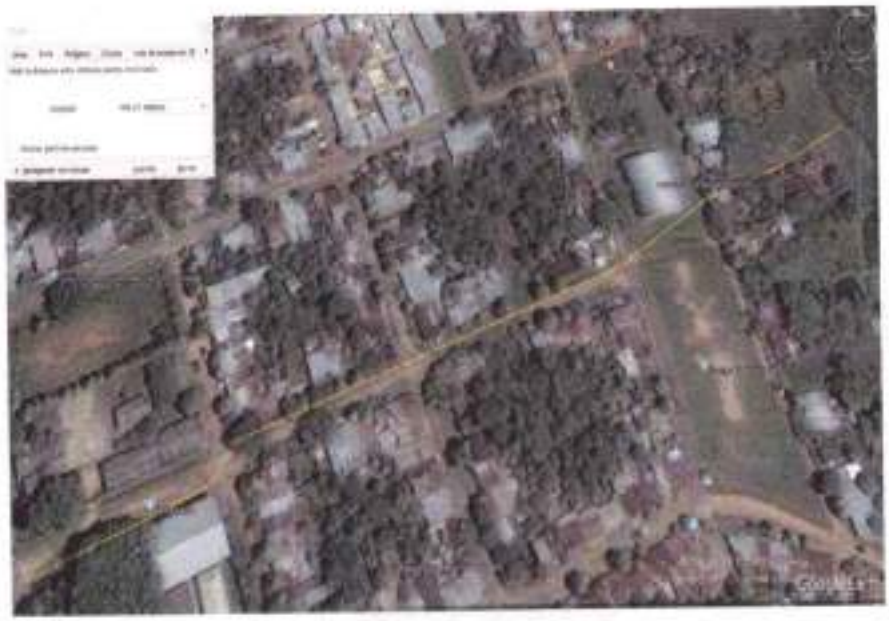

El diseño final se define basado en la protección de la carpeta asfáltica de la primera calle, El diseño final establece que la primera calle se ejecutará por la parte derecha, y a partir de ahí, el trazado se desviará en diagonal hacia la izquierda hasta su conclusión.

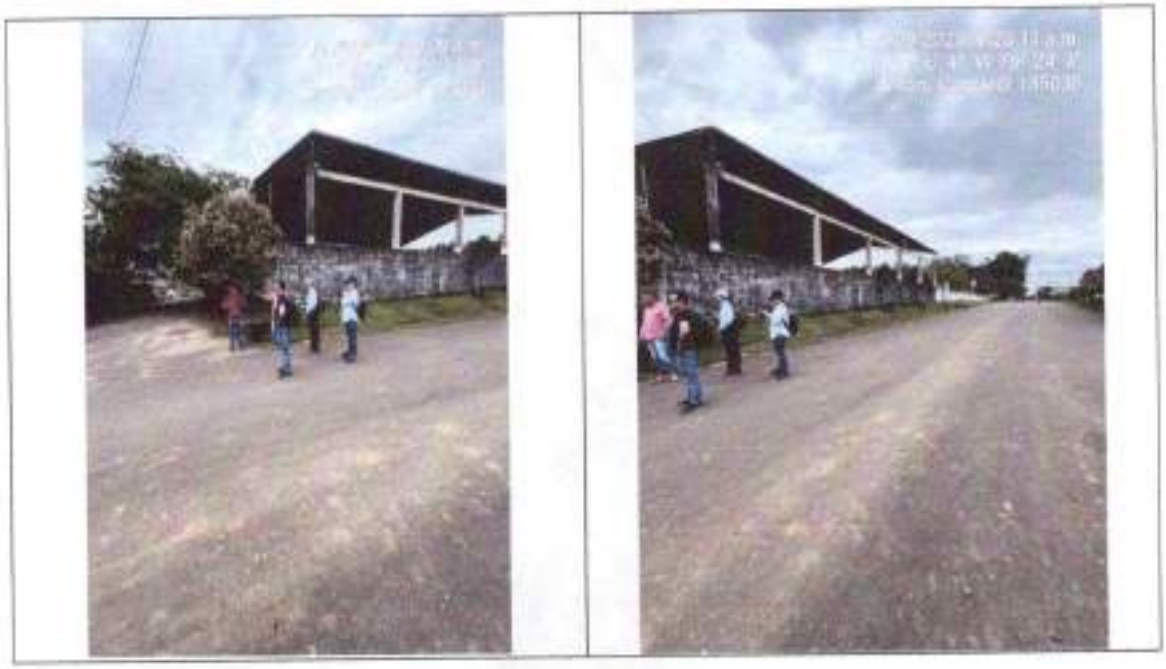

REPLANTEO

- Localización y replanteo topográfico inicial: Se realizó la demarcación del área de intervención y la nivelación preliminar.
- Replanteo de las redes manejo pluvial: Se marcó el trazado y se establecieron los ejes y niveles de referencia para guiar las actividades de excavación y construcción de obras civiles.
- Durante la construcción de las redes de alcantarillado se da acompañamiento con equipo topográfico indicando las pendientes de excavación y grados de nivelación de la tubería.



Localización y replanteo



Localización y replanteo

MOVIMIENTOS DE TIERRA


- Descapote y limpieza del terreno: Se ejecutó el desmonte y limpieza del área destinada a la celda, retirando vegetación superficial.
- Excavación mecánica general: Se inició la excavación del área para conformación del trazado de tubería
- Transporte de material: El material excedente fue acopiado en zonas autorizadas dentro del predio, conforme a especificaciones ambientales.
- Relleno con material seleccionado: una vez terminada la excavación mecánica se inició con el relleno para la instalación de tubería.
- Suministro e instalación de tubería PVC D=36"; NTC 5055 ASTM F 794
-

RESUMEN DE LA ACTIVIDADES DESARROLLADOS

Se han iniciado actividades de instalación de tubería las cuales tienen como base las siguientes actividades:

- Localización y replanteo de redes
- Cerramiento provisional lona verde (h=2,00m)
- Excavación manual en material común de 0.00 a 2.00 m
- Excavación manual en material común de 2.00 a 4.00 m
- Excavación mecánica en material común
- Entibado en madera para proteger talud de excavación
- Cargue, transporte y retiro de material sobrante
- "Relleno, Cimentación tubería con arena SP de acuerdo con la norma ASTM 2487
- Relleno con material seleccionado de la excavación
- Suministro e instalación de tubería PVC D=30"; NTC 5055 ASTM F 794
- Suministro e instalación de tubería PVC D=36"; NTC 5055 ASTM F 794

Actualmente se han iniciado actividades en los siguientes tramos

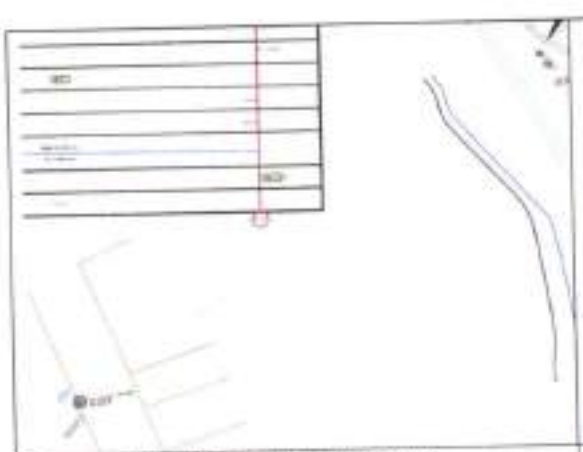


Tramos P8 – Cabezote de descarga




Tramos P7 – Tramo P8



Tramos P6 – Tramo P7

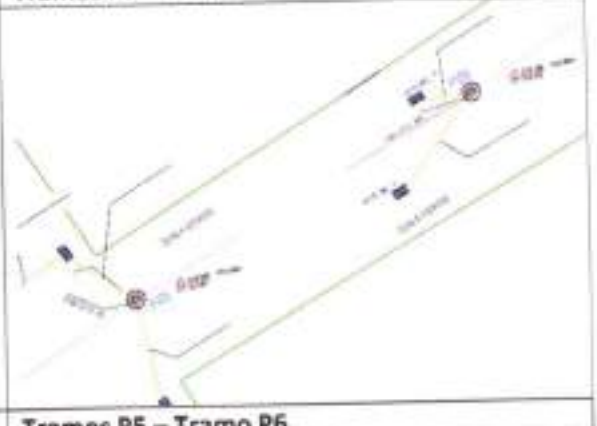


Tramos P5 – Tramo P6

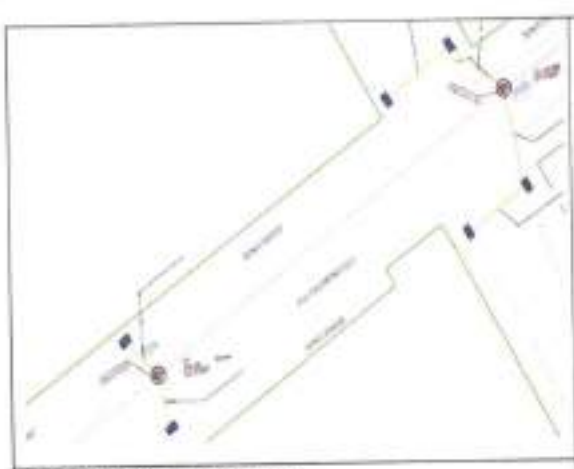

Tramos P4 – Tramo P5



Tramos P3 – Tramo P4

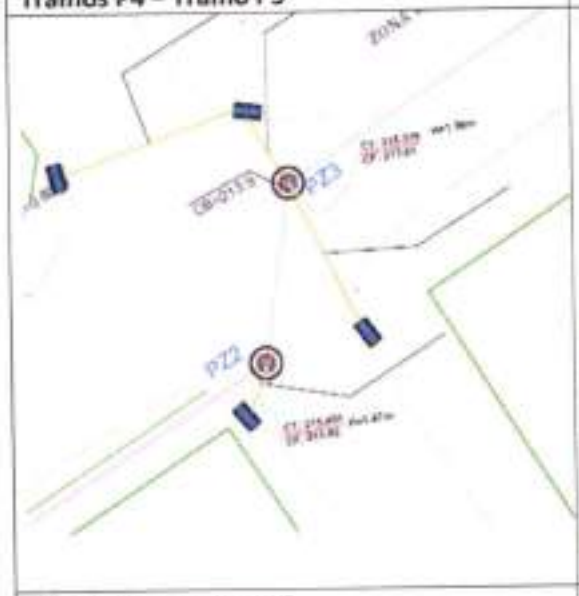

Tramos P2 – Tramo P3



Tramos P1– Tramo P2 con observación

Resumen de las tramos ejecutadas hasta el periodo transcurrido en el contrato

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA VERIFICACION DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES

- El contratista de obra hace entrega a la interventoría las hojas de vida debidamente certificadas y cumpliendo con los requisitos habilitantes en el proceso de selección, el personal de obra se compone de los siguientes cargos:
- En el periodo no se han presentado cambios o solicitudes de cambios de personal profesional.

- Se realiza la entrega de informes de obra
- Se realiza la entrega de informes de seguridad y salud en el trabajo
- Se realiza la entrega de informes PAPSO
- El contratista a cumplido con las especificaciones técnicas y de calidad que exige el contrato

➢ EQUIPOS DE OBRA

Las actividades desarrolladas por parte del contratista de obra fue la localización y replanteo de redes y ajustes al diseño original con base al resultado de la modelación.

EQUIPO	MARCA	MODELO
RETROEXCAVADORA	CAT	LLANTAS 420
VOLQUETA 1	CHEVROLET	6 M3
CANGURO	YAMAHA	

ANEXO 3 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO

➢ MATERIALES DE OBRA

El contratista tiene en bodega los siguientes materiales de obra.

ELEMENTO	UND	CANTIDAD
Suministro e instalación de tubería PVC D=450 mm; NTC 3722-3 S8	Und	2
Suministro e instalación de tubería PVC D=27"; NTC 5055 ASTM F 794	Und	10
Tubo PVC D=315mm; NTC 3722-3 S8	Und	23
Tubería PVC D=400mm; NTC 3722-3 S8	Und	12
ARENA	M3	6
TELA PROPIVIDA	ML	55
MADERA 5/5	UND	32
MADERA 5/10	UND	32
TABLA BURRA	UND	15
Bultos de cemento 50 kg	und	58

➢ REPORTE DE VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA OBJETO DE LA INTERVENTORIA

El contratista de obra presenta los soportes de pago de SS. A la fecha se encuentra pago de la totalidad planillas de seguridad social del personal mostrado en el anexo. propuesta según al A.I.U

El contratista de obra presento el soporte de pago de la planilla de seguridad social de *los siguientes meses:*

ANEXO 4 FORMATO DE CONTROL DE SS DEL CONTRATO DE OBRA

SEPTIEMBRE DE 2025

PERSONAL DE MANO DE OBRA CALIFICADA

Nombre	Cargo
Gustavo Adolfo Olarte Collazos	Director de obra
Diana Lorena Ramos Lozano	Profesional en salud ocupacional
Fernando Andrés Marín Cabrera	Residente de obra
Oscar Orlando Méndez Buitrago	Ingeniero hidráulico

PERSONAL DE OBRA EN GENERAL

Nombre	Cargo	No Dias mes (Base Liquidación)	C.C
GUSTAVO ADOLFO OLARTE COLLAZOS	DIRECTOR DE OBRA	30	17.650.594
FERNANDO ANDRES MARIN CABRERA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	30	1.117.512.681
OSCAR ORLANDO MENDEZ BUITRAGO	INGENIERO HIDRAULICO	30	1.130.744.004
DIANA LORENA RAMOS LOZANO	SISO-SST	30	40.782.364
ANCIZAR ORJUELA MANRIQUE	MAESTRO DE OBRA	30	17.658.583
NORBEY CORREA PLAZAS	AUXILIAR DE OBRA	30	6.801.673
ALEXANDER CARMONA RIOS	AUXILIAR DE OBRA	3	1.117.262.033
JHON AINER PEREZ PARRA	AUXILIAR DE OBRA	30	1.006.511.551
NORVEY CAMILO NIETO	AUXILIAR DE OBRA	30	83.091.770
FAIBER CARDONA PULIDO	AUXILIAR DE OBRA	30	1.117.234.725
ORLANDO CALDERON JIMENEZ	AUXILIAR DE OBRA	30	1.117.233.024
JUAN NARVAEZ	OPERADOR	5	1.080.934.116

Mese de la seguridad en donde soporta el pago el contratista de obra

Diciembre de 2023	ACREDITA	NO ACREDITA
Agosto de 2025	X	
Septiembre de 2025	X	
Octubre de 2025		No acredita – todavia no se vence la fecha de pago

➢ BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO LO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO

El contratista de obra entrega el flujograma de ejecución del periodo del presente informe n. 2, este se soporta con la preacta N.2, generada en compañía del contratista de obra en compañía de la interventoría.

ANEXO 5 CRONOGRAMA SEGÚN MODIFICATORIA 2



Seguimiento al cronograma de ejecucion

SEMANA	PROGRAMADO SEMANAL	EJECUTADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
SEMANA 1	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33
SEMANA 2	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33	$ 4.865.051,33	$ 2.797.892,67
SEMANA 3	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33	$ 7.297.577,00	$ 4.196.839,00
SEMANA 4	$ 51.167.237,90	$ 198.033.374,00	$ 58.464.814,90	$ 202.230.213,00
SEMANA 5	$ 51.167.237,90	$ 71.861.373,50	$ 109.632.052,79	$ 274.091.586,50
SEMANA 6	$ 58.508.557,90	$ 69.774.887,50	$ 168.140.610,69	$ 343.866.474,00
SEMANA 7	$ 58.508.557,90	$ 58.177.530,50	$ 226.649.168,58	$ 402.044.004,50
SEMANA 8	$ 18.865.814,40	$ 103.873.589,50	$ 245.514.982,98	$ 505.917.594,00
SEMANA 9	$ 33.638.801,15		$ 279.153.784,13	
SEMANA 10	$ 25.018.101,49		$ 304.171.885,62	
SEMANA 11	$ 33.638.801,15		$ 337.810.686,77	
SEMANA 12	$ 82.467.836,99		$ 420.278.523,76	
SEMANA 13	$ 106.348.747,78		$ 526.627.271,54	
SEMANA 14	$ 44.339.044,11		$ 570.966.315,65	
SEMANA 15	$ 49.769.396,78		$ 620.735.712,43	
SEMANA 16	$ 36.955.057,58		$ 657.690.770,01	

SEMANA 17	$	44.831.000,58	$	702.521.770,59
SEMANA 18	$	30.916.109,41	$	733.437.880,00
SEMANA 19	$	19.202.617,05	$	752.640.497,05
SEMANA 20	$	12.545.842,95	$	765.186.340,00


ANEXO 6 SEGUIMIENTO AL FLUJOGRAMA DE INVERSION

El contratista de obra lleva un avance ejecutado real del 66% frente al programado que es 32%, teniendo en cuenta la programación de obra. El contratista tiene un avance en la ejecución de obra del 34%.

➢ INFORME DE AVANCE DE EJECUCION FISICO, FINANCIERO Y CRONOLOGICO DEL PERIODO Y ACUMULADO

Componente y porcentaje de ejecución

CAPITULO	% EJECUTADO
1.0 PRELIMINARES	57%
2.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA	85%
3.0 POZOS DE INSPECCION	0%
4,0 CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROSY CABEZA DE SALIDA	0%
5,0 ASEO GENERAL	0%
6.0 ITEM NO PREVISTO	61%
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	27%

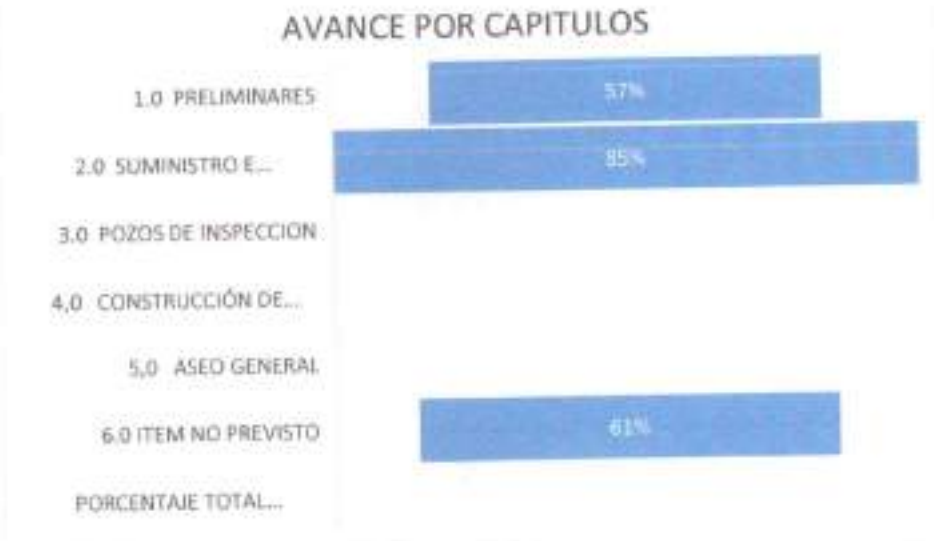

CRONOLOGICO DEL PERIODO Y ACUMULADO

INICIOS DE ACTIVIDAD	*INICIO*	*SUSPENSIÓN*	*DÍAS ACTIVO*
INICIO	22 de agosto de 2025		
agosto de 2025			10
Septiembre de 2025			30
Octubre de 2025			21
noviembre de 2025			
Diciembre de 2025			
Enero de 2026			

2025 *DIAS TRANSCURRIDOS*	61
% TOTAL DE AVANCE DE TIEMPO DEL CONTRATO	40%

Plazo de ejecución Inicial:	*Cinco (5) meses*
Plazo adicional 1:	*N.A*
Plazo adicional 1:	*N.A*
Tiempo en Días:	*150 días*
Plazo de ejecución final	*150 días*

En el siguiente cuadro se plasma los tiempos transcurridos a la fecha de corte del presente informe

- **AVANCE FINANCIERO**

Inversión Contratada:	*$ 988.082.243,00*
Inversión Básica del Contrato:	*$ 765.186.340,00*
Inversión Básica ejecutada en el periodo:	*$ 505.917.594,00*
Porcentaje ejecutado en el periodo:	***37.85%***
Inversión total ejecutada:	**$ 505.917.594,00**
Porcentaje total ejecutado:	***66.15%***
Porcentaje total por ejecutar, pendiente de la liquidación:	***33.78%***

➢ CONDICIONES CLIMATICAS

SEPTIEMBRE 2025

CLIMA	CANT	%
Seco	15	50,69%
Lluvias moderadas	12	42,41%
Lluvias intensas	2	6,90%
Total, días	29	100,00%



OCTUBRE 2025

CLIMA	CANT	%
Seco	17	78,81%
Lluvias moderadas	3,7	17,38%
Lluvias intensas	0,8	3,81%
Total dias	21	100,00%



ANEXO 7 FORMATO DE CONTROL DE LLUVIAS

Las condiciones climáticas en la región han sido favorables, se presentaron días con precipitaciones intensas en donde no se podían realizar trabajos al aire libre, el 80% del tiempo se presentaron diaas

soleados y esto favoreció el rendimiento de obra, el contratista lleva un rendimiento de obra superior al contratado.

- INFORME DE SEGUIMIENTO A: PLAN DE TRABAJO, ASPECTOS SISO, MANEJO AMBIENTAL, RELACIÓN Y ORGANIGRAMA DEL PERSONAL DE NÓMINA Y CONTRATADO

FICHAS AMBIENTALES DEL PROYECTO

N.	*Ficha Ambiental*	*Nombre del programa/ ficha ambiental*
1	FICHA N. 1	AFECTACION DEL PROYECTO SOBRE EL AREA DE INFLUENCIA
2	FICHA N. 2	MANEJO DE CAMPAMENTOS INSTALACIONES Y TEMPORALES
3	FICHA N. 3	MANEJO DEL RECURSO SUELO
4	FICHA N. 4	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS Y SOBRANTES DE OBRA
5	FICHA N. 5	MANEJO COMPONENTE ATMOSFERICO
6	FICHA N. 6	MANEJO DE FLORA Y FAUNA
7	FICHA N. 7	PROGRAMA COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Programas ambientales con presupuesto

INVERSION SOCIO – AMBIENTAL.				
ITEM	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**
GESTIÓN AMBIENTAL				
Manejo de Residuos Sólidos				
PUNTO ECOLOGICO EN EL AVANCE POR TRAMOS DE LA OBRA	un	1	$680.000	$680.000
Plástico negro calibre 4 ancho de 2 m	M2	400	$2.145	$858.000
Señalización vial				
Señales informativas según manual de señalización vial INICIO Y FIN DE OBRA	un	2	$240.000	$480.000
Señales preventivas según manual de señalización vial MAQUINARIA Y OBREROS	un	2	$240.000	$480.000

Auxiliar de Señalización y orientación de cierres viales e identificación en las áreas de los frentes de trabajo	Mes	5	$1.800.000	$9.000.000
Dispositivos para canalizar el tránsito				
Conos de 0,90	un	10	$97.500	$975.000
Maletín de señalización	Und	2	$750.000	$1.500.000
Abanderados				
Paleta de pare y siga*	un	1	$55.000	$55.000
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL				
Ubicación y dotación de campamentos				
Camilla de emergencias	un	1	$300.000	$300.000
Extintor ABC 10 LB (más dos recargas)	un	1	$180.000	$180.000
Botiquín cruz roja	un	1	$580.000	$580.000
Demarcación del área de trabajos				
Cinta Señalización Peligro	ml	600	$450	$525.000
RETIRO y disposición final				
Disposición final de demoliciones	M3	95.49	$65.000	$6.206.850
VALOR TOTAL INVERSION AMBIENTAL				**$22.200.000**

Fuente- Contratista de obra

El contratista de obra entrego los ajustes a las fichas de manejo ambiental y adicionalmente se realiza un ajuste del presupuesto de ejecución de este.

El contratista de obra entrega informe de cumplimiento ambiental

ANEXO 8 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

➢ INFORMES TÉCNICOS DESARROLLADOS Y/O APROBADOS EN EL PERIODO.

Semana	Periodo inicial	Periodo final	N. de informe
01	22/08/2025	28/09/2025	
02	29/08/2025	04/09/2025	
03	05/09/2025	11/09/2025	**1**
04	12/09/2025	18/09/2025	
05	19/09/2025	25/09/2025	
06	26/09/2025	2/10/2025	
07	3/10/2025	9/10/2025	**2**
08	10/10/2025	18/09/2025	

ANEXO 9 INFORMES SEMANALES

➢ MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS O MODIFICADAS

Se genero el **ACTA DE MODIFICACIÓN No. 002 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-2025-002, en donde se plasman y se legalizan los ajustes de las cantidades obra.**

ANEXO 10 ACTA DE MODIFICATORIA N.2

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRATO			VALORES MODIFICATORIOS PRESENTE ACTA			TOTAL CANTIDADES MODIFICADAS	
			CANTIDAD CONTRATO	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD TOTAL +/-	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
I	**1.0 PRELIMINARES**									
1,01	Localización y replanteo de redes	M2	897,25	$ 7.138,00	$ 6.404.571,00	-341,41		-$ 2.436.993,00	555,84	$ 3.967.577,00
1,02	Cerramiento provisional lona verde (h=2,00m)	ML	897,25	$ 15.149,00	$ 13.592.440,00	-23,89		-$ 361.910,00	873,36	$ 13.230.531,00
1,03	Excavación manual en material común de 0.00 a 2.00 m	M3	72,71	$ 52.702,00	$ 3.831.962,00	65,95		$ 3.475.627,00	138,66	$ 7.307.589,00
1,04	Excavación manual en material común de 2.00 a 4.00 m	M3	37,50	$ 69.015,00	$ 2.588.063,00	-27,33		-$ 1.886.478,00	10,17	$ 701.585,00
1,05	Excavación mecánica en material común	M3	1281,00	$ 21.868,00	$ 28.012.908,00	17,44		$ 381.414,00	1298,44	$ 28.394.322,00
1,06	Entibado en madera para proteger talud de excavación	M2	390,55	$ 60.322,00	$ 23.558.757,00	526,20		$ 31.741.277,00	916,75	$ 55.300.034,00

1,07	Cargue, transporte y retiro de material sobrante	M3	653,41	$ 53.566,00	$ 35.000.326,00	-244,59	-$ 13.101.733,00	408,82	$ 21.898.593,00
1,08	Relleno, Cimentación tubería con arena SP de acuerdo a la norma ASTM 2487	M3	104,29	$ 92.334,00	$ 9.629.513,00	-7,14	-$ 659.402,00	97,15	$ 8.970.111,00
1,09	Relleno con material seleccionado de la excavación	M3	736,13	$ 17.493,00	$ 12.877.122,00	519,87	$ 9.094.062,00	1256,00	$ 21.971.184,00
1,10	Suministro e instalación de sub_base granular tipo C, NT1	M3	183,70	$ 265.164,00	$ 48.710.627,00	-71,22	-$ 18.883.654,00	112,49	$ 29.826.973,00
1,11	Suministro e instalación de base granular tipo C, NT1	M3	63,30	$ 275.164,00	$ 17.417.881,00	-34,92	-$ 9.608.342,00	28,38	$ 7.809.540,00
1,12	Suministro e instalación de asfaltita natural, en áreas afectadas por la excavación	M2	177,46	$ 57.428,00	$ 10.191.173,00	40,78	$ 2.341.799,00	218,24	$ 12.532.972,00
				SUBTOTAL	**$ 211.815.343,00**		**$ 95.667,00**		**$ 211.911.011,00**
2	**2.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA**								
2,01	Suministro e instalación de tubería PVC D=315mm; NTC 3722-3 S8	ML	168,24	$ 143.318,00	$ 24.111.820,00	-15,21	-$ 2.179.867,00	153,03	$ 21.931.954,00

2,02	Suministro e instalación de tubería PVC D=400mm; NTC 3722-3 S8	ML	43,84	$ 288.623,00	$ 12.653.232,00	35,17	-	$ 10.150.871,00	79,01	$ 22.804.103,00
2,03	Suministro e instalación de tubería PVC D=450 mm; NTC 3722-3 S8	ML	82,02	$ 384.475,00	$ 31.534.640,00	-35,26	-	-$ 13.556.589,00	46,76	$ 17.978.051,00
2,04	Suministro e instalación de tubería PVC D=27"; NTC 5055 ASTM F 794	ML	160,27	$ 790.424,00	$ 126.681.254,00	3,67	-	$ 2.900.856,00	163,94	$ 129.582.111,00
2,05	Suministro e instalación de tubería PVC D=30"; NTC 5055 ASTM F 794	ML	51,96	$ 860.479,00	$ 44.710.489,00	-0,77	-	-$ 662.569,00	51,19	$ 44.047.920,00
2,06	Suministro e instalación de tubería PVC D=36"; NTC 5055 ASTM F 794	ML	77,68	$ 1.655.575,00	$ 128.605.066,00	18,10	-	$ 29.965.908,00	95,78	$ 158.570.974,00
				SUBTOTAL	**$ 368.296.501,00**			**$ 26.618.610,00**		**$ 394.915.113,00**
3	**3.0 POZOS DE INSPECCION**									
3,01	Pozos de inspección en concreto f´c= 24Mpa D=1.20 m y h<=2.00 m. incluye tapa	UN D.	6,00	$ 5.291.913,00	$ 31.751.478,00	-6,00	-	-$ 31.751.478,00	0,00	$ -
3,02	Pozos de inspección en concreto	UN D	3,00	$ 8.892.711,00	$ 26.678.133,00	-3,00	-	-$ 26.678.133,00	0,00	$ -

	f´c= 24Mpa D=1.20 m y 2.01>h<=4.00 mincluye tapa									
				SUBTOTAL	**$ 58.429.611,00**			**-$ 58.429.611,00**		**$ -**
4	**4,0 CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROSY CABEZA DE SALIDA**									
4,01	Construcción de cunetas transversales de vía, L=10.97m x 0.85 m, ancho útil de 0.45m, espesor de muros de 0.20m, y rejillas en platina de 2" x 3/8	UND	3,00	$ 15.491.870,00	$ 46.475.610,00	-3,00	-	-$ 46.475.610,00	0,00	$ -
4,02	Construcción de cunetas transversales de vía, L=9.32m x 0.85 m, ancho útil de 0.45m, espesor de muros de 0.20m, y rejillas en platina de 2" x 3/8	UND	1,00	$ 13.602.431,00	$ 13.602.431,00	-1,00	-	-$ 13.602.431,00	0,00	$ -
4,03	Construcción de sumidero de 1.64m x 0.88m, ancho útil de 0.58m x 1.34m, e=0.15m,	UND	9,00	$ 3.520.431,00	$ 31.683.879,00	-9,00	-	-$ 31.683.879,00	0,00	$ -

	rejilla platina de 2 x 3/8									
4,04	Construcción de sumidero de 1.64m x 0.98m, ancho útil de 0.68m x 1.34m, e=0.15m, rejilla platina de 2 x 3/8	UND	2,00	$ 3.759.731,00	$ 7.519.462,00	16,00	-	$ 60.155.696,00	18,00	$ 67.675.158,00
4,05	Construcción de cabezal de salida	UND	1,00	$ 4.154.529,00	$ 4.154.529,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 4.154.529,00
				SUBTOTAL	**$ 103.435.911,00**			**-$ 31.606.224,00**		**$ 71.829.687,00**
5	**5,0 ASEO GENERAL**									
5,01	Aseo general de Obra	UND	1,00	$ 1.008.974,00	$ 1.008.974,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 1.008.974,00
				SUBTOTAL	**$ 1.008.974,00**			**$ -**		**$ 1.008.974,00**
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**									
NP-1	Pozos de inspección en concreto f'c= 24Mpa D=1.50 m y h<=2.00 m. incluye tapa	UND			$ -	4,00	$ 6.148.564,00	$ 24.594.256,00	4,00	$ 24.594.256,00
NP-2	Pozos de inspección en concreto f'c= 24Mpa D=1.50 m y 2.01>h<=3.00 mincluye tapa	UND			$ -	3,00	$ 9.043.314,00	$ 27.129.942,00	3,00	$ 27.129.942,00
NP-3	Pozos de inspección en concreto f'c= 24Mpa D=1.60	UND			$ -	1,00	$ 11.597.357,00	$ 11.597.357,00	1,00	$ 11.597.357,00

m y 3.01>h<=4.00 mincluye tapa						
		SUBTOTAL	**$ -**	**$ 11.597.357,00**		**$ 63.321.555,00**
COSTO DIRECTO DE OBRA (A)			**$ 742.986.340,00**			**$ 742.986.340,00**
ADMINISTRACION	24 %		$ 178.316.722,00	ADMINISTRACION	24%	$ 178.316.722,00
IMPREVISTOS	2%		$ 14.859.727,00	IMPREVISTOS	2%	$ 14.859.727,00
UTILIDAD	4%		$ 29.719.454,00	UTILIDAD	4%	$ 29.719.454,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			$ 22.200.000,00	PLAN DE MANJO AMBIENTAL		$ 22.200.000,00
COSTO TOTAL DE OBRA			**$ 988.082.243,00**	**COSTO TOTAL DE LA OBRA MODIFICADO**		**$ 988.082.243,00**

PRE-ACTA N°1

ANEXO 11 COPIA DE LA PREACTA N. 2

➢ RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS DENTRO DEL PERIODO

A continuación, se relacionan las reuniones realizadas en comités de obra

COMITÉ	TEMA	COMPROMISOS
ACTA DE COMITÉ N.1	dar seguimiento a la ejecución del contrato de obra e interventoria desde la firma del acta de inicio el 22 de julio de 2025	Acta de concertación de precios. Acta del comité técnico donde se reflejan las modificaciones y demora en la elaboración del acta de modificación. Justificación técnica de obra para el acta modificatoria. Informe técnico de la interventoria que avale los cambios. APUs de los items no previstos. Acta modificatoria.
ACTA DE COMITÉ N.2	Comité de obra para el análisis del trazado actualizado ➢ Dudas e inquietudes por parte de la comunidad ➢ Aspectos técnicos ➢ Conclusión del comité.	Entregar Modelación hidráulica Entregar Diseño estructural Entregar el Prebalance de obra según las nuevas modificaciones Entregar item no previstos.
ACTA DE COMITÉ N.3	Socialización de justificación de imprevistos.	

ACTA DE COMITÉ N.4	Comité de obra para el análisis del trazado actualizado • Solicitudes de Obra • Cambio de diseños de las rejillas de sumideros por tapas prefabricadas • modificación del tramo P1-P2	• Entregar soporte hidráulico para poder estudiar la modificación del tramo PZ1 - PZ2 • Entregar el Prebalance de obra según las nuevas modificaciones • Entregar APU borrador ítem no previstos, sumideros de rejillas plásticas

ANEXO 12 COPIA DE ACTA DE COMITE DE OBRA 03 y 04

CORRESPONDENCIA ENVIADA

A continuación, se relacionan los oficios enviados y recibidos por parte del contratista

ITEM	FECHA	ENVIA	RECIBE	ASUNTO
1	22/09/2025	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	CONSORCIO SAN ANTONIO 2025	RECOMENDACIONES DE OBRA
2	25/09/2025	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	CONSORCIO SAN ANTONIO 2025	RECOMENDACIONES DE OBRA
3	27/09/2025	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	CAROLINA TAMAYO BUITRAGO SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA / GESTOR PDA GOBERNACION DEL CAQUETA	SEGUIMIENTO A COMPROMISOS MESA DE TRABAJO NO. 2 DE 15-09-2025
4	30/09/2025	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	CONSORCIO SAN ANTONIO 2025	RECOMENDACIONES DE OBRA
5	02/10/2025	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	CONSORCIO SAN ANTONIO 2025	SOLICITUD DE INFORMACION

6	09/10/2025	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	CAROLINA TAMAYO BUITRAGO SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA / GESTOR PDA GOBERNACION DEL CAQUETA	INFORME DE INTERVENTORIA No 1 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.° COP2025-002
7	09/10/2025	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	MUNICIPIO DE MILAN	Entrega informe de interventoria No 1

CORRESPONDENCIA RECIBIDAS

ITEM	FECHA	ENVIA	RECIBE	ASUNTO
1	23/09/2025	CONSORCIO SAN ANTONIO 2025	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	RESPUESTA OFICIO ASA 007
2	24/09/2025	CONSORCIO SAN ANTONIO 2025	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	RESPUESTA OFICIO ASA 008
3	26/09/2025	CAROLINA TAMAYO BUITRAGO SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA / GESTOR PDA GOBERNACION DEL CAQUETA	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	SEGUIMIENTO A COMPROMISOS MESA DE TRABAJO NO. 2 DE 15-09-2025
4	01/10/2025	CONSORCIO SAN ANTONIO 2025	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	RESPUESTA OFICIO ASA 009
5	03/10/2025	CONSORCIO SAN ANTONIO 2025	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	RESPUESTA OFICIO ASA 010
6	11/10/2025	CONSORCIO SAN ANTONIO 2025	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	RESPUESTA OFICIO ASA 011

ANEXO 13 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

➢ RELACIONAR Y ADJUNTAR COPIAS DE ACTAS Y SOPORTES

comité n.	fecha del comité	Entidades asistentes al comité
Comité n. 1	(06 de septiembre de 2025)	MUNICIPIO DE MILAN CAQUETA CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
Comité n. 2	(15 de septiembre de 2025)	APOYO TECNICO PDA CAQUETA MUNICIPIO DE MILAN CAQUETA CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
Comité n. 3	(18 de soctubre de 2025)	CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
Comité n. 4	(20 de octubre de 2025)	APOYO TECNICO PDA CAQUETA MUNICIPIO DE MILAN CAQUETA CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

➢ INFORME DEL ESTADO DEL TRAMITE DE LOS PERMISOS

Permisos ambientales o de obra

Tipo de permiso	Necesidad	Observación
Permiso de ocupación de cauce	N.A	
Concesión de aguas	N. A	
Permiso de vertimientos	N. A	
Título minero y/o Rucom de proveedores	N.A	El contratista entrego soporte de los proveedores de material pétreo
Disposición de material sobrante	N.A	El municipio no cuenta con ninguna escombrera certificada, se debe buscar un predio privado que certifique el recibo del material sobrante de obra. No se han iniciado labores constructivas
Permiso de servidumbre		Se cuenta con el permiso de servidumbre del predio privado intervenido.

➢ OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

- El contrato se viene desarrollando con normalidad, el avance es superior al programado, se han encontrado tuberías de alcantarillado sanitario que no habían sido registrado y esto ha obligado a realizar ajustes pequeños en las profundidades y retiros de tubería instalado, el noventa 82% de la tubería se encuentra

ANEXO 14 INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A. INFORMACION BASICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Unidad Ejecutora:	**GOBERNACION DEL CAQUETA V -PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS**
Número del contrato:	202500000620 DE 2025
Objeto:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.
Nombre del contratista:	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
Fecha del contrato:	
Plazo de Ejecución Inicial:	5 MESES
Valor Inicial:	SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($69.165.757,00) M/CTE
Valor Anticipado:	N.A
Fecha de iniciación:	22 DE AGOSTO DE 2025
Fecha de Terminación Contractual inicial:	22 DE ENERO DE 2026

B. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato actualmente se encuentra en ejecución, desde el 22 de agosto de 2025, hasta el 21 enero de 2026.

C. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

No se han realizado suspensiones o prorrogas al contrato de obra o interventoría.

D. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad de Recursos número 17357 de fecha 06 de noviembre de 2024, por valor de $69.165.757.00.

No de CDR	17357	**Fecha de expedición**	06 de noviembre de 2024		
Valor			$69.165.757.00		
Rubro	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		**Valor por rubro**	$69.165.757.00	

E. RELACIÓN DE PAGOS

Hasta el momento no se ha realizado ningún cobro por parte de la obra o interventoria.

CONCEPTO	PERIODO		VALOR	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	VALOR A PAGAR	SALDO
	DE	A				
VALOR DEL CONTRATO			$68.868.934			
Anticipo			N.a	N.a	N.a	N.a
COBRO N.1						

ANEXO 15 Formato financiero de la interventoria

F. BALANCE DEL ANTICIPO DE INTERVENTORIA

El contrato tiene no tiene anticipo

G. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO

No se han realizado modificatorios y/o aclaratorios hasta el momento.

CONTRATO ADICIONAL No.	CLÁUSULA ACLARADA Y/O MODIFICADA

H. VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS

Las pólizas solicitadas en el contrato fueron expedidas por compañía **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA SAS**

POLIZAS INICIALES DEL CONTRATO

AMPARO	% sobre Vlr. contrato	VIGENCIA SOLICITADA EN CONTRATO		Nº PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA PÓLIZA	
		DESDE	HASTA			INICIO	FIN
Cumplimiento	20%	22/04/2025	2/04/2026	560-47-994000189215 ANEXO 0	$ 13.773.786,80	22/04/2025	2/04/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y Prestaciones	10%	22/04/2025	22/10/2028	560-47-994000189215 ANEXO 0	$ 6.886.893,40	22/04/2025	22/10/2028
Calidad del servicio	20%	22/05/2025	22/09/2030	560-47-994000189215 ANEXO 0	$ 13.773.786,80	22/05/2025	22/09/2030

POLIZAS DEL ACTA INICIO

AMPARO	% sobre Vlr. contrato	VIGENCIA SOLICITADA EN CONTRATO		N.º PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA PÓLIZA	
		DESDE	HASTA			INICIO	FIN
Cumplimiento	20%	29/05/2025	9/05/2026	560-47-994000189215 ANEXO 1	$ 13.773.786,80	29/05/2025	9/05/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y Prestaciones	10%	29/05/2025	9/11/2028	560-47-994000189215 ANEXO 1	$ 6.886.893,40	29/05/2025	9/11/2028
Calidad del servicio	20%	28/10/2025	28/10/2030	560-47-994000189215 ANEXO 1	$ 13.773.786,80	28/10/2025	28/10/2030

A continuación, se relaciona las pólizas entregadas por el contratista en cada momento contractual.

ANEXO 16 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

I. SUPERVISORES E INTERVENTORES DELEGADOS AL CONTRATO

INTERVENTOR/SUPERVISOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - NIDIA CAROLINA	22 DE AGOSTO DE 2025	21 DE ENERO DE 2025

J. VERIFICACIÓN DE PERSONAL DE INTERVENTORIA

Nombre	Cargo	C.C.
FABIAN NARVAEZ CANO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	79.872.034
DAIRA LUCIA VALENZUELA PASTRANA	ASESOR AMBIENTAL	1.075.240.914
BRYAN ANDRES VALENCIA ROA	ASESOR CONTABLE	1.117.530.134
NADIA ALEJANDRA MURILLO ORTIZ	ASESOR JURIDICO	1.117.512.172
PAULA VANESSA OME SANCHEZ	ASESOR SOCIAL	1.117.525.037
JORGE ANDRES MONCADA SUAZA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	5.819.666

La interventoría hace entrega de las seguridades sociales de los siguientes meses:

Año	Mes	n. de planilla
2025	Agosto	9492583700-9492583913
2025	Septiembre	9493173202 - 9493173215
2025	Octubre	Pendiente

ANEXO 17 -FORMATO COPIA DEL FORMATO SE SEGUIMIENTO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y SOPORTE DE PAGO
ANEXO 18 – INFORME DE OBRA
ANEXO 19 – REGISTRO FOTOGRAFICO
ANEXO 20 – COPIA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA AMBIENTAL N.º 2
ANEXO 21 –INFORME SOCIAL DE OBRA N.º 2
ANEXO 22 – BITACORA DE OBRA

CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO APORTES SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA

Yo, CARLOS DARIO CANO SANCHEZ como Representante Legal del CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025, que a su cargo tiene la interventoría sobre el contrato de obra **Nº** OP-2025-002 del municipio de SAN MILAN CAQUETA

CERTIFICO:

Que la empresa CONSORCIO SAN ANTONIO 2025, como CONTRATISTA de las referidas obras, ha suministrado a la interventoría el pago de seguridad social de manera parcial:

Certificación expedida por el representante legal de la interventoría, que la empresa CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 se encuentra a paz y salvo con las obligaciones sobre el sistema de Seguridad Social, riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, del personal que está vinculado al proyecto, en el periodo comprendido entre el **22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - 21 DE OCTUBRE DE 2025**

Personal para presentar

Nombre	Cargo	No Dias mes (Base Liquidación)	C.C.
GUSTAVO ADOLFO OLARTE COLLAZOS	DIRECTOR DE OBRA	30	17.650.594
FERNANDO ANDRES MARIN CABRERA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	30	1.117.512.681
OSCAR ORLANDO MENDEZ BUITRAGO	INGENIERO HIDRAULICO	30	1.130.744.004
DIANA LORENA RAMOS LOZANO	SISO-SST	30	40.782.364
ANCIZAR ORJUELA MANRIQUE	MAESTRO DE OBRA	30	17.656.583
NORBEY CORREA PLAZAS	AUXILIAR DE OBRA	30	6.801.673
ALEXANDER CARMONA RIOS	AUXILIAR DE OBRA	3	1.117.262.033
JHON AINER PEREZ PARRA	AUXILIAR DE OBRA	30	1.006.511.551
NORVEY CAMILO NIETO	AUXILIAR DE OBRA	30	83.091.770
FAIBER CARDONA PULIDO	AUXILIAR DE OBRA	30	1.117.234.725
ORLANDO CALDERON JIMENEZ	AUXILIAR DE OBRA	30	1.117.233.024
JUAN NARVAEZ	OPERADOR	5	1.080.934.116

Mese de la seguridad en donde soporta el pago el contratista de obra

Diciembre de 2023	ACREDITA	NO ACREDITA
Agosto de 2025	X	Acredita de manera parcial

Septiembre de 2025	X	Acredita de manera parcial
Octubre 2025	x	Pendiente de pago

Para constancia se firma en el Municipio de Florencia a los treinta (30) días del mes de octubre de 2025

CARLOS DARÍO CANO SÁNCHEZ
CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

ANEXOS

ANEXO 1 COPIA ANEXO FINANCIERO DE OBRA 9
ANEXO 2 SEGUIMIENTOS A LAS GARANTIAS CONTRACTUALES DE OBRA 10
ANEXO 3 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO 16
ANEXO 4 FORMATO DE CONTROL DE SS DEL CONTRATO DE OBRA 17
ANEXO 5 CRONOGRAMA SEGÚN MODIFICATORIA 2 18
ANEXO 6 SEGUIMIENTO AL FLUJOGRAMA DE INVERSION 19
ANEXO 7 FORMATO DE CONTROL DE LLUVIAS 21
ANEXO 8 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 23
ANEXO 9 INFORMES SEMANALES 24
ANEXO 10 ACTA DE MODIFICATORIA N.2 25
ANEXO 11 COPIA DE LA PREACTA N. 2 31
ANEXO 12 COPIA DE ACTA DE COMITE DE OBRA 03 y 04 32
ANEXO 13 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 33
ANEXO 14 INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 35
ANEXO 15 Formato financiero de la interventoría 37
ANEXO 16 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 38
ANEXO 18 -FORMATO COPIA DEL FORMATO SE SEGUIMIENTO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y SOPORTE DE PAGO 39
ANEXO 17 - INFORME DE OBRA 39
ANEXO 18 – REGISTRO FOTOGRAFICO 39
ANEXO 19 – COPIA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA AMBIENTAL N.º 2 39
ANEXO 20 –INFORME SOCIAL DE OBRA N.º 2 39
ANEXO 21 – BITACORA DE OBRA 39

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

Yo, CARLOS DARIO CANO SANCHEZ como Representante Legal del CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025, que a su cargo tiene la interventoría sobre el contrato de obra Nº OP-2025-002 del municipio de SAN MILAN CAQUETA

CERTIFICO:

Que el CONSORCIO SAN ANTONIO 2025, como contratista de las referidas obras, ha realizado la socialización del proyecto según la siguiente relación:

- Socialización inicial en el municipio de Milán

Para constancia se firma en el Municipio de Florencia a los treinta (30) días del mes de octubre de 2025

CARLOS DARÍO CANO SÁNCHEZ
CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

CERTIFICADO DE CALIDAD DE OBRAS EJECUTADAS

Yo, CARLOS DARIO CANO SANCHEZ como Representante Legal del CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025, que a su cargo tiene la interventoría sobre el contrato de obra Nº OP-2025-002 del municipio de SAN MILAN CAQUETA **CERTIFICO:**

Que CONSORCIO SAN ANTONIO 2025, como contratista de las referidas obras, ha ejecutado actividades de obra en el periodo correspondiente entre en el periodo comprendido entre el periodo comprendido entre el **22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - 21 DE OCTUBRE DE 2025,** por lo tanto, ha sido necesario sustentarlas mediante (Corte de Obra).

Para constancia se firma en el Municipio de Florencia a los treinta (30) días del mes de octubre de 2025

CARLOS DARIO CANO SÁNCHEZ
CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

CERTIFICADO DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO DE OBRA

Yo, CARLOS DARIO CANO SANCHEZ como Representante Legal del CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025, que a su cargo tiene la interventoría sobre el contrato de obra Nº OP-2025-002 del municipio de SAN MILAN CAQUETA**CERTIFICO:**

- Que el CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 como contratista de las referidas obras, ha ejecutado actividades de obra en el periodo correspondiente en el periodo comprendido entre el periodo comprendido entre el **22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - 21 DE OCTUBRE DE 2025,** por lo tanto, se sustentan mediante PREACTA No. 2 (Corte de Obra) y se puede asegurar que se desarrollaron con arreglo a condiciones;
- Que CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 ha construido el campamento y/o adecuando instalaciones para almacenar los materiales, insumos en el periodo comprendido entre el **22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - 21 DE OCTUBRE DE 2025**, por lo tanto, se puede asegurar la existencia de estos y que están de acuerdo con las condiciones establecidas en las especificaciones del contrato y las aplicables al proyecto.
- Se tiene EVIDENCIA que la empresa CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 ha suministrado el equipo en el sitio de la obra en el periodo comprendido entre el **22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - 21 DE OCTUBRE DE 2025**, por lo tanto, se puede asegurar que son los mencionados por el contratista en la propuesta.

Para constancia se firma en el Municipio de Florencia a los treinta (30) días del mes de octubre de 2025



CARLOS DARÍO CANO SÁNCHEZ
CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

ANEXOS

ANEXO 1 COPIA ANEXO FINANCIERO DE OBRA

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA MUNICIPIO DE MILAN CAQUETA ANEXO INFORME FINANCIERO DE LA OBRA	CODIGO			
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

PERIODO

Inicio 22-sep-25 Fin 22-oct-25

UNIDAD EJECUTORA MUNICIPIO DE MILAN CAQUETA MUNICIPIO: MILAN

OBJETO ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, UNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

CONTRATO No CDP-2025-002

CONTRATISTA CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

INTERVENTORIA CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE OBRA

Acta No	Mes/ Año	Valor Facturado	Valor IVA	Valor Total	Amortización Anticipo	Saldo Anticipo	Saldo Registro presup.	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	Observaciones
				$988.082.242,00			$988.082.242,00			
Anticipo				$ 395.232.807						El contratista renuncio al anticipo, entrego oficio manifestando esto
1				$ 646.148.872,20			$ 646.148.872		$ 341.933.370	Pendiente de pago y revisión
TOTALES		$ -	$ -	$ 646.148.872	$ -	$ -	$ 341.933.370	$ -	$ 341.933.370	

Firma

Nombre CARLOS DARIO CANO SANCHEZ

Representante Legal CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

ANEXO 2 SEGUIMIENTOS A LAS GARANTIAS CONTRACTUALES DE OBRA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE GETUCHA
ANEXO 8
SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CÓDIGO	
VERSIÓN	1

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE GETUCHA
CONTRATO No.: N.° COP-2025-002
PERIODO — Inicio: 22-ago-25 — Fin: 21-ene-26
OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

PLAZOS CONTRACTUALES

PLAZOS		FECHAS	
Plazo inicial para ejecución del contrato	5 MESES	Inicio del contrato	22-ene-25
		Inicio de actividades	22-ago-25
Plazo ejecución contrato actualizado	153 días	Terminación inicial contractual	22-ago-25
Plazo ejecutado	30 días	Terminación final contractual	21-ene-26
Plazo faltante por ejecutar	123 días		

SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIONES EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Nº Susp.	Nº Prórroga	Inicio susp. o prórroga	Reinicio de actividades	Plazo	Estado	Fecha de radicación
			Total aprobados:	0 d		N.A
Observaciones:			Sin novedades			

PRORROGAS DE PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Nº de Adición	Plazo	Estado	Fecha de radicación	Fecha de aprobación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Total aprobados:	0 d			N.A
Sin novedades				

CONTROL DE LA INVERSION

Valor inicial del contrato de OBRA	$	998.982.242
Valor inicial del contrato de CONSULTORÍA	$	68.168.767
Valor TOTAL INICIAL del contrato (consultoría + obra)		$ 1.067.247.008,64

ADICIONES

No	Estado	Fecha de radicación	Fecha de aprobación	VALOR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
			Total adiciones aprobadas:	$ 0,00
VALOR CONTRATO CON ADICIONES APROBADAS				$ 1.067.247.008,64

VALORES GENERALES DEL ANTICIPO

Porcentaje del anticipo		
Valor del anticipo	$	-

PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

AMPARO	% sobre Vlr. contrato	VIGENCIA SOLICITADA EN CONTRATO		Nº PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA PÓLIZA		COMENTARIOS
		DESDE	HASTA			INICIO	FIN	
Cumplimiento	20%	22/04/2025	22/03/2026	11-44-101253742 ANEXO 0	$ 167.615.448,40	22/04/2025	22/03/2026	
Anticipo	40%	22/04/2025	22/03/2026	11-44-101253742 ANEXO 0	$ 399.232.896,80	22/04/2025	22/03/2026	
Salarios y Prestaciones	5%	22/04/2025	22/09/2028	11-44-101253742 ANEXO 0	$ 49.404.112,10	22/04/2025	22/09/2028	
Estabilidad y Calidad de Obra	20%	22/09/2025	22/09/2030	11-44-101253742 ANEXO 0	$ 167.615.448,40	22/09/2025	22/09/2030	
Responsabilidad Civil		22/04/2025	22/09/2025	11-80-101077282 ANEXO 0	$ 427.050.000,00	22/04/2025	22/09/2025	
Todo Riesgo								
Calidad de la Obra								
Calidad de la Consultoría								

PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA ACTA DE INICIO

AMPARO	% sobre Vlr. contrato	VIGENCIA SOLICITADA EN CONTRATO		Nº PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA PÓLIZA		COMENTARIOS
		DESDE	HASTA			INICIO	FIN	
Cumplimiento	20%	22/08/2025	22/07/2026	11-44-101253742 ANEXO 2	$ 167.615.448,40	22/08/2025	22/07/2026	
Anticipo	40%	22/08/2025	22/07/2026	11-44-101253742 ANEXO 2	$ 399.232.896,80	22/08/2025	22/07/2026	
Salarios y Prestaciones	5%	22/08/2025	22/01/2029	11-44-101253742 ANEXO 2	$ 49.404.112,10	22/08/2025	22/01/2029	
Estabilidad y Calidad de Obra	20%	22/01/2026	22/01/2031	11-44-101253742 ANEXO 2	$ 167.615.448,40	22/01/2026	22/01/2031	
Responsabilidad Civil		22/08/2025	22/01/2029	11-80-101077282 ANEXO 2	$ 427.050.000,00	22/08/2025	22/01/2029	
Todo Riesgo								
Calidad de la Obra								
Calidad de la Consultoría								

PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA RENUNCIA ANTICIPO

AMPARO	% sobre Vlr. contrato	VIGENCIA SOLICITADA EN CONTRATO		Nº PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA PÓLIZA		COMENTARIOS
		DESDE	HASTA			INICIO	FIN	
Cumplimiento	20%	22/08/2025	22/07/2026	11-44-101253742 ANEXO 3	$ 167.615.448,40	22/08/2025	22/07/2026	
Anticipo								
Salarios y Prestaciones	5%	22/08/2025	22/01/2029	11-44-101253742 ANEXO 3	$ 49.404.112,10	22/08/2025	22/01/2029	
Estabilidad y Calidad de Obra	20%	22/01/2026	22/01/2031	11-44-101253742 ANEXO 3	$ 167.615.448,40	22/01/2026	22/01/2031	
Responsabilidad Civil		22/08/2025	22/01/2029	11-80-101077282 ANEXO 3	$ 427.050.000,00	22/08/2025	22/01/2029	
Todo Riesgo								
Calidad de la Obra								
Calidad de la Consultoría								

Firma:
Nombre: CARLOS DARIO SANCHEZ
Representante Legal de Interventoría
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

ANEXO 3 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE MILAN CAQUETA
ANEXO 2A CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE LA OBRA

CÓDIGO	FDA	
VERSIÓN	1	
PAGINA	1	DE

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

UNIDAD EJECUTORA: MILAN CAQUETA
CONTRATO No.: COP-2025-002
INTERVENTORIA: CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

PERIODO — Inicio: 22-sep-25 Fin: 21-c

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE OBRA

				SEPTIEMBRE														OCTUBRE														
				LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR
MAQUINA	MARCA	MODELO	CAPACIDAD	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RETROEXCAVADORA	CAT	420F		A	A		A	A	A		A	A		A	A	A		A	A		A	A	A		A	A		A	A	A		A	A
VOLQUETA 1	CHEVROLETE		6 TON		A						A	A			A				A			A			A					A		A
CANGURO	YAMAHA			A	A		A	A	A		A			A	A	A		A	A		A	A	A		A	A		A	A	A		A	A

CONVENCIONES

ACTIVO = A
REPARACION = R
INACTIVO = I

Firma
Nombre: CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
Representante Legal de Interventoria

ANEXO 4 FORMATO DE CONTROL DE SS DEL CONTRATO DE OBRA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE MILAN CAQUETA
ANEXO 6 CONTROL SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES OBRA

CODIGO	
VERSION	1
PAGINA	1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA : **MUNICIPIO DE MILAN CAQUETA** MUNICIPIO: **MILAN CAQUETA**

OBJETO **"ADECUACIÓN Y CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCION DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"**

CONTRATO No: CONTRATO DE OBRA N. COP-2025-008 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

PERIODO: Del 01 de septiembre a 31 de septiembre 2025

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Nombre	Cargo	Periodo laborado		No Dias mes (Base Liquidación)	C.C.	1 LUN	2 MAR	3 MIE	4 JUE	5 VIE	6 SAB	7 DOM	8 LUN	9 MAR	10 MIE	11 JUE	12 VIE	13 SAB	14 DOM	15 LUN	16 MAR	17 MIE	18 JUE	19 VIE	20 SAB	21 DOM	22 LUN	23 MAR	24 MIE	25 JUE	26 VIE	27 SAB	28 DOM	29 LUN	30 MAR	Planilla	No. dias cotizados
		INICIO	FIN																																	
GUSTAVO ADOLFO OLARTE COLLAZOS	DIRECTOR DE OBRA	22/09/2025		30	17.650.594	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34419460-34893261	30
FERNANDO ANDRES MARIN CABRERA	RESIDENTE DE INTERV	22/09/2025		30	1.117.512.661	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34893204	30
OSCAR ORLANDO MENDEZ BUITRAGO	INGENIERO HIDRAULIC	22/09/2025		30	1.130.744.004	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34893393-34893261	30
DIANA LORENA RAMOS LOZANO	SISO-SST	22/09/2025		30	40.782.394	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9492198161-34893261	30
ANCIZAR ORJUELA MANRIQUE	MAESTRO DE OBRA	26/09/2025		30	17.656.683	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34859619	30
NORBEY CORREA PLAZAS	AUXILIAR DE OBRA	26/09/2025		30	6.661.673	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34859619	30
ALEXANDER CARMONA RIOS	AUXILIAR DE OBRA	26/09/2025		3	1.117.282.033	1	1	1																											34859619	3
JHON AMER PEREZ PARRA	AUXILIAR DE OBRA	26/09/2025		30	1.006.511.551	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34859619	30
NORVEY GAMBLO NIETO	AUXILIAR DE OBRA	26/09/2025		30	83.091.770	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34859619	30
FABER CARDONA PULIDO	AUXILIAR DE OBRA	26/09/2025		30	1.117.234.725	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34859619	30
ORLANDO CALDERON JIMENEZ	AUXILIAR DE OBRA	26/09/2025		30	1.117.223.024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34859619	30
JUAN NARVAEZ	OPERADOR	26/09/2025		5	1.080.934.116																											1	1	1	9460043553	5
						11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	11	11	11		

ELABORÓ

Firma _____
Nombre CARLOS DARIO CANO
Representante Legal de Interventoría
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7110	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
76-1	CL 14 12 15 PISO 3 OFICINA 305 CENTRO		[illegible]		CAMBIOSR1POSEMPRESARIAL@SURA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-09	34860081	Y	2025-10-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	297.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (FIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	34860081	2025-10-02	Pagada							

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUC. DEP	DIRECCION		TELEFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pagada							

EMPLEADO					ADV/FONDOS					DIAS				PENSION				SALUD				CCF			PRESTACIONES		TARIFA	AFP/AFC	RIESGO	IBC	IBC	IBC	IBC	IBC					
N	DP	EMPLEADO	SALARIO	APORTANTE DE SALARIO	[illegible]																																		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																																		

RESUMEN PLANILLA PAGADA


DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUC. DEP	DIRECCION		TELEFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGO	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	368.000	0	0	0	368.000
PROTECCION	20201	800229739	6	1	368.000	0	0	0	368.000
EPS(Administradoras: 1)				1	92.000	0	0	0	92.000
SANITAS	EPS005	830251449	6	1	92.000	0	0	0	92.000
ARP(Administradoras: 1)				1	580.500	0	0	0	580.500
ARL SURA	14-11	860811760	5	1	103.100	0	0	0	103.100
CCF(Administradores: 1)				1	92.000	0	0	0	92.000
COMFACA	CCF13	891100047	2	1	92.000	0	0	0	92.000
Gran Total					712.100	0	0	0	712.100

PLANILLA NRO. 38415469 Tipo I 2025 09

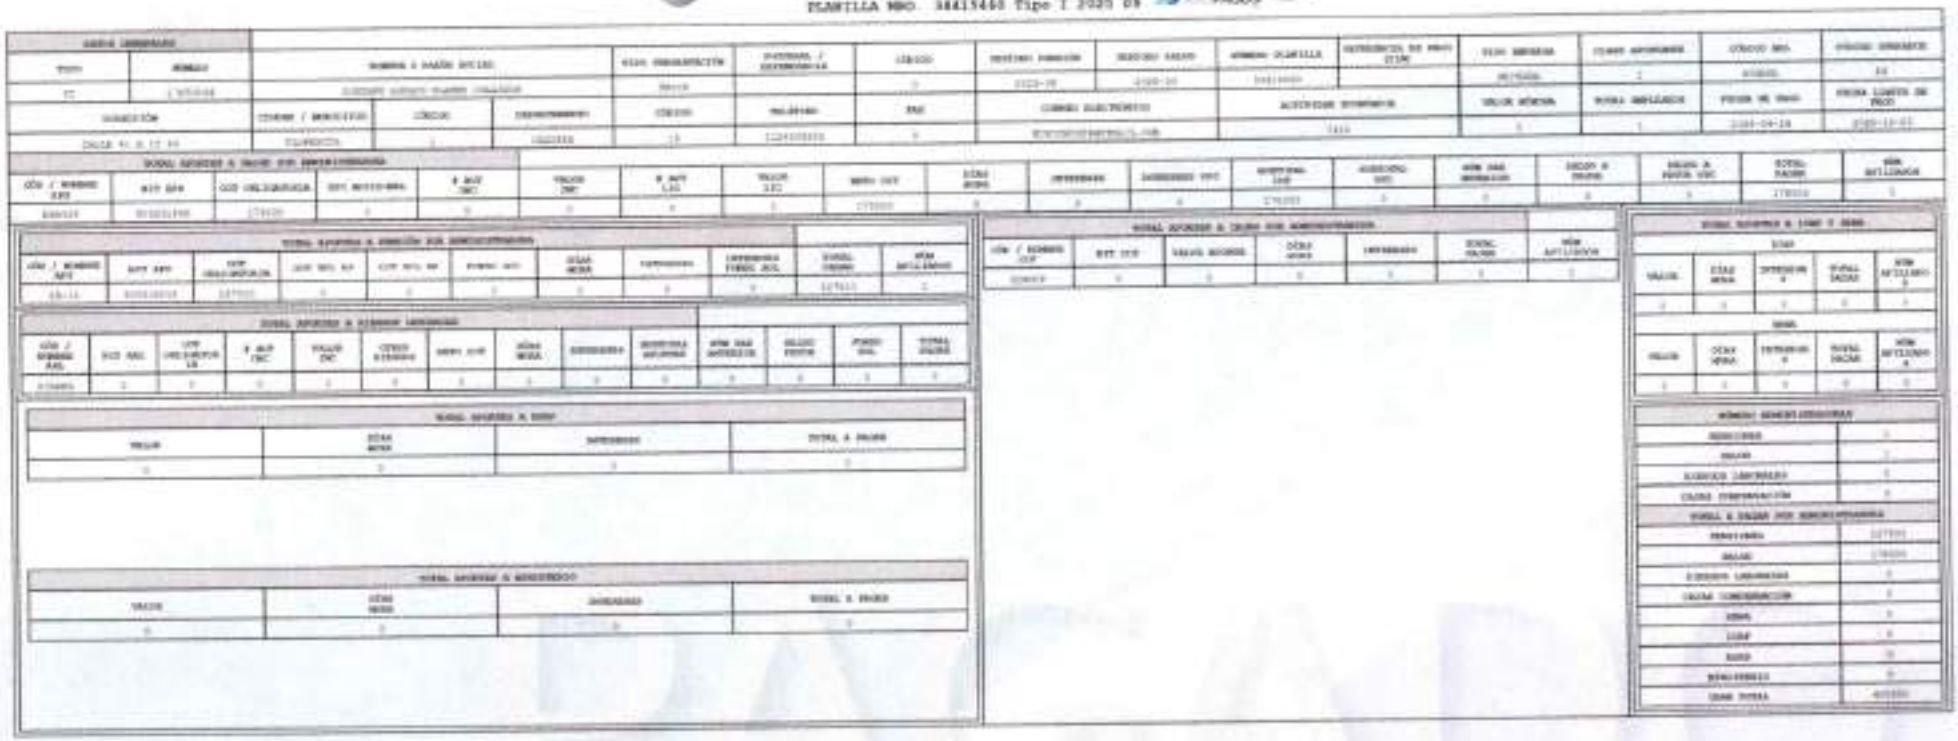

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS S.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUCURSAL	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO CENSADO	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº PLANILLA ASO	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pagada							

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO.	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUNICIPIO	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	[illegible]	[illegible]	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	FEC. DE PAGO (PILA)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				7	1.389.600	0	0	0	1.389.600
PORVENIR	230301	800224808	8	4	706.800	0	0	0	706.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	227.800	0	0	0	227.800
PROTECCION	230201	800229739	0	1	227.800	0	0	0	227.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 3)				7	347.700	0	0	0	347.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	800130907	2	3	119.700	0	0	0	119.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.000	0	0	0	57.000
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	3	171.000	0	0	0	171.000
ARP(Administradoras: 1)				7	604.700	0	0	0	604.700
ARL SURA	14-11	860511730	5	7	604.700	0	0	0	604.700
CCF(Administradoras: 1)				7	347.700	0	0	0	347.700
COMFACA	CCF15	891150847	2	7	347.700	0	0	0	347.700
Gran Total					2.689.700	0	0	0	2.689.700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	de	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40781364		RAMOS LUZARO OSAVA LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 15 # 2 -61	FLORENCIA-CAQUETA	4375459	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	179166780	94921965651	E	2025/10/06	2025/09/23	BANCOLOMBIA	0	$495,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	40781364	RAMOS OSAVA	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-13	30	$1,600,000	$39,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$39,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$0	$0	$39,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-13	860,011,153	6	1	$39,000	$0	$0	$39,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				1	$495,000	$0	$0	$495,000

2025/09/23 09:08 AM

PLANILLA NRO. 54419480 Tipo I 2025 09 MI PAGOS

DATOS EMPRESARIO														
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	NATURAL / JURÍDICA	CÓDIGO	PERÍODO ABONADO	FECHA DE PAGO	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (BNA)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ART	CÓDIGO CONVENIO
CT	[illegible]	[illegible]	Normal		1	2025-09	2025-09	54419480		[illegible]	0	838888	99

UBICACIÓN	DOMICILIO / NOMENCLADOR	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR MÓVIL	TOTAL FACTURACIÓN	FECHA DE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
[illegible]	[illegible]	1	CAPITAL	18	[illegible]	0	[illegible]	7412	0	0	2025-09-24	2025-09-25

TOTAL APORTES A CARGO POR ADMINISTRADORA

CÓD. / NOMBRE ADM	REM IMP	CNT CONTRIBUTIVA	CNT ASISTENCIAL	R ADI (SAC)	VALOR (SAC)	R ADI (SAC)	VALOR (SIJP)	BASE (SIJ)	DÍAS (SIJ)	INTERESES	INTERESES CNT	PORCENTUAL (SIJP)	PORCENTUAL (SNU)	MÁX NAC APORTACIÓN	SALDO A FAVOR	VALOR A FAVOR CNT	TOTAL PAGAR	MÁX APORTANTES
0-14	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	[illegible]	0	0	0	[illegible]	0	0	0	0	[illegible]	1

TOTAL APORTES A CARGO POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCP	REM CCP	VALOR APORTE	DÍAS (SIJP)	INTERESES	TOTAL PAGAR	MÁX APORTANTES
[illegible]	0	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES A SINDICATOS

CÓD / NOMBRE SIN	REM SIN	CUIT OBLIGATORIA	R ADI (SAC)	VALOR (SAC)	CUOTA SINDICAL	APORTE (SIJP)	DÍAS (SIJP)	INTERESES	PORCENTUAL APORTES	MÁX NAC APORTACIÓN	SALDO A FAVOR	TOTAL PAGAR	MÁX APORTANTES
941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES A RENATEA

VALOR	DÍAS (SIJP)	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A RENATRE

VALOR	DÍAS (SIJP)	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A SIJP Y SNU

SIJP

VALOR	DÍAS (SIJP)	INTERESES	TOTAL PAGAR	MÁX APORTANTES
0	0	0	0	0

SNU

VALOR	DÍAS (SNU)	INTERESES	TOTAL PAGAR	MÁX APORTANTES
0	0	0	0	0

RÉGIMEN AGROPECUARIO	
TRABAJADORES	0
SALARIO	0
APORTES SOLIDARIOS	0
VALOR CONTRIBUCIÓN	0
TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PRESTACIONES	[illegible]
SALARIO	[illegible]
APORTES SOLIDARIOS	0
VALOR CONTRIBUCIÓN	0
SNUA	0
SIJP	0
RENATEA	0
RENATRE	0
GRAN TOTAL	[illegible]

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901424439	8	RENTACAT ZOMAC SAS	5 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 11 4a SUR 430	FLORENCIA-CAQUETA	3155555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	93555582197	94938407011	E	2025/10/06	2025/10/07	BANCO DAVIVIENDA	1	$6,719,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerados SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (13 Afiliados)																									
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)						$4,901,300	$784,600			$4,901,300	$196,200			$4,901,300	$196,200			$4,901,300		$245,700		$0	$0		$1,382,700
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (2 Afiliados)						$4,901,300	$784,600			$4,901,300	$196,200			$4,901,300	$196,200			$4,901,300		$245,700		$0	$0		$1,382,700
1	CC	9085944	NIEVA ALVARO	25-14	30	$1,460,000	$336,400	EPS009	30	$1,460,000	$139,200	CCF10	30	$1,460,000	$139,200	14-22	30	$1,460,000	0.522%	$18,300	30	$0	$0	SI	$833,400
2	CC	93870472?1	VALLEJOS ARYELA	23010 1	30	$1,421,300	$327,600	EPS037	30	$1,421,300	$37,000	CCF11	30	$1,421,300	$37,000	14-03	30	$1,421,300	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (11 Afiliados)						$14,377,350	$2,300,800			$14,377,350	$575,700			$13,870,040	$610,400			$14,377,350		$1,007,800		$0	$0		$4,312,900
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (11 Afiliados)						$14,377,350	$2,300,800			$14,377,350	$575,700			$13,870,040	$610,400			$14,377,350		$1,007,800		$0	$0		$4,312,900
3	CC	9118471107	CANO JOHAN	23010 1	30	$1,421,300	$327,600	EPS009	30	$1,421,300	$37,000	CCF11	30	$1,319,140	$85,200	14-22	30	$1,421,300	0.960%	$95,100	30	$0	$0	SI	$469,100
4	CC	9818233?1	CARDERO EDILBERTO	23010 1	30	$1,421,300	$327,600	EPS037	30	$1,421,300	$37,000	CCF11	30	$1,421,300	$37,000	14-22	30	$1,421,300	0.960%	$95,100	30	$0	$0	SI	$440,900
5	CC	36183?10	CASTILLO, JAIRO	23-14	30	$1,421,300	$327,600	EPS037	30	$1,421,300	$37,000	CCF11	30	$1,421,300	$37,000	14-22	30	$1,421,300	0.960%	$95,100	30	$0	$0	SI	$440,900
6	CC	96035986	CHAMBOCUE JUAN	23-14	30	$1,421,300	$327,600	EPS037	30	$1,421,300	$37,000	CCF11	30	$1,421,300	$37,000	14-22	30	$1,421,300	0.960%	$95,100	30	$0	$0	SI	$440,900
7	CC	9975219?27	GARCIA JAMES	23010 1	30	$1,421,300	$327,600	EPS037	30	$1,421,300	$37,000	CCF11	30	$1,421,300	$37,000	14-22	30	$1,421,300	0.960%	$95,100	30	$0	$0	SI	$440,900
8	CC	9389?24?10	NARVAEZ JUAN	23010 1	30	$1,421,300	$327,600	EPS037	30	$1,421,300	$37,000	CCF11	30	$1,421,300	$37,000	14-22	30	$1,421,300	0.960%	$95,100	30	$0	$0	SI	$440,900
9	CC	37580113	ORTIZ OSCAR	23010 1	30	$1,421,300	$327,600	EPS037	30	$1,421,300	$37,000	CCF11	30	$1,421,300	$37,000	14-22	30	$1,421,300	0.960%	$95,100	30	$0	$0	SI	$440,900
10	CC	96343881	POLO HECTOR	23010 1	3	$142,330	$21,800	EPS037	3	$142,330	$3,700	CCF11	3	$804,230	$37,300	14-22	3	$142,330	0.960%	$10,200	3	$0	$0	SI	$75,700
11	CC	96145516	SANCHEZ ALEJANDRO	23010 1	30	$1,421,300	$327,600	EPS009	30	$1,421,300	$37,000	CCF11	30	$1,421,300	$37,000	14-22	30	$1,421,300	0.960%	$95,100	30	$0	$0	SI	$440,900
12	CC	96021?76	SILVA ROMULO	23010 1	30	$1,421,300	$327,600	EPS037	30	$1,421,300	$37,000	CCF11	30	$1,421,300	$37,000	14-22	30	$1,421,300	0.960%	$95,100	30	$0	$0	SI	$440,900
13	CC	7986367467	VILLAMIZAR JORGE	23010 1	30	$1,421,300	$327,600	EPS037	30	$1,421,300	$37,000	CCF11	30	$1,421,300	$37,000	14-22	30	$1,421,300	0.960%	$95,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total		**Afiliados(13)**				$19,280,650	$3,085,400			$19,280,650	$771,900			$18,771,340	$810,600			$19,280,650		$1,253,500		$0	$0		$5,719,600

2025/10/07 03:10 PM

aportes en línea

Planill[illegible]esumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Cromerade SENA e ICBF
NIT 901436420	8	RENTACAT COMAC SAS	9 - MENOS DE 200 TRABAJADORES	PRINCIPAL	CARRERA 11 4a SUR 420	FLORENCIA-CAQUETA	3155555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1035556297	94930455S3	E	2025/10/06	2025/10/07	BANCO DAVIVIENDA	1	$5,719,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$3,085,400	$2,100	$0	$3,087,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$455,600	$300	$0	$455,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,012,400	$700	$0	$1,013,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,161,800	$800	$0	$1,162,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$300	$0	$455,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,026,700	$700	$0	$1,027,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	13	$1,026,700	$700	$0	$1,027,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$831,600	$600	$0	$832,200
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	13	$831,600	$600	$0	$832,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				13	$771,900	$600	$0	$772,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$518,700	$400	$0	$519,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$253,200	$200	$0	$253,400
TOTAL				13	$5,715,600	$4,000	$0	$5,719,600

2025/10/07 03:10 PM

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	OSCAR MENDEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1130744004
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-03
FECHA DE PAGO:	2025-10-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34893363
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34893363
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 4.000.000	$ 0	$ 0	$ 400	$ 500.000	$ 500.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 4.000.000	$ 0	$ 0	$ 400	$ 640.000	$ 640.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 4.000.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 20.900	$ 21.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 900	$ 1.160.900	$ 1.161.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/11/2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE MILAN CAQUETA
ANEXO 6 CONTROL SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES OBRA

CODIGO	
VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE MILAN CAQUETA
OBJETO: "ADECUACION Y CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCION DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"
CONTRATO No: CONTRATO DE OBRA N. COP-2025-003
MUNICIPIO: MILAN CAQUETA
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

PERIODO:
Del 01 de agosto a 31 de agosto 2025

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Nombre	Cargo	Periodo laborado		No Días mes (Base Liquidación)	C.C.	1 VIE	2 SAB	3 DOM	4 LUN	5 MAR	6 MIÉ	7 JUE	8 VIE	9 SAB	10 DOM	11 LUN	12 MAR	13 MIÉ	14 JUE	15 VIE	16 SAB	17 DOM	18 LUN	19 MAR	20 MIÉ	21 JUE	22 VIE	23 SAB	24 DOM	25 LUN	26 MAR	27 MIÉ	28 JUE	29 VIE	30 SAB	Planilla	No. días cotizados
		INICIO	FIN																																	
GUSTAVO ADOLFO OLARTE COLLAZOS	DIRECTOR DE OBRA	22/08/2025		16	17.650.594															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34803495-34067051	16
FERNANDO ANDRES MARIN CARRERA	RESIDENTE DE INTERV	22/08/2025		16	1.117.512.681															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34803422	16
OSCAR ORLANDO MENDEZ BUITRAGO	INGENIERO HIDRAULIC	22/08/2025		16	1.130.744.004															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34803495-34246725	16
DIANA LORENA RAMOS LOZANO	SISO-SST	22/08/2025		16	40.782.364															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34803495-94907456[illegible]	16
ANCIZAR ORJUELA MANRIQUE	MAESTRO DE OBRA	26/08/2025		5	17.656.583																											1	1	1	1	1	34803422	5
NORBEY CORREA PLAZAS	AUXILIAR DE OBRA	26/08/2025		5	6.801.673																											1	1	1	1	1	34803422	5
ALEXANDER CARMONA RIOS	AUXILIAR DE OBRA	26/08/2025		5	1.117.262.033																											1	1	1	1	1	34803422	5
JHON ABNER PEREZ PARRA	AUXILIAR DE OBRA	26/08/2025		5	1.006.911.551																											1	1	1	1	1	34803422	5
NORVEY CAMILO NIETO	AUXILIAR DE OBRA	26/08/2025		5	83.061.770																											1	1	1	1	1	34803422	5
FAIBER CARDONA PULIDO	AUXILIAR DE OBRA	26/08/2025		5	1.117.734.725																											1	1	1	1	1	34803422	5
ORLANDO CALDERON JIMENEZ	AUXILIAR DE OBRA	26/08/2025		5	1.117.233.134																											1	1	1	1	1	34803422	5
JUAN NARVAEZ	OPERADOR	26/08/2025		5	1.080.934.116																											1	1	1	1	1	94[illegible]	5
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	11	11	11		

ELABORÓ

Firma
Nombre CARLOS ORTIZ CANO
Representante Legal de Interventoría
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

PLANILLA NRO. 34367651 Tipo I 2025 08 PAGOS

DATOS GENERALES																	
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	FECHA DESDE	FECHA HASTA	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (CBU)	FECHA GENERACIÓN	CLAVE ACTUALIZADA	CÓDIGO ARCA	CÓDIGO ACTIVIDAD
CUIT	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	PROVINCIA	CÓDIGO POSTAL		TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		TOTAL REMUNERADOS	TOTAL NO REMUNERADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTAL APORTES A CAJAS NO ADMINISTRADORAS

COD / NOMBRE CAJA	REM IMP	CONTRIB DIF	APORTE VOL	CONTRIB VOL	REM IMP 4	ADIC SOS	APORTE SOLID	CONTRIB SOLID	REM IMP 5	ADIC SOLID	APORTE SUSS	CONTRIB SUSS	REM IMP 6	APORTE FAECYS	CONTRIB FAECYS	REM IMP 7	APORTE OBRA SOCIAL	CONTRIB OBRA SOCIAL	REM IMP 8	ADIC OBRA SOCIAL	APORTE RAM	CONTRIB RAM	REM IMP 9	APORTE OSPLAD	CONTRIB OSPLAD	TOTAL CAJAS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTAL APORTES A CAJAS NO ADMINISTRADORAS

COD / NOMBRE CCE	REM CCE	TOTAL APORTE	CÓDIGO ACTIVIDAD	CONTRIBUCIÓN	TOTAL CAJAS	REM ADICIONAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTAL APORTES A CUSPP Y CRES

CUSPP				
TOTAL	CÓDIGO ACTIVIDAD	CONTRIBUCIÓN	TOTAL CUSPP	REM AFILIADO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CRES				
TOTAL	CÓDIGO ACTIVIDAD	CONTRIBUCIÓN	TOTAL CRES	REM AFILIADO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTAL APORTES A CAJAS NO ADMINISTRADORAS

COD / NOMBRE CAJA	REM IMP	APORTE	CÓDIGO ACTIVIDAD	CONTRIBUCIÓN	TOTAL CAJAS	REM AFILIADO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTAL APORTES A OBRAS SOCIALES

COD / NOMBRE OBRA SOCIAL	REM IMP	CANT GRUPO FAMILIAR	APORTE ADICIONAL	CONTRIBUCIÓN ADICIONAL	REM IMP 2	APORTE OBRA SOCIAL	CONTRIBUCIÓN OBRA SOCIAL	APORTES ADICIONALES	REM IMP 3	APORTE RAM	CONTRIBUCIÓN RAM	TOTAL OBRAS SOCIALES
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTAL APORTES A RENATEA

APORTE	CÓDIGO ACTIVIDAD	CONTRIBUCIÓN	TOTAL A PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTAL APORTES A SEGUROS

APORTE	CÓDIGO ACTIVIDAD	CONTRIBUCIÓN	TOTAL A PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NOMINA CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS	
VIÁTICOS	[illegible]
SALAS	[illegible]
HORAS LABORALES	[illegible]
CLASE CONMEMORATIVA	[illegible]
TOTAL A PAGAR POR CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS	
VIÁTICOS	[illegible]
SALAS	[illegible]
HORAS LABORALES	[illegible]
CLASE CONMEMORATIVA	[illegible]
CUSPP	[illegible]
CRES	[illegible]
FAECYS	[illegible]
SUSS	[illegible]
GRAN TOTAL	[illegible]

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40783364		RAMOS LOZANO DIANA LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 25 # 2-43	FLORENCIA-CAQUETA	4375459	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1724294667	94937416258	I	2025/09/15	2025/08/25	BANCOLOMBIA	0	$495,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	40783364	RAMOS DIANA	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,600,000	$39,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,600,000**	**$256,000**			**$1,600,000**	**$200,000**			**$0**	**$0**			**$1,600,000**	**$39,000**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$0	$0	$39,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$39,000	$0	$0	$39,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				1	$495,000	$0	$0	$495,000

2025/08/25 04:40 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901428429	0	RENTALCAT ZOMAC SAS	6 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 11 4a SUR 400	FLORENCIA-CAQUETA	3165555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1768035862	5489178758	E	2025/09/04	2025/09/11	BANCO BANCOLOMBIA	7	$6,094,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (14 Afiliados)						$20,609,456	$1,236,000			$20,609,456	$825,900			$20,611,427	$825,200			$20,609,456		$1,719,200		$0	$0		$6,607,300
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)						$4,901,500	$294,600			$4,901,500	$196,200			$4,901,500	$196,200			$4,901,500		$25,700		$0	$0		$1,303,700
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (2 Afiliados)						$4,901,500	$294,600			$4,901,500	$196,200			$4,901,500	$196,200			$4,901,500		$25,700		$0	$0		$1,303,700
1	CC	80450846	SILVA ALVARO	25-14	30	$3,480,000	$208,800	CPS025	30	$3,480,000	$139,200	CCF13	30	$3,480,000	$139,200	14-23	30	$3,480,000	0.522%	$18,200	30	$0	$0	SI	$803,400
2	CC	1067947291	VALLEJOS MARTIN	23030 1	30	$1,421,500	$227,800	CPS037	30	$1,421,500	$57,000	CCF13	30	$1,421,500	$57,000	14-23	30	$1,421,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (12 Afiliados)						$15,705,956	$2,513,400			$15,705,956	$628,900			$15,707,927	$629,000			$15,705,956		$1,693,500		$0	$0		$4,864,800
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (12 Afiliados)						$15,705,956	$2,513,400			$15,705,956	$628,900			$15,707,927	$629,000			$15,705,956		$1,693,500		$0	$0		$4,864,800
3	CC	1118473137	CANO JONAH	23030 1	30	$1,421,500	$227,800	CPS050	30	$1,421,500	$57,000	CCF13	30	$1,421,500	$57,000	14-23	30	$1,421,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	CC	9134226H	CURREROS DELGADO	23030 1	30	$1,421,500	$227,800	CPS037	30	$1,421,500	$57,000	CCF13	30	$1,421,500	$57,000	14-23	30	$1,421,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
5	CC	9139748	CURREROS JAIRO	25-14	30	$1,421,500	$227,800	CPS037	30	$1,421,500	$57,000	CCF13	30	$1,421,500	$57,000	14-23	30	$1,421,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
6	CC	9125398H	CHAMOCUE JUAN	25-14	30	$1,421,500	$227,800	CPS037	30	$1,421,500	$57,000	CCF13	30	$1,421,500	$57,000	14-23	30	$1,421,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
7	CC	1075217137	GARCIA JAMES	23030 1	30	$1,421,500	$227,800	CPS037	30	$1,421,500	$57,000	CCF13	30	$1,421,500	$57,000	14-23	30	$1,421,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
8	CC	1006459292	MEDICO JULIAN	23030 1	1	$47,450	$7,600	CPS037	1	$47,450	$1,900	CCF13	1	$49,427	$2,000	14-23	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	SI	$14,900
9	CC	1088034116	MARINEZ JUAN	23030 1	30	$1,421,500	$227,800	CPS037	30	$1,421,500	$57,000	CCF13	30	$1,421,500	$57,000	14-23	30	$1,421,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
10	CC	1144883151	YEPEZ OSCAR	23030 1	30	$1,421,500	$227,800	CPS037	30	$1,421,500	$57,000	CCF13	30	$1,421,500	$57,000	14-23	30	$1,421,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
11	CC	96343861	POLO HECTOR	23030 1	30	$1,421,500	$227,800	CPS037	30	$1,421,500	$57,000	CCF13	30	$1,421,500	$57,000	14-23	30	$1,421,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
12	CC	96140516	SANCHEZ ALEXANDER	23030 1	30	$1,421,500	$227,800	CPS037	30	$1,421,500	$57,000	CCF13	30	$1,421,500	$57,000	14-23	30	$1,421,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
13	CC	6802316	SILVA RONALD	23030 1	30	$1,421,500	$227,800	CPS037	30	$1,421,500	$57,000	CCF13	30	$1,421,500	$57,000	14-23	30	$1,421,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
14	CC	1080361467	VILLAMIZAL JORGE	23030 1	30	$1,421,500	$227,800	CPS037	30	$1,421,500	$57,000	CCF13	30	$1,421,500	$57,000	14-23	30	$1,421,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total		Afiliados(14)				$20,609,456	$1,236,000			$20,609,456	$825,900			$20,611,427	$825,200			$20,609,456		$1,719,200		$0	$0		$6,607,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901436420	8	RENTACAT ZOMAC SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 11 4a SUR 439	FLORENCIA-CAQUETA	3155555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1769033862	5495678758	E	2025/09/04	2025/09/11	BANCO DAVIVIENDA	7	$6,094,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$3,298,000	$14,800	$0	$3,312,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$455,600	$2,100	$0	$457,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,012,400	$4,500	$0	$1,016,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,374,400	$6,100	$0	$1,380,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$2,100	$0	$457,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,119,200	$5,000	$0	$1,124,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	14	$1,119,200	$5,000	$0	$1,124,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$825,200	$3,700	$0	$828,900
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	14	$825,200	$3,700	$0	$828,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				14	$825,100	$3,800	$0	$828,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$571,900	$2,600	$0	$574,500
SANITAS	EPS005	830,251,440	6	3	$253,200	$1,200	$0	$254,400
TOTAL				14	$6,067,500	$27,100	$0	$6,094,800

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	OSCAR MENDEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1130744004
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-03
FECHA DE PAGO:	2025-09-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34249725
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34249725
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	830251640	SANITAS	1	$ 4.600.000	$ 0	$ 0	$ 400	$ 920.000	$ 920.400
25-14	800235084	COLPENSIONES	1	$ 4.200.000	$ 0	$ 0	$ 500	$ 840.000	$ 840.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 4.600.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 20.600	$ 21.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 1.180.600	$ 1.181.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 02/10/2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[redacted]	3	[redacted]	R	0	ARL SURA - 14-11	WEB	7112	Aportes
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			DIENTES DE PARAFISCALES
08-1	CL 14 12 15 PISO 3 OFICINA 306 CENTRO		3205162758		CAMBIOSRUPOEMPRESARIAL@GMAIL.COM			X

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-09	54661422	E	2025-09-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	$80.000	1.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PSE)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	33853972	2025-09-02	Pagado							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN				
Nº	ID	EMPLEADO	SALARIO	DEVENGADO DO SALARIO	INC T	INC EG	LIC MAT	LIC PAT	VAC	VAC L	LIC NR	LIC R	SUS	AUS	RET	TDE	TAE	IGE	LMA	ERAT	APFT	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	NOMBRE	IBC	TAR	PENSIÓN	FSOL	FSUB	NOMBRE	IBC	TAR	NOMBRE	IBC	TAR	IBC	EXC	ARL	IBC	CAJA	ICBF	ESAP	MEN	Tipo Cot	Actividad Trabajo Pesado	Tarifa	Fondo de Pensiones	Actividad Económica
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]																		0	0	0	0	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]																		0	0	0	0	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]																		0	0	0	0	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]																		0	0	0	0	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]																		0	0	0	0	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]																		0	0	0	0	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
7	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]																		0	0	0	0	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
8	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]																		30	30	30	30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	2	[illegible]	4	0	ARL SURA – 14-11	Directa	7112	Jurídica
MUNDEP	DIRECCION		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
76-1	CL 14 12 SI PISO 3 OFICINA 305 CENTRO		[illegible]		CAMBIOSPLPOEMPRESARIAL@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-09	34603423	E	2025-09-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	885.600	1.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	34603423	2025-09-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF.
2.887.417	2.887.417	2.887.417	2.887.417	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				6	462.300	0	700	0	463.000
PROTECCION	230201	800229739	0	2	234.300	0	300	0	234.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	38.000	0	900	0	38.900
COLFONDOS	231001	800227940	5	1	38.000	0	600	0	38.600
PORVENIR	230301	800224808	8	4	152.000	0	200	0	152.200
EPS(Administradoras: 3)				6	115.600	0	300	0	115.900
SANITAS	EPS065	800251440	6	2	58.800	0	100	0	58.700
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	3	28.500	0	100	0	28.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	800130907	2	3	28.500	0	100	0	28.600
ARP(Administradoras: 1)				8	201.600	0	300	0	201.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	8	201.600	0	300	0	201.900
CCF(Administradoras: 1)				8	115.600	0	200	0	115.800
COMFACA	CCF13	891100047	2	8	115.600	0	200	0	115.800
Gran Total					895.100	0	1.500	0	896.600

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	2	CONSORCIO SAN ANTONIO 2022	R	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
76-1	CL 14 12 10 PISO 3 OFICINA 305 CENTRO		3203183798		CAMBIOSRUPOSEMPRESARIAL@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-08	34603480	Y	2025-09-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	158.900	200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	34603480	2025-09-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																		SIMÓN		PENSIÓN				SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN					
Nº	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SUS	INCAPACIDAD	LICENCIA MATERNIDAD	VACACIONES	AUSENTISMO	APORTE	IBC	TAR	COT	FSPB	FSPS	NOMBRE	IBC	TAR	COT	NOMBRE	IBC	TAR	COT	IBC	TAR	COT	TAR	IBC	TAR	IBC	TAR	IBC	TAR	Cot.	Tipo Cot.	Días Cot.	Total	Planilla Asociada	Autoliquidación Asociada
1	[illegible]	[illegible]	1.423.500		X																									[illegible]				[illegible]																			
2	[illegible]	[illegible]	1.423.500		X																									[illegible]				[illegible]																			
3	[illegible]	[illegible]	1.423.500		X																									[illegible]				[illegible]																			

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	2	CONSORCIO SAN ANTONIO 2022	R	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
76-1	CL 14 12 10 PISO 3 OFICINA 305 CENTRO		3203183798		CAMBIOSRUPOSEMPRESARIAL@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-08	2025-08	34603480	Y	2025-09-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	158.900	200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	34603480	2025-09-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	3.277.900	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				3	158.700	0	200	0	158.900
ARL SURA	14-11	800001740	5	3	158.700	0	200	0	158.900
Gran Total					158.700	0	200	0	158.900

ANEXO 5 CRONOGRAMA SEGÚN MODIFICATORIA 2

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALE!

PROYECTO :	ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL C
DEPARTAMENTO :	CAQUETA
COSTO TOTAL DEL PROYECTO :	$ 988.082.242,00
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

RESUMEN DE AVANCE DE OBRA

				MES 1		
				SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
A	VALORES INICIALES SEGÚN CONTRATO					
ITEM	DESCRIPCION	V/R EJECUTADO				
1	**1.0 PRELIMINARES**					
1,1	Localización y replanteo de redes	$	3.967.577	$ 1.322.525,67	$ 1.322.525,67	$ 1.322.525,67
1,2	Cerramiento provisional lona verde (h=2,00m)	$	13.230.531			
1,3	Excavación manual en material común de 0.00 a 2.00 m	$	7.307.589			
1,4	Excavación manual en material común de 2.00 a 4.00 m	$	701.585			
1,5	Entibado en madera para proteger talud de excavación	$	28.394.322			
1,6	Entibado en madera para proteger talud de excavación	$	55.300.034			
1,7	Cargue, transporte y retiro de material sobrante	$	21.898.593			
1,8	Relleno, Cimentación tubería con arena SP de acuerdo a la norma ASTM 2487	$	8.970.111			
1,9	Relleno con material seleccionado de la excavación	$	21.971.184			
1,10	Suministro e instalación de sub_base granular tipo C, NT1	$	29.826.973			
1,11	Suministro e instalación de base granular tipo C, NT1	$	7.809.540			
1,12	Suministro e instalación de asfaltita natural, en áreas afectadas por la excavación	$	12.532.972			
2	**2.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA**					
2,1	Suministro e instalación de tubería PVC D=315mm; NTC 3722-3 S8	$	21.931.954			
2,2	Suministro e instalación de tubería PVC D=400mm; NTC 3722-3 S8	$	22.804.103			
2,3	Suministro e instalación de tubería PVC D=450 mm; NTC 3722-3 S8	$	17.978.051			
2,4	Suministro e instalación de tubería PVC D=27"; NTC 5055 ASTM F 794	$	129.582.111			

2,5	Suministro e instalación de tubería PVC D=30"; NTC 5055 ASTM F 794	$ 44.047.920			
2,6	Suministro e instalación de tubería PVC D=36"; NTC 5055 ASTM F 794	$ 158.570.974			
3	**3.0 POZOS DE INSPECCION**				
3,1	Pozos de inspección en concreto f'c= 24Mpa D=1.20 m y h<=2.00 m. incluye tapa	$ -			
3,2	Pozos de inspección en concreto f'c= 24Mpa D=1.20 m y 2.01>h<=4.00 mincluye tapa	$ -			
4	**4,0 CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROSY CABEZA DE SALIDA**				
4.1	Construcción de cunetas transversales de vía, L=10.97m x 0.85 m, ancho útil de 0.45m, espesor de muros de 0.20m, y rejillas en platina de 2" x 3/8				
4.2	Construcción de cunetas transversales de vía, L=9.32m x 0.85 m, ancho útil de 0.45m, espesor de muros de 0.20m, y rejillas en platina de 2" x				
4.3	Construcción de sumidero de 1.64m x 0.88m, ancho útil de 0.58m x 1.34m, e=0.15m, rejilla platina de 2 x 3/8				
4.4	Construcción de sumidero de 1.64m x 0.98m, ancho útil de 0.68m x 1.34m, e=0.15m, rejilla platina de 2 x 3/8	$ 67.675.158			
4.5	Construcción de cabezal de salida	$ 4.154.529			
5	**5,0 ASEO GENERAL**				
5,1	Aseo general de Obra	$ 1.008.974			

N.P	ITEMS NO PREVISTOS				
N.P 1	Pozos de inspección en concreto f'c= 24Mpa D=1.50 m y h<=2.00 m. incluye tapa	$ 24.594.256			
N.P 2	Pozos de inspección en concreto f'c= 24Mpa D=1.50 m y 2.01>h<=3.00 mincluye tapa	$ 27.129.942			
N.P 3	Pozos de inspección en concreto f'c= 24Mpa D=1.60 m y 3.01>h<=4.00 mincluye tapa	$ 11.597.357			
PMA	PMA	$ 22.200.000			
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 22.200.000	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00
EJECUCION DE OBRA PROGRAMADO SEMANAL			$ 2.432.525,67	$ 2.432.525,67	$ 2.432.525,67
PROGRAMACION OBRA ACUMULADO			$ 2.432.525,67	$ 4.865.051,33	$ 7.297.577,00
PORCENTAJE DE EJECUCION			0,18%	0,37%	0,55%

ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA
Rep. Legal CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

CARLOS DARÍO
Rep. Legal CONSORCIO ALCAN

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MILAN CAQUETA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE

S, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJ
DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUET/

ASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, UNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

MUNICIPIO :	
ACTA DE INICIO:	
ENTIDAD CONTRATANTE :	

	MES 2				MES 3		
SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11
							0
$ 778.266,53	$ 778.266,53	$ 778.266,53	$ 778.266,53	$ 778.266,53	$ 778.266,53	$ 778.266,53	$ 778.266,53
$ 487.172,60	$ 487.172,60	$ 487.172,60	$ 487.172,60	$ 487.172,60	$ 487.172,60	$ 487.172,60	$ 487.172,60
$ 46.772,33	$ 46.772,33	$ 46.772,33	$ 46.772,33	$ 46.772,33	$ 46.772,33	$ 46.772,33	$ 46.772,33
$ 1.892.954,80	$ 1.892.954,80	$ 1.892.954,80	$ 1.892.954,80	$ 1.892.954,80	$ 1.892.954,80	$ 1.892.954,80	$ 1.892.954,80
$ 3.686.668,93	$ 3.686.668,93	$ 3.686.668,93	$ 3.686.668,93	$ 3.686.668,93	$ 3.686.668,93	$ 3.686.668,93	$ 3.686.668,93
$ 1.459.906,20	$ 1.459.906,20	$ 1.459.906,20	$ 1.459.906,20	$ 1.459.906,20	$ 1.459.906,20	$ 1.459.906,20	$ 1.459.906,20
$ 598.007,40	$ 598.007,40	$ 598.007,40	$ 598.007,40	$ 598.007,40	$ 598.007,40	$ 598.007,40	$ 598.007,40
$ 1.464.745,60	$ 1.464.745,60	$ 1.464.745,60	$ 1.464.745,60	$ 1.464.745,60	$ 1.464.745,60	$ 1.464.745,60	$ 1.464.745,60

		$ 7.341.320,00	$ 7.341.320,00	$ 7.341.320,00	$ 7.341.320,00	$ 7.341.320,00	$ 7.341.320,00
$ 39.642.743,50	$ 39.642.743,50	$ 39.642.743,50	$ 39.642.743,50				
				$ -			$ -
				$ -			$ -
					$ 6.152.287,09	$ 6.152.287,09	$ 6.152.287,09

					$ 4.099.042,67		$ 4.099.042,67
					$ 4.521.657,00		$ 4.521.657,00
$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00
$ 51.167.237,90	$ 51.167.237,90	$ 58.508.557,90	$ 58.508.557,90	$ 18.865.814,40	$ 33.638.801,15	$ 25.018.101,49	$ 33.638.801,15
$ 58.464.814,90	$ 109.632.052,79	$ 168.140.610,69	$ 226.649.168,58	$ 245.514.982,98	$ 279.153.784,13	$ 304.171.885,62	$ 337.810.686,77
26,43%	**35,82%**	**44,94%**	**52,54%**	**66,12%**	**66,12%**	**66,12%**	**66,12%**

CANO SANCHEZ
TARILLADO SAN ANTONIO 2025

FONDOS

ETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASC Ś.

MILAN CAQUETA

22 DE AGOSTO DE 2025

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

	MES 4				MES 5		
SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19
$ 778.266,53	$ 778.266,53	$ 778.266,53	$ 778.266,53	$ 778.266,53	$ 778.266,53	$ 778.266,53	$ 778.266,53
$ 487.172,60	$ 487.172,60	$ 487.172,60	$ 487.172,60	$ 487.172,60	$ 487.172,60	$ 487.172,60	
$ 46.772,33	$ 46.772,33	$ 46.772,33	$ 46.772,33	$ 46.772,33	$ 46.772,33	$ 46.772,33	
$ 1.892.954,80	$ 1.892.954,80	$ 1.892.954,80	$ 1.892.954,80	$ 1.892.954,80	$ 1.892.954,80	$ 1.892.954,80	
$ 3.686.668,93	$ 3.686.668,93	$ 3.686.668,93	$ 3.686.668,93	$ 3.686.668,93	$ 3.686.668,93	$ 3.686.668,93	
$ 1.459.906,20	$ 1.459.906,20	$ 1.459.906,20	$ 1.459.906,20	$ 1.459.906,20	$ 1.459.906,20	$ 1.459.906,20	
$ 598.007,40	$ 598.007,40	$ 598.007,40	$ 598.007,40	$ 598.007,40	$ 598.007,40	$ 598.007,40	
$ 1.464.745,60	$ 1.464.745,60	$ 1.464.745,60	$ 1.464.745,60	$ 1.464.745,60	$ 1.464.745,60	$ 1.464.745,60	
	$ 3.728.371,63	$ 3.728.371,63	$ 3.728.371,63	$ 3.728.371,63	$ 3.728.371,63	$ 3.728.371,63	$ 3.728.371,63
	$ 976.192,50	$ 976.192,50	$ 976.192,50	$ 976.192,50	$ 976.192,50	$ 976.192,50	$ 976.192,50
	$ 1.566.621,50	$ 1.566.621,50	$ 1.566.621,50	$ 1.566.621,50	$ 1.566.621,50	$ 1.566.621,50	$ 1.566.621,50
				$ 4.386.390,80	$ 4.386.390,80	$ 4.386.390,80	$ 4.386.390,80
		$ 11.402.051,50	$ 11.402.051,50				
	$ 8.989.025,50	$ 8.989.025,50					
$ 64.791.055,50	$ 64.791.055,50						

$ -					$ -	$ -	
$ -					$ -	$ -	
$ 6.152.287,09	$ 6.152.287,09	$ 6.152.287,09	$ 6.152.287,09	$ 6.152.287,09	$ 6.152.287,09	$ 6.152.287,09	$ 6.152.287,09
					$ 2.077.264,50	$ 2.077.264,50	
						$ 504.487,00	$ 504.487,00

	$ 4.099.042,67		$ 4.099.042,67	$ 4.099.042,67	$ 4.099.042,67		
	$ 4.521.657,00		$ 4.521.657,00	$ 4.521.657,00	$ 4.521.657,00		
			$ 5.798.678,50		$ 5.798.678,50		
$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00
$ 82.467.836,99	$ 106.348.747,78	$ 44.339.044,11	$ 49.769.396,78	$ 36.955.057,58	$ 44.831.000,58	$ 30.916.109,41	$ 19.202.617,05
$ 420.278.523,76	$ 526.627.271,54	$ 570.966.315,65	$ 620.735.712,43	$ 657.690.770,01	$ 702.521.770,59	$ 733.437.880,00	$ 752.640.497,05

66,12%	**66,12%**	**66,12%**	**66,12%**	**66,12%**	**66,12%**	**66,12%**	**66,12%**

O URBANO DE LA INSPECCIÓN

	PROGRAMACION
	2,00

	TOTAL
SEMANA 20	PROYECTO
	#¡REF!
	$ 3.967.577,00
$ 778.266,53	$ 13.230.531,00
	$ 7.307.589,00
	$ 701.585,00
	$ 28.394.322,00
	$ 55.300.034,00
	$ 21.898.593,00
	$ 8.970.111,00
	$ 21.971.184,00
$ 3.728.371,63	$ 29.826.973,00
	$ -
$ 976.192,50	$ 7.809.540,00
$ 1.566.621,50	$ 12.532.972,00
	#¡REF!
$ 4.386.390,80	$ 21.931.954,00
	$ 22.804.103,00
	$ 17.978.051,00
	$ 129.582.111,00

	$	44.047.920,00
	$	158.570.974,00
	$	-
	$	-
	$	-
	#¡REF!	
	$	-
	$	-
	$	-
	$	67.675.158,00
	$	4.154.529,00
	#¡REF!	
	$	1.008.974,00

	$ 51.724.198,00
	$ 24.594.256,00
	$ 27.129.942,00
	$ 22.200.000,00
$ 1.110.000,00	$ 22.200.000,00
$ 12.545.842,95	$ 765.186.340,00
$ 765.186.340,00	

66,12%	

ANEXO 6 SEGUIMIENTO AL FLUJOGRAMA DE INVERSION

DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE LA MILAN CAQUETA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE FONDOS

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARA EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS D INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

PROYECTO:					
CLIENTE:					
VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$				
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO SAN ANTONIO 2023				


UBICACIÓN:					
DURACIÓN:					

RESUMEN DE AVANCE DE OBRA




A.P	ITEMS NO PREVISTOS																		
A.P.1		$										$		$		$		$	
A.P.2		$										$		$		$		$	
A.P.3		$						$										$	
PMS	PMS	$																	
		$		$		$		$		$		$		$		$		$	
				$		$		$		$									
				$		$		$		$		$		$		$		$

4 LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA

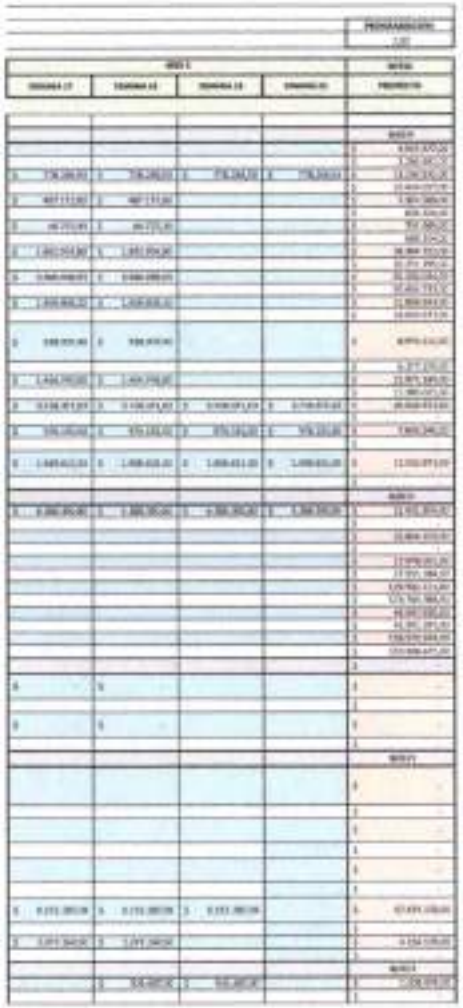

				$
$				$
				$
$				$
$				
				$
$	$	$	$	$
$	$	$	$	$
$	$	$	$	$
$	$	$	$	
$	$	$	$	$
66,13%	**66,13%**	**66,13%**	**66,13%**	

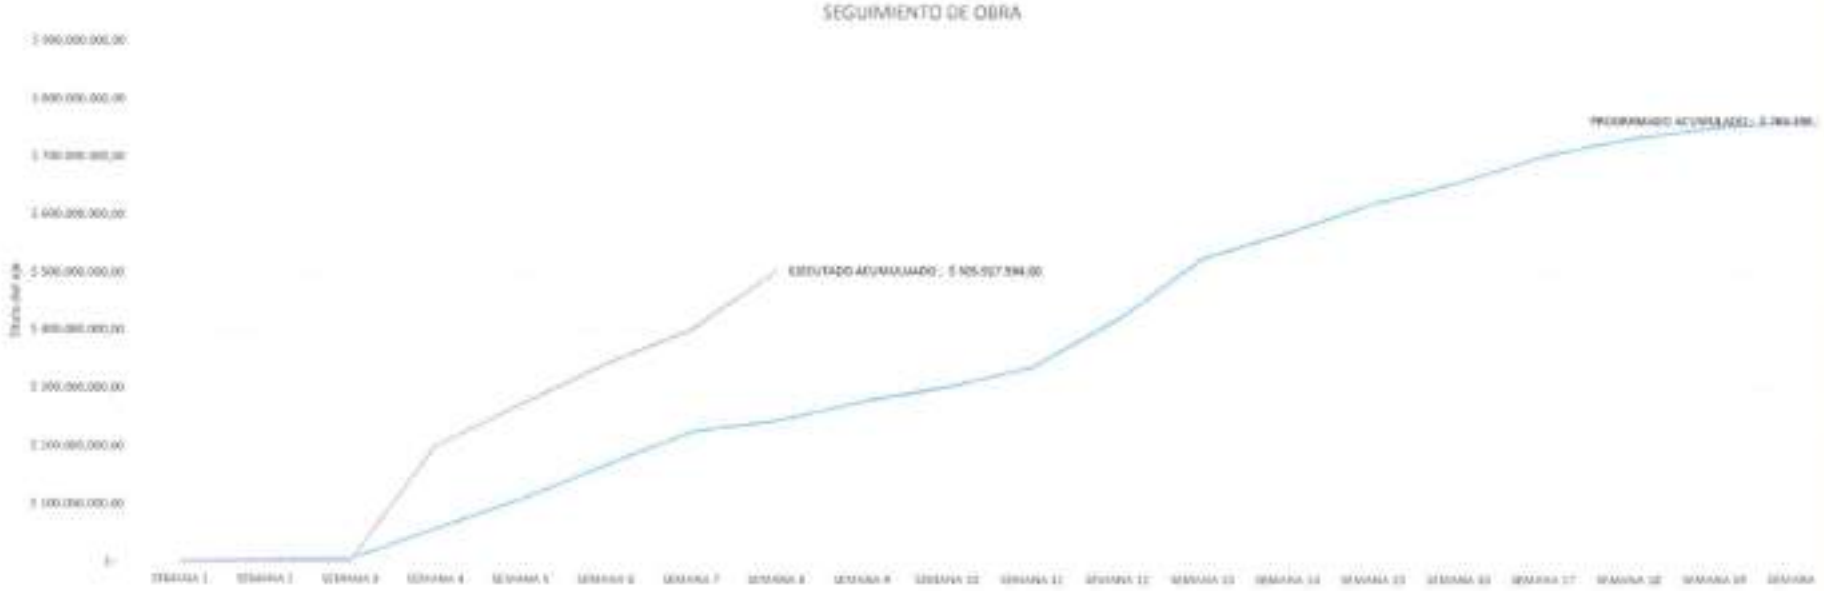
SEGUIMIENTO DE OBRA

SEMANA	PROGRAMADO SEMANAL	EJECUTADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULUADO
SEMANA 1	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33
SEMANA 2	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33	$ 4.865.051,33	$ 2.797.892,67
SEMANA 3	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33	$ 7.297.577,00	$ 4.196.839,00
SEMANA 4	$ 51.167.237,90	$ 198.033.374,00	$ 58.464.814,90	$ 202.230.213,00
SEMANA 5	$ 51.167.237,90	$ 71.861.373,50	$ 109.632.052,79	$ 274.091.586,50
SEMANA 6	$ 58.508.557,90	$ 69.774.887,50	$ 168.140.610,69	$ 343.866.474,00
SEMANA 7	$ 58.508.557,90	$ 58.177.530,50	$ 226.649.168,58	$ 402.044.004,50
SEMANA 8	$ 18.865.814,40	$ 103.873.589,50	$ 245.514.982,98	$ 505.917.594,00
SEMANA 9	$ 33.638.801,15		$ 279.153.784,13	
SEMANA 10	$ 25.018.101,49		$ 304.171.885,62	
SEMANA 11	$ 33.638.801,15		$ 337.810.686,77	
SEMANA 12	$ 82.467.836,99		$ 420.278.523,76	
SEMANA 13	$ 106.348.747,78		$ 526.627.271,54	
SEMANA 14	$ 44.339.044,11		$ 570.966.315,65	
SEMANA 15	$ 49.769.396,78		$ 620.735.712,43	
SEMANA 16	$ 36.955.057,58		$ 657.690.770,01	
SEMANA 17	$ 44.831.000,58		$ 702.521.770,59	
SEMANA 18	$ 30.916.109,41		$ 733.437.880,00	
SEMANA 19	$ 19.202.617,05		$ 752.640.497,05	
SEMANA 20	$ 12.545.842,95		$ 765.186.340,00	
	$ 765.186.340,00			

ANEXO 7 FORMATO DE CONTROL DE LLUVIAS

	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ MUNICIPIO DE MILÁN CAQUETÁ ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	FMI # 1
		VERSIÓN	1
	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 8, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.		

| | | |

	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ MUNICIPIO DE MILÁN CAQUETÁ ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	FM1 # 1
		VERSIÓN	1

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 8, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

FECHA: DÍA 25 | MES 10 | AÑO 2025

UNIDAD EJECUTORA: PDA CAQUETA — MUNICIPIO: MILAN CAQUETA — MES: MAYO

CONTRATO No.: [illegible] — INTERVENTORIA: CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025 — SECTOR: SAN ANTONIO DE GETUCHA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

MES	OCTUBRE																																				
Día	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
Tipos de Tiempo																																					
Seco	0,2	1	1	0,5	1	1	1			0,8	0,4	1	1	1	0,6		1	0,5	1	1	1	1															
Lluvias moderadas	0,8			0,5				0,4	0,6	0,2				0,4	1		0,5																				
Lluvias intensas								0,6	0,2																												

Firma
Nombre: Interventoría


	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	FM1 #
		VERSIÓN	1

FECHA: DÍA 25 | MES 10 | AÑO 2025

UNIDAD EJECUTORA: PDA CAQUETA — MUNICIPIO: MILAN CAQUETA — MES: OCTUBRE

CONTRATO No.: [illegible] — CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025 — SECTOR: SAN ANTONIO DE GETUCHA

CLIMA	CANT.	%
Seco	17	54,84%
Lluvias moderadas	5,7	17,39%
Lluvias intensas	0,8	3,81%
Total días	31	100,00%

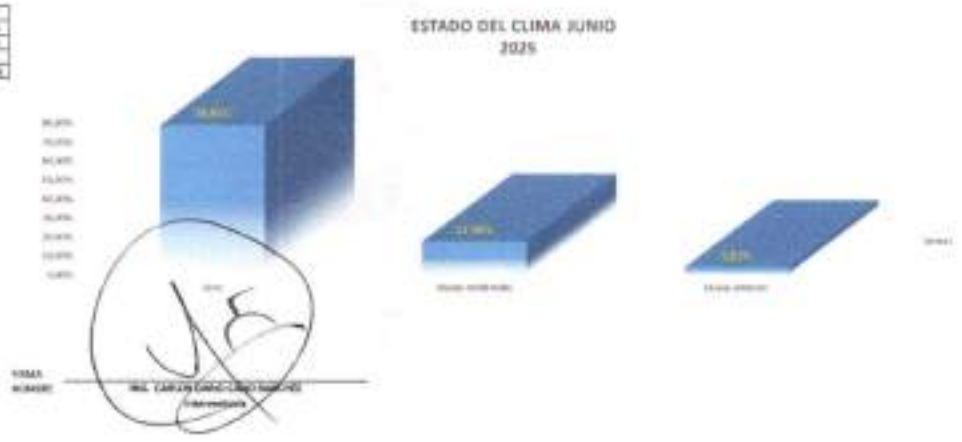

FIRMA
NOMBRE: [illegible]
Interventoría

ANEXO 8 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

INFORME ACOMPAÑAMIENTO AMBIENTAL N°2

22 de septiembre al 21 de octubre de 2025



ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

CONTRATO DE OBRA No. COP-2025-002

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCION 3
2 OBJETIVOS 3
2.1 OBJETIVOS GENERALES 3
3 GENERALIDADES DEL PROYECTO 4
3.1 INFORMACION GENERAL 4
3.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 5
4 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 5
4.1.1 Componente Biótico 6
4.1.2 Componente Abiótico 6
4.1.3 Componente Social 6
4.2 IMPACTOS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 6
4.2.1 Interrupciones Viales 7
4.2.2 Impacto Económico 7
4.2.3 Mejora en la Salud Pùblica 7
4.2.4 Desarrollo Urbano 7
5 PLAN DE MANEJO 8
FICHA N. 4A 8
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS Y SOBRANTES DE OBRA 8
MANEJO DE FLORA Y FAUNA 8
PROGRAMA COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 8
6 MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES 20

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ubicación de San Antonio de Getucha en Colombia 5
Ilustración 2. Ubicación del proyecto en mapa 5
Ilustración 3. Area de Influencia 8

1 INTRODUCCION

El siguiente documento hace referencia al estudio realizado, sobre el componente ambiental en la ejecución del proyecto "ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.". Este Plan de Manejo Ambiental se elaboró a partir de la normatividad vigente por organismos que rigen a nivel nacional, regional y municipal.

El objetivo del desarrollo del presente Plan de Manejo Ambiental es brindar al proyecto una orientación descriptiva práctica para la adopción de medidas de manejo ambiental en los impactos generados durante la ejecución.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivos generales

- Brindar las herramientas necesarias para el buen manejo de los elementos constituyentes del medio abiótico, biótico y antrópico durante el desarrollo de las actividades a realizar en el proyecto, a través de la prevención, el control, un adecuado manejo y la mitigación que se busca, con las acciones contempladas dentro del plan de manejo ambiental.
- Identificación de los diferentes impactos negativos y positivos que se van a generar con el desarrollo de los diferentes proyectos.

- Formular programas orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales adversos, las mismas que serán implementadas durante las fases de los diferentes proyectos.

3 GENERALIDADES DEL PROYECTO

3.1 INFORMACION GENERAL

Este Plan de Manejo Ambiental aplica a la ejecución de obras de construcción, adecuación y canalización de aguas lluvias en la calle 4, entre Cra 2 a la Cra 6, del casco urbano de la inspección de San Antonio de Getucha, en el municipio de Milán, departamento del Caquetá.

En el desarrollo de las actividades este documento abarca los lineamientos enmarcados en la construcción de diferentes tramos de alcantarillados en el municipio de Milán, para el desarrollo del proyecto se encuentra la entidad de ambiental reguladora Corpoamazonia de la regional del Caquetá.

Este documento corresponde a un plan de manejo ambiental PMA, cuyos ajustes son necesarios para las obras de mantenimiento y construcción de las redes de alcantarillado del municipio de Milán, se tuvo en cuenta el sitio de disposición final de escombros, materiales de excavación y demás áreas que serán destinadas para el desarrollo de las actividades constructivas.

La estructura del presente PMA, contiene la linea base socio-ambiental, evaluación ambiental, definición de las áreas de influencia, plan de manejo ambiental que incluye el programa de seguimiento y control y el plan de emergencias y contingencias

El objetivo es Definir las medidas de manejo ambiental que contemple las acciones en materia ambiental que se requieran para el desarrollo de las actividades del proyecto "Adecuación y canalización de aguas lluvias en la calle 4, entre cra 2 a la cra 6, del casco urbano de la inspección de San Antonio de Getucha, en el Municipio de Milán, Departamento del Caquetá." que se pretende presentar en PDA CAQUETA.

3.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA



Ilustración 1. Ubicación de San Antonio de Getucha en Colombia

El proyecto se localiza geográficamente en el casco urbano de la inspección de San Antonio de Getucha especificamente en la calle 4, entre Cra 2 a la Cra 6.



Ilustración 2. Ubicación del proyecto en mapa

4 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Esto requiere estimar la localización, tipo e intensidad de uso de los recursos durante las distintas fases del ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, así como considerar los impactos generados sobre estos y su variación en tiempo y espacio.

De acuerdo a lo anterior, El área de influencia del proyecto de construcción del alcantarillado pluvial en el municipio de Milán, Caquetá, se delimita a partir de la evaluación de los impactos ambientales potenciales en los componentes biótico, abiótico y social. La influencia del proyecto no es continua y se extiende más allá de la zona de construcción directa, integrando áreas que pueden verse afectadas por las actividades de excavación, instalación de tuberías, y movimientos de maquinaria pesada. La delimitación del área de influencia se basa en la estimación de la localización, tipo e intensidad de uso de los recursos durante las distintas fases del proyecto, así como la consideración de los impactos generados y su variación en el tiempo y espacio.

4.1.1 Componente Biótico

Incluye la flora y fauna presente en la zona de intervención y sus alrededores. La vegetación podría verse afectada por la remoción de suelo y la alteración de hábitats. Es necesario identificar especies sensibles y áreas de conservación que puedan necesitar medidas de protecciones específicas.

4.1.2 Componente Abiótico

Comprende el suelo, agua y aire de la región. Las actividades de construcción pueden generar emisiones de polvo y contaminantes, así como cambios en la calidad del agua debido a la posible infiltración de residuos. La calidad del suelo también puede verse afectada por los movimientos de tierra y la compactación del terreno.

4.1.3 Componente Social

Se refiere a la población local, actividades económicas, y servicios comunitarios que pueden verse impactados por el proyecto. La fase de construcción puede causar interrupciones en el tráfico, dificultando el acceso a viviendas y negocios, y generando ruido y molestias para los residentes. La operación del sistema de alcantarillado, sin embargo, promete mejoras significativas en la salud pública y la calidad de vida a largo plazo.

4.2 Impactos Identificados en el Área de Influencia

Considerando los impactos ambientales evaluados en el estudio ambiental, el área de influencia se caracteriza principalmente por los impactos sociales derivados de

la ejecución y operación del proyecto. Entre los impactos negativos durante la fase de construcción, se incluyen:

4.2.1 Interrupciones Viales

Los cierres temporales de calles y la alteración de rutas pueden causar molestias significativas para los residentes y trabajadores locales, generando retrasos en los desplazamientos diarios y afectando la rutina cotidiana.

4.2.2 Impacto Económico

Los comercios locales pueden sufrir pérdidas debido a la disminución del tránsito de clientes y las dificultades de acceso a los establecimientos. Los trabajadores también pueden enfrentar desafíos para llegar a sus lugares de trabajo, afectando la productividad y el bienestar económico de la comunidad.

4.2.3 Mejora en la Salud Pública

Un sistema de alcantarillado pluvial eficiente reducirá la incidencia de enfermedades relacionadas con la gestión inadecuada de las aguas lluvias, mejorando la calidad de vida y la salud de los residentes.

4.2.4 Desarrollo Urbano

La mejora en la infraestructura de la red pluvial puede incentivar el desarrollo urbano y atraer nuevas inversiones, contribuyendo al crecimiento económico y social de la Inspección de San Antonio de Getucha del Municipio de Milán Caquetá. El área de influencia de ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA , por lo tanto, está influenciada tanto por los impactos negativos temporales durante la fase de construcción como por los beneficios positivos a largo plazo que resultarán de la implementación de un sistema de alcantarillado pluvial moderno y eficiente, en tal sentido, a continuación, se muestra el área de influencia del proyecto:



Ilustración 3. Area de Influencia

5 PLAN DE MANEJO

Una vez evaluados los impactos ambientales del proyecto, para el periodo comprendido entre 22 de septiembre al 21 de octubre del presente año y de acuerdo a las medidas de prevención, control, mitigación o corrección, se presenta a continuación los programas ejecutados

N.	Ficha Ambiental	Nombre del programa/ ficha ambiental
3	FICHA N. 3A	MANEJO DEL RECURSO SUELO
4	FICHA N. 4A	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS Y SOBRANTES DE OBRA
5	FICHA N. 5A	MANEJO COMPONENTE ATMOSFERICO
6	FICHA N. 6A	MANEJO DE FLORA Y FAUNA
7	FICHA N. 7A	PROGRAMA COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

N°3	FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL		CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
Ficha 3 de 7	COMPONENTE	FICHA N°3A	
MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA FÍSICO		MANEJO DEL RECURSO SUELO	
Objetivos	• Diseño de medidas de manejo ambiental encaminadas hacia la protección del suelo • Evitar perdida de suelo		
Impactos a manejar	Esta actividad está referida al cargue, transporte y disposición final de los residuos generados por las labores de podas y desmonte, en las cuales se produce una alta cantidad de madera, follaje, ramas que pueden o no tener un uso posterior en la obra. En primera instancia, el material vegetal de desecho generado por la actividad de poda, se ubicó en una zona de disposición final, con el objetivo de generar descomposición de la misma, que generen nutrientes al suelo. • Se minimizo la afectación del suelo durante la excavación. Se utilizó siempre que sea posible, áreas previamente intervenidas dentro del área de influencia del proyecto. Se minimizo la perturbación de suelos fuera del área de trabajo. • La capa orgánica removida por la excavación debe ser apilado y protegido para ser utilizada durante los trabajos de restauración. Se acopio el suelo de excavación formando montículos o pilas cuya altura no exceda de 1.2 metros.		

TIPO DE MEDIDA				
Prevención	**Control**	**Mitigación**	**Compensación**	**Protección**

MEDIDAS DE MANEJO

- Aislamiento de la zona de influencia directa
- Jornadas de capacitación

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

En el marco de la implementación de la presente Ficha de Manejo Ambiental, se continúa ejecutando un conjunto de medidas técnicas orientadas a la protección, conservación y estabilización del suelo en la zona de intervención. Estas acciones se alinean con los principios de prevención, mitigación y control de impactos ambientales establecidos en la normativa ambiental vigente y en los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental del proyecto.

Como parte de las estrategias de manejo del recurso suelo, se han llevado a cabo actividades especificas de señalización y acondicionamiento de montículos de tierra generados durante las labores de preparación del terreno. Dichos montículos han sido debidamente compactados y cubiertos con geo membranas de polietileno de color negro (plástico negro), cuya función principal es minimizar la erosión hídrica y eólica, reducir la pérdida de material particulado, evitar la lixiviación de nutrientes y controlar el crecimiento de vegetación no deseada en zonas temporales de acopio. La selección del material de cobertura responde a criterios técnicos relacionados con su durabilidad, impermeabilidad y capacidad de absorción térmica, lo cual contribuye a mantener condiciones estables en el material almacenado.

Adicionalmente, se ha establecido una delimitación clara y rigurosa del área de trabajo autorizada, mediante señalización física y control operativo continuo. Se ha restringido de forma estricta cualquier actividad que implique la alteración, remoción, compactación o modificación del perfil edáfico fuera de los límites predefinidos para la intervención. Esta medida busca salvaguardar las características físico-químicas y biológicas del suelo en las áreas adyacentes, preservando así la integridad de los ecosistemas circundantes y los servicios ambientales que estos proveen, tales como la regulación hídrica, el soporte a la biodiversidad y la fijación de carbono.

La aplicación de estas medidas refleja el compromiso del proyecto con la sostenibilidad ambiental y la gestión responsable del territorio, garantizando que las actividades desarrolladas se realicen dentro de los umbrales de impacto aceptables y con el debido respeto por los componentes del medio natural en el área de influencia directa e indirecta.





PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

N°	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	PERIOCIDAD	RESPONSABLE
1	Registros fotográficos (Informe)	Mensual	Contratista
2	Reforestación si se requiere	Al finalizar la obra	Contratista

N°4	FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL		CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
Ficha 4 de 7	COMPONENTE	FICHA N°4A	
MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA FÍSICO		MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS Y SOBRANTES DE OBRA	
Objetivos	• Destinar área especifica para la disposición de residuos sólidos generados durante la ejecución de la obra. • Realizar una buena disposición de residuos sólidos y/o líquidos.		
Impactos a manejar	• Generación de residuos tanto sólidos y líquidos. • Manejo de residuos sólidos sobrantes de obra		

TIPO DE MEDIDA				
Prevención	Control	Mitigación	Compensación	Protección

MEDIDAS DE MANEJO

- Procedimientos para el Manejo adecuado de residuos líquidos y sólidos.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

En el marco del cumplimiento de la presente Ficha de Manejo Ambiental, se mantiene la implementación continua de acciones orientadas a la gestión integral de los residuos sólidos generados durante las actividades del proyecto. Esta gestión incluye tanto los residuos domésticos provenientes del personal asignado a la obra como los residuos de construcción y demolición (RCD) o sobrantes propios de las labores de intervención en el sitio.

Para tal fin, se ha habilitado un Punto Ecológico debidamente señalizado y ubicado dentro de los límites autorizados de la zona de intervención. Este punto de acopio temporal cumple con las condiciones mínimas de operación establecidas en la normativa ambiental vigente, garantizando la separación en la fuente, almacenamiento seguro, manejo higiénico y posterior disposición final adecuada de los residuos generados. La ubicación estratégica del Punto Ecológico responde a criterios técnicos de accesibilidad, logística operativa y mitigación de impactos, evitando su proximidad a cuerpos de agua, zonas de alta sensibilidad ecológica o áreas residenciales.

La implementación de esta infraestructura temporal tiene como objetivo principal minimizar los impactos ambientales asociados a la generación y manejo inadecuado de residuos, tales como la contaminación del suelo, la degradación paisajística, la proliferación de vectores de enfermedades y la afectación a la fauna

silvestre en las zonas aledañas. Asimismo, contribuye a la prevención de derrames, lixiviados o dispersión de materiales por efecto del viento o la escorrentía superficial.

Todas las actividades relacionadas con la recolección, clasificación, almacenamiento y retiro de residuos se ejecutan conforme al cronograma establecido en el Plan de Manejo de Residuos Sólidos del proyecto, y bajo la supervisión del responsable ambiental asignado. El retiro periódico de los residuos se realiza a través del personal autorizado por la autoridad ambiental competente, garantizando su trazabilidad y disposición final en sitios legalmente habilitados para tal fin.

Esta práctica refuerza el compromiso del proyecto con los principios de la economía circular, la responsabilidad ambiental y el cumplimiento normativo, asegurando que la generación de residuos no comprometa la calidad ambiental del entorno ni la salud de las comunidades circundantes.









PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO			
N°	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	PERIOCIDAD	RESPONSABLE

1	Informe mensual (registro fotográfico)	Mensual	Contratista
2	Capacitación al equipo de trabajo (asistencia)	Mensual	Contratista

N°4	FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL		CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
Ficha 5 de 7	COMPONENTE	FICHA N°5A	
MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA FÍSICO		MANEJO COMPONENTE ATMOSFERICO	
Objetivos	• Establecer medidas para el control del ruido a fin de asegurar que se eviten o reduzcan los impactos en la comunidad y animales. • Realizar el estricto control y mantenimiento de maquinaria y equipos de Obra.		
Impactos a manejar	• Afectación a hábitat por generación de ruido y/o polvo • Incremento en los niveles de ruido por los vehículos y maquinaria utilizada en las obras		

TIPO DE MEDIDA				
Prevención	Control	Mitigación	Compensación	Protección

MEDIDAS DE MANEJO

- Clasificación de las áreas de trabajo y diseño de acciones a tomar
- Socialización de normas de movilización de vehículos y operación de maquinaria
- Identificación de áreas sensible al ruido y polvo

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Con el objetivo de minimizar los impactos ambientales asociados a las actividades de obra, especialmente aquellos relacionados con la emisión de ruido, polvo y gases contaminantes, se ha establecido que todos los trabajos se ejecutarán exclusivamente en horario diurno, en concordancia con las disposiciones legales vigentes en materia de ruido ambiental y calidad de vida de las comunidades aledañas. Este horario se aplicará siempre que las condiciones climáticas, de seguridad y logísticas lo permitan, priorizando tanto la eficiencia operativa como la protección del entorno socio ambiental.

Paralelamente, se garantiza que toda la maquinaria y equipo móvil utilizado en la intervención se mantenga en óptimas condiciones técnicas y mecánicas. Este requisito se verifica mediante un programa preventivo de mantenimiento, inspecciones periódicas y registros de funcionamiento, lo cual contribuye directamente a la reducción de emisiones atmosféricas (partículas suspendidas,


óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, entre otros) y al control de fugas de combustibles o lubricantes. El buen estado mecánico no solo incrementa la eficiencia energética de los equipos, sino que también disminuye significativamente los nesgos de fallas operativas que puedan generar impactos ambientales no planificados.

Como parte del componente de sensibilización y formación ambiental del personal, se están implementando charlas técnicas y sesiones de inducción periódicas orientadas a la protección del recurso atmosférico. Estas capacitaciones están dirigidas a todo el personal que interviene directa o indirectamente en la obra —incluyendo operarios, supervisores, conductores y personal de apoyo— y abordan temas clave como:

- Calentamiento global - Fuentes y efectos de la contaminación atmosférica en el entorno de obra,
- Buenas prácticas para la reducción de emisiones (por ejemplo, evitar el ralentí prolongado de motores, humedecer áreas críticas para controlar el polvo),
- Uso adecuado de equipos de control de emisiones,
- Importancia del mantenimiento preventivo en la calidad del aire

Estas acciones formativas se alinean con los principios de responsabilidad ambiental, prevención de impactos y participación activa del personal en la gestión sostenible del proyecto, reforzando una cultura de respeto por el medio ambiente y el cumplimiento de los compromisos establecidos en la presente Ficha de Manejo Ambiental.



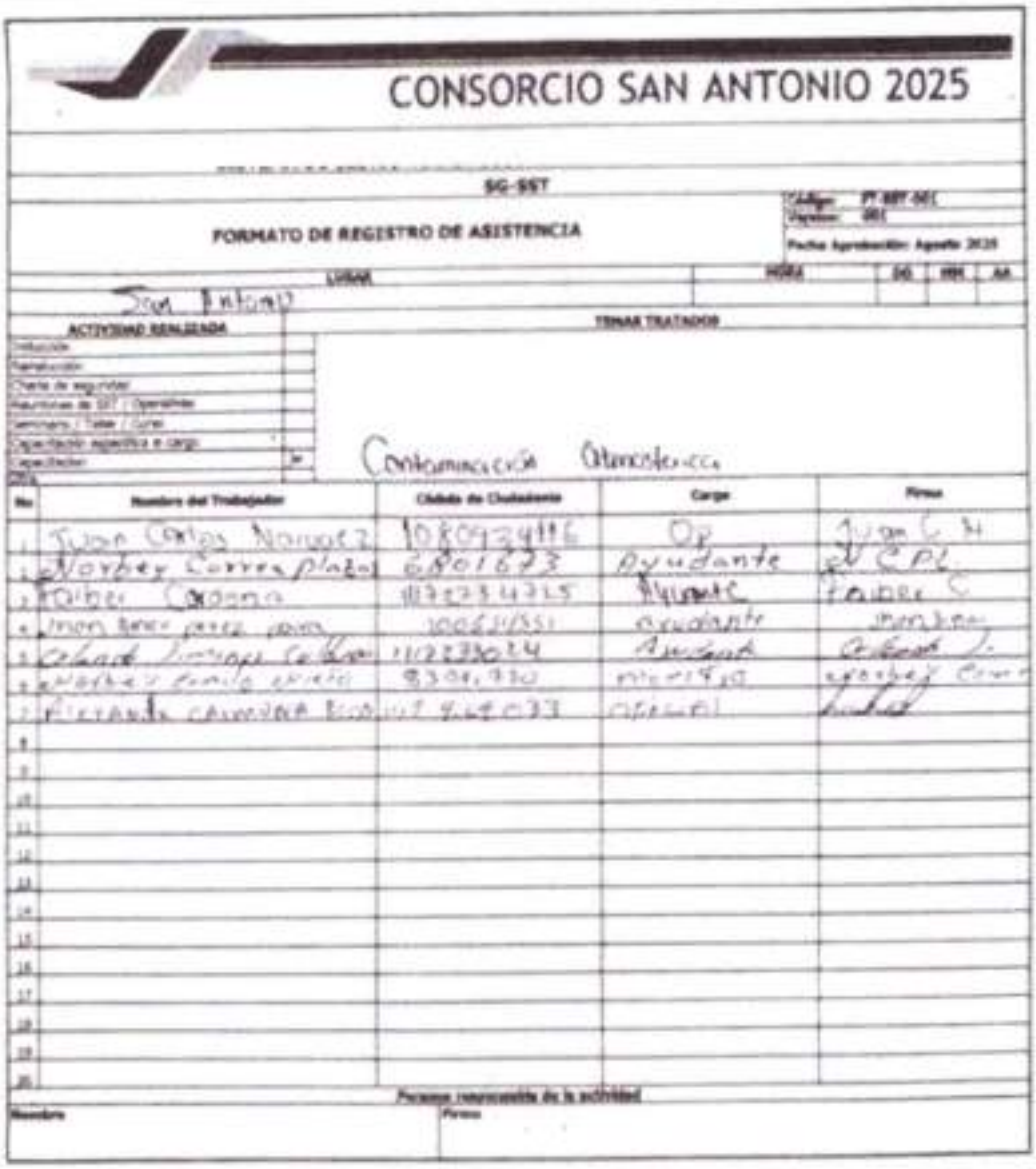

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: PT-SST-001
Versión: 001
Fecha Aprobación: Agosto 2025

LUGAR: San Antonio | HORA: DD MM AA

ACTIVIDAD REALIZADA: Inducción; Reinducción; Charla de seguridad; Reuniones de SST / Operativas; Seminario / Taller / Curso; Capacitación específica a cargo; Capacitación; Otro

TEMAS TRATADOS: Contaminación Atmosférica

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Juan Carlos Nuñez	1080934116	Op	Juan C. N.
2	Norbey Correa Plaza	6801673	Ayudante	N. C. P.
3	Fabian Cadena	1192234215	Ayudante	Fabian C.
4	Jhon Jairo perez arias	1006211551	Ayudante	Jhon Jairo
5	Cristian Enrique Cabrera	1122330124	Auxiliar	Cristian C.
6	Norbey Camilo urrego	9304930	Maestro	Norbey Camilo
7	Alexander Cardenas Rodriguez	1.142033	Operador	Alexander
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Persona responsable de la actividad

Nombre | Firma

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO			
N°	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	PERIOCIDAD	RESPONSABLE
1	Registros fotográficos (Informe)	Inicio	Contratista

N°4	FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL		CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
Ficha 6 de 7	COMPONENTE	FICHA N°6A	
MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA FÍSICO		MANEJO DE FLORA Y FAUNA	
Objetivos	• Identificación la Flora y Fauna si reciben alguna intervención por la obra		
Impactos a manejar	• Afectación del paisaje • Afectación de las especies endémicas		

TIPO DE MEDIDA				
Prevención	Control	Mitigación	Compensación	Protección

MEDIDAS DE MANEJO

- Realizar charla al personal de obra sobre el manejo de flora y fauna
- Concertar estrategias con la comunidad si se llega afectar alguna zona con flora y fauna

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Con el objetivo de prevenir, mitigar y controlar los impactos sobre los componentes bióticos del entorno, se establece como principio fundamental que el área a despejar para el desarrollo de las actividades de construcción deberá corresponder estrictamente a la mínima necesaria para la ejecución técnica, segura y eficiente de las obras.

En cumplimiento de la normativa ambiental nacional y local, incluyendo leyes, decretos y resoluciones sobre protección de flora y fauna silvestre, se establecen las siguientes prohibiciones estrictas para todo el personal, contratistas y subcontratistas involucrados en el proyecto:

- Realizar tala, poda, extracción, trasplante o cualquier forma de aprovechamiento de especies vegetales (nativas, introducidas o protegidas) fuera del área de intervención autorizada, sin la respectiva autorización de la autoridad ambiental competente.

- Cazar, capturar, molestar, alimentar, transportar o comercializar especies de fauna silvestre, así como destruir nidos, madrigueras, huevos o refugios naturales.
- Utilizar madera de especies forestales —incluso de árboles caídos o ramas— para leña, cercas, apuntalamientos u otros usos dentro del campamento o zona de obra, salvo que provenga de fuentes legales y documentadas.
- Introducir especies exóticas invasoras (vegetales o animales) en el área de influencia del proyecto, ya sea intencionalmente o como resultado de prácticas no controladas (por ejemplo, en material de relleno, jardinería o transporte de maquinaria).

Como parte del componente de sensibilización y formación ambiental, se realizan charlas técnicas obligatorias dirigidas a todo el personal de obra, incluyendo

operarios, supervisores, conductores y personal de apoyo. Estas sesiones, impartidas por el responsable ambiental del proyecto, abordando los siguientes temas:

- Identificación básica de especies de flora y fauna nativas del entorno, con énfasis en aquellas protegidas, amenazadas o de importancia ecológica.
- Protocolos de actuación ante el avistamiento de fauna silvestre (especialmente especies en riesgo o crías).
- Prohibiciones legales y sanciones asociadas al maltrato, caza o tráfico de especies silvestres.
- Importancia de mantener la integridad de los ecosistemas circundantes y el rol del personal en su protección.

Estas capacitaciones se realizan durante la inducción inicial y se refuerzan mediante charlas periódicas, afiches informativos en zonas comunes y recordatorios en las reuniones de seguridad. El cumplimiento de estas medidas refuerza el compromiso del proyecto con la conservación de la biodiversidad, el respeto por la legislación ambiental y la promoción de una cultura de responsabilidad ecológica en el sector de la construcción.




CONSORCIO SAN ANTONIO 2025



CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-021
Versión: 001
Fecha Aprobación: Agosto 2025

LUGAR: San Antonio

HORA: 10 | 00 | AM

ACTIVIDAD REALIZADA: Inducción / Reinducción / Charla de seguridad / Reunión de SST / Operativa / Seminario / Taller / Curso / Capacitación específica a cargo / Otra(cual)

TEMAS TRATADOS: Inicio del contrato

No.	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Orlando Jaimes Calderón	1193538334	Maestro	
2	Jhon Jairo Parra Cortes	1070611157	Oficial	
3	Ruben Darío Alvarado	5208480	oficial	
4	Wilmer Yesid Guerra Pinto	1193552623	Ayudante	
5	Wilmer Carmona Ruiz	1193552623	oficial	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Persona responsable de la actividad

Nombre: | Firma:



PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO			
N°	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	PERIOCIDAD	RESPONSABLE
1	Registros fotográficos (Informe)	Inicio	Contratista
2	Formato de asistencia	Una vez durante la	Contratista

		ejecución de la obra.	

N°7	FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL		CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
Ficha 7 de 7	COMPONENTE	FICHA N°7A	
MANEJO DE LA GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL		PROGRAMA COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
Objetivos	• Crear mecanismos y canales de comunicación y participación permanente de la ciudadanía de la zona en las actividades del proyecto. • Asegurar que todos los temas planteados por los grupos de interés sean adecuadamente referidos y reflejados en las decisiones y diseños del proyecto.		
Impactos a manejar	• Inconvenientes con la comunidad • Falsa expectativas de trabajo • Oposición de la comunidad a la ejecución de las obras. • Dificultades con la comunidad para la implementación de las medidas previstas		
TIPO DE MEDIDA			
Prevención	**Control**	**Mitigación**	**Compensación**	**Protección**
MEDIDAS DE MANEJO			
• Establecer canales efectivos de comunicación con la comunidad • Establecer mecanismo de selección de personal transparentes			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS En cumplimiento de los compromisos establecidos en la presente Ficha de Manejo Ambiental y en concordancia con los principios de transparencia, se continúa creando mecanismos de participación ciudadana de carácter permanente. Como parte de esta estrategia, se mantiene operativo un Punto de Buzón de Sugerencias y Quejas ubicado estratégicamente en el frente de obra o zona de intervención, fácilmente accesible para los habitantes del Municipio de San Antonio de Getucha. Dicho buzón está acompañado de un formato estandarizado de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias), debidamente identificado y con instrucciones claras para su diligenciamiento, lo que facilita la participación de cualquier miembro de la comunidad, independientemente de su nivel educativo o condición socioeconómica. Hasta la fecha de corte de este informe (21 de octubre de 2025), no se han recibido PQRS por parte de la comunidad, lo cual puede interpretarse como un indicador de aceptación social inicial o de baja percepción de impactos negativos. No obstante, el equipo de gestión social y ambiental mantiene una vigilancia activa y continua sobre este canal, asegurando que, en caso de presentarse alguna comunicación, esta será atendida, registrada, analizada y respondida de manera oportuna, clara y documentada, conforme al protocolo de atención establecido y en los plazos definidos por la normativa aplicable.				

La implementación de estos mecanismos refleja el compromiso del proyecto con el respeto a los derechos de las comunidades, la prevención de conflictos socio ambientales y la construcción de relaciones de confianza basadas en la transparencia y la responsabilidad social empresarial.			
PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO			
N°	**REGISTRO DE CUMPLIMIENTO**	**PERIOCIDAD**	**RESPONSABLE**
1	Informe mensual (registro fotográfico)	Mensual	Contratista
2	Registros fotográficos	Mensual	Contratista
3	Reuniones si se requiere (asistencia)	Mensual	Contratista

6 MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES

De acuerdo a los programas establecidos para el proyecto "ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA" se realizó la siguiente matriz con la finalidad de realizar seguimiento constante de los impactos ambientales generados.

ELEMENTOS Y FACTORES AMBIENTALES		Manejo de Residuos sólidos	Desmonte y descapote	Excavaciones varias	Operación de la infraestructura temporal	Desmantelamiento de la infraestructura temporal
SUELO	Contaminación o alteración de la capa orgánica del suelo					
	Contaminación del suelo por inadecuada disposición de residuos ordinarios					
	Degradación física del suelo					
CALIDAD ATMOSFERICA	Incremento en los niveles de ruido por los					

	vehículos y maquinaria utilizada en las obras					
	Contaminación visual.					
BIOLÓGICO	Alteración de hábitat y la biodiversidad					
	Afectación a la flora por la remoción de la cobertura vegetal.					
ECONOMÍA	Generación de empleo					

Evaluación de Impactos Ambientales y Sociales

De acuerdo con el porcentaje de avance de la obra y las actividades desarrolladas hasta la fecha (21 de octubre de 2025), no se han identificado impactos ambientales de alta magnitud o relevancia significativa que comprometan la integridad ecológica del área de intervención ni generen afectaciones directas o indirectas a la comunidad en general. No obstante, como es inherente a cualquier actividad de transformación del territorio, se han registrado alteraciones puntuales y localizadas, consistentes en:

- Remoción parcial de la cobertura vegetal en los sectores autorizados para la ejecución de obras;
- Degradación física del suelo, manifestada en procesos incipientes de compactación y pérdida de estructura en zonas de tránsito de maquinaria y acopio temporal de materiales;
- Alteración de la capa orgánica del suelo (horizonte O), derivada de la preparación del terreno para la instalación de infraestructura.

Estas alteraciones se encuentran totalmente contenidas dentro del área de intervención autorizada, han sido anticipadas en el diagnóstico de línea base y consideradas en el diseño del Plan de Manejo Ambiental (PMA). Su magnitud y extensión son acordes con la fase constructiva actual y no representan, en este momento, un riesgo sistémico para los recursos naturales ni para los servicios eco sistémicos del entorno.

En coherencia con los principios de prevención, precaución y responsabilidad ambiental, el proyecto mantiene un enfoque proactivo y riguroso en la

implementación de las medidas de manejo ambiental establecidas en el Plan de Gestión Ambiental correspondiente. Dichas medidas incluyen, entre otras:

- Delimitación estricta del área de trabajo autorizada.
- Cobertura y estabilización de montículos de tierra con geo membranas impermeables.
- Control de erosión mediante barreras físicas y prácticas de manejo de suelos;
- Actividades a horario diurno y uso de maquinaria en óptimas condiciones técnicas.
- Gestión integral de residuos sólidos a través del Punto Ecológico;
- Capacitación continúa del personal en buenas prácticas ambientales, incluyendo protección de flora y fauna.
- Monitoreo periódico de los indicadores ambientales definidos en el PMA.

Estas acciones tienen como objetivo *prevenir la generación de impactos adicionales, mitigar los efectos ya manifestados y, en su caso, aplicar medidas de rehabilitación o compensación* conforme avance la obra y se identifiquen nuevas condiciones de campo.

La supervisión ambiental, en coordinación con la interventoría, garantiza el cumplimiento continuo de los compromisos ambientales, asegurando que cualquier efecto adverso potencial sea abordado de manera oportuna, técnica y conforme a la normativa ambiental vigente.

CRONOGRAMA **22 de Octubre al 21 de Noviembre de 2025**	
FICHA N. 3A	MANEJO DEL RECURSO SUELO
FICHA N. 4A	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS Y SOBRANTES DE OBRA
FICHA N. 5A	MANEJO COMPONENTE ATMOSFERICO
FICHA N. 6A	MANEJO DE FLORA Y FAUNA
FICHA N. 7A	PROGRAMA COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ALDA MARTIZA DUSSAN ACOSTA
C.C. No. 40.781.657 DE FLORENCIA
R/L. CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

ANEXO 9 INFORMES SEMANALES

	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	F-GCT-01-V1 Vigencia: 30/07/2023
CONSORCIO SAN ANTONIO 2025	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

PERIODO DEL INFORME: DEL: 19/09/2025 AL 25/09/2025 **fecha del informe** 28/09/2025

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (INTERVENTORIA U OBRA SEGÚN EL CASO)

CONTRATO DE (OBRA O INTERVENTORIA):	No. COP 2025-002 DE	PLAZO INICIAL:	CINCO MESES (5)
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO 2025	PLAZO ACTUAL:	CINCO MESES (5)
REP. LEGAL:	ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA		FECHA
		FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	22/04/2025
OBJETO:	ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:	22/08/2025
		FECHA DE TERMINACION INICIAL CONTRATO:	21/01/2026 0
VALOR INICIAL:	$ 988.082.242,00 ANTICIPO (%) 0%	FECHA DE PRORROGA:	
VALOR ADICIONAL:	$ - PARCIAL 1 (%) 0% $ -	FECHA DE SUSPENSION:	NA NA
VALOR FINAL:	$ 988.082.242,00 PARCIAL 2 (%) 0% $ -	FECHA DE REINICIO:	NA NA
	PARCIAL 3 (%) 0% $ -		
	Σ PARCIALES 0% $ -	FECHA ACTUAL DE TERMINACION CONTRATO:	21/01/2026
FORMA DE PAGO:	CONFORME AVANCE DE OBRA - SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA	ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:	EN EJECUCION

2. DATOS TECNICOS DEL CONTRATO:

METAS FISICAS ACTUALIZADA:			OBRA	INTERVENTORIA
☐ RED DE ACUEDUCTO		ML	PROGRAMA:	PROGRAMA:
☑ RED ALC. SAN / PLUV	594,01	ML	ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, LA CUAL ESTA CUBRE EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE
☐ PTAP / PTAR		UN		
☐ POZOS PROFUNDOS		ML		
☐ VIA URB / SEC / TERC		KM		
☐ PUENTE / ALC / BOX		UN		
☐ OTRO. CUAL?	CELDA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	UN		
			RUBRO: FUENTE:	RUBRO: FUENTE: PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y
			FUENTE	FUENTE
META FISICA (VALOR/UN):	$ 988.082.242 $/UN		ACTAS COBRADAS $ 0	ACTAS COBRADAS $ 0,00%
			0	

3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1 CONTRATO	22/04/2025		$ 988.082.242	
2 ACTA DE INICIO	22/08/2025		$ 988.082.242	
3 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES OBRA N° 1	22/08/2025		$ 988.082.242	
4 ACTA DE APROBACION DE ITEM NO PREVISTOS No1				
4 ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1				
5 OTRO SI 1				
6 ACTA DE MODIFICACION No 2				
7 ACTA DE RECIBO PARCIAL No 2	29/09/2025		$ 988.082.242	
8 OTRO SI 2				
9 ACTA DE MODIFICACION 3				
10 ACTA No 3 DE RECIBO FINAL DE OBRA				
11 ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO DE OBRA				
12 ACTA DE LIQUIDACION				

	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	F-GCT-01-V1 Vigencia: 30/07/2023
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

4. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA (SI APLICA)	CONTRATO DE OBRA (SEGÚN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SI APLICA)

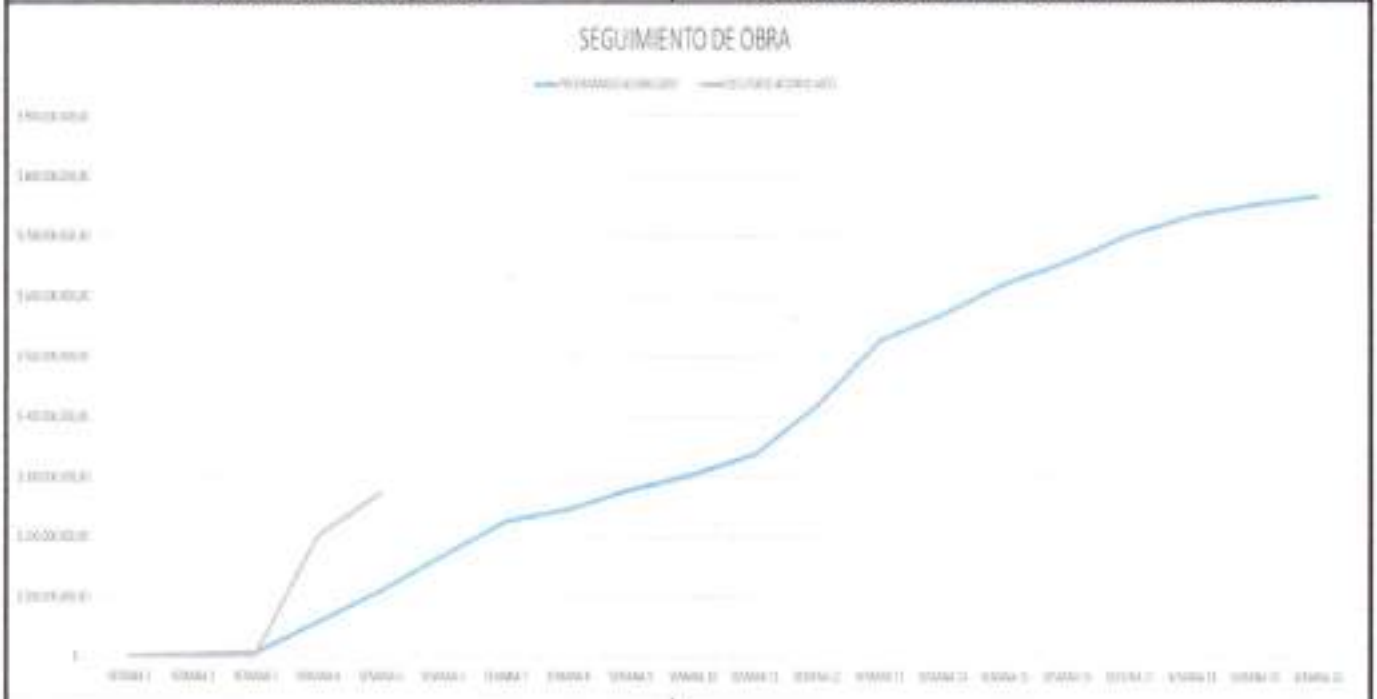


GRAFICO DE AVANCE

CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X SUP	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
CUADRO DE RELACION DE PERSONAL SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORMES MENSUAL ENTREGADO A LA INTERVENTORIA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
COPIA DE LA BITACORA AL DIA FIRMADA Y AL DIA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐	NO CUMPLE

TABLA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE

CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X INT	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
CUADRO DE RELACION DE PERSONAL SEGUN OFERTA E IBC PROPUESTO REV INTER	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
CUADRO DE EQUIPO SEGUN PROPUESTA REV POR INTERVENTORIA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORME METEREOLOGICO	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORMES MENSUALES	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORME PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORME PLAN DE SALUD OCUPACIONAL	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
SOCIALIZACION	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
VEEDURIA CIUDADANA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
VALLA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐		☐	
	☐		☐	

5. INFORMACION DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO, AVANCES EN % OBRA PROGRAMADA VS EJECUTADA

INTERVENTORIA

% AVANCE EN PLAZO:	23,00%	PLAZO FALTANTE:	77,00%	% PROGRAMACION OBRA	14,06%	% OBRA EJECUTADA	16,82%

OBRA (SEGÚN INFORMACION DE INTERVENTORIA SI APLICA)

% AVANCE EN PLAZO:	23,00%	PLAZO FALTANTE:	77,00%	% PROGRAMACION OBRA	14,06%	% OBRA EJECUTADA	16,82%

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITE TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

El contratista da inicio al la instalacion de la tuberia en el tramo -P7- p8

	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	F-GCT-01-V1 Vigencia: 30/07/2023
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

7. REGISTRO FOTOGRAFICO (DESCRIPCION). ENVIAR COPIA MAGNETICA AL CORREO INSTITUCIONAL (XXXX)



Foto 1




Foto 2

8. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUMPLE SI [x] NO [ ]
CUALES? :
SE REQUIERE AJUSTES A LOS DISEÑOS: SI [x] NO [ ]
CAUSALES?: REUBICACION DE SENDEROS PEATONALES Y BARRAS DE PARQUEO A CAUSA DE ARBOLES EXISTENTES

SE CUMPLE CON EL OBJETO DEL CONTRATO? SI [x] NO [ ]
PORQUE?
REQUIERE ADICIONAL? SI [ ] NO [x] VALOR? $ 0
EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN? SI [x] NO [ ]
PORQUE?

9. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

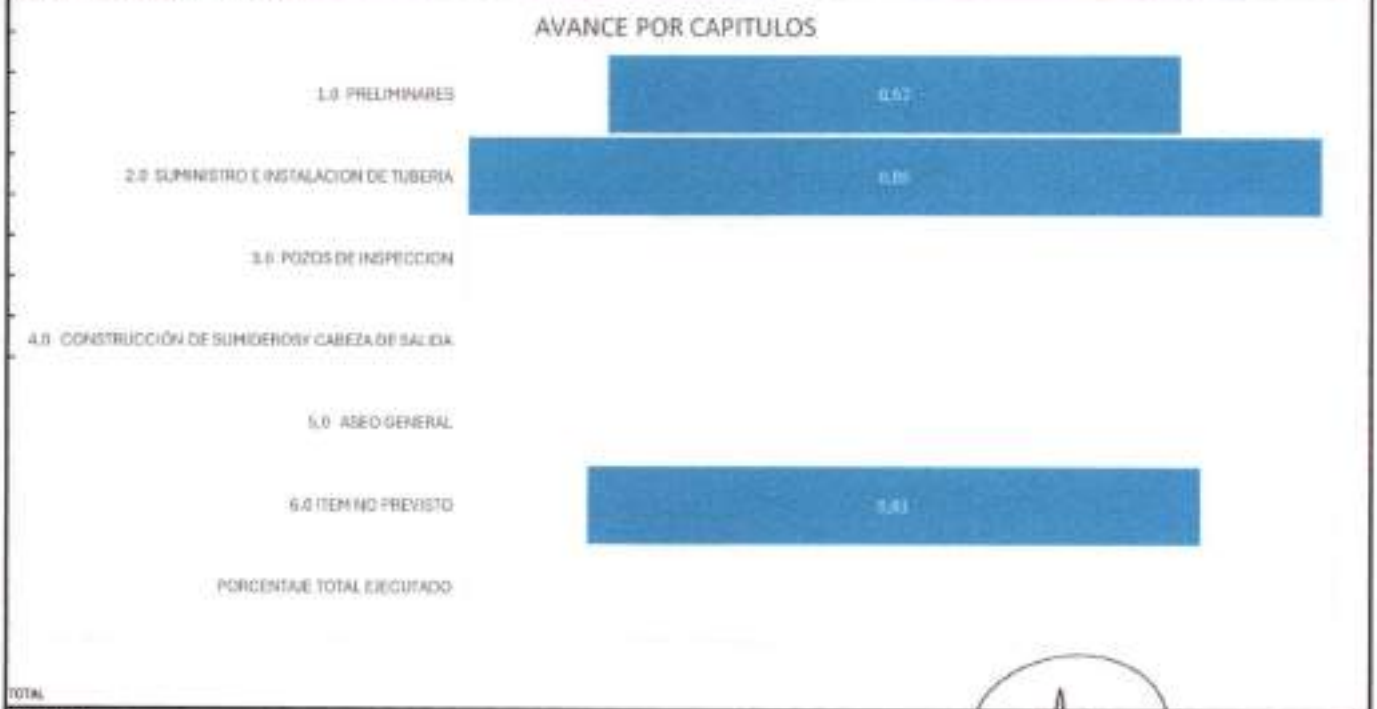

TOTAL

10. FIRMAS

FIRMA DEL INTERVENTOR - CARLOS DARIO CANO SANCHEZ

	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	F-GCT-01-V1
		Vigencia: 30/07/2023
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

PERIODO DEL INFORME: DEL 28/09/2025 AL 3/10/2025 **fecha del informe** 28/06/2025

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (INTERVENTORIA U OBRA SEGÚN EL CASO)

CONTRATO DE (OBRA O INTERVENTORIA): No. COP-2025-002 CE
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
REP. LEGAL: ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA

OBJETO: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 8, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

VALOR INICIAL:	$ 888.092.242,00	ANTICIPO (%)	0%		
VALOR ADICIONAL:	$ -	PARCIAL 1 (%)	0%	$	-
VALOR FINAL:	$ 888.092.242,00	PARCIAL 2 (%)	0%	$	-
		PARCIAL 3 (%)	0%	$	-
		Σ PARCIALES	0%	$	-

FORMA DE PAGO: CONFORME AVANCE DE OBRA - SEGÚN PROPUESTA ECONÓMICA

PLAZO INICIAL:	CINCO MESES (5)
PLAZO ACTUAL:	CINCO MESES (5)
	FECHA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	22/04/2025
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:	22/08/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL CONTRATO:	21/01/2026 0
FECHA DE PRORROGA:	
FECHA DE SUSPENSION:	NA NA
FECHA DE REINICIO:	NA NA
FECHA ACTUAL DE TERMINACION CONTRATO:	21/01/2026
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:	EN EJECUCION

2. DATOS TECNICOS DEL CONTRATO:

METAS FISICAS ACTUALIZADA:

☐	RED DE ACUEDUCTO		ML
☑	RED ALC. SAN / PLUV	944,01	ML
☐	PTAP / PTAR		UN
☐	POZOS PROFUNDOS		ML
☐	VIA URB / SEC / TERC		KM
☐	FUENTE / ALC / BOX		UN
☐	OTRO. CUAL?	ORDEN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	UN

META FISICA (VALOR/UN): $ 888.092.242 $/UN

OBRA	INTERVENTORIA
PROGRAMA: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 8, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	PROGRAMA: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARA EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN
RUBRO: FUENTE:	RUBRO: FUENTE: PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y
FUENTE	FUENTE
ACTAS COBRADAS $ 0	ACTAS COBRADAS $ 0,00%
0	

3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorroga, Adicional, Modificatoria, Parciales,Cornbea, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1 CONTRATO	22/04/2025		$ 888.092.242	
2 ACTA DE INICIO	22/08/2025		$ 888.092.242	
3 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES OBRA № 1	22/08/2025		$ 888.092.242	
4 ACTA DE APROBACION DE ITEM NO PREVISTOS No1				
4 ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1				
5 OTRO SI 1				
6 ACTA DE MODIFICACION No.2				
7 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2	29/09/2025		$ 888.092.242	
8 OTRO SI 2				
9 ACTA DE MODIFICACION 3				
10 ACTA No.3 DE RECIBO FINAL DE OBRA				
11 ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO DE OBRA				
12 ACTA DE LIQUIDACION				

	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	F-GCT-01-V1 Vigencia: 30/07/2023
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

4. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA (SI APLICA)	CONTRATO DE OBRA (SEGÚN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SI APLICA):

CONTROL DE CRONOGRAMA

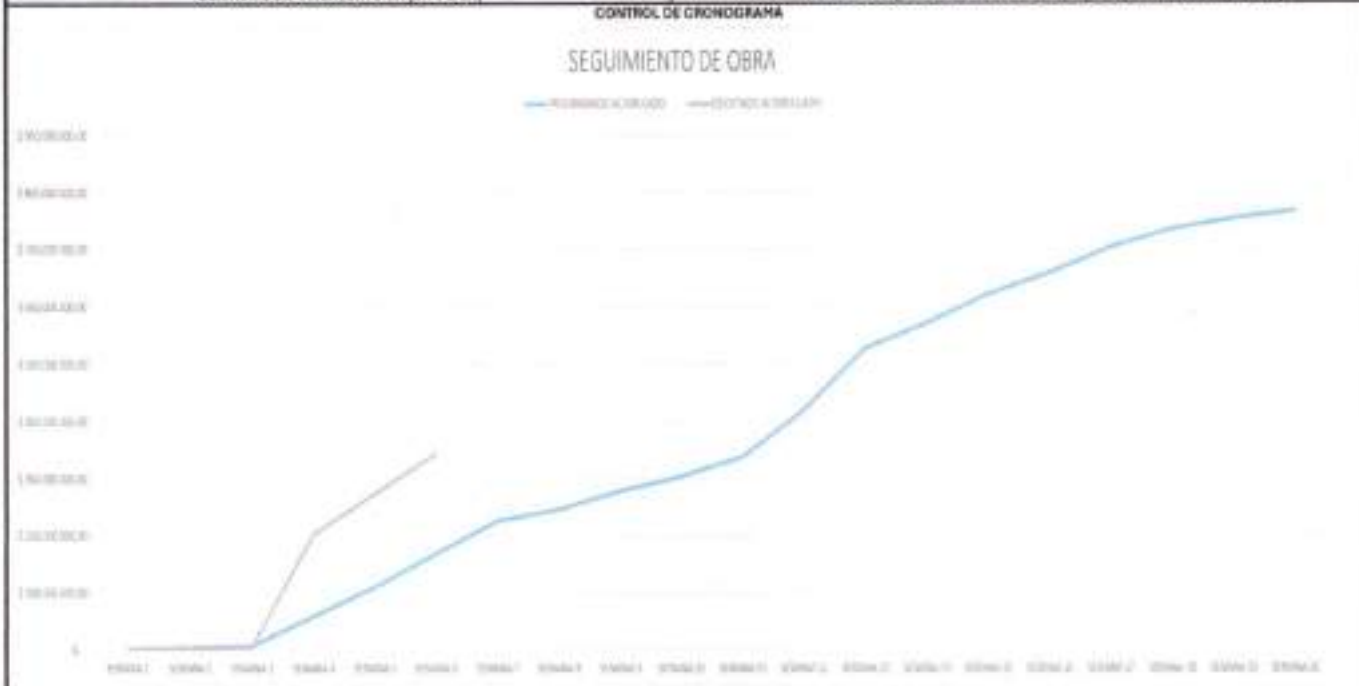


GRAFICO DE AVANCE					TABLA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE				
CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X SUP	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE	**CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS** ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X INT	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
CUADRO DE RELACION DE PERSONAL SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE	**CUADRO DE RELACION DE PERSONAL** SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO REV INTER	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE	**CUADRO DE EQUIPO** SEGÚN PROPUESTA REV POR INTERVENTORIA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORMES MENSUAL ENTREGADO A LA INTERVENTORIA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE	**INFORME METEREOLOGICO**	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
COPIA DE LA BITACORA AL DIA FIRMADA Y AL DIA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE	**INFORMES MENSUALES**	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐	NO CUMPLE	**INFORME PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐	NO CUMPLE	**INFORME PLAN DE SALUD OCUPACIONAL**	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐	NO CUMPLE	**SOCIALIZACION**	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
					VEEDURIA CIUDADANA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
					VALLA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
						☐		☐	
						☐		☐	

5. INFORMACION DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO, AVANCES EN % OBRA PROGRAMADA VS EJECUTADA

INTERVENTORIA

% AVANCE EN PLAZO:	28,00%	PLAZO FALTANTE:	72,00%	% PROGRAMACION OBRA	22,99%	% OBRA EJECUTADA	44,00%

OBRA (SEGUN INFORMACION DE INTERVENTORIA SI APLICA)

% AVANCE EN PLAZO:	28,00%	PLAZO FALTANTE:	72,00%	% PROGRAMACION OBRA	22,99%	% OBRA EJECUTADA	44,00%

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITE TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

El contratista da inicio al la instalacion de la tuberia en el tramo -P6- p7

	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	F-GCT-01-V1 Vigencia: 30/07/2023
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO (DESCRIPCION). ENVIAR COPIA MAGNETICA AL CORREO INSTITUCIONAL (XXXX)



Foto 1



Foto 2

8. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUMPLE SI ☑ NO ☐
CUALES?:

SE REQUIERE AJUSTES A LOS DISEÑOS: SI ☑ NO ☐
CAUSALES? REUBICACION DE SENDEROS PEATONALES Y BARRAS DE PARQUEETA CAUSA DE ARBOLES EXISTENTES

SE CUMPLE CON EL OBJETO DEL CONTRATO? SI ☑ NO ☐
PORQUE?

REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ NO ☑ VALOR? $ 0
EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN? SI ☑ NO ☐
PORQUE?

9. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

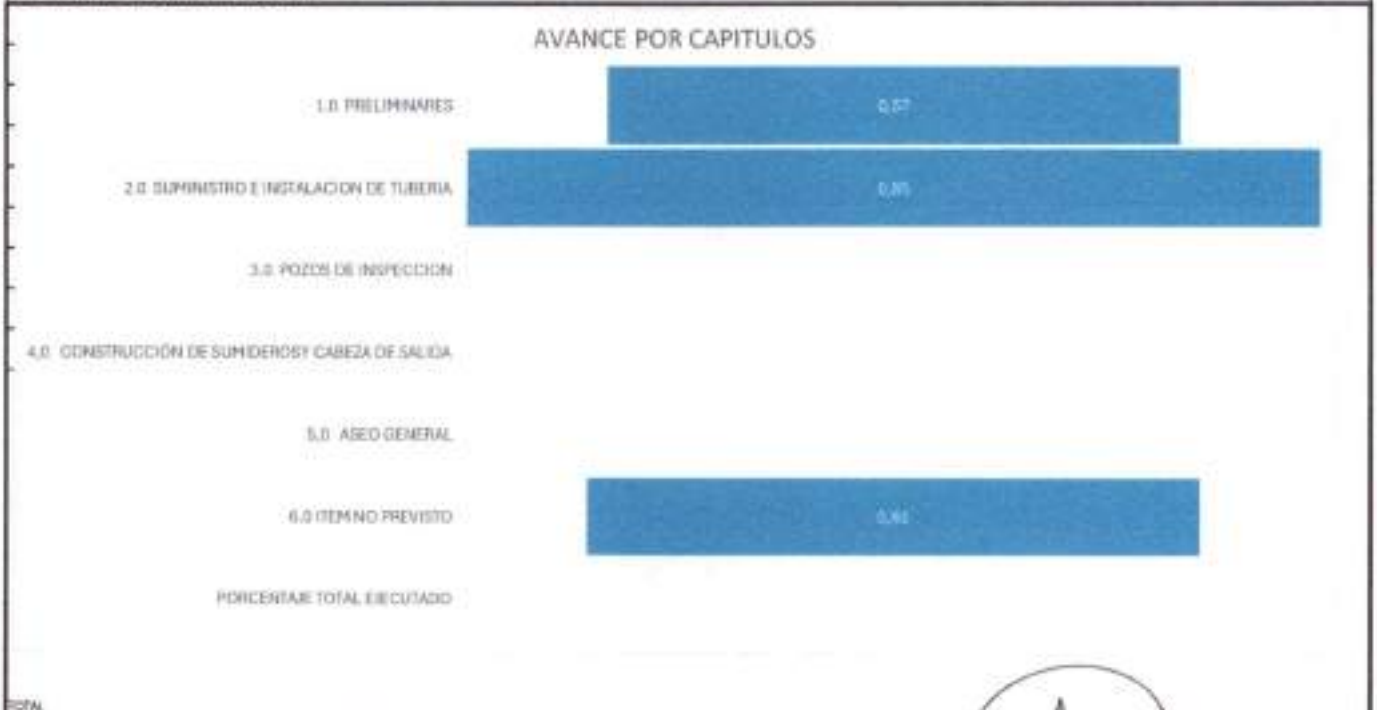

TOTAL

10. FIRMAS

FIRMA DEL INTERVENTOR - CARLOS DARIO CANO SANCHEZ

	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	F-GCT-01-V1 Vigencia: 30/07/2023
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

PERIODO DEL INFORME: DEL: 3/10/2025 AL 9/16/2025 **fecha del informe** 28/06/2025

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (INTERVENTORIA U OBRA SEGÚN EL CASO)

CONTRATO DE (OBRA O INTERVENTORIA): No. COP-2025-002 DE
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
REP. LEGAL: ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA

OBJETO: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 8, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

VALOR INICIAL :	$ 988.082.342,00	ANTICIPO (%)	0%		
VALOR ADICIONAL:	$ -	PARCIAL 1 (%)	0%	$ -	
VALOR FINAL:	$ 988.082.342,00	PARCIAL 2 (%)	0%	$ -	
		PARCIAL 3 (%)	0%	$ -	
		E PARCIALES	0%	$ -	

FORMA DE PAGO: CONFORME AVANCE DE OBRA - SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA

PLAZO INICIAL:	CINCO MESES (5)
PLAZO ACTUAL:	CINCO MESES (5)
	FECHA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	22/04/2025
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO :	22/09/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL CONTRATO :	21/01/2026 0
FECHA DE PRORROGA:	
FECHA DE SUSPENSION: NA	NA
FECHA DE REINICIO: NA	NA
FECHA ACTUAL DE TERMINACION CONTRATO :	21/01/2026
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO :	EN EJECUCION

2. DATOS TECNICOS DEL CONTRATO:

METAS FISICAS ACTUALIZADA:

☐	RED DE ACUEDUCTO		ML
☑	RED ALC. SAN. / PLUV	584,01	ML
☐	PTAP / PTAR		UN
☐	POZOS PROFUNDOS		ML
☐	VIA URB / SEC / TERC		KM
☐	PUENTE / ALC / BOX		UN
☐	OTRO, CUAL?	CELDA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	UN

META FISICA (VALOR/UN): $ 988.082,342 $/UN

OBRA	INTERVENTORIA
PROGRAMA: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 8, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	PROGRAMA: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, LA CUAL ETC LLEVARA EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE
RUBRO: FUENTE:	RUBRO: FUENTE: PA PA - SGP - AGUA POTABLE Y
FUENTE	FUENTE
ACTAS COBRADAS $ 0	ACTAS COBRADAS $ 0,00%
0	

3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO:


ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1 CONTRATO	22/04/2025		$ 988.082.342	
2 ACTA DE INICIO	22/09/2025		$ 988.082.342	
3 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES OBRA Nº 1	22/09/2025		$ 988.082.342	
4 ACTA DE APROBACION DE ITEM NO PREVISTOS No1				
4 ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1				
5 OTRO SI 1				
6 ACTA DE MODIFICACION No 2				
7 ACTA DE RECIBO PARCIAL No 2	29/09/2025		$ 988.082.342	
8 OTRO SI 2				
9 ACTA DE MODIFICACION 3				
10 ACTA No 3 DE RECIBO FINAL DE OBRA				
11 ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO DE OBRA				
12 ACTA DE LIQUIDACION				

	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	F-GCT-01-V1 Vigencia: 30/07/2023
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

4. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA (SI APLICA)	CONTRATO DE OBRA (SEGÚN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SI APLICA):

CONTROL DE CRONOGRAMA

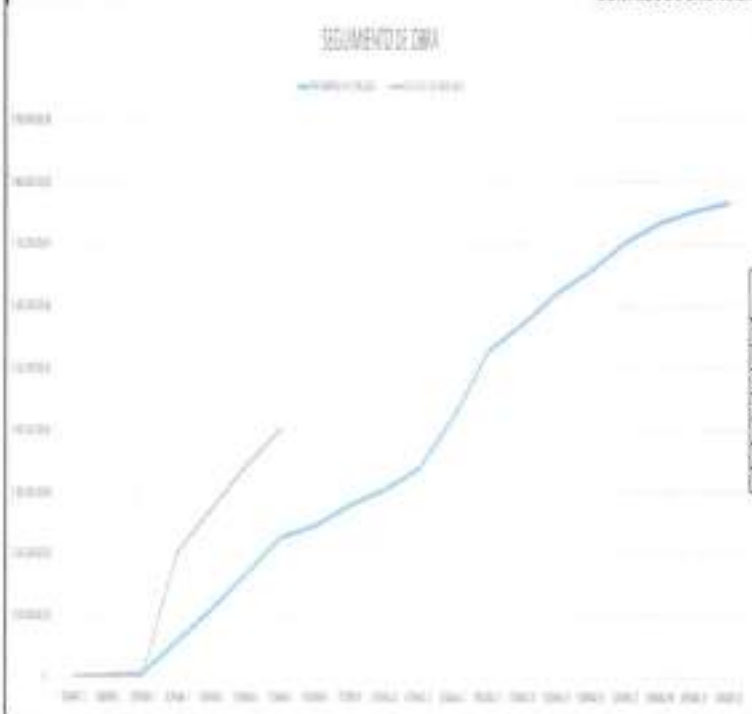

SEMANA	PROGRAMADO SEMANAL	EJECUTADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
SEMANA 1	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33
SEMANA 2	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33	$ 4.865.051,33	$ 2.797.892,67
SEMANA 3	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33	$ 7.297.577,00	$ 4.196.839,00
SEMANA 4	$ 51.167.237,90	$ 198.013.374,00	$ 58.464.814,90	$ 202.210.213,00
SEMANA 5	$ 51.167.237,90	$ 71.861.373,50	$ 109.632.052,79	$ 274.051.586,50
SEMANA 6	$ 58.508.557,90	$ 69.774.887,50	$ 168.140.610,69	$ 343.866.474,00
SEMANA 7	$ 58.508.557,90	$ 58.177.530,50	$ 226.649.168,58	$ 402.044.004,50

CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X SUP	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
CUADRO DE RELACION DE PERSONAL SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
INFORMES MENSUAL ENTREGADO A LA INTERVENTORIA	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
COPIA DE LA BITACORA AL DIA FIRMADA Y AL DIA	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐ NO CUMPLE

TABLA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE

CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X INT	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
CUADRO DE RELACION DE PERSONAL SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO REV INTER	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
CUADRO DE EQUIPO SEGÚN PROPUESTA REV POR INTERVENTORIA	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
INFORME METEREOLOGICO	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
INFORMES MENSUALES	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
INFORME PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
INFORME PLAN DE SALUD OCUPACIONAL	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
SOCIALIZACION	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
VEEDURIA CIUDADANA	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
VALLA	☑	CUMPLE	☐ NO CUMPLE
	☐		☐
	☐		☐

5. INFORMACION DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO, AVANCES EN % OBRA PROGRAMADA VS EJECUTADA

INTERVENTORIA

% AVANCE EN PLAZO:	32,00%	PLAZO FALTANTE:	68,00%	% PROGRAMACION OBRA	30,00%	% OBRA EJECUTADA	52,54%

OBRA (SEGÚN INFORMACION DE INTERVENTORIA SI APLICA)

% AVANCE EN PLAZO:	32,00%	PLAZO FALTANTE:	68,00%	% PROGRAMACION OBRA	30,00%	% OBRA EJECUTADA	52,54%

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITE TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

El contratista da inicio a la instalacion de la tuberia en el tramo -P6- P8

	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	F-GCT-01-V1 Vigencia: 30/07/2023
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

7. REGISTRO FOTOGRAFICO (DESCRIPCION). ENVIAR COPIA MAGNETICA AL CORREO INSTITUCIONAL (XXXX)



Foto 1




Foto 2

8. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS: CUMPLE SI ☑ NO ☐
CUALES? :
SE REQUIERE AJUSTES A LOS DISEÑOS: SI ☑ NO ☐
CUALES?: REUBICACIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y BARRAS DE PARQUEO A CAUSA DE ARBOLES EXISTENTES

SE CUMPLE CON EL OBJETO DEL CONTRATO? SI ☑ NO ☐
PORQUE?
REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ NO ☑ VALOR? $ 0
EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN? SI ☑ NO ☐
PORQUE?

9. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

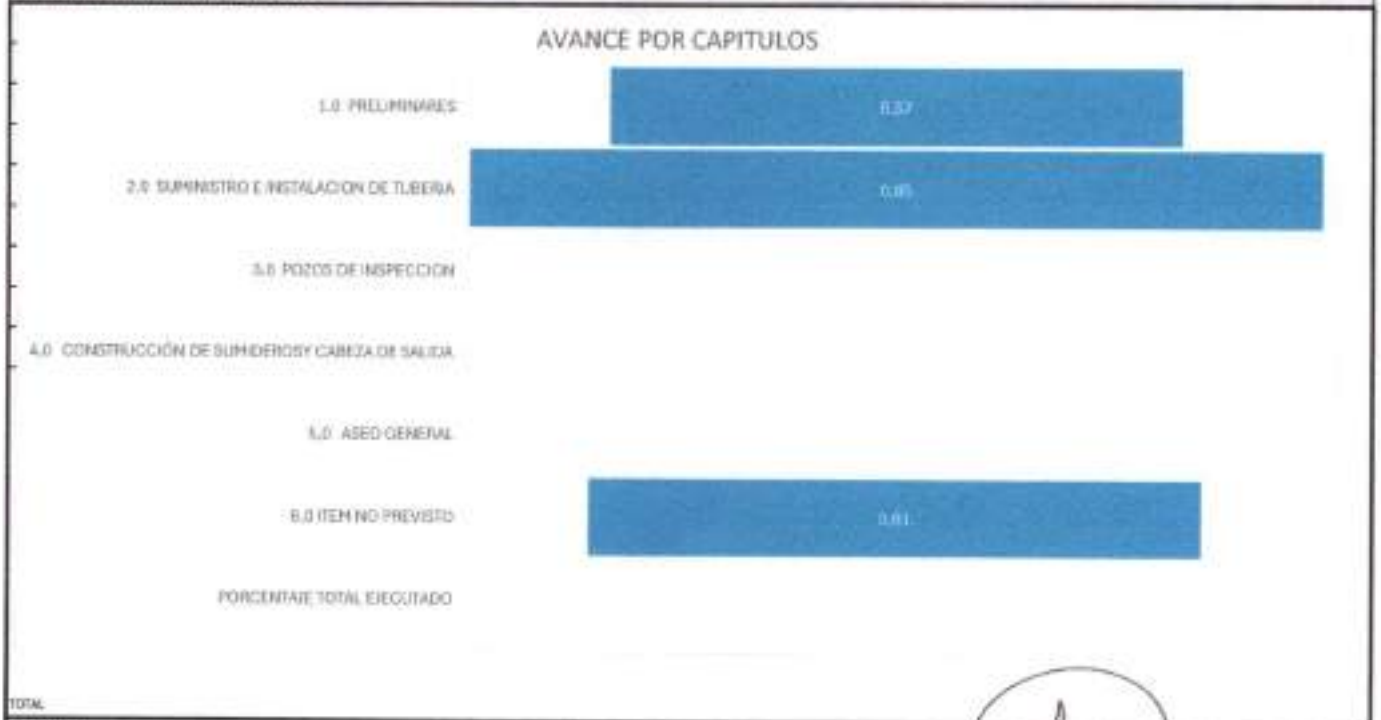

TOTAL

10. FIRMAS

FIRMA DEL INTERVENTOR - CARLOS DARIO CANO SANCHEZ

	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	F-GCT-01-V1
		Vigencia: 30/07/2023
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

PERIODO DEL INFORME: DEL: 10/10/2025 AL 18/10/2025 **fecha del informe** 28/06/2025

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (INTERVENTORIA U OBRA SEGÚN EL CASO)

CONTRATO DE (OBRA O INTERVENTORIA): No. CDP-2025-003 DE
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
REP. LEGAL: ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA

OBJETO: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

VALOR INICIAL:	$ 988.082.242,00	ANTICIPO (%)	0%		
VALOR ADICIONAL:	$ -	PARCIAL 1 (%)	0%	$ -	
VALOR FINAL:	$ 988.082.242,00	PARCIAL 2 (%)	0%	$ -	
		PARCIAL 3 (%)	0%	$ -	
		2 PARCIALES	0%	$ -	

FORMA DE PAGO: CONFORME AVANCE DE OBRA - SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA

PLAZO INICIAL:	CINCO MESES (5)
PLAZO ACTUAL:	CINCO MESES (5)
	FECHA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	22/04/2025
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:	22/09/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL CONTRATO:	21/01/2026 0
FECHA DE PRORROGA:	
FECHA DE SUSPENSION:	NA NA
FECHA DE REINICIO:	NA NA
FECHA ACTUAL DE TERMINACION CONTRATO:	21/01/2026
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:	EN EJECUCION

2. DATOS TECNICOS DEL CONTRATO:

METAS FISICAS ACTUALIZADA:

☐	RED DE ACUEDUCTO		ML
☑	RED ALC. SAN / PLUV	584.01	ML
☐	PTAP / PTAR		UN
☐	POZOS PROFUNDOS		ML
☐	VIA URB / SEC / TERC		KM
☐	FUENTE / ALC / BOX		UN
☐	OTRO. CUAL?	CELDA DE RELLENO DE RESIDUOS SOLIDOS	UN

META FISICA (VALOR/UN): $ 988.082.242 $/UN

OBRA	INTERVENTORIA
PROGRAMA: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	PROGRAMA: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, LA CUAL ESTA FIRMA ES RESPONSABLE DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE
RUBRO: FUENTE:	RUBRO: FUENTE: PA FVA - SGP - AGUA POTABLE Y
FUENTE	FUENTE
ACTAS COBRADAS $ 0	ACTAS COBRADAS $ 0,00%
0	

3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1 CONTRATO	22/04/2025		$ 988.082.242	
2 ACTA DE INICIO	22/09/2025		$ 988.082.242	
3 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES OBRA Nº 1	22/09/2025		$ 988.082.242	
4 ACTA DE APROBACION DE ITEM NO PREVISTOS No1				
4 ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1				
5 OTRO SI 1				
6 ACTA DE MODIFICACION No 2				
7 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2	29/09/2025		$ 988.082.242	
8 OTRO SI 2				
9 ACTA DE MODIFICACION 3				
10 ACTA No.3 DE RECIBO FINAL DE OBRA				
11 ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO DE OBRA				
12 ACTA DE LIQUIDACION				

	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	F-GCT-01-V1 Vigencia: 30/07/2023
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

4. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA (SI APLICA)	CONTRATO DE OBRA (SEGÚN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SI APLICA):

CONTROL DE CRONOGRAMA



SEMANA	PROGRAMADO SEMANAL	EJECUTADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULUADO
SEMANA 1	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33
SEMANA 2	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33	$ 4.865.051,33	$ 2.797.892,67
SEMANA 3	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33	$ 7.297.577,00	$ 4.196.839,00
SEMANA 4	$ 51.167.237,90	$ 198.033.374,00	$ 58.464.814,90	$ 202.230.213,00
SEMANA 5	$ 51.167.237,90	$ 71.861.373,50	$ 109.632.052,79	$ 274.091.586,50
SEMANA 6	$ 58.508.557,90	$ 69.774.887,50	$ 168.140.610,69	$ 343.866.474,00
SEMANA 7	$ 58.508.557,90	$ 58.177.530,50	$ 226.649.168,58	$ 402.044.004,50
SEMANA 8	$ 18.865.814,40	$ 103.873.589,50	$ 245.514.982,98	$ 505.917.594,00

GRAFICO DE AVANCE

CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X SUP	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
CUADRO DE RELACION DE PERSONAL SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORMES MENSUAL ENTREGADO A LA INTERVENTORIA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
COPIA DE LA BITACORA AL DIA FIRMADA Y AL DIA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐	NO CUMPLE

TABLA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE

CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X INT	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
CUADRO DE RELACION DE PERSONAL SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO REV INTER	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
CUADRO DE EQUIPO SEGÚN PROPUESTA REV POR INTERVENTORIA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORME METEREOLOGICO	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORMES MENSUALES	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORME PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORME PLAN DE SALUD OCUPACIONAL	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
SOCIALIZACION	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
VEEDURIA CIUDADANA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
VALLA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐		☐	
	☐		☐	

5. INFORMACION DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO, AVANCES EN % OBRA PROGRAMADA VS EJECUTADA

INTERVENTORIA

% AVANCE EN PLAZO:	37,66%	PLAZO FALTANTE:	63,00%	% PROGRAMACION OBRA:	32,00%	% OBRA EJECUTADA:	88,00%

OBRA (SEGÚN INFORMACION DE INTERVENTORIA SI APLICA)

% AVANCE EN PLAZO:	37,66%	PLAZO FALTANTE:	63,00%	% PROGRAMACION OBRA:	32,00%	% OBRA EJECUTADA:	88,00%

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITE TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

El contratista da inicio al la instalacion de la tuberia en el tramo - PD-P4

	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	F-GCT-01-V1 Vigencia: 30/07/2023
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

7. REGISTRO FOTOGRAFICO (DESCRIPCION). ENVIAR COPIA MAGNETICA AL CORREO INSTITUCIONAL (CCEE)



Foto 1




Foto 2

8. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS: CUMPLE SI ☑ NO ☐
CUALES?:
SE REQUIERE AJUSTES A LOS DISEÑOS: SI ☑ NO ☐
CAUSALES? REUBICACION DE SENDEROS PEATONALES Y BARRAS DE PARQUEO A CAUSA DE ARBOLES EXISTENTES

SE CUMPLE CON EL OBJETO DEL CONTRATO? SI ☑ NO ☐
PORQUE?
REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ NO ☑ VALOR? $ 0
EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN? SI ☑ NO ☐
PORQUE?

9. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

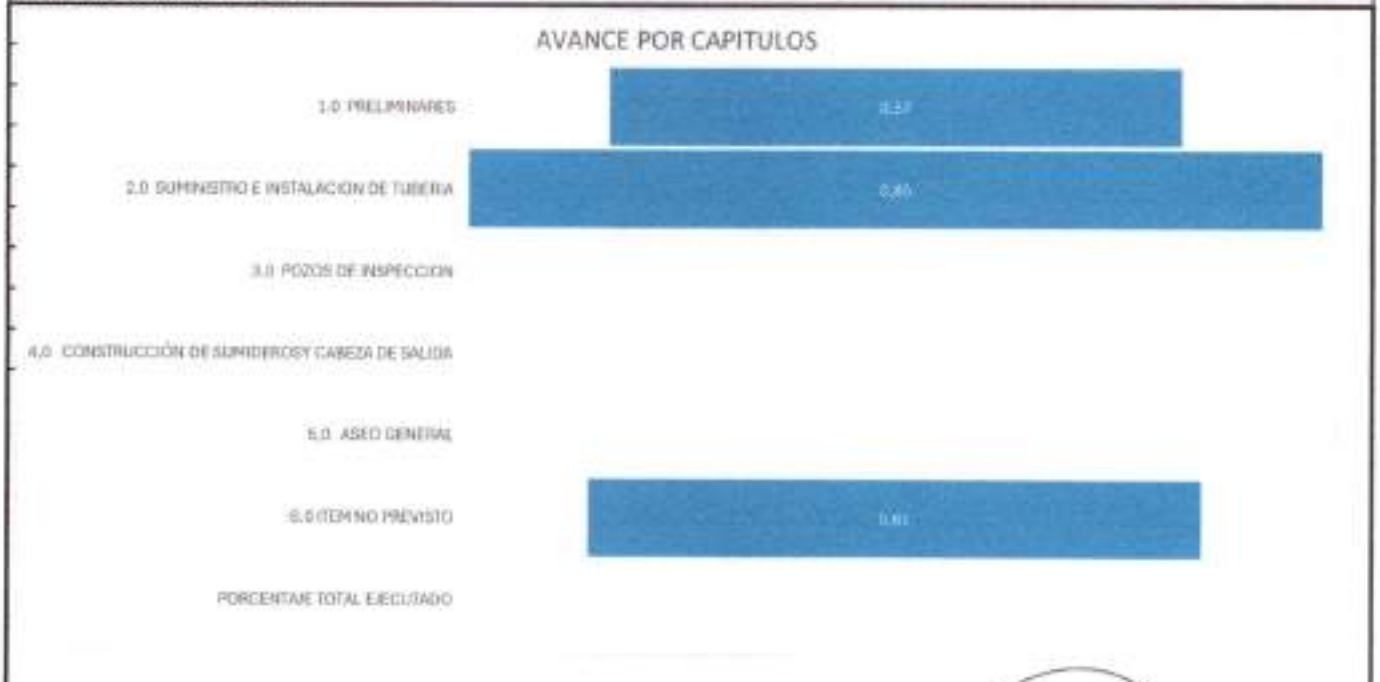

TOTAL

10. FIRMAS

FIRMA DEL INTERVENTOR - CARLOS DARIO CANO SANCHEZ

	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	F-GCT-01-V1 Vigencia: 30/07/2023
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

PERIODO DEL INFORME: DEL: 17/10/2025 AL 23/10/2025 **fecha del informe** 28/06/2025

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (INTERVENTORIA U OBRA SEGÚN EL CASO)

CONTRATO DE (OBRA O INTERVENTORIA):	No. COP-2025-002 DE	PLAZO INICIAL:	CINCO MESES (5)
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO 2025	PLAZO ACTUAL:	CINCO MESES (5)
REP. LEGAL:	ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA		FECHA
		FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	22/04/2025
OBJETO:	ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:	22/06/2025
		FECHA DE TERMINACION INICIAL CONTRATO:	21/01/2026 0
VALOR INICIAL:	$ 988.082.242,00 ANTICIPO (%) 0%	FECHA DE PRORROGA:	
VALOR ADICIONAL:	$ - PARCIAL 1 (%) 0% $ -	FECHA DE SUSPENSION:	NA NA
VALOR FINAL:	$ 988.082.242,00 PARCIAL 2 (%) 0% $ -	FECHA DE REINICIO:	NA NA
	PARCIAL 3 (%) 0% $ -		
	3 PARCIALES 0% $ -	FECHA ACTUAL DE TERMINACION CONTRATO:	21/01/2026
FORMA DE PAGO:		ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:	
	CONFORME AVANCE DE OBRA - SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA		EN EJECUCION

2. DATOS TÉCNICOS DEL CONTRATO:

METAS FISICAS ACTUALIZADA:			OBRA	INTERVENTORIA
☐ RED DE ACUEDUCTO		ML	PROGRAMA:	PROGRAMA:
☑ RED ALC. SAN / PLUV	584,83	ML	ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, LA CUAL EJECUTARA EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN
☐ PTAP / PTAR		UN		
☐ POZOS PROFUNDOS		ML		
☐ VIA URB / SEC / TERC		KM		
☐ FUENTE / ALC / BOX		UN		
☐ OTRO. CUAL?	GESTIÓN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	UN		
			RUBRO: FUENTE:	RUBRO: FUENTE: PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y
META FISICA (VALOR/UN):	$ 988.082.242 $/UN		FUENTE:	FUENTE:
			ACTAS COBRADAS $ 0	ACTAS COBRADAS $ 0,00%
			0	

3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Combis, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1 CONTRATO	22/04/2025		$ 988.082.242	
2 ACTA DE INICIO	22/06/2025		$ 988.082.242	
3 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES OBRA N° 1	22/08/2025		$ 988.082.242	
4 ACTA DE APROBACION DE ITEM NO PREVISTOS No1				
4 ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1				
5 OTRO SI 1				
6 ACTA DE MODIFICACION No.2				
7 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2	29/09/2025		$ 988.082.242	
8 OTRO SI 2				
9 ACTA DE MODIFICACION 3				
10 ACTA No 3 DE RECIBO FINAL DE OBRA				
11 ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO DE OBRA				
12 ACTA DE LIQUIDACION				

	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	F-GCT-01-V1 Vigencia: 30/07/2023
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

4. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA (SI APLICA)	CONTRATO DE OBRA (SEGÚN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SI APLICA):

CONTROL DE CRONOGRAMA



SEMANA	PROGRAMADO SEMANAL	EJECUTADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULUADO
SEMANA 1	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33
SEMANA 2	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33	$ 4.865.051,33	$ 2.797.892,67
SEMANA 3	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33	$ 7.297.577,00	$ 4.196.839,00
SEMANA 4	$ 51.167.237,90	$ 198.033.374,00	$ 58.464.814,90	$ 202.230.213,00
SEMANA 5	$ 51.167.237,90	$ 71.861.373,50	$ 109.632.052,79	$ 274.091.586,50
SEMANA 6	$ 58.508.557,90	$ 69.774.887,50	$ 168.140.610,69	$ 343.866.474,00
SEMANA 7	$ 58.508.557,90	$ 58.177.530,50	$ 226.649.168,58	$ 402.044.004,50
SEMANA 8	$ 18.865.814,40	$ 103.873.589,50	$ 245.514.982,98	$ 505.917.594,00

GRAFICO DE AVANCE

CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X SUP	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
CUADRO DE RELACION DE PERSONAL SEGUN OFERTA E IBC PROPUESTO	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORMES MENSUAL ENTREGADO A LA INTERVENTORIA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
COPIA DE LA BITACORA AL DIA FIRMADA Y AL DIA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐	NO CUMPLE

TABLA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE

CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X INT	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
CUADRO DE RELACION DE PERSONAL SEGUN OFERTA E IBC PROPUESTO REV INTER	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
CUADRO DE EQUIPO SEGUN PROPUESTA REV POR INTERVENTORIA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORME METEREOLOGICO	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORMES MENSUALES	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORME PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORME PLAN DE SALUD OCUPACIONAL	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
SOCIALIZACION	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
VEEDURIA CIUDADANA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
VALLA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐		☐	
	☐		☐	

5. INFORMACION DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO, AVANCES EN % OBRA PROGRAMADA VS EJECUTADA

INTERVENTORIA

% AVANCE EN PLAZO:	41,00%	PLAZO FALTANTE	59,00%	% PROGRAMACION OBRA	32,00%	% OBRA EJECUTADA	68,00%

OBRA (SEGÚN INFORMACION DE INTERVENTORIA SI APLICA)

% AVANCE EN PLAZO:	41,00%	PLAZO FALTANTE	59,00%	% PROGRAMACION OBRA	32,00%	% OBRA EJECUTADA	68,00%

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITE TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

El contratista da inicio al la instalacion de la tuberia en el tramo P3-P4

	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	F-GCT-01-V1 Vigencia: 30/07/2023
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Página de

7. REGISTRO FOTOGRAFICO (DESCRIPCION). ENVIAR COPIA MAGNETICA AL CORREO INSTITUCIONAL (XXXX)



Foto 1




Foto 2

8. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS: CUMPLE SI ☑ NO ☐
CUALES?:
SE REQUIERE AJUSTES A LOS DISEÑOS: SI ☑ NO ☐
CAUSALES?: REUBICACION DE SENDEROS PEATONALES Y BARRAS DE PARQUEO A CAUSA DE ARBOLES EXISTENTES

SE CUMPLE CON EL OBJETO DEL CONTRATO? SI ☑ NO ☐
PORQUE?
REQUIERE ADICIONAL? SI: ☐ NO ☑ VALOR? $ 0
EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN? SI ☑ NO ☐
PORQUE?

9. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

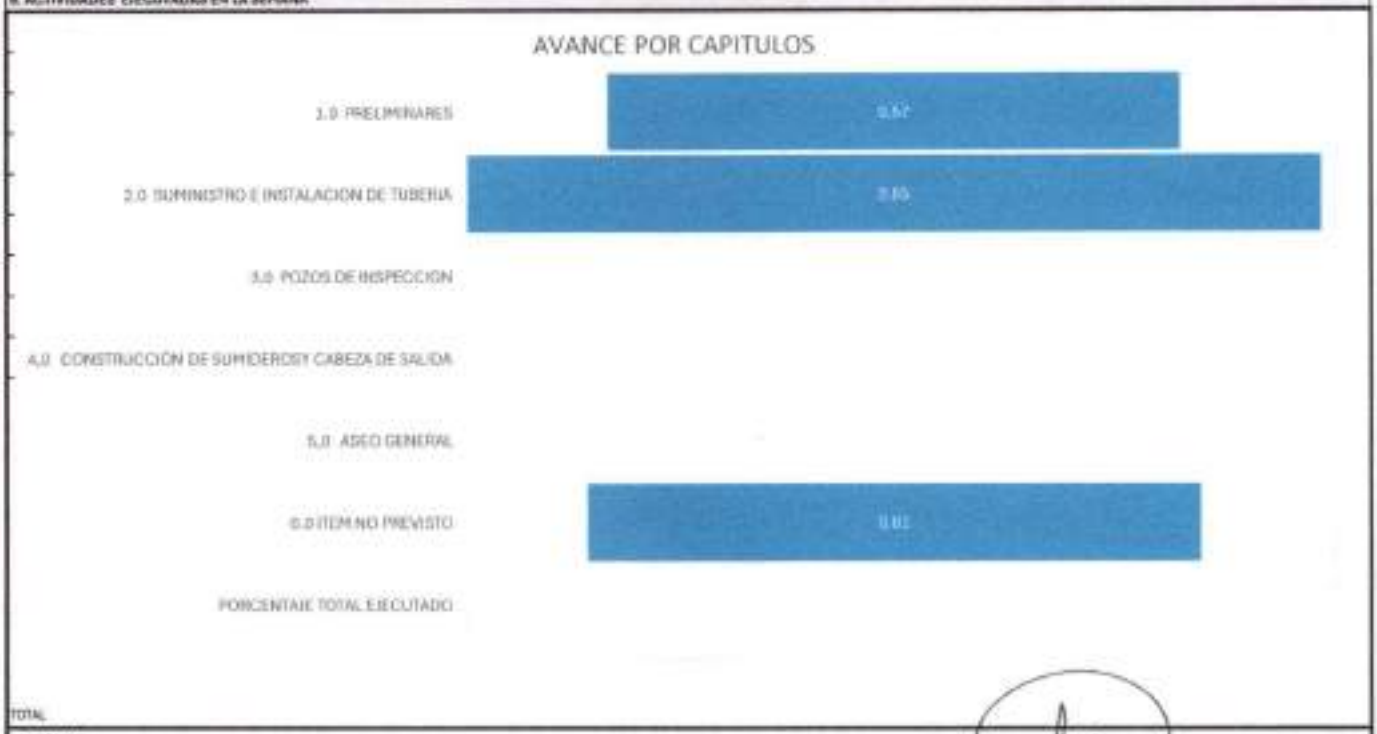

TOTAL

10. FIRMAS

FIRMA DEL INTERVENTOR - CARLOS DARIO CANO SANCHEZ

ANEXO 10 ACTA DE MODIFICATORIA N.2

ACTA DE MODIFICACIÓN No. 002 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-2025-002

Tipo Documento	Acta de Modificación
Fecha	29 de septiembre de 2025
Clase de contrato:	Contrato de Obra Pública
No. de contrato:	COP-2025-002
Fecha de celebración:	22 de abril del 2025
Objeto:	"ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"
Valor del contrato:	NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($988.082.242,00) M/CTE
CDP:	No. 17355, 17356, 17358 del 06 de noviembre de 2024
RP	No. 17355, 17356, 17358 del 02/12/2024
Fecha suscripción del acta de inicio	22 de agosto de 2025
Plazo de Ejecución inicial:	Cinco (05) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, y previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones.
Fecha de terminación:	22 de enero de 2026

Entre los suscritos a saber, **VICTOR ANDRÉS VASCO QUIVANO**, mayor de edad, con domicilio en el municipio de Milán, Caquetá, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 17.691.098 expedida en Florencia Caquetá, en su calidad de alcalde y representante legal del municipio de Milán, según credencial electoral No. E-27 de fecha treinta y uno (31) de octubre de 2023, y acta de posesión del día veinte nueve (29) de diciembre de 2023, suscrita ante la Notaria Primera del Circulo de Florencia, debidamente facultado para contratar, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte; y por la otra, el **CONSORCIO SAN ANTONIO 2025**, identificado con NIT. 901.935.706-2, representado por **ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.781.657 de Florencia – Caquetá, quien para todos los efectos de este contrato se llamará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar la presente Acta de Modificación No.002 al Contrato de Obra No. COP-2025-002 del 22 de abril de 2025, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Proyectó PJ	Carolina Burgos Triana	**Cargo**	Contratista Apoyo a la Supervisión	**Firma**	
Revisó PT	Consorcio Alcantarillado San Antonio 2025	**Cargo**	Interventor COP-2025-002	**Firma**	
Revisó PT	Kelly Juliana Llanos Jaramillo	**Cargo**	Secretaria de Planeación	**Firma**	
Aprobó	Victor Andrés Vasco Quivano	**Cargo**	Alcalde Municipal	**Firma**	

CONSIDERACIONES

1. Que el **Municipio de Milán**, suscribió el **Contrato de Obra Nº COP-2025-002** del 22 de abril de 2025, con el **CONSORCIO SAN ANTONIO 2025**, identificado con NIT. 901.935.706-2, representado por **ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.781.657 de Florencia – Caquetá, cuyo objeto corresponde a realizar la "ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ".

2. Que el valor del **Contrato de Obra Nº COP-2025-002** del 22 de abril de 2025, fue pactado inicialmente en **NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($988.082.242,00) M/CTE**, equivalentes a 694,7 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2025, suma respaldada con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 17355, 17356, 17358 del 06 de noviembre de 2024.

3. Que la operación mediante la cual se perfeccionó el compromiso y se afectó en forma definitiva la apropiación (Registro Presupuestal), se llevó a cabo por el valor de **NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($988.082.242,00) M/CTE**, de conformidad con los Certificados de Compromiso Presupuestal No. 17355, 17356, 17358 del 06 de noviembre de 2024.

4. Que conforme a lo previsto en la Cláusula Cuarta del **Contrato de Obra Nº COP-2025-002** del 22 de abril de 2025, el plazo de ejecución contractual fue pactado por el término de **cinco (05) meses**; contados a partir del **22 de agosto de 2025**, y hasta el **22 de enero de 2026**, según Acta de Inicio.

5. Que, la Cláusula 10- Obligaciones especificas del contratista, numeral 12, del Contrato de Obra No. COP-2025-002, establece: *"12. Cuando se requiera hacer una modificación, deberá concertarlo con el supervisor y/o interventor y el alcalde Municipal para su respectiva aprobación."*

6. Que el **22 de agosto de 2025**, las partes dispusieron, con base en la autonomía de su voluntad y bajo la premisa que el Consorcio San Antonio 2025, cuenta con la capacidad para ejecutar la obra conforme a los términos descritos en el Contrato, sin hacer uso de la posibilidad de apalancamiento financiero que le brinda la figura del anticipo, modificar el **Contrato de Obra Nº COP-2025-002** del 22 de abril de 2025, en el sentido de eliminar la Cláusula 6- ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO, y los apartes del contrato relacionados con aquél.

7. Que el **22 de agosto de 2025**, se suscribió el **ACTA DE MODIFICACIÓN No. 001**, Modificar la **Cláusula 18- GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO** del **Contrato de Obra Nº COP-2025-002**, en el sentido de suprimir y dejar sin efectos lo correspondiente a la constitución de amparos para el "**Buen manejo y correcta inversión del anticipo**", que se encontraba pactada con una vigencia de **"hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo"**, y con un valor asegurado del 100% del valor entregado a título de anticipo. En todo lo demás, dicha cláusula permanecerá bajo absoluta vigencia.

8. Que, mediante comunicación del **26 de septiembre de 2025**, fue allegado al municipio el **"Informe de Revisión y Aprobación de Localización de los Trabajos y Condiciones Técnicas No. 3"**, suscrito por el señor **Carlos Dario Cano Sánchez**, actuando en calidad de Representante Legal del **Consorcio Alcantarillado San Antonio 2025**, quien ejerce la Interventoría Integral del Contrato de Obra No. COP-2025-002.

Dicho informe, contiene:

Proyectó PJ	Carolina Burgos Triana	**Cargo**	Contratista Apoyo a la Supervisión	**Firma**	
Revisó PT	Consorcio Alcantarillado San Antonio 2025	**Cargo**	Interventor COP-2025-002	**Firma**	
Revisó PT	Kelly Juliana Llanos Jaramillo	**Cargo**	Secretaria de Planeación	**Firma**	
Aprobó	Victor Andres Vasco Quivano	**Cargo**	Alcalde Municipal	**Firma**	

(i) Las generalidades del contrato;

(ii) La descripción del lugar de ejecución del contrato objeto de vigilancia;

(iii) El diseño propuesto para la construcción del pozo;

(iv) La aclaración sobre la existencia de permisos de servidumbre para ejecutar el proyecto, pese al aumento de longitud en el tramo final conforme a los ajustes al diseño inicial;

(v) La enunciación de anexos que prevén la concertación de precios sobre ítems no previstos, la respectiva acta de aprobación, los respectivos Análisis de Precios Unitarios que la soportan, las cantidades de obra y el presupuesto en documentos adjuntos;

(vi) La manifestación sobre la conservación de las especificaciones técnicas requeridas para desarrollar el proyecto;

(vii) La precisión sobre la existencia de un plan de manejo ambiental para la construcción del sistema de red pluvial;

(viii) La manifestación sobre la realización previa de dos simulaciones hidráulicas que modificaron el trazado del proyecto para cambio del costado. Lo anterior, dada la presencia de enramadas, pozos de extracción de aguas subterráneas para consumo domiciliario, andenes en concreto, entre otras estructuras construidas por la comunidad.

(ix) Se advierte que, conforme a lo expuesto en el Comité de Obra del 06 de septiembre de 2025, la comunidad manifestó gran preocupación y oposición frente a la afectación de la carpeta asfáltica en la calle que inicia desde el parque principal hasta la Institución Educativa; motivo por el cual, fue necesaria una tercera simulación hidráulica y la generación de un pre balance, fijando un nuevo trazado del proyecto. Al respecto, el informe de interventoría señala: *"El diseño final se define basado en la protección de la carpeta asfáltica de la primera calle. El diseño final establece que la primera calle se ejecutará por la parte derecha, y a partir de ahí, el trazado se desviará en diagonal hasta la izquierda hasta su conclusión"*.

(x) En relación con el nuevo diseño, se adjuntan los cálculos realizados por el Ingeniero Especialista Hidráulico, Fabio Hernán Fiesco Gorrón y el ingeniero especialista en estructuras Sebastián Valero Florez, adjuntando sus Tarjeta Profesional, las memorias de cálculo, así como los planos del diseño hidráulico y estructural.

(xi) En concordancia, manifiesta la necesidad de crear tres ítems no previstos conforme a la nueva modelación hidráulica, con fundamento en el aumento del diámetro, con el fin de garantizar el funcionamiento óptimo del sistema, reduciendo riesgos de colapso o reboses de los pozos en los periodos de intensas lluvias. Aquellos ítems se relacionan a continuación:

Proyectó PJ	Carolina Burgos Triana	**Cargo**	Contratista Apoyo a la Supervisión	**Firma**	
Revisó PT	Consorcio Alcantarillado San Antonio 2025	**Cargo**	Interventor COP-2025-002	**Firma**	
Revisó PT	Kelly Juliana Llanos Jaramillo	**Cargo**	Secretaria de Planeación	**Firma**	
Aprobó	Víctor Andrés Vasco Quivano	**Cargo**	Alcalde Municipal	**Firma**	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
NP1	Pozos de inspección en concreto f´c= 24Mpa D=1.50 m y h<=2.00 m. incluye tapa	und	$6.148.564,00
NP2	Pozos de inspección en concreto f´c= 24Mpa D=1.50 m y 2.01>h<=3.00 mincluye tapa	und	$9.043.314
NP3	Pozos de inspección en concreto f´c= 24Mpa D=1.60 m y 3.01>h<=4.00 mincluye tapa	und	$11.597.357

(xii) Finalmente, el informe contiene la viabilidad del interventor para la suscripción de la presente Acta de Modificación, en los siguientes términos: *"(...) Dentro del análisis del proyecto entregado por la entidad contratante de la interventoria PDA Caquetá, la interventoria llego a la conclusión de emitir concepto de viabilidad para la ejecución del proyecto, basados en el reajuste de trazado entregado por el contratista y desarrollado por el ingeniero especialista hidráulico Fabio Hernán Fiesco Gorrón y el ingeniero especialista en estructuras Sebastián Valero Florez , llamado por la interventoria como versión de diseño n. 3, el cual se encuentra anexo a este documento y doy la aprobación para generar el acta de modificación n. 2 (...).*

9. Que, una vez estudiados los anexos adjuntos al informe que fue emitido por la interventoria del proyecto, específicamente en lo relativo a las memorias de cálculo del colector sanitario, se advierte una adecuada planeación en su diseño estructural, con fundamento modelos matemáticos de análisis, aplicando normativas de diseño y criterios de sismo resistencia. Además, puede apreciarse que, para su proyección, han sido observados los estudios geotécnicos de cimentación, de análisis ambiental, e incluso aquellos relativos al estudio hidrogeológico para aguas subterráneas.

10. Que, la presente modificación se fundamenta parcialmente en las recomendaciones efectuadas por el ingeniero especialista hidráulico **Fabio Hernán Fiesco Gorrón** y el ingeniero especialista en estructuras **Sebastián Valero Florez**, que a su vez fueron **propuestas por el Contratista y avaladas por la Interventoría**, cuyas conclusiones se citan a continuación:

"(...) 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- *Las áreas utilizadas para determinar caudales corresponden al área propia de la zona de influencia del proyecto. Debido a la caracterización del sector.*
- *La tubería utilizada para los cálculos en el diseño es tubería sanitaria corrugada en PVC (los diámetros se encuentran plasmados en los cuadros de cálculo y planos hidráulicos).*
- *Para conservar al máximo la integridad de la tubería que compone el colector, deberán ser protegidos con concreto reforzado los tramos de tubería en donde la conta clave de esta se encuentra manos de un metro de profundidad respecto a la rasante de la vía.*
- *Se aclara que el sistema de recolección y colector está diseñado para tomar las aguas lluvias generadas por las precipitaciones locales y su uso es exclusivo para este fin.*
- *El descole se realizará sobre cuerpo de agua que recorre el sector, en el mismo punto en el que se ha venido realizando el vertimiento.*
- *Los puntos planteados para la descarga de las aguas recolectadas son los que actualmente evacuan las aguas del sector, por tanto, se considera seguir usándolos para este fin.*

Proyectó PJ	Carolina Burgos Triana	**Cargo**	Contratista Apoyo a la Supervisión	**Firma**	
Revisó PT	Consorcio Alcantarillado San Antonio 2025	**Cargo**	Interventor CDP-2025-002	**Firma**	
Revisó PT	Kelly Juliana Llanos Jaramillo	**Cargo**	Secretaria de Planeación	**Firma**	
Aprobó	Víctor Andres Vasco Quivano	**Cargo**	Alcalde Municipal	**Firma**	

- *Se recomienda construir una estructura de concreto con aletas laterales en el punto final del emisor, con el fin de proteger tanto la integridad de la tubería como el terreno. (...)"*

11. Que, la señora **ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 40.781.657 de Florencia – Caquetá, actuando en calidad de representante legal del Consorcio **SAN ANTONIO 2025**, justificó la necesidad de suscribir la presente Acta de Modificación de Mayores, Menores Cantidades e Inclusión de Ítems no previstos, con fundamento en los siguientes motivos:

"(...) **1. PRELIMINARES**

- **1.01. Localización y replanteo de redes.** La cantidad disminuye en este ítem debido a que el área presenta variaciones por el nuevo trazado de la tubería donde se calcula el ancho y la longitud, por esta razón se ajusta a la necesidad real del proyecto, que pasa de 897,25 m2 a quedar en 555,84 m2 de localización para la presente acta.

- **1.02. Cerramiento provisional lona verde (h=2,00m).** La cantidad disminuye por el nuevo trazado y se ajusta de acuerdo a los tramos de intervención, por esta razón este ítem es necesario modificarlo a lo real del proyecto, que pasa de 897,25 ml a quedar en 873,36 ml de cerramiento en lona.

- **1.03. Excavación manual en material común de 0.00 a 2.00 m.** La cantidad aumenta debido a que hay un aumento en la construcción de los sumideros que son 18 en total, y la excavación para los pozos con profundidades entre el rango de 0 metros a 2 metros, esta excavación se llevara a cabo de esta manera para no dañar la estructura de la vía. Esta cantidad pasa de 72,71 m3 a 138,66 de volumen de excavación.

- **1.04. Excavación manual en material común de 2.00 a 4.00 m.** La cantidad disminuye ya que, en el nuevo trazado y replanteo, se calcula el volumen de excavación para los 3 pozos con mayor profundidad a 3 metros, por esta razón se ajusta a la necesidad real del proyecto, que pasa de 37,50 m3 a quedar en 10,17 m3 de volumen de excavación.

- **1.05. Excavación mecánica en material común.** La cantidad aumenta debido a la necesidad de incluir mayor longitud en la entrega final, esto a razón que afectaba alrededor de 18.00 m del predio para el paso de ganado, en aras de mejorar la entrega sin afectar el predio de la servidumbre en la construcción del alcantarillado pluvial, y los nuevos trazados de excavación de los diferentes tramos, el alcance de esta red debido al aumento de longitud del trazado. Esta cantidad pasa de 1281 m3 a 1298,44 de volumen de excavación.

- **1.06. Entibado en madera para proteger talud de excavación.** La cantidad aumenta debido a la variación en la longitud del trazado y a las excavaciones más profunda, en los apiques que se realizaron en el estudio de suelos se encontraron niveles freáticos altos, en donde se debe buscar un estrato estable, por esta razón la cantidad del entibado pasa de 390,55 m2 a 916,75 m2 de área de entibado en madera.

- **1.07. Cargue, transporte y retiro de material sobrante.** La cantidad disminuye ya que en el nuevo trazado y replanteo se calculan los volúmenes de excavación en donde se tiene en cuenta el factor de expansión del 30% y en donde el diámetro de la tubería es variable según el tipo de tubo por

tramos expresados en metros y una capa de arena de 20 cm, por esta razón la cantidad disminuye de 653,41 m3 a 408,82 m3.

- **1.08. Relleno, Cimentación tubería con arena SP de acuerdo a la norma ASTM 2487.** La cantidad aumenta debido a la variación en la longitud del trazado y a las excavaciones más profundas, por esta razón la cantidad de relleno aumenta de 104,29 m3 a 97,15 m3.

- **1.09. Relleno con material seleccionado de la excavación.** La cantidad aumenta debido a la variación en la longitud del trazado, las excavaciones más profundas, y se analizó que la calidad del terreno cumplía con las condiciones de relleno, de tal forma se puede reutilizar este material para cumplir con las necesidades del proyecto. Por esta razón la cantidad de relleno aumenta de 104,29 m3 a 1256 m3.

- **1.10. Suministro e instalación de sub_base granular tipo C, NT1.** La cantidad disminuye ya que en el nuevo trazado y replanteo no se afectará la estructura de la vía, minimizando el impacto y la necesidad de restaurar la carpeta asfáltica, por esta razón la cantidad disminuye de 183,70 m3 a 112,49 m3 de subbase granular.

- **1.11. Suministro e instalación de base granular tipo C, NT1.** La cantidad disminuye ya que en el nuevo trazado y replanteo no se afectará la estructura de la vía, minimizando el impacto y la necesidad de restaurar la carpeta asfáltica, por esta razón la cantidad disminuye de 63,30 m3 a 28,38 m3 de base granular.

- **1.12. Suministro e instalación de asfáltica natural, en áreas afectadas por la excavación.** La cantidad disminuye ya que en el nuevo trazado y replanteo no se afectará la estructura de la vía, minimizando el impacto y la necesidad de restaurar la carpeta asfáltica, por esta razón la cantidad disminuye de 177,46 m2 a 218,24 m2 de asfáltica natural.

2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA

- **2.01. Suministro e instalación de tubería PVC D=315mm; NTC 3722-3 S8.** La cantidad disminuye de acuerdo con el nuevo trazado por cambio a la margen izquierda se realiza el cambio para evitar arreglos de aljibes andenes, cunetas, entre otras. La cantidad disminuye de 168,24 ml a 153,03 ml.

- **2.02. Suministro e instalación de tubería PVC D=400mm; NTC 3722-3 S8.** La cantidad aumento por el replanteo y el nuevo trazado donde se trasladó la tubería hacia el otro costado de la vía, esto debido a los requerimientos del municipio para conservar la estructura asfáltica existente y afectarla lo mejor posible, se instalará por la zona verde, en donde la cantidad pasa de 43,84 ml a 79,01 ml.

- **2.03. Suministro e instalación de tubería PVC D=450 mm; NTC 3722-3 S8.** La cantidad disminuye de acuerdo al nuevo trazado por cambio a la margen izquierda se realiza el cambio para evitar arreglos de aljibes andenes, cunetas, entre otras. La cantidad disminuye de 82,02 ml a 46,76 ml.

- **2.04. Suministro e instalación de tubería PVC D=27"; NTC 5055 ASTM F 794.** La cantidad aumento por el replanteo y el nuevo trazado donde se trasladó la tubería hacia el otro costado de la

vía, esto debido a los requerimientos del municipio para conservar la estructura asfáltica existente y afectarla lo mejor posible, se instalará por la zona verde, en donde la cantidad pasa de 160,27 ml a 163,94 ml.

- **2.05. Suministro e instalación de tubería PVC D=30"; NTC 5055 ASTM F 794.** La cantidad disminuye de acuerdo con el nuevo trazado por cambio a la margen izquierda se realiza el cambio para evitar arreglos de aljibes andenes, cunetas, entre otras. La cantidad disminuye de 51,96 ml a 51,19 ml.

- **2.06. Suministro e instalación de tubería PVC D=36"; NTC 5055 ASTM F 794.** La cantidad aumento por el replanteo y el nuevo trazado donde se trasladó la tubería hacia el otro costado de la vía, esto debido a los requerimientos del municipio para conservar la estructura asfáltica existente y afectarla lo mejor posible, se instalará por la zona verde, en donde la cantidad pasa de 77,68 ml a 95,78 ml.

3. POZOS DE INSPECCIÓN

- **3.01. Pozos de inspección en concreto f'c= 24Mpa D=1.20 m y h<=2.00 m. incluye tapa.** Se elimina este ítem porque según la modelación hidráulica se ajustan las profundidades de los pozos y diámetros de 1.2 m, 1,5 m y 1,6m, para que se conserve el tiempo de inundación.

- **3.02. Pozos de inspección en concreto f'c= 24Mpa D=1.20 m y 2.01>h<=4.00 m incluye tapa.** Se elimina este ítem porque según la modelación hidráulica se ajustan las profundidades de los pozos y diámetros de 1,2 m, 1,5 m y 1,6m, para que se conserve el tiempo de inundación.

4. CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS Y CABEZA DE SALIDA

- **4.01. Construcción de cunetas transversales de vía, L=10.97m x 0.85 m, ancho útil de 0.45m, espesor de muros de 0.20m, y rejillas en platina de 2" x 3/8.** Se elimina este ítem porque según la modelación hidráulica se ajustan las profundidades de los pozos y diámetros de 1,2 m, 1,5 my 1,6m, para que se conserve el tiempo de inundación. Las cunetas transversales se eliminan y se dejan solo dos tipos de sumideros.

- **4.02. Construcción de cunetas transversales de vía, L=9.32m x 0.85 m, ancho útil de 0.45m, espesor de muros de 0.20m, y rejillas en platina de 2" x 3/8.** Se elimina este ítem porque según la modelación hidráulica se ajustan las profundidades de los pozos y diámetros de 1,2 m, 1,5 my 1,6m, para que se conserve el tiempo de inundación. Las cunetas transversales se eliminan y se dejan solo dos tipos de sumideros.

- **4.03. Construcción de sumidero de 1.64m x 0.88m, ancho útil de 0.58m x 1.34m, e=0.15m, rejilla platina de 2 x 3/8.** Se elimina este ítem porque según la modelación hidráulica se ajustan las profundidades de los pozos y diámetros de 1,2 m, 1,5 my 1,6m, para que se conserve el tiempo de inundación. Las cunetas transversales se eliminan y se dejan solo dos tipos de sumideros.

- **4.04. Construcción de sumidero de 1.64m x 0.98m, ancho útil de 0.68m x 1.34m, e=0.15m, rejilla platina de 2 x 3/8.** Esta cantidad aumenta por la necesidad de cambiar las cunetas transversales y dejar dos tipos de sumideros.

Proyectó PJ	Carolina Burgos Triana	**Cargo**	Contratista Apoyo a la Supervisión	**Firma**	
Revisó PT	Consorcio Alcantarillado San Antonio 2025	**Cargo**	Interventor COP-2025-002	**Firma**	
Revisó PT	Kelly Juliana Llanos Jaramillo	**Cargo**	Secretaria de Planeación	**Firma**	
Aprobó	Victor Andres Vasco Quivano	**Cargo**	Alcalde Municipal	**Firma**	

- **4.05. Construcción de cabezal de salida.** Esta cantidad se mantiene igual, para no afectar las necesidades reales del proyecto.

5. ASEO GENERAL DE OBRA

- **5.01. Aseo general de Obra**. Esta cantidad se mantiene igual, para no afectar las necesidades reales del proyecto.

NP. ITEM NO PREVISTOS

NP-01 Pozos de inspección en concreto f´c= 24Mpa D=1.50 m y h<=2.00 m. incluye tapa. Este item no previsto es creado debido a que se realiza la modelación estructural e hidráulica y se añaden como necesidad del proyecto, para una cantidad de 4 und.

NP-02 Pozos de inspección en concreto f´c= 24Mpa D=1.50 m y 2.01>h<=3.00 incluye tapa. Este item no previsto es creado debido a que se realiza la modelación estructural e hidráulica y se añaden como necesidad del proyecto, para una cantidad de 3 und.

NP-03 Pozos de inspección en concreto f´c= 24Mpa D=1.60 m y 3.01>h<=4.00 incluye tapa. Este item no previsto es creado debido a que se realiza la modelación estructural e hidráulica y se añaden como necesidad del proyecto, para una cantidad de 1 und.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

1. Que, realizado el balance de mayores y menores cantidades y la necesidad de modificar las condiciones contractuales, se representa el Acta Modificatoria No. 2 con presupuesto contractual.
2. Que, a partir de lo expuesto anteriormente, el contratista de la obra solicita de manera respetuosa que se realice los cambios pertinentes al contrato No. COP-2025-002, es así como se realiza la solicitud de aprobación para el balance de mayores y menores cantidades No. 1 para poder continuar adecuadamente la ejecución del contrato de obra.

(...)"

12. Que la presente modificación no implica la transformación del objeto del contrato, que corresponde a realizar la **"ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"**; sino que únicamente se refiere a un ajuste de mayores, menores cantidades e inclusión de ítems no previstos en la Cláusula 3 del acuerdo de voluntades.

13. Que, a propósito de la modificación a los contratos estatales, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, han indicado lo siguiente:

Proyectó PJ	Carolina Burgos Triana	**Cargo**	Contratista Apoyo a la Supervisión	**Firma**	
Revisó PT	Consorcio Alcantarillado San Antonio 2025	**Cargo**	Interventor COP-2025-002	**Firma**	
Revisó PT	Kelly Juliana Llanos Jaramillo	**Cargo**	Secretaria de Planeación	**Firma**	
Aprobó	Victor Andres Vasco Quivano	**Cargo**	Alcalde Municipal	**Firma**	

*"(...) Por regla general, **los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado**, a los cuales sirve el contrato[1]. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, entre otros. En el mismo sentido en la **Sentencia C-949 de 2001[2]**, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos, como especie de modificación, pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. (...)"*

14. En igual sentido, indicó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto del 06 de junio de 2018 con radicación No. 2369 y número único 11001-03-06-000-2018-00034-00, Consejero Ponente Dr. Óscar Darío Amaya Navas, referente a los límites a la modificación de los contratos, lo siguiente:

"(...) La Sala de Consulta en el concepto referido, procedió a fijar los límites de orden temporal, formal y material para la modificación de un contrato estatal. Estas restricciones de orden jurídico están orientadas principalmente a preservar los principios de origen legal, de libertad de concurrencia, de transparencia y de igualdad, lo cual no contradice las facultades otorgadas a la Administración para orientar el contrato al fin de interés público (...)".

15. Que, la presente acta se encuentra ajustada a los límites de orden temporal, formal y material, previstos por el ordenamiento jurídico para la modificación de los contratos estatales; los cuales, han sido sintetizados por la Sala de Consulta y Servicio Civil mediante Concepto del 17 de marzo de 2016, expediente 2263, C.P. Edgar González López, en: (i) **la vigencia del contrato**, resumido en la posibilidad de modificar un contrato solo mientras el plazo de ejecución para el cumplimiento de las obligaciones contractuales se encuentre vigente; (ii) **La prohibición de consagrar prorrogas automáticas, sucesivas o indefinidas**, por ser contrarias al derecho esencial de la libertad de competencia; (iii) **La solemnidad de la modificación al contrato**, en cuanto a la obligación de elevar a escrito el acuerdo de voluntades; (iv) **La motivación y justificación de la modificación**, en cuanto al deber de dar cuenta de las razones de interés público que hacen necesario afectar lo inicialmente pactado.

16. Que el **artículo 40 de la Ley 80 de 1993**, frente a la autonomía de la libertad de las partes, dispone que:

"(...) Las especificaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración. (...)".

17. Que, conforme a las consideraciones precitadas, y teniendo en cuenta la exposición de motivos realizada por el Contratista, respaldadas técnica, jurídica y financieramente por el Interventor, con base en estudios y documentos técnicos; y, además, bajo el principio de autonomía de la voluntad de las partes, resulta

[1] Sobre la naturaleza instrumental del contrato para alcanzar los fines propios del estado social de derecho, ver Sentencia C-932 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[2] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

Proyectó PJ	Carolina Burgos Triana	**Cargo**	Contratista Apoyo a la Supervisión	**Firma**	
Revisó PT	Consorcio Alcantarillado San Antonio 2025	**Cargo**	Interventor COP-2025-002	**Firma**	
Revisó PT	Kelly Juliana Llanos Jaramillo	**Cargo**	Secretaria de Planeación	**Firma**	
Aprobó	Víctor Andrés Valco Quivano	**Cargo**	Alcalde Municipal	**Firma**	

procedente celebrar la presente Acta de Modificación No. 002 al **Contrato de Obra Nº COP-2025-002** del 22 de abril de 2025, la cual se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios y en especial por las siguientes:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA 1 – MODIFICAR

1.1. Modificar la Cláusula 3- Alcance del Objeto del **Contrato de Obra Nº COP-2025-002** del 22 de abril de 2025, considerando el balance de mayores y menores cantidades de obra e inclusión de ítems no previstos, necesarios para la correcta ejecución del objeto contratado, tal y como se enuncia a continuación:

"(...) **CLAUSULA 3 – ALCANCE DEL OBJETO**

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO N° AM-LP-2025-002, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme a lo señalado en el Formulario 1 – Formulario de presupuesto oficial; salvo modificación posterior, en los términos y cantidades que se expresan a continuación:

Proyectó PJ	Carolina Burgos Triana	**Cargo**	Contratista Apoyo a la Supervisión	**Firma**	
Revisó PT	Consorcio Alcantarillado San Antonio 2025	**Cargo**	Interventor COP-2025-002	**Firma**	
Revisó PT	Kelly Juliana Llanos Jaramillo	**Cargo**	Secretaria de Planeacion	**Firma**	
Aprobó	Victor Andrés Vasco Quivano	**Cargo**	Alcalde Municipal	**Firma**	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRATO			VALORES MODIFICATORIOS PRESENTE ACTA			TOTAL CANTIDADES MODIFICADAS		JUSTIFICACION
			CANTIDAD CONTRATO	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD TOTAL +/-	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
I	1.0 PRELIMINARES										
1,01	Localización y replanteo de redes	M2	897,25	$ 7.138,00	$ 6.404.571,00	-341,41		-$ 2.436.993,00	555,84	$ 3.967.577,00	se ajusta a necesidad real del proyecto
1,02	Cerramiento provisional lona verde (h=2,00m)	ML	897,25	$ 15.149,00	$ 13.592.440,00	-23,89		-$ 361.910,00	873,36	$ 13.230.531,00	se ajusta a necesidad real del proyecto
1,03	Excavación manual en material comun de 0.00 a 2.00 m	M3	72,71	$ 52.702,00	$ 3.831.962,00	65,95		$ 3.475.627,00	138,66	$ 7.307.589,00	se ajusta a necesidad real del proyecto
1,04	Excavación manual en material comun de 2.00 a 4.00 m	M3	37,50	$ 69.015,00	$ 2.588.063,00	-27,33		-$ 1.886.478,00	10,17	$ 701.585,00	se ajusta a necesidad real del proyecto
1,05	Excavación mecánica en material comun	M3	1281,00	$ 21.868,00	$ 28.012.908,00	17,44		$ 381.414,00	1298,44	$ 28.394.322,00	Se ajusta este apu ya que es el mismo 6.3 del capitulo de clausura, ajustandolo al menor valor
1,06	Entibado en madera para proteger talud de excavación	M2	390,55	$ 60.322,00	$ 23.558.757,00	526,20		$ 31.741.277,00	916,75	$ 55.300.034,00	Se ajusta a la necesidad real del proyecto
1,07	Cargue, transporte y retiro de material sobrante	M3	653,41	$ 53.566,00	$ 35.000.326,00	-244,59		-$ 13.101.733,00	408,82	$ 21.898.593,00	Se ajusta a la necesidad real del proyecto
1,08	Relleno, Cimentación tubería con arena SP de acuerdo a la norma ASTM 2487	M3	104,29	$ 92.334,00	$ 9.629.513,00	-7,14		-$ 659.402,00	97,15	$ 8.970.111,00	Se ajusta a la necesidad real del proyecto
1,09	Relleno con material	M3	736,13	$ 17.493,00	$ 12.877.122,00	519,87		$ 9.094.062,00	1256,00	$ 21.971.184,00	Se ajusta a la necesidad real del proyecto

Proyectó PJ	Carolina Burgos Triana	Cargo	Contratista Apoyo a la Supervisor	Firma	
Revisó PT	Consorcio Alcantarillado San Antonio 2025	Cargo	Interventor CDP-2025-062	Firma	
Revisó PT	Kelly Juliana Llanos Jaramillo	Cargo	Secretaria de Planeación	Firma	
Aprobó	Victor Andrés Vasco Quevano	Cargo	Alcalde Municipal	Firma	

	seleccionado de la excavación											
1,10	Suministro e instalación de sub_base granular tipo C, NT1	M3	183,70	$ 265.164,00	$ 48.710.627,00	-71,22		-$ 16.883.654,00	112,49	$ 29.826.973,00	Se ajusta a la necesidad real del proyecto
1,11	Suministro e instalación de base granular tipo C, NT1	M3	63,30	$ 275.164,00	$ 17.417.881,00	-34,92		-$ 9.608.342,00	28,38	$ 7.809.540,00	Se ajusta a la necesidad real del proyecto
1,12	Suministro e instalación de asfaltita natural, en áreas afectadas por la excavación	M2	177,46	$ 57.428,00	$ 10.191.173,00	40,78		$ 2.341.799,00	218,24	$ 12.532.972,00	Se ajusta a la necesidad real del proyecto
				SUBTOTAL	**$ 211.815.343,00**			**$ 95.667,00**		**$ 211.911.011,00**	
2	**2.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA**										
2,01	Suministro e instalación de tuberia PVC D=315mm; NTC 3722-3 S8	ML	168,24	$ 143.318,00	$ 24.111.820,00	-15,21		-$ 2.179.867,00	153,03	$ 21.931.954,00	Se ajusta a la necesidad real del proyecto
2,02	Suministro e instalación de tuberia PVC D=400mm; NTC 3722-3 S8	ML	43,84	$ 288.623,00	$ 12.653.232,00	35,17		$ 10.150.871,00	79,01	$ 22.804.103,00	Se ajusta a la necesidad real del proyecto
2,03	Suministro e instalación de tuberia PVC D=450 mm; NTC 3722-3 S8	ML	82,02	$ 384.475,00	$ 31.534.640,00	-35,26		-$ 13.556.589,00	46,76	$ 17.978.051,00	Se ajusta a la necesidad real del proyecto
2,04	Suministro e instalación de tuberia PVC D=27"; NTC 5055 ASTM F 794	ML	160,27	$ 790.424,00	$ 126.681.254,00	3,67		$ 2.900.856,00	163,94	$ 129.582.111,00	Se ajusta a la necesidad real del proyecto
2,05	Suministro e instalación de tuberia PVC	ML	51,96	$ 860.479,00	$ 44.710.469,00	-0,77		-$ 662.569,00	51,19	$ 44.047.920,00	Se ajusta a la necesidad real del proyecto

Proyectó PJ	Carolina Burgos Triana	**Cargo**	Contratista Apoyo a la Supervisor	**Firma**	
Revisó PT	Consorcio Alcantarillado San Antonio 2025	**Cargo**	Interventor COP-2025-002	**Firma**	
Revisó PT	Kelly Juliana Llanos Jaramillo	**Cargo**	Secretaria de Planeación	**Firma**	
Aprobó	Victor Andres Vasco Guevara	**Cargo**	Alcalde Municipal	**Firma**	

	D=30"; NTC 5055 ASTM F 794											
2.06	Suministro e instalación de tubería PVC D=36"; NTC 5055 ASTM F 794	ML	77,68	$ 1.655.575,00	$ 128.605.066,00	18,10		$ 29.966.908,00	95,78	$ 158.570.974,00	Se ajusta a la necesidad real del proyecto
				SUBTOTAL	**$ 358.296.501,00**			**$ 26.618.610,00**		**$ 394.915.113,00**	
3	**3,0 POZOS DE INSPECCION**										
3,01	Pozos de inspección en concreto f'c= 24Mpa D=1.20 m y h<=2.00 m incluye tapa	UND	6,00	$ 5.291.913,00	$ 31.751.478,00	-6,00		-$ 31.751.478,00	0,00	$ -	Se ajusta a la necesidad real del proyecto
3,02	Pozos de inspección en concreto f'c= 24Mpa D=1.20 m y 2.01>h<=4.00 mincluye tapa	UND	3,00	$ 8.892.711,00	$ 26.678.133,00	-3,00		-$ 26.678.133,00	0,00	$ -	Se ajusta a la necesidad real del proyecto
				SUBTOTAL	**$ 58.429.611,00**			**-$ 58.429.611,00**		**$ -**	
4	**4,0 CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROSY CABEZA DE SALIDA**										
4,01	Construcción de cunetas transversales de vía, L=10.97m x 0.85 m, ancho útil de 0.45m, espesor de muros de 0.20m, y rejillas en platina de 2" x 3/8	UND	3,00	$ 15.491.870,00	$ 46.475.610,00	-3,00		-$ 46.475.610,00	0,00	$ -	Se ajusta a la necesidad real del proyecto
4,02	Construcción de cunetas transversales de vía, L=9.32m x 0.85 m, ancho útil de 0.45m, espesor de muros de 0.20m, y	UND	1,00	$ 13.602.431,00	$ 13.602.431,00	-1,00		-$ 13.602.431,00	0,00	$ -	se ajusta a necesidad real del proyecto

Proyectó PJ	Carolina Burgos Triana	**Cargo**	Contratista Apoyo a la Supervision	**Firma**	
Revisó PT	Consorcio Alcantarillado San Antonio 2025	**Cargo**	Interventor COP-2025-002	**Firma**	
Revisó PT	Kelly Juliana Llanos Jaramillo	**Cargo**	Secretaria de Planeación	**Firma**	
Aprobó	Victor Andrés Vasco Quirano	**Cargo**	Alcalde Municipal	**Firma**	

	rejillas en platina de 2" x 3/8										
4.03	Construcción de sumidero de 1.64m x 0.86m, ancho útil de 0.58m x 1.34m, e=0.15m, rejilla platina de 2 x 3/8	UND	9.00	$ 3.520.431,00	$ 31.683.879,00	-9,00		-$ 31.683.879,00	0,00	$ -	Se ajusta a la necesidad real del proyecto
4.04	Construcción de sumidero de 1.64m x 0.98m, ancho útil de 0.68m x 1.34m, e=0.15m, rejilla platina de 2 x 3/8	UND	2,00	$ 3.759.731,00	$ 7.519.462,00	16,00		$ 60.155.696,00	18,00	$ 67.675.158,00	se ajusta a necesidad real del proyecto
4.05	Construcción de cabezal de salida	UND	1,00	$ 4.154.529,00	$ 4.154.529,00	0,00		$ -	1,00	$ 4.154.529,00	Se ajusta a la necesidad real del proyecto
				SUBTOTAL	**$ 103.435.911,00**			**-$ 31.606.224,00**		**$ 71.829.687,00**	
5	**5,0 ASEO GENERAL**										
5,01	Aseo general de Obra	UND	1,00	$ 1.008.974,00	$ 1.008.974,00	0,00		$ -	1,00	$ 1.008.974,00	Se ajusta a la necesidad real del proyecto
				SUBTOTAL	**$ 1.008.974,00**			**$ -**		**$ 1.008.974,00**	
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**										
NP-1	Pozos de inspección en concreto f'c= 24Mpa D=1.50 m y h<=2.00 m incluye tapa	UND			$ -	4,00	$ 6.148.564,00	$ 24.594.256,00	4,00	$ 24.594.256,00	Se ajusta a la necesidad real del proyecto
NP-2	Pozos de inspección en concreto f'c= 24Mpa D=1.50 m y 2.01>h<=3.00 mincluye tapa	UND			$ -	3,00	$ 9.043.314,00	$ 27.129.942,00	3,00	$ 27.129.942,00	Se ajusta a la necesidad real del proyecto

Proyectó PJ	Carolina Burgos Triana	**Cargo**	Contratista Apoyo a la Supervisión	**Firma**	
Revisó PT	Consorcio Alcantarillado San Antonio 2025	**Cargo**	Interventor CDP 2025-007	**Firma**	
Revisó PT	Kelly Juliana Llanos Jaramillo	**Cargo**	Secretaria de Planeación	**Firma**	
Aprobó	Victor Andrés Vasco Quivano	**Cargo**	Alcalde Municipal	**Firma**	

NP-3	Pozos de inspección en concreto f'c= 24Mpa D=1.80 m y 3.01>h<=4.00 mincluye tapa	UND			$ -	1.00	$ 11.597.357,00	$ 11.597.357,00	1.00	$ 11.597.357,00	Se ajusta a la necesidad real del proyecto
				SUBTOTAL	$ -			$ 11.597.357,00		$ 63.321.555,00	
				COSTO DIRECTO DE OBRA (A)	$ 742.986.340,00					$ 742.986.340,00	

	ADMINISTRACION	24%			$ 178.316.722,60							
	IMPREVISTOS	2%			$ 14.859.727,80							
	UTILIDAD	4%			$ 29.719.454,60							
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$ 22.200.000,00							
				COSTO TOTAL DE OBRA	$ 988.082.242,00							

	ADMINISTRACION	24%			$ 178.316.722,60							
	IMPREVISTOS	2%			$ 14.859.727,80							
	UTILIDAD	4%			$ 29.719.454,60							
	PLAN DE MANJO AMBIENTAL				$ 22.200.000,00							
				COSTO TOTAL DE LA OBRA MODIFICADO	$ 988.082.242,00							

Proyectó PJ	Carolina Burgos Triana	**Cargo**	Contratista Apoyo a la Supervisión	**Firma**	
Revisó PT	Consorcio Alcantarillado San Antonio 2025	**Cargo**	Interventor COP 2025-002	**Firma**	
Revisó PT	Kelly Johana Llanos Jaramillo	**Cargo**	Secretaria de Planeación	**Firma**	
Aprobó	Victor Andres Vasco Quivano	**Cargo**	Alcalde Municipal	**Firma**	

1.2. Modificar la Cláusula 5- Valor del **Contrato de Obra Nº COP-2025-002** del 22 de abril de 2025, **únicamente en el sentido de aplicar la discriminación efectuada en el numeral anterior de la presente acta**, conforme al balance de mayores y menores cantidades de obra e inclusión de ítems no previstos, que como consecuencia generan la afectación de algunos valores unitarios y totales; sin que aquello pueda entenderse como una afectación al valor total del contrato, que continúa siendo la suma de **NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($988.082.242,00) M/CTE**, equivalentes a 694,7 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2025.

CLÁUSULA 2 – PERFECCIONAMIENTO.

La presente acta de modificación se perfecciona con la firma de las partes.

CLÁUSULA 3 –VIGENCIA DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS.

Todas las cláusulas y estipulaciones convenidas en el **Contrato de Obra Nº COP-2025-002** del 22 de abril de 2025, deberán interpretarse y tasarse conforme al contenido de la presente acta de modificación; luego, las disposiciones no adicionadas o modificadas por el presente acuerdo, continúan vigentes.

En constancia de lo anterior, la presente acta de modificación de mutuo acuerdo se firma en el municipio de Milán, Departamento del Caquetá, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2025.

Victor A. Vasco.

VICTOR ANDRES VASCO QUIVANO
ALCALDE MUNICIPIO DE MILÁN
Contratante

ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA
R. CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
Contratista

CARLOS DARÍO CANO SÁNCHEZ
R. CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
Interventor del Contrato COP-2025-002

Proyectó PJ	Carolina Burgos Triana	Cargo	Contratista Apoyo a la Supervisión	Firma	
Revisó PT	Consorcio Alcantarillado San Antonio 2025	Cargo	Interventor COP-2025-002	Firma	
Revisó PT	Kelly Juliana Llanos Jaramillo	Cargo	Secretaria de Planeacion	Firma	
Aprobó	Victor Andres Vasco Quivano	Cargo	Alcalde Municipal	Firma	

ANEXO 11 COPIA DE LA PREACTA N. 2

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE NILIVA - CAQUETÁ
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA
PREACTA N. 2

OBJETO DE CONTRATO: Adecuación y conformación de cauce fluvial en la calle 4, entre cra 2 a la cra 4, del casco urbano de la inspección de San Antonio de Getucito, en el municipio de Nilivia, Departamento del Caquetá
CONTRATISTA : CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
REPRESENTANTE LEGAL: ALBA MARITZA DUSSÁN ACOSTA
INTERVENTOR: CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS DARÍO CANO SÁNCHEZ
FECHA DE INICIO: 20 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 21 DE ENERO DE 2026
FECHA PREACTA No. 02: 31 DE OCTUBRE DE 2025

Adecuación y conformación de cauce fluvial en la calle 4, entre cra 2 a la cra 4, del casco urbano de la inspección de San Antonio de Getucito, en el municipio de Nilivia, Departamento del Caquetá

			VALORES INICIALES			ACTA MODIFICATORIA 3			ACTA PARCIAL No. 01		ACUMULADO TOTAL		SALDOS	
Nº	TEN	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
						$ 742.994.340,00			$ 742.994.340,00		$ 568.163.611,20		$ 568.163.611,20		$ 757.163.027,20
1	CD04					$ 311.815.845,00			$ 311.815.845,00		$ 121.038.743,00		$ 121.038.743,00		$ 153.872.246,00
1	1.0 PRELIMINARES														
1	1.01	Localización y replanteo de obra	M2	891,25	$ 5.190,00	$ 4.624.237,50	594,84		$ 3.087.327,60	440,45	$ 2.286.697,05	440,45	$ 2.286.697,05	96,39	$ 440.865,07
2	1.02	Cerramiento provisional en malla verde (H=2,00m)	ML	857,25	$ 13.149,00	$ 13.581.440,00	973,84		$ 15.138.127,00	488,10	$ 15.434.027,00	488,10	$ 15.434.027,00	195,84	$ 2.984.454,00
3	1.03	Excavación manual en material común de 0,00 a 2,00m	M3	72,71	$ 33.772,00	$ 9.851.240,00	185,64		$ 7.307.285,00	11,47	$ 454.324,00	11,47	$ 454.324,00	131,14	$ 4.103.240,00
4	1.04	Excavación manual en material común de 2,00 a 4,00m	M3	37,00	$ 49.618,00	$ 2.599.640,00	16,17		$ 707.280,00	4,70	$ 645.514,00	4,70	$ 645.514,00	0,47	$ 32.271,00
5	1.05	Excavación mecánica en material común	M3	1.281,00	$ 7.849,00	$ 38.012.938,00	1.296,84		$ 38.954.303,00	936,09	$ 32.201.795,00	936,09	$ 32.201.795,00	972,00	$ 6.143.534,00
6	1.06	Entibado en madera para contener talud de excavación	M2	960,00	$ 40.302,00	$ 33.648.757,00	914,76		$ 33.300.084,00	806,29	$ 30.454.710,00	806,29	$ 30.454.710,00	81,13	$ 4.899.362,00
7	1.07	Cargue, transporte y retiro de material sobrante	M3	638,41	$ 53.644,00	$ 36.205.336,00	668,00		$ 21.868.559,00	310,09	$ 16.635.217,00	310,0903	$ 16.635.217,00	165,00	$ 3.378.071,00
8	1.08	Relleno, Compactado tubería con cierre de 95 de densidad (Incluye ASTM D467	M3	134,29	$ 92.394,00	$ 9.329.513,00	97,73		$ 8.930.111,00	65,87	$ 6.371.275,00	65,87	$ 6.371.275,00	39,08	$ 3.972.450,00
9	1.09	Relleno con material seleccionado de la excavación	M3	706,13	$ 77.475,00	$ 13.677.123,00	1.294,09		$ 21.971.994,00	707,71	$ 12.980.722,00	707,71	$ 12.980.722,00	586,38	$ 9.191.402,00
10	1.11	Suministro e instalación de subdren granular tipo C, M3	M3	140,70	$ 240.144,00	$ 48.719.647,20	112,46		$ 29.830.575,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	112,46	$ 29.830.575,00
11	1.11	Suministro e instalación de base granular tipo C, M3	M3	63,82	$ 272.144,00	$ 17.411.000,20	36,38		$ 7.907.245,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	36,38	$ 7.907.245,00
12	1.12	Suministro e instalación de subdrén horizontal en tubería ranurada PVC D=4"	ML	117,46	$ 57.376,00	$ 10.111.173,00	278,24		$ 12.000.417,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	139,24	$ 12.000.417,00
						$ 349.276.851,70			$ 284.710.719,60		$ 207.291.920,05		$ 207.291.920,05		$ 87.423.080,00
2	2.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA														
9	2.01	Suministro e instalación de tubería PVC D=6" RDE 32,5 NTC 3722-3 08	ML	168,34	$ 133.300,00	$ 24.117.800,00	129,08		$ 21.930.954,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	129,08	$ 21.930.954,00
10	2.02	Suministro e instalación de tubería PVC D=4" RDE 32,5 NTC 3722-3 08	ML	83,84	$ 388.400,00	$ 17.653.353,60	79,81		$ 23.804.155,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	79,81	$ 23.804.155,00
11	2.03	Suministro e instalación de tubería PVC D=4" RDE 13 NTC 3722-3 08	ML	82,00	$ 384.672,00	$ 31.539.504,00	46,79		$ 17.978.001,00	43,40	$ 17.021.284,00	43,40	$ 17.021.284,00	3,39	$ 956.717,00
12	2.04	Suministro e instalación de tubería PVC D=12" RDE 9 NTC 3722-3 Pte	ML	158,27	$ 192.404,00	$ 134.488.234,80	149,94		$ 128.982.777,00	136,80	$ 133.782.315,60	136,80	$ 133.782.315,60	7,36	$ 5.821.717,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE MILAN - CAQUETÁ
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

PREACTA N. 2

PDA CAQUETÁ

15	3.09	Suministro e instalación de tubería PVC D=8" RD 32.5 ASTM F 794	ML	31.00	$ 140,679.00	$ 44,770,490.00	31.11		$ 44,047,500.00	98.00	$ 41,991,375.00	89.00	$ 41,991,375.00	0.09	$ 3,056,344.00
16	3.04	Suministro e instalación de tubería PVC D=16" RD 32.5 ASTM F 794	ML	11.00	$ 1,448,870.00	$ 15,935,560.00	10.78		$ 100,570,974.00	70.00	$ 100,998,470.00	70.00	$ 100,748,470.00	2.78	$ 4,427,496.00
3	3.0 POZOS DE INSPECCION					$ 60,477,417.00			$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
18	3.01	Pozos de inspección en concreto T=1 24Mpa D=1.00 m y H=1.00 m, incluye tapa	UND	4.00	$ 3,291,910.00	$ 21,701,476.00	0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
19	3.02	Pozos de inspección en concreto T=1 24Mpa D=1.20 m y H=4.00 m, incluye tapa	UND	5.00	$ 8,915,711.00	$ 38,478,730.00	0.00		$ 71,427,491.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 71,427,491.00
4	4.0 CONSTRUCCION DE SUMIDEROS Y CABEZA DE SALIDA					$ 100,426,111.00			$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
17	4.01	Construcción de cunetas triangulares de dim. z=0.5/H=x 0.80 m, ancho= 2ft de 0.40m, espesor de muros de 0.20m, y refilos en plástico de 2" x 3/8	UND	4.00	$ 13,481,870.00	$ 53,927,480.00	0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
18	4.02	Construcción de cunetas triangulares de dim. z=0.5/H=x 0.80 m, ancho= 2ft de 0.40m, espesor de muros de 0.20m, y refilos en madera de 2" x 3/8	UND	1.00	$ 13,481,871.00	$ 13,481,871.00	0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
19	4.03	Construcción de sumidero de 1.2m x 0.80m, ancho= 2ft de 0.20m x 1.2m, en 0.15m, refilos madera de 2 x 3/8	UND	9.00	$ 3,930,451.00	$ 31,443,674.00	0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
20	4.04	Construcción de sumidero de 1 pare x 0.80m, ancho= 2ft de 0.20m x 1.2pies, en 0.15m, refilos madera de 2 x 3/8	UND	2.00	$ 5,795,751.00	$ 7,019,462.00	46.00		$ 67,975,100.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	46.00	$ 67,975,100.00
21	4.05	Construcción de cabezote de salida	UND	1.00	$ 4,154,217.00	$ 4,154,217.00	1.00		$ 1,000,974.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1,000,974.00
5	5.0 ASEO GENERAL					$ 1,000,974.00			$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
22	5.01	Aseo general de Obra	UND	1.00	$ 1,000,974.00	$ 1,000,974.00	1.00		$ 1,000,974.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 1,000,974.00
MP	OBRAS NO PREVISTAS					$ 0.00			$ 44,321,000.00		$ 41,442,717.00		$ 41,442,717.00		$ 55,478,000.00
23	MP.1	Pozos de Inspección en concreto T=1 24Mpa D=1.00 m y H=2.00 m, incluye tapa	UND	0.00	$ 4,180,344.00	$ 0.00	4.00		$ 16,294,284.00	1.40	$ 5,913,476.00	1.40	$ 5,913,476.00	0.00	$ 0.00
24	MP.2	Pozos de Inspección en concreto T=1 24Mpa D=1.50 m y 2.21 m<H<3.00 m incluye tapa	UND	0.00	$ 9,025,911.00	$ 0.00	0.00		$ 27,126,943.00	0.00	$ 27,126,943.00	0.00	$ 27,126,943.00	0.00	$ 0.00
25	MP.3	Pozos de Inspección en concreto T=1 24Mpa D=1.40 m y 3.01 m<H<4.00 m incluye tapa	UND	0.00	$ 11,397,267.00	$ 0.00	1.00		$ 11,397,267.00	1.00	$ 11,397,267.00	0.00	$ 11,397,267.00	0.00	$ 0.00
					COSTO DIRECTO	$ 142,904,340			$ 142,904,340		$ 100,000,000		$ 100,000,000		$ 237,283,327

ADMINISTRACION	10%	$ 14,290,434.00
IMPREVISTOS	5%	$ 7,145,217.00
UTILIDAD	4%	$ 5,716,173.60
SUBTOTAL		$ 169,055,964.60
IVA SOBRE U.		$ 27,045,754.34
Plan DE MANEJO AMBIENTAL		$ 2,000,000.00
VALOR TOTAL		$ 198,101,718.94

ALLIANCE FIDUCIARIA (CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 198,382,343.00
VALOR ADICIONAL	$ 0.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 198,382,343.00
ACTA DE OBRA No 01	$ 437,738,911.47
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 437,738,911.47
PORCENTAJE EJECUTADO	44.37%
SALDO POR EJECUTAR	$ 280,343,155.47
PORCENTAJE POR EJECUTAR	55.63%

AIDA MARCELA OVIEDO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

ANEXO 12 COPIA DE ACTA DE COMITE DE OBRA 03 y 04

	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	CÓDIGO	ACTA DE COMITÉ DE INTERVENTORÍA		
		VERSIÓN	0.1		
	ACTA DE COMITÉ N. 3	FECHA	18	10	2025
	ACTA DE COMITÉ INTERVENTORÍA				

MUNICIPIO: MILAN CAQUETA CONTRATO No.: COP-2025-002

OBJETO DE CONTRATO:

ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Carlos Darío Cano (**CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025**)	
ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA (CONSORCIO SAN ANTONIO 2025)	

II. OBJETIVOS DEL COMITÉ

- Socialización de justificación de imprevistos.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y REVISIÓN DE COMPROMISOS

N.A

IV. TEMAS TRATADOS

JUSTIFICACION DE IMPREVISTOS

V. DESARROLLO TEMAS

Fecha: 18 de octubre de 2025

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: San Antonio de Getucha.

El contratista de obra hace entrega del informe de justificacion de anticipo en donde relaciona los siguientes gastos adicionales no previstos en la propuesta entregada al municipio, a continuacion se realcionan las situaciones relacionadas con las situaciones de imprevistos:

De acuerdo con la intervención realizada en los tramos anteriores, se presentaron actividades no prevista en la ejecución del contrato que se relacionan a continuación:

1. Fue necesario realizar nuevamente el levantamiento topográfico de toda la red a construir, con el fin de evaluar la necesidad de correr el lineamiento inicial, esto se debió a la existencia de andenes, cubiertas sobre salida en las zonas verdes que se tenia planteada la red de alcantarillado a construir; una vez identificado en el levantamiento fue necesario presentar de manera formal al interventor tener en cuenta la modificación de la red del paramento lado derecho y este se reubicara por la zona verde del paramento izquierdo que no presenta ninguna existencia de obras de construcción que afectara presupuestalmente el contrato.

La interventoria menciona que desde la revisión inicial antes de dar inicio de obra el contratista de obra ha realizado dos ajustes al diseño con la finalidad de ajustar el proyecto, llega a la conclusión de aprobar este gasto como imprevistos.

Los primeros ajustes se realizaron a causa del informe que se envió por parte de la interventoria para poder dar acta de inicio.

La segunda modificación se planteó debido a que se hablan construido gran cantidad de pisos en espacio público, enramadas por fuera de los paramentos y demás situaciones de obra.

Con el traslado de lado del trazado se debió ajustar por segunda vez debido a las peticiones de la comunidad donde nos solicita realizar el cambio del primer tramo PZ1 – PZ2

La interventoria acepta la justificación de este imprevisto.

IMPREVISTO	VALOR COSTO DIRECTO		VALOR IMPREVISTO	
DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DISEÑO HIDRAULICO	UND	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00

2. El mal estado de las vias que comunica de Florencia a San Antonio de Getucha fue necesario realizar transbordos en carros adecuados para este tipo de trochas.

El contratista presenta entrega de oficio soporte de justificación de no entrega del material en la inspección San Antonio de Getucha.

En el informe de justificación entrega una relación y cuenta de trasbordo de la tuberia a causa de la entrega de la tuberia en Florencia y no en la inspección de san Antonio de Getucha

La interventoria acepta la justificación de este imprevisto.

IMPREVISTO	VALOR COSTO DIRECTO		VALOR IMPREVISTO	
DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TRANSBORDO DE TUBERIA (AUMENTO DE FLETES).	UND	5	$ 800.000,00	$ 4.000.000,00

3. Debido al recorrido de los vehículos fue necesario la intervención de la retro excavadora de llanta tipo pajarita movilizarla alrededor de 8 km para ayudar a los vehículos de carga de la tubería empujarlos en un tramo critico por la vía llamado San Roque.

En la inspección se vive una situación constate de mal estado en las vías de acceso, la obra entro en riesgo desabastecimiento de materiales a causa de las vías de acceso. El contratista decidió movilizar la maquinaria amarilla para poder habilitar y solucionar el problema camiones enterrados y trancón en la vía de acceso desde Florencia.

La interventoría acepta la justificación de este imprevisto.

IMPREVISTO	VALOR COSTO DIRECTO		VALOR IMPREVISTO	
DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
HORAS MAQUINARIA TRABAJO DE VIA	Horas	15	$ 150.000,00	$ 2.250.000,00

4. Debido al desarrollo de la ejecución de los tramos de alcantarillado fue necesario realizar el retiro del tramo del pozo 5 al pozo 6 a causa de la existencia de una red de alcantarillado de una domiciliaria para profundizarla para poder pasar la tubería de 27" principal.

Dentro de la instalacion de la tuebria en el tramo del pozo 5 al pozo 6, se encontro una tuberia de alcantarillado no registrada, la cual pasaba por la mitad del tubo instalado, esto nos obligo a retirar la tuberia instalda en este tramo.

La interventoría acepta la justificación de este imprevisto.



IMPREVISTO	VALOR COSTO DIRECTO		VALOR IMPREVISTO	
DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AUMENTO DE HORAS RETRO EXCAVADORA (CRUCE DE DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO)	Horas	15	$ 150.000,00	$ 2.250.000,00

Conclusión

El contratista justifica el valor de $ 10.500.000 como justificación de anticipo.

Se da por terminada la reunión

VI. INFORME DEL PROYECTO A LAS VEEDURÍAS / CIUDADANÍA (si lo requieren)

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA		RESPONSABLES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA ____ (DÍA) ____ (MES) ____ (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en Florencia, a los

18 días del mes de 10 DE 2025

	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	CÓDIGO	ACTA DE COMITÉ DE INTERVENTORÍA		
		VERSIÓN	0.1		
	ACTA DE COMITÉ N. 4	FECHA	20	10	2025
	ACTA DE COMITÉ INTERVENTORÍA				

MUNICIPIO: MILAN CAQUETA — CONTRATO No.: COP-2025-002

OBJETO DE CONTRATO:

ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
JORGE ANDRES MONCADA SUAZA **CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025)**	
CARLOS DARÍO CANO (**CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025)**	
ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA (**CONSORCIO SAN ANTONIO 2025)**	
FERNANDO ANDRES MARIN CABRERA (**CONSORCIO SAN ANTONIO 2025)**	

II. OBJETIVOS DEL COMITÉ

- Comité de obra para el análisis de alternativas de obra

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y REVISIÓN DE COMPROMISOS

N.A

IV. TEMAS TRATADOS

Solicitudes de obra

Cambio de diseños de las rejillas de sumideros por tapas prefabricadas

modificación del tramo P1-P2

Se da inicio al comité de obra, siendo las 10:00 am, el contratistas de obra presenta la solicitud de modificar el el tramo P1-P2, el contratista de obra menciona que los sumideros existentes en la esquina donde se ubica el P2, el contratista de obra manifiesta que en este sumidero se evidencian obstrucciones por solidos de gran tamaño, se observa una creciente colmatación y debido a este fenómeno que se ha venido observando el contratista presenta la propuesta de crear un pozo adicional en este tramo el cual tendría una diámetro de tubería de PVC 16", se construiría un pozo adiciona, que se llamaría PZ 1ª, y se instalaría tubería de 16''en este tramo.



La interventoria menciona que se debe realizar un balance de obra y un chequeo hidráulico para poder aprobar este cambio, estas modificaciones no podrán tener alteraciones al presupuesto que aumenten el valor contratado, el contratista de obra menciona que realizara la solicitud formal y entregara el chequeo hidráulico el prebalance para estudiar esta solicitud.

		Lugar donde plantea la modificación del diámetro de tubería. Se plantea el cambio de diámetro en una parte del tramo y instalar un pozo adicional, el alcance del proyecto se conserva, la solicitud se realiza para prevenir futuras obstrucciones por solidos de gran tamaño.

Lugar en donde se plantea la modificación de diámetros de tubería

El contratista de obra menciona y solicita realizar el ajuste del diseño de la rejillas de los sumideros, por rejillas plásticas prefabricadas, argumenta que estas presentan una mayor durabilidad por el tipo de material, el interventor menciona que estudiara la solicitud realizada y estimara los beneficios de calidad, durabilidad y costos de estas rejillas prefabricadas, la interventoría menciona que los sumideros no pueden ser cambiados de tamaño y que encaso de aceptar el cambio el contratista de obra tendrá que conseguir las rejillas plásticas del tamaño ya diseñado para el presente contrato. "sumidero de 1.64m x 0.98m, ancho útil de 0.68m x 1.34m, e=0.15m, rejilla platina de 2 x 3/8".

Nuevamente la interventoría advierte que se debe realizar un balance de obra, estas modificaciones no podrán tener alteraciones al presupuesto, ni aumentos el valor contratado, el contratista de obra menciona que realizara la solicitud formal y entregara el chequeo APU para realizar las verificaciones presupuestales.

MODELO PROPUESTO	Rejilla en acero
	

El contratista de interventoría menciona que el contrato de obra lleva un avance ejecutado real del 66% frente al programado que es 32%, teniendo en cuenta la programación de obra. El contratista tiene un avance en la ejecución de obra del 34%.

Siendo las 11:15 am se da por terminado el comité de obra

V. DESARROLLO TEMAS

VI. INFORME DEL PROYECTO A LAS VEEDURÍAS / CIUDADANÍA (si lo requieren)

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
Entregar soporte hidráulico para poder estudiar la modificación del tramo PZ1 -PZ2	CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
Entregar el Prebalance de obra según las nuevas modificaciones	CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
Entregar APU borrador Item no previstos, sumideros de rejillas plásticas	CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
.	

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 05 (DÍA) 11 (MES) 2025 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en Florencia, a los

20 días del mes de 10 DE 2025

ANEXO 13 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
NIT: 901.955.099-5

Florencia Caquetá 22 De septiembre de 2025

ASA-007


Señores

ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA
R.L. CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
Florencia – Caquetá

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000620 DE 2025**
ASUNTO: Recomendaciones de obra

Comedidamente me dirijo a usted en calidad de interventor del contrato cuyo objeto es "ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ". Con la intención de poner en conocimiento la ubicación de los sumideros.



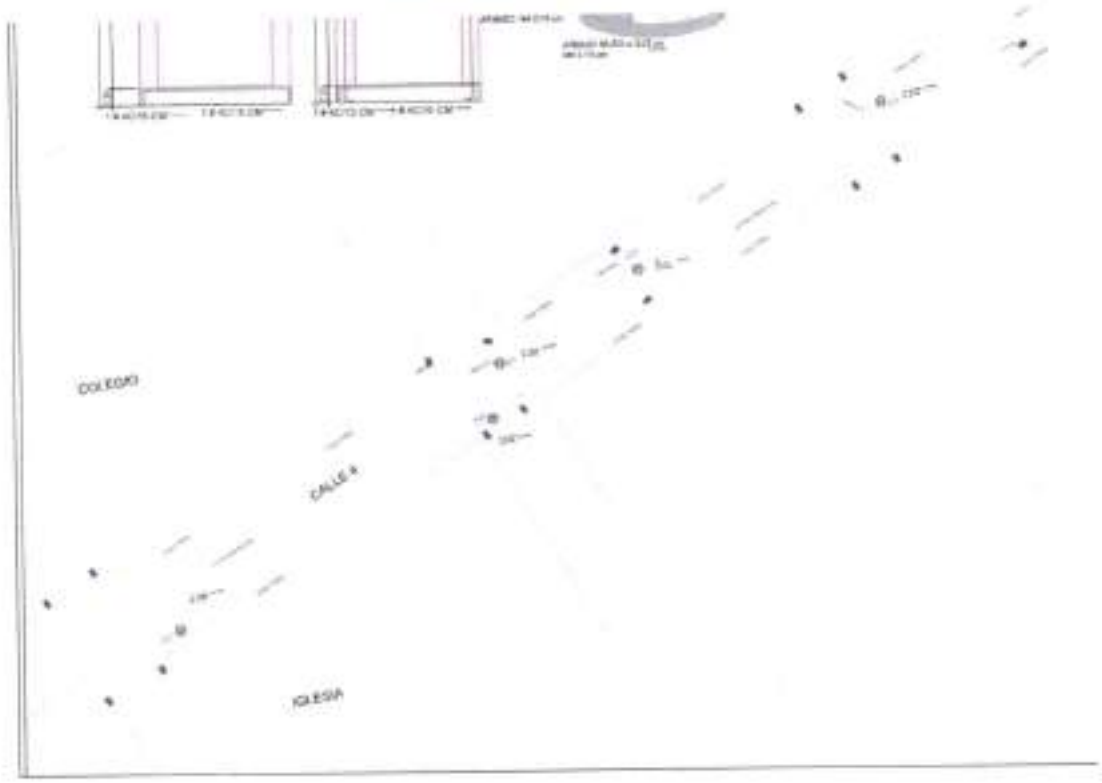

Cordialmente

Carlos Darío Cano Sánchez
Representante Legal
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

Florencia Caquetá 25 De septiembre de 2025

ASA-008

Señores

ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA
R.L. CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
Florencia – Caquetá

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000620 DE 2025**

ASUNTO: Recomendaciones de obra

Comedidamente me dirijo a usted en calidad de interventor del contrato cuyo objeto es "ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ". Con la intención de solicitar realizar la prueba hidráulica de manera manual por tramo de manera conjunta en los tramos construidos hasta el momento

- PZ9 - DESCOLE
- PZ8 - PZ9
- PZ7 – PZ8

Lo anterior se realizara el día 27 de septiembre

Cordialmente

Carlos Dario Cano Sánchez
Representante Legal
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

Florencia Caquetá 30 De septiembre de 2025

ASA-009

Señores

ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA
R.L. CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
Florencia – Caquetá

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000620 DE 2025**

ASUNTO: Recomendaciones de obra

Comedidamente me dirijo a usted en calidad de interventor del contrato cuyo objeto es "ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ". La interventoria solicita retirar la tubería instalada en el tramo PZX5 A PZX6, lo anterior debido a aparición de una acometida domiciliaria no registrada que se cruza con el trazado de la tubería del tramo anterior, se deben retirar esta tubería y reajustar las profundidades y pendientes de la tubería por instalar.

Cordialmente

Carlos Darío Cano Sánchez
Representante Legal
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

Gmail **consorcio alcantarillado san antonio <consorcioalcantarilladosananto@gmail.com>**

Seguimiento a Compromisos mesa de trabajo No. 2 de 15-09-2025

consorcio alcantarillado san antonio <consorcioalcantarilladosananto@gmail.com> 27 de septiembre de 2025, 5:02 p.m.

Para: PDA Caquetá <apoyogestor@pdacaqueta.gov.co>
CC: planeacion@milan-caqueta.gov.co

Buenas tardes me dirijo a usted para realizar entrega de los documentos solicitados por usted, se aclara que se han iniciado actividades para realizar actas de modificación, por procedimientos propios del municipio se realizan primero los siguientes documentos que para quedar en firme dentro del contrato de obra se debe generar una modificatoria al contrato en este caso sería la modificatoria n. 2 , la cual se está en espera a que el municipio la genere.
se adjuntan los documentos solicitados por usted

cordialmente

CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
Interventoría
[Texto citado oculto]

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025.pdf
21800K

Florencia Caquetá 02 De octubre de 2025

ASA-010

Señores

ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA
R.L. CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
Florencia – Caquetá

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000620 DE 2025**

ASUNTO: Solicitud de información

Comedidamente me dirijo a usted en calidad de interventor del contrato cuyo objeto es "ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ". Me permito solicitar la siguiente información:

- Informe ambiental
- Informe de seguridad y salud en el trabajo
- Bitácora de obra
- Informe de obra
- Pago de seguridad social incluyendo el operador de maquina
- Informe social

Cordialmente

Carlos Darío Cano Sánchez
Representante Legal
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

Florencia Caquetá 10 De octubre de 2025

ASA-011

Señores

ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA
R.L. CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
Florencia – Caquetá

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000620 DE 2025**

ASUNTO: Solicitud de obra

Comedidamente me dirijo a usted en calidad de interventor del contrato cuyo objeto es "ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ". Me permito recordar que en cada pozo fundido se debe realizar la toma de muestras para realizar los ensayos de resistencia del concreto.

Se solicita entregar los resultados de las pruebas de resistencia realizadas.

Cordialmente

Carlos Dario Cano Sánchez
Representante Legal
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

Gmail **consorcio alcantarillado san antonio <consorcioalcantarilladosananto@gmail.com>**

INFORME DE INTERVENTORIA No 1 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.° COP-2025-002

1 mensaje

consorcio alcantarillado san antonio <consorcioalcantarilladosananto@gmail.com> 9 de octubre de 2025, 3:14 p.m.

Para: PDA Caquetá <apoyogestor@pdacaqueta.gov.co>

Florencia Caquetá 09 De octubre de 2025

Señores

CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA / GESTOR PDA
GOBERNACION DEL CAQUETA
Florencia – Caquetá

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000620 DE 2025**

ASUNTO: Entrega informe de interventoria No 1

Comedidamente me dirijo a usted en calidad de interventor del contrato cuyo objeto es "ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ". Con la intención de hacer entrega del informe de interventoría No 1 del contrato CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.º COP-2025-002

Cordialmente

Carlos Darío Cano Sánchez
Representante Legal
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

INFORME DE INTERVENTORIA MILAN 1.pdf

ENTREGA INFORME DE INTERVENTORIA No 1.pdf
194K

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
NIT: 901.955.099-5

Florencia Caquetá 09 De octubre de 2025

Señores

CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA / GESTOR PDA
GOBERNACION DEL CAQUETA
Florencia – Caquetá

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000620 DE 2025**

ASUNTO: Entrega informe de interventoria No 1

Comedidamente me dirijo a usted en calidad de interventor del contrato cuyo objeto es "ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ". Con la intención de hacer entrega del informe de interventoría No 1 del contrato CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.º COP-2025-002

Cordialmente

Carlos Darío Cano Sánchez
Representante Legal
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

Gmail **consorcio alcantarillado san antonio <consorcioalcantarilladosananto@gmail.com>**

Entrega informe de interventoría No 1

1 mensaje

consorcio alcantarillado san antonio <consorcioalcantarilladosananto@gmail.com> 9 de octubre de 2025, 3:18 p.m.

Para: planeacion@milan-caqueta.gov.co

Florencia Caquetá 09 De octubre de 2025

Señores

KETTY JULIANA LLANOS
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
Milán – Caquetá

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000620 DE 2025**

ASUNTO: Entrega informe de interventoria No 1

Comedidamente me dirijo a usted en calidad de interventor del contrato cuyo objeto es "ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ". Con la intención de hacer entrega del informe de interventoria No 1 del contrato CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.º COP-2025-002 para sus fines y conocimiento.

INFORME DE INTERVENTORIA MILAN 1.pdf

Cordialmente

Carlos Darío Cano Sánchez
Representante Legal
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

ENTREGA INFORME DE INTERVENTORIA No 1 - municipio.pdf
193K

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
NIT: 901.955.099-5

Florencia Caquetá 09 De octubre de 2025

Señores

KETTY JULIANA LLANOS
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
Milán – Caquetá

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000620 DE 2025**

ASUNTO: Entrega informe de interventoria No 1

Comedidamente me dirijo a usted en calidad de interventor del contrato cuyo objeto es "ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ". Con la intención de hacer entrega del informe de interventoría No 1 del contrato CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.º COP-2025-002 para sus fines y conocimiento.

Cordialmente

Carlos Dario Cano Sánchez
Representante Legal
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

Florencia, 23 de septiembre de 2025

OF-006-2025

Señores
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO
ATN. ING. CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
INTERVENTOR

Referencia. ***CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-2025-002.***
"ADECUACION Y CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"

Asunto: **Respuesta a oficio ASA-007**

Cordial saludo.
Mediante la presente y de acuerdo a lo solicitado, manifestamos que se llevaran a cabo las recomendaciones de obra en cuanto a la ubicación de los sumideros.

Gracias por la recomendación, quedamos prestos a cualquier inquietud.

Atentamente,

ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA
R.L. Consorcio San Antonio 2025

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

Florencia, 24 de septiembre de 2025

OF-007-2025

Señores
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO
ATN. ING. CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
INTERVENTOR

Referencia. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-2025-002.
"ADECUACION Y CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"

Asunto: **Respuesta a oficio ASA-008**

Cordial saludo,
Mediante la presente y de acuerdo a lo solicitado, manifestamos que se llevaran a cabo las recomendaciones de obra en cuanto a realizar la prueba hidráulica de manera manual por tramo de manera conjunta en los tramos construidos hasta el momento en la fecha prevista

- PZ9 - DESCOLE
- PZ8 - PZ9
- PZ7 – PZ8.

Gracias por la recomendación, quedamos prestas a cualquier inquietud.

Atentamente,

ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA
R.L. Consorcio San Antonio 2025

Gmail **consorcio alcantarillado san antonio <consorcioalcantarilladosananto@gmail.com>**

Seguimiento a Compromisos mesa de trabajo No. 2 de 15-09-2025

2 mensajes

PDA Caquetá <apoyogestor@pdacaqueta.gov.co> 26 de septiembre de 2025, 3:44 p.m.
Para: Consorcioalcantarilladosananto <consorcioalcantarilladosananto@gmail.com>

Adjunto oficio de fecha 26 de septiembre de 2025, con solicitud de cumplimiento acuerdos.

--
Cordialmente,

Ing. NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
Secretaria de Infraestructura
Gestora PDA Caquetá
Carrera 13 Calle 15 Esquina - Piso 4
Teléfonos: (8) 435 8240 - 435 5320, 435 1488 Ext. 117, 118
Celular: 317 639 9095.
www.pdacaqueta.gov.co

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO.pdf
796K

consorcio alcantarillado san antonio <consorcioalcantarilladosananto@gmail.com> 27 de septiembre de 2025, 5:02 p.m.
Para: PDA Caquetá <apoyogestor@pdacaqueta.gov.co>
CC: planeacion@milan-caqueta.gov.co

Buenas tardes me dirijo a usted para realizar entrega de los documentos solicitados por usted, se aclara que se han iniciado actividades para realizar actas de modificación, por procedimientos propios del municipio se realizan primero los siguientes documentos que para quedar en firme dentro del contrato de obra se debe generar una modificatoria al contrato en este caso sería la modificatoria n. 2 , la cual se está en espera a que el municipio la genere.
se adjuntan los documentos solicitados por usted

cordialmente

CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
Interventoría
[Texto citado oculto]

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025.pdf
21800K

CAQUETÁ

CAQUETÁ

Florencia, 26 SEP 2025

Ingeniero
CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
Representante Legal
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
consorcioalcantarilladosananto@gmail.com
Florencia – Caquetá

Asunto: Seguimiento de compromisos: Mesa de seguimiento 2 con fecha del 15 de septiembre de 2025

Cordial saludo.

En el marco del desarrollo de las actividades del Plan Departamental de Agua del Departamento de Caquetá, y en mi calidad de supervisor del Contrato de Interventoría N.°202500000620 que tiene como objeto "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.", me permito solicitar la remisión de los soportes que validen el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Mesa de Seguimiento N.° 2, celebrada el 15 de septiembre de 2025.

Se constata que, a la fecha, los siguientes documentos, cuya entrega estaba pactada a más tardar para el 19 de septiembre de 2025, se encuentran pendientes de presentación:

1. Acta de concertación de precios.
2. Acta del comité técnico donde se reflejan las modificaciones y demora en la elaboración del acta de modificación.
3. Justificación técnica de obra para el acta modificatoria.
4. Informe técnico de la interventoría que avale los cambios.
5. APUs de los ítems no previstos.
6. Acta modificatoria.

El incumplimiento de los plazos estipulados en la Mesa de Seguimiento N.° 2 contraviene lo establecido en el ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA para el Concurso de Méritos N.° 202500000620. En particular, se hace referencia a la CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR, donde se enuncia lo siguiente:

"ADMINISTRATIVA.

F. Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, manteniéndola a disposición de los interesados
J. Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos, con la periodicidad que se requiera, atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos;
Q. Presentar los informes que le solicite la ENTIDAD del contrato de interventoría, dentro de los términos y sobre los asuntos que aquel señale y que se relacionen con las obligaciones a cargo del INTERVENTOR.
M. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del contrato
Y. Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento por el contratista de Obra de las obligaciones contractuales.
CC. Requerir al contratista de obra cuando incumpla con las obligaciones contractuales, informar de ello por escrito a LA ENTIDAD y, de resultar pertinente, dar aviso a la aseguradora

TECNICAS

A. Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato, igualmente constatar, según corresponda, la existencia de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de iniciación y la ejecución del objeto pactado; Previo al inicio de cualquier actividad por parte del equipo encargado de la ejecución del proyecto, la Interventoria emitirá el informe inicial, en el cual acredite que los aspectos contractuales, administrativos, financieros, sociales, de predios y autorizaciones, ambientales y técnicos, se encuentran plenamente definidos para la ejecución del proyecto, con base en la programación y cronograma del mismo.
E. Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones estas deberán someterse a la decisión de la autoridad correspondiente (Ordenador del Gasto), previo concepto escrito de la Interventoría.
M.) Realizar todas las acciones que correspondan tanto de acompañamiento como verificación y seguimiento a los ajustes de los estudios y diseños que sean solicitados por todas las entidades involucradas en el proyecto.
Q. Verificar que el contrato de obra se ejecute cumpliendo con el cronograma de ejecución de la obra aprobado por la Interventoría, y emitir concepto en relación con la solicitud de prórroga o modificación del mismo realizada por el contratista de obra, para aprobación por parte de LA ENTIDAD.

GOBERNACIÓN DE
CAQUETÁ

CAQUETÁ

JURIDICAS

I. Revisar, corregir, sugerir y/o dar el visto bueno para adiciones, modificaciones, supresiones de obras o de cantidades de obra, etc."

Por lo expuesto, se requiere que, en un término no superior a tres (3) días hábiles a partir de la recepción de esta comunicación, se remita la totalidad de la documentación requerida.

Agradezco de antemano su atención y colaboración en el pronto saneamiento de estos pendientes contractuales.

NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
Secretaria de Infraestructura- Gestora PDA
Gobernación de Caquetá

Copia: N/A
Anexos: Mesa de seguimiento 2 con fecha del 15 de septiembre de 2025
Elaboró: Ana Sofía Santofimio Calderón/ Apoyo a la supervisión desde el componente técnico PDA Caquetá
Revisó:
Vo. Bo. Esp. Yudy Narley García Rojas – Coordinadora PDA Caquetá

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

Florencia, 01 de octubre de 2025

OF-008-2025

Señores
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO
ATN. ING. CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
INTERVENTOR

Referencia. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-2025-002.
"ADECUACION Y CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"

Asunto: **Respuesta a oficio ASA-009**

Cordial saludo,
Mediante la presente y de acuerdo a lo solicitado, manifestamos que se llevaran a cabo las recomendaciones de obra en cuanto a la solicitud de retirar la tubería instalada en el tramo PZX5 A PZX6, lo anterior debido a aparición de una acometida domiciliaria no registrada que se cruza con el trazado de la tubería del tramo anterior, se retirara esta tubería y se reajustaran las profundidades y pendientes de la tubería por instalar de los sumideros.

Gracias por la recomendación, quedamos prestos a cualquier inquietud.

Atentamente,

ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA
R.L. Consorcio San Antonio 2025

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

Florencia, 3 de octubre de 2025

OF-009-2025

Señores
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO
ATN. ING. CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
INTERVENTOR

Referencia. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-2025-002.
"ADECUACION Y CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"

Asunto: **Remisión de documentos en respuesta a oficio ASA-010**

Cordial saludo,
Mediante la presente y de acuerdo a lo solicitado, remitimos la siguiente información:

- Informe ambiental
- Informe de seguridad y salud en el trabajo
- Bitácora de obra
- Informe de obra
- Pago de seguridad social incluyendo el operador de maquina
- Informe social

Quedamos prestos a cualquier inquietud.

Atentamente,

ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA
R.L. Consorcio San Antonio 2025

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

Florencia, 11 de octubre de 2025

OF-010-2025

Señores
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO
ATN. ING. CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
INTERVENTOR

Referencia. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-2025-002.
"ADECUACION Y CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"

Asunto: **Respuesta a oficio ASA-011 – Solicitud de Obra**

Cordial saludo,
Mediante la presente y de acuerdo a lo solicitado, manifestamos que se llevará a cabo la solicitud de obra y se procederá a realizar la toma de muestras para realizar los ensayos de resistencia del concreto de cada pozo, una vez tengamos los resultados, se los haremos llegar en la menor brevedad.

Gracias por la solicitud, quedamos prestos a cualquier inquietud.

Atentamente,

ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA
R.L. Consorcio San Antonio 2025

ANEXO 14 INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO

"ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"

INFORME COMPRENDIDO DESDE EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 21 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

PRESENTADO A:

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

ELABORO:

DIANA LORENA RAMOS LOZANO
PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 2
2. OBJETIVO 3
3. ALCANCE 3
4. DATOS DEL PROYECTO 4
5. UBICACIÓN DE LA OBRA. 4
6. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 6
7. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 10
7.1 RELACIÓN DEL PERSONAL. 10
7.2 CAPACITACIONES 11
7.5 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN 16
7.6 SEÑALIZACION EN OBRA 17
8 REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO 21
9 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 21
10 ORDEN Y ASEO 22
11 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES. 23
12 CONCLUSIONES 24
13. ANEXOS 24

1. INTRODUCCIÓN

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es una disciplina orientada a la prevención de lesiones y enfermedades derivadas de las condiciones laborales, así como a la protección y promoción de la salud integral de los trabajadores. Su propósito es garantizar un entorno laboral seguro, saludable y propicio para el bienestar físico, mental y social de todas las personas vinculadas a la organización.

En cumplimiento de la normatividad vigente emitida por el Ministerio de Trabajo, las organizaciones están obligadas a implementar políticas, reglamentos y procesos que fortalezcan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Estas acciones buscan controlar los factores de riesgo que puedan afectar a trabajadores, contratistas y visitantes, asegurando el cumplimiento de los requisitos mínimos legales y promoviendo una cultura de prevención, autocuidado y mejora continua en las condiciones laborales.

En este marco, el **CONSORCIO SAN ANTONIO 2025** establece su Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, relacionada con los diferentes procesos productivos y administrativos de la organización. Este documento determina el alcance del SG-SST, define las responsabilidades de los participantes e incluye la información general de las actividades ejecutadas, los procedimientos e instructivos generados durante la vigencia comprendida entre el **22 de septiembre de 2025 al 21 de octubre de 2025**. Todo ello, bajo la aplicación del ciclo **PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar)**, que permite mejorar los procesos y fortalecer el desempeño en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

De acuerdo con lo anterior, el **CONSORCIO SAN ANTONIO 2025**, mediante el contrato N° **COP-2025-002**, cuyo objeto es la ***"Adecuación y canalización de aguas lluvias en la calle 4, entre carrera 2 y carrera 6, del casco urbano de la inspección de San Antonio de Getucha, municipio de Milán, departamento del Caquetá"***, velará por la adecuada implementación del SG-SST. Con ello se busca lograr la máxima identificación y compromiso del personal asociado, garantizando el cumplimiento de la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, en concordancia con la Resolución 0312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015.

2. OBJETIVO

Evidenciar la gestión y el cumplimiento en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y de Gestión Ambiental, durante el periodo comprendido entre el **22 de septiembre de 2025 al 21 de octubre de 2025.** por parte del **CONSORCIO SAN ANTONIO 2025** y su personal asociado, garantizando el fortalecimiento de una cultura preventiva, de autocuidado y de responsabilidad socioambiental en el desarrollo de sus actividades.

3. ALCANCE

El presente informe aplica a todas y cada una de las actividades realizadas por el personal que labora en obra referentes a la Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. DATOS DEL PROYECTO

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MILÁN, CAQUETÁ
CONTRATISTA.	CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
NIT:	901.935.706-2
NUMERO DE CONTRATO DE OBRA:	N° COP-2025-002
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"
FECHA DE INICIO:	veintidós (22) de agosto del 2025.
PLAZO:	El plazo de ejecución del objeto del contrato es de cinco (05) meses, a partir de la suscripción del acta de inicio, y previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones.

5. UBICACIÓN DE LA OBRA.

Milán es un municipio localizado en el departamento del Caquetá, al sur de Colombia, parte de la región amazónica del país, siendo uno de los 16 municipios que conforman el departamento. La cabecera del municipio de Milán está aproximadamente a **84.9 km** al sur-sureste de Florencia, Caquetá, desde donde se llega por vía terrestre en un término de 2 horas con 31 minutos aproximadamente.

La obra se encuentra en San Antonio de Getuchá, siendo parte de Milán, está relativamente cerca de Milán, por lo que la distancia a Florencia es parecida. La ruta terrestre entre Florencia y San Antonio de Getuchá es aproximadamente **90.1 km**, con un tiempo estimado de viaje de unas 2 horas y 42 minutos.

GEOREFERENCIA



UBICACIÓN DE LA OBRA



6. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Entre el 22 de septiembre y el 21 de octubre de 2025, se ejecutaron las actividades correspondientes al proyecto "Adecuación y canalización de aguas lluvias en la calle 4, entre carrera 2 y carrera 6, del casco urbano de la inspección de San Antonio de Getuchá, municipio de Milán, departamento del Caquetá".

Durante este periodo, se realizaron excavaciones en cada tramo de la vía, seguidas de la instalación de tuberías y la construcción de cilindros de pozo en concreto, aplicando las medidas de seguridad necesarias mediante el uso de entibado para garantizar la estabilidad de las zanjas.

Asimismo, en cada tramo intervenido se efectuó el encerramiento con lona para delimitar el área de trabajo y proteger a los transeúntes. Una vez instaladas las estructuras, se procedió al relleno con cama de arena, asegurando la correcta compactación y nivelación del terreno, cumpliendo con las especificaciones técnicas de la obra.

Se anexan registros fotográficos.


























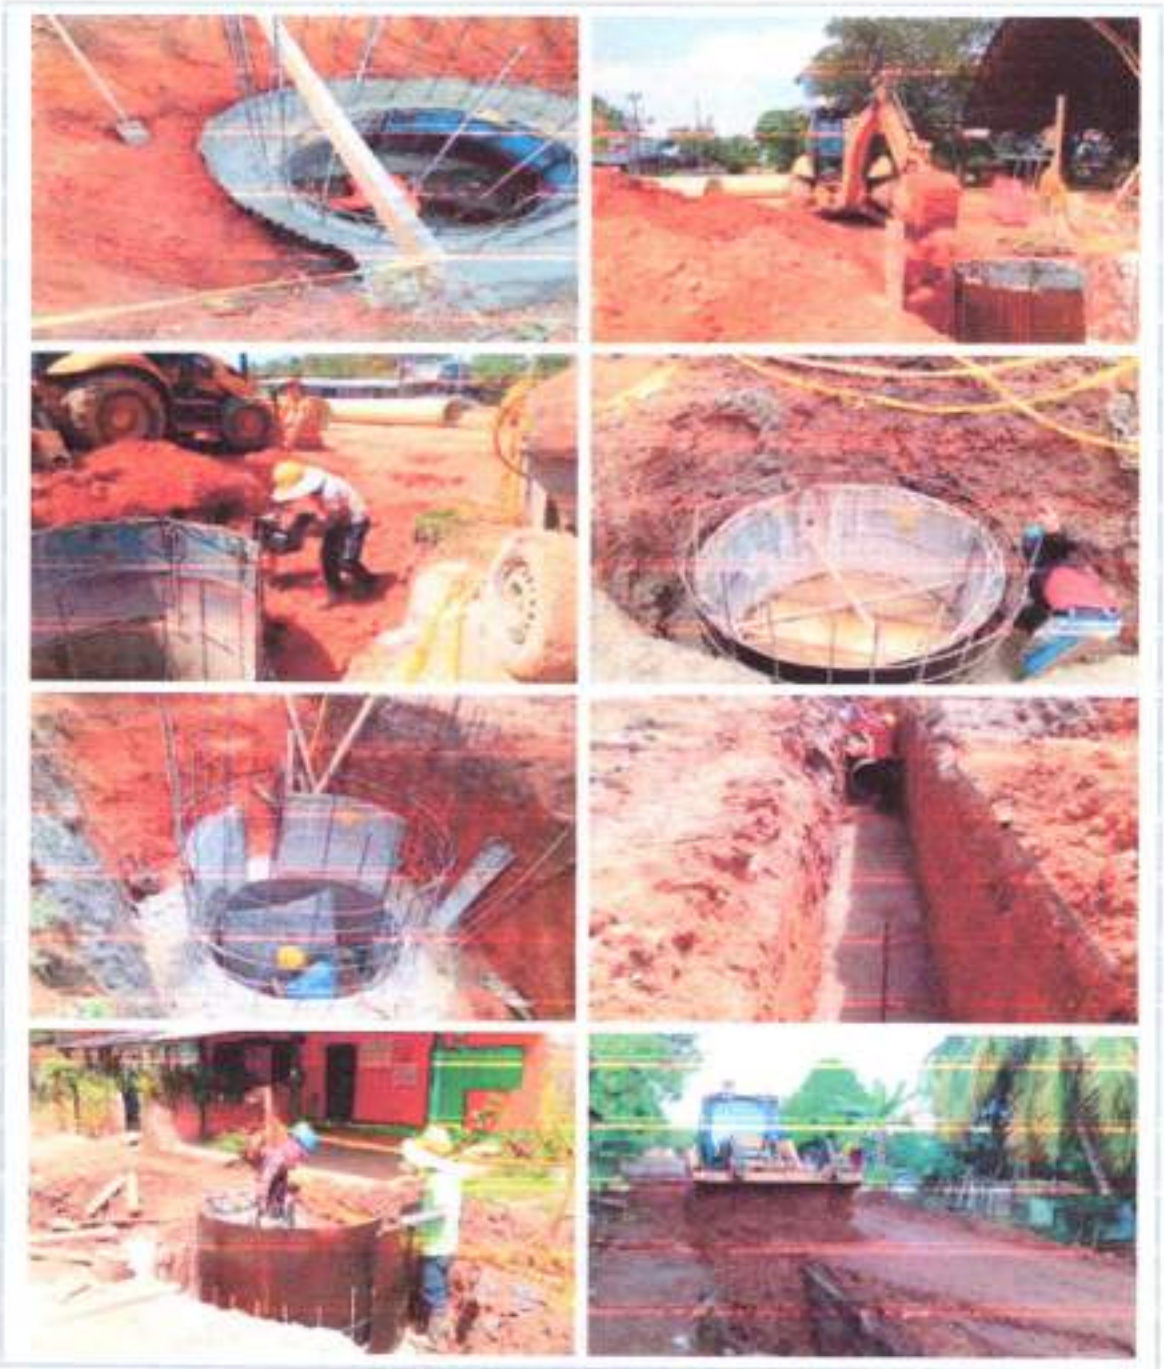

Fuente: Profesional_ Diana Ramos

7. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante el periodo comprendido entre el 22 de septiembre de 2025 al 21 de octubre de 2025, se desarrollaron diferentes actividades, las cuales se describirán a continuación:

7.1 RELACIÓN DEL PERSONAL.

Durante el periodo comprendido entre el 22 de septiembre de 2025 al 21 de octubre de 2025, se realizaron las respectivas afiliaciones y pagos al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) del personal vinculado, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 153 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 806 de 1998 y el Decreto 1703 de 2022.

VER ANEXO 1. AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL.

Tabla 1. Relación del personal en la obra

NOMBRE COMPLETO	No. De CEDULA	CARGO
GUSTAVO ADOLFO OLARTE COLLAZOS	17650594	DIRECTOR DE OBRA
FERNANDO ANDRES MARIN CABRERA	1117512681	RESIDENTE DE OBRA
OSCAR ORLANDO MENDEZ BUITRAGO	1130744004	INGENIERO HIDRAULICO
DIANA LORENA RAMOS LOZANO	40782364	SISO
NORVEY CAMILO NEITO	83091770	MAESTRO DE OBRA
ANCIZAR ORJUELA MANRIQUE	17658583	MAESTRO DE OBRA
YEFERSON CHARO PERDOMO	1117513915	OFICIAL DE OBRA
GERMINSON BARBOSA PLASAS	1.119.581.345	OFICIAL DE OBRA
JHON AINER PEREZ PARRA	1006511551	AYUDANTE
ALEXANDER CARMONA RIOS	1117262033	AYUDANTE
NORBEY CORREA PLAZAS	6801673	AYUDANTE
ORLANDO JIMENEZ CALDERON	1117233024	AYUDANTE
FAIBER CARDONA PULIDO	1117234725	AYUDANTE

Fuente: Profesional_ Diana Ramos

7.2 CAPACITACIONES

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.11, se llevaron a cabo capacitaciones dirigidas a los trabajadores de la obra, con el fin de implementar medidas preventivas y correctivas que garanticen su seguridad durante la ejecución.

Asimismo, se incluyeron contenidos orientados a la protección del medio ambiente, fomentando prácticas sostenibles dentro del entorno laboral. la prevención de la contaminación y la conservación de la biodiversidad presente en la obra.

FECHA	*CAPACITACIONES*
22/09/2025	*CONDICIONES DE SEGURIDAD- ESPACIOS CONFINADOS*
24/09/2025	*CONTAMINACION ATMOSFERICA*
26/09/2025	*MOVIMIENTOS REPETITIVOS*
29/09/2025	*TEMPERATURAS EXTREMAS*
01/10/2025	*FAUNA Y FLORA*
03/10/2025	*FLUIDOS O EXCREMENTOS*
06/10/2025	*FENOMENOS NATURALES-VENDAVALES*
08/10/2025	*CAMBIO CLIMATICO*
10/10/2025	*TRABAJO EN EQUIPO*
14/10/2025	*IDENTIFICACION DE ACTOS INSEGUROS*
16/10/2025	*FUENTES HIDRICAS*
20/10/2025	*INDUCCION SG-SST*
21/10/2025	*TRABAJO SEGURO DE ESPCIOS CONFINADOS*

Fuente: Profesional_ Diana Ramos

VER ANEXO 2. FORMATOS DE ASISTENCIA DE CAPACITACIONES.

VER ANEXO 3. FORMATOS DE INDUCCION AL SG-SST.

A continuación, relaciono evidencias fotográficas:



Fuente: Profesional_ Diana Ramos

7.3 PAUSAS ACTIVAS

Durante el periodo presente, se llevaron a cabo pausas activas como parte de las estrategias de bienestar laboral en el frente de obra. Estas consistieron en sesiones breves de ejercicios físicos y estiramientos, con el objetivo de prevenir lesiones musculoesqueléticas, reducir la fatiga y mejorar la concentración de los trabajadores.

VER ANEXO 4. FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE PAUSAS ACTIVAS.

A continuación, relaciono evidencias fotográficas:



Fuente: Profesional_ Diana Ramos

7.4 INSPECCIONES DE SEGURIDAD.

Con el objeto de identificar condiciones inseguras y prevenir la ocurrencia de incidentes y/o accidentes, a continuación, se presentan las diferentes inspecciones realizadas durante el presente período.

VER ANEXO 5. FORMATOS DE INSPECCION DE SEGURIDAD.

VER ANEXO 6. DOCUMENTACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA.

VER ANEXO 7. DOCUMENTACIÓN DEL CONDUCTOR.

Relación de inspecciones realizadas.

FECHA	ASPECTO A INSPECCIONAR
15/10/2025	Inspección de herramienta
25/09/2025	Inspección de EPP
09/10/2025	Inspección de bodega
25/09/2025 30/09/2025 07/10/2025 15/10/2025	Inspecciones de retroexcavadora

Fuente: Profesional_ Diana Ramos

A continuación, relaciono evidencias fotográficas de las inspecciones realizadas:

RETOEXCAVADORA





EPP



Fuente: Profesional_ Diana Ramos

7.5 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN

Con el objetivo de proteger a los trabajadores de los peligros existentes, se realizó entrega de elementos de protección y dotación al personal, tales como: guantes de carnaza, casco, gafas de seguridad.

VER ANEXO 8. FORMATO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.



Fuente: Profesional_ Diana Ramos

7.6 SEÑALIZACION EN OBRA

Durante la presente obra, se implementaron señalizaciones preventivas e informativas con el objetivo de advertir a trabajadores y transeúntes sobre la presencia de actividades de excavación, movimiento de maquinaria y demás labores propias de la obra.

Estas medidas permiten organizar la circulación en los frentes de trabajo, reducir el riesgo de accidentes y brindar información clara y visible sobre las condiciones de la zona, garantizando así un entorno laboral más seguro y ordenado.

A continuación, relaciono evidencias fotográficas:











FIN
DE
OBRA









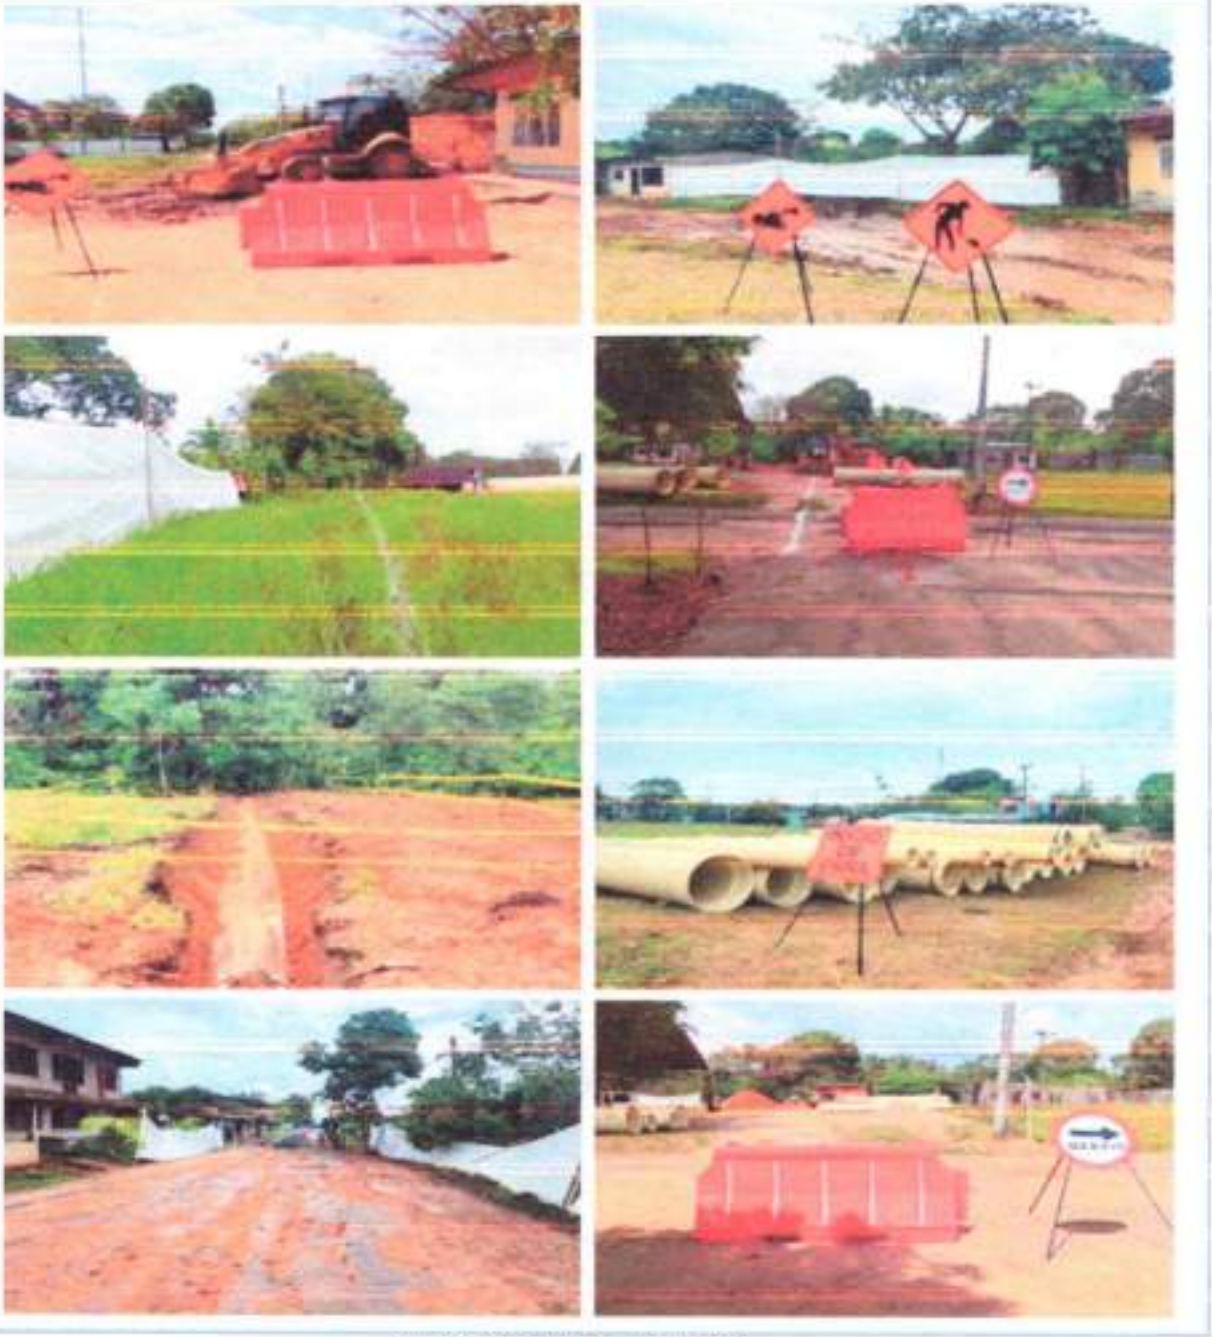

Fuente: Profesional_ Diana Ramos

8 REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO



En el periodo comprendido entre el 22 de septiembre de 2025 al 21 de octubre de 2025, no hubo reporte de accidentes de trabajo ni enfermedades laborales.

9 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Durante la ejecución de la obra se instaló tres puntos ecológicos, destinado a la adecuada clasificación y disposición de los residuos sólidos generados. Este espacio cuenta con recipientes diferenciados para separar materiales aprovechables, no aprovechables y orgánicos, fomentando entre los trabajadores una cultura de manejo responsable de los residuos y contribuyendo al cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos en el proyecto.

A continuación, relaciono evidencias fotográficas:



Fuente: Profesional_ Diana Ramos

10 ORDEN Y ASEO

Durante la obra se realizaron actividades de orden y aseo por parte de los trabajadores, quienes llevaron a cabo la recolección de residuos y la limpieza de las áreas intervenidas.



Fuente: Profesional_ Diana Ramos

11 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.

Teniendo en cuenta las actividades desarrolladas en obra, se evidencia a continuación el espacio en donde se realiza de manera temporal el almacenamiento de los materiales, se encuentra ubicada dentro de la institución educativa.

12 CONCLUSIONES

- Las actividades se han realizado en cumplimiento de la normatividad vigente.
- No se presentaron reportes de actos y condiciones inseguras.
- No se presentaron incidentes y accidentes de trabajo.
- Los trabajadores demuestran aprensión sobre el tema expuesto.
- Los materiales y herramienta menor son almacenados de manera correcta.

13. ANEXOS

ANEXO 2. AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL.

Medellín, 16 de October de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO SAN ANTONIO 2025.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo	900000003 OBRA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1119581345	BARBOSA PLASAS GERMINSON	17/10/2025		21318202	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación.
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 16/10/2025 21:26:58.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.97.8.241, 192.230.104.4, 172.16.42.57

porvenir

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 900.336.004-7

CERTIFICA QUE:

GERMINSON BARBOSA PLASAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.119.561.345**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 23 de Octubre del 2025.

Cordialmente,

Porvenir

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir. ¿por qué? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1119581345
NOMBRES	GERMINSON
APELLIDOS	BARBOSA PLASAS
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	CAQUETA
MUNICIPIO	MILAN

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	ASMET SALUD EPS S.A.S	SUBSIDIADO	01/07/2015	31/12/2999	CABEZA DE FAMILIA

Fecha de Impresión:	10/23/2025 10:43:36	Estación de origen:	2801:12:c800:2070::1

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya

ARL | sura

Medellín, 06 de October de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Numero identificacion	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Codigo de novedad	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000000 OBRA				Clase: 5	Porcentaje cotizacion: 6.96 %	
C1117513910	CHARO PERDOMO YEFERSON	09/10/2025		24022910	DEPENDIENTE	POR HACER

nul

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación de trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación prioritaria. La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos a 06/10/2025 15:44:24
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las direcciones marcadas con dos asteriscos (**) son consultas pendientes de retiro.

Dirección IP: 131.153.52.218, 142.250.184.12, 172.16.42.67

VIGILADO

porvenir

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

Nit 800.224.808-6

CERTIFICA QUE:

YEFERSON CHARO PERDOMO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.117.513.915, se encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir

La presente certificación se expide el 23 de Octubre del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir. ¿por qué? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliacion en la Base de Datos Unica de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Informacion Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NUMERO DE IDENTIFICACION	1117513915
NOMBRES	YEFERSON
APELLIDOS	CHARO PERDOMO
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	CAQUETA
MUNICIPIO	FLORENCIA

Datos de afiliacion :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	NUEVA EPS S.A.	CONTRIBUTIVO	01/01/2021	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	10/23/2025 10:49:29	Estación de origen:	2801:12:c800:2070::1

La información registrada en esta pagina es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Proteccion Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo tecnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES"

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado

ANEXO 3. FORMATOS DE ASISTENCIA DE CAPACITACIONES.

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-001
Version: 001
Fecha Aprobación: Agosto 2025

LUGAR	HORA	DD	MM	AA
San Antonio	10:00 am	12	09	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		Condiciones de Seguridad - Espacios Confinados
Reinducción		
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación específica al cargo		
Capacitación COPASST		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Juan Carlos Navarro	1080934111	O.P.	Juan Carlos N
2	Norbey Correa Plazas	6.801.673	Ayudante	N C P
3	Juan Diego Ayala Parra	1006511551	ayudante	Juan Diego
4	Fauber Cardona	1117234765	Ayudante	fauber CD
5	Norbey Ayala	8709170	maestro	Norbey
6	Orlando Jimenez	11773074	Andamio	Orlando J.
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Dana Ramos	

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-051
Versión: 001
Fecha Aprobación: Agosto 2025

LUGAR	HORA	DD	MM	AA
San Antonio	8:30 am	20	10	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		Trabajo Seguro de espacio Confinados
Reinducción		
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación específica al cargo		
Capacitacion		
Otro		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Faiber Cardona	1117234725	Ayudante	Faiber C.D
2	Norbey Correa Pinzon	6801.673	Ayudante	NCPL
3	Juan Carlos N.	1030934116	OP.	Juan Carlos
4	Orlando Lizcano	1117833014	Ayuda de	Orlando L.
5	Norbey Camilo	8704.724	maestro	Norbey
6	Jhon Alexander Perez Pa	1006515151	ayudante	Jhon Alexander
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Diana Ramos	

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-002
Versión: 005
Fecha Aprobación: Agosto 2023

LUGAR	HORA	DD	MM	AA
San Antonio	8:00 am	26	09	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Riesgo Biomecanico - Movimientos Repetitivos
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación específica al cargo		
Capacitación		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Fanyer Cordoba	1117534715	Ayudante	Fanyer C.P.
2	Idan Jair Parra Parra	1006511531	ayudante	Idan Jair
3	Eduardo Lizcano	1117730274	Ayudante	Eduardo L.
4	Juan Camilo N	1082134776	OP	Juan C. N
5	Walter Cuellar	1209122	maestro	Walter
6	Norbey Correa Plazas	6.801673	Ayudante	NCPL
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Diana Rumos	

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-001
Versión: 001
Fecha Aprobación: Agosto 2025

LUGAR	HORA	DD	MM	AA
San Antonio	10:00 am	12	09	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		Riesgo Físico - Temperaturas extremas
Reinducción		
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación específica al cargo		
Capacitación		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Norbey Correa Plazas	6501.677	Ayudante	NCPL
2	Juan Carlos N	1085344776	TP	Juan Carlos N.
3	Fabian Cardona	1083844798	Ayudante	Fabian C.
4	Jhon Alex Perez Zapata	1006511251	Ayudante	Jhonper
5	Orlando Ivaccel	1117237024	Ayudante	Orlando I.
6	Elkin Yesid Rumio	85091726	Maestro	Elkin Y.
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Persona responsable de la actividad

Nombre: Diana Rumos
Firma:

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-001
Version: 001
Fecha Aprobación: Agosto 2025

LUGAR	HORA	DD	MM	AA
San Antonio	10 pm	05	10	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		
Reinducción		
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación específica al cargo		
Capacitación		Riesgo Biologico - Fluidos o excrementos
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Faiber Cardona	1[illegible]7 28	Ayudante	Faiber C P.
2	Olan de Jesus C.	1132337824	Ayudante	Olan de J
3	Norbey Cortes Plazas	6.801673	Ayudante	N C PL
4	Juan Carlos N	10X09[illegible]16	O.P	Juan Carlos N
5	Juan Alirio Perez-parra	1006[illegible]551	ayudante	Juan Alirio
6	Norbey Ramos	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Dyna Ramos	

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-001
Version: 001
Fecha Aprobación: Agosto 2025

LUGAR	HORA	DD	MM	AA
San Antonio	3:00 pm	08	10	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		Trabajos Nocturnos - Verticales
Reinducción		
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación específica al cargo		
Capacitación		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Juan Aimer Perez Parra	1006511551	ayudante	
2	Orlando Lozano Calderón	1123333014	Andaluh	
3	Norbey Correa Plazas	6.801.673	Ayudante	
4	Norbey Camilo	8209170	Maestro	
5	Alex XAVIER CAMACHO RIOS	1117 262 033	OFICIAL	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Diana Lorena Ramos	

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-001
Versión: 001
Fecha Aprobación: Agosto 2025

LUGAR	HORA	DD	MM	AA
San Antonio	4:00 pm	10	10	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Trabajo en Equipo
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación específica al cargo		
Capacitacion		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Juan Carlos Moreno	1085094796	Op	Juan Carlos M
2	Walber Tovilo	87091770	motilo	
3	Oland Lopez Calvo	1117273074	Ayudante	
4	Faiber Cardona	1117238715	Ayuante	Faiber C.
5	Norbey Correa Plaza	6.801.673	Ayudante	NCPL
6	Jhon Alver Leyva Jaramillo	1006511551	ayudante	
7	Alexander Carmona Rios	1117268033	oficial	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Diana Lorena Parra	

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-001
Versión: 001
Fecha Aprobación: Agosto 2025

LUGAR	HORA	DD	MM	AA
San Antonio	10:00 am	14	10	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		Identificación de actos Inseguros
Reinducción		
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación específica a cargo		
Capacitación		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Norbey Camilo	83091410	maestro	Norbey Camilo
2	Faiber Cardona	117 2239725	Ayudante	Faiber C.
3	Juan Carlos Narvaez	1080939916	OP	Juan Carlos
4	Norbey Correa plazas	6.801.673	Ayudante	N C PL
5	Jhon Fiver Perdomo	1006511551	ayudante	Jhon Fiver
6	Oscar Vicente Calderón	1117233064	Ayudante	Oscar V.
7	Gerardo CAMACHO R	1174628033	oficial	Gerardo
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Diana Lorena Ramos	

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-001
Versión: 001
Fecha Aprobación: Agosto 2018

LUGAR: San Antonio

HORA:

FECHA: DD: 18 MM: 10 AA: 25

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción	
Reinducción	
Charla de seguridad	X
Inspección de SST / Operativos	
Seminario / Taller / Curso	
Capacitación específica al cargo	
Capacitación	
Otra	

TEMAS TRATADOS: Prevención de Caidas

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Juan Carlos Mosquera	1090934796	operario	Juan Carlos M.
2	Cristian Lozano G.	1122330924	Ayudante	Cristian L.
3	Norbey Perdomo	83091770	maestro	Norbey Perdomo
4	Sebastian Chaux	1117513915		Sebastian Chaux
5	Jhan Brian yara yara	1006511551	ayudant	Jhan Brian
6	Norbey Correa Plazas	6801673	Ayudante	NCPL
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Diana Lorena Pardo	

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-001
Versión: 001
Fecha Aprobación: Agosto 2025

LUGAR: San Antonio

HORA:

DÍA	MES	AÑO
10	10	25

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción	
Reinducción	
Charla de seguridad	X
Reuniones de SST / Operativas	
Seminario / Taller / Curso	
Capacitación específica al cargo	
Capacitación	
Otra	


TEMAS TRATADOS: Uso adecuado de EPP.

No.	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Norbey Correa Prados	6.801.673	Ayudante	NCPL
2	Jhon Jairo Pena Borja	1006311551	Ayudante	Jhon Jairo
3	Orlando Lozano C	1117233024	Ayudante	Orlando L.
4	Weiber Cuellar	5.709.710	maestro	
5	Johnson Chaza R.	1117513915		Johnson Chaza R.
6	Juan Carlos Monroy	1098934976	Operario	Juan Carlos M.
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Persona responsable de la actividad

Nombre: Diana Carreras Ramos

Firma:

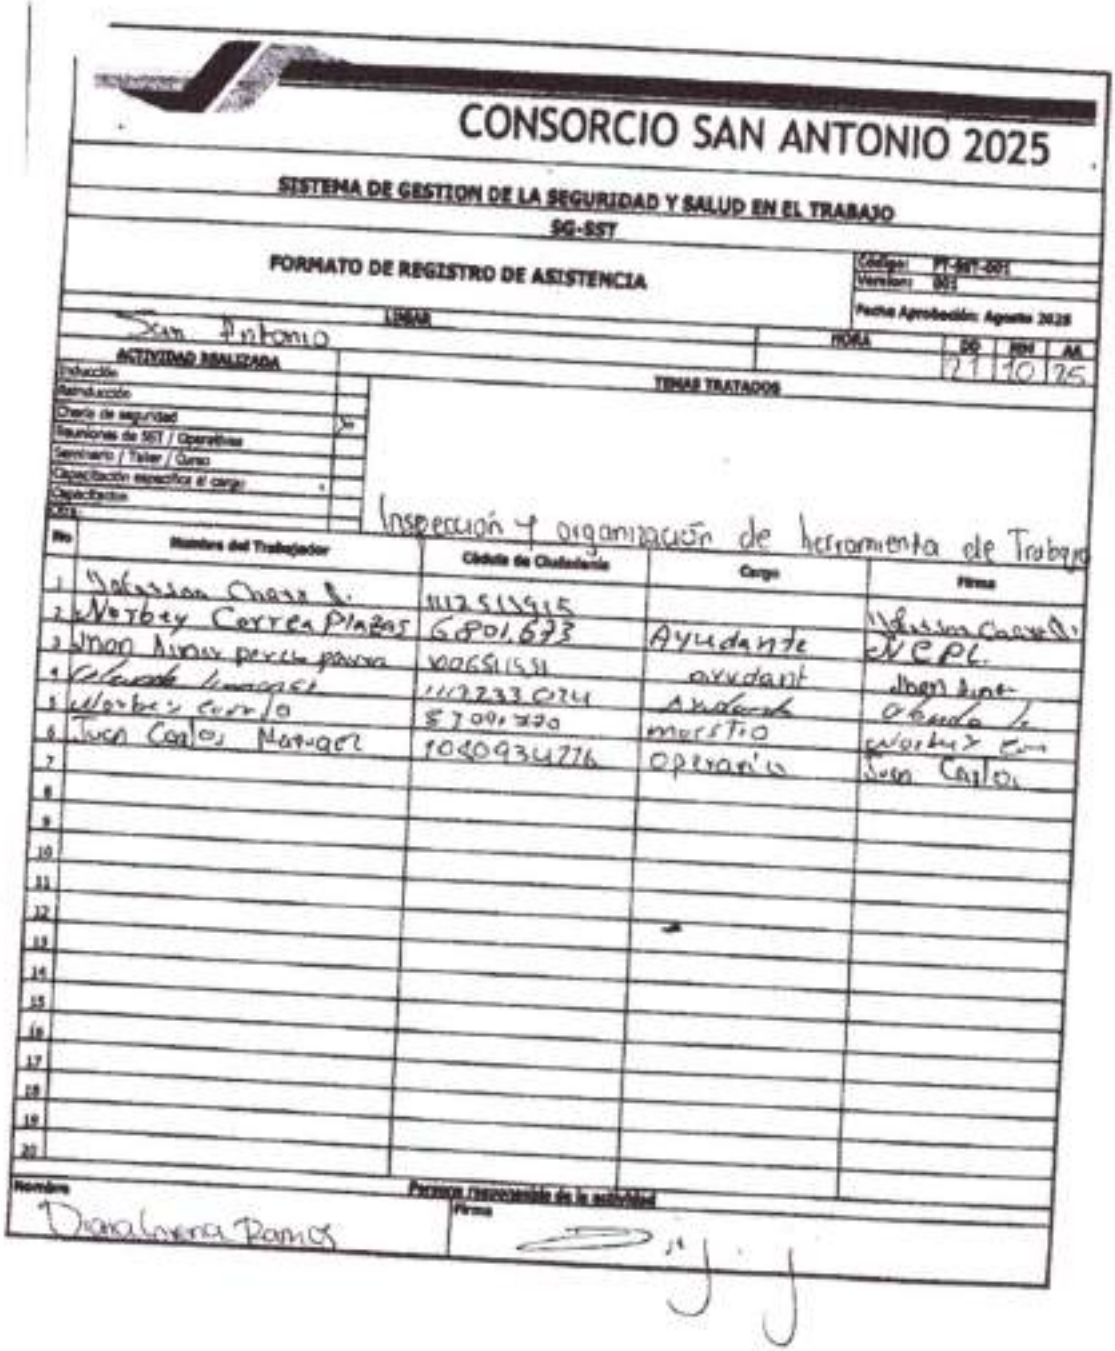

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-001
Version: 001
Fecha Aprobación: Agosto 2025

LUGAR: San Antonio

HORA:

FECHA: DD 21 MM 10 AA 25

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción	
Reinducción	
Charla de seguridad	X
Reuniones de SST / Operativas	
Seminario / Taller / Curso	
Capacitación específica al cargo	
Capacitación	
ARL	

TEMAS TRATADOS: Inspección y organización de herramienta de Trabajo

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Jefersson Chaux L.	1117511415		Jefersson Chaux L.
2	Norbey Cerrea Pinzos	6801.673	Ayudante	NCPL.
3	Jhon Alexis perdomo pavon	1006511511	ayudant	Jhon Alexis
4	Yolanda Lizcano	1117233 0214	Ayudante	Yolanda L.
5	Norbey Cerrejo	5709.770	maestro	Norbey Cerrejo
6	Juan Carlos Noriega	1040934776	Operario	Juan Carlos
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Persona responsable de la actividad

Nombre: Diana Lorena Ramos

Firma:

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-001
Versión: 001
Fecha Aprobación: Agosto 2025

LUGAR: San Antonio | HORA: 9:00 a.m. | DD: 07 | MM: 10 | AA: 2025

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción	
Reinducción	
Charla de seguridad	
Reuniones de SST / Operativas	
Seminario / Taller / Curso	
Capacitación específica al cargo	1
Capacitación	20
Otra:	

TEMAS TRATADOS: Fauna y Flora

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Norbey Camilo	83091770	motista	Norbey Cam.
2	Salazar Oscar	1117513915		Salazar Oscar
3	Jhon Jaider perez parra	1006511551	ayudante	Jhon Jaider
4	Orlando Jimenez	1117330124	Ayudante	Orlando Jimenez
5	Norbey Carrera Plazas	6801673	Ayudante	NCP
6	Juan Carlos Narvaez	1040094776	operativo	Juan Carlos N
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Persona responsable de la actividad

Nombre: Diana Lorena Reyes Lozano | Firma:

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-001
Versión: 001
Fecha Aprobación: Agosto 2025

LUGAR: San Antonio
HORA: 2:00 pm
DD: 16 MM: 10 AA: 2025

ACTIVIDAD REALIZADA

Inducción	
Reinducción	
Charla de seguridad	
Reuniones de SST / Operativas	
Seminario / Taller / Curso	
Capacitación específica al cargo	
Capacitacion	X
Otra	

TEMAS TRATADOS: Fuentes Hidricas

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Orlando Jimenez	1117233024	Ayudante	Orlando J.
2	Norbey Cerón	83991720	Motilon	Norbey Cerón
3	Johnson Chaux S.	1117513915		Johnson Chaux S.
4	Jhon Kiner perez mora	1006911551	ayudante	Jhon Kiner
5	Norbey Cerron Plazas	6.801.673	Ayudante	NCPL
6	Juan Carlos Narvaez	1098934176	operario	Juan Carlos N.
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Persona responsable de la actividad

Nombre: Diana Lorena Ramos Lozano
Firma:

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-001
Versión: 001
Fecha Aprobación: Agosto 2025

LUGAR	HORA	DD	MM	AA
San Antonio.	8:00 am	08	10	2025

ACTIVIDAD REALIZADA	
Inducción	
Reinducción	
Charla de seguridad	
Reuniones de SST / Operativas	
Seminario / Taller / Curso	
Capacitación específica al cargo	
Capacitación	X
Otra	

TEMAS TRATADOS

Cambio Climatico

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Norbey Correa Pinzon	6801673	Ayudante	NCPL
2	Faibli Cardona	1117253945	Ayudante	Faibli C P
3	Jhon Anderson Parra	1006511351	ayudante	Jhon Anderson
4	Claudia Vanessa Calderon	1117233024	Ayudante	Calderon.
5	Norbey Camilo Prieto	82491710	maestro	Norbey camilo
6	ALEJANDRO CALMORA DIAZ	1117262033	OFICIAL	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Diana Maria Ramos Lozano	

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-005
Versión: 001
Fecha Aprobación: Agosto 2025

LUGAR	HORA	DD	MM	AA
San Antonio.	10:00 am	24	09	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación específica al cargo		
Capacitación	X	Contaminación Atmosferica
Otra		

No.	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Juan Carlos Narvaez	1080934116	Op	Juan C N
2	Norbey Correa plazas	6801673	Ayudante	N C PL
3	Faiber Cardona	1117273425	Ayudante	Faiber C
4	Jhon Aner perez pava	1006211551	ayudante	Jhon Aner
5	Ethack Jimenez Cubillos	1117233024	Ayudante	Ethack J.
6	Norbey Camilo Muñoz	8309870	motorista	Norbey Camilo
7	ALEXANDER CARDONA RIOS	1117 849033	oficial	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Dandelaero Ramos C	

ANEXO 4. FORMATOS DE INDUCCION AL SG-SST.

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-051
Versión: 001
Fecha Aprobación: Agosto 2025

LUGAR	HORA	DD	MM	AA
San Antonio.	10:00 a.m	20	10	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción	X	Inducción
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación específica al cargo		
Capacitación		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Jeferson Chavo R	1117513915	Oficial	Jeferson Chavo R
2	Germania Barbosa Flores	1.119.582.345	Oficial	Germania B. Flores
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Diana Cosera Ramos Lozano	

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION

Código: FT-SST-[illegible]
Versión: 001
Fecha: Agosto 31/25

LUGAR	FRENTE DE TRABAJO	Hora	DD	MM	AA
San Antonio	Consorcio San Antonio 2025	10:00 a.m.	10	10	2025

NOMBRE: Yeremison Bendezu Plazas — CC: 1.117.521.545

CARGO: Oficial

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. Cual es la administradora de riesgos laborales a la que usted se encuentra afiliado. (Marque con una **X**)

POSITIVA — GRUPO SURA ✓

2. Accidente de trabajo es: Suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.

VERDADERO	X	FALSO		✓

3. La Seguridad y Salud en el Trabajo es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo

VERDADERO	X	FALSO		✓

4. Marque con una X los factores de riesgo a los cuales esta expuesto en su trabajo

* Golpes, caídas, fracturas.	X
* Caídas al mismo nivel.	X
* Caídas de alturas.	X
* Heridas por cortadas o punzantes.	X
* Lesiones de columna.	X
* manipulación de cargas	X
* Estrés Laboral.	X
*Golpe.	X
* Accidentes de tránsito.	X
* Quemaduras.	X

6/6 ✓

5. Enumere por orden los pasos para reportar un accidente (1,2,3,4)

*Reportar al jefe inmediato.	5
* Prestar los primeros auxilios, si cuenta con los medios para hacerlo y el conocimiento suficiente.	3
* Reportar a la ARL.	4
* Verificar si el accidente es de origen laboral, comunicarse de inmediato con el área de SST, o con	2

✓

6.En que lugar se encuentra publicada las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Porteria ✓

RANGO DE EVALUACION		RESPONSABLE DEL PROCESO EN CAMPO		Firma
RANGO DE EVALUACION	DESCRIPCION	Nombre	Diana Lorena Ramos	
100% - 96%	EXCELENTE			
95% - 76%	REGULAR			
75% -	MALO	Cargo	SISO	

✓

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE EVALUACION DE INDUCCION Y REINDUCCION

Codigo: FT-GST-063
Versión: 001
Fecha: Agosto 2025

LUGAR	FRENTE DE TRABAJO	Hora	DD	MM	AA
San Antonio	Consorcio San Antonio 2025		10	10	2025

NOMBRE: Jefferson Charo — CC: 1075 13945
CARGO: Oficial

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

1. Cual es la administradora de riesgos laborales a la que usted se encuentra afiliado. (Marque con una X)

POSITIVA — GRUPO SURA X

2. Accidente de trabajo es: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte.

VERDADERO: X — FALSO:

3. La Seguridad y Salud en el Trabajo es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causas por las condiciones de trabajo.

VERDADERO: X — FALSO:

4. Marque con una X los factores de riesgo a los cuales esta expuesto en su trabajo

* Golpes, caidas, fracturas.	X
* Caidas al mismo nivel.	X
* Caidas de alturas.	X
* Heridas por cortadas o punzones.	X
* Lesiones de columna.	X
* manipulación de cargas.	X
* Estrés Laboral.	X
*Gripe.	X
* Accidentes de tránsito.	X
* Quemaduras.	

6-6

5. Enumere por orden los pasos para reportar un accidente (1,2,3,4)

*Reportar al jefe inmediato.	3
* Prestar los primeros auxilios, si cuenta con los medios para hacerlo y el conocimiento suficiente.	1
* Reportar a la ARL	4
* Verificar si el accidente es de origen laboral, comuníquese de inmediato con el área de SST, o con	2

6.En que lugar se encuentra publicada las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Recepción

RANGO DE EVALUACIÓN		RESPONSABLE DEL PROCESO EN CAMPO		
RANGO DE EVALUACION	INDUCCION	Nombre:	Diana Lorena Ramos	Firma
100%	NO EXISTENTE			
70%	REGULAR	Cargo:	SISO	
40%	DEFICIENTE			

ANEXO 5. FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE PAUSAS ACTIVAS.

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-001
Versión: 001
Fecha Aprobación: Agosto 2025

LUGAR	HORA	DD	MM	AA
San Antonio	12:00 pm	22	09	2025

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		
Reinducción		
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación específica al cargo		
Capacitacion		Pausa Activa
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Juan Carlos N	1030934176	OP	Juan Carlos N
2	Oberdo Lopez A	1127230214	Ayudante	Oberdo L.
3	Norbey Cerón	93091 21c.	maestro	Norbey. C.
4	Jhon Alber Garzon	1006511551	Oficiante	Jhon Alber
5	Faiber Cardona	1117279326	Ayudante	Faiber C.D
6	Norbey Correa P/zas	6901673	Ayudante	N C pl.
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Persona responsable de la actividad

Nombre: Diana Ramos

Firma:

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-001
Versión: 001
Fecha Aprobación: Agosto 2025

LUGAR	HORA	DD	MM	AA
San Antonio	11:00 am	03	10	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		Pausa Activa
Reinducción		
Charla de seguridad	Si	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación específica al cargo		
Capacitación		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Norbey Correa Plazas	6801673	Ayudante	NCPL
2	Faiber Caldona	1122334335	Practicante	Faiber C.P.
3	Orlando Lasprilla	1117233044	Ayudante de	Orlando L.
4	Nombre Camilo	6701770	MUESTRO	Nombre
5	Jhon Jairo Bolaños	1006515150	ayudante	Jhon Jairo
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Diana Ramos	

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: PT-SST-001
Versión: 001
Fecha Aprobación: Agosto 2025

LUGAR	HORA	DD	MM	AA
San Antonio	9:00am	09	10	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		
Reinducción		
Charla de seguridad	X	Pausa Activa
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación específica al cargo		
Capacitación		
Otro		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Norbey Cerón	87091770	maestro	Norbey
2	Juan Diego Diaz Polo	1006511551	ayudante	Juan Diego
3	Oscar Serrano	1117333074	Ayudante	Oscar S.
4	Norbey Correa Plaza	6AP01673	Ayudante	N C P L
5	Faiber Cardona	1117234715	Ayudante	Faiber C. P
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Diana Ramos	

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-501
Versión: 001
Fecha Aprobación: Agosto 2025

LUGAR	HORA	DD	MM	AA
San Antonio	7:00 am	16	10	25


ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		Pausa Activa
Reinducción		
Charla de seguridad	X	
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación específica al cargo		
Capacitación		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Abad Jurado el	1117232024	Ayudante	
2	Wilber Ruiz	82091770	maestro	
3	Juan Angel perez garcia	1006511551	ayudante	
4	Faiber Cardona	1117229735	Ayudante	
5	Norbey Correa Pinzon	6.801.673	Ayudante	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Diana Ramos	

ANEXO 6. FORMATOS DE INSPECCION DE SEGURIDAD.

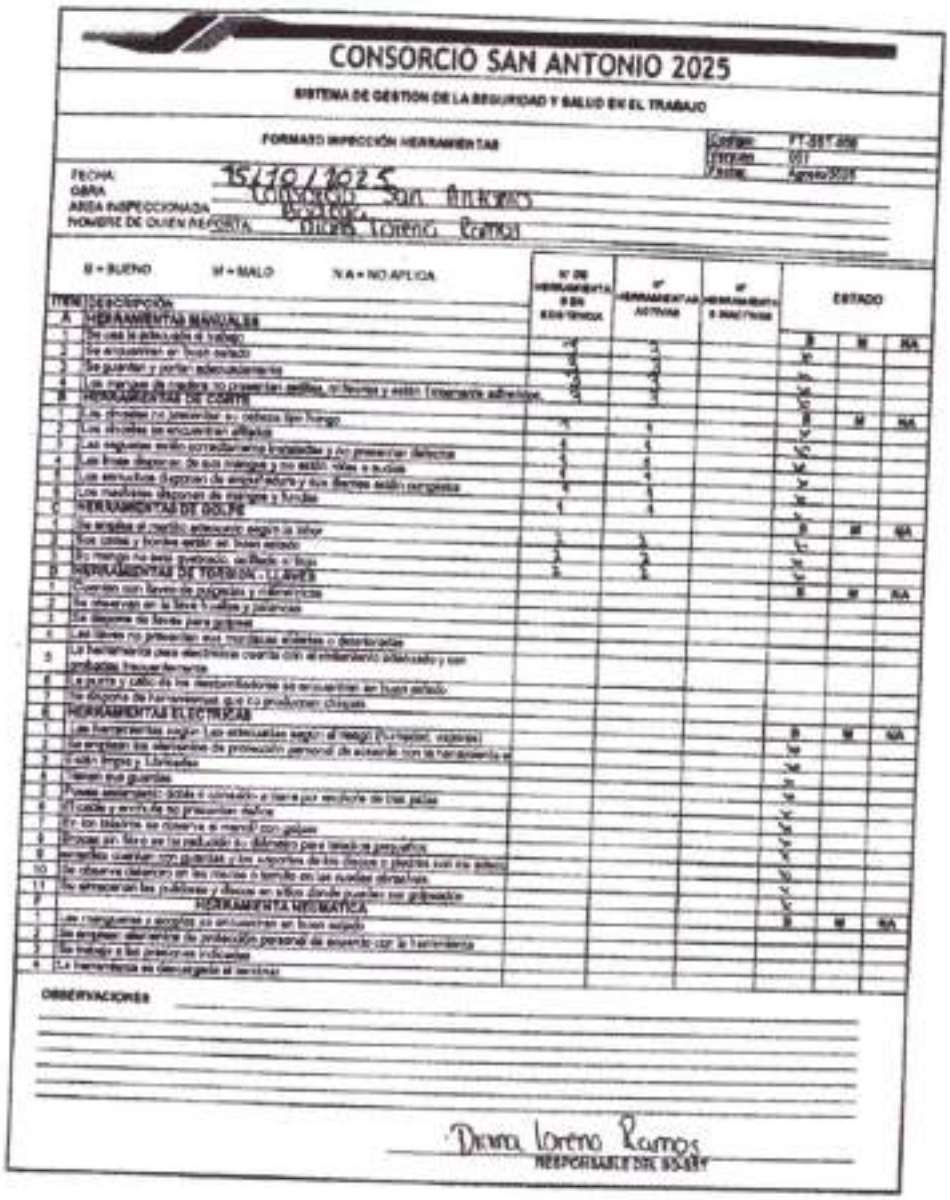

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO INSPECCIÓN HERRAMIENTAS

Codigo: FT-SST-056
Version: 001
Fecha: Agosto/2025

FECHA: 15/10/2025
OBRA: Consorcio San Antonio
AREA INSPECCIONADA: Getucha
NOMBRE DE QUIEN INSPECTA: Diana Lorena Ramos

B = BUENO M = MALO N/A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° DE HERRAMIENTAS EN EXISTENCIA	N° HERRAMIENTAS ACTIVAS	N° HERRAMIENTAS INACTIVAS	ESTADO		
A	HERRAMIENTAS MANUALES				B	M	N/A
1	Se usa la adecuada al trabajo	4	4		X		
2	Se encuentran en buen estado	4	4		X		
3	Se guardan y portan adecuadamente	4	4		X		
4	Las mangas de madera no presentan astillas, rajaduras y están firmemente adheridas	4	4		X		
B	HERRAMIENTAS DE CORTE				B	M	N/A
1	Las cuchillas no presentan un defecto filo/hoyo	4	4		X		
2	Las cuchillas se encuentran afiladas	4	4		X		
3	Las segueras están correctamente instaladas y no presentan defecto	4	4		X		
4	Las frutas disponen de sus mangas y no están rotas o sucias	4	4		X		
5	Las estructuras (agarres de seguetas) son libres están completas	4	4		X		
6	Los machetes disponen de mangas y fundas	4	4		X		
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE				B	M	N/A
1	La cabeza el martillo adecuado según la labor	1	1		X		
2	Los cabos y hombs están en buen estado	1	1		X		
3	Su manejo no exige esfuerzo, cadera o fuga	1	1		X		
D	HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES				B	M	N/A
1	Cuentan con llaves de tamaños y dimensiones						
2	Se observan en la llave fisuras y deformidades						
3	Se disponen las llaves para pernos						
4	Las llaves no presentan ser mordidas erosiones o deterioradas						
5	La herramienta para electricistas cuenta con el aislamiento adecuado y con protección frente terceros						
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado						
7	No disponen de herramientas que no produzcan chispas						
E	HERRAMIENTAS ELECTRICAS				B	M	N/A
1	Las herramientas cuentan Las adecuadas según el riesgo (corrosivo, explosivo)				X		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta a				X		
3	Están limpias y lubricadas				X		
4	Tienen sus guardas				X		
5	Poseen aislamiento doble o conexión a tierra por encima de las patas				X		
6	El cable y enchufe no presentan daños				X		
7	En los talleres se observa el marcaje con colores				X		
8	Poseen un libro en la realización su mantenimiento para tener un registro				X		
9	Las fijas cuentan con guardas y los soportes de las mesas y piedras son los adecu				X		
10	Se observa cableado en las mesas o tendido en los suelos derechos				X		
11	Se almacenan las máquinas y discos en sitios donde cuentan con protección				X		
F	HERRAMIENTA NEUMATICA				B	M	N/A
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado						
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta						
3	Se trabaja a las presiones indicadas						
4	La herramienta es descargada al terminar						

OBSERVACIONES

Diana Lorena Ramos
RESPONSABLE DEL SSST

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FORMATO DE INSPECCION BODEGAS

FECHA DE INSPECCION	04/30/2025
PARTICIPANTES DE LA INSPECCION	3

BODEGA

ILUMINACIÓN					
Se tiene iluminacion adecuada	X				
Se tiene un mantenimiento adecuado en las lámparas	X				
MECÁNICO					
Las estibas están en buen estado.	X				
El sistema de almacenamiento es concordante con la forma, peso y tamaño de los elementos. (los objetos de mayor peso y tamaño abajo)	X				
Los elementos están almacenados de forma ordena.	X				
Las herramientas están almacenadas de forma correcta	X				
ELECTRICO					
Los cables están protegidos y canalizados	X				
Las instalaciones eléctricas están protegidas	X				
Todas las instalaciones eléctricas cuentan con switches y tomacorrientes	X				
ORDEN Y ASEO (CONDICIÓN LOCATIVA)					
Superficies almacenaje en perfecto estado, en orden y limpieza	X				
Aseo y ventilación adecuado	X				
Techos, paredes y pisos en buen estado	X				
Area de almacenamiento suficiente para la cantidad de elementos, herramientas		X			
QUIMICO					
Se almacenan los productos químicos en lugares adecuados y se almacenan según la tabla de compatibilidad				X	
Los envases de los productos químicos tienen etiquetas o rótulos según la clase de producto y los envases cumplen con las especificaciones para manejo seguro				X	
Están disponibles las hojas de seguridad de las sustancias químicas almacenadas				X	
EMERGENCIAS					
Se tiene señalizacion de identificación al exterior de la bodega		X			
Las bodegas cuentan con extintores y se encuentran señalizados		X			
El área de los extintores esta libre de objetos y obstáculos		X			

INSPECCION DE RETROEXCAVADORA




CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

OBRA: Consorcio san Antonio 2025

INSPECCIONADO POR: Diana Lorena Ramos Ojeda

LOCALIDAD: San Antonio

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M
SUCRE		X		X		X		X		X		X			
Planchas		X		X		X		X		X		X			
Traslado de mezcla (vehículo)		X		X		X		X		X		X			
Direcciones detectoras de peligros (DDP)		X		X		X		X		X		X			
Direcciones frente de peligros (DFP)		X		X		X		X		X		X			
De Stop y señalizadores		X		X		X		X		X		X			
Cuadra															
Apertura de hoyo(s)		X		X		X		X		X		X			
Pico		X		X		X		X		X		X			
Pesa de varilla		X		X		X		X		X		X			
Pesa de arrastrado		X		X		X		X		X		X			
Desplazamiento Personales		X		X		X		X		X		X			
Chaleco de seguridad		X		X		X		X		X		X			
Casco y/o filtrador (P.C.P.S) certificado															
Botiquín de herramientas (1) Bot. PCP		X		X		X		X		X		X			
Valeria en buena condición		X		X		X		X		X		X			
Indicaciones (habitables-vehículos)		X		X		X		X		X		X			
Hacha (afilamiento encorvado y afilo)		X		X		X		X		X		X			
Señalizar y protección (cabeza/cuerpo)		X		X		X		X		X		X			
Botiquín y pañitos		X		X		X		X		X		X			
GUANTAS															
En contratante encargados y en abastecimiento		X		X		X		X		X		X			
RIESGO MECÁNICO															
Control de fuga hidráulicos		X		X		X		X		X		X			
Topografías, excavación		X		X		X		X		X		X			
Control tuyos de obra		X		X		X		X		X		X			
Bolsas de fricción hidráulicos		X		X		X		X		X		X			
Cinturón y protección de cabeza		X		X		X		X		X		X			
Derrumbes (pozos, pluvial, pozadores)		X		X		X		X		X		X			
Uso de tanque de fuego		X		X		X		X		X		X			
Almacenamiento de agua y de alta presión		X		X		X		X		X		X			
Hojas suspendas															
Fuera de servicio: d ... as	Fecha de Corrección					Hora Corrección									
Nivel:		NOMBRE OPERADOR													
OBSERVACIONES:		Jesus Carlos Mendoza													

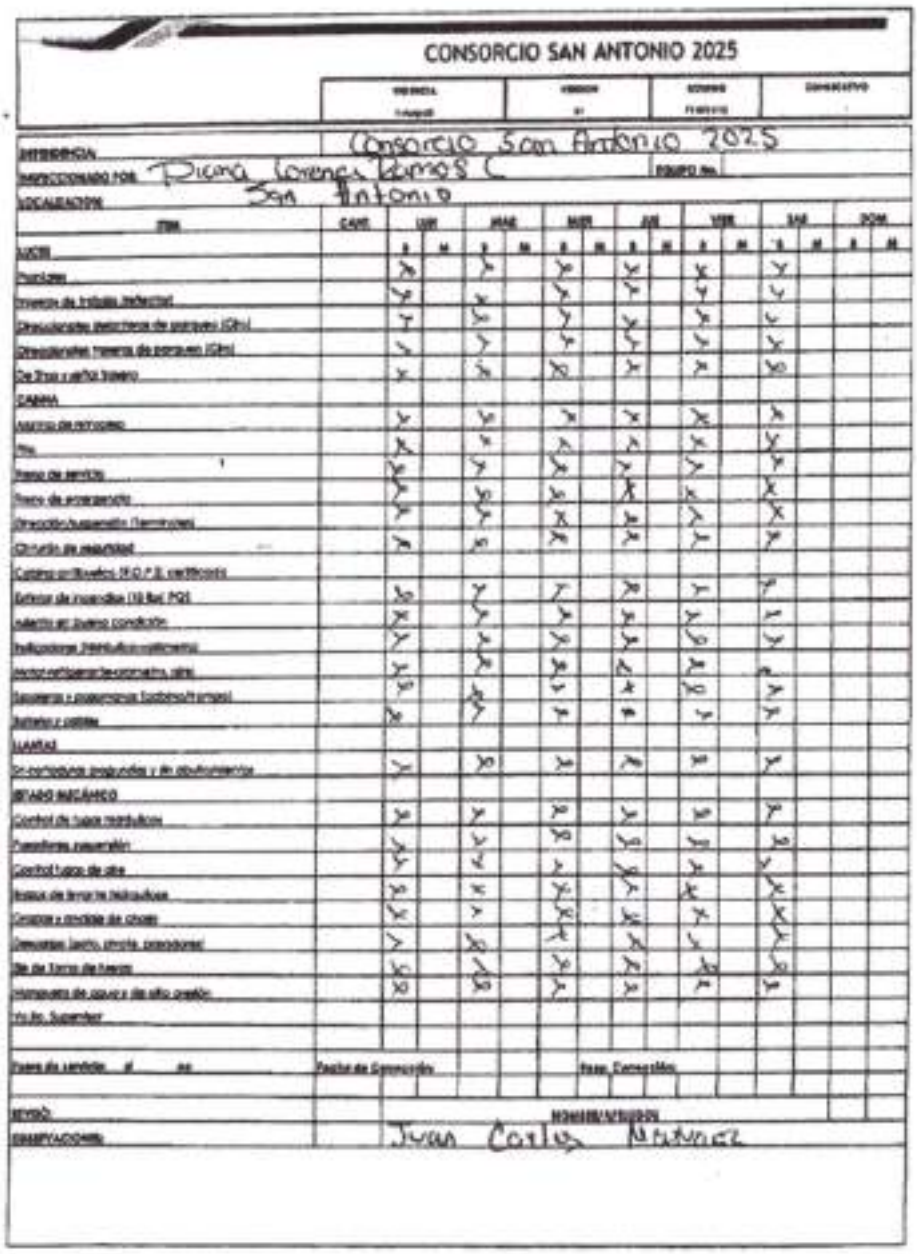

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

EMPRESA: Consorcio San Antonio 2025

INSPECCIONADO POR: Diana Lorena Ramos C. EQUIPO No.

LOCALIZACION: San Antonio

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
LUCES		X		X		X		X		X		X			
Pitorreo		X		X		X		X		X		X			
Presencia de trabajo nocturno		X		X		X		X		X		X			
Deslizamiento peatonal de personas (Dia)		X		X		X		X		X		X			
Deslizamiento vehicular de personas (Dia)		X		X		X		X		X		X			
De Dios y vaya bueno		X		X		X		X		X		X			
CAMPA															
Manejo de herramienta		X		X		X		X		X		X			
Pito		X		X		X		X		X		X			
Trabajo de altura		X		X		X		X		X		X			
Trabajo de profundidad		X		X		X		X		X		X			
Derrumbe/Hundimiento (Terraplenes)		X		X		X		X		X		X			
Caída de maquinaria		X		X		X		X		X		X			
Cortes en Niveles (E.C / E. vertical)															
Exterior de maquina (Si Bat. PQ)		X		X		X		X		X		X			
Asiento en buena condición		X		X		X		X		X		X			
Instalación herramienta eléctrica		X		X		X		X		X		X			
Vector refrigerante (Hormiga, zika)		X		X		X		X		X		X			
Lesiones o quemaduras (cabeza/manos)		X		X		X		X		X		X			
Ruidos y caídas		X		X		X		X		X		X			
LLANTAS															
En condiciones seguridad y de abastecimiento		X		X		X		X		X		X			
BRAZO MECÁNICO															
Control de cuyos movedizos		X		X		X		X		X		X			
Pasadores asegurados		X		X		X		X		X		X			
Control cuyos de sitio		X		X		X		X		X		X			
Bloque de tierra no radioactivo		X		X		X		X		X		X			
Cargas y circular de cruce		X		X		X		X		X		X			
Descargas (pecho, circula, precauciones)		X		X		X		X		X		X			
Ida de tierra de fuerza		X		X		X		X		X		X			
Hormigueo de cayuco y de sitio creación		X		X		X		X		X		X			
Vo.Bo. Supervisor															
Fuera de servicio SI NO	Fecha de Corrección					Firma Corrección									
REVISÓ:		HOMBRE VIGILANTE													
OBSERVACIONES:		Juan Carlos Alvarez													



CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

VIGENCIA		VIGENCIA	CODIGO	CONSECUTIVO

DEPENDENCIA: Consorcio San Antonio

INSPECCIONADO POR: Diana Lorena Ramos — PUNTO No.

LOCALIZACION: San Antonio

ITEM	CARG	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M
LISTA															
Horarios		X		X		X		X		X		X			
Hogera de trabajo radiación		X		X		X		X		X		X			
Charla diaria de inducción de personal (Obra)		X		X		X		X		X		X			
Capacitación hogera de personal (Obra)		X		X		X		X		X		X			
Os (cap y señal hogera)		X		X		X		X		X		X			
CARNE															
Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X			
EPP		X		X		X		X		X		X			
Pesa de servicio		X		X		X		X		X		X			
Pesa de emergencia		X		X		X		X		X		X			
Preventivo/suspensión (semanal)		X		X		X		X		X		X			
Circuito de seguridad		X		X		X		X							
Cabina ambiental (E.O.P.S) certificado															
Cobertor de incendio (10 kg) PQS		1		X		X		X		X		X			
Cubierta en buena condición		X		X		X		X		X		X			
Hydrostop (Hidrofugo cristalino)		X		X		X		X		X		X			
Hidrohidrato (Hidrofugo cristalino)		X		X		X		X		X		X			
Servicio y mantenimiento (cabina/transporte)		X		X		X		X		X		X			
Botiquín y camilla		X		X		X		X		X		X			
EXAMENES															
Se contabilizan capacitación y se diligenciación		X		X		X		X		X		X			
MEDIO AMBIENTE															
Control de fugas hidráulicos		X		X		X		X		X		X			
Pozos de separación		X		X		X		X		X		X			
Control fugas de aire		X		X		X		X		X		X			
Bloqueo de tuberías hidráulicos		X		X		X		X		X		X			
Cargas y arrastre de chapa		X		X		X		X		X		X			
Descargas fuentes abiertas, cocinetas		X		X		X		X		X		X			
Uso de fuente de fuegos		X		X		X		X		X		X			
Manejadores de aguas y de otra naturaleza															
Visita Supervisor															

Fuera de servicio el ___ de | Fecha de Corrección: | | | Hora Corrección: | | | | | | | | | | | |

NOMBRE/APELLIDOS	
OBSERVACIONES:	Juan Carlos Ramirez



CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

| | | |

ANEXO 7 DOCUMENTACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA.


REPÚBLICA DE COLOMBIA
TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA
CATERPILLAR
CONSTRUCCION
RETROEXCAVADORA
AMARILLO



ANEXO 8 DOCUMENTACIÓN DEL CONDUCTOR.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento del Decreto 1072 de 2015

otorga

Certificado de Competencia Laboral a

JUAN CARLOS NARVAEZ DIAZ

Con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1080954126

Quien demostró su Competencia Laboral en la


Norma

Operar maquinaria pesada de acuerdo con manual del fabricante y tipo de labor / Retrocargador - NIVEL INTERMEDIO

Código: 270101120 - Versión: 1

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en BARRANCABERMEJA. A los treinta (30) días del mes de Octubre de dos mil veintiuno (2021)

Firmado Digitalmente por



EDGAR GOMEZ RODRIGUEZ

Subdirector CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO

REGIONAL SANTANDER

156061 - 30/10/2021
No Y FECHA REGISTRO

Vigencia:
hasta el 30 de Octubre de 2024

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9400027101120CC1080954126C

ANEXO 9. FORMATO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO	Fecha: Agosto/2025
	Versión: 001
	Codigo: FT-SST-005

día	mes	año
20	09	2025

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Yeferson Charo V CC 1117513915

CARGO: Oficial UBICACIÓN DE LA OBRA: San Antonio

DOTACIÓN PERSONAL

	CANTIDAD	TALLA
BOTAS		
PANTALON		
CAMISA MANGA LARGA		
ESCAFANDRA		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón		Protector Auditivo Tipo Orejera	
Guantes en Carnaza	X	Gafas de Seguridad	X
Guantes Hilo y PVC		Guantes para Soldador	
Guantes Dieléctricos		Careta para Soldar	
Careta para Esmerilar		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Prehormado		Tapabocas Industrial/desechable	
Casco	X	Barbuquejo	

FIRMAS

Diana Lorena Ramos — ENTREGA

Yeferson Charo — RECIBE

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO	Fecha: Agosto/2025 Versión: 001 Codigo: PT-SST-005

dd	mm	aaaa
30	09	2025

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Acbado Isacet Co Ducue CC. 1.117.233.084

CARGO: Ayudante UBICACIÓN DE LA OBRA: San Antonio

DOTACIÓN PERSONAL

	CANTIDAD	TALLA
BOTAS	____	____
PANTALON	____	____
CAMISA MANGA LARGA	____	____
ESCAFANDRA	____	____

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón	____	Protector Auditivo Tipo Orejera	____
Guantes en Carnaza	Xa	Gafas de Seguridad	Xa
Guantes Hilo y PVC	____	Guantes para Soldador	____
Guantes Dieléctricos	____	Careta para Soldar	____
Careta para Esmerilar	____	Respirador Contra Gases y Vapores	____
Tapabocas Prehormado	____	Tapabocas Industrial/desechable	____
Casco	____	Barbuquejo	____

FIRMAS

Diana Lucena Ramos — ENTREGA

Abado Isacet Co — RECIBE

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO	Fecha: Agosto/2025
	Versión: 001
	Codigo: FT-SST-005

dd	mm	aaaa
30	09	2025

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Jhon Anier perez garcia C.C. 1006511551

CARGO: Ayudante UBICACIÓN DE LA OBRA: San Antonio

DOTACIÓN PERSONAL

	CANTIDAD	TALLA
BOTAS	____	____
PANTALON	____	____
CAMISA MANGA LARGA	____	____
ESCAFANDRA	____	____

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón	____	Protector Auditivo Tipo Orejera	____
Guantes en Carnaza	X	Gafas de Seguridad	X
Guantes Hilo y PVC	____	Guantes para Soldador	____
Guantes Dieléctricos	____	Careta para Soldar	____
Careta para Esmerilar	____	Respirador Contra Gases y Vapores	____
Tapabocas Prehormado	____	Tapabocas Industrial/desechable	____
Casco	____	Barbuquejo	____

FIRMAS

Diana Valeria Ramos — ENTREGA

Jhon Anier Perez Garcia — RECIBE

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO	Fecha: Agosto/2025
	Versión: 001
	Codigo: FT-SST-005

día	mm	anno
30	09	2025

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Faiber Cardona CC. 1117234725

CARGO: Ayudante UBICACIÓN DE LA OBRA: San Antonio

DOTACIÓN PERSONAL

	CANTIDAD	TALLA
BOTAS	___	___
PANTALON	___	___
CAMISA MANGA LARGA	___	___
ESCAFANDRA	___	___

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón		Protector Auditivo Tipo Orejera	
Guantes en Carnaza	X0	Gafas de Seguridad	X0
Guantes Hilo y PVC	___	Guantes para Soldador	___
Guantes Dieléctricos	___	Careta para Soldar	___
Careta para Esmerilar	___	Respirador Contra Gases y Vapores	___
Tapabocas Prehormado	___	Tapabocas industrial/desechable	___
Casco	___	Barbuquejo	___

FIRMAS

Diana Lorena Ramos — ENTREGA

Faiber Cardona — RECIBE

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO	Fecha: Agosto/2025
	Versión: 001
	Codigo: FT-SST-005

dd	mm	aaaa
30	04	2025

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Wilber Cumilo CC. 8709720

CARGO: Maestro UBICACIÓN DE LA OBRA: San Antonio

DOTACIÓN PERSONAL

	CANTIDAD	TALLA
BOTAS		
PANTALON		
CAMISA MANGA LARGA		
ESCAFANDRA		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón		Protector Auditivo Tipo Orejera	
Guantes en Carnaza	X	Gafas de Seguridad	X
Guantes Hilo y PVC		Guantes para Soldador	
Guantes Dieléctricos		Careta para Soldar	
Careta para Esmerilar		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Prehormado		Tapabocas Industrial/desechable	
Casco		Barbuquejo	

FIRMAS

Diana Lorena Ramos — ENTREGA

Wilber Cumilo — RECIBE

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO	Fecha: Agosto/2025
	Versión: 001
	Codigo: FT-SST-005

dd	mm	aaaa
30	09	2025

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Norbey Correa Plazas cc 6.801673

CARGO: Ayudante UBICACIÓN DE LA OBRA: San Antonio

DOTACIÓN PERSONAL

	CANTIDAD	TALLA
BOTAS	____	____
PANTALON	____	____
CAMISA MANGA LARGA	____	____
ESCAFANDRA	____	____

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón	____	Protector Auditivo Tipo Orejera	____
Guantes en Carnaza	X	Gafas de Seguridad	X
Guantes Hilo y PVC	____	Guantes para Soldador	____
Guantes Dieléctricos	____	Careta para Soldar	____
Careta para Esmerilar	____	Respirador Contra Gases y Vapores	____
Tapabocas Prehormado	____	Tapabocas Industrial/desechable	____
Casco	____	Barbuquejo	____

FIRMAS

Diana Lorena Ramos — ENTREGA

N C P L. — RECIBE

ANEXO 15 Formato financiero de la interventoría

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA CAQUETA ANEXO 4 INFORME FINANCIERO DE LA INTERVENTORIA	CODIGO			
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

PERIODO Inicio: 22-sep-25 Fin: 22-oct-25

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACION DEL CAQUETA — MUNICIPIO: MILAN

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

CONTRATO No: 20250000020 DE 2025 — CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

SUPERVISOR: PDA CAQUETA

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Acta No	Mes/ Año	Valor Facturado	Valor IVA	Valor Total	Amortización Anticipo	Saldo Anticipo	Saldo Registro presup.	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	Observaciones
				$ 69.165.757,00			$69.165.757		$69.165.757,00	
										n.a
TOTALES		$ -	$ -	$ 69.165.757	$ -	$ -	$ 69.165.757	$ -	$ 69.165.757	

Firma

Nombre: CARLOS DARIO CANO SANCHEZ

Representante Legal de: CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

Original PDA CAQUETA

ANEXO 16 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE GETUCHA
ANEXO 8
SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CÓDIGO	
VERSIÓN	1

PERIODO
Inicio: 22-ago-25 Fin: 21-oct-25

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACION DEL CAQUETA
CONTRATO No: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2025000090 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARA EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.
CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

PLAZOS CONTRACTUALES

PLAZOS			FECHAS	
Plazo inicial para ejecución del contrato:	5 MESES		Inicio del contrato	18-jun.-25
			Inicio de actividades	22-ago.-25
Plazo ejecución contrato actualizado		152 días	Terminación inicial contractual	22-ene.-26
Plazo ejecutado		32 días	Terminación final contractual	22-ene.-26
Plazo faltante por ejecutar		120 días		

SUSPENSIONES Y AMPLIACION DE SUSPENSIONES EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES						
Nº Suso	Nº Prorroga	Inicio susp. o prorroga	Reinicio de actividades	Plazo	Estado	Fecha de radicación
			Total aprobados	0 d		N.A
Observaciones			Sin novedades			

PRORROGAS DE PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES				
Nº de Adición	Plazo	Estado	Fecha de radicación	Fecha de aprobación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Total aprobados				N.A
		Sin novedades		

CONTROL DE LA INVERSION

Valor inicial del contrato de OBRA	$ 986.582.342
Valor inicial del contrato de CONSULTORIA	$ 69.185.707
Valor TOTAL INICIAL del contrato (consultoría + obra)	$ 1.057.317.999,94

ADICIONES

No	Estado	Fecha de radicación	Fecha de aprobación	VALOR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
			Total adiciones aprobadas	$ 0,00
VALOR CONTRATO CON ADICIONES APROBADAS				$ 1.057.317.999,94

VALORES ORIGINALES DEL ANTICIPO

Porcentaje del anticipo	
Valor del anticipo	$ -

PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

AMPARO	% sobre Vlr contrato	VIGENCIA SOLICITADA EN CONTRATO		Nº PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA PÓLIZA		COMENTARIOS
		DESDE	HASTA			INICIO	FIN	
Cumplimiento	20%	18/06/2025	28/04/2028	980 47 994000100940 ANEXO 0	$ 13.833.151,40	18/06/2025	28/09/2026	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Salarios y Prestaciones	10%	18/06/2025	20/12/2028	980 47 994000100940 ANEXO 0	$ 6.916.575,70	18/06/2025	20/12/2028	
Calidad del servicio	20%	18/11/2025	18/11/2030	980 47 994000100940 ANEXO 0	$ 13.833.151,40	18/11/2025	18/11/2030	
Responsabilidad Civil								
Todo Riesgo								
Calidad de la Obra								
Calidad de la Consultoría								

PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA - ACTA DE INICIO

AMPARO	% sobre Vlr contrato	VIGENCIA SOLICITADA EN CONTRATO		Nº PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA PÓLIZA		COMENTARIOS
		DESDE	HASTA			INICIO	FIN	
Cumplimiento	20%	22/08/2025	1/06/2028	980 47 994000100940 ANEXO 1	$ 13.833.151,40	22/08/2025	1/06/2028	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Salarios y Prestaciones	10%	22/08/2025	3/03/2029	980 47 994000100940 ANEXO 1	$ 6.916.575,70	22/08/2025	3/03/2029	
Calidad del servicio	20%	21/10/2025	21/10/2031	980 47 994000100940 ANEXO 1	$ 13.833.151,40	21/10/2025	21/10/2031	
Responsabilidad Civil								
Todo Riesgo								
Calidad de la Obra								
Calidad de la Consultoría								

Firma:
Nombre: CARLOS DARIO OSPINO SANCHEZ
Representante Legal de interventoría
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

###

ANEXO 17 -FORMATO COPIA DEL FORMATO SE SEGUIMIENTO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y SOPORTE DE PAGO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE MILAN CAQUETA
ANEXO 6 CONTROL SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES OBRA

CODIGO		
VERSION	1	
PAGINA	1	DE 1

UNIDAD EJECUTORA : GOBERNACION DEL CAQUETA
OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARA EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO
CONTRATO No: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000620 DE 2025
MUNICIPIO: MILAN CAQUETA
CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

PERIODO:
Del 01 de agosto a 31 de agosto 2025

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Nombre	Cargo	Periodo laborado		No Días mes (base Liquidación)	C.C.	1 VIE	2 SAB	3 DOM	4 LUN	5 MAR	6 MIE	7 JUE	8 VIE	9 SAB	10 DOM	11 LUN	12 MAR	13 MIE	14 JUE	15 VIE	16 SAB	17 DOM	18 LUN	19 MAR	20 MIE	21 JUE	22 VIE	23 SAB	24 DOM	25 LUN	26 MAR	27 MIE	28 JUE	29 VIE	30 SAB	31 DOM	Planilla	No. días cotizados
		INICIO	FIN																																	
FABIAN NARVAEZ CANO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	16/08/2025		16	79.872.934															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9492583700	16
DAIRA LUCIA VALENZUELA PASTRANA	ASESOR AMBIENTAL	16/08/2025		16	1.075.240.914															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9492583913	16
BRYAN ANDRES VALENCIA ROA	ASESOR CONTABLE	16/08/2025		16	1.117.530.134															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9492583913	16
NADIA ALEJANDRA MURILLO ORTIZ	ASESOR JURÍDICO	16/08/2025		16	1.117.812.172															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9492583913	16
PAULA VANESSA OME SANCHEZ	ASESOR SOCIAL	16/08/2025		16	1.117.525.037															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9492583913	16
JORGE ANDRES MONCADA SUAZA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	16/08/2025		16	5.819.666															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9492583913	16
				0																																0
				0																																0
				0																																0
				0																																0
				0																																0

2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELABORO

Firma
Nombre: CARLOS DARIO CANO
Representante Legal de Interventoría
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901955899	5	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 14 13 40 CENTRO	FLORENCIA-CAQUETA	3134629955	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1849707747	94025837	E	2025/09/10	2025/10/14	BANCOLOMBIA	21	$460,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vst	cor	vsp	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	cue	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Tipo	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1947	MARINEZ CANO FABIAN	E																	20-44	15	$1,850,000	$296,000	DP0005	15	$1,850,000	$74,000	14-13	15	$1,850,000	$4,700	15	$0	$0	SI	$450,700				
Total Afiliados(1)																							$1,850,000	$296,000			$1,850,000	$74,000			$1,850,000	$4,700								$450,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901955099	5	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 14 13 40 CENTRO	FLORENCIA-CAQUETA	3134629855	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	5844707767	94915503700	E	2025/09/22	2025/10/14	BANCOLOMBIA	22	$460,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$296,000	$4,100	$0	$300,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$296,000	$4,100	$0	$300,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,700	$200	$0	$9,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,700	$200	$0	$9,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$74,000	$1,100	$0	$75,100
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$74,000	$1,100	$0	$75,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$74,000	$1,100	$0	$75,100
SANITAS	EPS305	800,251,440	6	1	$74,000	$1,100	$0	$75,100
TOTAL				1	$453,700	$6,500	$0	$460,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901955099	5	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	9 - MENOS DE 300 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 14 13 48 CENTRO	FLORENCIA-CAQUETA	3134633855	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-08	2025-08	5869732253	5492583913	Y	2025/09/22	2025/10/14	BANCOLOMBIA	21	$231,480

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación		Nombre	Ing	ret	TDA	tae	tde	tvp	tsp	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	rtp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1[illegible]66	MONCADA VALLE JORGE [illegible]	X																			6	$0	$0		6	$0	$0		6	$0	$0	14-21	15	$711,750	$49,600	0	$0	$0	No	$49,600
3	CC	1[illegible]1751217[illegible]	MURILLO ORTIZ MARIA ALEJANDRA	X																			6	$0	$0		6	$0	$0		6	$0	$0	14-21	15	$711,750	$49,600	0	$0	$0	No	$49,600
2	CC	1[illegible]7[illegible]3037	DIAZ SANCHEZ PAULA VANESSA	X																			6	$0	$0		6	$0	$0		6	$0	$0	14-21	15	$711,750	$49,600	0	$0	$0	No	$49,600
4	CC	1[illegible]7[illegible]134	VALENCIA ROA BRYAN ANDRES	X																			6	$0	$0		6	$0	$0		6	$0	$0	14-21	15	$711,750	$49,600	0	$0	$0	No	$49,600
5	CC	1[illegible]7[illegible]814	VALDERRAMA MALTRANA MARIA ALICIA	X																			6	$0	$0		6	$0	$0		6	$0	$0	14-21	15	$711,750	$49,600	0	$0	$0	No	$49,600
Total	**Afiliados(5)**																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,558,750	$240,000		$0	$0		$240,000

2025/10/28 03:27 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901155099	5	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	8 - MENOS DE 500 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 14 13 46 CENTRO	FLORENCIA-CAQUETA	3134629855	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	5949703353	5949703913	Y	2025/09/22	2025/10/14	BANCOLOMBIA	13	$251,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$248,000	$3,400	$0	$251,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$248,000	$3,400	$0	$251,400
TOTAL				5	$248,000	$3,400	$0	$251,400

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE MILAN CAQUETA
ANEXO 6 CONTROL SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES OBRA

CODIGO			
VERSIÓN	1		
PAGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACION DEL CAQUETA
OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARA EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE
CONTRATO No: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 20250000620 DE 2025
MUNICIPIO: MILAN CAQUETA
CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

PERIODO:
Del 01 de septiembre a 30 de septiembre 2025

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Nombre	Cargo	Periodo laborado		No Dias mes (Base Liquidación)	C.C.	1 LUN	2 MAR	3 MIE	4 JUE	5 VIE	6 SAB	7 DOM	8 LUN	9 MAR	10 MIE	11 JUE	12 VIE	13 SAB	14 DOM	15 LUN	16 MAR	17 MIE	18 JUE	19 VIE	20 SAB	21 DOM	22 LUN	23 MAR	24 MIE	25 JUE	26 VIE	27 SAB	28 DOM	29 LUN	30 MAR		Planilla	No. dias cotizados
		INICIO	FIN																																	
FABIAN NARVAEZ CANO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	16/09/2025		30	79.972.034	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9493173202	30
DAIRA LUCIA VALENZUELA PASTRANA	ASESOR AMBIENTAL	16/09/2025		30	1.075.240.814	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9493173215	30
BRYAN ANDRES VALENCIA ROA	ASESOR CONTABLE	16/09/2025		30	1.117.530.134	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9493173215	30
NADIA ALEJANDRA MURILLO ORTIZ	ASESOR JURIDICO	16/09/2025		30	1.117.512.172	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9493173215	30
PAULA VANESSA OME SANCHEZ	ASESOR SOCIAL	16/09/2025		30	1.117.525.027	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9493173215	30
JORGE ANDRES MONCADA SUAZA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	16/09/2025		30	5.819.868	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9493173215	30
				0																																0
				0																																0
				0																																0
				0																																0
				0																																0

ELABORO

Firma
Nombre CARLOS DARIO OSPINO
Representante Legal de Interventoria
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901955099	5	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	9 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 14 13 48 CENTRO	FLORENCIA-CAQUETA	3134629855	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	5869794031	94911732O2	E	2025/10/13	2025/10/14	BANCOLOMBIA	0	$907,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Vsp	vst	Sln	Cau	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vio	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vio	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79873334	BARRIOS CANO FABIAN																			25-14	30	$1,700,000	$190,400	EPS005	30	$1,700,000	$140,000	CCF15	30	$1,700,000	$48,000	14-23	30	$1,700,000	$59,500	30	$0	$0	SI	$907,400
Total	Afiliados(1)																							$1,700,000	$190,400			$1,700,000	$140,000			$1,700,000	$48,000			$1,700,000	$59,500		$0	$0		$907,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901955099	5	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 14 11 46 CENTRO	FLORENCIA-CAQUETA	3134619855	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1869794131	94961173303	E	2025/10/23	2025/10/14	BANCOLOMBIA	0	$907,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$592,000	$0	$0	$592,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$592,000	$0	$0	$592,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,400	$0	$0	$19,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$19,400	$0	$0	$19,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$148,000	$0	$0	$148,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$148,000	$0	$0	$148,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$148,000	$0	$0	$148,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$148,000	$0	$0	$148,000
TOTAL				1	$907,400	$0	$0	$907,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901193099	5	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	0 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 14 13 40 CENTRO	FLORENCIA-CAQUETA	3134627835	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1849715181	94017332 15	Y	2025/10/23	2025/10/14	BANCOLOMBIA	0	$495,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificacion		Nombre	NOVEDADES																	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7891666	PADILLA SUAZA JORGE ANDRES																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,483,500	$89,100	0	$0	$0	No	$89,100
2	CC	1117513172	MUÑOZ ORTIZ MARIA ALEJANDRA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,483,500	$89,100	0	$0	$0	No	$89,100
3	CC	1117525837	DIAZ SANCHEZ PAOLA VANESSA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,483,500	$89,100	0	$0	$0	No	$89,100
4	CC	1117530134	VALENCIA RIOS BRYAN ANDRES																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,483,500	$89,100	0	$0	$0	No	$89,100
5	CC	1075240914	PALECHUZUELA PASTRANA DAIRA LUCIA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,483,500	$89,100	0	$0	$0	No	$89,100
Total	Afiliados(5)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$7,417,500	$495,500		$0	$0		$495,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901955099	5	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	B - AEMOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 14 13 40 CENTRO	FLORENCIA-CAQUETA	3134629855	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1049715185	94831732?5	Y	2025/10/13	2025/10/14	BANCOLOMBIA	0	$495,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$495,500	$0	$0	$495,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$495,500	$0	$0	$495,500
TOTAL				5	$495,500	$0	$0	$495,500

ANEXO 18 - INFORME DE OBRA

OBJETO: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.



INFORME 02

FECHA CONTRATO: 22 DE ABRIL DE 2025

CONTRATO DE OBRA No. COP-2025-002

FECHA: 22 DE ABRIL DE 2025

DEPARTAMENTO DE CAQUETA

ALCALDIA MUNICIPAL DE MILAN

INFORME **02**

DESDE EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 21 DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATISTA
CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

TABLA DE CONTENIDO

1 GENERALIDADES DEL CONTRATO 4
1.1 INFORMACION GENERAL 4
1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 4
2 DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO 5
3 INTRODUCCION 6
3.1 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 6
3.2 INTRODUCCIÓN AL CONTRATO DE EJECUCION 6
4 OBJETIVOS 7
5 INFORMACION GENERAL INICIALES DEL CONTRATO 9
5.1 CONTRATO DE OBRA COP-2025-002 9
5.2 CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA COP-2025-002/2025 9
5.3 ACTIVIDADES CONTRACTUALES INICIALES: 10
5.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES FINALES: 11
6 ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 14
6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 14
6.2 CONTROL DE LA INVERSIÓN: 14
6.3 PLAZOS DE EJECUCIÓN (DÍAS CALENDARIO): 15
6.4 POLIZAS DEL CONTRATO 15
6.5 AVANCE FISICO DEL PROYECTO 15
7 ACTA PARCIAL NO 1 DE OBRA DEL CONTRATO COP-2025-002 16
8 PROCESOS CONSTRUCTIVOS A LA FECHA 17
8.1 INFORME DE MANEJO AMBIENTAL, DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA 17
INTRODUCCIÓN 17
8.2 PERSONAL EN OBRA 18
8.3 GESTION PARA EL TALENTO HUMANO 18
8.4 PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS 19
8.5 MANEJO AMBIENTAL 19
9 REGISTRO FOTOGRAFICO 21
10 PÓLIZAS: 52
11 COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS ENVIADAS 52
12 PARAFISCALES 54

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ubicación de San Antonio de Getucha en Colombia 4
Ilustración 2. Ubicación del proyecto en mapa 4

1 GENERALIDADES DEL CONTRATO

1.1 INFORMACION GENERAL

Este Plan de Calidad aplica a la ejecución de obras de construcción, adecuación y canalización de aguas lluvias en la calle 4, entre Cra 2 a la Cra 6, del casco urbano de la inspección de San Antonio de Getucha, en el municipio de Milán, departamento del Caquetá.

El contrato se ejecuta en dos etapas: (i) Planificación y logística; (ii) Ejecución de obras conforme al alcance aprobado.

El objetivo es asegurar la conformidad del producto/servicio con los requisitos del cliente, especificaciones técnicas y la normativa aplicable, garantizando satisfacción y mejora continua.

1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA



Ilustración 1. Ubicación de San Antonio de Getucha en Colombia

El proyecto se localiza geográficamente en el casco urbano de la inspección de San Antonio de Getucha específicamente en la calle 4, entre Cra 2 a la Cra 6.

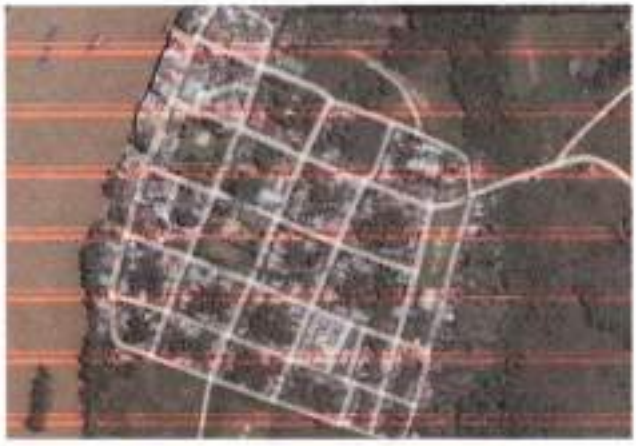


Ilustración 2. Ubicación del proyecto en mapa

2 DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO:	COP-2025-002.
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA.
OBJETO DEL CONTRATO:	ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	150 DIAS APARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIACIÓN:	22 DE AGOSTO DE 2025.
NOMBRE CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 NIT. 901.935.706-2 R.L. ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA C.C.40.781.657 DE FLORENCIA - CAQUETA
FECHA DE ADICIÓN:	N.A
PLAZO DE ADICIÓN:	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE ENERO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO INICIAL ($):	$ 988.082.242,00.
VALOR EN LETRA:	NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE
VALOR ADICIÓN CONTRATO ($):	N.A.
VALOR CONTRATO FINAL ($):	N.A.
VALOR EN LETRA:	.

3 INTRODUCCION

3.1 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 NIT. 901.747.281-8**
NOMBRE DE LA INTERVENTORIA	**CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025 NIT. 901.955.0.99-5**

1. ESTADO DE LA OBRA:

- ✓ SUSPENDIDA ()
- ✓ EN EJECUCIÓN (X)
- ✓ TERMINADA ()

OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL

3.2 INTRODUCCIÓN AL CONTRATO DE EJECUCION

El presente informe, es un documento para el suministro de información de la presentación de las actividades a realizar para su revisión la revisión y llevar a cabo el control y seguimiento de la obra **ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA** a cargo del contratista CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 NIT. 901.935.706-2 cuyo representante legal es ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA C.C. 40.781.657 DE FLORENCIA - CAQUETA Y contrato de obra No COP-2025-002. Este documento describe las labores técnicas y administrativas que se llevaron a cabo en la ejecucion, así como el seguimiento a la programación de obra presentada por el contratista

En dicho procedimiento se toman como parámetros y herramientas de control, el presupuesto o propuesta económica, especificaciones técnicas, capital humano, Normas técnicas vigentes y procedimientos establecidos por la entidad contratante **ALCALDIA MUNICIPAL DE MILAN.**, así como factores externos como el clima e imprevistos, los cuales son influyentes y determinantes en el desarrollo de este proyecto. Teniendo en cuenta la importancia del presente reporte y con el fin de dar claridad al proceso con el fin de cumplir el objeto contractual contratado.

4 OBJETIVOS

1. Ejecutar el contrato en las condiciones y términos establecidos, disponiendo del personal técnico y de apoyo propuesto, usando los materiales y las cantidades pactadas.
2. Durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA está obligado a organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para adelantar en forma sostenible la obra y con las disposiciones ambientales contenidas en la Ley 99 de 1993, Decreto 2041 de 2014 y demás normas reglamentarias, así como las normas especiales para la obtención de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones específicas requeridas para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, que se utilicen durante la ejecución de las obras.
3. La obtención de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, así como los sitios de disposición de sobrantes, estarán bajo la responsabilidad del contratista y son requisitos indispensables para que en calidad de constructor pueda iniciar las obras. El tiempo que su obtención conlleve deberá considerarse dentro de la programación. Las demoras en la obtención de estos permisos no serán causa válida para justificar atrasos o incumplimientos.
4. Realizar los trabajos de construcción, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas, con materiales de calidad, el personal idóneo y en los plazos pactados, de acuerdo a la programación que se acuerde con el Interventor y/o supervisor.
5. Respetar las disposiciones establecidas en el Código Nacional de Minas sobre extracción y explotación de materiales de construcción.
6. El contratista se obliga a dar inicio, cuando se firma el acta de inicio por las partes. Presentar ante el supervisor y/o interventor actas parciales del avance de la obra cada 30 días.
7. Llevar un registro fotográfico desde la iniciación de la ejecución contractual y hasta la entrega definitiva de los trabajos (antes de iniciar labores, durante la ejecución y después cuando se ha culminado la labor) para aportarlos al expediente del contrato como evidencia de la ejecución en medio físico y digital.
8. Llevar las bitácoras de obras debidamente actualizadas y con anotación de todas las novedades que se presenten durante la ejecución.
9. Tomar las garantías contractuales, ampliarlas, extenderlas o modificarlas cuando a ello hubiere lugar.
10. No suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el contrato.
11. Cuando se requiera hacer una modificación, deberá concertarlo con el supervisor y/o interventor y el alcalde Municipal para su respectiva aprobación.
12. El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecución de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos.
13. El contratista se obliga a permanecer personalmente al frente de los trabajos o mantener al frente de los mismos un residente, personal que debe estar suficientemente facultado para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato. El Municipio se reserva el derecho de exigir, por escrito, al contratista el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Esta exigencia no dará derecho al contratista para elevar ningún reclamo contra el Municipio. La Supervisión y/o interventoría podrá solicitar al contratista, en cualquier momento, el suministro de información sobre la

nómina del personal. El contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo razonable que la Supervisión y/o interventoría haya fijado.

14. El CONTRATISTA se obliga a la colocación de vallas informativas con el fin de prevenir situaciones de riesgo si hay lugar a ello, en cada uno de los sitios donde se adelante la obra con base en las especificaciones señaladas por la secretaria de Planeación.
15. Periódicamente deberán celebrarse reuniones con participación del residente de la obra, y el supervisor y/o Interventor con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes áreas del Municipio. De cada una de estas reuniones se levantará un acta, la cual será mantenida en custodia por la Supervisión y/o Interventor.
16. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y laboral y sismo resistencia en la ejecución de las obras.
17. Informar oportunamente al supervisor y/o interventor del contrato sobre cualquier situación que pueda alterar el curso normal de la ejecución contractual o el equilibrio financiero del contrato.
18. A la terminación de la obra, el contratista removerá de los alrededores de ellas las instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección. En caso que no lo haga así, el Supervisor y/o Interventor ordenará la limpieza por cuenta del Municipio y cargará su costo al contratista. El contratista realizará las gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales producto de esta limpieza puedan ser utilizados por miembros de la comunidad. Una vez realizada la limpieza, se restaurarán las áreas utilizadas, realizando como mínimo revegetalización, control de erosión y acabado de rellenos sanitarios de tal forma que estas zonas queden en similares o mejores condiciones que las encontradas inicialmente.
19. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato y para hacer efectivo el pago.
20. Presentar los informes al supervisor y/o interventor contractual, sobre la ejecución del contrato.
21. Pagar de su propia cuenta los impuestos, tasas y contribuciones que demande el perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.
22. Mantener indemne al Municipio frente a reclamaciones de terceros por hechos o actuaciones que le sean imputables y que deriven de la ejecución del contrato.
23. Adicional a las antes contempladas y dando cumplimiento al Plan de Gestión Social y Manual Operativo del PDA Caquetá, el contratista deberá

5 INFORMACION GENERAL INICIALES DEL CONTRATO

5.1 CONTRATO DE OBRA COP-2025-002

OBJETO: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

1. **ANTECEDENTES:** la Alcaldía Municipal de Milán, mediante licitación pública de obra pública de infraestructura de infraestructura de agua potable y saneamiento básico No AM-LP-2025-002, junto con el presupuesto de la actividades contractuales, planos y demás documentos de carácter técnico, que tiene por objeto **ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA,** que será respaldado por los Certificados de Disponibilidad de Recursos CDP No. 2.3.2.01.01.001.3.16.01 del 09 de mayo de 2024, por valor de **NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($ 988.082.242,00).**

5.2 CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA COP-2025-002/2025

NÚMERO DE CONTRATO:	COP-2025-002	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	OBRA	
DATOS DE CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE MILAN	
DATOS CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO SAN ANTONIO NIT. 901.564.960-4
	SUSCRIPTOR CONTRATO –	R.L. ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA C.C.40.781.657 DE FLORENCIA -CAQUETA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP No. 17355-17356-17358 del 06 de noviembre 2024
VALOR DEL CONTRATO:	**NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($ 988.082.242,00).**
FECHA DE INICIO CONTRATO:	22 DE AGOSTO DE 2025
PLAZO EJECUCIÓN:	SESENTA (150) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE ENERO DE 2026

5.3 ACTIVIDADES CONTRACTUALES INICIALES:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRATO
			CANTIDAD CONTRATO
I	**1.0 PRELIMINARES**		
1,01	Localización y replanteo de redes	M2	897,25
1,02	Cerramiento provisional lona verde (h=2,00m)	ML	897,25
1,03	Excavación manual en material común de 0.00 a 2.00 m	M3	72,71
1,04	Excavación manual en material común de 2.00 a 4.00 m	M3	37,50
1,05	Excavación mecánica en material común	M3	1281,00
1,06	Entibado en madera para proteger talud de excavación	M2	390,55
1,07	Cargue, transporte y retiro de material sobrante	M3	653,41
1,08	Relleno, Cimentación tubería con arena SP de acuerdo a la norma ASTM 2487	M3	104,29
1,09	Relleno con material seleccionado de la excavación	M3	736,13
1,10	Suministro e instalación de sub_base granular tipo C, NT1	M3	183,70
1,11	Suministro e instalación de base granular tipo C, NT1	M3	63,30
1,12	Suministro e instalación de asfaltita natural, en áreas afectadas por la excavación	M2	177,46
			SUBTOTAL
2	**2.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA**		

2,01	Suministro e instalación de tubería PVC D=315mm; NTC 3722-3 S8	ML	168,24
2,02	Suministro e instalación de tubería PVC D=400mm; NTC 3722-3 S8	ML	43,84
2,03	Suministro e instalación de tubería PVC D=450 mm; NTC 3722-3 S8	ML	82,02
2,04	Suministro e instalación de tubería PVC D=27"; NTC 5055 ASTM F 794	ML	160,27
2,05	Suministro e instalación de tubería PVC D=30"; NTC 5055 ASTM F 794	ML	51,96
2,06	Suministro e instalación de tubería PVC D=36"; NTC 5055 ASTM F 794	ML	77,68
			SUBTOTAL
3	**3.0 POZOS DE INSPECCION**		
3,01	Pozos de inspección en concreto f´c= 24Mpa D=1.20 m y h<=2.00 m. incluye tapa	UND.	6,00
3,02	Pozos de inspección en concreto f´c= 24Mpa D=1.20 m y 2.01>h<=4.00 mincluye tapa	UND	3,00
			SUBTOTAL
4	**4,0 CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROSY CABEZA DE SALIDA**		
4,01	Construcción de cunetas transversales de vía, L=10.97m x 0.85 m, ancho útil de 0.45m, espesor de muros de 0.20m, y rejillas en platina de 2" x 3/8	UND	3,00
4,02	Construcción de cunetas transversales de vía, L=9.32m x 0.85 m, ancho útil de 0.45m, espesor de muros de 0.20m, y rejillas en platina de 2" x 3/8	UND	1,00
4,03	Construcción de sumidero de 1.64m x 0.88m, ancho útil de 0.58m x 1.34m, e=0.15m, rejilla platina de 2 x 3/8	UND	9,00
4,04	Construcción de sumidero de 1.64m x 0.98m, ancho útil de 0.68m x 1.34m, e=0.15m, rejilla platina de 2 x 3/8	UND	2,00
4,05	Construcción de cabezal de salida	UND	1,00
			SUBTOTAL
5	**5,0 ASEO GENERAL**		
5,01	Aseo general de Obra	UND	1,00

5.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES FINALES:

Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
I	**OBRA**			

1	**1.0 PRELIMINARES**			
1	1,01	Localización y replanteo de redes	M2	555,84
2	1,02	Cerramiento provisional lona verde (h=2,00m)	ML	873,36
3	1,03	Excavación manual en material común de 0.00 a 2.00 m	M3	138,66
4	1,04	Excavación manual en material común de 2.00 a 4.00 m	M3	10,17
5	1,05	Excavación mecánica en material común	M3	1.298,44
6	1,06	Entibado en madera para proteger talud de excavación	M2	916,75
7	1,07	Cargue, transporte y retiro de material sobrante	M3	408,82
8	1,08	Relleno, Cimentación tubería con arena SP de acuerdo a la norma ASTM 2487	M3	97,15
9	1,09	Relleno con material seleccionado de la excavación	M3	1.256,00
10	1,1	Suministro e instalación de sub_base granular tipo C, NT1	M3	112,49
11	1,11	Suministro e instalación de base granular tipo C, NT1	M3	28,38
12	1,12	Suministro e instalación de asfaltita natural, en áreas afectadas por la excavación	M2	218,24
2	**2.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA**			
9	2,01	Suministro e instalación de tubería PVC D=315mm; NTC 3722-3 S8	ML	153,03
10	2,02	Suministro e instalación de tubería PVC D=400mm; NTC 3722-3 S8	ML	79,01
11	2,03	Suministro e instalación de tubería PVC D=450 mm; NTC 3722-3 S8	ML	46,76

12	2,04	Suministro e instalación de tubería PVC D=27"; NTC 5055 ASTM F 794	ML	163,94
13	2,05	Suministro e instalación de tubería PVC D=30"; NTC 5055 ASTM F 794	ML	51,19
14	2,06	Suministro e instalación de tubería PVC D=36"; NTC 5055 ASTM F 794	ML	95,78
3	**3.0 POZOS DE INSPECCION**			
15	3,01	Pozos de inspección en concreto f´c= 24Mpa D=1.20 m y h<=2.00 m. incluye tapa	UND.	0,00
16	3,02	Pozos de inspección en concreto f´c= 24Mpa D=1.20 m y 2.01>h<=4.00 mincluye tapa	UND	0,00
4	**4,0 CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROSY CABEZA DE SALIDA**			
17	4,01	Construcción de cunetas transversales de vía, L=10.97m x 0.85 m, ancho útil de 0.45m, espesor de muros de 0.20m, y rejillas en platina de 2" x 3/8	UND	0,00
18	4,02	Construcción de cunetas transversales de vía, L=9.32m x 0.85 m, ancho útil de 0.45m, espesor de muros de 0.20m, y rejillas en platina de 2" x 3/8	UND	0,00
19	4,03	Construcción de sumidero de 1.64m x 0.88m, ancho útil de 0.58m x 1.34m, e=0.15m, rejilla platina de 2 x 3/8	UND	0,00
20	4,04	Construcción de sumidero de 1.64m x 0.98m, ancho útil de 0.68m x 1.34m, e=0.15m, rejilla platina de 2 x 3/8	UND	18,00
21	4,05	Construcción de cabezal de salida	UND	1,00
5	**5,0 ASEO GENERAL**			
22	5,01	Aseo general de Obra	UND	1,00
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**			
23	NP-1	Pozos de inspección en concreto f´c= 24Mpa D=1.50 m y h<=2.00 m. incluye tapa	UND	4,00
24	NP-2	Pozos de inspección en concreto f´c= 24Mpa D=1.50 m y 2.01>h<=3.00 mincluye tapa	UND	3,00
25	NP-3	Pozos de inspección en concreto f´c= 24Mpa D=1.60 m y 3.01>h<=4.00 mincluye tapa	UND	1,00

6 ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Bajo el marco de **ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA,** se encuentra este proyecto, con el fin de mejorar la red de alcantarillado de aguas lluvias para la comunidad de la inspección de San Antonio de Getucha.

Este proyecto además beneficiará que la red instalada garantice la continuidad del flujo de las aguas lluvias y evitar inundación en las vías.

6.2 CONTROL DE LA INVERSIÓN:

DESCRIPCIÓN	VALOR BRUTO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 988.082.242
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 988.082.242
VALOR DEL ANTICIPO:	$ 395.232.896
PORCENTAJE DEL ANTICIPO:	0%

AVANCE DE INVERSIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	DIFERENCIA
ACUMULADO MANO DE OBRA:	$193.844.661,70	$186.539.595,27	$8.305.066,43
ACUMULADO SUMINISTROS:	$452.304.210,50	$435.259.055,60	$17.045.154.9
TOTAL, ACUMULADO PROYECTO:	$646.148.872,20	$ 621.798.650,87	$24.350.221,33
FACTURADO (BRUTO) ACUMULADO:	$0	$ 0	$0
SALDO POR FACTURAR:	$646.148.872,20	$ 621.798.650,87	$24.350.221,33
PORCENTAJE ACUMULADO	65.39%	62.93%	2.46%

6.3 PLAZOS DE EJECUCIÓN (días calendario):

FECHA INICIAL DE LA OBRA: 22/08/2025			
PLAZO INICIAL:	150	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	60
PLAZO ACTUALIZADO:	0	**PLAZO RESTANTE:**	90

6.4 POLIZAS DEL CONTRATO

1. **Cumplimiento:** Por el 20% sobre el valor del contrato.
2. **Salarios prestaciones indemnizaciones:** Por el 5% del valor del contrato.
3. **Buen manejo y correcta inversión del anticipo.** Por el 100% del valor del anticipo.
4. **Estabilidad de la obra:** Por el 20% del valor del contrato

6.5 AVANCE FISICO DEL PROYECTO

A continuación, se detalla el avance físico de cada una de las actividades desarrolladas hasta la fecha, teniendo como referencia las cantidades contratadas de cada una de ellas, y se refleja el porcentaje global ejecutado el cual corresponde al **65.39%**

7 ACTA PARCIAL No 1 DE OBRA DEL CONTRATO COP-2025-002

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VALORES PROGRAM. CANTIDAD	VALORES PROGRAM. VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ADIC. MODIFICATORIA 1 CANTIDAD	ADIC. MODIFICATORIA 1 VALOR UNITARIO	ADIC. MODIFICATORIA 1 VALOR TOTAL	ADIC. RELING TARIOAL No. 01 CANTIDADES ADICIONALES	ADIC. RELING TARIOAL No. 01 VALOR TOTAL	ACUMULADO TOTAL CANTIDADES	ACUMULADO TOTAL VALOR TOTAL
						$ 743.984.340,00			$ 417.037.034,00		$ 417.037.034,00		$ 417.037.034,00
1	OBRA					$ 911.870.349,80			$ 911.411.977,00		$ 191.878.743,00		$ 191.878.743,00
1	1.0 PRELIMINARES												
1	1.01	Localización y replanteo del lote	M2	841,45	$ 7.100,00	$ 6.464.971,00	625,84		$ 5.947.577,00	467,45	$ 4.284.493,00	467,45	$ 4.284.493,00
2	1.02	Cerramiento provisional en lona verde (incluye	ML	891,25	$ 15.189,00	$ 13.392.440,25	873,34		$ 13.184.551,00	889,12	$ 13.404.857,00	889,12	$ 13.404.857,00
3	1.03	Retiro de cerramiento provisional en lona verde (incluye	ML	172,71	$ 22.700,00	$ 3.921.842,00	186,34		$ 7.267.289,00	11,40	$ 444.594,00	11,40	$ 444.594,00
4	1.04	Demolición mampostería existente con un es	M2	37,42	$ 69.97 8,00	$ 2.386.046,00	13,17		$ 701.365,00	9,70	$ 645.214,00	9,70	$ 645.214,00
5	1.05	Remoción mecánica en material común	M3	1.991,00	$ 31.848,00	$ 58.012.908,00	1.995,44		$ 95.101.668,00	926,00	$ 29.491.748,00	926,00	$ 29.491.748,00
6	1.06	Empleado en mejoramiento entre profundidad nivel de excavación	M2	295,32	$ 69.595,00	$ 20.548.737,00	414,70		$ 33.300.074,00	626,68	$ 20.404.723,00	626,68	$ 20.404.723,00
7	1.07	Cargue, transporte y retiro de material sobrante	M3	483,41	$ 69.594,00	$ 33.644.000,00	468,83		$ 31.886.202,00	315,00	$ 14.625.377,00	315,00	$ 14.625.377,00
8	1.08	Relleno, Compactación (Granito Común de 5P no incluido a la rueda +20% Agua	M3	134,39	$ 91.344,00	$ 8.424.313,00	93,15		$ 8.591.111,00	67,07	$ 6.127.979,00	66,07	$ 6.037.977,00
9	1.09	Relleno mejoramiento seleccionado de 5)	M3	734,15	$ 17.445,00	$ 12.807.132,00	1.356,00		$ 21.911.184,00	767,71	$ 13.389.993,00	767,71	$ 13.389.993,00
10	1.1	Suministro e instalación de subbase granular	M3	1.821,70	$ 260.164,00	$ 46.716.627,00	112,44		$ 29.808.943,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11	1.11	Suministro e instalación de base granular 70% G	M3	63,30	$ 270.164,00	$ 17.417.881,00	36,96		$ 7.999.540,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12	1.12	Suministro e instalación de concreto vertedor, en mezcla proporcionada por la concretera	M3	171,46	$ 97.448,00	$ 16.191.173,00	218,24		$ 12.332.913,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3	3.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA					$ 168.276.261,00			$ 215.712.113,00		$ 227.241.232,00		$ 227.241.232,00
9	9.01	Suministro e instalación de Tubería PVC S=63.5mm, NTC 3722-3 M	ML	198,34	$ 142.218,00	$ 34.111.895,00	132,00		$ 21.761.994,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
10	9.02	Suministro e instalación de Tubería PVC S=160mm NTC 3722-3 M	ML	42,84	$ 388.163,00	$ 13.440.230,00	78,91		$ 25.984.419,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11	9.03	Suministro e instalación de Tubería PVC S=400 mm NTC 3722-3 M	ML	80,33	$ 2.304.473,00	$ 61.884.440,00	44,70		$ 17.978.031,00	46,65	$ 17.931.384,00	46,65	$ 17.931.384,00
12	9.04	Suministro e instalación de Tubería PVC S=315 mm, NTC 3722-3 PM	ML	149,67	$ 960.424,00	$ 153.481.254,00	183,54		$ 129.962.511,00	154,40	$ 123.580.966,00	154,40	$ 123.580.966,00
13	9.05	Suministro e instalación de Tubería PVC S=200 mm, NTC 3722-3 PM	ML	51,84	$ 960.424,00	$ 46.710.489,00	51,19		$ 44.047.940,00	46,80	$ 41.991.379,00	46,80	$ 41.991.379,00
14	9.06	Suministro e instalación de Tubería PVC S=160 mm, NTC 3722-3 PM	ML	72,49	$ 1.400.975,00	$ 196.806.564,00	83,76		$ 180.370.974,00	83,60	$ 183.948.415,00	83,60	$ 183.948.415,00
4	4.0 PUESTA DE INSPECCION					$ 55.427.611,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
15	4.01	Pozos de inspección en concreto f'c= 3000psi D=1.80 m y h=0.00 m. Incluye Tapa	UND	4,00	$ 6.261.413,00	$ 31.701.445,00	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
16	4.02	Pozos de inspección en concreto f'c= 3000psi D=1.20 m y 2.0 m incluye Tapa	UND	3,00	$ 6.850.711,00	$ 24.676.133,00	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5	5.0 CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS CUNETA DE SABANA					$ 142.422.917,00			$ 77.920.467,00		$ 0,00		$ 0,00
17	4.07	Construcción de sumidero de rejilla f'c=3000psi de 1.00 m x 0.60 m x 3.60 m, ancho de viga de 0.45m, espesor de muros de 0.20m, y losa de fondo de 0.1 m	UND	3,00	$ 15.481.049,00	$ 46.471.413,00	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18	4.08	Construcción de sumidero de rejilla f'c=3000psi de 1.00 m x 0.60 m x 3.60 m, ancho de viga de 0.45m, espesor de muros de 0.20m, y losa de fondo de 0.1 m	UND	1,00	$ 15.805.481,00	$ 15.805.481,00	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19	4.09	Construcción de sumidero de 1.64m x 0.64m x 1.34m, en concreto f'c de 3000psi, con rejilla metálica	UND	8,00	$ 5.925.951,00	$ 51.883.879,00	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20	4.04	Construcción de sumidero de 1.64m x 0.64m x 1.34m, en concreto f'c de 3000psi, con rejilla metálica	UND	3,00	$ 5.945.753,00	$ 7.319.463,00	58,00		$ 37.476.108,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
21	4.05	Construcción de sumidero de 1.64m x 0.64m x 1.34m, en concreto f'c de 3000psi, con rejilla metálica	UND	1,00	$ 6.151.520,00	$ 6.151.520,00	0,00		$ 6.151.520,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6	6.0 AIRE GENERAL					$ 7.008.974,00			$ 1.008.974,00		$ 0,00		$ 0,00
22	6.01	Aseo general de Obra	GLOB	1,00	$ 1.008.974,00	$ 1.008.974,00	1,00		$ 1.008.974,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
AP	ITEMS NO PERTINENTES					$ 0,00			$ 24.354.509,00		$ 38.727.231,00		$ 38.727.231,00
23	AP-1	Pozos de inspección en concreto f'c= 3000psi D=1.80 m y h=0.00 m. Incluye Tapa	UND	0,00	$ 6.146.944,00	$ 0,00	4,00		$ 27.134.940,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
24	AP-2	Pozos de inspección en concreto f'c= 3000psi D=1.80 m y 2.0 m incluye Tapa	UND	0,00	$ 6.850.711,00	$ 0,00	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
25	AP-3	Pozos de inspección en concreto f'c= 3000psi D=1.80 m y 3.0 m incluye Tapa	UND	0,00	$ 11.897.307,00	$ 0,00	1,00		$ 11.897.307,00	1,00	$ 11.897.307,00	1,00	$ 11.897.307,00
					COSTO DIRECTO	$ 766.984.240			$ 743.984.340		$ 417.037.034		$ 417.037.034

ADMINISTRACION	10%	$ 126.511.191,60	$ 113.287.434,00	$ 113.287.434,00
IMPREVISTOS	5%	$ 71.009.776,50	$ 63.574.717,00	$ 63.574.717,00
UTILIDAD	5%	$ 71.009.776,50	$ 63.574.717,00	$ 63.574.717,00
SUBTOTAL AIU		$ 322.945.744,60	$ 289.136.868,00	$ 289.136.868,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 13.493.536	$ 12.081.004,00	$ 12.081.004,00
VALOR DE ANTICIPO SOLICITADO		$ 336.439.281	$ 301.217.872,00	$ 301.217.872,00
VALOR TOTAL		$ 1.089.423.521,80	$ 1.044.202.212,00	$ 493.256.906,00

8 PROCESOS CONSTRUCTIVOS A LA FECHA

En el trascurso de la obra, se han ejecutado los procesos constructivos de acuerdo a cada una de las especificaciones técnicas siguiendo las indicaciones constructivas y lo firmado en el contrato.

8.1 INFORME DE MANEJO AMBIENTAL, DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

INTRODUCCIÓN

La gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SST) forma parte de las herramientas indispensables para tener óptimas condiciones de trabajo, así como garantizar la calidad de vida de todos los empleados que están en contacto con la obra. Es importante tener en cuenta que todas las personas vinculadas de manera directa (contratista, subcontratistas, proveedores) o indirecta (comunidad aledaña) a la obra, están expuestos a riesgos relacionados con lesiones, incidentes, accidentes y enfermedades, que pueden generarse como consecuencia de las actividades ejecutadas.

Por lo anterior, la gestión SST es importante ya que busca eliminar los factores de riesgo de la seguridad y salud en el trabajo, desarrollando y promoviendo la salud y seguridad de los trabajadores para prevenir y controlar enfermedades ocupacionales y accidentes.

Por otro lado, es necesarito tener en cuenta que los impactos generados en cualquier proyecto de obra civil, requieren del desarrollo de estrategias ambientales que prevengan, mitiguen, corrijan o compensen la contaminación y el uso insostenible de los recursos naturales. Es por ello que se hace fundamental la gestión ambiental en la obra con el fin de conservar los recursos.

8.2 PERSONAL EN OBRA

Continuamente se verifica que el personal que ingrese a la obra cuente con los aportes al sistema de seguridad social de acuerdo a los requerimientos de la ley 100 de 1993 (Soportes en informe final SST SGA No 1 del Contratista). Además, cada personal en la obra, se verifica que se encuentra afiliado al sistema de Riesgos Laborales ARL. De acuerdo a lo verificado en campo y reportado por el contratista, se cumple con los requerimientos relacionados anteriormente. Se le ha recomendado al contratista mantener en cualquier momento soportes en obra del personal, incluyendo las personas nuevas que van ingresando.



8.3 GESTION PARA EL TALENTO HUMANO

Durante el periodo de evaluación se presentó un máximo de 11 trabajadores en obra y 2 trabajadores del área administrativa del contratista. A la fecha no se presentaron accidentes ni incidentes de trabajo.







Durante el periodo de ejecucion el personal cumple con cada uno de sus elementos de protección personal para evitar accidentes trabajo.

8.4 PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS





El contratista maneja su plan de emergencias ante las excavaciones que se realizan en situó, al finalizar cada jornada laboral se realiza el retiro del movimiento de tierra, con el fin de que este sea afectado por las aguas lluvias.

A parte de las excavaciones en los puntos de acopio de material se tiene debidamente señalizado para que personal externo a la obra pueda identificar que es un área intervenida.

En la obra se mantiene la información de contacto documentada en físico, para cualquier emergencia presentada. Dentro del manejo de emergencias para este proyecto en específico se siguen los procedimientos internos presentados por el contratista y en caso de no poderse manejar la siguiente instancia es acudir a los protocolos de emergencia que se manejan en el municipio de Florencia – Caquetá en coordinación con el hospital local.

8.5 MANEJO AMBIENTAL

Se realizó el cumplimiento de la totalidad de la normatividad en los que respecta al área ambiental aplicable para la ejecución de este proyecto. Busca mitigar, reducir, eliminar o compensar impactos ambientales que se puedan generar durante la ejecución de la obra.









Para este periodo se realizó el cierre de cada uno de los materiales sobrantes en obra, se llevaron a cabo la limpieza total del área de trabajo intervenida como se evidencia en las fotografías.

9 REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1 Socialización del Contrato



Foto 2 Socialización del Contrato



Foto 3 Socialización del Contrato



Foto 4 Socialización del Contrato







Foto 5 Levantamiento de paramentos



Foto 6 Levantamiento de paramentos



Foto 7 Levantamiento de paramentos



Foto 8 Levantamiento de paramentos



Foto 9 l Levantamiento de paramentos



Foto 10 Levantamiento de paramentos



Foto 11 Levantamiento de paramentos



Foto 12 Levantamiento de paramentos



Foto 13 Acopio de tubería corrugada para los tramos



Foto 14 Localización de tramos de alcantarillado



Foto 15 Distribución de tubería de 36" tramo Pozo 8 al Descole



Foto 16 Tubería para los diferentes tramos en acopio.



Foto 17 Localización de tramos de alcantarillado



Foto 18 Cerramiento en lona para tramo descole al pozo 8



Foto 19 Cerramiento en lona para tramo descole al pozo 8



Foto 20 Excavación mecánica tramo descole al pozo 8 de 36"



Foto 21 Excavación mecánica tramo descole al pozo 8 de 36"



Foto 22 Excavación mecánica tramo descole al pozo 8 de 36"



Foto 23 Suministro de Cama de Arena y entibado para tubería de 36" tramo del descole al Pozo 8



Foto 24 Suministro de Cama de Arena para tubería de 36" tramo del descole al Pozo 8



Foto 25 Excavaciones de la reposición de la red de alcantarillado



Foto 26 Suministro e instalación de cama de arena tubería de 36"



Foto 27 Cargue y retiro de material sobrante de excavación



Foto 28 Relleno seleccionado de la reposición de la red de alcantarillado



Foto 29 Relleno de material seleccionado



Foto 30 Suministro e instalación de relleno de material seleccionado



Foto 31 Suministro e instalación de entibado



Foto 32 Suministro e instalación de entibado



Foto 33 Suministro e instalación de entibado



Foto 34 Suministro e instalación de entibado



Foto 35 Suministro e instalación de cama de arena y entibado



Foto 36 Suministro e instalación de cama de arena y entibado



Foto 37 Suministro e instalación de cama de arena y entibado



Foto 38 Suministro e instalación de tubería de 36"



Foto 39 Excavaciones de la reposición de la red de alcantarillado



Foto 40 Suministro e instalación de entibado



Foto 35 Suministro e instalación de tubería de 36"



Foto 42 Suministro e instalación de tubería de 36"



Foto 43 Suministro e instalación de material de cama de arena para tubería de 36"



Foto 45 Suministro e instalación de señalización y cerramiento tramo pozo 8 al descole



Foto 46 Acopio de tubería de diferentes diámetros



Foto 47 Señalización de acopio de tuberías de diferentes diámetros



Foto 48 Excavación para la instalación de tubería de 36"



Foto 49 Excavación para la instalación de tubería de 36"



Foto 50 Relleno de cama de arena para tubería de 36"



Foto 51 Acopio de material de arena para ancho de zanja



Foto 52 Suministro e instalación de entibado en madera



Foto 53 Suministro e instalación de tubería de 36"



Foto 54 Demolición de baño existente



Foto 55 Retiro de material sobrante de excavación



Foto 56 Excavación mecánica y suministro de tubería de 36"



Foto 57 Retiro de material sobrante de excavación



Foto 58 Relleno de material seleccionado para ancho de zanja



Foto 59 Suministro de cama de arena



Foto 60 Excavación de tubería 36" al cabezal de salida



Foto 61 Relleno de material seleccionado para ancho de zanja



Foto 62 Señalización de área de trabajo



Foto 63 Relleno de material seleccionado para ancho de zanja



Foto 64 Suministro e instalación de cámara de arena



Foto 65 Excavación y Suministro e instalación de tubería de 36"



Foto 66 Suministro de señalización



Foto 67 Relleno de material seleccionado



Foto 68 Suministro e instalación de señalización



Foto 69 Excavación mecánica para la tubería de 36"



Foto 70 Suministro e instalación de cama de arena



Foto 71 Excavación mecánico y señalización del área de trabajo



Foto 72 Suministro e instalación de tubería de 36", cama de arena y relleno de material seleccionado



Foto 73 Localización tramo pozo 8 al pozo 7, cerramiento



Foto 74 Suministro tubería de 36" corrugada



Foto 75 Suministro tubería de 36" corrugada



Foto 76 Suministro e instalación de cama de arena



Foto 77 Suministro e instalación de cama de arena



Foto 78 Corte de tubo de 36" para finalización de tramo



Foto 79 Relleno de material seleccionado y señalización del tramo del pozo 8 al pozo 7



Foto 80 Suministro tubería de 36" y tubería de 30" y relleno de material seleccionado



Foto 81 Suministro e instalación de entibado en madera y cama de arena para tubería de 30"



Foto 82 Relleno de material seleccionado para tramo del pozo 8 al pozo 7



Foto 83 Excavación mecánica para tubería de 30"



Foto 84 Perfilado de terreno manual

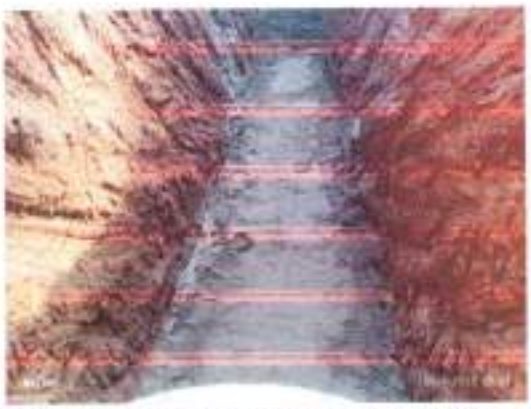


Foto 85 Suministro e instalación de cama de arena para tubería de 30"

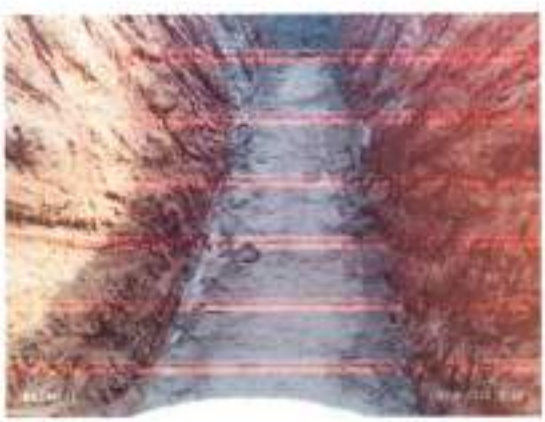


Foto 86 Suministro e instalación de cama de arena para tubería de 30"



Foto 87 Retiro de material sobrante de excavación



Foto 88 Excavación mecánica de tubería de 30"



Foto 89 Excavación mecánica de tubería de 30"



Foto 90 Excavación del pozo7 al Pozo 6



Foto 91 Corte de Pavimento del Pozo 7 al Pozo6



Foto 92 Suministro de concreto para revestir tubería del paso al pozo 7



Foto 93 Protección de Excavación con caucho negro



Foto 94 Suministro e instalación de tubería de 27"



Foto 95 Suministro e instalación de cama de arena para tubería de 27"



Foto 96 *Suministro e instalación de entibado*



Foto 97 Suministro e instalación de tubería de 27"



Foto 98 Suministro e instalación de entibado y cama de arena



Foto 99 Retiro de material sobrante de excavación



Foto 100 Retiro de material sobrante de excavación



Foto 101 Retiro de material sobrante de excavación



Foto 102 Señalización del área de trabajo tramo de 27"



Foto 103 Ubicación del punto ecológico de la obra



Foto 104 Excavación para tramo de tubería de 27"



Foto 105 Suministro e instalación de tubería de 27" y cama de arena



Foto 106 Compactación de relleno de material seleccionado



Foto 107 Suministro e instalación de cama de arena y entibado



Foto 108 *Excavación de tramo de 27"*



Foto 109 Cerramiento en lona tramo de 27"



Foto 110 Corte de pavimento tramo de 27"



Foto 111 Suministro de cama de arena tramo de 27"



Foto 112 Compactación de tramo de 27"



Foto 113 Excavación mecánica de tubería de 27"



Foto 114 *Excavación para tramo de 27"*



Foto 115 Señalización y excavación de tramo de 27"



Foto 116 Perfilada manual para excavación de pozos



Foto 117 Excavación manual para despejar tubería existente



Foto 118 Excavación mecánica de tubería de 27"



Foto 119 Limpieza de tramos finalizados de tramo de 27"



Foto 120 Excavación y Cerramiento tubería de 27"



Foto 121 Suministro e instalación de cama de arena para tubería de 27" y entibado



Foto 122 Suministro e instalación de cama de arena para tubería de 27"



Foto 123 Retiro de material sobrante de excavación



Foto 124 Relleno de material seleccionado de 27"



Foto 125 Excavación mecánica de tubería de 27"



Foto 126 *Excavación manual para tramo de 27"*



Foto 127 Suministro e instalación de cama de arena para tubería de 27"



Foto 128 Suministro e instalación de cama de arena para tubería de 27"



Foto 129 Señalización de área de trabajo del pozo 5



Foto 130 Cerramiento en lona para tramo de tubería de 27" del pozo 5 al pozo 4



Foto 131 Excavación mecánica de tubería de 27"



Foto 132 Tramo del pozo 5 al pozo 6 finalizado de tubería de 27"



Foto 133 Suministro e instalación de cerramiento del pozo 5 al pozo 4 tramo de 27"



Foto 134 Suministro e instalación de cerramiento tramo de 27"



Foto 135 Capacitación del personal en obra



Foto 136 Excavación mecánica de tubería de 27"



Foto 137 Reparación de tubería de agua



Foto 138 *Suministro e instalación de acero y concreto para pozo 8*



Foto 139 Suministro e instalación de concreto para pozo 8



Foto 140 Suministro e instalación de formaleta para pozo 8



Foto 141 Relleno de material seleccionado para el ancho de zanja



Foto 142 Suministro e instalación de concreto final para pozo 8



Foto 143 Excavación mecánica de tubería de 27" e instalación de cama de arena



Foto 144 *Suministro de formaleta, acero y concreto para pozo 7*



Foto 145 Suministro e instalación de relleno para pozo 7



Foto 146 Suministro e instalación de relleno para pozo 7



Foto 147 Relleno para pozo 7



Foto148 Excavación mecánica de tubería de 18"



Foto 149 Suministro e instalación de cama de arena para tubería de 18"



Foto 150 *Relleno de material seleccionado tramo de 18"*



Foto 151 Señalización del pozo 4



Foto 152 Suministro e instalación de cama de arena para tubería de 30"



Foto 153 Suministro e instalación de concreto de cilindro final del pozo 7



Foto 154 Suministro e instalación de acero y concreto para pozo 6



Foto 155 Suministro e instalación de acero y formaleta para pozo 5



Foto 156 *Excavación manual de pozo*



Foto 157 Suministro e instalación de concreto para pozo 6



Foto 158 Suministro e instalación de cama de arena para tubería de 18"



Foto 159 Suministro e instalación de entibado



Foto 160 Señalización de área de trabajo



Foto 161 Excavación mecánica de tubería de 18"



Foto 162 Suministro e instalación de cama de arena



Foto 163 Suministro e instalación de cama de arena para tubería de 18"



Foto 164 Suministro e instalación de cama de arena para tubería de 18"



Foto 165 Suministro e instalación de acero de pozo 5



Foto 166 Cilindro finalizado pozo 8



Foto 167 Cilindro finalizado pozo 8



Foto 168 *Suministro de concreto para pozo 7*



Foto 169 Suministro e instalación de cama de arena para tubería de 18"



Foto 170 Suministro e instalación de cama de arena para tubería de 18"



Foto 171 Suministro de concreto para pozo 6



Foto 172 Excavación mecánica de tubería de 18"



Foto 173 Señalización de pozo 6



Foto 174 Señalización de pozo 8



Foto 175 Excavación manual pozo 4



Foto 176 Suministro de concreto para pozo 5



Foto 177 Material protegido



Foto 178 Suministro e instalación de tubería de 18 al pozo 2



Foto 179 Material protegido



Foto 180 Punto ecológico de la obra



Foto 181 tramo finalizado del pozo4 al pozo 3



Foto 182 Area finalizada tramos



Foto 183 Area de tramos finalizados



Foto 184 Áreas de tramos finalizados



Foto 185 Punto ecológico tramo del pozo 2 al pozo 1

10 PÓLIZAS:

CONDICIONES INICIALES SEGUROS MUNDIAL				
GARANTÍAS	**No PÓLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento del contrato	11-44-10-101253742	22-04-2025	22/03/2026	$ 197.616.448,40
Pago de salarios	11-44-10-101253742	22-04-2025	22/03/2026	$ 49.404.112,10
Estabilidad y calidad de la obra	11-44-10-101253742	22-04-2025	22/09/2030	$ 197.616.448,40
Buen manejo del anticipo	11-44-10-101253742	22-04-2025	22/03/2026	$ 395.232.896,80

11 COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS ENVIADAS

TIPO DE DOCUMENTO	**OFICIO EXTERNO No 01**
PARA	Consorcio Alcantarillado San Antonio 2025
ASUNTO	Renuncia al anticipo.
PROYECTADO	**CONSORCIO SAN ANTONIO 2025** - CONTRATISTA
TIPO DE DOCUMENTO	**OFICIO EXTERNO No 02**
PARA	Consorcio Alcantarillado San Antonio 2025
ASUNTO	Pólizas consorcio san Antonio
PROYECTADO	**CONSORCIO SAN ANTONIO 2025** - CONTRATISTA
TIPO DE DOCUMENTO	**OFICIO EXTERNO No 03**
PARA	Consorcio Alcantarillado San Antonio 2025
ASUNTO	Ingreso del personal
PROYECTADO	**CONSORCIO SAN ANTONIO 2025** - CONTRATISTA
TIPO DE DOCUMENTO	**OFICIO EXTERNO No 04**

PARA	Consorcio Alcantarillado San Antonio 2025
ASUNTO	Carpeta de la propuesta
PROYECTADO	**CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 -** CONTRATISTA
TIPO DE DOCUMENTO	**OFICIO EXTERNO No 05**
PARA	Consorcio Alcantarillado San Antonio 2025
ASUNTO	Control seguridad social y parafiscales obra mes agosto
PROYECTADO	**CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 -** CONTRATISTA
TIPO DE DOCUMENTO	**OFICIO EXTERNO No 06**
PARA	Consorcio Alcantarillado San Antonio 2025
ASUNTO	Inconformidad por retraso de entrega de la tubería
PROYECTADO	**CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 -** CONTRATISTA
TIPO DE DOCUMENTO	**OFICIO EXTERNO No 07**
PARA	Consorcio Alcantarillado San Antonio 2025
ASUNTO	Aclaración y desistimiento de reclamación por entrega de la tubería
PROYECTADO	**CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 -** CONTRATISTA
TIPO DE DOCUMENTO	**OFICIO EXTERNO No 08**
PARA	Consorcio Alcantarillado San Antonio 2025
ASUNTO	Programa de inducción SST y otros
PROYECTADO	**CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 - CONTRATISTA**
TIPO DE DOCUMENTO	**OFICIO EXTERNO No 09**
PARA	**Consorcio Alcantarillado San Antonio 2025**
ASUNTO	Entrega de balance de cantidades de acta de mayores y menores

PROYECTADO	CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 - CONTRATISTA

12 PARAFISCALES

Yo Oscar Eduardo Calderon Rosas, identificado con cédula de ciudadania No. 16.187.260 de Florencia – Caquetá, en mi calidad de Contador Público de **CONSORCIO SAN ANTONIO 2025,** con **NIT No.** 901.935.706, bajo la gravedad del juramento manifiesto que **CONSORCIO SAN ANTONIO 2025**. ha cumplido durante la ejecucion del contrato a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud **-EPS-**
, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales **-ARP-**, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar **-ICBF-** y el Servicio Nacional de Aprendizaje **-SENA-**, para lo cual se adjuntan las planillas correspondientes.


Carlos E Calderon R.


OSCAR EDUARDO CALDERON ROSAS
CONTADOR PÚBLICO
C.C. 16.187.260 DE FLORENCIA
T.P. No 165913-T
CONSORCIO SAN ANTONIO 2025


ALDA MARTIZA DUSSAN ACOSTA
C.C. No. 40.761.657 DE FLORENCIA
R/L. CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
CONTRATISTA


ANEXO 19 – REGISTRO FOTOGRAFICO


REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME N.2

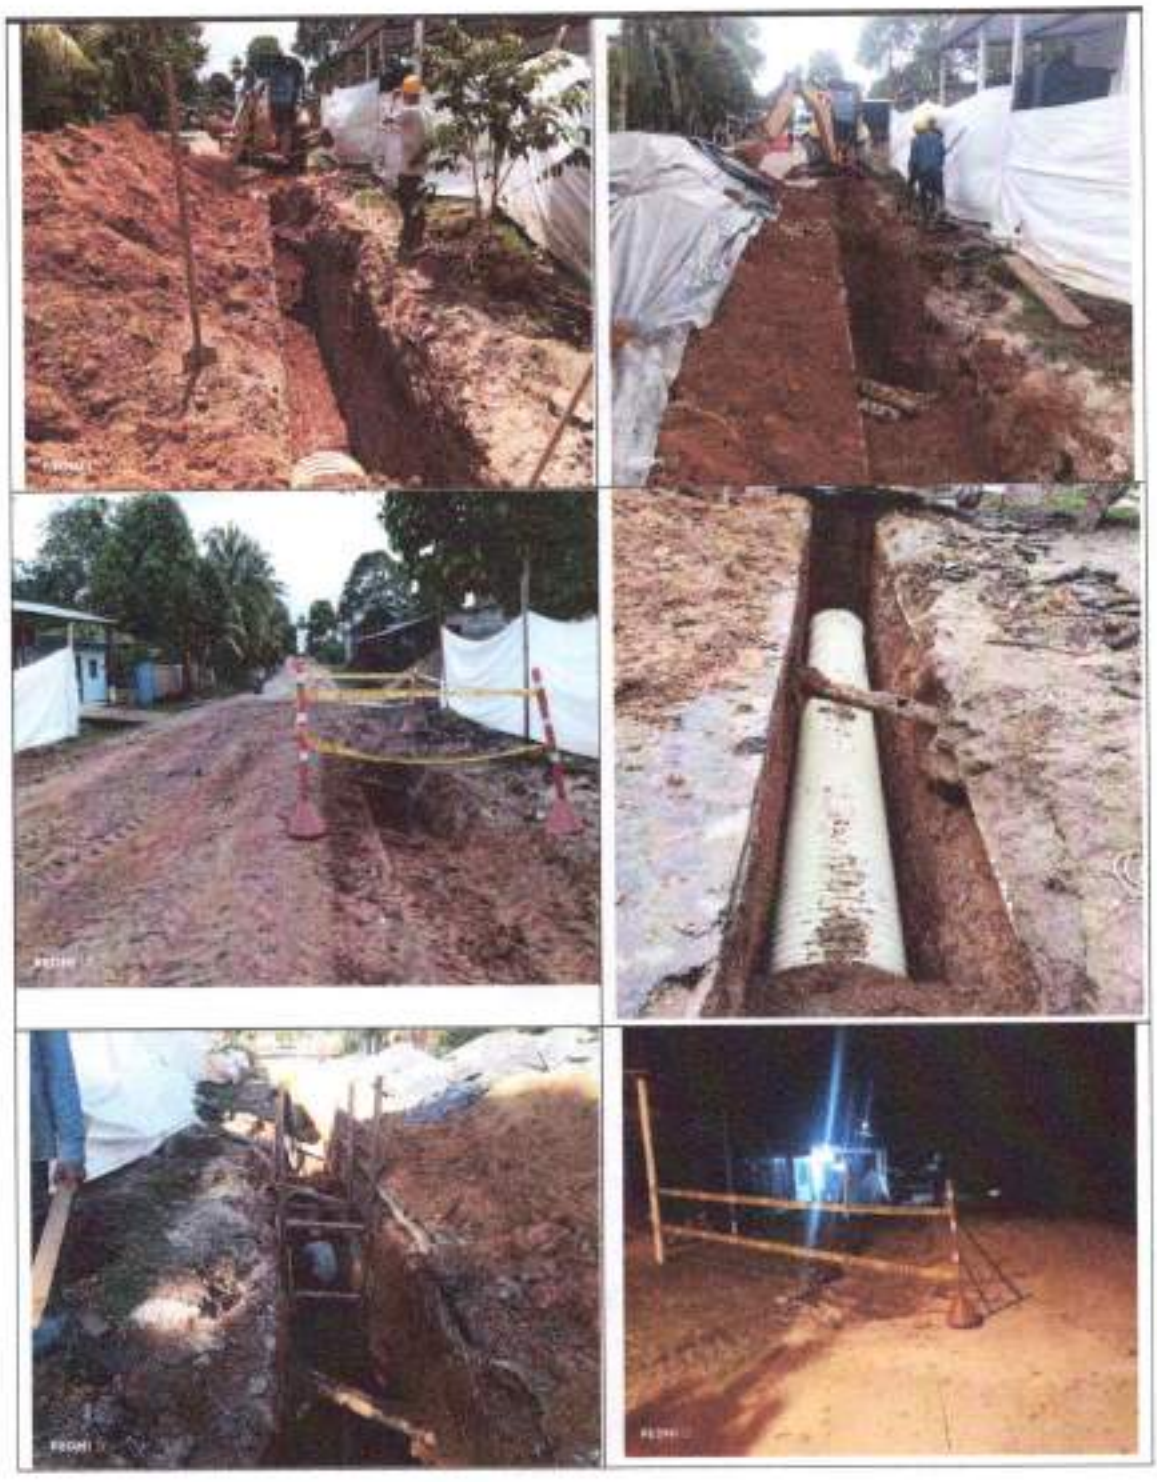

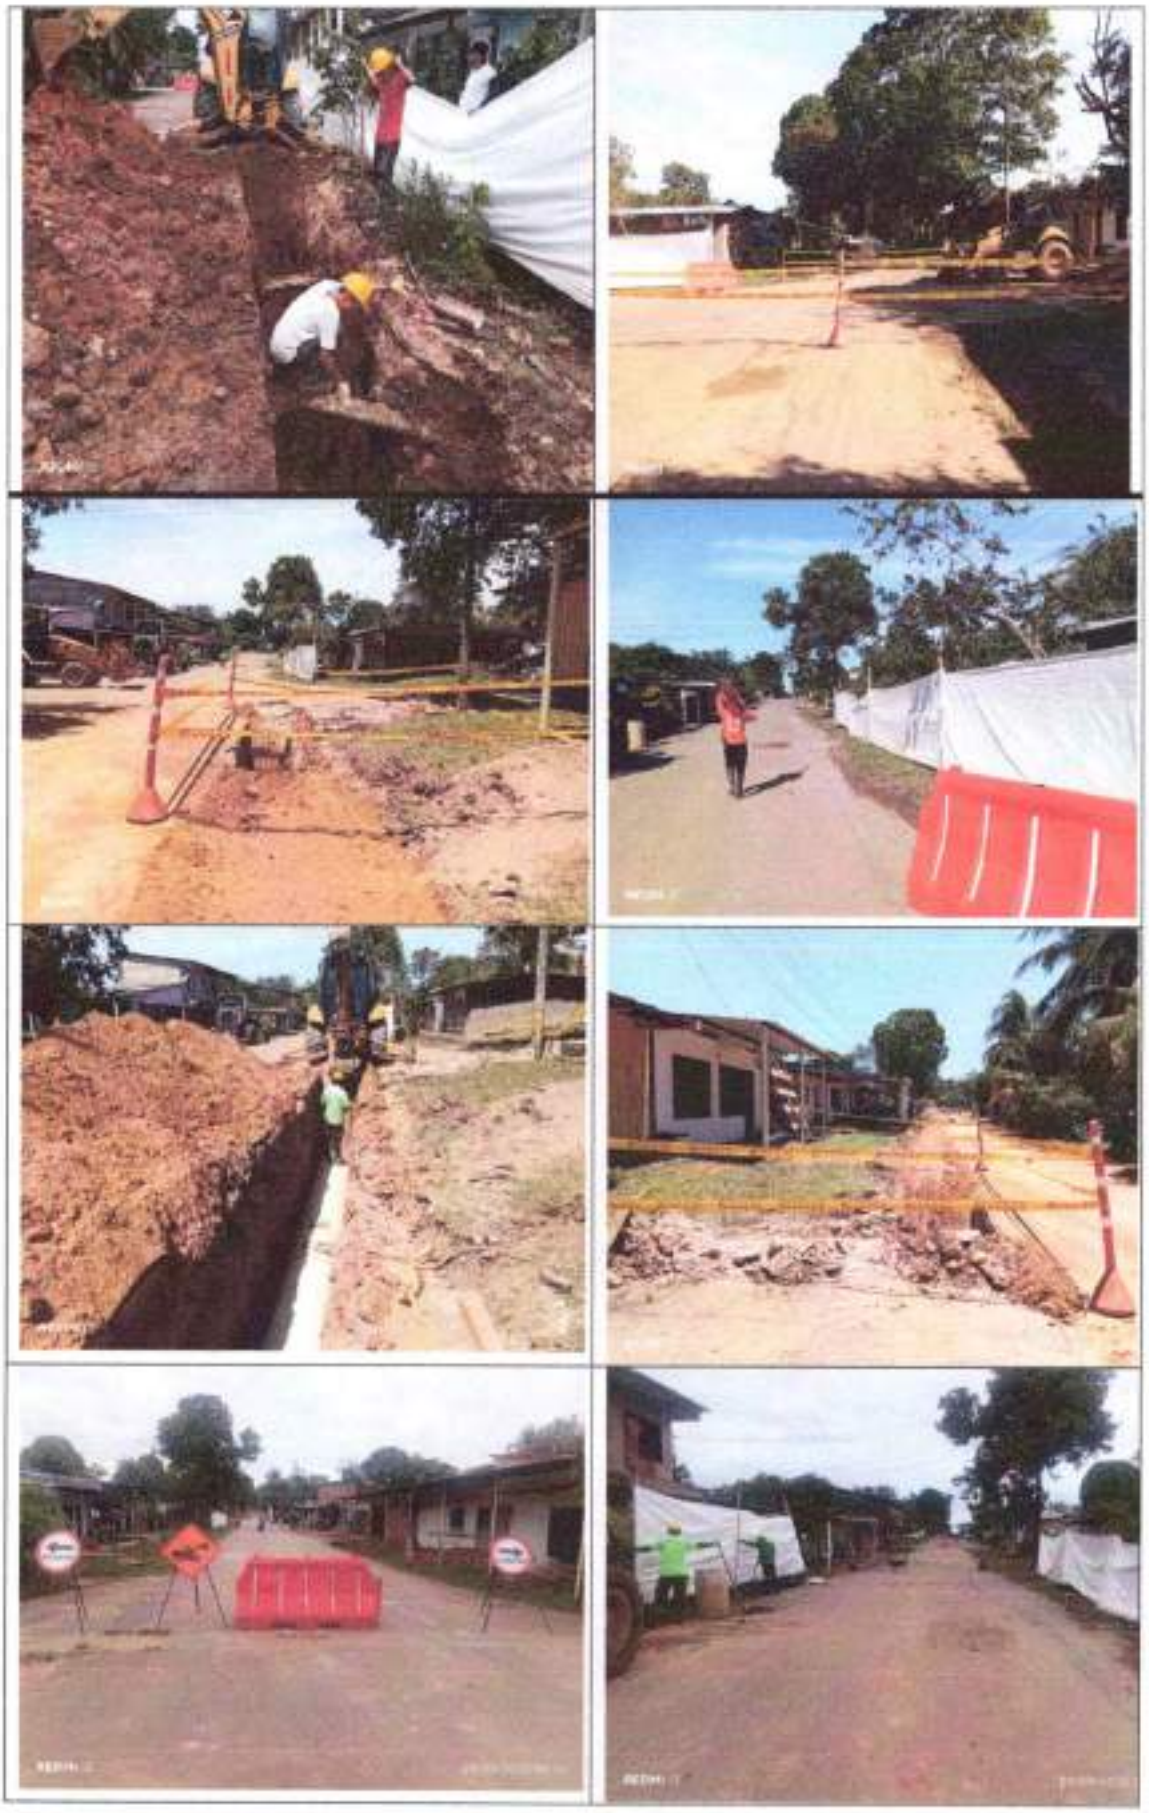


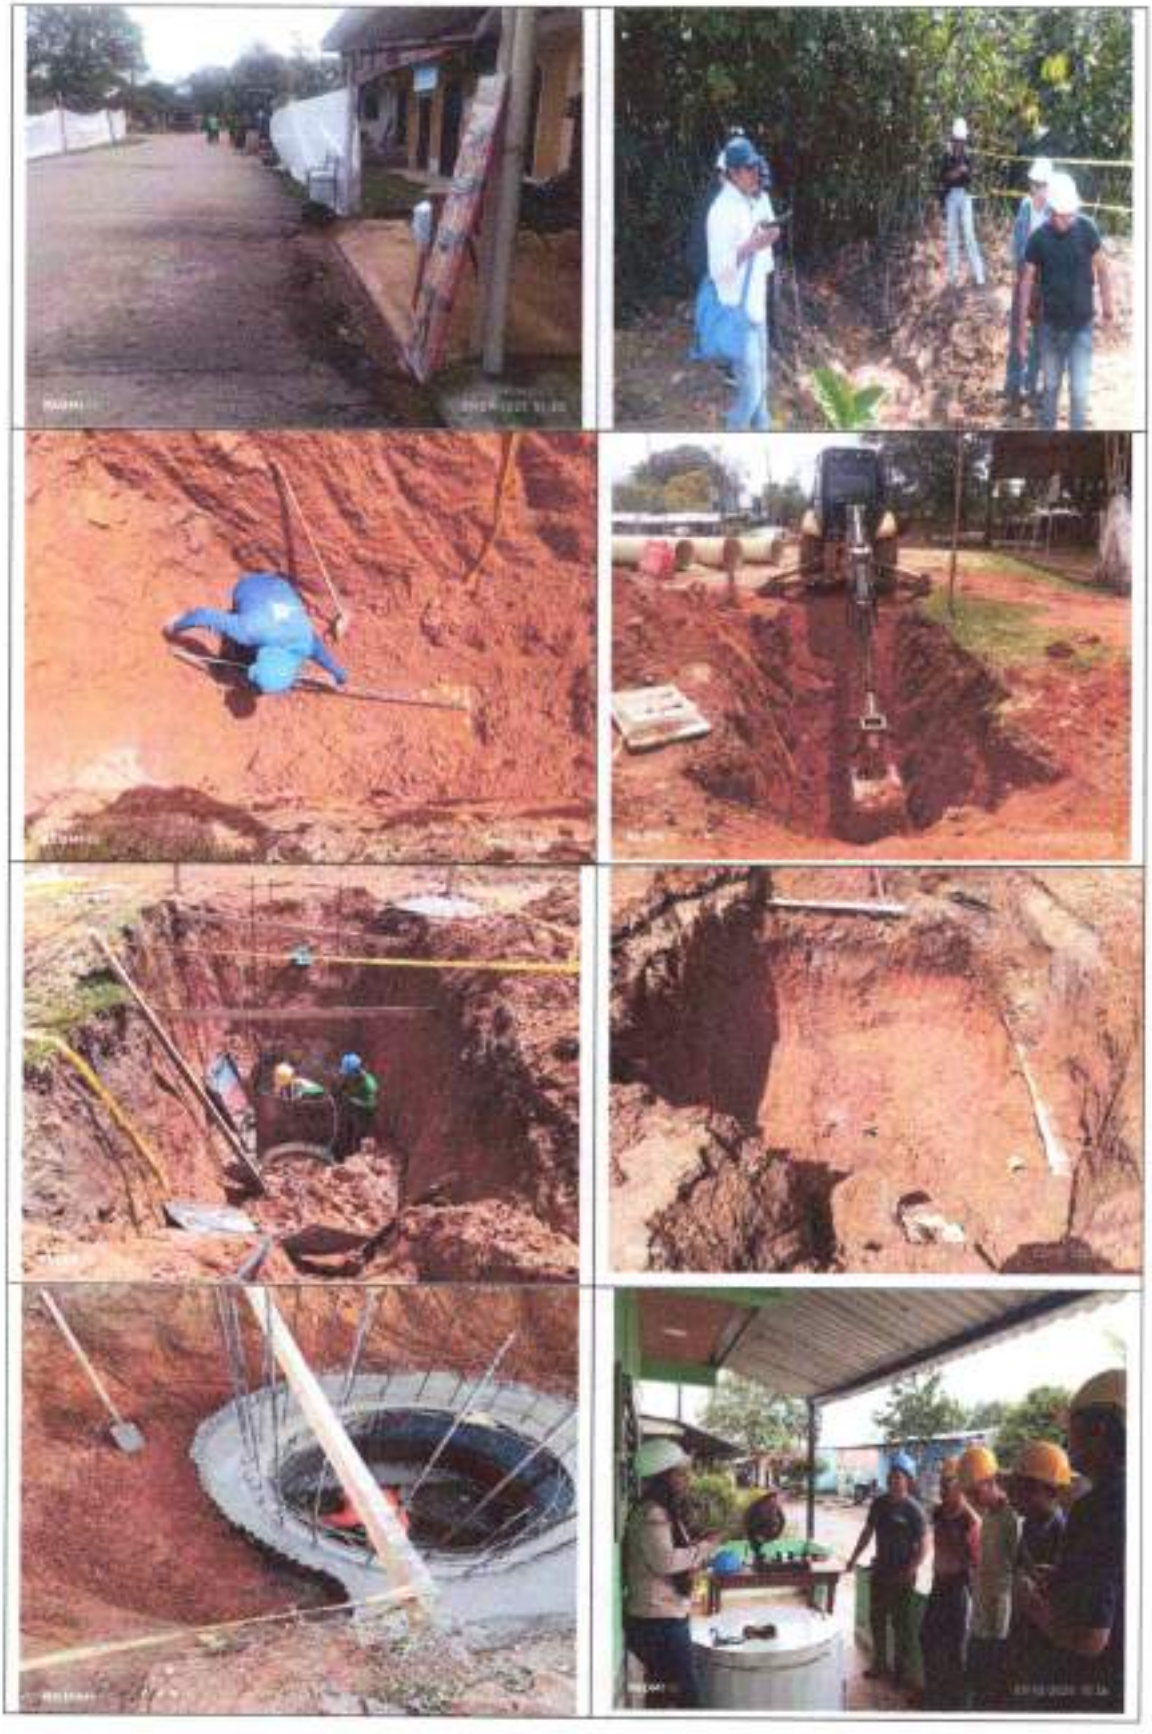

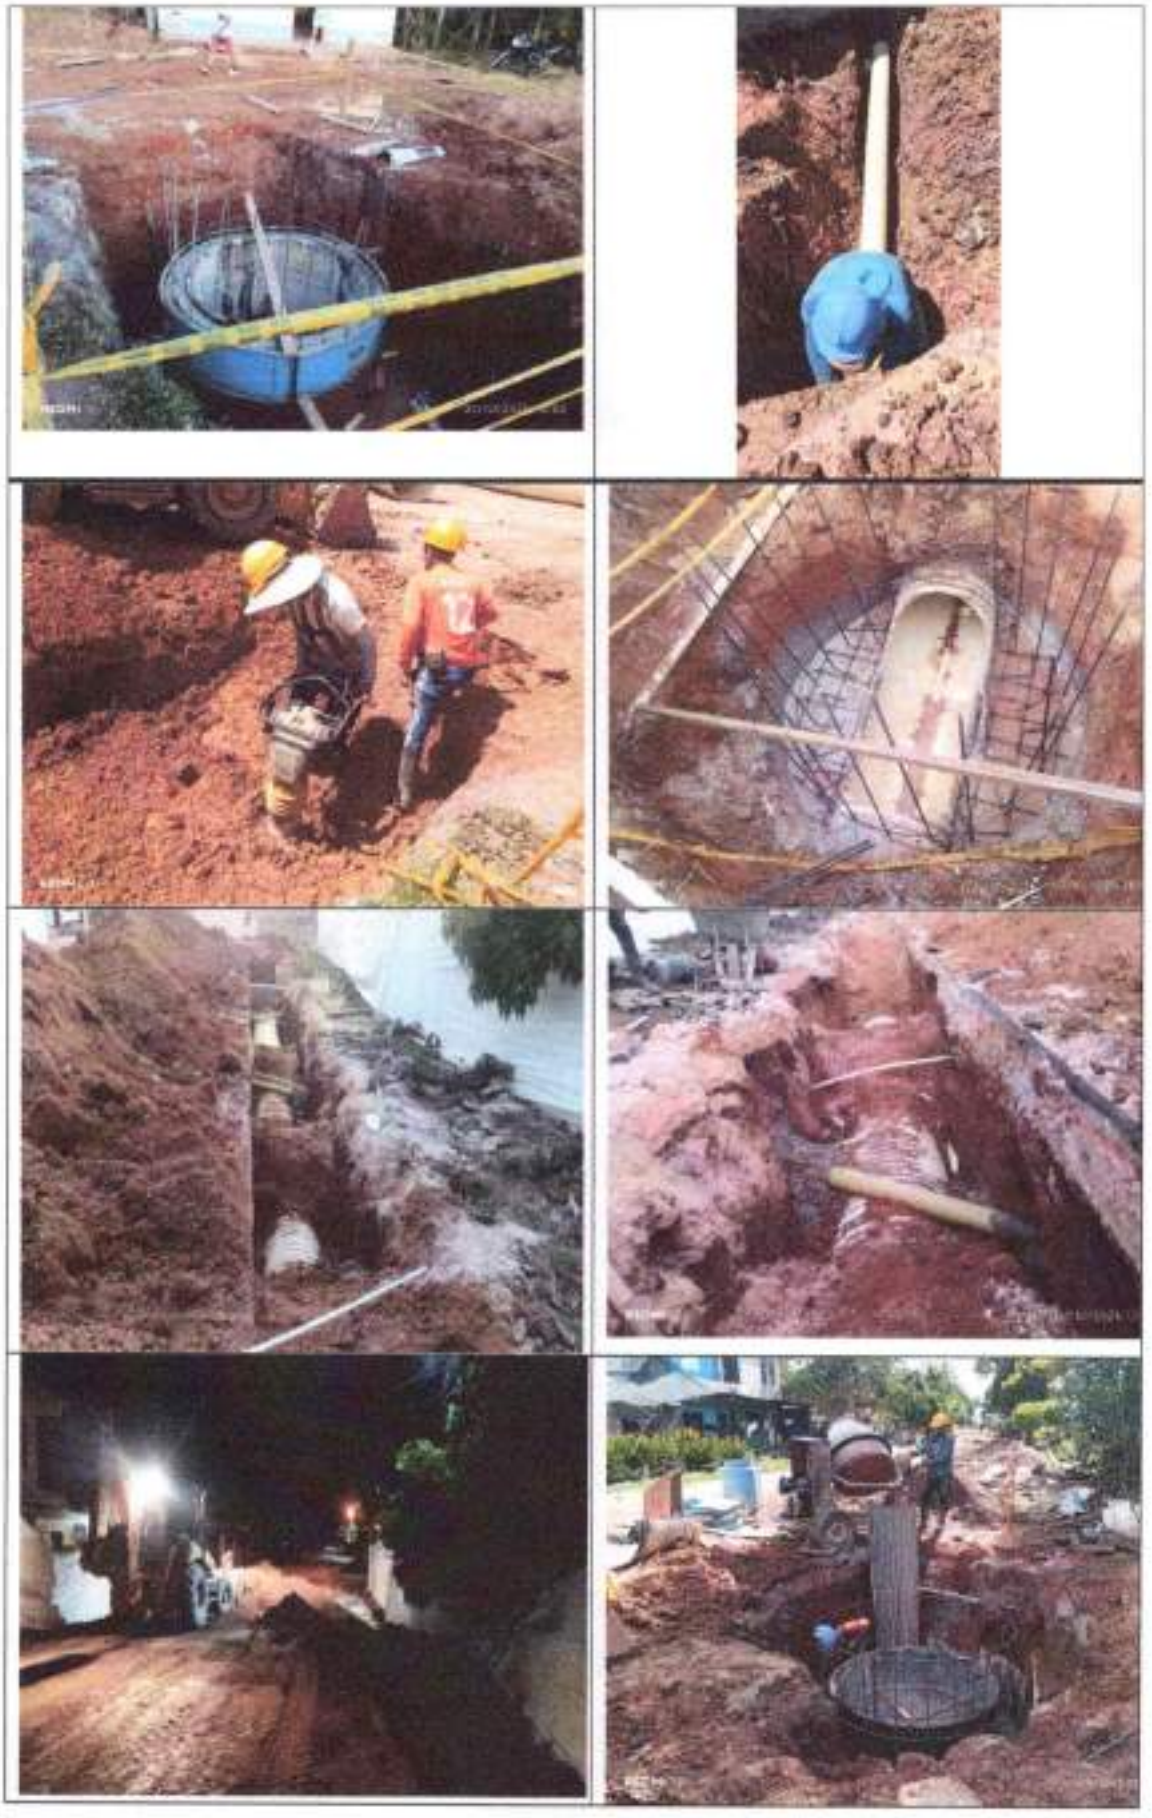

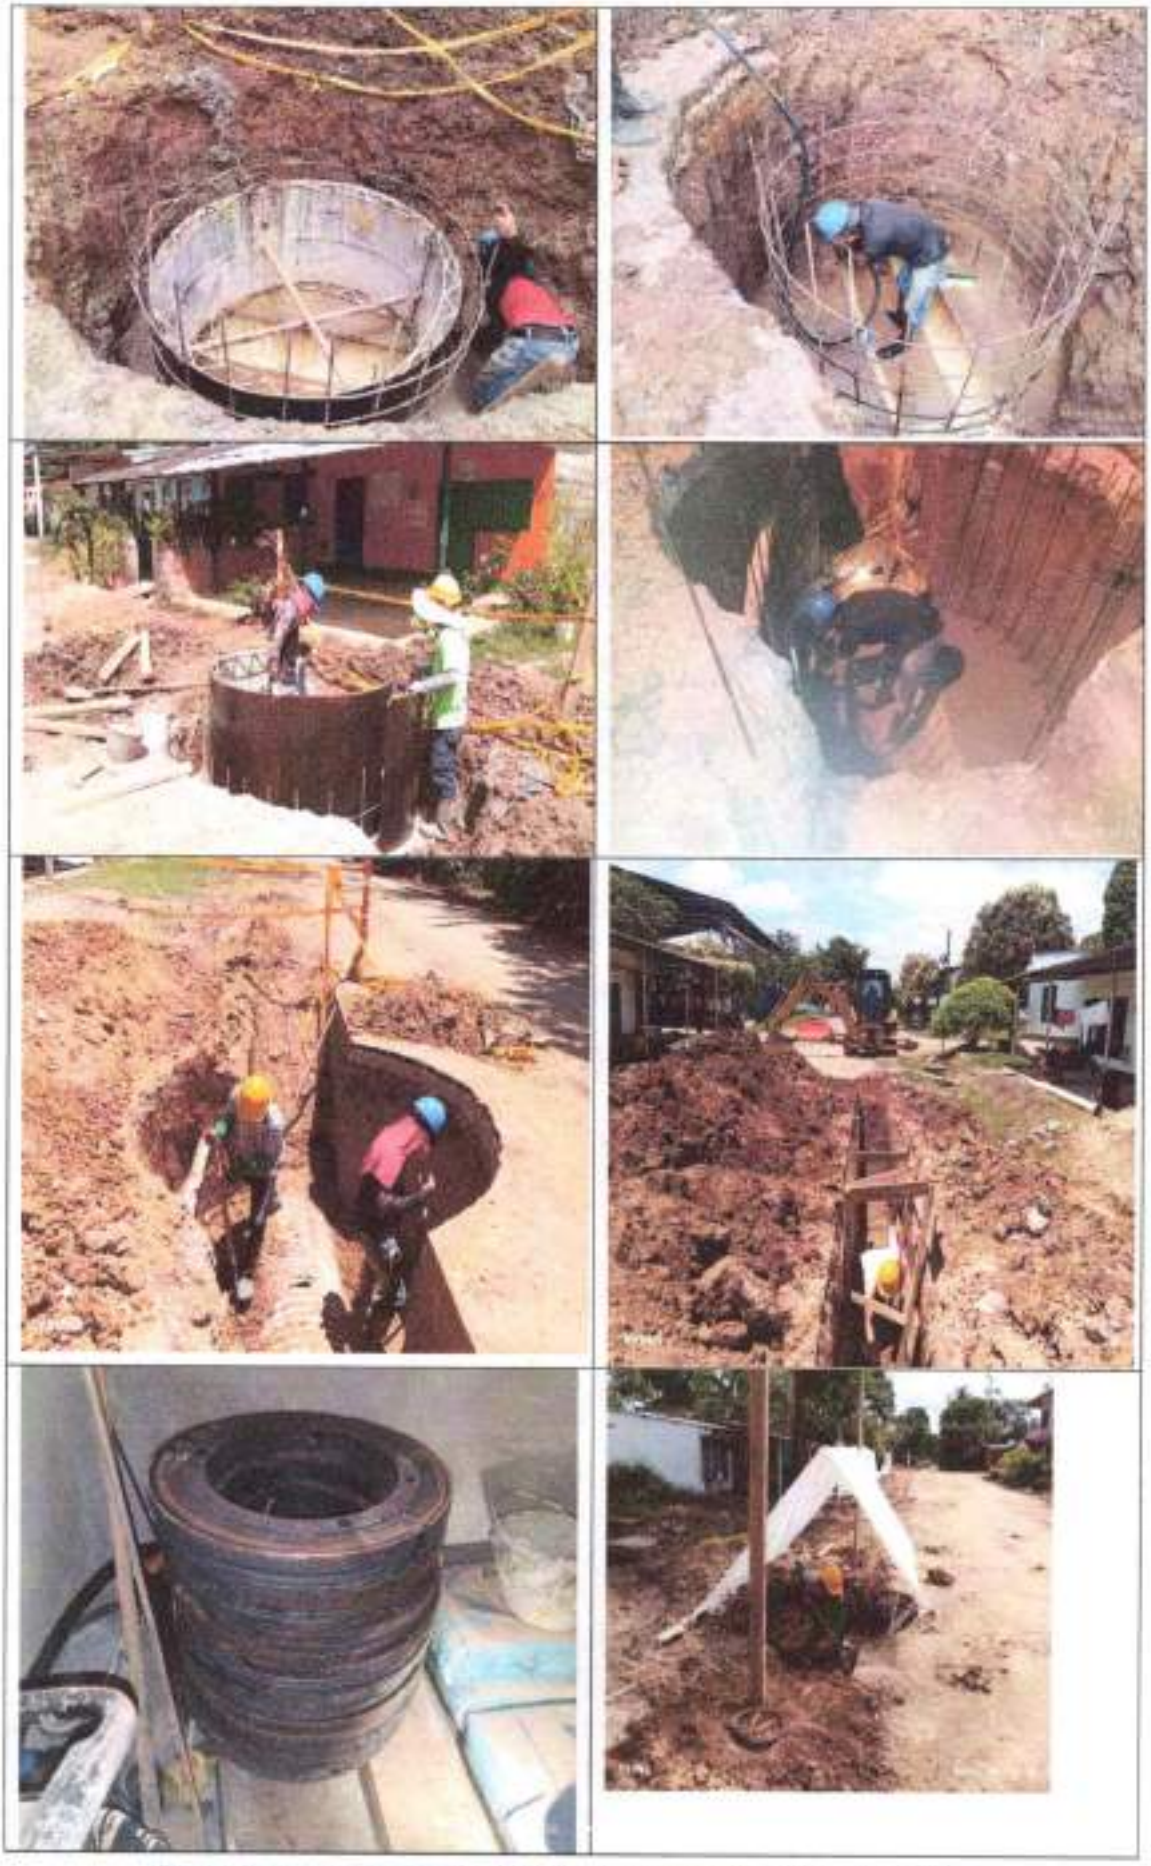



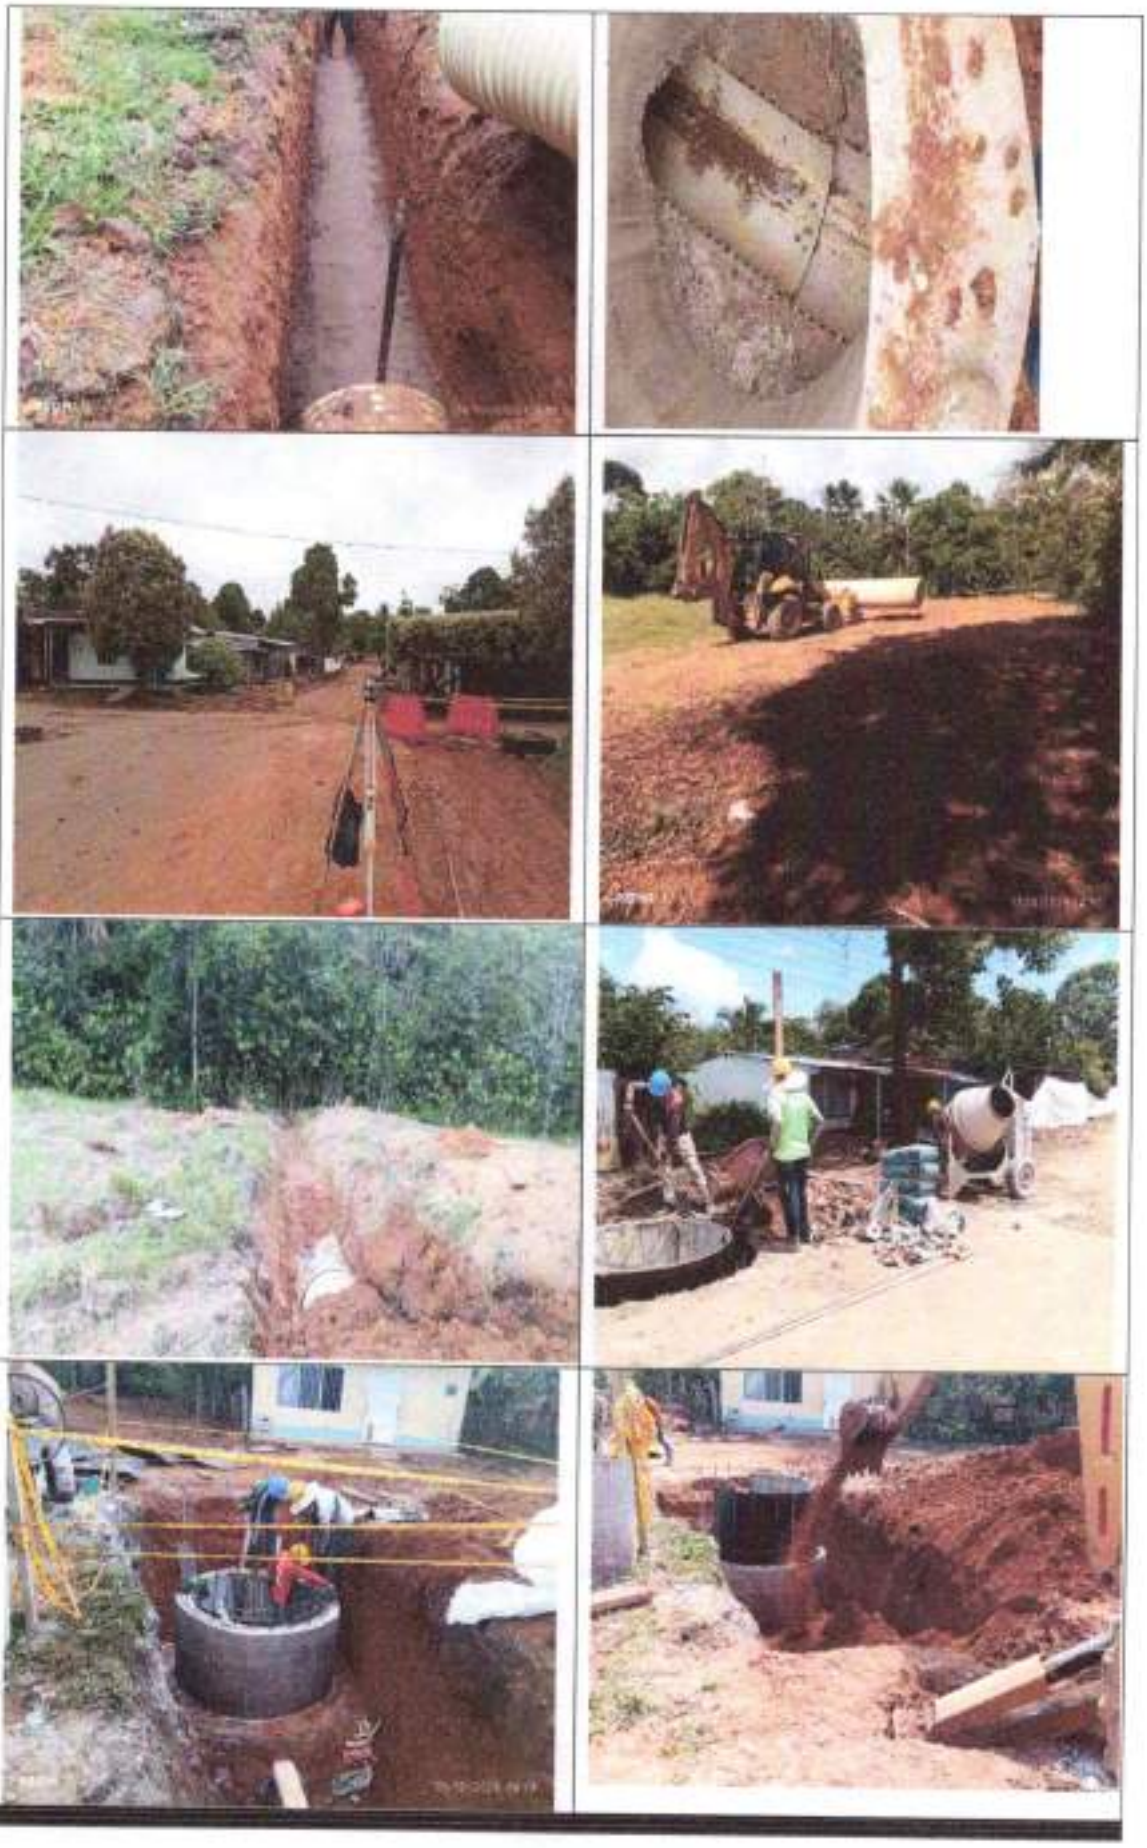

ANEXO 21 – COPIA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA AMBIENTAL N.º 2

ANEXO 20 – COPIA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA AMBIENTAL N.º 2

INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA AMBIENTAL N.º 2



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000620 DE 2025

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

CONTRATO DE OBRA N. COP-2025-002 (22 DE ABRIL DEL 2025)

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

OBJETO: "ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, UNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ."

PERIODO DE EJECUCION

22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - 21 DE OCTUBRE DE 2025

Contenido

INTRODUCCION 3

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 4

1. DESCRIPCION GENERAL 4
2. LOCALIZACION 4
3. ALCANCE 5
4. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA 6
5. COMPONENTES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA 7

FICHAS AMBIENTALES DEL PROYECTO 7

Manejo De Instalaciones Temporales 7

MANEJO DEL RECURSO SUELO 7

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS Y SOBRANTES DE OBRA 8

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 9

Evaluación del cumplimiento ambiental 10

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 12

INTRODUCCION

El departamental del Caquetá se proyecta como un territorio armónico y equilibrado, conformado por un espacio urbano y otro rural, integrados funcionalmente en lo económico, social y cultural. Tal integración se logra gracias a la consolidación de un sistema de ordenamiento que brinde las condiciones necesarias para mantener estructural y funcionalmente la diversidad ecológica, social y cultural que caracteriza el territorio distrital. De tal manera, este sistema de ordenamiento se refleja en varios de los sistemas consagrados en el esquemas y ordenamiento territoriales como son el Sistema de saneamiento ambiental a construir.

En cumplimiento de los principios ambientales y los requerimientos de seguridad y salud ocupacional consagrados en las normas vigentes, así como los Objetivos Ambientales,

fijados en los planes de manejo Ambiental del departamento, y teniendo en cuenta las exigencias del sistema general de riesgos profesionales, resulta fundamental e indispensable

para el Plan Departamental de aguas incorporar la variable SISOMA (Seguridad Integral, Salud Ocupacional y Medio Ambiente) en el desarrollo de sus funciones, de tal forma que se garantice la prevención, mitigación, compensación y control de los impactos ambientales y de los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores generados durante la ejecución y mantenimiento de sus obras.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

1. DESCRIPCION GENERAL

Con el siguiente proyecto se proyecta construir sistema de alcantarillado pluvial que tendrá los siguientes componentes

La estructura del proyecto del proyecto es construir un alcantarillado pluvial en la inspección de San Antonio de Getucha

- PRELIMINARES
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
- POZOS DE INSPECCION
- CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROSY CABEZA DE SALIDA
- ASEO GENERAL

2. LOCALIZACION


El lugar de ejecución del contrato de obra se ubica en la inspección de San Antonio de Getucha, Caquetá, en las coordenadas de ubicación 1°06´33.55¨ N – Longitud -75°24´03.96¨ O, con una altura 283, sobre la vía central de la inspección.



Ilustración 1- GOOGLEAERTH.COM

3. ALCANCE

El proyecto tiene como alcance la construcción de una línea de alcantarillado pluvial de 415.77 ml, con 9 pozos de inspección, con un cabezal de descarga y 11 sumideros.

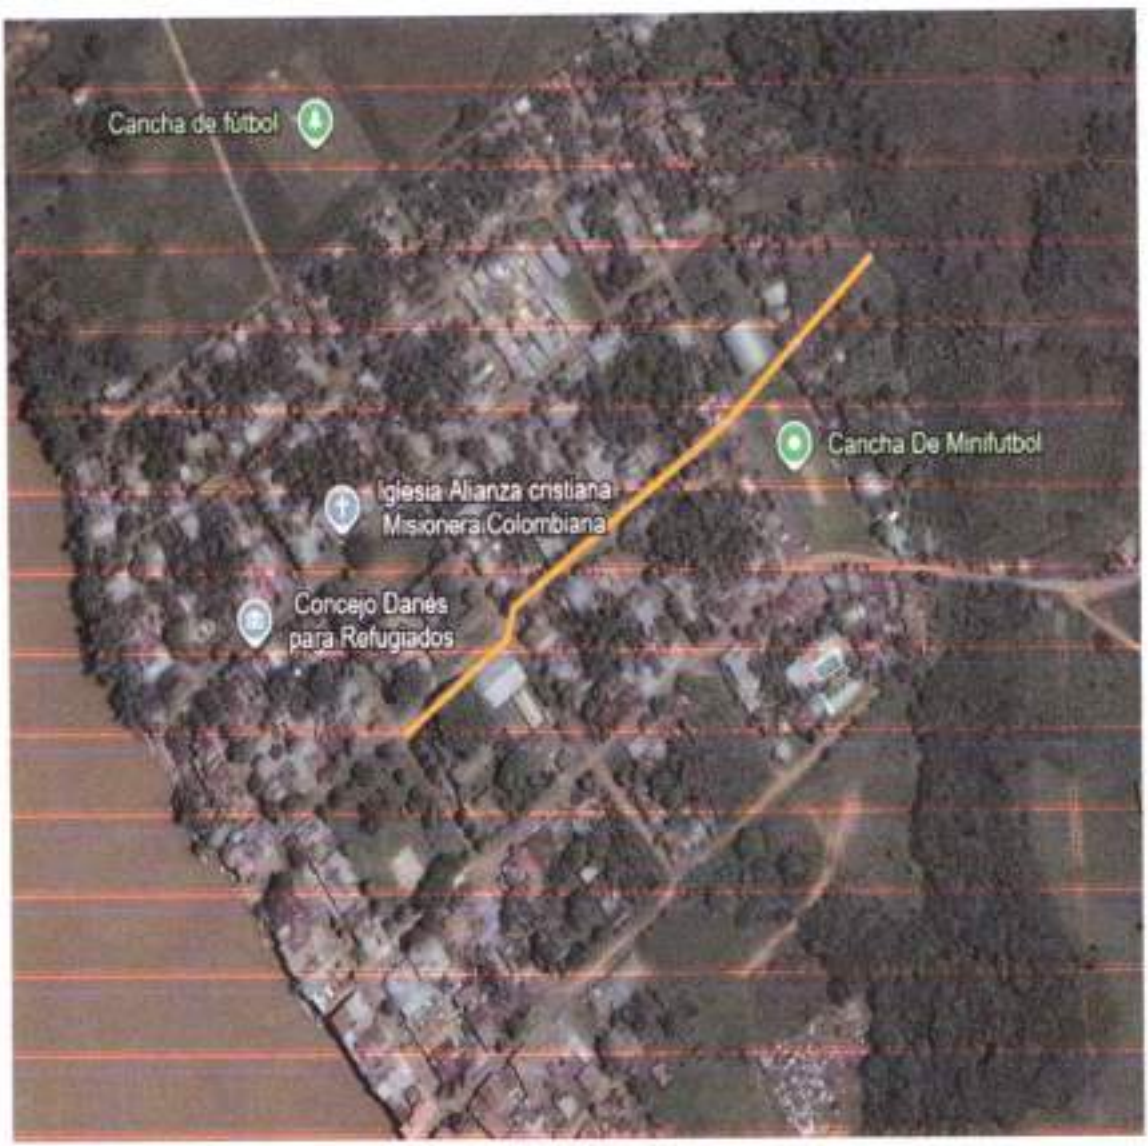

4. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACIÓN BÁSICA

Unidad Ejecutora:	MUNICIPIO DE MILAN CAQUETA
Número del contrato:	**CONTRATO DE OBRA N.** COP- 2025-002
Objeto:	ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, UNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
Nombre del contratista:	CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
Fecha del contrato:	22 DE ABRIL DEL 2025
Plazo de Ejecución Inicial:	5 MESES
Valor Inicial:	OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES CHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($860.836.959) M/CTE
Valor Anticipado:	NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($988.082.242,00) M/CTE, equivalentes a 694,7 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2025
Fecha de iniciación:	22 DE AGOSTO DE 2025
Fecha de Terminación Contractual Inicial:	21 DE ENERO DE 2025

5. COMPONENTES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

FICHAS AMBIENTALES DEL PROYECTO

N.	*Ficha Ambiental*	*Nombre del programa/ ficha ambiental*
1	FICHA N. 1	AFECTACION DEL PROYECTO SOBRE EL AREA DE INFLUENCIA
2	FICHA N. 2	MANEJO DE CAMPAMENTOS INSTALACIONES Y TEMPORALES
3	FICHA N. 3	MANEJO DEL RECURSO SUELO
4	FICHA N. 4	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS Y SOBRANTES DE OBRA
5	FICHA N. 5	MANEJO COMPONENTE ATMOSFERICO
6	FICHA N. 6	*MANEJO DE FLORA Y FAUNA*
7	FICHA N. 7	*PROGRAMA COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA*

Manejo De Instalaciones Temporales

MANEJO DE CAMPAMENTOS INSTALACIONES Y TEMPORALES

MANEJO DEL RECURSO SUELO

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES COMPONENTE AMBIENTAL

Ficha de Manejo Ambiental N° 3	**Componente:** MANEJO DEL RECURSO SUELO
ACTIVIDADES	• Diseño de medidas de manejo ambiental encaminadas hacia la protección del suelo • • Evitar perdida de suelo

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CUMPLIMIENTO SI/NO	SI
CONCEPTO POR PARTE INTERVENTORÍA	El contratista de obra cumple con la implementación de las medidas establecidas en el plan de manejo ambientes
PORCENTAJE DE CALIFICACION OBTENIDA	84%

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS Y SOBRANTES DE OBRA

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES COMPONENTE AMBIENTAL

Ficha de Manejo Ambiental N° 4	**Componente:** MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS Y SOBRANTES DE OBRA

ACTIVIDADES	• Destinar área especifica para la disposición de residuos sólidos generados durante la ejecución de la obra. • Realizar una buena disposición de residuos sólidos y/o líquidos. **REGISTRO FOTOGRÁFICO** 
CUMPLIMIENTO SI/NO	SI
CONCEPTO POR PARTE INTERVENTORÍA	El contratista de obra cumple con la implementación de las medidas establecidas en el plan de manejo ambientes
PORCENTAJE DE CALIFICACION OBTENIDA	91%

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES COMPONENTE AMBIENTAL	
Ficha de Manejo Ambiental N° 6	**Componente:** Manejo de flora y fauna

ACTIVIDADES	• Evitar capturas, caza, molestar y transportar o comercializar especies de fauna silvestre, no se evidencia actividad en alguna de estas • El personal es capacitado frente a los diferentes temas ambientales • No se evidencia la utilización madera de proveniente de arboles o especies de la zona • No se evidencia la introducción de especies exóticas en la zona por parte de los trabajadores de la obra

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CUMPLIMIENTO SI/NO	SI
CONCEPTO POR PARTE INTERVENTORÍA	El contratista de obra cumple con la implementación de las medidas establecidas en el plan de manejo ambientes
PORCENTAJE DE CALIFICACION OBTENIDA	95%

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES COMPONENTE AMBIENTAL

Ficha de Manejo Ambiental N° 7	**Componente:** Programa comunicación y participación ciudadana

ACTIVIDADES	• Se realizaron una serie de socializaciones, la inicial antes de firmar acta de inicio y la socialización casa a casa. • Se mantiene el buzón de PQR, en el frente de obra. **REGISTRO FOTOGRÁFICO** 
CUMPLIMIENTO SI/NO	SI
CONCEPTO POR PARTE INTERVENTORÍA	El contratista de obra cumple con la implementación de las medidas establecidas en el plan de manejo ambientes
PORCENTAJE DE CALIFICACION OBTENIDA	91%

Evaluación del cumplimiento ambiental

N.	Ficha Ambiental	Nombre del programa/ ficha ambiental	% de cumplimiento

1	FICHA N. 1	AFECTACION DEL PROYECTO SOBRE EL AREA DE INFLUENCIA	
2	FICHA N. 2	MANEJO DE CAMPAMENTOS INSTALACIONES Y TEMPORALES	
3	FICHA N. 3	MANEJO DEL RECURSO SUELO	84%
4	FICHA N. 4	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS Y SOBRANTES DE OBRA	91%
5	FICHA N. 5	MANEJO COMPONENTE ATMOSFERICO	92%
6	FICHA N. 6	MANEJO DE FLORA Y FAUNA	95%
7	FICHA N. 7	PROGRAMA COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	91%



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

- El contratista de obra alcanzo una calificación en su gestión ambiental de 91%, existen actividades para corregir, pero en términos generales la intervención de las obras realizadas en el relleno sanitario ha mejorado las condiciones ambientales del entorno.

- La interventoría recomienda al contratista realice de ejecución de la totalidad de los programas durante la ejecución de la obra, esto se debe realizar a partir del segundo mes de ejecución.

DAIRA LUCIA VALENZUELA PASTRANA
Asesor Ambiental

ANEXO 20 –INFORME SOCIAL DE OBRA N.º 2

INFORME SOCIAL No. 02

CONTRATO N° COP-2025-002

"ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"

CONTRATISTA
CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

Milán, Caquetá, 21 de octubre de 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 4
2. JUSTIFICACION 5
3. ALCANCE 6
4. OBJETIVO GENERAL 6
4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6
5. DIAGNOSTICO DE ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL CONTRATO 7
5.1 Localización del contrato 7
5.2 ÁREA DE INFLUENCIA 8
5.3 Población 8
5.4 Altitud y relieve 8
5.5 Suelo 8
5.6 Vías de comunicación 8
5.7 Hidrografía 8
5.8 Ubicación directa de proyecto 9
5.8 Ruido Ambiental 10
6. LINEA BASE DE DATOS 11
7. CENSOS DE INMUEBLES 11
7.1 MAPA DE ACTORES 11
8. RECORRIDO RUTA SALUDABLE INICIAL 12
8.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO 13
8.2 CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE OBRAS 14
8.3 CONFORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS 15
9. ARTICULACIÓN CON LOS OPERADORES 16
9.1 REUNIONES CON LA COMUNIDAD 16
10. INTERFERENCIAS PRESENTADAS DURANTE LA OBRA 17
10.1 ACCESIBILIDAD A VIVIENDAS Y ESTABLECIMIENTOS 17
10.2 DAÑOS A EDIFICACIONES, MOBILIARIOS Y ZONAS VERDES 17
10.3 SUSPENSIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS 18
10.4 TRABAJOS NOCTURNOS 18
11. DISEÑOS DE INDICADORES DE GESTIÓN 18
12. ACTIVIDADES PARA REALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (FICHA TÉCNICA) 19
13. RECORRIDO POR LOS FRENTES DE OBRA 20
14. RUTA SALUDABLE 21
15. PUNTOS DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 22
16. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO DE LAS VEEDURIAS CIUDADANAS Y LAS RENDICIONES DE CUENTAS 23
17. PRESENTACION DE INFORMES 23
18. VALLA INFORMATIVA 23

19. CONTRATACIÓN DE LA MANO DE OBRA 23
20. PROFESIONAL SOCIAL 24
21. PAGO SSGG PROFESIONAL SOCIAL 24
22. ANEXOS 25

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Resultados del monitoreo de ruido. 10
Tabla 2. Información línea base de datos 11
Tabla 3. Mapa de actores municipio Milán 11
Tabla 4. Comités de obra 14
Tabla 5. Identificación de veedores de la obra según Resolución No. 011 del 30 de Julio del 2025. 15
Tabla 6. Relación reuniones con la comunidad 17
Tabla 7. Indicadores de gestión 18
Tabla 8. Actividades para realizar (ficha técnica) 19
Tabla 9. Relación mano de obra calificada y no calificada 24

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ubicación de San Antonio de Getucha en Colombia. 7
Ilustración 2. Ubicación del lugar donde se desarrollará el contrato en el mapa 7
Ilustración 3. Ubicación directa de proyecto 9
lustración 4. Grafica resultado del monitoreo de ruido 10
Ilustración 5. Socialización contexto de contratos 13
Ilustración 6. Socialización contexto de contratos. 13
Ilustración 7. Visitas a la comunidad. 14
Ilustración 8. Reunión de socialización del CONTRATO No. COP – 2025 - 002 15
Ilustración 9. Articulacion operarios 16
Ilustración 10. Reuniones con la comunidad 17
Ilustración 11. Recorrido frentes de obra. 21
Ilustración 12. Ruta saludable 22
Ilustración 13. Buzon de sugerencias. 22
Ilustración 14. Valla informativa del contrato 23

1. INTRODUCCION

En el marco del contrato de Obra Civil N° COP-2025-002, cuyo objeto es la "**ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA**". Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en contrato en mención, se reconoce el tramo a intervenir como necesidad de realizar la adecuación y canalización de aguas lluvias para mejorar las condiciones de vida de la comunidad.

Teniendo en cuenta el objetivo general del contrato, el cual es mejorar la distribución de los servicios públicos de alcantarillado, se cumple con el plan de acción en el área social. En el presente informe se evidencia la interrelación entre la Empresa CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 y la comunidad, se cumple con socialización y visitas domiciliaria a cada una de las viviendas identificadas dentro del objeto de contrato, mediante un contexto de creación participativa, de acuerdo a las actividades, materiales y el tiempo que se estimara para la ejecución de la obra, facilitando una apropiación comunitaria, ya que se le proporcionó información clara y detallada a los participantes, esto con el fin de minimizar los impactos negativos generados durante la obra y en consecuencia se fortaleció los indicadores positivos, como es la mejora de las condiciones de desplazamiento, circulación vehicular y peatonal de la comunidad que reside y transita por el sector a intervenir.

2. JUSTIFICACION

El plan de acompañamiento social del contrato **"ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"**. Requiere la intervención del profesional social quien hace de mediador entre la comunidad beneficiada y el ejecutor CONSORCIO SAN ANTONIO 2025, fundamentada en la necesidad imperante de comprender y abordar las actividades de carácter social en cuanto al desarrollo de la obra, propendiendo por el buen desarrollo y comunicación entre las partes. La justificación para la realización de este informe se fundamenta en los siguientes puntos:

1. **Relevancia y Pertinencia del Tema**: El informe social, es de vital importancia en el contexto actual, ya que ayuda a comprender y escuchar de una forma amplia a la población que se ven inmersos de una manera directa e indirecta en el desarrollo de la obra.
2. **Impacto en la Comunidad o Grupo Afectado**: La adecuación y canalización de aguas lluvias afecta de una manera temporal a los propietarios/arrendatarios de las viviendas que colindan con el mismo, es por ello, que es crucial comprender las dinámicas sociales y los desafíos específicos que enfrentan, a fin de diseñar intervenciones y poder brindar una atención efectiva.
3. **Necesidad de Datos y Análisis Fundamentados**: La elaboración de este informe se justifica por la necesidad de contar con datos concretos y análisis que respalden la toma de decisiones informadas. Esto permitirá identificar tendencias, patrones y desafíos que de otro modo podrían pasar desapercibidos.
4. **Promoción del Bienestar y la Equidad Social**: Abordar los temas especificados para el informe social, contribuirá directamente a la promoción del bienestar y la equidad social. Al comprender y atender las necesidades de manera adecuada, se busca mejorar la calidad de vida, condiciones de desplazamiento y las oportunidades para todos los involucrados.
5. **Cumplimiento de Responsabilidades y Obligaciones**: La realización de este informe se alinea con las responsabilidades y obligaciones de CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 en el ámbito social. Esto demuestra un compromiso tangible con el mejoramiento de las condiciones sociales en la comunidad que se encuentra alrededor del contrato.
6. **Influencia en la Toma de Decisiones**: La información proporcionada será esencial para la toma de decisiones informadas y efectivas a los requerimientos de las comunidades asociadas con el desarrollo de la obra; identificando sus necesidades reales en torno al mismo y generando alternativas de solución.

En resumen, la realización de este informe social es esencial para abordar temas relacionados con el mismo, de manera integral y efectiva. La información recopilada y los análisis realizados contribuirán significativamente a la promoción del bienestar y la equidad social con la comunidad del tramo identificado y a la vez con la comunidad general del casco urbano de la Inspección de San Antonio De Getucha, en el municipio de Milán, departamento del Caquetá.

El presente informe se presenta como una herramienta valiosa para la toma de decisiones informadas y la implementación de acciones que generen un impacto positivo y sostenible en el ámbito social. Por ello se hace necesaria la intervención a cada vivienda que se encuentran en circunferencia de la zona de influencia, para prever posibles daños o situaciones que pueda ocasionar el personal, el equipo o maquinaria que se utilizará en la adecuación y canalización de aguas lluvias. Se obtiene información por parte de sus propietarios/arrendatarios de las cuarenta y un (41) viviendas ubicadas en la calle 4, entre carrera 2 a la carrera 6, del casco urbano de la Inspección de San Antonio De Getucha, en el municipio de Milán, departamento del Caquetá.

3. ALCANCE

Con el siguiente proyecto se planea realizar una adecuación y canalización de aguas lluvias que se realizaran de la siguiente manera:

- Preliminares (Localización y replanteo de redes – Cerramiento provisional – excavación manual y mecánica entre otras)
- Suministro e instalación de tubería
- Pozos de inspección
- Construcción de sumideros y cabeza de salida
- Aseo general

4. OBJETIVO GENERAL

Proporcionar información clara, concisa y veraz a la población del área de influencia y comunidad en general, acerca de las actividades técnicas, operativas y demás actividades implícitas dentro del plan de acompañamiento social en obra que tiene por objeto: **"ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"** mediante mecanismos de comunicación directa, facilitando el proceso de ejecución del contrato.

4.1 Objetivos especificos

- Recolectar información en formatos de vecindad a las viviendas que se encuentran en circunferencia de la zona de influencia del contrato, con el fin de prever posibles daños que pueda ocasionar con el personal, el equipo o maquinaria que se utilizará en la reposición de las redes de alcantarillado.
- Generar espacios de interlocución y participación con las comunidades, dirigiendo los medios que permitan el acceso a la información, sensibilizando a los colaboradores y comunidad en la participación y al control social de la inversión pública y al buen uso de la obra civil.

- Formular recomendaciones claras y específicas, basadas en los hallazgos y análisis realizados, que orienten la toma de decisiones y la implementación de acciones concretas para abordar los aspectos sociales y así brindar respuestas oportunas a la comunidad y resolver las inquietudes de estas con el fin de brindar un ambiente ameno y seguro durante el desarrollo del mejoramiento.

5. DIAGNOSTICO DE ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL CONTRATO

5.1 Localización del contrato

El lugar donde se desarrollará el contrato se encuentra localizado en la calle 4, entre carrera 2 a la carrera 6, del casco urbano de la Inspección de San Antonio De Getucha, en el municipio de Milán, departamento del Caquetá.



Ilustración 1. Ubicación de San Antonio de Getucha en Colombia.



Ilustración 2. *Ubicación del lugar donde se desarrollará el contrato en el mapa*

5.2 Área de Influencia

El lugar de ejecución del contrato es en la inspección de San Antonio de Getucha, ubicado al sur del casco urbano del municipio de Milán en el departamento del Caquetá con las siguientes coordenadas geográficas:
Latitud: **1°17'21"N**
Longitud: **75°30'23"O**

5.3 Población

San Antonio de Getucha, ubicado en el municipio de Milán del departamento del Caquetá, es un municipio que presenta una población de acuerdo a las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el año 2024 con una población aproximada de 10.339 habitantes.

5.4 Altitud y relieve

El Municipio de Milán - Caquetá, se encuentra a una altitud aproximada de 460 metros sobre el nivel del mar (msnm) y su relieve se caracteriza por la transición entre la zona de piedemonte y la llanura amazónica.

5.5 Suelo

Los suelos de esta población son áreas de **"Tierra Firme" (lomerio)** y las formas aluviales. Los suelos de lomerio son **pobres en nutrientes, muy ácidos con poca materia orgánica** , mientras que los de las **vegas de ríos andinos (como el Orteguaza) son más fértiles** debido al arrastre de sedimentos ricos en nutrientes desde la cordillera. La fertilidad de los suelos amazónicos está intrínsecamente ligada al ciclo cerrado de nutrientes del bosque

5.6 Vías de comunicación

VIA TERRESTRE: Existe una carretera principal destapada que comunica a Milán con el municipio de La Montañita, que es el único acceso terrestre al municipio.
VIA FLUVIAL.: El río Orteguaza sirve como una ruta de transporte fluvial vital para el municipio.

5.7 Hidrografía

La hidrografía del municipio de Milán, Caquetá, está definida principalmente por el **río Orteguaza**, que es su principal vía de comunicación fluvial. Este río y sus afluentes son fundamentales para el transporte de personas y mercancías.

Principales cuerpos de agua

- **Río Orteguaza**: Es el eje fluvial del municipio, utilizado para el transporte de remesas, combustible, productos agrícolas y más. El Orteguaza es un afluente del río Caquetá.
- **Río Bodoquero y río Pescado**: Estos ríos son importantes afluentes del Orteguaza que también atraviesan el municipio.
- **Quebradas**: Además de los ríos principales, la red hidrográfica de Milán incluye varias quebradas, como las de Platanillo y Getucha.

5.8 Ubicación directa de proyecto

El proyecto se encuentra ubicado en calle 4 entre la carrera 2 a la carrera 6, del caso urbano de la inspección San Antonio de Getucha del municipio de Milán, departamento del Caquetá, en la región de la Amazonía colombiana.

Ubicación y geografía:

- Se encuentra en la parte sur de Colombia.
- Predominan los terrenos semi-ondulados y llanuras de inundación.
- Su principal fuente hídrica es el río Orteguaza.

Distancia desde Florencia:

- Se ubica a aproximadamente 1 hora y 20 minutos de distancia a la ciudad de Florencia la capital del departamento del Caquetá.



Ilustración 3. Ubicación directa de proyecto

5.8 Ruido Ambiental

Dentro de los horarios de trabajos se realizan mediciones de ruido y en ningún caso se ha superado los 100 decibelios (dB), se llevan registros de seguimiento de ruido ocasionalmente cuando se presentan jornadas de trabajo continuo o se percibe niveles de ruido alto.
Durante el segundo corte de obra comprendido del 22 de septiembre al 21 de octubre se han realizado cuatro monitoreos de ruido de manera sorpresiva y aleatoria los siguientes días y con resultados dentro del rango de los 100 (dB).
Evidencia de medición de niveles de ruido:

Tabla 1. Resultados del monitoreo de ruido.

FECHA	HORA	PROM dB	MAX Db	MIN dB
25 de septiembre de 2025	8:00:00 a m.	61	92	55
08 de octubre de 2025	10:00:00 a m.	58	96	56
15 de octubre de 2025	1:00:00 p m.	63	90	55
21 de septiembre de 2025	3:00:00 p m.	62	92	56

Fuente. Elaboración propia

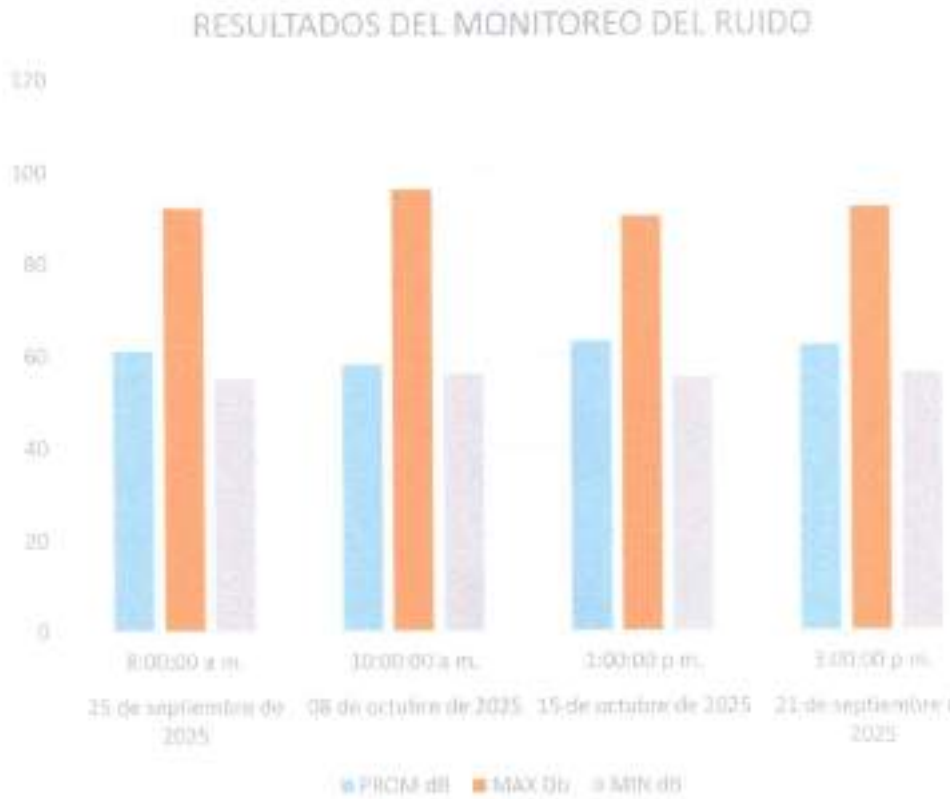


Ilustración 4. Grafica resultado del monitoreo de ruido.

6. LINEA BASE DE DATOS

Tabla 2. Información línea base de datos

ENTIDAD	UBICACION	TELEFONO
ALCALDIA MUNICIPAL	Cra 6 N° 7-12 Centro	3103191755
CONTRATISTA – CONSORCIO SAN ANTONIO 2025	Calle 14 N° 12-15 piso 3 oficina 305 edif Bancolombia - Centro	3223102758
INTERVENTORIA- CONSORCIO ALCANTARILLA SAN ANTONIO 2025	Calle 14 N° 13-40 Barrio Centro	3134629855
SUPERVISOR – PDA CAQUETA	Calle 14 N° 13-40 Barrio Centro	3134629855
POLICIA NACIONAL	Barrio Pueblo nuevo	3112569123
CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE GETUCHA	Calle principal	3132073088

Fuente. Elaboración propia

7. CENSOS DE INMUEBLES

Durante el segundo corte de obra comprendido del 22 de septiembre al 21 de octubre no se realizó esta actividad, teniendo en cuenta que ya fue realizada el dia 4 de septiembre 2025, en donde se iniciaron las actividades de levantamiento de las actas de vecindad para asi dar cumplimiento a la gestión social de obra y proceder con censo a las viviendas que se encuentran implicadas en la adecuación y canalización de aguas lluvias y que posiblemente pueden resultar afectadas por los trabajos realizados con los equipos y maquinas necesarias en el desarrollo del contrato.

7.1 Mapa de actores

Con base a la necesidad de conocer la organización social del municipio, se hizo necesario realizar la relación de los actores más representativos del municipio que dinamizan el desarrollo municipal.

Se ha establecido una línea base con los siguientes grupos de interés que se pudo tener información a través de una recolección de información primaria y secundaria, como instrumento para tener una comunicación continua que mejoren los procesos de gestión de la comunidad beneficiada, sobre las condiciones en que se ejecuta la obra.

Tabla 3. Mapa de actores municipio Milán

ACTOR	DESCRIPCIÓN	REPRESENTANTES
ORGANIZACIONES SOCIALES	COMITÉ DE VEEDURIA, RESOLUCIÓN No. 011 DEL 30 JULIO DE 2025	AHUDELY BERMEO HERNANDEZ
		HERCILIA BARRERA TRIVIÑO
		ELIBERTO TRUJILLO TRUJILLO

ACTOR	DESCRIPCIÓN	REPRESENTANTES
ORGANISMOS DE CONTROL TERRITORIAL	ALCALDIA MUNICIPAL	VICTOR ANDRES VASCO QUIVANO
	PERSONERIA	EDGAR ANDRES GUTIERREZ DUSSAN
OTRO TIPO DE ACTORES	CONTRATISTA	ALDA MARTIZA DUSSAN ACOSTA
	INTERVENTORIA	CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
	SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO

Fuente: Elaboración propia, basado en información primaria.

8. RECORRIDO RUTA SALUDABLE INICIAL

Durante el segundo corte de obra comprendido del 22 de septiembre al 21 de octubre no se realizó esta actividad, debido a que ya fue realizada el corte pasado en donde se realizó la socialización que permitió informar a la comunidad sobre las iniciativas que se llevarán a cabo, involucrar a los residentes en el proceso de toma de decisiones y generar un sentido de pertenencia hacia el objetivo del contrato, para lo cual se les oriento la siguiente información:

1. Objeto del contrato.
2. Número del contrato.
3. Responsable del contrato
4. Responsable de la ejecución
5. Beneficios a obtener.
6. Breve descripción del contrato.
7. Ubicación de las casas a intervenir.
8. Contratación de mano de obra.
9. Materiales, equipos y maquinas requeridos en la obra.
10. Tiempo estipulado para la ejecución.

Estas acciones fomentan la participación activa de la comunidad, promueven la transparencia y evitan posibles conflictos. En esta socialización se compartió con la comunidad también datos relevantes del mismo, como lo es la firma contratista que será la encargada de ejecutar el contrato, la interventoría encargada y demás aspectos que resultan de importancia para el conocimiento de la comunidad y su participación.

8.1 Registro fotográfico



Ilustración 5. Socialización contexto de contratos

- **Capacitación ambiental y SST**



Ilustración 6. Socialización contexto de contratos.

- **Visitas de la comunidad**



Ilustración 7. Visitas a la comunidad.

8.2 Conformación de comité de obras

Durante el presente corte no se realizaron comités de obra, sin embargo, en el corte anterior se realizaron reuniones de socialización con el equipo de trabajo que hacen parte del personal, sobre los compromisos a desarrollar con la comunidad y como se manejara la revisión del avance de la obra, con respecto a la seguridad y salud en el trabajo en lo compete la correcta ejecución de la obra.

Comités de obra

Tabla 4. Comités de obra

ITEM	FECHA	OBJETIVOS	COMPROMISOS
1	06/09/2025	• COMITÉ DE OBRA PARA EL ANÁLISIS DEL TRAZADO ACTUALIZADO.	✓ Acta de concertación de precios. ✓ Acta del comité técnico donde se reflejan las modificaciones y demora en la elaboración del acta de modificación. ✓ Justificación técnica de obra para el acta modificatoria. ✓ Informe técnico de la interventoria que avale los cambios. ✓ APUs de los ítems no previstos. ✓ Acta modificatoria.
2	15/09/2025	• MESA DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.	✓ Entregar Modelación hidráulica. ✓ Entregar Diseño estructural ✓ Entregar el Prebalance de obra según las nuevas modificaciones ✓ Entregar Item no previstos.

Fuente: Elaboración propia.

8.3 Conformación de veedurias ciudadanas

*La Ley 850 se encarga de promover la conformación de las veedurías ciudadanas, señalando que para este caso el representante legal de la entidad privada encargada de la ejecución del **CONTRATO Nº COP-2025-002**, se encargó de dar a conocer el proyecto mediante la socialización, aspecto que promovió la asamblea para la constitución de la Veeduría ciudadana.*

En el comité de veeduría se apoyó en la recopilación de la información previo a los requisitos establecidos por la personería municipal para el reconocimiento e inscripción a la veeduría ciudadana.



Ilustración 8. Reunión de socialización del CONTRATO No. COP – 2025 - 002

Siendo así, se expidió la Resolución No. 011 DEL 30 JULIO DE 2025

Tabla 5. Identificación de veedores de la obra según Resolución No. 011 del 30 de Julio del 2025.

NOMBRE	TIPO IDENTIFICACIÓN	No. IDENTIFICACIÓN
AHUDELY BERMEO HERNANDEZ	C.C.	17.648.306
HERCILIA BARRERA TRIVIÑO	C.C.	30.506.550
ELIBERTO TRUJILLO TRUJILLO	C.C.	83.087.391

Fuente: Elaboración propia.

A la fecha se encuentran desempeñando su cargo de manera activa, asistiendo a las actividades programadas por las partes involucradas.

9. ARTICULACIÓN CON LOS OPERADORES

Durante el presente corte, se continúa realizando las actividades de capacitación con los operadores que hacen parte de la obra encargados de la excavación mecánica que se lleva realizando.



Ilustración 9. Articulacion operarios

9.1 Reuniones con la comunidad

Durante el presente periodo, se llevó a cabo una reunión con la comunidad, la cual surgió a partir de una visita de seguimiento a la obra. En esta actividad participaron representantes del contratista, la interventoría y el PDA.

En el encuentro, la comunidad manifestó su satisfacción con el avance y la calidad de la ejecución de la obra. No obstante, expresaron su inquietud respecto al estado final de la vía una vez concluyeran las labores de excavación e instalación de la tubería, ya que antes de la intervención se encontraba en buen estado.

Frente a esta preocupación, el ingeniero residente de obra explicó que el contrato incluye la ejecución de los rellenos correspondientes y, posteriormente, el suministro e instalación de una capa de asfalto natural en las áreas afectadas por la excavación. De esta manera, se garantiza que la vía quede en condiciones iguales o mejores a las existentes antes de la intervención, brindando así tranquilidad y confianza a la comunidad.




Ilustración 10. Reuniones con la comunidad

Tabla 6. Relación reuniones con la comunidad

N.	Fecha de la reunión	Asunto
1	04 de septiembre de 2025	Socialización del proyecto y conformación del comité de veeduría
2	21 de octubre de 2025	Inquietud respecto al estado final de la vía

Fuente: Elaboración propia.

10. INTERFERENCIAS PRESENTADAS DURANTE LA OBRA

En el periodo informado, si se presentaron algunas interrupciones mientras se realizaba la obra, en este caso daños en algunas tuberías de agua y de gas, pero se hicieron los arreglos de manera inmediata y quedaron funcionales.

10.1 Accesibilidad a viviendas y establecimientos

En el desarrollo de la obra no se requirió acceso ni a las viviendas ni a establecimientos

10.2 Daños a edificaciones, mobiliarios y zonas verdes

Dentro del proyecto desarrollado se presentaron daños en zonas verdes debido a la localización y excavaciones de la red principal de alcantarillado en los pozos del 8 al 4.

10.3 Suspensiones de servicios públicos

Se realizaron suspensiones del gas y el agua debido a los daños que se presentaron, pero tan pronto se hicieron las reparaciones se retomó el funcionamiento de estos servicios.

10.4 Trabajos nocturnos

Frente al punto en mención, para el periodo informado no se tuvo la necesidad de realizar trabajos nocturnos.

11. DISEÑOS DE INDICADORES DE GESTIÓN

Tabla 7. Indicadores de gestión

Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
I	OBRA			
1	1.0 PRELIMINARES			
1	1,01	Localización y replanteo de redes	M2	555,84
2	1,02	Cerramiento provisional lona verde (h=2,00m)	ML	873,36
3	1,03	Excavación manual en material común de 0.00 a 2.00 m	M3	138,66
4	1,04	Excavación manual en material común de 2.00 a 4.00 m	M3	10,17
5	1,05	Excavación mecánica en material común	M3	1.298,44
6	1,06	Entibado en madera para proteger talud de excavación	M2	916,75
7	1,07	Cargue, transporte y retiro de material sobrante	M3	408,82
8	1,08	Relleno, Cimentación tubería con arena SP de acuerdo a la norma ASTM 2487	M3	97,15
9	1,09	Relleno con material seleccionado de la excavación	M3	1.256,00
10	1,1	Suministro e instalación de sub_base granular tipo C, NT1	M3	112,49
11	1,11	Suministro e instalación de base granular tipo C, NT1	M3	28,38
12	1,12	Suministro e instalación de asfaltita natural, en áreas afectadas por la excavación	M2	218,24
2	2.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA			
9	2,01	Suministro e instalación de tubería PVC D=315mm; NTC 3722-3 S8	ML	153,03
10	2,02	Suministro e instalación de tubería PVC D=400mm; NTC 3722-3 S8	ML	79,01
11	2,03	Suministro e instalación de tubería PVC D=450 mm; NTC 3722-3 S8	ML	46,76
12	2,04	Suministro e instalación de tubería PVC D=27"; NTC 5055 ASTM F 794	ML	163,94

Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
13	2,05	Suministro e instalación de tubería PVC D=30"; NTC 5055 ASTM F 794	ML	51,19
14	2,06	Suministro e instalación de tubería PVC D=36"; NTC 5055 ASTM F 794	ML	95,78
3	**3.0 POZOS DE INSPECCION**			
15	3,01	Pozos de inspección en concreto f'c= 24Mpa D=1.20 m y h<=2.00 m. incluye tapa	UND.	0,00
16	3,02	Pozos de inspección en concreto f'c= 24Mpa D=1.20 m y 2.01>h<=4.00 m incluye tapa	UND	0,00
4	**4,0 CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROSY CABEZA DE SALIDA**			
17	4,01	Construcción de cunetas transversales de vía, L=10.97m x 0.85 m, ancho útil de 0.45m, espesor de muros de 0.20m, y rejillas en platina de 2" x 3/8	UND	0,00
18	4,02	Construcción de cunetas transversales de vía, L=9.32m x 0.85 m, ancho útil de 0.45m, espesor de muros de 0.20m, y rejillas en platina de 2" x 3/8	UND	0,00
19	4,03	Construcción de sumidero de 1.64m x 0.88m, ancho útil de 0.58m x 1.34m, e=0.15m, rejilla platina de 2 x 3/8	UND	0,00
20	4,04	Construcción de sumidero de 1.64m x 0.98m, ancho útil de 0.68m x 1.34m, e=0.15m, rejilla platina de 2 x 3/8	UND	18,00
21	4,05	Construcción de cabezal de salida	UND	1,00
5	**5,0 ASEO GENERAL**			
22	5,01	Aseo general de Obra	UND	1,00
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**			
23	NP-1	Pozos de inspección en concreto f'c= 24Mpa D=1.50 m y h<=2.00 m. incluye tapa	UND	4,00
24	NP-2	Pozos de inspección en concreto f'c= 24Mpa D=1.50 m y 2.01>h<=3.00 m incluye tapa	UND	3,00
25	NP-3	Pozos de inspección en concreto f'c= 24Mpa D=1.60 m y 3.01>h<=4.00 m incluye tapa	UND	1,00

Fuente: Presupuesto del contrato.

12. ACTIVIDADES PARA REALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (FICHA TÉCNICA)

Tabla 8. Actividades para realizar (ficha técnica).

ITEM	ACTIVIDAD
1	Localización y replanteo de redes
2	Cerramiento provisional lona verde (h=2,00m)

ITEM	ACTIVIDAD
3	Excavación manual en material común de 0.00 a 2.00 m
4	Excavación manual en material común de 2.00 a 4.00 m
5	Excavación mecánica en material común
6	Entibado en madera para proteger talud de excavación
7	Cargue, transporte y retiro de material sobrante
8	Relleno, Cimentación tubería con arena SP de acuerdo con la norma ASTM 2487
9	Relleno con material seleccionado de la excavación
10	Suministro e instalación de sub_base granular tipo C, NT1
11	Suministro e instalación de base granular tipo C, NT1
12	Suministro e instalación de asfaltita natural, en áreas afectadas por la excavación
13	Suministro e instalación de tubería PVC D=315MM; NTC 3722-3-S8
14	Suministro e instalación de tubería PVC D=400MM; NTC 3722-3-S8
15	Suministro e instalación de tubería PVC D=450 mm; NTC 3722-3 S8
16	Suministro e instalación de tubería PVC D=27"; NTC 5055 ASTM F 794
17	Suministro e instalación de tubería PVC D=30"; NTC 5055 ASTM F 794
18	Suministro e instalación de tubería PVC D=36"; NTC 5055 ASTM F 794
19	Pozos de inspección en concreto f'c= 24Mpa D=1.20 m y h<=2.00 m. incluye tapa
20	Pozos de inspección en concreto f'c= 24Mpa D=1.20 m y 2.01>h<=4.00 mincluye tapa
21	Construcción de cunetas transversales de vía, L=10.97m x 0.85 m, ancho útil de 0.45m, espesor de muros de 0.20m, y rejillas en platina de 2" x 3/8
22	Construcción de cunetas transversales de vía, L=9.32m x 0.85 m, ancho útil de 0.45m, espesor de muros de 0.20m, y rejillas en platina de 2" x 3/8
23	Construcción de sumidero de 1.64m x 0.88m, ancho útil de 0.58m x 1.34m, e=0.15m, rejilla platina de 2 x 3/8
24	Construcción de sumidero de 1.64m x 0.98m, ancho útil de 0.68m x 1.34m, e=0.15m, rejilla platina de 2 x 3/8
25	Construcción de cabezal de salida
26	Aseo general de Obra
1	Localización y replanteo de redes

Fuente: Presupuesto del contrato.

13. RECORRIDO POR LOS FRENTES DE OBRA

Se realizó un recorrido por los diferentes frentes de obra con la participación de representantes del contratista, la interventoría y el PDA. Durante la jornada se efectuó seguimiento al avance de los trabajos y a la ejecución de las actividades establecidas en el contrato.



Ilustración 11. Recorrido frentes de obra.

14. RUTA SALUDABLE

Como se señaló anteriormente, para el periodo informado, se realizó un recorrido por los diferentes frentes de obra con la participación de representantes del contratista, la interventoria, el PDA y la comunidad, estando presente un integrante de la veeduría del contrato.

Durante el recorrido fueron atendidas todas sus inquietudes, en donde manifestaron su satisfacción con el avance y la calidad de la ejecución de la obra. No obstante, expresaron su inquietud respecto al estado final de la vía una vez concluyeran las labores de excavación e instalación de la tubería, ya que antes de la intervención se encontraba en buen estado. Preocupación que fue resuelta por el ingeniero residente de obra, en donde manifestó que el contrato garantiza que la vía quede en condiciones iguales o mejores a las existentes antes de la intervención.



Ilustración 12. Ruta saludable

15. PUNTOS DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

El punto de atención al ciudadano se encuentra en la zona donde se realiza la obra de la adecuación y canalización de aguas lluvias y a la fecha no se han recibido PQRS durante el periodo



Ilustración 13. Buzon de sugerencias.

16. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO DE LAS VEEDURIAS CIUDADANAS Y LAS RENDICIONES DE CUENTAS

Se ha venido realizando el acompañamiento a la comunidad por el profesional contratado, informando con anticipación el desarrollo de actividades, atendiendo las solicitudes presentadas y divulgando información concerniente a la obra; de acuerdo con lo establecido en la Ley 850 de 2003.

17. PRESENTACION DE INFORMES

Hasta la fecha, se ha presentado el primer informe social, correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de agosto y el 21 de septiembre de 2025. El presente documento corresponde al segundo informe, que abarca las actividades desarrolladas entre el 22 de septiembre y el 21 de octubre de 2025.

18. VALLA INFORMATIVA

Las vallas se encuentran ubicadas en el Polideportivo central y la carrera 6 en l inspección de San Antonio de Getucha.



Ilustración 14. Valla informativa del contrato

19. CONTRATACIÓN DE LA MANO DE OBRA

A fecha de corte del presente informe, se ha contratado el personal correspondiente a la mano de obra calificada y no calificada requerida para el desarrollo de la obra. A continuación, se detalla el personal vinculado y activo en el periodo informado.

Tabla 9. Relación mano de obra calificada y no calificada

Nombres y apellidos	Cedula de ciudadanía	Cargo
Fernando Andrés Marín	1.117.512.681	Residente de obra
Oscar Orlando Méndez	1.130.744.004	Ingeniero especialista hidráulico
Gustavo Adolfo Olarte Collazos	17.650.594	Director de la obra
Diana Lorena Ramos Lozano	40.782.364	Profesional SISOMA
Wilson Lugo Chilatra	1.117.491.307	Profesional social
Ancizar Orjuela Manrique	17.658.583	Maestro de Obra
Norbey Correa Plazas	6.801.673	Auxiliar de Obra
Alexander Carmona Rios	1.117.262.033	Auxiliar de Obra
Jhon Ainer Perez Parra	1.006.511.551	Auxiliar de Obra
Norvey Camilo Nieto	83.901.770	Auxiliar de Obra
FaibeR Cardona Pulido	1.117.234.725	Auxiliar de Obra
Orlando Calderon Jimenez	1.117.233.024	Auxiliar de Obra
Juan Narvaez	1.080.934.116	Operario

Fuente: Elaboración propia

20. PROFESIONAL SOCIAL

El componente social lo maneja el psicólogo Wilson Lugo Chilatra, quien cumple con los requisitos mínimos para el desarrollo del presente informe.

21. PAGO SSGG PROFESIONAL SOCIAL

Se anexa la documentación que corresponde a los aportes de seguridad social comprendidos entre los meses de septiembre del presente año.

22. ANEXOS

ANEXO 1- Pago de SSGG del profesional

Responsables.

WILSON LUGO CHILATRA
C.c 1.117.491.307
Psicólogo

ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA
C.c 40.781.657
Representante legal
Consorcio San Antonio 2025

ANEXO 22 – BITACORA DE OBRA

Contrato de obra No Cop-2025-002.
Objeto del contrato "Adecuación y Canalización de Aguas lluvias en la Calle 4, entre Cra 2 a la Cra 6, del Casco Urbano de la inspección de San Antonio de Getucha, en el Municipio de Milan, Departamento de Caqueta"

Contrato de Interventoria No. 20250000000620
Objeto del contrato "Realizar la interventoria integral, la cual efectuara el seguimiento de los Aspectos contractuales, técnicos, administrativos, financieros, sociales y ambientales al contrato de obra cuyo objeto es: Adecuación y canalización de aguas lluvias en la calle 4, entre Cra 2 a la Cra 6, del casco urbano de la inspección de San Antonio de getucha, Municipio de Milan, Departamento del Caqueta.

Fecha de Inicio: 22 de Agosto de 2025
Fecha Terminacion: 21 de enero de 2026.

Fecha: 22 de Agosto de 2025.
Hora Inicio Jornada : 9:00 AM
Hora Terminacion : 1:30 Pm.
Personal en obra: 1. Residente de obra
Interventoria: Residente de interventoria.
Actividades Realizadas: Se realizo la socialización del contrato con la comunidad, se exponen las cantidades generales en metros lineales, las dimensiones de la tuberia por cada uno de los tramos, la cantidad de pozos a construir. para los cambios de direccion y/o interseccion entre las cuadras que se beneficiara la linea del Alcantarillado Pluvial, se expone el tiempo de ejecución y se da a conocer el traumatismo que genera al iniciar las actividades contractuales en Situ al momento de iniciar las actividades.

En el recorrido se evidencio la existencia de unos anderes, cubiertas existentes que invaden las zonas verdes por la margen derecha de las casas que se afectaran por la construcción del Alcantarillado pluvial

Residente de obra

Fecha: 23 de Agosto de 2025
Hora Inicio: 7:00 am
Hora Terminacion: 5:00 P.M.
Personal en obra: 1. Residente de obra,
1. Residente de interventoria.

Actividades Realizadas: Se realizo la logistica para solicitarle al provedor el pedido de los diametros de la tuberia de 36", 30", 27", 18", 16" y 12" para hacerlos a llegar a la inspección de San Antonio Getucha del Municipio de Milón.

Se programo la topografia con el fin de levantar cada uno de los paramentos de la red de Alcantarillado, Una vez levantada la información se presentara a la entidad correspandiente de los Cambios a realizar para dar cumplimiento a la parte constructual.

Residente de obra

Fecha: 24 de Agosto de 2025.
Hora Inicio: 7:00 am
Hora Terminación: 7:30 am.
Personal en obra 1. Residente de obra,
1. Residente de Interventoria

Residente de obra.

Fecha: 25 Agosto al 15 de Septiembre de 2025.
Hora Inicio: 7:00 Am
Hora Terminacion: 5:00 pm
Personal en obra: 1. Residente de obra, 1. Residente de Interventoria.

Actividades Realizadas: Se realizo el levantamiento topografico el dia 25 de Agosto al 27 de Agosto de 2025 de cada uno de los parumentos.

Una vez tenida la información se presento el 28 de agosto de 2025 al hidraulico para que realizara la evaluación de la modificacion de los diamos y este presentara el dia 05 de Septiembre las memorias de responsabilidad de la necesidad de realizar pozos de diametros de 1.50m y 1.60m, lo que se requrio realizar un estudio estructural para los pozos en mención.

De acuerdo a lo anteror mencionado se realizo los detalles constructivos, memorias de responsabilidad el dia 15 de Septiembre se radico dicha información para aprobar los cambios de los diamos.

Fecha: 16 de septiembre de 2025.
Hora Inicio: 7:00 am
Hora Terminacion: 6:30 pm.
Personal en obra: 1 Residente de obra, 1. Residente de Interventoria, 1. Maestro de obra, 1. Oficial, 4 Ayudantes, 1. Operador.

Actividades Realizadas: Se realizo las excavaciones de tramo alcantarillado Pluvial del punto de descole al pozo 8 de la tuberia de 36".
Se realizo el suministro e instalación de 1 entibado de madera, cama de arena e instalación del tubería de 36".
Se realizo el cerramiento en lona necesario para la intervención del tramo.

Se ampliaron la sección de excavación mecanica tipo talud debido a la existencia de nivel freatico en las excavaciones.

Relleno de material seleccionado se realizo para los 3 tubos de 36" que se instalaron en el tramo.

Residente de obra.

Fecha: 17 de Septiembre de 2025.
Hora Inicio: 7:00 AM
Hora Terminacion: 6:00pm.
Personal en obra: 1. Residente de obra, 1. Residente de interventoria, 1. Maestro de obra, 1. Oficial, 4 Ayudantes, 1. Operador.

Actividades Realizadas: Se realizo las excavaciones mecanicas, Suministro e instalacio del entibado en madera y la cama de arena para el tramo del descole al pozo 8.

Se realizo el suministro e instalacion de 5 tubos de 36"

Se realizo el relleno del material Seleccionado al ancho de zanja tipo talud.

Se recomienda al contratista realizar el tapado del material sobrante con cuidado para prevenir la humedad de la tierra.

Residente de obra

Fecha: 18 de Septiembre de 2025
Hora Inicio: 7:00 AM
Hora Terminacion: 6:30 PM.
Personal en obra: 1. Residente de obra, 1 Residente

Actividades Realizadas: Se suspendieron actividades por motivos de lluvias desde la 7:00 AM a las 10:30 AM.

Se reiniciaron actividades a las 11:00 AM para continuar con las excavaciones del tramo de descole al pozo 8, se suministro e instalo el entibado de madera para instalar la cama de arena.

Se suministro e instala 5 tubos de 36" y se realizo el relleno de material seleccionado de excavación.

Se realizo los retiros del material sobrante de excavacion del tramo del descole al pozo 8.

Se realizo el cerramiento del area de trabajo del tramo del descole al pozo 8.

Se recomienda al contratista mejorar la señalización de los tramos para prevenir personal ajeno a la obra.

Se realizo el ajuste por parte de la interventoria en aras de prever personal ajeno a la obra.

Fecha: 19 Septiembre de 2025.
Hora Inicio: 7:00 AM
Hora terminacion: 6.00 pm.
Personal en obra: 1. Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1. Maestro de obra, 1. Oficial, 4 Ayudantes, 1. Operador.

Actividades Realizadas: Se realizo las excavaciones mecanica para el tramo final del descole al poto 80 y Se Inicia las excavaciones del poto 8 al poto 7

Se realizo la señalizacion del tramo del poto 8 al poto 7 y se instala el cerramiento

Se realizo el Suministro e instalación del entibado de madera y cama de arena del tramo final del descole al poto 8.

Se Suministro la tuberia de 36" 3 tubos faltantes para el cierre del tramo al descole al poto 8. y Se instalo 3 tubos de 30" del tramo del Pozo 8 al poto 7
Se realizo el relleno del material Seleccionado de excavación del tramo final del descole al pozo 8 y se Relleno del tramo del pot8 al poto 7. de los 3 tubos que se instalaron.

Residente de obra.

Fecha: 20 Septiembre de 2025
Hora Inicio: 7:00 AM
Hora terminacion: 7:05 a.m.
Personal en obra: 1. Residente de obra, 1. Residente de interventoria, 1. Maestro de obra, 1. Oficial, 4. Ayudantes, 1. operador.

Actividades Realizadas: El dia de hoy se suspendieron las labores por las lluvias en la zona.

Residente de obra.

Fecha: 21 de Septiembre de 2025.
Hora: Inicio: 7:00 AM
Hora Terminacion: 7:01 AM.

el dia de hoy no se labora por ser un dia festivo de descanso.

Residente de obra.

Fecha: 22 de Septiembre de 2025.
Hora Inicio: 7:00 AM
Hora Terminacion: 6:30 pm
Personal en obra: 1. Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 Maestro 1. Oficial. 4 Ayudant

Actividades Realizadas: Se continua con las excavaciones del tramo del poto 8 al poto 7 para la tubera de 30"

Se realizo el cerramiento para el avance de las excavaciones del tramo del poto 8 al poto 7.

Se Suministro e instalo el entibado de madera y la cama de arena para el tramo del poto 8 al poto 7

Se Suministro e instalo 5 tubos de diametro de 30" en el tramo del poto e al poto 7.

Se Suministro e instalo el material Seleccionado para el tramo final del poto 8 al poto 7.

Residente de obra

Fecha: 23 de Septiembre de 2025.
Hora Inicio: 7:00 Am.
Hora Terminacion: 5:00 pm
Personal en obra: 1 Residente de obra, 1. Residente de interventoria, 1. Maestro de obra, 1. Oficial, 4 Ayudantes, 1. operador.

Actividades Realizadas: Se realizo la excavacion mecanica del tramo del (poto 7) al

Se realizo el cerramiento en lona del tramo del pozo 7 al pozo 6.

En las excavaciones del pozo 7 para el paso de tuberia fue necesario elevar el pozo con el fin de no obstruir la tuberia de alcantarillado Sanitario existente.

Una vez realizado esta actividad se recomienda al contratista verificar el nivel de los pozos del 6 al 1 la variacion de subida de nivel.

Dadas las recomendaciones de la interventoria Se realizo la verificacion de los niveles esta subida no afecta el comportamiento hidraulico de la red nueva a instalar.


Se continuo con las excavaciones y el suministro e instalación del entibado de madera y la cama de arena del tramo del pozo 7 al pozo 6.

Se suministro e instalo 4 tubos de 27" entre tramo del pozo 7 al pozo 6.

Fecha: 24 de Septiembre de 2025.
Hora Inicio: 7:00 AM
Hora Terminacion: 5:00 pm
Personal en obra: 1. Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1. Maestro de obra, 1 oficial, 4 Ayudantes, 1. operador.

Actividades Realizadas: Se suspende actividades desde la 7:00 AM hasta 8:50 am por las lluvias.
Se retoma las actividades de excavaciones para el tramo del pozo 7 al pozo 6 de 27"
Se suministro e instalo el entibado de madera, la cama de arena.
Se instalaron 5 tubos de 27" para el tramo del pozo 7 al pozo 6.
Se realizo el relleno del material seleccionado de excavación y se hizo el retiro del material sobrante de excavación.

Residente de obra

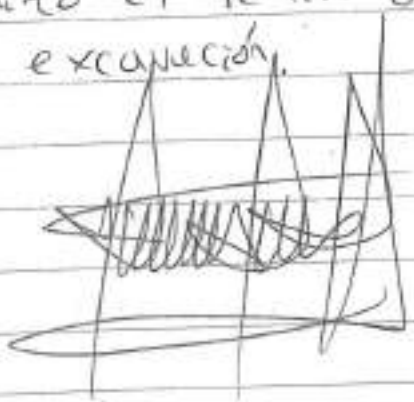

Fecha: 25 de Septiembre de 2025
Hora Inicio: 7:00AM
Hora terminacion: 5:30 pm
Personal en obra: 1. Residente de obra, 1. Residente de interventoria, 1 Maestro de obra, 1. oficial, 4 Ayudantes, 1. operador

entibado de madera.
Se suministro la cama de arena del tramo pozo 7 al pozo 6 y se instalo 8 tubos de 27".
Se avanzo con las excavaciones del tramo del 6 al pozo 5.
Se realizo el suministro e instalación del material sobrante de excavación del tramo del pozo 7 al pozo 5.
Se realizo el cerramiento del tramo del pozo 6 al pozo 5.

Residente de obra.

Fecha: 26 de Septiembre de 2025.
Hora inicio: 7:00 Am.
Hora Terminacion: 5:30 pm.
Personal en obra: 1. Residente de obra, 1. Residente de interventoria, 1. Maestro de obra, 1. Oficial, 4. Ayudantes, 1. Operador.

Actividades Realizadas: Se continua con actividades de Relleno de material Seleccionado desde el tramo 7 al pozo 5.
Se realizo el cerramiento del pozo 5 al pozo 4.
Se retomaron actividades de retiro del material sobrante de excavación del tramo del pozo 7 al pozo 5.

Fecha: 27 de septiembre de 2025.
Hora inicio: 7:00 am
Hora Terminacion: 5:30 pm
Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 Maestro, 1 Oficial, 4 Ayudantes, 1 operador.

Actividades realizadas: Se realiza nuevamente las excavaciones del tramo del pozo 5 al pozo 6 ya instalada a raiz de la existencia de una tuberia de alcantarillado Sanitario de una vivienda.

Se realizo el desmonte de la tuberia de 27" del tramo del pozo 5 al pozo 6 con el fin de profundizarla para dar el pozo a la tuberia de 27".

Una vez retirada la tuberia se replantea las profundidades del tramo del pozo 5 al pozo 1 con el fin de definir las pendientes nuevas dentro de la red a instalar.

Residente de obra.

Fecha: 28 de septiembre de 2025
Hora inicio: 7:00 AM
Hora terminacion: 7:10 am.

Fecha: 29 de Septiembre de 2025.
Hora Inicio: 7:00 AM
Hora Terminacion: 6:30 pm.
Personal en obra: 1. Residente de obra, 1 residente de interventoria, 1. Maestro de obra, 1 oficial, 4 Ayudantes, 1. Operador.

Actividades Realizadas: Se retoma las excavaciones de la tuberia de 24" de reposición por profundidad del tramo del pozo 5 al pozo 6.
Se realizo nuevamente la instalación de la Cama de arena para el tramo del pozo 5 al pozo 6 por la profundización.
Se realizo el relleno del material de excavación del tramo de pozo 5 al pozo 6.
Se realizo el cerramiento del tramo del pozo 5 al pozo 9.
El dia de hoy se tiene la visita técnica por parte de los profesionales del POA de los diferentes componentes para el seguimiento de los avances constructivos.

Se retoma el avance de las excavaciones del pozo 5 al pozo 9.

Residente de obra.

Fecha: 30 de Septiembre de 2025
Hora Inicio: 7:00 AM

1. operados

Actividades Realizadas: Se Continua con las excavaciones del tramo del pozo 5 al pozo 4.
Se realizo el suministro e instalación del entibado de madera y la instalación de la cama de arena.
Se suministro e instalo 3 tubos de 27" del tramo del pozo 5 al pozo 4.
Se realizo el relleno del material seleccionado del tramo del pozo 5 al pozo 6.
Se realizo el retiro del material sobrante del pozo 5 al pozo 6.
Se realizo la señalización de las areas de trabajo acorde a la actividad ejecutada.

Residente de obra.

Fecha: 01 de octubre de 2025.
Hora inicio: 7:00 AM.
Hora terminación: 5:00 pm
Personal en obra: 1. Residente de obra, 1. Residente de interventoria, 1. Maestro, 1. oficial, 4. Ayudantes, 1. operador.

Actividades Realizadas: Se realizo el relleno del material seleccionado para el tramo del pozo 5 al pozo 4 de la tubería instalada.
Se realizo las excavaciones manuales y mecanicas para el pozo 8.
Se realizo el suministro de los aceros para el


Se realizó el suministro e instalación de la formaleta circular de diametro de 1.60m para el pozo 8.



Residente de obra.

Fecha: 02 de octubre de 2025.
Hora inicio: 7:00 AM
Hora Terminacion: 5:00pm
Personal en obra: 1. Residente de obra, 1. Residente de interventoria, 1. Maestro, 1. Oficial, 4 Ayudantes, 1. operador.

Actividades Realizadas: Se realiza la señalización y cerramiento en los dos frentes de trabajo, en las excavaciones del tramo del pozo 4 al pozo 5 y la excavaciones posterior formaleteo del pozo 8. Se realiza actividades de figurado, amarre de acero y fundición del primer anillo del pozo 8
Se realizo la instalación de 1 tubo de 27" del tramo del pozo 5 al pozo 4.



Residente de obra.

Fecha: 03 de octubre de 2025.
Hora inicio: 7:00 AM.
Hora Terminacion: 5:00pm
Personal en obra: 1. Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1. Maestro, 1 oficial, 4 Ayudantes, 1

Actividades Realizadas: Se continua con las excavaciones del tramo del pozo 5 al pozo 9 de la tuberia 27"
Se realiza el suministro e instalación del entibado de madera y la cama de arena.
Se avanza con las excavaciones del pozo 7 de manera manual y mecanica.
Se termina de fundir el ultimo anillo del pozo 8

Residente de obra.

Fecha: 09 de octubre de 2025
Hora Inicio: 7:00AM
Hora Terminacion: 5:00pm
Personal en obra: 1 Residente de obra, 1. Residente de Interventoria, 1. Maestro, 1 Oficial, 9 Ayudantes, 1. operador.

Actividades Realizadas: Se realiza las excavaciones del tramo del pozo 5 al pozo 9. para la instalacion de 3 tubos de 27".
Se realizo el suministro e instalación de 3 tubos de 27" para el tramo del pozo 5 al pozo 9.
Se realizo la fundición del anillo del pozo 7.
Se realizo el relleno del material seleccionado de excavación del pozo 8 y del tramo de tuberia instalado del pozo 5 al pozo 9.
Se realizo la señalización de las areas de trabajo intervenidas.
Se realiza la toma de muestras de los cilindros de los pozos. 8 y 7.

Fecha: 05 de octubre de 2025.
Hora Inicio: 7:00 Am
Hora Terminacion: 7:05 pm


El dia de hoy no se labora por ser un dia festivo de descanso.



Residente de obra.

Fecha: 06 de octubre de 2025.
Hora Inicio: 7:00 Am.
Hora Terminacion: 5:00 pm.
Personal de obra: 1. Res. Residente de obra, 1. Residente de interventoria, 1. Maestro, 1. Oficial, 1. operador, 4 Ayudantes.

Actividades Realizadas: Se continuan con las excavaciones para el fuste del pozo 5 al pozo 9.
Se avanza en la fundición del segundo anillo del pozo 7 en concreto.
Se realiza el figurado e instalación de cama de arena y cerramiento.



Residente de obra.

Fecha: 07 de octubre de 2025
Hora Inicio: 7:00 Am
Hora terminacion: 5:00 pm
Personal en obra: 1 Residente de obra, 1. Residente de interventoria, 1 Maestro, 1 oficial, 1 operador, 4

Actividades Realizadas: Se realiza el relleno del material seleccionado para los 5 tubos instalados de 27" del tramo del pozo 5 al pozo 9.
Se realizo la excavación mecanica y manual para el pozo 6.
Se realizo el avance del amarre del hierro del pozo 6.
Se realizo la fundición del ultimo anillo del pozo 7.

Residente de obra.

Fecha: 08 de octubre de 2025
Hora Inicio: 7:00 Am
Hora Terminacion: 5:00pm
Personal en obra: 1 Residente de obra, 1. Residente de Interventoria, 1. Topografo, 1. Oficial, 4 Ayudantes, 1. Operador.

Actividades Realizadas: Se realizan las excavaciones del tramo del pozo 5 al pozo 9., Se continua con labores de figurado y fundición de concreto. Se suspenden actividades por lluvias a la 10:55 am y se reinician a la 1:00pm y asi dando continuidad a las actividades anteriores mencionadas.

Residente de obra.

Fecha: 09 de octubre de 2025
Hora inicio: 7:00 Am
Hora Terminación: 5:00 pm
Personal de obra: 1. Residente de obra, 1 Residente de Interventoria)

para la tubería de 27".
Se realiza el cerramiento del tramo del pozo 4 al pozo 3, Se avanza con la actividad de fundición del pozo 6.

Residente de obra

Fecha: 10 de octubre de 2025.
Hora inicio: 7:00 Am
Hora terminación: 5:00 pm.
Personal de obra: 1. Residente de obra, 1. residente de interventoría, 1. Maestro, 1. Oficial, 4 Ayudantes, 1. operador.
Actividades Realizadas: Se avanza con la excavación y figurado para el pozo 5, Se avanza en las excavaciones del tramo 05 al pozo 4 para la finalización del tramo, y Se realiza el Suministro e instalación de entibado y cama de arena.

Residente de obra

Fecha: 11 de octubre de 2025
Hora inicio: 7:00 Am
Hora Terminación: 5:00pm
Personal de obra: 1. Residente de obra, 1. Residente de interventoría, 1. Maestro, 1. Oficial, 4 Ayudantes, 1. operador.
Actividades Realizadas: Se continua con las mismas actividades del día anterior.

Residente de obra

El dia de hoy no se labora por ser un dia festivo de descanso.

Residente de obra.

Fecha: 13 de octubre de 2025.
Hora inicio: 7:00 AM
Hora Terminacion: 5:00 pm
Personal en obra: 1. Residente de obra, 1. Residente de Interventoria, 1. Maestro, 1. Oficial, 4 Ayudantes, 1. operador.
Actividades Realizadas: Se realiza el relleno del material Seleccionado del tramo del pozo 5 al pozo 4 y Se realiza el retiro de material Sobrante de excavación. Se realiza la fundición del pozo 5. de diametro de 1.50 m

Residente de obra.

Fecha: 14 de octubre de 2025.
Hora inicio: 7:00AM
Hora Terminacion: 5:00pm
Personal en obra: 1. Residente de obra, 1. Residente de interventoria, 1. Maestro, 1 oficial, 4 Ayudantes, 1. operador.
Actividades Realizadas: Se realiza el Cerramiento del tramo 4 al pozo 3. de la tuberia de 18", se realiza el Suministro e instalacion de la cama de arena, Se continua con la fundición del pozo 5, Se avanza con la fundicion y amarre de acero de la tapa del pozo 8, Se avanza con las excavaciones del tramo del pozo 4 al pozo 3 de la tuberia de 18" y Se instala 2 tubos de 18"

Fecha: 15 de octubre de 2025.
Hora Inicio: 7:00 AM
Hora Terminacion: 5:00pm
Personal en obra: 1. Residente de obra, 1. Residente de interventoria, 1. Maestro, 1. Oficial, 4 Ayudantes, 1 operador.
Actividades Realizadas: Se continua con actividades de excavaciones del tramo del pozo 4 al pozo 3
Se realiza la figuracion y amarre del acero para placa Superior del pozo 7.
Se realizo la fundición de la placa Superior del pozo 7.
Se Suspende las actividades a la 3:40 pm por lluvias, se reinicia a las 4:30pm para finalizar la fundición de la tapa Superior.

Residente de obra

Fecha: 16 de octubre de 2025.
Hora Inicio: 7:00 AM
Hora terminacion:
Personal en obra: 1 Residente de obra, 1. residente de interventoria, 1 Maestro, 1. Oficial, 4 Ayudantes, 1 Operador
Actividades Realizadas: Se realiza las excavaciones del tramo del pozo 4 al pozo 3 de los ultimos 3 tubos de 18"
Se realiza las excavaciones manuales para el pozo 4.
Se


Se realiza el cerramiento y la señalización correspondiente.

Residente de obra



Fecha: 17 de octubre de 2025.
Hora inicio: 7:00 AM
Hora terminación: 5:00 pm
Personal en obra: 1. Residente de obra, 1. residente de interventoría, 1. Maestro, 1. oficial, 4 Ayudantes, 1. operador.
Actividades Realizadas: Se realiza el relleno del material sobrante del tramo del pozo 4 al pozo 3 y Se realiza el retiro del material sobrante de excavación.
Se avanza con el figurado de la tapa superior del pozo 5 y se realiza la fundición del mismo.

Residente de obra.




Fecha: 18 de octubre de 2025.
Hora inicio: 7:00 AM
Hora terminación: 5:00 pm.
Personal en obra: 1. Residente de obra, 1. Residente de interventoría, 1. Maestro, 1. oficial, 4 Ayudantes, 1 operador.
Actividades Realizadas: Se realiza las excavaciones para la intersección del pozo 3 al pozo 2.
Se encuentra tubería de Acueducto en el cruce

señalización



de 18"
Se avanzo en el figurado y amarre de aceros para el pozo 4
Se realizo el cerramiento y señalización de las áreas de trabajo.



Residente de obra.

Fecha: 19 de octubre de 2025.
Hora Inicio: 7:00 AM
Hora Terminacion: 7:10 AM
El dia de hoy no se laboro por ser un dia festivo de descanso.



Residente de obra.

Fecha: 20 de octubre de 2025.
Hora Inicio: 7:00 AM
Hora terminacion: 5:30 pm
Personal en obra: 1. Residente de obra, 1. Residente de interventoria, 1. Maestro, 1 oficial, 4 Ayudantes, 1. operador.
Actividades Realizadas: Se realizo la excavación para la instalación del ultimo tubo de 18" del tramo del pozo 3 al pozo 2.
Se realizo el relleno del material seleccionado de excavación para el tramo del pozo 3 al pozo 2.

las áreas de trabajo intervenidas
Se realiza jornada de aseo a lo largo del tramo.
Se suspenden actividades por lluvias a las 2:50pm y se reinician actividades a las 3:30pm

Residente de obra.

Fecha: 21 de octubre de 2025
Hora inicio: 7:00 AM
Hora terminacion: 5:00pm.
Personal en obra: 1. Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 Maestro, 1. Oficial, 4 Ayudantes, 1 operador.
Actividades Realizadas: Se avanza con el cerramiento del pozo 3 y el tramo del pozo 2 al pozo 1.
Se realiza el relleno del material sobrante de excavación para los pozos 6, 5 y 4 ya finalizados
Se avanza con el corte, figurado de los aceros para los Sumideros
Se avanza con las excavaciones del tramo del pozo 2 al pozo 1 de la tubería de 16"
Se suspenden actividades por lluvias a las 10:53 am y se reinician actividades a las 2:00pm donde se continuan con las actividades mencionadas.
