INFORME INTERVENTORÍA No. 4



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 202500000620 DE 2025

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

CONTRATO DE OBRA N. COP-2025-002 (22 DE ABRIL DEL 2025)

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

OBJETO: "ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, UNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ."

PERIODO DE EJECUCION

22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 21 DE DICIEMBRE DE 2025

Contenido

INTRODUCCIÓN 4
ANTECEDENTES DEL PROYECTO 5
- DESCRIPCION GENERAL 5
- LOCALIZACION 5
- ALCANCE 6
- ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA 6
- ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 7
- MODIFICACIONES EN EL TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES 7
- INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 8
- RELACIÓN DE PAGOS 9
- BALANCE DEL ANTICIPO 9
- MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO 9
- VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS 10
- SUPERVISORES E INTERVENTORES DELEGADOS AL CONTRATO 10
- INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 10

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA VERIFICACION DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES 15
- EQUIPOS DE OBRA 16
- MATERIALES DE OBRA 16
- REPORTE DE VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA OBJETO DE LA INTERVENTORIA 16
- BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO LO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO 18
- INFORME DE AVANCE DE EJECUCION FISICO, FINANCIERO Y CRONOLOGICO DEL PERIODO Y ACUMULADO 19

Componente y porcentaje de ejecución 19

CRONOLOGICO DEL PERIODO Y ACUMULADO 20
- CONDICIONES CLIMATICAS 21
- INFORME DE SEGUIMIENTO A: PLAN DE TRABAJO, ASPECTOS SISO, MANEJO AMBIENTAL, RELACIÓN Y ORGANIGRAMA DEL PERSONAL DE NÓMINA Y CONTRATADO 23

FICHAS AMBIENTALES DEL PROYECTO 23

Programas ambientales con presupuesto 23
- INFORMES TÉCNICOS DESARROLLADOS Y/O APROBADOS EN EL PERIODO 25
- MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS O MODIFICADAS 26
- RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS DENTRO DEL PERIODO 32
- RELACIONAR Y ADJUNTAR COPIAS DE ACTAS Y SOPORTES 34

- INFORME DEL ESTADO DEL TRAMITE DE LOS PERMISOS 35
- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR 36

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 37

A. INFORMACION BASICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 37

B. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 37

C. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES 37

D. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 38

E. RELACIÓN DE PAGOS 38

F. BALANCE DEL ANTICIPO DE INTERVENTORIA 38

G. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO 38

H. VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS 38

I. SUPERVISORES E INTERVENTORES DELEGADOS AL CONTRATO 39

J. VERIFICACIÓN DE PERSONAL DE INTERVENTORIA 40

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO APORTES SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA 41

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 44

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025CERTIFICADO DE CALIDAD DE OBRAS EJECUTADAS 44

CERTIFICADO DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO DE OBRA 46

INTRODUCCIÓN

En el presente documento se despliega el análisis constructivo la construcción de adecuación y canalización de aguas lluvias en la calle 4, entre cra 2 a la cra 6, del casco urbano de la inspección de san Antonio de Getucha, Municipio de Milán, departamento del Caquetá.". Cabe aclarar que el proyecto antes mencionado se ubica en la zona de urbana de PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MILAN

En cumplimiento con la alcaldía municipal de Milán Caquetá y el PDA Caquetá, en el siguiente informe se presenta la información correspondiente al desarrollo del **CONTRATO DE OBRA N. COP-2025-002 (22 DE ABRIL DEL 2025)** cuyo objeto es "ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, UNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.". Dicho informe es el resultado de la información recopilada en campo y oficina del periodo correspondiente y su veracidad corresponde a la misma.

	Número de Revisión		
Elaboro:	Equipo de interventoría		
Reviso:	Carlos Darío Cano Sánchez		
Aprobó:	Carlos Darío Cano Sánchez		

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

➢ DESCRIPCION GENERAL

Con el siguiente proyecto se proyecta construir sistema de alcantarillado pluvial que tendrá los siguientes componentes

La estructura del proyecto del proyecto es construir un alcantarillado pluvial en la inspección de San Antonio de Getucha

- PRELIMINARES
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
- POZOS DE INSPECCION
- CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROSY CABEZA DE SALIDA
- ASEO GENERAL

➢ LOCALIZACION

El lugar de ejecución del contrato de obra se ubica en la inspección de San Antonio de Getucha, Caquetá, en las coordenadas de ubicación 1°06´33.55¨ N – Longitud -75°24´03.96¨ O, con una altura 283, sobre la vía central de la inspección.



Ilustración 1- GOOGLEAERTH.COM

➢ ALCANCE

El proyecto tiene como alcance la construcción de una línea de alcantarillado pluvial de 415.77 ml, con 9 pozos de inspección, con un cabezal de descarga y 18 sumideros según actualizaciones de diseño.



➢ ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACIÓN BÁSICA

Unidad Ejecutora:	MUNICIPIO DE MILAN CAQUETA
Número del contrato:	**CONTRATO DE OBRA N.** COP- 2025-002
Objeto:	ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, UNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
Nombre del contratista:	CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
Fecha del contrato:	22 DE ABRIL DEL 2025
Plazo de Ejecución Inicial:	5 MESES
Valor Inicial:	NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

	($988.082.242,00) M/CTE, equivalentes a 694,7 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2025
Valor Anticipado:	El anticipo es del 30%, el contratista renuncio al anticipo
Fecha de iniciación:	22 DE AGOSTO DE 2025
Fecha de Terminación Contractual inicial:	21 DE ENERO DE 2025

➢ ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato actualmente se encuentra en ejecución, desde el 22 de agosto de 2025, hasta el 21 octubre de 2025.

➢ MODIFICACIONES EN EL TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

SUSPENSIÓN/ PRÓRROGA	MOTIVO	FECHA DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	PERIODO DE SUSPENSIÓN / PRÓRROGA	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
ACTA DE MODIFICACIÓN No. 001 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-2025-002	**Renuncia al anticipo por parte del contratista**			**(22) días del mes de agosto de 2025.**
ACTA DE MODIFICACIÓN No. 002 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-2025-002	**Modificación de cantidades e item no previstos**			**veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2025.**

➢ INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE MILAN

PROYECTO: Adecuacion y canalizacion de aguas lluvias en la calle 4, entre cra 2 a la cra 6, del casco urbano de la inspección de San Antonio de Getucha, en el municipio de Milán, Departamento del Caquetá

ANÁLISIS DE ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD

		$13.27	SMMLV

Costo directo estimado de obra en pesos	$ 742.996.340		
Programas, adaptación Guía Ambiental y otros			
Tiempo estimado de ejecución obra en meses	5,00	Costo total de Obras del Proyecto:	$ 1.057.248.000
AIU sólo en de impuestos y pólizas	30,00%		

COSTOS DE PERSONAL

Personal Profesional	Cantidad de personal	Dedicacion	Meses Requeridos de labores	Salario mensual	Valor Total
Director de Obra	1	15%	5	$4.000.000,00	$3.000.000,00
Residente de Obra	1	100%	5	$2.500.000,00	$11.500.000,00
Especialista Hidraulico	1	10%	5	$2.500.000,00	$1.250.000,00
SISOMA	1	15%	5	$2.200.000,00	$1.650.000,00
COSTO TOTAL PERSONAL PROFESIONAL					$17.400.000,00

COSTOS VARIOS

Descripcion	Cantidad	Unidad	Repeticion	Valor Unitario	Valor Parcial
GASTOS GENERALES					$ 3.703.845,00
Logistica Previa					$ 2.344.800,00
Campamento					$ 2.344.800,00
Valla informativa obra	1,0	GL	1	$ 400.000,00	$ 400.000,00
Arrendamiento para campamento	1,0	MES	5	$ 345.600,00	$ 1.744.800,00
Gastos Generales					$ 1.359.045,00
SERVICIOS PUBLICOS					$ 459.045,00
Consumo Servicio Agua	1,0	MES	5	$ 50.000,00	$ 250.000,00
Consumo Servicio Ener	1,0	MES	5	$ 41.969,00	$ 209.845,00
Consumo Servicio Tel e Inter	1,0	MES	5		
Sistema Consumo Cel	1,0	MES	5		
GASTOS VARIOS				$ -	$ 900.000,00
Gastos Gen. y Aseo	1,0	Mes	5	$ 80.000,00	$ 400.000,00
Papeleria implementos	1,0	MES	5	$ 80.000,00	$ 400.000,00
Copias Heliog. Fotog	1,0	GL	5	$ 20.000,00	$ 100.000,00

OTROS COSTOS

Descripción	Tasa Impues	Valor
Estampilla Pro adulto mayor	4,00%	$ 42.289.920,0
Estampilla Procultura	2,00%	$ 21.144.960,0
Estampilla Pro Universidad de la Amazonia	3,50%	$ 5.286.240,0
Estampilla pro Electrificación Rural	0,50%	$ 5.286.240,0
Estampilla prodeportes	0,50%	$ 5.286.240,0
Estampilla para la Justica Familiar	7,00%	$ 21.144.960,0
Contribución Sobre Contratos de Obras	6,00%	$ 32.867.400,0
COSTO TOTAL DE IMPUESTOS		$153.300.960,00

COSTOS POLIZAS DE GARANTIA

Descripción	% Asegurado	Meses de Vigencia	Valor Base	Tasa de Asegurdora	Valor Poliza
Cumplimiento	10%	16,00	$1.057.248.000,00	0,12%	$1.057.248,00
Salarios y prestaciones sociales	5%	48,00	$1.057.248.000,00	0,07%	$740.073,00
Estabilidad de la obra	10%	60,00	$1.057.248.000,00	0,12%	$1.057.248,00
Responsabilidad civil extracontractual	400smlv	12,00	$1.057.248.000,00	0,12%	$1.057.248,00
COSTO POLIZAS					$3.911.817,00

VALOR TOTAL ADMINISTRACION DE OBRA	$ 178.316.722,00	24,00%
VALOR TOTAL DE IMPREVISTOS	$ 14.855.727,00	2,00%
VALOR TOTAL DE UTILIDAD	$ 29.719.454,00	4,00%
VALOR TOTAL AIU DE OBRA	$ 222.895.903,00	30,00%

➢ RELACIÓN DE PAGOS

Acta No	Mes/ Año	Valor Facturado	Valor Total	Amortización Anticipo	Saldo Anticipo	Saldo Registro presup.
			$988.082.242,00			
Anticipo			$ 395.232.897			$ 988.082.242 NO FUE COBRADO
1			$ 646.148.872,20			Por pagar
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$988.082.242**

ANEXO 1 COPIA ANEXO FINANCIERO DE OBRA

➢ BALANCE DEL ANTICIPO

El contrato tiene anticipo, el contratista no presenta plan de manejo del anticipo, El contratista renuncio al anticipo, entrego oficio manifestando esto, el oficio fue enviado el 19 de junio de 2025.

BALANCE			
PAGO	**VALOR DESEMBOLSO**	**AMORTIZADO**	**SALDO POR AMORTIZAR**
			N.A
TOTAL			**N. A**

➢ MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO

No se han realizado modificatorios y/o aclaratorios hasta el momento.

CONTRATO ADICIONAL No.	CLÁUSULA ACLARADA Y/O MODIFICADA
Aclaratorio o Modificatorio No. 1	**ACTA DE MODIFICACIÓN No. 001 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-2025-002**
Descripción	**Renuncia al anticipo por parte del contratista**
Aclaratorio o Modificatorio No. 2	**ACTA DE MODIFICACIÓN No. 002 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-2025-002**
Descripción	**1.1.** Modificar la Cláusula 5- Valor del **Contrato de Obra Nº COP-2025-002** del 22 de abril de 2025, **únicamente en el sentido de aplicar la discriminación efectuada en el numeral anterior de la presente acta**, conforme al balance de mayores y menores cantidades de obra e inclusión de ítems no previstos, que como consecuencia generan la afectación de algunos valores unitarios y totales; sin que aquello pueda entenderse como una afectación al valor total del contrato, que continúa

	siendo la suma de **NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($988.082.242,00) M/CTE,** equivalentes a 694,7 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2025.

➢ VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS

Las pólizas solicitadas en el contrato fueron expedidas por compañía ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO

- Pólizas n. 11-40—101077292
- Pólizas 11-44-101253742

A continuación, se relaciona las pólizas entregadas por el contratista en cada momento contractual.

PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

Legalización Del Contrato De Obra

ANEXO 2 SEGUIMIENTOS A LAS GARANTIAS CONTRACTUALES DE OBRA

➢ SUPERVISORES E INTERVENTORES DELEGADOS AL CONTRATO

INTERVENTOR/SUPERVISOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	22 DE AGOSTO DE 2025	21 DE FEBERO DE 2025

➢ INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Revisión documental: Verificación de diseños, planos, estudios de suelos y especificaciones técnicas.

Gestión social y ambiental: Socialización del proyecto con la comunidad, señalización ambiental, gestión de permisos requeridos.

Se debió realizar dos simulaciones hidráulicas desde el acta de inicio, inicialmente se modificó el trazado para cambio del costado, se identificaron presencia de enramadas, pozos de extracción de aguas subterráneas para consumo domiciliario, andenes en concreto entre otras estructuras

construidas por la comunidad. Se realizo una localización y replanteo, equivalente a un levantamiento topográfico en donde se ubicó el siguiente trazado



Se realizo con la simulación hidráulica, se realizó un prebalance de obra, que se origina como base el acta de modificación n.1, pero el día

Las actividades ejecutadas durante el primer mes del proyecto son las mencionadas a continuación:

"Reciba un cordial saludo por parte de la administración municipal y de la secretaria de planeación, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y con el fin de realizar seguimiento al contrato de referencia, me permito convocarlos cordialmente a participar en el Comité de Obra, que se llevará a cabo el día 06 de septiembre de 2025, a las 9:30 a.m., en la zona de intervención.

El propósito de la reunión será resolver dudas e inquietudes por parte de la comunidad, así como tratar aspectos técnicos, administrativos y contractuales que contribuyan al adecuado desarrollo del proyecto. Se solicita puntual asistencia y la de los equipos de trabajo; personal de obra, interventoria y demás actores pertinentes), con el fin de garantizar una revisión integral y oportuna de las actividades ejecutadas y programadas."

En donde básicamente se recibió el sentir de la comunidad sobre la preocupación y la oposición de la afectación de la carpeta asfáltica en la calle que inicia desde el parque principal hasta la institución educativa, obligando nuevamente a realizar una tercera simulación hidráulica y la generación de un prebalance, teniendo como referencia los principios técnicos, financieros y sociales del proyecto, dando como resultado el nuevo trazado del proyecto.



El diseño final se define basado en la protección de la carpeta asfáltica de la primera calle, El diseño final establece que la primera calle se ejecutará por la parte derecha, y a partir de ahí, el trazado se desviará en diagonal hacia la izquierda hasta su conclusión.



REPLANTEO

- Localización y replanteo topográfico inicial: Se realizó la demarcación del área de intervención y la nivelación preliminar.
- Replanteo de las redes manejo pluvial: Se marcó el trazado y se establecieron los ejes y niveles de referencia para guiar las actividades de excavación y construcción de obras civiles.
- Durante la construcción de las redes de alcantarillado se da acompañamiento con equipo topográfico indicando las pendientes de excavación y grados de nivelación de la tubería.



Localización y replanteo



Localización y replanteo

MOVIMIENTOS DE TIERRA


- Descapote y limpieza del terreno: Se ejecutó el desmonte y limpieza del área destinada a la celda, retirando vegetación superficial.
- Excavación mecánica general: Se inició la excavación del área para conformación del trazado de tubería
- Transporte de material: El material excedente fue acopiado en zonas autorizadas dentro del predio, conforme a especificaciones ambientales.
- Relleno con material seleccionado: una vez terminada la excavación mecánica se inició con el relleno para la instalación de tubería.
- Suministro e instalación de tubería PVC D=36"; NTC 5055 ASTM F 794
-

RESUMEN DE LA ACTIVIDADES DESARROLLADOS


Se han iniciado actividades de instalación de tubería las cuales tienen como base las siguientes actividades:

- Localización y replanteo de redes
- Cerramiento provisional lona verde (h=2,00m)
- Excavación manual en material común de 0.00 a 2.00 m
- Excavación manual en material común de 2.00 a 4.00 m
- Excavación mecánica en material común
- Entibado en madera para proteger talud de excavación
- Cargue, transporte y retiro de material sobrante
- "Relleno, Cimentación tubería con arena SP de acuerdo con la norma ASTM 2487
- Relleno con material seleccionado de la excavación
- Suministro e instalación de tubería PVC D=30"; NTC 5055 ASTM F 794
- Suministro e instalación de tubería PVC D=36"; NTC 5055 ASTM F 794


Actualmente se han iniciado actividades en los siguientes tramos

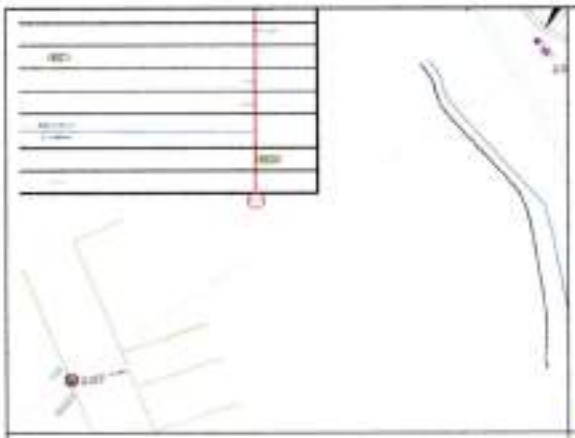


Tramos P8 – Cabezote de descarga

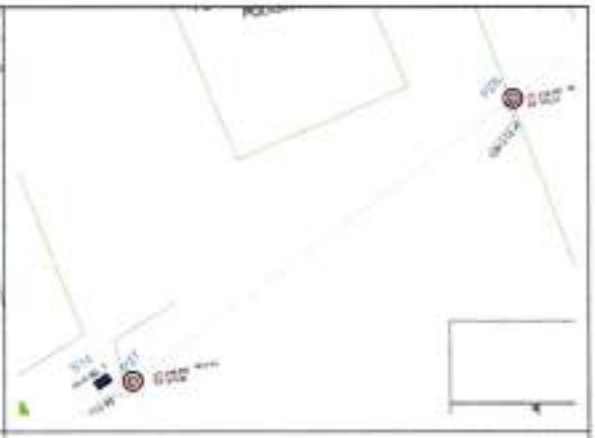

Tramos P7 – Tramo P8

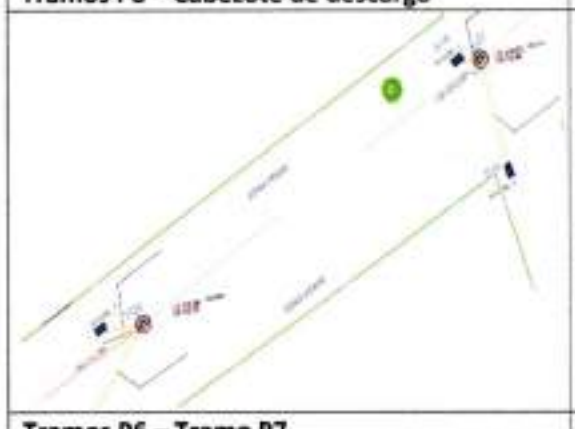

Tramos P6 – Tramo P7

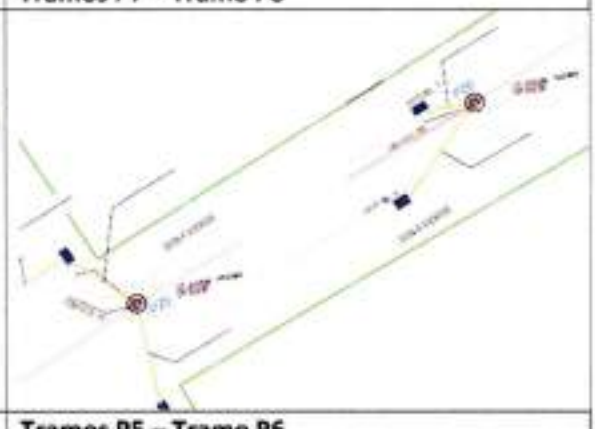

Tramos P5 – Tramo P6




Tramos P4 – Tramo P5



Tramos P3 – Tramo P4



Tramos P2 – Tramo P3

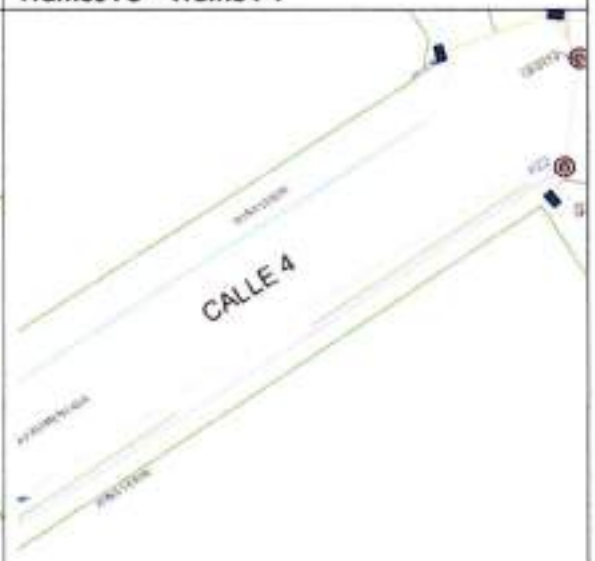

Tramos P1– Tramo P2 con observación

Resumen de los tramos ejecutados hasta el periodo transcurrido en el contrato

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA VERIFICACION DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES

- El contratista de obra hace entrega a la interventoría las hojas de vida debidamente certificadas y cumpliendo con los requisitos habilitantes en el proceso de selección, el personal de obra se compone de los siguientes cargos:
- En el periodo no se han presentado cambios o solicitudes de cambios de personal profesional.

- Se realiza la entrega de informes de obra
- Se realiza la entrega de informes de seguridad y salud en el trabajo
- Se realiza la entrega de informes PAPSO
- El contratista a cumplido con las especificaciones técnicas y de calidad que exige el contrato

➢ EQUIPOS DE OBRA

Las actividades desarrolladas por parte del contratista de obra fue la localización y replanteo de redes y ajustes al diseño original con base al resultado de la modelación.

EQUIPO	MARCA	MODELO
RETROEXCAVADORA	CAT	LLANTAS 420
VOLQUETA 1	CHEVROLET	6 M3
CANGURO	YAMAHA	

ANEXO 3 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO

➢ MATERIALES DE OBRA

El contratista tiene en bodega los siguientes materiales de obra.

ELEMENTO	UND	CANTIDAD
ARENA	M3	9
TELA PROPIVIDA	ML	15
MADERA 5/5	UND	16
MADERA 5/10	UND	9
TABLA BURRA	UND	12
Bultos de cemento 50 kg	und	25

➢ REPORTE DE VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA OBJETO DE LA INTERVENTORIA

El contratista de obra presenta los soportes de pago de SS. A la fecha se encuentra pago de la totalidad planillas de seguridad social del personal mostrado en el anexo. propuesta según al A.I.U

El contratista de obra presento el soporte de pago de la planilla de seguridad social de *los siguientes meses:*

ANEXO 4 FORMATO DE CONTROL DE SS DEL CONTRATO DE OBRA

NOVIEMBRE DE 2025

PERSONAL DE MANO DE OBRA CALIFICADA

Nombre	Cargo
Gustavo Adolfo Olarte Collazos	Director de obra
Diana Lorena Ramos Lozano	Profesional en salud ocupacional
Fernando Andrés Marín Cabrera	Residente de obra
Oscar Orlando Méndez Buitrago	Ingeniero hidráulico – No acredita

PERSONAL DE OBRA EN GENERAL


Nombre	Cargo	Periodo laborado		No Días mes (Base Liquidación)	C.C.
		INICIO	FIN		
DIANA LORENA RAMOS LOZANO	SISO-SST	22/08/2025		30	40.782.364
ANCIZAR ORJUELA MANRIQUE	MAESTRO DE OBRA	26/08/2025		30	17.658.583
NORVEY CAMILO NIETO	AYUDANTE DE OBRA	1/11/2025	12/11/2025	12	83.091.770
GERMINSON BARBOSA PLASAS	AYUDANTE DE OBRA	1/11/2025	12/11/2025	12	1.119.581.245

El contratista presenta los soportes de pago de la seguridad social correspondiente al mes de noviembre, no acredita el pago del ingeniero hidráulico.

Diciembre de 2023	ACREDITA	NO ACREDITA
Agosto de 2025	X	
Septiembre de 2025	X	
Octubre de 2025	X	
Noviembre de 2025		No acredita el pago del ingeniero hidráulico.

➢ BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO LO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO

El contratista de obra entrega el flujograma de ejecución del periodo del presente informe n. 4, este se soporta con la preacta N.4, generada en compañía del contratista de obra en compañía de la interventoria.

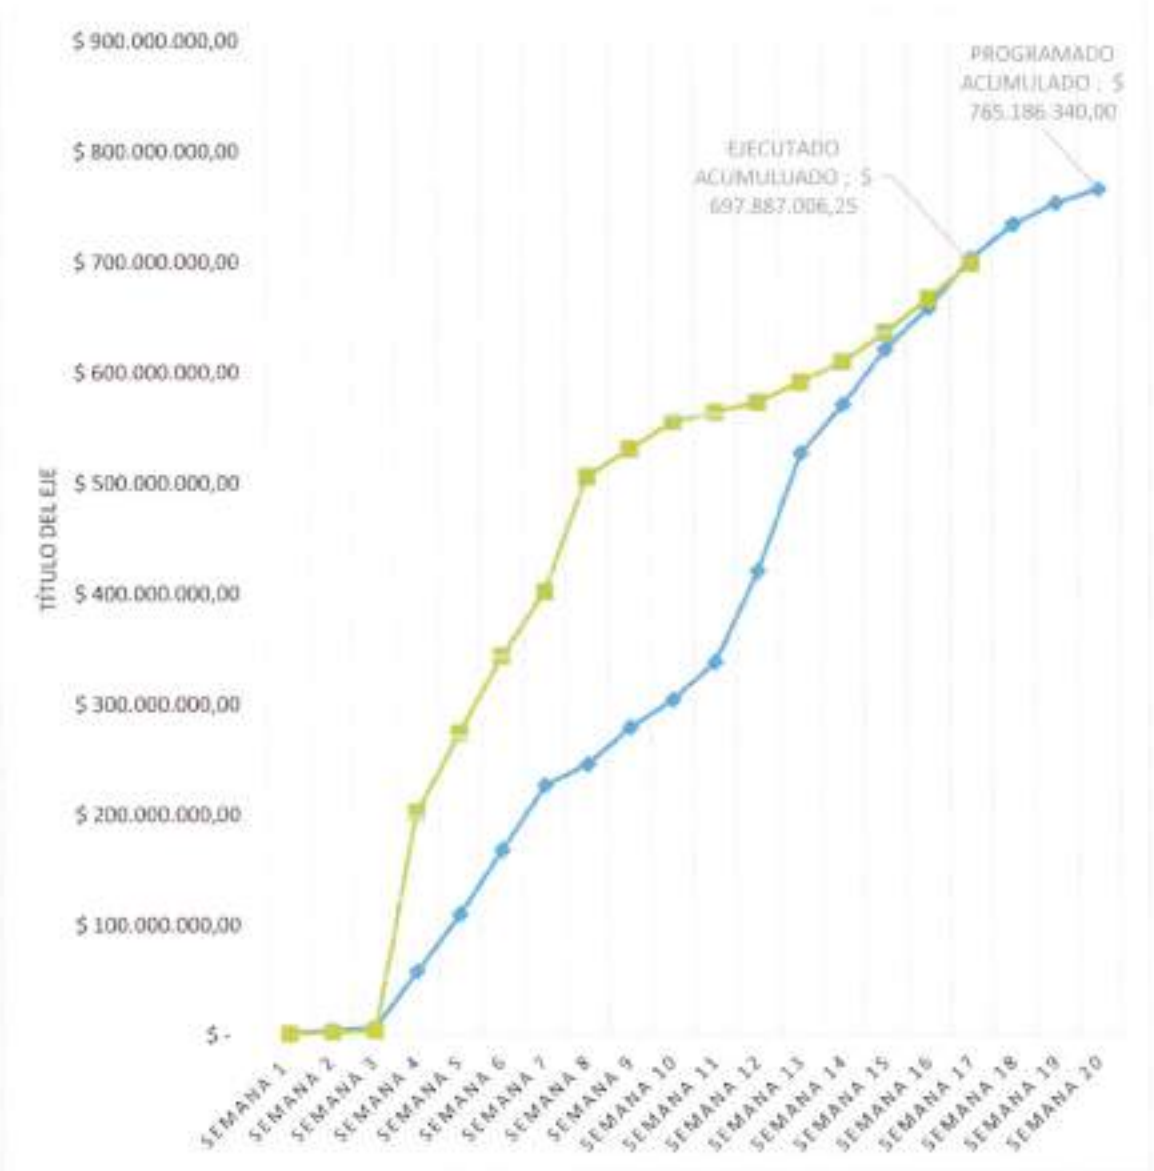

Seguimiento al cronograma de ejecucion

SEMANA	PROGRAMADO SEMANAL	EJECUTADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULUADO

SEMANA 1	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33
SEMANA 2	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33	$ 4.865.051,33	$ 2.797.892,67
SEMANA 3	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33	$ 7.297.577,00	$ 4.196.839,00
SEMANA 4	$ 51.167.237,90	$ 198.033.374,00	$ 58.464.814,90	$ 202.230.213,00
SEMANA 5	$ 51.167.237,90	$ 71.861.373,50	$ 109.632.052,79	$ 274.091.586,50
SEMANA 6	$ 58.508.557,90	$ 69.774.887,50	$ 168.140.610,69	$ 343.866.474,00
SEMANA 7	$ 58.508.557,90	$ 58.177.530,50	$ 226.649.168,58	$ 402.044.004,50
SEMANA 8	$ 18.865.814,40	$ 103.873.589,50	$ 245.514.982,98	$ 505.917.594,00
SEMANA 9	$ 33.638.801,15	$ 25.132.647,50	$ 279.153.784,13	$ 531.050.241,50
SEMANA 10	$ 25.018.101,49	$ 24.290.845,50	$ 304.171.885,62	$ 555.341.087,00
SEMANA 11	$ 33.638.801,15	$ 8.778.576,50	$ 337.810.686,77	$ 564.119.663,50
SEMANA 12	$ 82.467.836,99	$ 8.778.576,50	$ 420.278.523,76	$ 572.898.240,00
SEMANA 13	$ 106.348.747,78	$ 18.192.153,25	$ 526.627.271,54	$ 591.090.393,25
SEMANA 14	$ 44.339.044,11	$ 18.192.153,25	$ 570.966.315,65	$ 609.282.546,50
SEMANA 15	$ 49.769.396,78	$ 26.390.238,58	$ 620.735.712,43	$ 635.672.785,08
SEMANA 16	$ 36.955.057,58	$ 30.319.367,58	$ 657.690.770,01	$ 665.992.152,67
SEMANA 17	$ 44.831.000,58	$ 31.894.853,58	$ 702.521.770,59	$ 697.887.006,25
SEMANA 18	$ 30.916.109,41		$ 733.437.880,00	
SEMANA 19	$ 19.202.617,05		$ 752.640.497,05	
SEMANA 20	$ 12.545.842,95		$ 765.186.340,00	

ANEXO 5 SEGUIMIENTO AL FLUJOGRAMA DE INVERSION

El contratista de obra lleva un avance ejecutado real del 88.83% frente al programado que es 85%, teniendo en cuenta la programación de obra. El contratista tiene avance superior del 3.83 % en la ejecución de obra


Se aclara que este porcentaje mostrado tiene en cuenta los sumideros los cuales no han sido terminados en su totalidad, estos carecen de la instalación de le rejilla en acero, si no se contemplan estas estructuras el avance seria del 75%

➢ INFORME DE AVANCE DE EJECUCION FISICO, FINANCIERO Y CRONOLOGICO DEL PERIODO Y ACUMULADO

Componente y porcentaje de ejecución

CAPITULO	% EJECUTADO
1.0 PRELIMINARES	**76%**
2.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA	**96%**
3.0 POZOS DE INSPECCION	**0%**
4,0 CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROSY CABEZA DE SALIDA	**79%**
5,0 ASEO GENERAL	**0%**
6.0 ITEM NO PREVISTO	**100%**
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	

AVANCE POR CAPITULOS

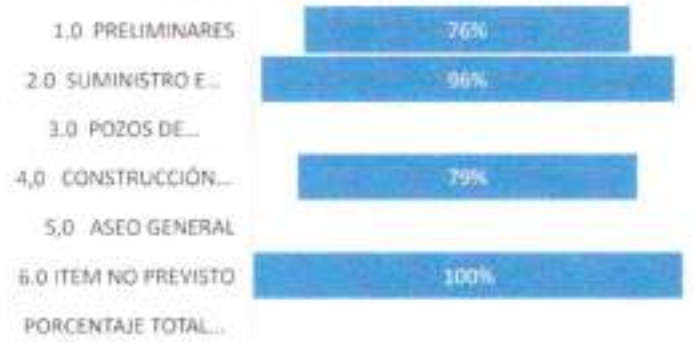

CRONOLOGICO DEL PERIODO Y ACUMULADO

INICIOS DE ACTIVIDAD	*INICIO*	*SUSPENSIÓN*	*DÍAS ACTIVO*
INICIO	22 de agosto de 2025		
agosto de 2025			10
Septiembre de 2025			30
Octubre de 2025			31
noviembre de 2025			30
Diciembre de 2025			22
Enero de 2026			

2025

DIAS TRANSCURRIDOS	123
% TOTAL DE AVANCE DE TIEMPO DEL CONTRATO	81%

Plazo de ejecución Inicial:	*Cinco (5) meses*
Plazo adicional 1:	*N.A*
Plazo adicional 1:	*N.A*
Tiempo en Días:	*150 días*
Plazo de ejecución final	*150 días*

En el siguiente cuadro se plasma los tiempos transcurridos a la fecha de corte del presente informe


- **AVANCE FINANCIERO**

Inversión Contratada:	*$ 988.082.243,00*
Inversión Básica del Contrato:	*$ 765.186.340,00*
Inversión Básica ejecutada en el periodo:	***$ 140.612.475.36***
Porcentaje ejecutado en el periodo:	***8.75%***
Inversión total ejecutada:	***$ 653.910.828***
Porcentaje total ejecutado:	***86.03%***
Porcentaje total por ejecutar, pendiente de la liquidación:	***13.97%***

➢ CONDICIONES CLIMATICAS

OCTUBRE 2025

CLIMA	CANT	%
Seco	25	82,10%
Lluvias moderadas	4,3	13,71%
Lluvias intensas	1,3	4,19%
Total, días	31	100,00%

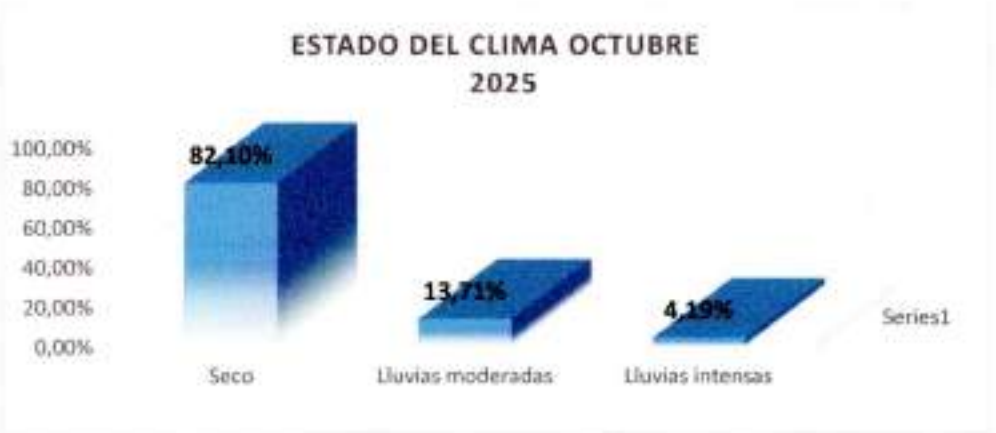

NOVIEMBRE 2025

CLIMA	CANT	%
Seco	23	76,59%
Lluvias moderadas	5,3	17,73%
Lluvias intensas	1,7	5,69%
Total días	30	100,01%



DICIEMBRE

CLIMA	CANT	%
Seco	20	93,33%
Lluvias moderadas	0,9	4,29%
Lluvias intensas	0,5	2,38%
Total días	21	100,00%



ANEXO 6 FORMATO DE CONTROL DE LLUVIAS

Las condiciones climáticas en la región han sido favorables, se presentaron días con precipitaciones intensas en donde no se podían realizar trabajos al aire libre, el 87% del tiempo se presentaron días soleados y esto favoreció el rendimiento de obra, el contratista lleva un rendimiento de obra superior al contratado.

➢ INFORME DE SEGUIMIENTO A: PLAN DE TRABAJO, ASPECTOS SISO, MANEJO AMBIENTAL, RELACIÓN Y ORGANIGRAMA DEL PERSONAL DE NÓMINA Y CONTRATADO

FICHAS AMBIENTALES DEL PROYECTO

N.	*Ficha Ambiental*	*Nombre del programa/ ficha ambiental*
1	FICHA N. 1	AFECTACION DEL PROYECTO SOBRE EL AREA DE INFLUENCIA
2	FICHA N. 2	MANEJO DE CAMPAMENTOS INSTALACIONES Y TEMPORALES
3	FICHA N. 3	MANEJO DEL RECURSO SUELO
4	FICHA N. 4	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS Y SOBRANTES DE OBRA
5	FICHA N. 5	MANEJO COMPONENTE ATMOSFERICO
6	FICHA N. 6	*MANEJO DE FLORA Y FAUNA*
7	FICHA N. 7	*PROGRAMA COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA*

Programas ambientales con presupuesto

INVERSION SOCIO - AMBIENTAL.				
ITEM	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**
GESTIÓN AMBIENTAL				
Manejo de Residuos Sólidos				
PUNTO ECOLOGICO EN EL AVANCE POR TRAMOS DE LA OBRA	un	1	$680.000	$680.000
Plástico negro calibre 4 ancho de 2 m	M2	400	$2.145	$858.000
Señalización vial				
Señales informativas según manual de señalización vial INICIO Y FIN DE OBRA	un	2	$240.000	$480.000
Señales preventivas según manual de señalización vial MAQUINARIA Y OBREROS	un	2	$240.000	$480.000

Auxiliar de Señalización y orientación de cierres viales e identificación en las áreas de los frentes de trabajo	Mes	5	$1.800.000	$9.000.000
Dispositivos para canalizar el tránsito				
Conos de 0,90	un	10	$97.500	$975.000
Maletín de señalización	Und	2	$750.000	$1.500.000
Abanderados				
Paleta de pare y siga*	un	1	$55.000	$55.000
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL				
Ubicación y dotación de campamentos				
Camilla de emergencias	un	1	$300.000	$300.000
Extintor ABC 10 LB (más dos recargas)	un	1	$180.000	$180.000
Botiquín cruz roja	un	1	$580.000	$580.000
Demarcación del área de trabajos				
Cinta Señalización Peligro	ml	600	$450	$525.000
RETIRO y disposición final				
Disposición final de demoliciones	M3	95.49	$65.000	$6.206.850
VALOR TOTAL INVERSION AMBIENTAL				**$22.200.000**

Fuente- Contratista de obra

El contratista de obra entrego los ajustes a las fichas de manejo ambiental y adicionalmente se realiza un ajuste del presupuesto de ejecución de este.

El contratista de obra entrega no realiza entrega informe de cumplimiento ambiental del presente periodo

➢ INFORMES TÉCNICOS DESARROLLADOS Y/O APROBADOS EN EL PERIODO.

Semana	Periodo inicial	Periodo final	Informe n.
01	22/08/2025	28/08/2025	1
02	29/08/2025	04/09/2025	
03	05/09/2025	11/09/2025	
04	12/09/2025	18/09/2025	
05	19/09/2025	25/09/2025	2
06	26/09/2025	2/10/2025	
07	3/10/2025	9/10/2025	
08	10/10/2025	18/10/2025	
09	17/10/2025	23/10/2025	3
10	24/10/2025	30/10/2025	
11	31/10/2025	6/11/2025	
12	7/10/2025	13/10/2025	
13	14/10/2025	20/10/2025	
14	21/11/2025	27/11/2025	4
15	28/11/2025	4/12/2025	
16	5/12/2025	11/12/2025	
17	12/12/2025	18/12/2025	
18	19/12/2025		

ANEXO 7 INFORMES SEMANALES

➢ MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS O MODIFICADAS

Se genero el **ACTA DE MODIFICACIÓN No. 001 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-2025-002, en donde se plasman y se legalizan los ajustes de las cantidades obra.**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRATO			VALORES MODIFICATORIOS PRESENTE ACTA			TOTAL CANTIDADES MODIFICADAS	
			CANTIDAD CONTRATO	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD TOTAL +/-	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
I	1.0 PRELIMINARES									
1,01	Localización y replanteo de redes	M2	897,25	$ 7.138,00	$ 6.404.571,00	-341,41		-$ 2.436.993,00	555,84	$ 3.967.577,00
1,02	Cerramiento provisional lona verde (h=2,00m)	ML	897,25	$ 15.149,00	$ 13.592.440,00	-23,89		-$ 361.910,00	873,36	$ 13.230.531,00
1,03	Excavación manual en material común de 0.00 a 2.00 m	M3	72,71	$ 52.702,00	$ 3.831.962,00	65,95		$ 3.475.627,00	138,66	$ 7.307.589,00
1,04	Excavación manual en material común de 2.00 a 4.00 m	M3	37,50	$ 69.015,00	$ 2.588.063,00	-27,33		-$ 1.886.478,00	10,17	$ 701.585,00
1,05	Excavación mecánica en material común	M3	1281,00	$ 21.868,00	$ 28.012.908,00	17,44		$ 381.414,00	1298,44	$ 28.394.322,00
1,06	Entibado en madera para proteger talud de excavación	M2	390,55	$ 60.322,00	$ 23.558.757,00	526,20		$ 31.741.277,00	916,75	$ 55.300.034,00
1,07	Cargue, transporte y retiro de	M3	653,41	$ 53.566,00	$ 35.000.326,00	-244,59		-$ 13.101.733,00	408,82	$ 21.898.593,00

	material sobrante									
1,08	Relleno, Cimentación tubería con arena SP de acuerdo a la norma ASTM 2487	M3	104,29	$ 92.334,00	$ 9.629.513,00	-7,14		-$ 659.402,00	97,15	$ 8.970.111,00
1,09	Relleno con material seleccionado de la excavación	M3	736,13	$ 17.493,00	$ 12.877.122,00	519,87		$ 9.094.062,00	1256,00	$ 21.971.184,00
1,10	Suministro e instalación de sub_base granular tipo C, NT1	M3	183,70	$ 265.164,00	$ 48.710.627,00	-71,22		-$ 18.883.654,00	112,49	$ 29.826.973,00
1,11	Suministro e instalación de base granular tipo C, NT1	M3	63,30	$ 275.164,00	$ 17.417.881,00	-34,92		-$ 9.608.342,00	28,38	$ 7.809.540,00
1,12	Suministro e instalación de asfaltita natural, en áreas afectadas por la excavación	M2	177,46	$ 57.428,00	$ 10.191.173,00	40,78		$ 2.341.799,00	218,24	$ 12.532.972,00
				SUBTOTAL	**$ 211.815.343,00**			**$ 95.667,00**		**$ 211.911.011,00**
2	**2.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA**									
2,01	Suministro e instalación de tubería PVC D=315mm; NTC 3722-3 S8	ML	168,24	$ 143.318,00	$ 24.111.820,00	-15,21	-	-$ 2.179.867,00	153,03	$ 21.931.954,00
2,02	Suministro e instalación de tubería PVC	ML	43,84	$ 288.623,00	$ 12.653.232,00	35,17	-	$ 10.150.871,00	79,01	$ 22.804.103,00

	D=400mm; NTC 3722-3 S8									
2,03	Suministro e instalación de tubería PVC D=450 mm; NTC 3722-3 S8	ML	82,02	$ 384.475,00	$ 31.534.640,00	-35,26	-	-$ 13.556.589,00	46,76	$ 17.978.051,00
2,04	Suministro e instalación de tubería PVC D=27"; NTC 5055 ASTM F 794	ML	160,27	$ 790.424,00	$ 126.681.254,00	3,67	-	$ 2.900.856,00	163,94	$ 129.582.111,00
2,05	Suministro e instalación de tubería PVC D=30"; NTC 5055 ASTM F 794	ML	51,96	$ 860.479,00	$ 44.710.489,00	-0,77	-	-$ 662.569,00	51,19	$ 44.047.920,00
2,06	Suministro e instalación de tubería PVC D=36"; NTC 5055 ASTM F 794	ML	77,68	$ 1.655.575,00	$ 128.605.066,00	18,10	-	$ 29.965.908,00	95,78	$ 158.570.974,00
				SUBTOTAL	**$ 368.296.501,00**			**$ 26.618.610,00**		**$ 394.915.113,00**
3	**3.0 POZOS DE INSPECCION**									
3,01	Pozos de inspección en concreto f´c= 24Mpa D=1.20 m y h<=2.00 m. incluye tapa	UN D.	6,00	$ 5.291.913,00	$ 31.751.478,00	-6,00	-	-$ 31.751.478,00	0,00	$ -
3,02	Pozos de inspección en concreto f´c= 24Mpa D=1.20 m y 2.01>h<=4.0	UN D	3,00	$ 8.892.711,00	$ 26.678.133,00	-3,00	-	-$ 26.678.133,00	0,00	$ -

	0 mincluye tapa									
				SUBTOTAL	**$ 58.429.611,00**			**-$ 58.429.611,00**		**$ -**
4	**4,0 CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROSY CABEZA DE SALIDA**									
4,01	Construcción de cunetas transversales de vía, L=10.97m x 0.85 m, ancho útil de 0.45m, espesor de muros de 0.20m, y rejillas en platina de 2" x 3/8	UND	3,00	$ 15.491.870,00	$ 46.475.610,00	-3,00	-	-$ 46.475.610,00	0,00	$ -
4,02	Construcción de cunetas transversales de vía, L=9.32m x 0.85 m, ancho útil de 0.45m, espesor de muros de 0.20m, y rejillas en platina de 2" x 3/8	UND	1,00	$ 13.602.431,00	$ 13.602.431,00	-1,00	-	-$ 13.602.431,00	0,00	$ -
4,03	Construcción de sumidero de 1.64m x 0.88m, ancho útil de 0.58m x 1.34m, e=0.15m, rejilla platina de 2 x 3/8	UND	9,00	$ 3.520.431,00	$ 31.683.879,00	-9,00	-	-$ 31.683.879,00	0,00	$ -

4,04	Construcción de sumidero de 1.64m x 0.98m, ancho útil de 0.68m x 1.34m, e=0.15m, rejilla platina de 2 x 3/8	UND	2,00	$ 3.759.731,00	$ 7.519.462,00	16,00	-	$ 60.155.696,00	18,00	$ 67.675.158,00
4,05	Construcción de cabezal de salida	UND	1,00	$ 4.154.529,00	$ 4.154.529,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 4.154.529,00
				SUBTOTAL	**$ 103.435.911,00**			**-$ 31.606.224,00**		**$ 71.829.687,00**
5	**5,0 ASEO GENERAL**									
5,01	Aseo general de Obra	UND	1,00	$ 1.008.974,00	$ 1.008.974,00	0,00	-	$ -	1,00	$ 1.008.974,00
				SUBTOTAL	**$ 1.008.974,00**			**$ -**		**$ 1.008.974,00**
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**									
NP-1	Pozos de inspección en concreto f'c= 24Mpa D=1.50 m y h<=2.00 m. incluye tapa	UND			$ -	4,00	$ 6.148.564,00	$ 24.594.256,00	4,00	$ 24.594.256,00
NP-2	Pozos de inspección en concreto f'c= 24Mpa D=1.50 m y 2.01>h<=3.00 mincluye tapa	UND			$ -	3,00	$ 9.043.314,00	$ 27.129.942,00	3,00	$ 27.129.942,00
NP-3	Pozos de inspección en concreto f'c= 24Mpa D=1.60 m y 3.01>h<=4.00 mincluye tapa	UND			$ -	1,00	$ 11.597.357,00	$ 11.597.357,00	1,00	$ 11.597.357,00

		SUBTOTAL	**$ -**	**$ 11.597.357,00**		**$ 63.321.555,00**
		COSTO DIRECTO DE OBRA (A)	**$ 742.986.340,00**			**$ 742.986.340,00**
ADMINISTRACION	24%	$ 178.316.722,00		ADMINISTRACION	24%	$ 178.316.722,00
IMPREVISTOS	2%	$ 14.859.727,00		IMPREVISTOS	2%	$ 14.859.727,00
UTILIDAD	4%	$ 29.719.454,00		UTILIDAD	4%	$ 29.719.454,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		$ 22.200.000,00		PLAN DE MANJO AMBIENTAL		$ 22.200.000,00
		COSTO TOTAL DE OBRA	**$ 988.082.243,00**	**COSTO TOTAL DE LA OBRA MODIFICADO**		**$ 988.082.243,00**

PRE-ACTA N°3

ANEXO 8 COPIA DE LA PREACTA N. 4

➢ RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS DENTRO DEL PERIODO

A continuación, se relacionan las reuniones realizadas en comités de obra

COMITÉ	TEMA	COMPROMISOS
ACTA DE COMITÉ N.1	dar seguimiento a la ejecución del contrato de obra e interventoría desde la firma del acta de inicio el 22 de julio de 2025	Acta de concertación de precios. Acta del comité técnico donde se reflejan las modificaciones y demora en la elaboración del acta de modificación. Justificación técnica de obra para el acta modificatoria. Informe técnico de la interventoría que avale los cambios. APUs de los ítems no previstos. Acta modificatoria.
ACTA DE COMITÉ N.2	Comité de obra para el análisis del trazado actualizado ➢ Dudas e inquietudes por parte de la comunidad ➢ Aspectos técnicos ➢ Conclusión del comité.	Entregar Modelación hidráulica Entregar Diseño estructural Entregar el Prebalance de obra según las nuevas modificaciones Entregar Item no previstos.
ACTA DE COMITÉ N.3	Socialización de justificación de imprevistos.	

ACTA DE COMITÉ N.4	Comité de obra para el análisis del trazado actualizado • Solicitudes de Obra • Cambio de diseños de las rejillas de sumideros por tapas prefabricadas • modificación del tramo P1-P2	• Entregar soporte hidráulico para poder estudiar la modificación del tramo PZ1 - PZ2 • Entregar el Prebalance de obra según las nuevas modificaciones • Entregar APU borrador ítem no previstos, sumideros de rejillas plásticas
ACTA DE COMITÉ N.5	Avance de obra Solicitud de Modificación de tramos P1 – P2 Diseños de sumideros	• Balance de obra como soporte de modificación de obra • Informe soporte de justificación de modificación de tramos p1-p2
ACTA DE COMITÉ N.6	Socialización de justificación de imprevistos. Seguimiento a la ejecución del contrato de obra APUS de los ítem no previstos Entrega de balance de obra n. 2 Solicitud de terminación de trabajos	Entregar los siguientes documentos • Informe de justificación de ítem non previstos y modificación de cantidades • APUS de ítem no previstos • Memorias de cantidades de acta de modificación Iniciar actividades pendientes en durante el quinto mes de ejecución
ACTA DE COMITÉ N.7	Verificación del avance de obra Señalización de estructuras incompletas Medición de las áreas de recuperación de pavimentos Sumideros adicionales ajustados a las profundidades por redes existentes	Señalizar y aislar las estructuras de sumideros por terminar. Revisión y aprobación del acta de modificación con cantidades mencionadas en comité

ANEXO 9 COPIA DE ACTA DE COMITE DE OBRA 06 Y 07

CORRESPONDENCIA ENVIADA

A continuación, se relacionan los oficios enviados y recibidos por parte del contratista

ITEM	FECHA	ENVIA	RECIBE	ASUNTO

1	28 noviembre de 2025	**CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025**	**CONSORCIO SAN ANTONIO 2025**	solicitudes de obra.
2	28 noviembre de 2025	**CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025**	**CONSORCIO SAN ANTONIO 2025**	Observaciones de obra.
3	04 diciembre de 2025	**CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025**	**CONSORCIO SAN ANTONIO 2025**	Observaciones de obra.
4	04 diciembre de 2025	**CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025**	**CONSORCIO SAN ANTONIO 2025**	Observaciones de obra.
5	19 diciembre de 2025	**CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025**	**CONSORCIO SAN ANTONIO 2025**	Solicitudes de obra.

CORRESPONDENCIA RECIBIDAS

ITEM	FECHA	ENVIA	RECIBE	ASUNTO
1	21 de noviembre de 2025	**PDA CAQUETA**	**CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025**	Cierre de recepción de cuentas del 2025
2	25 noviembre de 2025	**PDA CAQUETA**	**CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025**	Observaciones de la cuenta

➢ RELACIONAR Y ADJUNTAR COPIAS DE ACTAS Y SOPORTES

comité n.	**fecha del comité**	**Entidades asistentes al comité**
Comité n. 1	**(06 de septiembre de 2025)**	MUNICIPIO DE MILAN CAQUETA CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

Comité n. 2	**(15 de septiembre de 2025)**	APOYO TECNICO PDA CAQUETA MUNICIPIO DE MILAN CAQUETA CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
Comité n. 3	**(18 de soctubre de 2025)**	CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
Comité n. 4	**(20 de octubre de 2025)**	APOYO TECNICO PDA CAQUETA MUNICIPIO DE MILAN CAQUETA CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
Comité n. 5	**(30 de octubre de 2025)**	APOYO TECNICO PDA CAQUETA CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
Comité n. 6	**(29 de noviembre de 2025)**	APOYO TECNICO PDA CAQUETA CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
Comité n. 7	**(21 de diciembre de 2025)**	APOYO TECNICO PDA CAQUETA CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

➢ INFORME DEL ESTADO DEL TRAMITE DE LOS PERMISOS

Permisos ambientales o de obra

Tipo de permiso	Necesidad	Observación
Permiso de ocupación de cauce	N.A	
Concesión de aguas	N. A	
Permiso de vertimientos	N. A	
Título minero y/o Rucom de proveedores	N.A	El contratista entrego soporte de los proveedores de material pétreo
Disposición de material sobrante	N.A	El municipio no cuenta con ninguna escombrera certificada, se debe buscar un predio privado que certifique el recibo del material sobrante de obra. No se han iniciado labores constructivas
Permiso de servidumbre		Se cuenta con el permiso de servidumbre del predio privado intervenido.

➢ OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

- El contrato se viene desarrollando con normalidad, el avance es superior al programado, se han encontrado tuberías de alcantarillado sanitario que no habían sido registrado y esto ha obligado a realizar ajustes pequeños en las profundidades y retiros de tubería instalado, el noventa 92% de la tubería se encuentra instalada.

- El contratista presenta falencias en el cumplimiento ambiental, se presenta un incumplimiento en la entrega del informe de cumplimiento ambiental.

- Es claro que el contrato ha tenido un avance de obra ha sido superior al programado, pero durante el ultimo mes "diciembre" los avances han caído en rendimiento

ANEXO 10 INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A. INFORMACION BASICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Unidad Ejecutora:	**GOBERNACION DEL CAQUETA V -PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS**
Número del contrato:	202500000620 DE 2025
Objeto:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.
Nombre del contratista:	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
Fecha del contrato:	
Plazo de Ejecución Inicial:	5 MESES
Valor Inicial:	SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($69.165.757,00) M/CTE
Valor Anticipado:	N.A
Fecha de iniciación:	22 DE AGOSTO DE 2025
Fecha de Terminación Contractual inicial:	22 DE ENERO DE 2026

B. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato actualmente se encuentra en ejecución, desde el 22 de agosto de 2025, hasta el 21 enero de 2026.

C. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

No se han realizado suspensiones o prorrogas al contrato de obra o interventoria.

D. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad de Recursos número 17357 de fecha 06 de noviembre de 2024, por valor de $69,165,757.00.

No de CDR	17357	**Fecha de expedición**	06 de noviembre de 2024		
Valor			$69,165,757.00		
Rubro	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		**Valor por rubro**	$69,165,757.00	

E. RELACIÓN DE PAGOS

Hasta el momento no se ha realizado ningún cobro por parte de la obra o interventoría.

CONCEPTO	PERIODO		VALOR	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	VALOR A PAGAR	SALDO
	DE	A				
VALOR DEL CONTRATO			$68.868.934			
Anticipo			N.a	N.a	N.a	N.a
COBRO N.1						

ANEXO 11 Formato financiero de la interventoría

F. BALANCE DEL ANTICIPO DE INTERVENTORIA

El contrato tiene no tiene anticipo

G. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO

No se han realizado modificatorios y/o aclaratorios hasta el momento.

CONTRATO ADICIONAL No.	CLÁUSULA ACLARADA Y/O MODIFICADA

H. VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS

Las pólizas solicitadas en el contrato fueron expedidas por compañía **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA SAS**

POLIZAS INICIALES DEL CONTRATO

AMPARO	% sobre Vlr. contrato	VIGENCIA SOLICITADA EN CONTRATO		Nº PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA PÓLIZA	
		DESDE	HASTA			INICIO	FIN
Cumplimiento	20%	22/04/2025	2/04/2026	560-47-994000189215 ANEXO 0	$ 13.773.786,80	22/04/2025	2/04/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y Prestaciones	10%	22/04/2025	22/10/2028	560-47-994000189215 ANEXO 0	$ 6.886.893,40	22/04/2025	22/10/2028
Calidad del servicio	20%	22/05/2025	22/09/2030	560-47-994000189215 ANEXO 0	$ 13.773.786,80	22/05/2025	22/09/2030

POLIZAS DEL ACTA INICIO

AMPARO	% sobre Vlr. contrato	VIGENCIA SOLICITADA EN CONTRATO		N.º PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA PÓLIZA	
		DESDE	HASTA			INICIO	FIN
Cumplimiento	20%	29/05/2025	9/05/2026	560-47-994000189215 ANEXO 1	$ 13.773.786,80	29/05/2025	9/05/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y Prestaciones	10%	29/05/2025	9/11/2028	560-47-994000189215 ANEXO 1	$ 6.886.893,40	29/05/2025	9/11/2028
Calidad del servicio	20%	28/10/2025	28/10/2030	560-47-994000189215 ANEXO 1	$ 13.773.786,80	28/10/2025	28/10/2030

A continuación, se relaciona las pólizas entregadas por el contratista en cada momento contractual.

ANEXO 12 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

I. SUPERVISORES E INTERVENTORES DELEGADOS AL CONTRATO

INTERVENTOR/SUPERVISOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS - NIDIA CAROLINA	22 DE AGOSTO DE 2025	21 DE ENERO DE 2025

J. VERIFICACIÓN DE PERSONAL DE INTERVENTORIA

Nombre	Cargo	C.C.
FABIAN NARVAEZ CANO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	79.872.034
DAIRA LUCIA VALENZUELA PASTRANA	ASESOR AMBIENTAL	1.075.240.914
BRYAN ANDRES VALENCIA ROA	ASESOR CONTABLE	1.117.530.134
NADIA ALEJANDRA MURILLO ORTIZ	ASESOR JURIDICO	1.117.512.172
PAULA VANESSA OME SANCHEZ	ASESOR SOCIAL	1.117.525.037
JORGE ANDRES MONCADA SUAZA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	5.819.666

La interventoría hace entrega de las seguridades sociales de los siguientes meses:

Año	Mes	n. de planilla
2025	Agosto	9492583700-9492583913
2025	Septiembre	9493173202 - 9493173215
2025	Octubre	Pendiente
2025	Noviembre	9495900166-9496722304

ANEXO 13 -FORMATO *COPIA* DEL FORMATO SE SEGUIMIENTO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y SOPORTE DE PAGO
ANEXO 14 - *INFORME* DE OBRA
ANEXO 15 – REGISTRO FOTOGRAFICO
ANEXO 16 – COPIA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA AMBIENTAL N.º 4
ANEXO 17 – CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA
ANEXO 18 – INFORME SOCIAL

CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO APORTES SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA

Yo, CARLOS DARIO CANO SANCHEZ como Representante Legal del CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025, que a su cargo tiene la interventoría sobre el contrato de obra **Nº** OP-2025-002 del municipio de MILAN CAQUETA

CERTIFICO:

Que la empresa CONSORCIO SAN ANTONIO 2025, como CONTRATISTA de las referidas obras, ha suministrado a la interventoría el pago de seguridad social de manera parcial:

Certificación expedida por el representante legal de la interventoría, que la empresa CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 se encuentra a paz y salvo con las obligaciones sobre el sistema de Seguridad Social, riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, del personal que está vinculado al proyecto, en el periodo comprendido entre el **22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 21 DE DICIEMBRE DE 2025**

Personal para presentar

Nombre	Cargo	No Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Planilla	No. días cotizados
GUSTAVO ADOLFO OLARTE COLLAZOS	DIRECTOR DE OBRA	30	17.650.594	35141430-35778826	30
FERNANDO ANDRES MARIN CABRERA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	30	1.117.512.681	35758178	30
OSCAR ORLANDO MENDEZ BUITRAGO	INGENIERO HIDRAULICO	0	1.130.744.004	35778826	0
DIANA LORENA RAMOS LOZANO	SISO-SST	30	40.782.364	9494595725-35778826	30
ANCIZAR ORJUELA MANRIQUE	MAESTRO DE OBRA	30	17.658.583	35758178	30
NORVEY CAMILO NIETO	AYUDANTE DE OBRA	12	83.091.770	35778565	12
GERMINSON BARBOSA PLASAS	AYUDANTE DE OBRA	12	1.119.581.245	35778565	12

El contratista de obra no presenta la ss del ingeniero hidráulico correspondiente el mes de noviembre.

Diciembre de 2023	ACREDITA	NO ACREDITA
Agosto de 2025	X	
Septiembre de 2025	X	
Octubre 2025	x	
Noviembre de 2025	x	No acredita la totalidad

Para constancia se firma en el Municipio de Florencia a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025

CARLOS DARÍO CANO SÁNCHEZ
CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

ANEXOS

ANEXO 1 COPIA ANEXO FINANCIERO DE OBRA 9
ANEXO 2 SEGUIMIENTOS A LAS GARANTIAS CONTRACTUALES DE OBRA 10
ANEXO 3 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO 16
ANEXO 4 FORMATO DE CONTROL DE SS DEL CONTRATO DE OBRA 17
ANEXO 5 SEGUIMIENTO AL FLUJOGRAMA DE INVERSION 19
ANEXO 6 FORMATO DE CONTROL DE LLUVIAS 22
ANEXO 7 INFORMES SEMANALES 25
ANEXO 8 COPIA DE LA PREACTA N. 4 32
ANEXO 09 COPIA DE ACTA DE COMITE DE OBRA 06 Y 07 33
ANEXO 10 INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 36
ANEXO 11 Formato financiero de la interventoria 38
ANEXO 12 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 39
ANEXO 13 -FORMATO COPIA DEL FORMATO SE SEGUIMIENTO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y SOPORTE DE PAGO 40
ANEXO 14 - INFORME DE OBRA 40
ANEXO 15 – REGISTRO FOTOGRAFICO 40
ANEXO 16 – COPIA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA AMBIENTAL N.º 4 40
ANEXO 17 – CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 40
ANEXO 18 – INFORME SOCIAL 40

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

Yo, CARLOS DARIO CANO SANCHEZ como Representante Legal del CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025, que a su cargo tiene la interventoría sobre el contrato de obra Nº OP-2025-002 del municipio de MILAN CAQUETA

CERTIFICO:

Que el CONSORCIO SAN ANTONIO 2025, como contratista de las referidas obras, ha realizado la socialización del proyecto según la siguiente relación:

- Socialización inicial en el municipio de Milán

Para constancia se firma en el Municipio de Florencia a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025

CARLOS DARIO CANO SÁNCHEZ
CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

CERTIFICADO DE CALIDAD DE OBRAS EJECUTADAS

Yo, CARLOS DARIO CANO SANCHEZ como Representante Legal del CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025, que a su cargo tiene la interventoría sobre el contrato de obra Nº OP-2025-002 del municipio de MILAN CAQUETA **CERTIFICO:**

Que CONSORCIO SAN ANTONIO 2025, como contratista de las referidas obras, ha ejecutado actividades de obra en el periodo correspondiente entre en el periodo comprendido entre el periodo comprendido entre el **22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 21 DE DICIEMBRE DE 202,** por lo tanto, ha sido necesario sustentarlas mediante (Corte de Obra N. 4).

Para constancia se firma en el Municipio de Florencia a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025



CARLOS DARIO CANO SÁNCHEZ
CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

CERTIFICADO DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO DE OBRA

Yo, CARLOS DARIO CANO SANCHEZ como Representante Legal del CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025, que a su cargo tiene la interventoría sobre el contrato de obra Nº OP-2025-002 del municipio de SAN MILAN CAQUETA**CERTIFICO:**

- Que el CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 como contratista de las referidas obras, ha ejecutado actividades de obra en el periodo correspondiente en el periodo comprendido entre el periodo comprendido entre el **22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 21 DE DICIEMBRE DE 2025,** por lo tanto, se sustentan mediante PREACTA No. 4 (Corte de Obra) y se puede asegurar que se desarrollaron con arreglo a condiciones;
- Que CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 ha construido y/o adecuado el campamento y/o adecuando instalaciones para almacenar los materiales, insumos en el periodo comprendido entre el **22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 21 DE DICIEMBRE DE 2025**, por lo tanto, se puede asegurar la existencia de estos y que están de acuerdo con las condiciones establecidas en las especificaciones del contrato y las aplicables al proyecto.
- Se tiene EVIDENCIA que la empresa CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 ha suministrado el equipo en el sitio de la obra en el periodo comprendido entre el **22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 21 DE DICIEMBRE DE 2025**, por lo tanto, se puede asegurar que son los mencionados por el contratista en la propuesta.

Para constancia se firma en el Municipio de Florencia a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025



CARLOS DARÍO CANO SÁNCHEZ
CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

ANEXOS

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
NIT: 901.955.099-5

ANEXO 1 COPIA ANEXO FINANCIERO DE OBRA

CR 14 # 13-40 – OFICINA 203 Barrio el centro - Tel: 3134629855 -
consorcioalcantarilladosananto@gmail.com

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA MUNICIPIO DE MILAN CAQUETA ANEXO INFORME FINANCIERO DE LA OBRA	CODIGO			
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

PERIODO
Inicio: 22-nov-25 Fin: 21-dic-25

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE MILAN CAQUETA — MUNICIPIO: MILAN
OBJETO: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, UNICIPIO DE MILÁN, DISPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
CONTRATO No: COP-2025-002
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE OBRA

Acta No	Mes/ Año	Valor Facturado	Valor IVA	Valor Total	Amortización Anticipo	Saldo Anticipo	Saldo Registro presup.	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	Observaciones
				$988.082.242,00			$988.082.242,00			
Anticipo				$ 395.232.897						El contratista renuncio al anticipo, entrego oficio manifestando esto
1				$ 646.148.872,20			$ 646.148.872		$ 341.933.370	Pendiente de pago y revision
TOTALES		$ -	$ -	$ 646.148.872	$ -	$ -	$ 341.933.370	$ -	$ 341.933.370	

Firma:
Nombre: CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
Representante Legal: CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
NIT: 901.955.099-5

ANEXO 2 SEGUIMIENTOS A LAS GARANTIAS CONTRACTUALES DE OBRA

CR 14 # 13-40 – OFICINA 203 Barrio el centro - Tel: 3134629855 -
consorcioalcantarilladosananto@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE GETUCHA
ANEXO 8
SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

CÓDIGO	
VERSIÓN	1

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE GETUCHA
CONTRATO No. N.° COP-2025-002
PERIODO Inicio: 22-abr-25 Fin: 21-dic-25
OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

PLAZOS CONTRACTUALES

PLAZOS		FECHAS	
Plazo inicial para ejecución del contrato	8 MESES	Inicio del contrato	22-abr-25
		Inicio de actividades	22-ago-25
Plazo ejecución contrato actualizado	153 días	Terminación inicial contractual	22-ago-25
Plazo ejecutado	30 días	Terminación final contractual	21-ene-26
Plazo faltante por ejecutar	123 días		

SUSPENSIONES Y AMPLIACION DE SUSPENSIONES EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Nº Susp.	Nº Prórroga	Inicio susp. o prórroga	Reinicio de actividades	Plazo	Estado	Fecha de radicación
			Total aprobados	0 d		N.A.
Observaciones:		Sin novedades				

PRORROGAS DE PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Nº de Adición	Plazo	Estado	Fecha de radicación	Fecha de aprobación
1				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
Total aprobados	0 d			N.A.
Sin novedades				

CONTROL DE LA INVERSION

Valor inicial del contrato de OBRA	$	985.002.343
Valor inicial del contrato de CONSULTORÍA	$	80.168.797
Valor TOTAL INICIAL del contrato (consultoría + obra)		$ 1.057.247.696,84

ADICIONES

No	Estado	Fecha de radicación	Fecha de aprobación	VALOR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
			Total adiciones aprobadas	$ 0,00
VALOR CONTRATO CON ADICIONES APROBADAS				$ 1.057.247.696,84

VALORES GENERALES DEL ANTICIPO

Porcentaje del anticipo		
Valor del anticipo	$	-

PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

AMPARO	% sobre VR contrato	VIGENCIA SOLICITADA EN CONTRATO DESDE	VIGENCIA SOLICITADA EN CONTRATO HASTA	Nº PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA PÓLIZA INICIO	VIGENCIA PÓLIZA FIN	COMENTARIOS
Cumplimiento	20%	22/04/2025	22/03/2026	11-44-101253742 ANEXO 0	$ 197.616.448,40	22/04/2025	22/03/2026	
Anticipo	40%	22/04/2025	22/03/2026	11-44-101253742 ANEXO 0	$ 396.232.686,80	22/04/2025	22/03/2026	
Salarios y Prestaciones	5%	22/04/2025	22/09/2028	11-44-101253742 ANEXO 0	$ 49.404.112,10	22/04/2025	22/09/2026	
Estabilidad y Calidad de Obra	20%	22/09/2025	22/09/2030	11-44-101253742 ANEXO 0	$ 197.616.448,40	22/09/2025	22/09/2030	
Responsabilidad Civil		22/04/2025	22/09/2025	11-43-101077292 ANEXO 0	$ 427.050.000,00	22/04/2025	22/09/2025	
Todo Riesgo								
Calidad de la Obra								
Calidad de la Consultoría								

PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA ACTA DE INICIO

AMPARO	% sobre VR contrato	VIGENCIA SOLICITADA EN CONTRATO DESDE	VIGENCIA SOLICITADA EN CONTRATO HASTA	Nº PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA PÓLIZA INICIO	VIGENCIA PÓLIZA FIN	COMENTARIOS
Cumplimiento	20%	22/08/2025	22/07/2026	11-44-101253742 ANEXO 2	$ 197.616.448,40	22/08/2025	22/07/2026	
Anticipo	40%	22/08/2025	22/07/2026	11-44-101253742 ANEXO 2	$ 396.232.686,80	22/08/2025	22/07/2026	
Salarios y Prestaciones	5%	22/08/2025	22/01/2029	11-44-101253742 ANEXO 2	$ 49.404.112,10	22/08/2025	22/01/2029	
Estabilidad y Calidad de Obra	20%	22/01/2026	22/01/2031	11-44-101253742 ANEXO 2	$ 197.616.448,40	22/01/2026	22/01/2031	
Responsabilidad Civil		22/08/2025	22/01/2026	11-43-101077292 ANEXO 2	$ 427.050.000,00	22/08/2025	22/01/2026	
Todo Riesgo								
Calidad de la Obra								
Calidad de la Consultoría								

PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA RENUNCIA ANTICIPO

AMPARO	% sobre VR contrato	VIGENCIA SOLICITADA EN CONTRATO DESDE	VIGENCIA SOLICITADA EN CONTRATO HASTA	Nº PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA PÓLIZA INICIO	VIGENCIA PÓLIZA FIN	COMENTARIOS
Cumplimiento	20%	22/08/2025	22/07/2026	11-44-101253742 ANEXO 3	$ 197.616.448,40	22/08/2025	22/07/2026	
Anticipo								
Salarios y Prestaciones	5%	22/08/2025	22/01/2029	11-44-101253742 ANEXO 3	$ 49.404.112,10	22/08/2025	22/01/2029	
Estabilidad y Calidad de Obra	20%	22/07/2026	22/01/2031	11-44-101253742 ANEXO 3	$ 197.616.448,40	22/01/2026	22/01/2031	
Responsabilidad Civil		22/08/2025	22/01/2026	11-43-101077292 ANEXO 3	$ 427.050.000,00	22/08/2025	22/01/2026	
Todo Riesgo								
Calidad de la Obra								
Calidad de la Consultoría								

Firma
Nombre: CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
Representante Legal de Interventoría
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
NIT: 901.955.099-5

ANEXO 3 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO

CR 14 # 13-40 – OFICINA 203 Barrio el centro - Tel: 3134629855 -
consorcioalcantarilladosananto@gmail.com

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE MILAN CAQUETA
ANEXO 2A CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE LA OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PAGINA	1	DE	

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

PERIODO

UNIDAD EJECUTORA: MILAN CAQUETA — INTERVENTORIA: CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025 — Inicio: 22-nov-25 — Fin: 21-d

CONTRATO No.: COP-2025-002 — CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE OBRA

				NOVIEMBRE																DICIEMBRE												
				SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
MAQUINA	**MARCA**	**MODELO**	**CAPACIDAD**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**
RETROEXCAVADORA	CAT	420F																														
VOLQUETA 1	CHEVROLETE		6 TON						1						1							1							1				
CANGURO					1	1	1			1	1		1	1	1			1		1	1	1		1					1		1	1	1	

CONVENCIONES

ACTIVO = A
REPARACION = R
INACTIVO = I

Firma
Nombre: CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
Representante Legal de Interventoría

ANEXO 4 FORMATO DE CONTROL DE SS DEL CONTRATO DE OBRA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÀ
MUNICIPIO DE MILAN CAQUETA
ANEXO 6 CONTROL SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES OBRA

CODIGO	
VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPIO DE MILAN CAQUETA — MUNICIPIO: MILAN CAQUETA

OBJETO "ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"

CONTRATO No: CONTRATO DE OBRA N. COP-2025-065 — CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

PERIODO: Del 01 de noviembre a 30 de noviembre 2025

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Nombre	Cargo	Periodo laborado INICIO	Periodo laborado FIN	No Dias mes (Base Liquidación)	C.C.	1 SAB	2 DOM	3 LUN	4 MAR	5 MIE	6 JUE	7 VIE	8 SAB	9 DOM	10 LUN	11 MAR	12 MIE	13 JUE	14 VIE	15 SAB	16 DOM	17 LUN	18 MAR	19 MIE	20 JUE	21 VIE	22 SAB	23 DOM	24 LUN	25 MAR	26 MIE	27 JUE	28 VIE	29 SAB	30 DOM		Planilla	No. días cotizados
GUSTAVO ADOLFO OLARTE COLLAZOS	DIRECTOR DE OBRA	22/08/2025		30	17.650.594	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		35141430 35778826	30
FERNANDO ANDRES MARIN CABRERA	RESIDENTE DE INTERV	22/08/2025		30	1.117.512.881	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		35758178	30
OSCAR ORLANDO MENDEZ BUITRAGO	INGENIERO HIDRAULIC	22/08/2025		0	1.132.744.004																															35778826	0
DIANA LORENA RAMOS LOZANO	SISO-SST	22/08/2025		30	40.760.364	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0494/35725-35778826	30
ANCIZAR ORJUELA MANRIQUE	MAESTRO DE OBRA	26/08/2025		30	17.656.583	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		35758178	30
NORVEY CAMILO NIETO	AYUDANTE DE OBRA	01/11/2025	12/11/2025	12	83.091.770	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																				35778565	12
GERMINSON BARBOSA PLAZAS	AYUDANTE DE OBRA	01/11/2025	12/11/2025	12	1.119.581.245	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																				35778565	12
																																				0
																																				0
																																				0
																																				0
																																				0
																																				0
																																				0
																																				0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			

NO PRESENTAN PLANILLA DEL RESIDENTE

ELABORÓ

Firma
Nombre: CARLOS DARIO CANO
Representante Legal de Interventoría
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1117461307		LUGO CHILATRA WILSON	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 4 1 1 F	VILLA CAQUETA	3128781043	N

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES			PENSION			SALUD			CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre				Código	Días	IBC	Aportes	Código	Días	IBC	Aportes	Código	Días	IBC	Aportes	Código	Días	IBC	Tarifa	Aportes	Días	IBC	Aportes	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)								$1.423.500	$170.800			$1.423.500	$199.290			$0	$0			$1.423.500		$14.950		$0	$0		$385.040
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)								$1.423.500	$170.800			$1.423.500	$199.290			$0	$0			$1.423.500		$14.950		$0	$0		$385.040
Ciudad: VILLA CAQUETA (1 Afiliados)								$1.423.500	$170.800			$1.423.500	$199.290			$0	$0			$1.423.500		$14.950		$0	$0		$385.040
1	CC	1117461307	LUGO WILSON			23/03	30	$1.423.500	$170.800	23/03	30	$1.423.500	$170.800		0	$0	$0	14	0.522	$1.423.500	0.0044	$14.950	0	$0	$0	No	$385.040
Total Afiliados(1)								$1.423.500	$170.800			$1.423.500	$170.800			$0	$0			$1.423.500		$14.950		$0	$0		$385.040

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	[redacted]	[redacted]	[redacted]	2025-12-02	2025-11-25	BANCO DE OCCIDENTE	0	$430.700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227.800	$0	$0	$227.800
PROTECCION	23|001	800.229.739	0	1	$227.800	$0	$0	$227.800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14.900	$0	$0	$14.900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14 23	860.011.153	6	1	$14.900	$0	$0	$14.900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178.000	$0	$0	$178.000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	1	$178.000	$0	$0	$178.000
TOTAL				1	$430.700	$0	$0	$430.700



aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40782364		RAMOS LOZANO DIANA LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 25 # 3 43	FLORENCIA-CAQUETA	4375459	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$39,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$39,000		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$39,000		$0	$0
1	CC	40782364	RAMOS DIANA	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$200,000	0	0	$0	$0	14-01	30	$1,600,000	$39,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$39,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-11	1948182133	94949865735	I	2025/12/10	2025/11/21	BANCOLOMBIA	0	$495.000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$0	$0	$39,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	1	$39,000	$0	$0	$39,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				1	$495,000	$0	$0	$495,000

60

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40782344		RAMOS LUZANO DIANA LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 25 # 2 43	FLORENCIA-CAQUETA	4375459	N

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$39,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$39,000		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$39,000		$0	$0
1	CC 40782344	RAMOS DIANA	23-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-21	30	$1,600,000	$39,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$39,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	99021771??	9496142912	1	2026/01/19	2025/12/29	BANCOLOMBIA	0	$499,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$0	$0	$39,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$39,000	$0	$0	$39,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				1	$495,000	$0	$0	$495,000

29

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO-PIN	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pagada							

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ARL SURA - 14-11	ONLY	7112	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCION		TELEFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	[illegible]		[illegible]		[illegible]			S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	0[illegible]5	E	2025-12-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.[illegible]	12.[illegible]	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	0[illegible]5	2025-12-22	Pagada							

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
COMFACA	CCF13	891190047	2	2	140.000	0	1.600	0	150.600
Gran Total					1.153.000	0	12.600	0	1.165.600

ASOPAGOS S.A.
PAGADO

59

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ARL SURA - 14-11	OMEA	7110	[illegible]
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CL 14 12 15 PISO 3 OFICINA 305 CENTRO		[illegible]		CAMBIOSPLPOSEMPRESARIAL@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	98775540	E	2026-02-09	TODOS LOS CENTROS	CASANARE	TODOS	454.600	4.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	30278668	2026-02-09	Pagada							

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IBC | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF(Administradoras: 1)				2	45.600	0	0	45.600
COMFACA	CCF11	891190047	2	2	45.600	0	0	45.600
SENA(Administradoras: 1)				1	11.400	0	0	11.400
SENA	PASENA	899999034	1	1	11.400	0	0	11.400
ICBF(Administradoras: 1)				1	17.100	0	0	17.100
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	17.100	0	0	17.100
Gran Total:					429.900	0	0	429.900

ASOPAGOS S.A.
PAGADO

67

ANEXO 5 SEGUIMIENTO AL FLUJOGRAMA DE INVERSION

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBI
ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPI

PROYECTO :	ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, UNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO D		
DEPARTAMENTO :	CAQUETÁ	**MUNICIPIO :**	
COSTO TOTAL DEL PROYECTO :	$ 988.083.262,00	**ACTA DE INICIO:**	
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO SAN ANTONIO 2025	**ENTIDAD CONTRATANTE :**	

RESUMEN DE AVANCE DE OBRA

			MES 1				MES 2		
			SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7
A	VALORES INICIALES SEGÚN CONTRATO								
ITEM	DESCRIPCION	V/R EJECUTADO							
1	**1.0 PRELIMINARES**								
1,1	Localización y replanteo de redes	$ 3.967.577	$ 1.322.525,67	$ 1.322.525,67	$ 1.322.525,67				
			$ 288.946,33	$ 288.946,33	$ 288.946,33		$ 2.419.053,00		
1,2	Cerramiento provisional lona verde (h=2,50m)	$ 13.230.531				$ 778.266,53	$ 778.266,53	$ 778.266,53	$ 778.266,53
						$ 6.132.355,00	$ 1.072.928,00	$ 1.072.928,00	$ 1.072.928,00
1,3	Excavación manual en material común de 0.00 a 2.00 m	$ 7.307.588				$ 487.172,00	$ 487.172,00	$ 487.172,00	$ 487.172,00
							$ 151.081,00	$ 151.081,00	$ 151.081,00
1,4	Excavación manual en material común de 2.00 a 4.00 m	$ 701.585				$ 46.772,55	$ 46.772,33	$ 46.772,55	$ 46.772,33
							$ 167.328,50	$ 167.328,50	$ 167.328,50
1,5	Entibado en madera para proteger talud de excavación	$ 28.594.322				$ 1.892.954,80	$ 1.892.954,80	$ 1.892.954,80	$ 1.892.954,80
						$ 7.201.613,00	$ 3.262.545,50	$ 3.262.545,50	$ 3.262.545,50
1,6	Entibado en madera para proteger talud de excavación	$ 55.300.034				$ 3.686.668,93	$ 3.686.668,93	$ 3.686.668,93	$ 3.686.668,93
						$ 20.794.803,00	$ 7.402.482,50	$ 7.402.482,50	$ 7.402.482,50
1,7	Cargue, transporte y retiro de material sobrante	$ 21.898.593				$ 1.459.906,20	$ 1.459.906,20	$ 1.459.906,20	$ 1.459.906,20
						$ 7.208.965,00	$ 2.352.903,00	$ 2.352.903,00	$ 2.352.903,00
1,8	Relleno, Cimentación tubería con arena SP de acuerdo a la norma ASTM 2487	$ 8.970.111				$ 598.007,40	$ 598.007,40	$ 598.007,40	$ 598.007,40
						$ 2.149.538,00	$ 1.056.935,75	$ 1.056.935,75	$ 1.056.935,75
1,9	Relleno con material seleccionado de la excavación	$ 21.971.384				$ 1.464.745,60	$ 1.464.745,60	$ 1.464.745,60	$ 1.464.745,60
						$ 5.928.571,00	$ 1.612.912,75	$ 1.612.912,75	$ 1.612.912,75
1,10	Suministro e instalación de sub_base granular tipo C, MT1	$ 29.826.973							
1,11	Suministro e instalación de base granular tipo C, MT1	$ 7.809.540							
1,12	Suministro e instalación de asfaltita natural, en áreas afectadas por la excavación	$ 12.592.972							
2	**2.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA**								
2,1	Suministro e instalación de tubería PVC D=315mm; NTC 3722-3 SB	$ 21.931.954							
2,2	Suministro e instalación de tubería PVC D=400mm; NTC 3722-3 SB	$ 22.804.103							

69

2.3	Suministro e instalación de tubería PVC D=450 mm; NTC 5722-3 58	$ 17.978.051								
2.4	Suministro e instalación de tubería PVC D=27"; NTC 5055 ASTM F 794	$ 129.582.111								
							$ 30.945.099,50	$ 30.945.099,50	$ 30.945.099,50	
2.5	Suministro e instalación de tubería PVC D=30"; NTC 5055 ASTM F 794	$ 44.047.920						$ 7.341.320,00	$ 7.341.320,00	
						$ 21.684.071,00	$ 20.307.304,00			
2.6	Suministro e instalación de tubería PVC D=36"; NTC 5055 ASTM F 794	$ 158.170.974				$ 39.642.743,50	$ 39.642.743,50	$ 39.642.743,50	$ 39.642.743,50	
						$ 125.823.700,00				
3	**3.0 POZOS DE INSPECCION**									
3.1	Pozos de inspección en concreto f'c= 24Mpa D=1.20 m y h<=2.00 m. incluye tapa	$ -								
3.2	Pozos de inspección en concreto f'c= 24Mpa D=1.20 m y 2.01>h<=6.00 mincluye tapa	$ -								
4	**4,0 CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROSY CABEZA DE SALIDA**									
4.1	Construcción de cunetas transversales de vía, L=10.97m x 0.85 m, ancho útil de 0.45m, espesor de muros de 0.20m, y rejillas en platina de 2" x 3/8									
4.2	Construcción de cunetas transversales de vía, L=9.32m x 0.85 m, ancho útil de 0.45m, espesor de muros de 0.20m, y rejillas en platina de 2" x									
4.3	Construcción de sumidero de 1.64m x 0.88m, ancho útil de 0.58m x 1.34m, e=0.15m, rejilla platina de 2 x 3/8									
4.4	Construcción de sumidero de 1.64m x 0.98m, ancho útil de 0.68m x 1.34m, e=0.15m, rejilla platina de 2 x 3/8	$ 67.675.158								
4.5	Construcción de cabezal de salida	$ 4.154.529								
5	**5,0 ASEO GENERAL**									
5.1	Aseo general de Obra	$ 1.008.974								

N.P	ITEMS NO PREVISTOS									
N.P 1	Pozos de inspección en concreto f'c= 24Mpa D=1.50 m y h<=2.00 m. incluye tapa	$ 24.594.256								
N.P 2	Pozos de inspección en concreto f'c= 24Mpa D=1.50 m y 2.01<h<=3.00 mincluye tapa	$ 27.129.942							$ 9.043.314,00	$ 9.043.314,00
N.P 3	Pozos de inspección en concreto f'c= 24Mpa D=1.60 m y 3.01<h<=4.000 mincluye tapa	$ 11.597.357							$ 11.597.357,00	
PMA	PMA	$ 22.200.000								
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 22.200.000	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00
			$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00
EJECUCION DE OBRA PROGRAMADO SEMANAL			$ 2.432.525,67	$ 2.432.525,67	$ 2.432.525,67	$ 51.167.237,00	$ 51.167.237,00	$ 58.508.557,00	$ 58.508.557,00	
EJECUCION DE OBRA EJECUTADO SEMANAL			$ 1.398.946,33	$ 1.398.946,33	$ 1.398.946,33	$ 199.019.974,00	$ 71.861.375,50	$ 69.776.887,50	$ 58.177.530,50	
PROGRAMACION OBRA ACUMULADO			$ 2.432.525,67	$ 4.865.051,33	$ 7.297.577,00	$ 58.484.314,50	$ 109.632.052,79	$ 168.140.610,69	$ 226.649.168,58	
OBRA EJECUTADA EJECUTOA			$ 1.398.946,33	$ 2.797.892,67	$ 4.196.839,00	$ 202.230.213,00	$ 274.091.586,50	$ 343.866.474,00	$ 402.044.004,50	

PORCENTAJE DE EJECUCION	0,18%	0,37%	0,55%	26,43%	35,82%	44,94%	52,54%

ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA
Rep. Legal CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

CARLOS DARÍO CANO SANCHEZ
Rep. Legal CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE LA MILAN CAQUETA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE FONDOS

**ENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CA
O DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.**

EL CAQUETÁ

MILAN CAQUETA
22 DE AGOSTO DE 2025
CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

	MES 3				MES 4				ME	
SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18
		0								
	$ 598.807,00	$ 82.078,00								
$ 778.266,53	$ 778.266,53	$ 778.266,53	$ 778.266,53	$ 778.266,53	$ 778.266,53	$ 778.266,53	$ 778.266,53	$ 778.266,53	$ 778.266,53	$ 778.266,53
$ 1.072.928,00	$ 701.626,00	$ 701.626,00	$ 701.626,00	$ 701.626,00						
$ 487.172,60	$ 487.172,60	$ 487.172,60	$ 487.172,60	$ 487.172,60	$ 487.172,60	$ 487.172,60	$ 487.172,60	$ 487.172,60	$ 487.172,60	$ 487.172,60
$ 151.081,00	$ 1.675.816,25	$ 1.675.816,25	$ 1.675.816,25	$ 1.675.816,25						
$ 46.772,33	$ 46.772,33	$ 46.772,33	$ 46.772,33	$ 46.772,33	$ 46.772,33	$ 46.772,33	$ 46.772,33	$ 46.772,33	$ 46.772,33	$ 46.772,33
$ 167.328,50	$ 32.271,00									
$ 1.892.954,80	$ 1.892.954,80	$ 1.892.954,80	$ 1.892.954,80	$ 1.892.954,80	$ 1.892.954,80	$ 1.892.954,80	$ 1.892.954,80	$ 1.892.954,80	$ 1.892.954,80	$ 1.892.954,80
$ 3.262.545,50	$ 2.035.631,75	$ 2.035.631,75	$ 2.035.631,75	$ 2.035.631,75						
$ 3.686.668,93	$ 3.686.668,93	$ 3.686.668,93	$ 3.686.668,93	$ 3.686.668,93	$ 3.686.668,93	$ 3.686.668,93	$ 3.686.668,93	$ 3.686.668,93	$ 3.686.668,93	$ 3.686.668,93
$ 7.402.482,50	$ 4.895.301,00									
$ 1.459.906,20	$ 1.459.906,20	$ 1.459.906,20	$ 1.459.906,20	$ 1.459.906,20	$ 1.459.906,20	$ 1.459.906,20	$ 1.459.906,20	$ 1.459.906,20	$ 1.459.906,20	$ 1.459.906,20
$ 2.352.903,00	$ 1.319.504,00	$ 1.319.504,00	$ 1.319.504,00	$ 1.319.504,00						
$ 598.007,40	$ 598.007,40	$ 598.007,40	$ 598.007,40	$ 598.007,40	$ 598.007,40	$ 598.007,40	$ 598.007,40	$ 598.007,40	$ 598.007,40	$ 598.007,40
$ 1.056.935,75	$ 648.208,00	$ 648.208,00	$ 648.208,00	$ 648.208,00						
$ 1.464.745,60	$ 1.464.745,60	$ 1.464.745,60	$ 1.464.745,60	$ 1.464.745,60	$ 1.464.745,60	$ 1.464.745,60	$ 1.464.745,60	$ 1.464.745,60	$ 1.464.745,60	$ 1.464.745,60
$ 1.612.912,75	$ 2.397.790,50	$ 2.397.790,50	$ 2.397.790,50	$ 2.397.790,50						
					$ 3.728.371,63	$ 3.728.371,63	$ 3.728.371,63	$ 3.728.371,63	$ 3.728.371,63	$ 3.728.371,63
					$ 976.192,50	$ 976.192,50	$ 976.192,50	$ 976.192,50	$ 976.192,50	$ 976.192,50
					$ 1.566.621,50	$ 1.566.621,50	$ 1.566.621,50	$ 1.566.621,50	$ 1.566.621,50	$ 1.566.621,50
								$ 4.386.390,80	$ 4.386.390,80	$ 4.386.390,80
					$ 4.093.162,00	$ 4.093.162,00	$ 4.093.162,00	$ 4.093.162,00		
						$ 11.402.051,50	$ 11.402.051,50			
	$ 10.827.692,00	$ 10.827.692,00						$ 1.148.719,00		

					$ 8.989.025,50	$ 8.989.025,50				
$ 17.551.284,00								$ 426.757,00		
				$ 64.791.055,50	$ 64.791.055,50					
$ 30.945.099,50							$ 2.900.856,50	$ 2.900.856,50		
$ 7.941.320,00	$ 7.941.320,00	$ 7.941.320,00	$ 7.941.320,00							
							$ 1.028.272,50	$ 1.028.272,50		
$ 28.144.775,00		$ 4.602.499,00								
$ -			$ -	$ -					$ -	$ -
$ -			$ -	$ -					$ -	$ -
	$ 6.152.287,09	$ 6.152.287,09	$ 6.152.287,09	$ 6.152.287,09	$ 6.152.287,09	$ 6.152.287,09	$ 6.152.287,09	$ 6.152.287,09	$ 6.152.287,09	$ 6.152.287,09
					$ 14.098.991,25	$ 14.098.991,25	$ 14.098.991,25	$ 14.098.991,25		
									$ 2.077.264,50	$ 2.077.264,50
										$ 504.487,00

	$ 4.099.042,67		$ 4.099.042,67		$ 4.099.042,67		$ 4.099.042,67	$ 4.099.042,67	$ 4.099.042,67	
						$ 9.198.085,33	$ 8.198.085,33	$ 9.198.085,33		
	$ 4.521.657,00		$ 4.521.657,00		$ 4.521.657,00		$ 4.521.657,00	$ 4.521.657,00	$ 4.521.657,00	
$ 9.043.314,00										
							$ 5.798.678,50		$ 5.798.678,50	
$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00
$ 1.110.000,00										
$ 18.865.814,40	$ 33.638.801,15	$ 25.018.101,49	$ 33.638.801,15	$ 82.467.896,99	$ 106.348.747,78	$ 44.339.044,11	$ 49.769.396,76	$ 86.955.057,58	$ 44.831.000,58	$ 90.916.109,41
$ 103.873.589,50	$ 25.132.647,50	$ 24.290.845,50	$ 8.778.576,50	$ 8.778.576,50	$ 18.192.153,25	$ 26.990.238,58	$ 30.319.967,58	$ 91.894.853,58	$ -	$ -
$ 245.514.982,98	$ 279.153.784,13	$ 304.171.885,62	$ 337.810.686,77	$ 420.278.523,76	$ 526.627.271,54	$ 570.966.515,65	$ 620.735.712,43	$ 657.690.770,01	$ 702.521.770,59	$ 793.437.880,00
$ 505.917.594,00	$ 581.050.241,50	$ 555.341.087,00	$ 564.119.663,50	$ 572.898.240,00	$ 591.090.393,25	$ 617.480.631,83	$ 647.799.599,42	$ 679.694.853,00	$ 679.694.853,00	$ 679.694.853,00

66,12%	**69,40%**	**72,58%**	**73,72%**	**74,87%**	**77,25%**	**80,70%**	**84,66%**	**88,83%**	**88,83%**	**88,83%**
						74,62%				

\SCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN


		PROGRAMACION
		2,00
$ $		TOTAL
SEMANA 19	SEMANA 20	PROYECTO
		$ 101.741.526,00
		$ 3.967.577,00
		$ 3.967.577,00
$ 778.266,53	$ 778.266,53	$ 13.230.531,00
		$ 13.230.531,00
		$ 7.307.589,00
		$ 7.307.589,00
		$ 701.585,00
		$ 701.585,00
		$ 28.394.322,00
		$ 28.394.322,00
		$ 55.300.034,00
		$ 55.300.034,00
		$ 21.898.595,00
		$ 21.898.595,00
		$ 8.970.111,00
		$ 8.970.111,00
		$ 21.971.186,00
		$ 21.971.186,00
$ 3.728.371,63	$ 3.728.371,63	$ 29.826.973,00
		$ -
$ 976.192,50	$ 976.192,50	$ 7.809.540,00
		$ -
$ 1.566.621,50	$ 1.566.621,50	$ 12.532.972,00
		$ -
		$ 211.911.011,00
$ 4.386.390,80	$ 4.386.390,80	$ 21.931.954,00
		$ 16.372.648,00
		$ 22.804.103,00
		$ 22.804.103,00

		$ 17.978.051,00
		$ 17.978.051,00
		$ 129.582.111,00
		$ 129.582.111,00
		$ 44.047.920,00
		$ 44.047.920,00
		$ 158.570.974,00
		$ 158.570.974,00
		$ 389.355.807,00
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -
$ 6.152.287,09		$ 67.675.158,00
		$ 56.395.965,00
		$ 4.154.529,00
		$ -
		$ 71.829.687,00
$ 504.487,00		$ 1.008.974,00
		$ -

		$ 51.724.188,00
		$ 24.594.256,00
		$ 24.594.256,00
		$ 27.129.942,00
		$ 27.129.942,00
		$ 11.597.357,00
		$ 11.597.357,00
		$ 22.200.000,00
$ 1.110.000,00	$ 1.110.000,00	$ 22.200.000,00
$ 19.202.617,05	$ 12.545.842,95	$ 765.188.340,00
$ -	$ -	$ 679.684.853,00
$ 752.640.497,05	$ 765.188.340,00	
$ 679.684.853,00	$ 679.684.853,00	$ 9.214.798.071,50

88,83%	**88,83%**	

	SEMANA	PROGRAMADO SEMANAL	EJECUTADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO		
0%	SEMANA 1	$ 2.432.525,67	$ 1.998.946,33	$ 2.432.525,67	$ 1.998.946,33	0,32%	0,32%
1%	SEMANA 2	$ 2.432.525,67	$ 1.998.946,33	$ 4.865.051,33	$ 3.997.892,67	0,32%	0,64%
1%	SEMANA 3	$ 2.432.525,67	$ 1.998.946,33	$ 7.297.577,00	$ 5.996.839,00	0,32%	0,95%
8%	SEMANA 4	$ 51.187.237,90	$ 108.033.374,00	$ 58.484.814,90	$ 202.230.213,00	8,14%	7,44%
18%	SEMANA 5	$ 51.187.237,90	$ 71.861.373,50	$ 109.632.052,79	$ 274.091.586,50	16,82%	36,33%
23%	SEMANA 6	$ 58.508.557,90	$ 69.774.887,50	$ 168.140.610,69	$ 343.866.474,00	24,54%	21,97%
33%	SEMANA 7	$ 58.508.557,90	$ 58.777.570,50	$ 226.649.168,58	$ 402.644.004,50	32,54%	29,62%
33%	SEMANA 8	$ 18.865.818,40	$ 103.873.589,50	$ 245.514.982,98	$ 506.917.594,00	36,12%	32,09%
36%	SEMANA 9	$ 33.638.805,15	$ 25.132.647,50	$ 279.153.784,13	$ 531.050.241,50	39,46%	36,68%
40%	SEMANA 10	$ 25.016.181,49	$ 24.290.845,50	$ 304.171.885,62	$ 555.341.087,00	72,58%	39,75%
48%	SEMANA 11	$ 33.638.801,15	$ 8.778.576,50	$ 337.810.686,77	$ 564.119.663,50	73,72%	44,15%
55%	SEMANA 12	$ 82.467.886,99	$ 8.778.576,50	$ 420.278.573,76	$ 572.898.240,00	74,87%	54,92%
69%	SEMANA 13	$ 506.368.747,78	$ 18.192.151,25	$ 926.627.271,54	$ 591.090.391,25	77,25%	68,82%
75%	SEMANA 14	$ 44.329.044,13	$ 18.192.151,25	$ 570.966.315,67	$ 609.282.548,50	79,65%	74,67%
81%	SEMANA 15	$ 49.769.396,78	$ 26.390.238,58	$ 620.735.712,45	$ 635.672.785,08	83,07%	81,12%
86%	SEMANA 16	$ 36.955.057,58	$ 30.319.367,58	$ 657.690.770,01	$ 665.992.152,67	87,04%	85,95%
92%	SEMANA 17	$ 44.891.080,58	$ 31.894.851,58	$ 702.521.778,59	$ 697.887.006,25	91,20%	91,81%
96%	SEMANA 18	$ 10.916.139,41		$ 713.437.880,00		0,00%	95,85%
98%	SEMANA 19	$ 19.202.617,05		$ 732.640.497,05		0,00%	98,38%
100%	SEMANA 20	$ 12.545.842,95		$ 765.186.340,00		0,00%	100,00%
		$ 765.186.340,00				39,23%	

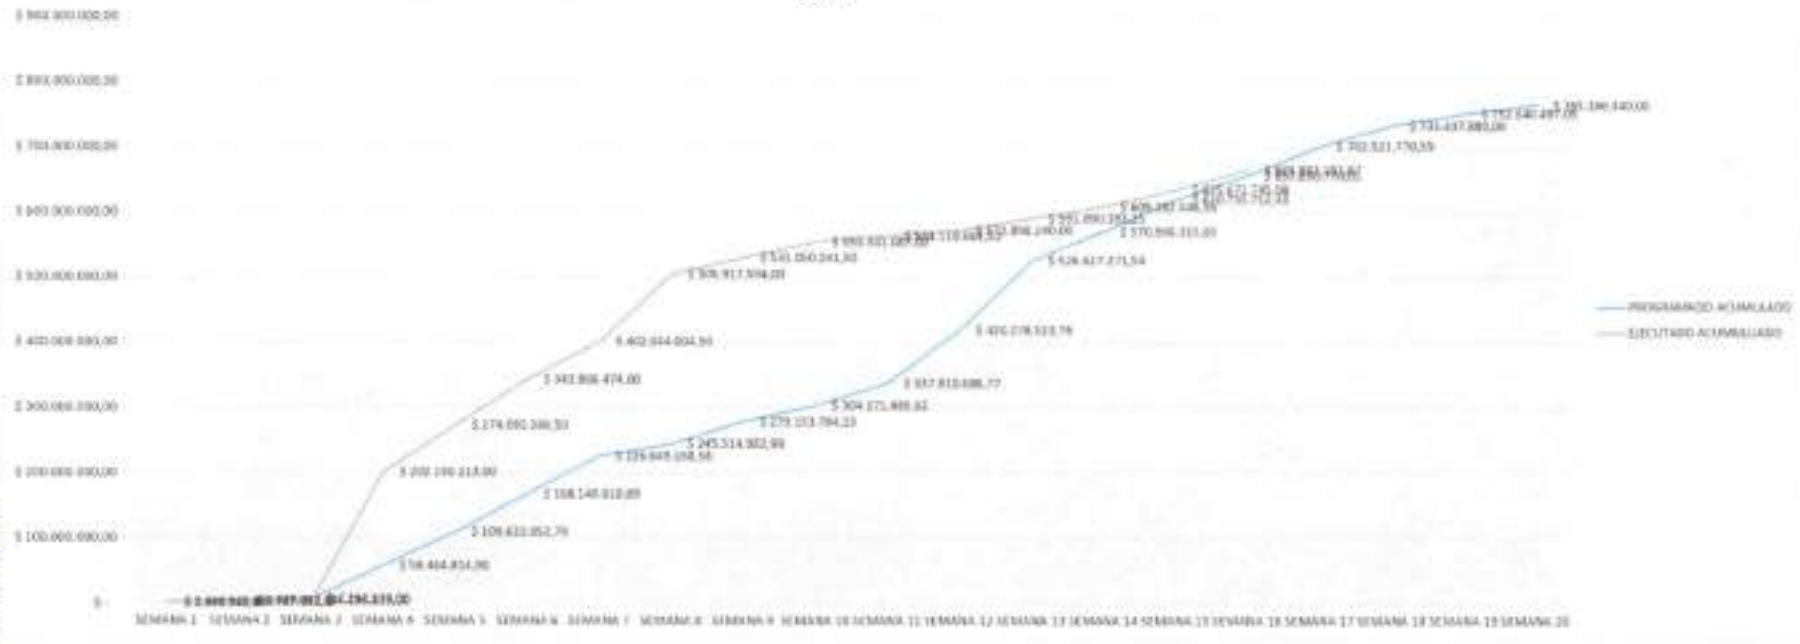

% EJECUTADO
59%
92%
0%
0%
0%
91%

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
NIT: 901.955.099-5

ANEXO 6 FORMATO DE CONTROL DE LLUVIAS

CR 14 # 13-40 – OFICINA 203 Barrio el centro - Tel: 3134629855 -
consorcioalcantarilladosananto@gmail.com

80

	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ MUNICIPIO DE MILAN CAQUETA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	FMI #1
		VERSIÓN	1

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 6, ENTRE CRA 2 A LA CRA 8, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

FECHA: DÍA 01 | MES 11 (NOVIEMBRE) | AÑO 2025

UNIDAD EJECUTORA: PDA-TAQUETA | MUNICIPIO: MILAN CAQUETA | MES: NOVIEMBRE

CONTRATO No: [illegible] | CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA MILLARO SAN ANTONIO 2025 | SECTOR: SAN ANTONIO DE GETUCHA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
MES: NOVIEMBRE

DÍA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Clase de Riesgo																															
Seco	1	1	0.1	1	0.9	1	1	0.8	1	0.8	1	1	1	0.9	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1			
Lluvias moderadas			0.9		0.1			0.2		0.2				0.1									1	1		1		1			
Lluvia intensas			0.9		0.1			0.2															1								

Firma:
Nombre: Interventoría


FECHA	DÍA	MES	AÑO
	01	11 (NOVIEMBRE)	2025

UNIDAD EJECUTORA: PDA-TAQUETA | MUNICIPIO: MILAN CAQUETA | MES: NOVIEMBRE

CONTRATO No: [illegible] | CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA MILLARO SAN ANTONIO 2025 | SECTOR: SAN ANTONIO DE GETUCHA

DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	FMI #
	VERSIÓN	1

CLIMA	DÍAS	%
Seco	23	76.59%
Lluvias moderadas	5.3	17.77%
Lluvias intensas	1.7	5.64%
Total días	30	100.00%

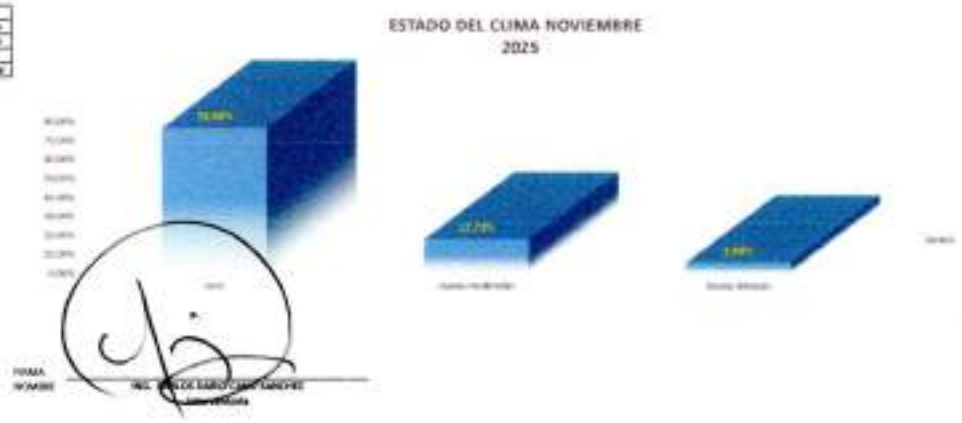

FIRMA
NOMBRE: [illegible]

	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ MUNICIPIO DE MILAN CAQUETA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	FMI #1
		VERSIÓN	1

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

FECHA: DÍA 11 | MES NOVIEMBRE | AÑO 2025

UNIDAD EJECUTORA: PDA CAQUETA — MUNICIPIO: MILAN CAQUETA

CONTRATO No.: [illegible] — INTERVENTORÍA: CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025 — SECTOR: SAN ANTONIO DE GETUCHA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

MES: DICIEMBRE

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Clase de tiempo																															
Seco	1	0,7	0,9	1	0,7	1	1	0,8	0,7	1	0,8	0,9	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
Lluvias moderadas			0,1		0,3				0,3		0,2	0,1																			
Lluvias intensas		0,3						0,2																							

Firma: [illegible]
Nombre: [illegible]


	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	FMI #
		VERSIÓN	1

FECHA: DÍA 11 | MES SEPTIEMBRE | AÑO 2025

UNIDAD EJECUTORA: PDA CAQUETA — MUNICIPIO: MILAN CAQUETA

CONTRATO No: [illegible] — CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025 — SECTOR: SAN ANTONIO DE GETUCHA

Clase de tiempo	DÍAS	%
Seco	20	95,24%
Lluvias moderadas	0,9	4,29%
Lluvias intensas	0,1	1,98%
Total días	21	100,00%

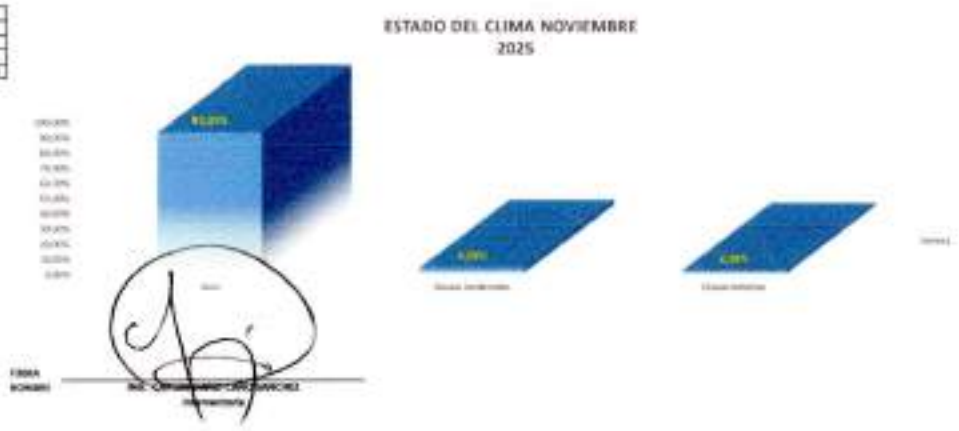

FIRMA
NOMBRE: [illegible]
Interventoría

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
NIT: 901.955.099-5

ANEXO 7 INFORMES SEMANALES

CR 14 # 13-40 – OFICINA 203 Barrio el centro - Tel: 3134629855 -
consorcioalcantarilladosananto@gmail.com

	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	F-GCT-01-V1
		Vigencia: 30/07/2023
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

PERIODO DEL INFORME: DEL: 21/11/2025 AL 27/11/2025 **fecha del informe** 22/12/2025

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (INTERVENTORIA U OBRA SEGÚN EL CASO)

CONTRATO DE (OBRA O INTERVENTORIA): No. COP-2025-002 DE
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
REP. LEGAL: ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA

OBJETO: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

VALOR INICIAL:	$ 988.082.242,00	ANTICIPO (%)	0%		
VALOR ADICIONAL:	$ -	PARCIAL 1 (%)	0%	$	-
VALOR FINAL:	$ 988.082.242,00	PARCIAL 2 (%)	0%	$	-
		PARCIAL 3 (%)	0%	$	-
		Σ PARCIALES	0%	$	-

FORMA DE PAGO: CONFORME AVANCE DE OBRA - SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA

PLAZO INICIAL: CINCO MESES (5)
PLAZO ACTUAL: CINCO MESES (5)

	FECHA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	22/04/2025
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO :	22/08/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL CONTRATO :	21/01/2026
	0
FECHA DE PRORROGA:	
FECHA DE SUSPENSION:	NA NA
FECHA DE REINICIO:	NA NA
FECHA ACTUAL DE TERMINACION CONTRATO :	21/01/2026

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO : EN EJECUCION

2. DATOS TÉCNICOS DEL CONTRATO:

METAS FISICAS ACTUALIZADA:

☐	RED DE ACUEDUCTO		ML
☑	RED ALC. SAN / PLUV	584,01	ML
☐	PTAP / PTAR		UN
☐	POZOS PROFUNDOS		ML
☐	VIA URB / SEC / TERC		KM
☐	PUENTE / ALC / BOX		UN
☐	OTRO. CUAL?	CELDA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	UN

META FISICA (VALOR/UN): $ 988.082.242 $/UN

OBRA

PROGRAMA: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

RUBRO: FUENTE:

FUENTE

ACTAS COBRADAS $ 0

0

INTERVENTORIA

PROGRAMA: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARA EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE

RUBRO: FUENTE: PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y

FUENTE

ACTAS COBRADAS $ 0,00%


3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Retiro de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Combas, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1 CONTRATO	22/04/2025		$ 988.082.242	
2 ACTA DE INICIO	22/08/2025		$ 988.082.242	
3 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES OBRA Nº 1	22/08/2025		$ 988.082.242	
4 ACTA DE APROBACION DE ITEM NO PREVISTOS No1				
4 ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1			$ 646.148.872	
5 OTRO SI 1				
6 ACTA DE MODIFICACION No.2				
7 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2				
8 OTRO SI 2				
9 ACTA DE MODIFICACION 3				
10 ACTA No.3 DE RECIBO FINAL DE OBRA				
11 ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO DE OBRA				
12 ACTA DE LIQUIDACION				

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2022	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	F-GCT-01-V1 Vigencia: 30/07/2023
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

4. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA (SI APLICA)	CONTRATO DE OBRA (SEGÚN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SI APLICA):

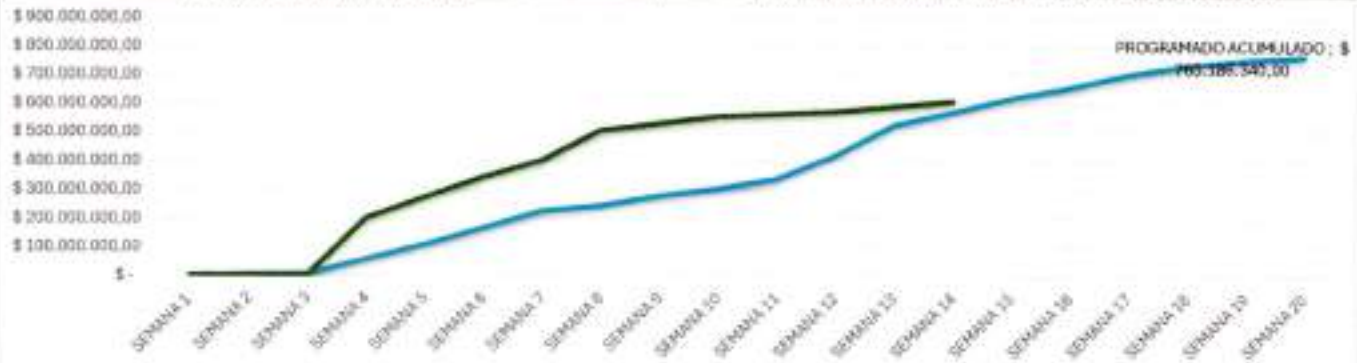

SEMANA	PROGRAMADO SEMANAL	EJECUTADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
SEMANA 1	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33
SEMANA 2	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33	$ 4.865.051,33	$ 2.797.892,67
SEMANA 3	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33	$ 7.297.577,00	$ 4.196.839,00
SEMANA 4	$ 51.167.237,90	$ 198.033.374,00	$ 58.464.814,90	$ 202.230.213,00
SEMANA 5	$ 51.167.237,90	$ 71.861.373,50	$ 109.632.052,79	$ 274.091.586,50
SEMANA 6	$ 58.508.557,90	$ 69.774.887,50	$ 168.140.610,69	$ 343.866.474,00
SEMANA 7	$ 58.508.557,90	$ 58.177.530,50	$ 226.649.168,58	$ 402.044.004,50
SEMANA 8	$ 18.865.814,40	$ 103.873.589,50	$ 245.514.982,98	$ 505.917.594,00
SEMANA 9	$ 33.638.801,15	$ 25.132.647,50	$ 279.153.784,13	$ 531.050.241,50
SEMANA 10	$ 25.018.101,49	$ 24.290.845,50	$ 304.171.885,62	$ 555.341.087,00
SEMANA 11	$ 33.638.801,15	$ 8.778.576,50	$ 337.810.686,77	$ 564.119.663,50
SEMANA 12	$ 82.467.836,99	$ 8.778.576,50	$ 420.278.523,76	$ 572.898.240,00
SEMANA 13	$ 106.348.747,78	$ 18.192.153,25	$ 526.627.271,54	$ 591.090.393,25
SEMANA 14	$ 44.339.044,11	$ 18.192.153,25	$ 570.966.315,65	$ 609.282.546,50

GRAFICO DE AVANCE

CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X SUP	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
CUADRO DE RELACION DE PERSONAL SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORMES MENSUAL ENTREGADO A LA INTERVENTORIA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
COPIA DE LA BITACORA AL DIA FIRMADA Y AL DIA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐	NO CUMPLE

TABLA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE

CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X INT	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
CUADRO DE RELACION DE PERSONAL SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO REV INTER	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
CUADRO DE EQUIPO SEGÚN PROPUESTA REV POR INTERVENTORIA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORME METEREOLOGICO	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORMES MENSUALES	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORME PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORME PLAN DE SALUD OCUPACIONAL	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
SOCIALIZACION	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
VEEDURIA CIUDADANA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
VALLA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐		☐	
	☐		☐	

5. INFORMACION DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO, AVANCES EN % OBRA PROGRAMADA VS EJECUTADA

INTERVENTORIA

% AVANCE EN PLAZO:	64,00%	PLAZO FALTANTE:	36,00%	% PROGRAMACION OBRA:	74,64%	% OBRA EJECUTADA	70,83%

OBRA (SEGÚN INFORMACION DE INTERVENTORIA SI APLICA)

% AVANCE EN PLAZO:	64,00%	PLAZO FALTANTE:	36,00%	% PROGRAMACION OBRA:	74,64%	% OBRA EJECUTADA	70,83%

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITE TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

El contratista da inicio al la instalacion de la tuberia en el tramo -P2-P3

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO (EJE)	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	F-GCT-01-V1
		Vigencia: 30/07/2023
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

7. REGISTRO FOTOGRAFICO (DESCRIPCION), ENVIAR COPIA MAGNETICA AL CORREO INSTITUCIONAL (XXXX)



Foto 1



Foto 2

8. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUMPLE SI ☑ NO ☐ CUALES? :	SE CUMPLE CON EL OBJETO DEL CONTRATO? SI ☑ NO ☐ PORQUE?
SE REQUIERE AJUSTES A LOS DISEÑOS: SI ☑ NO ☐ CAUSALES?: REUBICACION DE SENDEROS PEATONALES Y BAHIAS DE PARQUEO A CAUSA DE ARBOLES EXISTENTES	REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ NO ☑ VALOR? $ 0 EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN? SI ☑ NO ☐ PORQUE?

9. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Terminacion de detalles de tapa de pozos

Construccion de los sumideros

Instalacion de tuberia de 12 pulgadas

CAPITULO	% EJECUTADO
1.0 PRELIMINARES	76%
2.0 SUMINISTRO E INSTALACIO	96%
3.0 POZOS DE INSPECCION	0%
4,0 CONSTRUCCIÓN DE SUMID	79%
5,0 ASEO GENERAL	0%
6.0 ITEM NO PREVISTO	100%
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	



TOTAL

10. FIRMAS

FIRMA DEL INTERVENTOR - CARLOS DARIO CANO SANCHEZ

	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	F-GCT-01-V1
		Vigencia: 30/07/2023
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

PERIODO DEL INFORME: DEL: 28/11/2025 AL 4/12/2025 **fecha del informe** 22/12/2025

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (INTERVENTORIA U OBRA SEGÚN EL CASO)

CONTRATO DE (OBRA O INTERVENTORIA): No. COP-2025-002 DE
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
REP. LEGAL: ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA

OBJETO: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

VALOR INICIAL :	$ 988.082.242,00	ANTICIPO (%)	0%	
VALOR ADICIONAL:	$ -	PARCIAL 1 (%)	0%	$ -
VALOR FINAL:	$ 988.082.242,00	PARCIAL 2 (%)	0%	$ -
		PARCIAL 3 (%)	0%	$ -
		3 PARCIALES	0%	$ -

FORMA DE PAGO: CONFORME AVANCE DE OBRA - SEGÚN PROFUESTA ECONOMICA

PLAZO INICIAL: CINCO MESES (5)
PLAZO ACTUAL: CINCO MESES (5)

	FECHA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	22/04/2025
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO :	22/08/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL CONTRATO :	21/01/2026
	0
FECHA DE PRORROGA:	
FECHA DE SUSPENSION:	NA NA
FECHA DE REINICIO:	NA NA
FECHA ACTUAL DE TERMINACION CONTRATO :	21/01/2026
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO :	EN EJECUCION

2. DATOS TÉCNICOS DEL CONTRATO:

METAS FISICAS ACTUALIZADA:

☐	RED DE ACUEDUCTO		ML
☑	RED ALC. SAN / PLUV	584,01	ML
☐	PTAP / PTAR		UN
☐	POZOS PROFUNDOS		ML
☐	VIA URB / SEC / TERC		KM
☐	PUENTE / ALC / BOX		UN
☐	OTRO. CUAL?	CELDA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	UN

META FISICA (VALOR/UN): $ 988.082,242 $/UN

OBRA

PROGRAMA: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

RUBRO: FUENTE:

ACTAS COBRADAS $ 0 FUENTE 0

INTERVENTORIA

PROGRAMA: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARA EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓNES

RUBRO: FUENTE: PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y

ACTAS COBRADAS $ FUENTE 0,00%

3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO:


ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1 CONTRATO	22/04/2025		$ 988.082.242	
2 ACTA DE INICIO	22/08/2025		$ 988.082.242	
3 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES OBRA No 1	22/08/2025		$ 988.082.242	
4 ACTA DE APROBACION DE ITEM NO PREVISTOS No1				
4 ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1			$ 546.148.872	
5 OTRO SI 1				
6 ACTA DE MODIFICACION No 2				
7 ACTA DE RECIBO PARCIAL No 2				
8 OTRO SI 2				
9 ACTA DE MODIFICACION 3				
10 ACTA No 3 DE RECIBO FINAL DE OBRA				
11 ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO DE OBRA				
12 ACTA DE LIQUIDACION				

	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	F-GCT-01-V1 Vigencia: 30/07/2023
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

4. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA (SI APLICA)	CONTRATO DE OBRA (SEGÚN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SI APLICA):

CONTROL DE CRONOGRAMA

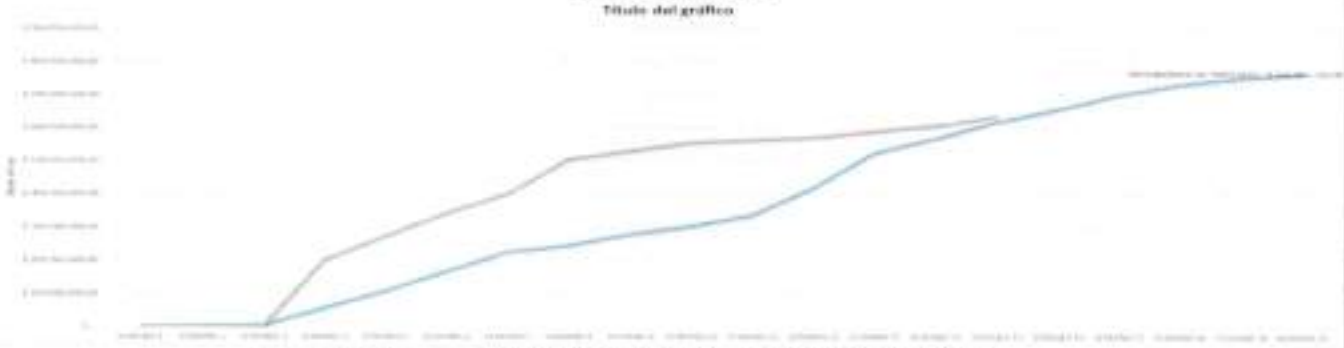

SEMANA	PROGRAMADO SEMANAL	EJECUTADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
SEMANA 1	$ 2.432.525,67	$ 1.388.966,33	$ 2.432.525,67	$ 1.388.966,33
SEMANA 2	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33	$ 4.865.051,33	$ 2.787.912,67
SEMANA 3	$ 2.432.525,67	$ 1.396.946,33	$ 7.297.577,00	$ 4.186.859,00
SEMANA 4	$ 51.167.237,90	$ 198.032.274,00	$ 58.464.814,90	$ 202.219.133,00
SEMANA 5	$ 51.167.237,90	$ 71.961.373,50	$ 109.632.052,79	$ 274.081.506,50
SEMANA 6	$ 58.508.557,80	$ 69.776.887,50	$ 168.140.610,59	$ 343.866.474,00
SEMANA 7	$ 58.308.557,80	$ 58.177.580,50	$ 226.449.168,38	$ 402.044.054,50
SEMANA 8	$ 18.865.814,40	$ 103.673.589,50	$ 245.314.982,98	$ 505.917.644,00
SEMANA 9	$ 33.618.800,15	$ 25.132.447,50	$ 278.193.784,13	$ 531.050.241,50
SEMANA 10	$ 25.018.101,49	$ 24.290.845,50	$ 304.171.885,62	$ 555.341.087,00
SEMANA 11	$ 33.638.800,15	$ 8.770.576,50	$ 337.810.685,77	$ 564.119.663,50
SEMANA 12	$ 82.867.838,99	$ 8.778.576,50	$ 420.278.523,75	$ 572.898.240,00
SEMANA 13	$ 106.868.767,79	$ 18.182.153,25	$ 526.627.271,54	$ 591.080.393,25
SEMANA 14	$ 44.339.364,11	$ 18.182.153,25	$ 570.966.315,65	$ 609.262.546,50
SEMANA 15	$ 49.769.996,75	$ 26.380.238,58	$ 620.735.712,43	$ 635.672.785,08

GRAFICO DE AVANCE

CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X SUP	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
CUADRO DE RELACION DE PERSONAL SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORMES MENSUAL ENTREGADO A LA INTERVENTORIA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
COPIA DE LA BITACORA AL DIA FIRMADA Y AL DIA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐	NO CUMPLE

TABLA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE

CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X INT	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
CUADRO DE RELACION DE PERSONAL SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO REV INTER	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
CUADRO DE EQUIPO SEGÚN PROPUESTA REV POR INTERVENTORIA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORME METEREOLOGICO	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORMES MENSUALES	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORME PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORME PLAN DE SALUD OCUPACIONAL	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
SOCIALIZACION	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
VEEDURIA CIUDADANA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
VALLA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐		☐	
	☐		☐	

5. INFORMACION DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO, AVANCES EN % OBRA PROGRAMADA VS EJECUTADA

INTERVENTORIA

% AVANCE EN PLAZO:	69,00%	PLAZO FALTANTE	31,00%	% PROGRAMACION OBRA	81,12%	% OBRA EJECUTADA	83,07%

OBRA (SEGÚN INFORMACION DE INTERVENTORIA SI APLICA)

% AVANCE EN PLAZO:	69,00%	PLAZO FALTANTE	31,00%	% PROGRAMACION OBRA	81,12%	% OBRA EJECUTADA	83,07%

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITÉ TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	F-GCT-01-V1
		Vigencia: 30/07/2023
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

7. REGISTRO FOTOGRAFICO (DESCRIPCION). ENVIAR COPIA MAGNETICA AL CORREO INSTITUCIONAL (XXXX)



Foto 1



Foto 2

8. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUMPLE SI ☑ NO ☐
CUALES? :

SE REQUIERE AJUSTES A LOS DISEÑOS: SI ☑ NO ☐
CAUSALES?: REUBICACION DE SENDEROS PEATONALES Y BAHIAS DE PARQUEO A CAUSA DE ARBOLES EXISTENTES

SE CUMPLE CON EL OBJETO DEL CONTRATO? SI ☑ NO ☐
PORQUE?

REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ NO ☑ VALOR? $0
EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN? SI ☑ NO ☐
PORQUE?

9. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Terminacion de detalles de tapa de pozos

Construccion de los sumideros

Instalacion de tuberia de 12 pulgadasd

CAPITULO	% EJECUTADO
1.0 PRELIMINARES	76%
2.0 SUMINISTRO E INSTALACIO	96%
3.0 POZOS DE INSPECCION	0%
4,0 CONSTRUCCIÓN DE SUMID	79%
5,0 ASEO GENERAL	0%
6.0 ITEM NO PREVISTO	100%
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	



TOTAL

10. FIRMAS

FIRMA DEL INTERVENTOR - CARLOS DARIO CANO SANCHEZ

	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	F-GCT-01-V1
CONSORCIO SAN ANTONIO 2025		Vigencia: 30/07/2023
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

PERIODO DEL INFORME: DEL: 5/12/2025 AL 15/12/2025 **fecha del informe** 22/12/2025

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (INTERVENTORIA U OBRA SEGÚN EL CASO)

CONTRATO DE (OBRA O INTERVENTORIA): No. COP-2025-562 DE
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
REP. LEGAL: ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA

OBJETO: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

VALOR INICIAL:	$ 988.082.242,00	ANTICIPO (%)	0%		
VALOR ADICIONAL:	$ -	PARCIAL 1 (%)	0%	$	-
VALOR FINAL:	$ 988.082.242,00	PARCIAL 2 (%)	0%	$	-
		PARCIAL 3 (%)	0%	$	-
		2 PARCIALES	0%	$	-

FORMA DE PAGO: CONFORME AVANCE DE OBRA - SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA

PLAZO INICIAL: CINCO MESES (5)
PLAZO ACTUAL: CINCO MESES (5)

	FECHA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	22/04/2025
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO :	23/06/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL CONTRATO :	21/01/2026 0
FECHA DE PRORROGA:	
FECHA DE SUSPENSION:	NA NA
FECHA DE REINICIO:	NA NA
FECHA ACTUAL DE TERMINACION CONTRATO :	21/01/2026

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO : EN EJECUCION

2. DATOS TECNICOS DEL CONTRATO:

METAS FISICAS ACTUALIZADA:			OBRA	INTERVENTORIA
☐ RED DE ACUEDUCTO		ML	PROGRAMA:	PROGRAMA:
☑ RED ALC. SAN / PLUV	584,01	ML	ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, LA CUAL INCLUIRA EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE
☐ PTAP / PTAR		UN		
☐ POZOS PROFUNDOS		ML		
☐ VIA URB / SEC / TERC		EM		
☐ PUENTE / ALC / BOX		UN		
☐ OTRO. CUAL?	CELDA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	UN		
META FISICA (VALOR/UN):	$ 988.082.242	$/UN	RUBRO: FUENTE:	RUBRO: FUENTE: PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y
			FUENTE	FUENTE
			ACTAS COBRADAS $ 0	ACTAS COBRADAS $ 0,00%
			0	


3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Retiro de Supervisor, Prorroga, Adicional, Modificatoria, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1 CONTRATO	22/04/2025		$ 988.082.242	
2 ACTA DE INICIO	22/06/2025		$ 988.082.242	
3 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES OBRA N° 1	22/09/2025		$ 988.082.242	
4 ACTA DE APROBACION DE ITEM NO PREVISTOS No1				
4 ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1			$ 646.148.872	
5 OTRO SI 1				
6 ACTA DE MODIFICACION No 2				
7 ACTA DE RECIBO PARCIAL No 2				
8 OTRO SI 2				
9 ACTA DE MODIFICACION 3				
10 ACTA No 3 DE RECIBO FINAL DE OBRA				
11 ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO DE OBRA				
12 ACTA DE LIQUIDACION				

	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	F-GCT-01-V1 Vigencia: 30/07/2023
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

4. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA (SI APLICA)	CONTRATO DE OBRA (SEGÚN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SI APLICA):

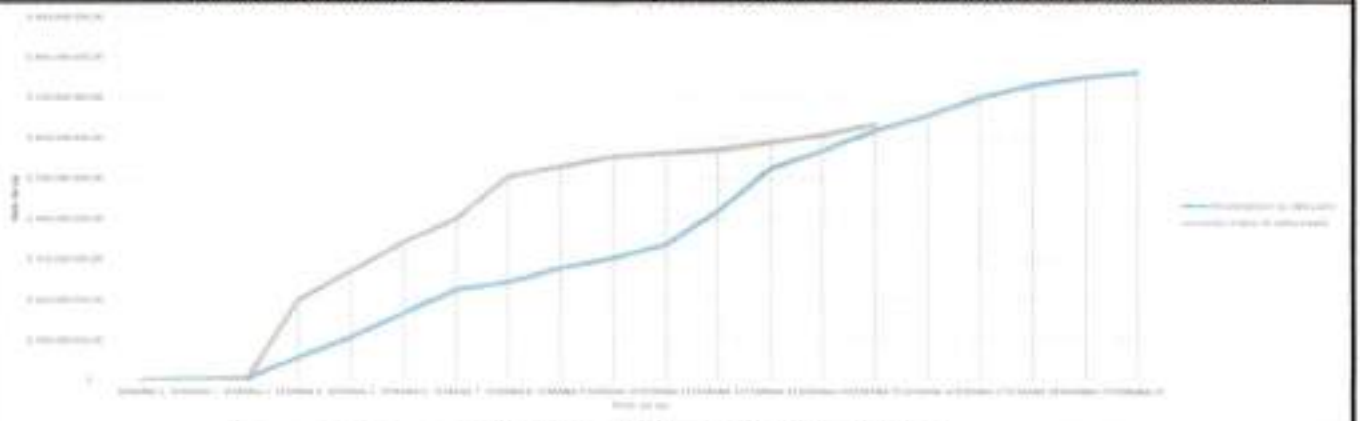

SEMANA	PROGRAMADO SEMANAL	EJECUTADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
SEMANA 1	$ 2.452.325,67	$ 1.998.946,33	$ 2.452.325,67	$ 1.998.946,33
SEMANA 2	$ 2.452.325,67	$ 1.998.946,33	$ 4.864.651,33	$ 3.997.892,67
SEMANA 3	$ 2.452.325,67	$ 1.998.946,33	$ 7.297.577,00	$ 5.996.839,00
SEMANA 4	$ 51.107.237,00	$ 198.033.574,00	$ 58.404.814,00	$ 204.030.413,00
SEMANA 5	$ 51.107.237,00	$ 73.860.979,50	$ 109.692.052,79	$ 278.091.586,50
SEMANA 6	$ 58.928.157,00	$ 68.774.087,50	$ 168.140.633,69	$ 346.866.674,00
SEMANA 7	$ 58.928.157,00	$ 58.777.530,00	$ 226.648.268,38	$ 402.094.204,50
SEMANA 8	$ 16.965.814,40	$ 103.873.569,50	$ 245.514.952,08	$ 505.967.774,00
SEMANA 9	$ 85.638.801,15	$ 25.152.947,63	$ 279.353.766,13	$ 531.050.241,50
SEMANA 10	$ 20.158.101,49	$ 24.240.845,50	$ 304.171.469,62	$ 555.361.087,00
SEMANA 11	$ 83.638.801,13	$ 8.778.576,50	$ 387.810.886,77	$ 564.119.663,50
SEMANA 12	$ 82.467.836,09	$ 8.778.576,50	$ 470.278.513,76	$ 572.898.240,00
SEMANA 13	$ 100.348.747,78	$ 18.352.153,25	$ 526.627.271,54	$ 591.050.393,25
SEMANA 14	$ 83.639.844,11	$ 18.282.103,25	$ 570.966.115,65	$ 609.282.546,50
SEMANA 15	$ 49.750.996,78	$ 26.890.226,25	$ 620.720.712,43	$ 636.072.798,25
SEMANA 16	$ 36.955.452,58	$ 30.119.367,08	$ 657.686.779,01	$ 665.992.142,67

GRAFICO DE AVANCE

CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X SUP	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
CUADRO DE RELACION DE PERSONAL SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORMES MENSUAL ENTREGADO A LA INTERVENTORIA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
COPIA DE LA BITACORA AL DIA FIRMADA Y AL DIA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐	NO CUMPLE

TABLA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE

CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X INT	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
CUADRO DE RELACION DE PERSONAL SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO REV INTER	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
CUADRO DE EQUIPO SEGÚN PROPUESTA REV POR INTERVENTORIA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORME METEREOLOGICO	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORMES MENSUALES	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORME PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORME PLAN DE SALUD OCUPACIONAL	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
SOCIALIZACION	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
VEEDURIA CIUDADANA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
VALLA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐		☐	
	☐		☐	

5. INFORMACION DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO, AVANCES EN % OBRA PROGRAMADA VS EJECUTADA

INTERVENTORIA							
% AVANCE EN PLAZO:	73,00%	PLAZO FALTANTE:	27,00%	% PROGRAMACION OBRA	85,95%	% OBRA EJECUTADA	87,98%
OBRA (SEGÚN INFORMACION DE INTERVENTORIA SI APLICA)							
% AVANCE EN PLAZO:	73,00%	PLAZO FALTANTE:	27,00%	% PROGRAMACION OBRA	85,95%	% OBRA EJECUTADA	87,98%

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITE TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	F-GCT-01-V1 Vigencia: 30/07/2023
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO (DESCRIPCION). ENVIAR COPIA MAGNETICA AL CORREO INSTITUCIONAL (XXXX)



Foto 1



Foto 2

8. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUMPLE SI ☑ NO ☐ CUALES? :	SE CUMPLE CON EL OBJETO DEL CONTRATO? SI ☑ NO ☐ PORQUE?
SE REQUIERE AJUSTES A LOS DISEÑOS SI ☑ NO ☐ CAUSALES?: REUBICACION DE SENDEROS PEATONALES Y BAHIAS DE PARQUEO A CAUSA DE ARBOLES EXISTENTES	REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ NO ☑ VALOR? $ 0 EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN? SI ☑ NO ☐ PORQUE?

9. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Terminacion de detalles de tapa de pozos

Construccion de los sumideros

Instalacion de tuberia de 12 pulgadas

CAPITULO	% EJECUTADO
1.0 PRELIMINARES	76%
2.0 SUMINISTRO E INSTALACIO	96%
3.0 POZOS DE INSPECCION	0%
4,0 CONSTRUCCIÓN DE SUMID	79%
5,0 ASEO GENERAL	0%
6.0 ITEM NO PREVISTO	100%
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	



TOTAL

10. FIRMAS

FIRMA DEL INTERVENTOR - CARLOS DARIO CANO SANCHEZ

	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	F-GCT-01-V1
		Vigencia: 30/07/2023
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

PERIODO DEL INFORME: DEL: 12/12/2025 AL 18/12/2025 **fecha del informe** 22/12/2025

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (INTERVENTORIA U OBRA SEGÚN EL CASO)

CONTRATO DE (OBRA O INTERVENTORIA): No. COP-2025-002 DE
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
REP. LEGAL: ALDA MARITZA OUSSAN ACOSTA

OBJETO: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

VALOR INICIAL:	$ 988.082.242,00	ANTICIPO (%)	0%	
VALOR ADICIONAL:	$ -	PARCIAL 1 (%)	0%	$ -
VALOR FINAL:	$ 988.082.242,00	PARCIAL 2 (%)	0%	$ -
		PARCIAL 3 (%)	0%	$ -
		Σ PARCIALES	0%	$ -

FORMA DE PAGO: CONFORME AVANCE DE OBRA - SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA

PLAZO INICIAL: CINCO MESES (5)
PLAZO ACTUAL: CINCO MESES (5)

	FECHA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	22/04/2025
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO :	22/08/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL CONTRATO :	21/01/2026 0
FECHA DE PRORROGA:	
FECHA DE SUSPENSION:	NA NA
FECHA DE REINICIO:	NA NA
FECHA ACTUAL DE TERMINACION CONTRATO :	21/01/2026

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO : EN EJECUCION

2. DATOS TECNICOS DEL CONTRATO:

METAS FISICAS ACTUALIZADA:

☐	RED DE ACUEDUCTO		ML
☑	RED ALC. SAN / PLUV	584,01	ML
☐	PTAP / PTAR		UN
☐	POZOS PROFUNDOS		ML
☐	VIA URB / SEC / TERC		KM
☐	PUENTE / ALC / BOX		UN
☐	OTRO. CUAL?	CELDA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	UN

META FISICA (VALOR/UN): $ 988.082.242 $/UN

OBRA

PROGRAMA: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

RUBRO: FUENTE:

FUENTE

ACTAS COBRADAS $ 0

0

INTERVENTORIA

PROGRAMA: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, LA CUAL EJECUTARA EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE

RUBRO: FUENTE: PAT1A - SGP - AGUA POTABLE Y

FUENTE

ACTAS COBRADAS $ 0,00%


3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO:

	ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatorio, Parciales,Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1	CONTRATO	22/04/2025		$ 988.082.242	
2	ACTA DE INICIO	22/08/2025		$ 988.082.242	
3	ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES OBRA Nº 1	22/08/2025		$ 988.082.242	
4	ACTA DE APROBACION DE ITEM NO PREVISTOS No1				
4	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1			$ 646.148.872	
5	OTRO SI 1				
6	ACTA DE MODIFICACION No.2				
7	ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2				
8	OTRO SI 2				
9	ACTA DE MODIFICACION 3				
10	ACTA No.3 DE RECIBO FINAL DE OBRA				
11	ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO DE OBRA				
12	ACTA DE LIQUIDACION				

CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO SAN ANTONIO 2020	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	F-GCT-01-V1
		Vigencia: 30/07/2023
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

4. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA (SI APLICA)	CONTRATO DE OBRA (SEGÚN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SI APLICA):

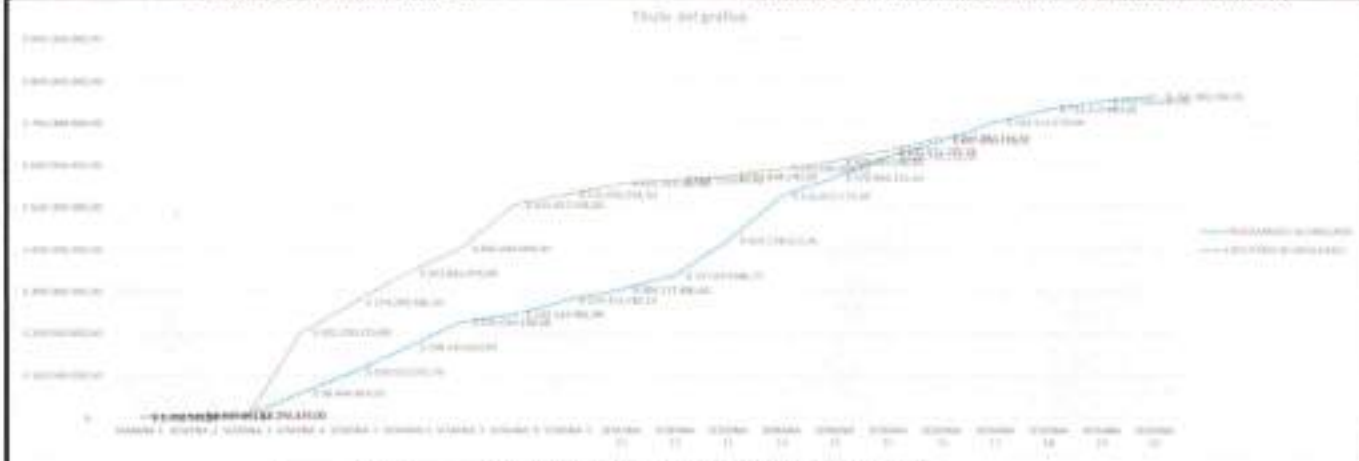

SEMANA	PROGRAMADO SEMANAL	EJECUTADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
SEMANA 1	$ 2.432.525.457	$ 1.398.946.331	$ 2.432.525.457	$ 1.398.946.331
SEMANA 2	$ 2.432.525.457	$ 1.398.946.331	$ 4.865.050.914	$ 2.797.892.662
SEMANA 3	$ 2.432.525.457	$ 1.398.946.331	$ 7.297.576.371	$ 4.196.838.993
SEMANA 4	$ 51.187.237.987	$ 396.031.874.000	$ 58.484.814.358	$ 400.228.712.993
SEMANA 5	$ 51.187.237.987	$ 71.960.373.397	$ 109.672.052.345	$ 472.189.086.390
SEMANA 6	$ 58.508.553.987	$ 68.774.087.540	$ 168.180.606.332	$ 540.963.173.930
SEMANA 7	$ 58.508.553.987	$ 58.127.040.540	$ 226.689.160.319	$ 599.090.214.470
SEMANA 8	$ 18.480.804.987	$ 103.973.089.540	$ 245.169.965.306	$ 703.063.304.010
SEMANA 9	$ 63.648.901.119	$ 25.132.047.397	$ 308.818.866.425	$ 728.195.351.407
SEMANA 10	$ 25.038.181.449	$ 69.288.085.540	$ 333.857.047.874	$ 797.483.436.947
SEMANA 11	$ 63.638.861.113	$ 8.778.576.540	$ 397.495.908.987	$ 806.262.013.487
SEMANA 12	$ 83.467.836.099	$ 8.778.576.540	$ 480.963.745.086	$ 815.040.590.027
SEMANA 13	$ 196.598.747.170	$ 18.782.153.470	$ 677.562.492.256	$ 833.822.743.497
SEMANA 14	$ 65.575.094.113	$ 18.782.153.470	$ 743.137.586.369	$ 852.604.896.967
SEMANA 15	$ 99.769.986.178	$ 26.390.286.540	$ 842.907.572.547	$ 878.995.183.507
SEMANA 16	$ 86.861.763.540	$ 93.218.967.540	$ 929.769.336.087	$ 972.214.151.047
SEMANA 17	$ 84.931.000.540	$ 31.884.853.540	$ 1.014.700.336.627	$ 1.004.099.004.587

GRAFICO DE AVANCE

CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X SUP	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
CUADRO DE RELACION DE PERSONAL SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORMES MENSUAL ENTREGADO A LA INTERVENTORIA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
COPIA DE LA BITACORA AL DIA FIRMADA Y AL DIA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐	NO CUMPLE

TABLA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE

CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X INT	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
CUADRO DE RELACION DE PERSONAL SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO REV INTER	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
CUADRO DE EQUIPO SEGÚN PROPUESTA REV POR INTERVENTORIA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORME METEREOLOGICO	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORMES MENSUALES	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORME PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORME PLAN DE SALUD OCUPACIONAL	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
SOCIALIZACION	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
VEEDURIA CIUDADANA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
VALLA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐		☐	
	☐		☐	

5. INFORMACION DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO, AVANCES EN % OBRA PROGRAMADA VS EJECUTADA

INTERVENTORIA							
% AVANCE EN PLAZO:	73,00%	PLAZO FALTANTE:	27,00%	% PROGRAMACION OBRA	85,95%	% OBRA EJECUTADA	87,66%
OBRA (SEGÚN INFORMACION DE INTERVENTORIA SI APLICA)							
% AVANCE EN PLAZO:	73,00%	PLAZO FALTANTE:	27,00%	% PROGRAMACION OBRA	85,95%	% OBRA EJECUTADA	87,66%

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITE TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	F-GCT-01-V1
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2023		Vigencia: 30/07/2023
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO (DESCRIPCION). ENVIAR COPIA MAGNETICA AL CORREO INSTITUCIONAL (XEEX)



Foto 1



Foto 2

8. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUMPLE SI [x] NO [ ]
CUALES? :

SE REQUIERE AJUSTES A LOS DISEÑOS: SI [x] NO [ ]
CAUSALES?: REUBICACION DE SENDEROS PEATONALES Y BAHIAS DE PARQUEO A CAUSA DE ARBOLES EXISTENTES

SE CUMPLE CON EL OBJETO DEL CONTRATO? SI [x] NO [ ]
PORQUE?

REQUIERE ADICIONAL? SI [ ] NO [x] VALOR? $ 0
EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN? SI [x] NO [ ]
PORQUE?


9. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Terminacion de detalles de tapa de pozos

Construccion de los sumideros

Instalacion de tuberia de 12 pulgadas

CAPITULO	% EJECUTADO
1.0 PRELIMINARES	76%
2.0 SUMINISTRO E INSTALACIO	96%
3.0 POZOS DE INSPECCION	0%
4,0 CONSTRUCCIÓN DE SUMID	79%
5,0 ASEO GENERAL	0%
6.0 ITEM NO PREVISTO	100%
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	

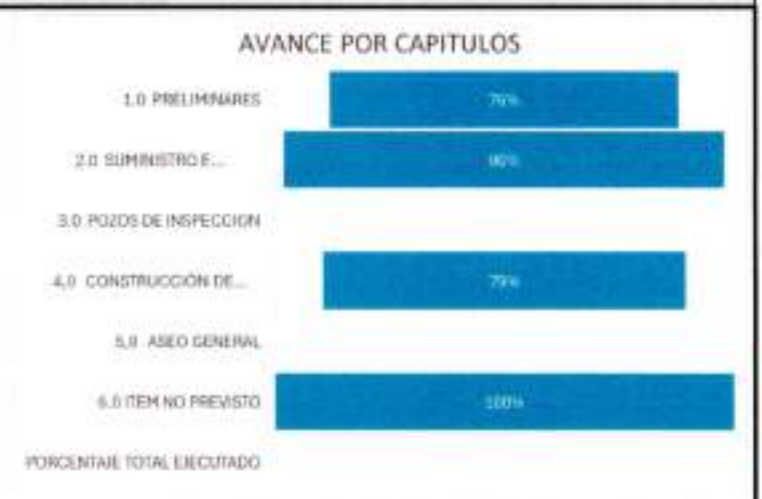

TOTAL

10. FIRMAS

FIRMA DEL INTERVENTOR - CARLOS DARIO CANO SANCHEZ

		F-GCT-01-V1
	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 30/07/2023
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de 3

PERIODO DEL INFORME: DEL: 10/12/2025 AL 25/12/2025 **fecha del informe** 22/12/2025

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (INTERVENTORIA U OBRA SEGÚN EL CASO)

CONTRATO DE (OBRA O INTERVENTORIA): No. COP-2025-002 DE
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
REP. LEGAL: ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA

OBJETO: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

VALOR INICIAL:	$ 988.082.242,00	ANTICIPO (%)	0%		
VALOR ADICIONAL:	$ -	PARCIAL 1 (%)	0%	$	-
VALOR FINAL:	$ 988.082.242,00	PARCIAL 2 (%)	0%	$	-
		PARCIAL 3 (%)	0%	$	-
		# PARCIALES	0%	$	-

FORMA DE PAGO: CONFORME AVANCE DE OBRA - SEGUN PROPUESTA ECONOMICA

PLAZO INICIAL: CINCO MESES (5)
PLAZO ACTUAL: CINCO MESES (5)

	FECHA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	22/04/2025
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:	22/08/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL CONTRATO:	21/01/2026
FECHA DE PRORROGA:	0
FECHA DE SUSPENSION:	NA NA
FECHA DE REINICIO:	NA NA
FECHA ACTUAL DE TERMINACION CONTRATO:	21/01/2026
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:	EN EJECUCION

2. DATOS TÉCNICOS DEL CONTRATO:

METAS FISICAS ACTUALIZADA:

☐	RED DE ACUEDUCTO		ML
☑	RED ALC. SAN / PLUV	584,01	ML
☐	PTAP / PTAR		UN
☐	POZOS PROFUNDOS		ML
☐	VIA URB / SEC / TERC		KM
☐	PUENTE / ALC / BOX		UN
☐	OTRO. CUAL?	CELDA DE RANERO DE RESIDUOS SOLIDOS	UN

META FISICA (VALOR/UN): $ 988.082.242 $/UN

OBRA

PROGRAMA: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

RUBRO: FUENTE:

ACTAS COBRADAS $ 0 FUENTE

0

INTERVENTORIA

PROGRAMA: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARA EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE

RUBRO: FUENTE: PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y

ACTAS COBRADAS $ FUENTE 0,00%


3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO:

ACTAS SUSCRITAS (Designacion, Inicio, Anticipo, Suspension, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comites, Terminacion, Liquidacion)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1 CONTRATO	22/04/2025		$ 988.082.242	
2 ACTA DE INICIO	22/08/2025		$ 988.082.242	
3 ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES OBRA N° 1	22/08/2025		$ 988.082.242	
4 ACTA DE APROBACION DE ITEM NO PREVISTOS No1				
4 ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1			$ 646.148.872	
5 OTRO SI 1				
6 ACTA DE MODIFICACION No.2				
7 ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2				
8 OTRO SI 2				
9 ACTA DE MODIFICACION 3				
10 ACTA No 3 DE RECIBO FINAL DE OBRA				
11 ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO DE OBRA				
12 ACTA DE LIQUIDACION				

	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	F-GCT-01-V1 Vigencia: 30/07/2023
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

4. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA (SI APLICA)	CONTRATO DE OBRA (SEGÚN INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA SI APLICA):

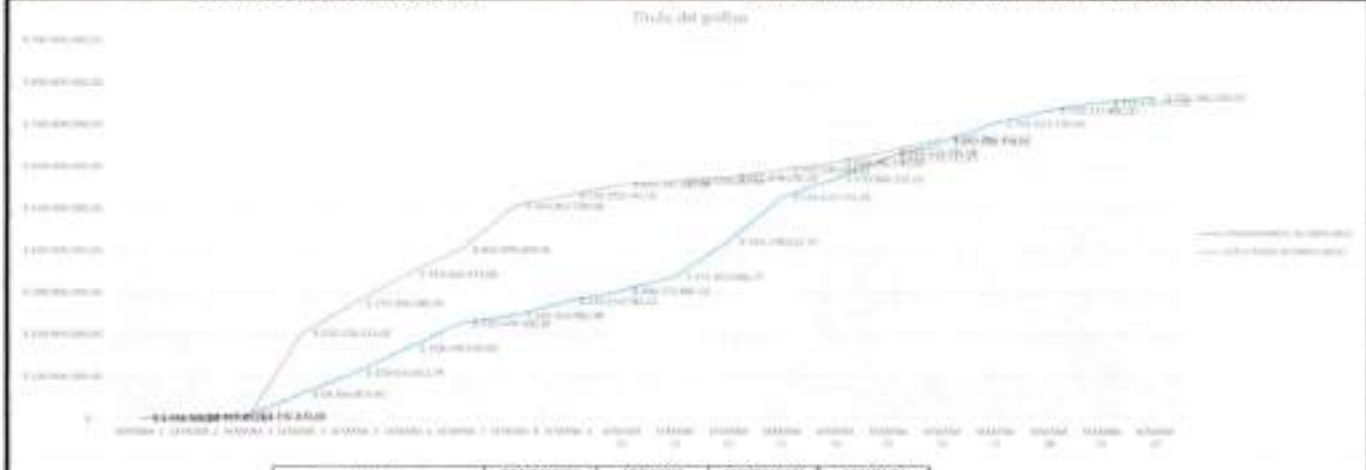

SEMANA	PROGRAMADO SEMANAL	EJECUTADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO
SEMANA 1	$ 2.934.525,67	$ 1.398.996,33	$ 2.934.525,67	$ 1.398.996,33
SEMANA 2	$ 3.452.525,67	$ 1.398.966,33	$ 6.885.051,33	$ 2.797.892,67
SEMANA 3	$ 3.452.525,67	$ 1.398.966,33	$ 7.897.577,00	$ 4.196.859,00
SEMANA 4	$ 51.357.157,00	$ 186.011.116,00	$ 58.464.814,00	$ 190.479.413,00
SEMANA 5	$ 13.367.452,00	$ 71.961.417,00	$ 197.824.494,77	$ 262.085.588,00
SEMANA 6	$ 58.006.951,00	$ 89.774.987,00	$ 366.160.634,00	$ 323.866.574,00
SEMANA 7	$ 58.508.557,00	$ 58.577.530,00	$ 236.845.398,00	$ 402.049.004,00
SEMANA 8	$ 48.865.814,00	$ 589.671.580,00	$ 285.514.982,98	$ 505.917.584,00
SEMANA 9	$ 33.638.802,35	$ 25.132.867,50	$ 270.010.396,13	$ 531.050.451,50
SEMANA 10	$ 25.033.373,42	$ 24.280.845,50	$ 304.171.885,62	$ 555.331.297,00
SEMANA 11	$ 33.638.802,35	$ 8.738.536,50	$ 337.810.686,77	$ 564.119.833,50
SEMANA 12	$ 42.467.696,99	$ 8.738.536,50	$ 380.278.383,76	$ 572.858.370,00
SEMANA 13	$ 306.348.167,38	$ 36.081.313,00	$ 686.627.217,14	$ 591.000.183,25
SEMANA 14	$ 44.330.045,11	$ 28.188.318,00	$ 730.960.313,86	$ 609.282.348,00
SEMANA 15	$ 46.988.848,48	$ 46.990.788,50	$ 777.791.712,49	$ 676.677.785,00
SEMANA 16	$ 36.955.057,56	$ 36.370.867,50	$ 857.890.770,05	$ 680.990.134,00
SEMANA 17	$ 44.811.000,00	$ 31.866.810,50	$ 902.521.770,05	$ 697.867.006,25

GRAFICO DE AVANCE

CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X SUP	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
CUADRO DE RELACION DE PERSONAL SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORMES MENSUAL ENTREGADO A LA INTERVENTORIA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
COPIA DE LA BITACORA AL DIA FIRMADA Y AL DIA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐	CUMPLE	☐	NO CUMPLE

TABLA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE

CUADRO ACTUALIZADO DE GARANTIAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS POR CONTRATACION REV X INT	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
CUADRO DE RELACION DE PERSONAL SEGÚN OFERTA E IBC PROPUESTO REV INTER	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
CUADRO DE EQUIPO SEGÚN PROPUESTA REV POR INTERVENTORIA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORME METEREOLOGICO	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORMES MENSUALES	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORME PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
INFORME PLAN DE SALUD OCUPACIONAL	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
SOCIALIZACION	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
VEEDURIA CIUDADANA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
VALLA	☑	CUMPLE	☐	NO CUMPLE
	☐		☐	
	☐		☐	

5. INFORMACION DE LOS PLAZOS DEL CONTRATO, AVANCES EN % OBRA PROGRAMADA VS EJECUTADA

INTERVENTORIA

% AVANCE EN PLAZO:	78,00%	PLAZO FALTANTE:	22,00%	% PROGRAMACION OBRA	85,05%	% OBRA EJECUTADA	87,95%

OBRA (SEGÚN INFORMACION DE INTERVENTORIA SI APLICA)

% AVANCE EN PLAZO:	78,00%	PLAZO FALTANTE:	22,00%	% PROGRAMACION OBRA	85,05%	% OBRA EJECUTADA	87,95%

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITÉ TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2023	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	F-GCT-01-V1
		Vigencia: 30/07/2023
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE INTERVENTORIA	Pagina de

7. REGISTRO FOTOGRAFICO (DESCRIPCION). ENVIAR COPIA MAGNETICA AL CORREO INSTITUCIONAL (3000)



Foto 1



Foto 2

8. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUMPLE SI ☑ NO ☐
CUALES?:

SE REQUIERE AJUSTES A LOS DISEÑOS: SI ☑ NO ☐
CAUSALES?: REUBICACION DE SENDEROS PEATONALES Y BAHIAS DE PARQUEO A CAUSA DE ARBOLES EXISTENTES

SE CUMPLE CON EL OBJETO DEL CONTRATO? SI ☑ NO ☐
PORQUE?

REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ NO ☑ VALOR? $ 0
EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN? SI ☑ NO ☐
PORQUE?

9. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Terminacion de detalles de tapa de pozos

Construccion de los sumideros

Instalacion de tuberia de 12 pulgadas

CAPITULO	% EJECUTADO
1.0 PRELIMINARES	76%
2.0 SUMINISTRO E INSTALACIO	96%
3.0 POZOS DE INSPECCION	0%
4,0 CONSTRUCCIÓN DE SUMID	79%
5,0 ASEO GENERAL	0%
6.0 ITEM NO PREVISTO	100%
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	



TOTAL

10. FIRMAS

FIRMA DEL INTERVENTOR - CARLOS DARIO CANO SANCHEZ

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
NIT: 901.955.099-5

ANEXO 8 COPIA DE LA PREACTA N. 4

CR 14 # 13-40 – OFICINA 203 Barrio el centro - Tel: 3134629855 -
consorcioalcantarilladosananto@gmail.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE MILAN - CAQUETÁ
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA
PRECTA N. 4

OBJETO DE CONTRATO: Adecuación y canalización de aguas lluvias en la calle 4, entre cra 2 a la cra 6, del casco urbano de la inspección de San Antonio de Getucha, en el municipio de Milán, Departamento del Caquetá.
CONTRATISTA : CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
REPRESENTANTE LEGAL: ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA
INTERVENTOR: CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
FECHA DE INICIO: 22 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 21 DE ENERO DE 2026
FECHA PRECTA No. 04: 21DE DICIEMBRE DE 2025

CONSTRUCCIÓN CELDA DE DISPOSICIÓN FINAL REGIONAL SANITARIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VALORES INICIALES			ACTA MODIFICATORIA 2			PRE ACTA 1 No. 03		PRE ACTA 2 No. 04		SALDOS	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS	VALOR TOTAL	CANTIDADES	VALOR TOTAL
CAPITULO					$ 743.986.340,00			$ 192.984.240,00		$ 448.747.360,00		$ 402.172.827,37		$ 181.401.406,00
CAPITULO					$ 211.911.343,00			$ 211.911.031,00		$ 104.412.712,00		$ 104.971.044,71		$ 97.240.091,00
1	**1.0 PRELIMINARES**													
1	1.01 Localización y replanteo de redes	M2	897,25	$ 17.396,00	$ 15.604.571,00	555,84		$ 9.667.377,00	340,34	$ 5.920.499,00	555,84	$ 9.667.377,00	11,50	$ 200.076,00
2	1.02 Cerramiento provisional tipo verde (H=2,00m)	M	897,25	$ 15.189,00	$ 13.630.445,00	873,50		$ 13.269.301,00	713,21	$ 11.712.499,00	873,50	$ 13.269.301,00	185,75	$ 1.417.170,00
3	1.03 Excavación manual en material común de 0,00 a 2,00 m	M3	72,71	$ 52.700,00	$ 3.831.162,00	150,44		$ 7.927.588,00	22,25	$ 1.202.830,00	113,80	$ 6.062.758,00	113,44	$ 6.080.382,00
4	1.04 Excavación manual en material común de 2,00 a 4,00 m	M3	37,80	$ 49.013,00	$ 1.909.063,00	10,17		$ 751.260,00	10,20	$ 1.008.700,00	10,17	$ 751.260,00	-9,68	$ 626.773,00
5	1.05 Excavación mecánica en material común	M3	1.381,00	$ 21.946,00	$ 28.012.906,00	1.296,44		$ 28.374.322,00	900,00	$ 19.698.000,00	1.167,64	$ 25.551.788,00	447,21	$ 9.786.081,00
6	1.06 Entibado en madera para protección total de excavación	M2	980,00	$ 40.300,00	$ 20.668.737,00	914,70		$ 46.300.004,00	640,00	$ 32.320.000,00	914,70	$ 46.300.004,00	50,85	$ 3.847.317,00
7	1.07 Cargue, transporte y botro de material sobrante	M3	853,47	$ 53.500,00	$ 50.000.204,00	438,82		$ 21.999.323,00	334,00	$ 16.999.000,00	480,00	$ 21.999.323,00	72,77	$ 3.997.917,00
8	1.08 Relleno, Conformación hidráulica con planta 2° de acuerdo a la norma ASTM 3487	M3	334,28	$ 42.874,00	$ 17.629.317,00	97,10		$ 5.970.717,00	71,38	$ 4.390.777,00	97,10	$ 5.970.717,00	29,77	$ 2.379.108,00
9	1.09 Relleno con material seleccionado de la excavación	M3	726,13	$ 11.400,00	$ 12.817.722,00	1.206,00		$ 21.971.784,00	633,47	$ 11.540.161,00	1.206,00	$ 21.971.784,00	420,53	$ 10.089.844,00
10	1.1 Suministro e instalación de sub_base granular tipo C, h=1	M3	180,70	$ 261.164,00	$ 46.110.467,00	112,49		$ 29.924.973,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	112,49	$ 29.924.973,00
11	1.11 Suministro e instalación de base granular tipo C, h=1	M3	43,30	$ 371.164,00	$ 11.417.881,00	26,36		$ 7.809.545,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	26,36	$ 7.809.545,00
12	1.12 Suministro e instalación de valastra natural en área afectada por la excavación	M2	117,46	$ 57.429,00	$ 10.191.173,00	218,24		$ 12.532.973,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	218,24	$ 12.532.973,00
CAPITULO	**2.0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA**				$ 368.294.207,00			$ 394.112.113,00		$ 343.247.612,00		$ 377.902.042,66		$ 91.365.496,00
9	2.01 Suministro e instalación de tubería PVC D=8"(200mm) NTC 5733-3 08	ML	146,24	$ 143.319,00	$ 24.111.005,00	169,04		$ 23.937.764,00	0,00	$ 0,00	115,20	$ 16.473.440,00	139,05	$ 21.910.764,00
10	2.02 Suministro e instalación de tubería PVC D=400mm) NTC 5733-3 08	ML	40,54	$ 266.424,00	$ 12.653.202,00	71,01		$ 22.454.109,00	75,00	$ 21.540.264,00	70,00	$ 21.405.264,00	0,99	$ 1.188.735,00
11	2.03 Suministro e instalación de tubería PVC D=600 mm) NTC 5733-3 08	ML	80,03	$ 384.415,00	$ 31.334.640,00	44,79		$ 17.218.080,00	60,00	$ 17.191.284,00	45,00	$ 17.221.283,71	1,11	$ 426.797,29

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE MILAN - CAQUETÁ
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA
PRECTA N. 4

12	2.04	Suministro e instalación de tubería PVC D=12" NEC 5000 ASTM F 794	ML	140,27	$ 790.424,00	$ 126.691.204,00	160,84		$ 127.092.111,00	100,31	$ 126.780.000,00	100,31	$ 126.780.000,00	1,34	$ 5.481.712,00
13	2.05	Suministro e instalación de tubería PVC D=10" NEC 5000 ASTM F 794	ML	61,84	$ 960.479,00	$ 44.713.485,00	51,31		$ 44.047.905,00	49,91	$ 47.921.373,00	49,91	$ 47.921.373,00	0,39	$ 2.084.544,00
14	2.06	Suministro e instalación de tubería PVC D=36" NEC 5000 ASTM F 794	ML	17,46	$ 1.420.575,00	$ 126.605.544,00	93,78		$ 108.978.918,00	76,75	$ 109.070.973,00	96,78	$ 109.070.973,00	0,00	$ 0,00
3	3.0	POZOS DE INSPECCIÓN				$ 98.829.411,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
13	3.01	Pozos de inspección en concreto T C= 3MM20 D=1,20 m y h=H=2,00 m, incluye tapa	UND	4,00	$ 8.291.911,00	$ 33.167.476,00	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
14	3.02	Pozos de inspección en concreto T C= 3MM20 D=1,20 m y 2,01<h=<4,00 m incluye tapa	UND	8,00	$ 8.972.711,00	$ 36.478.150,00	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
4	4.0	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS Y CANOA DE SARDINEL				$ 333.699.911,00			$ 71.809.467,00		$ 0,00		$ 34.355.748,00		$ 71.809.467,00
17	4.01	Construcción de cunetas transversales de vía, z=0,01m x 0,60 m, ancho cili de 0,40m, espesor de muros de 0,20m, y rejilla en platina de 2" x 3/8	UND	3,00	$ 15.491.870,00	$ 46.475.610,00	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
18	4.03	Construcción de cunetas transversales de vía, z=9,32m x 0,60 m, ancho cili de 0,40m, espesor de muros de 0,20m, y rejilla en platina de 2" x 3/8	UND	1,00	$ 13.402.201,00	$ 13.402.201,00	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
19	4.04	Construcción de sumidero de 1,40m x 0,80m, ancho cili de 0,60m x 1,30m, e=0,15m, rejilla platina de 2 x 3/8	UND	9,00	$ 3.520.451,00	$ 31.683.879,00	0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
20	4.04	Construcción de sumidero de 1,40m x 0,80m, ancho cili de 0,60m x 1,30m, e=0,15m, rejilla platina de 2 x 3/8	UND	2,00	$ 3.759.731,00	$ 7.519.462,00	19,00		$ 67.675.158,00	0,00	$ 0,00	19,00	$ 34.355.748,00	19,00	$ 67.675.158,00
21	4.05	Construcción de cordón de sardín	UND	1,00	$ 4.154.529,00	$ 4.154.529,00	1,00		$ 4.154.529,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 4.154.529,00
5	5.0	ASEO GENERAL				$ 1.000.974,00			$ 1.000.974,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 1.000.974,00
22	5.01	Aseo general de obra	UND	1,00	$ 1.000.974,00	$ 1.000.974,00	1,00		$ 1.000.974,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.000.974,00
MP	OTRO NO PREVISTO					$ 0,00			$ 63.521.000,00		$ 57.310.000,00		$ 43.521.000,00		$ 0,00
23	MP-1	Pozos de inspección en concreto T C= 3MM20 D=1,50 m y h=H=3,00 m, incluye tapa	UND	0,00	$ 8.148.944,00	$ 0,00	4,00		$ 34.594.304,00	4,00	$ 34.891.360,00	4,00	$ 30.994.304,00	0,00	$ 0,00
24	MP-2	Pozos de inspección en concreto T C= 3MM20 D=1,50 m y 2,01<h=<3,00 m incluye tapa	UND	0,00	$ 9.043.314,00	$ 0,00	3,00		$ 27.129.942,00	1,00	$ 9.043.314,00	3,00	$ 27.129.942,00	0,00	$ 0,00
25	MP-3	Pozos de inspección en concreto T C= 3MM20 D=1,80 m y 3,51<h=<4,00 m incluye tapa	UND	0,00	$ 11.297.357,00	$ 0,00	1,00		$ 11.297.357,00	1,00	$ 11.297.357,00	1,00	$ 11.297.357,00	0,00	$ 0,00
					COSTO DIRECTO	$ 743.186.240			$ 743.186.240		$ 638.757.581		$ 533.113.828		$ 191.449.454

ADMINISTRACIÓN	24%	$ 178.364.697,60	$ 178.364.697,60	$ 153.301.819,44	$ 127.963.878,72	$ 45.947.813,62
IMPREVISTOS	2%	$ 14.859.724,80	$ 14.859.724,80	$ 12.775.151,62	$ 10.663.656,56	$ 3.828.984,38
UTILIDAD	4%	$ 29.719.449,60	$ 29.719.449,60	$ 25.550.303,24	$ 21.327.313,12	$ 7.657.969,75
SUBTOTAL AIU		$ 223.943.872,00	$ 223.943.872,00	$ 192.491.274,30	$ 160.654.848,40	$ 57.434.767,75
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		$ 22.200.000	$ 22.200.000	$ 22.200.000	$ 22.200.000	$ 22.200.000
VALOR TOTAL		$ 966.382.240,00	$ 966.382.240,00	$ 853.448.855,30	$ 821.612.728,40	$ 271.084.240
				11,69%	15,00%	

BALANCE GENERAL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 966.382.240,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 966.382.240,00
VALOR DE LA PRECTA N. 3	$ 729.611.468,30
VALOR DE LA PRECTA N. 4	$ 65.084.570
SALDO POR EJECUTAR	$ 171.084.240,20
PORCENTAJE EJECUTADO	82,29%

CARLOS FABIO [illegible] SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL UNIÓN TEMPORAL

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
NIT: 901.955.099-5

ANEXO 09 COPIA DE ACTA DE COMITE DE OBRA 06 Y 07

CR 14 # 13-40 – OFICINA 203 Barrio el centro - Tel: 3134629855 -
consorcioalcantarilladosananto@gmail.com

	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	CÓDIGO	ACTA DE COMITÉ DE INTERVENTORÍA		
		~~VERSIÓN~~	~~0.1~~		
	ACTA DE COMITÉ N. 6	FECHA	28	11	2025
	ACTA DE COMITÉ INTERVENTORÍA				

MUNICIPIO MILAN CAQUETA CONTRATO No. COP-2025-002

OBJETO DE CONTRATO:

ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
CARLOS DARÍO CANO (**CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025**)	
ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA (CONSORCIO SAN ANTONIO 2025)	

II. OBJETIVOS DEL COMITÉ

- Socialización de justificación de imprevistos.
- Seguimiento a la ejecución del contrato de obra
- APUS de los item no previstos
- Entrega de balance de obra n. 2
- Solicitud de terminación de trabajos

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y REVISIÓN DE COMPROMISOS

N.A

IV. TEMAS TRATADOS

Seguimiento a la ejecución del contrato de obra

Entrega de balance de obra n. 2

APUS de los item no previstos

V. DESARROLLO TEMAS

Fecha: 28 de noviembre de 2025

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: San Antonio de Getucha.

AVANCE DE OBRA

El contratista de interventoria mencio que el contratista de obra lleva un avance ejecutado real del 88.83% frente al programado que es 74.62%, teniendo en cuenta la programación de obra. El contratista tiene avance superior del 6 % en la ejecución de obra.

SEMANA	PROGRAMADO SEMANAL	EJECUTADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULUADO
SEMANA 1	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33
SEMANA 2	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33	$ 4.865.051,33	$ 2.797.892,67
SEMANA 3	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33	$ 7.297.577,00	$ 4.196.839,00
SEMANA 4	$ 51.167.237,90	$ 198.033.374,00	$ 58.464.814,90	$ 202.230.213,00
SEMANA 5	$ 51.167.237,90	$ 71.861.373,50	$ 109.632.052,79	$ 274.091.586,50
SEMANA 6	$ 58.508.557,90	$ 69.774.887,50	$ 168.140.610,69	$ 343.866.474,00
SEMANA 7	$ 58.508.557,90	$ 58.177.530,50	$ 226.649.168,58	$ 402.044.004,50
SEMANA 8	$ 18.865.814,40	$ 103.873.589,50	$ 245.514.982,98	$ 505.917.594,00
SEMANA 9	$ 33.638.801,15	$ 25.132.647,50	$ 279.153.784,13	$ 531.050.241,50
SEMANA 10	$ 25.018.101,49	$ 24.290.845,50	$ 304.171.885,62	$ 555.341.087,00
SEMANA 11	$ 33.638.801,15	$ 8.778.576,50	$ 337.810.686,77	$ 564.119.663,50
SEMANA 12	$ 82.467.836,99	$ 8.778.576,50	$ 420.278.523,76	$ 572.898.240,00
SEMANA 13	$ 106.348.747,78	$ 18.192.153,25	$ 526.627.271,54	$ 591.090.393,25
SEMANA 14	$ 44.339.044,11	$ 18.192.153,25	$ 570.966.315,65	$ 609.282.546,50

Grafica de ejecución a la fecha



ENTREGA DE APUS NUEVOS

El contratista de obra hace entrega de dos item no previstos, los cuales se describen a continuación:

- Construcción de sumidero de 1.64m x 0.88m, ancho útil de 0.58m x 1.34m, e=0.15m, Tapa en concreto reforzado y perforada en tubo de 2" y una profundidad de 0,3 a 0.5 m
- Concreto ciclopeo para descoles del sistema
- Relleno con material de prestamo para remplazo de material contaminado

Estos APU, serán analizados por la interventoría para ser aprobados y el balance de obra entregado por el contratista de al termino de esta acta de comité.

El contraista de interventoria solicita se entregue un informe de justificacion de los item no previstos.

SOLICITUD DE TERMINACION DE TRABAJOS

La interventoria solicita entregar una reprogramación de obra y entregar el balance de obra respectivo del cual se ha mencionado en el último comité de obra generado.

Actividades faltantes del contrato de obra

1,10	Suministro e instalación de sub_base granular tipo C, NT1
1,11	Suministro e instalación de base granular tipo C, NT1
1,12	Suministro e instalación de asfaltita natural, en áreas afectadas por la excavación

Los siguientes son los item representativos que se encuentra pendiente para dar terminacion del proyecto y alcanzar su alcance proyectado.

ACTA DE MODIFICACION N. 2

El contratista de obra menciona que realizara el acta de modificacion pero que hasta el momento no ha realizado los ajustes solicitados informalmente por la interventoria, los cuales son:

- Ajustar las areas reales de recuperacion del pavimento en asfaltita natural.
- Rellenos con metarial de la misma excavacion
- Ajsuets de longitudes de tuberia, estos se deben ajustar basados en la medicion de la topografia que se debe relaizar.

La interventoria solicita empezar a levantar el plano record de obra y este debera ser la guia para ajustar realmente las cantidades plasmadas en el acta de modificacion n.2.

EL contratista de obra debera entregar adjunto al acta de modificacion los siguientes documentos:

1. Informe de justificacion de item non previstos y modificacion de cantidades
2. APUS de item no previstos
3. Memorias de cantidades de acta de modificacion.

VI. INFORME DEL PROYECTO A LAS VEEDURÍAS / CIUDADANÍA (si lo requieren)

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA		RESPONSABLES
Entregar los siguientes documentos • Informe de justificacion de item non previstos y modificacion de cantidades • APUS de item no previstos • Memorias de cantidades de acta de modificacion		CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
Iniciar actividades pendientes en durante el quinto mes de ejecución		CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
VII. PRÓXIMA REUNIÓN		

FECHA 18 (DÍA) 12 (MES) 2025 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en Florencia, a los

28 días del mes de 11 DE 2025

	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	CÓDIGO	ACTA DE COMITÉ DE INTERVENTORÍA		
		VERSIÓN	0.1		
	ACTA DE COMITÉ N. 7	FECHA	21	12	2025
	ACTA DE COMITÉ INTERVENTORÍA				

MUNICIPIO **MILAN CAQUETA** CONTRATO No. **COP-2025-002**

OBJETO DE CONTRATO:

ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

I. PARTICIPANTES	**FIRMA DE LOS PARTICIPANTES**
CARLOS DARÍO CANO (**CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025**)	
ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA (CONSORCIO SAN ANTONIO 2025)	

II. OBJETIVOS DEL COMITÉ

OBSERVACIONES DE OBRA Y SOLICITUDES DE LA INTERVENTORIA.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y REVISIÓN DE COMPROMISOS

N.A

IV. TEMAS TRATADOS

- Verificación del avance de obra
- Señalización de estructuras incompletas
- Medición de las áreas de recuperación de pavimentos
- Sumideros adicionales ajustados a las profundidades por redes existentes

V. DESARROLLO TEMAS

Fecha: 19 de Diciembre de 2025


Hora: 11:00 a.m.

Lugar: San Antonio de Getucha.

VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE OBRA

El contratista de obra lleva un avance ejecutado real del 88.83% frente al programado que es 85%, teniendo en cuenta la programación de obra. El contratista tiene avance superior del 3.83 % en la ejecución de obra

Se aclara que este porcentaje mostrado tiene en cuenta los sumideros los cuales no han sido terminados en su totalidad, estos carecen de la instalación de le rejilla en acero, si no se contemplan estas estructuras sin terminar el avance seria del 75%.

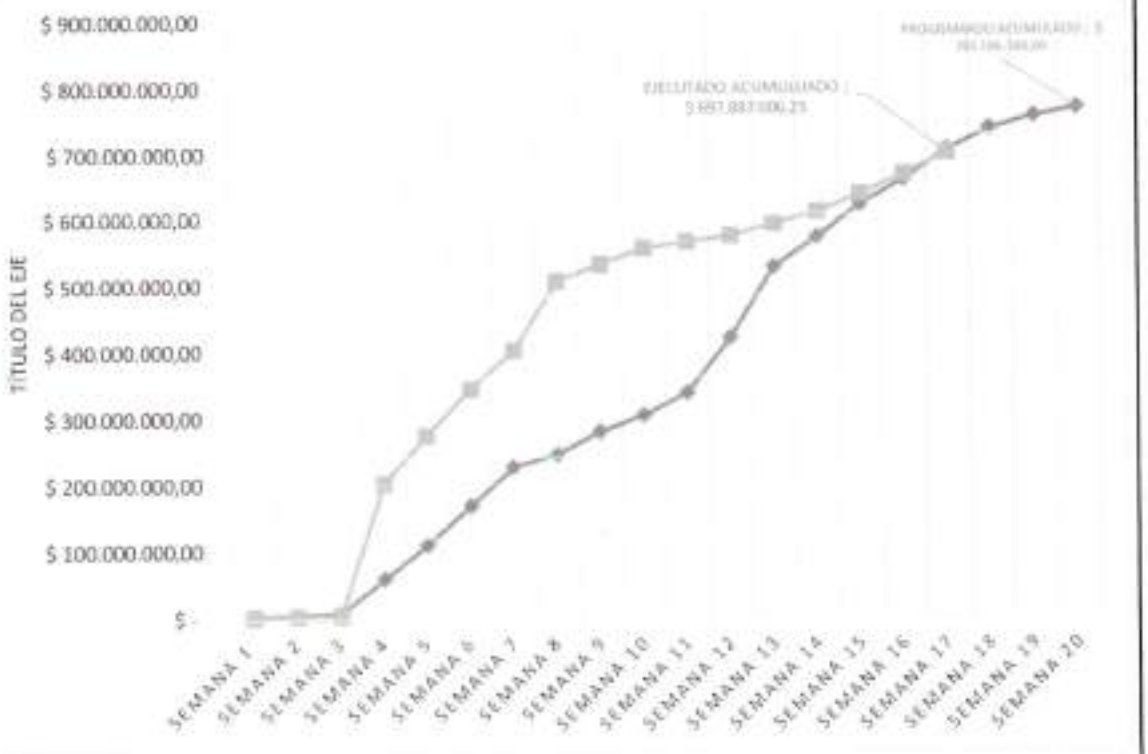

SEÑALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS INCOMPLETAS

La interventoria solicita al contratista de obra señalizar las estructuras incompletas especificamente sumideros, los cuales carecen de regillas y generan un riesgo para la comunidad del area de influencia directa del proyecto, se realiza enfasis en este situacion para esta epoca de festividades, la interventoria solicita estar reacomodando las señalizaciones o mecanismo de aislamiento de estas estructuras por terminar.

El contratista de obra menciona que estas se han dejado aisladas mediaante cinta peligro, pero abvierte que la comunidad arranca las cintas y deja sin proteccion las estructuras en concreto sin terminar, el

contratista de obra se compromete a señalizar estas estructuras durante el periodo que tarden en fabricar las regillas en acero, que es el compenete que hace falta por terminar.

MEDICIÓN DE LAS ÁREAS DE RECUPERACIÓN DE PAVIMENTOS

La interventoria menciona que las areas a recuperar el pavimento se traducen en el siguiente cuadro y que hara el ajuste del acta de modificacion en proceso de aprobacion:

Localización	Dimensiones			Medida Total
	Longitud	Ancho	Perfil	
PZ1-PZ1'	57,75			
PZ2-PZ3	11	1,00		11,00
PZ3-PZ4	35,43	1,60		56,69
PZ4-PZ5	59,2	1,60		94,72
PZ5-PZ6	42,97	1,60		68,75
PZ6-PZ7	57	1,60		91,20
PZ1'-PZ2	18,2			
SUMIDEROS				
SUMIDERO 1	12,6	0,80		10,08
SUMIDERO 4	7,89	0,70		5,52
SUMIDERO 5	3,26	0,70		2,28
SUMIDERO 6	10,15	0,80		8,12
SUMIDERO 7	6,54	0,70		4,58
SUMIDERO 9	8,52	0,70		5,96
SUMIDERO 10	7,14	0,70		5,00
SUMIDERO 12	5,66	0,70		3,96
Subtotal				**367,87**


El area de recuperacion sera ajustada en el acta de modificacion

SUMIDEROS ADICIONALES AJUSTADOS A LAS PROFUNDIDADES POR REDES EXISTENTES

Existen tres zonas en las cuales se deben instalar los sumideros, por observación y comportamiento de las aguas lluvias, pero existe el inconveniente de no poder construir estos sumideros con las especificaciones originales, especificamente en la profundidad requeridas, debido a que en estas zonas existen redes de servicios públicos antiguas, debido a esto se deben construir sumideros con dimensiones inferiores a 0.4m de profundidad, es imperativo instalar estos sumideros en esta áreas, por tal motivo se creara un item no previsto que se ajuste al presupuesto del proyecto y se aumentara la cantidad de estructura de captación de aguas lluvias del sistema instalado.

Estos lugares se representarán en las siguientes zonas en el plano de diseño:

SUMIDERO ADICIONAL CON ESTRUCTURA DE PROFUNDIDAD REDUCIDA – CANTIDAD 3

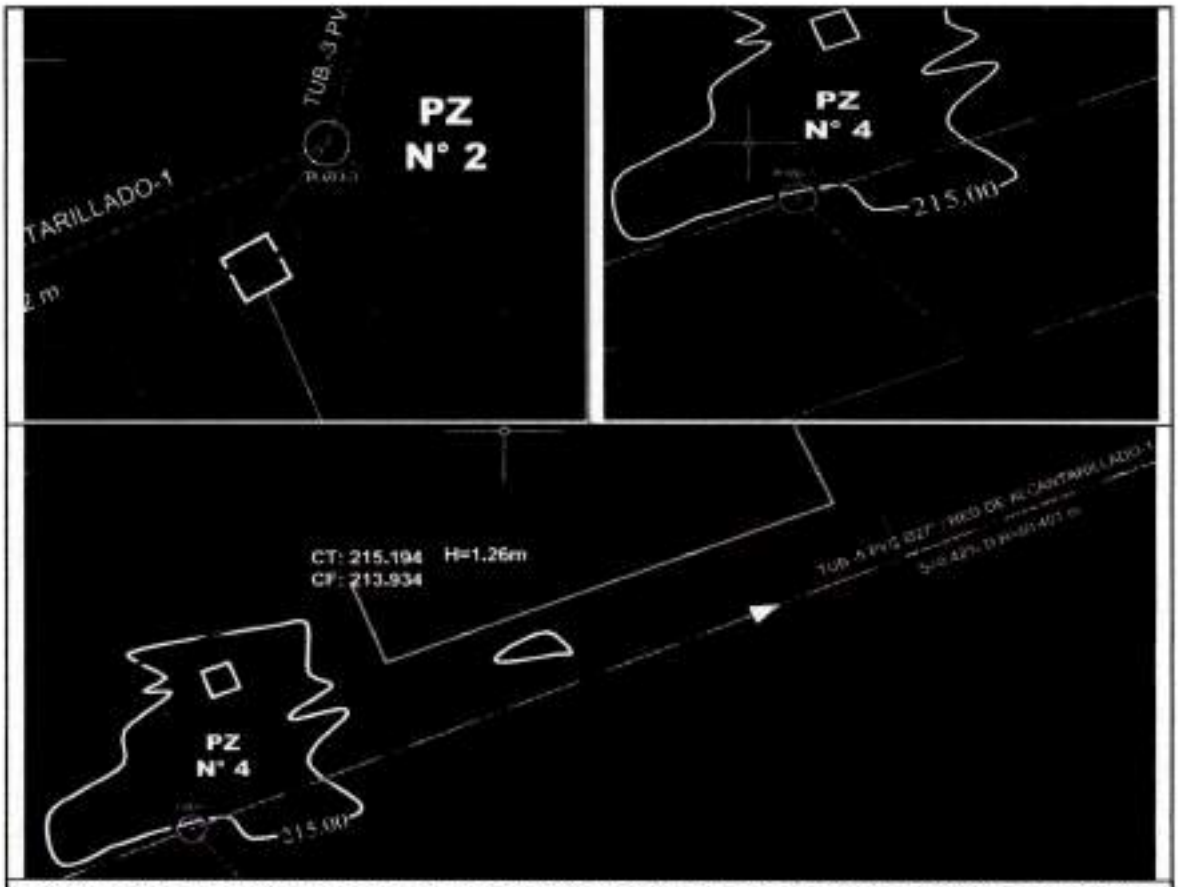

La interventora menciona que necesario la construcción de estos sumideros, debido a la necesidad comprobado que se ha evidenciado en lluvias torrenciales y estos serán tenidos en cuenta dentro del acta de modificación del contrato que se encuentra en aprobación.

VI. INFORME DEL PROYECTO A LAS VEEDURÍAS / CIUDADANÍA (si lo requieren)

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA		RESPONSABLES
Señalizar y aislar las estructuras de sumideros por terminar.		CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
Revisión y aprobación del acta de modificación con cantidades mencionadas en comité		CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 06 (DÍA) 01 (MES) 2026 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en Florencia, a los

21 días del mes de 12 DE 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
NIT: 901.955.099-5

ANEXO 10 INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -4

PROYECTO

"ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"

INFORME COMPRENDIDO DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

PRESENTADO A:

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

ELABORO:

DIANA LORENA RAMOS LOZANO
PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVO 3
3. ALCANCE 4
4. DATOS DEL PROYECTO 4
5. UBICACIÓN DE LA OBRA. 4
6. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 6
6.1 RELACIÓN DEL PERSONAL. 6
6.2 CAPACITACIONES 6
6.5 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN 10
6.6 SEÑALIZACION EN OBRA 11
7 REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO 12
8 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES. 12
9 CONCLUSIONES 13
11. ANEXOS 13

1. INTRODUCCIÓN

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es una disciplina orientada a la prevención de lesiones y enfermedades derivadas de las condiciones laborales, así como a la protección y promoción de la salud integral de los trabajadores. Su propósito es garantizar un entorno laboral seguro, saludable y propicio para el bienestar físico, mental y social de todas las personas vinculadas a la organización.

En cumplimiento de la normatividad vigente emitida por el Ministerio de Trabajo, las organizaciones están obligadas a implementar políticas, reglamentos y procesos que fortalezcan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Estas acciones buscan controlar los factores de riesgo que puedan afectar a trabajadores, contratistas y visitantes, asegurando el cumplimiento de los requisitos mínimos legales y promoviendo una cultura de prevención, autocuidado y mejora continua en las condiciones laborales.

En este marco, el **CONSORCIO SAN ANTONIO 2025** establece su Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, relacionada con los diferentes procesos productivos y administrativos de la organización. Este documento determina el alcance del SG-SST, define las responsabilidades de los participantes e incluye la información general de las actividades ejecutadas, los procedimientos e instructivos generados durante la vigencia comprendida entre el **22 de noviembre al 21 de diciembre de 2025**. Todo ello, bajo la aplicación del ciclo **PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar)**, que permite mejorar los procesos y fortalecer el desempeño en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

De acuerdo con lo anterior, el **CONSORCIO SAN ANTONIO 2025**, mediante el contrato N° **COP-2025-002**, cuyo objeto es la ***"Adecuación y canalización de aguas lluvias en la calle 4, entre carrera 2 y carrera 6, del casco urbano de la inspección de San Antonio de Getucha, municipio de Milán, departamento del Caquetá"***, velará por la adecuada implementación del SG-SST. Con ello se busca lograr la máxima identificación y compromiso del personal asociado, garantizando el cumplimiento de la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, en concordancia con la Resolución 0312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015.

2. OBJETIVO

Evidenciar la gestión y el cumplimiento en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), durante el periodo comprendido entre el **22 de noviembre al 21 de diciembre de 2025**, por parte del **CONSORCIO SAN ANTONIO 2025** y su personal asociado, garantizando el fortalecimiento de una cultura preventiva.

3. ALCANCE

El presente informe aplica a todas y cada una de las actividades realizadas por el personal que labora en obra referentes a la Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. DATOS DEL PROYECTO

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MILÁN, CAQUETÁ
CONTRATISTA.	CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
NIT:	901.935.706-2
NUMERO DE CONTRATO DE OBRA:	N° COP-2025-002
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"
FECHA DE INICIO:	veintidós (22) de agosto del 2025.
PLAZO:	El plazo de ejecución del objeto del contrato es de cinco (05) meses, a partir de la suscripción del acta de inicio, y previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones.

5. UBICACIÓN DE LA OBRA.


Milán es un municipio localizado en el departamento del Caquetá, al sur de Colombia, parte de la región amazónica del país, siendo uno de los 16 municipios que conforman el departamento. La cabecera del municipio de Milán está aproximadamente a **84.9 km** al sur-sureste de Florencia, Caquetá, desde donde se llega por vía terrestre en un término de 2 horas con 31 minutos aproximadamente.

La obra se encuentra en San Antonio de Getuchá, siendo parte de Milán, está relativamente cerca de Milán, por lo que la distancia a Florencia es parecida. La ruta terrestre entre Florencia y San Antonio de Getuchá es aproximadamente **90.1 km**, con un tiempo estimado de viaje de unas 2 horas y 42 minutos.

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

CONTRATO DE OBRA N° COP-2025-002
"ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"
PÁGINA 5 DE 43

GEOREFERENCIA

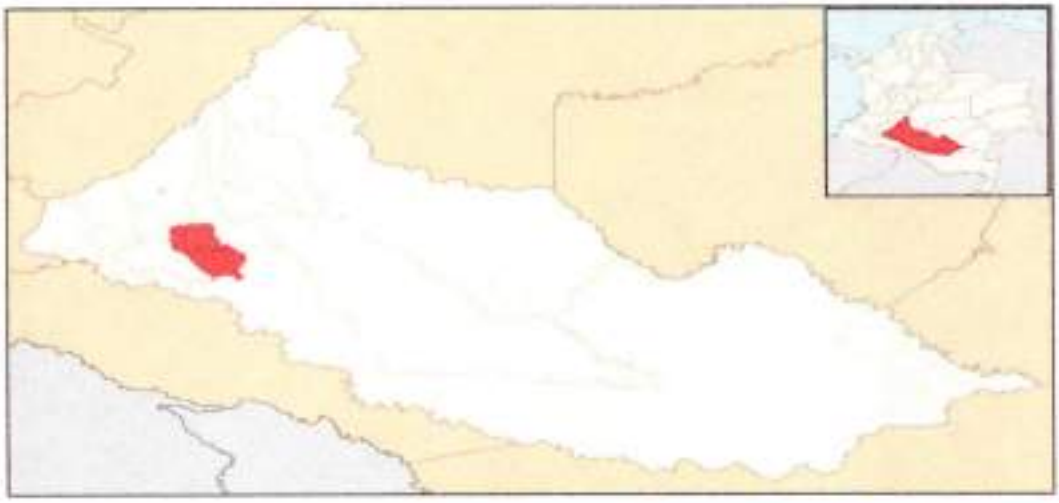

UBICACIÓN DE LA OBRA



6. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante el periodo comprendido entre el 22 de noviembre al 21 de diciembre de 2025, se desarrollaron diferentes actividades de seguridad y salud en el trabajo, las cuales se describirán a continuación:

6.1 RELACIÓN DEL PERSONAL.

Durante el período comprendido entre el 22 de noviembre al 21 de diciembre de 2025, se realizaron las respectivas afiliaciones y pagos al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) del personal vinculado, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 153 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 806 de 1998 y el Decreto 1703 de 2022.

VER ANEXO 1. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Tabla 1. Relación del personal en la obra

NOMBRE COMPLETO	No. De CEDULA	CARGO
GUSTAVO ADOLFO OLARTE COLLAZOS	17650594	DIRECTOR DE OBRA
FERNANDO ANDRES MARIN CABRERA	1117512681	RESIDENTE DE OBRA
OSCAR ORLANDO MENDEZ BUITRAGO	1130744004	INGENIERO HIDRAULICO
DIANA LORENA RAMOS LOZANO	40782364	SISO
NORVEY CAMILO NEITO	83091770	MAESTRO DE OBRA
ANCIZAR ORJUELA MANRIQUE	17658583	MAESTRO DE OBRA
GERMINSON BARBOSA PLASAS	1119581345	AYUDANTE
ANDRES MARIN CABRERA	1117512681	AYUDANTE

Fuente: Profesional_ Diana Ramos

6.2 CAPACITACIONES

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.11, se llevaron a cabo capacitaciones dirigidas a los trabajadores de la obra, con el fin de implementar medidas preventivas y correctivas que garanticen su seguridad durante la ejecución.

FECHA	*CAPACITACIONES*
26/11/2025	*PELIGROS ASOCIADOS A UN ESPACIO CONFINADO*
03/12/2025	*ERGONOMIA Y SALUD POSTURAL*
10/12/2025	*INTELIGENCIA EMOCIONAL*
15/12/2025	*PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO*
17/12/2025	*DESORDENES MUSCULO ESQUELETICO*

Fuente: Profesional_ Diana Ramos

VER ANEXO 2. FORMATOS DE ASISTENCIA DE CAPACITACIONES.

A continuación, relaciono evidencias fotográficas:



Fuente: Profesional_ Diana Ramos

6.3 PAUSAS ACTIVAS

Durante el presente periodo se realizaron pausas activas en el frente de obra. Dichas pausas incluyeron ejercicios de movilidad, estiramientos y dinámicas de activación física, con el fin de prevenir trastornos musculoesqueléticos, reducir la fatiga laboral y mejorar el bienestar general de los trabajadores.

VER ANEXO 3. FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE PAUSAS ACTIVAS.

A continuación, relaciono evidencias fotográficas:





Fuente: Profesional_ Diana Ramos

6.4 INSPECCIONES DE SEGURIDAD.

En cumplimiento de las actividades de vigilancia y control establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), y con el fin de identificar condiciones subestándares, así como prevenir la ocurrencia de incidentes y/o accidentes, se llevaron a cabo diversas inspecciones en el frente de obra durante el periodo reportado.

VER ANEXO 4. FORMATOS DE INSPECCION DE SEGURIDAD.
VER ANEXO 5. DOCUMENTACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA.
VER ANEXO 6. DOCUMENTACIÓN DEL CONDUCTOR.

Relación de inspecciones realizadas.

FECHA	ASPECTO A INSPECCIONAR
18/12/2025	Inspección de herramientas
24/11/2025 01/12/2025 15/12/2025	Inspecciones de retroexcavadora
25/11/2025	Inspección de bodega
01/12/2025 15/12/2025	Inspección de EPP

Fuente: Profesional_ Diana Ramos

A continuación, relaciono evidencias fotográficas de las inspecciones realizadas:

RETOEXCAVADORA



EPP





HERRAMIENTAS Y BODEGA



Fuente: Profesional_ Diana Ramos

6.5 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN

Con el objetivo de proteger a los trabajadores de los peligros existentes, se realizó entrega de elementos de protección y dotación al personal, tales como: tapabocas.

VER ANEXO 7. FORMATO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

6.6 SEÑALIZACION EN OBRA

Durante la presente obra, se implementaron señalizaciones preventivas e informativas con el objetivo de advertir a trabajadores y transeúntes sobre la presencia de actividades de excavación, movimiento de maquinaria y demás labores propias de la obra.

A continuación, relaciono evidencias fotográficas:







Fuente: Profesional_ Diana Ramos

7 REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO



En el periodo comprendido entre el 22 de noviembre al 21 de diciembre de 2025, no hubo reporte de accidentes de trabajo ni enfermedades laborales.

8 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.

Teniendo en cuenta las actividades desarrolladas en obra, se evidencia a continuación el espacio en donde se realiza de manera temporal el almacenamiento de los materiales, se encuentra ubicada dentro de la institución educativa.

VER ANEXO 4. FORMATOS DE INSPECCION DE SEGURIDAD.

9 CONCLUSIONES


- Las actividades se han realizado en cumplimiento de la normatividad vigente.
- No se presentaron reportes de actos y condiciones inseguras.
- No se presentaron incidentes y accidentes de trabajo.
- Los trabajadores demuestran aprensión sobre el tema expuesto.
- Los materiales y herramienta menor son almacenados de manera correcta.


11. ANEXOS


ANEXO 1. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL.

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

CONTRATO DE OBRA N° COP-2025-002
"ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"
PÁGINA 15 DE 43

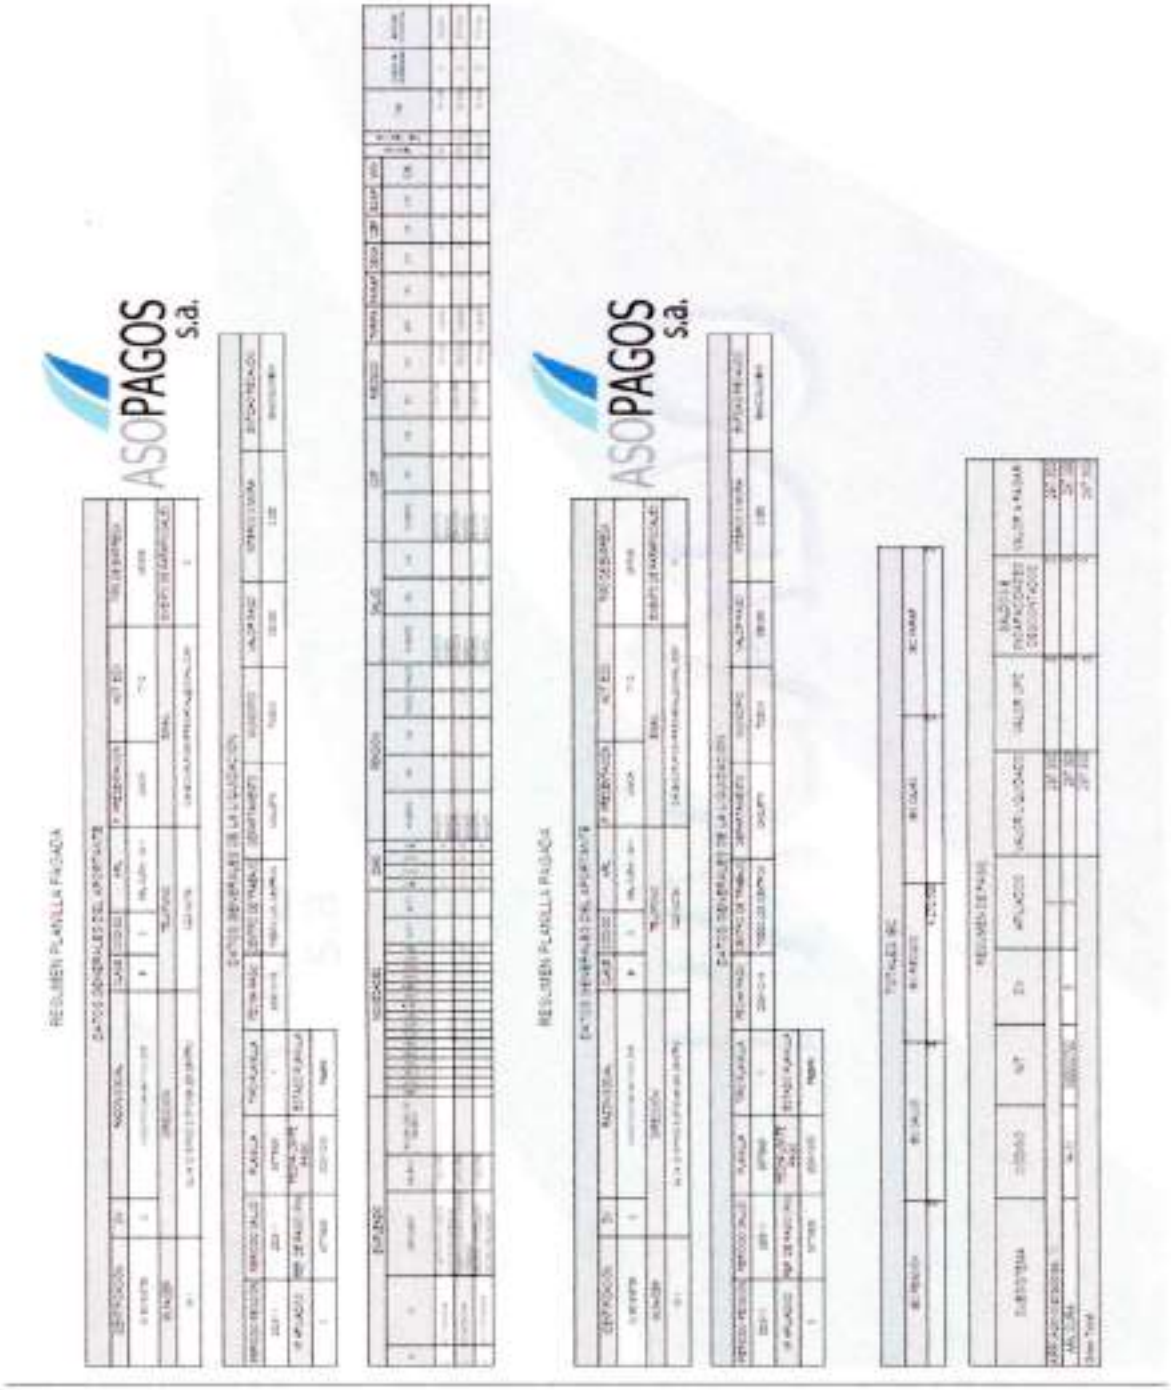

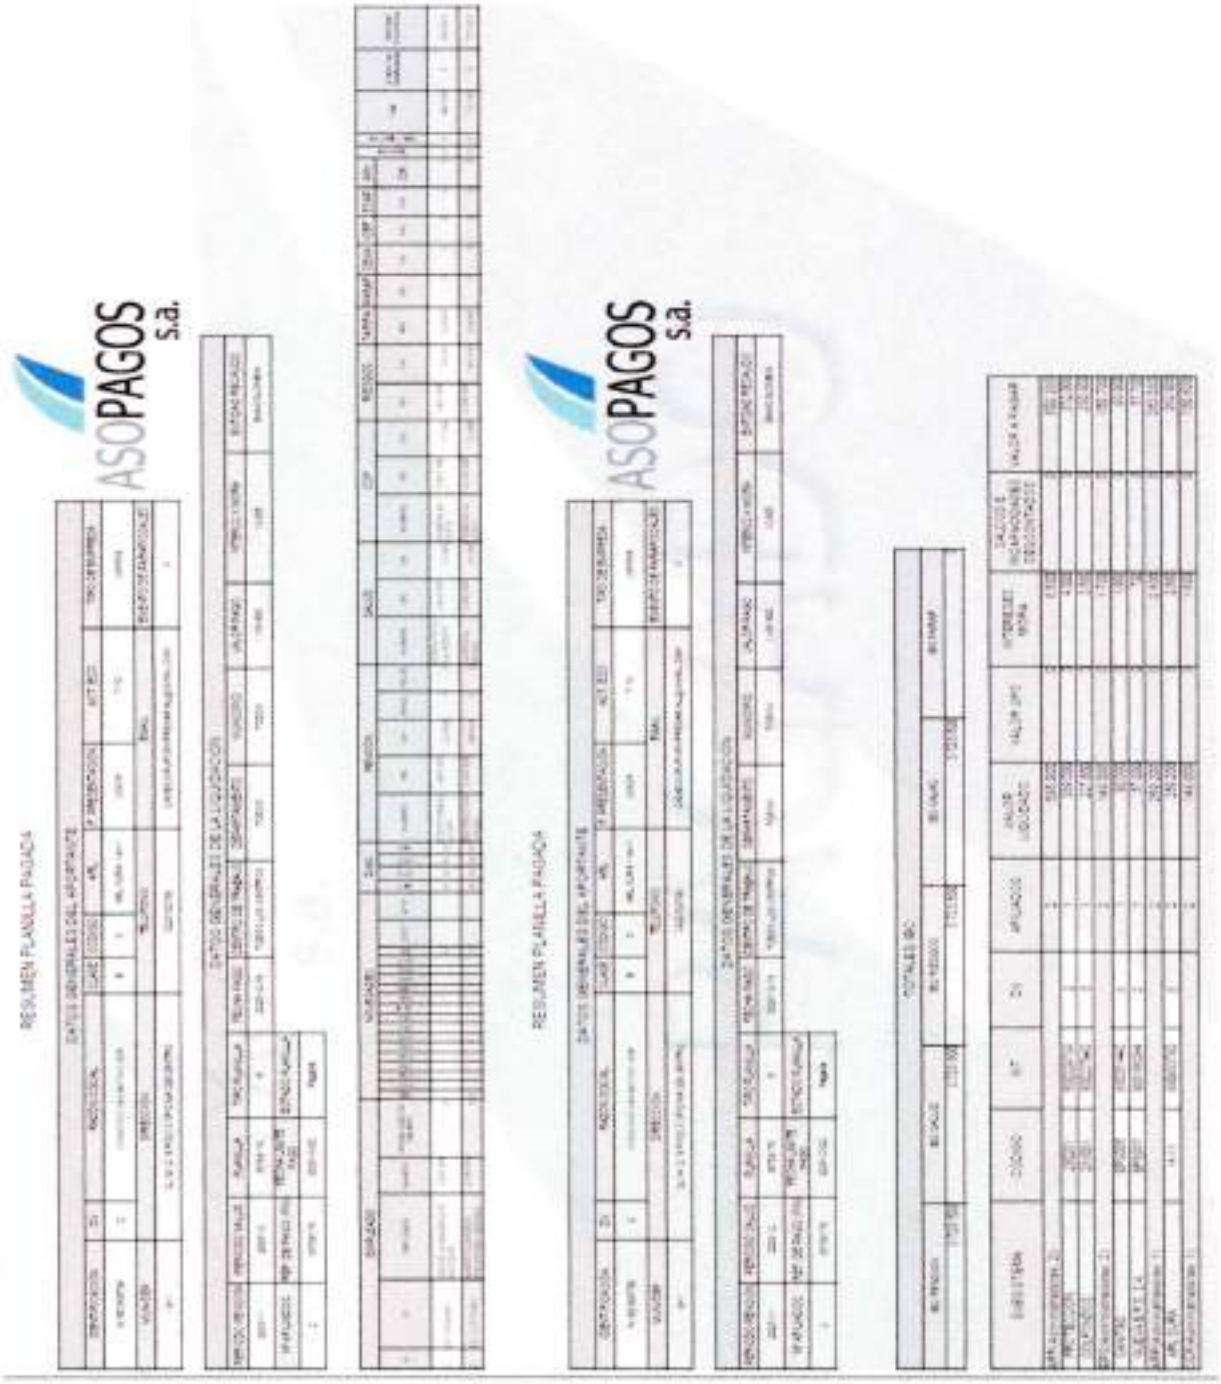
ASOPAGOS s.a.
RESUMEN PLANILLA PAGADA
ASOPAGOS s.a.
RESUMEN PLANILLA PAGADA

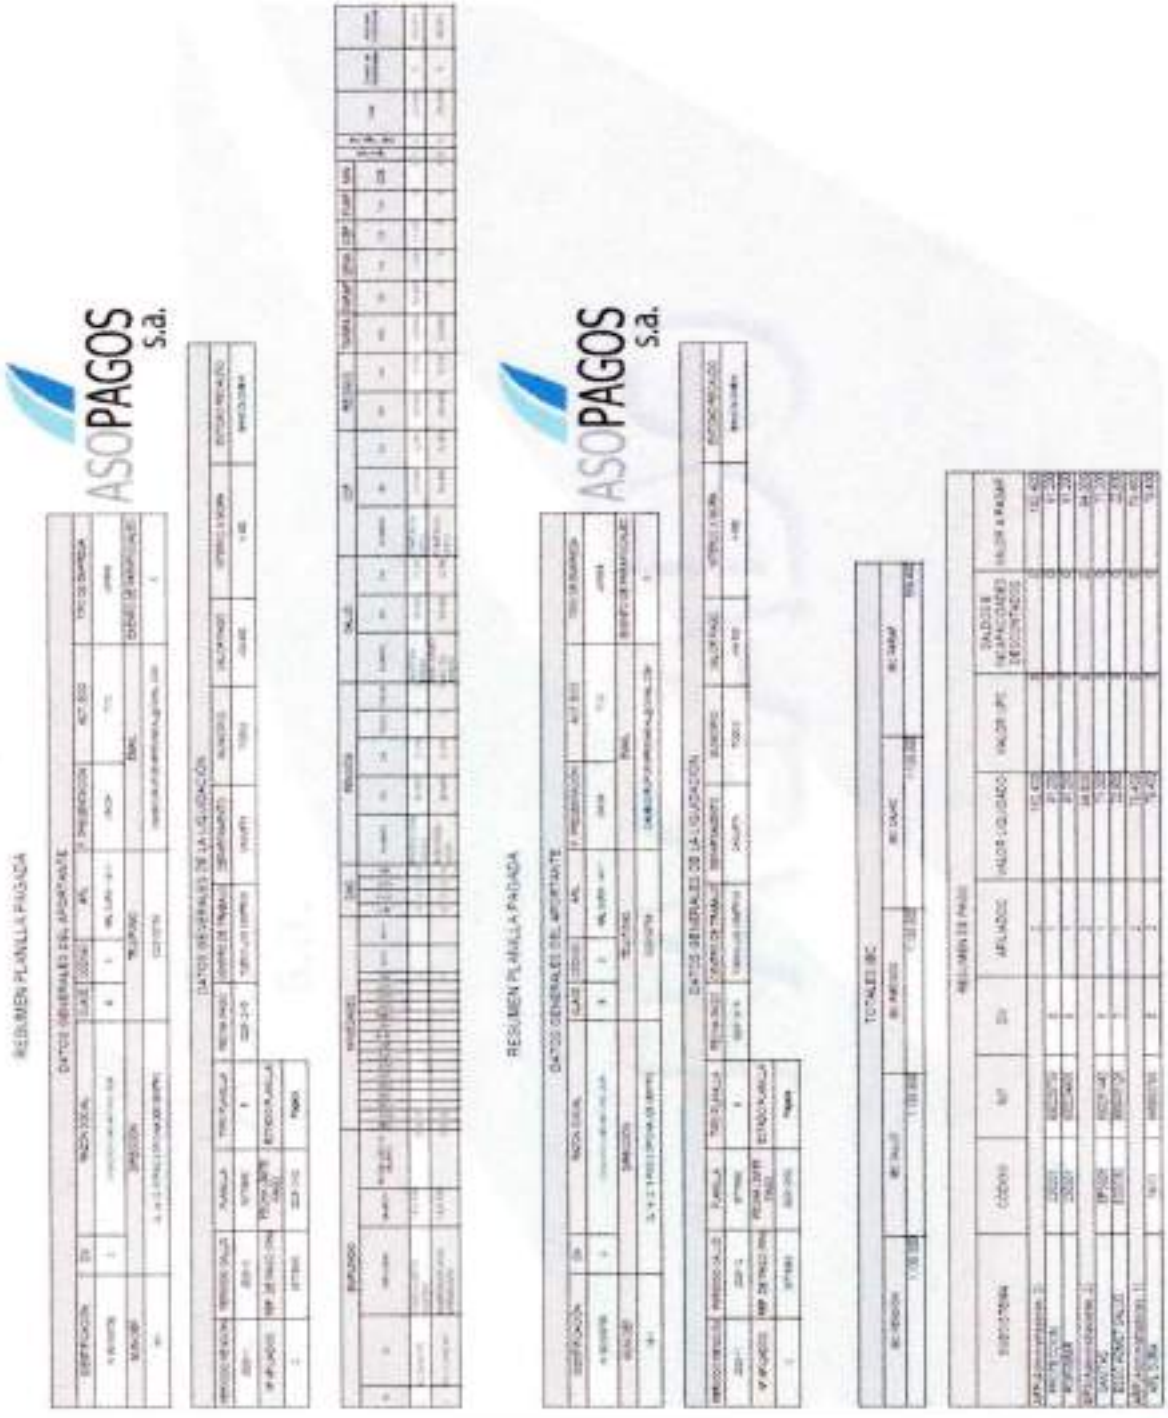
ASOPAGOS S.A.
RESUMEN PLANILLA PAGADA
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN
BENEFICIOS
TOTALES BC
RESUMEN DE PAGO
ASOPAGOS S.A.
RESUMEN PLANILLA PAGADA
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN
TOTALES BC
RESUMEN DE PAGO

ANEXO 2. FORMATOS DE ASISTENCIA DE CAPACITACIONES.

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-081
Versión: 001
Fecha Aprobación: Agosto 2023

LUGAR	HORA	DD	MM	AA
Prelocacion de la obra	10:00 am	26	11	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación específica al cargo		
Capacitacion	x	Peligros asociados a un espacio confinado
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Norbey Camilo Nieto	53091770	maestro	Norbey Camilo
2	Anuar Orjuela M.	17658583	Maestro	Anuar orjuela
3	Brandon Rodrigo Plazas	1119581845	Ayudante	
4	Andres marin Cabrera	1118512681	Ayudante	Andres m
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Diana Lorena Ramos Lozano	

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-001
Versión: 001
Fecha Aprobación: Agosto 2025

LUGAR	HORA	DD	MM	AA
Instalación de la obra	2:00 Pm	03	12	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación específica al cargo		
Capacitación	X	Ergonomia y Salud Postural
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Alcides Orjuela M.	17.658558	Maestro	Alcides Orjuela
2	Harley Camilo Ayala	1069177.0	Maestro	Harley Camilo
3	Andres Maria Cabrera	1172512681	Ayudante	Andres M
4	Fernando Barrera P	1119581345	Ayudante	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Diana Lorena Ramos Lozano	

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-061
Versión: 003
Fecha Aprobación: Agosto 2025

LUGAR	HORA	DD	MM	AA
Instalacion de la obra	8:00 Pm	10	12	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativos		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación específica al cargo		
Capacitacion	X	Capacitación Sobre inteligencia emocional
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Norbey Camilo Nieto	83091770	maestro	Norbey Camilo
2	Anaizar orjuela M.	17658583	Maestro	Anaizar orjuela
3	Andres mauricio cabrera	1118512681	Ayudante	Andres M
4	Geronimo Bolaños Plazas	1117681542	Ayudante	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Diana lorena Ramos lozano	

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-001
Versión: 001
Fecha Aprobación: Agosto 2025

LUGAR	HORA	DD	MM	AA
Instalación de la obra	9:00 am	15	12	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		Prevencion de Accidentes de trabajo
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Entrenamiento / Taller / Curso		
Capacitación específica al cargo		
Capacitación		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Alexander Orquera M.	17658583	Maestro	Alexander Orquera
2	Mayley Camila Muñoz	1130177270	Maestro	Mayley Camila
3	Cesar Andres Ramos	1117581415	Ayudante	
4	Andres mona Cabrera	1117512681	Ayudante	Andres M.
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Diana Lorena Ramos Lozano	

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-001
Version: 001
Fecha Aprobación: Agosto 2025

LUGAR	HORA	DD	MM	AA
Tienda anexo de la obra	7:00 pm	17	12	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación específica al cargo		
Capacitación		
Otra	X	Capacitacion Sobre desordenes Musculo esqueletico.

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Anderson Orjuela M.	17658582	Maestro	Anderson Orjuela
2	Wesley Camilo Muñoz	1.509.177.0	Maestro	Wesley Camilo
3	Andres Marin Cabrera	1117513681	Ayudante	Andres Marin
4	Germanico Rodeas parra	1.117.957.345	Ayudante	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Diana Lucena Ramos Lozano	

ANEXO 3. FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE PAUSAS ACTIVAS.

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: FT-SST-001
Versión: 001
Fecha Aprobación: Agosto 2025

LUGAR	HORA	DD	MM	AA
Instalacion de la obra	9:00 am	19	12	25


ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		
Reinducción		
Charla de seguridad		
Reuniones de SST / Operativas		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación específica al cargo		
Capacitación		Pausas Activas
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Norbey Camilo Nieto	83091770	maestro	Norbey Camilo
2	Ancizar Orjuela M.	17658583	Maestro	Ancizar Orjuela
3	Germania Badillo Th.	1119581845	Ayudante	
4	Andres Mauricio Cabrera	1117512681	Ayudante	Andres Mauri.
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Diana Lorena Ramos Lozano	

ANEXO 4. FORMATOS DE INSPECCION DE SEGURIDAD.

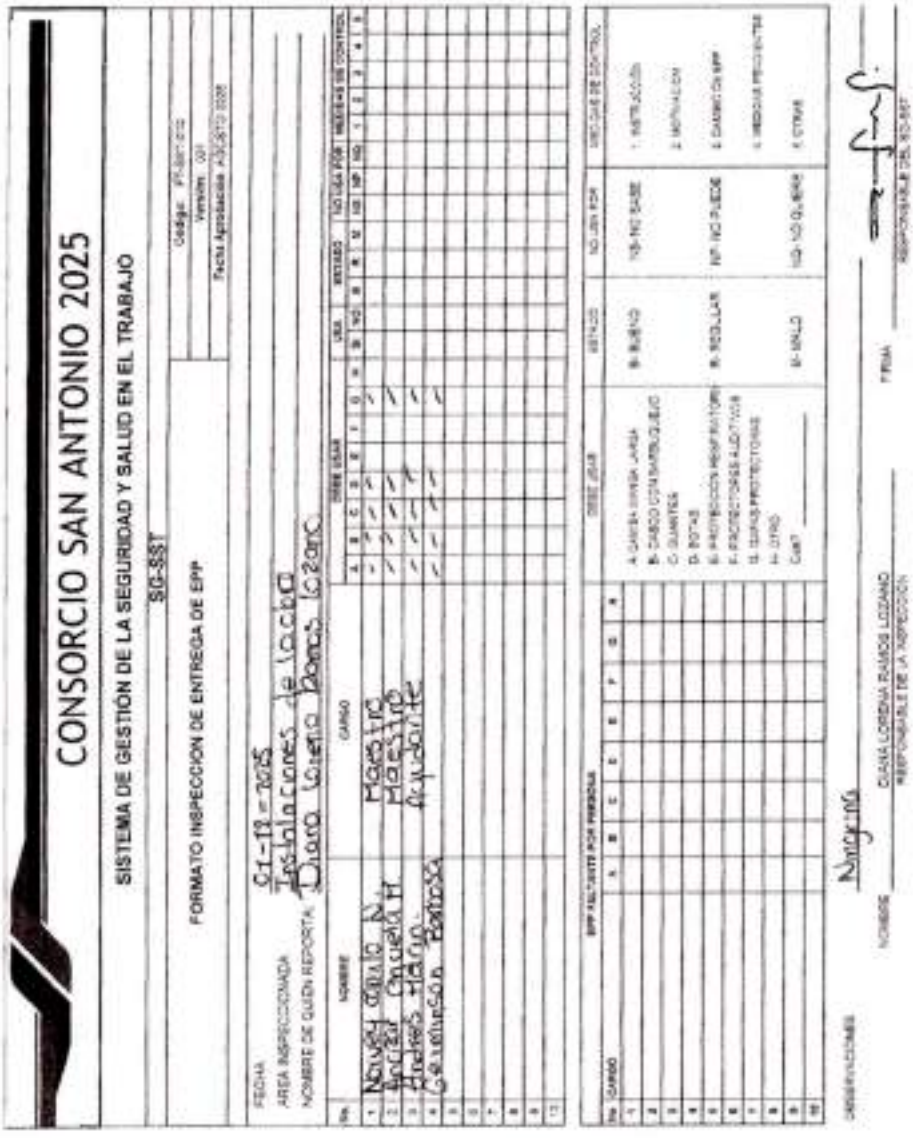

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FORMATO INSPECCION DE ENTREGA DE EPP

Código: FT-SST-072
Versión: 001
Fecha Aprobación: 4/08/2025

FECHA: 21-11-2025
AREA INSPECCIONADA: Instalaciones de Locho
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Diana Lorena Ramos Lozano

No.	NOMBRE	CARGO	DIAS USAR							USA	ESTADO	NOTIFICA POR	MEDIDAS DE CONTROL					
			A	B	C	D	E	F	G					1	2	3	4	5
1	Nayeli Ayala N.	Maestro																
2	Angie Chicuela H.	Maestro																
3	Andres Haro	Ayudante																
4	Sebastian Botero																	
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		

No.	CARGO	EPP SUMINISTRO POR PERSONA								DEBE USAR	ESTADO	NOTIFICA POR	DECISIONES DE CONTROL
		A	B	C	D	E	F	G	H				
1										A. CASCO CON BARBUQUEJO	B. BUENO	NB- NO SABE	1. INSTRUCCIÓN
2										B. CASCO CON BARBUQUEJO			
3										C. GUANTES			2. MOTIVACIÓN
4										D. BOTAS			
5										E. PROTECCIÓN RESPIRATORIA	B. REGULAR	NP- NO PUEDE	3. DIAGNOSTICO EPP
6										F. PROTECTORES AUDITIVOS			
7										G. GAFAS PROTECTORAS			4. MEDIDAS PREVENTIVAS
8										H. OTRO			
9										Cual? _____	M- MALO	NO- NO QUIERE	5. OTRAS
10													

OBSERVACIONES: Ninguna

NOMBRE: DIANA LORENA RAMOS LOZANO
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

FIRMA: _____
RESPONSABLE DEL SG-SST

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SISTEMA DE GESTIÒN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FORMATO INSPECCION DE ENTREGA DE EPP

Código: FT-SST-010
Versión: 001
Fecha Aprobación: AGOSTO 2025

FECHA: 15-12-2025
AREA INSPECCIONADA: Instalaciones de la obra
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Diana Lorena Ramos Lozano

No.	NOMBRE	CARGO	DEBE USAR A	B	C	D	E	F	G	H	USA SI	USA NO	ESTADO B	ESTADO R	ESTADO M	NO USA POR NB	NO USA POR NP	NO USA POR NO	MEDIDAS DE CONTROL 1	2	3	4	5
1	Jaciar cavera	maestro	X	X	X	X			X														
2	Yorney rueda	maestro	X	X	X	X			X														
3	Germàn Bedoya	Ayudante	X	X	X	X			X														
4	Andres marin	Ayudante	X	X	X	X			X														
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							

No.	CARGO	EPP FALTANTE POR PERSONA A	B	C	D	E	F	G	H
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

DEBE USAR: A-CAMISA MANGA LARGA; B-CASCO CON BARBUQUEJO; C-GUANTES; D-BOTAS; E-PROTECCION RESPIRATORIA; F-PROTECTORES AUDITIVOS; G-GAFAS PROTECTORAS; H-OTRO; Cual? _____

ESTADO: B- BUENO; R- REGULAR; M- MALO

NO USA POR: NB- NO SABE; NP- NO PUEDE; NO- NO QUIERE

MEDIDAS DE CONTROL: 1. INSTRUCCIÓN; 2. MOTIVACIÓN; 3. CAMBIO DE EPP; 4. MEDIDAS FISCIENTES; 5. OTRAS

OBSERVACIONES: Por el momento ninguna.

NOMBRE: DIANA LORENA RAMOS LOZANO
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

FIRMA: _____
RESPONSABLE DEL SG-SST

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO INSPECCIÓN HERRAMIENTAS

Código: FT-SST-006
Versión: 001
Fecha: Agosto 2025

FECHA: 18-12-2025
OBRA: Consorcio San Antonio
AREA INSPECCIONADA: Bodega
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Diana Lorena Ramos

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° DE HERRAMIENTA O EQUIPO EXISTENTES	N° HERRAMIENTAS ACTIVAS	N° HERRAMIENTAS O EQUIPOS INACTIVOS	ESTADO B	ESTADO M	ESTADO N/A
A	HERRAMIENTAS MANUALES						
1	Se usa la adecuada al trabajo	24	24		X		
2	Se encuentran en buen estado	24	24		X		
3	Se guardan y portan adecuadamente	24	24		X		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos	24	24		X		
B	HERRAMIENTAS DE CORTE				B	M	N/A
1	Las cuchillas no presentan su cubierta tipo funda	4	4		X		
2	Las cuchillas se encuentran afiladas	4	4		X		
3	Las segueras están correctamente instaladas y no presentan defectos	4	4		X		
4	Las hojas disponen de sus mangos y no están rotas o sueltas	4	4		X		
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos	4	4		X		
6	Los machetes disponen de mangos y fundas	1	1		X		
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE				B	M	N/A
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	3	3		X		
2	Sus cares y bordes están en buen estado	3	3		X		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	3	3		X		
D	HERRAMIENTAS DE TORSIÓN - LLAVES				B	M	N/A
1	Cuentan con llaves de tubos y mordazas						
2	Se observan en la boca fisuras y grietas						
3	No descarte de llaves para golpear						
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas						
5	Las mordazas para ajustar tubos cuenta con el ajustamiento adecuado y son probadas frecuentemente						
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado						
7	Se observa de herramientas que no producen chispas						
E	HERRAMIENTAS ELECTRICAS				B	M	N/A
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)				X		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta a				X		
3	Están limpia y lubricadas				X		
4	Tienen sus guardas				X		
5	Poseen aislamiento doble o conexión a tierra por artículo de los palos				X		
6	El cable y enchufe no presentan daños				X		
7	En las taladros se observa el mandil con pinzas				X		
8	Broca en filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños				X		
9	Sierras/las cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecu				X		
10	Se observa deterioro en las cauces o bordo en las cuerdas eléctricas				X		
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde pueden ser golpeados				X		
F	HERRAMIENTA NEUMATICA				B	M	N/A
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado						
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta						
3	Se evitan a los pistones enfiestes						
4	La herramienta se desengrasa al terminar.						

OBSERVACIONES

Diana Lorena Ramos
RESPONSABLE DEL SG-SST

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SG-SST

FORMATO DE INSPECCION BODEGAS

FECHA DE INSPECCION	10 - 11 - 2025
PARTICIPANTES DE LA INSPECCION	3

BODEGA

ILUMINACIÓN					
Se tiene iluminacion adecuada	X				
Se tiene un mantenimiento adecuado en las lamparas.	X				
MECÁNICO					
Las estibas están en buen estado.	X				
El sistema de almacenamiento es concordante con la forma, peso y tamaño de los elementos. (los objetos de mayor peso y tamaño estan)	X				
Los elementos están almacenados de forma ordena.	X				
Las herramientas están almacenadas de forma correcta	X				
ELECTRICO					
Los cables están protegidos y canalizados	X				
Las instalaciones eléctricas están protegidas	X				
Todas las instalaciones eléctricas cuentan con switches y tomacorrientes	X				
ORDEN Y ASEO (CONDICIÓN LOCATIVA)					
Superficies almacenaje en perfecto estado, en orden y limpieza	X				
Aseo y ventilación adecuado.	X				
Techos, paredes y pisos en buen estado.	X				
Area de almacenamiento suficiente para la cantidad de elementos, herramientas		X			
QUÍMICO					
Se almacena los productos químicos en lugares asignados y se almacenan según la tabla de compatibilidad.				X	
Los envases de los productos químicos tienen etiqueta o rótulo según la clase de producto y los envases cumplen con las especificaciones para manejo seguro.				X	
Están disponibles las hojas de seguridad de las sustancias químicas almacenadas.				X	
EMERGENCIAS					
Se tiene señalizacion de identificación al exterior de la bodega		X			
Las bodegas cuentan con extintores y se encuentran señalizados		X			
El área de los extintores esta libre de objetos y obstáculos.		X			

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025


PROYECTO	VERSIÓN	CÓDIGO	CONSECUTIVO

REFERENCIA:

INSPECCIONADO POR: Diana Patricia Ramos — EQUIPO No.:

UBICACIÓN: San Antonio

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M	X	M
CASCO															
Ingreso		X		X		X		X		X		X			
Puesto de trabajo (silleria)		X		X		X		X		X		X			
Direcciones estaticas de parqueo (Dm)		X		X		X		X		X		X			
Direcciones Puesto de parqueo (Dm)		X		X		X		X		X		X			
De Trap y cerca Puesto		X		X		X		X		X		X			
CABINA															
Asiento de ventanilla		X		X		X		X		X		X			
Piso		X		X		X		X		X		X			
Panel de servicio		X		X		X		X		X		X			
Panel de emergencia		X		X		X		X		X		X			
Dirección suspensión Electrodos		X		X		X		X		X		X			
Cortina de seguridad		X		X		X		X		X		X			
Cabina enfriamiento (S.O.P.) certificado															
Sistema de extinción (Si/No) FQ		X		X		X		X		X		X			
Asiento en buena condición		X		X		X		X		X		X			
Instalación Hidráulico-eléctrico		X		X		X		X		X		X			
Vidrio refrigerante(polarizado, otro)		X		X		X		X		X		X			
Botones y pulsadores cabina/Tablero		X		X		X		X		X		X			
Botones y cables		X		X		X		X		X		X			
CUARTO															
En cuarto de engrase y en alrededores		X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO															
Cuarto de fuego Hidráulico		X		X		X		X		X		X			
Poleas de suspensión		X		X		X		X		X		X			
Cuarto fuego de aire		X		X		X		X		X		X			
Bajos de engrase hidráulico		X		X		X		X		X		X			
Grapas y anclaje de cables		X		X		X		X		X		X			
Cerrojos (gatos) puerta principales		X		X		X		X		X		X			
Eje de Tornillo de fuego		X		X		X		X		X		X			
Lubricante de aceite y de otro grado		X		X		X		X		X		X			
Nivel Superior															
Puerta de acceso: si no:	Fecha de Corrección:					Resp. Corrección:									
OBSERVACIÓN:	NOMBRE Y APELLIDOS: Juan Carlos Narvaez C 1080933477														
OBSERVACIONES:															

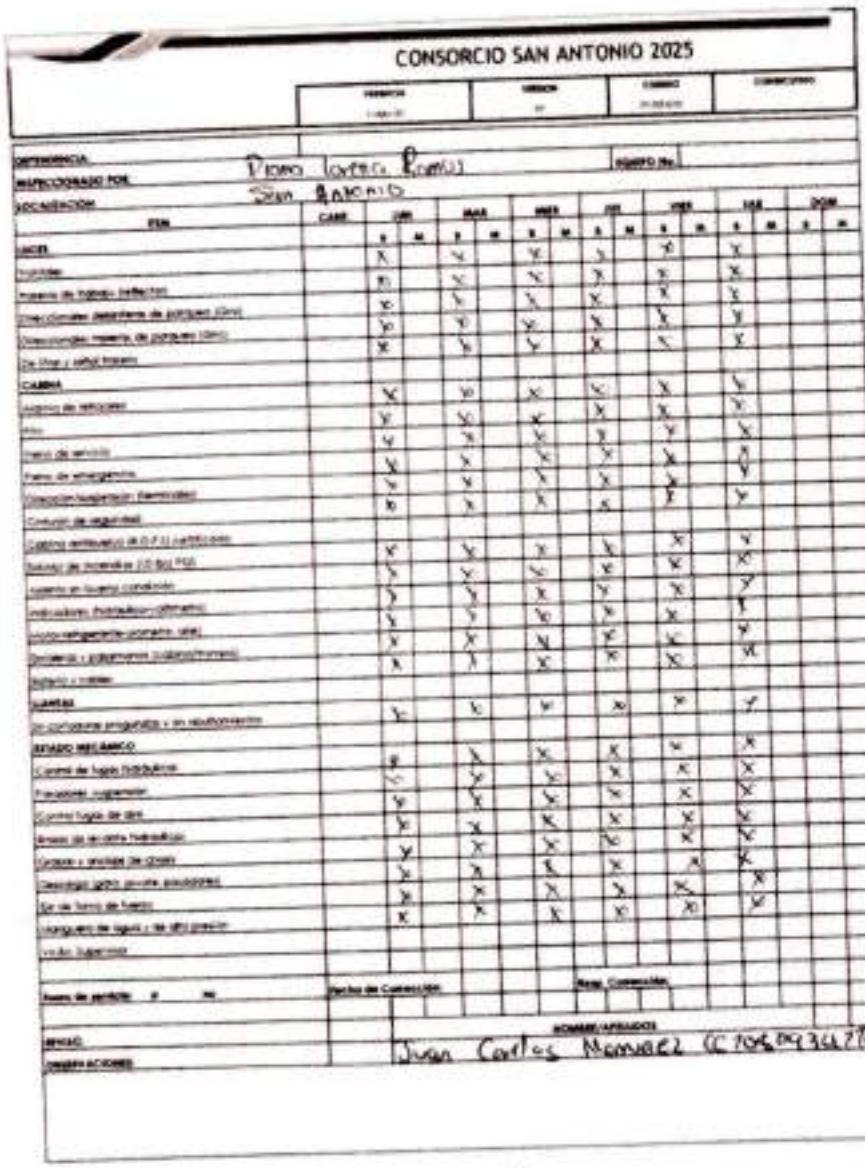

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

OFERENCIA: Diana Lorena Ramírez

INSPECCIONADO POR: San Antonio

UBICACIÓN:

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M
LUCES		X		X		X		X		X		X			
Frontales		X		X		X		X		X		X			
Intensidad de trabajo (reflectiva)		X		X		X		X		X		X			
Direccionales delanteras de parqueo (Izq)		X		X		X		X		X		X			
Direccionales traseras de parqueo (Der)		X		X		X		X		X		X			
De freno y señal trasera															
CABINA		X		X		X		X		X		X			
Espejos de retrovisor		X		X		X		X		X		X			
Pito		X		X		X		X		X		X			
Freno de servicio		X		X		X		X		X		X			
Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X			
Dirección/suspensión (servicio)		X		X		X		X		X		X			
Cinturón de seguridad															
Cabina certificada (ROPS) (certificado)		X		X		X		X		X		X			
Sistema de extinción (SI SO PO)		X		X		X		X		X		X			
Asiento en buena condición		X		X		X		X		X		X			
Instructivo (Instalación/Operario)		X		X		X		X		X		X			
Luces retrogarantía (cámara, otro)		X		X		X		X		X		X			
Pantalla y pictogramas (cabina/frontal)		X		X		X		X		X		X			
Espejo y radios															
LLANTAS		X		X		X		X		X		X			
En condiciones adecuadas y sin reutilizamiento															
ESTADO MECÁNICO		X		X		X		X		X		X			
Control de fugas hidráulicas		X		X		X		X		X		X			
Frenadas suaves		X		X		X		X		X		X			
Control fugas de aire		X		X		X		X		X		X			
Ajuste de presión hidráulica		X		X		X		X		X		X			
Cadena y anclaje de cargo		X		X		X		X		X		X			
Desplaz. ajuste pluma auxiliares		X		X		X		X		X		X			
En las torre de fuego		X		X		X		X		X		X			
Manguera de agua / de alta presión															
Vidrio Superior															

Fecha de Corrección: Resp. Corrección:

APROBÓ: NOMBRE/APELLIDOS: Juan Carlos Moreno CC 1065936776

OBSERVACIONES:

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

| | | |

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M
Puntillas		X		X		X		X		X		X			
Tiempo de trabajo (efectivo)		X		X		X		X		X		X			
Direcciones delantera de parales (Dm)		X		X		X		X		X		X			
Direcciones trasera de parales (Dm)		X		X		X		X		X		X			
De (Hor.) a (Hor.) final		X		X		X		X		X		X			
CASINA															
Análisis de reflectores		X		X		X		X		X		X			
Kits		X		X		X									
Tiempo de servicio		X		X		X		X		X		X			
Tiempo de entregados		X		X		X		X		X		X			
Dirección (seguridad) (Semáforos)		X		X		X		X		X		X			
Cintura de seguridad		X		X		X		X		X					
Cubierta antifluvión (E.P.P.) (utilizado)															
Extintor de incendios (Tipo PQS)		X		X		X		X		X		X			
Arnés en buenas condiciones		X		X		X		X		X		X			
Instrucciones (Instructivo) (utilizado)		X		X		X		X		X		X			
Uso/almacenamiento correcto (de)		X		X		X		X		X		X			
Accidente y preventivos (Uso/almacenamiento)		X		X		X		X		X		X			
(Buenos) (Cotas)		X		X		X		X		X		X			
CUENTAS															
En cumplidos programados y no cumplimiento		X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO															
Control de fugas hidráulicos		X		X		X		X		X		X			
Pinzadoras suspensión		X		X		X		X		X		X			
Control fugas de aire		X		X		X		X		X		X			
Análisis de la caída hidráulicos		X		X		X		X		X		X			
Cilindro y pinzas de chalo		X		X		X		X		X		X			
Descarga (para un más presiones)		X		X		X		X		X		X			
En de forma de fuerza		X		X		X		X		X		X			
Manguera de agua y de alta presión		X		X		X		X		X		X			
Visto Supervisor															
Pozos de servicio: # m:	Fecha de Construcción:					Resp. Construcción:									
REVISO:		NOMBRE APELLIDOS:													
OBSERVACIONES:		Juan Carlos Narvaez CC 1020934176													

ANEXO 5. DOCUMENTACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA.


REPUBLICA DE COLOMBIA
TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA
CATERPILLAR
CONSTRUCCION
RETROEXCAVADORA



ANEXO 6 DOCUMENTACIÓN DEL CONDUCTOR.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento del Decreto 1072 de 2015

otorga

Certificado de Competencia Laboral a

JUAN CARLOS NARVAEZ DIAZ

Con CEDULA DE CIUDADANÍA No. 1006934116

Quien demostró su Competencia Laboral en la

Norma

Operar maquinaria pesada de acuerdo con manual del fabricante y tipo de labor / Retrocargador - NIVEL INTERMEDIO

Código 270101120 Versión 1

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en BARRANCABERMEJA A los treinta (30) días del mes de Octubre de dos mil veintiuno (2021)

Firmado Digitalmente por



116081 - 30/10/2021
No Y FECHA REGISTRO

EDGAR GOMEZ RODRIGUEZ
Subdirector CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO
REGIONAL SANTANDER

Vigencia:
hasta el 30 de Octubre de 2024

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.senasofiaplus.co, bajo el número 9540027416112OCC1006934116C

ANEXO 7. FORMATO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO	Fecha: Agosto/2025	
	Versión: 001	
	Codigo: FT-SST-005	

dd	mm	aaaa
11	12	2025

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Anemar Orjuela Monrique CC. 17658583

CARGO: Maestro UBICACIÓN DE LA OBRA: San Antonio

DOTACIÓN PERSONAL

	CANTIDAD	TALLA
BOTAS		
PANTALON		
CAMISA MANGA LARGA		
ESCAFANDRA		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón		Protector Auditivo Tipo Orejera	
Guantes en Carnaza		Gafas de Seguridad	
Guantes Hilo y PVC		Guantes para Soldador	
Guantes Dieléctricos		Careta para Soldar	
Careta para Esmerilar		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Prehormado		Tapabocas Industrial/desechable	2
Casco		Barboquejo	

FIRMAS

Diana Lorena Ramos L. — ENTREGA

Anemar Orjuela — RECIBE

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO	Fecha: Agosto/2025	
	Versión: 001	
	Codigo: FT-SST-005	

dd	mm	aaaa
11	12	202

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Germaro Barbosa Plazas C.C. 1119581545

CARGO: Ayudante UBICACIÓN DE LA OBRA: San Antonio

DOTACIÓN PERSONAL

	CANTIDAD	TALLA
BOTAS		
PANTALON		
CAMISA MANGA LARGA		
ESCAFANDRA		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón		Protector Auditivo Tipo Orejera	
Guantes en Carnaza		Gafas de Seguridad	
Guantes Hilo y PVC		Guantes para Soldador	
Guantes Dieléctricos		Careta para Soldar	
Careta para Esmerilar		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Prehormado		Tapabocas industrial/desechable	2
Casco		Barbuquejo	

FIRMAS

Diana Lorena Ramos L
ENTREGA

RECIBE

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO	Fecha: Agosto/2025
	Versión: 001
	Codigo: FT-SST-005

dd	mm	aaaa
11	12	2025

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Andres maria cabrera C.C. 1117513781

CARGO: Ayudante UBICACIÓN DE LA OBRA: San Antonio

DOTACIÓN PERSONAL

	CANTIDAD	TALLA
BOTAS		
PANTALON		
CAMISA MANGA LARGA		
ESCAFANDRA		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón		Protector Auditivo Tipo Orejera	
Guantes en Carnaza		Gafas de Seguridad	
Guantes Hilo y PVC		Guantes para Soldador	
Guantes Dieléctricos		Careta para Soldar	
Careta para Esmerilar		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Prefonsado		Tapabocas Industrial/desechable	2
Casco		Barbuquejo	

FIRMAS

Diana Lorena Ramos L
ENTREGA

Andrés marin
RECIBE

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO	Fecha: Agosto/2025
	Versión: 001
	Codigo: FT-SST-005

dd	mm	aaaa
11	12	2025

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Norbey camilo Nieto C.C. 83041770

CARGO: Maestro UBICACIÓN DE LA OBRA: San antonio

DOTACIÓN PERSONAL

	CANTIDAD	TALLA
BOTAS		
PANTALON		
CAMISA MANGA LARGA		
ESCAFANDRA		

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Tapón		Protector Auditivo Tipo Orejera	
Guantes en Carnaza		Gafas de Seguridad	
Guantes Hilo y PVC		Guantes para Soldador	
Guantes Dieléctricos		Careta para Soldar	
Careta para Esmerilar		Respirador Contra Gases y Vapores	
Tapabocas Prehormado		Tapabocas Industrial/desechable	2
Casco		Barbuquejo	

FIRMAS

Diana Lorena Ramos
ENTREGA

Norbey Camilo Nieto
RECIBE

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
NIT: 901.955.099-5

ANEXO 11 Formato financiero de la interventoría

CR 14 # 13-40 – OFICINA 203 Barrio el centro - Tel: 3134629855 -
consorcioalcantarilladosananto@gmail.com

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA CAQUETA ANEXO 4 INFORME FINANCIERO DE LA INTERVENTORIA	CODIGO			
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

PERIODO Inicio: 22-nov-25 Fin: 21-dic-25

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACION DEL CAQUETA — MUNICIPIO: MILAN

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

CONTRATO No: 20250000820 DE 2025 — CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

SUPERVISOR: PDA CAQUETA

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Acta No	Mes/ Año	Valor Facturado	Valor IVA	Valor Total	Amortización Anticipo	Saldo Anticipo	Saldo Registro presup.	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	Observaciones
				$ 69.165.757,00			$69.165.757		$69.165.757,00	
										n.a
TOTALES		$ -	$ -	$ 69.165.757	$ -	$ -	$ 69.165.757	$ -	$ 69.165.757	

$

Firma
Nombre: CARLOS DARIO MIÑO SANCHEZ
Representante Legal de: CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

Original: PDA CAQUETA

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
NIT: 901.955.099-5

ANEXO 12 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CR 14 # 13-40 – OFICINA 203 Barrio el centro - Tel: 3134629855 -
consorcioalcantarilladosananto@gmail.com

157

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE GETUCHA **ANEXO 8** **SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**	CODIGO	
		VERSION	1

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACION DEL CAQUETA

CONTRATO No. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 20250909620 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

PERIODO — Inicio: 22-nov-25 — Fin: 21-dic-25

PLAZOS CONTRACTUALES

PLAZOS		FECHAS	
Plazo inicial para ejecución del contrato	5 MESES	Inicio del contrato	18-jun.-25
		Inicio de actividades	22-ago.-25
Plazo ejecución contrato actualizado	150 días	Terminación inicial contractual	22-ene.-26
Plazo ejecutado	32 días	Terminación final contractual	22-ene.-26
Plazo faltante por ejecutar	120 días		

SUSPENSIONES Y AMPLIACION DE SUSPENSIONES EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Nº Susp.	Nº Prórroga	Inicio susp. o prórroga	Reinicio de actividades	Plazo	Estado	Fecha de radicación
			Total aprobados	0 d		N.A.
Observaciones			Sin comentarios			

PRORROGAS DE PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Nº de Adición	Plazo	Estado	Fecha de radicación	Fecha de aprobación
1				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
Total aprobados				N.A.
Sin comentarios				

CONTROL DE LA INVERSION

Valor inicial del contrato de OBRA	$	989.080.340
Valor inicial del contrato de CONSULTORIA	$	68.166.757
Valor TOTAL INICIAL del contrato (consultoría + obra)		$ 1.057.247.096,94

ADICIONES

No.	Estado	Fecha de radicación	Fecha de aprobación	VALOR
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
			Total adiciones aprobadas	$ 0,00
VALOR CONTRATO CON ADICIONES APROBADAS				$ 1.057.247.096,94

VALORES GENERALES DEL ANTICIPO

Porcentaje del anticipo		
Valor del anticipo	$	-

PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

AMPARO	% sobre VR contrato	VIGENCIA SOLICITADA EN CONTRATO		Nº PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA PÓLIZA		COMENTARIOS
		DESDE	HASTA			INICIO	FIN	
Cumplimiento	20%	18/06/2025	28/05/2026	360 47 994000190840 ANEXO 0	$ 13.833.151,40	18/06/2025	28/05/2026	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Salarios y Prestaciones	10%	18/06/2025	28/12/2028	360 47 994000190840 ANEXO 0	$ 6.916.575,70	18/06/2025	28/12/2028	
Calidad del servicio	20%	18/11/2025	18/11/2030	360 47 994000190840 ANEXO 0	$ 13.833.151,40	18/11/2025	18/11/2030	
Responsabilidad Civil								
Todo Riesgo								
Calidad de la Obra								
Calidad de la Consultoria								

PÓLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA - ACTA DE INICIO

AMPARO	% sobre VR contrato	VIGENCIA SOLICITADA EN CONTRATO		Nº PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA PÓLIZA		COMENTARIOS
		DESDE	HASTA			INICIO	FIN	
Cumplimiento	20%	22/08/2025	1/08/2028	360 47 994000190840 ANEXO 1	$ 13.833.151,40	22/08/2025	1/08/2028	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Salarios y Prestaciones	10%	22/08/2025	30/8/2028	360 47 994000190840 ANEXO 1	$ 6.916.575,70	22/08/2025	30/8/2028	
Calidad del servicio	20%	21/01/2026	21/01/2031	360 47 994000190840 ANEXO 1	$ 13.833.151,40	21/01/2026	21/01/2031	
Responsabilidad Civil								
Todo Riesgo								
Calidad de la Obra								
Calidad de la Consultoria								

Firma

Nombre: CARLOS DARIO CANO SANCHEZ

Representante Legal de la Interventoría

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
NIT: 901.955.099-5

ANEXO 13 -FORMATO COPIA DEL FORMATO SE SEGUIMIENTO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y SOPORTE DE PAGO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE MILAN CAQUETA
ANEXO 6 CONTROL SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES OBRA

CODIGO			
VERSIÓN	1		
PAGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA : GOBERNACION DEL CAQUETA
OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARA EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE
CONTRATO No: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 20250000020 DE 2025
MUNICIPIO: MILAN CAQUETA
CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

PERIODO: Del 01 de noviembre a 30 de noviembre 2025

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Nombre	Cargo	Periodo laborado		No Días mes (Base Liquidación)	C.C.	1 SAB	2 DOM	3 LUN	4 MAR	5 MIÉ	6 JUE	7 VIE	8 SAB	9 DOM	10 LUN	11 MAR	12 MIÉ	13 JUE	14 VIE	15 SAB	16 DOM	17 LUN	18 MAR	19 MIÉ	20 JUE	21 VIE	22 SAB	23 DOM	24 LUN	25 MAR	26 MIÉ	27 JUE	28 VIE	29 SAB	30 DOM	Planilla	No. días cotizados
		INICIO	FIN																																
FABIAN NARVAEZ CANO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	15/09/2025		30	79.872.034	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9495900166	30
DAIRA LUCIA VALENZUELA PASTRANA	ASESOR AMBIENTAL	15/09/2025		30	1.075.240.914	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9496722304	30
BRYAN ANDRES VALENCIA ROA	ASESOR CONTABLE	15/09/2025		30	1.117.550.134	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9496722304	30
NADIA ALEJANDRA MURILLO ORTIZ	ASESOR JURIDICO	15/09/2025		30	1.117.512.172	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9496722304	30
PAULA VANESSA OME SANCHEZ	ASESOR SOCIAL	15/09/2025		30	1.117.525.837	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9496722304	30
JORGE ANDRES MONCADA SUAZA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	15/09/2025		30	5.819.886	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		0
				0																															0
				0																															0
				0																															0
				0																															0
				0																															0

EJEMPLO

Firma
Nombre CARLOS MARIO CANO
Representante Legal de Interventoría
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

159

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
MUNICIPIO DE MILAN CAQUETA
ANEXO 6 CONTROL SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES OBRA

CODIGO			
VERSION	1		
PAGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACION DEL CAQUETA — MUNICIPIO: MILAN CAQUETA

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE

CONTRATO No: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 20250000620 DE 2025 — CONTRATISTA: CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

PERIODO:
Del 01 de octubre a 30 de octubre 2025

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Nombre	Cargo	Periodo laborado		No Dias mes (Base Liquidación)	C.C.	1 LUN	2 MAR	3 MIE	4 JUE	5 VIE	6 SAB	7 DOM	8 LUN	9 MAR	10 MIE	11 JUE	12 VIE	13 SAB	14 DOM	15 LUN	16 MAR	17 MIE	18 JUE	19 VIE	20 SAB	21 DOM	22 LUN	23 MAR	24 MIE	25 JUE	26 VIE	27 SAB	28 DOM	29 LUN	30 MAR	Planilla	No. dias cotizados
		INICIO	FIN																																	
FABIAN NARVAEZ CANO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	16/09/2025		30	79.872.034	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9495370227	30
DAIRA LUCIA VALENZUELA PASTRANA	ASESOR AMBIENTAL	16/09/2025		30	1.075.240.914	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9495370179	30
BRYAN ANDRES VALENCIA ROA	ASESOR CONTABLE	16/09/2025		30	1.117.530.124	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9495370179	30
NADIA ALEJANDRA MURILLO ORTIZ	ASESOR JURIDICO	16/09/2025		30	1.117.512.172	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9495370179	30
PAULA VANESSA OME SANCHEZ	ASESOR SOCIAL	16/09/2025		30	1.117.525.037	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9495370179	30
JORGE ANDRES MONCADA SUAZA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	16/09/2025		30	5.819.886	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9495370179	30
				0																																0
				0																																0
				0																																0
				0																																0
				0																																0
				0																																0

ELABORO

Firma
Nombre: CARLOS PARDO CANO
Representante Legal de Interventoria
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901955099	5	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	0 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 14 12 40 CENTRO	FLORENCIA-CAQUETA	3134629855	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2031748623	94959307166	E	2025/12/13	2025/12/12	BANCOLOMBIA	0	$407,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	71871034	HARVEY CANO PARRA																		15-11	30	$3,700,000	$592,000	EPS009	30	$3,700,000	$148,000	CCF13	30	$3,700,000	$148,000	14-23	30	$3,700,000	$19,400	30	$0	$0	SI	$407,400
Total	Afiliados(1)																						$3,700,000	$592,000			$3,700,000	$148,000			$3,700,000	$148,000			$3,700,000	$19,400		$0	$0		$407,400

2026/01/17 12:32 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901955099	5	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 14 13 40 CENTRO	FLORENCIA-CAQUETA	3134629855	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2031748623	94958166	E	2025/12/23	2025/12/13	BANCOLOMBIA	0	$907,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$592,000	$0	$0	$592,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$592,000	$0	$0	$592,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,400	$0	$0	$19,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$19,400	$0	$0	$19,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$148,000	$0	$0	$148,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$148,000	$0	$0	$148,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$148,000	$0	$0	$148,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$148,000	$0	$0	$148,000
TOTAL				1	$907,400	$0	$0	$907,400

2026/01/17 12:32 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901955099	5	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	9 - MENOS DE 300 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 14 13 40 CENTRO	FLORENCIA-CAQUETA	3134628855	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	5031754996	9496731304	Y	2025/12/23	2025/12/13	BANCOLOMBIA	0	$495,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificacion		Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	PENSION Dias	PENSION IBC	PENSION Aporte	SALUD Codigo	SALUD Dias	SALUD IBC	SALUD Aporte	CCF Codigo	CCF Dias	CCF IBC	CCF Aporte	RIESGOS Codigo	RIESGOS Dias	RIESGOS IBC	RIESGOS Aporte	PARAFISCALES Dias	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES Aporte	PARAFISCALES Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1017[illegible]4	MONCADA SUAZA JORGE ANDRES			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-01	30	$1,413,500	$99,000	0	$0	$0	No	$99,000
2	CC	1117510172	MURILLO ORTIZ VALERIA ALEJANDRA			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-01	30	$1,413,500	$99,000	0	$0	$0	No	$99,000
3	CC	1117529037	DIAZ SANCHEZ PAULA VANESSA			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-01	30	$1,413,500	$99,000	0	$0	$0	No	$99,000
4	CC	1117580934	VALENCIA ROA BRYAN ANDRES			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-01	30	$1,413,500	$99,000	0	$0	$0	No	$99,000
5	CC	1075040914	VALDES[illegible]A PASTRANA DAFNA LUCIA			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-01	30	$1,413,500	$99,000	0	$0	$0	No	$99,000
Total	Afiliados(5)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$7,067,500	$495,000		$0	$0		$495,000

2026/01/17 12:30 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901955099	5	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	8 - MENOS DE 100 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 14 13 4E CENTRO	FLORENCIA-CAQUETA	3134629855	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1011754096	94867122104	Y	2025/12/13	2025/12/03	BANCOLOMBIA	0	$495,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$495,500	$0	$0	$495,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$495,500	$0	$0	$495,500
TOTAL				5	$495,500	$0	$0	$495,500

2026/01/17 12:30 PM

PAGADA EL APORTE

191

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901155099	5	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	5 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 14 C1 40 CENTRO	FLORENCIA-CAQUETA	3134629855	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	2002718181	94951702217	E	2025/11/26	2025/12/12	BANCOLOMBIA	16	$916,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	vst	sln	ige	lma	vac	avp	cet	if	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79870004	[illegible]																	25-14	30	$3,700,000	$592,000	EPS005	30	$3,700,000	$148,000	CCF10	30	$3,700,000	$148,000	14-23	30	$3,700,000	$14,400	30	$0	$0	N	$907,400
Total	Afiliados(1)																					$3,700,000	$592,000			$3,700,000	$148,000			$3,700,000	$148,000			$3,700,000	$14,400		$0	$0		$907,400

2026/01/17 12:29 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901955099	5	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	0 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 14 13 40 CENTRO	FLORENCIA-CAQUETA	3134629855	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	38027501081	94953780127	E	2025/11/14	2025/12/13	BANCOLOMBIA	16	$916,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$592,000	$6,000	$0	$598,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$592,000	$6,000	$0	$598,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,400	$200	$0	$19,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$19,400	$200	$0	$19,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$148,000	$1,500	$0	$149,500
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$148,000	$1,500	$0	$149,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$148,000	$1,500	$0	$149,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$148,000	$1,500	$0	$149,500
TOTAL				1	$907,400	$9,200	$0	$916,600

2026/01/17 12:29 PM

PAGADO EN LINEA

166

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901915099	5	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 14 13 40 CENTRO	FLORENCIA-CAQUETA	3134629855	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	10027216731	94951378179	Y	2025/11/26	2025/12/12	BANCOLOMBIA	16	$580,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No	EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación		Nombre	Ing	Ret	TDer	TAre	Sanc	Trab	Sus	Inc	Lic	VSt	Vac	LMA	AVP	VCT	IGE	LMA	VAC	AVP	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1017[illegible]	MORCATE [illegible] JORGE ANDRES																				0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	14-13	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	$0	No	$99,100
2	CC	1117513171	MURILLO ORTIZ ANGIE ALEJANDRA																				0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	14-13	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	$0	No	$99,100
3	CC	1117525007	DIAZ SANCHEZ PAULA VANESSA																				0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	14-13	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	$0	No	$99,100
4	CC	1117530134	VALENCIA ROA BRYAN ANDRES																				0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	14-13	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	$0	No	$99,100
5	CC	1078340914	VALDERRAMA PASTRANA ZAIRA LUCIA																				0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	14-13	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	$0	No	$99,100
Total			APRendon(5)																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$0	$0		$495,500

2026/01/17 12:28 PM

aportes en línea

Planill[illegible]esumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901955099	5	CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 14 13 40 CENTRO	FLORENCIA-CAQUETA	3134629855	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	2002721471	449528179	Y	2025/11/25	2025/12/12	BANCOLOMBIA	16	$500,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$495,500	$5,000	$0	$500,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$495,500	$5,000	$0	$500,500
TOTAL				5	$495,500	$5,000	$0	$500,500

2026/01/17 12:28 PM

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
NIT: 901.955.099-5

ANEXO 14 - INFORME DE OBRA

CR 14 # 13-40 - OFICINA 203 Barrio el centro - Tel: 3134629855 -
consorcioalcantarilladosananto@gmail.com

CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

OBJETO: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.



INFORME 04

FECHA CONTRATO: 22 DE ABRIL DE 2025

CONTRATO DE OBRA No. COP-2025-002

FECHA: 22 DE ABRIL DE 2025

DEPARTAMENTO DE CAQUETA

ALCALDIA MUNICIPAL DE MILAN

INFORME 04

DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025
AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA
CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

INFORME 04

TABLA DE CONTENIDO

1 GENERALIDADES DEL CONTRATO 5
1.1 INFORMACION GENERAL 5
1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 5
2 DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO 6
3 INTRODUCCION 7
3.1 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 7
3.2 INTRODUCCIÓN AL CONTRATO DE EJECUCION 7
4 OBJETIVOS 8
5 INFORMACION GENERAL INICIALES DEL CONTRATO 10
5.1 CONTRATO DE OBRA COP-2025-002 10
5.2 CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA COP-2025-002/2025 10
5.3 ACTIVIDADES CONTRACTUALES INICIALES: 11
5.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES FINALES: 12
6 ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 15
6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 15
6.2 CONTROL DE LA INVERSIÓN: 15
6.3 PLAZOS DE EJECUCIÓN (DÍAS CALENDARIO): 16
6.4 POLIZAS DEL CONTRATO 16
6.5 AVANCE FISICO DEL PROYECTO 16
7 ACTA PARCIAL NO 1 DE OBRA DEL CONTRATO COP-2025-002 17
8 PROCESOS CONSTRUCTIVOS A LA FECHA 18
8.1 INFORME DE MANEJO AMBIENTAL, DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA 18
INTRODUCCIÓN 18
8.2 PERSONAL EN OBRA 19
8.3 GESTION PARA EL TALENTO HUMANO 19
8.4 PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
8.5 MANEJO AMBIENTAL ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
9 REGISTRO FOTOGRAFICO 20
10 PÓLIZAS: 23
11 COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS ENVIADAS 23
12 PARAFISCALES 25

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ubicación de San Antonio de Getucha en Colombia 5
Ilustración 2. Ubicación del proyecto en mapa 5
Ilustración 3 Personal realizando trabajos de compactación manual del terreno en el tramo excavado, como preparación de la base para la instalación de la tubería. 20
Ilustración 4 Pozo en excavación con estructura de acero de refuerzo y formaleta instalada, preparado para el vaciado de concreto y conexión de la tubería 20
Ilustración 5 Pozo en proceso de construcción con formaleta y acero de refuerzo, evidenciando labores de alineación y nivelación previas al vaciado de concreto. 20
Ilustración 6 Colocación de tubería corrugada con apoyo de retroexcavadora, durante las labores de instalación en el sistema de drenaje. 20
Ilustración 7 Trabajos de excavación mecánica en zona de bosque para la adecuación de la zanja y empalme de la tubería 20

Ilustración 8 Tramo de tubería instalado en terreno natural, con presencia de agua superficial, previo a las actividades de relleno y conformación del terreno. 20
Ilustración 9 Área de excavación con presencia de agua y lodo, donde se observa la tubería instalada y la retroexcavadora realizando labores de conformación del terreno alrededor del tramo. 21
Ilustración 10 Pozo de inspección ya fundido, con marco metálico instalado y trabajos de relleno y adecuación del terreno alrededor de la estructura. 21
Ilustración 11 Tramo de vía intervenido luego de la instalación de la tubería, evidenciando la superficie nivelada y conformada para su posterior rehabilitación. 21
Ilustración 12 Pozo de inspección delimitado con cerramiento metálico de seguridad, protegiendo el área mientras se realizan labores de relleno y compactación. 21
Ilustración 13 Pozo en proceso de relleno con estructura de formaleta y señalización provisional instalada para garantizar la estabilidad y seguridad del área. 21
Ilustración 14 Fundida de la losa de concreto en la base del pozo, con la tubería instalada y personal ejecutando trabajos de nivelación y acabado del concreto. 21
Ilustración 15 Formaleta exterior instalada para la conformación del pozo, asegurada con puntales y apoyos para garantizar la estabilidad durante el vaciado del concreto. 22
Ilustración 16 Colocación de la malla de acero de refuerzo sobre el terreno preparado, como base estructural para la fundida de concreto del pozo. 22
Ilustración 17 Formaleta instalada en la base del pozo con la tubería posicionada, preparada para la fundida de la losa de concreto. 22
Ilustración 18 Base del pozo con formaleta y acero de refuerzo instalado, junto con la tubería colocada, previo al vaciado de concreto. 22
Ilustración 19 Encofrado interior del pozo con formaleta de madera, utilizado para la fundida de los muros y canal de conducción. 22

1 GENERALIDADES DEL CONTRATO

1.1 INFORMACION GENERAL

Este Plan de Calidad aplica a la ejecución de obras de construcción, adecuación y canalización de aguas lluvias en la calle 4, entre Cra 2 a la Cra 6, del casco urbano de la inspección de San Antonio de Getucha, en el municipio de Milán, departamento del Caquetá.

El contrato se ejecuta en dos etapas: (i) Planificación y logística; (ii) Ejecución de obras conforme al alcance aprobado.

El objetivo es asegurar la conformidad del producto/servicio con los requisitos del cliente, especificaciones técnicas y la normativa aplicable, garantizando satisfacción y mejora continua.

1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA



Ilustración 1. Ubicación de San Antonio de Getucha en Colombia

El proyecto se localiza geográficamente en el casco urbano de la inspección de San Antonio de Getucha específicamente en la calle 4, entre Cra 2 a la Cra 6.



Ilustración 2. Ubicación del proyecto en mapa

2 DESCRIPCION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO:	COP-2025-002.
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA.
OBJETO DEL CONTRATO:	ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	150 DIAS APARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIACIÓN:	22 DE AGOSTO DE 2025.
NOMBRE CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 NIT. 901.935.706-2 R.L. ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA C.C.40.781.657 DE FLORENCIA - CAQUETA
FECHA DE ADICIÓN:	N.A
PLAZO DE ADICIÓN:	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE ENERO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO INICIAL ($):	$ 988.082.242,00.
VALOR EN LETRA:	NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE
VALOR ADICIÓN CONTRATO ($):	N.A.
VALOR CONTRATO FINAL ($):	N.A.
VALOR EN LETRA:	.

3 INTRODUCCION

3.1 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 NIT. 901.747.281-8**
NOMBRE DE LA INTERVENTORIA	**CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025 NIT. 901.955.0.99-5**

1. ESTADO DE LA OBRA:

- ✓ SUSPENDIDA ()
- ✓ EN EJECUCIÓN (**X**)
- ✓ TERMINADA ()

OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL

3.2 INTRODUCCIÓN AL CONTRATO DE EJECUCION

El presente informe, es un documento para el suministro de información de la presentación de las actividades a realizar para su revisión la revisión y llevar a cabo el control y seguimiento de la obra **ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA** a cargo del contratista CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 NIT. 901.935.706-2 cuyo representante legal es ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA C.C. 40.781.657 DE FLORENCIA - CAQUETA Y contrato de obra No COP-2025-002. Este documento describe las labores técnicas y administrativas que se llevaron a cabo en la ejecución, así como el seguimiento a la programación de obra presentada por el contratista

En dicho procedimiento se toman como parámetros y herramientas de control, el presupuesto o propuesta económica, especificaciones técnicas, capital humano, Normas técnicas vigentes y procedimientos establecidos por la entidad contratante **ALCALDIA MUNICIPAL DE MILAN.**, así como factores externos como el clima e imprevistos, los cuales son influyentes y determinantes en el desarrollo de este proyecto. Teniendo en cuenta la importancia del presente reporte y con el fin de dar claridad al proceso con el fin de cumplir el objeto contractual contratado.

4 OBJETIVOS

1. Ejecutar el contrato en las condiciones y términos establecidos, disponiendo del personal técnico y de apoyo propuesto, usando los materiales y las cantidades pactadas.
2. Durante la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA está obligado a organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para adelantar en forma sostenible la obra y con las disposiciones ambientales contenidas en la Ley 99 de 1993, Decreto 2041 de 2014 y demás normas reglamentarias, así como las normas especiales para la obtención de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones específicas requeridas para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, que se utilicen durante la ejecución de las obras.
3. La obtención de los permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, así como los sitios de disposición de sobrantes, estarán bajo la responsabilidad del contratista y son requisitos indispensables para que en calidad de constructor pueda iniciar las obras. El tiempo que su obtención conlleve deberá considerarse dentro de la programación. Las demoras en la obtención de estos permisos no serán causa válida para justificar atrasos o incumplimientos.
4. Realizar los trabajos de construcción, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas, con materiales de calidad, el personal idóneo y en los plazos pactados, de acuerdo a la programación que se acuerde con el Interventor y/o supervisor.
5. Respetar las disposiciones establecidas en el Código Nacional de Minas sobre extracción y explotación de materiales de construcción.
6. El contratista se obliga a dar inicio, cuando se firma el acta de inicio por las partes. Presentar ante el supervisor y/o interventor actas parciales del avance de la obra cada 30 días.
7. Llevar un registro fotográfico desde la iniciación de la ejecución contractual y hasta la entrega definitiva de los trabajos (antes de iniciar labores, durante la ejecución y después cuando se ha culminado la labor) para aportarlos al expediente del contrato como evidencia de la ejecución en medio físico y digital.
8. Llevar las bitácoras de obras debidamente actualizadas y con anotación de todas las novedades que se presenten durante la ejecución.
9. Tomar las garantías contractuales, ampliarlas, extenderlas o modificarlas cuando a ello hubiere lugar.
10. No suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el contrato.
11. Cuando se requiera hacer una modificación, deberá concertarlo con el supervisor y/o interventor y el alcalde Municipal para su respectiva aprobación.
12. El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecución de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y recibo de ellas, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos.
13. El contratista se obliga a permanecer personalmente al frente de los trabajos o mantener al frente de los mismos un residente, personal que debe estar suficientemente facultado para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato. El Municipio se reserva el derecho de exigir, por escrito, al contratista el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Esta exigencia no dará derecho al contratista para elevar ningún reclamo contra el Municipio. La Supervisión y/o interventoría podrá solicitar al contratista, en cualquier momento, el suministro de información sobre la

nómina del personal. El contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo razonable que la Supervisión y/o interventoría haya fijado.

14. El CONTRATISTA se obliga a la colocación de vallas informativas con el fin de prevenir situaciones de riesgo si hay lugar a ello, en cada uno de los sitios donde se adelante la obra con base en las especificaciones señaladas por la secretaria de Planeación.
15. Periódicamente deberán celebrarse reuniones con participación del residente de la obra, y el supervisor y/o Interventor con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes áreas del Municipio. De cada una de estas reuniones se levantará un acta, la cual será mantenida en custodia por la Supervisión y/o Interventor.
16. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y laboral y sismo resistencia en la ejecución de las obras.
17. Informar oportunamente al supervisor y/o interventor del contrato sobre cualquier situación que pueda alterar el curso normal de la ejecución contractual o el equilibrio financiero del contrato.
18. A la terminación de la obra, el contratista removerá de los alrededores de ellas las instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección. En caso que no lo haga así, el Supervisor y/o Interventor ordenará la limpieza por cuenta del Municipio y cargará su costo al contratista. El contratista realizará las gestiones necesarias para que en caso tal, los materiales producto de esta limpieza puedan ser utilizados por miembros de la comunidad. Una vez realizada la limpieza, se restaurarán las áreas utilizadas, realizando como mínimo revegetalización, control de erosión y acabado de rellenos sanitarios de tal forma que estas zonas queden en similares o mejores condiciones que las encontradas inicialmente.
19. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato y para hacer efectivo el pago.
20. Presentar los informes al supervisor y/o interventor contractual, sobre la ejecución del contrato.
21. Pagar de su propia cuenta los impuestos, tasas y contribuciones que demande el perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.
22. Mantener indemne al Municipio frente a reclamaciones de terceros por hechos o actuaciones que le sean imputables y que deriven de la ejecución del contrato.
23. Adicional a las antes contempladas y dando cumplimiento al Plan de Gestión Social y Manual Operativo del PDA Caquetá, el contratista deberá

5 INFORMACION GENERAL INICIALES DEL CONTRATO

5.1 CONTRATO DE OBRA COP-2025-002

OBJETO: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

1. **ANTECEDENTES:** la Alcaldia Municipal de Milán, mediante licitación pública de obra pública de infraestructura de infraestructura de agua potable y saneamiento básico No AM-LP-2025-002, junto con el presupuesto de la actividades contractuales, planos y demás documentos de carácter técnico, que tiene por objeto **ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA**, que será respaldado por los Certificados de Disponibilidad de Recursos CDP No. 2.3.2.01.01.001.3.16.01 del 09 de mayo de 2024, por valor de **NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($ 988.082.242,00).**

5.2 CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA COP-2025-002/2025

NÚMERO DE CONTRATO:	COP-2025-002	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	OBRA	
DATOS DE CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE MILAN	
DATOS CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO SAN ANTONIO NIT. 901.564.960-4
	SUSCRIPTOR CONTRATO –	R.L. ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA C.C.40.781.657 DE FLORENCIA -CAQUETA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP No. 17355-17356-17358 del 06 de noviembre 2024
VALOR DEL CONTRATO:	**NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($ 988.082.242,00).**
FECHA DE INICIO CONTRATO:	22 DE AGOSTO DE 2025
PLAZO EJECUCIÓN:	SESENTA (150) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 DE ENERO DE 2026

5.3 ACTIVIDADES CONTRACTUALES INICIALES:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRATO
			CANTIDAD CONTRATO
I	**1.0 PRELIMINARES**		
1,01	Localización y replanteo de redes	M2	897,25
1,02	Cerramiento provisional lona verde (h=2,00m)	ML	897,25
1,03	Excavación manual en material común de 0.00 a 2.00 m	M3	72,71
1,04	Excavación manual en material común de 2.00 a 4.00 m	M3	37,50
1,05	Excavación mecánica en material común	M3	1281,00
1,06	Entibado en madera para proteger talud de excavación	M2	390,55
1,07	Cargue, transporte y retiro de material sobrante	M3	653,41
1,08	Relleno, Cimentación tubería con arena SP de acuerdo a la norma ASTM 2487	M3	104,29
1,09	Relleno con material seleccionado de la excavación	M3	736,13
1,10	Suministro e instalación de sub_base granular tipo C, NT1	M3	183,70
1,11	Suministro e instalación de base granular tipo C, NT1	M3	63,30
1,12	Suministro e instalación de asfaltita natural, en áreas afectadas por la excavación	M2	177,46
			SUBTOTAL
2	**2.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA**		

2,01	Suministro e instalación de tubería PVC D=315mm; NTC 3722-3 S8	ML	168,24
2,02	Suministro e instalación de tubería PVC D=400mm; NTC 3722-3 S8	ML	43,84
2,03	Suministro e instalación de tubería PVC D=450 mm; NTC 3722-3 S8	ML	82,02
2,04	Suministro e instalación de tubería PVC D=27"; NTC 5055 ASTM F 794	ML	160,27
2,05	Suministro e instalación de tubería PVC D=30"; NTC 5055 ASTM F 794	ML	51,96
2,06	Suministro e instalación de tubería PVC D=36"; NTC 5055 ASTM F 794	ML	77,68
			SUBTOTAL
3	**3.0 POZOS DE INSPECCION**		
3,01	Pozos de inspección en concreto f´c= 24Mpa D=1.20 m y h<=2.00 m. incluye tapa	UND.	6,00
3,02	Pozos de inspección en concreto f´c= 24Mpa D=1.20 m y 2.01>h<=4.00 mincluye tapa	UND	3,00
			SUBTOTAL
4	**4,0 CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROSY CABEZA DE SALIDA**		
4,01	Construcción de cunetas transversales de vía, L=10.97m x 0.85 m, ancho útil de 0.45m, espesor de muros de 0.20m, y rejillas en platina de 2" x 3/8	UND	3,00
4,02	Construcción de cunetas transversales de vía, L=9.32m x 0.85 m, ancho útil de 0.45m, espesor de muros de 0.20m, y rejillas en platina de 2" x 3/8	UND	1,00
4,03	Construcción de sumidero de 1.64m x 0.88m, ancho útil de 0.58m x 1.34m, e=0.15m, rejilla platina de 2 x 3/8	UND	9,00
4,04	Construcción de sumidero de 1.64m x 0.98m, ancho útil de 0.68m x 1.34m, e=0.15m, rejilla platina de 2 x 3/8	UND	2,00
4,05	Construcción de cabezal de salida	UND	1,00
			SUBTOTAL
5	**5,0 ASEO GENERAL**		
5,01	Aseo general de Obra	UND	1,00

5.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES FINALES:

Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
I	**OBRA**			

1	**1.0 PRELIMINARES**			
1	1,01	Localización y replanteo de redes	M2	540.02
2	1,02	Cerramiento provisional lona verde (h=2,00m)	ML	847.92
3	1,03	Excavación manual en material común de 0.00 a 2.00 m	M3	120.71
4	1,04	Excavación manual en material común de 2.00 a 4.00 m	M3	8.35
5	1,05	Excavación mecánica en material común	M3	1166.50
6	1,06	Entibado en madera para proteger talud de excavación	M2	835.85
7	1,07	Cargue, transporte y retiro de material sobrante	M3	322.28
8	1,08	Relleno, Cimentación tubería con arena SP de acuerdo a la norma ASTM 2487	M3	81.00
9	1,09	Relleno con material seleccionado de la excavación	M3	1158.57
10	1,1	Suministro e instalación de sub_base granular tipo C, NT1	M3	90.98
11	1,11	Suministro e instalación de base granular tipo C, NT1	M3	36.39
12	1,12	Suministro e instalación de asfaltita natural, en áreas afectadas por la excavación	M2	367.87
2	**2.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA**			
9	2,01	Suministro e instalación de tubería PVC D=315mm; NTC 3722-3 S8	ML	105.35
10	2,02	Suministro e instalación de tubería PVC D=400mm; NTC 3722-3 S8	ML	57.75
11	2,03	Suministro e instalación de tubería PVC D=450 mm; NTC 3722-3 S8	ML	75.47

12	2,04	Suministro e instalación de tubería PVC D=27"; NTC 5055 ASTM F 794	ML	158.01
13	2,05	Suministro e instalación de tubería PVC D=30"; NTC 5055 ASTM F 794	ML	49.21
14	2,06	Suministro e instalación de tubería PVC D=36"; NTC 5055 ASTM F 794	ML	95.18
3	**3.0 POZOS DE INSPECCION**			
15	3,01	Pozos de inspección en concreto f´c= 24Mpa D=1.20 m y h<=2.00 m. incluye tapa	UND.	0,00
16	3,02	Pozos de inspección en concreto f´c= 24Mpa D=1.20 m y 2.01>h<=4.00 mincluye tapa	UND	0,00
4	**4,0 CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROSY CABEZA DE SALIDA**			
17	4,01	Construcción de cunetas transversales de vía, L=10.97m x 0.85 m, ancho útil de 0.45m, espesor de muros de 0.20m, y rejillas en platina de 2" x 3/8	UND	0,00
18	4,02	Construcción de cunetas transversales de vía, L=9.32m x 0.85 m, ancho útil de 0.45m, espesor de muros de 0.20m, y rejillas en platina de 2" x 3/8	UND	0,00
19	4,03	Construcción de sumidero de 1.64m x 0.88m, ancho útil de 0.58m x 1.34m, e=0.15m, rejilla platina de 2 x 3/8	UND	0,00
20	4,04	Construcción de sumidero de 1.64m x 0.98m, ancho útil de 0.68m x 1.34m, e=0.15m, rejilla platina de 2 x 3/8	UND	18,00
21	4,05	Construcción de cabezal de salida	UND	1,00
5	**5,0 ASEO GENERAL**			
22	5,01	Aseo general de Obra	UND	1,00
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**			
23	NP-1	Pozos de inspección en concreto f´c= 24Mpa D=1.50 m y h<=2.00 m. incluye tapa	UND	6.00
24	NP-2	Pozos de inspección en concreto f´c= 24Mpa D=1.50 m y 2.01>h<=3.00 mincluye tapa	UND	2.00
25	NP-3	Pozos de inspección en concreto f´c= 24Mpa D=1.60 m y 3.01>h<=4.00 mincluye tapa	UND	1.00

6 ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Bajo el marco de **ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA,** se encuentra este proyecto, con el fin de mejorar la red de alcantarillado de aguas lluvias para la comunidad de la inspección de San Antonio de Getucha.

Este proyecto además beneficiará que la red instalada garantice la continuidad del flujo de las aguas lluvias y evitar inundación en las vías.

6.2 CONTROL DE LA INVERSIÓN:

DESCRIPCIÓN	VALOR BRUTO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 988.082.242
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 988.082.242
VALOR DEL ANTICIPO:	$ 395.232.896
PORCENTAJE DEL ANTICIPO:	0%

AVANCE DE INVERSIÓN	EJECUTADO
ACUMULADO MANO DE OBRA:	$232.885.486.50
ACUMULADO SUMINISTROS:	$543.399.468.50
TOTAL, ACUMULADO PROYECTO:	$776.284.955.00
FACTURADO (BRUTO) ACUMULADO:	$0
SALDO POR FACTURAR:	$776.284.955.00
PORCENTAJE ACUMULADO	80.49%

6.3 PLAZOS DE EJECUCIÓN (dias calendario):

FECHA INICIAL DE LA OBRA: 22/08/2025			
PLAZO INICIAL:	150	PLAZO TRANSCURRIDO:	120
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO RESTANTE:	30

6.4 POLIZAS DEL CONTRATO

1. **Cumplimiento:** Por el 20% sobre el valor del contrato.
2. **Salarios prestaciones indemnizaciones:** Por el 5% del valor del contrato.
3. **Buen manejo y correcta inversión del anticipo.** Por el 100% del valor del anticipo.
4. **Estabilidad de la obra:** Por el 20% del valor del contrato

6.5 AVANCE FISICO DEL PROYECTO

A continuación, se presenta el progreso físico de cada una de las actividades ejecutadas hasta el momento, tomando como base las cantidades contratadas, y se indica el porcentaje total de avance, el cual alcanza el **80,49 %.**

7 ACTA PARCIAL DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO COP-2025-002

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CONTRATO			VALORES MODIFICATORIOS PRESENTE ACTA			TOTAL CANTIDADES MODIFICADAS		IDENTIFICACION
			CANTIDAD CONTRATO	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD TOTAL	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
1	1.0 PRELIMINARES										
1.01											
1.02											
1.03											
1.04											
1.05											
1.06											
1.07											
1.08											
1.09											
1.10											
1.11											
1.12											
				SUBTOTAL							
2	2.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA										
2.01											
2.02											
2.03											
2.04											
2.05											
2.06											
				SUBTOTAL							
3	3.0 POZOS DE INSPECCION										
3.01											
3.02											
				SUBTOTAL							
4	4.0 CONSTRUCCION DE SUPERSIFON Y CAMARA DE SALIDA										
4.01											
4.02											
4.03											
4.04											
4.05											
				SUBTOTAL							
5	5.0 ASEO GENERAL										
5.01											
				SUBTOTAL							
NP	ITEMS NO PREVISTOS										
NP-1											
NP-2											
NP-3											
				SUBTOTAL							
	COSTO DIRECTO DE OBRA (A)										
	COSTO TOTAL DE OBRA										

	COSTO TOTAL DE LA OBRA MODIFICADO		

8 PROCESOS CONSTRUCTIVOS A LA FECHA

Durante el desarrollo de la obra, los procesos constructivos se han llevado a cabo conforme a las especificaciones técnicas, respetando las directrices de ejecución y lo establecido en el contrato.

8.1 INFORME DE MANEJO AMBIENTAL, DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

INTRODUCCIÓN

La gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es una herramienta fundamental para asegurar condiciones laborales adecuadas y proteger el bienestar de todas las personas vinculadas a la obra. Tanto quienes participan de forma directa —como contratistas, subcontratistas y proveedores— como quienes lo hacen de manera indirecta —por ejemplo, la comunidad cercana— están expuestos a riesgos asociados a accidentes, incidentes, lesiones y enfermedades derivadas de las actividades desarrolladas.

En este sentido, la gestión en SST resulta esencial, ya que tiene como propósito identificar, reducir y eliminar los factores de riesgo, promoviendo la protección y la salud de los trabajadores, así como la prevención y control de accidentes y enfermedades laborales.

De igual manera, los proyectos de obra civil generan impactos ambientales que hacen necesario implementar estrategias orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar la contaminación y el uso inadecuado de los recursos naturales. Por esta razón, la gestión ambiental en la obra es clave para garantizar la conservación y el uso responsable de dichos recursos.

8.2 PERSONAL EN OBRA

Continuamente se verifica que el personal que ingrese a la obra cuente con los aportes al sistema de seguridad social de acuerdo a los requerimientos de la ley 100 de 1993 (Soportes en informe final SST SGA No 1 del Contratista). Además, cada personal en la obra, se verifica que se encuentra afiliado al sistema de Riesgos Laborales ARL. De acuerdo a lo verificado en campo y reportado por el contratista, se cumple con los requerimientos relacionados anteriormente. Se le ha recomendado al contratista mantener en cualquier momento soportes en obra del personal, incluyendo las personas nuevas que van ingresando.



8.3 GESTION PARA EL TALENTO HUMANO

Durante el periodo de evaluación se presentó un máximo de 11 trabajadores en obra y 2 trabajadores del área administrativa del contratista. A la fecha no se presentaron accidentes ni incidentes de trabajo.







Durante el periodo de ejecución el personal cumple con cada uno de sus elementos de protección personal para evitar accidentes trabajo.

9 REGISTRO FOTOGRAFICO



Ilustración 3 Personal realizando trabajos de compactación manual del terreno en el tramo excavado, como preparación de la base para la instalación de la tubería.



Ilustración 4 Pozo en excavación con estructura de acero de refuerzo y formaleta instalada, preparado para el vaciado de concreto y conexión de la tubería.



Ilustración 5 Pozo en proceso de construcción con formaleta y acero de refuerzo, evidenciando labores de alineación y nivelación previas al vaciado de concreto.



Ilustración 6 Colocación de tubería corrugada con apoyo de retroexcavadora, durante las labores de instalación en el sistema de drenaje.



Ilustración 7 Trabajos de excavación mecánica en zona de bosque para la adecuación de la zanja y empalme de la tubería.



Ilustración 8 Tramo de tubería instalada en terreno natural, con presencia de agua superficial, previo a las actividades de relleno y conformación del terreno.



Ilustración 9 Área de excavación con presencia de agua y lodo, donde se observa la tubería instalada y la retroexcavadora realizando labores de conformación del terreno alrededor del tramo.



Ilustración 10 Pozo de inspección ya fundido, con marco metálico instalado y trabajos de relleno y adecuación del terreno alrededor de la estructura.



Ilustración 11 Tramo de vía intervenido luego de la instalación de la tubería, evidenciando la superficie nivelada y conformada para su posterior rehabilitación.



Ilustración 12 Pozo de inspección delimitado con cerramiento metálico de seguridad, protegiendo el área mientras se realizan labores de relleno y compactación.



Ilustración 13 Pozo en proceso de relleno con estructura de formaleta y señalización provisional instalada para garantizar la estabilidad y seguridad del área.



Ilustración 14 Fundida de la losa de concreto en la base del pozo, con la tubería instalada y personal ejecutando trabajos de nivelación y acabado del concreto.



Ilustración 16 Colocación de la malla de acero de refuerzo sobre el terreno preparado, como base estructural para la fundida de concreto del pozo.



Ilustración 17 Formaleta instalada en la base del pozo con la tubería posicionada, preparada para la fundida de la losa de concreto.



Ilustración 18 Base del pozo con formaleta y acero de refuerzo instalado, junto con la tubería colocada, previo al vaciado de concreto.



Ilustración 19 Encofrado exterior del pozo con formaleta de madera, utilizado para la fundida de los muros y canal de conducción.



Ilustración 15 Formaleta exterior instalada para la canalización del pozo, asegurada con puntales y apoyos para garantizar la estabilidad durante el vaciado del concreto.

10 PÓLIZAS:

CONDICIONES INICIALES SEGUROS MUNDIAL				
GARANTÍAS	**No PÓLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento del contrato	11-44-10-101253742	22-04-2025	22/03/2026	$ 197.616.448,40
Pago de salarios	11-44-10-101253742	22-04-2025	22/03/2026	$ 49.404.112,10
Estabilidad y calidad de la obra	11-44-10-101253742	22-04-2025	22/09/2030	$ 197.616.448,40
Buen manejo del anticipo	11-44-10-101253742	22-04-2025	22/03/2026	$ 395.232.896,80

11 COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS ENVIADAS

TIPO DE DOCUMENTO	**OFICIO EXTERNO No 03**
PARA	Consorcio Alcantarillado San Antonio 2025
ASUNTO	Ingreso del personal
PROYECTADO	**CONSORCIO SAN ANTONIO 2025** - CONTRATISTA
TIPO DE DOCUMENTO	**OFICIO EXTERNO No 04**
PARA	Consorcio Alcantarillado San Antonio 2025
ASUNTO	Carpeta de la propuesta
PROYECTADO	**CONSORCIO SAN ANTONIO 2025** - CONTRATISTA
TIPO DE DOCUMENTO	**OFICIO EXTERNO No 05**
PARA	Consorcio Alcantarillado San Antonio 2025
ASUNTO	Control seguridad social y parafiscales obra mes agosto

PROYECTADO	**CONSORCIO SAN ANTONIO 2025** - CONTRATISTA
TIPO DE DOCUMENTO	**OFICIO EXTERNO No 06**
PARA	Consorcio Alcantarillado San Antonio 2025
ASUNTO	Inconformidad por retraso de entrega de la tubería
PROYECTADO	**CONSORCIO SAN ANTONIO 2025** - CONTRATISTA
TIPO DE DOCUMENTO	**OFICIO EXTERNO No 07**
PARA	Consorcio Alcantarillado San Antonio 2025
ASUNTO	Aclaración y desistimiento de reclamación por entrega de la tubería
PROYECTADO	**CONSORCIO SAN ANTONIO 2025** - CONTRATISTA
TIPO DE DOCUMENTO	**OFICIO EXTERNO No 08**
PARA	Consorcio Alcantarillado San Antonio 2025
ASUNTO	Programa de inducción SST y otros
PROYECTADO	**CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 - CONTRATISTA**
TIPO DE DOCUMENTO	**OFICIO EXTERNO No 09**
PARA	**Consorcio Alcantarillado San Antonio 2025**
ASUNTO	Entrega de balance de cantidades de acta de mayores y menores
PROYECTADO	**CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 - CONTRATISTA**

12 PARAFISCALES

Yo OSCAR EDUARDO CALDERON ROSAS, identificado con cédula de ciudadanía **No.** 16.187.260 de Florencia – Caquetá, en mi calidad de Contador Público de **CONSORCIO SAN ANTONIO 2025,** con **NIT No.** 901.935.706, bajo la gravedad del juramento manifiesto que **CONSORCIO SAN ANTONIO 2025**. ha cumplido durante la ejecucion del contrato a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud **-EPS-**, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales **-ARP-**, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar **-ICBF-** y el Servicio Nacional de Aprendizaje **-SENA-**, para lo cual se adjuntan las planillas correspondientes.

OSCAR EDUARDO CALDERON ROSAS
CONTADOR PÚBLICO
C.C. 16.187.260 DE FLORENCIA
T.P. No 165913-T
CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

ALDA MARTIZA DUSSAN ACOSTA
C.C. No. 40.781.657 DE FLORENCIA
R/L. CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
CONTRATISTA


CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
NIT: 901.955.099-5

ANEXO 15 – REGISTRO FOTOGRAFICO


CR 14 # 13-40 - OFICINA 203 Barrio el centro - Tel: 3134629855 -
consorcioalcantarilladosananto@gmail.com

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
NIT: 901.955.099-5


REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME N.4

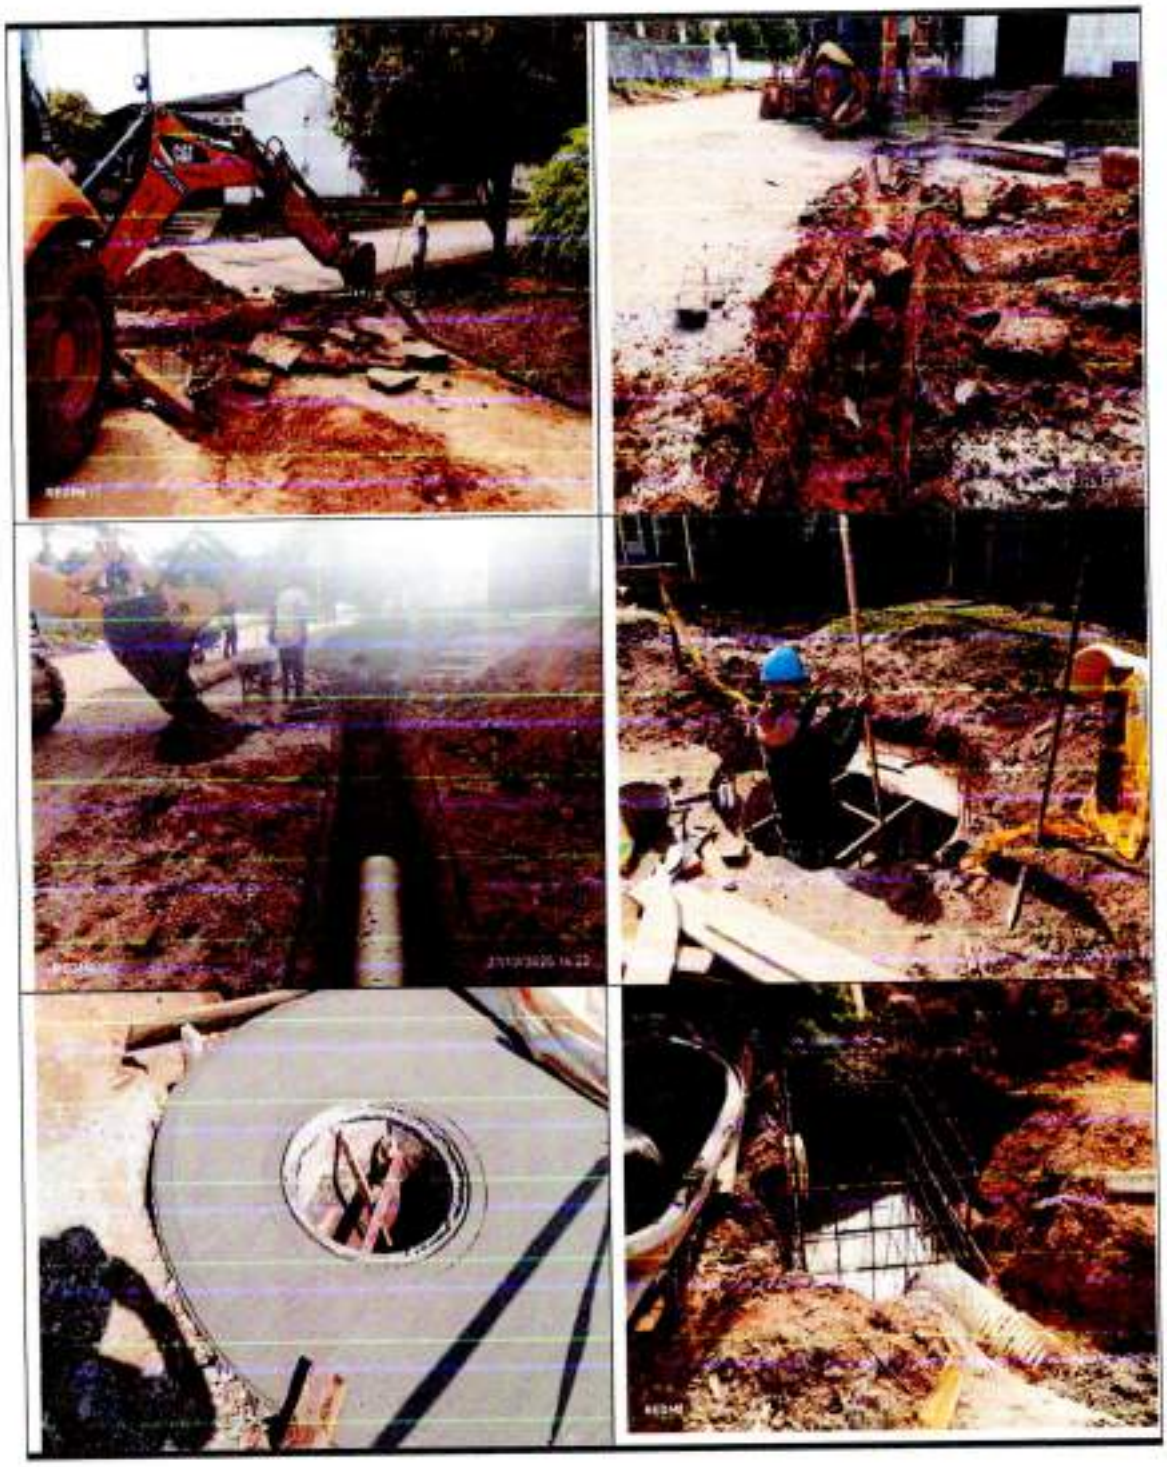

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
NIT: 901.955.099-5

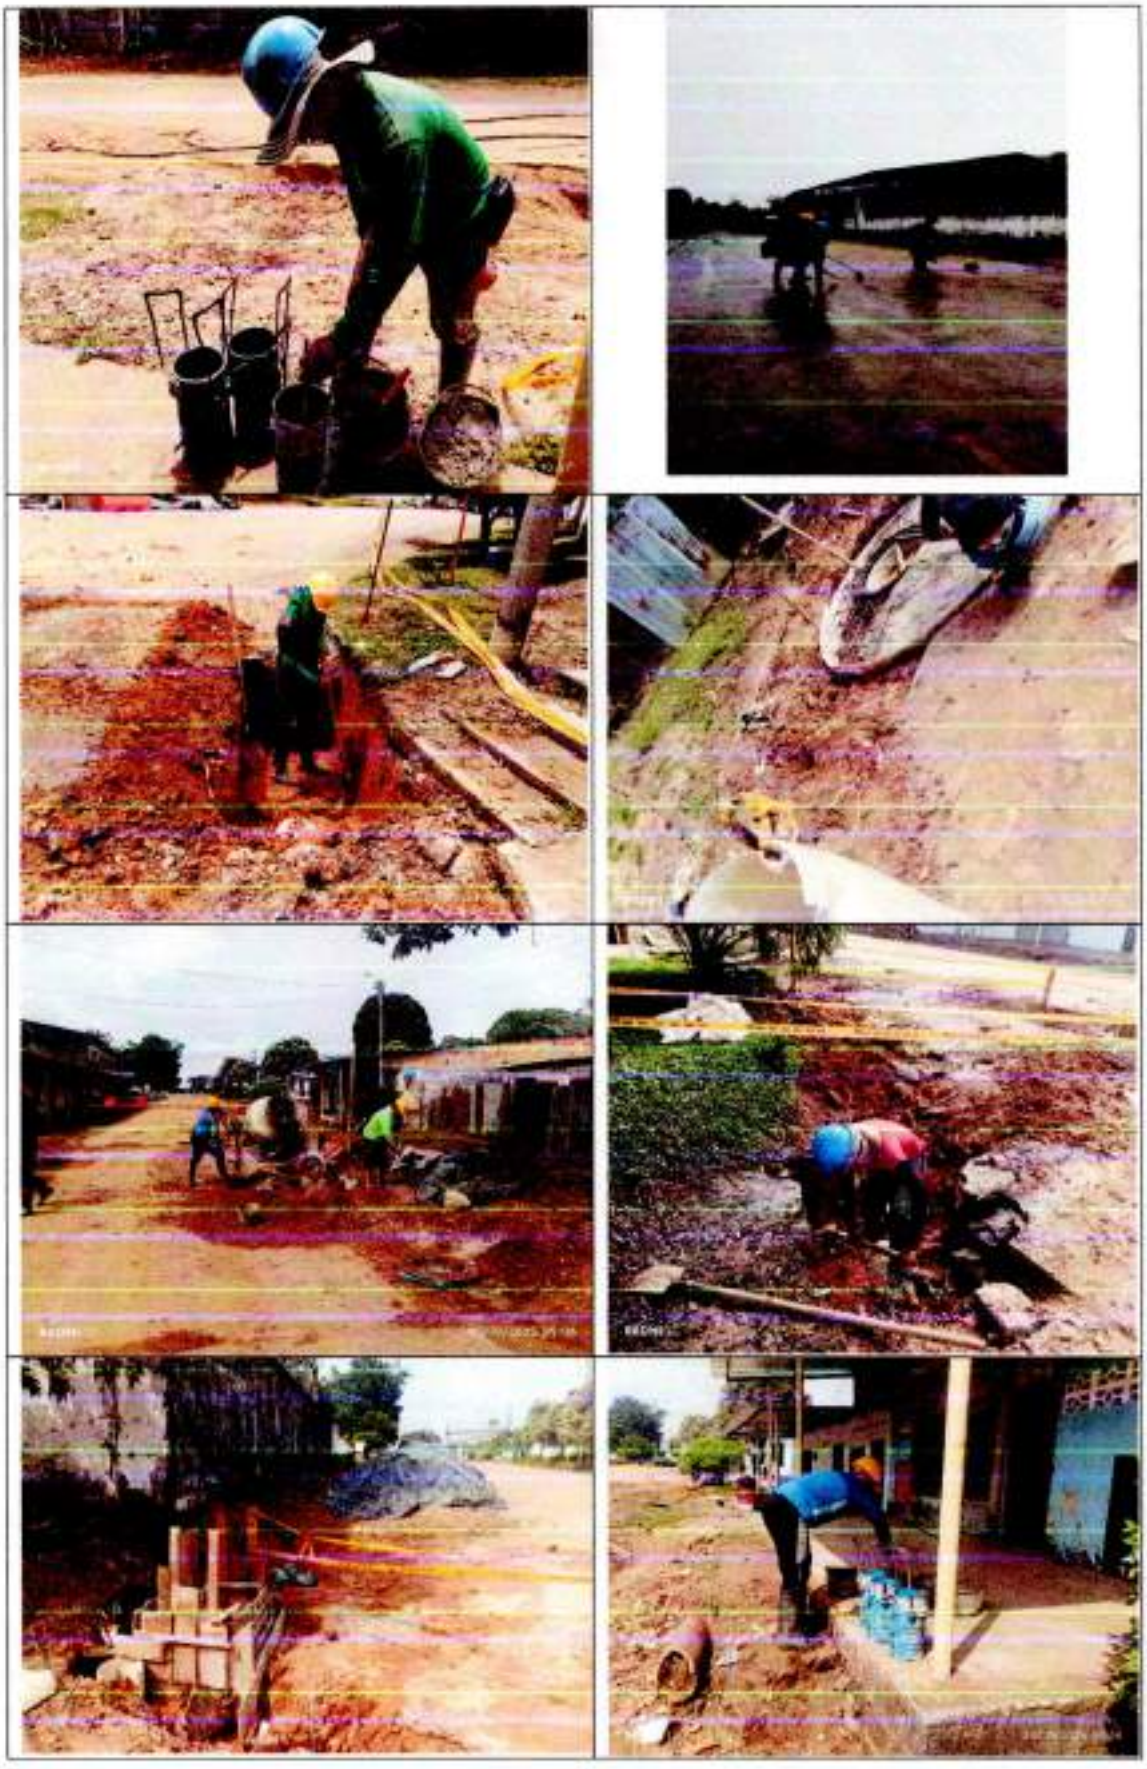


CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
NIT: 901.955.099-5

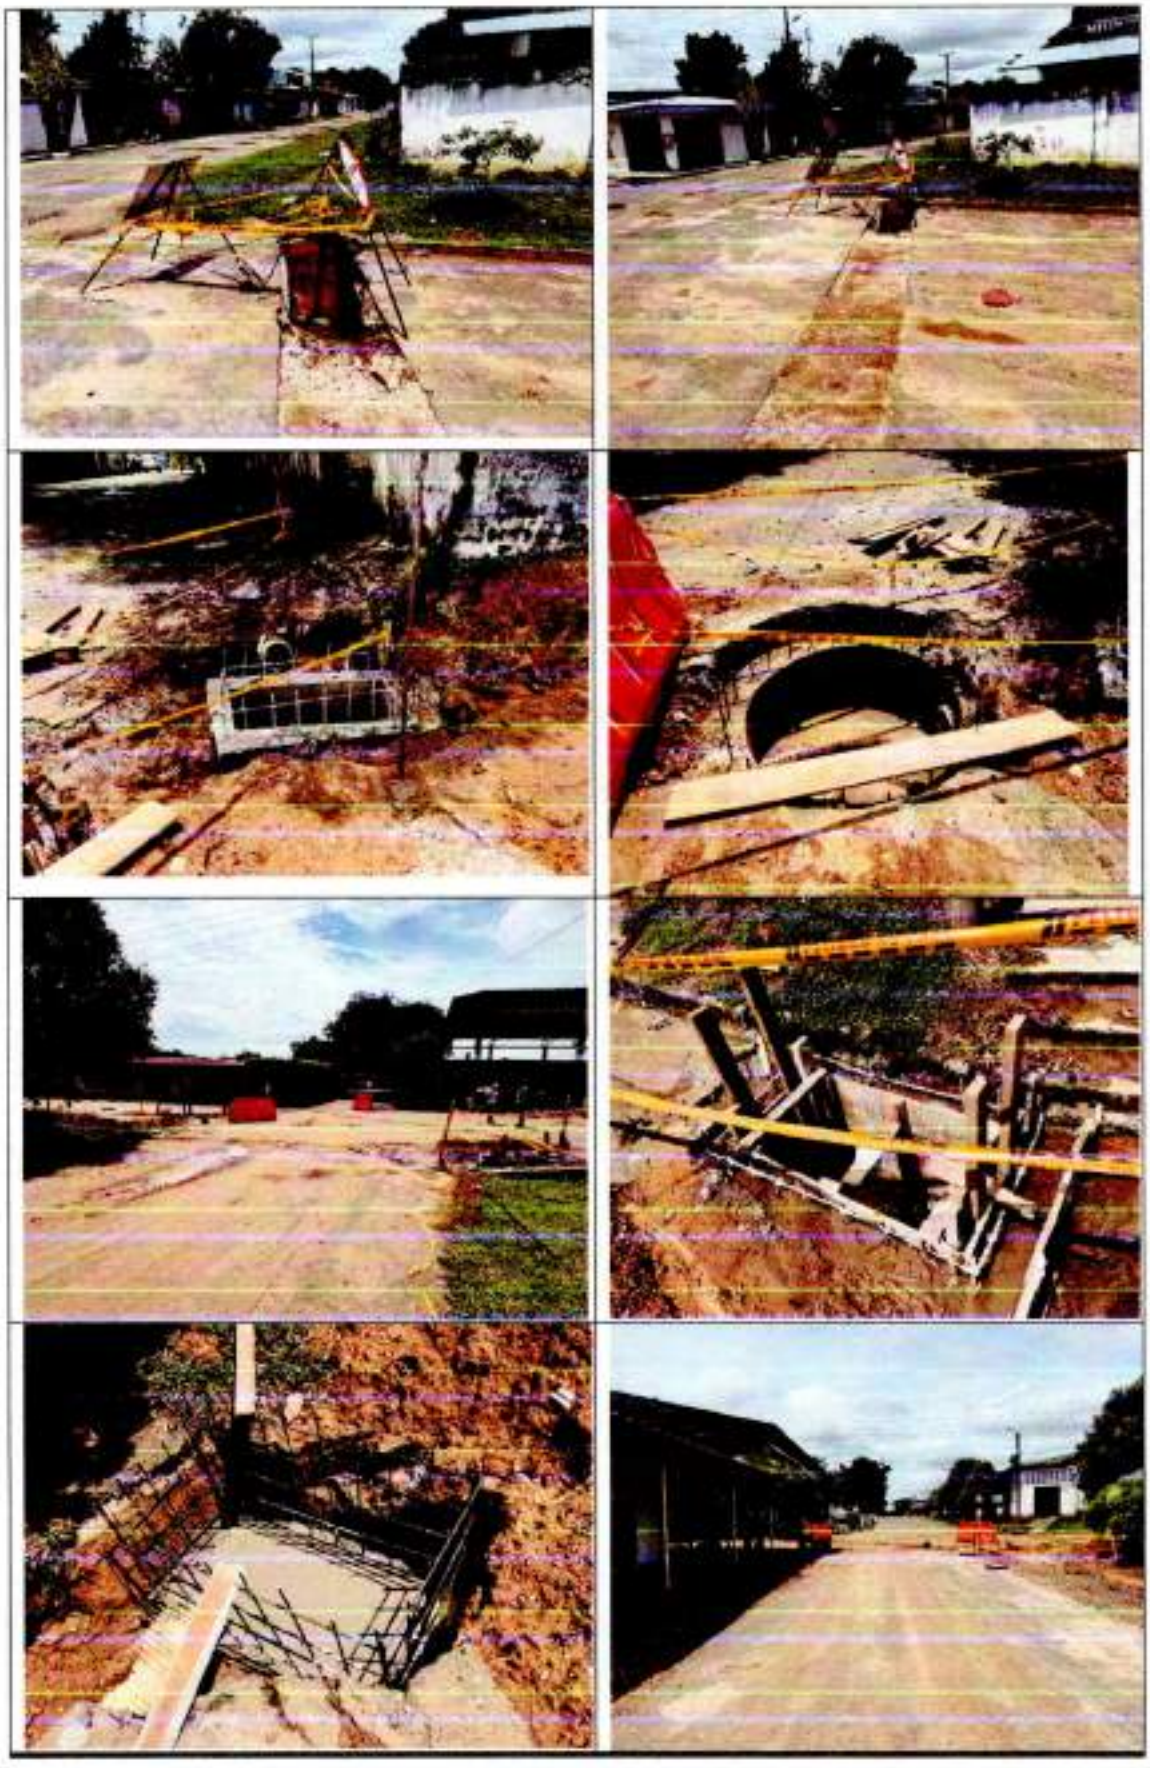


CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
NIT: 901.955.099-5



CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
NIT: 901.955.099-5

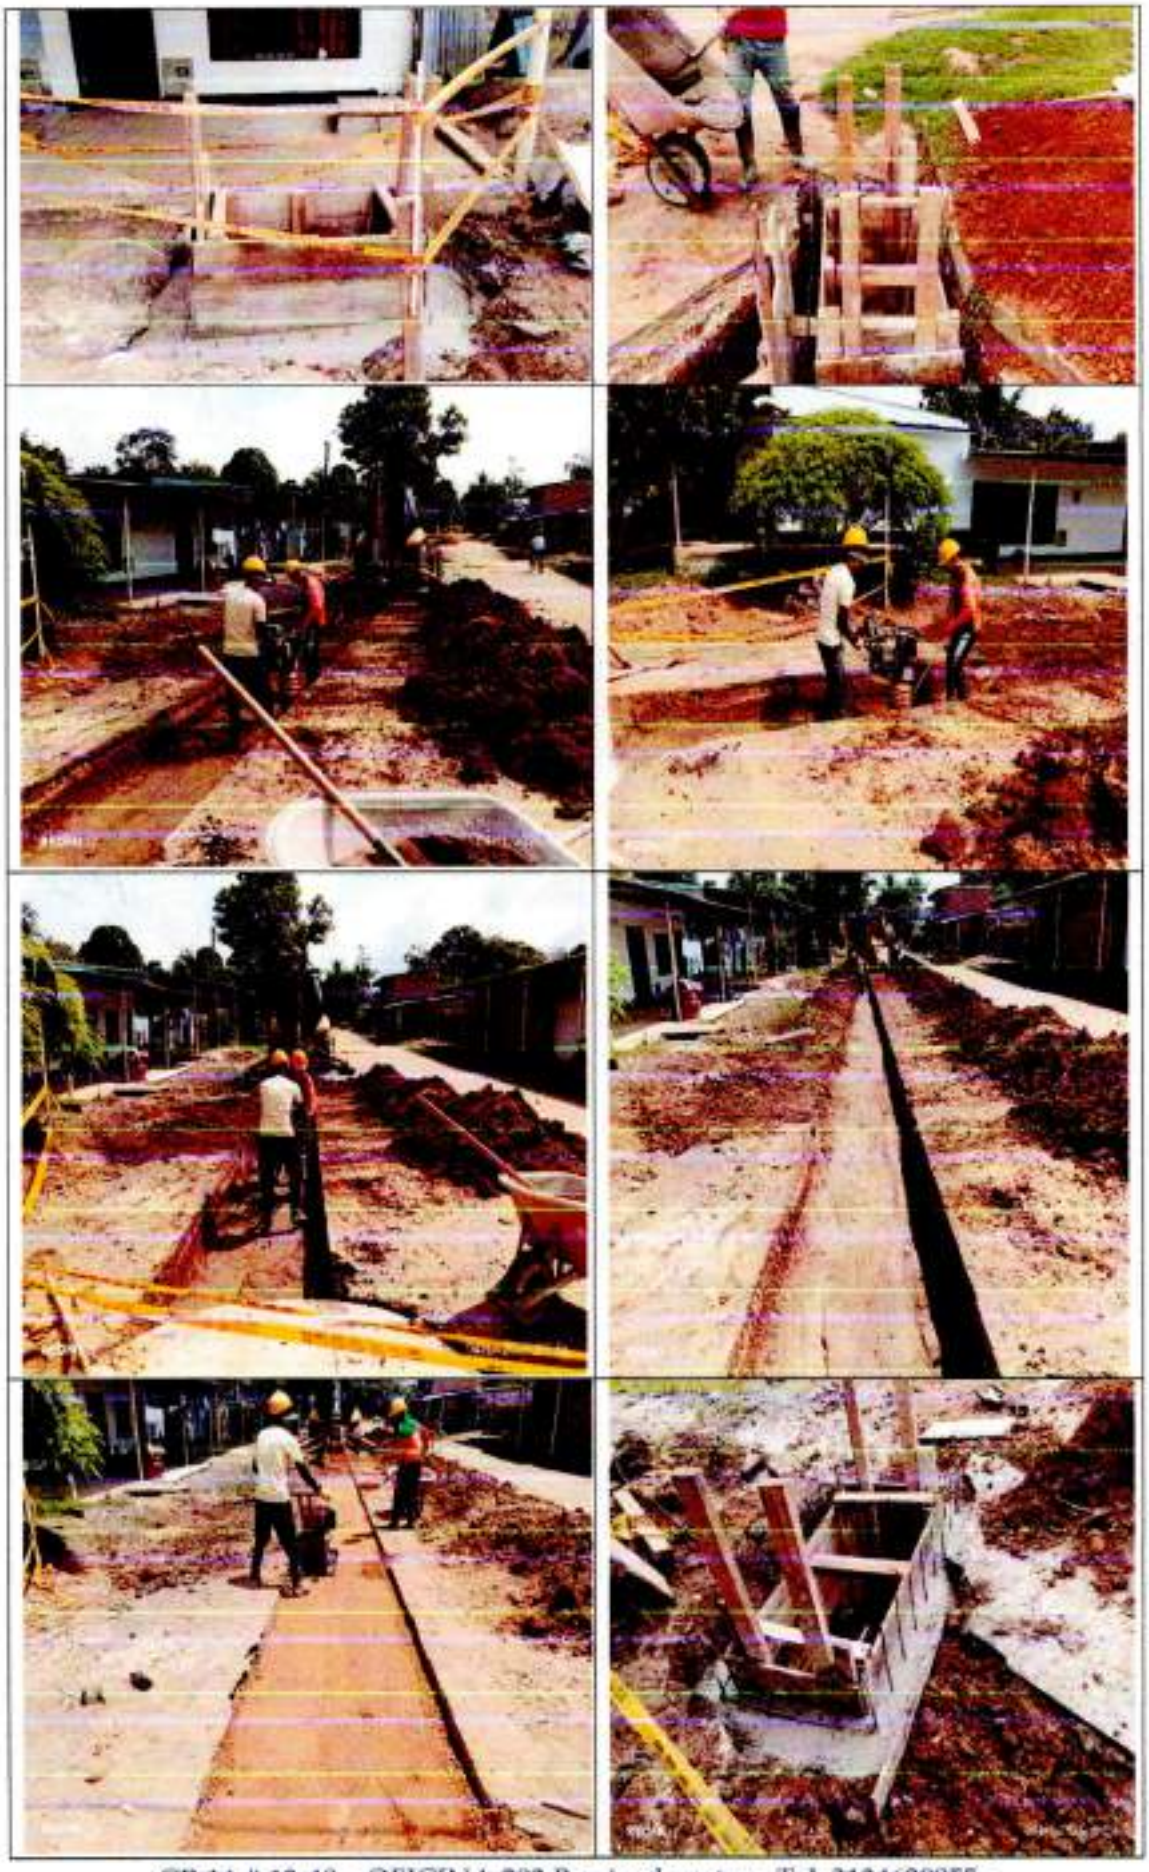


CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
NIT: 901.955.099-5

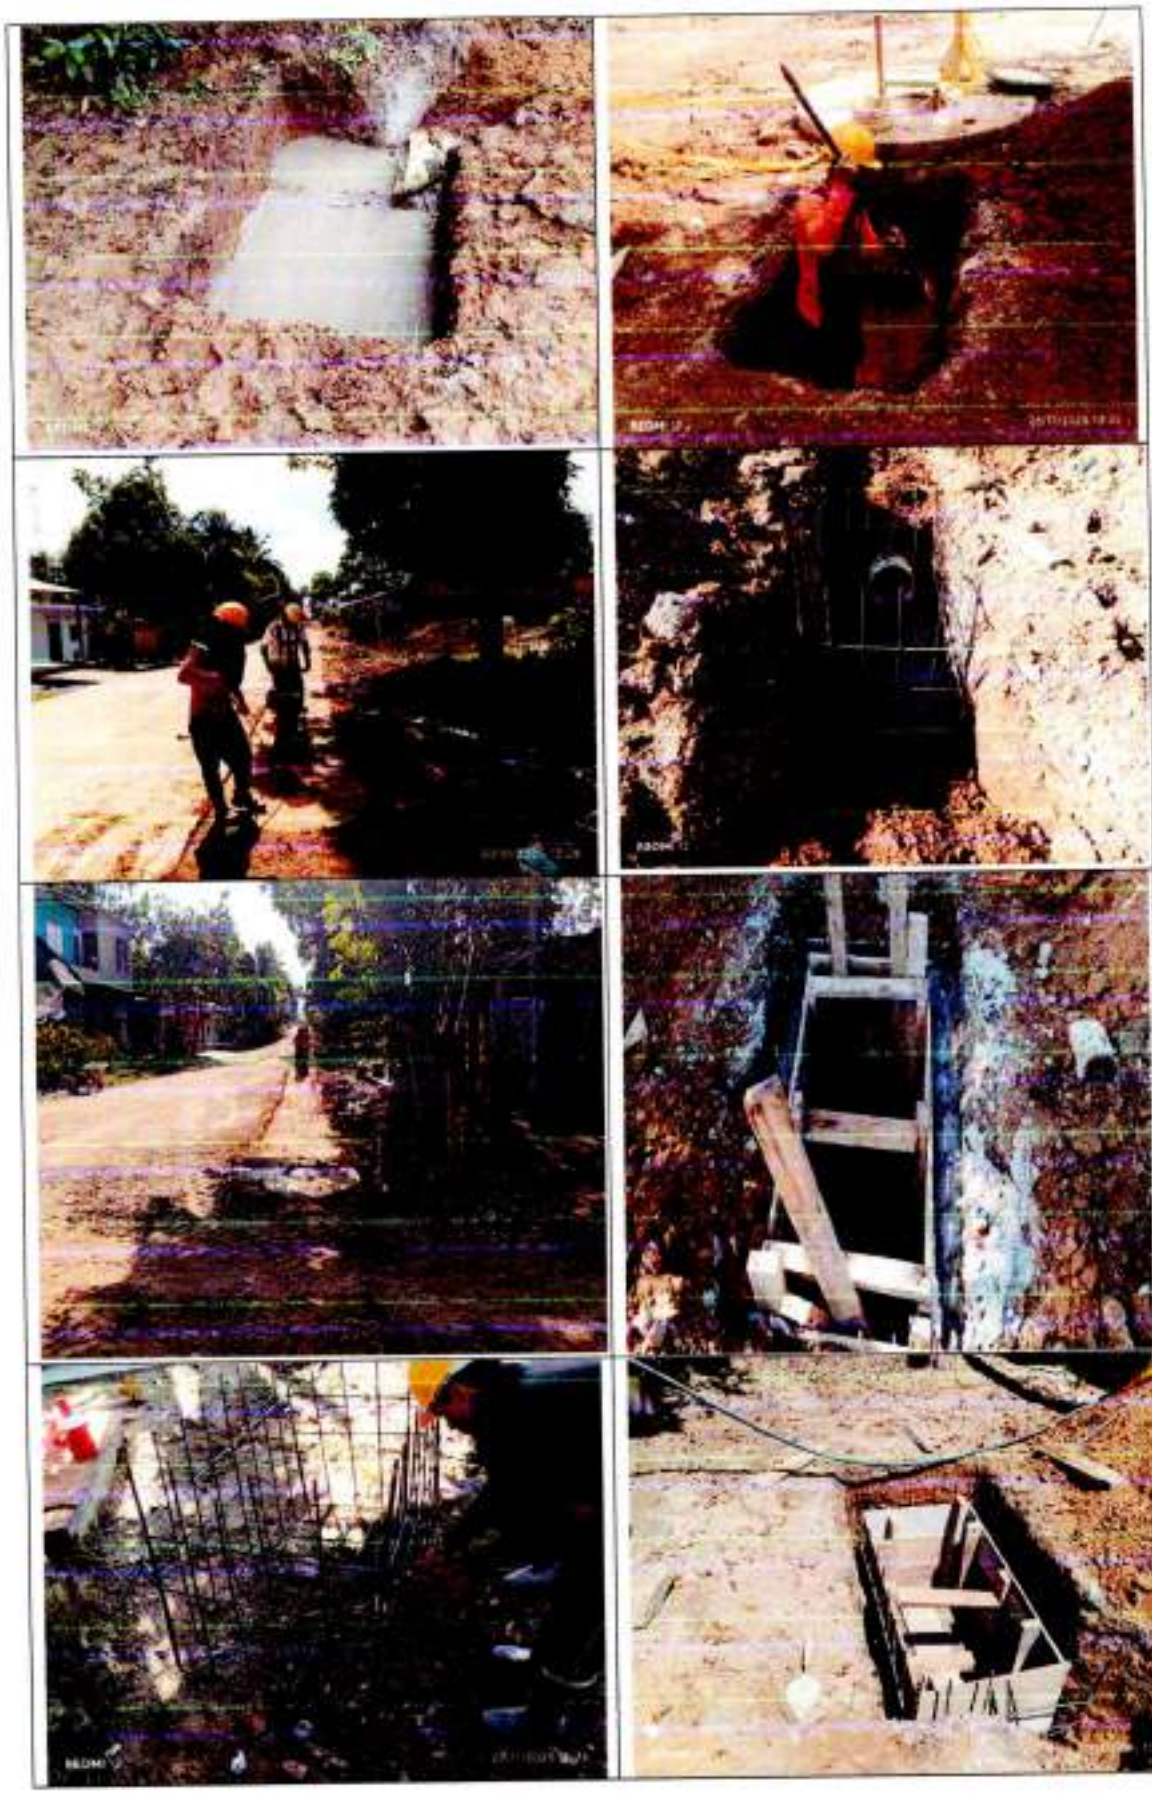



CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
NIT: 901.955.099-5

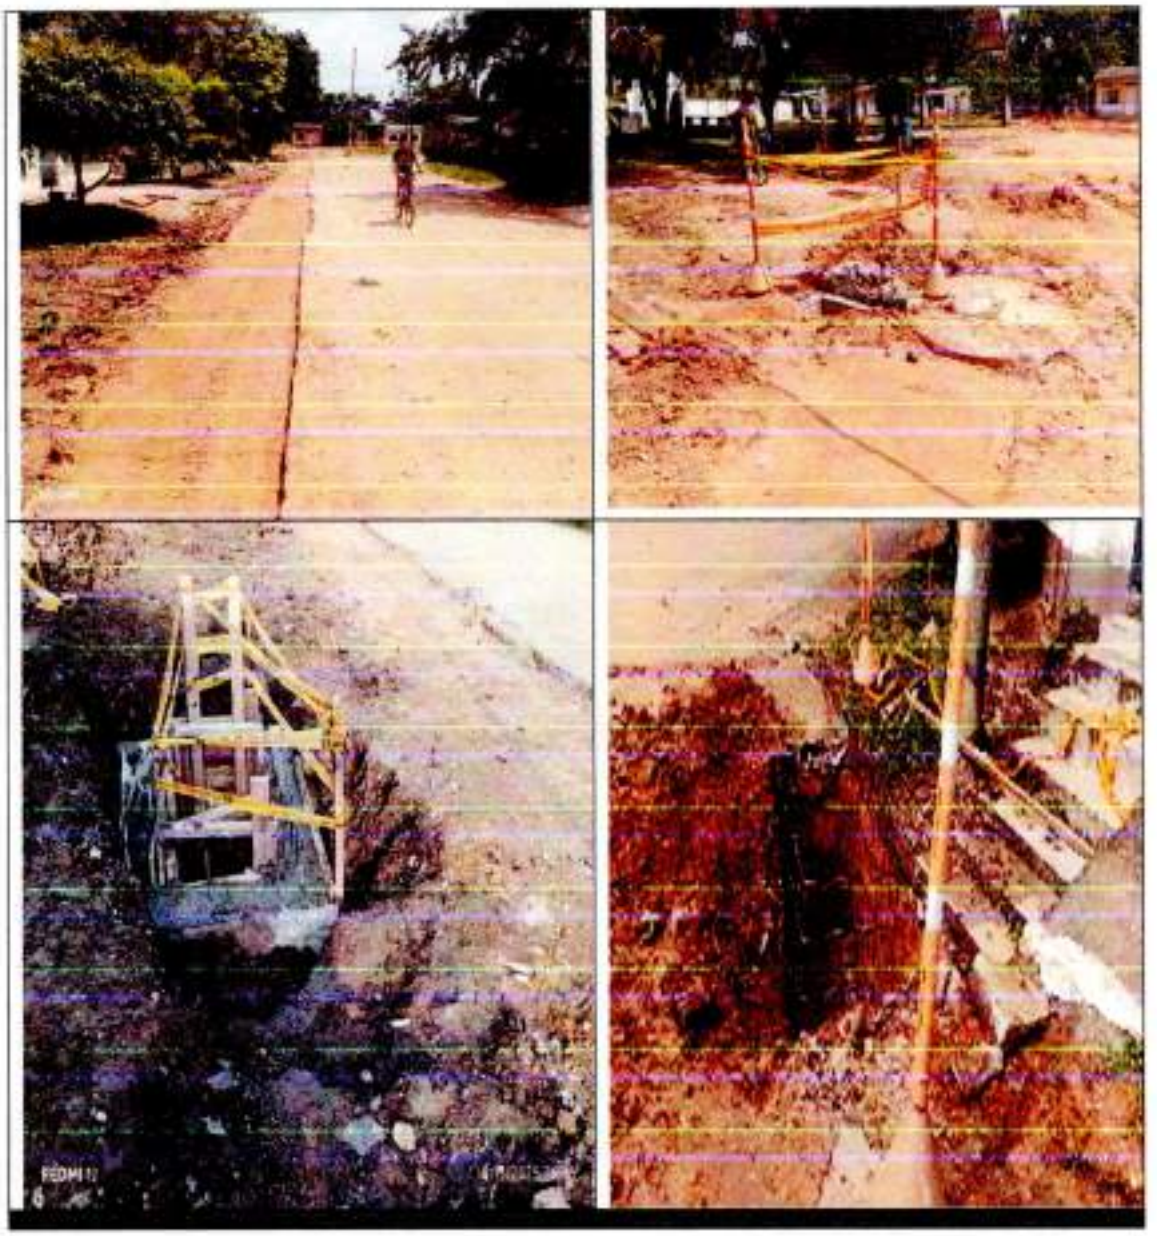

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
NIT: 901.955.099-5

ANEXO 16 – COPIA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA AMBIENTAL N.º 4

CR 14 # 13-40 – OFICINA 203 Barrio el centro - Tel: 3134629855 -
consorcioalcantarilladosananto@gmail.com

INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA AMBIENTAL N.º 4



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000620 DE 2025

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

CONTRATO DE OBRA N. COP-2025-002 (22 DE ABRIL DEL 2025)

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

OBJETO: "ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, UNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ."

PERIODO DE EJECUCION

22 DE NOVIEMBRE DE 2025 - 21 DE DICIEMBRE DE 2025

Contenido

INTRODUCCION 3

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 4

1. DESCRIPCION GENERAL 4
2. LOCALIZACION 4
3. ALCANCE 5
4. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA 6
5. COMPONENTES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA 7

FICHAS AMBIENTALES DEL PROYECTO 7

El contratista no presenta informe de cumplimiento ambiental, la interventoría realiza una estimación de cumplimiento con las acciones realizadas en el presente periodo 7

Evaluación del cumplimiento ambiental 7

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 8

INTRODUCCION

El departamental del Caquetá se proyecta como un territorio armónico y equilibrado, conformado por un espacio urbano y otro rural, integrados funcionalmente en lo económico, social y cultural. Tal integración se logra gracias a la consolidación de un sistema de ordenamiento que brinde las condiciones necesarias para mantener estructural y funcionalmente la diversidad ecológica, social y cultural que caracteriza el territorio distrital. De tal manera, este sistema de ordenamiento se refleja en varios de los sistemas consagrados en el esquemas y ordenamiento territoriales como son el Sistema de saneamiento ambiental a construir.

En cumplimiento de los principios ambientales y los requerimientos de seguridad y salud ocupacional consagrados en las normas vigentes, así como los Objetivos Ambientales,

fijados en los planes de manejo Ambiental del departamento, y teniendo en cuenta las exigencias del sistema general de riesgos profesionales, resulta fundamental e indispensable

para el Plan Departamental de aguas incorporar la variable SISOMA (Seguridad Integral, Salud Ocupacional y Medio Ambiente) en el desarrollo de sus funciones, de tal forma que se garantice la prevención, mitigación, compensación y control de los impactos ambientales y de los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores generados durante la ejecución y mantenimiento de sus obras.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

1. DESCRIPCION GENERAL

Con el siguiente proyecto se proyecta construir sistema de alcantarillado pluvial que tendrá los siguientes componentes

La estructura del proyecto del proyecto es construir un alcantarillado pluvial en la inspección de San Antonio de Getucha

- PRELIMINARES
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
- POZOS DE INSPECCION
- CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROSY CABEZA DE SALIDA
- ASEO GENERAL

2. LOCALIZACION


El lugar de ejecución del contrato de obra se ubica en la inspección de San Antonio de Getucha, Caquetá, en las coordenadas de ubicación 1°06´33.55" N – Longitud -75°24´03.96" O, con una altura 283, sobre la vía central de la inspección.



Ilustración 1- GOOGLEAERTH.COM

3. ALCANCE

El proyecto tiene como alcance la construcción de una línea de alcantarillado pluvial de 415.77 ml, con 9 pozos de inspección, con un cabezal de descarga y 11 sumideros.

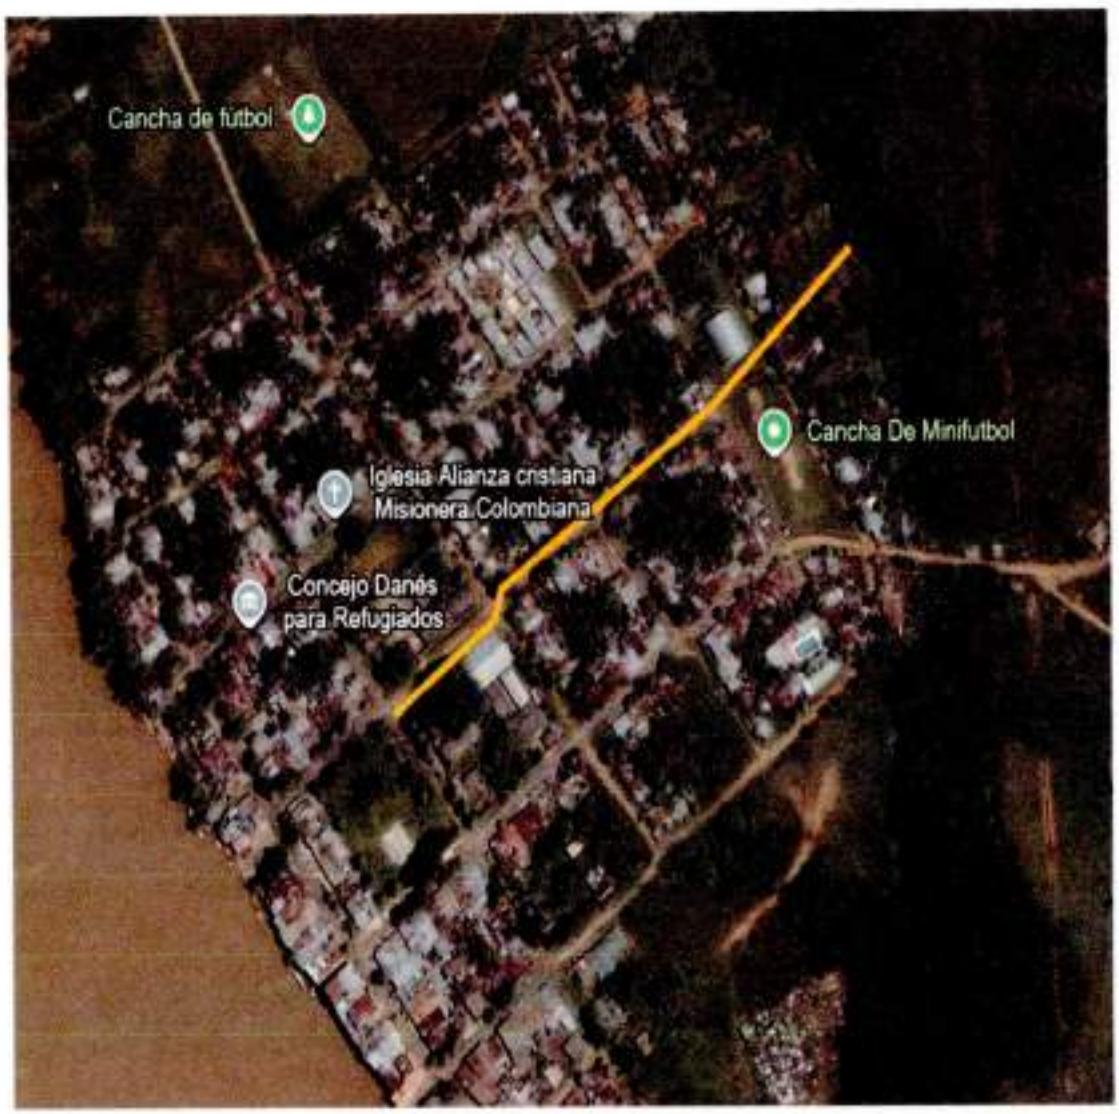

4. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACIÓN BÁSICA

Unidad Ejecutora:	MUNICIPIO DE MILAN CAQUETA
Número del contrato:	**CONTRATO DE OBRA N.** COP- 2025-002
Objeto:	ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, UNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
Nombre del contratista:	CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
Fecha del contrato:	22 DE ABRIL DEL 2025
Plazo de Ejecución Inicial:	5 MESES
Valor Inicial:	OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES CHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($860.836.959) M/CTE
Valor Anticipado:	NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($988.082.242,00) M/CTE, equivalentes a 694,7 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2025
Fecha de iniciación:	22 DE AGOSTO DE 2025
Fecha de Terminación Contractual inicial:	21 DE ENERO DE 2025

5. COMPONENTES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

FICHAS AMBIENTALES DEL PROYECTO

N.	*Ficha Ambiental*	*Nombre del programa/ ficha ambiental*
1	FICHA N. 1	AFECTACION DEL PROYECTO SOBRE EL AREA DE INFLIUENCIA
2	FICHA N. 2	MANEJO DE CAMPAMENTOS INSTALACIONES Y TEMPORALES
3	FICHA N. 3	MANEJO DEL RECURSO SUELO
4	FICHA N. 4	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS Y SOBRANTES DE OBRA
5	FICHA N. 5	MANEJO COMPONENTE ATMOSFERICO
6	FICHA N. 6	*MANEJO DE FLORA Y FAUNA*
7	FICHA N. 7	*PROGRAMA COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA*

El contratista no presenta informe de cumplimiento ambiental, la interventoría realiza una estimación de cumplimiento con las acciones realizadas en el presente periodo

Evaluación del cumplimiento ambiental

N.	*Ficha Ambiental*	*Nombre del programa/ ficha ambiental*	% de cumplimiento
1	FICHA N. 1	AFECTACION DEL PROYECTO SOBRE EL AREA DE INFLIUENCIA	71%
2	FICHA N. 2	MANEJO DE CAMPAMENTOS INSTALACIONES Y TEMPORALES	85%
3	FICHA N. 3	MANEJO DEL RECURSO SUELO	50%
4	FICHA N. 4	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS Y SOBRANTES DE OBRA	88%

5	FICHA N. 5	MANEJO COMPONENTE ATMOSFERICO	75%
6	FICHA N. 6	MANEJO DE FLORA Y FAUNA	50%
7	FICHA N. 7	PROGRAMA COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	85%



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

- El contratista de obra alcanzo una calificación en su gestión ambiental de 72%, existen actividades para corregir, pero en términos generales la intervención de las obras realizadas en el relleno sanitario ha mejorado las condiciones ambientales del entorno.

- La interventoría recomienda al contratista realice de ejecución de la totalidad de los programas durante la ejecución de la obra, esto se debe realizar a partir del segundo mes de ejecución.

- El contratista no entrega informe de cumplimiento ambiental, se debe realizar énfasis en la entrega del informe pendiente.

- Existen área como el predio final entre el tramo p8 a descole o cabezote que fue impactada por el contratista de obra y no se han realizado actividades de recuperación de las pastos afectado, la interventoría solicita tomar medidas de recuperación en esta área afectada

DAIRA LUCIA VALENZUELA PASTRANA
Asesor Ambiental

ANEXO 17 – CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

215

GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ

CAQUETÁ

3908

Florencia, 25 NOV 2025

Ingeniero
CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
Representante Legal
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
consorcioalcantarilladosananto@gmail.com
Florencia – Caquetá

Asunto: Observaciones cuenta de cobro 1 del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.° COP-2025-002

Cordial saludo.
En mi calidad de supervisora del Contrato de Interventoría N.°202500000620 y en ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011, de manera atenta me permito solicitar información sobre la entrega del Plan de Calidad especifico para el proyecto denominado "ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ." me permito presentar las siguientes observaciones identificadas en la Cuenta de Cobro N.° 1 y solicitar información y subsanaciones necesarias.

DOCUMENTACION GENERAL- CONTRACTUAL

- Hace falta la aprobación de los Anexos N.° 3 correspondientes a la Póliza de Cumplimiento 11-44-101253742, dado que esta es la última póliza presentada conforme al Otrosí Modificatorio N.° 1.

DOCUMENTACION REVISION TECNICA

- No se presenta Certificación de cumplimiento por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE, donde se especifica que REVISO Y APROBÓ el informe técnico de obra
  NOTA: En dicho certificado se debe encontrar firmado en original por el supervisor, debe de especificar: 1. N° y objeto del contrato 2. el periodo que es aprobado 3. Tipo de pago (Parcial o Final)
- No se presenta Certificación de calidad de obra por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE, donde se especifica que las obras realizadas han sido RECIBIDAS SATISFACTORIAMENTE Y APROBADAS
  NOTA: En dicho certificado se debe encontrar firmado en original por el supervisor, debe de especificar: 1. N° y objeto del contrato 2. el periodo que es aprobado 3. El valor básico ejecutado y el porcentaje equivalente respecto al valor básico del proyecto 4. Actividades ejecutadas conforme al presupuesto y relacionadas en la respectiva preacta y/o corte de obra.
- Conforme al Acta Parcial de Obra, durante la última visita técnica realizada el dia **7 de noviembre**, se evidenciaron **variaciones en las medidas de los tramos de tubería** durante el recorrido. Se solicita **modificar y corregir** estas medidas en la documentación de soporte de la cuenta.

DOCUMENTACION REVISION AMBIENTAL

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto se encuentra alineado con los lineamientos establecidos por la normatividad ambiental vigente, y sus fichas de manejo ambiental son coherentes con el objeto, alcance y naturaleza de las actividades previstas en la obra.

GOBERNACIÓN DE
CAQUETÁ

CAQUETÁ

En concordancia con la revisión de los informes de acompañamiento ambiental, correspondientes al periodo del 22 de agosto al 21 de septiembre de 2025 (Informe No. 1) y del 22 de septiembre al 21 de octubre de 2025 (Informe No. 2), se verifica el cumplimiento de las fichas ambientales establecidas en el PMA, así como su adecuada ejecución conforme al cronograma de actividades definido.

Adicionalmente, durante la verificación del informe de Seguridad industrial y Salud Ocupacional SISO se identificó que dos de las actividades reportadas se encuentran debidamente contempladas dentro del PMA: la Ficha #4 "Manejo de Residuos Sólidos Domésticos y Sobrantes de Obra" y la Ficha #2 "Manejo de Campamentos, Instalaciones y Áreas Temporales". Dado que estas actividades están siendo ejecutadas en el marco del acompañamiento ambiental, se recomienda reforzar su implementación desde un enfoque integral que integre tanto la gestión ambiental como los principios de seguridad y salud en el trabajo, asegurando así la prevención de riesgos laborales y la protección del entorno.

NIDIA CAROLIÑA TAMAYO BUITRAGO
Secretaria de Infraestructura- Gestora PDA
Gobernación de Caquetá

Copia: N/A
Anexos: N/A
Elaboró: Ana Sofia Santofimio Calderón/ Apoyo a la supervisión desde el componente técnico PDA Caquetá
Revisó: Lina marcela Ortiz guerrero / Apoyo Ambiental y Gestión de Riesgo Sectorial PDA Caquetá

Gmail **consorcio alcantarillado san antonio <consorcioalcantarilladosananto@gmail.com>**

Rad 3908- Observaciones cuenta de cobro 1 del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.° COP-2025-002

2 mensajes

PDA Caquetá <apoyogestor@pdacaqueta.gov.co> 25 de noviembre de 2025 a las 5:49 p.m.
Para: consorcioalcantarilladosananto@gmail.com

25/11/2025

Ingeniero
CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
Representante Legal
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
consorcioalcantarilladosananto@gmail.com
Florencia - Caquetá

En mi calidad de supervisora del Contrato de Interventoría No.202500000620 y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 84 de la Ley 147 4 de 2011, de manera atenta me permito solicitar información sobre la entrega del Plan de Calidad especifico para el proyecto denominado **"ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LACRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA."** me permito presentar las siguientes observaciones identificadas en la Cuenta de Cobro No.1 y solicitar información y subsanaciones necesarias, se adjunta requerimiento rad 3908.

Escribió: Blanca Flor Carvajal Becerra
Apoyo al Gestor PDA

Cordialmente,

Ing. NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
Secretaria de Infraestructura
Gestora PDA Caquetá
Carrera 13 Calle 15 Esquina - Piso 4
Teléfonos: (8) 435 8240 - 435 5320, 435 1488 Ext. 117, 118
Celular: 317 639 9095.
www.pdacaqueta.gov.co

Rad 3908 Carlos Dario Cano Sanchez.pdf
749K

consorcio alcantarillado san antonio <consorcioalcantarilladosananto@gmail.com> 27 de noviembre de 2025 a las 4:12 p.m.
Para: PDA Caquetá <apoyogestor@pdacaqueta.gov.co>

Florencia Caquetá 27 De noviembre de 2025

ASA-015

Señores

NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
Serestaria de infraestructura – Gestor PDA Caqueta
Florencia – Caquetá

REF: **CONTRATO DE OBRA- 0P-2025-002 DEL 22 DE ABRIL 2025**

216

Comedidamente me dirijo a usted en calidad de interventor del contrato cuyo objeto es "ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ". Con la intención de dar respuesta al oficio de la referencia, se informa que se realizaron las mediciones respectivas con el fin de corroborar las cantidades expresadas en el Acta Parcial No. 1.

De acuerdo con el avance de la obra, actualmente se está elaborando el plano récord del proyecto mediante levantamiento topográfico detallado. Con base en este insumo técnico se efectuarán los ajustes correspondientes al acta de cantidades, garantizando que la información consignada refleje de manera precisa las dimensiones y cantidades realmente ejecutadas en campo.

Cordialmente

[Texto citado oculto]

ASA -015.pdf
162K

219

Gmail **consorcio alcantarillado san antonio <consorcioalcantarilladosananto@gmail.com>**

Cierre Recepción de cuentas 2025

1 mensaje

PDA Caquetá <apoyogestor@pdacaqueta.gov.co> 21 de noviembre de 2025 a las 3:47 p.m.
Para: Apoyoygestionintegral <apoyoygestionintegral@gmail.com>, Consorcioacueductomorelia <consorcioacueductomorelia@gmail.com>, Consorcioalcantarilladosananto <consorcioalcantarilladosananto@gmail.com>, Consorcioceldaelcairosolano <consorcioceldaelcairosolano@gmail.com>, Consorciopluvialascartagena <consorciopluvialascartagena@gmail.com>, Consorciotanquealbania <consorciotanquealbania@gmail.com>, Interventoriaconsorciotanque <interventoriaconsorciotanque@gmail.com>, inter alcantarillado albania <interalcantarilladoalbania@gmail.com>, Interalcantarillados2025 <interalcantarillados2025@gmail.com>, Aquagssas <aquagssas@gmail.com>, Yace01 <yace01@gmail.com>, Constructorawalmarn <constructorawalmarn@gmail.com>, Alcaldia <alcaldia@cartagenadelchaira-caqueta.gov.co>, Gerencia <gerencia@esercu.com.co>, Gerencia <gerencia@servaf.com>, Alcaldia <alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co>, Contactenos <contactenos@puertorico-caqueta.gov.co>, Planeacion <planeacion@eldoncello-caqueta.gov.co>, Contactenos <contactenos@morelia-caqueta.gov.co>, "secretariaplaneacion @morelia-caqueta.gov.co" <secretariaplaneacion@morelia-caqueta.gov.co>, Planeacion <planeacion@albania-caqueta.gov.co>, Alcaldia <alcaldia@florencia-caqueta.gov.co>, Planeacion <planeacion@milan-caqueta.gov.co>
CC: NEISER CASTRO <NEISER.CASTRO@pdacaqueta.gov.co>, Sofia Santofimio <sofia.santofimio@pdacaqueta.gov.co>, Ana Nunez <ana.nunez@pdacaqueta.gov.co>, Jhonfrankyfacundotraslavina <jhonfrankyfacundotraslavina@gmail.com>

Cordial saludo;

Con el ánimo de que los contratistas de PDA y Municipio autorizados para ejecutar obras con recursos asociados al PDA CAQUETÁ, este enterados del cierre de operaciones del FIA, de manera atenta me permito remitir documento oficial del Consorcio Fiduciario, en donde se dan a conocer las fechas de cierre de los procesos operativos de la vigencia 2025.

Lo anterior con el fin de que, si requieren tramitar algún pago en la presente vigencia, tengan en cuenta que el equipo gestor sólo tramitará las cuentas que se recepcionen hasta el día 30 de noviembre de 2025, las cuales deben ser revisadas por nosotros para proceder al trámite de radicación ante el consorcio FIA (PAGADOR), cuya fecha límite es el 15 de diciembre de 2025.

Quien no radique antes, o en esta fecha (30 de noviembre de 2025), por favor recuerde que la cuenta no alcanzará a ser tramitada en la presente vigencia.

--
Cordialmente,

Digitó: Yudy Narley García Rojas
Coordinadora PDA CAQUETÁ

Ing. NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
Secretaria de Infraestructura
Gestora PDA Caquetá
Carrera 13 Calle 15 Esquina - Piso 4
Teléfonos: (8) 435 8240 - 435 5320, 435 1488 Ext. 117, 118
Celular: 317 639 9095.
www.pdacaqueta.gov.co

CIERRE OPERACION FIA VIGENCIA 2025.pdf
1091K

220

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
NIT: 901.955.099-5

Florencia Caquetá 19 diciembre de 2025

ASA-020

Señores

ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA
R.L. CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
Florencia – Caquetá

Recibido 19 Dic. 2025
5:00 p.m.

REF: **CONTRATO DE OBRA- 0P-2025-002 DEL 22 DE ABRIL 2025**

ASUNTO: solicitudes de obra.

Comedidamente me dirijo a usted en calidad de interventor del contrato cuyo objeto es "ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ". Con la intención de realizar las siguientes solicitudes:

- La interventoria solicita al contratista de obra señalizar las estructuras incompletas especificamente sumideros, los cuales carecen de regillas y generan un riesgo para la comunidad del area de influencia directa del proyecto, se realiza enfasis en este situacion para esta epoca de festividades, la interventoria solicita estar reacomodando las señalizaciones o mecanismo de aislamiento de estas estructuras por terminar.
- Estudiar la posibilidad de organizar la instalacion de sumideros en tres zonas en las cuales se deben instalar los sumideros, por observación y comportamiento de las aguas lluvias, pero existe el inconveniente de no poder construir estos sumideros con las especificaciones originales, especificamente en la profundidad requeridas, debido a que en estas zonas existen redes de servicios públicos antiguas, se debe plantear e informar las observaciones de construir sumideros en estos puntos menciones y los cueles se conocen por ustedes.
- La interventoría solicita que se entreguen los resultados de los ensayos de resistencia de concreto de los sumideros.
- La interventoría solicita la entrega del soporte de pago la SS del mes correspondiente a noviembre de 2025, el cual se encentra pendiente.

Agradezco su atención

Cordialmente

Carlos Dario Cano Sanchez
Representante Legal
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
NIT: 901.955.099-5

Florencia Caquetá 07 enero de 2026

ASA-021

Señores

ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA
R.L. CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
Florencia – Caquetá

Recibido Firma 7/1/2026 5:10 p.m.

REF: **CONTRATO DE OBRA- 0P-2025-002 DEL 22 DE ABRIL 2025**

ASUNTO: Observaciones de obra.

Comedidamente me dirijo a usted en calidad de interventor del contrato cuyo objeto es "ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ". Con la intención de poner en conocimiento las siguientes situaciones de obra:

Actualmente el contrato tiene una vigencia de 14 dias calendario, es decir hasta el 21 de enero de 2025, reflejando un avance de obra de 75% a corte del 4 mes, específicamente el 22 de diciembre de 2025, la interventoría solicita acelerar los ajustes pendientes de los sumideros construidos y la recuperación de los diferentes pavimentos afectados por la instalación de tubería instalada, debido que se tiene retraso de obra del 11%.

CUADRO DE EJECUCION VS PROGRAMACION SEGÚN ACTA DE MODIFICATORIA N1

SEMANA	PROGRAMADO SEMANAL	EJECUTADO SEMANAL	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULUADO	PORCENTAJE EJECUTADO	PORCENTAJE PROGRAMADO
SEMANA 1	$2.432.525,67	$1.398.946,33	$ 2.432.525,67	$1.398.946,33	0,18%	0,32%
SEMANA 2	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33	$ 4.865.051,33	$2.797.892,67	0,37%	0,64%
SEMANA 3	$ 2.432.525,67	$ 1.398.946,33	$ 7.297.577,00	$ 4.196.839,00	0,55%	0,95%
SEMANA 4	$ 51.167.237,90	$ 198.033.374,00	$ 58.464.814,90	$202.230.213,00	26,43%	7,64%
SEMANA 5	$51.167.237,90	$71.861.373,50	$ 109.632.052,79	$274.091.586,50	35,82%	14,33%
SEMANA 6	$58.508.557,90	$ 69.774.887,50	$ 168.140.610,69	$ 343.866.474,00	44,94%	21,97%
SEMANA 7	$58.508.557,90	$ 58.177.530,50	$ 226.649.168,58	$ 402.044.004,50	52,54%	29,62%
SEMANA 8	$ 18.865.814,40	$103.873.589,50	$ 245.514.982,98	$ 505.917.594,00	66,12%	32,09%
SEMANA 9	$ 33.638.801,15	$25.132.647,50	$ 279.153.784,13	$ 531.050.241,50	69,40%	36,48%
SEMANA 10	$ 25.018.101,49	$24.290.845,50	$ 304.171.885,62	$ 555.341.087,00	72,58%	39,75%
SEMANA 11	$ 33.638.801,15	$ 8.778.576,50	$ 337.810.686,77	$ 564.119.663,50	73,72%	44,15%
SEMANA 12	$ 82.467.836,99	$ 8.778.576,50	$ 420.278.523,76	$572.898.240,00	74,87%	54,92%
SEMANA 13	$ 06.348.747,78	$ -	$ 526.627.271,54	$572.898.240,00	74,87%	68,82%
SEMANA 14	$44.339.044,11		$ 570.966.315,65		0,00%	74,62%
SEMANA 15	$49.769.396,78		$ 620.735.712,43		0,00%	81,12%
SEMANA 16	$36.955.057,58		$ 657.690.770,01		0,00%	85,95%
SEMANA 17	$44.831.000,58		$702.521.770,59		0,00%	91,81%
SEMANA 18	$30.916.109,41		$733.437.880,00		0,00%	95,85%
SEMANA 19	$ 19.202.617,05		$752.640.497,05		0,00%	98,36%
SEMANA 20	$ 12.545.842,95		$765.186.340,00		0,00%	100,00%

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
NIT: 901.955.099-5

La interventoria solicita entregar una reprogramación de obra y entregar el balance de obra respectivo del cual se ha mencionado en el último comité de obra generado.

Actividades faltantes del contrato de obra

1,10	Suministro e instalación de sub_base granular tipo C, NT1
1,11	Suministro e instalación de base granular tipo C, NT1
1,12	Suministro e instalación de asfaltita natural, en áreas afectadas por la excavación

Agradezco su atencion

Cordialmente

Carlos Dario Cano Sánchez
Representante Legal
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

223

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
NIT: 901.955.099-5

Florencia Caquetá 04 diciembre de 2025

ASA-019

Señores

ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA
R.L. CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
Florencia – Caquetá

Recibido 7 DIC 2025
8:30 AM.

REF: **CONTRATO DE OBRA- 0P-2025-002 DEL 22 DE ABRIL 2025**

ASUNTO: Observaciones de obra.

Comedidamente me dirijo a usted en calidad de interventor del contrato cuyo objeto es "ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÀN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÀ". Con la intención solicitar se realice un sellado de las áreas en las que se rellenaron con base y subbase con mecanismos de compactación de rodillos metálicos, estáticos o vibratorios, de neumáticos o mixtos. Teniendo en cuenta que la tubería ya fue instalada hace mas de un mes y estas intervenciones no se encuentra pavimentadas, lo anterior se debe realizar para garantizar la calidad y la perdida del material instalado, estas deben ser re- compactadas en los próximos días después de recibir el presente oficio.

Agradezco su atención

Cordialmente

Carlos Darío Cano Sánchez
Representante Legal
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
NIT: 901.955.099-5

Florencia Caquetá 04 diciembre de 2025

ASA-018

Señores

ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA
R.L. CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
Florencia – Caquetá

Pablo D. 3:50 pm.

REF: **CONTRATO DE OBRA- 0P-2025-002 DEL 22 DE ABRIL 2025**

ASUNTO: Observaciones de obra.

Comedidamente me dirijo a usted en calidad de interventor del contrato cuyo objeto es "ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ". Con la intención solicitar se plantee un mejoramiento del suelo de la estructura de salida, dentro del diseño en planos se plantea un enrocado como soporte del suelo, este no se encuentra contemplado dentro de las cantidades del APU, debido a esta situación debemos diseñar y calcular cantidades de obra y realizar un mejoramiento en el suelo de salida.

Agradezco su atención

Cordialmente

Carlos Darío Cano Sánchez
Representante Legal
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

225

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
NIT: 901.955.099-5

Florencia Caquetá 28 noviembre de 2025

ASA-017

Recibido 29/11/2025 10:15 AM.

Señores

ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA
R.L. CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
Florencia – Caquetá

REF: **CONTRATO DE OBRA- 0P-2025-002 DEL 22 DE ABRIL 2025**

ASUNTO: Observaciones de obra.

Comedidamente me dirijo a usted en calidad de interventor del contrato cuyo objeto es "ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ". Con la intención solicitar la siguiente documentación e informes de obra:

- Soporte de pago de la seguridad social del personal de obra y de los profesionales a cargo del proyecto.
- Informe mensual de obra
- Informe mensual de cumplimiento social
- Informe mensual SST
- Informe de cumplimiento ambiental.
- Soportes de resistencia del concreto de sumideros

Agradezco su atención

Cordialmente

Carlos Darío Cano Sánchez
Representante Legal
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

226

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
NIT: 901.955.099-5

Florencia Caquetá 28 noviembre de 2025

ASA-016

Señores

ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA
R.L. CONSORCIO SAN ANTONIO 2025
Florencia – Caquetá

Recibo 28 Nov 2025 3:30 pm.

REF: **CONTRATO DE OBRA- 0P-2025-002 DEL 22 DE ABRIL 2025**

ASUNTO: Observaciones de obra.

Comedidamente me dirijo a usted en calidad de interventor del contrato cuyo objeto es "ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ". Con la intención de poner en conocimiento las siguientes situaciones de obra:

Cordialmente me dirijo a uste con la intensión de solicitar la reparación de los pavimemntos afectados con la construcción del sistema de alcantarillado pluvial, se recomienda tener en cuenta los siguientes tramos:

Localización	Dimensiones			Medida Total
	Longitud	Ancho	Perfil	
PZ1-PZ1´	57,75			
PZ2-PZ3	11	1,00		11,00
PZ3-PZ4	35,43	1,60		56,69
PZ4-PZ5	59,2	1,60		94,72
PZ5-PZ6	42,97	1,60		68,75
PZ6-PZ7	57	1,60		91,20
PZ1´-PZ2	18,2			
	SUMIDEROS			
SUMIDERO 1	12,6	0,80		10,08
SUMIDERO 4	7,89	0,70		5,52
SUMIDERO 5	3,26	0,70		2,28
SUMIDERO 6	10,15	0,80		8,12
SUMIDERO 7	6,54	0,70		4,58
SUMIDERO 9	8,52	0,70		5,96
SUMIDERO 10	7,14	0,70		5,00
SUMIDERO 12	5,66	0,70		3,96

Adicionalmente se solicita reparar los diámetros de la carpeta asfáltica que fue afectadas con las excavaciones de los pozos.

Agradezco su atención

Cordialmente

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
NIT: 901.955.099-5



Carlos Dario Cano Sánchez
Representante Legal
CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025

CONSORCIO ALCANTARILLADO SAN ANTONIO 2025
NIT: 901.955.099-5

ANEXO 18 – INFORME SOCIAL

INFORME PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL N°04

CONTRATO N° COP-2025-002

"ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"

CONTRATISTA
CONSORCIO SAN ANTONIO 2025

Milán, Caquetá. 21 de diciembre de 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 4
2. JUSTIFICACION 5
3. ALCANCE 6
4. OBJETIVO GENERAL 6
4.1 Objetivos específicos 6
5. DIAGNOSTICO DE ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL CONTRATO 7
5.1 Localización del contrato 7
5.2 ÁREA DE INFLUENCIA 8
5.3 Población 8
5.4 Altitud y relieve 8
5.5 Suelo 8
5.6 Vías de comunicación 8
5.7 Hidrografía 8
5.8 Ubicación directa de proyecto 9
5.8 Ruido Ambiental 10
6. LINEA BASE DE DATOS 11
7. CENSOS DE INMUEBLES 11
7.1 Mapa de actores 11
8. RECORRIDO RUTA SALUDABLE INICIAL 12
8.1 Registro fotográfico 13
8.2 Auditorias Visibles y/o Rendición de Cuentas 14
8.3 Conformación de comité de obras 14
8.3 Conformación de veedurías ciudadanas 14
8.4 Articulación con los operadores 16
9. REUNIONES CON LA COMUNIDAD 16
9.1 Reunión inicial de obras 17
10. INTERFERENCIAS PRESENTADAS DURANTE LA OBRA 18
10.1 Accesibilidad a viviendas y establecimientos 18
10.2 Daños a edificaciones, mobiliarios y zonas verdes 18
10.3 Suspensiones de servicios públicos 18
10.4 Trabajos nocturnos 18
11. DISEÑOS DE INDICADORES DE GESTIÓN 18
12. ACTIVIDADES PARA REALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (FICHA TÉCNICA) 20
13. RECORRIDO POR LOS FRENTES DE OBRA 21
14. RUTA SALUDABLE 21
15. PUNTOS DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 22
16. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO DE LAS VEEDURIAS CIUDADANAS Y LAS RENDICIONES DE CUENTAS 23
17. PRESENTACION DE INFORMES 23

18. VALLA INFORMATIVA 23
19. CONTRATACIÓN DE LA MANO DE OBRA 24
20. PROFESIONAL SOCIAL 24
21. PAGO SSGG PROFESIONAL SOCIAL 24
22. ANEXOS 25

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Resultados del monitoreo de ruido. 10
Tabla 2. Información línea base de datos 11
Tabla 3. Mapa de actores municipio Milán 11
Tabla 4. Comités de obra 14
Tabla 5. Identificación de veedores de la obra según Resolución No. 011 del 30 de Julio del 2025. 16
Tabla 6. Relación reuniones con la comunidad 17
Tabla 7. Indicadores de gestión 18
Tabla 8. Actividades para realizar (ficha técnica). 20
Tabla 9. Relación mano de obra calificada y no calificada 24

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ubicación de San Antonio de Getucha en Colombia. 7
Ilustración 2. Ubicación del lugar donde se desarrollará el contrato en el mapa 7
Ilustración 3. Ubicación directa de proyecto 9
lustración 4. Grafica resultado del monitoreo de ruido. 10
Ilustración 5. Socialización contexto de contratos 13
Ilustración 6. Capacitación ambiental y SST. 13
Ilustración 7. Visitas a la comunidad. 13
Ilustración 8. Reunión de socialización del CONTRATO No. COP – 2025 – 002 15
Ilustración 9. Resolucion Comité de Veeduria 15
Ilustración 10. Articulacion operarios 16
Ilustración 11. Reuniones con la comunidad 17
Ilustración 12. Recorrido frentes de obra. 21
Ilustración 13. Ruta saludable 22
Ilustración 14. Buzon de sugerencias. 22
Ilustración 15. Valla informativa del contrato 23

1. INTRODUCCION

En el marco del contrato de Obra Civil N° COP-2025-002, cuyo objeto es la "**ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA**". Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en contrato en mención, se reconoce el tramo a intervenir como necesidad de realizar la adecuación y canalización de aguas lluvias para mejorar las condiciones de vida de la comunidad.

Teniendo en cuenta el objetivo general del contrato, el cual es mejorar la distribución de los servicios públicos de alcantarillado, se cumple con el plan de acción en el área social. En el presente informe se evidencia la interrelación entre la Empresa CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 y la comunidad, se cumple con socialización y visitas domiciliaria a cada una de las viviendas identificadas dentro del objeto de contrato, mediante un contexto de creación participativa, de acuerdo a las actividades, materiales y el tiempo que se estimara para la ejecución de la obra, facilitando una apropiación comunitaria, ya que se le proporcionó información clara y detallada a los participantes, esto con el fin de minimizar los impactos negativos generados durante la obra y en consecuencia se fortaleció los indicadores positivos, como es la mejora de las condiciones de desplazamiento, circulación vehicular y peatonal de la comunidad que reside y transita por el sector a intervenir.

2. JUSTIFICACION

El plan de acompañamiento social del contrato **"ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"**. Requiere la intervención del profesional social quien hace de mediador entre la comunidad beneficiada y el ejecutor CONSORCIO SAN ANTONIO 2025, fundamentada en la necesidad imperante de comprender y abordar las actividades de carácter social en cuanto al desarrollo de la obra, propendiendo por el buen desarrollo y comunicación entre las partes. La justificación para la realización de este informe se fundamenta en los siguientes puntos:

1. **Relevancia y Pertinencia del Tema**: El informe social, es de vital importancia en el contexto actual, ya que ayuda a comprender y escuchar de una forma amplia a la población que se ven inmersos de una manera directa e indirecta en el desarrollo de la obra.
2. **Impacto en la Comunidad o Grupo Afectado**: La adecuación y canalización de aguas lluvias afecta de una manera temporal a los propietarios/arrendatarios de las viviendas que colindan con el mismo, es por ello, que es crucial comprender las dinámicas sociales y los desafíos específicos que enfrentan, a fin de diseñar intervenciones y poder brindar una atención efectiva.
3. **Necesidad de Datos y Análisis Fundamentados**: La elaboración de este informe se justifica por la necesidad de contar con datos concretos y análisis que respalden la toma de decisiones informadas. Esto permitirá identificar tendencias, patrones y desafíos que de otro modo podrían pasar desapercibidos.
4. **Promoción del Bienestar y la Equidad Social**: Abordar los temas especificados para el informe social, contribuirá directamente a la promoción del bienestar y la equidad social. Al comprender y atender las necesidades de manera adecuada, se busca mejorar la calidad de vida, condiciones de desplazamiento y las oportunidades para todos los involucrados.
5. **Cumplimiento de Responsabilidades y Obligaciones**: La realización de este informe se alinea con las responsabilidades y obligaciones de CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 en el ámbito social. Esto demuestra un compromiso tangible con el mejoramiento de las condiciones sociales en la comunidad que se encuentra alrededor del contrato.
6. **Influencia en la Toma de Decisiones**: La información proporcionada será esencial para la toma de decisiones informadas y efectivas a los requerimientos de las comunidades asociadas con el desarrollo de la obra; identificando sus necesidades reales en torno al mismo y generando alternativas de solución.

En resumen, la realización de este informe social es esencial para abordar temas relacionados con el mismo, de manera integral y efectiva. La información recopilada y los análisis realizados contribuirán significativamente a la promoción del bienestar y la equidad social con la comunidad del tramo identificado y a la vez con la comunidad general del casco urbano de la Inspección de San Antonio De Getucha, en el municipio de Milán, departamento del Caquetá.

El presente informe se presenta como una herramienta valiosa para la toma de decisiones informadas y la implementación de acciones que generen un impacto positivo y sostenible en el ámbito social. Por ello se hace necesaria la intervención a cada vivienda que se encuentran en circunferencia de la zona de influencia, para prever posibles daños o situaciones que pueda ocasionar el personal, el equipo o maquinaria que se utilizará en la adecuación y canalización de aguas lluvias. Se obtiene información por parte de sus propietarios/arrendatarios de las cuarenta y un (41) viviendas ubicadas en la calle 4, entre carrera 2 a la carrera 6, del casco urbano de la Inspección de San Antonio De Getucha, en el municipio de Milán, departamento del Caquetá.

3. ALCANCE

Con el siguiente proyecto se planea realizar una adecuación y canalización de aguas lluvias que se realizaran de la siguiente manera:

- Preliminares (Localización y replanteo de redes – Cerramiento provisional – excavación manual y mecánica entre otras)
- Suministro e instalación de tubería
- Pozos de inspección
- Construcción de sumideros y cabeza de salida
- Aseo general

4. OBJETIVO GENERAL

Proporcionar información clara, concisa y veraz a la población del área de influencia y comunidad en general, acerca de las actividades técnicas, operativas y demás actividades implícitas dentro del plan de acompañamiento social en obra que tiene por objeto: **"ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CRA 2 A LA CRA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"** mediante mecanismos de comunicación directa, facilitando el proceso de ejecución del contrato.

4.1 Objetivos específicos

- Recolectar información en formatos de vecindad a las viviendas que se encuentran en circunferencia de la zona de influencia del contrato, con el fin de prever posibles daños que pueda ocasionar con el personal, el equipo o maquinaria que se utilizará en la reposición de las redes de alcantarillado.
- Generar espacios de interlocución y participación con las comunidades, dirigiendo los medios que permitan el acceso a la información, sensibilizando a los colaboradores y comunidad en la participación y al control social de la inversión pública y al buen uso de la obra civil.

- Formular recomendaciones claras y específicas, basadas en los hallazgos y análisis realizados, que orienten la toma de decisiones y la implementación de acciones concretas para abordar los aspectos sociales y así brindar respuestas oportunas a la comunidad y resolver las inquietudes de estas con el fin de brindar un ambiente ameno y seguro durante el desarrollo del mejoramiento.

5. DIAGNOSTICO DE ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL CONTRATO

5.1 Localización del contrato

El lugar donde se desarrollará el contrato se encuentra localizado en la calle 4, entre carrera 2 a la carrera 6, del casco urbano de la Inspección de San Antonio De Getucha, en el municipio de Milán, departamento del Caquetá.



Ilustración 1. Ubicación de San Antonio de Getucha en Colombia.



Ilustración 2. *Ubicación del lugar donde se desarrollará el contrato en el mapa*

5.2 Área de Influencia

El lugar de ejecución del contrato es en la inspección de San Antonio de Getucha, ubicado al sur del casco urbano del municipio de Milán en el departamento del Caquetá con las siguientes coordenadas geográficas:
Latitud: **1°17'21"N**
Longitud: **75°30'23"O**

5.3 Población

San Antonio de Getucha, ubicado en el municipio de Milán del departamento del Caquetá, es un municipio que presenta una población de acuerdo a las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el año 2024 con una población aproximada de 10.339 habitantes.

5.4 Altitud y relieve

El Municipio de Milán - Caquetá, se encuentra a una altitud aproximada de 460 metros sobre el nivel del mar (msnm) y su relieve se caracteriza por la transición entre la zona de piedemonte y la llanura amazónica.

5.5 Suelo

Los suelos de esta población son áreas de **"Tierra Firme" (lomerío)** y las formas aluviales. Los suelos de lomerio son **pobres en nutrientes, muy ácidos con poca materia orgánica,** mientras que los de las **vegas de ríos andinos (como el Orteguaza) son más fértiles** debido al arrastre de sedimentos ricos en nutrientes desde la cordillera. La fertilidad de los suelos amazónicos está intrínsecamente ligada al ciclo cerrado de nutrientes del bosque

5.6 Vías de comunicación

VIA TERRESTRE: Existe una carretera principal destapada que comunica a Milán con el municipio de La Montañita, que es el único acceso terrestre al municipio.
VIA FLUVIAL: El rio Orteguaza sirve como una ruta de transporte fluvial vital para el municipio.

5.7 Hidrografía

La hidrografía del municipio de Milán, Caquetá, está definida principalmente por el **río Orteguaza**, que es su principal vía de comunicación fluvial. Este río y sus afluentes son fundamentales para el transporte de personas y mercancías.

Principales cuerpos de agua

- **Río Orteguaza**: Es el eje fluvial del municipio, utilizado para el transporte de remesas, combustible, productos agrícolas y más. El Orteguaza es un afluente del río Caquetá.
- **Río Bodoquero y río Pescado**: Estos ríos son importantes afluentes del Orteguaza que también atraviesan el municipio.
- **Quebradas**: Además de los ríos principales, la red hidrográfica de Milán incluye varias quebradas, como las de Platanillo y Getucha.

5.8 Ubicación directa de proyecto

El proyecto se encuentra ubicado en calle 4 entre la carrera 2 a la carrera 6, del caso urbano de la inspección San Antonio de Getucha del municipio de Milán, departamento del Caquetá, en la región de la Amazonia colombiana.

Ubicación y geografía:

- Se encuentra en la parte sur de Colombia.
- Predominan los terrenos semi-ondulados y llanuras de inundación.
- Su principal fuente hídrica es el río Orteguaza.

Distancia desde Florencia:

- Se ubica a aproximadamente 1 hora y 20 minutos de distancia a la ciudad de Florencia la capital del departamento del Caquetá.

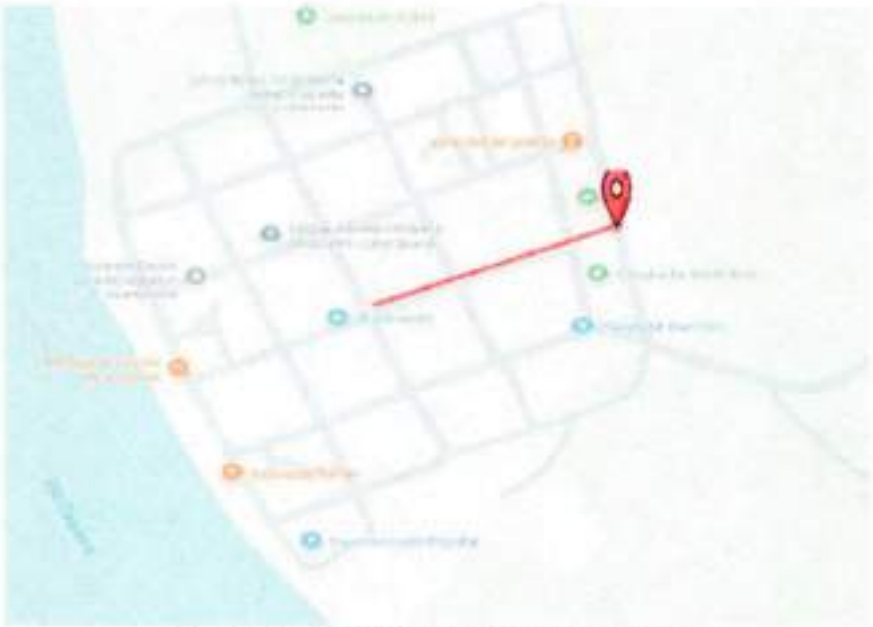


Ilustración 3. Ubicación directa de proyecto


5.8 Ruido Ambiental

Dentro de los horarios de trabajos se realizan mediciones de ruido y en ningún caso se ha superado los 100 decibelios (dB), se llevan registros de seguimiento de ruido ocasionalmente cuando se presentan jornadas de trabajo continuo o se percibe niveles de ruido alto.
Durante el cuarto corte de obra comprendido del 22 de noviembre al 21 de diciembre se han realizado cuatro monitoreos de ruido de manera sorpresiva y aleatoria los siguientes días y con resultados dentro del rango de los 100 (dB).
Evidencia de medición de niveles de ruido:

Tabla 1. Resultados del monitoreo de ruido.

FECHA	HORA	PROM dB	MAX Db	MIN dB
22 de noviembre de 2025	8:00:00 a m.	66	98	61
26 de noviembre de 2025	10:00:00 a m.	64	99	62
29 de noviembre de 2025	1:00:00 p m.	69	96	61
01 de diciembre de 2025	3:00:00 p m.	68	98	62

Fuente. Elaboración propia

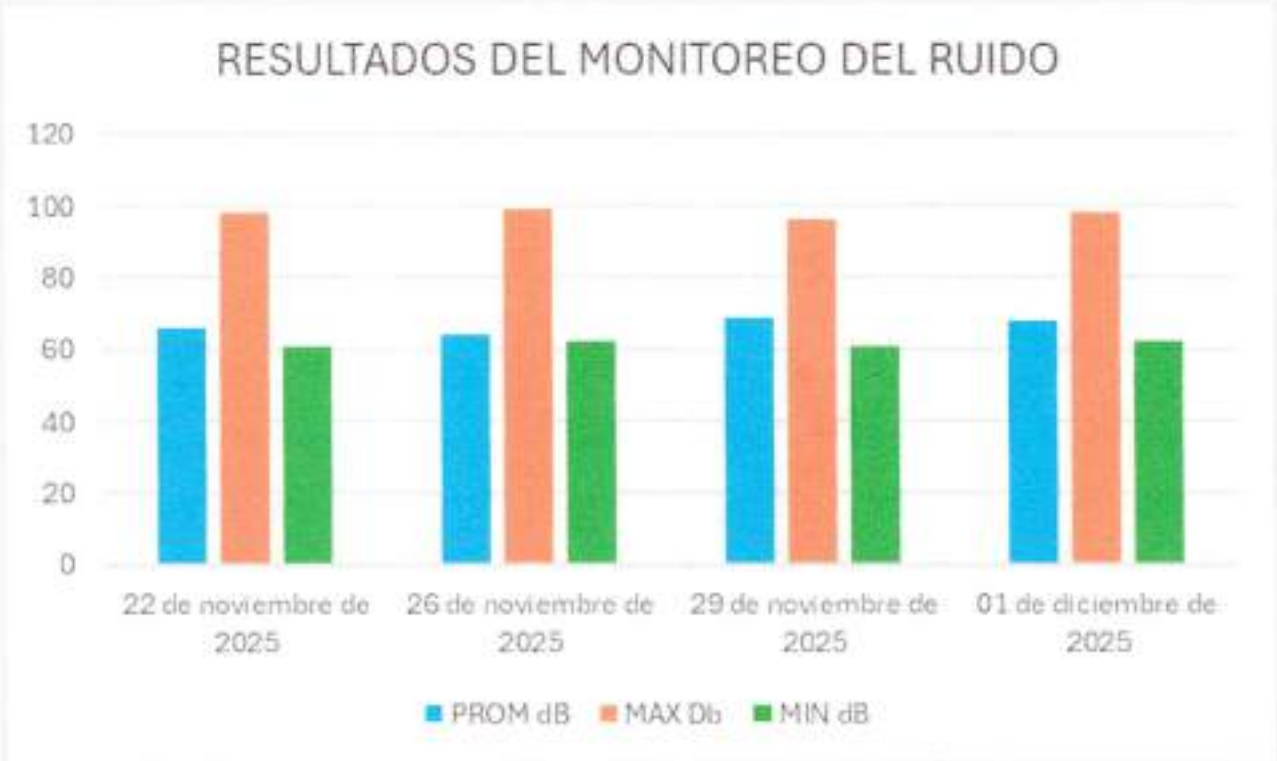

lustración 4. Grafica resultado del monitoreo de ruido.

6. LINEA BASE DE DATOS

Tabla 2. Información linea base de datos

ENTIDAD	UBICACION	TELEFONO
ALCALDIA MUNICIPAL	Cra 6 N° 7-12 Centro	3103191755
CONTRATISTA – CONSORCIO SAN ANTONIO 2025	Calle 14 N° 12-15 piso 3 oficina 305 edif Bancolombia - Centro	3223102758
INTERVENTORIA- CONSORCIO ALCANTARILLA SAN ANTONIO 2025	Calle 14 N° 13-40 Barrio Centro	3134629855
SUPERVISOR – PDA CAQUETA	Calle 14 N° 13-40 Barrio Centro	3134629855
POLICIA NACIONAL	Barrio Pueblo nuevo	3112569123
CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE GETUCHA	Calle principal	3132073088

Fuente. Elaboración propia

7. CENSOS DE INMUEBLES

Durante el cuarto corte de obra comprendido del 22 de noviembre al 21 de diciembre no se realizó esta actividad, teniendo en cuenta que ya fue realizada el dia 4 de septiembre 2025, en donde se llevó a cabo el censo a las viviendas que se encuentran implicadas en la adecuación y canalización de aguas lluvias y que posiblemente pueden resultar afectadas por los trabajos realizados con los equipos y maquinas necesarias en el desarrollo del contrato. Finalmente se procedió con el levantamiento de las actas de vecindad dando cumplimiento a la gestión social de la obra.

7.1 Mapa de actores

Con base a la necesidad de conocer la organización social del municipio, se hizo necesario realizar la relación de los actores más representativos del municipio que dinamizan el desarrollo municipal.

Se ha establecido una línea base con los siguientes grupos de interés que se pudo tener información a través de una recolección de información primaria y secundaria, como instrumento para tener una comunicación continua que mejoren los procesos de gestión de la comunidad beneficiada, sobre las condiciones en que se ejecuta la obra.

Tabla 3. Mapa de actores municipio Milán

ACTOR	DESCRIPCIÓN	REPRESENTANTES
ORGANIZACIONES SOCIALES	COMITÉ DE VEEDURIA, RESOLUCIÓN No. 011 DEL 30 JULIO DE 2025	AHUDELY BERMEO HERNANDEZ
		HERCILIA BARRERA TRIVIÑO
		ELIBERTO TRUJILLO TRUJILLO

ACTOR	DESCRIPCIÓN	REPRESENTANTES
ORGANISMOS DE CONTROL TERRITORIAL	ALCALDIA MUNICIPAL	VICTOR ANDRES VASCO QUIVANO
	PERSONERIA	EDGAR ANDRES GUTIERREZ DUSSAN
OTRO TIPO DE ACTORES	CONTRATISTA	ALDA MARTIZA DUSSAN ACOSTA
	INTERVENTORIA	CARLOS DARIO CANO SANCHEZ
	SUPERVISOR	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO

Fuente: Elaboración propia, basado en información primaria.

8. RECORRIDO RUTA SALUDABLE INICIAL

Durante el cuarto corte de obra comprendido del 22 de noviembre al 21 de diciembre no se realizó esta actividad, debido a que ya fue realizada durante el primer corte, el dia 4 de septiembre de 2025, en donde se realizó la socialización que permitió informar a la comunidad sobre las iniciativas que se llevarán a cabo, involucrando a los residentes en el proceso de toma de decisiones y generar un sentido de pertenencia hacia el objetivo del contrato, para lo cual se les oriento la siguiente información:

1. Objeto del contrato.
2. Número del contrato.
3. Responsable del contrato
4. Responsable de la ejecución
5. Beneficios a obtener.
6. Breve descripción del contrato.
7. Ubicación de las casas a intervenir.
8. Contratación de mano de obra.
9. Materiales, equipos y maquinas requeridos en la obra.
10. Tiempo estipulado para la ejecución.

Estas acciones fomentan la participación de la comunidad, promueven la transparencia y evitan posibles conflictos. En esta socialización se compartió con la comunidad también datos relevantes del mismo, como lo es la firma contratista que será la encargada de ejecutar el contrato, la interventoria encargada y demás aspectos que resultan de importancia para el conocimiento de la comunidad y su participación.

8.1 Registro fotográfico



Ilustración 5. *Socialización contexto de contratos*

- **Capacitación ambiental y SST**



Ilustración 6. Capacitación ambiental y SST.

- **Visitas de la comunidad**



Ilustración 7. Visitas a la comunidad.

8.2 Auditorias Visibles y/o Rendición de Cuentas

Esta actividad se realiza al finalizar la obra y su ejecución se presenta en el informe social final.

8.3 Conformación de comité de obras

Durante el presente corte no se realizaron comités de obra, sin embargo, en los cortes anteriores se realizaron reuniones de socialización con el equipo de trabajo que hacen parte del personal, sobre los compromisos a desarrollar con la comunidad y como se manejara la revisión del avance de la obra, con respecto a la seguridad y salud en el trabajo en lo compete la correcta ejecución de la obra. De igual forma, se llevó a cabo comité en donde se realizó la aprobación de los imprevistos.

Comités de obra

Tabla 4. *Comités de obra*

ITEM	FECHA	OBJETIVOS	COMPROMISOS
1	06/09/2025	COMITÉ DE OBRA PARA EL ANÁLISIS DEL TRAZADO ACTUALIZADO.	✓ Acta de concertación de precios. ✓ Acta del comité técnico donde se reflejan las modificaciones y demora en la elaboración del acta de modificación. ✓ Justificación técnica de obra para el acta modificatoria. ✓ Informe técnico de la interventoria que avale los cambios. ✓ APUs de los items no previstos. ✓ Acta modificatoria.
2	15/09/2025	MESA DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.	✓ Entregar Modelación hidráulica. ✓ Entregar Diseño estructural ✓ Entregar el Prebalance de obra según las nuevas modificaciones ✓ Entregar Ítem no previstos.

Fuente: Elaboración propia.

8.3 Conformación de veedurias ciudadanas

La Ley 850 se encarga de promover la conformación de las veedurías ciudadanas, señalando que para este caso el representante legal de la entidad privada encargado de la ejecución del ***CONTRATO N° COP-2025-002****, se encargó de dar a conocer el proyecto mediante la socialización, aspecto que promovió la asamblea para la constitución de la Veeduría ciudadana.*

En el comité de veeduría se apoyó en la recopilación de la información previo a los requisitos establecidos por la personería municipal para el reconocimiento e inscripción a la veeduría ciudadana.



Ilustración 8. Reunión de socialización del CONTRATO No. COP – 2025 – 002

Siendo así, se expidió la Resolución No. 011 DEL 30 JULIO DE 2025



Ilustración 9. Resolucion Comité de Veeduria

Tabla 5. Identificación de veedores de la obra según Resolución No. 011 del 30 de Julio del 2025.

NOMBRE	TIPO IDENTIFICACIÓN	No. IDENTIFICACIÓN
AHUDELY BERMEO HERNANDEZ	C.C.	17.648.306
HERCILIA BARRERA TRIVIÑO	C.C.	30.506.550
ELIBERTO TRUJILLO TRUJILLO	C.C.	83.087.391

Fuente: Elaboración propia.

A la fecha se encuentran desempeñando su cargo de manera activa, asistiendo a las actividades programadas por las partes involucradas.

8.4 Articulación con los operadores

Durante el presente corte, se continúa realizando las actividades de capacitación con los operadores que hacen parte de la obra encargados de la excavación mecánica que se lleva realizando.



Ilustración 10. Articulacion operarios

9. REUNIONES CON LA COMUNIDAD

Durante el periodo en evaluación se realizó un encuentro con la comunidad, el cual se originó a partir de una visita de supervisión a la obra. En esta reunión participaron delegados del contratista, la interventoria y el PDA. En el desarrollo del espacio de diálogo, los habitantes expresaron su conformidad con el progreso y la calidad de los trabajos ejecutados. Sin embargo, manifestaron su preocupación por las condiciones en que quedará la vía una vez finalicen las actividades de excavación y la instalación de la tuberia, dado que antes de la intervención esta se encontraba en óptimo estado. Ante esta inquietud, el ingeniero residente informó que dentro del alcance contractual se contempla la realización de los rellenos necesarios y la posterior aplicación de una capa de asfalto

natural en los sectores intervenidos, con el fin de asegurar que la vía quede en condiciones iguales o superiores a las que presentaba antes de la obra, garantizando así la tranquilidad de la comunidad.



Ilustración 11. Reuniones con la comunidad

9.1 Reunión inicial de obras

La reunión se llevó a cabo el 4 de septiembre de 2025, ocasión en la cual se socializó ante la comunidad la información general del contrato, incluyendo su objeto, responsables, beneficios, alcance, localización de las viviendas a intervenir, vinculación de mano de obra, materiales, equipos y plazo de ejecución. Durante este encuentro se constituyó la veeduría ciudadana, con el propósito de fomentar la participación comunitaria, la transparencia y el sentido de apropiación del proyecto. Asimismo, se presentaron los datos de la empresa contratista y de la interventoría responsable de la obra.

Tabla 6. Relación reuniones con la comunidad

N.	Fecha de la reunión	Asunto
1	04 de septiembre de 2025	Socialización del proyecto y conformación del comité de veeduría
2	21 de octubre de 2025	Inquietud respecto al estado final de la via
3	31 de octubre de 2025	Seguimiento de la obra
4	12 de noviembre de 2025	Seguimiento Social
5	22 de noviembre de 2025	Seguimiento de la obra
6	29 de noviembre de 2025	Seguimiento Social

Fuente: Elaboración propia.

10. INTERFERENCIAS PRESENTADAS DURANTE LA OBRA

En el periodo informado, no se presentaron interrupciones durante la realización de la obra.

10.1 Accesibilidad a viviendas y establecimientos

En el desarrollo de la obra dentro el presente periodo de ejecución de la obra no se requirió acceso ni a las viviendas ni a establecimientos

10.2 Daños a edificaciones, mobiliarios y zonas verdes

Dentro del presente periodo de ejecución de la obra no se presentaron daños en edificaciones, mobiliarios y zonas verdes.

10.3 Suspensiones de servicios públicos

Dentro del presente periodo de ejecución de la obra no se realizaron suspensiones del gas y de agua.

10.4 Trabajos nocturnos

Frente al punto en mención, para el periodo informado no se tuvo la necesidad de realizar trabajos nocturnos.

11. DISEÑOS DE INDICADORES DE GESTIÓN

Tabla 7. Indicadores de gestión

Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
I	OBRA			
1	1.0 PRELIMINARES			
1	1,01	Localización y replanteo de redes	M2	540.02
2	1,02	Cerramiento provisional lona verde (h=2,00m)	ML	847.92
3	1,03	Excavación manual en material común de 0.00 a 2.00 m	M3	120.71
4	1,04	Excavación manual en material común de 2.00 a 4.00 m	M3	8.35
5	1,05	Excavación mecánica en material común	M3	1166.50
6	1,06	Entibado en madera para proteger talud de excavación	M2	835.85
7	1,07	Cargue, transporte y retiro de material sobrante	M3	322..28
8	1,08	Relleno, Cimentación tuberia con arena SP de acuerdo a la norma ASTM 2487	M3	81.00

Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
9	1.09	Relleno con material seleccionado de la excavación	M3	1158.57
10	1.1	Suministro e instalación de sub_base granular tipo C, NT1	M3	90.98
11	1.11	Suministro e instalación de base granular tipo C, NT1	M3	36.36
12	1.12	Suministro e instalación de asfaltita natural, en áreas afectadas por la excavación	M2	367.87
2				
9	2.01	Suministro e instalación de tubería PVC D=315mm; NTC 3722-3 S8	ML	105.35
10	2.02	Suministro e instalación de tubería PVC D=400mm; NTC 3722-3 S8	ML	57.75
11	2.03	Suministro e instalación de tubería PVC D=450 mm; NTC 3722-3 S8	ML	75.47
12	2.04	Suministro e instalación de tubería PVC D=27"; NTC 5055 ASTM F 794	ML	158.01
13	2.05	Suministro e instalación de tubería PVC D=30"; NTC 5055 ASTM F 794	ML	49.21
14	2.06	Suministro e instalación de tubería PVC D=36"; NTC 5055 ASTM F 794	ML	95.18
3				
15	3.01	Pozos de inspección en concreto f´c= 24Mpa D=1.20 m y h<=2.00 m, incluye tapa	UND.	0.00
16	3.02	Pozos de inspección en concreto f´c= 24Mpa D=1.20 m y 2.01>h<=4.00 m incluye tapa	UND	0.00
4				
17	4.01	Construcción de cunetas transversales de vía, L=10.97m x 0.85 m, ancho útil de 0.45m, espesor de muros de 0.20m, y rejillas en platina de 2" x 3/8	UND	0.00
18	4.02	Construcción de cunetas transversales de vía, L=9.32m x 0.85 m, ancho útil de 0.45m, espesor de muros de 0.20m, y rejillas en platina de 2" x 3/8	UND	0.00
19	4.03	Construcción de sumidero de 1.64m x 0.88m, ancho útil de 0.58m x 1.34m, e=0.15m, rejilla platina de 2 x 3/8	UND	0.00
20	4.04	Construcción de sumidero de 1.64m x 0.98m, ancho útil de 0.68m x 1.34m, e=0.15m, rejilla platina de 2 x 3/8	UND	18.00
21	4.05	Construcción de cabezal de salida	UND	1.00
5				
22	5.01	Aseo general de Obra	UND	1.00
NP				

Nº	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
23	NP-1	Pozos de inspección en concreto f´c= 24Mpa D=1.50 m y h<=2.00 m. incluye tapa	UND	6.00
24	NP-2	Pozos de inspección en concreto f´c= 24Mpa D=1.50 m y 2.01>h<=3.00 m incluye tapa	UND	2.00
25	NP-3	Pozos de inspección en concreto f´c= 24Mpa D=1.60 m y 3.01>h<=4.00 m incluye tapa	UND	1.00

Fuente: Presupuesto del contrato.

12. ACTIVIDADES PARA REALIZAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (FICHA TÉCNICA)

Tabla 8. Actividades para realizar (ficha técnica).

ITEM	ACTIVIDAD
1	Localización y replanteo de redes
2	Cerramiento provisional lona verde (h=2,00m)
3	Excavación manual en material común de 0.00 a 2.00 m
4	Excavación manual en material común de 2.00 a 4.00 m
5	Excavación mecánica en material común
6	Entibado en madera para proteger talud de excavación
7	Cargue, transporte y retiro de material sobrante
8	Relleno, Cimentación tubería con arena SP de acuerdo con la norma ASTM 2487
9	Relleno con material seleccionado de la excavación
10	Suministro e instalación de subbase granular tipo C, NT1
11	Suministro e instalación de base granular tipo C, NT1
12	Suministro e instalación de asfaltita natural, en áreas afectadas por la excavación
13	Suministro e instalación de tubería PVC D=315MM; NTC 3722-3-S8
14	Suministro e instalación de tubería PVC D=400MM; NTC 3722-3-S8
15	Suministro e instalación de tubería PVC D=450 mm; NTC 3722-3 S8
16	Suministro e instalación de tubería PVC D=27"; NTC 5055 ASTM F 794
17	Suministro e instalación de tubería PVC D=30"; NTC 5055 ASTM F 794
18	Suministro e instalación de tubería PVC D=36"; NTC 5055 ASTM F 794
19	Pozos de inspección en concreto f´c= 24Mpa D=1.20 m y h<=2.00 m. incluye tapa
20	Pozos de inspección en concreto f´c= 24Mpa D=1.20 m y 2.01>h<=4.00m incluye tapa
21	Construcción de cunetas transversales de vía, L=10.97m x 0.85 m, ancho útil de 0.45m, espesor de muros de 0.20m, y rejillas en platina de 2" x 3/8
22	Construcción de cunetas transversales de vía, L=9.32m x 0.85 m, ancho útil de 0.45m, espesor de muros de 0.20m, y rejillas en platina de 2" x 3/8

ITEM	ACTIVIDAD
23	Construcción de sumidero de 1.64m x 0.88m, ancho útil de 0.58m x 1.34m, e=0.15m, rejilla platina de 2 x 3/8
24	Construcción de sumidero de 1.64m x 0.98m, ancho útil de 0.68m x 1.34m, e=0.15m, rejilla platina de 2 x 3/8
25	Construcción de cabezal de salida
26	Aseo general de Obra
1	Localización y replanteo de redes

Fuente: Presupuesto del contrato.

13. RECORRIDO POR LOS FRENTES DE OBRA

El 22 de noviembre se llevó a cabo una visita a los distintos frentes de trabajo, con la participación de delegados del contratista, la interventoria y el PDA. Durante esta actividad se realizó la verificación del progreso de la obra y del cumplimiento de las actividades contempladas en el contrato.



Ilustración 12. Recorrido frentes de obra.

14. RUTA SALUDABLE

Tal como se mencionó previamente, durante el periodo reportado se efectuó una visita a los distintos frentes de trabajo, con la participación de representantes del contratista, la interventoría, el PDA y la comunidad, contando además con la presencia de un miembro de la veeduria del contrato.

Durante el recorrido se dio respuesta a todas las inquietudes planteadas, y los asistentes expresaron su conformidad con el progreso y la calidad de los trabajos ejecutados.



Ilustración 13. Ruta saludable

15. PUNTOS DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

El punto de atención al ciudadano está ubicado en el área donde se ejecutan las obras de adecuación y canalización de aguas lluvias y, durante el periodo evaluado, no se han registrado PQRS.



Ilustración 14. Buzon de sugerencias.

16. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO DE LAS VEEDURIAS CIUDADANAS Y LAS RENDICIONES DE CUENTAS

El profesional contratado ha venido realizando un acompañamiento permanente a la comunidad, comunicando de manera anticipada las actividades a ejecutar, atendiendo las solicitudes formuladas y difundiendo la información relacionada con la obra, conforme a lo establecido en la Ley 850 de 2003.

17. PRESENTACION DE INFORMES

A la fecha se han elaborado tres informes sociales. El documento actual corresponde al cuarto informe y comprende las actividades ejecutadas entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre de 2025.

18. VALLA INFORMATIVA

Las vallas continúan ubicadas en el Polideportivo central y la carrera 6 en la inspección de San Antonio de Getucha.



Ilustración 15. Valla informativa del contrato

19. CONTRATACIÓN DE LA MANO DE OBRA

A fecha de corte del presente informe, se ha contratado el personal correspondiente a la mano de obra calificada y no calificada requerida para el desarrollo de la obra. A continuación, se detalla el personal vinculado y activo en el periodo informado.

Tabla 9. Relación mano de obra calificada y no calificada

Nombres y apellidos	Cedula de ciudadanía	Cargo
Fernando Andrés Marin	1.117.512.681	Residente de obra
Oscar Orlando Méndez	1.130.744.004	Ingeniero especialista hidráulico
Gustavo Adolfo Olarte Collazos	17.650.594	Director de la obra
Diana Lorena Ramos Lozano	40.782.364	Profesional SISOMA
Wilson Lugo Chilatra	1.117.491.307	Profesional social
Ancizar Orjuela Manrique	17.658.583	Maestro de Obra
Norbey Correa Plazas	6.801.673	Auxiliar de Obra
Alexander Carmona Rios	1.117.262.033	Auxiliar de Obra
Jhon Ainer Perez Parra	1.006.511.551	Auxiliar de Obra
Norvey Camilo Nieto	83.901.770	Auxiliar de Obra
Faiber Cardona Pulido	1.117.234.725	Auxiliar de Obra
Orlando Calderon Jimenez	1.117.233.024	Auxiliar de Obra
Juan Narvaez	1.080.934.116	Operario

Fuente: Elaboración propia

20. PROFESIONAL SOCIAL

El componente social lo maneja el psicólogo Wilson Lugo Chilatra, quien cumple con los requisitos mínimos para el desarrollo del presente informe.

21. PAGO SSGG PROFESIONAL SOCIAL

Se anexa la documentación que corresponde a los aportes de seguridad social comprendidos entre los meses de octubre del presente año.

22. ANEXOS

ANEXO 1- Hoja de Vida del profesional social.
ANEXO 2- Planilla de SSGG del profesional social.

Responsables,

Wilson Lugo Chilatra

WILSON LUGO CHILATRA
C.c 1.117.491.307
Psicólogo

ALDA MARITZA DUSSAN ACOSTA
C.c 40.781.657
Representante legal
Consorcio San Antonio 2025

ANEXO 1- HOJA DE VIDA DEL PROFESIONAL SOCIAL.

ANEXO 2- PAGO DE SSGG DEL PROFESIONAL

27/11/25, 10:56 Bandeja de entrada: Wilson Lugo Chilatra - Outlook

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Nº	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES		PENSIÓN			SALUD			ICBF			RIESGOS			PARAFISCALES			
Nº	Identificación	Nombre																		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Aportante		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Tipoid	Idaid	Pago	Planilla	Planilla	Liquida	Pago	Banco	Día Hábil	Hora

RESUMEN DE PAGO

ENTIDAD	CÓDIGO	NIT	DV	APORTANTES	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS A FAVOR APORTANTES	VALOR A PAGAR
TOTAL								

27/11/25, 10:56 Bandeja de entrada: Wilson Lugo Chilatra - Outlook

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Aportante		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Tipoid	Idaid	Pago	Planilla	Planilla	Liquida	Pago	Banco	Día Hábil	Hora

RESUMEN DE PAGO

ENTIDAD	CÓDIGO	NIT	DV	APORTANTES	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS A FAVOR APORTANTES	VALOR A PAGAR
TOTAL								
