15/06/2016 Actividad: Se realiza excavación y demolición manual para el traslado de la rede de Vanti en ambos costados del Ander el el CIV: 18003250
personal: 1 Boal
2 Ayudantes
1 Inspector obra ARC

16/06/2016 Actividad: Se realiza excavación y demolición manual para el traslado de la red de Vanti en ambos costados del Ander en el CIV: 18003250
personal: 1 Boal
2 Ayudantes
1 Inspector SST
1 Inspector obra ARC

17/06/2016 Actividad: Se realiza excavación y demolición manual para el traslado de la red de Vanti en ambos costados del Ander en el CIV: 18003250
personal: 1 Boal
2 Ayudantes
1 Inspector SST
1 Inspector obra ARC

18/06/2016 Actividad: Se realiza excavación y demolición manual para el traslado de la red de Vanti

en ambos costados de la
vía en el civ:1800 3250
personal: 1 Bool
2 Ayudantes
1 Inspector SST
1 Inspector obra ARL

19/06/2016 Actividad: se realiza demolición
y excavación manual para el
translado de vanti en
ambos costados del Andén
en el civ:1800 3250
personal: 1 Bool
2 Ayudantes
1 Inspector SST
1 Inspector obra ARL

20/06/2016 Actividad: se realiza demolición
y excavación manual para el
translado de vanti en ambos
costados del Andén en
el civ: 1800 3250
personal: 1 Bool
2 Ayudantes
1 Inspector SST
1 Inspector obra ARL

21/06/2016 Actividad: se realiza demolición y
excavación manual para el
translado de vanti en ambos

costados del anden en el civ:18003250
personal: 1 Boal
2 Ayudantes
1 Inspector SST
1 Inspector obra Dec

23/06/2026 Actividad: se realiza demolición y excavación manual para el translado de varti en el anden de ambos costados en el civ: 18003250
personal: 1 Boal
2 Ayudantes
1 Inspector SST
1 Inspector obra Dec
Residentes

24/06/2026 Actividad: se realiza demolición y excavación manual para el translado de vanli en ambos costados dd Anden en el civ: 18003250
Residente Dec

25/06/2026 Actividad: se realiza excavación manual del tubo potable para manejo, se continua con la demolición manual y excavación para el translado de vanli en ambos costados del anden en el civ/18003250
personal: 1 Boal
2 Ayudantes
1 Inspector SST Dec
1 Inspector obra

Scanned with CamScanner

26/06/2026	Actividad: se realiza manija al tubo potable 4" a 3/4"; se continua con la demolición manual y excavación para el traslado de vanti en ambos costados del anden en el civ.18003250 personal: 1 Boal 3 Ayudantes 1 Oficial 1 Inspector SST ARL 1 Inspector obra Residente
27/06/2026	Actividad: se realiza demolición y excavación manual para el traslado de vanti en ambos costados del anden en el civ.18003250 personal: 1 Boal 3 Ayudantes 1 Inspector SST 1 Inspector obra ARL Residente
30/06/2026	Actividad: se realiza demolición excavación manual para el traslado de vanti en ambos costados del anden en el civ.18003250 Personal: 1 Boal 3 Ayudantes 1 Inspector SST 1 Inspector obra ARL Residente

Scanned with CamScanner

Marco Fidel Suarez
B003059

Scanned with CamScanner

	Personal: 1 Boal Clima: Soleado 1 oficial 1 Ayudante 1 inspector sst 1 comisionado p 1 operador maquinaria: 1 Retroexcavadora : Enterro : Rec.
31-05-26	Domingo
1-06-26	En este dia se realiza perfilamiento de via para la conformacion de la subrasante, oiden y aseo en todo el segmento vial.
	Personal de obras: 1 Boal Clima: Soleado 1 Oficial 2 Auxiliares de obra 1 Inspector sst. 1 Inspector tecnico Maquinaria: Minicargador. Rec
2-06-206	En este dia se continuan actividades con el perfilamiento de la subrasante. Se realiza excavacion manual para la construccion de caja de inspeccion en la direccion 126-33.

Scanned with CamScanner

Personal de obra: Maestros 2. Clima: lluvias moderadas
Auxiliares de obra 4.
Bodi 1.
Inspector de obra 1
Inspector sst. ARC

3-06-2026. En este día se inician actividades con el perfilamiento de la vía, y Compactación de la subrasante, se realiza
- instalación de geotextil de la abscisa Km0+000 - Km0+333
- Instalación de agregado reciclado " " ?
- Instalación de geoceldas " " ?
- Instalación de agregado reciclado. " " ?
- Compactación de material instalado

Clima: Seco soleado.
personal de obra: Maestros 2.
Auxiliares de obra 4.
Bodi 1.
Inspector de obra 1. ARC
Inspector sst 1
Maquinaria y equipo: Minicargador, Bibocompactador, herramienta menor

4-06-2026. En este día se inician actividades, con la instalación de geotextil, agregado reciclado y geoceldas, nuevamente se instala y Compacta una Capa de agregado reciclado de 6cm. las actividades anteriormente mencionadas se realizaron de la abscisa Km0+333 - Km0+500.

Scanned with CamScanner

Clima: Soleado
personal de obra: Maestros 2
Auxiliares de obra 1
Boal 1
Inspectal sst 1
Inspectal de obra 1
Maquinaria y equipo: Minicargador, bibriocompactadores y herramienta menor.

5-06-2026. En este dia se inician actividades con la nivelación del material instalado el dia anterior, posterior a esta actividad se realizo la adecuación del pozo donde llega la red sanitaria de 10", se realiza la instalación mezclado y Compactación de base mejorada con Cemento al 5%, Las actividades anteriormente mencionadas se realizaron entre las abscisas

Clima: Soleado
personal de obra: Maestros 2.
Auxiliares de obra 4.
Boal 1
Operada de maquinaria 2.
Inspecta sst 1
Inspecta tecnico 1

6-06-2026. En este dia se realiza excavación manual para adecuación e instalación de tubería de 10" que Conecta al pozo inicial de red Sanitaria de la misma manera se realiza excavación manual para.

Scanned with CamScanner

12

Instalación de domiciliaria de 6" con sus respectivos rellenos todos como fracturado y B-200.
Clima: Seco soleado
Personal de obra: Maestros 2.
Aux de obra: 3
boral: 1
operadores: 1
Inspector: SST.
Inspector técnico: 1
Maquinaria: Minicargador y herramienta menor.

9-06-2026 En este día se realizo excavación manual para construcción de pozo inicial red sanitaria.
- Excavación manual en pozo final red sanitaria para instalación de una batilla de tubería de 6" con el fin de efectuar la conexión al pozo final de recolección.
- Excavación manual para construcción de caja de inspección.

Clima: Seco soleado.
personal de obra: Maestros 2.
Aux de obra 3.
Boral: 1
operadores: 1
Inspector SST: 1.
Inspector técnico 1
Maquinaria: Minicargador y herramienta menor.

Scanned with CamScanner

10-06-2026 En este día se inician actividades con la excavación manual para construcción de pozo inicial red sanitaria, paralelamente se realiza construcción de barcamo para protección de red pluvial existente. y se realiza excavación manual para Construcción de cajas de inspección.
Clima: Seco soleado.
- personal de obra: Maestro 2.
- Auxiliares de obra 4.
- Bodl: 1
- Inspecta sst 1.
- Inspecta tecnico 1 ARC

11-06-2026. En este día se continúan actividades con la mampostería para las cajas de inspección, mampostería del pozo inicial de red sanitaria. y mampostería del pozo final de la misma red.
- Clima seco soleado
- personal de obra: Maestros 2.
Auxiliares de obra 4.
Bodl 1.
- Inspecta sst. ARC
Inspecta tecnico
Maquinaria y equipos: Mincagada, Cargue, herramienta menor.

12-06-2026. En este día se inician actividades con la mampostería de de los dos pozos de red sanitaria, inicial y final, Construcción de cajas de inspección.
Clima: Seco soleado
Personal de obra: Maestros 2
Aux de obra 4.
Bodl 1

Scanned with CamScanner

- Inspecta sst.
- Inspectal tecnico
- Maquinaria y equipos: Minicargador, Conguo, herramienta menor.


13-06-2026 En este dia se inicia actividades con la instalación de gramallo, base estabilizada en la mitad del tramo - excavación manual para la Construcción de Cajas de inspección, se realiza aseo en todo el frente de obra.
Clima: seco soleado personal de obra: Inspecta sst. 1
Inspecta tecnico 1
Maestros = 1
Auxiles de obra: 3
Bodl = 1
Maquinaria y equipos: Herramienta menor, minicargador.

16-06-2026 En este dia se realiza perfilamiento de via para la Conformación de la estructura, se Continuan Con la excavaciones manuales para la Construcción de Cajas de inspección.
Clima: seco soleado. Personal de obra: Inspecta sst 1.
Inspecta tecnico 1
Maestros 1:
Auxiliares de obra 3.
Bodl 1.
Maquinaria y equipos: Herramienta menor y minicargador.

17-06-2026 Se Continuan actividades Con la excavación manual para la Construcción de Cajas de inspección, de la misma manera, se levanta la mamposteria de las mismas.
Clima: seco soleado, personal de obra: Inspecta sst 1

Inspector técnico 1.
Maestros 1.
Auxiliares de obra 1.
Boal 1.

ARE




18.06.2026. para este día se inician actividades con la excavación manual para la Construcción de Cajas de Inspección, se realiza instalación de geotextil en el sobre ancho de la vía finalizando el tramo entre las abscisas Km55+165 - Km61+700, de la misma manera se instala. la agregado reciclado, instalación de geoceldas y agregado reciclado, así culminan las actividades mencionadas en el Frente de obra.

Clima

Clima = Seco soleado

Personal de obra =
Inspector SST: 1
Inspector técnicos: 1
Maestro = 1.
Auxiliares de obra 3:
Boal 1.

Maquinaria y equipo: Minicargador y herramienta menor. ARE



19.06.2026. Se realiza instalación de Geomalla desde la abscisa Km60+000 - Km61+700, posterior a esta actividad, se realiza la mezcla y extendida de base estabilizada. Primera Capa en todo el segmento vial.
Clima: Seco Soleado. Personal: Inspector SST.
Inspector técnico.
Maestro 1.
Auxiliares de obra: 1

Scanned with CamScanner

16

Boal : 1.
Maquinaria y equipo: Herramienta menor y minicargador. Dic

20-06-2026 En este día se inician actividades con la excavación manual para la construcción de Cajas de inspección. y se realiza paralelamente el levantamiento de mampostería de las mismas.
Clima: Seco Soleado. Personal de obra: Inspector SST. 1
Inspector técnico 1.
Boal : 1
Maestros 1
Auxiliares de obra: 3.
Maquinaria y equipo: Minicargador, herramienta menor. Dic

22.06.2026 En este día se inician actividades con la excavación manual para la construcción de anclajes, costado derecho e izquierdo de la vía, mampostería de Cajas de inspección, Colocación de tapas para las mismas.
Clima: Seco Soleado. Personal de obra: Inspector SST 1.
Inspector técnico 1.
Auxiliares de obra 3.
Maestros. 1
Boal = 1
Maquinaria y equipo: herramienta menor, Minicargador, Dic

Scanned with CamScanner

23-06-2026.	En este día se inician actividades con la excavación manual para la instalación de sardinel y continúan actividades de mampostería para cajas de inspección. Clima: seco soleado. Personal de obra: Inspector sst 1 Inspector técnico 1 Boal: 1 Maestros 1 Auxiliar de obra: 3. Maquinaria y equipo: Minicargador y herramienta menor. ARC
24-06-2026.	En este día se realiza excavación manual e instalación de sardinel c/o, perfilamiento de andén. Clima: seco soleado, personal de obra: Inspector sst 1. Inspector técnico 1. Boal: 1. Maestro 1 Auxiliares de obra: 3 Maquinaria y equipo: Minicargador y herramienta menor. ARC
25-06-2026.	En este día se continúan actividades con la instalación de sardinel costado derecho e izquierdo, instalación de bajo rampa, perfilamiento de andén clima: seco soleado, personal de obra: Maestro 1 Auxiliar de obra: 3 Inspector sst: 1 Inspector Técnico 1 Maquinaria y equipo: Minicargador y herramienta menor. ARC

26.06.2026 Para este dia, se iniciaron actividades con la terminación de la instalación del sardinel, y mezcla de la segunda capa de la base estabilizada.
Clima: Seco soleado. Personal de obra: Maestro 2
Auxiliar de obra 3
Inspector SST 1
Inspector técnico.
Boal 1.
Maquinaria y equipo: herramienta menor, mincargador. Arc


27.06.2026 para este dia se realiza la nivelación de pozos, armado y figurado de hierro, nivelación de anden costado izquierdo.
Clima: Seco soleado. Personal de obra: Inspector SST 1
Inspector técnico.
Auxiliar de obra 3
Maestro 1
Maquinaria y equipo. herramienta menor, mincargador.
Arc.

Scanned with CamScanner

Abdelkader Sor

18003676.

Scanned with CamScanner

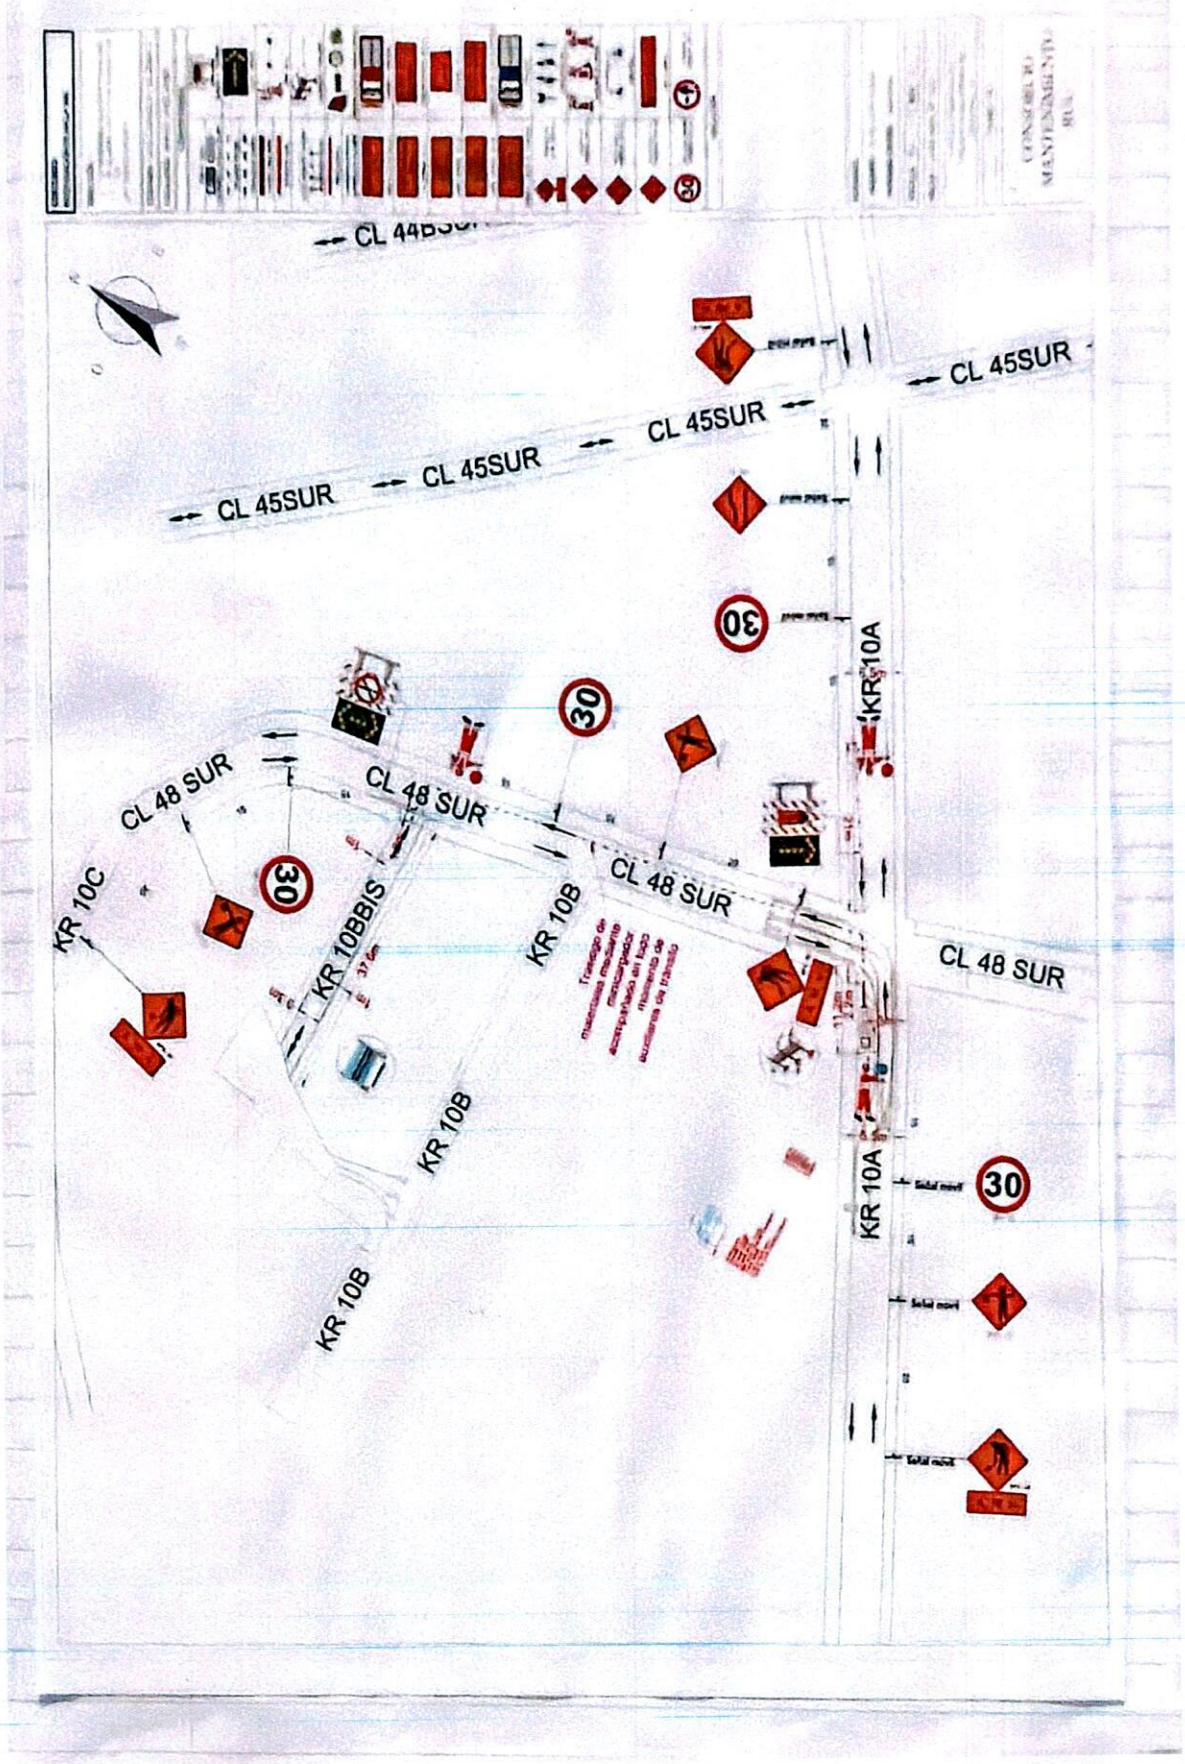

Scanned with CamScanner

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
	PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
	Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)
	CÓDIGO: PM02-PR01-F01 / VERSIÓN: 3.0

CONSOLIDADO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (COI)

SEÑORES: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD (SDM)

La interventoría y el contratista, compartiendo responsabilidades solicitan a la SDM, la aprobación del Plan de Manejo de Tráfico, para la realización de las obras que se relacionan a continuación al **Contratista: CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU**

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	LOCALIDAD	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DE LA OBRA
INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN					
18003676	N/A	KR 108BIS - CL 48 SUR	KR 108BIS - 57.6m AL SUR	1-may-25	29-ago-25	07:00 - 17:00 HORAS	24 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE	FDRRUU-717 DE 2025	Cierre total de calzada para realizar actividades de conservación de la malla vial en la localidad de RAFAEL URIBE URIBE
18003835	N/A	KR 10A - 2.2m AL SUR de la CL 48 SUR	KR 10A - 11.2m AL SUR de la CL 48 SUR	1-may-25	29-ago-25	07:00 - 17:00 HORAS	07:00 - 17:00 HORAS	RAFAEL URIBE URIBE	FDRRUU-717 DE 2025	Cierre parcial de calzada costado occidente para realizar posicionamiento de vehículo de obra para cargue y descargue de materiales y escombros.

Las obras se solicitan con las siguientes observaciones

N/A

OBRAS PROGRAMADAS POR:

Contratista de la Obra

Firma:

Nombre: CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU
Especialista de Tránsito: Carlos Andrés Muñoz León

Interventoría de la Obra

Firma:

Nombre: INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Especialista de Tránsito: Jovanny Alejandro Vargas Rodriguez

Instituto de Desarrollo Urbano

Firma:

Nombre: N/A

Otros

Firma:

Nombre: N/A

NORMATIVIDAD

El Plan de Manejo de Tránsito debe cumplir con lo establecido en el Manual de Señalización Vial vigente.

La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no le exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espacio público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.

A. ESPACIO PÚBLICO

Según ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre: Artículos 55-56-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

Decreto 840 del 27 de diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones"
Decreto 077 del 04 de marzo de 2020 "Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 840 de 2019 y se dictan otras disposiciones"

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán aislarse y/o canalizarse mediante malatres plásticos entrelazados.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
8. La longitud de transición a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
9. Para trabajos nocturnos, dominicales y/o festivos se debe contar con la autorización por parte de la alcaldía local de acuerdo con lo estipulado en el decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.5.1.5.15, o aquellas normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan
10. Si en el área de influencia del proyecto existen redes de semaforización, el contratista debe propender por su integridad, de igual manera durante la ejecución de obras el contratista es responsable de la custodia de redes y elementos de mobiliario semafórico, y de incidentes que se deriven por daños a los controles semafóricos.
11. Previo a la intervención se debe socializar las actividades, el PMT y demás restricciones con la comunidad directamente afectada, y es responsabilidad de la interventoría y la entidad contratante verificar el cumplimiento de esta condición.

Scanned with CamScanner

1/6/2026 Se inician actividades de instalacion de senalizacion vertical aprobado previamente en el PMT y COI, se realiza instalacion de cerramiento de obra, con rollizos de madera, polisombra verde demarcado doble cinta peligro, polimalla azul para proteger en altitud el radio de giro de la maquina, junto con el paso peatonal. Se instalan senderos peatonales longitudinales y transversales con señalizadores tubulares de plastico (cebra) y cinta peligro triple, demarcado de via cerrada. se instala campamento de obra con kit de emergencia (camilla, botiquin, extintor, y señalizacion sst preventiva), punto ecologico, cartelera informativa ambiental y sst, punto de hidratación, unidad sanitaria, y punto de acopio de herramientas, se deja en optimas condiciones para inicio de actividades constructivas.

Jessica Isaza
Residente Ambiental

Camilo Arcos
Residente SST

la interventoria realiza recorrido al frente de obra y revisa instalación de PMT (señalización, encerramiento, caseta con botiquin, extintor camilla, punto de hidratacion, unidad movil de aseo. Se revisan pasos peatonales, punto ecologico y se mira el punto de acopio estipulado en el PMT.

INV SIA

4

02/06/2026	Se inicia actividad de excavación mecánica desde Ko.0 donde previamente se realiza verificación de la Área Condiciones de Acceso y Flujo de Salida de material, el clima para este día se encuentra en condiciones optimas y Soleado / Finalizando en el tramo Ko-03, se realiza el retiro de 30 m3 de material Sobrante objetado al Área asegurado y encerrado no se deja material Sobrante.
	David F Dede Sanchez inspector de obra.
03/06/2026.	Se inicia Actividades excavación mecánica, dejando Continuidad desde el Ko.03 siguiendo con la Proyección de la Programación de obra Con un clima totalmente nublado Pero se continua Con las excavaciones en el tramo Ko.03 al Ko.06 para un total de 16 m3 Los cuales se dejan acordonados en el Punto designado, para esta actividad no se contempla ningun daños a tuberias ni infraestructura de las casas al rededor y cerca al Área.
	David F Dede Sanchez inspector de obra.
04-06-2026	Se inicia y Se continua con excavaciones mecanicas, dando Continuidad al desarrollo de las actividades en horarios perfilando y Pro Funolisando de 1,50 a 1.10 mts, dando como resultado un Porcentaje medinte 15 m3 no se presentes ningun tipo de Anomalia de daños a infraestructura Cercana a la Obra. Se realiza El retiro de 30 m3 de Material Sobrante debidos a la excavaciones totales el dia de Hoy
	David F Dede Sanchez inspector de Obra.

Scanned with CamScanner

05/06/2026 el dia de hoy se realiza actividades de excavacion desde el ko+00 al ko+12 donde canalizada las excavaciones mecanicas, el dia de hoy sobre las 06:49 am se presentan lluvias hasta las 9:50 am las cuales generan atraso en las actividades ya que se presentan lodos y el terreno se torna en condiciones dificiles para avanzar. al dia de hoy se realiza la excavacion de 12 ms de material sobrante.

Observaciones: lluvias fuertes en la mañana con dificultad para continuar con las excavaciones.

David F. Peale Sanchez
inspector de obra.

06/06/2026 el dia de hoy se realiza limpieza general de la via debido al retiro del material sobrante el cual permite que caigan algunas particulas a la via generando suciedad, por otra parte se continua con el perfilamiento de terreno para dejar terreno listo para compactar y rellenar se dejan sondeos pactados listos y terminado asegurado.

David F Peale Sanchez
inspector de obra.

9/06/2026 el dia de hoy se realiza actividades de excavacion mecanica para la instalacion de tuberia de alcantarillado, A la vez relleno de estas excavaciones clima tolerable nublado con lluvias suaves.

David Felipe Sanchez
Inspector obra.

Scanned with CamScanner

6

10-06-2026	el día de hoy se realizan actividades de excavación mecánica para instalación de tubería de alcantarillado y Relleno de la misma, en los tramos Ko-01 al Ko-03. Clima totalmente nublado pronostico de posibles lluvias
	David de Jesús Sánchez Arc inspector obra Residente
11-06-2026	el día de hoy se realiza excavaciones mecánicas para la instalación de tubería de alcantarillado, adicional cama de triturado para la instalación de la nueva tubería, se realiza encamisados para la protección contra derrumbes en el área se restituye el paso peatonal y se adecua una nueva ruta de evacuación para así salvaguardar la seguridad de los peatones, clima totalmente soleado
12-06-2026	David Jesús Sánchez Arc Inspector obra Residente
12-06-2026	el día de hoy se realiza excavación mecánica para instalación de tubería de PVC de alcantarillado de 8" y Rellenos de excavaciones, se recibe materiales y se procede reforzar soberbio y llenado a otro autorizado.
	David Jesús Sánchez Arc inspector obra Residente
15-06-2026	el día de hoy se continua con las excavaciones mecánicas para tubería de PVC de alcantarillado perforado de llenero y relleno de la misma; se realiza broka y otra organización de pozo
	David Jesús Sánchez Arc Inspector de obra Residente

Scanned with CamScanner

7

16-06-2026	el día de Hoy se realiza actividades de excavación mecánica para instalación de tubería de 8" del servicio de alcantarillado, también la instalación de la tubería sobre excavación de tuberías dañadas por deterioro, ajuste de pvc David Uzcátegui Sánchez inspector de obra. Res interv. ARC
17-06-2026	el día de Hoy se realiza excavación mecánica para la instalación de tubería de 8" en la finalización del eje, perfilado de fondo y cama de asentado, pos tensor a esta instalación de la tubería, se realiza la recolección del material sobrante. David Uzcátegui Sánchez inspector de obra Res interv. ARC
18-06-2026	el día de Hoy se realiza excavaciones mecánicas para la finalización de la actividad instalación de tubería de 8", también se realiza la recolección de materiales sobrante de las excavaciones mecánicas finalizo la excavación semanal, se inicia con perfilado de fondo para rellenar las excavación mecánica. David Uzcátegui Sánchez inspector de obra. ARC
19-06-2026	El día de Hoy se realiza Relleno y Compactación Pa en las excavaciones mecánicas esto con el fin de dejar fondo listo para Funcionar, adicional subsanación de bajas fel. David Uzcátegui Sánchez inspector obra ARC

Scanned with CamScanner

8

20-06-2026	El día hoy se continua con el apique de barandas y pisone de apisonadora sobre el eje Ø y ya que presentaba problemas de desgastes Huecos de rodillos y no encontraba el agua hacia las tuberías, por otra parte se avanza con el relleno y compactación de las sub base y relleno en ex cava anual. Daniel Valle Sanchez inspector obra. Residente
23-06-2026	El día de hoy se realiza relleno y compactación del eje vial sobre 19 al 23, relleno y compactado mecánico pechisando y apisonado al nivel de la rasante asignada topográficamente, recolección de material sobrante sobre la vía apoyo de señales de seguridad y protección Daniel Valle Sanchez inspector obra. Residente
21-06-2026	el día de hoy se continua con las actividades de relleno y compactación mecánica sobre 23/27, realizando un buen compactado significativo, logrando el perfilado y nivelado de niveles asignados, recolección material sobrante en la vía debido a que hay materiales de compactación y limpieza realizado. Daniel Valle Sanchez inspector obra

30-06-2026	El dia de hoy se continua con la compactacion mecanica y nivelacion de terreno, Resane de Cajas en generales se inicia las demoliciones de muros para la realizacion de nuevos muros estructurales, Recoleccion de material sobrante Charlas iniciales de seguridad y Salud en el trabajo. Clima lluvioso con lluvias leves.

Yaurol Deok Sanchez
inspector obra

Ing Intern

Scanned with CamScanner

Mamecos

18005074

Scanned with CamScanner

05:26 Llenos con base de tubería sanitaria, se realizo compactación por capas y se continua con la excavación mecanica para instalación de tubería

Personal= 1 oficial
1 fontanero
3 ayudantes
1 cadenero
1 inspector tecnico
1 inspector SST

Maquinaria= 1 retroexcavadora
1 minicargador

Apc

1/06/2026 Actividad: se realiza excavación mecanica de tubería residual 8"; excavación manual para las domiciliaria en el CIV: 1800574

Personal: 1 Boal
1 oficial
3 Ayudantes
1 Inspector SST
2 operadores
1 Inspector obra

maquinaria
1 retro excavadora
1 Minicargador

Apc.

02/06/2026 Actividad: se realiza instalación de tubería 8" y 6" para la red sanitaria, Instalación de triturado 3/4"; se realiza excavación manual de cajas y inspección en el CIV: 1800574

personal: 1 Boal
3 Ayudantes
1 oficial
2 operadores
1 Inspector SST
1 Inspector obra

maquinaria
1 Retroexcavadora
1 Minicargador

Apc

03/06/2026 Actividad: se realiza llenos de material Tubería residual de 8" y 6" en B-200, se continua con la excavación manual de cajas Inspección en el CLV:18005074

personal: 1 Boal
3 Ayudantes
1 Oficial
2 Operadores
1 Inspector SST
1 Inspector obra

Maquinaria
1 Retroexcavadora
1 Mini cargador

DRC

Residente

04/06/2026 Actividad: se realiza excavación mecánica de Tubería residual 8"; se realiza excavación manual de domiciliarios; se continua con la excavación manual de cajas de Inspección en el CLV:18005074

personal: 1 Boal
3 Ayudantes
1 Oficial
2 Operadores
1 Inspector SST
1 Inspector obra

Maquinaria
1 Retro excavadora
1 Mini cargador

DRC

Residente

05/06/2026 Actividad: se realiza; Instalación de Triturado e Instalación de Tubería residual 8" y de los domiciliarios 6"; se continua con la excavación manual de los cajas Inspección en el CLV:18005074

personal: 1 Boal
3 Ayudantes
1 Oficial
2 Operadores

Maquinaria
1 Retro excavadora
1 Mini cargador

	1 Inspector SST Apc 1 Inspector obra Residente
06/06/2026	Actividad: se realiza llenos de Tubería residual 8" y los domiciliarios de 6" con material B-200; se compacta por capas en el civil 8005074 personal: 1 Boal maquinaria 1 oficial 1 Retro excavadora 3 Ayudantes 1 Mini cargador 2 operadores 1 Inspector SST 1 Inspector obra Apc Residente
07/06/2026	Actividad: se realiza mampostería de los cajos Inspección; se realiza excavación manual de cajos Inspección en el civil 8005074 personal: 1 Boal 4 Ayudantes 2 oficiales 1 Inspector obra Apc Residente.
09/06/2026	Actividad: se realiza excavación mecánica de Tubería 8" residual; se realiza excavación manual de los domiciliarios 6"; se continua con la excavación manual y mampostería de los cajos de Inspección en el civil 8005074 personal: 1 Boal 3 Ayudantes

16

c	1 Oficial	maquinaria
	20 peradores	1 Retroexcavadora
	1 Inspector SST	1 Mini cargador
	1 Inspector obra	
	Yes intaw	Arc
10/06/2026	Actividad: se realiza Instalación de triturado; se Instala la tubería residual 8" y los domiciliarias Tubería de 6"; se continua con la amposteria de los cajas de Inspección en el CIV: 18005074	
	personal: 1 Boal	maquinaria
o	3 Ayudantes	1 Retro excavadora
	1 Oficial	1 mini cargador
	20 peradores	
	1 Inspector SST	
	1 Inspector obra	Arc
	Yes intaw	
11/06/2026	Actividad: se realiza lleno de Tubería 8" residual y los domiciliarias de 6", se realiza compactación de material 13-200 por capas en el CIV: 18005074	
	personal: 1 Bool	maquinaria
o.	3 Ayudantes	1 Retro excavadora
	1 Oficial	1 Mini cargador
	Operadores	
	1 Inspector SST	
	1 Inspector obra	Arc
	Yes intaw.	
12/06/2026	Actividad: se realiza excavación mecanica de Tubería residual 8"	

Scanned with CamScanner

se realiza excavacion manual para las domiciliarias 6", se continua con la demolicion y excavacion manual de las cajas de Inspeccion en el CIV.18005074

personal: 1Boal
2Ayudantes
1oficial
2Operadores
1Inspector SST
1Inspector obra

maquinaria
1Retro excavadora
1Minicargador

Ape

Res inter

3/06/2026 Actividad: Instalacion de triturado y de tuberia 8" y 6" domiciliarias en el CIV: 18005074

personal: 1Boal
2Ayudantes
1oficial
2Operadores
1Inspector SST
1Inspector obra

maquinaria
1Retro excavadora
1Minicargador

Ape

Res inter

14/06/2026 Actividad: se realiza excavacion y demolicion manual para las cajas de Inspeccion, se continua con la manposteria de las cajas de Inspeccion en el CIV: 18005074

personal: 1Boal
3Ayudantes
3Oficiales
1Inspector obra

Ape

Res inter

15/06/2016	Actividad: se realiza demolición y excavación manual para las cajas de inspección, se continua con la instalación de las cajas de inspección en el civ: 1800574 personal: 1 Boal 4 Ayudantes 2 oficiales 1 Inspector obra ADC Res interv
16/06/2016	Actividad: se realiza excavación mecanica de tubería residual 8"; se realiza excavación manual de los domiciliarios 6" en el civ: 1800574 personal: 1 Boal maquinaria 3 Ayudantes 1 Retroexcavadora 1 Oficial 1 Minicargador 2 Operadores 1 Inspector SST 1 Inspector obra AMC Res interv
17/06/2026	Actividad: se realiza instalación de la tubería de 8" y los domiciliarios de 6" en el civ: 1800574 personal: 1 Boal maquinaria 3 Ayudantes 1 Retroexcavadora 1 Oficial 1 Minicargador 2 Operadores 1 Inspector SST 1 Inspector obra ADC

Scanned with CamScanner

18/06/2016 Actividad: se realizan lleno de tubería 8" residual y de domiciliarios 6"; se continua con la excavación manual de cajas de Inspección en el CLV: 18005074

personal: 1 Boal
3 Ayudantes
2 operadores
1 Oficial
1 Inspector SST
1 Inspector obra

maquinaria
1 mini cargador
1 Retroexcavadora

Res intes

19/06/2016 Actividad: se realiza excavación mecanica de tubería residual 8" y se realiza excavación manual de domiciliarios 6" en el CLV: 18005074

personal: 1 Boal
3 Ayudantes
2 operadores
1 Oficial
1 Inspector SST
1 Inspector obra

maquinaria
1 Retroexcavadora
1 mini cargador

Res inter

20/06/2016 Actividad: se realiza rempladteo dela via, se realiza jornada de aseo, orden y limpieza detodo el segmento Vial en el CLV: 18005074

personal: 1 Boal
3 Ayudantes
2 operadores
1 Oficial
1 Inspector SST

1 Inspector obra
maquinaria: 1 mini cargador
1 Retroexcavadora

Scanned with CamScanner

20

22/06/2026	Actividad: se realiza instalación de triturado y de los tuberías 8" y de 6" domiciliarios; se continua con la excavación manual de los cajas de inspección en el CIV: 18005074 personal: 1 Boal — maquinaria: 1 minicargador 3 Ayudantes 1 oficial 1 operador 1 Inspector SST 1 Inspector obra Res interv.
23/06/2026	Actividad: se realiza manposteria de pozo residual se realiza llenos de Tubería residual 8" y de los domiciliaria 6" con material de B-200 con compactación en el CIV: 18005074 personal: 1 Boal 3 Ayudantes 1 oficial 1 operador 1 Inspector SST 1 Inspector obra Res interv.
24/06/2026	Actividad: se realiza instalación de Geotextil y de Geoceldo con compactación de material de relleno-Retiro en el CIV: 18005074 personal: 1 Boal — 1 Inspector obra 3 Ayudantes — maquinaria: 1 minicargador 1 oficial 1 Inspector SST

Scanned with CamScanner

25/06/2026 Actividad: se realiza excavación manual de los cajas de inspección; se realiza manipostería de los cajas de inspección en el CIV:1800507H

personal: 1 Boal
3 Ayudantes
1 Oficial
1 Operador
1 Inspector SST
1 Inspector obra

maquinaria
1 Mini cargador

ARC

Res intes

26/06/2026 Actividad: se realiza excavación y manipostería de los cajas de inspección en el CIV:1800507H

personal: 1 Boal
3 Ayudantes
1 Oficial
1 Operador
1 Inspector SST
1 Inspector obra

maquinaria:
1 Mini cargador

Arc

Res intes

27/06/2026 Actividad: se realiza excavación manual y manipostería de los cajas de inspección en el CIV:1800507H

personal: 1 Boal
3 Ayudantes
1 Operador
1 Inspector SST
1 Inspector obra

maquinaria
1 Mini cargador

Arc

Res intes

Scanned with CamScanner

22

2	30/06/2016	Actividad: se rediza excavacion manual y mamposteria de los cajas de Inspeccion en el civil 8 cosoyu.
		Personal: 1 Jefe de brigada — maquinaria: 1 mini cargador
		3 Ayudantes
		1 oficial
		1 operador
		1 Inspector SST
		1 Inspector obra
		Les inter
2		
2		

Scanned with CamScanner

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C."

FONDO DE DESARROLLO LOCAL
ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

CONTRATO N.º 717 de 2025

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL MAO N ° 4
1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORÓ:	Camilo Duran	Residente SST	
	Luisa Isaza	Residente Ambiental	
REVISÓ Y APROBO	Carlos Alberto Arambula	Representante legal Interventoría	

CONTROL DE CAMBIO DOCUMENTO

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
00	30 de junio 2026	Versión inicial
01	30 de junio 2026	Observaciones interventoria

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVOS 5
2.1. OBJETIVO GENERAL 5
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
3. MARCO TEÓRICO 6
3.1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 6
3.2. METODOLOGÍA 6
4. INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7
5. COMPONENTES DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL- MAO. 8
5.1. COMPONENTE A. CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST 10
5.2. COMPONENTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 12
5.2.1. B1. Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio 12
5.2.2. B2- Manejo de materiales de construcción 16
5.2.3. B3 - Manejo integral de residuos sólidos 20
5.2.4. B4 – Control de emisiones atmosféricas 25
5.2.5. B5 – Manejo integral de cuerpos de agua y sumideros 28
5.3. COMPONENTE C. MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJÍSTICO. 32
5.4. COMPONENTE D. PROGRAMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 33
5.4.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 34

5.4.2. COPASST Y CVL 34
- **COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL** 35

5.4.3. DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO 36
5.4.4. GESTIÓN PARA EL TALENTO HUMANO 37
5.4.4.1. Ingreso de Personal a la obra 37
5.4.4.2. Afiliación al sistema de seguridad social y riesgos laborales 38
5.4.4.3. Inducción concienciación y entrenamiento 38
5.4.4.4. Capacitaciones 40
5.4.5. PROCESOS OPERATIVOS BASICOS 41
5.4.5.1. Subprograma De Medicina Del Trabajo 41
5.4.5.2. Subprograma De Medicina Preventiva 42
5.4.6. SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL 43
5.4.7. FICHAS GUIA DE MANEJO AMBIENTAL DE OBRA COMPONENTE D SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 46
5.4.7.1. D1. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS – MEV 46
5.4.7.2. D2. TRABAJO SEGURO DE EXCAVACIONES 49
5.5. COMPONENTE E. PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD ... 50
6. CONLUSIONES 54

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información Contractual 7
Tabla 2. Personal Ambiental y sst 10
Tabla 3. Cantidades proveedores Periodo junio 17
Tabla 4. Indicador de cumplimiento Decreto 265 de 2016 18
Tabla 5. Cantidades Disposición final Periodo junio 22
Tabla 6. Listado de personal 38
Tabla 7. Indicadores de Accidentalidad 44
Tabla 8. Causales de Ausentismo 45

Tabla 9. Indicadores de Ausentismo..... 45

Tabla 10. Listado de control PMT y frente abiertos..... 52

1. INTRODUCCIÓN

El CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU presenta en este documento el reporte de cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas en el Contrato de Obra Pública No. 717 de 2025, cuyo objeto corresponde a la ejecución de obras y actividades orientadas a la construcción y conservación de la malla vial y el espacio público en la localidad de Rafael Uribe Uribe, derivadas del Contrato de Consultoría No. 281 de 2019, bajo la modalidad de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable, en la ciudad de Bogotá D.C.

Para el periodo correspondiente a mayo de 2026, se exponen las estrategias implementadas, así como las medidas de manejo ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, dirigidas a la prevención, control y mitigación de incidentes, accidentes laborales y enfermedades de origen laboral. Estas acciones se desarrollan con el propósito de gestionar adecuadamente los impactos ambientales negativos que puedan generarse durante la ejecución de las actividades constructivas en cada uno de los frentes de obra activos.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Implementar las actividades descritas dentro del Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental (Fichas Numeral 5.2) – Dentro del MAO (Manual Ambiental de Obra), aprobado inicialmente por interventoría, con el fin de controlar, mitigar y prevenir cualquier impacto posible a generarse por la intervención del Proyecto bajo el contrato # 717 – 2025.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir los avances en la obra durante el periodo en cuanto a los Componentes del Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental – MAO.
- Evidenciar las medidas implementadas para el manejo de las actividades constructivas para el presente periodo.
- Presentar la implementación de las estrategias de salud ocupacional y seguridad industrial en la obra en la etapa actual.

3. MARCO TEÓRICO

3.1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

El Contrato de Obra No. 717 de 2025 contempla la ejecución de actividades orientadas a la conservación de la malla vial y del espacio público en la localidad de Rafael Uribe Uribe, priorizando aquellas vías que presentan mayor nivel de deterioro y requieren intervención urgente, conforme a los lineamientos establecidos por el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe. Estas acciones tienen como finalidad atender las necesidades propias de los diferentes sectores de la localidad, mejorando el acceso a los barrios y la conectividad entre sus zonas.

En este contexto, el CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU establece como objetivo principal garantizar la recuperación y funcionalidad de las vías que presentan condiciones críticas, previamente priorizadas por el contratante. Para ello, desarrolla sus actividades en cumplimiento de los requisitos contractuales, implementando procedimientos adecuados, el uso correcto de herramientas y la aplicación de medidas técnicas que aseguren una ejecución eficiente y acorde con los fines del proyecto.

3.2. METODOLOGÍA

El Plan de Acción ejecutado por la empresa CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU, para la ejecución y cumplimento del Plan de Manejo Ambiental (Fichas numeral 5.2) y el Programa de Seguridad y Salud en el trabajo en la realización de las actividades de las obras publicas requeridas para el mantenimiento de vías de la localidad de Rafael Uribe Uribe contando este inicialmente para la ejecución de obras.

La idea del desarrollo de informes mensuales será evidenciar el cumplimiento de acciones debidas a ejercer en cada uno de los componentes expuestos dentro del MAO, aprobado por la interventoría, los cuales son:

- Componente A, Cumplimiento a obligaciones ambientales y sst
- Componente B, Manejo ambiental en la ejecución de actividades

- Componente C. Manejo de Vegetación y del Paisaje
- Componente D. Salud Ocupacional y Seguridad Integral.
- Componente E. Programa De Señalización De Seguridad

4. INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto contempla la intervención de varios segmentos de la malla vial de la localidad de Rafael Uribe Uribe. Donde se ejecutará la construcción de segmentos viales que a la fecha se encuentran en afirmado, algunas de las actividades u obras para ejecutar dentro del alcance del proyecto son las indicadas a continuación:

- Construcción de obras de arte: alcantarillas, cunetas y filtros. Incluye excavaciones y rellenos.
- Transporte y disposición de material proveniente de excavación y demolición en botadero certificado.
- Construcción obra para vía primaria y/o secundaría y/o terciaria.
- Construcción de obras de mitigación y/o contención, según los resultados de la etapa de diagnósticos.
- Tratamiento superficial doble y/o mezcla asfáltica

A continuación, se presenta una descripción General del Contrato de Obra:

Tabla 1. Información Contractual


REGISTRO DE LA OBRA ANTE SDA O PIN	**16646**
CONTRATO	**717-2025**
NOMBRE DE LA OBRA	"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 281 DE 2019 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C."
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU
VALOR INICIAL	$5'653.841.400
LOCALIDAD	RAFAEL URIBE URIBE

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION INICIAL	7 MESES
FECHA DE INCIO DE LA OBRA	23 de febrero 2026
FECHA ESTIMADA DE TERMINACION	22 de septiembre 2026
ENTIDAD CONTRATANTE:	Fondo de desarrollo local de Rafael Uribe Uribe .

Fuente: CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU, 2026

Por consiguiente, la localización del proyecto se encuentra ubicado según se muestra en la ilustración a continuación.

Figura 1. Ubicación de la localidad de RAFAEL URIBE URIBE

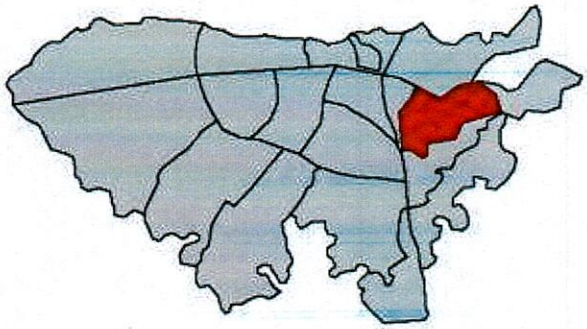

Fuente: Plan Ambiental de RAFAEL URIBE URIBE 2021-2025

5. COMPONENTES DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL- MAO.

La gestión ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) del proyecto se desarrolla en estricto cumplimiento de los lineamientos establecidos en los pliegos de condiciones del Contrato de Obra No. 717 de 2025 y del proceso de licitación correspondiente. En este sentido, el contratista acoge las disposiciones definidas en el apéndice contractual en materia Ambiental y de SST (A&SST), el cual establece las obligaciones específicas para la adecuada ejecución del contrato.

Dichas disposiciones complementan lo establecido en el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto de Desarrollo Urbano, con el propósito de asegurar que el desarrollo del proyecto cumpla con altos estándares de desempeño ambiental, así como

con condiciones seguras y saludables para el personal vinculado a las actividades constructivas.

En concordancia con lo anterior, la implementación de las medidas ambientales y de SST se articula con la normativa vigente aplicable en Colombia, entre ellas el Decreto 1076 de 2015, el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, garantizando su aplicación desde el inicio del contrato y durante la ejecución progresiva de los diferentes frentes de obra.

A continuación, se mencionan los componentes que se implementaran en la etapa constructiva del contrato

COMPONENTE A- MANEJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y OBLIGACIONES A&SST	
COMPONENTE B- MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	
B1	Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio
B2	Manejo de materiales de construcción
B3	Manejo integral de residuos sólidos
B4	Control de emisiones atmosféricas
B5	Manejo integral de cuerpos de agua, sumideros y obras hidráulicas
COMPONENTE C - MANEJO DE LA VEGETACIÓN, PAISAJISMO Y FAUNA SILVESTRE	
C1	Manejo de la vegetación
C2	Manejo de fauna silvestre
C3	Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS)
COMPONENTE D. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
D1	Manejo de Maquinaria, Equipos y Vehículos - MEV
D1.1	Manejo de Maquinaria y Equipos
D1.2	Manejo de vehículos
D1.3	Traslado de maquinaria, equipos y cargas
D1.4	Abastecimiento de combustibles en el proyecto
D1.5	Almacenamiento de combustibles en obra
D2	Trabajo seguro en excavaciones
D3	Trabajo en alturas
D4	Izaje mecánico de cargas
D5	Manipulación de redes eléctricas
COMPONENTE E. MANEJO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD	
E1	MANEJO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

En las fichas se establece el ítem de seguimiento y control con indicadores de evaluación el cual permite controlar y evidenciar el cumplimiento porcentual a las medidas y actividades de mitigación planteadas según las afectaciones en el ámbito ambiental y sst.

A continuación, se demuestran las actividades realizadas para cada componente en el presente periodo de este informe.

5.1. COMPONENTE A. CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST

Durante el presente periodo y con el fin de darle cumplimiento a las obligaciones ambientales, la empresa CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU con el contrato 717 -2025, inicio con el proceso de cumplimiento a los requerimientos de la gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo que se encuentran incluidos en el Manual ambiental de obra, junto con los que sean solicitados en pliegos de condiciones, por ello se dio el inicio de contratar algunos de los profesionales requeridos en los pliegos de condiciones. De igual forma se realizó toda la documentación preliminar exigida bajo los pliegos de condiciones como lo fue el Manual Ambiental de Obra Mao y el PG-RCD, el cual ya se radico a interventoría y este emite su aprobación.

Personal ambiental y SST

Para el cumplimiento de los requerimientos ambientales en la ejecución del contrato el contratista conformó un grupo de gestión ambiental, este equipo está compuesto por:

Tabla 2. Personal Ambiental y sst

CONTRATISTA	NOMBRE	DEDICACION	CARGO
CONSORCIO	Camilo Duran	50%	Residente SST
	Luisa Fernanda Isaza	50%	Residente Ambiental

Fuente: CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU, 2026

Brigadas de aseo

El orden y aseo en los frentes de obra constituyen factores determinantes para la protección de la salud, la prevención de riesgos laborales, el aseguramiento de la calidad en los procesos constructivos y la eficiencia operativa del proyecto. Asimismo, inciden directamente en la adecuada convivencia laboral y en la interacción con el entorno social, tanto al interior como en las áreas de influencia de la obra.

En este sentido, se establecen estándares definidos de desempeño en materia de orden y limpieza, los cuales son implementados mediante trabajo articulado y la participación activa de todo el personal en cada frente de intervención. El personal designado para actividades de aseo recibe capacitación específica respecto a sus funciones, orientadas a garantizar el mantenimiento permanente de condiciones óptimas en las áreas de trabajo.

La gestión integral de residuos sólidos se desarrolla conforme a los lineamientos distritales y la normativa vigente, mediante la separación en la fuente utilizando código de colores, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 2184 de 2019 y el Documento CONPES 3874 de 2016. Para tal efecto, se dispone de puntos ecológicos debidamente señalizados en cada frente de obra.

La recolección y disposición de los residuos se coordina con el prestador autorizado del servicio público de aseo, Proambiental Distrito, realizando la entrega en los días establecidos (lunes, miércoles y viernes), garantizando así el manejo adecuado y la disposición final conforme a la regulación aplicable.

Permisos ambientales

Suministro de Materiales y disposición final: En el inicio de obra los materiales de construcción y de ejecución para las estructuras de cada frente, se tendrá como proveedores los del listado priorizado, igualmente a los sitios

de disposición final, los cuales se encuentran con la Inscripción en el "Directorio de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición Final, Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU" Categoría de Agregados Pétreos RES. 0836 DE 07/2015 RES. 1110 DE 09/2017 ANLA IDU No. 427-2015.

Manejo de RCD: Durante el contrato se buscará darle cumplimiento a la normatividad legal vigente con el Decreto Distrital 646 de 2025 que organiza el cumplimiento de la Resolución nacional 1257 de 2021, se realiza durante el periodo la apertura de pin ambiental 16646.

No se requiere sacar de ningún permiso ambiental exigido por ley ya que dentro del contrato anterior de consultoría y estudios y diseños la alcaldía ya emitió los permisos pertinentes para intervención Arborea.

5.2. COMPONENTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Este componente permite desarrollar las actividades necesarias para prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles impactos y riesgos generados por las actividades constructivas en el contrato de obra 717-2025, a continuación, se describe las actividades del periodo para cada ítem.

5.2.1. B1. Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio

FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA - MAO	
B1	**Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio**
Impactos a manejar:	
Alteración de la calidad del agua	
Alteración de la calidad del aire	
Cambios temporales de uso del suelo	

FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA - MAO			
B1	**Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio**		
Alteración de la calidad visual			
Generación de residuos sólidos			
Tipo de medida:			
Prevención: X	Control: X	Mitigación:	Compensación:

Medidas de Manejo

Durante el presente periodo se cumplió con las características del componente con los siguientes aspectos:

Campamento principal: Se encuentra ubicado en la Transversal 19 # 47ª – 53 sur, el cual está destinado para el funcionamiento de la oficina y punto PAC. Las instalaciones cuentan con baño y servicios públicos.

FOTOGRAFIA 1. Campamento principal



Fuente: CONSORCIO MANTENIMIENTO RUU, 2026

Campamento y acopios temporales: Para la ejecución de obras en cada frente se instalará un campamento ubicado dentro del área de influencia de las intervenciones, los campamentos constaran de una carpa de 2mx2m, donde se ubicará el espacio para la zona de cambio y almacenamiento de objetos personales de los trabajadores. El área de almacenamiento de insumos y

FICHAS DE MANUAL AMBIENTAL DE OBRA - MAO	
B1	**Manejo ambiental de campamentos fijos y/o temporales y centros de acopio**

herramientas que con frecuencia son requeridas en los frentes de obra, dichos campamentos debidamente señalizados y dotados con:

- Servicio de baño (Unidad Móvil Sanitaria)
- Punto ecológico los cuales son protegidos contra la acción del agua, diferenciados por colores con el fin de hacer la clasificación de los residuos en la fuente.
- Extintor para el control de incendios
- Botiquín de primeros auxilios
- Señalización de cada una de las áreas
- Señalización en caso de emergencia
- Camilla
- Cartelera SST – AMBIENTAL.
- Punto de Hidratación para los Trabajadores.

En los campamentos de obra se implementó la señalización de tipo informativa, preventiva y restrictiva, con el fin de delimitar y diferenciar las áreas operativas, administrativas y de apoyo, garantizando condiciones seguras para el desarrollo de las actividades y la adecuada circulación del personal.

La instalación de la señalización se realizó conforme a los lineamientos establecidos en la normativa vigente aplicable, particularmente lo dispuesto en la Resolución 2400 de 1979 y la Resolución 0312 de 2019, así como en concordancia con las especificaciones técnicas del Instituto de Desarrollo Urbano para proyectos de infraestructura vial.

Esta medida permite fortalecer la gestión del riesgo en los frentes de obra, asegurando la correcta identificación de peligros, la prevención de incidentes y
