2026 05 21 106,448,014.00

800049148- INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S.

CIENTO SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CATORCE

PESOS M/CTE

2026 05 21 106,448,014.00

800049148 - INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S.

CIENTO SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CATORCE

PESOS M/CTE

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
NIT. 800.223.337-6

Carrera 49 No 44-94 Local 196 PBX: 5767630 FAX: 5718693
www.edu.gov.co - info@edu.gov.co
Medellin-Colombia

COMPROBANTE DE PAGO
No. 258855

nuevo

21-may.-2026 No. Cheque 26

Beneficiario: 800049148 INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S.

Cuenta: 0 Tipo: 0 Banco: 0

Descripción: PAGO DE FACTURA FE 1035 CTO 3326-139 DE 2026Asunto: 7 CASO 223430 FAC 113605

No. Cuenta: 200000757 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIQUIA

Nombre Cuenta: 43925 DE 2025 ATANASIO GIRARDOT

Concepto de Flujo: 134 - ESTUDIOS Y DISEÑOS CI, PS Y CS

Detalle Facturas: 1035-

CUENTA	NOMBRE CUENTA	CEN.COSTOS	AREA	DÉBITO	CRÉDITO
11100659	BANCO IDEA	0030028	SNE		106,448,014.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0030028	SNE	106,448,014.00	

Autoriza:	Elabora:	Aprueba:
DIANA CAROLINA VALLEJO MORA	SANTIAGO HERNANDEZ MORALES	JUAN DAVID MESA BLANDON

Recibido:

C.C o NIT

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU-

NIT 800.223.337 - 6

FACTURA DE PROVEEDOR

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. FE1035 Fecha: 20/05/2026 **Estado**: Aplicada **Número: 113605**

Proveedor NIT 800049148 INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S.

Dirección: CR 80 A 32 E E 72 IN 1219

Condición Comercial: 10 CONDICIÓN CONTADO PROVEEDORES

Moneda:. PESO COLOMBIANO

T.Operación **602** **FACTURA PROVEEDOR ADMON DELEGADA**

Telefono: 4124163

Sucursal: 1 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

Descripcción:. PAGO DE FACTURA FE 1035 CTO 3326-139 DE 2026 - INGESTRUCTURAS INGENIEROS - REDES ESTADIO

Caso:. 223430

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Descuento	Total
23010032	Consultoria Persona Nat/Jur 19%	UNIDAD	1	97,955,291.00	0.00	97,955,291.00

2. CAUSACIÓN CONTABLE

CUENTA		BASE	PORC	DEBITO	CREDITO	CENTRO	AREA
24362703	RETEICA ACTIVIDAD DE SERVICIOS	97.955.291,00	0.18%	0.00	176,320.00	0030028	SNE
29020101	EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0.00%	116,566,796.00	0.00	0030028	SNE
24360301	HONORARIOS	97.955.291,00	6.00%	0.00	5,877,317.00	0030028	SNE
24079017	TASA PRO-DEPORTE	97.955.291,00	1.30%	0.00	1,273,419.00	0030028	SNE
24362507	RETENCION DE IVA REGIMEN COMUN 2.8%	18.611.505,00	15.00%	0.00	2,791,726.00	0030028	SNE
24010201	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0,00	0.00%	0.00	106,448,014.00	0030028	SNE

3. AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO		CP	VALOR	AREA	CENTRO DE COSTOS	
23SNE0030028010271-2350208	CI 43925 DE 2025 ESTADIO ATANASIO GIRARDOT - EST Y DIS -REC.	139	116,566,796.00	SNE	0030028	CI 43925 DE 2025 ESTADIO ATANASIO GIRARDOT

TIPO OPERACION

3326 ORDEN DE EJECUCION

Elaboró: juan.restrepo JUAN DAVID RESTREPO RENDON

Aplicó: lady.duque LADY JOHANA DUQUE ZAMORA

Autorizó:

Comprobante final - Respuesta con estado transacciones

NIT 890.980.179-2

Lote: BT00036217

Cliente: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

NIT: 800223337

Fecha de Solicitud: 5/22/2026 2:43:17 PM

Estado del Lote:Finalizado

Resumen del Lote

	Registros	Valor
Exitosos	15	$ 246.369.491
Rechazados	0	$ 0
Pendientes	0	$ 0
Total Registros	**15**	**$ 246.369.491**

Información Ordenante	Información Beneficiario								
Cuenta IDEA	**Canal de Pago**	**Banco**	**Nro de Cta.**	**Tipo Cta.**	**Documento**	**Nombre**	**Valor**	**Referencia**	**Estado Transacción**
00000000200000756	07-238	BANCO DE BOGOTA	386510606	Ahorro	890984630	METROPARQUES	$7,436,360	258840	PAGO EXITOSO
00000000200000756	07-238	BANCO DE BOGOTA	386510606	Ahorro	890984630	METROPARQUES	$570,260	258841	PAGO EXITOSO
00000000200000756	07-238	BANCO DE BOGOTA	434707170	Ahorro	890984630	METROPARQUES	$70,481,505	258843	PAGO EXITOSO
00000000200000712	07-238	BANCOLOMBIA	60402064032	Ahorro	800223337	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU	$8,284,920	258851	PAGO EXITOSO
00000000200000757	07-238	BANCOLOMBIA	10872835754	Ahorro	800049148	INGESTRUCTURAS INGENIEROS	$106,448,014	258855	PAGO EXITOSO
00000000200000712	07-238	BANCOLOMBIA	00528565176	Corriente	71265408	ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO	$149,404	258885	PAGO EXITOSO
00000000200000199	07-238	BANCOLOMBIA	61600002907	Ahorro	901841394	UNION TEMPORAL EDU PRINT	$273,958	258897	PAGO EXITOSO
00000000200000758	07-238	BANCOLOMBIA	61600002907	Ahorro	901841394	UNION TEMPORAL EDU PRINT	$704,419	258903	PAGO EXITOSO
00000000200000757	07-238	BANCO DE BOGOTA	075767806	Ahorro	901886426	CONSORCIO INTER ESTUDIOS EDU	$25,377,295	258905	PAGO EXITOSO
00000000200000728	07-238	BANCOLOMBIA	20935956965	Ahorro	830118348	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES	$1,008,728	258907	PAGO EXITOSO
00000000200001320	07-238	BANCOLOMBIA	20935956965	Ahorro	830118348	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES	$832,396	258909	PAGO EXITOSO
00000000200000712	07-238	BANCOLOMBIA	00110029185	Corriente	811032640	SOMATEC BIC	$21,495,009	258935	PAGO EXITOSO
00000000200000758	51-283	BANCO DAVIVIENDA S.A.	550035900075850	Ahorro	901938661	UNION TEMPORAL EDUAT	$719,252	258931	PAGO EXITOSO
00000000200001320	51-283	BANCO DAVIVIENDA S.A.	550035900075850	Ahorro	901938661	UNION TEMPORAL EDUAT	$2,050,372	258894	PAGO EXITOSO
00000000200001320	51-283	BANCO DAVIVIENDA S.A.	550035900075850	Ahorro	901938661	UNION TEMPORAL EDUAT	$537,599	258895	PAGO EXITOSO

Fecha de Generación: lunes, 25 de mayo de 2026

INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S
NIT 800.049.148-5
CR 80 A 32 E E 72 IN 1207
Tel: (604) 3220272
Medellín - Colombia
info@inges.net.co

Factura electrónica de venta
No. FE 1035

Señores	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-		
NIT	800.223.337-6	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Cra 49 #44 94	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/05/2026, 14:54
Expedición	13/05/2026, 14:55
Vencimiento	12/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE COBRO # 3 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO OE 139 DE 2026 CUYO OBJETO ES ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE REDES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, SUPERVISOR ENCARGADO JUAN DAVID RESTREPO	1.00	116,566,796.29

Al contestar, por favor cite estos datos
Radicado: 022026007323
Fecha y hora rad:
13/05/2026 15:25:19.173
Enviado por:
INGESTRUCTURAS INGENIEROS SAS

edu®
Empresa de Desarrollo Urbano

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento dieciseis millones quinientos sesenta y seis mil setecientos noventa y seis pesos m/cte con veintinueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-12 por $ 116,566,796.29

Total Bruto	97,955,291.00
IVA 19% COMPRAS	18,611,505.29
Total a Pagar	**116,566,796.29**

Juan Restrepo

Observaciones:
* Código CIIU Actividad Principal: 7112 (Actividades de arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica).
* Favor Consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia N. 1087-2835754 a nombre de Ingestructuras.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764106500938 aprobado en 20260226 prefijo FE desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 12701c584afd5a29f69c8a17ecc4a2c68624edc7f3f0321071e55af66691e060e2b9287aea6b016d0dbb2c7daf518650

edu® Empresa de Desarrollo Urbano	**CERTIFICACION DE FACTURACION ELECTRONICA**		
Código:	Versión:	Fecha:	Página 1

CONTRATISTA: INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S

CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	NUMERO	AÑO
	CONSULTORIA	OE 139	2026

OBJETO "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE REDES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"

PERÍODO DESDE: 1/4/2026 HASTA: 30/4/2026

VALOR FACTURA $ 116.566.796.29

El suscrito interventor o supervisor hace constar que el contratista ha prestado a satisfacción sus servicios durante el periodo mencionado, dando así cumplimiento al Contrato, por tal motivo se autoriza la generacion de la factura electronica

Para constancia se expide el presente certificado martes, 12 de mayo de 2026

Juan David Restrepo Rendon

PROFESIONAL

Juan Restrepo

PROFESIONAL: FIRMA

Daniela Mira Palacio

APOYO A LA SUPERVISIÓN (cuando aplique)

DANIELA MIRA PALACIO

APOYO A LA SUPERVISIÓN: FIRMA

edu Empresa de Desarrollo Urbano	**CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**		
Código: FA10-18	Versión: 2	Fecha: 11-10-21	Página 1 de 1

CONTRATISTA: INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S

No DEL CONTRATO: 139 de 2026

OBJETO: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE REDES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

PERÍODO DESDE: 1 de abril de 2026 HASTA: 30 de abril de 2026

EN DESARROLLO DEL CONVENIO No: 6700043925 de 2025

VALOR PAGO: $116,566,796.29

El suscrito interventor o supervisor hace constar que el contratista ha prestado a satisfacción sus servicios durante el periodo mencionado, dando así cumplimiento al Contrato.

Certifico que he recibido el correspondiente informe Parcial

De conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2002, el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones

En consecuencia, se autoriza la cancelación de la presente cuenta.

Disponibilidad	Compromiso	Nro. Factura/Cta. Cobro	Valor
179	3326 - 139	FE1035	$116,566,796.29

Para constancia se expide el presente certificado el miércoles, 13 de mayo de 2026

Juan Restrepo

JUAN DAVID RESTREPO RENDON
SUPERVISOR

Daniela Mira Palacio
Apoyo a la Supervisión - Subgerencia de Estructuracion de Proyectos
Firma: DANIELA MIRA PALACIO

Empresa de Desarrollo Urbano	**CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**		
Código: FA10-18	Versión: 2	Fecha: 1-03-18	Página 2 de 2

RUBRO PRESUPUESTAL	PROYECTO	FONDO	DP	CP	VALOR
23SNE0030028010271-2350208	CI 43925 DE 2025 ESTADIO ATANASIO GIRARDOT - EST Y DIS - REC		179	3326 - 139	$116,566,796.29

SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

Contrato Nº	OE 150 DE 2025	**Contratista Consultor:**		Ingestructuras	**ACTA N°:**
Objeto:		**Contratista Interventor:**		Consorcio Inter estudios EDU	3
Estudios y diseños técnicos de redes para la unidad deportiva Atanasio Girardot, en el distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín		**Supervisor EDU:**		Juan David Restrepo Rendón	**Fecha presentación acta**
		Apoyo a la supervisión EDU:		Daniela Mira Palacio	10 de mayo de 2026
V/Inicial (Antes de IVA):	$1.174.981.924,00				
Plazo Inicial:	120 días				
Fecha inicio:	5/02/2026				

Condiciones Originales del Contrato						Modificación de Cantidades		Condiciones Actualizadas		Acta N° 1		Acta N° 2		Acta N° 3		Acta N° 4		Acumulado Contratual		Saldo Contractual	
Item	Descripción	Un	Cant	V/Unitario	V/Parcial	+	-	Cant	Valor	Cant	Valor	Cant	Valor	Cant	Valor			Cant	Valor	Cant	Valor
5	**DISEÑO DE REDES HIDRAULICAS Y DE GAS**																				
	LEVANTAMIENTO, INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO DE REDES HIDROSANITARIAS																				
OE	Levantamiento e investigación de redes hidrosanitarias (abasto, residuales y lluvias) que se encuentren dentro del polígono de intervención. Incluye: Redes de abastecimiento de agua, tanques, canoas, bajantes, colectores, cajas de inspección, Manholes, sumideros, pozo séptico, cárcamos, cunetas y de las demás estructuras hidráulicas que correspondan al sistema de abastecimiento y alcantarillado interno. Incluye: Trazado de todas las redes hidrosanitarias, ubicación de estructuras de	m2	54003,0	$ 4.488	$ 242.365.464		54003,0		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -			-	$ -
OE	Diagnóstico técnico del sistema de bombeo de la red de aguas lluvias y/o residuales. Incluye (levantamiento de información en campo, revisión de equipos electromecánicos existentes (bombas, tableros, válvulas y accesorios), verificación de condiciones hidráulicas de operación, análisis de caudales, niveles y presiones, evaluación del desempeño del sistema frente a las condiciones actuales de operación, identificación de fallas, restricciones o riesgos operativos, y elaboración de informe técnico con diagnóstico del estado del sistema y recomendaciones de mejora o correctivos). El estudio deberá entregarse con memoria técnica, registro fotográfico, esquemas o planos de referencia y conclusiones técnicas.	Global	1,0	$ 7.804.800	$ 7.804.800	1,0		2,0	$ 15.609.600		$ -		$ -		$ -		$ -			2,00	$ 15.609.600
OE	Diagnóstico técnico del sistema de bombeo y presurización de la red de abasto de agua potable existente. Incluye (Inspección de los equipos de bombeo, tanques de almacenamiento, redes asociadas y sistemas de control; la verificación de caudales, presiones y condiciones operativas; la evaluación del estado físico y funcional de los componentes; y el análisis de la capacidad del sistema frente a la demanda actual y proyectada. El diagnóstico contempla la identificación de deficiencias, riesgos operativos y oportunidades de mejora, así como la formulación de recomendaciones técnicas orientadas a optimizar el funcionamiento, la confiabilidad y la eficiencia del sistema. El estudio deberá entregarse con memoria técnica, registro fotográfico, esquemas o planos de referencia y conclusiones técnicas.	Global	1,0	$ 9.756.000	$ 9.756.000			1,0	$ 9.756.000		$ -		$ -		$ -		$ -			1,00	$ 9.756.000
4.4	Diagnóstico de redes con circuito cerrado de televisión, diámetros entre 150 mm y 600 mm. Incluye lavado preliminar de la red. Según todas las normas y especificaciones de EPM. Este ítem se pagará siempre y cuando se requiera por metro lineal diagnosticado en caso de que no haya información desde EPM de la totalidad de la televisación del tramo a estudiar. Incluye modelacion BIM, deacuerdo a protocolo establecido por la Entidad.	m	600,0	$ 38.024	$ 22.814.400			600,0	$ 22.814.400		$ -		$ -	500,0	$ 19.012.000		$ -	500,00	$ 19.012.000	100,00	$ 3.802.400
	LEVANTAMIENTO, INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO DE REDES HIDROSANITARIAS																				
5.1	**REDES INTERNAS**																				
5.1.4	Diseño de las redes hidrosanitarias internas del proyecto. Los diseños deben complir con lo estipulado en la Resolución 0549 del 10 de Julio de 2015 "por la cual se reglamenta el Capítulo 1 del Título 7 de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parámetros y lineamientos de construcción sostenible y se adopta la guía para el ahorro de agua y energía en edificaciones". Incluye el diseño de redes de abastos (agua fría y agua caliente), redes de alcantarillado de aguas lluvias y aguas residuales, y diseño de redes de captación, conducción, almacenamiento, tratamiento y recirculación de aguas lluvias provenientes de cubiertas. Incluye el diseño completo del sistema de bombeo para abastos y para aguas de recirculación. Además incluye el diseño de tragantes, ubicación de bajantes, definición de pendientes de flujo de aguas de escorrentía sobre losas, cubiertas y/o pisos duros, dimensionamiento de canoas para cubiertas y/o sistemas alternativos para conducción de dichas aguas lluvias, ubicación de cunetas, cárcamos, cajas de inspección, tanques de agua (con dimensionamiento hidráulico), cuartos de bombas (con los requerimientos técnicos de las bombas), y demás elementos inherentes al diseño hidrosanitario interno de las edificaciones, incluyendo	m2	73353,0	$ 4.488	$ 329.208.264		36523,6	36.829,4	$ 165.290.302		$ -		$ -		$ -		$ -			36.829,39	$ 165.290.302
OE	Diseño de acometida o punto de conexión para descarga de aguas lluvias y/o residuales a caja existente o proyectada. Incluye (levantamiento de condiciones en sitio, verificación de cotas, pendientes y capacidad hidráulica de la red receptora, definición de diámetros, materiales y pendientes de la acometida, detalle constructivo del empalme, y elaboración de planos constructivos, memoria de cálculo y especificaciones técnicas, de conformidad con la normativa vigente y los requerimientos del operador de red.) Este precio es por unidad siempre y cuando el diseño de la acometida cambie. El valor unitario incluye hasta ochenta (80) metros lineales de longitud de acometida.	un	1,0	$ 1.756.080	$ 1.756.080			1,0	$ 1.756.080		$ -		$ -		$ -		$ -			1,00	$ 1.756.080
5.3	**RED EXTERNA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**																				
5.3.2	Diseño de redes externas de alcantarillado de aguas lluvias. Incluye empalme a la red de EPM o descarga al sitio indicado por éstos. Los diseños se deben realizar según las últimas disposiciones de la Entidad a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de cantidades de obra, con sus respectivas memorias de cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de acuerdo a los parámetros (unidades de medida, poli líneas, formato en Excel, etc) solicitados por la Entidad.	m	1200,0	$ 21.560	$ 25.872.000			1.200,0	$ 25.872.000		$ -		$ -		$ -		$ -			1.200,00	$ 25.872.000

SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

Contrato Nº	OE 150 DE 2025																														
Objeto:																															
Estudios y diseños técnicos de redes para la unidad deportiva Atanasio Girardot, en el distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín																															
V/Inicial (Antes de IVA):	$1.174.981.924,00																														
Plazo Inicial:	120 días																														
Fecha inicio:	5/02/2026																														

Contratista Consultor:																															
Contratista Interventor:																															
Supervisor EDU:																															
Apoyo a la supervisión EDU:																															

Ingestructuras																															
Consorcio Inter estudios EDU																															
Juan David Restrepo Rendón																															
Daniela Mira Palacio																															

ACTA N°:	
3	
Fecha presentación acta	
10 de mayo de 2026	

	Condiciones Originales del Contrato					Modificación de Cantidades		Condiciones Actualizadas		Acta N° 1		Acta N° 2		Acta N° 3		Acta N° 4		Acumulado Contratual		Saldo Contractual	
Item	**Descripción**	**Un**	**Cant**	**V/Unitario**	**V/Parcial**	**+**	**-**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**			**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**
5.3.4	Diseño de redes externas de alcantarillado de aguas negras. Incluye empalme a la red de EPM o descarga al sitio indicado por éstos. Los diseños se deben realizar según las últimas disposiciones de la Entidad a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de cantidades de obra, con sus respectivas memorias de cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de acuerdo a los parámetros (unidades de medida, polilíneas, formato en Excel, etc) solicitados por la Entidad.	m	1200,0	$ 21.780	$ 26.136.000			1.200,0	$ 26.136.000		$ -		$ -		$ -		$ -			1.200,00	$ 26.136.000
5.3.6	Diseño de redes externas de acueducto. Incluye empalme a la red de EPM. Incluye evaluación de la capacidad hidráulica. Los diseños se deben realizar según las últimas disposiciones de la Entidad a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de cantidades de obra, con sus respectivas memorias de cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de acuerdo a los parámetros (unidades de medida, polilíneas, formato en Excel, etc) solicitados por la Entidad. Incluye modelacion BIM, deacuerdo a protocolo establecido por la Entidad	m	1000,0	$ 24.960	$ 24.960.000			1.000,0	$ 24.960.000		$ -		$ -		$ -		$ -			1.000,00	$ 24.960.000
5.3.8	Diseño de redes para captación y conducción de aguas lluvias provenientes del urbanismo del proyecto. Incluye el diseño de filtros y de tuberías colectoras de aguas lluvias, cárcamos, cunetas, y todos aquellos elementos necesarios para la captación y conducción de las aguas lluvias provenientes de rondas de coronación, canchas, pisos duros, rampas, andenes, plazoletas, áreas vehiculares y áreas peatonales. Incluye el diseño de estructuras hidráulicas para captación y cruce de aguas de escorrentia, cajas de inspección u otros elementos de recolección de aguas lluvias y de infiltración en zonas de urbanismo del proyecto. Incluye chequeo de la capacidad hidráulica de los	m	1000,0	$ 19.000	$ 19.000.000			1.000,0	$ 19.000.000		$ -		$ -		$ -		$ -			1.000,00	$ 19.000.000
5.3.9	Chequeo y cálculo de la capacidad hidráulica de las redes, aguas arriba y aguas abajo, requerida por EE.PP.M, con el fin de verificar las redes existentes y evaluar la necesidad de reposición. Comprende el análisis del área tributaria requerida para la aceptación por parte de EPM. Dicho chequeo se deberá realizar conforme a las ultimas disposiciones de EPM. Longitud hasta 100 m.	Global	1,0	$ 1.727.376	$ 1.727.376			1,0	$ 1.727.376		$ -		$ -		$ -		$ -			1,00	$ 1.727.376
5.3.11	Trámites para la aprobación del diseño de las redes externas de alcantarillado de aguas lluvias ante el operador de la red (EPM). El consultor deberá realizar todos los trámites que se requieran por dicha entidad, incluyendo posibles ajustes a los diseños, hasta la obtención de la aprobación final de éstos. Los diseños se deben realizar según las últimas disposiciones de la Entidad a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de cantidades de obra, con sus respectivas memorias de	Global	1,0	$ 1.874.195	$ 1.874.195			1,0	$ 1.874.195		$ -		$ -		$ -		$ -			1,00	$ 1.874.195
5.3.12	Trámites para la aprobación del diseño de las redes externas de alcantarillado de aguas residuales ante el operador de la red (EPM). El consultor deberá realizar todos los trámites que se requieran por dicha entidad, incluyendo posibles ajustes a los diseños, hasta la obtención de la aprobación final de éstos. Los diseños se deben realizar según las últimas disposiciones de la Entidad a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de cantidades de obra, con sus respectivas memorias de	Global	1,0	$ 3.663.767	$ 3.663.767			1,0	$ 3.663.767		$ -		$ -		$ -		$ -			1,00	$ 3.663.767
5.3.13	Trámites para la aprobación del diseño de las redes externas de acueducto ante el operador de la red (EPM). El consultor deberá realizar todos los trámites que se requieran por dicha entidad, incluyendo posibles ajustes a los diseños, hasta la obtención de la aprobación final de éstos. Los diseños se deben realizar según las últimas disposiciones de la Entidad a cargo de la aprobación (EPM). Incluye la entrega de cantidades de obra, con sus respectivas memorias de cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de acuerdo a los parámetros (unidades de medida, poli líneas, formato en Excel, etc) solicitados por la Entidad.	Global	1,0	$ 3.626.760	$ 3.626.760			1,0	$ 3.626.760		$ -		$ -		$ -		$ -			1,00	$ 3.626.760
5.2	**RED DE GAS**																				
5.2.3	Diseño de la red de gas para el proyecto. Incluye el diseño de la red interna y externa, con su respectivo medidor. Incluye el diseño de la acometida. Los diseños se deben llevar a cabo según la normatividad vigente, y se deberán entregar las especificaciones de los equipos que se requieran para el adecuado funcionamiento de la red diseñada. El consultor deberá atender a las solicitudes que al respecto se puedan generar durante el proceso constructivo. Incluye la entrega de cantidades de obra, con sus respectivas memorias de cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de acuerdo a los parámetros (unidades de medida, polilíneas, formato en Excel, etc) solicitados por la Entidad.	m2	11059,0	$ 5.390	$ 59.608.010		807,2	10.251,8	$ 55.257.148		$ -		$ -		$ -		$ -			10.251,79	$ 55.257.148
8	**DISEÑO DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS**																				
8.1	Diseño del sistema de detección y alarma de incendios El Consultor deberá realizar el análisis y el estudio pertinente que le permita definir el tipo de sistemas de protección requeridos, de acuerdo a los tipos de riesgo encontrados y las recomendaciones normativas para cada uno de los espacios. Incluye el diseño de todas las redes (eléctricas, electrónicas) para el completo y correcto funcionamiento de la Red de detección de incendios El diseño debe cumplir con el Reglamento Colombiano de Construcción Sismoresistente NSR-10 y las normas NTC a las que éste haga mención. Además se deberán tener como referencia las normas de la National Fire Protection Association (NFPA). Incluye el diseño de los dispositivos para la detección temprana de incendios y el sistema de alarmas (lo que se requiera de acuerdo a la normatividad y reglamentación vigente); dichos dispositivos pueden tener componentes eléctricos y/o electrónicos. Incluye planos de construcción, memorias de cálculo y visitas para atender																				
8.1.4	Areas mayores a 5000m2	m2	76194,0	$ 2.292	$ 174.636.648		$ 12.487	63.706,9	$ 146.016.259		$ -		$ -		$ -		$ -			63.706,92	$ 146.016.259
11	**DISEÑO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y/O VENTILACIÓN MECÁNICA**																				

SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

Contrato Nº	OE 150 DE 2025	**Contratista Consultor:**		Ingestructuras	**ACTA N°:**
Objeto:		**Contratista Interventor:**		Consorcio Inter estudios EDU	3
Estudios y diseños técnicos de redes para la unidad deportiva Atanasio Girardot, en el distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín		**Supervisor EDU:**		Juan David Restrepo Rendón	**Fecha presentación acta**
		Apoyo a la supervisión EDU:		Daniela Mira Palacio	
V/Inicial (Antes de IVA):	$1.174.981.924,00				10 de mayo de 2026
Plazo Inicial:	120 días				
Fecha inicio:	5/02/2026				

Condiciones Originales del Contrato						Modificación de Cantidades		Condiciones Actualizadas		Acta N° 1		Acta N° 2		Acta N° 3		Acta N° 4		Acumulado Contratual		Saldo Contractual	
Item	**Descripción**	**Un**	**Cant**	**V/Unitario**	**V/Parcial**	**+**	**-**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**			**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**
11.1	Diseño del sistema de aire acondicionado y/o sistema de ventilación mecánica para los cuartos técnicos que requiera el proyecto, según las recomendaciones de la asesoría bioclimática. Se acordarán con este asesor las necesidades de refrigeración y/o ventilación, según el tipo de uso de los espacios. Incluye el diseño mediante sistemas de refrigeración convencional, así como la ventilación forzada para los espacios requeridos. En caso de que para algún espacio determinado se requiera de sistemas especiales de refrigeración (vigas frías, piso falso, etc), se deberá informar oportunamente a la Entidad, con el fin de evaluar el costo del mismo. Incluye diseño de reventilaciones, extracción mecánica y/o sistemas adiabáticos, en los sitios requeridos, de acuerdo a las necesidades bioclimáticas y/o arquitectónicas del proyecto. Los espacios específicos para los que se diseñarán éstos sistemas, se definirán con la interventoría y el arquitecto a cargo. El diseño se debe realizar de acuerdo a parámetros de eficiencia, optimización de recursos y ahorro energético. Incluye esquema de ubicación y áreas de influencia de los sistemas diseñados. Se deberán tener en cuenta que el proyecto contará con dos datacenter, los cuales deben tener diseños de arires acondicionados de precisión. Se deberá entregar el cálculo de la capacidad necesaria a instalar para el aire acondicionado, así como la definición de los equipos requeridos con su	m2	35284,0	$ 6.240	$ 220.172.160		21896,8	13.387,2	$ 83.536.315		$ -		$ -		$ -		$ -			13.387,23	$ 83.536.315
	OBRAS EXTRAS																				
OE 1	El área de intervención corresponde al interior del estadio y las subestaciones de las torres de iluminación Alcance N°1: Realizar el diagnóstico de cumplimiento normativo de las redes de tomacorrientes, potencia y sistema de puesta a tierra por muestreo, encaminado a la identificación de no conformidades o aspectos que generen riesgo eléctrico y/o funcionalidad, a la luz del RETIE de 2024. La muestra será definida, mediante la selección de dos salidas por espacio. El diagnóstico incluye: - Recomendaciones generales para mejorar la red eléctrica existente de la edificación. - Levantamiento en RVT de la red de potencia principal: media tensión y baja tensión, con su respectivo diagrama unifilar. No incluye las torres de iluminación de la cancha. Alcance N°2: Realizar el diagnóstico de cumplimiento normativo de iluminación existente por muestreo, con mediciones aleatorias de luxes en zonas críticas, encaminado a la identificación de no conformidades o aspectos que generen riesgo y/o baja eficiencia, a la luz del RETILAP de 2024. Incluye: - Recomendaciones generales para mejorar la iluminación existente de la edificación. - Modelamiento BIM del esquema de potencia principal: subestaciones, alimentadores y tableros. - Toma de la medida de resistencia de puesta a tierra de las subestaciones y evaluación de cargabilidad de los transformadores, sin considerar las las torres de iluminación. No incluye el levantamiento de las torres, pero sí de su subestación.	glo		$ 65.276.250	$ -	1,0		1,0	$ 65.276.250	0,8	$ 52.221.000		$ -		$ -		$ -	0,80	$ 52.221.000	0,20	$ 13.055.250
OE 2	El área de intervención corresponde a los locales y burbujas del exterior del estadio. Alcance N°1: Realizar el diagnóstico de cumplimiento normativo de las redes de tomacorrientes, potencia y sistema de puesta a tierra por muestreo, encaminado a la identificación de no conformidades o aspectos que generen riesgo eléctrico y/o funcionalidad, a la luz del RETIE de 2024. La muestra será definida, mediante la selección de dos salidas por espacio. El diagnóstico incluye: - Recomendaciones generales para mejorar la red eléctrica existente de la edificación. - Levantamiento en RVT de la red de potencia principal: media tensión y baja tensión, con su respectivo diagrama unifilar. Alcance N°2: Realizar el diagnóstico de cumplimiento normativo de iluminación existente por muestreo, con mediciones aleatorias de luxes en zonas críticas, encaminado a la identificación de no conformidades o aspectos que generen riesgo y/o baja eficiencia, a la luz del RETILAP de 2024. Incluye: - Recomendaciones generales para mejorar la iluminación existente de la edificación. - Modelamiento BIM del esquema de potencia principal: subestaciones, alimentadores y tableros.	glo		$ 27.384.450	$ -	1,0		1,0	$ 27.384.450	0,1	$ 2.738.445	0,5	$ 13.692.225		$ -		$ -	0,60	$ 16.430.670	0,40	$ 10.953.780
OE 3	Presentación de modelo Revit con la ubicación de las luminarias, su convención y su estado, para el area de intervención al interior del estadio.	glo		$ 38.658.750	$ -	1,0		1,0	$ 38.658.750		$ -		$ -		$ -		$ -			1,00	$ 38.658.750
	Levantamiento, investigación y diagnóstico de redes hidrosanitarias internas y/o externas (abasto, residuales y lluvias), mediante el uso de escaner 3D y georradar (GPR), para la caracterización técnica de la infraestructura existente (materialidad, diametros, lineamiento y estado general de las redes). Incluye los siguientes entregables: - Base de datos GIS en DWG de todas las anomalías e infraestructura existente - Fotografías relevantes - Mapas de anomalías georreferenciadas digitales con ubicación de anomalías e interpretaciones - Planos digitales en DWG y PDF - Modelo BIM 3D - Informe técnico: incluye metdología del estudio, perfiles GPR interpretados y recomendaciones generales																				
OE 4	Redes hidrosanitarias internas (abasto, residuales y lluvias)	m²		$ 6.956	$ -	54003,0		54.003,0	$ 375.666.469	16.200,9	$ 112.699.941	13.501,0	$ 93.918.356	540,0	$ 3.756.665		$ -	30.241,93	$ 210.374.962	23.761,07	$ 165.291.507
OE 5	Redes hidrosanitarias externas (abasto, residuales y lluvias)	m²		$ 6.956	$ -	21997,0		21.997,0	$ 153.019.931		$ -	2.199,7	$ 15.301.993	9.898,7	$ 68.858.969		$ -	12.098,35	$ 84.160.962	9.898,65	$ 68.858.969

SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

Contrato Nº	OE 150 DE 2025	**Contratista Consultor:**		Ingestructuras	**ACTA N°:**
Objeto:		**Contratista Interventor:**		Consorcio Inter estudios EDU	3
Estudios y diseños técnicos de redes para la unidad deportiva Atanasio Girardot, en el distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín		**Supervisor EDU:**		Juan David Restrepo Rendón	**Fecha presentación acta**
		Apoyo a la supervisión EDU:		Daniela Mira Palacio	10 de mayo de 2026
V/Inicial (Antes de IVA):	$1.174.981.924,00				
Plazo Inicial:	120 días				
Fecha inicio:	5/02/2026				

Condiciones Originales del Contrato						Modificación de Cantidades		Condiciones Actualizadas		Acta N° 1		Acta N° 2		Acta N° 3		Acta N° 4		Acumulado Contratual		Saldo Contractual	
Item	**Descripción**	**Un**	**Cant**	**V/Unitario**	**V/Parcial**	**+**	**-**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**			**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**
	Procesamiento del levantamiento y diagnóstico de redes, al interior del Estadio, para la caracterización técnica de la infraestructura existente (materialidad, diametros, lineamiento y estado general de las redes). Incluye los siguientes entregables: - Base de datos GIS en DWG de todas las anomalías e infraestructura existente - Fotografías relevantes - Mapas de anomalías georreferenciadas digitales con ubicación de anomalías e interpretaciones - Planos digitales en DWG y PDF - Modelo BIM 3D - Informe técnico: incluye metdología del estudio, perfiles GPR interpretados y recomendaciones generales																				
OE 6	Red de aire acondicionado	m²		$ 3.826	$ -	2826,2		2.826,2	$ 10.812.987		$ -		$ -		$ -		$ -			2.826,17	$ 10.812.987
OE 7	Red de gas	m²		$ 3.826	$ -	1418,0		1.418,0	$ 5.425.105		$ -		$ -		$ -		$ -			1.417,95	$ 5.425.105
OE 8	Red contra incendio	m²		$ 3.826	$ -	3007,0		3.007,0	$ 11.504.831		$ -		$ -	1.653,8	$ 6.327.657		$ -	1.653,85	$ 6.327.657	1.353,15	$ 5.177.174
OE 9	Determinación de la funcionalidad y operatividad de los equipos de bombeo del sistema contra incendio, en función del uso y características técnicas del servicio para los cuales fueron considerados; siempre y cuando se puedan encender y probar en sitio. Incluye la inspección técnica y visual de los equipos, tuberías, válvulas, accesorios y verificación de buenas prácticas de instalación de los mismos. elaboración de informe técnico con diagnóstico del estado del sistema y recomendaciones de mejora o correctivos). El estudio incluye memoria técnica, registro fotográfico, esquemas o planos de referencia y conclusiones técnicas.	un		$ 6.125.000		1,0		1,0	$ 6.125.000						$ -					1,00	$ 6.125.000
OE 10	Inspección y análisis integral del sistema eléctrico. Incluye la subestación, acometidas, tableros y todos los equipos eléctricos asociados al sistema de bombeo RCI. El estudio incluye memoria técnica, registro fotográfico, esquemas o planos de referencia y conclusiones técnicas.	un		$ 6.125.000		1,0		1,0	$ 6.125.000						$ -					1,00	$ 6.125.000
	Diseño de redes eléctricas de potencia internas para el proyecto. Diseño del sistema de potencia de uso final, transformación y distribución, conformado por: diseño de red normal, red regulada, UPS, acondicionadores de tensión, transferencias eléctricas, banco de condensadores, conexión de ascensores y demás equipos electromecánicos, mallas de tierra para media y/o baja tensión con medición resistividad del terreno por medio de un telurómetro calibrado (anexar certificado de calibración inferior a un año), diseño de subestación según se requiera, plantas de emergencia, potencia para luminarias y demás equipos que requieran energía eléctrica para funcionar. No incluye diseño detallado de subsistemas de seguridad electrónica, el diseñador de estos sistemas entregará potencia en punto 0. Incluye el diseño y dimensionamiento de los tableros y/o gabinetes, cuadros de																				
OE 11	Areas mayores a 5000 m2	m²		$ 7.458		39521,3		39.521,3	$ 294.749.632						$ -					39.521,27	$ 294.749.632
	Diseño de iluminación interno para el proyecto. Comprende el cálculo y diseño de la iluminación interior, alumbrado de emergencia (tipo batería; lo cual es diferente a luminarias de trabajo normal con baterías de emergencia adicionadas; estas solo se utilizarán en casos que la EDU los requiera.), el cual comprende el alumbrado de emergencia permanente, no permanente, alumbrado de escape, alumbrado de respaldo, alumbrado de seguridad, iluminación ambiental y de servicio (con recomendaciones para los tipos de luminarias a utilizar). Se deberá concertar con el arquitecto el tipo de iluminación que se empleará, la cual debe ajustarse a los criterios técnico-económicos del proyecto. Para esto el consultor recomendará varios tipos de luminarias que se puedan emplear y que cumplan con los requerimientos técnicos del proyecto, de forma que en conjunto con la interventoría y la Entidad se pueda concertar el (o los) tipo(s) de luminaria(s) más convenientes. No incluye el diseño de iluminación de la cancha. El diseño de iluminación debe incluir sistemas para control de iluminación con criterio URE y para aprovechamiento de luz natural, con sus respectivos																				
OE 12	Areas mayores a 5000 m2	m²		$ 3.051		39521,3		39.521,3	$ 120.579.395						$ -					39.521,27	$ 120.579.395
	Diseño de cableado estructurado. Estudios y diseños de cableado estructurado de acuerdo con las normas ANSI/TIA-568-C.O – Norma sobre cableado genérico de telecomunicaciones, ANSI/TIA-568-C.1, ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA-568-C.3, ANSI/TIA-569-B, ANSI/TIA-606-A, ANSI/TIA-607-B, ANSI/TIA-758-A, ANSI/TIA-862, ANSI/TIA-942, en fibra optica y cobre; incluyendo conectividad WIFI para todos los equipos que lo requieran. No incluye diseño de telecomunicaciones para sistema de seguridad electrónica																				
OE 13	Areas mayores a 5000 m2	m²		$ 5.801		11375,0		11.375,0	$ 65.986.375						$ -					11.375,00	$ 65.986.375
	Diseño del Sistema Integral de Protección Contra Rayos (SIPRA) para el proyecto, el cual debe ser elaborado con software de simulación a la medida. Se llevará a cabo, en caso de que se requiera según el estudio de riesgo. Incluye el cálculo de los DPS y sus especificaciones. Se debe medir la resistividad del terreno por metodo de Wenner, con telurómetro calibrado. En caso de que las cubiertas y/o las pérgolas de las edificaciones tengan mantos recubiertos con foil de aluminio, se deberá diseñar un sistema para descargar a tierra las cargas electrostáticas que se generen allí. Se debe elaborar según RETIE y Norma NTC 4552 1-2-3. El diseño se debe																				
OE 14	Areas mayores a 5000 m2	global		$ 45.590.000		1,0		1,0	$ 45.590.000						$ -					1,00	$ 45.590.000

SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

Contrato Nº	OE 150 DE 2025																					**ACTA N°:**	
Objeto:																						3	
Estudios y diseños técnicos de redes para la unidad deportiva Atanasio Girardot, en el distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín																						**Fecha presentación acta**	
V/Inicial (Antes de IVA):	$1.174.981.924,00																					10 de mayo de 2026	
Plazo Inicial:	120 días																						
Fecha inicio:	5/02/2026																						

Contratista Consultor:																	Ingestructuras			
Contratista Interventor:																	Consorcio Inter estudios EDU			
Supervisor EDU:																	Juan David Restrepo Rendón			
Apoyo a la supervisión EDU:																	Daniela Mira Palacio			

	Condiciones Originales del Contrato					Modificación de Cantidades		Condiciones Actualizadas		Acta N° 1		Acta N° 2		Acta N° 3		Acta N° 4		Acumulado Contratual		Saldo Contractual	
Item	**Descripción**	**Un**	**Cant**	**V/Unitario**	**V/Parcial**	**+**	**-**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**
	Diseño del proyecto de redes ante el operador de red, para la instalación de transformador o transformadores, según las necesidades energéticas del proyecto. se debe solicitar factibilidad y punto de conexiòn, tràmites de aprobación ante el operador de la red (EPM). Incluye el levantamiento y diseño del traslado y/o retiro de las redes que interfieran en el proyecto. Los diseños y materiales deben acogerse a la normatividad vigente para Colombia según RETIE y EPM y deben incluir los pagos asociados al proceso de revisión por parte del operador de red. Entregables: Plano sellado por el operador de Red en digital, modelo 3D																				
OE 15	Areas mayores a 5000 m2	global		$ 8.500.000		1,0		1,0	$ 8.500.000						$ -					1,00	$ 8.500.000
	Diseño de la Red Contra Incendio para el proyecto. Incluye el diseño de red seca o red húmeda según sea el caso. Los diseños se deben llevar a cabo según la normatividad vigente (NTC, NSR 10 y NFPA y otras), y se deberán entregar las especificaciones de los equipos que se requieran para el adecuado funcionamiento de la red diseñada. Incluye el diseño de tanques de agua (con dimensionamiento hidráulico), equipo de bombeo (con los requerimientos técnicos de las bombas), ubicación de tanques y cuarto de bombeo, ubicación de hidrantes, siamesas, gabinetes, aspersores, alarmas manuales y demás elementos y/o estudios que se requieran para extinción según el estudio de seguridad humana.																				
OE 16	Areas mayores a 5000 m2	m²		$ 5.626		63706,9		63.706,9	$ 358.415.127						$ -					63.706,92	$ 358.415.127
OE 17	Diseño de las redes de aguas lluvias internas del proyecto. Se deberán tener en cuenta e incorporar en los diseños las recomendaciones y/o parámetros que brinde los asesores del proyecto. Incluye la entrega de cantidades de obra, con sus respectivas memorias de cálculo, y cotizaciones vigentes del mercado, de acuerdo a los parámetros (unidades de medida, polilíneas, formato en Excel, etc) solicitados por la Entidad	m²		$ 2.244		66640,4		66.640,4	$ 149.541.135						$ -					66.640,43	$ 149.541.135
SUBTOTAL					**$ 1.174.981.924**				**$ 2.350.256.639**		**$ 167.659.386**		**$ 122.912.574**		**$ 97.955.290**				**$ 388.527.251**		**$ 1.961.729.388**
IVA (19%)					**$ 223.246.566**				**$ 446.548.761**		**$ 31.855.283**		**$ 23.353.389**		**$ 18.611.505**				**$ 73.820.178**		**$ 372.728.584**
Costo Total incluido IVA:					**$ 1.398.228.490**				**$ 2.796.805.400**		**$ 199.514.669**		**$ 146.265.964**		**$ 116.566.796**				**$ 462.347.428**		**$ 2.334.457.972**
											7,13%		5,23%		4,17%				16,53%		

$ 2.796.805.400
Diferencia
Liquidación $ 233.445.797

Juan Carlos Jaramillo Rueda
Representante Legal
Ingestructuras
Consultoría

German Alfredo Bazzani Pradere
Representante Legal
Consorcio Inter estudios EDU
Interventoría

Juan David Restrepo Rendón
Empresa de Desarrollo Urbano - EDU
Supervisión

Daniela Mira
Apoyo a la supervisión
Empresa de Desarrollo Urbano - EDU

edu Empresa de Desarrollo Urbano	**MEMORIA CANTIDADES ACTA DE PAGO**	Ingestructuras
Código: F-M-07-008	Fecha de aprobación: 28/09/2022	Versión:01

No Contrato:	**OE 150 DE 2025**	**MEMORIA N°**	**1**

Objeto Contrato	Estudios y diseños técnicos de redes para la unidad deportiva Atanasio Girardot, en el distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín
Actividad contractual	
Especialidad	☐ **Topografía** ☐ **Geotecnia** ☐ **Hidrologia** ☐ **Modelación Hidraulica** ☒ **Diseño hidráulico** ☐ **Estructuras** ☐ **Pavimentos**

GRAFICOS Y/O ESQUEMAS

PLANO DE REFERENCIA


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		DETALLE	CANTIDAD EJECUTADA
4.4	Diagnóstico de redes con circuito cerrado de televisión, diámetros entre 150 mm y 600 mm. Incluye lavado preliminar de la red. Según todas las normas y especificaciones de EPM. Este item se pagará siempre y cuando se requiera por metro lineal diagnosticado en caso de que no haya información desde EPM de la totalidad de la televisación del tramo a estudiar. Incluye modelacion BIM, deacuerdo a protocolo establec ido por la Entidad.	m	600,0		**500,0**









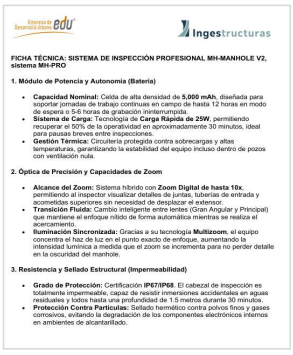



OBSERVACION: Se presenta avance parcial de la televisación de redes al interior y al exterior del estadio, con fecha de corte al mes de abril del 2026; en la cual se registran 500m de intervención en tramos 60 tramos, con una longitud máxima de 10m cada uno. Se anexa link de descarga con los videos sin editar

Juan Carlos Jaramillo Rueda	**German Alfredo Bazzani Pradere**	**Juan David Restrepo Rendón**	**Daniela Mira Palacio**
Elaboró	Aprobó	Visto Bueno	Visto Bueno
INGESTRUCTURAS	CONSORCIO INTER ESTUDIOS EDU	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE MEDELLÍN	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE MEDELLÍN

edu Empresa de Desarrollo Urbano	**MEMORIA CANTIDADES ACTA DE PAGO**	Ingestructuras
Código: F-M-07-008	Fecha de aprobación: 28/09/2022	Versión:01

No Contrato:	**OE 150 DE 2025**	**MEMORIA N°**	**2**


Objeto Contrato	Estudios y diseños técnicos de redes para la unidad deportiva Atanasio Girardot, en el distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín
Actividad contractual	
Especialidad	☐ Topografía ☐ Geotecnia ☐ Hidrologia ☐ Modelación Hidraulica ☒ Diseño hidráulico ☐ Estructuras ☐ Pavimentos


GRAFICOS Y/O ESQUEMAS



PLANO DE REFERENCIA


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		DETALLE	CANTIDAD EJECUTADA
OE 4	Levantamiento, investigación y diagnóstico de redes hidrosanitarias internas y/o externas (abasto, residuales y lluvias), mediante el uso de escaner 3D y georradar (GPR), para la caracterización técnica de la infraestructura existente (materialidad, diametros, lineamiento y estado general de las redes). Incluye los siguientes entregables: - Base de datos GIS en DWG de todas las anomalías e infraestructura existente - Fotografías relevantes - Mapas de anomalías georreferenciadas digitales con ubicación de anomalías e interpretaciones - Planos digitales en DWG y PDF -	m^2	54003,0		540,0













































OBSERVACION: Se realiza la entrega del informe parcial N°3, con avance general del 55% en los niveles de sótano, primer y segundo piso.

Juan Carlos Jaramillo Rueda	**German Alfredo Bazzani Pradere**	**Juan David Restrepo Rendón**	**Daniela Mira Palacio**
Elaboró	Aprobó	Visto Bueno	Visto Bueno
INGESTRUCTURAS	CONSORCIO INTER ESTUDIOS EDU	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE MEDELLÍN	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE MEDELLÍN

edu Empresa de Desarrollo Urbano	**MEMORIA CANTIDADES ACTA DE PAGO**	Ingestructuras
Código: F-M-07-008	Fecha de aprobación: 28/09/2022	Versión:01


No Contrato:	**OE 150 DE 2025**	**MEMORIA N°**	**3**


Objeto Contrato	Estudios y diseños técnicos de redes para la unidad deportiva Atanasio Girardot, en el distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín
Actividad contractual	
Especialidad	☐ **Topografía** ☐ **Geotecnia** ☐ **Hidrologia** ☐ **Modelación Hidraulica** ☒ **Diseño hidráulico** ☐ **Estructuras** ☐ **Pavimentos**

GRAFICOS Y/O ESQUEMAS


PLANO DE REFERENCIA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		DETALLE	CANTIDAD EJECUTADA
OE 5	Levantamiento, investigación y diagnóstico de redes hidrosanitarias internas y/o externas (abasto, residuales y lluvias), mediante el uso de escaner 3D y georradar (GPR), para la caracterización técnica de la infraestructura existente (materialidad, diametros, lineamiento y estado general de las redes). Incluye los siguientes entregables: - Base de datos GIS en DWG de todas las anomalías e infraestructura existente - Fotografías relevantes - Mapas de anomalías georreferenciadas digitales con ubicación de anomalías e interpretaciones - Planos digitales en DWG y PDF - Modelo BIM 3D - Informe técnico: incluye metdología del	m²	21997,0		9898,7

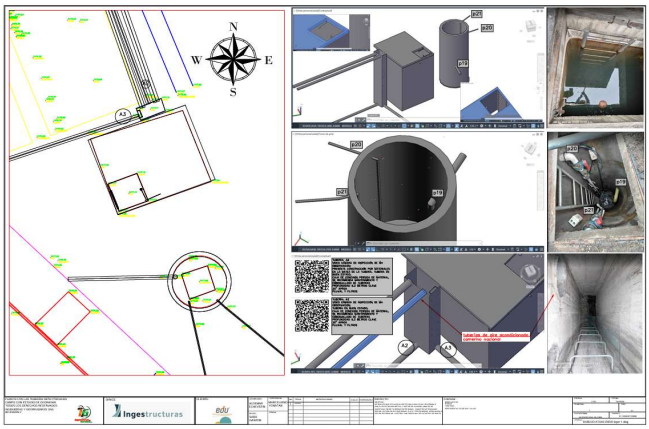

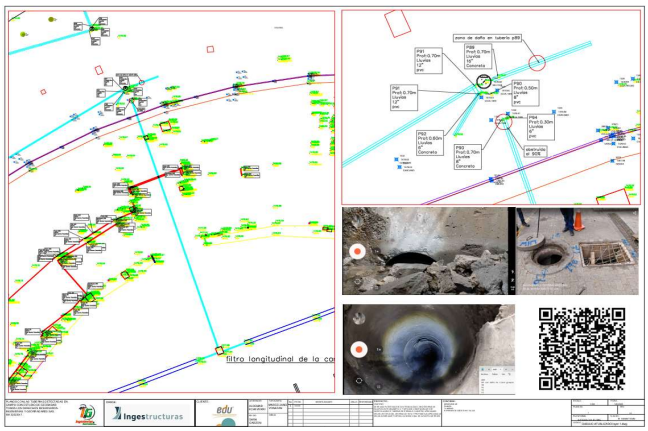



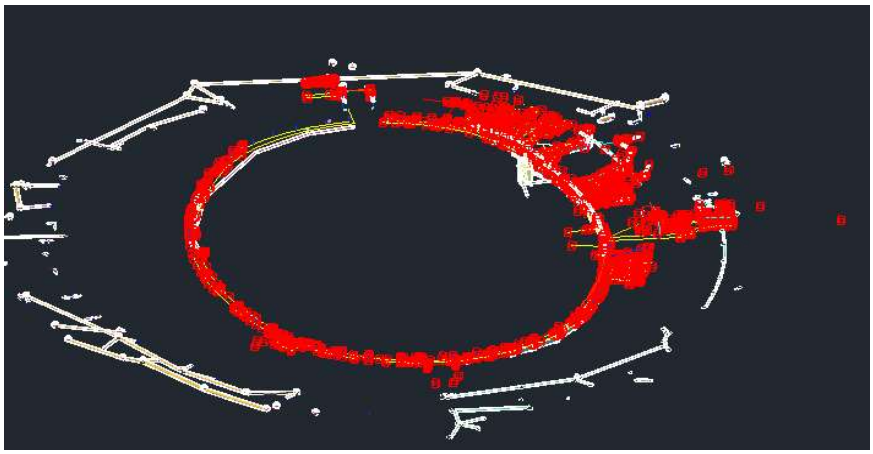

OBSERVACION: Se realiza la entrega del informe parcial N°3, con avance general del 55% en la inspección de redes externas. Se presenta imagen de nube de puntos de todos los elementos identificados en la investigación de redes externas

Juan Carlos Jaramillo Rueda	**German Alfredo Bazzani Pradere**	**Juan David Restrepo Rendón**	**Daniela Mira Palacio**
Elaboró	Aprobó	Visto Bueno	Visto Bueno
INGESTRUCTURAS	CONSORCIO INTER ESTUDIOS EDU	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE MEDELLÍN	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE MEDELLÍN

edu Empresa de Desarrollo Urbano	**MEMORIA CANTIDADES ACTA DE PAGO**	Ingestructuras
Código: F-M-07-008	Fecha de aprobación: 28/09/2022	Versión:01


No Contrato:	**OE 150 DE 2025**	**MEMORIA N°**	**4**

Objeto Contrato	Estudios y diseños técnicos de redes para la unidad deportiva Atanasio Girardot, en el distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín
Actividad contractual	
Especialidad	[ ] Topografía [ ] Geotecnia [ ] Hidrologia [ ] Modelación Hidraulica [X] Diseño RCI [ ] Estructuras [ ] Pavimentos


GRAFICOS Y/O ESQUEMAS


PLANO DE REFERENCIA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD		DETALLE	CANTIDAD EJECUTADA
OE 8	Procesamiento del levantamiento y diagnóstico de redes, al interior del Estadio, para la caracterización técnica de la infraestructura existente (materialidad, diametros, lineamiento y estado general de las redes). Incluye los siguientes entregables: - Base de datos GIS en DWG de todas las anomalías e infraestructura existente - Fotografías relevantes - Mapas de anomalías georreferenciadas digitales con ubicación de anomalías e interpretaciones - Planos digitales en DWG y PDF - Modelo BIM 3D - Informe técnico: incluye metdología del estudio, perfiles GPR interpretados y recomendaciones generales	m²	3007,0		1653,8

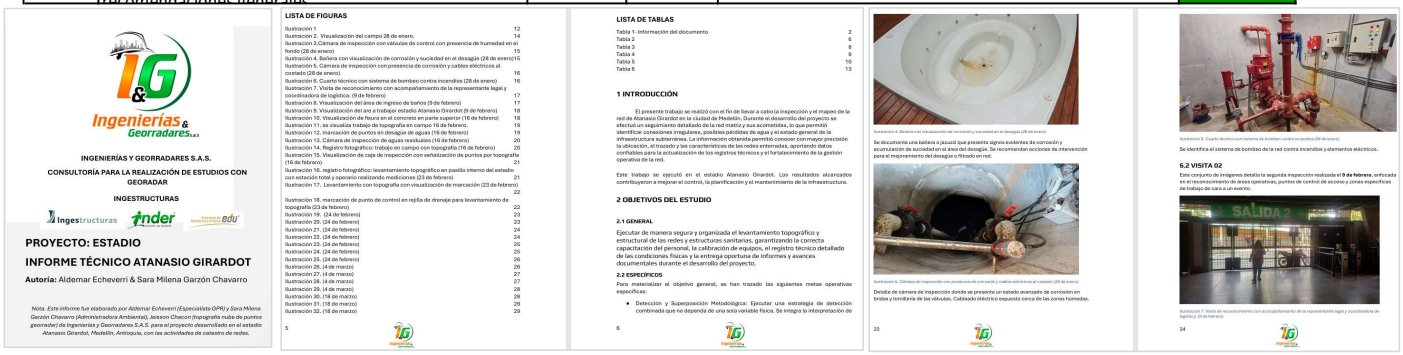



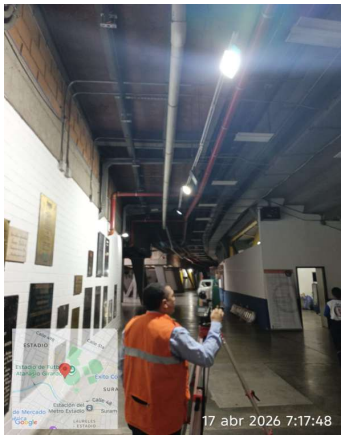

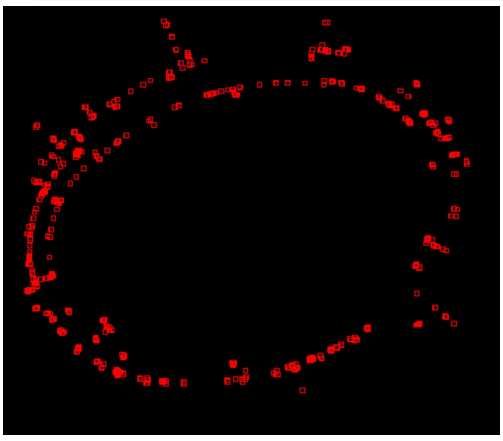

OBSERVACION: Se realiza la entrega del informe parcial N°3 de investigación de redes internas, con avance general del 55% en los niveles de sótano, primer y segundo piso para RCI. Se presenta nube de puntos de todos los elementos de la RCI, los cuales se actualizaran en el modelo 3D en próximas entregas de avance parcial

		Juan Restrepo	DANIELA MIRA PALACIO
Juan Carlos Jaramillo Rueda	**German Alfredo Bazzani Pradere**	**Juan David Restrepo Rendón**	**Daniela Mira Palacio**
Elaboró	Aprobó	Visto Bueno	Visto Bueno
INGESTRUCTURAS	CONSORCIO INTER ESTUDIOS EDU	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE MEDELLÍN	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE MEDELLÍN

Bogotá 12 de mayo de 2026.

038-EDU-REDESESTADIO-INT-2026

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
Carrera 49 No. 44 - 94
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación – Medellín

REFERENCIA: **ORDEN DE EJECUCIÓN Nro. OE 026 DE 2025** cuyo objeto es **"INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE REDES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN"**

Asunto: **Acta parcial No. 3 CONSULTORIA.**

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones asignadas a esta interventoría, nos permitimos entregar el acta parcial No. 3 con sus documentos soporte del contrato de consultoría **OE 139 DE 2026** cuyo objeto es **ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE REDES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN**, el cual esta revisado y avalado por esta interventoría.

Agradezco de antemano la atención suministrada a la presente y me suscribo muy atentamente.

ARQ. GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERESTUDIOS EDU

Tv. 24 a N° 60 - 12
Cel. (+57) 314 474 9354 – (+57) 315 654 4287
Telefax: 310 26 56
arquitecturayurbanismo12@gmail.com
Bogotá, D.C., Colombia

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Medellín, 10 de mayo de 2026

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU
Ciudad

ASUNTO: PAZ Y SALVO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES.

Por medio de la presente me permito certificar, que la firma que represento, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses.

Atentamente,



JUAN CARLOS JARAMILLO RUEDA
C.C: 98.669.877
Representante Legal
Ingestructuras Ingenieros S.A.S
NIT: 800.049.148-5





JUAN CARLOS JARAMILLO RUEDA

CC. 98.669.877

JUAN CARLOS JARAMILLO RUEDA
Ingeniero Civil
Tarjeta Profesional Nº 05202127575
Cédula Nº 98.669.877



REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
COPNIACOPNIACOPNIACO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800049148
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGESTRUCTURAS INGENIEROS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 30 # 10C - 228 OFICINA	TELÉFONO:	3220272
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6014385487**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		213067996

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	6	$ 5.440.000
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 2.548.800
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	4	$ 2.769.300
		SUBTOTAL:	14	**$ 11.038.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2	$ 170.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 70.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 320.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	12	$ 2.246.900
		SUBTOTAL:	16	**$ 2.807.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	16	$ 2.807.100
		SUBTOTAL:	16	**$ 2.807.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	16	$ 3.274.700
		SUBTOTAL:	16	**$ 3.274.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 19.927.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 19.927.200**

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-04-14, 08:27:20 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1080434216

Periodo Cotización 202603 **Periodo Servicio** 202604

Cliente:

PAGADA 2026-04-14

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIAS Y GEORRADARES SAS				
Documento	NI 901333229	**Dirección**	CL 19 #23 - 44 APT		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3228282		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	9
Ciudad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	HENAO ARANGO SANDRA ISABEL	**Identificación**	CC 1040033763		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1040046702		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					HENAO ARANGO JOHANA ANDREA	5376000 - 5		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-11	5	6.960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF04	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-04-14, 08:27:20 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1080434216

Periodo Cotización 202603 **Periodo Servicio** 202604

Cliente:

PAGADA 2026-04-14

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIAS Y GEORRADARES SAS				
Documento	NI 901333229	**Dirección**	CL 19 #23 - 44 APT		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3228282		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	9
Ciudad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	HENAO ARANGO SANDRA ISABEL	**Identificación**	CC 1040033763		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1067092045		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					DIAZ ARRIETA MARCELIANO ANTONIO	5376000 - 5		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30					F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-11	5	6.960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF04	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-04-14, 08:27:20 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1080434216

Periodo Cotización 202603 **Periodo Servicio** 202604

Cliente:

PAGADA 2026-04-14

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIAS Y GEORRADARES SAS				
Documento	NI 901333229	**Dirección**	CL 19 #23 - 44 APT		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3228282		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	9
Ciudad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	HENAO ARANGO SANDRA ISABEL	**Identificación**	CC 1040033763		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1040034085		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ECHEVERRI RAMIREZ ALDEMAR DE JESUS	5376000 - 5	000000001	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS040		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-11	5	6.960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF04	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-04-14, 08:27:20 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1080434216

Periodo Cotización 202603 **Periodo Servicio** 202604

Cliente:

PAGADA 2026-04-14

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIAS Y GEORRADARES SAS				
Documento	NI 901333229	**Dirección**	CL 19 #23 - 44 APT		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3228282		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	9
Ciudad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	HENAO ARANGO SANDRA ISABEL	**Identificación**	CC 1040033763		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1017187486		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					TANGARIFE BETANCUR YONATAN STIVEN	5376000 - 5		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.750.905	230201		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-11	5	6.960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF04	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-04-14, 08:27:20 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1080434216

Periodo Cotización 202603 **Periodo Servicio** 202604

Cliente:

PAGADA 2026-04-14

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIAS Y GEORRADARES SAS				
Documento	NI 901333229	**Dirección**	CL 19 #23 - 44 APT		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3228282		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	9
Ciudad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	HENAO ARANGO SANDRA ISABEL	**Identificación**	CC 1040033763		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1040049639		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					HENAO ARANGO LUIS ANGEL	5376000 - 5	000000001	ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-11	5	6.960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF04	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-04-14, 08:27:20 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1080434216

Periodo Cotización 202603 **Periodo Servicio** 202604

Cliente:

PAGADA 2026-04-14

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIAS Y GEORRADARES SAS				
Documento	NI 901333229	**Dirección**	CL 19 #23 - 44 APT		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3228282		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	9
Ciudad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	HENAO ARANGO SANDRA ISABEL	**Identificación**	CC 1040033763		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1040033763		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					HENAO ARANGO SANDRA ISABEL	5376000 - 5		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
															0	30	30	30	30			F	$ 1.750.905	230201		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS040		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-11	5	6.960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF04	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-04-14, 08:27:20 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1080434216

Periodo Cotización 202603 **Periodo Servicio** 202604

Cliente:

PAGADA 2026-04-14

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIAS Y GEORRADARES SAS				
Documento	NI 901333229	**Dirección**	CL 19 #23 - 44 APT		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3228282		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	9
Ciudad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	HENAO ARANGO SANDRA ISABEL	**Identificación**	CC 1040033763		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1036786124		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					DUQUE VARGAS ARLEY	5376000 - 5		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.750.905	230201		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS040		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-11	5	6.960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF04	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 121.900	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-04-14, 08:27:20 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1080434216

Periodo Cotización 202603 **Periodo Servicio** 202604

Cliente:

PAGADA 2026-04-14

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIAS Y GEORRADARES SAS				
Documento	NI 901333229	**Dirección**	CL 19 #23 - 44 APT		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3228282		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	9
Ciudad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	HENAO ARANGO SANDRA ISABEL	**Identificación**	CC 1040033763		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1025761300		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					MOLINA GONZALEZ STIVEN	5376000 - 5		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X															0	13	13	13	13			F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 758.726	$ 121.400	$ 0	$ 0	EPS040		4 %	$ 758.726	$ 30.400	$ 0	14-11	5	6.960 %	$ 758.726	$ 52.900	CCF04	4 %	$ 758.726	$ 30.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 121.400	$ 0	$ 0	$ 30.400	$ 52.900	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-04-14, 08:27:20 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1080434216

Periodo Cotización 202603 **Periodo Servicio** 202604

Cliente:

PAGADA 2026-04-14

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIAS Y GEORRADARES SAS				
Documento	NI 901333229	**Dirección**	CL 19 #23 - 44 APT		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3228282		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	9
Ciudad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	HENAO ARANGO SANDRA ISABEL	**Identificación**	CC 1040033763		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1152203875		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ALVAREZ MARTINEZ JOHN WILDER	5376000 - 5		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
X	X														0	1	1	1	1			F	$ 1.750.905	230301		16 %	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	EPS037		4 %	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	14-11	5	6.960 %	$ 58.364	$ 4.100	CCF04	4 %	$ 58.364	$ 2.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 4.100	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Certificado
Bancario

Martes, 20 de mayo de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INGESTRUCTURAS INGENIEROS SAS identificado(a) con NIT 800049148, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	10872835754	2002/08/02	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.


*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Ejecución Contrato



Porcentaje Ejecutado del Contrato

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU-
HOJA DE VIDA ORDEN DE COMPRA POR CONVENIO

Estado	Activo	Fecha	17-ene.-2026	Plazo Inicial	120 Dias
Numero	139	Fecha Inicio	5-feb.-2026	Fecha Final	02-oct.-2026
Tipo	CONSULTORIA				
Proveedor	800049148 INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S.				
Objeto	ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE REDES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN				

Valor Inicial	1.398.228.490
Valor Adiciones	1.398.576.910
Valor Total Liberado	0
Valor Cambio Imputacion	0
Valor Total	2.796.805.400
Valor Total Pagado	345.780.633
Saldo Total	2.451.024.767

Porcentaje Adicionado 100 %

Adiciones en Tiempo

Ad. Numero	Fecha	
1	14-abr.-2026	120 Dias

Detalle Hoja De Vida
ORDEN DE COMPRA No 139
Proveedor
INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S.

Página: 1
Programa: SCtContr
Usuario: juan.restrepo
Fecha Imp.: 2026/05/15
Hora: 02:49:08p. m.

T op.	Num.		Fecha	Conv.	C. costo	Prov	Valor	Pagado	Liberaciones	Saldo	% Ejec
3304		**Adiciones**									
3304	18143	# 1	14-abr.-2026	CI 43925 DI	0030028	01	1,398,576,910	0	0	1,398,576,910.00	0%
					Total Adiciones		**1.398.576.910**	**0**	**0**	**1.398.576.910**	**0%**
3326											
3326	139		17-ene.-2026	CI 43925 DI	0030028	01	1,398,228,490	345,780,633	0	1,052,447,857.00	25%
					Total		**1.398.228.490**	**345.780.633**	**0**	**1.052.447.857**	**25%**

Detalle Hoja De Vida
ORDEN DE COMPRA No 139
Proveedor
INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S.

T op.	Num.	Fecha	Conv.	C. costo	Prov	Valor	Pagado	Liberaciones	Saldo	% Ejec

Los siguientes compromisos estan asociados al contrato y se encuentra en estado BLOQUEADO

Tipo Operacion	Numero	Fecha

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3

PROYECTO: **ORDEN DE EJECUCIÓN Nro. OE 026 DE 2026** cuyo objeto es **INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE REDES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN**

Ubicación del proyecto: Municipio de Medellín

Periodo:
Del 01 de ABRIL 2026 al 29 de ABRIL 2026.

Consorcio Inter estudios EDU

ABRIL 2026

Calle 57 Nº 18 – 22 Oficina 602
Cel. (+57) 314 474 9354 – (+57) 315 654 4287
Telefax: 310 26 56 - 3836763
bazzani.licitaciones20@gmail.com
Bogotá, D.C., Colombia

Tabla de contenido

1. INFORMACIÓN general 3
   1.1 Introducción 3
2. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO 3
3. Alcance del objeto contractual 3
4. Datos generales de los contratos 5
   4.1.1 Información del contrato de Interventoría 5
   4.1.2 4.1.2 Información del contrato de consultoría 6
5. Localización del proyecto 7
6. PERSONAL PROFESIONAL Y CRONOGRAMA DE OBRA 8
   6.1 PERSONAL profesional interventoría 8
   6.2 Personal profesional de la consultoría 8
   6.3 Cronograma de obra. 9
7. CORRESPONDENCIA 31
   7.1 Correspondencia generada por la interventoría. 31
   7.1 Correspondencia generada por el consultor 32
   7.2 Correspondencia generada por la supervisión. 32
8. INFORME TÉCNICO 32
9. INFORME FINANCIERO ..... 36.
   9.1.1 Detalle financiero contrato de Interventoría No. OE 26 DE 2026 37
   9.1.2 Detalle financiero contrato de consultoría No. OE 152 DE 2025 38
10. INFORME JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO 39
   10.1.1 Garantías contractuales interventoría 39
   10.1.2 Garantías contractuales consultoría 39
11. ANEXOS: 40
12. CONCLUSIONES 41
12.1. Componente Técnico 41

Calle 57 Nº 18 – 22 Oficina 602
Cel. (+57) 314 474 9354 – (+57) 315 654 4287
Telefax: 310 26 56 - 3836763
bazzani.licitaciones20@gmail.com
Bogotá, D.C., Colombia

12.1. INFORMACIÓN general

1.1 Introducción

La Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, en el marco de sus funciones como entidad descentralizada del orden municipal, actúa como gerente integral de proyectos estratégicos para el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, desarrollando procesos de estructuración, contratación y seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico.

En cumplimiento de la Orden de Ejecución N° 26 de 2026, cuyo objeto corresponde a la Interventoría integral a los estudios y diseños técnicos de redes para la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, la interventoría realiza el presente informe mensual con el propósito de documentar el avance y estado del contrato durante el período de corte correspondiente.

El objeto contractual contempla la supervisión técnica, administrativa, financiera y jurídica de los estudios y diseños de redes húmedas, red de gas, sistema de detección y alarma contra incendios, y sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, normativas vigentes y obligaciones contractuales establecidas por la Entidad.

12.2. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO

La empresa de desarrollo urbano, dentro de la planeación del proyecto, estableció las siguientes actividades a realizar de acuerdo con el anexo técnico:

De manera general las principales actividades para desarrollar son:

- Levantamiento, investigación y diagnóstico de redes hidrosanitarias.
- Diseño de redes internas del proyecto.
- Diseño de redes externas del proyecto.
- Trámites para la aprobación de diseños.
- Diseño de red de gas.
- Diseño de red contra incendios.
- Diseño de sistema de aire acondicionado.

12.3. Alcance del objeto contractual

3.1. CONDICIONES GENERALES:

El objeto del contrato es: "**ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE REDES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – MEDELLÍN**".

Las condiciones generales corresponden a las del contrato marco, se puntualizan las correspondientes a la presente orden de ejecución.

a. El consultor tendrá presente que el plazo contractual es de Ciento veinte (120) días calendario, dichos productos deben entregarse en los tiempos que la entidad indique, partiendo de esto el consultor entregará, previo a la suscripción del acta de inicio, el cronograma detallado, con el que se hará el seguimiento a la ejecución de la totalidad de actividades, y trámites a curaduría hasta lograr la aprobación del interventor, del supervisor designado por la Entidad y de la curaduría asignada. El interventor deberá aprobar el cronograma para la ejecución de los estudios y diseños, cuidando que se conserven los hitos establecidos por la Entidad, y también presentará para cada actividad un tiempo estimado de revisión y aprobación final. El interventor deberá realizar un acompañamiento continuo al proceso de diseño, durante el que se brindarán asesorías y se harán revisiones periódicas al avance, que deberán facilitar que la aprobación final por parte de la interventoría se pueda realizar en periodos de tiempo muy cortos.

ANEXO CRONOGRAMA. El consultor deberá hacer entrega de un plan de trabajo a implementar en el presente contrato, con el fin de organizar, optimizar y simplificar las tareas necesarias para el cumplimiento del alcance contractual, previa aprobación de la interventoría. Este cronograma deberá tener desglosado los hitos BIM en entregables parciales y finales por cada una de las disciplinas.

3.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS O ALCANCE

- Levantamiento, investigación y diagnóstico de redes hidrosanitarias.
- Diseño de redes internas del proyecto.
- Diseño de redes externas del proyecto.
- Trámites para la aprobación de diseños.
- Diseño de red de gas.
- Diseño de red contra incendios.
- Diseño de sistema de aire acondicionado.

12.4. Datos generales de los contratos

1.1.1 Información del contrato de Interventoría

En desarrollo de **la Orden de Ejecución N° 26 de 2026**, derivada del Contrato Marco N° 07 de 2024. Su objeto corresponde a la interventoría integral a los estudios y diseños técnicos de redes para la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, con el propósito de realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico a los productos desarrollados por el consultor, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, normativas y técnicas establecidas por la Entidad.

Contratista	CONSORCIO INTER ESTUDIOS EDU
NIT	901.886.426-4
Número de Contrato (SECOP II)	CO1.PCCNTR.8780738
OBJETO:	Interventoría integral a los estudios y diseños técnicos de redes para la Unidad Deportiva Atanasio Girardot
FECHA DE INICIO:	05 DE FEBRERO DE 2026
VALOR INICIAL:	$ 353.866.104 COP (Incluye IVA)
PLAZO INICIAL:	135 días calendario
ADICIÓN NO.1:	$ 353.866.104
AMPLIACIÓN NO.1:	120 días calendario
AMPLIACIÓN NO. 2	N/A
AMPLIACIÓN NO 3:	N/A
SUSPENSIÓN NO.1:	N/A
REANUDACIÓN NO.1:	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 707.732.208,00 COP
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	255 días calendario
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	19 DE JUNIO DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: FINAL	17 DE OCTUBRE DE 2026

1.1.2 4.1.2 Información del contrato de consultoría

En el marco de la **Orden de Ejecución N° 139 de 2026**, derivada del Contrato Marco correspondiente. Su objeto contempla la elaboración de los estudios y diseños técnicos de redes para la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, así como sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica, bajo lineamientos técnicos de la Entidad y conforme a la normativa vigente aplicable.

CONTRATISTA:	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S
NIT CONTRATISTA:	800049148
NO. CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8886979
OBJETO:	Estudios y diseños técnicos de redes para la Unidad Deportiva Atanasio Girardot
FECHA DE INICIO:	05 DE FEBRERO DE 2026
VALOR INICIAL:	$1.398.228.490 COP (Incluye IVA)
PLAZO INICIAL:	120 DÍAS
ADICIÓN NO.1:	$ 1.398.576.910
AMPLIACIÓN 1:	120 días calendario
AMPLIACIÓN 2:	N/A
SUSPENSIÓN NO.1:	N/A
REANUDACIÓN NO.1:	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 2.796.805.400,00 COP
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	240 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	04 DE JUNIO DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: FINAL	02 DE OCTUBRE DE 2026

12.5. Localización del proyecto

El proyecto objeto del presente contrato se desarrolla en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, ubicada en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, Departamento de Antioquia
De acuerdo con la información contractual registrada en SECOP II, la dirección asociada al proceso corresponde a:

Carrera 49 N° 44-94
Medellín, Antioquia – Colombia.



Calle 57 Nº 18 – 22 Oficina 602
Cel. (+57) 314 474 9354 – (+57) 315 654 4287
Telefax: 310 26 56 - 3836763
bazzani.licitaciones20@gmail.com
Bogotá, D.C., Colombia

12.6. PERSONAL PROFESIONAL Y CRONOGRAMA DE OBRA

1.2 PERSONAL profesional interventoría

El equipo profesional de la interventoría corresponde al personal presentado en la propuesta y aprobado por la Entidad para la ejecución del contrato OE 26 de 2026. Este equipo tiene la responsabilidad de realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico a los estudios y diseños desarrollados por el consultor.

NOMBRE DEL PROFESIONAL	ESPECIALIDAD SEGÚN FICHA TÉCNICA
Gonzalo Fernando Cisneros Garavito	INGENIERO MECÁNICO
Omar Johanny Archila Mendoza	INGENIERO SANITARIO
Henry Alfonso Centeno Centeno	INGENIERO MECÁNICO
Yair Antonio Calle	INGENIERO SANITARIO

1.3 Personal profesional de la consultoría

De acuerdo a los requerimientos de la ficha técnica los profesionales solicitados para el equipo de consultoría son los siguientes:

NOMBRE DEL PROFESIONAL	ESPECIALIDAD SEGÚN FICHA TÉCNICA
FERNANDO CABRERA	INGENIERO MECÁNICO
FRAN FELIPE GONZALEZ	INGENIERO SANITARIO
JUAN CARLOS TRIGOS HUERTAS	INGENIERO MECÁNICO
CAROLINA MONSALVE	INGENIERO SANITARIO

1.4 Cronograma de obra.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la interventoría durante el mes de abril de 2026 y con base en la programación actualizada del proyecto, para el corte del presente informe se registra un avance programado del 17,00% frente a un avance ejecutado del 22,00%, evidenciando un adelanto del 5% respecto a la programación vigente, como resultado de la reprogramación del cronograma y la continuidad en el desarrollo de actividades de diagnóstico y avance hacia la fase de diseño.

Nombre de tarea	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	Duración	Comienzo	Fin
ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE REDES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN	**17%**	**22%**	**240 días**	**jue 05/02/26**	**vie 02/10/26**
Inicio contrato	**100%**	100%	**0 días**	**jue 05/02/26**	**jue 05/02/26**
Acta de inicio	100%	100%	0 días	jue 05/02/26	jue 05/02/26
Levantamiento y diagnóstico de redes húmedas	**62%**	48%	**168 días**	**jue 05/02/26**	**mié 22/07/26**
Preliminares	**100%**	100%	**50 días**	**jue 05/02/26**	**jue 26/03/26**
Revisión de información existente año 2013	100%	100%	15 días	jue 05/02/26	jue 19/02/26
Analisis de condiciones contractuales: elaboración de balance y presentación de obras extras	100%	100%	50 días	jue 05/02/26	jue 26/03/26
Preoperativos	**70%**	70%	**120 días**	**jue 05/02/26**	**jue 04/06/26**
Gestión de permisos y logística de acompañamiento: INDER - EDU	70%	70%	120 días	jue 05/02/26	jue 04/06/26
Trabajos de campo	**66%**	43%	**120 días**	**jue 05/02/26**	**jue 04/06/26**
Levantamiento e investigación de redes	**66%**	43%	**120 días**	**jue 05/02/26**	**jue 04/06/26**
Investigación de red de abastos interna, mediante escaner 3D y georradar	70%	70%	120 días	jue 05/02/26	jue 04/06/26
Investigación de red de alcantarillado residual interna, mediante escaner 3D y georradar	70%	70%	120 días	jue 05/02/26	jue 04/06/26
Investigación de red de alcantarillado lluvias interna, mediante escaner 3D y georradar	70%	70%	120 días	jue 05/02/26	jue 04/06/26

Levantamiento y diagnóstico de red de aire acondicionado, mediante escaner 3D y georradar	70%	70%	120 días	jue 05/02/26	jue 04/06/26
Levantamiento y diagnóstico de red de gas, mediante escaner 3D y georradar	70%	0%	120 días	jue 05/02/26	jue 04/06/26
Levantamiento y diagnóstico de red RCI, mediante escaner 3D y georradar	70%	0%	120 días	jue 05/02/26	jue 04/06/26
Investigación de red de alcantarillado y abastos externas, mediante escaner 3D y georradar	40%	40%	60 días	lun 06/04/26	jue 04/06/26
Diagnóstico de redes CCTV	40%	0%	60 días	lun 06/04/26	jue 04/06/26
Procesamiento de la información	**0%**	40%	**35 días**	**vie 05/06/26**	**jue 09/07/26**
Elaboración de planos de redes húmedas existentes	0%	40%	30 días	vie 05/06/26	sáb 04/07/26
Elaboración modelo 3D de condiciones existentes	0%	40%	30 días	vie 05/06/26	sáb 04/07/26
Revisión interventoría	0%	40%	5 días	dom 05/07/26	jue 09/07/26
Elaboración de informes y conclusiones	**0%**	31%	**48 días**	**vie 05/06/26**	**mié 22/07/26**
Informe de diagnóstico de redes húmedas	0%	50%	30 días	vie 05/06/26	sáb 04/07/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	dom 05/07/26	jue 09/07/26
Atención observaciones	0%	0%	8 días	vie 10/07/26	vie 17/07/26
Revisión y aprobación interventoría	0%	0%	5 días	sáb 18/07/26	mié 22/07/26
Fin levantamiento y diagnóstico redes húmedas	0%	0%	0 días	mié 22/07/26	mié 22/07/26
Diagnóstico técnico de sistemas de bombeo	**57%**	48%	**92 días**	**dom 22/03/26**	**dom 21/06/26**
Preoperativos	**65%**	65%	**60 días**	**dom 22/03/26**	**mié 20/05/26**
Gestión de permisos y logística de acompañamiento: INDER - EDU	65%	65%	60 días	dom 22/03/26	mié 20/05/26
Trabajos de campo	**62%**	50%	**60 días**	**mar 24/03/26**	**vie 22/05/26**
Diagnóstico técnico de sistemas	**62%**	50%	**60 días**	**mar 24/03/26**	**vie 22/05/26**
Sistema de bombeo agua lluvias y/o residual	62%	50%	60 días	mar 24/03/26	vie 22/05/26

Calle 57 Nº 18 – 22 Oficina 602
Cel. (+57) 314 474 9354 – (+57) 315 654 4287
Telefax: 310 26 56 - 3836763
bazzani.licitaciones20@gmail.com
Bogotá, D.C., Colombia

Sistema de bombeo y presurización de agua potable	62%	50%	60 días	mar 24/03/26	vie 22/05/26
Sistema de bombeo RCI	62%	50%	60 días	mar 24/03/26	vie 22/05/26
Inspección de sistemas eléctricos sistemas de bombeo	62%	50%	60 días	mar 24/03/26	vie 22/05/26
Elaboración de informes y conclusiones	**0%**	0%	**30 días**	**sáb 23/05/26**	**dom 21/06/26**
Informe de diagnóstico técnico de sistemas	0%	0%	15 días	sáb 23/05/26	sáb 06/06/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	dom 07/06/26	jue 11/06/26
Atención observaciones	0%	0%	5 días	vie 12/06/26	mar 16/06/26
Revisión y aprobación interventoría	0%	0%	5 días	mié 17/06/26	dom 21/06/26
Fin diagnóstico técnico de sistemas de bombeo	0%	0%	0 días	dom 21/06/26	dom 21/06/26
Diagnóstico del sistema eléctrico	**66%**	59%	**136 días**	**mar 10/02/26**	**jue 25/06/26**
Preoperativos	**75%**	75%	**106 días**	**mar 10/02/26**	**mar 26/05/26**
Gestión de permisos y logística de acompañamiento: INDER - EDU	75%	75%	106 días	mar 10/02/26	mar 26/05/26
Entrega de levantamiento arquitectónico interior aprobado por interventoria	0%	30%	0 días	jue 30/04/26	jue 30/04/26
Trabajos de campo	**79%**	70%	**106 días**	**mar 10/02/26**	**mar 26/05/26**
Diagnóstico sistema eléctrico interno	**100%**	70%	**30 días**	**mar 10/02/26**	**mié 11/03/26**
Diagnóstico de cumplimiento normativo de redes al interior del estadio	100%	70%	30 días	mar 10/02/26	mié 11/03/26
Diagnóstico sistema eléctrico externo	**73%**	70%	**100 días**	**lun 16/02/26**	**mar 26/05/26**
Diagnóstico de cumplimiento normativo de redes en locales comerciales	73%	70%	100 días	lun 16/02/26	mar 26/05/26
Elaboración de informes y conclusiones	**58%**	41%	**84 días**	**jue 12/03/26**	**mié 03/06/26**
Informe de diagnóstico eléctrico interno	98%	70%	50 días	jue 12/03/26	jue 30/04/26
Elaboración modelo RVT diagnóstico eléctrico e iluminación	0%	0%	20 días	jue 30/04/26	mar 19/05/26

Calle 57 Nº 18 – 22 Oficina 602
Cel. (+57) 314 474 9354 – (+57) 315 654 4287
Telefax: 310 26 56 - 3836763
bazzani.licitaciones20@gmail.com
Bogotá, D.C., Colombia

Revisión interventoría	0%	0%	5 días	mié 20/05/26	dom 24/05/26
Atención observaciones	0%	0%	5 días	lun 25/05/26	vie 29/05/26
Revisión y aprobación interventoría	0%	0%	5 días	sáb 30/05/26	mié 03/06/26
Elaboración de informes y conclusiones	**0%**	0%	**30 días**	**mié 27/05/26**	**jue 25/06/26**
Informe de diagnóstico eléctrico externo	0%	0%	15 días	mié 27/05/26	mié 10/06/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	jue 11/06/26	lun 15/06/26
Atención observaciones	0%	0%	5 días	mar 16/06/26	sáb 20/06/26
Revisión y aprobación interventoría	0%	0%	5 días	dom 21/06/26	jue 25/06/26
Fin diagnóstico sistema eléctrico	0%	0%	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26
Diseño de redes hidrosanitarias y de gas internas	**0%**	14%	**151 días**	**mar 05/05/26**	**vie 02/10/26**
Red de abasto	**0%**	14%	**151 días**	**mar 05/05/26**	**vie 02/10/26**
Preoperativos	**0%**	30%	**90 días**	**mar 05/05/26**	**dom 02/08/26**
Entrega de modelos de topografía, arquitectura y estructura coordinados y aprobados por todas las entidades externas que corresponda	0%	30%	0 días	vie 15/05/26	vie 15/05/26
Mesas técnicas de trabajo con Arquitectura	0%	30%	90 días	mar 05/05/26	dom 02/08/26
Definición criterios de diseño hidrosanitaio	0%	30%	60 días	mar 05/05/26	vie 03/07/26
Desarrollo del diseño	**0%**	0%	**85 días**	**lun 18/05/26**	**lun 10/08/26**
Trazado esquemático - LOD 100	0%	0%	15 días	lun 18/05/26	lun 01/06/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	lun 01/06/26	lun 01/06/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	mar 02/06/26	sáb 06/06/26
Definición de rutas y trazados preliminares - LOD 200	0%	0%	25 días	dom 07/06/26	mié 01/07/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	mié 01/07/26	mié 01/07/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	jue 02/07/26	lun 06/07/26
Modelación coordinada con Arquitectura y estructuras - LOD 300	0%	0%	30 días	mar 07/07/26	mié 05/08/26

Calle 57 Nº 18 – 22 Oficina 602
Cel. (+57) 314 474 9354 – (+57) 315 654 4287
Telefax: 310 26 56 - 3836763
bazzani.licitaciones20@gmail.com
Bogotá, D.C., Colombia

Entrega avances	0%	0%	0 días	mié 05/08/26	mié 05/08/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	jue 06/08/26	lun 10/08/26
Procesamiento de la información	**0%**	0%	**35 días**	**mar 11/08/26**	**lun 14/09/26**
Diseño de detalles constructivos - LOD 350	0%	0%	30 días	mar 11/08/26	mié 09/09/26
Elaboración de planos definitivos	0%	0%	5 días	jue 10/09/26	lun 14/09/26
Especificaciones técnicas y memorias	**0%**	0%	**88 días**	**mar 07/07/26**	**vie 02/10/26**
Memorias de cálculo	0%	0%	30 días	mar 07/07/26	mié 05/08/26
Cantidades de obra	0%	0%	5 días	mar 15/09/26	sáb 19/09/26
Consolidado y entrega final	0%	0%	0 días	sáb 19/09/26	sáb 19/09/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	dom 20/09/26	jue 24/09/26
Atención observaciones	0%	0%	8 días	vie 25/09/26	vie 02/10/26
Fin Diseño red de abasto	0%	0%	0 días	vie 02/10/26	vie 02/10/26
Red de alcantarillado lluvias y punto de conexión para descarga	**0%**	14%	**151 días**	**mar 05/05/26**	**vie 02/10/26**
Preoperativos	**0%**	30%	**90 días**	**mar 05/05/26**	**dom 02/08/26**
Entrega de modelos de topografía, arquitectura y estructura coordinados y aprobados por todas las entidades externas que corresponda	0%	30%	0 días	vie 15/05/26	vie 15/05/26
Mesas técnicas de trabajo con Arquitectura	0%	30%	90 días	mar 05/05/26	dom 02/08/26
Definición criterios de diseño hidrosanitario	0%	30%	60 días	mar 05/05/26	vie 03/07/26
Desarrollo del diseño	**0%**	0%	**85 días**	**lun 18/05/26**	**lun 10/08/26**
Trazado esquemático - LOD 100	0%	0%	15 días	lun 18/05/26	lun 01/06/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	lun 01/06/26	lun 01/06/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	mar 02/06/26	sáb 06/06/26
Definición de rutas y trazados preliminares - LOD 200	0%	0%	25 días	dom 07/06/26	mié 01/07/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	mié 01/07/26	mié 01/07/26

Calle 57 Nº 18 – 22 Oficina 602
Cel. (+57) 314 474 9354 – (+57) 315 654 4287
Telefax: 310 26 56 - 3836763
bazzani.licitaciones20@gmail.com
Bogotá, D.C., Colombia

Revisión interventoría	0%	0%	5 días	jue 02/07/26	lun 06/07/26
Modelación coordinada con Arquitectura y estructuras - LOD 300	0%	0%	30 días	mar 07/07/26	mié 05/08/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	mié 05/08/26	mié 05/08/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	jue 06/08/26	lun 10/08/26
Procesamiento de la información	**0%**	0%	**35 días**	**mar 11/08/26**	**lun 14/09/26**
Diseño de detalles constructivos - LOD 350	0%	0%	30 días	mar 11/08/26	mié 09/09/26
Elaboración de planos definitivos	0%	0%	5 días	jue 10/09/26	lun 14/09/26
Especificaciones técnicas y memorias	**0%**	0%	**88 días**	**mar 07/07/26**	**vie 02/10/26**
Memorias de cálculo	0%	0%	30 días	mar 07/07/26	mié 05/08/26
Cantidades de obra	0%	0%	5 días	mar 15/09/26	sáb 19/09/26
Consolidado y entrega final	0%	0%	0 días	sáb 19/09/26	sáb 19/09/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	dom 20/09/26	jue 24/09/26
Atención observaciones	0%	0%	8 días	vie 25/09/26	vie 02/10/26
Fin Diseño red de alcantarillado lluvias	0%	0%	0 días	vie 02/10/26	vie 02/10/26
Red de alcantarillado residual y punto de conexión para descarga	**0%**	14%	**151 días**	**mar 05/05/26**	**vie 02/10/26**
Preoperativos	**0%**	30%	**90 días**	**mar 05/05/26**	**dom 02/08/26**
Entrega de modelos de topografía, arquitectura y estructura coordinados y aprobados por todas las entidades externas que corresponda	0%	30%	0 días	vie 15/05/26	vie 15/05/26
Mesas técnicas de trabajo con Arquitectura	0%	30%	90 días	mar 05/05/26	dom 02/08/26
Definición criterios de diseño hidrosanitario	0%	30%	60 días	mar 05/05/26	vie 03/07/26
Desarrollo del diseño	**0%**	0%	**85 días**	**lun 18/05/26**	**lun 10/08/26**
Trazado esquemático - LOD 100	0%	0%	15 días	lun 18/05/26	lun 01/06/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	lun 01/06/26	lun 01/06/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	mar 02/06/26	sáb 06/06/26

Calle 57 Nº 18 – 22 Oficina 602
Cel. (+57) 314 474 9354 – (+57) 315 654 4287
Telefax: 310 26 56 - 3836763
bazzani.licitaciones20@gmail.com
Bogotá, D.C., Colombia

Definición de rutas y trazados preliminares - LOD 200	0%	0%	25 días	dom 07/06/26	mié 01/07/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	mié 01/07/26	mié 01/07/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	jue 02/07/26	lun 06/07/26
Modelación coordinada con Arquitectura y estructuras - LOD 300	0%	0%	30 días	mar 07/07/26	mié 05/08/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	mié 05/08/26	mié 05/08/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	jue 06/08/26	lun 10/08/26
Procesamiento de la información	**0%**	0%	**35 días**	**mar 11/08/26**	**lun 14/09/26**
Diseño de detalles constructivos - LOD 350	0%	0%	30 días	mar 11/08/26	mié 09/09/26
Elaboración de planos definitivos	0%	0%	5 días	jue 10/09/26	lun 14/09/26
Especificaciones técnicas y memorias	**0%**	0%	**88 días**	**mar 07/07/26**	**vie 02/10/26**
Memorias de cálculo	0%	0%	30 días	mar 07/07/26	mié 05/08/26
Cantidades de obra	0%	0%	5 días	mar 15/09/26	sáb 19/09/26
Consolidado y entrega final	0%	0%	0 días	sáb 19/09/26	sáb 19/09/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	dom 20/09/26	jue 24/09/26
Atención observaciones	0%	0%	8 días	vie 25/09/26	vie 02/10/26
Fin Diseño red de alcantarillado residual	0%	0%	0 días	vie 02/10/26	vie 02/10/26
Red de gas	**0%**	14%	**151 días**	**mar 05/05/26**	**vie 02/10/26**
Preoperativos	**0%**	30%	**90 días**	**mar 05/05/26**	**dom 02/08/26**
Entrega de modelos de topografía, arquitectura y estructura coordinados y aprobados por todas las entidades externas que corresponda	0%	30%	1 día	vie 15/05/26	vie 15/05/26
Mesas técnicas de trabajo con Arquitectura	0%	30%	90 días	mar 05/05/26	dom 02/08/26
Definición criterios de diseño	0%	30%	60 días	mar 05/05/26	vie 03/07/26
Desarrollo del diseño	**0%**	0%	**85 días**	**lun 18/05/26**	**lun 10/08/26**
Trazado esquemático - LOD 100	0%	0%	15 días	lun 18/05/26	lun 01/06/26

Calle 57 Nº 18 – 22 Oficina 602
Cel. (+57) 314 474 9354 – (+57) 315 654 4287
Telefax: 310 26 56 - 3836763
bazzani.licitaciones20@gmail.com
Bogotá, D.C., Colombia

Entrega avances	0%	0%	0 días	lun 01/06/26	lun 01/06/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	mar 02/06/26	sáb 06/06/26
Definición de rutas y trazados preliminares - LOD 200	0%	0%	25 días	dom 07/06/26	mié 01/07/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	mié 01/07/26	mié 01/07/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	jue 02/07/26	lun 06/07/26
Modelación coordinada con Arquitectura y estructuras - LOD 300	0%	0%	30 días	mar 07/07/26	mié 05/08/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	mié 05/08/26	mié 05/08/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	jue 06/08/26	lun 10/08/26
Procesamiento de la información	**0%**	0%	**35 días**	**mar 11/08/26**	**lun 14/09/26**
Diseño de detalles constructivos - LOD 350	0%	0%	30 días	mar 11/08/26	mié 09/09/26
Elaboración de planos definitivos	0%	0%	5 días	jue 10/09/26	lun 14/09/26
Especificaciones técnicas y memorias	**0%**	0%	**88 días**	**mar 07/07/26**	**vie 02/10/26**
Memorias de cálculo	0%	0%	30 días	mar 07/07/26	mié 05/08/26
Cantidades de obra	0%	0%	5 días	mar 15/09/26	sáb 19/09/26
Consolidado y entrega final	0%	0%	0 días	sáb 19/09/26	sáb 19/09/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	dom 20/09/26	jue 24/09/26
Atención observaciones	0%	0%	8 días	vie 25/09/26	vie 02/10/26
Fin Diseño de red de gas	0%	0%	0 días	vie 02/10/26	vie 02/10/26
Diseño de redes secas	**0%**	14%	**151 días**	**mar 05/05/26**	**vie 02/10/26**
Red de potencia internas	**0%**	14%	**151 días**	**mar 05/05/26**	**vie 02/10/26**
Preoperativos	**0%**	30%	**90 días**	**mar 05/05/26**	**dom 02/08/26**
Entrega de modelos de topografía, arquitectura y estructura coordinados y aprobados por todas las entidades externas que corresponda	0%	30%	0 días	vie 15/05/26	vie 15/05/26
Mesas técnicas de trabajo con Arquitectura	0%	30%	90 días	mar 05/05/26	dom 02/08/26

Calle 57 Nº 18 – 22 Oficina 602
Cel. (+57) 314 474 9354 – (+57) 315 654 4287
Telefax: 310 26 56 - 3836763
bazzani.licitaciones20@gmail.com
Bogotá, D.C., Colombia

Definición criterios de diseño	0%	30%	60 días	mar 05/05/26	vie 03/07/26
Desarrollo del diseño	**0%**	0%	**85 días**	**lun 18/05/26**	**lun 10/08/26**
Trazado esquemático - LOD 100	0%	0%	15 días	lun 18/05/26	lun 01/06/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	lun 01/06/26	lun 01/06/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	mar 02/06/26	sáb 06/06/26
Definición de rutas y trazados preliminares - LOD 200	0%	0%	25 días	dom 07/06/26	mié 01/07/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	mié 01/07/26	mié 01/07/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	jue 02/07/26	lun 06/07/26
Modelación coordinada con Arquitectura y estructuras - LOD 300	0%	0%	30 días	mar 07/07/26	mié 05/08/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	mié 05/08/26	mié 05/08/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	jue 06/08/26	lun 10/08/26
Procesamiento de la información	**0%**	0%	**35 días**	**mar 11/08/26**	**lun 14/09/26**
Diseño de detalles constructivos - LOD 350	0%	0%	30 días	mar 11/08/26	mié 09/09/26
Elaboración de planos definitivos	0%	0%	5 días	jue 10/09/26	lun 14/09/26
Especificaciones técnicas y memorias	**0%**	0%	**88 días**	**mar 07/07/26**	**vie 02/10/26**
Memorias de cálculo	0%	0%	30 días	mar 07/07/26	mié 05/08/26
Cantidades de obra	0%	0%	5 días	mar 15/09/26	sáb 19/09/26
Consolidado y entrega final	0%	0%	0 días	sáb 19/09/26	sáb 19/09/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	dom 20/09/26	jue 24/09/26
Atención observaciones	0%	0%	8 días	vie 25/09/26	vie 02/10/26
Fin Diseño de red de potencia interna	0%	0%	0 días	vie 02/10/26	vie 02/10/26
Red de iluminación interna	**0%**	14%	**151 días**	**mar 05/05/26**	**vie 02/10/26**
Preoperativos	**0%**	30%	**90 días**	**mar 05/05/26**	**dom 02/08/26**
Entrega de modelos de topografía, arquitectura y estructura	0%	30%	0 días	vie 15/05/26	vie 15/05/26

Calle 57 Nº 18 – 22 Oficina 602
Cel. (+57) 314 474 9354 – (+57) 315 654 4287
Telefax: 310 26 56 - 3836763
bazzani.licitaciones20@gmail.com
Bogotá, D.C., Colombia

coordinados y aprobados por todas las entidades externas que corresponda					
Mesas técnicas de trabajo con Arquitectura	0%	30%	90 días	mar 05/05/26	dom 02/08/26
Definición criterios de diseño	0%	30%	60 días	mar 05/05/26	vie 03/07/26
Desarrollo del diseño	**0%**	0%	**85 días**	**lun 18/05/26**	**lun 10/08/26**
Trazado esquemático - LOD 100	0%	0%	15 días	lun 18/05/26	lun 01/06/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	lun 01/06/26	lun 01/06/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	mar 02/06/26	sáb 06/06/26
Definición de rutas y trazados preliminares - LOD 200	0%	0%	25 días	dom 07/06/26	mié 01/07/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	mié 01/07/26	mié 01/07/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	jue 02/07/26	lun 06/07/26
Modelación coordinada con Arquitectura y estructuras - LOD 300	0%	0%	30 días	mar 07/07/26	mié 05/08/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	mié 05/08/26	mié 05/08/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	jue 06/08/26	lun 10/08/26
Procesamiento de la información	**0%**	0%	**35 días**	**mar 11/08/26**	**lun 14/09/26**
Diseño de detalles constructivos - LOD 350	0%	0%	30 días	mar 11/08/26	mié 09/09/26
Elaboración de planos definitivos	0%	0%	5 días	jue 10/09/26	lun 14/09/26
Especificaciones técnicas y memorias	**0%**	0%	**88 días**	**mar 07/07/26**	**vie 02/10/26**
Memorias de cálculo	0%	0%	30 días	mar 07/07/26	mié 05/08/26
Cantidades de obra	0%	0%	5 días	mar 15/09/26	sáb 19/09/26
Consolidado y entrega final	0%	0%	0 días	sáb 19/09/26	sáb 19/09/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	dom 20/09/26	jue 24/09/26
Atención observaciones	0%	0%	8 días	vie 25/09/26	vie 02/10/26
Fin Diseño de red de iluminación interna	0%	0%	0 días	vie 02/10/26	vie 02/10/26
Red de cableado estructurado	**0%**	14%	**151 días**	**mar 05/05/26**	**vie 02/10/26**

Calle 57 Nº 18 – 22 Oficina 602
Cel. (+57) 314 474 9354 – (+57) 315 654 4287
Telefax: 310 26 56 - 3836763
bazzani.licitaciones20@gmail.com
Bogotá, D.C., Colombia

Preoperativos	**0%**	30%	**90 días**	**mar 05/05/26**	**dom 02/08/26**
Entrega de modelos de topografía, arquitectura y estructura coordinados y aprobados por todas las entidades externas que corresponda	0%	30%	0 días	vie 15/05/26	vie 15/05/26
Mesas técnicas de trabajo con Arquitectura	0%	30%	90 días	mar 05/05/26	dom 02/08/26
Definición criterios de diseño	0%	30%	60 días	mar 05/05/26	vie 03/07/26
Desarrollo del diseño	**0%**	0%	**85 días**	**lun 18/05/26**	**lun 10/08/26**
Trazado esquemático - LOD 100	0%	0%	15 días	lun 18/05/26	lun 01/06/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	lun 01/06/26	lun 01/06/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	mar 02/06/26	sáb 06/06/26
Definición de rutas y trazados preliminares - LOD 200	0%	0%	25 días	dom 07/06/26	mié 01/07/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	mié 01/07/26	mié 01/07/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	jue 02/07/26	lun 06/07/26
Modelación coordinada con Arquitectura y estructuras - LOD 300	0%	0%	30 días	mar 07/07/26	mié 05/08/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	mié 05/08/26	mié 05/08/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	jue 06/08/26	lun 10/08/26
Procesamiento de la información	**0%**	0%	**35 días**	**mar 11/08/26**	**lun 14/09/26**
Diseño de detalles constructivos - LOD 350	0%	0%	30 días	mar 11/08/26	mié 09/09/26
Elaboración de planos definitivos	0%	0%	5 días	jue 10/09/26	lun 14/09/26
Especificaciones técnicas y memorias	**0%**	0%	**88 días**	**mar 07/07/26**	**vie 02/10/26**
Memorias de cálculo	0%	0%	30 días	mar 07/07/26	mié 05/08/26
Cantidades de obra	0%	0%	5 días	mar 15/09/26	sáb 19/09/26
Consolidado y entrega final	0%	0%	0 días	sáb 19/09/26	sáb 19/09/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	dom 20/09/26	jue 24/09/26
Atención observaciones	0%	0%	8 días	vie 25/09/26	vie 02/10/26

Calle 57 Nº 18 – 22 Oficina 602
Cel. (+57) 314 474 9354 – (+57) 315 654 4287
Telefax: 310 26 56 - 3836763
bazzani.licitaciones20@gmail.com
Bogotá, D.C., Colombia

Fin Diseño de red de cableado estructurado	0%	0%	0 días	vie 02/10/26	vie 02/10/26
Red del sistema Integral de protección contra rayos (SIPRA)	**0%**	14%	**151 días**	**mar 05/05/26**	**vie 02/10/26**
Preoperativos	**0%**	30%	**90 días**	**mar 05/05/26**	**dom 02/08/26**
Entrega de modelos de topografía, arquitectura y estructura coordinados y aprobados por todas las entidades externas que corresponda	0%	30%	0 días	vie 15/05/26	vie 15/05/26
Mesas técnicas de trabajo con Arquitectura	0%	30%	90 días	mar 05/05/26	dom 02/08/26
Definición criterios de diseño	0%	30%	60 días	mar 05/05/26	vie 03/07/26
Desarrollo del diseño	**0%**	0%	**85 días**	**lun 18/05/26**	**lun 10/08/26**
Trazado esquemático - LOD 100	0%	0%	15 días	lun 18/05/26	lun 01/06/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	lun 01/06/26	lun 01/06/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	mar 02/06/26	sáb 06/06/26
Definición de rutas y trazados preliminares - LOD 200	0%	0%	25 días	dom 07/06/26	mié 01/07/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	mié 01/07/26	mié 01/07/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	jue 02/07/26	lun 06/07/26
Modelación coordinada con Arquitectura y estructuras - LOD 300	0%	0%	30 días	mar 07/07/26	mié 05/08/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	mié 05/08/26	mié 05/08/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	jue 06/08/26	lun 10/08/26
Procesamiento de la información	**0%**	0%	**35 días**	**mar 11/08/26**	**lun 14/09/26**
Diseño de detalles constructivos - LOD 350	0%	0%	30 días	mar 11/08/26	mié 09/09/26
Elaboración de planos definitivos	0%	0%	5 días	jue 10/09/26	lun 14/09/26
Especificaciones técnicas y memorias	**0%**	0%	**88 días**	**mar 07/07/26**	**vie 02/10/26**
Memorias de cálculo	0%	0%	30 días	mar 07/07/26	mié 05/08/26
Cantidades de obra	0%	0%	5 días	mar 15/09/26	sáb 19/09/26
Consolidado y entrega final	0%	0%	0 días	sáb 19/09/26	sáb 19/09/26

Calle 57 Nº 18 – 22 Oficina 602
Cel. (+57) 314 474 9354 – (+57) 315 654 4287
Telefax: 310 26 56 - 3836763
bazzani.licitaciones20@gmail.com
Bogotá, D.C., Colombia

Revisión interventoría	0%	0%	5 días	dom 20/09/26	jue 24/09/26
Atención observaciones	0%	0%	8 días	vie 25/09/26	vie 02/10/26
Fin Diseño de red del sistema Integral de protección contra rayos (SIPRA)	0%	0%	0 días	vie 02/10/26	vie 02/10/26
Red para la instalación de transformador	**0%**	14%	**151 días**	**mar 05/05/26**	**vie 02/10/26**
Preoperativos	**0%**	30%	**90 días**	**mar 05/05/26**	**dom 02/08/26**
Entrega de modelos de topografía, arquitectura y estructura coordinados y aprobados por todas las entidades externas que corresponda	0%	30%	0 días	vie 15/05/26	vie 15/05/26
Mesas técnicas de trabajo con Arquitectura	0%	30%	90 días	mar 05/05/26	dom 02/08/26
Definición criterios de diseño	0%	30%	60 días	mar 05/05/26	vie 03/07/26
Desarrollo del diseño	**0%**	0%	**85 días**	**lun 18/05/26**	**lun 10/08/26**
Trazado esquemático - LOD 100	0%	0%	15 días	lun 18/05/26	lun 01/06/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	lun 01/06/26	lun 01/06/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	mar 02/06/26	sáb 06/06/26
Definición de rutas y trazados preliminares - LOD 200	0%	0%	25 días	dom 07/06/26	mié 01/07/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	mié 01/07/26	mié 01/07/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	jue 02/07/26	lun 06/07/26
Modelación coordinada con Arquitectura y estructuras - LOD 300	0%	0%	30 días	mar 07/07/26	mié 05/08/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	mié 05/08/26	mié 05/08/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	jue 06/08/26	lun 10/08/26
Procesamiento de la información	**0%**	0%	**35 días**	**mar 11/08/26**	**lun 14/09/26**
Diseño de detalles constructivos - LOD 350	0%	0%	30 días	mar 11/08/26	mié 09/09/26
Elaboración de planos definitivos	0%	0%	5 días	jue 10/09/26	lun 14/09/26
Especificaciones técnicas y memorias	**0%**	0%	**88 días**	**mar 07/07/26**	**vie 02/10/26**

Calle 57 Nº 18 – 22 Oficina 602
Cel. (+57) 314 474 9354 – (+57) 315 654 4287
Telefax: 310 26 56 - 3836763
bazzani.licitaciones20@gmail.com
Bogotá, D.C., Colombia

Memorias de cálculo	0%	0%	30 días	mar 07/07/26	mié 05/08/26
Cantidades de obra	0%	0%	5 días	mar 15/09/26	sáb 19/09/26
Consolidado y entrega final	0%	0%	0 días	sáb 19/09/26	sáb 19/09/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	dom 20/09/26	jue 24/09/26
Atención observaciones	0%	0%	8 días	vie 25/09/26	vie 02/10/26
Fin Diseño de red para la instalación de transformador	0%	0%	0 días	vie 02/10/26	vie 02/10/26
Diseño de red contra incendio y detección	**0%**	14%	**151 días**	**mar 05/05/26**	**vie 02/10/26**
Red de detección y alarma	**0%**	14%	**151 días**	**mar 05/05/26**	**vie 02/10/26**
Preoperativos	**0%**	30%	**90 días**	**mar 05/05/26**	**dom 02/08/26**
Entrega de modelos de topografía, arquitectura y estructura coordinados y aprobados por todas las entidades externas que corresponda	0%	30%	0 días	vie 15/05/26	vie 15/05/26
Mesas técnicas de trabajo con Arquitectura	0%	30%	90 días	mar 05/05/26	dom 02/08/26
Definición criterios de diseño	0%	30%	60 días	mar 05/05/26	vie 03/07/26
Desarrollo del diseño	**0%**	0%	**85 días**	**lun 18/05/26**	**lun 10/08/26**
Trazado esquemático - LOD 100	0%	0%	15 días	lun 18/05/26	lun 01/06/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	lun 01/06/26	lun 01/06/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	mar 02/06/26	sáb 06/06/26
Definición de rutas y trazados preliminares - LOD 200	0%	0%	25 días	dom 07/06/26	mié 01/07/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	mié 01/07/26	mié 01/07/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	jue 02/07/26	lun 06/07/26
Modelación coordinada con Arquitectura y estructuras - LOD 300	0%	0%	30 días	mar 07/07/26	mié 05/08/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	mié 05/08/26	mié 05/08/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	jue 06/08/26	lun 10/08/26
Procesamiento de la información	**0%**	0%	**35 días**	**mar 11/08/26**	**lun 14/09/26**

Calle 57 Nº 18 – 22 Oficina 602
Cel. (+57) 314 474 9354 – (+57) 315 654 4287
Telefax: 310 26 56 - 3836763
bazzani.licitaciones20@gmail.com
Bogotá, D.C., Colombia

Diseño de detalles constructivos - LOD 350	0%	0%	30 días	mar 11/08/26	mié 09/09/26
Elaboración de planos definitivos	0%	0%	5 días	jue 10/09/26	lun 14/09/26
Especificaciones técnicas y memorias	**0%**	0%	**88 días**	**mar 07/07/26**	**vie 02/10/26**
Memorias de cálculo	0%	0%	30 días	mar 07/07/26	mié 05/08/26
Cantidades de obra	0%	0%	5 días	mar 15/09/26	sáb 19/09/26
Consolidado y entrega final	0%	0%	0 días	sáb 19/09/26	sáb 19/09/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	dom 20/09/26	jue 24/09/26
Atención observaciones	0%	0%	8 días	vie 25/09/26	vie 02/10/26
Fin Diseño de red de detección y alarma	0%	0%	0 días	vie 02/10/26	vie 02/10/26
Red contra incendio	**0%**	14%	**151 días**	**mar 05/05/26**	**vie 02/10/26**
Preoperativos	**0%**	30%	**90 días**	**mar 05/05/26**	**dom 02/08/26**
Entrega de modelos de topografía, arquitectura y estructura coordinados y aprobados por todas las entidades externas que corresponda	0%	30%	0 días	vie 15/05/26	vie 15/05/26
Mesas técnicas de trabajo con Arquitectura	0%	30%	90 días	mar 05/05/26	dom 02/08/26
Definición criterios de diseño	0%	30%	60 días	mar 05/05/26	vie 03/07/26
Desarrollo del diseño	**0%**	0%	**85 días**	**lun 18/05/26**	**lun 10/08/26**
Trazado esquemático - LOD 100	0%	0%	15 días	lun 18/05/26	lun 01/06/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	lun 01/06/26	lun 01/06/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	mar 02/06/26	sáb 06/06/26
Definición de rutas y trazados preliminares - LOD 200	0%	0%	25 días	dom 07/06/26	mié 01/07/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	mié 01/07/26	mié 01/07/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	jue 02/07/26	lun 06/07/26
Modelación coordinada con Arquitectura y estructuras - LOD 300	0%	0%	30 días	mar 07/07/26	mié 05/08/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	mié 05/08/26	mié 05/08/26

Calle 57 Nº 18 – 22 Oficina 602
Cel. (+57) 314 474 9354 – (+57) 315 654 4287
Telefax: 310 26 56 - 3836763
bazzani.licitaciones20@gmail.com
Bogotá, D.C., Colombia

Revisión interventoría	0%	0%	5 días	jue 06/08/26	lun 10/08/26
Procesamiento de la información	**0%**	0%	**35 días**	**mar 11/08/26**	**lun 14/09/26**
Diseño de detalles constructivos - LOD 350	0%	0%	30 días	mar 11/08/26	mié 09/09/26
Elaboración de planos definitivos	0%	0%	5 días	jue 10/09/26	lun 14/09/26
Especificaciones técnicas y memorias	**0%**	0%	**88 días**	**mar 07/07/26**	**vie 02/10/26**
Memorias de cálculo	0%	0%	30 días	mar 07/07/26	mié 05/08/26
Cantidades de obra	0%	0%	5 días	mar 15/09/26	sáb 19/09/26
Consolidado y entrega final	0%	0%	0 días	sáb 19/09/26	sáb 19/09/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	dom 20/09/26	jue 24/09/26
Atención observaciones	0%	0%	8 días	vie 25/09/26	vie 02/10/26
Fin Diseño de red contra incendio	0%	0%	0 días	vie 02/10/26	vie 02/10/26
Diseño de red de aire acondicionado	**0%**	0%	**151 días**	**mar 05/05/26**	**vie 02/10/26**
Red de aire acondicionado	**0%**	0%	**151 días**	**mar 05/05/26**	**vie 02/10/26**
Preoperativos	**0%**	0%	**90 días**	**mar 05/05/26**	**dom 02/08/26**
Entrega de modelos de topografía, arquitectura y estructura coordinados y aprobados por todas las entidades externas que corresponda (Catastro, Curaduría urbana, DAP, Secretaria de medio ambiente, etc)	0%	50%	0 días	vie 15/05/26	vie 15/05/26
Mesas técnicas de trabajo con Arquitectura	0%	0%	90 días	mar 05/05/26	dom 02/08/26
Definición criterios de diseño	0%	0%	60 días	mar 05/05/26	vie 03/07/26
Desarrollo del diseño	**0%**	0%	**85 días**	**lun 18/05/26**	**lun 10/08/26**
Trazado esquemático - LOD 100	0%	0%	15 días	lun 18/05/26	lun 01/06/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	lun 01/06/26	lun 01/06/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	mar 02/06/26	sáb 06/06/26
Definición de rutas y trazados preliminares - LOD 200	0%	0%	25 días	dom 07/06/26	mié 01/07/26

Calle 57 Nº 18 – 22 Oficina 602
Cel. (+57) 314 474 9354 – (+57) 315 654 4287
Telefax: 310 26 56 - 3836763
bazzani.licitaciones20@gmail.com
Bogotá, D.C., Colombia

Entrega avances	0%	0%	0 días	mié 01/07/26	mié 01/07/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	jue 02/07/26	lun 06/07/26
Modelación coordinada con Arquitectura y estructuras - LOD 300	0%	0%	30 días	mar 07/07/26	mié 05/08/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	mié 05/08/26	mié 05/08/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	jue 06/08/26	lun 10/08/26
Procesamiento de la información	**0%**	0%	**35 días**	**mar 11/08/26**	**lun 14/09/26**
Diseño de detalles constructivos - LOD 350	0%	0%	30 días	mar 11/08/26	mié 09/09/26
Elaboración de planos definitivos	0%	0%	5 días	jue 10/09/26	lun 14/09/26
Especificaciones técnicas y memorias	**0%**	0%	**88 días**	**mar 07/07/26**	**vie 02/10/26**
Memorias de cálculo	0%	0%	30 días	mar 07/07/26	mié 05/08/26
Cantidades de obra	0%	0%	5 días	mar 15/09/26	sáb 19/09/26
Consolidado y entrega final	0%	0%	0 días	sáb 19/09/26	sáb 19/09/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	dom 20/09/26	jue 24/09/26
Atención observaciones	0%	0%	8 días	vie 25/09/26	vie 02/10/26
Fin Diseño de red de aire acondicionado	0%	0%	0 días	vie 02/10/26	vie 02/10/26
Diseño de redes hidrosanitarias externas	**0%**	0%	**124 días**	**lun 01/06/26**	**vie 02/10/26**
Red externa de acueducto Estadio. Incluye evaluación de la capacidad hidráulica y trámite ante EPM	**0%**	0%	**124 días**	**lun 01/06/26**	**vie 02/10/26**
Preoperativos	**0%**	0%	**60 días**	**lun 01/06/26**	**jue 30/07/26**
Entrega de modelo de urbanismo y topografía coordinados y aprobados por todas las entidades externas que corresponda	0%	30%	0 días	lun 01/06/26	lun 01/06/26
Entrega de modelo de diseño geométrico de vías aprobado por el DAP	0%	30%	0 días	lun 01/06/26	lun 01/06/26
Entrega de diagnóstico de redes de EPM	0%	0%	0 días	lun 01/06/26	lun 01/06/26

Calle 57 Nº 18 – 22 Oficina 602
Cel. (+57) 314 474 9354 – (+57) 315 654 4287
Telefax: 310 26 56 - 3836763
bazzani.licitaciones20@gmail.com
Bogotá, D.C., Colombia

Mesas técnicas de trabajo con Arquitectura	0%	0%	60 días	lun 01/06/26	jue 30/07/26
Definición criterios de diseño hidrosanitaio	0%	0%	60 días	lun 01/06/26	jue 30/07/26
Desarrollo del diseño	**0%**	0%	**57 días**	**dom 05/07/26**	**dom 30/08/26**
Trazado esquemático - LOD 100	0%	0%	15 días	dom 05/07/26	dom 19/07/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	dom 19/07/26	dom 19/07/26
Revisión interventoría	0%	0%	4 días	lun 20/07/26	jue 23/07/26
Definición de rutas y trazados preliminares - LOD 200	0%	0%	15 días	vie 24/07/26	vie 07/08/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	vie 07/08/26	vie 07/08/26
Revisión interventoría	0%	0%	4 días	sáb 08/08/26	mar 11/08/26
Modelación coordinada con Arquitectura y estructuras - LOD 300	0%	0%	15 días	mié 12/08/26	mié 26/08/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	mié 26/08/26	mié 26/08/26
Revisión interventoría	0%	0%	4 días	jue 27/08/26	dom 30/08/26
Procesamiento de la información	**0%**	0%	**18 días**	**lun 31/08/26**	**jue 17/09/26**
Diseño de detalles constructivos - LOD 350	0%	0%	13 días	lun 31/08/26	sáb 12/09/26
Elaboración de planos definitivos	0%	0%	5 días	dom 13/09/26	jue 17/09/26
Especificaciones técnicas y memorias	**0%**	0%	**52 días**	**mié 12/08/26**	**vie 02/10/26**
Memorias de cálculo	0%	0%	15 días	mié 12/08/26	mié 26/08/26
Cantidades de obra	0%	0%	5 días	vie 18/09/26	mar 22/09/26
Consolidado y entrega final	0%	0%	0 días	mar 22/09/26	mar 22/09/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	mié 23/09/26	dom 27/09/26
Radicación en EPM	0%	0%	0 días	dom 27/09/26	dom 27/09/26
Atención observaciones	0%	0%	5 días	lun 28/09/26	vie 02/10/26
Fin Diseño red de acueducto	0%	0%	0 días	vie 02/10/26	vie 02/10/26
Red externa de alcantarillado lluvias Estadio. Incluye evaluación	**0%**	0%	**123 días**	**lun 01/06/26**	**vie 02/10/26**

Calle 57 Nº 18 – 22 Oficina 602
Cel. (+57) 314 474 9354 – (+57) 315 654 4287
Telefax: 310 26 56 - 3836763
bazzani.licitaciones20@gmail.com
Bogotá, D.C., Colombia

de la capacidad hidráulica y trámite ante EPM					
Preoperativos	**0%**	0%	**60 días**	**lun 01/06/26**	**vie 31/07/26**
Entrega de modelo de urbanismo y topografía coordinados y aprobados por todas las entidades externas que corresponda	0%	30%	0 días	lun 01/06/26	lun 01/06/26
Entrega de modelo de diseño geométrico de vías aprobado por el DAP	0%	30%	0 días	lun 01/06/26	lun 01/06/26
Entrega de diagnóstico de redes de EPM	0%	0%	0 días	lun 01/06/26	lun 01/06/26
Mesas técnicas de trabajo con Arquitectura	0%	0%	60 días	mar 02/06/26	vie 31/07/26
Definición criterios de diseño hidrosanitario	0%	0%	60 días	mar 02/06/26	vie 31/07/26
Desarrollo del diseño	**0%**	0%	**57 días**	**dom 05/07/26**	**dom 30/08/26**
Trazado esquemático - LOD 100	0%	0%	15 días	dom 05/07/26	dom 19/07/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	dom 19/07/26	dom 19/07/26
Revisión interventoría	0%	0%	4 días	lun 20/07/26	jue 23/07/26
Definición de rutas y trazados preliminares - LOD 200	0%	0%	15 días	vie 24/07/26	vie 07/08/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	vie 07/08/26	vie 07/08/26
Revisión interventoría	0%	0%	4 días	sáb 08/08/26	mar 11/08/26
Modelación coordinada con Arquitectura y estructuras - LOD 300	0%	0%	15 días	mié 12/08/26	mié 26/08/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	mié 26/08/26	mié 26/08/26
Revisión interventoría	0%	0%	4 días	jue 27/08/26	dom 30/08/26
Procesamiento de la información	**0%**	0%	**18 días**	**lun 31/08/26**	**jue 17/09/26**
Diseño de detalles constructivos - LOD 350	0%	0%	13 días	lun 31/08/26	sáb 12/09/26
Elaboración de planos de abastos definitivos	0%	0%	5 días	dom 13/09/26	jue 17/09/26
Especificaciones técnicas y memorias	**0%**	0%	**52 días**	**mié 12/08/26**	**vie 02/10/26**
Memorias de cálculo	0%	0%	15 días	mié 12/08/26	mié 26/08/26

Calle 57 Nº 18 – 22 Oficina 602
Cel. (+57) 314 474 9354 – (+57) 315 654 4287
Telefax: 310 26 56 - 3836763
bazzani.licitaciones20@gmail.com
Bogotá, D.C., Colombia

Cantidades de obra	0%	0%	5 días	vie 18/09/26	mar 22/09/26
Consolidado y entrega final	0%	0%	0 días	mar 22/09/26	mar 22/09/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	mié 23/09/26	dom 27/09/26
Radicación en EPM	0%	0%	0 días	dom 27/09/26	dom 27/09/26
Atención observaciones	0%	0%	5 días	lun 28/09/26	vie 02/10/26
Fin Diseño red de alcantarillado lluvias Estadio	0%	0%	0 días	vie 02/10/26	vie 02/10/26
Red externa de alcantarillado residual Estadio. Incluye evaluación de la capacidad hidráulica y trámite ante EPM	**0%**	0%	**123 días**	**lun 01/06/26**	**vie 02/10/26**
Preoperativos	**0%**	0%	**60 días**	**lun 01/06/26**	**vie 31/07/26**
Entrega de modelo de urbanismo y topografía coordinados y aprobados por todas las entidades externas que corresponda	0%	30%	0 días	lun 01/06/26	lun 01/06/26
Entrega de modelo de diseño geométrico de vías aprobado por el DAP	0%	30%	0 días	lun 01/06/26	lun 01/06/26
Entrega de diagnóstico de redes de EPM	0%	0%	0 días	lun 01/06/26	lun 01/06/26
Mesas técnicas de trabajo con Arquitectura	0%	0%	60 días	mar 02/06/26	vie 31/07/26
Definición criterios de diseño hidrosanitario	0%	0%	60 días	mar 02/06/26	vie 31/07/26
Desarrollo del diseño	**0%**	0%	**57 días**	**dom 05/07/26**	**dom 30/08/26**
Trazado esquemático - LOD 100	0%	0%	15 días	dom 05/07/26	dom 19/07/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	dom 19/07/26	dom 19/07/26
Revisión interventoría	0%	0%	4 días	lun 20/07/26	jue 23/07/26
Definición de rutas y trazados preliminares - LOD 200	0%	0%	15 días	vie 24/07/26	vie 07/08/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	vie 07/08/26	vie 07/08/26
Revisión interventoría	0%	0%	4 días	sáb 08/08/26	mar 11/08/26
Modelación coordinada con Arquitectura y estructuras - LOD 300	0%	0%	15 días	mié 12/08/26	mié 26/08/26

Calle 57 Nº 18 – 22 Oficina 602
Cel. (+57) 314 474 9354 – (+57) 315 654 4287
Telefax: 310 26 56 - 3836763
bazzani.licitaciones20@gmail.com
Bogotá, D.C., Colombia

Entrega avances	0%	0%	0 días	mié 26/08/26	mié 26/08/26
Revisión interventoría	0%	0%	4 días	jue 27/08/26	dom 30/08/26
Procesamiento de la información	**0%**	0%	**18 días**	**lun 31/08/26**	**jue 17/09/26**
Diseño de detalles constructivos - LOD 350	0%	0%	13 días	lun 31/08/26	sáb 12/09/26
Elaboración de planos de abastos definitivos	0%	0%	5 días	dom 13/09/26	jue 17/09/26
Especificaciones técnicas y memorias	**0%**	0%	**52 días**	**mié 12/08/26**	**vie 02/10/26**
Memorias de cálculo	0%	0%	15 días	mié 12/08/26	mié 26/08/26
Cantidades de obra	0%	0%	5 días	vie 18/09/26	mar 22/09/26
Consolidado y entrega final	0%	0%	0 días	mar 22/09/26	mar 22/09/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	mié 23/09/26	dom 27/09/26
Radicación en EPM	0%	0%	0 días	dom 27/09/26	dom 27/09/26
Atención observaciones	0%	0%	5 días	lun 28/09/26	vie 02/10/26
Fin Diseño red de alcantarillado residual Estadio	0%	0%	0 días	vie 02/10/26	vie 02/10/26
Red externa de alcantarillado lluvias urbanismo. Incluye evaluación de la capacidad hidráulica y trámite ante EPM	**0%**	0%	**124 días**	**lun 01/06/26**	**vie 02/10/26**
Preoperativos	**0%**	0%	**61 días**	**lun 01/06/26**	**vie 31/07/26**
Entrega de modelo de urbanismo y topografía coordinados y aprobados por todas las entidades externas que corresponda	0%	30%	1 día	lun 01/06/26	lun 01/06/26
Entrega de modelo de diseño geométrico de vías aprobado por el DAP	0%	30%	0 días	lun 01/06/26	lun 01/06/26
Entrega de diagnóstico de redes de EPM	0%	0%	0 días	lun 01/06/26	lun 01/06/26
Mesas técnicas de trabajo con Arquitectura	0%	0%	60 días	mar 02/06/26	vie 31/07/26
Definición criterios de diseño hidrosanitario	0%	0%	60 días	mar 02/06/26	vie 31/07/26
Desarrollo del diseño	**0%**	0%	**57 días**	**dom 05/07/26**	**dom 30/08/26**

Calle 57 Nº 18 – 22 Oficina 602
Cel. (+57) 314 474 9354 – (+57) 315 654 4287
Telefax: 310 26 56 - 3836763
bazzani.licitaciones20@gmail.com
Bogotá, D.C., Colombia

Trazado esquemático - LOD 100	0%	0%	15 días	dom 05/07/26	dom 19/07/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	dom 19/07/26	dom 19/07/26
Revisión interventoría	0%	0%	4 días	lun 20/07/26	jue 23/07/26
Definición de rutas y trazados preliminares - LOD 200	0%	0%	15 días	vie 24/07/26	vie 07/08/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	vie 07/08/26	vie 07/08/26
Revisión interventoría	0%	0%	4 días	sáb 08/08/26	mar 11/08/26
Modelación coordinada con Arquitectura y estructuras - LOD 300	0%	0%	15 días	mié 12/08/26	mié 26/08/26
Entrega avances	0%	0%	0 días	mié 26/08/26	mié 26/08/26
Revisión interventoría	0%	0%	4 días	jue 27/08/26	dom 30/08/26
Procesamiento de la información	**0%**	0%	**18 días**	**lun 31/08/26**	**jue 17/09/26**
Diseño de detalles constructivos - LOD 350	0%	0%	13 días	lun 31/08/26	sáb 12/09/26
Elaboración de planos de abastos definitivos	0%	0%	5 días	dom 13/09/26	jue 17/09/26
Especificaciones técnicas y memorias	**0%**	0%	**52 días**	**mié 12/08/26**	**vie 02/10/26**
Memorias de cálculo	0%	0%	15 días	mié 12/08/26	mié 26/08/26
Cantidades de obra	0%	0%	5 días	vie 18/09/26	mar 22/09/26
Consolidado y entrega final	0%	0%	0 días	mar 22/09/26	mar 22/09/26
Revisión interventoría	0%	0%	5 días	mié 23/09/26	dom 27/09/26
Radicación en EPM	0%	0%	0 días	dom 27/09/26	dom 27/09/26
Atención observaciones	0%	0%	5 días	lun 28/09/26	vie 02/10/26
Fin Diseño red de alcantarillado lluvias urbanismo	0%	0%	0 días	vie 02/10/26	vie 02/10/26

Calle 57 Nº 18 – 22 Oficina 602
Cel. (+57) 314 474 9354 – (+57) 315 654 4287
Telefax: 310 26 56 - 3836763
bazzani.licitaciones20@gmail.com
Bogotá, D.C., Colombia

12.7. CORRESPONDENCIA

A continuación, se presenta un resumen de la correspondencia enviada y recibida por parte de la consultoría, interventoría y supervisión.

1.5 Correspondencia generada por la interventoría.

Fecha de emisión	Comunicado	Asunto
04/02/2026	ITT_026_COM001_REDESESTADIO.pdf	Revisión hojas de vida consultoría
05/02/2026	ITT_026_COM002_REDESESTADIO.pdf	Llamado de atención documentación precontractual
05/02/2026	ITT_026_COM003_REDESESTADIO.pdf	Revisión programación consultoría
09/02/2026	ITT_026_COM004_REDESESTADIO.pdf	Revisión hojas de vida consultoría
11/02/2026	ITT_026_COM005_REDESESTADIO.pdf	Revisión hojas de vida consultoría
12/02/2026	ITT_026_COM007_REDESESTADIO.pdf	Informe semanal No. 01
17/02/26	ITT_026_COM008_REDESESTADIO.pdf	Revisión hojas de vida consultoría
18/02/2026	ITT_026_COM009_REDESESTADIO.pdf	Informe semanal No. 02
26/02/2026	ITT_026_COM010_REDESESTADIO.pdf	Solicitud adición No. 01 consultoría
26/02/2026	ITT_026_COM011_REDESESTADIO.pdf	Solicitud adición No. 01 interventoría
26/02/2026	ITT_026_COM012_REDESESTADIO.pdf	Informe semanal No. 03
04/03/2026	ITT_026_COM013_EAG	Informe semanal No. 04
04/03/2026	ITT_026_COM014_EAG	Informe mensual No. 01
10/03/2026	ITT_026_COM015_EAG	Acta parcial No. 01 CONSULTORIA
12/03/2026	ITT_026_COM016_EAG	Informe semanal No. 05
17/03/2026	ITT_026_COM017_EAG	Revisión diagnostico eléctrico
17/03/2026	ITT_026_COM018_EAG	Revisión estudio de mercado
18/03/2026	ITT_026_COM019_EAG	Informe semanal No. 06
25/03/2026	ITT_026_COM020_EAG	Informe semanal No. 07
06/04/2026	ITT_026_COM021_EAG.pdf	SOLICITUD ADICION No. 1 CONSULTORIA
06/04/2026	ITT_026_COM022_EAG.pdf	INFORME SEMANAL No. 08
06/04/2026	ITT_026_COM023_EAG.pdf	INFORME MENSUAL No. 02
07/04/2026	ITT_026_COM024_EAG.pdf	SOLICITUD ADICION No. 1 INTERVENTORÍA
09/04/2026	ITT_026_COM025_EAG.pdf	INFORME SEMANAL No. 09
14/04/2026	ITT_026_COM026_EAG.pdf	Revisión diagnostico eléctrico v2
15/04/2026	ITT_026_COM027_EAG.pdf	Acta parcial No. 2 CONSULTORIA
15/04/2026	ITT_026_COM028_EAG.pdf	Acta parcial No. 1 INTERVENTORIA

15/04/2026	ITT_026_COM029_EAG.pdf	Revisión diagnostico HIDROSANITARIO
15/04/2026	ITT_026_COM030_EAG.pdf	INFORME SEMANAL No. 10
22/04/2026	ITT_026_COM031_EAG.pdf	INFORME SEMANAL No. 11
29/04/2026	ITT_026_COM032_EAG.pdf	Revisión diagnostico ELECTRICO
29/04/2026	ITT_026_COM033_EAG.pdf	INFORME SEMANAL No. 12

1.1 Correspondencia generada por el consultor

Fecha de emisión	Comunicado	Asunto
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

1.2 Correspondencia generada por la supervisión.

Fecha de emisión	Comunicado	Asunto
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

12.8. INFORME TÉCNICO

8.1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

Durante el periodo evaluado, el proyecto avanzó en la consolidación de los diagnósticos técnicos de las redes existentes de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, con énfasis en la verificación de cumplimiento normativo, identificación de riesgos y estructuración de insumos para la fase de diseño.

Se evidencia un estado general de infraestructura con alto nivel de obsolescencia y múltiples no conformidades frente a normativa vigente, lo cual condiciona la necesidad de intervenciones integrales y no soluciones parciales.

Adicionalmente, la interventoría realizó observaciones técnicas orientadas a mejorar la trazabilidad de la información, precisión del alcance evaluado y definición de zonas de intervención y programación futura.

8.2. Componente Eléctrico

Diagnóstico de Infraestructura Eléctrica

Se desarrolló el diagnóstico del sistema eléctrico existente, evaluando tableros, conductores, subestaciones, canalizaciones y condiciones de operación.

Se identificaron las siguientes situaciones relevantes:

- Tableros eléctricos sin identificación de circuitos ni esquemas unifilares.
- Conductores sin rotulación y con posible deterioro de aislamiento.
- Infraestructura eléctrica abierta o con accesos no controlados.
- Deficiencias en ventilación, orden y accesibilidad en gabinetes eléctricos.

Estas condiciones evidencian incumplimientos directos del RETIE 2024, especialmente en lo relacionado con seguridad, operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas.

Evaluación de Cumplimiento Normativo (RETIE 2024)

El análisis técnico permitió identificar desviaciones frente a los principios fundamentales del RETIE, entre los cuales se destacan:

- Falta de protección contra contacto directo e indirecto.
- Incumplimiento en identificación y rotulado de circuitos.
- Deficiencias en señalización de riesgo eléctrico.
- Condiciones inadecuadas en canalizaciones y materiales.

Lo anterior configura un escenario de riesgo técnico alto, especialmente crítico al tratarse de un equipamiento con alta concentración de personas.

Condiciones de Seguridad Eléctrica

Se identificaron condiciones críticas que comprometen la seguridad de usuarios y personal operativo:

- Acceso a partes energizadas sin restricción.
- Ausencia de señalización en zonas de riesgo.
- Equipos eléctricos ubicados en espacios no técnicos.
- Falta de sistemas adecuados de protección y encerramiento.

Estas condiciones representan riesgos de electrocución, arco eléctrico y fallas operativas, con potencial impacto en la operación del escenario.

Subestaciones y Cuartos Técnicos

En la revisión de subestaciones y cuartos técnicos se evidenció:

- Accesos abiertos o sin control de ingreso.
- Equipos energizados accesibles al personal no autorizado.
- Falta de señalización y delimitación de áreas.
- Espacios de trabajo inferiores a los mínimos normativos.

Estas condiciones representan incumplimientos graves en materia de seguridad y operación, incrementando la exposición al riesgo eléctrico.

Estado de Canalizaciones y Materiales

Se identificaron deficiencias relevantes en la infraestructura física asociada al sistema eléctrico:

- Uso de materiales no adecuados (ej. madera en cárcamos).
- Canalizaciones deterioradas o abiertas.
- Estructuras mecánicas en mal estado.
- Desorganización del cableado y falta de protección mecánica.

Estas condiciones incrementan el riesgo de incendio, deterioro del sistema y fallas estructurales asociadas a la red eléctrica.

Matriz de Riesgos

Del análisis consolidado se establece una matriz de riesgos con predominancia de nivel alto, destacándose:

Hallazgo	Incumplimiento Normativo (RETIE 2024)	Riesgo Asociado	Nivel de Riesgo	Acción Correctiva
Tableros eléctricos sin identificación ni esquemas unifilares	Requisitos de identificación de circuitos y rotulado de tableros	Operación insegura, errores en maniobras y mantenimiento	Alto	Normalización, rotulado y rediseño de tableros
Conductores sin identificación y con posible deterioro	Requisitos de selección, uso e identificación de conductores	Sobrecalentamiento, cortocircuitos, fallas eléctricas	Alto	Reemplazo y normalización de conductores
Deficiencias en sistemas de puesta a tierra	Protección contra contactos indirectos	Riesgo de electrocución y fallas de protección	Alto	Implementación de sistema de puesta a tierra certificado
Infraestructura eléctrica abierta o con accesos no controlados	Condiciones de operación segura y acceso restringido	Contacto directo con partes energizadas	Alto	Cerramientos, control de acceso y adecuación física
Falta de señalización eléctrica	Requisitos de señalización y protección al usuario	Accidentes por desconocimiento del riesgo	Alto	Implementación de señalización conforme RETIE
Canalizaciones en mal estado o con materiales no adecuados	Requisitos de canalización y materiales no combustibles	Riesgo de incendio y propagación de fallas	Alto	Sustitución de canalizaciones y materiales
Cuartos técnicos con condiciones inadecuadas	Requisitos de espacios de trabajo y seguridad	Riesgo operativo y dificultad en mantenimiento	Medio	Adecuación de espacios técnicos
Acceso a subestaciones sin restricción	Requisitos de acceso restringido a personal autorizado	Electrocución y manipulación indebida	Alto	Implementación de cerramientos y control de acceso

8.3. Componente de Diagnóstico y Levantamiento

Información Base y Metodología

El levantamiento se realizó mediante inspección visual, registro fotográfico y verificación técnica en campo, bajo criterios de ingeniería eléctrica y normativa RETIE.

Se identificó la necesidad de complementar la información con:

- Planos de redes existentes.
- Información histórica de intervenciones.
- Registros técnicos de operación y mantenimiento.

Limitaciones Identificadas

Durante el desarrollo de las actividades se evidenciaron limitaciones que afectan la precisión del diagnóstico:

- Falta de acceso a algunas redes o cajas de inspección.
- Ausencia de información técnica base.
- Restricciones operativas en campo.

Se recomienda documentar formalmente estas limitaciones en los informes siguientes, conforme a lo indicado por interventoría.

8.4. Requerimientos para Fase de Diseño

A partir del diagnóstico realizado, se establecen los siguientes lineamientos para la fase de diseño:

- Remodelación integral del sistema eléctrico.
- Rediseño de tableros bajo normativa vigente.
- Implementación de sistema de puesta a tierra certificado.
- Normalización de conductores y canalizaciones.
- Implementación de señalización y sistemas de protección.
- Definición de zonas de intervención y programación técnica.

Estas acciones son necesarias para garantizar el cumplimiento normativo, la seguridad de los usuarios y la operación adecuada del escenario.

12.9. INFORME FINANCIERO

1.2.1 Detalle financiero contrato de Interventoría No. OE 26 DE 2026

1.2.1.1 Consolidado de pagos

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 353.866.104
VALOR DE ADICIÓN NO. 1	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 353.866.104
VALOR PAGO NO.1 - FEBRERO	$ 86.445.158
VALOR PAGO NO.2 - MARZO	
VALOR PAGO NO.3 - ABRIL	0
VALOR PAGO N0 4 - MAYO	0
VALOR PAGO NO.5 - JUNIO	0
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA:	$ 86.445.158
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$120.314.475,36
VALOR SALDO TOTAL POR PAGAR:	$ 621.287.050

1.2.1.2 Consolidado de avance financiero.

A continuación, se muestra el avance financiero de la interventoría ejecutado hasta la semana de corte del presente informe mensual

- **Mes Anterior**: $208.781.001,36
- **Acumulado actual:** $120.314.475,36

INTERVENTORÍA			% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO ANTERIOR INTERVENTORÍA	% DE AVANCE PROGRAMADO FINANCIERO ACTUAL INTERVENTORÍA	% PROG.	% EJECUTADO
SEMANA	DESDE	HASTA				
semana1	5/02/2026	11/02/2026	$14.154.644,16	$14.154.644,16	2,00%	1,00%
semana2	12/02/2026	18/02/2026	$14.154.644,16	$28.309.288,32	4,00%	4,00%
semana3	19/02/2026	25/02/2026	$49.541.254,56	$77.850.542,88	11,00%	11,00%
semana4	26/02/2026	4/03/2026	$56.618.576,64	$134.469.119,52	19,00%	19,00%
semana5	05/03/2026	11/03/2026	$84.927.864,96	$219.396.984,48	31,00%	31,00%
semana6	12/03/2026	25/03/2026	$70.773.220,80	$290.170.205,28	41,00%	41,00%
semana7	26/03/2026	01/04/2026	$70.773.220,80	$360.943.426,08	51,00%	51,0%

semana8	02/04/2026	08/04/2026	$56.618.576,64	$417.562.002,72	59,00%	59,0%
semana9	09/04/2026	15/04/2026	$14.154.644,16	$431.716.646,88	61,00%	61,0%
semana10	16/04/2026	22/04/2026	$14.154.644,16	$445.871.291,04	63,00%	63,0%
semana11	23/04/2026	29/04/2026	-$325.556.815,68	$120.314.475,36	17,00%	17,0%

1.2.2 Detalle financiero contrato de consultoría No. OE 152 DE 2025

1.2.2.1 Consolidado de pagos

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$1.398.228.490 COP
VALOR DE ADICIÓN NO. 1	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$1.398.228.490 COP
VALOR PAGO NO.1 - FEBRERO	$ 199.514.669
VALOR PAGO NO.2 - MARZO	$ 146.265.964
VALOR PAGO NO.3 - ABRIL	0
VALOR PAGO N0 4 - MAYO	0
VALOR PAGO NO.5 - JUNIO	0
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA:	$ 345.780.633
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$475.456.918,00
VALOR SALDO TOTAL POR PAGAR:	$ 2.451.024.767,31

1.2.2.2 Consolidado de avance financiero

A continuación, se muestra el avance financiero de la consultoría ejecutado hasta la semana de corte del presente informe mensual.

- **Mes Anterior:** $824.954.809,10
- **Acumulado actual:** $475.456.918,00

CONSULTORÍA			% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE CONSULTORÍA ANTERIOR	% DE AVANCE REAL FINANCIERO DE CONSULTORÍA ACTUAL	% PROG.	% EJECUTADO
SEMANA	DESDE	HASTA				
semana1	05/02/2026	11/02/2026	$55.936.108,00	$55.936.108,00	2,00%	3,00%
semana2	12/02/2026	18/02/2026	$55.936.108,00	$111.872.216,00	4,00%	4,00%
semana3	19/02/2026	25/02/2026	$195.776.378,00	$307.648.594,00	11,00%	10,00%

semana4	26/02/2026	04/03/2026	$223.744.432,00	$531.393.026,00	19,00%	17,00%
semana5	05/03/2026	11/03/2026	$335.616.648,00	$867.009.674,00	31,00%	28,00%
semana6	12/03/2026	25/03/2026	$279.680.540,00	$1.146.690.214,00	41,00%	36,00%
semana7	26/03/2026	01/04/2026	$279.680.540,00	$1.426.370.754,00	51,00%	46,00%
semana8	02/04/2026	08/04/2026	$223.744.432,00	$1.650.115.186,00	59,00%	50,00%
semana9	09/04/2026	15/04/2026	$55.936.108,00	$1.706.051.294,00	61,00%	53,00%
semana10	16/04/2026	22/04/2026	$55.936.108,00	$1.761.987.402,00	63,00%	54,00%
semana11	23/04/2026	29/04/2026	-$1.286.530.484,0	$475.456.918,00	17,00%	22,00%

12.10. INFORME JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO

1.2.3 Garantías contractuales interventoría

De acuerdo con lo establecido en el contrato suscrito entre la empresa de desarrollo urbano y la EL CONSORCIO INTER ESTUDIOS EDU, se estableció las características que deben tener las garantías expedidas por el contratista, estas se muestran a continuación:

- **Aseguradora:** Seguros del estado
- **CUMPLIMIENTO PARTICULAR:** Póliza N°: **65-45-101096513**
- **Anexo N°:** 2
- **Fecha de expedición:**

OC 026 DE 2026					
PÓLIZA	**Anexo**	**AMPAROS**	**VIGENCIA**		**SUMA ASEG-ACTUAL**
			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO Póliza N°: 65-45-101096513	Anexo 2	Cumplimiento	5/02/2026	20/06/2027	$ 70.773.220,80
		Calidad del servicio	5/02/2026	20/06/2029	$ 70.773.220,80
		Salario y prestaciones sociales	5/02/2026	20/06/2029	$ 70.773.220,80

1.2.4 Garantías contractuales consultoría

De acuerdo con lo establecido en el contrato suscrito entre la empresa de desarrollo urbano y la INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S, se estableció las características que deben tener las garantías expedidas por el contratista, estas se muestran a continuación:

- **Aseguradora:** Seguros del estado
- **CUMPLIMIENTO:** Póliza de Cumplimiento **No. 65-45-101096590**

- **Anexo N°:** 2
- **Fecha de expedición:** 02 de Febrero de 2026

OE 139 DE 2026					
	Anexo	AMPAROS	VIGENCIA – (días) DESDE	VIGENCIA – (días) HASTA	SUMA ASEG-ACTUAL
Póliza de Cumplimiento **No. 65-45-101096590**	Anexo 2	CUMPLIMIENTO	5/02/2026	5/06/2027	$279,645,698.00
		CALIDAD DEL SERVICIO	5/02/2026	5/06/2029	$279,645,698.00
		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5/02/2026	5/06/2029	$279,645,698.00

12.11. ANEXOS:

Durante el tiempo transcurrido del presente informe se dio tramite a las siguientes actuaciones Documentales:

- **EDT Y Cronograma:** la documentación entregada para el control del avance y ejecución del proyecto.
-
- **Informes semanales**: los informes semanales presentados a corte del presente informe son los siguientes:

- ITT_026_IS_SE05_EAG
- ITT_026_IS_SE06_EAG
- ITT_026_IS_SE07_EAG
- ITT_026_IS_SE08_EAG

- **Actas de comité:** las actas de comité de seguimiento de este mes son las siguientes:

    - ITT_26_AT_CS04_EAG
    - ITT_26_AT_CS05_EAG
    - ITT_26_AT_CS06_EAG

Comunicados emitidos por la interventoría y consultoría: los oficios o comunicados emitidos por esta interventoría se encuentran almacenados en los respectivos correos del supervisor del contrato como de su apoyo a la supervisión.

12.12. CONCLUSIONES

Durante el período evaluado correspondiente al mes de marzo de 2026, el contrato de interventoría OE 26 de 2026 presenta avances en su fase de diagnóstico y transición hacia etapas iniciales de diseño, evidenciando los siguientes aspectos relevantes:

12.13. Componente técnico

Durante el mes de abril de 2026, el componente técnico del proyecto presentó avances significativos en la consolidación del diagnóstico de las redes existentes y en la estructuración de los insumos necesarios para el desarrollo de la fase de diseño. La información recopilada y validada en este periodo permitió tener una lectura más precisa del estado real de la infraestructura, evidenciando la necesidad de intervenciones de carácter integral y no soluciones puntuales.

En este sentido, se concluye que:

- Se logró la consolidación de los diagnósticos técnicos, particularmente en los componentes eléctricos e hidrosanitarios, incorporando ajustes y validaciones derivadas de observaciones de interventoría.
- Se identificaron condiciones generalizadas de obsolescencia e incumplimiento normativo, especialmente frente a los requerimientos del RETIE, lo cual implica la necesidad de rediseñar integralmente los sistemas existentes.
- Los hallazgos técnicos evidencian la presencia de riesgos operativos relevantes, asociados a condiciones de seguridad eléctrica, accesibilidad a equipos y estado de las canalizaciones, lo que refuerza la necesidad de una intervención estructural del sistema.
- Durante el periodo se avanzó en la transición hacia la fase de diseño, iniciando actividades de modelación y estructuración de soluciones técnicas, soportadas en la información levantada en campo.
- Se evidenció la necesidad de realizar reprocesos técnicos y ajustes en la información base, derivados de la validación de condiciones reales de la infraestructura, lo cual impacta la definición de soluciones y el alcance técnico del proyecto.
- La información técnica consolidada durante el mes permite contar con una base sólida para el desarrollo de los entregables de diseño, garantizando que estos

respondan a las condiciones reales del escenario y a los requisitos normativos aplicables.

En términos generales, el proyecto avanza hacia una etapa de mayor definición técnica, en la cual el enfoque pasa de la identificación de problemáticas a la formulación de soluciones, en el marco de un alcance ajustado a la complejidad real de la infraestructura intervenida.

12.14. Componente Financiero

Durante el mes de abril de 2026, el componente financiero del proyecto evidenció ajustes en el comportamiento del avance económico, en línea con la reprogramación del cronograma y la revisión de los valores previamente reconocidos, manteniendo coherencia con el estado técnico y contractual del proyecto.

En este sentido, se concluye que:

- Se realizó la actualización y depuración del avance financiero, evidenciándose una variación en el acumulado ejecutado como resultado de ajustes en el reconocimiento de actividades previamente registradas.
- El comportamiento financiero del proyecto se encuentra alineado con la programación actualizada, reflejando los ajustes derivados de la reprogramación del cronograma y la redistribución de actividades en el tiempo.
- Se evidencia una coherencia entre el avance técnico y el avance financiero, en la medida en que la consolidación de diagnósticos y el inicio de actividades de diseño se reflejan en la ejecución económica del contrato.
- La variación presentada en el acumulado financiero responde a procesos de revisión, validación y control del reconocimiento de ingresos, garantizando la correcta correspondencia entre lo ejecutado y lo registrado.
- No obstante, se identifican ajustes asociados a la dinámica del proyecto, lo cual requiere seguimiento permanente al comportamiento financiero,

con el fin de asegurar la adecuada ejecución presupuestal conforme al avance real de las actividades.

- El componente financiero se mantiene bajo control, en el marco de la programación ajustada del proyecto, permitiendo una adecuada gestión de los recursos frente a las condiciones técnicas y contractuales actuales.

En términos generales, el comportamiento financiero del proyecto refleja un proceso de ajuste y estabilización, asociado a la maduración técnica del mismo y a la alineación entre la ejecución real y su correspondiente reconocimiento económico.

12.15. Componente Jurídico–Administrativoç


Durante el mes de abril de 2026, el componente jurídico–administrativo del proyecto se enfocó en la gestión y formalización de ajustes contractuales derivados de la evolución técnica del mismo, en particular en lo relacionado con la ampliación del alcance y la reprogramación del plazo de ejecución.

- Se adelantaron las gestiones correspondientes a la Adición No. 1 y la ampliación del plazo contractual, tanto para el contrato de consultoría como para el de interventoría, en respuesta a las condiciones técnicas identificadas durante la fase de diagnóstico.
- Los ajustes contractuales se encuentran debidamente sustentados en hallazgos técnicos, los cuales evidencian la necesidad de desarrollar soluciones de carácter integral, superando el alcance inicialmente previsto.
- Se evidencia una articulación entre los componentes técnico, financiero y contractual, permitiendo que las modificaciones propuestas respondan a la realidad del proyecto y a sus requerimientos normativos.

En términos generales, presenta un adecuado nivel de gestión, orientado a la formalización de los ajustes necesarios para garantizar la viabilidad y correcta ejecución del proyecto en su etapa actual.

12.16. Consideraciones Generales

Durante el mes de abril de 2026, el proyecto presentó avances en la consolidación del diagnóstico técnico y en el inicio de la fase de diseño, en el marco de la reprogramación del cronograma y los ajustes derivados de la complejidad real de la infraestructura existente.

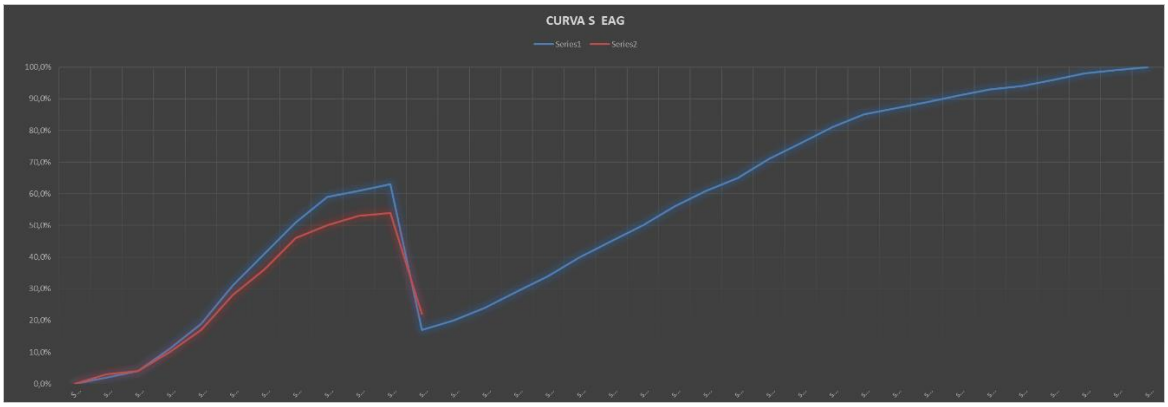

Las condiciones identificadas durante el desarrollo del diagnóstico evidencian la necesidad de abordar soluciones de carácter integral, lo cual ha implicado la revisión del alcance técnico inicialmente previsto y la estructuración de los ajustes contractuales correspondientes.

En este sentido, la reprogramación del proyecto y la gestión de la adición y ampliación de plazo permiten alinear el desarrollo de las actividades con las condiciones técnicas, operativas y normativas del escenario intervenido, garantizando la viabilidad del proyecto en su etapa actual.

Así mismo, se evidencia coherencia entre los componentes técnico, financiero y jurídico–administrativo, lo cual permite mantener un adecuado control sobre la ejecución del contrato y asegurar la trazabilidad de las decisiones adoptadas durante el periodo.

En términos generales, el proyecto avanza de manera controlada hacia una etapa de mayor definición técnica, en la cual se prioriza la formulación de soluciones que respondan a las condiciones reales identificadas, manteniendo el seguimiento permanente a la programación, la ejecución financiera y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Se expone a solicitud de los interesados el presente informe de interventoría con el fin de dar a conocer e informar los posibles reprocesos y atrasos que pueda presentar la ejecución del proyecto de consultoría **OE 026 DE 2025** cuyo objetivo es la "**INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE REDES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT, EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN**" transcurridos 22 días de plazo contractual a la fecha de corte del presente informe.

Atentamente,



ARQ. GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER ESTUDIOS EDU

Calle 57 Nº 18 – 22 Oficina 602
Cel. (+57) 314 474 9354 – (+57) 315 654 4287
Telefax: 310 26 56 - 3836763
bazzani.licitaciones20@gmail.com
Bogotá, D.C., Colombia
