INFORME DE LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS POR PARTE DE EMSERPUVAG S.A. E.S.P

EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

NIT. 900.304.997-8

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1

DESCRIPCION CONTRATO

EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

CONTRATO DE OBRA No.SPO-CO-005-2025 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2025

OBJETO: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CONTRATISTA:	CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S.
IDENTIFICACION:	NIT. 901.379.821-6
R.L:	DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN
IDENTIFICACION:	C.C. No. 1.122.340.473 de San Miguel(P)
INTERVENTORIA:	C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS
IDENTIFICACION:	NIT. 900.860.555-1
R.L:	LEYDER CEDIEL CABRERA

IDENTIFICACION:	C.C. 1.131.085.107 de Nariño (N)
SUPERVISOR: CARLOS ESNEHIDER QUIROZ C.	
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (01) MES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 199,995,892.43
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 199,995,892.43
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30/10/2025
FECHA DE INICIO:	13/11/2025
FECHA DE TERMINACION:	12/12/2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	5/12/2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1

FECHA: viernes, 5 de diciembre de 2025

PERIODO EJECUTADO DEL ACTA DESDE: jueves, 13 de noviembre de 2025 **HASTA:** viernes, 5 de diciembre de 2025

En el Municipio Valle del Guamuez, a los cinco (5) días del mes de diciembre del año 2025, Se reunieron en las instalaciones de la Empresa Administrativa De Servicios Públicos Domiciliarios Del Valle Del Guamuez - EMSERPUVAG S.A. E.S.P., **CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA**, Gerente **EMSERPUVAG S.A. E.S.P**, en calidad de **SUPERVISOR** del Contrato de Obra No. SPO-CO-005-2025 del 30 de octubre del 2025, el ingeniero **LEYDER CEDIEL CABRERA** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.131.085.107 de Nariño (N), en calidad de **INTERVENTOR** según Contrato de Consultoria No. SUO-CD-018-2025 del 31 de octubre del 2025 y la señora **DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN** identificada con cedula de ciudadanía N°. 1.122.340.473 de San Miguel (P), en calidad de Representante Legal de la empresa **CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC.** con Nit. No. 901379821-6 **CONTRATISTA DE OBRA**, mediante el presente documento se deja constancia **Acta De Recibo Parcial No. 1**, teniendo en cuenta las actividades contractuales detalladas a continuación:

CONDICIONES INICIALES						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		SALDOS	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR
1.0	**REALIZAR EXCAVACIONES**										
1.1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	286.78	$ 29,900.00	$ 8,574,722.00		$ -	286.78	$ 8,574,722.00	0.00	$ -
1.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	73.39	$ 30,319.44	$ 2,225,143.70		$ -	49.49	$ 1,500,509.09	23.90	$ 724,634.62
2.0	**REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA**										
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø = 10"	ML	180.55	$ 129,860.31	$ 23,446,278.97		$ -	180.55	$ 23,446,278.97	0.00	$ -
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION CAMA DE CIMENTACION CON RECEBO E=0,20 MÁS ATRAQUE Y CORONA E=0,45	M3	105.84	$ 141,748.25	$ 15,002,280.41		$ -	99.11	$ 14,049,023.43	6.72	$ 953,256.98
2.3	ENTIBADO DE TALUDES PARA EXCAVACIÓN DE ZANJAS	M2	671.65	$ 46,528.13	$ 31,250,618.51		$ -	671.65	$ 31,250,618.51	0.00	$ -
2.4	SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILAR	M2	695.12	$ 19,364.24	$ 13,460,470.51		$ -	695.12	$ 13,460,470.51	0.00	$ -
3.0	**CONSTRUCCION CÁMARAS DE INSPECCIÓN**										
3.1	CONSTRUCCION CAMARA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3,000 PSI	UND	2.00	$ 4,448,441.35	$ 8,896,882.70		$ -	2.00	$ 8,896,882.70	0.00	$ -
4.0	**REALIZAR RELLENOS Y OTRAS ACTIVIDADES**										
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	193.45	$ 23,900.00	$ 4,623,455.00		$ -	182.85	$ 4,370,115.00	10.60	$ 253,340.00
4.2	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACIÓN PARA RELLENO FINAL CON MATERIAL DE RIO SELECCIONADO	M3	75.98	$ 142,575.00	$ 10,832,135.63		$ -	70.39	$ 10,035,497.81	5.59	$ 796,637.81
4.3	DESALOJO DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION	M3	256.16	$ 16,500.00	$ 4,226,681.25		$ -	110.27	$ 1,819,475.04	145.89	$ 2,407,206.20
5.0	**CONSTRUIR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO**										
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø = 6"	ML	57.25	$ 98,405.56	$ 5,633,718.31		$ -	35.99	$ 3,541,616.10	21.26	$ 2,092,102.21
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE KID SILLA YEE	UND	11.00	$ 210,673.25	$ 2,317,405.75		$ -	7.00	$ 1,474,712.75	4.00	$ 842,693.00
5.3	CAJILLA CONEXIÓN DOMICILIARIA EN CONCRETO DE 3,000PSI DE	UND	11.00	$ 1,317,509.77	$ 14,492,607.47		$ -	7.00	$ 9,222,568.39	4.00	$ 5,270,039.08
5.4	SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILAR	M2	220.42	$ 19,364.24	$ 4,268,265.78		$ -	138.56	$ 2,683,109.09	81.86	$ 1,585,156.69
	TOTAL COSTOS DIRECTOS			**%**	**$ 149,250,665.99**		**$ -**		**$ 134,325,599.39**		**$ 14,925,066.59**
	COSTOS INDIRECTOS	Administracion		29%	$ 43,282,693.14		$ -		$ 38,954,423.83		$ 4,328,269.32
		Utilidad		4%	$ 5,970,026.64		$ -		$ 5,373,023.98		$ 597,002.66
		Imprevistos		1%	$ 1,492,506.66		$ -		$ 1,343,255.99		$ 149,250.67
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS			**34%**	**$ 50,745,226.44**		**$ -**		**$ 45,670,703.80**		**$ 5,074,522.65**
	TOTAL COSTO DE OBRA				**$ 199,995,892.43**		**$ -**		**$ 179,996,303.19**		**$ 19,999,589.24**

EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

NIT. 900.304.997-8

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1

DESCRIPCION CONTRATO

EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

CONTRATO DE OBRA No.SPO-CO-005-2025 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2025

OBJETO: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CONTRATISTA:	CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S.
IDENTIFICACION:	NIT. 901.379.821-6
R.L:	DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN
IDENTIFICACION:	C.C. No. 1.122.340.473 de San Miguel(P)
INTERVENTORIA:	C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS
IDENTIFICACION:	NIT. 900.860.555-1
R.L:	LEYDER CEDIEL CABRERA

IDENTIFICACION:	C.C. 1.131.085.107 de Nariño (N)
SUPERVISOR: CARLOS ESNEHIDER QUIROZ C.	
TIEMPO DE EJECUCION:	UN (01) MES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 199,995,892.43
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 199,995,892.43
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30/10/2025
FECHA DE INICIO:	13/11/2025
FECHA DE TERMINACION:	12/12/2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	5/12/2025

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1

FECHA: viernes, 5 de diciembre de 2025

PERIODO EJECUTADO DEL ACTA DESDE: jueves, 13 de noviembre de 2025 **HASTA:** viernes, 5 de diciembre de 2025

En el Municipio Valle del Guamuez, a los cinco (5) días del mes de diciembre del año 2025, Se reunieron en las instalaciones de la Empresa Administrativa De Servicios Públicos Domiciliarios Del Valle Del Guamuez - EMSERPUVAG S.A. E.S.P., **CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA**, Gerente **EMSERPUVAG S.A. E.S.P**, en calidad de **SUPERVISOR** del Contrato de Obra No. SPO-CO-005-2025 del 30 de octubre del 2025, el ingeniero **LEYDER CEDIEL CABRERA** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.131.085.107 de Nariño (N), en calidad de **INTERVENTOR** según Contrato de Consultoria No. SUO-CD-018-2025 del 31 de octubre del 2025 y la señora **DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN** identificada con cedula de ciudadanía N°. 1.122.340.473 de San Miguel (P), en calidad de Representante Legal de la empresa **CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC.** con Nit. No. 901379821-6 **CONTRATISTA DE OBRA**, mediante el presente documento se deja constancia **Acta De Recibo Parcial No. 1**, teniendo en cuenta las actividades contractuales detalladas a continuación:

CONDICIONES INICIALES					ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		SALDOS	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR

BALANCE DE EJECUCION A LA FECHA			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$	199,995,892.43	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	$	-	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$	199,995,892.43	
VALOR ACTA PARCIAL No.1:	$	179,996,303.19	
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$	179,996,303.19	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	$	19,999,589.24	

BALANCE DEL ANTICIPO:			
VALOR DE ANTICIPO CONTRATO INICIAL 30%:	$	-	
VALOR DE ANTICIPO CONTRATO ADICIONAL 30%:	$	-	
VALOR TOTAL DE ANTICIPOS:	$	-	
AMORTIZACIÓN DEL 30% SEGÚN ACTA PARCIAL No.1:	$	-	
SALDO POR AMORTIZAR:	$	-	

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO	PORCENTAJE	90.00%	$	179,996,303.19
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	PORCENTAJE	10.00%	$	19,999,589.24

TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$	179,996,303.19

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA SEIS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE LEGAL

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA O EL PERÍODO FACTURADO: ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1

FECHA DE ELABORACIÓN: viernes, 5 de diciembre de 2025

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR, Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTORÍA	POR LA SUPERVISIÓN
MARCELA DIAZ		
DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN	**LEYDER CEDIEL CBRERA**	**CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA**
C.C. No. 1.122.340.473 de San Miguel(P)	**C.C. 1.131.085.107 de Nariño (N)**	
CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC	C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS	GERENTE EMSERPUVAG S.A. E.S.P
NIT. 901.379.821-6	NIT. 900.860.555-1	

Proyecto y Aprobo P.T.: LEYDER CEDIEL CABRERA
Interventor Según Contrato de Consultoria No. SUO-CD-018-2025

Reviso P.T.: EDELBERTO JEREZ NOVOA
Apoyo Profesional Emserpuvag S.A. E.S.P.

MEMORIA DE CANTIDAD DE OBRA

CAPITULO 1	INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA AGUAS RESIDUALES	UNIDAD	CANTIDAD
" OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."			
ITEM: 1,1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL MIXTO	M3	286.78

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR
	H	ANCH	LARGO	V		A	L	H				
Tuberia PVC 10" Tramo (1) Ver Planos	63.60	0.90	1.82		1.00				104.18	104.18	286.78	0.00
Tuberia PVC 10" Tramo (2) Ver Planos	58.40	0.90	1.87		1.00				98.29	98.29		
Tuberia PVC 10" Tramo (3) Ver Planos	58.55	0.90	1.60		1.00				84.31	84.31		
TOTAL PARCIAL										286.78		

MARCELA DIAZ

DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN
R/L: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC
CONTRATISTA DE OBRA

LEYDER CEDIEL CBRERA
R/L:C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CARLOS [illegible] QUIROZ CAMPAÑA
GERENTE EMSERPUVAG S.A. E.S.P
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDAD DE OBRA

CAPITULO 1	INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA AGUAS	UNIDAD	CANTIDAD
" OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."			
ITEM: 1,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL MIXTO	M3	73.39

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR
	H	ANCH	LARGO	AREA		A	L	H				
Excavacion Tuberia de 6" - Domiciliaria (1)	1.40	0.70	4.57		1.00				4.48	4.48	49.49	23.90
Excavacion Tuberia de 6" - Domiciliaria (2)	1.35	0.70	4.68		1.00				4.42	4.42		
Excavacion Tuberia de 6" - Domiciliaria (3)	1.35	0.70	4.72		1.00				4.46	4.46		
Excavacion Tuberia de 6" - Domiciliaria (4)	1.35	0.70	4.74		1.00				4.48	4.48		
Excavacion Tuberia de 6" - Domiciliaria (5)	1.40	0.70	6.54		1.00				6.41	6.41		
Excavacion Tuberia de 6" - Domiciliaria (6)	1.35	0.70	5.38		1.00				5.08	5.08		
Excavacion Tuberia de 6" - Domiciliaria (7)	1.35	0.70	5.36		1.00				5.07	5.07		
Excavacion Camaras (2)	1.86			2.27	2.00				4.22	8.44		
Excavacion Cajillas (11)	0.95	1.00	1.00		7.00				0.95	6.65		
									-	-		
TOTAL PARCIAL										49.49		

MARCELA DIAZ

DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN
R/L: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC
CONTRATISTA DE OBRA

LEYDER CEDIEL CABRERA
R/L: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CARLOS ENRIQUE QUIROZ CAMPAÑA
GERENTE EMSERPUVAG S.A. E.S.P
SUPERVISOR

423

MEMORIA DE CANTIDAD DE OBRA

CAPITULO 2	REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO	UNIDAD	CANTIDAD
" OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."			
ITEM: 2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø = 10"	ML	180.55

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR
	H	ANCH	LARGO	AREA		A	L	H				
Tuberia corrugada PVC 10" - Tramo (1) (Ver Pla			63.60		1.00				63.60	63.60	180.55	0.00
Tuberia corrugada PVC 10" - Tramo (2) (Ver Pla			58.40		1.00				58.40	58.40		
Tuberia corrugada PVC 10" - Tramo (3) (Ver Pla			58.55		1.00				58.55	58.55		
									-	-		
									-	-		
									-	-		
TOTAL PARCIAL										180.55		

MARCELA DIAZ

DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN
R/L: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC
CONTRATISTA DE OBRA

LEYDER CEDIEL CABRERA
R/L: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA
GERENTE EMSERPUVAG S.A. E.S.P
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDAD DE OBRA

CAPITULO 2	REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO	UNIDAD	CANTIDAD
" OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."			
ITEM: 2,2	SUMINISTRO E INSTALACION CAMA DE CIMENTACION CON RECEBO E=0,20 MÁS	M3	105,84

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR
	H	ANCHO	LARGO	MENOS AREA TUBO		A	L	H				
Tuberia PVC 10" Tramo (1) Ver Planos	0,65	0,90	63,60		1,00				37,21	37,21	99,11	6,72
Tuberia PVC 10" Tramo (2) Ver Planos	0,65	0,90	58,40		1,00				34,16	34,16		
Tuberia PVC 10" Tramo (3) Ver Planos	0,65	0,90	58,55		1,00				34,25	34,25		
Domiciliaria (1)	0,53	0,70	4,57		1,00				1,70	1,70		
Domiciliaria (2)	0,53	0,70	4,68		1,00				1,74	1,74		
Domiciliaria (3)	0,53	0,70	4,72		1,00				1,75	1,75		
Domiciliaria (4)	0,53	0,70	4,74		1,00				1,76	1,76		
Domiciliaria (5)	0,53	0,70	6,54		1,00				2,43	2,43		
Domiciliaria (6)	0,53	0,70	5,38		1,00				2,00	2,00		
Domiciliaria (7)	0,53	0,70	5,36		1,00				1,99	1,99		
Tuberia PVC 10" Tramo (1) Ver Planos			63,60	(0,20)	1,00				(12,49)	- 12,49		
Tuberia PVC 10" Tramo (2) Ver Planos			58,40	(0,20)	1,00				(11,47)	- 11,47		
Tuberia PVC 10" Tramo (3) Ver Planos			58,55	(0,20)	1,00				(11,50)	- 11,50		
Domiciliaria (1)			4,57	(0,12)	1,00				(0,54)	- 0,54		
Domiciliaria (2)			4,68	(0,12)	1,00				(0,55)	- 0,55		
Domiciliaria (3)			4,72	(0,12)	1,00				(0,56)	- 0,56		
Domiciliaria (4)			4,74	(0,12)	1,00				(0,56)	- 0,56		
Domiciliaria (5)			6,54	(0,12)	1,00				(0,77)	- 0,77		
Domiciliaria (6)			5,38	(0,12)	1,00				(0,63)	- 0,63		
Domiciliaria (7)			5,36	(0,12)	1,00				(0,63)	- 0,63		
SUBTOTAL										**79,29**		
COMPACTACION (1,25%)										**19,82**		
TOTAL PARCIAL										**99,11**		

DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN
R/L: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC
CONTRATISTA DE OBRA

LEYDER CEDIEL CABRERA
R/L: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA
GERENTE EMSERPUVAG S.A. E.S.P
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDAD DE OBRA

CAPITULO 2	REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO	UNIDAD	CANTIDAD
" OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."			
ITEM: 2,3	ENTIBADO DE TALUDES PARA EXCAVACIÓN DE ZANJAS	M2	671.65

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR
	H	ANCHO	LARGO	MENOS AREA TUBO		A	L	H				
Tuberia PVC 10" Tramo (1) Ver Planos	1.86		63.60		2.00				118.30	236.59	671.65	0.00
Tuberia PVC 10" Tramo (2) Ver Planos	1.86		58.40		2.00				108.62	217.25		
Tuberia PVC 10" Tramo (3) Ver Planos	1.86		58.55		2.00				108.90	217.81		
										-		
										-		
TOTAL PARCIAL										671.65		

MARCELA DIAZ

DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN
R/L: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC
CONTRATISTA DE OBRA

LEYDER CADIEL CABRERA
U/L: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CARLOS [illegible] QUIROZ CAMPAÑA
GERENTE EMSERPUVAG S.A. E.S.P
SUPERVISOR

926

MEMORIA DE CANTIDAD DE OBRA

CAPITULO 2	REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO	UNIDAD	CANTIDAD
" OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."			
ITEM: 2,4	SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILAR	M2	695.12

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR
	H	ANCHO	LARGO	MENOS AREA TUBO		A	L	H				
Tuberia PVC 10" Tramo (1) Ver Planos		3.85	63.60		1.00				244.86	244.86	695.12	0.00
Tuberia PVC 10" Tramo (2) Ver Planos		3.85	58.40		1.00				224.84	224.84		
Tuberia PVC 10" Tramo (3) Ver Planos		3.85	58.55		1.00				225.42	225.42		
										-		
										-		
TOTAL PARCIAL										695.12		

MARCELA DIAZ

DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN
R/L: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC
CONTRATISTA DE OBRA

LEYDER CEDIEL CABRERA
U/L: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CARLOS EDUARDO ARROYO CAMPAÑA
GERENTE EMSERPUVAG S.A. E.S.P
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDAD DE OBRA

CAPITULO 3	CONSTRUCCION CÁMARAS DE INSPECCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
" OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."			
ITEM: 3,1	CONSTRUCCION CAMARA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3,000 PSI	UND	2.00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR
	H	ANCHO	LARGO	MENOS AREA TUBO		A	L	H				
Camara de inspeccion Reforzada					2.00				2.00	2.00	2.00	0.00
									-	-		
									-	-		
										-		
										-		
TOTAL PARCIAL										2.00		

MARCELA DIAZ

DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN
R/L: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC
CONTRATISTA DE OBRA

LEYDER CEDEL CABRERA
U/L: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CARLOS ENRIQUE ERAZO CAMPAÑA
GERENTE EMSERPUVAG S.A. E.S.P
SUPERVISOR

428

MEMORIA DE CANTIDAD DE OBRA

CAPITULO 4	REALIZAR RELLENOS Y OTRAS ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
" OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."			
ITEM: 4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	193.45

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR
	H	ANCHO	LARGO	MENOS AREA TUBO		A	L	H				
Tuberia PVC 10" Tramo (1) Ver Planos	0.87	0.90	63.60		1.00				49.80	49.80	182.85	10.60
Tuberia PVC 10" Tramo (2) Ver Planos	0.92	0.90	58.40		1.00				48.36	48.36		
Tuberia PVC 10" Tramo (3) Ver Planos	0.65	0.90	58.55		1.00				34.25	34.25		
Domiciliaria (1)	0.57	0.70	4.57		1.00				1.82	1.82		
Domiciliaria (2)	0.52	0.70	4.68		1.00				1.70	1.70		
Domiciliaria (3)	0.52	0.70	4.72		1.00				1.72	1.72		
Domiciliaria (4)	0.52	0.70	4.74		1.00				1.73	1.73		
Domiciliaria (5)	0.57	0.70	6.54		1.00				2.61	2.61		
Domiciliaria (6)	0.57	0.70	5.38		1.00				2.15	2.15		
Domiciliaria (7)	0.57	0.70	5.36		1.00				2.14	2.14		
SUBTOTAL										**146.28**		
COMPACTACION (1,25%)										**36.57**		
TOTAL PARCIAL										**182.85**		

MARCELA DIAZ

DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN
R/L: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC
CONTRATISTA DE OBRA

LEYDER YEDIEL CABRERA
U/L: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CARLOS ESNEIDER QUIROZ CAMPAÑA
GERENTE EMSERPUVAG S.A. E.S.P
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDAD DE OBRA

CAPITULO 4	REALIZAR RELLENOS Y OTRAS ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
" OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."			
ITEM: 4,2	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACIÓN PARA RELLENO FINAL CON	M3	75,98

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR
	H	ANCHO	LARGO	MENOS AREA TUBO		A	L	H				
Tuberia PVC 10" Tramo (1) Ver Planos	0,30	0,90	63,60		1,00				17,17	17,17	70,39	5,59
Tuberia PVC 10" Tramo (2) Ver Planos	0,30	0,90	58,40		1,00				15,77	15,77		
Tuberia PVC 10" Tramo (3) Ver Planos	0,30	0,90	58,55		1,00				15,81	15,81		
Domiciliaria (1)	0,30	0,70	4,57		1,00				0,96	0,96		
Domiciliaria (2)	0,30	0,70	4,68		1,00				0,98	0,98		
Domiciliaria (3)	0,30	0,70	4,72		1,00				0,99	0,99		
Domiciliaria (4)	0,30	0,70	4,74		1,00				1,00	1,00		
Domiciliaria (5)	0,30	0,70	6,54		1,00				1,37	1,37		
Domiciliaria (6)	0,30	0,70	5,38		1,00				1,13	1,13		
Domiciliaria (7)	0,30	0,70	5,36		1,00				1,13	1,13		
SUBTOTAL										56,31		
COMPACTACION (1,25%)										14,08		
TOTAL PARCIAL										70,39		

MARCELA DIAZ

DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN
R/L: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC
CONTRATISTA DE OBRA

LEYDER CEDIEL CABRERA
U/L: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CARLOS [illegible] MUÑOZ CAMPAÑA
GERENTE EMSERPUVAG S.A. E.S.P
SUPERVISOR

050

MEMORIA DE CANTIDAD DE OBRA

CAPITULO 4	REALIZAR RELLENOS Y OTRAS ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
" OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."			
ITEM: 4,3	DESALOJO DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION	M3	256.16

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR
	H	ANCHO	LARGO	AREA		A	L	H				
Tuberia PVC 10" Tramo (3) Ver Planos	0.95	0.90	58.55		1.00				50.06	50.06		
Domiciliaria (1)	0.83	0.70	4.57		1.00				2.66	2.66		
Domiciliaria (2)	0.78	0.70	4.68		1.00				2.56	2.56		
Domiciliaria (3)	0.78	0.70	4.72		1.00				2.58	2.58		
Domiciliaria (4)	0.78	0.70	4.74		1.00				2.59	2.59		
Domiciliaria (5)	0.83	0.70	6.54		1.00				3.80	3.80		
Domiciliaria (6)	0.78	0.70	5.38		1.00				2.94	2.94	110.27	145.89
Domiciliaria (7)	0.78	0.70	5.36		1.00				2.93	2.93		
Excavacion Camaras (2)	1.86			2.27	2.00				4.22	8.44		
Excavacion Cajillas (11)	0.95	1.00	1.00		7.00				0.95	6.65		
SUBTOTAL										**85.21**		
COMPACTACION (1,25%)										**25.06**		
TOTAL PARCIAL										**110.27**		

MARCELA DIAZ

DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN
R/L: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC
CONTRATISTA DE OBRA

LEYDER CADIEL CABRERA
U/L: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CARLOS EDUARDO [illegible] CAMPAÑA
GERENTE EMSERPUVAG S.A. E.S.P
SUPERVISOR

431

MEMORIA DE CANTIDAD DE OBRA

CAPITULO 5	CONSTRUIR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO	UNIDAD	CANTIDAD
" OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."			
ITEM: 5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø = 6"	ML	57.25

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR
	H	ANCHO	LARGO	AREA		A	L	H				
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (1) (Ver P			4.57		1.00				4.57	4.57	35.99	21.26
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (2) (Ver P			4.68		1.00				4.68	4.68		
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (3) (Ver P			4.72		1.00				4.72	4.72		
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (4) (Ver P			4.74		1.00				4.74	4.74		
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (5) (Ver P			6.54		1.00				6.54	6.54		
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (6) (Ver P			5.38		1.00				5.38	5.38		
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (7) (Ver P			5.36		1.00				5.36	5.36		
TOTAL PARCIAL										35.99		

MARCELA DIAZ

DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN
R/L: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC
CONTRATISTA DE OBRA

LEYDER DIDIEL CABRERA
U/L: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA
GERENTE EMSERPUVAG S.A. E.S.P
SUPERVISOR

USA

MEMORIA DE CANTIDAD DE OBRA

CAPITULO 5	CONSTRUIR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO	UNIDAD	CANTIDAD
" OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."			
ITEM: 5,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE KID SILLA YEE ESTRUCTURADA DE 250mm	UND	11.00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR
	H	ANCHO	LARGO	AREA		A	L	H				
Kit Silla Yee Estructurada 250mm*160mm					7.00				7.00	7.00	7.00	4.00
									-	-		
									-	-		
TOTAL PARCIAL										7.00		

MARCELA DIAZ

DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN
R/L: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC
CONTRATISTA DE OBRA

LEYDER CEDIEL CABRERA
U/L: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CARLOS ESNEIDER QUIROZ CAMPAÑA
GERENTE EMSERPUVAG S.A. E.S.P
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDAD DE OBRA

CAPITULO 5	CONSTRUIR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO	UNIDAD	CANTIDAD
" OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."			
ITEM: 5,3	CAJILLA CONEXIÓN DOMICILIARIA EN CONCRETO DE 3,000PSI DE	UND	11.00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR
	H	ANCHO	LARGO	AREA		A	L	H				
Cajillas de Inspeccion (11)					7.00				7.00	7.00	7.00	4.00
									-	-		
									-	-		
TOTAL PARCIAL										7.00		

MARCELA DIAZ

DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN
R/L: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC
CONTRATISTA DE OBRA

LEYDER CIDIEL CABRERA
U/L: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA
GERENTE EMSERPUVAG S.A. E.S.P
SUPERVISOR

MEMORIA DE CANTIDAD DE OBRA

CAPITULO 5	CONSTRUIR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO	UNIDAD	CANTIDAD
" OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."			
ITEM: 5,4	SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILAR	M2	220.42

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR
	H	ANCHO	LARGO	AREA		A	L	H				
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (1) (Ver P		3.85	4.57		1.00				17.59	17.59	138.56	81.86
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (2) (Ver P		3.85	4.68		1.00				18.02	18.02		
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (3) (Ver P		3.85	4.72		1.00				18.17	18.17		
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (4) (Ver P		3.85	4.74		1.00				18.25	18.25		
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (5) (Ver P		3.85	6.54		1.00				25.18	25.18		
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (6) (Ver P		3.85	5.38		1.00				20.71	20.71		
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (7) (Ver P		3.85	5.36		1.00				20.64	20.64		
TOTAL PARCIAL										138.56		

MARCELA DIAZ

DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN
R/L: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC
CONTRATISTA DE OBRA

LEYDER CEDIEL CABRERA
U/L: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

CARLOS ESNEIDER GUIRRA CAMPAÑA
GERENTE EMSERPUVAG S.A. E.S.P
SUPERVISOR

Compromiso de Todos...	**EMSERPUVAG S.A. E.S.P** **NIT. 900.304.997-8** **ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1**	**NÚMERO** **SPO-CO-005-2025 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2025**

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
CONTRATO DE OBRA No. SPO-CO-005-2025

CONTRATANTE:	EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ- EMSERPUVAG S.A. E.S.P.
NIT. CONTRATANTE:	900.304.997-8
CONTRATISTA:	CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC
NIT:	901.379.821-6
REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN C.C. No. 1.122.340.473 De San Miguel (La Dorada)
INTERVENTOR:	C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A S.
NIT:	900.860.555-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LEYDER CEDIEL CABRERA C.C. No. 1.131.085.107 de Nariño (N)
SUPERVISOR:	CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
OBJETO:	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
VALOR:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($199.995.892,43)
PLAZO:	UN (01) MES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	13 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	05 DE DICIEMBRE DE 2025

En el Municipio del Valle del Guamuez, a los cinco (05) días del mes de diciembre del año 2025, se reunieron en las instalaciones de la Empresa Administrativa De Servicios Públicos Domiciliarios Del Valle Del Guamuez - EMSERPUVAG S.A. E.S.P., **CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA**, Gerente de EMSERPUVAG S.A. E.S.P., en calidad de **SUPERVISOR** del **Contrato de Obra No. SPO-CO-005-2025**, el ingeniero **LEYDER CEDIEL CABRERA** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.131.085.107 de Nariño (N), representante legal de **C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S., en calidad de INTERVENTOR,** según **Contrato de Consultoría No. SUO-CD-018-2025** y **DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.122.340.473 De San Miguel (La Dorada), Representante Legal de **CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC.**, Identificada con Nit. No. 901379821-6 **CONTRATISTA DE OBRA**, mediante el presente documento se deja constancia del **Acta Parcial No. 1.**

Mediante el presente documento se deja constancia que **EL CONTRATISTA**, en el período comprendido entre el 13 de noviembre de 2025 al 05 de diciembre de 2025, ejecutó las actividades y cantidades de obra correspondientes a las establecidas en el **Acta de Recibo Parcial No. 1 Financiera**, con la cual se certifica que los ítems allí relacionados fueron ejecutados a plena satisfacción y conforme a lo establecido en el pliego de condiciones, minuta contractual, presupuesto y especificaciones técnicas:

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@emserpuvag.gov.co

431

BALANCE

VALORES DEL CONTRATO	
Valor Inicial Del Contrato	$ 199.995.892,43
Valor Adicional	$ 0.00
Valor Actual Del Contrato	$ 199.995.892,43
Saldo A Favor De EMSERPUVAG S.A. E.S.P.	$ 0.00

VALORES CANCELADOS	
Anticipo Contrato	$ 0,00
Valor Según Acta De Recibo Parcial No. 1	$ 179.996.303,19
Valor Amortización del Anticipo para el Acta De Recibo Parcial No. 1	$ 0,00
Valor Ejecutado Acumulado (90.00%)	$ 179.996.303,19
Valor Real A Pagar Según Acta Parcial No. 1 Con Amortización De Anticipo	$ 179.996.303,19
Saldo Por Amortizar	$ 0,00
Saldo Por Ejecutar	$ 19.999.589,24

VALORES POR EJECUTAR	
Valor Por Ejecutar (10.00%)	$ 19.999.589,24

VALOR EN LETRAS DE LA PRESENTE ACTA: CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES CON DIECINUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($179.996.303,19)

El INTERVENTOR, deja constancia de la entrega del Acta de Recibo Parcial No. 1 real y conforme a las especificaciones técnicas requeridas tanto en estudios previos, invitación, minuta contractual y cada una de las actividades contractuales ejecutadas y relacionadas en el **Acta de Recibo Parcial No. 01 Financiera** anexa al presente documento.

El recibo parcial de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Para constancia se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2025.

POR EL CONTRATISTA	**POR LA INTERVENTORÍA**
MARCELA DIAZ	
R.L. DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN **C.C. No. 1.122.340.473 de San Miguel (P)**	**R.L. LEYDER CEDIEL CABRERA.** **C.C. No. 1.131.085.107 de Nariño (N),**
CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC Nit. No. 901379821-6	C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A S. Nit. No. 900.860.555-1

POR LA SUPERVISIÓN
R.L. CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA. **C.C. No. 1.126.454.088 de Valle del Guamuez (P)**
GERENTE EMSERPUVAG S.A. E.S.P. - Nit. No. 900.304.997-8

Proyectó: EDELBERTO JEREZ NOVOA – Apoyo Profesional Emserpuvag S.A. E.S.P.

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@emserpuvag.gov.co

U38

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SUO-CD-018-2025

CONTRATANTE:	EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ- EMSERPUVAG S.A. E.S.P.
NIT. CONTRATANTE:	900.304.997-8
CONTRATISTA:	C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS
NIT:	900860555-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LEYDER CEDIEL CABRERA C.C. No. 1.131.085.107 de Nariño (N)
SUPERVISOR	CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE CONSULTORÍA
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
VALOR:	TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($13.999.712,47)
PLAZO:	UN (01) MES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	31 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO:	13 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	05 DE DICIEMBRE DE 2025

En el Municipio del Valle del Guamuez, a los cinco (05) días del mes de diciembre del año 2025, se reunieron en las instalaciones de la Empresa Administrativa De Servicios Públicos Domiciliarios Del Valle Del Guamuez - EMSERPUVAG S.A. E.S.P., **CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA**, Gerente de EMSERPUVAG S.A. E.S.P., en calidad de **SUPERVISOR** del **Contrato de Consultoría No. SUO-CD-018-2025**, y **LEYDER CEDIEL CABRERA** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.131.085.107 de Nariño (N), representante legal de **C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.**, en calidad de **INTERVENTOR**, según **Contrato de Consultoría No. SUO-CD-018-2025**, contratista de interventoría, con el objeto de celebrar la presente **Recibo Parcial No. 1** del **Contrato de Consultoría No. SUO-CD-01-2025**, de acuerdo con el siguiente cuadro de valores.

BALANCE

VALORES DEL CONTRATO	
Valor Inicial Del Contrato	$ 13.999.712,47
Valor Adicional	$ 0,00
Valor Actual Del Contrato	$ 13.999.712,47

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@emserpuvag.gov.co

Saldo A Favor De EMSERPUVAG S.A. E.S.P.	$ 0,00

VALORES CANCELADOS	
Anticipo Contrato	$ 0,00
Valor Según Acta De Recibo Parcial No. 1	$ 12.599.741,22
Valor Amortización del Anticipo para el Acta De Recibo Parcial No. 1	$ 0,00
Valor Ejecutado Acumulado (90.00%)	$ 12.599.741,22
Valor Real A Pagar Según Acta Parcial No. 1 Con Amortización De Anticipo	$ 12.599.741,22
Saldo Por Amortizar	$ 0,00
Saldo Por Ejecutar	$ 1.399.971,25

VALORES POR EJECUTAR	
Valor Por Ejecutar (10.00%)	$ 1.399.971,25

VALOR EN LETRAS PRESENTE ACTA: DOCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN CON VEINTIDÓS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($12.599.741,22)

La suscripción de esta Acta de Recibo Parcial No. 1 no releva al Interventor(a), de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.

La interventoría asume plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida en este documento, no se exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado.

El contratista debe aportar los requisitos necesarios para el pago parcial del contrato de interventoría según lo establecido en el contrato.

Para constancia se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2025.

POR EL CONTRATISTA INTERVENTOR	**POR LA SUPERVISIÓN**
R.L. LEYDER CEDIEL CABRERA. **C.C. No. 1.131.085.107 de Nariño (N),**	**R.L. CARLOS ESNEHIDER QUIROZ C.** **C.C. No. 1.126.454.088 de Valle del Guamuez (P)**
C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A S. - Nit. No. 900.860.555-1	GERENTE EMSERPUVAG S.A. E.S.P. Nit. No. 900.304.997-8

Proyectó: EDELBERTO JEREZ NOVOA - Apoyo Profesional Emserpuvag S.A. E.S.P.

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@emserpuvag.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
EMSERPUVAG S.A. E.S.P.
NIT. 900.304.997-8

CERTIFICACIÓN

EL GERENTE DE LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ "EMSERPUVAG S.A. E.S.P." NIT: 900.304.997-8.

CERTIFICA QUE

En ejecución del Contrato De Consultoría No. SUO-CD-018-2025 del 31 de octubre del 2025, que tiene por objeto: "INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", presento a la Empresa el informe mensual para el Acta de Recibo Parcial No. 1 del seguimiento y control a la ejecución de las obras correspondiente al Contrato De Obra No. SPO-CO-005-2025 del 30 de octubre de 2025, durante el periodo comprendido entre el 13 de noviembre de 2025 al 05 de diciembre de 2025, conforme a los requisitos técnicos, administrativos, financieros, legales y ambientales establecidos en el Contrato De Consultoría No. SUO-CD-018-2025.

De acuerdo con lo anterior y una vez revisando los informes de interventoría, El Gerente De EMSERPUVAG S.A. E.S.P., en calidad de Supervisor del Contrato De Consultoría No. SUO-CD-018-2025 (Interventoría), certifica que el Informe para el acta de Recibo Parcial No. 1, CUMPLE con el 90 % de ejecución y está cumpliendo con los con los requisitos establecidos en el Contrato De Consultoría No. SUO-CD-018-2025.

Para constancia se firma en el Municipio de Valle del Guamuez – Putumayo, a los cinco (05) días del mes de diciembre del 2025.

Cordialmente;

R.L. CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA
GERENTE EMSERPUVAG S.A. E.S.P.
Nit. No. 900.304.997-8

Proyecto: EDELBERTO JEREZ NOVOA
Apoyo Profesional Emserpuvag S.A. E.S.P.

041

INFORME RECIBO PARCIAL No. 1 EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SPOPM-CONV-044-2025 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2025

OBJETO DEL CONVENIO; AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ Y LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P. – EMSERPUVAG S.A. E.S.P., PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

BENEFICIARIO: EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ "EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

CONTRATO DE OBRA No. SPO-CO-005-2025 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2025

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CONTRATISTA: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC
REPRESENTANTE LEGAL: DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. SUO-CD-018-2025 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025

INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTRATISTA: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS
REPRESENTANTE LEGAL: LEYDER CEDIEL CABRERA

SUPERVISOR DE CONTRATOS:
CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA
GERENTE EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

SUPERVISOR DE CONVENIO:
HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL.

PERIODO DEL INFORME
16 DE OCTUBRE DEL 2025 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DEL INFORME
05 DE DICIEMBRE DE 2025

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

INTRODUCCIÓN

El presente informe, hace parte de las obligaciones contractuales adquiridas en el Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-044-2025 del 16 de octubre de 2025, que tiene por objeto: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ Y LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P. – EMSERPUVAG S.A. E.S.P., PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

Tanto la Alcaldía Municipal de Valle Del Guamuez y La Empresa Administrativa De Servicios Públicos Domiciliarios Del Municipio Valle Del Guamuez "EMSERPUVAG S.A. E.S.P. tienen como obligación cumplir y velar por el desarrollo de las funciones y objetivos institucionales a su cargo, a las cuales con el fin de dar cumplimiento a la misión de la Alcaldía Municipal como entidad territorial el impulsar el desarrollo económico, social, ambiental, y político de la comunidad. Tienen entre sus fines garantizar el acceso a las oportunidades y al libre ejercicio de los derechos fundamentales con la participación de la comunidad bajo el marco de una solidaridad y eficiencia administrativa, esto contempla realizar la construcción, ampliación y/o reposición de las redes de alcantarillado sanitario del Municipio tanto en el casco urbano como en el área rural, ya que es de vital importancia su correcto funcionamiento, El municipio Valle del Guamuez es uno de los municipios que se encuentra en desarrollo económico e industrial.

Dicho lo anterior, dentro del Plan de Desarrollo Municipal, "JUNTOS AVANZAMOS", se incluye mejorar la calidad de vida con obras que permitan dar soluciones a la recolección, transporte y tratamiento de las aguas residuales generadas por las diferentes actividades antrópicas (uso humano en entornos domésticos, industriales y agrícolas), evitando que se conviertan en una amenaza para la salud humana y los ecosistemas si no son tratadas adecuadamente. Con base en lo anterior, se estructuro el presente proyecto, asi se evita que el agua contaminada sea tirada sin control. Gracias a esta ampliación contaremos con un sistema que sirva para la distribución de aguas residuales de manera segura para el municipio y el medio ambiente.

En cumplimiento al Plan de Desarrollo Institucional y Municipal, la Empresa Administrativa de Servicios Públicos Domiciliarios del Valle del Guamuez, implementan la ejecución de este proyecto que permite la optimización del Alcantarillado Sanitario En El Barrio Los Alpes, carrera 15 entre calles 5 y 7b, con tubería sanitaria PVC de 10" para la red principal y tubería sanitaria PVC de 6" para las acometidas domiciliarias en beneficio para la comunidad.

Es de reconocer que el desarrollo del presente proyecto genera un impacto significativo de bienestar y desarrollo en el sector a intervenir, pues al culminar dicho propósito no solo se beneficiara la parte más importante que es la comunidad, sino también la Empresa Administrativa de Servicios Públicos Domiciliarios del Valle del Guamuez, que aumentara

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

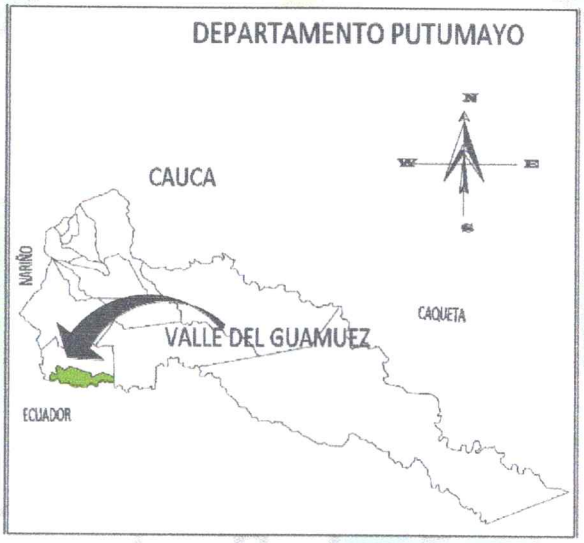
1143

su capacidad de operación y servicios. La ejecución del presente contrato permite brindar las condiciones idóneas para la operación del sitio, para la ampliación de la Red existente del Alcantarillado Sanitario del Municipio de Valle del Guamuez.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La ampliación de la red de alcantarillado sanitario en el tramo urbano en la siguiente dirección; Barrio Los Alpes, carrera 15 entre calles 5 y 7b, en el municipio Valle del Guamuez, Departamento Del Putumayo.





Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

1.2. ALCANCE DEL PROYECTO

En el Barrio Los Alpes, carrera 15 entre calles 5 y 7b Del Casco Urbano Del Municipio del Valle del Guamuez, departamento del Putumayo, Actualmente el sistema de Alcantarillado Sanitario está funcionando de forma ineficaz, debido a su avanzada edad de construcción y a que en las condiciones actuales, de la población han cambiado, por esta razón, es necesario mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector urbano del municipio, bajar el impacto ambiental generado por las condiciones actuales de la tubería y contribuir a la descontaminación de fuentes hídricas a las que se vierten aguas residuales. Debido al crecimiento poblacional, y el cambio climático que genera grandes descargas de agua lluvias y muchos de los usuarios nuevos realizan su descarga de sus residuos a pozo séptico, y en otros predios empezaron a construirse viviendas, repercuten en la deficiencia de la prestación de servicios y la necesidad de optimizar la red de alcantarillado asi como ampliar a nuevos usuarios. La mala disposición de las aguas servidas en la carrera 15 entre calles 5 y 7b, genera proliferación de olores que conlleva a problemas de salubridad en los habitantes, dicha situación es planteada por los habitantes afectados mediante comunicados por escrito que la proliferación de zancudos y moscas por el estancamiento de aguas y colapso del alcantarillado existente. Es necesaria la construcción de acometidas domiciliarias para que las viviendas se conecten a la red principal, y mejorar las condiciones de vida de los habitantes del sector, y contar con mejor servicio públicos domiciliarios y ampliar la cobertura de este servicio Los anteriores servicios son operados por La Empresa Administrativa De Servicios Públicos Domiciliarios Del Municipio Valle Del Guamuez "EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

El proyecto tiene como alcance principal la ejecución de las actividades necesarias para la optimización del Alcantarillado Sanitario en el Barrio Los Alpes, carrera 15 entre calles 5 y 7b del casco urbano Del Municipio Valle Del Guamuez, Con la implementación de este proyecto se pretende brindar a más familias el acceso al servicio de alcantarillado sanitario y disminuir las afectaciones ambientales generadas por las filtraciones de aguas residuales, esto a su vez genera una disminución en las afectaciones de salud a esta población. Departamento Del Putumayo.

El alcance del proyecto incluye la ampliación de la red de alcantarillado sanitario en una longitud total de 180,55 Metros Lineales aproximados de red de alcantarillado sanitario por ampliar en el Barrio Los Alpes, carrera 15 entre calles 5 y 7b del municipio Valle del Guamuez, mediante la instalación de tuberías y accesorios necesarios para garantizar un sistema sanitario eficiente. Asimismo, contempla la instalación de 11 acometidas domiciliarias y 2 cámaras de inspección, permitiendo la conexión directa al servicio de alcantarillado sanitario para igual número de hogares.

1.3. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

La obra en ejecución abarca la realización de actividades como lo son:

I INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA AGUAS RESIDUALES.

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

1.0 **REALIZAR EXCAVACIONES**:
- Excavación Mecánica en Material Común
- Excavación Manual de Material Común

2.0 **REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO:**
- Suministro e instalación de tubería sanitaria pvc ø = 10"
- Suministro e instalación cama de cimentación con recebo e=0,20 más atraque y corona e=0,45 compactado mecánicamente
- Entibado de taludes para excavación de zanjas
- Sum. inst. de geotextil nt 1800 o similar

3.0 **CONSTRUCCION CÁMARAS DE INSPECCIÓN:**
- Construcción cámara de inspección en concreto de 3,000 psi d=1,20m prof: h <= 2,00m, inc. tapa en ferro concreto

4.0 **REALIZAR RELLENOS Y OTRAS ACTIVIDADES:**
- Suministro e instalación de relleno con material seleccionado de la excavación compactado mecánicamente.
- Suministro, instalación y compactación para relleno final con material de rio seleccionado.
- Desalojo de materiales provenientes de la excavación.

5.00 **CONSTRUIR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO:**
- Suministro e instalación de tubería sanitaria pvc ø = 6"
- Suministro e instalación de kid silla yee estructurada de 250mm x 160mm
- Cajilla conexión domiciliaria en concreto de 3,000psi de 0,70mx0,70m medidas internas
- Sum. Inst. De Geotextil Nt 1800 O Similar

2. RESUMEN EJECUTIVO

2.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONVENIO

No. DE CONVENIO:	SPOPM-CONV-044-2025 del 16 de octubre de 2025
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ Y LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P. – EMSERPUVAG S.A. E.S.P., PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

446

	MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
CONTRATANTE	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
BENEFICIARIO:	EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ "EMSERPUVAG S.A. E.S.P.
APORTE POR PARTE DEL MUNICIPIO	DOSCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($212.995.604.90).
APORTE POR PARTE EMSERPUVAG S.A E.S.P.	UN MILLON DE PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL (1.000.000,00).
VALOR DEL CONVENIO:	DOSCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($213.995.604,90)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SETENTA Y SIETE (77) DIAS CALENDARIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	16 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2025

2.1.1. CLAUSULA TERCERA: COMPROMISOS DE LAS PARTES

Teniendo en cuenta los compromisos específicos que en virtud del convenio la Empresa Emserpuvag S.A. E.S.P. dio cumplimiento.

COMPROMISOS GENERALES DE LA EMPRESA EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

DESCRIPCIÓN	SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO
Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos previstos en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante toda la vigencia del convenio.	La empresa EMSERPUVAG S.A. E.S.P. ha cumplido con el pago de sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social, se anexo la certificación de cumplimiento de los aportes a parafiscales establecidos y copias de las planillas de seguridad social y parafiscales de los meses noviembre del año 2025.
Ejecutar el objeto del convenio con idoneidad, oportunidad y eficiencia, dando cumplimiento a los compromisos establecidos en el presente instrumento, el presupuesto, el cronograma de ejecución y demás documentos que hacen parte integral del convenio	Se ha cumplido la ejecución contractual y todos los compromisos contenidos en el Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-044-2025 de 16 de octubre de 2025, se anexa copia del Contrato De Obra No.SPO-CO-005-2025 del 30 de octubre de 2025, y del Contrato De Consultoría No.

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

	SUO-CD-018-2025 del 31 de octubre de 2025 (Interventoría), con los correspondientes anexos entre los más específicos están: Acta de Recibo Parcial No. 1 del Contrato De Obra y Acta de Recibo Parcial No. 1 del Contrato de Interventoría, contiene Acta Financiera con sus respectivas Memorias de Cálculo, Informe De Ejecución Del Contrato De Obra Detallado, Informe De Ejecución Del Contrato De Interventoría Detallado, con todos los anexos necesarios, certificación de cumplimiento supervisor del contratos. Informe Parcial No. 1 de Supervisión, con todos los respectivos anexos.
Adelantar el proceso de contratación de bienes, obras o servicios requeridos para la ejecución del convenio, conforme a su Manual de Contratación y al régimen especial de derecho privado establecido en la Ley 142 de 1994, aplicando la modalidad procedente de acuerdo con la cuantía, complejidad y naturaleza del objeto a contratar.	Se adelanto el proceso de contratación de bienes, obras o servicios requeridos para la ejecución del convenio, conforme a su Manual de Contratación y al régimen especial de derecho privado establecido en la Ley 142 de 1994, aplicando la modalidad procedente de acuerdo con la cuantía, complejidad y naturaleza del objeto a contratar. De los cual dio origen al Contrato De Obra No. SPO-CO-005-2025 del 30 de octubre de 2025, y del Contrato De Consultoría No. SUO-CD-018-2025 del 31 de octubre de 2025 (Interventoría).

COMPROMISOS ESPECIFICOS DE LA EMPRESA EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

DESCRIPCIÓN	SOPORTE DEL CUMPLIMIENTO
Ejecutar el objeto del convenio conforme al proyecto aprobado, atendiendo las especificaciones técnicas, estudios, diseños, cronograma, presupuesto y demás documentos contractuales.	El presente informe, realizado muestra específicamente el cumplimento según el Acta De Recibo Parcial No. 1 en un 90% de las obligaciones contractuales adquiridas en el Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-044-2025 del 16 de octubre de 2025.
Acreditar y mantener al día el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, conforme a la Ley 1150 de 2007, Ley 789 de 2002 y demás normas vigentes.	La empresa EMSERPUVAG S.A. E.S.P. ha cumplido con el pago de sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social, se anexo la certificación de cumplimiento de los aportes a parafiscales establecidos y copias de las planillas de seguridad social y parafiscales de los meses de mayo a octubre del año 2025.

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

Ejecutar el objeto del convenio con idoneidad, eficiencia y oportunidad, en concordancia con los principios de planeación, economía, transparencia, responsabilidad y eficacia que orientan la contratación estatal.	El presente informe, realizado muestra específicamente la Ejecución y cumplimiento del objeto del convenio con idoneidad, eficiencia y oportunidad, en concordancia con los principios de planeación, economía, transparencia, responsabilidad y eficacia que orientan la contratación estatal. A través el Acta De Recibo Parcial No. 1 ejecutada en un 90 % de las obligaciones contractuales adquiridas en el Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-044-2025 del 16 de octubre de 2025.
Cumplir con la normatividad técnica aplicable a los servicios de saneamiento básico, incluyendo el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS, la Norma Sismo Resistente NSR-10, las Normas Técnicas Colombianas-NTC, y demás regulaciones ambientales, sanitarias y de calidad vigentes.	El presente informe, muestra específicamente el cumplimento según el Acta De Recibo Parcial No. 1 en un 90%, el cual se ejecuta de acuerdo con los estudios y diseños entregados por EMSERPUVAG S.A. E.S.P. En donde Para el seguimiento se tuvo en cuenta adicionalmente a los estudios y diseños las siguientes normas y códigos: La calidad de los materiales que se utilizan en las obras, los trabajos de ejecución de las obras civiles y complementarias, la instalación de materiales y accesorios, se realizan cumpliendo con los requisitos y procedimientos exigidos en los pliegos o los establecidos en las normas que les sean aplicables, de las cuales se citan las siguientes: • Norma RAS 2000 • Resolución No. 330 DE 2017 • Resolución No.799 de 2021 • Resolución No.908 de 2021 • NSR 2010 • Decreto No. 1711 de 2021 • Decreto No. 1401 de 2023 • Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC • American Concrete Instituto ACI • American National Standards Institute Inc. ANSI
Administrar los recursos del convenio con destinación exclusiva al objeto contractual, asegurando un manejo responsable y	Una vez firmado el Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-044-2025 del 16 de octubre de 2025, y

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

permitiendo el control fiscal, administrativo y ciudadano.	haber tenido en cuenta el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 2025000762 y Registro presupuestal No. 2025000939 por un valor de $212.995.604,90 MDA/CTE), por parte de la Alcaldía Municipal De Valle Del Guamuez, asi mismo el Certificado de disponibilidad presupuestal No. 2025000351 y Registro presupuestal No. 2025000433 por un valor de $1.000.000,00 por parte EMSERPUVAG S.A. E.S.P. posteriormente se realiza la correspondiente contratación de Contrato De Obra No. SPO-CO-005-2025 del 30 de octubre del 2025, y del Contrato De Consultoría no. SUO-CD-018-2025 del 31 de octubre del 2025 (Interventoría)
Adelantar el proceso de contratación de bienes, obras o servicios requeridos para la ejecución del convenio, conforme a su Manual de Contratación y al régimen especial de derecho privado establecido en la Ley 142 de 1994, aplicando la modalidad procedente de acuerdo con la cuantía, complejidad y naturaleza del objeto a contratar, incluyendo las garantías contractuales según los estudios previos.	Se adelanto el proceso de contratación de bienes, obras o servicios requeridos para la ejecución del convenio, conforme a su Manual de Contratación y al régimen especial de derecho privado establecido en la Ley 142 de 1994, aplicando la modalidad procedente de acuerdo con la cuantía, complejidad y naturaleza del objeto a contratar. De los cual dio origen al Contrato De Obra No. SPO-CO-005-2025 del 30 de octubre de 2025, y del Contrato De Consultoría No. SUO-CD-018-2025 del 31 de octubre de 2025 (Interventoría).
Abrir una cuenta bancaria de ahorros exclusiva para la administración de los recursos transferidos por el Municipio, destinando los mismos únicamente al cumplimiento del objeto del convenio y reintegrando al Municipio los saldos no ejecutados y los rendimientos financieros que se generen.	Se aperturo la cuenta de ahorros No. 45100004829 por parte de EMSERPUVAG S.A. E.S.P. cuenta bancaria de ahorros exclusiva para la administración de los recursos transferidos por el Municipio del Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-044-2025, los mismos se destinan únicamente al cumplimiento del objeto del convenio y los saldos no ejecutados y los rendimientos financieros que se generen se reintegran al Municipio.
Aportar al convenio la suma de UN MILLON DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.000.000 MDA/CTE), destinados a cofinanciar las actividades necesarias para la ampliación del alcantarillado sanitario objeto del convenio. Estos recursos se	EMSERPUVAG S.A. E.S.P. Aporto al convenio la suma de $1.000.000,00 destinados a cofinanciar las actividades necesarias para la ampliación del alcantarillado sanitario objeto del convenio, de acuerdo con el Certificado de

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

USO

ejecutarán de manera complementaria a los aportes del Municipio y deberán ser invertidos exclusivamente en los fines del convenio, conforme al presupuesto aprobado y bajo supervisión del Municipio.	disponibilidad presupuestal No. 2025000351 y Registro presupuestal No. 2025000433 por un valor de $1.000.000,00
Aportar los recursos técnicos, humanos, financieros y operativos que se requieran para la adecuada ejecución del convenio Cualquier modificación o sustitución de personal clave deberá contar con la aprobación previa y escrita de la secretaria de Planeación y Obras Públicas del Municipio.	EMSERPUVAG S.A. E.S.P. aporto todo los recursos técnicos, humanos, financieros y operativos que se requieran para la adecuada ejecución del convenio, y adelanto el proceso de contratación de bienes, obras o servicios requeridos para la ejecución del convenio, conforme a su Manual de Contratación y al régimen especial de derecho privado establecido en la Ley 142 de 1994, aplicando la modalidad procedente de acuerdo con la cuantía, complejidad y naturaleza del objeto a contratar. De los cual dio origen al Contrato De Obra No. SPO-CO-005-2025 del 30 de octubre de 2025, y del Contrato De Consultoría No. SUO-CD-018-2025 del 31 de octubre de 2025 (Interventoría).
Cumplir con las obligaciones de visibilidad y socialización del proyecto, incluyendo la instalación de vallas informativas, piezas de divulgación y demás mecanismos de información exigidos por el Municipio o por la normatividad aplicable.	La Alcaldía Municipal De Valle Del Guamuez y EMSERPUVAG S.A E.S P. llevaron a cabo la socialización donde se hicieron las recomendaciones y sugerencias necesarias para el desarrollo normal en la ejecución del Convenio Interadministrativo que derivo en el Contrato de obra No. SPO-CO-005-2025 del 30 de octubre de 2025, Cuyo Objeto Es: optimización del sistema de alcantarillado sanitario en el barrio los Alpes, carrera 15 entre calles 5 y 7b, cabecera municipal la hormiga del municipio de Valle del Guamuez, departamento del putumayo y del Contrato De Obra No. SPO-CO-005-2025 del 30 de octubre de 2025, Cuyo Objeto Es: optimización del sistema de alcantarillado sanitario en el barrio los Alpes, carrera 15 entre calles 5 y 7b, cabecera municipal la hormiga del municipio de valle del Guamuez, Departamento Del Putumayo.
Ejecutar los recursos de acuerdo con el presupuesto oficial; cualquier modificación de diseños, rediseños o ajustes técnicos	El presente informe realizado muestra específicamente el cumplimento según el Acta De Recibo Parcial No. 1 en un 90% de

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

US1

deberá contar con la autorización previa del Municipio y los costos adicionales serán asumidos por la Empresa.	las obligaciones contractuales adquiridas en el Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-044-2025 del 16 de octubre de 2025.
Gestionar y obtener, en coordinación con las autoridades competentes, los permisos, licencias o autorizaciones ambientales, sanitarias o de otra índole que sean necesarias para la ejecución de las obras.	Por parte de EMSERPUVAG S.A. E.S.P. no se tiene que Gestionar o obtener, en coordinación con las autoridades competentes, ningún permisos, licencias o autorizaciones ambientales, sanitarias o de otra índole para la ejecución de las obras teniendo en cuenta que emitieron un concepto de viabilidad técnica, financiera, económica y ambiental con fecha del 15/08/2025, donde su código BPIN No. 202500000031252 firmado por el Secretario De Planeación y Obras Públicas, Jefe Banco De Proyectos y Apoyo Profesional De La Secretaría De Planeación De Obras Públicas Municipal, por un valor de DOSCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($213.995.604,90).
Coordinar con la Secretaria de Planeación y Obras la revisión técnica antes, durante y después de la ejecución de la obra, atendiendo las observaciones o requerimientos de la supervisión.	EMSERPUVAG S.A. E.S.P. ha coordinado junto a la Secretaria De Planeación y Obras Públicas Municipal, la socialización del proyecto y también en varias oportunidades visitas técnicas de inspección de la obra para ver el desarrollo de la ejecución del contrato de obra acompañado por la interventoría y supervisor de los contratos y del convenio y revisar el cumplimiento satisfactorio al Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-044-2025 del 16 de octubre de 2025
Presentar al Municipio informes de avance periódicos y un informe final de ejecución, acompañados de soportes técnicos, administrativos y financieros que acrediten la correcta aplicación de los recursos.	El presente informe, realizado muestra específicamente el cumplimento según el Acta De Recibo Parcial No. 1 en un 90% de las obligaciones contractuales adquiridas en el Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-044-2025 del 16 de octubre de 2025.
Facilitar el ejercicio de la supervisión municipal, asi como el control fiscal y disciplinario por parte de los órganos	Se tiene a disposición de la supervisión municipal, asi como el control fiscal y disciplinario por parte de los órganos

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

competentes, suministrando oportunamente toda la documentación, archivos y demás información que se requiera.	competentes, un archivo físico detallado y con toda la información necesaria de los procesos de contratación ejercida por parte de EMSERPUVAG S.A. E.S.P. del Contrato de obra No. SPO-CO-005-2025 de 30 de octubre de 2025, Cuyo Objeto Es: optimización del sistema de alcantarillado sanitario en el barrio los Alpes, carrera 15 entre calles 5 y 7b, cabecera municipal la hormiga del municipio de valle del Guamuez , departamento del putumayo
Consultar con la Secretaría de Planeación y Obras cualquier modificación sustancial al convenio, adjuntando los soportes que justifiquen la solicitud.	Hasta el día de hoy no se ha tenido que consultar de ninguna manera a la Secretaría de Planeación y Obras Municipal para ningún tipo de modificación sustancial al convenio, ningún cambio alguno ni cambio de especificaciones técnicas o ningún cambio de materiales en las actividades contractuales ejecutadas.
Conservar los archivos técnicos, financieros y contractuales relacionados con el convenio durante el término legal correspondiente y ponerlos a disposición de las autoridades cuando sean requeridos.	Contiene archivo físico detallado y con toda la información necesaria de los procesos de contratación ejercida por parte de EMSERPUVAG S.A. E.S.P. del Contrato de obra No. SPO-CO-005-2025 del 30 de octubre de 2025, Cuyo Objeto Es: optimización del sistema de alcantarillado sanitario en el barrio los Alpes, carrera 15 entre calles 5 y 7b, cabecera municipal la hormiga del municipio de valle del Guamuez, departamento del putumayo

1.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO DE OBRA

No. DE CONTRATO:	SPO-CO-005-2025 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
CONTRATANTE	EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ- EMSERPUVAG S.A. E.S.P.
CONTRATISTA:	CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC RTE. LEGAL: DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

VALOR INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($199.995.892,43).
VALOR ADICIONAL:	CERO PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($0,00)
VALOR TOTAL CONTRATO:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($199.995.892,43).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (01) MES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	13 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE DICIEMBRE DE 2025

1.2. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No. DE CONTRATO:	SUO-CD-018-2025 DE 31 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
CONTRATANTE	EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ- EMSERPUVAG S.A. E.S.P.
CONTRATISTA:	C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS RTE. LEGAL: LEYDER CEDIEL CABRERA
VALOR INICIAL:	TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($13.999.712,47).
VALOR ADICIONAL:	CERO PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($0,00)
VALOR TOTAL CONTRATO:	TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($13.999.712,47).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (01) MES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	31 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	13 DE NOVIEMBRE DE 2025

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

2.1. ACTA DE INICIO

2.1.1. CONVENIO

El día 16 de octubre de 2025 se firmó el Acta de Inicio del Convenio Interadministrativo, en la cual, con un plazo de ejecución inicial del convenio de Setenta Y Siete (77) Días Calendarios, se estableció que la fecha de inicio el día 16 de octubre del 2025 y con fecha de terminación del 31 de diciembre del 2025, posterior a la revisión de la supervisión del convenio por parte de la Secretaria De Planeación Y Obras Publicas Municipal.

2.1.2. CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

El día 13 de noviembre del 2025 se firmó el Acta de Inicio de los Contratos de Obra e Interventoría, en la cual, considerando plazo de ejecución de estos que es de Un (01) Mes, se estableció que ambos contratos tendrían como fecha de inicio el día 13 de noviembre del 2025 y como fecha de terminación el día 12 de diciembre del 2025.

2.2. FORMA DE PAGO

2.2.1. CONVENIO

***CLAUSULA QUINTA. FORMA DE TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS**: El Municipio de Valle del Guamuez transferirá a la Empresa Administradora de Servicios Públicos Domiciliarios del Valle del Guamuez S.A. ESP-EMSERPUVAG SA. ESP, su aporte por **DOSCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($213.995.604.,90) M/CTE.**, conforme al siguiente esquema de ejecución financiera*

I. *Transferencia inicial: El treinta por ciento (30%) del valor del aporte del Municipio cumpliendo las siguientes condiciones (i) se perfeccione y legalice al convenio, (ii) se acredite in expedición del registro presupuestal (RP), (ii) se suscriba el contrato de obra derivado del convenio, con aprobación de garantías. El desembolso se realizará a la cuenta bancaria exclusiva del convenio.*

II. *Transferencias parciales por avance de ejecución: El sesenta por ciento (60%) del valor del aporte será transferido mediante giros parciales, previa presentación de informes técnicos de ejecución y avance físico por parte de EMSERPUVAG S.A. ES.P., debidamente aprobados por la Secretaria de Planeación y Obres Públicas y validados por el interventor designado. Cada transferencia estará condicionada a la ejecución proporcional del valor ya transferido y al uso adecuado de los recursos conforme al cronograma aprobado.*

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

USS

III. *Transferencia final: El saldo final, correspondiente como mínimo al diez por ciento (10%) del valor total del convenio, será transferido una vez EMSERPUVAG S.A. E.S.P. presente y se aprueben por parte del Municipio el acta de entrega y recibo final de las obras ejecutadas, el informe técnico y financiero de cierre, el certificado de cumplimiento emitido por la interventoría, asi como los documentos adicionales que se definan en el presente convenio y será transferido posterior a la suscripción del acta de liquidación del convenio.*

El Municipio de Valle del Guamuez (Ptyo), se obliga para con EMSERPUVAG S.A. E.S.P. a sufragar los gastos establecidos en el presupuesto del convenio y su limitación es exclusiva al proceso adelantado, por ende, la entidad no asumirá costos extras, que se encuentren por fuera de él, sin perjuicio de los costos, que se llegaren a imputar al municipio por responsabilidad objetiva del mismo, en ocasión a circunstancias contractuales de la ejecución del convenio.

Las transferencias que por este concepto le efectúe el Municipio de Valle del Guamuez se realizarán mediante transacción bancaria, para ello se deberá realizar apertura de cuenta bancaria de ahorros exclusiva para la ejecución del convenio en mención y recibir en la misma los recursos trasferidos por el Municipio para destinarios exclusivamente al cumplimiento del objeto del presente convenio.

Si perjuicio de lo anterior el pago efectivo se sujetará a la disponibilidad y apropiación presupuestal, ajustándose al programa anual mensualizado de Caja del Municipio de Valle del Guamuez Putumayo.

PARAGRAFO 1º. En caso de terminación anticipada sólo habrá lugar al pago de los servicios efectivamente prestados y liquidados en forma proporcional.

PARAGRAFO 2. EMSERPUVAG SA. ESP deberá aportar los documentos requeridos por el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II y las demás directrices impartidas por la Secretaria de Hacienda del MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ

***Derecho de Turno:** No obstante, el pago estará sujeto a las disponibilidades, del plan de anualizado de caja y el contratista deberá tener en cuenta lo dispuesta por el artículo 19 de la ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno.*

2.2.2. CONTRATO DE OBRA

***CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO:** La entidad entregará un anticipo del treinta por ciento (30%) y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva amortización todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado.*

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

USG

Parágrafo 1. *La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad.*

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda

5.1. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones:

El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

Para el desembolso y manejo de estos recursos el CONTRATISTA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato deberá apertura cuenta bancaria de ahorros con una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera, cuenta que será exclusiva para la administración de los recursos transferidos por la empresa, destinando los mismos únicamente al cumplimiento del objeto del contrato y reintegrando a la empresa los saldos no ejecutados y los rendimientos financieros que se generen, así mismo deberá a su costa asumir todos los costos directos e indirectos relacionados con dicha apertura.

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.

Para el pago del anticipo el contratista deberá presentar ante la Empresa el respectivo plan de inversión, para lo cual La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo.

El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

U57

inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría.

Cuando el contratista sea un auto retenedor, deberá informar en la factura esta condición a fin de no efectuar la retención.

2.2.3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CLAUSULA CUARTA, FORMA DE PAGO.

Para todos los efectos a que haya lugar, el valor total del presente proceso asciende a la suma de ***TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS($13.999.712,47) M/CTE. IVA INCLUIDO****, o por el menor precio ofertado por el Contratista seleccionado, incluido IVA, los costos e impuestos directos e indirectos y los ajustes previstos por incrementos de asignaciones, tarifas y demás costos necesarios para el normal desarrollo del contrato, que la Empresa pagará al contratista asi:*

Un anticipo equivalente al 30% previa suscripción y legalización del contrato, hasta el 90% mediante actas de avance obra, es decir, la interventoría se pagará juntamente con actas de obra, para garantizar el avance de obra y previa autorización de supervisión y/o interventoría que designe la empresa, y el 10% final con el acta de liquidación.

Para el desembolso y manejo de estos recursos el CONTRATISTA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato deberá apertura cuenta bancaria de ahorros con una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera, cuenta que será exclusiva para la administración de los recursos transferidos por la empresa, destinando los mismos únicamente al cumplimiento del objeto del contrato y reintegrando a la empresa los saldos no ejecutados y los rendimientos financieros que se generen, así mismo deberá a su costa asumir todos los costos directos e indirectos relacionados con dicha apertura.

El anticipo no es un pago, por lo tanto, no requiere factura, para desembolso de anticipo el contratista debe presentar un plan de inversión del anticipo, junto con copia del contrato, registro presupuestal y acta de inicio de obra y de interventoría.

Parágrafo 1. *Los pagos señalados quedan condicionados adicionalmente a lo siguiente: a) Que EL CONTRATISTA acredite el cumplimiento de la obligación de que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002. B) Que el contratista haya cumplido con la obligación de entregar los informes parciales y/o final y documentos, c) Que el contratista haya cumplido con los requisitos exigidos, entre ellos, la obligación de mantener el personal ofrecido en su propuesta, con las calidades exigidas.*

Parágrafo 2. *Derecho al turno, No obstante, lo señalado, el pago estará sujeto a las disponibilidades del Programa Anual Mensualizado de Caja, y el contratista deberá tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 19 de la ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno.*

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

Para tramitar el pago, el contratista deberá acreditar constancia de pago al sistema general de seguridad social integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo establecido en la Ley 1150 artículo 23, ley 100 de 1993, ley 190 de 1995, ley 797 de 2003, decreto 1703 de 2002 y 2800 de 2003 y demás normas concordantes y/o complementarias.

2.3. RELACIÓN DE PAGOS

2.3.1. CONVENIO

No se realizó la transferencia por concepto del anticipo correspondiente al 30% del valor del aporte por parte del Municipio, así mismo el presente informe es para hacer el cobro del Acta de Recibo Parcial del 90% del valor del Convenio, pero de acuerdo con la CLAUSULA QUINTA. FORMA DE TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS el municipio de valle del Guamuez solo hará la trasferencia del 90% del valor del aporte del municipio.

2.3.2. CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

No se realizó la transferencia por concepto del anticipo correspondiente treinta por ciento (30%) del valor del Contrato De Obra y Del Contrato De Interventoría: teniendo en cuenta esto la Entidad EMSERPUVAG S.A. E.S.P. con el presente informe estamos realizando el cobro del Acta de Recibo Parcial del 90% del valor del aporte del Municipio y asi poder pagar el Acta de Recibo Parcial del 90% del valor del Contrato De Obra y del Contrato De Interventoría, EMSERPUVAG S.A. E.S.P. efectuará al Contratista de obras pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado. Asi mismo hará el pago la interventoría se pagará juntamente con actas de obra, para garantizar el avance de obra y previa autorización de supervisión y/o interventoría que designe la empresa, y el 10% final con el acta de liquidación.

3. INFORMACIÓN BENEFICIARIO, CONTRATISTA E INTERVENTOR

3.1. INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO

Nombre	EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ "EMSERPUVAG S.A. E.S.P."
Tipo De Identificación	NIT
Número De Identificación	900.304.997-8
Tipo De Contratista	Publico
Naturaleza Del Contratista	Persona Jurídica

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

US9

Representante Legal	CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA
Tipo De Identificación Del Representante Legal	Cédula de ciudadanía
Número De Identificación Representante Legal	1.126.454.088 de Valle del Guamuez (P)
Dirección De Oficina	Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad
Departamento	Putumayo
Municipio	Valle del Guamuez

3.2. INFORMACIÓN CONTRATISTA DE OBRA

Nombre	CIVILTOP CONSTRUCCIONES SAS ZOMAC
Tipo De Identificación	NIT
Número De Identificación	901379821-6
Tipo De Contratista	Privado
Naturaleza Del Contratista	Persona Jurídica
Representante Legal	DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN
Tipo De Identificación Del Representante Legal	Cédula de ciudadanía
Número De Identificación Representante Legal	1.122.340.473 DE SAN MIGUEL (LA DORADA)
Dirección De Oficina	Carrera 4 No7 -17 Barrio central
Departamento	Putumayo
Municipio	San Miguel

3.3. INFORMACIÓN CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Nombre	C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS
Tipo De Identificación	Nit
Número De Identificación	900,860,555-1
Tipo De Contratista	Privado
Naturaleza Del Contratista	Persona jurídica
Representante Legal	LEYDER CEDIEL CABRERA
Tipo De Identificación Del Representante Legal	Cedula de ciudadanía
Número De Identificación Representante Legal	1.131.085.107 de Nariño
Dirección De Oficina	Carrera 6 Barrio San Felipe
Departamento	Putumayo
Municipio	San Miguel

4. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

4.1. GENERALIDADES

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

A la fecha del presente informe se ha logrado realizar las actividades descritas y relacionadas en la tabla No. 1 correspondiente a todos los capítulos.

En el siguiente cuadro se describen las actividades ejecutadas a la fecha y el porcentaje total de ejecución de obra:

CONDICIONES INICIALES				OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA	
ITEM	**DESCRIPCION DE LA OBRA**	**UND.**	**CANT.**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**
1,0	**REALIZAR EXCAVACIONES**				
1,1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	286,78	286,78	$ 8.574.722,00
1,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	73,39	49,49	$ 1.500.509,09
2,0	**REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLA**				
2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø = 10"	ML	180,55	180,55	$ 23.446.278,97
2,2	SUMINISTRO E INSTALACION CAMA DE CIMENTACION CON RECEBO E=0,20 MÁS ATRAQUE Y CORONA E=0,45 COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	105,84	99,11	$ 14.049.023,43
2,3	ENTIBADO DE TALUDES PARA EXCAVACIÓN DE ZANJAS	M2	671,65	671,65	$ 31.250.618,51
2,4	SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILAR	M2	695,12	695,12	$ 13.460.470,51
3,0	**CONSTRUCCION CÁMARAS DE INSPECCIÓN**				
3,1	CONSTRUCCION CAMARA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3,000 PSI D=1,20m PROF: H <= 2,00m, INC. TAPA EN FERROCONCRETO	UND	2,00	2,00	$ 8.896.882,70
4,0	**REALIZAR RELLENOS Y OTRAS ACTIVIDADES**				
4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	193,45	182,85	$ 4.370.115,00
4,2	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACIÓN PARA RELLENO FINAL CON MATERIAL DE RIO SELECCIONADO	M3	75,98	70,39	$ 10.035.497,81
4,3	DESALOJO DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION	M3	256,16	110.27	$ 1.819.475,04
5,0	**CONSTRUIR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO**				
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø = 6"	ML	57,25	35,99	$ 3.541.616,10
5,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE KID SILLA YEE ESTRUCTURADA DE 250mm x 160mm	UND	11,00	7,00	$ 1.474.712,75
5,3	CAJILLA CONEXIÓN DOMICILIARIA EN CONCRETO DE 3,000PSI DE 0,70mx0,70m MEDIDAS INTERNAS	UND	11,00	7,00	$ 9.222.568,39

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

UG1

5,4	SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILA	M2	220,42	138,56	$	2.683.109,09
TOTAL COSTOS DIRECTOS	**TOTAL COSTOS DIRECTOS**				**$**	**134.325.599,39**
	COSTOS INDIRECTOS	Administración				$ 38.954.423,83
		Utilidad				$ 5.373.023,98
		Imprevistos				$ 1.343.255,99
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$**	**45.649.617,40**
	TOTAL COSTO DE OBRA				**$**	**179.996.303,19**

4.2. AVANCE FÍSICO

INFORME No.	PERIODO		AVANCE FÍSICO %	
	DESDE	HASTA	% EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN ACUMULADO
Acta Parcial No. 1	13/11/2025	05/12/2025	90.00%	90.00%

4.3. AVANCE EN EL TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN:	Un (01) mes
FECHA DE INICIO:	13 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 de diciembre de 2025
TIEMPO PERIODO TRANSCURRIDO:	Veintitrés (23) días
TIEMPO CONTRACTUAL ACUMULADO:	Veintitrés (23) días
AVANCE PORCENTUAL DE TIEMPO HASTA LA FECHA:	76.67%

4.4. AVANCE FINANCIERO

BALANCE

VALORES DEL CONTRATO	
Valor Inicial Del Contrato	$ 199.995.892,43
Valor Adicional	$ 0.00
Valor Actual Del Contrato	$ 199.995.892,43
Saldo A Favor De EMSERPUVAG S.A. E.S.P.	$ 0.00

VALORES HACER CANCELADOS	
Anticipo Contrato	$ 0,00

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

462

Valor Según Acta De Recibo Parcial No. 1	$ 179.996.303,19
Valor Amortización del Anticipo para el Acta De Recibo Parcial No. 1	$ 0,00
Valor Ejecutado Acumulado (90.00%)	$ 179.996.303,19
Valor Real A Pagar Según Acta Parcial No. 1 Con Amortización De Anticipo	$ 179.996.303,19
Saldo Por Amortizar	$ 0,00
Saldo Por Ejecutar	$ 19.999.589,24

VALORES POR EJECUTAR	
Valor Por Ejecutar (10.00%)	$ 19.999.589,24

4.5. RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

En el periodo informado del contrato el contratista ejecutó las siguientes actividades:

CONDICIONES INICIALES				OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	CANT.	PORCENTAJE
1,0	**REALIZAR EXCAVACIONES**				
1,1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	286,78	286,78	100%
1,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	73,39	49,49	67%
2,0	**REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLA**				
2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø = 10"	ML	180,55	180,55	100%
2,2	SUMINISTRO E INSTALACION CAMA DE CIMENTACION CON RECEBO E=0,20 MÁS ATRAQUE Y CORONA E=0,45 COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	105,84	99,11	94%
2,3	ENTIBADO DE TALUDES PARA EXCAVACIÓN DE ZANJAS	M2	671,65	671,65	100%
2,4	SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILAR	M2	695,12	695,12	100%
3,0	**CONSTRUCCION CÁMARAS DE INSPECCIÓN**				
3,1	CONSTRUCCION CAMARA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3,000 PSI D=1,20m PROF: H <= 2,00m, INC. TAPA EN FERROCONCRETO	UND	2,00	2,00	100%
4,0	**REALIZAR RELLENOS Y OTRAS ACTIVIDADES**				
4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	193,45	182,85	95%

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

163

4,2	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACIÓN PARA RELLENO FINAL CON MATERIAL DE RIO SELECCIONADO	M3	75,98	70,39	93%
4,3	DESALOJO DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION	M3	256,16	110,27	43%
5,0	**CONSTRUIR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO**				
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø = 6"	ML	57,25	35,99	63%
5,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE KID SILLA YEE ESTRUCTURADA DE 250mm x 160mm	UND	11,00	7,00	64%
5,3	CAJILLA CONEXIÓN DOMICILIARIA EN CONCRETO DE 3,000PSI DE 0,70mx0,70m MEDIDAS INTERNAS	UND	11,00	7,00	64%
5,4	SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILA	M2	220,42	138,56	63%

5. DE OBRA

5.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

1.0. REALIZAR EXCAVACIONES:

1.1. EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN

Esta actividad comprende la ejecución de excavaciones que se deben realizar con maquinaria amarilla comprende en general la excavación necesaria para la instalación de redes de alcantarillado.

Las excavaciones se ejecutarán como se especifica en este numeral de acuerdo con las líneas y pendientes que se muestran en los planos de acuerdo con las normas establecidas y las necesidades de la obra.

No se hizo discriminación del material a excavar; es decir que podrá ser arcilla, limo, arena, grava, conglomerado etc.; no se debe tener en cuenta el grado de compactación o expansión. Las excavaciones en conglomerado se realizarán con la maquina adecuada para este tipo de actividad, de acuerdo con los alineamientos, pendientes, cotas y dimensiones indicadas en los pliegos, mostradas en los planos.

Medida Y Pago

La medida de las excavaciones se hará por metro cúbico (m3) de material excavado, medido en su posición original, de acuerdo con los alineamientos, pendientes, cotas y dimensiones indicadas en los pliegos, mostradas en los planos. Los precios para excavaciones deberán incluir, el costo de los equipos, herramientas, materiales, mano de

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutar las excavaciones de acuerdo con estas especificaciones.

1.2. EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN

Esta actividad comprende toda remoción de materiales térreos o pétreos in situ, con el fin de permitir la conformación de la estructura de las cámaras de inspección, acometida domiciliaria y cajillas de inspección según los diseños técnicos del proyecto.

El material de las excavaciones deberá depositarse evitando obstaculizar la entrada a la obra, este material se deberá reutilizar en el relleno de la zanja una vez se instale la acometida domiciliaria. El perfilado del fondo y las paredes de la excavación también se hará manualmente, respetando las cotas y dimensiones indicadas en los planos.

Medida Y Pago

La medida de las excavaciones se hará por metro cúbico (m3) de material excavado, medido en su posición original, de acuerdo con los alineamientos, pendientes, cotas y dimensiones indicadas en los pliegos, mostradas en los planos o autorizadas por el municipio. Los precios para excavaciones deberán incluir, el costo de los equipos, herramientas, materiales, mano de obra y los demás costos directos e indirectos necesarios para ejecutar las excavaciones de acuerdo con estas especificaciones.

2.0. REALIZAR SUMINISTRO E INSTALCION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO:

2.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA PVC Ø = 10"

Se refiere a la instalación de tubería de PVC tipo Novafort o similar con diámetro de 10in en los sitios indicados en los planos.
Previo a la instalación de la tubería, se debe verificar el replanteo de hilos, niveles y pendientes, de acuerdo con lo definido en los planos, esquemas y diseños del proyecto. Esta tarea se realizará bajo la supervisión de una cuadrilla topográfica donde dará los niveles de la tubería.

Medida Y Pago

La medida será por metro lineal (M) de tubería instalada y aprobada por la interventoría. El pago se realizará según el precio unitario establecido en el contrato, que incluirá todos los costos de suministro, transporte, instalación, pruebas, mano de obra, equipos y demás costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de esta actividad.

2.2. SUMINISTRO CAMA CIMENTACIÓN CON RECEBO E=0,20 COMPACTADO MECÁNICAMENTE.

Esta actividad comprende en la colocación de una capa de material de recebo, en la cual, descansara la tubería, esta capa de recebo debe ser compactada mecánicamente en capas

U64

de 10cm, con la finalidad de hacer resistente esta capa y no permitir que la tubería se mueva, perdiendo líneas de pendiente.

Medida Y Pago

La medida para el pago de cimentación con recebo será el volumen en metros cúbicos (m3) medido en el lugar y comprendido entre las líneas y cotas de excavación mostradas en los planos o indicadas por la supervisión del proyecto.

La parte de la obra por llevar a cabo a los precios unitarios de la lista de cantidades y precios consistirá en la ejecución de todos los trabajos necesarios para la colocación de los rellenos estipulados en esta especificación y deberá incluir el suministro, selección, colocación, compactación, instalaciones, equipo, transporte, energía y mano de obra necesarios para completar esta parte de la obra, y todos los trabajos relacionados con la misma que no tendrán medida ni pago por separado.

2.3. ENTIBADO DE TALUDES PARA EXCAVACIÓN DE ZANJAS

El entibado y acodalamiento se usará para sostener las paredes de las zanjas en las excavaciones de terrenos inestables o con aguas subterráneas, con el objeto de evitar hundimiento o desplomes de paredes laterales. También para proteger el personal, las edificaciones vecinas, el tránsito, o para la ejecución misma de las obras, en los sitios indicados por la supervisión.

Los entibados podrán ser para toda la profundidad de las excavaciones o sólo para una parte, dependiendo de la clase de terreno y las condiciones particulares de la excavación.

Las excavaciones en suelos con taludes verticales y profundidades superiores a 1.5 m tendrán obligatoriamente entibados a menos que la supervisión indique lo contrario.

El tipo de entibado y los límites señalados obedecerán a la interpretación obtenida de los sondeos y estudios de suelos y podrán variar de acuerdo con las condiciones que se encuentren al momento de iniciada la excavación.

Los entibados deberán ser colocados antes de iniciar las excavaciones, simultáneamente con la excavación o tan pronto se termine la excavación de un tramo dado, caso en el cual, deberán rellenarse los espacios vacíos entre las láminas de madera de entibado y el corte de terreno. El Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para garantizar que los entibados no se desplacen cuando se retiren temporalmente los codales para permitir la instalación de las tuberías. Para evitar sobrecarga en el entibado el material excavado deberá ser colocado a una distancia mínima de la zanja, equivalente al 60% de su profundidad.

Se debe evitar la formación de vacíos en las zonas de contacto del entibado, con el suelo y, si se presentan, se rellenarán inmediatamente con material adecuado y compactado. Igualmente, los vacíos dejados en los retiros de entibados se rellenarán inmediatamente.

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

165

El derecho que tiene la supervisión para ordenar que se dejen en el sitio entibados o puntales no se entenderá que constituya ninguna obligación de su parte para expedir tales órdenes, y la omisión de ejercitar ese derecho no relevará al Contratista de su responsabilidad por los daños al personal de la obra o a terceros, como consecuencia de derrumbes causados por negligencia o descuido por parte del Contratista al no dejar en la zanja suficientes entibados y puntales para prevenir cualquier derrumbe o hundimiento del terreno adyacente a la zanja.

El Contratista será el único responsable por cualquier daño o perjuicio que se produzca con motivo de los trabajos, si a juicio de la supervisión hubiera podido evitarlos o prevenirlos en alguna forma, de manera que la no autorización para entibar no releva al Contratista de las responsabilidades que sobrevengan por efectos de derrumbes, deslizamientos, ni será motivo para que deje de hacer, por su cuenta, los entibados que considere indispensables. El entarimado es una plataforma que se construye dentro de las zanjas, con el fin de colocar el material de la excavación, de donde es paleado nuevamente a la superficie. Deben ser construidos con material resistente que garanticen completa seguridad en la ejecución de los trabajos. Como este es un sistema que facilita al Contratista la ejecución de las excavaciones no tendrá pago por separado. Por lo tanto, en el análisis de precios unitarios de excavaciones debe incluir los costos necesarios

Medida Y Pago

Se medirá y pagará por (m2) de entibado instalado, debidamente aceptado por la supervisión de la obra, con aceptación de los requisitos mínimos de acabados.

2.4. SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILAR.

Comprende el suministro e instalación sobre la superficie del terreno natural, un geotextil no tejido 1800 o similar; con el fin de separar del terreno natural, los rellenos de material seleccionado como recebo y/o crudo de rio, aumentando la capacidad portante de la estructura. Su instalación se realizará conforme a los planos de diseño de redes de alcantarillado y recomendaciones del supervisor de la obra.

Medida Y Pago

Se medirá y pagará por (m2) de geotextil colocado, debidamente aceptado por la supervisión de la obra, con aceptación de los requisitos mínimos de acabados.

La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos de diseño de estructuras hidráulicas y sanitarias.

No se medirá en metro lineal y por tanto no se pagará ningún tipo de elemento por esta medida.

3.0. CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN.

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

U66

3.1. CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 3,000 PSI D=1,2 PROF: H <= 2,00 M, INCLUYE 6 PELDAÑOS EN VARILLA 5/8" Y TAPA EN FERRO CONCRETO.

Esta Especificación técnica reglamenta la ejecución de las operaciones de suministro, almacenamiento de materiales, colocación y remoción de formaletas, instalación del acero figurado, dosificación, preparación y diseño de mezclas; transporte, colocación, vibrado, fraguado, acabado, curado, terminado y reparación de los hormigones o concretos, conforme a las resistencias, alineamientos, dimensiones y detalles indicados en los planos de la Ingeniería de Detalle y/o documentos técnicos entregados.
El diámetro interno de la parte cilíndrica de las cámaras de inspección para aguas residuales deberá ser de 1.10m.

Medida Y Pago

La unidad de medida de cámaras de inspección para aguas lluvias construidas en concreto de 3.000 psi será la Unidad (und), con aproximación a dos decimales y sin distinción de tipo, forma y dimensiones, de cámaras de inspección que haya sido construida cumpliendo con lo especificado

4.0. REALIZAR RELLENOS Y OTRAS ACTIVIDADES

4.1. SUMINISTRO DE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO MECÁNICAMENTE

Esta actividad comprende el suministro, colocación, humedecimiento, extensión y compactación de material común seleccionado proveniente de las excavaciones para el relleno de zanjas o áreas específicas del proyecto.

El relleno es un material común seleccionado proveniente de las excavaciones, explanaciones, préstamos o cualquier fuente, el cual debe ser homogéneo.

Este relleno se colocará y compactará en capas horizontales uniformes no mayores a 20 centímetros de espesor final. Cada capa se compactará convenientemente hasta obtener una densidad adecuada para la duración. Este relleno se podrá utilizar para rellenar zanjas de tuberías o ductería para conformación de taludes, para conformación del terreno en zonas adyacentes al proyecto, alrededor de cajas o pozos, o en zonas indicadas en los planos.

Medida Y Pago

La medida para el pago de relleno colocados encima de las tuberías será el volumen en metros cúbicos (m3) medido en el lugar y comprendido entre las líneas y cotas de excavación mostradas en los planos o indicadas por la supervisión del proyecto.

La parte de la obra por llevar a cabo a los precios unitarios de la lista de cantidades y precios consistirá en la ejecución de todos los trabajos necesarios para la colocación de los rellenos

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

467

estipulados en esta especificación y deberá incluir el suministro, selección, colocación, compactación, instalaciones, equipo, transporte, energía y mano de obra necesarios para completar esta parte de la obra, y todos los trabajos relacionados con la misma que no tendrán medida ni pago por separado.

4.2. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA RELLENO FINAL CON MATERIAL DE RIO SELECCIONADO.

Esta actividad comprende el suministro, colocación, humedecimiento, extensión y compactación de material común seleccionado para el relleno final de zanjas o áreas específicas del proyecto.

El relleno final es un material rio común seleccionado de fuentes o balastreras legales, el cual debe ser homogéneo.

Este relleno final se colocará y compactará en capas horizontales uniformes no mayores a 15 centímetros de espesor final. Cada capa se compactará convenientemente hasta obtener una densidad adecuada para la duración. Este relleno se podrá utilizar para rellenar zanjas de tuberías o ductería para conformación de taludes, para conformación del terreno en zonas adyacentes al proyecto, alrededor de cajas o pozos, o en zonas indicadas en los planos.

Medida Y Pago

La medida para el pago de relleno final colocados encima del relleno con material seleccionado proveniente de la excavación compactado mecánicamente será el volumen en metros cúbicos (m3) medido en el lugar y comprendido entre las líneas y cotas de excavación mostradas en los planos o indicadas por la supervisión del proyecto.

La parte de la obra por llevar a cabo a los precios unitarios de la lista de cantidades y precios consistirá en la ejecución de todos los trabajos necesarios para la colocación de los rellenos finales estipulados en esta especificación y deberá incluir el suministro, selección, colocación, compactación, instalaciones, equipo, transporte, energía y mano de obra necesarios para completar esta parte de la obra, y todos los trabajos relacionados con la misma que no tendrán medida ni pago por separado

4.3. DESALOJO DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN.

Esta actividad consiste en la, cargue, transporte y disposición del material sobrante en obra en el botadero certificado más cercano o donde la entidad territorial indique su desalojo.

Medida Y Pago

Se medirá y pagará por metro cúbico (M3) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Materiales
- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.
- Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

5. CONSTRUIR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO

5.1. SUMINISTRO TUBERÍA SANITARIA PVC Ø = 6"

Se refiere a la instalación de tubería sanitaria de PVC o similar en los sitios indicados en los planos para las acometidas domiciliarias, estas tuberías serán suministrada a los propietarios de las viviendas para que estos realicen la instalación de esta tubería, ya que este ítem no incluye mano de obra para la instalación.

Medida Y Pago

La medida de pago será en metros (m), incluye el transporte de la tubería al sitio de obra y el descargue de la misma, se le entregará a cada propietario de vivienda la longitud de 10m, el contratista deberá asegurar al buen estado de la tubería a la hora de la entrega de esta. El pago correspondiente se hará según las longitudes de tubería entregadas de acuerdo, como antes se ha establecido y de acuerdo con los precios unitarios consignados en el Formulario de Precios del Contrato, para los ítems respectivos.

5.2. SUMINISTRO KID SILLA YEE ESTRUCTURADA 250MM X 160MM

Esta actividad hace referencia al suministro del kit silla yee a los beneficiarios del proyecto, con el propósito de que realicen la acometida para conectarse a la tubería sanitaria principal, esta actividad deberá ser supervisada por el contratista, para la verificación de la correcta instalación de las conexiones de las tuberías.

Medida Y Pago

La medida que se manejará para este ítem será la unida, la cual, deberá incluir todos los materiales de pegado y sellado incluidos en los precios unitarios. Este se pagará de acuerdo a los kits entregados en obra, lo anteriormente mencionado será inspeccionado por el ingeniero supervisor de obra del municipio.

5.3. CAJA CONEXIÓN DOMICILIARIA EN CONCRETO DE 3,000 PSI DE 0,70X0,70M MEDIDAS INTERNAS

Este Actividad se refiere a la realización de caja de inspección indicada en los planos para la correspondiente llegada de aguas negras de las casas, incluye materiales, excavación y relleno conveniente parala construcción de la caja, de acuerdo con los planos, en las especificaciones particulares o por la supervisión de obra.

U69

Medida Y Pago

La unidad de medida de pago será por unidad (UND) de caja de inspección realizada con los respectivos accesorios, recibidos a satisfacción por el supervisor de obra. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.

5.4. SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILAR.

Comprende el suministro e instalación sobre la superficie del terreno natural, un geotextil no tejido 1800 o similar; con el fin de separar del terreno natural, los rellenos de material seleccionado como recebo y/o crudo de rio, aumentando la capacidad portante de la estructura. Su instalación se realizará conforme a los planos de diseño de redes de alcantarillado y recomendaciones del supervisor de la obra

Medida Y Pago

Se medirá y pagará por (m2) de geotextil colocado, debidamente aceptado por la supervisión de la obra, con aceptación de los requisitos mínimos de acabados.

La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre planos de diseño de estructuras hidráulicas y sanitarias.

No se medirá en metro lineal y por tanto no se pagará ningún tipo de elemento por esta medida.

6. CONTROL Y SEGUIMIENTO

6.1. CONTROL CLIMÁTICO

Durante el periodo informado en la ejecución del proyecto se presentaron condiciones climáticas variables.

En el mes de noviembre de 2025, el clima en el municipio de Valle del Guamuez, Putumayo, se caracterizó por ser **cálido, húmedo y con alta nubosidad**, con una persistencia de condiciones inestables que generaron lluvias a lo largo del mes.

Resumen del Clima en Noviembre de 2025

Temperaturas: Las temperaturas se mantuvieron dentro del rango típico para la región amazónica y del Pacífico, con máximas diarias promedio cercanas a los **30-31 °C** y mínimas que rondaban los 21-22 °C. El ambiente fue sofocante y húmedo.

Precipitaciones: El mes estuvo marcado por la influencia de la Zona de Confluencia Intertropical y sistemas de baja presión, lo que resultó en **lluvias ligeras a moderadas y algunas tormentas** en diferentes sectores del departamento del Putumayo. Aunque los pronósticos climáticos a largo plazo habían sugerido un posible déficit de lluvias en algunas

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

470

áreas para la temporada, las condiciones locales y los pronósticos semanales indicaron precipitaciones constantes durante noviembre.

Cielos: El cielo estuvo mayormente nublado o parcialmente cubierto durante aproximadamente el 77% del tiempo, lo que limitó las horas de sol directo y contribuyó a la alta humedad ambiental.

En general, el clima fue el típico de la selva tropical, con un ambiente cálido y húmedo que favoreció la presencia de lluvias frecuentes, especialmente en horas de la tarde y noche. Para consultar datos climáticos históricos detallados o reportes específicos, se puede acceder a la información disponible en el IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) o en los boletines de seguimiento disponibles en los sitios web de autoridades ambientales y de salud de Colombia.

6.2. CONTROL ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

6.2.1. RELACIÓN DE ACTAS

7.2.1. ACTA DE INICIO

El día 16 de octubre de 2025 se firmó el Acta de Inicio del Convenio Interadministrativo, con las firmas de HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal supervisor del convenio y CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA Gerente EMSERPUVAG S.A. E.S.P. como entidad beneficiaria con un plazo de ejecución inicial del convenio de setenta y siete (77) días calendarios, se estableció que la fecha de inicio es el día 16 de octubre de 2025 y como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2025.

El día 13 de noviembre de 2025 se firmó el acta de inicio con las firmas de CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA, Gerente de EMSERPUVAG S.A. E.S.P supervisor de los contratos de ejecución; el contratista de obra CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC. R.L. DIANA MARCELA DIAZ GUALMATAN y contratista de interventoría C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS, R.L. LEYDER CEDIEL CABRERA los dos con fecha de terminación el 12 de diciembre de 2025.

6.2.2. CONTROL DE PÓLIZAS

6.2.2.1. CONVENIO

Los siguientes cuadros que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Convenio interadministrativo, y que a la fecha se encuentran vigentes:

ANEXO 0 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

Tipo de póliza: Cumplimiento Entidad Estatal
Entidad aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860.524.654-6

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

471

Tomador: EMSERPUVAG S.A. E.S.P.
Póliza No.: 775-47-994000002851 ANEXO 0
Fecha de expedición: 16-10-2025
Resolución de Aprobación No.: OJMVG-255-2025 del 16/10/2025
Estado: Aprobada

COMPAÑÍA DE SEGURO	AMPARO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO	775-47-994000002851	16/10/2025	30/06/2026	$21.399.560,49
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	775-47-994000002851	16/10/2025	30/06/2026	$63.898.681,00

6.2.2.2. CONTRATO DE OBRA

Los siguientes cuadros que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato de Obra, y que a la fecha se encuentran vigentes:

GARANTÍAS:

ANEXO 0 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

Tipo de póliza: Cumplimiento Entidad Estatal
Entidad aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NIT. 860.037.013-6
Tomador: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC
Póliza No.: AGP-100005519 ANEXO 0
No. Certificado: 552009863
Fecha de expedición: 31-10-2025
Resolución de Aprobación No.: 636 del 31/10/2025
Estado: Aprobada

COMPAÑÍA DE SEGURO	AMPARO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO	AGP-100005519	31-10-2025	31-05-2026	$19.999.589,24
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	AGP-100005519	31-10-2025	31-05-2026	$59.998.767,73
	PRESTACIONES SOCIALES	AGP-100005519	31-10-2025	30-11-2028	$19.999.589,24
	CALIDAD DEL SERVICIO	AGP-100005519	31-10-2025	31-05-2026	$19.999.589,24
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	AGP-100005519	30-11-2025	30-11-2030	$19.999.589,24

ANEXO 0 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Tipo de póliza: Responsabilidad Civil Extracontractual
Entidad aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NIT. 860.037.013-6
Tomador: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC
Póliza No.: AGP-100000969 ANEXO 0
No. Certificado: 552009864
Fecha de expedición: 31-10-2025
Resolución de Aprobación No.: 636 del 31/10/2025
Estado: Aprobada

COMPAÑÍA DE SEGURO	AMPARO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	AMPARO BASICO - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	AGP-100000969	31-10-2025	30-11-2025	$ 284.700.000,00
	PATRONAL	AGP-100000969	31-10-2025	30-11-2025	$ 284.700.000,00
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	AGP-100000969	31-10-2025	30-11-2025	$ 284.700.000,00
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	AGP-100000969	31-10-2025	30-11-2025	$ 284.700.000,00

ANEXO 1 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

Tipo de póliza: Cumplimiento Entidad Estatal
Entidad aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NIT. 860.037.013-6
Tomador: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC
Póliza No.: AGP-100005519 ANEXO 1
No. Certificado: 552010686
Fecha de expedición: 19-11-2025
Resolución de Aprobación No.: 691 del 20/11/2025
Estado: Rechazada

COMPAÑÍA DE SEGURO	AMPARO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO	AGP-100005519	31-10-2025	31-05-2026	$-19.999.589,24
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	AGP-100005519	31-10-2025	31-05-2026	$-59.998.767,73
	PRESTACIONES SOCIALES	AGP-100005519	31-10-2025	30-11-2028	$-19.999.589,24
	CALIDAD DEL SERVICIO	AGP-100005519	31-10-2025	31-05-2026	$-19.999.589,24
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	AGP-100005519	30-10-2025	30-11-2030	$-19.999.589,24

473

ANEXO 1 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Tipo de póliza: Responsabilidad Civil Extracontractual
Entidad aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NIT. 860.037.013-6
Tomador: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC
Póliza No.: AGP-100000969 ANEXO 1
No. Certificado: 552010688
Fecha de expedición: 19-11-2025
Resolución de Aprobación No.: 691 del 20/11/2025
Estado: Rechazada

COMPAÑÍA DE SEGURO	AMPARO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	AMPARO BASICO - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	AGP-100000969	31-10-2025	30-11-2025	$-284.700.000,00
	PATRONAL	AGP-100000969	31-10-2025	30-11-2025	$-284.700.000,00
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	AGP-100000969	31-10-2025	30-11-2025	$-284.700.000,00
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	AGP-100000969	31-10-2025	30-11-2025	$-284.700.000,00

ANEXO 2 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

Tipo de póliza: Cumplimiento Entidad Estatal
Entidad aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NIT. 860.037.013-6
Tomador: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC
Póliza No.: AGP-100005519 ANEXO 2
No. Certificado: 552010687
Fecha de expedición: 19-11-2025
Resolución de Aprobación No.: 691 del 20/11/2025
Estado: Aprobada

COMPAÑÍA DE SEGURO	AMPARO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO	AGP-100005519	13-11-2025	13-06-2026	$19.999.589,24
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	AGP-100005519	13-11-2025	13-06-2026	$59.998.767,73
	PRESTACIONES SOCIALES	AGP-100005519	13-11-2025	13-12-2028	$19.999.589,24
	CALIDAD DEL SERVICIO	AGP-100005519	13-11-2025	13-06-2026	$19.999.589,24

COMPAÑÍA DE SEGURO	AMPARO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	AGP-100005519	13-12-2025	13-12-2030	$19.999.589,24

ANEXO 2 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Tipo de póliza: Responsabilidad Civil Extracontractual
Entidad aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NIT. 860.037.013-6
Tomador: CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC
Póliza No.: AGP-100000969 ANEXO 2
No. Certificado: 552010689
Fecha de expedición: 19-11-2025
Resolución de Aprobación No.: 691 del 20/11/2025
Estado: Aprobada

COMPAÑÍA DE SEGURO	AMPARO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS MUNDIAL	AMPARO BASICO - PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	AGP-100000969	13-11-2025	13-12-2025	$ 284.700.000,00
	PATRONAL	AGP-100000969	13-11-2025	13-12-2025	$ 284.700.000,00
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	AGP-100000969	13-11-2025	13-12-2025	$ 284.700.000,00
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	AGP-100000969	13-11-2025	13-12-2025	$ 284.700.000,00

6.2.3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRADO DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL.

El plan de gestión integrado de salud ocupacional tiene entre sus propósitos integrar la seguridad con la calidad y productividad, con el fin de lograr una reducción de los costos generados por los accidentes de trabajo y las enfermedades de origen profesional, mejorar la calidad de los productos y ante todo generar ambientes sanos para los que aquí trabajan. Para ello se cumple con la normatividad vigente y con el suministro de los recursos necesarios para implementar las medidas de seguridad acordes con las prioridades establecidas en el diagnóstico de las condiciones de trabajo y de salud.

En la ejecución del contrato se asignó los elementos de protección personal a todo el personal involucrado en la obra, así mismo se verifico y exigió la vinculación, afiliación y pago oportuno de los aportes de seguridad social, lo cual se puede verificar en las planillas anexas.

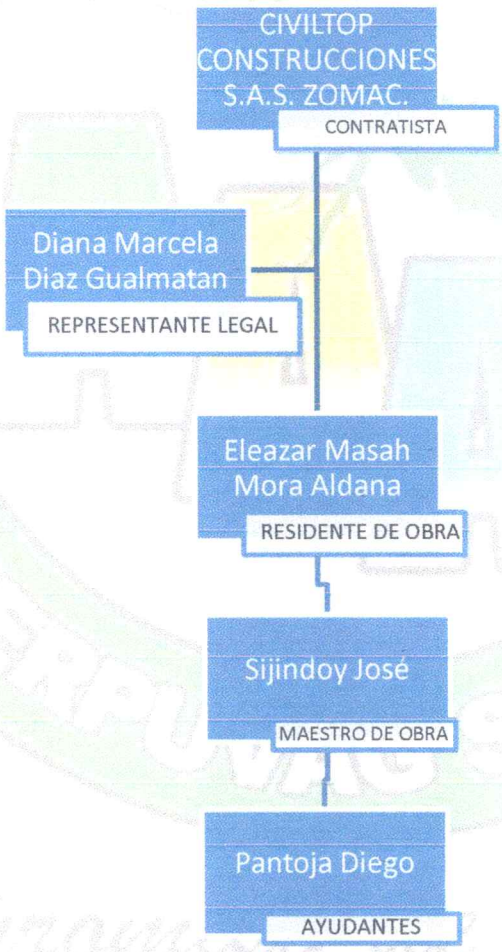
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	No. PLANILLA

U75

Diana Marcela Diaz Gualmatan.	R/L. CIVILTOP CONSTRUCCIONES S.A.S. ZOMAC	9495005512	Noviembre 2025
Eleazar Masah Mora Aldana	Residente de obra Dedicación 100%	9493838961	Noviembre 2025
Sijindoy José	Maestro de obra	9495005512	Noviembre 2025
Pantoja Diego	Ayudantes de obra	9495005512	Noviembre 2025

6.3. ASPECTOS LOGÍSTICOS

6.3.1. PERSONAL DE OBRA: ORGANIGRAMA CONTRATISTA



El contratista ha dispuesto para la ejecución del proyecto el siguiente personal de obra:

- Representante Legal: Diana Marcela Diaz Gualmatan
- Residente De Obra: Eleazar Masah Mora Aldana

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

176

- Maestro De Obra: Sijindoy José
- Ayudantes De Obra: Pantoja Diego

7. INFORME ADMINISTRATIVO BÁSICO SERVICIO DE INTERVENTORÍA

Para la ejecución de la interventoría, la Empresa Administrativa de Servicios Públicos Domiciliarios del Valle Del Guamuez S.A. E.S.P. "EMSERPUVAG S.A. E.S.P" seleccionó a C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS, con quien celebró el Contrato de Consultoría No. SUO-CD-018-2025, cuyo objeto es INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. Para la ejecución de la INTERVENTORÍA se pactó un plazo inicial de un (01) mes y un valor inicial de TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($13.999.712,47). El acta de inicio se firmó el día 13 de noviembre de 2025.

7.1. GENERALIDADES DE LA INTERVENTORÍA

7.1.1. ACTA DE INICIO

El día 13 de noviembre de 2025 se firmó el acta de inicio la cual se encuentra anexa al presente informe con las firmas de los señores: CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA, Gerente de EMSERPUVAG S.A. E.S.P, en calidad de SUPERVISOR del Contrato y el contratista interventor C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS, representante legal: LEYDER CEDIEL CABRERA.

7.1.2. FORMA DE PAGO

La entidad pagara el valor del contrato de la siguiente manera:

Para todos los efectos a que haya lugar, el valor total del presente proceso asciende a la suma de TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($13.999.712,47) IVA INCLUIDO, o por el menor precio ofertado por el Contratista seleccionado, incluido IVA, los costos e impuestos directos e indirectos y los ajustes previstos por incrementos de asignaciones, tarifas y demás costos necesarios para el normal desarrollo del contrato, que la Empresa pagará al contratista asi:

Un anticipo equivalente al 30% previa suscripción y legalización del contrato, hasta el 90% mediante actas de avance obra, es decir, la interventoría se pagará juntamente con actas de obra, para garantizar el avance de obra y previa autorización de supervisión y/o interventoría que designe la empresa, y el 10% final con el acta de liquidación.

7.1.3. RELACIÓN DE PAGOS

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

Al corte de la elaboración del presente informe no se ha realizado ningún pago a la interventoría, pero presenta el informe para el Acta De Recibo Parcial No. 01, la cual es aprobada por el y viabilizada por la supervisión que ejercemos como EMSERPUVAG S.A E.S.P.

7.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA

7.2.1. ASPECTOS DE DISEÑO

El proyecto se ejecuta de acuerdo con los estudios y diseños entregados por EMSERPUVAG S.A. E.S.P

Lo anterior previa verificación del cumplimiento de la normatividad aplicable, El alcance del proyecto incluye la optimización de la red de alcantarillado sanitario en una longitud total de 180.55 Metros Lineales (Ml), mediante la instalación de tuberías y accesorios necesarios para garantizar un sistema sanitario eficiente. Como lo son 180.55 ml de red principal tubería sanitaria PVC de 10", construcción de 2 cámaras de inspección, y así mismo, contempla la instalación de 11 domiciliarias, permitiendo la conexión directa al servicio de alcantarillado sanitario.

Para el seguimiento se tuvo en cuenta adicionalmente a los estudios y diseños las siguientes normas y códigos:

Normas y códigos

La calidad de los materiales a utilizar en las obras, los trabajos de ejecución de las obras civiles y complementarias, la instalación de materiales y accesorios, se realizan cumpliendo con los requisitos y procedimientos exigidos en los pliegos o los establecidos en las normas que les sean aplicables, de las cuales se citan las siguientes:

- Norma RAS 2000
- Resolución No. 330 DE 2017
- Resolución No.799 de 2021
- Resolución No.908 de 2021
- NSR 2010
- Decreto No. 1711 de 2021
- Decreto No. 1401 de 2023
- Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC
- American Concrete Instituto ACI
- American National Standards Institute Inc. ANSI

7.3. CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA

7.3.1. ASPECTOS TÉCNICOS VERIFICADOS

- Responsabilidad del contratista: en contratista debe cumplir con lo siguiente:

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

478

Proyecto, ordenamiento y disposición de su trabajo.

Conservación de los materiales en sus bodegas, en forma nítida y ordenada, evitando dejar equipos, materiales, herramientas y sobrantes de material en zonas de circulación de la obra.
Consulta y familiarización con los planos del proyecto, a fin de localizar adecuadamente los equipos, maquinaria, cajas y tuberías.

Instrucción a su personal y provisión de todos los elementos necesarios tendientes a evitar accidentes de trabajo.

- Personal del Contratista

Todo el personal empleado por el Contratista para la ejecución de las debió ser competente en su oficio.

El Contratista dispone en la obra el personal necesario y de manera ininterrumpida para el desarrollo de las actividades operacionales y el personal idóneo para que supervise el desarrollo de las distintas fases técnicas del trabajo, coordine los diferentes aspectos del mismo y asistencia a todas aquellas reuniones de obra para las cuales se le cite.

- Pruebas Y Ajustes

A la fecha de ejecución del proyecto ya se han desarrollado actividades que requieren pruebas para su verificación de cumplimiento, se está a la espera de los resultados de laboratorio así mismo no se ha hecho necesario realizar ajustes a las actividades contractuales.

- Equipos Y Herramientas De Trabajo

Todos los equipos y herramientas necesarias para efectuar las labores de movilización, manipulación e instalación de los equipos, materiales y accesorios debieron estar en perfecto estado para desempeñar las funciones propias. No se permitió el uso de maquinaria y equipos con daños y que puedan causar accidentes laborales o trabajos mal ejecutados.

Se verifico que los equipos y herramientas se operen con las precauciones necesarias para no producir daños o realizar operaciones peligrosas debido al uso inadecuado, o falta de entrenamiento en la forma de su utilización.

- Equipo en obra:

1 Retroexcavadora (pajarita)
1 Volqueta
1 Mezcladora de concreto
1 Motobomba Diésel
Herramienta Menor

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

479

- Apariencia De Los Trabajos

  Todos los trabajos terminados que se presentan para la aceptación debieron lucir ordenados, libres de herramientas, desperdicios propios de la labor y elementos extraños

7.3.2. ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

7.3.2.1. CONTROL DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ANEXO 0 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

Tipo de póliza: Cumplimiento Entidad Estatal
Entidad aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NIT. 860.037.013-6
Tomador: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
Póliza No.: AGP-100005517 ANEXO 0
No. Certificado: 552009861
Fecha de expedición: 31-10-2025
Resolución de Aprobación No.: 677 del 13/11/2025
Estado: Rechazada

COMPAÑÍA DE SEGURO	AMPARO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO	AGP-100005517	31/10/2025	31/05/2026	$1.399.971,25
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	AGP-100005517	31/10/2025	31/05/2026	$4.199.913.74
	CALIDAD DEL SERVICIO	AGP-100005517	30/11/2025	30/11/2030	$1.399.971,25

ANEXO 1 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

Tipo de póliza: Cumplimiento Entidad Estatal
Entidad aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NIT. 860.037.013-6
Tomador: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
Póliza No.: AGP-100005517 ANEXO 1
No. Certificado: 552010339
Fecha de expedición: 12-11-2025
Resolución de Aprobación No.: 677 del 13/11/2025
Estado: Aprobada

COMPAÑÍA DE SEGURO	AMPARO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO	AGP-100005517	31/10/2025	31/05/2026	$1.399.971,25
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	AGP-100005517	31/10/2025	31/05/2026	$4.199.913.74

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

U80

COMPAÑÍA DE SEGURO	AMPARO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
	CALIDAD DEL SERVICIO	AGP-100005517	30/11/2025	30/11/2030	$1.399.971,25
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	AGP-100005517	31/10/2025	30/11/2028	$1.399.971,25

ANEXO 2 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

Tipo de póliza: Cumplimiento Entidad Estatal
Entidad aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NIT. 860.037.013-6
Tomador: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
Póliza No.: AGP-100005517 ANEXO 2
No. Certificado: 552010744
Fecha de expedición: 19-11-2025
Resolución de Aprobación No.: 690 del 20/11/2025
Estado: Rechazada

COMPAÑÍA DE SEGURO	AMPARO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO	AGP-100005517	31/10/2025	31/05/2026	$-1.399.971,25
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	AGP-100005517	31/10/2025	31/05/2026	$-4.199.913.74
	CALIDAD DEL SERVICIO	AGP-100005517	30/11/2025	30/11/2030	$-1.399.971,25
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	AGP-100005517	31/10/2025	30/11/2028	$-1.399.971,25

ANEXO 3 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

Tipo de póliza: Cumplimiento Entidad Estatal
Entidad aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NIT. 860.037.013-6
Tomador: C&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S.
Póliza No.: AGP-100005517 ANEXO 3
No. Certificado: 552010745
Fecha de expedición: 19-11-2025
Resolución de Aprobación No.: 690 del 20/11/2025
Estado: Aprobada

COMPAÑÍA DE SEGURO	AMPARO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO	AGP-100005517	13/11/2025	13/06/2026	$1.399.971,25
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	AGP-100005517	13/11/2025	13/06/2026	$4.199.913.74
	CALIDAD DEL SERVICIO	AGP-100005517	13/12/2025	13/12/2030	$1.399.971,25
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	AGP-100005517	13/11/2025	13/12/2028	$1.399.971,25

7.3.3. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRADO DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL.

El plan de gestión integrado de salud ocupacional tiene entre sus propósitos integrar la seguridad con la calidad y productividad, con el fin de lograr una reducción de los costos generados por los accidentes de trabajo y las enfermedades de origen profesional, mejorar la calidad de los productos y ante todo generar ambientes sanos para los que aquí trabajan. Para ello se cumple con la normatividad vigente y con el suministro de los recursos necesarios para implementar las medidas de seguridad acordes con las prioridades establecidas en el diagnóstico de las condiciones de trabajo y de salud.

En la ejecución del contrato de la interventoría se asignó los elementos de protección personal a todo el personal involucrado en la obra, así mismo se verifico y exigió la vinculación, afiliación y pago oportuno de los aportes de seguridad social, lo cual se puede verificar en las planillas anexas.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	No. PLANILLA	
Leyder Cediel Cabrera	Representante legal	9496230967	Noviembre 2025
Wuilliams Gilberto Quiroz Botina	Residente De Interventoría	9496673856	Noviembre 2025

7.4. ASPECTOS LOGÍSTICOS

7.4.1. PERSONAL DE INTERVENTORIA:

ORGANIGRAMA INTERVENTORIA



Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co



El contratista de la Interventoría ha dispuesto para la ejecución del contrato el siguiente personal de obra:

Director De Interventoría: Leyder Cediel Cabrera
Residente De Interventoría: Ing. Wuilliams Gilberto Quiroz Botina

7.5. AVANCE FÍSICO

INFORME PARCIAL No.	PERIODO		AVANCE FÍSICO %	
	DESDE	HASTA	% EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN ACUMULADO
1	13/11/2025	05/12/2025	90.00%	90.00%

7.6. AVANCE EN EL TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (01) MES
FECHA DE INICIO:	13 DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE DICIEMBRE DEL 2025
TIEMPO PERIODO TRANSCURRIDO:	23 días
TIEMPO CONTRACTUAL ACUMULADO:	23 días
AVANCE PORCENTUAL DE TIEMPO HASTA LA FECHA:	76.67%

7.7. AVANCE FINANCIERO

BALANCE

VALORES DEL CONTRATO	
Valor Inicial Del Contrato	$ 13.999.712,47
Valor Adicional	$ 0,00
Valor Actual Del Contrato	$ 13.999.712,47
Saldo A Favor De EMSERPUVAG S.A. E.S.P.	$ 0,00

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

VALORES CANCELADOS	
Anticipo Contrato	$ 0,00
Valor Según Acta De Recibo Parcial No. 1	$ 12,599,741.22
Valor Amortización del Anticipo para el Acta De Recibo Parcial No. 1	$ 0,00
Valor Ejecutado Acumulado (90.00%)	$ 12,599,741.22
Valor Real A Pagar Según Acta Parcial No. 1 Con Amortización De Anticipo	$ 12,599,741.22
Saldo Por Amortizar	$ 0,00
Saldo Por Ejecutar	$ 1,399,971.25

VALORES POR EJECUTAR	
Valor Por Ejecutar (10.00%)	$ 1,399,971.25

8. GENERALIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

8.1. GENERALIDADES

8.1.1. PRESUPUESTO GENERAL DEL CONVENIO

CONDICIONES INICIALES				OBRA EJECUTADA 16-10-2025 al 05-12-2025		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1,0	**REALIZAR EXCAVACIONES**						
1,1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	286,78	286,78	$ 8.574.722,00	286,78	$ 8.574.722,00
1,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	73,39	49,49	$ 1.500.509,09	49,49	$ 1.500.509,09
2,0	**REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLA**						
2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø = 10"	ML	180,55	180,55	$ 23.446.278,97	180,55	$ 23.446.278,97
2,2	SUMINISTRO E INSTALACION CAMA DE CIMENTACION CON RECEBO E=0,20 MÁS ATRAQUE Y CORONA E=0,45 COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	105,84	99,11	$ 14.049.023,43	99,11	$ 14.049.023,43
2,3	ENTIBADO DE TALUDES PARA EXCAVACIÓN DE ZANJAS	M2	671,65	671,65	$ 31.250.618,51	671,65	$ 31.250.618,51
2,4	SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILAR	M2	695,12	695,12	$ 13.460.470,51	695,12	$ 13.460.470,51
3,0	**CONSTRUCCION CÁMARAS DE INSPECCIÓN**						
3,1	CONSTRUCCION CAMARA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3,000 PSI D=1,20m PROF: H <= 2,00m, INC. TAPA EN FERROCONCRETO	UND	2,00	2,00	$ 8.896.882,70	2,00	$ 8.896.882,70

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

4,0	**REALIZAR RELLENOS Y OTRAS ACTIVIDADES**							
4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	193,45	182,85	$ 4.370.115,00	182,85	$	4.370.115,00
4,2	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACIÓN PARA RELLENO FINAL CON MATERIAL DE RIO SELECCIONADO	M3	75,98	70,39	$ 10.035.497,81	70,39	$	10.035.497,81
4,3	DESALOJO DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION	M3	256,16	110,27	$ 1.819.475,04	110,27	$	1.819.475,04
5,0	**CONSTRUIR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO**							
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø = 6"	ML	57,25	35,99	$ 3.541.616,10	35,99	$	3.541.616,10
5,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE KID SILLA YEE ESTRUCTURADA DE 250mm x 160mm	UND	11,00	7,00	$ 1.474.712,75	7,00	$	1.474.712,75
5,3	CAJILLA CONEXIÓN DOMICILIARIA EN CONCRETO DE 3,000PSI DE 0,70mx0,70m MEDIDAS INTERNAS	UND	11,00	7,00	$ 9.222.568,39	7,00	$	9.222.568,39
5,4	SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILA	M2	220,42	138,56	$ 2.683.109,09	138,56	$	2.683.109,09
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 134.325.599,39**		**$**	**134.325.599,39**
	COSTOS INDIRECTOS	Administración		29%	$ 38.954.423,83		$	38.954.423,83
		Utilidad		4%	$ 5.373.023,98		$	5.373.023,98
		Imprevistos		1%	$ 1.343.255,99		$	1.343.255,99
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS			**34%**	**$ 45.670.703,80**		**$**	**45.670.703,80**
	VALOR TOTAL EJECUTADO				**$ 179.996.303,19**		**$**	**179.996.303,19**
	VALOR TOTAL EJECUTADO DE INTERVENTORIA				**$ 12.599.741,22**		**$**	**12.599.741,22**
	VALOR TOTAL EJECUTADO DE CONVENIO				**$ 192.596.044,41**		**$**	**192.596.044,41**
	VALOR TOTAL CONTRATADO DE CONVENIO				**$ 213.995.604,90**		**$**	**213.995.604,90**
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE CONVENIO				**90,00%**			**90,00%**

8.2. AVANCE FÍSICO

INFORME PARCIAL No.	PERIODO		AVANCE FÍSICO %	
	DESDE	HASTA	% EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN ACUMULADO

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

1	16/10/2025	05/12/2025	90.00%	90.00%

8.3. AVANCE EN EL TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN:	SETENTA Y SIETE (77) DÍAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO:	16 de octubre del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre del 2025
TIEMPO PERIODO TRASCURRIDO:	CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIOS
TIEMPO CONTRACTUAL ACUMULADO:	CINCUENTA Y UN (51) DÍAS CALENDARIOS
AVANCE PORCENTUAL DE TIEMPO HASTA LA FECHA:	66.23%

8.4. AVANCE FINANCIERO

BALANCE

VALORES DEL CONVENIO	
Valor Aporte Del Municipio	$ 212.995.604,90
Valor Aporte De EMSERPUVAG S.A. E.S.P.	$1.000.000,00
Valor Inicial Del Convenio	$ 213.995.604,90
Valor Adicional Del Convenio	$ 0,00
Valor Actual Del Convenio	$ 213.995.604,90
Valor Acta Parcial No. 1 Del Convenio (90%)	$ 192.596.044,40
Saldo A Favor Del Municipio	$ 0,00

VALORES CANCELADOS	
Anticipo Inicial (30%) del Aporte del Municipio al Convenio	$ 0,00
Anticipo Adicional %	$ 0,00
Valor Acta De Recibo Parcial No. 01 del Aporte del Municipio al Convenio (90%)	$ 191,696,044.40
Valor Amortización Parcial No. 01 del Aporte del Municipio al Convenio	$ 0,00
Valor A Pagar Presente Acta Parcial No. 01 del Aporte del Municipio al Convenio	$ 191,696,044.40

VALORES POR EJECUTAR	
Valor Por Ejecutar del Aporte del Municipio (10%)	$ 21,299,560.50

9. CONCLUSIONES

- A la fecha administrativamente se han celebrado las actas de inicio de los contratos de obra e interventoría el día 13 de noviembre de 2025.

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

UAS

- El desarrollo del contrato de manera coordinada entre contratista de obra, interventoría y supervisión ha permitido la ejecución normal y eficaz de las obras, evitando así inconvenientes, retrasos o aplazamientos en el progreso de las mismas.

- Se presenta un avance físico ejecutado del 90.00% vs un avance físico programado de 81.80% lo que indica que la ejecución de las obras está dentro de los plazos acordados y se desarrollan sin mayores contratiempos, y se observa un avance mayor favorable que es del 8.20% y se precisa que el tiempo faltante contractual es adecuado para la ejecución de las obras restantes.

- Es importante dejar claridad y salvedad del caso, que para el Presente Informe de Acta De Recibo Parcial No. 1, se recibió haciendo falta los siguientes documentos:
  - La bitácora de obra
  - El consolidado de plano récord
  - Laboratorios de la resistencia del concreto de 3000 PSI según laboratorio indicado por el Invias y teniendo en cuenta que a la fecha del presente informe, no habían expedido el informe del laboratorio contratado por el contratista de la obra y revisado por la interventoría.
  - El FIC que se dará con el acta de recibo final del contrato de obra.
  - Pero serán requisitos indispensables en el posterior Informe de Recibo Final De Supervisión y que contenga todos los anexos correspondientes tanto del Informe De Obra e Informe Interventoría y teniendo en cuenta la totalidad de obligaciones generales y especificas contempladas en las minutas contractuales de los contratos de ejecución (Obra e Interventoría) y minuta contractual del Convenio Interadministrativo que serán solicitados para el Acta de Recibo Final y Liquidacion ya en su totalidad

R.L. CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA
GERENTE EMSERPUVAG S.A. E.S.P.
Nit. No. 900.304.997-8

Proyecto: EDELBERTO JEREZ NOVOA
Apoyo Profesional Emserpuvag S.A. E.S.P.

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

106

ANEXOS

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

487

ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. REALIZAR EXCAVACIONES

1.1 EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN





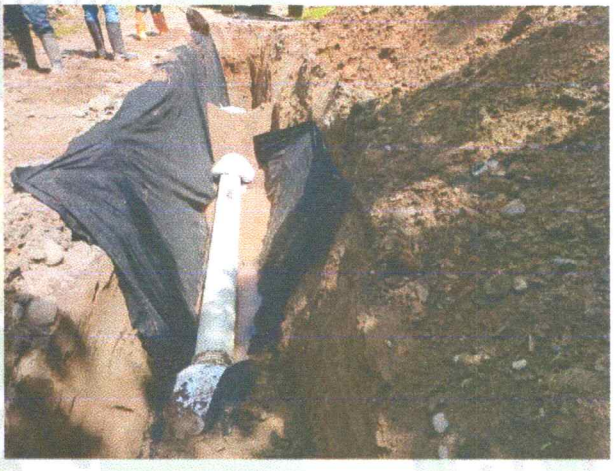
1. REALIZAR EXCAVACIONES

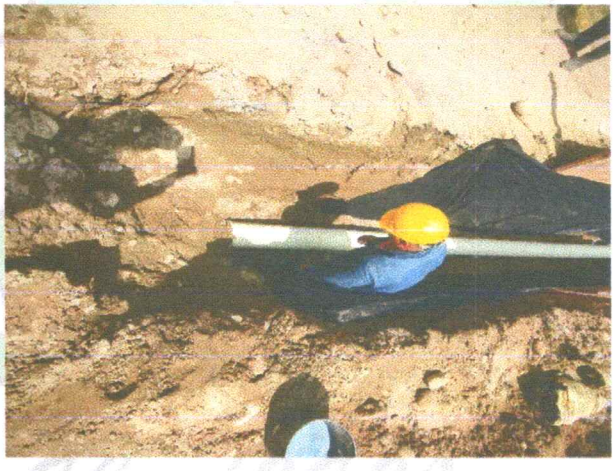
1.2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN





489

2. REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLA 2,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø = 10"	
	

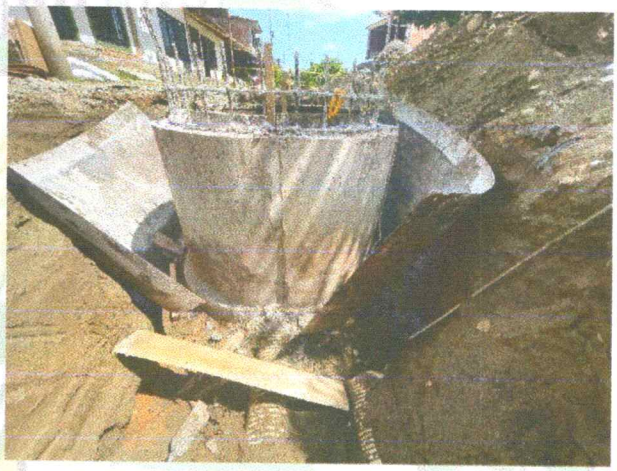
2. REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLA 2,2 SUMINISTRO E INSTALACION CAMA DE CIMENTACION CON RECEBO E=0,20 MÁS ATRAQUE Y CORONA E=0,45 COMPACTADO MECANICAMENTE	
	

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

2. REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLA 2,3 ENTIBADO DE TALUDES PARA EXCAVACIÓN DE ZANJAS	
	

2. REALIZAR SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLA 2,4 SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILAR	
	

490

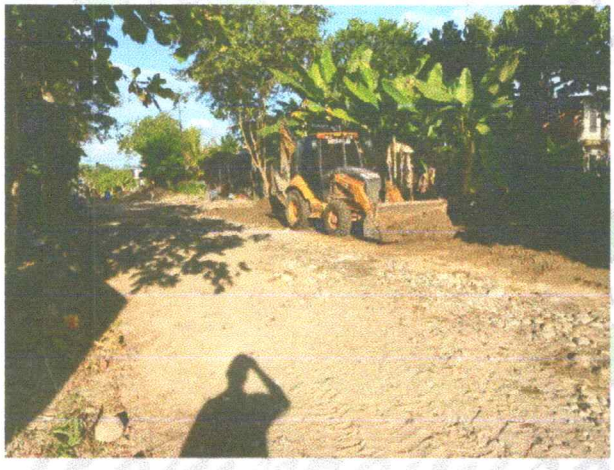
3. CONSTRUCCION CÁMARAS DE INSPECCIÓN	
3,1 CONSTRUCCION CAMARA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3,000 PSI D=1,20m PROF: H <= 2,00m, INC. TAPA EN FERROCONCRETO	
	

4. REALIZAR RELLENOS Y OTRAS ACTIVIDADES	
4,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO MECANICAMENTE	
	

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

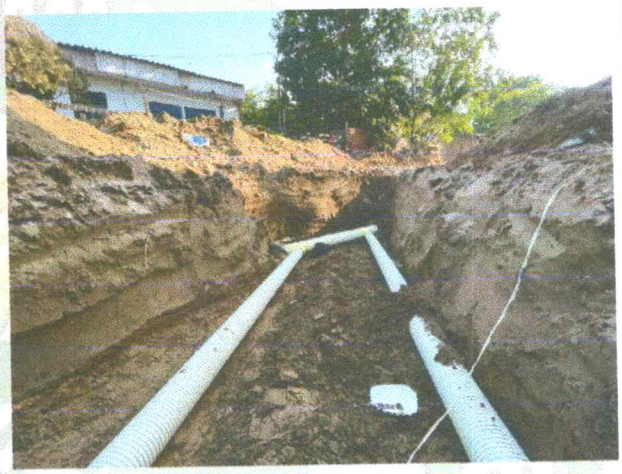
UD1

4. REALIZAR RELLENOS Y OTRAS ACTIVIDADES 4,2 SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACIÓN PARA RELLENO FINAL CONMATERIAL DE RIO SELECCIONADO	
	

4. REALIZAR RELLENOS Y OTRAS ACTIVIDADES 4,3 DESALOJO DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION	
	

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

492

5. CONSTRUIR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO 5,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø = 6"	
	

5. CONSTRUIR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO 5,2 SUMINISTRO E INSTALACION DE KID SILLA YEE ESTRUCTURADA DE 250mm x 160mm	
	

U93

5. CONSTRUIR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO 5,3 CAJILLA CONEXIÓN DOMICILIARIA EN CONCRETO DE 3,000PSI DE 0,70mx0,70m MEDIDAS INTERNAS	
	

5. CONSTRUIR ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO 5,4 SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILA	
	

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

ANEXO 2. MEMORIA DE CANTIDADES DEL CONVENIO

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

CAPITULO 1	INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA AGUAS RESIDUALES	UNIDAD	CANTIDAD
" OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS ALPES, CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 7B, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."			
ITEM: 1,1	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL MIXTO	M3	286,78

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR
	H	ANCH	LARGO	V		A	L	H				
Tuberia PVC 10" Tramo (1) Ver Planos	63,60	0,90	1,82		1,00				104,18	104,18	286,78	0,00
Tuberia PVC 10" Tramo (2) Ver Planos	58,40	0,90	1,87		1,00				98,29	98,29		
Tuberia PVC 10" Tramo (3) Ver Planos	58,55	0,90	1,60		1,00				84,31	84,31		
TOTAL PARCIAL										286,78		

ITEM: 1,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL MIXTO	M3	73.39

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR
	H	ANCH	LARGO	AREA		A	L	H				
Excavacion Tuberia de 6" - Domiciliaria (1)	1.40	0.70	4.57		1.00				4.48	4.48	49.49	23.90
Excavacion Tuberia de 6" - Domiciliaria (2)	1.35	0.70	4.68		1.00				4.42	4.42		
Excavacion Tuberia de 6" - Domiciliaria (3)	1.35	0.70	4.72		1.00				4.46	4.46		
Excavacion Tuberia de 6" - Domiciliaria (4)	1.35	0.70	4.74		1.00				4.48	4.48		
Excavacion Tuberia de 6" - Domiciliaria (5)	1.40	0.70	6.54		1.00				6.41	6.41		
Excavacion Tuberia de 6" - Domiciliaria (6)	1.35	0.70	5.38		1.00				5.08	5.08		
Excavacion Tuberia de 6" - Domiciliaria (7)	1.35	0.70	5.36		1.00				5.07	5.07		
Excavacion Camaras (2)	1.86			2.27	2.00				4.22	8.44		
Excavacion Cajillas (11)	0.95	1.00	1.00		7.00				0.95	6.65		
									-	-		
TOTAL PARCIAL										49.49		

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

ITEM: 2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø = 10"										ML	180,55
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR
	H	ANCH	LARGO	AREA		A	L	H				
Tuberia corrugada PVC 10" - Tramo (1) (Ver Pla			63,60		1,00				63,60	63,60	180,55	0,00
Tuberia corrugada PVC 10" - Tramo (2) (Ver Pla			58,40		1,00				58,40	58,40		
Tuberia corrugada PVC 10" - Tramo (3) (Ver Pla			58,55		1,00				58,55	58,55		
									-	-		
									-	-		
									-	-		
TOTAL PARCIAL										180,55		

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

ITEM: 2,2	SUMINISTRO E INSTALACION CAMA DE CIMENTACION CON RECEBO E=0,20 MÁS										M3	105.84
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR
	H	ANCHO	LARGO	MENOS AREA TUBO		A	L	H				
Tuberia PVC 10" Tramo (1) Ver Planos	0.65	0.90	63.60		1.00				37.21	37.21		
Tuberia PVC 10" Tramo (2) Ver Planos	0.65	0.90	58.40		1.00				34.16	34.16		
Tuberia PVC 10" Tramo (3) Ver Planos	0.65	0.90	58.55		1.00				34.25	34.25		
Domiciliaria (1)	0.53	0.70	4.57		1.00				1.70	1.70		
Domiciliaria (2)	0.53	0.70	4.68		1.00				1.74	1.74		
Domiciliaria (3)	0.53	0.70	4.72		1.00				1.75	1.75		
Domiciliaria (4)	0.53	0.70	4.74		1.00				1.76	1.76		
Domiciliaria (5)	0.53	0.70	6.54		1.00				2.43	2.43		
Domiciliaria (6)	0.53	0.70	5.38		1.00				2.00	2.00		
Domiciliaria (7)	0.53	0.70	5.36		1.00				1.99	1.99		
Tuberia PVC 10" Tramo (1) Ver Planos			63.60	(0.20)	1.00				(12.49)	- 12.49		
Tuberia PVC 10" Tramo (2) Ver Planos			58.40	(0.20)	1.00				(11.47)	- 11.47		
Tuberia PVC 10" Tramo (3) Ver Planos			58.55	(0.20)	1.00				(11.50)	- 11.50	99.11	6.72
Domiciliaria (1)			4.57	(0.12)	1.00				(0.54)	- 0.54		
Domiciliaria (2)			4.68	(0.12)	1.00				(0.55)	- 0.55		
Domiciliaria (3)			4.72	(0.12)	1.00				(0.56)	- 0.56		
Domiciliaria (4)			4.74	(0.12)	1.00				(0.56)	- 0.56		
Domiciliaria (5)			6.54	(0.12)	1.00				(0.77)	- 0.77		
Domiciliaria (6)			5.38	(0.12)	1.00				(0.63)	- 0.63		
Domiciliaria (7)			5.36	(0.12)	1.00				(0.63)	- 0.63		
SUBTOTAL										**79.29**		
COMPACTACION (1,25%)										**19.82**		
TOTAL PARCIAL										**99.11**		

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

ITEM: 2,3	ENTIBADO DE TALUDES PARA EXCAVACIÓN DE ZANJAS										M2	671,65
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR
	H	ANCHO	LARGO	MENOS AREA TUBO		A	L	H				
Tuberia PVC 10" Tramo (1) Ver Planos	1,86		63,60		2,00				118,30	236,59	671,65	0,00
Tuberia PVC 10" Tramo (2) Ver Planos	1,86		58,40		2,00				108,62	217,25		
Tuberia PVC 10" Tramo (3) Ver Planos	1,86		58,55		2,00				108,90	217,81		
										-		
										-		
TOTAL PARCIAL										671,65		

ITEM: 2,4	SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILAR										M2	695,12
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR
	H	ANCHO	LARGO	MENOS AREA TUBO		A	L	H				
Tuberia PVC 10" Tramo (1) Ver Planos		3,85	63,60		1,00				244,86	244,86	695,12	0,00
Tuberia PVC 10" Tramo (2) Ver Planos		3,85	58,40		1,00				224,84	224,84		
Tuberia PVC 10" Tramo (3) Ver Planos		3,85	58,55		1,00				225,42	225,42		
										-		
										-		
TOTAL PARCIAL										695,12		

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

ITEM: 3,1	CONSTRUCCION CAMARA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3,000 PSI										UND	2,00
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR
	H	ANCHO	LARGO	MENOS AREA TUBO		A	L	H				
Camara de inspeccion Reforzada					2,00				2,00	2,00	2,00	0,00
									-	-		
									-	-		
										-		
										-		
TOTAL PARCIAL										2,00		

ITEM: 4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO										M3	193,45
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR
	H	ANCHO	LARGO	MENOS AREA TUBO		A	L	H				
Tuberia PVC 10" Tramo (1) Ver Planos	0,87	0,90	63,60		1,00				49,80	49,80	182,85	10,60
Tuberia PVC 10" Tramo (2) Ver Planos	0,92	0,90	58,40		1,00				48,36	48,36		
Tuberia PVC 10" Tramo (3) Ver Planos	0,65	0,90	58,55		1,00				34,25	34,25		
Domiciliaria (1)	0,57	0,70	4,57		1,00				1,82	1,82		
Domiciliaria (2)	0,52	0,70	4,68		1,00				1,70	1,70		
Domiciliaria (3)	0,52	0,70	4,72		1,00				1,72	1,72		
Domiciliaria (4)	0,52	0,70	4,74		1,00				1,73	1,73		
Domiciliaria (5)	0,57	0,70	6,54		1,00				2,61	2,61		
Domiciliaria (6)	0,57	0,70	5,38		1,00				2,15	2,15		
Domiciliaria (7)	0,57	0,70	5,36		1,00				2,14	2,14		
SUBTOTAL										146,28		
COMPACTACION (1,25%)										36,57		
TOTAL PARCIAL										182,85		

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

ITEM: 4,2	SUMINISTRO, INSTALACION Y COMPACTACIÓN PARA RELLENO FINAL CON										M3	75.98
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR
	H	ANCHO	LARGO	MENOS AREA TUBO		A	L	H				
Tuberia PVC 10" Tramo (1) Ver Planos	0.30	0.90	63.60		1.00				17.17	17.17		
Tuberia PVC 10" Tramo (2) Ver Planos	0.30	0.90	58.40		1.00				15.77	15.77		
Tuberia PVC 10" Tramo (3) Ver Planos	0.30	0.90	58.55		1.00				15.81	15.81		
Domiciliaria (1)	0.30	0.70	4.57		1.00				0.96	0.96		
Domiciliaria (2)	0.30	0.70	4.68		1.00				0.98	0.98		
Domiciliaria (3)	0.30	0.70	4.72		1.00				0.99	0.99		
Domiciliaria (4)	0.30	0.70	4.74		1.00				1.00	1.00	70.39	5.59
Domiciliaria (5)	0.30	0.70	6.54		1.00				1.37	1.37		
Domiciliaria (6)	0.30	0.70	5.38		1.00				1.13	1.13		
Domiciliaria (7)	0.30	0.70	5.36		1.00				1.13	1.13		
SUBTOTAL										**56.31**		
COMPACTACION (1,25%)										**14.08**		
TOTAL PARCIAL										**70.39**		

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

ITEM: 4,3	DESALOJO DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION										M3	256,16
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR
	H	ANCHO	LARGO	AREA		A	L	H				
Tuberia PVC 10" Tramo (3) Ver Planos	0,95	0,90	58,55		1,00				50,06	50,06	110,27	145,89
Domiciliaria (1)	0,83	0,70	4,57		1,00				2,66	2,66		
Domiciliaria (2)	0,78	0,70	4,68		1,00				2,56	2,56		
Domiciliaria (3)	0,78	0,70	4,72		1,00				2,58	2,58		
Domiciliaria (4)	0,78	0,70	4,74		1,00				2,59	2,59		
Domiciliaria (5)	0,83	0,70	6,54		1,00				3,80	3,80		
Domiciliaria (6)	0,78	0,70	5,38		1,00				2,94	2,94		
Domiciliaria (7)	0,78	0,70	5,36		1,00				2,93	2,93		
Excavacion Camaras (2)	1,86			2,27	2,00				4,22	8,44		
Excavacion Cajillas (11)	0,95	1,00	1,00		7,00				0,95	6,65		
SUBTOTAL										85,21		
COMPACTACION (1,25%)										21,30		
TOTAL PARCIAL										110,27		

ITEM: 5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC Ø = 6"										ML	57,25
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR
	H	ANCHO	LARGO	AREA		A	L	H				
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (1) (Ver			4,57		1,00				4,57	4,57	35,99	21,26
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (2) (Ver			4,68		1,00				4,68	4,68		
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (3) (Ver			4,72		1,00				4,72	4,72		
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (4) (Ver			4,74		1,00				4,74	4,74		
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (5) (Ver			6,54		1,00				6,54	6,54		
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (6) (Ver			5,38		1,00				5,38	5,38		
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (7) (Ver			5,36		1,00				5,36	5,36		
TOTAL PARCIAL										35,99		

591

ITEM: 5,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE KID SILLA YEE ESTRUCTURADA DE 250mm x 160mm	UND	11,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR
	H	ANCHO	LARGO	AREA		A	L	H				
Kit Silla Yee Estructurada 250mm*160mm					7,00				7,00	7,00	7,00	4,00
									-	-		
									-	-		
TOTAL PARCIAL										7,00		

ITEM: 5,3	CAJILLA CONEXIÓN DOMICILIARIA EN CONCRETO DE 3,000PSI DE	UND	11,00

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR
	H	ANCHO	LARGO	AREA		A	L	H				
Cajillas de Inspeccion (11)					7,00				7,00	7,00	7,00	4,00
									-	-		
									-	-		
TOTAL PARCIAL										7,00		

Carrera 6 No. 5-131 Barrio La Amistad - La Hormiga – Putumayo
Celular: 3123214143 E-mail: contactenos@mserpuvag.gov.co

Confidencial

592

ITEM: 5,4	SUM. INST. DE GEOTEXTIL NT 1800 O SIMILA									M2	220,42	
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				CANT	VANOS			VALOR PARCIAL	TOTAL	TOTAL EJECUADO	TOTAL POR EJECUTAR
	H	ANCHO	LARGO	AREA		A	L	H				
											138,56	81,86
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (1) (Ver		3,85	4,57		1,00				17,59	17,59		
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (2) (Ver		3,85	4,68		1,00				18,02	18,02		
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (3) (Ver		3,85	4,72		1,00				18,17	18,17		
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (4) (Ver		3,85	4,74		1,00				18,25	18,25		
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (5) (Ver		3,85	6,54		1,00				25,18	25,18		
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (6) (Ver		3,85	5,38		1,00				20,71	20,71		
Tuberia corrugada PVC 6" Domiciliaria (7) (Ver		3,85	5,36		1,00				20,64	20,64		
TOTAL PARCIAL										138,56		

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELPUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DEL VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P.
EMSERPUVAG S.A. E.S.P.
NIT. 900.304.997-8

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P.

CERTIFICA

Que de acuerdo con el resultado de mis procedimientos de auditoría y con base en la información contenida en las Planillas Integradas de Liquidación de Aportes – operador ASOPAGOS, correspondientes a los últimos seis (6) meses, la información relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables, observando que la Empresa se encuentra al día por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Aportes Parafiscales y Aportes a la Administradora de Riesgos Laborales durante este periodo.

En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisora Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue, verificada con las fuentes antes mencionadas.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 7 del Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.

La presente se expide en la ciudad de La Hormiga, municipio Valle del Guamuez, Putumayo el día veintitrés (23) de diciembre de 2025.

LEYVI PATRICIA LASSO ARMERO
REVISORA FISCAL
T.P. 173333-T

505

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELPUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DEL VALLE DEL GUAMUEZ S.A. E.S.P.
EMSERPUVAG S.A. E.S.P.
NIT. 900.304.997-8



Aportes al Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales
EMSERPUVAG S.A. E.S.P.
Ciudad y fecha: Valle del Guamuez, Putumayo 23 de diciembre de 2025
Válido con firma



506

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 3 E C 8 9 4 7 A 8 B 2 3 7 8 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEYVI PATRICIA LASSO ARMERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1126444726 de VALLE DEL GUAMUEZ (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 173333-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900364997	8	EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ SA ESP	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	3600	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
86-865	CRA 6 N5 131 BARRIO LA AMISTAD		3123214143			EMSERPUVAG@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35442274	E	2025-11-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.757.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	35442274	2025-11-26	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 12971074	ACHICANOY CULCHA CLAUDIO AGUSTIN	2.223.050	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.291.538	366.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.291.538	286.500	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	2.291.538	91.700	2.291.538	99.700	0,04350	2.291.538	45.900	68.800	0	0	01	0	959.300	N	4382101
2	CC 18112865	MEDINA MORENO WILMER JHON	2.331.597	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.331.597	373.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.331.597	291.500	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	2.331.597	93.300	2.331.597	12.200	0,00522	2.331.597	46.700	70.000	0	0	01	0	886.800	N	1701001
3	CC 18124375	MUÑOZ PEDRO ENRIQUE	2.255.231	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.255.231	360.900	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	2.255.231	282.000	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	2.255.231	90.300	2.255.231	55.000	0,02436	2.255.231	45.300	67.700	0	0	01	0	901.100	N	3360001
4	CC 98325930	MUÑOZ YANDAR NICEFORO	1.602.363	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.602.363	236.400	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	1.602.363	200.300	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	1.602.363	64.100	1.602.363	39.100	0,02436	1.602.363	32.100	48.100	0	0	01	0	640.100	N	3360001
5	CC 1136454088	QUIROZ CAMPAÑA CARLOS ESNEHIDER	4.873.905	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.873.905	779.900	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	4.873.905	609.300	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	4.873.905	195.000	4.873.905	25.500	0,00522	4.873.905	97.500	146.300	0	0	01	0	1.853.500	N	1701001
6	CC 41119623	TOVAR CHAMORRO NARCISA EVELSI	2.180.738	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.180.738	349.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.180.738	272.600	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	2.180.738	87.300	2.180.738	11.400	0,00522	2.180.738	43.700	65.500	0	0	01	0	829.500	N	1701001
7	CC 97529053	ZAMBRANO CUACES JESUS NORIEL	1.719.226	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.719.226	275.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.719.226	215.000	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	1.719.226	68.800	1.719.226	41.900	0,02436	1.719.226	34.400	51.600	0	0	01	0	686.800	N	3360001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900304997	8	EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ SA ESP	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	3600	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
86-865	CRA 6 N5 131 BARRIO LA AMISTAD		3123214143			EMSERPUVAG@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35442274	E	2025-11-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.757.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	35442274	2025-11-26	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
17.254.598	17.254.598	17.254.598	17.254.598	17.254.598

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				7	2.761.100	0	0	0	2.761.100
PROTECCION	230201	800229739	0	1	256.400	0	0	0	256.400
PORVENIR	230301	800224808	8	5	2.138.000	0	0	0	2.138.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	366.700	0	0	0	366.700
EPS(Administradoras: 2)				7	2.157.200	0	0	0	2.157.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	1.065.600	0	0	0	1.065.600
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	3	1.091.600	0	0	0	1.091.600
ARP(Administradoras: 1)				7	284.800	0	0	0	284.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	7	284.800	0	0	0	284.800
CCF(Administradoras: 1)				7	690.500	0	0	0	690.500
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891200337	8	7	690.500	0	0	0	690.500
SENA(Administradoras: 1)				7	345.500	0	0	0	345.500
SENA	PASENA	899999034	1	7	345.500	0	0	0	345.500
ICBF(Administradoras: 1)				7	518.000	0	0	0	518.000
ICBF	PAICBF	899999239	2	7	518.000	0	0	0	518.000
Gran Total					6.757.100	0	0	0	6.757.100

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900304897	8	EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ SA ESP	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	3600	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
86-865	CRA 6 N5 131 BARRIO LA AMISTAD		3123214143			EMSERPUVAG@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35670246	E	2025-12-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.778.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	35670246	2025-12-23	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
1	CC 12971074	ACHICANOY CULCHA CLAUDIO AGUSTIN	2.223.050	F									X								0		30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.341.612	374.700	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.341.612	292.800	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	2.341.612	93.700	2.341.612	101.900	0,04350	2.341.612	46.900	70.300	0	0	01	0	980.300	N	4382101
2	CC 18312865	MEDINA MORENO WILMER JHON	2.331.597	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.331.597	373.100	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.331.597	291.500	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	2.331.597	93.300	2.331.597	12.200	0,00522	2.331.597	46.700	70.000	0	0	01	0	886.800	N	1701001
3	CC 18124375	MUÑOZ PEDRO ENRIQUE	2.255.231	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.255.231	360.900	0		EPS-S OEMSSANAR-ESSC18	2.255.231	282.000	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	2.255.231	90.300	2.255.231	55.000	0,02436	2.255.231	45.200	67.700	0	0	01	0	901.100	N	3360001
4	CC 98325930	MUÑOZ YANDAR NICEFORO	1.602.363	F																	0		30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.602.363	256.400	0		EPS-S OEMSSANAR-ESSC18	1.602.363	200.300	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	1.602.363	64.100	1.602.363	39.100	0,02436	1.602.363	32.100	48.100	0	0	01	0	640.100	N	3360001
5	CC 1126454088	QUIROZ CAMPAÑA CARLOS ESNEHIDER	4.873.905	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.873.905	779.900	0		EPS-S OEMSSANAR-ESSC18	4.873.905	609.300	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	4.873.905	195.000	4.873.905	25.500	0,00522	4.873.905	97.500	146.300	0	0	01	0	1.853.500	N	1701001
6	CC 41119623	TOVAR CHAMORRO NARCISA EVELSI	2.180.738	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.180.738	349.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.180.738	272.600	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	2.180.738	87.300	2.180.738	11.400	0,00522	2.180.738	43.700	65.500	0	0	01	0	829.500	N	1701001
7	CC 97520053	ZAMBRANO CUACES JESUS NORIEL	1.719.226	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.719.226	275.100	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.719.226	215.000	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	1.719.226	68.800	1.719.226	41.900	0,02436	1.719.226	34.400	51.600	0	0	01	0	666.800	N	3360001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900304997	8	EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ SA ESP	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	3600	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
86-865	CRA 6 N5 131 BARRIO LA AMISTAD		3123214143			EMSERPUVAG@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-12	35670246	E	2025-12-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.778.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	35670246	2025-12-23	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
17.304.672	17.304.672	17.304.672	17.304.672	17.304.672

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				7	2.769.100	0	0	0	2.769.100
PROTECCION	230201	800229739	0	1	256.400	0	0	0	256.400
PORVENIR	230301	800224808	8	5	2.138.000	0	0	0	2.138.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	374.700	0	0	0	374.700
EPS(Administradoras: 2)				7	2.163.500	0	0	0	2.163.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	1.071.900	0	0	0	1.071.900
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	3	1.091.600	0	0	0	1.091.600
ARP(Administradoras: 1)				7	287.000	0	0	0	287.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	7	287.000	0	0	0	287.000
CCF(Administradoras: 1)				7	692.500	0	0	0	692.500
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891200337	8	7	692.500	0	0	0	692.500
SENA(Administradoras: 1)				7	346.500	0	0	0	346.500
SENA	PASENA	899999034	1	7	346.500	0	0	0	346.500
ICBF(Administradoras: 1)				7	519.500	0	0	0	519.500
ICBF	PAICBF	899999239	2	7	519.500	0	0	0	519.500
Gran Total					6.778.100	0	0	0	6.778.100

510

RESUMEN PLA[illegible]A PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900304997	8	EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ SA ESP	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	3600	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
86-865	CRA 6 NS 131 BARRIO LA AMISTAD		3123214143		EMSERPUVAG@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35724585	E	2025-12-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.753.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
7	35724585	2026-01-26	Pagada						

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 12971074	ACHICANOY CULCHA CLAUDIO AGUSTIN	2.223.050	F									X								0		30	30	30	30	COLPENSIONES -25-14	2.282.331	565.200	0		NUEVA E.P.S. O S.A.-EPS037	2.282.331	285.300	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	2.282.331	91.300	2.282.331	99.300	0,04350	2.282.331	45.700	68.500	0	0	01	0	955.300	N	4582101
2	CC 18112865	MEDINA MORENO WILMER JHON	2.331.597	F	X																0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.331.597	373.100	0		NUEVA E.P.S. O S.A.-EPS037	2.331.597	291.500	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	2.331.597	93.300	2.331.597	12.200	0,00522	2.331.597	46.700	70.000	0	0	01	0	886.800	N	1701001
3	CC 18124375	MUÑOZ PEDRO ENRIQUE	2.255.231	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.255.231	360.900	0		EPS-S O EMSSANAR-ESSC18	2.255.231	282.000	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	2.255.231	90.300	2.255.231	55.000	0,02436	2.255.231	45.200	67.700	0	0	01	0	901.100	N	3360001
4	CC 98325930	MUÑOZ YANDAR NICEFORO	1.602.363	F																	0		30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.602.363	256.400	0		EPS-S O EMSSANAR-ESSC18	1.602.363	200.300	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	1.602.363	64.100	1.602.363	39.100	0,02436	1.602.363	32.100	48.100	0	0	01	0	640.100	N	3360001
5	CC 1126454088	QUIROZ CAMPAÑA CARLOS ESNEHIDER	4.873.905	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.873.905	779.900	0		EPS-S O EMSSANAR-ESSC18	4.873.905	609.300	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	4.873.905	195.000	4.873.905	25.500	0,00522	4.873.905	97.500	146.300	0	0	01	0	1.853.500	N	1701001
6	CC 41119623	TOVAR CHAMORRO NARCISA EVELSI	2.180.738	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.180.738	349.000	0		NUEVA E.P.S. O S.A.-EPS037	2.180.738	272.600	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	2.180.738	87.300	2.180.738	11.400	0,00522	2.180.738	43.700	65.500	0	0	01	0	829.500	N	1701001
7	CC 97520053	ZAMBRANO CUACES JESUS NORIEL	1.719.226	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.719.226	275.100	0		NUEVA E.P.S. O S.A.-EPS037	1.719.226	215.000	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	1.719.226	68.800	1.719.226	41.900	0,02436	1.719.226	34.400	51.600	0	0	01	0	686.800	N	3360001

544

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900304997	8	EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ SA ESP	B	0	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	3600	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
86-865	CRA 6 N5 131 BARRIO LA AMISTAD		3123214143			EMSERPUVAG@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35724585	E	2025-12-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.753.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	35724585	2026-01-26	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
17.245.391	17.245.391	17.245.391	17.245.391	17.245.391

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				7	2.759.600	0	0	0	2.759.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	256.400	0	0	0	256.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	365.200	0	0	0	365.200
PORVENIR	230301	800224808	8	5	2.138.000	0	0	0	2.138.000
EPS(Administradoras: 2)				7	2.156.000	0	0	0	2.156.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	1.064.400	0	0	0	1.064.400
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	3	1.091.600	0	0	0	1.091.600
ARP(Administradoras: 1)				7	284.400	0	0	0	284.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	7	284.400	0	0	0	284.400
CCF(Administradoras: 1)				7	690.100	0	0	0	690.100
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891200337	8	7	690.100	0	0	0	690.100
SENA(Administradoras: 1)				7	345.300	0	0	0	345.300
SENA	PASENA	899999034	1	7	345.300	0	0	0	345.300
ICBF(Administradoras: 1)				7	517.700	0	0	0	517.700
ICBF	PAICBF	899999239	2	7	517.700	0	0	0	517.700
Gran Total					6.753.100	0	0	0	6.753.100
