Acta No:	09	**Tema:**	Comité Obra Contrato 2025-2780
Fecha:	16/02/2026	**Ubicación:**	Calle 74 No 20c-04
Hora Inicio:	08:00 AM	**Hora Fin:**	12:00 PM

1. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo	Seguimiento técnico, administrativo y operativo al contrato No. 2025-2780
Agenda	1. Presentación y registro de asistencia 2. Temas para desarrollar en el comité 3. Varios 4. Conclusiones

2. SEGUIMIENTO COMPROMISOS ANTERIORES

No.	Descripción	Responsable	Estado
1	Cumplir con la finalización de los complementos correspondientes a la AK 50 a más tardar el 19 de enero de 2026, con excepción del complemento ubicado en la intersección AK 50 X CL 5A.	Contratista	Cumplido
2	Realizar entrega del complemento a la interventoría de la AK 50 X CL 5 A el 24 de enero de 2026	Contratista	Cumplido

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Presentación y registro de asistencia

Se registró la asistencia a la reunión en el listado de asistencia (se adjunta listado de asistencia).

2. Temas para desarrollar en el comité

La Interventoría presentó el informe actualizado de compromisos, identificando el cumplimiento de todos los compromisos que se tenían del comité pasado.

Avance de cada una de las intersecciones verificando una a una el avance que se tiene de ejecución a la fecha y pactando con el contratista fechas de entrega en los complementos que se tiene retraso.

PMT - TRÁNSITO

✓ **PMT General**

A la fecha del 16 de febrero de 2026, por PMT general se tuvo aprobado por SDM las siguientes intersecciones:

Tabla **1.** PMT General aprobados a la fecha

ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	ESTADO PMT	COI - APROBADO	FECHA COI	FECHA INICIO	FECHA FIN
203	1002	KR 11 X CL 69	Chapinero	Plazo Finalizado	4	22/01/2026	23-ene-26	13-feb-26
-	-	AK 50 X AC 63	Teusaquillo	Plazo Finalizado	4	22/01/2026	23-ene-26	6-feb-26
770	3659	AK 50 X CL 16 Sur	Puente Aranda	Plazo Finalizado	4	22/01/2026	23-ene-26	6-feb-26
736	2911	AK 50 X CL 5A	Puente Aranda	Plazo Finalizado	4	22/01/2026	23-ene-26	6-feb-26
258	1488	KR 55 x CL 127	Suba	Plazo Finalizado	4	22/01/2026	23-ene-26	6-feb-26
17	1169	AK 9 X AC 134	USAQUEN	Plazo Finalizado	4	22/01/2026	23-ene-26	6-feb-26

Fuente: Consorcio Movilidad Capital

✓ **PMT Específicos**

A la fecha del 16 de febrero de 2026, el estado de los PMT específicos es el siguiente:

Tabla **2.** PMT estado PMT específicos autorizados por la entidad, otros en revisión y con observaciones

TIPO DE PMT	CANTIDAD	ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	N° RADICADO SDM	FECHA EN SDM	ESTADO DEL PMT	COI -APROBADO	FECHA INICIO	FECHA FIN	COI 06	COI 07	COI 08	COI 09
												feb-26			
												5/02/2026	12/02/2026	19/02/2026	28/02/2026
5 - NUEVAS	1	759	1176	KR 70G X CL 72	Engativá	202661200096562	9/01/2026	Con observaciones de SDM remitidas al CBM el 21-ene-2026							
	1	1927	2184	KR 100 X CL 18	Fontibón	202561204576872	15/12/2025	Aprobado por SDM	52	27-dic-25	26-feb-26				
40 - COMPLEMETOS	10	1133	1877	KR 58 X AC 170	Suba	202661200248352	21/01/2026	Con observaciones de SDM remitidas al CBM el 29-ene-2026							
		183	1877	KR 62 X CL 169 B	Suba	202661200248352	21/01/2026	Con observaciones de SDM remitidas al CBM el 29-ene-2026							
		167	1877	KR 58 X CL 169 B	Suba	202661200248352	21/01/2026	Con observaciones de SDM remitidas al CBM el 29-ene-2026							
		404	2762	KR 17 X AC 32	Teusaquillo	202661200247352	21/01/2026	Con observaciones de SDM remitidas al CBM el 27-ene-2026							
		432	2762	KR 16 X AC 32	Teusaquillo	202661200247352	21/01/2026	Con observaciones de SDM remitidas al CBM el 27-ene-2026							
		177	1194	KR 15 X CL 77	Chapinero	202661200136682	14/01/2026	Con observaciones de SDM remitidas al CBM el 21-ene-2026							
		274	2056	KR 13 X CL 50	Chapinero	202661200189852	17/01/2026	Con observaciones de SDM remitidas al CBM el 27-ene-2026							
		279	2056	KR 13 X CL 49	Chapinero	202661200189852	17/01/2026	Con observaciones de SDM remitidas al CBM el 27-ene-2026		Idpc no fue solicitadda inicialmente					
		424	2152	KR 24 X AC 63	Teusaquillo	202661200099822	9/01/2026	Con observaciones de SDM remitidas al CBM el 21-ene-2026							
		1172	1001	KR 11 X CL 66	Chapinero	202561204772612	29/12/2025	En revisión por SDM							
40 - COMPLEMETOS	15	1167	2961	KR 121 X CL 64	Engativá	202661200247762	21/01/2026	Aprobado por SDM	5	30-ene-26	26-ene-26				
		670	1372	KR 77 A x AC 72	Engativá	202561204133832 202561204583982	12/11/2025	Aprobado por SDM	4	23-ene-26	26-feb-26				
		203	1002	KR 11 X CL 69	Chapinero	202661200096972	9/01/2026	Aprobado por SDM	4	23-ene-26	26-feb-26				
		213	1002	KR 11 X CL 67	Chapinero	202661200096972	9/01/2026	Aprobado por SDM	4	23-ene-26	26-feb-26				
		354	1151	AK 24 X CL 66	Barrios Unidos	202661200061772	7/01/2026	Aprobado por SDM	4	23-ene-26	26-feb-26				
		354	2749	KR 19A X CL 63	Teusaquillo	202561204786382	31/12/2025	Aprobado por SDM	3	16-ene-26	26-feb-26				
		318	2132	KR 17 X AC 63	Teusaquillo	202561204787202	31/12/2025	Aprobado por SDM	3	16-ene-26	26-feb-26				
		298	2132	KR 16 X AC 63	Teusaquillo	202561204787202	31/12/2025	Aprobado por SDM	3	16-ene-26	26-feb-26				
		282	1029	KR 19 X CL 69	Barrios Unidos	202561204031512 202561204499502	5/11/2025	Aprobado por SDM	3	16-ene-26	26-feb-26				
		297	1029	KR 20 X CL 69	Barrios Unidos	202561204031512 202561204499502	5/11/2025	Aprobado por SDM	3	16-ene-26	26-feb-26				
		607	2813	KR 37 x AC 24	Teusaquillo	202561204031962 202561204424522	5/11/2025	Aprobado por SDM	2	9-ene-26	26-feb-26				
		1467	1557	KR 106 x AC 132	Suba	202561204050182 202561204499152	6/11/2025	Aprobado por SDM	2	9-ene-26	26-feb-26				
		267	2055	KR 13 X CL 53	Chapinero	202561204132712 202561204584482	12/11/2025	Aprobado por SDM	2	9-ene-26	26-feb-26				
		857	2918	KR 103 A X CL 17	Fontibón	202561204787412	31/12/2025	Aprobado por SDM	2	16-ene-26	26-feb-26				
		589	1359	KR 68 H X AC 72	Engativá	202561204133472 202561204583622	12/11/2025	Aprobado por SDM	1	3-ene-26	28-feb-26				
	1	407	2137	KR 19 X AC 45	Teusaquillo	202561204756932	29/12/2025	Negado por SDM. No se atendió la totalidad de las Observaciones de SDM remitidas al CBM el 06-ene-2026	7	N.A.	N.A.				

	PMT radicado en la SDM en revisión y/o con OBS
	PMT Aprobado por SDM
	PMT Finalizado
	No se puede ejecutar

Fuente: Consorcio Movilidad Capital

EJECUCIÓN DE OBRA

Se realiza el análisis de ejecución el cronograma de obra versión n.° 04 aprobado mediante acta del 28 de octubre de 2025 con corte al 16 de febrero de 2026.

Tabla **3.** Ejecución Plan de Mejoramiento

N.°	EXT	INTERSECCIÓN	INICIO	FECHA PROGRAMACIÓN FINALIZACIÓN	FECHA PROGRAMACIÓN FINALIZACIÓN (PLAN DE MEJORAMIENTO)	DÍAS DE ATRASO	DÍAS DE ATRASO (PLAN DE MEJORAMIENTO)	% AVANCE
1	1176	CARRERA 70G POR CALLE 72	5/05/2025	12/12/2025	24/01/2026	66	23	62,00%
2	2184	CARRERA 100 POR CALLE 18	3/06/2025	14/02/2026	31/01/2026	2	16,00	23,00%
3	2185	TRASVERSAL 42 X CALLE 4A	2/10/2025	10/12/2025	12/01/2026	68	35,00	89,00%
4	3664	AK 50 x CL 8S	7/07/2025	13/08/2025	5/01/2026	155	N/A	100,00%
5	3658	AK 50 x CL 2C	7/07/2025	20/08/2025	5/01/2026	148	N/A	100,00%
6	3660	AK 50 x CL 1G	14/07/2025	1/09/2025	19/01/2026	136	N/A	100,00%
7	3659	AK 50 x DG 16S	28/07/2025	1/09/2025	19/01/2026	136	N/A	100,00%
8	2911	AK 50 x CL 5A	4/08/2025	20/09/2025	19/01/2026	117	N/A	100,00%
9	2950	AK 50 x CL 4F	4/08/2025	15/09/2025	5/01/2026	122	N/A	100,00%
10	3410	KR 56 x AC 3	1/09/2025	1/10/2025	29/12/2025	106	N/A	100,00%
11	2843	AK 101 CL 72	25/08/2025	9/10/2025	17/01/2026	98	N/A	100,00%
12	1564	AV CALI x CL 23	1/09/2025	10/10/2025	29/12/2025	97	N/A	100,00%
13	1151	KR 13 X CL 46 (BZC) IDPC	22/09/2025	23/10/2025	31/01/2026	116	16,00	82,00%
14	1002	AK 11 x CL 67 - IDPC	16/10/2025	3/01/2026	24/01/2026	123	23,00	59,00%
15	1002	AK 11 X CL 69 (CFG) - IDPC	16/10/2025	13/01/2026	24/01/2026	123	23,00	46,00%
16	2912	TV 42 AC 6	11/11/2025	25/11/2025	29/01/2026	97	18,00	0,00%
17	2813	KR 37 AC 24 (CFG) – IDPC	16/10/2025	24/02/2026	24/02/2026	123	-8,00	0,00%
18	1557	KR 106 X CL 132	22/11/2025	5/12/2025	24/01/2026	86	23,00	94,00%
19	2055	KR 13 X AC 53 (CFG) IDPC	16/10/2025	24/01/2026	24/01/2026	123	23,00	0,00%
20	2057	KR 13 X CL 47 (NUE) IDPC	16/10/2025	31/01/2026	24/01/2026	123	N/A	100,00%
21	2057	AK 24 CL 66	16/10/2025	31/01/2026	24/01/2026	123	23,00	46,00%
22	2137	KR 19 AC 45 - IDPC	16/10/2025	28/02/2026	28/02/2026	123	-12,00	0,00%
23	2749	KR 19A x CL 63 (CFG) IDPC	16/10/2025	9/02/2026	9/02/2026	123	7,00	0,00%
24	2132	KR 17 x AC 63 (NUE)	24/12/2025	9/02/2026	9/02/2026	54	7,00	0,00%
25	2152	AK 24 x CL 63 (IDPC)	16/10/2025	19/02/2026	19/02/2026	123	-3,00	0,00%
26	2961	KR 121 X CL 64 (CFG) - IDPC	22/12/2025	19/02/2026	19/02/2026	56	-3,00	0,00%

27	2918	KR 103A X CL 17 (NUE) - IDPC	16/10/2025	19/02/2026	19/02/2026	123	-3,00	0,00%

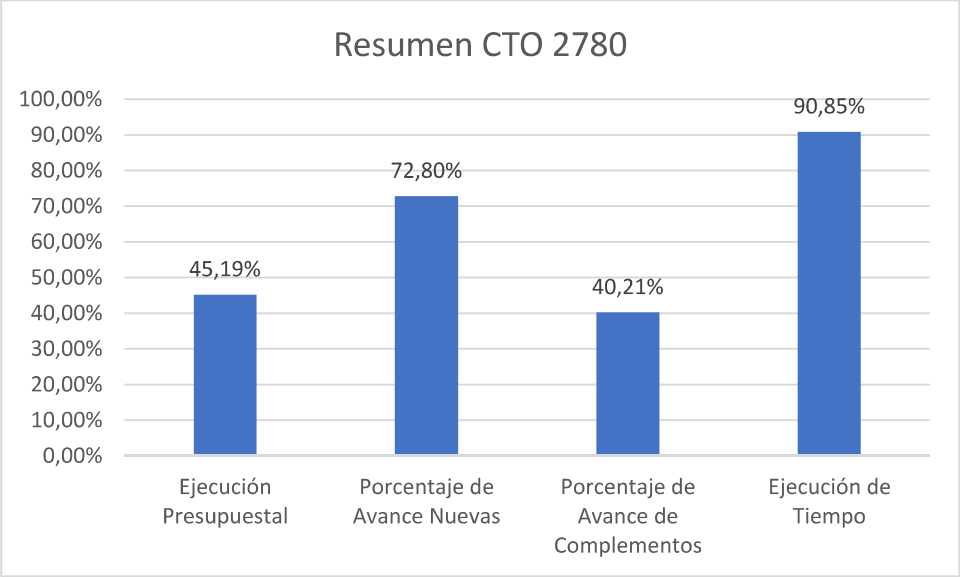
Fuente: Consorcio Movilidad Capital

De acuerdo con el avance presentado en el cuadro anterior, se concluye que, si bien se ha registrado progreso respecto al comité anterior, este no ha sido suficiente para garantizar el cumplimiento de las fechas establecidas en el plan de mejoramiento y en el cronograma aprobado.
Se evidencia que no se cuenta con el personal suficiente para atender las actividades que presentan días de atraso, ni para iniciar aquellas intersecciones que, conforme a los planes de mejoramiento, también registran retrasos. En relación con las intersecciones nuevas, a la fecha se han recibido dos (2), mientras que las tres (3) restantes ya presentan atraso en sus fechas de entrega.

En cuanto a los complementos, se han entregado diez (10), y actualmente se tienen cinco (5) en ejecución.

La Interventoría reitera la necesidad de fortalecer el recurso humano en obra, con el fin de nivelar los atrasos existentes y dar cumplimiento a las obligaciones contractuales en los plazos establecidos.

Ilustración 1. Estado del contrato 2025-2780



Fuente: Consorcio Movilidad Capital

3. Varios

- La Supervisión solicita realizar una visita conjunta con la Interventoría a las intersecciones que ya han sido entregadas, con el fin de efectuar de verificar las condiciones de obra y operación finales.
- Para el trámite de los PMT, ya sea para nuevas solicitudes o modificaciones (adiciones), que se requieran tramitar como nuevos y que impliquen solicitud de adición, debe adjuntar el pantallazo de la publicación en el SECOP de la prórroga aprobada. Lo anterior aplica para los ocho (8) complementos que se encuentran dentro del plazo de la prórroga.
- Se establece como prioritaria la ejecución de actividades de mantenimiento en la intersección AK 9 X AC 134, el cual deberá iniciarse a la mayor brevedad posible, dada su condición de urgencia.







- Para la intersección KR 70G X CL 72, la interventoría debe emitir concepto sobre las observaciones emitidas con el fin de remitirlo a la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y dar atención integral a las observaciones formuladas por la SPMT.
- El contratista deberá radicar la prórroga del PMT correspondiente a la intersección KR 100 x CL 18 el 16 de febrero de 2026.
- Se programó visita conjunta (Supervisión, Contratista e Interventoría) a la intersección KR 100 x CL 18 para el lunes 16 de febrero de 2026 en horas de la tarde, con el fin de evaluar y definir la solución técnica más adecuada.
- Todo cambio de diseño que implique modificaciones sustanciales deberá contar previamente con el visto bueno de la supervisión de SDM.
- Para las intersecciones KR 17 X AC 63 y KR 16 X AC 63, se programa reunión virtual el 16/02/2026 entre la interventoría y el equipo eléctrico para verificación técnica y reunión presencial el miércoles 18 de febrero 1 pm.
- Para las intersecciones KR 15 x CL 77 y KR 24 X AC 63 se deberá dar atención a las observaciones pendientes de PMT a más tardar el lunes 23 de febrero.
- KR 70G X CL 72 se solicita por parte de la supervisión la visita para liberación de los códigos QR y las placas para AUCE en esta intersección. Esta intersección estaba para fecha de entrega en el plan de mejoramiento el 24 de enero de 2026.
- Av Cali X CL 23 traslado de postes quedan programados para el miércoles 18 de febrero de 2026.
- La supervisión pide que todos los cambios que se hagan se deben comunicar a la supervisión por medios oficiales (correos).
- La supervisión solicita mejorar los cerramientos de todos los frentes de obra abiertos por el contratista garantizando seguridad y adecuada señalización.
- KR 37 X AC 24 iniciar labores el 23 de febrero, se debe pedir prórroga del PMT.
- Se realiza llamado de atención a la interventoría por la falta de socialización oportuna con la supervisión sobre situaciones presentadas en las intersecciones.
- Se reitera la obligación de realizar la recolección periódica de los RCD con el fin de evitar inconvenientes y observaciones recurrentes.
- La interventoría realiza llamado de atención al contratista por el incumplimiento en la entrega de los informes, evidenciándose la presentación de anexos incompletos y/o información desactualizada correspondiente al periodo anterior.
- Las bitácoras y todos los formatos de control deben estar firmadas por el residente del contratista y de la interventoría o los profesionales designados por las partes.
- Para las obras terminadas, la interventoría deberá remitir mediante oficio a la SDM los planos récord en formato digital, debidamente radicados.

4. COMPROMISOS

N.°	Descripción	Responsable	Fecha Limite
1	Remitir por parte de la Interventoría el concepto técnico de obra correspondiente a la intersección KR 70G X CL 72, respecto al cambio de diseño en las atravesadas, derivado de la inspección de redes mediante perforación horizontal (PH), en la cual se evidenció la presencia de tuberías sobre los andenes y limitaciones de espacio para la ejecución de los lanzamientos.	Interventoría	16/02/2026

2	Visita a la KR 100 x CL18 contratista e interventoría para la definición de los lanzamientos de PH que se van a tener.	Contratista / Interventoría / Supervisión	16/02/2026
3	Reunión con el grupo eléctrico, interventoría y supervisión en EXT 2762 KR 17 X AC 32, para definición de actividades que se van a realizar.	Interventoría	16/02/2026
4	Atender el mantenimiento de la AK 9 X CL 163 A.	Contratista	17/02/2026
5	Atención de las observaciones de PMT´s que se tienen pendientes con la interventoría y la SDM.	Contratista	23/02/2026
6	Cumplir con el envío del oficio de respuesta al comunicado BEL-SDM-ADM-358-26 a la Supervisión, en relación con los inconvenientes presentados para la ejecución del complemento en la intersección TV 42 X AC 6, asociados al contrato IDU 1787 de 2023.	Interventoría	18/02/2026
7	Realizar la entrega de la subsanación de las observaciones al informe mensual del Contratista correspondiente al mes de enero.	Contratista	20/02/2026

5. FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Adriana Lucía Rodríguez Fonseca	Profesional Especializada - Secretaría Distrital de Movilidad	
Nancy Mateus Ráquira	Contratista - Secretaría Distrital de Movilidad	
Andrés Valderrama Padilla	Director de Obra - Consorcio Belzcon - Movilidad	
Sergio Andrés Torres Toloza	Residente de Obra - Consorcio Belzcon - Movilidad	
Javier Andrés Meza Gil	Especialista de Tránsito - Consorcio Belzcon - Movilidad	
Nestor Bautista	Gerente Técnico - Consorcio Belzcon - Movilidad	
Valentín Eduardo Barajas	Director de Interventoría – Consorcio Movilidad Capital	
Andrés García Avendaño	Coordinador Técnico de Interventoría – Consorcio Movilidad Capital	
Luis Carlos Daza	Especialista de Tránsito – Consorcio Movilidad Capital	
Wilson Pineda	Residente de obra – Consorcio Movilidad Capital	

MOVILIDAD CAPITAL CONSORCIO	**LISTADO DE ASISTENCIA – REUNIONES** **Contrato 2025-2769 Contrato de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte**	**VERSIÓN:** 1 **FECHA DE VIGENCIA:** 23/04/2025

N.° de Acta:	09				
Tema de la reunión:	Comité Quincenal de Obra No. 9 CBM - CMC - SDM - Contrato Lote 1 No. 2025-2780				
Fecha:	16/02/2026	**Hora:**	08:00	**Lugar:**	Calle 74 No. 20c-04, Barrio San Felipe

No	Nombres y Apellidos	Empresa/ Entidad	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Andrés Valderrama P	Consorcio Bzekcon	Director de Obra	avalderrama.bzc@gmail.co	
2	Cristian Camilo Maldonado	Consorcio Belzcon	Residente	cmaldonado.bzc@gmail.com	
3	Javier Andrés Meza	CBM	Esp. en Tránsito	jmeza.bzc@gmail.com	
4	Jorge Andrés Torres	CBM	Residente	Stres.bzc@gmail.com	
5	Nancy Natalia Rojas	SDM / SEMA	Contratista	nmatens@movilidadbogota	
6	Esteban Barbosa Cortés	Consorcio Belzcon	Aux. ingeniería	sdm2780.bzc@gmail.com	
7	Luis Carlos Daza V.	Interventoría CMC	Esp. en Tránsito	sem-esp-transitytransporte.redtic.com	
8	NESTOR BAUTISTA	CONSORCIO BELZCON	GERENTE TECNICO	NBAUTISTA.BZC@GMAIL.COM	
9	Adriana Rodriguez	SDM	Profesional Esp	adrodriguez@movilidadbogot	
10	Valentina Ibarra	CMC	Director de Interv	sem-director@redtic.com.co	
11	Wilson Pineda Martinez	CMC	Ing residente de obra	sem-ing-residente@redtic.com.co	
12	Andrés García Avendaño	CMC	Coordinador Técnico	sem-coordinador-tecnico@redtic.com.co	
13					
14					
15					
16					
17					
