TIC	**ACTA DE REUNIÓN**	mig

CÓDIGO TRD: 2100				
ACTA No. **15**	**LUGAR:** Google Meet	**FECHA:** 27/04/2026	**HORA DE INICIO:** 2:00 PM	**HORA FINAL:** 2:50 PM

OBJETO DE LA REUNIÓN
Reunión de seguimiento entre responsable MINTIC e interventoría Consorcio Interlineas 2.0, contrato de interventoría No. 2169-2024 cuyo objeto es: *"Ejercer la Interventoría a las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras, y administrativas requeridas para la vigilancia y el seguimiento integral de la ejecución del proyecto Líneas de Fomento 2.0 de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico".*

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación
2. Seguimiento compromisos anteriores
3. Estado documental
4. Informes de interventoría
5. Estado pago interventoría
6. Fase del proyecto (planeación- instalación- operación)
7. Finalización operación metas
8. Finalización resoluciones
9. Estado pagos resoluciones
10. Estado revisión informes mensuales ejecutores
11. Informes de posible incumplimiento
12. Varios
13. Cierre

3. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES		
ITEM	**COMPROMISO**	**ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)**
	N/A	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Presentación

Se realiza la reunión de seguimiento por medio de la plataforma Google Meet, con presencia del equipo de interventoría Consorcio Inter-líneas 2.0 y responsable MINTIC.

La vocería de la reunión estuvo a cargo del equipo de interventoría Consorcio Inter-Líneas 2.0

2. Seguimiento a compromisos anteriores

Información consignada al inicio del acta de comité de seguimiento 15 entre la supervisión e interventoría

3. Estado documental

Frente al estado actual de las actas de comité operativo y de seguimiento del año 2025 (enero- diciembre) y 2026 (enero- abril), a continuación, se relaciona el estado por región

Región	Ene a Nov 25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26
4	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
5	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
6	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
7	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
8	Firmada	**Pte. Firmas**	**Pte. Firmas**	**Pte. Firmas**	**Pte. Firmas**	Ejecutada
14	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
15	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
16	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
17	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
18	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
19	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
20	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
21	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
22	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
23	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
24	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
25	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
26	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
27	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
29	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
30	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
32	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
36	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
37	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
39	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada

El director de interventoría informa que, con respecto a los meses de diciembre de 2025 y enero, febrero y marzo de 2026, las actas de la región 8 se encuentran sin firma. En este sentido, se aclara que se ha radicado alerta de presunto incumplimiento para conminar al ejecutor de firmar dichas actas.
Asimismo, el ejecutor remitió observaciones correspondientes a todos los meses en mención, a las cuales ya se dio respuesta; sin embargo, a la fecha no se ha logrado la firma de las actas durante la presente semana.
En consecuencia, se prevé la radicación de un informe de presunto incumplimiento, teniendo en cuenta que el ejecutor también se había comprometido a enviar observaciones adicionales, las cuales no han sido remitidas hasta el momento.

De igual forma, se relaciona el estado documental de las actas de seguimiento entre la interventoría y responsable MINTIC

Mes	Fecha	Estado	Observaciones
Febrero-25	19/02/2025	Firmado	
Marzo-25	17/03/2025	Firmado	
Abril-25	16/04/2025	Firmado	
Mayo-25	15/05/2025	Firmado	
Junio-25	20/06/2025	Firmado	
Julio-25	28/07/2025	Firmado	
Agosto-25	21/08/2025	Firmado	
Septiembre-25	24/09/2025	Firmado	
Octubre-25	29/10/2025	Firmado	
Noviembre -25	28/11/2025	Firmado	
Diciembre -25	29/12/2025	Firmado	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Enero - 26	29/01/2026	Firmado	
Febrero-26	26/02/2026	Firmado	
26/03/2026	26/03/2026	Firmado	
24/04/2026	24/04/2026	Programada	

4. Informes de interventoría

Con relación a los informes mensuales de interventoría, se informa acerca de la fecha de entrega de estos.

Mes	Radicado	Fecha radicación	Estado	Radicado
Enero-25	251013659	07/02/2025	Aprobado	252029280
Febrero-25 v2	251036136	31/03/2025	Aprobado	252057282
Marzo-25 v2	251047458	25/04/2025	Aprobado	252066925
Abril-25 v2	251061902	26/05/2025	Aprobado	252091575
Informe periodo 1 v2	251067146	06/06/2025	Aprobado	252089964
Mayo-25-v2	251077238	01/07/2025	Aprobado	252107540
Junio-25-v2	251095869	22/07/2025	Aprobado	252120665
Julio-25-v2	251109083	25/08/2025	Aprobado	252153658
Agosto-25-v2	251123498	26/09/2025	Aprobado	252171011
Septiembre-25-v2	251134014	22/10/2025	Aprobado	252179032
Octubre-25-v2	251147895	25/11/2025	Aprobado	252200630
Noviembre-25-v1	251151010	3/12/2025	Aprobado	252204835
Diciembre-25-v2	251130240	30/12/2026	Aprobado	262026687
Enero-26-v2	261022384	04/03/2026	Aprobación	262052796
Febrero-26-v2	261030402	26/03/2026	Aprobación	262068069
Marzo-26-v1	261035750	9/04/2026	Con observaciones	262071076
Marzo-26-v2	261042576	24/04/2026	En revisión	

El líder del equipo de MinTIC informa que, frente a las observaciones presentadas al informe mensual de la interventoría, el equipo se encuentra actualmente verificando que se hayan subsanado los requerimientos solicitados, con el fin de continuar con el trámite correspondiente.

5. Estado pago interventoría

Conforme al estado actual de pagos a la interventoría se relaciona la información consignada en la siguiente tabla, en donde se indica los pagos a realizar para el contrato de interventoría 2169-2024. Asimismo, se relaciona el estado de cada uno referente al trámite surtido.

VALOR HASTA	%	CONCEPTO	ESTADO
$ .117.278.416	21,72%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 1) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 257429925
$ 985.078.317	19,15%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 2) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 240380625 2025-07-11
$ 576.181.089	11,2%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 3) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 298756225 2025-08-22
$ 576.181.090	11,2%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 4) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 426918025 2025-11-10.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

$ 384.120.724	7,46%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 5) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 544979025 2025-12-29.
$ 192.060.364	3,73%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 6) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 75090126 2026-03-16
$375.142.684	7,29%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 7) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico. (iii) Soporte de pago del impuesto sobre el valor total de la adición de acuerdo con las instrucciones establecidas en la Circular Externa 010 del 05 de marzo de 2025 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	LFF2-INTV-DIRINFRA-04605-26 el 14/04/2026 radicado 261037432
$375.142.684	7,29%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 8) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PENDIENTE
$562.714.027	10,94	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 9) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PENDIENTE
$5.143.899.395	**100%**		

El líder del equipo de MinTIC indica que, en relación con el pago del periodo 7 de la interventoría, se ha venido avanzando con el equipo, especialmente con el componente financiero, en la consolidación de los documentos, con el fin de radicarlos oficialmente esta misma semana ante el área financiera.
Señala que ya se han adelantado los trámites internos con la Dirección de Infraestructura y que actualmente el proceso se encuentra en dicha etapa. En ese sentido, estima que, a más tardar el viernes (4 de mayo de 2026), el pago podría quedar radicado ante tesorería.

6. Fase planeación

En cuanto a la fase de planeación, a continuación, se expone el estado actual por región frente a documentos de planeación requeridos:

- ✓ Repositorio de información
- ✓ IDIO
- ✓ Plan de comercialización
- ✓ Plan de instalación
- ✓ Plan de mantenimiento

Región	Ejecutor	Repositorio información	IDIO	Plan Comercialización	Plan Instalación	Plan Mantenimiento
Región 4	SPACE COMUNICACIONES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 5	EME INGENIERIA	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 6	EME INGENIERIA	A conformidad ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 7	DIGINORTE	A conformidad ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 8	HIZ TELECOMUNICACIONES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 14	UT FOMENTO CASA	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 15	INTERMEGAMUNDO	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 16	UT FIBRANOVATEL -UC7	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 17	UT MEGAINTERCONECTA 2	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 18	UT CONECTANDO REGIONES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 19	UT CONECTANDO BAJO	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 20	PUNTO RED TELECOM	A conformidad ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 21	CF INGENIEROS	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 22	UT CONECTANDO REGIONES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 23	UT FIBERCOL UC6	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 24	UT UNA COLOMBIA 5	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 25	UT INTERSOCIAL META	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 26	UT FOMENTO NORTE	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 27	UT FOMENTO NORTE	A conformidad ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 29	NET I.S.P	A conformidad ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 30	SÚPER REDES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 32	UT CONECTANDO REGIONES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 36	UT ASINTEL UC	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 37	NETWORKS TV	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 39	UT INTERSOCIAL CUNDI	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑

6.1 Fase instalación

Con respecto a la fase de instalación, se relaciona la cantidad de accesos en estado aprobado, rechazado, en subsanación y en revisión por la interventoría con respecto a la meta total para cada región.

Región	Metas	Aprobados	Finalizado	Rechazados	En Subsanación	En Revisión	Total
Región 4	3.142	3.142	0	81	0	0	3.142
Región 5	2.706	2.706	0	4	0	0	2.706
Región 6	2.133	2.133	0	2	0	0	2.133
Región 7	1.027	976	513	1	0	0	1.027
Región 8	3.701	3.701	0	2	0	0	3.701
Región 14	1.330	1.264	66	11	0	0	1.330
Región 15	2.325	1.163	1.162	4	0	0	2.325
Región 16	2.279	2.165	2.279	13	0	0	2.279
Región 17	2.420	2.299	1210	50	0	0	2.420
Región 18	4.249	4.249	0	14	0	0	4.249
Región 19	2.134	2.027	107	1	0	0	2.134
Región 20	3.029	2.878	151	1	0	0	3.029
Región 21	2.146	2.039	2.146	9	0	0	2.146
Región 22	3.909	3.909	0	71	0	0	3.909
Región 23	2.310	2.310	0	11	0	0	2.310
Región 24	2.543	1.272	1.271	5	0	0	2.543
Región 25	1.413	1.413	0	9	0	0	1.413
Región 26	1.391	1.391	0	52	0	0	1.391

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Región 27	1.279	1.279	0	40	0	0	1.279
Región 29	2.567	2.567	0	84	0	0	2.567
Región 30	763	763	0	3	0	2	763
Región 32	2.621	2.621	131	20	0	0	2.621
Región 36	1.346	1.346	0	22	0	0	1.346
Región 37	1.601	1.521	80	0	0	0	1.601
Región 39	644	643	0	1	0	2	644
TOTAL	**55.008**	**51.777**	**8.027**	**511**	**0**	**4**	**55.008**

6.2 Fase operación

En cuanto a la fase de operación, se expone el estado de avance de cada región en relación con el cumplimiento de las metas y la fecha de inicio de operación.

Región	Meta total	Meta 1	Inicio operación Meta 1	Meta 2	Inicio operación Meta 2	Meta 3	Inicio operación Meta 3
Región 4	3.142	157	29/11/24	1.414	11/03/25	1.571	19/06/2025
Región 5	2.706	135	1/02/25	1.218	2/05/25	1.353	01/07/2025
Región 6	2.133	107	3/03/25	960	7/06/25	1.067	01/08/2025
Región 7	1.027	51	29/11/24	462	7/03/25	514	29/04/2025
Región 8	3.701	185	29/11/24	1.665	1/04/25	1.851	30/09/2025
Región 14	1.330	66	7/12/24	599	24/02/25	665	01/04/2025
Región 15	2.325	116	1/12/24	1.046	1/12/24	1.163	01/04/2025
Región 16	2.279	114	30/11/24	1.026	5/03/25	1.139	28/05/2025
Región 17	2.420	121	21/12/24	1.089	21/12/24	1.210	08/04/2025
Región 18	4.249	212	3/12/24	1.912	30/04/25	2.125	01/08/2025
Región 19	2.134	107	6/12/24	960	1/04/25	1.067	25/06/2025
Región 20	3.029	151	29/11/24	1.363	30/04/25	1.515	27/06/2025
Región 21	2.146	107	29/11/24	966	24/04/25	1.073	01/07/2025
Región 22	3.909	195	3/12/24	1.759	12/05/25	1.955	18/07/2025
Región 23	2.310	116	4/12/24	1.040	12/05/25	1.154	01/07/2025
Región 24	2.543	127	29/11/24	1.144	26/03/25	1.272	30/05/2025
Región 25	1.413	71	1/02/25	636	7/03/25	706	01/04/2025
Región 26	1.391	70	11/03/25	626	12/06/25	695	30/10/2025
Región 27	1.279	64	11/03/25	576	24/06/25	640	27/10/2025
Región 29	2.567	128	10/03/25	1.155	28/05/25	1.284	27/08/2025
Región 30	763	38	1/02/25	343	7/03/25	382	29/04/2025
Región 32	2.621	131	3/12/24	1.179	20/05/25	1.311	30/07/2025
Región 36	1.346	67	7/04/25	606	3/06/25	673	14/08/2025
Región 37	1.601	80	7/12/24	720	13/03/25	801	25/04/2025
Región 39	644	32	21/02/25	290	11/03/25	322	29/04/2025
TOTAL	**55.008**	**2.748**		**24.754**		**27.506**	

Así mismo y con relación al cumplimiento de metas desde la interventoría se indica el estado actual de las regiones que presentan finalización de operación de metas (1-2-3) en la actualidad

Región	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Observaciones
Región 4	Finalizada	Finalizada	En operación	Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación meta 1 Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación meta 2
Región 5	Con concepto finalización	En operación	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG16-04229-26 / 261017960
Región 6	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación meta 1
Región 7	Con concepto finalización	Con concepto finalización	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG07-03992-26 / 261006468 Concepto fin meta 2: LFF2-INTV-REG07-04686-26 / 261042651
Región 8	Finalizada	Finalizada	En operación	Pendiente entrega de facturas meta 1

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

				Pendiente entrega de facturas meta 2
Región 14	Con concepto finalización	Finalizada	Finalizada	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG14-04239-26 / 261018671 Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación meta 2
Región 15	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Finalizada	Concepto fin metas 1 y 2: LFF2-INTV-REG15-04190-26 / 261016577
Región 16	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG16-04229-26 / 261017960 Concepto fin meta 2: LFF2-INTV-REG16-04488-26 / 261030576 Concepto fin meta 3: LFF2-INTV-REG16-04562-26 / 261034203
Región 17	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Finalizada	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG17-04354-26 / 261021883 Concepto fin meta 2: LFF2-INTV-REG17-04619-26 / 261039180 Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación meta 3
Región 18	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación meta 1
Región 19	Con concepto finalización	Finalizada	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG19-04228-26 / 261017959
Región 20	Con concepto finalización	En operación	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG20-03991-26 / 261006201
Región 21	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG21-03940-26 / 261003727 Concepto fin meta 2: LFF2-INTV-REG21-04674-26 / 261042571 Concepto fin meta 3: LFF2-INTV-REG21-04675-26 / 261042572
Región 22	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación meta 1
Región 23	Finalizada	Finalizada	Finalizada	Pendiente entrega de facturas reposición y compensación metas 1, 2 y 3
Región 24	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Finalizada	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG24-03725-25 / 251156256 Concepto fin meta 2: LFF2-INTV-REG24-04430-26 / 261025942 Pendiente entrega de algunas facturas con compensación meta 3
Región 25	Finalizada	Finalizada	Finalizada	Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación metas 1 y 2
Región 26	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación meta 1
Región 27	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación meta 1
Región 29	Finalizada	Finalizada	En operación	Pendiente entrega de facturas con compensación meta 1 Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación meta 2
Región 30	Finalizada	Finalizada	En operación	Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación metas 1 y 2
Región 32	Con concepto finalización	En operación	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG32-04685-26 / 261042589
Región 36	Finalizada	Finalizada	En operación	Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación meta 1
Región 37	Con concepto finalización	Finalizada	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG37-04227-26 / 261017958 Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación meta 2
Región 39	Finalizada	Finalizada	En operación	Pendiente entrega de facturas con reposición metas 1 y 2

Finalizadas: 50
En Operación: 25
Finalizadas formalmente: 20

De igual forma se hace importante reportar desde la interventoría la fecha en la que se termina cada una de las 25 resoluciones objeto del proyecto de interventoría así:

ENERO 2026		
Región	**Fecha fin resolución**	**Tiempo adicional estimado**
16	31/01/26	1 mes
24	31/01/26	15 días

FEBRERO 2026		
Región	**Fecha fin resolución**	**Tiempo adicional estimado**
21	28/02/26	2.5 meses
23	28/02/26	1 mes

MARZO 2026		
Región	**Fecha fin resolución**	**Tiempo adicional estimado**
14	31/03/26	2 meses
15	31/03/26	1 mes

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

25	31/03/26	2.5 meses

ABRIL 2026		
Región	**Fecha fin resolución**	**Tiempo adicional estimado**
7	30/04/26	3 meses
29	30/04/26	3 meses
30	30/04/26	1 mes
37	30/04/26	5 meses
39	30/04/26	1 mes

El líder del equipo de MinTIC informa que, en relación con las resoluciones que finalizaban en abril, actualmente se encuentran en la etapa de espera de la renuncia a términos por parte de algunas regiones. Señala que ya se surtió el proceso de notificación a los ejecutores y que se avanza en la consolidación de dichas renuncias, con el fin de expedir las constancias de ejecutoria. En ese sentido, indica que, una vez los ejecutores remitan formalmente la renuncia a términos a través de los canales oficiales, se espera emitir las ejecutorias en el corto plazo, conforme a la planeación establecida.

Asimismo, **el líder del equipo de MinTIC y abogado** precisan que, de las regiones en proceso, ya se cuenta con la renuncia a términos de las regiones 30, 37 y 39, mientras que se encuentran pendientes las regiones 7 y 29. Indican que, para estas últimas, los ejecutores han manifestado observaciones relacionadas con cálculos pendientes.

Por su parte, **el profesional técnico de la interventoría** informa que se llevará a cabo una reunión con la región 29 para revisar temas relacionados con facturación e indisponibilidades, lo cual podría derivar en solicitudes de recálculo de indicadores. En cuanto a la región 7 **el director de interventoría**, señala que las aclaraciones ya fueron realizadas con la representante legal y que se enviará un mensaje reiterando la solicitud de la renuncia a términos.

JUNIO 2026		
Región	**Fecha fin resolución**	**Tiempo adicional estimado**
4	30/06/26	Pendiente
5	30/06/26	Pendiente
19	30/06/26	Pendiente
20	30/06/26	Pendiente
36	31/05/25 (13/06/26) *	Pendiente

El director de interventoría informa que, con relación con la región 36, se aclara que la resolución finalizó el 31 de marzo de 2026, conforme a un acto aclaratorio que no fue tenido en cuenta oportunamente, ya que inicialmente se consideró la fecha prorrogada al 31 de mayo 2026. En consecuencia, la interventoría informa que remitirá un informe detallado de pendientes, incluyendo aspectos de cumplimiento de metas, facturación, medición de indicadores, reposición y compensaciones.

El abogado del MinTIC realiza un análisis jurídico preliminar, en donde se advierte que podría configurarse un posible escenario de incumplimiento, en la medida en que al vencimiento del plazo no se habría cumplido la totalidad del objeto contractual. No obstante, se resalta la necesidad de contar con el informe detallado, tanto con corte al 31 de marzo 2026 como a la fecha actual, para determinar el estado real de ejecución y definir las acciones a seguir, así como la competencia para su trámite.

Finalmente, **el director de interventoría** señala que, independientemente del análisis jurídico, el ejecutor continúa con la fase de operación, así como con la presentación de informes y facturación, los cuales seguirán siendo objeto de seguimiento por parte de la interventoría, mientras se define la ruta a seguir al interior de la entidad.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

JULIO 2026		
Región	**Fecha fin resolución**	**Tiempo adicional estimado**
6	31/07/26	Pendiente
18	31/07/26	Pendiente
22	30/06/25 (17/07/26) *	Pendiente
32	31/07/26	Pendiente

SEPTIEMBRE 2026		
Región	**Fecha fin resolución**	**Tiempo adicional estimado**
8	30/09/26	Pendiente

OCTUBRE 2026		
Región	**Fecha fin resolución**	**Tiempo adicional estimado**
26	30/06/25 (29/10/26) *	Pendiente
27	31/08/25 (26/10/26) *	Pendiente

* Regiones con accesos reportados después de fecha fin de prórroga. Las fechas mostradas corresponden al fin de operación (10 meses para R36 y 12 meses para R22, R26 y R27)

6.3 Liquidación de resoluciones

En relación con el estado de avance de las resoluciones, se presenta el estado actual de los hitos de cumplimiento dentro del proceso de liquidación en las distintas regiones.

Informe final	
S: En subsanación:	0
R: En revisión:	3
SE: Sin entregar:	0
OK: APROBADO:	0
S: En subsanación:	0

Informe de cumplimiento	
P: Proceso de elaboración:	7
OK: COMPLETO:	4

Informe final	
F: Meta finalizada sin concepto:	30
C: Meta finalizada con concepto:	20

Documentación digital	
P: Proceso de certificación:	0
OK: APROBADO: 3	3

Región	Fecha fin resolución	Informe final	Informe Cumplimiento	Doc. digital	Meta 1		Meta 2		Meta 3	
					Fecha fin	Estado	Fecha fin	Estado	Fecha fin	Estado
Región 4	30/06/2026				28/11/2025	F	10/03/2026	F	18/06/2026	
Región 5	30/06/2026				31/01/2026	C	1/05/2026		30/06/2026	
Región 6	31/06/26				2/03/2026	F	6/06/2026		31/07/2026	
Región 7	30/04/2026		P		28/11/2025	C	6/03/2026	C	28/04/2026	
Región 8	30/09/2026				28/11/2025	F	31/03/2026	F	29/09/2026	
Región 14	31/03/2026		P		6/12/2025	C	23/02/2026	F	31/03/2026	F
Región 15	31/03/2026		P		30/11/2025	C	30/11/2025	C	31/03/2026	F
Región 16	28/02/2026	R	OK	OK	29/07/2025	C	4/11/2025	C	27/01/2026	C
Región 17	30/04/2026		P		20/12/2025	C	20/12/2025	C	7/04/2026	F
Región 18	31/07/2026				2/12/2025	F	29/04/2026		31/07/2026	
Región 19	30/06/2026				5/12/2025	C	31/03/2026	F	24/06/2026	
Región 20	30/06/2026				28/11/2025	C	29/04/2026		26/06/2026	
Región 21	15/05/2026		OK		28/07/2025	C	23/12/2025	C	28/02/2026	C
Región 22	30/06/2026				2/12/2025	F	11/05/2026		17/07/2026	
Región 23	31/03/2026	R	OK	OK	3/08/2025	F	11/01/2026	F	28/02/2026	F
Región 24	15/02/2026	R	OK	OK	28/07/2025	C	25/11/2025	C	31/01/2026	F
Región 25	31/03/2026		P		31/01/2026	F	6/03/2026	F	31/03/2026	F
Región 26	30/06/2026				10/03/2026	F	11/06/2026		29/10/2026	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Región 27	31/08/2026				10/03/2026	F	23/06/2026		26/10/2026	
Región 29	30/04/2026				9/11/2025	F	27/01/2026	F	26/04/2026	
Región 30	30/04/2026		P		31/01/2026	F	6/03/2026	F	28/04/2026	
Región 32	31/07/2026				2/12/2025	C	19/05/2026		29/07/2026	
Región 36	31/05/2026				6/02/2026	F	2/04/2026	F	13/06/2026	
Región 37	30/04/2026				6/12/2025	C	12/03/2026	F	24/04/2026	
Región 39	30/04/2026		P		20/02/2026	F	10/03/2026	F	28/04/2026	

En atención a la consulta del **líder del equipo de MinTIC** sobre la finalización de los comités operativos mensuales para algunas regiones, **el director de interventoría** informa que, para las regiones 16, 23 y 24, no sería necesario continuar con la realización de estos comités, siempre que se logre avanzar en la revisión y aprobación de los informes finales.

Señala que, en el caso de las regiones 23 y 24, únicamente se encuentran pendientes una o dos facturas de compensación, por lo que, una vez aprobados los informes finales, no habría lugar a convocar nuevos comités para estas regiones. En ese sentido, estima que, de los 25 comités inicialmente previstos, se podría reducir a aproximadamente 22 comités para el mes de mayo 2026. No obstante, advierte que, si no se presenta avance en la aprobación de los informes, será pertinente mantener los comités como mecanismo de seguimiento y presión, con el fin de instar a los ejecutores a agilizar el cierre de las resoluciones y atender los pendientes.

Por su parte, **el equipo de apoyo a la supervisión** recomienda formalizar el cierre de las obligaciones periódicas para las regiones que ya han culminado su etapa de operación, con el fin de generar un control interno y de calidad. Para ello, sugiere emitir una certificación en la que se deje constancia del cumplimiento de las metas contractuales y de la finalización de la etapa de operación, indicando expresamente que, a partir de dicha fecha, no se requerirá la realización de comités operativos, ni la presentación de informes mensuales, ni demás obligaciones asociadas, como facturación periódica y seguimiento de indicadores.

El director de interventoría acoge la recomendación y concluye que no es necesario realizar un comité adicional para formalizar este cierre, sino que bastará con la emisión de la certificación correspondiente dirigida al ejecutor, en la que se deje constancia del cumplimiento de las metas y de la terminación de las obligaciones mensuales asociadas.

6.4 Visitas en campo

Frente a las visitas en campo programadas para los meses mencionados, a continuación, se presentan las regiones y la cantidad de visitas realizadas, discriminadas por departamento y municipio.

Cabe destacar que, a partir de mayo de 2025, se iniciaron las visitas de calidad, las cuales están previstas hasta completar un total de 3.300 visitas, adicionales a las 1.100 visitas de aprobación.

Asimismo, se informa que durante el mes de agosto de 2025 se finalizaron la totalidad de las visitas programadas (tanto de calidad como de aprobación).


Mes	Región	Departamento	Municipio	Cantidad de Visitas Programadas	Cantidad de Visitas Ejecutadas	Tipo de Visita
Marzo 2025	39	Cundinamarca	Tena	27	43	Aprobación
	25	Meta	Puerto López	48	74	Aprobación
	20	Meta	Vistahermosa	70	88	Aprobación
	27	Nte. De Santander	Cachirá	54	0	Aprobación
	37	Tolima	Chaparral	67	60	Aprobación
	36	Tolima	Purificación	43	35	Aprobación
Abril 2025	4	Atlántico	Sabanalarga	115	149	Aprobación
	5	Atlántico	Galapa	35	33	Aprobación
	6	Atlántico	Luruaco	100	69	Aprobación
	15	Cesar	Pailitas	85	0	Aprobación
	15	Cesar	Curumani	0	84	Aprobación

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	16	Cesar	Bosconia	85	85	Aprobación
	17	Cesar	San Alberto	85	83	Aprobación
Mayo 2025	21	Magdalena	Plato	125	127	Aprobación
	22	Magdalena	Fundación	125	125	Aprobación
	24	Magdalena	Santa Ana	48	52	Aprobación
	Total visitas de aprobación			**1.112**	**1.107**	
	7	Bolivar	Cicuco	81	83	Calidad
	7	Bolivar	Talaigua nuevo	81	82	Calidad
	24	Magdalena	Santa Ana	40	40	Calidad
Junio 2025	32	Sucre	Coveñas	120	121	Calidad
	32	Sucre	Ovejas	120	121	Calidad
	32	Sucre	San Onofre	60	62	Calidad
	14	Casanare	Paz de Ariporo	300	300	Calidad
	19	Córdoba	Tuchin	300	300	Calidad
	29	Putumayo	Puerto Asis	70	104	Calidad
	29	Putumayo	Villagarzon	150	116	Calidad
	29	Putumayo	Puerto Caicedo	80	80	Calidad
Julio 2025	23	Magdalena	Salamina	70	71	Calidad
	23	Magdalena	Pivijay	230	230	Calidad
	18	Córdoba	Cerete	140	141	Calidad
	18	Córdoba	San Carlos	30	32	Calidad
	18	Córdoba	Planeta Rica	130	131	Calidad
	30	Risaralda	Quinchía	190	172	Calidad
	30	Risaralda	Guática	70	83	Calidad
	30	Risaralda	La Celia	40	45	Calidad
Agosto 2025	8	Bolívar	Arjona	150	150	Calidad
	8	Bolívar	Arroyohondo	25	25	Calidad
	8	Bolívar	Clemencia	25	25	Calidad
	8	Bolívar	Mahates	50	0	Calidad
	8	Bolívar	San Cristóbal	25	25	Calidad
	8	Bolívar	San Estanislao	25	25	Calidad
	20	Meta	El Castillo	25	0	Calidad
	20	Meta	Fuente De Oro	25	0	Calidad
	20	Meta	Granada	130	88	Calidad
	20	Meta	lejanías	25	0	Calidad
	20	Meta	San Juan De Arama	20	0	Calidad
	25	Meta	Castilla La Nueva	25	0	Calidad
	25	Meta	Guamal	25	0	Calidad
	25	Meta	San Martin	25	25	Calidad
	4	Atlántico	Palmar De Varela	30	0	Calidad
	4	Atlántico	Sabanagrande	30	0	Calidad
	4	Atlántico	Santo Tomas	90	0	Calidad
	5	Atlántico	Malambo	90	70	Calidad
	6	Atlántico	Campo De La Cruz	30	30	Calidad
	26	N. Santander	El Zulia	75	74	Calidad
	26	N. Santander	San Cayetano	25	0	Calidad
TOTAL, VISITAS DE CALIDAD				**3.302**	**3.330**	
TOTAL, APROBACIÓN Y CALIDAD				**4.414**	**4.437**	

6.5 Llamadas telefónicas

Con corte al presente comité, la interventoría ha llevado a cabo un total de **65.367** llamadas a los usuarios beneficiarios del proyecto. Estas comunicaciones telefónicas tienen como propósito principal validar la calidad del servicio de internet brindado, a fin de garantizar que se estén cumpliendo los estándares establecidos en los lineamientos técnicos y contractuales.

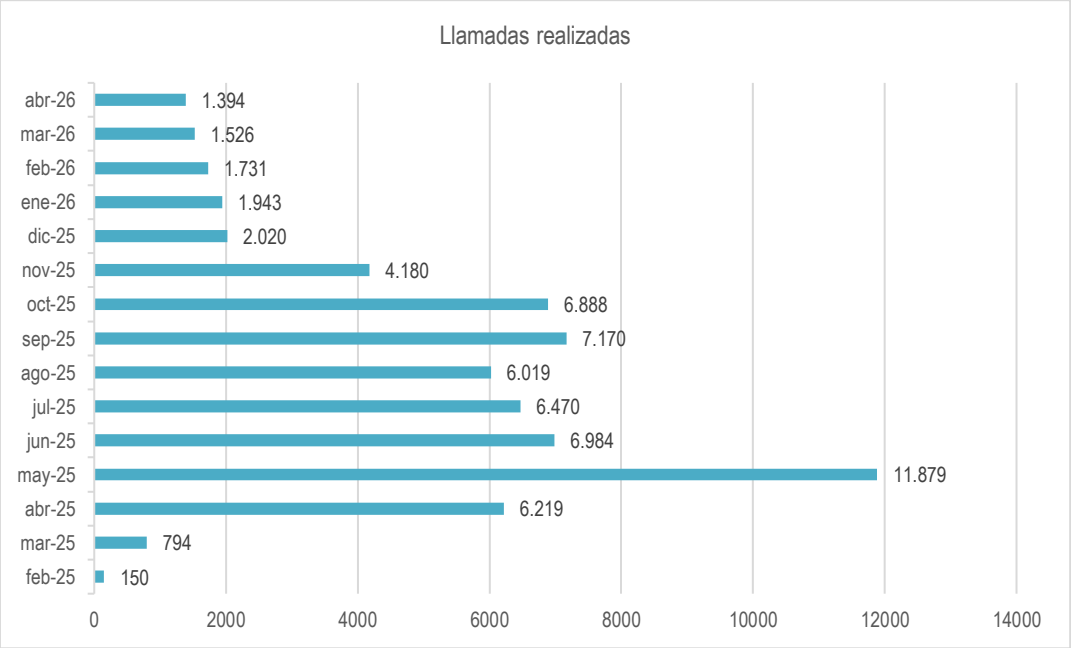

7 Estado de pagos

En relación con el estado de pagos para las regiones, a continuación, se expone el consolidado de pagos generados a las 25 regiones objeto del contrato de interventoría 2194-2024

CONSOLIDADO DE PAGOS POR REGIÓN

REGION	EJECUTOR	VALOR TOTAL CAPEX REGIONES	PAGO APROBADO	LIBERACIÓN
4	SPACE COMUNICACIONES S.A.S	$ 1.596.613.584	$ 1.596.573.045	$ 40.539
5	EME INGENIERIA S.A. BIC.	$ 1.375.059.312	$ 1.374.547.832	$ 511.480
6	EME INGENIERIA S.A. BIC.	$ 1.083.888.216	$ 1.083.888.216	$ 0
7	DIGINORTE S.A.S.	$ 521.872.104	$ 521.421.293	$ 450.811
8	HIZ TELECOMUNICACIONES S.A.S.	$ 1.880.670.552	$ 1.880.670.552	$ 0
14	UT FOMENTO CASANARE 2.0	$ 675.842.160	$ 673.552.617	$ 2.289.543
15	INTERMEGAMUNDO PARTNERS S.A.S.	$ 1.181.453.400	$ 1.181.420.312	$ 33.088
16	UNIÓN TEMPORAL FIBRANOVATEL -UC7	$ 1.158.078.408	$ 1.157.374.195	$ 704.213
17	UNION TEMPORAL MEGAINTERCONECTA 2	$ 1.229.727.840	$ 1.229.727.840	$ 0
18	UNIÓN TEMPORAL CONECTANDO REGIONES SRCC	$ 2.159.137.848	$ 2.155.409.666	$ 3.728.182
19	UT CONECTANDO BAJO SINU	$ 1.084.396.368	$ 1.084.396.368	$ 0
20	PUNTO RED TELECOMUNICACIONES SAS	$ 1.539.192.408	$ 1.539.191.597	$ 811
21	CF INGENIEROS SAS	$ 1.090.494.192	$ 1.090.494.192	$ 0
22	UNIÓN TEMPORAL CONECTANDO REGIONES SRCC	$ 1.986.366.168	$ 1.986.098.660	$ 267.508
23	UNIÓN TEMPORAL FIBERCOL UC6	$ 1.173.831.120	$ 1.173.831.120	$ 0
24	UNIÓN TEMPORAL UNA COLOMBIA 5	$ 1.292.230.536	$ 1.292.225.151	$ 5.385
25	UNIÓN TEMPORAL INTERSOCIAL META	$ 718.018.776	$ 718.018.776	$ 0
26	UT FOMENTO DEL NORTE	$ 706.839.432	$ 704.951.787	$ 1.887.645
27	UT FOMENTO DEL NORTE	$ 649.926.408	$ 649.894.604	$ 31.804
29	REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NET I.S.P S.A.S.,	$ 1.304.426.184	$ 1.304.426.184	$ 0
30	SÚPER REDES S.A.S	$ 387.719.976	$ 387.719.976	$ 0
32	UNIÓN TEMPORAL CONECTANDO REGIONES SRCC	$ 1.331.866.392	$ 1.331.216.854	$ 649.538

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

36	UNION TEMPORAL ASINTEL UC	$ 683.972.592	$ 683.972.592	$ 0
37	NETWORKS TV S.A.S	$ 813.551.352	$ 813.467.999	$ 83.353
39	UNIÓN TEMPORAL INTERSOCIAL CUNDINAMARCA	$ 327.249.888	$ 327.249.888	$ 0
TOTAL		**$ 27.952.425.216**	**$ 27.941.741.316**	**$ 10.683.900**

Referente al estado actual de los documentos requisitos de pago se indica el estado actual de cumplimiento de cada región frente al o los pagos pendientes por tramitar

RESUMEN	
NA: No Aplica	2
S: En subsanación	8
R: En revisión	13
SE: Sin entregar	0
OK: APROBADO	427

Región	INFORMES															
	Oct- Dic 24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	Dic.25	ene-26	feb-26	mar-26
Región 4	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 5	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 6	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 7	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 8	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 14	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 15	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 16	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NA
Región 17	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 18	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 19	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 20	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 21	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 22	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 23	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 24	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NA
Región 25	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 26	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R	R
Región 27	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R	R
Región 29	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R	OK
Región 30	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 32	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 36	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 37	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 39	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S

8 Informes de posible incumplimiento

El componente jurídico de la interventoría expone la relación de Informes de posible incumplimiento que se han emitido, indicando región, numero de comunicado fecha, tema y tasación tal como se evidencia a continuación

REGIÓN	INFORME DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO	FECHA	TEMA	TASACIÓN	TOTAL TASACIONES	SUPERACIÓN
8	LFF2-INTV-DIRINFRA-00010-25 (251120461)	18/09/2025	Respuesta a Requerimiento	$17.344.787,70	$29.195.263,75	Parcialmente superado

	LFF2-INTV-DIRINFRA-00014-25 (251129596)	10/10/2025	Informes	$11.850.476,05		Superado
26	LFF2-INTV-DIRINFRA-00001-25 (251082544)	10/07/2025	Metas	$7.143.586,09	$39.451.462,40	Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00003-25 (251111224)	28/08/2025	Registro (logs)	$20.502.828,52		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00006-25 (251115061)	8/09/2025	Informes	$9.756.237,85		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00011-25 (251127417)	6/10/2025	Informes	$1.024.404,97		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00015-25 (251132896)	20/10/2025	Informes	$1.024.404,97		Superado
27	LFF2-INTV-DIRINFRA-00004-25 (251111902)	29/08/2025	Registro (logs)	$18.853.175,65	$35.415.985,05	Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00007-25 (251117436)	11/09/2025	Metas	$7.143.586,09		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00008-25 (251117593)	11/09/2025	Informes	$7.706.637,25		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00012-25 (251128211)	8/10/2025	Informes	$856.293,03		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00016-25 (251132897)	20/10/2025	Informes	$856.293,03		Superado
29	LFF2-INTV-DIRINFRA-00002-25 (251099528)	30/07/2025	Informes	$11.939.827,77	$53.950.332,90	Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00013-25 (251128212)	8/10/2025	Informes	$2.100.525,26		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00017-25 (251132898)	20/10/2025	Informes	$2.100.525,26		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00018-25 (251156188)	17/12/2025	Respuesta a Requerimiento y mantenimiento	$37.809.454,61		Superado
36	LFF2-INTV-DIRINFRA-00005-25 (251112325)	1/09/2025	Registro (logs)	$19.825.292,52	$29.154.841,94	Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00009-25 (251117880)	12/09/2025	Informes	$9.329.549,42		Superado

El director de interventoría informa que, en relación con los informes de presunto incumplimiento, actualmente se cuenta con el correspondiente a la región 8, y que, posiblemente, se incluya uno adicional asociado a la no firma de las cuatro actas de comité operativo y de seguimiento que aún se encuentran pendientes.

Asimismo, señala que la región 8 ha solicitado información sobre el estado de cierre del presunto incumplimiento relacionado con los informes, manifestando su preocupación debido a que, en los comités, se ha indicado que el tema se encuentra en gestión o en trámite. En ese sentido, resalta que el interés del ejecutor de conocer con claridad si, al interior del Ministerio, dicho informe ya fue cerrado o cuál es su estado actual.

9 Varios

9.1 Socialización de PQRS

El director de interventoría informa que, en relación con la región 18, sostuvo comunicación con Julio Puentes (representante legal región 22), quien señaló que, si bien se realizó un pago parcial tal como lo había indicado el Sr Federico mediante correo, no se cumplieron las fechas pactadas inicialmente.

En ese sentido, el representante legal de la región 18 manifestó que ya se encuentran en contacto con Sr Federico para elaborar y suscribir un documento entre las partes, en el que se establezcan de manera clara las nuevas fechas de pago.

9.2 Facturación a beneficiarios región 26 – 27

El líder del equipo de MinTIC solicita a la interventoría revisar nuevamente el tema de las llamadas realizadas a los usuarios, con el fin de fortalecer los mecanismos de control frente a la novedad identificada en el último comité. Asimismo, pide verificar las acciones correctivas implementadas por el operador, dado que la situación genera especial preocupación.

El director de interventoría informa que, respecto a la inquietud presentada sobre la facturación, se evidenció un caso en el que un usuario manifestó haber recibido el servicio durante cuatro meses, lo cual coincide con las cinco facturas reportadas por el ejecutor. En este sentido, explica que, cuando el ejecutor no reporta

oportunamente la novedad de retiro, debe posteriormente reponer el tiempo no prestado, distribuyéndolo entre los usuarios de las metas correspondientes, conforme a los lineamientos establecidos.
Adicionalmente, señala que la identificación de estas situaciones se dificulta, ya que las llamadas a los usuarios se realizan una sola vez y, si el usuario responde, no se vuelve a contactar. Por ello, el esfuerzo actual se concentra en los usuarios que no han respondido, buscando alcanzar la mayor cobertura posible dentro del universo de beneficiarios.
Desde el equipo de apoyo a la supervisión en vocería del Sr armando calderón se reconoce como positivo que no se evidencien facturaciones superiores al tiempo real de prestación del servicio; no obstante, se advierte la necesidad de reforzar el control sobre el reporte de novedades, ya que, aunque los ejecutores suelen indicar que no existen novedades, posteriormente se identifican tiempos muertos que evidencian tiempos sin prestación del servicio.
Por otra parte, **el director de interventoría** advierte que, en las regiones 26 y 27, el incumplimiento en el reporte de novedades, sumado a los tiempos de indisponibilidad, reposición y compensación, podría extender la ejecución más allá de diciembre de 2026. Esto se debe a que las compensaciones acumuladas, junto con las que se generen en los meses restantes por medición de indicadores, incrementarán los tiempos de cumplimiento.
Ante este panorama, **el líder del equipo de MinTIC** propone la implementación de un plan de choque para estas regiones, con el fin de evitar mayores desviaciones en los tiempos de ejecución. Asimismo, desde el equipo de apoyo se recomienda establecer mecanismos adicionales de seguimiento, como reuniones periódicas entre comités, que permitan ejercer mayor control sobre el operador y mitigar el riesgo de ampliación de los plazos.
El director de interventoría se compromete a fortalecer el seguimiento durante la etapa preliminar a la emisión de los conceptos finales de indicadores, de manera que, en caso de identificarse altos niveles de indisponibilidad, se puedan realizar mesas de trabajo con el ejecutor y líder del equipo MinTic para revisar las causas y tomar acciones correctivas oportunas, esto en pro de mitigar la acumulación de tiempos de reposición y compensación que puedan afectar el cierre de la vigencia.

9.3 Respuesta relacionada con la aclaración de los tiempos de reposición y compensación.
El abogado de MinTIC informa que se realizó nuevamente la socialización con la misma firma con la que se trabajó el tema de la región 8, en la cual se abordaron las inquietudes planteadas por la interventoría. Asimismo, se contextualizó a la firma sobre el desarrollo técnico relacionado con las compensaciones y las disposiciones establecidas en el numeral 3.5.
Señala que la semana anterior se llevó a cabo una reunión en la que se brindó una explicación clara y estructurada; sin embargo, la firma aún se encuentra analizando la información y no ha emitido una respuesta de fondo. En ese sentido, se mantienen a la espera de un pronunciamiento formal o de la manifestación de dudas específicas que requieran una nueva sesión de aclaración, considerando la complejidad técnica del tema.
Finalmente, indica que se continúa realizando seguimiento, dada la prioridad del asunto, el director de interventoría indica que se encuentran disponibles para programar una nueva reunión en caso de ser necesario para resolver inquietudes adicionales.

9.4 Creación de estrategias para regiones próximas a finalizar
El líder del equipo de MinTIC solicita que, teniendo en cuenta lo evidenciado en el último comité operativo y de seguimiento No. 18, donde se prevé la pronta culminación de las metas en las regiones 21, 39, 17 y 25, se implementen mecanismos de apoyo que faciliten el cierre de estas regiones. Indica que, dado que se encuentran en la etapa final, es necesario impulsar acciones que permitan completar la “última milla” y evitar

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

que en el próximo comité se mantengan pendientes mínimos, como una o dos facturas o ajustes asociados a la reposición de la meta 3.

En este sentido, propone fortalecer el acompañamiento y la articulación con los ejecutores, de manera que se logre avanzar de forma efectiva en el cierre de estas regiones adicionales a las ya previstas para el mes en curso.

Por su parte, **el director de interventoría** señala que esta directriz ya hace parte de la gestión interna, indicando que se viene realizando seguimiento a las regiones que presentan pendientes mínimos, con el fin de lograr la radicación de las facturas faltantes. Asimismo, informa que durante la semana anterior se recibieron facturaciones de varias regiones, entre ellas la 7, 21, 23 y 24, como parte de este esfuerzo.

Finalmente, reitera que el cierre de estas resoluciones es una prioridad y que se continuará con el acompañamiento directo a cada región, con el objetivo de lograr el cierre de al menos cuatro o cinco regiones en las próximas semanas.

10 Cierre

En la presente acta se deja constancia de la reunión que se llevó a cabo entre la interventoría y responsable MINTIC, como consta la PPT presentada

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN A EJECUTAR	**RESPONSABLE DE EJECUCIÓN**	**FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN**
NA	NA	NA

REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE COMPLETO	**CARGO**	**FIRMA**
María Carolina Zúñiga Hernández	Directora Infraestructura	
Cesar Polo	Líder del equipo del MinTIC	
Juan Barrero	Director de Interventoría	

Anexos

- PPT Reunión de seguimiento No 15



TIC

TIC

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2169 -2024

REUNIÓN SEGUIMIENTO No. 15

Abril 2026

CONSORCIO INTER-LÍNEAS 2.0

Temas

- Seguimiento compromisos anteriores
- Estado documental
- Informes de interventoría
- Estado pago interventoría
- Fase del proyecto (planeación- instalación- operación)
- Finalización operación metas
- Finalización resoluciones
- Estado pagos resoluciones
- Estado revisión informes mensuales ejecutores
- Informes de posible incumplimiento
- Varios

TIC

"Ejercer la Interventoría a las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras, y administrativas requeridas para la vigilancia y el seguimiento integral de la ejecución del proyecto Líneas de Fomento 2.0 de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico"

- Firma Contrato: 27 de diciembre de 2024
- Acta de Inicio: 31 de diciembre de 2024
- Inicio de Actividades: 31 de diciembre de 2024
- Fecha Terminación: 31 de julio de 2026
- Otrosí No 2: 01 de enero de 2026
- Valor: $5.143.899.395
- Estado: Activo y en ejecución



TIC

Seguimiento compromisos anteriores

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
N/A	N/A	N/A

Estado documental – Actas comités operativos

Región	Ene-25	Feb-25	Mar-25	Abr-25	May-25	Jun-25	Jul- 25	Ago-25	Sept-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-,2026	Feb-26	Mar-26	Abr-26
Región 4	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 5	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 6	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 7	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 8	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Pte. Firmas	Pte. Firmas	Pte. Firmas	Pte. Firmas	Ejecutada
Región 14	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 15	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 16	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 17	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 18	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 19	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 20	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 21	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 22	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 23	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 24	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 25	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 26	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 27	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 29	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 30	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 32	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 36	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 37	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 39	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada

Estado documental – actas de seguimiento

Mes	Fecha	Estado	Observaciones
Febrero-25	19/02/2025	Firmado	
Marzo-25	17/03/2025	Firmado	
Abril-25	16/04/2025	Firmado	
Mayo-25	14/05/2025	Firmado	
Junio-25	20/06/2025	Firmado	
Julio-25	29/07/2025	Firmado	
Agosto-25	21/08/2025	Firmado	
Septiembre-25	24/09/2025	Firmado	
Octubre-25	29/10/2025	Firmado	
Noviembre -25	28/11/2025	Firmado	
Diciembre -25	29/12/2025	Firmado	
Enero-26	29/01/2026	Firmado	
Febrero-26	26/02/2026	Firmado	
Marzo-26	26/03/2026	Firmado	
Abril-26	24/04/2026	Programada	

Informes de interventoría

Mes	Radicado	Fecha radicado	Estado	Radicado
Enero-25	251013659	07/02/2025	Aprobado	252029280
Febrero-25 v2	251036136	31/03/2025	Aprobado	252057282
Marzo-25 v2	251047458	25/04/2025	Aprobado	252066925
Abril-25 v2	251061902	26/05/2025	Aprobado	252091575
Informe periodo 1 v2	251067146	06/06/2025	Aprobado	252089964
Mayo-25-v2	251077238	01/07/2025	Aprobado	252107540
Junio-25-v2	251095869	28/07/2025	Aprobado	252120665
Julio-25-v2	251109083	25/08/2025	Aprobado	252153658
Agosto-25-v2	251123498	26/09/2025	Aprobado	252171011
Septiembre-25-v2	251134014	22/10/2025	Aprobado	252179032
Octubre-25-v2	251147895	25/11/2025	Aprobado	252200630
Noviembre-25-v1	251151010	3/12/2025	Aprobado	252204835
Diciembre-25-v2	251130240	30/12/2026	Aprobado	262026687
Enero-26-v2	261022384	04/03/2026	Aprobación	262052796
Febrero-26-v2	261030402	26/03/2026	Aprobación	262068069
Marzo-26-v1	261035750	9/04/2026	Con observaciones	262071076
Marzo-26-v2	261042576	24/04/2026	En revisión	

Estado pagos de interventoría

VALOR HASTA	PORCENTAJE	CONCEPTO	ESTADO
$ 1.117.278.416	21,72%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 1) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 257429925 2025-07-11
$ 985.078.317	19,15%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 2) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 240380625 2025-07-11
$ 576.181.089	11,2%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 3) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 298756225 2025-08-22
$ 576.181.090	11,2%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 4) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 426918025 2025-11-10.
$ 384.120.724	7,46%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 5) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 544979025 2025-12-29.
$ 192.060.364	3,73%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 6) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 75090126 2026-03-16
$375.142.684	7,29%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 7) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico. (iii) Soporte de pago del impuesto sobre el valor total de la adición de acuerdo con las instrucciones establecidas en la Circular Externa 010 del 05 de marzo de 2025 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	LFF2-INTV-DIRINFRA-04605-26 el 14/04/2026 radicado 261037432
$375.142.684	7,29%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 8) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PENDIENTE
$562.714.027	10,94	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 9) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PENDIENTE
$5.143.899.395	**100%**		

Fase de planeación

Región	Ejecutor	Repositorio información	IDIO	Plan Comercialización	Plan Instalación	Plan Mantenimiento
Región 4	SPACE COMUNICACIONES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 5	EME INGENIERIA	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 6	EME INGENIERIA	A conformidad ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 7	DIGINORTE	A conformidad ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 8	HIZ TELECOMUNICACIONES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 14	UT FOMENTO CASA	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 15	INTERMEGAMUNDO	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 16	UT FIBRANOVATEL -UC7	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 17	UT MEGAINTERCONECTA 2	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 18	UT CONECTANDO REGIONES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 19	UT CONECTANDO BAJO	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 20	PUNTO RED TELECOM	A conformidad ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 21	CF INGENIEROS	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 22	UT CONECTANDO REGIONES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 23	UT FIBERCOL UC6	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 24	UT UNA COLOMBIA 5	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 25	UT INTERSOCIAL META	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 26	UT FOMENTO NORTE	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 27	UT FOMENTO NORTE	A conformidad ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 29	NET I.S.P	A conformidad ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 30	SÚPER REDES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 32	UT CONECTANDO REGIONES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 36	UT ASINTEL UC	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 37	NETWORKS TV	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 39	UT INTERSOCIAL CUNDI	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑

Fase de instalación

Región	Metas	Aprobados	Finalizado	Rechazados	En Subsanación	En Revisión	Total
Región 4	3.142	3.142	0	81	0	0	3.142
Región 5	2.706	2.706	0	4	0	0	2.706
Región 6	2.133	2.133	0	2	0	0	2.133
Región 7	1.027	976	513	1	0	0	1.027
Región 8	3.701	3.701	0	2	0	0	3.701
Región 14	1.330	1.264	66	11	0	0	1.330
Región 15	2.325	1.163	1.162	4	0	0	2.325
Región 16	2.279	2.165	2.279	13	0	0	2.279
Región 17	2.420	2.299	1210	50	0	0	2.420
Región 18	4.249	4.249	0	14	0	0	4.249
Región 19	2.134	2.027	107	1	0	0	2.134
Región 20	3.029	2.878	151	1	0	0	3.029
Región 21	2.146	2.039	2.146	9	0	0	2.146
Región 22	3.909	3.909	0	71	0	0	3.909
Región 23	2.310	2.310	0	11	0	0	2.310
Región 24	2.543	1.272	1.271	5	0	0	2.543
Región 25	1.413	1.413	0	9	0	0	1.413
Región 26	1.391	1.391	0	52	0	0	1.391
Región 27	1.279	1.279	0	40	0	0	1.279
Región 29	2.567	2.567	0	84	0	0	2.567
Región 30	763	763	0	3	0	2	763
Región 32	2.621	2.621	131	20	0	0	2.621
Región 36	1.346	1.346	0	22	0	0	1.346
Región 37	1.601	1.521	80	0	0	0	1.601
Región 39	644	643	0	1	0	2	644
	55.008	**51.777**	**8.027**	**511**	**0**	**4**	**55.008**

Fase de operación

Región	Accesos meta	Accesos meta 1	Inicio operación meta 1	Accesos meta 2	Inicio operación meta 2	Accesos meta 3	Inicio operación meta 3
Región 4	3.142	157	29/11/24	1.414	11/03/25	1.571	19/06/2025
Región 5	2.706	135	1/02/25	1.218	2/05/25	1.353	01/07/2025
Región 6	2.133	107	3/03/25	960	7/06/25	1.067	01/08/2025
Región 7	1.027	51	29/11/24	462	7/03/25	514	29/04/2025
Región 8	3.701	185	29/11/24	1.665	1/04/25	1.851	30/09/2025
Región 14	1.330	66	7/12/24	599	24/02/25	665	01/04/2025
Región 15	2.325	116	1/12/24	1.046	1/12/24	1.163	01/04/2025
Región 16	2.279	114	30/11/24	1.026	5/03/25	1.139	28/05/2025
Región 17	2.420	121	21/12/24	1.089	21/12/24	1.210	08/04/2025
Región 18	4.249	212	3/12/24	1.912	30/04/25	2.125	01/08/2025
Región 19	2.134	107	6/12/24	960	1/04/25	1.067	25/06/2025
Región 20	3.029	151	29/11/24	1.363	30/04/25	1.515	27/06/2025
Región 21	2.146	107	29/11/24	966	24/04/25	1.073	01/07/2025
Región 22	3.909	195	3/12/24	1.759	12/05/25	1.955	18/07/2025
Región 23	2.310	116	4/12/24	1.040	12/05/25	1.154	01/07/2025
Región 24	2.543	127	29/11/24	1.144	26/03/25	1.272	30/05/2025
Región 25	1.413	71	1/02/25	636	7/03/25	706	01/04/2025
Región 26	1.391	70	11/03/25	626	12/06/25	695	30/10/2025
Región 27	1.279	64	11/03/25	576	24/06/25	640	27/10/2025
Región 29	2.567	128	10/03/25	1.155	28/05/25	1.284	27/08/2025
Región 30	763	38	1/02/25	343	7/03/25	382	29/04/2025
Región 32	2.621	131	3/12/24	1.179	20/05/25	1.311	30/07/2025
Región 36	1.346	67	7/04/25	606	3/06/25	673	14/08/2025
Región 37	1.601	80	7/12/24	720	13/03/25	801	25/04/2025
Región 39	644	32	21/02/25	290	11/03/25	322	29/04/2025
	55.008	**2.748**		**24.754**		**27.506**	

Finalización operación metas

Región	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Observaciones
Región 4	Finalizada	Finalizada	En operación	Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación meta 1 Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación meta 2
Región 5	Con concepto finalización	En operación	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG16-04229-26 / 261017960
Región 6	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación meta 1
Región 7	Con concepto finalización	Con concepto finalización	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG07-03992-26 / 261006468 Concepto fin meta 2: LFF2-INTV-REG07-04686-26 / 261042651
Región 8	Finalizada	Finalizada	En operación	Pendiente entrega de facturas meta 1 Pendiente entrega de facturas meta 2
Región 14	Con concepto finalización	Finalizada	Finalizada	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG14-04239-26 / 261018671 Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación meta 2
Región 15	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Finalizada	Concepto fin metas 1 y 2: LFF2-INTV-REG15-04190-26 / 261016577
Región 16	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG16-04229-26 / 261017960 Concepto fin meta 2: LFF2-INTV-REG16-04488-26 / 261030576 Concepto fin meta 3: LFF2-INTV-REG16-04562-26 / 261034203
Región 17	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Finalizada	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG17-04354-26 / 261021883 Concepto fin meta 2: LFF2-INTV-REG17-04619-26 / 261039180 Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación meta 3
Región 18	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación meta 1
Región 19	Con concepto finalización	Finalizada	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG19-04228-26 / 261017959
Región 20	Con concepto finalización	En operación	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG20-03991-26 / 261006201
Región 21	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG21-03940-26 / 261003727 Concepto fin meta 2: LFF2-INTV-REG21-04674-26 / 261042571 Concepto fin meta 3: LFF2-INTV-REG21-04675-26 / 261042572

Finalizadas: 50
En Operación: 25
Finalizadas con concepto: 20

Finalización operación metas

Región	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Observaciones
Región 22	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación meta 1
Región 23	Finalizada	Finalizada	Finalizada	Pendiente entrega de facturas reposición y compensación metas 1, 2 y 3
Región 24	Con concepto finalización	Con concepto finalización	Finalizada	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG24-03725-25 / 251156256 Concepto fin meta 2: LFF2-INTV-REG24-04430-26 / 261025942 Pendiente entrega de algunas facturas con compensación meta 3
Región 25	Finalizada	Finalizada	Finalizada	Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación metas 1 y 2
Región 26	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación meta 1
Región 27	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación meta 1
Región 29	Finalizada	Finalizada	En operación	Pendiente entrega de facturas con compensación meta 1 Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación meta 2
Región 30	Finalizada	Finalizada	En operación	Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación metas 1 y 2
Región 32	Con concepto finalización	En operación	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG32-04685-26 / 261042589
Región 36	Finalizada	Finalizada	En operación	Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación meta 1
Región 37	Con concepto finalización	Finalizada	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG37-04227-26 / 261017958 Pendiente entrega de facturas con reposición y compensación meta 2
Región 39	Finalizada	Finalizada	En operación	Pendiente entrega de facturas con reposición metas 1 y 2

Finalizadas: 50
En Operación: 25
Finalizadas con concepto: 20

Finalización resoluciones

ENERO 2026		
Región	Fecha fin resolución	Tiempo adicional estimado
16	31/01/26	1 mes
24	31/01/26	15 días

FEBRERO 2026		
Región	Fecha fin resolución	Tiempo adicional estimado
21	28/02/26	2.5 meses
23	28/02/26	1 mes

MARZO 2026		
Región	Fecha fin resolución	Tiempo adicional estimado
14	31/03/26	2 meses
15	31/03/26	1 mes
25	31/03/26	2.5 meses

ABRIL 2026		
Región	Fecha fin resolución	Tiempo adicional estimado
7	30/04/26	3 meses
29	30/04/26	3 meses
30	30/04/26	1 mes
37	30/04/26	5 meses
39	30/04/26	1 mes

JUNIO 2026		
Región	Fecha fin resolución	Tiempo adicional estimado
4	30/06/26	Pendiente
5	30/06/26	Pendiente
19	30/06/26	Pendiente
20	30/06/26	Pendiente
36	31/05/25 (13/06/26)*	Pendiente

JULIO 2026		
Región	Fecha fin resolución	Tiempo adicional estimado
6	31/07/26	Pendiente
18	31/07/26	Pendiente
22	30/06/25 (17/07/26)*	Pendiente
32	31/07/26	Pendiente

SEPTIEMBRE 2026		
Región	Fecha fin resolución	Tiempo adicional estimado
8	30/09/26	Pendiente

OCTUBRE 2026		
Región	Fecha fin resolución	Tiempo adicional estimado
26	30/06/25 (29/10/26)*	Pendiente
27	31/08/25 (26/10/26)*	Pendiente

* Regiones con accesos reportados después de fecha fin de prórroga. Las fechas mostradas corresponden al fin de operación (10 meses para R36 y 12 meses para R22, R26 y R27)

Liquidación resoluciones

Región	Fecha fin resolución	Informe final	Informe Cumplimiento	Documentación digital	META 1		META 2		META 3	
					Fecha fin	Estado	Fecha fin	Estado	Fecha fin	Estado
Región 4	30/06/26				28/11/2025	F	10/03/2026	F	18/06/2026	
Región 5	30/06/26				31/01/2026	C	01/05/2026		30/06/2026	
Región 6	31/06/26				02/03/2026	F	06/06/2026		31/07/2026	
Región 7	30/04/26		P		28/11/2025	C	06/03/2026	C	28/04/2026	
Región 8	30/09/26				28/11/2025	F	31/03/2026	F	29/9/2026	
Región 14	31/03/26		P		6/12/2025	C	23/02/2026	F	31/03/2026	F
Región 15	31/03/26		P		30/11/2025	C	30/11/2025	C	31/03/2026	F
Región 16	28/02/26	R	OK	OK	29/07/2025	C	4/11/2025	C	27/01/2026	C
Región 17	30/04/26		P		20/12/2025	C	20/12/2025	C	07/04/2026	F
Región 18	31/07/26				2/12/2025	F	29/04/2026		31/07/2026	
Región 19	30/06/26				5/12/2025	C	31/03/2026	F	24/06/2026	
Región 20	30/06/26				28/11/2025	C	29/04/2026		26/06/2026	
Región 21	15/05/26		OK		28/07/2025	C	23/12/2025	C	28/02/2026	C
Región 22	30/06/26				2/12/2025	F	11/05/2026		17/07/2026	
Región 23	31/03/26	R	OK	OK	03/08/2025	F	11/01/2026	F	28/02/2026	F
Región 24	15/02/26	R	OK	OK	28/07/2025	C	25/11/2025	C	31/01/2026	F
Región 25	31/03/26		P		31/01/26	F	06/03/2026	F	31/03/2026	F
Región 26	30/06/26				10/03/2026	F	11/06/2026		29/10/2026	
Región 27	31/08/26				10/03/2026	F	23/06/2026		26/10/2026	
Región 29	30/04/26				9/11/2025	F	27/01/2026	F	26/04/2026	
Región 30	30/04/26		P		31/01/2026	F	06/03/2026	F	28/04/2026	
Región 32	31/07/26				2/12/2025	C	19/05/2026		29/07/2026	
Región 36	31/05/26				06/02/2026	F	02/04/2026	F	13/06/2026	
Región 37	30/04/26				6/12/2025	C	12/03/2026	F	24/04/2026	
Región 39	30/04/26		P		20/02/2026	F	10/03/2026	F	28/04/2026	

Informe final

S: En subsanación: 0

R: En revisión: 3

SE: Sin entregar: 0

OK: APROBADO: 0

Informe Cumplimiento

P: Proceso de elaboración : 7

OK: COMPLETO: 4

Documentación digital

P: Proceso de certificación: 0

OK: APROBADO: 3

Metas

F: Meta finalizada sin concepto: 30

C: Meta finalizada con concepto: 20

Estado visitas de campo

Mes	Región	Departamento	Municipio	Cantidad de Visitas Programadas	Cantidad de Visitas Ejecutadas	Tipo de Visita
mar-25	39	Cundinamarca	Tena	27	43	Aprobación
	25	Meta	Puerto López	48	74	Aprobación
	20	Meta	Vistahermosa	70	88	Aprobación
	27	Nte. De Santander	Cachirá	54	0	Aprobación
	37	Tolima	Chaparral	67	60	Aprobación
	36	Tolima	Purificación	43	35	Aprobación
abr-25	4	Atlántico	Sabanalarga	115	149	Aprobación
	5	Atlántico	Galapa	35	33	Aprobación
	6	Atlántico	Luruaco	100	69	Aprobación
	15	Cesar	Pailitas	85	0	Aprobación
	15	Cesar	Curumani	0	84	Aprobación
	16	Cesar	Bosconia	85	85	Aprobación
	17	Cesar	San Alberto	85	83	Aprobación
may-25	21	Magdalena	Plato	125	127	Aprobación
	22	Magdalena	Fundación	125	125	Aprobación
	24	Magdalena	Santa Ana	48	52	Aprobación
	Total visitas de aprobación			**1.112**	**1.107**	
	7	Bolivar	Cicuco	81	83	Calidad
	7	Bolivar	Talaigua nuevo	81	82	Calidad
	24	Magdalena	Santa Ana	40	40	Calidad


Estado visitas de campo

Mes	Región	Departamento	Municipio	Cantidad de Visitas Programadas	Cantidad de Visitas Ejecutadas	Tipo de Visita
jun-25	32	Sucre	Coveñas	120	121	Calidad
	32	Sucre	Ovejas	120	121	Calidad
	32	Sucre	San Onofre	60	62	Calidad
	14	Casanare	Paz de Ariporo	300	300	Calidad
	19	Córdoba	Tuchin	300	300	Calidad
	29	Putumayo	Puerto Asis	70	104	Calidad
	29	Putumayo	Villagarzón	150	116	Calidad
	29	Putumayo	Puerto Caicedo	80	80	Calidad
jul-25	23	Magdalena	Salamina	70	71	Calidad
	23	Magdalena	Pivijay	230	230	Calidad
	18	Córdoba	Cerete	140	141	Calidad
	18	Córdoba	San Carlos	30	32	Calidad
	18	Córdoba	Planeta Rica	130	131	Calidad
	30	Risaralda	Quinchía	190	172	Calidad
	30	Risaralda	Guática	70	83	Calidad
	30	Risaralda	La Celia	40	45	Calidad

Estado visitas de campo

Mes	Región	Departamento	Municipio	Cantidad de Visitas Programadas	Cantidad de Visitas Ejecutadas	Tipo de Visita
ago-25	8	Bolívar	Arjona	150	153	Calidad
	8	Bolívar	Arroyohondo	25	25	Calidad
	8	Bolívar	Clemencia	25	27	Calidad
	8	Bolivar	Mahates	50	52	Calidad
	8	Bolivar	San Cristobal	25	26	Calidad
	8	Bolivar	San Estanislao	25	27	Calidad
	20	Meta	El Castillo	25	25	Calidad
	20	Meta	Fuente De Oro	25	21	Calidad
	20	Meta	Granada	130	159	Calidad
	20	Meta	Lejanias	25	20	Calidad
	20	Meta	San Juan De Arama	20	0	Calidad
	25	Meta	Castilla La Nueva	25	25	Calidad
	25	Meta	Guamal	25	25	Calidad
	25	Meta	San Martin	25	25	Calidad
	4	Atlántico	Palmar De Varela	30	31	Calidad
	4	Atlántico	Sabanagrande	30	31	Calidad
	4	Atlántico	Santo Tomas	90	91	Calidad
	5	Atlántico	Malambo	90	91	Calidad
	6	Atlántico	Campo De La Cruz	30	31	Calidad
	6	Atlántico	Candelaria	30	31	Calidad
	26	N. Santander	El Zulia	75	75	Calidad
	26	N. Santander	San Cayetano	25	25	Calidad
Total visitas de calidad				**3.302**	**3.330**	
TOTAL APROBACION Y CALIDAD				**4.414**	**4.437**	

Llamadas Realizadas

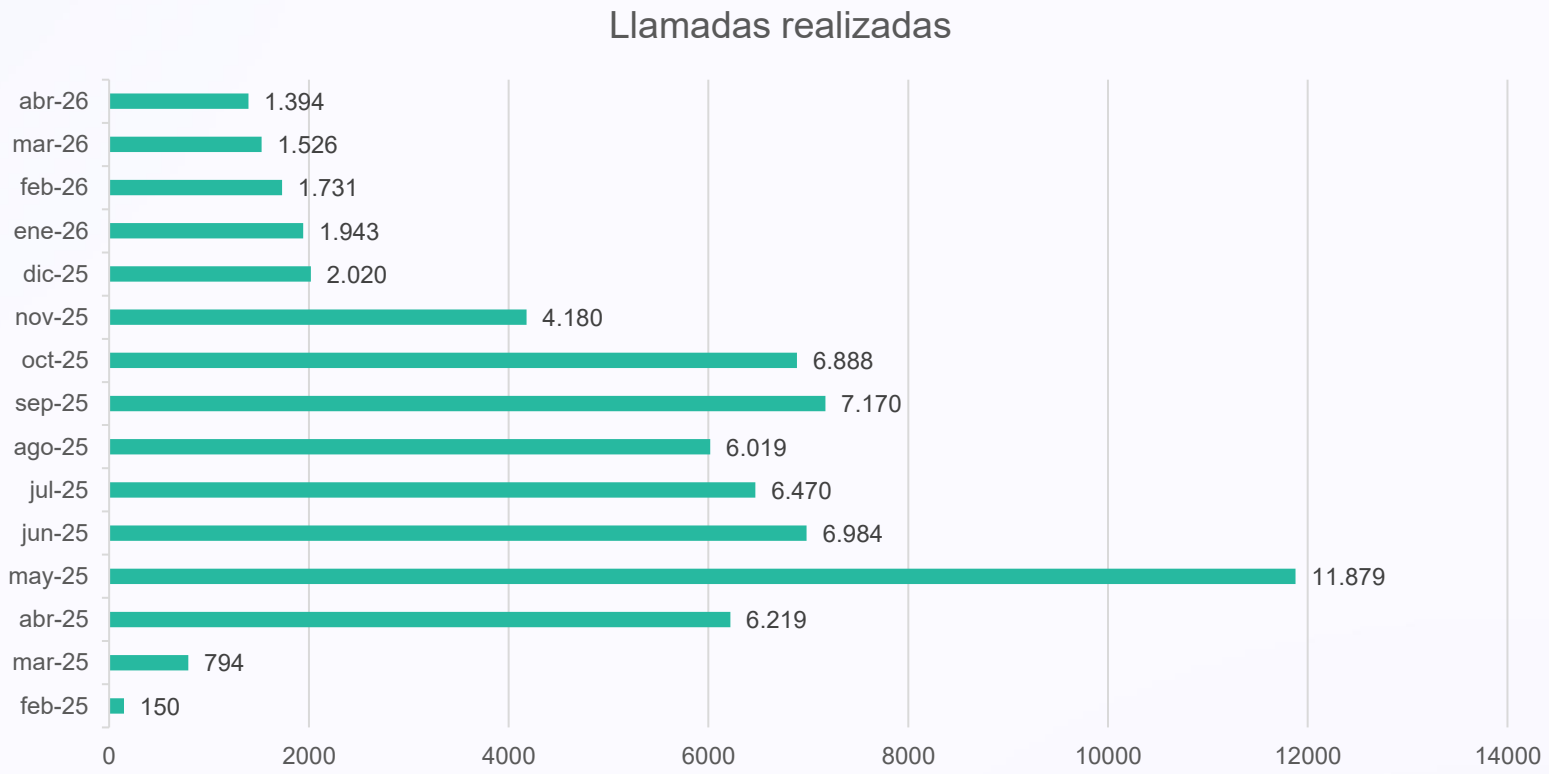

Con corte al presente comité , la interventoría ha llevado a cabo un total de **65.367** llamadas a los usuarios beneficiarios del proyecto. Estas comunicaciones telefónicas tienen como propósito principal validar la calidad del servicio de internet brindado, a fin de garantizar que se estén cumpliendo los estándares establecidos en los lineamientos técnicos y contractuales.

Consolidado de pagos

Región	Ejecutor	VALOR TOTAL CAPEX	PAGO APROBADO	LIBERACIÓN
4	SPACE COMUNICACIONES S.A.S	$ 1.596.613.584	$ 1.596.573.045	$ 40.539
5	EME INGENIERIA S.A. BIC.	$ 1.375.059.312	$ 1.374.547.832	$ 511.480
6	EME INGENIERIA S.A. BIC.	$ 1.083.888.216	$ 1.083.888.216	$ 0
7	DIGINORTE S.A.S.	$ 521.872.104	$ 521.421.293	$ 450.811
8	HIZ TELECOMUNICACIONES S.A.S.	$ 1.880.670.552	$ 1.880.670.552	$ 0
14	UT FOMENTO CASANARE 2.0	$ 675.842.160	$ 673.552.617	$ 2.289.543
15	INTERMEGAMUNDO PARTNERS S.A.S.	$ 1.181.453.400	$ 1.181.420.312	$ 33.088
16	UNIÓN TEMPORAL FIBRANOVATEL -UC7	$ 1.158.078.408	$ 1.157.374.195	$ 704.213
17	UNION TEMPORAL MEGAINTERCONECTA 2	$ 1.229.727.840	$ 1.229.727.840	$ 0
18	UNIÓN TEMPORAL CONECTANDO REGIONES SRCC	$ 2.159.137.848	$ 2.155.409.666	$ 3.728.182
19	UT CONECTANDO BAJO SINU	$ 1.084.396.368	$ 1.084.396.368	$ 0
20	PUNTO RED TELECOMUNICACIONES SAS	$ 1.539.192.408	$ 1.539.191.597	$ 811
21	CF INGENIEROS SAS	$ 1.090.494.192	$ 1.090.494.192	$ 0
22	UNIÓN TEMPORAL CONECTANDO REGIONES SRCC	$ 1.986.366.168	$ 1.986.098.660	$ 267.508
23	UNIÓN TEMPORAL FIBERCOL UC6	$ 1.173.831.120	$ 1.173.831.120	$ 0
24	UNIÓN TEMPORAL UNA COLOMBIA 5	$ 1.292.230.536	$ 1.292.225.151	$ 5.385
25	UNIÓN TEMPORAL INTERSOCIAL META	$ 718.018.776	$ 718.018.776	$ 0
26	UT FOMENTO DEL NORTE	$ 706.839.432	$ 704.951.787	$ 1.887.645
27	UT FOMENTO DEL NORTE	$ 649.926.408	$ 649.894.604	$ 31.804
29	Redes y Servicios de Telecomunicaciones NET I.S.P S.A.S.,	$ 1.304.426.184	$ 1.304.426.184	$ 0
30	SÚPER REDES S.A.S	$ 387.719.976	$ 387.719.976	$ 0
32	UNIÓN TEMPORAL CONECTANDO REGIONES SRCC	$ 1.331.866.392	$ 1.331.216.854	$ 649.538
36	UNION TEMPORAL ASINTEL UC	$ 683.972.592	$ 683.972.592	$ 0
37	NETWORKS TV S.A.S	$ 813.551.352	$ 813.467.999	$ 83.353
39	UNIÓN TEMPORAL INTERSOCIAL CUNDINAMARCA	$ 327.249.888	$ 327.249.888	$ 0
	TOTALES	$ 27.952.425.216	$ 27.941.741.316	$ 10.683.900

Estado revisión informes mensuales ejecutores

Región	INFORMES																	
	Oct-24	Nov-24	Dic-24	Ene-25	Feb-25	Mar-25	Abr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Ago-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26
Región 4	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 5	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 6	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 7	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 8	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 14	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 15	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 16	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NA
Región 17	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 18	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 19	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 20	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 21	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 22	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 23	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 24	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	NA
Región 25	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 26	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R	R
Región 27	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R	R
Región 29	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R	OK
Región 30	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 32	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 36	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 37	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 39	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S

RESUMEN

NA: No Aplica	2
S: En subsanación	8
R: En revisión	13
SE: Sin entregar	0
OK: APROBADO	427

INFORMES DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO

REGIÓN	INFORME DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO	FECHA	TEMA	TASACIÓN	TOTAL TASACIONES	SUPERACIÓN
8	LFF2-INTV-DIRINFRA-00010-25 (251120461)	18/09/2025	Respuesta a Requerimiento	$17.344.787,70	$29.195.263,75	Parcialmente superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00014-25 (251129596)	10/10/2025	Informes	$11.850.476,05		Superado
26	LFF2-INTV-DIRINFRA-00001-25 (251082544)	10/07/2025	Metas	$7.143.586,09	$39.451.462,40	Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00003-25 (251111224)	28/08/2025	Registro (logs)	$20.502.828,52		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00006-25 (251115061)	8/09/2025	Informes	$9.756.237,85		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00011-25 (251127417)	6/10/2025	Informes	$1.024.404,97		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00015-25 (251132896)	20/10/2025	Informes	$1.024.404,97		Superado
27	LFF2-INTV-DIRINFRA-00004-25 (251111902)	29/08/2025	Registro (logs)	$18.853.175,65	$35.415.985,05	Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00007-25 (251117436)	11/09/2025	Metas	$7.143.586,09		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00008-25 (251117593)	11/09/2025	Informes	$7.706.637,25		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00012-25 (251128211)	8/10/2025	Informes	$856.293,03		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00016-25 (251132897)	20/10/2025	Informes	$856.293,03		Superado
29	LFF2-INTV-DIRINFRA-00002-25 (251099528)	30/07/2025	Informes	$11.939.827,77	$53.950.332,90	Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00013-25 (251128212)	8/10/2025	Informes	$2.100.525,26		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00017-25 (251132898)	20/10/2025	Informes	$2.100.525,26		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00018-25 (251156188)	17/12/2025	Respuesta a Requerimiento y mantenimiento	$37.809.454,61		Superado
36	LFF2-INTV-DIRINFRA-00005-25 (251112325)	1/09/2025	Registro (logs)	$19.825.292,52	$29.154.841,94	Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00009-25 (251117880)	12/09/2025	Informes	$9.329.549,42		Superado

Varios

- Socialización de PQR
- Trámite de las Prórrogas R7, R29, R30, R37 y R39
- Respuesta relacionada con la aclaración de los tiempos de reposición y compensación.

TIC

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

2025

ministerio_tic @ministerio_tic @ministerio_tic

@Ministerio_TIC MinisterioTIC.Colombia @ministeriotic @MinisterioTIC_Colombia

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA 15 SEGUIMIENTO INTERVENTORIA

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260504-114559-8e3785-96650324

Creación: 2026-05-04 11:45:59

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-05-06 11:44:06

Escanee el código para verificación

Firma: Director de la interventoría



Juan Fernando Barrero Gonzalez
5826043
jbarrero@scain.co
Director Interventoría
Consorcio Inter-Lineas 2.0

Firma: Directora (e) Infraestructura



MARIA CAROLINA ZUÑIGA HERNANDEZ
32907441
mzuniga@mintic.gov.co
ASESORA DESPACHO DE LA MINISTRA
MINTIC

Firma: Apoyo principal equipo de apoyo al seguimiento MINTIC



CESAR AUGUSTO POLO
80851277
cpolo@mintic.gov.co

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA 15 SEGUIMIENTO INTERVENTORIA

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260504-114559-8e3785-96650324
Creación: 2026-05-04 11:45:59
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-05-06 11:44:06

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CESAR AUGUSTO POLO cpolo@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-05-04 11:46:02 Lec.: 2026-05-04 16:42:02 Res.: 2026-05-04 16:42:37 IP Res.: 181.49.95.120 Canal: Email
Firma	MARIA CAROLINA ZUÑIGA HERNANDEZ mzuniga@mintic.gov.co ASESORA DESPACHO DE LA MINISTRA MINTIC	Aprobado	Env.: 2026-05-04 16:42:37 Lec.: 2026-05-05 10:12:36 Res.: 2026-05-06 11:42:05 IP Res.: 181.79.88.114 Canal: Email
Firma	Juan Fernando Barrero Gonzalez jbarrero@scain.co Director Interventoría Consorcio Inter-Lineas 2.0	Aprobado	Env.: 2026-05-06 11:42:05 Lec.: 2026-05-06 11:43:58 Res.: 2026-05-06 11:44:05 IP Res.: 186.154.150.82 Canal: Email
