TIC	**ACTA DE REUNIÓN**	mig

CÓDIGO TRD: 2100				
ACTA No. **12**	**LUGAR:** Microsoft TEAMS	**FECHA:** 30/01/2026	**HORA DE INICIO:** 4:00 PM	**HORA FINAL:** 4:30 PM

OBJETO DE LA REUNIÓN
Reunión de seguimiento entre responsable MINTIC e interventoría Consorcio Interlineas 2.0, contrato de interventoría No. 2169-2024 cuyo objeto es: *"Ejercer la Interventoría a las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras, y administrativas requeridas para la vigilancia y el seguimiento integral de la ejecución del proyecto Líneas de Fomento 2.0 de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico".*

ORDEN DEL DÍA
1. Presentación 2. Seguimiento compromisos anteriores 3. Estado documental 4. Informes de interventoría 5. Estado pago interventoría 6. Fase del proyecto (planeación- instalación- operación) 7. Finalización operación metas 8. Estado pagos resoluciones 9. Estado revisión informes mensuales ejecutores 10. Informes de posible incumplimiento 11. Personal Otrosí No. 2 12. Varios 13. Cierre

1. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES		
ITEM	**COMPROMISO**	**ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)**
	N/A	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

2. Presentación

Se realiza la reunión de seguimiento por medio de la plataforma Microsoft TEAMS, con presencia del equipo de interventoría Consorcio Inter-líneas 2.0 y responsable MINTIC – Directora de Infraestructura (E).

La vocería de la reunión estuvo a cargo del equipo de interventoría Consorcio Inter-Líneas 2.0 quien presente el seguimiento a los proyectos objeto de interventoría.

3. Estado documental

Frente al estado actual de las actas de comité operativo y de seguimiento del año 2025 (enero a diciembre) y enero 2026, a continuación, se relaciona el estado por región

Región	Ene-25	Feb-25	Mar-25	Abr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Agos-25	Sept-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26
Región 4	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 5	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 6	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 7	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 8	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	**Pte. Firmas**	Ejecutada
Región 14	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 15	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 16	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 17	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 18	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 19	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 20	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 21	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 22	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 23	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 24	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 25	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 26	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 27	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 29	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 30	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 32	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 36	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 37	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 39	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada

Para la fecha del presente seguimiento, las actas de enero 2026 desarrolladas los días 27, 28 y 29 de enero, están en elaboración de la interventoría como secretario técnico del comité operativo.

De igual forme se relaciona el estado documental de las actas de seguimiento entre la interventoría y responsable MINTIC

Mes	Fecha	Estado	Observaciones
Febrero-25	19/02/2025	Firmado	
Marzo-25	17/03/2025	Firmado	
Abril-25	16/04/2025	Firmado	
Mayo-25	15/05/2025	Firmado	
Junio-25	20/06/2025	Firmado	
Julio-25	28/07/2025	Firmado	
Agosto-25	21/08/2025	Firmado	
Septiembre-25	24/09/2025	Firmado	
Octubre-25	29/10/2025	Firmado	
Noviembre -25	28/11/2025	Firmado	
Diciembre -25	29/12/2025	Firmado	
Enero - 26	29/01/2026	Programado	

4. Informes de interventoría

Con relación a los informes mensuales de interventoría, se informa acerca de la fecha de entrega de estos.

Mes	Radicado	Fecha radicación	Estado	Radicado
Enero-25	251013659	07/02/2025	Aprobado	252029280
Febrero-25 v1	251025247	07/03/2025	Con observaciones	252044798
Febrero-25 v2	251036136	31/03/2025	Aprobado	252057282
Marzo-25 v1	251039051	07/04/2025	Con observaciones	252059156

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Marzo-25 v2	251047458	25/04/2025	Aprobado	252066925
Abril-25 v1	251052700	08/05/2025	Con observaciones	252078062
Abril-25 v2	251061902	26/05/2025	Aprobado	252091575
Informe periodo 1 v1	251065217	03/06/2025	Con observaciones	252089223
Informe periodo 1 v2	251067146	06/06/2025	Aprobado	252089964
Mayo-25-v1	251067628	09/06/2025	Con observaciones	252097450
Mayo-25-v2	251077238	01/07/2025	Aprobado	252107540
Junio-25-v1	241080674	07/07/2025	Con observaciones	252114745
Junio-25-v2	251095869	22/07/2025	Aprobado	252120665
Julio-25-v1	251103208	08/08/2025	Con observaciones	252134223
Julio-25-v2	251109083	25/08/2025	Aprobado	252153658
Agosto-25-v1	251114829	5/09/2025	Con observaciones	252156377
Agosto-25-v2	251123498	26/09/2025	Aprobado	252171011
Septiembre-25-v1	251127900	7/10/2025	Con observaciones	252173591
Septiembre-25-v2	251134014	22/10/2025	Aprobado	252179032
Octubre-25-v1	251141681	10/11/2025	Con observaciones	252194155
Octubre-25-v2	251147895	25/11/2025	Aprobado	252200630
Noviembre-25-v1	251151010	3/12/2025	Aprobado	252204835
Diciembre-25-v1	251158293	22/12/2025	En revisión	252220064
Diciembre-25-v2	251130240	30/12/2026	Aprobado	262026687

5. Estado pago interventoría

Conforme al estado actual de pagos a la interventoría se relaciona la información consignada en la siguiente tabla, en donde se indica los pagos a realizar para el contrato de interventoría 2169-2024. Asimismo, se relaciona el estado de cada uno referente al trámite surtido.

VALOR HASTA	%	CONCEPTO	ESTADO
$ .117.278.416	21,72%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 1) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 257429925
$ 985.078.317	19,15%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 2) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 240380625 2025-07-11
$ 576.181.089	11,2%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 3) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 298756225 2025-08-22
$ 576.181.090	11,2%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 4) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 426918025 2025-11-10.
$ 384.120.724	7,46%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 5) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 544979025 2025-12-29.
$ 192.060.364	3,73%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 6) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PENDIENTE
$375.142.684	7,29%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 7) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico. (iii) Soporte de pago del impuesto sobre el valor total de la adición de acuerdo con las instrucciones establecidas en la Circular Externa 010 del 05 de marzo de 2025 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	PENDIENTE

$375.142.684	7,29%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 8) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PENDIENTE
$562.714.027	10,94	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 9) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PENDIENTE
$5.143.899.395	**100%**		

En relación con el pago No. 6 de **la interventoría**, se consulta si es posible radicar la factura la próxima semana. Frente a ello, **MinTIC** informa que no es viable, debido a que aún no se tiene la confirmación de la constitución de la reserva presupuestal correspondiente a dicho pago. En consecuencia, hasta tanto no se cuente con esta validación oficial, no es posible tramitar el pago.
Por su parte, **la interventoría** manifiesta que permanecerá atenta al proceso, con el fin de realizar el cobro correspondiente una vez se cuente con la autorización respectiva.

6. Fase planeación

En cuanto a la fase de planeación, a continuación, se expone el estado actual por región frente a documentos de planeación requeridos:

- ✓ Repositorio de información
- ✓ IDIO
- ✓ Plan de comercialización
- ✓ Plan de instalación
- ✓ Plan de mantenimiento

Región	Ejecutor	Repositorio información	IDIO	Plan Comercialización	Plan Instalación	Plan Mantenimiento
Región 4	SPACE COMUNICACIONES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 5	EME INGENIERIA	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 6	EME INGENIERIA	A conformidad ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 7	DIGINORTE	A conformidad ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 8	HIZ TELECOMUNICACIONES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 14	UT FOMENTO CASA	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 15	INTERMEGAMUNDO	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 16	UT FIBRANOVATEL -UC7	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 17	UT MEGAINTERCONECTA 2	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 18	UT CONECTANDO REGIONES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 19	UT CONECTANDO BAJO	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 20	PUNTO RED TELECOM	A conformidad ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 21	CF INGENIEROS	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 22	UT CONECTANDO REGIONES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 23	UT FIBERCOL UC6	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 24	UT UNA COLOMBIA 5	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 25	UT INTERSOCIAL META	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 26	UT FOMENTO NORTE	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 27	UT FOMENTO NORTE	A conformidad ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 29	NET I.S.P	A conformidad ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 30	SÚPER REDES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 32	UT CONECTANDO REGIONES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 36	UT ASINTEL UC	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 37	NETWORKS TV	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 39	UT INTERSOCIAL CUNDI	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑

7. Fase instalación

Con respecto a la fase de instalación, se relaciona la cantidad de accesos en estado aprobado, rechazado, en subsanación y en revisión por la interventoría con respecto a la meta total para cada región.

Región	Metas	Aprobados	Finalizado	Rechazados	En Subsanación	En Revisión	Total
Región 4	3142,00	3142	0	81	0	0	3142
Región 5	2706,00	2706	0	4	0	0	2706
Región 6	2133,00	2133	0	2	0	0	2133
Región 7	1027,00	1027	0	1	0	0	1027
Región 8	3701,00	3701	0	2	0	0	3701
Región 14	1330,00	1327	0	11	2	1	1330
Región 15	2325,00	2325	0	4	0	0	2325
Región 16	2279,00	2279	0	13	0	0	2279
Región 17	2420,00	2420	0	50	0	0	2420
Región 18	4249,00	4249	0	14	0	0	4249
Región 19	2134,00	2134	0	1	0	0	2134
Región 20	3029,00	2878	151	1	0	0	3029
Región 21	2146,00	2039	107	9	0	0	2146
Región 22	3909,00	3909	0	71	0	0	3909
Región 23	2310,00	2310	0	11	0	0	2310
Región 24	2543,00	2416	127	5	0	0	2543
Región 25	1413,00	1412	0	9	1	0	1413
Región 26	1391,00	1391	0	52	0	0	1391

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Región 27	1279,00	1279	0	40	0	0	1279
Región 29	2567,00	2567	0	84	0	0	2567
Región 30	763,00	763	0	3	0	0	763
Región 32	2621,00	2621	0	20	0	0	2621
Región 36	1346,00	1346	0	22	0	0	1346
Región 37	1601,00	1601	0	0	0	0	1601
Región 39	644,00	644	0	1	0	0	644
TOTAL	**55.008**	**54.619**	**385**	**511**	**3**	**1**	**55.008**

8. Fase operación

En cuanto a la fase de operación, se expone el estado de avance de cada región en relación con el cumplimiento de las metas y la fecha de inicio de operación.

Región	Meta total	Meta 1	Inicio operación Meta 1	Meta 2	Inicio operación Meta 2	Meta 3	Inicio operación Meta 3
Región 4	3.142	157	29/11/24	1.414	11/03/25	1.571	19/06/2025
Región 5	2.706	135	1/02/25	1.218	2/05/25	1.353	01/07/2025
Región 6	2.133	107	3/03/25	960	7/06/25	1.067	01/08/2025
Región 7	1.027	51	29/11/24	462	7/03/25	514	29/04/2025
Región 8	3.701	185	29/11/24	1.665	1/04/25	1.851	30/09/2025
Región 14	1.330	66	7/12/24	599	24/02/25	665	01/04/2025
Región 15	2.325	116	1/12/24	1.046	1/12/24	1.163	01/04/2025
Región 16	2.279	114	30/11/24	1.026	5/03/25	1.139	28/05/2025
Región 17	2.420	121	21/12/24	1.089	21/12/24	1.210	08/04/2025
Región 18	4.249	212	3/12/24	1.912	30/04/25	2.125	01/08/2025
Región 19	2.134	107	6/12/24	960	1/04/25	1.067	25/06/2025
Región 20	3.029	151	29/11/24	1.363	30/04/25	1.515	27/06/2025
Región 21	2.146	107	29/11/24	966	24/04/25	1.073	01/07/2025
Región 22	3.909	195	3/12/24	1.759	12/05/25	1.955	18/07/2025
Región 23	2.310	116	4/12/24	1.040	12/05/25	1.154	01/07/2025
Región 24	2.543	127	29/11/24	1.144	26/03/25	1.272	30/05/2025
Región 25	1.413	71	1/02/25	636	7/03/25	706	01/04/2025
Región 26	1.391	70	11/03/25	626	12/06/25	695	30/10/2025
Región 27	1.279	64	11/03/25	576	24/06/25	640	27/10/2025
Región 29	2.567	128	10/03/25	1.155	28/05/25	1.284	27/08/2025
Región 30	763	38	1/02/25	343	7/03/25	382	29/04/2025
Región 32	2.621	131	3/12/24	1.179	20/05/25	1.311	30/07/2025
Región 36	1.346	67	7/04/25	606	3/06/25	673	14/08/2025
Región 37	1.601	80	7/12/24	720	13/03/25	801	25/04/2025
Región 39	644	32	21/02/25	290	11/03/25	322	29/04/2025
TOTAL	**55.008**	**2.748**		**24.754**		**27.506**	

Así mismo y con relación al cumplimiento de metas desde la interventoría se indica el estado actual de las regiones que presentan finalización de operación de metas (1-2-3) en la actualidad

Región	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Observaciones
Región 4	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1
Región 5	En operación	En operación	En operación	
Región 6	En operación	En operación	En operación	
Región 7	Finalizada	En operación	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG07-03992-26 / 261006468
Región 8	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1
Región 14	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1
Región 15	Finalizada	Finalizada	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar metas 1 y 2
Región 16	Finalizada	Finalizada	Finalizada	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar metas 1, 2 y 3
Región 17	Finalizada	Finalizada	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición) para poder cerrar metas 1 y 2

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Región 18	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1
Región 19	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1
Región 20	Finalizada	En operación	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG20-03991-26 / 261006201
Región 21	Finalizada	Finalizada	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG21-03940-26 / 261003727
Región 22	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1
Región 23	Finalizada	Finalizada	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar metas 1 y 2
Región 24	Finalizada	Finalizada	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG24-03725-25 / 251156256
Región 25	En operación	En operación	En operación	
Región 26	En operación	En operación	En operación	
Región 27	En operación	En operación	En operación	
Región 29	Finalizada	Finalizada	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1
Región 30	En operación	En operación	En operación	
Región 32	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1
Región 36	En operación	En operación	En operación	
Región 37	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1
Región 39	En operación	En operación	En operación	

- **Finalizadas: 25**
- **En Operación: 50**
- **Finalizadas formalmente: 4**

De igual forma se hace importante reportar desde la interventoría la fecha en la se termina cada una de las 25 resoluciones objeto del proyecto de interventoría así:

ENERO 2026		
Región	**Fecha fin resolución**	**Tiempo adicional estimado**
16	31/01/26	1 mes
24	31/01/26	15 días

FEBRERO 2026		
Región	**Fecha fin resolución**	**Tiempo adicional estimado**
21	28/02/26	2.5 meses
23	28/02/26	1 mes

MARZO 2026		
Región	**Fecha fin resolución**	**Tiempo adicional estimado**
14	31/03/26	Pendiente
15	31/03/26	Pendiente
25	31/03/26	Pendiente

ABRIL 2026		
Región	**Fecha fin resolución**	**Tiempo adicional estimado**
7	30/04/26	Pendiente
17	30/04/26	Pendiente
29	30/04/26	Pendiente
30	30/04/26	Pendiente
37	30/04/26	Pendiente
39	30/04/26	Pendiente

JUNIO 2026		
Región	**Fecha fin resolución**	**Tiempo adicional estimado**
4	30/06/26	Pendiente
5	30/06/26	Pendiente
19	30/06/26	Pendiente
20	30/06/26	Pendiente
36	31/05/25 (13/06/26) *	Pendiente

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

JULIO 2026		
Región	**Fecha fin resolución**	**Tiempo adicional estimado**
6	31/07/26	Pendiente
18	31/07/26	Pendiente
22	30/06/25 (17/07/26) *	Pendiente
32	31/07/26	Pendiente

SEPTIEMBRE 2026		
Región	**Fecha fin resolución**	**Tiempo adicional estimado**
8	30/09/26	Pendiente

OCTUBRE 2026		
Región	**Fecha fin resolución**	**Tiempo adicional estimado**
26	30/06/25 (29/10/26) *	Pendiente
27	31/08/25 (26/10/26) *	Pendiente

* Regiones con accesos reportados después de fecha fin de prórroga. Las fechas mostradas corresponden al fin de operación (10 meses para R36 y 12 meses para R22, R26 y R27)

En relación con las fechas de finalización de meta, **MinTIC** informa que las regiones 16 y 24, cuya terminación estaba prevista para el día siguiente (31 enero 2026), ya cuentan con nueva resolución, la cual fue expedida y notificada a los ejecutores. Estos, a su vez, remitieron al Ministerio la renuncia a términos, trámite que les corresponde realizar posteriormente al Grupo Interno de Trabajo de Notificación de MinTIC, con el fin de que la resolución quede en firme.

No obstante, el procedimiento de verificación de dicha renuncia corresponde al área de notificaciones. Actualmente se está a la espera de que esta área valide la documentación y expida el certificado respectivo, mediante el cual se formaliza la firmeza de la resolución. Una vez se cuente con esta certificación, será remitida a la interventoría junto con las nuevas resoluciones para su incorporación al expediente y para dejar constancia de la nueva fecha establecida.

En cuanto a las siguientes regiones que finalizan en febrero 2026, correspondientes a las regiones 21 y 23, se solicita a la interventoría, como se ha realizado en casos anteriores, preparar los informes o conceptos con la trazabilidad histórica de cada resolución, incluyendo la recomendación final sobre el plazo requerido para la prórroga. Lo anterior, con el fin de trabajarlo de manera articulada con la Secretaría General, área encargada de expedir el nuevo acto administrativo. Dicho trámite contempla varias revisiones y filtros, incluido el concepto de un asesor externo, por lo que se agradece remitir estos documentos a la mayor brevedad, idealmente durante la próxima semana, para evitar contratiempos en los tiempos de gestión.

Desde el Ministerio también se destaca que algunas resoluciones ya están entrando en su fase de cierre oficial. Por ejemplo, la región 24, con la nueva prórroga, estaría culminando la operación total de la resolución a mediados de febrero 2026. En ese sentido, se hace necesario comenzar la preparación de los informes de cierre, conforme a lo dispuesto en la Resolución 3689. Aunque no se trata de un acta de liquidación, sí corresponde a un informe de cierre que permita verificar el cumplimiento integral de las obligaciones establecidas.

Se propone coordinar una reunión técnica (interventoría – supervisión) la próxima semana para definir conjuntamente la estructura de estos informes, asegurando que incluyan todos los aspectos necesarios y que los expedientes queden debidamente organizados para un cierre ordenado.

La interventoría manifiesta que ya se encuentra proyectando una estructura de informe final para remitir a los ejecutores, con el fin de que estos presenten el informe requerido una vez termine la resolución. Indica que enviará dicha estructura previamente y que, en la reunión propuesta, se podrá revisar si es necesario ajustarla

o complementarla. Precisa que la intención es que el ejecutor elabore el informe final conforme a lo establecido en el anexo correspondiente.

Por su parte, **MinTIC** aclara que, además del informe final del ejecutor, se requiere un informe de cierre elaborado por la supervisión, el cual servirá para avalar el cumplimiento de todas las obligaciones de la resolución. En consecuencia, se trataría de dos documentos: el informe final del ejecutor y el informe de cierre de supervisión, este último similar a un informe de liquidación, aunque formalmente no reciba esa denominación.

La interventoría responde que revisará el requerimiento, ya que no recuerda que deba elaborarse un informe por cada resolución, pero confirma que lo validará internamente.

8.1 Visitas en campo

Frente a las visitas en campo programadas para los meses mencionados, a continuación, se presentan las regiones y la cantidad de visitas realizadas, discriminadas por departamento y municipio.
Cabe destacar que, a partir de mayo de 2025, se iniciaron las visitas de calidad, las cuales están previstas hasta completar un total de 3.300 visitas, adicionales a las 1.100 visitas de aprobación.
Asimismo, se informa que durante el mes de agosto de 2025 se finalizaron la totalidad de las visitas programadas (tanto de calidad como de aprobación).


Mes	Región	Departamento	Municipio	Cantidad de Visitas Programadas	Cantidad de Visitas Ejecutadas	Tipo de Visita
Marzo 2025	39	Cundinamarca	Tena	27	43	Aprobación
	25	Meta	Puerto López	48	74	Aprobación
	20	Meta	Vistahermosa	70	88	Aprobación
	27	Nte. De Santander	Cachirá	54	0	Aprobación
	37	Tolima	Chaparral	67	60	Aprobación
	36	Tolima	Purificación	43	35	Aprobación
Abril 2025	4	Atlántico	Sabanalarga	115	149	Aprobación
	5	Atlántico	Galapa	35	33	Aprobación
	6	Atlántico	Luruaco	100	69	Aprobación
	15	Cesar	Pailitas	85	0	Aprobación
	15	Cesar	Curumani	0	84	Aprobación
	16	Cesar	Bosconia	85	85	Aprobación
	17	Cesar	San Alberto	85	83	Aprobación
Mayo 2025	21	Magdalena	Plato	125	127	Aprobación
	22	Magdalena	Fundación	125	125	Aprobación
	24	Magdalena	Santa Ana	48	52	Aprobación
	Total visitas de aprobación			**1.112**	**1.107**	
	7	Bolivar	Cicuco	81	83	Calidad
	7	Bolivar	Talaigua nuevo	81	82	Calidad
	24	Magdalena	Santa Ana	40	40	Calidad
Junio 2025	32	Sucre	Coveñas	120	121	Calidad
	32	Sucre	Ovejas	120	121	Calidad
	32	Sucre	San Onofre	60	62	Calidad
	14	Casanare	Paz de Ariporo	300	300	Calidad
	19	Córdoba	Tuchin	300	300	Calidad
	29	Putumayo	Puerto Asis	70	104	Calidad
	29	Putumayo	Villagarzon	150	116	Calidad
	29	Putumayo	Puerto Caicedo	80	80	Calidad
Julio 2025	23	Magdalena	Salamina	70	71	Calidad
	23	Magdalena	Pivijay	230	230	Calidad
	18	Córdoba	Cerete	140	141	Calidad


	18	Córdoba	San Carlos	30	32	Calidad
	18	Córdoba	Planeta Rica	130	131	Calidad
	30	Risaralda	Quinchía	190	172	Calidad
	30	Risaralda	Guática	70	83	Calidad
	30	Risaralda	La Celia	40	45	Calidad
Agosto 2025	8	Bolívar	Arjona	150	150	Calidad
	8	Bolívar	Arroyohondo	25	25	Calidad
	8	Bolívar	Clemencia	25	25	Calidad
	8	Bolívar	Mahates	50	0	Calidad
	8	Bolívar	San Cristóbal	25	25	Calidad
	8	Bolívar	San Estanislao	25	25	Calidad
	20	Meta	El Castillo	25	0	Calidad
	20	Meta	Fuente De Oro	25	0	Calidad
	20	Meta	Granada	130	88	Calidad
	20	Meta	lejanías	25	0	Calidad
	20	Meta	San Juan De Arama	20	0	Calidad
	25	Meta	Castilla La Nueva	25	0	Calidad
	25	Meta	Guamal	25	0	Calidad
	25	Meta	San Martin	25	25	Calidad
	4	Atlántico	Palmar De Varela	30	0	Calidad
	4	Atlántico	Sabanagrande	30	0	Calidad
	4	Atlántico	Santo Tomas	90	0	Calidad
	5	Atlántico	Malambo	90	70	Calidad
	6	Atlántico	Campo De La Cruz	30	30	Calidad
	26	N. Santander	El Zulia	75	74	Calidad
	26	N. Santander	San Cayetano	25	0	Calidad
TOTAL, VISITAS DE CALIDAD				**3.302**	**3.330**	
TOTAL, APROBACION Y CALIDAD				**4.414**	**4.437**	

8.2 Llamadas telefónicas

Con corte al presente comité, la interventoría ha llevado a cabo un total de 60.716 llamadas a los usuarios beneficiarios del proyecto. Estas comunicaciones telefónicas tienen como propósito principal validar la calidad del servicio de internet brindado, a fin de garantizar que se estén cumpliendo los estándares establecidos en los lineamientos técnicos y contractuales.

.

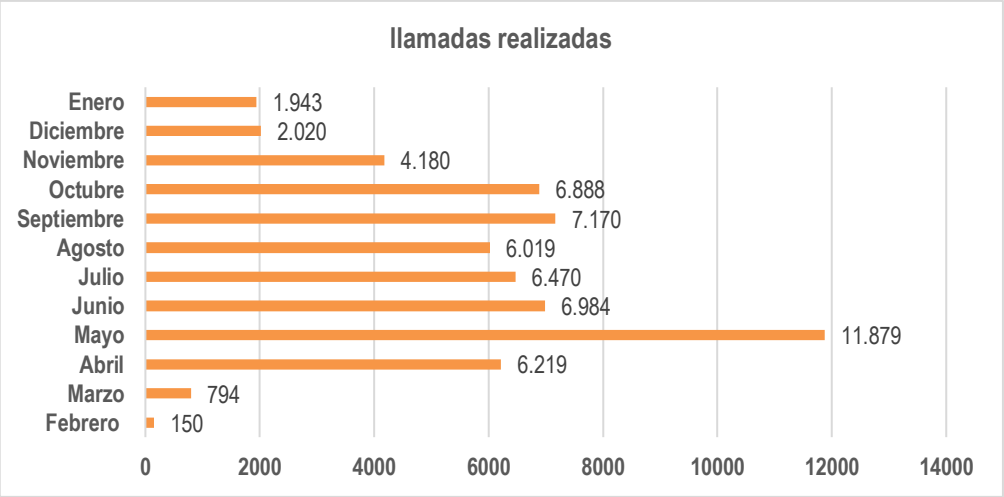

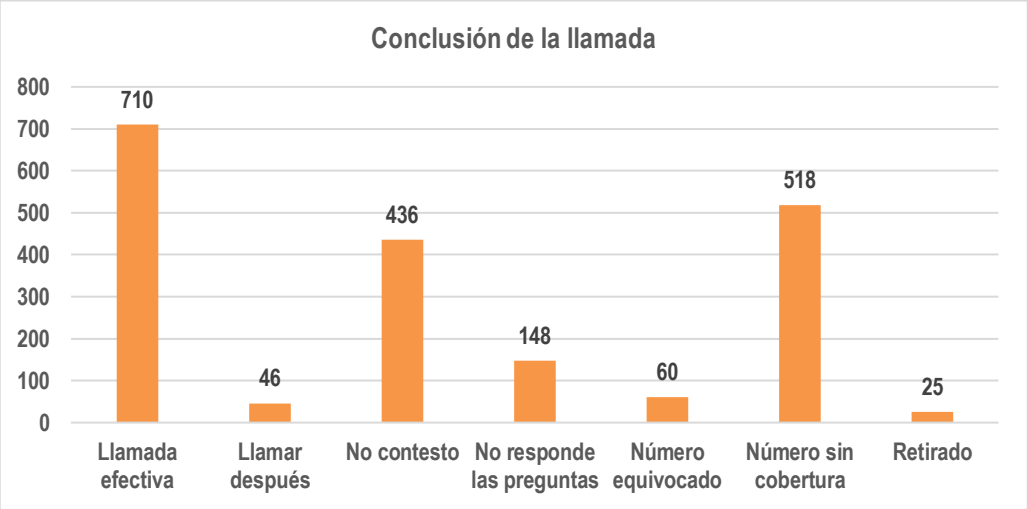

9. Estado de pagos de los proyectos

En relación con el estado de pagos para las regiones, a continuación, se expone el consolidado de pagos generados a las 25 regiones objeto del contrato de interventoría 2194-2024

CONSOLIDADO DE PAGOS POR REGIÓN

REGION	EJECUTOR	Valor total Capex regiones	Pagado o tramitado	Por pagar
4	SPACE COMUNICACIONES S.A.S	**$ 1.596.613.584**	$ 1.596.613.584	$ 0
5	EME INGENIERIA S.A. BIC.	**$ 1.375.059.312**	$ 1.375.059.312	$ 0
6	EME INGENIERIA S.A. BIC.	**$ 1.083.888.216**	$ 1.083.888.216	$ 0
7	DIGINORTE S.A.S.	**$ 521.872.104**	$ 521.872.104	$ 0
8	HIZ TELECOMUNICACIONES S.A.S.	**$ 1.880.670.552**	$ 940.335.276	$ 0
14	UT FOMENTO CASANARE 2.0	**$ 675.842.160**	$ 675.842.160	$ 0
15	INTERMEGAMUNDO PARTNERS S.A.S.	**$ 1.181.453.400**	$ 1.181.453.400	$ 0
16	UNIÓN TEMPORAL FIBRANOVATEL -UC7	**$ 1.158.078.408**	$ 1.158.078.408	$ 0
17	UNION TEMPORAL MEGAINTERCONECTA 2	**$ 1.229.727.840**	$ 1.229.727.840	$ 0
18	UNIÓN TEMPORAL CONECTANDO REGIONES SRCC	**$ 2.159.137.848**	$ 2.159.137.848	$ 0
19	UT CONECTANDO BAJO SINU	**$ 1.084.396.368**	$ 1.084.396.368	$ 0
20	PUNTO RED TELECOMUNICACIONES SAS	**$ 1.539.192.408**	$ 1.539.192.408	$ 0
21	CF INGENIEROS SAS	**$ 1.090.494.192**	$ 1.090.494.192	$ 0
22	UNIÓN TEMPORAL CONECTANDO REGIONES SRCC	**$ 1.986.366.168**	$ 993.450.592	$ 0
23	UNIÓN TEMPORAL FIBERCOL UC6	**$ 1.173.831.120**	$ 1.173.831.120	$ 0
24	UNIÓN TEMPORAL UNA COLOMBIA 5	**$ 1.292.230.536**	$ 1.292.230.536	$ 0
25	UNIÓN TEMPORAL INTERSOCIAL META	**$ 718.018.776**	$ 718.018.776	$ 0
26	UT FOMENTO DEL NORTE	**$ 706.839.432**	$ 706.839.432	$ 0
27	UT FOMENTO DEL NORTE	**$ 649.926.408**	$ 649.926.408	$ 0
29	REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NET I.S.P S.A.S.,	**$ 1.304.426.184**	$ 652.213.092	$ 0
30	SÚPER REDES S.A.S	**$ 387.719.976**	$ 387.719.976	$ 0
32	UNIÓN TEMPORAL CONECTANDO REGIONES SRCC	**$ 1.331.866.392**	$ 666.582.734	$ 0
36	UNION TEMPORAL ASINTEL UC	**$ 683.972.592**	$ 683.972.592	$ 0
37	NETWORKS TV S.A.S	**$ 813.551.352**	$ 813.551.352	$ 0
39	UNIÓN TEMPORAL INTERSOCIAL CUNDINAMARCA	**$ 327.249.888**	$ 327.249.888	$ 0
TOTAL		**$ 27.952.425.216 (100%)**	**$ 27.952.425.216 (100%)**	**$ 0 (0%)**

Así mismo se expone el resumen de pagos de las 25 regiones objeto del contrato de interventoría

	Radicados interventoría*	Pagos realizados o radicados ante FUTIC	Pagos ptes. para completar meta
Pago 1	25	25	0
Pago 2	25	25	0
Pago 3	25	25	**0**
Total	**75**	**75**	**0**

*** En el 2024 fueron aprobados 14 pagos por la supervisión de los cuales la Interventoría realizó la validación y verificación integral en cuanto el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de pago establecidos en las resoluciones, anexo técnico y adendas.**

MinTIC informa que, para efectos del cierre financiero global, se remitirán a la interventoría dos solicitudes de liberación de recursos.

Lo anterior obedece a que, como es de conocimiento general, algunas regiones no lograron demostrar la ejecución del 100 % del CAPEX previsto, razón por la cual algunos pagos tramitados se realizaron por un valor inferior al techo presupuestal establecido en cada una de las resoluciones, conforme la aprobación de uso de CAPEX validado por la interventoría.

En consecuencia, y con el fin de mantener la consistencia entre los valores planeados y los efectivamente ejecutados presupuestalmente en cada resolución, la Dirección gestionó al cierre de la vigencia la correspondiente liberación de recursos. Dichas solicitudes serán compartidas para su incorporación en el expediente del proyecto y para que se cuente con el soporte consolidado del ajuste financiero.

Referente al estado actual de los informes mensuales se indica el estado actual de cumplimiento de cada región:

RESUMEN	
S: En subsanación	7
R: En revisión	11
SE: Sin entregar	0
OK: APROBADO	357

Región	Pago	Informes														
		Oct-24	Nov-24	Dic-24	Ene-25	Feb-25	Mar-25	Abr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Ago-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dic.25
Región 4	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 5	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 6	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 7	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 8	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 14	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 15	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 16	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 17	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R	R
Región 18	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 19	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 20	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 21	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 22	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R	OK
Región 23	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 24	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S

Región 25	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 26	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R	R
Región 27	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R	R
Región 29	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 30	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 32	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 36	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 37	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 39	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S

10. Informes de posible incumplimiento

El componente jurídico de la interventoría expone la relación de Informes de posible incumplimiento que se han emitido, indicando región, numero de comunicado fecha, tema y tasación tal como se evidencia a continuación

REGIÓN	INFORME DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO	FECHA	TEMA	TASACIÓN	TOTAL TASACIONES	SUPERACIÓN
8	LFF2-INTV-DIRINFRA-00010-25 (251120461)	18/09/2025	Respuesta a Requerimiento	$17.344.787,70	$29.195.263,75	Parcialmente superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00014-25 (251129596)	10/10/2025	Informes	$11.850.476,05		Superado
26	LFF2-INTV-DIRINFRA-00001-25 (251082544)	10/07/2025	Metas	$7.143.586,09	$39.451.462,40	Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00003-25 (251111224)	28/08/2025	Registro (logs)	$20.502.828,52		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00006-25 (251115061)	8/09/2025	Informes	$9.756.237,85		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00011-25 (251127417)	6/10/2025	Informes	$1.024.404,97		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00015-25 (251132896)	20/10/2025	Informes	$1.024.404,97		Superado
27	LFF2-INTV-DIRINFRA-00004-25 (251111902)	29/08/2025	Registro (logs)	$18.853.175,65	$35.415.985,05	Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00007-25 (251117436)	11/09/2025	Metas	$7.143.586,09		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00008-25 (251117593)	11/09/2025	Informes	$7.706.637,25		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00012-25 (251128211)	8/10/2025	Informes	$856.293,03		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00016-25 (251132897)	20/10/2025	Informes	$856.293,03		Superado
29	LFF2-INTV-DIRINFRA-00002-25 (251099528)	30/07/2025	Informes	$11.939.827,77	$53.950.332,90	Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00013-25 (251128212)	8/10/2025	Informes	$2.100.525,26		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00017-25 (251132898)	20/10/2025	Informes	$2.100.525,26		Superado*
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00018-25 (251156188)	17/12/2025	Respuesta a Requerimiento y mantenimiento	$37.809.454,61		Superado*
36	LFF2-INTV-DIRINFRA-00005-25 (251112325)	1/09/2025	Registro (logs)	$19.825.292,52	$29.154.841,94	Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00009-25 (251117880)	12/09/2025	Informes	$9.329.549,42		Superado

*** En proyección y/o radicación de actualización de estado**

MinTIC señala que el tema de los presuntamente ya había sido abordado previamente en los comités operativos de seguimiento. No obstante, precisa que la Dirección de Infraestructura no es la instancia competente para pronunciarse o resolver sobre los presuntos incumplimientos.

En ese sentido, teniendo en cuenta que las resoluciones bajo las cuales fueron asignados estos proyectos corresponden a un esquema nuevo para el área, se elevó la consulta a la Dirección Jurídica. Dicha dependencia indicó que, dado que se trata de prestadores de redes y servicios de telecomunicaciones, la competencia para adelantar las actuaciones correspondientes recae en la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control.


Por lo anterior, se está preparando el traslado formal del caso a esa dirección, incluyendo la totalidad de los antecedentes: los hechos que dieron origen a los presuntos incumplimientos, los informes elaborados en su momento y los informes posteriores en los que se evidencia la superación de los hechos presuntamente incumplidos. Lo anterior, con el fin de que cuenten con el acervo probatorio completo y puedan adelantar el debido proceso conforme a sus competencias.

Finalmente, MinTIC indica que se mantendrá informada a la interventoría sobre las actuaciones y decisiones que adopte dicha dependencia. Asimismo, se realizará la socialización integral de los antecedentes del proyecto, considerando que podría tratarse de un asunto nuevo para esa área. Una vez se emita una decisión definitiva, esta será comunicada oportunamente.

11. Personal Otrosí No. 2

De acuerdo al otro si generado, se reporta el personal requerido para el desarrollo del proyecto líneas de fomento 2.0

Cargo	Cantidad
Director de interventoría	1
Profesional técnico	6
Profesional jurídico	1
Profesional Admón. y Financiero	3
Profesional Sistema de información	2
Profesional de calidad	1
Tecnólogo archivista	1
Tecnólogo llamadas	1
Total	16

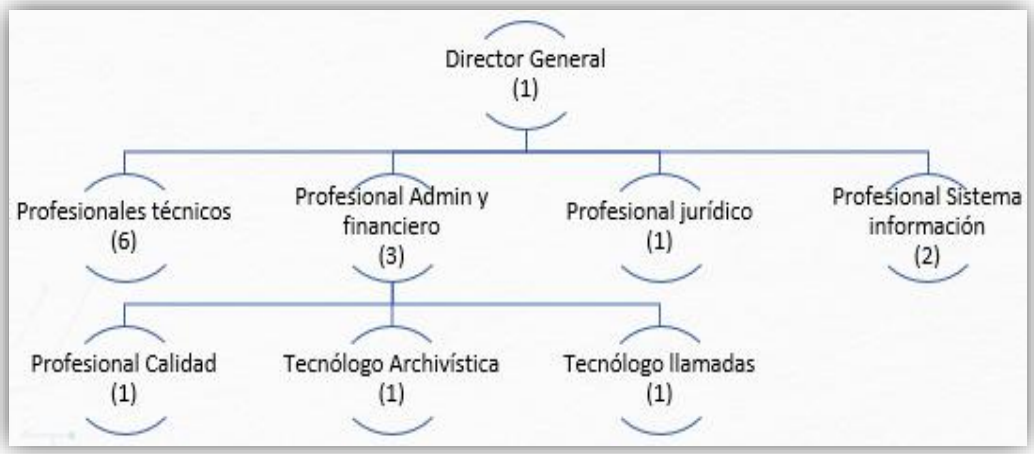

MinTIC solicita, únicamente para efectos de claridad y registro, contar con los nombres específicos de las personas que participan en cada uno de los espacios de trabajo y roles del equipo. En ese sentido, agradece que se compartan los nombres propios asociados a cada cargo o función, con el fin de tener plenamente identificados a los profesionales con los que se interactúa.
Lo anterior, considerando que durante el mes de diciembre 2025 se presentaron algunos movimientos en el equipo, por lo que se busca asegurar una comunicación fluida y un relacionamiento adecuado con cada uno de los responsables.
Por su parte, **la interventoría** indica que dicha información se encuentra relacionada en el informe mensual, donde se detalla el rol, el cargo y el nombre de cada integrante del equipo, y consulta si se requiere algún reporte adicional.
MinTIC validará la información consignada en el informe mensual.

12. Varios

12.1 Socialización de PQRS
En atención a las recomendaciones emitidas en el marco de la auditoría, se realizó un barrido sobre el estado actual de las PQRS allegadas a la interventoría.
Al respecto, la interventoría informa que, con corte al mes de diciembre de 2025 y lo corrido de enero 2026, se encuentra al día, sin PQRS en seguimiento, y que las correspondientes a meses anteriores se encuentran debidamente cerradas.
Desde Mintic se confirma que no existen PQR pendientes de atención.

12.2 Requerimientos de la supervisión
MinTIC reporta dos puntos a tratar en la presente reunión de seguimiento:

12.2.1 **Ajustes al sistema de información**
MinTIC agradece el desarrollo realizado por la interventoría frente a las mejoras solicitadas al sistema de información. No obstante, tras la generación del primer reporte, se identificaron aproximadamente 222 registros que requieren validación, debido a posibles inconsistencias en los datos.
En particular, al descargar el reporte del estado del servicio, se evidencian casos en los que accesos con estado “activo” registran una fecha de finalización correspondiente al año 2025, lo cual no resulta consistente, dado que no deberían figurar como activos. De igual forma, se presentan situaciones inversas, en las que accesos reportados como finalizados muestran fechas de finalización posteriores de la vigencia 2026.
MinTIC informó que ya compartió algunos ejemplos con el responsable del sistema y solicitó realizar una nueva verificación durante la semana siguiente, con el fin de validar si la inconsistencia obedece a errores de los campos consultados en la base de datos.

12.2.2 **Seguimiento a facturación a beneficiarios**
MinTIC propone revisar un mecanismo que permita apoyar a las regiones que presentan rezagos en la facturación a beneficiarios, con el fin de evitar atrasos acumulados.
Se reconoce que la interventoría, como parte del proceso, remite informes detallados a los operadores con observaciones sobre facturas pendientes o por subsanar. Sin embargo, se ha identificado que algunas regiones presentan baja disciplina en el reporte de información. Por ello, se solicita fortalecer el acompañamiento mediante alertas tempranas y, de ser necesario, mesas de trabajo focalizadas, como se ha realizado en otras oportunidades.
Se menciona como ejemplo el comportamiento recurrente de regiones como la 26 y 27, entre otras que puedan presentar situaciones similares. La propuesta es concentrar los esfuerzos en estas regiones críticas, evitando

aplicar la misma estrategia a aquellas que cumplen oportunamente, con el propósito de mantener al día los reportes de prestación del servicio.

Por su parte, **la interventoría** informa que, además de las mesas de trabajo, realiza llamadas telefónicas periódicas y brinda acompañamiento constante a los ejecutores para explicar el manejo de los reportes y el proceso de facturación. No obstante, señala que, pese a estos esfuerzos, persisten incumplimientos reiterados por parte de algunas regiones, que no atienden completamente las recomendaciones o remiten información incorrecta o incompleta.
Indica que, más allá del acompañamiento técnico y operativo, las alternativas de presión son limitadas, siendo el recurso jurídico por presunto incumplimiento la última instancia, aunque considera que este mecanismo puede resultar desgastante y poco efectivo. Aun así, manifiesta su disposición para continuar con las mesas de trabajo y el seguimiento directo.

MinTIC señala que comparte esta preocupación y propone que, adicional a las acciones adelantadas por la interventoría, el equipo de supervisión del Ministerio acompañe las mesas de trabajo, con el fin de servir como puente institucional, sensibilizar a los ejecutores y reforzar los compromisos adquiridos. Se precisa que el objetivo no es aplicar medidas sancionatorias, sino promover el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales.
En consecuencia, se acuerda como primera medida fortalecer la comunicación directa y el acompañamiento conjunto, antes de escalar a instancias sancionatorias. Por lo tanto, inicialmente se implementarán mesas de trabajo con el acompañamiento del equipo de apoyo al seguimiento del Ministerio.

Finalmente, **la interventoría** se compromete a realizar un barrido para identificar las regiones más críticas en materia de facturación a beneficiarios y, con base en ello, coordinar la programación de las mesas de trabajo con el acompañamiento del equipo de apoyo a la supervisión.

13. Cierre

En la presente acta se deja constancia de la reunión que se llevó a cabo entre la interventoría y responsable MINTIC, como consta la PPT presentada

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN A EJECUTAR	**RESPONSABLE DE EJECUCIÓN**	**FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN**
NA	NA	NA

REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE COMPLETO	**CARGO**	**FIRMA**
María Carolina Zúñiga Hernández	Directora Infraestructura	
Roberto Carlos Rubio Bautista	Líder del equipo del MinTIC	
Juan Barrero	Director de Interventoría	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Anexos

- PPT Reunión de seguimiento No 12

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 04904 DEL 19 de NOVIEMBRE DEL 2025

"Por la cual se termina y se efectúa un encargo de funciones de un empleo de libre nombramiento y remoción"

LA MINISTRA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las otorgadas por la ley 909 de 2004, modificada por la ley 1960 de 2004, Decreto 1083 de 2015 y Decreto 0268 de 2025 y

CONSIDERANDO QUE:

El artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, establece: *"(…) Los cargos de libre nombramiento y remoción, en caso de vacancia temporal o definitiva, podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño.*

En caso de vacancia definitiva el cargo será hasta por el término de tres (3) meses, prorrogable por tres (3) meses más, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto en forma definitiva. (…)"

Es así que mediante Resolución 03311 del 13 de agosto del 2025 se encargó al Servidor Público **JUAN MANUEL GUERRERO FORERO**, identificado con Cedula de Ciudadanía 1.049.616.253, titular del empleo subdirector Técnico Código 0150 grado 21 de la Subdirección de Estructuración de Proyectos en el empleo en el empleo denominado Director Técnico de la Dirección de Infraestructura Código 0100 Grado 23 adscrito a la Dirección de infraestructura del Ministerio Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

No obstante, atendiendo a la experticia y conocimiento de la Servidora Pública **MARÍA CAROLINA ZÚÑIGA HERNÁNDEZ**, identificado con Cedula de Ciudadanía 32.907.441, quien actualmente se desempeña como Asesor Código 1020 Grado 18 del Despacho de la Ministra del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, relacionado con la formulación, estructuración, implementación y ejecución de Proyectos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el País, y con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio, procede encargarlo del empleo de Director Técnico de la Dirección de Infraestructura Código 0100 Grado 23 adscrito a la Dirección de infraestructura del Ministerio Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a la Servidora Pública **MARÍA CAROLINA ZÚÑIGA HERNÁNDEZ**, con el fin de que apoye en el cumplimiento y gestión de las metas del área.

Por lo expuesto, procede terminar el encargo de la Dirección de Infraestructura Código 0100 Grado 23 adscrito a la Dirección de infraestructura del Ministerio Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al servidor público **JUAN MANUEL GUERRERO FORERO**, identificada con cédula de ciudadanía 1.049.616.253.

En efecto, mediante Estudio Técnico suscrito el 19 de noviembre de 2025 la SUBDIRECTORA PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, establece que, analizada la hoja de vida de la servidora **MARÍA CAROLINA ZÚÑIGA HERNÁNDEZ**, se evidencia que acredita los requisitos y perfil requerido en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para desempeñar el empleo de director

Pública

técnico de la dirección de infraestructura Código 0100 Grado 23 adscrito a la Dirección de infraestructura del Ministerio Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Terminación del Encargo. Dar por terminado el encargo efectuado mediante Resolución N.° 03311 del 13 de agosto del 2025 del empleo Director Técnico de la Dirección de Infraestructura Código 0100 Grado23 adscrito a la Dirección de infraestructura del Ministerio Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al servidor público **JUAN MANUEL GUERRERO FORERO**, identificada con cédula de ciudadanía 1.049.616.253.

ARTÍCULO 2. Encargo. Encargar a la servidora pública **MARÍA CAROLINA ZÚÑIGA HERNÁNDEZ**, identificada con cédula de ciudadanía 32.907.441, titular del empleo Asesor Código 1020 Grado 18 del Despacho de la Ministra, en el empleo denominado Director Técnico de la Dirección de Infraestructura Código 0100 Grado 23 adscrito a la Dirección de infraestructura del Ministerio Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sin que se separe de las funciones propias de su cargo, a partir de la fecha de notificación del presento acto administrativo.

ARTÍCULO 3. Comunicación. Comunicar el contenido de la presente Resolución a los servidores **JUAN MANUEL GUERRERO FORERO** y **MARÍA CAROLINA ZÚÑIGA HERNÁNDEZ**, para los fines pertinentes.

ARTÍCULO 4. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de 2025.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado Digitalmente)
CARINA MURCIA YELA
Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaboró: Laura Mayerly Calderón Cárdenas - Abogada - GIT de Administración de Personal.
Revisó: Gysell Esther Sanz González - Subdirectora para la Gestión del Talento Humano

Edna Sánchez- Contratista Secretaría General

Olga Isabel Buelvas Dickson- Secretaria General

Pública

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Resolución MinTIC 04904 del 2025

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251119-205007-35a5a9-29608183

Creación: 2025-11-19 20:50:07

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-11-19 21:42:21

Escanee el código para verificación

Firma: Firmante del Acto Administrativo



Yeimi Carina Murcia Yela
1032434954
ymurciay@mintic.gov.co
Ministra
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Resolución MinTIC 04904 del 2025

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251119-205007-35a5a9-29608183
Creación: 2025-11-19 20:50:07
Estado: Finalizado
Finalización: 2025-11-19 21:42:21

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Yeimi Carina Murcia Yela ymurciay@mintic.gov.co Ministra Ministerio de Tecnologías de la Información y las	Aprobado	Env.: 2025-11-19 20:50:10 Lec.: 2025-11-19 21:42:07 Res.: 2025-11-19 21:42:21 IP Res.: 191.156.149.87


TIC

Líneas de Fomento 2.0

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2169 -2024

REUNIÓN SEGUIMIENTO No. 12

Enero 2026

CONSORCIO INTER-LÍNEAS 2.0

“Ejercer la Interventoría a las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras, y administrativas requeridas para la vigilancia y el seguimiento integral de la ejecución del proyecto Líneas de Fomento 2.0 de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico”

- Firma Contrato: 27 de diciembre de 2024
- Acta de Inicio: 31 de diciembre de 2024
- Inicio de Actividades: 31 de diciembre de 2024
- Fecha Terminación: 31 de julio de 2026
- Otrosí No 2: 01 de enero de 2026
- Valor: $5.143.899.395
- Estado: Activo y en ejecución

Líneas de Fomento 2.0

TIC




TEMAS

- Seguimiento compromisos anteriores
- Estado documental
- Informes de interventoría
- Estado pago interventoría
- Fase del proyecto (planeación- instalación- operación)
- Finalización operación metas
- Finalización resoluciones
- Estado pagos resoluciones
- Estado revisión informes mensuales ejecutores
- Informes de posible incumplimiento
- Personal Otrosí No. 2
- Varios



Seguimiento compromisos anteriores

Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
N/A	N/A	N/A

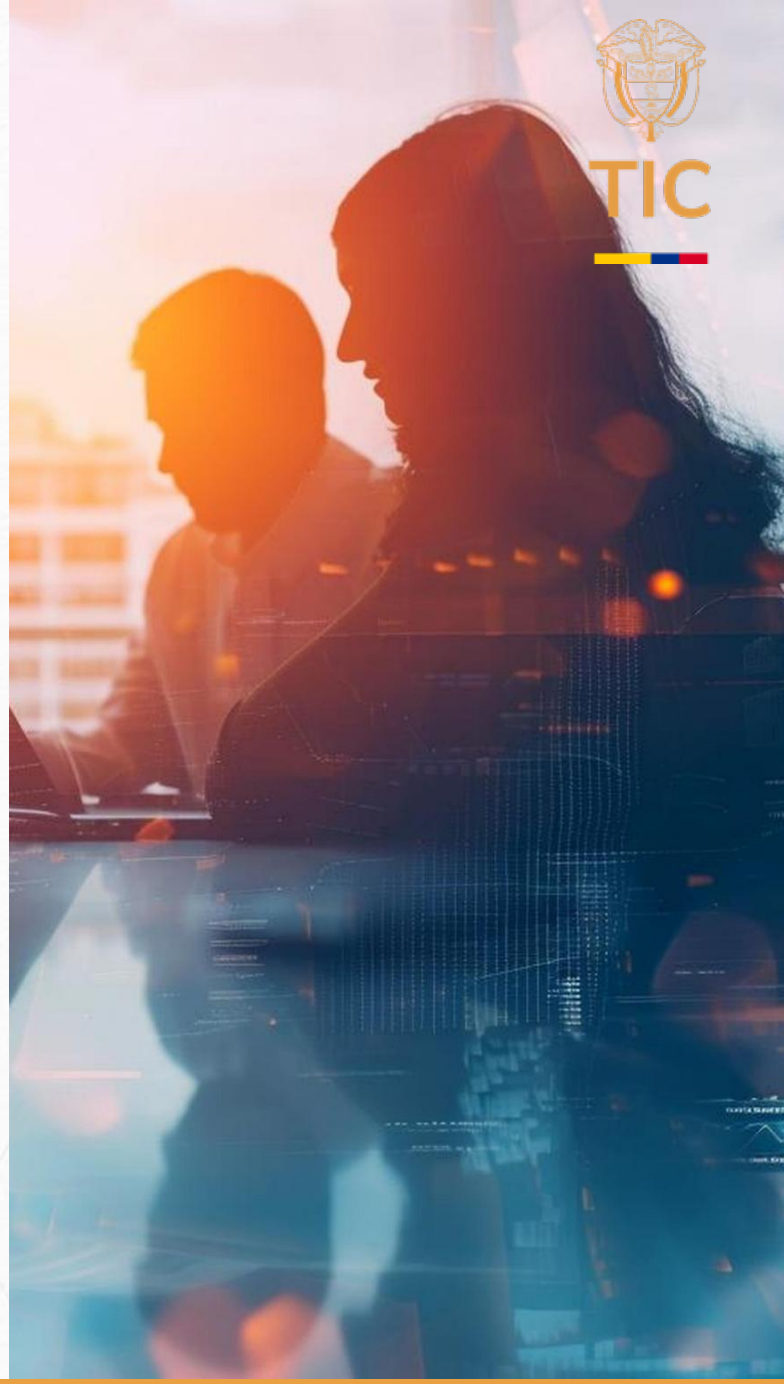

Estado documental – Actas comités operativos


Región	Enero-25	Febrero-25	Marzo-25	Abril-25	Mayo-25	Junio-25	Julio- 25	Agosto-25	Sept-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Enero 2026
Región 4	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 5	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 6	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 7	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 8	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Pte. Firmas	Ejecutada
Región 14	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 15	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 16	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 17	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 18	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 19	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 20	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 21	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 22	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 23	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 24	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 25	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 26	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 27	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 29	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 30	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 32	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 36	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 37	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 39	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada

Estado documental – actas de seguimiento

Mes	Fecha	Estado	Observaciones
Febrero-25	19/02/2025	Firmado	
Marzo-25	17/03/2025	Firmado	
Abril-25	16/04/2025	Firmado	
Mayo-25	14/05/2025	Firmado	
Junio-25	20/06/2025	Firmado	
Julio-25	29/07/2025	Firmado	
Agosto-25	21/08/2025	Firmado	
Septiembre-25	24/09/2025	Firmado	
Octubre-25	29/10/2025	Firmado	
Noviembre -25	28/11/2025	Firmado	
Diciembre -25	29/12/2025	Firmado	
Enero-26	29/01/2026	Programada	

Informes de interventoría

Mes	Radicado	Fecha radicado	Estado	Radicado
Enero-25	251013659	07/02/2025	Aprobado	252029280
Febrero-25 v1	251025247	07/03/2025	Con observaciones	252044798
Febrero-25 v2	251036136	31/03/2025	Aprobado	252057282
Marzo-25 v1	251039051	07/04/2025	Con observaciones	252059156
Marzo-25 v2	251047458	25/04/2025	Aprobado	252066925
Abril-25 v1	251052700	08/05/2025	Con observaciones	252078062
Abril-25 v2	251061902	26/05/2025	Aprobado	252091575
Informe periodo 1 v1	251065217	03/06/2025	Con observaciones	252089223
Informe periodo 1 v2	251067146	06/06/2025	Aprobado	252089964
Mayo-25-v2	251067628	09/06/2025	Con observaciones	252097450
Mayo-25-v2	251077238	01/07/2025	Aprobado	252107540
Junio-25-v1	241080674	07/07/2025	Con observaciones	252114745
Junio-25-v2	251095869	28/07/2025	Aprobado	252120665
Julio-25-v1	251103208	08/08/2025	Con observaciones	252134223
Julio-25-v2	251109083	25/08/2025	Aprobado	252153658
Agosto-25-v1	251114829	5/09/2025	Con observaciones	252156377
Agosto-25-v2	251123498	26/09/2025	Aprobado	252171011
Septiembre-25-v1	251127900	7/10/2025	Con observaciones	252173591
Septiembre-25-v2	251134014	22/10/2025	Aprobado	252179032
Octubre-25-v1	251141681	10/11/2025	Con observaciones	252194155
Octubre-25-v2	251147895	25/11/2025	Aprobado	252200630
Noviembre-25-v1	251151010	3/12/2025	Aprobado	252204835
Diciembre-25-v1	251158293	22/12/2025	En revisión	252220064
Diciembre-25-v2	251130240	30/12/2026	Aprobado	262026687

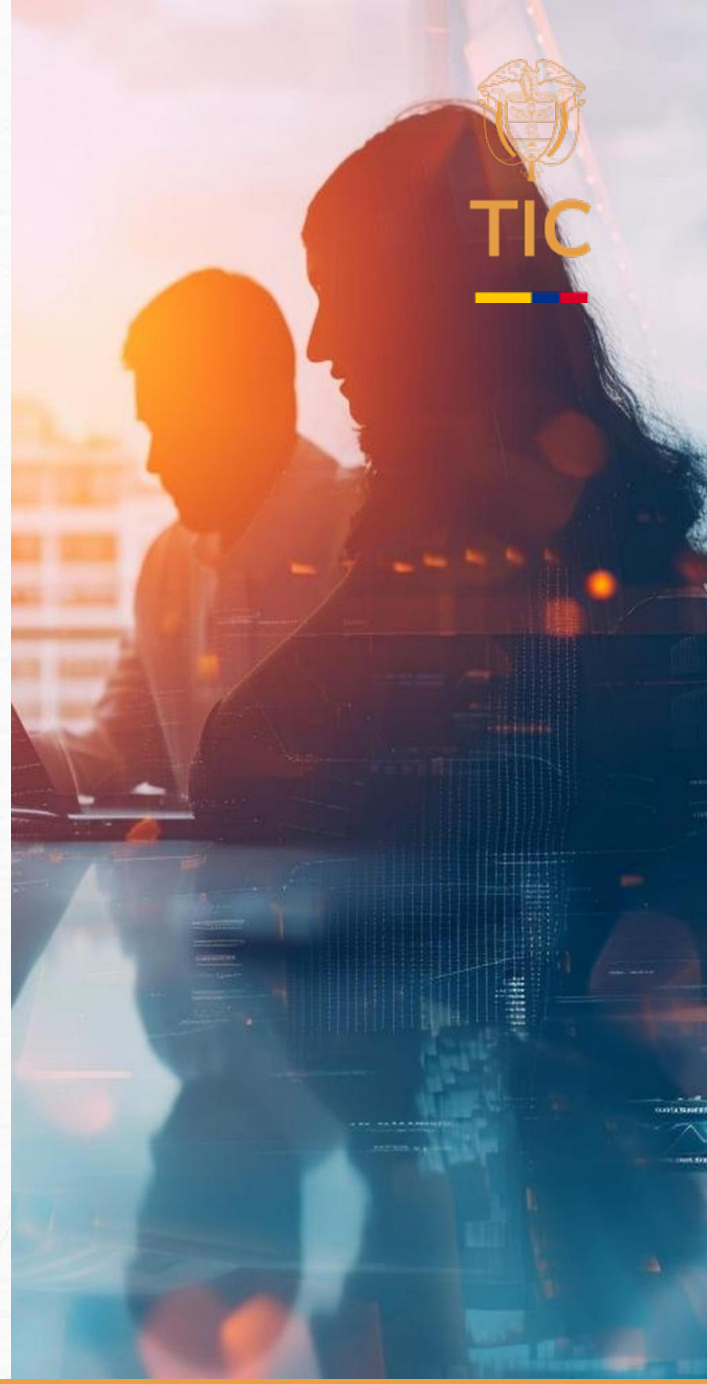

Estado pagos de interventoría

VALOR HASTA	PORCENTAJE	CONCEPTO	ESTADO
$ 1.117.278.416	21,72%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 1) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 257429925 2025-07-11
$ 985.078.317	19,15%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 2) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 240380625 2025-07-11
$ 576.181.089	11,2%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 3) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 298756225 2025-08-22
$ 576.181.090	11,2%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 4) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 426918025 2025-11-10.
$ 384.120.724	7,46%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 5) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 544979025 2025-12-29.
$ 192.060.364	3,73%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 6) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PENDIENTE
$375.142.684	7,29%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 7) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico. (iii) Soporte de pago del impuesto sobre el valor total de la adición de acuerdo con las instrucciones establecidas en la Circular Externa 010 del 05 de marzo de 2025 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	PENDIENTE
$375.142.684	7,29%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 8) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PENDIENTE
$562.714.027	10,94	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 9) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PENDIENTE
$5.143.899.395	**100%**		

Fase de planeación

Región	Ejecutor	Repositorio información	IDIO	Plan Comercialización	Plan Instalación	Plan Mantenimiento
Región 4	SPACE COMUNICACIONES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 5	EME INGENIERIA	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 6	EME INGENIERIA	A conformidad ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 7	DIGINORTE	A conformidad ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 8	HIZ TELECOMUNICACIONES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 14	UT FOMENTO CASA	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 15	INTERMEGAMUNDO	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 16	UT FIBRANOVATEL -UC7	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 17	UT MEGAINTERCONECTA 2	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 18	UT CONECTANDO REGIONES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 19	UT CONECTANDO BAJO	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 20	PUNTO RED TELECOM	A conformidad ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 21	CF INGENIEROS	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 22	UT CONECTANDO REGIONES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 23	UT FIBERCOL UC6	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 24	UT UNA COLOMBIA 5	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 25	UT INTERSOCIAL META	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 26	UT FOMENTO NORTE	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 27	UT FOMENTO NORTE	A conformidad ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 29	NET I.S.P	A conformidad ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 30	SÚPER REDES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 32	UT CONECTANDO REGIONES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 36	UT ASINTEL UC	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 37	NETWORKS TV	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 39	UT INTERSOCIAL CUNDI	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑

Fase de instalación

Región	Metas	Aprobados	Finalizado	Rechazados	En Subsanaciòn	En Revisión	Total
Región 4	3142,00	3142	0	81	0	0	3142
Región 5	2706,00	2706	0	4	0	0	2706
Región 6	2133,00	2133	0	2	0	0	2133
Región 7	1027,00	1027	0	1	0	0	1027
Región 8	3701,00	3701	0	2	0	0	3701
Región 14	1330,00	1327	0	11	2	1	1330
Región 15	2325,00	2325	0	4	0	0	2325
Región 16	2279,00	2279	0	13	0	0	2279
Región 17	2420,00	2420	0	50	0	0	2420
Región 18	4249,00	4249	0	14	0	0	4249
Región 19	2134,00	2134	0	1	0	0	2134
Región 20	3029,00	2878	151	1	0	0	3029
Región 21	2146,00	2039	107	9	0	0	2146
Región 22	3909,00	3909	0	71	0	0	3909
Región 23	2310,00	2310	0	11	0	0	2310
Región 24	2543,00	2416	127	5	0	0	2543
Región 25	1413,00	1412	0	9	1	0	1413
Región 26	1391,00	1391	0	52	0	0	1391
Región 27	1279,00	1279	0	40	0	0	1279
Región 29	2567,00	2567	0	84	0	0	2567
Región 30	763,00	763	0	3	0	0	763
Región 32	2621,00	2621	0	20	0	0	2621
Región 36	1346,00	1346	0	22	0	0	1346
Región 37	1601,00	1601	0	0	0	0	1601
Región 39	644,00	644	0	1	0	0	644
	55.008	**54.619**	**385**	**511**	**3**	**1**	**55.008**

TIC

Líneas de Fomento 2.0

Fase de operación

Región	Accesos meta	Accesos meta 1	Inicio operación meta 1	Accesos meta 2	Inicio operación meta 2	Accesos meta 3	Inicio operación meta 3
Región 4	3.142	157	29/11/24	1.414	11/03/25	1.571	19/06/2025
Región 5	2.706	135	1/02/25	1.218	2/05/25	1.353	01/07/2025
Región 6	2.133	107	3/03/25	960	7/06/25	1.067	01/08/2025
Región 7	1.027	51	29/11/24	462	7/03/25	514	29/04/2025
Región 8	3.701	185	29/11/24	1.665	1/04/25	1.851	30/09/2025
Región 14	1.330	66	7/12/24	599	24/02/25	665	01/04/2025
Región 15	2.325	116	1/12/24	1.046	1/12/24	1.163	01/04/2025
Región 16	2.279	114	30/11/24	1.026	5/03/25	1.139	28/05/2025
Región 17	2.420	121	21/12/24	1.089	21/12/24	1.210	08/04/2025
Región 18	4.249	212	3/12/24	1.912	30/04/25	2.125	01/08/2025
Región 19	2.134	107	6/12/24	960	1/04/25	1.067	25/06/2025
Región 20	3.029	151	29/11/24	1.363	30/04/25	1.515	27/06/2025
Región 21	2.146	107	29/11/24	966	24/04/25	1.073	01/07/2025
Región 22	3.909	195	3/12/24	1.759	12/05/25	1.955	18/07/2025
Región 23	2.310	116	4/12/24	1.040	12/05/25	1.154	01/07/2025
Región 24	2.543	127	29/11/24	1.144	26/03/25	1.272	30/05/2025
Región 25	1.413	71	1/02/25	636	7/03/25	706	01/04/2025
Región 26	1.391	70	11/03/25	626	12/06/25	695	30/10/2025
Región 27	1.279	64	11/03/25	576	24/06/25	640	27/10/2025
Región 29	2.567	128	10/03/25	1.155	28/05/25	1.284	27/08/2025
Región 30	763	38	1/02/25	343	7/03/25	382	29/04/2025
Región 32	2.621	131	3/12/24	1.179	20/05/25	1.311	30/07/2025
Región 36	1.346	67	7/04/25	606	3/06/25	673	14/08/2025
Región 37	1.601	80	7/12/24	720	13/03/25	801	25/04/2025
Región 39	644	32	21/02/25	290	11/03/25	322	29/04/2025
	55.008	**2.748**		**24.754**		**27.506**	

Finalización operación metas

Región	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Observaciones
Región 4	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1
Región 5	En operación	En operación	En operación	
Región 6	En operación	En operación	En operación	
Región 7	Finalizada	En operación	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG07-03992-26 / 261006468
Región 8	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1
Región 14	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1
Región 15	Finalizada	Finalizada	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar metas 1 y 2
Región 16	Finalizada	Finalizada	Finalizada	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar metas 1, 2 y 3
Región 17	Finalizada	Finalizada	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición) para poder cerrar metas 1 y 2
Región 18	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1
Región 19	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1
Región 20	Finalizada	En operación	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG20-03991-26 / 261006201
Región 21	Finalizada	Finalizada	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG21-03940-26 / 261003727
Región 22	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1
Región 23	Finalizada	Finalizada	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar metas 1 y 2
Región 24	Finalizada	Finalizada	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG24-03725-25 / 251156256
Región 25	En operación	En operación	En operación	
Región 26	En operación	En operación	En operación	
Región 27	En operación	En operación	En operación	
Región 29	Finalizada	Finalizada	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1
Región 30	En operación	En operación	En operación	
Región 32	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1
Región 36	En operación	En operación	En operación	
Región 37	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1
Región 39	En operación	En operación	En operación	

TIC

Líneas de Fomento 2.0

Finalizadas: 25
En Operación: 50
Finalizadas formalmente: 4

Finalización resoluciones

ENERO 2026		
Región	**Fecha fin resolución**	**Tiempo adicional estimado**
16	31/01/26	1 mes
24	31/01/26	15 días

FEBRERO 2026		
Región	**Fecha fin resolución**	**Tiempo adicional estimado**
21	28/02/26	2.5 meses
23	28/02/26	1 mes

MARZO 2026		
Región	**Fecha fin resolución**	**Tiempo adicional estimado**
14	31/03/26	Pendiente
15	31/03/26	Pendiente
25	31/03/26	Pendiente

ABRIL 2026		
Región	**Fecha fin resolución**	**Tiempo adicional estimado**
7	30/04/26	Pendiente
17	30/04/26	Pendiente
29	30/04/26	Pendiente
30	30/04/26	Pendiente
37	30/04/26	Pendiente
39	30/04/26	Pendiente

JUNIO 2026		
Región	**Fecha fin resolución**	**Tiempo adicional estimado**
4	30/06/26	Pendiente
5	30/06/26	Pendiente
19	30/06/26	Pendiente
20	30/06/26	Pendiente
36	31/05/25 (13/06/26)*	Pendiente

JULIO 2026		
Región	**Fecha fin resolución**	**Tiempo adicional estimado**
6	31/07/26	Pendiente
18	31/07/26	Pendiente
22	30/06/25 (17/07/26)*	Pendiente
32	31/07/26	Pendiente

SEPTIEMBRE 2026		
Región	**Fecha fin resolución**	**Tiempo adicional estimado**
8	30/09/26	Pendiente

OCTUBRE 2026		
Región	**Fecha fin resolución**	**Tiempo adicional estimado**
26	30/06/25 (29/10/26)*	Pendiente
27	31/08/25 (26/10/26)*	Pendiente

TIC

Líneas de Fomento 2.0

* Regiones con accesos reportados después de fecha fin de prórroga. Las fechas mostradas corresponden al fin de operación (10 meses para R36 y 12 meses para R22, R26 y R27)

Estado visitas de campo

Mes	Región	Departamento	Municipio	Cantidad de Visitas Programadas	Cantidad de Visitas Ejecutadas	Tipo de Visita
mar-25	39	Cundinamarca	Tena	27	43	Aprobación
	25	Meta	Puerto López	48	74	Aprobación
	20	Meta	Vistahermosa	70	88	Aprobación
	27	Nte. De Santander	Cachirá	54	0	Aprobación
	37	Tolima	Chaparral	67	60	Aprobación
	36	Tolima	Purificación	43	35	Aprobación
abr-25	4	Atlántico	Sabanalarga	115	149	Aprobación
	5	Atlántico	Galapa	35	33	Aprobación
	6	Atlántico	Luruaco	100	69	Aprobación
	15	Cesar	Pailitas	85	0	Aprobación
	15	Cesar	Curumani	0	84	Aprobación
	16	Cesar	Bosconia	85	85	Aprobación
	17	Cesar	San Alberto	85	83	Aprobación
may-25	21	Magdalena	Plato	125	127	Aprobación
	22	Magdalena	Fundación	125	125	Aprobación
	24	Magdalena	Santa Ana	48	52	Aprobación
	Total visitas de aprobación			**1.112**	**1.107**	
	7	Bolivar	Cicuco	81	83	Calidad
	7	Bolivar	Talaigua nuevo	81	82	Calidad
	24	Magdalena	Santa Ana	40	40	Calidad


Estado visitas de campo

Mes	Región	Departamento	Municipio	Cantidad de Visitas Programadas	Cantidad de Visitas Ejecutadas	Tipo de Visita
jun-25	32	Sucre	Coveñas	120	121	Calidad
	32	Sucre	Ovejas	120	121	Calidad
	32	Sucre	San Onofre	60	62	Calidad
	14	Casanare	Paz de Ariporo	300	300	Calidad
	19	Córdoba	Tuchin	300	300	Calidad
	29	Putumayo	Puerto Asis	70	104	Calidad
	29	Putumayo	Villagarzon	150	116	Calidad
	29	Putumayo	Puerto Caicedo	80	80	Calidad
jul-25	23	Magdalena	Salamina	70	71	Calidad
	23	Magdalena	Pivijay	230	230	Calidad
	18	Córdoba	Cerete	140	141	Calidad
	18	Córdoba	San Carlos	30	32	Calidad
	18	Córdoba	Planeta Rica	130	131	Calidad
	30	Risaralda	Quinchía	190	172	Calidad
	30	Risaralda	Guática	70	83	Calidad
	30	Risaralda	La Celia	40	45	Calidad

Estado visitas de campo


Mes	Región	Departamento	Municipio	Cantidad de Visitas Programadas	Cantidad de Visitas Ejecutadas	Tipo de Visita
ago-25	8	Bolivar	Arjona	150	153	Calidad
	8	Bolivar	Arroyohondo	25	25	Calidad
	8	Bolívar	Clemencia	25	27	Calidad
	8	Bolivar	Mahates	50	52	Calidad
	8	Bolivar	San Cristobal	25	26	Calidad
	8	Bolivar	San Estanislao	25	27	Calidad
	20	Meta	El Castillo	25	25	Calidad
	20	Meta	Fuente De Oro	25	21	Calidad
	20	Meta	Granada	130	159	Calidad
	20	Meta	Lejanias	25	20	Calidad
	20	Meta	San Juan De Arama	20	0	Calidad
	25	Meta	Castilla La Nueva	25	25	Calidad
	25	Meta	Guamal	25	25	Calidad
	25	Meta	San Martin	25	25	Calidad
	4	Atlántico	Palmar De Varela	30	31	Calidad
	4	Atlántico	Sabanagrande	30	31	Calidad
	4	Atlántico	Santo Tomas	90	91	Calidad
	5	Atlántico	Malambo	90	91	Calidad
	6	Atlántico	Campo De La Cruz	30	31	Calidad
	6	Atlántico	Candelaria	30	31	Calidad
	26	N. Santander	El Zulia	75	75	Calidad
	26	N. Santander	San Cayetano	25	25	Calidad
Total visitas de calidad				**3.302**	**3.330**	
TOTAL APROBACION Y CALIDAD				**4.414**	**4.437**	

Llamadas Realizadas

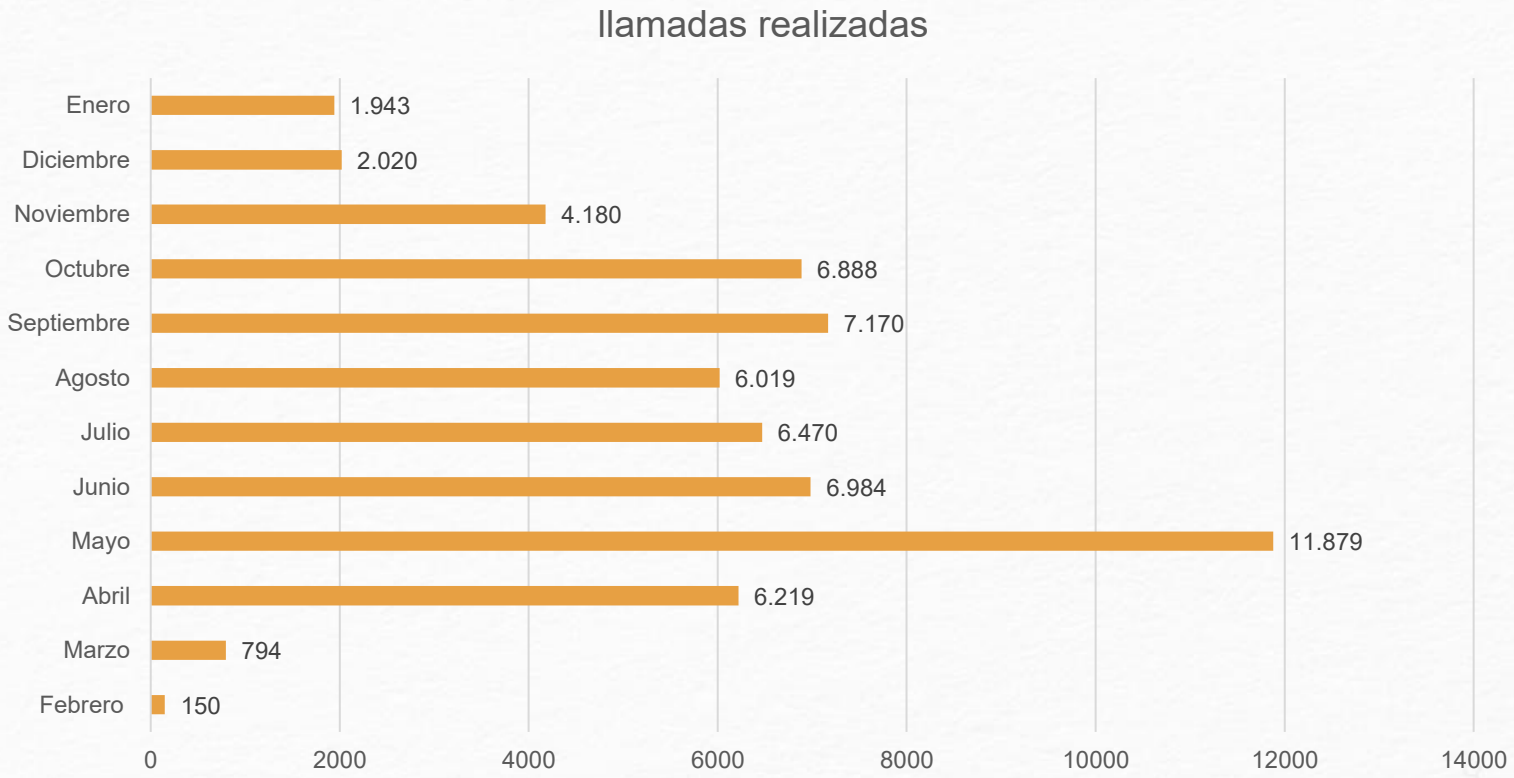

Con corte al presente comité , la interventoría ha llevado a cabo un total de 60.716 llamadas a los usuarios beneficiarios del proyecto. Estas comunicaciones telefónicas tienen como propósito principal validar la calidad del servicio de internet brindado, a fin de garantizar que se estén cumpliendo los estándares establecidos en los lineamientos técnicos y contractuales.

Conclusión de la llamada

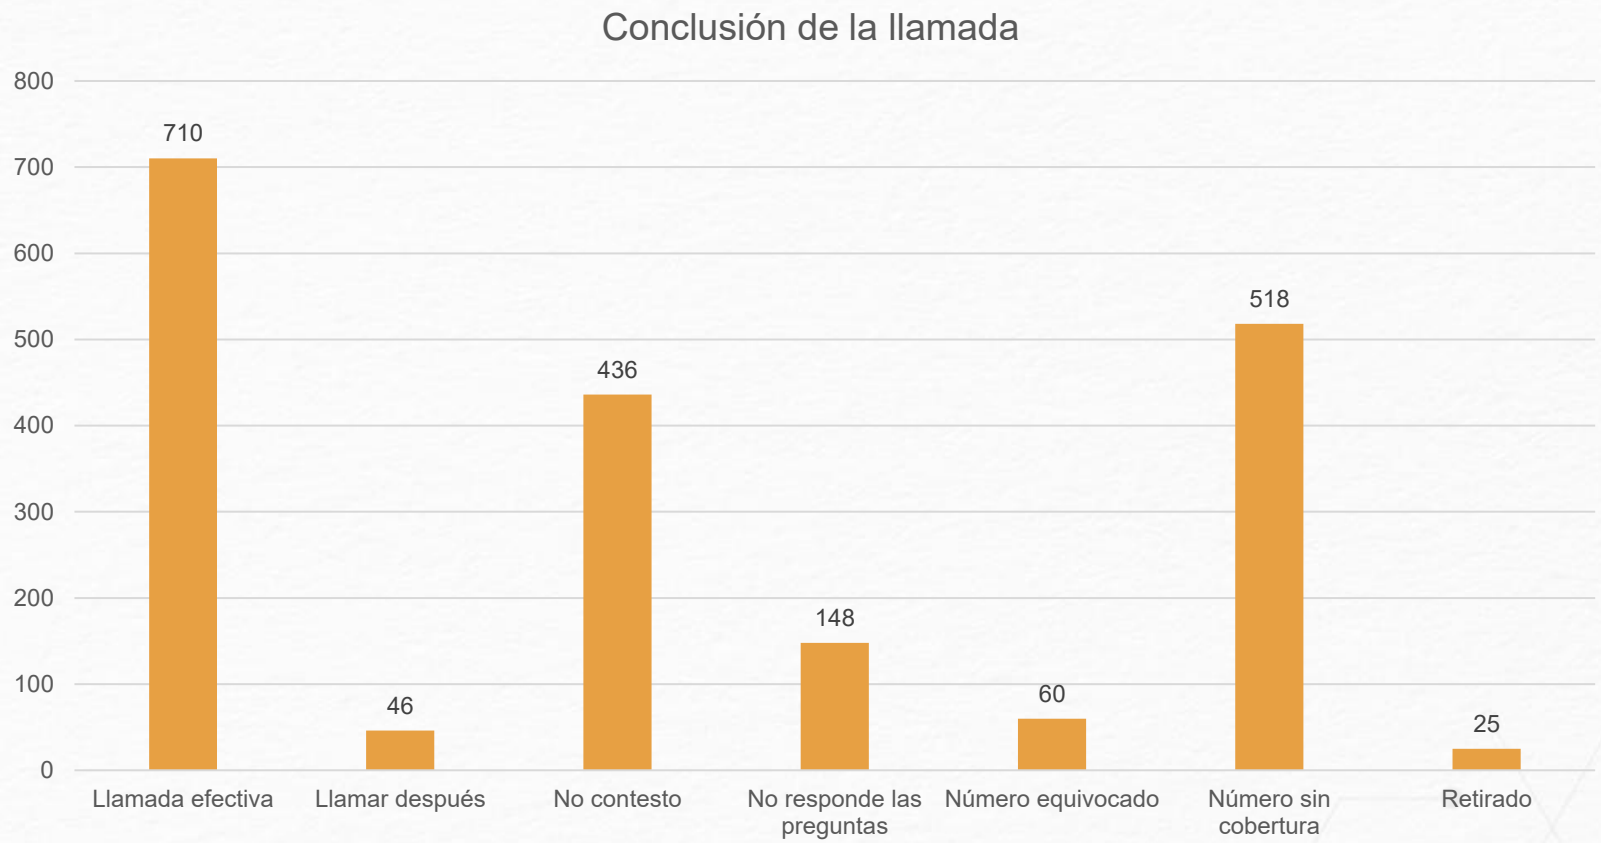

Consolidado de pagos

Región	Ejecutor	valor total capex regiones	pagado	por pagar
4	SPACE COMUNICACIONES S.A.S	$ 1.596.613.584	$ 1.596.613.584	$ 0
5	EME INGENIERIA S.A. BIC.	$ 1.375.059.312	$ 1.375.059.312	$ 0
6	EME INGENIERIA S.A. BIC.	$ 1.083.888.216	$ 1.083.888.216	$ 0
7	DIGINORTE S.A.S.	$ 521.872.104	$ 521.872.104	$ 0
8	HIZ TELECOMUNICACIONES S.A.S.	$ 1.880.670.552	$ 940.335.276	$ 0
14	UT FOMENTO CASANARE 2.0	$ 675.842.160	$ 675.842.160	$ 0
15	INTERMEGAMUNDO PARTNERS S.A.S.	$ 1.181.453.400	$ 1.181.453.400	$ 0
16	UNIÓN TEMPORAL FIBRANOVATEL -UC7	$ 1.158.078.408	$ 1.158.078.408	$ 0
17	UNION TEMPORAL MEGAINTERCONECTA 2	$ 1.229.727.840	$ 1.229.727.840	$ 0
18	UNIÓN TEMPORAL CONECTANDO REGIONES SRCC	$ 2.159.137.848	$ 2.159.137.848	$ 0
19	UT CONECTANDO BAJO SINU	$ 1.084.396.368	$ 1.084.396.368	$ 0
20	PUNTO RED TELECOMUNICACIONES SAS	$ 1.539.192.408	$ 1.539.192.408	$ 0
21	CF INGENIEROS SAS	$ 1.090.494.192	$ 1.090.494.192	$ 0
22	UNIÓN TEMPORAL CONECTANDO REGIONES SRCC	$ 1.986.366.168	$ 993.450.592	$ 0
23	UNIÓN TEMPORAL FIBERCOL UC6	$ 1.173.831.120	$ 1.173.831.120	$ 0
24	UNIÓN TEMPORAL UNA COLOMBIA 5	$ 1.292.230.536	$ 1.292.230.536	$ 0
25	UNIÓN TEMPORAL INTERSOCIAL META	$ 718.018.776	$ 718.018.776	$ 0
26	UT FOMENTO DEL NORTE	$ 706.839.432	$ 706.839.432	$ 0
27	UT FOMENTO DEL NORTE	$ 649.926.408	$ 649.926.408	$ 0
29	Redes y Servicios de Telecomunicaciones NET I.S.P S.A.S.,	$ 1.304.426.184	$ 652.213.092	$ 0
30	SÚPER REDES S.A.S	$ 387.719.976	$ 387.719.976	$ 0
32	UNIÓN TEMPORAL CONECTANDO REGIONES SRCC	$ 1.331.866.392	$ 666.582.734	$ 0
36	UNION TEMPORAL ASINTEL UC	$ 683.972.592	$ 683.972.592	$ 0
37	NETWORKS TV S.A.S	$ 813.551.352	$ 813.551.352	$ 0
39	UNIÓN TEMPORAL INTERSOCIAL CUNDINAMARCA	$ 327.249.888	$ 327.249.888	$ 0
	TOTALES	**$ 27.952.425.216 100%**	**$ 27.952.425.216 100%**	**$ 0 0%**

Resumen de pagos

	Radicados interventoría*	Pagos realizados o radicados ante FUTIC	Pagos ptes. para completar meta
Pago 1	25	25	0
Pago 2	25	25	0
Pago 3	25	25	0
Total	**75**	**75**	**0**

* En el 2024 fueron aprobados 14 pagos por la supervisión de los cuales la Interventoría realizó la validación y verificación integral en cuanto el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de pago establecidos en las resoluciones, anexo técnico y adendas.

Estado revisión informes mensuales ejecutores

Región	Pago	Informes														
		Oct-24	Nov-24	Dic-24	Ene-25	Feb-25	Mar-25	Abr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Ago-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25
Región 4	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 5	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 6	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 7	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 8	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 14	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 15	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 16	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 17	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R	R
Región 18	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 19	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 20	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 21	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 22	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R	OK
Región 23	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 24	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 25	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 26	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R	R
Región 27	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R	R
Región 29	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 30	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 32	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 36	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 37	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 39	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S

RESUMEN


S: En subsanación	7
R: En revisión	11
SE: Sin entregar	0
OK: APROBADO	357

INFORMES DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO

REGIÓN	INFORME DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO	FECHA	TEMA	TASACIÓN	TOTAL TASACIONES	SUPERACIÓN
8	LFF2-INTV-DIRINFRA-00010-25 (251120461)	18/09/2025	Respuesta a Requerimiento	$17.344.787,70	$29.195.263,75	Parcialmente superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00014-25 (251129596)	10/10/2025	Informes	$11.850.476,05		Superado
26	LFF2-INTV-DIRINFRA-00001-25 (251082544)	10/07/2025	Metas	$7.143.586,09	$39.451.462,40	Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00003-25 (251111224)	28/08/2025	Registro (logs)	$20.502.828,52		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00006-25 (251115061)	8/09/2025	Informes	$9.756.237,85		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00011-25 (251127417)	6/10/2025	Informes	$1.024.404,97		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00015-25 (251132896)	20/10/2025	Informes	$1.024.404,97		Superado
27	LFF2-INTV-DIRINFRA-00004-25 (251111902)	29/08/2025	Registro (logs)	$18.853.175,65	$35.415.985,05	Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00007-25 (251117436)	11/09/2025	Metas	$7.143.586,09		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00008-25 (251117593)	11/09/2025	Informes	$7.706.637,25		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00012-25 (251128211)	8/10/2025	Informes	$856.293,03		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00016-25 (251132897)	20/10/2025	Informes	$856.293,03		Superado
29	LFF2-INTV-DIRINFRA-00002-25 (251099528)	30/07/2025	Informes	$11.939.827,77	$53.950.332,90	Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00013-25 (251128212)	8/10/2025	Informes	$2.100.525,26		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00017-25 (251132898)	20/10/2025	Informes	$2.100.525,26		Superado*
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00018-25 (251156188)	17/12/2025	Respuesta a Requerimiento y mantenimiento	$37.809.454,61		Superado*
36	LFF2-INTV-DIRINFRA-00005-25 (251112325)	1/09/2025	Registro (logs)	$19.825.292,52	$29.154.841,94	Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00009-25 (251117880)	12/09/2025	Informes	$9.329.549,42		Superado

* En proyección y/o radicación de actualización de estado

Personal Otrosí No. 2

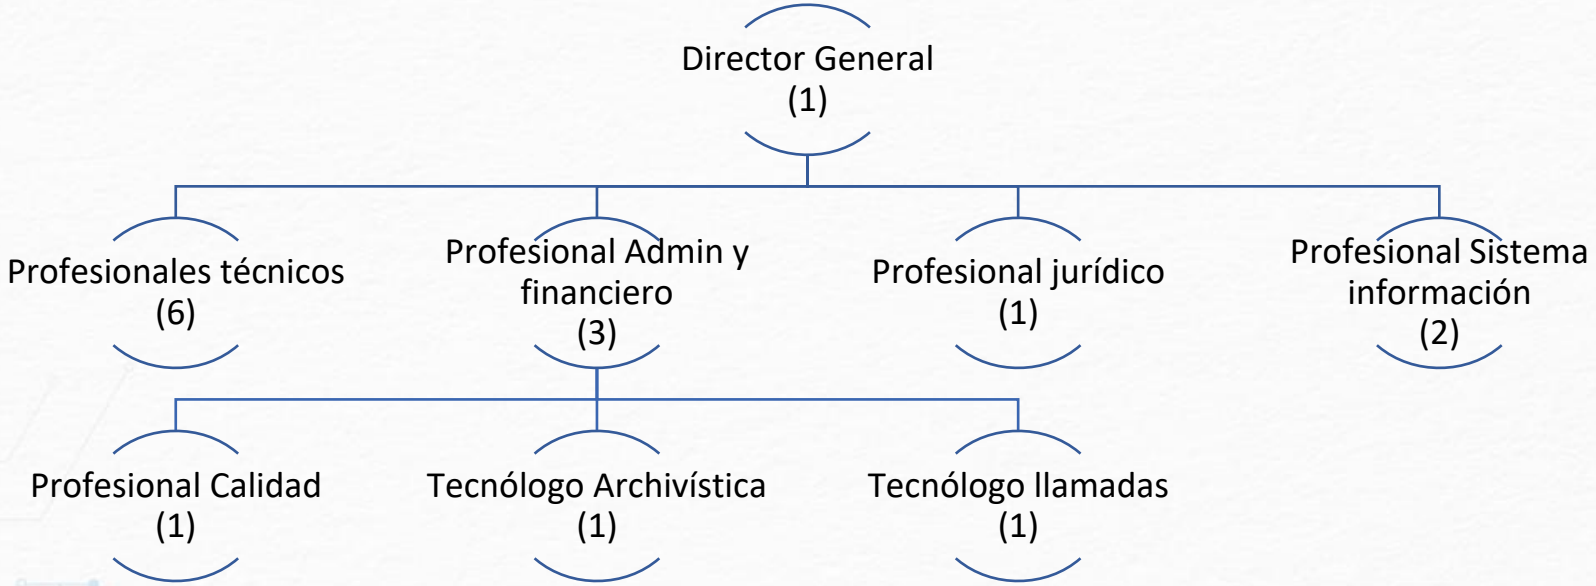

Cargo	Cantidad
Director de interventoría	1
Profesional técnico	6
Profesional jurídico	1
Profesional Admin y Financiero	3
Profesional Sistema de información	2
Profesional de calidad	1
Tecnólogo archivista	1
Tecnólogo llamadas	1
Total	**16**

Varios

- Socialización de PQR

TIC

2026

Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones
Tel:+57(601) 344 34 60
Edif. Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12 y 13, Bogotá,
Colombia - Código Postal 111711 www.mintic.gov.co

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO/IEC 27001:2013
EMPRESA CERTIFICADA

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta_seguimiento12_INTV-FUTIC Consolidada

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260203-110951-7b6855-99111584
Estado: Finalizado

Creación: 2026-02-03 11:09:51
Finalización: 2026-02-05 15:16:02

Escanee el código para verificación

Firma: Director de Interventoría LF 2.0




Juan Fernando Barrero Gonzalez
5826043
jbarrero@scain.co
Director Interventoría
Consorcio Inter-Lineas 2.0

Firma: Directora de Infraestructura (E)



MARIA CAROLINA ZUÑIGA HERNANDEZ
32907441
mzuniga@mintic.gov.co
ASESORA DESPACHO DE LA MINISTRA
MINTIC

Firma: Contratista



Roberto Carlos Rubio Bautista
75102069
rrubio@mintic.gov.co
Contratista
MinTIC

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Acta_seguimiento12_INTV-FUTIC Consolidada

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260203-110951-7b6855-99111584
Creación: 2026-02-03 11:09:51
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-02-05 15:16:02

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Roberto Carlos Rubio Bautista rrubio@mintic.gov.co Contratista MinTIC	Aprobado	Env.: 2026-02-03 11:09:55 Lec.: 2026-02-03 11:15:16 Res.: 2026-02-03 11:15:37 IP Res.: 191.95.50.49 Canal: Email
Firma	MARIA CAROLINA ZUÑIGA HERNANDEZ mzuniga@mintic.gov.co ASESORA DESPACHO DE LA MINISTRA MINTIC	Aprobado	Env.: 2026-02-03 11:15:37 Lec.: 2026-02-05 15:09:58 Res.: 2026-02-05 15:10:18 IP Res.: 186.28.2.189 Canal: Email
Firma	Juan Fernando Barrero Gonzalez jbarrero@scain.co Director Interventoría Consorcio Inter-Lineas 2.0	Aprobado	Env.: 2026-02-05 15:10:18 Lec.: 2026-02-05 15:16:00 Res.: 2026-02-05 15:16:02 IP Res.: 186.155.163.120 Canal: Email
