TIC	**ACTA DE REUNIÓN**	mig

CÓDIGO TRD: 2100				
ACTA No.	**LUGAR:**	**FECHA:**	**HORA DE INICIO:**	**HORA FINAL:**
13	Google Meet	26/02/2026	10:00 AM	11:00 AM

OBJETO DE LA REUNIÓN
Reunión de seguimiento entre responsable MINTIC e interventoría Consorcio Interlineas 2.0, contrato de interventoría No. 2169-2024 cuyo objeto es: *"Ejercer la Interventoría a las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras, y administrativas requeridas para la vigilancia y el seguimiento integral de la ejecución del proyecto Líneas de Fomento 2.0 de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico".*

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación
2. Seguimiento compromisos anteriores
3. Estado documental
4. Informes de interventoría
5. Estado pago interventoría
6. Fase del proyecto (planeación- instalación- operación)
7. Finalización operación metas
8. Estado pagos resoluciones
9. Estado revisión informes mensuales ejecutores
10. Informes de posible incumplimiento
11. Varios
12. Cierre

1. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

ITEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
	N/A	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

2. Presentación

Se realiza la reunión de seguimiento por medio de la plataforma Google Meet, con presencia del equipo de interventoría Consorcio Inter-líneas 2.0 y responsable MINTIC.

La vocería de la reunión estuvo a cargo del equipo de interventoría Consorcio Inter-Líneas 2.0

3. Estado documental

Frente al estado actual de las actas de comité operativo y de seguimiento del año 2025 (enero- diciembre) y 2026 (enero-febrero), a continuación, se relaciona el estado por región

Región	Ene-25	Feb-25	Mar-25	Abr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Agos-25	Sept-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26
4	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
5	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
6	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

7	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
8	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	**Pte. Firmas**	**Pte. Firmas**	Ejecutada
14	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
15	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
16	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
17	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
18	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
19	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
20	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
21	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
22	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
23	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
24	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
25	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
26	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
27	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
29	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
30	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
32	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
36	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
37	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
39	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada

De igual forme se relaciona el estado documental de las actas de seguimiento entre la interventoría y responsable MINTIC

Mes	Fecha	Estado	Observaciones
Febrero-25	19/02/2025	Firmado	
Marzo-25	17/03/2025	Firmado	
Abril-25	16/04/2025	Firmado	
Mayo-25	15/05/2025	Firmado	
Junio-25	20/06/2025	Firmado	
Julio-25	28/07/2025	Firmado	
Agosto-25	21/08/2025	Firmado	
Septiembre-25	24/09/2025	Firmado	
Octubre-25	29/10/2025	Firmado	
Noviembre -25	28/11/2025	Firmado	
Diciembre -25	29/12/2025	Firmado	
Enero - 26	29/01/2026	Firmado	
Febrero-26	26/02/2026	Programado	

4. Informes de interventoría

Con relación a los informes mensuales de interventoría, se informa acerca de la fecha de entrega de estos.

Mes	Radicado	Fecha radicación	Estado	Radicado
Enero-25	251013659	07/02/2025	Aprobado	252029280
Febrero-25 v2	251036136	31/03/2025	Aprobado	252057282
Marzo-25 v2	251047458	25/04/2025	Aprobado	252066925
Abril-25 v2	251061902	26/05/2025	Aprobado	252091575
Informe periodo 1 v2	251067146	06/06/2025	Aprobado	252089964
Mayo-25-v2	251077238	01/07/2025	Aprobado	252107540
Junio-25-v2	251095869	22/07/2025	Aprobado	252120665
Julio-25-v2	251109083	25/08/2025	Aprobado	252153658
Agosto-25-v2	251123498	26/09/2025	Aprobado	252171011
Septiembre-25-v2	251134014	22/10/2025	Aprobado	252179032
Octubre-25-v2	251147895	25/11/2025	Aprobado	252200630

Noviembre-25-v1	251151010	3/12/2025	Aprobado	252204835
Diciembre-25-v2	251130240	30/12/2026	Aprobado	262026687
Enero-26-v1	261022614	06/02/2026	Con observaciones	262040003

5. Estado pago interventoría

Conforme al estado actual de pagos a la interventoría se relaciona la información consignada en la siguiente tabla, en donde se indica los pagos a realizar para el contrato de interventoría 2169-2024. Asimismo, se relaciona el estado de cada uno referente al trámite surtido.

VALOR HASTA	%	CONCEPTO	ESTADO
$ .117.278.416	21,72%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 1) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 257429925
$ 985.078.317	19,15%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 2) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 240380625 2025-07-11
$ 576.181.089	11,2%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 3) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 298756225 2025-08-22
$ 576.181.090	11,2%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 4) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 426918025 2025-11-10.
$ 384.120.724	7,46%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 5) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 544979025 2025-12-29.
$ 192.060.364	3,73%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 6) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	*LFF2-INTV-DIRINFRA-04146-26* 11/02/2026 con radicado MinTic 261014275
$375.142.684	7,29%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 7) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico. (iii) Soporte de pago del impuesto sobre el valor total de la adición de acuerdo con las instrucciones establecidas en la Circular Externa 010 del 05 de marzo de 2025 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	PENDIENTE
$375.142.684	7,29%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 8) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PENDIENTE
$562.714.027	10,94	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 9) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PENDIENTE
$5.143.899.395	**100%**		

Referente al pago No. 6 de la Interventoría, **la Supervisión** informa que, efectivamente, el día de hoy quedó radicado ante el área financiera el pago número seis del Contrato 2169

6. Fase planeación

En cuanto a la fase de planeación, a continuación, se expone el estado actual por región frente a documentos de planeación requeridos:

- ✓ Repositorio de información
- ✓ IDIO
- ✓ Plan de comercialización
- ✓ Plan de instalación
- ✓ Plan de mantenimiento

Región	Ejecutor	Repositorio información	IDIO	Plan Comercialización	Plan Instalación	Plan Mantenimiento
Región 4	SPACE COMUNICACIONES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 5	EME INGENIERIA	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 6	EME INGENIERIA	A conformidad ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 7	DIGINORTE	A conformidad ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 8	HIZ TELECOMUNICACIONES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 14	UT FOMENTO CASA	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 15	INTERMEGAMUNDO	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 16	UT FIBRANOVATEL -UC7	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 17	UT MEGAINTERCONECTA 2	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 18	UT CONECTANDO REGIONES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 19	UT CONECTANDO BAJO	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 20	PUNTO RED TELECOM	A conformidad ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 21	CF INGENIEROS	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 22	UT CONECTANDO REGIONES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 23	UT FIBERCOL UC6	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 24	UT UNA COLOMBIA 5	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 25	UT INTERSOCIAL META	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 26	UT FOMENTO NORTE	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 27	UT FOMENTO NORTE	A conformidad ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 29	NET I.S.P	A conformidad ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 30	SÚPER REDES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 32	UT CONECTANDO REGIONES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 36	UT ASINTEL UC	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 37	NETWORKS TV	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 39	UT INTERSOCIAL CUNDI	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑

7. Fase instalación

Con respecto a la fase de instalación, se relaciona la cantidad de accesos en estado aprobado, rechazado, en subsanación y en revisión por la interventoría con respecto a la meta total para cada región.

Región	Metas	Aprobados	Finalizado	Rechazados	En Subsanación	En Revisión	Total
Región 4	3.142	3.142	0	81	0	0	3.142
Región 5	2.706	2.706	0	4	0	0	2.706
Región 6	2.133	2.133	0	2	0	0	2.133
Región 7	1.027	1.027	51	1	0	0	1.027
Región 8	3.701	3.701	0	2	0	0	3.701
Región 14	1.330	1.327	66	11	1	3	1.330

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Región 15	2.325	2.325	1.162	4	0	0	2.325
Región 16	2.279	2.279	114	13	0	0	2.279
Región 17	2.420	2.420	0	50	0	0	2.420
Región 18	4.249	4.249	0	14	0	0	4.249
Región 19	2.134	2.134	107	1	0	0	2.134
Región 20	3.029	2.878	151	1	0	0	3.029
Región 21	2.146	2.039	107	9	0	0	2.146
Región 22	3.909	3.909	0	71	0	0	3.909
Región 23	2.310	2.310	0	11	0	0	2.310
Región 24	2.543	2.416	127	5	0	0	2.543
Región 25	1.413	1.412	0	9	0	0	1.413
Región 26	1.391	1.391	0	52	0	0	1.391
Región 27	1.279	1.279	0	40	0	0	1.279
Región 29	2.567	2.567	0	84	0	0	2.567
Región 30	763	763	0	3	0	0	763
Región 32	2.621	2.621	0	20	0	0	2.621
Región 36	1.346	1.346	0	22	0	0	1.346
Región 37	1.601	1.601	80	0	0	0	1.601
Región 39	644	644	0	1	0	0	644
TOTAL	**55.008**	**54.619**	**1.965**	**511**	**1**	**3**	**55.008**

8. Fase operación

En cuanto a la fase de operación, se expone el estado de avance de cada región en relación con el cumplimiento de las metas y la fecha de inicio de operación.

Región	Meta total	Meta 1	Inicio operación Meta 1	Meta 2	Inicio operación Meta 2	Meta 3	Inicio operación Meta 3
Región 4	3.142	157	29/11/24	1.414	11/03/25	1.571	19/06/2025
Región 5	2.706	135	1/02/25	1.218	2/05/25	1.353	01/07/2025
Región 6	2.133	107	3/03/25	960	7/06/25	1.067	01/08/2025
Región 7	1.027	51	29/11/24	462	7/03/25	514	29/04/2025
Región 8	3.701	185	29/11/24	1.665	1/04/25	1.851	30/09/2025
Región 14	1.330	66	7/12/24	599	24/02/25	665	01/04/2025
Región 15	2.325	116	1/12/24	1.046	1/12/24	1.163	01/04/2025
Región 16	2.279	114	30/11/24	1.026	5/03/25	1.139	28/05/2025
Región 17	2.420	121	21/12/24	1.089	21/12/24	1.210	08/04/2025
Región 18	4.249	212	3/12/24	1.912	30/04/25	2.125	01/08/2025
Región 19	2.134	107	6/12/24	960	1/04/25	1.067	25/06/2025
Región 20	3.029	151	29/11/24	1.363	30/04/25	1.515	27/06/2025
Región 21	2.146	107	29/11/24	966	24/04/25	1.073	01/07/2025
Región 22	3.909	195	3/12/24	1.759	12/05/25	1.955	18/07/2025
Región 23	2.310	116	4/12/24	1.040	12/05/25	1.154	01/07/2025
Región 24	2.543	127	29/11/24	1.144	26/03/25	1.272	30/05/2025
Región 25	1.413	71	1/02/25	636	7/03/25	706	01/04/2025
Región 26	1.391	70	11/03/25	626	12/06/25	695	30/10/2025
Región 27	1.279	64	11/03/25	576	24/06/25	640	27/10/2025
Región 29	2.567	128	10/03/25	1.155	28/05/25	1.284	27/08/2025
Región 30	763	38	1/02/25	343	7/03/25	382	29/04/2025
Región 32	2.621	131	3/12/24	1.179	20/05/25	1.311	30/07/2025
Región 36	1.346	67	7/04/25	606	3/06/25	673	14/08/2025
Región 37	1.601	80	7/12/24	720	13/03/25	801	25/04/2025
Región 39	644	32	21/02/25	290	11/03/25	322	29/04/2025
TOTAL	**55.008**	**2.748**		**24.754**		**27.506**	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Así mismo y con relación al cumplimiento de metas desde la interventoría se indica el estado actual de las regiones que presentan finalización de operación de metas (1-2-3) en la actualidad

Región	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Observaciones
Región 4	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1
Región 5	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1
Región 6	En operación	En operación	En operación	
Región 7	Finalizada	En operación	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG07-03992-26 / 261006468
Región 8	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas para poder cerrar meta 1
Región 14	Finalizada	En operación	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG14-04239-26 / 261018671
Región 15	Finalizada	Finalizada	En operación	Concepto fin metas 1 y 2: LFF2-INTV-REG15-04190-26 / 261016577
Región 16	Finalizada	Finalizada	Finalizada	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG16-04229-26 / 261017960 - Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar metas 2 y 3
Región 17	Finalizada	Finalizada	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición) para poder cerrar metas 1 y 2
Región 18	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1
Región 19	Finalizada	En operación	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG19-04228-26 / 261017959
Región 20	Finalizada	En operación	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG20-03991-26 / 261006201
Región 21	Finalizada	Finalizada	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG21-03940-26 / 261003727 - Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 2
Región 22	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1
Región 23	Finalizada	Finalizada	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar metas 1 y 2
Región 24	Finalizada	Finalizada	Finalizada	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG24-03725-25 / 251156256 - Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar metas 2 y 3
Región 25	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1
Región 26	En operación	En operación	En operación	
Región 27	En operación	En operación	En operación	
Región 29	Finalizada	Finalizada	En operación	Pendiente subsanación de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1 - Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 2
Región 30	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1
Región 32	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1
Región 36	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1
Región 37	Finalizada	En operación	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG37-04227-26 / 261017958
Región 39	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1

- **Finalizadas: 31**
- **En Operación: 44**
- **Finalizadas formalmente: 10**

De igual forma se hace importante reportar desde la interventoría la fecha en la se termina cada una de las 25 resoluciones objeto del proyecto de interventoría así:

ENERO 2026		
Región	**Fecha fin resolución**	**Tiempo adicional estimado**
16	31/01/26	1 mes
24	31/01/26	15 días

FEBRERO 2026		
Región	**Fecha fin resolución**	**Tiempo adicional estimado**
21	28/02/26	2.5 meses
23	28/02/26	1 mes

MARZO 2026		
Región	**Fecha fin resolución**	**Tiempo adicional estimado**
14	31/03/26	Pendiente
15	31/03/26	Pendiente
25	31/03/26	Pendiente

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

ABRIL 2026		
Región	**Fecha fin resolución**	**Tiempo adicional estimado**
7	30/04/26	Pendiente
17	30/04/26	Pendiente
29	30/04/26	Pendiente
30	30/04/26	Pendiente
37	30/04/26	Pendiente
39	30/04/26	Pendiente

JUNIO 2026		
Región	**Fecha fin resolución**	**Tiempo adicional estimado**
4	30/06/26	Pendiente
5	30/06/26	Pendiente
19	30/06/26	Pendiente
20	30/06/26	Pendiente
36	31/05/25 (13/06/26) *	Pendiente

JULIO 2026		
Región	**Fecha fin resolución**	**Tiempo adicional estimado**
6	31/07/26	Pendiente
18	31/07/26	Pendiente
22	30/06/25 (17/07/26) *	Pendiente
32	31/07/26	Pendiente

SEPTIEMBRE 2026		
Región	**Fecha fin resolución**	**Tiempo adicional estimado**
8	30/09/26	Pendiente

OCTUBRE 2026		
Región	**Fecha fin resolución**	**Tiempo adicional estimado**
26	30/06/25 (29/10/26) *	Pendiente
27	31/08/25 (26/10/26) *	Pendiente

* Regiones con accesos reportados después de fecha fin de prórroga. Las fechas mostradas corresponden al fin de operación (10 meses para R36 y 12 meses para R22, R26 y R27)

La Interventoría indica que, respecto a las resoluciones, para el mes de enero 2026 la región número 16 y 24; sin embargo, se tramitó una prórroga y, en el marco de esta, se están realizando las verificaciones necesarias para que dichas regiones cumplan con la reposición y compensación de los tiempos de indisponibilidad.
Para el mes de febrero 2026, las regiones 21 y 23 finalizan el sábado 28 de febrero. Frente a estas, ya se emitió concepto para la solicitud de prórroga; no obstante, según lo informado en los comités del día anterior, dichas solicitudes se encuentran en gestión.
De otra parte, para el periodo que inicia marzo 2026, se cuenta con las regiones 14, 15 y 25, las cuales finalizan el 31 de marzo. Sobre estas tres regiones, el día de ayer se emitieron los conceptos para la solicitud de prórroga y se está a la espera de la definición que adopte el Ministerio.

El líder del equipo MINTIC, en vocería de **la Supervisión**, informa que frente a las resoluciones 21 y 23, estas fueron expedidas el día anterior en horas de la noche y debidamente notificadas a los ejecutores.

Actualmente, se está a la espera de que sean remitidas nuevamente, en caso de que se presente la renuncia a términos, con el fin de dejar en firme las resoluciones de manera definitiva.
Señala que esta es una buena noticia, toda vez que se encuentran al día estas dos actuaciones que habían quedado como compromisos del comité anterior, estimando que en el transcurso del día quedarán completamente finiquitadas.
En relación con el mes de marzo y las regiones 14, 15 y 25, indica que ya se inició el trabajo para la proyección de las resoluciones, con el propósito de tenerlas dentro de los términos correspondientes y avanzar en las prórrogas pendientes para dicho mes.

8.1 Visitas en campo

Frente a las visitas en campo programadas para los meses mencionados, a continuación, se presentan las regiones y la cantidad de visitas realizadas, discriminadas por departamento y municipio.
Cabe destacar que, a partir de mayo de 2025, se iniciaron las visitas de calidad, las cuales están previstas hasta completar un total de 3.300 visitas, adicionales a las 1.100 visitas de aprobación.
Asimismo, se informa que durante el mes de agosto de 2025 se finalizaron la totalidad de las visitas programadas (tanto de calidad como de aprobación).

Mes	Región	Departamento	Municipio	Cantidad de Visitas Programadas	Cantidad de Visitas Ejecutadas	Tipo de Visita
Marzo 2025	39	Cundinamarca	Tena	27	43	Aprobación
	25	Meta	Puerto López	48	74	Aprobación
	20	Meta	Vistahermosa	70	88	Aprobación
	27	Nte. De Santander	Cachirá	54	0	Aprobación
	37	Tolima	Chaparral	67	60	Aprobación
	36	Tolima	Purificación	43	35	Aprobación
Abril 2025	4	Atlántico	Sabanalarga	115	149	Aprobación
	5	Atlántico	Galapa	35	33	Aprobación
	6	Atlántico	Luruaco	100	69	Aprobación
	15	Cesar	Pailitas	85	0	Aprobación
	15	Cesar	Curumani	0	84	Aprobación
	16	Cesar	Bosconia	85	85	Aprobación
	17	Cesar	San Alberto	85	83	Aprobación
Mayo 2025	21	Magdalena	Plato	125	127	Aprobación
	22	Magdalena	Fundación	125	125	Aprobación
	24	Magdalena	Santa Ana	48	52	Aprobación
	Total visitas de aprobación			**1.112**	**1.107**	
	7	Bolivar	Cicuco	81	83	Calidad
	7	Bolivar	Talaigua nuevo	81	82	Calidad
	24	Magdalena	Santa Ana	40	40	Calidad
Junio 2025	32	Sucre	Coveñas	120	121	Calidad
	32	Sucre	Ovejas	120	121	Calidad
	32	Sucre	San Onofre	60	62	Calidad
	14	Casanare	Paz de Ariporo	300	300	Calidad
	19	Córdoba	Tuchin	300	300	Calidad
	29	Putumayo	Puerto Asis	70	104	Calidad
	29	Putumayo	Villagarzon	150	116	Calidad
	29	Putumayo	Puerto Caicedo	80	80	Calidad
Julio 2025	23	Magdalena	Salamina	70	71	Calidad
	23	Magdalena	Pivijay	230	230	Calidad
	18	Córdoba	Cerete	140	141	Calidad
	18	Córdoba	San Carlos	30	32	Calidad
	18	Córdoba	Planeta Rica	130	131	Calidad


"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	30	Risaralda	Quinchía	190	172	Calidad
	30	Risaralda	Guática	70	83	Calidad
	30	Risaralda	La Celia	40	45	Calidad
Agosto 2025	8	Bolívar	Arjona	150	150	Calidad
	8	Bolívar	Arroyohondo	25	25	Calidad
	8	Bolívar	Clemencia	25	25	Calidad
	8	Bolívar	Mahates	50	0	Calidad
	8	Bolívar	San Cristóbal	25	25	Calidad
	8	Bolívar	San Estanislao	25	25	Calidad
	20	Meta	El Castillo	25	0	Calidad
	20	Meta	Fuente De Oro	25	0	Calidad
	20	Meta	Granada	130	88	Calidad
	20	Meta	lejanías	25	0	Calidad
	20	Meta	San Juan De Arama	20	0	Calidad
	25	Meta	Castilla La Nueva	25	0	Calidad
	25	Meta	Guamal	25	0	Calidad
	25	Meta	San Martin	25	25	Calidad
	4	Atlántico	Palmar De Varela	30	0	Calidad
	4	Atlántico	Sabanagrande	30	0	Calidad
	4	Atlántico	Santo Tomas	90	0	Calidad
	5	Atlántico	Malambo	90	70	Calidad
	6	Atlántico	Campo De La Cruz	30	30	Calidad
	26	N. Santander	El Zulia	75	74	Calidad
	26	N. Santander	San Cayetano	25	0	Calidad
TOTAL, VISITAS DE CALIDAD				**3.302**	**3.330**	
TOTAL, APROBACION Y CALIDAD				**4.414**	**4.437**	

8.2 Llamadas telefónicas

Con corte al presente comité, la interventoría ha llevado a cabo un total de 62.243llamadas a los usuarios beneficiarios del proyecto. Estas comunicaciones telefónicas tienen como propósito principal validar la calidad del servicio de internet brindado, a fin de garantizar que se estén cumpliendo los estándares establecidos en los lineamientos técnicos y contractuales.

.

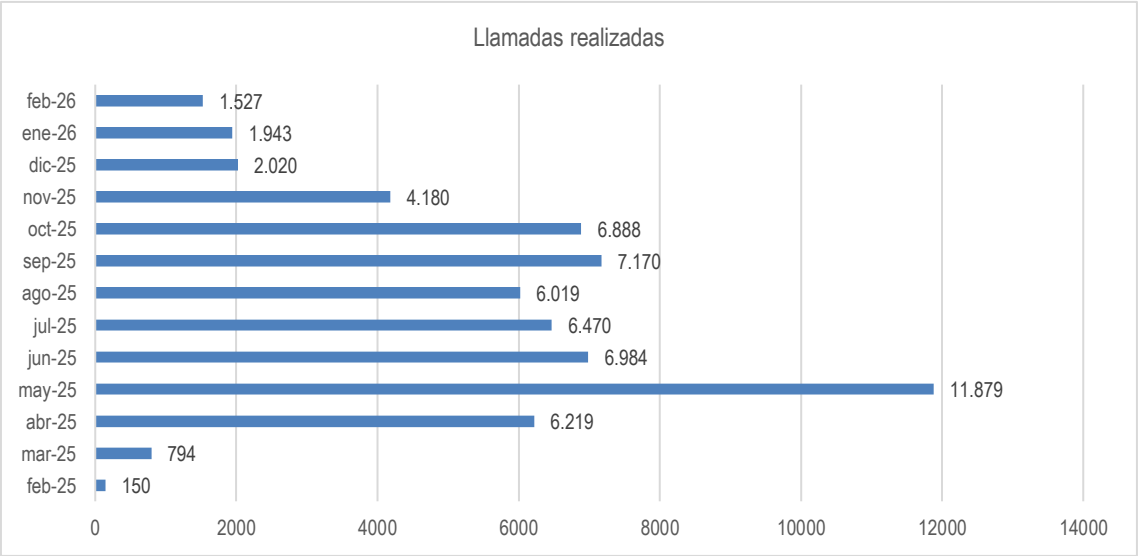

9. Estado de pagos

En relación con el estado de pagos para las regiones, a continuación, se expone el consolidado de pagos generados a las 25 regiones objeto del contrato de interventoría 2194-2024

CONSOLIDADO DE PAGOS POR REGIÓN

REGION	EJECUTOR	VALOR TOTAL CAPEX REGIONES	PAGO APROBADO	LIBERACIÓN
4	SPACE COMUNICACIONES S.A.S	**$ 1.596.613.584**	$ 1.596.573.045	$ 40.539
5	EME INGENIERIA S.A. BIC.	**$ 1.375.059.312**	$ 1.374.547.832	$ 511.480
6	EME INGENIERIA S.A. BIC.	**$ 1.083.888.216**	$ 1.083.888.216	$ 0
7	DIGINORTE S.A.S.	**$ 521.872.104**	$ 521.421.293	$ 450.811,02
8	HIZ TELECOMUNICACIONES S.A.S.	**$ 1.880.670.552**	$ 1.880.670.552	$ 0
14	UT FOMENTO CASANARE 2.0	**$ 675.842.160**	$ 673.552.617	$ 2.289.543,48
15	INTERMEGAMUNDO PARTNERS S.A.S.	**$ 1.181.453.400**	$ 1.181.420.312	$ 33.088,01
16	UNIÓN TEMPORAL FIBRANOVATEL -UC7	**$ 1.158.078.408**	$ 1.157.374.195	$ 704.213
17	UNION TEMPORAL MEGAINTERCONECTA 2	**$ 1.229.727.840**	$ 1.229.727.840	$ 0
18	UNIÓN TEMPORAL CONECTANDO REGIONES SRCC	**$ 2.159.137.848**	$ 2.155.409.666	$ 3.728.181,63
19	UT CONECTANDO BAJO SINU	**$ 1.084.396.368**	$ 1.084.396.368	$ 0
20	PUNTO RED TELECOMUNICACIONES SAS	**$ 1.539.192.408**	$ 1.539.191.597	$ 811
21	CF INGENIEROS SAS	**$ 1.090.494.192**	$ 1.090.493.886	$ 306,46
22	UNIÓN TEMPORAL CONECTANDO REGIONES SRCC	**$ 1.986.366.168**	$ 1.986.098.660	$ 267.508
23	UNIÓN TEMPORAL FIBERCOL UC6	**$ 1.173.831.120**	$ 1.173.831.120	$ 0,07
24	UNIÓN TEMPORAL UNA COLOMBIA 5	**$ 1.292.230.536**	$ 1.292.225.151	$ 5.385,06
25	UNIÓN TEMPORAL INTERSOCIAL META	**$ 718.018.776**	$ 717.471.838	$ 546.938,27
26	UT FOMENTO DEL NORTE	**$ 706.839.432**	$ 704.951.787	$ 1.887.645
27	UT FOMENTO DEL NORTE	**$ 649.926.408**	$ 649.894.604	$ 31.804
29	REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NET I.S.P S.A.S.,	**$ 1.304.426.184**	$ 1.304.426.184	$ 0
30	SÚPER REDES S.A.S	**$ 387.719.976**	$ 387.719.976	$ 0
32	UNIÓN TEMPORAL CONECTANDO REGIONES SRCC	**$ 1.331.866.392**	$ 1.331.216.854	$ 649.538
36	UNION TEMPORAL ASINTEL UC	**$ 683.972.592**	$ 683.972.592	$ 0
37	NETWORKS TV S.A.S	**$ 813.551.352**	$ 813.467.999	$ 83.352,88
39	UNIÓN TEMPORAL INTERSOCIAL CUNDINAMARCA	**$ 327.249.888**	$ 327.249.888	$ 0
TOTAL		**$ 27.952.425.216**	**$ 27.941.194.071**	**$ 11.231.145**

Referente al estado actual de los documentos requisitos de pago se indica el estado actual de cumplimiento de cada región frente al o los pagos pendientes por tramitar

RESUMEN	
S: En subsanación	3
R: En revisión	6
SE: Sin entregar	0
OK: APROBADO	391

Región	Pago	INFORMES														
		Oct-24	Nov-24	Dic-24	Ene-25	Feb-25	Mar-25	Abr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Ago-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dic.25
Región 4	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 5	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 6	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 7	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 8	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Región 14	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 15	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 16	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 17	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 18	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 19	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 20	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 21	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 22	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 23	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 24	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 25	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 26	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 27	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 29	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 30	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 32	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 36	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 37	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 39	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

10. Informes de posible incumplimiento

El componente jurídico de la interventoría expone la relación de Informes de posible incumplimiento que se han emitido, indicando región, numero de comunicado fecha, tema y tasación tal como se evidencia a continuación

REGIÓN	INFORME DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO	FECHA	TEMA	TASACIÓN	TOTAL TASACIONES	SUPERACIÓN
8	LFF2-INTV-DIRINFRA-00010-25 (251120461)	18/09/2025	Respuesta a Requerimiento	$17.344.787,70	$29.195.263,75	Parcialmente superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00014-25 (251129596)	10/10/2025	Informes	$11.850.476,05		Superado
26	LFF2-INTV-DIRINFRA-00001-25 (251082544)	10/07/2025	Metas	$7.143.586,09	$39.451.462,40	Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00003-25 (251111224)	28/08/2025	Registro (logs)	$20.502.828,52		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00006-25 (251115061)	8/09/2025	Informes	$9.756.237,85		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00011-25 (251127417)	6/10/2025	Informes	$1.024.404,97		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00015-25 (251132896)	20/10/2025	Informes	$1.024.404,97		Superado
27	LFF2-INTV-DIRINFRA-00004-25 (251111902)	29/08/2025	Registro (logs)	$18.853.175,65	$35.415.985,05	Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00007-25 (251117436)	11/09/2025	Metas	$7.143.586,09		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00008-25 (251117593)	11/09/2025	Informes	$7.706.637,25		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00012-25 (251128211)	8/10/2025	Informes	$856.293,03		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00016-25 (251132897)	20/10/2025	Informes	$856.293,03		Superado
29	LFF2-INTV-DIRINFRA-00002-25 (251099528)	30/07/2025	Informes	$11.939.827,77	$53.950.332,90	Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00013-25 (251128212)	8/10/2025	Informes	$2.100.525,26		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00017-25 (251132898)	20/10/2025	Informes	$2.100.525,26		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00018-25 (251156188)	17/12/2025	Respuesta a Requerimiento y mantenimiento	$37.809.454,61		Superado
36	LFF2-INTV-DIRINFRA-00005-25 (251112325)	1/09/2025	Registro (logs)	$19.825.292,52	$29.154.841,94	Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00009-25 (251117880)	12/09/2025	Informes	$9.329.549,42		Superado

11. Varios

11.1 Socialización de PQRS

La Interventoría expone que, frente a las PQR, únicamente se ha recibido como información la correspondiente al oficio radicado por la región 8; el resto de la información se encuentra al día.

Por su parte, **la Supervisión** solicita a la Interventoría su colaboración puntual con la emisión del concepto técnico para la proyección de respuesta al derecho de petición, toda vez que este constituye un insumo base para realizar el análisis jurídico interno frente a la radicación de HIZ TELECOMUNICACIONES S.A.S., región 8, conforme al derecho de petición allegado al Ministerio durante la presente semana y que fue compartido oportunamente.

En respuesta, se informa que el profesional jurídico de **la Interventoría** se encuentra trabajando el tema de manera articulada con el área técnica y que se espera remitirlo a la mayor brevedad posible, precisando que ya se encuentra en gestión**.**

11.2 Solicitud información de frente a auditorías de control interno

La Supervisión indica, en primer lugar, su agradecimiento por el apoyo brindado con la información relacionada con las auditorías de Control Interno. Señala que actualmente se están recibiendo múltiples requerimientos tanto de Control Interno como de algunos entes de control, los cuales han sido compartidos con la Interventoría con el fin de que se mantengan al tanto de las solicitudes de información que se presentan entre el ejecutor y el Ministerio.

En ese orden de ideas, reitera la importancia de continuar trabajando de manera articulada, como se ha venido haciendo, frente a este tipo de requerimientos. Asimismo, manifiesta que, cuando se presenten estas solicitudes, sería conveniente atenderlas conjuntamente con la mayor diligencia posible, procurando un plazo estimado de dos días, teniendo en cuenta que en algunas ocasiones el Ministerio dispone de un máximo de cuatro días e incluso menos para dar respuesta.

Finalmente, insiste en la necesidad de continuar trabajando de manera coordinada en este primer punto.

11.2.1 Informe Final

La Supervisión expone la necesidad de revisar las observaciones al informe final, con el propósito de realizar los ajustes correspondientes y lograr que dicho documento sea lo más robusto posible, de manera que sirva como insumo sólido para llevar a término el proyecto con cada uno de los ejecutores.

La Interventoría responde que, respecto al informe final o de cierre de las resoluciones, se encuentran ajustadas casi en su totalidad las observaciones formuladas por la Supervisión. Precisa que únicamente está pendiente el capítulo de contratación derivada, frente al cual se realizará una revisión jurídica para determinar qué aspectos pueden complementarse. Indica que se presentarán algunas propuestas para validar su viabilidad y así definir el formato del informe de cierre, con el fin de replicarlo en las demás regiones. Señala que el objetivo es asegurar que el documento quede acordado antes de iniciar reprocesos en radicaciones posteriores. Estima que la versión ajustada podría remitirse el mismo día y, en todo caso, se enviará la versión final para el respectivo visto bueno.

Aprovechando el tema del informe de cierre, la Interventoría manifiesta que existen regiones próximas a finalizar, como las regiones 16 y 24. En particular, la región 24 finalizó el 15 de febrero de 2026 y actualmente se encuentran revisando la reposición y compensación de tiempos para proceder con la terminación de la resolución. Indica que el siguiente paso corresponde a la presentación del informe final por parte del ejecutor, junto con la documentación respectiva.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Recuerda que en semanas anteriores se había conversado sobre la forma de entrega de la documentación digital, específicamente si el contratista debía realizar radicación física ante PACO o si podía efectuarse de manera digital a través de la página del Ministerio. Se había planteado realizar una reunión con el área de gestión documental para definir el procedimiento, dado que resulta prioritario agilizar el cierre de resoluciones, especialmente en regiones como la 24 y la 16, que se encuentran en etapa final.

La Supervisión informa que se solicitó orientación a PACO y se recibió una presentación relacionada con archivo físico; no obstante, se requirió un alcance para contar con el paso a paso de la entrega digital. Actualmente se está a la espera de la respuesta y, una vez recibida, será compartida con el equipo y la Interventoría, teniendo en cuenta la urgencia de los cierres con los ejecutores.
Adicionalmente, el ingeniero Armando Calderón del equipo de la supervisión interviene para consultar si la información digital incluye también los repositorios, señalando que en otros contratos que involucran sistemas de información o bases de datos, existen lineamientos establecidos por la Dirección de Infraestructura para su recepción. Menciona que el ingeniero Ariel Parodi cuenta con experiencia en procesos similares y recomienda tener en cuenta dichos lineamientos, dado que los repositorios también deben ser entregados y encontrarse plenamente actualizados.

La Interventoría responde que, en proyectos anteriores con acompañamiento del ingeniero Ariel Parodi, se ha procedido mediante la entrega de un índice detallado de la información. Explica que, en los contratos de interventoría, descargan toda la información del sistema y la entregan en medio de almacenamiento físico (disco duro o USB), debidamente indexada para facilitar su consulta, procedimiento que se replicará al finalizar el contrato actual.
No obstante, advierte que con los ejecutores el proceso puede resultar más complejo, ya que, pese a las instrucciones impartidas, la información puede presentarse de manera distinta a la solicitada. Señala que las resoluciones establecen claramente la obligación de entregar toda la documentación generada en el proyecto, incluyendo repositorios y soportes documentales de los usuarios. Considera pertinente exigir también a los ejecutores la presentación de un índice que permita consultar y referenciar adecuadamente la información entregada en medio magnético. Indica que, dependiendo de las directrices que imparta PACO, podría requerirse la radicación física en el Ministerio, lo que implicaría el desplazamiento del ejecutor a Bogotá. En todo caso, estima necesario realizar las consultas formales antes de definir el procedimiento con lo cual se manifiesta de acuerdo el equipo de apoyo a la supervisión por parte del MINTIC.

Finalmente, **la Supervisión** manifiesta que se encuentra gestionando la respuesta correspondiente y que, una vez recibida, será compartida tanto con el equipo interno como con la Interventoría para alinear el procedimiento. Señala que este aspecto podría constituir un capítulo o anexo del informe de cierre; sin embargo, no se adoptará una definición en la presente reunión hasta contar con los lineamientos oficiales.

12. Cierre

En la presente acta se deja constancia de la reunión que se llevó a cabo entre la interventoría y responsable MINTIC, como consta la PPT presentada

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN A EJECUTAR	**RESPONSABLE DE EJECUCIÓN**	**FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN**

NA	NA	NA

REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE COMPLETO	**CARGO**	**FIRMA**
María Carolina Zúñiga Hernández	Directora Infraestructura	
Cesar Polo	Líder del equipo del MinTIC	
Juan Barrero	Director de Interventoría	

Anexos

- PPT Reunión de seguimiento No 13

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



TIC

TIC

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2169 -2024

REUNIÓN SEGUIMIENTO No. 13

Febrero 2026

CONSORCIO INTER-LÍNEAS 2.0

TIC

"Ejercer la Interventoría a las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras, y administrativas requeridas para la vigilancia y el seguimiento integral de la ejecución del proyecto Líneas de Fomento 2.0 de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico"

- Firma Contrato: 27 de diciembre de 2024
- Acta de Inicio: 31 de diciembre de 2024
- Inicio de Actividades: 31 de diciembre de 2024
- Fecha Terminación: 31 de julio de 2026
- Otrosí No 2: 01 de enero de 2026
- Valor: $5.143.899.395
- Estado: Activo y en ejecución

Temas

- Seguimiento compromisos anteriores
- Estado documental
- Informes de interventoría
- Estado pago interventoría
- Fase del proyecto (planeación- instalación- operación)
- Finalización operación metas
- Finalización resoluciones
- Estado pagos resoluciones
- Estado revisión informes mensuales ejecutores
- Informes de posible incumplimiento
- Varios



TIC

Seguimiento compromisos anteriores

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
N/A	N/A	N/A

Estado documental – Actas comités operativos

Región	Ene-25	Feb-25	Mar-25	Abr-25	May-25	Jun-25	Jul- 25	Ago-25	Sept-2025	Oct-2025	Nov-2025	Dic-2025	Ene-,2026	Febr-26
Región 4	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 5	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 6	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 7	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 8	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Pte. Firmas	Pte. Firmas	Ejecutada
Región 14	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 15	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 16	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 17	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 18	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 19	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 20	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 21	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 22	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 23	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 24	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 25	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 26	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 27	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 29	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 30	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 32	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 36	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 37	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada
Región 39	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Firmada	Ejecutada

Estado documental – actas de seguimiento

Mes	Fecha	Estado	Observaciones
Febrero-25	19/02/2025	Firmado	
Marzo-25	17/03/2025	Firmado	
Abril-25	16/04/2025	Firmado	
Mayo-25	14/05/2025	Firmado	
Junio-25	20/06/2025	Firmado	
Julio-25	29/07/2025	Firmado	
Agosto-25	21/08/2025	Firmado	
Septiembre-25	24/09/2025	Firmado	
Octubre-25	29/10/2025	Firmado	
Noviembre -25	28/11/2025	Firmado	
Diciembre -25	29/12/2025	Firmado	
Enero-26	29/01/2026	Firmado	
Febrero-26	26/02/2026	Programada	

Informes de interventoría

Mes	Radicado	Fecha radicado	Estado	Radicado
Enero-25	251013659	07/02/2025	Aprobado	252029280
Febrero-25 v2	251036136	31/03/2025	Aprobado	252057282
Marzo-25 v2	251047458	25/04/2025	Aprobado	252066925
Abril-25 v2	251061902	26/05/2025	Aprobado	252091575
Informe periodo 1 v2	251067146	06/06/2025	Aprobado	252089964
Mayo-25-v2	251077238	01/07/2025	Aprobado	252107540
Junio-25-v2	251095869	28/07/2025	Aprobado	252120665
Julio-25-v2	251109083	25/08/2025	Aprobado	252153658
Agosto-25-v2	251123498	26/09/2025	Aprobado	252171011
Septiembre-25-v2	251134014	22/10/2025	Aprobado	252179032
Octubre-25-v2	251147895	25/11/2025	Aprobado	252200630
Noviembre-25-v1	251151010	3/12/2025	Aprobado	252204835
Diciembre-25-v2	251130240	30/12/2026	Aprobado	262026687
Enero -26	261022614	06/02/2026	Con observaciones	262040003

Estado pagos de interventoría

VALOR HASTA	PORCENTAJE	CONCEPTO	ESTADO
$ 1.117.278.416	21,72%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 1) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 257429925 2025-07-11
$ 985.078.317	19,15%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 2) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 240380625 2025-07-11
$ 576.181.089	11,2%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 3) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 298756225 2025-08-22
$ 576.181.090	11,2%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 4) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 426918025 2025-11-10.
$ 384.120.724	7,46%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 5) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PAGADO CE 544979025 2025-12-29.
$ 192.060.364	3,73%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 6) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	*LFF2-INTV-DIRINFRA-04146-26* 11/02/2026 con radicado MinTic 261014275
$375.142.684	7,29%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 7) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico. (iii) Soporte de pago del impuesto sobre el valor total de la adición de acuerdo con las instrucciones establecidas en la Circular Externa 010 del 05 de marzo de 2025 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público	PENDIENTE
$375.142.684	7,29%	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 8) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PENDIENTE
$562.714.027	10,94	Sujeto a la entrega por parte del Interventor y aprobación por parte del Supervisor de: (i) Informe de actividades de Interventoría (periodo 9) (ii) cumplimiento de las obligaciones y actividades previstas en el anexo técnico.	PENDIENTE
$5.143.899.395	**100%**		

Fase de planeación

Región	Ejecutor	Repositorio información	IDIO	Plan Comercialización	Plan Instalación	Plan Mantenimiento
Región 4	SPACE COMUNICACIONES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 5	EME INGENIERIA	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 6	EME INGENIERIA	A conformidad ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 7	DIGINORTE	A conformidad ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 8	HIZ TELECOMUNICACIONES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 14	UT FOMENTO CASA	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 15	INTERMEGAMUNDO	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 16	UT FIBRANOVATEL -UC7	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 17	UT MEGAINTERCONECTA 2	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 18	UT CONECTANDO REGIONES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 19	UT CONECTANDO BAJO	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 20	PUNTO RED TELECOM	A conformidad ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 21	CF INGENIEROS	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 22	UT CONECTANDO REGIONES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 23	UT FIBERCOL UC6	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 24	UT UNA COLOMBIA 5	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 25	UT INTERSOCIAL META	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 26	UT FOMENTO NORTE	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 27	UT FOMENTO NORTE	A conformidad ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 29	NET I.S.P	A conformidad ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 30	SÚPER REDES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 32	UT CONECTANDO REGIONES	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 36	UT ASINTEL UC	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 37	NETWORKS TV	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑
Región 39	UT INTERSOCIAL CUNDI	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑	Aprobado ☑

Fase de instalación

Región	Metas	Aprobados	Finalizado	Rechazados	En Subsanación	En Revisión	Total
Región 4	3.142	3.142	0	81	0	0	3.142
Región 5	2.706	2.706	0	4	0	0	2.706
Región 6	2.133	2.133	0	2	0	0	2.133
Región 7	1.027	1.027	51	1	0	0	1.027
Región 8	3.701	3.701	0	2	0	0	3.701
Región 14	1.330	1.327	66	11	1	3	1.330
Región 15	2.325	2.325	1.162	4	0	0	2.325
Región 16	2.279	2.279	114	13	0	0	2.279
Región 17	2.420	2.420	0	50	0	0	2.420
Región 18	4.249	4.249	0	14	0	0	4.249
Región 19	2.134	2.134	107	1	0	0	2.134
Región 20	3.029	2.878	151	1	0	0	3.029
Región 21	2.146	2.039	107	9	0	0	2.146
Región 22	3.909	3.909	0	71	0	0	3.909
Región 23	2.310	2.310	0	11	0	0	2.310
Región 24	2.543	2.416	127	5	0	0	2.543
Región 25	1.413	1.412	0	9	0	0	1.413
Región 26	1.391	1.391	0	52	0	0	1.391
Región 27	1.279	1.279	0	40	0	0	1.279
Región 29	2.567	2.567	0	84	0	0	2.567
Región 30	763	763	0	3	0	0	763
Región 32	2.621	2.621	0	20	0	0	2.621
Región 36	1.346	1.346	0	22	0	0	1.346
Región 37	1.601	1.601	80	0	0	0	1.601
Región 39	644	644	0	1	0	0	644
	55.008	**54.619**	**1.965**	**511**	**1**	**3**	**55.008**

Fase de operación

Región	Accesos meta	Accesos meta 1	Inicio operación meta 1	Accesos meta 2	Inicio operación meta 2	Accesos meta 3	Inicio operación meta 3
Región 4	3.142	157	29/11/24	1.414	11/03/25	1.571	19/06/2025
Región 5	2.706	135	1/02/25	1.218	2/05/25	1.353	01/07/2025
Región 6	2.133	107	3/03/25	960	7/06/25	1.067	01/08/2025
Región 7	1.027	51	29/11/24	462	7/03/25	514	29/04/2025
Región 8	3.701	185	29/11/24	1.665	1/04/25	1.851	30/09/2025
Región 14	1.330	66	7/12/24	599	24/02/25	665	01/04/2025
Región 15	2.325	116	1/12/24	1.046	1/12/24	1.163	01/04/2025
Región 16	2.279	114	30/11/24	1.026	5/03/25	1.139	28/05/2025
Región 17	2.420	121	21/12/24	1.089	21/12/24	1.210	08/04/2025
Región 18	4.249	212	3/12/24	1.912	30/04/25	2.125	01/08/2025
Región 19	2.134	107	6/12/24	960	1/04/25	1.067	25/06/2025
Región 20	3.029	151	29/11/24	1.363	30/04/25	1.515	27/06/2025
Región 21	2.146	107	29/11/24	966	24/04/25	1.073	01/07/2025
Región 22	3.909	195	3/12/24	1.759	12/05/25	1.955	18/07/2025
Región 23	2.310	116	4/12/24	1.040	12/05/25	1.154	01/07/2025
Región 24	2.543	127	29/11/24	1.144	26/03/25	1.272	30/05/2025
Región 25	1.413	71	1/02/25	636	7/03/25	706	01/04/2025
Región 26	1.391	70	11/03/25	626	12/06/25	695	30/10/2025
Región 27	1.279	64	11/03/25	576	24/06/25	640	27/10/2025
Región 29	2.567	128	10/03/25	1.155	28/05/25	1.284	27/08/2025
Región 30	763	38	1/02/25	343	7/03/25	382	29/04/2025
Región 32	2.621	131	3/12/24	1.179	20/05/25	1.311	30/07/2025
Región 36	1.346	67	7/04/25	606	3/06/25	673	14/08/2025
Región 37	1.601	80	7/12/24	720	13/03/25	801	25/04/2025
Región 39	644	32	21/02/25	290	11/03/25	322	29/04/2025
	55.008	**2.748**		**24.754**		**27.506**	

Finalización operación metas

Región	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Observaciones
Región 4	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1
Región 5	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1
Región 6	En operación	En operación	En operación	
Región 7	Finalizada	En operación	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG07-03992-26 / 261006468
Región 8	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas para poder cerrar meta 1
Región 14	Finalizada	En operación	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG14-04239-26 / 261018671
Región 15	Finalizada	Finalizada	En operación	Concepto fin metas 1 y 2: LFF2-INTV-REG15-04190-26 / 261016577
Región 16	Finalizada	Finalizada	Finalizada	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG16-04229-26 / 261017960 - Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar metas 2 y 3
Región 17	Finalizada	Finalizada	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición) para poder cerrar metas 1 y 2
Región 18	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1
Región 19	Finalizada	En operación	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG19-04228-26 / 261017959
Región 20	Finalizada	En operación	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG20-03991-26 / 261006201
Región 21	Finalizada	Finalizada	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG21-03940-26 / 261003727 - Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 2
Región 22	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1
Región 23	Finalizada	Finalizada	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar metas 1 y 2
Región 24	Finalizada	Finalizada	Finalizada	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG24-03725-25 / 251156256 - Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar metas 2 y 3
Región 25	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1
Región 26	En operación	En operación	En operación	
Región 27	En operación	En operación	En operación	
Región 29	Finalizada	Finalizada	En operación	Pendiente subsanación de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1 - Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 2
Región 30	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1
Región 32	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1
Región 36	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1
Región 37	Finalizada	En operación	En operación	Concepto fin meta 1: LFF2-INTV-REG37-04227-26 / 261017958
Región 39	Finalizada	En operación	En operación	Pendiente entrega de facturas (reposición y compensación) para poder cerrar meta 1

Finalizadas: 31
En Operación: 44
Finalizadas formalmente: 10

Finalización resoluciones

ENERO 2026		
Región	Fecha fin resolución	Tiempo adicional estimado
16	31/01/26	1 mes
24	31/01/26	15 días

FEBRERO 2026		
Región	Fecha fin resolución	Tiempo adicional estimado
21	28/02/26	2.5 meses
23	28/02/26	1 mes

MARZO 2026		
Región	Fecha fin resolución	Tiempo adicional estimado
14	31/03/26	Pendiente
15	31/03/26	Pendiente
25	31/03/26	Pendiente

ABRIL 2026		
Región	Fecha fin resolución	Tiempo adicional estimado
7	30/04/26	Pendiente
17	30/04/26	Pendiente
29	30/04/26	Pendiente
30	30/04/26	Pendiente
37	30/04/26	Pendiente
39	30/04/26	Pendiente

JUNIO 2026		
Región	Fecha fin resolución	Tiempo adicional estimado
4	30/06/26	Pendiente
5	30/06/26	Pendiente
19	30/06/26	Pendiente
20	30/06/26	Pendiente
36	31/05/25 (13/06/26)*	Pendiente

JULIO 2026		
Región	Fecha fin resolución	Tiempo adicional estimado
6	31/07/26	Pendiente
18	31/07/26	Pendiente
22	30/06/25 (17/07/26)*	Pendiente
32	31/07/26	Pendiente

SEPTIEMBRE 2026		
Región	Fecha fin resolución	Tiempo adicional estimado
8	30/09/26	Pendiente

OCTUBRE 2026		
Región	Fecha fin resolución	Tiempo adicional estimado
26	30/06/25 (29/10/26)*	Pendiente
27	31/08/25 (26/10/26)*	Pendiente

* Regiones con accesos reportados después de fecha fin de prórroga. Las fechas mostradas corresponden al fin de operación (10 meses para R36 y 12 meses para R22, R26 y R27)

Estado visitas de campo

Mes	Región	Departamento	Municipio	Cantidad de Visitas Programadas	Cantidad de Visitas Ejecutadas	Tipo de Visita
mar-25	39	Cundinamarca	Tena	27	43	Aprobación
	25	Meta	Puerto López	48	74	Aprobación
	20	Meta	Vistahermosa	70	88	Aprobación
	27	Nte. De Santander	Cachirá	54	0	Aprobación
	37	Tolima	Chaparral	67	60	Aprobación
	36	Tolima	Purificación	43	35	Aprobación
abr-25	4	Atlántico	Sabanalarga	115	149	Aprobación
	5	Atlántico	Galapa	35	33	Aprobación
	6	Atlántico	Luruaco	100	69	Aprobación
	15	Cesar	Pailitas	85	0	Aprobación
	15	Cesar	Curumani	0	84	Aprobación
	16	Cesar	Bosconia	85	85	Aprobación
	17	Cesar	San Alberto	85	83	Aprobación
may-25	21	Magdalena	Plato	125	127	Aprobación
	22	Magdalena	Fundación	125	125	Aprobación
	24	Magdalena	Santa Ana	48	52	Aprobación
	Total visitas de aprobación			**1.112**	**1.107**	
	7	Bolivar	Cicuco	81	83	Calidad
	7	Bolivar	Talaigua nuevo	81	82	Calidad
	24	Magdalena	Santa Ana	40	40	Calidad


Estado visitas de campo

Mes	Región	Departamento	Municipio	Cantidad de Visitas Programadas	Cantidad de Visitas Ejecutadas	Tipo de Visita
jun-25	32	Sucre	Coveñas	120	121	Calidad
	32	Sucre	Ovejas	120	121	Calidad
	32	Sucre	San Onofre	60	62	Calidad
	14	Casanare	Paz de Ariporo	300	300	Calidad
	19	Córdoba	Tuchin	300	300	Calidad
	29	Putumayo	Puerto Asis	70	104	Calidad
	29	Putumayo	Villagarzón	150	116	Calidad
	29	Putumayo	Puerto Caicedo	80	80	Calidad
jul-25	23	Magdalena	Salamina	70	71	Calidad
	23	Magdalena	Pivijay	230	230	Calidad
	18	Córdoba	Cerete	140	141	Calidad
	18	Córdoba	San Carlos	30	32	Calidad
	18	Córdoba	Planeta Rica	130	131	Calidad
	30	Risaralda	Quinchía	190	172	Calidad
	30	Risaralda	Guática	70	83	Calidad
	30	Risaralda	La Celia	40	45	Calidad

Estado visitas de campo

Mes	Región	Departamento	Municipio	Cantidad de Visitas Programadas	Cantidad de Visitas Ejecutadas	Tipo de Visita
ago-25	8	Bolivar	Arjona	150	153	Calidad
	8	Bolivar	Arroyohondo	25	25	Calidad
	8	Bolívar	Clemencia	25	27	Calidad
	8	Bolivar	Mahates	50	52	Calidad
	8	Bolivar	San Cristobal	25	26	Calidad
	8	Bolivar	San Estanislao	25	27	Calidad
	20	Meta	El Castillo	25	25	Calidad
	20	Meta	Fuente De Oro	25	21	Calidad
	20	Meta	Granada	130	159	Calidad
	20	Meta	Lejanias	25	20	Calidad
	20	Meta	San Juan De Arama	20	0	Calidad
	25	Meta	Castilla La Nueva	25	25	Calidad
	25	Meta	Guamal	25	25	Calidad
	25	Meta	San Martin	25	25	Calidad
	4	Atlántico	Palmar De Varela	30	31	Calidad
	4	Atlántico	Sabanagrande	30	31	Calidad
	4	Atlántico	Santo Tomas	90	91	Calidad
	5	Atlántico	Malambo	90	91	Calidad
	6	Atlántico	Campo De La Cruz	30	31	Calidad
	6	Atlántico	Candelaria	30	31	Calidad
	26	N. Santander	El Zulia	75	75	Calidad
	26	N. Santander	San Cayetano	25	25	Calidad
Total visitas de calidad				**3.302**	**3.330**	
TOTAL APROBACION Y CALIDAD				**4.414**	**4.437**	

Llamadas Realizadas

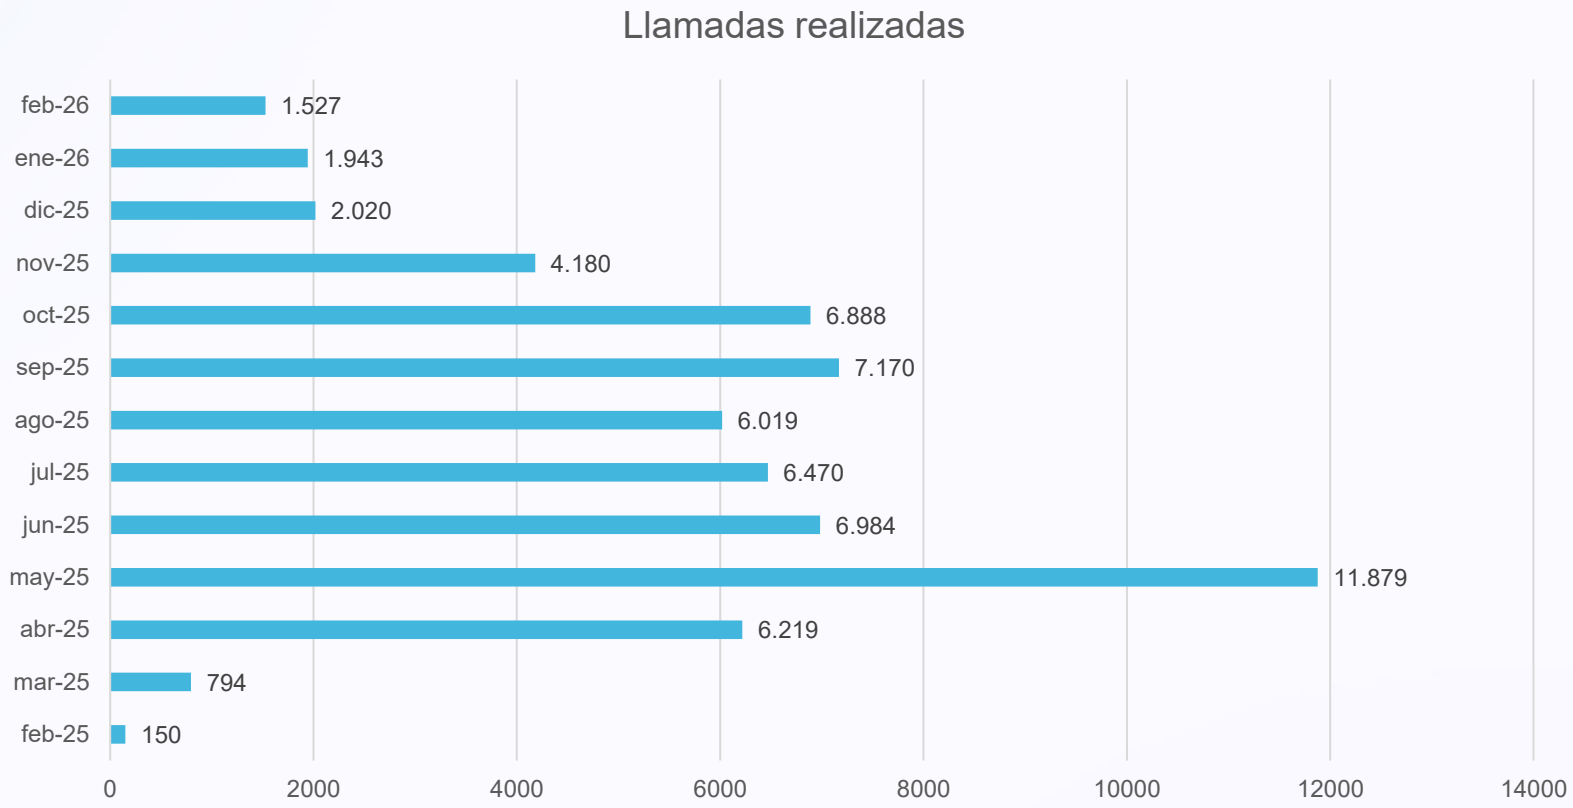

Con corte al presente comité , la interventoría ha llevado a cabo un total de 62.243 llamadas a los usuarios beneficiarios del proyecto. Estas comunicaciones telefónicas tienen como propósito principal validar la calidad del servicio de internet brindado, a fin de garantizar que se estén cumpliendo los estándares establecidos en los lineamientos técnicos y contractuales.

Consolidado de pagos

Región	Ejecutor	VALOR TOTAL CAPEX	PAGO APROBADO	LIBERACIÓN
4	SPACE COMUNICACIONES S.A.S	$ 1.596.613.584	$ 1.596.573.045	$ 40.539
5	EME INGENIERIA S.A. BIC.	$ 1.375.059.312	$ 1.374.547.832	$ 511.480
6	EME INGENIERIA S.A. BIC.	$ 1.083.888.216	$ 1.083.888.216	$ 0
7	DIGINORTE S.A.S.	$ 521.872.104	$ 521.421.293	$ 450.811,02
8	HIZ TELECOMUNICACIONES S.A.S.	$ 1.880.670.552	$ 1.880.670.552	$ 0
14	UT FOMENTO CASANARE 2.0	$ 675.842.160	$ 673.552.617	$ 2.289.543,48
15	INTERMEGAMUNDO PARTNERS S.A.S.	$ 1.181.453.400	$ 1.181.420.312	$ 33.088,01
16	UNIÓN TEMPORAL FIBRANOVATEL -UC7	$ 1.158.078.408	$ 1.157.374.195	$ 704.213
17	UNION TEMPORAL MEGAINTERCONECTA 2	$ 1.229.727.840	$ 1.229.727.840	$ 0
18	UNIÓN TEMPORAL CONECTANDO REGIONES SRCC	$ 2.159.137.848	$ 2.155.409.666	$ 3.728.181,63
19	UT CONECTANDO BAJO SINU	$ 1.084.396.368	$ 1.084.396.368	$ 0
20	PUNTO RED TELECOMUNICACIONES SAS	$ 1.539.192.408	$ 1.539.191.597	$ 811
21	CF INGENIEROS SAS	$ 1.090.494.192	$ 1.090.493.886	$ 306,46
22	UNIÓN TEMPORAL CONECTANDO REGIONES SRCC	$ 1.986.366.168	$ 1.986.098.660	$ 267.508
23	UNIÓN TEMPORAL FIBERCOL UC6	$ 1.173.831.120	$ 1.173.831.120	$ 0,07
24	UNIÓN TEMPORAL UNA COLOMBIA 5	$ 1.292.230.536	$ 1.292.225.151	$ 5.385,06
25	UNIÓN TEMPORAL INTERSOCIAL META	$ 718.018.776	$ 717.471.838	$ 546.938,27
26	UT FOMENTO DEL NORTE	$ 706.839.432	$ 704.951.787	$ 1.887.645
27	UT FOMENTO DEL NORTE	$ 649.926.408	$ 649.894.604	$ 31.804
29	Redes y Servicios de Telecomunicaciones NET I.S.P S.A.S.,	$ 1.304.426.184	$ 1.304.426.184	$ 0
30	SÚPER REDES S.A.S	$ 387.719.976	$ 387.719.976	$ 0
32	UNIÓN TEMPORAL CONECTANDO REGIONES SRCC	$ 1.331.866.392	$ 1.331.216.854	$ 649.538
36	UNION TEMPORAL ASINTEL UC	$ 683.972.592	$ 683.972.592	$ 0
37	NETWORKS TV S.A.S	$ 813.551.352	$ 813.467.999	$ 83.352,88
39	UNIÓN TEMPORAL INTERSOCIAL CUNDINAMARCA	$ 327.249.888	$ 327.249.888	$ 0
	TOTALES	**$ 27.952.425.216**	**$ 27.941.194.071**	**$ 11.231.145**

Estado revisión informes mensuales ejecutores

Región	Pago	INFORMES															
		Oct-24	Nov-24	Dic-24	Ene-25	Feb-25	Mar-25	Abr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Ago-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26
Región 4	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 5	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 6	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 7	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 8	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 14	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 15	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 16	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 17	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 18	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 19	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 20	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 21	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 22	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 23	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 24	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	S
Región 25	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 26	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 27	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	R
Región 29	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 30	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 32	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 36	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 37	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Región 39	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

RESUMEN

S: En subsanación	3
R: En revisión	6
SE: Sin entregar	0
OK: APROBADO	391

INFORMES DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO

REGIÓN	INFORME DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO	FECHA	TEMA	TASACIÓN	TOTAL TASACIONES	SUPERACIÓN
8	LFF2-INTV-DIRINFRA-00010-25 (251120461)	18/09/2025	Respuesta a Requerimiento	$17.344.787,70	$29.195.263,75	Parcialmente superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00014-25 (251129596)	10/10/2025	Informes	$11.850.476,05		Superado
26	LFF2-INTV-DIRINFRA-00001-25 (251082544)	10/07/2025	Metas	$7.143.586,09	$39.451.462,40	Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00003-25 (251111224)	28/08/2025	Registro (logs)	$20.502.828,52		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00006-25 (251115061)	8/09/2025	Informes	$9.756.237,85		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00011-25 (251127417)	6/10/2025	Informes	$1.024.404,97		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00015-25 (251132896)	20/10/2025	Informes	$1.024.404,97		Superado
27	LFF2-INTV-DIRINFRA-00004-25 (251111902)	29/08/2025	Registro (logs)	$18.853.175,65	$35.415.985,05	Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00007-25 (251117436)	11/09/2025	Metas	$7.143.586,09		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00008-25 (251117593)	11/09/2025	Informes	$7.706.637,25		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00012-25 (251128211)	8/10/2025	Informes	$856.293,03		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00016-25 (251132897)	20/10/2025	Informes	$856.293,03		Superado
29	LFF2-INTV-DIRINFRA-00002-25 (251099528)	30/07/2025	Informes	$11.939.827,77	$53.950.332,90	Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00013-25 (251128212)	8/10/2025	Informes	$2.100.525,26		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00017-25 (251132898)	20/10/2025	Informes	$2.100.525,26		Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00018-25 (251156188)	17/12/2025	Respuesta a Requerimiento y mantenimiento	$37.809.454,61		Superado
36	LFF2-INTV-DIRINFRA-00005-25 (251112325)	1/09/2025	Registro (logs)	$19.825.292,52	$29.154.841,94	Superado
	LFF2-INTV-DIRINFRA-00009-25 (251117880)	12/09/2025	Informes	$9.329.549,42		Superado

Varios

- Socialización de PQR
- Trámite de las Prórrogas R21 y R23

TIC

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

2025

ministerio_tic @ministerio_tic @ministerio_tic

@Ministerio_TIC MinisterioTIC.Colombia @ministeriotic @MinisterioTIC_Colombia

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA COMITE DE SEGUIMIENTO 13 CON ANEXO

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260303-091304-787e03-87580969
Creación: 2026-03-03 09:13:04
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-03-05 10:09:13

Escanee el código para verificación

Firma: Director de la interventoría



Juan Fernando Barrero Gonzalez
5826043
jbarrero@scain.co
Director Interventoría
Consorcio Inter-Lineas 2.0

Firma: Directora (e) Infraestructura



MARIA CAROLINA ZUÑIGA HERNANDEZ
32907441
mzuniga@mintic.gov.co
ASESORA DESPACHO DE LA MINISTRA
MINTIC

Firma: Líder del equipo de seguimiento MINTIC



CESAR AUGUSTO POLO
80851277
cpolo@mintic.gov.co

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA COMITE DE SEGUIMIENTO 13 CON ANEXO

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260303-091304-787e03-87580969
Creación: 2026-03-03 09:13:04
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-03-05 10:09:13

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CESAR AUGUSTO POLO cpolo@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-03-03 09:13:06 Lec.: 2026-03-03 09:39:30 Res.: 2026-03-03 09:40:23 IP Res.: 181.49.95.120 Canal: Email
Firma	MARIA CAROLINA ZUÑIGA HERNANDEZ mzuniga@mintic.gov.co ASESORA DESPACHO DE LA MINISTRA MINTIC	Aprobado	Env.: 2026-03-03 09:40:24 Lec.: 2026-03-05 09:55:58 Res.: 2026-03-05 09:56:12 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Firma	Juan Fernando Barrero Gonzalez jbarrero@scain.co Director Interventoría Consorcio Inter-Lineas 2.0	Aprobado	Env.: 2026-03-05 09:56:12 Lec.: 2026-03-05 10:09:10 Res.: 2026-03-05 10:09:13 IP Res.: 186.29.121.182 Canal: Email
