INFORME No. 04

Periodo

1 de marzo a 15 de abril de 2026

Contrato No. 002-SAM-2025

	MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA **FUNPRODESA** INFORME DE AVANCE No. 04 Y FINAL	

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación:	**15 de abril de 2026**	**Período del informe:**	**Desde el 1 marzo hasta el 15 de abril de 2026**
Nombre del Contratista:	FUNDACION PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO "FUNPRODESA" NIT 900.373.700-2 R.P VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ Cc: 34639432 Bolivar Cauca		
Nombre Supervisora:	**CAROLINA GASCA MUÑOZ** Secretaria de Planeación e infraestructura Municipal		

DATOS DEL CONTRATO	
Contrato de Prestación de Servicios	**No. 002 – SAMC – 2025**
Valor del Contrato	Ciento noventa y dos millones ochocientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta pesos ($192.843.750)
Valor cobro unico	100% actividades desarrolladas Ciento noventa y dos millones ochocientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta pesos ($192.843.750)
Saldo	Cero pesos ($0,0)

INFORMES A PRESENTAR	**CUATRO (04)**	**Numero de informe**	**CUARTO (04)**
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO RESTAURACION, PRESERVACION Y CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO DE LAS AREAS ESTRATEGICAS - EL MACO Y LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA FINANCIADO CON RECURSOS DEL SGR			
OBSERVACIONES	Se presenta cuarto y último informe en cumplimiento al contrato No. 002 – SAMC – 2025		

EJECUCIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLICACIONES CONTRACTUALES DURANTE EL PERIODO REPORTADO EN EL PRESENTE INFORME

1. COORDINACION, ASISTENCIA TECNICA

AVANCES:

Durante el presente periodo (01 de marzo a 15 de abril de 2026) el personal contratado para la parte de coordinación y asistencia técnica: Coordinadora (Maryi Daniela Ruiz Muñoz), Personal de apoyo 1 (Ana Luby Gómez Rengifo), Personal de

apoyo 2 (Leidy Melisa Daza Gómez) y procesos de reforestación y aislamiento (Víctor Hugo Gómez Díaz) realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Se realizaron cuatro (04) capacitaciones pendientes para cumplir el total de lo contratado (24 capacitaciones)
- ✓ Se organizaron los sitios y logística para cada una de las actividades a desarrollar en cumplimiento del contrato
- ✓ Para las entregas de las estufas ecoeficientes a base de leña se realizó una reunión con la comunidad beneficiaria y contratistas de la administración Municipal de Sucre Cauca (área ambiental y agropecuaria),
- ✓ Se revisaron los sitios de las viviendas de los 15 beneficiarios donde se entregaron e instalaron las estufas ecoeficientes
- ✓ Se realizaron los procesos de seguimiento, verificación de las diversas actividades de repoblamiento: siembra, fertilización y control fitosanitario para las 1050 plantas pendientes (920 en El Maco y 130 en Las Minas); para completar la siembra total de 1650 plantas (se sembraron 50 plantas más adicionales como proceso de reposición por perdidas a futuro).
- ✓ Entrega e instalación de las quince (15) estufas ecoeficientes a base de leña
- ✓ Presentación de informe final
- ✓ Análisis de avance mensual y cumplimiento del 100% de lo contratado.

CONSOLIDADO DE AVANCES

ÍTEM	PROCESO	UNID	CANT	AVANCE DESCRIPCION
1	**1 ASISTENCIA TECNICA**			
1,1	**COORDINACION Y ASISTENCIA TECNICA**			
1,1,1	1 Coordinador: Profesional Especialista área ambiental, por el tiempo de ejecución del proyecto, dedicación en un 40% del tiempo	MESES	4	Contratación y liquidación Actividades correspondientes a su contratación de coordinación
1.1.2	Personal de apoyo (2 personas) durante la organización de los eventos de capacitación y ejecución de actividades del proyecto	No. Asistencias Técnicas	64	Contratación y liquidación del personal requerido Organización de eventos, 24 capacitaciones, 64 seguimientos y asistencia al proyecto en los diversos procesos, seguimiento de las actividades

Meta cumplida al 100% evidencias en Anexos

2 TALLERES EN EDUCACION AMBIENTAL

El personal contratado para coordinación y apoyo a asistencia técnica realizaron los talleres y capacitaciones de educación ambiental, desarrollaron las siguientes actividades:

- ✓ Se trabajaron los últimos cuatro (04) procesos de capacitación de acuerdo a los temas anteriormente presentados y previamente concertados con las comunidades y la administración municipal de Sucre Cauca
- ✓ Dichas capacitaciones se realizaron en sitios previamente concertado, en los cuales hubo participación de los beneficiarios de las estufas y sus familiares de acuerdo a lo pactado con anterioridad.

PLAN DE CAPACITACIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD		
No.	**CAPACITACIONES**	**MES**
1	Buenas prácticas ambientales	6 de marzo
2	Energías Alternativas Y Renovables (Energía Solar)	8 de marzo
3	Energías Alternativas Y Renovables (Energía Eólica)	14 de marzo
4	Energías Alternativas Y Renovables (Energía Hídrica.)	21 de marzo

Cada taller o capacitación fue complementado con un refrigerio de acuerdo a las condiciones contratadas. los cuales fueron entregados a cada uno de los participantes

CONTENIDO DE LAS CAPACITACIONES

1) Buenas prácticas ambientales
✓ Ahorro en el consumo del agua
✓ Uso eficiente y ahorros del agua
✓ Generación de residuos
✓ Ahorro en el consumo de energía
✓ Limpieza
✓ Hábitos de consumo
✓ Mejores prácticas ambientales
✓ Objetivos
✓ Práctica ambiental
✓ Cosecha de agua lluvia
✓ Maquinaria solar otros
✓ Tecnología libre
✓ Acciones que reducen impactos negativos en el medio ambiente
✓ Modelos de mejores practicas

Energías Alternativas Y Renovables (Energía Solar)
• Impulsando el Futuro Energético Sostenible en Colombia • Energía Solar: Aprovechando el Poder del Sol • Sistemas solaresfotovoltaicos, tipos, aplicaciones, fabricación, diseño y composición • Ultimas noticias • Sistemas de energía solar fotovoltaica • Paneles solares fotovoltaicos • Tecnologías • TIPOS de Celdas • ¿Cuál tipo de panel es mejor? • Mercado global • Aspectos técnicos de los paneles • Sistemas solares fotovoltaicos • Otras tecnologías de almacenamiento

Energías Alternativas Y Renovables (Energía Eólica)
• Energía eólica contenidos • Comportamiento del recurso eólico • Uso de energía eólica • Ventajas y desventajas energía eólica • Aerogeneradores • El viento fuente de energía • Molinos de viento

Energías Alternativas Y Renovables (Energía Hídrica.)
• energía hidráulica • contenido de proceso energía hidráulica • ventajas de energía hidráulica • inconvenientes de energía hidráulica • potencial hídrico • las hidroeléctricas, la contaminación y la producción de electricidad • la contaminación en el mundo, en materia de energía eléctrica • gases de efecto invernadero en el sector eléctrico mundial • producción de electricidad - la hidroelectricidad • generación a base de recursos renovables en el mundo • generación vs contaminación • tecnologías de mayor contaminación en el sector eléctrico a nivel mundo • utilización de recursos renovables para producción de electricidad • conclusiones

PORCENTAJE DE AVANCES

ÍTEM	PROCESO	UNID	CANT	AVANCE DESCRIPCION
2	**TALLERES EN EDUCACION AMBIENTAL**			
2,1	Talleres de capacitación en procesos de sensibilización y cuidado del recurso hídrico, de las fuentes del Maco y las Minas (incluye papelería, logística, refrigerios, localidad)	Unidad	24	Se realizaron 4 talleres en el periodo, para un total de 24 talleres de educación ambiental de acuerdo a los requerimientos del contrato



REUNION CAPACITACIONES EL FRESNO SUCRE CAUCA MARZO DE 2026



REUNION CAPACITACIONES FINALES EL FRESNO SUCRE CAUCA



REUNION CAPACITACIONES FINALES EL FRESNO SUCRE CAUCA .INCLUYE REFRIGERIOS



REUNION CAPACITACIONES FINALES EL FRESNO SUCRE CAUCA .INCLUYE REFRIGERIOS



Metas cumplidas en un 100%, evidencias en anexos

3. REPOBLAMIENTO DE LAS ÁREAS DEL MACO Y LAS MINAS CON ÁRBOLES NATIVOS EN UNA EXTENSIÓN DE 5 HECTÁREAS

- ✓ Los lugares para el repoblamiento fueron visitados y cubiertos según lo siguiente:

- ✓ El Maco se trabajó en cinco (05) sitios (1320 plantas): En el periodo se realizó la siembre de 920 plantas, Acumulado: Adquisición de material vegetal y puesta las zonas de trabajo en el Territorio del Municipio de Sucre Cauca: Siembra de 1320 plantas en el predio del Maco Municipio de Sucre Cauca. Fertilización y control de plagas de1320 plantas sembradas, Se Incluye reposición de plantas

DESCRIPCION REPOBLAMIENTO	METROS LINEALES	DIC	ENERO	FEBR	MARZO	ABRIL	SUMAS
El Maco: en 5 sitios: (1320)							
Lote 1 (Parte alta = norte)	360	0	0	350	10	0	360
Lote 2 (Parte media= Occidente)	300	0	0	50	250	0	300
Lote 3 (parte media = oriente)	230	0	0	0	230	0	230
Lote 4 (Parte media = sur oriente)	120				120	0	120
Lote 5 (parte baja = sur)	310				310	0	310
SUMAS CONTRATO	**1320**	**0**	**0**	**400**	**920**	**0**	**1320**
Reposición	**50**						**50**
SUMAS TOTALES	**1370**						**1370**


- ✓ En Las Minas se trabajó en dos (02) sitios (330 Plantas): En el periodo se realizó

la siembre de 130 plantas, Adquisición de material vegetal y puesta las zonas de trabajo en el Territorio del Municipio de Sucre Cauca, Siembra de 330 plantas en el predio del Maco Municipio de Sucre Cauca; fertilización y control de plagas de 330 plantas, sembradas, Se Incluye reposición de plantas

DESCRIPCION REPOBLAMIENTO	METROS LINEALES	DIC	ENERO	FEBR	MARZO	ABRIL	SUMAS
Las Minas en 2 sitios (330)							
Lote 1: Parte media (occidente)	90	0	0	90	0		**90**
Lote 2: Parte media (oriente)	240	0	0	110	130		**240**
SUMAS	**330**	**0**	**0**	**200**	**130**	**0**	**330**

Los costos de las plantas de reposición son asumidos por la Fundación

ZONAS INTERVENIDAS PREDIO EL MACO

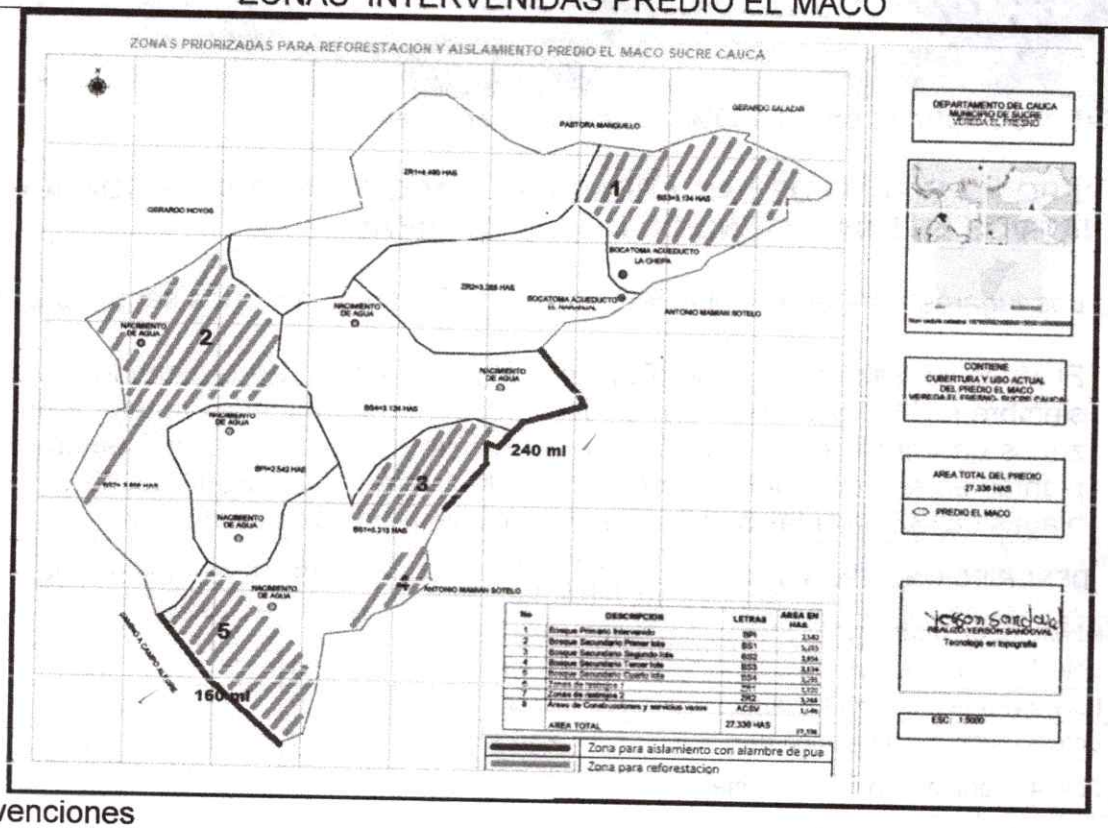


Convenciones

Zona de aislamiento: 400 metros lineales
Zona de reforestacion: siembra de 1.320 plantas nativas en proceso de Repoblamiento

ZONAS INTERVENIDAS LAS MINAS

ZONAS PRIORIZADAS PARA REFORESTACION Y AISLAMIENTO PREDIO LAS MINAS SUCRE CAUCA

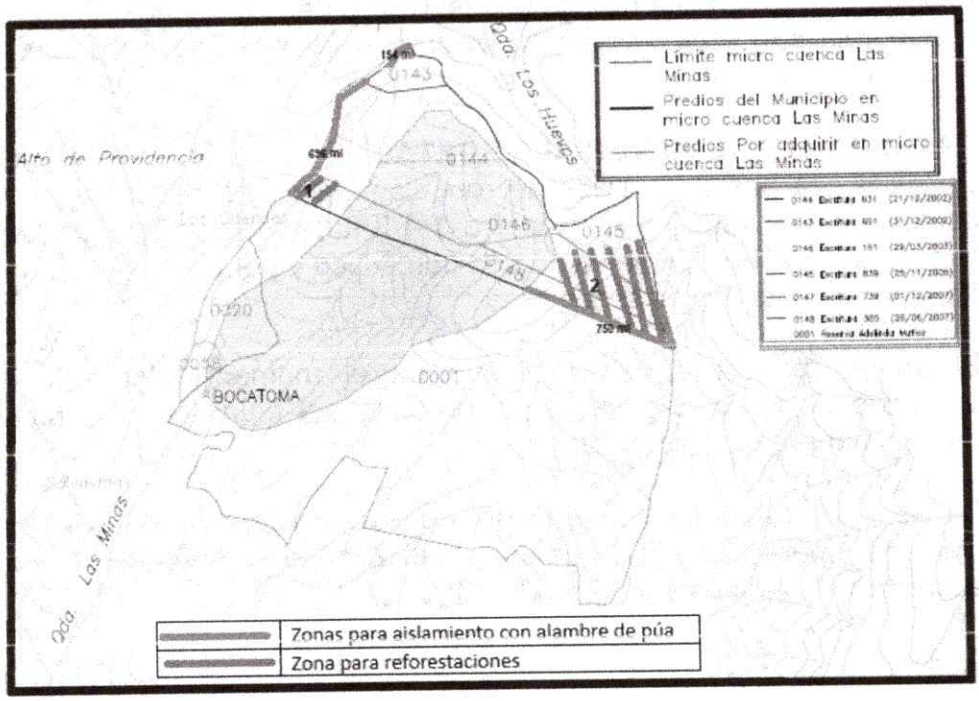

Convenciones

Zona de aislamiento: 1600 metros lineales

Zona de reforestacion: siembra de 330 plantas nativas en proceso de repoblamiento

MATERIAL VEGETAL ADQUIRIDO

El material vegetal adquirido (1700 plantas en total) está compuesto por plantas de: Aliso (Alnus acuminata), jigua (Nectandra sp), Cascarillo (Ladenbergia magnifolia), Cedro de 2 variedades (Cedrela odorata y Cedrela sp), gualanday (Jacaranda mimosifolia) , guayacán (Tabebuia chrysantha), , roble (Quercus), cedrillo o fresno (Tapirira guianensis) y chachafruto (Erythrina edulis)

Se organizaron las especies arbóreas en canastillas de acuerdo a los requerimientos de los predios de Las Minas y El Maco, dejando las de clima más frio para los predios de las Minas y los de menor adaptabilidad al frio para los sectores del predio El Maco.

- ✓ Especies para zona de El Maco (1320 plantas, de los cuales 920 plantas se plantaron en e presente periodo): Aliso (Alnus acuminata), jigua (Nectandra sp), Cascarillo (Ladenbergia magnifolia), gualanday (Jacaranda

mimosifolia) , guayacán (Tabebuia chrysantha), cedrillo o fresno (Tapirira guianensis), chachafruto (Erythrina edulis)

- ✓ Especies para zona de Las Minas: Cedro de 2 variedades (Cedrela odorata y Cedrela sp), roble (Quercus), cedrillo o fresno (Tapirira guianensis) y Aliso (Alnus acuminata),

TRANSPORTE DE MATERIAL VEGETAL

- ✓ Desde la vía hasta los sitios de repoblamiento, Las Minas (a 2 1/2 horas por camino de herradura) y El Maco (a 1 1/2 horas por camino de herradura) son trasportados sobre animales de uso doméstico y por personal contratado para el transporte hasta el sitio se siembra

El abono respectivo para aplicarlo en el momento del repoblamiento fue adquirido en los almacenes agropecuarios del Municipio y transportado de la misma manera que las plantas

- ✓ Se anexan registros fotográficos de los diferentes medios de transporte utilizados para llegar el material hasta el sitio final de los procesos de aislamiento y reforestación.

AVANCES

ÍTEM	PROCESO	UNID	CANT	AVANCE DESCRIPCION
3	**REPOBLAMIENTO DE LAS ÁREAS DEL MACO Y LAS MINAS CON ÁRBOLES NATIVOS EN UNA EXTENSIÓN DE 5 HECTÁREAS**			
3.1	Siembra de 1320 plántulas nativas (ver cuadro anexo de especies) en 4 Hectáreas en el área del Maco: Incluye: 1) Mano de obra no calificada para: Preparación de terreno, Trazado, Plateo, Ahoyado, Aplicación de fertilizantes y correctivos, Transporte interno de insumos, Plantación (siembra), Control fitosanitario, Reposición (Replante), Adecuación de caminos, Protección de incendios). 2) insumos: Plántulas, Fertilizantes npk, Correctivos, Insecticidas	HAS 1320 plantas	4	En el periodo se realizó la siembre de 920 plantas Acumulado: Adquisición de material vegetal y puesta las zonas de trabajo en el Territorio del Municipio de Sucre Cauca: Siembra de 1320 plantas en el predio del Maco Municipio de Sucre Cauca Fertilización y control de plagas de1320 plantas sembradas, Se Incluye reposición de plantas (ver descripción de repoblamiento)

ÍTEM	PROCESO	UNID	CANT	AVANCE DESCRIPCION
3	**REPOBLAMIENTO DE LAS ÁREAS DEL MACO Y LAS MINAS CON ÁRBOLES NATIVOS EN UNA EXTENSIÓN DE 5 HECTÁREAS**			
3,2	Siembra de 330 plántulas nativas (ver cuadro anexo de especies) en 1 Hectárea en el área de las Minas Incluye: 1) Mano de obra no calificada para: Preparación de terreno, Trazado, Plateo, Ahoyado, Aplicación de fertilizantes y correctivos, Transporte interno de insumos, Plantación (siembra), Control fitosanitario, Reposición (Replante), Adecuación de caminos, Protección de incendios). 2) insumos: Plántulas, Fertilizantes npk, Correctivos, Insecticidas	Hectáreas 330 plantas	1	En el periodo se realizó la siembre de 130 plantas. Adquisición de material vegetal y puesta las zonas de trabajo en el Territorio del Municipio de Sucre Cauca, Siembra total de 330 plantas en el predio del Maco Municipio de Sucre Cauca Fertilización y control de plagas de 330 plantas, sembradas, Se Incluye reposición de plantas (ver descripción de repoblamiento)

Metas cumplidas al 100%

4 AISLAMIENTOS DE ZONAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL MACO Y LAS MINAS

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA PREDIO


EL MACO: Aislamiento de las áreas de interés ambientales de El Maco 400 metros lineales, del municipio de Sucre, con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor

LAS MINAS: Aislamiento de las áreas de interés ambientales de Las Minas, 1600 metros lineales del municipio de Sucre, con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor

UBICACIÓN DE LOS SITIOS A AISLAR


- ✓ La ubicación de los sitios a aislar está determinada desde el principio del proyecto, para identificar los sitios en terreno se realizaron tres (03) recorridos en cada uno de los predios para ubicar con exactitud los sitios a aislar con alambre de púa

EL MACO: Dos (02) sitios, ubicados en los círculos azules de la siguiente imagen

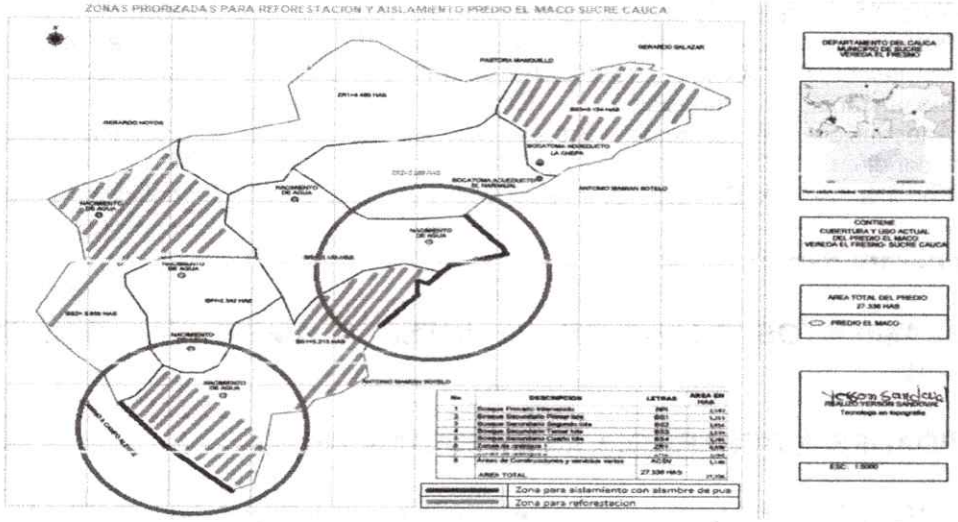

LAS MINAS: Tres (03) sitios, ubicados en los círculos azules de la siguiente imagen

ZONAS A INTERVENIR LAS MINAS

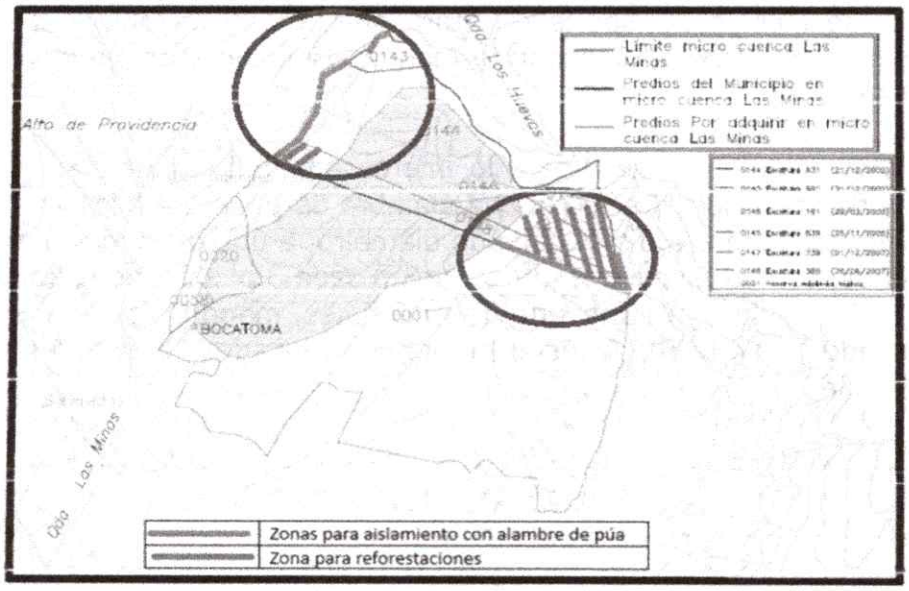

AVANCES

Se compró, transporto e instalo todo el alambre, posteadura y las grapas para el aislamiento de los 2000 metros lineales

PREDIO LAS MINAS: En el presente periodo solamente se realizó revisión de lo aislado en este sector, ya que se había cubierto con anterioridad la meta en el sector, a la fecha se han aislado mil seiscientos (1600) metros lineales con 4 hilos de alambre de púa (avance de un 100% para el predio) dando cumplimiento a lo recomendado: con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor.

DESCRIPCION AISLAMIENTO	METROS LINEALES	DIC	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	SUMATORIA
Las Minas: Aislamiento en 3 sitios: (1600)							
Lote 1: Parte alta (Norte)	154	0	0	154	0	0	154
Lote 2: Parte media (oriente)	696	0	0	696	0	0	696
Lote 3: Parte media (occidente)	750	0	0	750	0	0	750
SUMAS	**1600**	**0**	**0**	**1600**	**0**	**0**	**1600**

PREDIO EL MACO: En el presente periodo se aislaron ochenta (80) metros lineales que estaban pendientes, logrando el 100% de lo contratado equivalentes a trecientos veinte metros lineales (320 ml), se aisló la parte inferior del predio en donde se presentaban problemas de ingreso de animales domésticos que contaminaban la fuente hídrica. Se da cumplimiento a lo recomendado: con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor

DESCRIPCION AISLAMIENTO	METROS LINEALES	DIC	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	SUMATORIA
El Maco: Aislamiento en 2 sitios (400)							
Lote 1: Parte baja (Sur)	160	0	0	160			**160**
Lote 2: Parte media (oriente)	240	0	0	160	80		**240**
SUMAS	**400**	**0**	**0**	**320**	**80**	**0**	**400**

AVANCES

ÍTEM	PROCESO	UNID	CANT	AVANCE DESCRIPCION
4	**AISLAMIENTOS DE ZONAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL MACO Y LAS MINAS**			
4,1	Aislamiento de las áreas de interés ambientales de El Maco 400 metros lineales, del municipio de Sucre, con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor	Metros lineales	400	En el periodo se realizó el aislamiento de 80 metros lineales en el Lote número 2. Acumulado. Compra, transporte e instalación de alambre, grapas y posteadura.400 metros lineales Procesos de ubicación de material en la zona a aislar Aislamiento de 400 metros lineales con 4 hilos de alambre
4,2	Aislamiento de las áreas de interés ambientales de Las Minas, 1600 metros lineales del municipio de Sucre, con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor	metros	1.600	En el periodo se realizó el aislamiento de 0 metros lineales. Acumulado: Compra, transporte e instalación de alambre, grapas y posteadura., Aislamiento de 1600 metros lineales con 4 hilos de alambre

Metas cumplidas en un 100% evidencias en los anexos

Teniendo en cuenta las diferentes situaciones presentes al inicio del proyecto, y una vez solucionado y ratificado los respectivos cambios (un Fallecimiento del Titular, tres (03) renuncias por desinterés en el proyecto) se obtiene como base final la siguiente:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	VEREDA	COORDENADAS	MSNM
1	Antonino Magin Palechor	10698295	El Fresno	2°04'04"N 76°53'42"W	1675
2	Audelia Moncayo Ijaji	34370168	El Fresno	2°05'08"N 76°53'14"W	1670
3	Doralba Yaned Rodriguez Guevara	59830218	El Fresno	2°04'59"N 76°53'35"W	1726
4	Eulalia Luna De Gomez	34370072	El Fresno	2°05'19"N 76°53'15"W	1601
5	Hecta Mery Luna Lopez	25588773	El Fresno	2°05'01"N 76°53'33"W	1717
6	Leonila Palechor Atoy	1131024001	El Fresno	2°05'10"N 76°53'26"W	1678
7	Maria Catalina Luna De Buesaquillo	25587896	El Fresno	2°05'1287"N 76°53'22"W	1680

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	VEREDA	COORDENADAS	MSNM
8	Martha Isabel Gomez Ruiz	34673919	El Fresno	2°05'13"N 76°53'10"W	1637
9	German Mamian Jiménez	1.059.900.996	El Fresno	2°04'23"N 76°54'31"W	1582
10	Maria Consuelo Mamian Jimenez	25599996	El Fresno	2°05'17"N 76°53'17"W	1616
11	Olga Salazar Quijano	34370105	El Fresno	2°05'29.22"N76°53'19"W	1548
12	Luceli Fernandez Rengifo	48649165	Salvavidas	2°02'03"N 76°53'6"W	1680
13	Fernando Gomez Diaz	10696793	Salvavidas	2°03'03"N 76°53'57"W	1760
14	Alirio Gironza Mamian	76308220	Salvavidas	2°02'024"N 76°54'04"W	1514
15	Maria Leonila Rengifo	25325205	Salvavidas	2°02'27"N 76°53'58"W	1597

5 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA ECOEFICIENTE A BASE DE LEÑA

Se visitaron los predios de cada uno de los beneficiarios y con ellos se trabajó lo siguiente:

- ✓ Revisión de cada uno de los sitios para la instalación de las estufas ecoeficientes a base de leña
- ✓ Explicación del manejo de las estufas
- ✓ Adquisición, y entrega de las estufas ecoeficientes a base de leña
- ✓ Instalación y puesta en funcionamiento de cada una de las estufas ecoeficientes a base de leña
- ✓ Llenado de actas de entrega de manera satisfactoria a cada uno de los beneficiarios
- ✓ Entregas finales al 100% a los quince (15) beneficiarios

AVANCES

ÍTEM	PROCESO	UNID	CANT	AVANCE DESCRIPCION
5	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA ECOEFICIENTE A BASE DE LEÑA**			
5,1	ESTUFA ECOEFICIENTE Multifuncional (4 hornillas + horno + azador). - Estructura resistente (material utilizado para alta resistencia y larga duración) • Accesorios y herrajes desmontables (permiten un mejor mantenimiento y cuidado a la estufa). Transportable (el modelo permite que el usuario pueda utilizarla en cualquier lugar, es decir, no queda sujeta o instalada en un solo lugar).•Modelo: ErgoNatura • Pintura: Martillada color gris acorazado • Cuerpo de la estufa: Elaborado en lámina Cold Rolled calibre 16 (1.4 mm), Pared frontal lamina HR (2.5mm). • Dimensiones: ancho 90 cm, alto 85 cm, fondo 60 cm,	Estufa	15	Revisión del 100% de los predios de los beneficiarios (15 POSTULADOS) Entrega e instalación de 15 hornillas ecoeficientes a base de leña

ÍTEM	PROCESO	UNID	CANT	AVANCE DESCRIPCION
5	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA ECOEFICIENTE A BASE DE LEÑA**			
	buitron 2,44 m • Acabado: gris acorazado, azul, • 4 hornillas. • Horno (25 ancho x 30 alto x 40 fondo) • Parrilla asadora (20 ancho x 35 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable			

Meta cumplida al 100% evidencias en los anexos

Dado en Sucre Cauca a los quince (15) días del mes de abril del año 2026

Atentamente

VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ
Cc: 34639432 Bolívar Cauca

Proyecto: Maryi Daniela Ruiz Muñoz MD
Reviso y aprobó: Vanessa Johanna Sánchez Ruiz VJS

ANEXO

Avances en el contrato total
Informes del Equipo Técnico del proyecto

INFORME DE EJECUCION POR LA CONTRATISTA	funprodesa Fundación para el Progreso y Desarrollo

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación:	**15 de abril de 2026**	**Período del informe:**	**01 de marzo a 15 de abril de 2026**
Nombre del Contratista:	MARYI DANIELA RUIZ MUÑOZ 1.061.810.605 Popayán		
Nombre del contratante:	FUNDACION PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO _ FUNPRODESA NIT 900.373.700-2 R.P VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ Cc: 34639432 Bolivar Cauca		

DATOS DEL CONTRATO			
INFORMES A PRESENTAR	**CUATRO (04)**	**Numero de informe**	**CUARTO (04)**
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales para el proyecto restauración, preservación y conservación del recurso hídrico de las áreas estratégicas - el maco y las minas del municipio de sucre cauca financiado con recursos del SGR para el contrato de prestación de servicios no. 002 – SAMC – 2025		
Fecha de inicio	15 de diciembre de 2025		
Fecha finalización	15 de abril de 2026		

EJECUCIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLICACIONES CONTRACTUALES DURANTE EL PERIODO REPORTADO EN EL PRESENTE INFORME

OBLIGACIONES.

ACTIVIDAD N°.1: COORDINAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA

AVANCES

- ✓ Apoyo en la realización de las cuatro (04) capacitaciones pendientes para cumplir el total de lo contratado (24 capacitaciones)
- ✓ Con el equipo técnico se realizó la revisión de los sitios o viviendas que estaban pendientes por visitar
- ✓ Se coordinó de actividades puntuales con la comunidad,
- ✓ Se Coordinó de entrega de las quince (15) estufas ecoeficientes a base de leña
- ✓ Apoyo en campo para cada una de las actividades (seguimiento en procesos de siembra, aislamiento y educación ambiental),
- ✓ Presentación de informes.
- ✓ Consolidación de los quince (15) beneficiarios de las estufas ecoeficientes a base de leña
- ✓ Análisis de avance mensual y cumplimiento del 100% de lo contratado.

ACTIVIDAD N°. 2 DIRIGIR LA SOCIALIZACIÓN E INICIO DEL PROYECTO AMBIENTAL PARA EL QUE FUE CONTRATADA COMO COORDINADORA

AVANCES

Para las entregas de las estufas ecoeficientes a base de leña se realizó una reunión con la comunidad beneficiaria y contratistas de la administración Municipal de Sucre Cauca (área ambiental y agropecuaria), en la cual se hace entrega oficial de las estufas y se dan las respectivas recomendaciones para el uso, así como los procesos a seguir

ACTIVIDAD N°. 3 COORDINAR LA VERIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS Y SU ESTADO

AVANCES

Teniendo en cuenta las diferentes situaciones presentes al inicio del proyecto, y una vez solucionado y ratificado los respectivos cambios (un Fallecimiento del Titular, tres (03) renuncias por desinterés en el proyecto) se obtiene como base final la siguiente:

BASE FINAL DE BENEFICIARIOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	VEREDA	COORDENADAS	MSNM
1	Antonino Magin Palechor	10698295	El Fresno	2°04'04"N 76°53"42"W	1675
2	Audelia Moncayo Ijaji	34370168	El Fresno	2°05'08"N 76°53'14"W	1670
3	Doralba Yaned Rodriguez Guevara	59830218	El Fresno	2°04'59"N 76°53'35"W	1726
4	Eulalia Luna De Gomez	34370072	El Fresno	2°05'19"N 76°53'15"W	1601
5	Hecta Mery Luna Lopez	25588773	El Fresno	2°05'01"N 76°53'33"W	1717
6	Leonila Palechor Atoy	1131024001	El Fresno	2°05'10"N 76°53'26"W	1678
7	Maria Catalina Luna De Buesaquillo	25587896	El Fresno	2°05'1287"N 76°53'22"W	1680
8	Martha Isabel Gomez Ruiz	34673919	El Fresno	2°05'13"N 76°53'10"W	1637
9	German Mamian Jiménez	1.059.900.996	El Fresno	2°04'23"N 76°54'31"W	1582
10	Maria Consuelo Mamian Jimenez	25599996	El Fresno	2°05'17"N 76°53'17"W	1616
11	Olga Salazar Quijano	34370105	El Fresno	2°05'29.22"N76°53'19"W	1548
12	Luceli Fernandez Rengifo	48649165	Salvavidas	2°02'03"N 76°53'6"W	1680
13	Fernando Gomez Diaz	10696793	Salvavidas	2°03'03"N 76°53'57"W	1760

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	VEREDA	COORDENADAS	MSNM
14	Alirio Gironza Mamian	76308220	Salvavidas	2°02'024"N 76°54'04"W	1514
15	Maria Leonila Rengifo	25325205	Salvavidas	2°02'27"N 76°53'58"W	1597

Se coordinó la visita del 100% de los beneficiarios por medio del personal de apoyo, para las entregas de las estufas ecoeficientes, realizando las respectivas observaciones y recomendaciones, compromisos adquiridos por las partes involucradas en el proyecto.

ACTIVIDAD N°. 4: VERIFICAR EL ESTADO DE CADA UNO DE LOS PREDIOS A REALIZAR LAS ACTIVIDADES

AVANCES

Se verifica nuevamente el estado de la vivienda de los beneficiarios, específicamente los compromisos asumen la anterior visita sobre la adecuación de cada sitio de instalación de la estufa ecoeficiente a base de leña.

ACTIVIDAD N°. 5 COORDINAR CON EL PERSONAL ENCARGADO Y LA COMUNIDAD EL PROCESO Y FECHAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS DIVERSAS CAPACITACIONES O TALLERES

AVANCES

- ✓ Se trabajaron los últimos cuatro (04) procesos de capacitación de acuerdo a los temas anteriormente presentados y previamente concertados con las comunidades y la administración municipal de Sucre Cauca
- ✓ Dichas capacitaciones se realizaron en sitios previamente concertado, en los cuales hubo participación de los beneficiarios de las estufas y sus familiares de acuerdo a lo pactado con anterioridad.

PLAN DE CAPACITACIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD			
No.	CAPACITACIONES		MES
1	Buenas prácticas ambientales	✓	6 de marzo
2	Energías Alternativas Y Renovables (Energía Solar)	✓	8 de marzo
3	Energías Alternativas Y Renovables (Energía Eólica)	✓	14 de marzo
4	Energías Alternativas Y Renovables (Energía Hídrica.)	✓	21 de marzo

Cada taller o capacitación fue complementado con un refrigerio de acuerdo a las condiciones contratadas, los cuales fueron entregados a cada uno de los participantes

ACTIVIDAD N°.6 DIRIGIR LOS DIVERSOS PROCESOS DE AISLAMIENTO EN LOS PREDIOS DE LAS MINAS Y EL MACO DEL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA

AVANCES

La ubicación de los sitios a aislar está determinada desde el principio del proyecto, para identificar los sitios en terreno se realizaron recorridos en cada uno de los predios para revisar con exactitud los sitios aislados con alambre de púa, según lo siguiente:

PREDIO LAS MINAS: En el presente periodo solamente se realizó revisión de lo aislado en este sector, ya que se había cubierto con anterioridad la meta en el sector, a la fecha se han aislado mil seiscientos (1600) metros lineales con 4 hilos de alambre de púa (avance de un 100% para el predio) dando cumplimiento a lo recomendado: con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor.

DESCRIPCION AISLAMIENTO	METROS LINEALES	DIC	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	SUMATORIA
Las Minas: Aislamiento en 3 sitios: (1600)							
Lote 1: Parte alta (Norte)	154	0	0	154	0	0	154
Lote 2: Parte media (oriente)	696	0	0	696	0	0	696
Lote 3: Parte media (occidente)	750	0	0	750	0	0	750
SUMAS	**1600**	**0**	**0**	**1600**	**0**	**0**	**1600**

PREDIO EL MACO: En el presente periodo se aislaron ochenta (80) metros lineales que estaban pendientes, logrando el 100% de lo contratado equivalentes a trecientos veinte metros lineales (320 ml), se aisló la parte inferior del predio en donde se presentaban problemas de ingreso de animales domésticos que contaminaban la fuente hídrica. Se da cumplimiento a lo recomendado: con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor

DESCRIPCION AISLAMIENTO	METROS LINEALES	DIC	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	SUMATORIA
El Maco: Aislamiento en 2 sitios (400)							
Lote 1: Parte baja (Sur)	160	0	0	160			**160**
Lote 2: Parte media (oriente)	240	0	0	160	80		**240**
SUMAS	**400**	**0**	**0**	**320**	**80**	**0**	**400**

ACTIVIDAD N°.7: COORDINAR LAS ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REPOBLAMIENTO EN LOS PREDIOS DE LAS MINAS Y EL MACO DEL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA

AVANCES 7

- ✓ Se realizó acompañamiento en cada uno de los predios de las Minas y El Maco en el Municipio de Sucre Cauca, en donde se realizan las actividades puntuales de reforestación y aislamiento.

- ✓ El material vegetal adquirido (1700 plantas en total), está compuesto por plantas de: Aliso (Alnus acuminata), jigua (Nectandra sp), Cascarillo (Ladenbergia magnifolia), Cedro de 2 variedades (Cedrela odorata y Cedrela sp), gualanday (Jacaranda mimosifolia) , guayacán (Tabebuia chrysantha), , roble (Quercus), cedrillo o fresno (Tapirira guianensis) y chachafruto (Erythrina edulis)

- ✓ Especies para zona de El Maco (1320 plantas, de los cuales 920 plantas se plantaron en e presente periodo): Aliso (Alnus acuminata), jigua (Nectandra sp), Cascarillo (Ladenbergia magnifolia), gualanday (Jacaranda mimosifolia) , guayacán (Tabebuia chrysantha), cedrillo o fresno (Tapirira guianensis), chachafruto (Erythrina edulis)
- ✓ Especies para zona de Las Minas: Cedro de 2 variedades (Cedrela odorata y Cedrela sp), roble (Quercus), cedrillo o fresno (Tapirira guianensis) y Aliso (Alnus acuminata),

TRANSPORTE DE MATERIAL VEGETAL

- Desde la vía hasta los sitios de repoblamiento, Las Minas (a 2 1/2 horas por camino de herradura) y El Maco (a 1 1/2 horas por camino de herradura) son trasportados sobre animales de uso doméstico y por personal contratado para el transporte hasta el sitio se siembra

  El abono respectivo para aplicarlo en el momento del repoblamiento fue adquirido en los almacenes agropecuarios del Municipio y transportado de la misma manera que las plantas

- ✓ Los lugares para el repoblamiento fueron visitados y cubiertos según lo siguiente:
  Las siembras se realizaron en de acuerdo a los requisitos del proyecto

- ✓ El Maco se trabajó en cinco (05) sitios (1320 plantas): En el periodo se realizó la siembre de 920 plantas, Acumulado: Adquisición de material vegetal y puesta las zonas de trabajo en el Territorio del Municipio de Sucre Cauca: Siembra de 1320 plantas en el predio del Maco Municipio de Sucre Cauca. Fertilización y control de plagas de1320 plantas sembradas, Se Incluye reposición de plantas

DESCRIPCION REPOBLAMIENTO	METROS LINEALES	DIC	ENERO	FEBR	MARZO	ABRIL	SUMAS
El Maco: en 5 sitios: (1320)							
Lote 1 (Parte alta = norte)	360	0	0	350	10	0	360
Lote 2 (Parte media= Occidente)	300	0	0	50	250	0	300
Lote 3 (parte media = oriente)	230	0	0	0	230	0	230
Lote 4 (Parte media = sur oriente)	120				120	0	120
Lote 5 (parte baja = sur)	310				310	0	310
SUMAS CONTRATO	**1320**	**0**	**0**	**400**	**920**	**0**	**1320**
Reposición	**50**						**50**
SUMAS TOTALES	**1370**						**1370**

- ✓ En Las Minas se trabajó en dos (02) sitios (330 Plantas): En el periodo se realizó la siembre de 130 plantas, Adquisición de material vegetal y puesta las zonas de trabajo en el Territorio del Municipio de Sucre Cauca, Siembra de 330 plantas en el predio del Maco Municipio de Sucre Cauca; fertilización y control de plagas de 330 plantas, sembradas, Se Incluye reposición de plantas

DESCRIPCION REPOBLAMIENTO	METROS LINEALES	DIC	ENERO	FEBR	MARZO	ABRIL	SUMAS
Las Minas en 2 sitios (330)							
Lote 1: Parte media (occidente)	90	0	0	90	0		**90**
Lote 2: Parte media (oriente)	240	0	0	110	130		**240**
SUMAS	**330**	**0**	**0**	**200**	**130**	**0**	**330**

Los costos de las plantas de reposición son asumidos por la Fundación

ACTIVIDAD N°.8: REALIZAR LAS RESPECTIVAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A EL ESTABLECIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTUFAS EFICIENTES EN CADA HOGAR DE LOS BENEFICIARIOS

AVANCES

Se visitaron los predios de cada uno de los beneficiarios y con ellos se trabajó lo siguiente:

- ✓ Revisión de cada uno de los sitios para la instalación de las estufas ecoeficientes a base de leña
- ✓ Explicación del manejo de las estufas
- ✓ Adquisición, y entrega de las estufas ecoeficientes a base de leña
- ✓ Instalación y puesta en funcionamiento de cada una de las estufas ecoeficientes a base de leña
- ✓ Llenado de actas de entrega de manera satisfactoria a cada uno de los beneficiarios
- ✓ Entregas finales al 100% a los quince (15) beneficiarios

ACTIVIDAD N°.9: COORDINAR LA PRESENTACIÓN DE LOS DIVERSOS INFORMES DEL PROYECTO

AVANCES

- ✓ Se recepcionaron los informes del equipo técnico
- ✓ Se presentó a la fundación el cuarto y último informe de avance (periodo 1 de marzo a 15 de abril de 2026)
- ✓ Se presenta el cuarto y último informe de avance del presente contrato a la administración municipal de Sucre Cauca

Dado en Sucre Cauca a los 15 días del mes de abril del año 2026

Atentamente

Maryi Daniela Ruiz M.

MARYI DANIELA RUIZ MUÑOZ
1.061.810.605 Popayán

INFORME DE EJECUCION POR LA CONTRATISTA	funprodesa Fundación para el Progreso y Desarrollo

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación:	**15 de abril de 2026**	**Período del informe:**	**01 de marzo al 15 de abril de 2026**
Nombre del Contratista:	**ANA LUBY GOMEZ RENGIFO** 52.734.621 Bogotá D.C		
Nombre del contratante:	FUNDACION PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO _ FUNPRODESA NIT 900.373.700-2 R.P VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ Cc: 34639432 Bolivar Cauca		

DATOS DEL CONTRATO			
INFORMES A PRESENTAR	**CUATRO (04)**	**Numero de informe**	**CUARTO (04)**
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales como apoyo para la organización de los eventos de capacitación y ejecución de actividades, para el proyecto restauración, preservación y conservación del recurso hídrico de las áreas estratégicas - El Maco Y Las Minas Del Municipio De Sucre cauca financiado con recursos del SGR - contrato de prestación de servicios no. 002 – SAMC - 2025		
Fecha de inicio	15 de diciembre de 2025		
Fecha finalización	15 de abril de 2026		

EJECUCIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLICACIONES CONTRACTUALES DURANTE EL PERIODO REPORTADO EN EL PRESENTE INFORME

OBLIGACIONES.

ACTIVIDAD N°.1 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y REUNIONES

AVANCES

En común acuerdo con el equipo técnico se realizó lo siguiente:

- ✓ Desarrollo de las cuatro (04) capacitaciones pendientes para cumplir el total de lo contratado (24 capacitaciones)
- ✓ Organización de los sitios y logística para cada una de las actividades a desarrollar en cumplimiento del contrato
- ✓ Revisión de los sitios o viviendas que están incluidos en el proyecto
- ✓ Seguimiento y verificación de las diversas actividades realizadas en repoblamiento: siembra, fertilización y control fitosanitario para las 1050 plantas (920 en El Maco y 130 en Las Minas); para completar la siembra total de 1650 plantas (se sembraron unas adicionales como proceso de reposición por perdidas a futuro).
- ✓ Se apoyó la de entrega e instalación de las quince (15) estufas ecoeficientes a base de leña
- ✓ Apoyo en campo para cada una de las actividades (seguimiento en procesos de

siembra, aislamiento y educación ambiental),
- ✓ Apoyo para la presentación de informes a fundación y al municipio de Sucre Cauca.

ACTIVIDAD N°.2_ REVISIÓN DE CAMPO DE LAS ZONAS DE AISLAMIENTO, REFORESTACIÓN E INSTALACIÓN DE LAS ESTUFAS ECOEFICIENTES A BASE DE LEÑA

AVANCES

- ✓ Se efectuaron seguimientos a los procesos en campo en los predios de El Maco y Las Minas frente a los avances en los aislamientos y en las reforestaciones (repoblamiento), los recorridos se realizaron con personal de la comunidad que desarrollaran las actividades correspondientes.
- ✓ Se realizaron visitas a predios de los beneficiarios en donde se les levanto la ficha técnica de seguimiento y el registro fotográfico, dándole las respectivas recomendaciones y recordándole el contenido y responsabilidad de cada uno de ellos con el proyecto ante el funcionamiento y manejo de las estufas ecoeficientes a base de leña
  Se anexan evidencias

ACTIVIDAD N°.3: ORGANIZACIÓN DE LUGARES DE EVENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS SOCIALIZACIONES, REUNIONES, CAPACITACIONES, TALLERES, ENTRE OTROS DEL PROYECTO

AVANCES

- ✓ Para el presente periodo de se programó y se realizaron las cuatro (04) capacitaciones en la vereda el Fresno corregimiento de El Paraíso Municipio de Sucre Cauca, en donde se organizaron los sitios, la silletería correspondiente y se contrataron con los mismos habitantes de la vereda los servicios de refrigerio
- ✓ Dichas capacitaciones se realizaron en un sitio previamente concertado, en los cuales hubo participación de los beneficiarios de las estufas y sus familiares de acuerdo a lo pactado con anterioridad
- ✓ Cada taller o capacitación fue complementado con un refrigerio de acuerdo a las condiciones contratadas, los cuales fueron entregados a cada uno de los participantes

PLAN DE CAPACITACIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD		
No.	CAPACITACIONES	MES
1	Buenas prácticas ambientales	6 de marzo
2	Energías Alternativas Y Renovables (Energía Solar)	8 de marzo
3	Energías Alternativas Y Renovables (Energía Eólica)	14 de marzo
4	Energías Alternativas Y Renovables (Energía Hídrica.)	21 de marzo

CONTENIDO DE LAS CAPACITACIONES

1) Buenas prácticas ambientales

- ✓ Ahorro en el consumo del agua
- ✓ Uso eficiente y ahorros del agua
- ✓ Generación de residuos
- ✓ Ahorro en el consumo de energía
- ✓ Limpieza
- ✓ Hábitos de consumo
- ✓ Mejores prácticas ambientales
- ✓ Objetivos
- ✓ Práctica ambiental
- ✓ Cosecha de agua lluvia
- ✓ Maquinaria solar otros
- ✓ Tecnología libre
- ✓ Acciones que reducen impactos negativos en el medio ambiente
- ✓ Modelos de mejores practicas


Energías Alternativas Y Renovables (Energía Solar)

- Impulsando el Futuro Energético Sostenible en Colombia
- Energía Solar: Aprovechando el Poder del Sol
- Sistemas solaresfotovoltaicos, tipos, aplicaciones, fabricación, diseño y composición
- Ultimas noticias
- Sistemas de energía solar fotovoltaica
- PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS
- Tecnologías
- TIPOS de Celdas
- ¿Cuál tipo de panel es mejor?
- Mercado global
- Aspectos técnicos de los paneles
- Sistemas solares fotovoltaicos
- Otras tecnologías de almacenamiento


Energías Alternativas Y Renovables (Energía Eólica)
• Energía eólica contenidos • Comportamiento del recurso eólico • Uso de energía eólica • Ventajas y desventajas energía eólica • Aerogeneradores • El viento fuente de energía • Molinos de viento
Energías Alternativas Y Renovables (Energía Hídrica.)
• energía hidráulica • contenido de proceso energía hidráulica • ventajas de energía hidráulica • inconvenientes de energía hidráulica • potencial hídrico • las hidroeléctricas, la contaminación y la producción de electricidad • la contaminación en el mundo, en materia de energía eléctrica • gases de efecto invernadero en el sector eléctrico mundial • producción de electricidad • la hidroelectricidad • generación a base de recursos renovables en el mundo • generación vs contaminación • tecnologías de mayor contaminación en el sector eléctrico a nivel mundo • utilización de recursos renovables para producción de electricidad • conclusiones

PORCENTAJE DE AVANCES

ÍTEM	PROCESO	UNID	CANT	AVANCE DESCRIPCION
2	**TALLERES EN EDUCACION AMBIENTAL**			
2,1	Talleres de capacitación en procesos de sensibilización y cuidado del recurso hídrico, de las fuentes del Maco y las Minas (incluye papelería, logística, refrigerios, localidad)	Unidad	24	Se realizaron 4 talleres en el periodo, para un total de 24 talleres de educación ambiental de acuerdo a los requerimientos del contrato

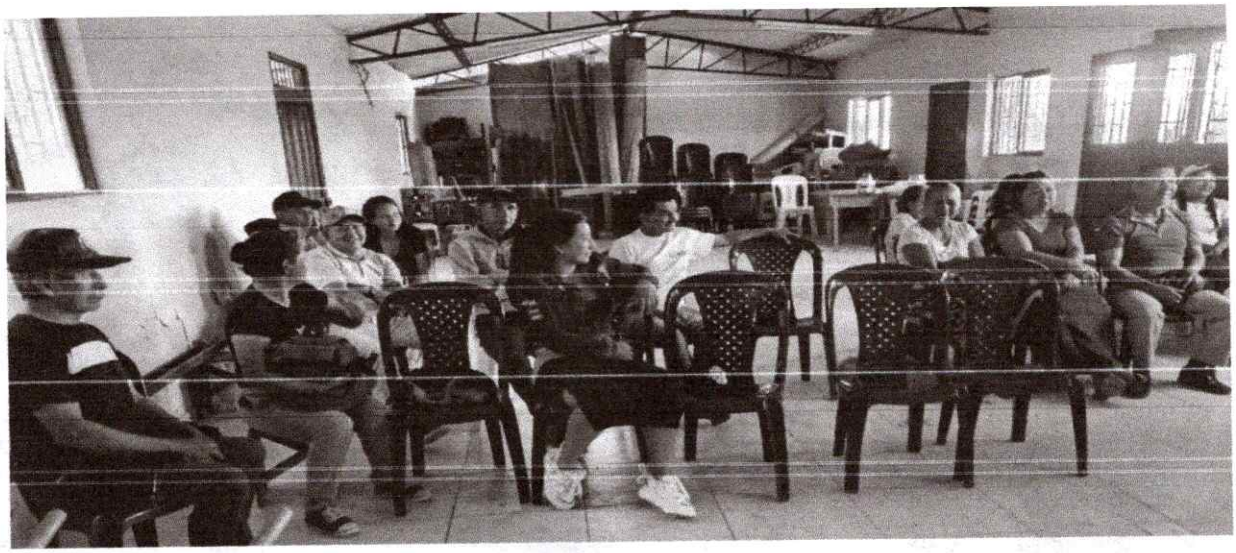

REUNION CAPACITACIONES EL FRESNO SUCRE CAUCA MARZO DE 2026

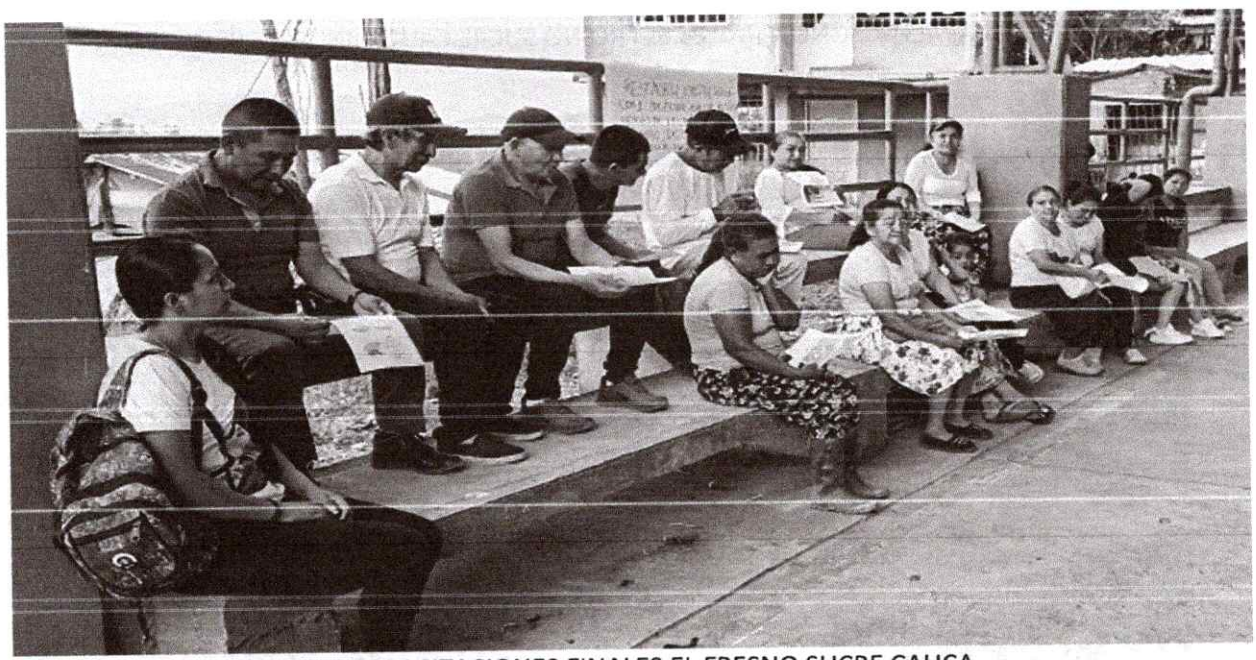

REUNION CAPACITACIONES FINALES EL FRESNO SUCRE CAUCA



REUNION CAPACITACIONES FINALES EL FRESNO SUCRE CAUCA .INCLUYE REFRIGERIOS



REUNION CAPACITACIONES FINALES EL FRESNO SUCRE CAUCA .INCLUYE REFRIGERIOS



Metas cumplidas en un 100%, evidencias en anexos

ACTIVIDAD N°. 4: COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PUNTUALES CON LA COMUNIDAD REFERENTES A AISLAMIENTOS, CAPACITACIONES, REPOBLAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS ESTUFAS.

AVANCES

Con las comunidades de El Fresno y Salvavidas se coordinaron y realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Reunión para entrega oficial de las estufas ecoeficienctes a base de leña
- ✓ Compromisos de beneficiarios personal requerido para aplicabilidad de las capacitaciones y el manejo de las estufas
- ✓ Adecuación y organización de sitios finales y establecimiento de las estufas
- ✓ Brindar apoyo al personal técnico a las visitas a los predios de las Minas y El Maco y en los predios de los beneficiarios

CONSOLIDADO DE AVANCES

ÍTEM	PROCESO	UNID	CANT	AVANCE DESCRIPCION
1	**1 ASISTENCIA TECNICA**			
1,1	**COORDINACION Y ASISTENCIA TECNICA**			
1,1,1	1 Coordinador: Profesional Especialista área ambiental, por el tiempo de ejecución del proyecto, dedicación en un 40% del tiempo	MESES	4	Contratación y liquidación Actividades correspondientes a su contratación de coordinación

ÍTEM	PROCESO	UNID	CANT	AVANCE DESCRIPCION
1.1.2	Personal de apoyo (2 personas) durante la organización de los eventos de capacitación y ejecución de actividades del proyecto	No. Asistencias Técnicas	64	Contratación y liquidación del personal requerido Organización de eventos, 24 capacitaciones, 64 seguimientos y asistencia al proyecto en los diversos procesos, seguimiento de las actividades
2	**TALLERES EN EDUCACION AMBIENTAL**			
2,1	Talleres de capacitación en procesos de sensibilización y cuidado del recurso hídrico, de las fuentes del Maco y las Minas (incluye papelería, logística, refrigerios, localidad)	Unidad	24	Se realizaron 4 talleres en el periodo, para un total de 24 talleres de educación ambiental de acuerdo a los requerimientos del contrato
3	**REPOBLAMIENTO DE LAS ÁREAS DEL MACO Y LAS MINAS CON ÁRBOLES NATIVOS EN UNA EXTENSIÓN DE 5 HECTÁREAS**			
3,1	Siembra de 1320 plántulas nativas (ver cuadro anexo de especies) en 4 Hectáreas en el área del Maco: Incluye: 1) Mano de obra no calificada para: Preparación de terreno, Trazado, Plateo, Ahoyado, Aplicación de fertilizantes y correctivos, Transporte interno de insumos, Plantación (siembra), Control fitosanitario, Reposición (Replante), Adecuación de caminos, Protección de incendios). 2) insumos: Plántulas, Fertilizantes npk, Correctivos, Insecticidas	HAS 1320 plantas	4	En el periodo se realizó la siembre de 920 plantas Acumulado: Adquisición de material vegetal y puesta las zonas de trabajo en el Territorio del Municipio de Sucre Cauca: Siembra de 1320 plantas en el predio del Maco Municipio de Sucre Cauca Fertilización y control de plagas de1320 plantas sembradas, Se Incluye reposición de plantas (ver descripción de repoblamiento)
3,2	Siembra de 330 plántulas nativas (ver cuadro anexo de especies) en 1 Hectárea en el área de las Minas Incluye: 1) Mano de obra no calificada para: Preparación de terreno, Trazado, Plateo, Ahoyado, Aplicación de fertilizantes y correctivos, Transporte interno de insumos, Plantación (siembra), Control fitosanitario, Reposición (Replante), Adecuación de caminos, Protección de incendios). 2) insumos: Plántulas, Fertilizantes npk, Correctivos, Insecticidas	Hectáreas 330 plantas	1	En el periodo se realizó la siembre de 130 plantas. Adquisición de material vegetal y puesta las zonas de trabajo en el Territorio del Municipio de Sucre Cauca, Siembra total de 330 plantas en el predio del Maco Municipio de Sucre Cauca Fertilización y control de plagas de 330 plantas, sembradas, Se Incluye reposición de plantas (ver descripción de repoblamiento)

INFORME DE EJECUCION POR LA CONTRATISTA

funprodesa
Fundación para el Progreso y Desarrollo

ÍTEM	PROCESO	UNID	CANT	AVANCE DESCRIPCION
4	**AISLAMIENTOS DE ZONAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL MACO Y LAS MINAS**			
4,1	Aislamiento de las áreas de interés ambientales de El Maco 400 metros lineales, del municipio de Sucre, con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor	Metros lineales	400	En el periodo se realizó el aislamiento de 80 metros lineales en el Lote número 2. Acumulado: Compra, transporte e instalación de alambre, grapas y posteadura.400 metros lineales Procesos de ubicación de material en la zona a aislar Aislamiento de 400 metros lineales con 4 hilos de alambre
4,2	Aislamiento de las áreas de interés ambientales de Las Minas, 1600 metros lineales del municipio de Sucre, con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor	metros	1.600	En el periodo se realizó el aislamiento de 0 metros lineales. Acumulado: Compra, transporte e instalación de alambre, grapas y posteadura., Aislamiento de 1600 metros lineales con 4 hilos de alambre
5	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA ECOEFICIENTE A BASE DE LEÑA**			
5,1	ESTUFA ECOEFICIENTE Multifuncional (4 hornillas + horno + azador). - Estructura resistente (material utilizado para alta resistencia y larga duración) • Accesorios y herrajes desmontables (permiten un mejor mantenimiento y cuidado a la estufa). Transportable (el modelo permite que el usuario pueda utilizarla en cualquier lugar, es decir, no queda sujeta o instalada en un solo lugar).•Modelo: ErgoNatura • Pintura: Martillada color gris acorazado • Cuerpo de la estufa: Elaborado en lámina Cold Rolled calibre 16 (1.4 mm), Pared frontal lamina HR (2.5mm). • Dimensiones: ancho 90 cm, alto 85 cm, fondo 60 cm, buitron 2,44 m • Acabado: gris acorazado, azul, • 4 hornillas. • Horno (25 ancho x 30 alto x 40 fondo) • Parrilla asadora (20 ancho x 35 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable	Estufa	15	Revisión del 100% de los predios de los beneficiarios (15 POSTULADOS) Entrega e instalación de 15 hornillas ecoeficientes a base de leña

305

ACTIVIDAD N°.5: RECIBIMIENTO DE MATERIALES DEL PROGRAMA EN AISLAMIENTO, REPOBLAMIENTO, CAPACITACIÓN, INSTALACIÓN DE ESTUFAS

AVANCES

- ✓ Para el presente periodo se recibieron, despacharon y se usaron los materiales: Alambre de púa y grapas para cada uno de los sitios aislados
- ✓ Se entrega las plantas pendientes 1050 plántulas arbóreas (920 para El Maco y 130 para Las Mlas) de: Aliso (Alnus acuminata), jigua (Nectandra sp), Cascarillo (Ladenbergia magnifolia), Cedro de 2 variedades (Cedrela odorata y Cedrela sp), gualanday (Jacaranda mimosifolia) , guayacán (Tabebuia chrysantha), , roble (Quercus), cedrillo o fresno (Tapirira guianensis) y chachafruto (Erythrina edulis), las cuales inicialmente se ubicaron en un predio en la cabecera Municipal con las respectivas condiciones de manejo sanitario. Estos fueron distribuidos de acuerdo a las condiciones de favorabilidad de adaptación del predio

ACTIVIDAD N°.6: COORDINACIÓN DE SALIDA DE MATERIALES E INSUMOS

AVANCES

Para el presente periodo del informe se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Se envió todo el material para aislamiento (alambre de púa, grapas, posteadura)
- ✓ Se envió el material vegetal (plántulas arbóreas de acuerdo a los requerimientos de los predios:
  - Especies para zona de El Maco: Aliso (Alnus acuminata), jigua (Nectandra sp), Cascarillo (Ladenbergia magnifolia), gualanday (Jacaranda mimosifolia) , guayacán (Tabebuia chrysantha), cedrillo o fresno (Tapirira guianensis), chachafruto (Erythrina edulis)
  - Especies para zona de Las Minas: Cedro de 2 variedades (Cedrela odorata y Cedrela sp), roble (Quercus), cedrillo o fresno (Tapirira guianensis) y Aliso (Alnus acuminata),

- ✓ Se envió adicionalmente los controladores de plagas e insectos, y los fertilizantes para cada sitio, según la descripción de la ficha técnica aprobada para el proyecto

Se anexa registro fotográfico

ACTIVIDAD N°. 7: APOYO EN CAMPO PARA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES (SEGUIMIENTO EN PROCESOS DE SIEMBRA, AISLAMIENTO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL)


AVANCES

Se realizaron visitas a campo a cada predio en donde se realizó el proyecto, viviendas de los beneficiarios donde se instalaron las estufas, sitios reforestados y sitios aislados con la finalidad de revisar que las actividades se desarrollaron de acuerdo al presente contrato ambiental

SITIOS DEFINIDOS AISLADOS


La ubicación de los sitios a aislar está determinada desde el principio del proyecto, para identificar los sitios en terreno se realizaron tres (03) recorridos en cada uno de los predios para ubicar con exactitud los sitios a aislar con alambre de púa

EL MACO: Dos (02) sitios, ubicados en los círculos azules de la siguiente imagen

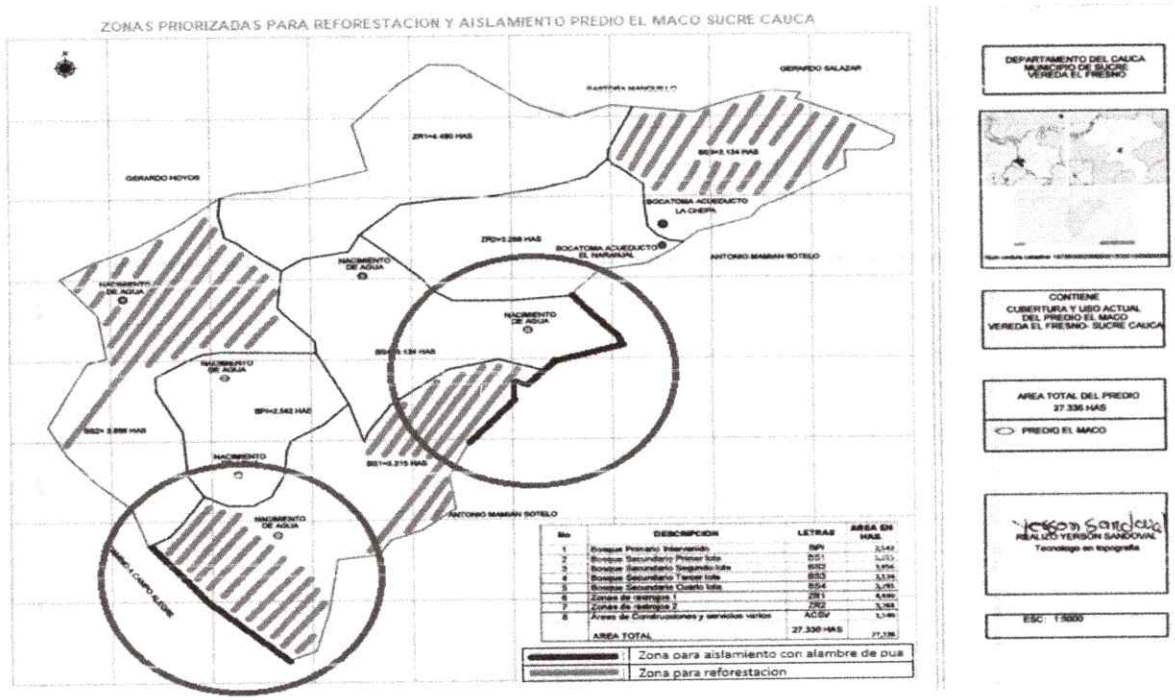

SITIOS REFORESTADOS

ZONAS INTERVENIDAS PREDIO EL MACO

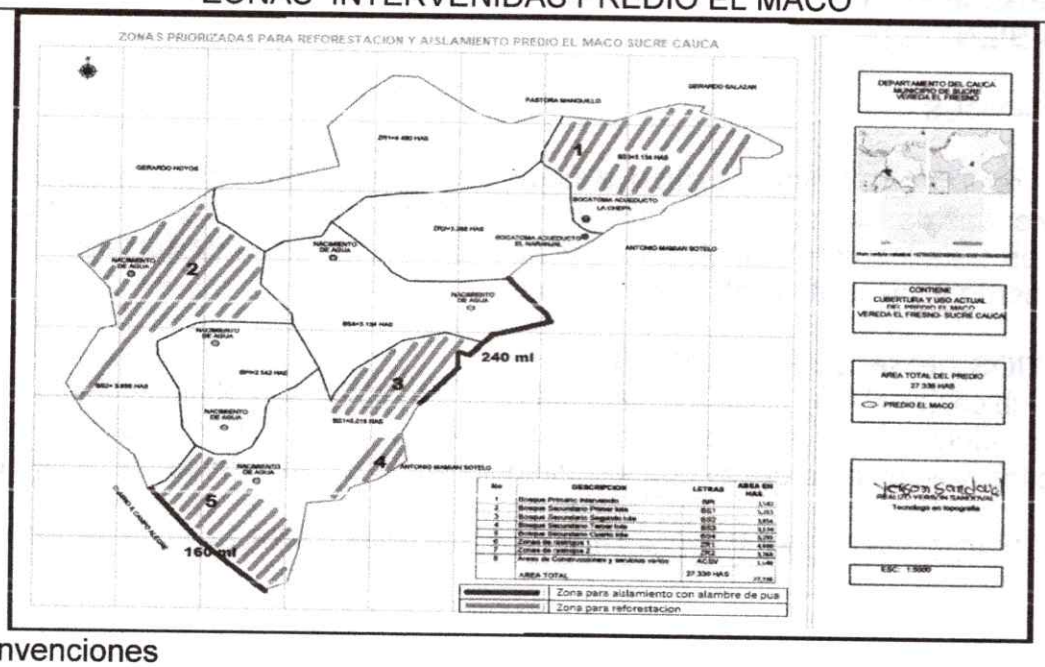


Convenciones

Zona de aislamiento: 400 metros lineales

Zona de reforestacion: siembra de 1.320 plantas nativas en proceso de Repoblamiento

ZONAS A INTERVENIDAS LAS MINAS

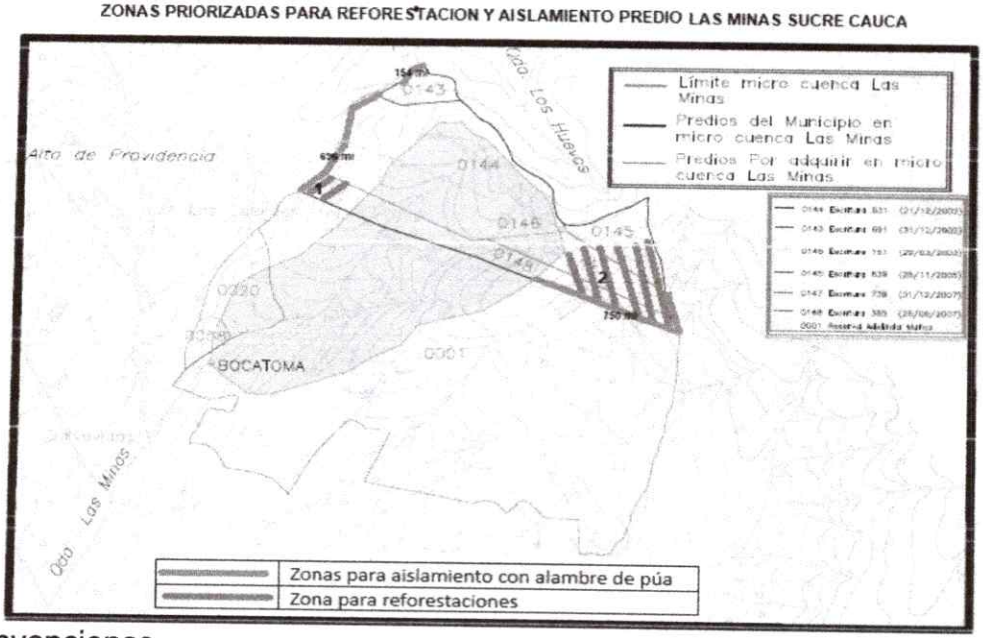

Convenciones

Zona de aislamiento: 1600 metros lineales

Zona de reforestacion: siembra de 330 plantas nativas en proceso de repoblamiento

- ✓ El Maco se trabajó en cinco (05) sitios (1320 plantas): En el periodo se realizó la siembre de 920 plantas, Acumulado: Adquisición de material vegetal y puesta las zonas de trabajo en el Territorio del Municipio de Sucre Cauca: Siembra de 1320 plantas en el predio del Maco Municipio de Sucre Cauca. Fertilización y control de plagas de1320 plantas sembradas, Se Incluye reposición de plantas

DESCRIPCION REPOBLAMIENTO	METROS LINEALES	DIC	ENERO	FEBR	MARZO	ABRIL	SUMAS
El Maco: en 5 sitios: (1320)							
Lote 1 (Parte alta = norte)	360	0	0	350	10	0	360
Lote 2 (Parte media= Occidente)	300	0	0	50	250	0	300
Lote 3 (parte media = oriente)	230	0	0	0	230	0	230
Lote 4 (Parte media = sur oriente)	120				120	0	120
Lote 5 (parte baja = sur)	310				310	0	310
SUMAS CONTRATO	**1320**	**0**	**0**	**400**	**920**	**0**	**1320**
Reposición	**50**						**50**
SUMAS TOTALES	**1370**						**1370**

- ✓ En Las Minas se trabajó en dos (02) sitios (330 Plantas): En el periodo se realizó la siembre de 130 plantas, Adquisición de material vegetal y puesta las zonas de trabajo en el Territorio del Municipio de Sucre Cauca, Siembra de 330 plantas en el predio del Maco Municipio de Sucre Cauca; fertilización y control de plagas de 330 plantas, sembradas, Se Incluye reposición de plantas

DESCRIPCION REPOBLAMIENTO	METROS LINEALES	DIC	ENERO	FEBR	MARZO	ABRIL	SUMAS
Las Minas en 2 sitios (330)							
Lote 1: Parte media (occidente)	90	0	0	90	0		**90**
Lote 2: Parte media (oriente)	240	0	0	110	130		**240**
SUMAS	**330**	**0**	**0**	**200**	**130**	**0**	**330**

Los costos de las plantas de reposición son asumidos por la Fundación

ACTIVIDAD N°. 8: APOYO EN LA ORGANIZACIÓN A LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

AVANCES

Se concertaron y realizaron las cuatro (04) capacitaciones en educación ambiental para el proyecto, las cuales se dieron en la vereda de El Fresno Municipio de Sucre Cauca. Contaron con la parte organizativa de localidad, silletería, papelería y demás medios para realizar las capacitaciones,
Se les dio en cada capacitación un refrigerio de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto (estos fueron contratados con personal de la misma comunidad)

El plan de capacitación propuesto y efectuado en el presente periodo fue el siguiente:

PLAN DE CAPACITACIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD		
No.	CAPACITACIONES	MES
1	Buenas prácticas ambientales	6 de marzo
2	Energías Alternativas Y Renovables (Energía Solar)	8 de marzo
3	Energías Alternativas Y Renovables (Energía Eólica)	14 de marzo
4	Energías Alternativas Y Renovables (Energía Hídrica.)	21 de marzo

ACTIVIDAD N°. 9: APOYO EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES ESCRITOS Y PRESENCIALES.

AVANCES

- ✓ Se presenta el cuarto y último informe de avance del contrato a la fundación, para el periodo de 1 de marzo a 15 de abril del año 2026
- ✓ Se apoya al equipo técnico para la elaboración del cuarto y último informe para presentar a la Alcaldía municipal de Sucre Cauca y realizar el cobro final

Dado en Sucre Cauca a los 15 días del mes de abril del año 2026

Atentamente

ANA LUBY GOMEZ RENGIFO
52.734.621 Bogotá D.C

INFORME DE EJECUCION POR LA CONTRATISTA	funprodesa Fundación para el Progreso y Desarrollo

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación:	**15 de abril de 2026**	**Período del informe:**	**01 de marzo al 15 de abril de 2026**
Nombre del Contratista:	**LEIDY MELISA DAZA GÓMEZ** 1.144.524.759		
Nombre del contratante:	FUNDACION PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO "FUNPRODESA" NIT 900.373.700-2 R.P VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ Cc: 34639432 Bolivar Cauca		

DATOS DEL CONTRATO			
INFORMES A PRESENTAR	**CUATRO (04)**	**Numero de informe**	**CUARTO (04)**
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales para realizar apoyo al proyecto de restauración, preservación y conservación del recurso hídrico de las áreas estratégicas - El Maco Y Las Minas Del Municipio De Sucre Cauca financiado con recursos del SGR, de acuerdo al contrato de prestación de servicios no. 002 – SAMC – 2025		
Fecha de inicio	15 de diciembre de 2025		
Fecha finalización	15 de abril de 2026		

EJECUCIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLICACIONES CONTRACTUALES DURANTE EL PERIODO REPORTADO EN EL PRESENTE INFORME

OBLIGACIONES.

ACTIVIDAD N°.1: COORDINAR CON EL EQUIPO DE CAMPO CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

- Se desarrollaron las actividades de acuerdo a la concertación de y procesos de capacitación y educación ambiental
- Se organizaron los sitios y logística para cada una de las actividades a desarrolladas en cumplimiento del contrato
- Se realizó acompañamiento a la revisión de viviendas priorizadas y beneficiadas con la instalación de la estufa ecoeficiente a base de leña
- Se realizaron as diversas labores y actividades planteadas (talleres ambientales, repoblamiento de los sitios, aislamiento y proceso de ajuste de información de los beneficiarios con las estufas e coeficientes a base de leña)

ACTIVIDAD N°.2 APOYAR AL EQUIPO TÉCNICO EN LOS EVENTOS CON LAS COMUNIDADES BENEFICIARIOS DE LA VEREDA EL FRESNO Y SALVAVIDAS, QUE TIENEN INFLUENCIA EN LOS PREDIOS DE EL MACO Y LAS MINAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA.

AVANCES

✓ De común acuerdo con el equipo técnico contratado para el proyecto (coordinadora y personal de apoyo 1 y 2 y responsable de la reforestación y aislamiento), se analizó cada situación de avances y compromisos a desarrollar en le periodo, dando cumplimiento a los últimos cuatro (04) talleres previstos

CRONOGRAMA DE ACTVIDADES CONCERTADAS						
ÍTEM	PROCESO	CANT	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
2	**TALLERES EN EDUCACION AMBIENTAL**					
2,1	Talleres de capacitación en procesos de sensibilización y cuidado del recurso hídrico, de las fuentes del Maco y las Minas (incluye papelería, logística, refrigerios, localidad)	24	5	8	7	4

ACTIVIDAD N°.3 REALIZAR VEINTICUATRO (24) CAPACITACIONES. TALLERES MEDIO AMBIENTALES CON LA POBLACIÓN DE INFLUENCIA DE LOS PREDIOS EL MACO Y LAS MINAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA.

AVANCES

Plan de capacitaciones programadas y cumplidas para el mes de marzo y abril de 2026, 4 capacitaciones según lo siguiente:

PLAN DE CAPACITACIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD		
No.	CAPACITACIONES	MES
1	Buenas prácticas ambientales	6 de marzo
2	Energías Alternativas Y Renovables (Energía Solar)	8 de marzo
3	Energías Alternativas Y Renovables (Energía Eólica)	14 de marzo
4	Energías Alternativas Y Renovables (Energía Hídrica.)	21 de marzo

Cada taller o capacitación fue complementado con un refrigerio de acuerdo a las condiciones contratadas. los cuales fueron entregados a cada uno de los participantes

CONTENIDO DE LAS CAPACITACIONES

1) Buenas prácticas ambientales
✓ Ahorro en el consumo del agua ✓ Uso eficiente y ahorros del agua ✓ Generación de residuos ✓ Ahorro en el consumo de energía ✓ Limpieza ✓ Hábitos de consumo ✓ Mejores prácticas ambientales ✓ Objetivos ✓ Práctica ambiental ✓ Cosecha de agua lluvia ✓ Maquinaria solar otros ✓ Tecnología libre ✓ Acciones que reducen impactos negativos en el medio ambiente ✓ Modelos de mejores practicas
Energías Alternativas Y Renovables (Energía Solar)
• Impulsando el Futuro Energético Sostenible en Colombia • Energía Solar: Aprovechando el Poder del Sol • Sistemas solaresfotovoltaicos, tipos, aplicaciones, fabricación, diseño y composición • Ultimas noticias • Sistemas de energía solar fotovoltaica • PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS • Tecnologías • TIPOS de Celdas • ¿Cuál tipo de panel es mejor? • Mercado global • Aspectos técnicos de los paneles • Sistemas solares fotovoltaicos • Otras tecnologías de almacenamiento
Energías Alternativas Y Renovables (Energía Eólica)
• Energía eólica contenidos • Comportamiento del recurso eólico • Uso de energía eólica • Ventajas y desventajas energía eólica • Aerogeneradores • El viento fuente de energía • Molinos de viento

Energías Alternativas Y Renovables (Energía Hídrica.)
• energía hidráulica • contenido de proceso energía hidráulica • ventajas de energía hidráulica • inconvenientes de energía hidráulica • potencial hídrico • las hidroeléctricas, la contaminación y la producción de electricidad • la contaminación en el mundo, en materia de energía eléctrica • gases de efecto invernadero en el sector eléctrico mundial • producción de electricidad • la hidroelectricidad • generación a base de recursos renovables en el mundo • generación vs contaminación • tecnologías de mayor contaminación en el sector eléctrico a nivel mundo • utilización de recursos renovables para producción de electricidad • conclusiones

ACTIVIDAD N°.4: REALIZAR EL SEGUIMIENTO A CADA POSTULADO O BENEFICIARIO DE LAS ESTUFAS ECOEFICIENTES

AVANCES

- ✓ Se realizaron visitas de campo a los beneficiarios del proyecto de la vereda El Fresno Corregimiento de El Paraíso y en la vereda Salvavidas Municipio de Sucre Cauca, cumpliendo el 100% de las visitas,en donde se efectuó la instalación de cada una
- ✓ Se visitó de manera puntual a la señora Olga Salazar Quijano, quien resulto ser beneficiaria del reemplazo por renuncia
- ✓ Se anexan fichas de seguimiento técnico y registro fotográfico

ACTIVIDAD N°.5: REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE REPOBLAMIENTO Y AILAMIENTO

AVANCES PARA AISLAMIENTO

Para el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Visitas de revisión de predios de Las Minas (2 sitios) y El Maco (5 sitios) de propiedad del Municipio (con recorridos de campo en los sitios aislados y repoblados).
- ✓ Las especies arbóreas son transportadas y sembradas en el sitio final
- ✓ El alambre, las grapas, el abono y las puntillas fueron transportadas en animales de uso doméstico (caballar) y luego por los trabajadores hasta el sitio final de aislamiento. Se anexa registro fotográfico

- **PREDIO LAS MINAS**: En el presente periodo solamente se realizó revisión de lo aislado en este sector, ya que se había cubierto con anterioridad la meta en el sector, a la fecha se han aislado mil seiscientos (1600) metros lineales con 4 hilos de alambre de púa (avance de un 100% para el predio) dando cumplimiento a lo recomendado: con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor.

DESCRIPCION AISLAMIENTO	METROS LINEALES	DIC	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	SUMATORIA
Las Minas: Aislamiento en 3 sitios: (1600)							
Lote 1: Parte alta (Norte)	154	0	0	154	0	0	154
Lote 2: Parte media (oriente)	696	0	0	696	0	0	696
Lote 3: Parte media (occidente)	750	0	0	750	0	0	750
SUMAS	**1600**	**0**	**0**	**1600**	**0**	**0**	**1600**

- **PREDIO EL MACO:** En el presente periodo se aislaron ochenta (80) metros lineales que estaban pendientes, logrando el 100% de lo contratado equivalentes a trecientos veinte metros lineales (320 ml), se aisló la parte inferior del predio en donde se presentaban problemas de ingreso de animales domésticos que contaminaban la fuente hídrica. Se da cumplimiento a lo recomendado: con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor

DESCRIPCION AISLAMIENTO	METROS LINEALES	DIC	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	SUMATORIA
El Maco: Aislamiento en 2 sitios (400)							
Lote 1: Parte baja (Sur)	160	0	0	160			**160**
Lote 2: Parte media (oriente)	240	0	0	160	80		**240**
SUMAS	**400**	**0**	**0**	**320**	**80**	**0**	**400**

AVANCES REFORESTACION

REPOBLAMIENTO DE LAS ÁREAS DEL MACO Y LAS MINAS

En El Maco: se trabajó en cinco (05) sitios (1320 plantas): En el periodo se realizó la siembre de 920 plantas, Acumulado: Adquisición de material vegetal y puesta las zonas de trabajo en el Territorio del Municipio de Sucre Cauca: Siembra de 1320 plantas en el predio del Maco Municipio de Sucre Cauca. Fertilización y control de plagas de1320 plantas sembradas, Se Incluye reposición de plantas

DESCRIPCION REPOBLAMIENTO	METROS LINEALES	DIC	ENERO	FEBR	MARZO	ABRIL	SUMAS
El Maco: en 5 sitios: (1320)							
Lote 1 (Parte alta = norte)	360	0	0	350	10	0	360
Lote 2 (Parte media= Occidente)	300	0	0	50	250	0	300
Lote 3 (parte media = oriente)	230	0	0	0	230	0	230
Lote 4 (Parte media = sur oriente)	120				120	0	120
Lote 5 (parte baja = sur)	310				310	0	310
SUMAS CONTRATO	**1320**	**0**	**0**	**400**	**920**	**0**	**1320**
Reposición	**50**						**50**
SUMAS TOTALES	**1370**						**1370**

En Las Minas: se trabajó en dos (02) sitios (330 Plantas): En el periodo se realizó la siembre de 130 plantas, Adquisición de material vegetal y puesta las zonas de trabajo en el Territorio del Municipio de Sucre Cauca, Siembra de 330 plantas en el predio del Maco Municipio de Sucre Cauca; fertilización y control de plagas de 330 plantas, sembradas, Se Incluye reposición de plantas

DESCRIPCION REPOBLAMIENTO	METROS LINEALES	DIC	ENERO	FEBR	MARZO	ABRIL	SUMAS
Las Minas en 2 sitios (330)							
Lote 1: Parte media (occidente)	90	0	0	90	0		**90**
Lote 2: Parte media (oriente)	240	0	0	110	130		**240**
SUMAS	**330**	**0**	**0**	**200**	**130**	**0**	**330**

ACTIVIDAD N°. 6: REALIZAR LOS PROCESOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE LAS ESTUFAS ECOEFICIENTES A BASE DE LEÑA

Se visitaron los predios de cada uno de los beneficiarios y con ellos se volvió a trabajar lo siguiente:

- ✓ Importancia del proyecto
- ✓ Información de uso de leña para preparación de alimentos

- ✓ Situación encontrada en el predio (vivienda) específicamente la zona donde se realizará la instalación de la estufa
- ✓ Observaciones y recomendaciones
- ✓ Compromisos adquiridos
- ✓ Registro de actas de entrega de cada una de las estufas ecoeficientes

ACTIVIDAD N°. 7: APOYO EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES ESCRITOS Y PRESENCIALES.

AVANCES

- ✓ Se presenta el cuarto informe de avance del contrato a la fundacion
- ✓ Se apoya al equipo técnico para la elaboración del último informe para presentar a la Alcaldía municipal de Sucre Cauca

NOTA: Se anexan magnéticamente copias de los procesos de capacitación y listados de asistencia para cada capacitación realizada.

Dado en Sucre Cauca a los quince (15) días del mes de abril del año 2026

Atentamente

Leidy Melisa Daza G.
LEIDY MELISA DAZA GÓMEZ
1.144.524.759

INFORME DE EJECUCION POR LA CONTRATISTA	funprodesa Fundación para el Progreso y Desarrollo

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación:	**31 de marzo de 2026**	**Período del informe:**	**Desde el 1 hasta el 31 de marzo de 2026**
Nombre del Contratista:	**VICTOR HUGO GOMEZ RUIZ** 76.327.492 de Popayán Cauca 76327492		
Nombre del contratante:	FUNDACION PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO "FUNPRODESA" NIT 900.373.700-2 R.P VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ Cc: 34639432 Bolivar Cauca		

DATOS DEL CONTRATO			
INFORMES A PRESENTAR	**TRES (01)**	**Numero de informe**	**TERCERO (03)**
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR PROCESOS DE AISLAMIENTO Y REFORESTACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 002 – SAMC – 2025		
Fecha de inicio	15 de diciembre del año 2025		
Fecha finalización	31 de marzo de 2026		

EJECUCIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLICACIONES CONTRACTUALES DURANTE EL PERIODO REPORTADO EN EL PRESENTE INFORME

ACTIVIDAD N°.1: REALIZAR EL PROCESO DE REPOBLAMIENTO DE CINCO HECTÁREAS (5 HAS) CON LA SIEMBRA DE MIL SEISCIENTAS CINCUENTA (1650) PLANTAS EN EL MACO Y LAS MINAS DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA ANEXA

1.1 SITUACIÓN ENCONTRADA

- **FICHA TECNICA**

ÍTEM	PROCESO
3	**REPOBLAMIENTO DE LAS ÁREAS DEL MACO Y LAS MINAS CON ÁRBOLES NATIVOS EN UNA EXTENSIÓN DE 5 HECTÁREAS**
3,1	Siembra de 1320 plántulas nativas (ver cuadro anexo de especies) en 4 Hectáreas en el área del Maco: Incluye: 1) Mano de obra no calificada para: Preparación de terreno, Trazado, Plateo, Ahoyado, Aplicación de fertilizantes y correctivos, Transporte interno de insumos, Plantación (siembra), Control fitosanitario, Reposición (Replante), Adecuación de caminos, Protección de incendios). 2) insumos: Plántulas, Fertilizantes npk, Correctivos, Insecticidas

INFORME DE EJECUCION POR LA CONTRATISTA	funprodesa Fundación para el Progreso y Desarrollo

ÍTEM	PROCESO
3,2	Siembra de 330 plántulas nativas (ver cuadro anexo de especies) en 1 Hectárea en el área de las Minas Incluye: 1) Mano de obra no calificada para: Preparación de terreno, Trazado, Plateo, Ahoyado, Aplicación de fertilizantes y correctivos, Transporte interno de insumos, Plantación (siembra), Control fitosanitario, Reposición (Replante), Adecuación de caminos, Protección de incendios). 2) insumos: Plántulas, Fertilizantes npk, Correctivos, Insecticidas


El Maco: se trabajó en cinco (05) sitios (1320 plantas): En el periodo se realizó la siembre de 920 plantas, Acumulado: Adquisición de material vegetal y puesta las zonas de trabajo en el Territorio del Municipio de Sucre Cauca: Siembra de 1320 plantas en el predio del Maco Municipio de Sucre Cauca. Fertilización y control de plagas de1320 plantas sembradas, Se Incluye reposición de plantas

DESCRIPCION REPOBLAMIENTO	METROS LINEALES	DIC	ENERO	FEBR	MARZO	ABRIL	SUMAS
El Maco: en 5 sitios: (1320)							
Lote 1 (Parte alta = norte)	360	0	0	350	10	0	360
Lote 2 (Parte media= Occidente)	300	0	0	50	250	0	300
Lote 3 (parte media = oriente)	230	0	0	0	230	0	230
Lote 4 (Parte media = sur oriente)	120				120	0	120
Lote 5 (parte baja = sur)	310				310	0	310
SUMAS CONTRATO	**1320**	**0**	**0**	**400**	**920**	**0**	**1320**
Reposición	**50**						**50**
SUMAS TOTALES	**1370**						**1370**

En Las Minas se trabajó en dos (02) sitios (330 Plantas): En el periodo se realizó la siembre de 130 plantas, Adquisición de material vegetal y puesta las zonas de trabajo en el Territorio del Municipio de Sucre Cauca, Siembra de 330 plantas en el predio del Maco Municipio de Sucre Cauca; fertilización y control de plagas de 330 plantas, sembradas, Se Incluye reposición de plantas

DESCRIPCION REPOBLAMIENTO	METROS LINEALES	DIC	ENERO	FEBR	MARZO	ABRIL	SUMAS
Las Minas en 2 sitios (330)							
Lote 1: Parte media (occidente)	90	0	0	90	0		**90**
Lote 2: Parte media (oriente)	240	0	0	110	130		**240**
SUMAS	**330**	**0**	**0**	**200**	**130**	**0**	**330**

ZONAS INTERVENIDAS PREDIO EL MACO

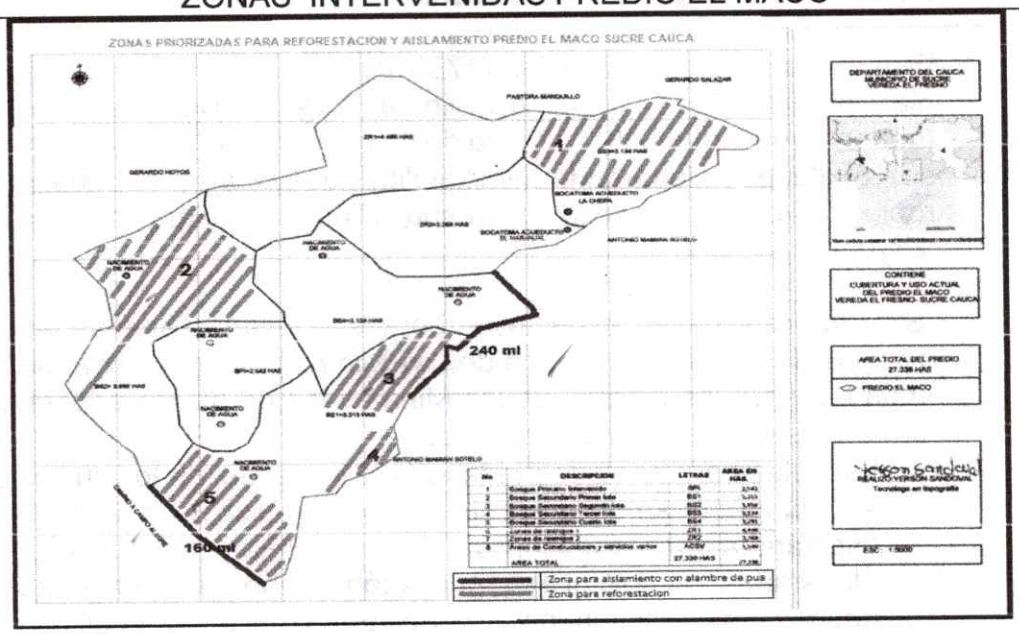


Convenciones

Zona de aislamiento: 400 metros lineales

Zona de reforestacion: siembra de 1.320 plantas nativas en proceso de Repoblamiento

ZONAS INTERVENIDAS LAS MINAS

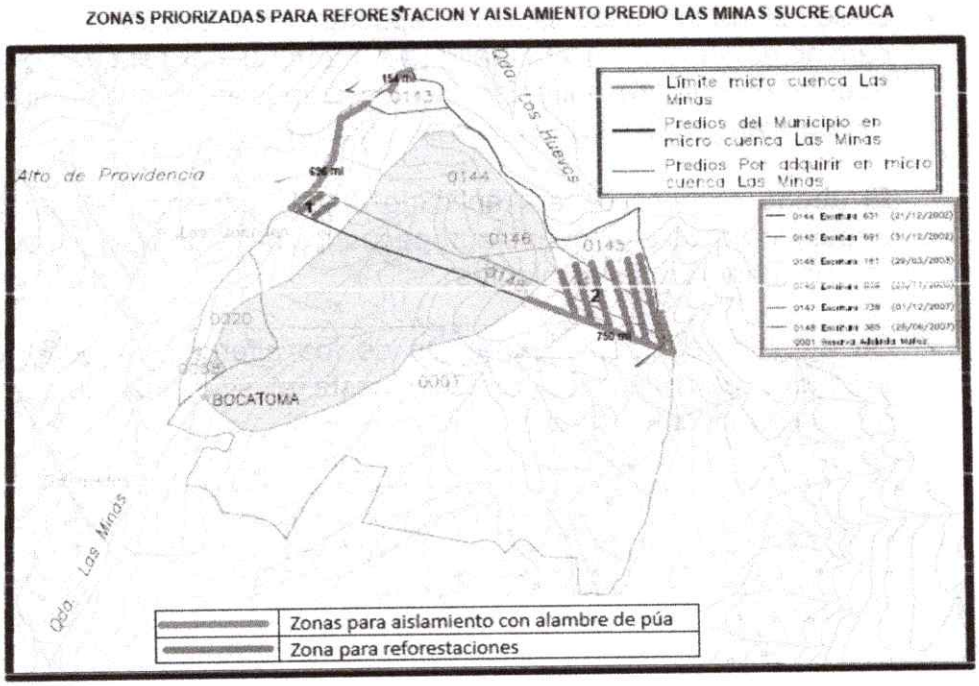

Convenciones

Zona de aislamiento: 1600 metros lineales

Zona de reforestacion: siembra de 330 plantas nativas en proceso de repoblamiento

MATERIAL VEGETAL ADQUIRIDO

El material vegetal adquirido (1700 plantas en total) está compuesto por plantas de: Aliso (Alnus acuminata), jigua (Nectandra sp), Cascarillo (Ladenbergia magnifolia), Cedro de 2 variedades (Cedrela odorata y Cedrela sp), gualanday (Jacaranda mimosifolia) , guayacán (Tabebuia chrysantha), , roble (Quercus), cedrillo o fresno (Tapirira guianensis) y chachafruto (Erythrina edulis)

Se organizaron las especies arbóreas en canastillas de acuerdo a los requerimientos de los predios de Las Minas y El Maco, dejando las de clima más frio para los predios de las Minas y los de menor adaptabilidad al frio para los sectores del predio El Maco.

- Especies para zona de El Maco (1320 plantas, de los cuales 920 plantas se plantaron en e presente periodo): Aliso (Alnus acuminata), jigua (Nectandra sp), Cascarillo (Ladenbergia magnifolia), gualanday (Jacaranda mimosifolia) , guayacán (Tabebuia chrysantha), cedrillo o fresno (Tapirira guianensis), chachafruto (Erythrina edulis)
- Especies para zona de Las Minas: Cedro de 2 variedades (Cedrela odorata y Cedrela sp), roble (Quercus), cedrillo o fresno (Tapirira guianensis) y Aliso (Alnus acuminata),

TRANSPORTE DE MATERIAL VEGETAL

✓ Desde la vía hasta los sitios de repoblamiento, Las Minas (a 2 1/2 horas por camino de herradura) y El Maco (a 1 1/2 horas por camino de herradura) son trasportados sobre animales de uso doméstico y por personal contratado para el transporte hasta el sitio se siembra

El abono respectivo para aplicarlo en el momento del repoblamiento fue adquirido en los almacenes agropecuarios del Municipio y transportado de la misma manera que las plantas

✓ Se anexan registros fotográficos de los diferentes medios de transporte utilizados para llegar el material hasta el sitio final de los procesos de aislamiento y reforestación.

ACTIVIDAD N°.2: EJECUTAR EL AISLAMIENTO DE DOS MIL METROS LINEALES (2000) EN LOS PREDIOS DE EL MACO Y LAS MINAS DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA ANEXA

2.1 SITUACIÓN ENCONTRADA


- **FICHA TECNICA**

ÍTEM	PROCESO
4	**AISLAMIENTOS DE ZONAS DE INTERÉS AMBIENTAL DEL MACO Y LAS MINAS**
4,1	Aislamiento de las áreas de interés ambientales de El Maco 400 metros lineales, del municipio de Sucre, con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor
4,2	Aislamiento de las áreas de interés ambientales de Las Minas, 1600 metros lineales del municipio de Sucre, con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor

UBICACIÓN DE LOS SITIOS A AISLAR


- ✓ La ubicación de los sitios a aislar está determinada desde el principio del proyecto, para identificar los sitios en terreno se realizaron tres (03) recorridos en cada uno de los predios para ubicar con exactitud los sitios a aislar con alambre de púa

EL MACO: Dos (02) sitios, ubicados en los círculos azules de la siguiente imagen

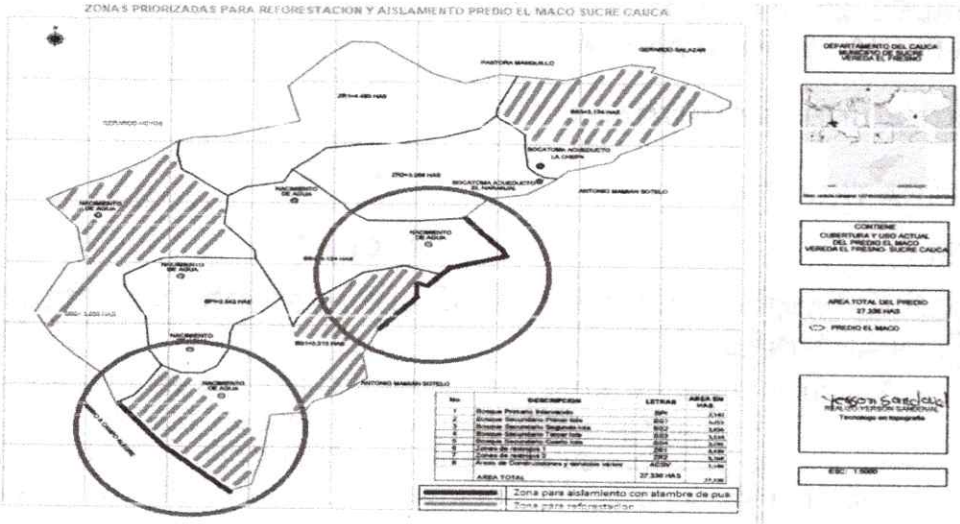

LAS MINAS: Tres (03) sitios, ubicados en los círculos azules de la siguiente imagen

ZONAS A INTERVENIR LAS MINAS

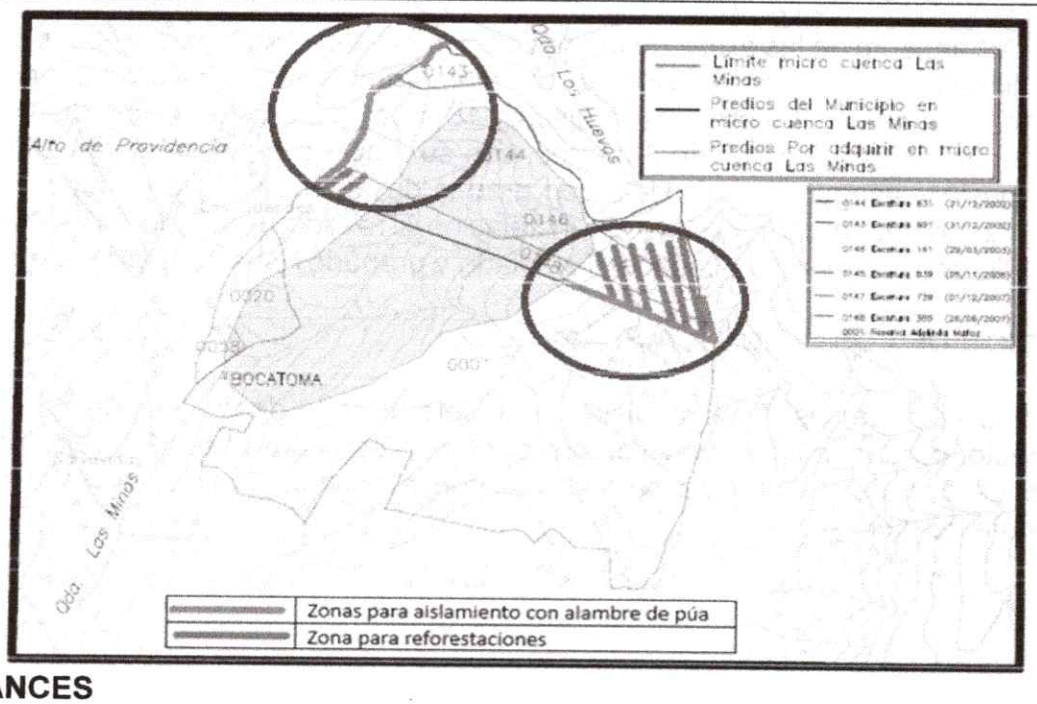

AVANCES

Se compró, transporto e instalo todo el alambre, posteadura y las grapas para el aislamiento de los 2000 metros lineales

PREDIO LAS MINAS: En el presente periodo solamente se realizó revisión de lo aislado en este sector, ya que se había cubierto con anterioridad la meta en el sector, a la fecha se han aislado mil seiscientos (1600) metros lineales con 4 hilos de alambre de púa (avance de un 100% para el predio) dando cumplimiento a lo

recomendado: con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor.

DESCRIPCION AISLAMIENTO	METROS LINEALES	DIC	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	SUMAS
Las Minas: Aislamiento en 3 sitios: (1600)							
Lote 1: Parte alta (Norte)	154	0	0	154	0	0	154
Lote 2: Parte media (oriente)	696	0	0	696	0	0	696
Lote 3: Parte media (occidente)	750	0	0	750	0	0	750
SUMAS	**1600**	**0**	**0**	**1600**	**0**	**0**	**1600**

PREDIO EL MACO: En el presente periodo se aislaron ochenta (80) metros lineales que estaban pendientes, logrando el 100% de lo contratado equivalentes a trecientos veinte metros lineales (320 ml), se aisló la parte inferior del predio en donde se presentaban problemas de ingreso de animales domésticos que contaminaban la fuente hídrica. Se da cumplimiento a lo recomendado: con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor

DESCRIPCION AISLAMIENTO	METROS LINEALES	DIC	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	SUMAS
El Maco: Aislamiento en 2 sitios (400)							
Lote 1: Parte baja (Sur)	160	0	0	160			**160**
Lote 2: Parte media (oriente)	240	0	0	160	80		**240**
SUMAS	**400**	**0**	**0**	**320**	**80**	**0**	**400**

ACTIVIDAD N°.3 EFECTUAR EL ALISTE DE LOS SITIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS ESTUFAS ECOEFICIENTES A BASE DE LEÑA

3.1 SITUACIÓN ENCONTRADA

- Quince (15) predios de beneficiarios para la instalación de las estufas ecoeficientes a base de leña distribuidas así: ocne (11) en la vereda El Fresno y cuatro (04) en la vereda Salvavidas, en la cual hubo 4 cambios de beneficiarios.

3.2 AVANCES

- Acompañamiento a las visitas realizadas por el equipo técnico a viviendas en donde se instalaron las estufas
- Identificación de cada uno de los beneficiarios y su ubicación
- Entrega e instalación de estufas ecoeficientes a base de leña

PRODUCTORES FINALES PARA ESTUFAS ECOEFICIENTES

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	VEREDA	COORDENADAS	MSNM
1	Antonino Magin Palechor	10698295	El Fresno	2°04'04"N 76°53"42"W	1675
2	Audelia Moncayo Ijaji	34370168	El Fresno	2°05'08"N 76°53'14"W	1670
3	Doralba Yaned Rodriguez Guevara	59830218	El Fresno	2°04'59"N 76°53'35"W	1726
4	Eulalia Luna De Gomez	34370072	El Fresno	2°05'19"N 76°53'15"W	1601
5	Hecta Mery Luna Lopez	25588773	El Fresno	2°05'01"N 76°53'33"W	1717
6	Leonila Palechor Atoy	1131024001	El Fresno	2°05'10"N 76°53'26"W	1678
7	Maria Catalina Luna De Buesaquillo	25587896	El Fresno	2°05'1287"N 76°53'22"W	1680
8	Martha Isabel Gomez Ruiz	34673919	El Fresno	2°05'13"N 76°53'10"W	1637
9	German Mamian Jiménez	1.059.900.996	El Fresno	2°04'23"N 76°54'31"W	1582
10	Maria Consuelo Mamian Jimenez	25599996	El Fresno	2°05'17"N 76°53'17"W	1616
11	Olga Salazar Quijano	34370105	El Fresno	2°05'29.22"N76°53'19"W	1548
12	Luceli Fernandez Rengifo	48649165	Salvavidas	2°02'03"N 76°53'6"W	1680
13	Fernando Gomez Diaz	10696793	Salvavidas	2°03'03"N 76°53'57"W	1760
14	Alirio Gironza Mamian	76308220	Salvavidas	2°02'024"N 76°54'04"W	1514
15	Maria Leonila Rengifo	25325205	Salvavidas	2°02'27"N 76°53'58"W	1597

Todos los registros fotográficos y anexos se entregan a la coordinadora del proyecto Ingeniera Daniela Ruiz Muñoz

Dado en Sucre Cauca a los treinta y un (31) días del mes de marzo del año 2.026

Atentamente

VICTOR HUGO GOMEZ RUIZ
76.327.492 de Popayán Cauca

ANEXO

Planillas de aportes de seguridad social del equipo técnico

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900373700	2	FUNDACION PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO FUNPRODESA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 7A 31N-19	POPAYAN-CAUCA	8318520	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	115965823	9499860536	E	2026/03/03	2026/03/05	NEQUI	2	$430,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				Total Aportes
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Centro de Trabajo: ADMON (1 Afiliados)						**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**		**$9,200**		**$0**	**$0**		**$429,600**
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)						**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**		**$9,200**		**$0**	**$0**		**$429,600**
1	CC	34639432	SANCHEZ VANESSA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Total Afiliados(1)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$400	$0	$280,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$400	$0	$280,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$100	$0	$9,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$100	$0	$70,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$70,100	$100	$0	$70,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$100	$0	$70,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$100	$0	$70,200
TOTAL				1	$429,600	$700	$0	$430,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900373700	2	FUNDACION PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO FUNPRODESA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 7A 31N-19	POPAYAN-CAUCA	8318520	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	93010765	9501622464	E	2026/04/06	2026/04/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$429,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Centro de Trabajo: ADMON (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
1	CC	34639432	SANCHEZ VANESSA																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF14	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Total Afiliados(1)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600

722

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				1	$429,600	$0	$0	$429,600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1061810805
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARYI DANIELA RUIZ MUNOZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipos per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	9012312342		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO	2026
DÍAS DE MORA:					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/07		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		203983301

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS			FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA		COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 200	$ 0	$ 280.200	$ 200	$ 280.400
SUBTOTALES:											**$ 280.200**	**$ 200**	**$ 280.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 200	$ 0	$ 218.900	$ 200	$ 0	$ 219.100
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 219.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 100	$ 0	$ 9.300
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 9.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	AVP	PENSIÓN								SALUD								ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MIN EDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1061810805	RUIZ MUNOZ MARYI DANIELA	23-DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	30	1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	1.750.905	106181060	$ 9.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1061816805
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARYI DANIELA RUIZ MUNOZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			96014796150	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES abril AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			7		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	301937818

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 149.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800	$ 0	$ 149.500	$ 800	$ 150.300
SUBTOTALES:										**$ 149.500**	**$ 800**	**$ 150.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 116.800	$ 0	$ 600	$ 0	$ 116.800	$ 600	$ 0	$ 117.400
SUBTOTALES:													**$ 116.800**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 117.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.900	$ 4.900	$ 100	$ 0	$ 5.000
SUBTOTALES:									**$ 4.900**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 5.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD								ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MIN EDU
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	AVP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1061816805	RUIZ MUNOZ MARYI DANIELA	DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO		18															230301-PORVENIR	16	$ 933.816	$ 149.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 149.500	NUEVA EPS CM	16	$ 933.816	$ 116.800	$ 0	$ 116.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	16	$ 933.816	106181060	$ 4.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 272.700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52734621		GOMEZ ANA LUBY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CAMPIN	SUCRE-CAUCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	223592385	9503082021	I	2026/04/08	2026/04/15	BANCOLOMBIA	7	$655,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,108,000	$337,300			$2,108,000	$263,500			$0	$0			$2,108,000	$51,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL. (1 Afiliados)					$2,108,000	$337,300			$2,108,000	$263,500			$0	$0			$2,108,000	$51,400		$0	$0
Ciudad: SUCRE Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$2,108,000	$337,300			$2,108,000	$263,500			$0	$0			$2,108,000	$51,400		$0	$0
1	CC 52734621	GOMEZ ANA	230201	30	$2,108,000	$337,300	ESSC62	30	$2,108,000	$263,500		0	$0	$0	14-23	30	$2,108,000	$51,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,108,000	$337,300			$2,108,000	$263,500			$0	$0			$2,108,000	$51,400		$0	$0

2026/04/14 06:57 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52734621		GOMEZ ANA LUBY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CAMPIN	SUCRE-CAUCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	223592385	9503082021	I	2026/04/08	2026/04/15	BANCOLOMBIA	7	$655,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$337,300	$1,600	$0	$338,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$337,300	$1,600	$0	$338,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$51,400	$300	$0	$51,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$51,400	$300	$0	$51,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$263,500	$1,300	$0	$264,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$263,500	$1,300	$0	$264,800
TOTAL				1	$652,200	$3,200	$0	$655,400

2026/04/14 06:57 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52734621		GOMEZ ANA LUBY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CAMPIN	SUCRE-CAUCA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	308399956	9504712430	I	2026/05/07	2026/05/14	BANCOLOMBIA	7	$566.100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,820,000	$291,200			$1,820,000	$227,500			$0	$0			$1,820,000	$44,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,820,000**	**$291,200**			**$1,820,000**	**$227,500**			**$0**	**$0**			**$1,820,000**	**$44,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: SUCRE Depto: CAUCA (1 Afiliados)					**$1,820,000**	**$291,200**			**$1,820,000**	**$227,500**			**$0**	**$0**			**$1,820,000**	**$44,400**		**$0**	**$0**
1	CC	52734621	GOMEZ ANA	230201	30	$1,820,000	$291,200	ESSC62	30	$1,820,000	$227,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,820,000	$44,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,820,000**	**$291,200**			**$1,820,000**	**$227,500**			**$0**	**$0**			**$1,820,000**	**$44,400**		**$0**	**$0**

2026/05/14 04:33 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52734621		GOMEZ ANA LUBY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CAMPIN	SUCRE-CAUCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	308399956	9504712430	I	2026/05/07	2026/05/14	BANCOLOMBIA	7	$566,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$291,200	$1,500	$0	$292,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$291,200	$1,500	$0	$292,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$44,400	$300	$0	$44,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$44,400	$300	$0	$44,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,500	$1,200	$0	$228,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$227,500	$1,200	$0	$228,700
TOTAL				1	$563,100	$3,000	$0	$566,100

2026/05/14 04:33 PM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	76327492
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VICTOR HUGO GOMEZ RUIZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SUCRE	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	EL CARMELO	TELÉFONO:	1006000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	901028619(		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	marzo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/09		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		208857331

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

329

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LEIDY MELISA DAZA GOMEZ identificado(a) con CC 1144524759 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: AGC INSUMOS AGRICOLAS SAS NI 901721190										Novedades																
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9504335156	281144835	E	2026/05/05	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30		X															
9504335156	281144835	E	2026/05/05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30		X															
9504335156	281144835	E	2026/05/05	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30		X															
9504335156	281144835	E	2026/05/05	CCF	CCF14	COMFACAUCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30		X															

Este certificado se expide el día 2026-05-29 a las 11:10.

728

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LEIDY MELISA DAZA GOMEZ identificado(a) con CC 1144524759 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: AGC INSUMOS AGRICOLAS SAS NI 901721190

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip
95058990888	357515098	E	2026-05-02	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30		X															
95058990888	357515098	E	2026-05-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30		X															
95058990888	357515098	E	2026-05-02	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30		X															
95058990888	357515098	E	2026-05-02	CCF	CCF14	COMFACAUCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	30		X															

Este certificado se expide el día 2026-06-03 a las 10:15.

ANEXO

Proceso de cambio de una beneficiaria
Por renuncia

Sucre Cauca, 26 de marzo de 2025

Ingeniera
CAROLINA GASCA MUÑOZ
Supervisora del Contrato No. 002-SAM-2025
Sucre Cauca

Asunto: Solicitud de nuevo cambio y actualización de beneficiarios - proyecto estufas ecoeficientes a base de leña

Referencia: Contrato No. 002-SAM-2025

Cordial saludo,

Por medio del presente yo VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ identificada con cedula de ciudadanía numero 34639432 expedida en Bolívar Cauca, en calidad de representante legal de la **Fundación Para El Progreso Y Desarrollo – FUNPRODESA**, con NIT 900.373.700-2, y como contratista del Contrato No. 002 – SAMC – 2025, suscrito el 06 de diciembre del año 2025, me permito solicitar cambio y actualización del listado de beneficiarios del proyecto de estufas ecoeficientes a base de leña

Lo anterior teniendo en cuenta que, una vez realizadas las respectivas visitas de verificación en campo en los sectores de influencia del proyecto, se presentó una nueva renuncia voluntaria:

- La señora OMAIRA SOSCUE PEREZ identificada con cedula de ciudadanía número 48.606.972 expedida en Sucre Cauca, manifiesta su renuncia al proyecto por traslado de residencia (se anexa acta de renuncia).
- En su reemplazo se propone la señora OLGA SALAZAR QUIJANO identificada con cedula de ciudadanía número 34.370.105 expedida en Bolívar Cauca, quien hacia parte del listado de elegibles o posibles suplentes (se anexa copia de documento de identidad)

En consecuencia y teniendo en cuenta que una vez revisados los documentos del proyecto, se puede constatar que la beneficiaria propuesta fue definida en la etapa de formulación del proyecto como posible beneficiario en la lista de espera, conforme a los lineamientos del Sistema General de Regalías (SGR), respetuosamente solicito adelantar el tramite correspondiente para:

- La aceptación de la renuncia voluntaria presentada
- La actualización del listado de beneficiarios, acudiendo al banco de elegibles o listado de suplentes, garantizando el cumplimiento de los criterios de focalización del proyecto.

Lo anterior, con el fin de asegurar la continuidad en la ejecución del contrato, la adecuada asignación del cupo disponible y el cumplimiento de los principios de inversión pública

Se anexan los documentos soportes correspondientes al caso expuesto.

Agradezco de antemano la atención prestada y quedo atenta a su aprobación y a las instrucciones a que haya lugar

Cordialmente

VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ
Representante Legal
Fundación para el progreso y desarrollo. – FUNPRODESA
Contratista

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SUCRE

ACTA DE RENUNCIA DE BENEFICIO DE UNA ACTIVIDAD O PROYECTO

Yo Omaira Soscué Pérez mayor de edad, identificado(a) con cedula de ciudadanía numero 48606972 expedida en Sucre ubicado en la vereda Salvaudos del corregimiento de Sucre cabecera RENUNCIO a ser beneficiario (a) del proyecto Hornillas ecoeficientes a base de leña

Motivos de la renuncia: (marcar con x)

- Desinterés de la necesidad del beneficio (X)
- Traslado de residencia a otro Municipio (X)
- Cambio de actividad económica ( )

Atentamente

Omaira Soscué Perez
C.C. 48 606 972
Cel: 320 653 9617




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 46606972

SOSCUE PEREZ

OMAIRA

Omaira. Soscué

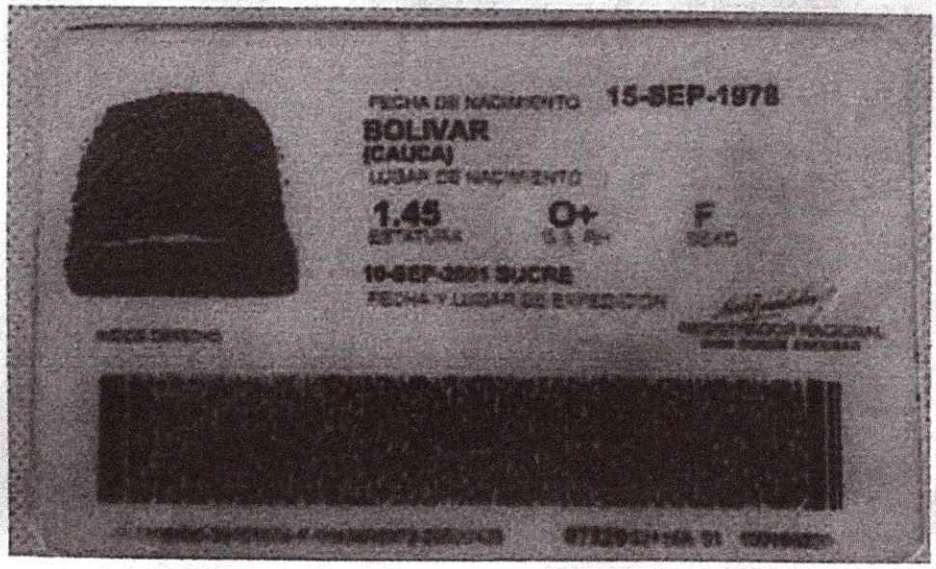

FECHA DE NACIMIENTO 15-SEP-1978

BOLIVAR
(CAUCA)

1.45
ESTATURA


O+
G.S. RH

F
SEXO

19-SEP-2001 SUCRE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
34.370.105
SALAZAR QUIJANO
OLGA

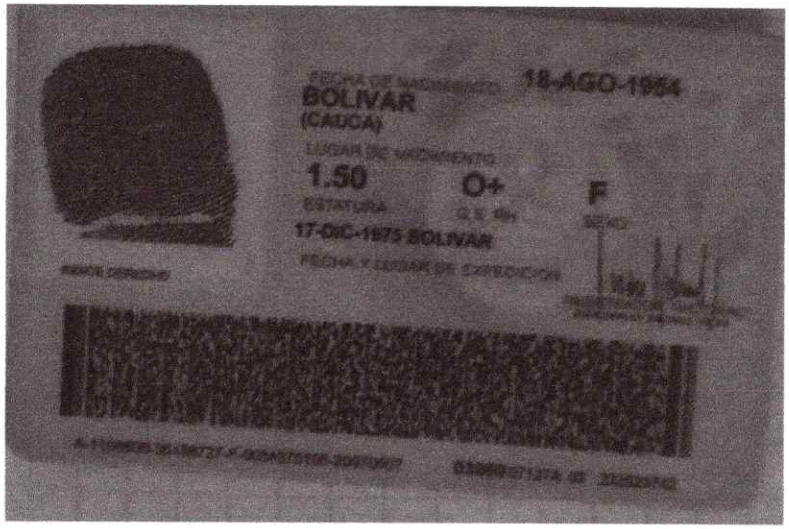
18-AGO-1954
BOLIVAR
(CAUCA)
1.50
O+
F
17-DIC-1975 BOLIVAR

Sucre Cauca, 27 de marzo del 2026

Doctor
CARLOS RUBER MORA MORA
Alcalde municipal
Sucre Cauca

ASUNTO: Informe técnico de justificación Técnica y Jurídica, para la sustitución de un beneficiario por renuncia voluntaria.

Referencia: Proyecto de inversión con código **BPIN: 2025197850001** denominado "**RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DE LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS, EL MACO Y LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA** "

Atento saludo:

En mi calidad de Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal de Sucre Cauca, y con funciones de supervisora del Contrato N° 002-SAM-2025, manifiesto que he realizado un análisis de la situación manifestada por el contratista en el oficio de fecha 28 de diciembre del 2025, respecto de los beneficiarios de la actividad **"1.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 ESTUFAS ECOEFICIENTES A BASE DE LEÑA, PARA 15 FAMILIAS"**, del proyecto de inversión con código **BPIN: 2025197850001** denominado "**RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DE LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS, EL MACO Y LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA**"; se puede indicar que es procedente y razonable la solicitud, teniendo en cuenta los siguientes parámetros.

1. Que dicha solicitud no se considera un ajuste del proyecto, según los establece el "Articulo 4.5.1.2.6, Cambios en las condiciones de ejecución respecto a los beneficiarios del proyecto de inversión", del Acuerdo N° 07 del 26 de mayo del 2022, de la Comisión Rectora.
2. Que la solicitud no implica cambios sustanciales, en el valor, en el tiempo, en los alcances y productos finales, como tampoco la localización del proyecto inicialmente aprobado.
3. Que los cambios específicamente, es de una porción de los beneficiarios en este caso específico en uno de los beneficiarios de la actividad **"1.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 ESTUFAS ECOEFICIENTES A BASE DE LEÑA, PARA 15 FAMILIAS".**
4. Que el cambio no modifica la localización del proyecto, teniendo en cuenta que la nueva beneficiaria es una familia localizada en las áreas de influencia de las áreas ambientales estratégicas, del Maco y Las Minas, del Municipio de Sucre Cauca.

Asimismo, manifiesto de conformidad con el "Articulo 4.5.1.2.6, Cambios en las condiciones de ejecución respecto a los beneficiarios del proyecto de inversión", del Acuerdo N° 07 del 26

de mayo del 2022, de la Comisión Rectora, que las razones técnicas y jurídicas que sustentan la necesidad y pertinencia del cambio sobre las variables mencionadas, se detallan a continuación:

1. RAZONES TÉCNICAS:

Técnicamente el ajuste solicitado, consistente en la sustitución de un cambio de beneficiario por renuncia voluntaria, de la actividad "1.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 ESTUFAS ECOEFICIENTES A BASE DE LEÑA, PARA 15 FAMILIAS", del proyecto de inversión con código BPIN: 2025197850001 denominado "RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DE LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS, EL MACO Y LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA", que dichas actividades, permitan cumplir con los alcances iniciales del proyecto y garantizar cumplir en un 100% las actividades programadas, dicho ajuste no cambia el objeto, el alcance, no se cambia de lugar de ejecución; como tampoco los objetivos específicos; está orientado a dar continuidad al desarrollo del proyecto de inversión y permitirá cumplir con las metas establecidas en el mismo.

A continuación, se describe técnicamente los cambios, que aplican para el proyecto en cuestión en virtud de lo establecido por el DNP, en la normativa aplicable y vigente para este tipo de procesos:

- La señora OMAIRA SOSCUE PEREZ identificada con cedula de ciudadanía número 48.606.972 expedida en Sucre Cauca, manifiesta su renuncia al proyecto por traslado de residencia a la actividad "1.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 ESTUFAS ECOEFICIENTES A BASE DE LEÑA, PARA 15 FAMILIAS", del proyecto de inversión con código BPIN: 2025197850001 denominado "RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DE LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS, EL MACO Y LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA ".

SUSTITUCIÓN Y CAMBIO DE BENFICIARIO

Teniendo en cuenta los requisitos del proyecto: Ser habitante de los sitios de influencia del proyecto, contar con vivienda, preparar alimentos con leña y tener un núcleo familiar; se propone el siguiente cambio:

- Como reemplazo de la señora OMAIRA SOSCUE PEREZ ingresa la señora OLGA SALAZAR QUIJANO identificada con cedula de ciudadanía número 34.370.105 expedida en Bolívar Cauca, quien es habitante de la vereda El Fresno y estaba entre los postulados posibles para reemplazo (se anexa copia de cedula).

NOMBRES Y APELLIDOS, COORDENADAS DE LA NUEVA BENEFICIARIA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	VEREDA	COORDENADAS	MSNM
1	Olga Salazar Quijano	34370105	El Fresno	2°05'29.22"N76°53'19"W	1548

236

2. RAZONES JURIDICAS

El artículo 1.2.1.2.14 del Decreto 1821 de 2020, establece que con posterioridad a su registro y hasta antes de su cierre, los proyectos de inversión podrán ser susceptibles de cambios, siempre y cuando las modificaciones introducidas no cambien el alcance de este, entendido como los objetivos generales y específicos, los productos y la localización, conforme con los lineamientos que defina el Departamento Nacional de Planeación y adopte la Comisión Rectora. **Este cambio, previo trámite y aprobación, deberá registrarse por la instancia que presentó el proyecto.**

El parágrafo transitorio 1 del Art. 1.2.1.2.14 del Decreto 1821 de 2020, determina que, para los proyectos de inversión registrados a 31 de diciembre de 2020, que con posterioridad a tal fecha requieran cambios no sustanciales, los mismos serán tramitados conforme a las reglas del ciclo de los proyectos de inversión aplicables a la asignación que **resulte de la homologación de los conceptos de gasto a que hace referencia el Art. 205 de Ley 2056 de 2020.**

Conforme a lo establecido en la Subsección 2; AJUSTES APROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS, en el artículo "Articulo 4.5.1.2.6, Cambios en las condiciones de ejecución respecto a los beneficiarios del proyecto de inversión, del Acuerdo 07 de fecha 26 de mayo del 2022, de la Comisión Rectora, aquellos proyectos financiados con recursos de ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL SEGÚN NBI Y CUARTA, QUINTA, Y SEXTA CATEGORÍA, por ende, deberán tramitar dichos procesos ante la secretaría técnica del respectivo municipio.

El alcance del cambio planteado y procedente fue argumentado de la siguiente manera:

VARIABLES QUE SON EL MARCO DE REFERENCIA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

- La solicitud se hace teniendo en cuenta que el Sistema General de Regalías, estable en el "Articulo 4.5.1.2.6, Cambios en las condiciones de ejecución respecto a los beneficiarios del proyecto de inversión", del Acuerdo N° 07 del 26 de mayo del 2022, de la Comisión Rectora, en donde se establece que, queda a discrecionalidad de la entidad que aprueba y la entidad ejecutora del proyecto, para decidir sobre los cambios de beneficiarios, siempre y cuando estos no cambien, el objeto del proyecto, la ubicación del proyecto, los alcances y los productos finales del proyecto inicialmente aprobado, como lo es, en este caso en particular.
- Es de poner en conocimiento que dichos cambios no corresponden a decisiones del contratista; obedecen a situaciones imprevistas que les ocurren a los beneficiarios y que hace necesario realizarlos y teniendo en cuenta que la normativa y procedimiento prestablecidos vigentes, establecidas por el Sistema General de Regalías, para todos los proyectos financiados con este tipo de recursos.
- Se adjunta como soportes los siguientes documentos de las 2 personas, tanto de quien sale, como de quien acepta como nueva beneficiaria.
- Persona que se retira del proyecto:
    1. Acta de renuncia voluntaria de la Señora Omaira Soscue Pérez

336

- Persona que se ingresa como nueva beneficiaria del proyecto:
    1. Copia de la cedula de ciudadanía de la señora Olga Salazar Quijano.

Por otra parte, al persistir la satisfacción de las necesidades colectivas y el interés general que motivaron la suscripción del contrato de prestación de Servicios N° 002-SAM-2025, el contratista adquiere u ostenta la connotación de colaborador de la entidad, a pesar de que pretenda obtener con su ejecución un beneficio económico inicialmente calculado, está al servicio de la entidad en pro de cumplir dicho fin; razón por la cual la Administración Municipal de Sucre Cauca, en cumplimiento de la ley, de los fines estatales, con el ánimo de asegurar la prestación de los servicios y en procura de dar cumplimiento a su Plan de Desarrollo 2024-2027 " Por un Sucre Grande", considera justificable y razonable, además de ser considerarlo CONVENIENTE resulta ser OPORTUNO para la Administración Municipal en la consecución de sus fines, para lo cual y como apenas es lógico la ejecución de estas actividades que no ocasionan incremento en el valor inicialmente contratado, donde dichas actividades son requeridas para continuar con la ejecución del proyecto y las mismas son básicas, necesarias y prioritarias para el buen funcionamiento; de más encuentra su fundamento en las siguientes normas y jurisprudencias:

*"(...) **Art. 3 Ley 80/93 - De los Fines de la Contratación Estatal**. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. (...)*

***Art. 14 Ley 80/93: De los medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el cumplimiento del objeto contractual**. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato:*
1°. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2° de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado (...)".

ART. 4°. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES.
Para la consecución de los fines, las entidades estatales: (...)
3. Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. (...)
8. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios.(...)

***ART. 5°. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS.** Para la realización de los fines de que trata el artículo 3 de esta ley, los contratistas: (...)*

1.. (…) En consecuencia, tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas. (...)
El Consejo de Estado manifiesta que:
"(…) Se ha establecido, que durante el desarrollo de un contrato como el de prestación de servicios, en el que pueden sobrevenir una serie de situaciones, hechos y circunstancias que impliquen adecuarlo a las nuevas exigencias y necesidades en interés público que se presenten y que inciden en las condiciones iniciales o en su precio, originados en cambios en las especificaciones, incorporación de nuevos ítems de obra, obras adicionales o nuevas, mayores costos no atribuibles al contratista que deban ser reconocido y sujetos a revisión (Art. 16 Ley 80 de 1993), entre otros, la oportunidad para presentar reclamaciones económicas con ocasión de las mismas y para ser reconocidas es al tiempo de suscribir o celebrar el contrato modificatorio o adicional (…)"
[Subrayado fuera del texto original]. [Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, Sentencia del 14/03/2013].

Como, evidencia y soportes de esta solicitud, se adjuntan los siguientes documentos:

1. Oficio del Contratista N° 002-SAM-2025, de fecha 26 de marzo del 2026
2. Documentos soportes de la sustitución y cambio de la beneficiaria

Sin otro en particular,

Carolina Gasca Muñoz
CAROLINA GASCA MUÑOZ
Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal
Sucre – Cauca
Supervisora contrato de prestación de servicios N° 002-SAM-2025

Proyectó: Oscar Mayorga- Apoyo a la Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal
Revisó y Aprobó Carolina Gasca Muñoz – Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal -Sucre Cauca

738

RESOLUCIÓN No. 133
(28/03/2026)

Por medio de la cual se aprueba un cambio en el listado de los beneficiarios de la actividad **"1.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 ESTUFAS ECOEFICIENTES A BASE DE LEÑA, PARA 15 FAMILIAS"**, del proyecto de inversión con código **BPIN: 2025197850001** denominado **"RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DE LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS, EL MACO Y LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA "**.

El, Alcalde, del Municipio de Sucre, Departamento del Cauca
En calidad de ejecutor designado del proyecto de inversión y en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el articulo 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que el Acto Legislativo No. 5 de 2011, creó el Sistema General de Regalías (SGR) y modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuyo funcionamiento e implementación fue regulado por la Ley 1530 de 2012.

Que el artículo 28 de la ley 1530 de 2012, determina que: "Los proyectos de inversión que se financien con cargo al Sistema General de Regalías serán ejecutados por quien designe el respectivo Órgano Colegiado de Administración y Decisión, con estricta sujeción al régimen presupuestal definido en esta ley y al de contratación pública vigente y aplicable y el ejecutor garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión, así como el suministro y registro de la información requerida por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación".

Que de acuerdo con el artículo 2.2.4.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015, "(...) Las entidades administradoras, beneficiarias y ejecutoras son responsables de suministrar de forma veraz, oportuna e idónea dicha información para realizar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación; identificar las situaciones que puedan afectar la correcta utilización de los recursos y el cumplimiento de los resultados programados; así como de implementar de forma inmediata las acciones de mejora que se requieran (...)".

Que la Dirección de Vigilancia de las Regalías (DVR) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) expidió la Circular No. 23 – 4, del 4 de diciembre de 2015, en la cual dio orientaciones del SMSCE, en el ciclo de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, que deben ser tenidos en cuenta por los representantes legales de las entidades públicas que los ejecutan.

Que mediante el Decreto N° 047 del 11 de abril del 2025, se aprobó el proyecto con numero BPIN 2025197850001, denominado **"RESTAURACIÓN,**

PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DE LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS, EL MACO Y LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA".

Que mediante el precitado Decreto municipal de Sucre, Departamento del Cauca, designó como entidad ejecutora al MUNICIPIO DE SUCRE, CAUCA; y como entidad pública designada la respectiva supervisión a la secretaria de planeacion e infraestructura Municipal de SUCRE, CAUCA.

Que mediante el Contrato de Prestación de Servicios N° 002-SAM-2025, de fecha 6 de diciembre de 2025, con acta de inicio de actividades el 15 de diciembre del 2025, con un plazo de 4 meses calendario, lo que indica que dicho proyecto está en etapa de ejecución y puede ser objeto de ajustes a como lo establece el Acuerdo N° 07 del 26 de mayo del 2022, de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.

Que el pasado 26 de marzo del 2026, por intermedio de la representante legal de FUNPRODESA, **VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ,** envió, un oficio, en donde se exponen de manera detallada, la situación encontrada en una vivienda de las familias beneficiarias de la actividad **"1.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 ESTUFAS ECOEFICIENTES A BASE DE LEÑA, PARA 15 FAMILIAS",** del proyecto de inversión con código **BPIN: 2025197850001** denominado "**RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DE LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS, EL MACO Y LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA** ", lo que implica realizar un (01) cambio, el cual se detalla a continuación.

Que teniendo como soporte oficio de fecha 26 de marzo de 2026, enviado por FUNPRODESA, se procedió por parte de la Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal de Sucre Cauca, en calidad de Supervisora del contrato N° 002-SAM-2025, de fecha 6 de Diciembre de 2025, realizar un INFORME TÉCNICO, teniendo en cuenta el "Articulo 4.5.1.2.6, Cambios en las condiciones de ejecución respecto a los beneficiarios del proyecto de inversión", del Acuerdo N° 07 del 26 de mayo del 2022, de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, en donde se expresa que el informe técnico debe contener una justificación Técnica y una justificación júridica.

Que la modificación solicitada por la contratista, no modifican los alcances, el objetivo general, el valor total, como el tiempo de ejecución del proyecto aprobado inicialmente.

Que basado en el oficio de FUNPRODESA y el reporte del comite técnico del 27 de marzo de 2026, se estableció lo siguiente;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Artículo 1. Aprobar el cambio en el listado de los beneficiarios de la actividad **"1.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 ESTUFAS ECOEFICIENTES A BASE DE**

LEÑA, PARA 15 FAMILIAS", del proyecto de inversión con código **BPIN: 2025197850001** denominado **"RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DE LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS, EL MACO Y LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA** ", la cual queda de la siguiente manera:

LISTADO DE BENEFICIARIO INICIALES					PERSONA NUEVA QUE INGRESAN AL PROYECTO				
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**IDENTIFICACION**	**VEREDA**	**COORDENADAS**	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**IDENTIFICACION**	**VEREDA**	**COORDENADAS**	**OBSERVACIONES**
1	ANTONINO MAGIN PALECHOR	10698295	EL FRESNO	2°04'04"N 76°53"42"W					
2	AUDELIA MONCAYO IJAJI	34370168	EL FRESNO	2°05'08"N 76°53'14"W					
3	DORALBA YANED RODRIGUEZ GUEVARA	59830218	EL FRESNO	2°04'59"N 76°53'35"W					
4	EULALIA LUNA DE GOMEZ	34370072	EL FRESNO	2°05'19"N 76°53'15"W					
5	MARIA CONSUELO MAMIAN JIMENEZ	25599996	EL FRESNO	2°05'17"N 76°53'17"W					
6	HECTA MERY LUNA LOPEZ	25588773	EL FRESNO	2°05'01"N 76°53'33"W					
7	LEONILA PALECHOR ATOY	1131024001	EL FRESNO	2°05'10"N 76°53'26"W					
8	MARIA CATALINA LUNA DE BUESAQUILLO	25587896	EL FRESNO	2°05'1287"N 76°53'22"W					
9	MARTHA ISABEL GOMEZ RUIZ	34673919	EL FRESNO	2°05'13"N 76°53'10"W					
10	GERMAN MAMIAN JIMÉNEZ	1059900996	EL FRESNO	2°04'23"N 76°54'31"W					
11	LUCELI FERNANDEZ RENGIFO	48649165	SALVAVIDAS	2°02'03"N 76°53'6"W					
12	MARIA LEONILA RENGIFO	25325205	SALVAVIDAS	2°02'27"N 76°53'58"W					
	OMAIRA SOSCUE PEREZ	48606972	SALVAVIDAS	2°02'27"N 76°53'58"W	OLGA SALAZAR QUIJANO	34370105	El FRESNO	2°05'29.22"N76°53'19"W	Por renuncia voluntaria del primer beneficiario
14	ALIRIO GIRONZA MAMIAN	76308220	SALVAVIDAS	2°02'024"N76°54'04"W					
15	FERNANDO GOMEZ DIAZ	10696793	SALVAVIDAS	2°03'03"N 76°53'57"W					

Artículo 2. Para tal efecto se deberá contar con la respectiva justificación técnica y jurídica del cambio, la cual reposará en los soportes documentales del proyecto, conforme a lo dispuesto en la Ley 594 de 2000 o las normas de gestión documental aplicables, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, disciplinarias, fiscales o penales que se puedan derivar.

Artículo 3. Adóptese como parte integral de esta Resolución los Anexos relacionados en la parte considerativa.

Artículo 5. La presente Resolución rige a partir de su publicación.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en el Municipio de Sucre Cauca, a los Veintiocho (28) días del mes de marzo del año 2.026

CARLOS RUBER MORA MORA
Alcalde Municipio de Sucre Cauca
Representate Legal, entidad ejecutora

Proyectó: Oscar Mayorga- Apoyo a la Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal
Revisó y Aprobó: Carolina Gasca Muñoz – Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal -Sucre Cauca

ANEXO

Actas de entregas de las estufas ecoeficientes a base de leña y registros fotográficos

MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

ACTA DE ENTREGA
DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A BASE DE LEÑA

Fecha:	14 DE ABRIL DE 2026
Nombre del Contratante	Municipio de Sucre Departamento del Cauca
Contratista:	FUNDACION PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO "FUNPRODESA" NIT 900.373.700-2 R.P VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ, Cc 34639432 Bolívar Cauca
Contrato de Prestación de Servicios	No. 002 – SAMC – 2025
Objeto :	Prestación de servicios para la ejecución del proyecto denominado restauración, preservación y conservación del recurso hídrico de las áreas estratégicas - El Maco y Las Minas del municipio de Sucre Cauca financiado con recursos del SGR

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD UNIDAD
1	ESTUFA ECOEFICIENTE: Multifuncional (4 hornillas + horno + asador). - Estructura resistente (material utilizado para alta resistencia y larga duración) • Accesorios y herrajes desmontables (permiten un mejor mantenimiento y cuidado a la estufa). Transportable (el modelo permite que el usuario pueda utilizarla en cualquier lugar, es decir, no queda sujeta o instalada en un solo lugar).•Modelo: ErgoNatura • Pintura: Martillada color gris acorazado • Cuerpo de la estufa: Elaborado en lámina Cold Rolled calibre 16 (1.4 mm), Pared frontal lamina HR (2.5mm). • Dimensiones: ancho 90 cm, alto 85 cm, fondo 60 cm, buitron 2,44 m • Acabado: gris acorazado, azul, • 4 hornillas. • Horno (25 ancho x 30 alto x 40 fondo) • Parrilla asadora (20 ancho x 35 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable	UNA ESTUFA ECOEFICIENTE A BASE DE LEÑA

Quien Entrega:	Quien recibe:	
	Antonino Magín Palechor	
Vanessa Johanna Sánchez Ruiz Cc: 34639432 Bolívar Cauca R.L FUNPRODESA	Antonino Magín Palechor CC. 10698295 Vereda El Fresno	HUELLA

DESTINO FINA: *Pequeños productores que preparan los alimentos a base de leña, ubicados cerca a los predios de El Maco y Las Minas de propiedad del Municipio de Sucre Cauca*

MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

ACTA DE ENTREGA
DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A BASE DE LEÑA

Fecha:	14 DE ABRIL DE 2026
Nombre del Contratante	Municipio de Sucre Departamento del Cauca
Contratista:	FUNDACION PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO "FUNPRODESA" NIT 900.373.700-2 R.P VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ, Cc 34639432 Bolivar Cauca
Contrato de Prestación de Servicios	No. 002 – SAMC – 2025
Objeto :	Prestación de servicios para la ejecución del proyecto denominado restauración, preservación y conservación del recurso hídrico de las áreas estratégicas - El Maco y Las Minas del municipio de Sucre Cauca financiado con recursos del SGR

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD UNIDAD
1	ESTUFA ECOEFICIENTE: Multifuncional (4 hornillas + horno + asador). - Estructura resistente (material utilizado para alta resistencia y larga duración) • Accesorios y herrajes desmontables (permiten un mejor mantenimiento y cuidado a la estufa). Transportable (el modelo permite que el usuario pueda utilizarla en cualquier lugar, es decir, no queda sujeta o instalada en un solo lugar).•Modelo: ErgoNatura • Pintura: Martillada color gris acorazado • Cuerpo de la estufa: Elaborado en lámina Cold Rolled calibre 16 (1.4 mm), Pared frontal lamina HR (2.5mm). • Dimensiones: ancho 90 cm, alto 85 cm, fondo 60 cm, buitron 2,44 m • Acabado: gris acorazado, azul, • 4 hornillas. • Horno (25 ancho x 30 alto x 40 fondo) • Parrilla asadora (20 ancho x 35 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable	UNA ESTUFA ECOEFICIENTE A BASE DE LEÑA

Quien Entrega:	Quien recibe:	
Vanessa Johanna Sánchez Ruiz Cc: 34639432 Bolívar Cauca R.L FUNPRODESA	Audelia Moncayo Ijaji CC. 34370168 Vereda El Fresno	HUELLA

DESTINO FINA: *Pequeños productores que preparan los alimentos a base de leña, ubicados cerca a los predios de El Maco y Las Minas de propiedad del Municipio de Sucre Cauca*

MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

ACTA DE ENTREGA
DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A BASE DE LEÑA

Fecha:	14 DE ABRIL DE 2026
Nombre del Contratante	Municipio de Sucre Departamento del Cauca
Contratista:	FUNDACION PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO "FUNPRODESA" NIT 900.373.700-2 R.P VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ, Cc 34639432 Bolivar Cauca
Contrato de Prestación de Servicios	No. 002 – SAMC – 2025
Objeto :	Prestación de servicios para la ejecución del proyecto denominado restauración, preservación y conservación del recurso hídrico de las áreas estratégicas - El Maco y Las Minas del municipio de Sucre Cauca financiado con recursos del SGR

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD UNIDAD
1	ESTUFA ECOEFICIENTE: Multifuncional (4 hornillas + horno + asador). - Estructura resistente (material utilizado para alta resistencia y larga duración) • Accesorios y herrajes desmontables (permiten un mejor mantenimiento y cuidado a la estufa). Transportable (el modelo permite que el usuario pueda utilizarla en cualquier lugar, es decir, no queda sujeta o instalada en un solo lugar).•Modelo: ErgoNatura • Pintura: Martillada color gris acorazado • Cuerpo de la estufa: Elaborado en lámina Cold Rolled calibre 16 (1.4 mm), Pared frontal lamina HR (2.5mm). • Dimensiones: ancho 90 cm, alto 85 cm, fondo 60 cm, buitron 2,44 m • Acabado: gris acorazado, azul, • 4 hornillas. • Horno (25 ancho x 30 alto x 40 fondo) • Parrilla asadora (20 ancho x 35 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable	UNA ESTUFA ECOEFICIENTE A BASE DE LEÑA

Quien Entrega:	Quien recibe:	
	Doralba Rodriguez	
Vanessa Johanna Sánchez Ruiz Cc: 34639432 Bolívar Cauca R.L FUNPRODESA	Doralba Yaned Rodriguez Guevara CC. 59830218 Vereda El Fresno	HUELLA

DESTINO FINA: *Pequeños productores que preparan los alimentos a base de leña, ubicados cerca a los predios de El Maco y Las Minas de propiedad del Municipio de Sucre Cauca*

744

MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

ACTA DE ENTREGA
DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A BASE DE LEÑA

Fecha:	14 DE ABRIL DE 2026
Nombre del Contratante	Municipio de Sucre Departamento del Cauca
Contratista:	FUNDACION PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO "FUNPRODESA" NIT 900.373.700-2 R.P VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ, Cc 34639432 Bolivar Cauca
Contrato de Prestación de Servicios	No. 002 – SAMC – 2025
Objeto :	Prestación de servicios para la ejecución del proyecto denominado restauración, preservación y conservación del recurso hídrico de las áreas estratégicas - El Maco y Las Minas del municipio de Sucre Cauca financiado con recursos del SGR

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD UNIDAD
1	ESTUFA ECOEFICIENTE: Multifuncional (4 hornillas + horno + asador). - Estructura resistente (material utilizado para alta resistencia y larga duración) • Accesorios y herrajes desmontables (permiten un mejor mantenimiento y cuidado a la estufa). Transportable (el modelo permite que el usuario pueda utilizarla en cualquier lugar, es decir, no queda sujeta o instalada en un solo lugar).•Modelo: ErgoNatura • Pintura: Martillada color gris acorazado • Cuerpo de la estufa: Elaborado en lámina Cold Rolled calibre 16 (1.4 mm), Pared frontal lamina HR (2.5mm). • Dimensiones: ancho 90 cm, alto 85 cm, fondo 60 cm, buitron 2,44 m • Acabado: gris acorazado, azul, • 4 hornillas. • Horno (25 ancho x 30 alto x 40 fondo) • Parrilla asadora (20 ancho x 35 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable	UNA ESTUFA ECOEFICIENTE A BASE DE LEÑA

Quien Entrega:	Quien recibe:	
	Eulalia Luna	
Vanessa Johanna Sánchez Ruiz Cc: 34639432 Bolívar Cauca R.L FUNPRODESA	Eulalia Luna De Gómez CC. 34370072 Vereda El Fresno	HUELLA

DESTINO FINA: *Pequeños productores que preparan los alimentos a base de leña, ubicados cerca a los predios de El Maco y Las Minas de propiedad del Municipio de Sucre Cauca*

MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

ACTA DE ENTREGA
DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A BASE DE LEÑA

Fecha:	14 DE ABRIL DE 2026
Nombre del Contratante	Municipio de Sucre Departamento del Cauca
Contratista:	FUNDACION PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO "FUNPRODESA" NIT 900.373.700-2 R.P VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ, Cc 34639432 Bolivar Cauca
Contrato de Prestación de Servicios	No. 002 – SAMC – 2025
Objeto :	Prestación de servicios para la ejecución del proyecto denominado restauración, preservación y conservación del recurso hídrico de las áreas estratégicas - El Maco y Las Minas del municipio de Sucre Cauca financiado con recursos del SGR

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD UNIDAD
1	ESTUFA ECOEFICIENTE: Multifuncional (4 hornillas + horno + asador). - Estructura resistente (material utilizado para alta resistencia y larga duración) • Accesorios y herrajes desmontables (permiten un mejor mantenimiento y cuidado a la estufa). Transportable (el modelo permite que el usuario pueda utilizarla en cualquier lugar, es decir, no queda sujeta o instalada en un solo lugar).•Modelo: ErgoNatura • Pintura: Martillada color gris acorazado • Cuerpo de la estufa: Elaborado en lámina Cold Rolled calibre 16 (1.4 mm), Pared frontal lamina HR (2.5mm). • Dimensiones: ancho 90 cm, alto 85 cm, fondo 60 cm, buitron 2,44 m • Acabado: gris acorazado, azul, • 4 hornillas. • Horno (25 ancho x 30 alto x 40 fondo) • Parrilla asadora (20 ancho x 35 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable	UNA ESTUFA ECOEFICIENTE A BASE DE LEÑA

Quien Entrega:	Quien recibe:	
	María Consuelo Mamian	
Vanessa Johanna Sánchez Ruiz Cc: 34639432 Bolívar Cauca R.L FUNPRODESA	María Consuelo Mamian Jiménez CC. 25599996 Vereda El Fresno	HUELLA

DESTINO FINA: *Pequeños productores que preparan los alimentos a base de leña, ubicados cerca a los predios de El Maco y Las Minas de propiedad del Municipio de Sucre Cauca*

MUNICIPIO DE SUCRE	**MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA** **FUNPRODESA** **ACTA DE ENTREGA** **DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A BASE DE LEÑA**	funprodesa Fundación para el Progreso y Desarrollo

Fecha:	14 DE ABRIL DE 2026
Nombre del Contratante	Municipio de Sucre Departamento del Cauca
Contratista:	FUNDACION PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO "FUNPRODESA" NIT 900.373.700-2 R.P VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ, Cc 34639432 Bolivar Cauca
Contrato de Prestación de Servicios	No. 002 – SAMC – 2025
Objeto :	Prestación de servicios para la ejecución del proyecto denominado restauración, preservación y conservación del recurso hídrico de las áreas estratégicas - El Maco y Las Minas del municipio de Sucre Cauca financiado con recursos del SGR

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD UNIDAD
1	ESTUFA ECOEFICIENTE: Multifuncional (4 hornillas + horno + asador). - Estructura resistente (material utilizado para alta resistencia y larga duración) • Accesorios y herrajes desmontables (permiten un mejor mantenimiento y cuidado a la estufa). Transportable (el modelo permite que el usuario pueda utilizarla en cualquier lugar, es decir, no queda sujeta o instalada en un solo lugar).•Modelo: ErgoNatura • Pintura: Martillada color gris acorazado • Cuerpo de la estufa: Elaborado en lámina Cold Rolled calibre 16 (1.4 mm), Pared frontal lamina HR (2.5mm). • Dimensiones: ancho 90 cm, alto 85 cm, fondo 60 cm, buitron 2,44 m • Acabado: gris acorazado, azul, • 4 hornillas. • Horno (25 ancho x 30 alto x 40 fondo) • Parrilla asadora (20 ancho x 35 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable	UNA ESTUFA ECOEFICIENTE A BASE DE LEÑA

Quien Entrega:	Quien recibe:	
	Hecta Mery Luna L.	
Vanessa Johanna Sánchez Ruiz Cc: 34639432 Bolívar Cauca R.L FUNPRODESA	Hecta Mery Luna López c.c. 25588773 Vereda El Fresno	HUELLA

DESTINO FINA: *Pequeños productores que preparan los alimentos a base de leña, ubicados cerca a los predios de El Maco y Las Minas de propiedad del Municipio de Sucre Cauca*

	MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA **FUNPRODESA** **ACTA DE ENTREGA** **DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A BASE DE LEÑA**	

Fecha:	14 DE ABRIL DE 2026
Nombre del Contratante	Municipio de Sucre Departamento del Cauca
Contratista:	FUNDACION PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO "FUNPRODESA" NIT 900.373.700-2 R.P VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ, Cc 34639432 Bolivar Cauca
Contrato de Prestación de Servicios	No. 002 – SAMC – 2025
Objeto :	Prestación de servicios para la ejecución del proyecto denominado restauración, preservación y conservación del recurso hídrico de las áreas estratégicas - El Maco y Las Minas del municipio de Sucre Cauca financiado con recursos del SGR

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD UNIDAD
1	ESTUFA ECOEFICIENTE: Multifuncional (4 hornillas + horno + asador). - Estructura resistente (material utilizado para alta resistencia y larga duración) • Accesorios y herrajes desmontables (permiten un mejor mantenimiento y cuidado a la estufa). Transportable (el modelo permite que el usuario pueda utilizarla en cualquier lugar, es decir, no queda sujeta o instalada en un solo lugar).•Modelo: ErgoNatura • Pintura: Martillada color gris acorazado • Cuerpo de la estufa: Elaborado en lámina Cold Rolled calibre 16 (1.4 mm), Pared frontal lamina HR (2.5mm). • Dimensiones: ancho 90 cm, alto 85 cm, fondo 60 cm, buitron 2,44 m • Acabado: gris acorazado, azul, • 4 hornillas. • Horno (25 ancho x 30 alto x 40 fondo) • Parrilla asadora (20 ancho x 35 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable	UNA ESTUFA ECOEFICIENTE A BASE DE LEÑA

Quien Entrega:	Quien recibe:	
	Leonila Palechor	
Vanessa Johanna Sánchez Ruiz Cc: 34639432 Bolívar Cauca R.L FUNPRODESA	Leonila Palechor Atoy CC. 1131024001 Vereda El Fresno	HUELLA

DESTINO FINA: *Pequeños productores que preparan los alimentos a base de leña, ubicados cerca a los predios de El Maco y Las Minas de propiedad del Municipio de Sucre Cauca*

MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

ACTA DE ENTREGA
DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A BASE DE LEÑA

Fecha:	14 DE ABRIL DE 2026
Nombre del Contratante	Municipio de Sucre Departamento del Cauca
Contratista:	FUNDACION PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO "FUNPRODESA" NIT 900.373.700-2 R.P VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ, Cc 34639432 Bolivar Cauca
Contrato de Prestación de Servicios	No. 002 – SAMC – 2025
Objeto :	Prestación de servicios para la ejecución del proyecto denominado restauración, preservación y conservación del recurso hídrico de las áreas estratégicas - El Maco y Las Minas del municipio de Sucre Cauca financiado con recursos del SGR

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD UNIDAD
1	ESTUFA ECOEFICIENTE: Multifuncional (4 hornillas + horno + asador). - Estructura resistente (material utilizado para alta resistencia y larga duración) • Accesorios y herrajes desmontables (permiten un mejor mantenimiento y cuidado a la estufa). Transportable (el modelo permite que el usuario pueda utilizarla en cualquier lugar, es decir, no queda sujeta o instalada en un solo lugar).•Modelo: ErgoNatura • Pintura: Martillada color gris acorazado • Cuerpo de la estufa: Elaborado en lámina Cold Rolled calibre 16 (1.4 mm), Pared frontal lamina HR (2.5mm). • Dimensiones: ancho 90 cm, alto 85 cm, fondo 60 cm, buitron 2,44 m • Acabado: gris acorazado, azul, • 4 hornillas. • Horno (25 ancho x 30 alto x 40 fondo) • Parrilla asadora (20 ancho x 35 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable	UNA ESTUFA ECOEFICIENTE A BASE DE LEÑA

Quien Entrega:	Quien recibe:	
Vanessa Johanna Sánchez Ruiz Cc: 34639432 Bolívar Cauca R.L FUNPRODESA	María Catalina Luna De Buesaquillo CC. 25587896 Vereda El Fresno	HUELLA

DESTINO FINA: *Pequeños productores que preparan los alimentos a base de leña, ubicados cerca a los predios de El Maco y Las Minas de propiedad del Municipio de Sucre Cauca*

MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

ACTA DE ENTREGA
DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A BASE DE LEÑA

Fecha:	14 DE ABRIL DE 2026
Nombre del Contratante	Municipio de Sucre Departamento del Cauca
Contratista:	FUNDACION PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO "FUNPRODESA" NIT 900.373.700-2 R.P VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ, Cc 34639432 Bolivar Cauca
Contrato de Prestación de Servicios	No. 002 – SAMC – 2025
Objeto :	Prestación de servicios para la ejecución del proyecto denominado restauración, preservación y conservación del recurso hídrico de las áreas estratégicas - El Maco y Las Minas del municipio de Sucre Cauca financiado con recursos del SGR

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD UNIDAD
1	ESTUFA ECOEFICIENTE: Multifuncional (4 hornillas + horno + asador). - Estructura resistente (material utilizado para alta resistencia y larga duración) • Accesorios y herrajes desmontables (permiten un mejor mantenimiento y cuidado a la estufa). Transportable (el modelo permite que el usuario pueda utilizarla en cualquier lugar, es decir, no queda sujeta o instalada en un solo lugar).•Modelo: ErgoNatura • Pintura: Martillada color gris acorazado • Cuerpo de la estufa: Elaborado en lámina Cold Rolled calibre 16 (1.4 mm), Pared frontal lamina HR (2.5mm). • Dimensiones: ancho 90 cm, alto 85 cm, fondo 60 cm, buitron 2,44 m • Acabado: gris acorazado, azul, • 4 hornillas. • Horno (25 ancho x 30 alto x 40 fondo) • Parrilla asadora (20 ancho x 35 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable	UNA ESTUFA ECOEFICIENTE A BASE DE LEÑA

Quien Entrega:	Quien recibe:	
	Martha Isabel Gomez Ruiz	
Vanessa Johanna Sánchez Ruiz Cc: 34639432 Bolívar Cauca R.L FUNPRODESA	Martha Isabel Gómez Ruiz CC. 34673919 Vereda El Fresno	HUELLA

DESTINO FINA: *Pequeños productores que preparan los alimentos a base de leña, ubicados cerca a los predios de El Maco y Las Minas de propiedad del Municipio de Sucre Cauca*

	MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA **FUNPRODESA** **ACTA DE ENTREGA** **DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A BASE DE LEÑA**	

Fecha:	14 DE ABRIL DE 2026
Nombre del Contratante	Municipio de Sucre Departamento del Cauca
Contratista:	FUNDACION PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO "FUNPRODESA" NIT 900.373.700-2 R.P VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ, Cc 34639432 Bolivar Cauca
Contrato de Prestación de Servicios	No. 002 – SAMC – 2025
Objeto :	Prestación de servicios para la ejecución del proyecto denominado restauración, preservación y conservación del recurso hídrico de las áreas estratégicas - El Maco y Las Minas del municipio de Sucre Cauca financiado con recursos del SGR

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD UNIDAD
1	ESTUFA ECOEFICIENTE: Multifuncional (4 hornillas + horno + asador). - Estructura resistente (material utilizado para alta resistencia y larga duración) • Accesorios y herrajes desmontables (permiten un mejor mantenimiento y cuidado a la estufa). Transportable (el modelo permite que el usuario pueda utilizarla en cualquier lugar, es decir, no queda sujeta o instalada en un solo lugar).•Modelo: ErgoNatura • Pintura: Martillada color gris acorazado • Cuerpo de la estufa: Elaborado en lámina Cold Rolled calibre 16 (1.4 mm), Pared frontal lamina HR (2.5mm). • Dimensiones: ancho 90 cm, alto 85 cm, fondo 60 cm, buitron 2,44 m • Acabado: gris acorazado, azul, • 4 hornillas. • Horno (25 ancho x 30 alto x 40 fondo) • Parrilla asadora (20 ancho x 35 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable	UNA ESTUFA ECOEFICIENTE A BASE DE LEÑA

Quien Entrega:	Quien recibe:	
Vanessa Johanna Sánchez Ruiz Cc: 34639432 Bolívar Cauca R.L FUNPRODESA	German Mamian Jiménez CC. 1.059.900.996 Vereda El Fresno	HUELLA

DESTINO FINA: *Pequeños productores que preparan los alimentos a base de leña, ubicados cerca a los predios de El Maco y Las Minas de propiedad del Municipio de Sucre Cauca*

14
251

	MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA **FUNPRODESA** **ACTA DE ENTREGA** **DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A BASE DE LEÑA**	

Fecha:	14 DE ABRIL DE 2026
Nombre del Contratante	Municipio de Sucre Departamento del Cauca
Contratista:	FUNDACION PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO "FUNPRODESA" NIT 900.373.700-2 R.P VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ, Cc 34639432 Bolivar Cauca
Contrato de Prestación de Servicios	No. 002 – SAMC – 2025
Objeto :	Prestación de servicios para la ejecución del proyecto denominado restauración, preservación y conservación del recurso hídrico de las áreas estratégicas - El Maco y Las Minas del municipio de Sucre Cauca financiado con recursos del SGR

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD UNIDAD
1	ESTUFA ECOEFICIENTE: Multifuncional (4 hornillas + horno + asador). - Estructura resistente (material utilizado para alta resistencia y larga duración) • Accesorios y herrajes desmontables (permiten un mejor mantenimiento y cuidado a la estufa). Transportable (el modelo permite que el usuario pueda utilizarla en cualquier lugar, es decir, no queda sujeta o instalada en un solo lugar).•Modelo: ErgoNatura • Pintura: Martillada color gris acorazado • Cuerpo de la estufa: Elaborado en lámina Cold Rolled calibre 16 (1.4 mm), Pared frontal lamina HR (2.5mm). • Dimensiones: ancho 90 cm, alto 85 cm, fondo 60 cm, buitron 2,44 m • Acabado: gris acorazado, azul, • 4 hornillas. • Horno (25 ancho x 30 alto x 40 fondo) • Parrilla asadora (20 ancho x 35 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable	UNA ESTUFA ECOEFICIENTE A BASE DE LEÑA

Quien Entrega:	Quien recibe:	
	Luceli Fernandez Rengifo	
Vanessa Johanna Sánchez Ruiz Cc: 34639432 Bolívar Cauca R.L FUNPRODESA	Luceli Fernández Rengifo CC. 48649165 Vereda Salvavidas	HUELLA

DESTINO FINA: *Pequeños productores que preparan los alimentos a base de leña, ubicados cerca a los predios de El Maco y Las Minas de propiedad del Municipio de Sucre Cauca*

MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

ACTA DE ENTREGA
DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A BASE DE LEÑA

Fecha:	14 DE ABRIL DE 2026
Nombre del Contratante	Municipio de Sucre Departamento del Cauca
Contratista:	FUNDACION PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO "FUNPRODESA" NIT 900.373.700-2 R.P VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ, Cc 34639432 Bolivar Cauca
Contrato de Prestación de Servicios	No. 002 – SAMC – 2025
Objeto :	Prestación de servicios para la ejecución del proyecto denominado restauración, preservación y conservación del recurso hídrico de las áreas estratégicas - El Maco y Las Minas del municipio de Sucre Cauca financiado con recursos del SGR

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD UNIDAD
1	ESTUFA ECOEFICIENTE: Multifuncional (4 hornillas + horno + asador). - Estructura resistente (material utilizado para alta resistencia y larga duración) • Accesorios y herrajes desmontables (permiten un mejor mantenimiento y cuidado a la estufa). Transportable (el modelo permite que el usuario pueda utilizarla en cualquier lugar, es decir, no queda sujeta o instalada en un solo lugar).•Modelo: ErgoNatura • Pintura: Martillada color gris acorazado • Cuerpo de la estufa: Elaborado en lámina Cold Rolled calibre 16 (1.4 mm), Pared frontal lamina HR (2.5mm). • Dimensiones: ancho 90 cm, alto 85 cm, fondo 60 cm, buitron 2,44 m • Acabado: gris acorazado, azul, • 4 hornillas. • Horno (25 ancho x 30 alto x 40 fondo) • Parrilla asadora (20 ancho x 35 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable	UNA ESTUFA ECOEFICIENTE A BASE DE LEÑA

Quien Entrega:	Quien recibe:	
		HUELLA
Vanessa Johanna Sánchez Ruiz Cc: 34639432 Bolívar Cauca R.L FUNPRODESA	María Leonila Rengifo CC. 25325205 Vereda Salvavidas	

DESTINO FINA: *Pequeños productores que preparan los alimentos a base de leña, ubicados cerca a los predios de El Maco y Las Minas de propiedad del Municipio de Sucre Cauca*

MUNICIPIO DE SUCRE	**MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA** **FUNPRODESA** **ACTA DE ENTREGA** **DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A BASE DE LEÑA**	funprodesa Fundación para el Progreso y Desarrollo

Fecha:	14 DE ABRIL DE 2026
Nombre del Contratante	Municipio de Sucre Departamento del Cauca
Contratista:	FUNDACION PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO "FUNPRODESA" NIT 900.373.700-2 R.P VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ, Cc 34639432 Bolivar Cauca
Contrato de Prestación de Servicios	No. 002 – SAMC – 2025
Objeto :	Prestación de servicios para la ejecución del proyecto denominado restauración, preservación y conservación del recurso hídrico de las áreas estratégicas - El Maco y Las Minas del municipio de Sucre Cauca financiado con recursos del SGR

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD UNIDAD
1	ESTUFA ECOEFICIENTE: Multifuncional (4 hornillas + horno + asador). - Estructura resistente (material utilizado para alta resistencia y larga duración) • Accesorios y herrajes desmontables (permiten un mejor mantenimiento y cuidado a la estufa). Transportable (el modelo permite que el usuario pueda utilizarla en cualquier lugar, es decir, no queda sujeta o instalada en un solo lugar).•Modelo: ErgoNatura • Pintura: Martillada color gris acorazado • Cuerpo de la estufa: Elaborado en lámina Cold Rolled calibre 16 (1.4 mm), Pared frontal lamina HR (2.5mm). • Dimensiones: ancho 90 cm, alto 85 cm, fondo 60 cm, buitron 2,44 m • Acabado: gris acorazado, azul, • 4 hornillas. • Horno (25 ancho x 30 alto x 40 fondo) • Parrilla asadora (20 ancho x 35 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable	UNA ESTUFA ECOEFICIENTE A BASE DE LEÑA

Quien Entrega:	Quien recibe:	
	Olga Salazar Quijano	
Vanessa Johanna Sánchez Ruiz Cc: 34639432 Bolívar Cauca R.L FUNPRODESA	Olga Salazar Quijano CC. 34370105 Vereda El Fresno	HUELLA

DESTINO FINA: *Pequeños productores que preparan los alimentos a base de leña, ubicados cerca a los predios de El Maco y Las Minas de propiedad del Municipio de Sucre Cauca*

754

MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

ACTA DE ENTREGA
DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A BASE DE LEÑA

Fecha:	14 DE ABRIL DE 2026
Nombre del Contratante	Municipio de Sucre Departamento del Cauca
Contratista:	FUNDACION PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO "FUNPRODESA" NIT 900.373.700-2 R.P VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ, Cc 34639432 Bolivar Cauca
Contrato de Prestación de Servicios	No. 002 – SAMC – 2025
Objeto :	Prestación de servicios para la ejecución del proyecto denominado restauración, preservación y conservación del recurso hídrico de las áreas estratégicas - El Maco y Las Minas del municipio de Sucre Cauca financiado con recursos del SGR

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD UNIDAD
1	ESTUFA ECOEFICIENTE: Multifuncional (4 hornillas + horno + asador). - Estructura resistente (material utilizado para alta resistencia y larga duración) • Accesorios y herrajes desmontables (permiten un mejor mantenimiento y cuidado a la estufa). Transportable (el modelo permite que el usuario pueda utilizarla en cualquier lugar, es decir, no queda sujeta o instalada en un solo lugar).•Modelo: ErgoNatura • Pintura: Martillada color gris acorazado • Cuerpo de la estufa: Elaborado en lámina Cold Rolled calibre 16 (1.4 mm), Pared frontal lamina HR (2.5mm). • Dimensiones: ancho 90 cm, alto 85 cm, fondo 60 cm, buitron 2,44 m • Acabado: gris acorazado, azul, • 4 hornillas. • Horno (25 ancho x 30 alto x 40 fondo) • Parrilla asadora (20 ancho x 35 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable	UNA ESTUFA ECOEFICIENTE A BASE DE LEÑA

Quien Entrega:	Quien recibe:	
Vanessa Johanna Sánchez Ruiz Cc: 34639432 Bolívar Cauca R.L FUNPRODESA	Alirio Gironza Marian CC. 76308220 Vereda Salvavidas	HUELLA

DESTINO FINA: *Pequeños productores que preparan los alimentos a base de leña, ubicados cerca a los predios de El Maco y Las Minas de propiedad del Municipio de Sucre Cauca*

MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

ACTA DE ENTREGA
DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A BASE DE LEÑA

Fecha:	14 DE ABRIL DE 2026
Nombre del Contratante	Municipio de Sucre Departamento del Cauca
Contratista:	FUNDACION PARA EL PROGRESO Y DESARROLLO "FUNPRODESA" NIT 900.373.700-2 R.P VANESSA JOHANNA SANCHEZ RUIZ, Cc 34639432 Bolivar Cauca
Contrato de Prestación de Servicios	No. 002 – SAMC – 2025
Objeto :	Prestación de servicios para la ejecución del proyecto denominado restauración, preservación y conservación del recurso hídrico de las áreas estratégicas - El Maco y Las Minas del municipio de Sucre Cauca financiado con recursos del SGR

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD UNIDAD
1	ESTUFA ECOEFICIENTE: Multifuncional (4 hornillas + horno + asador). - Estructura resistente (material utilizado para alta resistencia y larga duración) • Accesorios y herrajes desmontables (permiten un mejor mantenimiento y cuidado a la estufa). Transportable (el modelo permite que el usuario pueda utilizarla en cualquier lugar, es decir, no queda sujeta o instalada en un solo lugar).•Modelo: ErgoNatura • Pintura: Martillada color gris acorazado • Cuerpo de la estufa: Elaborado en lámina Cold Rolled calibre 16 (1.4 mm), Pared frontal lamina HR (2.5mm). • Dimensiones: ancho 90 cm, alto 85 cm, fondo 60 cm, buitron 2,44 m • Acabado: gris acorazado, azul, • 4 hornillas. • Horno (25 ancho x 30 alto x 40 fondo) • Parrilla asadora (20 ancho x 35 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable	UNA ESTUFA ECOEFICIENTE A BASE DE LEÑA

Quien Entrega:	Quien recibe:	
	Fernando Gómez	
Vanessa Johanna Sánchez Ruiz Cc: 34639432 Bolívar Cauca R.L FUNPRODESA	Fernando Gómez Díaz CC. 10696793 Vereda Salvavidas	HUELLA

DESTINO FINA: *Pequeños productores que preparan los alimentos a base de leña, ubicados cerca a los predios de El Maco y Las Minas de propiedad del Municipio de Sucre Cauca*

LISTADO DE ASISTENCIA
MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

FECHA: 15 de abril de 2026 Responsable: Equipo técnico FUNPRODESA
EVENTO: Reunion con comunidad para entrega de estufas ecoeficientes a base de leña en la vereda el fresno sucre Cauca.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	VEREDA	TELÉFONO	FIRMA
01	Alivio Hernandez Jimenes	10691550	El fresno		Alivio Hernandez
02	Pastora luna	25587568	El fresno		Pastora Luna
03	Angela luna gomez	3470097	El fresno	3122627773	Angela Luna Gomez
04	Juliana gomez	1002867292	El fresno		Juliana Gomez
05	Doralba Rodrigues	59830278	El fresno	3212062759	Doralba Rodriguez
06	Delfin anacona	10690077	El fresno	3215952598	
07	Delfin anacona	10690077	El fresno	3215952598	Delfin Anacona
08	Antonino magin	10698295	El fresno	3128737294	Antonino Magin
09	Audelia moncayo	34370768	El fresno	3143707681	Audelia Moncayo
10	Doriani Gomez castillo	1144525050	El fresno	3128637294	Doriani Gomez
11	Jhonibel Mamian	10697483	El fresno	3145304475	Jhonibel Mamian A.
12	Hecta Mery Luna	25588773	El fresno	3106452132	Hecta Mery Luna
13	Segundo Peregrino Gomez	10345716	El fresno	3106452132	S. Peregrino Gomez
14	Mileidy Barbano pino	1.061.764.685	El Paraiso	3112266527	Mileidy Barbano pino
15	Sebastian Muñoz	1061746341	sucre	3167952273	Sebastian Muñoz

*INCLUYE: capacitación, lugar, refrigerio, papeleria para el taller - capacitación

LISTADO DE ASISTENCIA
MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

FECHA: 15 de abril de 2026 Responsable: Equipo técnico de FUNPRODESA
EVENTO: Reunion con comunidad para entrega de estufas ecoeficiente a base de leña en la Vereda el Fresno Sucre Cauca.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	VEREDA	TELÉFONO	FIRMA
16	Arnulfo Gomez luna	76276460	El fresno		Arnulfo Gomez luna
17	Eulalia luna Gomez	34370072	El fresno	3125501155	Eulalia Luna Gomez
18	Laura Isabella Gomez M	1144524675	El fresno	3122514374	Laura Isabella Gome
19	Nicole Victoria Gomez M	1144324392	El fresno		Nicole Victoria Gomez
20	Victor Hugo Gomez R	76327492	El fresno	3122514374	
21	Ana Rita Ruiz Quiroz	25325094	El fresno		Ana Rita Ruiz
22	Martha Isabel Gomez	34673919	El fresno	3217460286	Martha Isabel
23	Catalina Luna	25587896	El fresno		Catalina Luna
24	German Mamian	1.059900996	El fresno	3117979013	German Mamian
25	leonila Palechor	1131024001	El fresno		Leonila Palechor
26	Maria Consuelo Mamian	25599996	El fresno	3126819187	Mª Consuelo Mamian

* Incluye: Capacitacion, lugar, refrigerio, papeleria para el taller- capacitación

ANEXO

Plan de Capacitaciones
y contenido de las capacitaciones

759.

ANEXO
PLAN DE CAPACITACION PROPUESTO Y EJECUTADO

PLAN DE CAPACITACIÓN PROPUESTO EN PROYECTO			
ÍTEM	TEMA	DESCRIPCIÓN	CANT.
2,2,1	GENERALIDADES AMBIENTALES	RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y NO RENOVABLES	3
2,2,2	GENERALIDADES AMBIENTALES	CALENTAMIENTO GLOBAL Y CAMBIO CLIMÁTICO	3
2,2,3	GENERALIDADES AMBIENTALES	NORMATIVIDAD AMBIENTAL SOBRE RECURSOS NATURALES	3
2,2,4	RECURSOS HÍDRICOS	MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, NORMATIVIDAD, TRAMITES DE CONCESIONES AMBIENTES	3
2,2,5	FLORA Y FAUNA	NORMATIVIDAD, TRAMITES, PROHIBICIONES, GENERALIDADES	3
1,2,6	RESIDUOS SOLIDOS Y LÍQUIDOS	NORMATIVIDAD, MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LÍQUIDOS	3
2,2,7	SUCRE AMBIENTAL	GENERALIDADES DEL MUNICIPIO, RECURSOS NATURALES DE SUCRE, ZONAS DE INTERÉS AMBIENTAL Y TURÍSTICAS	3
1,2,7	ENERGIAS ALTERNATIVAS Y RENOVABLES	ENERGIA SOLAR ENERGIA EOLICA ENERGIA HIDRICA	3
	SUMATORIA		**24**
DURACION DE CADA TALLER: DE 2 HORAS (depende de la dinámica de los participantes) No incluye el tiempo de refrigerio			

PLAN DE CAPACITACIONES CONCERTADAS CON LA COMUNIDAD		
No.	**CAPACITACIONES**	FECHA
1	Generalidades Del Municipio, Recursos Naturales De Sucre	19-dic
2	Calentamiento Global Y Cambio Climático	20-dic
3	Zonas De Interés Ambiental Y Turísticas de Sucre Cauca	26-dic
4	Recursos Naturales Renovables Y No Renovables	27-dic
5	Manejo de los recursos hídricos	28-dic
6	Normatividad Ambiental Sobre Recursos Naturales,	4-ene
7	Normatividad, Tramites De Concesiones Ambientes,	5-ene
8	Normatividad, Tramites, Prohibiciones, Generalidades ambientales	7-ene
9	Manejo Integral De Residuos Sólidos Y Líquidos,	11-ene
10	El Recurso hídrico como fuente de vida para los seres vivos	16-ene
11	El agua en la economía familiar	18-ene
12	Perdida de los recursos hídricos por efectos antrópicos	22-ene
13	Ciclo hidrológico	25-ene
14	Cuidados del recurso hídrico y del Medio ambiente	1 de febrero
15	El agua y la correlación con la comunidad	2 de febrero
16	Medición de caudales y contaminantes - Principales fuentes hídricas de Sucre Cauca	8 de febrero
17	El Medio ambiente y sus componentes	15 de febrero
18	Procesos de conservación del recurso hídrico	17 de febrero

PLAN DE CAPACITACIONES CONCERTADAS CON LA COMUNIDAD		
No.	**CAPACITACIONES**	FECHA
19	Recursos hídricos, aire y el suelo como fuente de vida	20 de febrero
20	Preservación y conservación de flora y fauna convivencia y territorio	22 de febrero
21	Buenas practicas ambientales	6 DE MARZO
22	Energías Alternativas Y Renovables (Energía Solar)	8 DE MARZO
23	Energías Alternativas Y Renovables (Energía Eólica)	14 DE MARZO
24	Energías Alternativas Y Renovables (Energía Hídrica.)	21 DE MARZO

ANEXOS MAGNÉTICOS DE LAS PRESENTACIONES

Nombre

- T21 Soberanía y seguridad alimentaria Una alimentación sana y saludable
- T21 BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES MINISTERIO
- T21 BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES CARTILLA CRC
- T22 Impulsando el Futuro Energético Sostenible en Colombia
- T23 -ENERGIA EOLICA ..CUENTAS
- T23 EOLICA PROCESOS
- T23 EOLICA
- T24 ENERGIA HIDRAULICA

TEMAS DE LAS CAPACITACIONES

CAPACITACIÓN 1. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO, RECURSOS NATURALES DE SUCRE1
✓ Ubicación del Municipio de Sucre en el planeta ✓ División política del Municipio de Sucre Cauca ✓ Recursos Naturales Municipio De Sucre Cauca ✓ Ecología Y Medio Ambiente De Sucre ✓ Estructura Y Cobertura De La Vegetación ✓ Fauna Y Flora ✓ Descripción De Propiedades Ambientales Del Municipio ✓ Descripción De Fuentes Abastecedoras ✓ Recursos Hídricos De Sucre

CAPACITACIÓN 2. ZONAS DE INTERÉS AMBIENTAL Y TURÍSTICAS DE SUCRE CAUCA
✓ Áreas De Interés Ambiental De Sucre ✓ Clases de turismo ✓ Tipos de turismo en Sucre ✓ Sitios turísticos en Sucre Cauca ✓ Valor del turismo ✓ Rutas turísticas ✓ Turismo social, turismo para niños ✓ Proyección del turismo en Sucre Cauca
CAPACITACIÓN 3. RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y NO RENOVABLES
✓ Concepto de renovables y no renovables ✓ Energía ✓ Manifestaciones de la energía ✓ Recursos energéticos ✓ Recurso renovable: El Sol ✓ Recursos energéticos no renovables ✓ Usos energía renovable y no renovable ✓ Industrialización ✓ Contaminación ✓ Tratamientos y manejo
CAPACITACIÓN 4. CALENTAMIENTO GLOBAL Y CAMBIO CLIMÁTICO
✓ Concepto cambio climático ✓ Efectos del cambio climático ✓ Causas del cambio climático ✓ El sistema climático ✓ las fuerzas externas que regulan el clima ✓ El estudio del clima ✓ Historia del clima en la tierra
CAPACITACIÓN 5. MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
✓ El agua y su ciclo vital ✓ Importancia del agua en la vida ✓ Fuentes del recurso hídrico ✓ Principales Fuentes hídricas de Sucre Cauca ✓ Usos del agua ✓ Manejo y cuidado del agua ✓ Perdida de la calidad del agua ✓ Valor del agua

CAPACITACION 6: Normatividad Ambiental Sobre Recursos Naturales
✓ la legislación ambiental y la rentabilidad organizacional a partir de las exenciones tributarias. ✓ constitución nacional de 1991 ✓ ley 99 de 1993. ley del medio ambiente ✓ decreto ley 2811 de 1974 . c.n.r.n.r ✓ ley 23 de 1973 ✓ El sina (sistema nacional ambiental) ✓ Competencias en materia ambiental ✓ Recurso hídrico normatividad
CAPACITACION 7: Normatividad, Tramites De Concesiones Ambientes,
✓ Concesión de aguas superficiales o subterráneas en la CRC ✓ Que es la concesión de aguas ✓ ¿Cuánto se paga por una concesión? ✓ ¿Quien puede recibir una concesión de agua? ✓ pasos clave para el trámite en la CRC ✓ Documentación requerida ✓ Pasos del proceso
CAPACITACION 8: Normatividad, Tramites, Prohibiciones, Generalidades ambientales
✓ Marco legal ambiental en Colombia ✓ Legislación ambiental colombiana ✓ Normas administrativas ✓ Normas penales ✓ Normas civiles y especiales ✓ Ministerio del medio ambiente (ley 99 de 1993) ✓ Conformación del sistema nacional ambiental ✓ Corporaciones autónomas regionales ✓ Licencias ambientales ✓ Historia normas generales
CAPACITACION 9: Manejo Integral De Residuos Sólidos Y Líquidos,
✓ Manejo integral de residuos sólidos y líquidos "un estado armónico entre el hombre y el medio ambiente" ✓ Definición de residuos solidos ✓ Tipo de residuos solidos ✓ Fuentes de residuos solidos ✓ Contaminación ✓ Manejo y aprovechamiento de residuos solidos ✓ Importancia de los residuos ✓ Afectación por residuos solidos ✓ Los residuos sólidos en la ciudad y el campo

- ✓ Influencia de los residuos sólidos en la vida del hombre

CAPACITACION 10: El Recurso hídrico como fuente de vida para los seres vivos

- ✓ El agua y su ciclo vital
- ✓ Importancia del agua en la vida
- ✓ Fuentes del recurso hídrico
- ✓ Principales Fuentes hídricas de Sucre Cauca
- ✓ Usos del agua
- ✓ Manejo y cuidado del agua
- ✓ Perdida de la calidad del agua
- ✓ Valor del agua

CAPACITACION 11: El agua en la economía familiar

- ✓ Valor del agua
- ✓ Importancia del agua en la familia
- ✓ Distribución del agua en la sociedad
- ✓ Control territorial del agua
- ✓ Precios y medidas del agua
- ✓ Futuro económico por el agua

CAPACITACION 12: Perdida de los recursos hídricos por efectos antrópicos

- ✓ Conceptos sobre efectos de perdida de agua
- ✓ Principales efectos antropicos para el agua
- ✓ Consumo e industria del agua
- ✓ Guerra por el agua
- ✓ El agua como fuente de vida

CAPACITACION 13: Ciclo hidrológico

- ✓ ¿Qué es el agua?
- ✓ Propiedades físicas del agua
- ✓ Distribución del agua en el planeta
- ✓ Uso racional del agua
- ✓ Arbol de problemas del agua
- ✓ Concepto de ciclo hidrológico
- ✓ Efectos sobre el ciclo hidrológico
- ✓ importancia del ciclo hidrológico

CAPACITACION 14: Cuidados del recurso hídrico y del Medio ambiente
✓ Conceptos ✓ Acciones para Cuidar el Agua en el Hogar ✓ Protección del Medio Ambiente ✓ Buenas practicas ambientales ✓ Tome medidas cotidianas ✓ 11 medidas para ahorrar agua ✓ Beneficios de ahorrar agua para el medio ambiente
CAPACITACION 15: El agua y la correlación con la comunidad
✓ Relación agua y comunidad ✓ ¿La vida sin agua es posible? ✓ Contaminación por la comunidad ✓ Correlación el agua y el ser humano ✓ Funciones Clave en el Cuerpo Humano ✓ Consumo y Salud ✓ Importancia Socio-Ecológica ✓ Composición por Etapas de Vida ✓ Funciones Vitales
CAPACITACION 16: Medición de caudales y contaminantes - Principales fuentes hídricas de Sucre Cauca
✓ Metodología para la estimación y evaluación del caudal ambiental en proyectos que requieren licencia ambiental ✓ Aplicabilidad de la metodología ✓ Criterios y lineamientos ✓ Criterios ecológicos ✓ Metodología ✓ Lineamientos de la propuesta metodológica ✓ Evaluación del impacto en la calidad del agua y el factor de asimilación breviaturas, notaciones, siglas y acrónimos ✓ Evaluación de usos actuales y prospectivos del agua y articulación con instrumentos de planificación ✓ Caracterización hidráulica y de calidad del agua a escala de tramo
CAPACITACION 17: Procesos de conservación del recurso hídrico
✓ Metodología para el manejo del recurso hídrico ✓ Justificación de la iniciativa. ✓ Parámetros de focalización para la selección de área geográfica ✓ Generalidades: Geografía y condiciones socioculturales ✓ Contexto general: Características socioculturales y económicas de la zona

- ✓ Condiciones Hidrológicas del Departamento
- ✓ Actores del sector agua potable y saneamiento
- ✓ El agua y sus usos
- ✓ Agua, Saneamiento y los ODS
- ✓ Agua, Energía y los ODS
- ✓ Sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento
- ✓ Economía circular del agua
- ✓ Eficiencia Energética

CAPACITACION 18: El Medio ambiente y sus componentes

- ✓ Concepto de medio ambiente
- ✓ Componentes ambientales
- ✓ Manifestación de la humanidad
- ✓ Preocupación ambiental
- ✓ Consecuencias de la revolución industrial
- ✓ Desarrollo sustentable
- ✓ Sustentabilidad
- ✓ Características de los problemas medioambientales
- ✓ Grandes temas ambientales
- ✓ Soluciones y cuidados del medio ambiente
- ✓ Los colores del reciclaje
- ✓ La importancia del Medio ambiente

CAPACITACION 19: Recursos hídricos, aire y el suelo como fuente de vida

- ✓ Caso o situación problemita del aire
- ✓ El aire
- ✓ Lai influencia de los seres vivos, el agua, el aire y el suelo
- ✓ El agua
- ✓ Osmosis
- ✓ Presión osmótica
- ✓ El suelo
- ✓ El aire
- ✓ La luz
- ✓ Temperatura
- ✓ Percepción del ambiente

CAPACITACION 20: Preservación y conservación de flora y fauna convivencia y territorio

- ✓ Que es la flora y la fana
- ✓ Flora y fauna de Colombia
- ✓ Características de la fauna y flora de Colombia
- ✓ Flora de Colombia
- ✓ Fauna de Colombia

CAPACITACION 21: Buenas prácticas ambientales
✓ Ahorro en el consumo del agua ✓ Uso eficiente y ahorros del agua ✓ Generación de residuos ✓ Ahorro en el consumo de energía ✓ Limpieza ✓ Habitos de consumo ✓ Mejores prácticas ambientales ✓ Objetivos ✓ Práctica ambiental ✓ Cosecha de Agua lluvia ✓ Maquinaria solar otros ✓ Tecnología libre ✓ Acciones que reducen impactos negativos en el medio ambiente ✓ Modelos de mejores practicas
CAPACITACION 22: Energías Alternativas Y Renovables (Energía Solar)
✓ Impulsando el Futuro Energético Sostenible en Colombia ✓ Energía Solar: Aprovechando el Poder del Sol ✓ Sistemas solares fotovoltaicos, tipos, ✓ Aplicaciones, fabricación, diseño y composición ✓ Ultimas noticias ✓ Sistemas de energía solar fotovoltaica ✓ Paneles solares fotovoltaicos ✓ Tecnologías ✓ TIPOS de Celdas ✓ ¿Cual tipo de panel es mejor? ✓ Mercado global ✓ Aspectos técnicos de los paneles ✓ Sistemas solares fotovoltaicos ✓ Otras tecnologías de almacenamiento
CAPACITACION 23: Energías Alternativas Y Renovables (Energía Eólica)
✓ Energía eólica contenidos ✓ Comportamiento del recurso eólico ✓ Uso de energía eólica ✓ Ventajas y desventajas energía eólica ✓ Aerogeneradores

- ✓ El viento fuente de energía
- ✓ Molinos de viento

CAPACITACION 24: Energías Alternativas Y Renovables (Energía Hídrica.)

- ✓ Energía hidráulica
- ✓ Contenido de proceso energía hidráulica
- ✓ Ventajas de energía hidráulica
- ✓ Inconvenientes de energía hidráulica
- ✓ Potencial Hídrico
- ✓ Las hidroeléctricas, la contaminación y la Producción de electricidad
- ✓ La contaminación en el mundo, en materia de energía eléctrica
- ✓ Gases de efecto invernadero en el sector eléctrico mundial
- ✓ Producción de electricidad
- ✓ La hidroelectricidad
- ✓ Generación a base de recursos renovables en el mundo
- ✓ Generación vs contaminación
- ✓ Tecnologías de mayor contaminación en el sector eléctrico a nivel mundo
- ✓ Utilización de recursos renovables para producción de electricidad
- ✓ Conclusiones

ANEXO

Registro de asistencia a cada uno de los 04 talleres dictados

LISTADO DE ASISTENCIA
MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

FECHA: 06 Marzo de 2026 Responsable: Equipo técnico, Funprodesa
EVENTO: Capacitacion Buenas prácticas ambientales
Incluye: Capacitacion, lugar, refrigerio y papeleria para la capacitacion

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	VEREDA	TELÉFONO	FIRMA
01	Angela Luna Gomez	34370097	El Fresno	3122022113	Angela Luna Gomez
02	Juliana Gomez	1002861292	El Fresno		Juliana Gomez
03	Delfin Anacona.	10 690 017	El Fresno	3215952598	Delfin Anacona
04	Audelia Moncayo	34370168	El Fresno		Audelia Moncayo
05	Einer Andres Girionza.	1151024 173	El Fresno		
06	Doralba Rodriguez.	59830218	El Fresno		Doralba Rodriguez
07	Antonino Magin.	10698295	El Fresno	3128137294	Antonino Magin
08	Pastora Luna.	25581568	El Fresno		Pastora Luna
09	Dorani Gomez	1 144525050	El Fresno	3128637294	Dorani Gomez
10	Mileidy Burbano Pino	1061764695	El Paraiso	3112726527	Mileidy Burbano Pino
11	Alirio Hernandez	10691550	El Fresno		Alirio Hernandez
12	Hecta Mery Luña.	25588773	El Fresno	25588773	Hecta Mery Luna
13	Jhonibel Mamian A	10697423	El Fresno	3145304415	Jhonibel Mamian A.
14	Segundo Peregrino Gomez	10345116	El Fresno	3106952132	S. Peregrino Gomez
15	Sebastian Muñoz	1061746341	Sucre	3163952273	Sebastian Muñoz

765

LISTADO DE ASISTENCIA
MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

FECHA: 06 Marzo de 2026 Responsable: Equipo técnico de Funprodesa
EVENTO: Capacitación Buenas Prácticas Ambientales
Incluye: Capacitación, lugar, refrigerio y papelería para las capacitaciones

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	VEREDA	TELÉFONO	FIRMA
76	Eulalia Luna Gomez	34370072	El Fresno	3125501155	Eulalia Luna Gomez
77	Arnulfo Gomez Luna.	76216466	El Fresno		Arnulfo Gomez Luna
78	Victor Hugo Gómez Q.	76 327 442	El Fresno		
79	Laura Isabella Gómez M	1144524615	El Fresno	3122514314	Laura Isabella Gómez
80	Nicole Victoria Gómez M	1144324392.	El Fresno		Nicole Victoria Gomez
81	Anita Ruiz Bustamante	25 325 099	El Fresno		Anita Ruiz
82	Martha Isabel Gomez	34673919	El Fresno	3215476209	Martha Isabel Gomez
83	Catalina Luna	25587896	El Fresno		Catalina Luna
84	Delfin Anacona	10690017	El Fresno	3128495256.	Delfin Anacona
85	Maria Consuelo Mamian	25699996.	El Fresno	3126819187.	Mª Consuelo Mamian
86	German Mamian	705900996	El Fresno	317 7919013	German Mamian
87	Leonila Palechor.	1231024001	El Fresno	3147914700	Leonila Palechor
88	Gerardo Gomez M	76319122	El Fresno	3122913445	
89	Fernando Gomez	10 696 793	Salbavidas		Fernando Gomez

LISTADO DE ASISTENCIA
MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

FECHA: 08 de Marzo de 2026 Responsable: Equipo técnico de funprodesa
EVENTO: Energías Alternativas y Renovables (Energía solar)
Incluye: capacitación, lugar, papelería general y refrigerios

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	VEREDA	TELÉFONO	FIRMA
1	Maria Catalina Luna	25587896	fresno		Catalina Luna
2	Luis carlos Guasaquillo	1061719409	fresno	3233612345	Luis carlos Guasaquillo
3	Eulalia Luna	34370077	fresno		Eulalia luna
4	Martha Gómez	34 673 919	fresno		Martha Gomez
5	Consuelo Mamian	25594996	fresno	3136819187	Mª Consuelo Mamian
6	Dibale Luna Martinez	1078348701	Fresno	3215952598	Dibale Luna martinez
7	German Mamian Jimenez	1059900996	Fresno	3117919013	German Mamian Jimenez
8	Yulieth lopez Erazo	1089904192	Fresno	3147015827	Yulieth lopez Erazo
9	Leidy Cristina Manquillo	1002925973	Fresno	3226336416	Leidy Cristina M.
10	Delfin Anacona	10 690 017	fresno		Delfín Anacona
11	Doralba yaned Rodriguez G.	59830218	fresno	3222002159	Doralba Rodriguez
12	Jhonibel Mamian Atoy	10.697.423	Fresno		Jhonibel Mamian A.
13	Audelia Moncayo	34 370 168	fresno		AUDELIA MONCAYO
14	Hecta Mery Luna	25 588 773	fresno		Hecta Mery Luna López
15	Hilda yeannia Gómez Luna	1061771745	Fresno	3116099403	Hilda yeannia Gómez L

LISTADO DE ASISTENCIA
MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

FECHA: 08 de Marzo de 2026 Responsable: Equipo técnico de Funprodesa
EVENTO: Capacitación Energías Alternativas y Renovables (Energía Eólica y solar)
Incluye: capacitación, lugar, papelería general y refrigerios.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	VEREDA	TELÉFONO	FIRMA
16	Aleider Antonio Bravo	1.131.024.259	Fresno	3108487890	Aleider Antonio Bravo
17	Denir Amparo Salazar	34 316 772	Carmelo	3234404852	Denir A Salazar
18	Fernando Gomez	10696793	Salvavidas	3234404852	Fernando Gomez
19	Alirio Gironza Mamian	76308 220	Salvavidas	3222785393	
20	Gerardo Gomez	76319 122	Sucre	3122913445	

768

365 23

LISTADO DE ASISTENCIA
MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

FECHA: 14 de marzo de 2026 Responsable: Equipo técnico de funprodesa
EVENTO: Capacitación Energías alternativas y Renovables (Energía eólica)
Incluye: capacitación, lugar, papelería para el taller y refrigerios

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	VEREDA	TELÉFONO	FIRMA
1	Audelia Monca	34370072.	Fresno	3143701681.	Audelia Monca
2	Elner Andres Gironza.	1131024173	Fresno	—	
3	Pastora Luna.	25581568	Fresno	—	Pastora Luna
4	Angela Luna. Gomez	34370097	Fresno	3122622113	Angela Luna Gomez
5	Juliana Gomez	1002861292	Fresno	—	Juliana Gomez
6	Doralba Rodriguez	59830218	Fresno	3212002159	Doralba Rodriguez
7	Antonino Magin.	10698295.	Fresno	3128137294	Antonino Magin
8	Alirio Hernandez	10691550	Fresno	—	Alirio Hernandez
9	Sebastian Muñoz	1061746341	Sumc	3163957773	Sebastian Muñoz
10	Dorani Gomez	1144525050	Fresno	—	Dorani Gomez
11	Jhonibel Mamian.	10697423	Fresno	3145304415	Jhonibel Mamián A.
12	Segundo Peregrino	10345116.	Fresno	3145304455	
13	Delfin Anacona.	10690017	Fresno	3215952598	Delfin Anacona
14	Hecta Mery Luna.	25588773	Fresno	—	Hecta Mery Luna L
15	Magaly Caicedo Ortiz	1144 525 157	Fresno	3183664249.	

369

LISTADO DE ASISTENCIA
MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

FECHA: 14 de Marzo de 2025 Responsable: Equipo técnico de Funprodesa
EVENTO: capacitacion Energias Alternativas y renovables (energia eolica) Incluye: capacitacion, lugar, papeleria para el taller, y refrigerios

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	VEREDA	TELÉFONO	FIRMA
16	Angie lorena Anacona	1144525755	Fresno	3205776002	Angie lorena Anacona
17	Catalina Luna	25318131	el fresno	—	Catalina Luna
18	Maria Consuelo Mamian	25599996	Fresno	3126819187	Mª Consuelo Mamian
19	YELENA Sofia Ruiz M	1144524880	Fresno	3215140774	YELENA SOFIA RUIZ
20	Germán Mamian	7059400996	Fresno	3117979073	Germán Mamian
21	Dorita Ruiz Bubano	25325044	el fresno	—	Dora Yanito Ruiz R
22	Laura Isabella Gomez	1144524392	el fresno	—	Laura Isabella Gomez
23	Nicole victoria Gomez	1144524312	el fresno	—	Nicole Victoria Gomez
24	Alirio Gironza Mamian	76308220	Salvaviday	3227785393	
25	Gerardo Gomez	7631912	Salvavida	3122913445	
26	Alirio Gironza Mamian	76308220	Salvaviday	3227785393	

LISTADO DE ASISTENCIA
MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

FECHA: 21 de Marzo de 2026 Responsable: EQUIPO TÉCNICO DE FUNPRODESA
EVENTO: CAPACITACION ENERGIAS ALTERNATIVAS Y RENOVABLES (ENERGIA HIDRICA)
INCLUYE: CAPACITACION, LUGAR, PAPELERIA GENERAL Y REFRIGERIOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	VEREDA	TELÉFONO	FIRMA
1	Einer Andres Gironza.	1131024173	El Fresno		
2	Alirio Hernandez Jimenez	10691550	El Fresno		Alirio Hernandez
3	Antonino Magin.	10698295	El Fresno	3128137294	Antonino Magin
4	Pastora Luna	25581568	El Fresno		Pastora Luna
5	Magaly Caicedo Ortiz	1144525157	El Fresno	3183664249.	Magaly Caicedo Ortiz
6	Jhonibel Mamian	10697423	El Fresno	3145304415	jhonibel Mamian A.
7	Dorani Gomez Castillo	1144525050	El Fresno	3128637294	Dorani Gomez
8	Adelio Moncayo	34370168	El Fresno	3143701681.	Adeli MNCAYOM
9	Sebastian Luna	1061746341	SUCRE	3163952273	Sebastian Luna
10	Segundo Peregrino Gomez	10345716	El Fresno	3106452132	
11	Doralba Rodriguez	59830218	El Fresno	3212002159	Doralba Rodriguez
12	Gerardo Gomez M	76314122	Sucre	3122913445	Gerardo Gómez
13	Delfin Anacona	10690017	El Fresno	3215952598	Delfin Anacona
14	Hecta Mery Luna	25588773	El Fresno	3106452132.	Hecta Mery Luna J.
15	Mileidy Burbano Pino	1.061.764.685	El Paraiso	3112266527	Mileidy Burbano Pino

LISTADO DE ASISTENCIA
MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA
FUNPRODESA

FECHA: 21 DE MARZO DE 2026 Responsable: EQUIPO TÉCNICO DE FUNPRODESA
EVENTO: CAPACITACION ENERGIAS ALTERNATIVAS Y RENOVABLES (ENERGIA HIBRIDA) INCLUYE: LUGAR, CAPACITACION, PAPELERIA GENERAL Y REFRIGERIOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	VEREDA	TELÉFONO	FIRMA
16	Victor Hugo Gómez Ruiz	76322492	El Fresno	3122514394	
17	Anita Ruiz Suarez	25325 094	El Fresno		Ana Maria Ruiz
18	Nicole Victoria Gómez	1144324392	El Fresno		Nicole Victoria Gómez
19	Arnulfo Gomez Luna	76216460	El Fresno		Arnulfo Gomez Luna
20	Eulalia Luna Gomez	34370072	El Fresno	3125501155	Eulalia Luna Gomez
21	Laura Isabella Gómez	1144524615	El Fresno	3122514314	Laura Isabella Gomez
22	Martha Isabel Gomez.	34673919	El Fresno	3217406280	Martha Isabel Gomez.
23	Catalina Luna	25 587 896	El Fresno		Catalina Luna
24	Maria Consuelo Mamian	25599996	El Fresno	3126819[illegible]	Mª Consuelo Mamian
25	German Mamian	1059900996	El Fresno	3117979613	German Mamian
26	Leonila Palechor.	1731021001	El Fresno	3147914720	Leonila Palechor
27	Alirio Gironza Mamian	76308220	Saludvidas	3222785393	

ANEXO

Fichas de seguimiento Técnico de diversos procesos a beneficiarios de hornillas ecoeficientes a base de leña y a predios intervenidos

MUNICIPIO DE SUCRE	**MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA** **FUNPRODESA** PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa Fundación para el Progreso y Desarrollo

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 31 | Marzo | 2026 (31-03-2026)
HORA DE INICIO: 7:20 A.M HORA FINAL: 1:00 . P.m

DATOS GENERALES

PROYECTO: Contrato 002 - SAMC - 2025
UBICACIÓN: Nombre del sitio Mazamorras Coordenadas
msnm Vereda Mazamorras Corregimiento Sucre Municipio Sucre

PERSONA DE CONTACTO: Lucely Fernandez Teléfono: 3116240235

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA: Apoyo para la revisión de vivienda de la beneficiaria

SITUACION ENCONTRADA:
La beneficiaria ha realizado la adecuación del sitio para la instalación de la estufa eficiente a base de leña.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
- Nivelar un poco mas el sitio para la instalación de la estufa
- Participar en las capacitaciones y reuniones del proyecto.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
Al 15 de Abril contar con todo ya Preparado para la instalación de la estufa.

FIRMAS

Ana Leby Gómez. TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	Luceli Fernandez USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

370

MUNICIPIO DE SUCRE	**MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA** **FUNPRODESA** PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 7/04/2026

HORA DE INICIO: 7:10 A.M HORA FINAL: 10:30 A.M

DATOS GENERALES

PROYECTO: contrato 002- SAMC - 2025

UBICACIÓN: Nombre del sitio _____ Coordenadas _____

msnm _____ Vereda _____ Corregimiento _____ Municipio _____

PERSONA DE CONTACTO: Leonila Palechor Teléfono: 3147914700

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA:

Apoyo y acompañamiento en revisión de vivienda de la beneficiaria

SITUACION ENCONTRADA:

La beneficiaria tiene pendiente la nivelación del espacio para la instalación de la estufa ecoeficiente a base de leña.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Realizar el proceso de nivelación del terreno para la instalación de la estufa

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Al 15 de abril tener el terreno listo para la instalación de la estufa ecoeficiente

FIRMAS

Ana Isabel Gómez. TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	Leonila palechor USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

MUNICIPIO DE SUCRE	MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA FUNPRODESA PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 6 - Abril | 2026
HORA DE INICIO: 8:10 A.M HORA FINAL: 9:45 A.M

DATOS GENERALES

PROYECTO: Contrato 002 - SAMC - 2025
UBICACIÓN: Nombre del sitio El Fresno Coordenadas _____
msnm _____ Vereda El Fresno Corregimiento El paraiso Municipio Sucre

PERSONA DE CONTACTO: Martha Isabel Gómez Teléfono: 3136508026

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA:
Apoyo y revisión de vivienda de la beneficiaria

SITUACION ENCONTRADA:
Cuenta con el espacio adecuado y nivelado para la instalación de la estufa eco eficiente a base de leña.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
- Mejorar el techo para evitar filtraciones de agua

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
Tener antes del 15 de abril el sitio completamente adecuado

FIRMAS

Ana Isabel Gómez TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	Martha Isabel Gomez USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

MUNICIPIO DE SUCRE	MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA FUNPRODESA PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 06 Abril 2026
HORA DE INICIO: 10:15 AM HORA FINAL: 12:20 p.m

DATOS GENERALES

PROYECTO: Contrato 002 - SAMC - 2025
UBICACIÓN: Nombre del sitio El Fresno Coordenadas _____
msnm _____ Vereda El Fresno Corregimiento El Paraiso Municipio Sucre

PERSONA DE CONTACTO: Maria Consuelo Manian Teléfono: 3238553370

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA:
Apoyo y revisión de la vivienda de la beneficiaria

SITUACION ENCONTRADA:
- Cuenta con el espacio para la instalación de la estufa eco eficiente a base de leña
- Tiene ingreso de animales domesticos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
- Realizar cerramiento para proteger la estufa ecoeficiente a instalar

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
Antes del 15 de abril haber adecuado el sitio final.

FIRMAS

Ana Isabel Gomez. TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	Mª Consuelo Manian USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

MUNICIPIO DE SUCRE	MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA FUNPRODESA PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 07 Abril 2026
HORA DE INICIO: 8:15 A.M HORA FINAL: 10:11 A.M

DATOS GENERALES

PROYECTO: Contrato 002 - SAMC - 2025
UBICACIÓN: Nombre del sitio El Fresno Coordenadas _____
msnm _____ Vereda El Fresno Corregimiento El Paraiso Municipio Sucre

PERSONA DE CONTACTO: German Manian Teléfono: 3145304415

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA:
Apoyo - Revisión de la vivienda del beneficiario

SITUACION ENCONTRADA:
Cuenta con un espacio con todas las condiciones requeridas para la instalación de la estufa ecoeficiente a base de leña

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Participar en los procesos de información, entrega e instalación de las estufas

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
Disponer de tiempo para recibir y apoyar en el transporte e instalación de la estufa.

FIRMAS

Ana Isabel Gomez. TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	German Manian USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

MUNICIPIO DE SUCRE	MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA FUNPRODESA PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 20 DE ENERO DE 2026
HORA DE INICIO: 8:25 AM HORA FINAL: 11:10 AM.

DATOS GENERALES

PROYECTO: CONTRATO 002-SOMC-2025
UBICACIÓN: Nombre del sitio salvavidas Coordenadas 2°3'03"N 76°53'57"W
msnm 1760 Vereda salvavidas Corregimiento SUCRE CAB Municipio SUCRE

PERSONA DE CONTACTO: FERNANDO GOMEZ DIAZ Teléfono: 3234404852

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA: REVISION ESTADO DE VIVIENDO DEL BENEFICIARIO

SITUACION ENCONTRADA:

- SITIO EN LA VIVIENDA DISPONIBLE Y LISTO PARA INSTALAR LA ESTUFA ECOEFICIENTE A BASE DE LEÑA
- INTERES EN EL PROYECTO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- NIVELAR UN POCO MAS EL PISO, SI ES POSIBLE CON RECURSOS PROPIOS COLOCAR PLANCHA DE CONCRETO EN EL SITIO PARA LA INSTALACION DE LA ESTUFA

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

- MEJORAR LAS CONDICIONES DEL PISO ANTES DE LA FECHA DE ENTREGA.

FIRMAS

Mayi Daniela Ruiz M. TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	Fernando Gomez USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

780

MUNICIPIO DE SUCRE	**MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA** **FUNPRODESA** PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 20 Marzo de 2025
HORA DE INICIO: 11:20 am HORA FINAL: 12:08 pm

DATOS GENERALES

PROYECTO: Contrato 002 - Samca 2025
UBICACIÓN: Nombre del sitio Los Minos Coordenadas 2°02.024N 76°54'049W
msnm 1514 Vereda Salvador Corregimiento Sucre cab Municipio Sucre

PERSONA DE CONTACTO: Alirio Gironza Hamian. Teléfono: 3227755393

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA: Revisar sitio o vivienda donde se instalara la estufa a base de leña.

SITUACION ENCONTRADA:
La vivienda cuenta con el espacio suficiente y adecuado para la instalación de la estufa ecoeficiente a base de leña.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
- Nivelar un poco mas el piso para la instalación de la estufa, si es posible hacer una base en concreto para mejor funcionalidad

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
- Adecuar el sitio final para la instalacion de la estufa ecoeficiente a base de leña

FIRMAS

Mary Daniela Ruiz M. TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

326

MUNICIPIO DE SUCRE	**MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA** **FUNPRODESA** PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa Fundación para el Progreso y Desarrollo

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 20 Marzo 2026
HORA DE INICIO: 10:15 am HORA FINAL: 12:10 pm

DATOS GENERALES

PROYECTO: Contrato 002-SDMC-2026
UBICACIÓN: Nombre del sitio El fresno Coordenadas 2°02'03"N 76°53'8"W
msnm 1680 Vereda Salvaguidas Corregimiento Suert cab Municipio Suere

PERSONA DE CONTACTO: Lucely Fernandez Rengifo Teléfono: 311 6240235

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA:
Revisión de vivienda para instalar estufa ecoeficiente a base de leña.

SITUACION ENCONTRADA:
Ha organizado el sitio para la instalación de la estufa ecoeficiente a base de leña, realizó las recomendaciones sobre nivelación y aplomado del mismo

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
- La posibilidad de realizar una plancha a base de concreto para mayor estabilidad.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
- Mejorar y participar en cada una de las actividades del proyecto

FIRMAS

Leidy Melisa Daza G. TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	Lucely Fernandez USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

MUNICIPIO DE SUCRE	**MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA** **FUNPRODESA** PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa Fundación para el Progreso y Desarrollo

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 22 Marzo 2026
HORA DE INICIO: 8:30 am HORA FINAL: 10:20 am.

DATOS GENERALES

PROYECTO: Contrato 002-SAMC-2025
UBICACIÓN: Nombre del sitio El fresno Coordenadas —
msnm — Vereda El fresno Corregimiento El Paraiso Municipio Sucre
PERSONA DE CONTACTO: Audilia Mancoyo Ijaji Teléfono: 3128499296

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA:
Visita a vivienda de Beneficiarios para revisar avances de actividades.

SITUACION ENCONTRADA:
No ha realizado las actividades de mitigación en el predio para la instalación de la estufa ecoeficiente a base de leña

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
- Organizar el piso de la cocina
- Mejorar las condiciones de techos de la cocina

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
-0 Adecuar cada uno de los sitios expresados

FIRMAS

Lédy Melisa Daza G. TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	Audilia Mancoyo USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

MUNICIPIO DE SUCRE	**MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA** **FUNPRODESA** PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa Fundación para el Progreso y Desarrollo

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 14- Abril 2026 (Catorce de abril de 2026)
HORA DE INICIO: 7:15 am HORA FINAL: 9:10 am

DATOS GENERALES

PROYECTO: Contrato
UBICACIÓN: Nombre del sitio El Fresno Coordenadas 2.05'08"N - 76°53'14"W
msnm 1670 Vereda El Fresno Corregimiento El paraiso Municipio Sucre

PERSONA DE CONTACTO: Audelia Moncayo Ijoj Teléfono: 3128499296

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA: Entrega e Instalación de Estufa Ecoeficiente a base de leña

SITUACION ENCONTRADA:
- Sitio de la vivienda adecuado.
- Se instaló la estufa con apoyo de la beneficiaria y el equipo técnico

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
- Organizar la parte del techo con mejor cobertura para evitar la entrada de animales o agua por la chimenea

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
- Adecuar zona de chimenea
- Darle uso apropiado a la estufa.

FIRMAS

TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	AUDELIA MONCAYO USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

MUNICIPIO DE SUCRE	MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA FUNPRODESA PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: (14) abril de 2026 (14/04/2026)
HORA DE INICIO: 8:10 am HORA FINAL: 9:30 a.m.

DATOS GENERALES

PROYECTO: Contrato 002 - SDRCA 2025
UBICACIÓN: Nombre del sitio Las Minas Coordenadas 2°20'24"N 76°5'54"O msnm 1514 Vereda Salvadas Corregimiento Sucre cab Municipio Sucre

PERSONA DE CONTACTO: Alirio Giraldo Mamian Teléfono: 3222785393

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA:
Entrega y puesta en funcionamiento de la estufa ecoeficiente a base de leña.

SITUACIÓN ENCONTRADA:
- Se contó con un sitio adecuado para la instalación de la estufa ecoeficiente
- Se realizó el proceso de instalación y puesta en funcionamiento

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
- Mejorar la parte de salida de la chimenea para evitar ser afectada por el agua, específicamente en la cobertura de la salida.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
→ Dark uso adecuado
→ Organizar adecuadamente el techo de la casa para evitar acceso de agua a la chimenea.

FIRMAS

TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

MUNICIPIO DE SUCRE	MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA FUNPRODESA PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 14 ABRIL DE 2026
HORA DE INICIO: 9:10 AM HORA FINAL: 10:15 AM

DATOS GENERALES

PROYECTO: CONTRATO 002 -SOMC- 2025
UBICACIÓN: Nombre del sitio SALVAVIDAS Coordenadas 2.03.03. N76°53'37W
msnm 1760 Vereda SALVAVIDAS Corregimiento SUCRE Municipio SUCRE

PERSONA DE CONTACTO: FERNANDO GOMEZ DIAZ Teléfono: 3234404852.

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA: Entrega y la instalacion de la estufa ecoeficiente a base de leña

SITUACION ENCONTRADA:
- El sitio estaba preparado adecuadamente
- se realizo el proceso de entrega e instalacion de la estufa ecoeficiente
- Se realizaron los ajustes para el buen funcionamiento.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
- Se instalo adecuadamente
- se recomendo el uso adecuado
- se dejo al 100% la entrega e instalada

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
- Darle manejo adecuado a la estufa ecoeficiente a base de leña.

FIRMAS

TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	Fernando Gomez USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

MUNICIPIO DE SUCRE	**MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA** **FUNPRODESA** PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 15 abril de 2026
HORA DE INICIO: 8:30 am HORA FINAL: 9:50 am

DATOS GENERALES

PROYECTO: Contrato 002 SOMC-2025
UBICACIÓN: Nombre del sitio El Fresno Coordenadas 2°05'17"N 76°53'17"W
msnm 1616 Vereda El Fresno Corregimiento El Danubio Municipio Sucre

PERSONA DE CONTACTO: Maria Consuelo Mamian Teléfono: 3176819187

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA:
Entrega e Instalación de estufas ecoeficientes a base de leña

SITUACION ENCONTRADA:
Se hace entrega de la estufa ecoeficiente a base de leña en la vivienda priorizada, dejándola funcional

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
- Mejorar las condiciones de los techos para evitar ingreso de animales y/o agua por la chimenea de la estufa

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
- Mejorar el techo
- Dar buen manejo adecuado a la hornilla e estufa.

FIRMAS

TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	Maria Consuelo Mamian USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

MUNICIPIO DE SUCRE	**MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA** **FUNPRODESA** PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 15. abril 2026
HORA DE INICIO: 10:10 am HORA FINAL: 11:05 am

DATOS GENERALES

PROYECTO: Contrato 002-SOMC-2025
UBICACIÓN: Nombre del sitio Fresno Bajo Coordenadas 2.65°79'122N 76°53'194W
msnm 1548 Vereda El Fresno Corregimiento El Paraiso Municipio Sucre

PERSONA DE CONTACTO: Olga Salazar Quijano Teléfono: 3133765754

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA:
Entrega e instalación de estufa ecoeficiente a base de leña

SITUACION ENCONTRADA:
La entrega se realizó en la vereda el Fresno, se llevó hasta el sitio final y se instaló con apoyo del equipo tecnico, dejando la funcional.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
- Mejorar las condiciones del piso donde se instalo la estufa
- Colocarle un protector a la chimenea para evitar ingreso de animales o agua.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
- Mejorar las condiciones del piso y cubrir la chimenea adecuadamente.

FIRMAS

TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	Olga Salazar Quijano USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

MUNICIPIO DE SUCRE	**MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA** **FUNPRODESA** PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa Fundación para el Progreso y Desarrollo

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 15 abril 2026
HORA DE INICIO: 11:30 am HORA FINAL: 12:40 pm

DATOS GENERALES

PROYECTO: Contrato 002-50MC-2025
UBICACIÓN: Nombre del sitio El Fresno Medio Coordenadas 2°04'23"N 76°54'31"W
msnm 1582 Vereda El Fresno Corregimiento El paraiso Municipio Sucre

PERSONA DE CONTACTO: German Hamian Jimenez Teléfono: 3215952598

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA:
Entrega de estufa ecoeficient instalado en la Vivienda dela persona beneficiaria.

SITUACION ENCONTRADA:
- Se entregó la estufa sobre la vereda, fue transportada e instalada por el equipo tecnico del proyecto - se dejo funcionando.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
- Colocarle protección para evitar contacto directo con los niños y evitar posibles quemas con la estufa ecoeficiente.
- Adecuar la zona de salida de la chimenea

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
- Colocar protección a la zona de la estufa
- Adecuar la salida de la chimenea para evitar ingreso de animales y otros

FIRMAS

TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	German Hamian USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

MUNICIPIO DE SUCRE	**MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA** **FUNPRODESA** PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 15 abril 2026
HORA DE INICIO: 2:10 pm HORA FINAL: 3:21 pm

DATOS GENERALES

PROYECTO: Contrato 002 SDMG 2025
UBICACIÓN: Nombre del sitio El Fresno Coordenadas 2.05'13"N 76°53'10"W
msnm 1637 Vereda El Fresno Corregimiento El Paraiso Municipio Sucre

PERSONA DE CONTACTO: Marta Isabel Gomez Ruiz Teléfono: 3215476709

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA: Entrega e Instalación de estufa eco-eficiente a base de leña en la casa de la beneficiaria

SITUACION ENCONTRADA:
- Se lleva la estufa hasta la vereda, con la ayuda del equipo técnico del proyecto se transporta hasta la vivienda en donde se hace la instalación de la misma.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
- Mejorar las condiciones del piso donde se instaló la estufa, preferiblemente hacerle una plancha en concreto y colocar protección a los lados para evitar quemaduras con la misma

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
- Adecuar el sitio para mejor uso de la estufa
- Darle uso adecuado a la estufa entregada.

FIRMAS

TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	Martha Isabel Gomez USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

MUNICIPIO DE SUCRE	MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA FUNPRODESA PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 15 abril 2026
HORA DE INICIO: 2:10 pm HORA FINAL: 4:20 pm

DATOS GENERALES

PROYECTO: Contrato 002-50Mc-2025
UBICACIÓN: Nombre del sitio El Mirador Coordenadas 2°05°0i N78°53'33W
msnm 1719 Vereda El Fresno Corregimiento El Paraiso Municipio Sucre

PERSONA DE CONTACTO: Hecta Mery Luna Lopez Teléfono: 3166457132

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA:
Entrega e Instalación de estufa ecoeficiente a base de leña en el sitio definido

SITUACION ENCONTRADA:
- Se transporto la estufa hasta el sitio final (Vivienda) en donde se ubicó en el sitio (cocina) y se dejó lista para ser usada.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
- Organizar el sitio final, especificamente el piso - hacer plancha en concreto para mayor estabilidad.
- Organizar o cubrir el sitio final de la chimenea.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
- Adecuar el sitio final para la estufa.
- Cubrir la parte superior de la chimenea para evitar ingreso de animales y/o agua por ella.

FIRMAS

TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	Hecta Mery Luna L. USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

385

MUNICIPIO DE SUCRE	**MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA** **FUNPRODESA** PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 15 de abril de 2026
HORA DE INICIO: 3:30 pm HORA FINAL: 4:10 pm

DATOS GENERALES

PROYECTO: Contrato 002-SOMC-2025
UBICACIÓN: Nombre del sitio El fresno bajo Coordenadas 2.65119"N 76°53'15"W
msnm 1601 Vereda El fresno Corregimiento el paraiso Municipio sucre

PERSONA DE CONTACTO: Eulalia Luna de Gomez Teléfono: 3122856250

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA:
Entrega e Instalación de la estufa ecoeficiente a base de leña

SITUACION ENCONTRADA:
Se transportó la estufa hasta la vivienda de la beneficiaria en donde se instaló y ensayo, dejandola funcional.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
- Mejorar y proteger el sitio donde se instaló las estufa
- Colocarle protección a la chimenea para evitar ingreso a animales o agua por la parte alta

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
- Mejorar las condiciones del sitio
- Darle uso adecuado a la estufa entregada.

FIRMAS

TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	Eulalia Luna USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

387

MUNICIPIO DE SUCRE	**MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA** **FUNPRODESA** PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa Fundación para el Progreso y Desarrollo

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 15 abril de 2026
HORA DE INICIO: 4:20 pm HORA FINAL: 5:10 pm

DATOS GENERALES

PROYECTO: Contrato 002-SAMC-2025
UBICACIÓN: Nombre del sitio El fresno Coordenadas 2°0'12.87"N 76°53'28"W
msnm 1650 Vereda El fresno Corregimiento El Paraiso Municipio Sucre

PERSONA DE CONTACTO: Maria Catalina Luna Diaz Teléfono: 3176716273

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA:
Entrega e instalación de estufa ecoeficiente en la vivienda de la beneficiaria.

SITUACION ENCONTRADA:
Se transporto y se instaló la estufa en el sitio definido con anterioridad para el tema, se entregó funcionando correctamente.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
- Se recomienda mejorar el espacio (piso y techo) donde fue instalada la estufa
- Colocarle protección en la parte alta para evitar ingreso de animales

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
- Mejorar y ajustar las condiciones del sitio.
- Darle uso adecuado a la estufa.

FIRMAS

TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	Catalina Luna USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

MUNICIPIO DE SUCRE	MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA FUNPRODESA PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 14 - abril - 2026 (14-04-2026)
HORA DE INICIO: 10:30 am HORA FINAL: 12:50 pm

DATOS GENERALES

PROYECTO: Contrato 002- SAMC- 2025
UBICACIÓN: Nombre del sitio El Fresno Coordenadas 2°02'03"N76°53'6"W
msnm 1680 Vereda Salvavidas Corregimiento Sucre Municipio Sucre

PERSONA DE CONTACTO: Lucely Fernanda Rengifo Teléfono: 3116244023 5

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA:
Entrega e instalación de estufa ecoeficiente a base de leña

SITUACION ENCONTRADA:
- El transporte desde la cabecera hasta la vereda se realizo con apoyo del equipo tecnico y las familias beneficiarias
- Se realizó la entrega e instalacion de manera adecuado.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
- Organizar protección para la zona donde se deja la estufa para evitar contacto con los animales domesticos de la finca.
- Colocarle protección a la zona de la chimenea para evitar ingreso de animales

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
- Organizar y adecuar la zona de instalacion, así como la parte alto de la Chimenea.

FIRMAS

Leidy Melisa Daza G. TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	Luceli Fernandez Rengifo USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

MUNICIPIO DE SUCRE	**MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA** **FUNPRODESA** PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 14 abril de 2020
HORA DE INICIO: 1:20 pm HORA FINAL: 3:10 pm

DATOS GENERALES

PROYECTO: Contrato 002 - samc - 2025
UBICACIÓN: Nombre del sitio Salvaviidas Coordenadas 2°02'27" N76°53'58" W
msnm 1597 Vereda Salvaviidas Corregimiento Sucre cab. Municipio Sucre

PERSONA DE CONTACTO: Maria Leonila Rengifo Teléfono: 3116241623

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA:

Entrega e Instalación de la estufa ecoeficiente a Base de leña en la vivienda de la beneficiaria

SITUACION ENCONTRADA:

El transporte fue realizado por la familia de la beneficiaria en apoyo con el equipo tecnico.
se realizó la instalación y prueba (funcionamiento) de la misma.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Mejorar las condiciones del piso donde se instaló, recomendación hacer plantilla en concreto.
- Adecuar la zona alta de la chimenea para evitar ingreso de animales hacia la estufa

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

- Adecuar la zona de piso y proteger la parte alta de la chimenea.

FIRMAS

Leidy Melisa Daza G. TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	maria Leonila R USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

MUNICIPIO DE SUCRE	**MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA** **FUNPRODESA** PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 15 abril de 2026
HORA DE INICIO: 7:30 am HORA FINAL: 9:30 am.

DATOS GENERALES

PROYECTO: Contrato 002-SOMC-2025
UBICACIÓN: Nombre del sitio El Fresno Coordenadas 2°05'12.87"N 76°53'26.7"W
msnm 1678 Vereda El Fresno Corregimiento El Paraiso Municipio Sucre
PERSONA DE CONTACTO: Leonila Palechor Ato Teléfono: 3145304415

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA:
Entrega y la instalación de la estufa ecoeficiente en la casa de la beneficiaria.

SITUACION ENCONTRADA:
La estufa fue transportada e instalada en la zona de la cocina, dejándola funcional

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
- Adecuar la zona aledaña a la estufa para evitar quemaduras a los menores que asisten a la vivienda
- Colocarle protector a la chimenea para evitar ingresos de animales

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
- Mejorar el sitio donde se instaló la estufa.
- Dark el uso adecuado a la estufa entregada.

FIRMAS

Leidy Melisa Dara G. TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	Leonila Palechor USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

MUNICIPIO DE SUCRE	**MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA** **FUNPRODESA** PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 15 de abril de 2026
HORA DE INICIO: 9:50 am HORA FINAL: 10:40 am.

DATOS GENERALES

PROYECTO: Contrato 002 SDMC-2025
UBICACIÓN: Nombre del sitio El Fresno Coordenadas 2°04'04"N 76°53'11"W
msnm 1675 Vereda El Fresno Corregimiento El Paraiso Municipio Sucre

PERSONA DE CONTACTO: Antonino Magin Palechor Teléfono: 3178637294

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA:
Entrega e instalación de la estufa ecoeficiente a base de leña en la casa del beneficiario

SITUACION ENCONTRADA:
Se transportó e instalo la estufa en la zona de la cocina dejándola funcional.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
- Colocarle protección o darle manejo para que los menores de edad no se vayan a quemar por contacto directo
- Hacerle protección en la parte alta de la chimenea.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
- Aislar la zona de la estufa.
- Darle el manejo adecuado a la estufa.

FIRMAS

Leidy Melisa Daza G. TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	Antonino Magin Palechor USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

797

MUNICIPIO DE SUCRE	**MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA** **FUNPRODESA** PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 15 abril de 2026
HORA DE INICIO: 11:15 am HORA FINAL: 12:30 pm.

DATOS GENERALES

PROYECTO: Contrato 002-SOMC-2025
UBICACIÓN: Nombre del sitio El Fresno Coordenadas 2°04'88"N 76°53'35"W
msnm 1776 Vereda El Fresno Corregimiento El Paraiso Municipio Sucre

PERSONA DE CONTACTO: Doralba Yanet Rodriguez Teléfono: 3222002159

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA:
Entrega e instalación de la estufa ecoeficiente a base de leña

SITUACION ENCONTRADA:
se transportó y se instaló la estufa en la zona de la cocina, dejándola funcional y en uso.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
- Realizarle protección a la zona de la estufa para evitar quemaduras por parte de los menores
- Colocarle protección en la parte alta de la chimenea para evitar ingreso de animales

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
- Organizar y proteger zonas de protección para la estufa y para la chimenea.

FIRMAS

Leidy Meliza Daza G. TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	Doralba Rodriguez USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

373

MUNICIPIO DE SUCRE	MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA FUNPRODESA PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 19 de Marzo del 2026
HORA DE INICIO: 7:30 a.m. HORA FINAL: 2:14 P.M.

DATOS GENERALES

PROYECTO: CONTRATO 002-SAMC-2025
UBICACIÓN: Nombre del sitio LAS MINAS Coordenadas
msnm Vereda MAZAMORRAS Corregimiento SUCRE Municipio SUCRE

PERSONA DE CONTACTO: FERNANDO GOMEZ Teléfono: 323H40H852

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA:
Revisión lote Nro.1 para proceso de reforestación

SITUACION ENCONTRADA:
- EL predio se encuentra en su totalidad, y de acuerdo a lo contratado (Siembra, resiembra, mantenimiento, control y fertilización) en un 100 % efectuado.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
- Se recomienda que se comunique a la comunidad para que este pendiente del control de plagas y enfermedades.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
- Para el mes de Marzo, realizar una campaña para mantenimiento y control sanitario.

FIRMAS

Iady Meliza Daza G TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	Fernando Gómez USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

MUNICIPIO DE SUCRE	MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA FUNPRODESA PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 20 de Marzo de 2026
HORA DE INICIO: 7:00 a.m. HORA FINAL: 1:40 P.M.

DATOS GENERALES

PROYECTO: CONTRATO 002-SAMC-2025
UBICACIÓN: Nombre del sitio LAS MINAS Coordenadas -
msnm - Vereda MAZAMORRAS Corregimiento SUCRE Municipio SUCRE

PERSONA DE CONTACTO: FERNANDO GOMEZ Teléfono: 3234404852

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA:
Revisión Lote N10. 2 para proceso de reforestación

SITUACION ENCONTRADA:
- El predio N10.2 dentro de las minas ha sido cubierto por repoblamiento de acuerdo a lo contratado.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
- Se recomienda control de plagas y enfermedades

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
- Antes de terminar el mes de Marzo, realizar mantenimiento y control sanitario

FIRMAS

Abel Arturo Tobar Gómez. TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	Fernando Gómez USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

MUNICIPIO DE SUCRE	MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA FUNPRODESA PROYECTO AMBIENTAL	funprodesa

FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO

FECHA: 26 de Marzo del 2026
HORA DE INICIO: 7:10 a.m. HORA FINAL: 3:05 P.M.

DATOS GENERALES

PROYECTO: CONTRATO 002 - SAMC - 2025
UBICACIÓN: Nombre del sitio LAS MINAS Coordenadas
msnm Vereda MAZAMORRAS Corregimiento SUCRE Municipio SUCRE

PERSONA DE CONTACTO: FERNANDO GOMEZ Teléfono: 3234404852

DATOS ESPECIFICOS DE LA VISITA

OBJETO DE LA VISTA:
Revisión procesos de aislamiento en los tres lotes de las minas

SITUACION ENCONTRADA:
- Los tres sitios cuentan con el aislamiento completo de acuerdo a lo contratado.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
- Realizar procesos de corredores o cauchos contraviento para evitar perdidas por incendios

COMPROMISOS ADQUIRIDOS
- La comunidad se compromete a vigilar y cuidar para que lo realizado no se pierda.

FIRMAS

Ana Leby Gómez TECNICO: Declara haber inspeccionado y verificado los aspectos técnicos requeridos y los requisitos para el cumplimiento de la visita	Fernando Gómez USUARIO: recibe la visita a satisfacción y declara haber recibido especificaciones técnicas y recomendaciones en general

ANEXO


Zonas intervenidas con repoblamiento en los dos predios de El Maco y Las Minas

funprodesa
Fundación para el Progreso y Desarrollo

ANEXO
PROCESO DE REPOBLAMIENTO

El Maco y Las Minas

ZONAS INTERVENIDAS PREDIO EL MACO

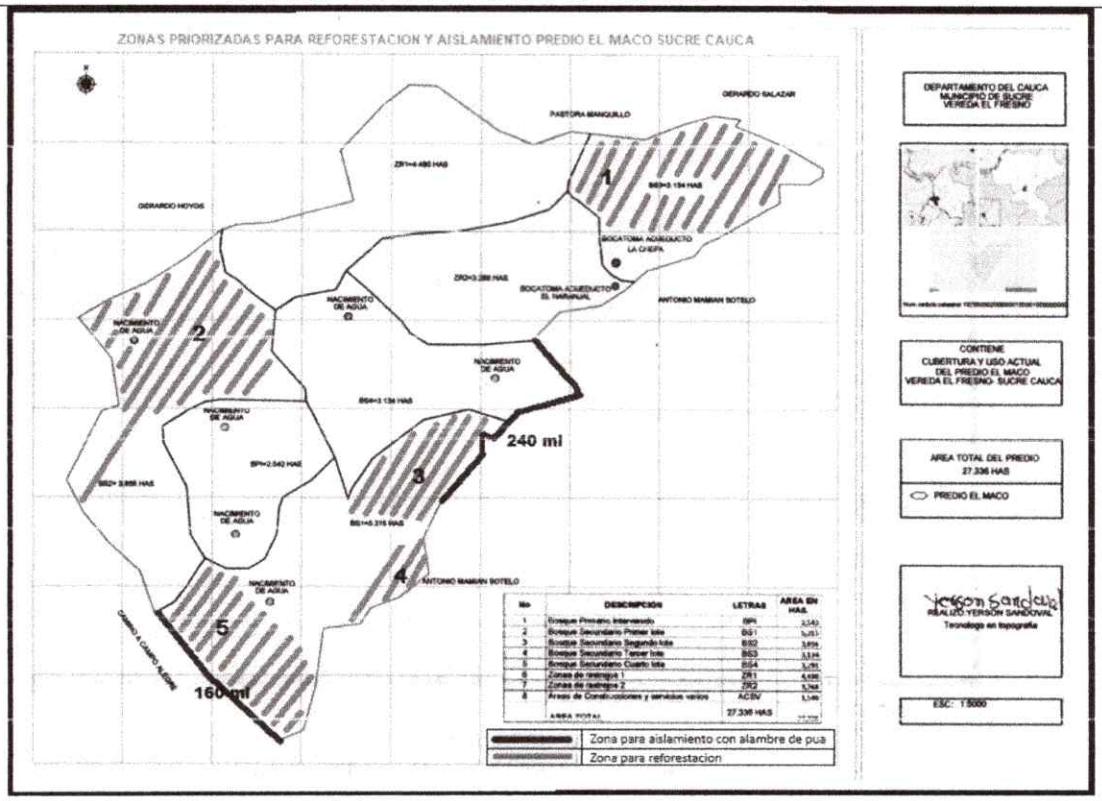

Convenciones


Zona de aislamiento: 400 metros lineales
Zona de reforestacion: siembra de 1.320 plantas nativas en proceso de Repoblamiento

DESCRIPCION REPOBLAMIENTO	METROS LINEALES	DIC	ENERO	FEBR	MARZO	ABRIL	SUMAS
El Maco: en 5 sitios: (1320)							
Lote 1 (Parte alta = norte)	360	0	0	350	10	0	360
Lote 2 (Parte media= Occidente)	300	0	0	50	250	0	300
Lote 3 (parte media = oriente)	230	0	0	0	230	0	230
Lote 4 (Parte media = sur oriente)	120				120	0	120
Lote 5 (parte baja = sur)	310				310	0	310
SUMAS CONTRATO	**1320**	**0**	**0**	**400**	**920**	**0**	**1320**
Reposición	**50**						**50**
SUMAS TOTALES	**1370**						**1370**

funprodesa
Fundación para el Progreso y Desarrollo

ZONAS INTERVENIDAS LAS MINAS

ZONAS PRIORIZADAS PARA REFORESTACION Y AISLAMIENTO PREDIO LAS MINAS SUCRE CAUCA

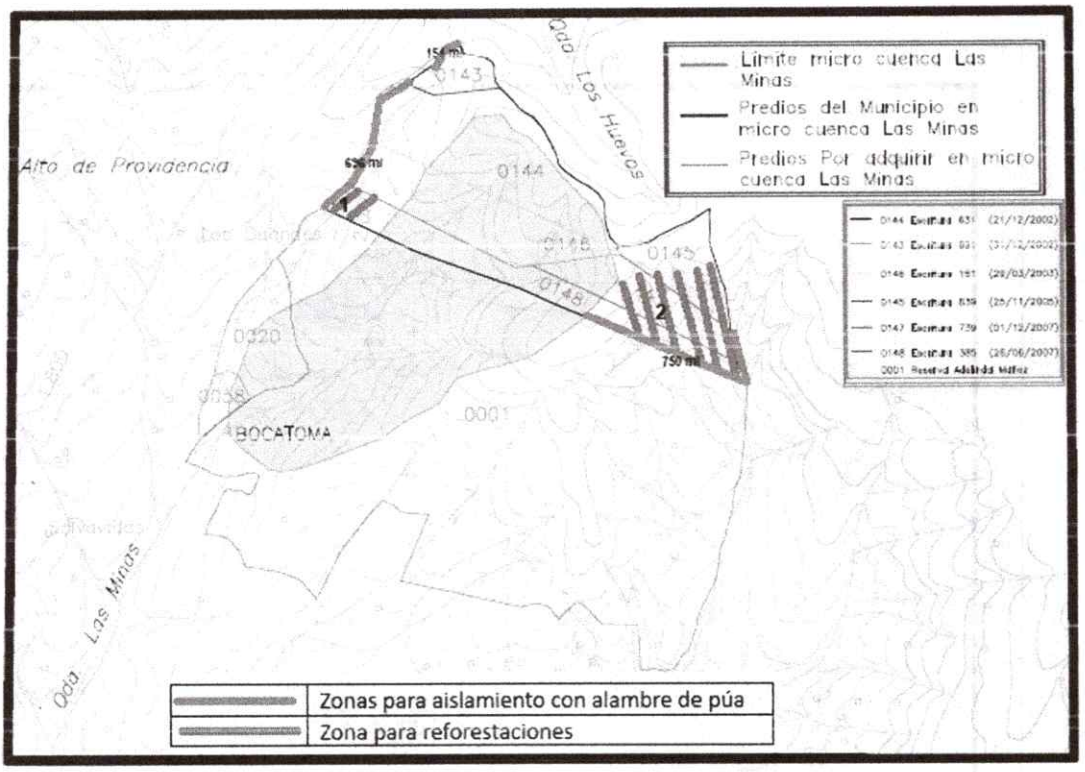

Convenciones

Zona de aislamiento: 1600 metros lineales

Zona de reforestacion: siembra de 330 plantas nativas en proceso de repoblamiento

DESCRIPCION REPOBLAMIENTO	METROS LINEALES	DIC	ENERO	FEBR	MARZO	ABRIL	SUMAS
Las Minas en 2 sitios (330)							
Lote 1: Parte media (occidente)	90	0	0	90	0		**90**
Lote 2: Parte media (oriente)	240	0	0	110	130		**240**
SUMAS	**330**	**0**	**0**	**200**	**130**	**0**	**330**

funprodesa
Fundación para el Progreso y Desarrollo

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS PROCESOS DE REPOBLAMIENTO EN LAS MINAS Y EL MACO FINAL

Especies a plantar







Limpieza y ahoyado en El Maco



Limpieza y ahoyado en El Maco

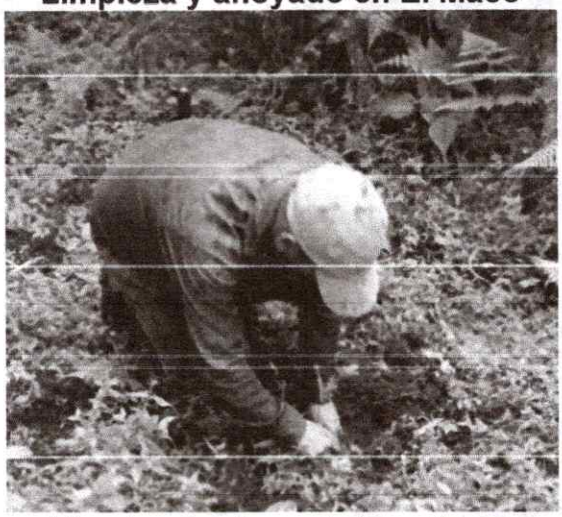


Limpieza y ahoyado Las Minas

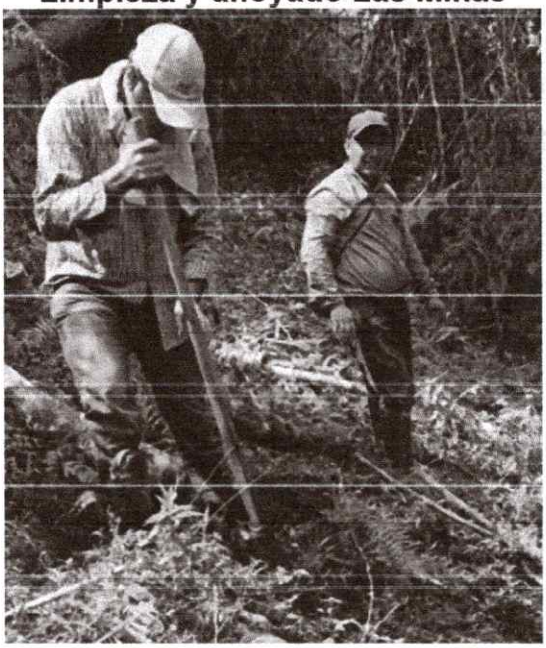



Siembra en El Maco

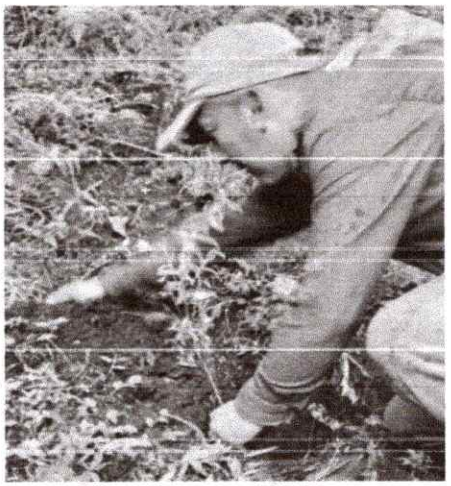


Siembra en El Maco




Siembra en El Maco

funprodesa
Fundación para el Progreso y Desarrollo

Siembra en El Maco

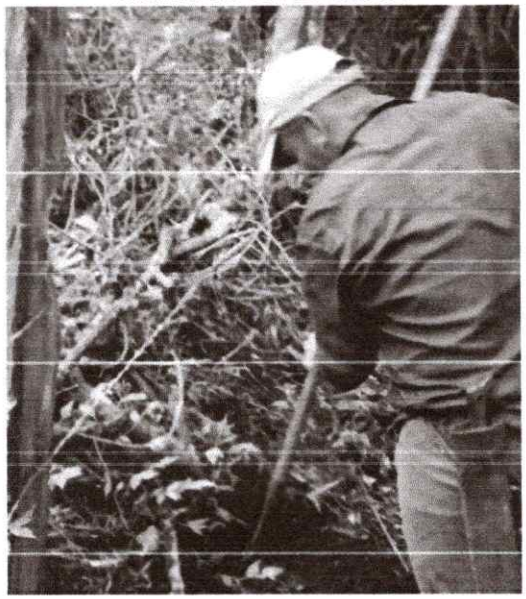


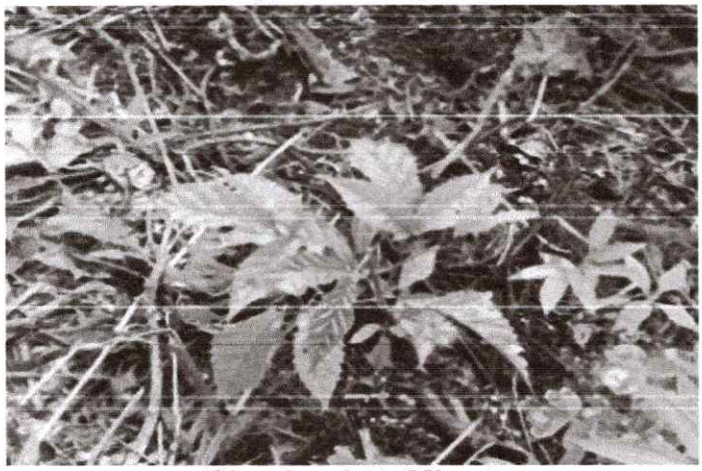


Siembra Las Minas



Siembra en Las Minas

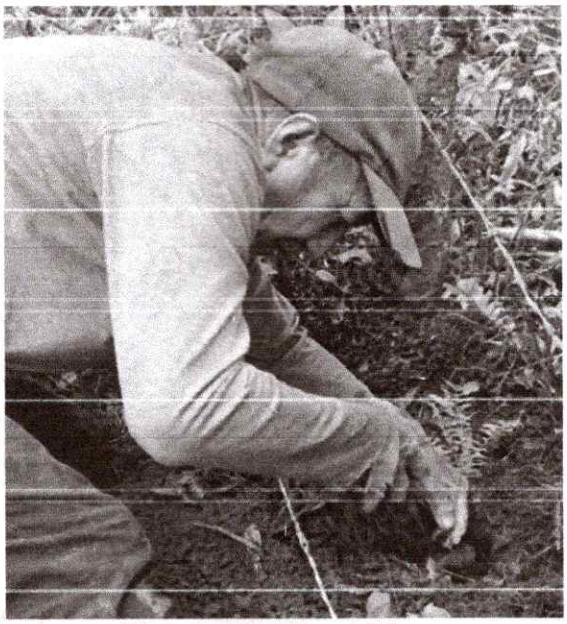


Siembra en Las Minas

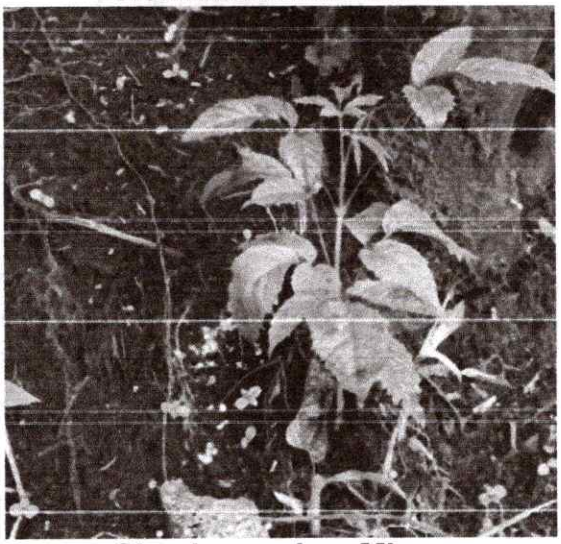

Siembra en Las Minas



Aplicación de fertilizantes en Las MInas

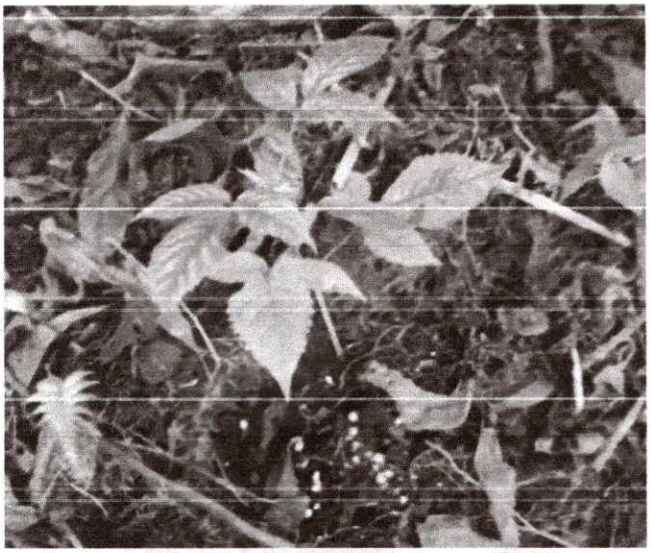

Aplicación de fertilizantes en El Maco




ANEXO

Proceso de aislamiento adelantado en Las Minas y El Maco

807

ANEXO
Proceso de aislamiento predios Las Minas y El Maco Sucre Cauca

EL MACO: Dos (02) sitios, ubicados en los círculos azules de la siguiente imagen

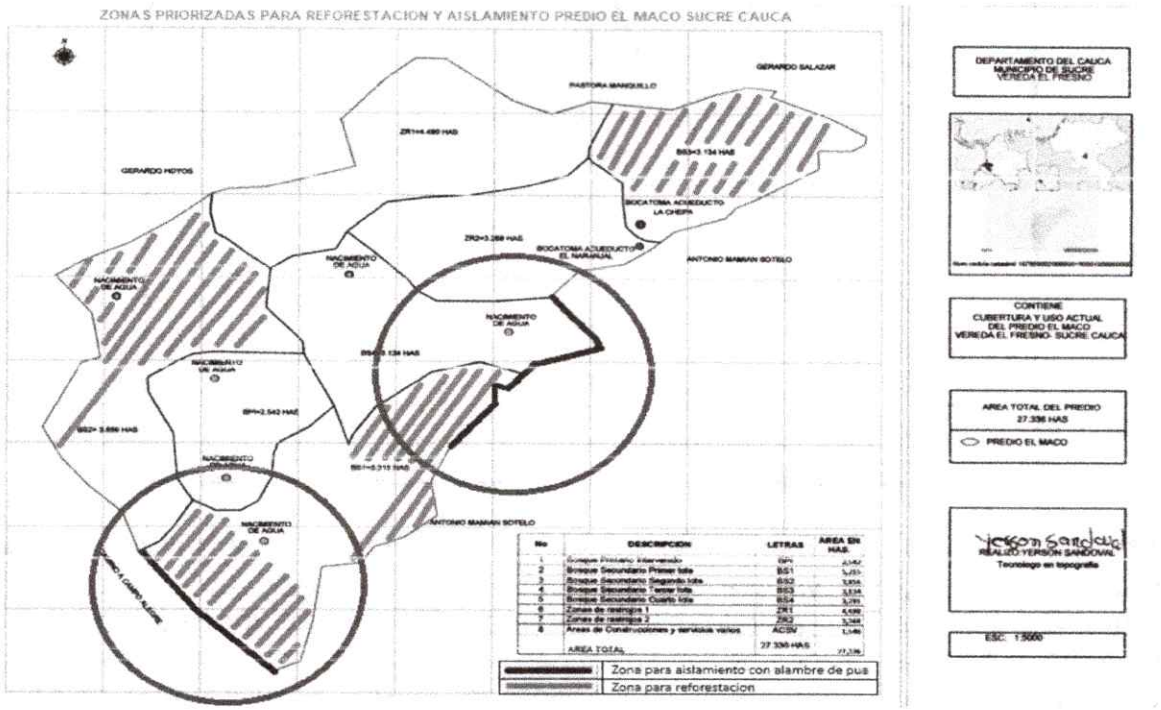


PREDIO EL MACO: En el presente periodo se aislaron ochenta (80) metros lineales que estaban pendientes, logrando el 100% de lo contratado equivalentes a trecientos veinte metros lineales (320 ml), se aisló la parte inferior del predio en donde se presentaban problemas de ingreso de animales domésticos que contaminaban la fuente hídrica. Se da cumplimiento a lo recomendado: con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor

DESCRIPCION AISLAMIENTO	METROS LINEALES	DIC	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	SUMAS
El Maco: Aislamiento en 2 sitios (400)							
Lote 1: Parte baja (Sur)	160	0	0	160			**160**
Lote 2: Parte media (oriente)	240	0	0	160	80		**240**
SUMAS	**400**	**0**	**0**	**320**	**80**	**0**	**400**

LAS MINAS: Tres (03) sitios, ubicados en los círculos azules de la siguiente imagen


ZONAS A INTERVENIR LAS MINAS

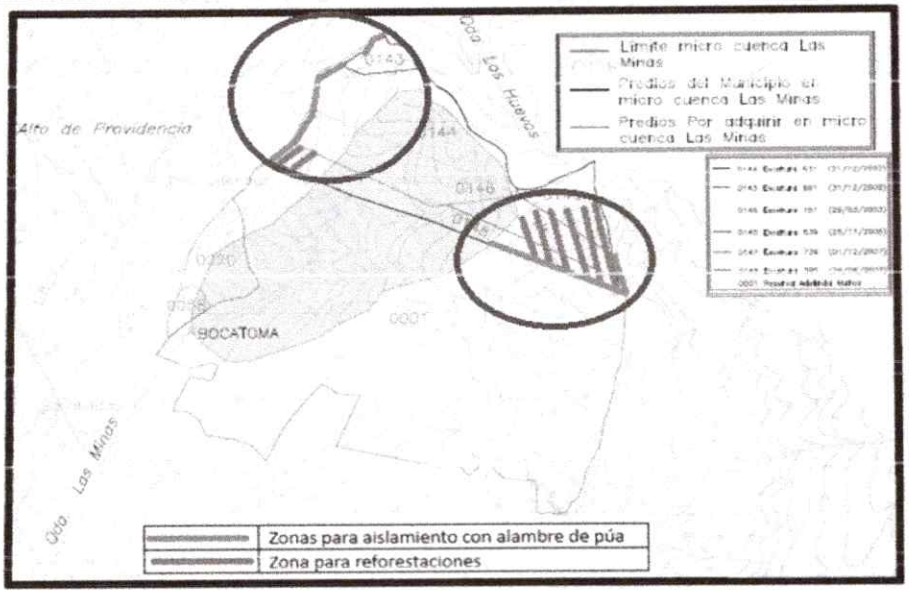


PREDIO LAS MINAS: En el presente periodo solamente se realizó revisión de lo aislado en este sector, ya que se había cubierto con anterioridad la meta en el sector, a la fecha se han aislado mil seiscientos (1600) metros lineales con 4 hilos de alambre de púa (avance de un 100% para el predio) dando cumplimiento a lo recomendado: con alambre de púas a 4 hilos, con postes de madera de 2 metros de longitud y 10 cms de diámetro, a una distancia entre postes y poste de 3 metros, con su respectivo pie de amigo cada 3 postes, asegurados al poste con grapas de 2", se incluye transporte de materiales, mano de obra de instalación (Trazado, Ahoyado (50x40x40), Transporte menor, Hincado, Templado y grapado) y herramienta menor.

DESCRIPCION AISLAMIENTO	METROS LINEALES	DIC	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	SUMAS
Las Minas: Aislamiento en 3 sitios: (1600)							
Lote 1: Parte alta (Norte)	154	0	0	154	0	0	154
Lote 2: Parte media (oriente)	696	0	0	696	0	0	696
Lote 3: Parte media (occidente)	750	0	0	750	0	0	750
SUMAS	**1600**	**0**	**0**	**1600**	**0**	**0**	**1600**

Alambre y grapas adquiridas

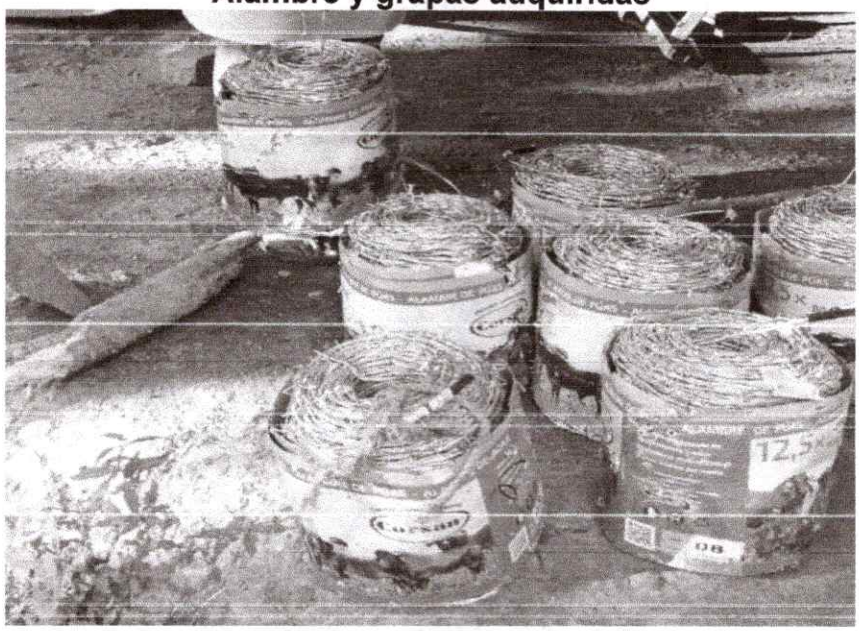

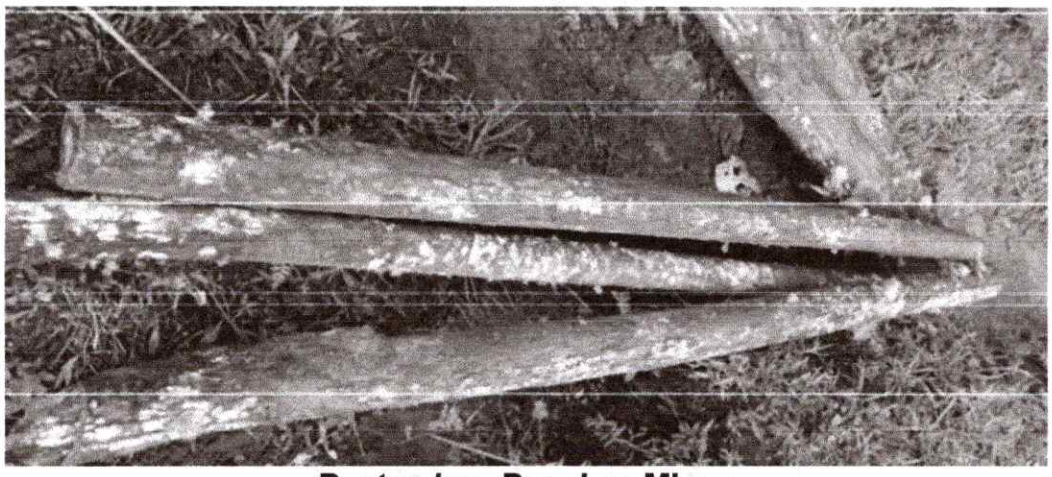

Posteadura Para Las Minas



Posteadura Para Las Minas







Transporte de posteadura Las MInas



PROCESO DE AISLAMIENTO LAS MINAS

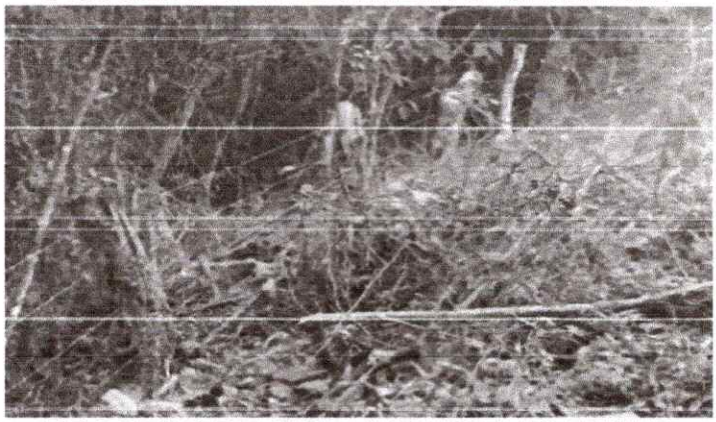

PROCESO DE AISLAMIENTO LAS MINAS

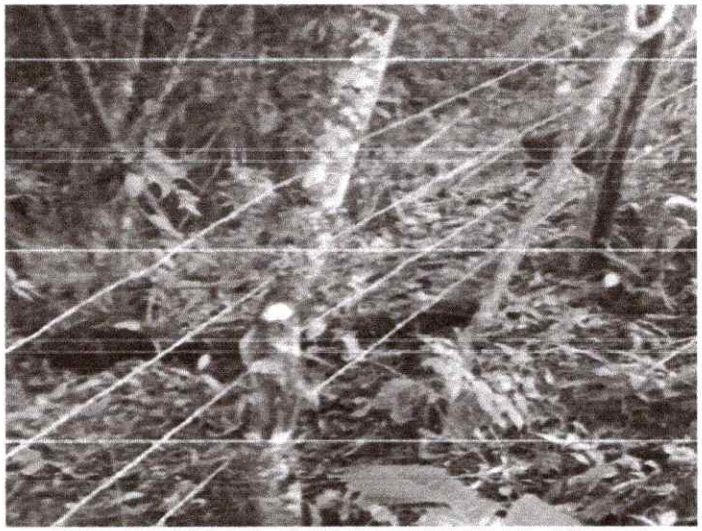


PROCESO DE AISLAMIENTO EL MACO






PROCESO DE AISLAMIENTO EL MACO

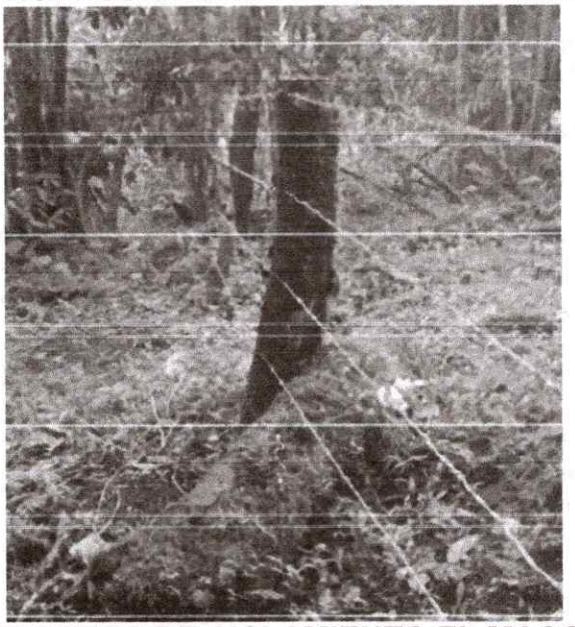


PROCESO DE AISLAMIENTO EL MACO

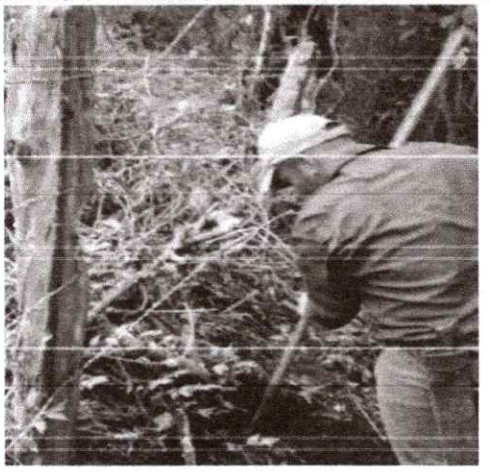


870

PROCESO DE AISLAMIENTO EL MACO

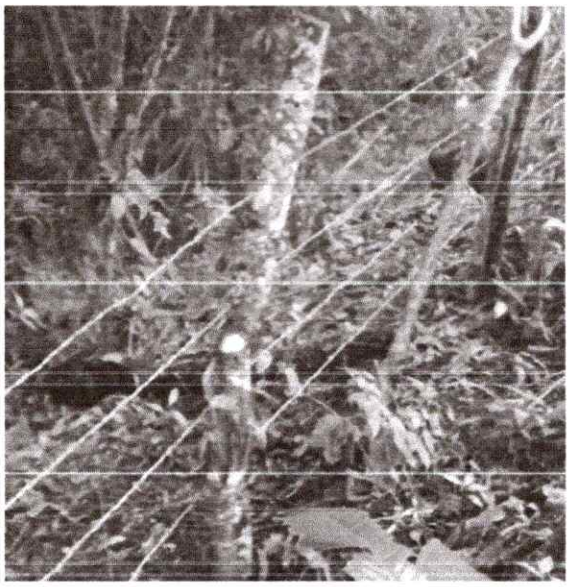

PROCESO DE AISLAMIENTO EL MACO

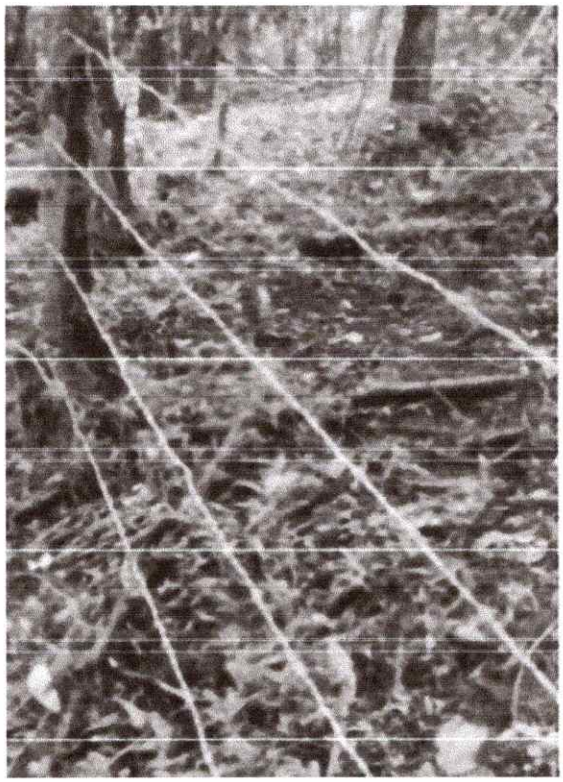


ANEXO


Registro fotográfico de revisión de viviendas de postulados para instalación de estufas ecoeficientes a base de leña

Entregas e instalación

ANEXO No
REUNION ENTREGA DE ESTUFAS
ENTREGA - INSTALACION DE ESTUFAS

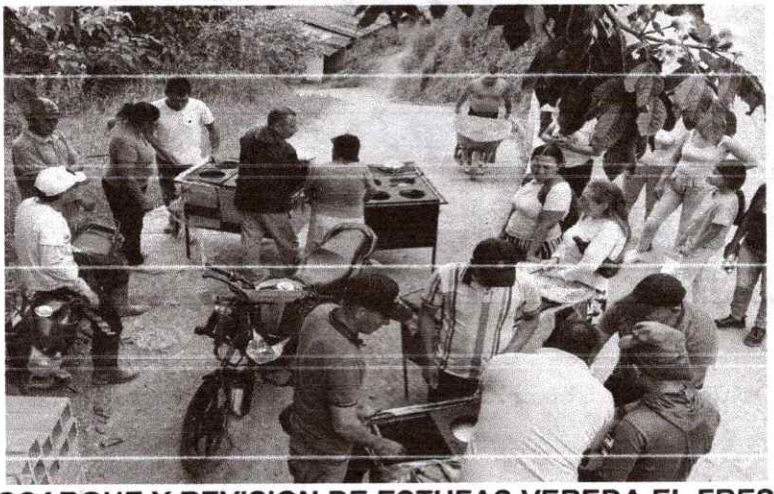


DESCARGUE Y REVISION DE ESTUFAS VEREDA EL FRESNO

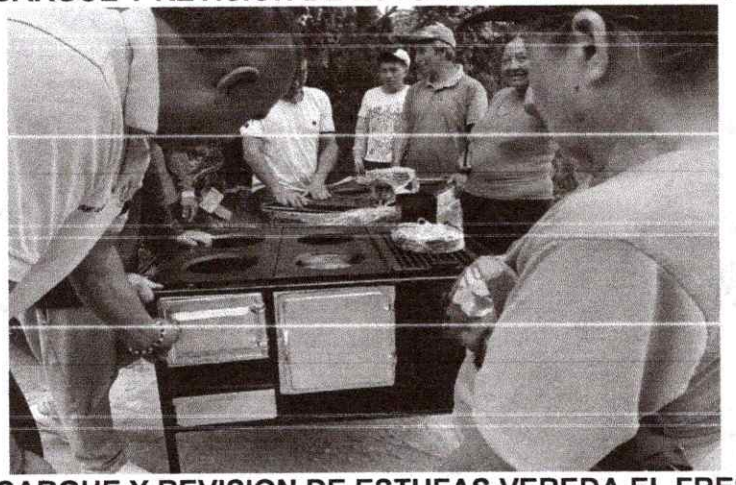

DESCARGUE Y REVISION DE ESTUFAS VEREDA EL FRESNO




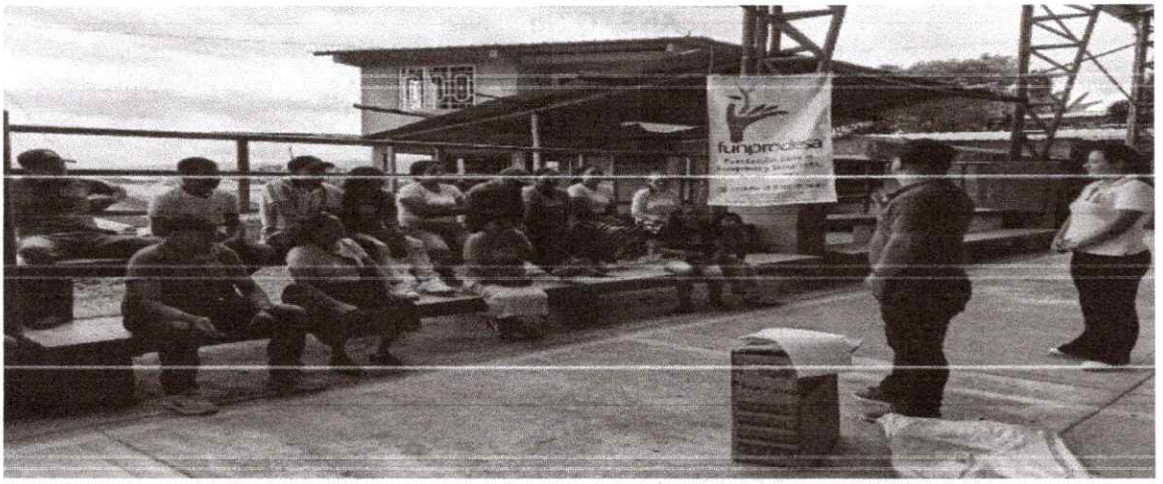


REUNION CON COMUNIDAD Y BENEFICIARIOS ANTES DE LA ENTREGA DE LAS ESTUFAS



REUNION CON COMUNIDAD Y BENEFICIARIOS ANTES DE LA ENTREGA DE LAS ESTUFAS

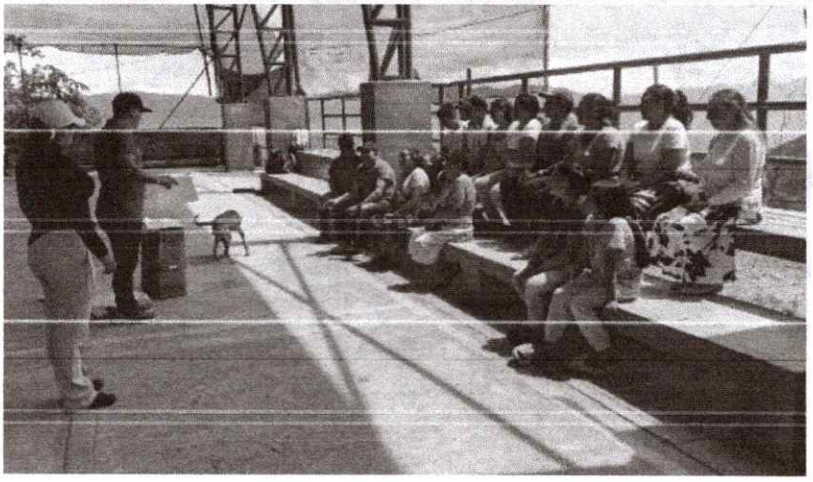

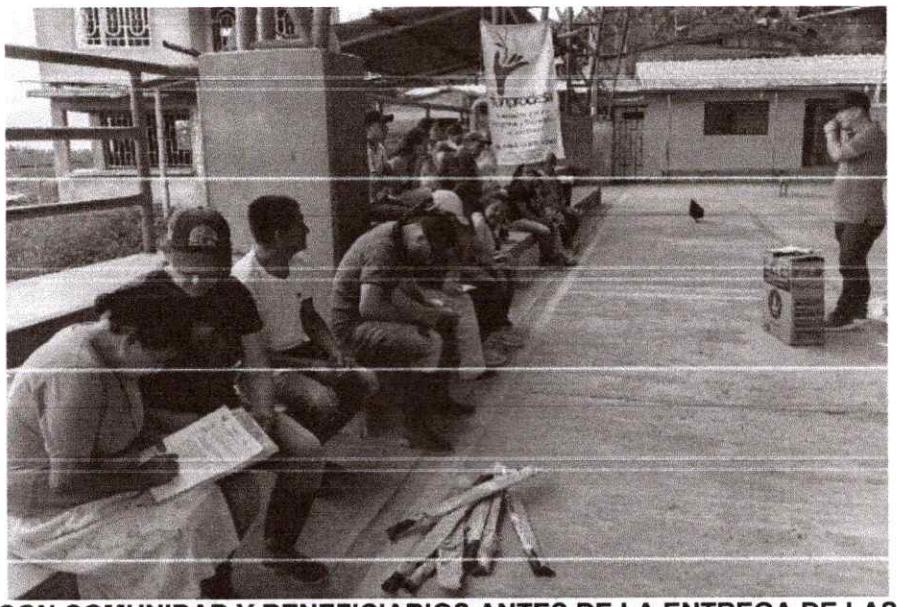

REUNION CON COMUNIDAD Y BENEFICIARIOS ANTES DE LA ENTREGA DE LAS ESTUFAS




REUNION CON COMUNIDAD Y BENEFICIARIOS ANTES DE LA ENTREGA DE LAS ESTUFAS




funprodesa
Fundación para el Progreso y Desarrollo

ENTREGA DE ESTUFAS ECOEFICIENTES

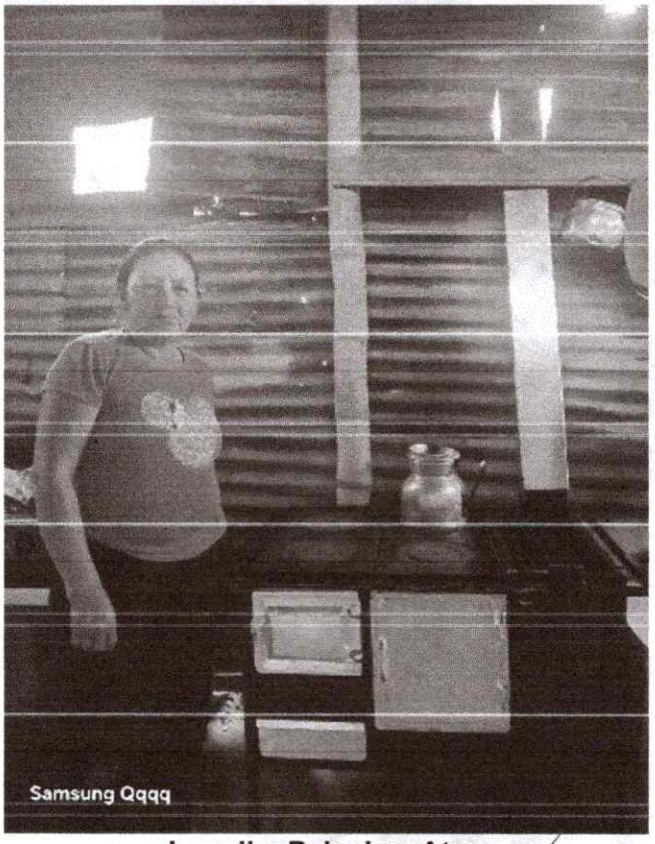

Leonila Palechor Atoy

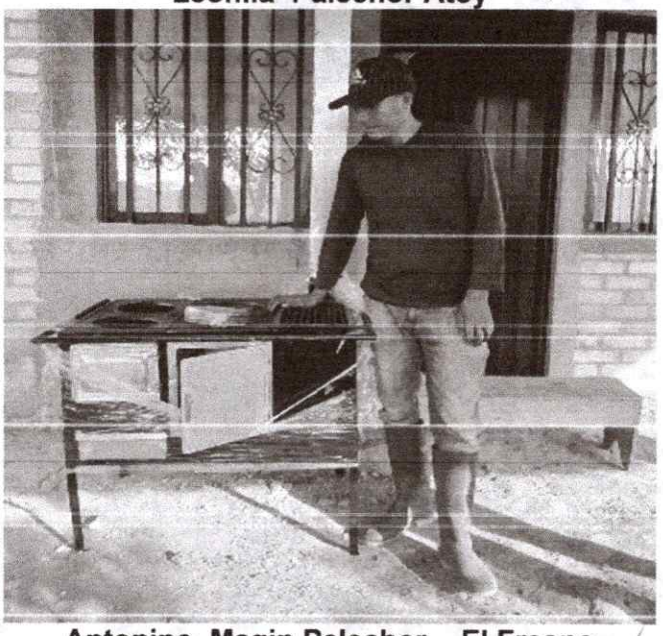

Antonino Magin Palechor - El Fresno




Martha Isabel Gomez Ruiz –El Fresno



Olga Salazar Quijano –El Fresno




Hecta Mery Luna Lopez – El Fresno

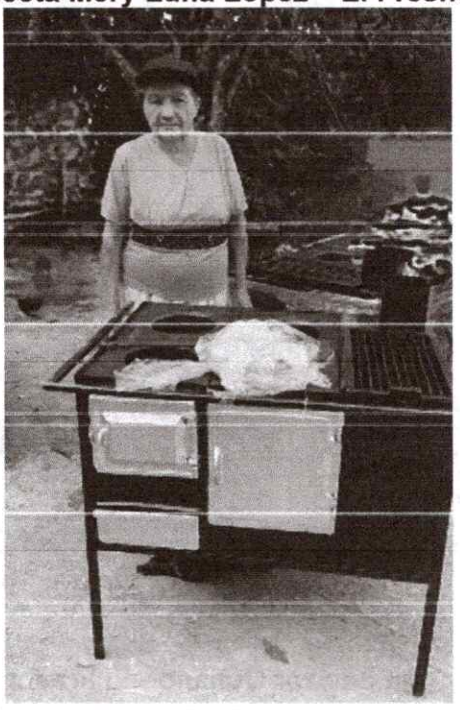

Maria Catalina Luna De Buesaquillo – El Fresno



Maria Consuelo Mamian Jimenez – El Fresno

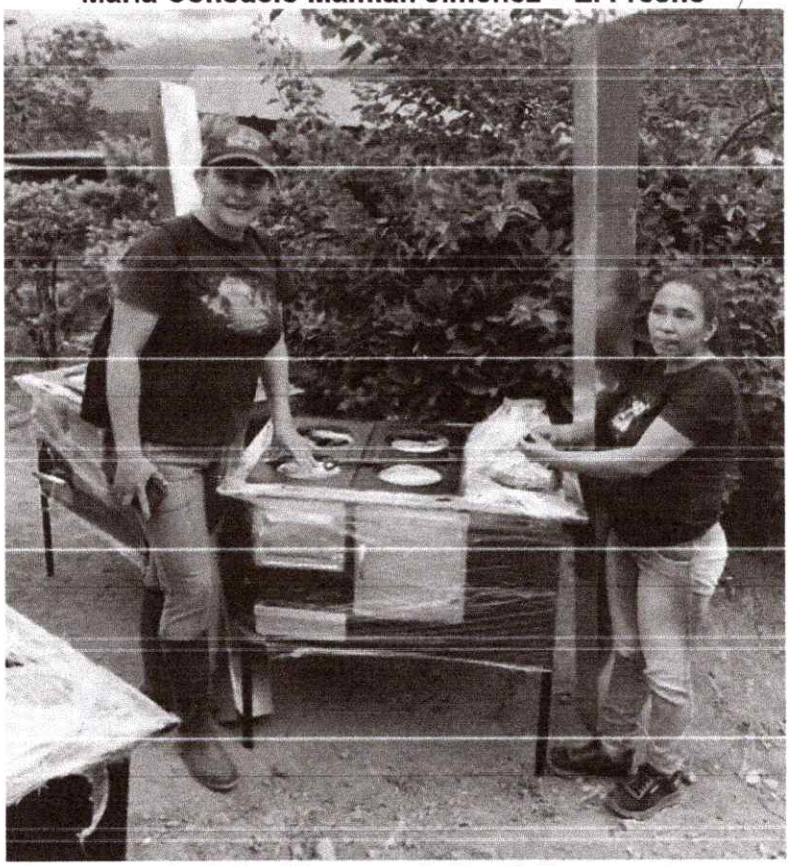

Audelia Moncayo Ijaji – El Fresno




Eulalia Luna De Gomez




German Mamian Jiménez –El Fresno




Doralba Yaned Rodriguez Guevara

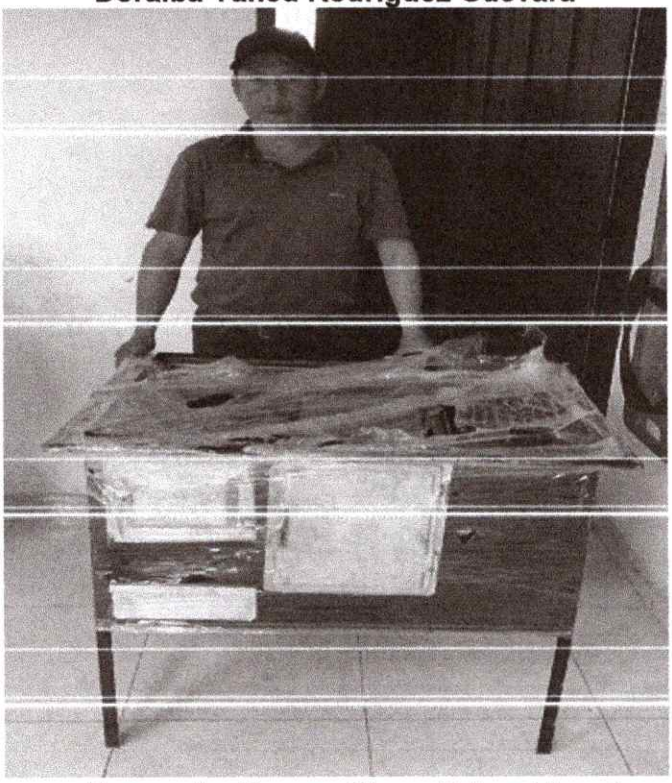


Fernando Gomez Diaz – Salvavidas

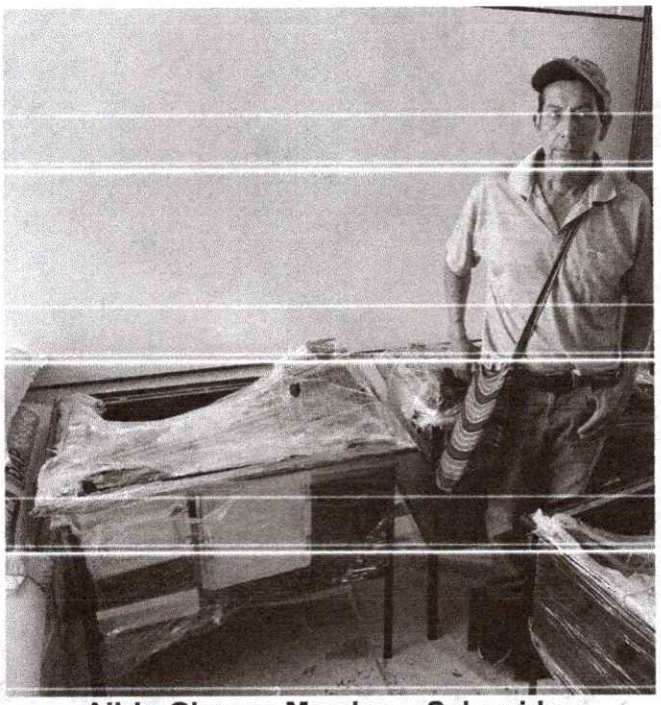

Alirio Gironza Mamian – Salvavidas

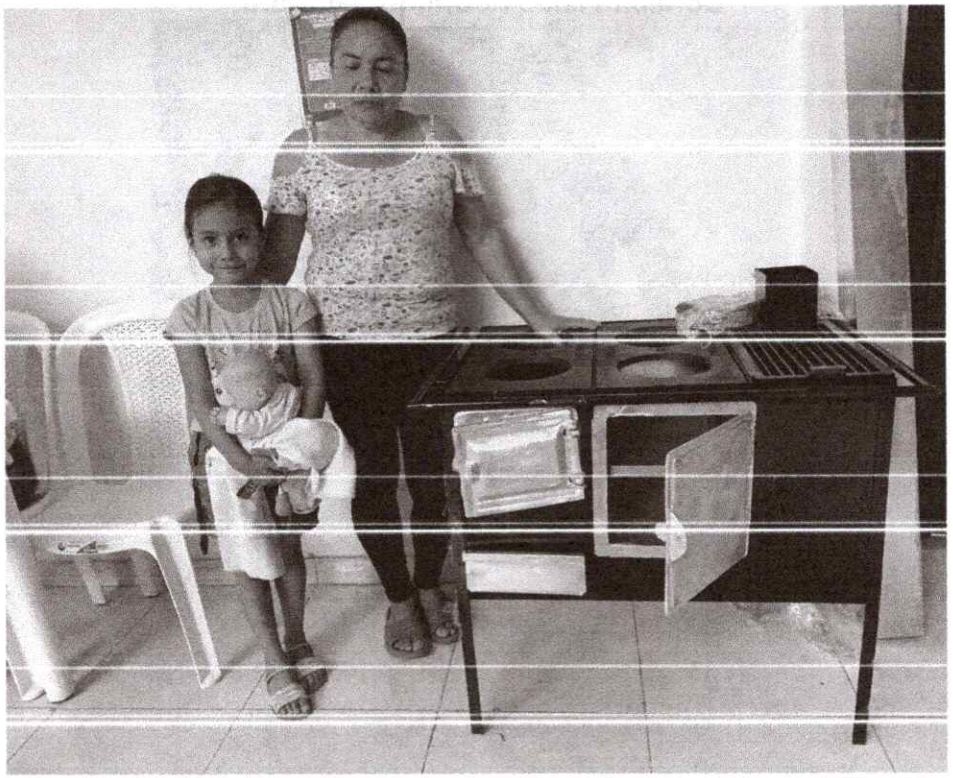

Luceli Fernandez Rengifo – Salvavidas

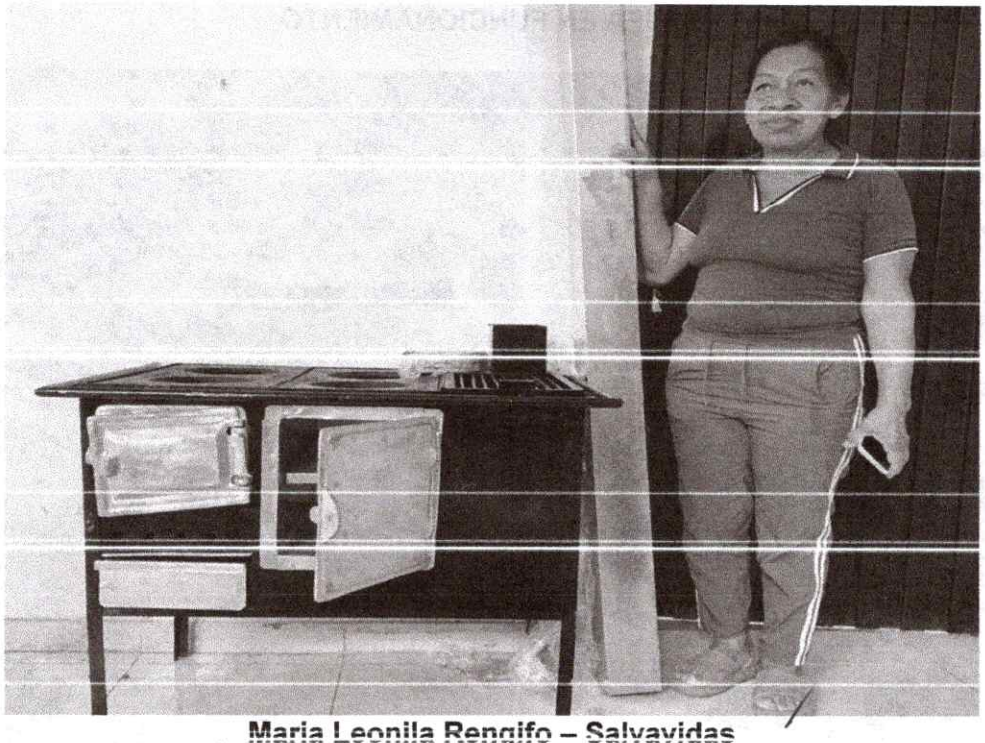


Maria Leonila Rengifo – Salvavidas

ESTUFA EN FUNCIONAMIENTO



funprodesa
Fundación para el Progreso y Desarrollo

ESTUFA EN FUNCIONAMIENTO

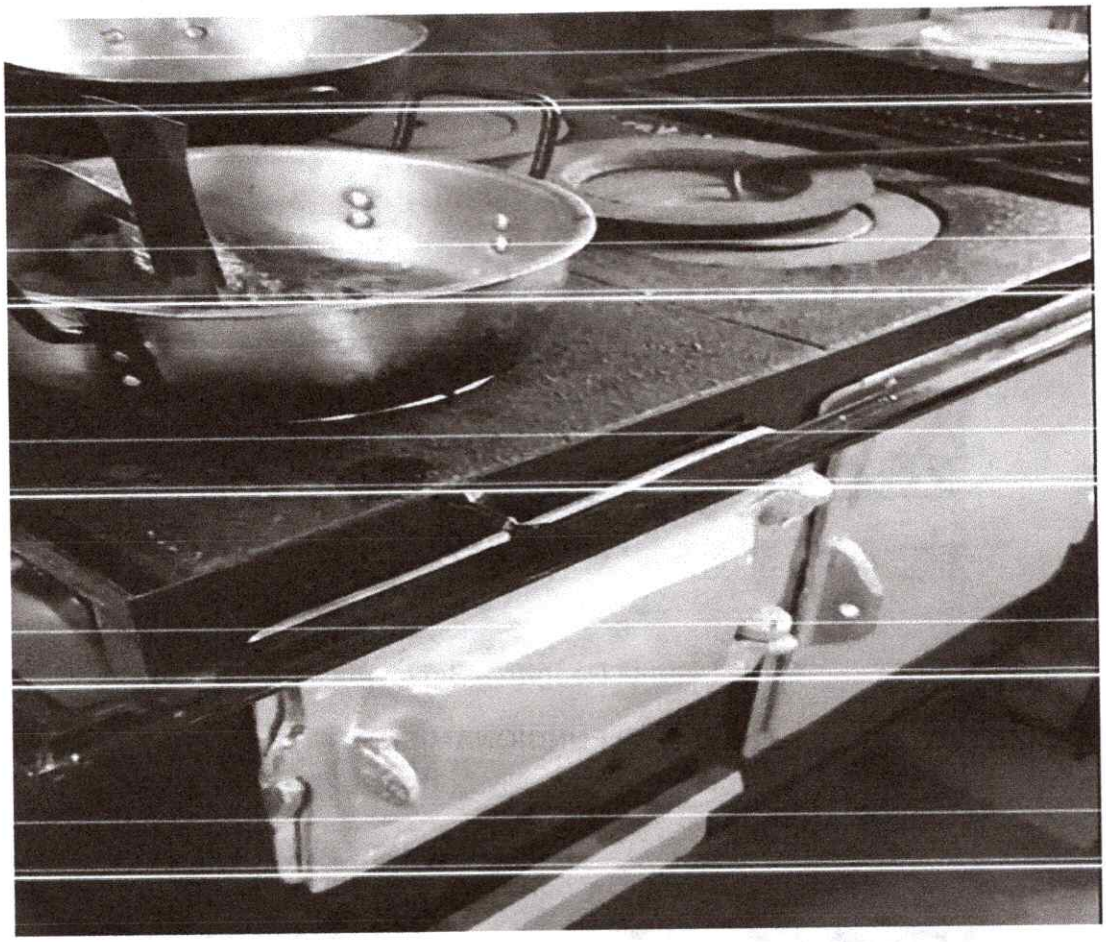

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SUCRE NIT: 817.003.440-5		Código: 120 Versión: 01 Fecha: 1/11/2019 Página 1 de 15

Sucre, 15 de abril de 2026

Asunto: Certificación cumplimiento del ITEM Numero 2: relacionado con Talleres en Educación Ambiental del contrato 002-SAMC-2025

Cordial saludo

Mediante el presente respetuosamente nosotros contratistas de apoyo a la secretaria de planeación e infraestructura Municipal de Sucre Cauca, como apoyo al sector medio ambiente de Sucre, Nos permitimos dar certificado de cumplimiento al ITEM 2 "Talleres en Educación Ambiental en los cuatro (04) puntos según lo siguiente_

- Desarrollo de Veinticuatro (24) talleres de capacitación en procesos de sensibilización y cuidado de recursos hídricos, de las fuentes de Las Minas y El Maco
- Cobertura de Seiscientos (600) refrigerios en los Veinticuatro (24) talleres dictados.
- Uso de papelería y material didáctico para la organización y preparación de cada uno de los veinticuatro (24) talleres
- Empleo de espacios (sitios adecuados) para el desarrollo de los Veinticuatro (24) talleres

En conclusión, se desarrollaron cada una de las capacitaciones con las comunidades del sector de acuerdo a lo contratado

Yessica Erazo

YESSICA DAYANA ERAZO CERON
Contratista de Secretaria de Planeación
e infraestructura Municipal de Sucre
Apoyo área ambiental Sucre Cauca|

Sebastian Muñoz

JOHAN SEBASTIAN MUÑOZ NAVIA
Contratista de Secretaria de Planeación
e infraestructura Municipal de Sucre
Apoyo área ambiental Sucre Cauca

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SUCRE NIT: 817.003.440-5		Código: 120 Versión: 01 Fecha: 1/11/2019 Página 1 de 15

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

De acuerdo con la *Certificación de Cumplimiento del Ítem No. 2 – Talleres en Educación Ambiental* del Contrato 002-SAMC-2025, remitida el 15 de abril de 2026, presentada por los contratistas de apoyo al sector medio ambiente de la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal, se puede constatar el cumplimiento integral de las actividades correspondientes al citado ítem, las cuales comprenden: i) el desarrollo de veinticuatro (24) talleres de capacitación em procesos de sensibilización y cuidado de los recursos hídricos de las fuentes Las Minas y El Maco; ii) la provisión de seiscientos (600) refrigerios distribuidos en los veinticuatro (24) talleres ejecutados; iii) el uso de papelería y material didáctico para la organización y preparación de los veinticuatro (24) talleres; y iv) la utilización de espacios adecuados para el desarrollo de las actividades formativas.

Asimismo, conforme a la certificación suscrita por las personas arriba mencionadas, se deja constancia de que cada una de las capacitaciones fue efectivamente desarrollada con las comunidades beneficiadas, en concordancia con lo contratado y con los lineamientos establecidos para su ejecución.

En consecuencia, se certifica que las actividades anteriormente descritas fueron ejecutadas a satisfacción, de conformidad con las obligaciones contractuales establecidas.

Por constancia se firma a los quince (15) días del mes de abril del dos mil veintiséis (2026)

Atentamente,

Carolina Gasca Muñoz

CAROLINA GASCA MUÑOZ
Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal
Municipio de Sucre, Cauca
