Bogotá D.C.

Fecha de ejecución: septiembre 24 de 2025

Dirección: KR 95A #85-80 SUR BOSA
Unidad Operativa: Casa de la Sabiduría Campo Verde

Asunto: Informe Asistencia por Emergencia Planta Eléctrica

Contrato No. 9334 - 2025

Secretaria Integración Social

Objeto contrato: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y TRANSFERENCIAS DE PROPIEDAD DE LA SDIS Y AQUELLOS POR LOS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE."

El día 24 de septiembre de 2025 se realizó una asistencia técnica de emergencia a la planta eléctrica ABC de 75 KVA en la unidad operativa Casa de la Sabiduría Campo Verde.


Durante la visita técnica, se detectó una alarma en la planta eléctrica, identificándose como posible causa del intento de arranque no exitoso. Se procedió a realizar la purga del sistema de inyección, logrando la puesta en marcha del equipo sin novedades.

Se recomienda realizar encendidos periódicos para evitar la descarga de combustible en las toberas.


Se requiere suministro de combustible. Nivel de acpm actual es de 20% aproximadamente.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Nivel Aceite

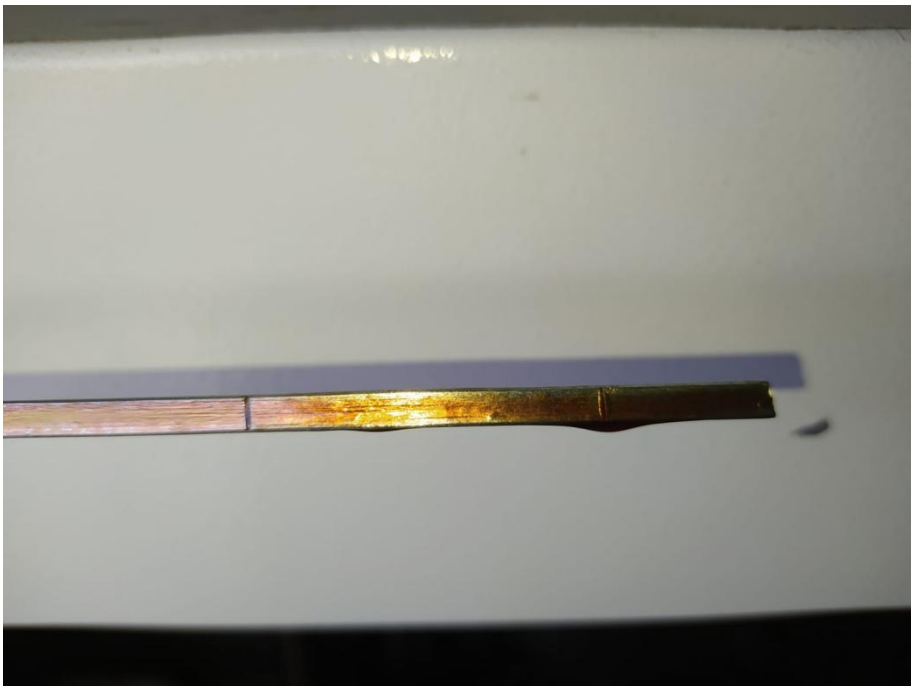


Transferencia

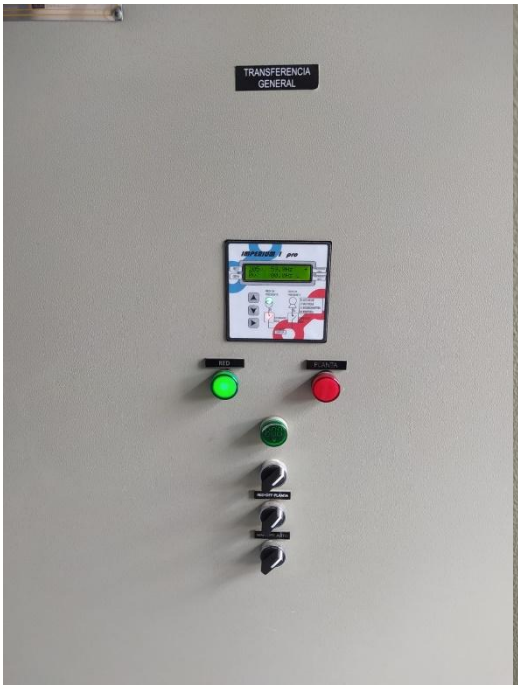



Inspección general

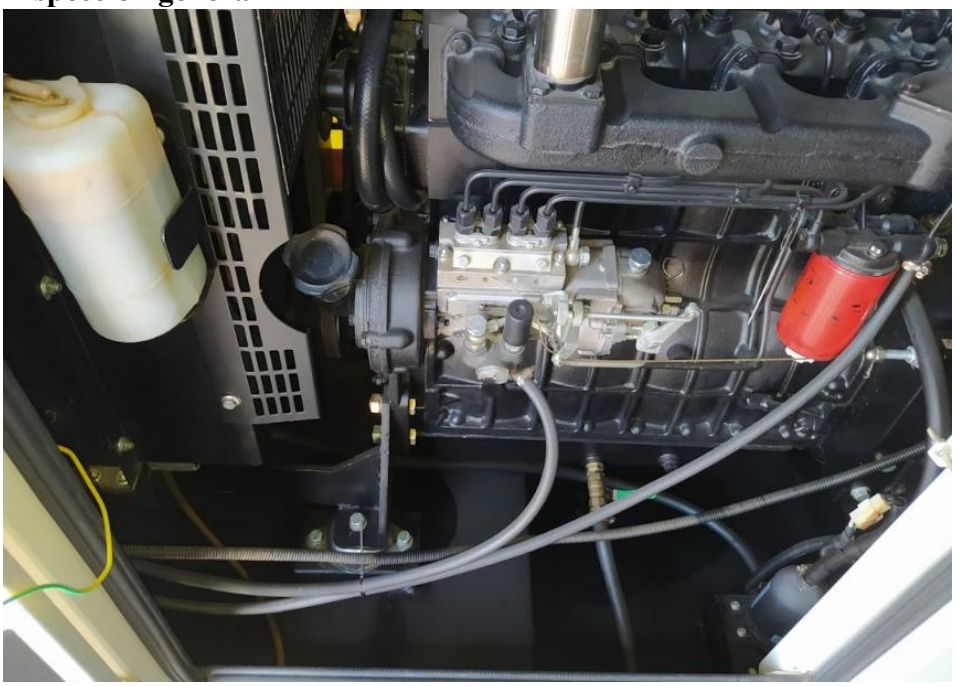

Voltajes



SE ANEXA CUADRO COSTOS

Mantenimiento preventivo planta electrica: 75 KVA KR 95A #85-80 SUR BOSA CASA DE LA SABIDURIA CAMPO VERDE						
3	PLANTA ELECTRICA Y TRANSFERENCIA DE 61-100 KVA-VISITA DE INSPECCION PLANTA ELECTRICA Y TRANSFERENCIA (Motores Diesel y tranferencia electrica) Revisión y diagnóstico del estado real de la planta electrica y su transferencia. Pruebas de funcionamiento, verificación de los parámetros eléctricos, mecánicos y fungibles. Nivelación de fluidos (aceite, refrigerante, combustible)	UNIDAD	1	$ 210,000.00	$ 210,000.00	015-2025
				Subtotal	**$ 210,000.00**	

FICHA TECNICA DE LA PLANTA

EQUIPO	POWER SOLUTIONS	**SERIE**	22259003
TIPO	PLANTA ELECTRICA	**MODELO**	LK224E
MARCA	ABC	**POTENCIA**	75 KVA
UBICACIÓN	DENTRO UNIDAD OPERATIVA	**AMPERAJE**	60 HZ
REFERENCIA	-	**VOLTAJE**	220
