Bogotá D.C.

Fecha de ejecución: septiembre 10 de 2025

Dirección: KR 95 A 85 90 SUR BOSA
Unidad Operativa: Jardín Infantil Campo Verde

Asunto: Informe Asistencia por Emergencia Planta Eléctrica

Contrato No. 9334- 2025

Secretaria Integración Social

Objeto contrato: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y TRANSFERENCIAS DE PROPIEDAD DE LA SDIS Y AQUELLOS POR LOS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE."


El día }10 de septiembre de 2025 se realizó una asistencia técnica de emergencia a la planta eléctrica AGG de 165 KVA en la unidad operativa Jardín Infantil Campo Verde.


Durante la visita técnica, se identificó una falla o anomalía en el sistema de transferencia automática.

Se procedió a realizar una revisión detallada y pruebas de funcionamiento, encontrándose un conflicto en los contactores motorizados.

La planta eléctrica quedó operativa al finalizar la asistencia. Sin embargo, se requiere realizar correctivos en el sistema de transferencia automática.

REGISTRO FOTOGRAFICO

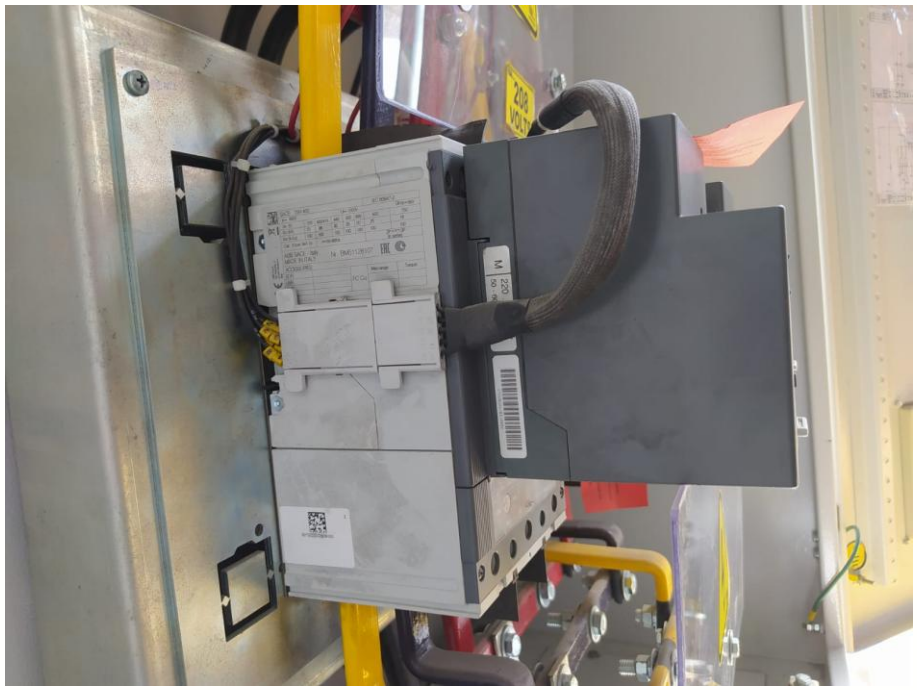

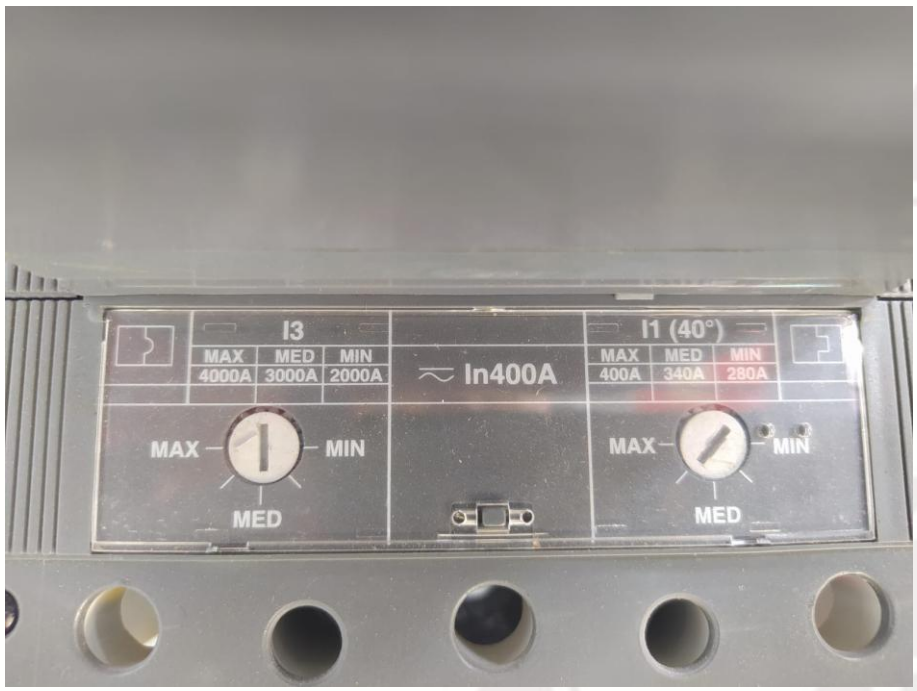


208
VOLTS
SACE Tmax
Push ON
Push OFF
O OFF
Auto Manual


208
VOLTS
ABB
SACE Tmax
Push ON
Push OFF
DISCHARGED SPRING
I ON
Auto Manual

TECNIELÉCTRICOS

SE ANEXA CUADRO COSTOS

ITEM BOLSA DE REPUESTOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Numero de Orden de Servicio
Mantenimiento preventivo planta electrica: 165 KVA // JI CAMPO VERDE TV 95 A 85 90 SUR						
5	PLANTA ELECTRICA DE 161-200 KVA-VISITA DE INSPECCION PLANTA ELECTRICA Y TRANSFERENCIA (Motores Diesel y tranferencia electrica) Revisión y diagnóstico del estado real de la planta electrica y su transferencia. Pruebas de funcionamiento, verificación de los parámetros eléctricos, mecánicos y fungibles. Nivelación de fluidos (aceite, refrigerante, combustible)	UNIDAD	1	$ 250,000.00	$ 250,000.00	003-2025
				Subtotal	$ 250,000.00	

FICHA TECNICA DE LA PLANTA

EQUIPO	GENERADOR	SERIE	A1905185	CAPACIDAD
TIPO	PLANTA ELECTRICA	MODELO	C165D6	BASE TANQUE
MARCA	AGG	POTENCIA	165 KVA	TANQUE EXTERNO
UBICACIÓN	DENTRO UNIDAD OPERATIVA	AMPERAJE	60 HZ	AISLAMIENTO
REFERENCIA	-	VOLTAJE	220	PRESION
