Bogotá D.C.

Fecha de ejecución: septiembre 16 de 2025

Dirección: KR 13A 31F 25 SUR RAFAEL URIBE URIBE
Unidad Operativa: Jardín Infantil Travesuras de Colores

Asunto: Informe Asistencia por Emergencia Planta Eléctrica

Contrato No. 9334 - 2025

Secretaria Integración Social

Objeto contrato: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y TRANSFERENCIAS DE PROPIEDAD DE LA SDIS Y AQUELLOS POR LOS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE."

El día 16 de septiembre de 2025 se realizó una asistencia técnica de emergencia a la planta eléctrica POWERGEN de 47 KVA en la unidad operativa Jardín Infantil Travesuras de Colores.


Durante la visita técnica, se evidenció que la planta eléctrica fue objeto de vandalismo. Como resultado de esta situación, se identificaron los siguientes hallazgos:

Hurto de elementos esenciales para el funcionamiento del equipo, tales como: la batería, cable de fuerza y acometida del cargador.

Daños en el sistema de control: deterioro en el cableado de control; el cual requiere adecuación general. Borneras y fusibles dañados.

Equipo (planta eléctrica) fuera de servicio.

REGISTRO FOTOGRAFICO

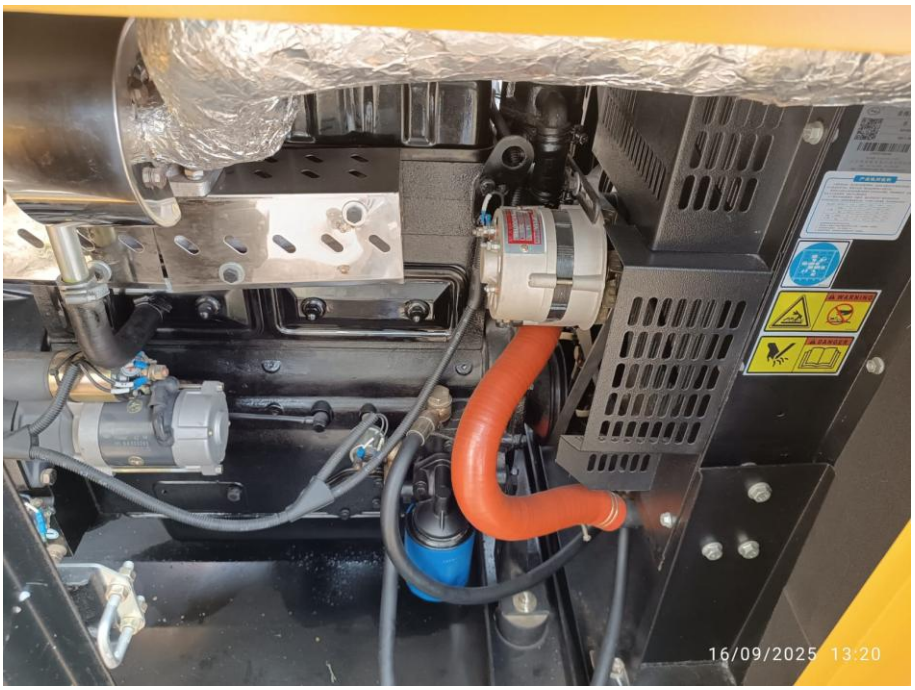



SE ANEXA CUADRO COSTOS

ITEM BOLSA DE REPUESTOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	Numero de Orden de Servicio
Mantenimiento preventivo planta electrica 47 KVA // JI TRAVESURAS DE COLORES KR 13A 31F 25 SUR						
2	PLANTA ELECTRICA Y TRANSFERENCIA DE 31-60 KVA-VISITA DE INSPECCION PLANTA ELECTRICA Y TRANSFERENCIA (Motores Diesel y tranferencia electrica) Revisión y diagnóstico del estado real de la planta electrica y su transferencia. Pruebas de funcionamiento, verificación de los parámetros eléctricos, mecánicos y fungibles. Nivelación de fluidos (aceite, refrigerante, combustible)	UNIDAD	1	$ 180,000.00	$ 180,000.00	009-2025
				Subtotal	**$ 180,000.00**	

FICHA TECNICA DE LA PLANTA

EQUIPO	GENERADOR	**SERIE**	TPS01FJ170082
TIPO	PLANTA ELECTRICA	**MODELO**	T45X PGK40
MARCA	POWERGEN	**POTENCIA**	47 KVA
UBICACIÓN	DENTRO UNIDAD OPERATIVA	**AMPERAJE**	60 HZ
REFERENCIA	2232928	**VOLTAJE**	220
