ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4

OBJETO DEL CONTRATO
Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI **FECHA ACTA:** **MAYO DE 2026**

FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACTA PARCIAL N. 1		ACTA PARCIAL N. 2		ACTA PARCIAL N. 3		ACTA PARCIAL N. 4		TOTAL EJECUTADO		POR EJECUTAR	
No.	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO OFERTADO**	**PRECIO TOTAL OFERTADO**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
1.00	**PRELIMINARES**																			
1.01	Localización y replanteo con equipo	m^2	277.00	$ 11,168.64	$ 3,093,713.28	357.66	$ 11,168.64	$3,994,575.78		$0.00	251.79	$2,812,151.87		$0.00	105.87	$1,182,423.92	357.66	$3,994,575.79	0.00	$0.00
1.02	Corte en húmedo de losa maciza de concreto reforzado, con sierra con disco diamantado, incluye retiro y disposición final de residuos	m^2	43.00	$ 159,656.64	$ 6,865,235.52	18.98	$ 159,656.64	$3,030,283.03		$0.00	18.98	$3,030,283.03		$0.00		$0.00	18.98	$3,030,283.03	0.00	$0.00
1.03	Desmontaje de tuberia hidraulica y sanitaria existente no embebida, incluye retiro y disposición final de residuos	ml	36.00	$ 12,401.28	$ 446,446.08	36.00	$ 12,401.28	$446,446.08		$0.00	36.00	$446,446.08		$0.00		$0.00	36.00	$446,446.08	0.00	$0.00
1.04	Desmontaje de aparatos sanitarios existentes, incluye retiro y disposición final de residuos	un	8.00	$ 65,895.36	$ 527,162.88	8.00	$ 65,895.36	$527,162.88	6.00	$395,372.16	2.00	$131,790.72		$0.00		$0.00	8.00	$527,162.88	0.00	$0.00
1.05	Desmontaje de tuberia electrica y cableado existente no embebida, incluye retiro y disposición final de residuos	ml	85.00	$ 8,387.52	$ 712,939.20	97.09	$ 8,387.52	$814,344.32	1.23	$10,316.65	76.64	$642,819.53	7.10	$59,551.39	12.12	$101,656.74	97.09	$814,344.31	0.00	$0.00
1.06	Desmontaje de aparatos electricos existentes, incluye retiro y disposición final de residuos	un	55.00	$ 14,362.56	$ 789,940.80	55.00	$ 14,362.56	$789,940.80		$0.00	55.00	$789,940.80		$0.00		$0.00	55.00	$789,940.80	0.00	$0.00
	TOTAL PRELIMINARES				**$ 12,435,437.76**			**$ 9,602,752.89**		**$ 405,688.81**		**$ 7,853,432.03**		**$ 59,551.39**		**$ 1,284,080.66**		**$ 9,602,752.89**		**$ 0.00**
2.00	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**																			
2.01	Excavación, cargue y retiro manual de material de suelo	m^3	25.00	$ 300,512.64	$ 7,512,816.00	5.85	$ 300,512.64	$1,757,998.94		$0.00	5.85	$1,757,998.94		$0.00		$0.00	5.85	$1,757,998.94	0.00	$0.00
2.02	Relleno en material seleccionado compactado mecanicamente	m^3	25.00	$ 164,544.00	$ 4,113,600.00	5.31	$ 164,544.00	$873,728.64		$0.00		$0.00	5.31	$873,728.64		$0.00	5.31	$873,728.64	0.00	$0.00
	TOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS				**$ 11,626,416.00**			**$ 2,631,727.58**		**$ 0.00**		**$ 1,757,998.94**		**$ 873,728.64**		**$ 0.00**		**$ 2,631,727.58**		**$ 0.00**
5.00	**ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**																			
5.01	Suministro y armado de acero de refuerzo de 60000 Psi para columnetas	kg	680.00	$ 6,761.28	$ 4,597,670.40	817.63	$ 6,761.28	$5,528,225.37		$0.00	635.47	$4,296,590.60	182.16	$1,231,634.76		$0.00	817.63	$5,528,225.36	0.00	$0.01
5.02	Suministro y armado de acero de refuerzo de 60000 Psi para viga cinta	kg	1028.00	$ 6,761.28	$ 6,950,595.84	283.51	$ 6,761.28	$1,916,890.49		$0.00	252.21	$1,705,262.43	31.30	$211,628.06		$0.00	283.51	$1,916,890.49	0.00	$0.00
5.03	Suministro y armado de acero de refuerzo de 60000 Psi para muros de mamposteria	kg	155.00	$ 6,761.28	$ 1,047,998.40	88.15	$ 6,761.28	$596,006.83		$0.00	56.27	$380,457.23		$0.00	31.88	$215,563.13	88.15	$596,020.36	0.00	-$13.53
5.04	Suministro y construcción de muro en mamposteria tipo Bloque No. 5 P-H Estriado 12 cms	m^2	200.00	$ 73,016.64	$ 14,603,328.00	145.30	$ 73,016.64	$10,609,317.79		$0.00	124.94	$9,122,699.00	20.36	$1,486,618.79		$0.00	145.30	$10,609,317.79	0.00	$0.00
5.05	Suministro y construcción de columnetas en concreto de 21 Mpa	m^3	3.00	$ 1,119,319.68	$ 3,357,959.04	0.00	$ 1,119,319.68	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
5.06	Suministro y construcción de vigas cinta en concreto de 21 Mpa	m^3	2.00	$ 1,104,406.08	$ 2,208,812.16	0.00	$ 1,104,406.08	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
5.07	Suministro y aplicación de anclaje químico estructural sobre concreto, mediante cartucho de inyección de resina epóxica	un	180.00	$ 23,016.00	$ 4,142,880.00	379.00	$ 23,016.00	$8,723,064.00		$0.00	176.00	$4,050,816.00	203.00	$4,672,248.00		$0.00	379.00	$8,723,064.00	0.00	$0.00
5.08	Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica de soporte luminarias	kg	1779.00	$ 20,591.04	$ 36,631,460.16	1761.49	$ 20,591.04	$36,270,911.05		$0.00		$0.00	1761.49	$36,270,911.05		$0.00	1761.49	$36,270,911.05	0.00	$0.00
	TOTAL ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES				**$ 73,540,704.00**			**$ 63,644,415.53**		**$ 0.00**		**$ 19,555,825.26**		**$ 43,873,040.66**		**$ 215,563.13**		**$ 63,644,429.05**		**-$ 13.52**
6.00	**REDES HIDRAULICAS**																			
6.01	Suministro e instalación de red PVC.P R de 21 - 3/4"	ml	8.00	$ 23,206.08	$ 185,648.64	6.49	$ 23,206.08	$150,607.46		$0.00		$0.00	6.49	$150,607.46		$0.00	6.49	$150,607.46	0.00	$0.00
6.02	Suministro e instalación de red PVC.P R de 21 - 1/2"	ml	99.00	$ 19,942.08	$ 1,974,265.92	116.97	$ 19,942.08	$2,332,625.10		$0.00		$0.00	93.91	$1,872,760.73	23.06	$459,864.36	116.97	$2,332,625.09	0.00	$0.00
6.03	Suministro e instalación de punto AF. PVC.P - 1/2"	un	13.00	$ 136,690.56	$ 1,776,977.28	13.00	$ 136,690.56	$1,776,977.28		$0.00		$0.00	13.00	$1,776,977.28		$0.00	13.00	$1,776,977.28	0.00	$0.00
6.04	Suministro e instalación de válvula de bola - 1/2"	un	8.00	$ 71,037.12	$ 568,296.96	10.00	$ 71,037.12	$710,371.20		$0.00		$0.00	8.00	$568,296.96	2.00	$142,074.24	10.00	$710,371.20	0.00	$0.00
	TOTAL REDES HIDRAULICAS				**$ 4,505,188.80**			**$ 4,970,581.04**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 4,368,642.43**		**$ 601,938.60**		**$ 4,970,581.03**		**$ 0.00**
7.00	**REDES SANITARIAS**																			
7.01	Suministro e instalación de red sanitaria PVC.S - 4"	ml	45.00	$ 101,246.40	$ 4,556,088.00	45.60	$ 101,246.40	$4,616,835.84		$0.00	11.70	$1,184,582.88	31.65	$3,204,448.56	2.25	$227,804.40	45.60	$4,616,835.84	0.00	$0.00
7.02	Suministro e instalación de red sanitaria PVC.S - 2"	ml	16.00	$ 84,138.24	$ 1,346,211.84	6.61	$ 84,138.24	$556,153.77		$0.00		$0.00	6.61	$556,153.77		$0.00	6.61	$556,153.77	0.00	$0.00
7.03	Suministro e instalación de salida sanitaria PVC.S - 4"	un	4.00	$ 186,925.44	$ 747,701.76	4.00	$ 186,925.44	$747,701.76		$0.00	1.00	$186,925.44	3.00	$560,776.32		$0.00	4.00	$747,701.76	0.00	$0.00
7.04	Suministro e instalación de salida sanitaria PVC.S - 2"	un	9.00	$ 141,343.68	$ 1,272,093.12	7.00	$ 141,343.68	$989,405.76		$0.00	1.00	$141,343.68	6.00	$848,062.08		$0.00	7.00	$989,405.76	0.00	$0.00
7.05	Suministro e instalación de sifones de piso - 2" incluye rejilla metálica	un	8.00	$ 124,836.48	$ 998,691.84	7.00	$ 124,836.48	$873,855.36		$0.00		$0.00	5.00	$624,182.40	2.00	$249,672.96	7.00	$873,855.36	0.00	$0.00
7.06	Suministro e instalación de tubería de ventilación PVC.L - 2"	ml	10.00	$ 32,410.56	$ 324,105.60	8.87	$ 32,410.56	$287,481.67		$0.00		$0.00	8.87	$287,481.67		$0.00	8.87	$287,481.67	0.00	$0.00
7.07	Ejecución de pase sacanucleos 4" en placa existente aligerada e=40cms	un	2.00	$ 128,588.16	$ 257,176.32	0.00	$ 128,588.16	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
7.08	Ejecución de pase sacanucleos 2" en placa existente aligerada e=40cms	un	4.00	$ 128,588.16	$ 514,352.64	0.00	$ 128,588.16	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00

7.09	Construcción de caja de inspección de 60x60cm, incluye excavación, marco en ángulo de 1.1/2" x 3/16" y tapa en platina de 1.1/2" x 3/16" reforzada con 1no. 2 c./0.15m en ambas direcciones, base en relleno, muros, losa de fondo, tapa y cañuelas en concreto de 2500 psi	un	1.00	$ 521,731.20	$ 521,731.20	1.00	$ 521,731.20	$521,731.20		$0.00		$0.00	1.00	$521,731.20		$0.00	1.00	$521,731.20	0.00	$0.00
	TOTAL REDES SANITARIAS				**$ 10,538,152.32**			**$ 8,593,165.35**		**$ 0.00**		**$ 1,512,852.00**		**$ 6,602,836.00**		**$ 477,477.36**		**$ 8,593,165.36**		**-$ 0.01**
8.00	**APARATOS SANITARIOS BAÑOS**																			
8.01	Suministro e instalación de sanitario de losa vitrificada tipo tanque con griferia tipo push cromada	un	4.00	$ 379,151.04	$ 1,516,604.16	4.00	$ 379,151.04	$1,516,604.16		$0.00		$0.00		$0.00	4.00	$1,516,604.16	4.00	$1,516,604.16	0.00	$0.00
8.02	Suministro e instalación de lavamanos de losa vitrificada tipo mural prefabricado con griferia tipo push	un	4.00	$ 282,216.00	$ 1,128,864.00	4.00	$ 282,216.00	$1,128,864.00		$0.00		$0.00		$0.00	4.00	$1,128,864.00	4.00	$1,128,864.00	0.00	$0.00
	TOTAL APARATOS SANITARIOS BAÑOS				**$ 2,645,468.16**			**$ 2,645,468.16**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 2,645,468.16**		**$ 2,645,468.16**		**$ 0.00**
10.00	**ACOMETIDAS, ALIMENTADORES Y TABLEROS**																			
10.01	Desconexion y conexion de acometida principal desde tablero de medidores, incluye verificacion de nivel de tension, verificacion de equipotenciaizacion de sistema de tierra, en el tablero de medidores No. 8.	un	1.00	$ 378,364.80	$ 378,364.80	1.00	$ 378,364.80	$378,364.80		$0.00		$0.00	1.00	$378,364.80		$0.00	1.00	$378,364.80	0.00	$0.00
10.02	Suministro, instalación y puesta en marcha de acometida 3x2+1x2(N)+1x8(T) Cobre AWG THHN, proveniente de punto de conexion tablero de medidores No. 8, hasta tablero T1 incluye tubería PVC 2" desde punto de conexión hasta tablero de distribución, remoción y compactación de tierra en su respectiva instalacion,	ml	25.00	$ 158,217.60	$ 3,955,440.00	61.80	$ 158,217.60	$9,777,847.68		$0.00		$0.00	42.00	$6,645,139.20	19.80	$3,132,708.48	61.80	$9,777,847.68	0.00	$0.00
10.03	Suministro, instalación y puesta en marcha de grupo de medida directa Ref. 3x(5-100) A, 120/208 V Corriente mínima: 5 A; Corriente máxima: 100 A; Diseñados para cargas de hasta 36 kW; Índice de Clase 1.; el medidor a suministrar debe tener el tamaño apto para instalar en el armario de medidores No. 8; Calibre máximo conductor : 2 AWG o 35 mm2, incluye calibración y el tramite de legalización ante el operador de red. Incluye protección 3x100A	un	1.00	$ 841,726.08	$ 841,726.08	0.00	$ 841,726.08	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
10.04	Suministro e instalación de tablero gabinete electrico T1 empotrable, con 24 circuitos trifasico, con espacio para totalizador ICC=10KA, incluye protecciones (3x100 - ajustable)+19(1x20)+3(2x40)+2(2x30)	un	1.00	$ 1,441,137.60	$ 1,441,137.60	0.00	$ 1,441,137.60	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
10.05	Suministro, instalación y puesta en marcha de alimentador en cable 2x8+1x8(N)+1x10(T) Cobre AWG THHN, libre de halogenos, en ducto EMT 3/4" proveniente de tablero T1, apto para instalar en bandeja, hasta UPS incluye puntas, arranque directo y terminales de conexión.	ml	25.00	$ 72,191.04	$ 1,804,776.00	50.00	$ 72,191.04	$3,609,552.00		$0.00		$0.00	25.00	$1,804,776.00	25.00	$1,804,776.00	50.00	$3,609,552.00	0.00	$0.00
10.06	Suministro, instalación y puesta en marcha de alimentador en cable 2x8+1x8(N)+1x10(T) Cobre AWG THHN, libre de halogenos, en ducto EMT 3/4" proveniente de UPS, hasta tablero de red regulada incluye puntas, arranque directo y terminales de conexión.	ml	2.00	$ 72,191.04	$ 144,382.08	2.00	$ 72,191.04	$144,382.08		$0.00		$0.00	2.00	$144,382.08		$0.00	2.00	$144,382.08	0.00	$0.00
10.07	Suministro e instalación de tablero electrico empotrable, red regulada, con 6 circuitos monofasico, sin totalizador, ICC=10KA,incluye llave by pass y transferencia, incluye protecciones 6(1x20)	un	1.00	$ 959,116.80	$ 959,116.80	1.00	$ 959,116.80	$959,116.80		$0.00		$0.00	1.00	$959,116.80		$0.00	1.00	$959,116.80	0.00	$0.00
10.08	Suministro, instalación y puesta en marcha de alimentador en cable 2x8+1x8(N)+1x10(T) Cobre AWG THHN, libre de halogenos, en ducto EMT 3/4" proveniente de tablero T1, hasta tablero de aires acondicionados incluye puntas, arranque directo y terminales de conexión.	ml	25.00	$ 72,191.04	$ 1,804,776.00	0.00	$ 72,191.04	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
10.09	Suministro e instalación de tablero electrico empotrable, aires acondicionados, con 6 circuitos bifásico, con totalizador 2x30A, ICC=10KA, incluye protecciones 6(2x20A)	un	1.00	$ 585,363.84	$ 585,363.84	0.00	$ 585,363.84	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
10.10	Suministro e instalacion de DPS en tablero principal Tipo 1, 3P+N 208/120V 15KA, incluye gabinete a medida y conexion con tablero T1	un	1.00	$ 324,097.92	$ 324,097.92	1.00	$ 324,097.92	$324,097.92		$0.00		$0.00	1.00	$324,097.92		$0.00	1.00	$324,097.92	0.00	$0.00
10.11	Ejecución de pase sacanucleos 2" en placa existente aligerada e=40cms	un	6.00	$ 128,588.16	$ 771,528.96	4.00	$ 128,588.16	$514,352.64		$0.00		$0.00	4.00	$514,352.64		$0.00	4.00	$514,352.64	0.00	$0.00
	TOTAL ACOMETIDAS, ALIMENTADORES Y TABLEROS				**$ 13,010,710.08**			**$ 15,707,713.92**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 10,770,229.44**		**$ 4,937,484.48**		**$ 15,707,713.92**		**$ 0.00**
11.00	**SALIDAS ELÉCTRICAS INTERNAS**																			
11.01	Suministro, instalación, marcación y puesta en marcha de salida de luminaria sobre techo en tuberia EMT 3/4" tipo pesado con conductor cable 1x12+1x12+1x14 Cobre AWG THHN, libre de halogenos, incluye alimentador, caja 5800 para conexión, elementos de fijacion, interruptor, tomacorriente monofasica con polo a tierra 120 V y accesorios, (no incluye luminaria)	un	79.00	$ 225,744.00	$ 17,833,776.00	0.00	$ 225,744.00	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00

11.02	Suministro, instalación, marcación y puesta en marcha de salida de luminaria sobre techo en doble altura en tuberia EMT 3/4" tipo pesado con conductor cable 1x12+1x12+1x14 Cobre AWG THHN, libre de halogenos, incluye alimentador, caja 5800 para conexión, elementos de fijacion, interruptor, tomacorriente monofasica con polo a tierra 120 V y accesorios, (no incluye luminaria)	un	7.00	$ 425,533.44	$ 2,978,734.08	0.00	$ 425,533.44	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
11.03	Suministro, instalación, marcación y puesta en marcha de salida de luminaria de emergencia en tuberia EMT 3/4" con conductor cable 1x12+1x12+1x14 Cobre AWG THHN, libre de halogenos, incluye alimentador, caja 5800 para conexión, elementos de fijacion, interruptor, tomacorriente monofasica con polo a tierra 120 V y accesorios, (no incluye luminaria)	un	7.00	$ 488,156.16	$ 3,417,093.12	0.00	$ 488,156.16	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
11.04	Suministro, instalación, marcación y puesta en marcha de salida para tomacorriente monofásico con polo a tierra en tubería EMT 3/4" y conductor cable 1x12+1x12+1x14 Cobre AWG THHN, libre de halogenos, incluye alimentador, caja 5800, accesorios y elementos de fijación.	un	61.00	$ 220,235.52	$ 13,434,366.72	0.00	$ 220,235.52	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
11.05	Suministro, instalación, marcación y puesta en marcha de salida para tomacorriente monofásico con polo a tierra regulada en tubería EMT 3/4" y conductor cable 1x12+1x12+1x14 Cobre AWG THHN, libre de halogenos, apto para instalar en bandeja, incluye alimentador, caja 5800, accesorios y elementos de fijación.	un	13.00	$ 220,235.52	$ 2,863,061.76	0.00	$ 220,235.52	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
11.06	Suministro, instalación, marcación y puesta en marcha de salida para extractores de baños en tubería EMT 3/4" y conductor cable 1x12+1x12+1x14 Cobre AWG THHN, libre de halogenos, apto para instalar en bandeja, incluye alimentador, caja 5800, accesorios y elementos de fijación.	un	4.00	$ 489,113.28	$ 1,956,453.12	0.00	$ 489,113.28	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
11.07	Suministro, instalación y puesta en marcha de alimentador cable 2x8+1x10 Cobre AWG THHN, libre de halogenos, apto para instalar en bandeja, proveniente de tablero T1 hasta maquina de corte ubicada en cuarto de corte. Incluye tomacorriente bifasica macho y hembra 208 V	ml	24.00	$ 82,049.28	$ 1,969,182.72	31.00	$ 82,049.28	$2,543,527.68		$0.00		$0.00	30.00	$2,461,478.40	1.00	$82,049.28	31.00	$2,543,527.68	0.00	$0.00
11.08	Suministro, instalación y puesta en marcha de alimentador cable 1x10+1x10+1x12 Cobre AWG THHN, libre de halogenos, apto para instalar en bandeja, proveniente de tablero T1 hasta maquina de secado ubicada en cuarto de secado. Incluye tomacorriente monofasica 120 V	ml	27.00	$ 69,216.00	$ 1,868,832.00	25.00	$ 69,216.00	$1,730,400.00		$0.00		$0.00	25.00	$1,730,400.00		$0.00	25.00	$1,730,400.00	0.00	$0.00
11.09	Suministro, instalación y puesta en marcha de alimentador cable 1x10+1x10+1x12 Cobre AWG THHN, libre de halogenos, apto para instalar en bandeja, proveniente de tablero T1 hasta maquina de rayos X ubicada en cuarto de secado. Incluye tomacorriente monofasica 120 V	ml	29.00	$ 69,216.00	$ 2,007,264.00	0.00	$ 69,216.00	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
11.10	Suministro, instalación y puesta en marcha de alimentador cable 2X8+1x8+1x10 Cobre AWG THHN, libre de halogenos, apto para instalar en bandeja, proveniente de tablero T1 hasta maquina de motoventilador ubicada en cuarto de secado. Incluye tomacorriente monofasica 120 V con tierra aislada	ml	28.00	$ 71,705.28	$ 2,007,747.84	0.00	$ 71,705.28	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
11.11	Siministro e instalacion de bandeja portacable 20cm de ancho, tipo canastilla, para carga ligera bajo cumplimiento IEC 61537, incluye accesorios y elementos de fijacion	ml	35.00	$ 85,480.32	$ 2,991,811.20	35.50	$ 85,480.32	$3,034,551.36		$0.00		$0.00	34.57	$2,955,054.66	0.93	$79,496.70	35.50	$3,034,551.36	0.00	$0.00
11.12	Suministro, instalación y puesta en marcha de caja de paso en techo para conexión eléctrica.	un	5.00	$ 41,418.24	$ 207,091.20	0.00	$ 41,418.24	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
11.13	Suministro, instalación y puesta en marcha de luminaria P26379-Led 30W	un	39.00	$ 108,262.08	$ 4,222,221.12	33.00	$ 108,262.08	$3,572,648.64		$0.00		$0.00	30.00	$3,247,862.40	3.00	$324,786.24	33.00	$3,572,648.64	0.00	$0.00
11.14	Suministro, instalación y puesta en marcha de luminaria P23950-Led 50W	un	13.00	$ 253,147.20	$ 3,290,913.60	4.00	$ 253,147.20	$1,012,588.80		$0.00		$0.00	4.00	$1,012,588.80		$0.00	4.00	$1,012,588.80	0.00	$0.00
11.15	Suministro, instalación y puesta en marcha de luminaria P29955-Led 6W	un	4.00	$ 101,027.52	$ 404,110.08	0.00	$ 101,027.52	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
11.16	Suministro, instalación y puesta en marcha de luminaria P24104 LED 100W	un	10.00	$ 644,309.76	$ 6,443,097.60	10.00	$ 644,309.76	$6,443,097.60		$0.00		$0.00	10.00	$6,443,097.60		$0.00	10.00	$6,443,097.60	0.00	$0.00
11.17	Suministro, instalación y puesta en marcha de luminaria P29579 LED PANEL PRO SQ 36W DL UNV BL	un	17.00	$ 176,341.44	$ 2,997,804.48	16.00	$ 176,341.44	$2,821,463.04		$0.00		$0.00	16.00	$2,821,463.04		$0.00	16.00	$2,821,463.04	0.00	$0.00
11.18	Suministro, instalación y puesta en marcha de luminaria de emergencia P26848 - LED, incluye bateria para su funcionamiento.	un	7.00	$ 179,114.88	$ 1,253,804.16	10.00	$ 179,114.88	$1,791,148.80		$0.00		$0.00	9.00	$1,612,033.92	2.00	$358,229.76	11.00	$1,970,263.68	-1.00	-$179,114.88
11.19	Suministro, instalación y puesta en marcha de extractor de aire sin salida al exterior incluye filtro	un	4.00	$ 402,748.80	$ 1,610,995.20	4.00	$ 402,748.80	$1,610,995.20		$0.00		$0.00	2.00	$805,497.60	2.00	$805,497.60	4.00	$1,610,995.20	0.00	$0.00
	TOTAL SALIDAS ELECTRICAS INTERNAS				**$ 73,758,360.00**	0.00		**$ 24,560,421.12**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 23,089,476.42**		**$ 1,650,059.58**		**$ 24,739,536.00**		**-$ 179,114.88**

12.00	**SISTEMA VOZ Y DATOS**																			
12.01	Suministro, instalación y puesta en marcha de Cable UTP Categoria 6A LSZH	ml	145.00	$ 22,056.96	$ 3,198,259.20	530.00	$ 22,056.96	$11,690,188.80		$0.00		$0.00	301.09	$6,641,130.09	228.91	$5,049,058.71	530.00	$11,690,188.80	0.00	$0.00
12.02	Suministro, instalación y puesta en marcha de Instalación de Jack RJ45 Categoria 6A para puestos de trabajo, televisores y salas de reuniones	un	24.00	$ 126,629.76	$ 3,039,114.24	22.00	$ 126,629.76	$2,785,854.72		$0.00		$0.00	22.00	$2,785,854.72		$0.00	22.00	$2,785,854.72	0.00	$0.00
12.03	Suministro, instalación y puesta en marcha de Jack RJ45 Categoria 6A para access point	un	5.00	$ 129,256.32	$ 646,281.60	4.00	$ 129,256.32	$517,025.28		$0.00		$0.00	4.00	$517,025.28		$0.00	4.00	$517,025.28	0.00	$0.00
12.04	Suministro, instalación y puesta en marcha de rack de comunicaciones de 42RU, incluye Organizador de fibra optica, organizador de cable, patch panel de 25 puertos y regleta de alimentacion	un	1.00	$ 2,017,873.92	$ 2,017,873.92	1.00	$ 2,017,873.92	$2,017,873.92		$0.00		$0.00	1.00	$2,017,873.92		$0.00	1.00	$2,017,873.92	0.00	$0.00
12.05	Suministro e instalacion de switch de 48 puertos	un	1.00	$ 2,752,781.76	$ 2,752,781.76	1.00	$ 2,752,781.76	$2,752,781.76		$0.00		$0.00	1.00	$2,752,781.76		$0.00	1.00	$2,752,781.76	0.00	$0.00
12.06	Suministro, instalación y puesta en marcha de Patch Panel 48 Puertos Categoria 6A	un	1.00	$ 512,474.88	$ 512,474.88	1.00	$ 512,474.88	$512,474.88		$0.00		$0.00	1.00	$512,474.88		$0.00	1.00	$512,474.88	0.00	$0.00
12.07	Suministro, instalación y puesta en marcha de organizador horizontal de 2RU frontal trasero	un	2.00	$ 163,509.12	$ 327,018.24	2.00	$ 163,509.12	$327,018.24		$0.00		$0.00	2.00	$327,018.24		$0.00	2.00	$327,018.24	0.00	$0.00
12.08	Suministro, instalación y puesta en marcha de Patch Cord Categoria 6A- 1.5 m	un	58.00	$ 99,238.08	$ 5,755,808.64	58.00	$ 99,238.08	$5,755,808.64		$0.00		$0.00	26.00	$2,580,190.08	32.00	$3,175,618.56	58.00	$5,755,808.64	0.00	$0.00
12.09	Marcacion y Codificacion de puntos en Patch Panel	un	29.00	$ 18,713.28	$ 542,685.12	29.00	$ 18,713.28	$542,685.12		$0.00		$0.00		$0.00	26.00	$486,545.28	26.00	$486,545.28	3.00	$56,139.84
12.10	Suministro, instalación y puesta en marcha de bandeja portaequipos	un	2.00	$ 83,746.56	$ 167,493.12	2.00	$ 83,746.56	$167,493.12		$0.00		$0.00	2.00	$167,493.12		$0.00	2.00	$167,493.12	0.00	$0.00
12.11	Suministro, instalación y puesta en marcha de multitoma horizontal de 6 tomacorrientes 6 salidas, marca Quest o similar.	un	2.00	$ 142,564.80	$ 285,129.60	2.00	$ 142,564.80	$285,129.60		$0.00		$0.00	2.00	$285,129.60		$0.00	2.00	$285,129.60	0.00	$0.00
12.12	Suministro, instalación y puesta en marcha de Barraje secundario TGB para aterrizaje de equipos de Rack	un	1.00	$ 639,651.84	$ 639,651.84	1.00	$ 639,651.84	$639,651.84		$0.00		$0.00	1.00	$639,651.84		$0.00	1.00	$639,651.84	0.00	$0.00
12.13	Suministro, instalación y puesta en marcha de Barraje horizontal para rack de comunicaciones.	un	1.00	$ 354,037.44	$ 354,037.44	1.00	$ 354,037.44	$354,037.44		$0.00		$0.00	1.00	$354,037.44		$0.00	1.00	$354,037.44	0.00	$0.00
12.14	Suministro, instalación y puesta en marcha de Cable No. 6 desnudo para union de TGB de datacenter con Rack principal por ducto y barraje de tablero regulado.	ml	12.00	$ 14,243.52	$ 170,922.24	15.00	$ 14,243.52	$213,652.80		$0.00		$0.00		$0.00	15.00	$213,652.80	15.00	$213,652.80	0.00	$0.00
12.15	Suministro, instalación y puesta en marcha de Cable No 12 LSZH para aterrizaje gabinetes, chasis de equipos y demas estructuras metalicas en sitio. Color verde	ml	12.00	$ 7,908.48	$ 94,901.76	13.00	$ 7,908.48	$102,810.24		$0.00		$0.00		$0.00	13.00	$102,810.24	13.00	$102,810.24	0.00	$0.00
12.16	Suministro, instalación y puesta en marcha de cajas de paso 15x15 para comunicación de barrajes.	un	2.00	$ 44,093.76	$ 88,187.52	2.00	$ 44,093.76	$88,187.52		$0.00		$0.00		$0.00	2.00	$88,187.52	2.00	$88,187.52	0.00	$0.00
12.17	Suministro e instalacion de caja galvanizada retie 5800, para salidas de datos o caja de paso, incluye accesorios	un	27.00	$ 21,192.00	$ 572,184.00	27.00	$ 21,192.00	$572,184.00		$0.00		$0.00	7.00	$148,344.00	20.00	$423,840.00	27.00	$572,184.00	0.00	$0.00
12.18	Suministro, instalación y puesta en marcha de tubería EMT de 3/4" con accesorios de instalación y soporte para sistema de datos.	ml	50.00	$ 52,883.52	$ 2,644,176.00	134.07	$ 52,883.52	$7,090,093.53		$0.00		$0.00	123.20	$6,515,249.66	19.81	$1,047,622.53	143.01	$7,562,872.19	-8.94	-$472,778.66
12.19	Suministro, instalación y puesta en marcha de tubería EMT de 1-1/2" con accesorios de instalación y soporte para sistema de datos y proveedor de servicio.	ml	20.00	$ 60,256.32	$ 1,205,126.40	34.65	$ 60,256.32	$2,087,881.49		$0.00		$0.00	30.65	$1,846,856.21	4.00	$241,025.28	34.65	$2,087,881.49	0.00	$0.00
12.20	Suministro e instalacion UPS de 5 KVA 2F+N+T (Según especificaciones técnicas), autonomia de 30 min plena carga. Incluye conexión, celda con baterías internas para 30 minutos a plena carga, instalación en Rack, start up	un	1.00	$ 10,528,920.96	$ 10,528,920.96	1.00	$ 10,528,920.96	$10,528,920.96		$0.00		$0.00	1.00	$10,528,920.96		$0.00	1.00	$10,528,920.96	0.00	$0.00
12.21	Suministro e instalacion de salida para sensor de control de temperatura y humedad	un	1.00	$ 558,816.96	$ 558,816.96	1.00	$ 558,816.96	$558,816.96		$0.00		$0.00		$0.00	1.00	$558,816.96	1.00	$558,816.96	0.00	$0.00
12.22	Suministro e instalacion de punto de control de acceso a cuarto de datos	un	1.00	$ 753,467.52	$ 753,467.52	1.00	$ 753,467.52	$753,467.52		$0.00		$0.00		$0.00	1.00	$753,467.52	1.00	$753,467.52	0.00	$0.00
	TOTAL SISTEMA VOZ Y DATOS				**$ 36,855,312.96**			**$ 50,344,038.37**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 38,620,031.80**		**$ 12,140,645.40**		**$ 50,760,677.20**		**-$ 416,638.83**
13.00	**SISTEMA SPT**																			
13.01	Suministro, instalación y puesta en marcha de caja de inspeccion 30x30 con varilla cobre 2.5 mts, incluye soldadura exotermica	un	1.00	$ 390,769.92	$ 390,769.92	1.00	$ 390,769.92	$390,769.92		$0.00		$0.00	1.00	$390,769.92		$0.00	1.00	$390,769.92	0.00	$0.00
13.02	Suministro, instalación y puesta en marcha de cable desnudo 8 AWQ desnudo para malla equipotencializacion de sistema SPT, soldadura exotermica y terminales de conexión	ml	25.00	$ 64,312.32	$ 1,607,808.00	37.50	$ 64,312.32	$2,411,712.00		$0.00		$0.00	24.74	$1,591,086.80	12.76	$820,625.20	37.50	$2,411,712.00	0.00	$0.00
13.03	Medicion de resistencia de puerta a tierra, para cumplimiento norma IEEE80	un	1.00	$ 124,156.80	$ 124,156.80	1.00	$ 124,156.80	$124,156.80		$0.00		$0.00		$0.00	1.00	$124,156.80	1.00	$124,156.80	0.00	$0.00
	TOTAL SISTEMA SPT				**$ 2,122,734.72**			**$ 2,926,638.72**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 1,981,856.72**		**$ 944,782.00**		**$ 2,926,638.72**		**$ 0.00**
14.00	**DETECCIÓN INCENDIOS**																			
14.01	Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4" con accesorios de instalación y soporte para sistema detección de incendio.	ml	138.00	$ 70,374.72	$ 9,711,711.36	118.69	$ 70,374.72	$8,352,775.52		$0.00		$0.00	81.74	$5,752,429.61	36.95	$2,600,345.90	118.69	$8,352,775.51	0.00	$0.00
14.02	Suministro, instalación y puesta en marcha de estacion manual de alarma, voltaje operación 24Vdc	un	3.00	$ 416,459.52	$ 1,249,378.56	3.00	$ 416,459.52	$1,249,378.56		$0.00		$0.00		$0.00	3.00	$1,249,378.56	3.00	$1,249,378.56	0.00	$0.00
14.03	Suministro, instalación y puesta en marcha de detectores de humo, Voltaje de operación 15-32VDC, Max corriente, 2mA	un	30.00	$ 729,280.32	$ 21,878,409.60	28.00	$ 729,280.32	$20,419,848.96		$0.00		$0.00		$0.00	28.00	$20,419,848.96	28.00	$20,419,848.96	0.00	$0.00
14.04	Suministro, instalación y puesta en marcha de alarma estroboscoipca P2rXX, Salida de sonido 88dbA, Voltaje de operación 12/24 Vdc, destello por segundo 1, instalacion en pared	un	3.00	$ 918,872.64	$ 2,756,617.92	3.00	$ 918,872.64	$2,756,617.92		$0.00		$0.00		$0.00	3.00	$2,756,617.92	3.00	$2,756,617.92	0.00	$0.00

14.05	Suministro, instalación y puesta en marcha de panel de deteccion de incendios Min 2 Zonas, 2xNAC´s, Voltaje de operación 120/208 V	un	1.00	$ 5,784,059.52	$ 5,784,059.52	1.00	$ 5,784,059.52	$5,784,059.52		$0.00		$0.00		$0.00	1.00	$5,784,059.52	1.00	$5,784,059.52	0.00	$0.00
	TOTAL DETECCIÓN INCENDIOS				**$ 41,380,176.96**			**$ 38,562,680.48**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 5,752,429.61**		**$ 32,810,250.86**		**$ 38,562,680.47**		**$ 0.00**
15.00	**REDES MECANICAS Y HVAC**																			
15.01	Suministro e instalación de TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 3/4", (Incluye aislamiento, suministro, transporte e instalación, fijaciones, materiales, accesorios, pruebas, arranques y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	ml	30.00	$ 74,027.52	$ 2,220,825.60	0.00	$ 74,027.52	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
15.02	Suministro e instalación de TUBO PVC DE 4" para extraccion en baños (Incluye suministro, transporte e instalación, fijaciones, materiales, accesorios, pruebas, arranques y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	ml	6.00	$ 101,246.40	$ 607,478.40	0.00	$ 101,246.40	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
15.03	Suministro e instalación de TUBO PVC DE 2" para desagüe (Incluye suministro, transporte e instalación, fijaciones, materiales, accesorios, pruebas, arranques y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	ml	10.00	$ 76,915.20	$ 769,152.00	0.00	$ 76,915.20	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
15.04	Suministro e instalación de Pipetas de refrigerante R410 x 13 kilos (Incluye suministro, transporte e instalación, fijaciones, materiales, accesorios, pruebas, arranques y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	un	1.00	$ 1,209,088.32	$ 1,209,088.32	0.00	$ 1,209,088.32	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
15.05	Suministro e instalación de ducto en lámina galvanizada calibre 20 de 6" a 20" con flanches de acople en ángulo. (Incluye suministro, transporte e instalación, fijaciones, materiales, accesorios, pruebas, arranques y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	m^2	30.00	$ 364,527.36	$ 10,935,820.80	0.00	$ 364,527.36	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
15.06	Suministro e instalación de CONDENSADORA DE 5 kw; 460/3ph-60hZ(Incluye suministro, transporte e instalación, fijaciones, materiales, accesorios, pruebas, arranques y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	un	1.00	$ 26,014,962.24	$ 26,014,962.24	0.00	$ 26,014,962.24	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
15.07	Suministro e instalación de Rejilla mecánica de extraccion o inyeccion de Aire (Incluye suministro, transporte e instalación, fijaciones, materiales, accesorios, pruebas, arranques y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento); aproximadamente 215 Rejillas de aire de inyeecion y extraccion	un	1.00	$ 27,160.32	$ 27,160.32	0.00	$ 27,160.32	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
15.08	Suministro e instalación de EVAPORADORA Cassette de pared 12.1kBTU 220-240V-1ph-50/60HZ (Incluye suministro)	un	1.00	$ 3,007,141.44	$ 3,007,141.44	0.00	$ 3,007,141.44	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
15.09	Suministro e instalación de WIRELESS REMOTE CONTROLLERCONTROL ; main or secondary controller setting (Incluye suministro, transporte e instalación, fijaciones, materiales, accesorios, pruebas, arranques y todo lo demás necesario para su correcta ejecución y funcionamiento)	un	1.00	$ 254,020.80	$ 254,020.80	0.00	$ 254,020.80	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
15.10	Suministro, instalación y puesta en marcha de alimentador cable 1x12+1x12+1x14 Cobre AWG THHN, libre de halogenos, apto para instalar en bandeja, de tablero aires acondicionados a cada aparato. Incluye tomacorriente bifasica 208 V	ml	40.00	$ 66,929.28	$ 2,677,171.20	0.00	$ 66,929.28	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
	TOTAL REDES MECANICAS Y HVAC				**$ 47,722,821.12**			**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**
16.00	**ACTIVIDADES ARQUITECTONICAS**																			
16.01	DESMONTE DE ALFOMBRA	M2	104.0	$ 3,840.00	$ 399,360.00	98.00	$ 3,840.00	$376,320.00	97.9959	$376,304.07		$0.00		$0.00		$0.00	98.00	$376,304.07	0.00	$15.93
16.02	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES	UND	5.0	$ 20,688.00	$ 103,440.00	5.00	$ 20,688.00	$103,440.00		$0.00	5.00	$103,440.00		$0.00		$0.00	5.00	$103,440.00	0.00	$0.00
16.03	DESMONTE DE VENTANERIA INTERIOR	M2	14.0	$ 18,135.36	$ 253,895.04	0.00	$ 18,135.36	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
16.04	DESMONTE DE REJA EXISTENTE EN PRIMER PISO					0.00	$ 0.00	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
16.05	DEMOLICIÓN DE MESÓN EN COCINETA INCLUYE LAVAPLATOS	M2	1.0	$ 29,374.08	$ 29,374.08	1.13	$ 29,374.08	$33,192.71		$0.00	0.95	$27,905.38		$0.00	0.18	$5,287.33	1.13	$33,192.71	0.00	$0.00
16.06	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 INCLUYE COLUMNAS	M2	793.0	$ 26,919.36	$ 21,347,052.48	0.00	$ 26,919.36	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
16.07	ESTUCO Y VINILO TIPO I SOBRE MUROS COLOR BLANCO TRES MANOS	M2	793.0	$ 24,459.84	$ 19,396,653.12	736.26	$ 24,459.84	$18,008,826.26		$0.00		$0.00	736.26	$18,008,801.80		$0.00	736.26	$18,008,801.80	0.00	$24.46
16.08	ALISTADO PARA PISOS E=0.04M (INCLUYE RAYADO DE PISO)	M2	363.0	$ 36,038.40	$ 13,081,939.20	0.00	$ 36,038.40	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
16.09	PISO EN PORCELANATO SOHO O SIMILAR COLOR BEIGE 0.60 X 0.60 O SIMILAR	M2	104.0	$ 82,269.12	$ 8,555,988.48	172.31	$ 82,269.12	$14,175,792.07		$0.00		$0.00	172.31	$14,175,792.07		$0.00	172.31	$14,175,792.07	0.00	$0.00
16.10	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SOHO O SIMILAR COLOR BEIGE DE ALTURA 0.08 MTS INCLUYE REMATE PULIDO	ML	99.0	$ 51,039.36	$ 5,052,896.64	185.39	$ 51,039.36	$9,462,186.95		$0.00		$0.00	114.34	$5,835,840.42	71.05	$3,626,346.53	185.39	$9,462,186.95	0.00	$0.00
16.11	ENCHAPE PARA BAÑOS 0.3 X 0.3 COLOR BLANCO LISO (INCLUYE BOQUILLA)	M2	19.0	$ 53,469.12	$ 1,015,913.28	11.57	$ 53,469.12	$618,637.72		$0.00		$0.00		$0.00	11.57	$618,637.72	11.57	$618,637.72	0.00	$0.00
16.12	PAREDES CON ENCHAPE CERÁMICO TIPO VELA O SIMILAR COLOR BLANCO 0.24X 0.40 HASTA ALTURA DE 1.20 MTS. SOBRE ESTA ALTURA Y HASTA CIELORASO PAREDES PAÑETADAS Y ESTUCADAS. PINTURA VINILO BLANCO	M2	43.0	$ 53,469.12	$ 2,299,172.16	34.27	$ 53,469.12	$1,832,386.74		$0.00		$0.00		$0.00	34.27	$1,832,386.74	34.27	$1,832,386.74	0.00	$0.00

16.13	ENCHAPE PARA COCINA 0.3 X 0.3 COLOR BLANCO LISO (INCLUYE BOQUILLA)	M2	1.0	$ 53,469.12	$ 53,469.12	4.08	$ 53,469.12	$218,154.01		$0.00		$0.00		$0.00	11.38	$608,478.59	11.38	$608,478.59	-7.30	-$390,324.58
16.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA BATIENTE METALICA COLOR NEGRO. (0.95X2.00)	UND	2.0	$ 912,000.00	$ 1,824,000.00	0.00	$ 912,000.00	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
16.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO COLOR NATURAL (INCLUYE REJILLA DE VENTILACIÓN). (0.95X2.00)	UND	1.0	$ 912,000.00	$ 912,000.00	0.00	$ 912,000.00	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
16.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA CORREDIZA EN MADERA AGLOMERADADA. (1.00X2.00)	UND	3.0	$ 1,056,000.00	$ 3,168,000.00	0.00	$ 1,056,000.00	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
16.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA BATIENTE EN MADERA AGLOMERADADA. (0.95X2.00)	UND	5.0	$ 777,600.00	$ 3,888,000.00	0.00	$ 777,600.00	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
16.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA BATIENTE EN MADERA AGLOMERADADA. (0.70X2.00)	UND	3.0	$ 777,600.00	$ 2,332,800.00	0.00	$ 777,600.00	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
16.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE COCINA CON MESÓN EN GRANITO Y GABINETE INFERIOR (INCLUYE LAVAPLATOS) (1.20x0.45x0.70)	UND	1.0	$ 1,865,760.00	$ 1,865,760.00	1.00	$ 1,865,760.00	$1,865,760.00		$0.00		$0.00		$0.00	1.00	$1,865,760.00	1.00	$1,865,760.00	0.00	$0.00
16.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE SUPERIOR EN COCINA (0.60x0.35x0.70)	UND	1.0	$ 635,040.00	$ 635,040.00	1.00	$ 635,040.00	$635,040.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	1.00	$635,040.00
16.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA FIJA EN VIDRIO TEMPLADO 6MM (0.90x1.30)	UND	8.0	$ 460,800.00	$ 3,686,400.00	0.00	$ 460,800.00	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
16.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO 6MM	M2	10.0	$ 500,160.00	$ 5,001,600.00	0.00	$ 500,160.00	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
16.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO 6MM (0.95X2.10)	UND	1.0	$ 1,584,000.00	$ 1,584,000.00	0.00	$ 1,584,000.00	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
16.24	CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA Y FRESCASA	M2	104.0	$ 84,231.36	$ 8,760,061.44	101.48	$ 84,231.36	$8,547,798.41		$0.00		$0.00	99.77	$8,403,762.79	1.71	$144,035.63	101.48	$8,547,798.42	0.00	$0.00
16.25	CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA	M2	104.0	$ 74,631.36	$ 7,761,661.44	93.13	$ 74,631.36	$6,950,418.56		$0.00		$0.00	50.53	$3,771,122.62	47.91	$3,575,588.46	98.44	$7,346,711.08	-5.31	-$396,292.52
16.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETA DE ASEO (INCLUYE LLAVE DE SALIDA Y ENCHAPE)	UND	2.0	$ 318,775.68	$ 637,551.36	2.00	$ 318,775.68	$637,551.36		$0.00		$0.00		$0.00	1.00	$318,775.68	1.00	$318,775.68	1.00	$318,775.68
16.27	PISO EN MICROCEMENTO GRIS	M2	85.0	$ 90,928.32	$ 7,728,907.20	164.00	$ 90,928.32	$14,912,244.48		$0.00		$0.00		$0.00	164.00	$14,912,244.48	164.00	$14,912,244.48	0.00	$0.00
	TOTAL ACTIVIDADES ARQUITECTONICAS				**$ 121,374,935.04**			**$ 78,377,749.27**		**$ 376,304.07**		**$ 131,345.38**		**$ 50,195,319.70**		**$ 27,507,541.15**		**$ 78,210,510.30**		**$ 167,238.96**
17.00	**ASEO Y LIMPIEZA**																			
17.01	Aseo y Limpieza	m^2	423.00	$ 4,208.64	$ 1,780,254.72	423.00	$ 4,208.64	$1,780,254.72		$0.00		$0.00		$0.00	383.29	$1,613,129.63	383.29	$1,613,129.63	39.71	$167,125.09
	TOTAL ASEO Y LIMPIEZA				**$ 1,780,254.72**			**$ 1,780,254.72**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 1,613,129.63**		**$ 1,613,129.63**		**$ 167,125.09**
NP	**ÍTEMS NO PREVISTOS**																			
N.P 1	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4, INCLUYE RELLENO	m2		$ 44,154.00		736.26	$ 44,154.00	$32,508,868.19		$0.00		$0.00	734.33	$32,423,723.83	47.22	$2,084,879.03	781.55	$34,508,602.86	-45.29	-$1,999,734.66
N.P 2	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	m		$ 18,818.01		479.89	$ 18,818.01	$9,030,574.82		$0.00		$0.00	392.29	$7,382,117.14	87.60	$1,648,457.68	479.89	$9,030,574.82	0.00	$0.00
N.P 3	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	m		$ 13,235.00		479.89	$ 13,235.00	$6,351,344.15		$0.00		$0.00	392.29	$5,191,958.15	87.60	$1,159,386.00	479.89	$6,351,344.15	0.00	$0.00
N.P 4	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4	m2		$ 42,725.80		11.75	$ 42,725.80	$502,028.15		$0.00		$0.00	6.28	$268,318.02	8.66	$370,005.43	14.94	$638,323.45	-3.19	-$136,295.30
N.P 5	FILOS BAJO PLACA MORTERO 1:4	m		$ 8,138.32		12.84	$ 8,138.32	$104,496.03		$0.00		$0.00	10.00	$81,383.20	2.84	$23,112.83	12.84	$104,496.03	0.00	$0.00
N.P 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS BAJO PLACA	m2		$ 47,663.00		11.75	$ 47,663.00	$560,040.25		$0.00		$0.00	6.28	$299,323.64	8.66	$412,761.58	14.94	$712,085.22	-3.19	-$152,044.97
N.P 7	MURO DOBLE CARA DE e = 0.08 m., EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 8 MM.	m2		$ 161,942.00		21.91	$ 161,942.00	$3,548,149.22		$0.00		$0.00	5.57	$902,016.94	16.34	$2,646,132.28	21.91	$3,548,149.22	0.00	$0.00
N.P 8	IMPERMEABILIZACION MURO EN LADRILLO	m2		$ 123,246.00		7.81	$ 123,246.00	$962,551.26		$0.00		$0.00	7.81	$962,551.26		$0.00	7.81	$962,551.26	0.00	$0.00
N.P 9	DESMONTE DE REJA EXISTENTE EN PRIMER PISO	m2		$ 21,148.00		37.33	$ 21,148.00	$789,454.84		$0.00		$0.00	37.33	$789,454.84		$0.00	37.33	$789,454.84	0.00	$0.00
N.P 10	CONCRETO DE 2500 PSI (17.5 Mpa) PARA COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO MUROS EN MAMPOSTERIA SECCIÓN 12x17 cm	m		$ 75,007.00		102.89	$ 75,007.00	$7,717,470.23		$0.00		$0.00	102.89	$7,717,470.23		$0.00	102.89	$7,717,470.23	0.00	$0.00
N.P 11	CONCRETO DE 2500 PSI PARA VIGUETAS DE CONFINAMIENTO MUROS EN MAMPOSTERIA SECCIÓN 12x17cm	m		$ 71,521.00		45.90	$ 71,521.00	$3,282,813.90		$0.00		$0.00	45.90	$3,282,813.90		$0.00	45.90	$3,282,813.90	0.00	$0.00
N.P 12	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ANTIFLAMA LIBRE DE ALOGENO TIPO FPLR O THHW - LS DE 2*16 AWG	m		$ 13,330.00		282.08	$ 13,330.00	$3,760,126.40		$0.00		$0.00	207.98	$2,772,373.40	74.10	$987,753.00	282.08	$3,760,126.40	0.00	$0.00
N.P 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE TIPO L PISO PARED PARA BAÑO PMR	und		$ 355,131.00		2.00	$ 355,131.00	$710,262.00		$0.00		$0.00		$0.00	2.00	$710,262.00	2.00	$710,262.00	0.00	$0.00
N.P 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA LISO PREFABRICADO EN GRANITO PULIDO	m		$ 71,338.00		53.46	$ 71,338.00	$3,813,729.48		$0.00		$0.00	53.46	$3,813,729.48		$0.00	53.46	$3,813,729.48	0.00	$0.00
N.P 15	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS EN ALUMINIO BLANCO PERFIL TIPO T, PARA MONTAJE DE LAMPARAS LED DE 60X60 cm EN CIELO RASO	und		$ 44,716.00		17.00	$ 44,716.00	$760,172.00		$0.00		$0.00	16.00	$715,456.00	2.00	$89,432.00	18.00	$804,888.00	-1.00	-$44,716.00
N.P 16	LAVAMANOS MANOS LIBRES EN ACERO INOXIDABLE CON PEDAL HIDRAULICO, PARA ZONA DE ABORDAJE	und		$ 1,794,153.00		2.00	$ 1,794,153.00	$3,588,306.00		$0.00		$0.00		$0.00	2.00	$3,588,306.00	2.00	$3,588,306.00	0.00	$0.00
N.P 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360°	und		$ 238,384.00		4.00	$ 238,384.00	$953,536.00		$0.00		$0.00	4.00	$953,536.00		$0.00	4.00	$953,536.00	0.00	$0.00
N.P 18	LIMPIEZA Y PINTURA ORNAMENTACION	m		$ 23,679.00		53.00	$ 23,679.00	$1,254,987.00		$0.00		$0.00		$0.00	53.00	$1,254,987.00	53.00	$1,254,987.00	0.00	$0.00
N.P 19	LIMPIEZA Y PINTURA Y CORTE DE PUERTA DE ACCESO	m2		$ 96,565.00		4.00	$ 96,565.00	$386,260.00		$0.00		$0.00		$0.00	4.00	$386,260.00	4.00	$386,260.00	0.00	$0.00
N.P 20	REVOQUE CON ADITIVO PARA COLUMNA	und		$ 144,630.00		1.00	$ 144,630.00	$144,630.00		$0.00		$0.00	1.00	$144,630.00		$0.00	1.00	$144,630.00	0.00	$0.00
N.P 21	DUCTOS EN SUPERBOARD PARA RECUBRIMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	m		$ 143,688.00		32.15	$ 143,688.00	$4,619,569.20		$0.00		$0.00	12.65	$1,817,653.20	19.50	$2,801,916.00	32.15	$4,619,569.20	0.00	$0.00
N.P 22	DESMONTE DE CIELO RASO EN MADERA	m2		$ 18,704.00		9.78	$ 18,704.00	$182,925.12		$0.00		$0.00	7.61	$142,337.44	2.17	$40,587.68	9.78	$182,925.12	0.00	$0.00
N.P 23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 10 mm DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS Y ARISTAS BISELADAS, CON HERRAJES TIPO PATCH FITTING Y PIVOTE SUPERIOR E INFERIOR. INCLUYE CERRADURA TUBULAR PREMIUM DE PALANCA CON ESCUDO CUADRADO ACABADO NEGRO MATE, LA HOJA LLEVARA APLIACION DE PELICULA TIPO FROST.	m2		$ 1,318,414.00		4.96	$ 1,318,414.00	$6,539,333.44		$0.00		$0.00		$0.00	4.96	$6,539,333.44	4.96	$6,539,333.44	0.00	$0.00

N.P 24	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTAIACIÓN DE PUERTA DESLIZABLE INTERIOR TIPO COLGANTE, ESPESOR APROXIMADO DE 35mm, FABRICADA EN TABLERO DE MADERA SOLIDA PRENSADA, ENCHAPADA EN LAMINADO MELAMINICO ACABADO MATE, CON CANTOS SELLADOS EN PVC. SISTEMA DE DESLIZAMIENTO SUPERIOR MEDIANTE RIEL METALICO OCULTO CON CARROS DE RODAMIENTO DE ALTA RESISTENCIA Y GUÍA INFERIOR DISCRETA PARA ESTABILIDAD. INCLUYE MARCO EN MDF O MADERA ENCHAPADA Y CENEFA O TAPA SUPERIOR EN MDF PARA OCULTAR EL RIEL. INCLUYE JALADERA EMBUTIDA TIPO UÑERO O CERRADURA TIPO CERROJO MARIPOSA SEGÚN CORRESPONDA	m2		$ 668,535.00		4.41	$ 668,535.00	$2,948,239.35		$0.00		$0.00			4.41	$2,948,239.35	4.41	$2,948,239.35	0.00	$0.00
N.P 25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE DE UNA HOJA PARA INTERIOR, ESPESOR APROXIMADO 35mm, FABRICADA EN MADERA AGLOMERADA SOLIDA PRENSADA, ENCHAPADA EN LAMINADO DECORATIVO ACABADO MATE, CON CANTOS SELLADOS. INCLUYE MARCO EN MDF O MADERA ENCHAPADA Y CERRADURA TUBULAR PREMIUM DE PALANCA CON ESCUDO CUADRADO ACABADO NEGRO MATE.	m2		$ 813,421.00		8.10	$ 813,421.00	$6,588,710.10		$0.00		$0.00			8.10	$6,588,710.10	8.10	$6,588,710.10	0.00	$0.00
N.P 26	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE METALICA DE UNA HOJA, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED (CR) CALIBRE 18, ESTRUCTURA PERIMETRAL REFORZADA Y LAMINA LISA SOLDADA. PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO MATE CON TRATAMIENTO PREVIO ANTICORROSIVO. CON REJILLA DE VENTILACION TIPO PERSIANA LOCALIZADA EN LA PARTE INFERIOR. INCLUYE MARCO METALICO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 Y CERRADURA TUBULAR PREMIUM DE PALANCA CON ESCUDO CUADRADO.	m2		$ 748,846.00		1.90	$ 748,846.00	$1,422,807.40		$0.00		$0.00			1.90	$1,422,807.40	1.90	$1,422,807.40	0.00	$0.00
N.P 27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE METALICA DE UNA HOJA, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL 18, ESTRUCTURA PERIMETRAL REFORZADA Y LAMINA LISA SOLDADA. ACABADO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO MATE. INCLUYE MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18, INCLUYE CERRADURA TUBULAR PREMIUM DE PALANCA CON ESCUDO CUADRADO ACABADO NEGRO MATE.	m2		$ 651,068.00		5.70	$ 651,068.00	$3,711,087.60		$0.00		$0.00			5.70	$3,711,087.60	5.70	$3,711,087.60	0.00	$0.00
N.P 28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO GFCI).	und		$ 257,967.00		8.00	$ 257,967.00	$2,063,736.00		$0.00		$0.00	6.00	$1,547,802.00	2.00	$515,934.00	8.00	$2,063,736.00	0.00	$0.00
N.P 29	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO (INCLUYE RETIRO Y ACARREO)	m2		$ 18,027.00		21.65	$ 18,027.00	$390,284.55		$0.00		$0.00	21.65	$390,284.55		$0.00	21.65	$390,284.55	0.00	$0.00
N.P 30	DEMOLICIÓN DE PISOS EN CERAMICA + MORTERO (INCLUYE RETIRO Y ACARREO)	m2		$ 25,994.00		14.51	$ 25,994.00	$377,172.94		$0.00		$0.00	11.24	$292,172.56	3.27	$85,000.38	14.51	$377,172.94	0.00	$0.00
N.P 31	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERIA DE LADRILLO (INCLUYE RETIRO Y ACARREO)	m2		$ 40,110.00		28.90	$ 40,110.00	$1,159,179.00		$0.00		$0.00	28.90	$1,159,179.00		$0.00	28.90	$1,159,179.00	0.00	$0.00
N.P 32	DEMOLICION DE LOSA DE ENTREPISO EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO Y ACARREO)	m2		$ 63,821.00		23.40	$ 63,821.00	$1,493,411.40		$0.00		$0.00	23.40	$1,493,411.40		$0.00	23.40	$1,493,411.40	0.00	$0.00
N.P 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GABINETE ELECTRICO T1 DE SOBREPONER, CON 30 CIRCUITOS TRIFASICO, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR ICC=10KA, INCLUYE PROTECCIONES (3X100 - AJUSTABLE) + 19(1X20) + 1(2X20) + 1(3X30)+3(2x30)	un		$ 2,069,439.69		1.00	$ 2,069,439.69	$2,069,439.69		$0.00		$0.00	1.00	$2,069,439.69		$0.00	1.00	$2,069,439.69	0.00	$0.00
N.P 34	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MARCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SALIDA DE LUMINARIA SOBRE TECHO EN TUBERIA EMT 3/4" TIPO PESADO CON CONDUCTOR CABLE 1X12+1X12+1X12 COBRE AWG THHN, LIBRE DE HALOGENOS, INCLUYE ALIMENTADOR, CAJA 5800 PARA CONEXIÓN, ELEMENTOS DE FIJACION, INTERRUPTOR, TOMACORRIENTE MONOFASICA CON POLO A TIERRA 120 V Y ACCESORIOS, (NO INCLUYE LUMINARIA)	un		$ 247,018.00		57.00	$ 247,018.00	$14,080,026.00		$0.00		$0.00	57.00	$14,080,026.00		$0.00	57.00	$14,080,026.00	0.00	$0.00
N.P 35	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MARCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SALIDA DE LUMINARIA SOBRE TECHO EN DOBLE ALTURA EN TUBERIA EMT 3/4" TIPO PESADO CON CONDUCTOR CABLE 1X12+1X12+1X12 COBRE AWG THHN, LIBRE DE HALOGENOS, INCLUYE ALIMENTADOR, CAJA 5800 PARA CONEXIÓN, ELEMENTOS DE FIJACION, INTERRUPTOR, TOMACORRIENTE MONOFASICA CON POLO A TIERRA 120 V Y ACCESORIOS, (NO INCLUYE LUMINARIA)	un		$ 464,330.00		10.00	$ 464,330.00	$4,643,300.00		$0.00		$0.00	10.00	$4,643,300.00		$0.00	10.00	$4,643,300.00	0.00	$0.00

N.P 36	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MARCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SALIDA DE LUMINARIA DE EMERGENCIA EN TUBERIA EMT 3/4" CON CONDUCTOR CABLE 1X12+1X12+1X12 COBRE AWG THHN, LIBRE DE HALOGENOS, INCLUYE ALIMENTADOR, CAJA 5800 PARA CONEXIÓN, ELEMENTOS DE FIJACION, INTERRUPTOR, TOMACORRIENTE MONOFASICA CON POLO A TIERRA 120 V Y ACCESORIOS, (NO INCLUYE LUMINARIA)	un		$ 527,915.00		10.00	$ 527,915.00	$5,279,150.00		$0.00		$0.00	9.00	$4,751,235.00	2.00	$1,055,830.00	11.00	$5,807,065.00	-1.00	-$527,915.00
N.P 37	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MARCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA EN TUBERÍA EMT 3/4" Y CONDUCTOR CABLE 1X12+1X12+1X12 COBRE AWG THHN, LIBRE DE HALOGENOS, INCLUYE ALIMENTADOR, CAJA 5800, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	un		$ 242,195.00		39.00	$ 242,195.00	$9,445,605.00		$0.00		$0.00	29.00	$7,023,655.00	18.00	$4,359,510.00	47.00	$11,383,165.00	-8.00	-$1,937,560.00
N.P 38	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MARCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA REGULADA EN TUBERÍA EMT 3/4" Y CONDUCTOR CABLE 1X12+1X12+1X12 COBRE AWG THHN, LIBRE DE HALOGENOS, APTO PARA INSTALAR EN BANDEJA, INCLUYE ALIMENTADOR, CAJA 5800, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	un		$ 242,195.00		14.00	$ 242,195.00	$3,390,730.00		$0.00		$0.00	4.00	$968,780.00	18.00	$4,359,510.00	22.00	$5,328,290.00	-8.00	-$1,937,560.00
N.P 39	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MARCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SALIDA PARA EXTRACTORES DE BAÑOS EN TUBERÍA EMT 3/4" Y CONDUCTOR CABLE 1X12+1X12+1X12 COBRE AWG THHN, LIBRE DE HALOGENOS, APTO PARA INSTALAR EN BANDEJA, INCLUYE ALIMENTADOR, CAJA 5800, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	un		$ 529,117.00		4.00	$ 529,117.00	$2,116,468.00		$0.00		$0.00	4.00	$2,116,468.00		$0.00	4.00	$2,116,468.00	0.00	$0.00
N.P 40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 7 mm 15x15 cm	kg		$ 13,656.00		103.65	$ 13,656.00	$1,415,423.97		$0.00		$0.00	103.65	$1,415,423.97		$0.00	103.65	$1,415,423.97	0.00	$0.00
N.P 41	CONCRETO DE 3000 PSI (21 MPA) PARA LOSA DE ENTREPISO	m2		$ 246,339.00		23.40	$ 246,339.00	$5,764,332.60		$0.00		$0.00	23.40	$5,764,332.60		$0.00	23.40	$5,764,332.60	0.00	$0.00
N.P 42	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO	m2		$ 34,910.00		75.19	$ 34,910.00	$2,624,882.90		$0.00		$0.00	75.19	$2,624,882.90		$0.00	75.19	$2,624,882.90	0.00	$0.00
N.P 43	RIEL PARA ILUMINACION INDIRECTA	un		$ 5,154,208.00		1.00	$ 5,154,208.00	$5,154,208.00		$0.00		$0.00	1.00	$5,154,208.00		$0.00	1.00	$5,154,208.00	0.00	$0.00
N.P 44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 10 mm DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS Y ARISTAS BISELADAS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, HERRAJES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, LA DIVISIÓN LLEVARA APLIACION DE PELICULA TIPO FROST.	m2		$ 1,162,632.00		10.51	$ 1,162,632.00	$12,219,262.32		$0.00		$0.00		$0.00	10.51	$12,219,262.32	10.51	$12,219,262.32	0.00	$0.00
N.P 45	DEMOLICIÓN MANUAL PARA EXPOSICION DE REFUERZO	m		$ 39,323.00		30.69	$ 39,323.00	$1,206,822.87							30.69	$1,206,822.87	30.69	$1,206,822.87	0.00	$0.00
N.P 46	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA METÁLICA TIPO PERSIANA DE UNA HOJA FABRICADA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18, CON BASTIDOR PERIMETRAL REFORZADO EN PERFILERIA METALICA. HOJA CONFORMADA POR LAMAS HORIZONTATES TIPO PERSIANA (FIJAS) DEBIDAMENTE ENSAMBLADAS PARA VENTILACION PERMANENTE. CON PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO COLOR NEGRO MATE Y TRATAMIENTO PREVIO ANTICORROSIVO. INCLUYE MARCO METALICO FABRICADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18 ANCLADO AL VANO MEDIANTE CHAZOS Y CERRADURA TUBULAR PREMIUM DE PALANCA CON ESCUDO CUADRADO. PARA VENTILACIÓN CUARTO DE RESIDUOS.	m2		$ 1,228,044.00		1.90	$ 1,228,044.00	$2,333,283.60							1.90	$2,333,283.60	1.90	$2,333,283.60	0.00	$0.00
N.P 47	RECONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN ZONA DE REGATAS H=18 cm CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	m2		$ 163,206.00		20.98	$ 163,206.00	$3,424,061.88							20.98	$3,424,061.88	20.98	$3,424,061.88	0.00	$0.00
N.P 48	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E = 0.18 m	m2		$ 144,520.00		20.98	$ 144,520.00	$3,032,029.60							20.98	$3,032,029.60	20.98	$3,032,029.60	0.00	$0.00
N.P 49	DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)	und		$ 137,788.00		1.00	$ 137,788.00	$137,788.00							1.00	$137,788.00	1.00	$137,788.00	0.00	$0.00
N.P 50	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 ANCHO <=0.60m - EN COLUMNAS	m		$ 23,143.00		82.40	$ 23,143.00	$1,906,983.20							82.40	$1,906,983.20	82.40	$1,906,983.20	0.00	$0.00
N.P 51	ESTUCO Y VINILO TIPO I SOBRE MUROS COLOR BLANCO TRES MANOS ANCHO <= 0.60m - EN COLUMNAS	m		$ 21,260.00		82.40	$ 21,260.00	$1,751,824.00							82.40	$1,751,824.00	82.40	$1,751,824.00	0.00	$0.00
N.P 52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3X100 A DE CAJA MOLDEADA TIPO FIJO	und		$ 302,457.00		2.00	$ 302,457.00	$604,914.00							2.00	$604,914.00	2.00	$604,914.00	0.00	$0.00
N.P 53	DEMOLICIÓN DE COLUMNETA EN CONCRETO SECCIÓN 0.17x12 cm, (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	m		$ 35,790.00		7.20	$ 35,790.00	$257,688.00							7.20	$257,688.00	7.20	$257,688.00	0.00	$0.00
N.P 54	BOCA PUERTA EN CERAMICA - ANCHO 12 cm	m		$ 37,522.00		9.98	$ 37,522.00	$374,469.56							9.98	$374,469.56	9.98	$374,469.56	0.00	$0.00
N.P 55	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA ESCALERA	m		$ 131,698.00		27.65	$ 131,698.00	$3,641,449.70							27.65	$3,641,449.70	27.65	$3,641,449.70	0.00	$0.00

N.P 56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL DE 12000 BTU, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	und		$ 3,123,297.00		1.00	$ 3,123,297.00	$3,123,297.00							1.00	$3,123,297.00	1.00	$3,123,297.00	0.00	$0.00
N.P 57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	m2		$ 28,364.00		24.79	$ 28,364.00	$703,143.56							24.79	$703,143.56	24.79	$703,143.56	0.00	$0.00
N.P 58	JUNTAS DE DILATACIÓN EN ENCHAPE DE PISO	m		$ 29,900.00		13.08	$ 29,900.00	$391,092.00							13.08	$391,092.00	13.08	$391,092.00	0.00	$0.00
N.P 59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO, EN CABLE DE COBRE No.12 AWG (F, N, T).	m		$ 18,471.00		332.00	$ 18,471.00	$6,132,372.00							267.00	$4,931,757.00	267.00	$4,931,757.00	65.00	$1,200,615.00
N.P 60	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:4 ESPESOR 6cm	m2		$ 56,636.00		352.02	$ 56,636.00	$19,937,004.72							352.02	$19,937,004.72	352.02	$19,937,004.72	0.00	$0.00
N.P 61	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE DE 1/2" EN BRONCE (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION)	und		$ 138,192.00		2.00	$ 138,192.00	$276,384.00							2.00	$276,384.00	2.00	$276,384.00	0.00	$0.00
N.P 62	PINTURA VINILO TIPO 1 TRES MANOS SOBRE CIELO RASO EN DRYWALL	m2		$ 18,357.00		186.94	$ 18,357.00	$3,431,657.58							186.94	$3,431,657.58	186.94	$3,431,657.58	0.00	$0.00
N.P 63	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO 4mm FLOTANTE, MEDIDAS 0.60x0.80m	un		$ 302,945.00		4.00	$ 302,945.00	$1,211,780.00							4.00	$1,211,780.00	4.00	$1,211,780.00	0.00	$0.00
N.P 64	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE CORAZAS DE PROTECCION Y TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	m		$ 444,229.00		8.10	$ 444,229.00	$3,598,254.90							7.92	$3,518,293.68	7.92	$3,518,293.68	0.18	$79,961.22
	TOTAL ITEMS NO PREVISTOS							**$ 237,905,384.67**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 125,155,447.34**		**$ 118,205,187.04**		**$ 243,360,634.38**		**-$ 5,455,249.71**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 453,296,672.64**	**8.10**		**$ 542,252,991.82**		**$ 781,992.88**		**$ 30,811,453.61**		**$ 311,342,590.15**		**$ 205,033,608.06**		**$ 547,969,644.70**		**-$ 5,716,652.87**
	ADMINISTRACION			22.76%	$ 103,170,323.00	22.76%		$ 123,416,780.94	22.76%	$ 177,982.00	22.76%	$ 7,012,687.00	22.76%	$ 70,861,573.52	22.76%	$ 46,665,649.19	22.76%	$ 124,717,891.13	22.76%	-$ 1,301,110.19
	IMPREVISTOS			3.00%	$ 13,598,901.00	3.00%		$ 16,267,590.00	3.00%	$ 23,460.00	3.00%	$ 924,344.00	3.00%	$ 9,340,277.70	3.00%	$ 6,151,008.24	3.00%	$ 16,439,089.34	3.00%	-$ 171,499.59
	UTILIDADES			5.00%	$ 22,664,834.00	5.00%		$ 27,112,650.00	5.00%	$ 39,100.00	5.00%	$ 1,540,573.00	5.00%	$ 15,567,129.51	5.00%	$ 10,251,680.40	5.00%	$ 27,398,482.23	5.00%	-$ 285,832.64
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$ 4,306,319.00	19%		$ 5,151,404.00	19%	$ 7,429.00	19.00%	$ 292,709.00	19.00%	$ 2,957,754.61	19.00%	$ 1,947,819.28	19.00%	$ 5,205,711.62	19.00%	-$ 54,308.20
	TOTAL AIU			**30.76%**	**$ 139,434,057.00**	**30.76%**		**$ 166,797,020.29**	**30.76%**	**$ 240,542.00**	**30.76%**	**$ 9,477,604.00**	**30.76%**	**$ 95,768,980.73**	**30.76%**	**$ 63,068,337.83**	**30.76%**	**$ 168,555,462.70**	**30.76%**	**-$ 1,758,442.42**
C	**COMPLEMENTARIAS**																			
C.03	Ejecución de prueba de presión de redes hidrosanitarias - por zonas	un	3.00	$ 856,000.00	$ 2,568,000.00	3.00		$2,568,000.00	0.00	$0.00		$0.00		$0.00	3.00	$2,568,000.00	3.00	$2,568,000.00	0.00	$0.00
C.04	Ejecución de prueba de flujo de redes hidrosanitarias - por zonas	un	3.00	$ 856,000.00	$ 2,568,000.00	3.00		$2,568,000.00	0.00	$0.00		$0.00		$0.00	3.00	$2,568,000.00	3.00	$2,568,000.00	0.00	$0.00
C.05	Ejecución de prueba de estanqueidad de redes hidrosanitarias - por zonas	un	3.00	$ 671,666.67	$ 2,015,000.00	3.00		$2,015,000.00	0.00	$0.00		$0.00		$0.00	3.00	$2,015,000.00	3.00	$2,015,000.00	0.00	$0.00
C.06	Ejecución de prueba hidroestatica de redes de distribución de incendios	un	1.00	$ 856,000.00	$ 856,000.00	0.00		$0.00	0.00	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
C.07	Ejecución de certificación RETIE y RETILAP de las redes eléctricas	un	1.00	$ 6,000,000.00	$ 6,000,000.00	1.00		$6,000,000.00	0.00	$0.00		$0.00		$0.00	1.00	$6,000,000.00	1.00	$6,000,000.00	0.00	$0.00
C.08	Trámites ante el operador de red para radicación y aprobación del diseño eléctrico	un	1.00	$ 500,000.00	$ 500,000.00	0.00		$0.00	0.00	$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
C.09	Certificación de puntos de red de voz y datos y sus componentes	un	1.00	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00	1.00		$3,500,000.00	0.00	$0.00		$0.00		$0.00	1.00	$3,500,000.00	1.00	$3,500,000.00	0.00	$0.00
	TOTAL COMPLEMENTARIAS				**$ 18,007,000.00**			**$ 16,651,000.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 16,651,000.00**		**$ 16,651,000.00**		**$ 0.00**
	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA				**$ 615,044,048.64**			**$ 730,852,416.11**		**$ 1,029,962.88**		**$ 40,581,765.61**		**$ 410,069,325.49**		**$ 286,700,765.17**		**$ 738,381,819.02**		**-$ 7,529,403.49**

VALOR CONTRATO MODIFICATRORIO No. 1	**$ 744,575,987.07**
VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DE OBRA	**$ 738,381,819.02**
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	**$ 6,194,168.05**

	% DE EJECUCIÓN	%						%	**6.60%**	%	**55.07%**		**38.51%**		**99.17%**		**0.83%**

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

DIANA CAROLINA SANDOVAL CORREDOR
SUPERVISOR CONTRATO

BERNARDO SOTO GARCÍA
SUPERVISOR CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**


CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
1.01	Localización y replanteo con equipo	m²	105.87

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto			
ZONA DE ABORDAJE - CORTE Y SECADO				162.33	m2	162.33
OFICINAS, PASILLOS Y BAÑOS 1ER PISO				89.46	m2	89.46
OFICINAS, PASILLOS Y BAÑOS 2DO PISO	3.56	7.33		1.00	M2	26.09
	1.33	1.16		1.00	M2	1.54
	1.49	2.30		1.00	M2	3.43
	5.02	2.08		1.00	M2	10.44
	0.16	0.70		1.00	M2	0.11
	1.85	1.15		1.00	M2	2.13
	1.85	1.34		1.00	M2	2.48
	0.15	0.89		1.00	M2	0.13
	5.02	0.56		1.00	M2	2.81
	0.20	0.23		1.00	M2	0.05
	7.32	6.68		1.00	M2	48.90
	7.15	0.20		1.00	M2	1.43
	0.09	0.32		-1.00	M2	-0.03
	0.09	0.33		-1.00	M2	-0.03
	0.30	2.08		1.00	M2	0.62
	3.87	1.49		1.00	M2	5.77
					Subtotal	**357.66**
					Cobrado en actas	**251.79**
					TOTAL A COBRAR EN ACTA No. 4	**105.87**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

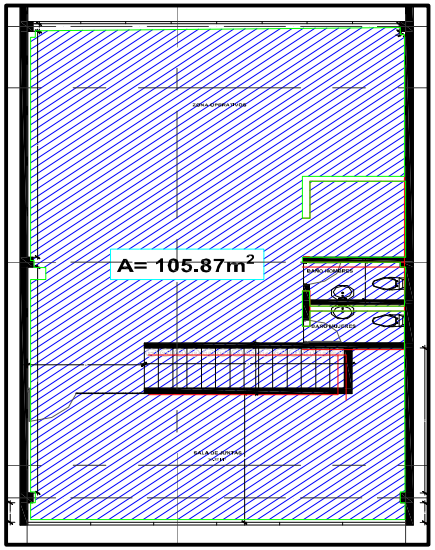


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD


CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
1.01	Localización y replanteo con equipo	m²	105.87

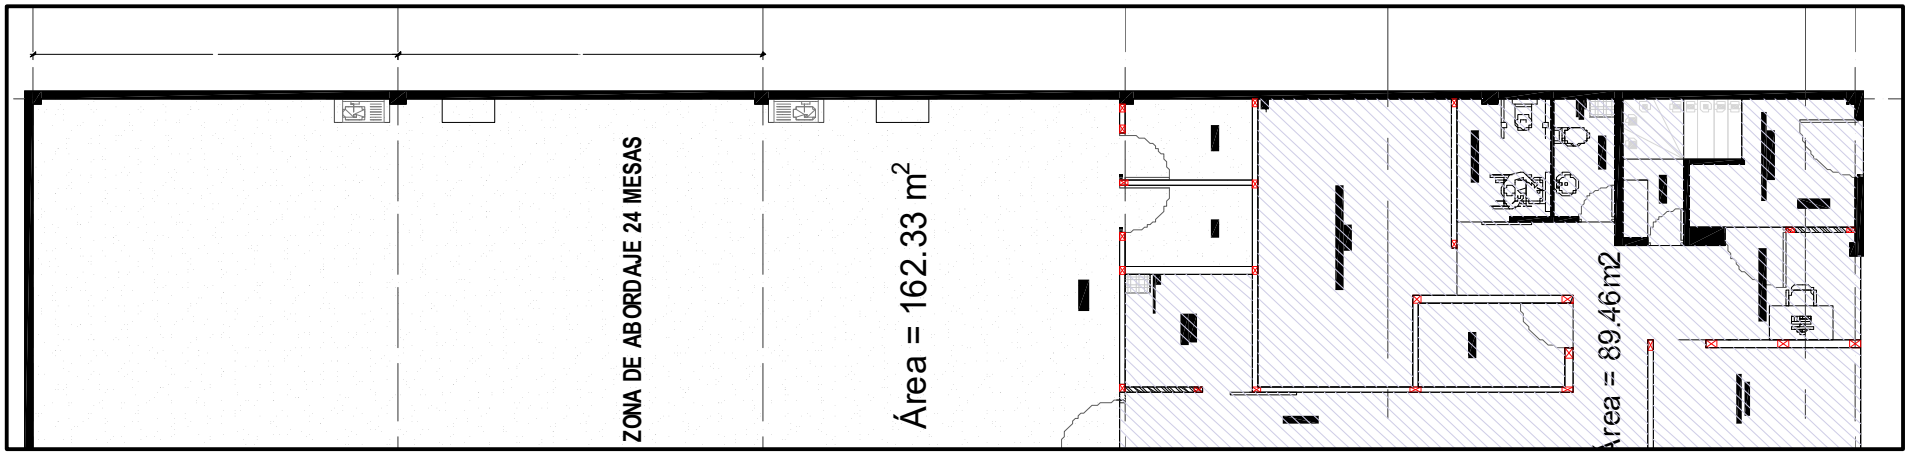

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
1.01	Localización y replanteo con equipo	m²	105.87

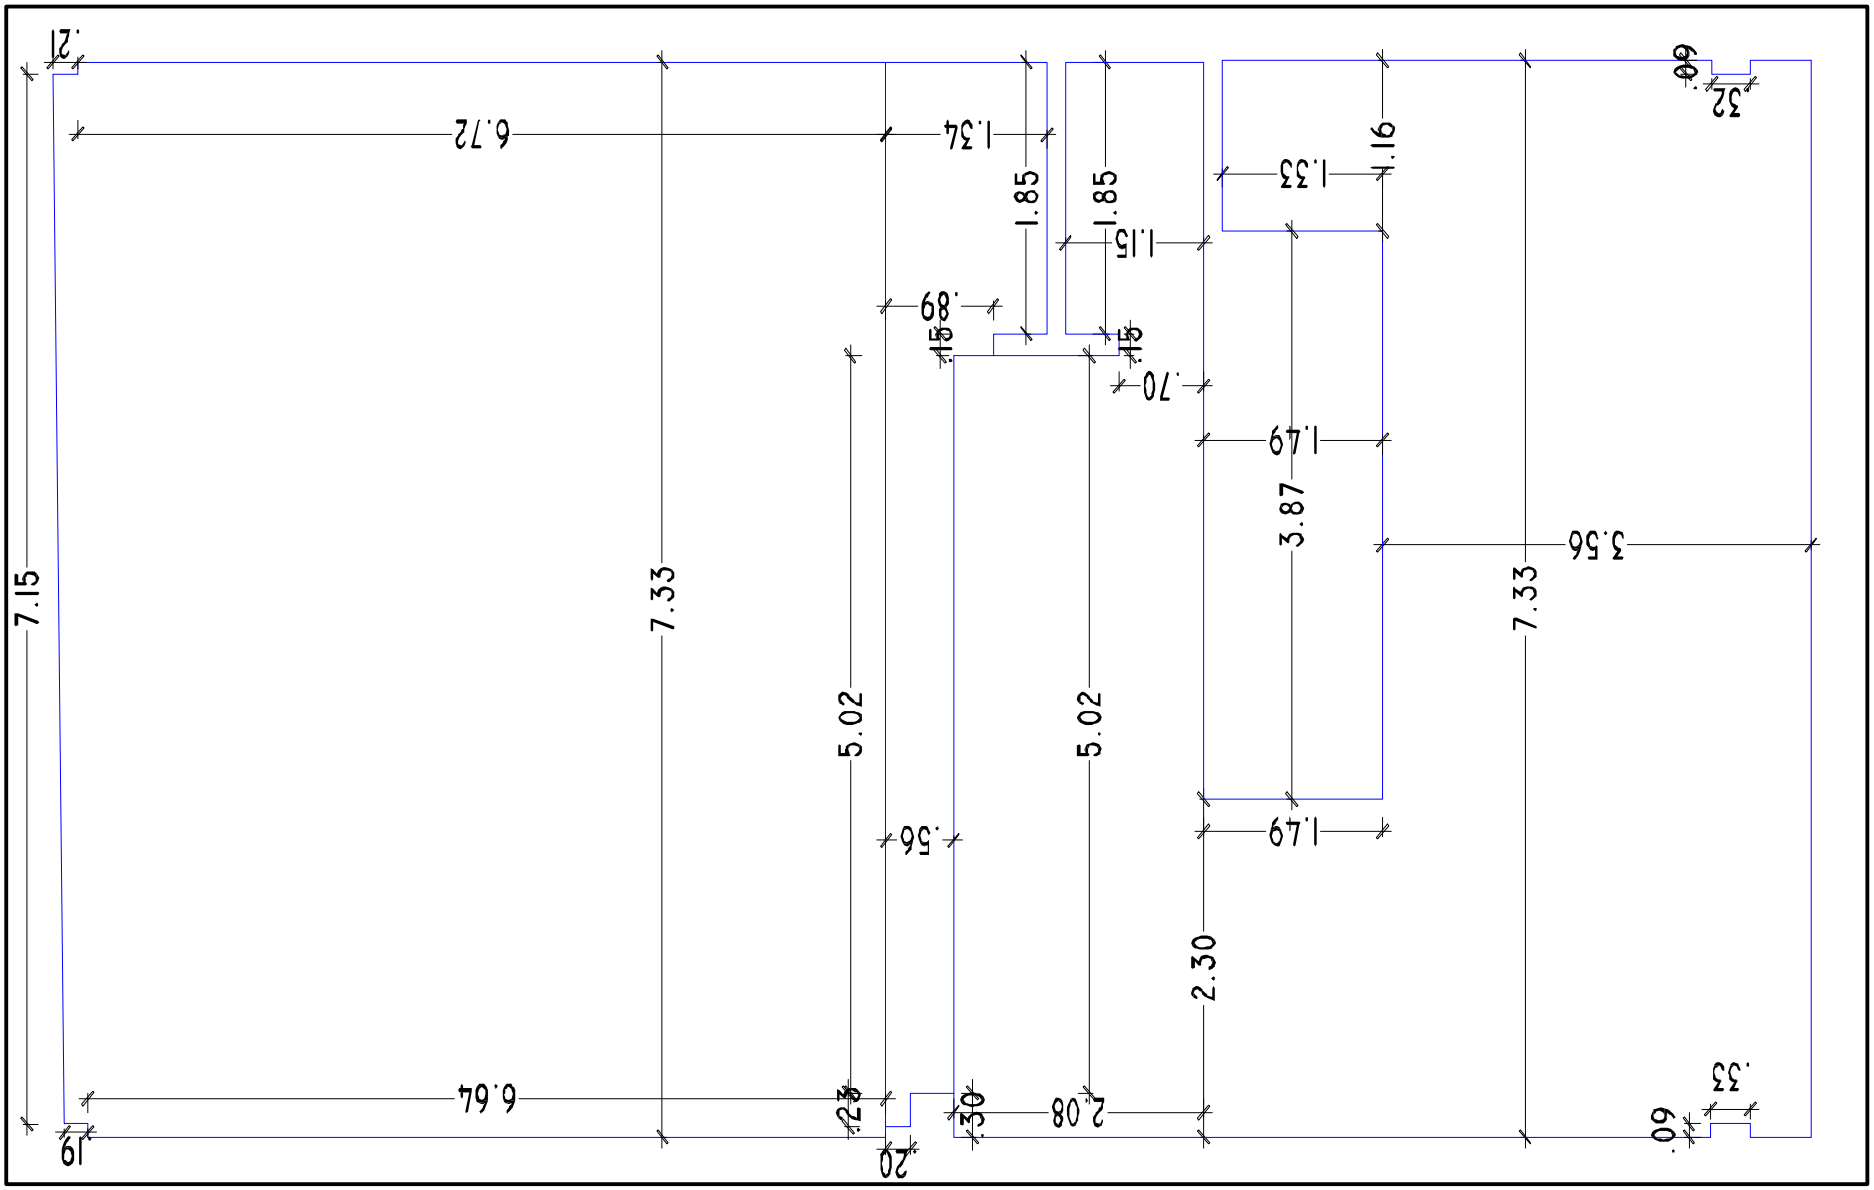



B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
1.01	Localización y replanteo con equipo	m²	105.87





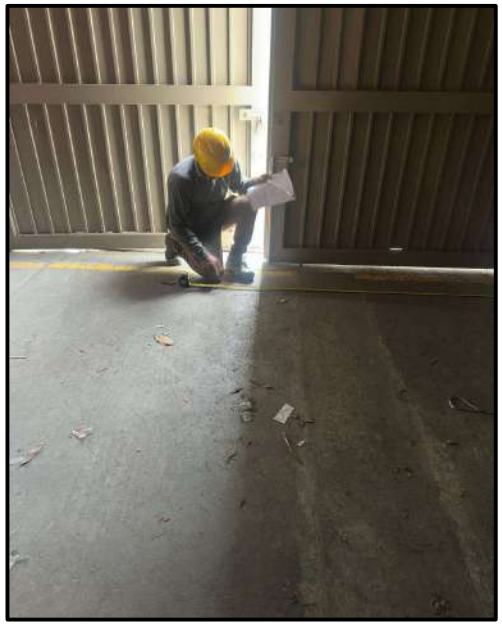

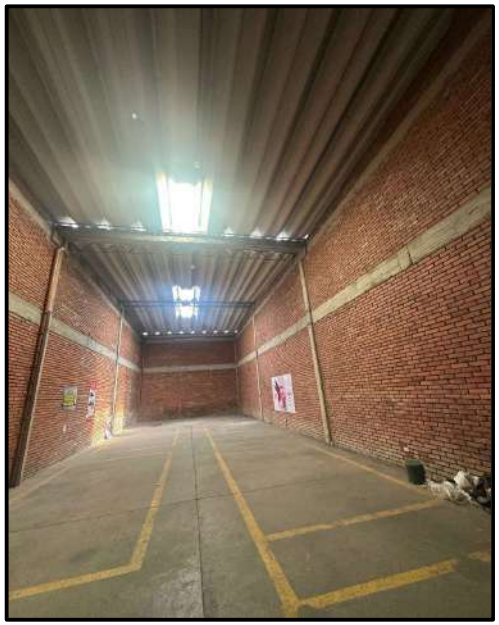

OBJETO DEL CONTRATO

Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
1.05	Desmontaje de tuberia electrica y cableado existente no embebida, incluye retiro y disposición final de residuos	ml	12.12

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
1. zona abordaje	35.07	---	---	1.00	ml	35.07	
2. segundo piso mezannine	14.00	---	---	2.00	ml	28.00	
3.segundo piso mezannine	7.40	---	---	4.00	ml	29.60	
4. Sube del primer al segundo piso			4.42	1.00	m	4.42	
					Subtotal	**97.09**	
					Cobrado en actas	**84.97**	
					TOTAL A COBRAR EN ACTA No. 4	**12.12**	

*Las cantidades deberan ser corroboradas por el constructor antes de iniciar las labores


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

ING. BERNARDO SOTO GARCÍA
SUPERVISOR UBPD

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
1.05	Desmontaje de tuberia electrica y cableado existente no embebida, incluye retiro y disposición final de residuos	ml	12.12

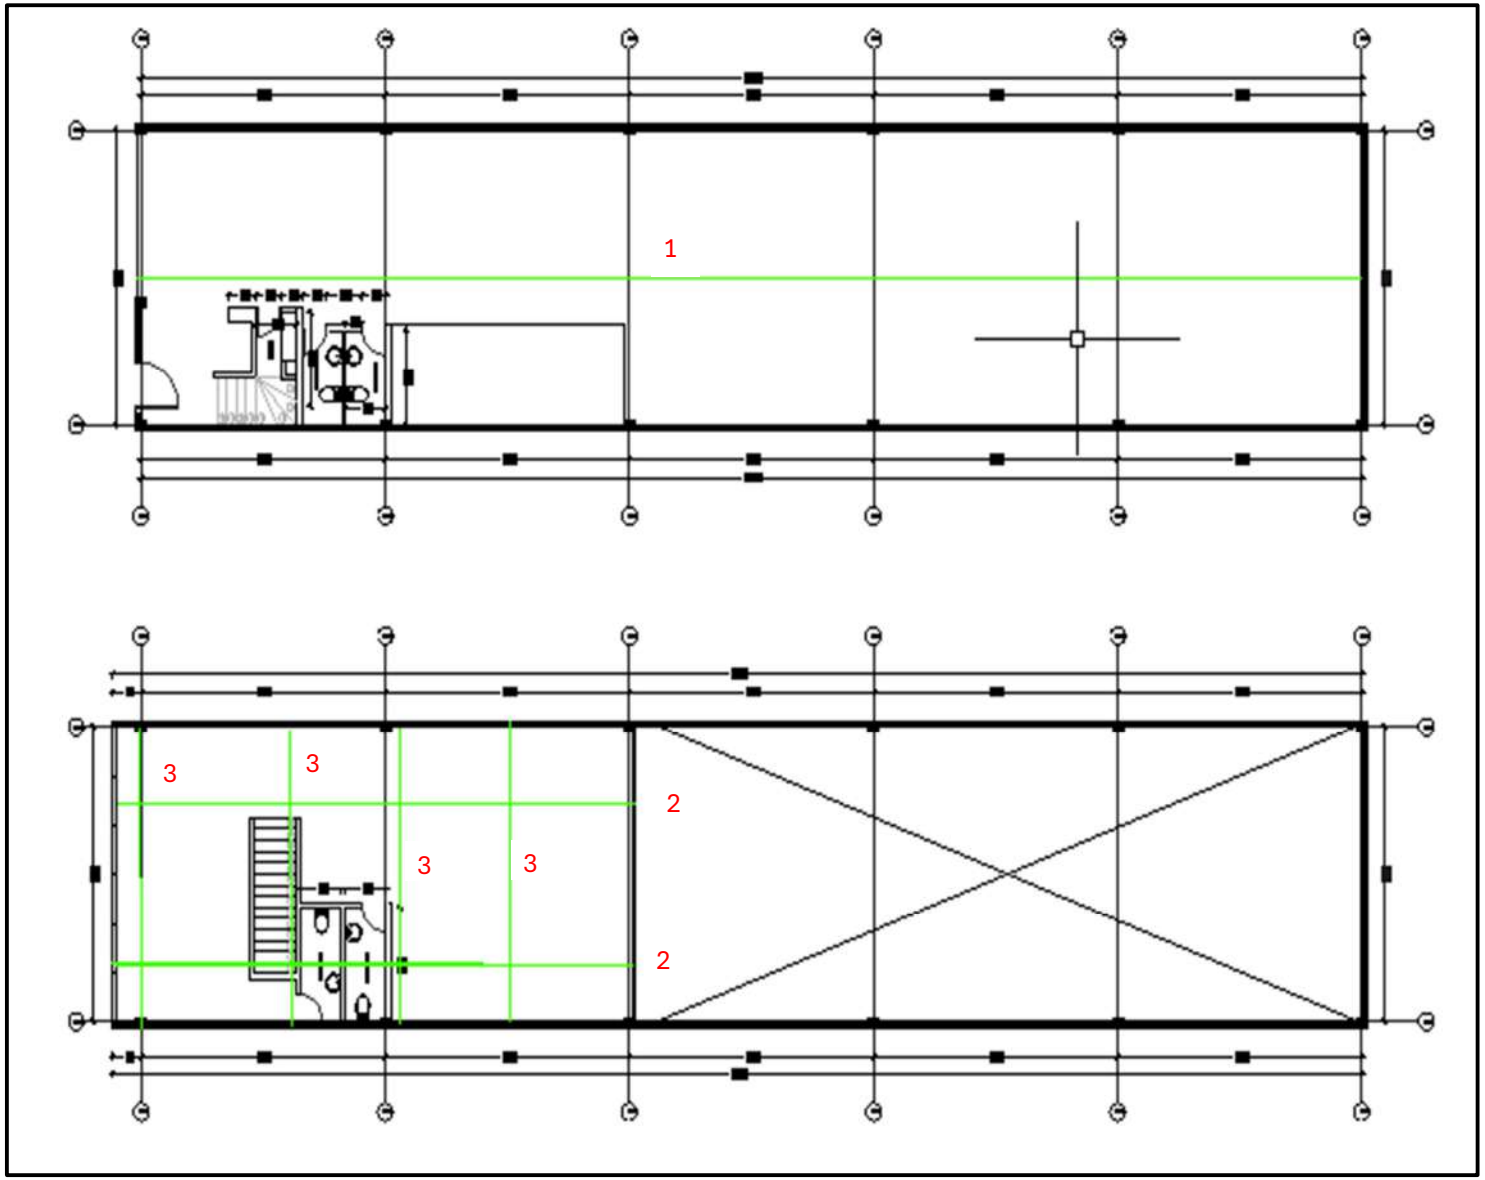

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad total**
1.05	Desmontaje de tuberia electrica y cableado existente no embebida, incluye retiro y disposición final de residuos	ml	12.12





OBJETO DEL CONTRATO

Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
5.03	Suministro y armado de acero de refuerzo de 60000 Psi para muros de mamposteria	kg	31.88

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				CANTIDAD	SUBTOTAL	UNIDAD	TOTAL
		#elementos	LONG	DIAMETRO	PESO				
		MUROS PRIMER PISO							
MURO 1	REF. PARA MURO	2.00	3.35	4 mm	0.15	4.00	1.01	kg	4.02
		2.00	0.72	4 mm	0.15	4.00	0.22	kg	0.86
		2.00	5.97	4 mm	0.15	2.00	1.79	kg	3.58
MURO 2	REF. PARA MURO	2.00	1.72	4 mm	0.15	4.00	0.52	kg	2.06
		2.00	6.26	4 mm	0.15	4.00	1.88	kg	7.51
		2.00	8.82	4 mm	0.15	2.00	2.65	kg	5.29
	MURO 3 REF. PARA MURO	2.00	6.07	4 mm	0.15	6.00	1.82	kg	10.93
	MURO 4 REF PARA MURO	2.00	2.80	4 mm	0.15	6.00	0.84	kg	5.04
	MURO 5 REF PARA MURO	2.00	2.80	4 mm	0.15	6.00	0.84	kg	5.04
	MURO 6 REF PARA MURO	2.00	2.07	4 mm	0.15	6.00	0.62	kg	3.73
MURO 7	REF PARA MURO	2.00	1.02	4 mm	0.15	4.00	0.31	kg	1.22
		2.00	2.07	4 mm	0.15	2.00	0.62	kg	1.24
	MURO 8 REF PARA MURO	2.00	3.19	4 mm	0.15	6.00	0.96	kg	5.74
	MURO 9 REF PARA MURO	2.00	3.17	4 mm	0.15	4.00	0.95	kg	3.80
		2.00	4.24	4 mm	0.15	2.00	1.27	kg	2.54
MURO 10	REF. PARA MURO	2.00	2.61	4 mm	0.15	6.00	0.78	kg	4.70
MURO 11	REF. PARA MURO	2.00	3.64	4 mm	0.15	2.00	1.09	kg	2.18
		2.00	2.64	4 mm	0.15	4.00	0.79	kg	3.17
		MUROS SEGUNDO PISO							
	MURO 1	2.00	2.12	4 mm	0.15	8.00	0.64	kg	5.09
	MURO 2	2.00	1.69	4 mm	0.15	8.00	0.51	kg	4.06
	MURO 3	2.00	2.02	4 mm	0.15	4.00	0.61	kg	2.42
	MURO 4	2.00	1.14	4 mm	0.15	4.00	0.34	kg	1.37
	MURO 5	2.00	2.12	4 mm	0.15	4.00	0.64	kg	2.54
								Subtotal	88.15
								COBRADO EN ACTAS	56.27
								TOTAL EJECUTADO	**31.88**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI


APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
5.03	Suministro y armado de acero de refuerzo de 60000 Psi para muros de mamposteria	kg	31.88

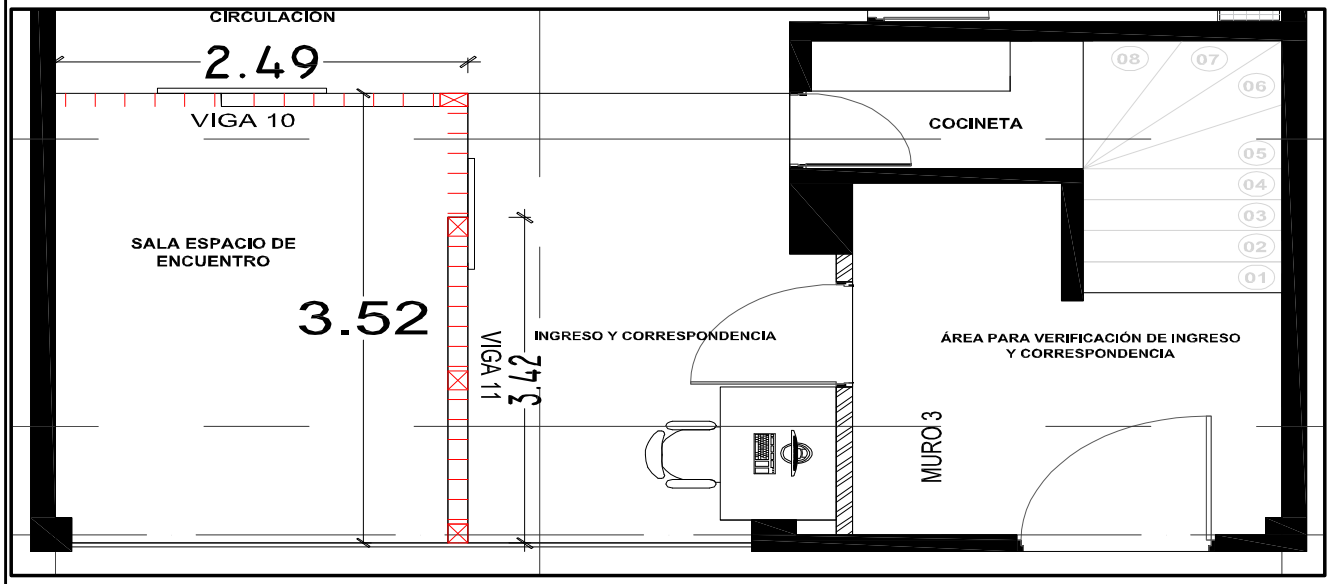


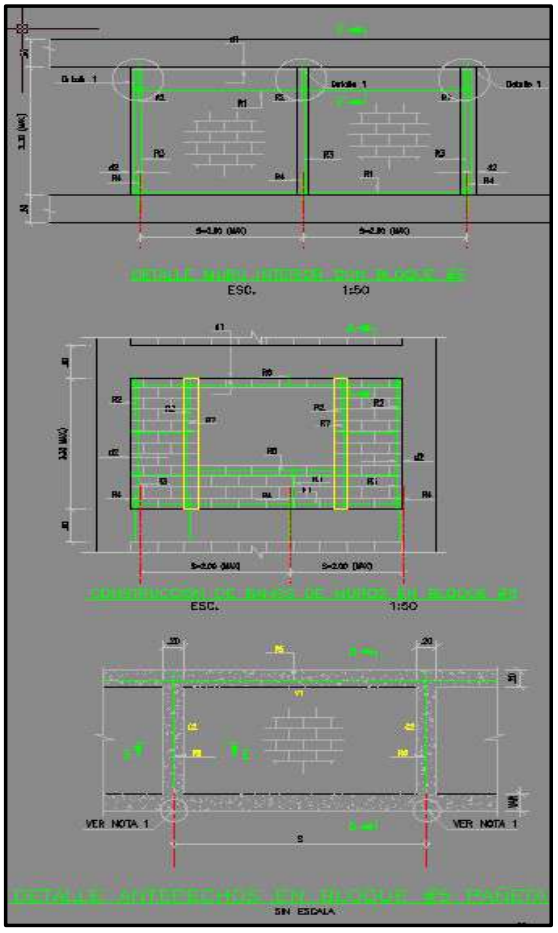

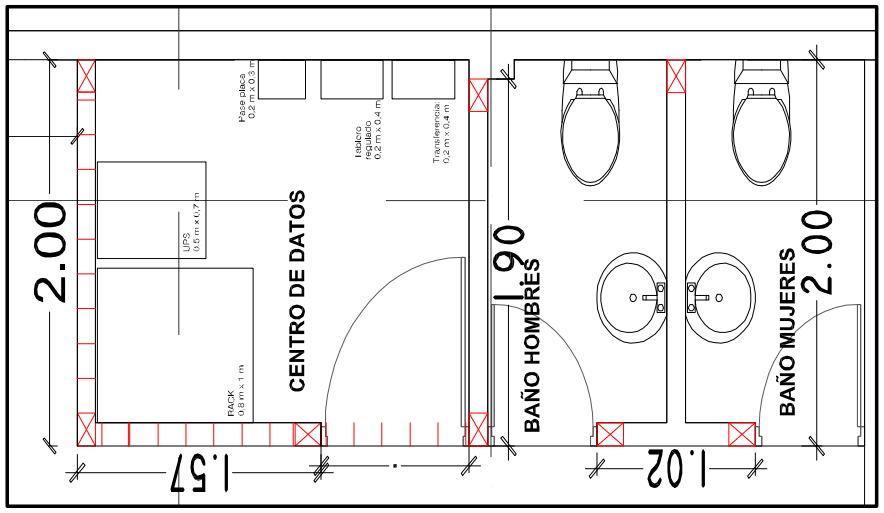


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
5.03	Suministro y armado de acero de refuerzo de 60000 Psi para muros de mamposteria	kg	31.88

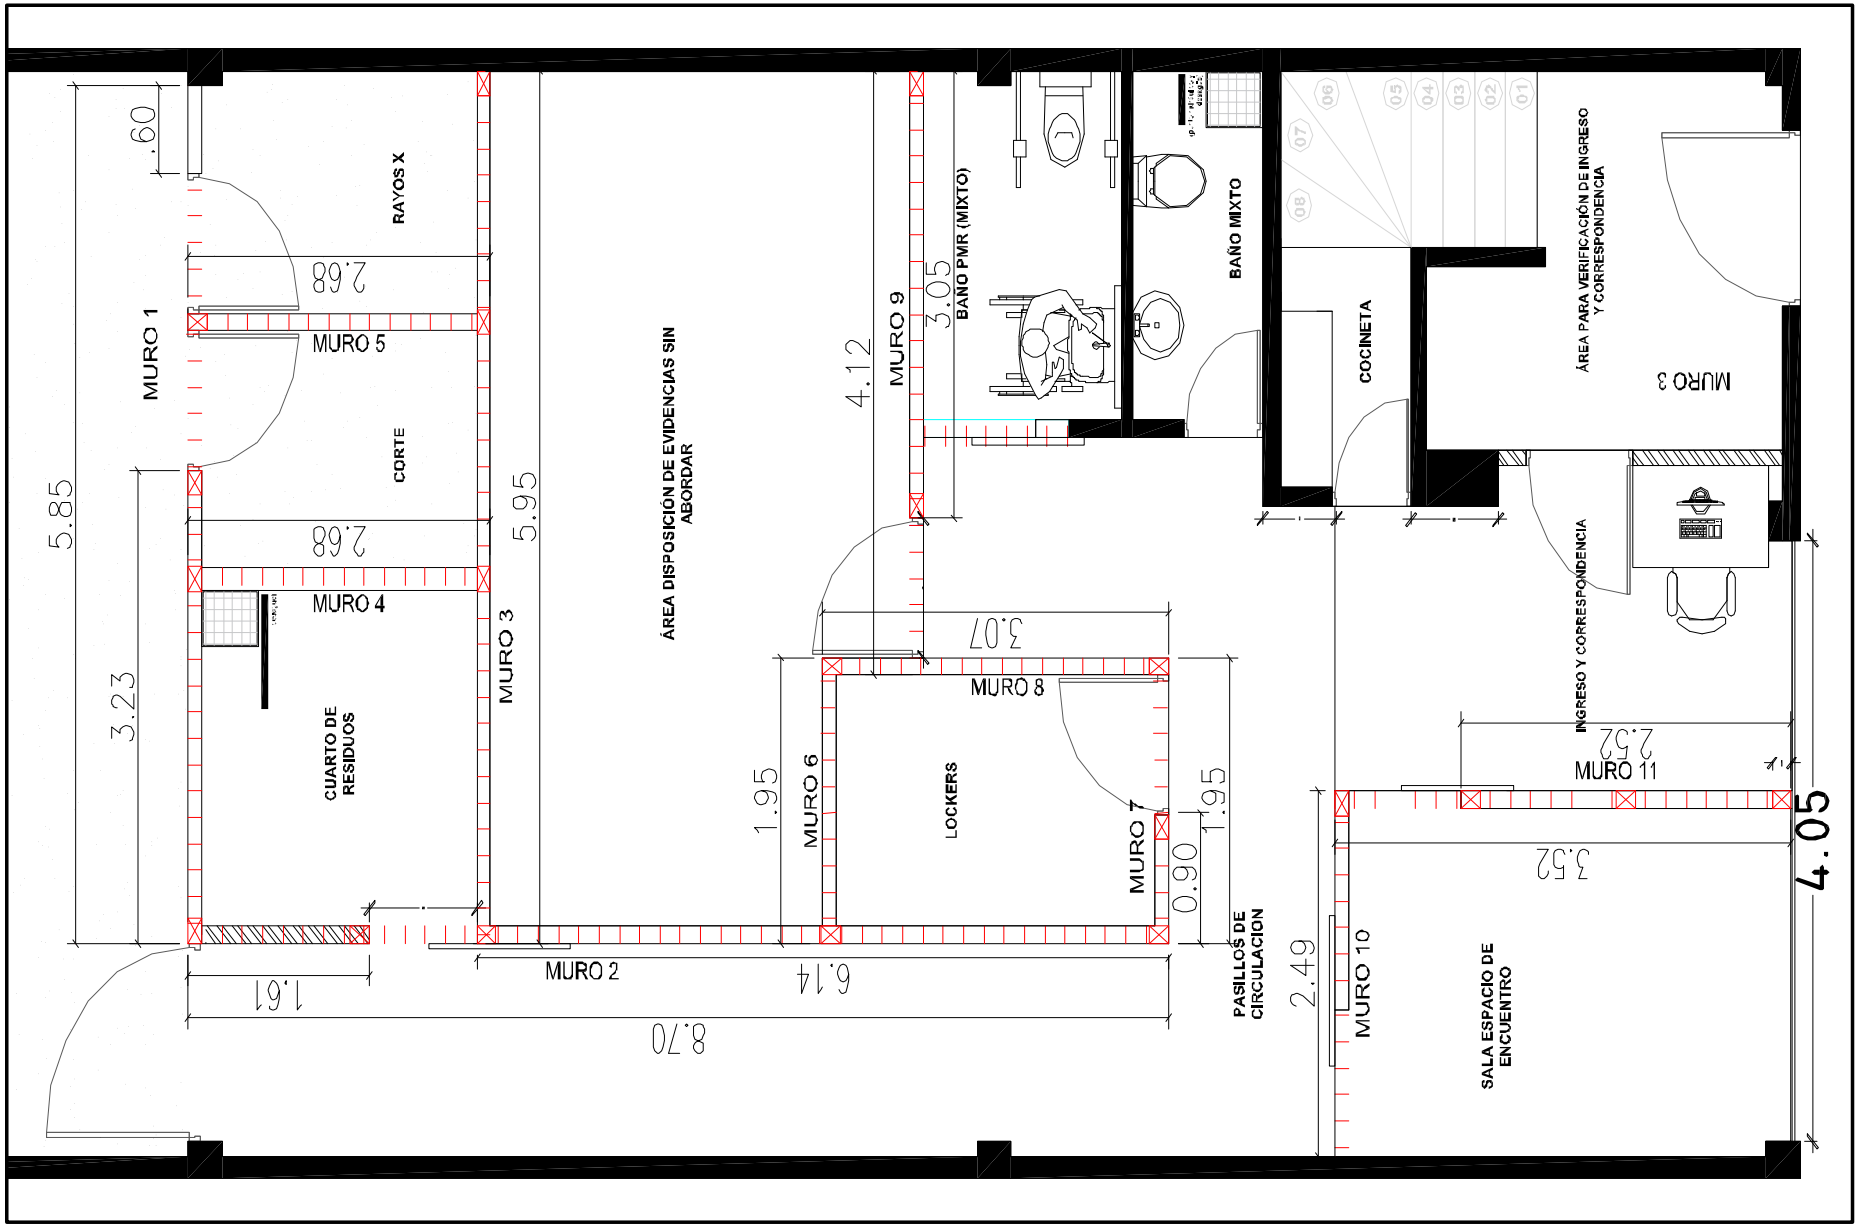

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
5.03	Suministro y armado de acero de refuerzo de 60000 Psi para muros de mamposteria	kg	31.88

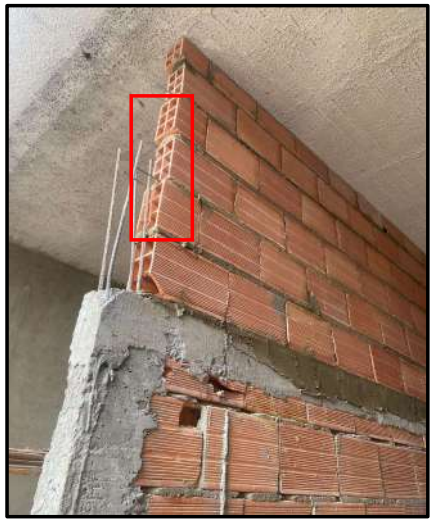





OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.02	Suministro e instalación de red PVC.P R de 21 - 1/2"	ml	23.06

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	LARGO	ANCHO	ALTO				
ALIMENTACIÓN A TANQUE	5.94			1	m	5.94	
	2.93			1	m	2.93	
SUBE A TANQUE DE RESERVA			6.70	1	m	6.70	
ALIMENTACIÓN COCINETA	1.00			1	m	1.00	
	0.14			1	m	0.14	
	0.90			1	m	0.90	
BAJA A REGISTRO COCINETA			3.00	1	m	3.00	
ALIMENTACION BAÑO MIXTO	0.26			1	m	0.26	
	0.10			2	m	0.20	
	2.21			1	m	2.21	
	1.15			1	m	1.15	
	0.32			1	m	0.32	
	0.08			3	m	0.24	
BAJA A REGISTRO BAÑO MIXTO			2.80	1	m	2.80	
SUBE DE REGISTRO			2.80	1	m	2.80	
BAJA A LAVAMANOS			3.05	1	m	3.05	
BAJA A SANITARIO			3.38	1	m	3.38	
BAJA A POCETA			3.00	1	m	3.00	
ALIMENTACION BAÑO PMR	0.26			1	m	0.26	
	2.38			1	m	2.38	
	0.70			3	m	2.10	
	0.10			1	m	0.10	
	0.66			1	m	0.66	
	0.12			1	m	0.12	
	0.11			1	m	0.11	
BAJA A REGISTRO BAÑO MIXTO			2.80	1	m	2.80	
SUBE DE REGISTRO			2.80	1	m	2.80	
BAJA A LAVAMANOS			3.05	1	m	3.05	
BAJA A SANITARIO			3.38	1	m	3.38	
ALIMENTACION ZONA DE ABORDAJE	7.33			1	m	7.33	
	3.30			1	m	3.30	
	15.46			1	m	15.46	
	0.15			2	m	0.31	
	0.39			1	m	0.39	
	0.34			1	m	0.34	
BAJA A REGISTRO POCETA			3.00	1	m	3.00	
BAJA A REGISTRO LAVAMANOS ZA 1			3.00	1	m	3.00	
BAJA A REGISTRO LAVAMANOS ZA 2			3.00	1	m	3.00	
BAÑO HOMBRES	1.41			1	m	1.41	
	0.68			1	m	0.68	
	0.35			1	m	0.35	
	1.88			1	m	1.88	
BAJA A SANITARIO			2.18	1	m	2.18	
BAJA A LAVAMANOS			1.85	1	m	1.85	
BAJA A REGISTRO			1.60	1	m	1.60	
SUBE DE REGISTRO			1.60	1	m	1.60	
BAÑO MUJERES	0.12			1	m	0.12	
	1.47			1	m	1.47	
	0.35			1	m	0.35	
	0.80			1	m	0.80	
	0.43			1	m	0.43	
	1.11			1	m	1.11	
					Subtotal	109.74	

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
12.08	Suministro, instalación y puesta en marcha de Patch Cord Categoria 6A- 1.5 m	un	0.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
BAJA A SANITARIO			2.18	1	m	2.18
BAJA A LAVAMANOS			1.85	1	m	1.85
BAJA A REGISTRO			1.60	1	m	1.60
SUBE DE REGISTRO			1.60	1	m	1.60
					Subtotal	7.23
					Viene	109.74
					TOTAL ACTIVIDAD	116.97
					TOTAL COBRADO EN ACTAS	93.91
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**23.06**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

Pablo R Peña
APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD


CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.02	Suministro e instalación de red PVC.P R de 21 - 1/2"	ml	23.06

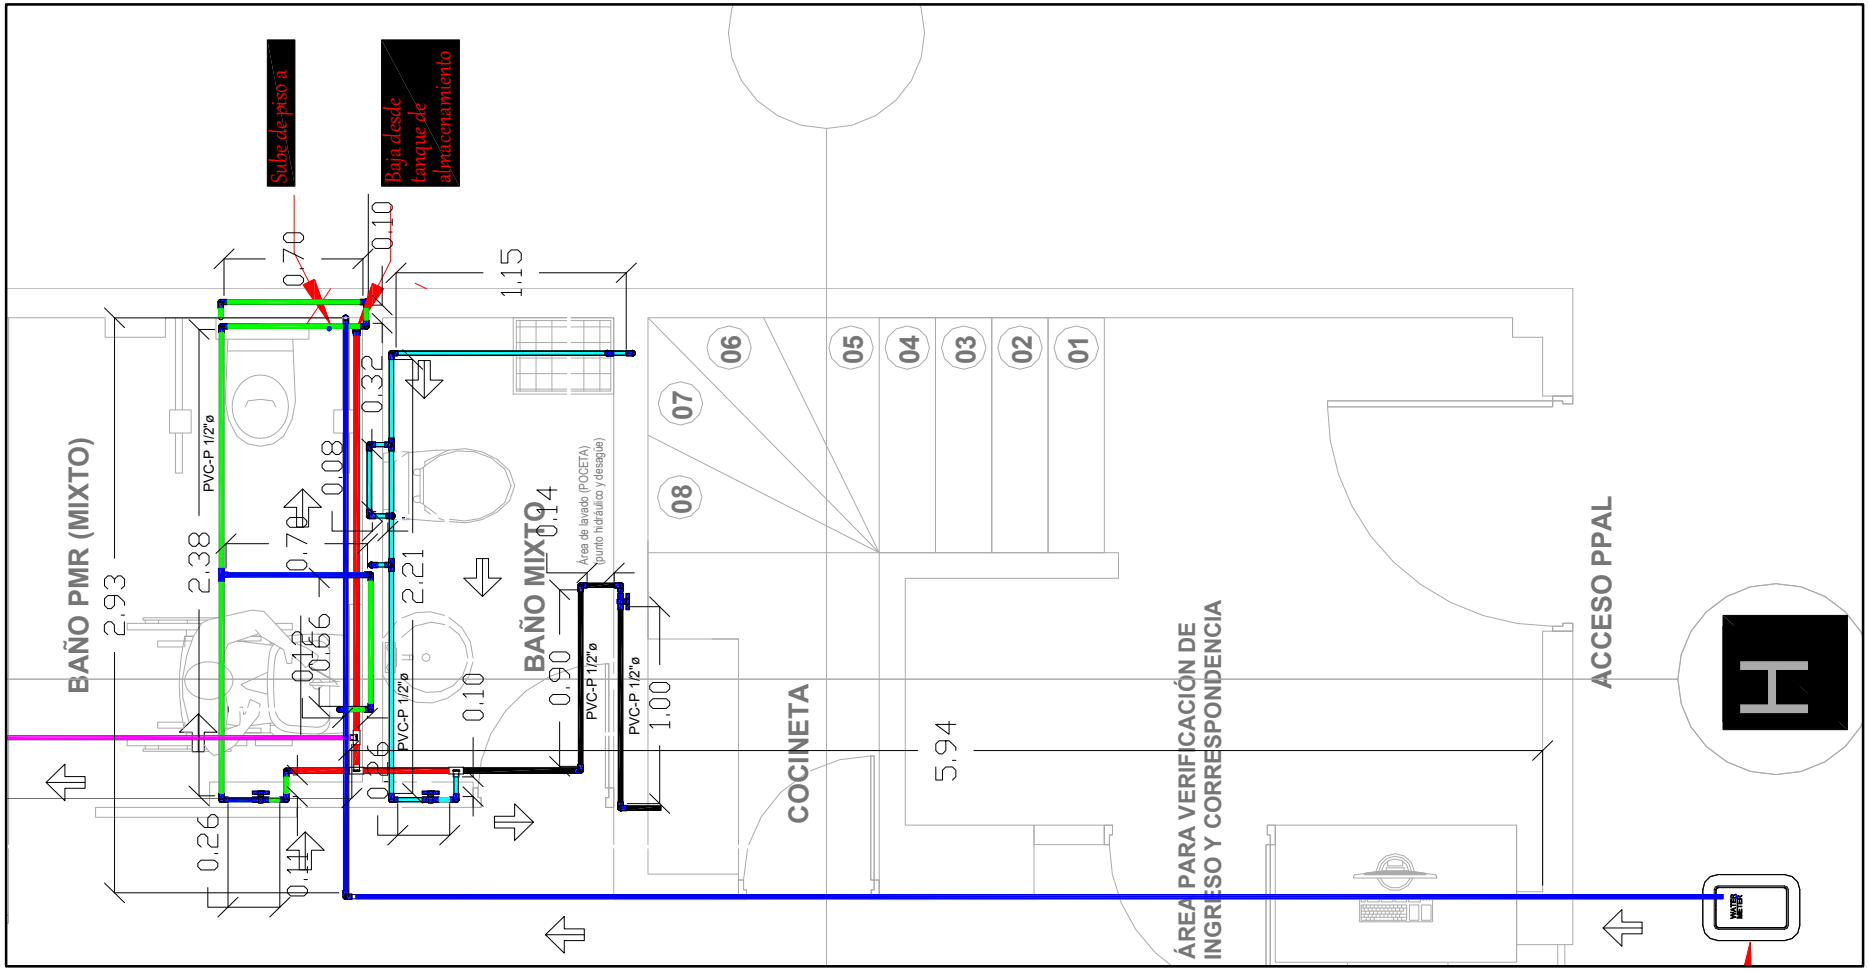


CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.02	Suministro e instalación de red PVC.P R de 21 - 1/2"	ml	23.06

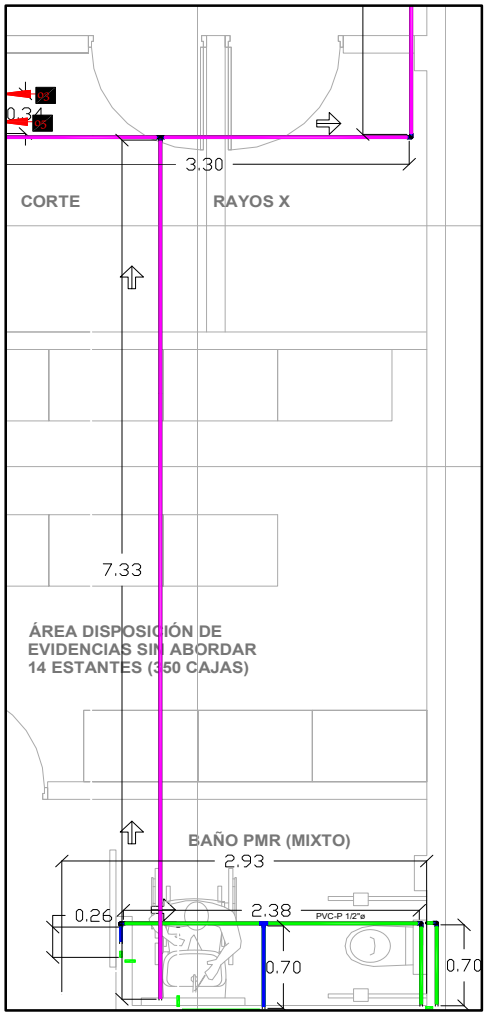


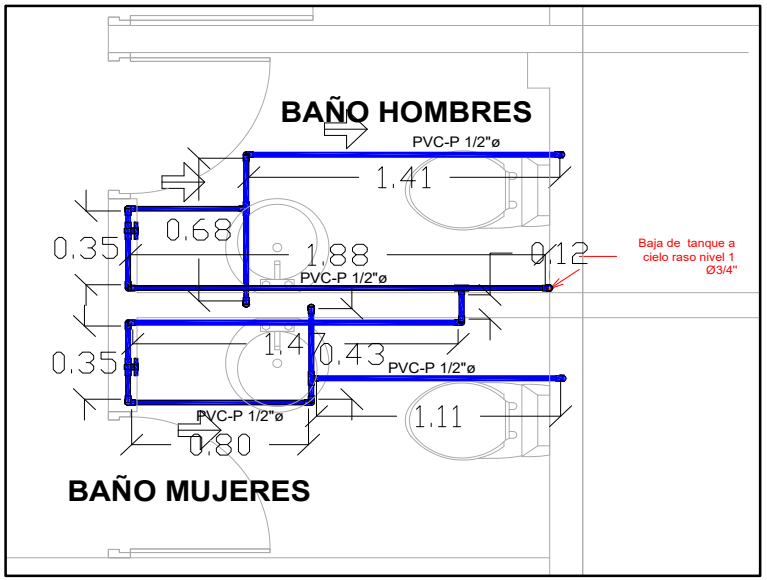

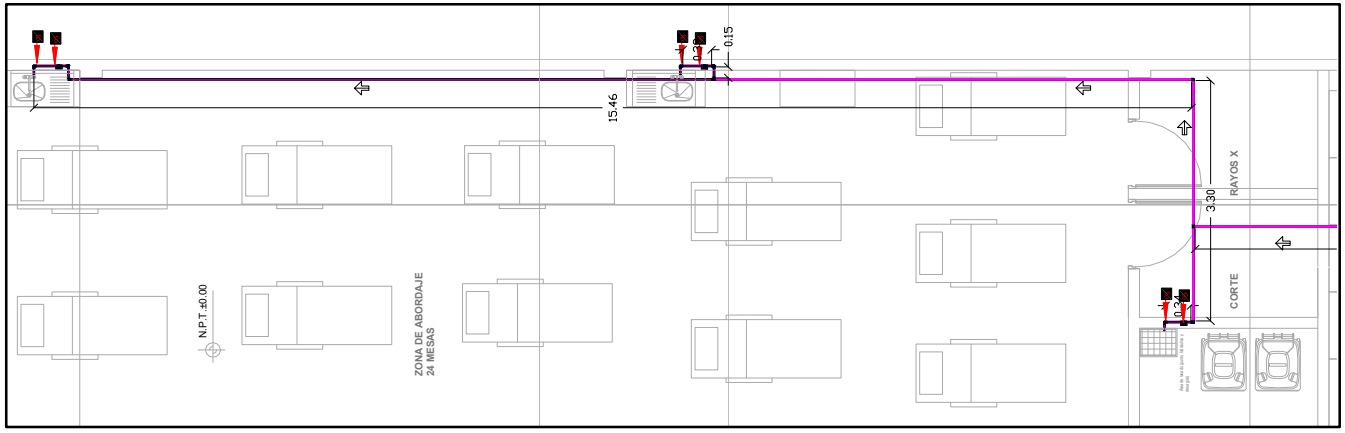

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.02	Suministro e instalación de red PVC.P R de 21 - 1/2"	ml	23.06

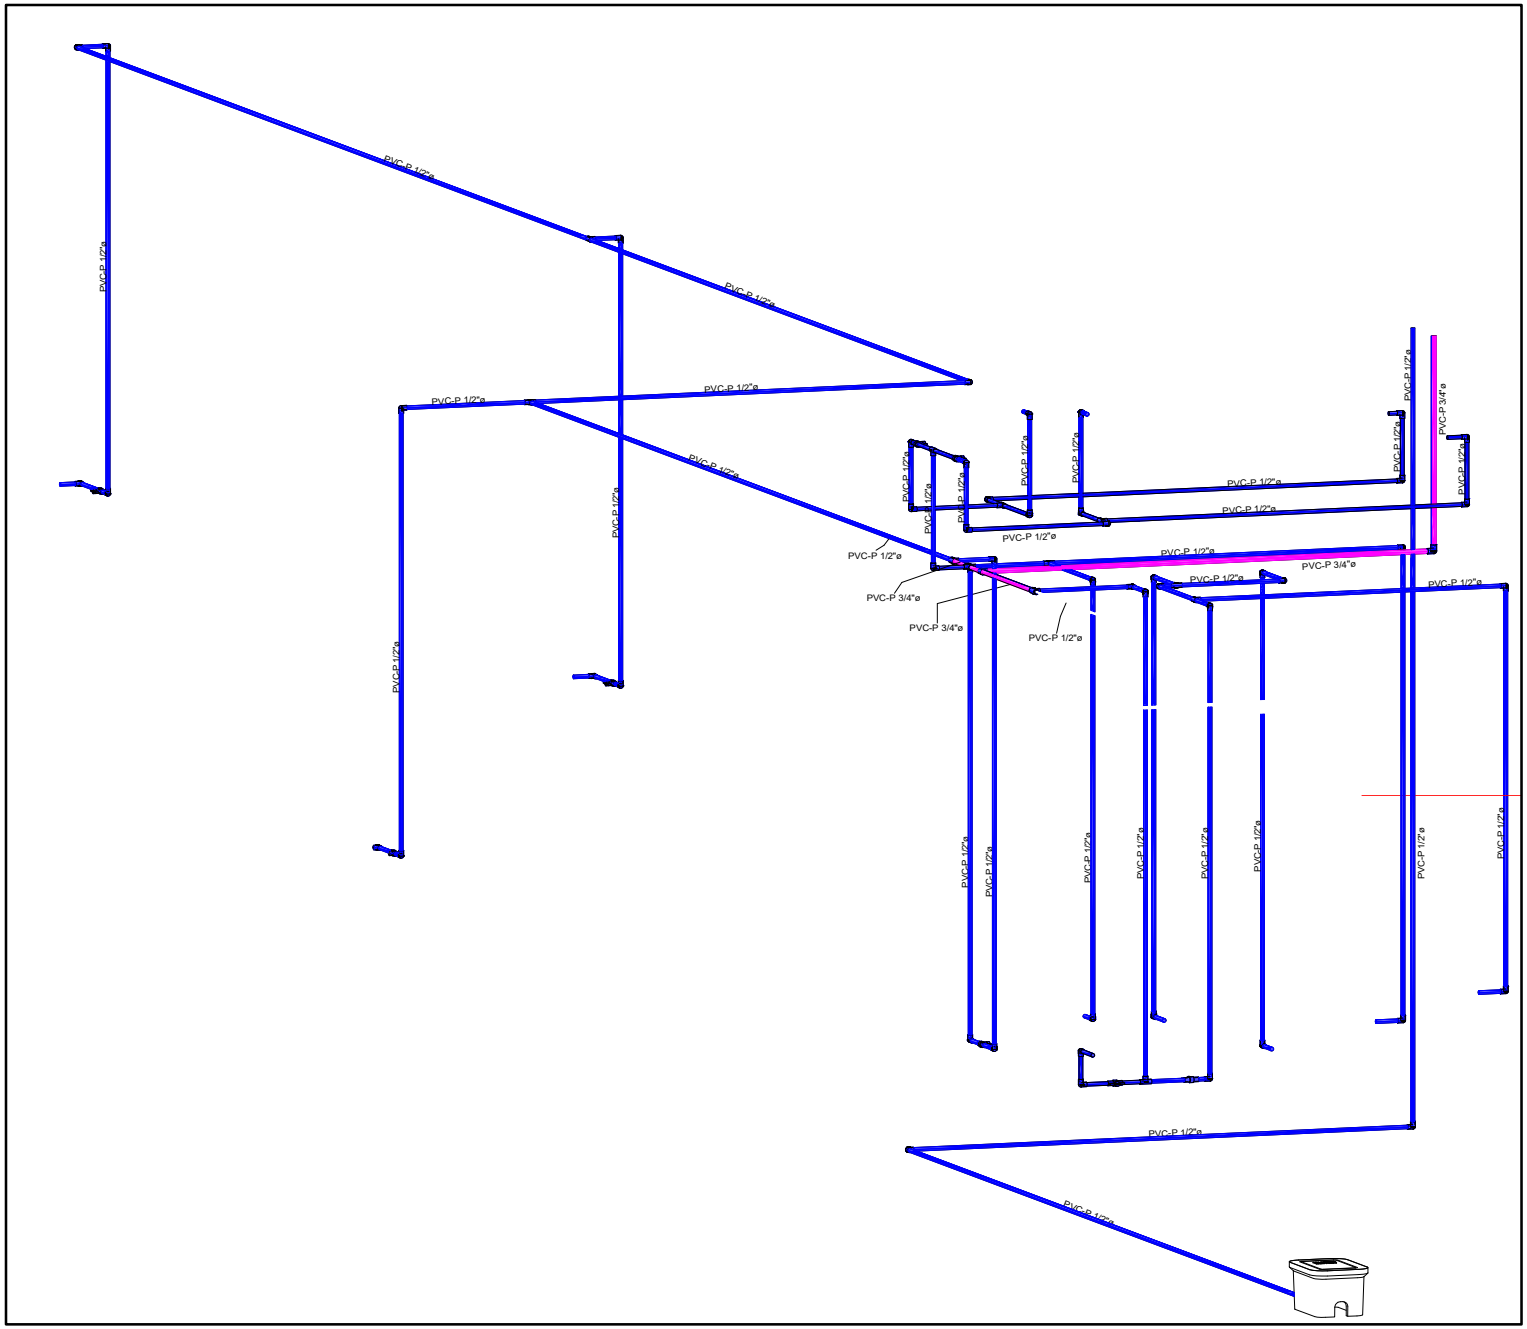

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.02	Suministro e instalación de red PVC.P R de 21 - 1/2"	ml	23.06












OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.04	Suministro e instalación de válvula de bola - 1/2"	un	2.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
ZONA DE ABORDAJE				2	un	2.00
CUARTO DE RESIDUOS				1	un	1.00
BAÑO PMR				1	un	1.00
BAÑO MIXTO				1	un	1.00
COCINETA				2	un	2.00
BAÑO HOMBREES				2	un	2.00
BAÑO MUJERES				1	un	1.00
					TOTAL EJECUTADO	10.00
					COBRADO EN ACTAS	8.00
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**2.00**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ


REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI


PABLO PEÑA


APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.04	Suministro e instalación de válvula de bola - 1/2"	un	2.00

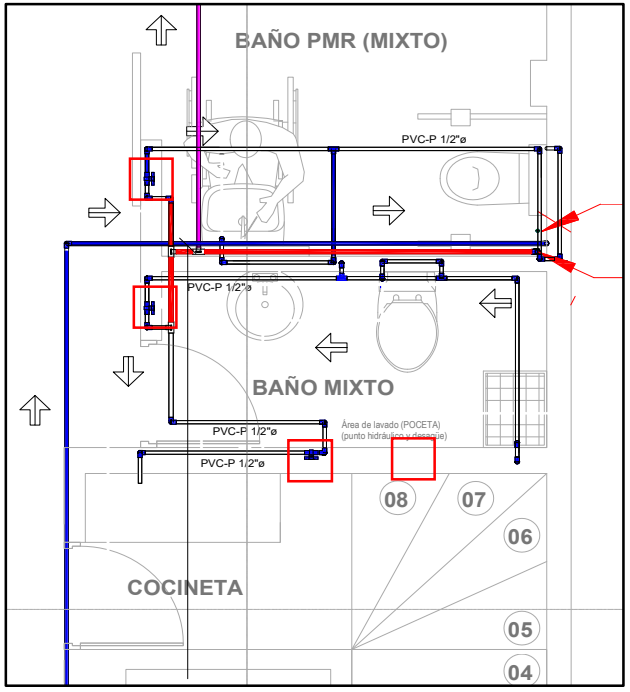

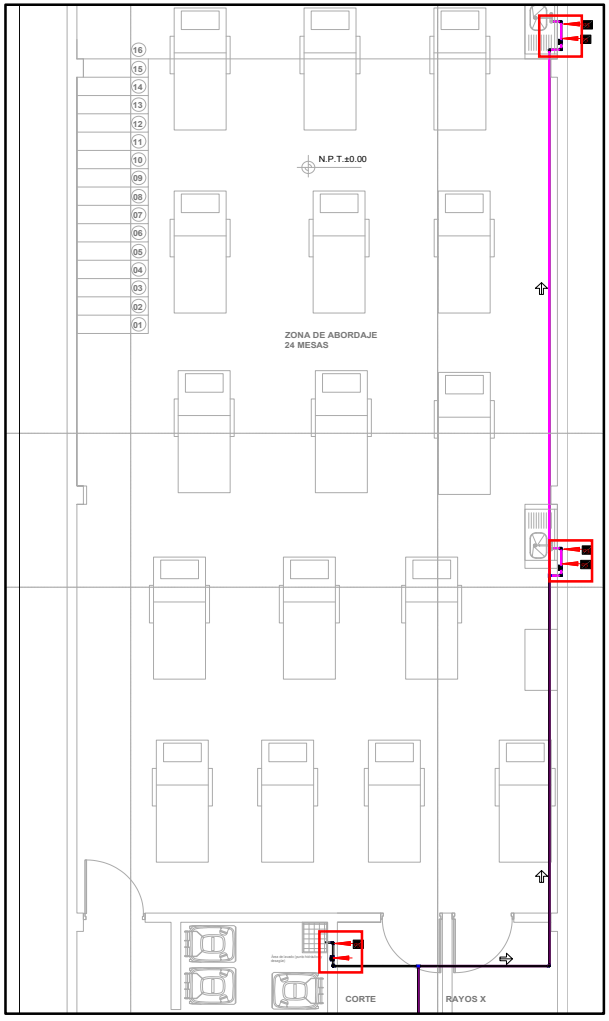

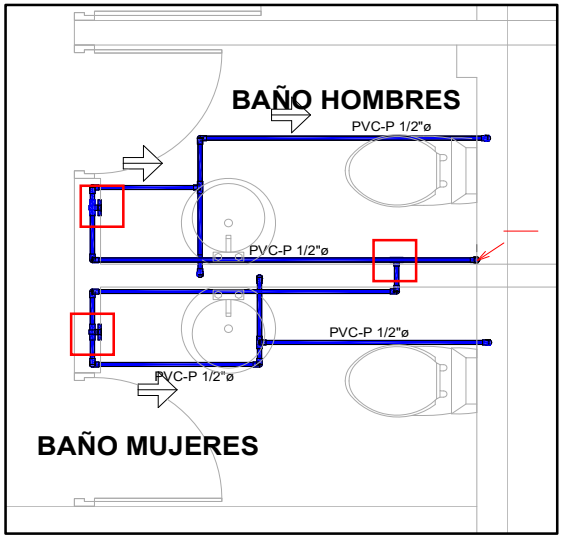

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
6.04	Suministro e instalación de válvula de bola - 1/2"	un	2.00












OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
7.01	Suministro e instalación de red sanitaria PVC.S - 4"	ml	2.25

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO			
DESCARGA AREA DE ABORDAJE	12.70			1		12.70
	4.20			1		4.20
DESCARGA POCETA ZONA DE RESIDUOS	1.25			1		1.25
DESCARGA	5.60			1		5.60
BAÑOS PRIMER PISO	3.10			1		3.10
	2.90			1		2.90
	1.00			1		1.00
	2.90			1		2.90
DESCARGA BAÑOS 2DO PISO	1.50			1		1.50
	1.35			1		1.35
DESCARGA	5.00			1		5.00
BAJANTE	4.10			1		4.10
					TOTAL EJECUTADO	45.60
					COBRADO EN ACTAS	43.35
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**2.25**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

PABLO A PEÑA
APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
7.01	Suministro e instalación de red sanitaria PVC.S - 4"	ml	2.25

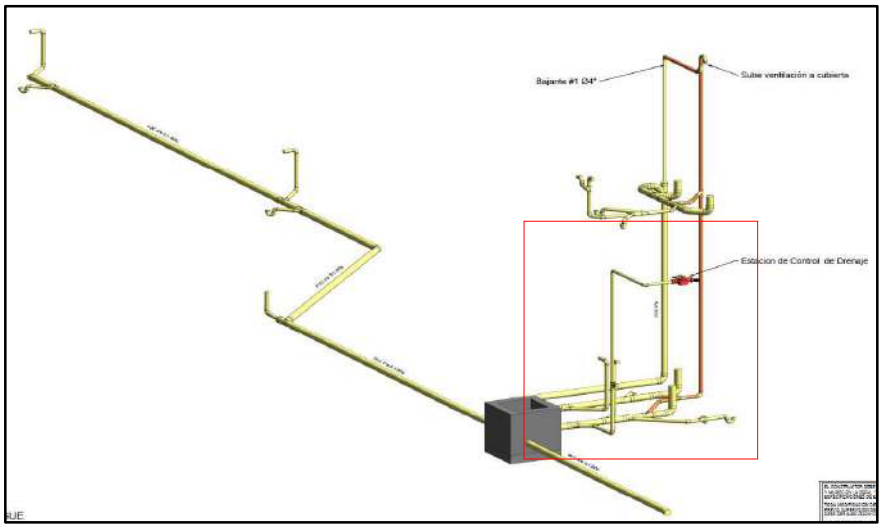


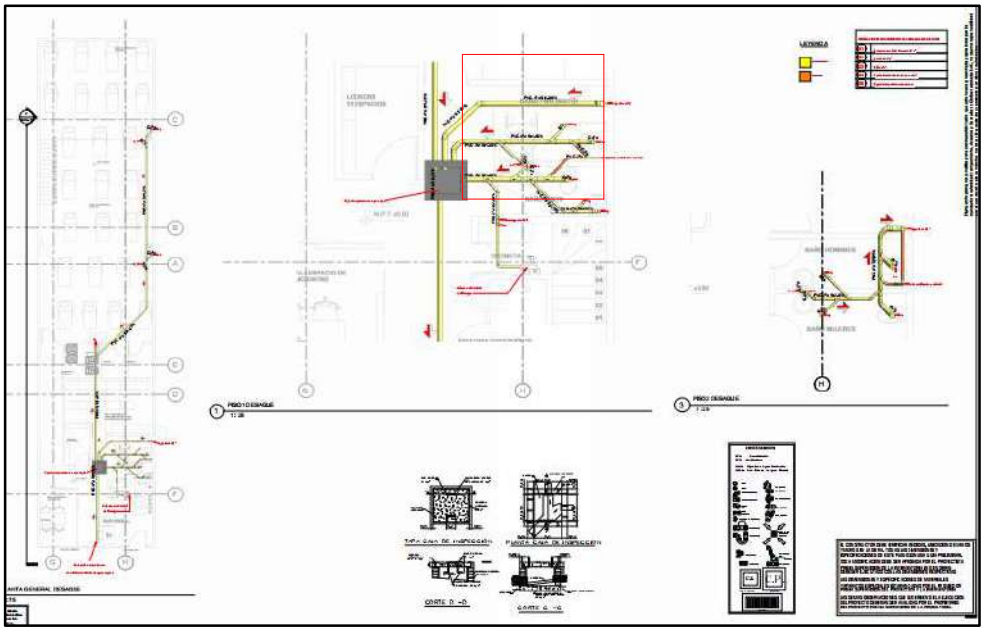

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
7.01	Suministro e instalación de red sanitaria PVC.S - 4"	ml	2.25

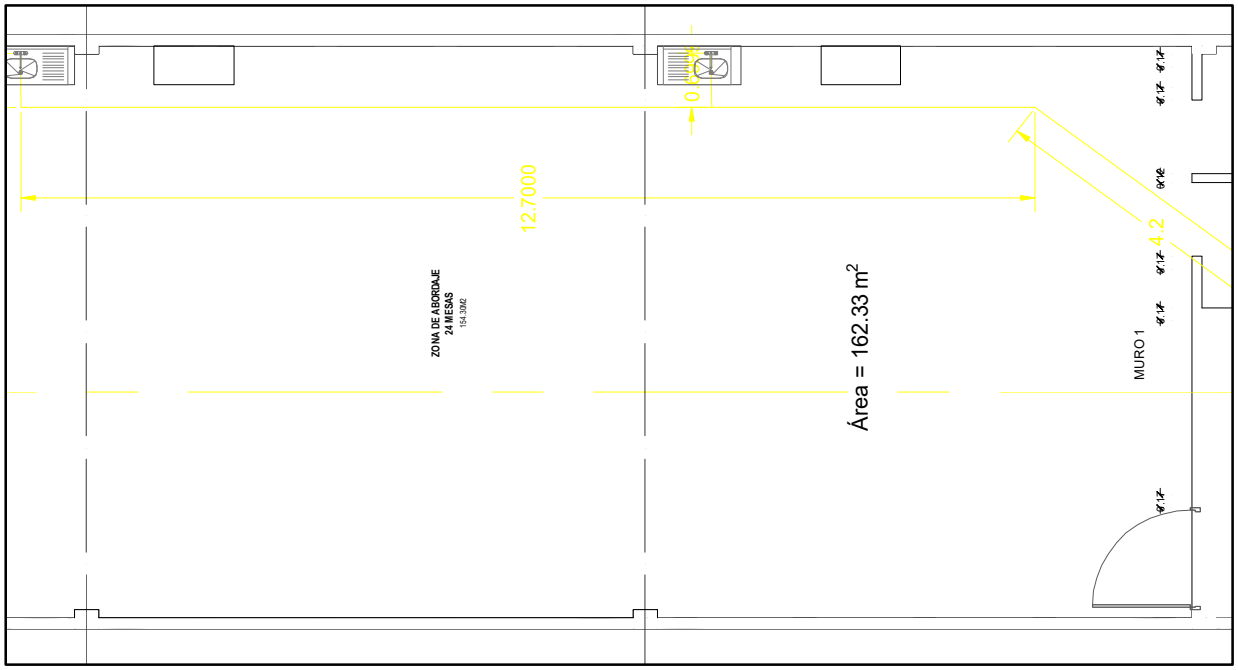


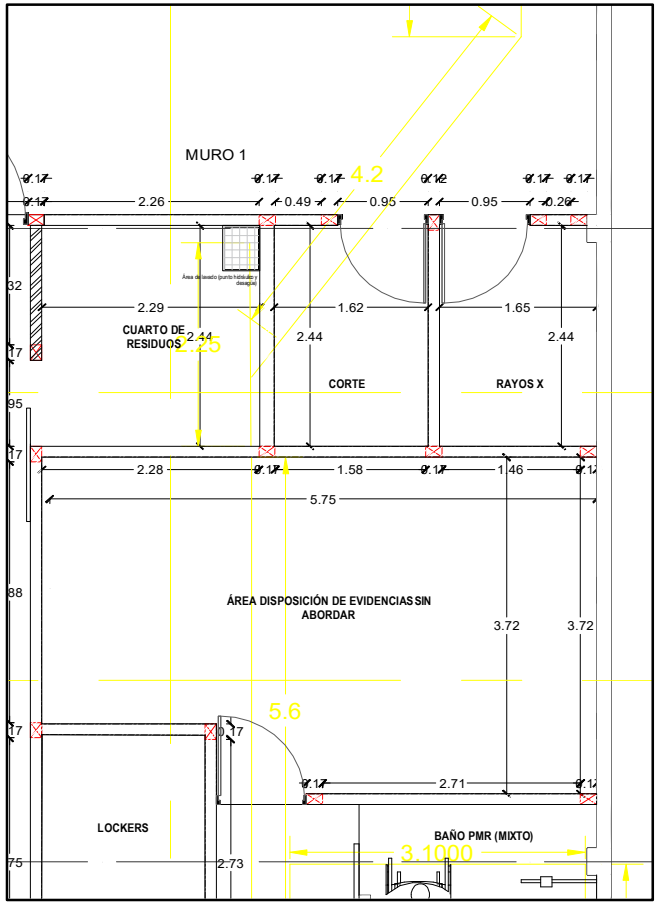

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
7.01	Suministro e instalación de red sanitaria PVC.S - 4"	ml	2.25

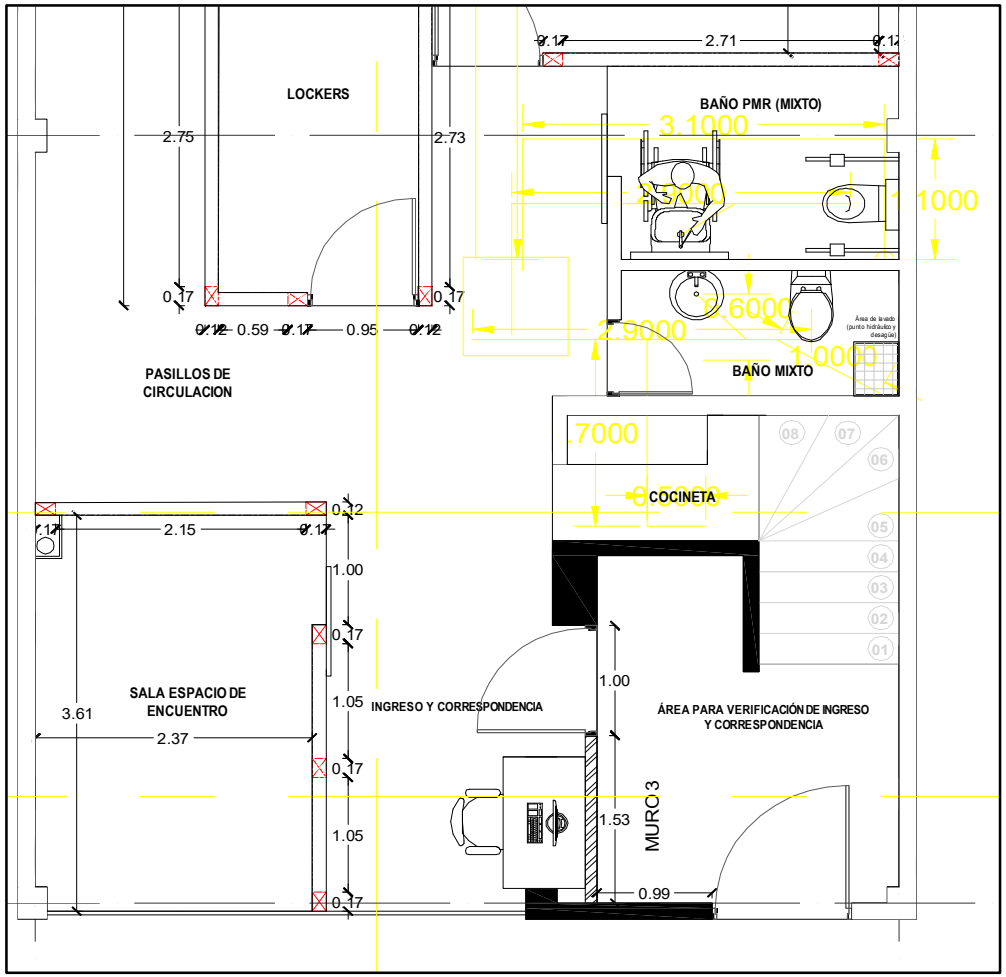

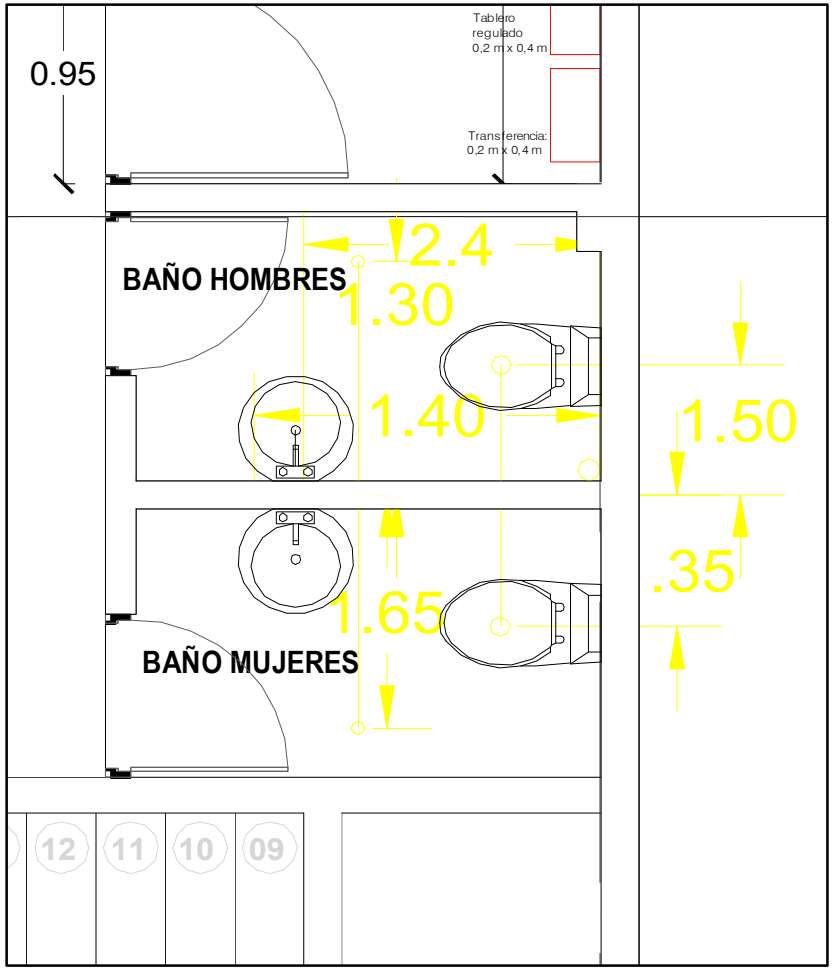

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
7.01	Suministro e instalación de red sanitaria PVC.S - 4"	ml	2.25













OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
7.05	Suministro e instalación de sifones de piso - 2" incluye rejilla metálica	un	2.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
BAÑO MIXTO	---	---	---	1.00	und	1.00	
BAÑO PMR				1.00	und	1.00	
BAÑO MUJER	---	---	---	1.00	und	1.00	
BAÑO HOMBRE	---	---	---	1.00	und	1.00	
LAVAMANOS ZONA DE ABORDAJE	---	---	---	2.00	und	2.00	
CUARTO DE RESIDUOS	---	---	---	1.00	und	1.00	
					TOTAL EJECUTADO	7.00	
					COBRADO EN ACTAS	5.00	
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**2.00**	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI


PABLO PEÑA
APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD


CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
7.05	Suministro e instalación de sifones de piso - 2" incluye rejilla metálica	un	2.00

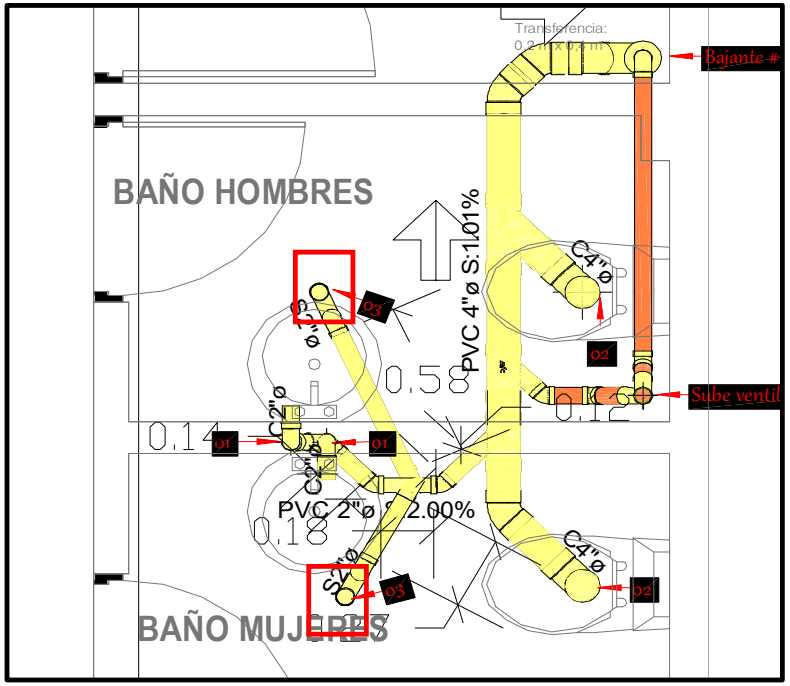

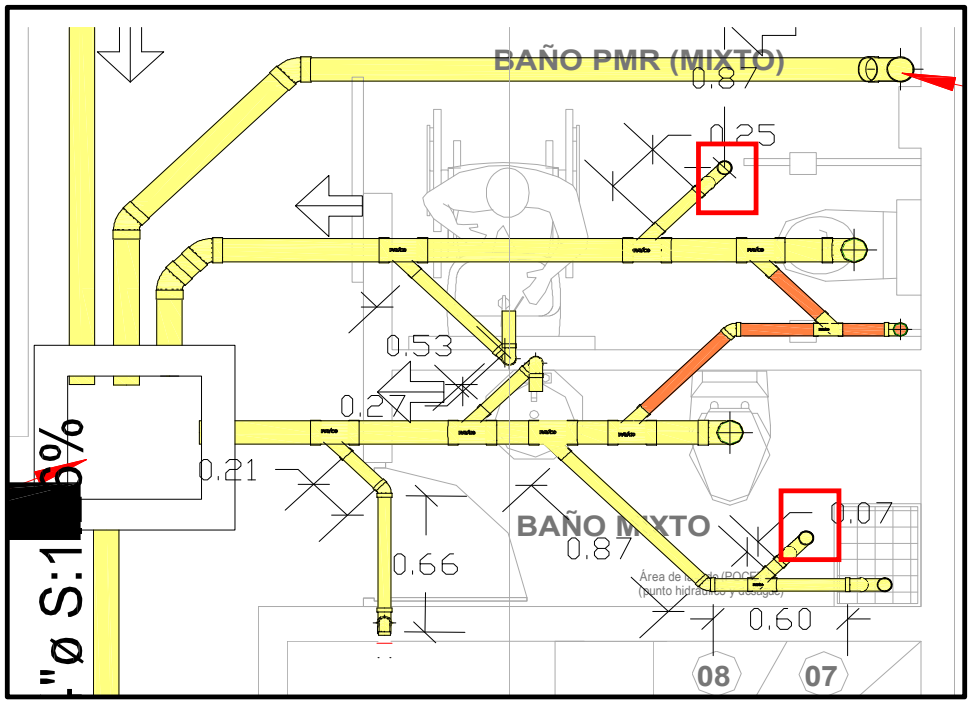

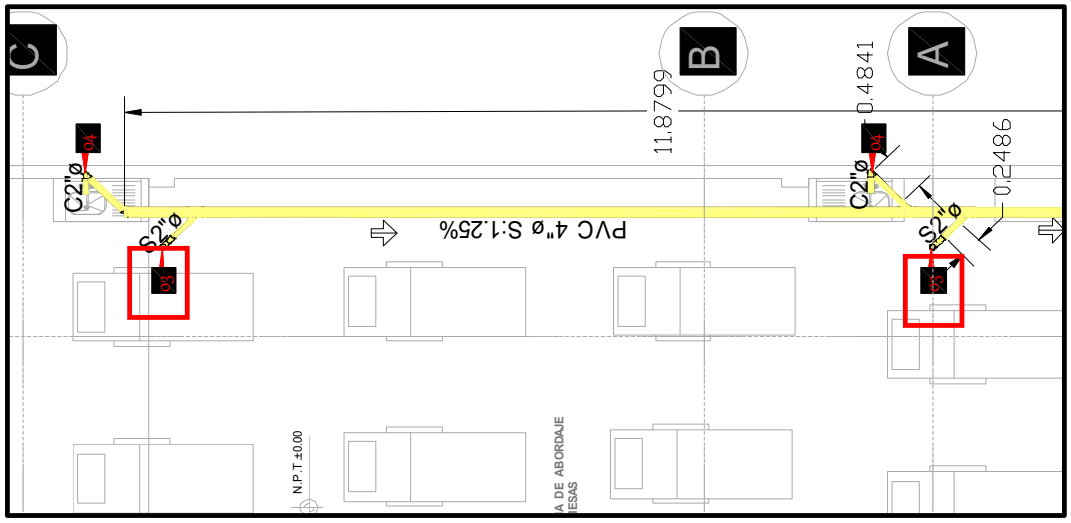

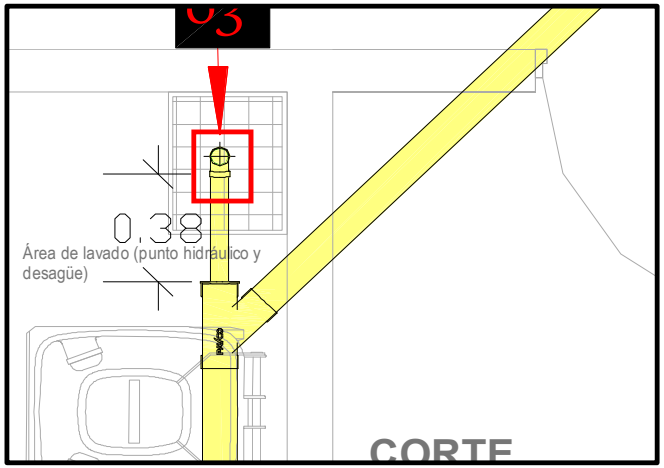

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
7.05	Suministro e instalación de sifones de piso - 2" incluye rejilla metálica	un	2.00











OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
8.01	Suministro e instalación de sanitario de losa vitrificada tipo tanque con griferia tipo push cromada	un	4.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
BAÑO MIXTO	---	---	---	1.00	und	1.00	
BAÑO PMR				1.00	und	1.00	
BAÑO MUJER	---	---	---	1.00	und	1.00	
BAÑO HOMBRE	---	---	---	1.00	und	1.00	
					TOTAL EJECUTADO	4.00	
					COBRADO EN ACTAS	0.00	
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**4.00**	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
8.01	Suministro e instalación de sanitario de losa vitrificada tipo tanque con griferia tipo push cromada	un	4.00

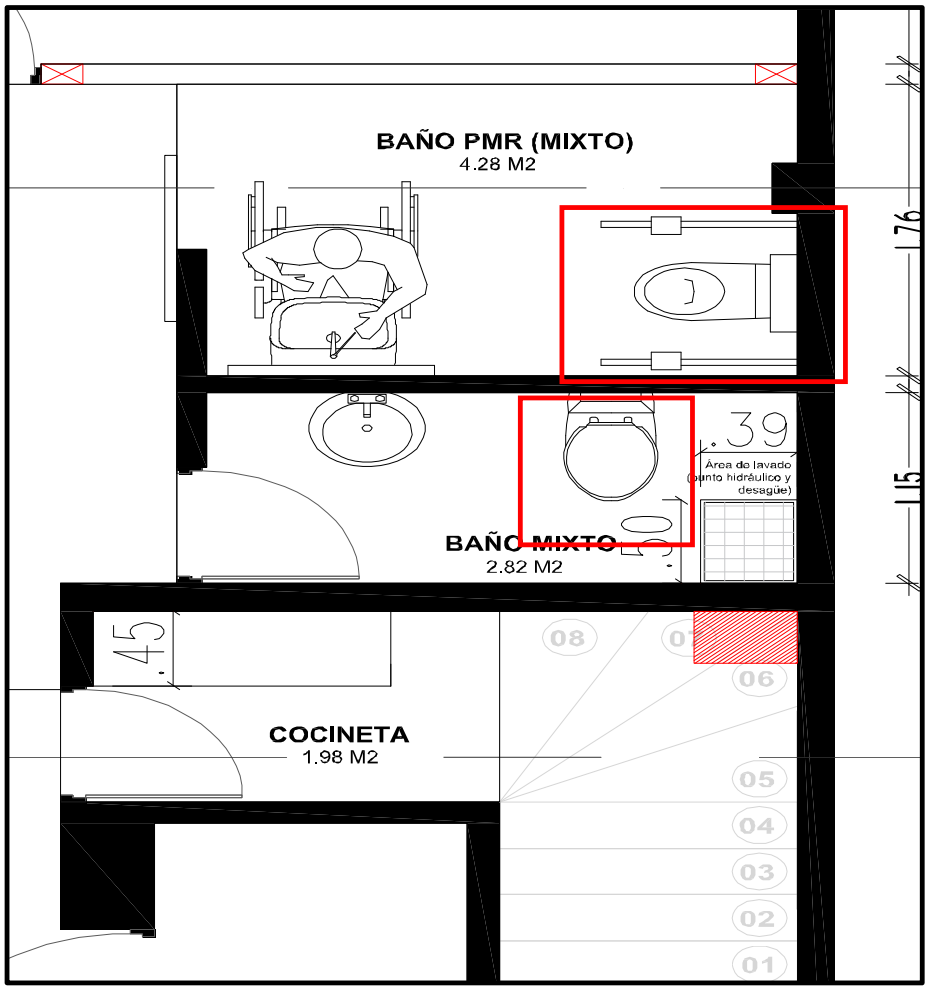

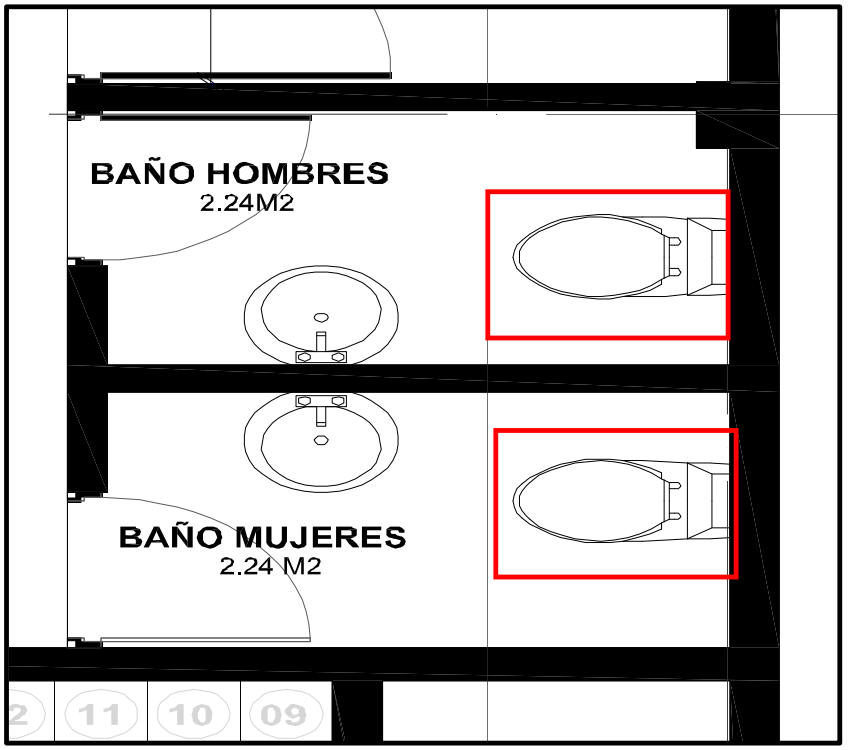

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
8.01	Suministro e instalación de sanitario de losa vitrificada tipo tanque con griferia tipo push cromada	un	4.00









OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
8.02	Suministro e instalación de lavamanos de losa vitrificada tipo mural prefabricado con griferia tipo push cromada	un	4.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
BAÑO MIXTO	---	---	---	1.00	und	1.00	
BAÑO PMR				1.00	und	1.00	
BAÑO MUJER	---	---	---	1.00	und	1.00	
BAÑO HOMBRE	---	---	---	1.00	und	1.00	
					TOTAL EJECUTADO	4.00	
					COBRADO EN ACTAS	0.00	
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**4.00**	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
8.02	Suministro e instalación de lavamanos de losa vitrificada tipo mural prefabricado con griferia tipo push cromada	un	4.00

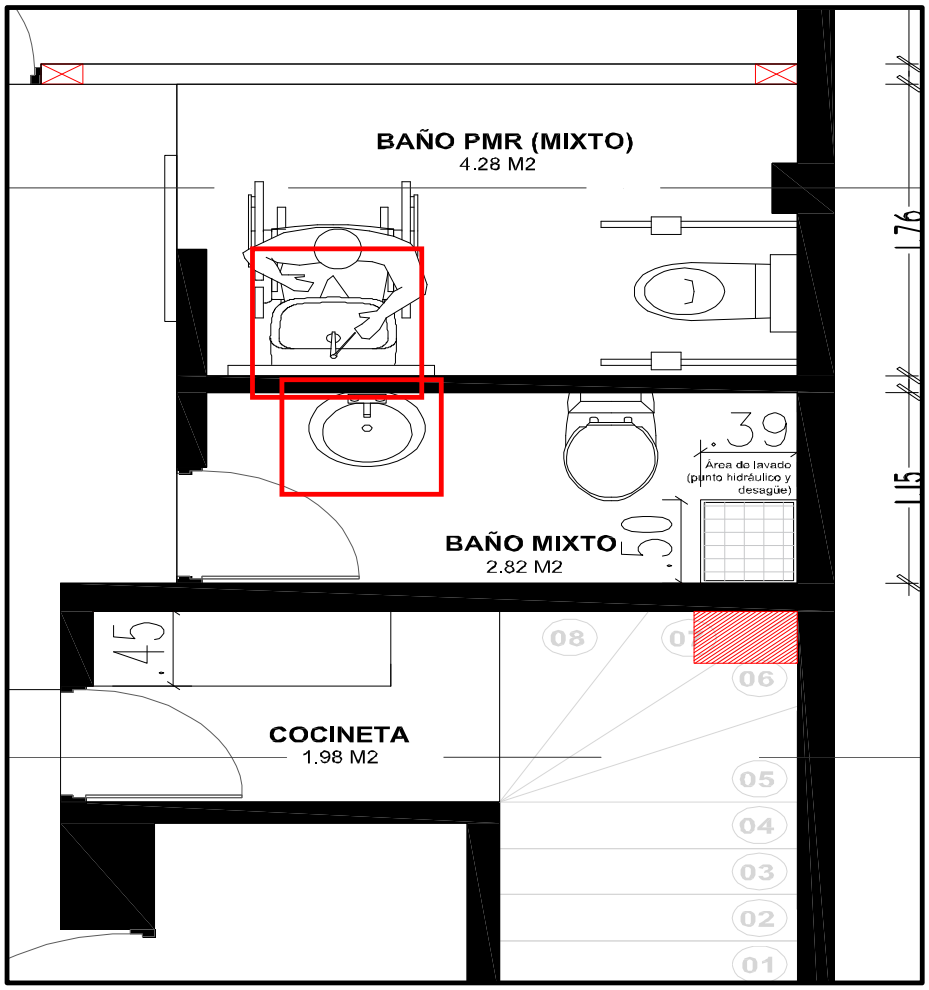

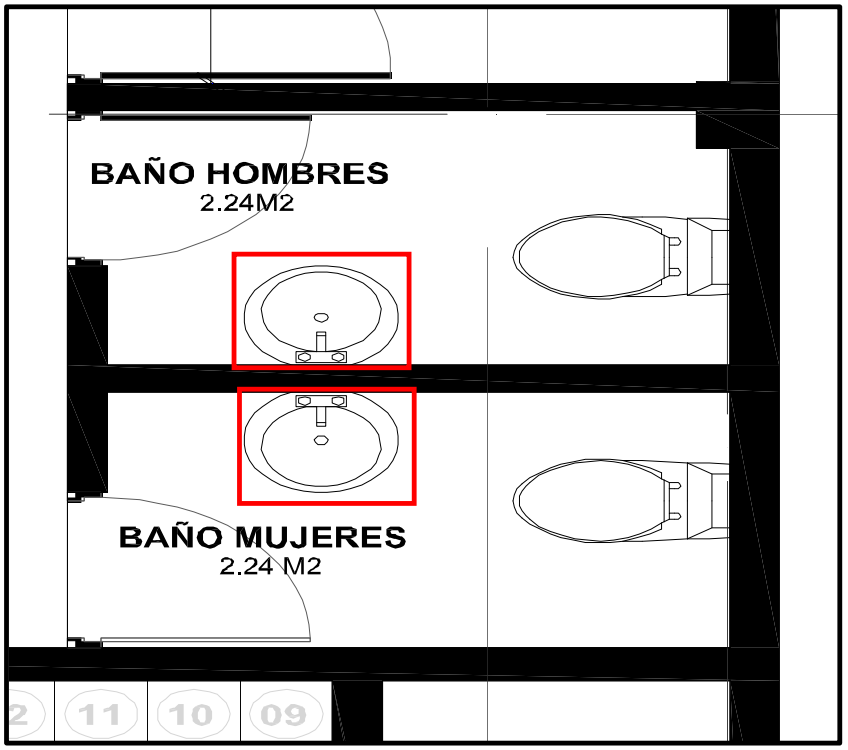

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
8.02	Suministro e instalación de lavamanos de losa vitrificada tipo mural prefabricado con griferia tipo push cromada	un	4.00










OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
10.02	Suministro, instalación y puesta en marcha de acometida 3x2+1x2(N)+1x8(T) Cobre AWG THHN, proveniente de punto de conexion tablero de medidores No. 8, hasta tablero T1 incluye tubería PVC 2" desde punto de conexión hasta tablero de distribución, remoción y compactación de tierra en su respectiva instalacion,	ml	19.80

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
Acometida	61.80	---	---	1.00	ml	61.80	
					TOTAL EJECUTADO	61.80	
					COBRADO EN ACTAS	42.00	
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	19.80	

OBSERVACIONES:	Se hizo revisión en obra, se incluye el cable necesario y requerido para realizar los trabajos de puenteo en el tablero No. 8

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

ING. BERNARDO SOTO GARCÍA
SUPERVISOR UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
10.02	Suministro, instalación y puesta en marcha de acometida 3x2+1x2(N)+1x8(T) Cobre AWG THHN, proveniente de punto de conexion tablero de medidores No. 8, hasta tablero T1 incluye tubería PVC 2" desde punto de conexión hasta tablero de distribución, remoción y compactación de tierra en su respectiva instalacion,	ml	19.80



B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad total**
10.02	Suministro, instalación y puesta en marcha de acometida 3x2+1x2(N)+1x8(T) Cobre AWG THHN, proveniente de punto de conexion tablero de medidores No. 8, hasta tablero T1 incluye tubería PVC 2" desde punto de conexión hasta tablero de distribución, remoción y compactación de tierra en su respectiva instalacion,	ml	19.80







OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
10.05	Suministro, instalación y puesta en marcha de alimentador en cable 2x8+1x8(N)+1x10(T) Cobre AWG THHN, libre de halogenos, en ducto EMT 3/4" proveniente de tablero T1, apto para instalar en bandeja, hasta UPS incluye puntas, arranque directo y terminales de conexión.	ml	25.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
SUBE DESDE TABLERO DE 30 CIRCUITOS	---	---	0.93	2.00	m	1.86	
DISTRIBUCIÓN	2.13			2.00	m	4.26	
	1.20			2.00	m	2.40	
	1.33			2.00	m	2.66	
	5.27			2.00	m	10.54	
	6.02			2.00	m	12.04	
SUBE ALIMENTACION RACK			0.42	4.00	m	1.68	
			2.40	4.00	m	9.60	
RECORRIDO A RACK	2.48			2.00	m	4.96	
					Subtotal	**50.00**	
					COBRADO EN ACTAS	**25.00**	
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**25.00**	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

ING. BERNARDO SOTO GARCÍA
SUPERVISOR UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
10.05	Suministro, instalación y puesta en marcha de alimentador en cable 2x8+1x8(N)+1x10(T) Cobre AWG THHN, libre de halogenos, en ducto EMT 3/4" proveniente de tablero T1, apto para instalar en bandeja, hasta UPS incluye puntas, arranque directo y terminales de conexión.	ml	25.00

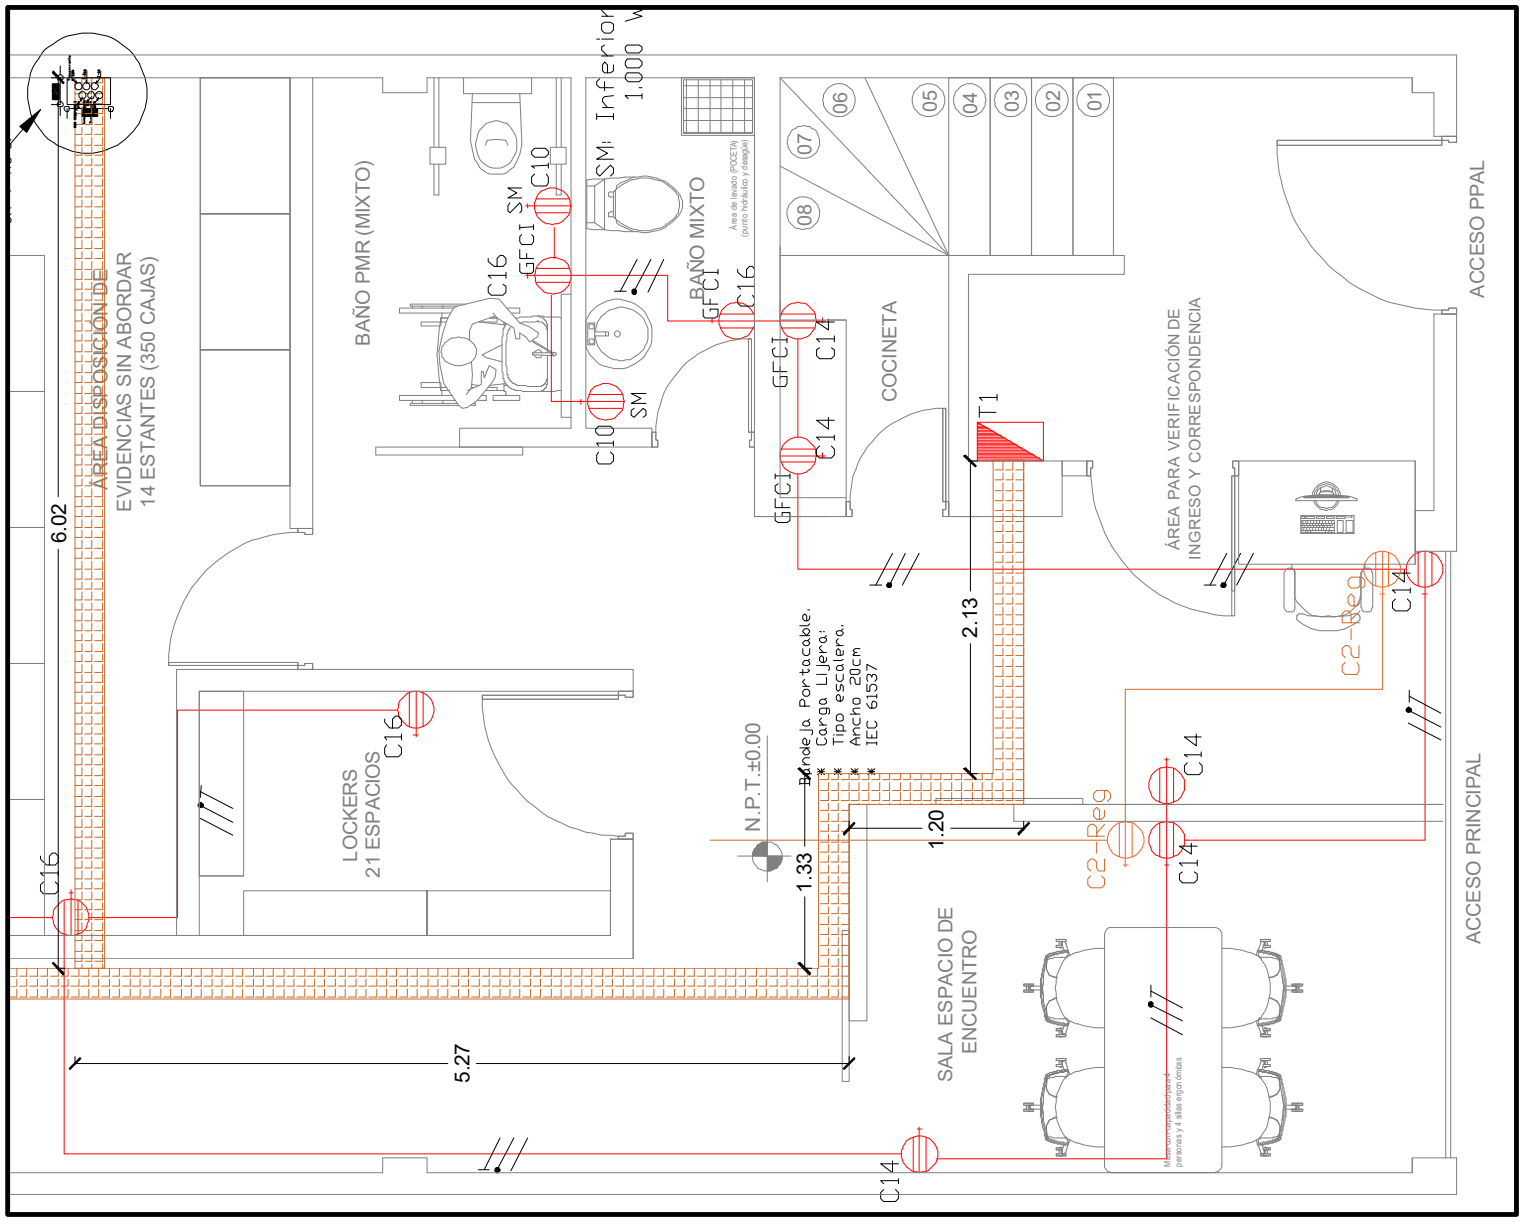

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
10.05	Suministro, instalación y puesta en marcha de alimentador en cable 2x8+1x8(N)+1x10(T) Cobre AWG THHN, libre de halogenos, en ducto EMT 3/4" proveniente de tablero T1, apto para instalar en bandeja, hasta UPS incluye puntas, arranque directo y terminales de conexión.	ml	25.00













OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
11.07	Suministro, instalación y puesta en marcha de alimentador cable 2x8+1x10 Cobre AWG THHN, libre de halogenos, apto para instalar en bandeja, proveniente de tablero T1 hasta maquina de corte ubicada en cuarto de corte. Incluye tomacorriente bifasica macho y hembra 208 V	ml	1.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
SUBE DESDE TABLERO DE 30 CIRCUITOS	---	---	1.76	1.00	m	1.76	
DISTRIBUCIÓN	2.13			1.00	m	2.13	
	1.20			1.00	m	1.20	
	1.33			1.00	m	1.33	
	10.45			1.00	m	10.45	
	5.94			1.00	m	5.94	
	4.99			1.00	m	4.99	
BAJA HASTA TOMACORRIENTE			3.20	1.00	m	3.20	
					Subtotal	**31.00**	
					COBRADO EN ACTAS	**30.00**	
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**1.00**	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

ING. BERNARDO SOTO GARCÍA
SUPERVISOR UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
11.07	Suministro, instalación y puesta en marcha de alimentador cable 2x8+1x10 Cobre AWG THHN, libre de halogenos, apto para instalar en bandeja, proveniente de tablero T1 hasta maquina de corte ubicada en cuarto de corte. Incluye tomacorriente bifasica macho y hembra 208 V	ml	1.00

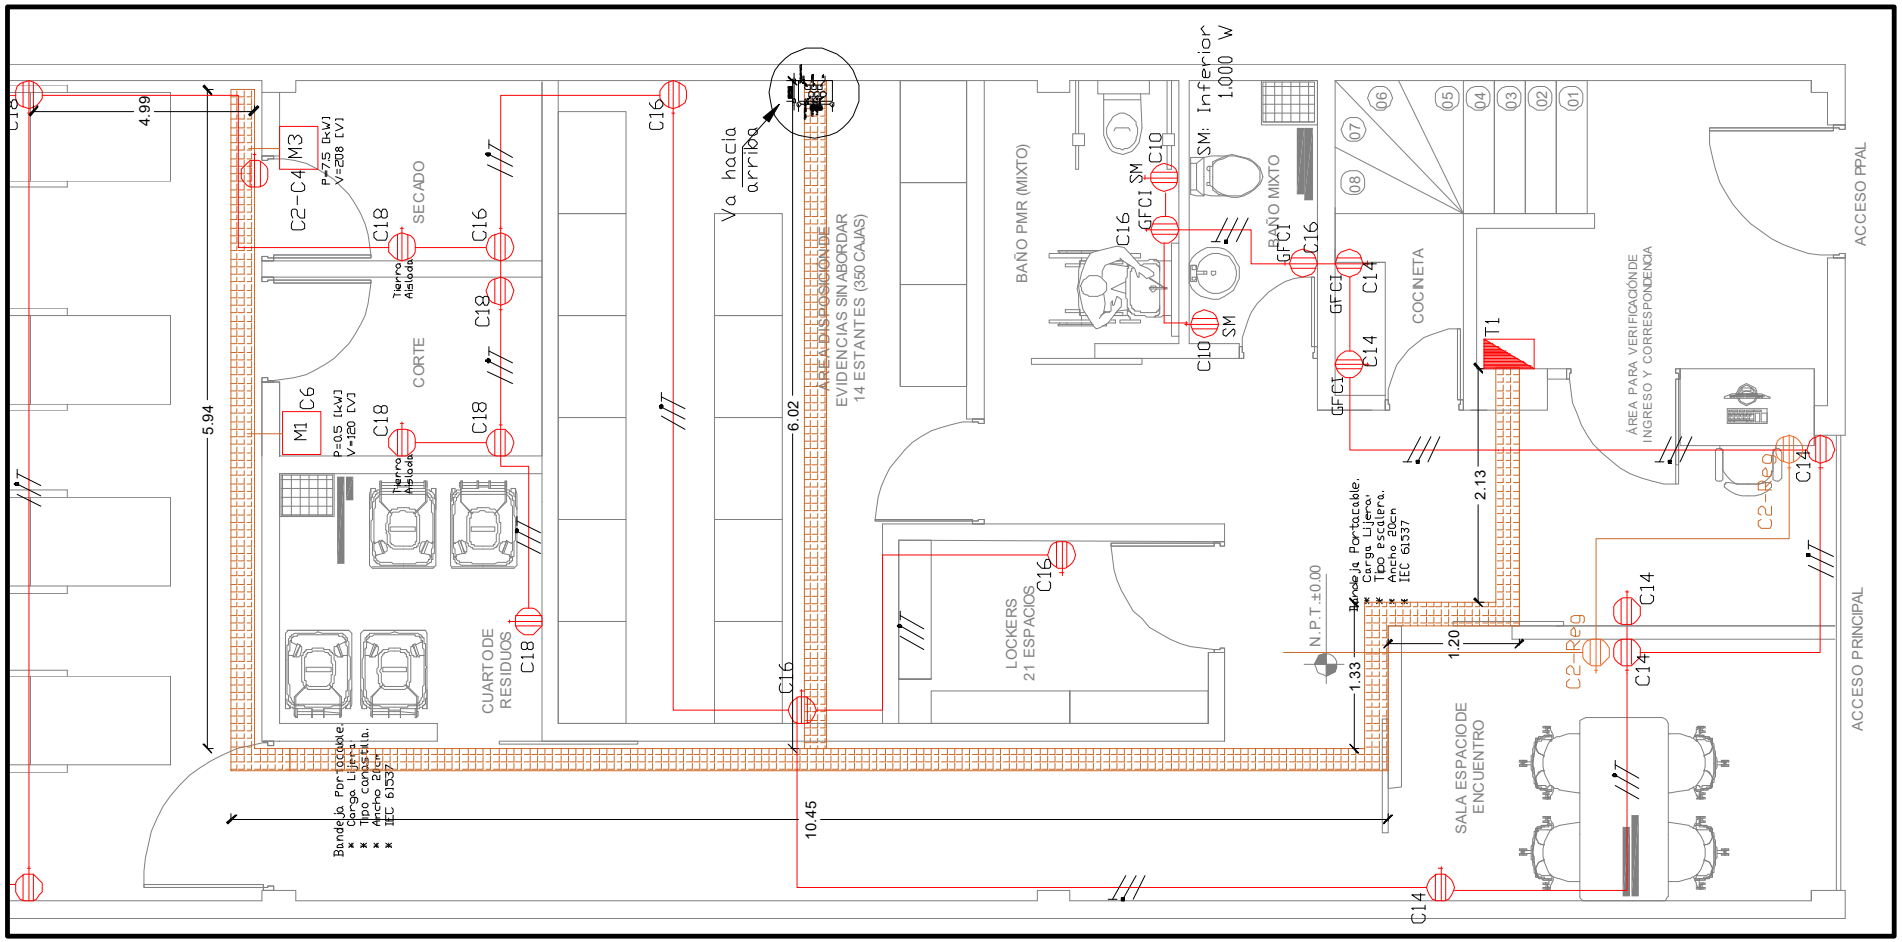

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
11.07	Suministro, instalación y puesta en marcha de alimentador cable 2x8+1x10 Cobre AWG THHN, libre de halogenos, apto para instalar en bandeja, proveniente de tablero T1 hasta maquina de corte ubicada en cuarto de corte. Incluye tomacorriente bifasica macho y hembra 208 V	ml	1.00













OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
11.11	Siministro e instalacion de bandeja portacable 20cm de ancho, tipo canastilla, para carga ligera bajo cumplimiento IEC 61537, incluye accesorios y elementos de fijacion	ml	0.93

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto			
SUBE DESDE TABLERO DE 30 CIRCUITOS	---	---	0.93	1.00	m	0.93
DISTRIBUCIÓN	2.13			1.00	m	2.13
	1.20			1.00	m	1.20
	1.33			1.00	m	1.33
	10.47			1.00	m	10.47
	6.02			1.00	m	6.02
	7.32			1.00	m	7.32
SUBE ALIMENTACION RACK			2.40	2.00	m	4.80
TAPAS PROTECCIÓN CABLEADO			1.30	1.00	m	1.30
					Subtotal	35.50
					COBRADO EN ACTAS	34.57
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**0.93**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

ING. BERNARDO SOTO GARCÍA
SUPERVISOR UBPD

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
11.11	Siministro e instalacion de bandeja portacable 20cm de ancho, tipo canastilla, para carga ligera bajo cumplimiento IEC 61537, incluye accesorios y elementos de fijacion	ml	0.93

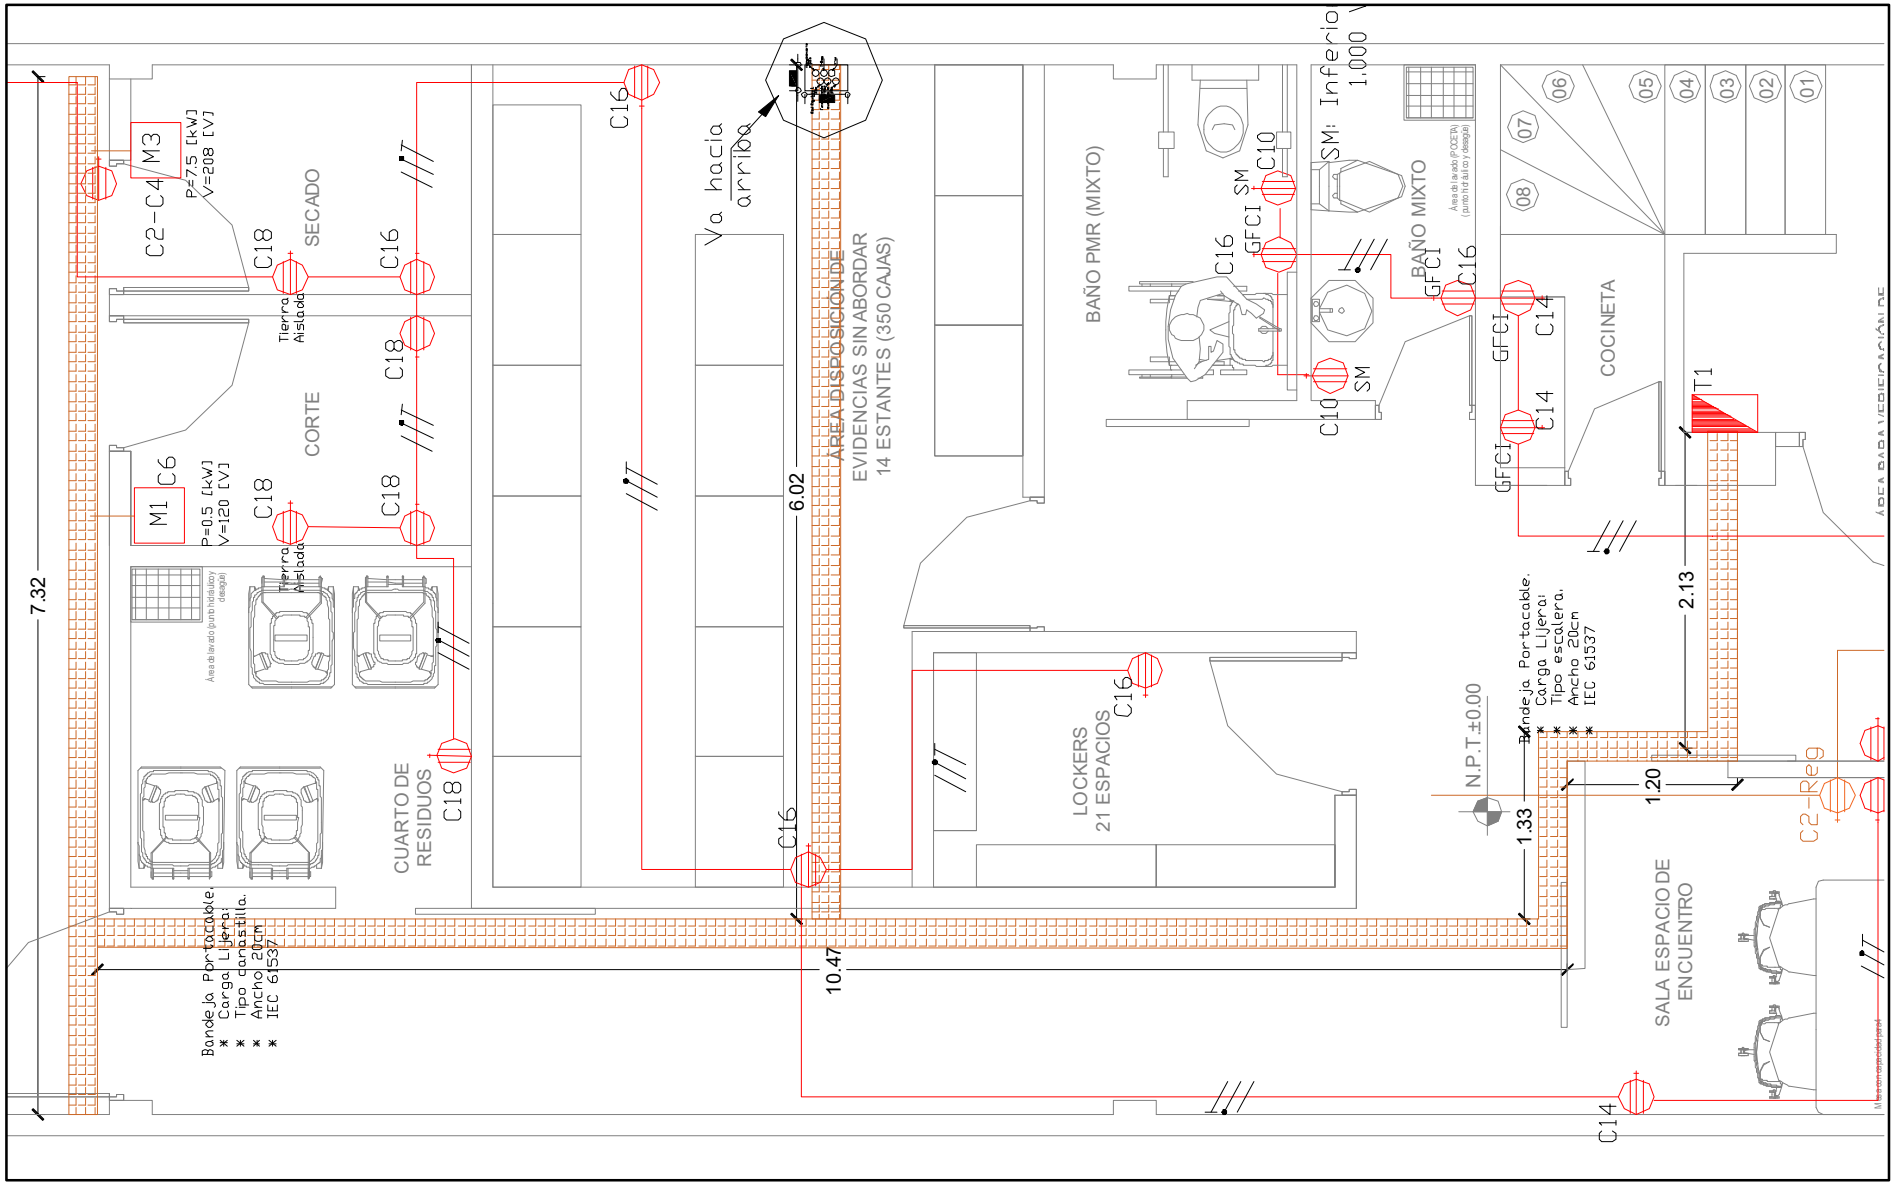

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
11.11	Siministro e instalacion de bandeja portacable 20cm de ancho, tipo canastilla, para carga ligera bajo cumplimiento IEC 61537, incluye accesorios y elementos de fijacion	ml	0.93












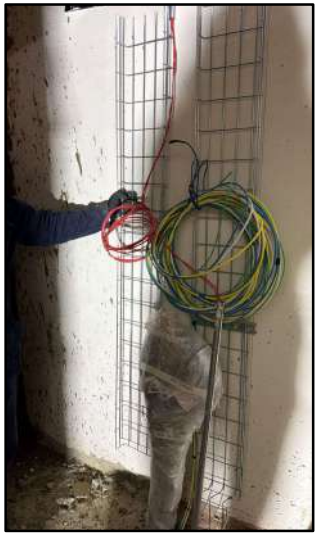

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
11.13	Suministro, instalación y puesta en marcha de luminaria P26379-Led 30W	un	3.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
BAÑO MUJERES				1.00	un	1.00	
BAÑO HOMBRES				1.00	un	1.00	
ESCALERAS				4.00	un	4.00	
RECEPCION				5.00	un	5.00	
SALA DE REUNIONES				3.00	un	3.00	
PASILLO DE CIRCULACION				6.00	un	6.00	
COCINA				1.00	un	1.00	
LOCKERS				2.00	un	2.00	
BAÑOS MIXTOS				1.00	un	1.00	
BAÑO PMR				1.00	un	1.00	
CUARTO DE RESIDUOS				2.00	un	2.00	
CORTE				2.00	un	2.00	
SECADO				2.00	un	2.00	
centro de datos				2.00	un	2.00	
					Subtotal	33.00	
					COBRADO EN ACTAS	30.00	
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**3.00**	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

ING. BERNARDO SOTO GARCÍA
SUPERVISOR UBPD

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
11.13	Suministro, instalación y puesta en marcha de luminaria P26379-Led 30W	un	3.00

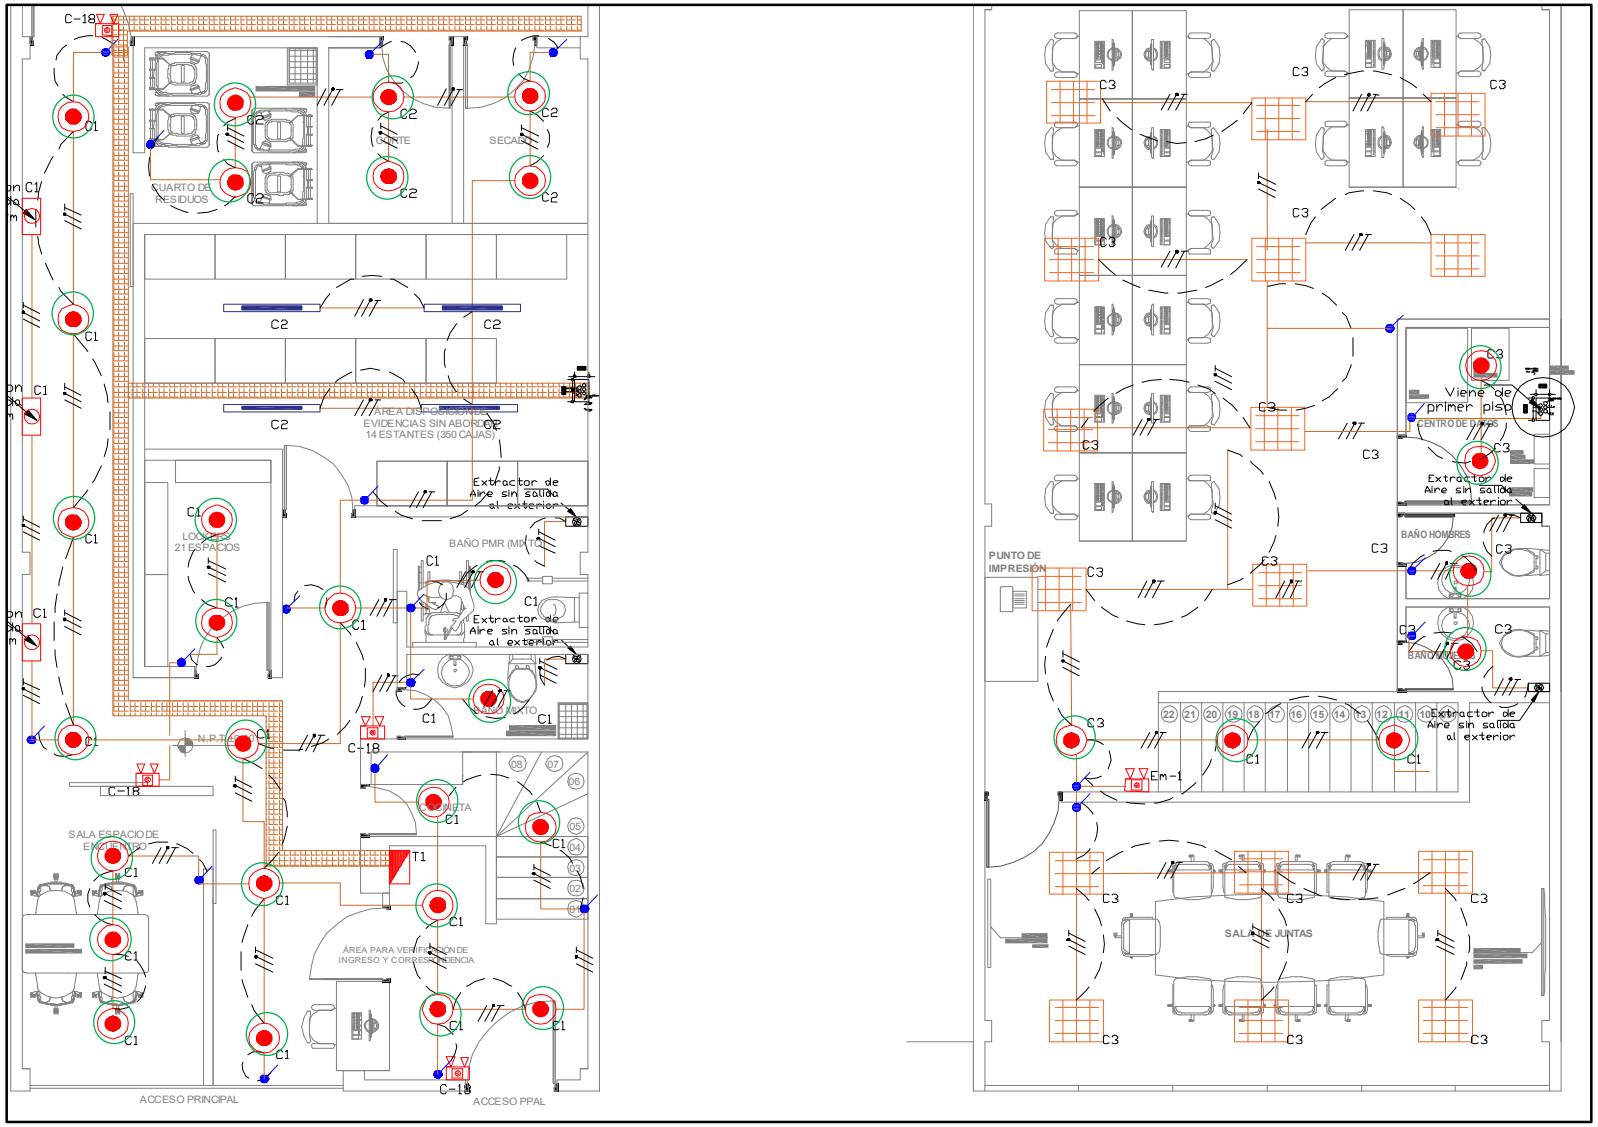


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
11.13	Suministro, instalación y puesta en marcha de luminaria P26379-Led 30W	un	3.00







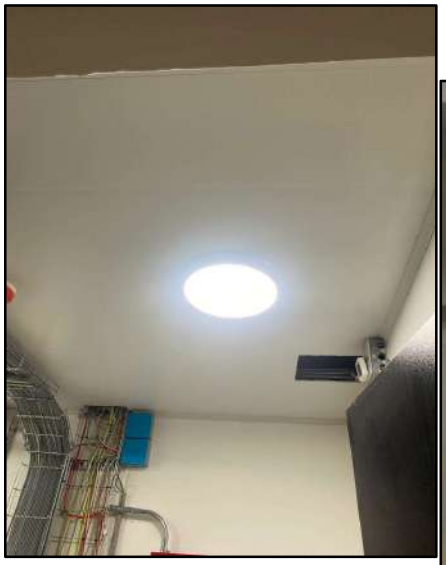





OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
11.18	Suministro, instalación y puesta en marcha de luminaria de emergencia P26848 - LED, incluye bateria para su funcionamiento.	un	2.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
ZONA DE ABORDAJE				3.00	un	3.00	
PASILLO DE CIRCULACION				3.00	un	3.00	
ESCALERAS				2.00	un	2.00	
ENTRADA				2.00	un	2.00	
ZONA DE OFICINAS 2DO PISO				1.00	un	1.00	
					Subtotal	11.00	
					COBRADO EN ACTAS	9.00	
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**2.00**	

OBSERVACIONES:	Se hace cambio de la referencia en luminarias en el centro de datos inicialmente de 30W, por dos luminarias de 36W.


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI


ING. BERNARDO SOTO GARCÍA
SUPERVISOR UBPD

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
11.18	Suministro, instalación y puesta en marcha de luminaria de emergencia P26848 - LED, incluye bateria para su funcionamiento.	un	2.00

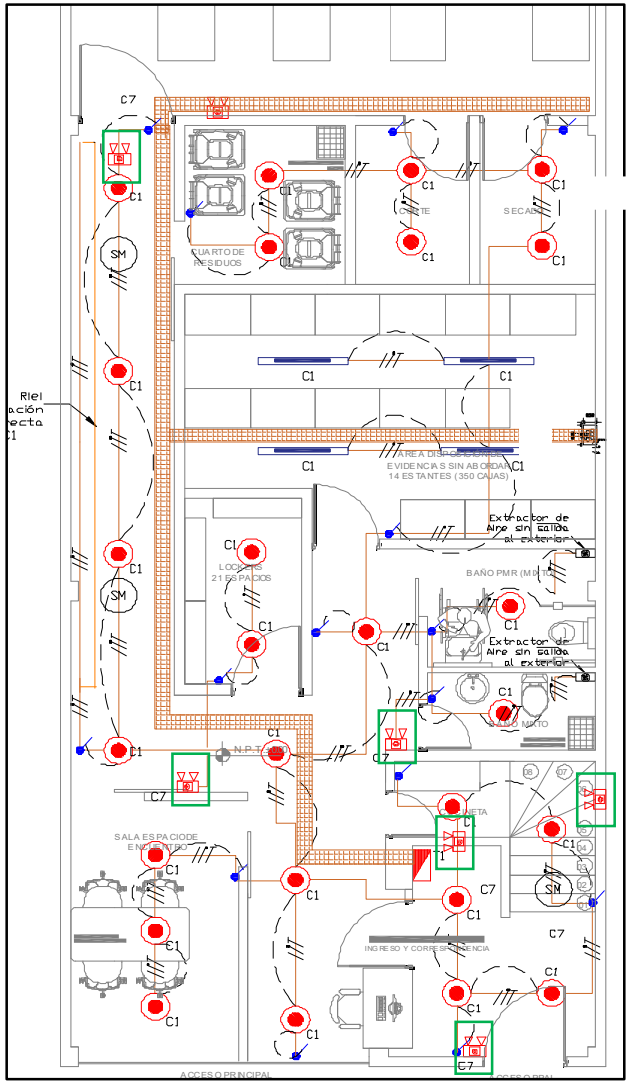

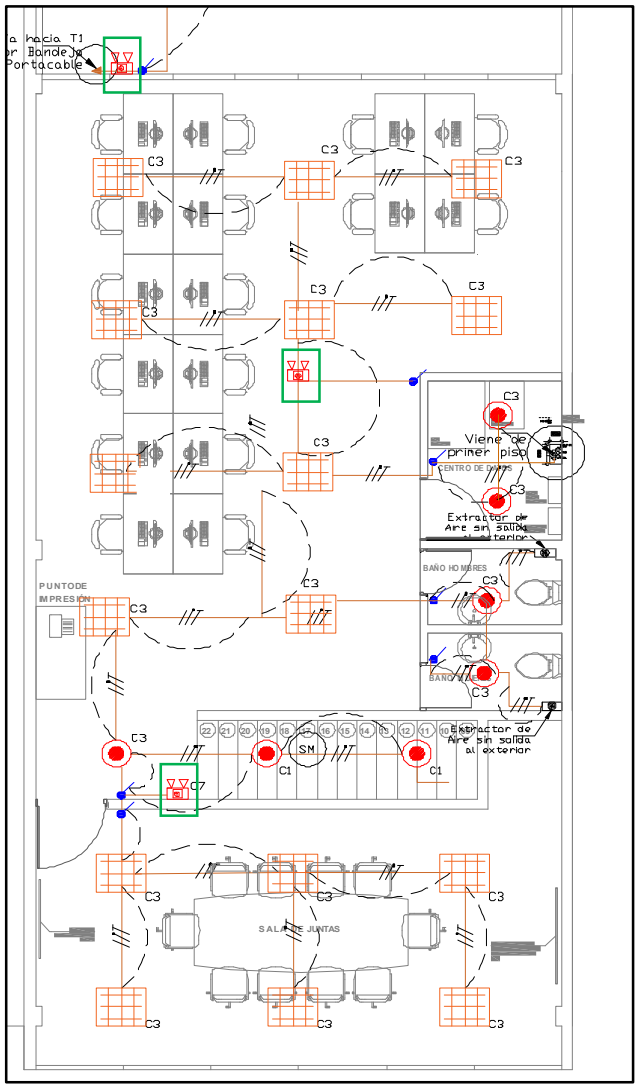

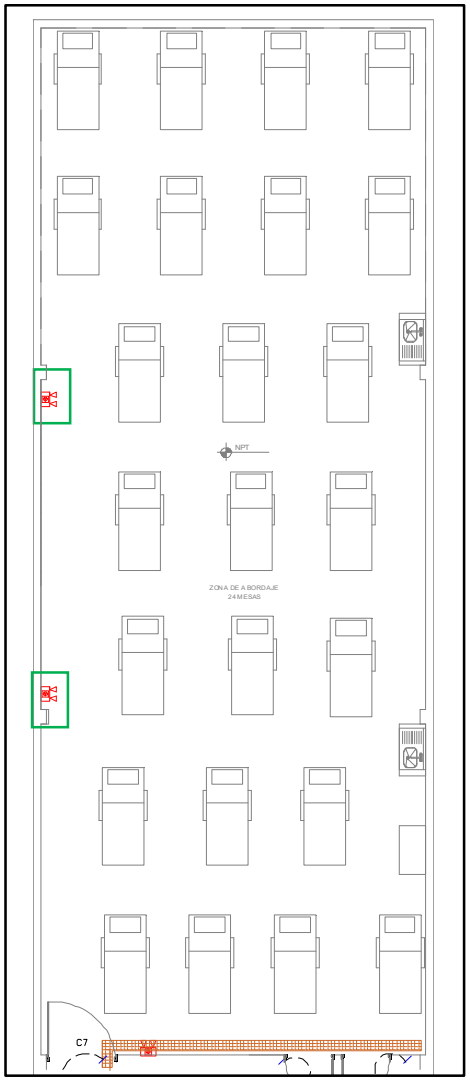

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
11.18	Suministro, instalación y puesta en marcha de luminaria de emergencia P26848 - LED, incluye bateria para su funcionamiento.	un	2.00
















OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
11.19	Suministro, instalación y puesta en marcha de extractor de aire sin salida al exterior incluye filtro	un	2.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
BAÑO HOMBRES				1.00	un	1.00	
BAÑO MUJERES				1.00	un	1.00	
					Subtotal	2.00	
					TOTAL EJECUTADO	**2.00**	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

ING. BERNARDO SOTO GARCÍA
SUPERVISOR UBPD

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
11.19	Suministro, instalación y puesta en marcha de extractor de aire sin salida al exterior incluye filtro	un	2.00

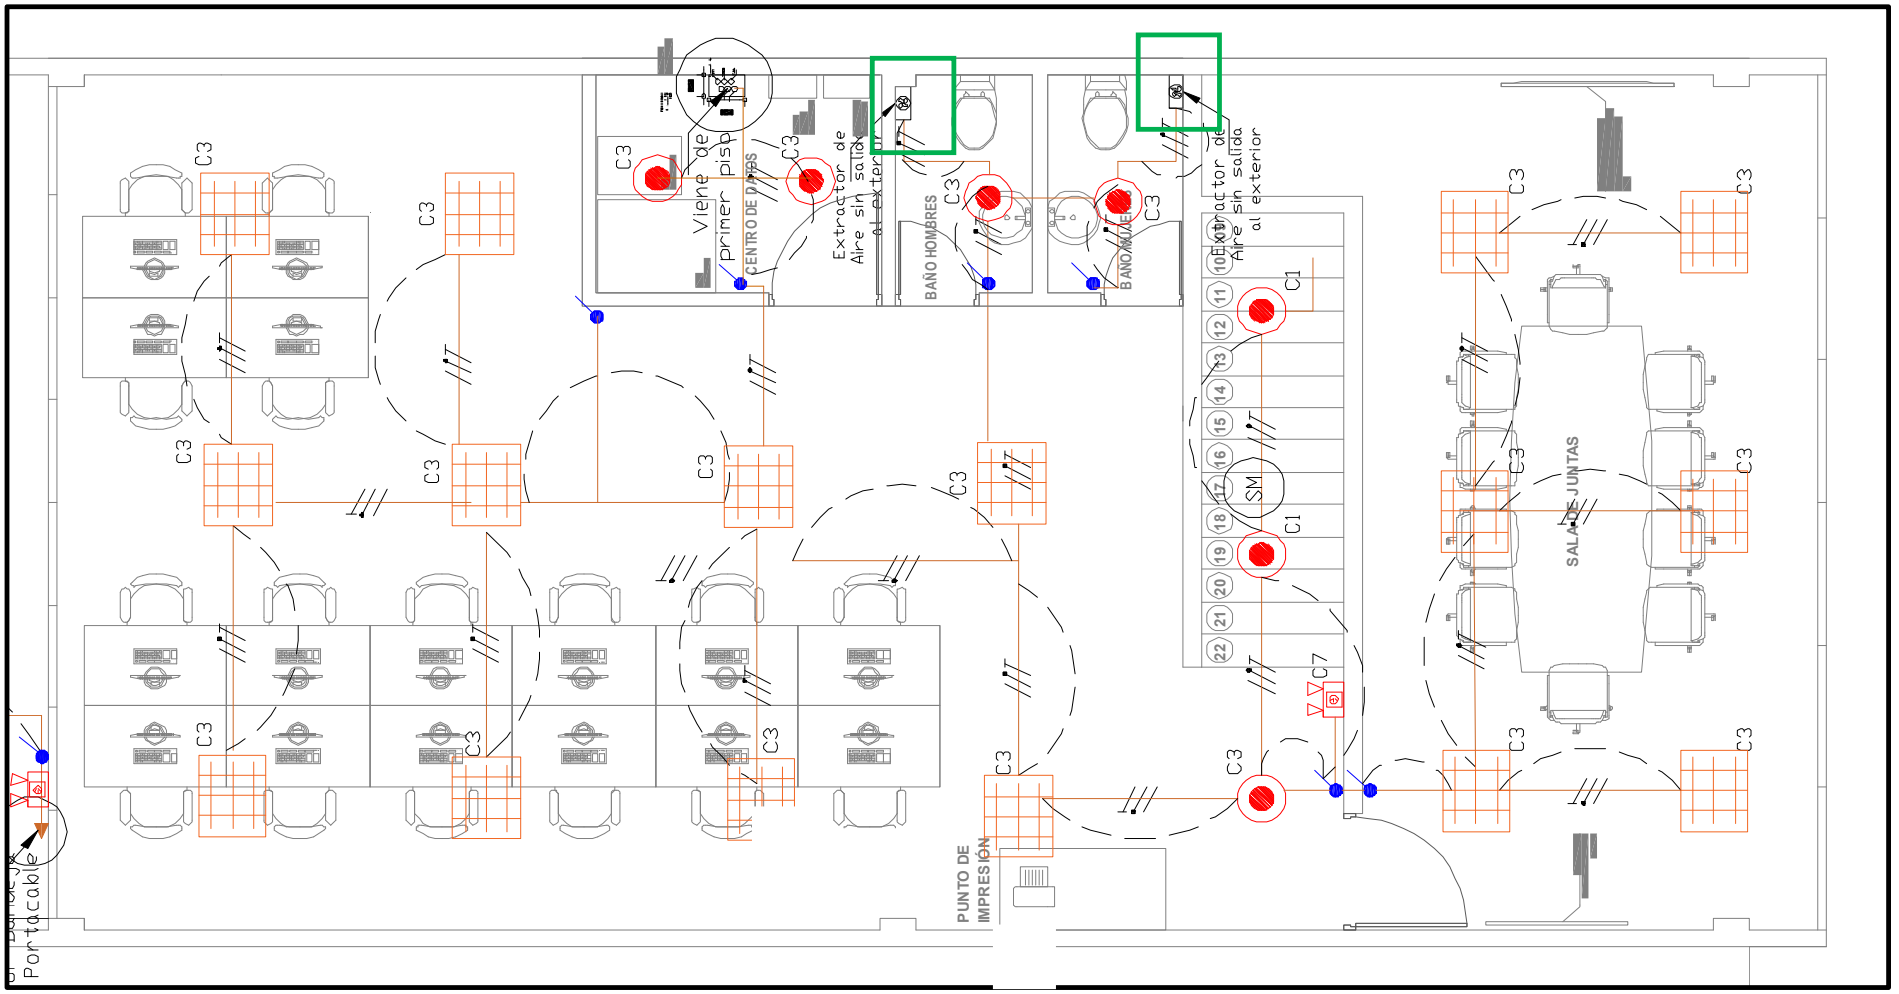

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
11.19	Suministro, instalación y puesta en marcha de extractor de aire sin salida al exterior incluye filtro	un	2.00









OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
12.01	Suministro, instalación y puesta en marcha de Cable UTP Categoria 6A LSZH	ml	228.91

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto			
PUNTO 1	15.90			1.00	m	15.90
PUNTO 2	15.60			1.00	m	15.60
PUNTO 3	17.80			1.00	m	17.80
PUNTO 4	17.90			1.00	m	17.90
PUNTO 5	16.60			1.00	m	16.60
PUNTO 6	16.80			1.00	m	16.80
PUNTO 7	18.90			1.00	m	18.90
PUNTO 8	18.70			1.00	m	18.70
PUNTO 9	21.80			1.00	m	21.80
PUNTO 10	21.6			1.00	m	21.60
PUNTO 11	16.4			1.00	m	16.40
PUNTO 12	16.5			1.00	m	16.50
PUNTO 13	18.4			1.00	m	18.40
PUNTO 14	18.8			1.00	m	18.80
PUNTO 15	20.9			1.00	m	20.90
PUNTO 16	20.7			1.00	m	20.70
PUNTO 17	21.3			1.00	m	21.30
PUNTO 18	19.4			1.00	m	19.40
PUNTO 19	22.6			1.00	m	22.60
PUNTO 20	26.4			1.00	m	26.40
PUNTO 21	22.7			1.00	m	22.70
PUNTO 22	23.5			1.00	m	23.50
PUNTO 23	20.6			1.00	m	20.60
PUNTO 24	11.8			1.00	m	11.80
PUNTO 25	20.4			1.00	m	20.40
PUNTO 26	31.7			1.00	m	31.70
PUNTAS PARA TRABAJO EN CADA SALIDA	16.3			1.00	m	16.30
					Subtotal	530.00
					COBRADO EN ACTAS	301.09
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**228.91**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBSERVACIONES:	Se realiza ajuste en medidas del cableado por cambio en trayectoria dentro del centro de datos.

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

JOSE LUIS GONZALEZ MEJIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
12.01	Suministro, instalación y puesta en marcha de Cable UTP Categoria 6A LSZH	ml	228.91




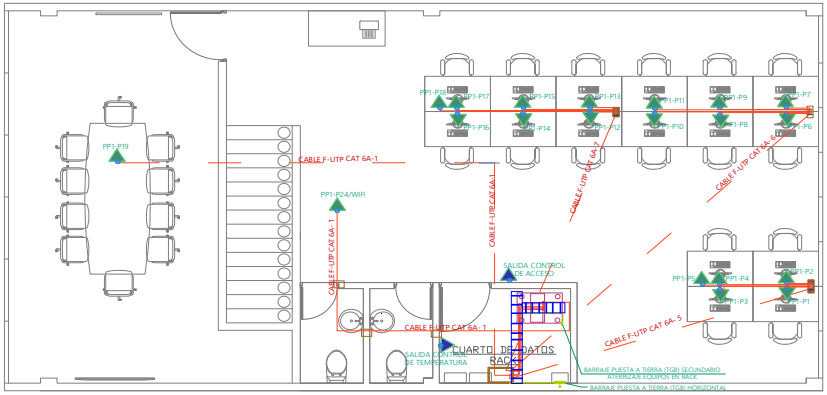


CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
12.01	Suministro, instalación y puesta en marcha de Cable UTP Categoria 6A LSZH	ml	228.91





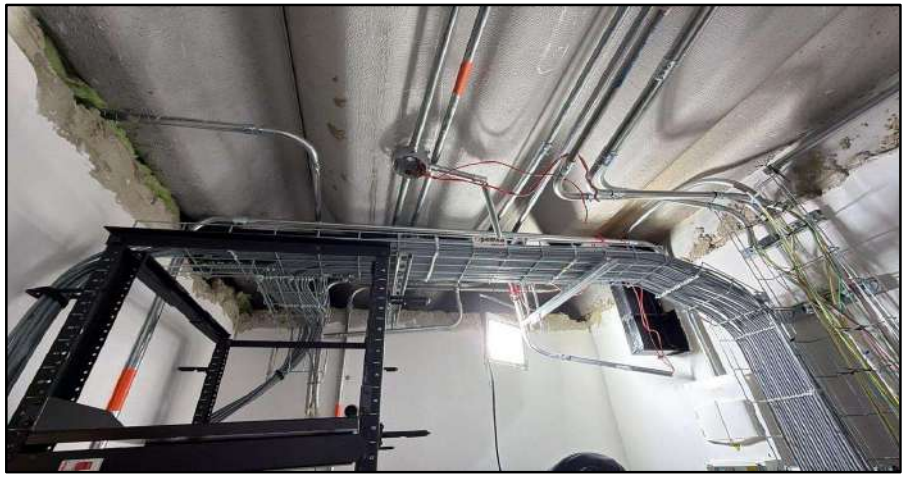


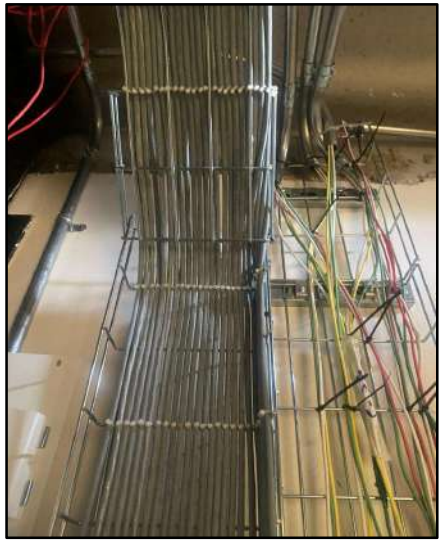







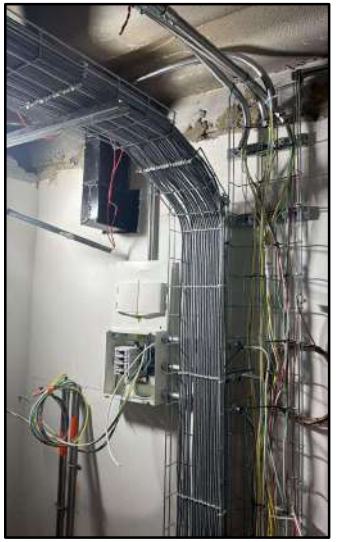

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
12.08	Suministro, instalación y puesta en marcha de Patch Cord Categoria 6A- 1.5 m	un	32.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
PUESTOS DE TRABAJO				32.00	UN	32.00	
					Subtotal	32.00	
					TOTAL EJECUTADO	**32.00**	

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de ABRIL DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ


REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

JOSE LUIS GONZALEZ MEJIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
12.08	Suministro, instalación y puesta en marcha de Patch Cord Categoria 6A- 1.5 m	un	32.00

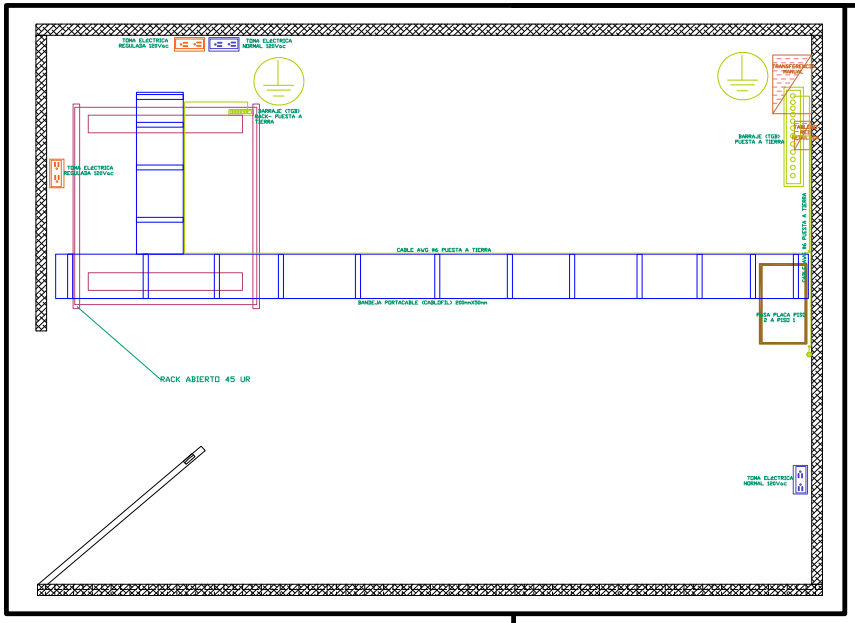

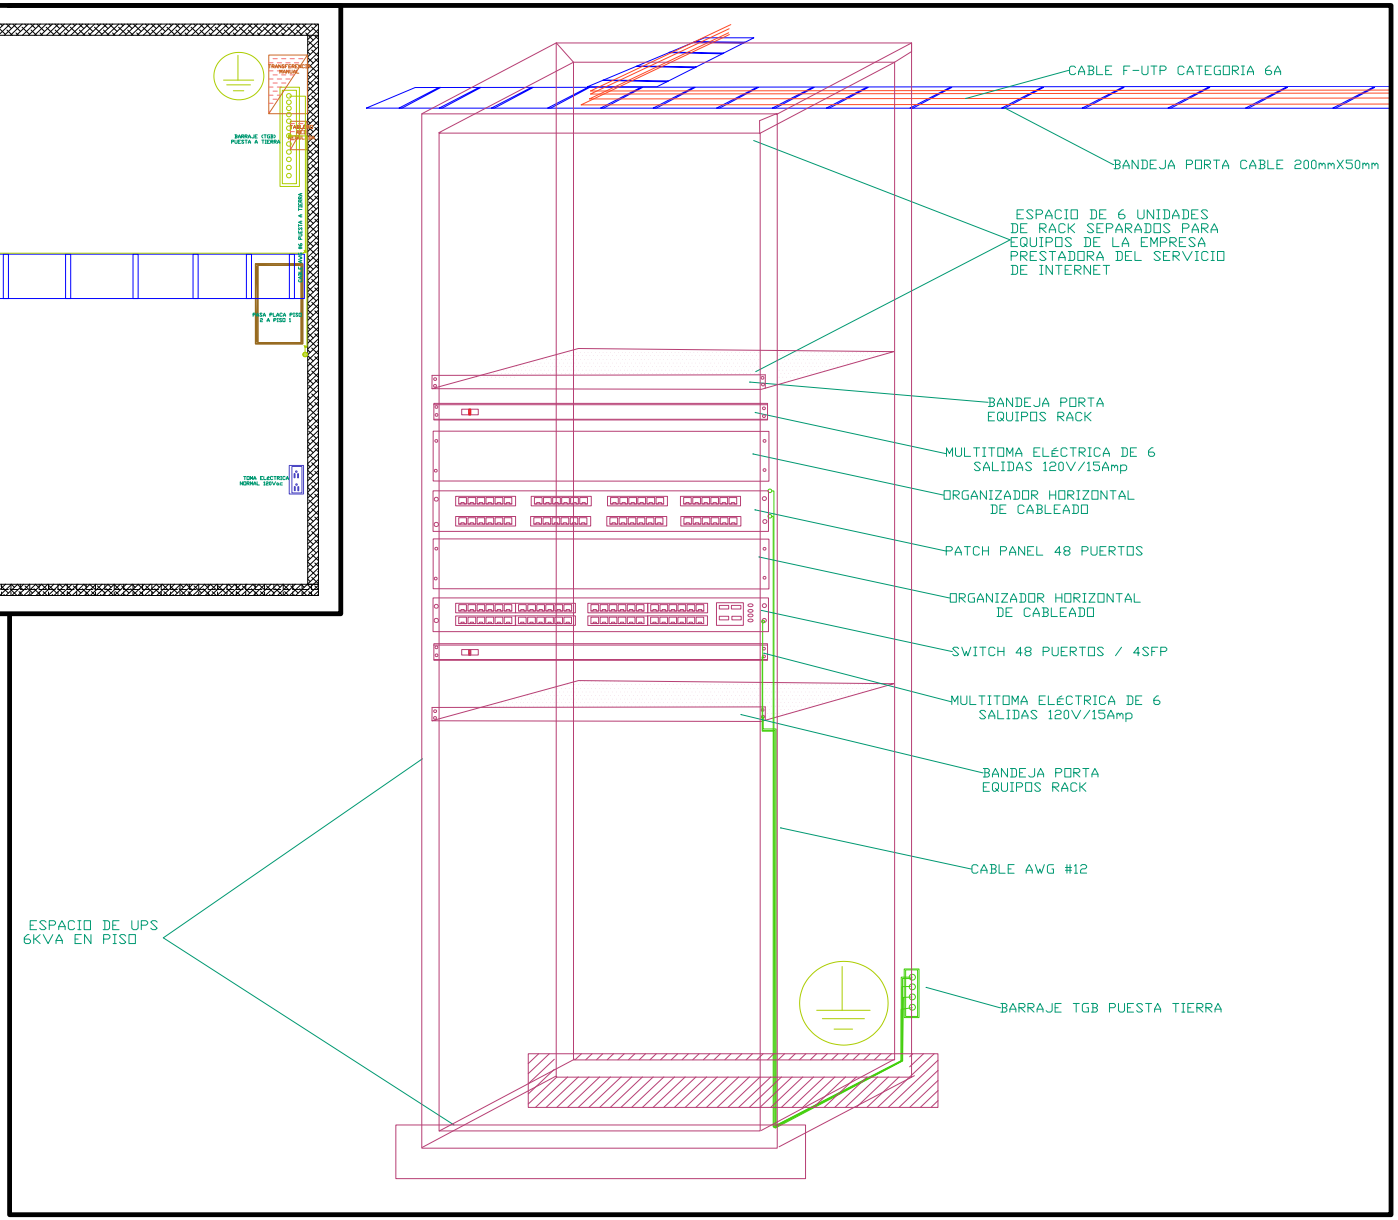

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
12.08	Suministro, instalación y puesta en marcha de Patch Cord Categoria 6A- 1.5 m	un	32.00





OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
12.09	Marcacion y Codificacion de puntos en Patch Panel	un	26.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
PATCH PANEL				26.00	UN	26.00	
					Subtotal	26.00	
					TOTAL EJECUTADO	**26.00**	

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de ABRIL DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ


REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

JOSE LUIS GONZALEZ MEJIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
12.09	Marcacion y Codificacion de puntos en Patch Panel	un	26.00

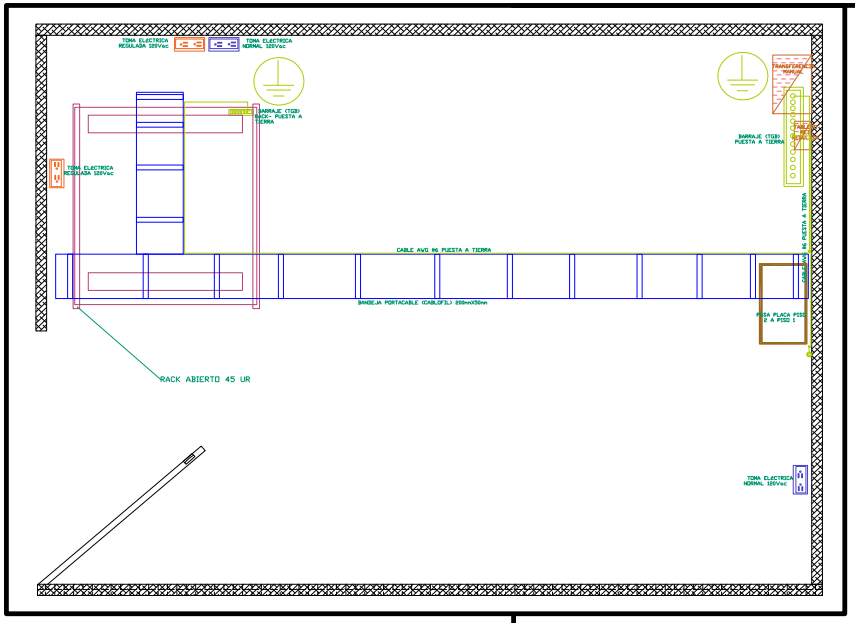


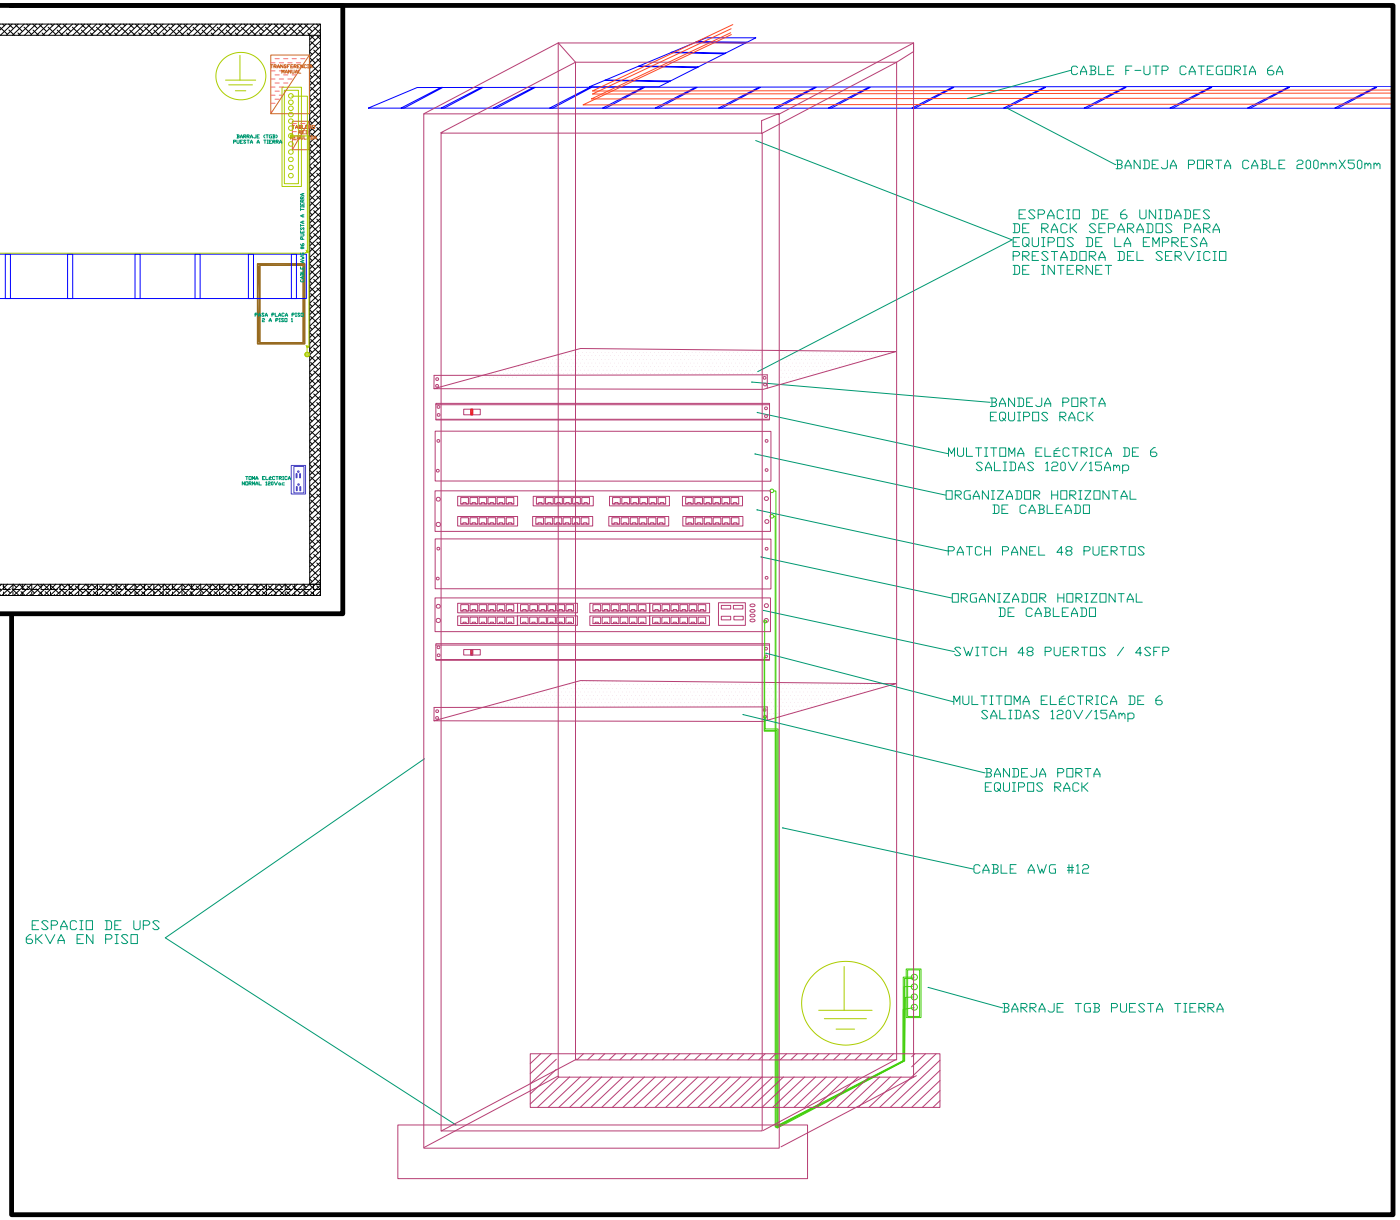

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
12.09	Marcacion y Codificacion de puntos en Patch Panel	un	26.00

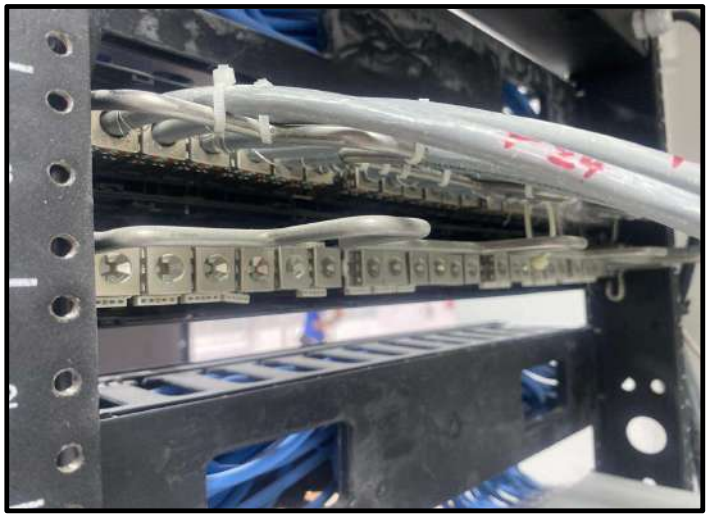

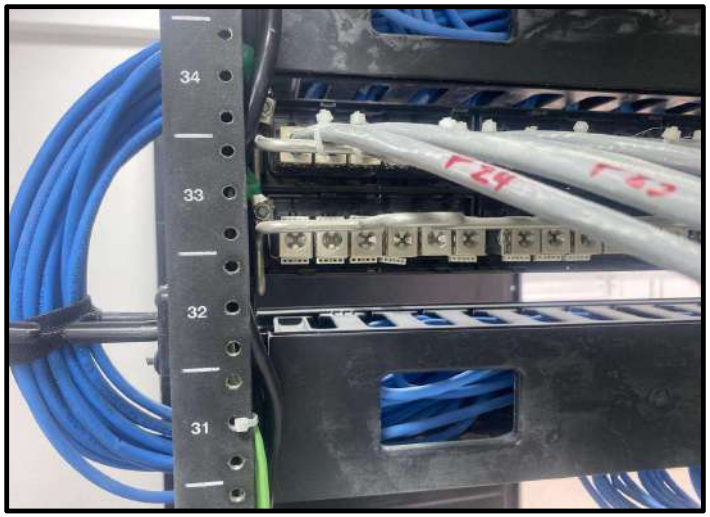







OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
12.14	Suministro, instalación y puesta en marcha de Cable No. 6 desnudo para union de TGB de datacenter con Rack principal por ducto y barraje de tablero regulado.	ml	15.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
TABLERO GENERAL DE BARRAJES CON RACK	15			1.00	m	15.00	
					Subtotal	15.00	
					TOTAL EJECUTADO	**15.00**	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

JOSE LUIS GONZALEZ MEJIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD


CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
12.14	Suministro, instalación y puesta en marcha de Cable No. 6 desnudo para union de TGB de datacenter con Rack principal por ducto y barraje de tablero regulado.	ml	15.00

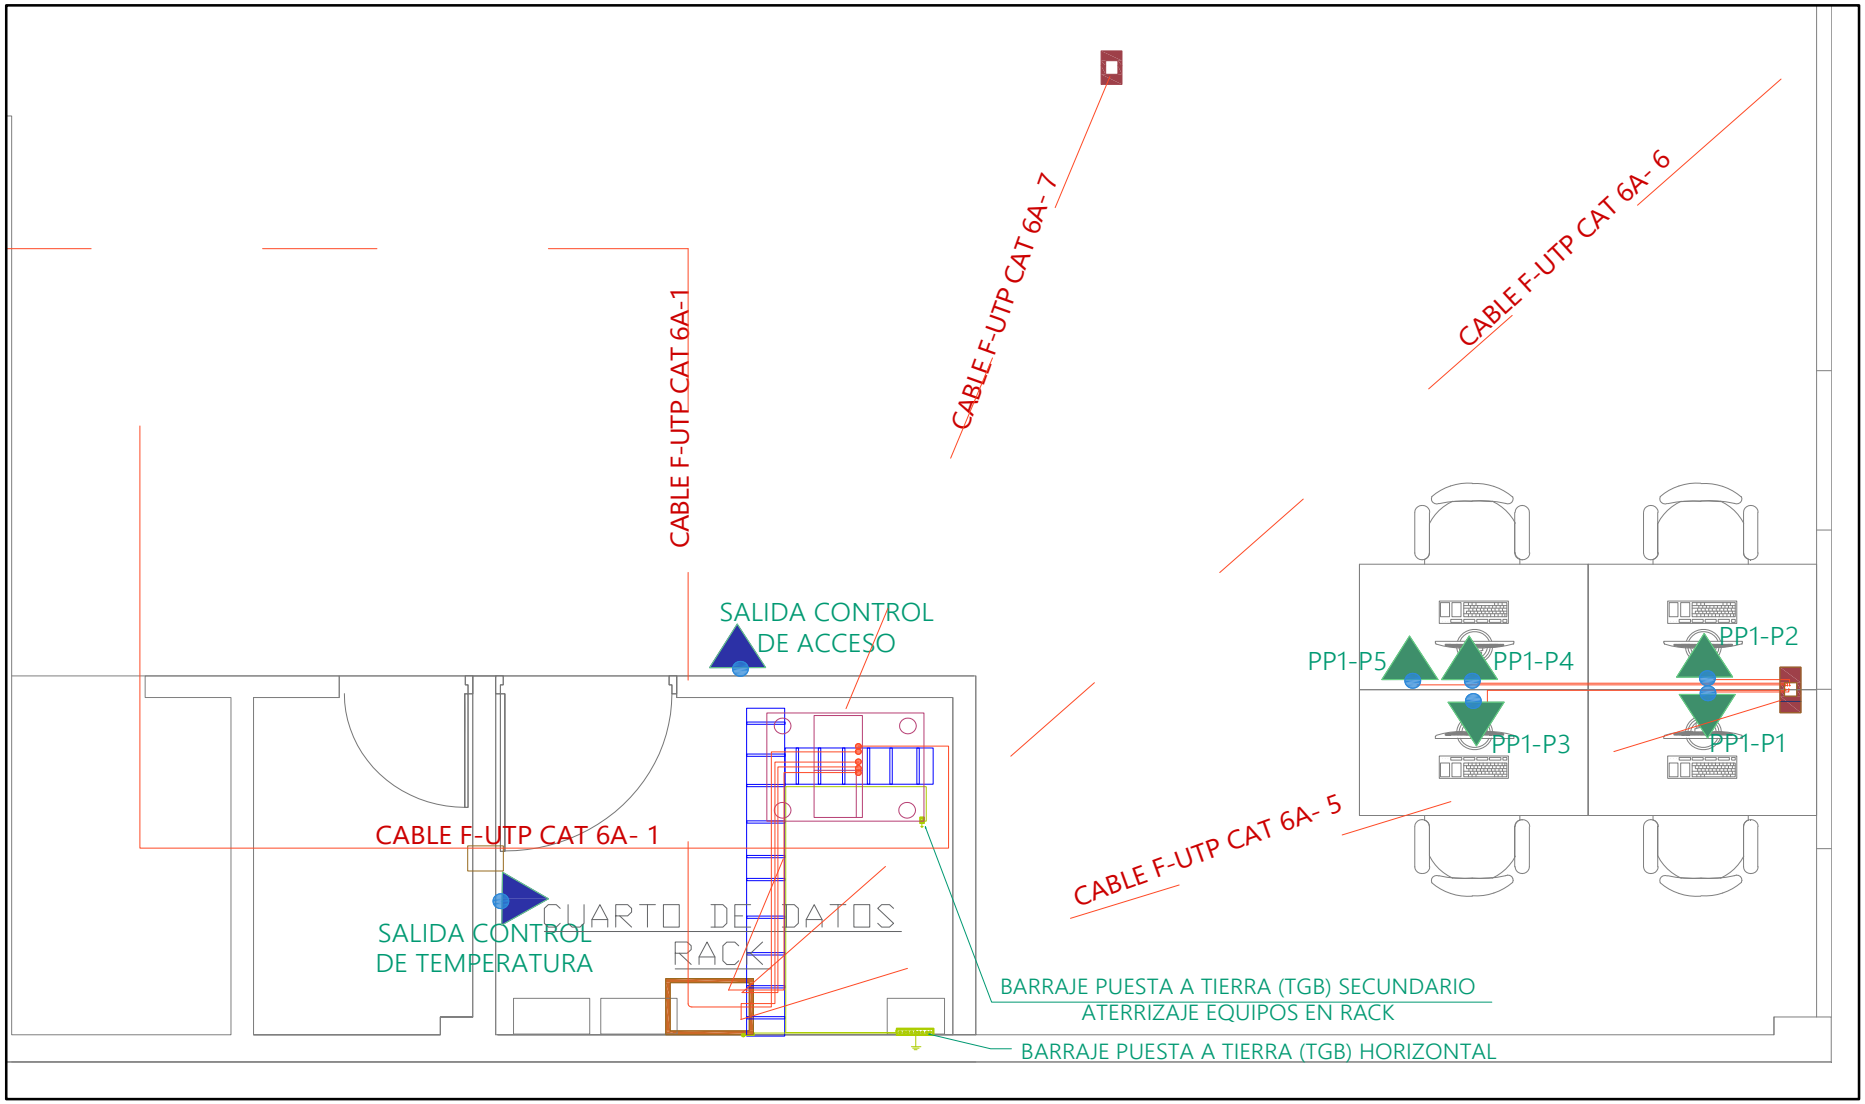



B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
12.14	Suministro, instalación y puesta en marcha de Cable No. 6 desnudo para union de TGB de datacenter con Rack principal por ducto y barraje de tablero regulado.	ml	15.00

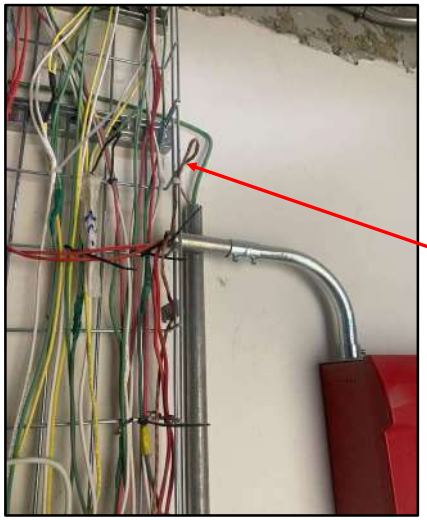


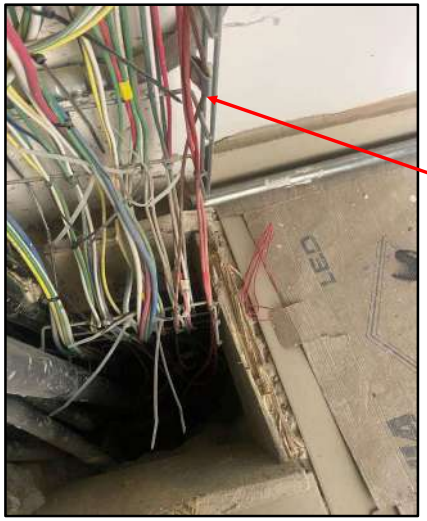

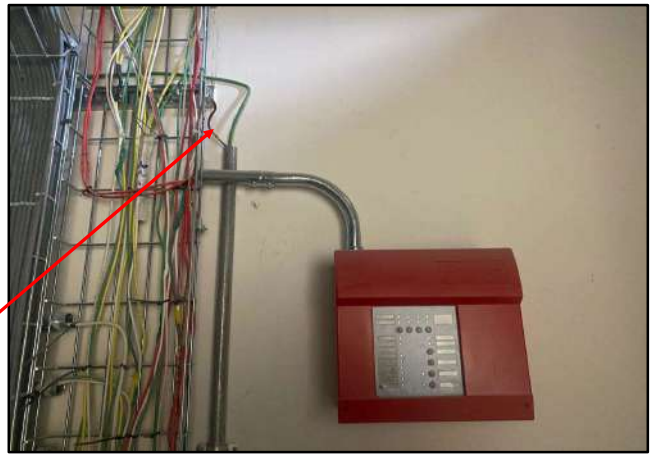

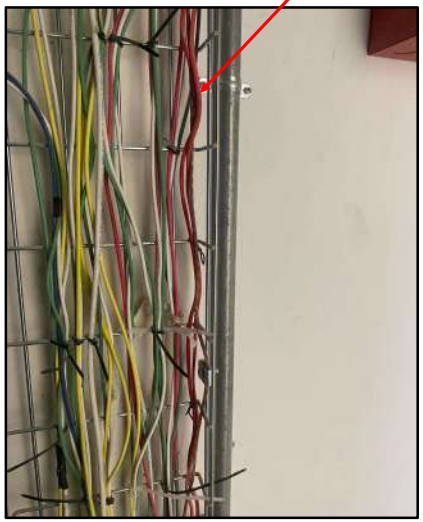

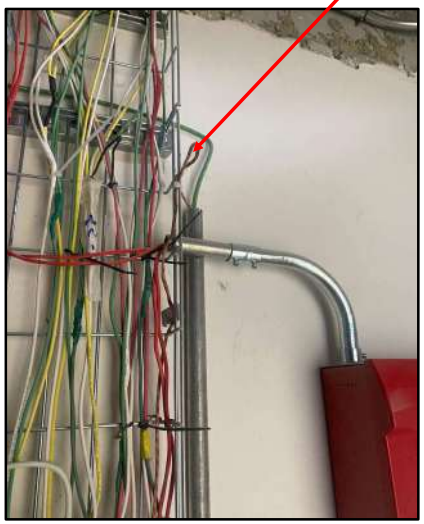

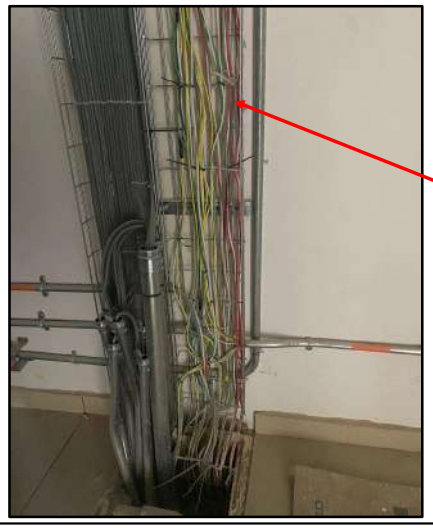

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
12.15	Suministro, instalación y puesta en marcha de Cable No 12 LSZH para aterrizaje gabinetes, chasis de equipos y demas estructuras metalicas en sitio. Color verde	ml	13.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto			
ATERRIZAJE DE EQUIPOS	13			1.00	m	13.00
					Subtotal	13.00
					TOTAL EJECUTADO	**13.00**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI


JOSE LUIS GONZALEZ MEJIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
12.15	Suministro, instalación y puesta en marcha de Cable No 12 LSZH para aterrizaje gabinetes, chasis de equipos y demas estructuras metalicas en sitio. Color verde	ml	13.00

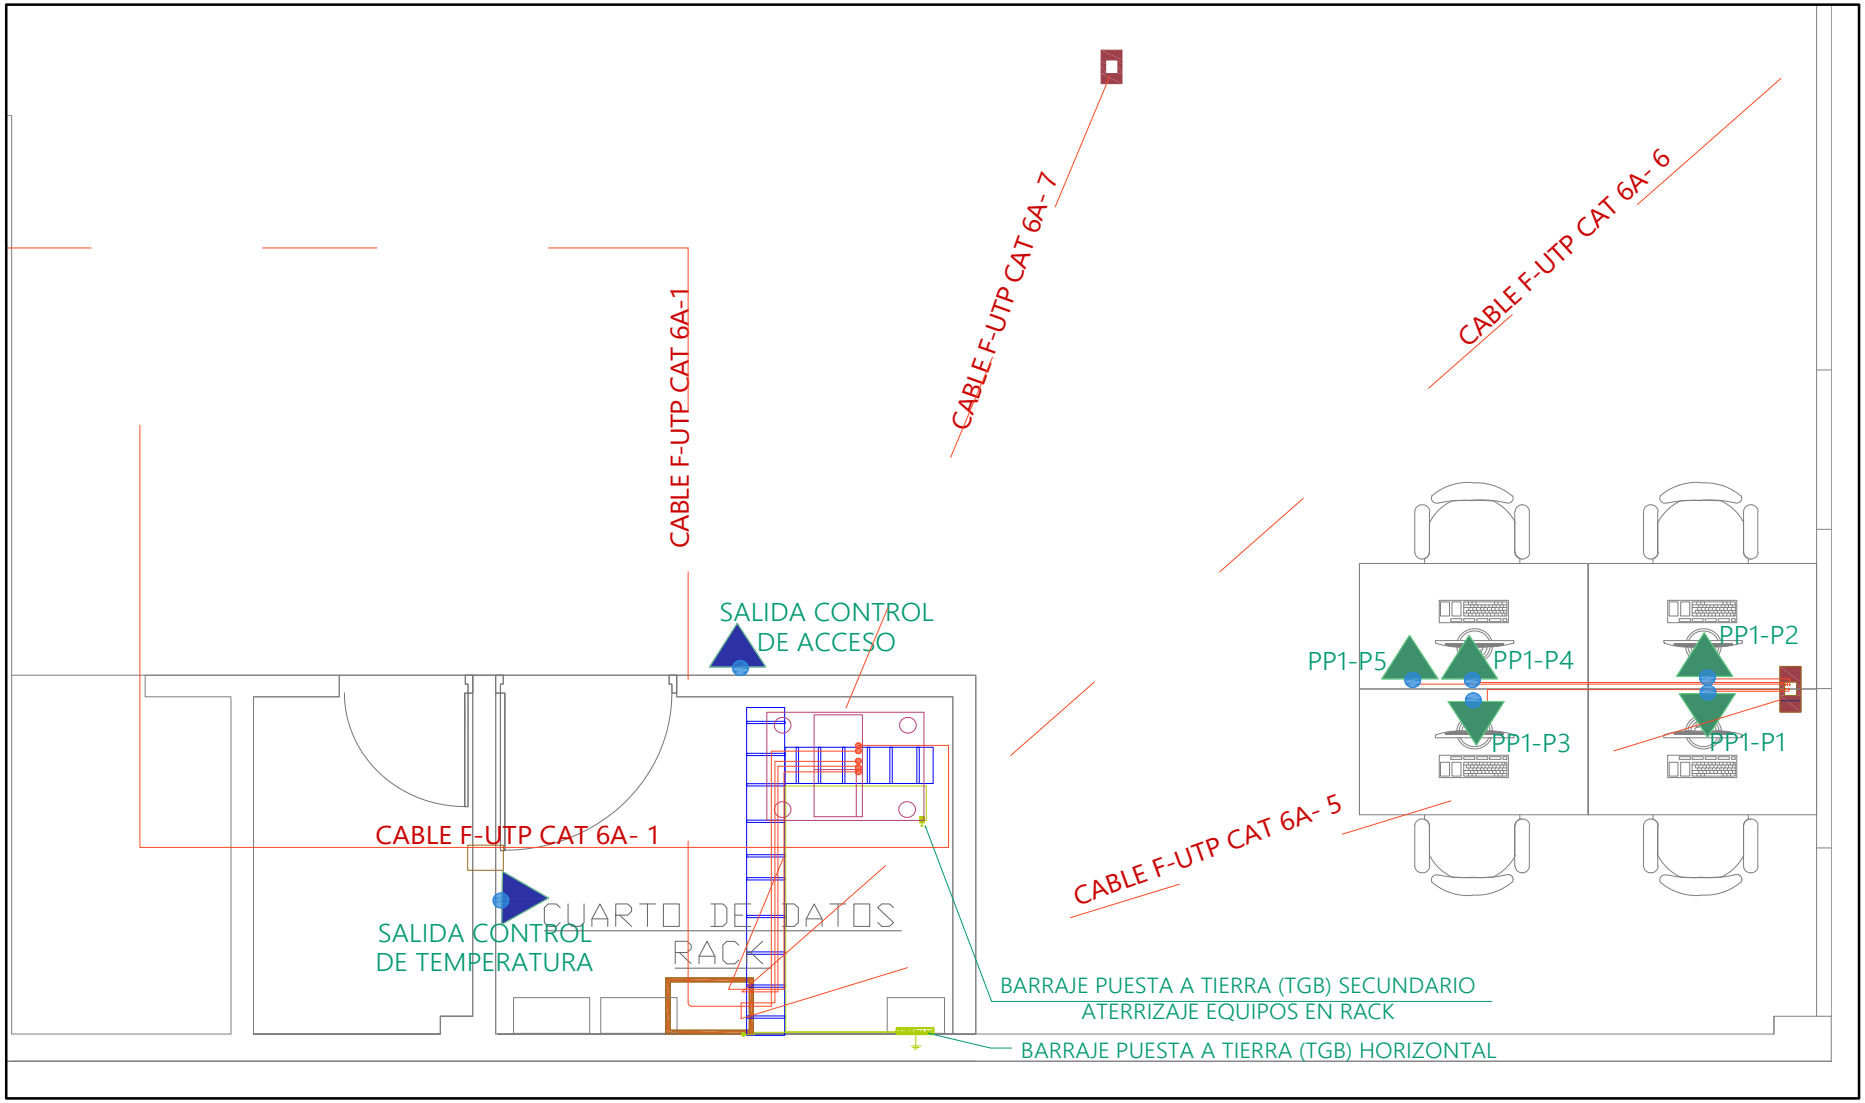


CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
12.15	Suministro, instalación y puesta en marcha de Cable No 12 LSZH para aterrizaje gabinetes, chasis de equipos y demas estructuras metalicas en sitio. Color verde	ml	13.00

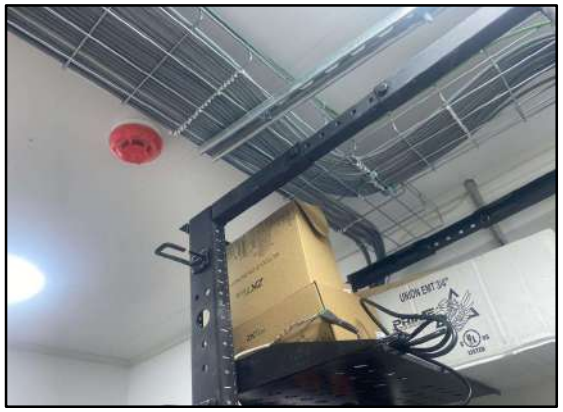








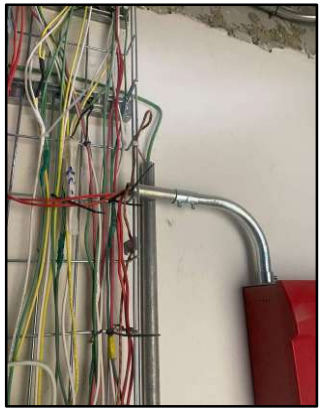





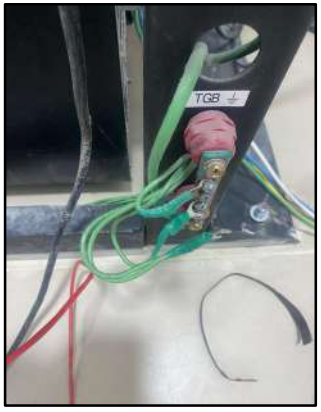



OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
12.16	Suministro, instalación y puesta en marcha de cajas de paso 15x15 para comunicación de barrajes.	un	2.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto			
centro de datos - comunicación barrajes				2.00	m	2.00
					Subtotal	2.00
					TOTAL EJECUTADO	**2.00**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

JOSE LUIS GONZALEZ MEJIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
12.16	Suministro, instalación y puesta en marcha de cajas de paso 15x15 para comunicación de barrajes.	un	2.00

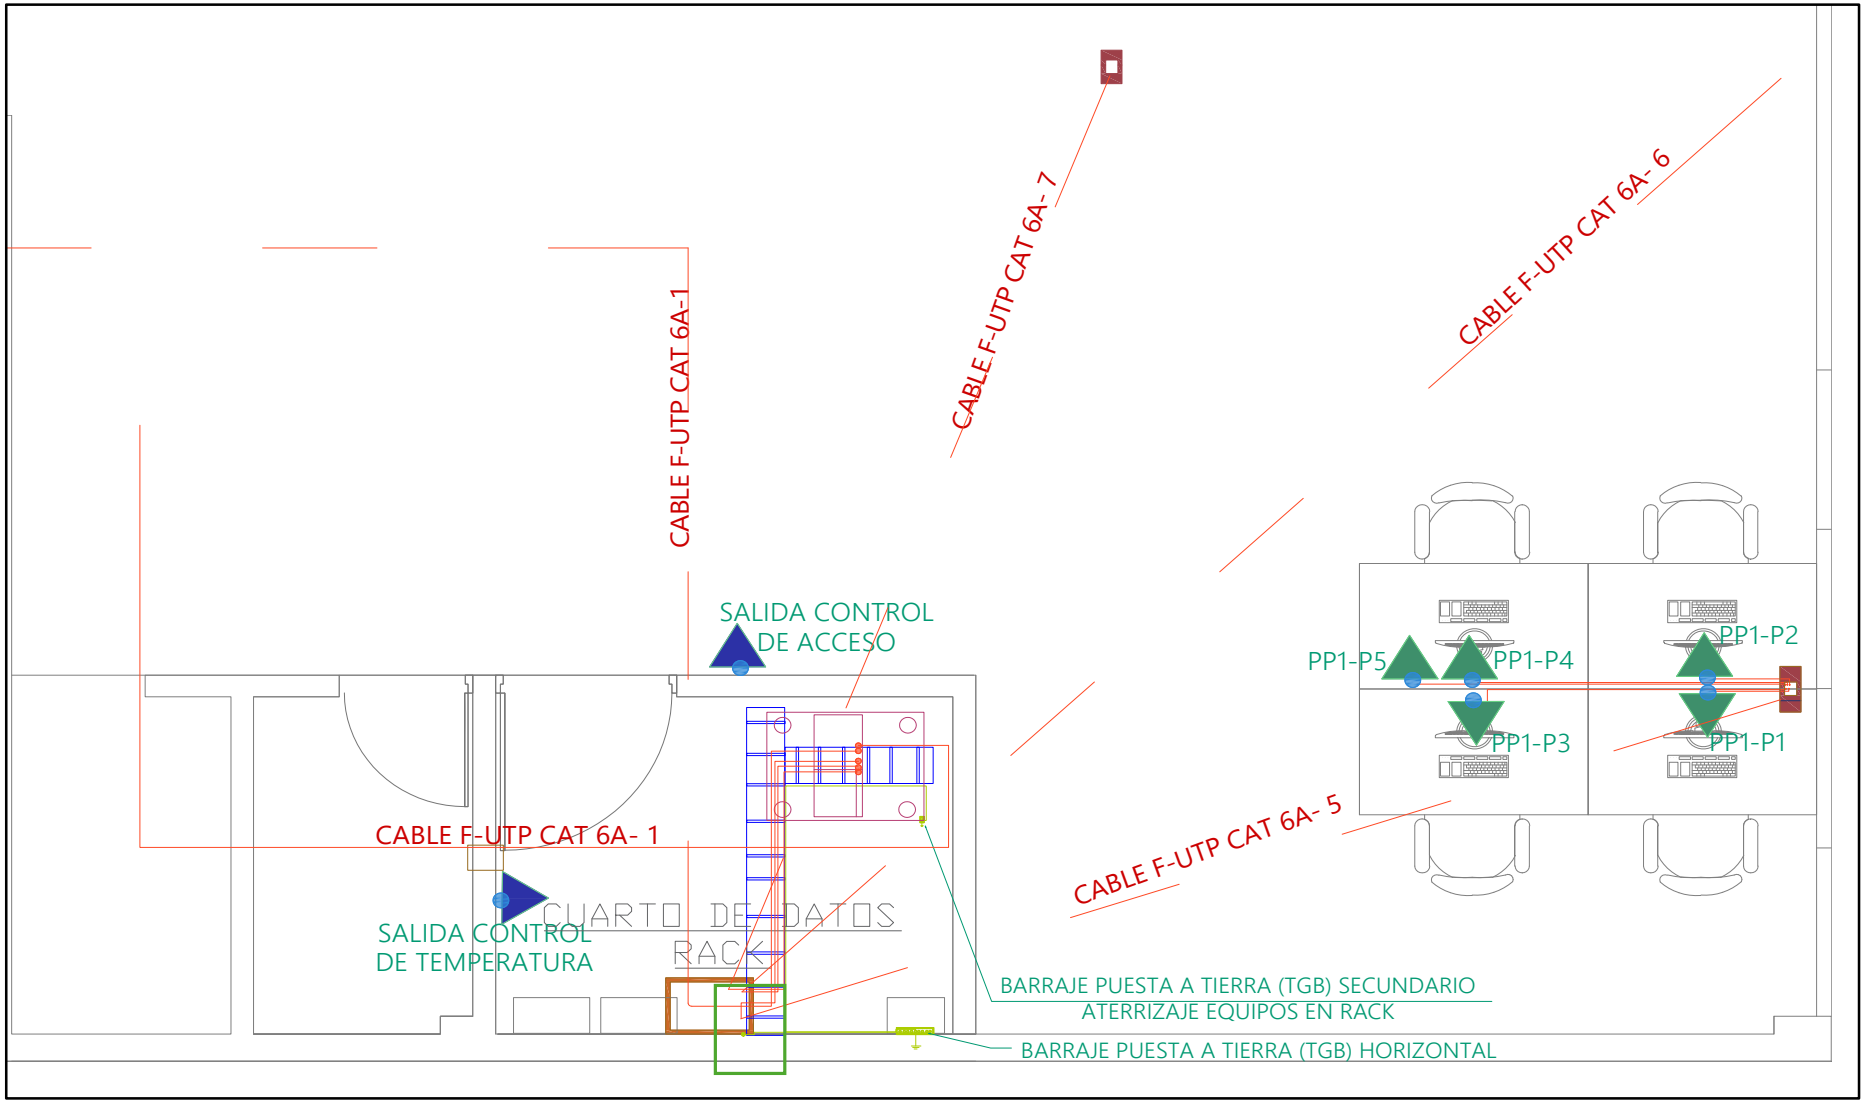

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
12.16	Suministro, instalación y puesta en marcha de cajas de paso 15x15 para comunicación de barrajes.	un	2.00







OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
12.17	Suministro e instalacion de caja galvanizada retie 5800, para salidas de datos o caja de paso, incluye accesorios	un	20.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto			
SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD				1.00	un	1.00
PUNTO DE CONTROL DE ACCESO				1.00	un	1.00
CONEXIÓN UPS				2.00	un	2.00
WI- FI				4.00	un	4.00
VOZ Y DATOS				19.00	un	19.00
					Subtotal	27.00
					COBRADO EN ACTAS	7.00
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**20.00**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI


JOSE LUIS GONZALEZ MEJIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
12.17	Suministro e instalacion de caja galvanizada retie 5800, para salidas de datos o caja de paso, incluye accesorios	un	20.00

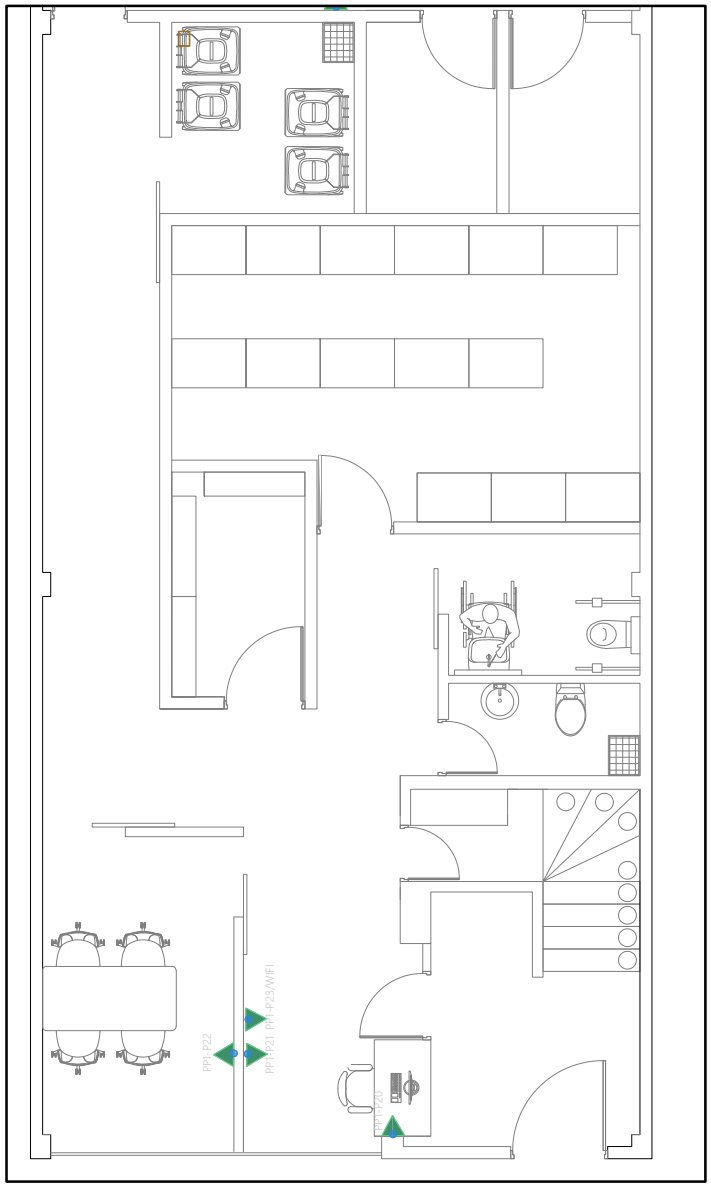

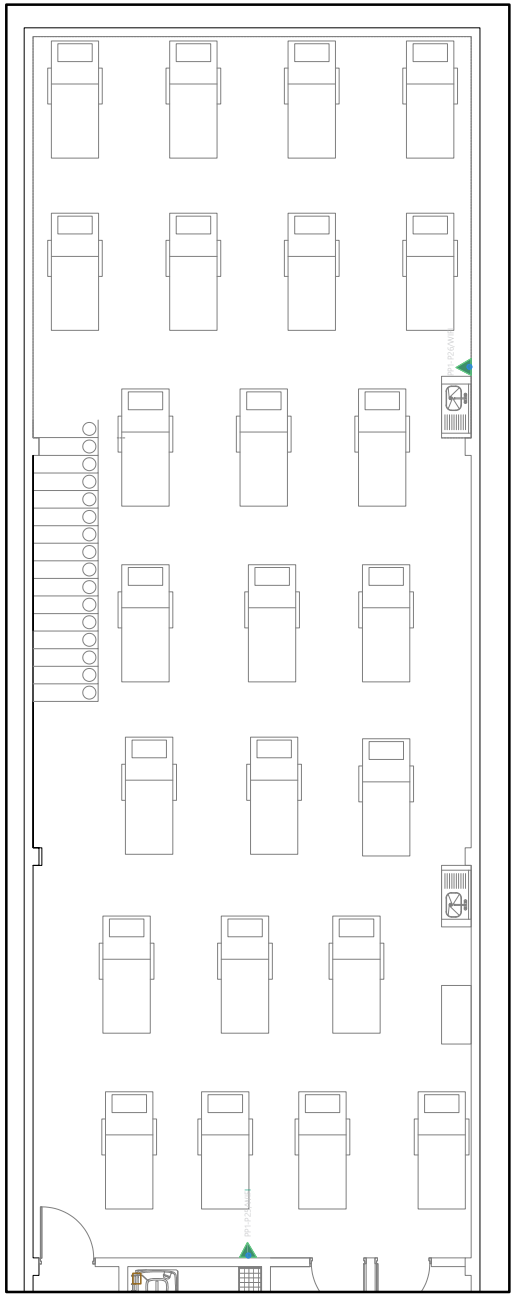

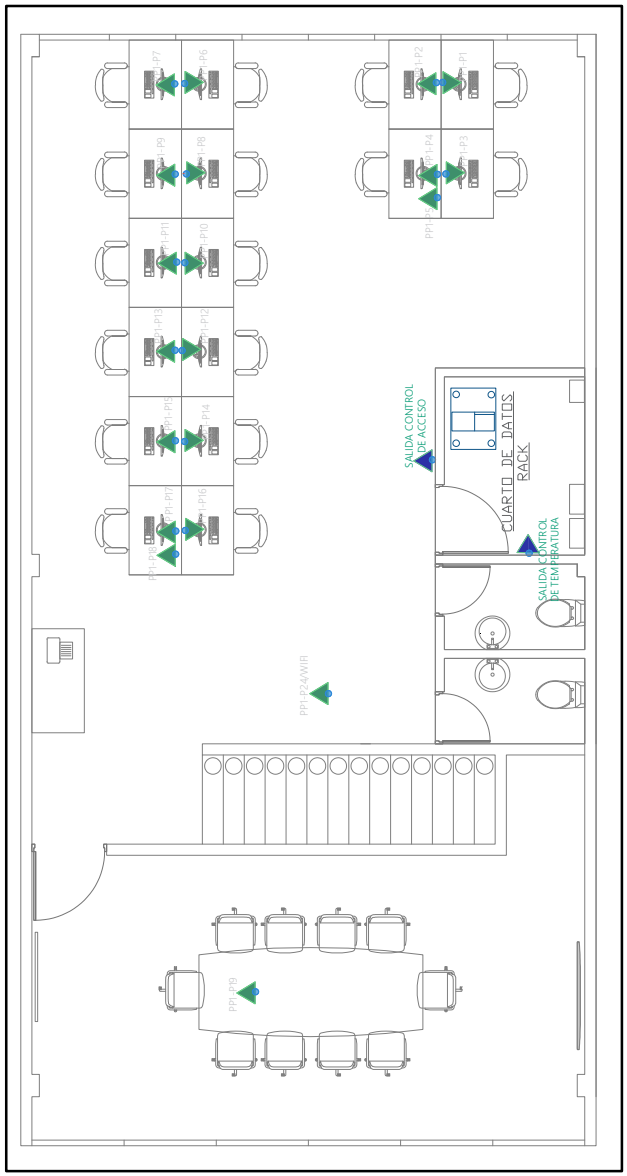

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
12.17	Suministro e instalacion de caja galvanizada retie 5800, para salidas de datos o caja de paso, incluye accesorios	un	20.00
















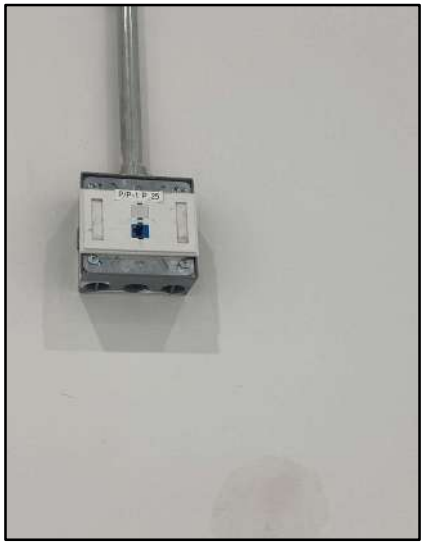



OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
12.18	Suministro, instalación y puesta en marcha de tubería EMT de 3/4" con accesorios de instalación y soporte para sistema de datos.	ml	19.81

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
PUNTO 19	18.39		3.00	1.00	m	21.39	
PUNTO 20 - wi fi	10.31		2.80	1.00	m	13.11	
PUNTO 21 - wifi	9.23		3.00	1.00	m	12.23	
PUNTO 22	14.62		5.50	1.00	m	20.12	
PUNTO 23 - WIFI	12.73		3.00	1.00	m	15.73	
PUNTO 24	14.04		5.50	1.00	m	19.54	
PUNTO 25	14.15		5.50	1.00	m	19.65	
PUNTO 26 - WIFI	18.24		3.00	1.00	m	21.24	
					Subtotal	143.01	
					COBRADO EN ACTAS	123.20	
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**19.81**	

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

JOSE LUIS GONZALEZ MEJIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
####	Suministro, instalación y puesta en marcha de tubería EMT de 3/4" con accesorios de instalación y soporte para sistema de datos.	ml	19.81



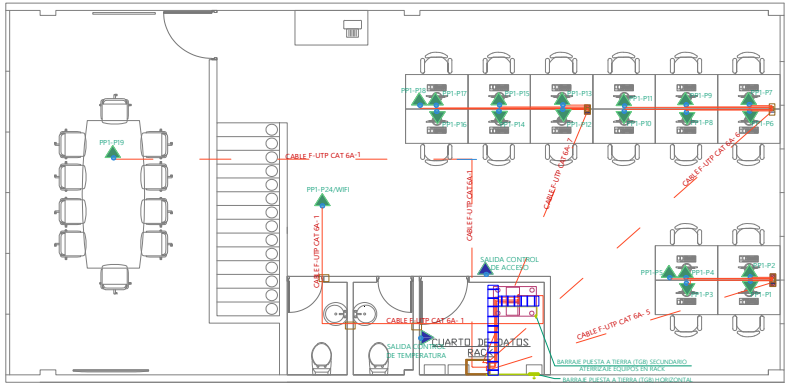

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
####	Suministro, instalación y puesta en marcha de tubería EMT de 3/4" con accesorios de instalación y soporte para sistema de datos.	ml	19.81



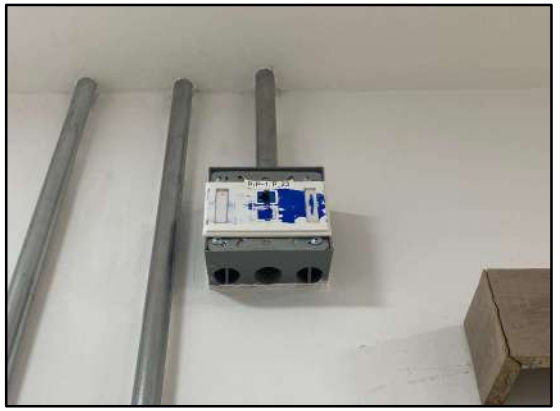



OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
12.19	Suministro, instalación y puesta en marcha de tubería EMT de 1-1/2" con accesorios de instalación y soporte para sistema de datos y proveedor de servicio.	ml	4.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto			
TUBERIA PARA PUNTOS 1 A 5	8.49		1.20	1.00	m	9.69
TUBERIA PARA PUNTOS 7, 8, 9, 10, 11 Y12	10.32		1.20	1.00	m	11.52
TUBERIA PARA PUNTOS 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6	8.24		1.20	1.00	m	9.44
CONEXIÓN UPS	4.00			1.00	m	4.00
					Subtotal	34.65
					COBRADO EN ACTAS	30.65
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**4.00**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

JOSE LUIS GONZALEZ MEJIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
12.19	Suministro, instalación y puesta en marcha de tubería EMT de 1-1/2" con accesorios de instalación y soporte para sistema de datos y proveedor de servicio.	ml	4.00



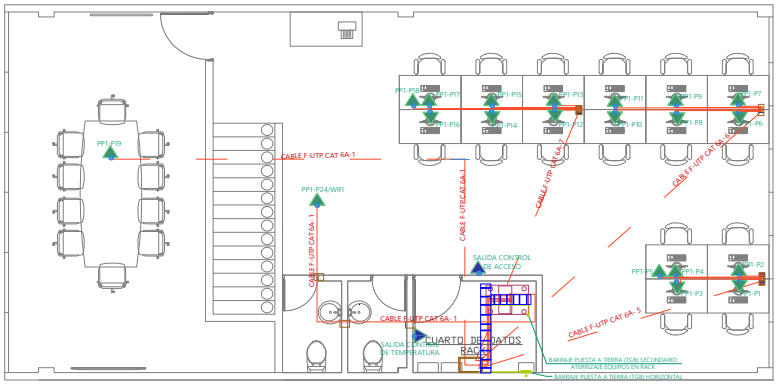

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
12.19	Suministro, instalación y puesta en marcha de tubería EMT de 1-1/2" con accesorios de instalación y soporte para sistema de datos y proveedor de servicio.	ml	4.00







OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
12.21	Suministro e instalacion de salida para sensor de control de temperatura y humedad	un	1.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto			
SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD				1.00	un	1.00
					Subtotal	1.00
					COBRADO EN ACTAS	
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**1.00**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO


OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

JOSE LUIS GONZALEZ MEJIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
12.21	Suministro e instalacion de salida para sensor de control de temperatura y humedad	un	1.00

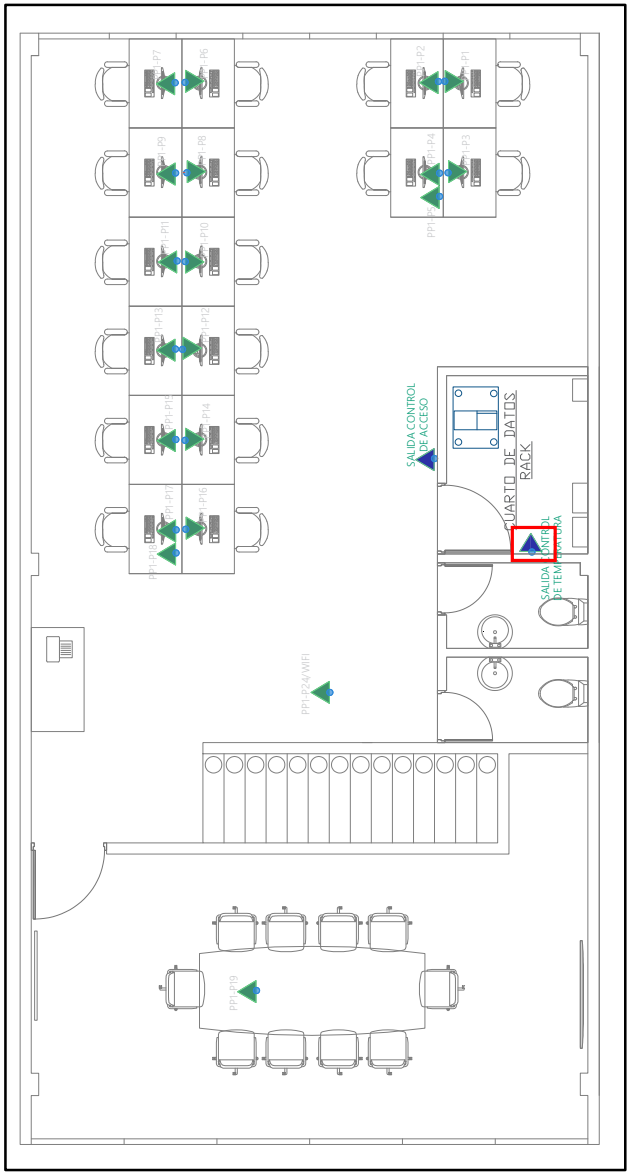

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
12.21	Suministro e instalacion de salida para sensor de control de temperatura y humedad	un	1.00

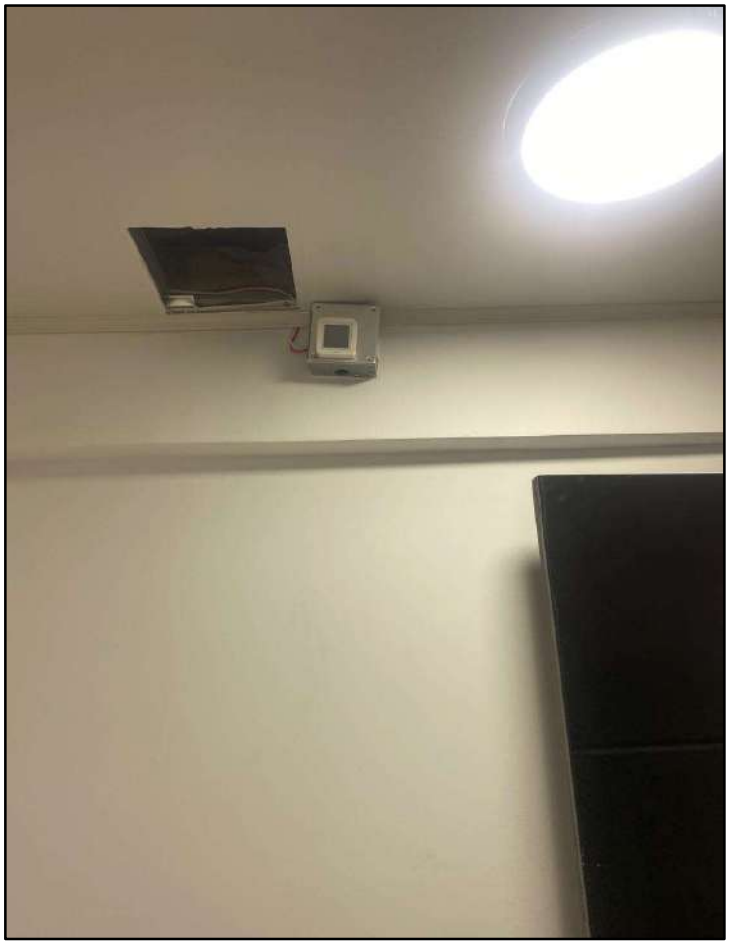



OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
12.22	Suministro e instalacion de punto de control de acceso a cuarto de datos	un	1.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto			
CENTRO DE DATOS				1.00	un	1.00
					Subtotal	1.00
					COBRADO EN ACTAS	
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**1.00**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO


OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

JOSE LUIS GONZALEZ MEJIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
12.22	Suministro e instalacion de punto de control de acceso a cuarto de datos	un	1.00

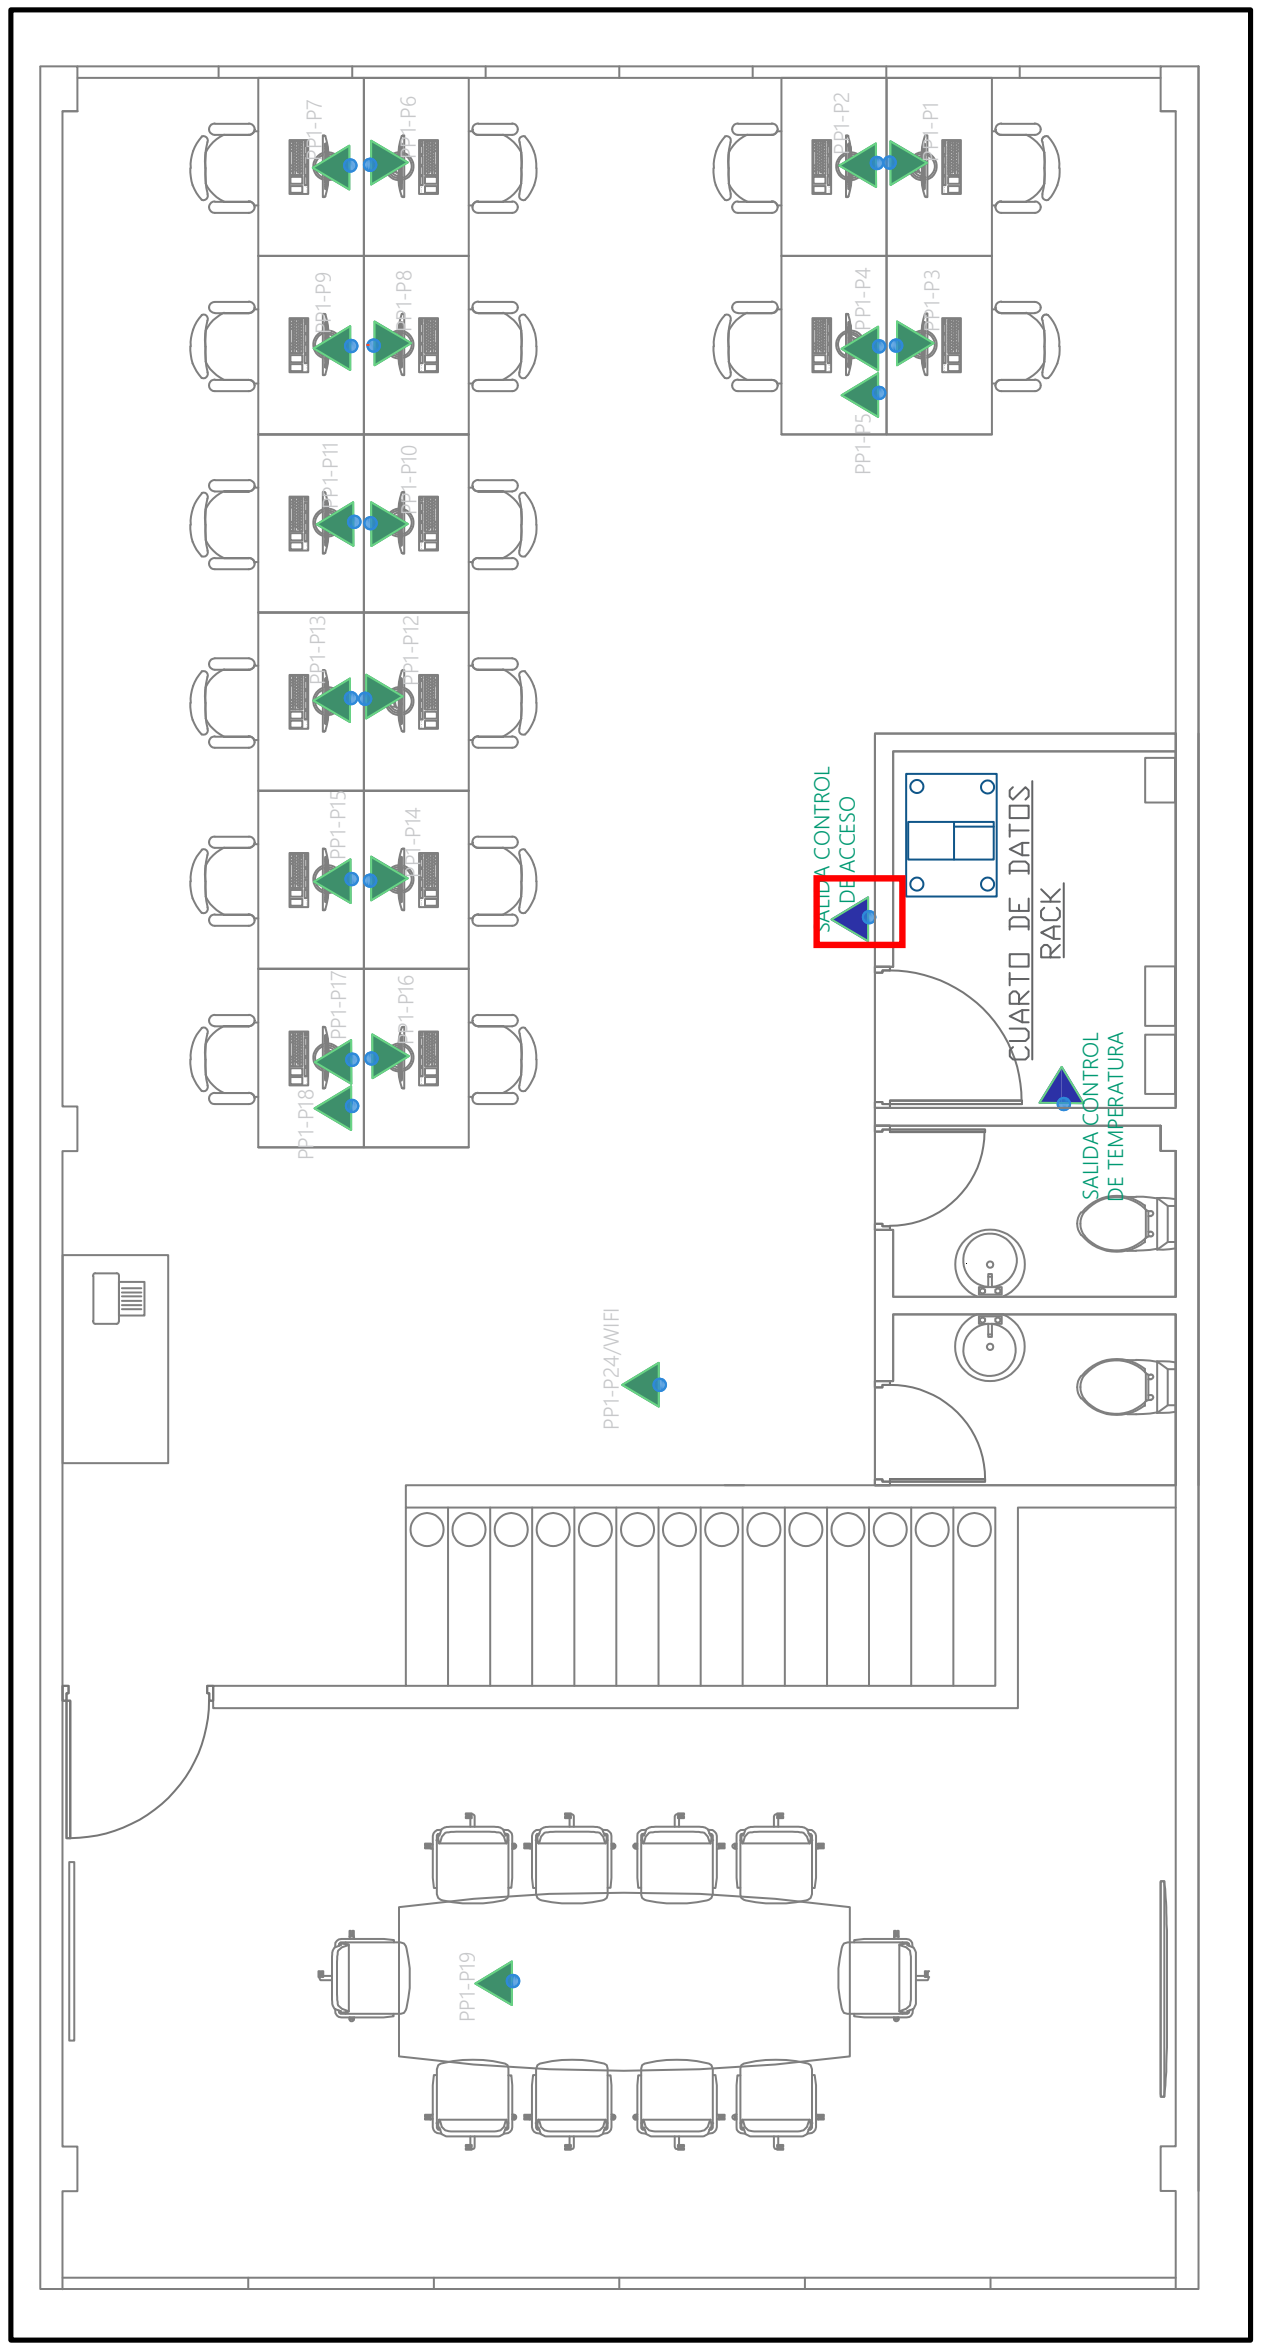

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
12.22	Suministro e instalacion de punto de control de acceso a cuarto de datos	un	1.00













OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
13.02	Suministro, instalación y puesta en marcha de cable desnudo 8 AWQ desnudo para malla equipotencializacion de sistema SPT, soldadura exotermica y terminales de conexión	ml	12.76

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
SUBE DESDE TABLERO DE 30 CIRCUITOS	---	---	2.23	1.00	m	2.23	
			2.00	1.00	m	2.00	
DISTRIBUCIÓN	2.13			1.00	m	2.13	
	1.20			1.00	m	1.20	
	1.33			1.00	m	1.33	
	10.47			1.00	m	10.47	
	6.02			1.00	m	6.02	
	7.32			1.00	m	7.32	
SUBE ALIMENTACION RACK			2.80	1.00	m	2.80	
	2.00			1.00	m	2.00	
					Subtotal	37.50	
					COBRADO EN ACTAS	24.74	
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**12.76**	

OBSERVACIONES:	


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

ING. BERNARDO SOTO GARCÍA
SUPERVISOR UBPD

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
13.02	Suministro, instalación y puesta en marcha de cable desnudo 8 AWQ desnudo para malla equipotencializacion de sistema SPT, soldadura exotermica y terminales de conexión	ml	12.76

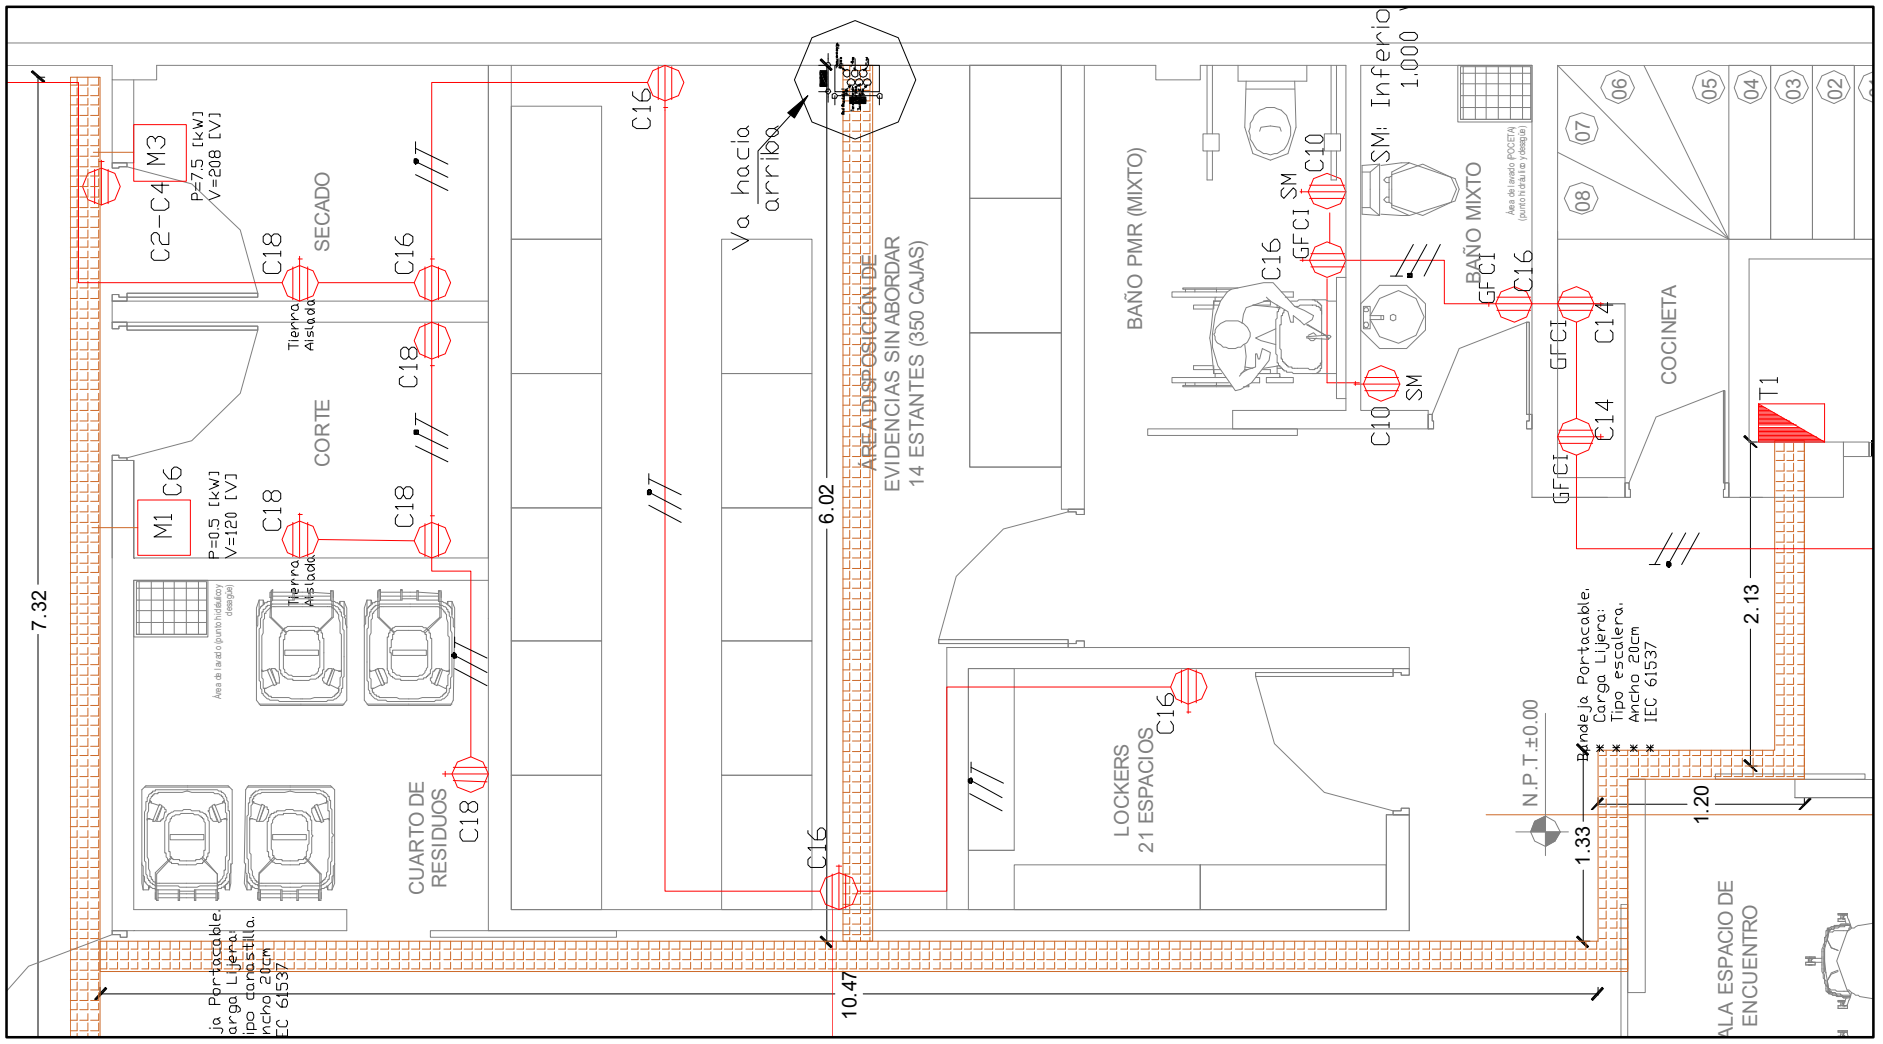


CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
13.02	Suministro, instalación y puesta en marcha de cable desnudo 8 AWQ desnudo para malla equipotencializacion de sistema SPT, soldadura exotermica y terminales de conexión	ml	12.76






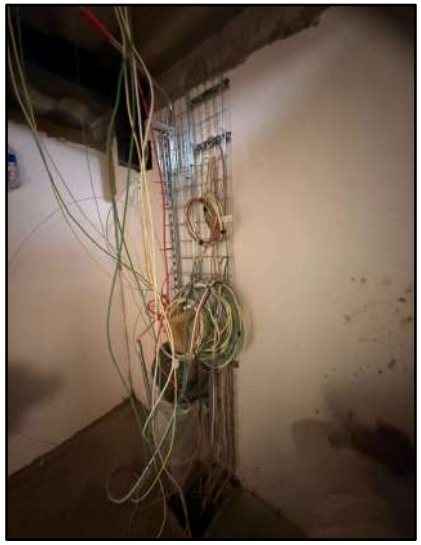





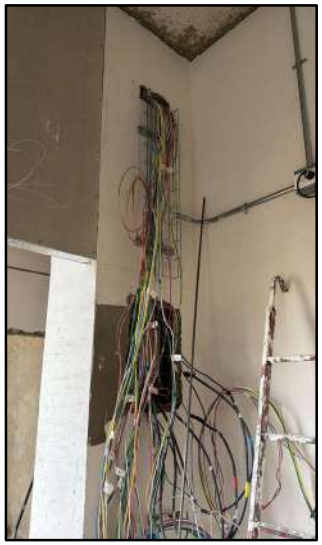



OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
13.03	Medicion de resistencia de puerta a tierra, para cumplimiento norma IEEE80	un	1.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
EN FRENTE DE TABLERO DE 30 CIRCUITOS	---	---	---	1.00	un	1.00	
					Subtotal	1.00	
					COBRADO EN ACTAS		
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**1.00**	

OBSERVACIONES:	


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

BERNARDO SOTO GARCÍA
SUPERVISOR CONTRATO

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
13.03	Medicion de resistencia de puerta a tierra, para cumplimiento norma IEEE80	un	1.00

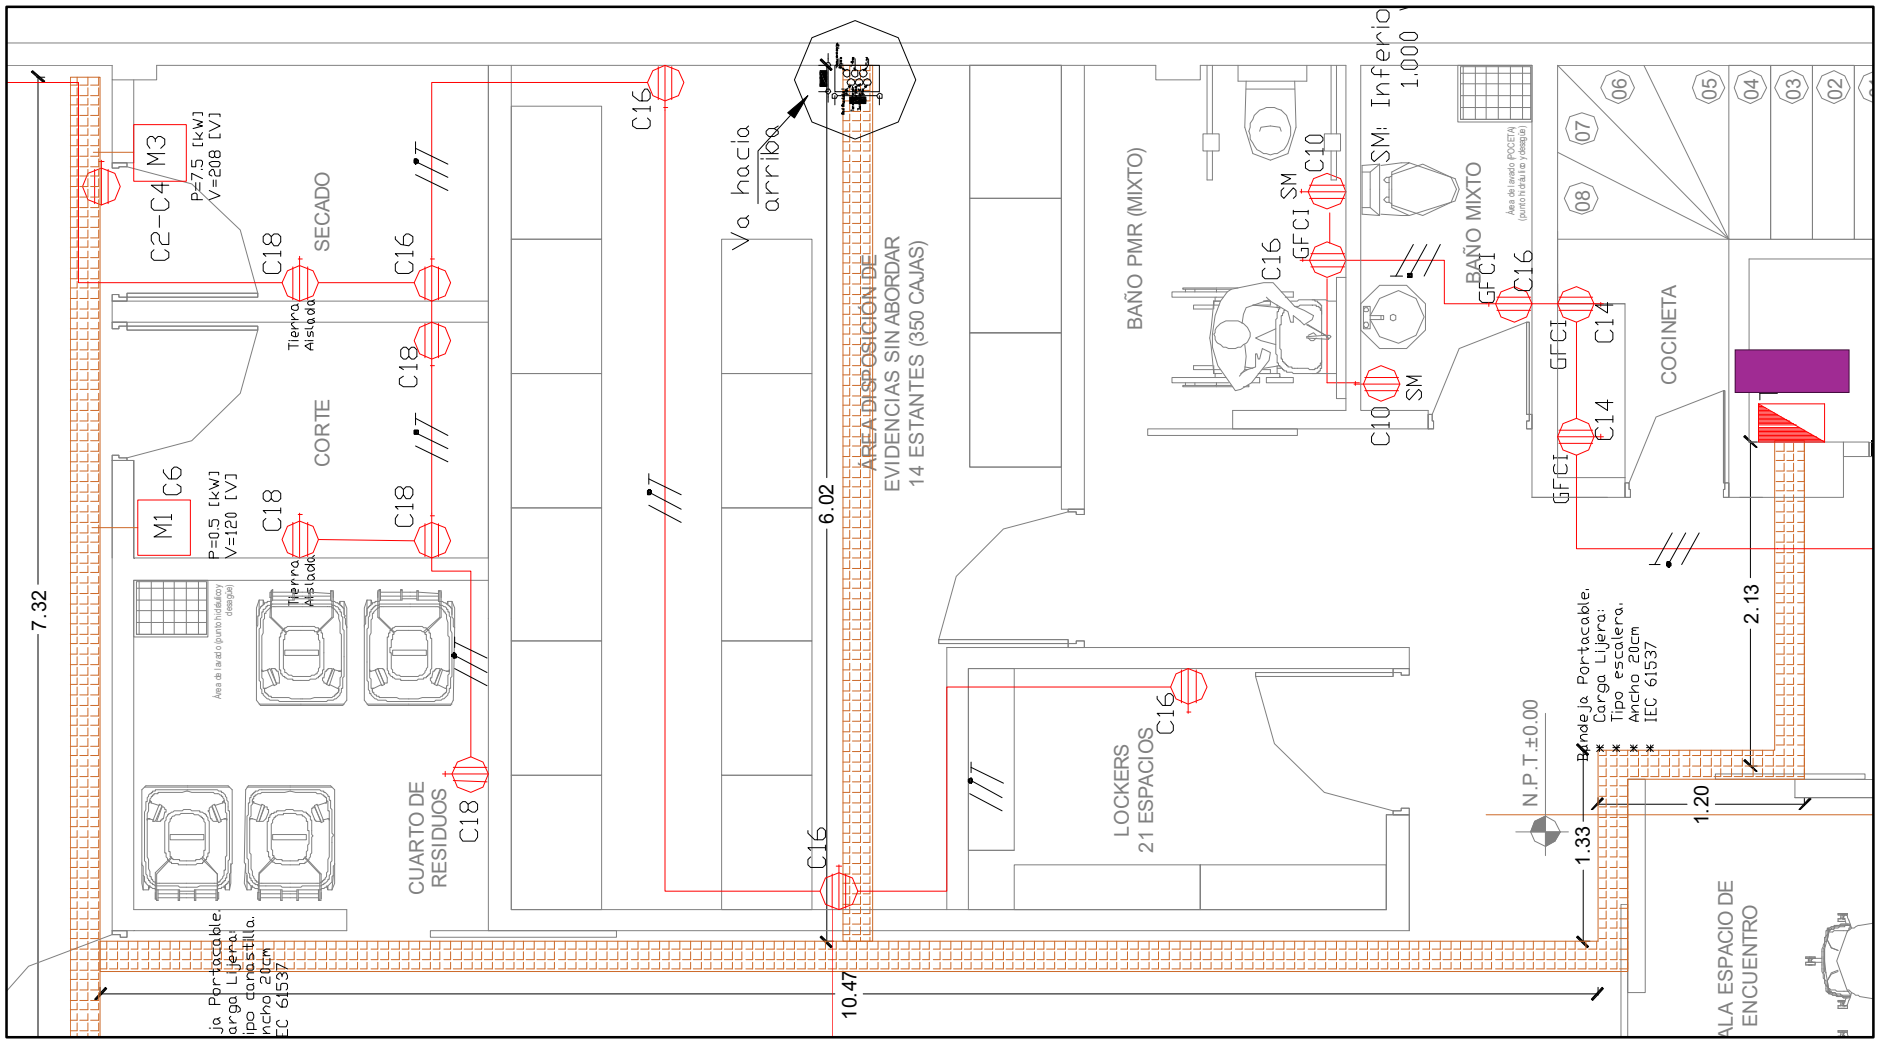


CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
13.03	Medicion de resistencia de puerta a tierra, para cumplimiento norma IEEE80	un	1.00








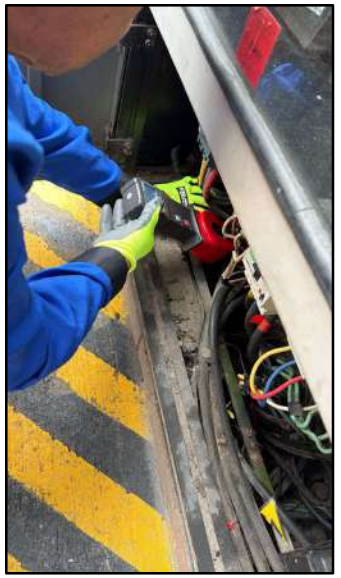





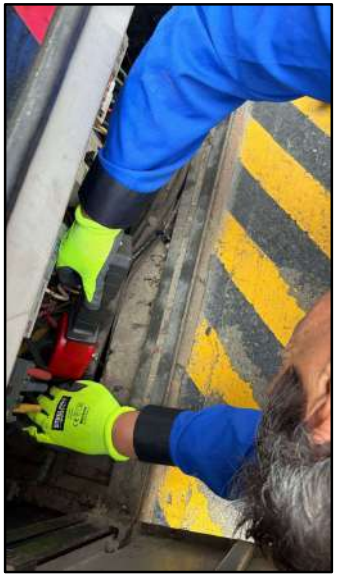

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
14.01	Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4" con accesorios de instalación y soporte para sistema detección de incendio.	ml	36.95

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto			
SEGUNDO PISO						
DETECTOR HUMO 1	3.15	---	---	1.00	m	3.15
DETECTOR HUMO 2	1.58	---	---	1.00	m	1.58
DETECTOR HUMO 3	1.23	---	---	1.00	m	1.23
DETECTOR HUMO 4	4.37	---	---	1.00	m	4.37
DETECTOR HUMO 5	6.43	---	---	1.00	m	6.43
DETECTOR HUMO 6	3.34	---	---	1.00	m	3.34
DETECTOR HUMO 7	4.60	---	---	1.00	m	4.60
DETECTOR HUMO 8			2.00	1.00	m	2.00
PRIMER PISO						
DETECTOR HUMO 1 A 2	3.46			1.00	m	3.46
DETECTOR HUMO 2 A 5	2.51			1.00	m	2.51
DETECTOR HUMO 5 A 4	2.98			1.00	m	2.98
DETECTOR HUMO 4 A 3	3.36			1.00	m	3.36
DETECTOR HUMO 3 A 9	4.99			1.00	m	4.99
DETECTOR HUMO 6 A 7	2.09			1.00	m	2.09
DETECTOR HUMO 7 A 8	1.65			1.00	m	1.65
DETECTOR HUMO 9 A 10	3.14			1.00	m	3.14
	0.99			1.00	m	0.99
DETECTOR HUMO 10 A 11	3.00			1.00	m	3.00
DETECTOR HUMO 11 A 12	1.89			1.00	m	1.89
DETECTOR HUMO 12 A 13	2.22			1.00	m	2.22
DETECTOR HUMO 13 A 14	1.78			1.00	m	1.78
DETECTOR HUMO 2 A ESTACION MANUAL 2	0.76			1.00	m	0.76
	1.06			1.00	m	1.06
			2.60	1.00	m	2.60
DETECTOR HUMO 11 A ESTACION MANUAL 3	1.44			1.00	m	1.44
	0.77			1.00	m	0.77
	0.45			1.00	m	0.45
			2.60	1.00	m	2.60
DETECTOR HUMO 9 HACIA PASE PLACA	3.14			1.00	m	3.14
	1.36			1.00	m	1.36
ESTACION MANUAL 1	2.40			1.00	m	2.40
			1.40	1.00	m	1.40
ALIMENTACION ZONA DE ABORDAJE	3.00			1.00	m	3.00
	5.95			1.00	m	5.95
BAJA			6.40	1.00	m	6.40
DETECTOR HUMO 15 A 16	4.20			1.00	m	4.20
DETECTOR HUMO 15 A 17	6.00			1.00	m	6.00
DETECTOR HUMO 17 A 18	4.20			1.00	m	4.20
DETECTOR HUMO 17 A 19	6.00			1.00	m	6.00
DETECTOR HUMO 19 A 20	4.20			1.00	m	4.20
					TOTAL EJECUTADO	118.69
					COBRADO EN ACTAS	81.74
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**36.95**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

WilsonPazosBastidas
APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
14.01	Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4" con accesorios de instalación y soporte para sistema detección de incendio.	ml	36.95

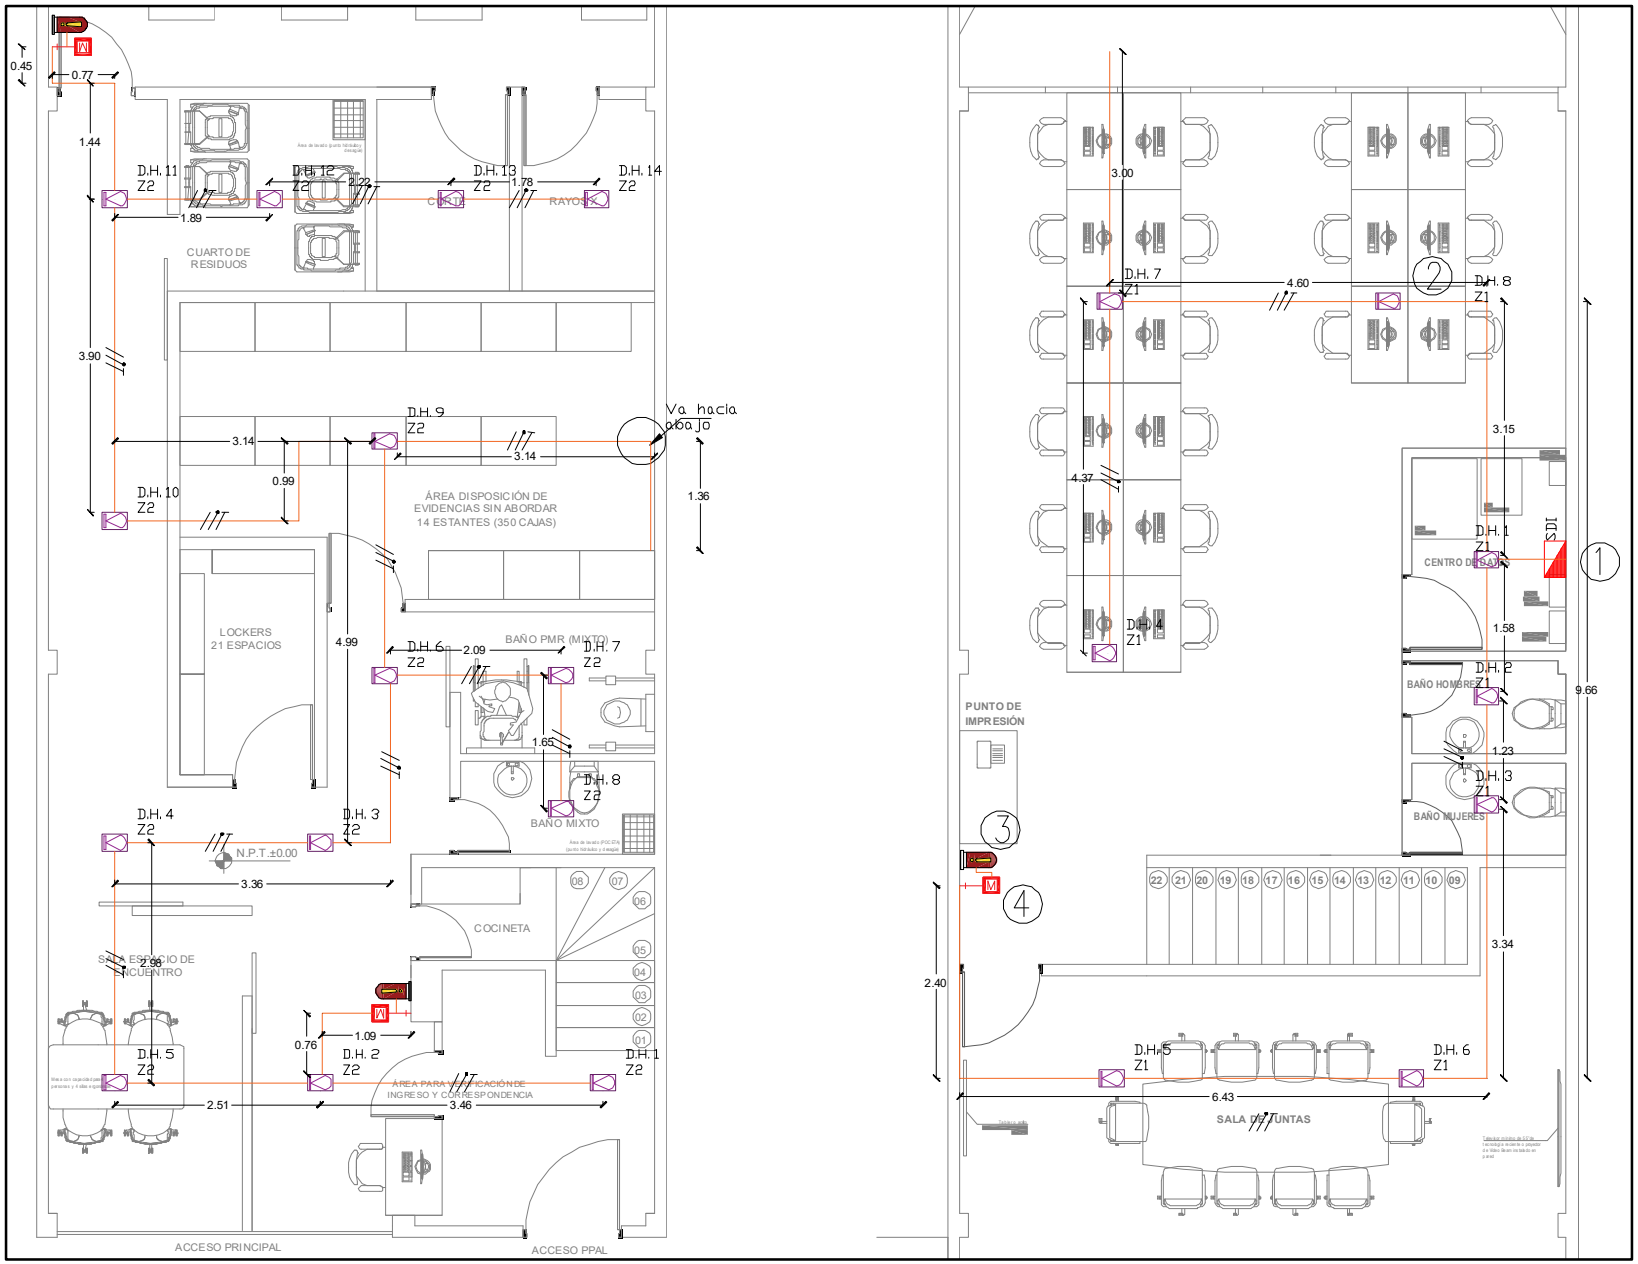

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
14.01	Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4" con accesorios de instalación y soporte para sistema detección de incendio.	ml	36.95

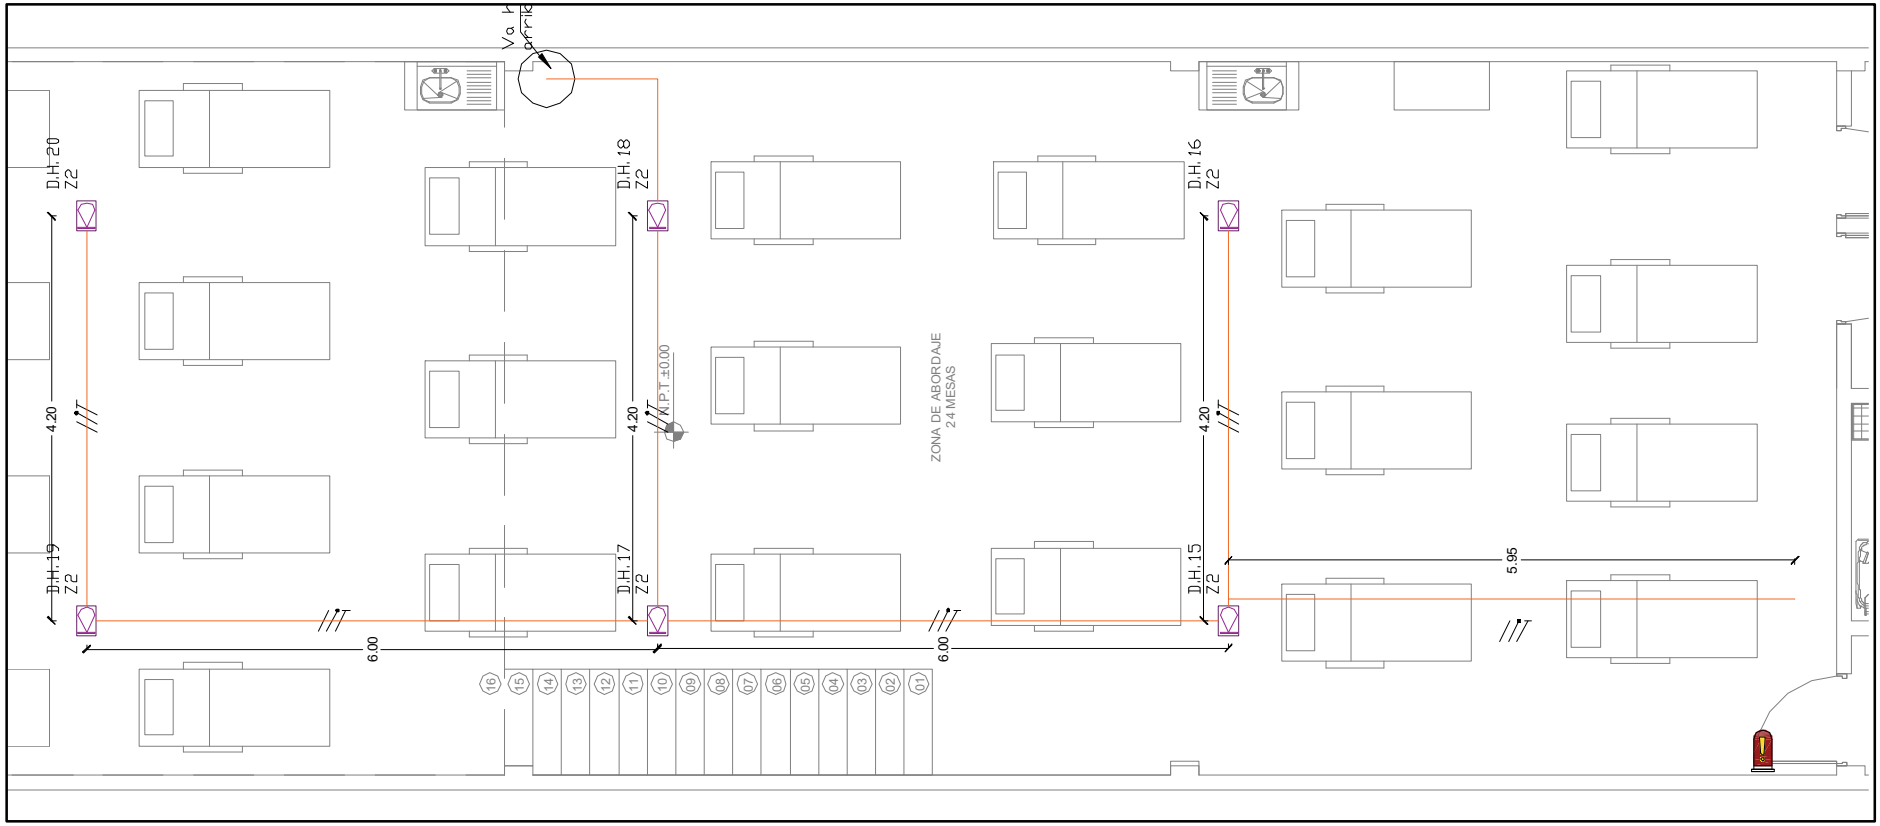

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
14.01	Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4" con accesorios de instalación y soporte para sistema detección de incendio.	ml	36.95



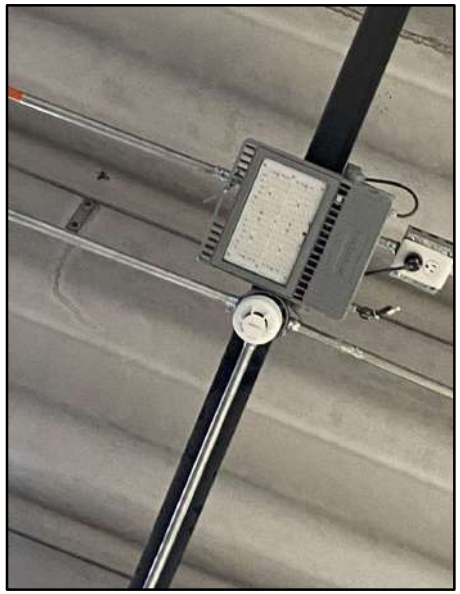





OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
14.02	Suministro, instalación y puesta en marcha de estacion manual de alarma, voltaje operación 24Vdc	un	3.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto			
ZONA DE ABORDAJE				1.00	un	1.00
PASILLO DE CIRCULACION				1.00	un	1.00
SEGUNDO PISO				1.00	un	1.00
					Subtotal	3.00
					COBRADO EN ACTAS	
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**3.00**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ


REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

WilsonPazosBastidas

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
14.02	Suministro, instalación y puesta en marcha de estacion manual de alarma, voltaje operación 24Vdc	un	3.00

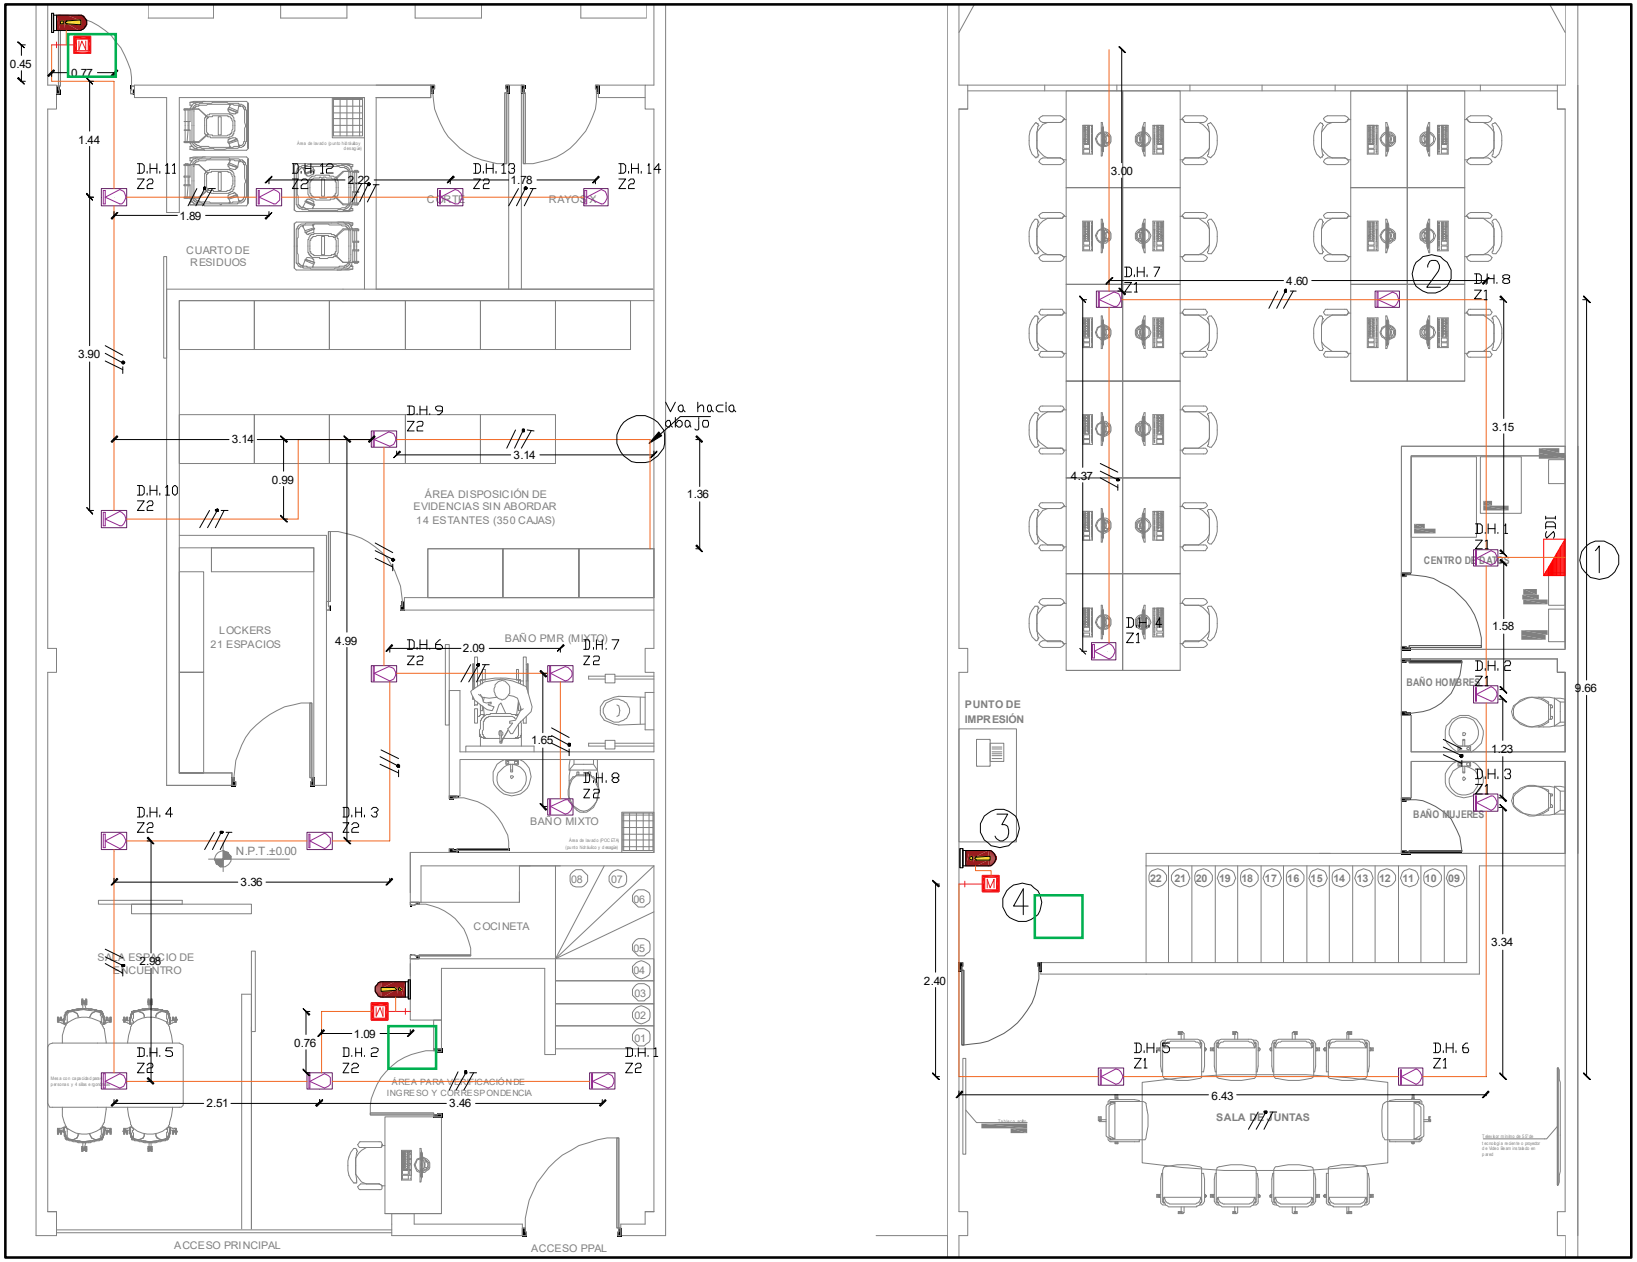

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
14.02	Suministro, instalación y puesta en marcha de estacion manual de alarma, voltaje operación 24Vdc	un	3.00











OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
14.03	Suministro, instalación y puesta en marcha de detectores de humo, Voltaje de operación 15-32VDC, Max corriente, 2mA	un	28.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
SEGUNDO PISO							
DETECTOR HUMO 1	---	---	---	1.00	m	1.00	
DETECTOR HUMO 2	---	---	---	1.00	m	1.00	
DETECTOR HUMO 3	---	---	---	1.00	m	1.00	
DETECTOR HUMO 4	---	---	---	1.00	m	1.00	
DETECTOR HUMO 5	---	---	---	1.00	m	1.00	
DETECTOR HUMO 6	---	---	---	1.00	m	1.00	
DETECTOR HUMO 7	---	---	---	1.00	m	1.00	
DETECTOR HUMO 8				1.00	m	1.00	
PRIMER PISO							
DETECTOR HUMO 9	---			1.00	m	1.00	
DETECTOR HUMO 10	---			1.00	m	1.00	
DETECTOR HUMO 11	---			1.00	m	1.00	
DETECTOR HUMO 12	---			1.00	m	1.00	
DETECTOR HUMO 13	---			1.00	m	1.00	
DETECTOR HUMO 14	---			1.00	m	1.00	
DETECTOR HUMO 15	---			1.00	m	1.00	
DETECTOR HUMO 16	---	---	---	1.00	m	1.00	
DETECTOR HUMO 17	---	---	---	1.00	m	1.00	
DETECTOR HUMO 18	---	---	---	1.00	m	1.00	
DETECTOR HUMO 19	---	---	---	1.00	m	1.00	
DETECTOR HUMO 20	---	---	---	1.00	m	1.00	
DETECTOR HUMO 21	---	---	---	1.00	m	1.00	
DETECTOR HUMO 22	---	---	---	1.00	m	1.00	
ZONA DE ABORDAJE							
DETECTOR HUMO 23	---	---	---	1.00	m	1.00	
DETECTOR HUMO 24	---	---	---	1.00	m	1.00	
DETECTOR HUMO 25	---	---	---	1.00	m	1.00	
DETECTOR HUMO 26	---	---	---	1.00	m	1.00	
DETECTOR HUMO 27				1.00	m	1.00	
DETECTOR HUMO 28	---	---	---	1.00	m	1.00	
					TOTAL EJECUTADO	28.00	
					COBRADO EN ACTAS		
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**28.00**	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

WilsonPazosBastidas
APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
14.03	Suministro, instalación y puesta en marcha de detectores de humo, Voltaje de operación 15-32VDC, Max corriente, 2mA	un	28.00

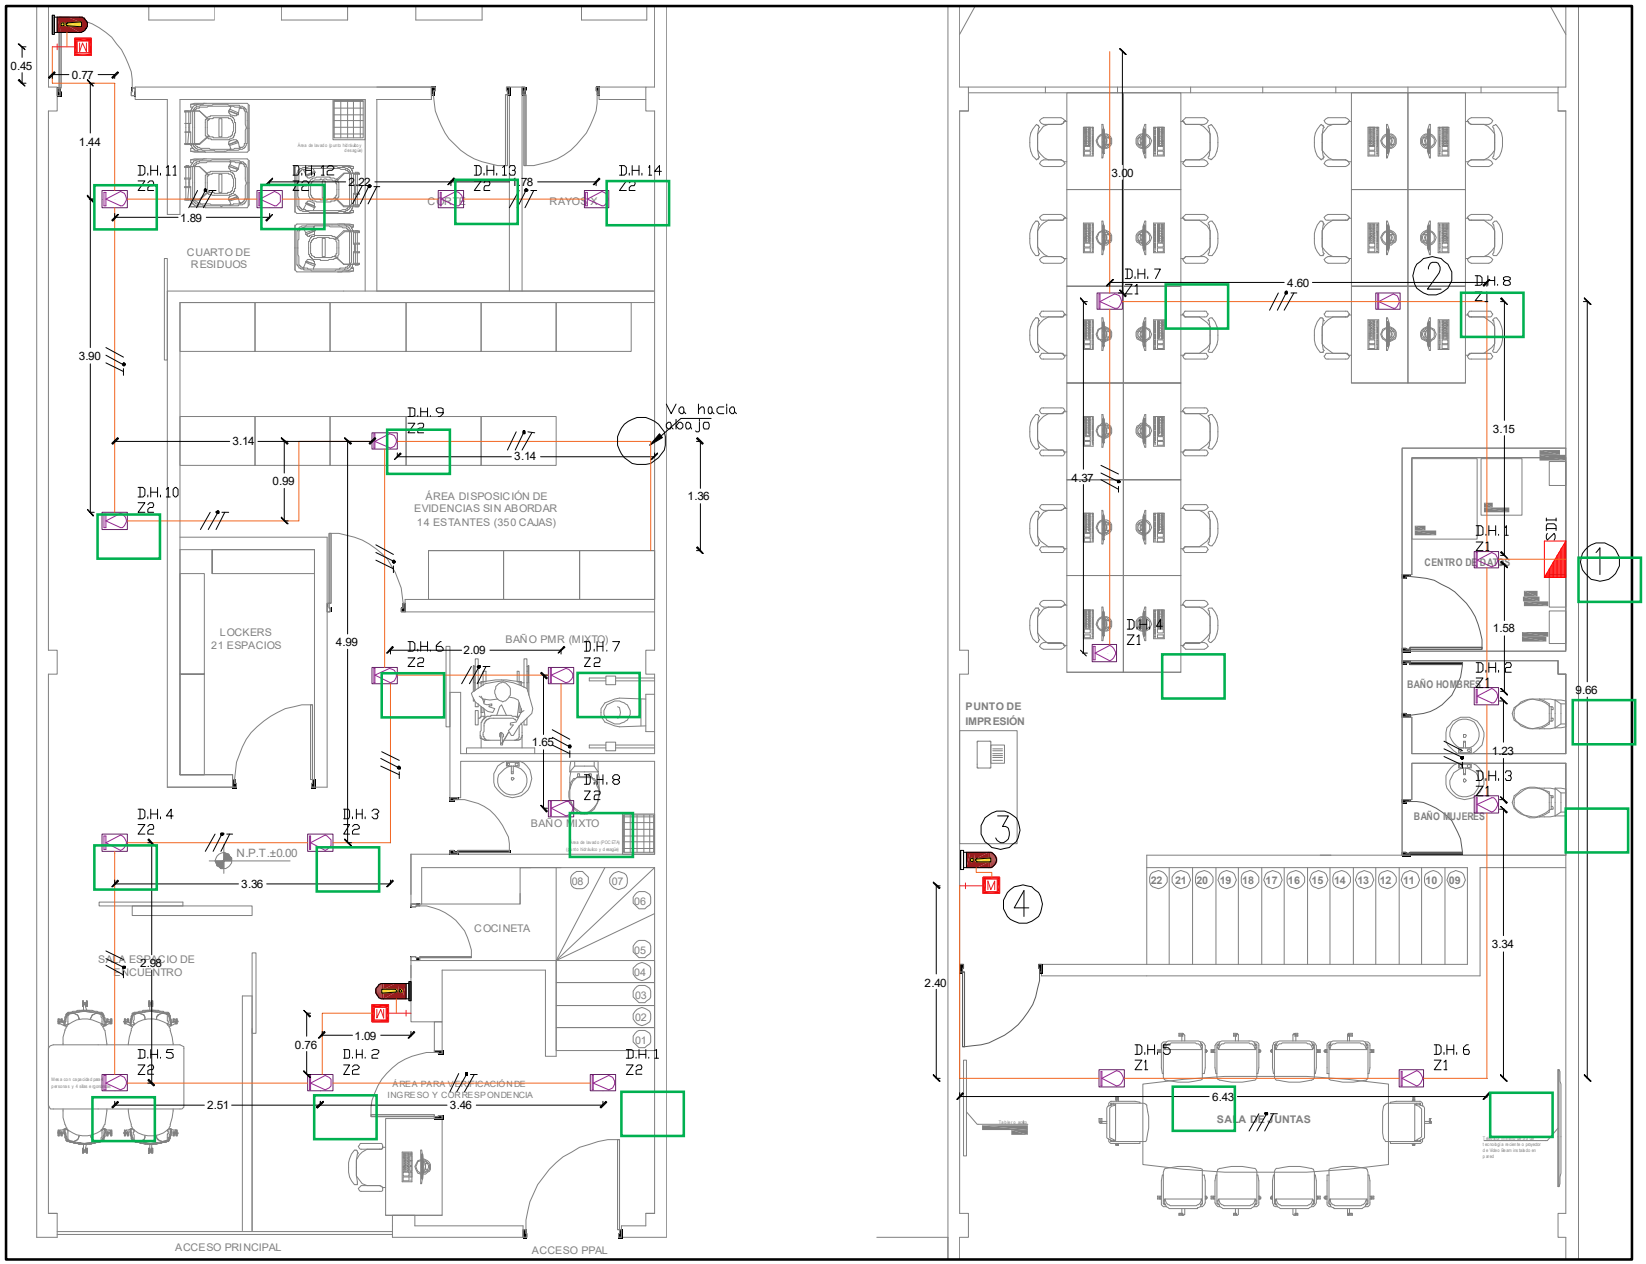

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
14.03	Suministro, instalación y puesta en marcha de detectores de humo, Voltaje de operación 15-32VDC, Max corriente, 2mA	un	28.00

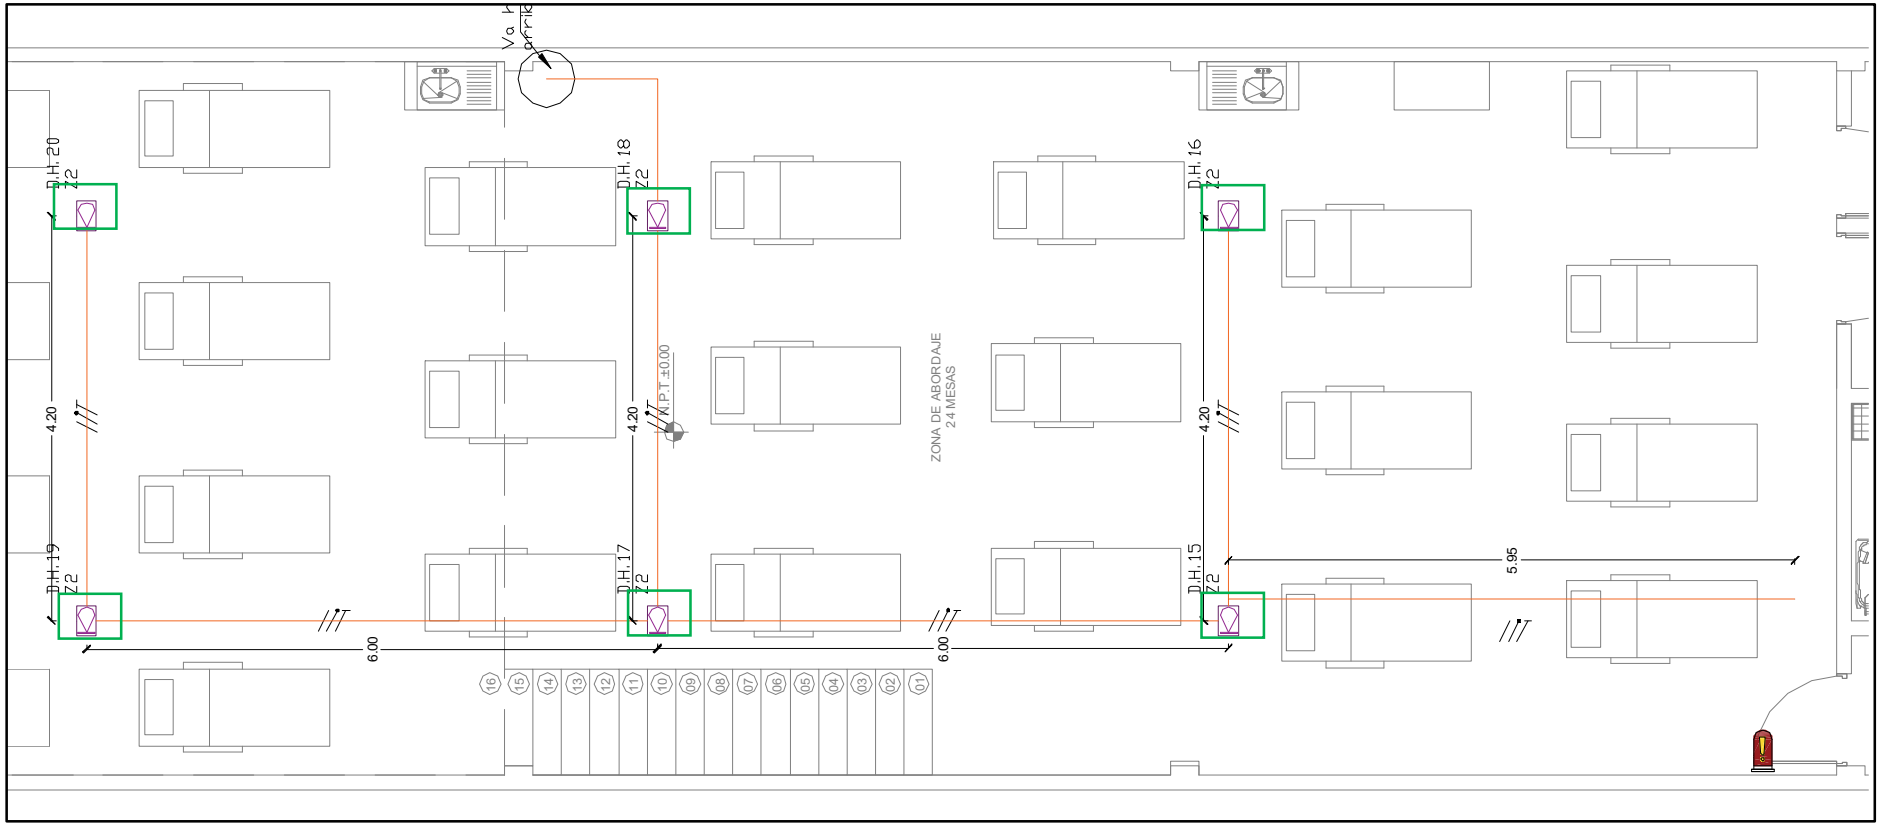


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
14.03	Suministro, instalación y puesta en marcha de detectores de humo, Voltaje de operación 15-32VDC, Max corriente, 2mA	un	28.00





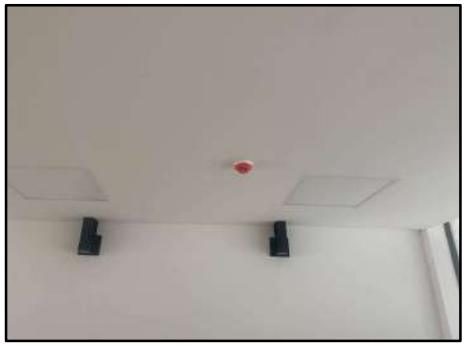











OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
14.04	Suministro, instalación y puesta en marcha de alarma estroboscoipca P2rXX, Salida de sonido 88dbA, Voltaje de operación 12/24 Vdc, destello por segundo 1, instalacion en pared	un	3.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto			
ZONA DE ABORDAJE				1.00	un	1.00
PASILLO DE CIRCULACION				1.00	un	1.00
SEGUNDO PISO				1.00	un	1.00
					Subtotal	3.00
					COBRADO EN ACTAS	
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**3.00**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

Wilson Pazos Bastidas
APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
14.04	Suministro, instalación y puesta en marcha de alarma estroboscoipca P2rXX, Salida de sonido 88dbA, Voltaje de operación 12/24 Vdc, destello por segundo 1, instalacion en pared	un	3.00

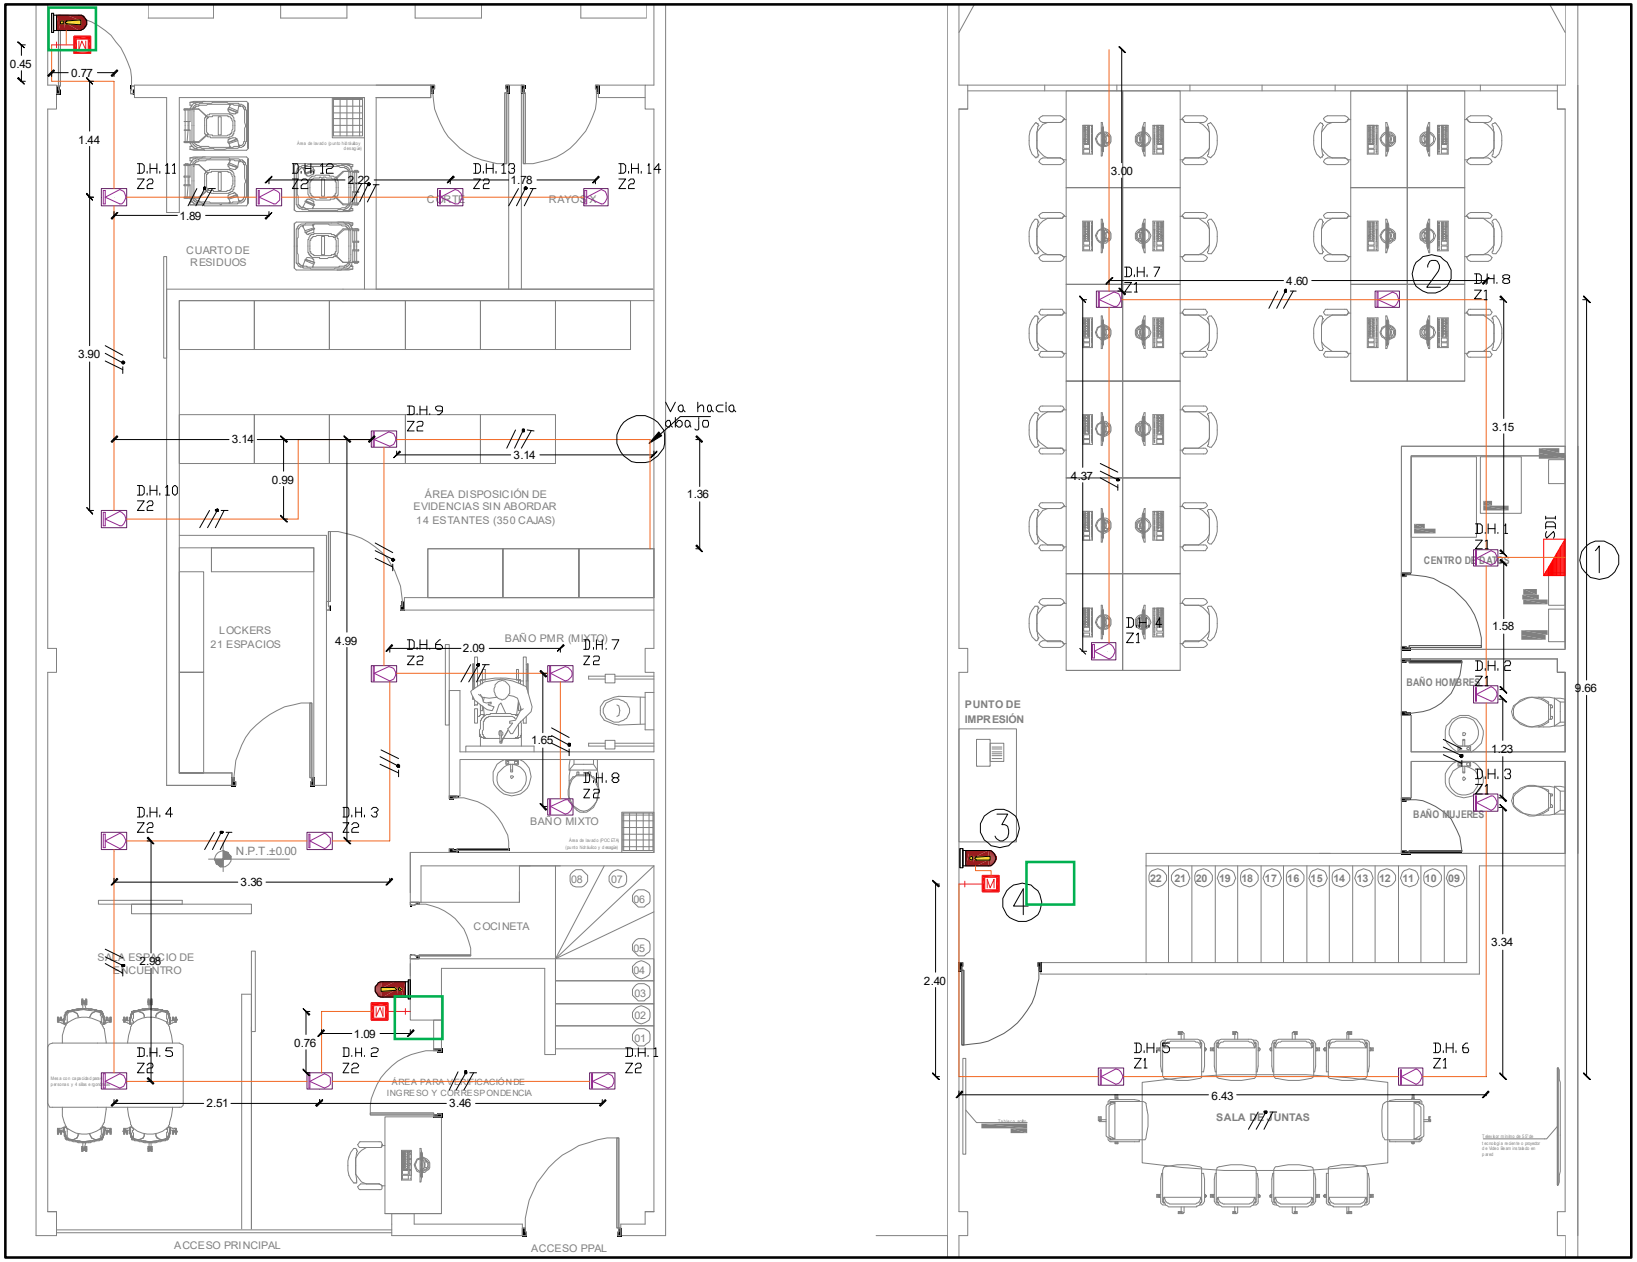

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
14.04	Suministro, instalación y puesta en marcha de alarma estroboscoipca P2rXX, Salida de sonido 88dbA, Voltaje de operación 12/24 Vdc, destello por segundo 1, instalacion en pared	un	3.00













OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
14.05	Suministro, instalación y puesta en marcha de panel de deteccion de incendios Min 2 Zonas, 2xNAC´s, Voltaje de operación 120/208 V	un	1.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto			
CENTRO DE DATOS				1.00	un	1.00
				Subtotal		1.00
				COBRADO EN ACTAS		
				TOTAL A COBRAR ACTA No. 4		**1.00**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

WilsonPazosBastidas
APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
14.05	Suministro, instalación y puesta en marcha de panel de deteccion de incendios Min 2 Zonas, 2xNAC´s, Voltaje de operación 120/208 V	un	1.00

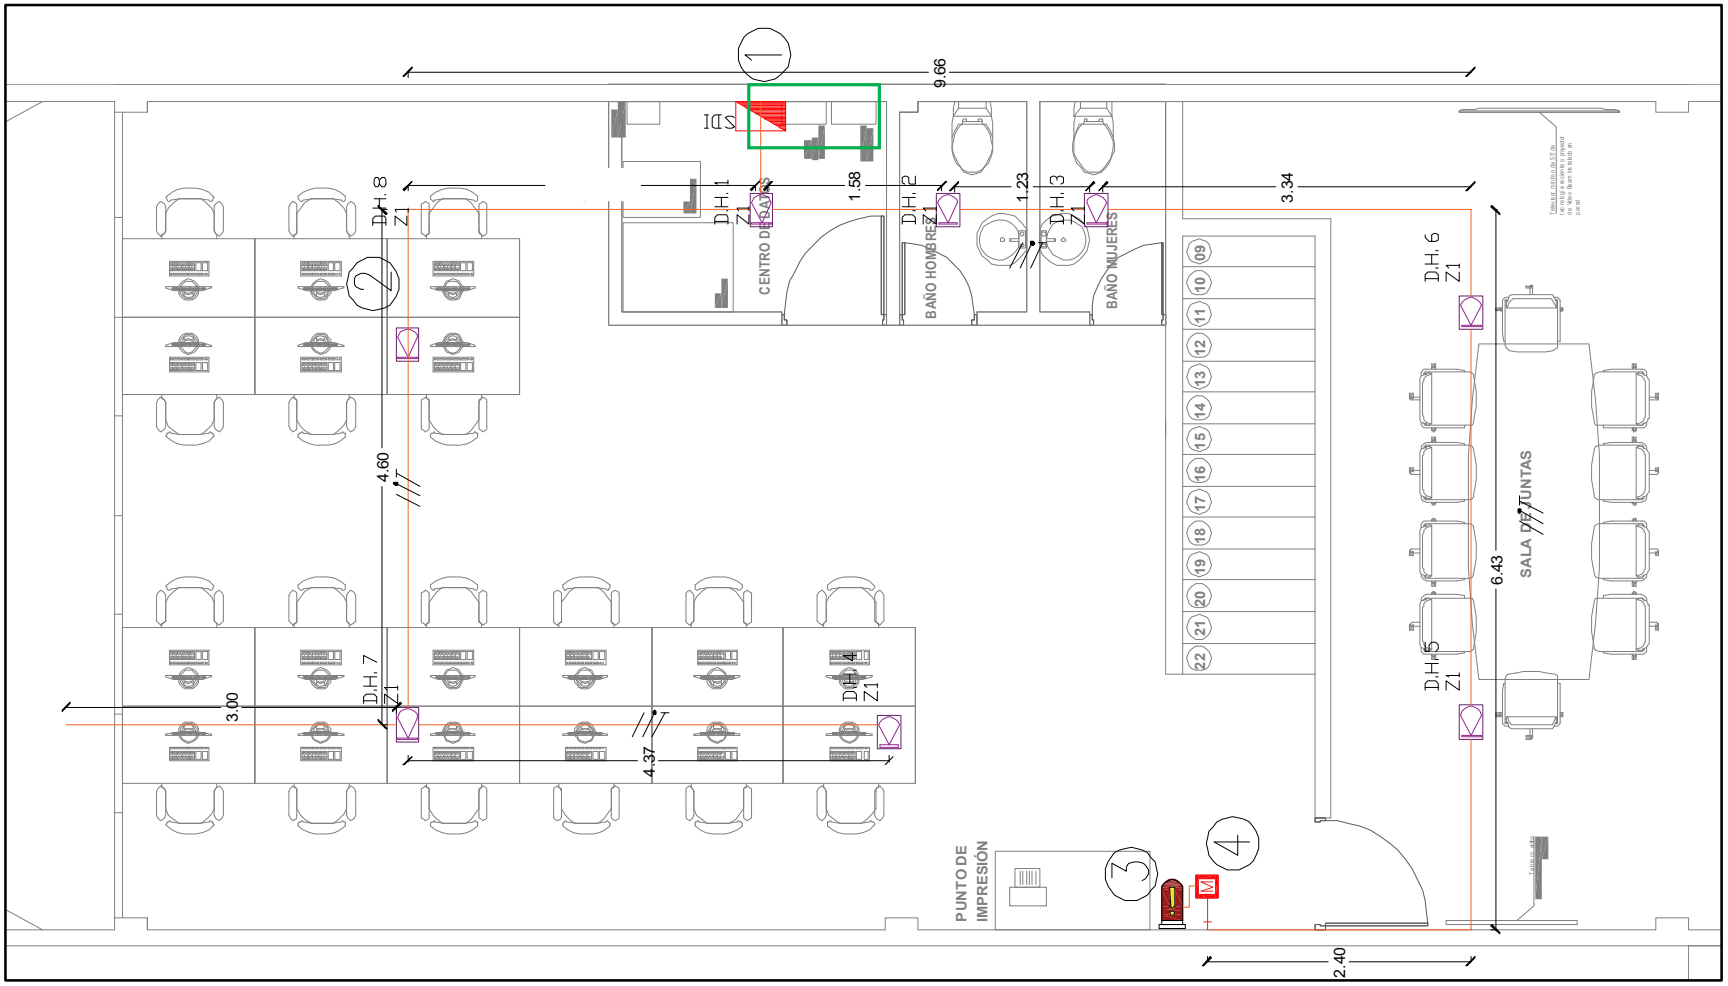

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
14.05	Suministro, instalación y puesta en marcha de panel de deteccion de incendios Min 2 Zonas, 2xNAC´s, Voltaje de operación 120/208 V	un	1.00







OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
16.05	DEMOLICIÓN DE MESÓN EN COCINETA INCLUYE LAVAPLATOS	M2	0.18

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto			
POCETA	0.40	0.45		1.00	m2	0.18
					Subtotal	0.18
					TOTAL EJECUTADO	**0.18**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISION UBPD

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
16.05	DEMOLICIÓN DE MESÓN EN COCINETA INCLUYE LAVAPLATOS	M2	0.18

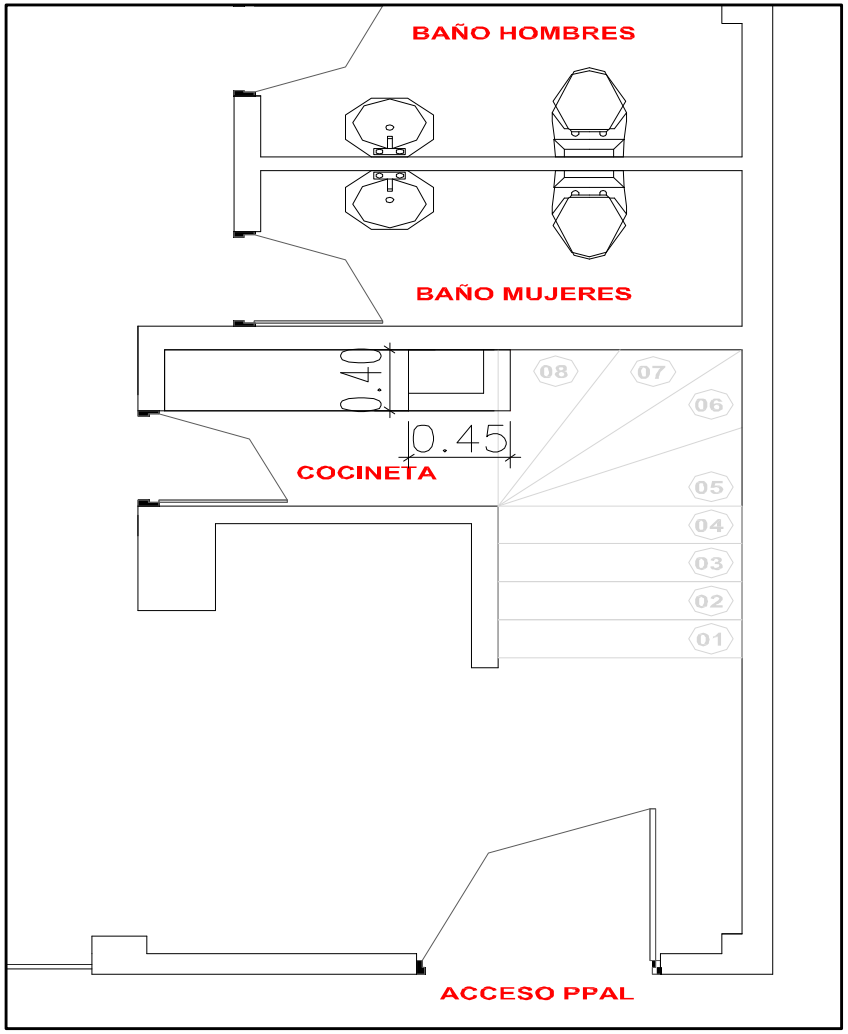

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
16.05	DEMOLICIÓN DE MESÓN EN COCINETA INCLUYE LAVAPLATOS	M2	0.18





OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
16.10	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SOHO O SIMILAR COLOR BEIGE DE ALTURA 0.08 MTS INCLUYE REMATE PULIDO	ML	71.05

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
AREA INTERVENCION 2DO PISO		7.15		1.00	m	7.15	
	0.21			1.00	m	0.21	
		0.08		1.00	m	0.08	
	4.21			1.00	m	4.21	
		2.00		1.00	m	2.00	
	1.60			1.00	m	1.60	
		0.15		1.00	m	0.15	
		1.85		1.00	m	1.85	
	2.40			1.00	m	2.40	
		2.00		1.00	m	2.00	
	0.15			1.00	m	0.15	
	1.05			1.00	m	1.05	
		3.02		1.00	m	3.02	
	0.16			2.00	m	0.32	
		3.87		1.00	m	3.87	
	1.33			1.00	m	1.33	
		1.16		1.00	m	1.16	
	4.07			1.00	m	4.07	
		0.09		4.00	m	0.36	
	0.32			2.00	m	0.64	
	0.50			2.00	m	1.00	
		7.33		1.00	m	7.33	
					Subtotal	45.95	

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
16.10	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SOHO O SIMILAR COLOR BEIGE DE ALTURA 0.08 MTS INCLUYE REMATE PULIDO	ML	71.05

AREA INTERVENCION 2DO PISO	6.30			1.00	m	6.30
		0.30		1.00	m	0.30
	0.36			1.00	m	0.36
		0.23		1.00	m	0.23
	0.20			1.00	m	0.20
		0.07		1.00	m	0.07
	6.64			1.00	m	6.64
		0.09		1.00	m	0.09
	0.19			1.00	m	0.19
SECADO	0.63			1.00	m	0.63
	2.48			1.00	m	2.48
	1.58			1.00	m	1.58
	2.64			1.00	m	2.64
CORTE	2.64			1.00	m	2.64
	1.53			1.00	m	1.53
	2.48			1.00	m	2.48
	0.58			1.00	m	0.58
RESIDUOS	1.58			1.00	m	1.58
	1.93			1.00	m	1.93
	2.38			1.00	m	2.38
	1.56			1.00	m	1.56
PASILLO CIRCULACION	7.89			1.00	m	7.89
	0.30			1.00	m	0.30
	0.10			1.00	m	0.10
	6.64			1.00	m	6.64
	0.09			2.00	m	0.18
	0.35			1.00	m	0.35
	2.99			1.00	m	2.99
	2.48			1.00	m	2.48
	2.53			1.00	m	2.53
	3.15			1.00	m	3.15
	0.42			1.00	m	0.42
	1.31			1.00	m	1.31
	0.45			1.00	m	0.45
	0.65			1.00	m	0.65
	0.80			1.00	m	0.80
					Subtotal	66.63
					Viene	45.95
					TOTAL	**112.58**

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
16.10	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SOHO O SIMILAR COLOR BEIGE DE ALTURA 0.08 MTS INCLUYE REMATE PULIDO	ML	71.05

LOCKERS	2.84			2.00	m	5.68	
	0.72			1.00	m	0.72	
	1.67			1.00	m	1.67	
	0.86			1.00	m	0.86	
EVIDENCIAS SIN ABORDAR	1.82			1.00	m	1.82	
	2.89			1.00	m	2.89	
	5.69			1.00	m	5.69	
	3.67			1.00	m	3.67	
	2.92			1.00	m	2.92	
SALA DE ENCUENTRO	0.40			1.00	m	0.40	
	0.29			1.00	m	0.29	
	0.41			1.00	m	0.41	
	0.29			1.00	m	0.29	
	2.45			1.00	m	2.45	
	2.35			1.00	m	2.35	
	2.35			1.00	m	2.35	
	2.50			1.00	m	2.50	
	0.16			1.00	m	0.16	
INGRESO	1.30			2.00	m	2.60	
	0.42			1.00	m	0.42	
	1.24			1.00	m	1.24	
	1.21			1.00	m	1.21	
	0.64			1.00	m	0.64	
	2.07			1.00	m	2.07	
	1.81			1.00	m	1.81	
	1.42			1.00	m	1.42	
ESCALERA HUELLAS	0.28			46.00	m	12.88	
ESCALERA CONTRAHUELLAS	0.27			43.00	m	11.40	
					Subtotal	72.81	
					Viene	112.58	
					TOTAL	**185.39**	
					COBRADO EN ACTAS	114.34	
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**71.05**	


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD


CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
16.10	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SOHO O SIMILAR COLOR BEIGE DE ALTURA 0.08 MTS INCLUYE REMATE PULIDO	ML	71.05

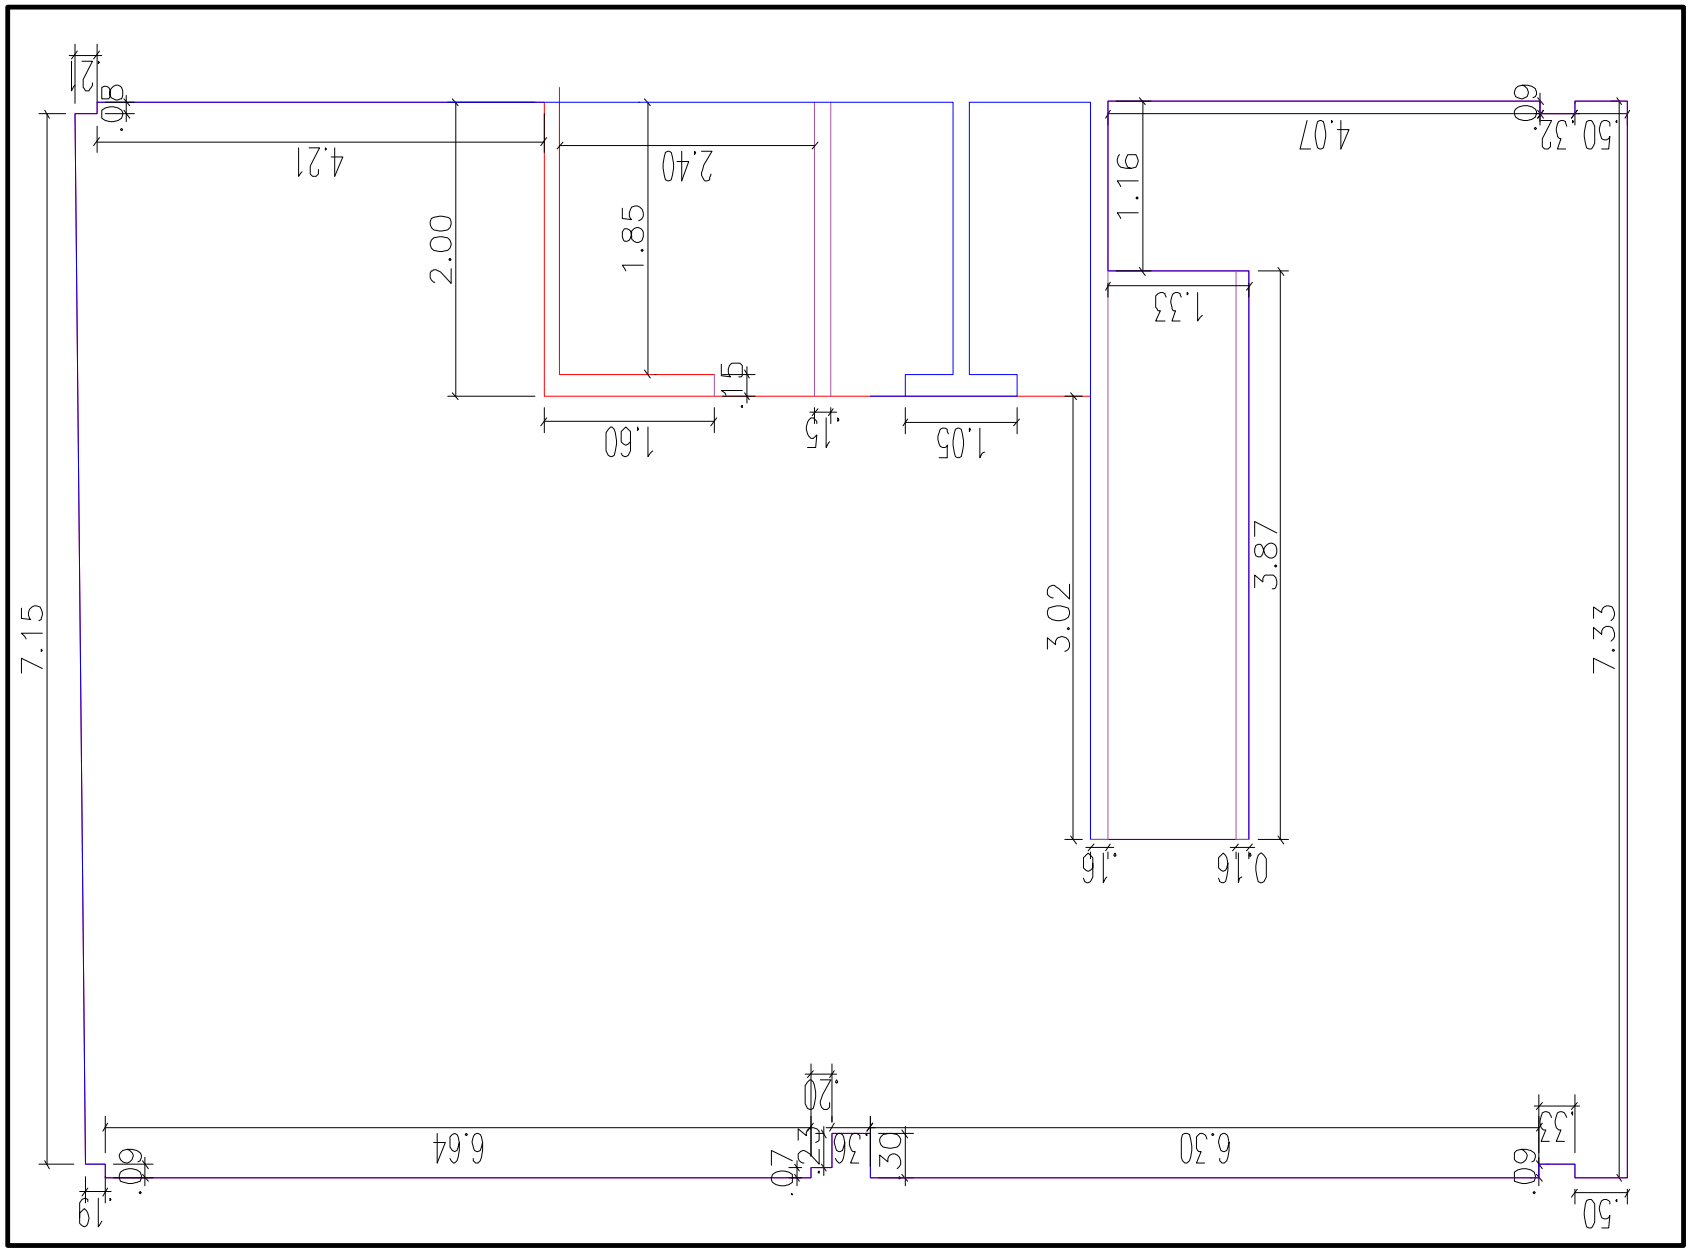

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
16.10	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SOHO O SIMILAR COLOR BEIGE DE ALTURA 0.08 MTS INCLUYE REMATE PULIDO	ML	71.05

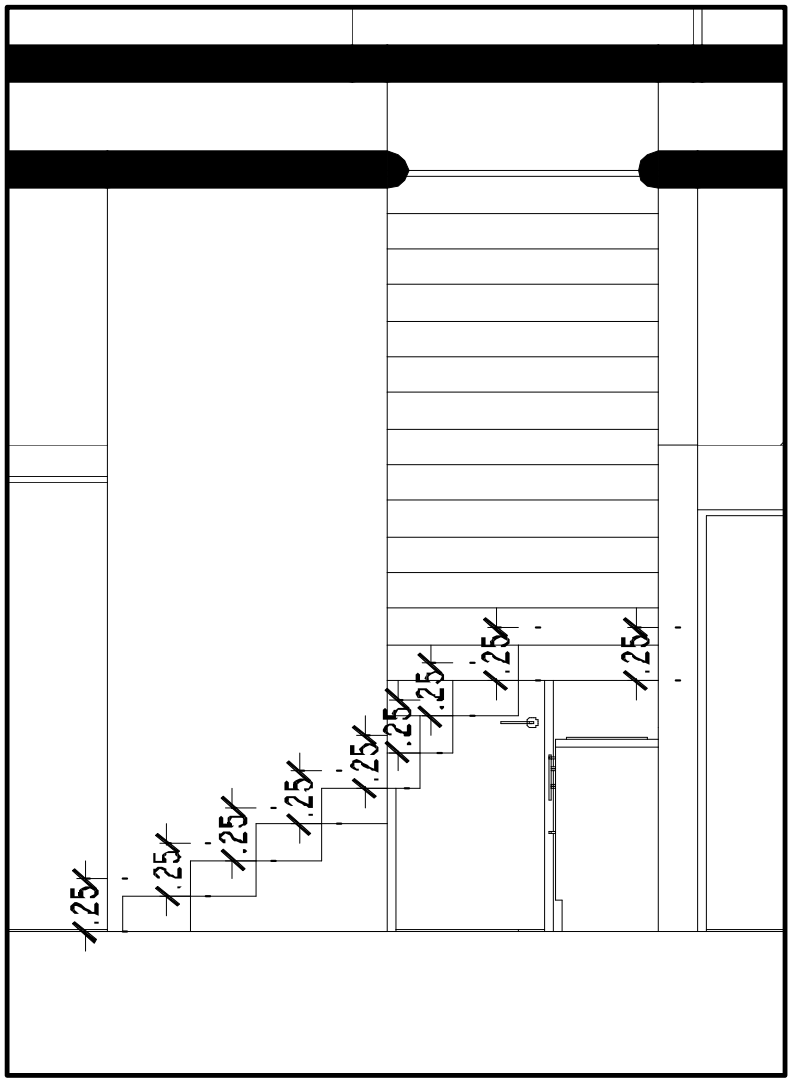

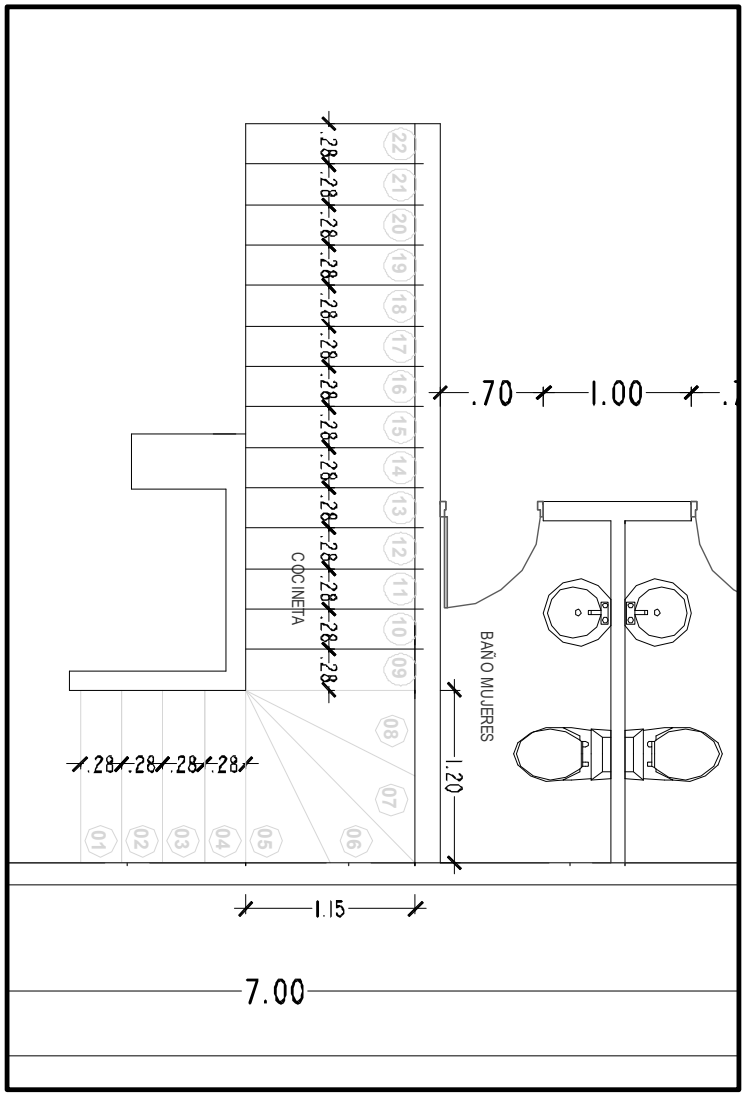


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
16.10	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SOHO O SIMILAR COLOR BEIGE DE ALTURA 0.08 MTS INCLUYE REMATE PULIDO	ML	71.05

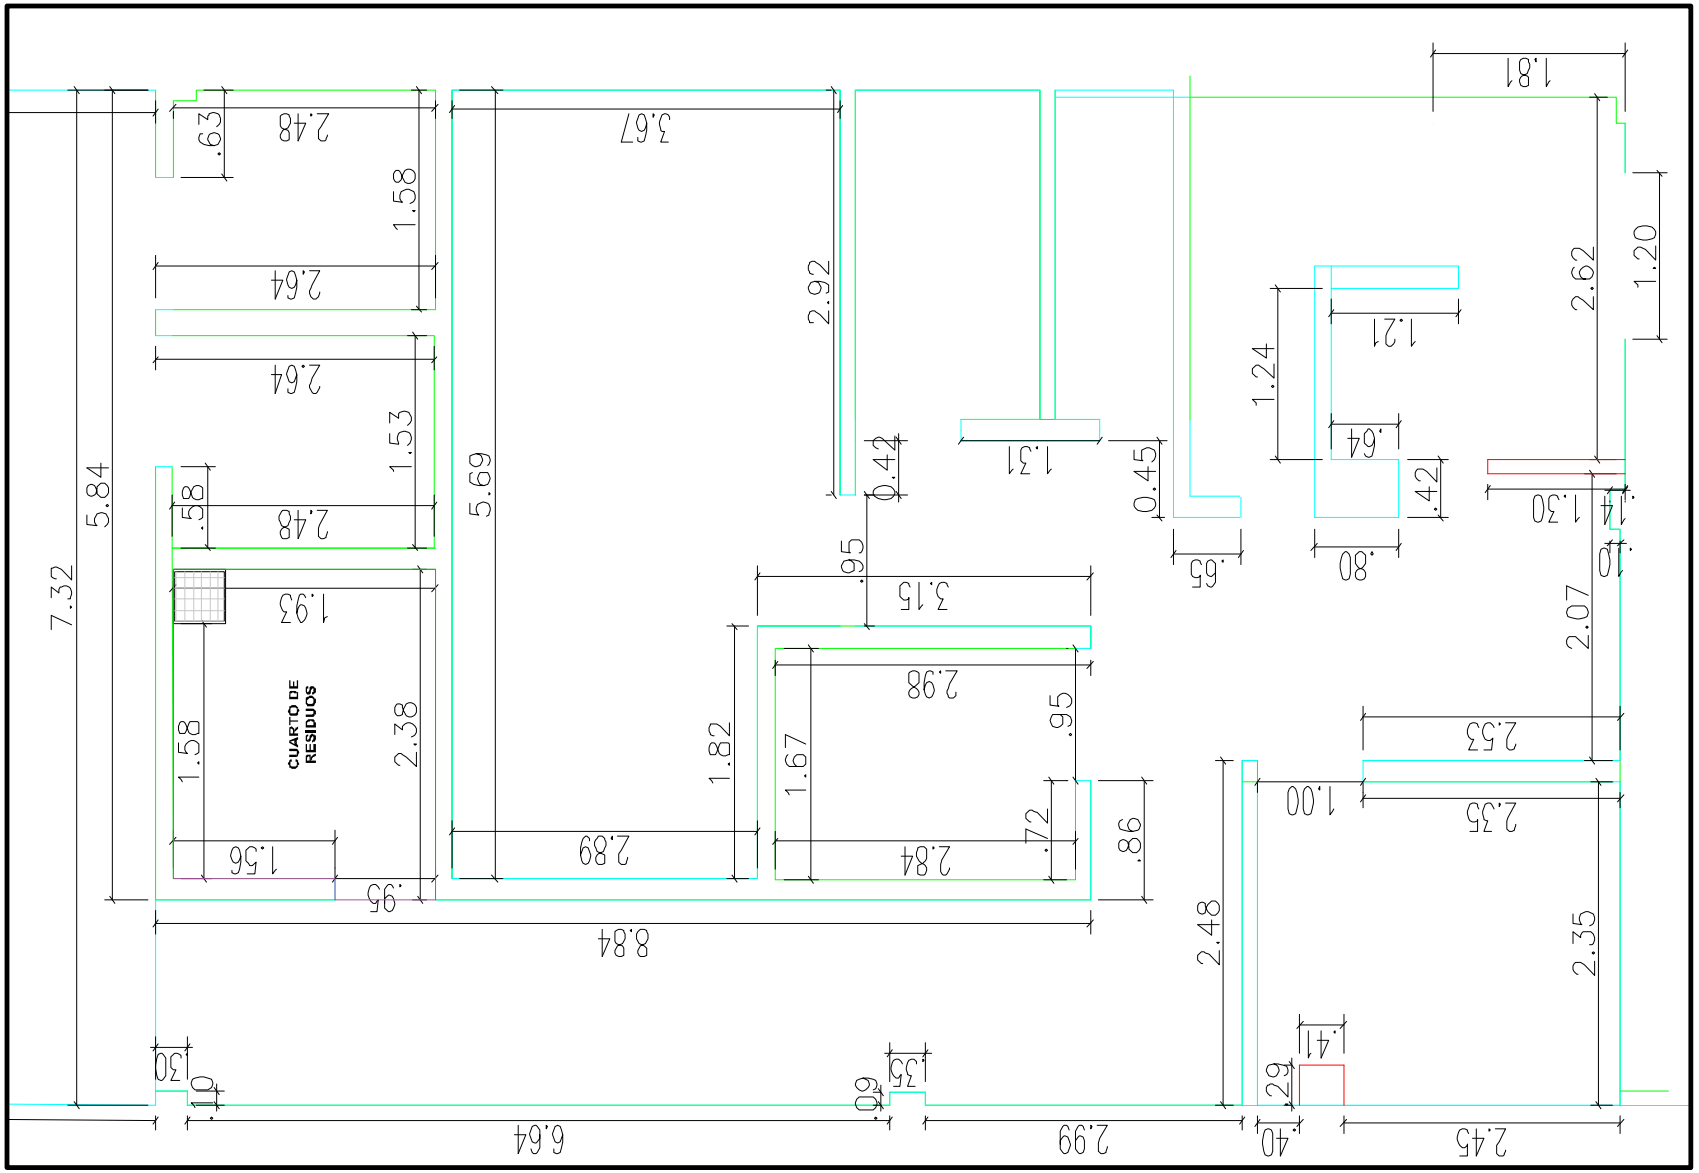

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
16.10	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SOHO O SIMILAR COLOR BEIGE DE ALTURA 0.08 MTS INCLUYE REMATE PULIDO	ML	71.05

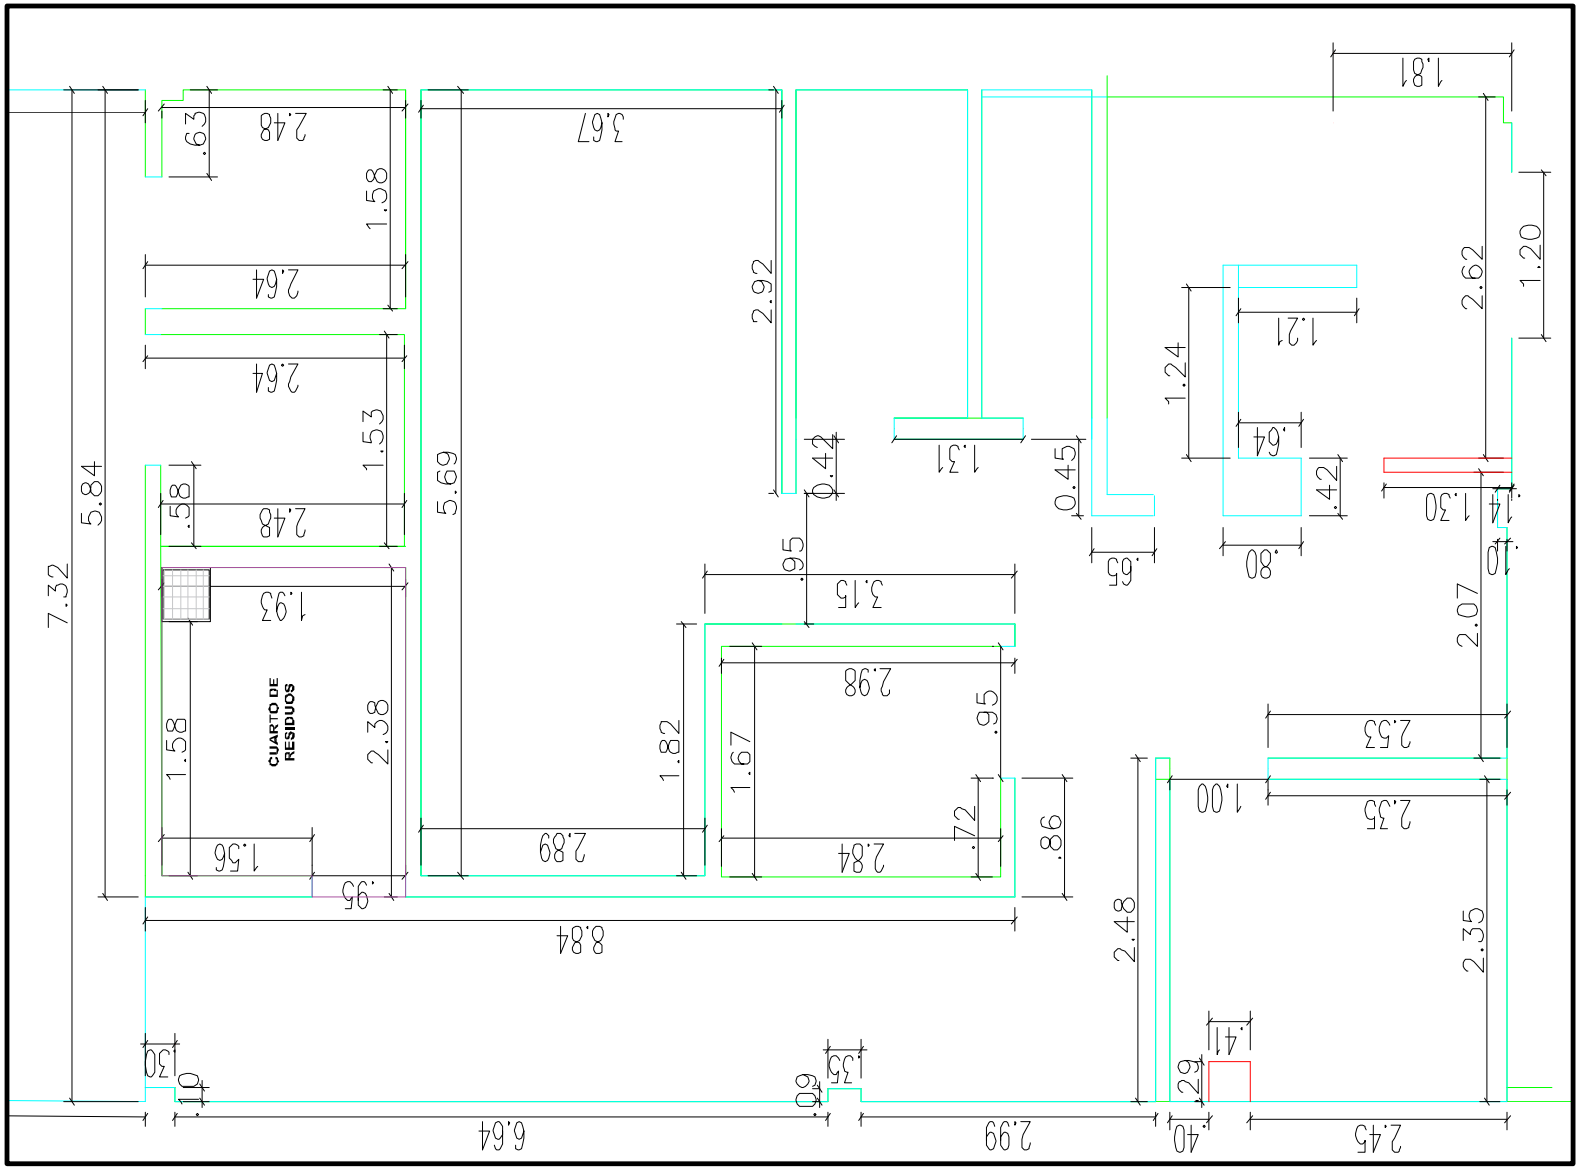

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
16.10	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SOHO O SIMILAR COLOR BEIGE DE ALTURA 0.08 MTS INCLUYE REMATE PULIDO	ML	71.05



















OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
16.11	Enchape para baños 0.30 x 0.30 color blanco liso (Incluye boquilla)	m²	11.57

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
BAÑO PMR	---	---	---	4.28	m²	4.28	
BAÑO MIXTO	---	---	---	2.82	m²	2.82	
BAÑO HOMBRES				2.23	m²	2.23	
BAÑO MUJERES				2.24	m²	2.24	
					Subtotal	11.57	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	11.57	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
16.11	Enchape para baños 0.30 x 0.30 color blanco liso (Incluye boquilla)	m²	11.57

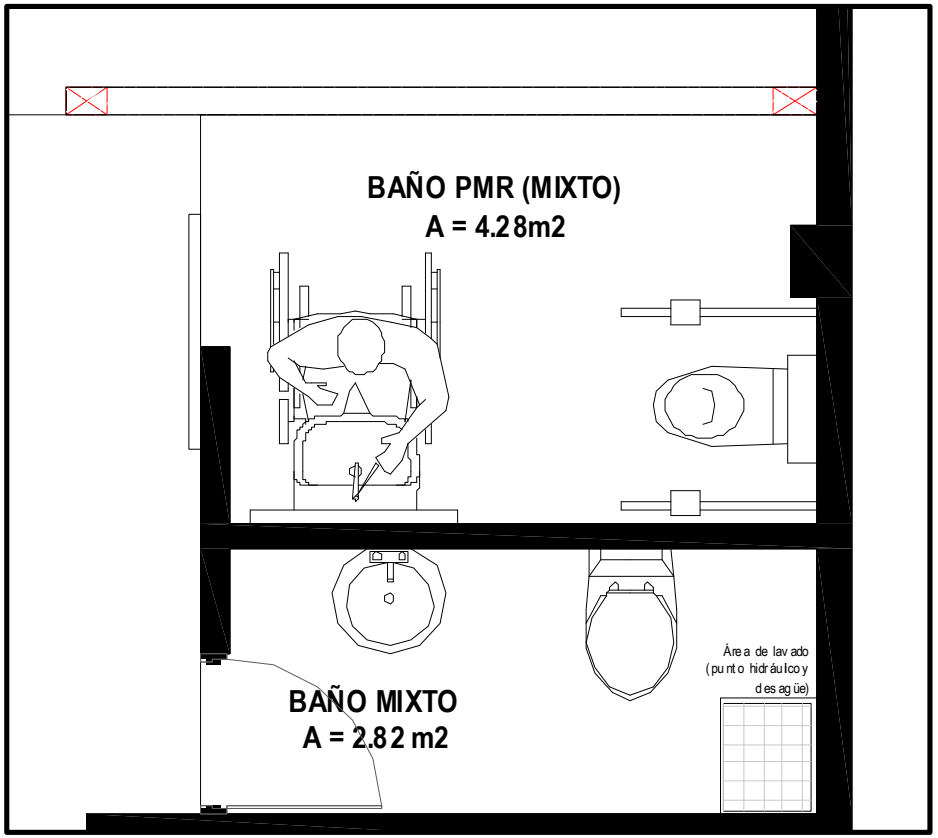

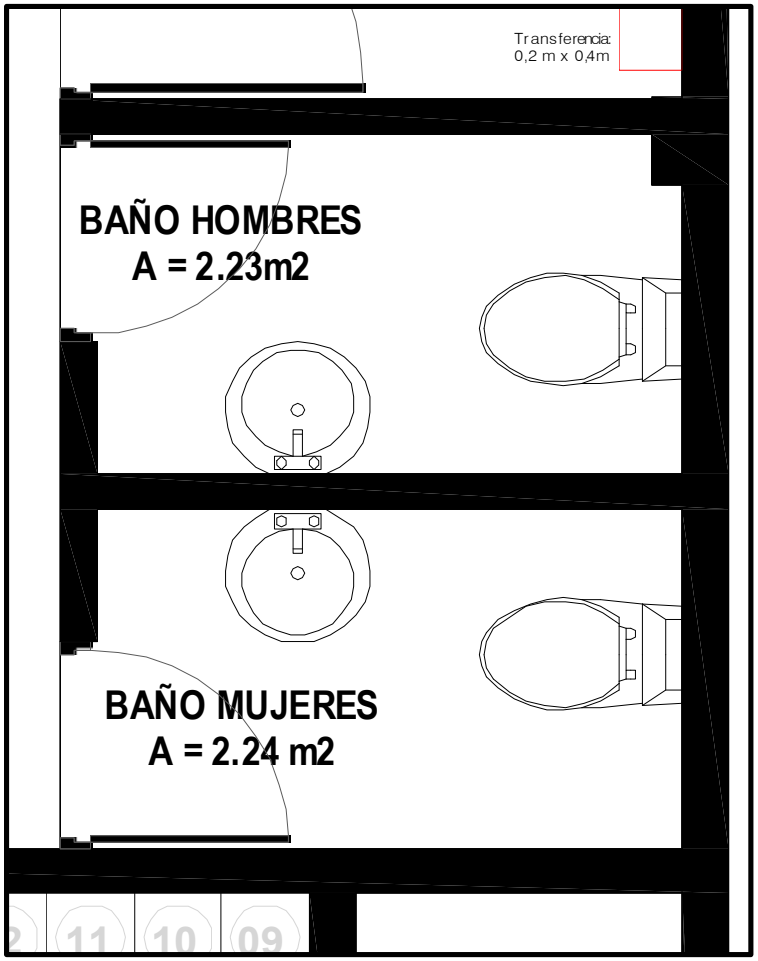

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad total**
16.11	Enchape para baños 0.30 x 0.30 color blanco liso (Incluye boquilla)	m²	11.57









OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
16.12	Paredes con enchape cerámico tipo vela o similar color blanco 0.24 x 0.40 hasta altura de 1.20mts. Sobre esta altura y hasta el cieloraso paredes pañetadas y estucadas. Pintura vinilo blanco	m²	34.27

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
BAÑO PMR	2.50	---	1.20	2.00	m²	6.00	
		1.76	1.20	2.00	m²	4.22	
	0.10	---	1.20	2.00	m²	0.24	
BAÑOMIXTO	2.47	---	1.20	2.00	m²	5.93	
		1.15	1.20	2.00	m²	2.76	
BAÑO HOMBRES	2.00		1.20	2.00	m²	4.80	
		1.15	1.20	2.00	m²	2.76	
BAÑO MUJERES	2.00		1.20	2.00	m²	4.80	
		1.15	1.20	2.00	m²	2.76	
					Subtotal	34.27	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	34.27	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
16.12	Paredes con enchape cerámico tipo vela o similar color blanco 0.24 x 0.40 hasta altura de 1.20mts. Sobre esta altura y hasta el cieloraso paredes pañetadas y estucadas. Pintura vinilo blanco	m²	34.27

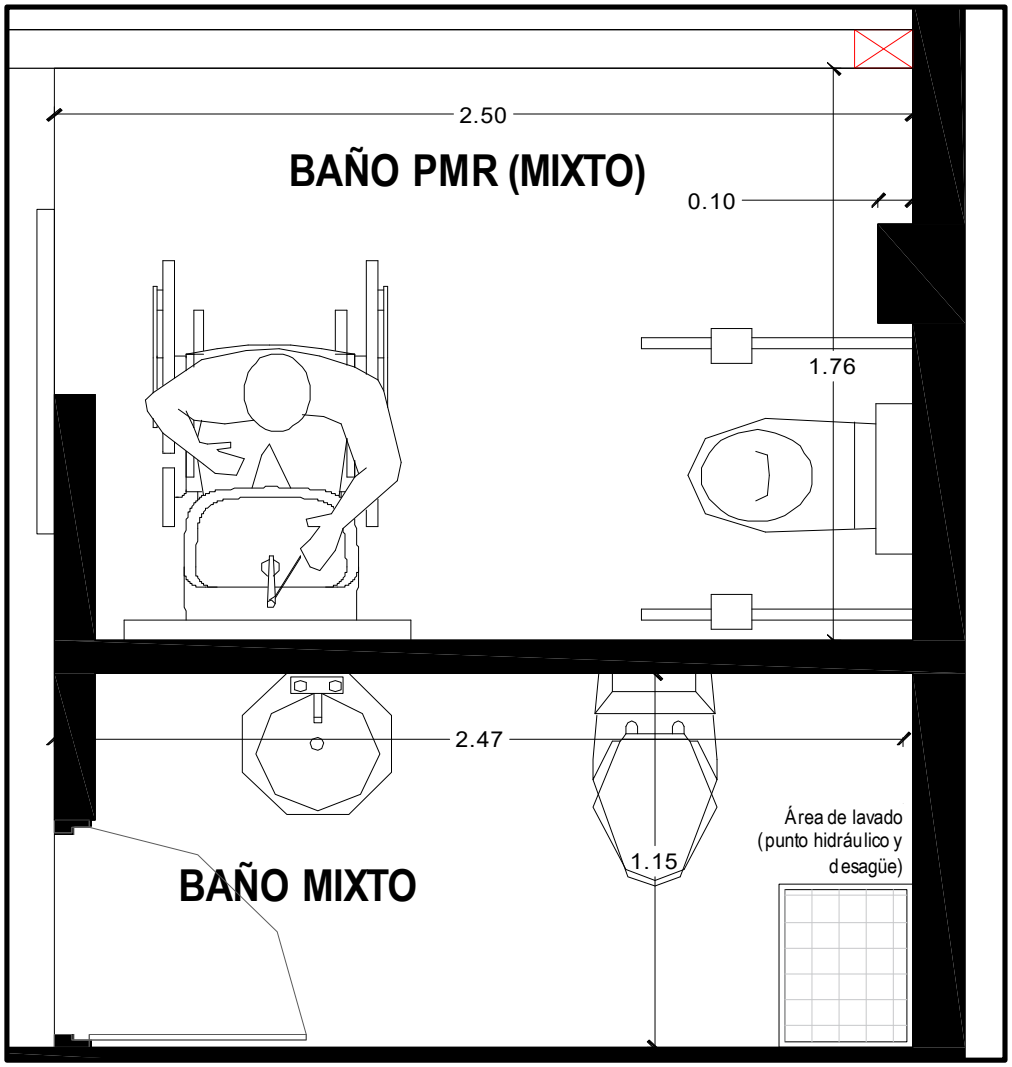

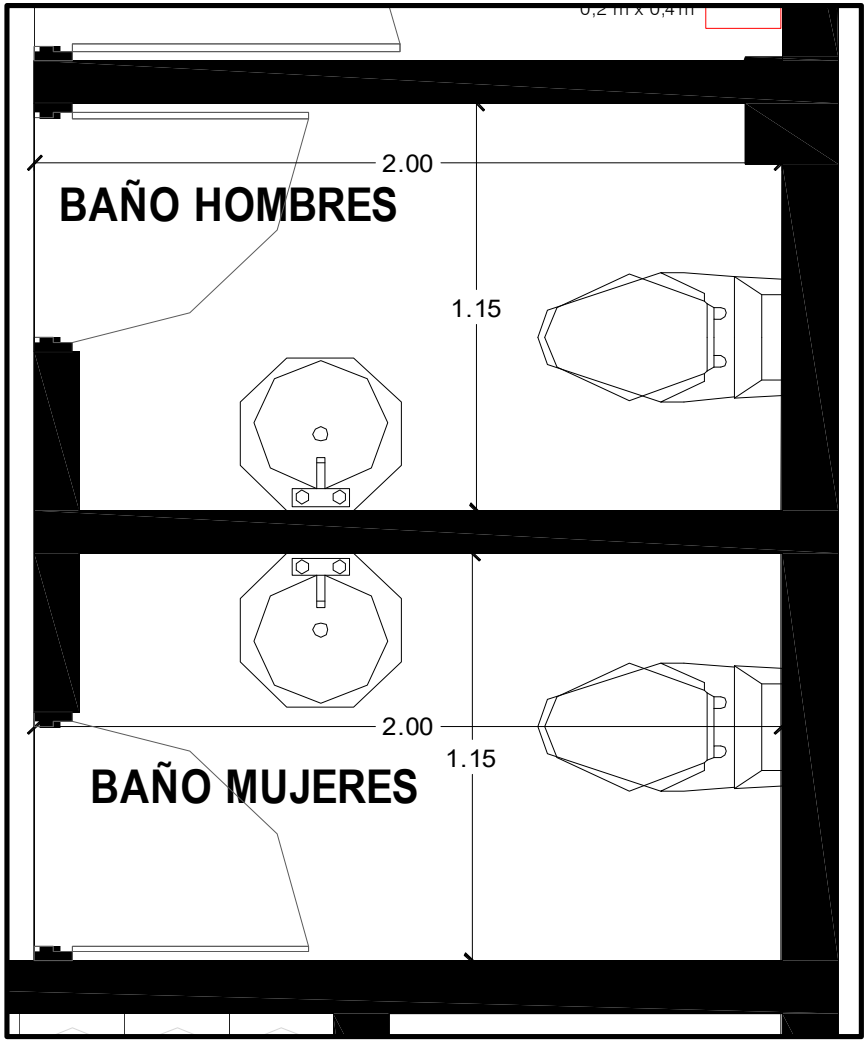

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad total**
16.12	Paredes con enchape cerámico tipo vela o similar color blanco 0.24 x 0.40 hasta altura de 1.20mts. Sobre esta altura y hasta el cieloraso paredes pañetadas y estucadas. Pintura vinilo blanco	m²	34.27










OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
16.13	Enchape para cocina 0.3 x 0.3 color blanco liso (Incluye boquilla)	m²	11.38

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			ÁREA	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
Área de piso	1.15	2.84	---	3.36	m²	3.36	
MUROS		1.64	1.69	2.76	m²	2.76	
		1.64	1.69	2.76	m²	2.76	
		1.20	0.90	1.08	m²	1.08	
		1.20	0.60	0.72	m²	0.72	
		1.15	0.60	0.69	m²	0.69	
					Subtotal	11.38	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	11.38	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
16.13	Enchape para cocina 0.3 x 0.3 color blanco liso (Incluye boquilla)	m²	11.38

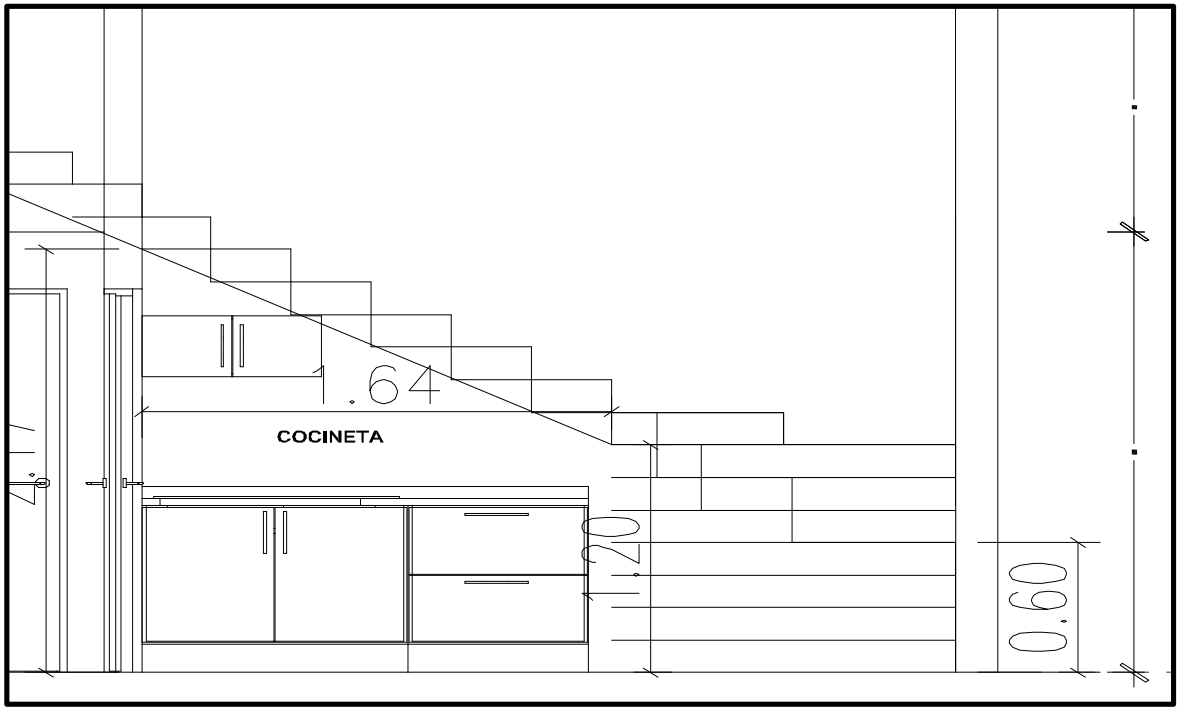

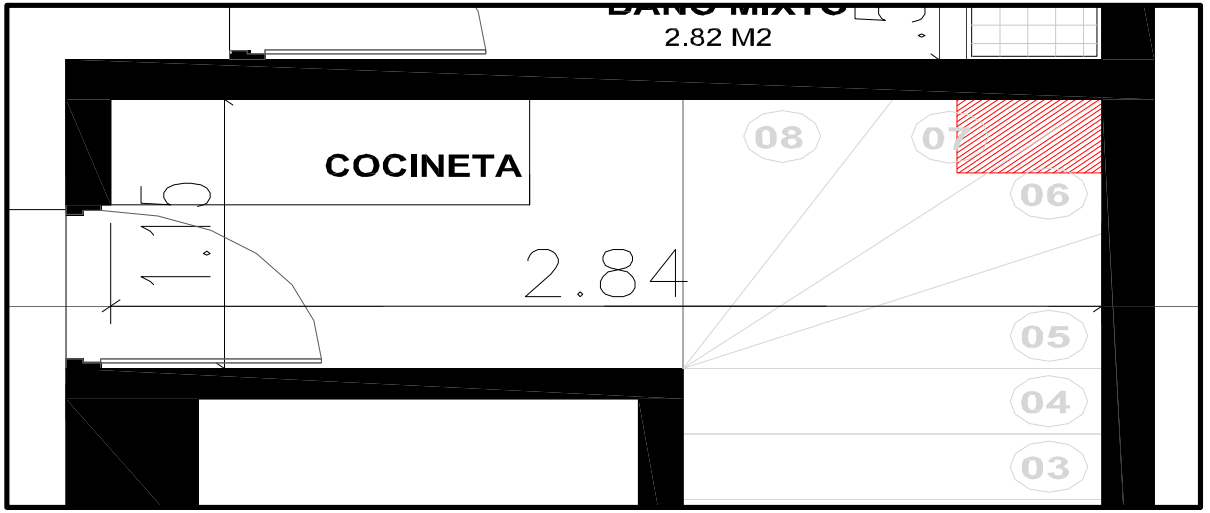

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad total**
16.13	Enchape para cocina 0.3 x 0.3 color blanco liso (Incluye boquilla)	m²	11.38















OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
16.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE COCINA CON MESÓN EN GRANITO Y GABINETE INFERIOR (INCLUYE LAVAPLATOS) (1.20x0.45x0.70)	UND	1.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
COCINETA				1.00	un	1.00	
					Subtotal	1.00	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	1.00	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
16.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE COCINA CON MESÓN EN GRANITO Y GABINETE INFERIOR (INCLUYE LAVAPLATOS) (1.20x0.45x0.70)	UND	1.00

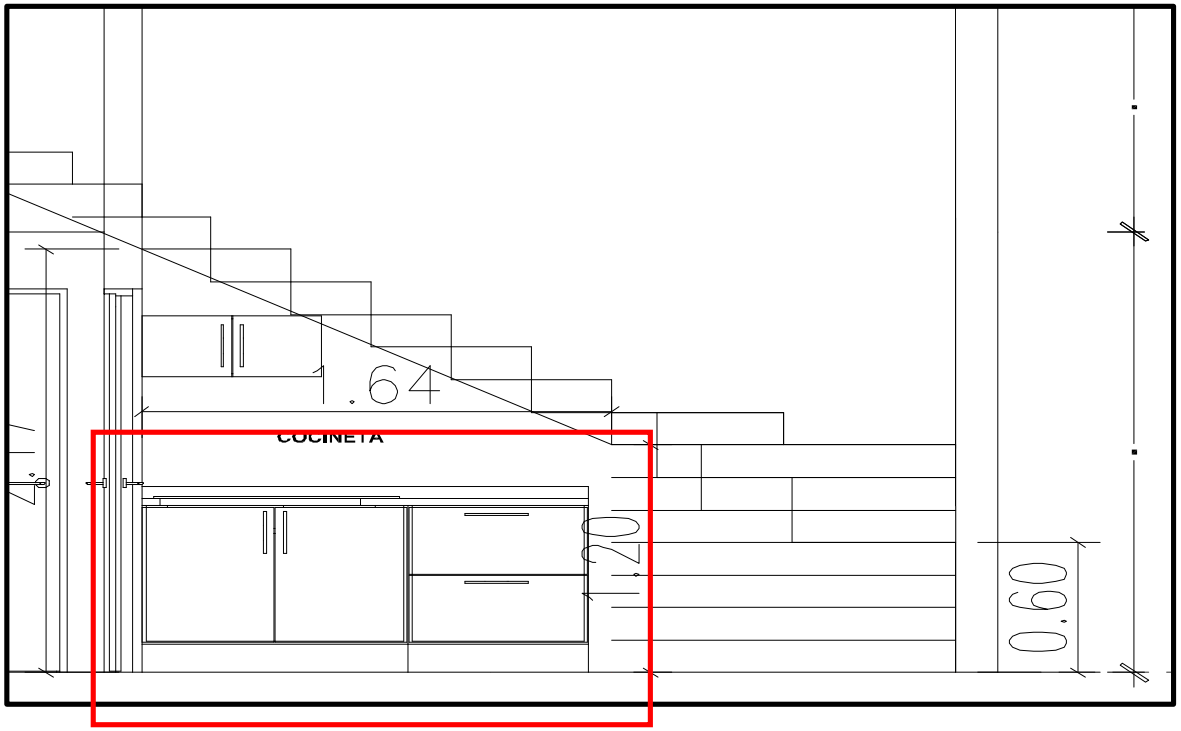

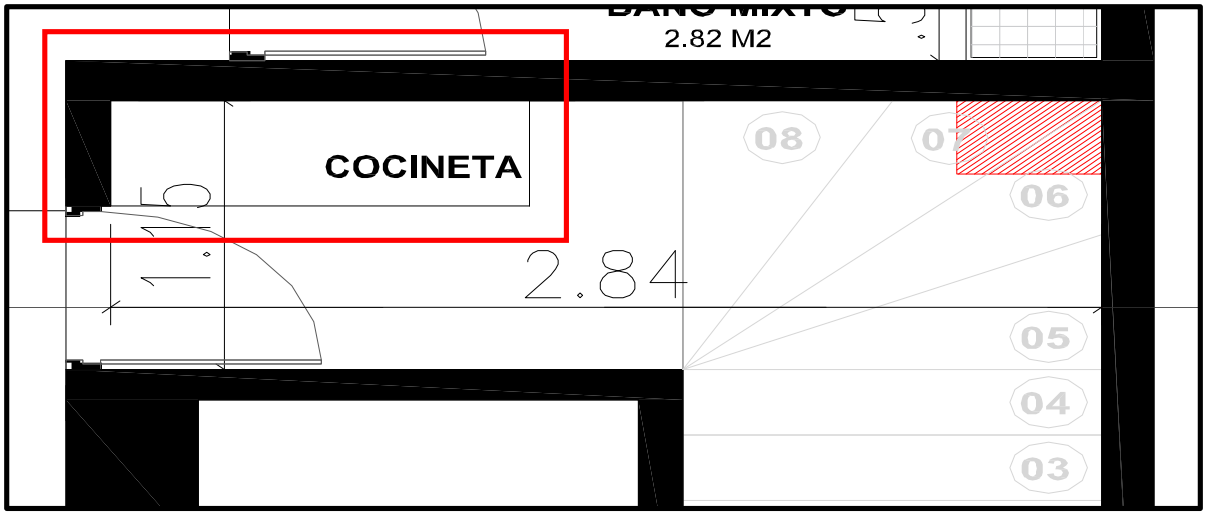

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
16.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE DE COCINA CON MESÓN EN GRANITO Y GABINETE INFERIOR (INCLUYE LAVAPLATOS) (1.20x0.45x0.70)	UND	1.00








OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
16.24	CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA Y FRESCASA	M2	1.71

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
AREA INTERVENCION 2DO PISO	6.80	5.32		1.00	m2	36.18	
	7.15	0.21		1.00	m2	1.50	
	4.31	2.00		1.00	m2	8.62	
	6.89	5.32		1.00	m2	36.65	
	4.89	2.01		1.00	m2	9.83	
	2.40	1.85		1.00	m2	4.44	
	1.15	1.85		1.00	m2	2.13	
	1.15	1.85		1.00	m2	2.13	
					Subtotal	101.48	
					e	99.77	
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**1.71**	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
16.24	CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA Y FRESCASA	M2	1.71

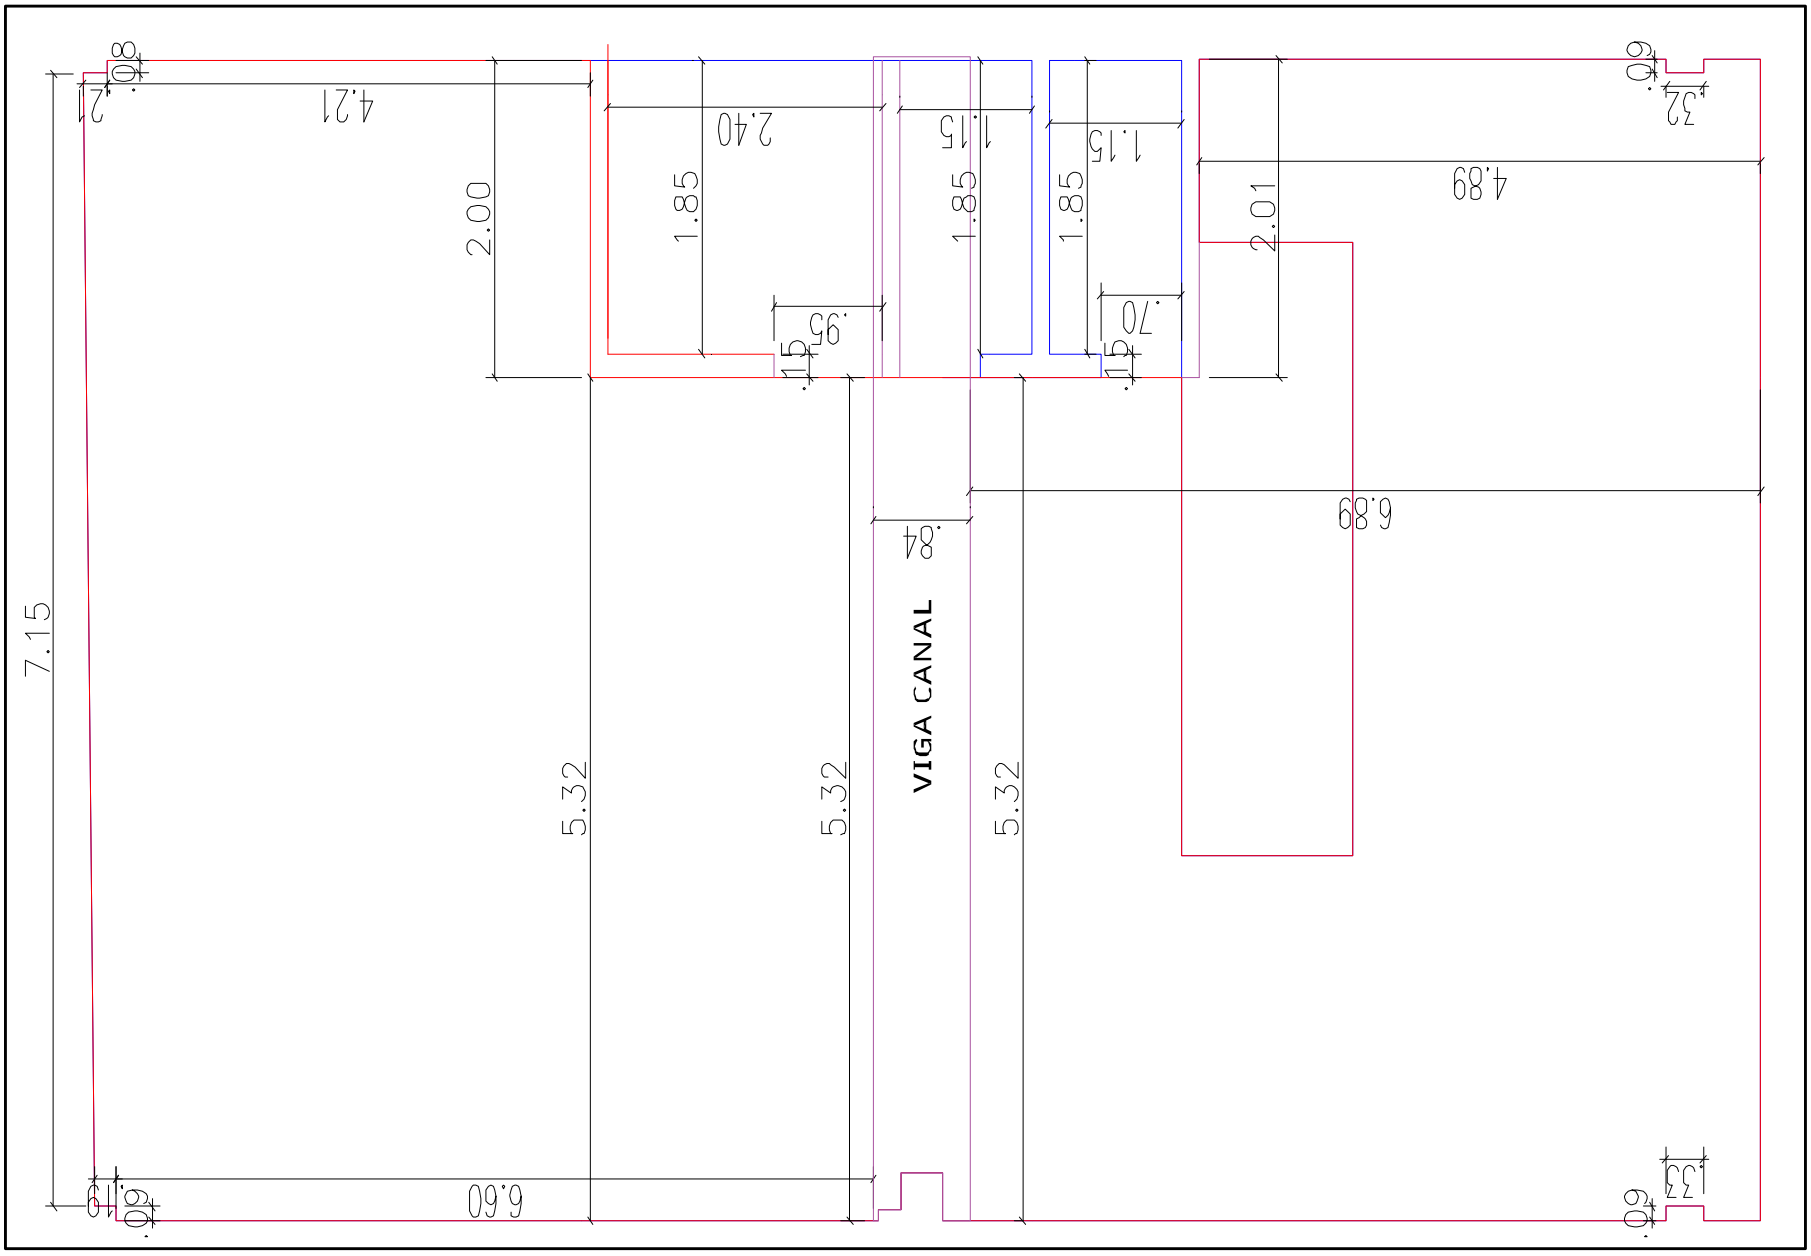

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
16.24	CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA Y FRESCASA	M2	1.71















OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
16.25	CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA	M2	47.91

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
SECADO	2.48	1.58		1.00	m2	3.92	
CORTE	2.48	1.58		1.00	m2	3.92	
CUARTO DE RESIDUOS	2.48	2.23		1.00	m2	5.53	
PASILLO DE CIRCULACIÓN	8.84	1.48		1.00	m2	13.08	
	3.48	1.50		1.00	m2	5.22	
	3.01	1.37		1.00	m2	4.12	
	0.93	0.72		1.00	m2	0.67	
TAPA PASILLO DE CIRCULACION	1.38		1.00	1.00	m2	1.38	
AREA DISPOSICION DE EVIDENCIAS	2.89	1.82		1.00	m2	5.26	
	3.67	3.87		1.00	m2	14.20	
LOCKERS	2.84	1.67		1.00	m2	4.74	
BAÑO PMR	2.38	1.74		1.00	m2	4.14	
BAÑO MIXTO	2.38	1.12		1.00	m2	2.67	
RECEPCIÓN	4.05	1.94		1.00	m2	7.86	
	1.24	1.21		1.00	m2	1.50	
	2.59	2.15		1.00	m2	5.57	
	2.30	0.42		1.00	m2	0.97	
SALA DE ENCUENTRO	3.52	2.33		1.00	m2	8.20	
TAPA ESCALERA	1.20		0.15	1.00	m2	0.18	
COCINETA	2.84	1.15		1.00	m2	3.27	
ZONA ESCALERAS	1.70	1.20		1.00	m2	2.04	
					e	98.44	
					COBRADO EN ACTAS	50.53	
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**47.91**	

OBSERVACIONES:	


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
16.25	CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA	M2	47.91

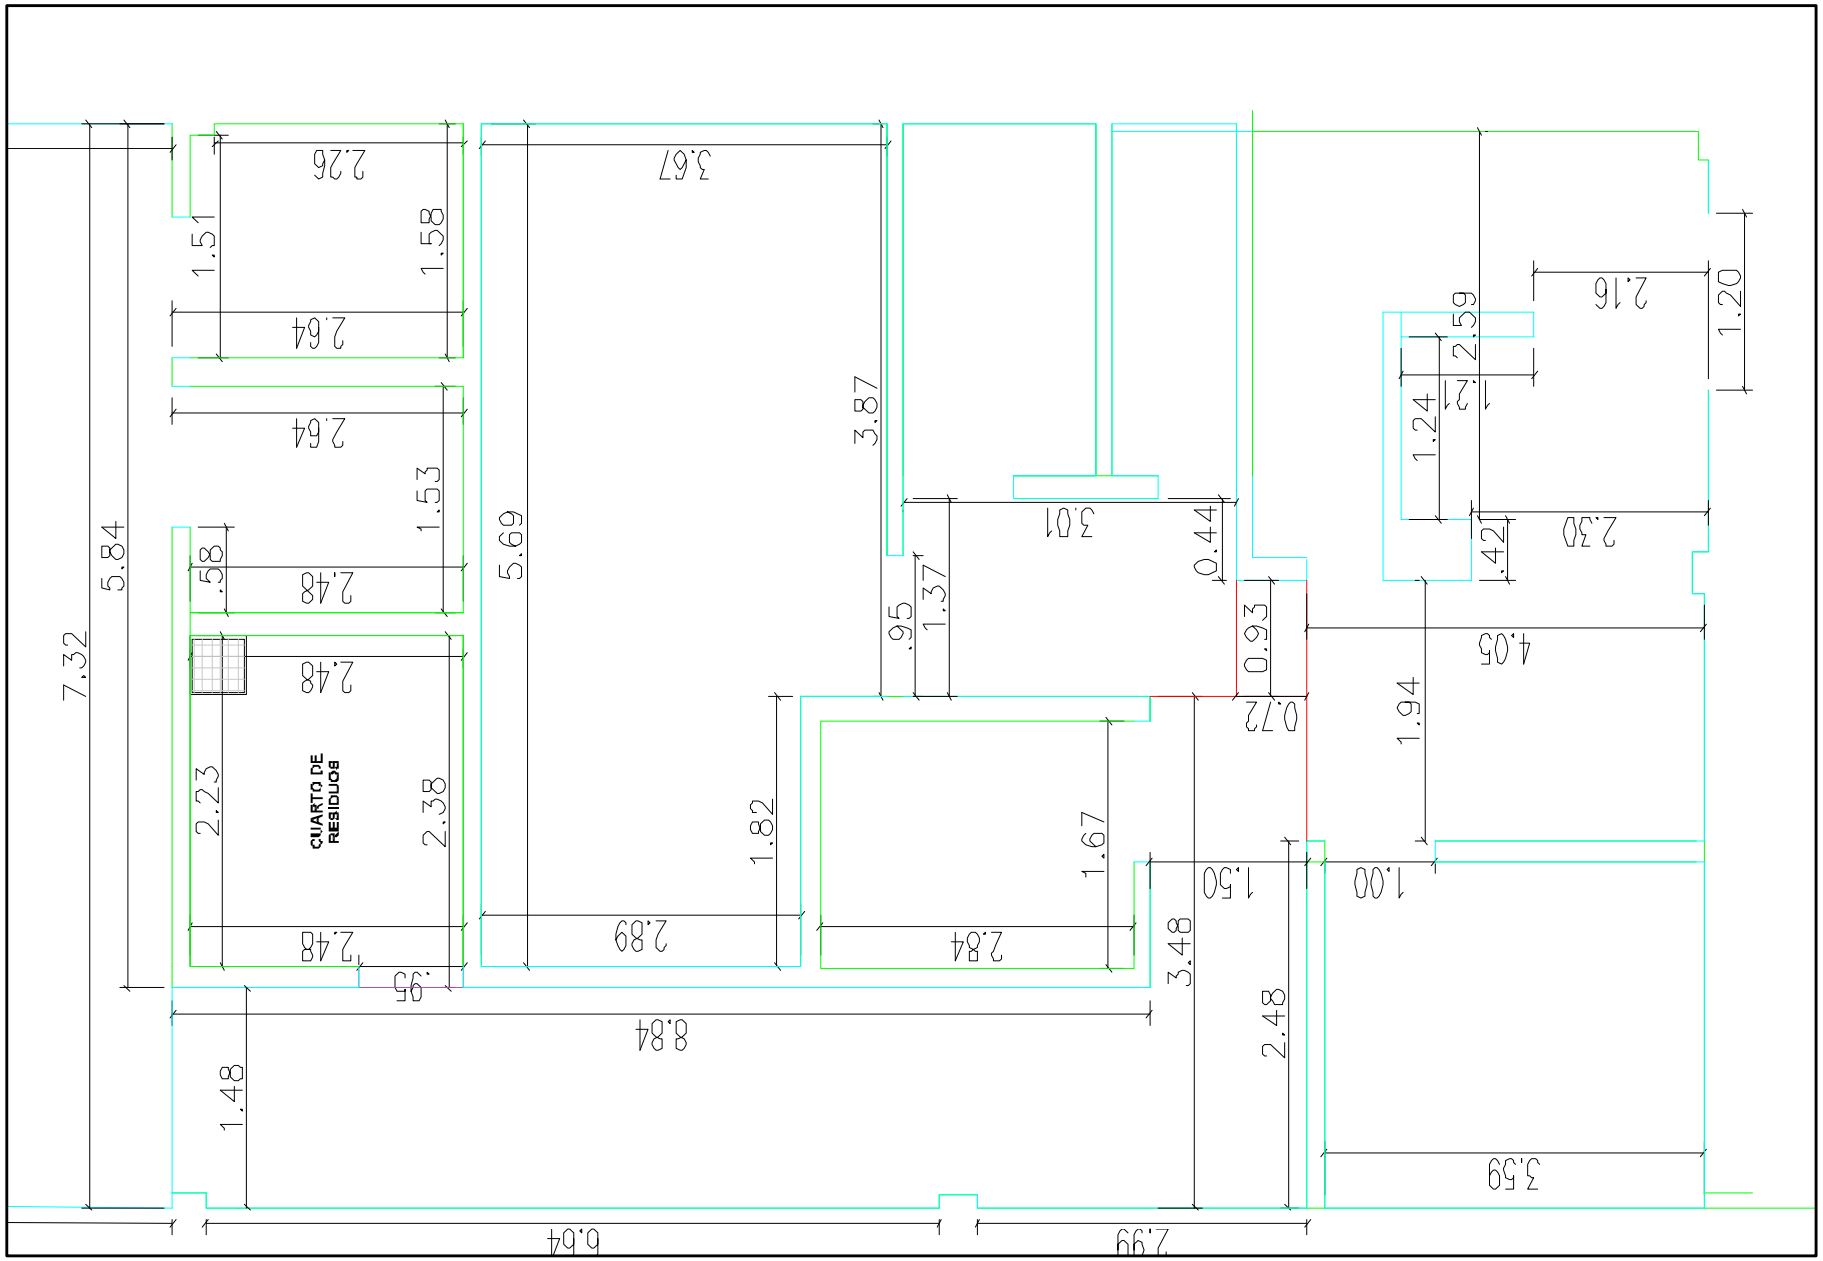

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
16.25	CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA	M2	47.91












OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
16.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETA DE ASEO (INCLUYE LLAVE DE SALIDA Y ENCHAPE)	UND	1.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
CUARTO DE RESIDUOS				1.00	un	1.00	
					Subtotal	1.00	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	1.00	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
16.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETA DE ASEO (INCLUYE LLAVE DE SALIDA Y ENCHAPE)	UND	1.00

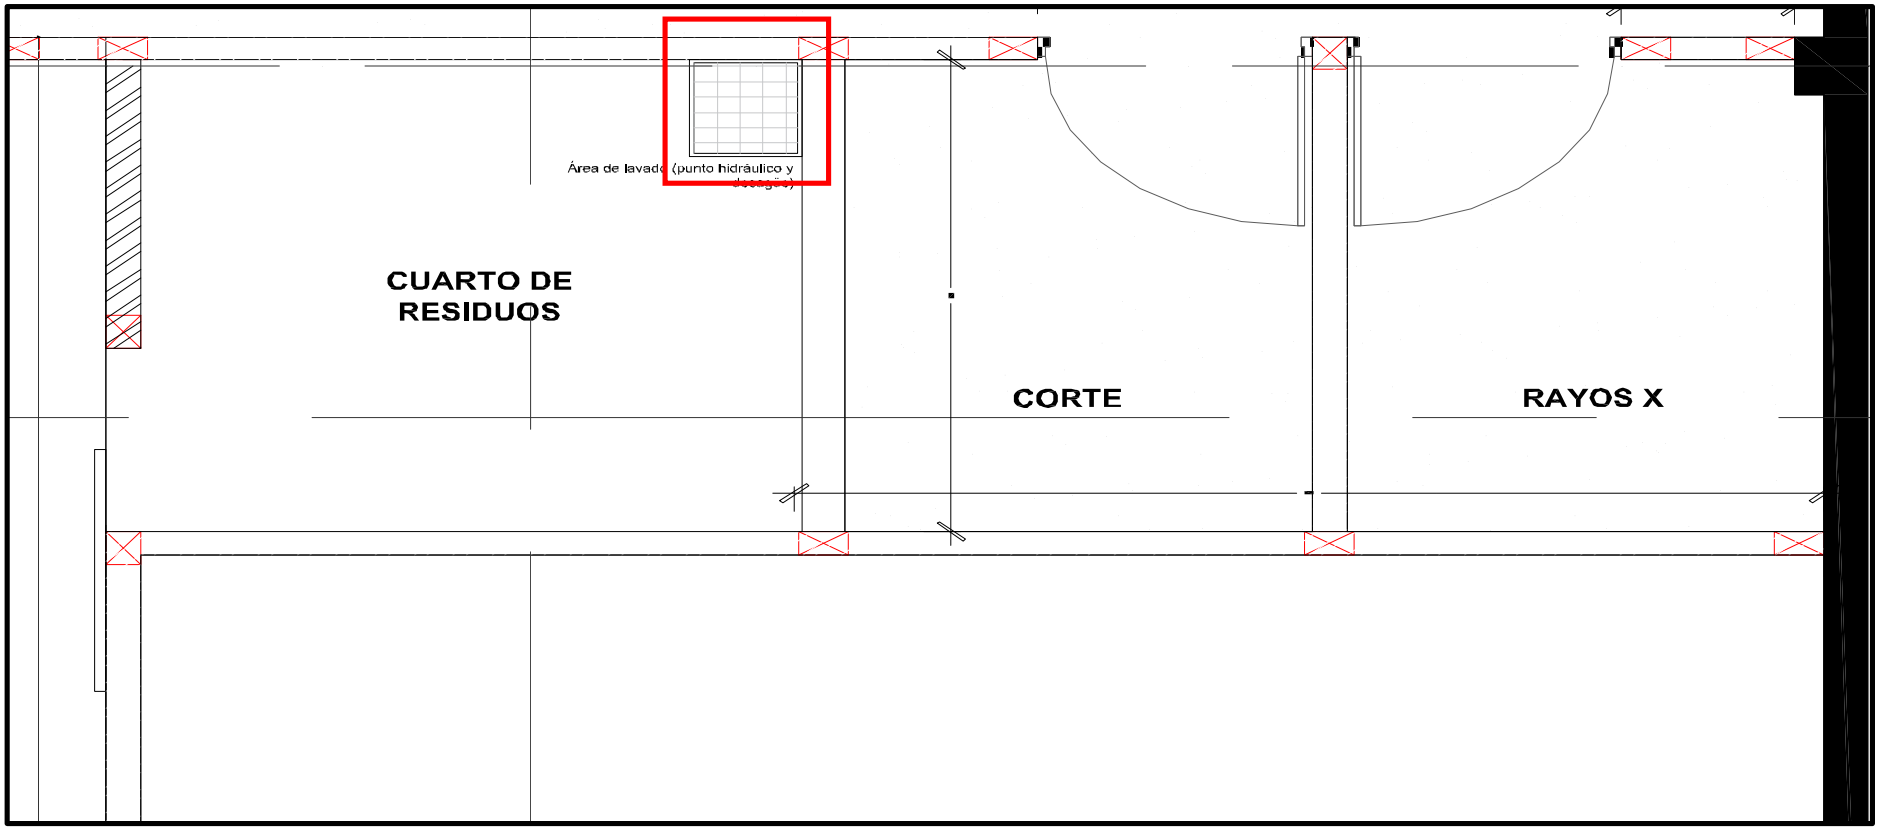

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
16.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETA DE ASEO (INCLUYE LLAVE DE SALIDA Y ENCHAPE)	UND	1.00







OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
16.27	PISO EN MICROCEMENTO GRIS	M2	164.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
ZONA DE ABORDAJE	21.00	7.40		1.00	m2	155.40	
CORTE	1.70	2.53	---	1.00	M2	4.30	
SECADO	1.70	2.53	---	1.00	M2	4.30	
					Subtotal	164.00	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	164.00	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
16.27	PISO EN MICROCEMENTO GRIS	M2	164.00

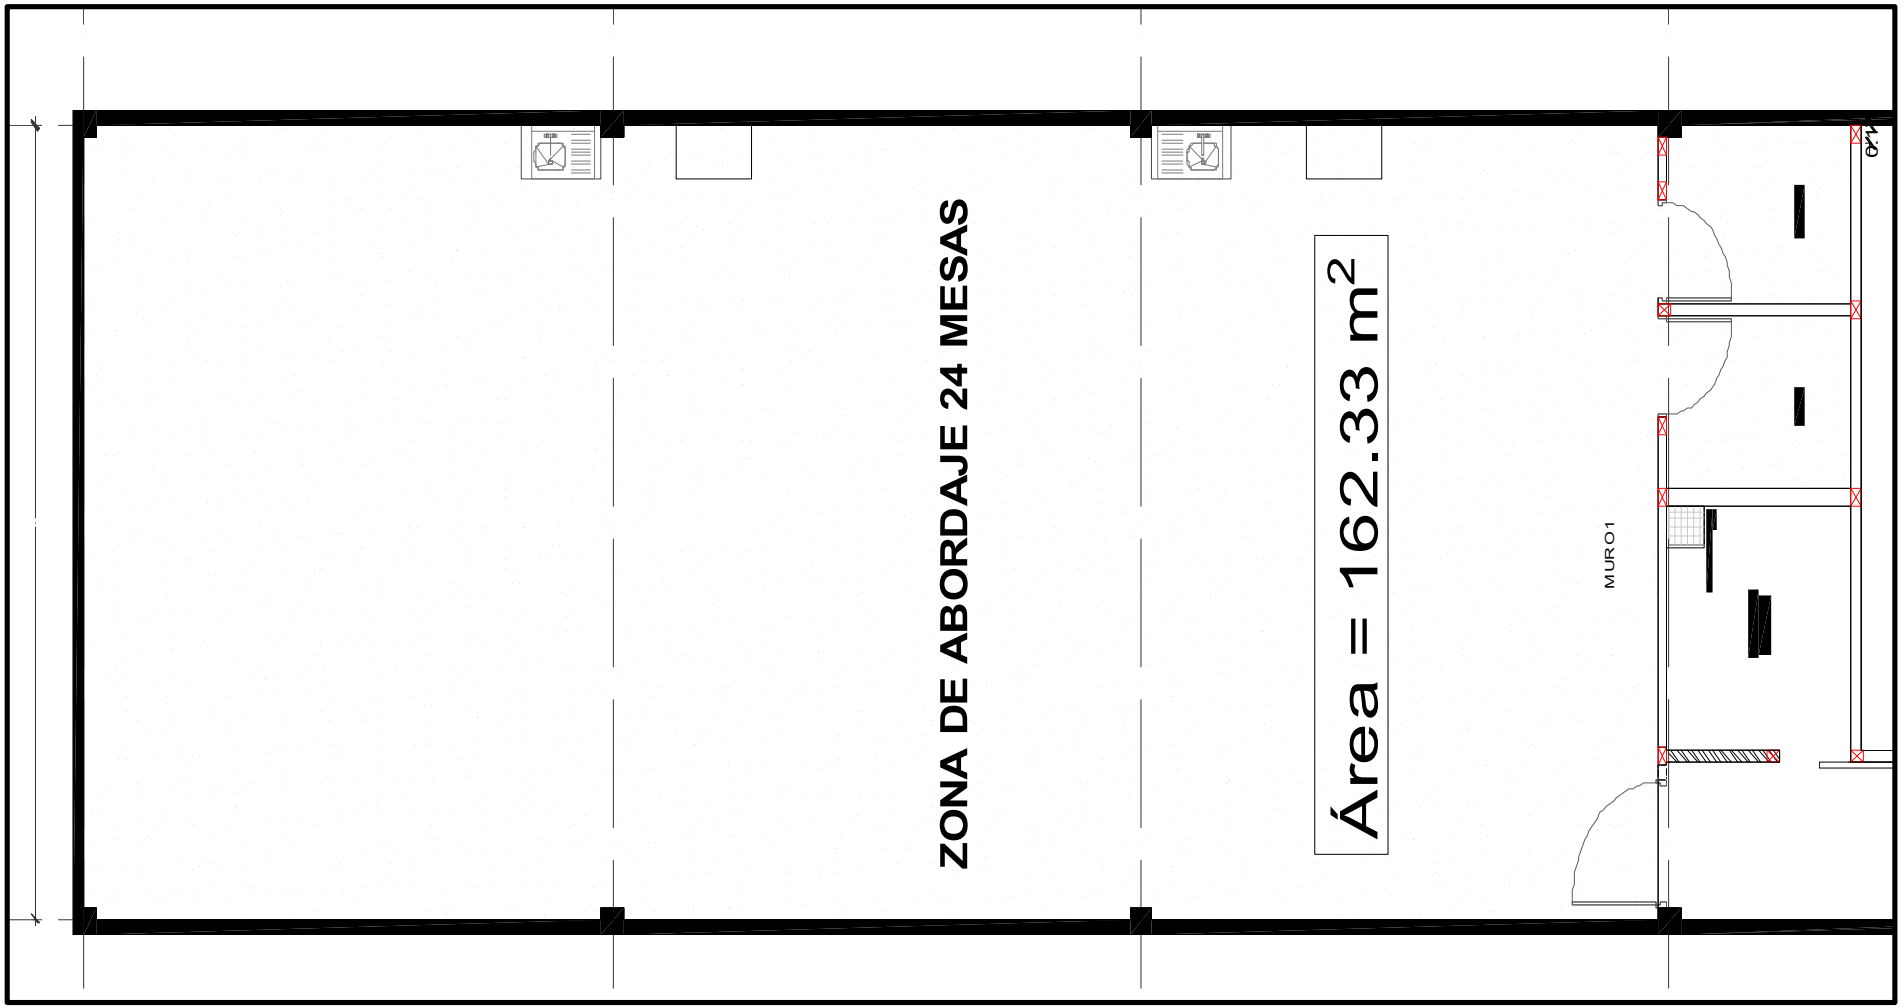

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad total**
16.27	PISO EN MICROCEMENTO GRIS	M2	164.00













OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
17.01	Aseo y Limpieza	m²	383.29

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	AREA				
ZONA DE ABORDAJE CON CORTE Y			164.00	1.00	m2	164.00	
PRIMER PISO			89.59	1.00	m2	89.59	
SEGUNDO PISO			100.10	1.00	m2	100.10	
ENTRADA	4.00	7.40	29.60	1.00	m2	29.60	
					Subtotal	383.29	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	383.29	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
17.01	Aseo y Limpieza	m²	383.29

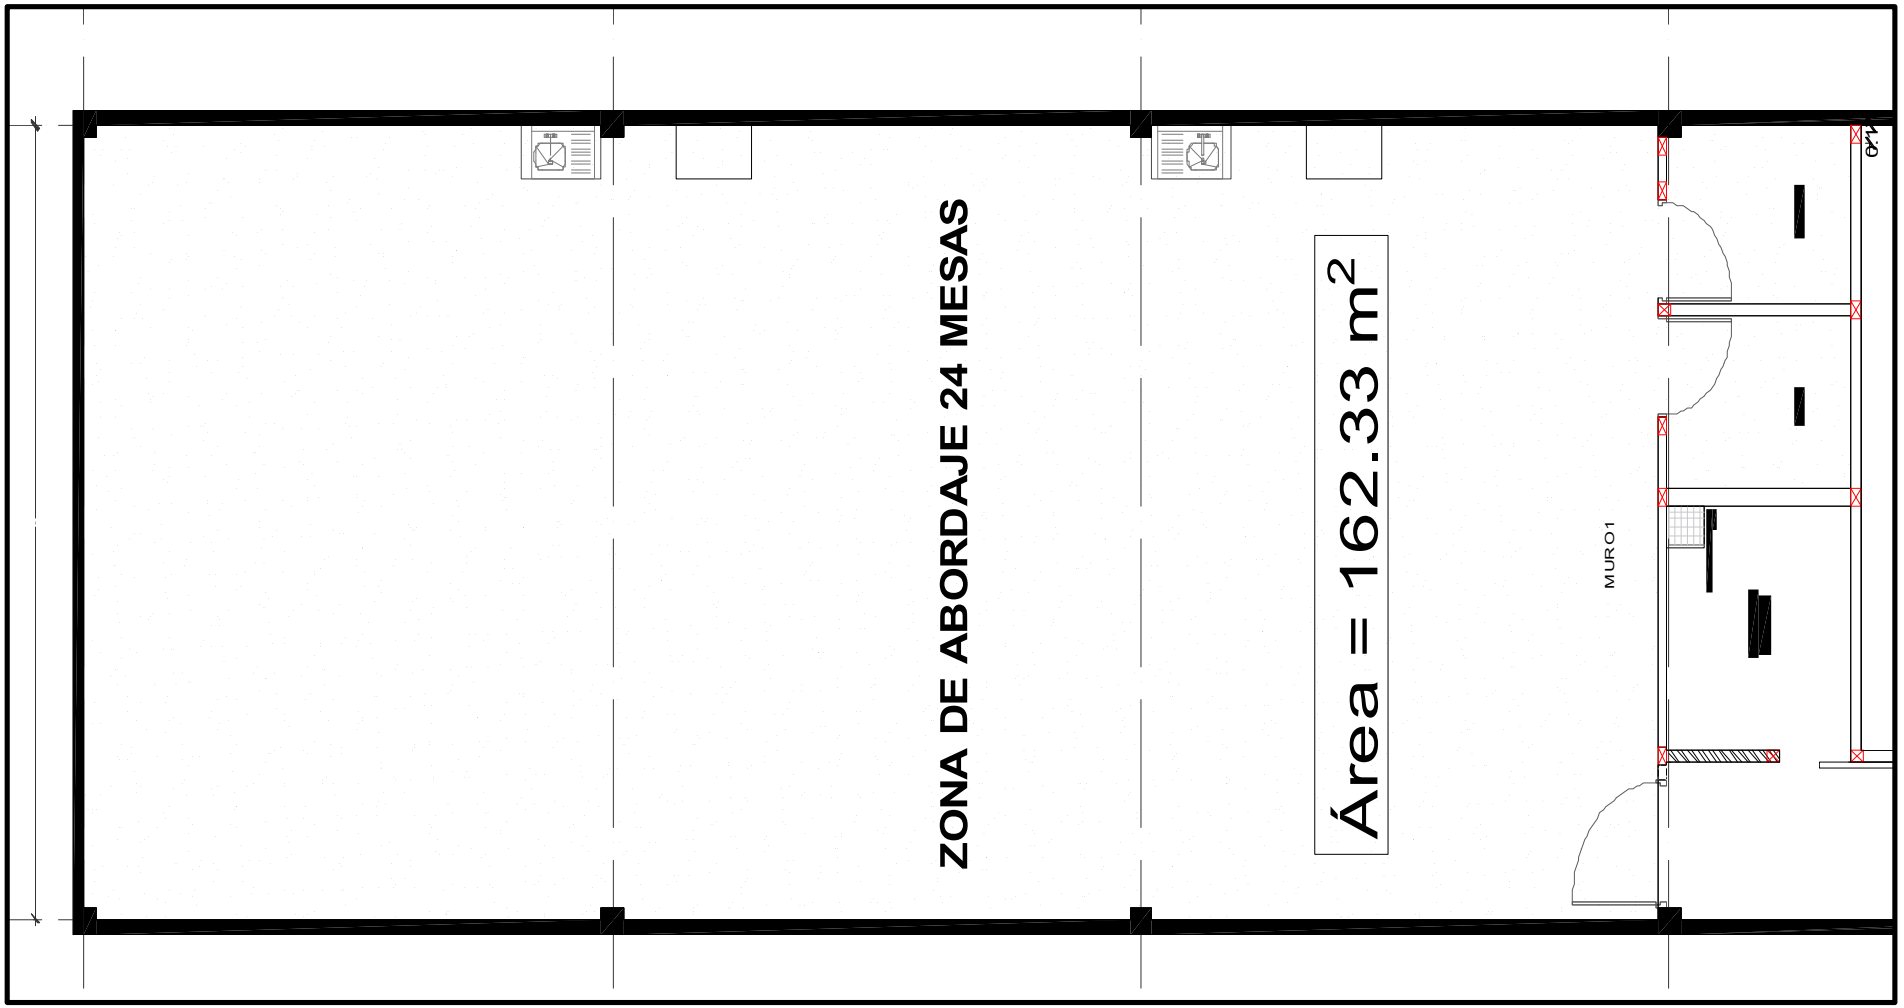


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
17.01	Aseo y Limpieza	m²	383.29

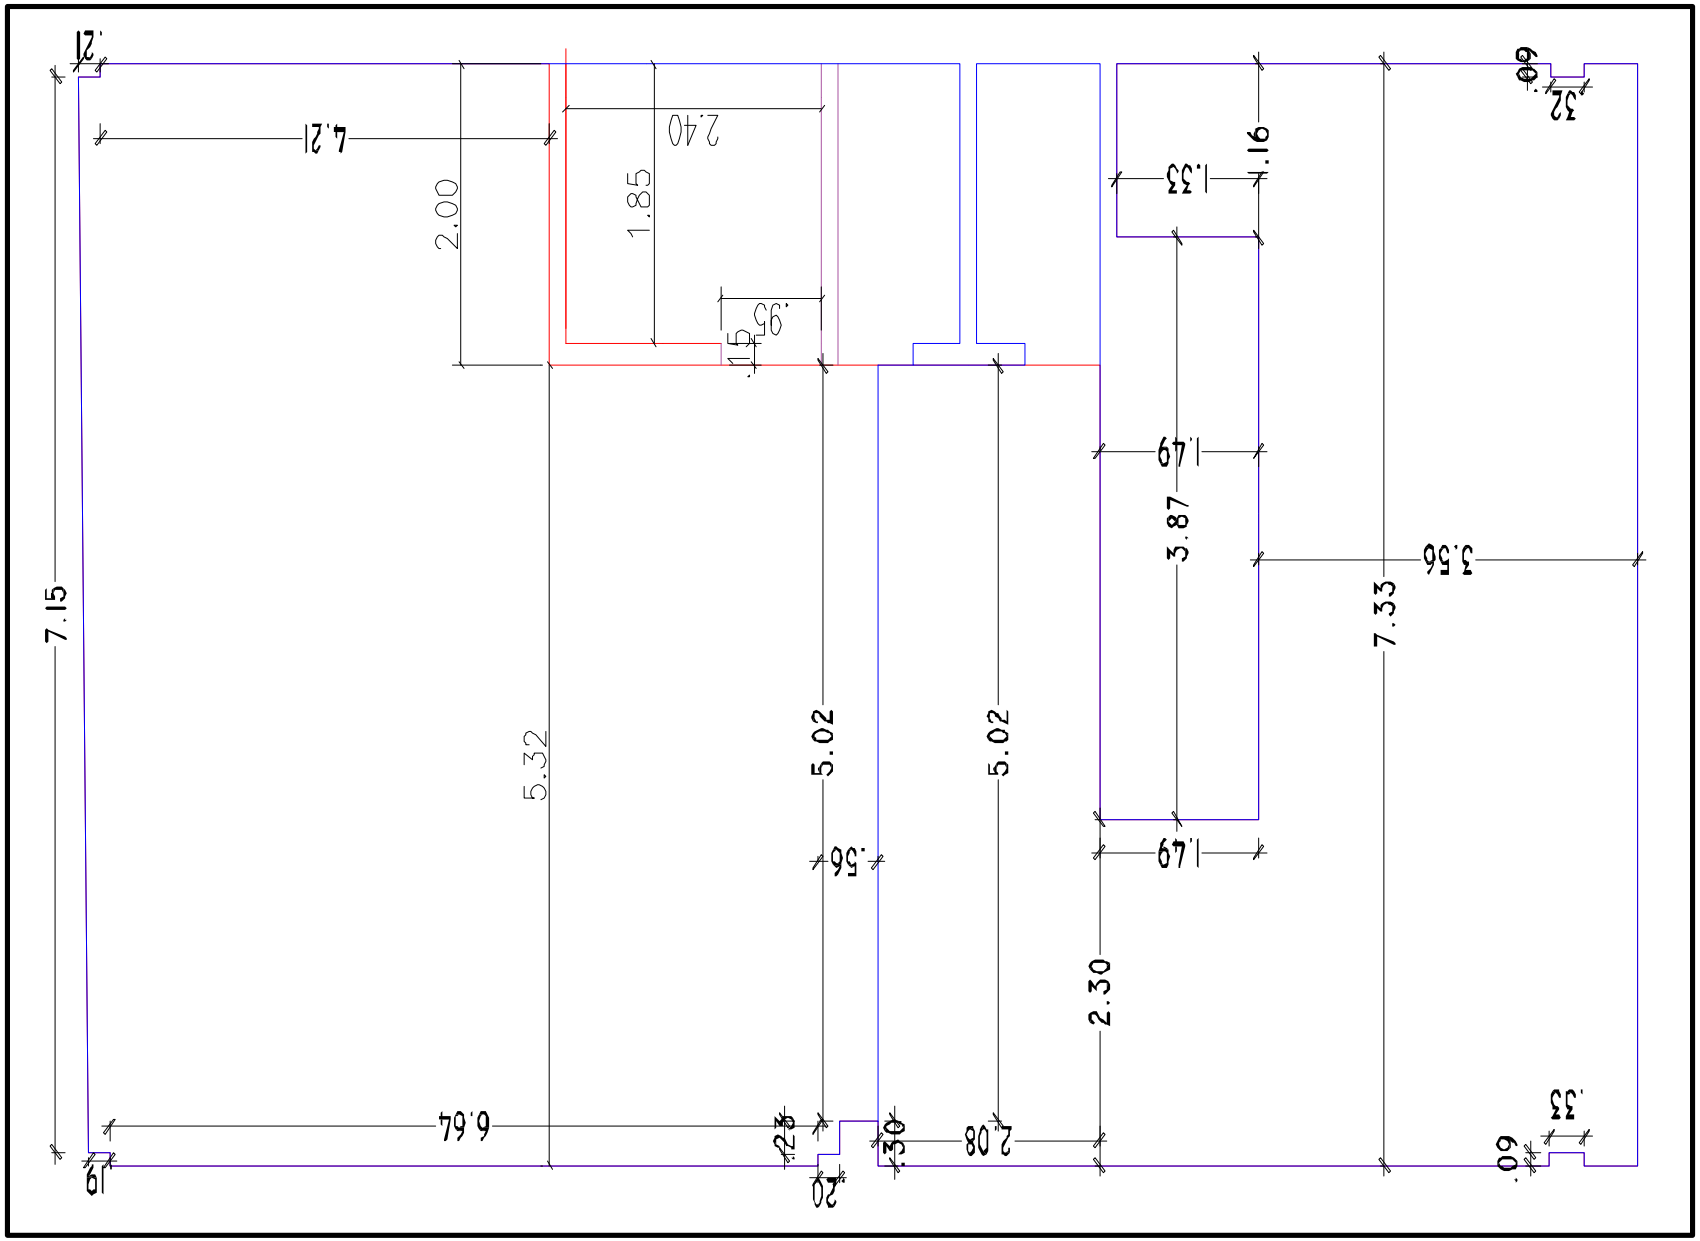

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
17.01	Aseo y Limpieza	m²	383.29

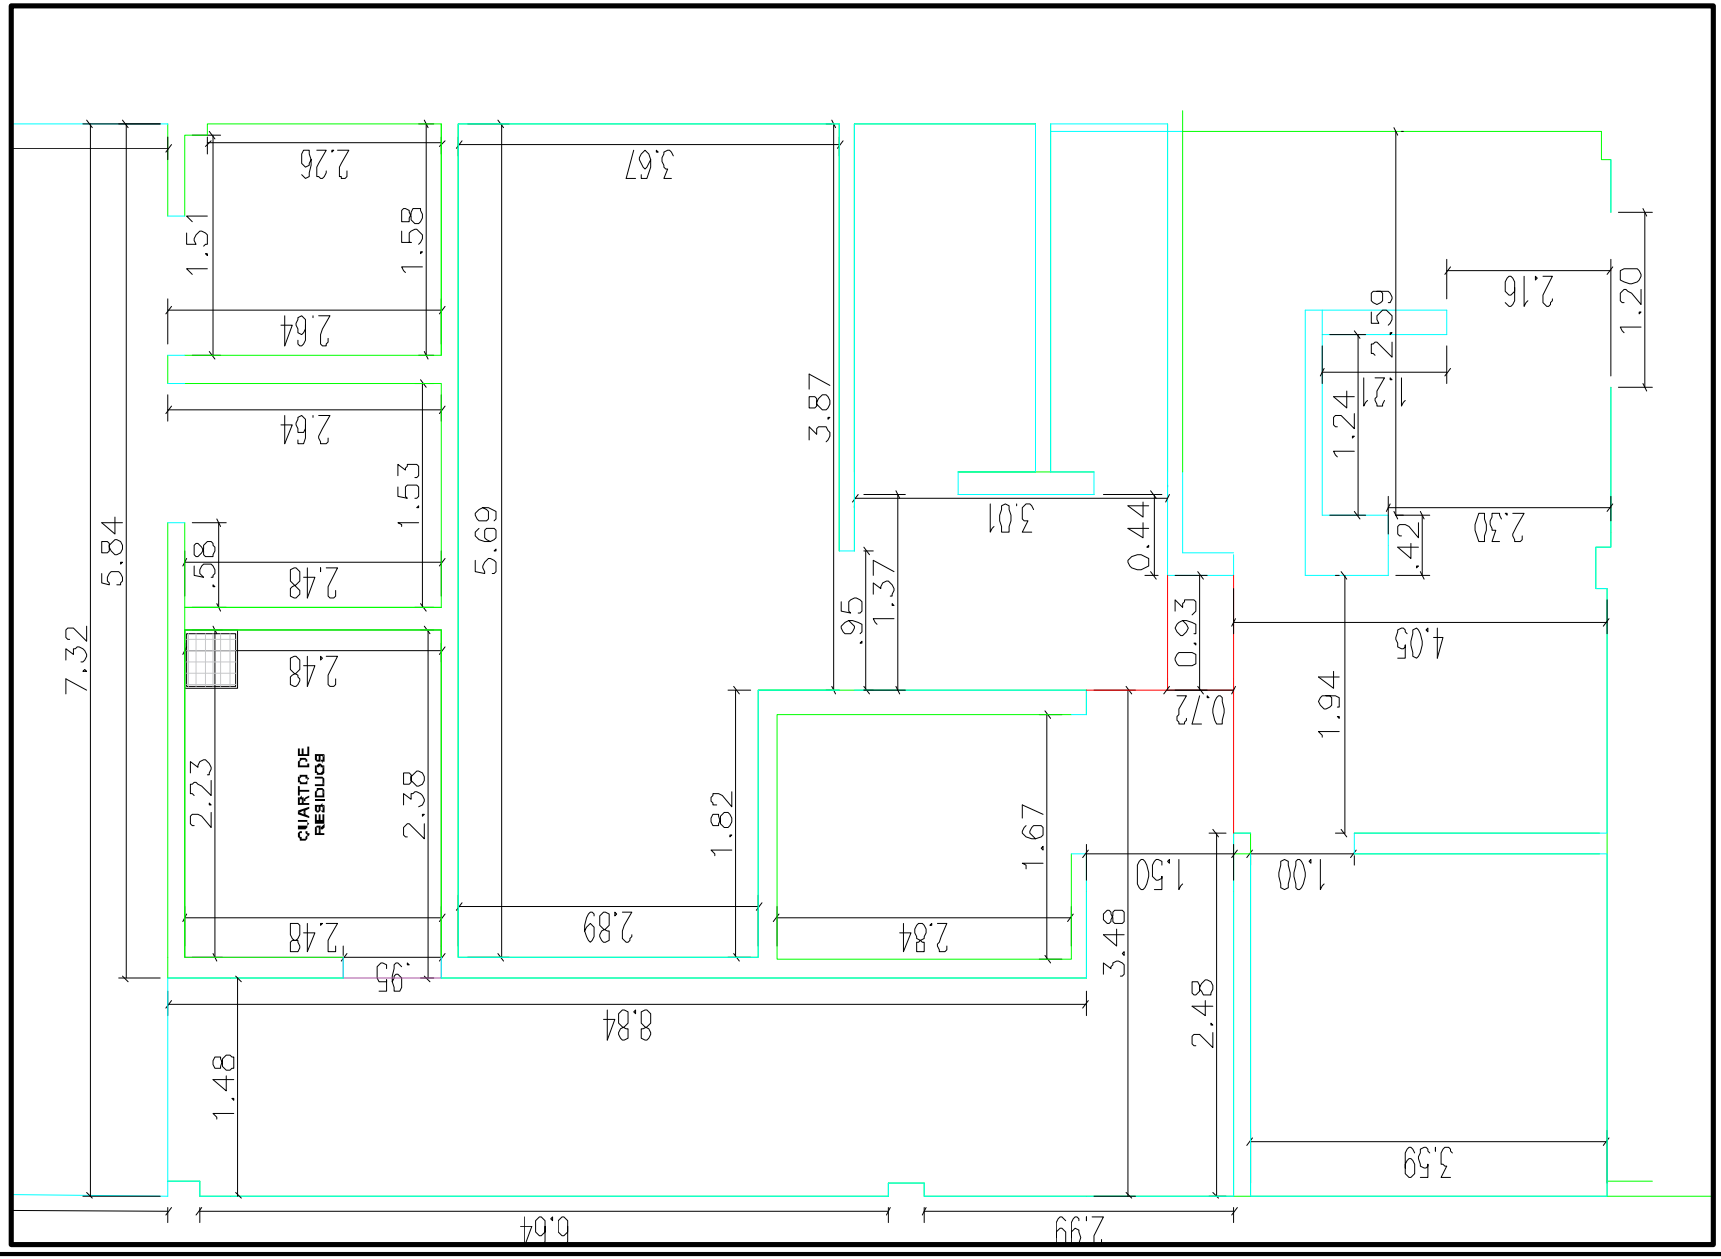


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
17.01	Aseo y Limpieza	m²	383.29







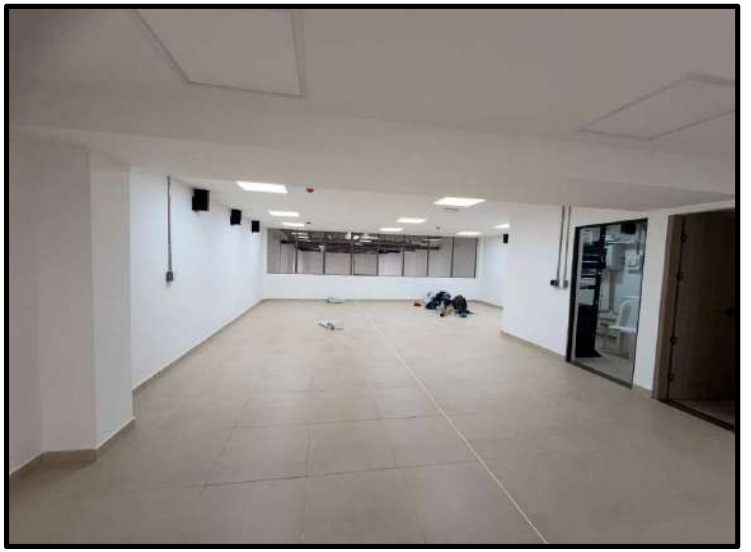

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
17.01	Aseo y Limpieza	m²	383.29













B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
17.01	Aseo y Limpieza	m²	383.29













OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 1	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4, INCLUYE RELLENO LADRILLOS	m2	47.22

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
MUROS ZONA DE ABRODAJE		7.10	5.30	1.00	m2	37.63	
		6.65	6.40	1.00	m2	42.56	
		6.73	6.40	1.00	m2	43.07	
		6.52	6.40	1.00	m2	41.73	
		6.56	6.40	1.00	m2	41.98	
		6.73	6.40	1.00	m2	43.07	
		6.66	6.40	1.00	m2	42.62	
		5.84	4.95	1.00	m2	28.91	
		1.48	1.35	1.00	m2	2.00	
CULATAS ZONA DE ABORDAJE		6.65	0.55	1.00	m2	3.66	
		6.73	0.55	1.00	m2	3.70	
		6.52	0.55	1.00	m2	3.59	
		6.56	0.55	1.00	m2	3.61	
		6.73	0.55	1.00	m2	3.70	
		6.66	0.55	1.00	m2	3.66	
COLUMNAS		0.28	0.55	1.00	m2	0.15	
		0.48	0.55	1.00	m2	0.26	
		0.29	0.55	2.00	m2	0.32	
PASILLO CIRCULACIÓN		8.84	2.65	1.00	m2	23.43	
		6.64	2.65	1.00	m2	17.60	
		2.99	2.65	1.00	m2	7.92	
		1.97	2.65	1.00	m2	5.22	
		3.15	2.65	1.00	m2	8.35	
		1.34	2.65	1.00	m2	3.55	
		3.01	2.65	1.00	m2	7.98	
		0.56	2.65	1.00	m2	1.48	
		2.14	2.65	1.00	m2	5.67	
PUERTA LOCKERS		0.95	2.00	-1.00	m2	-1.90	
PUERTA ZONA DISP. EVIDENCIAS		0.95	2.00	-1.00	m2	-1.90	
PUERTA BAÑO PMR		1.00	2.00	-1.00	m2	-2.00	
PUERTA BAÑO MIXTO		0.70	2.00	-1.00	m2	-1.40	
PUERTA COCINETA		0.70	2.00	-1.00	m2	-1.40	
PUERTA AREA RESIDUOS		0.95	2.00	-1.00	m2	-1.90	
SECADO		1.60	2.65	1.00	m2	4.24	
		2.26	2.65	1.00	m2	5.99	
		1.58	2.65	1.00	m2	4.19	
		2.64	2.65	1.00	m2	7.00	
PUERTA		0.95	2.00	-1.00	m2	-1.90	
CORTE		2.62	2.65	1.00	m2	6.94	
		1.53	2.65	1.00	m2	4.05	
		2.48	2.65	1.00	m2	6.57	
		1.52	2.65	1.00	m2	4.03	
PUERTA		0.95	2.00	-1.00	m2	-1.90	
CUARTO DE RESIDUOS		2.48	2.65	1.00	m2	6.57	
		2.23	2.65	1.00	m2	5.91	
		2.48	2.65	1.00	m2	6.57	
		2.23	2.65	1.00	m2	5.91	
PUERTA		0.95	2.00	-1.00	m2	-1.90	
SALA DE ENCUENTRO		2.48	2.65	2.00	m2	13.14	
		3.74	2.65	1.00	m2	9.91	
		3.59	2.65	2.00	m2	19.03	
PUERTA		1.00	2.00	-2.00	m2	-4.00	
					SUBTOTAL	517.28	

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción							Unidad	Cantidad total
N.P 1	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4, INCLUYE RELLENO LADRILLOS							m2	47.22
	LOCKERS		1.67	2.65	1.00	m2	4.43		
			2.84	2.65	1.00	m2	7.53		
			1.67	2.65	1.00	m2	4.43		
			2.98	2.65	1.00	m2	7.90		
	PUERTA		0.95	2.00	-1.00	m2	-1.90		
	DISPOSICION DE EVIDENCIAS		1.82	2.65	1.00	m2	4.82		
			2.89	2.65	1.00	m2	7.66		
			5.69	2.65	1.00	m2	15.08		
			3.67	2.65	1.00	m2	9.73		
			3.87	2.65	1.00	m2	10.26		
	PUERTA		0.95	2.00	-1.00	m2	-1.90		
	ENTRADA		2.66	3.60	1.00	m2	9.58		
	PUERTA		1.15	2.00	-1.00	m2	-2.30		
	ENTRADA		4.07	2.50	1.00	m2	10.18		
			1.75	1.10	1.00	m2	1.93		
			1.12	0.55	1.00	m2	0.61		
			0.60	0.18	1.00	m2	0.11		
			0.28	0.18	4.00	m2	0.10		
			0.64	3.60	1.00	m2	1.15		
			1.24	3.60	1.00	m2	2.23		
	ANTEPECHO ESCALERA		1.21	1.29	2.00	m2	1.56		
			1.21	0.38	1.00	m2	0.23		
			0.65	0.73	1.00	m2	0.24		
			0.28	0.18	2.00	m2	0.05		
			1.17	0.93	1.00	m2	1.09		
			1.33	0.92	1.00	m2	1.22		
			3.02	0.92	1.00	m2	2.78		
			3.87	0.92	1.00	m2	3.56		
	MURO 1 ESCALERA		0.60	0.18	1.00	m2	0.11		
			0.76	2.14	1.00	m2	1.63		
			0.46	2.31	1.00	m2	1.06		
			3.64	2.37	1.00	m2	4.31		
			0.28	0.18	13.00	m2	0.33		
			3.70	0.92	1.00	m2	3.40		
			0.84	1.48	1.00	m2	1.24		
			1.16	2.40	1.00	m2	2.78		
			1.23	0.80	-1.00	m2	-0.49		
	MURO 2 ESCALERA		3.70	0.92	1.00	m2	3.40		
			3.64	2.37	1.00	m2	4.31		
			0.46	0.35	1.00	m2	0.08		
			0.28	0.18	8.00	m2	0.20		
			1.11	0.73	-1.00	m2	-0.41		
	CENTRO DE DATOS		2.00	2.40	2.00	m2	9.60		
			1.85	2.40	1.00	m2	4.44		
			2.40	2.40	2.00	m2	11.52		
	MURO COMPARTIDO		5.15	2.40	1.00	m2	12.36		
	PUERTA CENTRO DATOS		0.95	2.00	-1.00	m2	-1.90		
	PUERTA BAÑO HOMBRES		0.70	2.00	-1.00	m2	-1.40		
	PUERTA BAÑO MUJERES		0.70	2.00	-1.00	m2	-1.40		
	MUROS PERIMETRALES 2DO PISO		7.33	0.92	1.00	m2	6.74		
			0.59	2.40	4.00	m2	5.66		
			6.30	2.40	2.00	m2	30.24		
			6.64	2.40	2.00	m2	31.87		
			1.16	2.40	2.00	m2	5.57		
			7.15	0.92	1.00	m2	6.58		
			4.30	2.40	1.00	m2	10.32		
			4.07	2.40	1.00	m2	9.77		
						Subtotal	264.27		
						VIENE	517.28		
						TOTAL EJECUTADO	**781.55**		
						COBRADO EN ACTAS	734.33		
						TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**47.22**		

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ


REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI


APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 1	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4, INCLUYE RELLENO LADRILLOS	m2	47.22

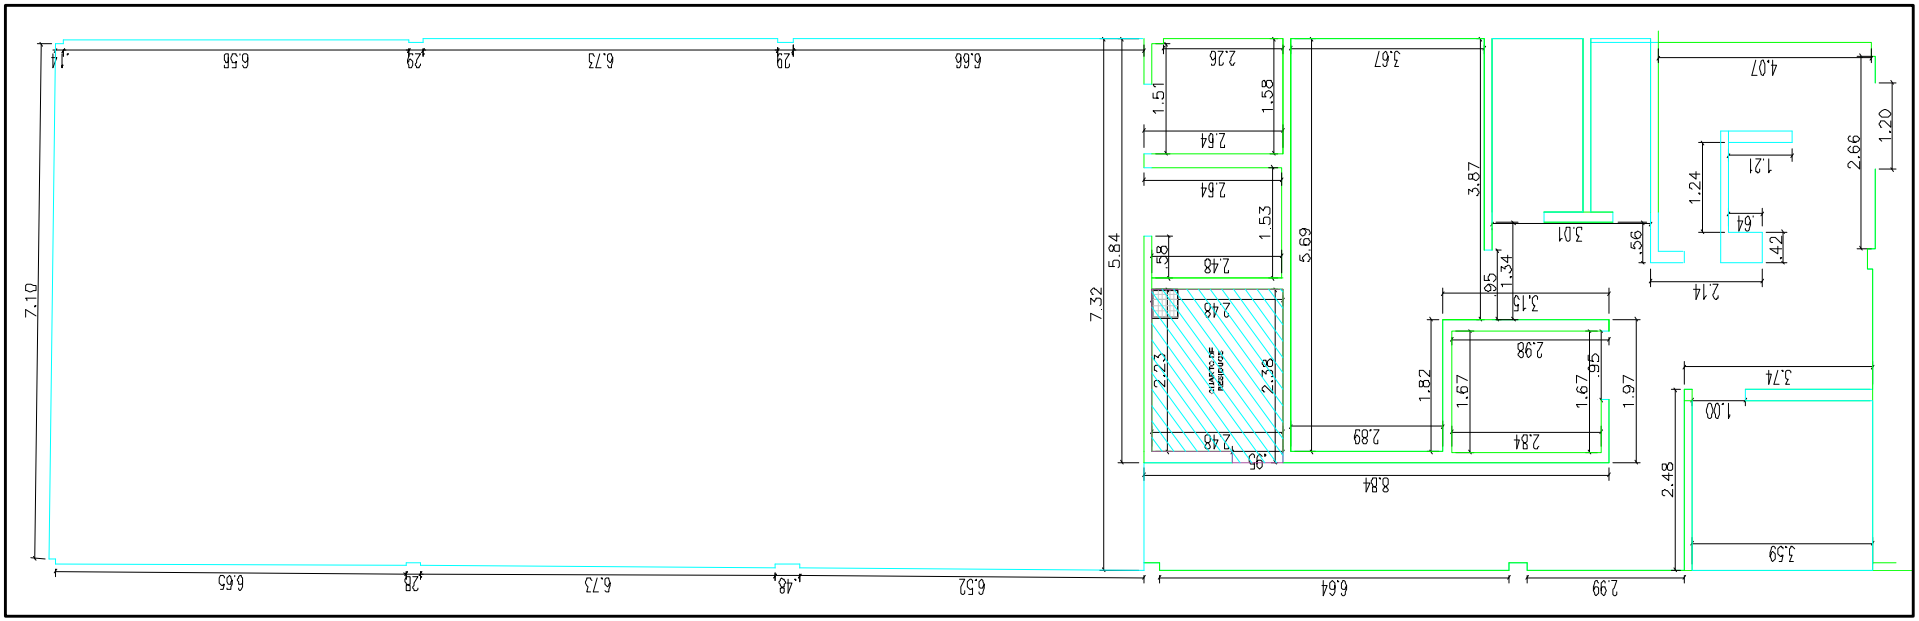


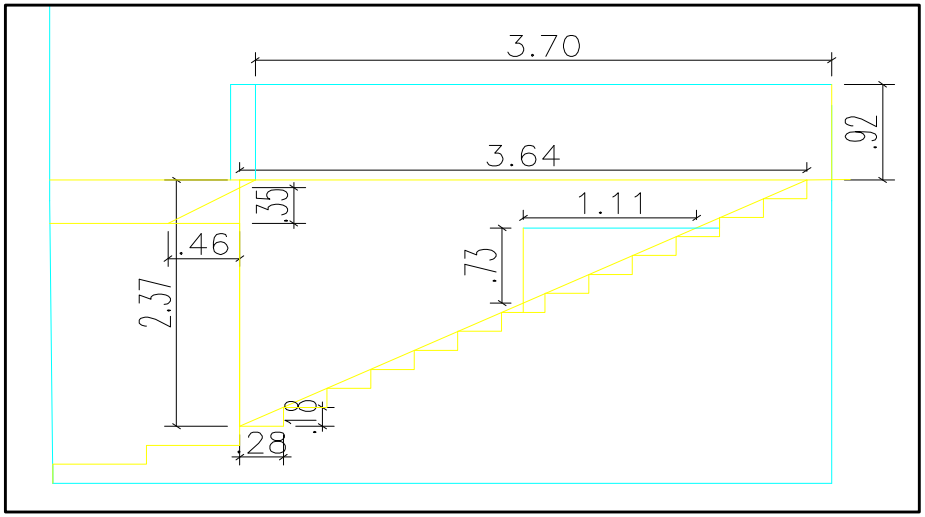


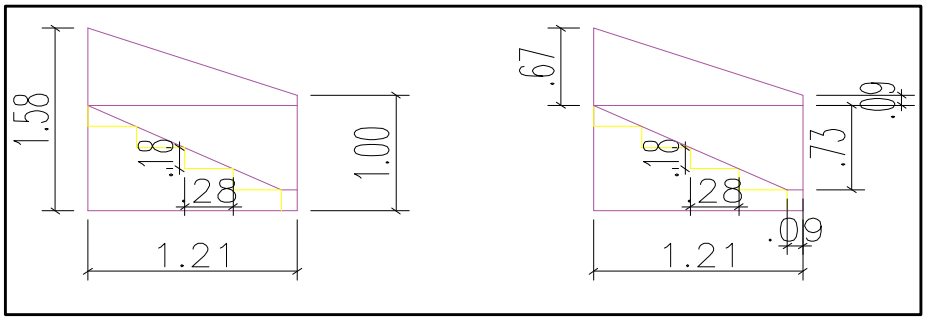


CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 1	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4, INCLUYE RELLENO LADRILLOS	m2	47.22

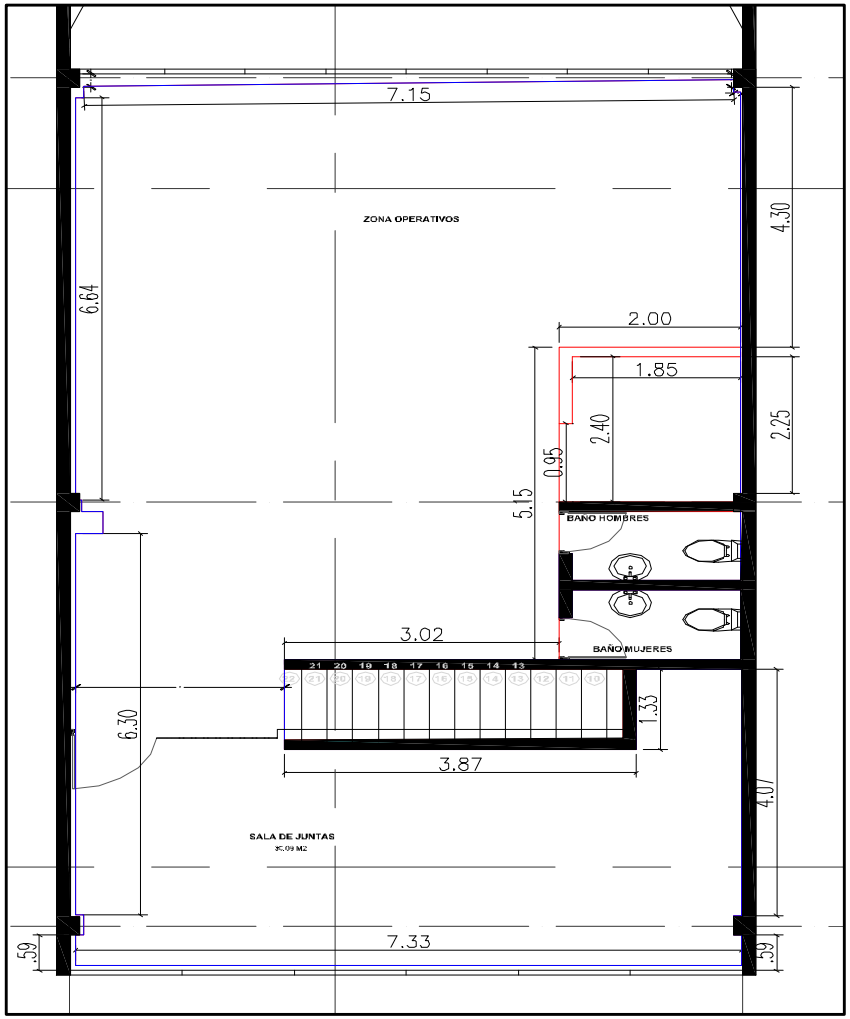

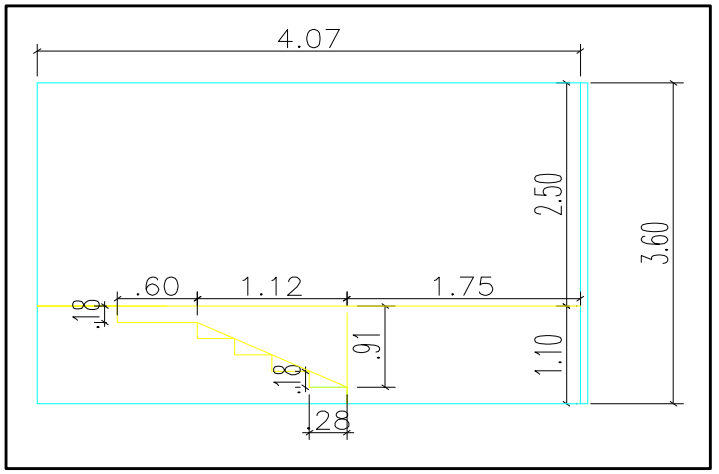


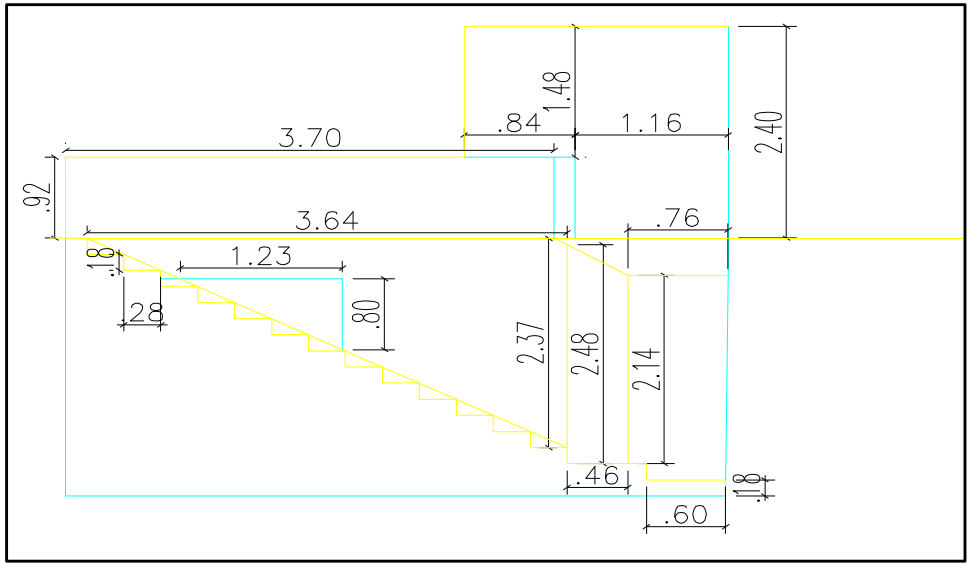

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 1	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4, INCLUYE RELLENO LADRILLOS	m2	47.22





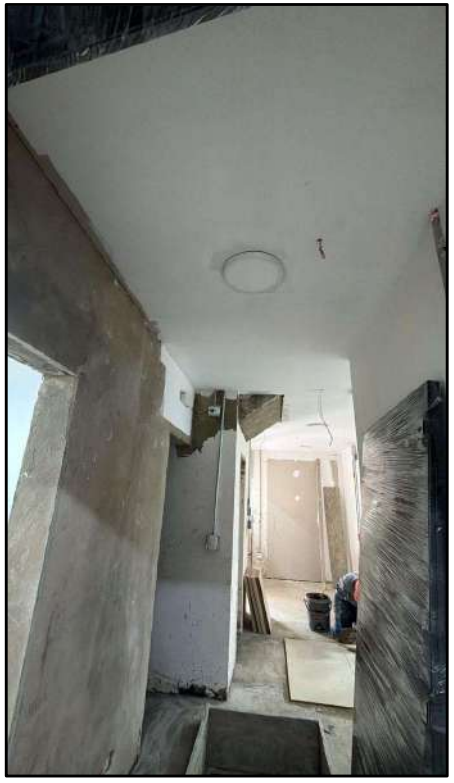

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 2	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	m	87.60

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto			
FILOS						
ZONA ABRODAJE COLUMNAS	---	---	6.10	11.00	m	67.10
ZONA DE ABORDAJE FILO			3.60	1.00	m	3.60
		7.32		1.00	m	7.32
		5.84		1.00	m	5.84
ZONA DE ABORDAJE MENSULAS			0.30	10.00	m	3.00
		0.20		10.00	m	2.00
SECADO			2.65	1.00	m	2.65
PUERTA			2.00	3.00	m	6.00
		0.95		2.00	m	1.90
CORTE PUERTA			2.00	3.00	m	6.00
		0.95		2.00	m	1.90
CUARTO DE RESIDUOS PUERTA			2.00	3.00	m	6.00
		0.95		2.00	m	1.90
PASILLO DE CIRCULACIÓN COLUMNAS			2.65	3.00	m	7.95
LOCKERS FILOS			2.65	2.00	m	5.30
LOCKERS PUERTAS			2.00	3.00	m	6.00
		0.95		2.00	m	1.90
DISPOSICION EVIDENCIAS FILO			2.65	1.00	m	2.65
DISPOSICION EVIDENCIAS PUERTA			2.00	2.00	m	4.00
		0.95		2.00	m	1.90
BAÑO PMR FILO			2.65	2.00	m	5.30
BAÑO PMR PUERTA			2.00	2.00	m	4.00
		1.00		2.00	m	2.00
BAÑO MIXTO PUERTA			2.00	2.00	m	4.00
		0.70		2.00	m	1.40
COCINETA PUERTA			2.00	3.00	m	6.00
		0.70		2.00	m	1.40
SALA DE ENCUENTRO COLUMNA			2.65	1.00	m	2.65
SALA DE ENCUENTRO FILO			2.65	1.00	m	2.65
					Subtotal	**174.31**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción							Unidad	Cantidad total
N.P 2	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES							m	87.60
	SALA DE ENCUENTRO PUERTA			2.00	3.00	m	6.00		
				1.00	2.00	m	2.00		
	INGRESO FILOS			2.65	1.00	m	2.65		
				3.60	1.00	m	3.60		
	INGRESO COLUMNAS			3.60	3.00	m	10.80		
	INGRESO PUERTAS			2.00	1.00	m	2.00		
			1.15		1.00	m	1.15		
	ESCALERAS FILOS		1.21		2.00	m	2.42		
				1.00	2.00	m	2.00		
				1.97	1.00	m	1.97		
				2.55	1.00	m	2.55		
	ANTEPECHO ESCALERAS FILOS		3.02		2.00	m	6.04		
			3.87		1.00	m	3.87		
			3.71		1.00	m	3.71		
			1.33		1.00	m	1.33		
			1.17		1.00	m	1.17		
				0.92	5.00	m	4.60		
	FILOS COLUMNAS SEGUNDO PISO			2.40	8.00	m	19.20		
	FILOS ANTEPECHOS VENTANAS		7.33		1.00	m	7.33		
			7.15		1.00	m	7.15		
	CENTRO DE DATOS FILOS			2.40	1.00	m	2.40		
	CENTRO DE DATOS PUERTA			2.00	3.00	m	6.00		
	BAÑO HOMBRES PUERTA			2.00	2.00	m	4.00		
			0.70		2.00	m			
	BAÑO MUJERES PUERTA			2.00	2.00	m	4.00		
			0.70		2.00	m	1.40		
	DILATACIONES								
	ZONA ABORDAJE DILATACIONES	7.14	---	---	4.00	m	28.56		
		6.69	---	---	4.00	m	26.76		
		6.77	---	---	4.00	m	27.08		
		6.56	---	---	4.00	m	26.24		
		6.70	---	---	4.00	m	26.80		
		6.77	---	---	4.00	m	27.08		
		6.60	---	---	4.00	m	26.40		
		7.32	---	---	1.00	m	7.32		
						Subtotal	305.58		
						VIENE	174.31		
						TOTAL EJECUTADO	**479.89**		
						COBRADO EN ACTAS	392.29		
						TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**87.60**		


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 2	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	m	87.60

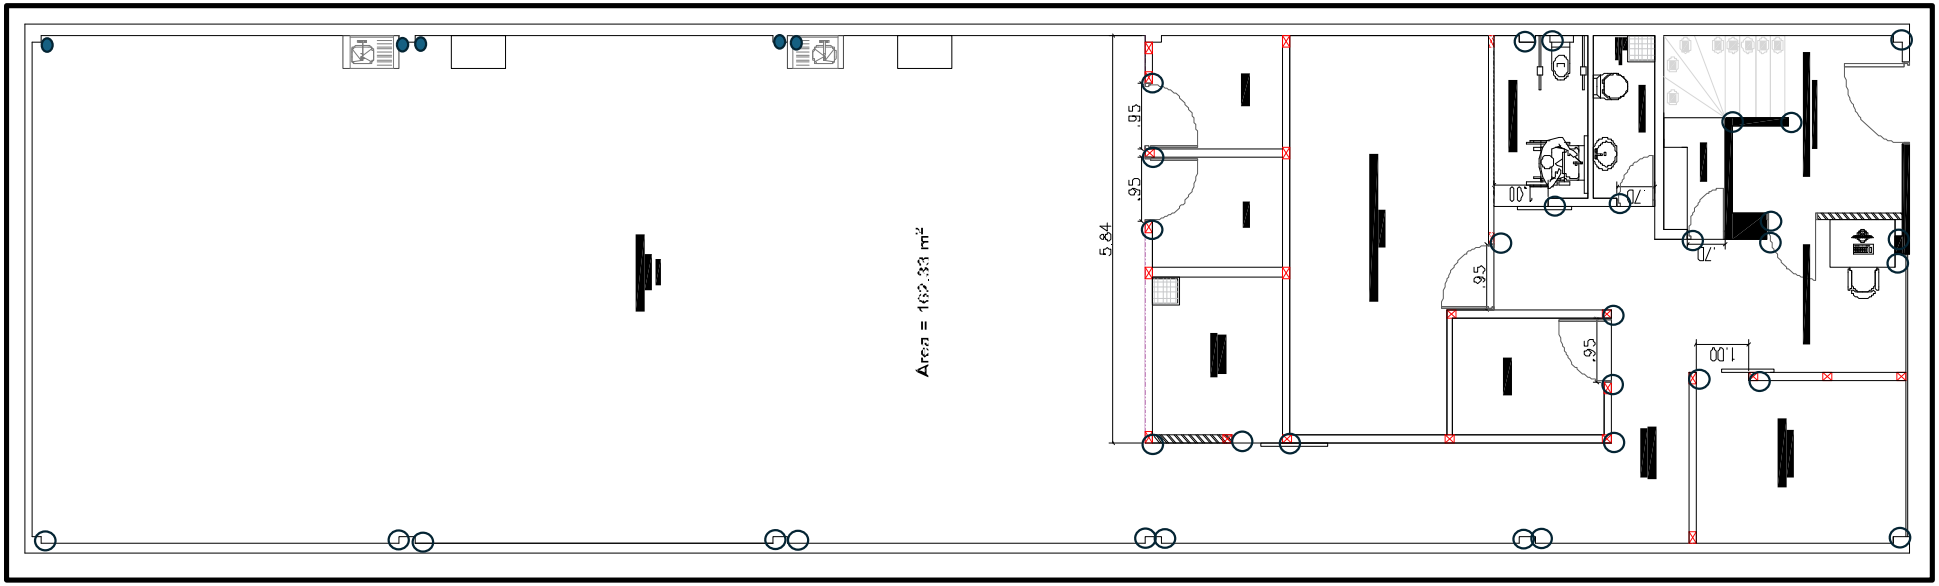


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 2	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	m	87.60

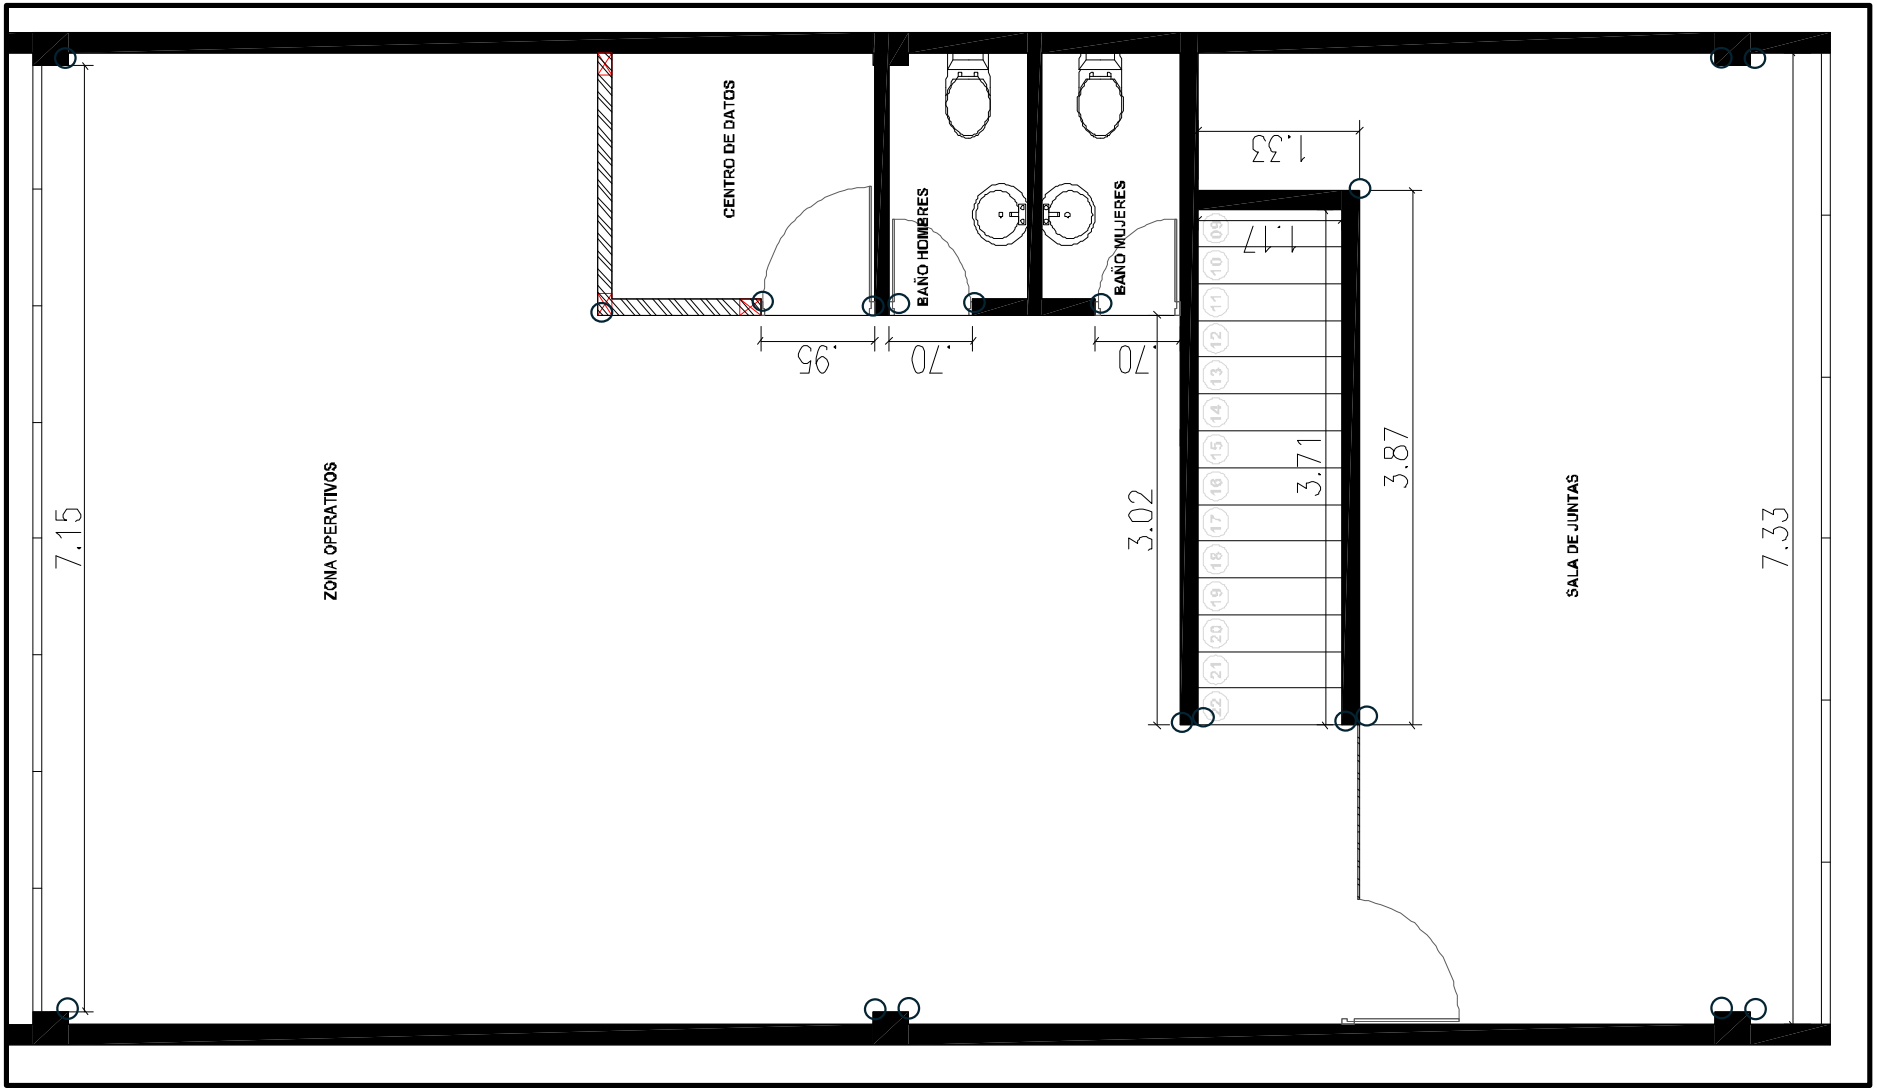

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 2	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	m	87.60

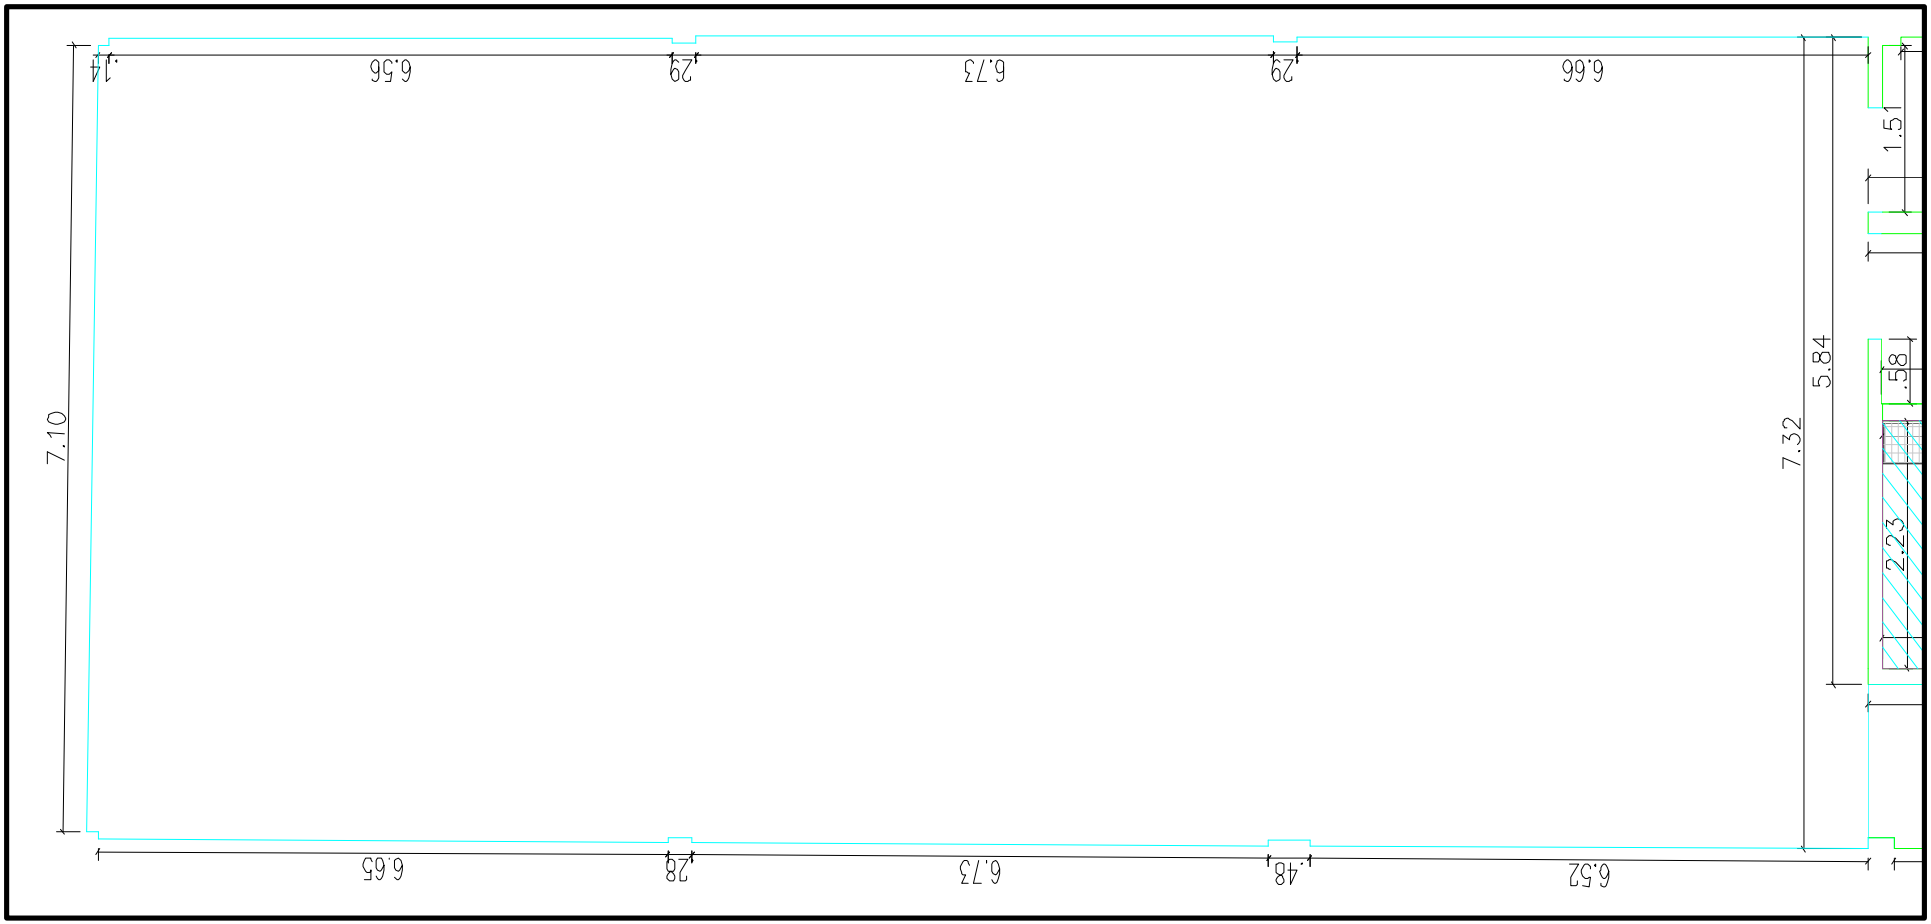

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 2	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	m	87.60











OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 3	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	m	87.60

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
FILOS							
ZONA ABRODAJE COLUMNAS	---	---	6.10	11.00	m	67.10	
ZONA DE ABORDAJE FILO			3.60	1.00	m	3.60	
		7.32		1.00	m	7.32	
		5.84		1.00	m	5.84	
ZONA DE ABORDAJE MENSULAS			0.30	10.00	m	3.00	
		0.20		10.00	m	2.00	
SECADO			2.65	1.00	m	2.65	
PUERTA			2.00	3.00	m	6.00	
		0.95		2.00	m	1.90	
CORTE PUERTA			2.00	3.00	m	6.00	
		0.95		2.00	m	1.90	
CUARTO DE RESIDUOS PUERTA			2.00	3.00	m	6.00	
		0.95		2.00	m	1.90	
PASILLO DE CIRCULACIÓN COLUMNAS			2.65	3.00	m	7.95	
LOCKERS FILOS			2.65	2.00	m	5.30	
LOCKERS PUERTAS			2.00	3.00	m	6.00	
		0.95		2.00	m	1.90	
DISPOSICION EVIDENCIAS FILO			2.65	1.00	m	2.65	
DISPOSICION EVIDENCIAS PUERTA			2.00	2.00	m	4.00	
		0.95		2.00	m	1.90	
BAÑO PMR FILO			2.65	2.00	m	5.30	
BAÑO PMR PUERTA			2.00	2.00	m	4.00	
		1.00		2.00	m	2.00	
BAÑO MIXTO PUERTA			2.00	2.00	m	4.00	
		0.70		2.00	m	1.40	
COCINETA PUERTA			2.00	3.00	m	6.00	
		0.70		2.00	m	1.40	
SALA DE ENCUENTRO COLUMNA			2.65	1.00	m	2.65	
SALA DE ENCUENTRO FILO			2.65	1.00	m	2.65	
					Subtotal	**174.31**	

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción						Unidad	Cantidad total
N.P 3	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO						m	87.60
	SALA DE ENCUENTRO PUERTA			2.00	3.00	m	6.00	
				1.00	2.00	m	2.00	
	INGRESO FILOS			2.65	1.00	m	2.65	
				3.60	1.00	m	3.60	
	INGRESO COLUMNAS			3.60	3.00	m	10.80	
	INGRESO PUERTAS			2.00	1.00	m	2.00	
			1.15		1.00	m	1.15	
	ESCALERAS FILOS		1.21		2.00	m	2.42	
				1.00	2.00	m	2.00	
				1.97	1.00	m	1.97	
				2.55	1.00	m	2.55	
	ANTEPECHO ESCALERAS FILOS		3.02		2.00	m	6.04	
			3.87		1.00	m	3.87	
			3.71		1.00	m	3.71	
			1.33		1.00	m	1.33	
			1.17		1.00	m	1.17	
				0.92	5.00	m	4.60	
	FILOS COLUMNAS SEGUNDO PISO			2.40	8.00	m	19.20	
	FILOS ANTEPECHOS VENTANAS		7.33		1.00	m	7.33	
			7.15		1.00	m	7.15	
	CENTRO DE DATOS FILOS			2.40	1.00	m	2.40	
	CENTRO DE DATOS PUERTA			2.00	3.00	m	6.00	
	BAÑO HOMBRES PUERTA			2.00	2.00	m	4.00	
			0.70		2.00	m		
	BAÑO MUJERES PUERTA			2.00	2.00	m	4.00	
			0.70		2.00	m	1.40	
	DILATACIONES							
	ZONA ABORDAJE DILATACIONES	7.14	---	---	4.00	m	28.56	
		6.69	---	---	4.00	m	26.76	
		6.77	---	---	4.00	m	27.08	
		6.56	---	---	4.00	m	26.24	
		6.70	---	---	4.00	m	26.80	
		6.77	---	---	4.00	m	27.08	
		6.60	---	---	4.00	m	26.40	
		7.32	---	---	1.00	m	7.32	
						Subtotal	305.58	
						VIENE	174.31	
						TOTAL EJECUTADO	**479.89**	
						COBRADO EN ACTAS	392.29	
						TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**87.60**	


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 3	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	m	87.60

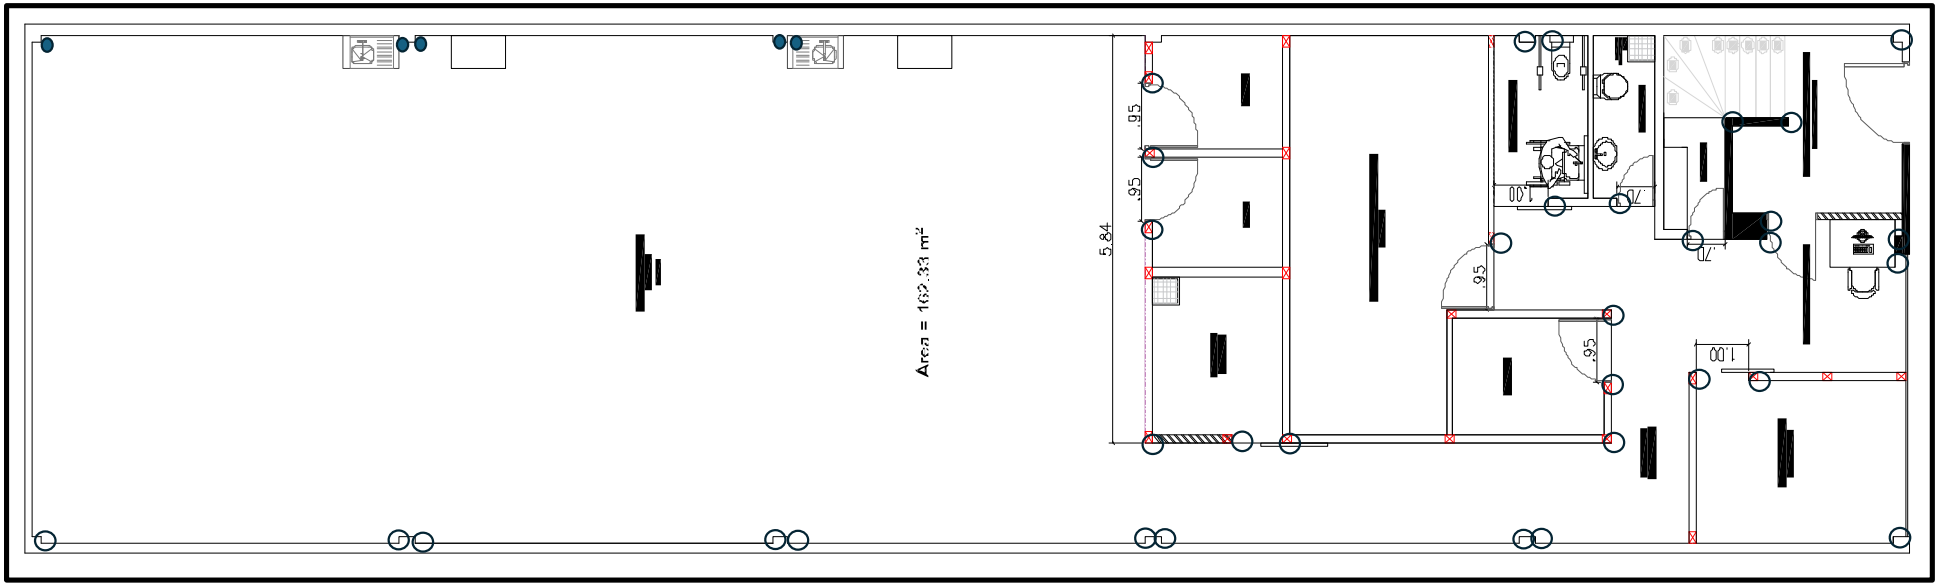


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 3	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	m	87.60

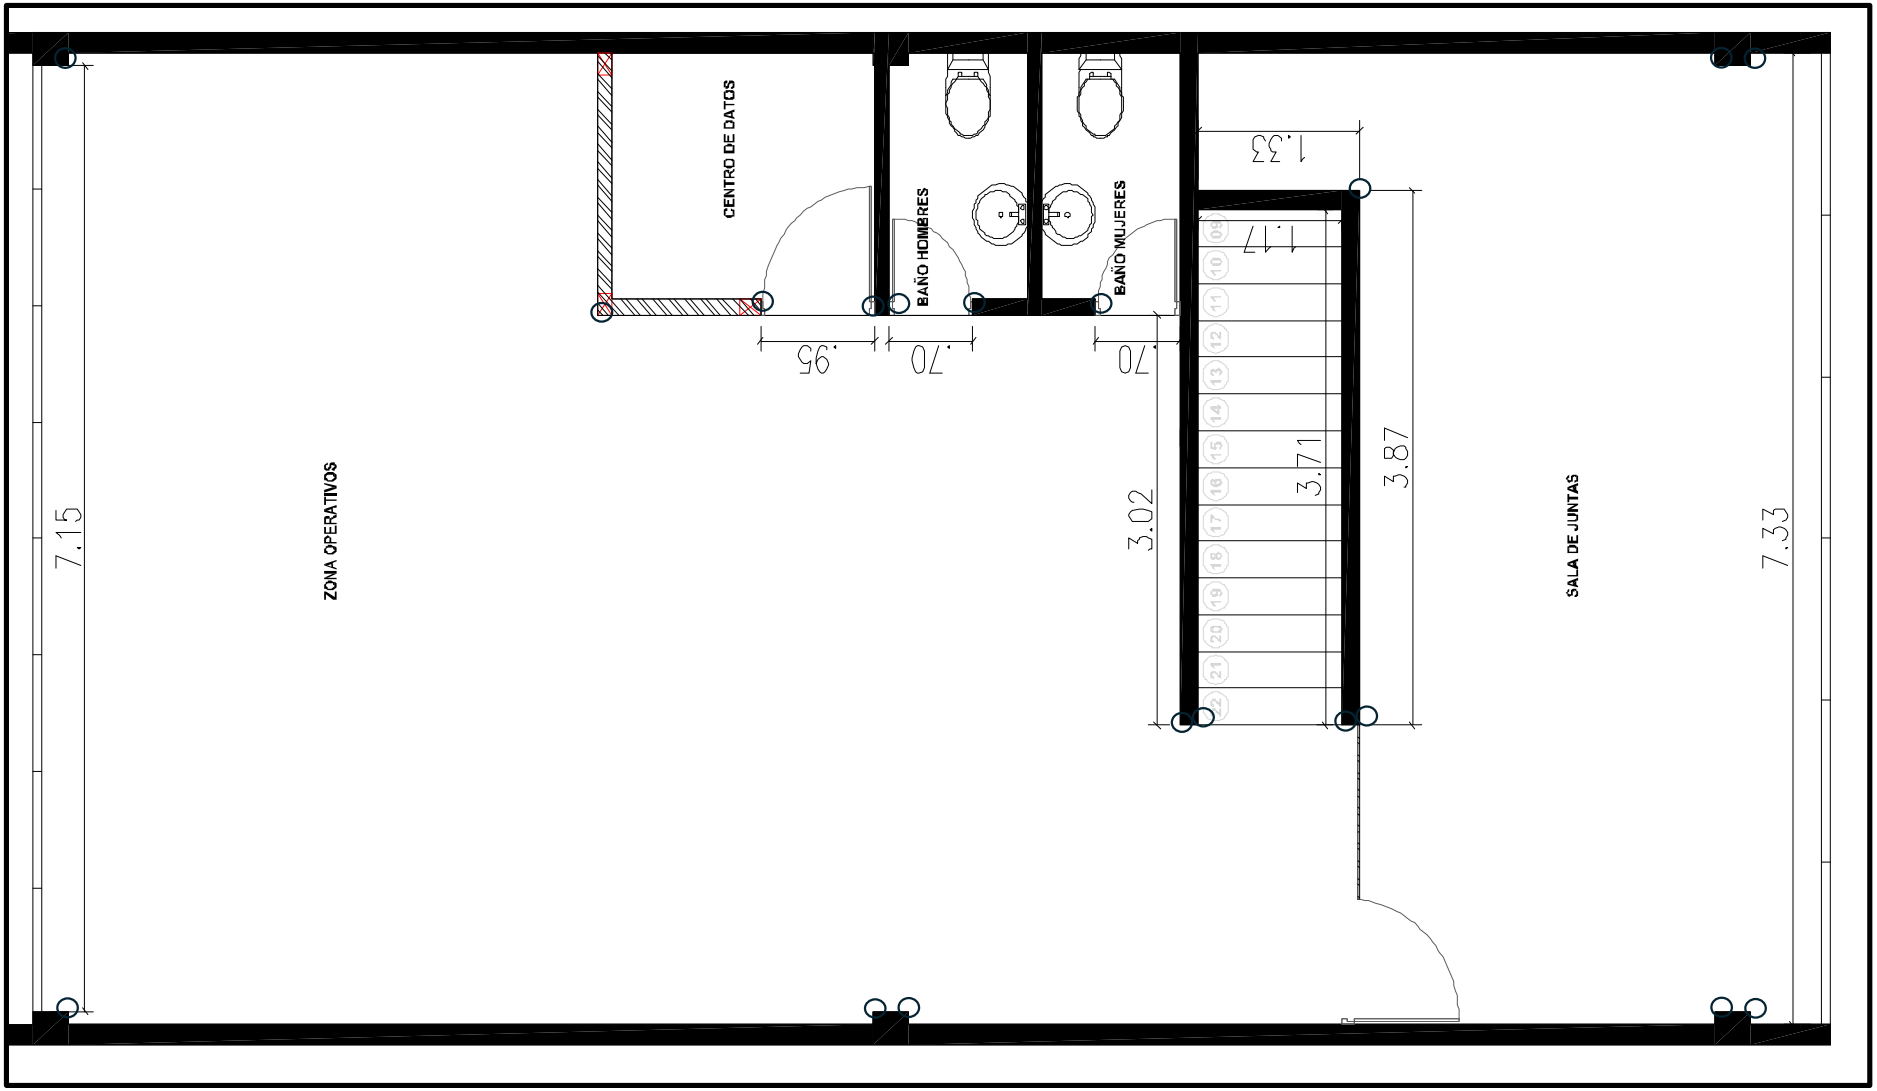

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 3	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	m	87.60

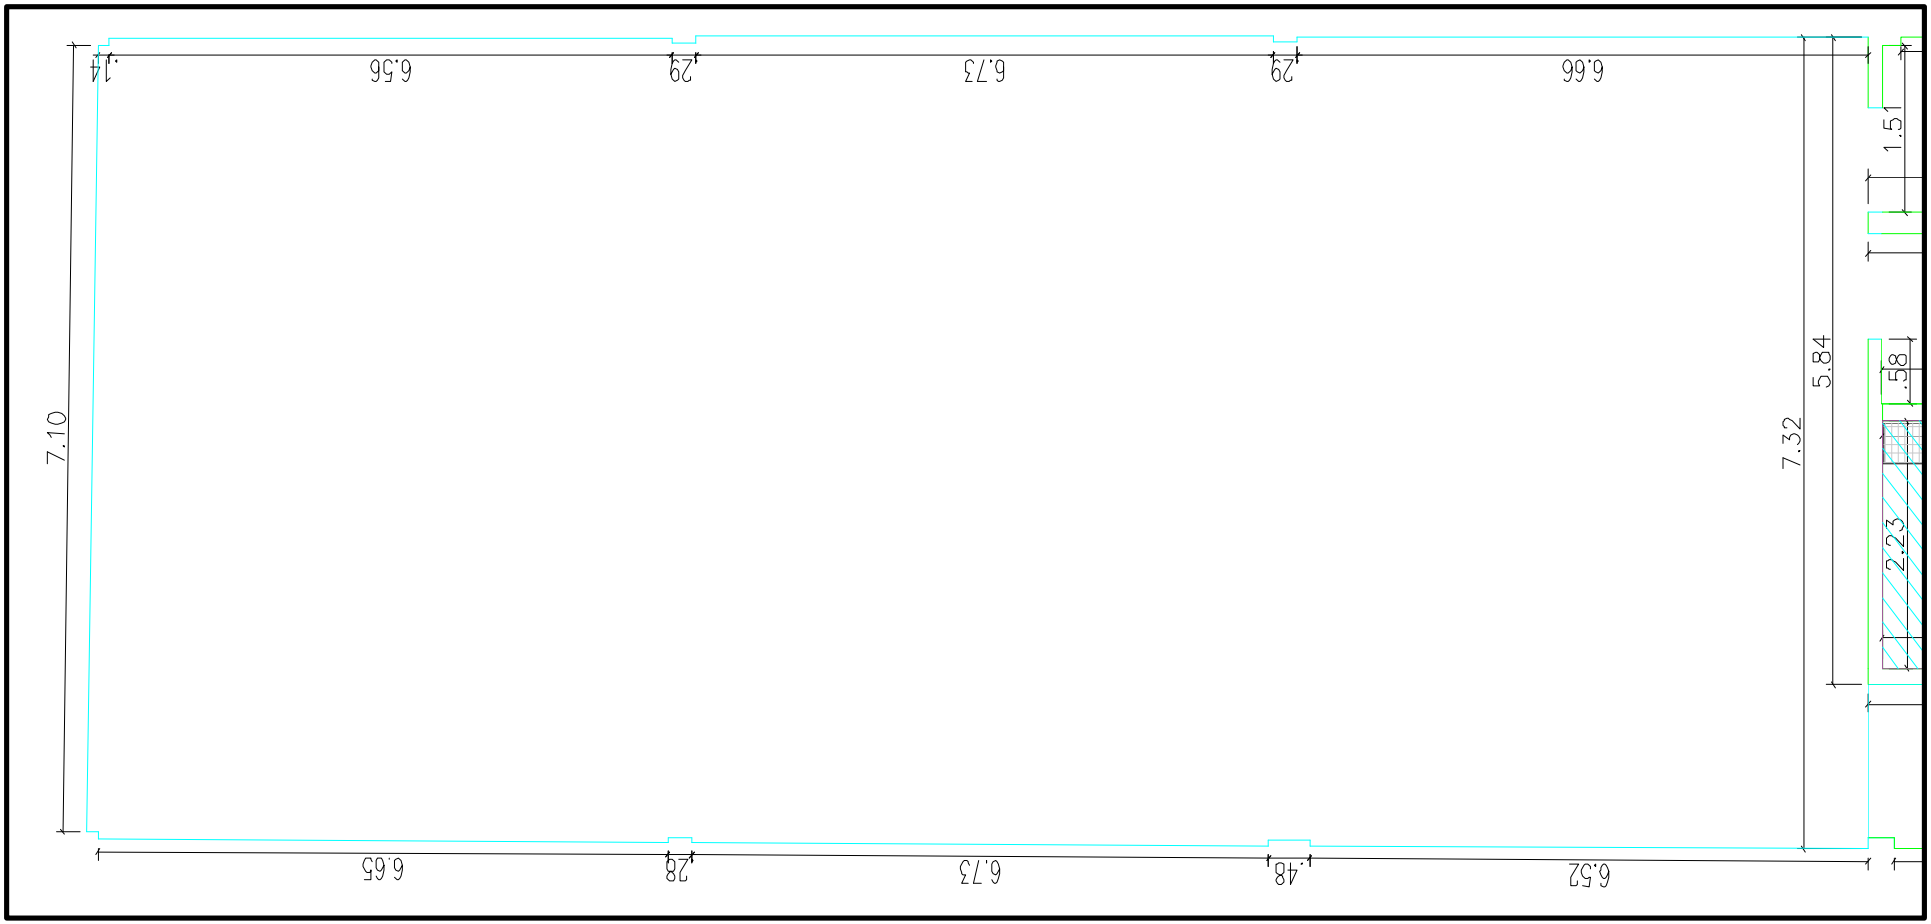

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 3	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	m	87.60

















OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 4	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4	m2	8.66

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
BAJO ESCALERAS	1.10	1.20	---	1.00	m2	1.32	
BAJO ESCALERA COCINETA	1.93	1.16		1.00	m2	2.24	
	1.20	1.20		1.00	m2	1.44	
VIGA CANAL	5.32	0.84		1.00	m2	4.47	
	5.32		0.36	2.00		3.83	
	0.36	0.30		-1.00	m2	-0.11	
SOBRE ESCALERA	0.70	1.20		1.00	m2	0.84	
	0.76	1.20		1.00	m2	0.91	
					Subtotal	14.94	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	14.94	
					COBRADO EN ACTAS	6.28	
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	8.66	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI


APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 4	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4	m2	8.66

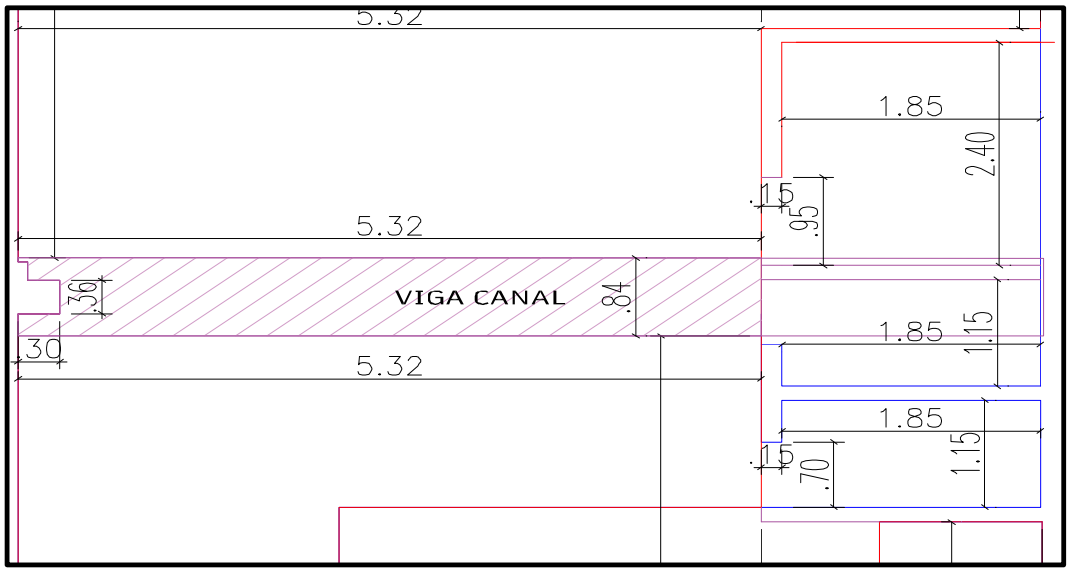

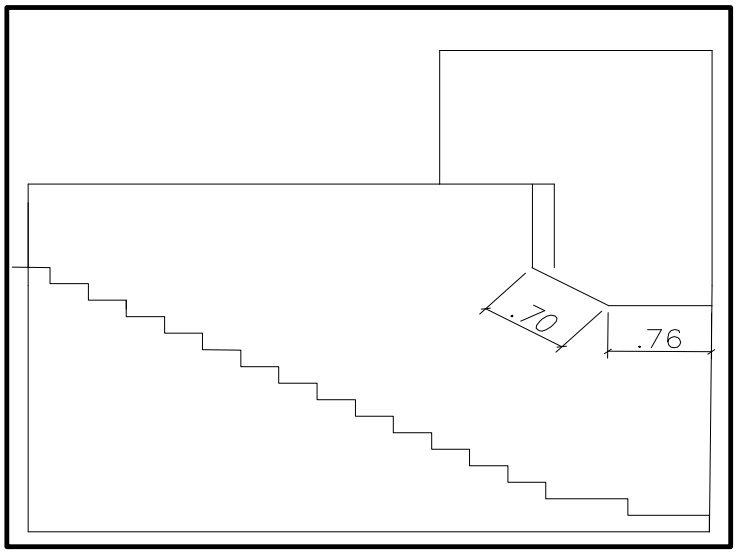

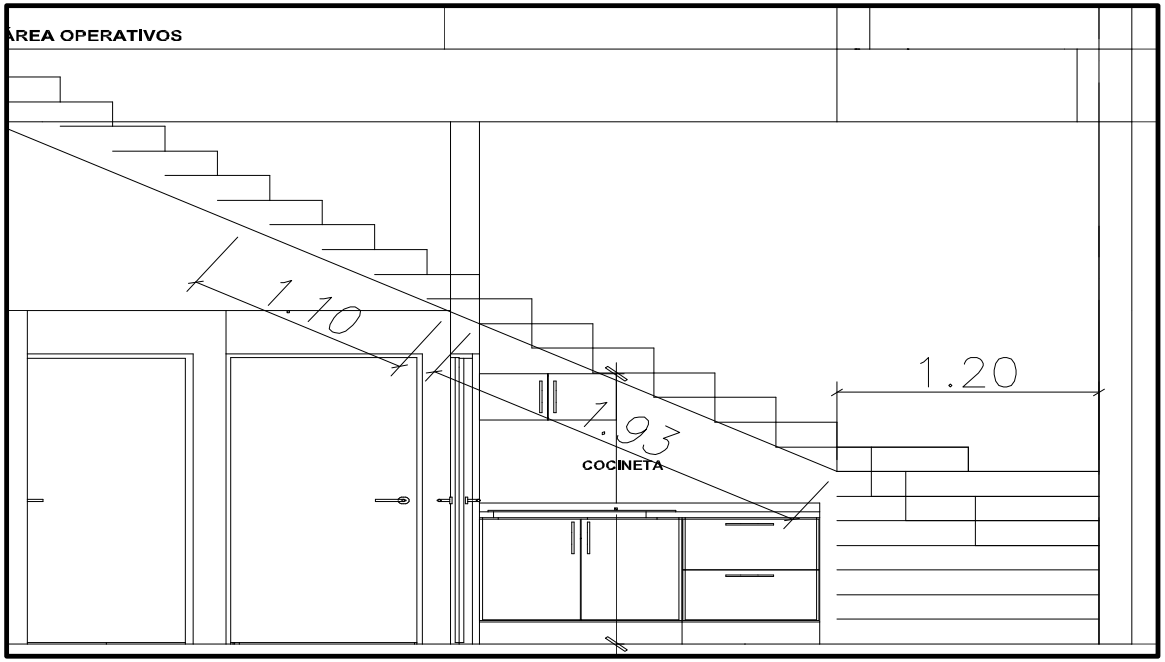

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 4	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4	m2	8.66





OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 5	FILOS BAJO PLACA MORTERO 1:4	m	2.84

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
BAJO ESCALERAS	1.10		---	2.00	m	2.20	
VIGA CANAL		5.32		2.00	m	10.64	
					Subtotal	12.84	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	12.84	
					COBRADO EN ACTAS	10.00	
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	2.84	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 5	FILOS BAJO PLACA MORTERO 1:4	m	2.84

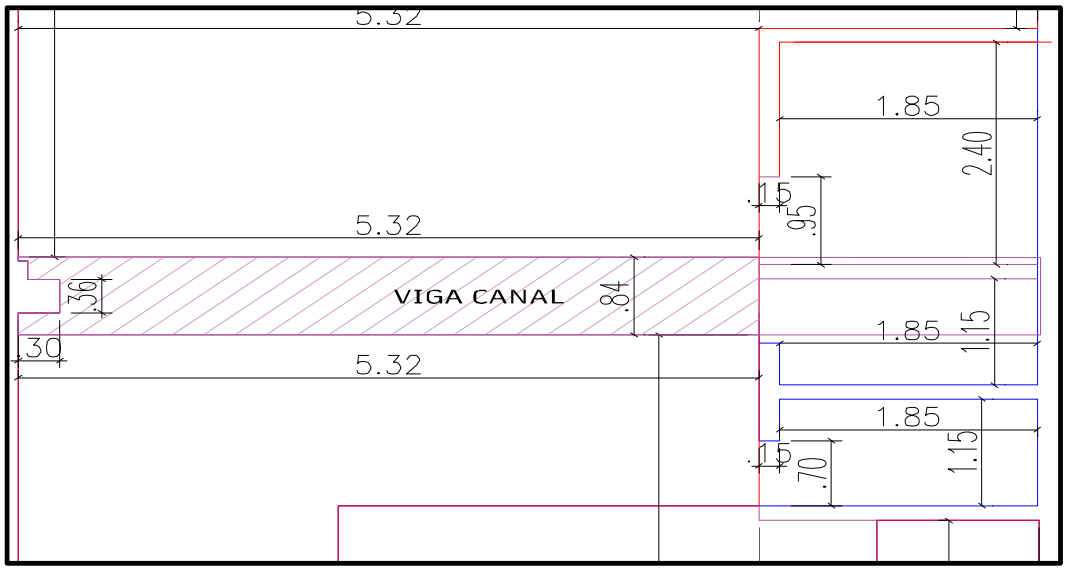

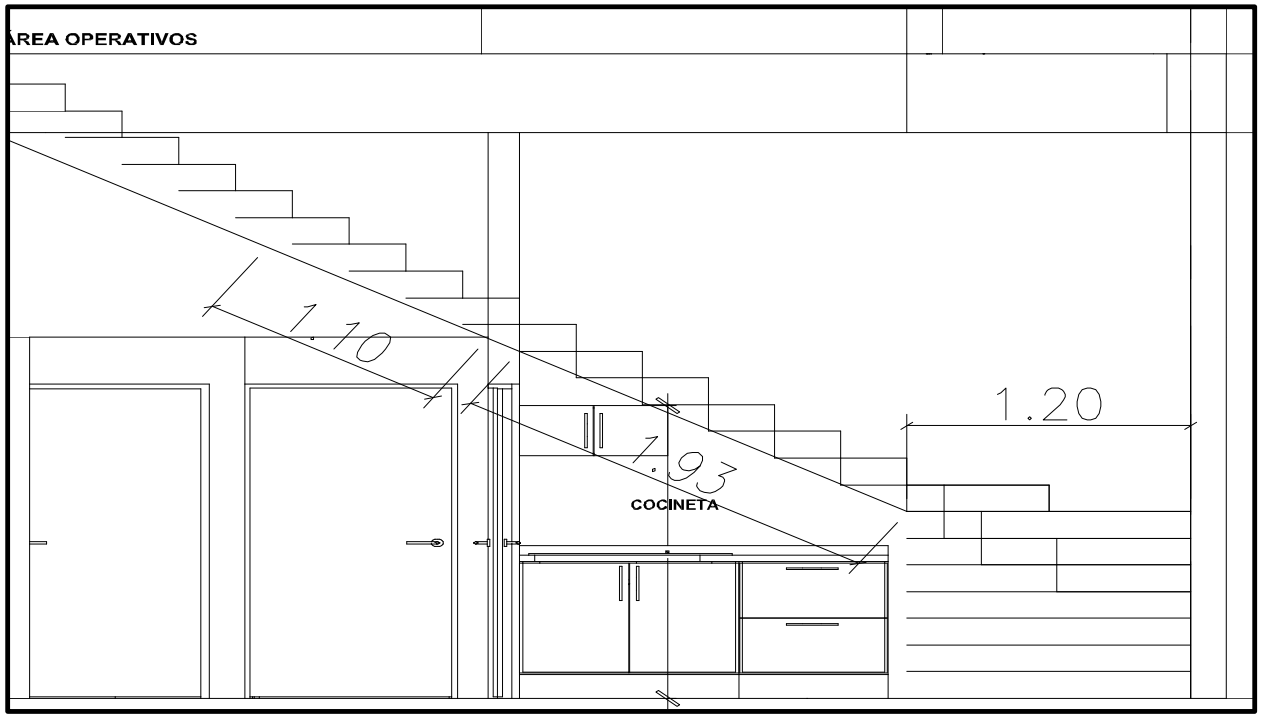

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 5	FILOS BAJO PLACA MORTERO 1:4	m	2.84





OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS BAJO PLACA	m2	8.66

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
BAJO ESCALERAS	1.10	1.20	---	1.00	m2	1.32	
BAJO ESCALERA COCINETA	1.93	1.16		1.00	m2	2.24	
	1.20	1.20		1.00	m2	1.44	
VIGA CANAL	5.32	0.84		1.00	m2	4.47	
	5.32		0.36	2.00		3.83	
	0.36	0.30		-1.00	m2	-0.11	
SOBRE ESCALERA	0.70	1.20		1.00	m2	0.84	
	0.76	1.20		1.00	m2	0.91	
					Subtotal	14.94	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	14.94	
					COBRADO EN ACTAS	6.28	
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	8.66	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI


APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS BAJO PLACA	m2	8.66

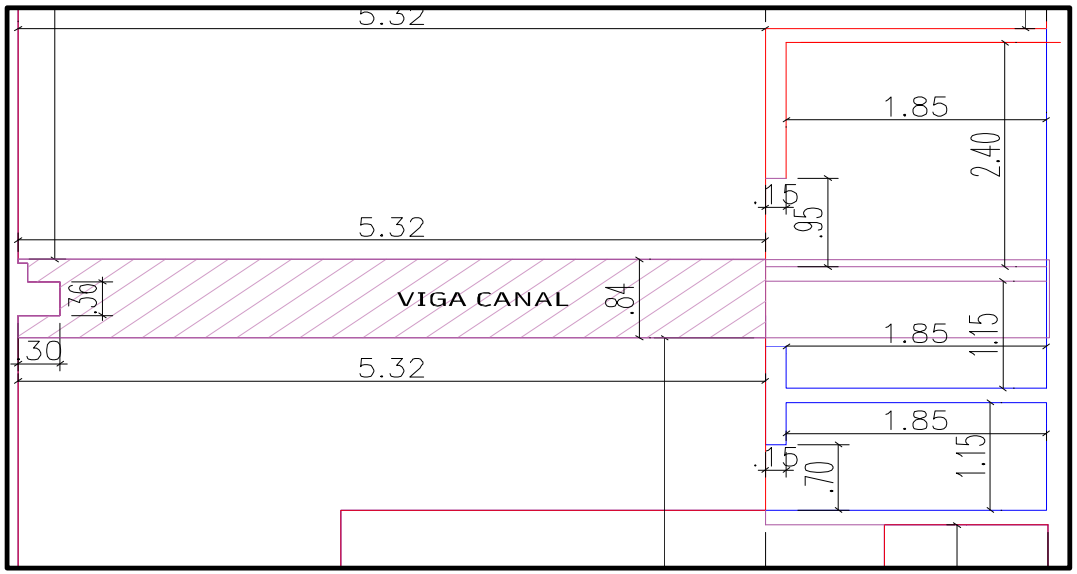

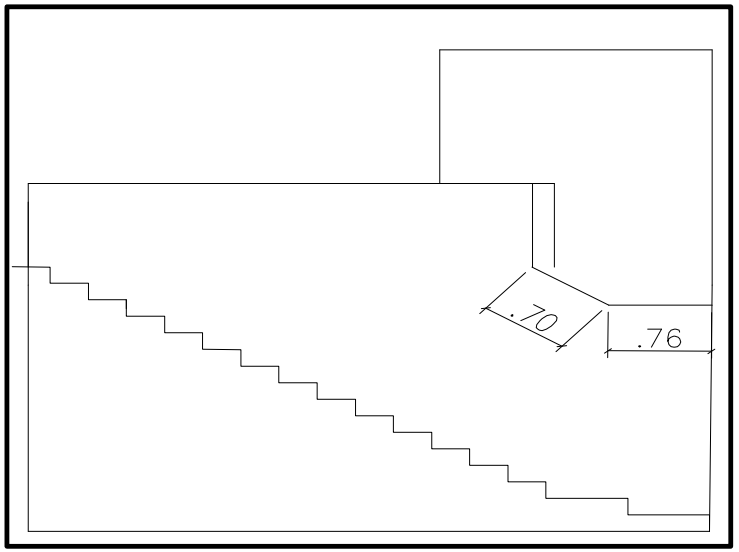

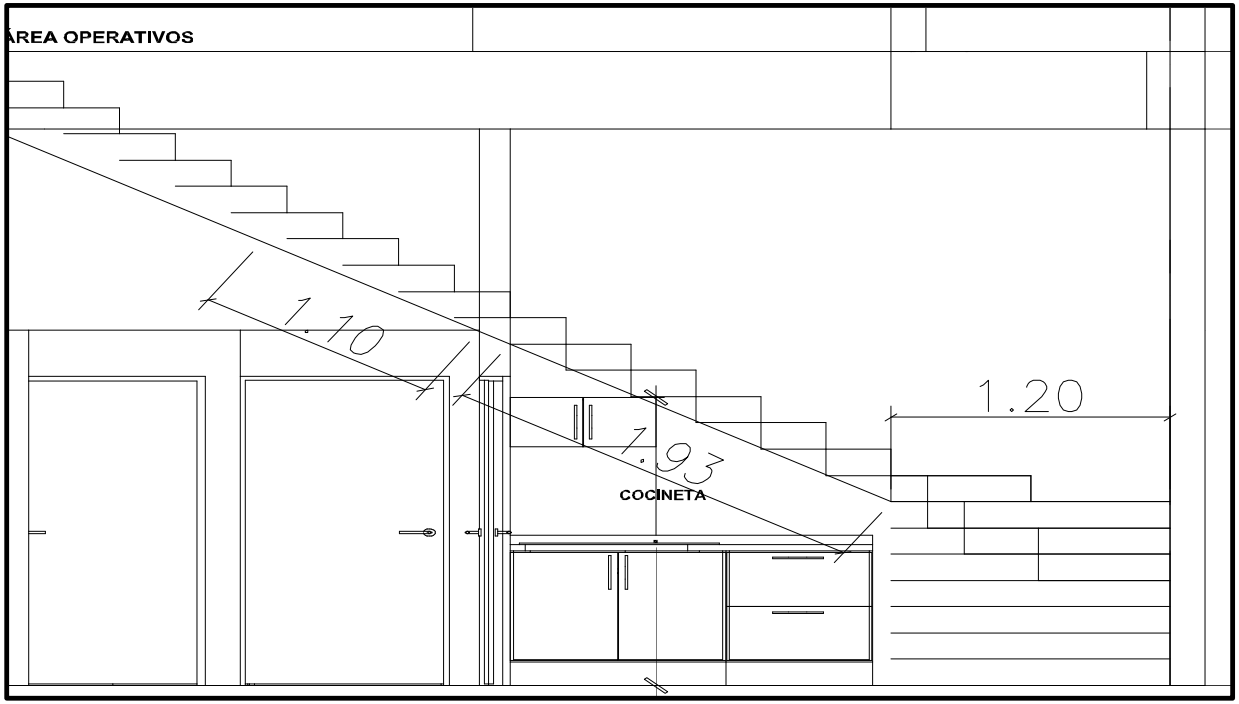

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad total**
N.P 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS BAJO PLACA	m2	8.66










OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 7	MURO DOBLE CARA DE e = 0.08 m., EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 8 MM.	m2	21.91

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
ENTRADA		2.30	3.60	1.00	m2	8.28	
VENTANILLA		0.90	0.90	-1.00	m2	-0.81	
PUERTA		1.00	2.00	-1.00	m2	-2.00	
SALA DE ENCUENTRO		4.15	3.60	1.00	m2	14.94	
ESCALERAS		1.36	0.55	1.00	m2	0.75	
		1.48	0.51	1.00	m2	0.75	
					Subtotal	21.91	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	21.91	
					COBRADO EN ACTAS	5.57	
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	16.34	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 7	MURO DOBLE CARA DE e = 0.08 m., EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 8 MM.	m2	21.91

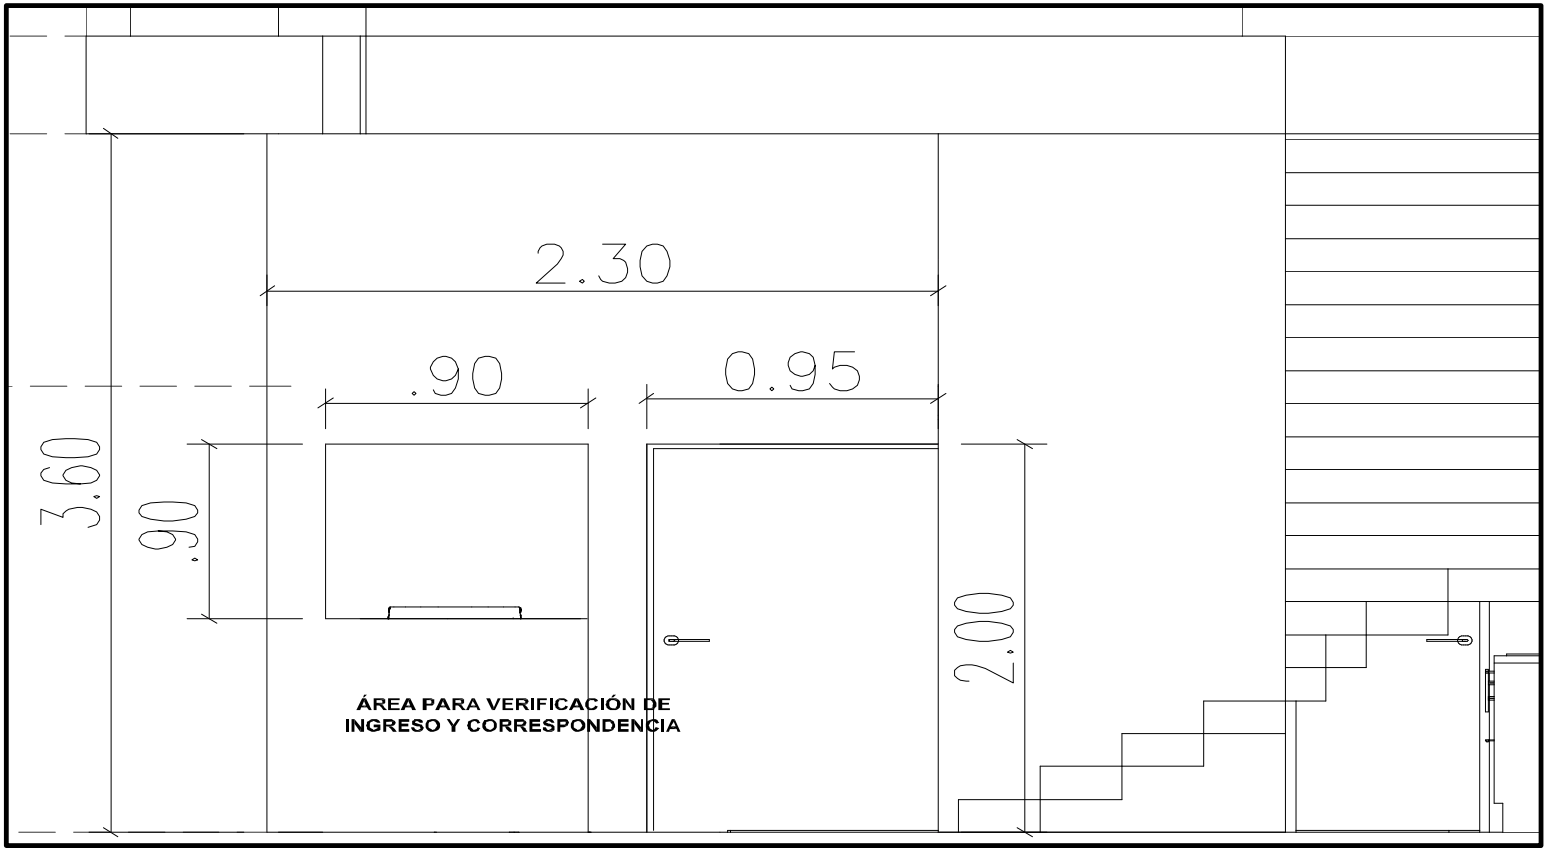

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 7	MURO DOBLE CARA DE e = 0.08 m., EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 8 MM.	m2	21.91

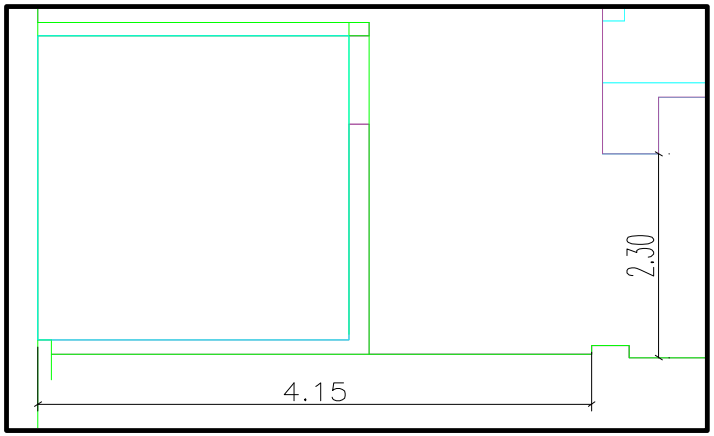

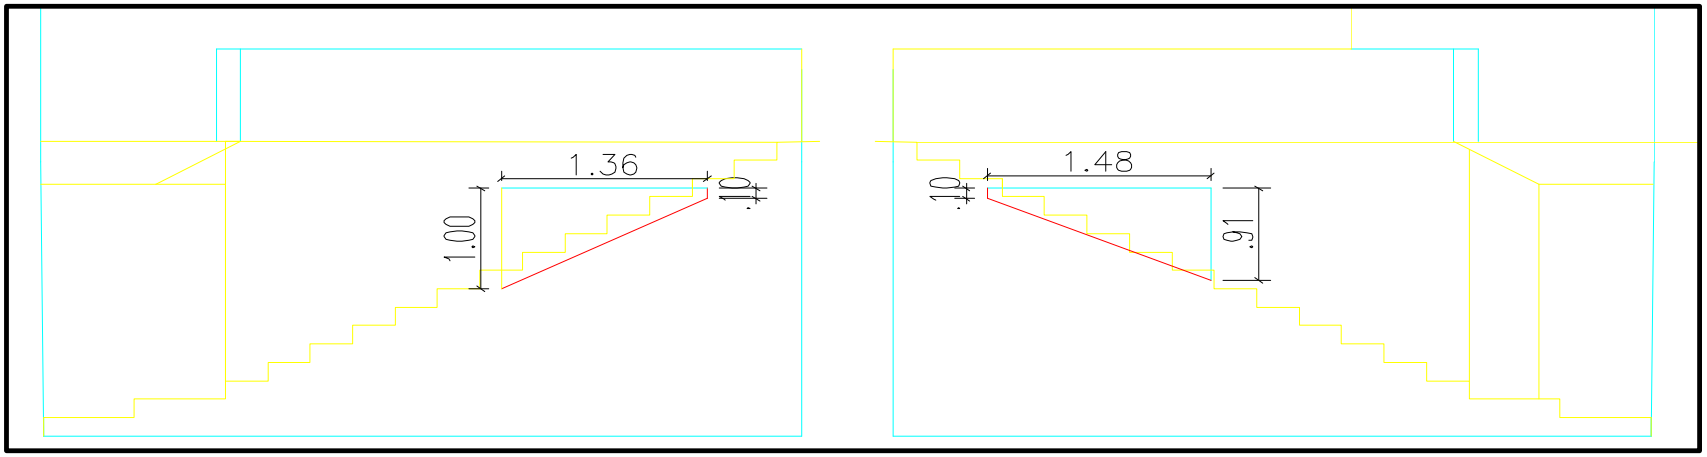

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 7	MURO DOBLE CARA DE e = 0.08 m., EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 8 MM.	m2	21.91











OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 12	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ANTIFLAMA LIBRE DE ALOGENO TIPO FPLR O THHW - LS DE 2*16 AWG	m	74.10

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto			
SEGUNDO PISO						
DETECTOR HUMO 1	6.30	---	1.40	1.00	m	7.70
DETECTOR HUMO 2	3.16	---	1.40	1.00	m	4.56
DETECTOR HUMO 3	2.46	---	1.40	1.00	m	3.86
DETECTOR HUMO 4	8.74	---	1.40	1.00	m	10.14
DETECTOR HUMO 5	12.86	---	1.40	1.00	m	14.26
DETECTOR HUMO 6	6.68	---	1.40	1.00	m	8.08
DETECTOR HUMO 7	9.20	---	2.10	1.00	m	11.30
DETECTOR HUMO 8	1.00		4.00	1.00	m	5.00
PRIMER PISO						
DETECTOR HUMO 1 A 2	6.92		1.00	1.00	m	7.92
DETECTOR HUMO 2 A 5	5.02		2.00	1.00	m	7.02
DETECTOR HUMO 5 A 4	5.96		2.00	1.00	m	7.96
DETECTOR HUMO 4 A 3	6.72		2.00	1.00	m	8.72
DETECTOR HUMO 3 A 9	9.98		2.00	1.00	m	11.98
DETECTOR HUMO 6 A 7	4.18		3.00	1.00	m	7.18
DETECTOR HUMO 7 A 8	3.30		3.00	1.00	m	6.30
DETECTOR HUMO 9 A 10	6.28		2.00	1.00	m	8.28
	1.98		1.00	1.00	m	2.98
DETECTOR HUMO 10 A 11	6.00		2.00	1.00	m	8.00
DETECTOR HUMO 11 A 12	3.78		2.00	1.00	m	5.78
DETECTOR HUMO 12 A 13	4.44		2.00	1.00	m	6.44
DETECTOR HUMO 13 A 14	3.56		1.00	1.00	m	4.56
DETECTOR HUMO 2 A ESTACION MANUAL 2	1.52		0.50	1.00	m	2.02
	2.12		0.50	1.00	m	2.62
	1.00		5.20	1.00	m	6.20
DETECTOR HUMO 11 A ESTACION MANUAL 3	2.88		1.00	1.00	m	3.88
	1.54		1.00	1.00	m	2.54
	0.90		1.00	1.00	m	1.90
	2.00		5.20	1.00	m	7.20
DETECTOR HUMO 9 HACIA PASE PLACA	6.28		2.00	1.00	m	8.28
	2.72		2.00	1.00	m	4.72
ESTACION MANUAL 1	4.80		2.00	1.00	m	6.80
	1.00		2.80	1.00	m	3.80
ALIMENTACION ZONA DE ABORDAJE	6.00			1.00	m	6.00
	11.90			1.00	m	11.90
BAJA			2.00	1.00	m	2.00
DETECTOR HUMO 15 A 16	8.40		1.00	1.00	m	9.40
DETECTOR HUMO 15 A 17	12.00		1.00	1.00	m	13.00
DETECTOR HUMO 17 A 18	8.40		1.00	1.00	m	9.40
DETECTOR HUMO 17 A 19	12.00		1.00	1.00	m	13.00
DETECTOR HUMO 19 A 20	8.40		1.00	1.00	m	9.40
					Subtotal	282.08
					TOTAL EJECUTADO	**282.08**
					COBRADO EN ACTAS	207.98
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**74.10**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBSERVACIONES: El cableado es el doble del largo de la tuberia instalada y se suma las puntas para hacer la conexión con los sensores de humo, las alarmas estroboscopicas y las estaciones manuales


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

WilsonPazosBastidas
APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 12	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ANTIFLAMA LIBRE DE ALOGENO TIPO FPLR O THHW - LS DE 2*16 AWG	m	74.10

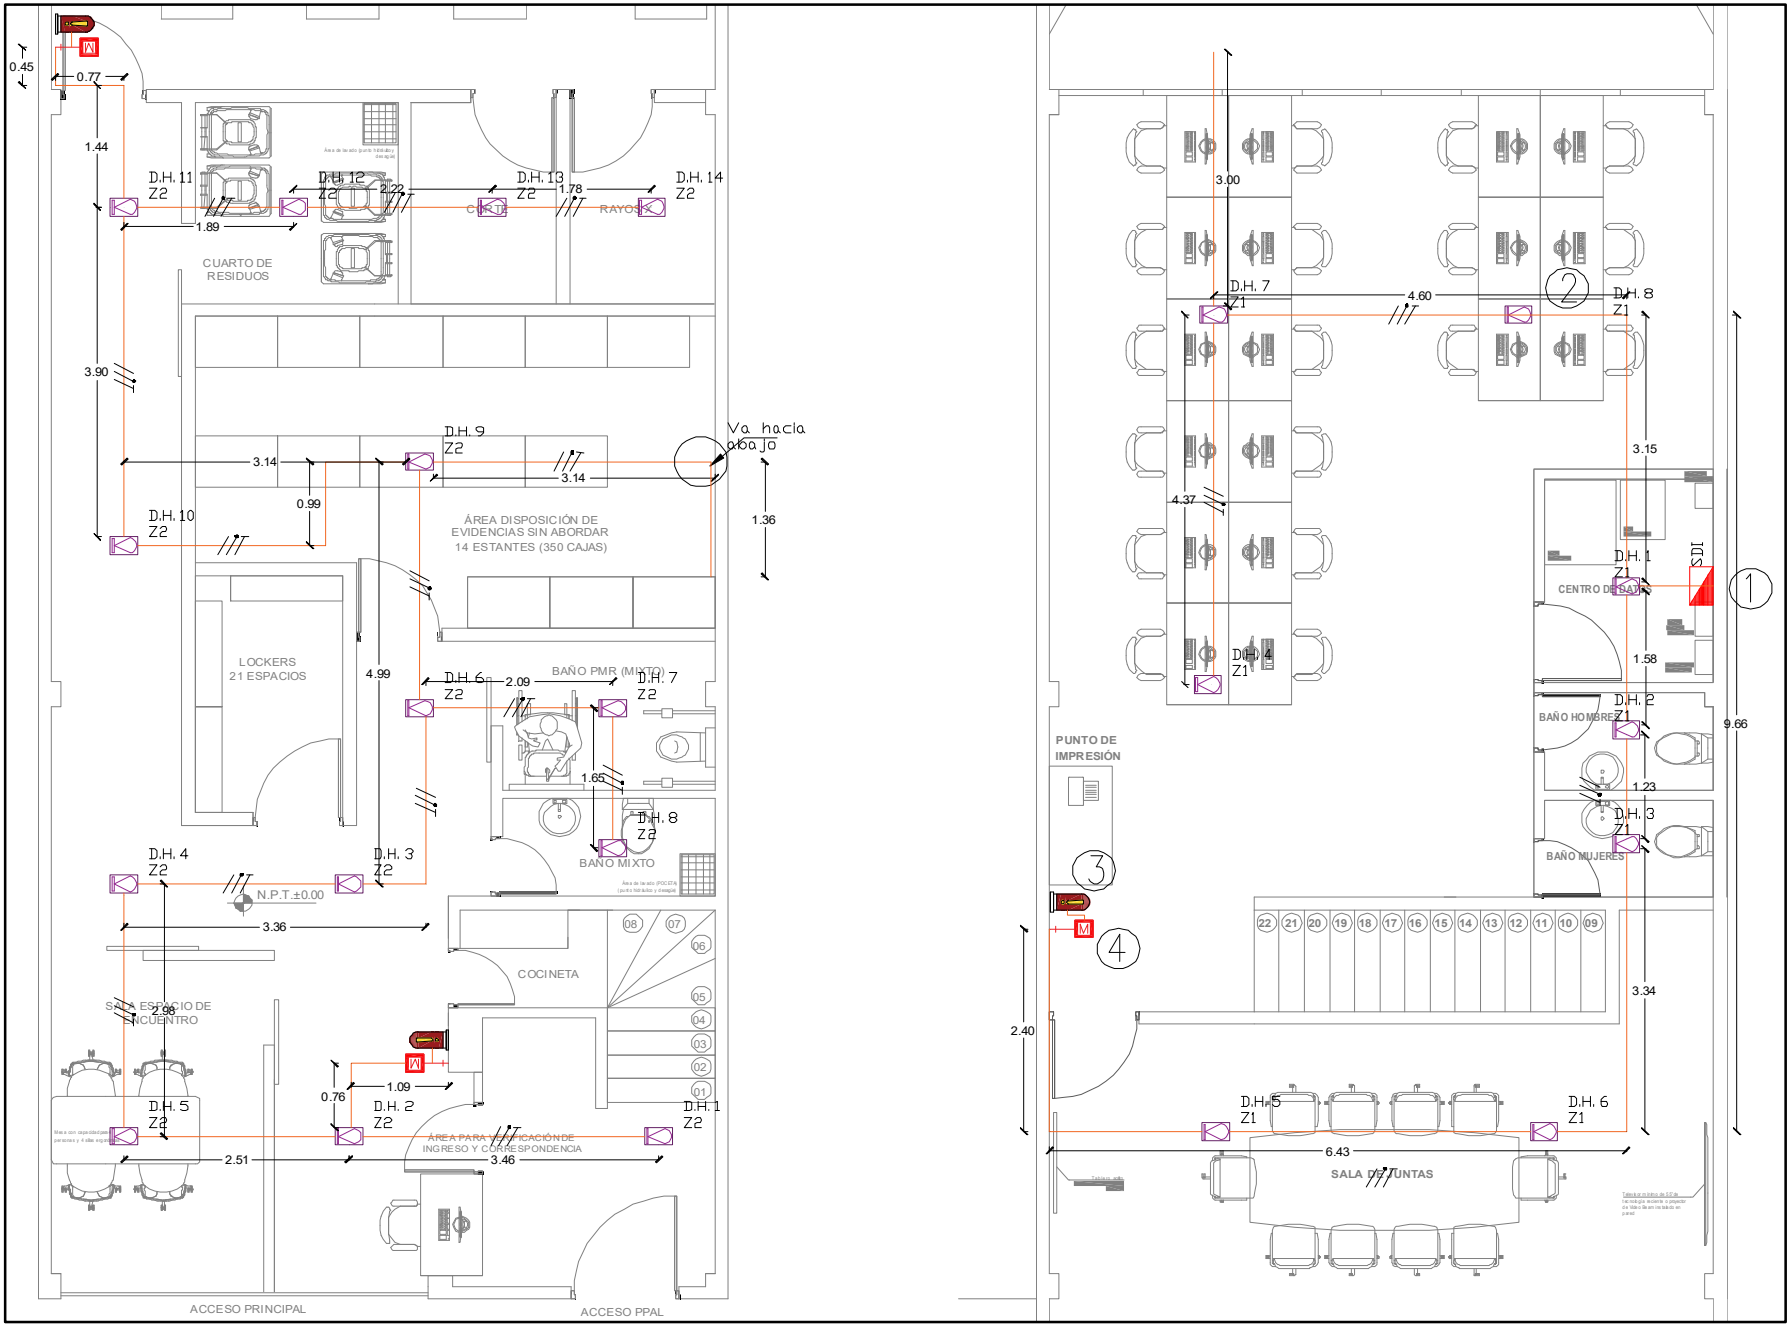

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 12	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ANTIFLAMA LIBRE DE ALOGENO TIPO FPLR O THHW - LS DE 2*16 AWG	m	74.10

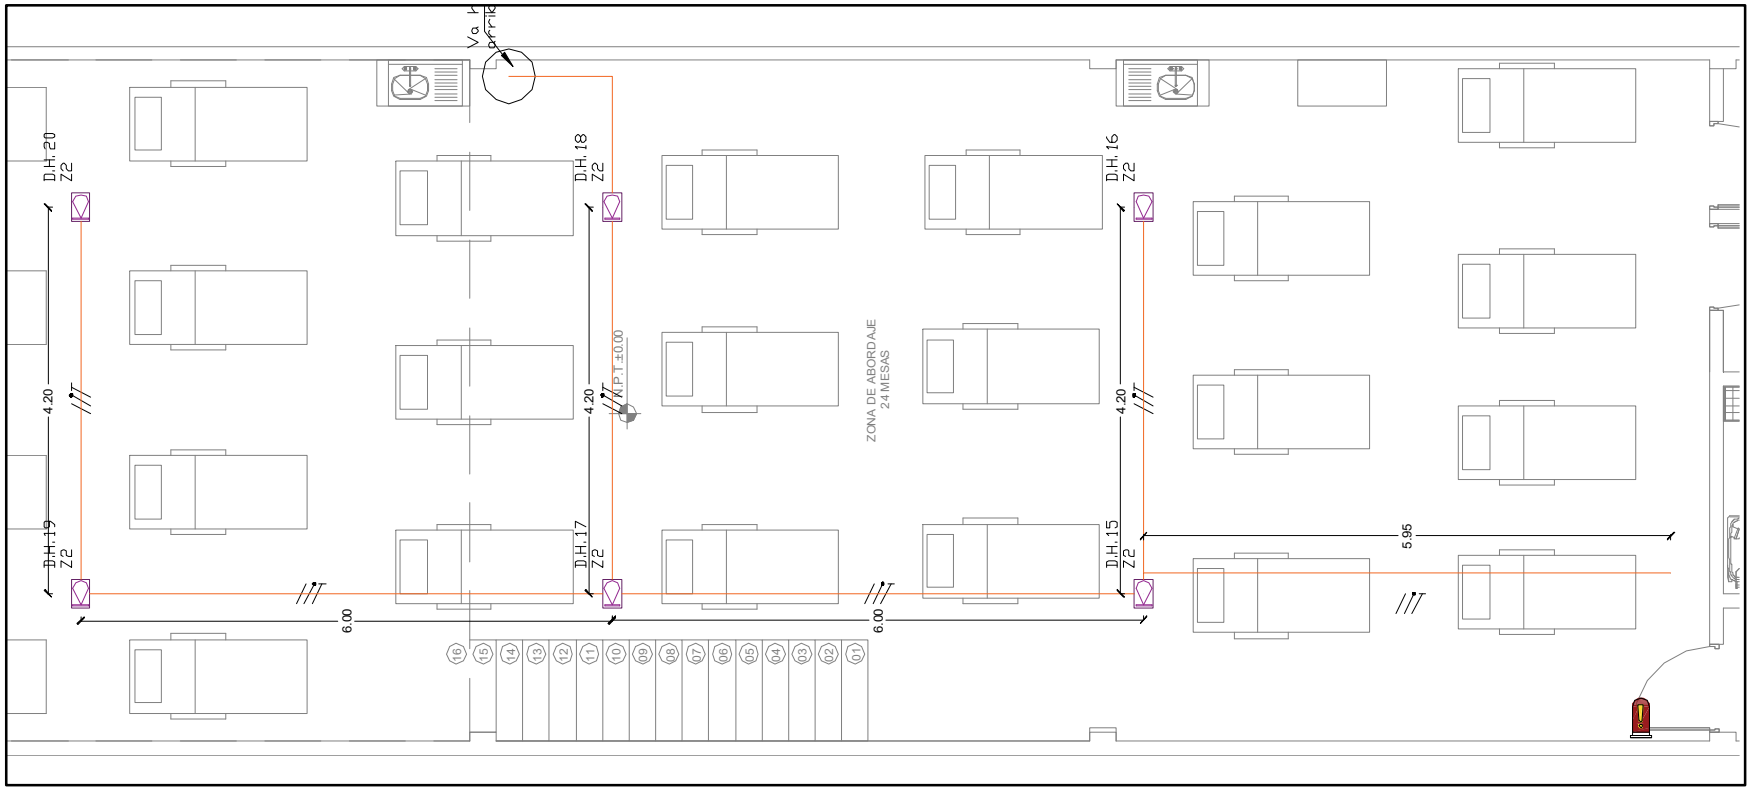

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 12	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ANTIFLAMA LIBRE DE ALOGENO TIPO FPLR O THHW - LS DE 2*16 AWG	m	74.10














OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE TIPO L PISO PARED PARA BAÑO PMR	und	2.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
BAÑO PMR				2.00	un	2.00	
					Subtotal	2.00	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	2.00	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE TIPO L PISO PARED PARA BAÑO PMR	und	2.00

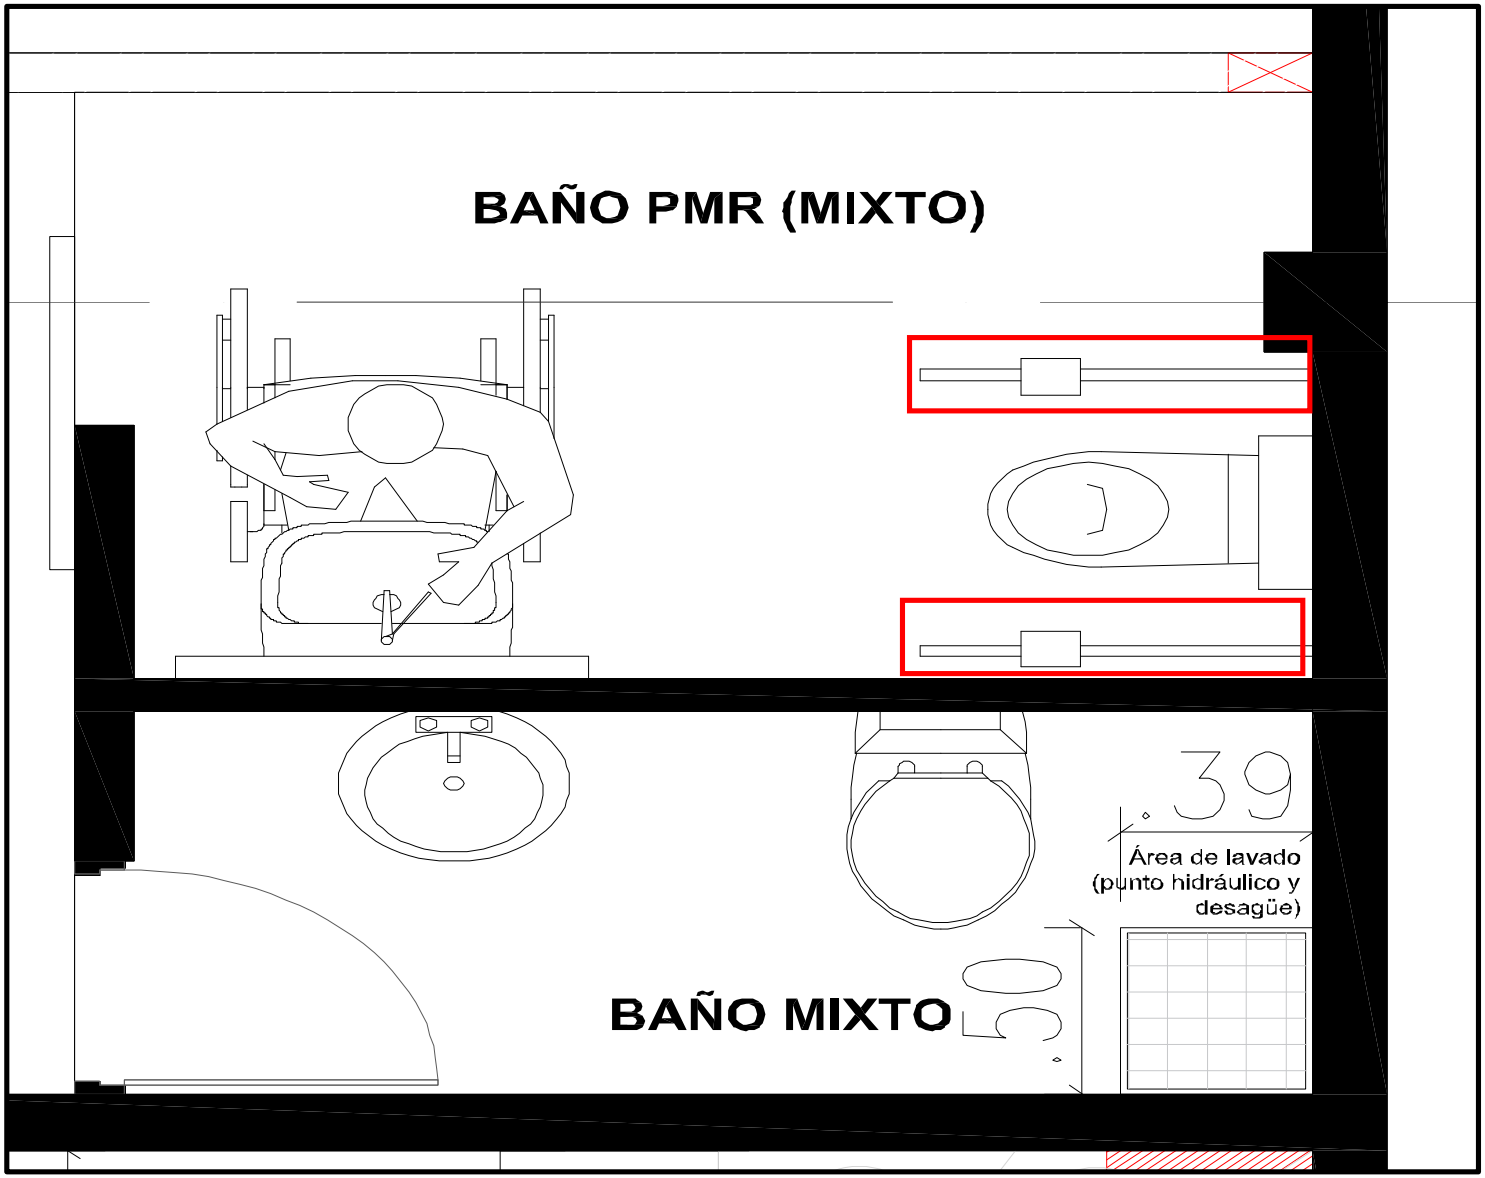

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE TIPO L PISO PARED PARA BAÑO PMR	und	2.00







OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**


CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 15	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS EN ALUMINIO BLANCO PERFIL TIPO T, PARA MONTAJE DE LAMPARAS LED DE 60X60 cm EN CIELO RASO	und	18.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto			
MODULOS OFICINAS				10.00	un	10.00
SALA DE JUNTAS				6.00	un	6.00
BAÑO PMR - MANHOLE CONEXIÓN AIRE				1.00	un	1.00
EVIDENCIAS SIN ABORDAR				1.00	un	1.00
					Subtotal	18.00
					TOTAL EJECUTADO	**18.00**
					COBRADO EN ACTAS	16.00
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**2.00**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

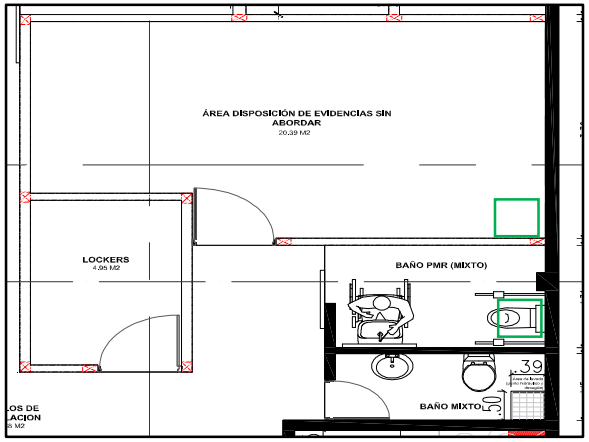

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

ING. BERNARDO SOTO GARCÍA
SUPERVISOR UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 15	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS EN ALUMINIO BLANCO PERFIL TIPO T, PARA MONTAJE DE LAMPARAS LED DE 60X60 cm EN CIELO RASO	und	18.00

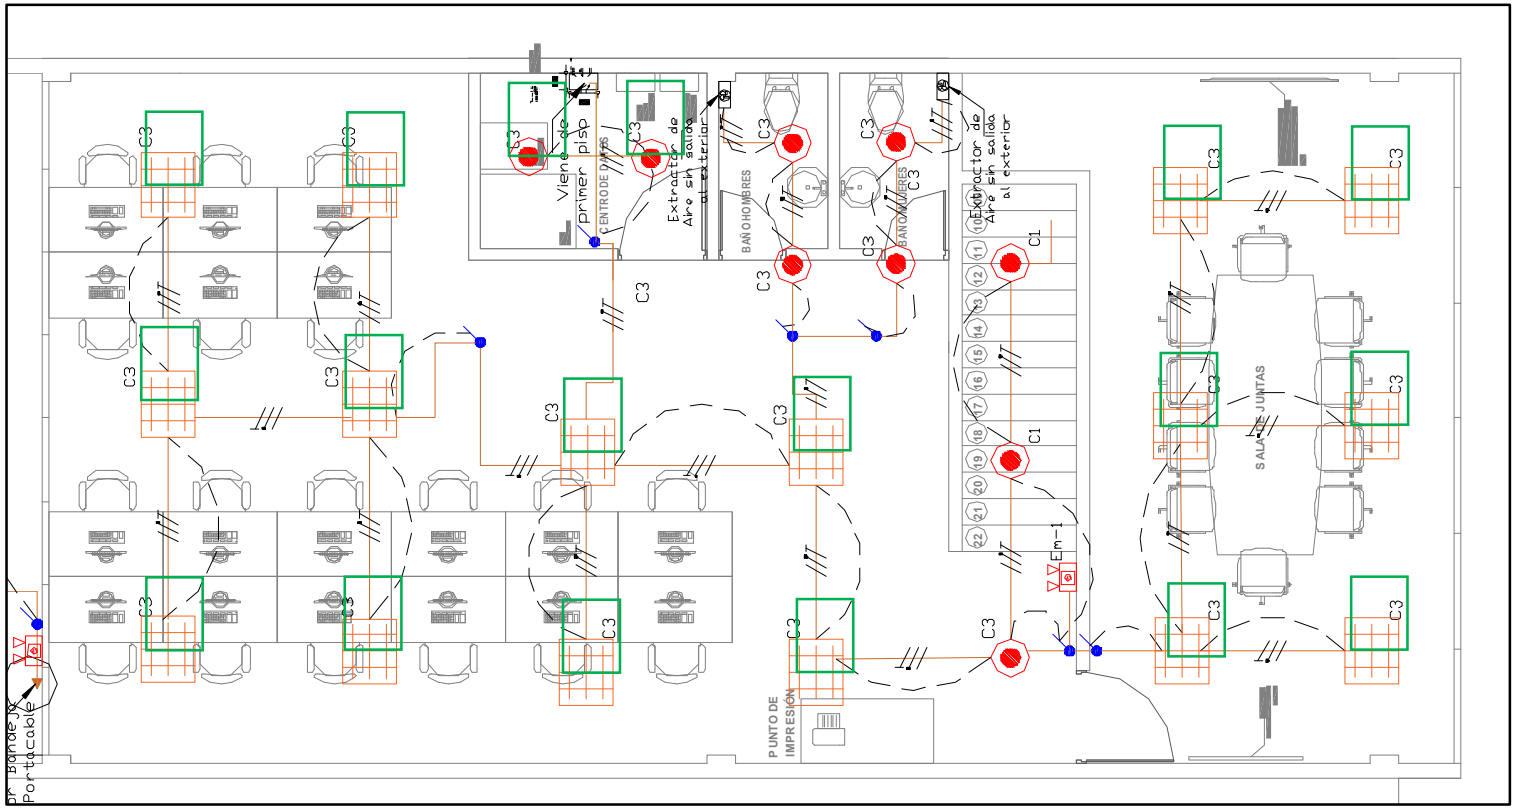

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 15	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS EN ALUMINIO BLANCO PERFIL TIPO T, PARA MONTAJE DE LAMPARAS LED DE 60X60 cm EN CIELO RASO	und	18.00

















OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 16	LAVAMANOS MANOS LIBRES EN ACERO INOXIDABLE CON PEDAL HIDRAULICO, PARA ZONA DE ABORDAJE	und	2.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto			
ZONA DE ABORDAJE				2.00	un	2.00
					Subtotal	2.00
					TOTAL EJECUTADO	**2.00**
					COBRADO EN ACTAS	
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**2.00**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBSERVACIONES:

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 16	LAVAMANOS MANOS LIBRES EN ACERO INOXIDABLE CON PEDAL HIDRAULICO, PARA ZONA DE ABORDAJE	und	2.00

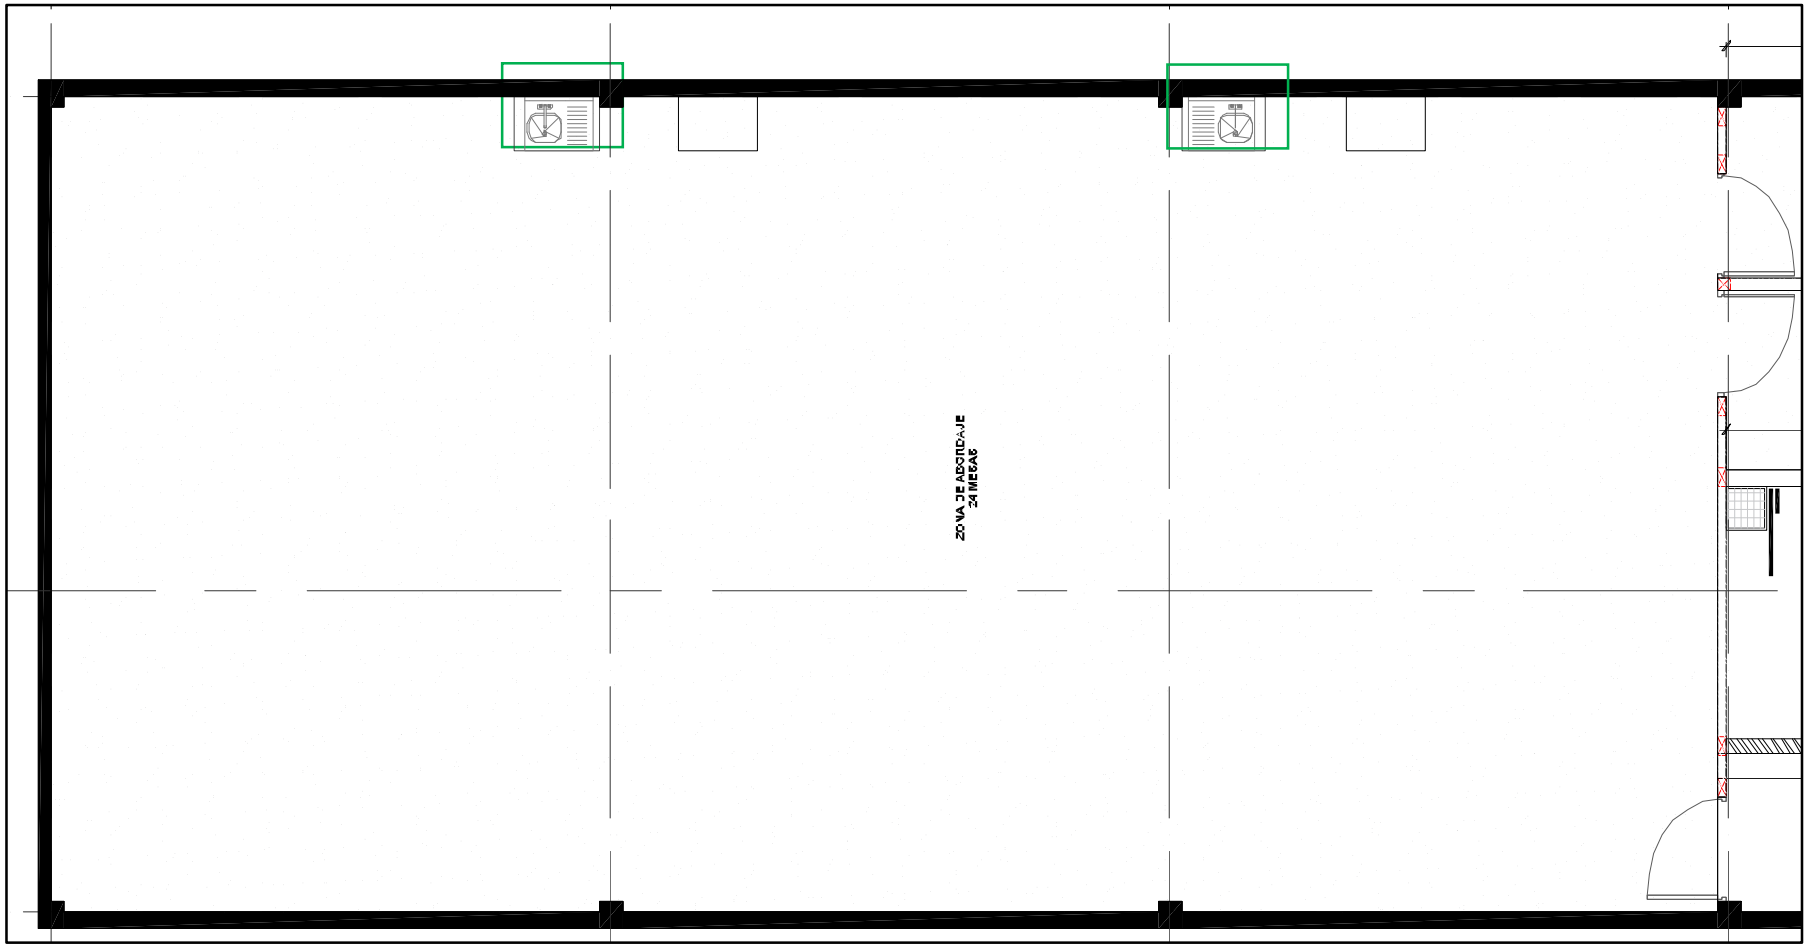

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 16	LAVAMANOS MANOS LIBRES EN ACERO INOXIDABLE CON PEDAL HIDRAULICO, PARA ZONA DE ABORDAJE	und	2.00












OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 18	LIMPIEZA Y PINTURA ORNAMENTACION	m	53.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
VENTANERIA POSTERIOR	1.30			9.00	m	11.70	
	7.40			2.00	m	14.80	
VENTANERIA ANTERIOR	1.30			9.00	m	11.70	
	7.40			2.00	m	14.80	
					Subtotal	53.00	
					TOTAL EJECUTADO	**53.00**	
					COBRADO EN ACTAS		
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**53.00**	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 18	LIMPIEZA Y PINTURA ORNAMENTACION	m	53.00

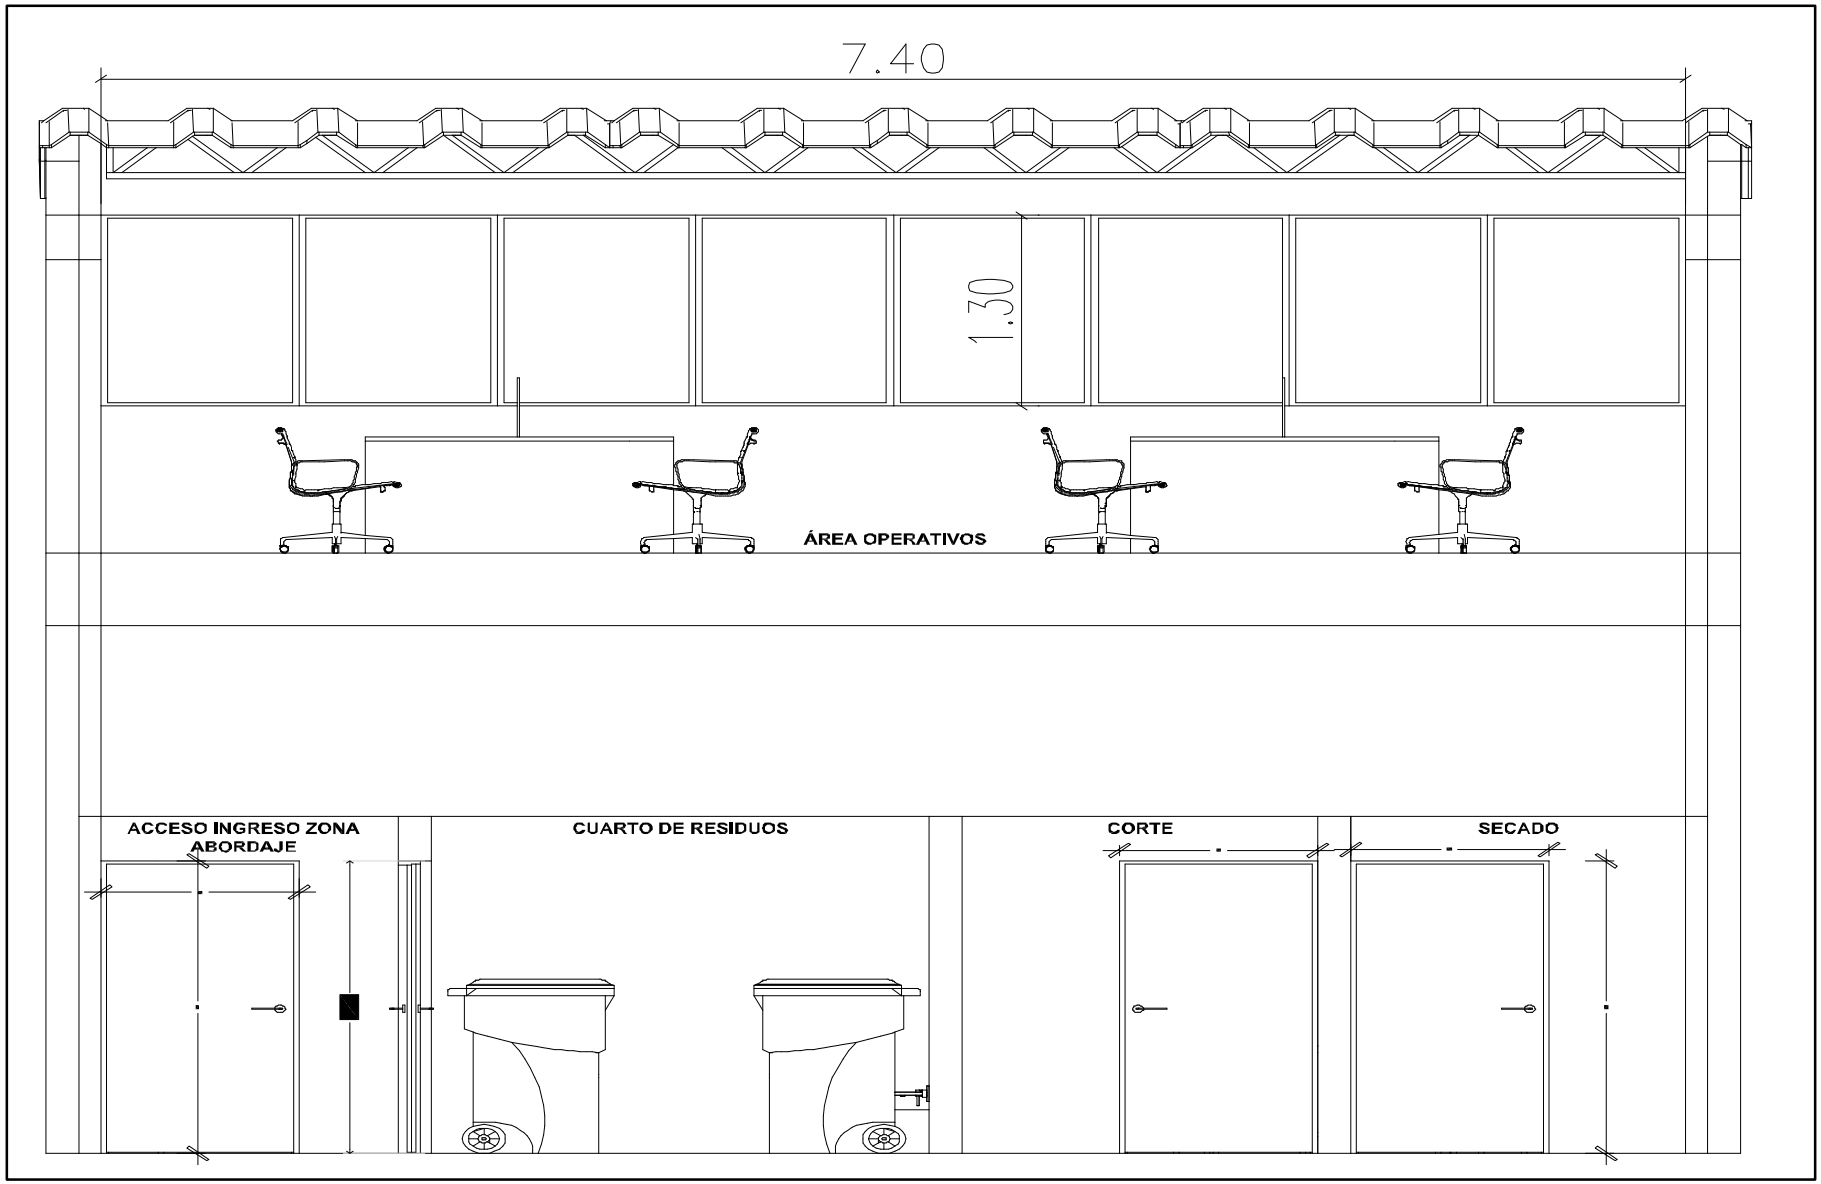

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 18	LIMPIEZA Y PINTURA ORNAMENTACION	m	53.00

















OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 19	LIMPIEZA Y PINTURA Y CORTE DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL	m2	4.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto			
PUERTA				4.00	m2	4.00
					Subtotal	4.00
					TOTAL EJECUTADO	**4.00**
					COBRADO EN ACTAS	
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**4.00**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 19	LIMPIEZA Y PINTURA Y CORTE DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL	m2	4.00

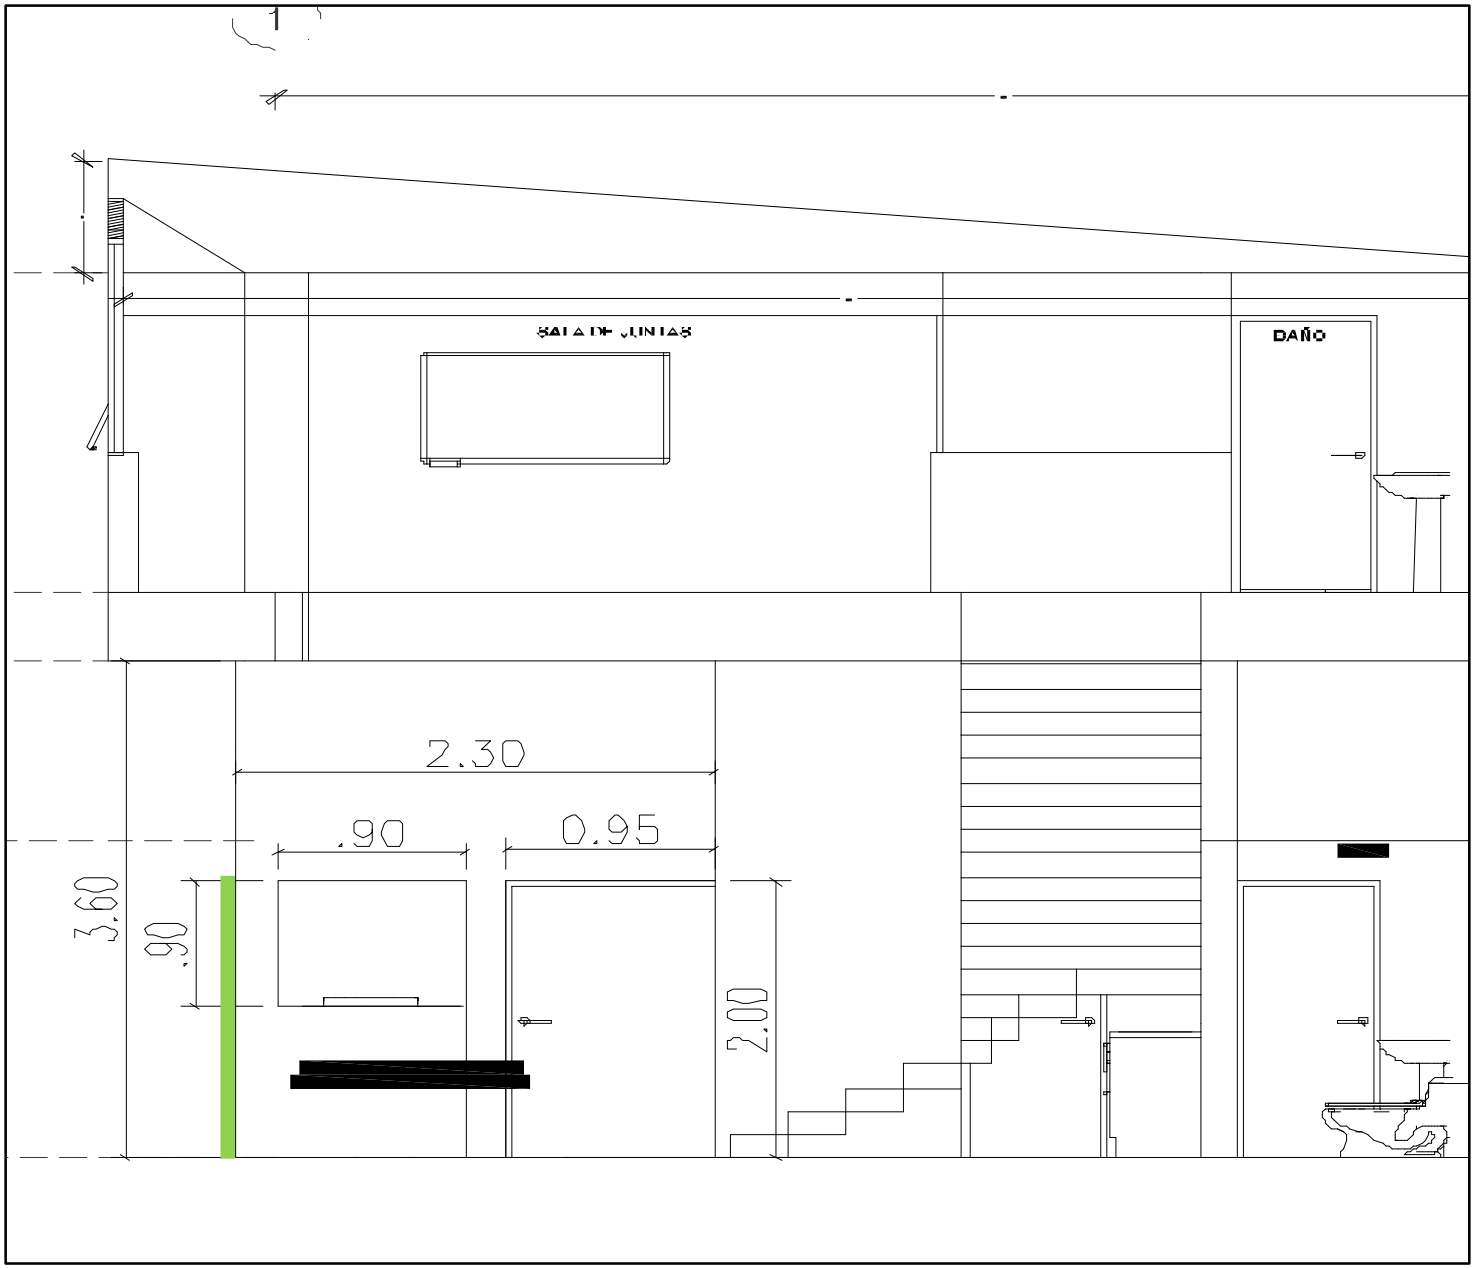

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 19	LIMPIEZA Y PINTURA Y CORTE DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL	m2	4.00

















OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025


CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 21	DUCTOS EN SUPERBOARD PARA RECUBRIMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	m	19.50

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto			
ZONA DE ABORDAJE BAJANTE 1			6.30	1.00	m	6.30
ZONA DE ABORDAJE BAJANTE 2			6.35	1.00	m	6.35
PUNTO DE ENCUENTRO			2.60	1.00	m	2.60
BAÑO PMR			2.60	1.00	m	2.60
BAÑO MIXTO			2.60	1.00	m	2.60
TABLERO DE CIRCUITOS			3.60	1.00	m	3.60
BAÑOS SEGUNDO PISO			2.40	2.00	m	4.80
CENTRO DE DATOS - CABLEADO			0.90	1.00	m	0.90
CENTRO DE DATOS AIRE ACONDICIONADO			2.40	1.00	m	2.40
					Subtotal	**32.15**
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	**32.15**
					COBRADO EN ACTAS	12.65
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**19.50**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

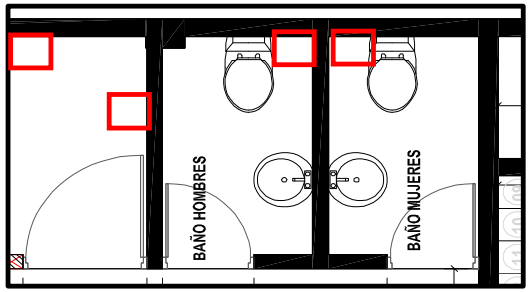

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD+


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 21	DUCTOS EN SUPERBOARD PARA RECUBRIMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	m	19.50

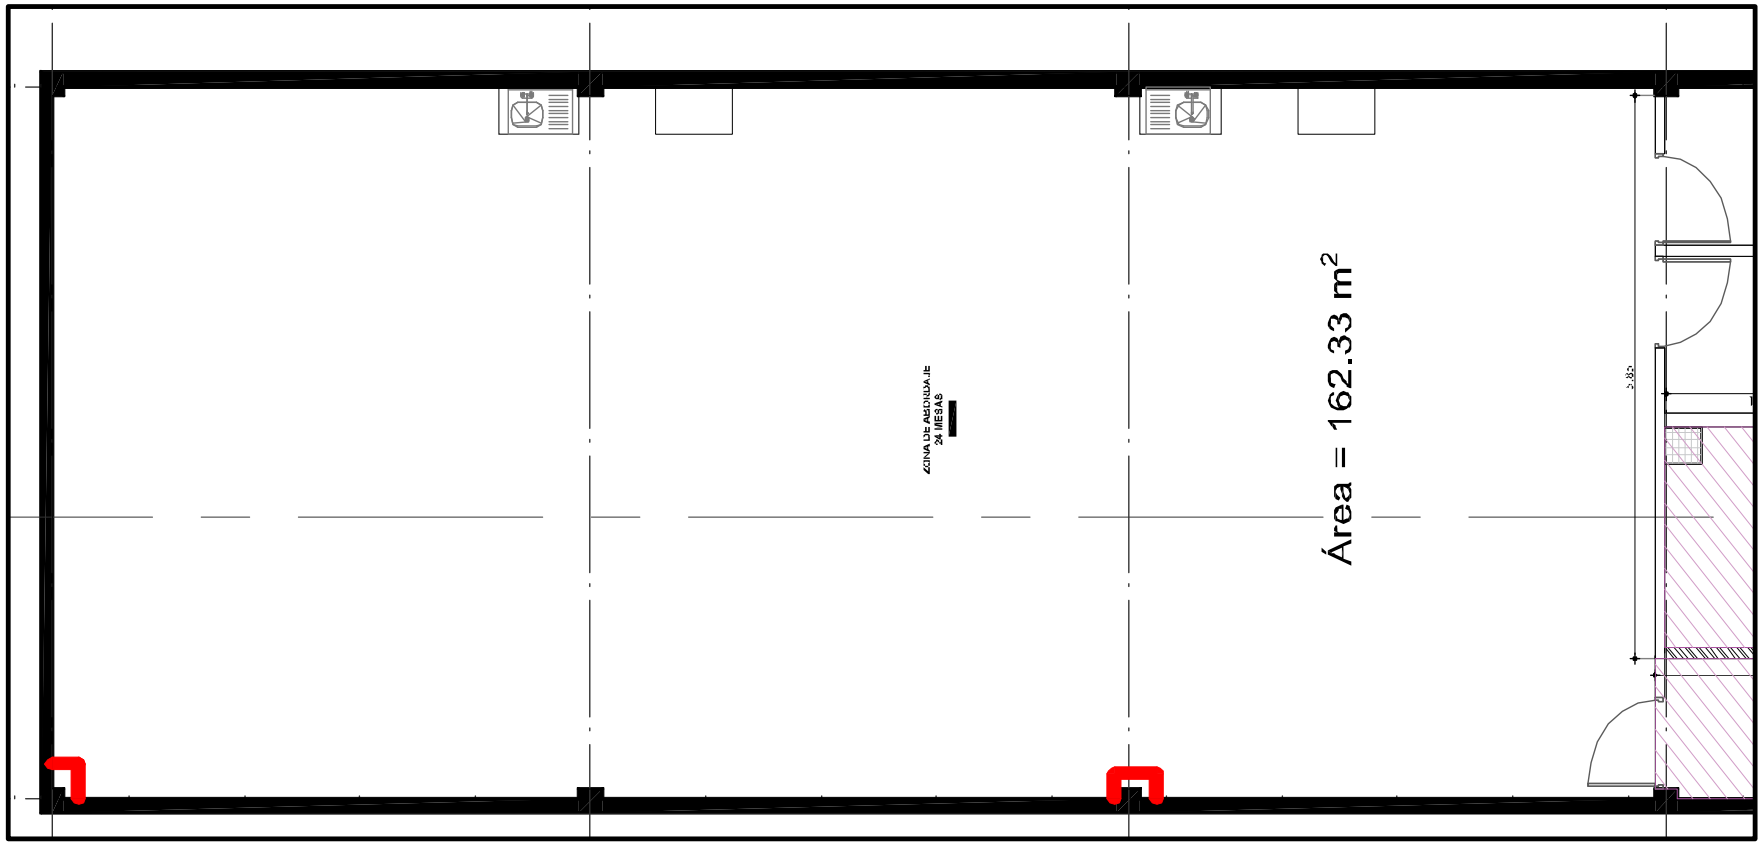

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 21	DUCTOS EN SUPERBOARD PARA RECUBRIMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	m	19.50

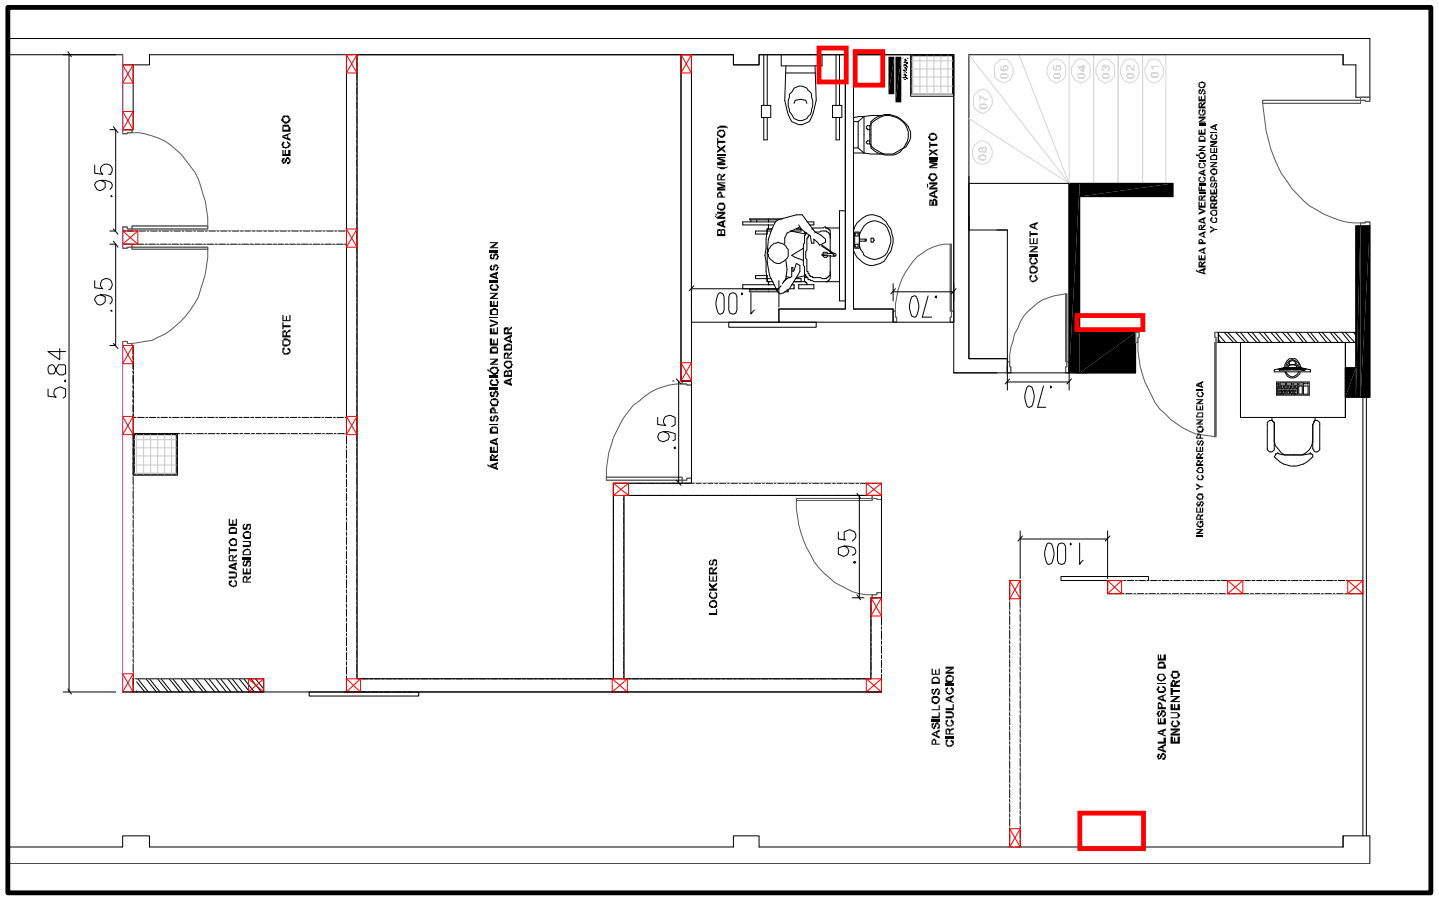

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 21	DUCTOS EN SUPERBOARD PARA RECUBRIMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	m	19.50











OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 22	DESMONTE DE CIELO RASO EN MADERA	m2	2.17

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
BAÑO HOMBRES 2PISO	1.88	1.15		1.00	m2	2.16	
BAÑO MUJERES 2 PISO	1.88	1.15		1.00	m2	2.16	
BAÑO HOMBRES 1ER PISO	2.37	1.15		1.00	m2	2.73	
BAÑO MUJERES 1ER PISO	2.37	1.15		1.00	m2	2.73	
					Subtotal	**9.78**	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	**9.78**	
					COBRADO EN ACTAS	7.61	
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**2.17**	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 22	DESMONTE DE CIELO RASO EN MADERA	m2	2.17

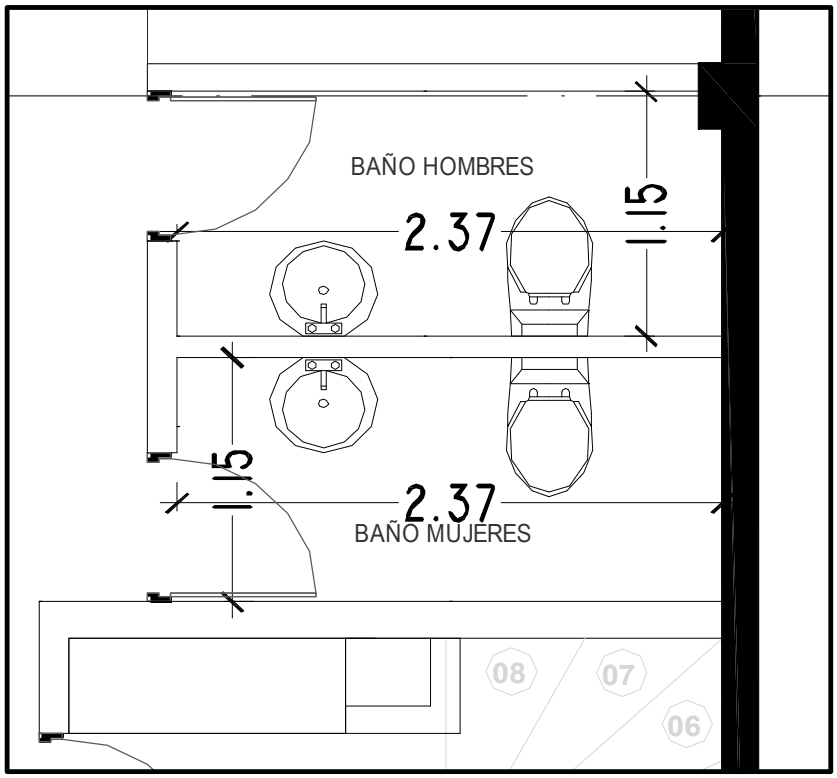

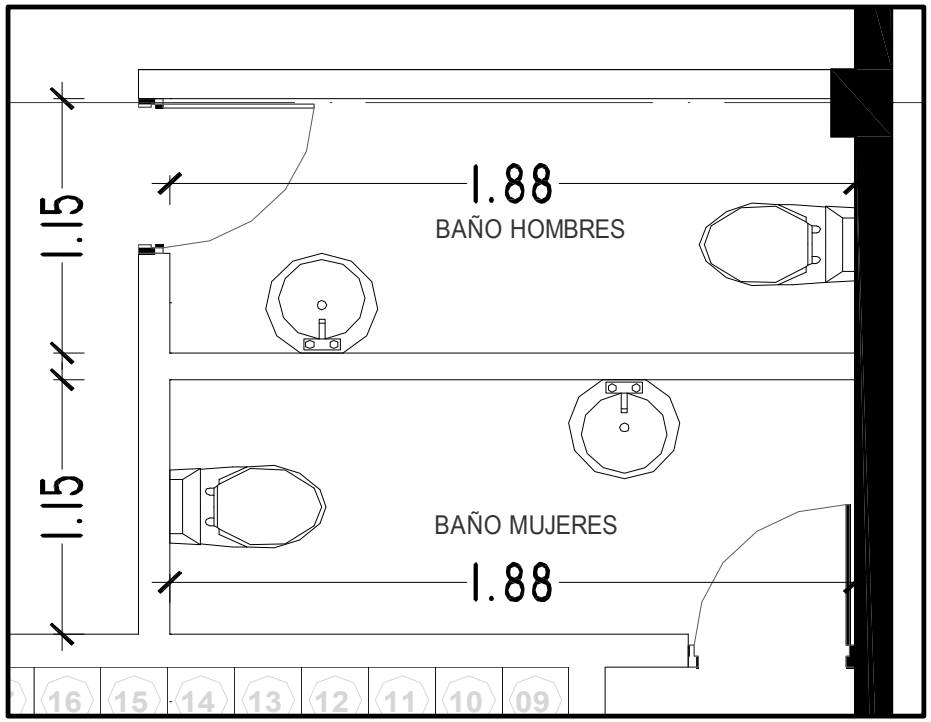

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad total**
N.P 22	DESMONTE DE CIELO RASO EN MADERA	m2	2.17





OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN VIDRIO TEtemplado DE SEGURIDAD DE 10 mm DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS Y ARISTAS BISELADAS, CON HERRAJES TIPO PATCH FITTING Y PIVOTE SUPERIOR E INFERIOR. INCLUYE CERRADURA TUBULAR PREMIUM DE PALANCA CON ESCUDO CUADRADO ACABADO NEGRO MATE, LA HOJA LLEVARA APLIACION DE PELICULA TIPO FROST.	m2	4.96

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
ZONA ENTRADA ABORDAJE P - 08		1.38	2.00	1.00	m2	2.76	
SALA DE JUNTAS P-14		1.00	2.20	1.00	m2	2.20	
					Subtotal	4.96	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	4.96	


OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI


APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			FECHA
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad total**
N.P 23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 10 mm DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS Y ARISTAS BISELADAS, CON HERRAJES TIPO PATCH FITTING Y PIVOTE SUPERIOR E INFERIOR. INCLUYE CERRADURA TUBULAR PREMIUM DE PALANCA CON ESCUDO CUADRADO ACABADO NEGRO MATE, LA HOJA LLEVARA APLIACION DE PELICULA TIPO FROST.	m2	4.96

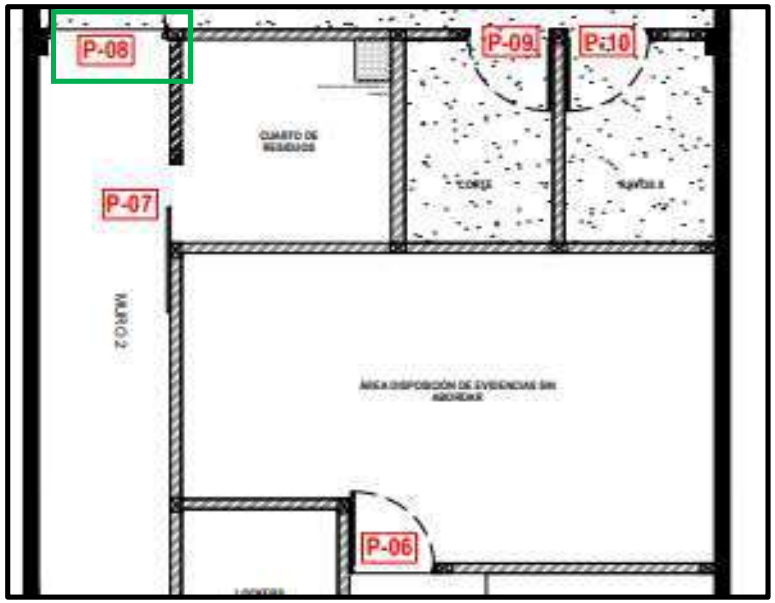


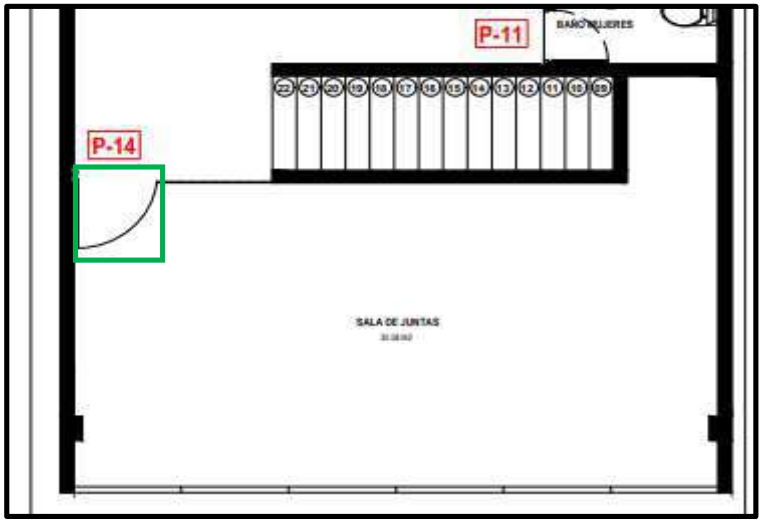

P-08	
ALTO	2.00 m
ANCHO	1.00 m
CANTIDAD	1
ESPECIFICACIONES	
Suministro, transporte e instalación de conjunto en vidrio templado de seguridad de 10 mm de espesor, compuesto por un panel fijo y una puerta batiente de una hoja, con cantos pulidos y aristas biseladas. La hoja móvil contará con herrajes tipo patch fitting con pivote superior e inferior y cerradura tubular premium de palanca con escudo cuadrado acabado negro mate, igual a la especificada en las demás puertas del proyecto. Instalada mediante sistema compatible para vidrio templado. El panel fijo se instalará con perfiles o herrajes de sujeción certificados, garantizando estabilidad estructural. Incluye elementos llevados aplicación de película tipo frost (acabado esmerilado) con diseño institucional de la entidad, instalada por personal especializado, asegurando alineación y acabado uniforme libre de imperfecciones. Incluye aplome, aplome, nivelación, ajuste de herrajes y entrega en perfecto funcionamiento para uso interior en oficina.	
NOTA: LAS MEDIDAS DE ESTE PLANO SON INDICATIVAS Y PUEDEN VARIAR SEGÚN LA OBRA EL FABRICANTE DEBE TOMAR LAS MEDIDAS REALES EN EL SITIO	




P-14	
ALTO	Dilatado 10 cm de techo
ANCHO	0.95 m
CANTIDAD	1
ESPECIFICACIONES	
Suministro, transporte e instalación de puerta batiente de una hoja en vidrio templado de seguridad de 10 mm de espesor, dimensiones según planos, con cantos pulidos y herrajes tipo patch fitting con pivote superior e inferior. Incluye cerradura tubular premium de palanca con escudo cuadrado acabado negro mate, igual a la especificada en las demás puertas de proyecto, instalada con herraje compatible para vidrio templado. La hoja llevará aplicación de película tipo frost (acabado esmerilado) con diseño institucional de la entidad, instalada por personal especializado, garantizando alineación, acabado uniforme y libre de burbujas. Incluye aplome, nivelación, ajuste de herrajes y entrega en perfecto funcionamiento para uso interior en oficina.	
NOTA: LAS MEDIDAS DE ESTE PLANO SON INDICATIVAS Y PUEDEN VARIAR SEGÚN LA OBRA EL FABRICANTE DEBE TOMAR LAS MEDIDAS REALES EN EL SITIO.	

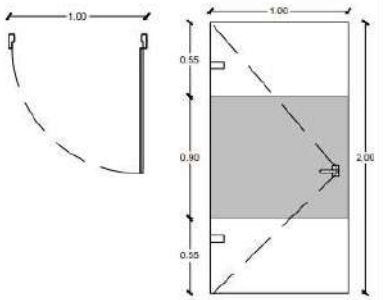

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 10 mm DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS Y ARISTAS BISELADAS, CON HERRAJES TIPO PATCH FITTING Y PIVOTE SUPERIOR E INFERIOR. INCLUYE CERRADURA TUBULAR PREMIUM DE PALANCA CON ESCUDO CUADRADO ACABADO NEGRO MATE, LA HOJA LLEVARA APLIACION DE PELICULA TIPO FROST.	m2	4.96

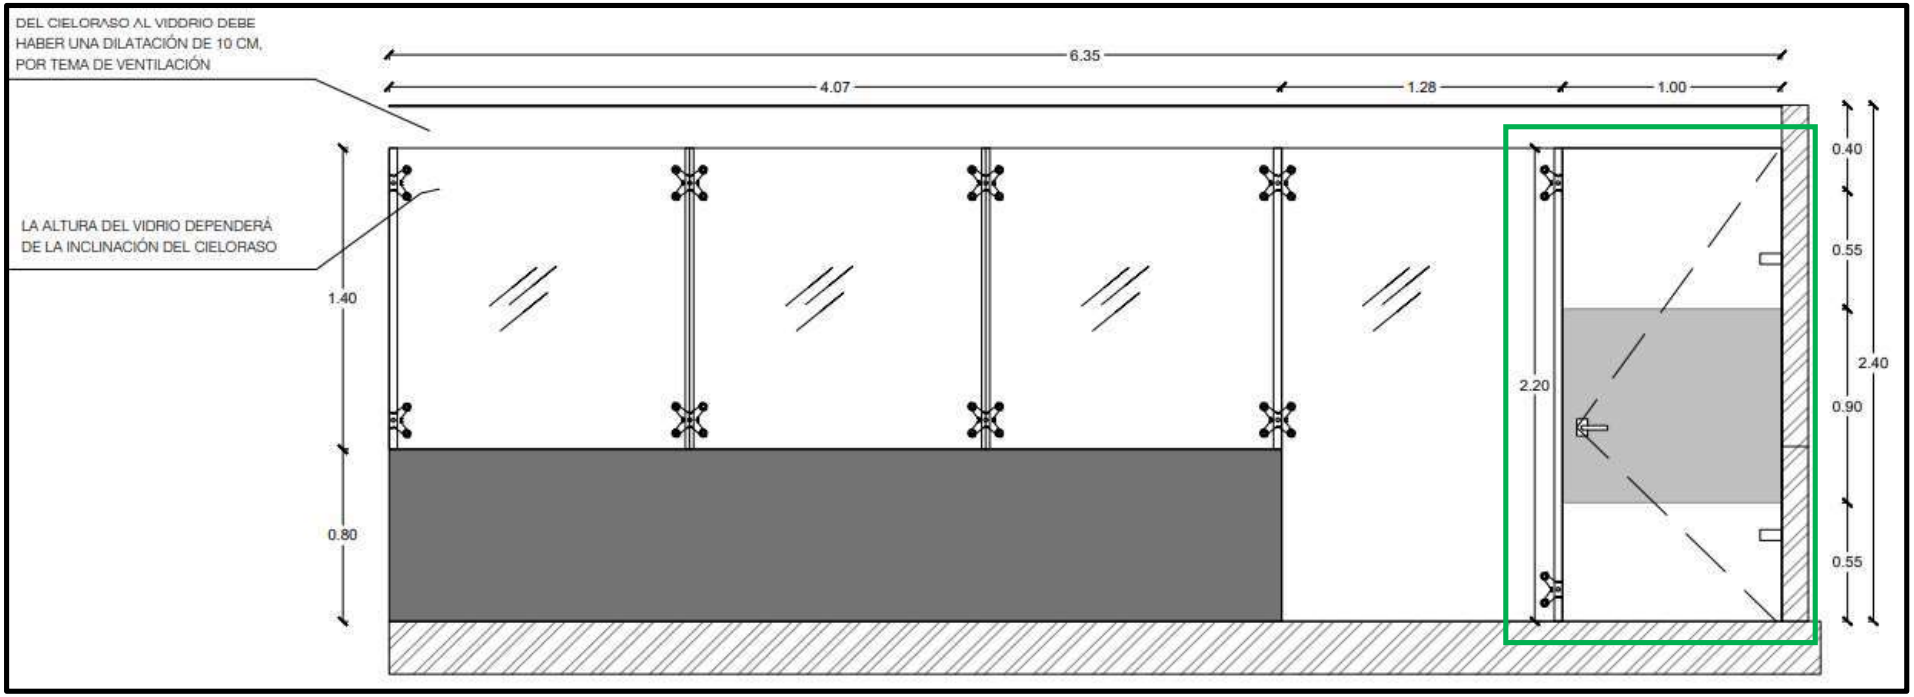

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 10 mm DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS Y ARISTAS BISELADAS, CON HERRAJES TIPO PATCH FITTING Y PIVOTE SUPERIOR E INFERIOR. INCLUYE CERRADURA TUBULAR PREMIUM DE PALANCA CON ESCUDO CUADRADO ACABADO NEGRO MATE, LA HOJA LLEVARA APLIACION DE PELICULA TIPO FROST.	m2	4.96



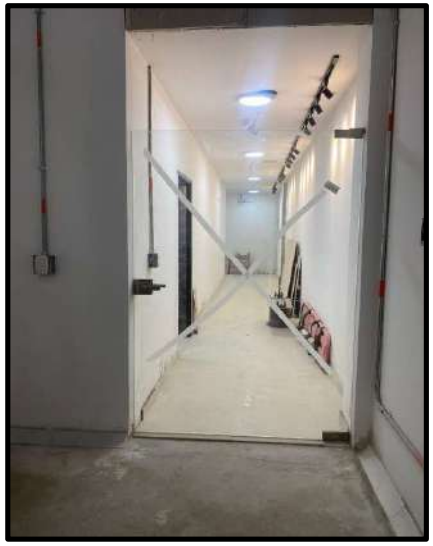






OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 24	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTAIACIÓN DE PUERTA DESLIZABLE INTERIOR TIPO COLGANTE, ESPESOR APROXIMADO DE 35mm, FABRICADA EN TABLERO DE MADERA SOLIDA PRENSADA, ENCHAPADA EN LAMINADO MELAMINICO ACABADO MATE, CON CANTOS SELLADOS EN PVC. SISTEMA DE DESLIZAMIENTO SUPERIOR MEDIANTE RIEL METALICO OCULTO CON CARROS DE RODAMIENTO DE ALTA RESISTENCIA Y GUÍA INFERIOR DISCRETA PARA ESTABILIDAD. INCLUYE MARCO EN MDF O MADERA ENCHAPADA Y CENEFA O TAPA SUPERIOR EN MDF PARA OCULTAR EL RIEL. INCLUYE JALADERA EMBUTIDA TIPO UÑERO O CERRADURA TIPO CERROJO MARIPOSA SEGÚN CORRESPONDA	m2	4.41


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
SALA ESPACIO DE ENCUENTRO P - 02		1.05	2.10	1.00	m2	2.21	
BAÑO PMR P - 05		1.05	2.10	1.00	m2	2.21	
					Subtotal	4.41	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	4.41	
OBSERVACIONES:							


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			FECHA
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad total**
N.P 24	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTAIACIÓN DE PUERTA DESLIZABLE INTERIOR TIPO COLGANTE, ESPESOR APROXIMADO DE 35mm, FABRICADA EN TABLERO DE MADERA SOLIDA PRENSADA, ENCHAPADA EN LAMINADO MELAMINICO ACABADO MATE, CON CANTOS SELLADOS EN PVC. SISTEMA DE DESLIZAMIENTO SUPERIOR MEDIANTE RIEL METALICO OCULTO CON CARROS DE RODAMIENTO DE ALTA RESISTENCIA Y GUÍA INFERIOR DISCRETA PARA ESTABILIDAD. INCLUYE MARCO EN MDF O MADERA ENCHAPADA Y CENEFA O TAPA SUPERIOR EN MDF PARA OCULTAR EL RIEL. INCLUYE JALADERA EMBUTIDA TIPO UÑERO O CERRADURA TIPO CERROJO MARIPOSA SEGÚN CORRESPONDA	m2	4.41

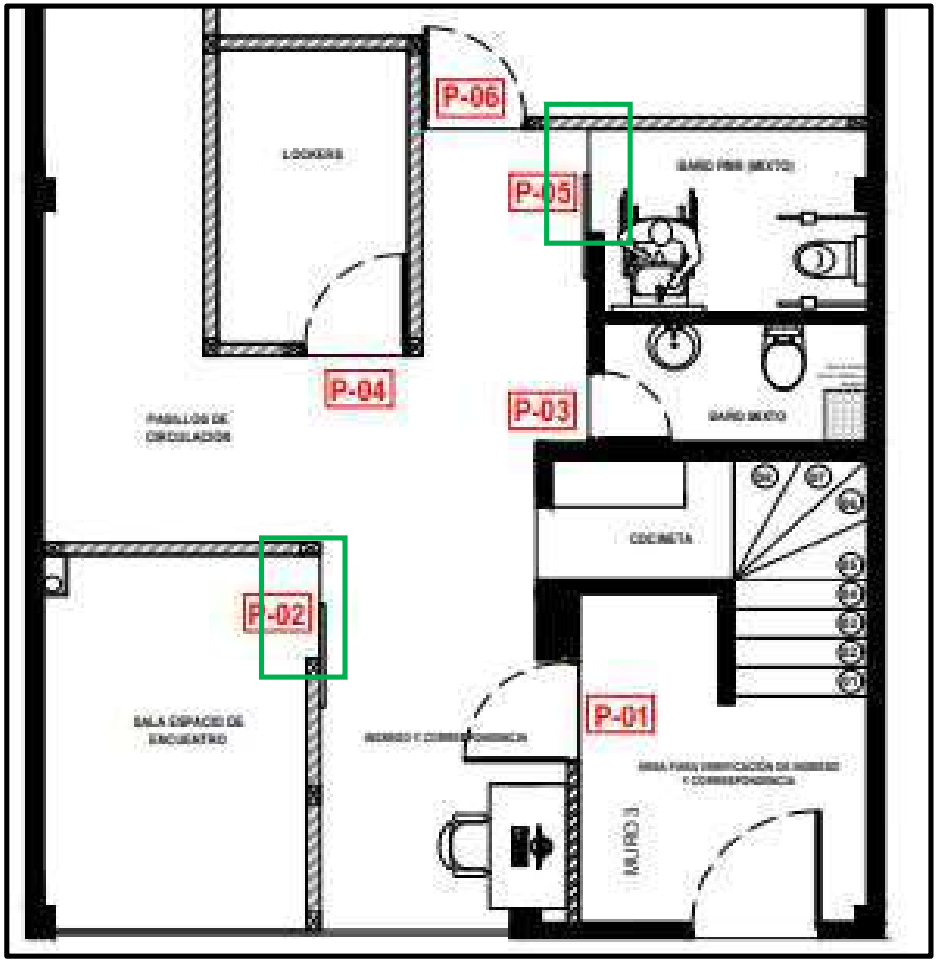

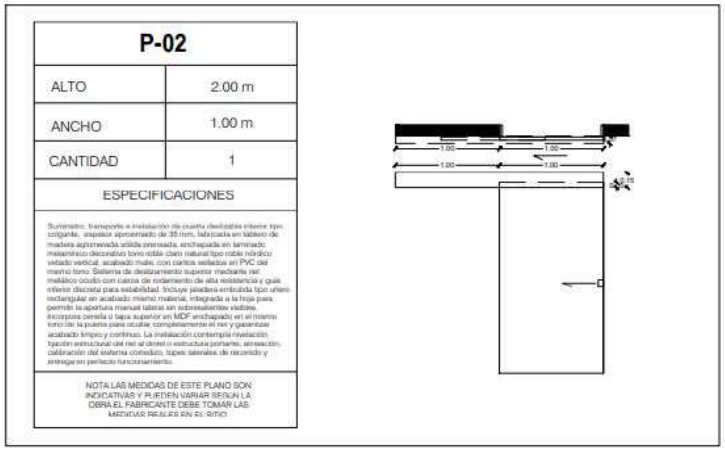

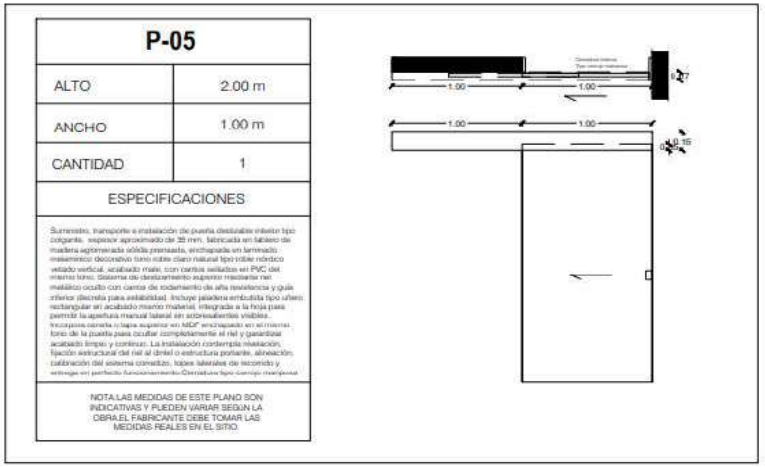

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO		FECHA	
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad total**
N.P 24	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTAIACIÓN DE PUERTA DESLIZABLE INTERIOR TIPO COLGANTE, ESPESOR APROXIMADO DE 35mm, FABRICADA EN TABLERO DE MADERA SOLIDA PRENSADA, ENCHAPADA EN LAMINADO MELAMINICO ACABADO MATE, CON CANTOS SELLADOS EN PVC. SISTEMA DE DESLIZAMIENTO SUPERIOR MEDIANTE RIEL METALICO OCULTO CON CARROS DE RODAMIENTO DE ALTA RESISTENCIA Y GUÍA INFERIOR DISCRETA PARA ESTABILIDAD. INCLUYE MARCO EN MDF O MADERA ENCHAPADA Y CENEFA O TAPA SUPERIOR EN MDF PARA OCULTAR EL RIEL. INCLUYE JALADERA EMBUTIDA TIPO UÑERO O CERRADURA TIPO CERROJO MARIPOSA SEGÚN CORRESPONDA	m2	4.41









OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE DE UNA HOJA PARA INTERIOR, ESPESOR APROXIMADO 35mm, FABRICADA EN MADERA AGLOMERADA SOLIDA PRENSADA, ENCHAPADA EN LAMINADO DECORATIVO ACABADO MATE, CON CANTOS SELLADOS. INCLUYE MARCO EN MDF O MADERA ENCHAPADA Y CERRADURA TUBULAR PREMIUM DE PALANCA CON ESCUDO CUADRADO ACABADO NEGRO MATE.	m2	8.10

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
BAÑO MIXTO P -03		0.70	2.00	1.00	m2	1.40	
LOCKERS P - 04		0.95	2.00	1.00	m2	1.90	
BAÑO HOMBRES P - 11		0.70	2.00	1.00	m2	1.40	
BAÑO MUJERES P -12		0.70	2.00	1.00	m2	1.40	
RECEPCIÓN P - 01		1.00	2.00	1.00	m2	2.00	
					Subtotal	**8.10**	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	**8.10**	


OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad total**
N.P 25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE DE UNA HOJA PARA INTERIOR, ESPESOR APROXIMADO 35mm, FABRICADA EN MADERA AGLOMERADA SOLIDA PRENSADA, ENCHAPADA EN LAMINADO DECORATIVO ACABADO MATE, CON CANTOS SELLADOS. INCLUYE MARCO EN MDF O MADERA ENCHAPADA Y CERRADURA TUBULAR PREMIUM DE PALANCA CON ESCUDO CUADRADO ACABADO NEGRO MATE.	m2	8.10

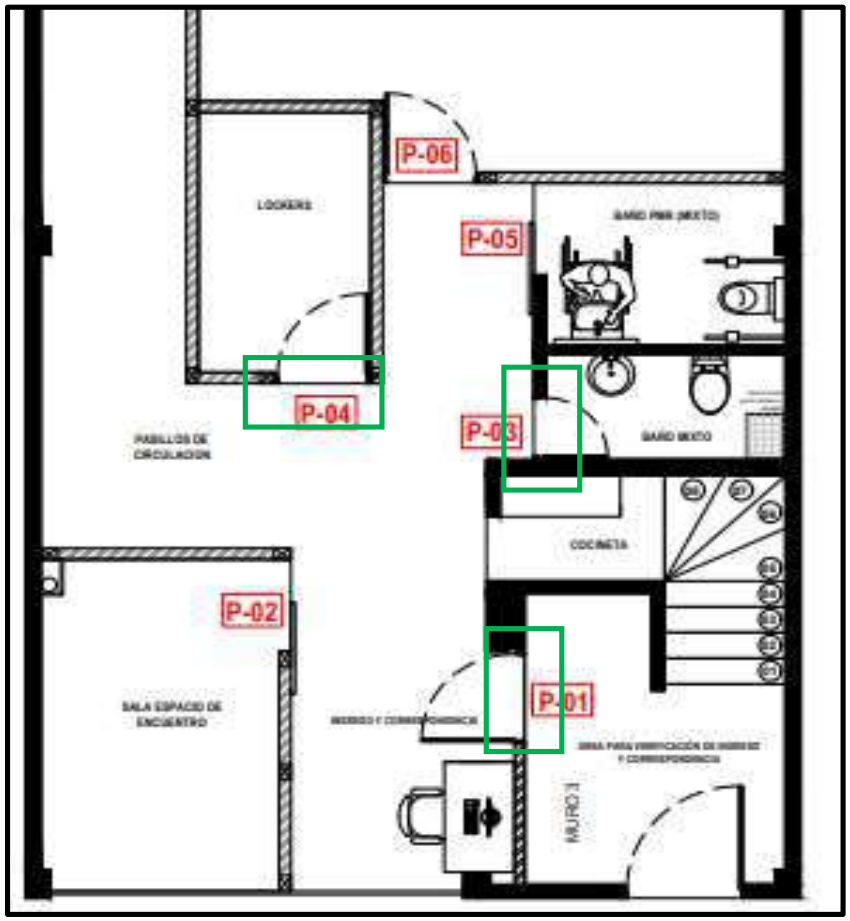

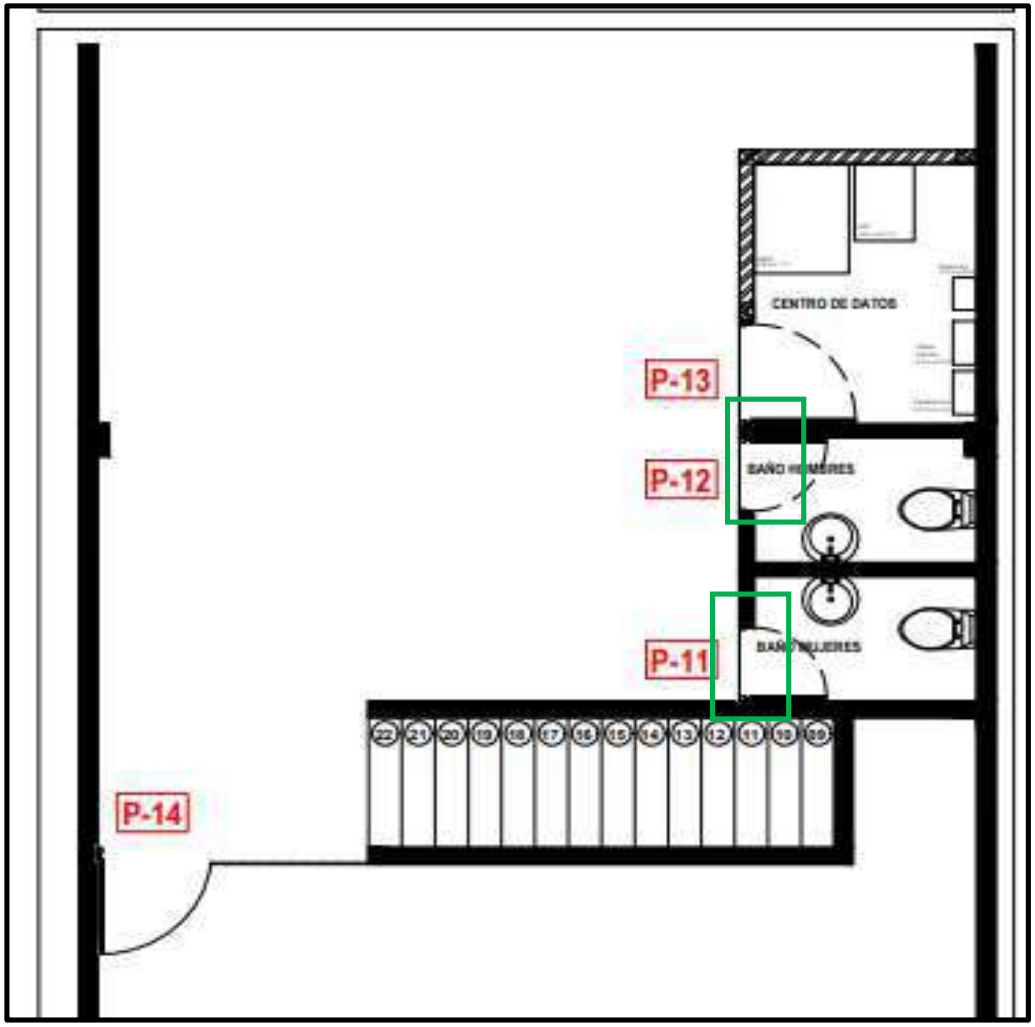

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad total**
N.P 25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE DE UNA HOJA PARA INTERIOR, ESPESOR APROXIMADO 35mm, FABRICADA EN MADERA AGLOMERADA SOLIDA PRENSADA, ENCHAPADA EN LAMINADO DECORATIVO ACABADO MATE, CON CANTOS SELLADOS. INCLUYE MARCO EN MDF O MADERA ENCHAPADA Y CERRADURA TUBULAR PREMIUM DE PALANCA CON ESCUDO CUADRADO ACABADO NEGRO MATE.	m2	8.10









OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 26	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE METALICA DE UNA HOJA, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED (CR) CALIBRE 18, ESTRUCTURA PERIMETRAL REFORZADA Y LAMINA LISA SOLDADA. PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO MATE CON TRATAMIENTO PREVIO ANTICORROSIVO. CON REJILLA DE VENTILACION TIPO PERSIANA LOCALIZADA EN LA PARTE INFERIOR. INCLUYE MARCO METALICO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 Y CERRADURA TUBULAR PREMIUM DE PALANCA CON ESCUDO CUADRADO.	m2	1.90


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
DISPOSICION DE EVIDENCIAS P - 06		0.95	2.00	1.00	m2	1.90	
					Subtotal	1.90	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	1.90	
OBSERVACIONES:							

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad total**
N.P 26	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE METALICA DE UNA HOJA, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED (CR) CALIBRE 18, ESTRUCTURA PERIMETRAL REFORZADA Y LAMINA LISA SOLDADA. PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO MATE CON TRATAMIENTO PREVIO ANTICORROSIVO. CON REJILLA DE VENTILACION TIPO PERSIANA LOCALIZADA EN LA PARTE INFERIOR. INCLUYE MARCO METALICO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 Y CERRADURA TUBULAR PREMIUM DE PALANCA CON ESCUDO CUADRADO.	m2	1.90

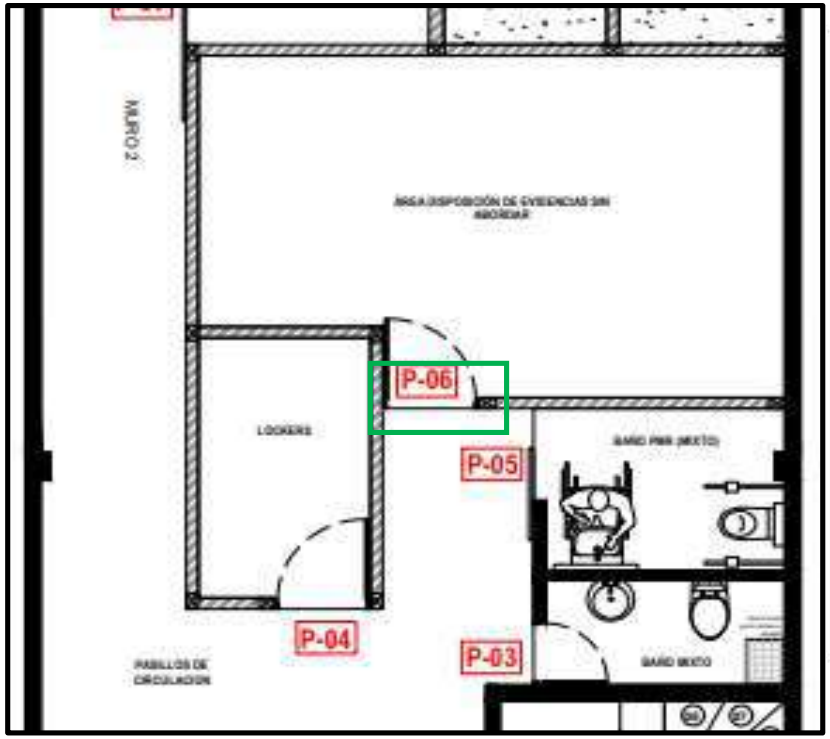

P-06	
ALTO	2.00 m
ANCHO	0.95 m
CANTIDAD	1
ESPECIFICACIONES	

Suministro, transporte e instalación de puerta batiente metálica de una hoja, fabricada en lámina de acero cold rolled (CR) calibre 18, estructura perimetral reforzada y lámina entamborada o lisa soldada. Acabado mediante aplicación de pintura electrostática en polvo color negro mate, con tratamiento previo anticorrosivo (fosfatizado y/o imprimante). La hoja incorpora en la parte inferior rejilla de ventilación metálica fija tipo persiana, fabricada en el mismo material y acabado, debidamente soldada o remachada a la estructura, permitiendo circulación de aire sin comprometer la seguridad. Incluye marco metálico en acero cold rolled calibre 16 o 18, anclado mecánicamente al vano, tres (3) bisagras reforzadas soldadas, y cerradura tubular premium de palanca con escudo cuadrado acabado negro mate para puerta de paso. La instalación contempla aplome, nivelación, fijación estructural al muro, ajuste y calibración de herrajes, retoques de pintura en obra y entrega en perfecto funcionamiento. Uso interior o en zonas cubierta

NOTA: LAS MEDIDAS DE ESTE PLANO SON INDICATIVAS Y PUEDEN VARIAR SEGúN LA OBRA EL FABRICANTE DEBE TOMAR LAS MEDIDAS REALES EN EL SITIO.

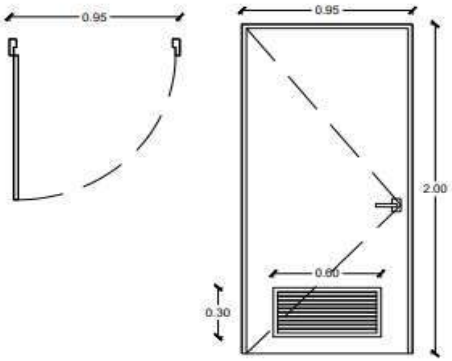

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad total**
N.P 26	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA BATIENTE METALICA DE UNA HOJA, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED (CR) CALIBRE 18, ESTRUCTURA PERIMETRAL REFORZADA Y LAMINA LISA SOLDADA. PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO MATE CON TRATAMIENTO PREVIO ANTICORROSIVO. CON REJILLA DE VENTILACION TIPO PERSIANA LOCALIZADA EN LA PARTE INFERIOR. INCLUYE MARCO METALICO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 Y CERRADURA TUBULAR PREMIUM DE PALANCA CON ESCUDO CUADRADO.	m2	1.90







OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTR	**CONTRATO No**	**No. 716**	DE	2025
CONTR	**CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI**			

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 27	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTAIACIÓN DE PUERTA DESLIZABLE METALICA DE UNA HOJA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL 18, ESTRUCTURA PERIMETRAL REFORZADA Y LAMINA LISA SOLDADA. ACABADO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO PREVIO Y APLICACION DE PINTURA ELECTROSTATICA DE COLOR NEGRO MATE. LA HOJA INCORPORARA EN LA PARTE INFERIOR REJILLA DE VENTILACIÓN METALICA TIPO PERSIANA FIJA. SISTEMA DE DESLIZAMIENTO SUPERIOR MEDIANTE RIEL METALICO DE ALTA RESISTENCIA CON CARROS DE RODAMIENTO REFORZADOS Y GUIA INFERIOR PARA CONTROL DE MOVIMIENTO. INCLUYE CERRADURA DE EMBUTIR PARA PUERTA CORREDIZA CON PESTILLO TIPO GANCHO, MARCO O ESTRUCTURA METALICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18.	m2	5.70


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
CORTE P - 09		0.95	2.00	1.00	m2	1.90	
SECADO P - 10		0.95	2.00	1.00	m2	1.90	
CENTRO DE DATOS P - 13		0.95	2.00	1.00	m2	1.90	
					Subtotal	**5.70**	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	**5.70**	
OBSERVACIONES:							


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad total**
N.P 27	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTAIACIÓN DE PUERTA DESLIZABLE METALICA DE UNA HOJA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL 18, ESTRUCTURA PERIMETRAL REFORZADA Y LAMINA LISA SOLDADA. ACABADO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO PREVIO Y APLICACION DE PINTURA ELECTROSTATICA DE COLOR NEGRO MATE. LA HOJA INCORPORARA EN LA PARTE INFERIOR REJILLA DE VENTILACIÓN METALICA TIPO PERSIANA FIJA. SISTEMA DE DESLIZAMIENTO SUPERIOR MEDIANTE RIEL METALICO DE ALTA RESISTENCIA CON CARROS DE RODAMIENTO REFORZADOS Y GUIA INFERIOR PARA CONTROL DE MOVIMIENTO. INCLUYE CERRADURA DE EMBUTIR PARA PUERTA CORREDIZA CON PESTILLO TIPO GANCHO, MARCO O ESTRUCTURA METALICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18.	m2	5.70

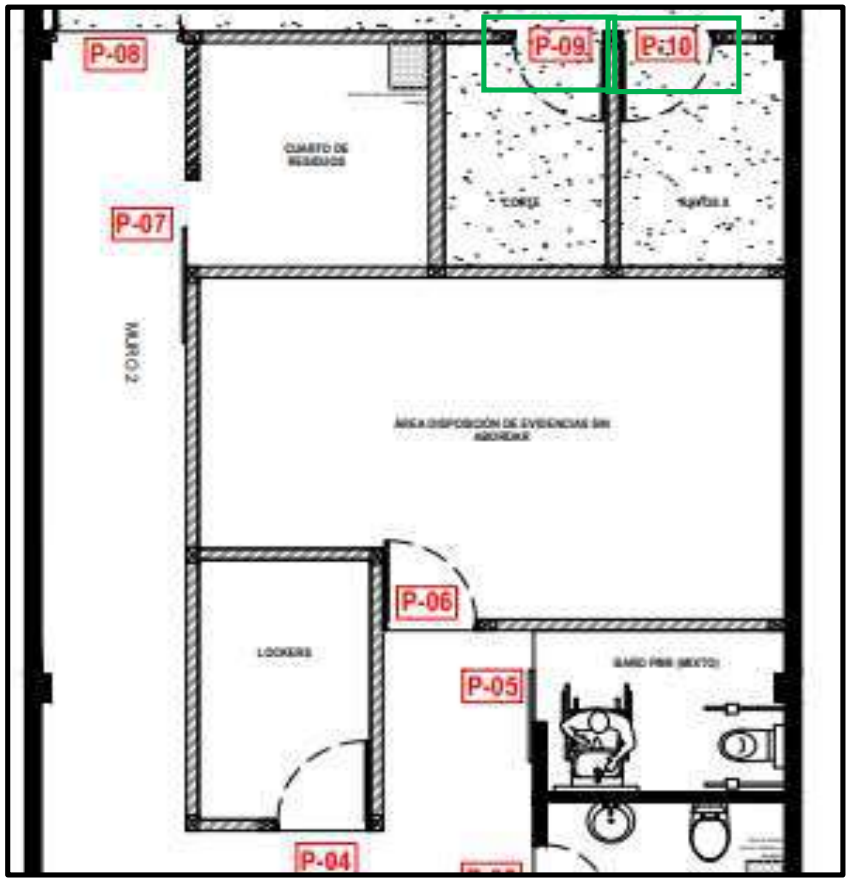

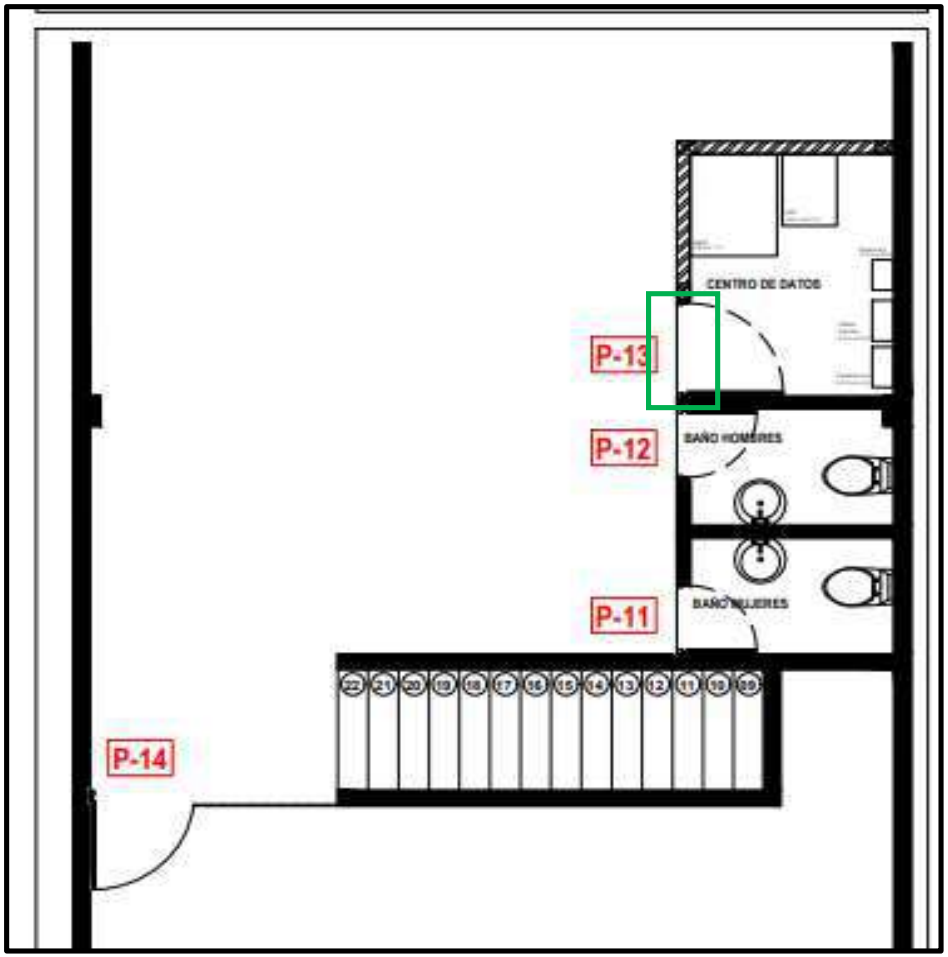

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad total**
N.P 27	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTAIACIÓN DE PUERTA DESLIZABLE METALICA DE UNA HOJA, FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL 18, ESTRUCTURA PERIMETRAL REFORZADA Y LAMINA LISA SOLDADA. ACABADO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO PREVIO Y APLICACION DE PINTURA ELECTROSTATICA DE COLOR NEGRO MATE. LA HOJA INCORPORARA EN LA PARTE INFERIOR REJILLA DE VENTILACIÓN METALICA TIPO PERSIANA FIJA. SISTEMA DE DESLIZAMIENTO SUPERIOR MEDIANTE RIEL METALICO DE ALTA RESISTENCIA CON CARROS DE RODAMIENTO REFORZADOS Y GUIA INFERIOR PARA CONTROL DE MOVIMIENTO. INCLUYE CERRADURA DE EMBUTIR PARA PUERTA CORREDIZA CON PESTILLO TIPO GANCHO, MARCO O ESTRUCTURA METALICA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18.	m2	5.70







OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO GFCI).	und	2.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
BAÑO MUJERES 2 PISO				2.00	un	2.00	
BAÑO HOMBRES 1ER PISO				2.00	un	2.00	
BAÑO MIXTO				1.00	un	1.00	
BAÑO PMR				1.00	un	1.00	
COCINETA				2.00	un	2.00	
					Subtotal	**8.00**	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	**8.00**	
					COBRADO EN ACTAS	6.00	
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**2.00**	
OBSERVACIONES:							


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

ING. BERNARDO SOTO GARCÍA
SUPERVISOR UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO GFCI).	und	2.00

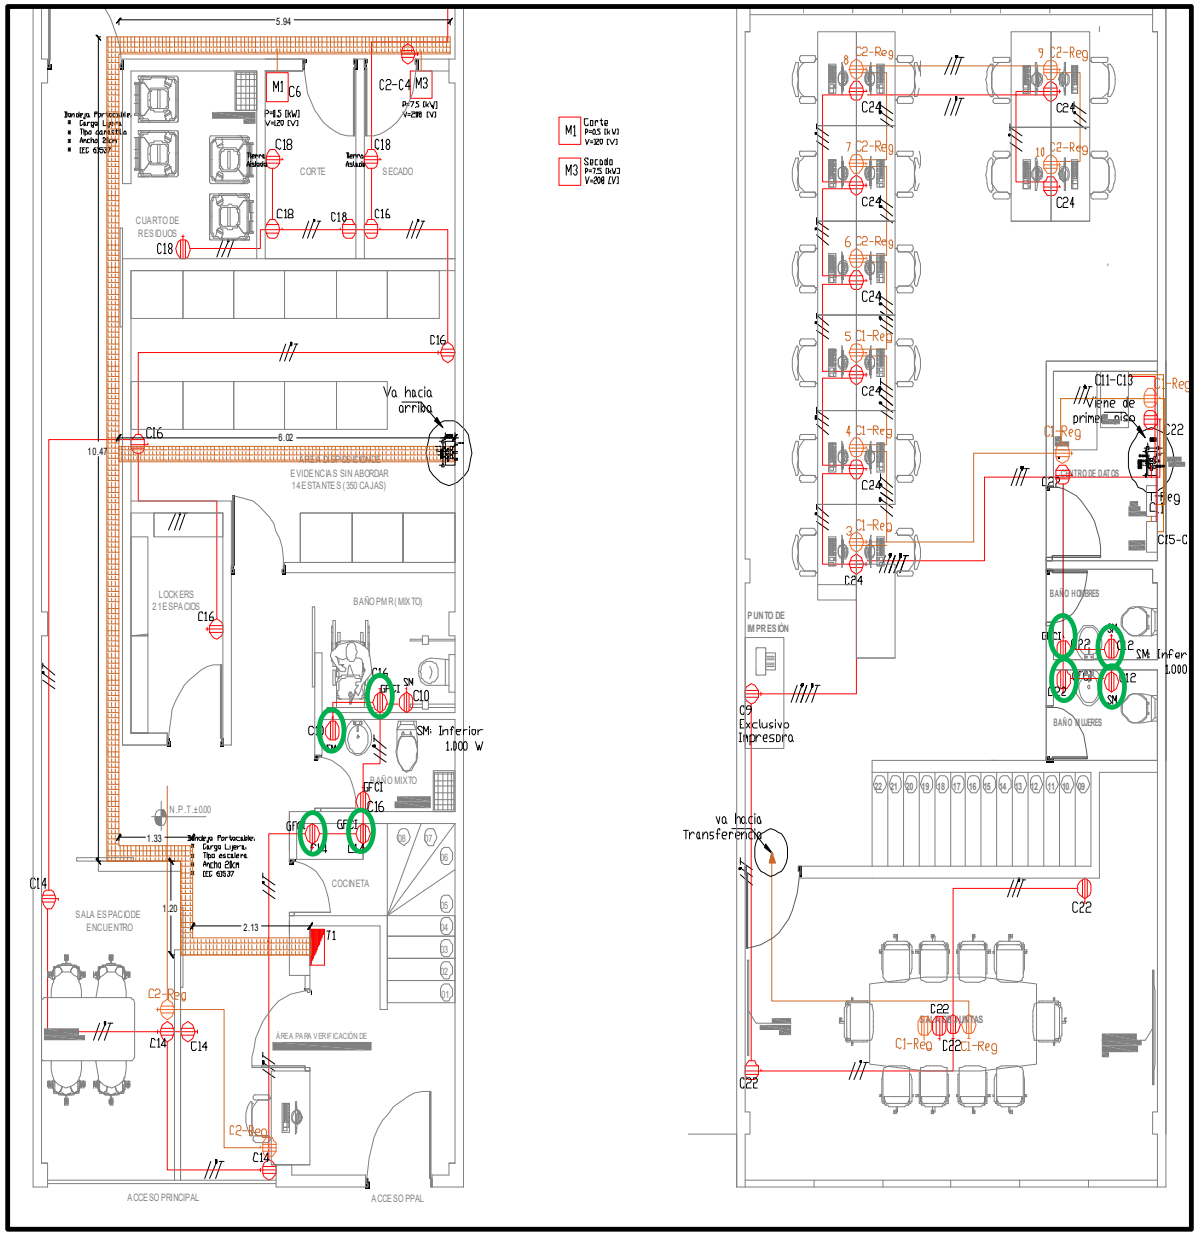

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO GFCI).	und	2.00

















OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 30	DEMOLICIÓN DE PISOS EN CERAMICA + MORTERO (INCLUYE RETIRO Y ACARREO)	m2	3.27

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
BAÑO HOMBRES 1ER PISO	2.37	1.15		1.00		2.73	
BAÑO MUJERES 1ER PISO	2.37	1.76		1.00		4.17	
BAÑO HOMBRES 2DO PISO	1.88	1.15		1.00		2.16	
BAÑO MUJERES 2DO PISO	1.88	1.16		1.00		2.18	
COCINETA	2.84	1.15		1.00		3.27	
					Subtotal	**14.51**	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	**14.51**	
					COBRADO EN ACTAS	11.24	
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**3.27**	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 30	DEMOLICIÓN DE PISOS EN CERAMICA + MORTERO (INCLUYE RETIRO Y ACARREO)	m2	3.27

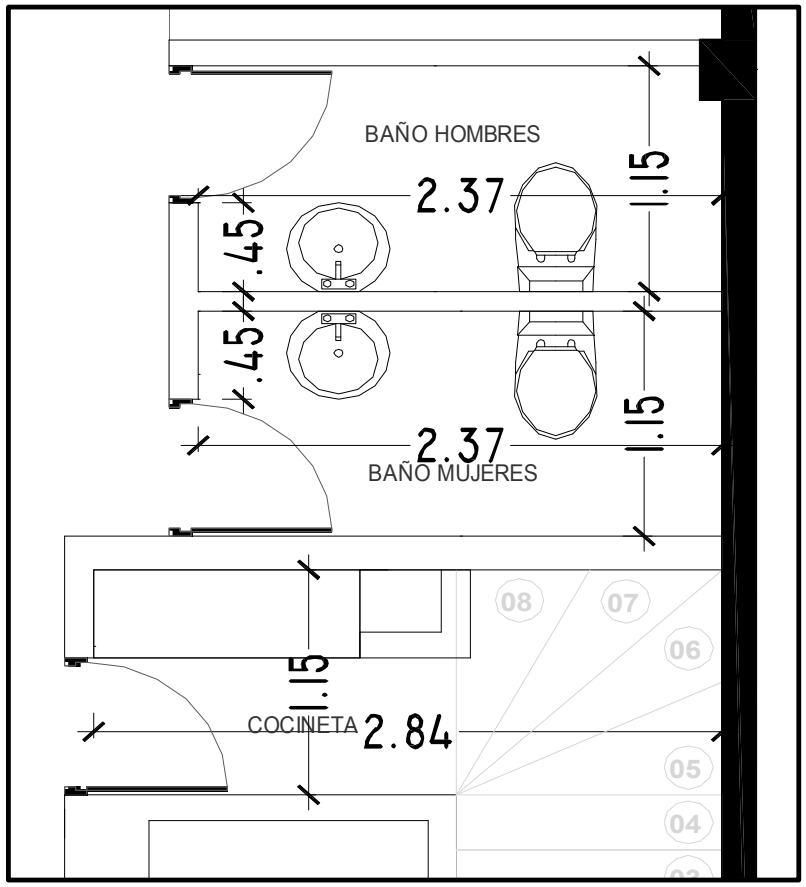

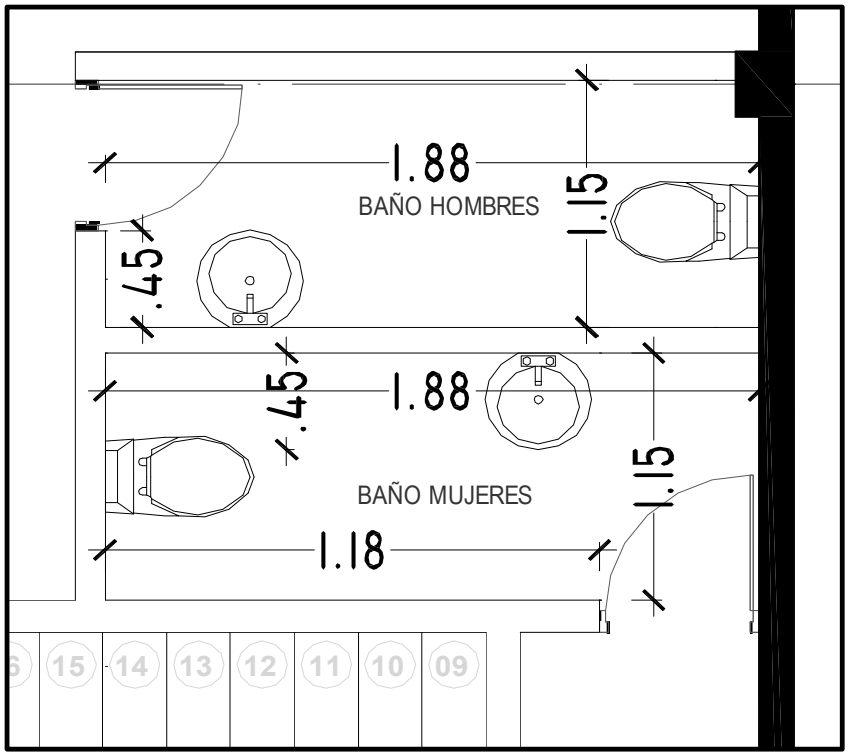

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 30	DEMOLICIÓN DE PISOS EN CERAMICA + MORTERO (INCLUYE RETIRO Y ACARREO)	m2	3.27







OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 36	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MARCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SALIDA DE LUMINARIA DE EMERGENCIA EN TUBERIA EMT 3/4" CON CONDUCTOR CABLE 1X12+1X12+1X12 COBRE AWG THHN, LIBRE DE HALOGENOS, INCLUYE ALIMENTADOR, CAJA 5800 PARA CONEXIÓN, ELEMENTOS DE FIJACION, INTERRUPTOR, TOMACORRIENTE MONOFASICA CON POLO A TIERRA 120 V Y ACCESORIOS, (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	2.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto			
ZONA DE ABORDAJE				3.00	un	3.00
PASILLO DE CIRCULACION				3.00	un	3.00
ESCALERAS				2.00	un	2.00
ENTRADA				2.00	un	2.00
ZONA DE OFICINAS 2DO PISO				1.00	un	1.00
				Subtotal		11.00
				COBRADO EN ACTAS		9.00
				TOTAL A COBRAR ACTA No. 4		**2.00**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBSERVACIONES: Se hace cambio de la referencia en luminarias en el centro de datos inicialmente de 30W, por dos luminarias de 36W.


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI


ING. BERNARDO SOTO GARCÍA
SUPERVISOR UBPD

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 36	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MARCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SALIDA DE LUMINARIA DE EMERGENCIA EN TUBERIA EMT 3/4" CON CONDUCTOR CABLE 1X12+1X12+1X12+1X12 COBRE AWG THHN, LIBRE DE HALOGENOS, INCLUYE ALIMENTADOR, CAJA 5800 PARA CONEXIÓN, ELEMENTOS DE FIJACION, INTERRUPTOR, TOMACORRIENTE MONOFASICA CON POLO A TIERRA 120 V Y ACCESORIOS, (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	2.00

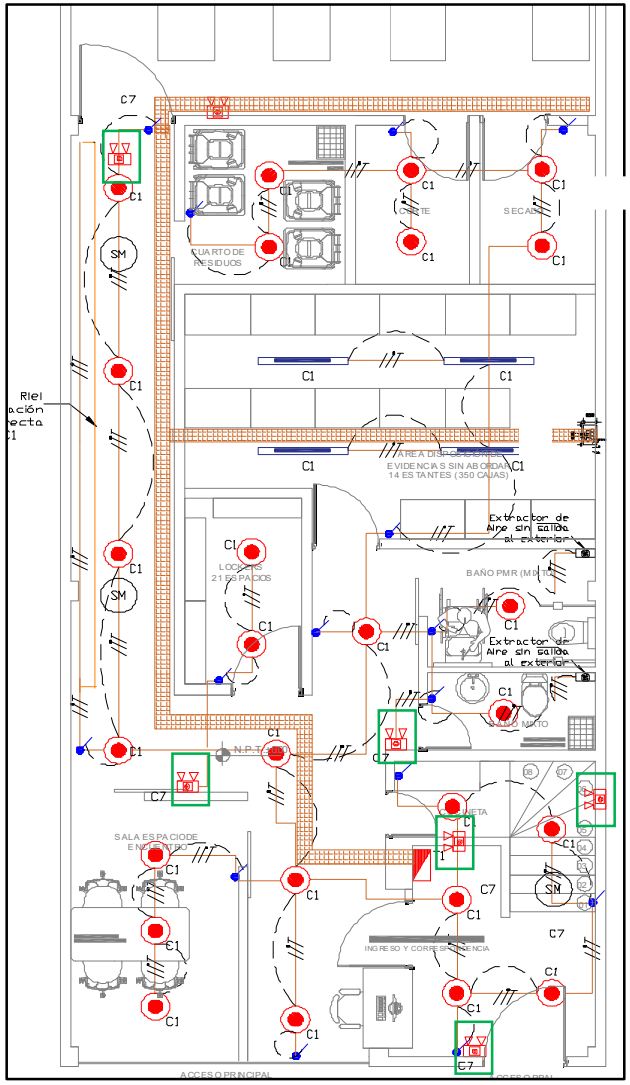

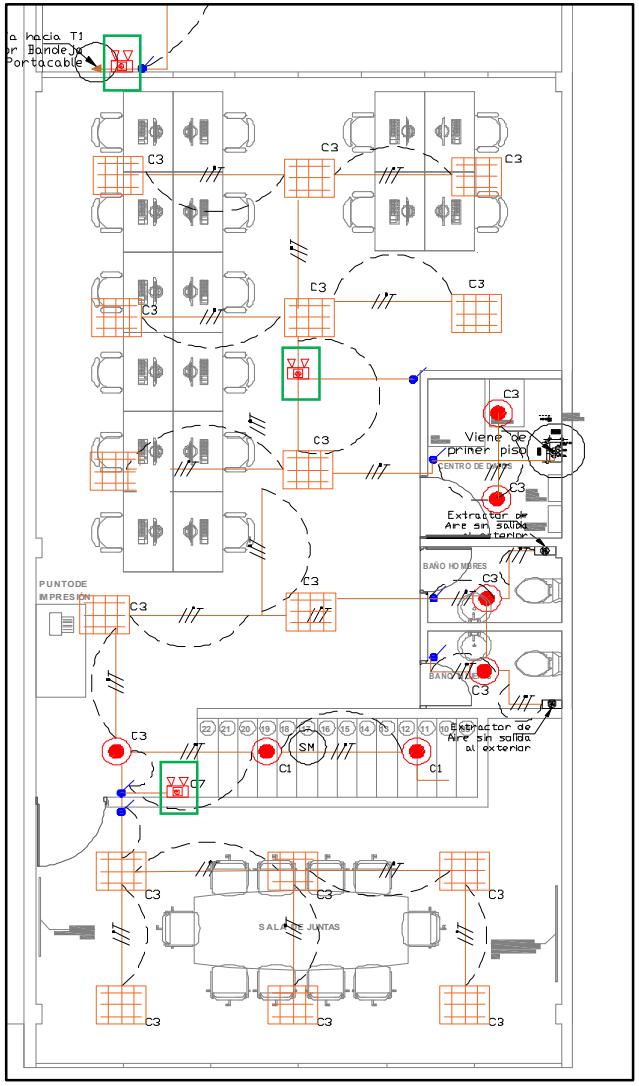

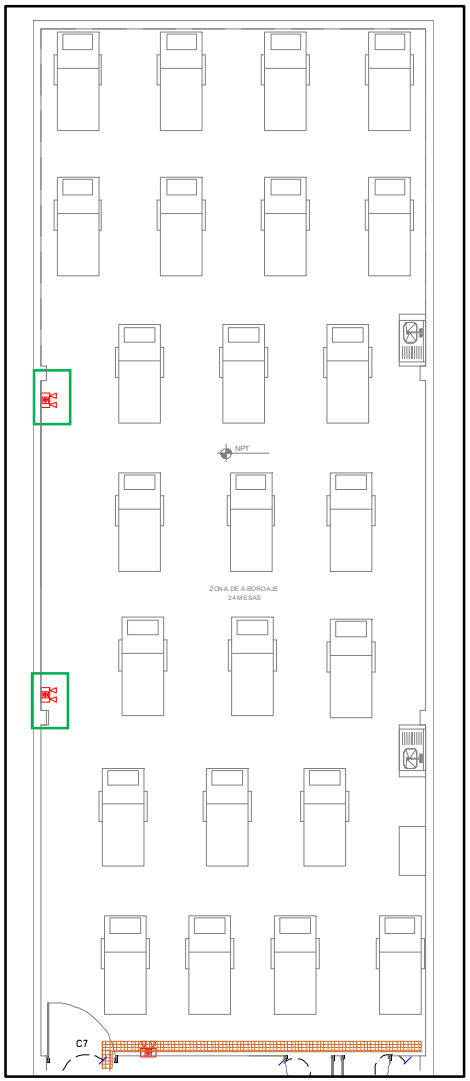

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 36	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MARCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SALIDA DE LUMINARIA DE EMERGENCIA EN TUBERIA EMT 3/4" CON CONDUCTOR CABLE 1X12+1X12+1X12 COBRE AWG THHN, LIBRE DE HALOGENOS, INCLUYE ALIMENTADOR, CAJA 5800 PARA CONEXIÓN, ELEMENTOS DE FIJACION, INTERRUPTOR, TOMACORRIENTE MONOFASICA CON POLO A TIERRA 120 V Y ACCESORIOS, (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	2.00
















OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 37	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MARCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA EN TUBERÍA EMT 3/4" Y CONDUCTOR CABLE 1X12+1X12+1X12 COBRE AWG THHN, LIBRE DE HALOGENOS, INCLUYE ALIMENTADOR, CAJA 5800, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	un	47.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
SALA DE JUNTAS				4.00	un	4.00	
PUNTO DE IMPRESIÓN				1.00	un	1.00	
CENTRO DE DATOS				2.00	un	2.00	
INGRESO				2.00	un	2.00	
SALA DE ENCUENTRO				2.00	un	2.00	
LOCKERS				1.00	un	1.00	
AREA DISPOSICION DE EVIDENCIAS				2.00	un	2.00	
SECADO				2.00	un	2.00	
BAÑO PMR				1.00	un	1.00	
BAÑO MIXTO				1.00	un	1.00	
CORTE				2.00	un	2.00	
RESIDUOS				1.00	un	1.00	
ZONA DE ABORDAJE				8.00	un	8.00	
MODULO OFICINAS 2DO PISO				18.00	un	18.00	
					Subtotal	**47.00**	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	**47.00**	
					COBRADO EN ACTAS	29.00	
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**18.00**	


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

ING. BERNARDO SOTO GARCÍA
SUPERVISOR UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 37	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MARCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA EN TUBERÍA EMT 3/4" Y CONDUCTOR CABLE 1X12+1X12+1X12 COBRE AWG THHN, LIBRE DE HALOGENOS, INCLUYE ALIMENTADOR, CAJA 5800, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	un	47.00

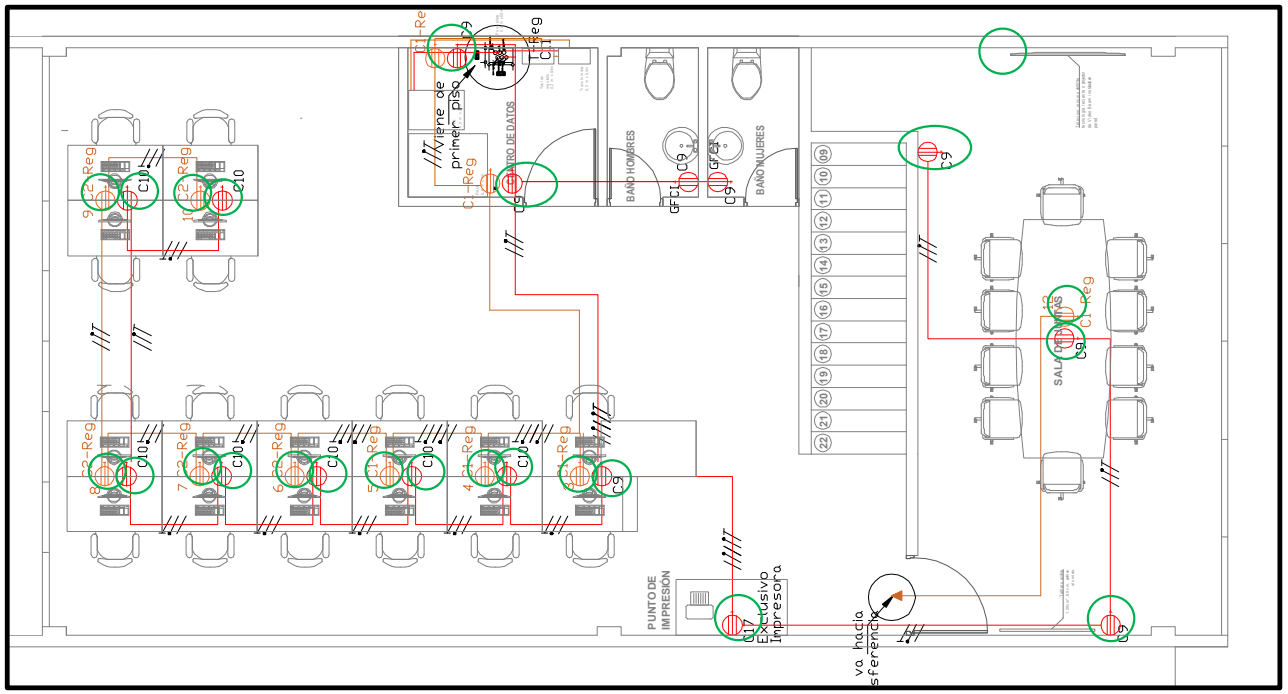


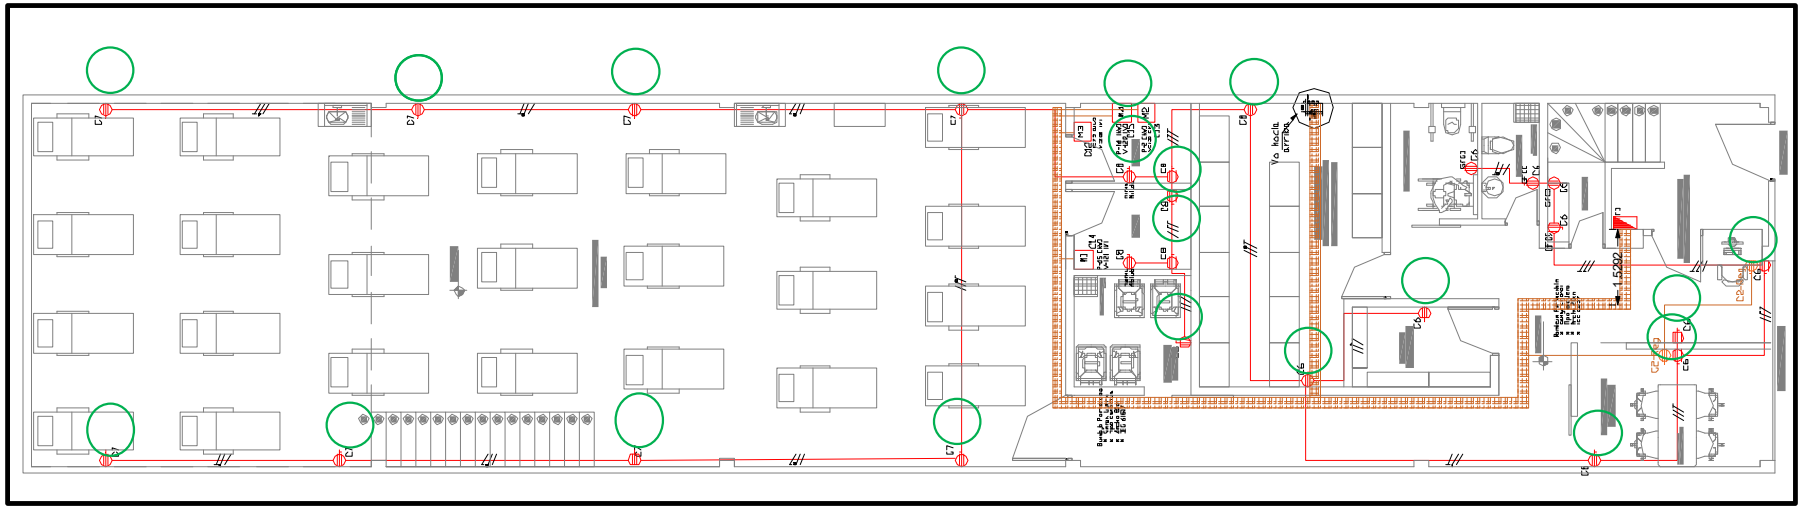


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad total**
N.P 37	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MARCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA EN TUBERÍA EMT 3/4" Y CONDUCTOR CABLE 1X12+1X12+1X12 COBRE AWG THHN, LIBRE DE HALOGENOS, INCLUYE ALIMENTADOR, CAJA 5800, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	un	47.00




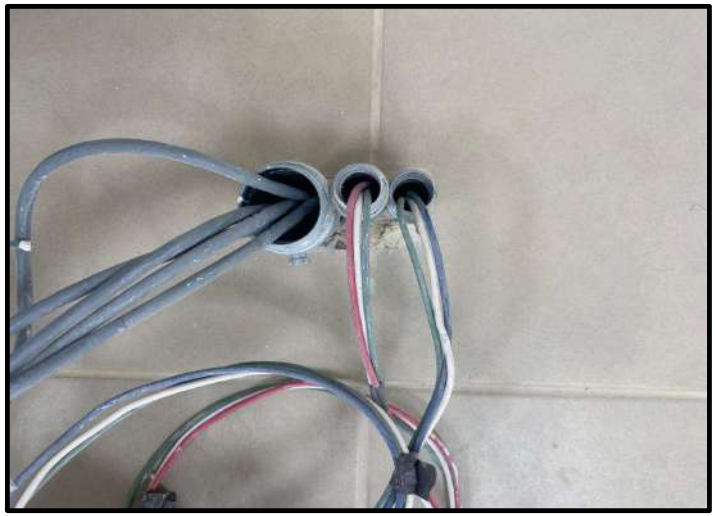

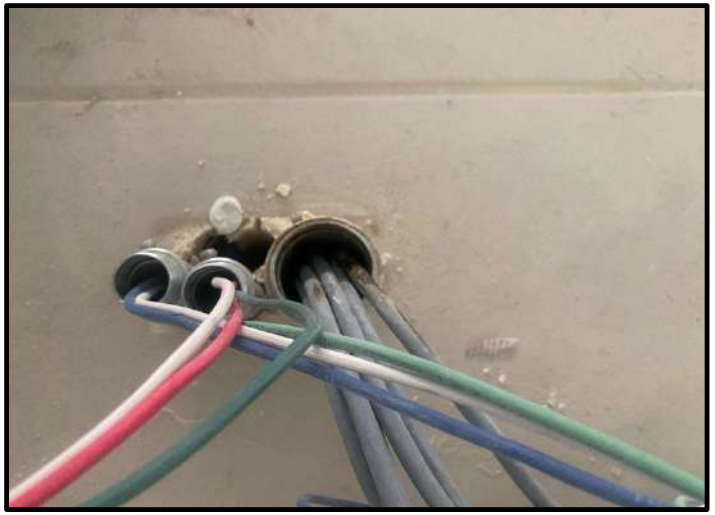



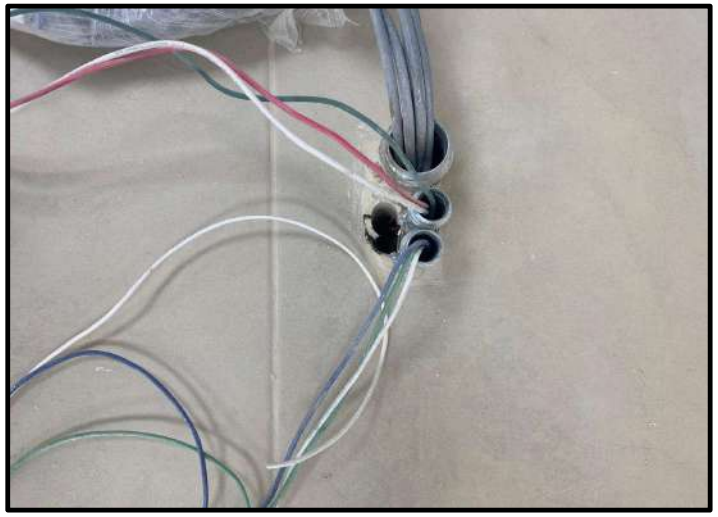

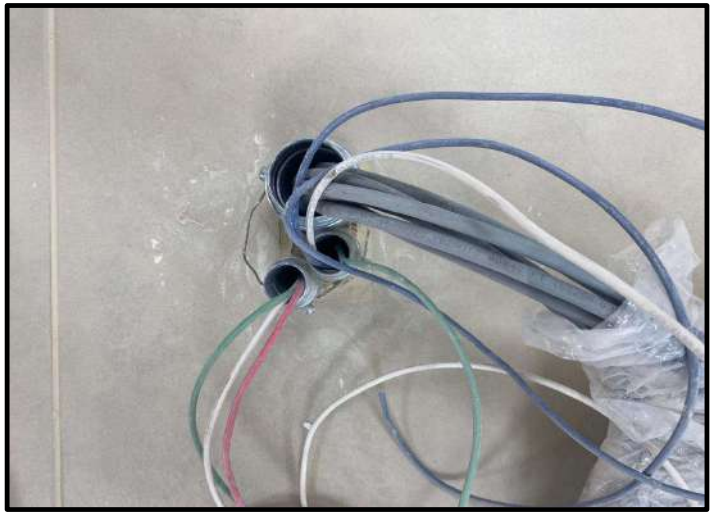

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 38	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MARCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA REGULADA EN TUBERÍA EMT 3/4" Y CONDUCTOR CABLE 1X12+1X12+1X12 COBRE AWG THHN, LIBRE DE HALOGENOS, APTO PARA INSTALAR EN BANDEJA, INCLUYE ALIMENTADOR, CAJA 5800, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	un	22.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
CENTRO DE DATOS				2.00	un	2.00	
INGRESO				1.00	un	1.00	
SALA DE ENCUENTRO				1.00	un	1.00	
EN PISO MODULOS OFICINAS 2DO PISO				18.00	un	18.00	
					Subtotal	**22.00**	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	**22.00**	
					COBRADO EN ACTAS	4.00	
					TOTAL A COBRAR ACTA No. 4	**18.00**	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

ING. BERNARDO SOTO GARCÍA
SUPERVISOR UBPD


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 38	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MARCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA REGULADA EN TUBERÍA EMT 3/4" Y CONDUCTOR CABLE 1X12+1X12+1X12 COBRE AWG THHN, LIBRE DE HALOGENOS, APTO PARA INSTALAR EN BANDEJA, INCLUYE ALIMENTADOR, CAJA 5800, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	un	22.00

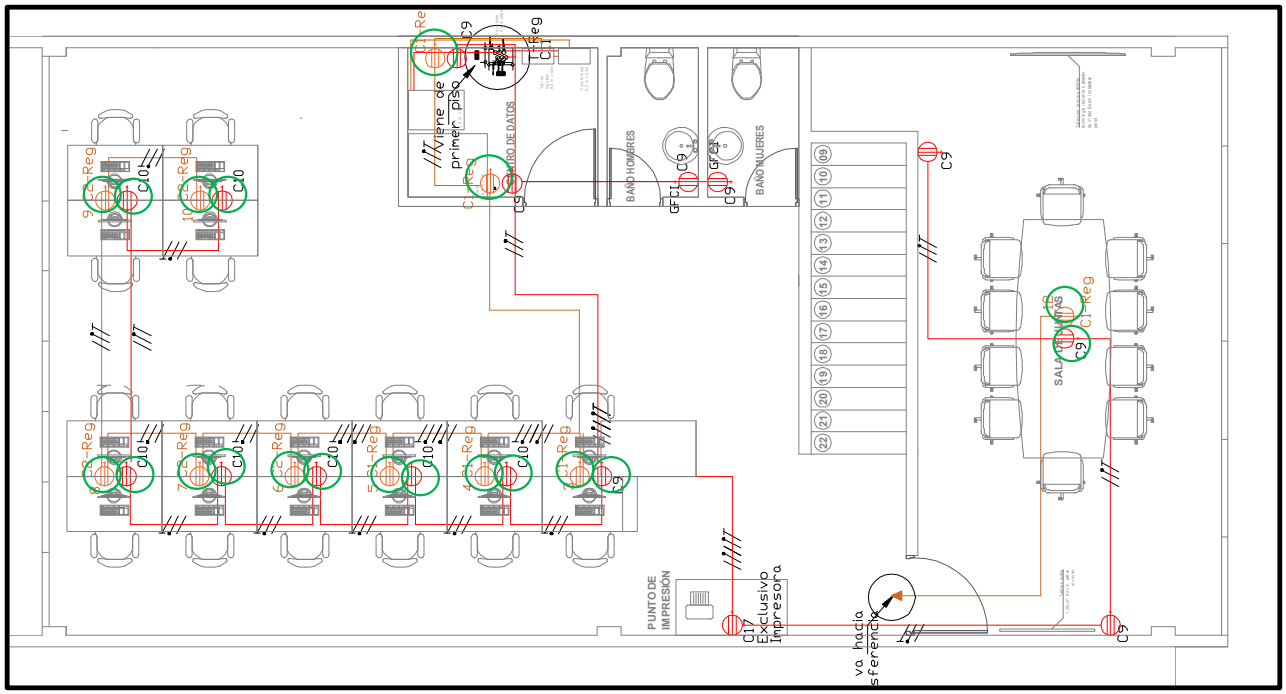

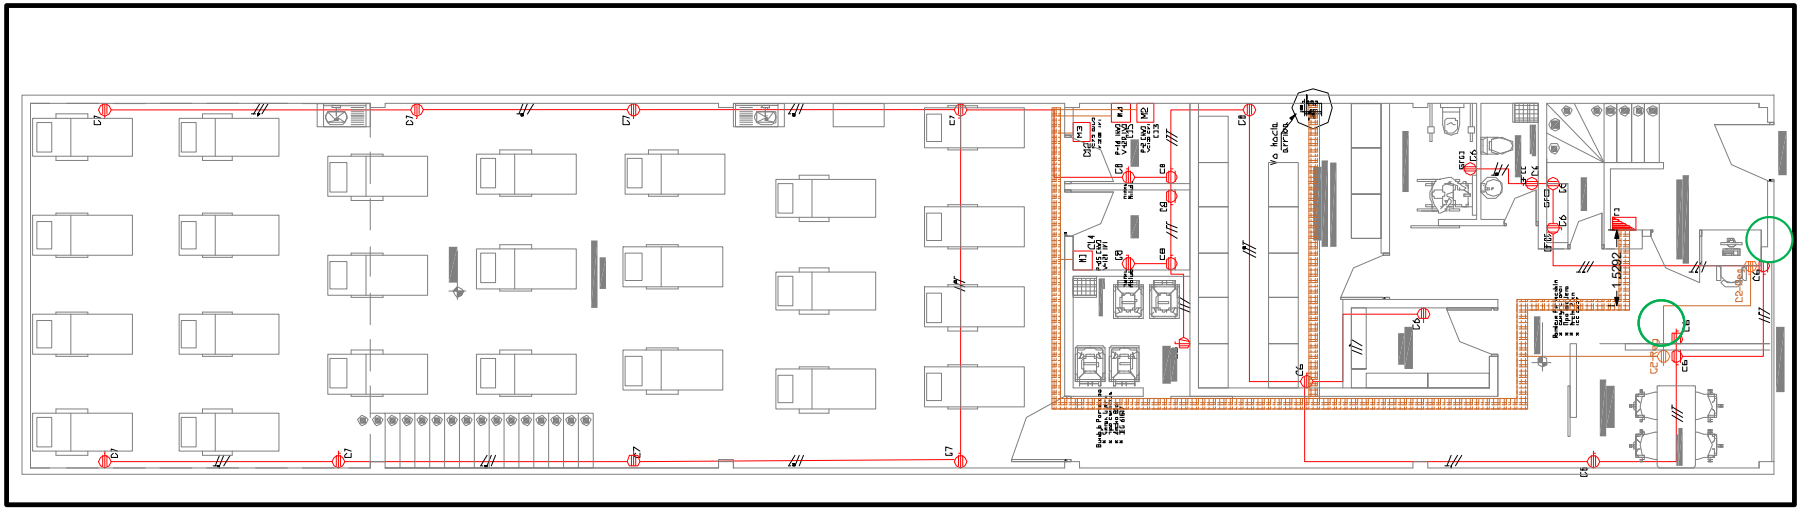


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad total**
N.P 38	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MARCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA REGULADA EN TUBERÍA EMT 3/4" Y CONDUCTOR CABLE 1X12+1X12+1X12 COBRE AWG THHN, LIBRE DE HALOGENOS, APTO PARA INSTALAR EN BANDEJA, INCLUYE ALIMENTADOR, CAJA 5800, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	un	22.00

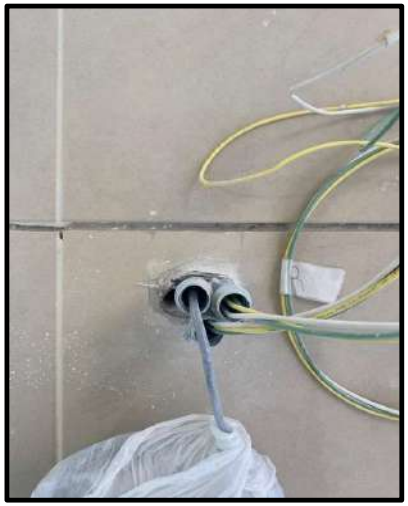





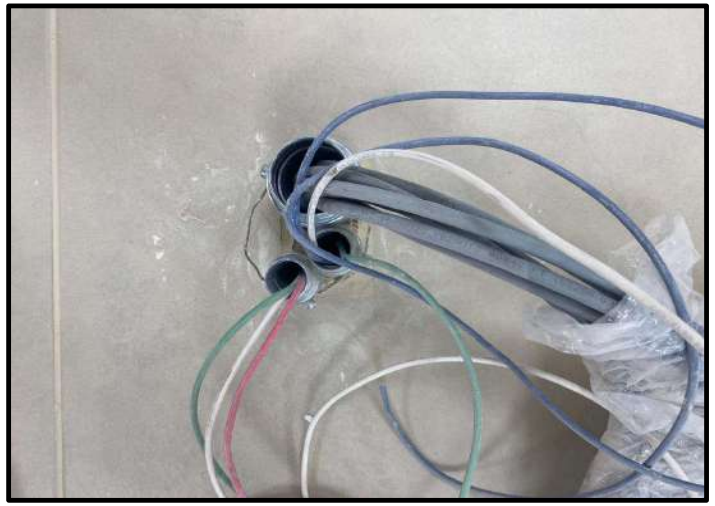

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO TEtemplado DE SEGURIDAD DE 10 mm DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS Y ARISTAS BISELADAS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, HERRAJES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, LA DIVISIÓN LLEVARA APLIACION DE PELICULA TIPO FROST.	m2	10.51

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
DIVISIÓN EN VIDRIO SOBRE ANTEPECHO		4.07	1.40	1.00	m2	5.70	
		1.35	1.40	1.00	m2	1.89	
DIVISIÓN EN VIDRIO CONTIGUO PUERTA		1.33	2.20	1.00	m2	2.93	
					Subtotal	10.51	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	10.51	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 10 mm DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS Y ARISTAS BISELADAS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, HERRAJES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, LA DIVISIÓN LLEVARA APLIACION DE PELICULA TIPO FROST.	m2	10.51

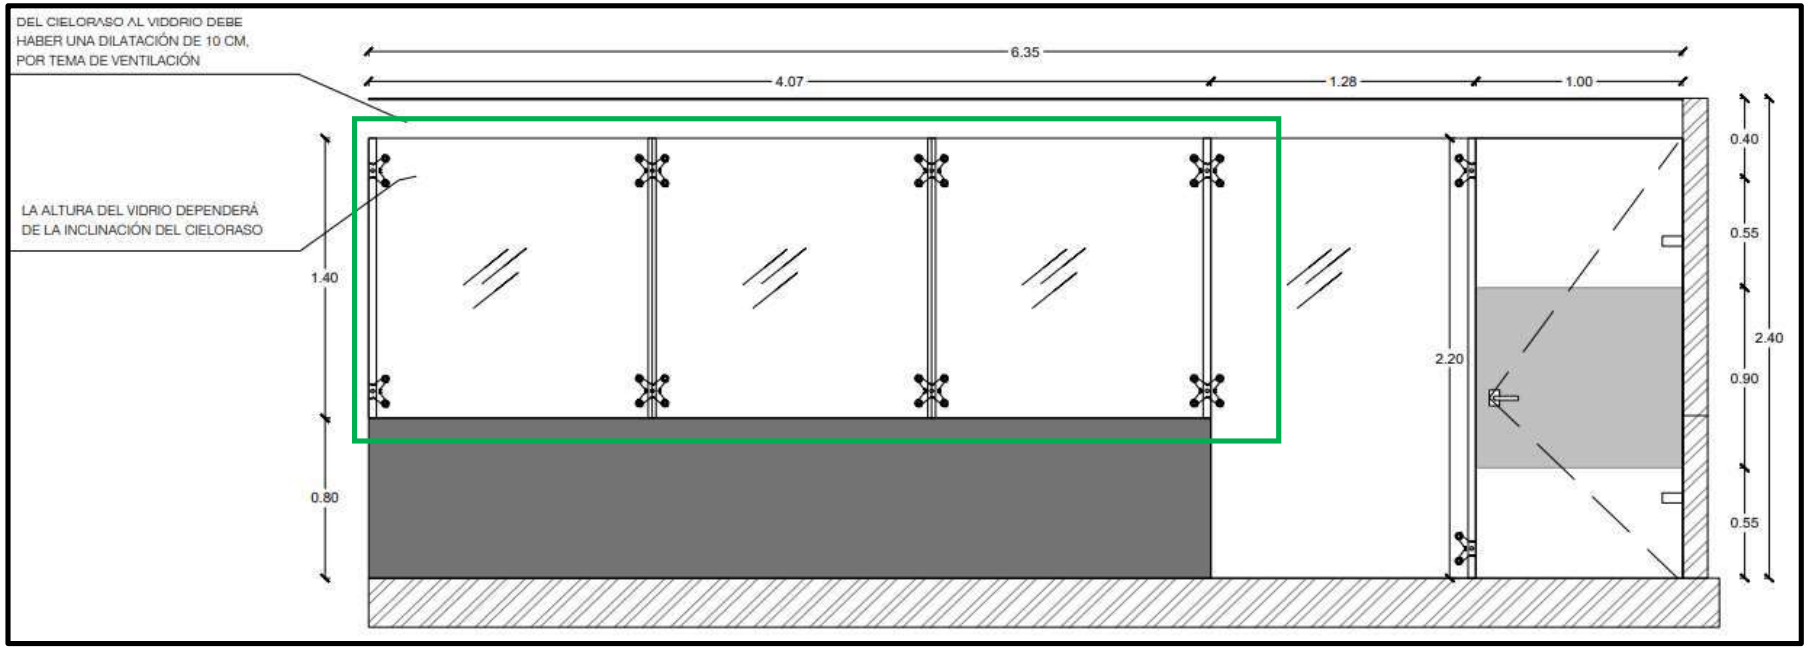

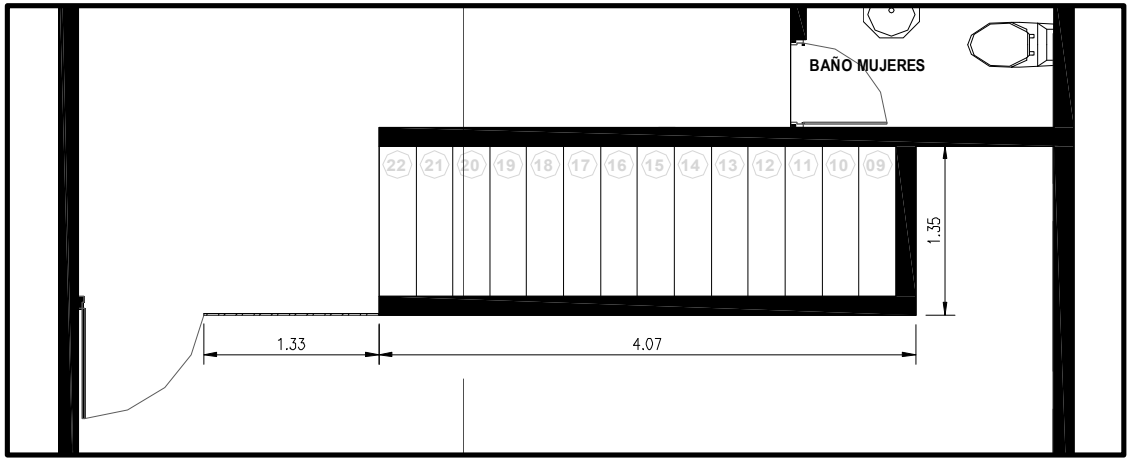

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 10 mm DE ESPESOR, CON CANTOS PULIDOS Y ARISTAS BISELADAS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, HERRAJES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, LA DIVISIÓN LLEVARA APLIACION DE PELICULA TIPO FROST.	m2	10.51











OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 45	DEMOLICIÓN MANUAL PARA EXPOSICION DE REFUERZO	m	30.69

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
LOSA	VIGUETAS	4.07			6.00	m	24.42	
	RIOSTRA	6.27			1.00	m	6.27	
						Subtotal	30.69	
						APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	30.69	

OBSERVACIONES:

*Las cantidades deberan ser corroboradas por el constructor antes de iniciar las labores


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 45	DEMOLICIÓN MANUAL PARA EXPOSICION DE REFUERZO	m	30.69

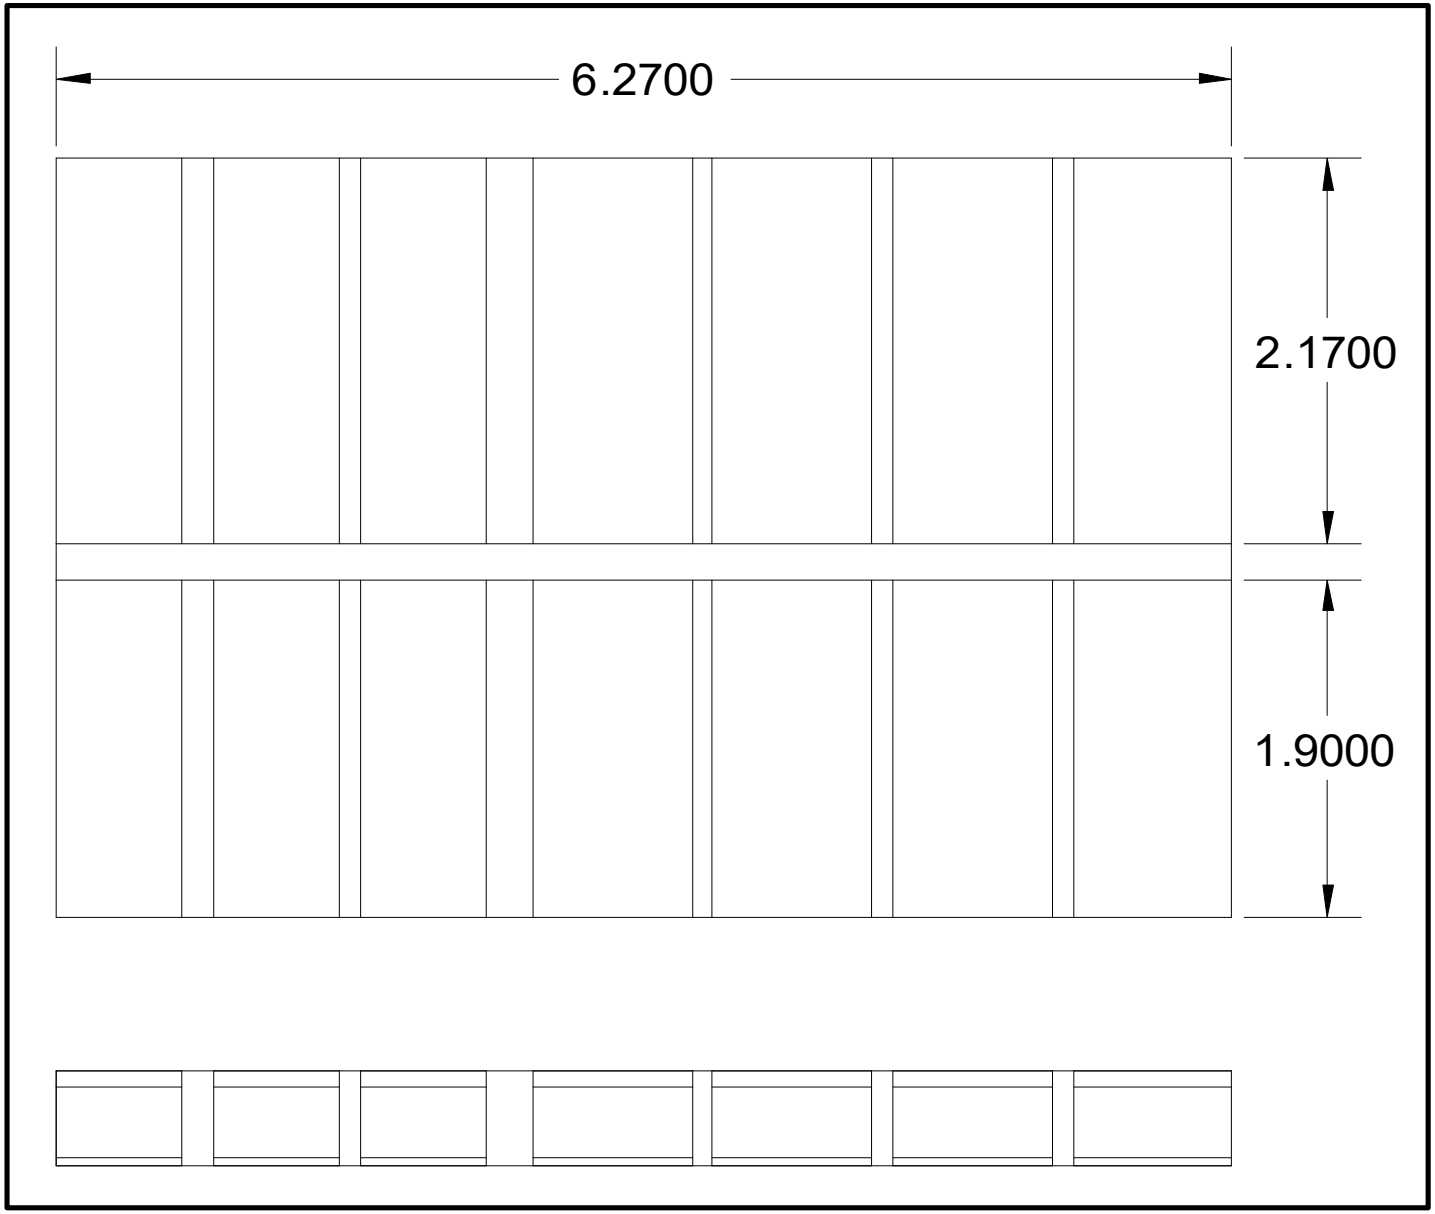

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 45	DEMOLICIÓN MANUAL PARA EXPOSICION DE REFUERZO	m	30.69







OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 46	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA METÁLICA TIPO PERSIANA DE UNA HOJA FABRICADA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18, CON BASTIDOR PERIMETRAL REFORZADO EN PERFILERIA METALICA. HOJA CONFORMADA POR LAMAS HORIZONTATES TIPO PERSIANA (FIJAS) DEBIDAMENTE ENSAMBLADAS PARA VENTILACION PERMANENTE. CON PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO COLOR NEGRO MATE Y TRATAMIENTO PREVIO ANTICORROSIVO. INCLUYE MARCO METALICO FABRICADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18 ANCLADO AL VANO MEDIANTE CHAZOS Y CERRADURA TUBULAR PREMIUM DE PALANCA CON ESCUDO CUADRADO. PARA VENTILACIÓN CUARTO DE RESIDUOS.	m2	1.90

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
CUARTO DE RESIDUOS P - 07		0.95	2.00	1.00	m2	1.90	
					Subtotal	1.90	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	1.90	

OBSERVACIONES:


*Las cantidades deberan ser corroboradas por el constructor antes de iniciar las labores

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad total**
N.P 46	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA METÁLICA TIPO PERSIANA DE UNA HOJA FABRICADA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18, CON BASTIDOR PERIMETRAL REFORZADO EN PERFILERIA METALICA. HOJA CONFORMADA POR LAMAS HORIZONTATES TIPO PERSIANA (FIJAS) DEBIDAMENTE ENSAMBLADAS PARA VENTILACION PERMANENTE. CON PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO COLOR NEGRO MATE Y TRATAMIENTO PREVIO ANTICORROSIVO. INCLUYE MARCO METALICO FABRICADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18 ANCLADO AL VANO MEDIANTE CHAZOS Y CERRADURA TUBULAR PREMIUM DE PALANCA CON ESCUDO CUADRADO. PARA VENTILACIÓN CUARTO DE RESIDUOS.	m2	1.90

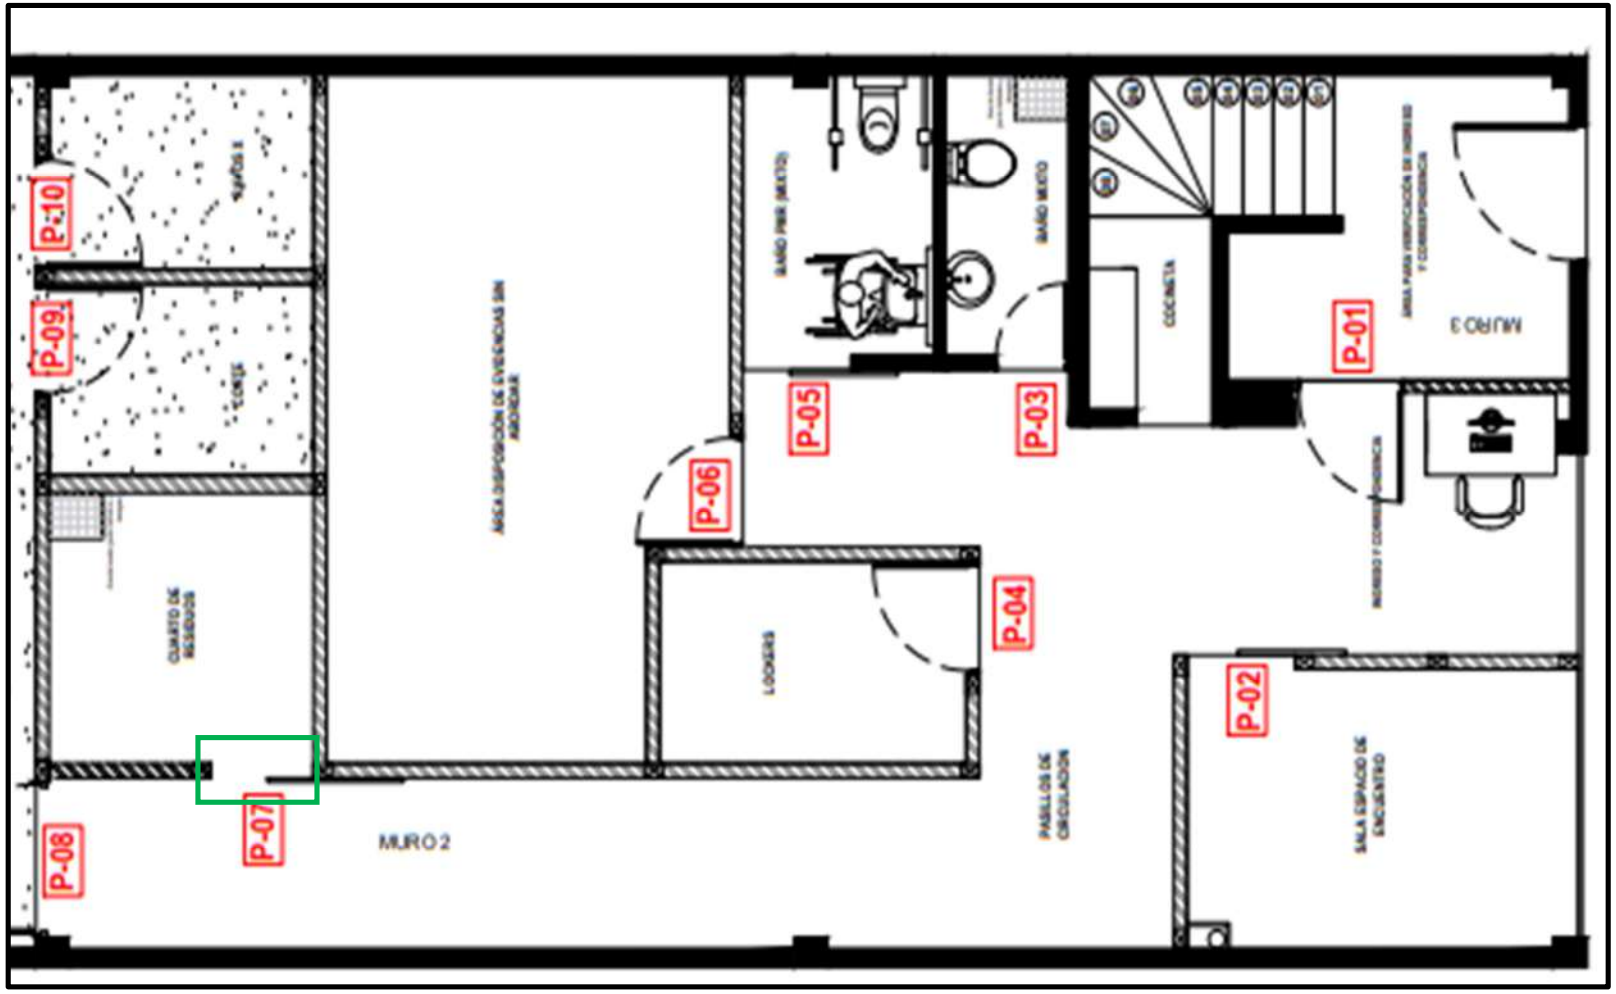

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad total**
N.P 46	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA METÁLICA TIPO PERSIANA DE UNA HOJA FABRICADA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18, CON BASTIDOR PERIMETRAL REFORZADO EN PERFILERIA METALICA. HOJA CONFORMADA POR LAMAS HORIZONTATES TIPO PERSIANA (FIJAS) DEBIDAMENTE ENSAMBLADAS PARA VENTILACION PERMANENTE. CON PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO COLOR NEGRO MATE Y TRATAMIENTO PREVIO ANTICORROSIVO. INCLUYE MARCO METALICO FABRICADO EN ACERO COLD ROLLED CAL 18 ANCLADO AL VANO MEDIANTE CHAZOS Y CERRADURA TUBULAR PREMIUM DE PALANCA CON ESCUDO CUADRADO. PARA VENTILACIÓN CUARTO DE RESIDUOS.	m2	1.90







OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 47	RECONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN ZONA DE REGATAS H=18 cm CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	m2	20.98

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
TRAMO 1	13.22	0.29	---	1.00	m²	3.83	
TRAMO 2	4.60	0.29		1.00	m²	1.33	
TRAMO 3	2.50	0.28		1.00	m²	0.70	
TRAMO 4	3.95	0.36		1.00	m²	1.42	
TRAMO 5	5.2	0.29		1.00	m²	1.51	
CAJA DE INSPECCIÓN	2.5	0.90		1.00	m²	2.25	
CORTE LOSA BAÑO PMR	3	1.36		1.00	m²	4.08	
CORTE LOSA BAÑO MIXTO	2.35	1.10		1.00	m²	2.59	
CORTE LOSA COCINETA	1.15	1.10		1.00	m²	1.27	
RED DE SUMINISTRO	6.2	0.20		1.00	m²	1.24	
RED DE SUMINISTRO	3.0	0.20		1.00	m²	0.60	
CAJA ELECTRICA PARA TIERRA	0.4	0.40		1.00	m²	0.16	
					Subtotal	**20.98**	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	**20.98**	

OBSERVACIONES:

*Las cantidades deberan ser corroboradas por el constructor antes de iniciar las labores


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 47	RECONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN ZONA DE REGATAS H=18 cm CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	m2	20.98

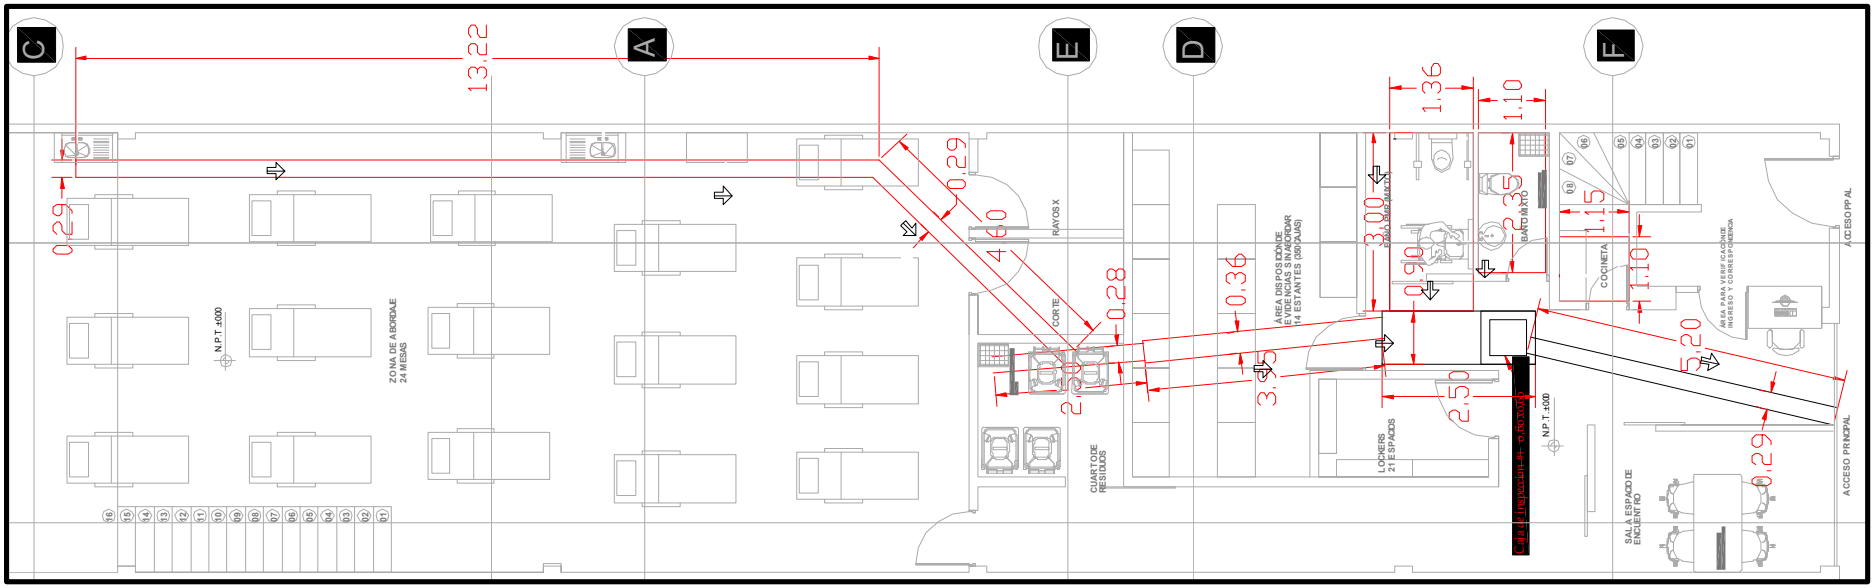

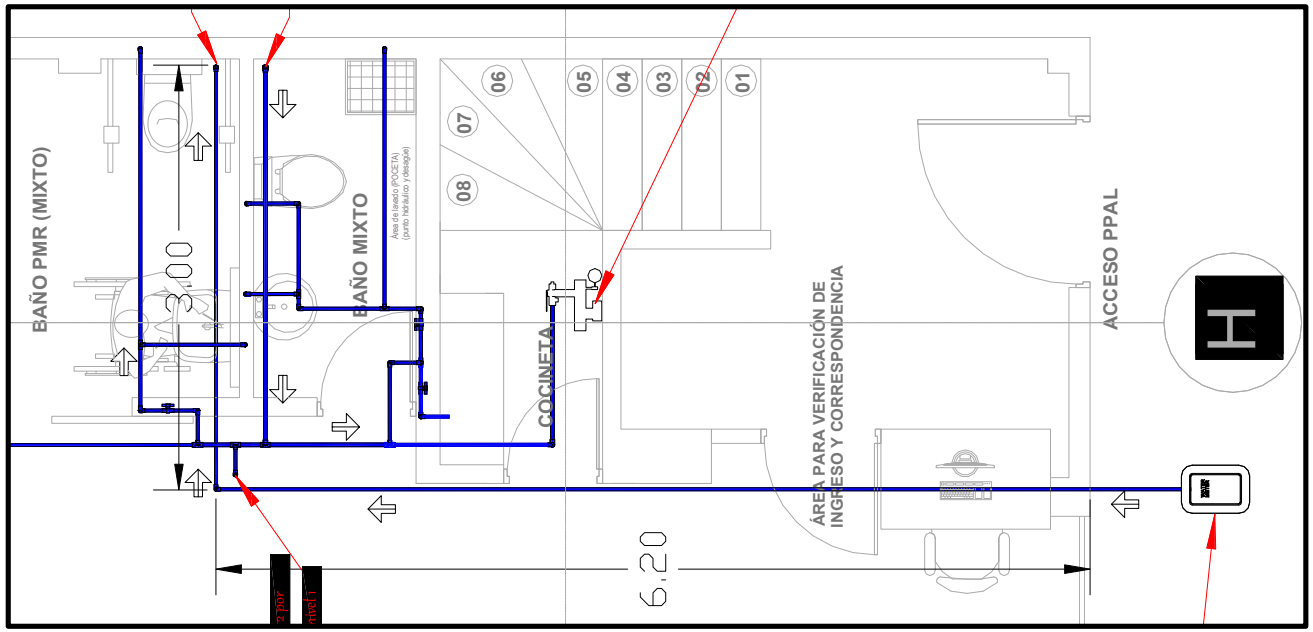

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 47	RECONSTRUCCION DE LOSA DE CONTRAPISO EN ZONA DE REGATAS H=18 cm CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	m2	20.98









OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 48	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E = 0.18 m	m2	20.98

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
TRAMO 1	13.22	0.29	---	1.00	m²	3.83	
TRAMO 2	4.60	0.29		1.00	m²	1.33	
TRAMO 3	2.50	0.28		1.00	m²	0.70	
TRAMO 4	3.95	0.36		1.00	m²	1.42	
TRAMO 5	5.2	0.29		1.00	m²	1.51	
CAJA DE INSPECCIÓN	2.5	0.90		1.00	m²	2.25	
CORTE LOSA BAÑO PMR	3	1.36		1.00	m²	4.08	
CORTE LOSA BAÑO MIXTO	2.35	1.10		1.00	m²	2.59	
CORTE LOSA COCINETA	1.15	1.10		1.00	m²	1.27	
RED DE SUMINISTRO	6.2	0.20		1.00	m²	1.24	
RED DE SUMINISTRO	3.0	0.20		1.00	m²	0.60	
CAJA ELECTRICA PARA TIERRA	0.4	0.40		1.00	m²	0.16	
					Subtotal	**20.98**	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	**20.98**	

OBSERVACIONES:

*Las cantidades deberan ser corroboradas por el constructor antes de iniciar las labores


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 48	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E = 0.18 m	m2	20.98

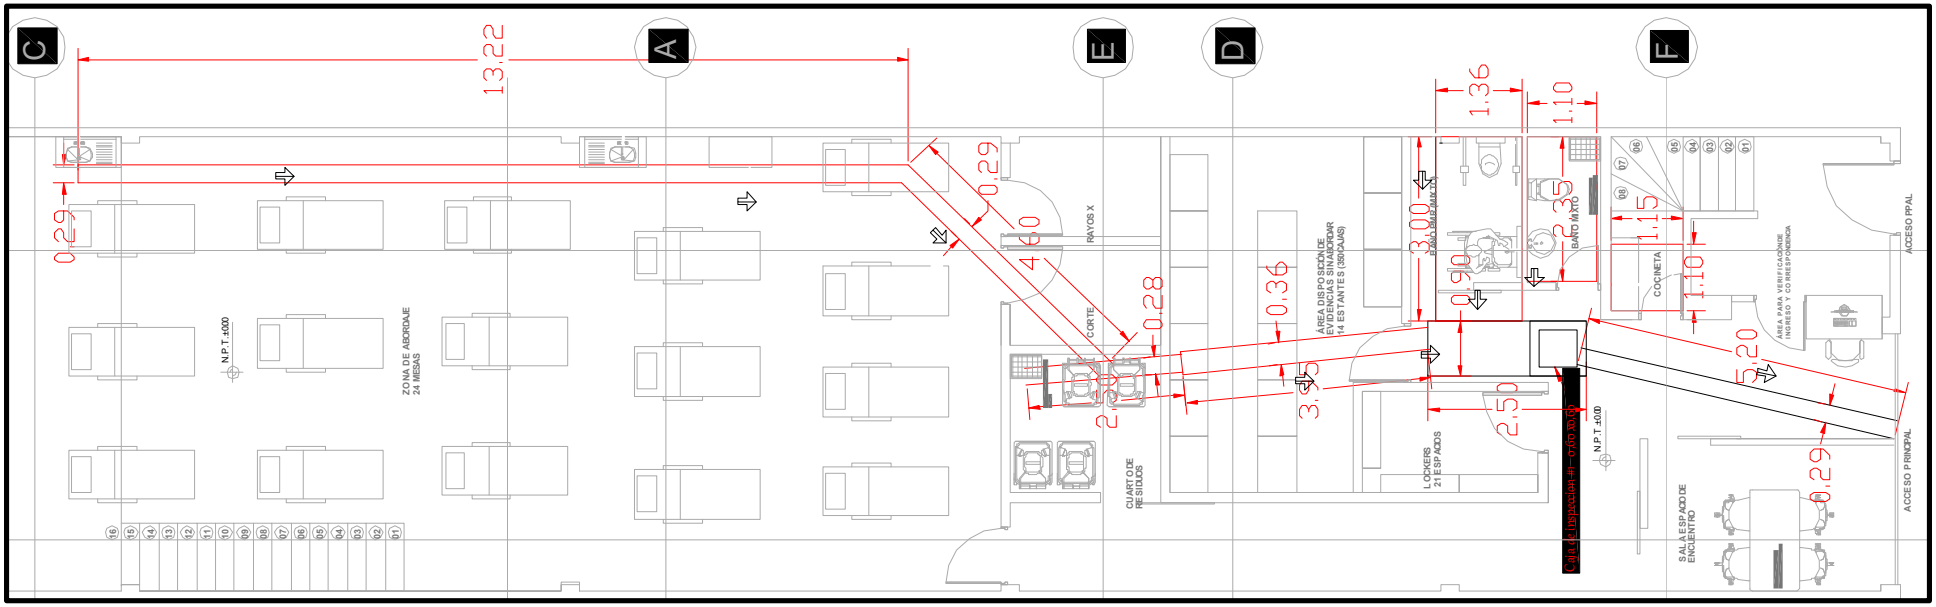


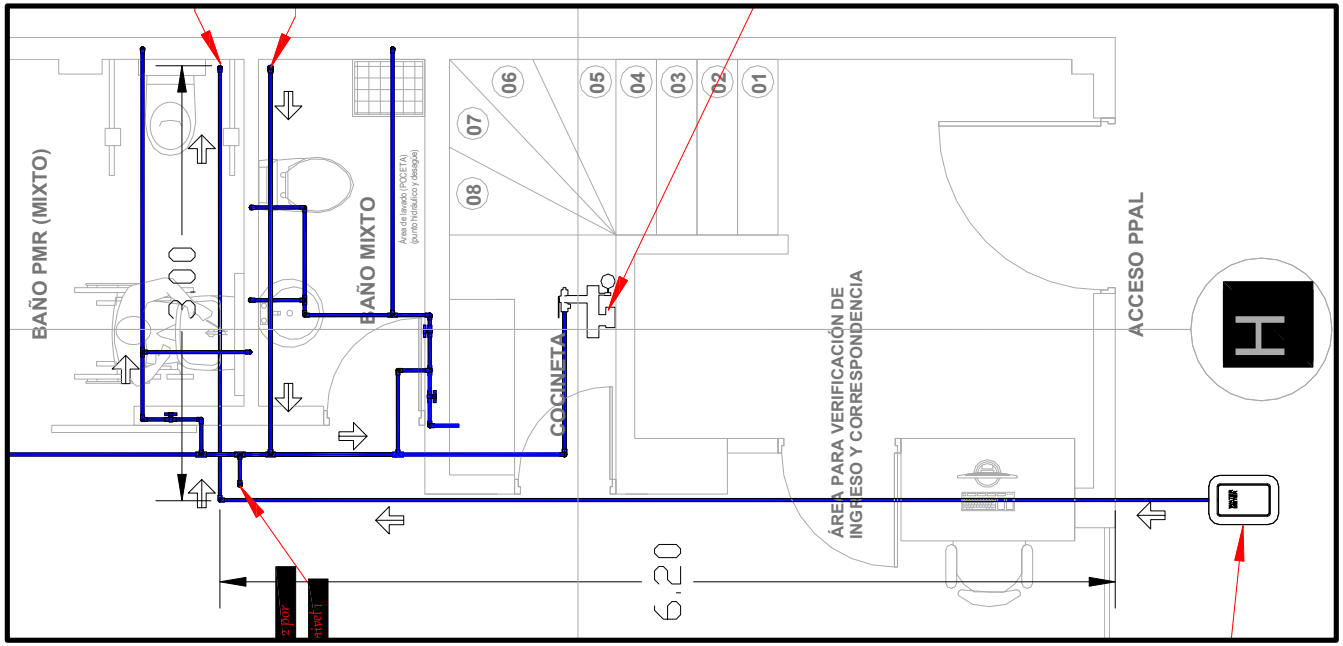

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 48	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E = 0.18 m	m2	20.98

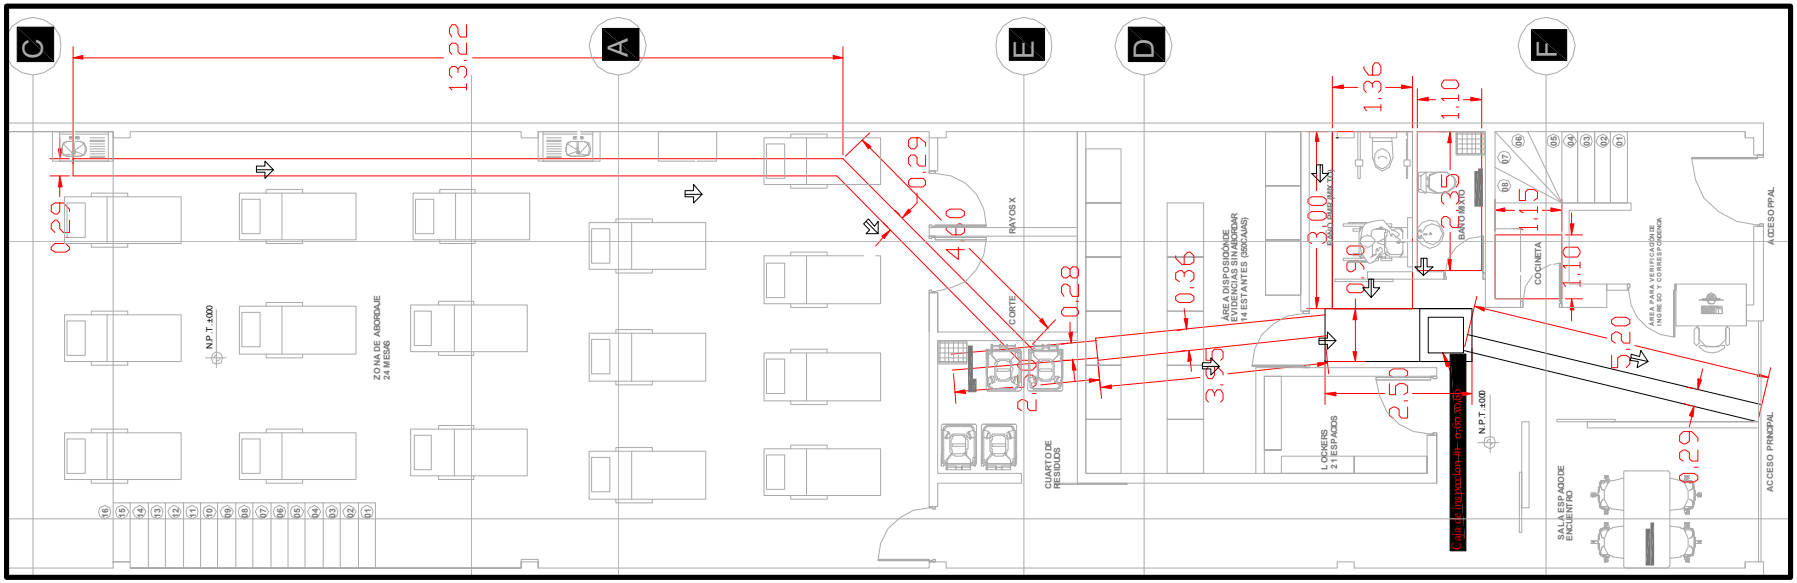

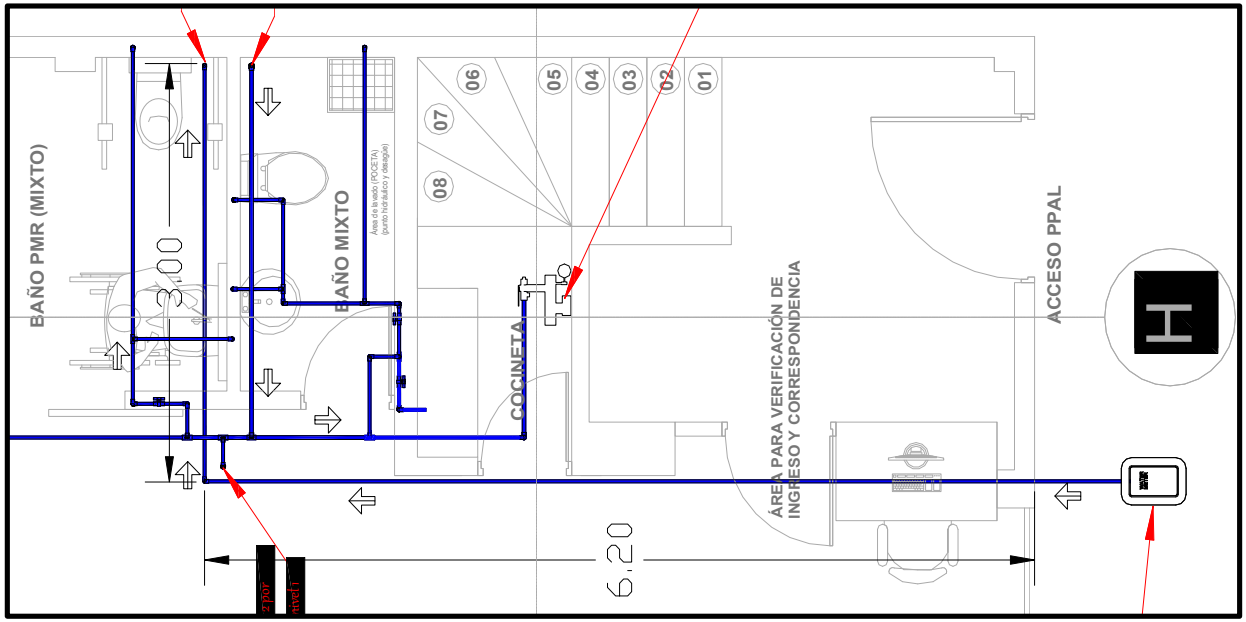

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 48	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E = 0.18 m	m2	20.98










OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 49	DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)	und	1.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
PASILLO ACCESO A BATERIAS 1ER PISO				1.00	UNIDAD	1.00	
					Subtotal	1.00	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	1.00	

OBSERVACIONES:

*Las cantidades deberan ser corroboradas por el constructor antes de iniciar las labores


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

PABLO A PEÑA
APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 49	DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)	und	1.00

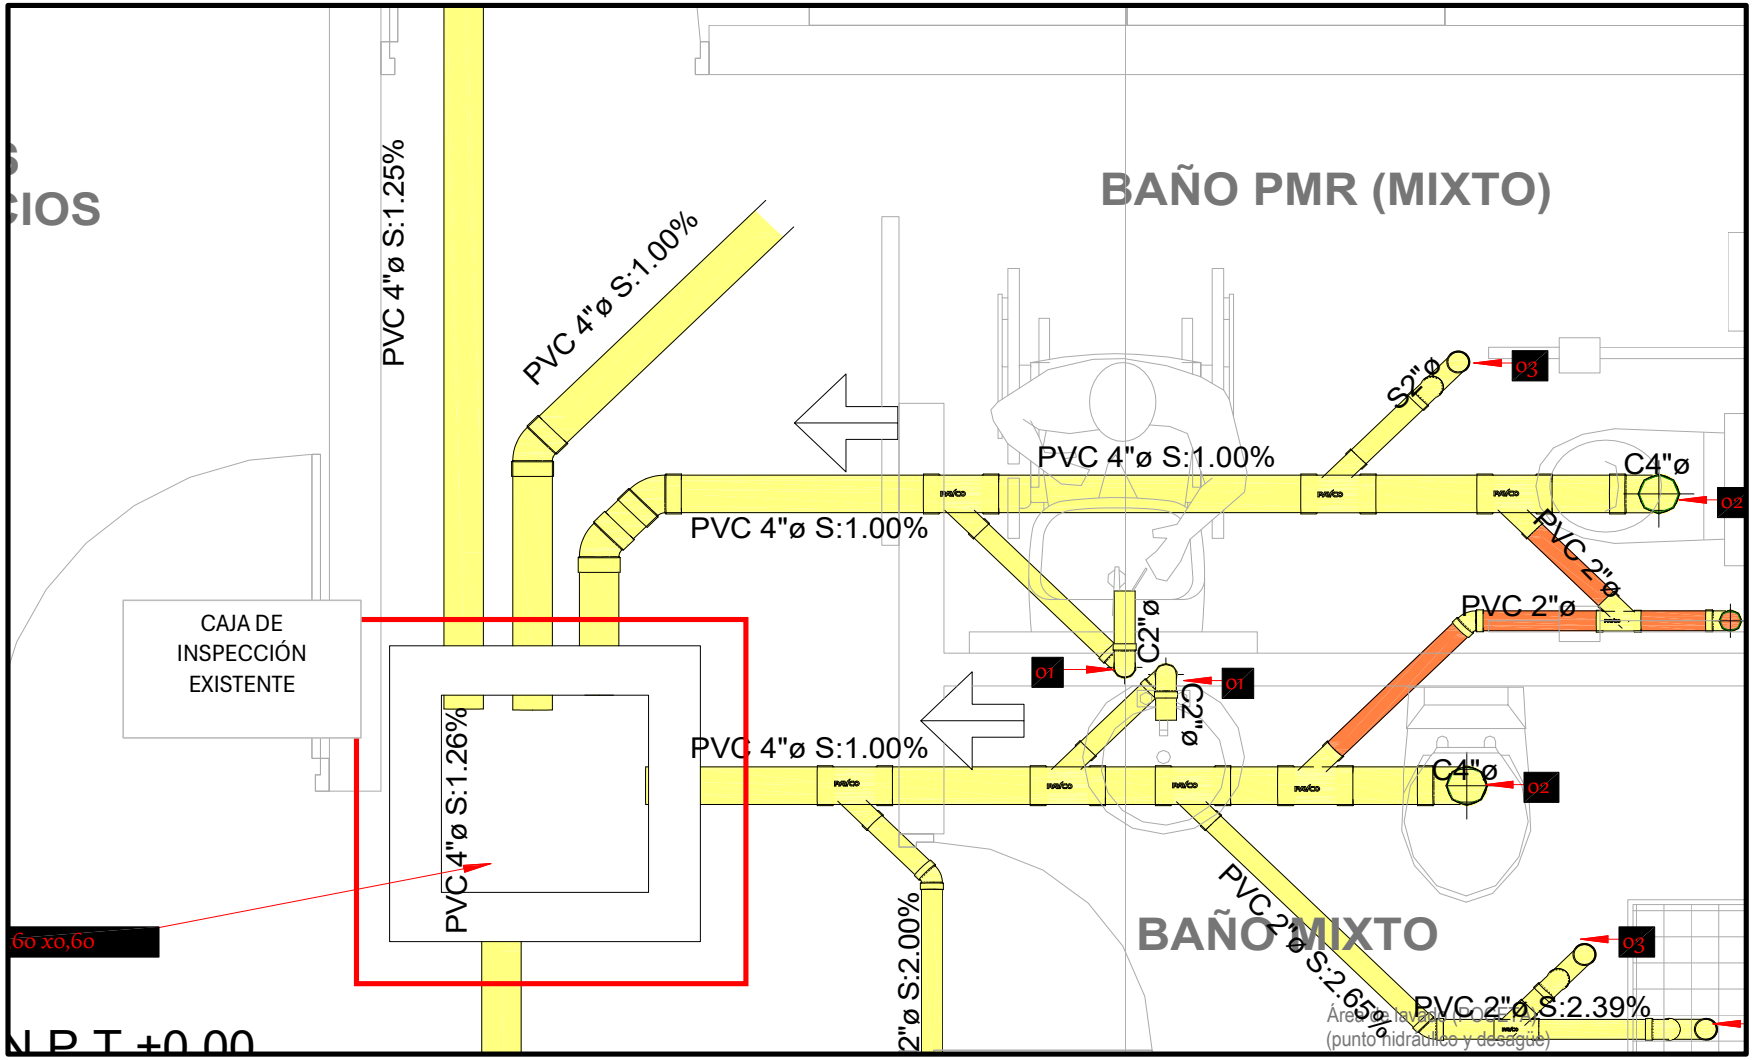

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad total**
N.P 49	DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN. (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)	und	1.00









OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 50	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 ANCHO <=0.60m - EN COLUMNAS	m	82.40

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
COL 1			6.30	1.00	m	6.30	
COL 2			6.30	1.00	m	6.30	
COL 3			6.30	1.00	m	6.30	
COL 4			6.30	1.00	m	6.30	
COL 5			6.30	1.00	m	6.30	
COL 6			6.30	1.00	m	6.30	
COL 7			2.60	1.00	m	2.60	
COL 8			2.60	1.00	m	2.60	
COL 9			2.60	1.00	m	2.60	
COL 10			2.60	1.00	m	2.60	
COL 11			2.60	1.00	m	2.60	
COL 12			2.60	1.00	m	2.60	
COL 13			2.60	1.00	m	2.60	
COL 14			2.40	1.00	m	2.40	
COL 15			2.40	1.00	m	2.40	
COL 16			2.40	1.00	m	2.40	
COL 17			2.40	1.00	m	2.40	
COL 18			2.40	1.00	m	2.40	
COL 19			2.40	1.00	m	2.40	
COL 20			2.40	1.00	m	2.40	
DUCTO 1			3.60	1.00	m	3.60	
DUCTO 2			2.40	1.00	m	2.40	
MENSULAS			0.30	12.00	m	3.60	
					Subtotal	**82.40**	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	**82.40**	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 50	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 ANCHO <=0.60m - EN COLUMNAS	m	82.40

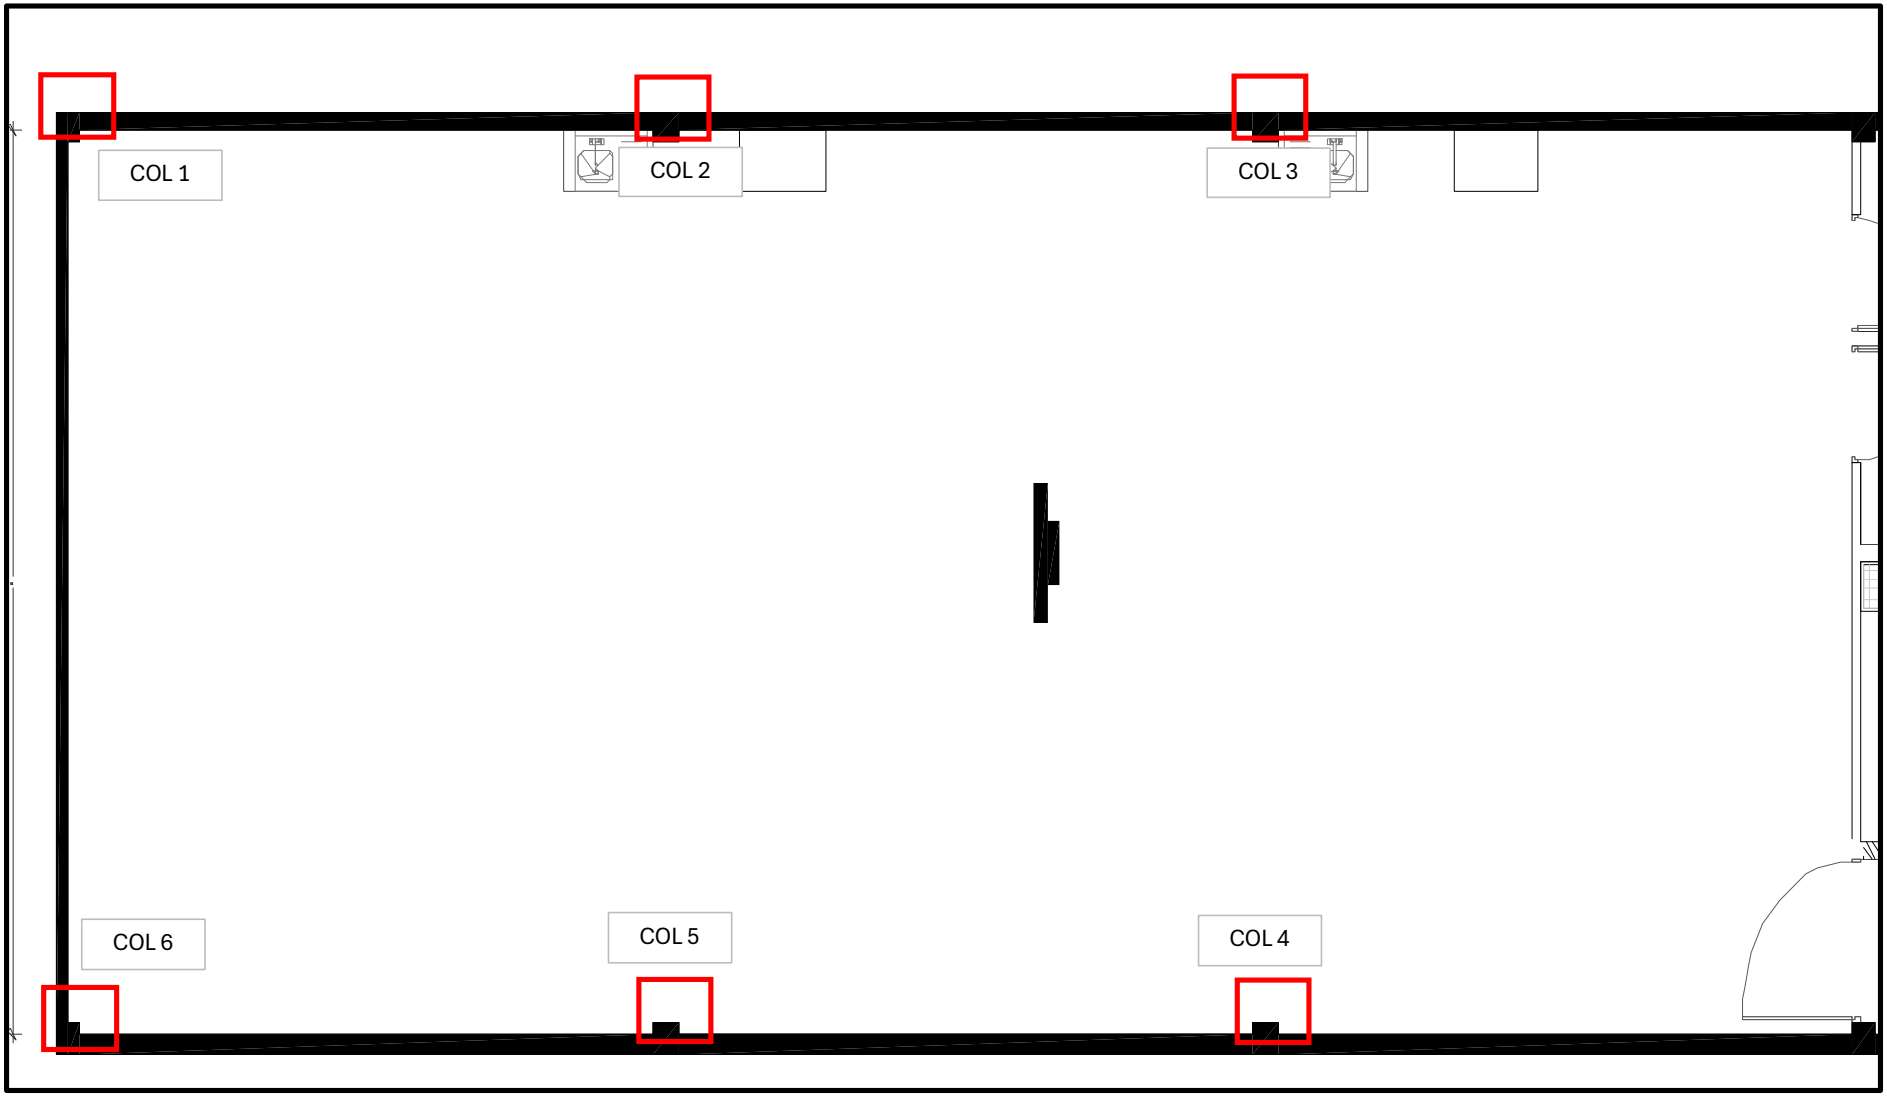


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 50	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 ANCHO <=0.60m - EN COLUMNAS	m	82.40

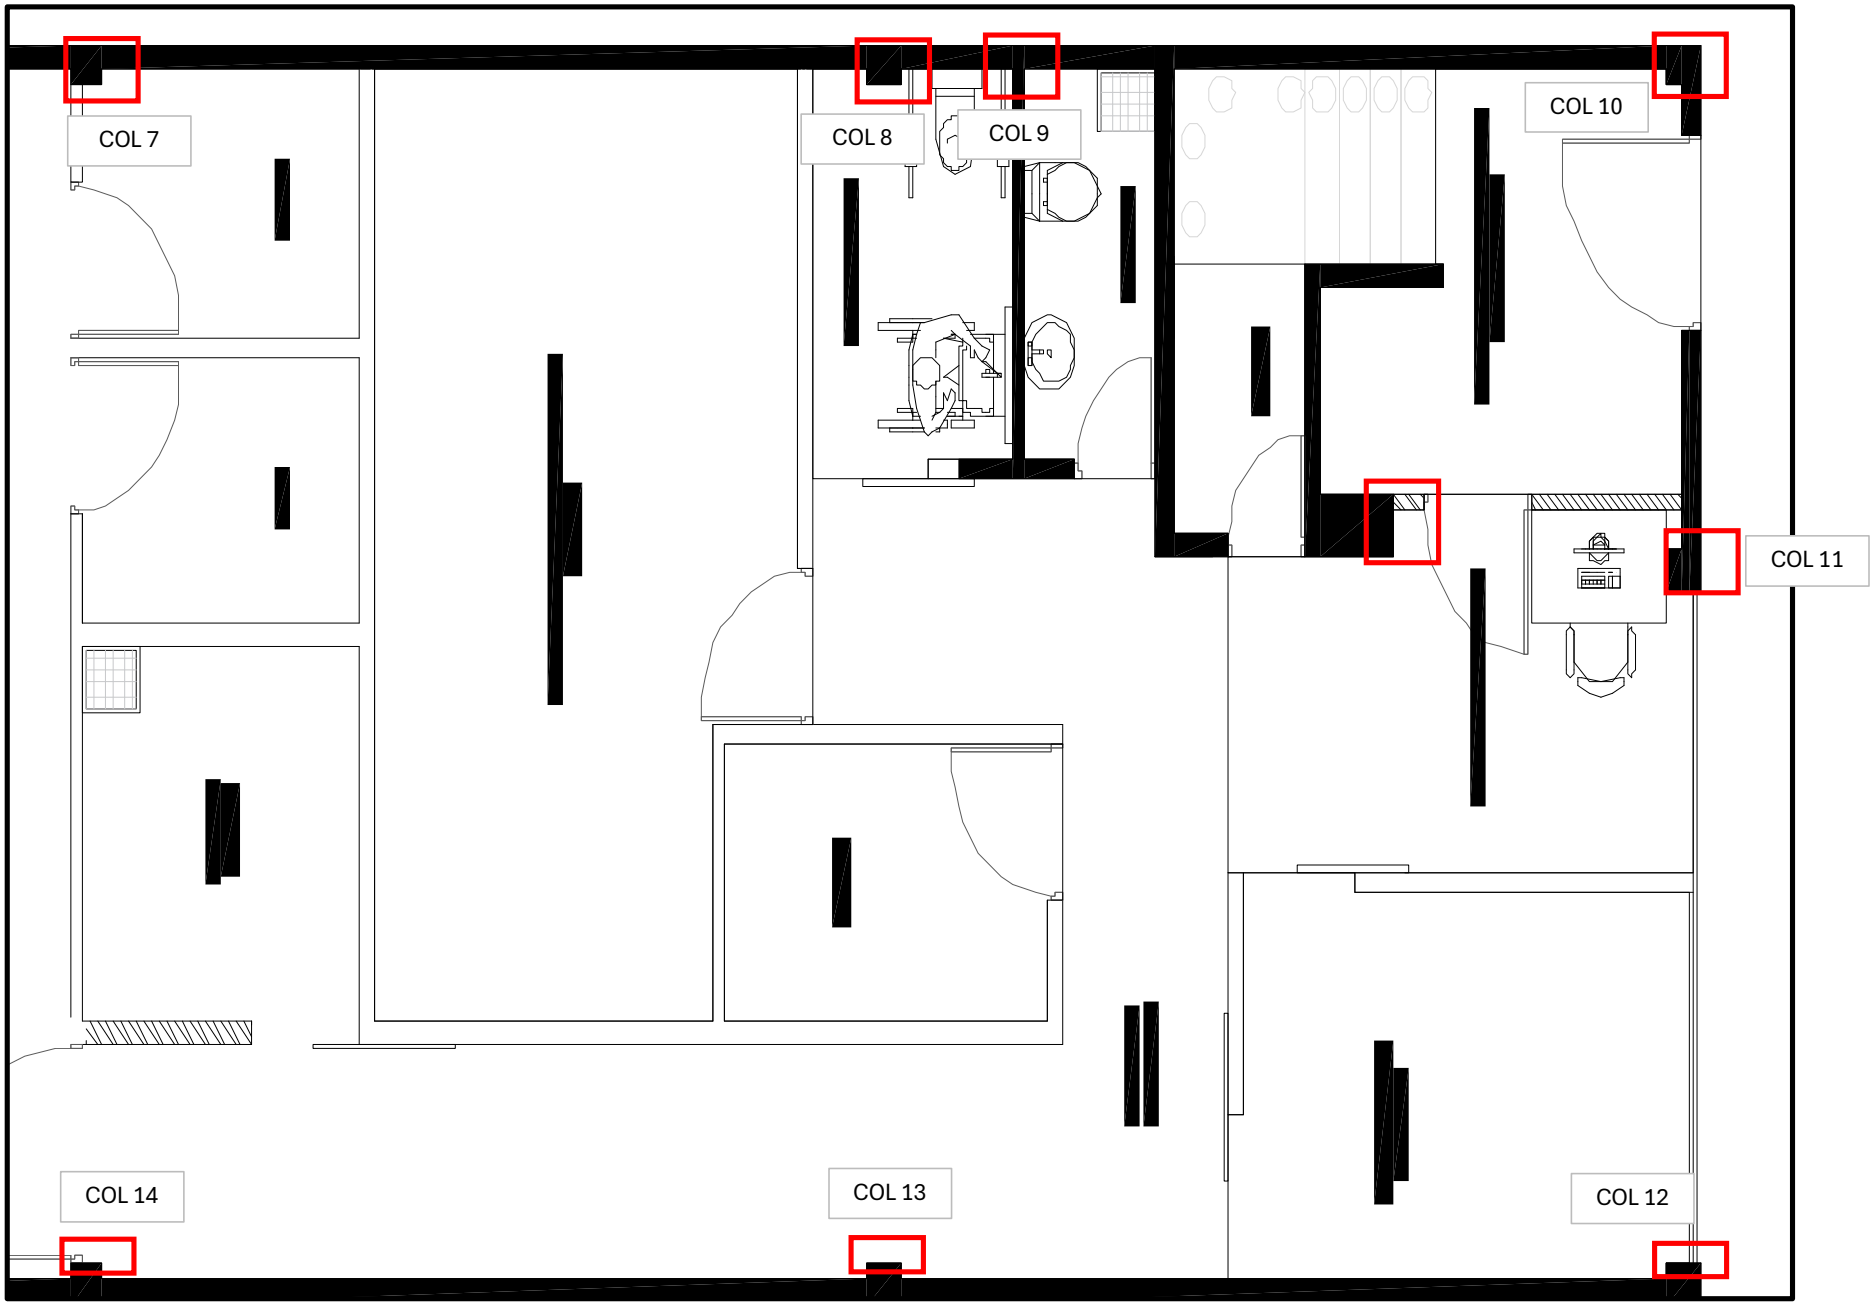

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 50	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 ANCHO <=0.60m - EN COLUMNAS	m	82.40

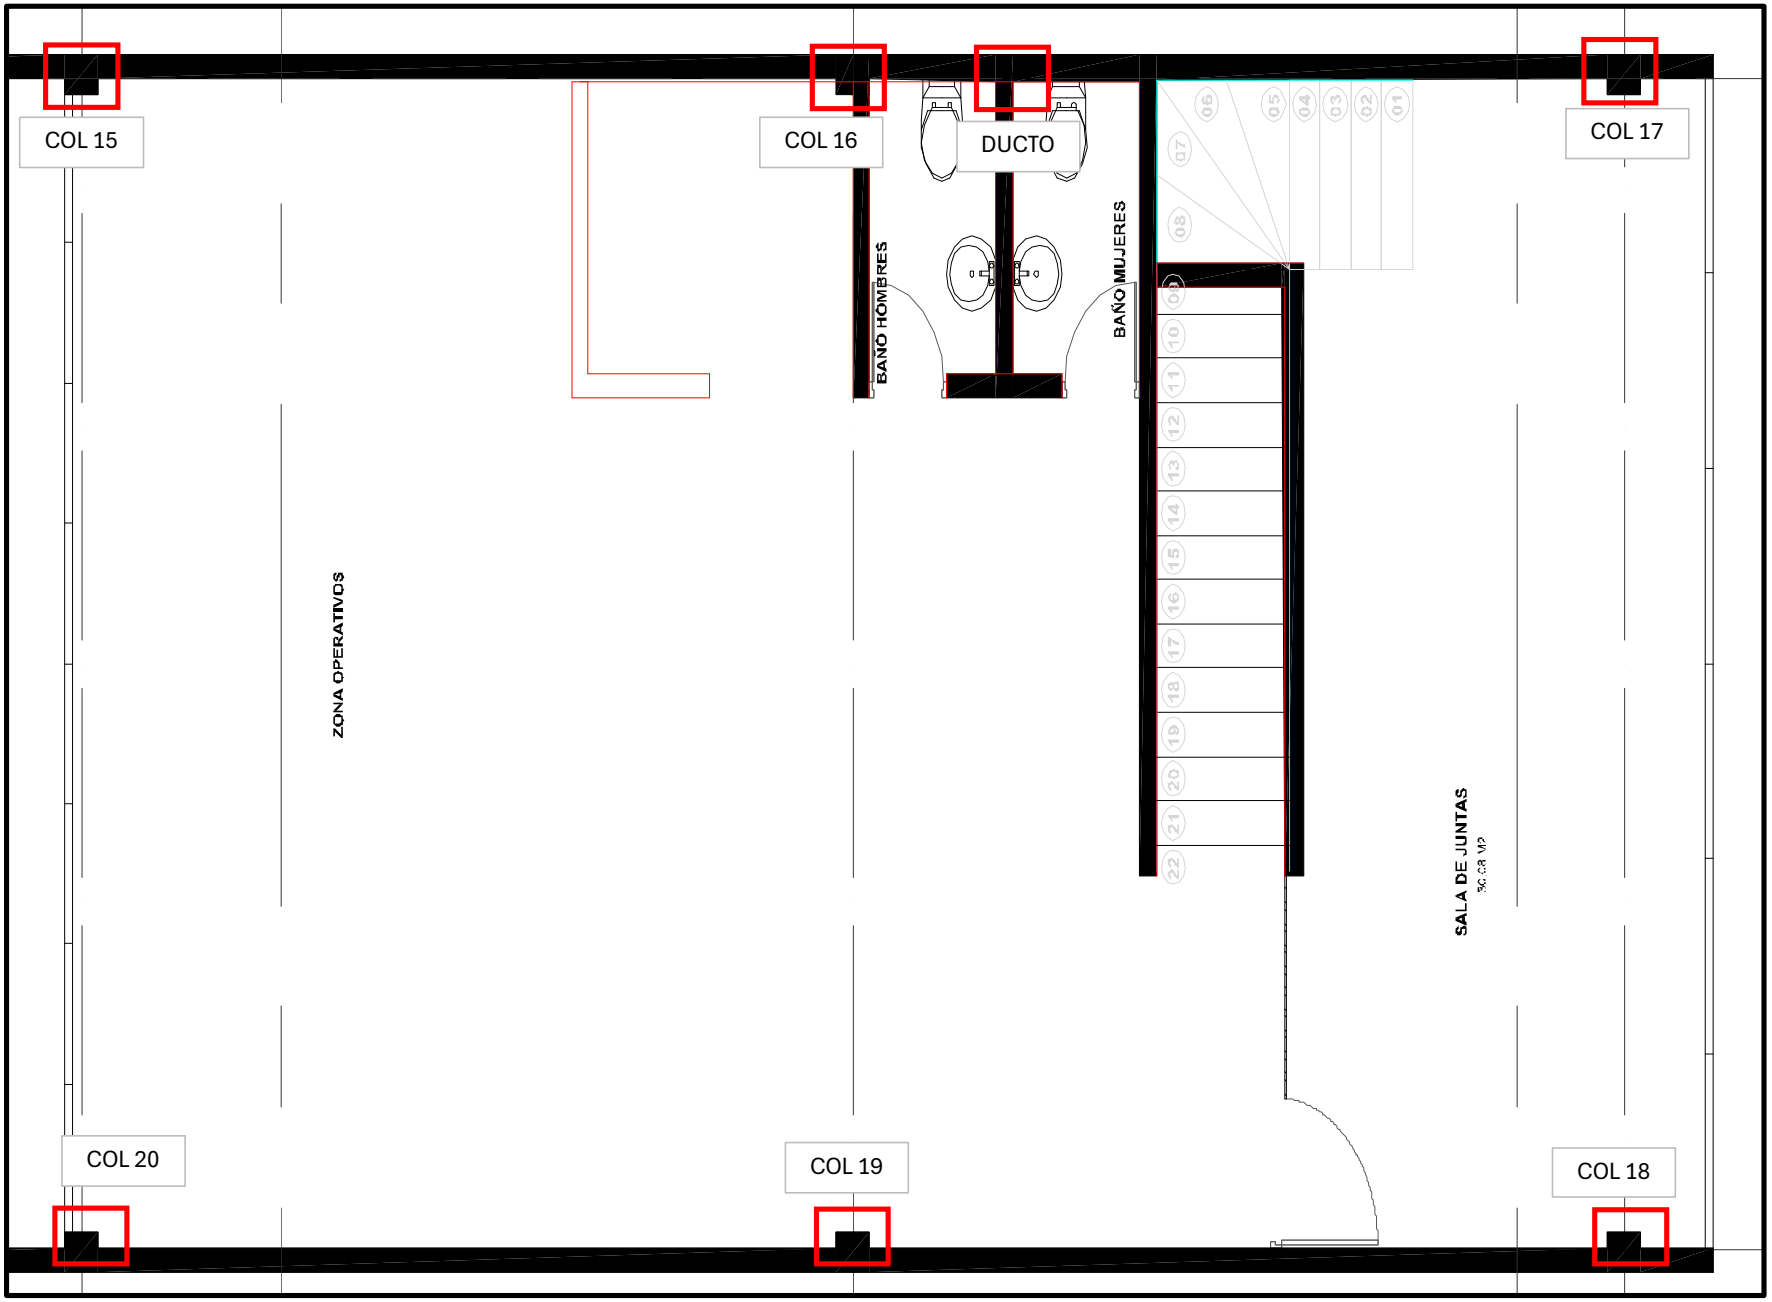

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 50	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 ANCHO <=0.60m - EN COLUMNAS	m	82.40









OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 51	ESTUCO Y VINILO TIPO I SOBRE MUROS COLOR BLANCO TRES MANOS ANCHO <= 0.60m - EN COLUMNAS	m	82.40

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
COL 1			6.30	1.00	m	6.30	
COL 2			6.30	1.00	m	6.30	
COL 3			6.30	1.00	m	6.30	
COL 4			6.30	1.00	m	6.30	
COL 5			6.30	1.00	m	6.30	
COL 6			6.30	1.00	m	6.30	
COL 7			2.60	1.00	m	2.60	
COL 8			2.60	1.00	m	2.60	
COL 9			2.60	1.00	m	2.60	
COL 10			2.60	1.00	m	2.60	
COL 11			2.60	1.00	m	2.60	
COL 12			2.60	1.00	m	2.60	
COL 13			2.60	1.00	m	2.60	
COL 14			2.40	1.00	m	2.40	
COL 15			2.40	1.00	m	2.40	
COL 16			2.40	1.00	m	2.40	
COL 17			2.40	1.00	m	2.40	
COL 18			2.40	1.00	m	2.40	
COL 19			2.40	1.00	m	2.40	
COL 20			2.40	1.00	m	2.40	
DUCTO 1			3.60	1.00	m	3.60	
DUCTO 2			2.40	1.00	m	2.40	
MENSULAS			0.30	12.00	m	3.60	
					Subtotal	**82.40**	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	**82.40**	


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO COLLADA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 51	ESTUCO Y VINILO TIPO I SOBRE MUROS COLOR BLANCO TRES MANOS ANCHO <= 0.60m - EN COLUMNAS	m	82.40

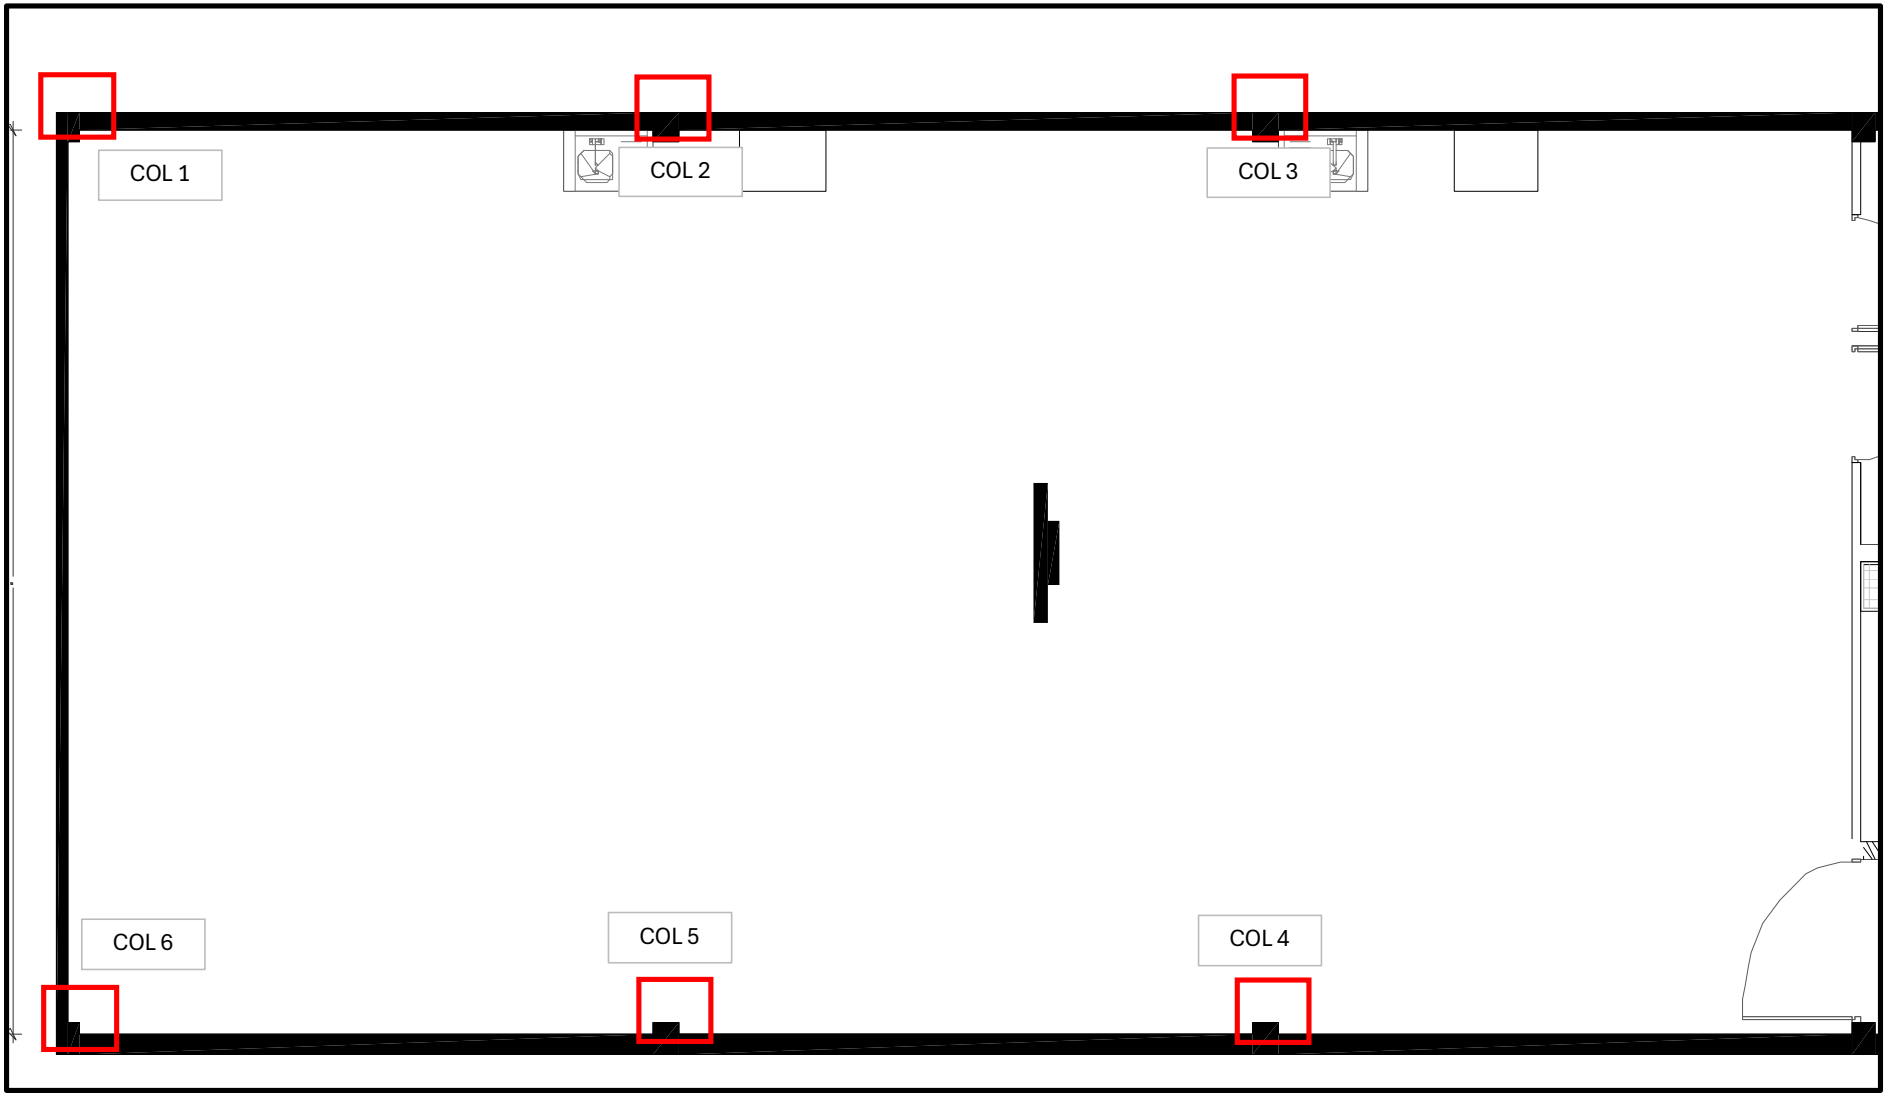


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 51	ESTUCO Y VINILO TIPO I SOBRE MUROS COLOR BLANCO TRES MANOS ANCHO <= 0.60m - EN COLUMNAS	m	82.40

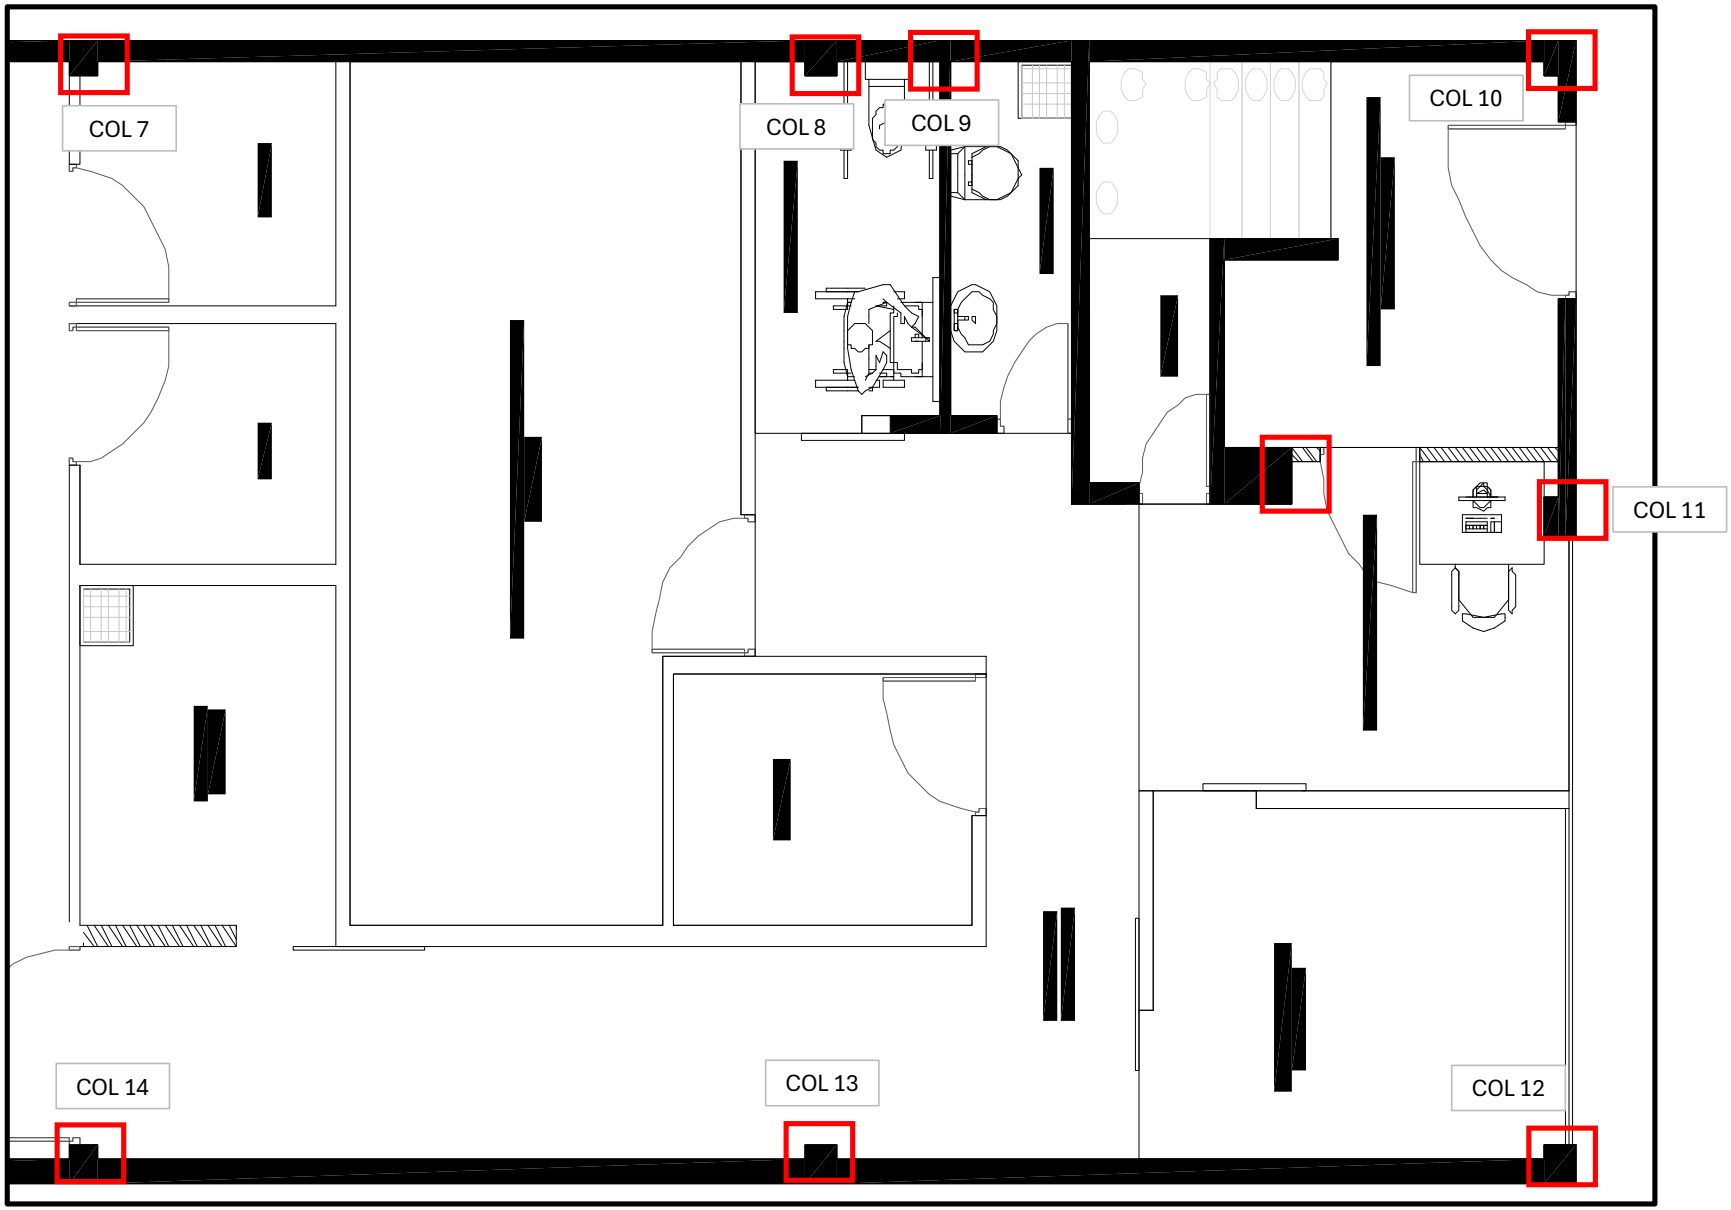



B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad total**
N.P 51	ESTUCO Y VINILO TIPO I SOBRE MUROS COLOR BLANCO TRES MANOS ANCHO <= 0.60m - EN COLUMNAS	m	82.40

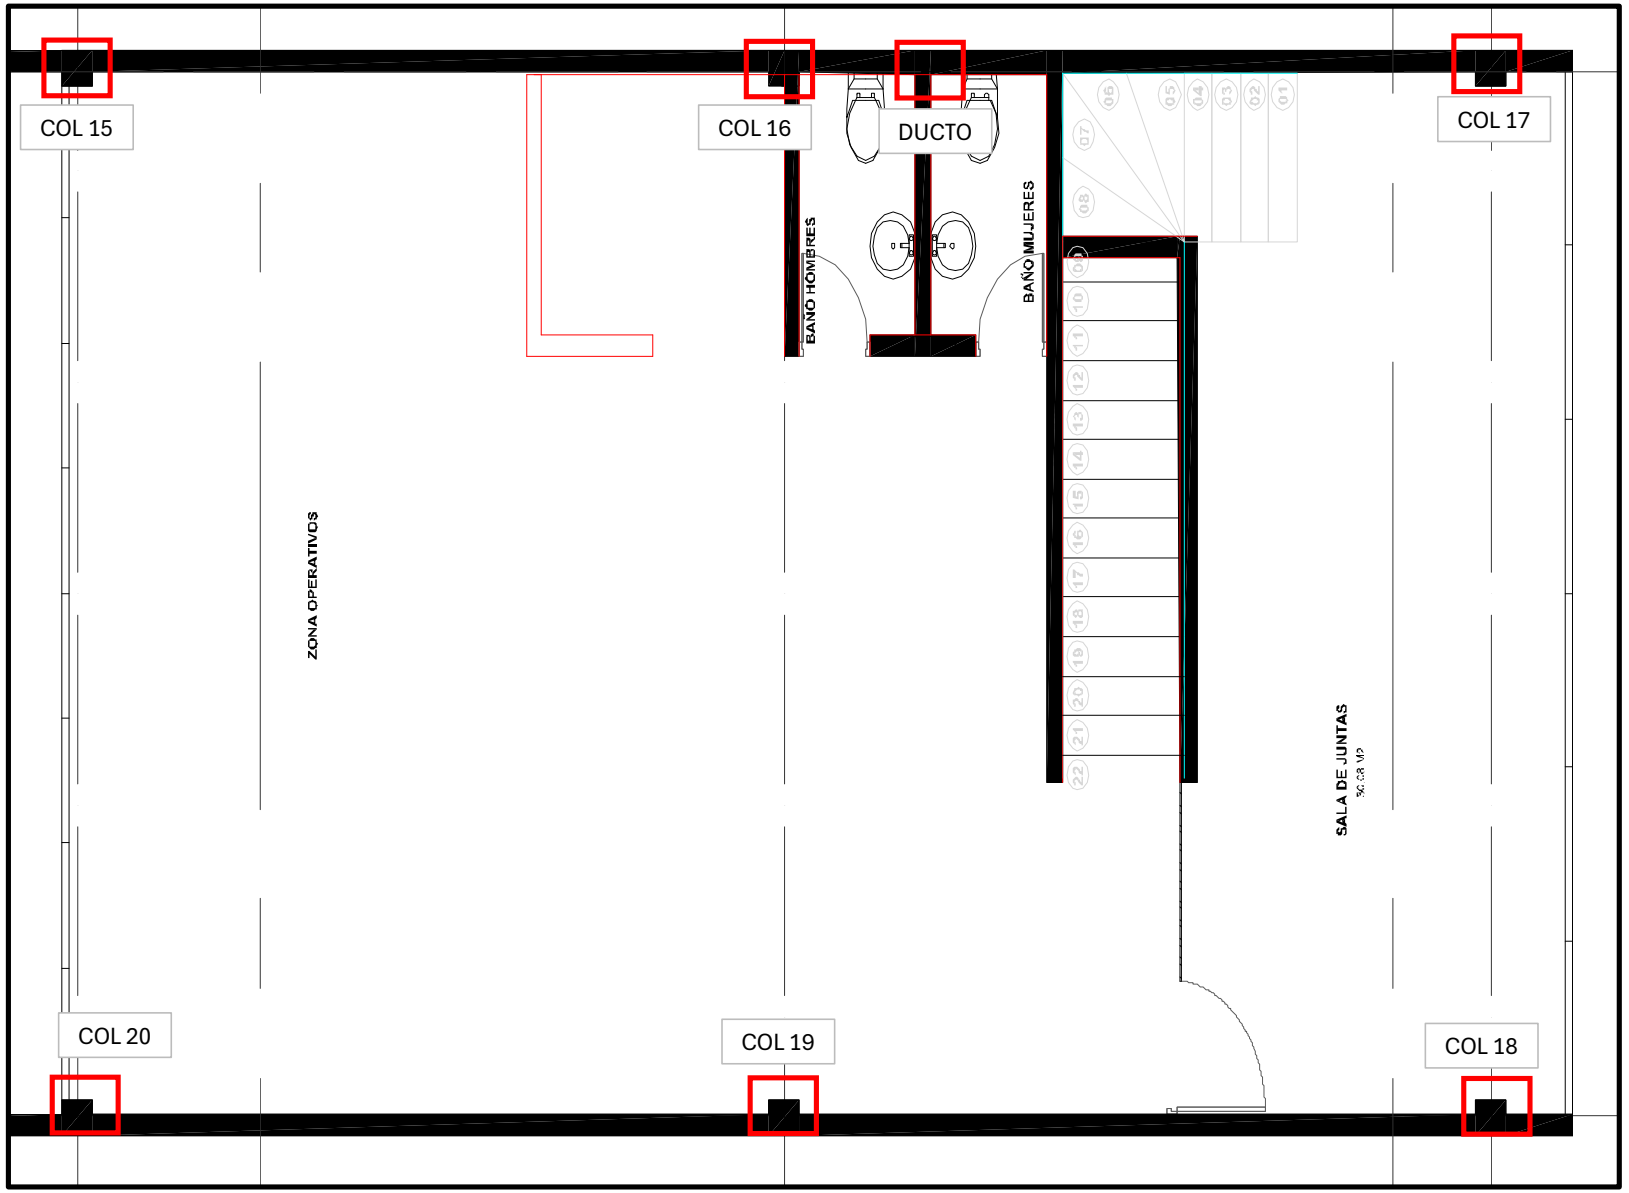


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad total**
N.P 51	ESTUCO Y VINILO TIPO I SOBRE MUROS COLOR BLANCO TRES MANOS ANCHO <= 0.60m - EN COLUMNAS	m	82.40



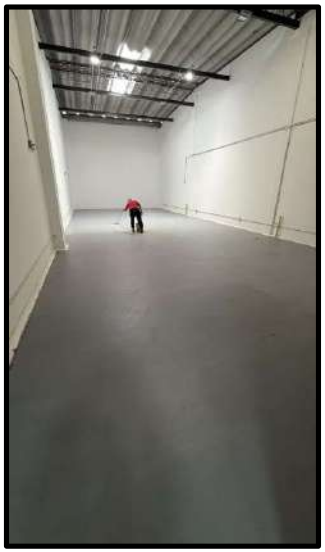

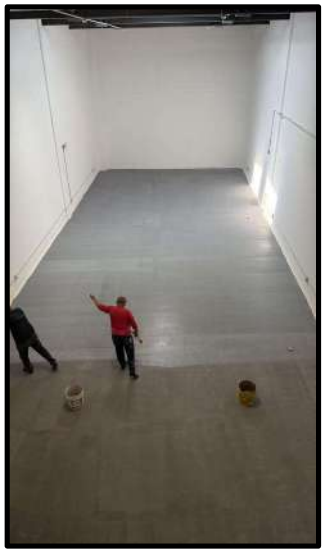



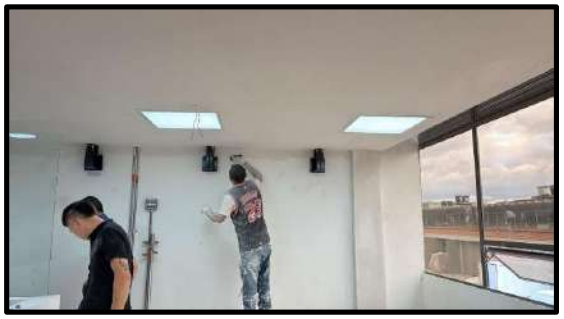





OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3X100 A DE CAJA MOLDEADA TIPO FIJO	und	2.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
TABLERO DE MEDIDORES No. 8				2.00	UNIDAD	2.00	
					Subtotal	2.00	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	2.00	
OBSERVACIONES:							

*Las cantidades deberan ser corroboradas por el constructor antes de iniciar las labores


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

ING. BERNARDO SOTO GARCÍA
SUPERVISOR UBPD


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3X100 A DE CAJA MOLDEADA TIPO FIJO	und	2.00

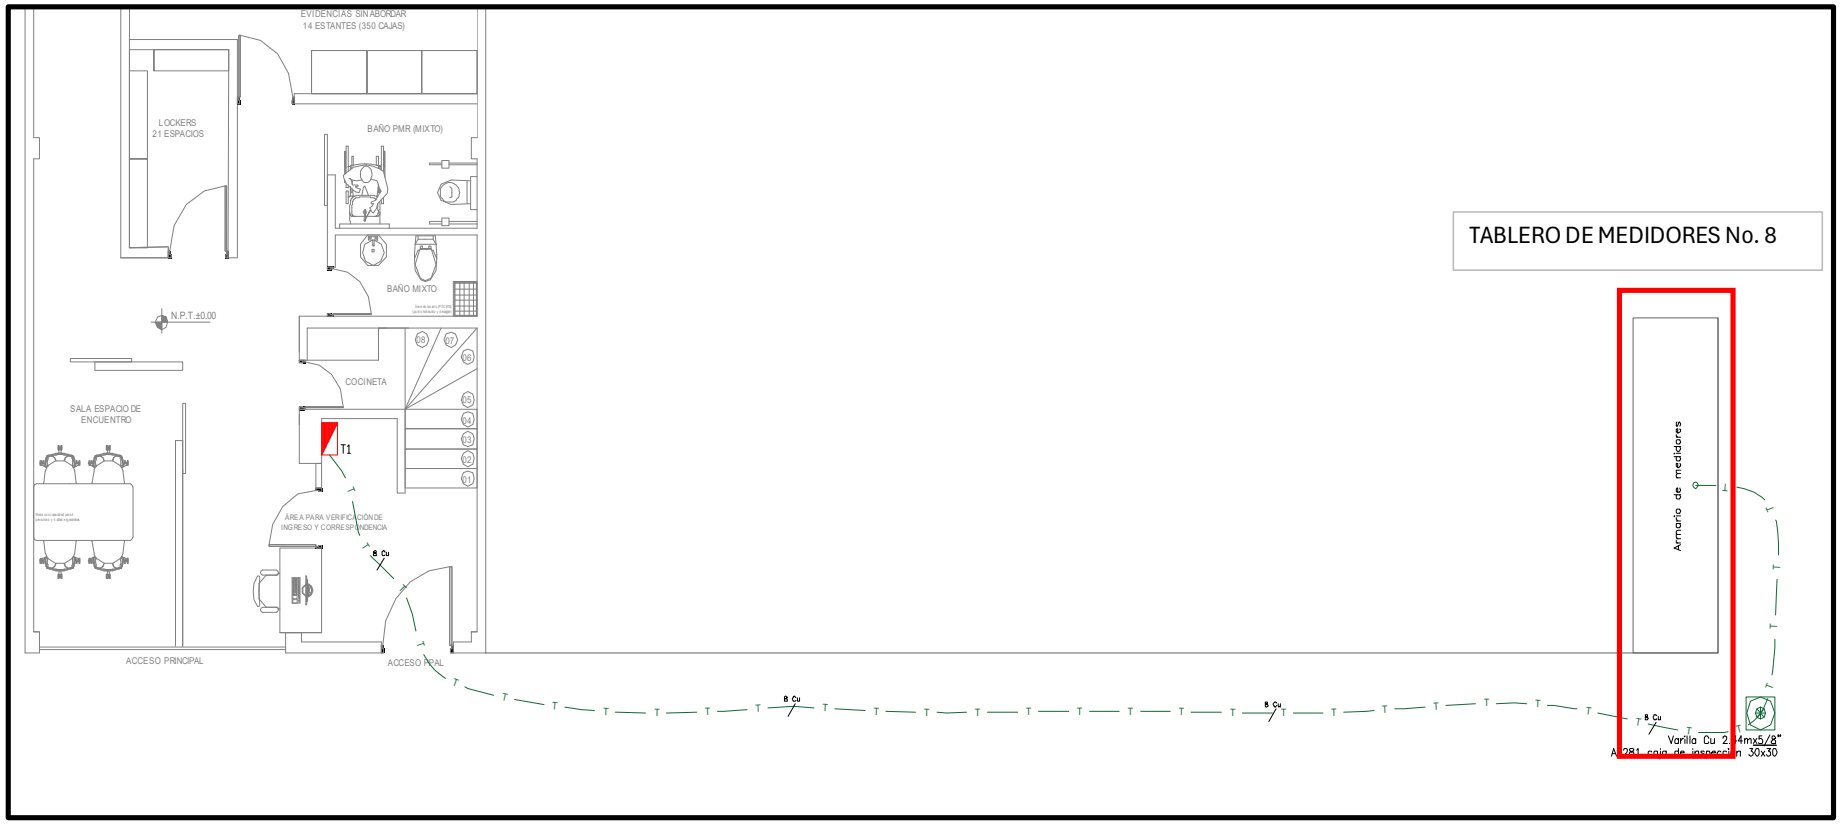

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad total**
N.P 52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3X100 A DE CAJA MOLDEADA TIPO FIJO	und	2.00



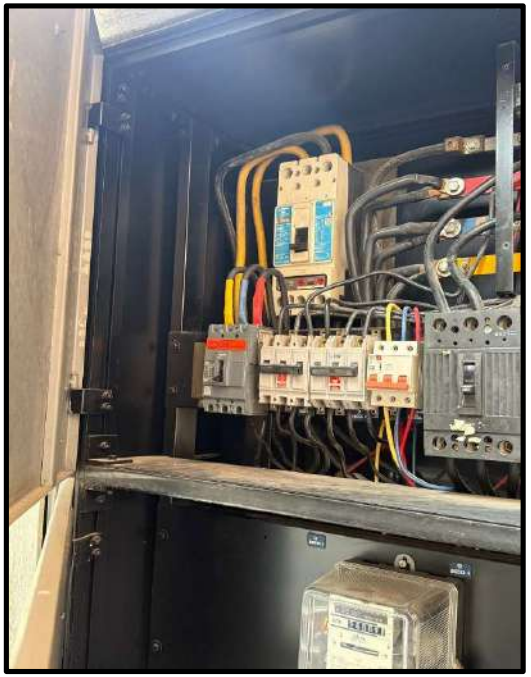



OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 53	DEMOLICIÓN DE COLUMNETA EN CONCRETO SECCIÓN 0.17x12 cm, (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	m	7.20

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
CENTRO DE DATOS			2.40	3.00	m	7.20	
					Subtotal	7.20	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	7.20	
OBSERVACIONES:							

*Las cantidades deberan ser corroboradas por el constructor antes de iniciar las labores


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 53	DEMOLICIÓN DE COLUMNETA EN CONCRETO SECCIÓN 0.17x12 cm, (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	m	7.20

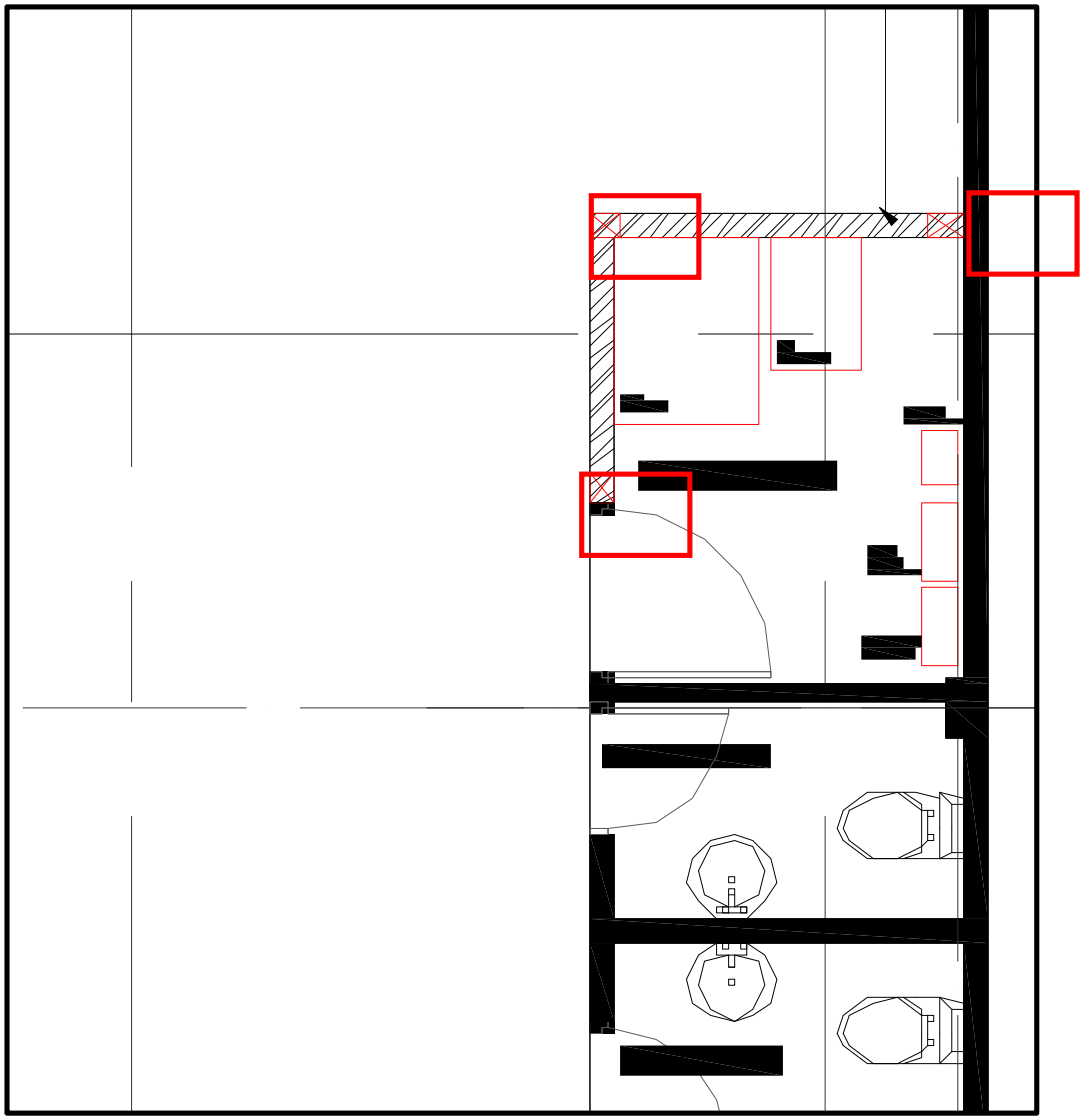

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 53	DEMOLICIÓN DE COLUMNETA EN CONCRETO SECCIÓN 0.17x12 cm, (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	m	7.20







OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**


CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 54	BOCA PUERTA EN CERAMICA - ANCHO 12 cm	m	9.98

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto			
PUERTA CUARTO DE RESIDUOS		0.95		1.00	m	0.95
PUERTA AREA DE ABORDAJE		1.38		1.00	m	1.38
PUERTA LOCKERS		0.95		1.00	m	0.95
PUERTA AREA DISPOSICION DE		0.95		1.00	m	0.95
PUERTA BAÑO PMR		1.00		1.00	m	1.00
PUERTA BAÑO MIXTO		0.70		1.00	m	0.70
PUERTA COCINETA		0.70		1.00	m	0.70
PUERTA SALA DE ENCUENTRO		1.00		1.00	m	1.00
PUERTA BAÑO HOMBRES		0.70		1.00	m	0.70
PUERTA BAÑO MUJERES		0.70		1.00	m	0.70
PUERTA CENTRO DE DATOS		0.95		1.00	m	0.95
					Subtotal	**9.98**
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	**9.98**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

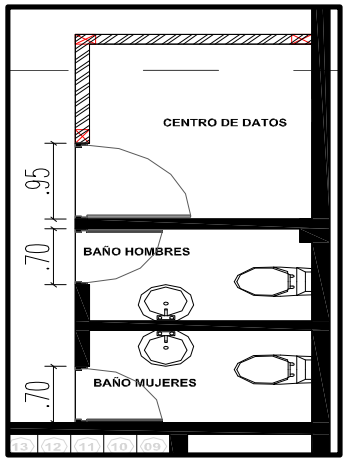

OBSERVACIONES:

*Las cantidades deberan ser corroboradas por el constructor antes de iniciar las labores


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 54	BOCA PUERTA EN CERAMICA - ANCHO 12 cm	m	9.98

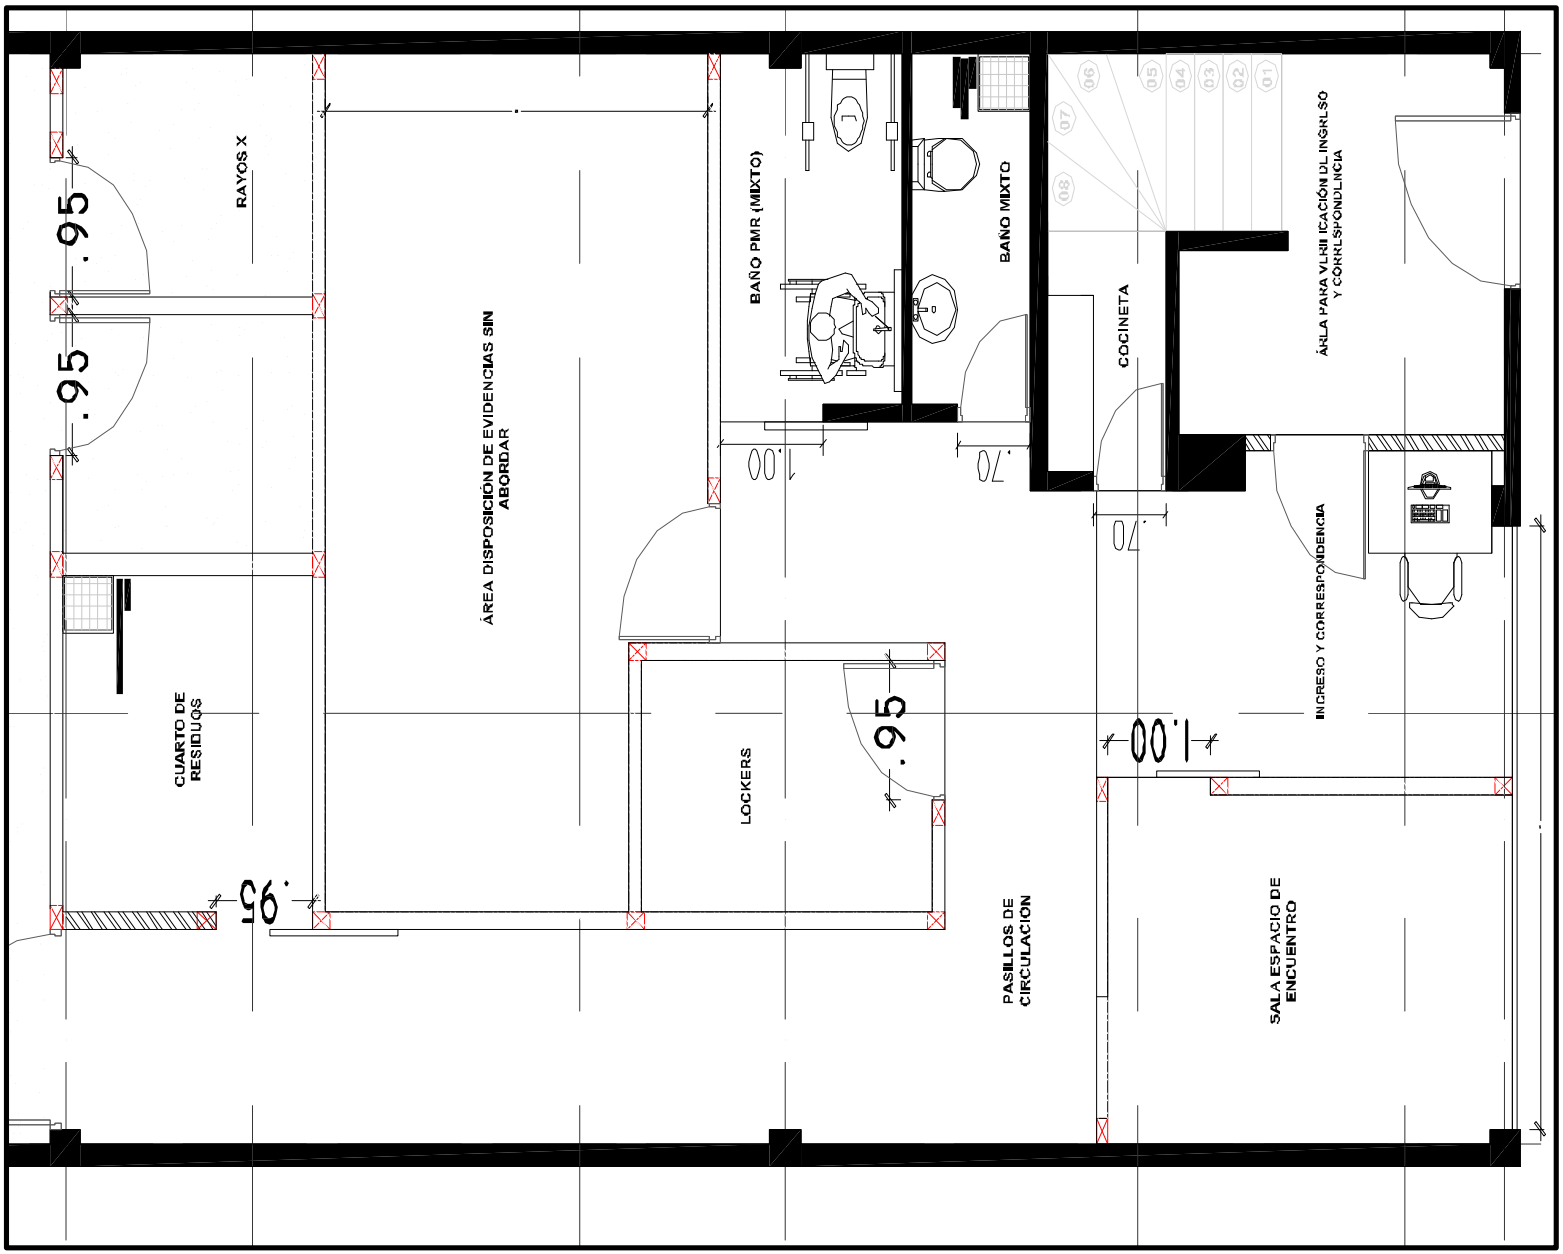


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 54	BOCA PUERTA EN CERAMICA - ANCHO 12 cm	m	9.98







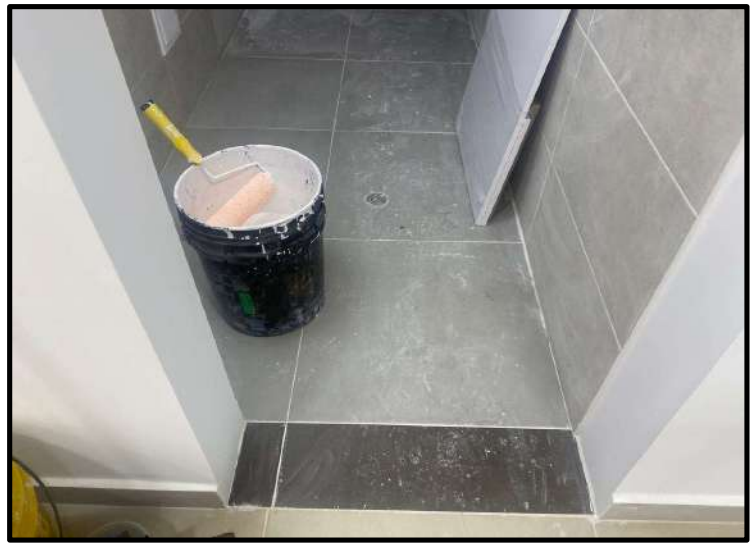

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 55	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA ESCALERA	m	27.65

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
PASO ESCA		1.16		16.00	un	18.56	
		1.20		4.00	un	4.80	
		1.66		1.00	un	1.66	
		1.30		1.00	un	1.30	
		1.33		1.00	un	1.33	
					Subtotal	27.65	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	27.65	

OBSERVACIONES:

*Las cantidades deberan ser corroboradas por el constructor antes de iniciar las labores


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 55	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA ESCALERA	m	27.65

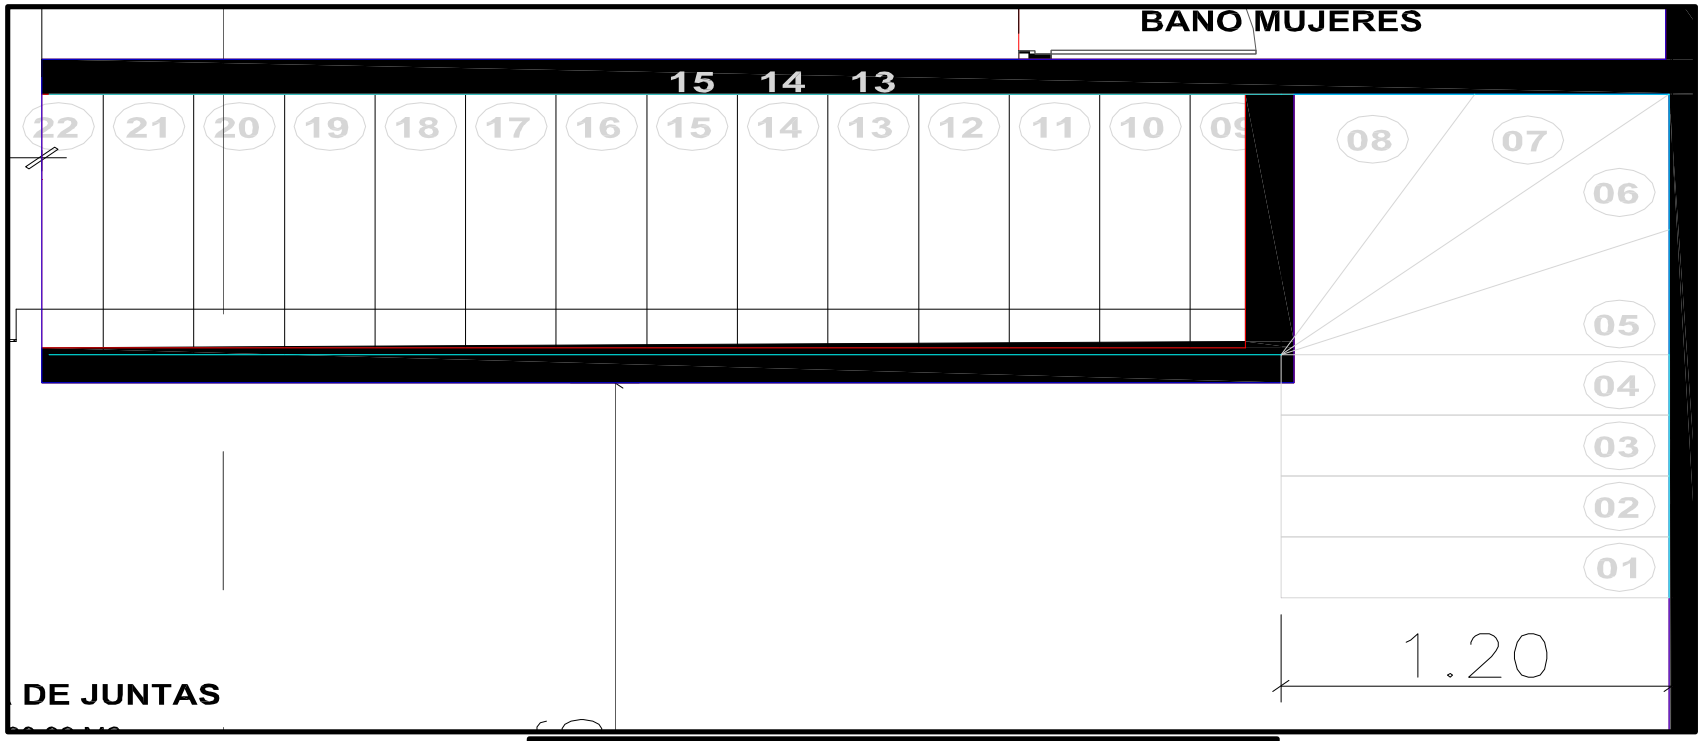

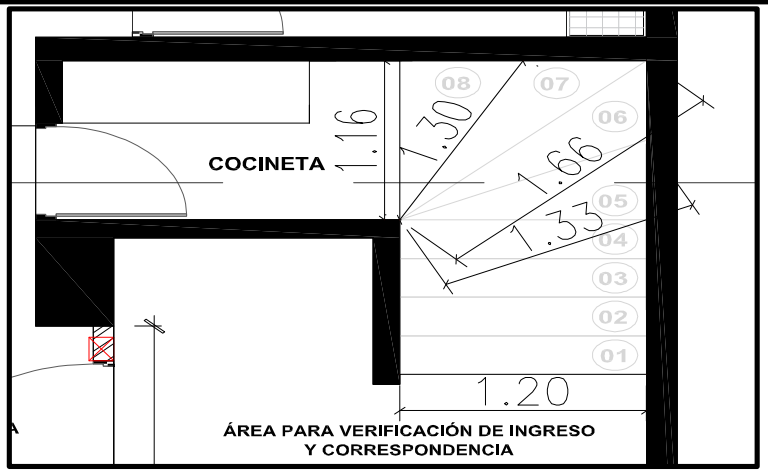

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad total**
N.P 55	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO PARA ESCALERA	m	27.65















OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL DE 12000 BTU, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	und	1.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
CENTRO DE DATOS				1.00	un	1.00	
					Subtotal	1.00	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	1.00	
OBSERVACIONES:							


*Las cantidades deberan ser corroboradas por el constructor antes de iniciar las labores

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

JOSE LUIS GONZALEZ MEJIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad total**
N.P 56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL DE 12000 BTU, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	und	1.00

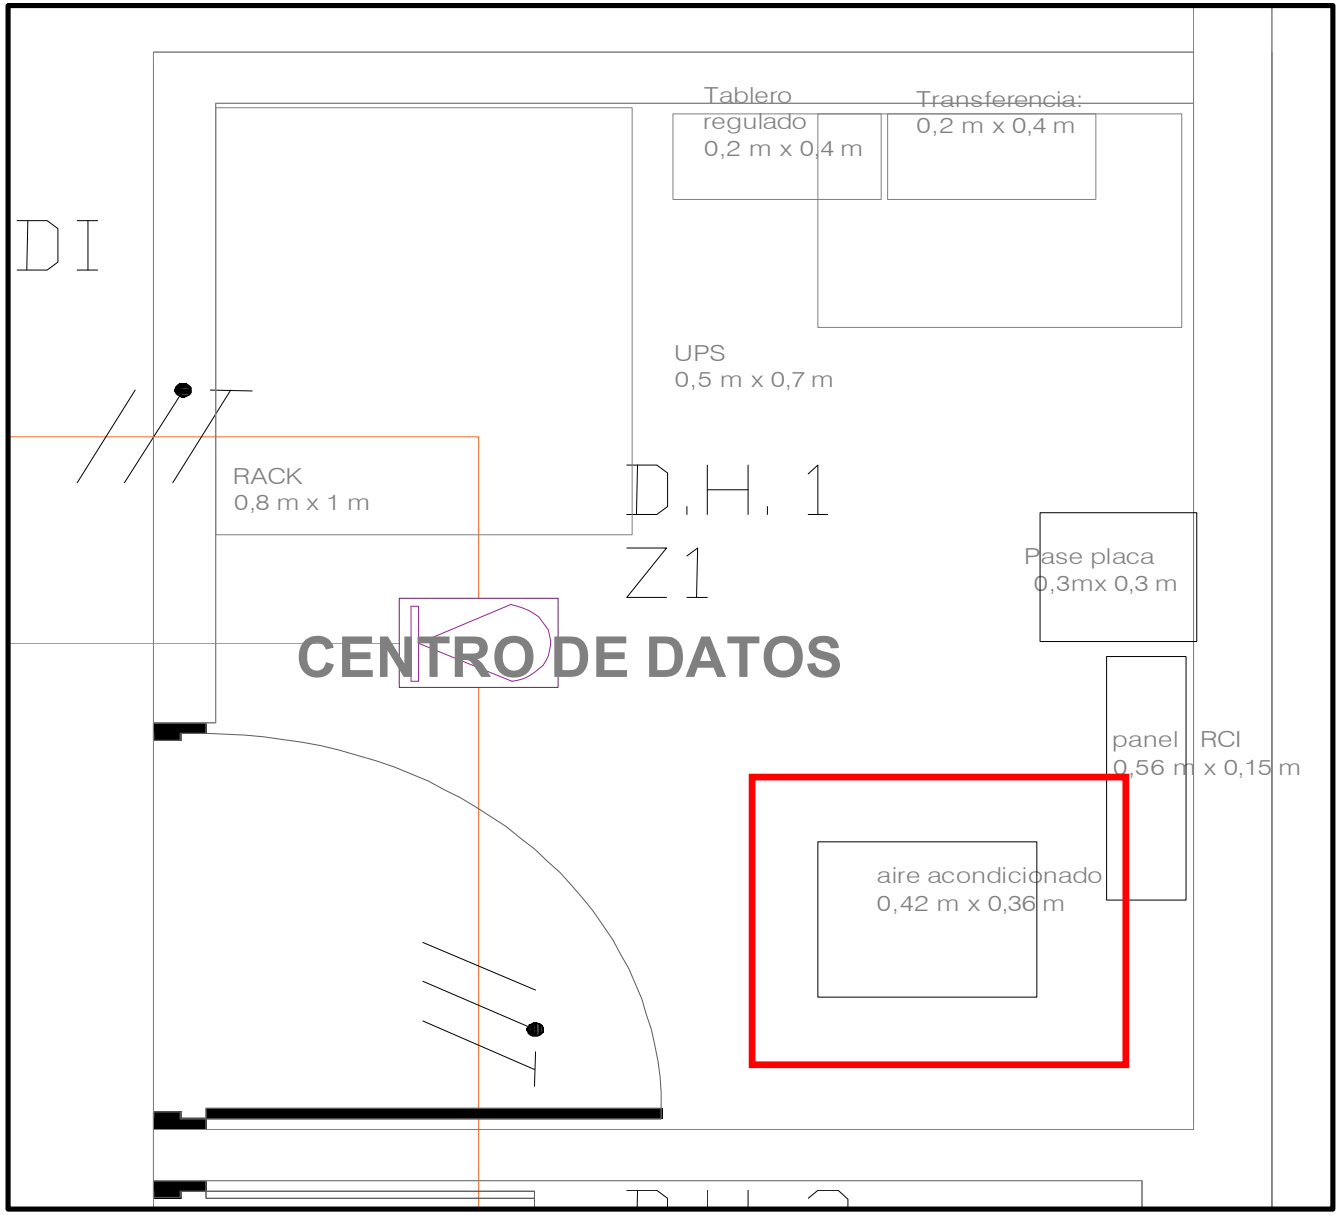

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL DE 12000 BTU, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	und	1.00











OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**


CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	m2	24.79

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto			
ZONA CUARTO DE RESIDUPS		2.48	2.65	1.00	m2	6.57
		2.23	2.65	1.00	m2	5.91
		2.48	2.65	1.00	m2	6.57
		2.38	2.65	1.00	m2	6.31
PUERTA		0.95	2.00	-1.00	m2	-1.90
COCINETA		0.45	2.95	1.00	m2	1.33
					Subtotal	**24.79**
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	**24.79**

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

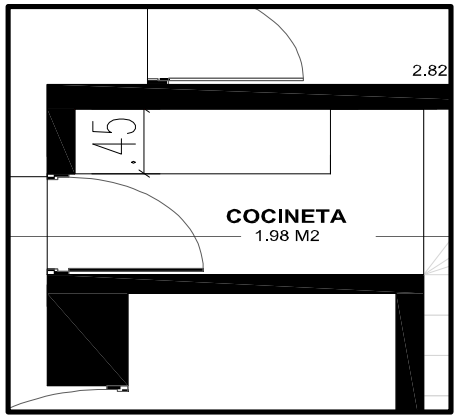

OBSERVACIONES:

*Las cantidades deberan ser corroboradas por el constructor antes de iniciar las labores


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	m2	24.79

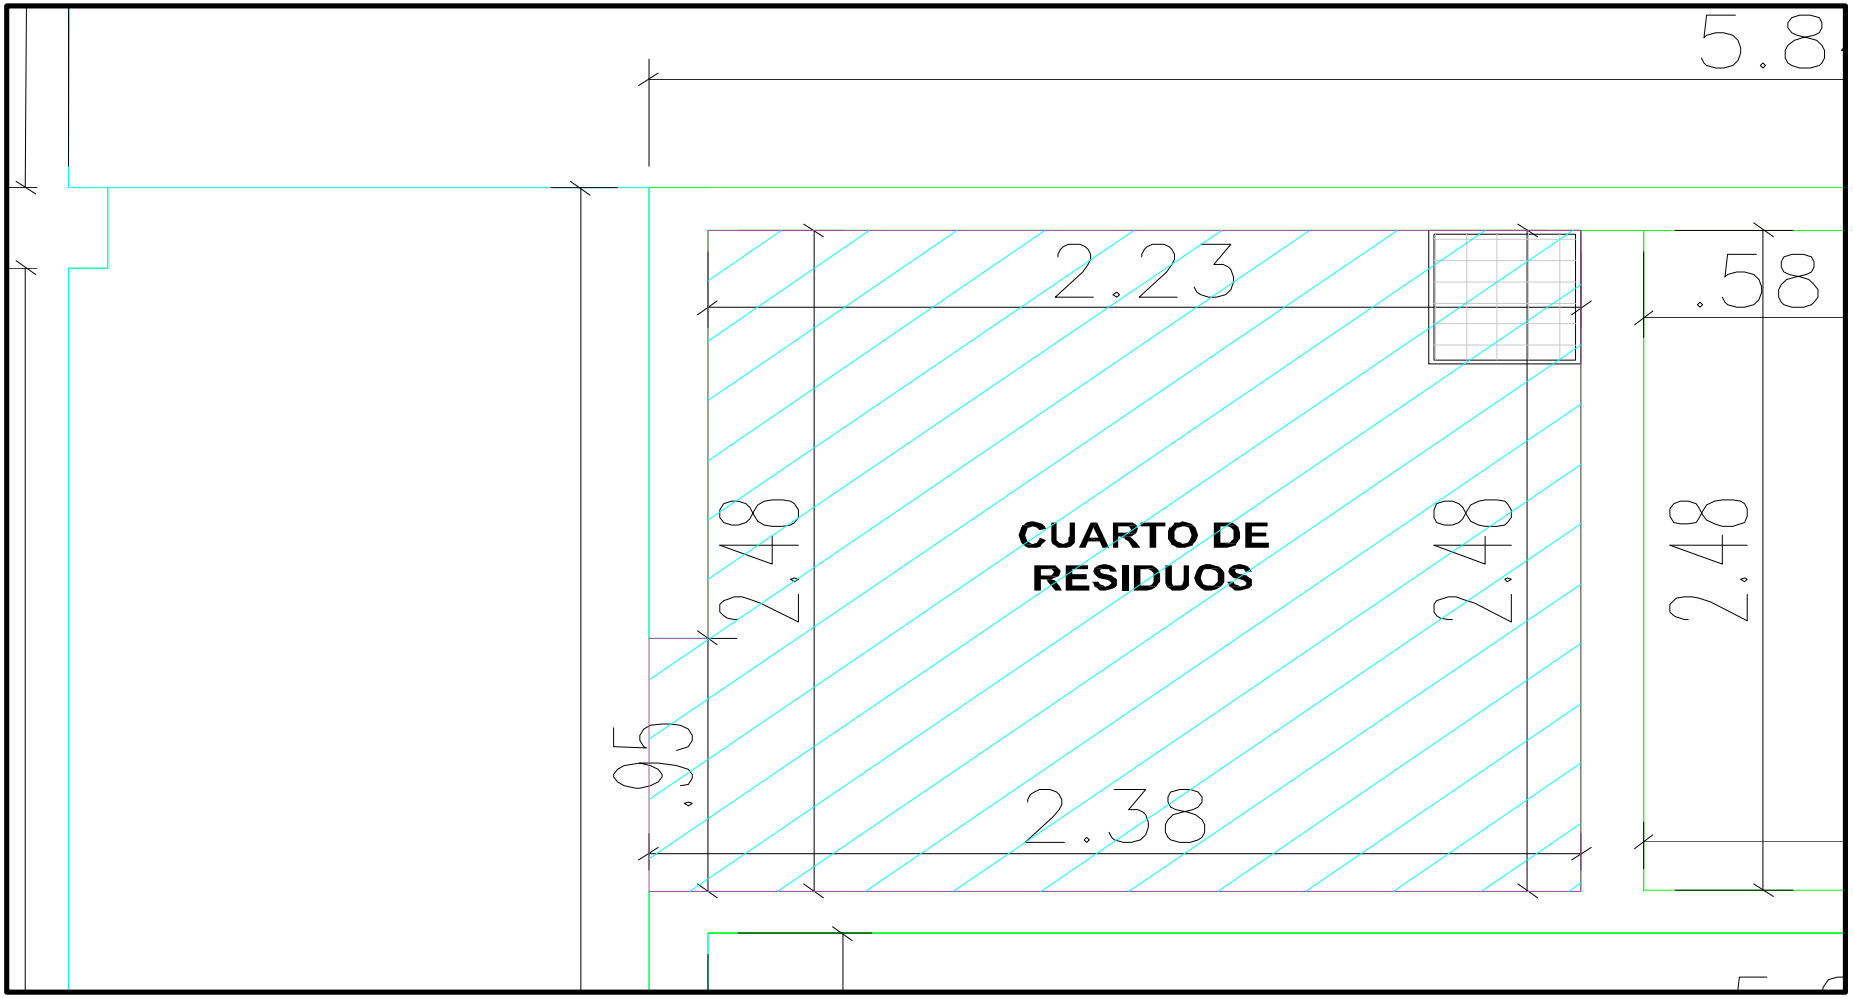

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad total**
N.P 57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	m2	24.79













OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 58	JUNTAS DE DILATACIÓN EN ENCHAPE DE PISO	m	13.08

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto			
SEGUNDO PISO	3.55			1.00	m	3.55
	9.53			1.00	m	9.53
					Subtotal	13.08
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	13.08

ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBSERVACIONES:

*Las cantidades deberan ser corroboradas por el constructor antes de iniciar las labores


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 58	JUNTAS DE DILATACIÓN EN ENCHAPE DE PISO	m	13.08

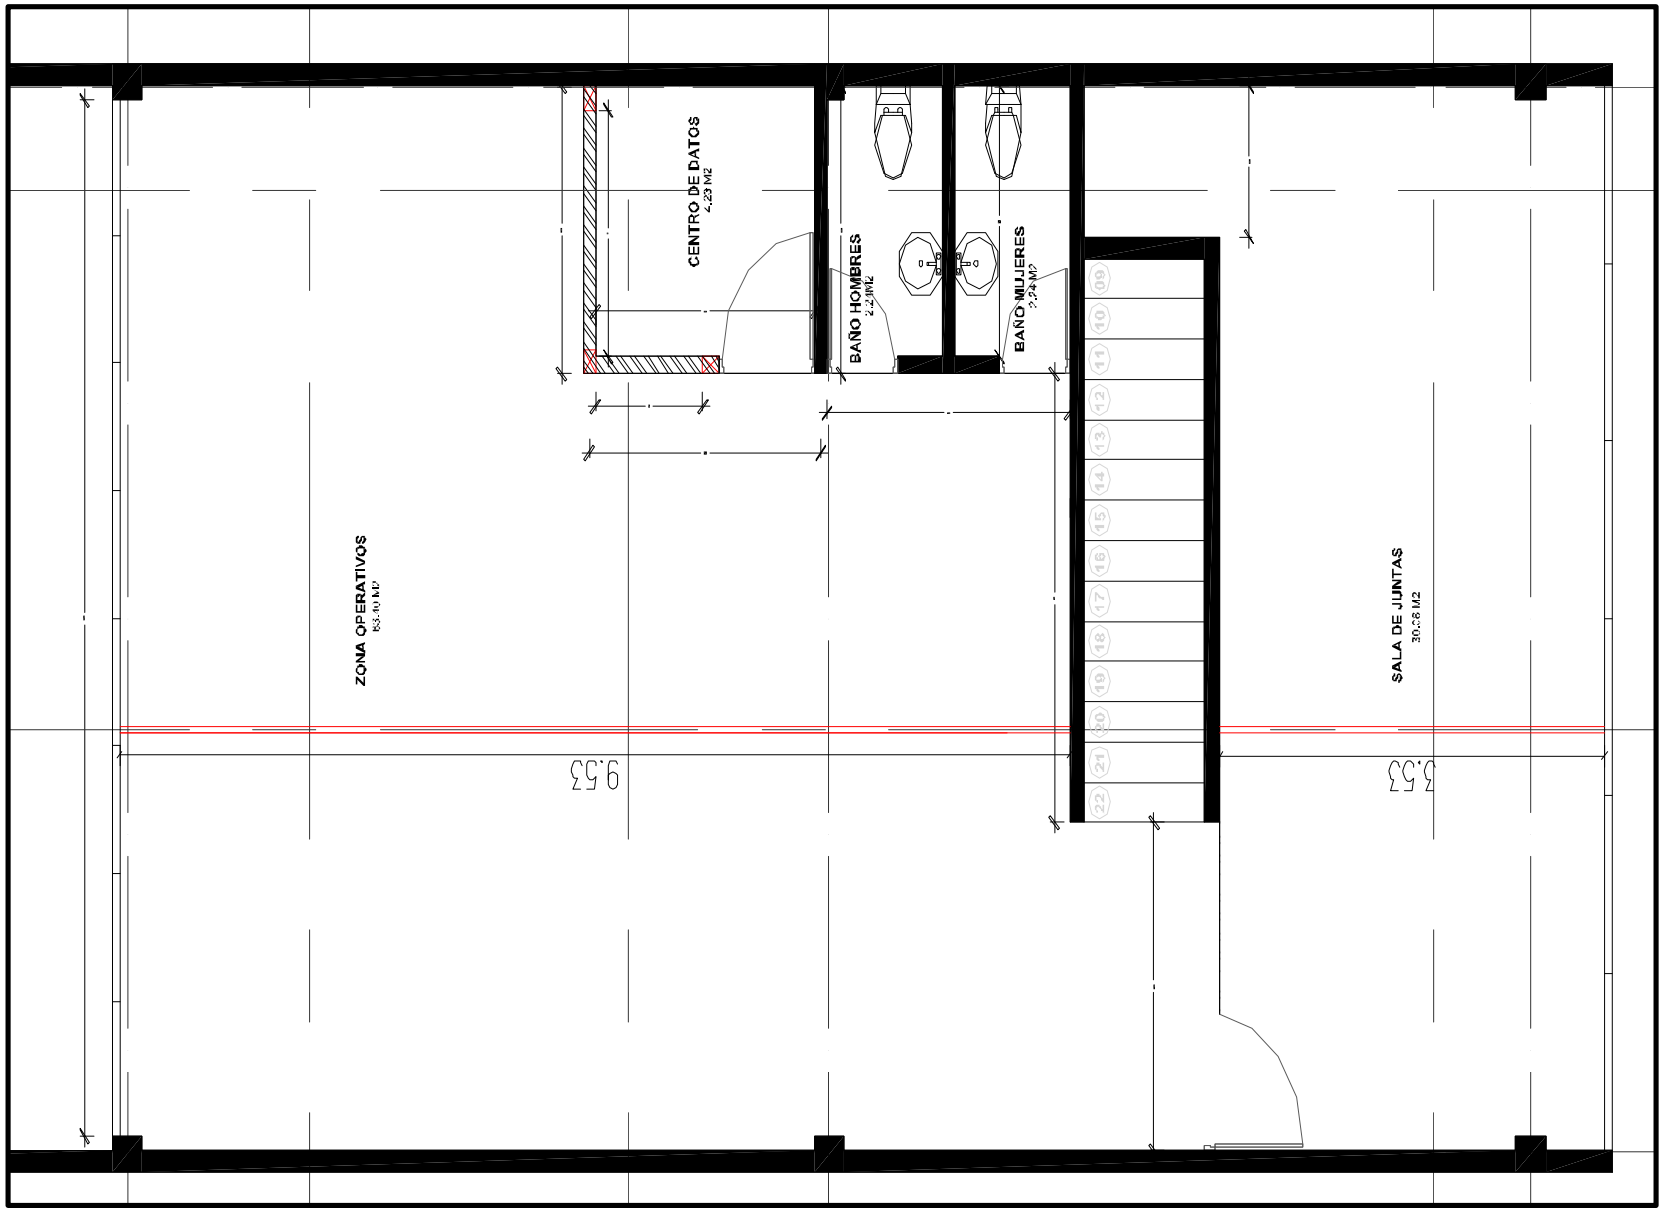

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad total**
N.P 58	JUNTAS DE DILATACIÓN EN ENCHAPE DE PISO	m	13.08












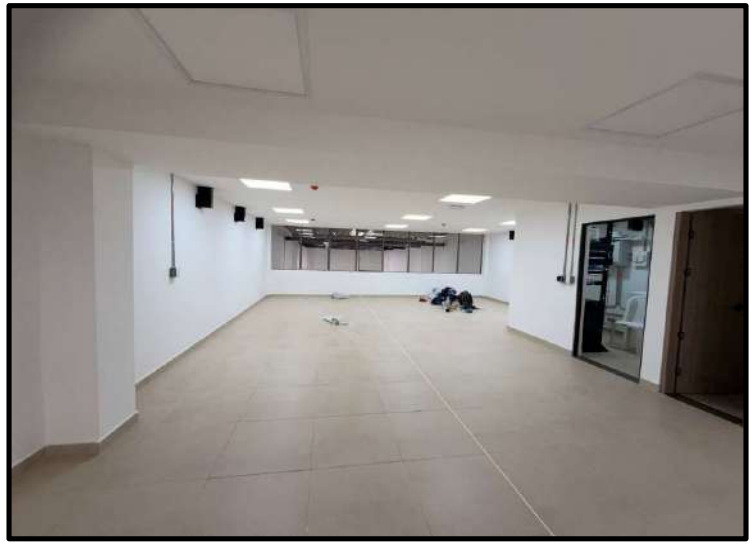

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO, EN CABLE DE COBRE No.12 AWG (F, N, T).	m	267.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
CIRCUITO 3	17.00			1.00	m	17.00	
CIRCUITO 5	29.00			1.00	m	29.00	
CIRCUITO 7	34.00			1.00	m	34.00	
CIRCUITO 9	41			1.00	m	41.00	
CIRCUITO 12	19			1.00	m	19.00	
CIRCUITO 18	26			1.00	m	26.00	
CIRCUITO 20	52			1.00	m	52.00	
CIRCUITO 22	31			1.00	m	31.00	
CIRCUITO 24	18			1.00	m	18.00	
					Subtotal	**267.00**	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	**267.00**	
OBSERVACIONES:							

*Las cantidades deberan ser corroboradas por el constructor antes de iniciar las labores

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

ING. BERNARDO SOTO GARCÍA
SUPERVISOR UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO, EN CABLE DE COBRE No.12 AWG (F, N, T).	m	267.00

OBSERVACIONES

CIRCUITO 3 - ALIMENTACION 10 LAMPARAS ZONA DE ABORDAJE

CIRCUITO 5 - ILUMINACION 2DO PISO 7 LAMPARAS REDONDAS Y 16 LAMPARAS DE 60X60cm

CIRCUITO 7 - LAMPARAS DE EMERGENCIA (10 UNIDADES)

CIRCUITO 9 - IMPRESORA (1 SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL)

CIRCUITO 12 - SALIDAS ELECTRICAS PARA SECADORES DE MANOS BAÑOS SEGUNDO PISO (2 TOMACORRIENTES RED NORMAL)

CIRCUITO 18 - SALIDAS PARA TOMACORRIENTES RED NORMAL CORTE, SECADO Y RESIDUOS (5 SALIDAS TOMACORRIENTES RED NORMAL)


CIRCUITO 20 - SALIDAS TOMACORRIENTES RED NORMAL S JNDO PISO - BAÑOS, RACK, SALA DE JUNTAS (10 SALIDAS)

CIRCUITO 22 - SALIDAS TOMACORRIENTES ZONA DE ABOI E (8 SALIDAS TOMACORRIENTES RED NORMAL)

CIRCUITO 24 - OFICINAS 2DO PISO (8 SALIDAS TOMACORRIENTES RED NORMAL)

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO, EN CABLE DE COBRE No.12 AWG (F, N, T).	m	267.00

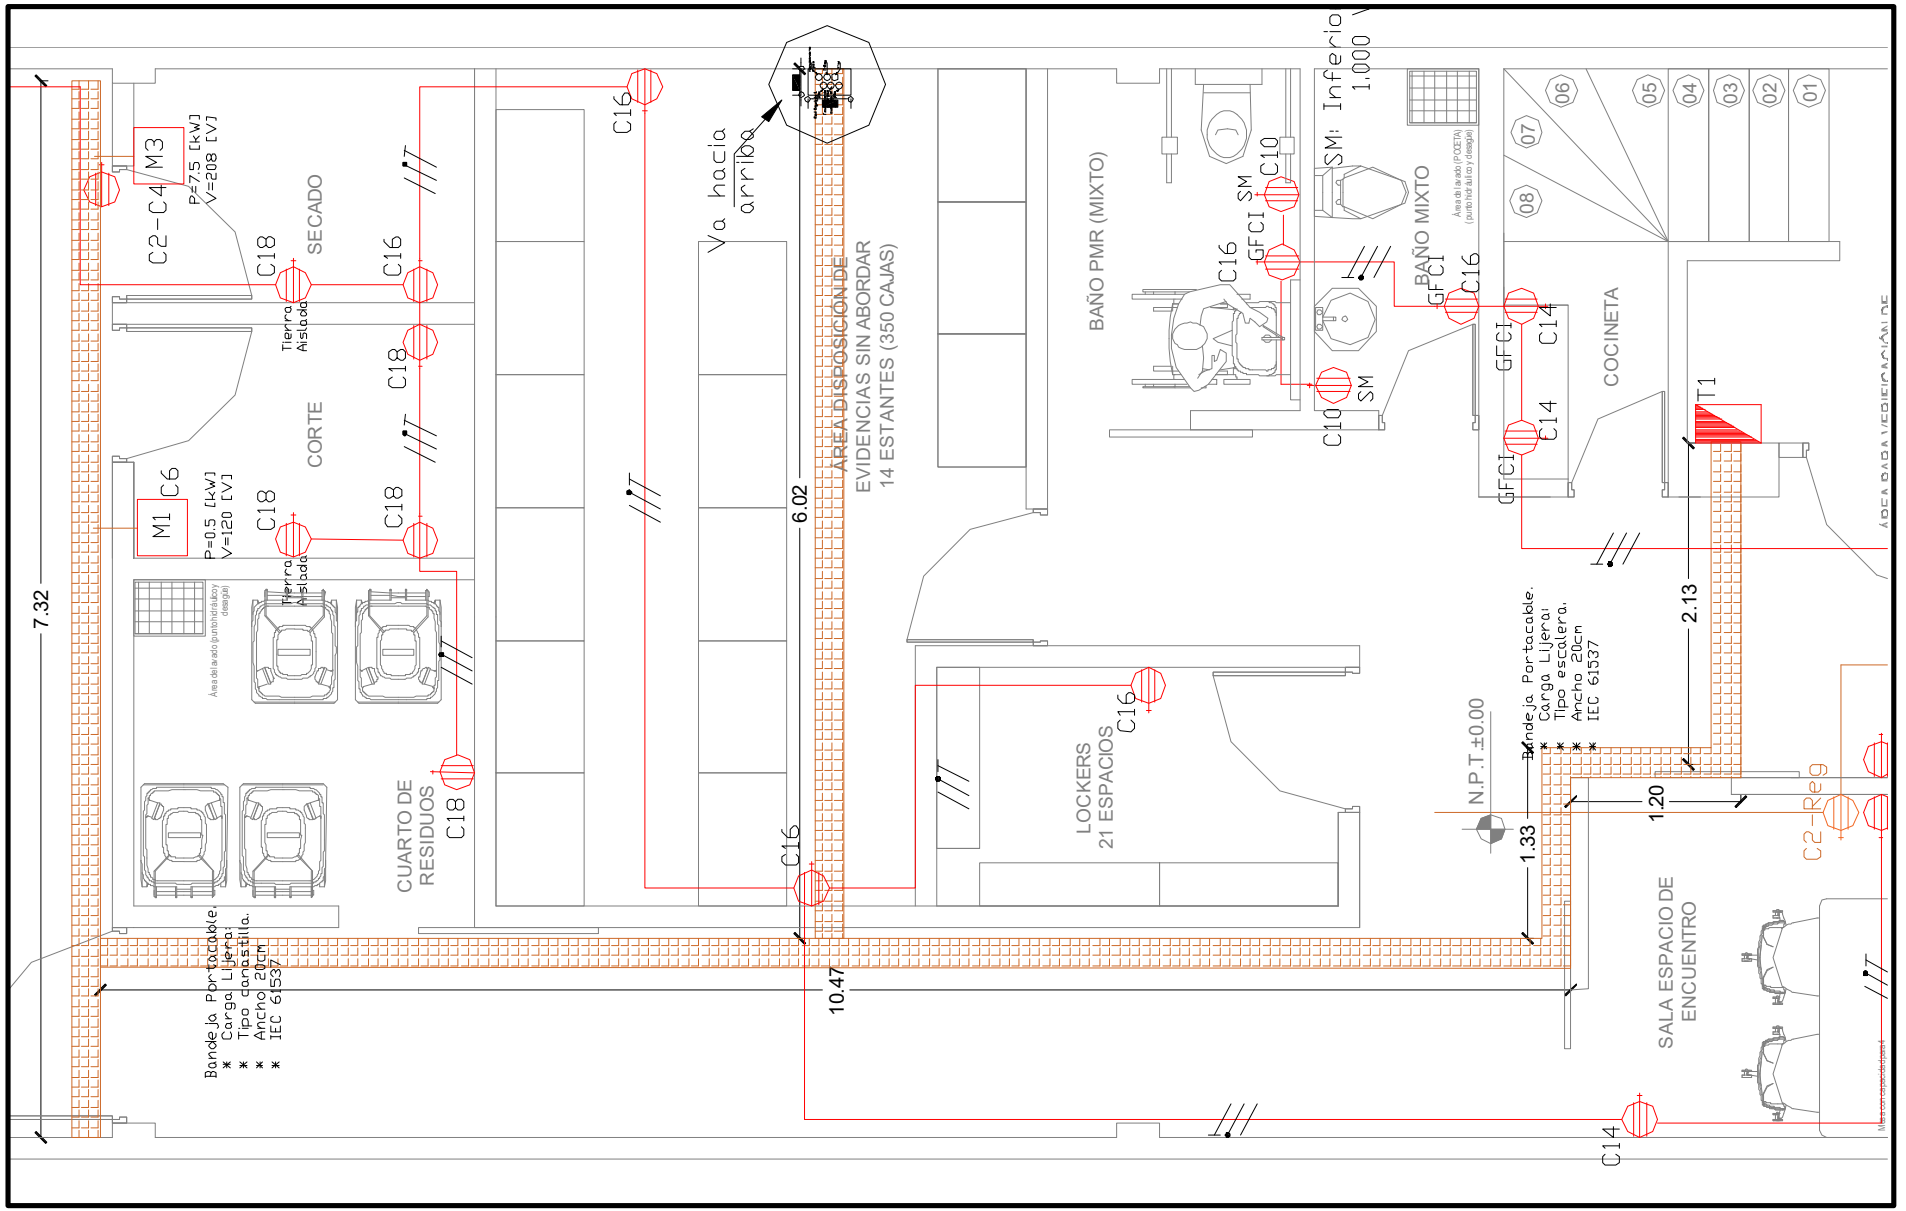

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO, EN CABLE DE COBRE No.12 AWG (F, N, T).	m	267.00



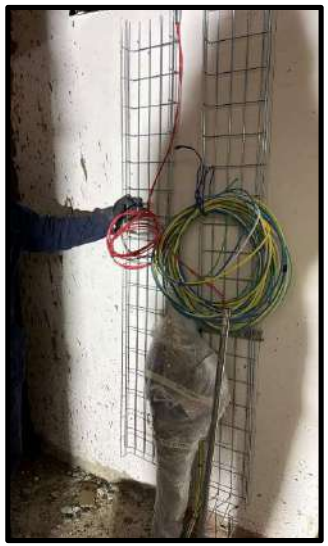



OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 60	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:4 ESPESOR 6cm	m2	352.02

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	AREA				
ZONA DE ABORDAJE CON CORTE Y SECADO			162.33	1.00	m2	162.33	
PRIMER PISO			89.59	1.00	m2	89.59	
SEGUNDO PISO			100.10	1.00	m2	100.10	
					Subtotal	**352.02**	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	**352.02**	
OBSERVACIONES:							

*Las cantidades deberan ser corroboradas por el constructor antes de iniciar las labores


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 60	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:4 ESPESOR 6cm	m2	352.02

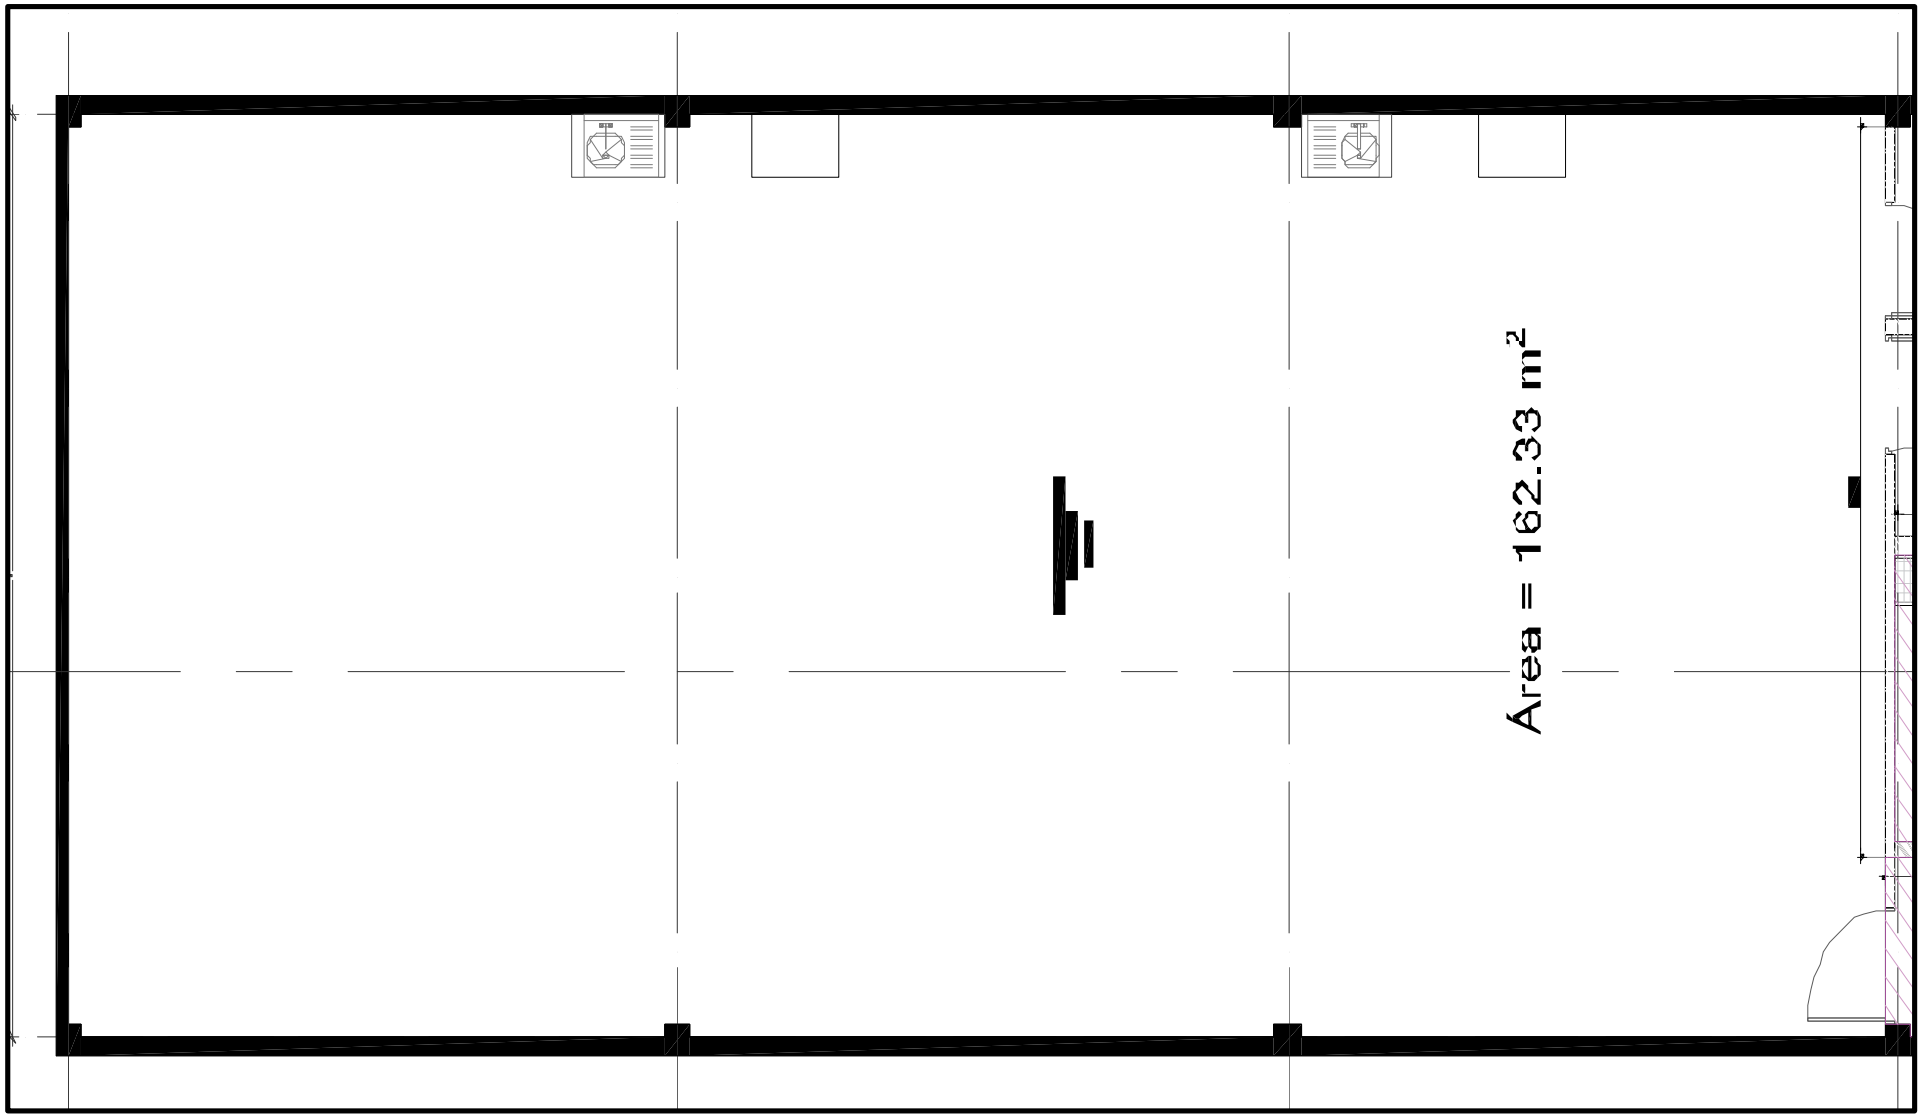


B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 60	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:4 ESPESOR 6cm	m2	352.02

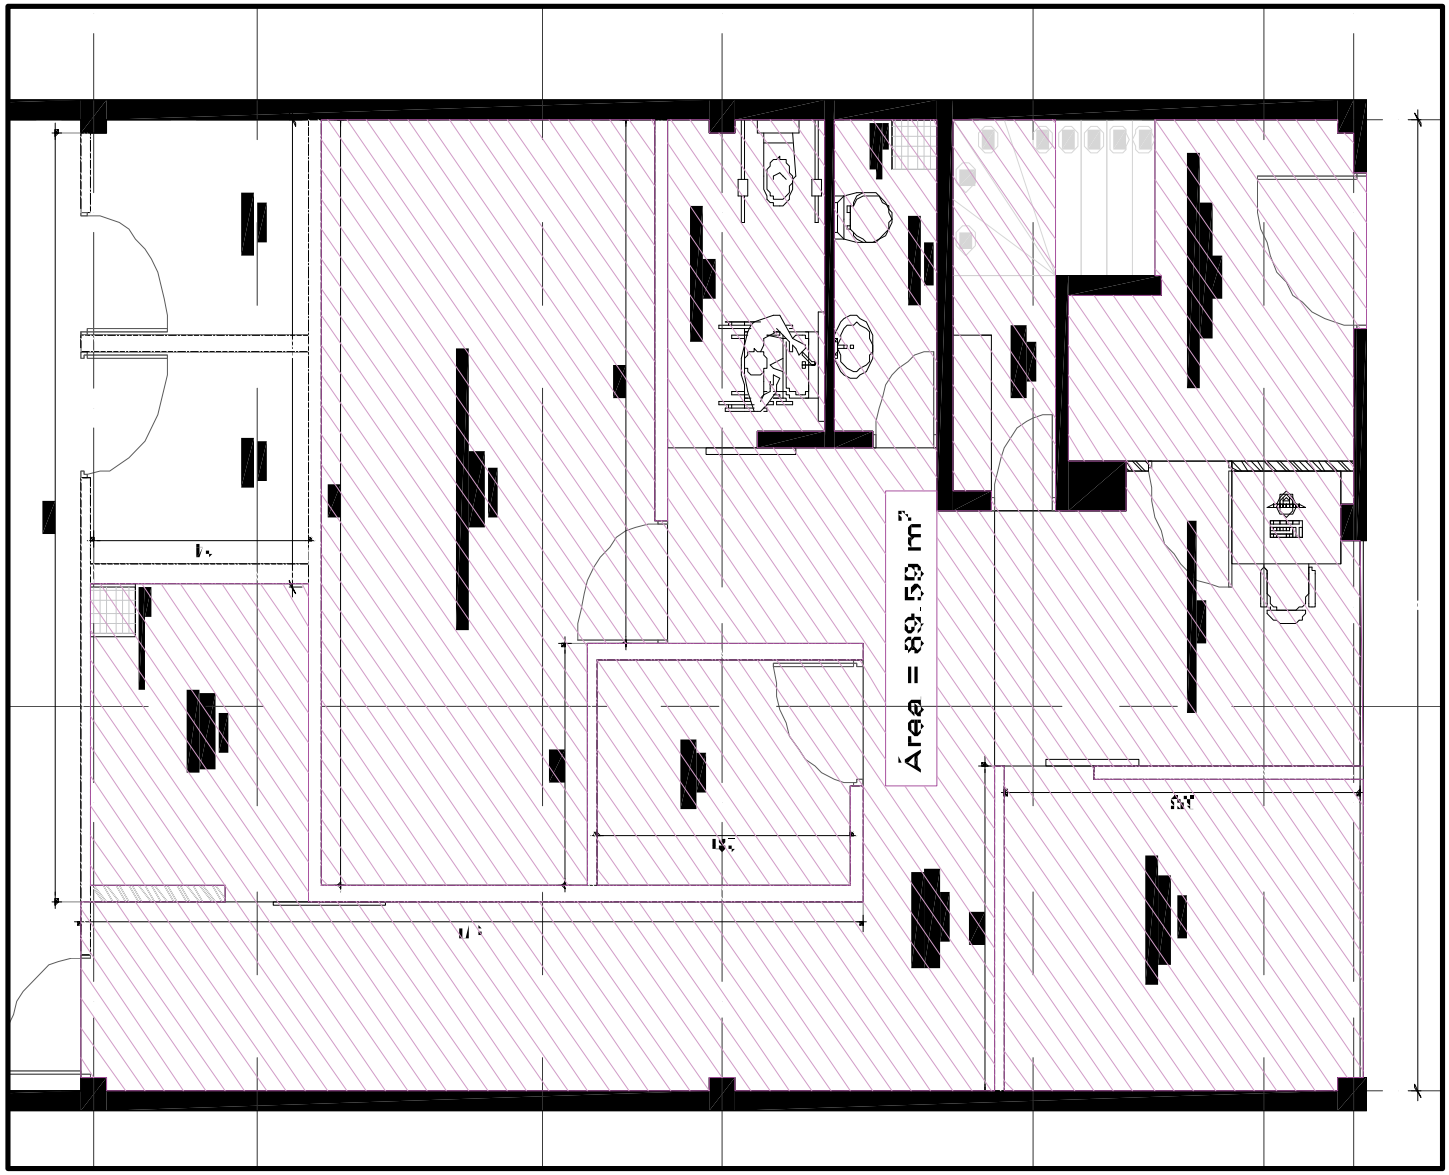

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 60	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:4 ESPESOR 6cm	m2	352.02

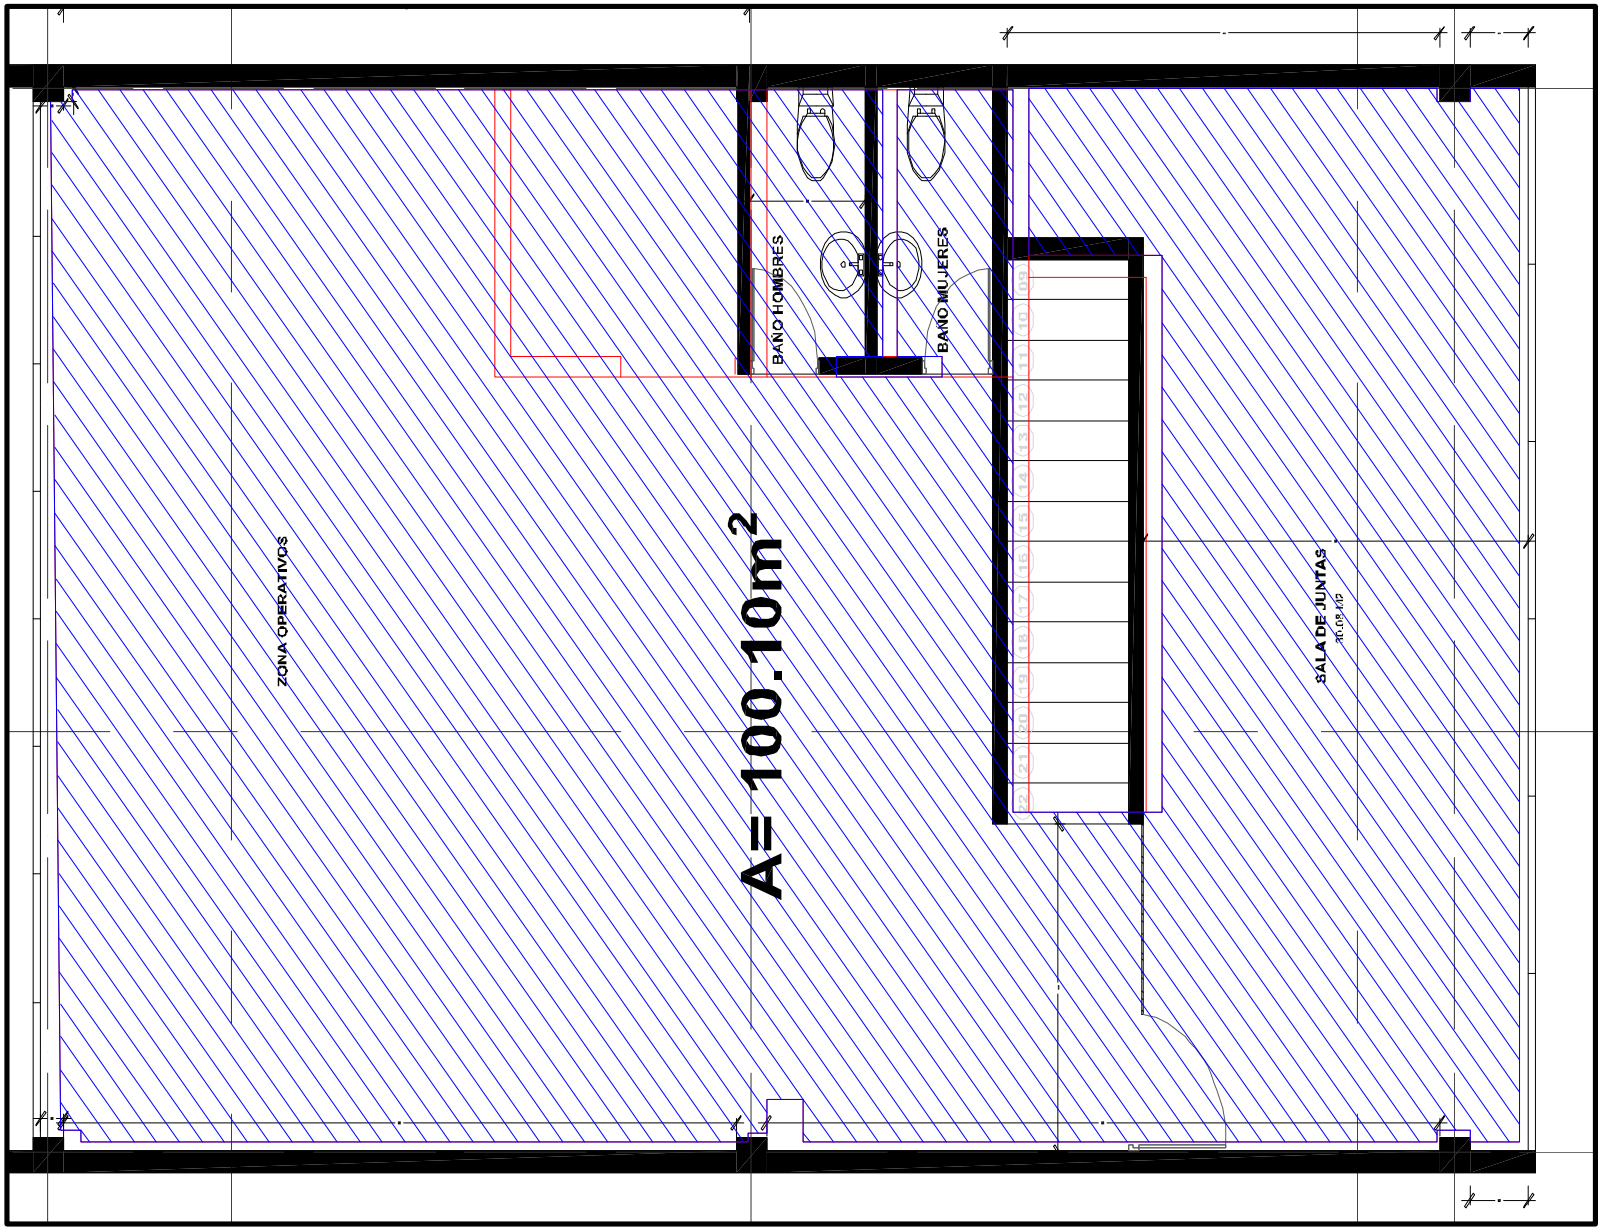

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 60	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:4 ESPESOR 6cm	m2	352.02


















OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 61	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE DE 1/2" EN BRONCE (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION)	und	2.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	AREA				
COCINETA				1.00	und	1.00	
BAÑO HOMBRES SEGUNDO PISO				1.00	und	1.00	
					Subtotal	2.00	
					APROXIMACIÓN DECIMAL SUPERIOR	2.00	
OBSERVACIONES:							

*Las cantidades deberan ser corroboradas por el constructor antes de iniciar las labores


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

PABLO PEÑA
APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 61	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE DE 1/2" EN BRONCE (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION)	und	2.00

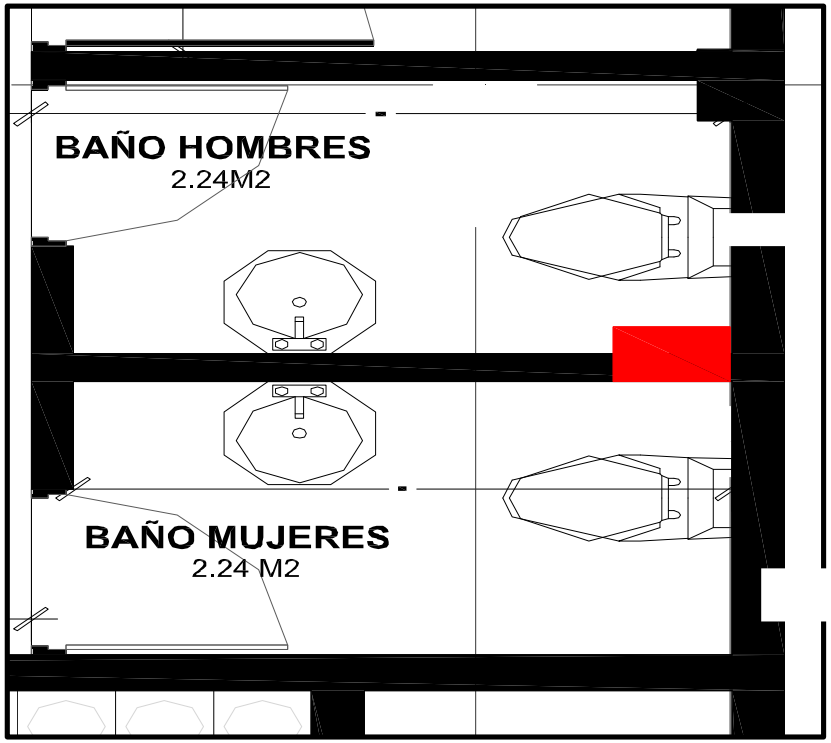

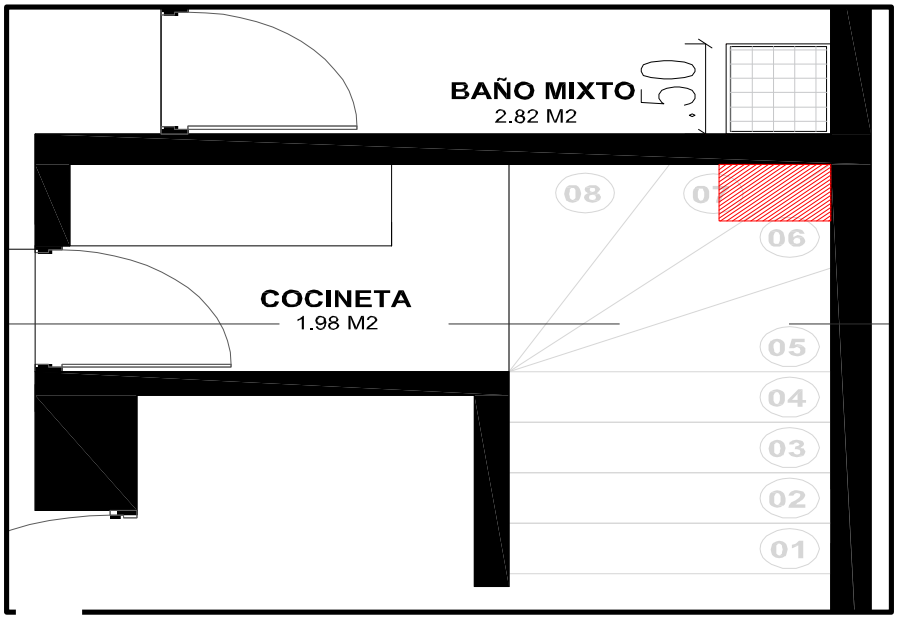

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 61	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHEQUE DE 1/2" EN BRONCE (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION)	und	2.00







OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 62	PINTURA VINILO TIPO 1 TRES MANOS SOBRE CIELO RASO EN DRYWALL	m2	186.94

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	Largo	Ancho	Alto				
AREA INTERVENCION 2DO PISO	6.80	5.32		1.00	m2	36.18	
	7.15	0.21		1.00	m2	1.50	
	4.31	2.00		1.00	m2	8.62	
	6.89	5.32		1.00	m2	36.65	
	4.89	2.01		1.00	m2	9.83	
	2.40	1.85		1.00	m2	4.44	
	1.15	1.85		1.00	m2	2.13	
	1.15	1.85		1.00	m2	2.13	
CORTE	2.48	1.58		1.00	m2	3.92	
SECADO	2.48	1.58		1.00	m2	3.92	
CUARTO DE RESIDUOS	2.48	2.23		1.00	m2	5.53	
EVIDENCIAS SIN ABORDAR	2.89	1.82		1.00	m2	5.26	
	3.87	3.67		1.00	m2	14.20	
PASILLO DE CIRCULACIÓN	8.84	1.48		1.00	m2	13.08	
	3.48	1.50		1.00	m2	5.22	
	3.01	1.37		1.00	m2	4.12	
	0.93	0.72		1.00	m2	0.67	
AREA DE ENCUENTRO	3.59	2.48		1.00	m2	8.90	
LOCKERS	2.84	1.67		1.00	m2	4.74	
INGRESO	4.05	1.94		1.00	m2	7.86	
	1.24	1.21		1.00	m2	1.50	
	2.59	2.15		1.00	m2	5.57	
	2.30	0.42		1.00	m2	0.97	
					Subtotal	186.94	
					TOTAL EJECUTADO	**186.94**	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD


CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 62	PINTURA VINILO TIPO 1 TRES MANOS SOBRE CIELO RASO EN DRYWALL	m2	186.94

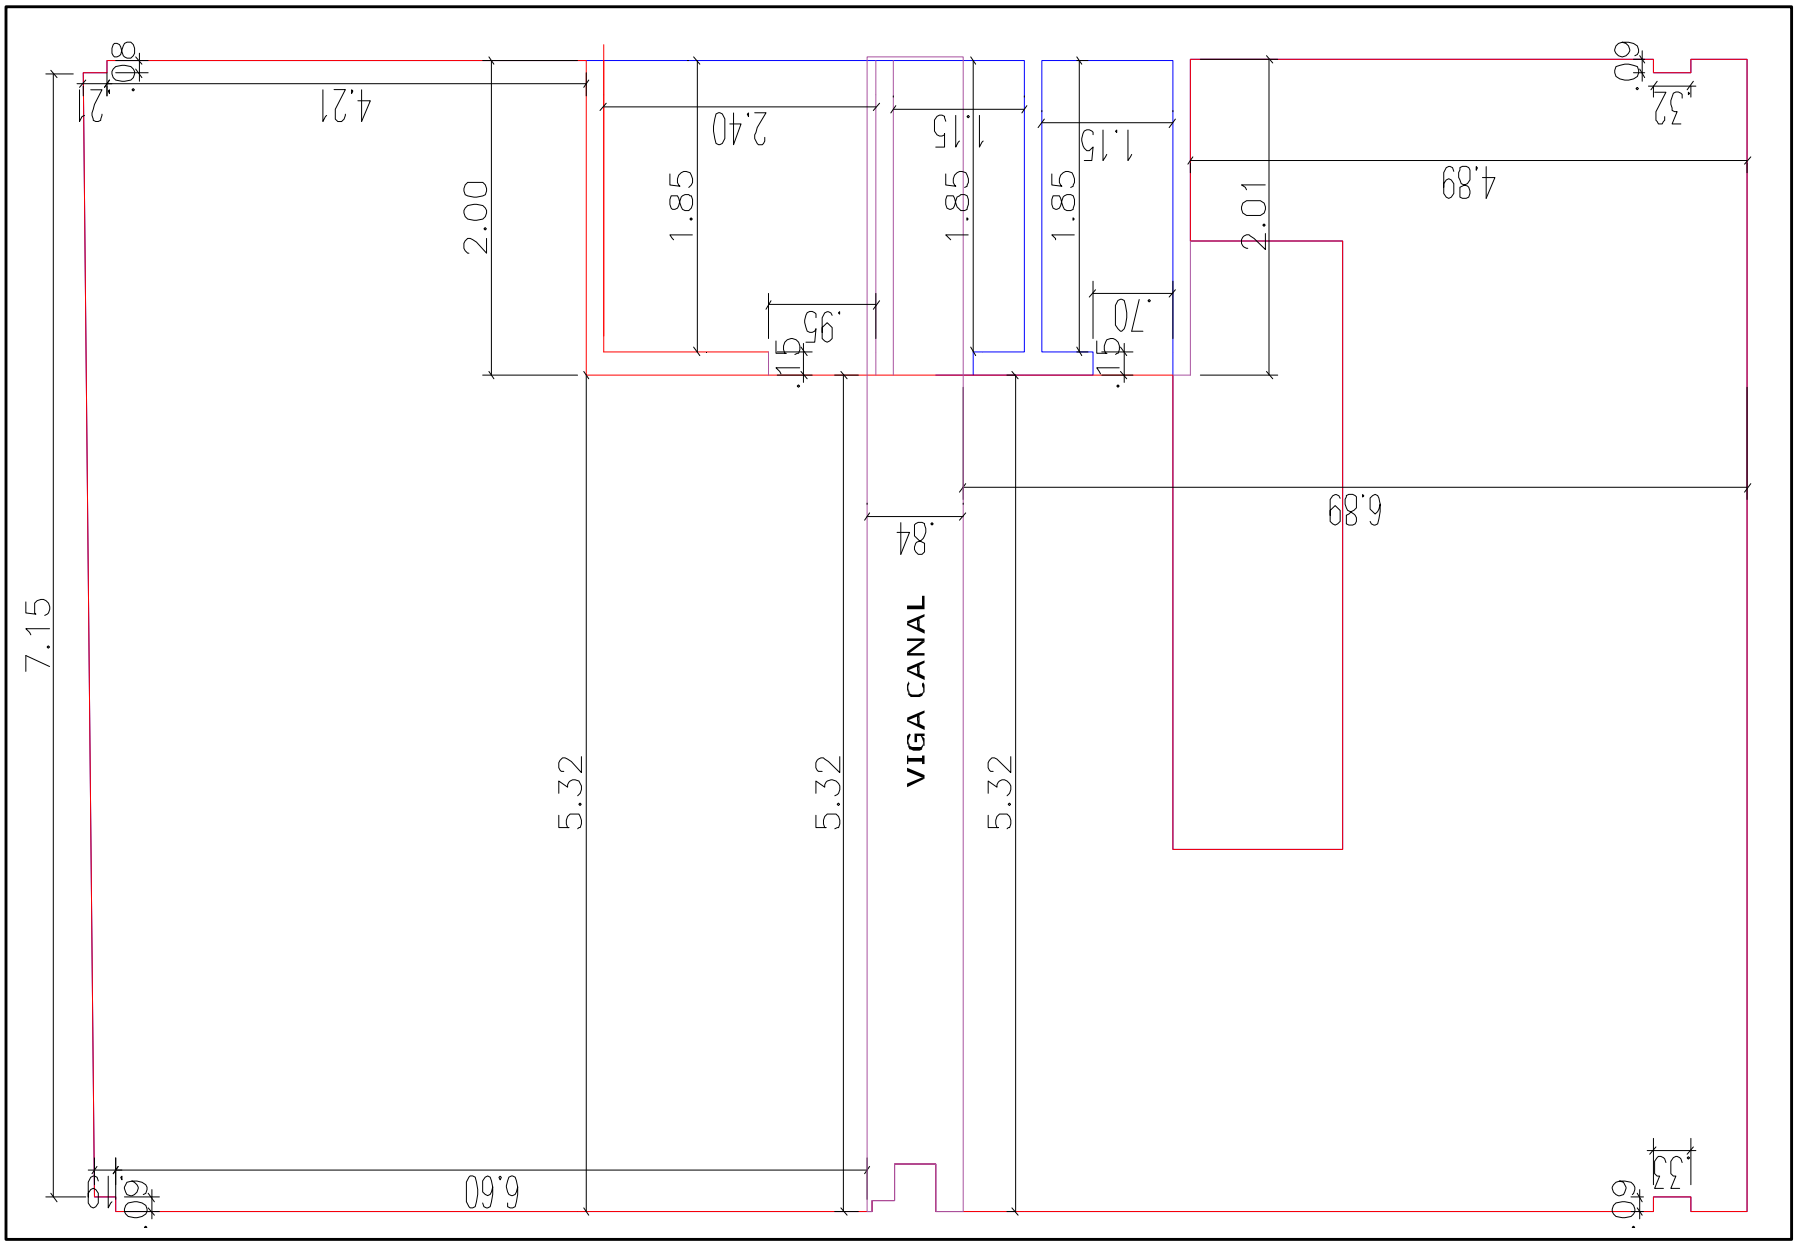

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 62	PINTURA VINILO TIPO 1 TRES MANOS SOBRE CIELO RASO EN DRYWALL	m2	186.94

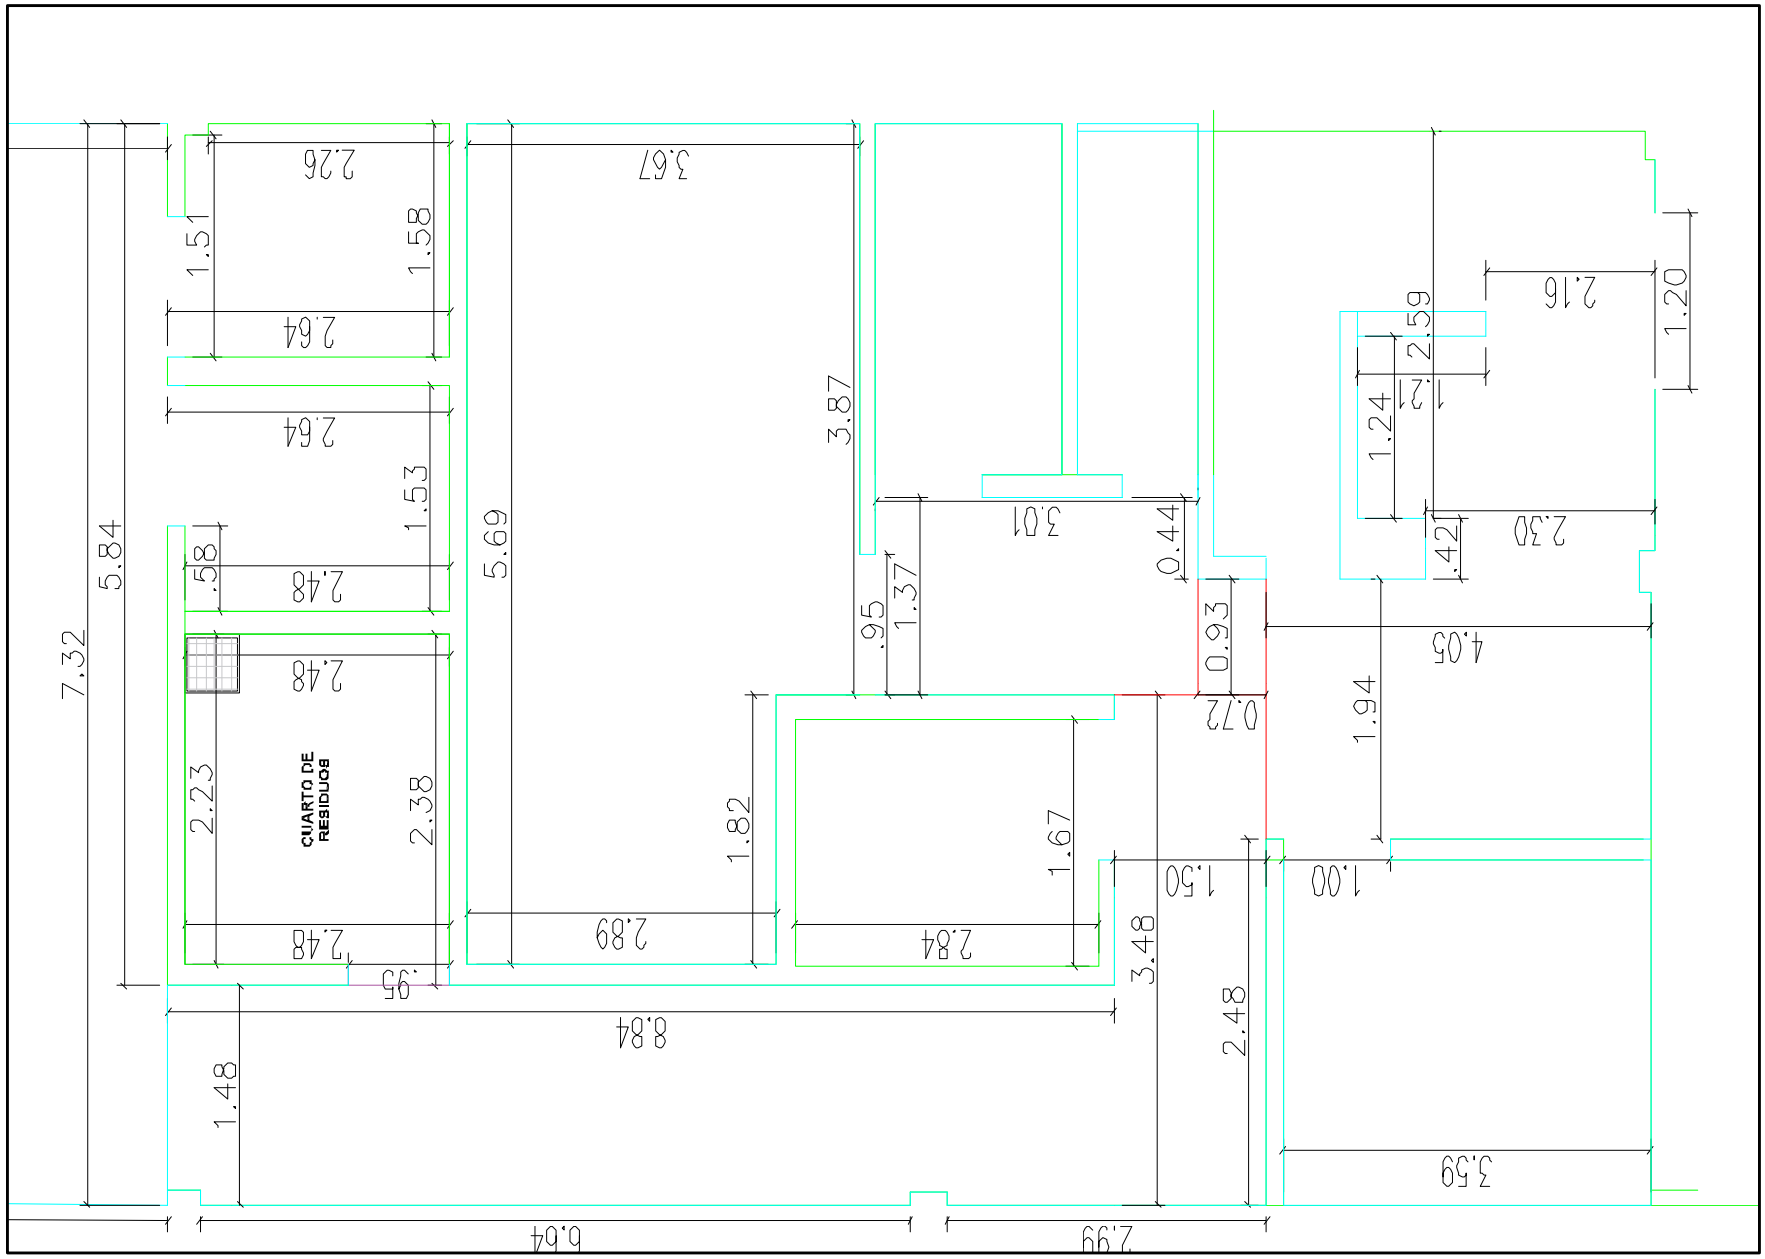

B. CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 62	PINTURA VINILO TIPO 1 TRES MANOS SOBRE CIELO RASO EN DRYWALL	m2	186.94

















OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 63	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO 4mm FLOTANTE, MEDIDAS 0.60x0.80m	un	4.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
			Alto				
BAÑO PMR				1.00	un	1.00	
BAÑO MIXTO				1.00	un	1.00	
BAÑO MUJERES				1.00	un	1.00	
BAÑO HOMBRES				1.00	un	1.00	
					Subtotal	4.00	
					TOTAL EJECUTADO	**4.00**	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 63	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO 4mm FLOTANTE, MEDIDAS 0.60x0.80m	un	4.00

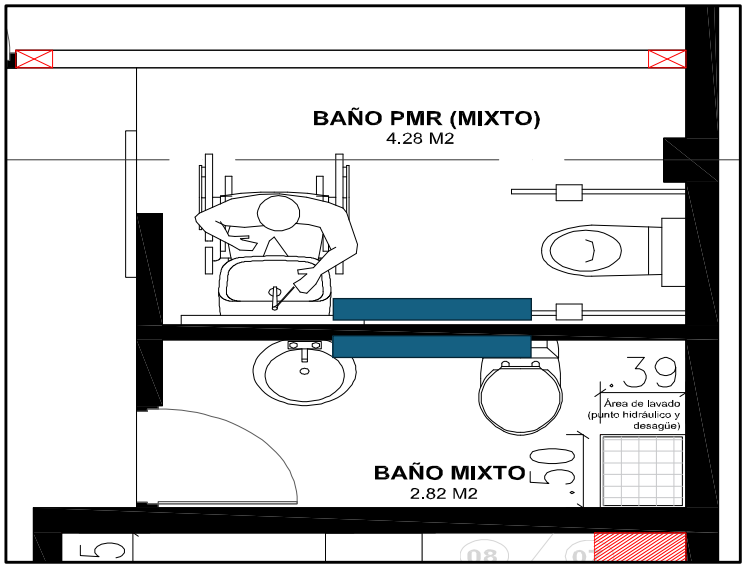

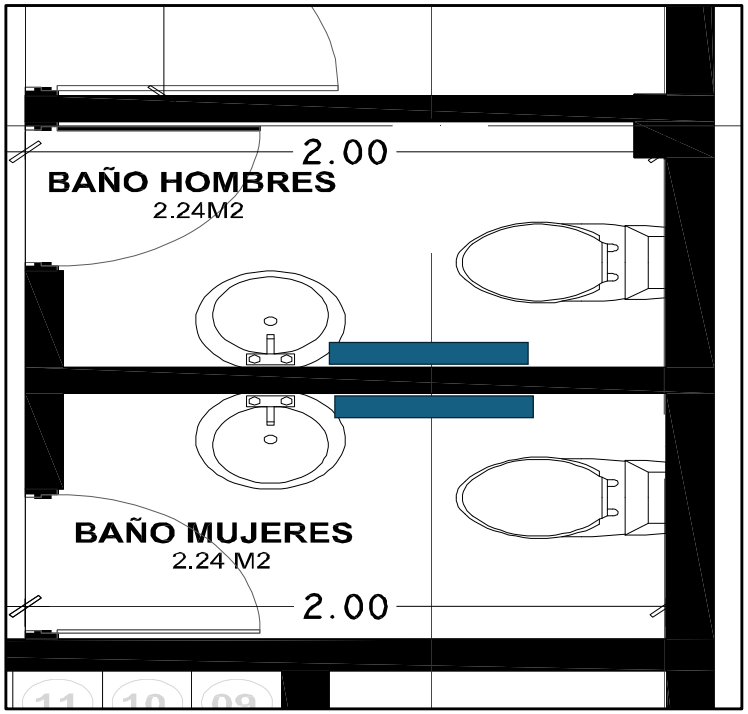

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 63	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO 4mm FLOTANTE, MEDIDAS 0.60x0.80m	un	4.00









OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 64	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE CORAZAS DE PROTECCION Y TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	m	7.92

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	LARGO	ANCHO	ALTO				
ESCALERAS	2.42			1.00	m	2.42	
	5.50			1.00	m	5.50	
					Subtotal	7.92	
					TOTAL EJECUTADO	**7.92**	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD


CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO


Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 64	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE CORAZAS DE PROTECCION Y TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	m	7.92

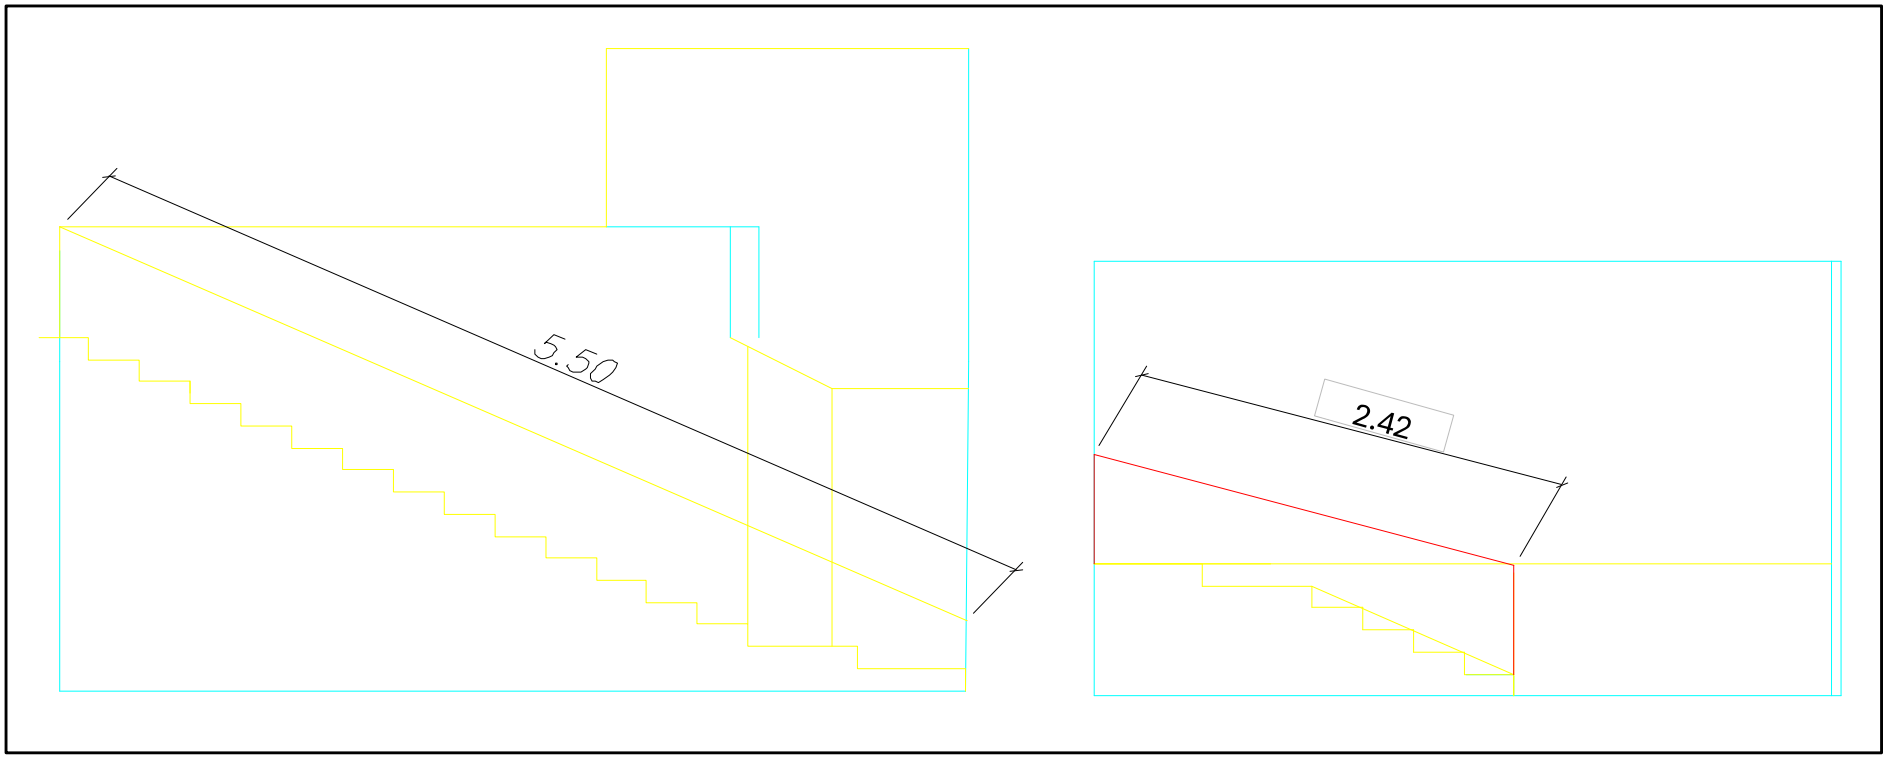

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
N.P 64	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE CORAZAS DE PROTECCION Y TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN)	m	7.92

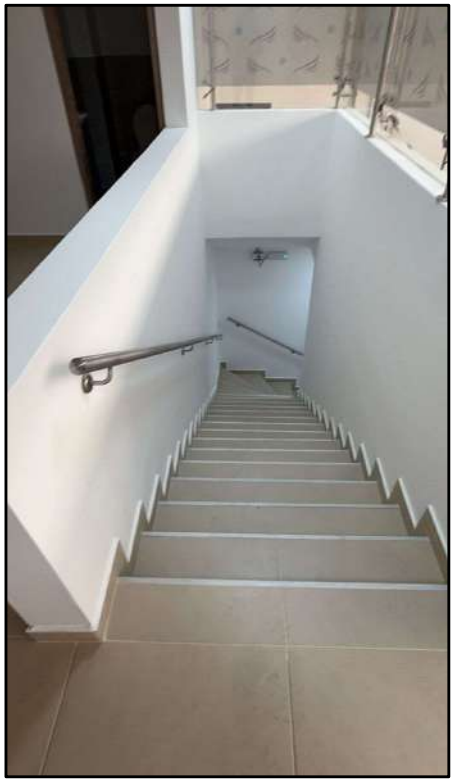

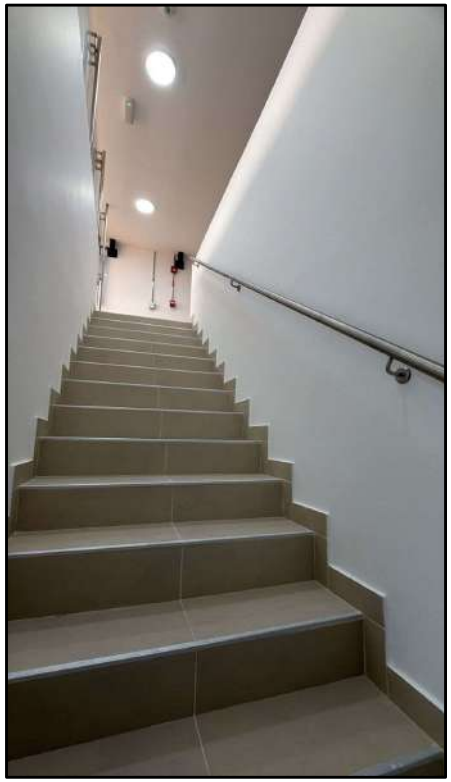



OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
C.03	Ejecución de prueba de presión de redes hidrosanitarias - por zonas	un	3.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	LARGO	ANCHO	ALTO				
SALIDA HIDRAULICA LAVAMANOS BAÑO MIXTO				1.00	un	1.00	
SALIDA HIDRAULICA POCETA CUARTO DE RESIDUOS				1.00	un	1.00	
SALIDA HIDRAULICA SABITARIO BAÑO MUJERES				1.00	un	1.00	
					Subtotal	3.00	
					TOTAL EJECUTADO	**3.00**	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI


PABLO PEÑA
APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
C.03	Ejecución de prueba de presión de redes hidrosanitarias - por zonas	un	3.00

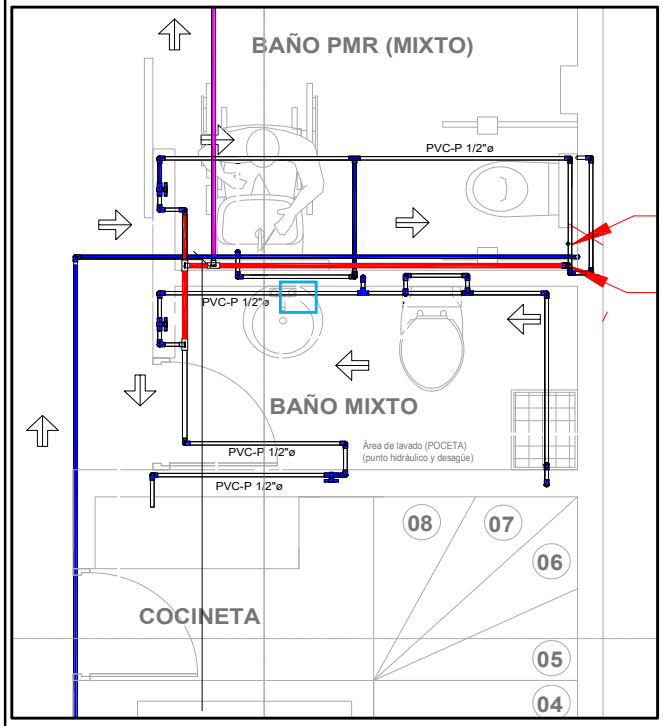

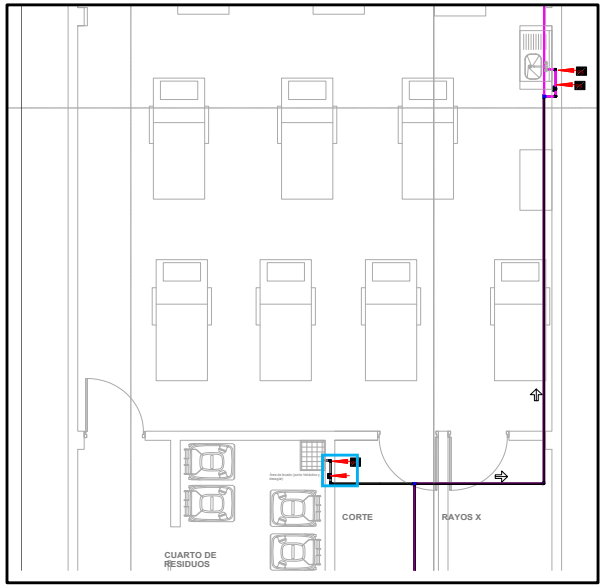

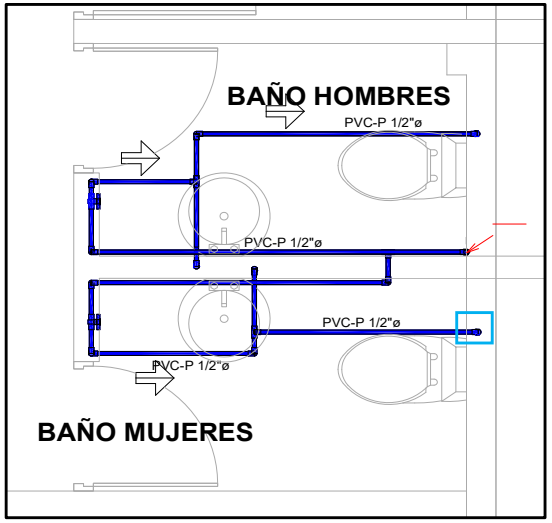

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
C.03	Ejecución de prueba de presión de redes hidrosanitarias - por zonas	un	3.00



















OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
C.04	Ejecución de prueba de flujo de redes hidrosanitarias - por zonas	un	3.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	LARGO	ANCHO	ALTO				
BAÑOS SEGUNDO PISO				1.00	un	1.00	
BAÑOS PRIMER PISO				1.00	un	1.00	
POCETA				1.00	un	1.00	
					Subtotal	3.00	
				TOTAL EJECUTADO		**3.00**	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI


PABLO A PEÑA
APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
C.04	Ejecución de prueba de flujo de redes hidrosanitarias - por zonas	un	3.00

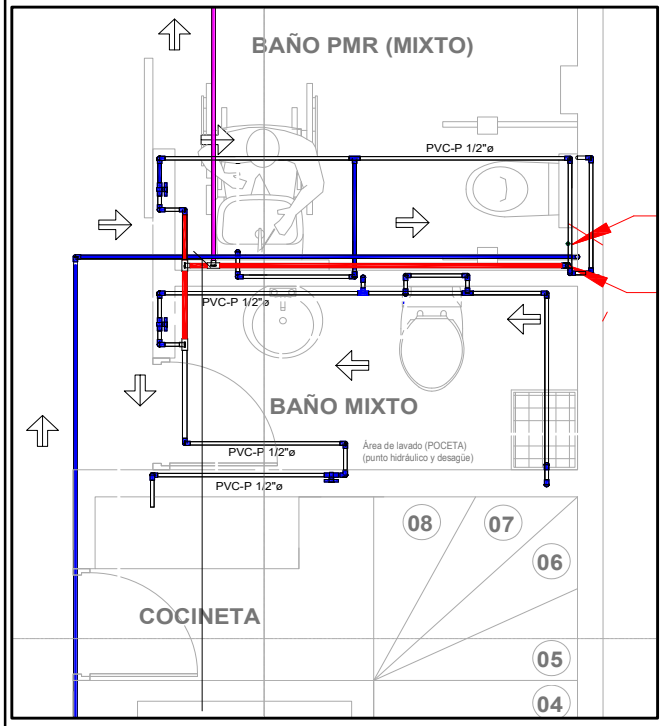

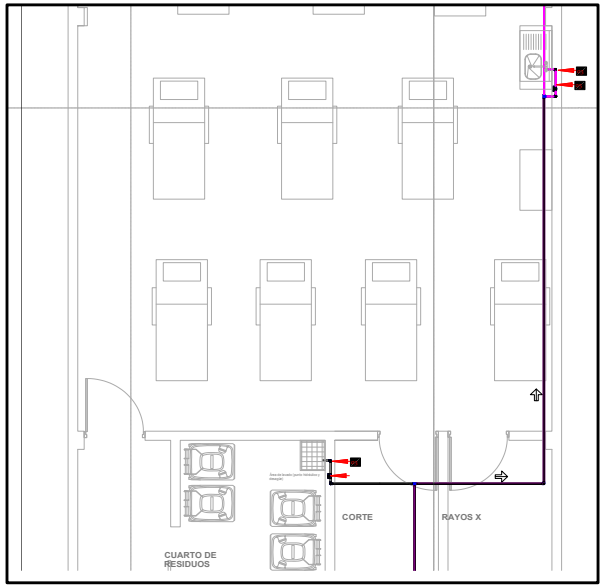

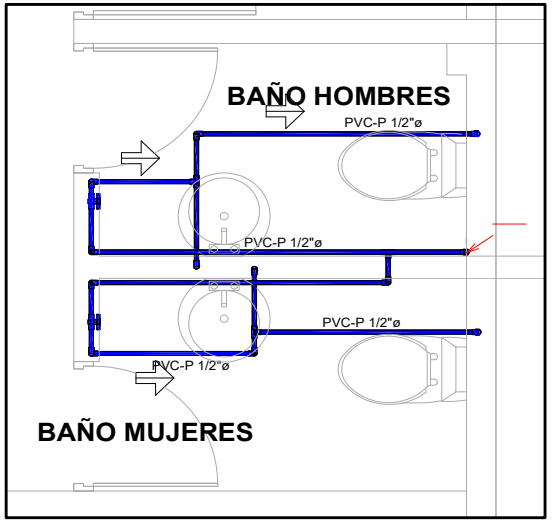

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
C.04	Ejecución de prueba de flujo de redes hidrosanitarias - por zonas	un	3.00















OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
C.05	Ejecución de prueba de estanqueidad de redes hidrosanitarias - por zonas	un	3.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	LARGO	ANCHO	ALTO				
BAÑOS SEGUNDO PISO				1.00	un	1.00	
BAÑOS PRIMER PISO				1.00	un	1.00	
POCETA				1.00	un	1.00	
					Subtotal	3.00	
				TOTAL EJECUTADO		**3.00**	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026


ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI


PABLO A PEÑA
APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
C.05	Ejecución de prueba de estanqueidad de redes hidrosanitarias - por zonas	un	3.00

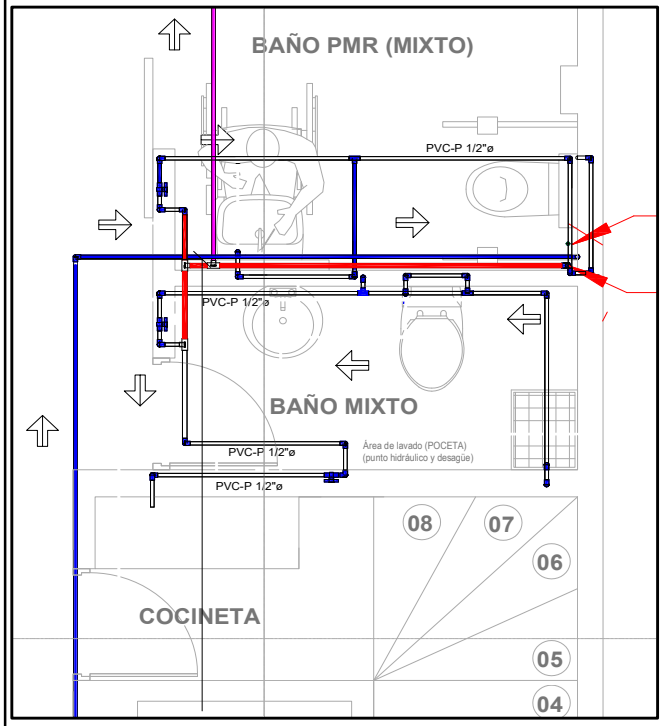

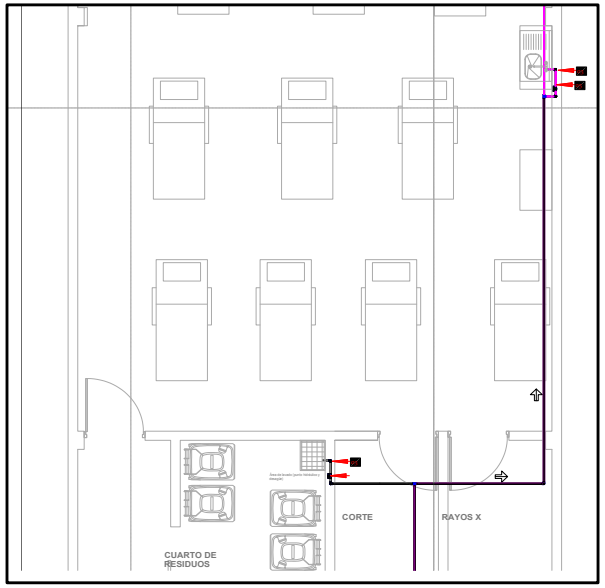


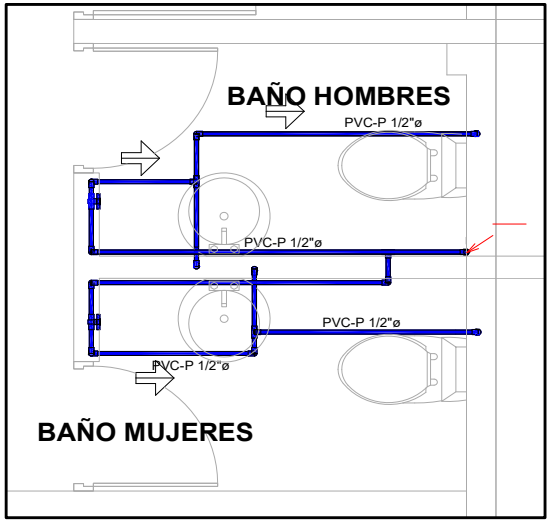

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
C.05	Ejecución de prueba de estanqueidad de redes hidrosanitarias - por zonas	un	3.00



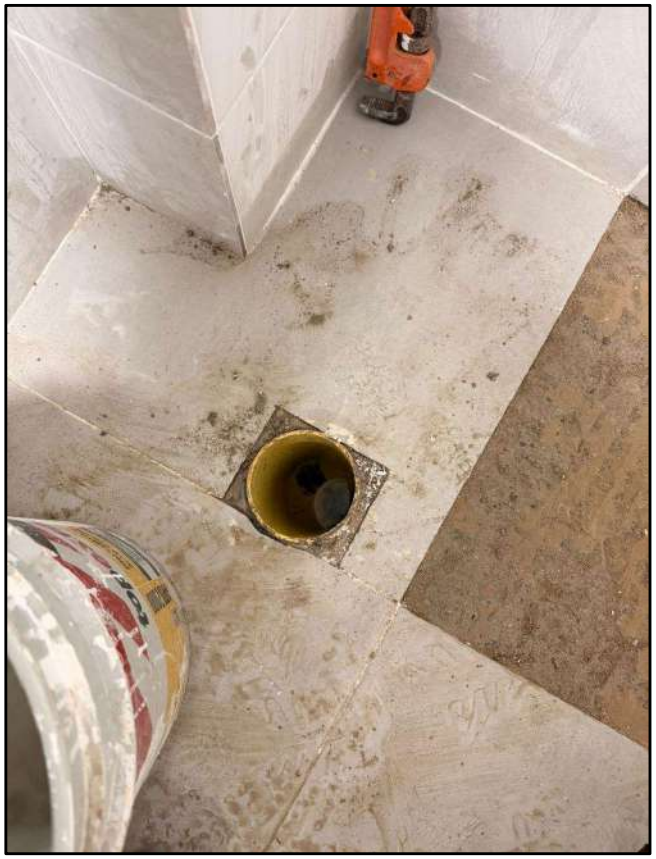

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
C.07	Ejecución de certificación RETIE y RETILAP de las redes eléctricas	un	1.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	LARGO	ANCHO	ALTO				
EDIFICACION				1.00	un	1.00	
					Subtotal	1.00	
				TOTAL EJECUTADO		**1.00**	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

BERNARDO SOTO GARCÍA
SUPERVISOR CONTRATO

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
C.07	Ejecución de certificación RETIE y RETILAP de las redes eléctricas	un	1.00

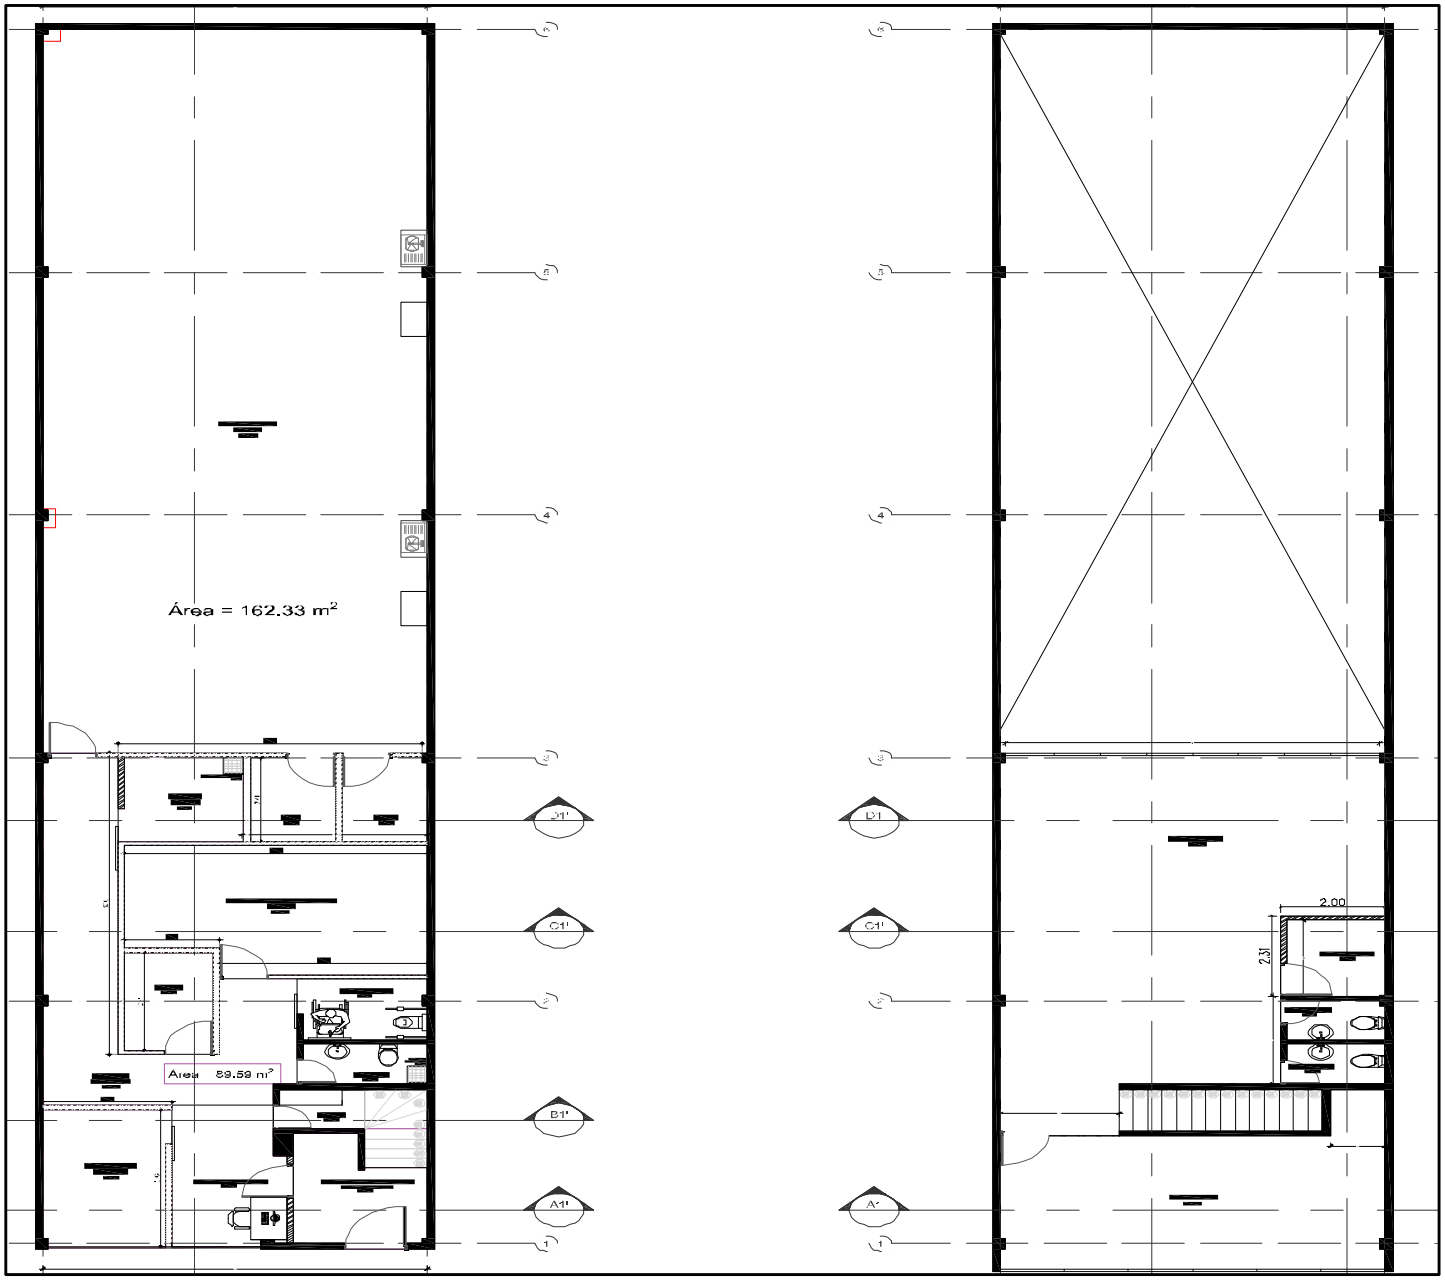

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
C.07	Ejecución de certificación RETIE y RETILAP de las redes eléctricas	un	1.00





















Bernardo Soto Garcia <bsotog@unidadbusqueda.gov.co>

CONTRATO 716-2025 - CIAFI BOGOTÁ - ENTREGABLES FACTURA 4 PARA TRÁMITE

Consorcio ciafi <consorciociafi@gmail.com> 29 de junio de 2026 a las 11:49
Para: Bernardo Soto Garcia <bsotog@unidadbusqueda.gov.co>
Cc: Diana Carolina Sandoval Corredor <dsandovalc@unidadbusqueda.gov.co>

Cordial saludo ingeniero,

En atencion a su solicitud se informa que ya se cuenta con los borradores de las certificaciones RETIE y RETILAP las cuales se estan revisando, y en el transcurso de la semana la entidad certificadora estara emitiendo las respectivas certificaciones.

Agradezco su atencion
[El texto citado está oculto]

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la adecuación, mejoramiento y puesta en correcto funcionamiento del inmueble destinado para el centro integral de abordaje forense e identificación (CIAFI) en la ciudad de Bogotá, de conformidad con los estudios y diseños definitivos suministrados por la UBPD.

UBPD
UNIDAD DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS

CENTRO INTEGRAL DE ABORDAJE FORENSE E IDENTIFICACIÓN

CONTRATO No **No. 716** **DE** **2025**

CONTRATISTA: CONSORCIO CIAFI

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
C.09	Certificación de puntos de red de voz y datos y sus componentes	un	1.00

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA/ REGISTRO FOTOGRÁFICO
	LARGO	ANCHO	ALTO				
EDIFICACION				1.00	un	1.00	
					Subtotal	1.00	
				TOTAL EJECUTADO		**1.00**	

OBSERVACIONES:


Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá D.C., en el mes de MAYO DE 2026

ING. FERNANDO OCHOA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIAFI

JOSE LUIS GONZALEZ MEJIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN UBPD

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
C.09	Certificación de puntos de red de voz y datos y sus componentes	un	1.00

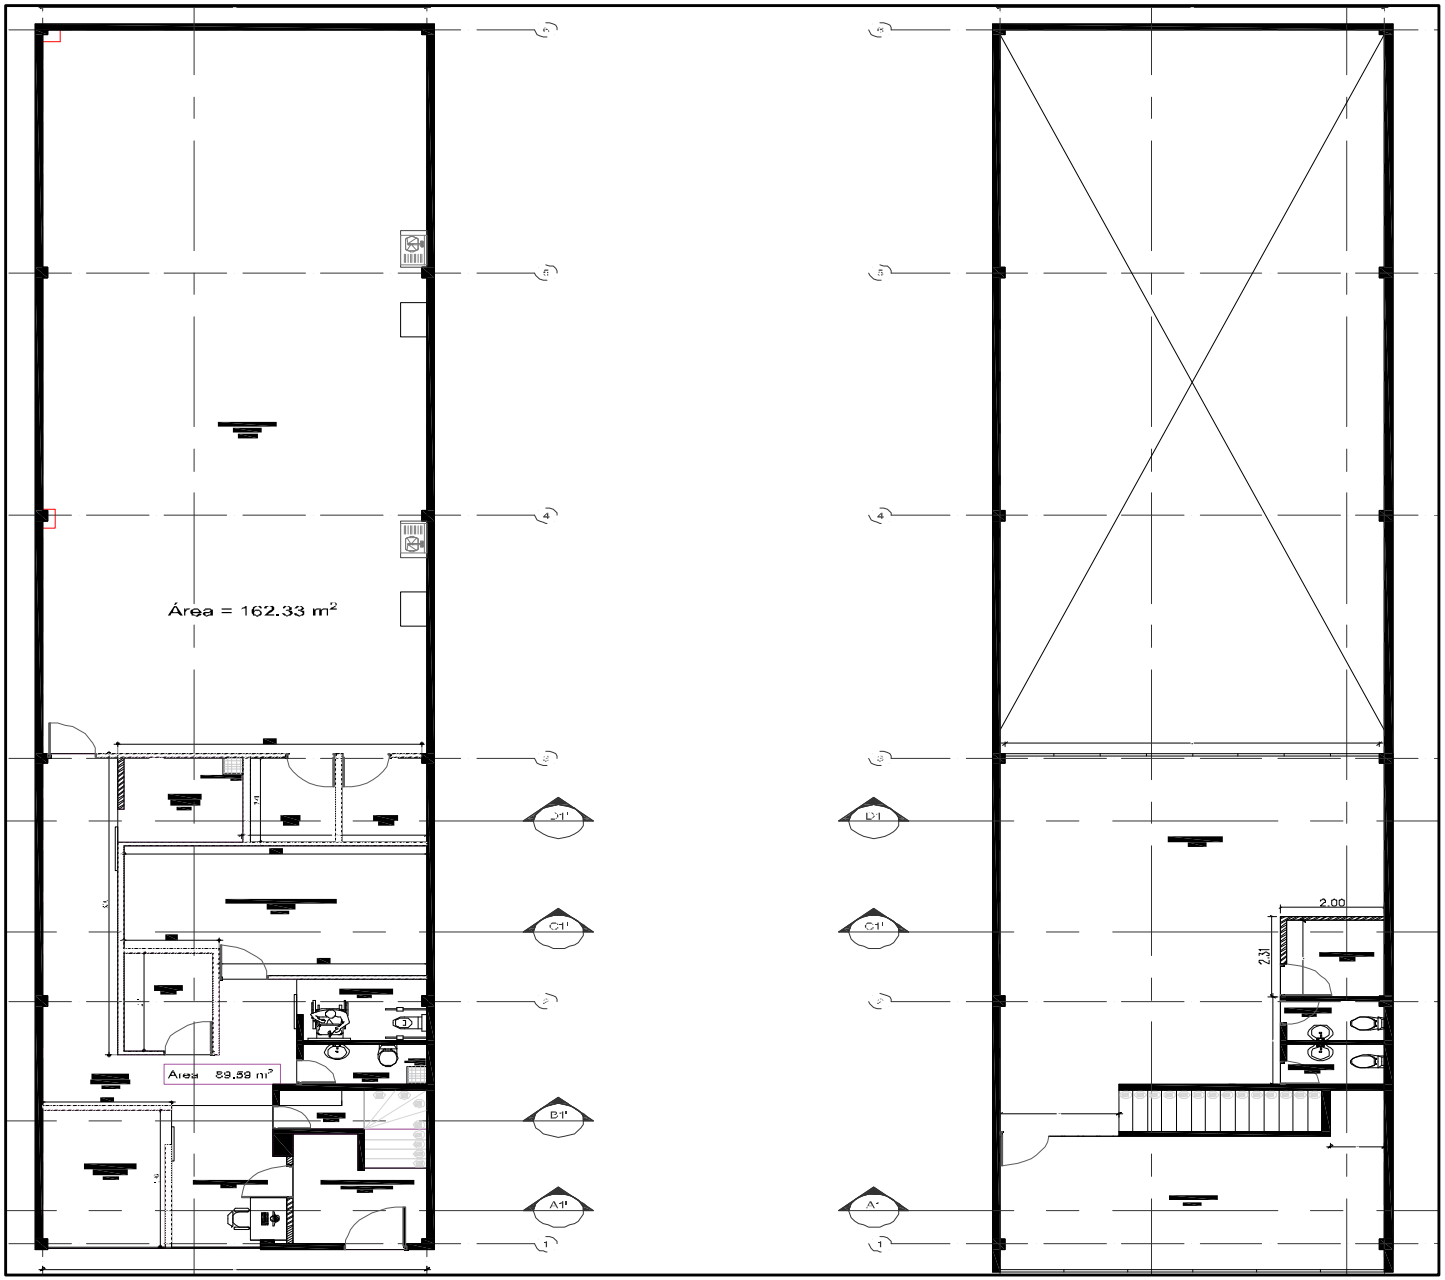

CANTIDADES DE OBRA - PROYECTO			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad total
C.09	Certificación de puntos de red de voz y datos y sus componentes	un	1.00







