TIC	**ACTA DE REUNIÓN**	mig

CODIGO TRD: 2120				
ACTA No. 15	**LUGAR:** TEAMS	**FECHA:** 26/11/2025	**HORA DE INICIO:** 03:00 PM	**HORA FINAL:** 04:00 PM

OBJETO DE LA REUNION

Realizar el Comité Técnico Operativo de noviembre de 2025 con la finalidad de revisar el avance técnico, jurídico y financiero y el cumplimiento del Convenio Interadministrativo 1989-2024 el cual tiene por objeto: "CONECTANDO EL CAUCA: INCLUSIÓN Y APROPIACIÓN TECNOLÓGICA PARA TODOS.", en cumplimiento de lo dispuesto en las Cláusulas Novena y Décima, con el fin de establecer los lineamientos para el cumplimiento de compromisos adquiridos y la toma de decisiones para la correcta ejecución del referido convenio.

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo
2. Verificación de Quorum
3. Estado del Convenio (Gobernación de Cauca)
   Presentación Informe avance de ejecución:
   Estado de obligaciones financieras
   Avance jurídico
4. Matriz de Riesgo
4. Propuestas – varios

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

ITEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
1	Radicar requisitos de la segunda utilización	**Culminado**
2	Remitir pólizas actualizadas tras aprobación de modificatorio	**Culminado**
3	Enviar piezas gráficas de marquillado a MinTIC para aprobación	**Pendiente**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Saludo y Verificación del Quórum

   Delegado del Fondo Único de TIC por parte del Ministerio TIC inicia la sesión y se procede con la verificación de la asistencia de los miembros del comité. Así:

- Por la gobernación de Cauca, se encuentra Daniel Valencia Vitery,
- Representante del Fondo Único De TIC-l ingeniero César Andrés Escalante Borrero

De acuerdo con la verificación del quórum se da por iniciado el comité.

2. Presentación del Estado del Convenio

La Gobernación del Cauca, a través del ingeniero Daniel Valencia, informó que:

El contrato del operador fue adjudicado a la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán (EMTEL S.A. E.S.P.) mediante el contrato 1515 de 2025, con acta de inicio firmada el 6 de junio de 2025.

La interventoría fue adjudicada mediante el contrato 1922 de 2025 a la Unión Temporal Interventoría Inclusión Tecnológica Cauca, con acta de inicio suscrita también el 6 de junio de 2025.

Es importante precisar que los contratos se encuentran en ejecución.

Avance técnico:

El equipo de la Gobernación reportó que el convenio se encuentra en ejecución paralela de varias fases, con el objetivo de optimizar tiempos y garantizar la continuidad y ejecución del proyecto, se está realizando instalación de nodos e instalación de ramales.

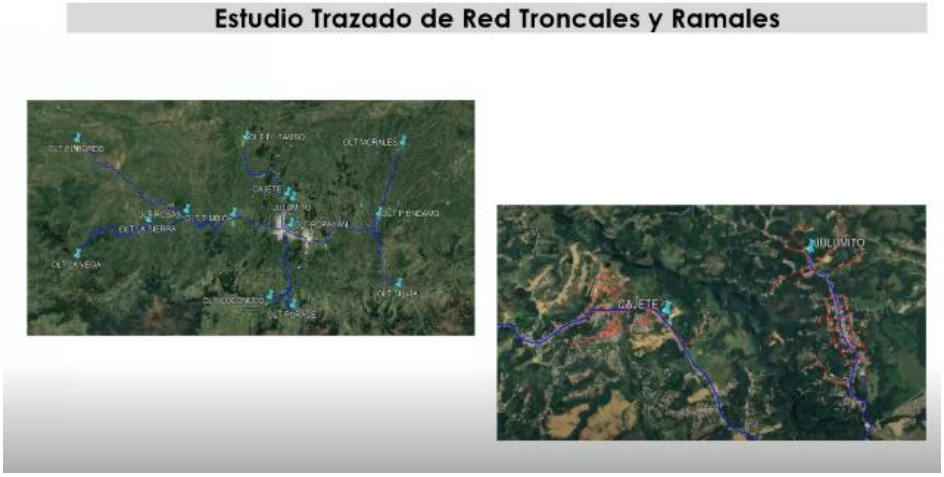


Imagen 1. Trazados de red troncales y ramales. Fuente: presentación gobernación de Cauca.

La gobernación indica que, referente a la instalación de los rack y equipos en los nodos, esta actividad ya se completó al 100%. Ya se hizo la configuración del canal de Internet en el nodo estratégico del proyecto, el nodo ubicado en Popayán. Ahí tenemos ya establecido el canal de Internet por donde se va a arrancar la. La distribución o la asignación del ancho de banda en Cajete y Julumito, que son los corregimientos que inician la operación del proyecto.



Imagen 2. Levantamiento de ramales.

Durante el mes de noviembre se alcanzaron 80 km en despliegue fibra óptica, teniendo en cuanta que se han presentado impactos al cronograma ya que se ha evidenciado que hay algunos que se han materializado riesgos relacionados con tema de orden público.

La gobernación manifiesta que se han presentado inconvenientes con los dueños de los predios, a pesar de que se les muestre que son que es un proyecto de la gobernación, Sin embargo, algunas son bastante ajenas al proyecto y se debe tomar otras negociaciones con ellos del tema de servidumbres, como por ejemplo en algunos escenarios donde se necesita que permitan el paso. Por ejemplo, se han ofrecido lámparas como compensación y de esta manera permiten el paso de los FID.



Imagen 3. Tendidos de fibra óptica.



Imagen 4. Instalación de equipos y nodos. Fuente: presentación gobernación de Cauca.

La gobernación reitera la preocupación por el tema del orden público, indicando que se ha intensificado las acciones terroristas sobre todo en la vía Panamericana, que comunica a todos los municipios.

Indican que se han recibido alertas tempranas que afecta de forma muy álgida el tema de la operación del del convenio. Se está recopilando información para sustentar este impacto frente al avance en la ejecución del convenio.

En ese mismo sentido, la interventoría manifiesta que no ha logrado hacer visitas para avalar los avances mencionados por el operador, sobre todo en la parte de centros de datos.

- **Avance financiero:**

  - Rendimientos financieros:

    De la cuenta bancaria de Banco de Occidente se generaron rendimientos desde diciembre 2024 a mayo 2025 por valor de $4.153.584,45 los cuales ya se encuentran girados en su totalidad al FUTIC.

    Desde la cuenta de Banco de Santander se ha generado rendimientos desde abril a octubre 2025 por valor de $54.207.203,6, los cuales se encuentran transferidos al FUTIC en su totalidad.

Periodo	Rendimientos obtenidos	Rendimientos consignados
Abril	$7,653,511,58	7653511,58
Mayo	$8,476,977,34	8476977,34
Junio	$7,659,688,06	7659688,06
Julio	$9,031,267,62	9031267,62
Agosto	$8,153,406,79	8153406,79
Septiembre	$6.194.216,31	$6.194.216,31
Octubre	$7,038,135,90	$7,038,135,90

TOTAL, RENDIMIENTOS CONSIGNADOS: $54.207.203,6

Tabla 1. Rendimientos financieros Cuenta Banco Santander convenio 1989-2024

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se han generado rendimientos financieros desde diciembre de 2024 a octubre 2025 el valor de $58.360.788, los cuales en su totalidad se encuentran transferidos al FUTIC.

- Seguimiento al Plan de utilizaciones:

Se han aprobado 2 utilizaciones, la primera utilización aprobada el 24 de julio de 2025 los recursos ya han sido girados al operador. La segunda utilización fue aprobada el 14 de noviembre y ya fue girada al operador.

.

UTILIZACION	VALOR UTILIZACION	ESTADO DE LA UTILIZACION
Utilizacion 1	$ 4.400.000.000	APROBADA
Utilizacion 2	$ 4.400.000.000	APROBADA
Utilizacion 3	$ 6.600.000.000	PENDIENTE
Utilizacion 4	$ 4.600.000.000	PENDIENTE

Tabla 2. Estado del plan de utilizaciones convenio 1989-2024

La gobernación indica se acataron y se subsanaron estas observaciones frente a los documentos de la legalización de la utilización dos, por lo que está pendiente radicar los documentos ante MINTIC.

El Supervisor por parte del MINTIC solicita a la Gobernación revisar y darle celeridad al hito que falta cumplir para darle continuidad al trámite financiero.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

- **Avance jurídico:**

- Formalización contractual: El contrato del operador (1515 – EMTEL) y de la interventoría (1922 – UT Inclusión Tecnológica Cauca) se encuentran en ejecución desde el 6 de junio de 2025, con actas de inicio firmadas y pólizas constituidas.

La supervisión de parte del MINTIC enfatizó la importancia de consolidar en los expedientes del convenio todos los modificatorios, pólizas y actas de subsanación, para garantizar trazabilidad en auditorías y soporte jurídico al cierre del convenio.

3. Matriz de riesgo

- Se mantiene el riesgo de orden público en zonas rurales por presencia de grupos armados ilegales, situación que ha dificultado el acceso seguro a algunos municipios.

- Se reiteró la recomendación de mantener reportes semanales para anticipar riesgos y activar alertas tempranas.

4. Proposiciones y Varios

- La supervisión de parte del MINTIC recomendó mantener la documentación de hitos técnicos actualizada para soportar la viabilidad de la segunda utilización.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN POR EJECUTAR	**RESPONSABLE DE EJECUCIÓN**	**FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN**
Documentar las acciones que han impactado el cronograma de implementación del proyecto.	Gobernación de Cauca	10/12/2025

REGISTRO FIRMAS COMITÉ		
NOMBRE COMPLETO	**CARGO**	**FIRMA**
Daniel Valencia Vitery	Delegado Gobernación de Cauca	
Cesar Andrés Escalante Borrero	Representante del Fondo TIC	

REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE COMPLETO	**CARGO**	**ENTIDAD**
Daniel Valencia Vitery	Delegado	Gobernación de Cauca
Carlos Alvis	Apoyo técnico	Gobernación de Cauca
Marly Ching	Líder	Interventoría
Ivone Carvajal Moreno	Apoyo técnico	Gobernación de Cauca
Cesar Andrés Escalante Borrero	Profesional Especializado Subdirección de Operaciones	MINTIC
Carmen Laura Mejía Puerta	Contratista dirección de Infraestructura	MINTIC
Kelly Johanna Aguilera	Contratista Dirección de Infraestructura	MINTIC
Adriana Patricia Moya Castaño	Contratista Dirección de Infraestructura	MINTIC

Anexos

• Lista de asistencia generada por Microsoft Teams.

10 Asistieron	**03:00 p.m. - 04:13 p.m.** Hora de inicio y finalización
1h 13m 16s Duración de la reunión	**43m 25s** Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión
CB Cesar Andres Escalante Borrero cescalante@mintic.gov.co	03:01 p.m.	03:50 p.m.	49m 32s
KM Kelly Johanna Aguilera Martinez kaguileram@mintic.gov.co	03:01 p.m.	03:50 p.m.	49m 31s
RN read.ai meeting ... (No comprobado)	03:03 p.m.	04:06 p.m.	1h 3m 2s
MC Marly Ching (No comprobado)	03:03 p.m.	03:50 p.m.	47m 27s
DV DANIEL VALEN... (No comprobado)	03:03 p.m.	03:50 p.m.	47m 26s
AC Adriana Patricia Moya Castano amoya@mintic.gov.co	03:03 p.m.	03:50 p.m.	46m 52s
CA Carlos alvis (No comprobado)	03:06 p.m.	03:50 p.m.	43m 43s
IM Ivon Carvajal Moreno	03:09 p.m.	03:50 p.m.	40m 51s
CP Carmen Laura Mejia Puerta cmejia@mintic.gov.co	03:24 p.m.	03:24 p.m.	5s
PM Pablo Alejandro Z... (No comprobado)	03:27 p.m.	04:13 p.m.	45m 43s

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta_comite_noviembre_Cauca 1989-2024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260121-140404-621646-18515230

Estado: Finalizado

Creación: 2026-01-21 14:04:04

Finalización: 2026-01-21 19:22:10


Escanee el código para verificación

Firma: Delegado Gobernación de Cauca



Daniel Fernando Valencia Vitery
1061728951
daniel.valencia@cauca.gov.co
Apoyo Técnico SED
Gobernación Del Cauca

Firma: Delegado FUTIC



Cesar Andrés Escalante Borrero
86078943
cescalante@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Subdirección de Operaciones - MINTIC

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Acta_comite_noviembre_Cauca 1989-2024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260121-140404-621646-18515230
Creación: 2026-01-21 14:04:04
Estado: Finalizado
Finalización: 2026-01-21 19:22:10

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Cesar Andrés Escalante Borrero cescalante@mintic.gov.co Profesional Especializado Subdirección de Operaciones - MINTIC	Aprobado	Env.: 2026-01-21 14:04:09 Lec.: 2026-01-21 15:42:36 Res.: 2026-01-21 15:42:47 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email
Firma	Daniel Fernando Valencia Vitery daniel.valencia@cauca.gov.co Apoyo Técnico SED Gobernación Del Cauca	Aprobado	Env.: 2026-01-21 15:42:48 Lec.: 2026-01-21 19:21:54 Res.: 2026-01-21 19:22:10 IP Res.: 190.130.97.89 Canal: Email
