INFORME DE EJECUCIÓN FINAL

1) Datos de identificación del Establecimiento Educativo

Razón Social: **INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESBÍTERO LUIS RODOLFO GÓMEZ RAMÍREZ**
Código DANE: **105697000069**
RUT actualizado del Establecimiento: **811.042.111-1**
Municipio: **EL SANTUARIO**
Nombre de la vereda: **N/A**
Nombre del (a) Rector(a): **ANGELA RUTH MONSALVE PATIÑO**
Cédula de ciudadanía: **42.700.999**
Dirección de la sede principal: **CARRERA 59 N°45-87**
Teléfono de la sede principal (fijo y móvil): **3206897124**
Dirección de correo electrónico de la I.E y del rector: ielisrodolfo@gmail.com
Número de estudiantes beneficiados: **900**
Sede educativa rural a intervenir: **Sede MERCEDES SANÍN CANO**
DANE Sede: 105697000093 Mejoramiento aprobado mediante resolución: **S2025061004860 del 31/10/2025**

2) Información general de la ejecución

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:

En el marco de la convocatoria "Firmes con la Infraestructura Educativa", la Institución Educativa Presbítero Luis Rodolfo Gómez Ramírez, recibió la suma de $28.470.000, para la ejecución de las actividades aprobadas por la Dirección de Infraestructura Educativa para la sede MERCEDES SANÍN CANO.

Porcentaje de ejecución: **100% Cien por ciento.**

1. PRELIMINAR

Como actividad inicial del proyecto, se realizó una visita técnica de reconocimiento con la participación del contratista, los directivos de la institución educativa y el equipo de interventoría de la Secretaría de Planeación del Municipio de Santuario (arquitecto e ingeniero). Durante la visita se verificó el estado de las áreas a intervenir, se revisaron los alcances del proyecto, los diseños y las condiciones técnicas del sitio, definiendo aspectos relacionados con la ejecución de las obras, rectificación de metros cuadrados de teja UPVC y kilos de estructura, medidas de seguridad, logística y coordinación entre las partes para garantizar el adecuado desarrollo de los trabajos.

2. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA

Cantidad ejecutada: 1.193 kg

Se realizó el suministro, fabricación y montaje de la estructura metálica en perfiles estructurales. Las actividades incluyeron corte, soldadura, instalación de anclajes, pernos y platinas, montaje de los elementos estructurales, aplicación de dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte de acabado, así como la verificación de alineación, nivelación y estabilidad de la

estructura. Los trabajos se ejecutaron cumpliendo las especificaciones técnicas y las normas de seguridad industrial.

3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA UPVC DE 2,5 MM

Cantidad ejecutada: 217 m²

Se efectuó el suministro e instalación de la cubierta en teja UPVC termoacustica de 2,5 mm sobre la estructura metálica previamente instalada. Los trabajos comprendieron la colocación, fijación con tornillería especializada, ajustes y limpieza final, garantizando una cubierta resistente, impermeable y conforme con las especificaciones técnicas del proyecto.
Adicional se instalaron en unos intervalos teja UPVC traslucida con el fin de darle iluminación a los patios y que logre entrar el sol del día para que el espacio no se sienta tan frio. Se dejó un intervalo de 0,30 cm alero en todas las superficies, con el fin que no se entre el agua lluvia.

Conclusión

Las actividades correspondientes a la estructura metálica y la instalación de la cubierta fueron ejecutadas satisfactoriamente, cumpliendo con las cantidades contratadas, las especificaciones técnicas, los diseños y los estándares de calidad establecidos para el proyecto.

La ejecución de la obra se logró realizar en el periodo de vacaciones de mitad de año de los niños y los docentes, esto facilito al contratista y no se tuvo riesgo alguno con personas que estuvieran dentro de las instalaciones.

3) Resumen del contrato

CONTRATANTE: Institución Educativa Presbítero Luis Rodolfo Gómez Ramírez
CONTRATISTA: HIDROACE S.A.S.
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LA SEDE EDUCATIVA MERCEDES SANÍN CANO DE LA IE PRESBÍTERO LUIS RODOLFO GÓMEZ RAMÍREZ, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA.".
PLAZO: 120 Días.
VALOR: Veintiocho millones cuatrocientos setenta mil pesos ($28.470.000).
NIT PROVEEDOR: 901.570.097-7
FECHA INICIO: 02 de junio de 2026
FECHA TERMINACIÓN: 25 de junio de 2026

CAMBIO DE OBRA: No aplica.

VALOR EJECUTADO: 100% Veintiocho millones cuatrocientos setenta mil pesos ($28.470.000).




ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
	Actividades			**Semana 1**	**Semana 2**	**Total**
1,00	Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE, W, C para elementos de cubierta	kg	1,193	100%		100%
2,00	Suministro e instalación de TEJA UPVC espesor de 2.5mm. No incluye caballete,.	m^2	217		100%	100%


Lugar de ejecución:




EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

*(Presentar el registro fotográfico del **antes** y el **después** de las actividades ejecutadas, procurar que la fotografía sea lo suficientemente amplia, las fotos deben ser tomadas desde el mismo punto en donde se logre identificar claramente el mejoramiento realizado.)*

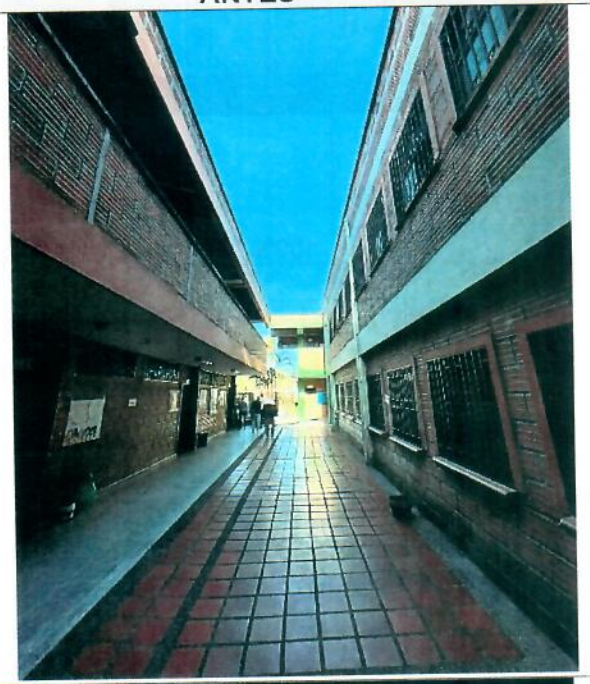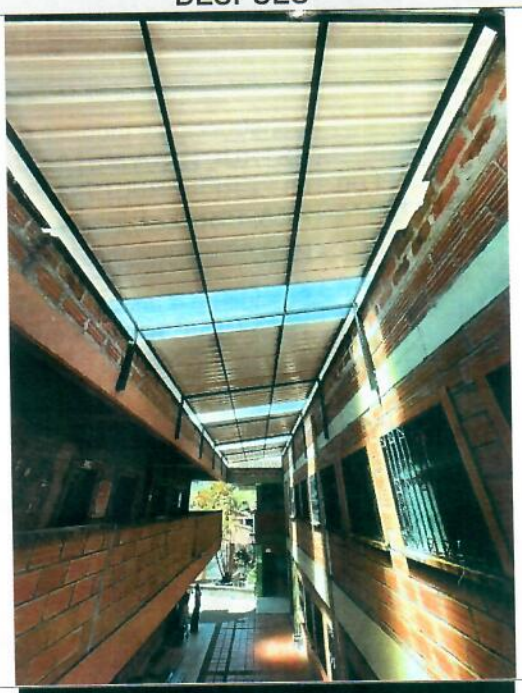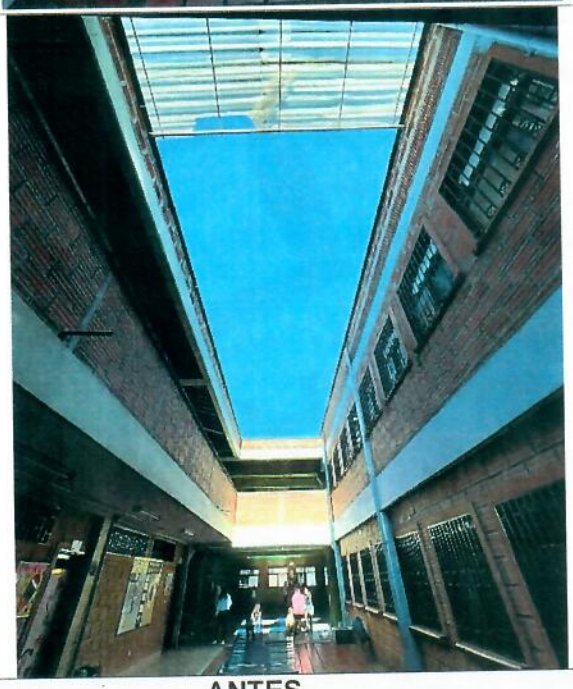ANTES	DESPUÉS
	
	
ANTES	DESPUÉS

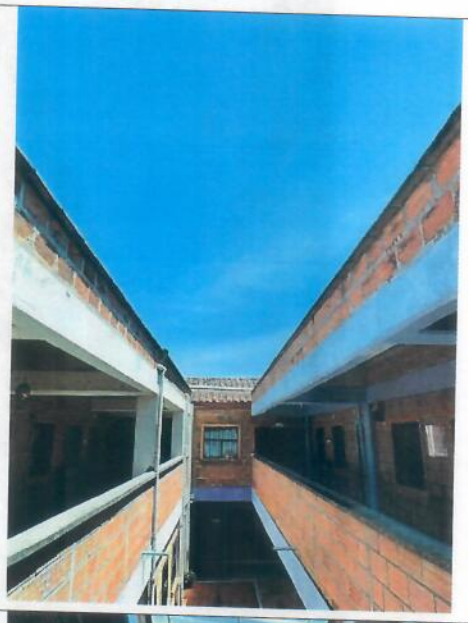



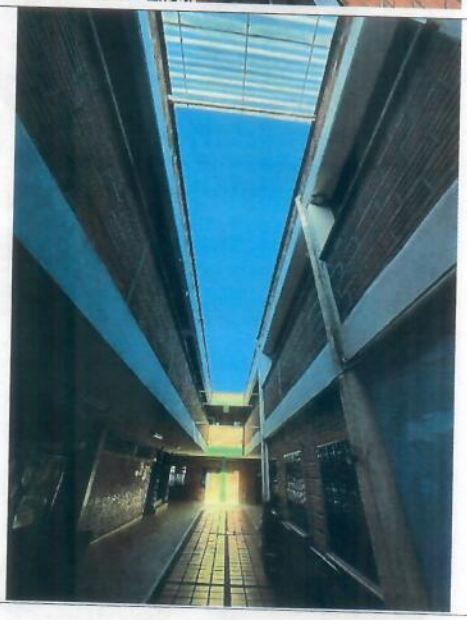






EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS


DURANTE



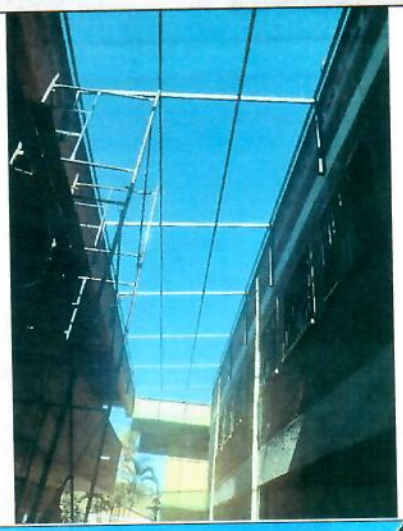

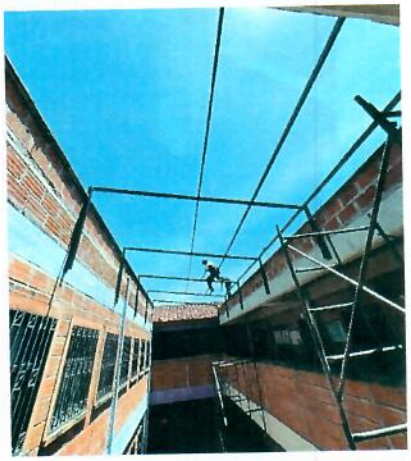


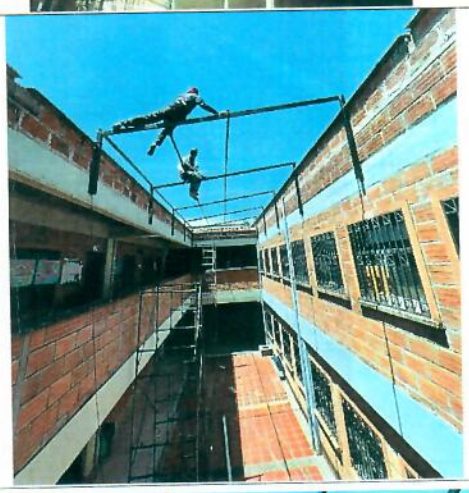

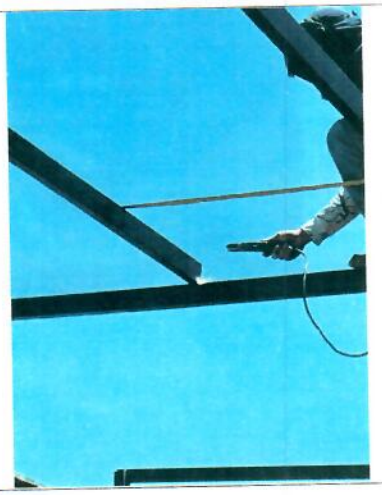



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
DURANTE

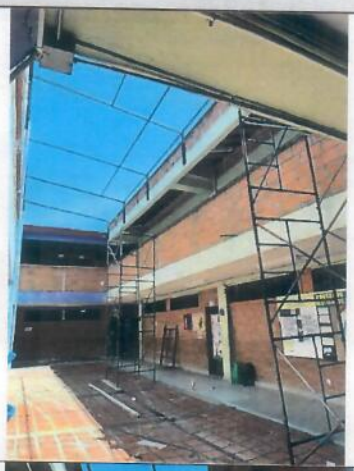






EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS


DURANTE
















EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

DURANTE

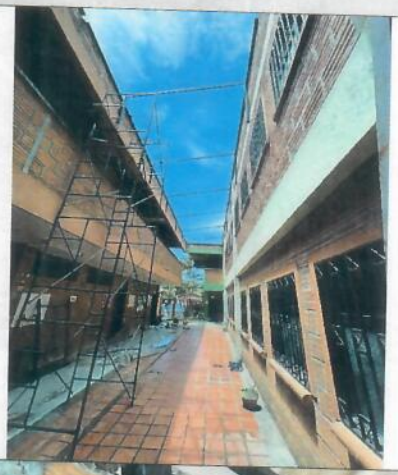












EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

DURANTE

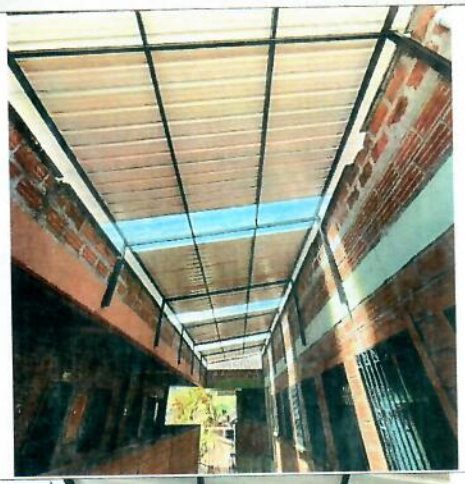











EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

DURANTE














EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
DURANTE



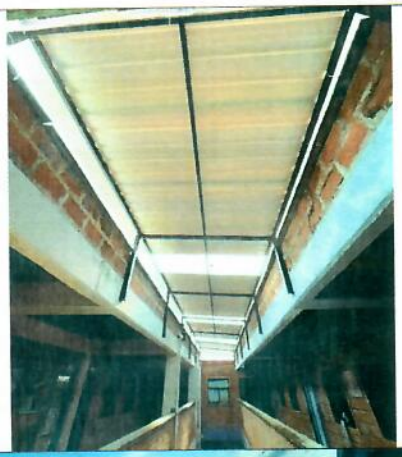









EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

DURANTE





OBSERVACIONES GENERALES

- Las actividades ejecutando sin ningún contratiempo y sin afectar la prestación del servicio académico, teniendo en cuenta que los estudiantes se encontraban en el receso escolar.
- Se ha verificado las actividades que está aprobado en el presupuesto y contrato.

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 de junio de 2026
NOMBRE QUIEN ELABORÓ: ANGELA RUTH MONSALVE PATIÑO

FIRMA:

CÉDULA: 42.700.999
