INFORME DE EJECUCIÓN

1) Datos de identificación del Establecimiento Educativo

Razón Social: **INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESBÍTERO LUIS RODOLFO GÓMEZ RAMÍREZ**
Código DANE: **105697000069**
RUT actualizado del Establecimiento: **811.042.111-1**
Municipio: **SANTUARIO**
Nombre de la vereda: **N/A**
Nombre del (a) Rector(a): **ANGELA RUTH MONSALVE PATIÑO**
Cédula de ciudadanía: **42.700.999**
Dirección de la sede principal: **CARRERA 59 N°45-87**
Teléfono de la sede principal (fijo y móvil): **5460187**
Dirección de correo electrónico de la I.E y del rector: ielisrodolfo@gmail.com
Número de estudiantes beneficiados: **900**
Sede educativa rural a intervenir: **Sede MERCEDES SANÍN CANO**
DANE Sede: 105697000093 Mejoramiento aprobado mediante resolución: **S2025061004860 del 31/10/2025**

2) Información general de la ejecución

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN:

En el marco de la convocatoria "Firmes con la Infraestructura Educativa", la Institución Educativa Presbítero Luis Rodolfo Gómez Ramírez, recibió la suma de $28.470.000, para la ejecución de las actividades aprobadas por la Dirección de Infraestructura Educativa para la sede MERCEDES SANÍN CANO.

Porcentaje de ejecución: 50% Cincuenta por ciento.

1. PRELIMINAR

Como actividad inicial del proyecto, se realizó una visita técnica de reconocimiento con la participación del contratista, los directivos de la institución educativa y el equipo de interventoría de la Secretaría de Planeación del Municipio de Santuario (arquitecto e ingeniero). Durante la visita se verificó el estado de las áreas a intervenir, se revisaron los alcances del proyecto, los diseños y las condiciones técnicas del sitio, definiendo aspectos relacionados con la ejecución de las obras, rectificación de metros cuadrados de teja UPVC y kilos de estructura, medidas de seguridad, logística y coordinación entre las partes para garantizar el adecuado desarrollo de los trabajos.

2. CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA

Cantidad ejecutada: 1.193 kg

Dentro el presupuesto de ejecución aprobado por la dirección de infraestructura, se tiene previsto 517 kg, al momento de la visita técnica se cuantifico el peso real de la estructura a instalar, este supera el valor aprobado, con el contratista llegamos a un acuerdo, el cual nos esta donando una parte y la asociación de padres de familia no puso el otro porcentaje, eso se realizó con el fin de

no afectar el presupuesto aprobado y realizar la intervención necesaria a ejecutar.
Posterior a esto el contratista realizó el suministro, fabricación y montaje de la estructura metálica en perfiles estructurales. Las actividades incluyeron corte, soldadura, instalación de anclajes, pernos y platinas, montaje de los elementos estructurales, aplicación de dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte de acabado, así como la verificación de alineación, nivelación y estabilidad de la estructura. Los trabajos se ejecutaron cumpliendo las especificaciones técnicas y las normas de seguridad industrial.

La ejecución de la obra se viene presentando en el receso escolar de los estudiantes, esto sin afectar las actividades académicas y agilizar el montaje de la estructura.

3) Resumen del contrato

CONTRATANTE: Institución Educativa Presbítero Luis Rodolfo Gómez Ramírez
CONTRATISTA: HIDROACE S.A.S.
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LA SEDE EDUCATIVA MERCEDES SANÍN CANO DE LA IE PRESBÍTERO LUIS RODOLFO GÓMEZ RAMÍREZ, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA.".
PLAZO: 120 Días.
VALOR: Veintiocho millones cuatrocientos setenta mil pesos ($28.470.000).
NIT PROVEEDOR: 901.570.097-7
FECHA INICIO: 02 de junio de 2026
FECHA TERMINACIÓN:

CAMBIO DE OBRA: No aplica.

VALOR EJECUTADO: 50% Catorce millones doscientos treinta y cinco mil pesos ($14.235.000).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
	Actividades			**Semana 1**	**Semana 2**	**Total**
1,00	Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE, W, C para elementos de cubierta	kg	1,193	100%		100%
2,00	Suministro e instalación de TEJA UPVC espesor de 2.5mm. No incluye caballete,.	m^2	217			0%

Lugar de ejecución:





EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS


DURANTE






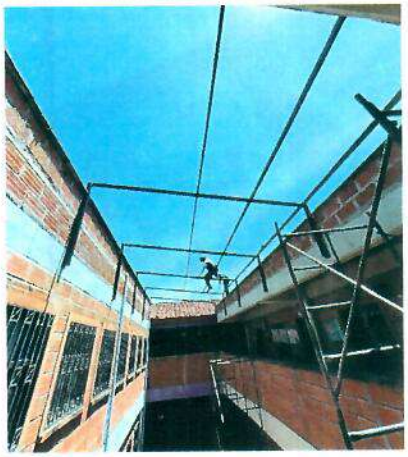

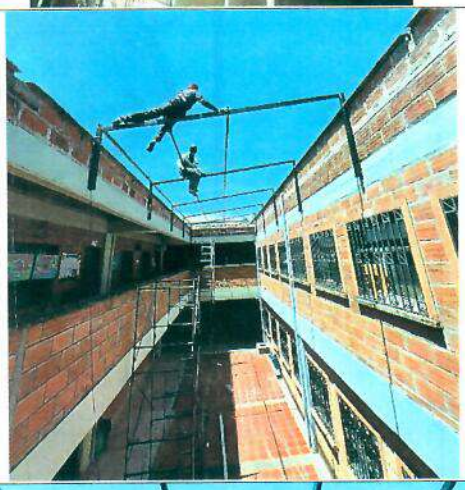


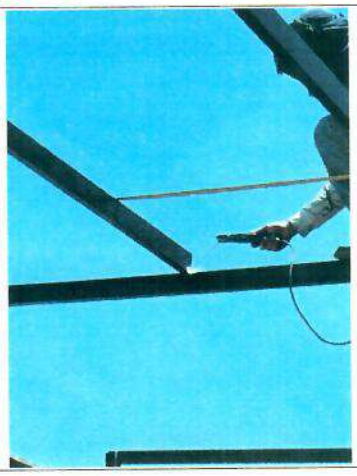

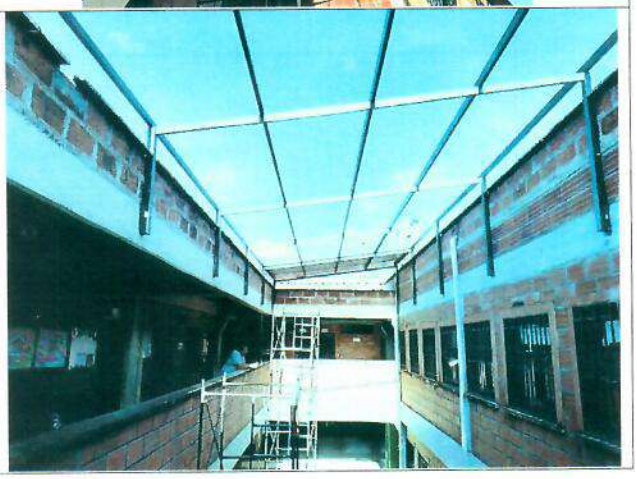

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
DURANTE



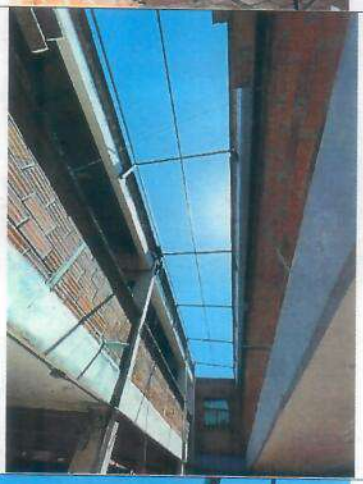




EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS
DURANTE

















EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

DURANTE

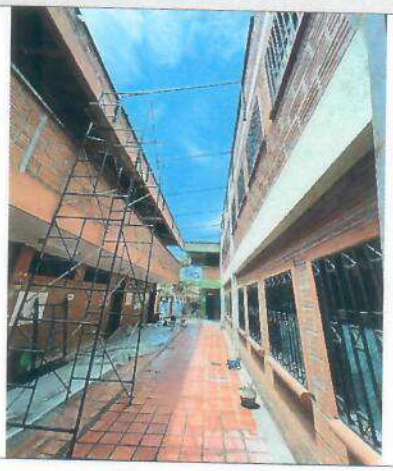

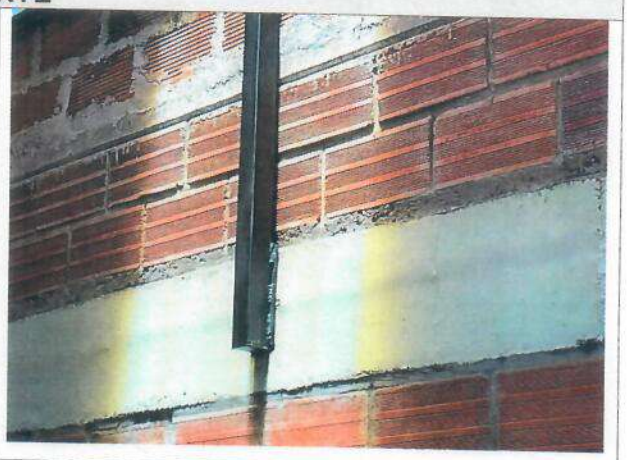

OBSERVACIONES GENERALES

- La actividad de construcción se viene realizando con base en lo estipulado en el presupuesto.

FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de junio de 2026
NOMBRE QUIEN ELABORÓ: ANGELA RUTH MONSALVE PATIÑO

FIRMA:

CÉDULA: 42.700.999
