Remite: CONSORCIO SG VIAL 25 <amvg4santander@gmail.com>

Fecha: 2026-06-03 15:16:29

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: REMISI N COMUNICADO No. 1535.18.484 REPORTE ESTADO DE LA CAPA DE RODADURA DE LA V A BUCARAMANGA C

Adjuntos: 01

Radicado: 2026E-VUVRAZ-057523

Fecha Radicación: 2026-06-03 15:29:13

Cc:



Bucaramanga, junio 03 de 2026

Ingeniero
JAIME ALCIDES RODRÍGUEZ PEÑA
Dirección Territorial Santander (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
jrodriguezp@invias.gov.co
Autopista Floridablanca Kilometro 1 vía a Ritoque

REFERENCIA: Contrato 1535 de 2025 cuyo objeto es: "Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Santander AMV Grupo 4, Lote 1."

Asunto : Reporte estado de la capa de rodadura de la vía Bucaramanga – Cuestaboba, RN6603

Cordial saludo

A través del presente documento, muy respetuosamente, nos permitimos presentar el reporte de novedades con su registro fotográfico, sobre las condiciones del pavimento en el tramo Bucaramanga - Cuesta Boba, RN 6603, con corte al 30 de mayo de 2026.

Con base en dicha inspección, se evidenció un deterioro severo en la estructura del pavimento en el sector comprendido entre el PR51+0900 y el PR53+0200, caracterizado por la presencia de baches que representan un alto riesgo para la seguridad vial y la operabilidad del corredor; por lo que consideramos pertinente que, este reporte sea dado a conocer al contratista vigente del Contrato de Mantenimiento Periódico No. 1720 de 2025, con el fin de que sea incluido en su programación de actividades para la ejecución del sello de fisuras o, conforme a su alcance contractual, la priorización e intervención de los sectores con mayor grado de afectación.

Atentamente,

ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
Ingeniera Residente
Administración Vial G4 – Territorial
Santander CONSORCIO SG VIAL 25

Proyectó: EPET- Ing. Residente.

C.C.	• Ingeniera María Conchita – Ingeniera de Apoyo CTO No 1535-2025 • Archivo Oficina
Anexo	• Registro Fotográfico Auscultación Pavimento con Corte a Mayo 30/2026 (23 Folios)

ANEXOS

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 4 LOTE 1

CONSORCIO SG VIAL 25

AUSCULTACIÓN CAPA DE RODADURA VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RUTA 6603

FECHA DE INSPECCIÓN 7 Y 15 DE MAYO DE 2026

PR INICIAL	PR FINAL	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA AFECTADA APROX (m2)	CARRIL	DESCRIPCIÓN DAÑO	FOTO
23+0378	23+0427	49	1,5	73,5	DERECHO	PIEL DE COCODRILO EN CARRIL DERECHO CON UNA LONGITUD DE 49 M	
23+0565	23+0630	65	7	455	AMBOS	PIEL DE COCODRILO EN EL CENTRO DE LA VÍA CON UNA LONGITUD DE 65 M	
23+0680	23+0710	30	7	210	AMBOS	PIEL DE COCODRILO EN EL CENTRO DE LA VÍA CON UNA LONGITUD DE 30 M	

AUSCULTACIÓN CAPA DE RODADURA VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RUTA 6603

FECHA DE INSPECCIÓN 7 Y 15 DE MAYO DE 2026

PR INICIAL	PR FINAL	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA AFECTADA APROX (m2)	CARRIL	DESCRIPCIÓN DAÑO	FOTO
34+0950	34+0967	17	3	51	DERECHO	PAVIMENTO EN MAL ESTADO GENERAL, PRESENTA FISURAS, DESGASTE SUPERFICIAL, DESPRENDIMIENTO PAVIMENTO	
36+0898	36+0973	75	4	300	DERECHO	DESGASTE SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO, CABEZAS EXPUESTAS, CUNETAS CON DESGASTE Y CONCRETO EN MAL ESTADO; ANCHO CARRIL 4 M, ANCHO CUNETA 2.2 M	
37+0650	37+0660	10	1,2	12	DERECHO	PIEL DE COCODRILO EN CARRIL DERECHO CON UNA LONGITUD DE 10 M	

AUSCULTACIÓN CAPA DE RODADURA VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RUTA 6603

FECHA DE INSPECCIÓN 7 Y 15 DE MAYO DE 2026

PR INICIAL	PR FINAL	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA AFECTADA APROX (m2)	CARRIL	DESCRIPCIÓN DAÑO	FOTO
37+0955	37+0963	8	2	16	DERECHO	PIEL DE COCODRILO EN CARRIL DERECHO CON UNA LONGITUD DE 10 M	
39+0528	39+0531	3	2	6	DERECHO	PIEL DE COCODRILO EN CARRIL DERECHO CON UNA LONGITUD DE 3 M	
39+0534	39+0538	4	2	8	DERECHO	PIEL DE COCODRILO EN CARRIL DERECHO CON UNA LONGITUD DE 4 M	

AUSCULTACIÓN CAPA DE RODADURA VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RUTA 6603

FECHA DE INSPECCIÓN 7 Y 15 DE MAYO DE 2026

PR INICIAL	PR FINAL	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA AFECTADA APROX (m2)	CARRIL	DESCRIPCIÓN DAÑO	FOTO
39+0560	39+0590	30	3,5	105	DERECHO	PIEL DE COCODRILO Y PRESENCIA DE MEDIA LUNA, REQUIERE SELLO DE JUNTA ENTRE CUNETA Y MURO DEBIDO A FILTRACIÓN DE AGUA EN DESNIVEL ALTO	
39+0963	39+0972	10	2	20	DERECHO	PIEL DE COCODRILO EN CARRIL DERECHO CON UNA LONGITUD DE 10 M	
40+0122	40+0132	10	2	20	DERECHO	PIEL DE COCODRILO EN CARRIL DERECHO CON UNA LONGITUD DE 10 M	

AUSCULTACIÓN CAPA DE RODADURA VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RUTA 6603

FECHA DE INSPECCIÓN 7 Y 15 DE MAYO DE 2026

PR INICIAL	PR FINAL	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA AFECTADA APROX (m2)	CARRIL	DESCRIPCIÓN DAÑO	FOTO
40+0160	40+0182	22	2	44	DERECHO	PIEL DE COCODRILO EN CARRIL DERECHO CON UNA LONGITUD DE 22 M	
40+0222	40+0233	11	3,5	38,5	DERECHO	PIEL DE COCODRILO Y PRESENCIA DE MEDIA LUNA, REQUIERE REEMPLAZO DE PAVIMENTO	
40+0353	40+0418	65	3	195	DERECHO	PIEL DE COCODRILO EN CARRIL DERECHO, NO TIENE CONFINAMIENTO A LA DERECHA	

AUSCULTACIÓN CAPA DE RODADURA VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RUTA 6603

FECHA DE INSPECCIÓN 7 Y 15 DE MAYO DE 2026

PR INICIAL	PR FINAL	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA AFECTADA APROX (m2)	CARRIL	DESCRIPCIÓN DAÑO	FOTO
44+0354		1		0	IZQUIERDO	PRESENCIA DE BACHE EN CURVA	
48+0885	48+0887	2	2	4	DERECHO	DESCASCARAMIENTO Y PIEL DE COCODRILO LONGITUD DE 2 M	
48+0887	48+0901	14	2,5	35	IZQUIERDO	PIEL DE COCODRILO EN CARRIL IZQUIERDO CON UNA LONGITUD DE 14 M	

AUSCULTACIÓN CAPA DE RODADURA VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RUTA 6603

FECHA DE INSPECCIÓN 7 Y 15 DE MAYO DE 2026

PR INICIAL	PR FINAL	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA AFECTADA APROX (m2)	CARRIL	DESCRIPCIÓN DAÑO	FOTO
48+0902	48+0922	20	3,65	73	AMBOS	PIEL DE COCODRILO EN AMBOS CARRILES CON UNA LONGITUD DE 20 M	
48+0945		1	1,45	1,45	DERECHO	PRESENCIA DE BACHE	
49+0174	49+0234	60	3,5	210	IZQUIERDO	PRESENCIA DE PIEL DE COCODRILO, FISURAS Y DESPRENDIMIENTO DE PAVIMENTO	

AUSCULTACIÓN CAPA DE RODADURA VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RUTA 6603

FECHA DE INSPECCIÓN 7 Y 15 DE MAYO DE 2026

PR INICIAL	PR FINAL	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA AFECTADA APROX (m2)	CARRIL	DESCRIPCIÓN DAÑO	FOTO
49+0234	49+0236	2	3,5	7	DERECHO	PIEL DE COCODRILO EN CARRIL DERECHO CON UNA LONGITUD DE 2 M	
49+0247	49+0259	12	5	60	AMBOS	PIEL DE COCODRILO EN EL CENTRO DE LA VÍA CON UNA LONGITUD DE 12 M	
49+0264	49+0293	29	5	145	AMBOS	PRESENCIA DE FISURAS LONGITUDINALES 29 M	

AUSCULTACIÓN CAPA DE RODADURA VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RUTA 6603

FECHA DE INSPECCIÓN 7 Y 15 DE MAYO DE 2026

PR INICIAL	PR FINAL	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA AFECTADA APROX (m2)	CARRIL	DESCRIPCIÓN DAÑO	FOTO
49+0319	49+0326	7	3,5	24,5	AMBOS	PIEL DE COCODRILO EN AMBOS CARRILES DE LA VÍA CON UNA LONGITUD DE 7 M	
49+0333	49+0350	17	3,5	59,5	AMBOS	PIEL DE COCODRILO EN EL CENTRO DE LA VÍA CON UNA LONGITUD DE 17 M	
49+0350	49+0363	13	3,5	45,5	IZQUIERDO	PIEL DE COCODRILO EN EL CARRIL IZQUIERDO DE LA VÍA CON UNA LONGITUD DE 13 M	

AUSCULTACIÓN CAPA DE RODADURA VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RUTA 6603

FECHA DE INSPECCIÓN 7 Y 15 DE MAYO DE 2026

PR INICIAL	PR FINAL	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA AFECTADA APROX (m2)	CARRIL	DESCRIPCIÓN DAÑO	FOTO
49+0363	49+0383	20	3,5	70	DERECHO	PRESENCIA DE FISURAS SEVERAS EN EL CARRIL DERECHO DE LA VÍA CON UNA LONGITUD DE 20 M	
49+0400	49+0403	3	3,5	10,5	DERECHO	PRESENCIA DE FISURAS Y DESPRENDIMIENTO DE BORDE LONGITUD 3 M	
49+0406	49+0422	16	3,5	56	DERECHO	PIEL DE COCODRILO EN EL CARRIL DERECHO DE LA VÍA CON UNA LONGITUD DE 16 M	

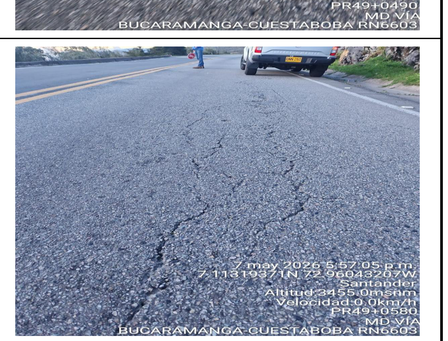
AUSCULTACIÓN CAPA DE RODADURA VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RUTA 6603

FECHA DE INSPECCIÓN 7 Y 15 DE MAYO DE 2026

PR INICIAL	PR FINAL	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA AFECTADA APROX (m2)	CARRIL	DESCRIPCIÓN DAÑO	FOTO
49+0422	49+0433	11	2	22	AMBOS	PIEL DE COCODRILO EN EL CENTRO DE LA VÍA CON UNA LONGITUD DE 11 M	
49+0433	49+0449	16	2	32	AMBOS	PIEL DE COCODRILO Y FISURAS EN EL CENTRO DE LA VÍA CON UNA LONGITUD DE 16 M	
49+0465	49+0482	17	2	34	AMBOS	PIEL DE COCODRILO EN EL CENTRO DE LA VÍA CON UNA LONGITUD DE 17 M	

AUSCULTACIÓN CAPA DE RODADURA VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RUTA 6603

FECHA DE INSPECCIÓN 7 Y 15 DE MAYO DE 2026

PR INICIAL	PR FINAL	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA AFECTADA APROX (m2)	CARRIL	DESCRIPCIÓN DAÑO	FOTO
49+0490	49+0560	70	2	140	DERECHO	PRESENCIA DE DESPRENDIMIENTO DE PAVIMENTO Y BACHES, LONGITUD DAÑO 70 M	
49+0580	49+0590	10	2	20	DERECHO	PIEL DE COCODRILO EN EL CARRIL DERECHO DE LA VÍA CON UNA LONGITUD DE 10 M	
49+0626	49+0632	6	3,5	21	AMBOS	PRESENCIA DE DESPRENDIMIENTO DE PAVIMENTO EN EL CENTRO DE LA VÍA LONGITUD 6 M	

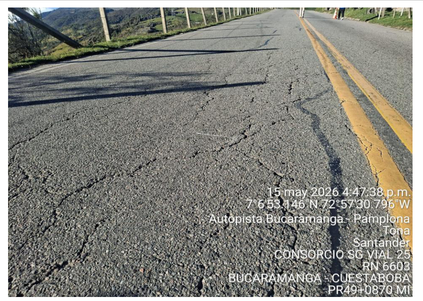
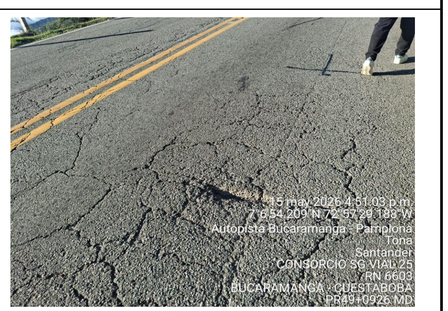
AUSCULTACIÓN CAPA DE RODADURA VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RUTA 6603

FECHA DE INSPECCIÓN 7 Y 15 DE MAYO DE 2026

PR INICIAL	PR FINAL	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA AFECTADA APROX (m2)	CARRIL	DESCRIPCIÓN DAÑO	FOTO
49+0687	49+0701	14	3,5	49	IZQUIERDO	PIEL DE COCODRILO EN EL CARRIL IZQUIERDO DE LA VÍA CON UNA LONGITUD DE 14 M	
49+0716	49+0796	80	7	560	AMBOS	PRESENCIA DE PIEL DE COCODRILO, FISURAS Y DESPRENDIMIENTO DE PAVIMENTO LONGITUD DAÑO 80 M	
49+0820	49+0855	35	2	70	DERECHO	PIEL DE COCODRILO Y BACHES CARRIL DERECHO LONGITUD DAÑO 35 M	

AUSCULTACIÓN CAPA DE RODADURA VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RUTA 6603

FECHA DE INSPECCIÓN 7 Y 15 DE MAYO DE 2026

PR INICIAL	PR FINAL	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA AFECTADA APROX (m2)	CARRIL	DESCRIPCIÓN DAÑO	FOTO
49+0855	49+0870	15	2	30	IZQUIERDO	PIEL DE COCODRILO Y BACHES CARRIL IZQUIERDO LONGITUD DAÑO 15 M	
49+0870	49+0881	11	2	22	AMBOS	PRESENCIA DE FISURA PROGRESIVA LONGITUDINAL DE ALTA SEVERIDAD EN AMBOS CARRILES DE LA VÍA LONGITUD DAÑO 11 M	
49+0889	49+0939	50	2	100	AMBOS	PIEL DE COCODRILO EN 100% DEL CARRIL IZQUIERDO Y PIEL DE COCODRILO EN UN 40% DEL CARRIL DERECHO LONGITUD DAÑO 50 M	

AUSCULTACIÓN CAPA DE RODADURA VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RUTA 6603

FECHA DE INSPECCIÓN 7 Y 15 DE MAYO DE 2026

PR INICIAL	PR FINAL	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA AFECTADA APROX (m2)	CARRIL	DESCRIPCIÓN DAÑO	FOTO
49+0987	50+0000	13	2	26	IZQUIERDO	PRESENCIA DE FISURAS LONGITUDINALES CARRIL IZQUIERDO LONGITUD 13 M	
50+0210	50+0220	10	2	20	DERECHO	PRESENCIA DE FISURAS LONGITUDINALES CARRIL DERECHO LONGITUD 10 M	
50+0234	50+0240	6	1,5	9	DERECHO	SE EVIDENCIA UN PARCHE REALIZADO POR LA ANI RECIENTEMENTE CON PIEL DE COCODRILO EN EL CARRIL DERECHO LONGITUD DAÑO 6 M	

AUSCULTACIÓN CAPA DE RODADURA VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RUTA 6603

FECHA DE INSPECCIÓN 7 Y 15 DE MAYO DE 2026

PR INICIAL	PR FINAL	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA AFECTADA APROX (m2)	CARRIL	DESCRIPCIÓN DAÑO	FOTO
50+0251	50+0258	7	2	14	IZQUIERDO	PRESENCIA DE DESGASTE SUPERFICIAL Y FISURA SEVERA EN EL CARRIL IZQUIERDO LONGITUD DAÑO 7 M	
50+0258				0	DERECHO	FISURA TRANSVERSAL EN EL CARRIL DERECHO	
50+0279	50+0289	10	2,5	25	IZQUIERDO	DETERIORO DEL PARCHE REALIZADO RECIENTEMENTE Y PIEL DE COCODRILO EN EL CARRIL IZQUIERDO DE LA VÍA LONGITUD 10 M	

AUSCULTACIÓN CAPA DE RODADURA VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RUTA 6603

FECHA DE INSPECCIÓN 7 Y 15 DE MAYO DE 2026

PR INICIAL	PR FINAL	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA AFECTADA APROX (m2)	CARRIL	DESCRIPCIÓN DAÑO	FOTO
50+0289	50+0299	10	2,5	25	DERECHO	PIEL DE COCODRILO EN EL CARRIL DERECHO DE LA VÍA CON UNA LONGITUD DE 10 M	
50+0330	50+0338	8	2	16	DERECHO	PIEL DE COCODRILO EN EL CARRIL DERECHO DE LA VÍA CON UNA LONGITUD DE 8 M	
52+0040	52+0057	17	3,5	59,5	DERECHO	PIEL DE COCODRILO EN EL CARRIL DERECHO DE LA VÍA CON UNA LONGITUD DE 17 M	

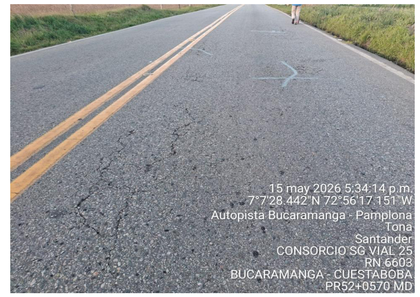
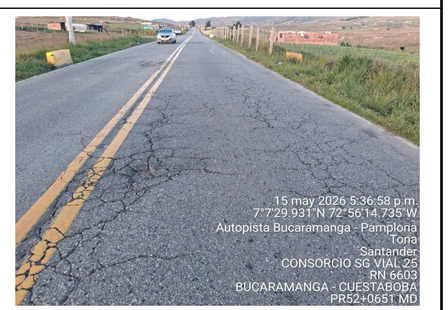
AUSCULTACIÓN CAPA DE RODADURA VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RUTA 6603

FECHA DE INSPECCIÓN 7 Y 15 DE MAYO DE 2026

PR INICIAL	PR FINAL	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA AFECTADA APROX (m2)	CARRIL	DESCRIPCIÓN DAÑO	FOTO
52+0088	52+0091	3	7	21	AMBOS	PERDIDA DE LIGANTE Y CABEZAS EXPUESTAS EN AMBOS CARRILES DE LA VÍA LONGITUD DAÑO DE 3 M	
52+0455	52+0470	15	3,5	52,5	DERECHO	PIEL DE COCODRILO EN EL CARRIL DERECHO DE LA VÍA CON UNA LONGITUD DE 15 M	
52+0480	52+0549	69	3,5	241,5	DERECHO	PIEL DE COCODRILO EN EL CARRIL DERECHO DE LA VÍA CON UNA LONGITUD DE 69 M	

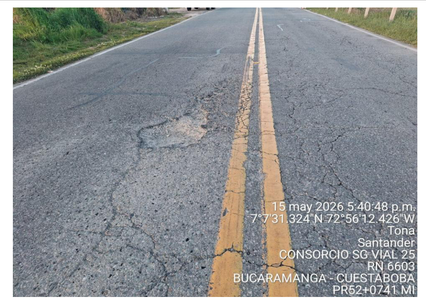
AUSCULTACIÓN CAPA DE RODADURA VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RUTA 6603

FECHA DE INSPECCIÓN 7 Y 15 DE MAYO DE 2026

PR INICIAL	PR FINAL	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA AFECTADA APROX (m2)	CARRIL	DESCRIPCIÓN DAÑO	FOTO
52+0570	52+0583	13	3,5	45,5	DERECHO	PIEL DE COCODRILO EN EL CARRIL DERECHO DE LA VÍA CON UNA LONGITUD DE 13 M	
52+0610	52+0624	14	3,5	49	DERECHO	PIEL DE COCODRILO EN EL CARRIL DERECHO DE LA VÍA CON UNA LONGITUD DE 14 M	
52+0651	52+0766	115	7	805	AMBOS	PRESENCIA DE PIEL COCODRILO EN UN 100% DEL CARRIL DERECHO Y EN UN 20% DEL CARRIL IZQUIERDO DE LA VÍA DURANTE UNA LONGITUD DE 115 M	

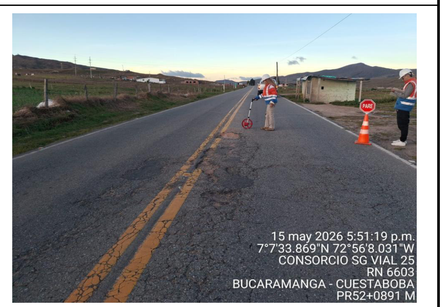
AUSCULTACIÓN CAPA DE RODADURA VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RUTA 6603

FECHA DE INSPECCIÓN 7 Y 15 DE MAYO DE 2026

PR INICIAL	PR FINAL	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA AFECTADA APROX (m2)	CARRIL	DESCRIPCIÓN DAÑO	FOTO
52+0679	52+0680	1	0,8	0,8	IZQUIERDO	BACHE EN EL CARRIL IZQUIERDO DE LA VÍA	
52+0741	52+0742	1,3	0.4	#¡VALOR!	IZQUIERDO	BACHE EN EL CARRIL IZQUIERDO DE LA VÍA	
52+0780	52+0820	40	2	80	DERECHO	PRESENCIA DE FISURA LONGITUDINAL Y TRANSVERSALES, REQUIERE SELLO LONGITUD 40 M	

AUSCULTACIÓN CAPA DE RODADURA VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RUTA 6603

FECHA DE INSPECCIÓN 7 Y 15 DE MAYO DE 2026

PR INICIAL	PR FINAL	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA AFECTADA APROX (m2)	CARRIL	DESCRIPCIÓN DAÑO	FOTO
52+0844	52+0859	15	7	105	AMBOS	ZONA DE BACHES Y PIEL DE COCODRILO, PRESENCIA DE DESCASCARAMIENTO EN AMBOS CARRILES DE LA VÍA LONGITUD DAÑO 15 M	
52+0863	52+0891	28	7	196	AMBOS	PRESENCIA DE PIEL COCODRILO EN UN 100% DEL CARRIL DERECHO Y EN UN 30% DEL CARRIL IZQUIERDO DE LA VÍA DURANTE UNA LONGITUD DE 28 M	
52+0891	52+0892	1	0,6	0,6	DERECHO	BACHE EN EL CARRIL DERECHO DE LA VÍA	

AUSCULTACIÓN CAPA DE RODADURA VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RUTA 6603

FECHA DE INSPECCIÓN 7 Y 15 DE MAYO DE 2026

PR INICIAL	PR FINAL	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA AFECTADA APROX (m2)	CARRIL	DESCRIPCIÓN DAÑO	FOTO
52+0912	52+0924	12	3,5	42	DERECHO	PRESENCIA DE PIEL DE COCODRILO, BACHES Y FISURAS EN EL CARRIL DERECHO DE LA VÍA LONGITUD DAÑO 12 M	
52+0955	52+0963	8	3,5	28	DERECHO	PIEL DE COCODRILO EN EL CARRIL DERECHO DE LA VÍA CON UNA LONGITUD DE 8 M	
52+0978	53+0000	18	2	36	DERECHO	PIEL DE COCODRILO EN EL CARRIL DERECHO DE LA VÍA CON UNA LONGITUD DE 18 M	

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL SANTANDER
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 4 LOTE 1

CONSORCIO SG VIAL 25

AUSCULTACIÓN CAPA DE RODADURA VÍA BUCARAMANGA - CUESTABOBA, RUTA 6603

FECHA DE INSPECCIÓN 7 Y 15 DE MAYO DE 2026

PR INICIAL	PR FINAL	LARGO (m)	ANCHO (m)	AREA AFECTADA APROX (m2)	CARRIL	DESCRIPCIÓN DAÑO	FOTO
53+0021	53+0066	45	3,5	157,5	DERECHO	PIEL DE COCODRILO EN EL CARRIL DERECHO DE LA VÍA CON UNA LONGITUD DE 45 M	
53+0084	53+0094	10	2	20	DERECHO	PIEL DE COCODRILO EN EL CARRIL DERECHO DE LA VÍA CON UNA LONGITUD DE 10 M	
53+0118	53+0141	23	3,5	80,5	DERECHO	DESCASCARAMIENTO Y PIEL DE COCODRILO LONGITUD DE 23 M	

ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES
Ingeniera Residente
Administración Vial G4 - INVIAS
CONSORCIO SG VIAL 25
